CONSORCIO
CONSOLIDACIÓN GIRÓN

GRUPO 4: CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACION PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN EL TALUD ORIENTAL DEL BARRIO VILLA DE LOS CABALLEROS EN EL MUNICIPIO DE GIRÓN, DEPARTAMENTO DE SANTANDER.



CONTRATO No. 210.16225.6 del 5 de septiembre del 2025

INFORME DE AVANCE DE OBRA No.06
PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DEL 2026

TABLA DE CONTENIDO

1. OBJETIVO GENERAL 4
1.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS 4
2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 5
3. INFORMACIÓN CONTRACTUAL 7
3.1 PRESUPUESTO INICIAL APROBADO 8
3.2 LEGALIZACIÓN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 210.16225.6 9
3.3 ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 210.16225.6 9
3.4 CONTROL DE GARANTÍAS – POLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA 9
4. RELACIÓN DE PERSONAL Y EQUIPO UTILIZADO POR CONSORCIO CONSOLIDACIÓN GIRÓN 10
5. INFORME AVANCE EJECUTADO POR EL CONSORCIO CONSOLIDACIÓN GIRÓN 13
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 13
5.1 SECCIÓN PRIMERA 14
5.1.1 Replanteo, Control y medición de Obra (mes) 14
5.2 SECCIÓN TERCERA 15
5.2.1 Suministro y colocación de concreto de 3000 psi con mezcla húmeda para zapatas 15
5.2.2 Suministro y colocación de concreto lanzado con mezcla húmeda de espesor 10 cm 16
5.3 SECCIÓN SEXTA 18
5.3.1 Canaleta (ancho = 1m; e =10cm) m 18
5.3.2 Estructura de disipación de energía (m) 19
1. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS 20
1.1 OBRAS PROGRAMADAS, EJECUTADAS Y ACUMULADAS 20
1.2 RELACIÓN DE ACTAS DE REUNIÓN 20
1.3 BITACORA DE OBRA 21
1.4 AFILIACIONES SEGURIDAD SOCIAL 22
1.5 SEGUIMIENTO Y CONTROL 22
1.6 ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES, DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 22
2. ACTIVIDADES ACUMULADAS TOTALES 25
3. INFORME GENERAL DE ESTADO DEL TIEMPO 26
4. PROGRAMA DE GERENCIA 27
5. CONCLUSIONES. 27
6. ANEXOS 29

1. INTRODUCCIÓN

El Consorcio Consolidación Girón, identificado con NIT 901.982.571-5 conformado por INFRACORP S.A.S con un porcentaje de participación del 90%, CONAINCO S.A.S con un porcentaje de participación del 10%, representado legalmente por la Ingeniera Johanna Marcela Padierna Castiblanco, fue establecido para licitar y ejecutar el Contrato de Obra No 210.16225.6 del 5 de septiembre del 2025 cuyo objeto es: **CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARMANGA- GRUPO 4: CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACION PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN EL TALUD ORIENTAL DEL BARRIO VILLA DE LOS CABALLEROS EN EL MUNICIPIO DE GIRÓN, DEPARTAMENTO DE SANTANDER.**

El municipio de Girón se encuentra altamente poblado por lo cual ha obligado a la población a migrar y construir en las zonas que presentan amenazas por movimientos en masa, erosión e inundación; por tal motivo y en miras de proteger a la comunidad presente en dichos sectores se realizó la evaluación de los factores de amenaza con el fin de controlar los problemas que se puedan presentar. Se realizó un estudio geotécnico y geológico debido a la posible afectación de múltiples viviendas que en caso de emergencia podrían provocar grandes pérdidas materiales y sobre todo pérdida de un gran número de vidas que se encuentran en el sector.

Se desarrolló un estudio sobre la evaluación de vulnerabilidad realizada a los predios que comprenden la zona objeto de intervención. Los resultados evidencian que el índice de vulnerabilidad total de las edificaciones analizadas presenta una distribución proporcional entre los índices de vulnerabilidad alta y media. Esta condición se asocia principalmente a construcciones localizadas sobre las coronas y los pies de taludes con pendientes pronunciadas, entre 40° y 70°, donde la cobertura vegetal es limitada y se concentra hacia el costado sur de la zona de estudio. En consecuencia, se considera prioritario ejecutar la obra geotécnica propuesta, orientada a mitigar la amenaza por movimientos en masa. Lo anterior obedece a los altos niveles de erosión generados tanto por la escasa vegetación como por las características geotécnicas propias del sector, con el fin de salvaguardar la integridad de las viviendas asentadas en el área aferente al proyecto.

Se presenta el Informe de Avance de Obra No. 06, correspondiente al período comprendido entre el 1 al 31 de marzo de 2026, en el cual se describen de manera técnica y detallada las actividades constructivas ejecutadas en el frente de obra, así como el comportamiento del avance físico del proyecto. Durante el período evaluado se registró un avance significativo asociado al Capítulo III: CONCRETOS. En este contexto, se ejecutaron y culminaron las actividades de concreto lanzado en la pantalla intervenida, cubriendo la totalidad del área proyectada, incluyendo las zapatas. Así mismo, se cuenta con los respectivos soportes de control de calidad mediante ensayos de laboratorio del concreto lanzado, con resistencia especificada de 3000 psi, agregado de 3/8", asentamiento de 7" y verificación a edades de 7 y 28 días.

De igual forma, se adelantaron actividades correspondientes a la construcción de estructuras para el manejo de aguas, incluyendo la canaleta inferior, el disipador de energía y su respectiva caja de inspección, garantizando condiciones adecuadas de drenaje y estabilidad en la zona intervenida

1. OBJETIVO GENERAL

El propósito principal del actual informe de obra consiste en evidenciar y soportar técnicamente el desarrollo de las actividades de obra comprendidas en el CONTRATO No. 210.16225.6 del 5 de septiembre del 2025 cuyo objeto consiste en la "**CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACION PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN EL TALUD ORIENTAL DEL BARRIO VILLA DE LOS CABALLEROS EN EL MUNICIPIO DE GIRÓN, DEPARTAMENTO DE SANTANDER",** durante el periodo establecido entre el 01 de marzo al 31 de marzo del 2026.

Así mismo demostrar el avance de cada una de las actividades programadas, cantidades de obra ejecutadas, balance financiero, registros fotográficos evidenciando el avance de la ejecución de la obra, relación de equipos y herramientas utilizadas, fotocopia de la bitácora, resumen de las actividades realizas en el mes, relación de personal empleado en la ejecución de obra indicando el rol que cumple.

1.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Demostrar técnica y visualmente la ejecución de cada una de las actividades realizadas en el periodo de este informe.

- Ejecutar cada uno de los ítems contractuales, en cumplimiento a las especificaciones técnicas del Contrato.

- Realizar labores administrativas, de seguridad en el trabajo, ambientales y de calidad, demostrando los resultados más relevantes por medio de documentación, registros fotográficos y demás soportes que evidencian la gestión.

- Entregar de manera formal los respectivos soportes de seguridad social del personal que acompaña la ejecución de los trabajos.

- Realizar comités técnicos de los avances en las fases preliminar y ejecución.

2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El sector denominado Villa de los Caballeros se encuentra adscrito al municipio de Girón, que pertenece al Área Metropolitana de Bucaramanga. Específicamente se encuentra ubicado en el costado Sur del municipio, al Sur-Este del Barrio Mirador de Arenales (Figura 1. Ubicación general del área de estudio.)

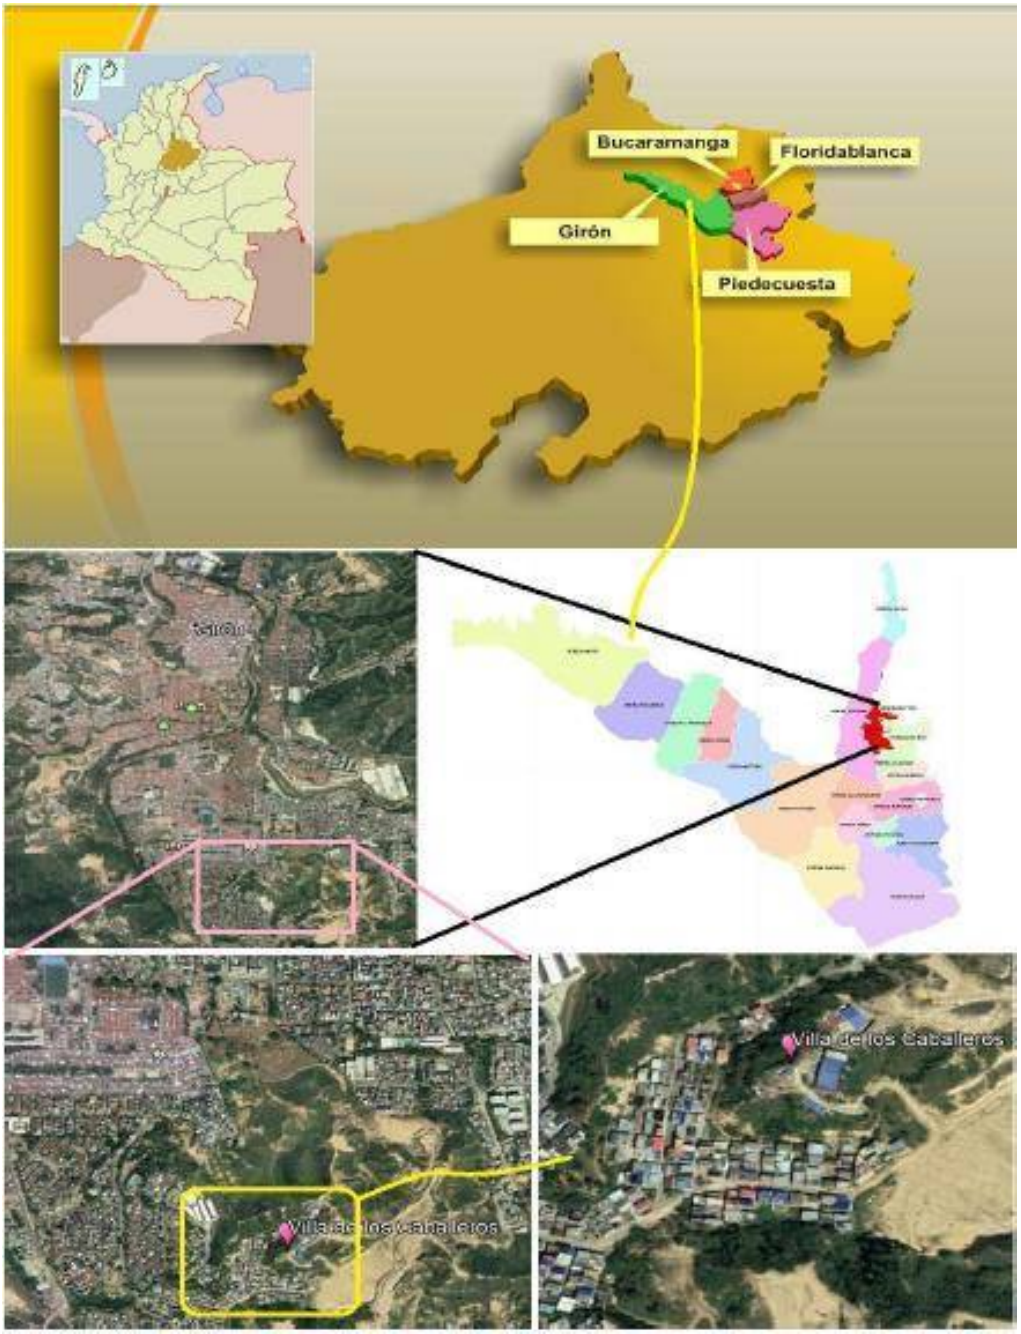


Figura 1. *Ubicación general del área de estudio*



***Figura 2**. Ubicación detallada del área de estudio. Tomado de Google Earth.*

3. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

Se relaciona la información del contrato de obra N°210.16225.6 suscrito para la ejecución del proyecto.

CONTRATO DE OBRA	N 210.16225.6 DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN EL TALUD ORIENTAL DEL BARRIO VILLA DE LOS CABALLEROS EN EL MUNICIPIO DE GIRÓN, DEPARTAMENTO DE SANTANDER (RA-OBRA-02).”
ENTIDAD CONTRATANTE	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA - CDMB
CONTRATISTA	CONSORCIO CONSOLIDACION GIRÓN
REPRESENTANTE LEGAL	JOHANNA MARCELA PEDIERNA CASTIBLANCO
NIT	901.982.571-5
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTER GRIÓN
REPRESENTANTE LEGAL	IBAN GUSTAVO BLANCO GONZALES
NIT	901.985.184-1
VALOR TOTAL DE LA INVERSION	$ 4.159.344.710.65
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	06 SEIS MESES
FECHA DE INICIO	15 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	14 DE ABRIL DE 2026
MUNICIPIO	GIRÓN, SANTANDER

3.1 PRESUPUESTO INICIAL APROBADO

PRESUPUESTO DE OBRA

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL BARRIO VILLA DE LOS CABALLEROS DEL MUNICIPIO DE GIRÓN, SANTANDER

CONDICIONES CONTRACTUALES

ITEM	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
SECCIÓN PRIMERA					
1.01	Replanteo, control y medición de la obra	mes	1,00	$11.584.277,00	$11.584.277,00
1.03.01.A	Valla tipo 1A (5,00m x 2,80 m)	und	1,00	$2.664.417,00	$2.664.417,00
1.04	Desmonte y limpieza	m^2	840,00	$5.453,00	$4.580.520,00
1.05	Retiro de basuras y escombros	m^3	168,00	$86.609,00	$14.550.312,00
1.07	Perfilado a mano descolgado de talud (en roca)	m^3	539,21	$257.918,00	$139.071.964,78
				SUBTOTAL SECCIÓN PRIMERA:	**$172.451.490,78**
SECCIÓN SEGUNDA					
2.01	Excavación a tajo abierto en taludes				
2.01.A	Excavación con acarreo libre				
2.01.A.02	Excavación con acarreo libre en material granular a cualquier profundidad	m^3	1.078,41	$49.921,00	$53.835.305,61
2.01.A.03	Excavación con acarreo libre en roca a cualquier profundidad	m^3	718,94	$91.187,00	$65.557.981,78
2.01.A.04	Excavación a mano con acarreo libre descolgado para zapata	m^3	29,00	$253.569,00	$7.353.501,00
2.03	Sobreacarreos para acarreos totales mayores de 1.000,00 m	m^3-km	26.614,8	$3.988,00	$106.139.822,40
				SUBTOTAL SECCIÓN SEGUNDA:	**$232.886.610,79**
SECCIÓN TERCERA					
3,00	Concretos				
3.01	Suministro y colocación de concreto de 3000 psi con mezcla humeda para zapatas	m^3	29,00	$1.089.450,00	$31.594.050,00
3.03	Suministro y colocación de concreto lanzado con mezcla húmeda de espesor 10 cm	m^2	840,00	$380.247,00	$319.407.480,00
3.08	Llenado de inyeccion con lechada cementicia para anclajes	m^3	87,00	$1.156.977,00	$100.656.999,00
				SUBTOTAL SECCIÓN TERCERA:	**$451.658.529,00**
SECCIÓN CUARTA					
4,00	Aceros				
4.01	Suministro y colocación acero de refuerzo fy 4200 kg / cm2	kg	5.807,00	$12.098,00	$70.253.086,00
4.02					
4.02.03	Suministro e instalación de 3 cables Ø=1/2" de L=25m	und	144,00	$1.085.176,00	$156.265.344,00
4.03	Tensionamiento de anclajes	und	144,00	$57.240,00	$8.242.560,00
4.04	Suministro y colocación				
4.04.01	Malla electrosoldada 4mm y abertura de 0,15m x 0,15m	m^2	840,00	$37.001,00	$31.080.840,00
4.05	Suministro e instalación de platina de 200mm x 200mm x 12mm con tres agujeros	und	144,00	$82.440,00	$11.871.360,00
4.06	Suministro e instalación de popora de 3 agujeros conicos para cuña de Ø=1/2"	und	144,00	$158.039,00	$22.757.616,00
4.07	Suministro e instalación de kit de cuñas de Ø=1/2" para anclaje	und	144,00	$96.886,00	$13.951.584,00
				SUBTOTAL SECCIÓN CUARTA:	**$314.422.390,00**
SECCIÓN QUINTA					
5,00	Perforaciones horizontales				
5.04	Ejecución perforaciones horizontales en taludes con pendientes mayores a 1:1 (en roca) con equipo de perforación descolgado para anclajes de 0,00m a 15,00m	m	2.160,00	$510.989,00	$1.103.736.240,00
5.05	Ejecución de perforaciones horizontales en taludes con pendientes mayores a 1:1 (en roca) con equipo de perforación descolgado para anclajes mayores a 15,00m	m	1.440,00	$585.973,00	$843.801.120,00
				SUBTOTAL SECCIÓN QUINTA:	**$1.947.537.360,00**
SECCIÓN SEXTA					
6,00	Varios				
6.02	Canaleta (ancho = 1m; e =10cm)	m	132,00	$134.615,00	$17.769.180,00
6.04	Estructura de disipación de energía	m	14,00	$634.862,00	$8.888.068,00
6.06	Sistema de abatimiento para líneas hidráulicas de infiltración interna y protección del trasdós de la estructura estabilizadora	m	408,00	$75.174,00	$30.670.992,00
				SUBTOTAL SECCIÓN SEXTA:	**$57.328.240,00**
	Presupuesto Costos directos				**$3.176.284.620,57**
	Administración:			24%	$762.308.308,94
	Imprevistos			1%	$31.762.846,21
	Utilidades:			5%	$158.814.231,03
	A.I.U.:			30%	$952.885.386,18
	I.V.A.			19%	$30.174.703,90
	Presupuesto total de obra				**$4.159.344.710,65**

3.2 LEGALIZACIÓN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 210.16225.6

El día 05 de septiembre de 2025, se perfecciona el Contrato de obra pública No 210.16225.6, celebrado entre la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA – CDMB y CONSORCIO CONSOLIDACION GIRÓN.

3.3 ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 210.16225.6

Se firma acta de inicio para el Contrato de obra, con fecha 15 de octubre de 2025, fijando un plazo de seis (06) meses para la ejecución de actividades.

3.4 CONTROL DE GARANTÍAS – POLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA

Tabla No. 2 *Cuadro control de pólizas del contrato N° 210.16225.6 a Acta de inicio*

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL A FIRMA DE ACTA DE INICIO			
ASEGURADORA	EQUIDAD SEGUROS		
POLIZA No.	AB002685	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	23/10/2025
AMPAROS OTORGADOS	**VALOR**	**VIGENCIA**	
		DESDE	**HASTA**
Cumplimiento del contrato	$ 831.868.942,60	15/10/2025	15/08/2026
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnización laboral	$ 207.967.235,65	15/10/2025	15/04/2029
Estabilidad y calidad de la Obra	$ 831.868.942,60	15/04/2026	15/04/2031

POLIZA DE SEGURO RCE ENTIDAD ESTATAL A FIRMA DE ACTA DE INICIO			
ASEGURADORA	EQUIDAD SEGUROS		
POLIZA No.	AB002686	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	23/10/2025
AMPAROS OTORGADOS	**VALOR**	**VIGENCIA**	
		DESDE	**HASTA**
Predios Labores y Operaciones	$ 569.400.000,00	15/10/2025	15/04/2026

4. RELACIÓN DE PERSONAL Y EQUIPO UTILIZADO POR CONSORCIO CONSOLIDACIÓN GIRÓN

A continuación, se presenta la relación de personal y equipo solicitado según pliego de condiciones, así mismo el ingreso y retiro de personal operativo para finalizar las actividades correspondientes a CAPITULO III: CONCRETOS. Se presentan las siguientes novedades:

PERSONAL SOLICITADO SEGÚN EL PLIEGO DE CONDICIONES O TÉRMINOS DE REFERENCIA					
ÍTEM	**NOMBRE**	**CÉDULA**	**CARGO**	**EMPRESA**	**INGRESO**
1	EDGAR LEONARDO GOMEZ RONCANCIO	72.254.372	DIRECTOR DE OBRA	CONAINCO	15/10/2025
2	OSCAR ANDRES SANCHEZ JEREZ	1.098.756.647	RESIDENTE DE OBRA	INFRACORP	15/10/2025
3	MARIA LUCIA HIGUERA PINO	1.095.700.657	GEOTECNISTA	INDEPENDIENTE	15/10/2025
4	JOHANA PAOLA OSPINO RODELO	1.098.618.429	ASESOR AMBIENTAL	INDEPENDIENTE	15/10/2025
5	CLARA MELISSA DONADO ARIAS	1.098.704.436	PROFESIONAL SISO	INFRACORP	15/10/2025
6	JUAN CARLOS RINCON LOZANO	80.089.079	PMP	INDEPENDIENTE	15/10/2025

Tabla No. 3 *Personal solicitado según pliego de condiciones*

PERSONAL UTILIZADO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO						
ÍTEM	**NOMBRE**	**CÉDULA**	**CARGO**	**EMPRESA**	**INGRESO**	**RETIRO**
1	SANDRA YOLIMA BERMUDEZ CALA	63.553.613	profesional ambiental	INFRACORP	1/11/2025	
2	EDSON ALEXANDER PORTILLA ARDILA	1.098.605.491	ALMACENISTA	CONSORCIO CONSOLIDACIÓN GIRÓN	24/11/2025	
3	ISAÍAS GARCÍA JAIMES	1.101.596.200	OPERADOR DE PERFORACIÓN I	CONSORCIO CONSOLIDACIÓN GIRÓN	8/10/2025	
4	JARRINSON STEVEN CAMARÓN CAICEDO	1.232.891.906	AYUDANTE DE PERFORACIÓN II	CONSORCIO CONSOLIDACIÓN GIRÓN	8/10/2025	
5	MIGUEL ANTONIO RANGEL FLORIÁN	1.124.048.478	AYUDANTE DE PERFORACIÓN II	CONSORCIO CONSOLIDACIÓN GIRÓN	8/10/2025	
6	JESÚS ALBERTO MAYORGA MAYORGA	1.101.520.618	AYUDANTE DE OBRA	CONSORCIO CONSOLIDACIÓN GIRÓN	8/10/2025	

7	WILLINTON ALARCÓN ASCANIO	91.479.571	AYUDANTE DE PERFORACIÓN II	CONSORCIO CONSOLIDACIÓN GIRÓN	5/11/2025	
8	MANUEL ENRIQUE CASTILLO FLÓREZ	1.082.871.247	AYUDANTE DE OBRA	CONSORCIO CONSOLIDACIÓN GIRÓN	6/11/2025	
9	GIOVANY SEBASTIAN PARRA FERRER	1.005.157.855	AYUDANTE DE OBRA	CONSORCIO CONSOLIDACIÓN GIRÓN	1/12/2025	
10	YOHAN ALEXANDER CACERES PABÓN	1.102.383.713	AYUDANTE DE OBRA	CONSORCIO CONSOLIDACIÓN GIRÓN	1/12/2025	12/03/2026
11	ALEX PRADA JEREZ	13.537.319	OFICIAL	INFRACORP	15/10/2025	
12	FABIAN ZAMBRANO LESMES	1.098.673.915	TOPOGRAFO	INFRACORP	15/10/2025	

Tabla No. 4 *Personal utilizado en la ejecución del contrato.*

EQUIPO		
ITEM	**MAQUINARIA / EQUIPO**	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
1	ESTACIÓN TOPOGRÁFICA	
2	COMPRESOR MQ 69	

3	CAMIÓN TIPO MIXER	
4	MOTOBOMBA	
5	BOMBA PERISTÁLTICA	

Tabla No. 5 *Equipo utilizado en la ejecución del contrato.*

5. INFORME AVANCE EJECUTADO POR EL CONSORCIO CONSOLIDACIÓN GIRÓN

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Durante el período comprendido entre el 01 y el 31 de marzo de 2026 se ejecutaron actividades correspondientes al proceso constructivo para la estabilización del talud. En el presente informe se describen las labores asociadas a la colocación de concreto lanzado en la pantalla y la construcción de zapatas, empleando concreto con resistencia especificada de 3.000 psi, agregado de 3/8” y asentamiento de 7”.

De manera complementaria, se desarrollaron obras hidráulicas consistentes en la construcción de canaleta perimetral y disipador de energía, destinadas al manejo y control de aguas superficiales presentes en la zona. Estas estructuras garantizan el adecuado control pluvial y la conducción eficiente de los caudales generados por escorrentía, particularmente en las áreas de escarpa, contribuyendo a la estabilidad del talud intervenido.

Las actividades anteriormente descritas se ejecutaron bajo un estricto control técnico y de calidad de los materiales. En el caso del concreto premezclado, se verificó el cumplimiento de las especificaciones técnicas del proyecto en cuanto a su dosificación y propiedades. Previo al descargue de cada suministro, se realizaron ensayos de asentamiento (*slump*) con el fin de evaluar su consistencia y trabajabilidad conforme a lo establecido en el diseño. Asimismo, para cada camión tipo mixer se elaboraron probetas de ensayo, las cuales fueron remitidas a laboratorio para la determinación de la resistencia a compresión, permitiendo verificar que el concreto colocado cumple con los requisitos estructurales definidos.

Adicionalmente, se dio inicio a actividades complementarias no contempladas dentro del alcance contractual, orientadas al mejoramiento urbanístico y a la optimización de las condiciones funcionales del proyecto. Estas intervenciones se ejecutaron con el propósito de asegurar la adecuada integración de la obra con su entorno, así como garantizar su correcta operatividad y uso por parte de la comunidad



Trabajos en el frente de obra villa de los caballeros municipio de Girón.

5.1 SECCIÓN PRIMERA

5.1.1 Replanteo, Control y medición de Obra (mes)

Durante el presente período se ejecutaron actividades de medición, control y replanteo en las áreas intervenidas con concreto lanzado. De igual manera, se realizó la verificación geométrica de las canaletas superior e inferior, así como de su respectivo disipador de energía, conforme a las coordenadas, alineamientos y cotas establecidas en los planos de diseño, garantizando el cumplimiento de los niveles requeridos para el adecuado manejo de aguas superficiales e infiltraciones.

Estas actividades constituyen un componente esencial para el control del avance físico del proyecto, permitiendo la verificación continua de las condiciones geométricas, hidráulicas y constructivas, en concordancia con las especificaciones técnicas y los criterios de diseño establecidos.

DESCRIPCION ITEM	UND	CANTIDADES CONTRACTUALES	CANT. EJECUTADA ENEL PRESENTE INFORME 06	CANTIDADES ACUMULADAS	% DE EJECUCIÓN
SECCIÓN PRIMERA					
REPLANTEO, CONTROL Y MEDICIÓN DE OBRA	MES	1.00	0,16	0,91	91,00%

	
Replanteo, Control y medición de Obra	**Replanteo, Control y medición de Obra**

5.2 SECCIÓN TERCERA

5.2.1 Suministro y colocación de concreto de 3000 psi con mezcla húmeda para zapatas

Esta actividad consistió en el suministro, colocación y conformación de concreto premezclado en zapatas de dimensiones 1,00 m x 1,00 m x 0,20 m. El concreto utilizado cumplió con las especificaciones técnicas del proyecto, presentando una resistencia a compresión de 3.000 psi, tamaño máximo de agregado de 3/8” y un asentamiento de 7”, el cual fue pedido en planta garantizando una adecuada trabajabilidad y una distribución homogénea de los componentes en toda la sección de la zapata. Con el fin de asegurar el recubrimiento mínimo del acero de refuerzo, se instalaron separadores (panelas) de concreto de 5 cm x 5 cm x 5 cm entre el terreno natural y las parrillas de refuerzo, los cuales fueron fijados mediante pines en sus extremos, garantizando su correcta posición durante el vaciado.

Durante la ejecución, se dispusieron los equipos necesarios para la colocación del concreto Adicionalmente, se anexo los resultados de laboratorio para la verificación de la resistencia del concreto conforme al diseño de mezcla aprobado. **Ver Anexo 10. Resultado de laboratorios.**

DESCRIPCION ITEM	UND	CANTIDADES CONTRACTUALES	CANT. EJECUTADA ENEL PRESENTE INFORME 06	CANTIDADES ACUMULADAS	% DE EJECUCIÓN
SECCIÓN TERCERA					
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO DE 3000 PSI CON MEZCLA HUMEDA PARA ZAPATAS	M3	29,00	28,80	28,80	99,31%



Suministro y colocación de concreto de 3000 psi para zapatas



Suministro y colocación de concreto de 3000 psi para zapatas



Suministro y colocación de concreto de 3000 psi para zapatas



Suministro y colocación de concreto de 3000 psi para zapatas

5.2.2 Suministro y colocación de concreto lanzado con mezcla húmeda de espesor 10 cm

Esta actividad consistió en el suministro y colocación de concreto sobre el área establecida en la superficie del talud, asegurando un espesor de 10 cm, que proporciona una capa resistente que

previene deslizamientos y erosión. El concreto proporcionado, de acuerdo con las especificaciones técnicas, fue de 3.000 psi, con agregado de 3/8" y un asentamiento de 7" el cual fue pedido previamente en planta. Se utilizo aditivo Eucoshot af 600 para acelerar el fraguado y lograr una cohesión más rápida sobre las superficies inclinadas del talud. Para garantizar un recubrimiento completo de la pantalla, se instalaron panelas de concreto de 5cmx5cmx5cm entre el terreno natural y la malla electrosoldada en toda el área a cubrir. Además, se presentaron informes certificados de laboratorio para verificar la resistencia del concreto conforme al diseño de la mezcla. De manera complementaria, se realizaron ensayos de laboratorio para verificar y garantizar la resistencia a la compresión de cilindros de concreto, de acuerdo con los estudios y diseños del proyecto. Los resultados obtenidos se anexan en el presente informe. Cabe resaltar que todo el procedimiento fue ejecutado bajo la supervisión de la interventoría, quien validó previamente las condiciones técnicas del proceso y realizó las observaciones pertinentes, con el fin de garantizar la conformidad con los requisitos del proyecto y las especificaciones contractuales. A modo de anexo se relaciona el certificado de calidad del aditivo correspondiente al lanzado. **Ver Anexo 10. Resultado de laboratorios.**

DESCRIPCION ITEM	UND	CANTIDADES CONTRACTUALES	CANT. EJECUTADA ENEL PRESENTE INFORME 06	CANTIDADES ACUMULADAS	% DE EJECUCIÓN
SECCIÓN TERCERA					
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO LANZADO CON MEZCLA HÚMEDA DE ESPESOR 10 CM	M2	840,00	840,00	840,00	100,00%



Suministro y colocación de concreto lanzado de espesor de 10cm



Suministro y colocación de concreto lanzado de espesor de 10cm

	
Suministro y colocación de concreto lanzado de espesor de 10cm	Suministro y colocación de concreto lanzado de espesor de 10cm


5.3 SECCIÓN SEXTA

5.3.1 Canaleta (ancho = 1m; e =10cm) m

Es muy común que las viviendas localizadas en los taludes y zonas de escarpa, no realicen un adecuado manejo de las aguas lluvias y superficiales que finalmente llegan a los taludes, generando erosión superficial debida al arrastre del material fino que compone la estructura del suelo y favorece el proceso de infiltración y aumento en la presión de poros del terreno que finalmente genera una superficie de falla y posterior deslizamiento. Para ello fue necesario realizar un control pluvial mediante la construcción de canaleta superior e inferior de la pantalla realizada que garantice la conducción adecuada del caudal pluvial que por escorrentía se acumula en las zonas de escarpa.

En el desarrollo de esta actividad, se llevaron a cabo excavaciones manuales para asegurar el cumplimiento de la sección transversal y la longitud total estipulada en el contrato. Posteriormente, se procedió con el suministro y la colocación de concreto de 3000 psi, grava 3/8" pedido en planta y el cual se les realiza su respectivo ensayo de laboratorio para comprobar su resistencia, el vaciado de concreto se realiza de manera progresiva siguiendo las guías metálicas y puliendo la superficie final.

DESCRIPCION ITEM	UND	CANTIDADES CONTRACTUALES	CANT. EJECUTADA ENEL PRESENTE INFORME 06	CANTIDADES ACUMULADAS	% DE EJECUCIÓN
SECCIÓN SEXTA					
CANALETA (ANCHO = 1M; E =10CM)	M	132,00	76,00	121,60	92,12%

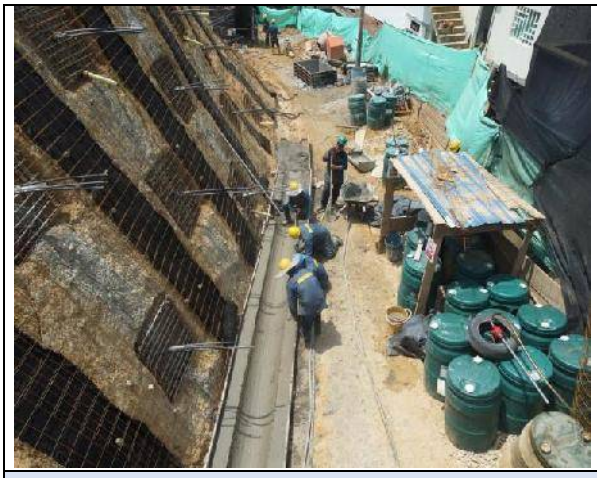	
Canaleta (ancho = 1m; e =10cm)	Canaleta (ancho = 1m; e =10cm)
	
Canaleta (ancho = 1m; e =10cm)	Canaleta (ancho = 1m; e =10cm)

5.3.2 Estructura de disipación de energía (m)

Este conjunto de actividad abarca el control de agua de escorrentía en pendientes muy pronunciadas que se conduce hacia la red existente del municipio. Se llevaron a cabo excavaciones manuales en forma de escalera (tipo torrentera), seguidas por la instalación de acero de refuerzo, encofrado mediante formaleta metálica, y finalmente, la aplicación de concreto de 3000 psi, que fue preparado en sitio siguiente las especificaciones técnicas.

DESCRIPCION ITEM	UND	CANTIDADES CONTRACTUALES	CANT. EJECUTADA ENEL PRESENTE INFORME 06	CANTIDADES ACUMULADAS	% DE EJECUCIÓN
SECCIÓN SEXTA					
ESTRUCTURA DE DISIPACIÓN DE ENERGÍA	M	14,00	14,00	14,00	100,00%

	
Estructura de disipación de energía	**Estructura de disipación de energía**
	
Estructura de disipación de energía	**Estructura de disipación de energía**

1. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

1.1 OBRAS PROGRAMADAS, EJECUTADAS Y ACUMULADAS

INDICADORES	VALOR ACUMULADO	% PORCENTAJE ACUMULADO
Obra Programada	$ 4.110.490.936,14	98,83%
Obra Ejecutada	$ 4.079.891.058,90	98,09%

Tabla No. 6 *Porcentaje de avance*

1.2 RELACIÓN DE ACTAS DE REUNIÓN

Se llevaron a cabo actas de reunión con los profesionales del contratista, la interventoría y la supervisión (CDMB), con el objetivo de revisar el avance de obra, verificar el cumplimiento de las obligaciones

contractuales y socializar las actividades ejecutadas durante el periodo evaluado. **Ver anexo No. 07 Actas de comité**

De igual manera se anexa las hojas de visita realizadas de la CDMB al frente de obra villa de los caballeros, donde queda recopilado el motivo de la visita, la fecha de realización, la situación encontrada, sus evidencias, observaciones y las firmas de quienes estuvieron presente. **Ver anexo No. 08 Evidencia hoja de visita**

	
Visita CDMB	**Visita CDMB**

Tabla No. 8 Actas de reunión

RELACIÓN DE COMITES TÉCNICOS REALIZADOS	
# COMITÉ	**FECHA**
Acta de Reunión No. 10	18/03/2026
Acta de Reunión No. 11	27/03/2026
Evidencia hoja de visita No.1	13/03/2026
Evidencia hoja de visita No.2	18/03/2026
Evidencia hoja de visita No.3	27/03/2026

1.3 BITACORA DE OBRA

El contratista lleva un registro diario en un único libro de actas autorizado por la Interventoría en la que se describe diariamente cada una de las actividades realizadas, el personal directo que se encuentra en la obra, los equipos presentes usados en obra, al igual el clima durante el día y su noche anterior. Este registro es revisado por la interventoría y firmado para su aprobación, así mismo, se deja registros de las inspecciones oculares que realiza la entidad CDMB como agente contratante del presente contrato y se registran las firmas del personal profesional presente, con la finalidad de llevar un control detallado diario del proceso constructivo del proyecto. **Ver Anexo 1. Bitácora de Obra**

1.4 AFILIACIONES SEGURIDAD SOCIAL

El compromiso del contratista es mantener a todo el personal vinculado al desarrollo de la obra bajo el sistema de seguridad social, como lo indica el contrato. Para esto el contratista reunió la documentación necesaria de cada uno de los empleados, para tramitar ante la respectiva EPS y mantener actualizada, la información y pagos para su afiliación. El personal que se encuentra vinculado, se encuentra afiliado al sistema de seguridad social bajo la razón social **CONSORCIO CONSOLIDACIÓN GIRÓN**, sus consorciados **INFRACORP Y CONAINCO** a excepción de los asesores en sus distintas especialidades quienes están afiliados al sistema de seguridad social como independientes. El personal vinculado durante el periodo comprendido entre el 01 de marzo al 31 de marzo de 2026 se puede observar en la tabla 3 y 4 adjunta al presente informe. **Ver Anexo 2. Seguridad Social**

1.5 SEGUIMIENTO Y CONTROL

Se lleva a cabo por parte del contratista un control, análisis y seguimiento de cada una de las actividades que se realizaron durante el periodo comprendido entre el 01 de al 31 de marzo de 2026. Así mismo, se mantiene una comunicación permanente con la comunidad y con la interventoría **INTER GIRÓN** a través de su Residente y director de Interventoría; brindando información de interés acorde a cada ente y se gestionan sus requerimientos, mediante correos electrónicos y reuniones en las instalaciones tanto de los contratistas como de la interventoría.

1.6 ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES, DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

1.6.1 ACTIVIDADES COMPONENTE AMBIENTAL

Respecto a las actividades ambientales desarrolladas durante el periodo comprendido entre el 01 de marzo al 31 de marzo de 2026, ver anexo informe de cumplimiento plan de acción socio ambiental. **Ver anexo 3. Informe Ambiental**

1.6.2 ACTIVIDADES COMPOMNENTE SOCIAL

Durante el mes de marzo se ejecutaron actividades complementarias no contempladas dentro del alcance contractual, orientadas al componente social y al adecuado manejo urbanístico optimizando las condiciones funcionales de la obra. Estas intervenciones se desarrollaron con el propósito de garantizar la correcta integración del proyecto con su entorno, así como de asegurar su operatividad y uso adecuado por parte de la comunidad.

Adicionalmente, en relación con la conformación geométrica de la terraza, los niveles serán definidos mediante pendientes dirigidas hacia la canaleta ubicada en el pie del talud. Para el control de material particulado y evitar el arrastre de sedimentos hacia las zonas peatonales, se realizó la construcción de un bordillo perimetral de 30 cm de altura, atendiendo a las peticiones de la comunidad se realizó la adecuación de rampas para acceso vehicular liviano (motocicletas).






1.6.3 ACTIVIDADES COMPONENTE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST)

El contratista durante el presente periodo realizó la entrega de elementos de protección personal empleado en obra y brindando elementos específicos según las actividades a desarrollar, entre estos, se encuentran: guantes, gafas, camisa, pantalón, botas de caucho, tapa oídos, cascos, etc. Siguiendo las políticas de prevención de accidentes laborales y el programa interno de cero accidentes laborales.

El contratista cuenta con personal capacitado que brinda regularmente charlas de seguridad laboral, pausas activas y demás. Esto con el fin de mantener un ambiente seguro de trabajo y empleados competentes ante cualquier imprevisto.

Algunas otras actividades realizadas por el contratista, fueron:

- Capacitación del personal
- Atención oportuna a los requerimientos y comunicaciones de la Interventoría con respecto a las medidas a tener en cuenta con el personal en alturas.
- Exigencia en el uso de los equipos y elementos de protección personal adecuados.
- Charlas, capacitaciones, inducciones y entrenamiento en obra.
- Inspección de herramientas y elementos de trabajo.

Ver anexo informe mensual de Gestión de seguridad y salud en el trabajo. **Ver anexo 4. Informe SST**

1.6.4 ACTIVIDADES DE CALIDAD

En el anexo se adjuntarán según la ejecución de la obra los certificados de aseguramiento de la calidad para los materiales utilizados y/o actividades desarrolladas durante el avance de la obra según el plan de calidad entregado a Interventoría. **Ver anexo No.05 Informe de Calidad**

2. ACTIVIDADES ACUMULADAS TOTALES

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL BARRIO VILLA DE LOS CABALLEROS DEL MUNICIPIO DE GIRÓN, SANTANDER						AVANCE No. 1 15/10/25 AL 31/10/25		ACUMULADO		%	AVANCE No. 2 01/11/25 AL 30/11/25		ACUMULADO		%	AVANCE No. 3 01/12/25 AL 31/12/25		ACUMULADO		%	AVANCE No. 4 01/01/26 AL 31/01/26		ACUMULADO		%	AVANCE No. 5 01/02/26 AL 28/02/26		ACUMULADO		%	AVANCE No. 6 01/03/26 AL 31/03/26		ACUMULADO		%
CONDICIONES CONTRACTUALES						CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL		CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL		CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL		CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL		CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL		CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	
ITEM	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL																														
SECCIÓN PRIMERA																																				
1.01	Replanteo, control y medición de la obra	mes	1,00	$11.584.277,00	$11.584.277,00	0,080	$ 926.742,16	0,080	$ 926.742,16	8,000%	0,17	$ 1.969.327,09	0,250	$ 2.896.069,2500	25,000%	0,17	$ 1.969.327,09	0,42	4865396,34	42,000%	0,17	$ 1.969.327,09	0,590	$ 6.834.723,4300	59,000%	0,16	$ 1.853.484,32	0,750	$ 8.688.207,75	75,000%	0,16	$ 1.853.484,32000	0,910	$ 10.541.692,07	91,00%
1.03.01.A	Valla tipo 1A (5.00m x 2.80 m)	und	1,00	$2.664.417,00	$2.664.417,00	1,00	$ 2.664.417,00	1,00	$ 2.664.417,00	100,000%		$ -	1,00	2664417,00	100,000%		$ -	1,00	$ 2.664.417,0000	100,000%		$ -	1,000	$ 2.664.417,000	100,000%		$ -	1,000	$ 2.664.417,00	100,00%		$ -	1,000	$ 2.664.417,00	100,00%
1.04	Desmonte y limpieza	m²	840,00	$5.453,00	$4.580.520,00	620,00	$ 3.380.860,00	620,00	$ 3.380.860,00	73,81%	220,0	$ 1.199.660,00	840,00	$ 4.580.520,00	100,00%		$ -	840,00	4580520,00	100,000%		$ -	840,00	$ 4.580.520,0000	100,000%		$ -	840,00	$ 4.580.520,00	100,00%		$ -	840,00	$ 4.580.520,00	100,00%
1.05	Retiro de basuras y escombros	m³	168,00	$86.609,00	$14.550.312,00	124,00	$ 10.739.516,00	124,00	$ 10.739.516,00	73,81%	44,0	$ 3.810.796,00	168,00	$ 14.550.312,00	100,00%		$ -	168,00	14550312,00	100,000%		$ -	168,00	$ 14.550.312,0000	100,000%		$ -	168,00	$ 14.550.312,00	100,00%		$ -	168,00	$ 14.550.312,00	100,00%
1.07	Perfilado a mano descolgado de talud (en roca)	m²	539,20	$257.918,00	$139.071.984,78	-	$ -	0,00	$ 0,00	0,00%	539,2	$ 139.069.385,60	539,20	$ 139.069.385,60	100,00%		$ -	539,20	139069385,60	100,00%		$ -	539,20	$ 139.069.385,6000	99,998%		$ -	539,20	$ 139.069.385,60	100,00%		$ -	539,20	$ 139.069.385,60	100,00%
				SUBTOTAL SECCIÓN PRIMERA:	$172.451.490,78		$ 17.711.535,16		$ 17.711.535,16	10,27%		$ 146.049.168,69		$ 163.760.703,85	94,96%		$ 1.969.327,09		$ 165.730.030,9400	96,10%		$ 1.969.327,09		$ 167.699.358,0300	97,24%		$ 1.853.484,32		$ 169.552.842,3500	98,32%		$ 1.853.484,32		$ 171.406.326,67	99,39%
SECCIÓN SEGUNDA																																				
2.01	Excavación a tajo abierto en taludes																																			
2.01.A	Excavación con acarreo libre																																			
2.01.A.01	Excavación con acarreo libre en material granular a cualquier profundidad	m³	1.078,41	$49.921,00	$53.835.305,61						1075,20	$ 53.675.059,20	1075,20	$ 53.675.059,20	99,70%		$ -	1075,20	53675059,20	99,70%		$ -	1075,20	$ 53.675.059,20	99,70%		$ -	1075,20	$ 53.675.059,20	99,70%		$ -	1075,20	$ 53.675.059,20	99,70%
2.01.A.02	Excavación con acarreo libre en roca a cualquier profundidad	m³	718,94	$91.187,00	$65.557.981,78						718,00	$ 65.472.266,00	718,00	$ 65.472.266,00	99,87%		$ -	718,00	65472266,00	99,87%		$ -	718,00	$ 65.472.266,00	99,87%		$ -	718,00	$ 65.472.266,00	99,87%		$ -	718,00	$ 65.472.266,00	99,87%
2.01.A.04	Excavación a mano con acarreo libre descolgado para zapata	m³	29,00	$253.569,00	$7.353.501,00							$ -					$ -				20,00	$ 5.071.380,00	20,00	$ 5.071.380,00	68,97%	8,80	$ 2.231.407,20	28,80	$ 7.302.787,20	99,31%		$ -	28,80	$ 7.302.787,20	99,31%
2.03	Sobreacarreos para acarreos totales mayores de 1.000,00 m	m³-km	26.614,8	$3.988,00	$106.139.822,40						26268,48	$ 104.758.698,24	26268,48	$ 104.758.698,24	98,70%		$ -	26268,48	104758698,24	98,70%	208,00	$ 829.504,00	26360,00	$ 105.123.680,00	99,04%	91,52	$ 364.981,76	26568,00	$ 105.953.184,00	99,82%		$ -	26568,00	$ 105.953.184,00	99,82%
				SUBTOTAL SECCIÓN SEGUNDA:	$232.886.610,79		$ -		$ -	0,00%		$ 223.905.023,44		$ 223.906.023,44	96,14%		$ -		$ 223.906.023,44	96,14%		$ 5.900.884,00		$ 229.342.385,20	98,48%		$ 2.596.388,96		$ 232.403.296,40	99,79%		$ -		$ 232.403.296,40	99,79%
SECCIÓN TERCERA																																				
3.00	Concretos																																			
3.01	Suministro y colocación de concreto de 3000 psi con mezcla humeda para zapatas	m³	29,00	$1.089.450,00	$31.594.050,00																											28,8	$ 31.376.160,00	28,80	$ 31.376.160,00	99,31%
3.03	Suministro y colocación de concreto lanzado con mezcla húmeda de espesor 10 cm	m²	840,00	$380.247,00	$319.407.480,00																											840	$ 319.407.480,00	840,00	$ 319.407.480,00	100,00%
3.08	Llenado de inyeccion con lechada cementicia para anclajes	m³	87,00	$1.156.977,00	$100.656.999,00											38,4	$ 44.427.916,80	38,40	44427916,80	44,14%	28,8	$ 33.320.937,60	67,20	77748854,40	77,24%	19,2	$ 22.213.958,40	86,40	$ 99.962.812,80	99,31%		$ -	86,40	$ 99.962.812,80	99,31%
				SUBTOTAL SECCIÓN TERCERA:	$451.658.529,00		$ -		$ -	0,00%		$ -		$ -	0,00%		$ 44.427.916,80		$ 44.427.916,80	9,84%		$ 33.320.937,60		$ 77.748.854,40	17,21%		$ 22.213.958,40		$ 99.962.812,80	22,13%		$ 350.783.640,00		$ 450.746.452,80	99,80%
SECCIÓN CUARTA																																				
4.00	Aceros						$ -		$ -			$ -		$ -			$ -		$ -			$ -		$ -			$ -		$ -			$ -		$ -	
4.01	Suministro y colocación acero de refuerzo fy 4200 kg / cm2	kg	5.807,00	$12.098,00	$70.253.086,00																2419,2	$ 29.267.481,60	2419,200	$ 29.267.481,60	41,66%	3386,88	$ 40.974.474,24	5806,080	$ 70.241.955,84	99,98%		$ -	5806,08	$ 70.241.955,84	99,98%
4.02																																				
4.02.03	Suministro e instalación de 3 cables Ø=1/2" de L=25m	und	144,00	$1.085.176,00	$156.265.344,00						24,00	$ 26.044.224,00	24,000	$ 26.044.224,00	16,67%	46,00	$ 49.918.096,00	70,000	$ 75.962.320,00	48,61%	52,00	$ 56.429.152,00	122,000	$ 132.391.472,00	84,72%	22,00	$ 23.873.872,00	144,000	$ 156.265.344,00	100,00%		$ -	144,00	$ 156.265.344,00	100,00%
4.03	Tensionamiento de anclajes	und	144,00	$67.240,00	$8.242.560,00																															
4.04	Suministro y colocación																																			
4.04.01	Malla electrosoldada 4mm y abertura de 0.15m x 0,15m	m²	840,00	$37.001,00	$31.080.840,00																					840,00	$ 31.080.840,00	840,000	$ 31.080.840,00	100,00%		$ -	840,00	$ 31.080.840,00	100,00%
4.05	Suministro e instalación de platina de 200mm x 200mm x 12mm con tres agujeros	und	144,00	$82.440,00	$11.871.360,00																															
4.06	Suministro e instalación de popora de 3 agujeros conicos para cuña de Ø=1/2"	und	144,00	$158.039,00	$22.757.616,00																															
4.07	Suministro e instalación de kit de cuñas de Ø=1/2" para anclaje	und	144,00	$96.886,00	$13.951.584,00																															
				SUBTOTAL SECCIÓN CUARTA:	$314.422.390,00		$ -		$ -	0,00%		$ 26.044.224,00		$ 26.044.224,00	8,28%		$ 49.918.096,00		$ 75.962.320,00	24,16%		$ 85.696.633,60		$ 161.658.953,60	51,41%		$ 95.929.186,24		$ 257.588.139,84	81,92%		$ -		$ 257.588.139,84	81,92%
SECCIÓN QUINTA																																				
5.00	Perforaciones horizontales																																			
5.04	Ejecución perforaciones horizontales en taludes con pendientes mayores a 1:1 (en roca) con equipo de perforación descolgado para anclajes de 0,00m a 15,00m	m	2.160,00	$510.989,00	$1.103.736.240,00						360,00	$ 183.956.040,00	360,000	$ 183.956.040,00	16,67%	690,00	$ 352.582.410,00	1050,00	$ 536.538.450,00	48,61%	780,00	$ 398.571.420,00	1830,000	$ 935.109.870,00	84,72%	330,00	$ 168.626.370,00	2160,00	$ 1.103.736.240	100,00%		$ -	2160,000	$ 1.103.736.240,00	100,00%
5.05	Ejecución de perforaciones horizontales en taludes con pendientes mayores a 1:1 (en roca) con equipo de perforación descolgado para anclajes mayores a 15,00m	m	1.440,00	$585.973,00	$843.801.120,00						240,00	$ 140.633.520,00	240,000	$ 140.633.520,00	16,67%	460,00	$ 269.547.580,00	700,00	$ 410.181.100,00	48,61%	520,00	$ 304.705.960,00	1220,000	$ 714.887.060,00	84,72%	220,00	$ 128.914.060,00	1440,00	$ 843.801.120	100,00%		$ -	1440,000	$ 843.801.120,00	100,00%
				SUBTOTAL SECCIÓN QUINTA:	$1.947.537.360,00		$ -		$ -	0,00%		$ 324.589.560,00		$ 324.589.560,00	16,67%		$ 622.129.990,00		$ 946.719.550,00	48,61%		$ 703.277.380,00		$ 1.649.996.930,00	84,72%		$ 297.540.430,00		$ 1.947.537.360,00	100,00%		$ -		$ 1.947.537.360,00	100,00%
SECCIÓN SEXTA																																				
6.00	Varios																																			
6.02	Canaleta (ancho = 1m; e =10cm)	m	132,00	$134.615,00	$17.769.180,00																45,60	$ 6.138.444,00	45,600	$ 6.138.444,00	34,55%		$ -	45,600	$ 6.138.444,00	34,55%	76,00	$ 10.230.740,00	121,600	$ 16.369.184,00	92,12%
6.04	Estructura de disipación de energía	m	14,00	$634.862,00	$8.888.068,00																		0,000		0,00%			0,000		0,00%	14,00	$ 8.888.068,00	14,000	$ 8.888.068,00	100,00%
6.06	Sistema de abatimiento para lineas hidráulicas de infiltración interna y protección del trasdós de la estructura estabilizadora	m	408,00	$75.174,00	$30.670.992,00																		0,000			408,00	$ 30.670.992,00	408,000	$ 30.670.992,00	100,00%		$ -	408,000	$ 30.670.992,00	100,00%
				SUBTOTAL SECCIÓN SEXTA:	$57.328.240,00		$ -		$ -			$ -		$ -			$ -		$ -			$ 6.138.444,00		$ 6.138.444,00			$ 30.670.992,00		$ 36.809.436,00			$ 19.118.808,00		$ 55.928.244,00	
	Presupuesto Costos directos				$3.176.284.620,57		$17.711.535,16		$17.711.535,16	0,56%		$720.588.976,13		$738.300.511,29	23,24%		$718.445.329,89		$1.456.745.841,18	45,86%		$836.303.606,29		$2.292.584.925,23	72,18%		$450.804.439,92		$2.743.853.887,39	86,39%		$371.755.932,32		$3.115.609.819,71	98,09%
	Administración:			24%	$762.308.308,94		$4.250.768,44		$4.250.768,44			$172.941.354,27		$177.192.122,71			$172.426.879,17		$349.619.001,87			$200.712.865,51		$550.220.382,05			$108.193.065,58		$658.524.932,96			$89.221.423,76		$747.746.356,72	
	Imprevistos			1%	$31.762.845,21		$177.115,35		$177.115,35			$7.205.889,76		$7.383.005,11			$7.184.453,30		$14.567.458,41			$8.363.036,06		$22.925.849,25			$4.508.044,40		$27.438.536,87			$3.717.559,32		$31.156.096,19	
	Utilidades:			5%	$158.814.231,03		$885.576,76		$885.576,76			$36.029.448,81		$36.915.025,58			$35.922.266,48		$72.837.292,06			$41.815.180,31		$114.629.246,26			$22.540.222,00		$137.192.694,37			$18.587.796,62		$155.780.490,99	
	A.I.U.			30%	$952.885.386,18		$5.313.460,55		$5.313.460,55			$216.176.692,84		$221.490.153,38			$215.533.598,96		$437.023.752,34			$250.891.081,88		$687.775.477,56			$135.241.331,98		$823.156.166,20			$111.526.779,70		$934.682.945,90	
	I.V.A.			19%	$30.174.703,90		$168.259,58		$168.259,58			$7.013.854,88		$7.182.114,46			$6.825.230,63		$13.839.085,49			$7.944.884,26		$21.779.556,79			$4.282.642,18		$26.066.611,93			$3.531.681,36		$29.598.293,29	
	Presupuesto total de obra				**$4.159.344.710,65**		**$23.193.255,29**		**$23.193.255,290**	0,56%		**$943.611.264,24**		**$966.804.519,53**	23,24%		**$940.804.159,48**		**$1.907.608.679,01**	45,86%		**$1.095.139.572,43**		**$3.002.139.959,58**	72,18%		**$590.328.414,08**		**$3.593.076.665,52**	86,39%		**$486.814.393,38**		**$4.079.891.058,90**	98,09%
							0,56%		0,56%			22,69%		23,24%			22,62%		45,86%			26,33%		72,18%			14,19%		86,39%			11,70%		98,09%	


3. INFORME GENERAL DE ESTADO DEL TIEMPO

Durante el período evaluado, en la zona de ejecución del proyecto se registraron eventos de precipitación que generaron una afectación equivalente al 8,64 % del tiempo programado para el mes de marzo de 2026, ocasionando la suspensión temporal de actividades por un total de diecinueve (19) horas.

Se destaca la ocurrencia de precipitaciones de alta intensidad en el área metropolitana de Bucaramanga, particularmente durante las noches y madrugadas de los días 18 y 25 de marzo de 2026. Estas condiciones permitieron evidenciar incrementos significativos en los caudales que circulan por las estructuras de disipación de energía existentes y las ejecutadas contractualmente.

En este contexto, se realizó seguimiento al comportamiento hidráulico de las estructuras de disipación de energía y de las canaletas perimetral realizadas en el presente contrato, observándose un desempeño adecuado, sin evidencias de desbordamientos, socavaciones ni afectaciones funcionales, lo que confirma la eficiencia de las soluciones implementadas frente a eventos de lluvia de alta intensidad.

En términos generales, las condiciones climáticas registradas durante el período permitieron el desarrollo continuo de las actividades programadas, sin generar impactos significativos en la programación ni en la ruta crítica del proyecto. **Ver anexo 6 Estado del tiempo**

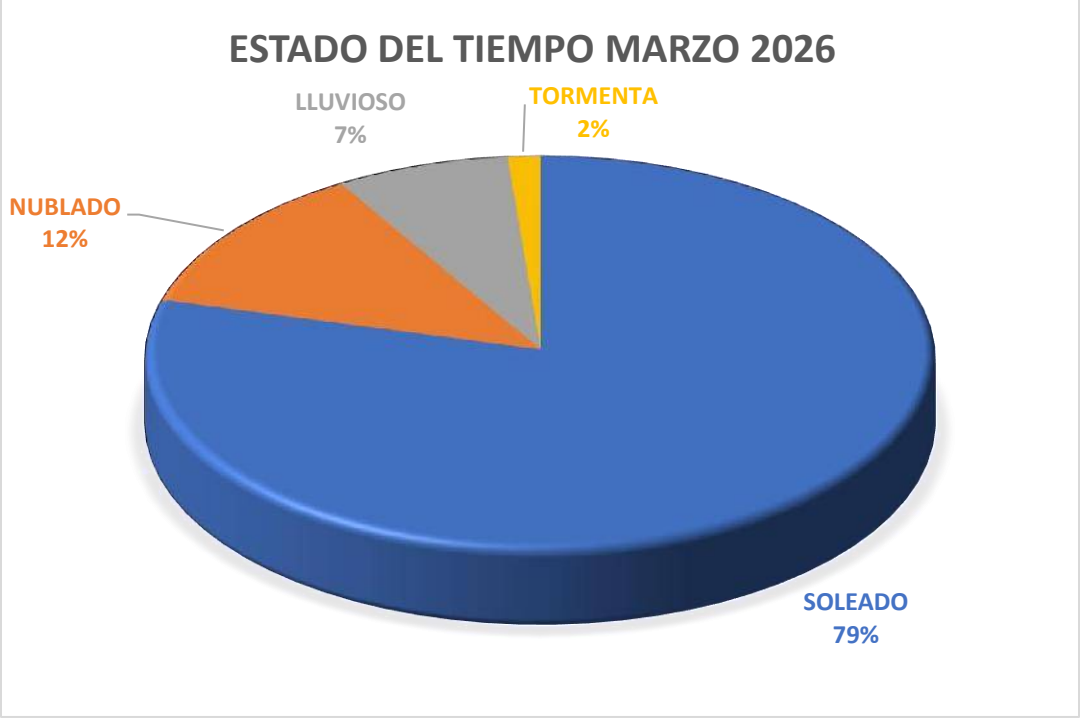

4. PROGRAMA DE GERENCIA


El presente documento corresponde al Informe del Programa de Gerencia del Proyecto, implementado y actualizado en el marco de la ejecución contractual. En él se consolida la información de seguimiento desde las distintas áreas de conocimiento de la gestión de proyectos, indicadores de desempeño, análisis de desviaciones y trazabilidad de la ejecución.

El informe describe el comportamiento del proyecto conforme a los lineamientos establecidos en el estándar del Project Management Institute –PMBOK®, Séptima Edición, constituyéndose en un instrumento de control y soporte para la toma de decisiones durante el desarrollo de la obra. **Ver. Anexo No.08 Informe de avance de gerencia**

5. CONCLUSIONES.

- Durante el período evaluado se evidenció el desarrollo satisfactorio de las actividades de concreto lanzado junto con sus respectivas zapatas, las cuales se llevaron a cabo sin contratiempos y en cumplimiento de los estudios, diseños y especificaciones técnicas, bajo la supervisión de la Interventoría. Asimismo, se ejecutaron las estructuras de disipación de energía y las canaletas superior e inferior. Estas obras fueron sometidas a condiciones reales de operación durante eventos de lluvia de alta intensidad registrados en el mes de marzo, presentando un comportamiento hidráulico adecuado, sin fallas ni observaciones técnicas. Actualmente, se encuentra en proceso el cumplimiento de la edad de diseño del concreto, con el fin de realizar los respectivos ensayos de resistencia que permitan validar las especificaciones y proceder posteriormente con las actividades de tensionamiento.

- Al cierre del mes de marzo se registra un avance físico acumulado ejecutado del 98,09 %, frente a un avance programado del 98,83 %. Esta ligera desviación se considera no significativa y se atribuye a la naturaleza de las actividades pendientes, correspondientes a labores de menor volumen. El desempeño general del proyecto refleja adecuados niveles de productividad y eficiencia en la ejecución de las actividades durante el período evaluado.

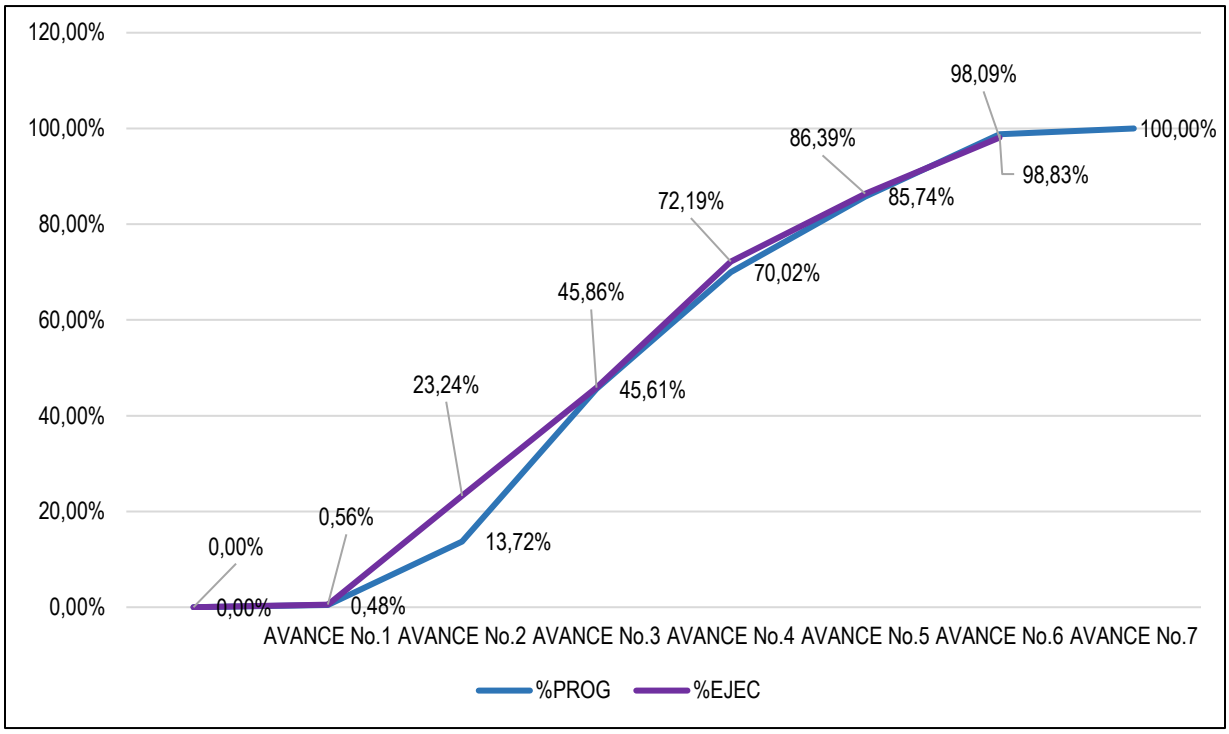

- Se dio continuidad a la realización de comités de obra, actas de seguimiento y recorridos técnicos de verificación con el equipo profesional de la Interventoría y la Entidad Contratante, con el propósito de realizar control y seguimiento al avance físico del proyecto. En estos espacios se evaluó la viabilidad del cumplimiento del plazo contractual, concluyéndose que es factible la terminación del proyecto en la fecha inicialmente establecida, considerando que las actividades pendientes corresponden principalmente al proceso de tensionamiento.

- Durante el período se registró, con fecha 27 de marzo, la radicación de un derecho de petición por parte de un habitante del barrio Villa de los Caballeros. Actualmente, dicho requerimiento se encuentra en proceso de análisis para la elaboración de la respuesta correspondiente, la cual será debidamente anexada al informe. De manera paralela, se mantienen activos los canales de comunicación con la comunidad, mediante la disposición de material informativo en puntos estratégicos del área de influencia del proyecto, incluyendo datos de contacto de la oficina de atención a la comunidad.

- Se continúa con la implementación de procesos de capacitación, inducción y sensibilización del personal vinculado al proyecto, a través de charlas y jornadas formativas orientadas a fortalecer el cumplimiento de los lineamientos de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), así como la identificación, prevención y control de los riesgos asociados a las actividades constructivas desarrolladas en obra.

6. ANEXOS

- ANEXO No. 1: Bitácora de Obra
- ANEXO No. 2: Seguridad Social
- ANEXO No. 3: Informe PASA
- ANEXO No. 4: Actividades SST
- ANEXO No. 5: Seguimiento plan de calidad
- ANEXO No. 6: Estado del tiempo
- ANEXO No. 7: Actas de comité
- ANEXO No. 8: Informe de avance de gerencia
- ANEXO No. 9: Evidencia hoja de visita
- ANEXO No.10: Ensayo de laboratorio

ANEXO No.01: BITACORA DE OBRA

28 de Febrero del 2026.

· Estado del tiempo: Soleado

· Descripción: Se inician actividades previas al lanzado, se realiza una jornada de orden y aseo en todo el area del frente de trabajo. Se acopio el material sobrante y se retira. Se realiza excavación de canaleta, pasando niveles y conformando lo que es la guia. Se chuzo el taladro para poder excavar debido a que se encuentra muy rocoso el terreno.

· Personal: (2) Ingenieros Residentes; (2) SST; (1) Almacenista; (1) Topografo; (1) Operador; (6) Ayudantes de obra.

· Equipo: Taladro, (1) Trompo

Melissa Donado

02 de Marzo del 2026

· Estado del tiempo: Soleado

· Descripción: Se inician actividades de instalación de pines y (pareles) de recubrimiento con el fin de preparar la pantalla para el lanzado y asegurar su recubrimiento de 10 cm. Se continua con el armado y fundida del disipador de energia en la finalización del talud. Se realiza excavación de concreto en la parte baja del talud para acceder a su recubrimiento

· Personal: (2) Ingenieros Residentes; (1) SST; (1) Almacenista; (1) Topografo; (1) Ingeniero Ambiental; (1) Director de obra; (1) Oficial; (1) Operador; (6) Ayudantes

· Equipo: (1) Trompo

03 de Marzo del 2026

· Estado del tiempo: Soleado

· Descripción: Se inician actividades de lanzado de concreto de 3000psi en toda el area de la pantalla, se ejecutan de manera paralela el suministro e instalación En-forcierro de las zapatas asegurando su recubrimiento. Se le deja una terminación adecuada asegurando su recubrimiento y se le instala aditivo acelerante liquido para asegurar su adherencia. Se realiza de igual manera la fundida de canaleta en la

parte baja del talud, de igual manera se funde los muros del disipador.

- Personal: (1) Almacenista; (1) Director de obra; (2) Ingenieros Residentes; (1) SST; (1) Ingeniero Ambiental; (1) Conductor Mixer (3) Operadores; (1) Oficial; (10) Ayudantes; (1) Maestro;
- Equipo: (1) Carro tipo mixer; (1) Bomba de concreto; (1) Peinsfaltica (1) Trompo; (1) Compresor

paula salgado

04 de Marzo del 2026

- Estado del tiempo: Soleado
- Descripción: Se inician actividades de suministro e instalación de concreto lanzado en la pantalla a intervenir junto con sus zapatas recubiertos, se lleva un control riguroso sobre el espesor, tanto de las zapatas como de la pantalla. Se realiza fundida de canaleta en la parte baja del talud y se realiza fundida de disipador de energía. Las anteriores actividades se ejecutaron según los estudios y diseños
- Personal: (2) Ingenieros Residentes; (1) SST; (1) Almacenista; (1) Topografo; (1) Ingeniero Ambiental; (1) Oficial; (12) Ayudantes
- Equipo: (1) Carro tipo mixer; (1) Bomba de concreto; (1) Peinsfaltica (1) Trompo; (1) Compresor

Melissa Donado

paula salgado

05 de Marzo del 2026

- Estadio del tiempo: Soleado
- Descripción: Se inicia actividades de suministro e instalación de concreto lanzado en las zapatas, se continua con la fundida de canaleta en la parte baja del talud, se realiza toma de muestras para comprobar la resistencia a la compresión. A cada carro se le toma el asentamiento.
- Personal: (2) Ingenieros Residentes; (2) SST; (1) Almacenista; (1) Topografo (1) Oficial; (2) Operadores; (1) Maestro; (4) Ayudantes de obra
- Equipo: (1) Carro tipo mixer; (1) Bomba de concreto; (1) Trompo; (1) Compresor

Melissa Donado

06 de Marzo del 2026

·Estado del tiempo: Soleado - lluvioso

·Descripción: Se inician actividades de concreto lanzado en el area intervenida y en las zapatas realizadas, asegurando su rebestimiento. Se continuo con la fundida tanto del disipador como de la canaleta inferior. Se verifican niveles y recubrimientos

·Personal: (2) Ingenieros Residentes; (1) SST; (1) Almacenista; (1) Topografo; (1) Oficial; (2) Operadores; (14) Ayudantes

·Equipo: (1) Carro tipo mixer; (1) Bomba de concreto; (1) Pluma electrica; (1) trompo; (1) Compresor.

paula salgado

7 de Marzo del 2026

·Estado del tiempo: Soleado

·Descripción: Se inicia con actividades de orden y aseo. Limpieza de desperdicio del concreto previamente lanzado. Se retira y se dispone al sitio de disposición final el material sobrante. Se retira de igual manera herramienta y equipo que ya no será utilizado en obra.

·Personal: (2) Ingenieros Residentes; (2) SST; (1) Almacenista; (1) Topografo; (1) Maestro; (6) Ayudantes de obra

·Equipo: (1) Estación Topografica

paula salgado

09 de Marzo del 2026

·Estado del tiempo: Soleado

·Descripción: Se inician actividades de corte de manguera en los anclajes con el fin de adelantar trabajo correspondiente a tensionamiento. Se continuan actividades de conformación de terraza garantizando los niveles respectivos. En el area adicional despues del disipador se conforma con el fin de replantear lo e instalar le geotextil

·Personal: (2) Ingenieros Residentes; (2) SST; (1) Almacenista; (1) Topografo; (1) Maestro; (8) Ayudantes

·Equipo: N/A.

paula salgado

10 de Marzo del 2026

- Estado del tiempo: Nublado
- Descripción: Se inician actividades de replanteo del area adicional, previo a esto, se instala el geotextil de cerera a pie del talud, y se asegura con pines. Se realiza una especie de bordillo en toda la delimitación de la presente area con el fin de asegurarla en el talud.
- Personal: (2) Ingenieros Residentes; (2) SST; (1) Almacenista; (1) Topografo; (1) Oficial; (8) Ayudantes de obra
- Equipo: N/A.

Paula Algado
Melissa Donado

11 de Marzo del 2026

- Estado del tiempo: Lluvioso
- Descripción: Se presentan lluvias desde las 5 de la mañana hasta las 9 am. Se observa el comportamiento de las aguas lluvias en las estructuras realizadas, y no se presenta ningún problema. Una vez escampa se inspeccionan los pozos que se encuentran cerca a la obra y se realiza jornada de limpieza dentro de ellos, retirando cualquier sedimento que tenga que obstruya el paso del agua
- Personal: (2) Ingenieros Residentes; (2) SST; (1) Almacenista; (1) Topografo; (1) Oficial; (8) Ayudantes
- Equipo: N/A

Melissa D
Paula Algado

12 de Marzo del 2026

- Estado del tiempo: Soleado
- Descripción: Se inicia actividades de replanteo de la terraza 8, verificando los niveles existentes. Se inicia con la excavación y alado de la caja de inspección ubicada al finalizar el disipador y canaleta inferior. Se verifican los niveles y se instala formaleta para sus paredes
- Personal: (2) Ingenieros Residentes; (2) SST; (1) Almacenista; (1) Topografo; (1) Oficial, (8) Ayudantes
- Equipo: Estación topografica

13 de Marzo del 2026

- Estado del tiempo: Soleado
- Descripción: Se inician actividades de fundido de caja en la parte baja del disipador, se realizan con dos salidas con el objetivo de generar rebose del agua. De igual manera se hacen las tapas dejando los respectivos ganchos
- Personal: (2) Ingenieros Residentes; (2) SST; (1) Almacenista (1) Topografo; (1) Maestro; (8) Ayudantes de obra
- Equipo: (1) Trompo

14 de Marzo del 2026

- Estado del tiempo: Soleado
- Descripción: Se inician actividades de resane de las estructuras realizadas como lo son estructura de disipación de energía, caja de inspección y canaleta en todos los filos que se encuentran grieteados. Se realiza limpieza general en obra por fin de semana
- Personal: (2) Ingenieros Residentes; (2) SST; (1) Almacenista (1) Oficial; (8) Ayudantes
- Equipo: (1) Trompo

16 de marzo del 2026

- Estado del tiempo: Soleado
- Descripción: Se inicia actividades de excavación de canaleta perimetral del área adicional con el objetivo de poder canalizar el agua en esa zona. Se verifica niveles y se realiza fundido de ese tramo. Se realizan actividades complementarias al contrato como es la realización de saidinel o bordillo en todas las peatonales con el fin de que sirva de barrera para no conducir el agua a las peatonales
- Personal: (2) Ingenieros Residentes; (2) SST; (1) Ingeniera Ambiental (1) Topografo; (1) Oficial; (8) Ayudantes

Scanned with CamScanner

•Equipo: (1) Trompo.

17 de Marzo del 2016

•Estado del tiempo: Soleado

•Descripción: Se continuan con actividades de fundida de amopeche en la pearenal con el objetivo de restringir el paso de cualquier sedimento. Se realiza la rampa para poder permitir el acceso de las motocicletas, según requerimiento de la comunidad

•Personal: (2) Ingenieras Residentes; (1) SST; (1) Trabajadora Social; (1) Ingeniera Ambiental; (1) Topografo; (1) Oficial; (8) Ayudantes

•Equipo: (1) Mezcladora

18 de Marzo del 2016

•Estado del tiempo: Lluvioso

•Descripción: Se presenta lluvias intensas desde las 5am, lluvias que se presentan en todo el Area Metropolitana. Se detiene las actividades de obra debido a las fuertes lluvias. Se aprovecha condición climatica para observar las estructuras realizadas para conducir el agua de escorrentía, y se observa que estas actividades contractuales realizadas presentan un comportamiento hidraulico adecuado, sin fallas u observaciones técnicas. Finalizando el día se recibe visita de la COMB para observar si hubieron daños por las lluvias presentadas, se toma registro fotografico y hoja de visita de las actividades vistas. Se deja la observación de reunirse con el presidente de la acción comunal para definir la compensación forestal

•Personal: (2) Ingenieras Residentes; (1) SST; (2) Ingenieras Ambientales (1) Director de obra; (1) Almacenista; (1) Oficial; (8) Ayudantes

•Equipo: N/A

19 de Mayo del 2016

•Estado del tiempo: Nublado

•Descripción: Se inician actividades de obra con limpieza del

frente de trabajo debido a las fuertes lluvias ocasionadas el día anterior. Se continua con actividades de fundida de canaleta en la zona inferior de la pantalla anclada. Se continua con actividades urbanisticas en la terraza del talud

- Personal: (2) Ingenieros Residente; (1) SST; (1) Almacenista; (1) Oficial; (1) Ingeniera Ambiental; (6) Ayudantes de obra
- Equipo: Mezcladora

20 de Marzo del 2026

- Estado del tiempo: Soleado
- Descripción: Se continua con la conformación geometrica de la terraza, y se verifica niveles mediante pendientes dirigidas hacia la canaleta ubicada en el pie del talud. Se continua la construcción de bodillo perimetral para el control de material particulado y evitar el arrastre de sedimentos
- Personal: (2) Ingenieros Residentes; (1) Oficial; (8) Ayudantes de Obra; (1) Almacenista; (1) Ingeniera Ambiental
- Equipo: Mezcladora

21, 22 y 23 Días festivos (No laboral)

24 de Marzo del 2026

- Estado del tiempo: Soleado
- Descripción: Se continuan con actividades de conformación de terraza, se verifica niveles y se perfila la tierra existente. Se instala abono para conformar una terraza ambientalista, y se riega semilla bracharia para que cierre el paso
- Personal: (2) Ingenieros Residentes; (1) Ingeniera Ambiental; (1) SST; (1) Oficial; (6) Ayudantes; (1) Topografo; (1) Almacenista
- Equipo: Estación Topografica; Mezcladora

25 de Marzo del 2026

- Estado del tiempo: Lluvioso
- Descripción: Se presenta en horas de la mañana lluvia

leves que no impiden el desarrollo de la obra. Se realiza las lamas peatonales en los bordillos previamente realizados. Se destapa los lloraderos realizados sobre dicho bordillo. Se continua con la colocación de la terraza.

- Personal: (2) Ingenieros Residentes; (1) SST; (1) Ingeniera Ambiental (1) topografo; (1) Oficial; (6) Ayudantes;
- Equipo: (1) Trompo

Melissa D.

26 de Marzo del 2026

- Estado del tiempo: Soleado
- Descripción Se realizan actividades de conformación de terraza verificando los niveles y se dejan pasantes en tubería de 2" para el desagüe. Se continua con la excavación de cunaleta en la zona posterior a la pantalla con el objetivo de canalizar la zona donde no se realizo estabilización
- Personal: (2) Ingenieros Residentes; (1) SST; (1) Almacenista; (1) Topografo; (1) Oficial; (6) Ayudantes; (1) topografo
- Equipo: (1) Mezcladora

27 de Marzo del 2026

- Estado del tiempo: Soleado
- Descripción. Se continuan con actividades de conformación de la terraza en el frente de obra. Se realiza fundida de cunaleta en la zona posterior a la pantalla con el objetivo de canalizar la zona donde no se realiza estabilización. Se recibe visita COMB
- Personal: (2) Ingenieros Residentes; (1) SST; (1) Almacenista; (1) Oficial; (6) Ayudantes; (Personal Contratista COMB
- Equipo (1) mezcladora

Melissa D

28 de Marzo del 2026

- Estado del tiempo: Soleado
- Descripción. Se continua con actividades de fundida de cunaleta en la zona posterior a la pantalla Estabilizada. Se continua

confirmado la terraza con instalación de abono y semilla.
Se realiza actividades menores de obra para dejar organizado para antes de semana santa
• Personal: (2) Ingenieros Residentes; (1) SST; (1) Almacenista (1) Topografo; (1) Oficial; 6) Ayudantes
• Equipo: Mezcladora

30 de marzo del 2026
Estado del tiempo: Soleado
• Descripción: Se inician actividades de conformación de terraza generada por medio de las obras intervenidas. Se realiza bordillo en las peatonales con el fin de restringir cualquier sedimento. Se continua con el riego de abono en la zona de la terraza
• Personal: (2) Ingenieros Residentes; (1) SST; (1) Almacenista; (1) Oficial (6) Ayudantes; (1) Director de obra, (1) Ingeniera Ambiental
• Equipo: (1) Trompo; (1) Estación Total

31 de Marzo del 2026
• Estado del tiempo: Soleado
• Descripción Se inician actividades de construcción de bordillo perimetral en cada peatonal, dejando un terminado liso e instalando lloraderos para el desague del agua, y por solicitud de la comunidad se dejan rampas para el ingreso de motocicletas
• Personal: (2) Ingenieros Residentes; (1) SST; (1) Almacenista; (1) Topografo; (1) Oficial; (6) Ayudantes
• Equipo: Estación Topografica; (1) mezcladora

01 de Abril del 2026
• Estado del tiempo Soleado
• Descripción. Se inician actividades de conformación de terraza en la parte baja del talud. Se replantea, se nivela y se compacta el terreno suelto presente. Se realizan actividades de inventario, orden y aseo para poder salir a receso de semana

ANEXO No.02: SEGURIDAD SOCIAL

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900847742	7	INFRACORP SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 74A 22 31	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7920530	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-04	210164771	9502917642	E	2026/04/13	2026/04/09	BANCO DE OCCIDENTE	0	$17.429.800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL Afiliados)																					**$58.219.145**	**$9.402.500**			**$59.970.050**	**$2.400.900**			**$58.104.376**	**$2.326.200**			**$59.970.050**		**$3.300.200**		**$0**	**$0**		**$17.429.800**
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (5 Afiliados)																					**$9.750.909**	**$1.560.600**			**$11.501.814**	**$460.600**			**$9.750.909**	**$390.500**			**$11.501.814**		**$57.100**		**$0**	**$0**		**$2.468.800**
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (2 Afiliados)																					**$4.500.002**	**$720.200**			**$4.500.002**	**$180.200**			**$4.500.002**	**$180.200**			**$4.500.002**		**$22.800**		**$0**	**$0**		**$1.103.400**
13	CC	63553613	BERMUDEZ CALA SANDRA YOLIMA																		230301	27	$2.255.924	$361.000	MIN001	27	$2.255.924	$90.300	CCF40	27	$2.255.924	$90.300	14-4	27	$2.255.924	6,960%	$157.100	27	$0	$0	Si	$698.700
14	CC	63553613	BERMUDEZ CALA SANDRA YOLIMA												X						230301	3	$250.659	$40.200	MIN001	3	$250.659	$10.100	CCF40	3	$250.659	$10.100	14-4	3	$250.659	0,000%	$0	3	$0	$0	Si	$60.400
19	CC	1098704436	DONADO ARIAS CLARA MELISSA																		230201	27	$1.575.815	$252.200	EPS010	27	$1.575.815	$63.100	CCF40	27	$1.575.815	$63.100	14-4	27	$1.575.815	6,960%	$109.700	27	$0	$0	Si	$488.100
20	CC	1098704436	DONADO ARIAS CLARA MELISSA												X						230201	3	$175.091	$28.100	EPS010	3	$175.091	$7.100	CCF40	3	$175.091	$7.100	14-4	3	$175.091	0,000%	$0	3	$0	$0	Si	$42.300
25	CC	1098673915	ZAMBRANO LESMES FABIAN LEONARDO																		25-14	27	$2.430.000	$388.800	EPS042	27	$2.430.000	$97.200	CCF40	27	$2.430.000	$97.200	14-4	27	$2.430.000	6,960%	$169.200	27	$0	$0	Si	$752.400
26	CC	1098673915	ZAMBRANO LESMES FABIAN LEONARDO												X						25-14	3	$270.000	$43.200	EPS042	3	$270.000	$10.800	CCF40	3	$270.000	$10.800	14-4	3	$270.000	0,000%	$0	3	$0	$0	Si	$64.800
34	CC	1098756647	SANCHEZ JEREZ OSCAR ANDRES																		230201	30	$4.000.000	$640.000	EPS010	30	$4.000.000	$160.000	CCF40	30	$4.000.000	$160.000	14-4	30	$4.000.000	6,960%	$278.400	30	$0	$0	Si	$1.238.400
38	CC	13537319	PRADA JEREZ ALEXANDER									X									231001	30	$1.895.156	$303.300	EPS037	30	$1.895.156	$75.900	CCF40	30	$1.895.156	$75.900	14-4	30	$1.895.156	6,960%	$132.000	30	$0	$0	Si	$587.100
Total		**Afiliados( )**																																							

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 72254372		GOMEZ RONCANCIO EDGAR LEONARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 39 # 51 - 31 APTO 1903	BUCARAMANGA-SANTANDER	6914305	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-03	210356905	9502922470	I	2026/04/20	2026/04/09	BANCO DE OCCIDENTE	0	$3,459,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	72254372	GOMEZ RONCANCIO EDGAR LEONARDO									X									231001	30	$10,832,042	$1,841,600	EPS010	30	$10,832,042	$1,354,100		0	$0	$0	14-7	30	$10,832,042	$263,900	0	$0	$0	No	$3,459,600
Total	**Afiliados(1)**																					$10,832,042	$1,841,600			$10,832,042	$1,354,100			$0	$0			$10,832,042	$263,900		$0	$0		$3,459,600

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 72254372		GOMEZ RONCANCIO EDGAR LEONARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 39 # 51 - 31 APTO 1903	BUCARAMANGA-SANTANDER	6914305	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-03	210356905	9502922470	I	2026/04/20	2026/04/09	BANCO DE OCCIDENTE	0	$3,459,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$1,841,600	$0	$0	$1,841,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$1,841,600	$0	$0	$1,841,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$263,900	$0	$0	$263,900
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	1	$263,900	$0	$0	$263,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$1,354,100	$0	$0	$1,354,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$1,354,100	$0	$0	$1,354,100
TOTAL				**1**	**$3,459,600**	**$0**	**$0**	**$3,459,600**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1098618429		OSPINO RODELO JOHANA PAOLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 197 15 185 CONJ VSER 2 CS 55	FLORIDABLANCA-SANTANDER	6898027	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-03	212339961	9501877860	I	2026/04/10	2026/04/10	BANCO DE OCCIDENTE	0	$499,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1098618429	OSPINO RODELO JOHANA PAOLA																		25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0	No	$499,100
Total	**Afiliados(1)**																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$0	$0		$0	$0		$499,100

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1098618429		OSPINO RODELO JOHANA PAOLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 197 15 185 CONJ VSER 2 CS 55	FLORIDABLANCA-SANTANDER	6898027	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-03	212339961	9501877860	I	2026/04/10	2026/04/10	BANCO DE OCCIDENTE	0	$499,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$280,200	$0	$0	$280,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				1	$499,100	$0	$0	$499,100

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-04-13, 08:23:26 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1080958708

Periodo Cotización: marzo de 2026 **Periodo Servicio:** marzo de 2026

PAGADO 10/04/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MARIA LUCIA HIGUERA PINO		
Documento	CC1095700657	**Dirección**	CRA 36 # 38 28 APTO 301
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3212192048
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1095700657	MARIA LUCIA HIGUERA PINO	59	00																	0	30	30	30	0	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS010) EPS SURA	$ 1.750.905	$ 218.900	0,522	$ 1.750.905	$ 9.200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 508.300

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 0	$ 280.200	$ 218.900	$ 9.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 508.300	$ 0	$ 508.300

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-04-10, 09:13:02 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1080790202

Periodo Cotización: marzo de 2026 **Periodo Servicio:** abril de 2026

PAGADO 09/04/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSORCIO CONSOLIDACION GIRON		
Documento	NI901982571	**Dirección**	CR 39 #51 - 31 AP 2405
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3012765665
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal	PADIERNA CASTIBLANCO JOHANNA MARCELA	**Identificación**	CC 1098682052
Total Afiliados	9	**ARP**	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1005157855	GIOVANY SEBASTIAN PARRA FERRER	01	00										X							0	29	29	29	29	(230301) PORVENIR	$ 1.796.999	$ 287.600	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.796.999	$ 71.900	6,960	$ 1.796.999	$ 125.100	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.796.999	$ 71.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 556.500
CC 1005157855	GIOVANY SEBASTIAN PARRA FERRER	01	00														X			0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 59.259	$ 9.500	(EPS005) EPS SANITAS	$ 59.259	$ 2.400	0,000	$ 59.259	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 58.364	$ 2.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.300
CC 1082871247	MANUEL ENRIQUE CASTILLO FLOREZ	01	00										X							0	29	29	29	29	(230301) PORVENIR	$ 1.772.129	$ 283.600	(ESSC24) EPS-S COOSALUD	$ 1.772.129	$ 70.900	6,960	$ 1.772.129	$ 123.400	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.772.129	$ 70.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 548.800
CC 1082871247	MANUEL ENRIQUE CASTILLO FLOREZ	01	00														X			0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 60.354	$ 9.700	(ESSC24) EPS-S COOSALUD	$ 60.354	$ 2.500	0,000	$ 60.354	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 58.364	$ 2.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.600
CC 1098605491	EDSON ALEXANDER PORTILLA ARDILA	01	00										X							0	29	29	29	29	(230301) PORVENIR	$ 1.987.803	$ 318.100	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.987.803	$ 79.600	6,960	$ 1.987.803	$ 138.400	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.987.803	$ 79.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 615.700
CC 1098605491	EDSON ALEXANDER PORTILLA ARDILA	01	00														X			0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 64.233	$ 10.300	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 64.233	$ 2.600	0,000	$ 64.233	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 63.334	$ 2.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 15.500
CC 1101520618	JESUS ALBERTO MAYORGA MAYORGA	01	00										X							0	28	28	28	28	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.723.713	$ 275.800	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.723.713	$ 69.000	6,960	$ 1.723.713	$ 120.000	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.723.713	$ 69.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 533.800
CC 1101520618	JESUS ALBERTO MAYORGA MAYORGA	01	00											X						0	1	1	1	1	(25-14) COLPENSIONES	$ 62.011	$ 7.500	(EPS005) EPS SANITAS	$ 62.011	$ 0	0,000	$ 62.011	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.500
CC 1101520618	JESUS ALBERTO MAYORGA MAYORGA	01	00														X			0	1	1	1	1	(25-14) COLPENSIONES	$ 62.012	$ 10.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 62.012	$ 2.500	0,000	$ 62.012	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 58.364	$ 2.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.900
CC 1101596200	ISAIAS GARCIA JAIMES	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.932.462	$ 309.200	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.932.462	$ 77.300	6,960	$ 1.932.462	$ 134.500	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.932.462	$ 77.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 598.300
CC 1102383713	YOHAN ALEXANDER CACERES PABON	01	00		X								X							0	12	12	12	12	(230301) PORVENIR	$ 789.897	$ 126.400	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 789.897	$ 31.600	6,960	$ 789.897	$ 55.000	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 866.331	$ 34.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 247.700
CC 1124048478	MIGUEL ANTONIO RANGEL FLORIAN	01	00										X							0	29	29	29	29	(230301) PORVENIR	$ 1.782.077	$ 285.200	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.782.077	$ 71.300	6,960	$ 1.782.077	$ 124.100	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.782.077	$ 71.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 551.900
CC 1124048478	MIGUEL ANTONIO RANGEL FLORIAN	01	00														X			0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 59.359	$ 9.500	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 59.359	$ 2.400	0,000	$ 59.359	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 58.364	$ 2.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.300
CC 1232891906	JARRINSON STEVEN CAMARON CAICEDO	01	00										X							0	27	27	27	27	(230301) PORVENIR	$ 1.715.092	$ 274.500	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 1.715.092	$ 68.700	6,960	$ 1.715.092	$ 119.400	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.715.092	$ 68.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 531.300
CC 1232891906	JARRINSON STEVEN CAMARON CAICEDO	01	00												X					0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 116.728	$ 18.700	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 116.728	$ 4.700	0,000	$ 116.728	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 116.728	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 23.400
CC 1232891906	JARRINSON STEVEN CAMARON CAICEDO	01	00														X			0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 58.364	$ 9.400	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 58.364	$ 2.400	0,000	$ 58.364	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 58.364	$ 2.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.200
CC 91479571	WILLINGTONG ALARCON ASCANIO	01	00										X							0	29	29	29	29	(230301) PORVENIR	$ 1.811.922	$ 290.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.811.922	$ 72.500	6,960	$ 1.811.922	$ 126.200	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.811.922	$ 72.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 561.200
CC 91479571	WILLINGTONG ALARCON ASCANIO	01	00														X			0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 59.027	$ 9.500	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 59.027	$ 2.400	0,000	$ 59.027	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 58.364	$ 2.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.300

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 15.913.441	$ 15.913.441	$ 15.913.441	$ 15.918.774	$ 2.544.500	$ 634.700	$ 1.066.100	$ 632.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.878.200	$ 0	$ 4.878.200

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-04-10, 09:12:37 AM **Tipo Planilla:** Y: PLANILLA INDEPENDIENTES EMPRESAS **Numéro Planilla:** 1080790284

Periodo Cotización: marzo de 2026 **Periodo Servicio:** marzo de 2026

PAGADO 09/04/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSORCIO CONSOLIDACION GIRON		
Documento	NI901982571	**Dirección**	CR 39 #51 - 31 AP 2405
Tipo de Empresa	CONTRATANTE	**Teléfono**	3012765665
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal	PADIERNA CASTIBLANCO JOHANNA MARCELA	**Identificación**	CC 1098682052
Total Afiliados	3	**ARP**	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1095700657	MARIA LUCIA HIGUERA PINO	59	00																	0	0	0	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 121.900
CC 1098618429	JOHANA PAOLA OSPINO RODELO	59	00																	0	0	0	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 121.900
CC 80089079	JUAN CARLOS RINCON LOZANO	59	00																	0	0	0	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 121.900

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 0	$ 0	$ 5.252.715	$ 0	$ 0	$ 0	$ 365.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 365.700	$ 0	$ 365.700

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	80089079
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JUAN CARLOS RINCON LOZANO
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANCABERMEJA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CARRERA 19 B NO 64 - 24	TELÉFONO:	6223036
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6008888949**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	marzo	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	marzo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	SALUD:	AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/03/16	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		145629614

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002279406	231001	231001-COLFONDOS	1	$ 280.200
		SUBTOTAL:	1	**$ 280.200**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1	$ 218.900
		SUBTOTAL:	1	**$ 218.900**

VALOR SIN MORA:	**$ 499.100**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 499.100**

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	80089079
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JUAN CARLOS RINCON LOZANO
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANCABERMEJA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CARRERA 19 B NO 64 - 24	TELÉFONO:	6223036
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NO		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6008888949**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES marzo AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES marzo AÑO 2026
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/03/16	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	145629614

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 0	$ 280.200
SUBTOTALES:										**$ 280.200**	**$ 0**	**$ 280.200**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 218.900
SUBTOTALES:													**$ 218.900**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 218.900**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																			PARAFISCALES						
																													PENSIÓN								SALUD							ARP												
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 80089079	RINCON LOZANO JUAN CARLOS	INDEPEND		$ 1.750.905				NO																		231001-COLFONDOS	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900			$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 499.100

Planilla Pagada

ANEXO No.03: INFORME AMBIENTAL

INFORME DE CUMPLIMIENTO
PLAN DE ACCION SOCIO AMBIENTAL

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN EL TALUD ORIENTAL DEL BARRIO VILLA DE LOS CABALLEROS EN EL MUNICIPIO DE GIRÓN, DEPARTAMENTO DE SANTANDER (RA-OBRA-02).”

ELABORADO POR:
CONSORCIO CONSOLIDACION GIRON

GIRON

01 AL 31 DE MARZO

2026

1. CONSIDERACIONES GENERALES

1.1 INTRODUCCION

El presente documento, corresponde a la información obtenida por el **CONSORCIO CONSOLIDACION GIRON** durante la ejecución de las obras de intervención correctiva requeridas para mitigar el riesgo por movimientos en masa mediante la construcción de pantallas ancladas y obras de mitigación y consolidación para el control de la erosión en el talud oriental del Barrio Villa de Los Caballeros en el Municipio de Girón, Departamento de Santander (RA-Obra-02); teniendo claro que el proyecto no requiere de trámite de Licencia Ambiental, el CONSORCIO CONSOLIDACION GIRON en cumplimiento de su responsabilidad ambiental aplica los programas basados en los lineamientos establecidos en el Manual de Gestión Socio Ambiental para obras de construcción, el cual establece el Plan de Acción Socio Ambiental para proyectos que no requieren licenciamiento Ambiental.

El objetivo del Plan de acción socio ambiental, es definir las medidas de prevención y/o corrección de los impactos negativos directos e indirectos que se puedan generar durante las etapas de desarrollo de la obra, teniendo como base, las características del área y las actividades a realizar para cumplir con las especificaciones del proyecto, en el cual se dispone que el desarrollo del mismo mejorara la calidad de vida de los habitantes del área de influencia indirecta de la obra.

El Plan de acción se encuentra enmarcado en la normatividad legal vigente en el país, que requiere imponer una práctica apropiada del manejo del espacio físico y de todos sus recursos naturales, tratando de conservar, mejorar y recuperar la calidad ambiental que conlleva al desarrollo sustentable del área a intervenir.

Todos los proyectos que se desarrollan en el Departamento de Santander deben realizarse dentro de un marco de actuación respetuoso con el ambiente, garantizando el uso racional, sostenible de los recursos naturales renovables, que intervienen y que deben incluir, para la ejecución, la presentación del plan de acción socio ambiental a las Autoridades que lo exijan según el marco de sus competencias.

Para la ejecución de este proyecto, se hace indispensable el cumplimiento de la normativa establecida por la autoridad ambiental y la legislación correspondiente; por lo cual se busca disponer de las acciones de la ley 99 de 1993 para el manejo ambiental de los proyectos como parte del buen ejercicio de la ingeniería.

En este sentido, el Plan de acción socio ambiental, propone con el presente documento, la orientación en el cumplimiento de las normas ambientales, con el fin de ejercer control antes, durante y después de la ejecución de las obras civiles necesarias para construir y mejorar las áreas que se puedan ver afectadas con el desarrollo del proyecto.

La aplicación de las medidas planteadas en este Plan, optimizarán el uso racional y el usufructo de los recursos naturales en este sector, ayudarán a mejorar la gestión ambiental al interior de la ejecución de la obra, con el desarrollo de los programas establecidos según las necesidades y dinámica propia del proyecto, proporcionando el mejoramiento de la calidad de vida del entorno social, otorgando una mejor comprensión de la variable

ambiental en la ejecución del proyecto por parte del ejecutor, el cual es completamente conscientes de su significado e importancia.

Por último, se busca, unificar y armonizar los lenguajes ingenieril y ambiental, de tal manera que las actividades desarrolladas en el proyecto, sean compatibles con el entorno en el cual se ejecutan y de esta manera permitir la sostenibilidad de los recursos naturales, acorde con los lineamientos consagrados en la Constitución Nacional, la ley 99 de 1993 y demás normatividad para la protección del medio ambiente.

El objetivo principal de este Plan de Acción es formular los mecanismos que permitan aplicar oportunamente una medida, bien sea de manejo, prevención, mitigación, control, protección, vigilancia o compensación, en las áreas de interés humano y ecológico para la zona de influencia del proyecto.

Los principales aspectos relacionados con el manejo y protección ambiental que se deben considerar para la ejecución del proyecto, son los siguientes programas:

1. PROGRAMA PARA EL MANEJO DE RESIDUOS
2. PROGRAMA CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS
3. PROGRAMA USO Y ALMACENAMIENTO ADECUADO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
4. PROGRAMA PROTECCIÓN DEL SUELO – PREVENCIÓN DE PROCESOS EROSIVOS Y CONTROL SOBRE LA ESCORRENTÍA.
5. PROGRAMA PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DE CUERPOS DE AGUA Y REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS
6. PROGRAMA PARA EL MANEJO DE LA VEGETACION LA FAUNA Y EL PAISAJE.
7. PROGRAMA DE SEÑALIZACION
8. PROGRAMA DE ADECUACION DE CAMPAMENTOS.
9. PROGRAMA DE GESTION SOCIAL

Las medidas de manejo ambiental que se presentan a continuación, corresponden a las acciones que se implementaron para controlar, mitigar, prevenir y/o compensar los diferentes impactos que se pueden presentar con la ejecución con la construcción de las obras de mitigación y consolidación para el control de la erosión en el Talud Oriental del Barrio Villa de Los Caballeros en el Municipio de Girón, Departamento de Santander (RA-Obra-02).”

1.2 OBJETIVOS

1.2.1 Objetivo General

Implementar las medidas de manejo que se deben aplicar en el desarrollo de las actividades de la construcción de obras de mitigación y consolidación para el control de la erosión en el talud oriental del Barrio Villa de Los Caballeros en el Municipio de Girón, Departamento de Santander (Ra-Obra-02); con el fin de prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos o afectaciones que se pueden generar sobre los recursos naturales y el medio ambiente y así mismo realizar una adecuada gestión social en la población influenciada directamente por el proyecto.

1.2.2 Objetivos específicos

- Implementar las medidas de manejo ambiental para prevenir, mitigar, corregir y/o compensar los impactos identificados y analizados para el proyecto.

- Lograr satisfactoriamente el cumplimiento de los indicadores de seguimiento y monitoreo para las medidas de manejo planteadas.

2. INFORME MENSUAL

En el desarrollo de Construcción de las obras de mitigación y consolidación para el control de la erosión en el talud oriental del barrio villa de los caballeros en el municipio de Girón, departamento de Santander (RA-OBRA-02)", busca fomentar la educación ambiental e implementar políticas y acciones enfocadas al desarrollo sostenible dando cumplimiento a la normatividad ambiental vigente.

El presente informe está contemplado desde el 01 al 31 de Marzo de 2026; se tiene en cuenta que en este primer periodo de ejecución se realizaron las siguientes actividades:

- ✓ Replanteo, control y medición de la obra
- ✓ Suministro y colocación de concreto de 3000 psi con mezcla húmeda para zapatas
- ✓ Suministro y colocación de concreto lanzado con mezcla húmeda de espesor 10 cm
- ✓ Canaleta (ancho = 1m; e =10cm)
- ✓ Estructura de disipación de energía

3. PROGRAMAS IMPLEMENTADOS EN EL CUMPLIMIENTO DEL MANEJO AMBIENTAL.

Las medidas de manejo ambiental que se presentan a continuación, corresponden a las acciones que se implementaron para controlar, mitigar, prevenir y/o compensar los diferentes impactos que se pueden presentar con la Construcción de las obras de mitigación y consolidación para el control de la erosión en el talud oriental del barrio villa de los caballeros en el municipio de Girón, departamento de Santander (RA-OBRA-02)", Las medidas ejecutadas abordan los aspectos físicos, bióticos y sociales que pueden ser impactados por el proyecto con el cumplimiento de sus indicadores para su seguimiento y monitoreo, además de los proyectos relacionados con la aplicación de la gestión ambiental.

Los principales aspectos relacionados con el manejo y protección ambiental que se consideran para la ejecución del proyecto, son:

3.1 PROGRAMA PARA EL MANEJO DE RESIDUOS

PROGRAMA PARA EL MANEJO DE RESIDUOS							PASA -01
OBJETIVO							
Prevenir y controlar la contaminación de los recursos: agua, suelo y aire, así como la afectación a la salud de las personas, mediante un manejo integral de los residuos sólidos convencionales y especiales que se generan durante el desarrollo de la obra.							
TIPO DE MEDIDA							
Control	X	Prevención	X	Mitigación		Compensación	
BENEFICIOS							
A través de un adecuado manejo de los residuos de la obra se logra: • Reducir la generación de emisiones atmosféricas. • Prevenir el aporte de sólidos en las redes de alcantarillado y corrientes superficiales. • Reducir el impacto visual de la obra y minimizar el área de afectación por presencia de residuos o escombros. • Minimizar las necesidades de transporte de residuos. • Asegurar el buen funcionamiento de las escombreras y maximizar su vida útil. • Reducir costos financieros. • Optimizar la administración de materiales. • Reducir riesgos inherentes al almacenamiento de residuos.							
• ACCIONES A EJECUTAR							
Durante las actividades de de intervención correctiva mediante la construcción de pantallas ancladas para mitigar el riesgo por deslizamiento y movimiento, se generarán diferentes tipos de residuos los cuales se consideran domésticos, reciclables y de disposición especial o peligrosa, los cuales recibirán el tratamiento adecuado.							

A continuación, se describe el procedimiento aplicado con el fin de dar cumplimiento al manejo integral de residuos sólidos, con lo cual se busca minimizar los impactos temporales que se puedan generar por su inadecuado manejo, estas son:

- Clasificar y reducir en la fuente.
- Recolectar y almacenar temporalmente.
- Disposición final adecuada.

Los residuos sólidos generados durante el proceso de construcción son de diversa naturaleza. Una adecuada gestión y clasificación de estos residuos resulta fundamental para identificar materiales que pueden ser reciclados o reutilizados, minimizando así la cantidad de desechos no aprovechables y favoreciendo prácticas más sostenibles en el desarrollo de las actividades; de esta forma, se reducen costos de disposición final, se optimiza el uso de los materiales y se alcanza un menor impacto ambiental.

Los residuos sólidos generados durante el periodo correspondiente del 01 al 31 de Marzo de 2026, teniendo en cuenta las actividades del periodo son:

RESIDUOS ORDINARIOS	RESIDUOS RECICLABLES
6.9 Kg	2.8 Kg

(Ver Anexo No 1. Manejo de Residuos Sólidos)

En el periodo de ejecución se realizó la clasificación de los residuos sólidos generados en la ejecución de la obra, los cuales son dispuestos temporalmente en el punto ecológico adaptado, y posteriormente son entregados a la empresa de servicio de recolección de aseo de Girón (Veolia); esta empresa es responsable de la recolección y el transporte de residuos sólidos en la ciudad, de acuerdo con las rutas de recolección de aseo, son transportados y finalmente dispuestos en el relleno sanitario El Carrasco, único sitio autorizado a nivel regional para la disposición final de residuos sólidos, sitio que opera bajo la figura de emergencia sanitaria.

Generación de residuos reciclables.
En el periodo relacionado se generaron **2.8 Kg** de residuos sólidos reciclables, los cuales se encuentran en almacenamiento temporal hasta tener un volumen considerable para ser entregados a una empresa legalmente constituida para realizar el aprovechamiento de este tipo de residuos, promoviendo así la economía circular y reduciendo la cantidad de residuos enviados a los rellenos sanitarios. Este proceso facilita la reincorporación de los materiales reciclables en la cadena productiva, contribuyendo de manera significativa a la sostenibilidad y al cumplimiento de las políticas de gestión integral de residuos sólidos.

Generación de residuos sólidos especiales
En el periodo relacionado no se generaron residuos sólidos peligrosos, cuando se generen residuos peligrosos, estos serán entregados a un gestor autorizado para realizar su tratamiento y disposición final adecuada.

Manejo de material sobrante y RCD
De acuerdo con la planificación de la obra, durante el periodo de ejecución relacionado no se realizaron, actividades generadoras de RCD´s ni material sobrante.

Actividades de Capacitación
En el periodo relacionado se realizó capacitación en manejo de la vegetación, fauna y paisajismo (ver anexo No 2. Registro de Asistencia a capacitación).





Jornadas de orden y aseo





Actividades de Capacitación Ambiental

ETAPA			
PRECONSTRUCCIÓN		OPERACIÓN	X
CONSTRUCCIÓN	X	DESMANTELAMIENTO	X
LUGAR DE APLICACIÓN			
Frentes de obra Villa de Los Caballeros			
CRONOGRAMA DE EJECUCION			

ACTIVIDADES	MESES DE EJECUCIÓN					
	1	2	3	4	5	6
Manejo para separación en la fuente de residuos sólidos						
Recolección de Residuos ordinarios y disposición final						
Recolección de residuos reciclables y especiales con disposición final						

–

RESPONSABLE DE LA EJACUCION

CONSORCIO CONSOLIDACION GIRON

Indicador

- Volumen de residuos ordinarios
- Volumen de residuos especiales
- Volumen de residuos reciclables

Descripción del Indicador

Cantidad de residuos ordinarios generados en la obra

Indicador de calificación

- Volumen residuos entregados gestor ambiental / Volumen residuos generados en el periodo X 100

6.9 / 6.9 *100 = 100%

- Volumen de RESPEL entregados a empresa autorizada/ Volumen RESPEL generado en el periodo X 100

No aplica, no se generaron residuos peligrosos

- Volumen residuos reciclables entregados a empresas recicladoras / Volumen residuos reciclables generados en el periodo X 100

No aplica, los residuos generados se encuentran en almacenamiento temporal

Frecuencia de verificación

Mensual a medida que la necesidad lo amerite, y las actividades de la obra los generen

Tipo de indicador

Cuantitativo.

Registro de cumplimiento

Informe mensual
Registro fotográfico

Cronograma

La aplicación de las medidas establecidas en el Plan de Acción Socio-Ambiental tiene el mismo tiempo y duración de las actividades constructivas, o el tiempo que sea necesario, con el fin de asegurar el manejo integral de los residuos sólidos durante la ejecución de la obra.

3.2 PROGRAMA CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS

Programa control de emisiones atmosféricas.								**PASA - 02**
OBJETIVO								
Controlar las emisiones de material particulado y gases a la atmósfera como resultado de los movimientos de tierra y operación de vehículos, equipos y maquinaria. Prevenir el incremento en los niveles de ruido durante las actividades constructivas del proyecto.								
Tipo de medida								
Control	X	Prevención	X	Mitigación	X	Compensación		
BENEFICIOS								
A través de la aplicación de las medidas ambientales se espera: • Minimizar los efectos adversos al medio ambiente controlando la generación de material particulado. • Controlar los niveles de ruido, durante la ejecución de la obra, garantizando que este se encuentre por debajo de los límites permisibles. • Minimizar las quejas y reclamos por parte de la comunidad durante la ejecución del proyecto.								
ACCIONES A EJECUTAR								
Durante el periodo del del 01 al 31 de Marzo de 2026, se realizaron las siguientes actividades: ✓ Replanteo, control y medición de la obra ✓ Suministro y colocación de concreto de 3000 psi con mezcla húmeda para zapatas ✓ Suministro y colocación de concreto lanzado con mezcla húmeda de espesor 10 cm ✓ Canaleta (ancho = 1m; e =10cm) ✓ Estructura de disipación de energía Para dar cumplimiento a las acciones establecidas en el Plan de Acción Socio Ambiental se aplicaron durante el mes relacionado las siguientes medidas: • Dentro de la implementación de medidas de manejo para el uso de maquinaria y equipos de construcción se garantizan las condiciones óptimas de funcionamiento. • En el frente de obra está prohibido el uso de corneta, pitos ni sirenas de los vehículos que hacen parte del proyecto, salvo la alarma de reversa. • Se restringe la operación de los equipos y herramientas de construcción, perforación y compresión generadores de ruido ambiental en la zona con uso residenciales, en horarios comprendidos entre las 7:00 p.m. y las 7:00 a.m. de lunes a sábado, o en cualquier horario los días domingos y feriados. • Se prohíbe realizar quemas a cielo abierto de llantas, baterías, plásticos, lubricantes usados o cualquier otro elemento que emita contaminantes tóxicos al aire. • Se realiza limpieza mediante barrido con hidratación previa, del área de influencia directa del proyecto.								

- Los equipos y maquinaria presente en el frente de obra son sometidos a chequeos y mantenimientos preventivos con el fin de evitar afectaciones al medio ambiente y garantizar su buen funcionamiento.

- En el periodo de ejecución relacionado no se requirió el uso de vehículos tipo volqueta teniendo en cuenta que no fue necesario realizar retiro de material sobrante hasta sitios de disposición final.





Cerramiento Perimetral para control de material particulado

_

ETAPA			
PRECONSTRUCCIÓN		OPERACIÓN	X
CONSTRUCCIÓN	X	DESMANTELAMIENTO	X

LUGAR DE APLICACIÓN

Frentes de obra Villa de Los Caballeros

CRONOGRAMA DE EJECUCION

ACTIVIDADES	MESES DE EJECUCIÓN					
	1	2	3	4	5	6
Manejo adecuado de material de construcción						
Mantenimiento de vehículos y maquinaria						

_

RESPONSABLE DE LA EJECUCION

CONSORCIO CONSOLIDACION GIRON

Indicador

- Acopio de materiales
- Control de emisiones atmosféricas, generadas por los vehículos maquinaria y los equipos

Descripción del Indicador

- Manejo de acopio de materiales
- Verificación de estado de equipos y vehículos

Indicador de calificación

- Acopio de materiales autorizado / Número total de acopios

1 / 1 * 100 = 100% • Vehículos con certificados técnico mecánico/ vehículos en obra x 100 = 100% **No Aplica en el periodo relacionado**
Frecuencia de verificación
Mensual a medida que la necesidad lo amerite, y las actividades de la obra los generen.
Tipo de indicador
Cuantitativo.
Registro de cumplimiento
Informe mensual
Cronograma
Estas actividades tienen el mismo tiempo y duración de las actividades constructivas y en la etapa de desmantelamiento o el tiempo que sea necesario.

3.3 PROGRAMA USO Y ALMACENAMIENTO ADECUADO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Programa Uso y almacenamiento adecuado de materiales de construcción							PASA -03
OBJETIVO							
Establecer los procedimientos que serán implementados para el adecuado manejo del material de construcción, desde el almacenamiento temporal, transporte, uso hasta su disposición final, esto con fin de prevenir, controlar y minimizar los posibles impactos que se generen sobre el ambiente. Garantizar la mínima incidencia ambiental, producto del empleo de diferentes insumos, materiales, y dispositivos para las obras.							
TIPO DE MEDIDA							
Control	X	Prevención	X	Mitigación		Compensación	
Beneficios							
Al establecer un sistema de manejo adecuado para el transporte, cargue, descargue y manipulación de los materiales de construcción (arenas, grava, triturados, recebos, ladrillos, triturados de arcilla y otros) se evitan pérdidas del mismo y por lo tanto se generan múltiples ventajas de orden financiero, logístico y ambiental. Al mismo tiempo, se reduce la cantidad de escombros y residuos generados, y el aporte de sedimentos y otros contaminantes a las redes de servicios públicos y fuentes de agua.							
ACCIONES A EJECUTAR							
Se consideran materiales de construcción, los productos pétreos explotados en minas y canteras usados, generalmente, en la industria de la construcción como agregados en la fabricación de piezas de concreto, morteros, pavimentos, obras de tierra y otros productos similares. Durante las actividades de intervención correctiva mediante la construcción de pantallas ancladas para mitigar el riesgo por deslizamiento y movimiento, se requiere la utilización de cemento y concreto, los cuales serán adquiridos a través de proveedores externos que cuenten con los respectivos permisos mineros y ambientales.							

Manejo de materiales de construcción:

El Consorcio CONSOLIDACION GIRON verificara que las empresas que suministren materiales de construcción cumplan con las exigencias normativas, así mismo se verificara que cuenten con el plan de contingencia establecido, el cual contempla todo el sistema de seguridad, prevención, organización de respuesta, equipos personales capacitado y presupuesto para la prevención y control de emisiones contaminantes y reparación de daños.

Medidas aplicadas para el manejo de concreto

- El cemento en sacos estará almacenado en sitios secos y aislados del suelo.
- El procedimiento para la mezcla y el vaciado del concreto y/o cemento, se realizará considerando una adecuada regulación de la mezcla.
- Se protegerá el suelo mediante material impermeable (plástico) evitando afectaciones temporales en el área de influencia directa de esta actividad.
- El personal de obra deberá utilizar los respectivos elementos de protección personal para la manipulación del cemento y concreto con el fin de prevenir accidentes de trabajo.
- En caso de derrame de mezcla se ha de limpiar la zona en forma inmediata, recogiendo y depositando el residuo en el sitio adecuado. Está prohibido depositar estas mezclas cerca de los cuerpos de agua, sobre zonas de cultivo y/o áreas verdes.
- Se prohíbe el lavado de mezcladoras de concreto en los frentes de obra o en cuerpos de agua.

Almacenamiento temporal de materiales

- Para el almacenamiento de materiales durante la construcción, se dispondrá de un área localizada de forma estratégica que favorezca la cercanía entre el sitio de almacenamiento y los sitios de obra.
- La zona de almacenamiento temporal estará señalizada, los materiales acopiados cubiertos completamente para evitar la contaminación y dispersión por efecto del agua o del viento.
- Se dispondrá de un sitio debidamente demarcado para el almacenamiento de materiales, el apilamiento de estos materiales no supera el 1.5 metros de altura.
- El sitio de almacenamiento en lo posible se establecerá en el área de influencia directa para facilitar su acceso y no interfiere con el tráfico vehicular y peatonal en la zona.
- Se prohíbe el almacenamiento temporal de materiales de construcción cerca a zonas verdes, ríos, quebradas, canales y caños.

Manejo de prefabricados

- En caso de ser necesario se dispondrá de uno a más sitios debidamente demarcados para el almacenamiento de prefabricados y tubería, y no se apilará a alturas superiores de 1.5 metros.

Se verificará la estabilidad del sitio de acopio, previniendo que se generen accidentes de trabajo.

- Las varillas se han de proteger y/o aislar estas áreas mediante encerramiento con cinta, malla y con avisos que indiquen el peligro, de acuerdo con el programa de señalización.
- El hierro se protegerá para evitar que las condiciones climáticas afecten su estructura.

Teniendo en cuenta las actividades del periodo relacionado, se usaron las siguientes cantidades de materiales pétreos en el frente de obra:

MATERIALES	CANTIDADES
Cemento	30 bultos
Triturado	8 m3
Arena	8 m3





Almacenamiento Adecuado de Materiales

PRECONSTRUCCIÓN		OPERACIÓN	X
CONSTRUCCIÓN	X	DESMANTELAMIENTO	X

LUGAR DE APLICACIÓN

Frentes de obra Villa de Los Caballeros

CRONOGRAMA DE EJECUCION

ACTIVIDADES	MESES DE EJECUCIÓN					
	1	2	3	4	5	6
Identificación y obtención de los materiales de construcción						
Transporte y disposición de materiales						
Medidas de manejo para concretos						

RESPONSABLE DE LA EJECUCION

CONSORCIO CONSOLIDACION GIRON

Indicador

Cumplir con los procedimientos propuestos para el manejo de materiales de construcción durante el proyecto

Descripción del Indicador
1. Cumplir con el 100% de las acciones propuestas para el manejo de materiales de construcción. 2. Aprovechamiento de material de construcción
Indicador de calificación
1. Número de acciones realizadas en obra para el manejo de los materiales de construcción / Número de acciones establecidas*100 **8 / 8 * 100 = 100%** 2. Cantidad total de material utilizado en obra / Cantidad de material de fuentes autorizadas *100 **Cemento** 30 / 30 * 100 = 100% **Arena** 8 m3 / 8 m3 * 100 = 100% **Triturado** 8 m3 / 8 3 * 100 = 100%
Frecuencia de verificación
Mensual
Tipo de indicador
Cuantitativo
Registro de cumplimiento
Informe mensual
Cronograma
Estas actividades tienen el mismo tiempo y duración de las actividades constructivas y en la etapa de desmantelamiento o el tiempo que sea necesario.

6.4 PROGRAMA PROTECCIÓN DEL SUELO – PREVENCIÓN DE PROCESOS EROSIVOS Y CONTROL SOBRE LA ESCORRENTÍA

Programa Protección del suelo – prevención de procesos erosivos y control sobre la escorrentía	PASA -04
OBJETIVO	
Garantizar la mínima incidencia ambiental, producto de la remoción de cobertura vegetal necesaria para la ejecución de la obra. Controlar los sedimentos generados por el retiro de materiales de recubrimiento en los sitios de obras que pueden ser arrastrados por la escorrentía, así mismo controlar la sedimentación y erosión causados por las obras hidráulicas requeridos por el proyecto, vertimientos de aguas con contenido de sedimentos, entre otros y evitar la aparición de focos erosivos en los frentes de obra.	

TIPO DE MEDIDA							
Control	X	Prevención	X	Mitigación		Compensación	

BENEFICIOS

El suelo es uno de los recursos que puede resultar más afectado a causa de las actividades asociadas con la construcción de obras civiles. La necesidad de retirar la cobertura vegetal y remover grandes volúmenes de tierra acelera procesos erosivos. Igualmente, el suelo se puede ver afectado por la compactación, manipulación inadecuada de ciertas sustancias contaminantes y el almacenamiento de escombros o materiales de construcción.

La acción de los agentes erosivos provoca una degradación progresiva de la estructura física del suelo lo que, a su vez, aumenta la vulnerabilidad de este a ser degradado y afecta al resto de las funciones del suelo. Por todo lo anterior, el suelo manifiesta una disminución progresiva en su capacidad de retención de agua y nutrientes disponibles para las plantas, lo que repercute en una reducción drástica de su fertilidad.

ACCIONES A EJECUTAR

La obra de intervención correctiva mediante la construcción de pantallas ancladas para mitigar el riesgo por deslizamiento y movimiento se presenta como respuesta al alto riesgo de ocurrencia de fenómenos de erosión (remoción en masa) que tiene como finalidad contrarrestar los altos nivel de deterioro del talud, el deficiente drenaje superficial, las altas pendientes y el aumento del área de expansión urbana.

Teniendo en cuenta lo anterior el objeto de la obra está conectado con la mitigación de impactos de erosión que presenta el suelo del sector; sin embargo, se plantea controlar los procesos de arrastre de sedimentos durante las actividades de obra mediante la protección y transporte inmediato de materiales resultantes de perfilado y pequeñas excavaciones para evitar el arrastre por lluvias y/o vientos.

El Consorcio Consolidación Girón implementara las siguientes acciones con el fin de proteger el suelo de procesos erosivos y control de la escorrentía:

- En cuanto al almacenamiento del ACPM necesario para proveer el combustible a maquinaria y equipos, se capacitará al personal que, en caso de presentar derrames accidentales, será recogido inmediatamente; si el volumen derramado es superior a 5 galones, debe removerse el suelo contaminado en su totalidad y restaurar la zona afectada.

- Cuando el derrame se presenta en cantidades pequeñas, será utilizado materiales absorbentes, trapos, aserrín y arena; estos residuos deberán ser dispuestos separadamente en canecas de 55 galones hasta que sean entregados a un gestor autorizado por la Autoridad Ambiental.

- Para prevenir la contaminación del suelo se realizará la mezcla de concreto sobre una plataforma o geotextil.

- Se ha de evitar el derrame de aceite o combustible sobre el suelo. Serán instaladas barreras y se dispondrá la maquinaria sobre una superficie que permita la fácil recolección.

- El sitio para la ubicación del campamento y despachos (almacén y depósito), se realizará donde se necesitó menor intervención sobre el suelo.

- Mediante la ejecución de las actividades propias de la obra se asegura la estabilidad del talud intervenido mediante un adecuado diseño geotécnico, que especifica el diseño de las pendientes, anclajes, barreras contra la erosión, obras de drenaje. Esto teniendo en cuenta que los taludes son un elemento crítico en el desarrollo de las obras civiles por lo cual su conformación debe contar con un estudio riguroso y acompañamiento técnico.

- El ACPM usado es almacenado de manera temporal en recipiente metálico con capacidad para 55 galones.





Suministro y colocación de concreto de 3000 psi para zapatas





Construcción de Canaleta y estructura de disipación de energía

ETAPA			
PRECONSTRUCCIÓN		OPERACIÓN	X
CONSTRUCCIÓN	X	DESMANTELAMIENTO	

LUGAR DE APLICACIÓN

Frentes de obra Villa de Los Caballeros

CRONOGRAMA DE EJECUCION

ACTIVIDADES	MESES DE EJECUCIÓN					
	1	2	3	4	5	6
Cumplir con las acciones propuestas para manejo y disposición de material sobrante						

RESPONSABLE DE LA EJECUCION

CONSORCIO CONSOLIDACION GIRON

Indicador

- Cumplir con las acciones propuestas para manejo de la erosión y arrastre de sedimentos.
- Cumplir con los requerimientos ambientales

Descripción del Indicador

- Aplicación de acciones de manejo para el control de la erosión y arrastre de materiales

Indicador de calificación

- Número de acciones realizadas / Número de acciones establecidas en el PASA*100

7 / 7 * 100 = 100%

Frecuencia de verificación

Mensual

Tipo de indicador

Cuantitativo.

Cronograma

El proyecto tiene el mismo tiempo de las actividades del desarrollo del mismo, teniendo en cuenta la necesidad en la obra de mitigación del talud.

3.5. PROGRAMA PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DE CUERPOS DE AGUA Y REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS

Programa de prevención de la contaminación de cuerpos de agua y redes de servicios públicos	PASA-05

OBJETIVO

Implementar medidas ambientales que minimicen las afectaciones por arrastre de materiales hacia cuerpos hídricos o redes de servicios públicos.

TIPO DE MEDIDA

Control	X	Prevención	X	Mitigación	X	Compensación

BENEFICIOS

En las obras de construcción, el agua debe manejarse considerando los siguientes criterios de manejo:

- Reducir el consumo
- Prevenir la contaminación.
- Recolectar separadamente aguas grises, aguas residuales, aguas de escorrentía.
- Recircular aguas grises.
- Tratar las aguas grises antes de su descarga para retirar grasas y/o sedimentos.
- Verter las aguas residuales domésticas a las redes de alcantarillado o tratarlas en pozos sépticos.

ACCIONES A EJECUTAR

Para el periodo de ejecución del 01 al 31 de Marzo de 2026, con el fin de dar cumplimiento al programa se ejecutaron las siguientes medidas de manejo:

- El abastecimiento de agua se realizará por medio de un punto de agua que se encuentra dentro de un predio privado contiguo a la obra y al área que se definió para adecuación y construcción de campamento; dicho punto de agua es abastecido por el acueducto metropolitano.

- Se prohíbe el vertimiento de residuos líquidos en las calles y zonas aledañas al frente de obra.

- Inicialmente se cuenta con una unidad sanitaria fija en el área destinada a campamento, del frente de obra, con el propósito de garantizar condiciones higiénicas adecuadas para los trabajadores. La unidad es sometida a jornadas de aseo y limpieza con lo cual se asegura las condiciones higiénicas para los trabajadores.

- El lavado de maquinaria, reparación y mantenimiento de vehículos está prohibido en el frente de obra con el fin de evitar verter aceites y residuos líquidos al suelo.

- No se registraron derrames o fugas de combustibles o residuos líquidos dentro o fuera del área de influencia, de presentarse un derrame este será recolectado, almacenado y enviado a tratamiento con una empresa autorizada para el tratamiento y disposición final de residuos peligrosos





Aseo y Limpieza de Unidad Sanitaria Fija y Lavamos para uso de los trabajadores

_

ETAPA			
PRECONSTRUCCIÓN		OPERACIÓN	X
CONSTRUCCIÓN	X	DESMANTELAMIENTO	

LUGAR DE APLICACIÓN
Frentes de obra Villa de Los Caballeros
CRONOGRAMA DE EJECUCION

ACTIVIDADES	MESES DE EJECUCIÓN					
	1	2	3	4	5	6
Transporte adecuado de ACPM						
Tanqueo de maquinaria con ACPM						
Aplicación del plan de contingencia						

_

RESPONSABLE DE LA EJECUCION
CONSORCIO CONSOLIDACION GIRON
SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y MONITOREO
Indicador
Cumplir con las actividades propuestas para controlar la totalidad de los vertimientos generados durante el proyecto
Descripción del Indicador
• Indicador servicio de baños. • Manejo de Residuos líquidos, Domésticos e Industriales.
Indicador de calificación
• No de US utilizadas/ No de US requeridas*100 1 / 1 * 100 = 100%
Frecuencia de verificación
Mensual
Tipo de indicador
Cuantitativo.
Registro de cumplimiento
Informe Mensual Registro fotográfico
Cronograma
Este programa se ejecutará durante el periodo de construcción de la obra de mitigación.

6.6 PROGRAMA PARA EL MANEJO DE LA VEGETACION LA FAUNA Y EL PAISAJE.

Programa para el manejo de la vegetación la fauna y el paisaje.							PASA -06
OBJETIVO							
Implementar medidas ambientales que minimicen las alteraciones del paisaje debido a la ejecución de las obras civiles de mitigación.							
TIPO DE MEDIDA							
Control	X	Prevención	X	Mitigación	X	Compensación	
BENEFICIOS							

La intervención racional y la adecuación del paisaje posterior a la terminación de la obra, permitirá que la comunidad que habita la zona pueda disfrutar de la mejora de su entorno.

ACCIONES A EJECUTAR

Para el periodo de ejecución del 01 al 31 de Marzo de 2026, se ejecutaron las siguientes acciones para dar cumplimiento al programa:

- Se realizó la intervención únicamente en las áreas establecidas en los diseños técnicos. Están prohibidas la quema a cielo abierto y la aplicación de herbicidas.
- Se encuentra prohibido el uso de árboles o arbustos para disponer elementos (alambres, carteles, sogas, cables, ropa, etc.).
- Está prohibido arrojar basuras, material sobrante de excavación en las zonas verdes, en la cobertura vegetal, ubicada en área de influencia de la obra.
- Se prohíbe el uso o porte de armas de fuego.
- Se prohíbe la caza y compra de especies de fauna silvestre.
- Se prohíbe el tránsito de maquinaria fuera de los frentes de obra.

Ahuyentamiento de fauna silvestre

- Teniendo en cuenta que las áreas a intervenir son zonas urbanizadas la presencia de fauna silvestre es baja, sin embargo, en caso de evidenciarse presencia de fauna dentro de los frentes de obra su Ahuyentamiento será útil para animales tales como aves, serpientes y lagartijas. Su desplazamiento será dirigido hacia las coberturas de vegetación secundaria y rastrojo. La presencia de maquinaria pesada y todo lo relativo al inicio de las obras se constituye en una actividad de Ahuyentamiento por cuanto el instinto de conservación de los animales que aún quedan, hace que se desplacen hacia sitios que consideran más seguros.

- A partir de las condiciones identificadas en el área de Influencia directa se prevé que las acciones de rescate y relocalización serán muy poco frecuentes o nulas. En caso de requerirse si la situación lo amerita se pedirá asistencia a la autoridad ambiental o al cuerpo de bomberos en busca de minimizar las afectaciones a la fauna.

ETAPA			
PRECONSTRUCCIÓN		OPERACIÓN	X
CONSTRUCCIÓN	X	DESMANTELAMIENTO	

LUGAR DE APLICACIÓN

Frentes de obra Villa de Los Caballeros

CRONOGRAMA DE EJECUCION

ACTIVIDADES	MESES DE EJECUCIÓN					
	1	2	3	4	5	6
Manejos preventivos en la cobertura de vegetación natural						
Manejo de la vegetación que permanecerá						

__

RESPONSABLE DE LA EJECUCION

CONSORCIO CONSOLIDACION GIRON

SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y MONITOREO

Por parte del Interventor Ambiental

Descripción del Indicador

- Aplicación de acciones para el manejo de la vegetación presente en el área de influencia del proyecto.
- % de especies identificadas para intervención

Indicador de calificación

- No. de acciones de Manejo implementadas/No. de acciones de manejo propuestas X 100.

7/7 * 100 = 100%

- Especie forestales intervenidas / especies forestales solicitadas *100

No Aplica en el periodo relacionado

Frecuencia de verificación

Mensual

Tipo de indicador

Cuantitativo.

Cronograma

Este programa se ejecutará durante el periodo de construcción de la obra de mitigación.

6.7 PROGRAMA DE SEÑALIZACION

Programa de señalización							PASA-.07
OBJETIVO							
Prevenir los impactos que se puedan generar por la no señalización de los sitios donde se realice intervención por el desarrollo de la obra; a fin de garantizar la seguridad de los peatones y trabajadores.							
TIPO DE MEDIDA							
Control	X	Prevención	X	Mitigación	X	Compensación	
BENEFICIOS							
El adecuado manejo de tránsito evitará accidentes que se puedan generar en el periodo de ejecución del proyecto.							
ACCIONES A EJECUTAR							
Para el periodo del 01 al 31 de Marzo de 2026, con el fin de dar cumplimiento al programa establecido se realizó la ejecución de las siguientes actividades:							

- Se instala señalización requerida en áreas de campamento del frente de obra
- La señalización instalada corresponde a Seguridad y Salud en el Trabajo, atención a emergencias, evacuación y Gestión Ambiental





Señalización Frentes de trabajo





Señalización Frente de Obra

–

ETAPA			
PRECONSTRUCCIÓN		OPERACIÓN	X
CONSTRUCCIÓN	X	DESMANTELAMIENTO	
LUGAR DE APLICACIÓN			
Frentes de obra Villa de Los Caballeros			
CRONOGRAMA DE EJECUCION			

ACTIVIDADES	MESES DE EJECUCIÓN					
	1	2	3	4	5	6
Señalización frentes de Obras, sitios temporales de almacenamiento y señalización vial cuando la obra lo amerite natural						

__

RESPONSABLE DE LA EJECUCION

CONSORCIO CONSOLIDACION GIRON

SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y MONITOREO

Por parte del Interventor Ambiental

Indicador

Cumplir con las medidas propuestas para la señalización adecuada del área de trabajo establecidas para las etapas de operación y desmantelamiento de las instalaciones temporales del proyecto.

Descripción del Indicador

Numero de áreas señalizadas en el área de ejecución del proyecto.

Indicador de calificación

- # de áreas señalizadas /# de áreas necesarias a señalizar

1 / 1 * 100 = 100%

- # De acopios en obra / # de puntos de acopio señalizados.

1 / 1 * 100 = 100%

Frecuencia de verificación

Mensual

Tipo de indicador

Cuantitativo.

Cronograma

Este programa se ejecutará durante el periodo de construcción de la obra de mitigación.

2.8 PROGRAMA DE ADECUACION DE CAMPAMENTOS.

PROGRAMA DE ADECUACION DE CAMPAMENTOS.							PASA-08
OBJETIVO							
Prevenir, minimizar y controlar los impactos generados por la operación de las instalaciones temporales para el almacenamiento de herramienta menor y maquinaria, y las instalaciones de infraestructura básica de saneamiento.							
TIPO DE MEDIDA							
Control	X	Prevención	X	Mitigación		Compensación	

BENEFICIOS

- Pérdida de suelo
- Cambios en la calidad de los suelos
- Cambios en la calidad del aire
- Cambios en los niveles de ruido
- Alteración a las unidades de paisaje
- Cambios en la cobertura vegetal y alteración de hábitat
- Afectación de la fauna silvestre
- Generación de expectativas y conflictos
- Incomodidades a los residentes y establecimientos de la zona.

ACCIONES A EJECUTAR

En el periodo relacionado se realiza la adecuación y construcción de las áreas de campamento temporal, las cuales se adecuaron según las necesidades del personal y del frente de obra.

Se realizo un contrato de arrendamiento en un predio contiguo al área de intervención del talud, en el barrio Villa de los Caballeros, donde las partes acuerdan expresamente que el pago de la totalidad de este canon se realizará en especie, mediante la ejecución de obras de mampostería y mejoras no locativas que el ARRENDATARIO (CONSORCIO CONSOLIDACIÓN GIRÓN) se obliga a realizar en el inmueble arrendado. El área funcionará para almacenamiento temporal de materiales y herramienta menor, Vestier y área de alimentación para trabajadores, y oficina temporal para los profesionales del proyecto.

- El campamento se adecuó en un área que no requiere mayor intervención del suelo.

- Se inicia la instalación de la señalización de SST, Ambiental, emergencias, primeros auxilios y evacuación requerida.

- El campamento cuenta con equipos para control de incendios –extintores, ubicados en sitios estratégicos, señalizados y a la altura adecuada e igualmente material de primeros auxilios como botiquín y camilla.

- Los residuos sólidos generados en instalaciones temporal, serán separados teniendo en cuenta el tipo de residuos y de acuerdo al Programa de manejo de residuos sólidos convencionales para posteriormente realizar su adecuada disposición final o aprovechamiento.

	
Áreas de campamento temporal	

ETAPA			
PRECONSTRUCCIÓN		OPERACIÓN	X
CONSTRUCCIÓN	X	DESMANTELAMIENTO	X

LUGAR DE APLICACIÓN

Frentes de obra Villa de Los Caballeros

CRONOGRAMA DE EJECUCION

ACTIVIDADES	MESES DE EJECUCIÓN					
	1	2	3	4	5	6
Instalación de infraestructura temporal						
Desmantelamiento de las instalaciones temporales						

RESPONSABLE DE LA EJECUCION

CONSORCIO CONSOLIDACION GIRON

SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y MONITOREO

Indicador

Cumplir con las medidas propuestas para reducir el impacto generado por la instalación, operación y desmantelamiento de las instalaciones temporales del proyecto.

Descripción del Indicador

- Número de sitios de uso temporal

Indicador de calificación

- Número sitios de uso temporal/Número de sitios desmantelados*100

No Aplica En El Periodo Relacionado

- No de medidas ambientales ejecutadas / No de medias ambientales programadas*100

4 / 4 * 100 = 100%

Frecuencia de verificación
Mensual
Tipo de indicador
Cuantitativo.
Registro de cumplimiento
Informe mensual
Cronograma
Este programa se ejecutará durante el periodo de construcción de la obra de mitigación.

2.9 PROGRAMA DE GESTION SOCIAL

2.9.1. Proyecto de atención a la Comunidad

Proyecto de Atención a la Comunidad	**PGS-6.1-15**
OBJETIVO DEL PROYECTO	
Establecer las acciones necesarias para recibir, atender y dar respuesta oportuna a las solicitudes, peticiones, quejas, reclamos y sugerencias presentadas por la comunidad o autoridades competentes sobre el desarrollo del proyecto.	
ACCIONES DESARROLLADAS	
Instalación de la oficina de atención a la comunidad Ubicar y adecuar la oficina de atención a la comunidad en zona aferente al sector de construcción, con volante informativo que incluye número telefónico y correo electrónico, para recibir, atender y brindar, respuesta oportuna a las solicitudes, peticiones, quejas, reclamos y sugerencias presentadas por la comunidad o autoridades competentes sobre el desarrollo del proyecto. (ver anexos de registro fotográfico y volante informativo) Entregar el volante informativo de la oficina de atención a la comunidad, por correo electrónico, WhatsApp y físico, a quienes lo requieran, el cual incluye horario, días de atención, número telefónico y correo electrónico; en la oficina del Campamento del Contratista en zona aferente al barrio Villa de los Caballeros.	
LUGAR DE APLICACIÓN	
Comunidad del área de influencia directa de la obra (AID) y actores sociales para la construcción de obras de mitigación y consolidación para el control de la erosión en el talud oriental del barrio Villa de los Caballeros en el municipio de Girón, departamento de Santander (RA-OBRA -02).”	
CRONOGRAMA DE EJECUCION	
ACTIVIDAD	Atención a la comunidad en temas de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias

EJECUCION (PERÍODOS)	1	2	3	4	5	6
ACTIVIDAD	X	X	X	X	X	X

RESPONSABLE DE EJECUCION	Profesional Social
SEGUIMIENTO Y MONITOREO	
Indicador:	Descripción del indicador:

Número de peticiones recibidas / número de peticiones atendidas * 100	Atención a PQRS
Número de peticiones atendidas / número de peticiones cerradas * 100	Cierre a reclamaciones recibidas
Tipo de indicador:	Cuantitativo.
Periodicidad de evaluación:	Mensual
Registro de cumplimiento:	Formatos de registro, recepción y seguimiento de PQRS, e Informes mensuales.

2.9.2. Proyecto de Información y Divulgación

Proyecto de Información y Divulgación	**PGS-6.2-16**
OBJETIVO DEL PROYECTO	
Informar de forma clara, veraz, oportuna y suficiente a la población que cubre las comunidades del área de influencia directa, a las autoridades locales, gremios, organizaciones, administración municipal, Concejo Municipal, Personería Municipal, Juntas de Acción Comunal y líderes comunitarios, vinculados con el desarrollo del proyecto y mantenerlos informados de los eventos de la obra constructiva. Ubicar en áreas lindantes a la obra, la valla informativa de la obra de mitigación y control a la erosión con los datos específicos requeridos para conocimiento de la comunidad de influencia directa de la obra, entidades y personas interesadas en esta información. Colocar y entregar el aviso inherente a la oficina de atención a la comunidad, con los datos de dirección, teléfono y correo electrónico, entre otros, para conocimiento de la comunidad del área de influencia de la obra.	
ACCIONES DESARROLLADAS	
Información a la comunidad El proyecto de mitigación y control a la erosión cuenta con valla informativa de la obra con los datos e información a lugar y aviso informativo de la oficina de atención a la comunidad, el cual contiene días y horario de atención, número telefónico y correo electrónico. La información es entregada a los actores sociales del proyecto, inmersos en las actividades a desarrollar, entre ellos, la Administración Municipal, Instituciones Educativas, empresas, funcionarios, unidades residenciales y otros, por medio físico, correo electrónico y WhatsApp, en caso de requerirse. Se entrega volante informativo de la oficina de atención a la comunidad, a las personas que lo solicitan, en el campamento de la obra en el barrio Villa de Los Caballeros de Girón. (ver anexo de volante informativo) **Atención a la comunidad en PQRS** El Señor Marcos Martínez Sarmiento envía petición al correo del Consorcio Consolidación Girón, donde solicita tomar las medidas a lugar, conforme la obra de mitigación y consolidación para el control de la erosión, está afectando al predio y solicita tomar las medidas pertinentes y correctivas; se envía esta novedad al área encargada para su revisión y respuesta. (ver anexo de registro de atención a PQRS)	
LUGAR DE APLICACIÓN	
Comunidad del área de influencia directa de la obra (AID) y actores sociales para la construcción de obras de mitigación y consolidación para el control de la erosión en el talud oriental del barrio Villa de los Caballeros en el municipio de Girón, departamento de Santander (RA-OBRA -02).”	

CRONOGRAMA DE EJECUCION	
ACTIVIDAD 1	Realizar las reuniones informativas de inicio, de avance, de finalización de la obra y las extraordinarias que se requieran
ACTIVIDAD 2	Invitar a las comunidades y actores sociales de la obra de mitigación y control a la erosión
ACTIVIDAD 3	Distribución de comunicaciones (volantes, cartas, llamadas telefónicas, mensajes) para las invitaciones a las reuniones informativas y otros

EJECUCION (PERÍODOS)	1	2	3	4	5	6
ACTIVIDAD 1	X					
ACTIVIDAD 2	X					
ACTIVIDAD 3	X	X	X	X	X	X

RESPONSABLE DE EJECUCION	Profesional Social

SEGUIMIENTO Y MONITOREO	
Indicador:	Descripción del indicador:
Número de reuniones informativas programadas / número de reuniones realizadas * 100	Reuniones informativas efectuadas
Número de actores sociales invitados a las reuniones informativas / número de volantes, comunicaciones, mensajes entregados a los actores sociales * 100	Invitación a las reuniones informativas
Número de actores sociales asistentes a las reuniones informativas / número de actores sociales invitados * 100	Actores sociales presentes en las reuniones informativas
Tipo de indicador:	Cuantitativo
Periodicidad de evaluación:	Mensual
Registro de cumplimiento:	Actas de reuniones, listados de asistencia, registro fotográfico y comunicaciones de convocatoria, entre otros documentos.

2.6.3. Proyecto para el manejo de la Infraestructura de predios y Servicios Públicos

Proyecto para el manejo de la Infraestructura de predios y Servicios Públicos	**PGS-6.3-17**
OBJETIVO DEL PROYECTO	
Registrar el estado físico de las construcciones e infraestructuras físicas que lo requieran, previo al inicio de las actividades edificativas a desarrollar. Cumplir los compromisos establecidos con las comunidades del área de influencia directa del proyecto.	
ACCIONES DESARROLLADAS	
Levantamiento de actas de vecindad El Contratista, realizó 18 (dieciocho) actas de vecindad de inicio, de forma conjunta entre el residente técnico del proyecto y el área social, conforme lo establece el protocolo y aplicando el formato establecido para ello; previamente se informó a la comunidad, la importancia de la participación del responsable de la unidad social o del dueño del predio y se contactó al propietario, residente y/o testigo de las viviendas objeto de esta labor. (ver anexo de registro de las actas de vecindad de inicio elaboradas)	

El área social cuenta con el archivo digital y físico de las Actas de vecindad desarrolladas por la obra de mitigación y control a la erosión; para los casos de personas que no colaboraron con la elaboración del documento, el Contratista realizó la actividad con un testigo.

Manejo de la infraestructura de predios y servicios públicos.

Conforme el proyecto lo requiera, se debe informar cuando proceda, respecto a los cortes de agua, luz u otros servicios, para la obra constructiva, en caso de presentarse estas acciones.

Elaboración de actas de compromiso

Durante el presente período para la elaboración del presente informe no se realizaron actas de compromiso requeridos por la obra en proceso constructivo.

LUGAR DE APLICACIÓN
Comunidad del área de influencia directa de la obra (AID) y actores sociales para la construcción de obras de mitigación y consolidación para el control de la erosión en el talud oriental del barrio Villa de los Caballeros en el municipio de Girón, departamento de Santander (RA-OBRA -02).”

CRONOGRAMA DE EJECUCION	
ACTIVIDAD 1	Realizar visitas domiciliarias para informar la elaboración de las actas de vecindad
ACTIVIDAD 2	Entrega de volantes informativos de la elaboración de actas de vecindad
ACTIVIDAD 3	Elaboración de actas de vecindad (iniciales, de seguimiento y cierre) conforme se requiera

EJECUCION (PERÍODOS)	1	2	3	4	5	6
ACTIVIDAD 1	X					
ACTIVIDAD 2	X					
ACTIVIDAD 3	X					

RESPONSABLE DE EJECUCION	Profesional Social

SEGUIMIENTO Y MONITOREO	
Indicador:	Descripción del indicador:
Número de informaciones sobre la elaboración de actas de vecindad en el AID de la obra / número de actas de vecindad realizadas * 100	Informar la elaboración de actas de vecindad
Número de volantes de elaboración de actas de vecindad entregados / número de actas de vecindad realizadas * 100	Entrega de información sobre la elaboración de actas de vecindad
Número de actas de vecindad realizadas / número de actas de vecindad cerradas * 100	Cierre de actas de vecindad elaboradas
Atención de PQRS relacionadas con daño a infraestructura = (# De quejas atendidas por daño a la infraestructura de predios / # de quejas por daño a infraestructura de predios presentadas) *100	Atención a PQRS, inherentes a afectaciones de predios
Tipo de indicador:	Cuantitativo
Periodicidad de evaluación:	Mensual
Registro de cumplimiento:	Actas de vecindad elaboradas, formatos de entrega de volantes, fichas socioeconómicas elaboradas e Informes mensuales.

6.4. Proyecto de recuperación del Derecho de vía (No aplica)

4. Proyecto de recuperación del Derecho de la vía	**PGS-6.4-18**
OBJETIVO DEL PROYECTO	
Recuperar el derecho de vía o área para la ejecución de las obras. Evitar conflictos con las comunidades.	
ACCIONES A DESARROLLAR	
Teniendo en cuenta que se están construyendo obras de mitigación y control de la erosión en el talud oriental del barrio Villa de los Caballeros de propiedad estatal, este proyecto no aplica.	
LUGAR DE APLICACIÓN	
Comunidad del área de influencia directa de la obra (AID) y actores sociales para la construcción de obras de mitigación y consolidación para el control de la erosión en el talud oriental del barrio Villa de los Caballeros en el municipio de Girón, departamento de Santander (RA-OBRA -02).”	

2.6.5. Proyecto de cultura vial y participación comunitaria

Proyecto de Cultura vial y participación comunitaria							**PGS-6.5-19**
OBJETIVO DEL PROYECTO							
Generar estrategias de apropiación del proyecto a través de procesos de educación y sensibilización con las comunidades educativas, población en general, líderes del AID y Comité de Participación Comunitaria.							
ACCIONES DESARROLLADAS							
Desarrollo de talleres pedagógicos de sostenibilidad Este proyecto aplica, conforme las actividades constructivas, en algunos momentos, implican acciones de cierre de vías o pasos restringidos y las tareas de obra se concentran en áreas de cerramiento, acciones presentes para algunos espacios en la construcción programada. Las inquietudes e información a la comunidad, en temas viales y otros, se ofrece a través de volantes informativos, de forma virtual, presencial o por teléfono en algunos momentos, brindando claridad en las actividades desarrolladas y por efectuar. En temas de educación y seguridad vial, los colaboradores vinculados a la obra de mitigación y control a la erosión, recibieron el jueves 19 de marzo, formación en temas de cultura vial, para mejor como usuarios de la vía y como auxiliares de tráfico en caso de requerir el desarrollo de estas tareas. (ver anexo de registro fotográfico y de asistencia)							
LUGAR DE APLICACIÓN							
Comunidad del área de influencia directa de la obra (AID) y actores sociales para la construcción de obras de mitigación y consolidación para el control de la erosión en el talud oriental del barrio Villa de los Caballeros en el municipio de Girón, departamento de Santander (RA-OBRA -02).”							
CRONOGRAMA DE EJECUCION							
ACTIVIDAD	Atención a la comunidad y trabajadores en temas de información sobre cultura vial y participación comunitaria						
	EJECUCION (PERÍODOS)	1	2	3	4	5	6
	ACTIVIDAD 1	X	X	X	X	X	X
RESPONSABLE DE EJECUCION					Profesional Social		

SEGUIMIENTO Y MONITOREO	
Indicador:	Descripción del indicador:
Número de informaciones elaboradas 1 / número de informaciones entregadas 1 * 100 = 100%	Capacitación mensual a los trabajadores de la obra de mitigación y control a la erosión
Tipo de indicador:	Cuantitativo.
Periodicidad de evaluación:	Mensual
Registro de cumplimiento:	Formatos de registro de asistencia a reuniones y formaciones en temas viales, registro fotográfico e Informes mensuales.

2.6.6. Proyecto de Contratación de mano de obra

Proyecto de Contratación de mano de obra	**PGS-6.6-20**
OBJETIVO DEL PROYECTO	
Generar ingresos en los hogares de las comunidades del AID Evitar la migración de población foránea al AID para vincularse al proyecto Respaldar los compromisos generados con la comunidad para la construcción de la obra. Apoyar la mano de obra disponible conforme la información de la ARN (Agencia para la Reincorporación y la Normalización).	
ACCIONES DESARROLLADAS	
El Contratista se encuentra vinculando mano de obra requerida para el proyecto, conforme listados emitidos por la oficina de empleo de la Administración municipal. A las personas que envían las hojas de vida a través del correo del Contratista, se les solicita registrarla en la oficina de empleo del municipio de Girón o en la plataforma del SENA, Agencia pública de empleo, entidad estatal donde se deben postular los perfiles ocupacionales del tipo de trabajador en caso de requerirse de estas acciones. Los colaboradores vinculados a la obra de mitigación y control a la erosión, el jueves 19 de marzo recibieron formación en el valor de la integridad y oficina de atención a la comunidad para mejorar como personas, trabajadores, miembros de una comunidad, de una familia y empresa. (ver anexo de registro fotográfico y de asistencia)	
LUGAR DE APLICACIÓN	
Comunidad del área de influencia directa de la obra (AID) y actores sociales para la construcción de obras de mitigación y consolidación para el control de la erosión en el talud oriental del barrio Villa de los Caballeros en el municipio de Girón, departamento de Santander (RA-OBRA -02).”	
CRONOGRAMA DE EJECUCION	
ACTIVIDAD 1	Gestión con la Agencia Colombiana para la Reintegración y Normalización, respecto a la mano de obra no calificada disponible para laborar en el proyecto
ACTIVIDAD 2	Informar en la reunión de inicio la vinculación de mano de obra no calificada del AID del proyecto
ACTIVIDAD 3	Recepción de hojas de vida para la vinculación de mano de obra no calificada al proyecto
ACTIVIDAD 4	Inducciones y capacitaciones en diversos temas del área social al personal vinculado para trabajar en la obra
ACTIVIDAD 5	Coordinación con la bolsa de empleo de la Alcaldía de Girón y Junta de Acción Comunal local, para la vinculación de mano de obra no calificada.

EJECUCION (PERÍODOS)	1	2	3	4	5	6
ACTIVIDAD 1	X					
ACTIVIDAD 2	X					
ACTIVIDAD 3	X	X				
ACTIVIDAD 4	X	X	X	X	X	X
ACTIVIDAD 5	X	X				

RESPONSABLE DE EJECUCION	Profesional social
SEGUIMIENTO Y MONITOREO	
Indicador:	Descripción del indicador:
# De personas contratadas como mano de obra no calificada que residen en área de influencia 5 / # total de personas registradas como mano de obra no calificada 7 * 100 = 71%	Mano de obra local y del sector del AID contratada para el proyecto
Registros afiliación de mano de obra local 5 / registro en planillas de pago de seguridad social de la mano de obra local 5 * 100 = 100%	Pago seguridad social de trabajadores locales contratados
Tipo de indicador:	Cuantitativo
Periodicidad de evaluación:	Mensual
Registro de cumplimiento:	Formatos de registro de mano de obra local, laborando en la obra

2.6.7. Proyectos productivos (No aplica)

7. Proyectos productivos	**PGS-6.7-21**
OBJETIVO DEL PROYECTO	
Apoyar a las comunidades organizadas en el desarrollo de proyectos productivos que contribuyan al mejoramiento del entorno y calidad de vida de la comunidad.	
ACCIONES A EJECUTAR	
Conforme se está desarrollando una obra de mitigacion y control de la erosión en el talud oriental del barrio Villa de los Caballeros en el municipio de Girón, departamento de Santander (RA-OBRA -02).", este proyecto no aplica, ni cuenta con rubro presupuestal.	
LUGAR DE APLICACIÓN	
Comunidad del área de influencia directa de la obra (AID) y actores sociales para la construcción de obras de mitigación y consolidación para el control de la erosión en el talud oriental del barrio Villa de los Caballeros en el municipio de Girón, departamento de Santander (RA-OBRA -02)."	

2.6.8. Proyecto protección al Patrimonio Arqueológico y Cultural (No aplica)

Proyecto de Protección al Patrimonio Arqueológico y Cultural	**PGS-6.8-22**

OBJETIVO DEL PROYECTO
Proteger el Patrimonio Arqueológico y Cultural de la Nación. Atender los compromisos con la comunidad del Área de Influencia Directa del proyecto.
ACCIONES A DESARROLLAR
Acorde a lo sugerido por el ICANH, no se van a realizar excavaciones que impliquen algún hallazgo arqueológico o antropológico, por tanto, este proyecto no aplica para la construcción de obras de mitigación y consolidación para el control de la erosión en el talud oriental del barrio Villa de los Caballeros en el municipio de Girón, departamento de Santander (RA-OBRA -02).” En caso de encontrar restos de fósiles, cerámicas y demás, se contactará al antropólogo autorizado para acordonar la zona y demás acciones de recolección de estos elementos de interés para el ICANH.
LUGAR DE APLICACIÓN
Comunidad del área de influencia directa de la obra (AID) y actores sociales para la construcción de obras de mitigación y consolidación para el control de la erosión en el talud oriental del barrio Villa de los Caballeros en el municipio de Girón, departamento de Santander (RA-OBRA -02).”

2.6.9. Proyecto de Gestión socio predial (no aplica)

Proyecto de Gestión socio predial	**PGS-6.9-23**
OBJETIVO DEL PROYECTO	
Mantener o mejorar las condiciones de vida, de las unidades sociales que deben ser trasladadas por la ejecución de las obras.	
ACCIONES A DESARROLLAR	
Compra de unidades sociales requeridas para la construcción de la obra En el desarrollo de la actividad constructiva no se requiere la compra de predios o bienes inmuebles, conforme el área a construir son taludes de espacio público y propiedad de la entidad estatal.	
LUGAR DE APLICACIÓN	
Comunidad del área de influencia directa de la obra (AID) y actores sociales para la construcción de obras de mitigación y consolidación para el control de la erosión en el talud oriental del barrio Villa de los Caballeros en el municipio de Girón, departamento de Santander (RA-OBRA -02).”	

ANEXOS

ANEXO No 1. MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

CONSORCIO CONSOLIDACIÓN GIRÓN	**REGISTRO DE MANEJO DE RESIDUOS**	**Código:**	SST-F-96
		Fecha:	27/07/2021
		Versión:	1

PROYECTO: **CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN EL TALUD ORIENTAL DEL BARRIO VILLA DE LOS CABALLEROS** **EN EL MUNICIPIO DE GIRÓN**	TIPO DE RESIDUO :
LUGAR: Frente de obra Villa de Los Caballeros	ORDINARIO __X_____ RECICLAJE _____

FECHA	LIQUIDO	SÓLIDO	PESO (KG)	DESCRIPCIÓN DISPOSICIÓN FINAL
6/03/2026		X	1,8	Los residuos sólidos generados y acopiados en el punto ecológico son entregados a la empresa de aseo de Girón, de acuerdo con las rutas de recolección de aseo municipal.
13/03/2026		X	1,6	
20/03/2026		X	2,0	
27/03/2026			1,5	
TOTAL			**6,9**	

PROYECTO: **CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN EL TALUD ORIENTAL DEL BARRIO VILLA DE LOS CABALLEROS** **EN EL MUNICIPIO DE GIRÓN**	TIPO DE RESIDUO :
LUGAR: Frente de obra Villa de los Caballeros	ORDINARIO _____ RECICLAJE ___X_____

FECHA	LIQUIDO	SÓLIDO	PESO (KG)	DESCRIPCIÓN DISPOSICIÓN FINAL
27/03/2026		X	2,8	Los residuos reciclabes generados en el periodo son almacenados temporalmente hasta obtener un volumen considerable para ser entregados a un gestor legalmente constituido para realizar su aprovechamiento.
TOTAL			**2,8**	

Revisó: Sandra Bermudez

Cargo: Ing. Ambiental

Firma:

ANEXO No 2. REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACION

CONSORCIO CONSOLIDACIÓN GIRON	FORMATO ASISTENCIA DE ENTRENAMIENTO, CHARLAS Y CAPACITACIONES	Código	RII-F-28
		Fecha	31/10/2022
		Versión	2
		Página	1 de 1

ENTRENAMIENTO [ ] CAPACITACION [X] CHARLA [ ]

OBRA Consorcio Consolidado Giron

TEMA DE CAPACITACIÓN Manejo de la Vegetación, fauna y Paisajismo

LUGAR: Frente de Obra FECHA 19 marzo 2026

CAPACITADOR Sandra Bermudez Cala DURACIÓN 20 min

No.	PARTICIPANTE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Jarrinson steven caicedo	1232891906	ayudante perforacion	estiven caicedo
2	Alexander Prada	13537319	Oficial	
3	Edson Alexander Portilla	1098605491	ALMACENISTA	Edson Portilla
4	Manuel Castillo	1082871247	ayudante	Manuel
5	Alexander Caceres	1102383713	Ej	A. Caceres
6	Sebastian Parra	1005157855	Ayudante	Sebastian Parra
7	Willington Alarcón Ds	91479574	Op Per.	
8	Isaias Garcia	1101596200	operador	Isaias Garcia
9	Alberto Mayorga	1101520618	ayudante	
10	Miguel Rangel	1240484 78	ayudante perfo.	Miguel Rangel
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

OBSERVACIONES:


CAPACITADOR

FIRMA

ANEXO No 3. GESTION SOCIAL

ANEXOS SOCIALES

ANEXO 1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERÍODO

<table>
<tr>
<td>

Volante informativo de la Oficina de Atención a la Comunidad en la zona de obras ubicado en el campamento del sector</td>
<td>

Valla informativa de la obra de intervención en Villa de los Caballeros de Girón, zona aferente a la obra en construcción</td>
</tr>
<tr>
<td>
Capacitación mensual con los trabajadores del Consorcio Consolidación Girón en fortalecimiento de valores, en el campamento de obra</td>
<td>
Formación mensual con los colaboradores de la obra de control a la erosión en el campamento de obra, sobre cultura y seguridad vial</td>
</tr>
</table>

ANEXO 2. VOLANTE INFORMATIVO DE LA OFICINA DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD EN EL BARRIO VILLA DE LOS CABALLEROS DE GIRÓN

Volante: 02

INFORMACIÓN DE LA OFICINA DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD

La Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga y el Consorcio Consolidación Girón

Informa a los actores sociales, líderes, Alcaldía, Personería, sector comercial, financiero, comunidad y residentes del área de influencia directa de la obra de **CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN EL TALUD ORIENTAL DEL BARRIO VILLA DE LOS CABALLEROS EN EL MUNICIPIO DE GIRÓN, DEPARTAMENTO DE SANTANDER (RA-OBRA-02).",** la oficina de atención a la comunidad, así:

Dirección: Calle 2C No. 16F-02 Campamento de Obra, Consorcio Consolidación Girón, Barrio Villa de los Caballeros - Girón

Horario: De lunes a viernes

Hora: De 8 a 10:00 a.m.

En esta oficina usted puede presentar sus peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y demás, en temas civiles, ambientales y sociales para ser atendidos por el Consorcio Consolidación Girón.

MAYOR INFORMACIÓN
Contratista: CONSORCIO CONSOLIDACIÓN GIRÓN
Tel: 3115557728
Correo electrónico:: consolidacion.giron@gmail.com

ANEXO No. 3. PQRS No. 01 (DERECHO DE PETICIÓN) DEL SEÑOR MARCOS MARTÍNEZ SARMIENTO RECLAMANDO AFECTACIONES A PREDIOS POR LA OBRA DE MITIGACIÓN Y CONTROL A LA EROSIÓN.

Gmail Daniela Merchan <danielamerchan31@gmail.com>

Fwd: Respuesta a Derecho de petición mediante correo electrónico con fecha del 27 de marzo del 2026.

1 mensaje

Consorcio Consolidación Giron <consolidacion.giron@gmail.com> 11 de abril de 2026 a las 13:40
Para: danielamerchan31@gmail.com

---------- Forwarded message ---------
De: **Marcos Martinez Sarmiento** <marsanvan0420@gmail.com>
Date: jue, 9 abr 2026 a las 18:01
Subject: Re: Respuesta a Derecho de petición mediante correo electrónico con fecha del 27 de marzo del 2026.
To: Consorcio Consolidación Giron <consolidacion.giron@gmail.com>
Cc: info <info@cdmb.gov.co>, <notificaciones.judiciales@cdmb.gov.co>, <construanlesas@gmail.com>, dir.ordenterritorial@giron-santander.gov.co <dir.ordenterritorial@giron-santander.gov.co>, <santander@defensoria.gov.co>

Buenas tardes de manera respetuosa me dirijo a ustedes con el fin de informarles que el piso que hicieron para reponer el que existía no cumple con la función técnica para la cual lo habíamos aplicado que era para que el agua corriera en sentido contrario alas viviendas agradezco se revise el tema ya que el agua va correr directamente hacia mi vivienda por qué la pendiente la dejaron hacia mi vivienda adjunto fotos y videos de lo que les digo.
Por otro lado le solicito las fotografías que evidencien las fisuras de mi predio por qué con la ingeniera residente las miramos en repetidas oportunidades y no había dicha fisura como las que presenta hoy mi vivienda de antemano les agradezco una pronta respuesta y solución.

IMG_0810.png

IMG_0809.jpeg


IMG_0808.jpeg

IMG_0806.mov

IMG_0807.jpeg

El El jue, 9 abr. 2026 a la(s) 4:48 p.m., Consorcio Consolidación Giron <consolidacion.giron@gmail.com> escribió:

> Cordial saludo
>
> Por medio de la presente y en virtud del contrato de referencia nos permitimos dar respuesta al oficio mencionado en el asunto, con relación a algunas inconformidades manifestada por el peticionario con relación a la ejecución del proyecto.
>
> Cordialmente
>
> CONSORCIO CONSOLIDACIÓN GIRÓN

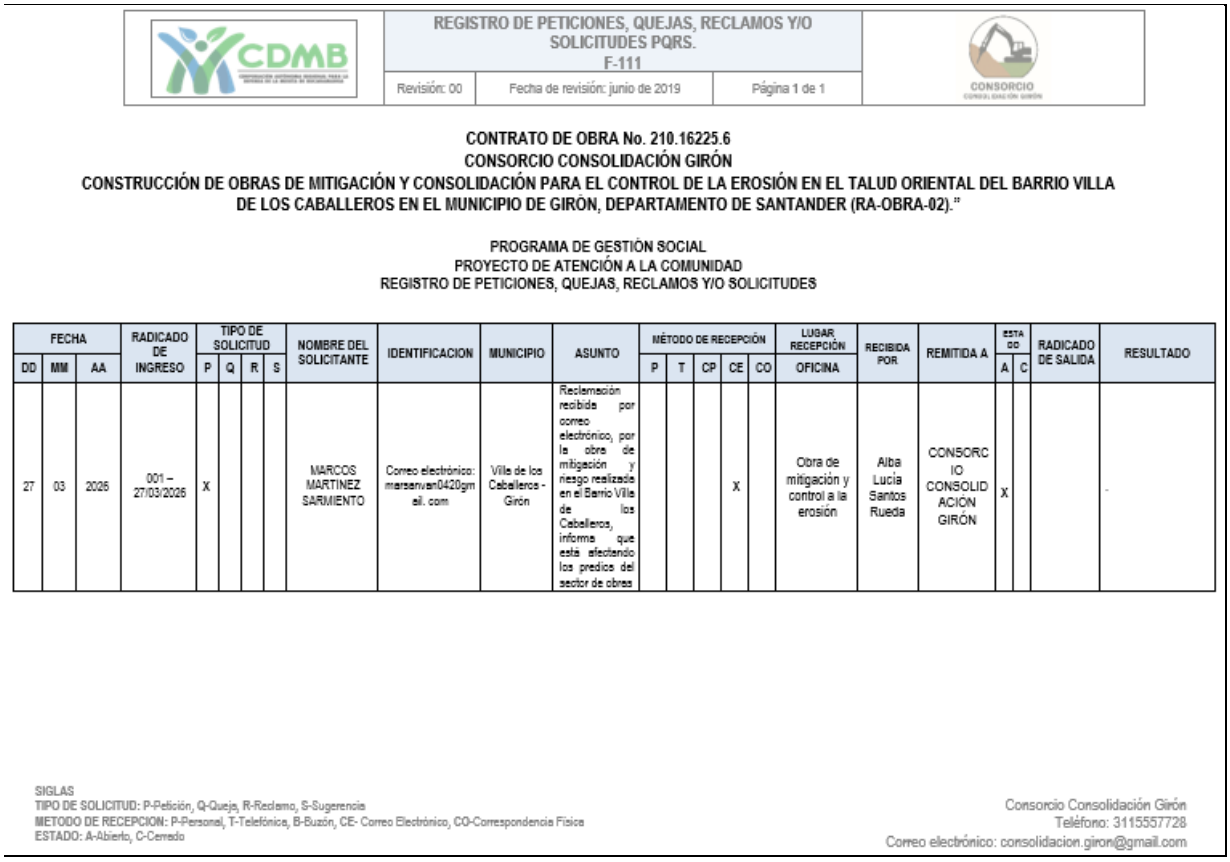

REGISTRO DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y/O SOLICITUDES PQRS.
F-111

Revisión: 00 | Fecha de revisión: junio de 2019 | Página 1 de 1

CONTRATO DE OBRA No. 210.16225.6
CONSORCIO CONSOLIDACIÓN GIRÓN
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN EL TALUD ORIENTAL DEL BARRIO VILLA DE LOS CABALLEROS EN EL MUNICIPIO DE GIRÓN, DEPARTAMENTO DE SANTANDER (RA-OBRA-02)."

PROGRAMA DE GESTIÓN SOCIAL
PROYECTO DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD
REGISTRO DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y/O SOLICITUDES

FECHA			RADICADO DE INGRESO	TIPO DE SOLICITUD				NOMBRE DEL SOLICITANTE	IDENTIFICACION	MUNICIPIO	ASUNTO	MÉTODO DE RECEPCIÓN					LUGAR RECEPCIÓN	RECIBIDA POR	REMITIDA A	ESTADO		RADICADO DE SALIDA	RESULTADO
DD	MM	AA		P	Q	R	S					P	T	CP	CE	CO	OFICINA			A	C		
27	03	2026	001 – 27/03/2026	X				MARCOS MARTINEZ SARMIENTO	Correo electrónico: marsenvan0420gmail. com	Ville de los Caballeros - Girón	Reclamación recibida por correo electrónico, por la obra de mitigación y riesgo realizada en el Barrio Ville de los Caballeros, informa que está afectando los predios del sector de obras				X		Obra de mitigación y control a la erosión	Alba Lucia Santos Rueda	CONSORCIO CONSOLIDACION GIRÓN	X			

SIGLAS
TIPO DE SOLICITUD: P-Petición, Q-Queja, R-Reclamo, S-Sugerencia
METODO DE RECEPCION: P-Personal, T-Telefónica, B-Buzón, CE- Correo Electrónico, CO-Correspondencia Física
ESTADO: A-Abierto, C-Cerrado

Consorcio Consolidación Girón
Teléfono: 3115557728
Correo electrónico: consolidacion.giron@gmail.com

ANEXO 4. REGISTRO DE ACTAS DE VECINDAD DE INICIO ELABORADAS EN LOS BARRIOS VILLA DE LOS CABALLEROS DE GIRÓN

VILLA DE LOS CABALLEROS – GIRÓN

No.	Nombre	Dirección vivienda	Barrio	No. de Cédula de Ciudadanía	No. telefónico
1	ELISEO SÁNCHEZ CARVAJAL	Calle 3 No. 16 F - 03	Villa de los Caballeros	91.343.755	3005721236
2	JUAN CARLOS NÚÑEZ CHAPARRO	Calle 3 B pt No. 16 F - 02	Villa de los Caballeros	13.511.022	3173181136
3	ABEL JHAIR RUEDA VELASCO	Transv. 16 No. 4 - 08	Villa de los Caballeros	1.005.326.107	3103712981
4	JAVIER RODRÍGUEZ ROJAS	Calle 3 No. peatonal 16 F - 03	Villa de los Caballeros	91.478.561	3184134927
5	NANCY PINZÓN OLARTE	Carrera 16 F No. 2 A - 38	Villa de los Caballeros	63.525.898	3156270694
6	NOELIA GOITIA ROBERTIS	Calle 3 No. 16 - 09	Villa de los Caballeros	9809154	3023218065

No.	Nombre	Dirección vivienda	Barrio	No. de Cédula de Ciudadanía	No. telefónico
7	GABRIEL ORLANDO PORRAS ARÉVALO	Calle 2 Lote 2 INGESOL LATINOAMÉRICA	Villa de los Caballeros	13.543.806	3103214912
8	WILSON SALAZAR DULCEY	Calle 4 No. 16 F - 03	Villa de los Caballeros	91.266.438	3003579595
9	ENRIQUE GAMBOA	Calle 3 A pt No. 16 F - PAR SIN NOMENCLATURA	Villa de los Caballeros	91.280.103	3043550191
10	SANDRA MILENA CALDERÓN ANAYA	Calle 3 B No. 16 F - 03	Villa de los Caballeros	63.559.752	3115742491
11	JOSÉ DEL CARMEN ESPARZA MALAGÓN	Áreas de vías y entorno Villa de los Caballeros	Villa de los Caballeros	19.306.218	3175610423
11	MELISSA DONADO ARIAS	Calle 3 No. 16 - 08	Villa de los Caballeros	1.098.704.436	3135095842
12	MELISSA DONADO ARIAS	Calle 3 Pt 16 F - 02	Villa de los Caballeros	1.098.704.436	3135095842
13	MELISSA DONADO ARIAS	Carrera 16 E pt No. 2 B - 15	Villa de los Caballeros	1.098.704.436	3135095842
14	MELISSA DONADO ARIAS	Transv. 16 pt 4 - 14 - 16	Villa de los Caballeros	1.098.704.436	3135095842
15	MELISSA DONADO ARIAS	TRANSV 16 pt No. 4 - 02	Villa de los Caballeros	1.098.704.436	3135095842
16	MELISSA DONADO ARIAS	Transv 16 No. 4 - 26	Villa de los Caballeros	1.098.704.436	3135095842
17	JOSÉ DEL CARMEN ESPARZA MALAGÓN	Áreas de entorno, andenes, fachada y vías de acceso a la obra	Villa de los Caballeros	19.306.218	3175610423
18	SANDRA CALDERÓN	Calle 3 B No. 16 F - 03	Villa de los Caballeros	63.559.752	3115742491

ANEXO 5. REGISTRO DE LA MANO DE OBRA LOCAL PARA LA OBRA DE MITIGACIÓN Y CONTROL A LA EROSIÓN – PROGRAMA DE GENERACIÓN DE EMPLEO –

CONTRATO DE OBRA No. 210.16225.6
CONSORCIO CONSOLIDACIÓN GIRÓN
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN EL TALUD ORIENTAL DEL BARRIO VILLA DE LOS CABALLEROS EN EL MUNICIPIO DE GIRÓN, DEPARTAMENTO DE SANTANDER (RA-OBRA-02)."

No.	NOMBRE COMPLETO	C.C. No.	FECHA DE NACIMIENTO	LUGAR DE NACIMIENTO	DIRECCIÓN	NÚMERO TELEFÓNICO	CARGO
1	ISAÍ BAUTISTA PINZÓN	1096193312	25/11/1987	Carmen de Chucurí - Santander	Barrio Carrizal - Girón	3112094081	Operador
2	WILLINGTON ALARCÓN ASCANIO	31.479.571	5/10/1975	Bucaramanga - Santander	Barrio Rincón de Girón	3185916429	Ayudante de obra
3	MANUEL ENRIQUE CASTILLO FLÓREZ	1.082.871.247	31/10/2005	Santa Marta - Magdalena	Barrio Villa de los Caballeros - Girón	3107438575	Ayudante de obra
4	JHON ALEXÁNDER CÁCERES PABÓN	1.102.383.713	11/03/1997	Bucaramanga - Santander	Barrio Brisas del Río	3224057528	Ayudante de obra
5	SEBASTIÁN PARRA FERRER	1.005.157.855	24/03/2003	Girón - Santander	Barrio Paraiso Alto	3214025171	Ayudante de obra

ANEXO 6. REGISTRO DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA CON LOS COLABORADORES DE LA OBRA DE MITIGACIÓN Y CONTROL A LA EROSIÓN

CONSORCIO CONSOLIDACION GIRÓN	FORMATO ASISTENCIA DE ENTRENAMIENTO, CHARLAS Y CAPACITACIONES	Código	RH-F-28
		Fecha	31/10/2022
		Versión	2
		Página	1 de 1

ENTRENAMIENTO		CAPACITACION	X	CHARLA	

OBRA: CONTRATO DE OBRA No. 210.16225.6 - CONSORCIO CONSOLIDACIÓN GIRÓN - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN EL TALUD ORIENTAL DEL BARRIO VILLA DE LOS CABALLEROS EN EL MUNICIPIO DE GIRÓN, DEPARTAMENTO DE SANTANDER (RA-OBRA-02)."

TEMA DE CAPACITACIÓN: Fortalecimiento de valores (integridad), educación vial y oficina de atencion a la comunidad

LUGAR: Campamento en obra - Consorcio Consolidación Girón		FECHA:	19/03/2026
CAPACITADOR	ALBA LUCÍA SANTOS RUEDA	DURACIÓN:	30 MINUTOS

No.	PARTICIPANTE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Miguel Rangel	1124048478	Ay. Perforacion	Miguel
2	William Fabian Palomeo Rs	91.499571	Ay. perforacion	
3	Alberto Pinzon	1101520618	Ayu.	
4	Edson Portilla.	1098605491	ALMACENISTA	
5	Mauricio Suarez	7700890778	OP	
6	Jarrinson steven cajcedo	1232841906	AY perforacion	estiven cajcedo
7	Sebastian Parra	1005578555	Ayudante	Sebastian Parra
8	Oscar Andres Sanchez	1098756647	Residente obra	
9	Manuel Castillo	1085712477	ayudante	Manuel
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

OBSERVACIONES:

CAPACITADOR
FIRMA

ANEXO No.04: INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONSORCIO CONSOLIDACIÓN GIRÓN	**INFORME DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**	CDMB

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN EL TALUD ORIENTAL DEL BARRIO VILLA DE LOS CABALLEROS EN EL MUNICIPIO DE GIRÓN, DEPARTAMENTO DE SANTANDER.

INFORME SST N° 06

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSOLIDACIÓN GIRÓN

CONSORCIO
CONSOLIDACIÓN GIRÓN

Melissa Donado Arias

ELABORADO POR:
CLARA MELISSA DONADO ARIAS
PROFESIONAL SISO

PERIODO DEL INFORME
DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2026

Tabla de contenido

1. INTRODUCCIÓN 3

2. OBJETIVOS DEL INFORME. 4

2.1 OBJETIVO GENERAL 4

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 4

3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 5

4. RELACIÓN DE PERSONAL Y NOVEDADES. 6

4.1 PERSONAL 6

4.2 NOVEDADES DE INGRESO. 8

5. PARTICIPACIÓN Y CONSULTA. 9

5.3 REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS. (RACI) 9

6. ENTREGA Y/O REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL... 9

7. PROCESOS DE FORMACIÓN. 10

8. INSPECCIONES DE SEGURIDAD 10

9. GESTIÓN DE LOS PELIGROS Y RIESGOS. 11

9.1 MEDIDAS PREVENTIVAS. 11

10. REPORTE DE INCIDENTES Y ACCIDENTES DE TRABAJO 12

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento describe la gestión en Seguridad y Salud en el trabajo del proyecto **"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN EL TALUD ORIENTAL DEL BARRIO VILLA DE LOS CABALLEROS EN EL MUNICIPIO DE GIRÓN, DEPARTAMENTO DE SANTANDER"** en el periodo comprendido entre el **01 AL 31 DE MARZO DE 2026;** en el mismo se reflejan y relacionan actividades ejecutadas, registros fotográficos y evidencias necesarias para respaldar la conformidad del sistema de Gestión SST en el marco de la prevención de riesgos, cumplimiento legal y contractual aplicables.

La estructura del informe esta direccionada desde un objetivo general y el cumplimiento de cada uno de los objetivos específicos descritos en el mismo, dentro de los cuales se podrá encontrar la relación del personal disponible para la ejecución del proyecto, rotación durante el periodo, conformación de los diferentes comités, mecanismos de participación y consulta dirigidos hacia la prevención de riesgos laborales, entre otros mecanismos necesarios para el eficaz desempeño de las actividades realizadas y registros de afiliación a seguridad social de la población trabajadora.

Comprometidos con el bienestar de la población trabajadora y la prevención continua de riesgos y accidentes laborales, presentamos este documento para que sea un soporte y ayuda para verificar el cumplimiento del plan de trabajo direccionado desde el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

2. OBJETIVOS DEL INFORME.

2.1 OBJETIVO GENERAL

Soportar la ejecución de actividades y cumplimiento del plan de trabajo del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud el trabajo del proyecto "**CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN EL TALUD ORIENTAL DEL BARRIO VILLA DE LOS CABALLEROS EN EL MUNICIPIO DE GIRÓN, DEPARTAMENTO DE SANTANDER"** por medio de fotografías, actas, soportes y otros asociados al mejoramiento de la calidad de vida de la población trabajadora.

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Presentar los soportes de inducción y/o re inducción y seguridad social vigente de toda la población trabajadora del proyecto.
- Describir las actividades desarrolladas en los diferentes comités y demás mecanismos de participación y consulta en materia de Seguridad y salud en el trabajo.
- Soportar la entrega de elementos de protección personal especifico y acordes a los factores de riesgos expuestos, suministrados a los trabajadores involucrados en el proyecto.
- Comunicar el avance y ejecución de las actividades del Sistema de seguridad y salud en el trabajo.
- Establecer medidas de control preventivas con el fin de mitigar y minimizar los riesgos potenciales que pueden generar accidentes de trabajo o enfermedades laborales a los trabajadores.
- Sensibilización a los trabajadores del contrato en mención la importancia de mantener ambientes y conductas de trabajo seguro.
- Establecer lineamientos técnicos para el desarrollo de las actividades y la correcta ejecución.

3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

NOMBRE DE LA EMPRESA	CONSORCIO CONSOLIDACIÓN GIRÓN
NIT	901.982.571-5
REPRESENTANTE LEGAL	JOHANNA MARCELA PADIERNA CASTIBLANCO
CONTRATO	210.16225.6
OBJETO DEL CONTRATO	"**CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN EL TALUD ORIENTAL DEL BARRIO VILLA DE LOS CABALLEROS EN EL MUNICIPIO DE GIRÓN, DEPARTAMENTO DE SANTANDER**"
DIRECCIÓN	Carrera 39 N° 51 – 31, Apto 2405
TELÉFONO	3012765665
CLASE DE RIESGO	V
	Actividad económica: construcción de obras de ingeniería civil incluye solamente a empresas dedicadas a el montaje y/o reparación de oleoductos

4. RELACIÓN DE PERSONAL Y NOVEDADES.

En este numeral se presentan las relaciones del personal disponible, novedades de ingreso y retiro del personal dispuesto para la ejecución del proyecto en el periodo de tiempo descrito para el presente informe.

4.1 PERSONAL

A continuación, se presenta el personal vinculado para la ejecución del proyecto, en el periodo.

Tabla No. 1. Personal Staff

PERSONAL ACTIVO EN OBRA							
PERIODO: DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2026							
CONTRATISTA: CONSORCIO CONSOLIDACIÓN GIRÓN							
NOMBRE COMPLETO	**NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN**	**CARGO**	**FECHA DE INGRESO**	**ARL**	**EPS**	**AFP**	**CCF**
María Lucia Higuera Pino	1.095.700.657	Geotecnista	15/10/2025	Axa Colpatria	Sura	Colpensiones	No Cotiza
Johana Paola Ospino Rodelo	1.098.618.429	Asesor ambiental	15/10/2025	Axa Colpatria	Sanitas	Colpensiones	No Cotiza
Juan Carlos Rincón Lozano	80.089.079	PMP	15/10/2025	Axa Colpatria	sanitas	Colfondos	No Cotiza
Isaías García Jaimes	1.101.596.200	Operador de perforación I	15/10/2025	Axa Colpatria	Nueva EPS	Porvenir	Comfenalco
Jarrinson Steven Camarón Caicedo	1.232.891.906	Ayudante de perforación II	15/10/2025	Axa Colpatria	Nueva EPS	Porvenir	Comfenalco
Miguel Antonio Rangel Florián	1.124.048.478	Ayudante de perforación II	15/10/2025	Axa Colpatria	Nueva EPS	Colpensiones	Comfenalco
Jesús Alberto Mayorga Mayorga	1.101.520.618	Ayudante de obra	15/10/2025	Axa Colpatria	Sanitas	Colpensiones	Comfenalco
Willington Alarcón Ascanio	91.479.571	Ayudante de perforación II	05/11/2025	Axa Colpatria	Nueva EPS	Porvenir	Comfenalco
Manuel Enrique Castillo Flórez	1.082.871.247	Ayudante de obra	06/11/2025	Axa Colpatria	Coosalud	Porvenir	Comfenalco

Edson Alexander Portilla Ardila	1.098.605.491	Almacenista	24/11/2025	Axa Colpatria	Salud Total	Porvenir	Comfenalco
Yohan Alexander Cáceres Pabón	1.102.383.713	Ayudante de obra	01/12/2025	Axa Colpatria	Nueva EPS	Porvenir	Comfenalco
Giovany Sebastián Parra Ferrer	1.005.157.855	Ayudante de obra	01/12/2025	Axa Colpatria	Sanitas	Porvenir	Comfenalco
TOTAL, PERSONAL CONTRATISTA					12		
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES CONAINCO S.A.S.							
NOMBRE COMPLETO	**NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN**	**CARGO**	**FECHA DE INGRESO**	**ARL**	**EPS**	**AFP**	**CCF**
Edgar Leonardo Gómez Roncancio	72.254.372	Director de obra	15/10/2025	Axa Colpatria	Sura	Colfondos	Cajasan
TOTAL, PERSONAL CONTRATISTA					1		
CONTRATISTA: INFRACORP S.A.S.							
NOMBRE COMPLETO	**NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN**	**CARGO**	**FECHA DE INGRESO**	**ARL**	**EPS**	**AFP**	**CCF**
Oscar Andrés Sánchez Jerez	1.098.756.647	Ingeniero residente	15/10/2025	Axa Colpatria	Sura	Protección	Comfenalco
Clara Melissa Donado Arias	1.098.704.436	Profesional SISO	15/10/2025	Axa Colpatria	Sura	Protección	Comfenalco
Alexander Prada Jerez	13.537.319	Oficial	15/10/2025	Axa Colpatria	Nueva EPS	Colfondos	Comfenalco
Fabián Leonardo Zambrano Lesmes	1.098.673.915	Topógrafo	15/10/2025	Axa Colpatria	Coosalud	Colpensiones	Comfenalco
Sandra Yolima Bermúdez Cala	63.553613	Profesional ambiental	01/11/2025	Axa Colpatria	Ecopetrol	Porvenir	Comfenalco
TOTAL, PERSONAL CONTRATISTA					5		
TOTAL, PERSONAL EN OBRA					**18**		

Para la ejecución de la obra se cuenta con personal de mano de obra calificado y no calificado. Todos se encuentran afiliados a ARL, EPS, AFP, conforme a las disposiciones laborales aplicables.

Ver anexo No 1. Afiliaciones y/o planilla de pagos de seguridad social.

4.2 NOVEDADES DE INGRESO.

Durante el periodo correspondiente al presente informe, no se presentaron novedades de ingreso de personal.

Tabla No 2. Novedades de Ingreso

NOVEDADES DE INGRESO			
PERIODO: DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2026			
CONTRATISTA: CONSORCIO CONSOLIDACIÓN GIRÓN			
NOMBRE COMPLETO	**NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN**	**CARGO**	**FECHA DE INGRESO**
NA	NA	NA	NA

4.3 NOVEDADES DE RETIRO

Durante el periodo del informe, se presentaron las siguientes novedades de retiro de personal:

NOVEDADES DE RETIRO DE PERSONAL		
PERIODO: DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2026		
NOMBRE COMPLETO	**NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN**	**FECHA DE RETIRO**
Yohan Alexander Cáceres Pabón	1.102.383.713	12/03/2026

Ver anexo No 2. Novedades de retiro de personal.

4.4 PERSONAL ROTATIVO

Durante el periodo correspondiente al presente informe, no se requirió la presencia de personal rotativo en obra, teniendo en cuenta las actividades técnicas programadas.

5. PARTICIPACIÓN Y CONSULTA.

Dentro de los mecanismos de participación y consulta se encuentra el Comité Paritario de Seguridad y salud en el trabajo COPASST o Vigía, el comité de convivencia laboral CCL y mecanismos de notificación de riesgos por parte de la población trabajadora.

5.1 COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Para el informe en mención y dando cumplimiento a la Resolución 2013 de 1986, modificada por el Decreto 1295 de 1994 y el Decreto 1072 de 2015, se llevó a cabo reunión del comité paritario de seguridad y salud en el trabajo. Se adjunta acta de realizada el día 26 de marzo de 2026.

Ver anexo N° 3. Acta de reunión Copasst.

5.2 COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL

La reunión del comité de convivencia laboral se llevó a cabo el día 27 de marzo de 2026. Cabe resaltar que las reuniones y el informe de su gestión se presentará de manera mensual, teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en la normatividad legal vigente aplicable. La próxima reunión se llevará a cabo en el mes de abril de 2026.

Ver anexo N° 4. Acta de reunión CCL.

5.3 REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS. (RACI)

Durante el periodo en reporte no se presentaron situaciones para reporte por parte de la población trabajadora los siguientes RACI.

6. ENTREGA Y/O REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL.

Es responsabilidad del empleador el suministro de los elementos de protección individual y dotación para la ejecución de las actividades de manera segura y de acuerdo a los perfiles del personal y las exigencias de las tareas a ejecutar; se realizó entrega de los elementos de protección de acuerdo a la vida útil del EPP y la necesidad del trabajador, a su vez se realizaron inspecciones periódicas de estos elementos con el fin de tener abastecido al personal.

Tabla 4. Entrega de dotación y EPP

ACTIVIDAD DESARROLLADA	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Entrega y/o reposición de elementos de protección personal	De acuerdo a la necesidad y desgaste normal de los elementos de protección, se realizó reposición de los mismos.

Ver anexo No 5. Registros de entrega de elementos de protección personal y dotación.

7. PROCESOS DE FORMACIÓN.

La formación es una estrategia indispensable para alcanzar los objetivos propuestos en el SGSST. Mediante estas se pretende lograr que todos los trabajadores involucrados en este proyecto, de todos los niveles, adquieran los conocimientos, actitudes y prácticas necesarios para generar ambientes de trabajos sanos, seguro y confortable.

Tabla N° 5. Capacitaciones SST en el periodo

CAPACITACIONES		
ITEM	**FECHA**	**TEMA**
1	11/03/2026	Prevención del riesgo mecánico
2	25/03/2026	Prevención del riesgo locativo

Ver anexo No 6. Registro de asistencia a capacitaciones SST.

8. INSPECCIONES DE SEGURIDAD

Una de las herramientas más utilizadas para Identificar peligros, para posteriormente ser evaluados, son las Inspecciones a sitios de trabajo, pues determinan el tipo de peligro al que está expuesto el trabajador en su área, constituye una prueba real de las condiciones laborales ya que se basa en la verificación de las diferentes zonas con las cuales tiene contacto el trabajador, además permite encontrar las fallas que pueden acarrear algún tipo de accidente y los posibles causales de enfermedad laboral.

Tabla 6. Inspecciones de seguridad realizadas en el periodo

INSPECCIÓN DESARROLLADA	FECHA DE INSPECCIÓN
Inspección de Elementos de Protección Personal	17/03/2026
Inspección de botiquín y camilla	10/03/2026
Inspección de extintores	19/03/2026
Inspección locativa de obra	24/03/2026
Inspección de herramientas	Del 02 al 06 de marzo de 2026 Del 09 al 14 de marzo de 2026 Del 16 al 20 de marzo de 2026 Del 24 al 28 de marzo de 2026

Ver anexo No 7. Inspecciones de Seguridad.

9. GESTIÓN DE LOS PELIGROS Y RIESGOS.

La gestión de los riesgos peligros prioritarios en el trabajo requiere mecanismos de prevención adicionales que permitan la gestión adecuada del riesgo, permitiendo ambientes de trabajo más seguros, en este numeral se relacionan las gestiones desarrolladas.

9.1 MEDIDAS PREVENTIVAS.

Tabla No. 9. Medidas preventivas adoptadas en el periodo

PELIGRO	GESTIÓN DE LOS PELIGROS	FECHA (S) DE REALIZACIÓN.
- Caídas, golpes, electrocución, heridas	- Señalización de riesgos y peligros; encerramiento - Inducción y/o reinducción SST - Diligenciamiento y aprobación de permisos de trabajo	Del 01 al 31 de marzo de 2026

Ver anexo No 8. Registro Fotográfico

Ver anexo No 9. Medidas preventivas

10. REPORTE DE INCIDENTES Y ACCIDENTES DE TRABAJO

Se hace relación al número de incidentes/accidentes/enfermedad laboral registrados en el espacio del informe que sea por causa u ocasión de las labores desempeñadas dentro del área de trabajo o encomendadas por personal supervisor o subcontratista. Dentro del presente informe se presenta la relación del número de eventos presentados, la gestión y plan de trabajo se anexará dentro de las investigaciones pertinentes.

Para el periodo que corresponde al presente informe, no se presentaron eventos relacionados con accidentes de trabajo

Tabla No. 10. Consolidado de incidentes y/o accidentes:

N°	MES	N° AT			N° TRABAJ	DIAS INCAPACIDAD	DÍAS CARGADOS	TOTAL DIAS TRABAJADOS	TOTAL HORAS EXTRAS	HORAS HOMBRE TRABAJADAS	INDICES				
		SI	CI	TOTAL							MES	IF	IS	TASA	ILI
1	oct-25	0	0	0	14	0	0	14	0	1568	oct-25	0,00	0,00	0,00	0,00
2	nov-25	0	0	0	19	0	0	21	0	3192	nov-25	0,00	0,00	0,00	0,00
3	dic-25	0	0	0	19	0	0	22	0	3344	dic-25	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ene-26	0	0	0	19	0	0	24	0	3648	ene-26	0,00	0,00	0,00	0,00
5	feb-26	0	0	0	19	0	0	22	0	3344	feb-26	0,00	0,00	0,00	0,00
6	mar-26	0	0	0	18	0	0	23	0	3312	mar-26	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0	0	0	18,0	0,0	0,0	57,0	0,0	18408,0	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Imagen 1. Distribución del índice de frecuencia

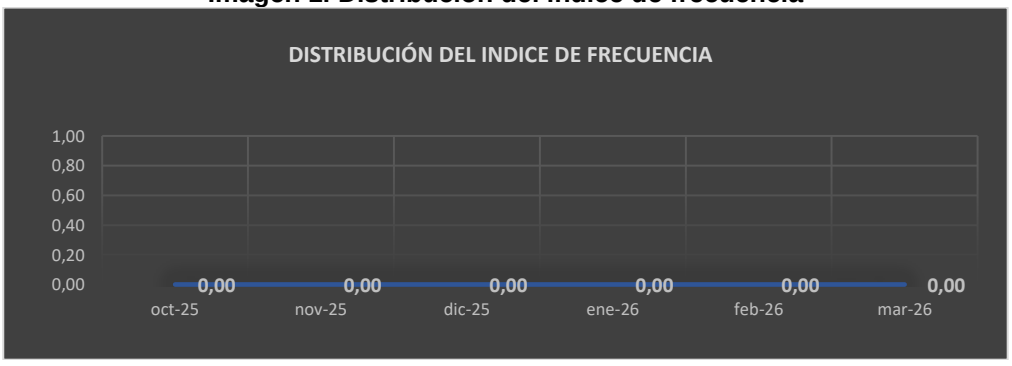


Imagen 2. Tasa de accidentalidad

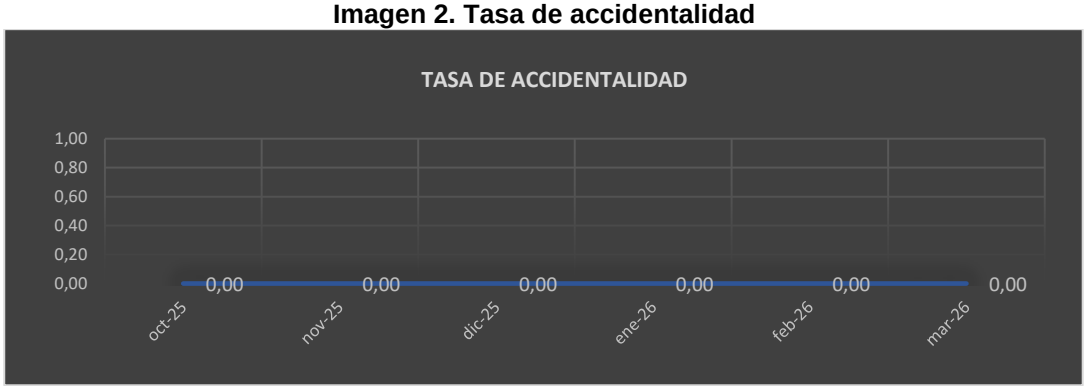


Imagen 3. Número de trabajadores mensual


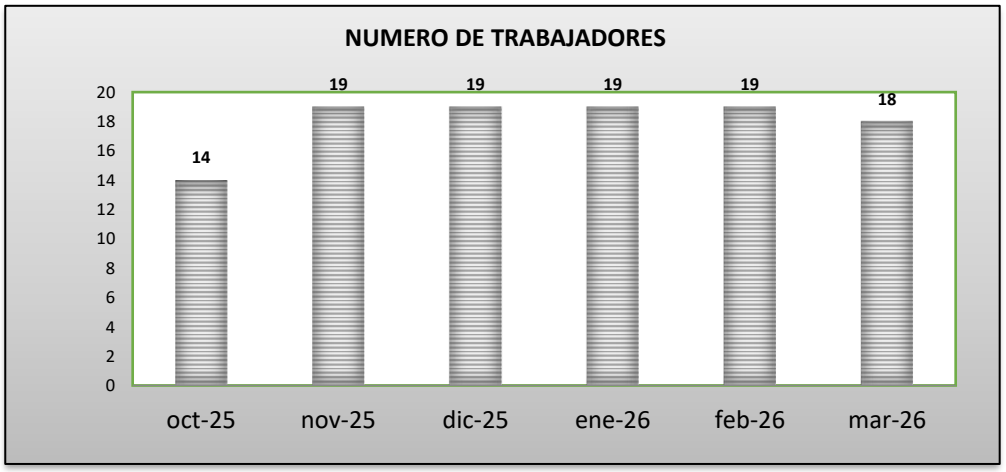


Imagen 4. Total, de accidentes de trabajo

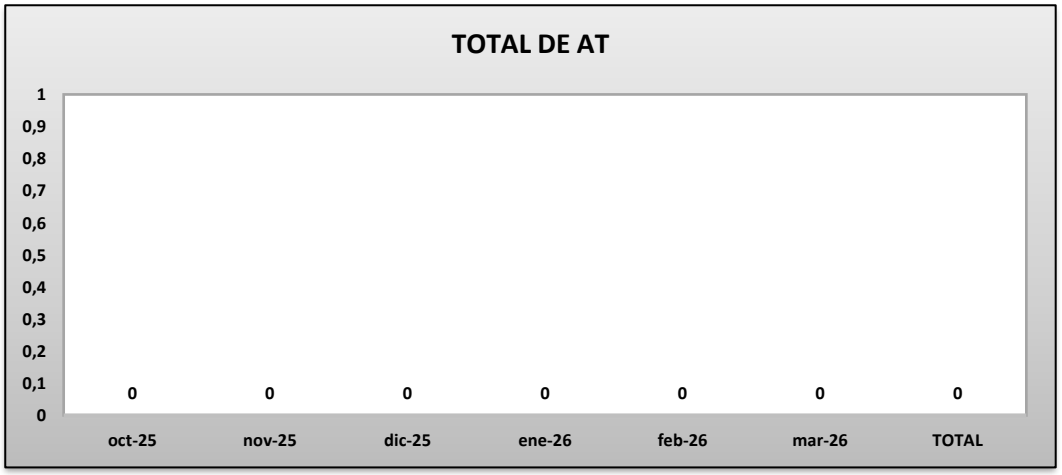

ANEXO N° 1
AFILIACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-04-13, 08:23:26 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1080958708

Periodo Cotización: marzo de 2026 **Periodo Servicio:** marzo de 2026

PAGADO 10/04/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MARIA LUCIA HIGUERA PINO		
Documento	CC1095700657	**Dirección**	CRA 36 # 38 28 APTO 301
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3212192048
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1095700657	MARIA LUCIA HIGUERA PINO	59	00																	0	30	30	30	0	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS010) EPS SURA	$ 1.750.905	$ 218.900	0,522	$ 1.750.905	$ 9.200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 508.300

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 0	$ 280.200	$ 218.900	$ 9.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 508.300	$ 0	$ 508.300

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1098618429		OSPINO RODELO JOHANA PAOLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 197 15 185 CONJ VSER 2 CS 55	FLORIDABLANCA-SANTANDER	6898027	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-03	212339961	9501877860	I	2026/04/10	2026/04/10	BANCO DE OCCIDENTE	0	$499,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1098618429	OSPINO RODELO JOHANA PAOLA																		25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0	No	$499,100
Total	**Afiliados(1)**																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$0	$0		$0	$0		$499,100

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1098618429		OSPINO RODELO JOHANA PAOLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 197 15 185 CONJ VSER 2 CS 55	FLORIDABLANCA-SANTANDER	6898027	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-03	212339961	9501877860	I	2026/04/10	2026/04/10	BANCO DE OCCIDENTE	0	$499,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$280,200	$0	$0	$280,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				1	$499,100	$0	$0	$499,100

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	80089079
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JUAN CARLOS RINCON LOZANO
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANCABERMEJA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CARRERA 19 B NO 64 - 24	TELÉFONO:	6223036
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6008888949**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	marzo	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	marzo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	SALUD:	AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/03/16	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		145629614

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002279406	231001	231001-COLFONDOS	1	$ 280.200
		SUBTOTAL:	1	**$ 280.200**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1	$ 218.900
		SUBTOTAL:	1	**$ 218.900**

VALOR SIN MORA:	**$ 499.100**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 499.100**

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	80089079
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JUAN CARLOS RINCON LOZANO
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANCABERMEJA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CARRERA 19 B NO 64 - 24	TELÉFONO:	6223036
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NO		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6008888949**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES marzo AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES marzo AÑO 2026
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/03/16	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	145629614

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 0	$ 280.200
SUBTOTALES:										**$ 280.200**	**$ 0**	**$ 280.200**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 218.900
SUBTOTALES:													**$ 218.900**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 218.900**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																			PARAFISCALES						
																													PENSIÓN								SALUD							ARP												
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 80089079	RINCON LOZANO JUAN CARLOS	INDEPEND		$ 1.750.905				NO																		231001-COLFONDOS	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900			$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 499.100

Planilla Pagada

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-04-10, 09:12:37 AM **Tipo Planilla:** Y: PLANILLA INDEPENDIENTES EMPRESAS **Numéro Planilla:** 1080790284

Periodo Cotización: marzo de 2026 **Periodo Servicio:** marzo de 2026

PAGADO 09/04/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSORCIO CONSOLIDACION GIRON		
Documento	NI901982571	**Dirección**	CR 39 #51 - 31 AP 2405
Tipo de Empresa	CONTRATANTE	**Teléfono**	3012765665
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal	PADIERNA CASTIBLANCO JOHANNA MARCELA	**Identificación**	CC 1098682052
Total Afiliados	3	**ARP**	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1095700857	MARIA LUCIA HIGUERA PINO	59	00																0	0	0	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 121.900
CC 1098618429	JOHANA PAOLA OSPINO RODELO	59	00																0	0	0	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 121.900
CC 80089079	JUAN CARLOS RINCON LOZANO	59	00																0	0	0	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 121.900

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 0	$ 0	$ 5.252.715	$ 0	$ 0	$ 0	$ 365.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 365.700	$ 0	$ 365.700

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-04-10, 09:13:02 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1080790202

Periodo Cotización: marzo de 2026 **Periodo Servicio:** abril de 2026

PAGADO 09/04/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSORCIO CONSOLIDACION GIRON		
Documento	NI901982571	**Dirección**	CR 39 #51 - 31 AP 2405
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3012765665
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal	PADIERNA CASTIBLANCO JOHANNA MARCELA	**Identificación**	CC 1098682052
Total Afiliados	9	**ARP**	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET_A	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1005157855	GIOVANY SEBASTIAN PARRA FERRER	01	00										X						0	29	29	29	29	(230301) PORVENIR	$ 1.796.999	$ 287.600	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.796.999	$ 71.900	6,960	$ 1.796.999	$ 125.100	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.796.999	$ 71.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 556.500
CC 1005157855	GIOVANY SEBASTIAN PARRA FERRER	01	00														X		0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 59.259	$ 9.500	(EPS005) EPS SANITAS	$ 59.259	$ 2.400	0,000	$ 59.259	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 58.364	$ 2.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.300
CC 1082871247	MANUEL ENRIQUE CASTILLO FLOREZ	01	00										X						0	29	29	29	29	(230301) PORVENIR	$ 1.772.129	$ 283.600	(ESSC24) EPS-S COOSALUD	$ 1.772.129	$ 70.900	6,960	$ 1.772.129	$ 123.400	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.772.129	$ 70.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 548.800
CC 1082871247	MANUEL ENRIQUE CASTILLO FLOREZ	01	00														X		0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 60.354	$ 9.700	(ESSC24) EPS-S COOSALUD	$ 60.354	$ 2.500	0,000	$ 60.354	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 58.364	$ 2.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.600
CC 1098605491	EDSON ALEXANDER PORTILLA ARDILA	01	00										X						0	29	29	29	29	(230301) PORVENIR	$ 1.987.803	$ 318.100	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.987.803	$ 79.600	6,960	$ 1.987.803	$ 138.400	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.987.803	$ 79.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 615.700
CC 1098605491	EDSON ALEXANDER PORTILLA ARDILA	01	00														X		0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 64.233	$ 10.300	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 64.233	$ 2.600	0,000	$ 64.233	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 63.334	$ 2.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 15.500
CC 1101520618	JESUS ALBERTO MAYORGA MAYORGA	01	00										X						0	28	28	28	28	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.723.713	$ 275.800	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.723.713	$ 69.000	6,960	$ 1.723.713	$ 120.000	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.723.713	$ 69.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 533.800
CC 1101520618	JESUS ALBERTO MAYORGA MAYORGA	01	00											X					0	1	1	1	1	(25-14) COLPENSIONES	$ 62.011	$ 7.500	(EPS005) EPS SANITAS	$ 62.011	$ 0	0,000	$ 62.011	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.500
CC 1101520618	JESUS ALBERTO MAYORGA MAYORGA	01	00														X		0	1	1	1	1	(25-14) COLPENSIONES	$ 62.012	$ 10.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 62.012	$ 2.500	0,000	$ 62.012	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 58.364	$ 2.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.900
CC 1101596200	ISAIAS GARCIA JAIMES	01	00										X						0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.932.462	$ 309.200	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.932.462	$ 77.300	6,960	$ 1.932.462	$ 134.500	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.932.462	$ 77.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 598.300
CC 1102383713	YOHAN ALEXANDER CACERES PABON	01	00	X									X						0	12	12	12	12	(230301) PORVENIR	$ 789.897	$ 126.400	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 789.897	$ 31.600	6,960	$ 789.897	$ 55.000	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 866.331	$ 34.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 247.700
CC 1124048478	MIGUEL ANTONIO RANGEL FLORIAN	01	00										X						0	29	29	29	29	(230301) PORVENIR	$ 1.782.077	$ 285.200	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.782.077	$ 71.300	6,960	$ 1.782.077	$ 124.100	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.782.077	$ 71.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 551.900
CC 1124048478	MIGUEL ANTONIO RANGEL FLORIAN	01	00														X		0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 59.359	$ 9.500	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 59.359	$ 2.400	0,000	$ 59.359	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 58.364	$ 2.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.300
CC 1232891906	JARRINSON STEVEN CAMARON CAICEDO	01	00										X						0	27	27	27	27	(230301) PORVENIR	$ 1.715.092	$ 274.500	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 1.715.092	$ 68.700	6,960	$ 1.715.092	$ 119.400	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.715.092	$ 68.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 531.300
CC 1232891906	JARRINSON STEVEN CAMARON CAICEDO	01	00											X					0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 116.728	$ 18.700	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 116.728	$ 4.700	0,000	$ 116.728	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 116.728	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 23.400
CC 1232891906	JARRINSON STEVEN CAMARON CAICEDO	01	00														X		0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 58.364	$ 9.400	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 58.364	$ 2.400	0,000	$ 58.364	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 58.364	$ 2.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.200
CC 91479571	WILLINGTONG ALARCON ASCANIO	01	00										X						0	29	29	29	29	(230301) PORVENIR	$ 1.811.922	$ 290.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.811.922	$ 72.500	6,960	$ 1.811.922	$ 126.200	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.811.922	$ 72.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 561.200
CC 91479571	WILLINGTONG ALARCON ASCANIO	01	00														X		0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 59.027	$ 9.500	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 59.027	$ 2.400	0,000	$ 59.027	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 58.364	$ 2.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.300

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 15.913.441	$ 15.913.441	$ 15.913.441	$ 15.918.774	$ 2.544.500	$ 634.700	$ 1.066.100	$ 632.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.878.200	$ 0	$ 4.878.200

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-04-10, 09:55:29 a. m. **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 1080788421

Periodo Cotización 202603 **Periodo Servicio** 202604

PAGADA 2026-04-08 00:00:00.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSTRUCCIONES CONAINCO SAS				
Documento	NI 901173035	**Dirección**	CR 39 #51 - 31 APT 1503		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	6914305		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL	**Total Afiliados**	17
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER		
Representante Legal	GOMEZ RONCANCIO EDGAR LEONARDO	**Identificación**	CC 72254372		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 72254372		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					GOMEZ RONCANCIO EDGAR LEONARDO	68001000 - 68		SANTANDER

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	27	27	27	27			F	$ 6.879.600	231001		16 %	$ 6.191.640	$ 990.700	$ 0	$ 0	EPS010		4 %	$ 6.191.640	$ 247.700	$ 0	14-4	5	6,960 %	$ 6.191.640	$ 431.000	CCF40	4 %	$ 6.191.640	$ 247.700	0 %	$ 0	0 %	$ 0
														X	0	3	3	3	3			F	$ 6.879.600	231001		16 %	$ 687.960	$ 110.100	$ 0	$ 0	EPS010		4 %	$ 687.960	$ 27.600	$ 0	14-4		0,000 %	$ 687.960	$ 0	CCF40	4 %	$ 687.960	$ 27.600	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLFONDOS	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SURA	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	COMFENALCO SANTANDER	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 1.100.800	$ 0	$ 0	$ 275.300	$ 431.000	$ 275.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.082.400

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900847742	7	INFRACORP SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 74A 22 31	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7920530	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-04	210164771	9502917642	E	2026/04/13	2026/04/09	BANCO DE OCCIDENTE	0	$17,429,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (25 Afiliados)																						**$58,219,145**	**$9,402,500**			**$59,970,050**	**$2,400,900**			**$58,104,376**	**$2,326,200**			**$59,970,050**		**$3,300,200**		**$0**	**$0**		**$17,429,800**
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (5 Afiliados)																						**$9,750,909**	**$1,560,600**			**$11,501,814**	**$460,600**			**$9,750,909**	**$390,500**			**$11,501,814**		**$57,100**		**$0**	**$0**		**$2,468,800**
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (2 Afiliados)																						**$4,500,002**	**$720,200**			**$4,500,002**	**$180,200**			**$4,500,002**	**$180,200**			**$4,500,002**		**$22,800**		**$0**	**$0**		**$1,103,400**
1	CC	1100893515	IBAÑEZ LOZADA DIANA MILENA																		23030 1	29	$2,416,667	$386,700	EPS002	29	$2,416,667	$96,700	CCF40	29	$2,416,667	$96,700	14-4	29	$2,416,667	0.522%	$12,700	29	$0	$0	Si	$592,800
2	CC	1100893515	IBAÑEZ LOZADA DIANA MILENA													X					23030 1	1	$83,334	$13,400	EPS002	1	$83,334	$3,400	CCF40	1	$83,334	$3,400	14-4	1	$83,334	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$20,200
3	CC	1098725994	PARADA HERNANDEZ YADDY VANESSA																		25-14	29	$1,933,334	$309,400	EPS010	29	$1,933,334	$77,400	CCF40	29	$1,933,334	$77,400	14-4	29	$1,933,334	0.522%	$10,100	29	$0	$0	Si	$474,300
4	CC	1098725994	PARADA HERNANDEZ YADDY VANESSA													X					25-14	1	$66,667	$10,700	EPS010	1	$66,667	$2,700	CCF40	1	$66,667	$2,700	14-4	1	$66,667	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$16,100
Ciudad: FLORIDABLANCA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)																						**$3,500,002**	**$560,200**			**$3,500,002**	**$140,200**			**$3,500,001**	**$140,100**			**$3,500,002**		**$15,900**		**$0**	**$0**		**$856,400**
5	CC	1098762015	DIAZ ARIZA KAREN DAYANNA																		23030 1	26	$3,033,334	$485,400	EPS005	26	$3,033,334	$121,400	CCF40	26	$3,033,334	$121,400	14-4	26	$3,033,334	0.522%	$15,900	26	$0	$0	Si	$744,100
6	CC	1098762015	DIAZ ARIZA KAREN DAYANNA													X					23030 1	1	$116,667	$18,700	EPS005	1	$116,667	$4,700	CCF40	1	$116,667	$4,700	14-4	1	$116,667	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$28,100
7	CC	1098762015	DIAZ ARIZA KAREN DAYANNA													X					23030 1	3	$350,001	$56,100	EPS005	3	$350,001	$14,100	CCF40	3	$350,000	$14,000	14-4	3	$350,001	0.000%	$0	3	$0	$0	Si	$84,200
Ciudad: GIRON Depto: SANTANDER (1 Afiliados)																						**$1,750,905**	**$280,200**			**$1,750,905**	**$70,100**			**$875,453**	**$35,100**			**$1,750,905**		**$9,200**		**$0**	**$0**		**$394,600**
8	CC	1095839242	TORRES PINZON MICHELLE MARIA																		23020 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF40	30	$875,453	$35,100	14-4	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	Si	$394,600
Ciudad: SAN GIL Depto: SANTANDER (1 Afiliados)																						**$0**	**$0**			**$1,750,905**	**$70,100**			**$875,453**	**$35,100**			**$1,750,905**		**$9,200**		**$0**	**$0**		**$114,400**
9	CC	91071916	ACERO ROJAS JULIO CESAR																			0	$0	$0	MIN001	30	$1,750,905	$70,100	CCF40	30	$875,453	$35,100	14-4	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	Si	$114,400

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				24	$9,402,500	$0	$0	$9,402,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$783,300	$0	$0	$783,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	7	$3,429,300	$0	$0	$3,429,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$2,539,200	$0	$0	$2,539,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	8	$2,650,700	$0	$0	$2,650,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				25	$3,300,200	$0	$0	$3,300,200
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	25	$3,300,200	$0	$0	$3,300,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				25	$2,326,200	$0	$0	$2,326,200
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	25	$2,326,200	$0	$0	$2,326,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				25	$2,400,900	$0	$0	$2,400,900
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$108,000	$0	$0	$108,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$70,200	$0	$0	$70,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	4	$380,400	$0	$0	$380,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$70,900	$0	$0	$70,900
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	2	$170,500	$0	$0	$170,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	$383,400	$0	$0	$383,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$70,500	$0	$0	$70,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	6	$464,000	$0	$0	$464,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$683,000	$0	$0	$683,000
TOTAL				**25**	**$17,429,800**	**$0**	**$0**	**$17,429,800**

ANEXO N° 2
DOCUMENTOS DE RETIRO

Obra Alfonso Lopez

Jueves 12 de Marzo del 2026

Renuncio Volotaria mente Cargo de Asistente de obra

CC. 1102.383-713

Num 322-4057-58

Nombre Johan Alexander Caceres Pabón

Firma Caceres

CONSORCIO CONSOLIDACIÓN GIRÓN	**ACEPTACIÓN DE RENUNCIA**	**Código**	**RH-F-15**
		Fecha	**29/07/2022**
		Versión	**4**
		Página 1 de 1	

bucaramanga, 13-marzo-2026

Señor(a)

Yohan Alexander Caceres Pabon

REF.: ACEPTACION DE RENUNCIA

Dando respuesta a su comunicación de fecha 12 de Marzo de 2026, nos permitimos manifestarle que la empresa acepta la **RENUNCIA** por Usted presentada de manera irrevocable al cargo desempeñado como **Ayudante de Obra** .


Esta aceptación se hace efectiva a partir del **12 de Marzo del 2026.**

A partir de esta fecha, se procederá a realizar su tramite de liquidación.

Favor solicitar en la oficina principal cita e indicaciones para realizarse exámenes de egreso, los cuales debe presentar a la empresa dentro de los 5 días siguientes a su retiro. En caso de no presentarse la empresa no asume responsabilidad por el incumplimiento de este requisito.

Agradecemos los servicios prestados a **CONSORCIO CONSOLIDACION GIRON** deseándole éxitos en sus labores futuras.

Cordialmente,



JOHANNA MARCELA PADIERNA CASTIBLANCO
REPRESENTANTE LEGAL

Recibí:

PROYECTÓ: CMRP REVISÓ: ELGR	CR 39 51 31 AP 2405

CONSORCIO CONSOLIDACIÓN GIRÓN	**FORMATO ORDEN EXAMEN DE RETIRO OCUPACIONAL**	**Código**	SST-F-37
		Fecha	22/08/2022
		Versión	2

Bucaramanga, 2026-03-12

Yohan Alexander Caceres Pabon

Cédula de Ciudadanía No. **1.102.383.713**

Ayudante de Obra

CONSORCIO CONSOLIDACION GIRON

Dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1072 de 2015, y en la Resolución 1443 de 2007, me permito notificarle que a partir de la fecha de terminación del vinculo laboral con **CONSORCIO CONSOLIDACION GIRON** dispone de 5 (cinco) días para presentarse a la práctica del correspondiente EVALUACIÓN MÉDICA OCUPACIONAL DE RETIRO, en:

IPS: Unisalud Salud Ocupacional ltda.

Dirección: CALLE 51A # 31 - 66 Bucaramanga - Santander

**Debe confirmar con el area de gestión humana previamente para asigar hora de la consulta.*

Finalizado tal tiempo sin que usted asista a la citación, se entenderá que renuncia a la práctica de tal, y la empresa no se hará responsable de las condiciones de salud que el trabajador reporte después del retiro.

La presente orden se expide digitalmente a los **2026-03-12.**

Melissa Donado Arias

Clara Melissa Donado

Coordinador SST

Contacto:

ANEXO N° 3
ACTA MENSUAL COPASST

CONSORCIO CONSOLIDACIÓN GIRÓN	ACTA DE REUNIÓN COMITÉS	Código	SST-F-28
		Fecha	12/07/2021
		Versión	3
		Página 1 de 2	

FECHA			LUGAR	HORA INICIO	HORA FIN	ACTA N°	TIPO REUNIÓN
DD	MM	AA	Campamento	07:45 am	8:58 pm	04	Mensual x
26	03	2026					Trimestral
							Extraordinaria

Señalar con X el Comité a realizar:

COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	x	COMITÉ CONVIVENCIA LABORAL		Otro:	

En las instalaciones de la empresa, se reunieron los integrantes del Comité para tratar los siguientes temas:

ORDEN DEL DIA
1. Verificación del quórum 2. Revisión de Acta anterior 3. Incidentes y accidentes de trabajo / Eventos que involucran el comité 4. Otros 5. Compromisos

Asistentes Comité	Firmas
Miguel Rangel	Miguel Rangel
Oscar Sanchez Perez	Oscar A. Sanchez

TEMAS TRATADOS
1. Verificación del quórum Se procede a tomar asistencia para verificar Quorum y dar inicio a la reunión 2. Revisión de acta anterior Se realiza revisión de los compromisos establecidos en el acta anterior 3. Seguimiento al plan de formación Siguiendo el cronograma de capacitación, se capacitó a los miembros del COPPAST y a todo el personal en: • Prevención del riesgo mecánico • Prevención del riesgo locativo 4. Inspecciones de lugares de trabajo Se observa la participación del comité en la realización de las inspecciones de seguridad del mes de marzo de 2026: inspección locativa de obra, inspección preoperacional de herramienta menor,

inspección de elementos de protección personal, inspección de botiquín, camilla y extintores, de las cuales no se reportan hallazgos que requieran atención.

5. Incidentes y accidentes de trabajo, enfermedades laborales/Análisis de causas

Durante el mes de marzo de 2026 no se presentaron accidentes de trabajo

Fecha	Nombre	Agente	Mecanismo	Parte del cuerpo afectada	Incapacidad
—	—	—	—	—	—

No se notificaron presuntos casos de enfermedad laboral.

6. Ausentismo

En el mes de marzo de 2026 no se presentaron eventos de ausentismo de origen común o laboral.

7. Visitas o auditorías gubernamentales, ARL, clientes, proveedores

Durante el periodo no se registraron visitas de entes de control o partes interesadas, ni se recibieron informes de seguimiento relacionados con SST que requieran el planteamiento de medidas de control.

8. Sugerencias, recomendaciones, quejas o reclamos de los trabajadores

No se presentaron

9. Otros programas y actividades

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA
Dar cumplimiento y acompañamiento a las actividades programadas en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.	COPASST	Abril de 2026

Fecha próxima reunión: abril de 2026

Oscar Andrés Sanchez
Firma presidente

Miguel Rangel.
Firma secretario

ANEXO N° 4
ACTA MENSUAL COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL

CONSORCIO CONSOLIDACIÓN GIRÓN	ACTA DE REUNIÓN COMITÉS	Código	SST-F-28
		Fecha	12/07/2021
		Versión	3
		Página 1 de 2	

FECHA			LUGAR	HORA INICIO	HORA FIN	ACTA NO.	TIPO REUNIÓN	
DD	MM	AA	Oficina Principal San Jorge	9:15 am	10:05 am	03	Mensual	x
27	03	2026					Trimestral	
							Extraordinaria	

Señalar con X el Comité a realizar:

COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		COMITÉ CONVIVENCIA LABORAL	X	Otro: _____	

En las instalaciones de la empresa, se reunieron los integrantes del Comité para tratar los siguientes temas:

ORDEN DEL DIA
1. Verificación del quórum 2. Revisión de Acta anterior 3. Quejas de Acoso laboral/ Eventos que involucran el comité 4. Casos no Resueltos 5. Otros Compromisos

Asistentes Comité	Firmas
Oscar Andrés Sanchez J.	Oscar Sanchez
Isaias Garcia	Isaias Garcia

TEMAS TRATADOS

1. Verificación del quórum

Se procede a tomar asistencia para verificar Quorum y se inicia la reunión al contar con el personal suficiente para la toma de decisiones.

2. Revisión de acta anterior

Se realiza la revisión del acta anterior para dar continuidad a los compromisos y actividades definidas anteriormente.

3. Quejas de Acoso Laboral:

Durante el periodo comprendido entre el 01 al 31 de marzo de 2026 no se evidenciaron reportes de acoso laboral ni quejas de convivencia.

Estadísticas de las quejas del periodo:

- Número de quejas presentadas en el periodo: 0

- Número de quejas abiertas de periodos anteriores: 0
- Número de quejas abiertas al final del periodo: 0
- Número de quejas cerradas en el periodo:0

4. Casos No resueltos:

En el periodo no se presentaron casos no resueltos que deban remitirse a entidades externas.

5. Otros

No se presentaron.

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA
Dar cumplimiento y acompañamiento a las actividades programadas	COCOLA	Abril de 2026

Fecha próxima reunión: abril de 2026

Isaias Garcia
Isaias García
Presidente

Oscar Andres Sanchez.
Oscar Andrés Sánchez
Secretario

ANEXO N° 5
REGISTROS DE ENTREGA DE EPPS

CONSORCIO CONSOLIDACIÓN GIRÓN	FORMATO ENTREGA Y REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Código	SST-F-17
		Fecha	25/07/2025
		Versión	2
		Página	1 de 1

I. INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR

NOMBRE	ISAIAS GARCIA.	ID		CARGO	OPERADOR. PERFORACIÓN
PROYECTO	CONSORCIO CONSOLIDACION – GIRÓN				

II. INSTRUCCIONES/COMPROMISOS

1. Mantenga sus Elementos de Protección Personal cerca a usted, siempre a su alcance.
2. Los elementos de protección personal son para uso exclusivo de su labor con MAQUINOBRAS DE COLOMBIA SAS
3. El deterioro por mal uso o mal almacenamiento es su responsabilidad.
4. NO utilizar los EPP's en las labores desempeñada representa un incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, lo cual acarreará un proceso disciplinario.
5. En caso de presentar perdida o daño, favor reportarlo al responsable de seguridad y salud en el trabajo o supervisor del área.

Acepto que he recibido y comprendido las instrucciones de uso y mantenimiento dadas al momento de entrega.

III. REGISTROS DE ENTREGA Y REPOSICIÓN

ELEMENTO A ENTREGAR	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA			FIRMA DEL TRABAJADOR	FIRMA DE QUIEN ENTREGA
		DÍA	MES	AÑO		
GAFAS SEGURIDAD	1	13	02	26		
TAPA-BOCAS	1	13	02	26		
TAPA-BOCAS	1	14	02	26		
GUANTES-YAQUECA	1	23	02	26		
TAPA-BOCAS	2	04	03	26		

Powered by CamScanner

CONSORCIO CONSOLIDACIÓN GIRÓN	FORMATO ENTREGA Y REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Código	SST-F-17
		Fecha	25/07/2025
		Versión	2
		Página	1 de 1

I. INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR

NOMBRE	SEBASTIAN PARRA	ID	1005157855	CARGO	AYUDANTE OBRA.
PROYECTO	CONSORCIO - CONSOLIDACION GIRON.				

II. INSTRUCCIONES/COMPROMISOS

1. Mantenga sus Elementos de Protección Personal cerca a usted, siempre a su alcance.
2. Los elementos de protección personal son para uso exclusivo de su labor con MAQUINOBRAS DE COLOMBIA SAS
3. El deterioro por mal uso o mal almacenamiento es su responsabilidad.
4. NO utilizar los EPP´s en las labores desempeñada representa un incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, lo cual acarreará un proceso disciplinario.
5. En caso de presentar perdida o daño, favor reportarlo al responsable de seguridad y salud en el trabajo o supervisor del área.

Acepto que he recibido y comprendido las instrucciones de uso y mantenimiento dadas al momento de entrega.

III. REGISTROS DE ENTREGA Y REPOSICIÓN

ELEMENTO A ENTREGAR	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA			FIRMA DEL TRABAJADOR	FIRMA DE QUIEN ENTREGA
		DÍA	MES	AÑO		
GUANTES CARNAZA	1	1	12	25	Sebastian Parra	EDGAR PUERTA
GAFAS SEGURIDAD	1	1	12	25	Sebastian Parra	EDGAR PUERTA.
CASCO SEGURIDAD	1	1	12	25	Sebastian Parra	EDGAR PUERTA.
TAPABOCAS	1	14	01	26	Sebastian Parra	EDGAR PUERTA.
GUANTES NITRILO	1	14	01	26	Sebastian Parra	EDGAR PUERTA.
GUANTES NITRILO	1	17	01	26	Sebastian Parra	EDGAR PUERTA
TAPA - BOCAS	1	14	02	26	Sebastian Parra	EDGAR PUERTA.
TAPA-BOCAS.	1	17	02	26	Sebastian Parra	EDGAR PUERTA
GUANTES VAQUETA	1	17	02	26	Sebastian Parra.	EDGAR PUERTA

Powered by CamScanner

CONSORCIO CONSOLIDACIÓN GIRÓN	FORMATO ENTREGA Y REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Código	SST-F-17
		Fecha	25/07/2025
		Versión	2
		Página	1 de 1

I. INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR

NOMBRE	JOHAN. CACERES	ID	1102383713	CARGO	AJUDANTE OBRA.
PROYECTO	CONSORCIO - CONSOLIDACION - GIRON.				

II. INSTRUCCIONES/COMPROMISOS

1. Mantenga sus Elementos de Protección Personal cerca a usted, siempre a su alcance.
2. Los elementos de protección personal son para uso exclusivo de su labor con MAQUINOBRAS DE COLOMBIA SAS
3. El deterioro por mal uso o mal almacenamiento es su responsabilidad.
4. NO utilizar los EPP's en las labores desempeñada representa un incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, lo cual acarreará un proceso disciplinario.
5. En caso de presentar perdida o daño, favor reportarlo al responsable de seguridad y salud en el trabajo o supervisor del área.

Acepto que he recibido y comprendido las instrucciones de uso y mantenimiento dadas al momento de entrega.

III. REGISTROS DE ENTREGA Y REPOSICIÓN

ELEMENTO A ENTREGAR	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA			FIRMA DEL TRABAJADOR	FIRMA DE QUIEN ENTREGA
		DÍA	MES	AÑO		
GUANTES CARNAZA.	1	1	12	25	J. Caceres	El Jefe
GAFAS SEGURIDAD	1	1	12	25	J. Caceres	El Jefe
CASCO SEGURIDAD	1	1	12	25	J. Caceres	El Jefe
TAPABOCAS	1	15	01	26	J. Caceres	El Jefe
GAFAS SEGURIDAD	1	16	01	26	J. Caceres	El Jefe
TAPA-BOCAS	1	19	01	26	J. Caceres	El Jefe
GUANTES VAQUETA	1	23	01	26	J. Caceres	El Jefe
GAFAS DE SEGURIDAD	1	28	01	26	J. Caceres	El Jefe
GUANTES VAQUETA	1	23	02	26	J. Caceres	El Jefe
GAFAS SEGURIDAD	1	26	02	26	J. Caceres	El Jefe
GUANTES VAQUETA	1	03	03	26	J. Caceres	El Jefe

Powered by CamScanner

CONSORCIO CONSOLIDACIÓN GIRÓN	FORMATO ENTREGA Y REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Código	SST-F-17
		Fecha	25/07/2025
		Versión	2
		Página	1 de 1

I. INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR

NOMBRE	Jarinson Steven	ID	1232891906	CARGO	ayudante Perforación
PROYECTO					

II. INSTRUCCIONES/COMPROMISOS

1. Mantenga sus Elementos de Protección Personal cerca a usted, siempre a su alcance.
2. Los elementos de protección personal son para uso exclusivo de su labor con MAQUINOBRAS DE COLOMBIA SAS
3. El deterioro por mal uso o mal almacenamiento es su responsabilidad.
4. NO utilizar los EPP´s en las labores desempeñada representa un incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, lo cual acarreará un proceso disciplinario.
5. En caso de presentar perdida o daño, favor reportarlo al responsable de seguridad y salud en el trabajo o supervisor del área.

Acepto que he recibido y comprendido las instrucciones de uso y mantenimiento dadas al momento de entrega.

III. REGISTROS DE ENTREGA Y REPOSICIÓN

ELEMENTO A ENTREGAR	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA			FIRMA DEL TRABAJADOR	FIRMA DE QUIEN ENTREGA
		DÍA	MES	AÑO		
Guante de cerraja	1	21	10	25	estiven caicedo	Sergio Ponce
Gafas de Soldar	1	22	10	25	estiven caicedo	Sergio Ponce
Guantes de Vinilico	1	23	10	25	estiven caicedo	Sergio Ponce
TAPABOCAS.	2	28	11	25	estiven caicedo	El Jefe Punto.
TAPABOCAS	3	09	12	25	estiven caicedo	El Jefe Punto.
TAPABOCAS	1	17	12	25	estiven caicedo	El Jefe Punto.
TAPABOCAS	1	08	01	26	estiven caicedo	El Jefe Punto.
GAFAS SEGURIDAD.	1	14	01	26	estiven caicedo	El Jefe Punto.
TAPA-BOCAS.	1	19	01	26	estiven caicedo	El Jefe Punto.
GAFAS-SEGURIDAD	1	14	02	26	estiven caicedo	El Jefe Punto.
GUANTES-SEGURIDAD	1	26	02	26	estiven caicedo	El Jefe Punto.
GAFAS-SEGURIDAD	1	27	02	26	estiven caicedo	El Jefe Punto.
TAPA BOCAS	2	03	03	26	estiven caicedo	El Jefe Punto.

Powered by CamScanner

CONSORCIO CONSOLIDACIÓN GIRÓN	FORMATO ENTREGA Y REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Código	SST-F-17
		Fecha	25/07/2025
		Versión	2
		Página	1 de 1

I. INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR

NOMBRE	Miguel Rangel	ID	1124048478	CARGO	Azudante Perf.
PROYECTO	Consorcio Consolidacion Giron				

II. INSTRUCCIONES/COMPROMISOS

1. Mantenga sus Elementos de Protección Personal cerca a usted, siempre a su alcance.
2. Los elementos de protección personal son para uso exclusivo de su labor con MAQUINOBRAS DE COLOMBIA SAS
3. El deterioro por mal uso o mal almacenamiento es su responsabilidad.
4. NO utilizar los EPP's en las labores desempeñada representa un incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, lo cual acarreará un proceso disciplinario.
5. En caso de presentar perdida o daño, favor reportarlo al responsable de seguridad y salud en el trabajo o supervisor del área.

Acepto que he recibido y comprendido las instrucciones de uso y mantenimiento dadas al momento de entrega.

III. REGISTROS DE ENTREGA Y REPOSICIÓN

ELEMENTO A ENTREGAR	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA			FIRMA DEL TRABAJADOR	FIRMA DE QUIEN ENTREGA
		DÍA	MES	AÑO		
Gafas de Seguridad	1	21	10	25	Miguel Rangel	
Guantes de vaquera	1	20	11	25	Miguel Rangel	
TAPAOIDOS INSERCION	1	11	12	25	Miguel Rangel	
GUANTES DE VAQUETA	1	09	01	26	Miguel Rangel	
GAFAS - SEGURIDAD	1	13	03	26	Miguel Rangel	

Powered by CamScanner

CONSORCIO CONSOLIDACIÓN GIRÓN	FORMATO ENTREGA Y REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Código	SST-F-17
		Fecha	25/07/2025
		Versión	2
		Página	1 de 1

I. INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR

NOMBRE	Alexander Pedda	ID	1353731	CARGO	Oficial
PROYECTO	Consorcio Consolidacion Giron				

II. INSTRUCCIONES/COMPROMISOS

1. Mantenga sus Elementos de Protección Personal cerca a usted, siempre a su alcance.
2. Los elementos de protección personal son para uso exclusivo de su labor con MAQUINOBRAS DE COLOMBIA SAS
3. El deterioro por mal uso o mal almacenamiento es su responsabilidad.
4. NO utilizar los EPP's en las labores desempeñada representa un incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, lo cual acarreará un proceso disciplinario.
5. En caso de presentar perdida o daño, favor reportarlo al responsable de seguridad y salud en el trabajo o supervisor del área.

Acepto que he recibido y comprendido las instrucciones de uso y mantenimiento dadas al momento de entrega.

III. REGISTROS DE ENTREGA Y REPOSICIÓN

ELEMENTO A ENTREGAR	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA			FIRMA DEL TRABAJADOR	FIRMA DE QUIEN ENTREGA
		DÍA	MES	AÑO		
Gafas de Seguridad	1	16	10	25		Sergio Ramirez
Guantes de Seguridad	1	29	10	25		Sergio Ramirez
GAFAS SEGURIDAD.	1	29	11	25		
TAPABOCAS	1	29	11	25		
Guantes nitrilo.	1	29	01	26		
Guantes nitrilo	1	03	03	26		

Powered by CamScanner

ANEXO N° 6
CAPACITACIONES SST

CONSORCIO CONSOLIDACIÓN GIRÓN	FORMATO ASISTENCIA DE ENTRENAMIENTO, CHARLAS Y CAPACITACIONES	Código	RH-F-28
		Fecha	31/10/2022
		Versión	2
		Página	1 de 1

ENTRENAMIENTO [ ] CAPACITACION [X] CHARLA [ ]

OBRA Consorcio Consolidación Girón

TEMA DE CAPACITACIÓN Prevención del Riesgo Mecánico

LUGAR: Campamento FECHA 11/03/2026

CAPACITADOR Melissa Donado DURACIÓN 40 minutos

No.	PARTICIPANTE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Jose Hirrio Valencia	5779254	Oficial	Jose Ulloa
2	Wilington Abren R3.	91479597	Perforacion	WAR
3	Jarvinson Steven Caicedo	1232891906	Ay Perforacion	estiven caicedo
4	Alberto Marcos	1001520618	AYS C	
5	Manuel Castillo	1082811247	ayudante	Manuel
6	Edson Tortilla.	1098.605491	ALMACENISTA	
7	Miguel Rangel	1124048478	Ay. Perforacion	Miguel Rangel
8	Sebastian Parra	1005157855	Ayudante	Sebastian Parra
9	Alexander Prada	1353731	Oficial	
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

OBSERVACIONES:

CAPACITADOR

Melissa Donado Arias

FIRMA

CONSORCIO CONSOLIDACIÓN GIRÓN	FORMATO ASISTENCIA DE ENTRENAMIENTO, CHARLAS Y CAPACITACIONES	Código	RH-F-28
		Fecha	31/10/2022
		Versión	2
		Página	1 de 1

ENTRENAMIENTO [ ] CAPACITACION [X] CHARLA [ ]

OBRA Consorcio Consolidacion Giron

TEMA DE CAPACITACIÓN Prevencion del Riesgo Locativo

LUGAR: Campamento FECHA 25/03/2026

CAPACITADOR Jennifer Gaona. DURACIÓN 30 minutos

No.	PARTICIPANTE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Williams Alonso Rs	91.499574	Ay perforacion	
2	Alexander Prada	1353731	Oficial	
3	Sebastian Parra	1005157655	ayudante	Sebastian Parra
4	Miguel Rangel	1124048478	Ay. Perforación	Miguel Rangel
5	Edson Portilla.	1098605491	ALMACENISTA.	Edson Portilla.
6	Manuel castillo	1082871247	ayudante	
7	Alberto Manzorga	1101520618	AYU	
8	Jairinson steven caicedo	1232891906	AY Perforacion	estiven caicedo
9	Jose Ulicio Velasco	5778254	OFICIAL	Jose Velasco
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

OBSERVACIONES:

CAPACITADOR

Jennifer Gaona.

FIRMA

ANEXO N° 7
INSPECCIONES SST

CONSORCIO CONSOLIDACIÓN GIRÓN	INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Código	SST-F-26
		Fecha	4/06/2021
		Versión	2
		Pagina 1 de 1	

NOMBRE DE QUIEN INSPECCIONA: Melissa Donado Arias Firma: Melissa Donado CARGO: profesional SST

FRENTE DE OBRA Y/O PROYECTO: Consorcio Consolidación Girón

Vo Bo COPASST (Nombre y firma): Oscar Sanchez CARGO: Ing. Residente

Tenga en cuenta que:

U: Uso y se califica con SI ó NO.

E: Estado y se califica como Excelente, Bueno, Regular ó Malo. (unicamente las letras iniciales)

Nota: La calificación se sujeta al momento de la obsevación

DATOS BÁSICOS		FECHA	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL																				OBSERVACIONES
			Casco		Protector Auditivo		Porteccion ocular		Protector Respiratorio		Dotación		Guantes		Botas		Barbuquejo		Otro		Otro		
NOMBRE	CARGO		U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	
Isaias Garcia	operador perf	17/03/26	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B							
willinton Alarcón	Ayudante perf	17/03/26	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B							
Manuel Castillo	ayudante obra	17/03/26	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B							
Alexander prada	Oficial	17/03/26	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B							
Jarrinson Camarón	Ayudante per	17/03/26	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B							
Miguel Rangel	Ayudante perf	17/03/26	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B							
Alberto Mayorga	Ayudante obra	17/03/26	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B							
Giovany Parra	Ayudante obra	17/03/26	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B							
Alexander Portilla	Almacenista	17/03/26	SI	B	/	/	SI	B	/	/	SI	B	SI	B	SI	B							
Fabián Zambrano	Topografo	17/03/26	SI	B	/	/	SI	B	/	/	SI	B	SI	B	SI	B							

CONSORCIO CONSOLIDACIÓN GIRÓN	INSPECCIÓN DE BOTIQUINES Y CAMILLAS	Código	SST-F-14
		Fecha	19/05/2025
		Versión	4
		Página 1 de 1	

Inspección realizada por		
Nombre: Melissa Donado A.	Fecha inspección: 10/08/2026	Próxima inspección: 04/2026
Cargo: Profesional SST	Lugar : Girón	Firma: Melissa Donado
Ubicación del botiquín: Campamento	Ubicación de la camilla: Campamento	
V.B. Copasst: Oscar Sanchez	V.B. Brigadas de emergencia: Alexander Portilla	

Marque con una X según criterio — B = Bueno | R = Regular | M = Malo | NA = No aplica

Elementos	Parámetros a revisar: Medida	Cantidad Stock	Cantidad Existente	Fecha vencimiento	Integridad empaque B	R	M	NA	Plan de acción: Acción Correctiva Propuesta	Fecha Propuesta	Fecha Ejecución	Responsable
Alcohol Antiséptico	Frasco	1	1	10/2026	✓							
Termómetro Digital	Unidad	1	1	NA	✓							
Algodón	Paquete	1	1	12/2029	✓							
Gasa Esteril	Paquete	8	11	31/07/2028	✓							
Gasa Limpia	Unidad	20	—	—	—							
Aplicadores y/o copitos	Unidad	10	10	NA	✓							
Esparadrapo de tela	Unidad	1	1	01/01/27	✓							
Esparadrapo micropore	Unidad	1	1	08/07/27	✓							
Apósito ocular	Unidad	3	4	02/2027	✓							
Baja lenguas	Unidad	10	10	08/2026	✓							
Yodopovidona Espuma	Frasco	1	1	17/01/27	✓							
Clorhexidina (Jabón Quirurgico)	Frasco	1	1	17/01/27	✓							
Linterna con pilas	Unidad	1	1	NA	✓							
Inmolizador Miembros superiores	Unidad	1	1	NA	✓							
Inmolizador Cervical	Unidad	1	1	NA	✓							
Inmovilizador miebros inferiores	Unidad	1	1	NA	✓							
Solución salina 250 ml ó 500 ml	Bolsa	2	2	05/2027	✓							
Silbato de emergencias	Unidad	1	1	NA	✓							
Tijeras	Unidad	1	1	NA	✓							
Curitas	Unidad	10	6	23/10/27	✓							
Sales de Rehidratación Oral	Sobre	3	3	08/2026	✓							
Tapabocas desechable	Unidad	10	10	01/2028	✓							
Compresas Esteriles	Unidad	3	5	06/2026	✓							
Guantes de nitrilo / latex	Unidad	20	20	01/2029	✓							
Venda de algodón 3"X5 yardas	Unidad	1	1	02/2027	✓							
Vendas elástica 2"X5 yardas	Unidad	1	1	10/2029	✓							
Vendas elástica 3"X5 yardas	Unidad	1	1	02/2027	✓							
Vendas elástica 5"X5 yardas	Unidad	1	1	02/2027	✓							
Mascarilla o Protector facial RCP	Unidad	1	—	—	—							
Manual primeros auxilios	Unidad	1	1	NA	✓							

INSPECCIÓN DE CAMILLA

La camilla debe ser plástica en polietileno de alta densidad, impermeable a todos los fluidos, de fácil manejo, con arnés tipo araña con reflectivos

Descripción	Estado B	R	M	NA	Observaciones
Instalación (Sitio de ubicación con facil acceso)	✓				
Se encuentra señalizado	✓				
Estado del soporte	✓				
Estado de las correas de seguridad	✓				
Estado general (sin fisuras o fracturas, limpio y libre de polvo)	✓				
Juego de inmovilizadores de miembro inferior y superior	✓				

Conclusiones y Sugerencias:

CONSORCIO CONSOLIDACIÓN GIRÓN	INSPECCIÓN LOCATIVA DE OBRA	Código	SST-F-18
		Fecha	15/08/2023
		Versión	3
		Página 2 de 2	

Frente de Obra	Consorcio Consolidación Girón	Fecha:	24/03/2026
Área Inspeccionada :	Campamento – Baños	V.B. Copasst:	Oscar Sanchez.

El área y todas sus zonas se encuentran libres de objetos fuera de uso o que no pertenecen a este lugar.	✓							
En la áreas se cuenta con puntos ecologicos para la clasificación y disposición de los residuos	✓							
Se mantienen avisos alusivos al orden y aseo en lugares apropiados y se dictan charlas de sensibilización periódicas al personal sobre el orden y aseo.	✓							
Se aplica un programa de reciclaje y proteccion al medio ambiente	✓							
El sitio para el almacenamiento de residuos es el adecuado y esta ordenado	✓							
Los recipientes donde se disponen los residuos son adecuados en tamaño y número	✓							
Las baterias sanitarias se encuentran en condiciones adecuadas de orden y aseo	✓							
SISTEMA DE EMERGENCIA								
En el área hay disponibilidad de recursos para la atención de emergencias (botiquín, camilla, extintor)	✓							
Se organizaron y asignaron las responsabilidades de las brigadas de emergencias	✓							
Se encuentran definidas y señalizadas las rutas de evacuación y punto de encuentro	✓							
Se encuentran definidas y señalizadas las salidas de emergencia	✓							
Se encuentra establecido y en funcionamiento un sistema de comunicación oportuno en caso de emergencia	✓							
Se cuenta con MEDEVAC	✓							
Los extintores se encuentran recargados, señalizados y funcionales	✓							
PRIMEROS AUXILIOS								
El botiquín de primeros auxilios se encuentra dotado y es de fácil acceso	✓							
Se cuenta con camilla en el área	✓							
Se realiza control de los insumos que se utilizan para la atención de emergencias con el fin de realizar la reposición oportuna de los mismos	✓							

OBSERVACIONES	

Responsable de la Inspección:	Melissa Donado	Cargo:	Profesional SST.

CONSORCIO CONSOLIDACIÓN GIRÓN	INSPECCIÓN LOCATIVA DE OBRA	Código	SST-F-18
		Fecha	15/08/2023
		Versión	3
		Página 1 de 2	

Frente de Obra	Consorcio Estabilización Girón	Fecha:	24/03/2026
Área Inspeccionada :	Frente de obra / campamento / Baños	V.B. Copasst:	Oscar Sanchez.

Marque según criterio:	B= Bueno R= Regular M= Malo NA= No aplica		
BUENO	REGULAR	MALO	NO APLICA
Cuando el ítem a revisar NO presenta algún daño, avería, riesgo (salud ocupacional, ambiental) y esta todo en perfecto orden.	Cuando alguno de los ítems inspeccionados presenta daño, avería, riesgo (salud ocupacional, ambiental) o no esta en orden y aseo.	Cuando la mayoría de los ítems inspeccionados presenta un daño, avería, riesgos y esta todo en desorden y deseado.	No es utilizado en alguna de las sedes.

PARAMETROS A INSPECCIONAR	B	R	M	NA	CORRECCIÓN	FECHA	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
ALMACENAMIENTO								
Las areas de almacenamiento estan señalizadas y demarcadas adecuadamente								
Se tienen TODAS las hojas de seguridad de las sustancias químicas presentes en el área.								
El almacenamiento de sustancias químicas esta acorde a las recomendaciones dadas en las hojas de seguridad o fichas tecnicas.								
El arrume de productos es el recomendado								
INSTALACIONES								
Los pisos tienen superficies seguras y adecuadas para el trabajo								
Los pisos estan limpios, secos, sin desperdicios								
Los pisos estan libres de obstaculos								
Las areas de trabajo estan debidamente señalizadas y demarcadas								
Los senderos son seguros y libres de obstaculos								
Las vias de circulacion estan debidamente demarcadas								
Los recipientes se encuentran debidamente rotulados o marcados con el contenido								
En las instalaciones se cuenta con baterias sanitarias								
Las áreas se encuentran libres o aseguradas de elementos que cuenten con								
MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS								
La maquinaria y/o equipo estan debidamente protegidos								
Las herramientas, maquinaria y equipos estan operativos para su uso								
Los equipos y/o maquinaria se encuentran libres de fugas								
El cable de alimentación de la herramienta y/o equipo está en buen estado? (libre de cortes)								
ORDEN Y ASEO								

CONSORCIO CONSOLIDACIÓN GIRÓN	INSPECCIÓN DE EXTINTORES	Código	SST-F-15
		Fecha	15/08/2023
		Versión	3
		Pagina	1 de 1

FECHA: 19 de Marzo de 2026 PROYECTO: Consorcio Consolidación Girón

INSPECCIÓN REALIZADA POR: Melissa Donado Arias

V.B. BRIGADAS DE EMERGENCIA: Alexander Portilla

V.B. COPASST: Oscar Sanchez

No. Interno	Descripción Agente extintor	Ubicación	Capacidad	Último mantenimiento	Fecha de próximo mantenimiento	Pintura	Señalización	Acceso	Visibilidad	Manómetro	Presión	Pasador	Manguera	Boquilla	Envase	Tarjeta	Manija	Observaciones
1	Pqs	Campamento	10 lbs	06/2025	06/2026	B	B	B	B	B	B	B	/	B	B	B	B	

OBSERVACIONES:

Nota: Para el diligenciamiento del estado de los extintores coloque B (Bueno), R (Regular) o M (Malo), según lo considere en la inspección.

CONSORCIO	FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTA MENOR	Código	SST-F-16
		Fecha	15/08/2023
		Versión	3
		Página	1 de 1

EMPRESA: CONSORCIO CONSOLIDACION GIRON — INSPECCIONADO POR: EDSON ALEXANDER PORTILLA.

FRENTE: VILLAS CABALLEROS. — FECHA: 02-MARZO AL. 07-MARZO-2026

¿Se realiza limpieza de herramientas? SI [ ] NO [ ] Periocidad de la limpieza:

HERRAMIENTA	REVISION	CANTIDAD	LUNES		MARTES		MIERCOL		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Alicates	Mango, aislamiento		✓		✓		✓		✓		✓					
Barras	Estado general		✓		✓		✓		✓		✓					
Caretas para esmerilar	Acetato, tafilete															
Cinceles	Estado general															
Cinta métrica	Estado general		✓		✓		✓		✓		✓					
Destornilladores	Mango, punta		✓		✓		✓		✓		✓					
Extensiones	Mango		✓		✓		✓		✓		✓					
Limas	Mango,estado general		✓		✓		✓		✓		✓					
Llaves Expansivas	Estado general															
Machetes con funda	Mango		✓		✓		✓		✓		✓					
Martillos de uña	Mango		✓		✓											
Palas	Cabo, hoja			X		X	✓	X	✓	X	✓	X				
Paladragas	Cabo, cavadora		✓		✓		✓		✓		✓					
Parasoles	Estado general															
Picas	Cabo			X		X	✓	X		X	✓	X				
Porras (9", 12", 18")	Mango		✓		✓		✓		✓		✓					
Extensiones electricás	Clavija, contacto		✓		✓		✓		✓		✓					
Tijeras industriales	Estado general		✓		✓		✓		✓		✓					
Serruchos	Mango, hoja, marco		✓		✓		✓		✓		✓					
Carretillas	Platon, mangos, neumáticos		✓		✓		✓		✓		✓					
Taladro (Mandril 3/8")	Cable, broca, mandril, mango		✓		✓		✓		✓		✓					
Cizalla (12", 24", 42")	Empuñadura, mango, pernos			X				X		X		X				
Pulidora Grande	Cable, swithc, mandril, disco															
Juego de Llaves	Estado general															
Llave de Tubo	Mordaza, regulador															
Nivel de Mano	Gota de nivel															
Hachas	Cabo - filo															
Tirfor	Guaya, palanca, carcasa, mordaza															

NOMBRE ALMACENISTA : EDSON ALEXANDER PORTILLA

FIRMA : [signature]

V.B. del Copasst y/o Vigia: _____

OBSERVACIONES:

CONSORCIO CONSOLIDACIÓN GIRÓN	FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTA MENOR	Código	SST-F-16
		Fecha	15/08/2023
		Versión	3
		Página	1 de 1

EMPRESA: CONSORCIO CONSOLIDACION GIRON. | INSPECCIONADO POR: Edson Alexander Portilla.

FRENTE: VILLAS DE LOS CABALLEROS. | FECHA: 09-MARZO - AL 14. MARZO 2026

¿Se realiza limpieza de herramientas? | SI | | NO | | Periocidad de la limpieza:

HERRAMIENTA	REVISION	CANTIDAD	LUNES		MARTES		MIERCOL		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Alicates	Mango, aislamiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Barras	Estado general		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Caretas para esmerilar	Acetato, tafilete															
Cinceles	Estado general		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Cinta métrica	Estado general		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Destornilladores	Mango, punta		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Extensiones	Mango		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Limas	Mango,estado general		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Llaves Expansivas	Estado general															
Machetes con funda	Mango		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Martillos de uña	Mango		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Palas	Cabo, hoja			X		X		X		X		X	✓	X		
Paladragas	Cabo, cavadora		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Parasoles	Estado general															
Picas	Cabo			X		X	✓	X		X		X	✓	X		
Porras (9", 12", 18")	Mango		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Extensiones electricás	Clavija, contacto		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Tijeras industriales	Estado general		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Serruchos	Mango, hoja, marco		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Carretillas	Platon, mangos, neumáticos			X		X	✓	X		X		X	✓	X		
Taladro (Mandril 3/8")	Cable, broca, mandril, mango		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Cizalla (12", 24", 42")	Empuñadura, mango, pernos			X		X	✓	X		X		X	✓	X		
Pulidora Grande	Cable, swithc, mandril, disco		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Juego de Llaves	Estado general															
Llave de Tubo	Mordaza, regulador															
Nivel de Mano	Gota de nivel															
Hachas	Cabo - filo															
Tirfor	Guaya, palanca, carcasa, mordaza															

NOMBRE ALMACENISTA : Edson Alexander Portilla

FIRMA : Edson Portilla.

V.B. del Copasst y/o Vigia: _____

OBSERVACIONES:

CONSORCIO CONSOLIDACIÓN GIRÓN	FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTA MENOR	Código	SST-F-16
		Fecha	15/08/2023
		Versión	3
		Página	1 de 1

EMPRESA: CONSORCIO CONSOLIDACION GIRON. | INSPECCIONADO POR: Edson Portilla.

FRENTE: VILLAS DE LOS CABALLEROS. | FECHA: 16-MARZO- AL 20 MARZO- 2026

¿Se realiza limpieza de herramientas? | SI | | NO | | Periocidad de la limpieza:

HERRAMIENTA	REVISION	CANTIDAD	LUNES		MARTES		MIERCOL		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Alicates	Mango, aislamiento		✓		✓		✓		✓		✓					
Barras	Estado general		✓		✓		✓		✓		✓					
Caretas para esmerilar	Acetato, tafilete															
Cinceles	Estado general		✓		✓		✓		✓		✓					
Cinta métrica	Estado general		✓		✓		✓		✓		✓					
Destornilladores	Mango, punta		✓		✓		✓		✓		✓					
Extensiones	Mango		✓		✓		✓		✓		✓					
Limas	Mango,estado general		✓		✓		✓		✓		✓					
Llaves Expansivas	Estado general															
Machetes con funda	Mango		✓		✓		✓		✓		✓					
Martillos de uña	Mango		✓		✓		✓		✓		✓					
Palas	Cabo, hoja			X		X		X		X		X				
Paladragas	Cabo, cavadora		✓		✓		✓		✓		✓					
Parasoles	Estado general															
Picas	Cabo			X		X		X		X		X				
Porras (9", 12", 18")	Mango		✓		✓		✓		✓		✓					
Extensiones electricás	Clavija, contacto		✓		✓		✓		✓		✓					
Tijeras industriales	Estado general		✓		✓		✓		✓		✓					
Serruchos	Mango, hoja, marco		✓			X		X		X		X				
Carretillas	Platon, mangos, neumáticos			X		X	✓	X	✓	X	✓	X				
Taladro (Mandril 3/8")	Cable, broca, mandril, mango		✓		✓		✓		✓		✓					
Cizalla (12", 24", 42")	Empuñadura, mango, pernos			X	✓	X	✓	X	✓	X	✓	X				
Pulidora Grande	Cable, swithc, mandril, disco		✓		✓		✓		✓		✓					
Juego de Llaves	Estado general															
Llave de Tubo	Mordaza, regulador															
Nivel de Mano	Gota de nivel															
Hachas	Cabo - filo															
Tirfor	Guaya, palanca, carcasa, mordaza															

NOMBRE ALMACENISTA : Edson Alexander Portilla.

FIRMA : Edson Portilla.

V.B. del Copasst y/o Vigia:

CONSORCIO CONSOLIDACIÓN BIRÓN	FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTA MENOR	Código	SST-F-16
		Fecha	15/08/2023
		Versión	3
		Página	1 de 1

EMPRESA: CONSORCIO CONSOLIDACION GIRON. | INSPECCIONADO POR: Edson Portilla

FRENTE: VILLAS DELOS CABALLEROS | FECHA: 24 MARZO AL 28 MARZO - 2026

¿Se realiza limpieza de herramientas? | SI | | NO | | Periocidad de la limpieza:

HERRAMIENTA	REVISION	CANTIDAD	LUNES		MARTES		MIERCOL		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Alicates	Mango, aislamiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Barras	Estado general		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Caretas para esmerilar	Acetato, tafilete															
Cinceles	Estado general		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Cinta métrica	Estado general		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Destornilladores	Mango, punta		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Extensiones	Mango		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Limas	Mango,estado general		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Llaves Expansivas	Estado general															
Machetes con funda	Mango		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Martillos de uña	Mango		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Palas	Cabo, hoja		✓	X	✓	X	✓	X	✓	X	✓	X	✓	X		
Paladragas	Cabo, cavadora		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Parasoles	Estado general															
Picas	Cabo			X	✓	X	✓	X	✓	X	✓	X	✓	X		
Porras (9", 12", 18")	Mango		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Extensiones electricás	Clavija, contacto		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Tijeras industriales	Estado general		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Serruchos	Mango, hoja, marco			X		X		X		X		X		X		
Carretillas	Platon, mangos, neumáticos			X	✓	X	✓	X	✓	X	✓	X	✓	X		
Taladro (Mandril 3/8")	Cable, broca, mandril, mango		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Cizalla (12", 24", 42")	Empuñadura, mango, pernos		✓	X	✓	X	✓	X	✓	X	✓	X	✓	X		
Pulidora Grande	Cable, swithc, mandril, disco		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Juego de Llaves	Estado general															
Llave de Tubo	Mordaza, regulador															
Nivel de Mano	Gota de nivel															
Hachas	Cabo - filo															
Tirfor	Guaya, palanca, carcasa, mordaza															

NOMBRE ALMACENISTA: EDSON ALEXANDER PORTILLA

FIRMA: Edson Portilla

V.B. del Copasst y/o Vigia: _____

OBSERVACIONES:

ANEXO N° 8
REGISTRO FOTOGRAFICO

CONSORCIO CONSOLIDACIÓN GIRÓN	**INFORME DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**	CDMB CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA





CAPACITACIONES SST





SEÑALIZACIÓN





ACOMPAÑAMIENTO A ACTIVIDADES

ANEXO N° 9
MEDIDAS PREVENTIVAS

LANZADO CONCRETO.

CONSORCIO

PERMISO PARA TRABAJO EN ALTURAS

CÓDIGO	SST-F-04
FECHA	12/08/2021
VERSIÓN	5
PÁGINA	1 DE 3

1. FECHA DE INICIO Y HORA: 02 (DÍA) MAR (MES) 2026 (AÑO) 7:30 (HORA)
2. TERMINACIÓN DE LA TAREA: 06 (DÍA) MAR. (MES) 2026 (AÑO) 4:30 (HORA)
3. CENTRO DE TRABAJO: VILLAS CABALLEROS.
4. ALTURA APROXIMADA: 12 MTS
5. CONSECUTIVO:

6. PERSONAS AUTORIZADAS Y REQUERIMIENTOS / 7. FIRMA DEL EJECUTOR O TRABAJADOR AUTORIZADO EN TA

Trabajador No.	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACIÓN	CARGO	APTO PARA TRABAJO EN ALTURAS?	CURSO DE ALTURAS VIGENTE?	AFILIACIÓN VIGENTE SEGURIDAD SOCIAL?	FIRMA DEL TRABAJADOR 02/03/26 LUNES	03/03/26 MARTES	04/03/26 MIÉRCOLES	05/03/26 JUEVES	06/03/26 VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
1	Isaias Ga	1067596200	Operador	Si	Si	Si	Isaias	Isaias	Isaias	Isaias	Isaias		
2	Miguel	1124048428	Ayudante Perforacion	\	\	\	Miguel	—	—	—	—		
3	estiven	1232891906	Ay perforacion	Si	Si	Si	estiven	estiven	estiven	estiven	estiven		
4	Caceres	1162383	Ay				Caceres	—	—	—	—		
5	walrangfong	91439511	Ayder.	/	/	/	WRA	WRA	WRA	WRA	WRA		
6	sebastian	1005357885	Ayudante	—	/	/		sebastian	—	—	—		
7	Alberto Mo		Ayud	—	~	~							
8													
9													
10													

6. SELECCIONE EL TIPO DE TRABAJO O TAREA / 7. ¿TRABAJO RUTINARIO?

		SI	NO
\	Desmonte de vegetación de talud		
\	Perfilamiento de talud manual y mecánico		
\	Topografía de marcación de puntos de anclaje		
●	Perforación de taludes	✓	
	Llenado o inyección de los anclajes		
✓	Dismanto o concreto lanzado		
	Tensionamiento de talud		
	Otras:		

8. SELECCIONE LAS HERRAMIENTAS Y EQUIPOS A UTILIZAR TENIENDO EN CUENTA LA TAREA A REALIZAR

8.1. SELECCIÓN DE HERRAMIENTAS

Pica		Porra de 24 libra	✓
Pala		Cizalla	
Azadón		Picos	
Paladiaga		Taladro	
Machete		Pulidora	
Llave de tubo		Sisa	
Serrucho		Segueta	
Llave expansiva	✓	Otras:	
Porra de 6 libras	✓		

8.2. SELECCIÓN DE EQUIPOS


Compresor		Retroexcavadora	✓
Unidad hidráulica		Volqueta	✓
Torre de perforación		Maquina de sitio	✓
Barras de perforación			
Martillo de perforación			
Compresor			
Tifor		Otros:	
Mandos de perforación			
Maquina hidráulica			

9. ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO "ATS"

DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE LA TAREA

Se anexa al presente documento los registros correspondientes en formato SST-F-55 Análisis de Trabajo Seguro

10. AUTOREPORTE DE CONDICIONES DE SALUD. ¿ PRESENTA ALGUNO DE ÉSTOS SINTOMAS?

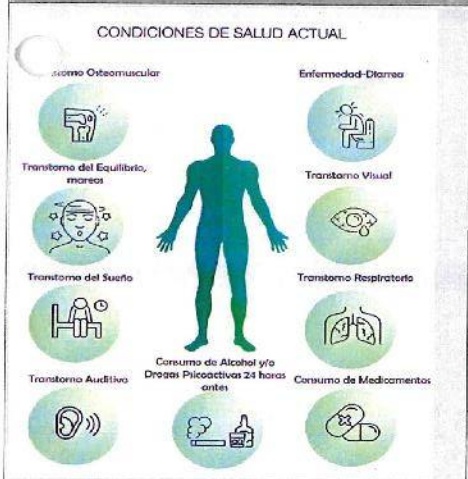

11. SELECCIONE E INSPECCIONE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PROPIOS DE LA TAREA SEGÚN CRITERIO

	✓	N/A
CASCO BARBUQUEJO	✓	
Sin fisuras, limpio, con barbuquejo		
GAFAS OSCURAS	✓	
Sin rayones, sin fisuras y con hilo sujetador		
GAFAS TRANSPARENTES	✓	
Sin rayones, sin fisuras y con hilo sujetador		
TAPA OIDO DE COPA	✓	
Sin desgaste, sin fracturas.		
TAPA OIDO INSERCCIÓN	✓	
Sin desgaste, sin fracturas,		
TAPABOCAS QUIRÚRGICO	✓	
Sin desgaste, libre de grasa, suciedad y polvo		
CAPUCHA	✓	
Sin oficios, libre de grasa, suciedad y polvo		
GUANTES DE CARNAZA	✓	
Sin oficios, libre de grasa, suciedad		
GUANTES DE PRECISIÓN	✓	
Sin oficios, libre de grasa, suciedad y polvo		
ZAPATOS SEGURIDAD	✓	
Sin agujeros, sin filtraciones de agua y amarrados		
BOTAS PANTANERAS		
Sin agujeros, sin filtraciones de agua		
CARETA		
Sin rayones, sin fisuras y con sujetador		
TAPABOCAS N95		
Sin desgaste, libre de grasa, suciedad y polvo		
Otras:		

12. SELECCIONE E INSPECCIONE LOS EQUIPOS SEGÚN PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS PROPIOS DE LA TAREA, SEGÚN CRITERIO

	✓	N/A
RED DE SEGURIDAD		
Instalada por personal calificado, en buen estado para su uso.		
ANCLAJE PORTÁTIL	✓	
Con etiqueta, Sin Oxidación, cortes, quemaduras, costuras sueltas y deformación		
LÍNEA DE VIDA VERTICAL		
Con etiqueta, Abre y cierra correctamente, Sin Oxidación, cortes, desgaste, Torcido, fracturas.		
ESLINGA EN Y CON AMORTIGUADOR	✓	
Con etiqueta, Abre y cierra correctamente, Sin Oxidación, deformación, cortes, quemaduras, costuras sueltas.		
ESLINGA DE POSICIONAMIENTO		
Con etiqueta, Abre y cierra correctamente, Sin Oxidación, deformación, cortes, quemaduras, costuras sueltas.		
ESLINGA DE RESTRICCIÓN		
Abre y cierra correctamente, Sin Oxidación, deformación, cortes, quemaduras, costuras sueltas.		
SISTEMA DE RESCATE		
Abre y cierra correctamente, Sin Oxidación, deformación, cortes, quemaduras, costuras sueltas.		
PUNTO DE ANCLAJE		
Certificado, Sin Oxidación, deformación, desgastado. Identificado.		
LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL		
Abre y cierra correctamente, Sin Oxidación, deformación, cortes, quemaduras, costuras sueltas		
ARNÉS		
Con etiqueta, Sin Oxidación, cortes, quemaduras, costuras sueltas y deformación		
MOSQUETÓN		
Abre y cierra correctamente, Sin Oxidación, deformación,		
DISPOSITIVOS RETRÁCTILES		
Con etiqueta, Sin Oxidación, deformación, Bloquea correctamente.		
CONECTORES PARA TRÁNSITO (LANYARD)		
Sin Oxidación, deformación, Abren y cierran correctamente		
Otros:		

PERMISO PARA TRABAJO EN ALTURAS

CÓDIGO	SST-F-24
FECHA	15/08/2023
VERSIÓN	5
PÁGINA	1 DE 5

13. REPORTE DE CONDICIONES DE SALUD DIARIA. (SI CUENTA CON UN SI ESPECIFICAR EN OBSERVACIONES)

11.1. INSPECCION DIARIA DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, ¿ CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE INSPECCIÓN ?

12.1. INSPECCIÓN DIARIA DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS ¿ CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE INSPECCIÓN ?

Nota: Si presenta dudas a realizar la inspección según criterios, preguntar al COORDINADOR DE TRABAJO DE ALTURAS

Trabajador No.	LUN.	MAR.	MIÉ.	JUE.	VIE.	SÁB.	DOM.	LUN.	MAR.	MIÉ.	JUE.	VIE.	SÁB.	DOM.	LUN.	MAR.	MIÉ.	JUE.	VIE.	SÁB.	DOM.
1	SI	✓	SI	SI	NO	SI	SI	✓	NO	✓	✓	✓	NO	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	NO
2	SI	✓	✓	✓	SI	✓	SI	✓	NO	✓	✓	NO	NO	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	NO
3	SI	✓	SI	✓	✓	✓	SI	✓	NO	✓	✓	NO	NO	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	NO
4	SI	✓	SI	SI	✓	SI	SI	✓	NO	✓	NO	NO	NO	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	NO
5	SI	✓	SI	✓	✓	✓	SI	✓	NO	✓	✓	NO	NO	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	NO
6	SI	✓	SI	SI	✓	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	NO
7	SI	NO	SI	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	NO
8	SI	NO	SI	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	NO
9	SI	NO	SI	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	NO
10	SI	NO	SI	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	NO

Observaciones de su condición de salud actual:

Observaciones de no cumplimento de criterios EPP:

Observaciones de no cumplimento de criterios EPCC:

14. SELECCIONE EL SISTEMA PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS A UTILIZAR SEGÚN ACTIVIDAD O TAREA

✓ = SI

SELECCIONE EL EPCC A UTILIZAR	SISTEMA PASIVO		SISTEMAS ACTIVOS DE PROTECCIÓN											REQUERIMIENTO DE CLARIDAD EN METROS			
			MECANISMO DE ANCLAJE				CONECTORES										
							CONECTORES PARA DETENCIÓN Y PREVENCIÓN DE CAÍDA			OTROS		CONECTORES PARA TRÁNSITO (FRIENOS)	SISTEMA DE RESCATE 4-1				
	RED DE SEGURIDAD	PUNTO DE ANCLAJE CERTIFICADO	ANCLAJES PORTÁTIL	LINEA DE VIDA HORIZONTAL	LINEA DE VIDA VERTICAL	ARNÉS DE CUERPO COMPLETO	MOSQUETÓN	ESLINGA CON ABSORBEDOR DE ENERGÍA	DISPOSITIVOS MECÁNICOS	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO	ESLINGA DE RESTRICCIÓN			ALTURA DEL TRABAJADOR	DISTANCIA DE LA ESLINGA	DISTANCIA ABSORBEDOR	FACTOR DE SEGURIDAD	TOTAL
IMAGEN																	
1				✓	✓	✓	✓										
2				✓	✓	✓	✓										
3				✓	✓	✓	✓										
4				✓	✓	✓	✓										
5				✓	✓	✓	✓										
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	

15. SELECCIONE LAS MEDIDAS COLECTIVAS DE PREVENCION A UTILIZAR VERIFIQUE LOS SIGUIENTES ASPECTOS:

✓

DELIMITACIÓN DEL AREA

Delimita la zona de peligro de caída de los trabajadores y permite visibilidad de día y de noche si aplica

CUMPLE ✓ | NO CUMPLE

CONTROL DE SUPERFICIES

Cuenta con demarcación, señalización, delimitación, Cobierta, o red de seguridad

CUMPLE ✓ | NO CUMPLE

SEÑALIZACIÓN

Cuenta con señalización visible para cualquier persona, en idioma español o extranjero, si aplica

CUMPLE ✓ | NO CUMPLE

SILLA PARA TRABAJO EN SUSPENSIÓN

La silla conectada a la argolla del arnés indicado por el fabricante de descenso certificado, y el trabajador estará equipado con un segundo sistema de seguridad.

CUMPLE | NO CUMPLE

LÍNEA DE ADVERTENCIA

Cuenta con ayuda de seguridad. Instalada en todos los lados desprotegidos, resistencia de 8 Kn, distancia 1,80 m antes del borde, altura de 1 m y cuenta con banderines de color a intervalos de 3,00 m

CUMPLE | NO CUMPLE

MARCOS DE DESNIVELES

Con ángulo de inclinación de 15° a 30°. Resistencia en la superficie por donde se transita de mínimo dos veces la carga máxima prevista que pueda llegar a soportar.

CUMPLE | NO CUMPLE

BARANDA

Cumple con Resistencia estructural de la baranda 200 lb, Alturas 1 m mínimo, Altura de los rodapiés 8 cm, Ubicación de barandillas intermedias horizontales 46 cm entre sí, rodillera si opera el rodapié

CUMPLE | NO CUMPLE

Otra Medidas Preventivas

CUMPLE | NO CUMPLE

16. SELECCIONE LOS SISTEMA DE ACCESO A UTILIZAR Y VERIFIQUE LOS SIGUIENTES ASPECTOS

ANDAMIOS MULTIDIRECCIONAL

Andamios certificados, Ausencia de corrosión o desgaste por sustancias o elementos que deterioren la estructura del mismo.

CUMPLE | NO CUMPLE

ANEXO: Formato inspección andamios

ESCALERA

Escalera certificadas, ausencia de corrosión o desgaste por sustancias o elementos que deterioren la estructura del mismo.

CUMPLE | NO CUMPLE

ANEXO: Formato inspección de escaleras

PRETALES

Uso como la última opción para acceso a postes. Si se hace indispensable la utilización de los pretales, de acuerdo usar sistemas de protección contra caídas

CUMPLE | NO CUMPLE

ANEXO: Formato inspección de pretales

OTROS SISTEMAS DE ACCESO

SISTEMA DE PLATAFORMAS DE PERSONAS

Inspeccionados mínimo una vez al año por una persona avalada por el fabricante, o una persona calificada conforme a las recomendaciones del fabricante.

CUMPLE | NO CUMPLE

ANEXO: Formato inspección de sistema de elevadores de personal

SISTEMAS SUSPENDIDOS POR CABLES

Andamio colgante certificado, que garantice la seguridad de la operación. Los contrapesos usados son instalados según fabricante y/o contar con diseños de ingeniería aprobados por una persona calificada

CUMPLE | NO CUMPLE

ANEXO: Formato de inspección de sistema de suspensión por cable

Nota 1: El trabajo en sistemas de acceso debe incluir el análisis de riesgos para determinar los sistemas de prevención y protección contra caídas aplicables, considerando para su selección la compatibilidad de las conexiones al sistema de acceso y las instrucciones de los fabricantes.

Nota 2: El trabajador que tenga la función de realizar el armado y desarmado de andamios y el trabajador que opere equipos para elevación de personas, deben contar con capacitación específica enfocada en la seguridad durante las operaciones y atendiendo las instrucciones de los fabricantes y/o las normas nacionales o internacionales aplicables.

CONSORCIO

PERMISO PARA TRABAJO EN ALTURAS

CÓDIGO	SST-F-24
FECHA	16/09/2025
VERSIÓN	5
PÁGINA	1 DE 3

17. VALIDACIÓN, FIRMA DEL PERMISO DE TRABAJO

17.1. FIRMA PERSONA QUE AUTORIZA EL TRABAJO: He verificado el sitio de ejecución del trabajo, que todos los elementos necesarios para llevar a cabo la actividad son seguros y están contemplados en el análisis de riesgos y que los controles son pertinentes para ejecutar la actividad de forma segura.

Día:	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
Fecha:	02/03/2026	03/03/2026	04/03/2026	05/03/2026	06/03/2026		
Nombre:	Oscar Sanchez	Oscar Sanchez	Oscar S.	Oscar Sanchez	Oscar Sanchez		
Firma:							
Hora:	7:30 am	7:30 am	7:30 am	7:30 am	7:30 am		

17.2. FIRMA DEL COORDINADOR DE TRABAJO EN ALTURAS: He verificado en campo todos los controles establecidos por el análisis de riesgos realizado y considero seguro el desarrollo de la actividad

Día:	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
Nombre:	Melissa D	Melissa D	Melissa D	Melissa Dorado	Melissa Dorado		
Firma:	Melissa D	Melissa D	Melissa D	Melissa D	Melissa D.		
Hora:	7:30 am	7:30 am	7:30 am	7:30 am	7:30 am		

17.3. FIRMA PERSONA RESPONSABLE DE ACTIVAR EL PLAN DE EMERGENCIAS: He verificado en campo todos los controles establecidos por el análisis de riesgos realizado y considero seguro el desarrollo de la actividad

Día:	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
Nombre:	Edson Portilla	Edson Portilla	Edson Portilla	Edson Portilla	Edson portilla		
Firma:							
Hora:	7:30 am	7:30 am	7:30 am	7:30 am	7:30 am		

17.4. FIRMA AYUDANTE DE SEGURIDAD (Si aplica): He verificado en campo todos los controles establecidos por el análisis de riesgos realizado y considero seguro el desarrollo de la actividad

Día:	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
Nombre							
Firma:							
Hora:							

18. CANCELACIÓN, SUSPENSIÓN, CIERRE DEL PERMISO DE TRABAJO

18.1. PERSONAS AUTORIZADAS PARA LA CANCELACIÓN: EL QUE AUTORIZA EL TRABAJO, COORDINADOR DE ALTURAS, ENCARGADO DE ACTIVAR EL PLAN DE EMERGENCIA

CAUSALES DE CANCELACIÓN DEL PERMISO DE TRABAJO: Cuando se presente aquella condición del entorno, actos críticos o prácticas inseguras que por su potencial se espera una alta severidad de sus efectos inmediatos o a corto plazo, que puedan comprometer fisiológicamente el cuerpo humano dando lugar a un accidente para o causar la muerte. Ausencia de controles eficaces en términos de medidas de prevención y de protección. Actos inseguros, ausencia de supervisión eficaz e condición insatisfactoria del trabajador.(Indicar otras causales si las hay)

NOMBRE Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	FIRMA	HORA DEL CIERRE	CAUSALES

18.2. PERSONAS AUTORIZADAS A LA SUSPENSIÓN: EL QUE AUTORIZA EL TRABAJO, COORDINADOR DE ALTURAS, ENCARGADO DE ACTIVAR EL PLAN DE EMERGENCIA

CAUSALES DE SUSPENSIÓN DEL PERMISO DE TRABAJO: (Clima tempestad) Cambio de clima, Cambio de condiciones iniciales, simulacros, reuniones, La ocurrencia de una situación de alerta, Incendio, Señal de evacuación, Orden expresa de la persona que autoriza. (Indicar otras causales si las hay)

Día	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
Nombre:														
Firma:														
Hora:	CIERRE	APERTURA	CIERRE	APERTURA	CIERRE	APERTURA	CIERRE	APERTURA	CIERRE	APERTURA	CIERRE	APERTURA	CIERRE	APERTURA

18.3. PERSONAS AUTORIZADA DEL CIERRE DEL PERMISO: EL QUE AUTORIZA EL TRABAJO Y COORDINADOR DE ALTURAS

CAUSALES DE CIERRE DEL PERMISO: Finalización de la tarea, Cambio de turno. (Indicar otras causales si las hay).

Al cierre del permiso validar:	¿El sitio queda en condiciones seguras?	¿El área quedó limpia y libre de desechos?	¿Ausencia de trabajadores en el área de trabajo?

Día	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
Nombre:	Melissa D	Melissa D	Melissa D	Melissa Dorado	Melissa Dorado		
Firma:	Melissa D	Melissa D	Fin Tareas	Melissa D	Melissa D		
Causal:	Fin Tareas	Fin Tareas	Fin Tareas	Fin Tareas	Fin Tareas		
Hora:	5:00pm	5:00 Pm	5:00pm	5:00pm	5:00 pm		

19. OBSERVACIONES

CONSORCIO CONSOLIDACIÓN GIRÓN	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO ATS	CÓDIGO:	SST-F-55
		FECHA:	15/08/2023
		VERSIÓN:	2
		PÁGINA:	1 DE 3

1. DATOS GENERALES

Empresa:	Consorcio Consolidación Girón	Ciudad:	Girón
Frente de obra:	Villa de los Caballeros		
Fecha de inicio :	02/03/2026	Fecha de finalización:	06/06/2026
Actividad a realizar:	ESTABILIZACIÓN DE TALUD		
Descripción de la tarea a realizar:	PERFORACIÓN E INSTALACIÓN DE ANCLAJES		
Herramientas, insumos y equipos a utilizar:	Almadara pequeña, llave de tubo de 24", llave en Y para tubería, almadana de 14 libras, barra de 18 libras, pines de anclaje, tubería de 7/8. Tubería de perforación, Tilfor, torre de perforación, plataforma, compresor, manguera de aire, controles, brocas de perforación (trialeta mano de angel y martillo de fondo.		
Elementos de Protección Personal requeridos:	Casco de seguridad, barbuquejo, protector auditivo, gafas de seguridad, tapabocas, guantes, botas de seguridad, dotación, Equipo de Protección Contra Caídas		

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

Trabajo en alturas	X	Espacios confinados		Otro ¿Cuál?	
Excavacion		Caliente			

2. ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

Paso a paso de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles requeridos
Descargue de herramientas y torre de perforación	Condiciones de seguridad: Locativo (terreno irregular)	Golpes, tropezones, caidas al mismo nivel	1.Inspección del área y herramientas de trabajo antes y durante la ejecución de actividades. 2. Reporte de actos y condiciones inseguras. 3.Trabajar en equipo. 4. Cumplir recomendaciones de seguridad. 5. Mantener condiciones de orden y aseo 6. Adoptar técnicas de manipulación manual de carga seguras. 7. Uso adecuado de EPP 8. Inducción al cargo y capacitación.
	Condiciones de seguridad: Mecánico (Manipulación de herramienta. Maquinaria y equipos)	Golpes, contusiones, aplastamiento, heridas.	
	Biomecánico: manipulación manual de cargas	Lesiones osteomusculares	
Inspección general del área de trabajo	Condiciones de seguridad: Locativo (superficies irregulares)	Golpes, tropezones, caidas al mismo nivel	1. Estar atento a las condiciones del entorno. 2. Reporte de actos y condiciones inseguras 3. Atender la señalización 4. Cumplir recomendaciones de seguridad. 5. Mantener condiciones de orden y aseo 6. Uso adecuado de EPI. 7. Inducción al cargo y capacitación.
	Biológico: picaduras y mordeduras	Alergias, irritación, afectaciones al estado de salud	
Posicionamiento, instalación y anclaje de torre de perforación y sus complementos	Condiciones de seguridad: Locativo (terreno irregular)	Golpes, tropezones, caidas al mismo nivel	1. Inspección del área de trabajo. 2. Inspecciones de herramientas, maquinaria y equipos 3. Reporte de actos y condiciones inseguras 4.Verificar puntos de anclajes 5.Diligenciamiento de permisos necesarios 6.Trabajar en equipo 7.Atender señalización y seguir recomendaciones de seguridad. 8. Mantener condiciones de orden y aseo. 9. Adoptar técnicas de manipulación manual de carga seguras. 10. Realizar pausas activas. 11. Uso adecuado de EPCC y EPI. 12. Personal idóneo para trabajo seguro en altura. 13. Inducción al cargo y capacitación.
	Condiciones de seguridad: Mecánico (Manipulación de herramienta. Maquinaria y equipos)	Golpes, contusiones, aplastamiento, heridas.	
	Biomecánico: manipulación manual de cargas	Lesiones osteomusculares	
	Biológico: picaduras y mordeduras	Alergias, irritación, afectaciones al estado de salud	
Inspección preoperacional de maquinaria, equipos y herramientas (anclajes de la torre)	Químico: sustancias químicas (grasas, aceites, lubricantes)	Irritación, quemaduras, afecciones respiratorias	1.Inspección del área de trabajo 2. Reporte de actos y condiciones inseguras 3.Atender a señalización y recomendaciones de seguridad. 4. Mantenar áreas en orden y asec. 5. Uso adeacuado de EPI 6. Inducción al cargo y capacitación.
	Biomecánico: posturas inadecuadas	Lesiones osteomusculares	
	Condiciones de seguridad: Locativo (terreno irregular)	Golpes, tropezones, caidas al mismo nivel	

Engrasado de rotaria y motor de avance	Químico: sustancias químicas (grasas, aceites, lubricantes)	Irritación, quemaduras, afecciones respiratorias	1.Inspección maquinarias, equipos y herramientas. 2. Reporte de actos y condiciones inseguras 3.Atender a señalización y recomendaciones de seguridad. 4. Rotulación, manipulación y almacenamiento seguro de sustancias químicas. 5. Mantener áreas en orden y aseo. 6. Uso adecuado de EPI 7. Inducción al cargo y capacitación.
	Condiciones de seguridad: Mecánico (Manipulación de herramienta. Maquinaria y equipos)	Golpes, contusiones, aplastamiento, heridas.	
Instalación de tubería de perforación	Condiciones de seguridad: Mecánico (Manipulación de herramienta. Maquinaria y equipos)	Golpes, contusiones, aplastamiento, heridas.	1.Inspección del área de trabajo. 2. Inspecciones de herramientas, maquinaria y equipos 3. Reporte de actos y condiciones inseguras 4.Verificar puntos de anclajes 5.Diligenciamiento de permisos de trabajo necesario. 6. Atender señalización y seguir recomendaciones de seguridad. 7. Mantener áreas en orden y aseo. 8. Pausas activas. 10.Inspeccion preoperacional de EPCC y EPI. 11. Uso adecuado de EPCC y EPI. 12. Personal idóneo para trabajo seguro en altura. 13. Inducción al cargo y capacitación.
	Condiciones de seguridad: trabajo en alturas	Golpes, caídas a distinto nivel, fracturas, politraumatismos	
	Condiciones de seguridad: Locativo (terreno irregular)	Golpes, tropezones, caídas al mismo nivel	
	Biomecánico: posturas inadecuadas	Lesiones osteomusculares	
	Fenomenos naturales: sismos, derrumbes	lesiones severas, perdidas humanas y materiales	
	Físico: ruido	Migraña, estrés, hipoacusia	
Perforación del talud	Condiciones de seguridad: Mecánico (Manipulación de herramientas y partes en movimiento)	Golpes, contusiones, aplastamiento, heridas, atrapamiento	1.Inspección del área de trabajo. 2. Inspecciones de herramientas, maquinaria y equipos 3. Reporte de actos y condiciones inseguras 4.Verificar puntos de anclajes 5.Diligenciamiento de permisos necesarios 6.Trabajar en equipo 7.Atender a señalización y seguir recomendaciones de seguridad. 8. Mantener condiciones de orden y aseo. 9. Pausas activas. 10.Inspeccion preoperacional de EPCC y EPI. 11. Uso adecuado de EPCC y EPI. 12. Personal idóneo para trabajo seguro en altura. 13. Inducción al cargo y capacitación.
	Condiciones de seguridad: trabajo en alturas	Golpes, caídas a distinto nivel, fracturas, politraumatismos	
	Químico: material particulado	Afecciones respiratorias	
	Condiciones de seguridad: Locativo (terreno irregular)	Golpes, tropezones, caídas al mismo nivel	
	Físico: ruido, radiaciones no ionizantes	Migraña, estrés, hipoacusia, golpe de calor, deshidratación, quemaduras 1er grado	
	Biomecánico: posturas inadecuadas, manipulación manual de cargas	Lesiones osteomusculares	
Desmonte de tubería de perforación	Condiciones de seguridad: Mecánico (Manipulación de herramienta. Maquinaria y equipos)	Golpes, contusiones, aplastamiento, heridas.	1.Inspección del área de trabajo. 2. Inspecciones de herramientas, maquinaria y equipos 3. Reporte de actos y condiciones inseguras 4.Verificar puntos de anclajes 5.Diligenciamiento de permisos necesarios 6.Trabajar en equipo 7.Atender a señalización y seguir recomendaciones de seguridad. 8. Mantener áreas en orden y aseo. 9. Pausas activas y estiramiento. 10.Inspeccion preoperacional de EPCC y EPI. 11. Uso adecuado de EPCC y EPI. 12. Personal idóneo para trabajo seguro en altura. 13. Inducción al cargo y capacitación.
	Condiciones de seguridad: trabajo en alturas	Golpes, caídas a distinto nivel, fracturas, politraumatismos	
	Condiciones de seguridad: Locativo (terreno irregular)	Golpes, tropezones, caídas al mismo nivel	
	Biomecánico: posturas inadecuadas	Lesiones osteomusculares	
	Físico: ruido	Migraña, estrés, hipoacusia	
Instalación de anclajes en el	Condiciones de seguridad: Locativo (terreno irregular)	Golpes, tropezones, caídas al mismo nivel	1.Inspección del área de trabajo. 2. Inspecciones de herramientas, maquinaria y equipos 3. Reporte de actos y condiciones inseguras 4.Verificar puntos de anclajes 5.Diligenciamiento de permisos necesarios 6.Trabajar en equipo 7.Atender a señalización y seguir recomendaciones de
	Condiciones de seguridad: trabajo en alturas	Golpes, caídas a distinto nivel, fracturas, politraumatismos	

talud	Biomecánico: Manipulación manual de cargas	Lesiones osteomusculares	seguridad. 8. Mantener áreas en orden y aseo. 9. Pausas activas y estiramiento. 10.Inspeccion preoperacional de EPCC y EPI. 11. Uso adecuado de EPCC y EPI. 12. Personal idóneo para trabajo seguro en altura. 13. Inducción al cargo y capacitación.
	Biológico: picaduras y mordeduras	Alergias, irritación, afectaciones al estado de salud	
Organización de herramientas y equipos, limpieza del área de trabajo	Condiciones de seguridad: Locativo (terreno irregular)	lesiones severas, perdidas humanas y materiales	1. Estar atento a las condiciones del entorno. 2. Reporte de actos y condiciones inseguras 3. Atender a señalización 4. Seguir recomendaciones e indicaciones de seguridad. 5. Mantener condiciones de orden y aseo 6. Uso adecuado de EPI. 7. Inducción al cargo y capacitación.
	Biológico: picaduras y mordeduras	Alergias, irritación, afectaciones al estado de salud	

Riesgos: todas las actividades: condiciones de seguridad (accidentes de tránsito, riesgo público); fenómenos naturales (sismos, derrumbes)

Controles generales: 1. Plan de emergencias y evacuación; 2. Conformación de brigadas de emergencias; 3. Disponibilidad de elementos para la atención de emergencias; 4. Verificar interferencia con trabajos adyacentes; 5. Emplear herramienta adecuada y en buen estado; 6. Realizar mantenimiento preventivo y/o correctivo de la maquinaria y equipos. 7. Fomentar cultura de autocuidado.

IDENTIFICACIÓN DE TRABAJADORES EJECUTORES

Nombres y Apellidos	No. de Identificación	Firma
Isaias Garcia	7701596200	Isa
Miguel Ranga	1124048478	Miguel Ranga
Jarinson Stiven caicedo	1232891906	Estiven caicedo
Willington Alarcón Ascanio	91.479.574,	W.AA

IDENTIFICACIÓN RESPONSABLE DE LA TAREA (Residente de Obra, Auxiliar de Ingeniería, Supervisor)

Nombres y Apellidos	No. de Identificación	Firma
Oscar Andres Sanchez Jerez	1098756647	

IDENTIFICACIÓN DEL EMISOR (Responsable SST)

Nombres y Apellidos	No. de Identificación	Firma
Melissa Dorado Arias	1098704436	Melissa Dorado

CONSORCIO

PERMISO PARA TRABAJO EN ALTURAS

CÓDIGO	SST-F-21
FECHA	31/03/2020
VERSIÓN	3
PÁGINA	1 DE 3

1. FECHA DE INICIO Y HORA	09 (DÍA)	MAR (MES)	2026 (AÑO)	7:30 (HORA)	3. CENTRO DE TRABAJO	VILLAS CABALLEROS.	
2. TERMINACIÓN DE LA TAREA	14	MAR	2026.	5:30	4. ALTURA APROXIMADA	12 mts	5. CONSECUTIVO

6. PERSONAS AUTORIZADAS Y REQUERIMIENTOS

7. FIRMA DEL EJECUTOR O TRABAJADOR AUTORIZADO EN TA

Trabajador No.	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACIÓN	CARGO	¿APTO EN EXAMEN DE ALTURAS?	¿CURSO DE ALTURAS VIGENTE?	¿AFILIACIÓN VIGENTE SEGURIDAD SOCIAL?	FIRMA DEL TRABAJADOR LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
								10/03/26	11/03/26	12/03/26			
1	Willinghong D. Q.	91079 571.	Ay	/	/	/	—	WDA	WDA	WDA	—	—	—
2	Miguel	1116648 478	Az Perf.	/	/	/	—	Miguel	Miguel	Miguel	—	—	—
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													

6. SELECCIONE EL TIPO DE TRABAJO O TAREA

		7. ¿TRABAJO RUTINARIO? SI	NO
	Desmonte de vegetación de talud		
	Perfilamiento de talud manual y mecánico		
	Topografía de marcación de puntos de anclaje		
✓	Perforación de talud	✓	
	Llenado o inyección de los anclajes		
	Biomanto o concreto lanzado		
	Tensionamiento de talud		
	Otros:		

8. SELECCIONE LAS HERRAMIENTAS Y EQUIPOS A UTILIZAR TENIENDO EN CUENTA LA TAREA A REALIZAR

8.1. SELECCIÓN DE HERRAMIENTAS

Pico		Barra de 14 libra	✓
Pala		Cizalla	
Azadón		Perros	
Palustrago		Taladro	
Machete		Polidora	
Llave de tubo		Sisa	
Serrucho		Segueta	✓
Llave expansiva	✓	Otras:	
Barra de 6 libras			


8.2. SELECCIÓN DE EQUIPOS

Compresor		Retroexcavadora	✓
Unidad hidráulica		Volqueta	✓
Torre de perforación		Maquera de aire	✓
Barras de perforación			
Martillo de perforación			
Compresor		Otros:	
Trifor			
Mandos de perforación			
Maquera hidráulica			

9. ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO. TSA

DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE LA TAREA		Se anexan al presente documento los registros correspondientes en formato SST-F-55 Análisis de Trabajo Seguro

10. AUTOREPORTE DE CONDICIONES DE SALUD. ¿PRESENTA ALGUNO DE ÉSTOS SINTOMAS?

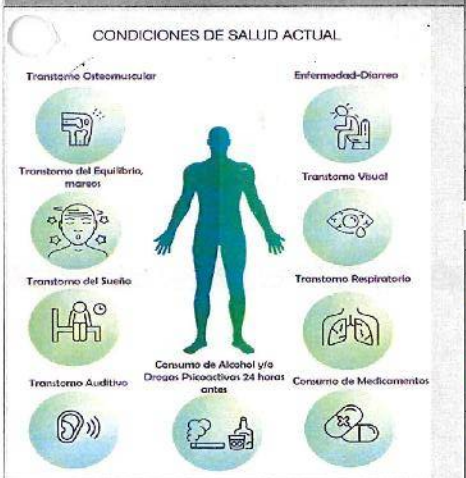

11. SELECCIONE E INSPECCIONE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PROPIOS DE LA TAREA SEGÚN CRITERIO

	✓	N/A

CASCO BARBUQUEJO	✓	GUANTES DE CARNAZA	✓		
Sin fisuras, limpio, con barbuquejo		Sin oficios, libre de grasa, suciedad			
GAFAS OSCURAS	✓	GUANTES DE PRECISIÓN	✓		
Sin rayones, sin fisuras y con hilo sujetador		Sin oficios, libre de grasa, suciedad y polvo			
GAFAS TRANSPARENTES	✓	ZAPATOS SEGURIDAD	✓		
Sin rayones, sin fisuras y con hilo sujetador		Sin agujeros, sin filtraciones de agua y antideslizantes			
TAPA OIDO DE COPA	✓	BOTAS PANTANERAS	✓		
Sin desgaste, Sin fracturas,		Sin agujeros, sin filtraciones de agua			
TAPA OIDO INSERCIÓN	✓	CARETA			
Sin desgaste, sin fracturas,		Sin rayones, sin fisuras y cores ajustador			
TAPABOCAS QUIRÚRGICO	✓	TAPABOCAS N95			
Sin desgaste, libre de grasa, suciedad y polvo		Sin desgaste, libre de grasa, suciedad y polvo			
CAPUCHA	✓	Otros:			
Sin oficios, libre de grasa, suciedad y polvo					

12. SELECCIONE E INSPECCIONE LOS EQUIPOS SEGÚN PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS PROPIOS DE LA TAREA, SEGÚN CRITERIO

	✓	N/A

RED DE SEGURIDAD		PUNTO DE ANCLAJE	
Instalada por personal calificado, en buen estado para su uso.		Certificado, Sin Oxidación, deformación, desgastado, identificado.	
ANCLAJE PORTÁTIL	✓	LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL	
Con etiqueta, Sin Oxidación, cortes, quemaduras, costuras sueltas y deformación		Abre y cierra correctamente, Sin Oxidación, deformación, cortes, quemaduras, costuras sueltas	
LÍNEA DE VIDA VERTICAL		ARNÉS	
Con etiqueta, Abre y cierra correctamente, Sin Oxidación, cortes, desgaste, fricción, fisuras.		Con etiqueta, Sin Oxidación, cortes, quemaduras, costuras sueltas y deformación	
ESLINGA EN Y CON AMORTIGUADOR	✓	MOSQUETÓN	
Con etiqueta, Abre y cierra correctamente, Sin Oxidación, deformación, cortes, quemaduras, costuras sueltas.		Abre y cierra correctamente, Sin Oxidación, deformación,	
ESLINGA DE POSICIONAMIENTO		DISPOSITIVOS RETRÁCTILES	
Con etiqueta, Abre y cierra correctamente, Sin Oxidación, deformación, cortes, quemaduras, costuras sueltas.		Con etiqueta, Sin Oxidación, deformación, Bloquea correctamente.	
ESLINGA DE RESTRICCIÓN		CONECTORES PARA TRÁNSITO (FERROS)	
Abre y cierra correctamente, Sin Oxidación, deformación, cortes, quemaduras, costuras sueltas.		Sin Oxidación, deformación, Abren y cierran correctamente	
SISTEMA DE RESCATE		Otros:	
Abre y cierra correctamente, Sin Oxidación, deformación, cortes, quemaduras, costuras sueltas.			

PERMISO PARA TRABAJO EN ALTURAS

CÓDIGO	SST-014
FECHA	15/03/2023
VERSIÓN	5
PÁGINA	1 DE 3

13. REPORTE DE CONDICIONES DE SALUD DIARIA. (SI CUENTA CON UN SI ESPECIFICAR EN OBSERVACIONES)

11.1. INSPECCIÓN DIARIA DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL. ¿ CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE INSPECCIÓN ?

12.1. INSPECCIÓN DIARIA DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS ¿ CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE INSPECCIÓN ?

Nota: Si presenta dudas a realizar la inspección según criterios, preguntar al COORDINADOR DE TRABAJO DE ALTURAS

Trabajador No.	LUN.	MAR.	MIÉ.	JUE.	VIE.	SÁB.	DOM.	LUN.	MAR.	MIÉ.	JUE.	VIE.	SÁB.	DOM.	LUN.	MAR.	MIÉ.	JUE.	VIE.	SÁB.	DOM.
1	SI	✓	SI	✓	SI	✓	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	NO	SI	✓	✓	✓	SI	NO	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	NO
2	SI	✓	SI	✓	SI	✓	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	NO	SI	✓	✓	✓	SI	NO	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	NO
3	SI	NO	SI	NO	SI	NO	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	NO
4	SI	NO	SI	NO	SI	NO	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	NO
5	SI	NO	SI	NO	SI	NO	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	NO
6	SI	NO	SI	NO	SI	NO	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	NO
7	SI	NO	SI	NO	SI	NO	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	NO
8	SI	NO	SI	NO	SI	NO	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	NO
9	SI	NO	SI	NO	SI	NO	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	NO
10	SI	NO	SI	NO	SI	NO	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	NO

Observaciones de su condición de salud actual:

Observaciones de no cumplimiento de criterios EPP:

Observaciones de no cumplimiento de criterios EPCC:

14. SELECCIONE EL SISTEMA PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS A UTILIZAR SEGÚN ACTIVIDAD O TAREA

✓ = SI NA = NO APLICA

SELECCIONE EL SPCC A UTILIZAR	SISTEMA PASIVO		SISTEMAS ACTIVOS DE PROTECCIÓN											REQUERIMIENTO DE CANTIDAD EN METROS				
			MECANISMO DE ANCLAJE			ARNÉS DE CUERPO COMPLETO	CONECTORES											
							CONECTORES PARA DETENCIÓN Y PREVENCIÓN DE CAÍDA					CONECTORES PARA TRÁNSITO [ANCLAS]	SISTEMA DE RESCATE 4:1					
										OTROS								
	RED DE SEGURIDAD	PUNTO DE ANCLAJE CERTIFICADO	ADAPTADORES DE ANCLAJE PORTÁTIL	LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL	LÍNEA DE VIDA VERTICAL		MOSQUETÓN	ESLINGA CON AMORTIGUADOR DE ENERGÍA	DISPOSITIVOS RETRÁCTILES	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO	ESLINGA DE RESTRICCIÓN			ALTURA DEL TRABAJADOR	DISTANCIA DE LA CAÍDA	DISTANCIA DE ABSORBEDOR	FACTOR DE SEGURIDAD	TOTAL
IMAGEN																		
1				✓	✓	✓	✓											
2				✓	✓	✓	✓											
3																		
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		

15. SELECCIONE LAS MEDIDAS COLECTIVAS DE PREVENCIÓN A UTILIZAR VERIFIQUE LOS SIGUENTES ASPECTOS:

	DELIMITACIÓN DEL AREA	CONTROL DE SUPERVICES	SEÑALIZACIÓN	SILLA PARA TRABAJO EN SUSPENSIÓN
✓	Delimita la zona de peligro de caída de los trabajadores y permite visibilidad de día y de noche si aplica	Cuenta con demarcación, señalización, Delimitación, Cinturón, cuerda de seguridad	Cuenta con señalización visible para cualquier persona, en idioma español o extranjero, si aplica	La silla conectada a la argolla del arnés indicada por el fabricante y al sistema de descenso certificado, y el trabajador estará asegurado a un segundo sistema de seguridad
	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE
✓	**LÍNEA DE ADVERTENCIA**	**MANEJO DE DESNIVELES**	**BARANDA**	**Otras Medidas Preventivas**
	Cuerda con cinta amarilla de seguridad, instalada en todos los lados desprotegidos, resistencia de 8 KG. Distancia 1,40 m antes del borde, altura de 1 m y cuenta con banderines de colores intervalos de 1,83 m	Con ángulo de inclinación de 15° a 30°, Resistencia en la superficie por donde se transita de mínimo dos veces la carga máxima prevista que pueda llegar a soportar	Cumple con Resistencia estructural de la baranda 200 lb, Altura: 1 m mínimo, Altura de los rodapiés 15 cm, ubicación de travesaños intermedios horizontales 45 cm entre sí, con base si aplica el rodapié	
	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE

16. SELECCIONE LOS SISTEMA DE ACCESO A UTILIZAR Y VERIFIQUE LOS SIGUIENTES ASPECTOS

	ANDAMIOS MULTIDIRECCIONAL	ESCALERA	PRETALES	OTROS SISTEMAS DE ACCESO
	Andamios certificados, Ausencia de corrosión o desgaste por sustancias o elementos que deterioren la estructura del mismo.	Escaleras certificadas, ausencia de corrosión o desgaste por sustancias o elementos que deterioren la estructura del mismo.	Usar esta la última opción para acceso a postes. Si se hace indispensable la utilización de los pretales, deberá usar sistemas de protección contra caídas.	
	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	
	ANEXO: Formato inspección andamios	ANEXO: Formato inspección de escaleras	ANEXO: Formato inspección de pretales	

	SISTEMA DE ELEVADORES DE PERSONAS	SISTEMAS SUSPENDIDOS POR CABLES	
	Incluye canastas elevadoras, que son el tipo por una persona avalada por el fabricante, o una persona calificada conforme a las recomendaciones del fabricante.	Andamio colgante certificado, que garantice la seguridad de la operación. Los contrapesos usados cumplirán con lo especificado en el diseño de ingeniería aprobados por una persona calificada	Nota 1: El trabajo en sistemas de acceso debe incluir el análisis de riesgos para determinar los sistemas de prevención y protección contra caídas aplicables, considerando para su selección la compatibilidad de las conexiones al sistema de acceso y las instrucciones de los fabricantes. Nota 2: El trabajador que tenga la función de realizar el armado y desarmado de andamios y el trabajador que opere equipos para elevación de personas, deben contar con capacitación específica enfocada en la seguridad durante las operaciones y atendiendo las instrucciones de los fabricantes y/o las normas nacionales o internacionales aplicables.
	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	
	ANEXO: Formato Inspección de elevación de trabajadores de personas	ANEXO: Formato de inspección de sistema de suspensión por cable	

	PERMISO PARA TRABAJO EN ALTURAS	CÓDIGO	SST-F-24
		FECHA	15/08/2023
		VERSIÓN	5
		PÁGINA	1 DE 2

17. VALIDACIÓN, FIRMA DEL PERMISO DE TRABAJO

17.1. FIRMA PERSONA QUE AUTORIZA EL TRABAJO: He verificado el sitio de ejecución del trabajo, que todos los elementos necesarios para llevar a cabo la actividad son seguros y están contemplados en el análisis de riesgos y que los controles son pertinentes para ejecutar la actividad de forma segura.

Día:	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
Fecha:		10/03/2026	11/03/2026	12/03/2026			
Nombre:		Oscar Sanchez	Oscar Sanchez	Oscar Sanchez			
Firma:							
Hora:		7:30am	7:30am	7:30am			

17.2. FIRMA DEL COORDINADOR DE TRABAJO EN ALTURAS: He verificado en campo todos los controles establecidos por el análisis de riesgos realizado y considero seguro el desarrollo de la actividad

Día:	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
Nombre:		Melissa Donado	Melissa D	Melissa Donado			
Firma:		Melissa D	Melissa D	Melissa D			
Hora:		7:30am	7:30am	7:30am			

17.3. FIRMA PERSONA RESPONSABLE DE ACTIVAR EL PLAN DE EMERGENCIAS: He verificado en campo todos los controles establecidos por el análisis de riesgos realizado y considero seguro el desarrollo de la actividad

Día:	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
Fecha:							
Firma:	El Supervisor	Edson Portilla El Supervisor	Edson Portilla El Supervisor	Edson Portilla El Supervisor	El Supervisor		
Hora:		7:30am	7:30am	7:30am			

17.4. FIRMA AYUDANTE DE SEGURIDAD (Si aplica): He verificado en campo todos los controles establecidos por el análisis de riesgos realizado y considero seguro el desarrollo de la actividad

Día:	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
Nombre:							
Firma:							
Hora:							

18. CANCELACIÓN, SUSPENSIÓN, CIERRE DEL PERMISO DE TRABAJO

18.1. PERSONAS AUTORIZADAS PARA LA CANCELACIÓN: EL QUE AUTORIZA EL TRABAJO, COORDINADOR DE ALTURAS, ENCARGADO DE ACTIVAR EL PLAN DE EMERGENCIA

CAUSALES DE CANCELACIÓN DEL PERMISO DE TRABAJO: Cuando se presente aquella condición del entorno, acto crítico o práctica irregular que por su potencial se espera una alta severidad de sus efectos inmediatos o a corto plazo, que puedan comprometer (fatalógicamente el cuerpo humano dando lugar a un accidente grave o causar la muerte. Ausencia de controles eficaces en términos de medidas de prevención y de protección. Actos inseguros, ausencia de supervisión eficaz o condición insitaria del trabajador.(Indicar otras causales si las hay).

NOMBRE Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	FIRMA	HORA DEL CIERRE	CAUSALES

18.2. PERSONAS AUTORIZADAS A LA SUSPENSIÓN: EL QUE AUTORIZA EL TRABAJO, COORDINADOR DE ALTURAS, ENCARGADO DE ACTIVAR EL PLAN DE EMERGENCIA

CAUSALES DE SUSPENSIÓN DEL PERMISO DE TRABAJO: (Cierre temporal) Cambio de clima, Cambio de condiciones iniciales, simulacros, reuniones, La ocurrencia de una situación de alerta, Incendio, Señal de evacuación, Orden expresa de la persona que autoriza. (Indicar otras causales si las hay).

Día	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
Nombre:														
Firma:														
Causal:														
Hora:	CIERRE	APERTURA	CIERRE	APERTURA	CIERRE	APERTURA	CIERRE	APERTURA	CIERRE	APERTURA	CIERRE	APERTURA	CIERRE	APERTURA

18.3. PERSONAS AUTORIZADA DEL CIERRE DEL PERMISO: EL QUE AUTORIZA EL TRABAJO Y COORDINADOR DE ALTURAS

CAUSALES DE CIERRE DEL PERMISO: *Finalización de la tarea, Cambio de turno, (Indicar otras causales si las hay).*

Al cierre del permiso validar:	¿ El sitio queda en condiciones seguras?	¿El área quedó limpia y libre de desechos?	¿Ausencia de trabajadores en el área de trabajo?

Día	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
Nombre:	Melissa D	Melissa D	Melissa D	Melissa D.			
Firma:	Melissa D	Melissa D	Melissa D	Melissa D			
Causal:	Fin Tareas	Fin Tareas	Fin Tareas	Fin Tareas			
Hora:		5:00pm	5:00pm	5:00pm			

19. OBSERVACIONES

CONSORCIO CONSOLIDACIÓN GIRÓN	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO ATS	CÓDIGO:	SST-F-55
		FECHA:	15/08/2023
		VERSIÓN:	2
		PÁGINA:	1 DE 3

1. DATOS GENERALES

Empresa:	Consorcio Consolidación Girón	Ciudad:	Girón
Frente de obra:	Villa de los Caballeros		
Fecha de inicio :	04/03/2026	Fecha de finalización:	13/03/2026
Actividad a realizar:	ESTABILIZACIÓN DE TALUD		
Descripción de la tarea a realizar:	PERFORACIÓN E INSTALACIÓN DE ANCLAJES		
Herramientas, insumos y equipos a utilizar:	Almadara pequeña, llave de tubo de 24", llave en Y para tubería, almadana de 14 libras, barra de 18 libras, pines de anclaje, tubería de 7/8. Tubería de perforación, Tilfor, torre de perforación, plataforma, compresor, manguera de aire, controles, brocas de perforación (trialeta mano de angel y martillo de fondo.		
Elementos de Protección Personal requeridos:	Casco de seguridad, barbuquejo, protector auditivo, gafas de seguridad, tapabocas, guantes, botas de seguridad, dotación, Equipo de Protección Contra Caídas		

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

Trabajo en alturas	X	Espacios confinados		Otro ¿Cuál?	
Excavacion		Caliente			

2. ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

Paso a paso de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles requeridos
Descargue de herramientas y torre de perforación	Condiciones de seguridad: Locativo (terreno irregular)	Golpes, tropezones, caidas al mismo nivel	1.Inspección del área y herramientas de trabajo antes y durante la ejecución de actividades. 2. Reporte de actos y condiciones inseguras. 3.Trabajar en equipo. 4. Cumplir recomendaciones de seguridad. 5. Mantener condiciones de orden y aseo 6. Adoptar técnicas de manipulación manual de carga seguras. 7. Uso adecuado de EPP 8. Inducción al cargo y capacitación.
	Condiciones de seguridad: Mecánico (Manipulación de herramienta. Maquinaria y equipos)	Golpes, contusiones, aplastamiento, heridas.	
	Biomecánico: manipulación manual de cargas	Lesiones osteomusculares	
Inspección general del área de trabajo	Condiciones de seguridad: Locativo (superficies irregulares)	Golpes, tropezones, caidas al mismo nivel	1. Estar atento a las condiciones del entorno. 2. Reporte de actos y condiciones inseguras 3. Atender la señalización 4. Cumplir recomendaciones de seguridad. 5. Mantener condiciones de orden y aseo 6. Uso adecuado de EPI. 7. Inducción al cargo y capacitación.
	Biológico: picaduras y mordeduras	Alergias, irritación, afectaciones al estado de salud	
Posicionamiento, instalación y anclaje de torre de perforación y sus complementos	Condiciones de seguridad: Locativo (terreno irregular)	Golpes, tropezones, caidas al mismo nivel	1. Inspección del área de trabajo. 2. Inspecciones de herramientas, maquinaria y equipos 3. Reporte de actos y condiciones inseguras 4.Verificar puntos de anclajes 5.Diligenciamiento de permisos necesarios 6.Trabajar en equipo 7.Atender señalización y seguir recomendaciones de seguridad. 8. Mantener condiciones de orden y aseo. 9. Adoptar técnicas de manipulación manual de carga seguras. 10. Realizar pausas activas. 11. Uso adecuado de EPCC y EPI. 12. Personal idóneo para trabajo seguro en altura. 13. Inducción al cargo y capacitación.
	Condiciones de seguridad: Mecánico (Manipulación de herramienta. Maquinaria y equipos)	Golpes, contusiones, aplastamiento, heridas.	
	Biomecánico: manipulación manual de cargas	Lesiones osteomusculares	
	Biológico: picaduras y mordeduras	Alergias, irritación, afectaciones al estado de salud	
Inspección preoperacional de maquinaria, equipos y herramientas (anclajes de la torre)	Químico: sustancias químicas (grasas, aceites, lubricantes)	Irritación, quemaduras, afecciones respiratorias	1.Inspección del área de trabajo 2. Reporte de actos y condiciones inseguras 3.Atender a señalización y recomendaciones de seguridad. 4. Mantenar áreas en orden y aseo. 5. Uso adeacuado de EPI 6. Inducción al cargo y capacitación.
	Biomecánico: posturas inadecuadas	Lesiones osteomusculares	
	Condiciones de seguridad: Locativo (terreno irregular)	Golpes, tropezones, caidas al mismo nivel	

Engrasado de rotaria y motor de avance	Químico: sustancias químicas (grasas, aceites, lubricantes)	Irritación, quemaduras, afecciones respiratorias	1.Inspección maquinarias, equipos y herramientas. 2. Reporte de actos y condiciones inseguras 3.Atender a señalización y recomendaciones de seguridad. 4. Rotulación, manipulación y almacenamiento seguro de sustancias químicas. 5. Mantener áreas en orden y aseo. 6. Uso adecuado de EPI 7. Inducción al cargo y capacitación.
	Condiciones de seguridad: Mecánico (Manipulación de herramienta. Maquinaria y equipos)	Golpes, contusiones, aplastamiento, heridas.	
Instalación de tubería de perforación	Condiciones de seguridad: Mecánico (Manipulación de herramienta. Maquinaria y equipos)	Golpes, contusiones, aplastamiento, heridas.	1.Inspección del área de trabajo. 2. Inspecciones de herramientas, maquinaria y equipos 3. Reporte de actos y condiciones inseguras 4.Verificar puntos de anclajes 5.Diligenciamiento de permisos de trabajo necesario. 6. Atender señalización y seguir recomendaciones de seguridad. 7. Mantener áreas en orden y aseo. 8. Pausas activas. 10.Inspeccion preoperacional de EPCC y EPI. 11. Uso adecuado de EPCC y EPI. 12. Personal idóneo para trabajo seguro en altura. 13. Inducción al cargo y capacitación.
	Condiciones de seguridad: trabajo en alturas	Golpes, caídas a distinto nivel, fracturas, politraumatismos	
	Condiciones de seguridad: Locativo (terreno irregular)	Golpes, tropezones, caidas al mismo nivel	
	Biomecánico: posturas inadecuadas	Lesiones osteomusculares	
	Fenomenos naturales: sismos, derrumbes	lesiones severas, perdidas humanas y materiales	
	Físico: ruido	Migraña, estrés, hipoacusia	
Perforación del talud	Condiciones de seguridad: Mecánico (Manipulación de herramientas y partes en movimiento)	Golpes, contusiones, aplastamiento, heridas, atrapamiento	1.Inspección del área de trabajo. 2. Inspecciones de herramientas, maquinaria y equipos 3. Reporte de actos y condiciones inseguras 4.Verificar puntos de anclajes 5.Diligenciamiento de permisos necesarios 6.Trabajar en equipo 7.Atender a señalización y seguir recomendaciones de seguridad. 8. Mantener condiciones de orden y aseo. 9. Pausas activas. 10.Inspeccion preoperacional de EPCC y EPI. 11. Uso adecuado de EPCC y EPI. 12. Personal idóneo para trabajo seguro en altura. 13. Inducción al cargo y capacitación.
	Condiciones de seguridad: trabajo en alturas	Golpes, caídas a distinto nivel, fracturas, politraumatismos	
	Químico: material particulado	Afecciones respiratorias	
	Condiciones de seguridad: Locativo (terreno irregular)	Golpes, tropezones, caidas al mismo nivel	
	Físico: ruido, radiaciones no ionizantes	Migraña, estrés, hipoacusia, golpe de calor, deshidratación, quemaduras 1er grado	
	Biomecánico: posturas inadecuadas, manipulación manual de cargas	Lesiones osteomusculares	
Desmonte de tubería de perforación	Condiciones de seguridad: Mecánico (Manipulación de herramienta. Maquinaria y equipos)	Golpes, contusiones, aplastamiento, heridas.	1.Inspección del área de trabajo. 2. Inspecciones de herramientas, maquinaria y equipos 3. Reporte de actos y condiciones inseguras 4.Verificar puntos de anclajes 5.Diligenciamiento de permisos necesarios 6.Trabajar en equipo 7.Atender a señalización y seguir recomendaciones de seguridad. 8. Mantener áreas en orden y aseo. 9. Pausas activas y estiramiento. 10.Inspeccion preoperacional de EPCC y EPI. 11. Uso adecuado de EPCC y EPI. 12. Personal idóneo para trabajo seguro en altura. 13. Inducción al cargo y capacitación.
	Condiciones de seguridad: trabajo en alturas	Golpes, caídas a distinto nivel, fracturas, politraumatismos	
	Condiciones de seguridad: Locativo (terreno irregular)	Golpes, tropezones, caidas al mismo nivel	
	Biomecánico: posturas inadecuadas	Lesiones osteomusculares	
	Físico: ruido	Migraña, estrés, hipoacusia	
Instalación de anclajes en el	Condiciones de seguridad: Locativo (terreno irregular)	Golpes, tropezones, caidas al mismo nivel	1.Inspección del área de trabajo. 2. Inspecciones de herramientas, maquinaria y equipos 3. Reporte de actos y condiciones inseguras 4.Verificar puntos de anclajes 5.Diligenciamiento de permisos necesarios 6.Trabajar en equipo 7.Atender a señalización y seguir recomendaciones de
	Condiciones de seguridad: trabajo en alturas	Golpes, caídas a distinto nivel, fracturas, politraumatismos	

talud	Biomecánico: Manipulación manual de cargas	Lesiones osteomusculares	seguridad. 8. Mantener áreas en orden y aseo. 9. Pausas activas y estiramiento. 10.Inspeccion preoperacional de EPCC y EPI. 11. Uso adecuado de EPCC y EPI. 12. Personal idóneo para trabajo seguro en altura. 13. Inducción al cargo y capacitación.
	Biológico: picaduras y mordeduras	Alergias, irritación, afectaciones al estado de salud	
Organización de herramientas y equipos, limpieza del área de trabajo	Condiciones de seguridad: Locativo (terreno irregular)	lesiones severas, perdidas humanas y materiales	1. Estar atento a las condiciones del entorno. 2. Reporte de actos y condiciones inseguras 3. Atender a señalización 4. Seguir recomendaciones e indicaciones de seguridad. 5. Mantener condiciones de orden y aseo 6. Uso adecuado de EPI. 7. Inducción al cargo y capacitación.
	Biológico: picaduras y mordeduras	Alergias, irritación, afectaciones al estado de salud	

Riesgos: todas las actividades: condiciones de seguridad (accidentes de tránsito, riesgo público); fenómenos naturales (sismos, derrumbes)

Controles generales: 1. Plan de emergencias y evacuación; 2. Conformación de brigadas de emergencias; 3. Disponibilidad de elementos para la atención de emergencias; 4. Verificar interferencia con trabajos adyacentes; 5. Emplear herramienta adecuada y en buen estado; 6. Realizar mantenimiento preventivo y/o correctivo de la maquinaria y equipos. 7. Fomentar cultura de autocuidado.

IDENTIFICACIÓN DE TRABAJADORES EJECUTORES

Nombres y Apellidos	No. de Identificación	Firma
Miguel Rangel	1124048478	Miguel
Willington Alarcón Asanio.	91.479571	WAA

IDENTIFICACIÓN RESPONSABLE DE LA TAREA (Residente de Obra, Auxiliar de Ingeniería, Supervisor)

Nombres y Apellidos	No. de Identificación	Firma
Oscar Andres Sanchez J.	1098756647	

IDENTIFICACION DEL EMISOR (Responsable SST)

Nombres y Apellidos	No. de Identificación	Firma
Melissa Dorado Arias	1098794436	Melissa Dorado

ANEXO No.05: SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD

CONSORCIO
CONSOLIDACIÓN GIRÓN

INFORME PLAN DE CALIDAD 006

CONTRATO Nº 210.16225.6

Fecha	Elaboró	Revisó	Aprobó
13/04/2026	Ing. Oscar Sánchez	Ing. Edgar Gomez	Ing. Edgar Gomez

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 3
1. CONSIDERACIONES GENERALES 4
2. GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE APOYO 4
2.1 Talento humano 4
2.2 Infraestructura 5
2.3 Conocimiento y toma de conciencia 6
2.4 Comunicaciones 6
2.5 Información documentada 7
3. OPERACIÓN 8
3.1 Planificación y control operacional 8
3.2 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente 9
3.3 Control en la prestación del servicio 9
3.4 Liberación de productos y servicios. 10
3.5 Control de salidas no conformes. 10
3.6 Encuesta de satisfacción del cliente. 10
4. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 10
5. AUDITORIAS INTERNAS 12
6. REVISIÓN DE LA DIRECCIÓN 12
7. MEJORA CONTINUA 12
8. ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS 12
9. CONCLUSIONES 12
10. RECOMENDACIONES 13

INTRODUCCIÓN

El CONSORCIO CONSOLIDACIÓN GIRÓN motivado a mejorar continuamente la eficacia de su sistema de gestión de calidad, se compromete en su participación directa, liderando, creando una cultura de calidad en la organización, fomentando la participación positiva de todo el personal en la ejecución del proyecto "CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACION PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN EL TALUD ORIENTAL DEL BARRIO VILLA DE LOS CABALLEROS EN EL MUNICIPIO DE GIRÓN, DEPARTAMENTO DE SANTANDER."

El presente informe comprende el periodo entre el 01 y el 31 de marzo 2026, describe el cumplimiento de las actividades propuestas en el aseguramiento y control de la calidad del proyecto contenidas en el plan de calidad del proyecto y el plan de inspección y ensayo. Los formatos utilizados para el seguimiento y control de este proyecto están acogidos al sistema de calidad de las empresas consorciadas.

Para el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de marzo 2026 se realizan las siguientes actividades:

- Replanteo, Control y medición de Obra (mes)
- Suministro y colocación de concreto de 3000 psi con mezcla húmeda para zapatas
- Suministro y colocación de concreto lanzado con mezcla húmeda de espesor 10 cm
- Canaleta (ancho = 1m; e =10cm) m
- Estructura de disipación de energía (m)

1. CONSIDERACIONES GENERALES

CONTRATO DE OBRA	N° 210.62225.6
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACION PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN EL TALUD ORIENTAL DEL BARRIO VILLA DE LOS CABALLEROS EN EL MUNICIPIO DE GIRÓN, DEPARTAMENTO DE SANTANDER.
ENTIDAD CONTRATANTE	CDMB – CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA.
CONTRATISTA	CONSORCIO CONSOLIDACIÓN GIRÓN
REPRESENTANTE LEGAL	JOHANNA MARCELA PEDIERNA CASTIBLANCO
NIT	901.982.51-5
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTER GIRÓN
REPRESENTANTE LEGAL	IBAN GUSTAVO BLANCO GONZALEZ
NIT	901.985.184-1
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	6 MESES
FECHA DE INICIO	15/10/2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	14/04/2026
MUNICIPIO	GIRÓN - SANTANDER

2. GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE APOYO

2.1 Talento humano

El CONSORCIO CONSOLIDACIÓN GIRÓN tiene establecido los perfiles y funciones de los cargos para el personal administrativo y obra. Para el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de marzo 2026 NO se realizaron ingresos de personal, se registró un retiro, el cual se relaciona en la siguiente tabla.

RETIRO DE PERSONAL	
NOMBRE	**CARGO**
Yohan Alexander Caceres Pabón	Ayudante De Obra

Ver anexo 1. Documentos soporte salida de personal.

El pago a los trabajadores hace parte de las obligaciones legales del CONSORCIO CONSOLIDACIÓN GIRÓN, realizándose en los términos pactados y dejando su correspondiente registro documental, los soportes de pago de seguridad social, para el periodo comprendido son verificadas en las entregas realizadas a interventoría en el informe SST. Para el periodo NO se presentaron egresos de personal.

2.2 Infraestructura

El CONSORCIO CONSOLIDACIÓN GIRÓN ha destinado como lugar de trabajo la oficina principal de la empresa INFRACORP, la cual se encuentra ubicada en la carrera 39 No. 51-31 Apartamento 2405, esta oficina cuenta con la estructura y los espacios necesarios para llevar a cabo las actividades de revisión y ajustes de diseños.

Adicionalmente, se realizan visitas a la zona de influencia del proyecto, donde se realizan estudios topográficos que permiten la revisión y ajuste de los diseños.

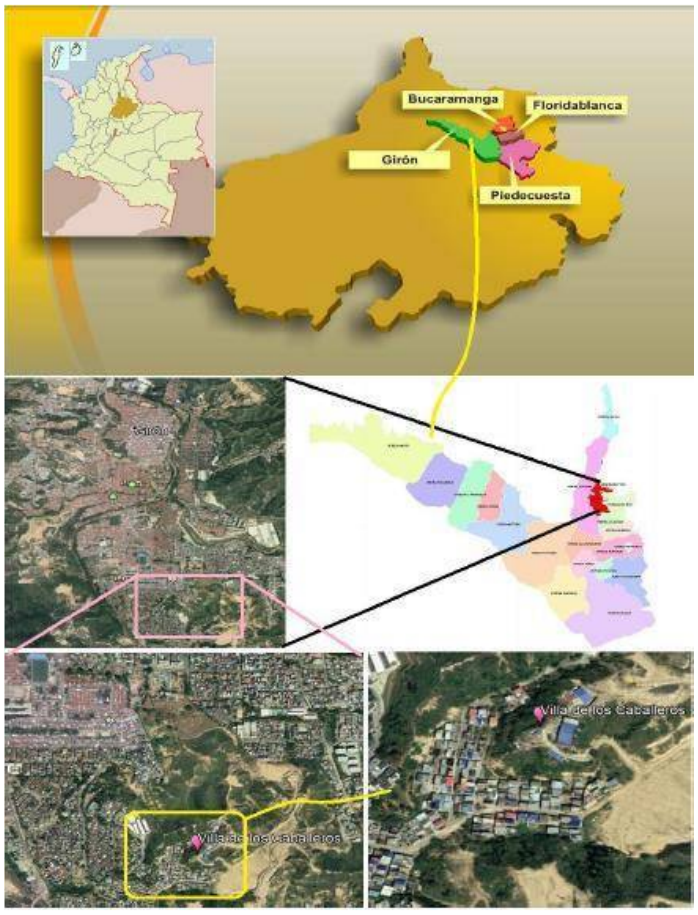


Tabla 3. Ubicación del proyecto

En el periodo comprendido se han requerido los siguientes equipos y maquinaría:

MAQUINARIA Y EQUIPO	
	
Compresor MQ69	Estación Topográfica

Anexo 2. Control de maquinaria y equipo.

2.3 Conocimiento y toma de conciencia

El CONOSORCIO CONSOLIDACIÓN GIRÓN tiene dentro de sus responsabilidades la capacitación y formación del personal, para el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de marzo 2026 se presentaron 4 capacitaciones. 2 del área SST; prevención del riesgo mecánico y prevención del riesgo locativo, 1 capacitación del área ambiental; manejo de la vegetación, fauna y paisajismo y 1 capacitación del área social; fortalecimiento de valores (integridad), educación vial y oficina de atención a la comunidad, Los soportes de asistencia a las capacitaciones se presentan en los informes mensuales entregados a interventoría.

2.4 Comunicaciones

La comunicación con las partes interesadas se realiza mediante, Bitácora de obra diaria, Comités técnicos, informes y control de la correspondencia y comunicaciones internas.

Durante el periodo establecido del 1 al 31 marzo se realizaron 2 comités técnicos y tres visitas técnicas, los soportes de los mismos están relacionados en el informe técnico.

RELACIÓN DE COMITES	
COMITÉ	**FECHA**
Acta de Reunión No. 10	18/03/2026
Acta de Reunión No. 11	27/03/2026
Evidencia hoja de visita No.1	13/03/2026
Evidencia hoja de visita No.2	18/03/2026
Evidencia hoja de visita No.3	27/03/2026

La comunicación con el personal vinculado durante este periodo se utilizaron medios tecnológicos aprobados por la gerencia como correo electrónico, mensajería instantánea y

correspondencia interna para tener conocimiento de las actividades e información importante de la organización.

2.5 Información documentada

Los documentos internos y externos se mantienen controlados de acuerdo con lo establecido en el procedimiento de control de documentos y registros, disponiendo de un mecanismo sistemático para editarlo, adecuarlo, aprobarlo, almacenarlo, distribuirlo, revisarlo, actualizarlo y generar un ciclo, los listados se entregan en los diferentes informes de SST y calidad.

Para el control documental del plan de calidad durante este periodo se utilizaron los siguientes procedimientos y formatos, los cuales se han tomado del sistema de gestión de calidad del contratista INFRACORP.

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS				
CODIGO	**NOMBRE**	**TIPO DE DOCUMENTO**	**VERSIÓN**	**FECHA**
RH-M-01	Manual de funciones y responsabilidades	Manual	6	28/05/2024
OB-P-31	Procedimiento de revisión y ajuste de diseños y desarrollo de proyectos	Procedimiento	2	30/06/2022
SST-F-02	Formato de inducción y reinducción	Formato	5	28/07/2025
SST-F-03	Evaluación de inducción y reinducción	Formato	5	28/07/2025
SST-F-06	Notificación de riesgos en seguridad y salud en el trabajo	Formato	3	02/01/2024
SST-F-44	Ficha de indicadores	Formato	2	03/05/2021
SST-P-15	Procedimiento de reporte e investigación de accidentes e incidentes de trabajo y enfermedades laborales	Procedimiento	3	01/11/2022
SST-P-19	Procedimiento para la entrega de Epp’s	Procedimiento	1	27/02/2022
SST-P-20	Procedimiento de capacitación y entrenamiento	Procedimiento	2	24/02/2022
SST-PR-10	Programa para trabajo seguro en alturas	Programa	3	01/11/2023
SST-PT-01	Política de seguridad y salud en el trabajo	Política	3	22/07/2025

SST-R-01	Reglamento de higiene y seguridad industrial	Reglamento	3	10/03/2021

Adicionalmente, se deben tener en cuenta los documentos externos que son sugeridos por el cliente y en algunos casos por la interventoría. A continuación, se presentan los documentos identificados a la fecha:

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS EXTERNOS	
NOMBRE	**TIPO DE DOCUMENTO**
Contrato de obra	Documento
Pólizas del contrato	Documento
Acta de inicio	Formato
Informe semanal de obra	Formato
Acta de comité técnico	Formato
Control de asistencia a reuniones	Formato

El CONSORCIO CONSOLIDACIÓN GIRÓN conservará los registros de calidad durante cinco (5) años; al cumplirse este período, y un mes antes de destruir dichos registros, se informará a la CDMB – CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA sobre tal acción, y si éste lo considera adecuado, podrá conservarlos, evitando así su destrucción.

Los documentos generados a la fecha se encuentran en custodia del director de Obra, quien realiza su respectiva conservación y control.

3. OPERACIÓN

3.1 Planificación y control operacional.

En este periodo entre el 1 al 31 marzo 2026 se ejecutaron actividades como el replanteo, así como el control y medición de la obra, son fundamentales para asegurar que lo construido corresponda a los planos y dimensiones definidas. De igual forma, el suministro y colocación de concreto para zapatas y concreto lanzado requieren una adecuada planificación y acompañamiento técnico para asegurar que los materiales, tiempos y procesos sean los correctos, evitando errores y retrabajos.

Por otro lado, la construcción de elementos como canaletas y estructuras de disipación de energía también requiere un seguimiento constante para verificar que se ejecuten de acuerdo con lo previsto. La planificación permite coordinar los recursos, definir responsables y mantener un control continuo de las actividades, lo que contribuye a mejorar

la calidad de la obra, cumplir con los tiempos establecidos y asegurar un resultado final acorde con lo esperado.

Para el periodo mencionado se avanza de acuerdo a la programación, en el informe técnico entregado a interventoría se desglosa de manera detallada cada una de las actividades realizadas. *(ver pdt anexo al informe técnico)*

3.2 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente

En el periodo se realizó la adquisición de los siguientes materiales ya que las actividades a ejecutar lo requieren.

LISTA DE MATERIALES
ALAMBRE
CEMENTO
VARILLA CORRUGADA
GEODREN
ARENA

Para el periodo no se presenta evaluación de proveedores, ya que la selección de proveedores se realizó de acuerdo a la evaluación realizada en mayo 2025 por la empresa consorciada INFRACORP SAS el cual garantiza las actividades de compras involucradas con la ejecución del proyecto.

Anexo 3. Control de ingreso y salida de material.

3.3 Control en la prestación del servicio

Para la ejecución de la revisión y ajuste de diseños, se ha dado cumplimiento al procedimiento de desarrollo y ajuste de diseños, donde se especifican las actividades que componen este proceso, se tiene como soporte, control y trazabilidad de las actividades:

1. Informes semanales
2. Fotografías
3. Actas de comités
4. Carteras topográficas.
5. Bitácora de obra

Esta información se encuentra consignada en los informes de avance de obra.

3.4 Liberación de productos y servicios.

Para el control de los materiales y procesos constructivos se realiza seguimiento al plan de inspección y ensayo.

Para el periodo comprendido se realiza la revisión y ajuste de los diseños, donde se requiere de estudios y recolección de información para realizar los cambios que sean necesarios, el especialista encargado mediante documento escrito y reuniones periódicas, las cuales son evidenciadas en las actas de reunión, hace las respectivas aclaraciones y conciliaciones de los diseños.

Para el desarrollo de esta actividad se cuenta con un equipo de topografía el cual se encuentra calibrado de acuerdo a las especificaciones del equipo.

Anexo 4. Certificados de calidad y Resultados de laboratorio - ensayos PIE

3.5 Control de salidas no conformes.

Durante el periodo no se identificaron elementos que no cumplieran con los requisitos de conformidad, por lo que no fue necesario implementar ningún tratamiento de acuerdo con lo dispuesto en el procedimiento de producto no conforme.

3.6 Encuesta de satisfacción del cliente.

En el sector de la contratación con el Estado colombiano tanto los requisitos como la satisfacción del cliente se encuentran manifiestos de forma escrita, en el caso de los requisitos se manifiestan en los términos de referencia, contrato o especificaciones. Las actas de recibo parcial mensuales de avance de obra y acta de recibo definitivo revisadas, aceptadas y recibidas manifiestan la satisfacción del cliente a través de la interventoría y/o supervisor de la entidad, por lo cual para los proyectos de obra pública lo establecido por el CONSORCIO CONSOLIDACIÓN GIRÓN se convalida como demostración de satisfacción del cliente las actas parciales de avance aprobadas y el acta de recibo final.

A la fecha no se han recibido actas que manifiesten la no conformidad del cliente y por los avances en obra no se han realizado encuestas o comunicados que aprueben la satisfacción de las demás partes interesadas.

4. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

Para el seguimiento, medición, análisis y evaluación de la gestión de calidad del proyecto, para el periodo establecido se miden los siguientes indicadores a corte del 31 de marzo 2026 :

INDICADOR	FRECUENCIA	META	LOGRO
Cumplimiento del avance de obra	Mensual	>90%	99,29%
Atención de quejas	Mensual	100%	No se han presentado quejas
Desempeño de los proveedores externos	Anual	>80%	No se ha realizado la evaluación de proveedores
Multas en el período	Mensual	0	No se han presentado multas
Ejecución del Plan de Capacitación y Formación	Mensual	100%	No se tenían capacitaciones programadas

- Durante el período comprendido entre el 1 y el 31 de marzo de 2026 se registra un avance físico acumulado ejecutado del 98,09%, el cual supera el avance programado del 98,83 % reflejando un cumplimiento del 99.25% evidenciando un cumplimiento no favorable de la programación establecida para el proyecto. Este resultado refleja cumplimiento en el desarrollo de las actividades y control operativo durante la ejecución de las obras, pero no se obtiene el100% ejecutado de lo programado debido a la ejecución de actividades de pormenores no obstante el desempeño general de proyecto es positivo.
- Dentro del periodo establecido no se reportaron productos no conformes y/o presentación de quejas, manteniendo los indicadores satisfactorios.
- Durante el periodo no se presentan sanciones o multas al proyecto, por lo cual el indicador se mantiene satisfactorio.
- Para el periodo se desarrollaron 4 capacitaciones. 2 del área SST; prevención del riesgo mecánico y prevención del riesgo locativo, 1 capacitación del área ambiental; manejo de la vegetación, fauna y paisajismo y 1 capacitación del área social; fortalecimiento de valores (integridad), educación vial y oficina de atención a la comunidad, Los soportes de asistencia a las capacitaciones se presentan en los informes mensuales entregados a interventoría.
- Los indicadores asociados a SST se encuentran establecidos en el informe SST del periodo.
- Los indicadores asociados al medio ambiente se encuentran establecidos en el PASA del proyecto.

Anexo 5. Ficha de indicadores.

5. AUDITORIAS INTERNAS

Para el periodo establecido no se realizaron auditorías internas, se tiene programado por parte del CONSORCIO CONSOLIDACIÓN GIRÓN realizar una auditoría interna pendiente definir fecha de realización.

6. REVISIÓN DE LA DIRECCIÓN

La revisión por parte de la dirección para temas organizacionales y de calidad se realiza anualmente, para el periodo establecido, no se ha hecho dicha revisión, se tiene previsto esta revisión para el mes de marzo del 2025.

Adicionalmente, se realiza revisión del contrato mediante comités de obra semanales o según lo establezca en conjunto con la interventoría donde se evaluará el avance del proyecto de acuerdo a la programación de obra, verificando tiempos de ejecución y programa de inversión, a la fecha no se han evidenciado factores de preocupación en el desarrollo de la obra.

7. MEJORA CONTINUA

El CONSORCIO CONSOLIDACIÓN GIRÓN durante el periodo organizó con el equipo de trabajo encargado de la ejecución del proyecto un plan de mejora de procesos enfocado en identificar los eslabones débiles en la cadena de procesos o cuellos de botella que impiden el trabajo tanto administrativos, de apoyo como de construcción, y luego encontrar formas de rectificar esas ineficiencias.

A la fecha no se han identificado procesos o actividades que perjudiquen el avance en el proyecto.

8. ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

En este periodo no se presentan acciones correctivas y preventivas.

9. CONCLUSIONES

1. Se realizó correctamente la vinculación, el pago de salarios y seguridad social del personal, de acuerdo con lo establecido por la organización y la normatividad vigente aplicable, permitiendo contar con el personal idóneo para el desarrollo de las actividades correspondientes a la revisión y ajuste de los diseños.
2. Se cuenta con los equipos y la infraestructura necesaria para ejecutar las actividades de este periodo a satisfacción.

3. Se cuenta con registros y soportes que permiten llevar el seguimiento del proyecto, se han realizado los respectivos informes y actas de comité que soportan dicho seguimiento.
4. No se han presentado quejas, sanciones, multas o productos no conformes que interfieran con las actividades del proyecto.
5. Se adecuo la oficina de atención a la comunidad. Se repartieron volantes informativos para conocimiento de la comunidad con el fin de dar respuesta oportuna a todas las solicitudes, peticiones, quejas o reclamos que provengan de la obra.

10. RECOMENDACIONES

1. Se recomienda continuar con la elaboración de informes y actas de comités del proyecto que permitan realizar el correcto seguimiento de las actividades.
2. Planear detalladamente las actividades del proyecto y realizar seguimiento a los equipos y/o materiales que se requieran.
3. Continuar con el seguimiento y control de las actividades contempladas, la realización de los ensayos según el PIE.
4. Control y verificación del ingreso y salida de materiales de la obra y los certificados de calidad de los materiales.
5. Continuar con el diligenciamiento y seguimiento de los preoperacionales de la maquinaria y equipo asignados al proyecto.
6. Realizar el registro del control de ingreso y salida de visitantes a la obra, el control del uso de los epp y la dotación correspondiente.

Anexo 1. Documentos soporte salida de personal.

Bucaramanga, 12 de marzo de 2026

Señores
CONSORCIO CONSOLIDACION GIRON
Ciudad

Ref. Renuncia Voluntaria

Por medio de la presente, me dirijo a ustedes para presentar formalmente mi renuncia al cargo que desempeño, en el **CONSORCIO CONSOLIDACION GIRON**, esta renuncia desde el día 12 de marzo de 2026, la decisión de renunciar a mi puesto se debe a motivos personales.

Agradezco las oportunidades brindadas.

Atentamente.

Yohan Alexander Caceres Pabon
YOHAN ALEXANDER CACERES PABON
C.C 1.102.383.713



CONSORCIO CONSOLIDACIÓN GIRÓN	**ACEPTACIÓN DE RENUNCIA**	**Código**	**RH-F-15**
		Fecha	**29/07/2022**
		Versión	**4**
		Página 1 de 1	

bucaramanga, 13-marzo-2026

Señor(a)

Yohan Alexander Caceres Pabon

REF.: ACEPTACION DE RENUNCIA

Dando respuesta a su comunicación de fecha 12 de Marzo de 2026, nos permitimos manifestarle que la empresa acepta la **RENUNCIA** por Usted presentada de manera irrevocable al cargo desempeñado como **Ayudante de Obra** .


Esta aceptación se hace efectiva a partir del **12 de Marzo del 2026.**

A partir de esta fecha, se procederá a realizar su tramite de liquidación.

Favor solicitar en la oficina principal cita e indicaciones para realizarse exámenes de egreso, los cuales debe presentar a la empresa dentro de los 5 días siguientes a su retiro. En caso de no presentarse la empresa no asume responsabilidad por el incumplimiento de este requisito.

Agradecemos los servicios prestados a **CONSORCIO CONSOLIDACION GIRON** deseándole éxitos en sus labores futuras.

Cordialmente,



JOHANNA MARCELA PADIERNA CASTIBLANCO
REPRESENTANTE LEGAL

Recibí:

PROYECTÓ: CMRP REVISÓ: ELGR	CR 39 51 31 AP 2405

Anexo 2. Control de maquinaria y equipo.

MAQUINOBRAS DE COLOMBIA	FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA	Código	GM-F-28
		Fecha	12/04/2024
		Versión	3
		Página 1 de 2	

TIPO DE MAQUINARIA	COMPRESOR	ID INTERNO	69
OBRA/PROYECTO	Consorcio Giron	MES	03
INSPECCIONADO POR	Isaac Garcia	SEMANA	01

INSPECCIÓN

ITEM		ACTIVIDADES	DÍAS DE LA SEMANA						
			DIA	03	04	05	06	DIA	DIA
1	ESTADO DEL MOTOR	*Unidad en buen estado		✓	✓	✓	✓		
2		*Motor en buen estado		✓	✓	✓	✓		
3		Tanque de combustible en buen estado		✓	✓	✓	✓		
4		*Válvula de seguridad funcionando		✓	✓	✓	✓		
5		*Salida de Aire en buen estado		✓	✓	✓	✓		
6		*Nivel de aceite de motor		✓	✓	✓	✓		
7		*Nivel de refrigerante		✓	✓	✓	✓		
8		*Nivel de aceite en la unidad		✓	✓	✓	✓		
9		Encendido del motor en buena condición		✓	✓	✓	✓		
10		Control de fugas		✓	✓	✓	✓		
11	SISTEMA NEUMÁTICO	*Válvulas de alivio operando		✓	✓	✓	✓		
12		Mangueras con abrazaderas en buen estado		✓	✓	✓	✓		
13		Racores de empalme en buena condición		✓	✓	✓	✓		
14		Acoples rápidos de mangueras con seguros		✓	✓	✓	✓		
15		Indicadores de tablero (horómetro, manometro de presión de aire, aceite de motor, refrigerante)		✓	✓	✓	✓		
16		*Sistema de enfriamiento		✓	✓	✓	✓		
17	ASPECTOS GENERALES	Estado de llantas		✓	✓		✓		
18		Estado de sistema de muelles de amortiguacion		✓	✓	✓	✓		
19		Revisión de tiro y partes móviles para facilitar el traslado.		✓	✓	✓	✓		
20		Estado de baterías y cables		✓	✓	✓	✓		
21		*Estado del radiador		✓	✓	✓	✓		
22		Estado de seguros de las puertas laterales		✓	✓	✓	✓		
23		Estado de la pintura.		✓	✓	✓	✓		
24		Estado de limpieza general		✓	✓	✓	✓		
		FIRMA DEL RESPONSABLE							

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR.

CRITERIOS DE INSPECCIÓN

✓ Se Ejecuta la actividad y cumple con el criterio de aceptación

✗ Se Ejecuta la actividad y NO cumple con el criterio de aceptación, Si no cumple llenar observaciones.

IV. OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

MAQUINOBRAS DE COLOMBIA	FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA	Código	GM-F-22
		Fecha	12/04/2024
		Versión	3
		Página 2 de 2	

INFORMACIÓN

UBICACIÓN:	Girón
INSPECCIONADO POR:	Isaías García
PROYECTO:	consorcio Girón

REPORTE DE HOROMETROS Y CONSUMOS

FECHA		03/03/2026	04/03/2026	05/03/2026	06/03/2026		
HORÓMETRO		2376	2325	2394	2345		
COMBUSTIBLE		30 gl	43 gl	50 gl	45 gl		
ACEITE DE MOTOR	✓	✓	✓	✓	✓		
REFRIGERANTE		✓	✓	✓	✓		
ACEITE DE LA UNIDAD		✓	✓	✓	✓		
OTRO _____							

OBSERVACIONES

FIRMA INSPECTOR	Isaías García
FECHA	03-03-2026
FIRMA SUPERVISOR	
FECHA	

Powered by CamScanner

TIENDA TOPOGRAFICA

NIT: 901.342.575-9

EQUIPOS DE TOPOGRAFIA Y ACCESORIOS, GNSS – GPS, BATIMETRIA, LABORATORIOS DIDACTICOS, DE ENTRENAMIENTO, SUELOS, DRONES, MEDIO AMBIENTE, FOTOGRAMETRIABASICA, DIGITAL, SOFTWARE TOPOGRAFICO, SERVICIO DE CALIBRACION Y MANTENIMIENTO EQUIPOS TOPOGRAFICOS.

	TIENDA TOPOGRAFICA	VERSION 1
	CERTIFICADO DE MANTENIMIENTO Y VERIFICACION DE EQUIPOS (NIVELES TOPOGRAFICOS)	FECHA DE EMISION: 01-01-2019
		DOCUMENTO CONTROLADO

Bucaramanga 11/JUNIO/2025 **Nº 1199**

EQUIPO: *NIVEL AUTOMATICO* **MARCA:** TOPCON **REF:** AT-B4 **No** ***RX6637***

EMPRESA: MAQUINOBRAS DE COLOMBIA **NIT:** 900.849.507 - 1 **CIUDAD:** BUCARAMANGA

DIRECCION: Carrera 26 No. 36 – 14 Of. 403 Edificio Fenix

TELEFONO: 6914305 - 3164735387

NUEVO **SI** ☐ **NO** ■

Certificado vigente hasta: 11 DE DICIEMBRE/2025, bajo buen uso guardando las precauciones propias para esta clase de instrumentos.

El presente documento hace la descripción de los procedimientos utilizados en nuestra empresa para hacer la calibración de instrumentos de topografía.

DIAGNOSTICO Y AJUSTE

DESCRIPCION	1	2	3	4
Base Nivelante	X	X		X
Giro del Instrumento	X	X		X
Movimiento Lento	X	X		X
Retículo		X		X
Compensador				X
Enfoque de Perilla	X	x		X
Lente Objetivo		X		X
Lente interno		X		X
Nivel circular		X		X

1. Cambio de Grasas **2.** Ajuste y/o limpieza **3.** Requiere Cambio **4.** Correcto

Nota: el numeral 4 indica que el componente está en buen estado o que ha sido corregido el problema

Cambio de Repuestos **SI** ☐ **NO** ■

Cuales:

Observaciones o Recomendaciones:

TIENDA TOPOGRÁFICA S.A.S. NIT. 901342575-9 Firma Autorizada

FLORIDABLANCA: Calle 109 #33ª26 B. Caldas
Tels: 3112685852- 3207361086 - 6362981
ventas@tiendatopografica.com
tiendatopografica.wixsite.com/inicio
COLOMBIA

VERIFICAR LA AUTENTICIDAD – SU RESPONSABILIDAD VERIFICAR LA VALIDEZ DEL CERTIFICADO – QUE PRESENTE CERTIFICADO

CERTIFICADO No. **1199**

LUIS ENRIQUE PINTO GOMEZ

Firmado digitalmente por LUIS ENRIQUE PINTO GOMEZ
Fecha: 2025.06.16 16:33:26 -05'00'

TIENDA TOPOGRAFICA
NIT: 901.342.575-9

EQUIPOS DE TOPOGRAFIA Y ACCESORIOS, GNSS – GPS, BATIMETRIA, LABORATORIOS DIDACTICOS, DE ENTRENAMIENTO, SUELOS, DRONES, MEDIO AMBIENTE, FOTOGRAMETRIABASICA, DIGITAL, SOFTWARE TOPOGRAFICO, SERVICIO DE CALIBRACION Y MANTENIMIENTO EQUIPOS TOPOGRAFICOS.

	TIENDA TOPOGRAFICA	VERSION 1
	CERTIFICADO DE MANTENIMIENTO Y VERIFICACION DE EQUIPOS (NIVELES TOPOGRAFICOS)	FECHA DE EMISION: 01-01-2019
		DOCUMENTO CONTROLADO

Nº 1199

La Verificación se efectuó siguiendo las indicaciones del fabricante, según sus catálogos.

TEST DE EXACTITUD RETICULO HORIZONTAL
LECTURA EN LINEA DE 26M

Patrón Referencia ***(Colimador SOUTH F420-4TA Serial:12-0678):***

	A
P1	6.235
	6.235
ERROR	0.000mm

TEST DE EXACTITUD RETICULO VERTICAL
LECTURA EN LINEA DE 26M

Patrón Referencia ***(Colimador SOUTH F420-4TA Serial:12-0678):***

P1	8.789
P2	8.789
ERROR	0.000mm

ERROR DETECTADO 2 MM CORREGIDO A 1 MM

PARÁMETRO O COMPONENTE	ESPECIFICACIÓN	CUMPLE	
		SI	NO
Sensibilidad nivel circular (/2mm)	8'	X	
Precisión a 30m/100ft(mm/in)	2,5	X	
Precisión del nivel automático	0.3"	X	
Rango de Compensación	(+-) 15'	X	
Campo de Visualización	1º 30'	X	
Mínimo Enfoque (m / ft.)	0.5 / 1.6	X	

Nota: Los ajustes realizados al nivel están en el rango de error máximo permitido, especificado por cada parámetro en el anterior cuadro dado por las especificaciones del fabricante que determina la máxima tolerancia de cierre permisible dentro de los parámetros y rangos proporcionales de error permitido, precisión técnica garantizada por el fabricante.

EQUIPO: *NIVEL AUTOMATICO* **MARCA:** TOPCON **REF:** AT-B4 No: ***RX6637***

TIENDA TOPOGRÁFICA S.A.S. NIT. 901342575-9
Firma Autorizada
LUIS ENRIQUE PINTO GOMEZ
GERENTE GENERAL

TIENDA TOPOGRÁFICA S.A.S. NIT. 901342575-9
Firma Autorizada
LUIS EMANUEL PINTO GRISALES
MANTENIMIENTO TECNICO

VERIFICAR LA AUTENTICIDAD
SU RESPONSABILIDAD VERIFICAR LA VALIDEZ DEL CERTIFICADO

FLORIDABLANCA: Calle 109 #33ª26 B. Caldas
Tels: 3112685852- 3207361086 - 6362981
ventas@tiendatopografica.com
tiendatopografica.wixsite.com/inicio
COLOMBIA

CERTIFICADO No.
1199

TIENDA TOPOGRAFICA

NIT: 901.342.575-9

EQUIPOS DE TOPOGRAFIA Y ACCESORIOS, GNSS – GPS, BATIMETRIA, LABORATORIOS DIDACTICOS, DE ENTRENAMIENTO, SUELOS, DRONES, MEDIO AMBIENTE, FOTOGRAMETRIABASICA, DIGITAL, SOFTWARE TOPOGRAFICO, SERVICIO DE CALIBRACION Y MANTENIMIENTO EQUIPOS TOPOGRAFICOS.

	TIENDA TOPOGRAFICA S.A.S	**VERSION 2**
	CERTIFICADO DE MANTENIMIENTO Y VERIFICACION DE EQUIPOS (ESTACION TOTAL)	**FECHA DE EMISION: 01-01-2019**
		DOCUMENTO CONTROLADO

Bucaramanga 11/JUNIO/2025 **Nº 1201**

EQUIPO: ESTACION TOTAL **MARCA:** TOPCON **REF:** GM-55 **PRECISION:** 5″ **No:** **1Y001620**

EMPRESA: MAQUINOBRAS DE COLOMBIA **NIT:** 900.849.507 - 1 **CIUDAD:** BUCARAMANGA

DIRECCION : Carrera 26 No. 36 – 14 Of. 403 Edificio Fenix

TELEFONO: 6914305 - 3164735387

NUEVO **SI** ☐ **NO** ■

Certificado vigente hasta: 11 DE DICIEMBRE/2025, bajo buen uso guardando las precauciones propias para esta clase de instrumentos.

El presente documento hace la descripción de los procedimientos utilizados en nuestra empresa para hacer la calibración de instrumentos de topografía.

DIAGNOSTICO Y AJUSTE

DESCRIPCION	1	2	3	4
Base Nivelante	X	X		X
Nivel circular y tubular		X		X
Movimiento Horizontal	X	X		X
Movimiento Vertical	X	X		X
Freno Horizontal	X	X		X
Freno Vertical	X	X		X
Display		X		X
Ajuste plomado		X		X
Revisión Batería		X		X
Revisión Cargador				X

DESCRIPCION	1	2	3	4
Lente Interno		X		X
Base de Retículo		X		X
Retículo		X		X
Objetivo				X
Verticalidad		X		X
Operación				X
Revisión de Teclado		X		X
Programación de Parámetros		X		X
Entrada y Salida de Datos				X

1. Cambio de Grasas **2.** Ajuste y/o limpieza **3.** Requiere Cambio **4.**Correcto

Nota el numeral 4 indica que el componente está en buen estado o que ha sido corregido el problema

Cambio de Repuestos **SI** ☐ **NO** ■

Cuales:

Observaciones o Recomendaciones:

TIENDA TOPOGRÁFICA S.A.S. NIT. 901.342.575-9
Firma Autorizada

FLORIDABLANCA: Calle 109 #33ª26 B. Caldas
Tels: 3112685852- 3207361086 - 6362981
ventas@tiendatopografica.com
tiendatopografica.wixsite.com/inicio
COLOMBIA

VERIFICAR LA AUTENTICIDAD DEL PRESENTE CERTIFICADO
SU RESPONSABILIDAD VERIFICAR LA VALIDEZ DEL CERTIFICADO

CERTIFICADO No. **1201**

LUIS ENRIQUE PINTO GOMEZ
Firmado digitalmente por LUIS ENRIQUE PINTO GOMEZ
Fecha: 2025.06.16 16:32:21 -05'00'

TIENDA TOPOGRAFICA
NIT: 901.342.575-9

EQUIPOS DE TOPOGRAFIA Y ACCESORIOS, GNSS – GPS, BATIMETRIA, LABORATORIOS DIDACTICOS, DE ENTRENAMIENTO, SUELOS, DRONES, MEDIO AMBIENTE, FOTOGRAMETRIABASICA, DIGITAL, SOFTWARE TOPOGRAFICO, SERVICIO DE CALIBRACION Y MANTENIMIENTO EQUIPOS TOPOGRAFICOS.

	TIENDA TOPOGRAFICA S.A.S	VERSION 2
	CERTIFICADO DE MANTENIMIENTO Y VERIFICACION DE EQUIPOS (ESTACION TOTAL)	FECHA DE EMISION: 01-01-2019
		DOCUMENTO CONTROLADO

Nº 1201

La Verificación se efectúo siguiendo las indicaciones del fabricante, según sus catálogos.

TEST DE EXACTITUD ANGULO HORIZONTAL Y VERTICAL

Patrón Referencia ***(Colimador SOUTH F420-4TA Serial:120663):***

	A HORIZONTAL		A VERTICAL
P1	0°00'00"	P1	269°56'40"
P2	180°00'00"	P2	90°03'19"
ERROR	00°00'00"	ERROR	00°00'01"

TOLERANCIA DE ERROR PERMITIDO POR EL FABRICANTE ES DE 2 SEGUNDOS
(La tolerancia de error especifica un margen como aceptable en la calibración)

ERROR ENCONTRADO EN LA REVISION DEL EQUIPO			
	°	´	´´
Posición 1 (Vertical D)	90	58	03
Posición 1 (Horizontal D)	00	00	00
Posición 1 (Vertical I)	269	01	40
Posición 1 (Horizontal I)	179	59	50
Error Observado V	00	00	17
Error Observado H	00	00	10

ERROR CORREGIDO Y CALIBRADO EL EQUIPO			
	°	´	´´
Posición 2 (Vertical D)	90	58	32
Posición 2 (Horizontal D)	00	00	00
Posición 2 (Vertical I)	269	01	29
Posición 2 (Horizontal I)	180	00	00
Error Observado V	00	00	01
Error Observado H	00	00	00

INSPECCION EDM SOBRE LINEA BASE (DISTANCIOMETRO) COND. 25° P. ATM 763MMHG CON. PRISMA -30					
ERROR ENCONTRADO EN LA REVISION			**ERROR CORREGIDO Y CALIBRACO EL EQUIPO**		
DISTANCIA	**MEDIDO**	**ERROR**	**DISTANCIA**	**MEDIDO**	**ERROR**
5 MTRS	4.992	8MM	5 MTRS	5.000	------
10 MTRS	9.992	8MM	10 MTRS	10.000	------
100 MTRS	99.992	8MM	100 MTRS	99.999	1MM

Nota: Los ajustes realizados a la estación están en el rango de error máximo permitido, especificado por cada parámetro en el anterior cuadro dado por las especificaciones del fabricante que determina la máxima tolerancia de cierre permisible dentro de los parámetros y rangos proporcionales de error permitido, precisión técnica garantizada por el fabricante.

EQUIPO: ESTACION TOTAL **MARCA:** TOPCON **REF:** GM - 55 **PRECISION:** 5" NO: **1Y001620**

TIENDA TOPOGRAFICA S.A.S. Nit. 901342575-9 Firma Autorizada
LUIS ENRIQUE PINTO GOMEZ
GERENTE GENERAL

TIENDA TOPOGRAFICA S.A.S. Nit. 901342575-9 Firma Autorizada
LUIS EMANUEL PINTO GRISALES
MANTENIMIENTO TECNICO

VERIFICAR LA AUTENTICIDAD — SU RESPONSABILIDAD VERIFICAR LA VALIDEZ DEL CERTIFICADO DEL PRESENTE CERTIFICADO

FLORIDABLANCA: Calle 109 #33ª26 B. Caldas
Tels: 3112685852- 3207361086 - 6362981
ventas@tiendatopografica.com
tiendatopografica.wixsite.com/inicio
COLOMBIA

CERTIFICADO No.
1201

Anexo 3. Control de ingreso y salida de material.

CONSORCIO
CONSOLIDACIÓN GIRÓN

ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES

Código	GR-F-05
Fecha	16/11/2021
Versión	2
Página	1 de 1

PROYECTO: VILLAS DE LOS CABALLEROS
RESPONSABLE: Edson Portilla

MATERIAL: ARENA X BULTOS.
CARGO: ALMACENISTA

ENTRADA						SALIDA				SALDO
FECHA ENTRADA	# RC	# REMISION	PROVEEDOR	UND.	CANT.	FECHA SALIDA	CANT.	DESTINO	RECIBE	CANT.
26/03/26		1-208.	FRANKFURT.	UND	20.	26/03/26	20	MURO PERIMETRAL.		0.
07/04/26			MATERIALY AGREGA	m^3	2 1/2	07/04/26	2 1/2	Cancheta y caja colector		0.

CONSORCIO
CONSOLIDACIÓN CIRÓN

ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES

Código	GR-F-05
Fecha	16/11/2021
Versión	2
Página	1 de 1

PROYECTO: VILLAS CABALLEROS.
RESPONSABLE: Edson Portilla.

MATERIAL: ANTI-CORROSIVO GRIS
CARGO: ALMACEN

ENTRADA						SALIDA				SALDO
FECHA ENTRADA	# RC	# REMISION	PROVEEDOR	UND.	CANT.	FECHA SALIDA	CANT.	DESTINO	RECIBE	CANT.
12/03/26.		1-170.	FRANKFURT.	gl.	2	13/03/26	2	PLATINAS.	Miguel.	0.

CONSORCIO CONSOLIDACIÓN DIRÓN	ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES	Código	GR-F-05
		Fecha	16/11/2021
		Versión	2
		Página	1 de 1

PROYECTO: Consorcio Consolidacion Giron
RESPONSABLE: Sergio Rensel

MATERIAL: Alambre negro # 18
CARGO: Al Mecanista

ENTRADA						SALIDA				SALDO	
FECHA ENTRADA	# RC	# REMISION	PROVEEDOR	UND.	CANT.	FECHA SALIDA	CANT.	DESTINO	RECIBE	CANT.	
20/10/25	131 RVC	63725277	G y J		50 K	24/10/25	1K	barricada	[illegible]	149	
						29/10/25	24	Tortugas	[illegible]	25	
						30/10/25	20	Tortugas	[illegible]	5	
						12/11/25	1K.	Amarre refraccion edificio	[illegible]	4	
NO TRAJO FAC. 26/11/25.				Kg.	150.	27/11/25	25kg	AMARRES	[illegible]	125kg	
						01/12/25	25kg	AMARRES	[illegible]	100kg	
						01/12/25	50kg	AMARRES	[illegible]	50kg	
						02/12/25	25kg	AMARRES	Miguel Rangel	25kg	
						03/12/25	25kg	AMARRES	Miguel Rangel	0	
17-12-25		#. 137.	FERRET. GYJ	Kg	100.	17/12/25	25kg	AMARRES.	[illegible]	75.	
						19/12/25	25kg	AMARRES	Manuel	50	mal
						27/01/26	25kg	AMARRES PARRILLA.	Manuel	25kg	
28/01/26		63737597	FERRET. GYJ	Kg.	175.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	200kg	
						29/01/26	25kg	Amarres parrilla	[illegible]	175.	
						02/02/26	25kg	FABRICACION PANELAS - CONCR	a Caceres	150	Sebas
						02/02/26	25kg	AMARRES PARRILLA	a Caceres	125	
						03/02/26	25kg	AMARRE PARRILLA	a Caceres	100	
						04/02/26	25kg	AMARRES PARRILLA	a Caceres	75	
						06/02/26	25kg	Amarres parrilla	a EBAL	50.	
						13/02/26	25kg	AMARRES ANCLAJES.	Manuel	25.	
						02/03/26	25kg	Pines malla Fundida	Sebastian Ruiz	0	
27/03/26	137.	63739301	GYJ FERRET.	kg.	25	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	25	

CONSORCIO
CONSOLIDACIÓN GIRÓN

ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES

Código	GR-F-05
Fecha	16/11/2021
Versión	2
Página	1 de 1

PROYECTO: VILLAS CABALLEROS.

RESPONSABLE:

MATERIAL: Cemento.

CARGO: ALMACEN.

ENTRADA						SALIDA				SALDO
FECHA ENTRADA	# RC	# REMISION	PROVEEDOR	UND.	CANT.	FECHA SALIDA	CANT.	DESTINO	RECIBE	CANT.
				Bulto.		02/03/26	4.	DISIPADOR	+ Ramiro	63.
						03/03/26	4.	DISIPADOR.	+ Ramiro	59.
						04/03/26	1	ESMALTADO CANASTA	x	58
						04/03/26	4.	DISIPADOR.		54.
						05/03/26	2.	DISIPADOR.		52
						07/03/26	3.	DISIPADOR.		49.
						10/03/26	10.	DISIPADOR.		39.
						11/03/26	3.	DISIPADOR		36.
						12/03/26.	2	DISIPADOR		34.
						13/03/26	1	DISIPADOR.		33.
						13/03/26	2	BAÑERO cemento.	+ Manuel	31
						19/03/26	5.	cangleta para talud.	x Sonston Parra	26.
						24/03/26	3	CANASTA PARA-TALUD	x Sonston Parra	23
						24/03/26	3.	CANASTA PARA-TALUD	x Sonston Parra	20.
						25/03/26	5.	MURO cerramiento	x	15
						26/03/26	4.	MURO cerramiento	x	11
27/03/26	137.	63739301	GoJ Ferrete.	Bulto.	30.	—	—	—	—	41
						27/03/26	2	MURO cerramiento	x miguel	39 miguel
						28/03/26	6	MURO antepecho.	x miguel	33.
						06/04/26	2	RAMPA. Pechinglos	x WILLIAM	31 William
						07/04/26.	4.	cangleta Bordillo.	x WILLIAM	27.
						08/04/26	2.	PISO CALLE coleda	x estiven caicedo	25.
						08/04/26	5.	CAJA coleda	x	20.

CONSORCIO
CONSOLIDACIÓN GIRÓN

ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES

Código	GR-F-05
Fecha	16/11/2021
Versión	2
Página	1 de 1

PROYECTO: consorcio consolidacion Girón
RESPONSABLE: Sergio Rangel

MATERIAL: Disco corte metal 4 1/2
CARGO: Almacenista

ENTRADA						SALIDA				SALDO
FECHA ENTRADA	# RC	# REMISION	PROVEEDOR	UND.	CANT.	FECHA SALIDA	CANT.	DESTINO	RECIBE	CANT.
9/1/25		1-1491	FRONKFURT	1	1	10/11/25	1	Corte metal	A R	0
11/11/25		1-5085	Frank Furt.	2.	.	19/11/25	2	Pines anclajes	A R	0
27/11/25		1-5130		UNd.	2.					2
						03/02/26	1	corte alcubre	estiven	1
						27/02/26	1	corte alcubre	Caceres	0.
10/02/26.		1-66.	FRANKFURT SAS	UND	3.	10/02/26	1	Corte vanillo pin	Caceres	2
						10/02/26	1	Disco DISIPADOR	[illegible]	1
11/02/26		1-71	FRANKFURT.	UND	5.					6.
						11/02/26	1	Disco corte pines	[illegible]	5.
						17/02/26	1	corte pines soporte	A	4.
						18/02/26	1	corte VARIOS	A [illegible]	3.
						19/02/26	2	corte Recuder	[illegible]	1.
						23/02/26	1	corte pines Geotex	A	0
24/02/26		1-112.	FRANKFURT.	UND	10.					10.
						24/02/26	2	corte pines geomembrana	A Estiven.	8.
						25/02/26	2.	corte pines geomembrana	A Miguel Rangel	6.
						27/02/26	1	corte pines	A [illegible]	5.
						03/03/26	2	DISIPADOR	A	3.
						02/03/26	1	Pines mallas	A Sebastian Parra	2
						04/03/26	2	corte pines	A [illegible]	0
12/03/26				UND	7	12/03/26	1	DISIPADOR	A [illegible]	6.
						19/03/26	1	OFICIOS VARIOS	A [illegible]	5.
						24/03/26	1	corte AVISO PUBLICIDAD	A Miguel Rangel	4
						24/03/26	1	corte pines muros	A [illegible]	3.

CONSORCIO
CONSOLIDACIÓN DIRÓN

ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES

Código	GR-F-05
Fecha	16/11/2021
Versión	2
Página	1 de 1

PROYECTO: VILLAS CABALLEROS — GEOMATRIX.
RESPONSABLE: EDSON PORTILLA.
MATERIAL: TERRATRAC. TRAMO ~~1.5m x 3.5m~~ 3.50 x 50m
CARGO: ALMACENISTA.

ENTRADA						SALIDA				SALDO
FECHA ENTRADA	# RC	# REMISION	PROVEEDOR	UND.	CANT.	FECHA SALIDA	CANT.	DESTINO	RECIBE	CANT.
		042011.	GEOMATRIX.	mt.	50.	13/03/26	32mt	TALUD.	Isaias	18mt.
						14/03/26	11mt	TALUD.	a	7mt.

CONSORCIO
CONSOLIDACIÓN OIRÓN

ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES

Código	GR-F-05
Fecha	16/11/2021
Versión	2
Página	1 de 1

PROYECTO: VILLAS DE LOS CABALLEROS.
RESPONSABLE: Edson Portilla

MATERIAL: GEODREN. -
CARGO: ALMACENISTA.

ENTRADA						SALIDA				SALDO
FECHA ENTRADA	# RC	# REMISION	PROVEEDOR	UND.	CANT.	FECHA SALIDA	CANT.	DESTINO	RECIBE	CANT.
25/02/26		844.	GEO ANDES SAS	mts	360.	25/02/26	140m	INSTALACION TACUN.		190 +.
						02/03/26	30	Instalacion Tadeo.		160.
						04/03/26	160	TRANSFERENCIA x Frente ALCON		0.

CONSORCIO
CONSOLIDACIÓN GIRÓN

ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES

Código	GR-F-05
Fecha	16/11/2021
Versión	2
Página	1 de 1

PROYECTO: VILLAS DE LOS CABALLEROS
RESPONSABLE: Edson Portilla.

MATERIAL: PINTURA ESMALTE VERDE X 9L.
CARGO: ALMACENISTA.

ENTRADA						SALIDA				SALDO
FECHA ENTRADA	# RC	# REMISION	PROVEEDOR	UND.	CANT.	FECHA SALIDA	CANT.	DESTINO	RECIBE	CANT.
26/03/26				9L	2.					

CONSORCIO
CONSOLIDACIÓN GIRÓN

ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES

Código	GR-F-05
Fecha	16/11/2021
Versión	2
Página	1 de 1

PROYECTO: VILLAS CABALLEROS
RESPONSABLE: Edson Portillo

MATERIAL: PORTICLA ACERO 2 1/2
CARGO: ALMACEN

ENTRADA						SALIDA				SALDO
FECHA ENTRADA	# RC	# REMISION	PROVEEDOR	UND.	CANT.	FECHA SALIDA	CANT.	DESTINO	RECIBE	CANT.
26/02/26		20-5053	Mendivil Carrillo	Lb	2	—	—	—	—	2
						03/02/26	1 Lb.	OFICIOS VARIOS.	[illegible]	1
08/04/26				Lb	1					2

CONSORCIO
CONSOLIDACIÓN GIRÓN

ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES

Código	GR-F-05
Fecha	16/11/2021
Versión	2
Página	1 de 1

PROYECTO: Consorcio Consolidacion Giron
RESPONSABLE: Sergio Ruge Jose

MATERIAL: Pantilles 1/2 corriente
CARGO: Al Mocente

ENTRADA						SALIDA				SALDO
FECHA ENTRADA	# RC	# REMISION	PROVEEDOR	UND.	CANT.	FECHA SALIDA	CANT.	DESTINO	RECIBE	CANT.
9 10 25		1-4981	FRANKFURT	1	12	24/10/25	02	bodega de	Jesus Gon	02
						24/10/25	1	Entrenchito de concreto		1
28/10/25		1-5040	FRANKFURT	UND	2	—	—	—	—	3
						28/10/25	2	bodega	Alexander Prada	1
						09/12/25	1	KZ SEGURIDAD	Alexander	0
26/02/26		20-5053	mundial correa	UND	2					2

Alex.

CONSORCIO
CONSOLIDACIÓN GIRÓN

ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES

Código	GR-F-05
Fecha	16/11/2021
Versión	2
Página	1 de 1

PROYECTO: VILLAS DE LOS CABALLEROS
RESPONSABLE: Edson Portillo

MATERIAL: Semi-codo SANITA 10"
CARGO: ALMACENISTA

ENTRADA						SALIDA				SALDO
FECHA ENTRADA	# RC	# REMISION	PROVEEDOR	UND.	CANT.	FECHA SALIDA	CANT.	DESTINO	RECIBE	CANT.
27/03/26	137	63739296	GyJ Ferret.	UND	2					

CONSORCIO CONSOLIDACIÓN GIRÓN	ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES	Código	GR-F-05
		Fecha	16/11/2021
		Versión	2
		Página	1 de 1

PROYECTO: VILLAS DE LOS CABALLEROS.
RESPONSABLE: Edson Portilla.

MATERIAL: SEMI-CODO. SANIT. 6"
CARGO: ALMACENISTA

ENTRADA						SALIDA				SALDO
FECHA ENTRADA	# RC	# REMISION	PROVEEDOR	UND.	CANT.	FECHA SALIDA	CANT.	DESTINO	RECIBE	CANT.
27/03/26	63739296.	137-	GYJ FERRETE.	UND	1.	27/03/26	1	DESAGUE CAJA.	AK	0

CONSORCIO CONSOLIDACIÓN GIRÓN	ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES	Código	GR-F-05
		Fecha	16/11/2021
		Versión	2
		Página	1 de 1

PROYECTO: VILLAS DE LOS CABALLEROS.
RESPONSABLE: EDSON PORTILLA.

MATERIAL: SEMILLA BRACHARIA X KG.
CARGO: ALMACENISTA.

ENTRADA						SALIDA				SALDO
FECHA ENTRADA	# RC	# REMISION	PROVEEDOR	UND.	CANT.	FECHA SALIDA	CANT.	DESTINO	RECIBE	CANT.
26/03/26		41751	FEDERADO.	KG	2.	28/03/26	1.	Sendero.		1.

CONSORCIO CONSOLIDACION GIRÓN	ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES	Código	GR-F-05
		Fecha	16/11/2021
		Versión	2
		Página	1 de 1

PROYECTO: CONSORCIO CONSOLIDACION GIRON.
RESPONSABLE: Edson Portilla

MATERIAL: TABLAS - MADERA . 2,5 x 3mts
CARGO: ALMACENISTA .

ENTRADA						SALIDA				SALDO
FECHA ENTRADA	# RC	# REMISION	PROVEEDOR	UND.	CANT.	FECHA SALIDA	CANT.	DESTINO	RECIBE	CANT.
1/12/25		4346	LUBEGON.	UND	15.	26/01/26	6.	CANALETA.	[illegible]	9.
						28/01/26	2.	CANALETA.	[illegible]	7
						04/03/26	2.	CANALETA PARA TALUD	[illegible]	5.
07/04/26						07/04/26	6.	CAJA COLECTOR	[illegible]	0.
				UND	6.	08/04/26	6.	canaleta y caja	[illegible]	0.

15 ar
Beba

CONSORCIO
CONSOLIDACIÓN GIRÓN

ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES

Código	GR-F-05
Fecha	16/11/2021
Versión	2
Página	1 de 1

PROYECTO: VILLAS DE LOS CABALLEROS.
RESPONSABLE: Edson Portilla.
MATERIAL: TRITURADO 1/2.x bulto.
CARGO: ALMACENISTA.

ENTRADA						SALIDA				SALDO
FECHA ENTRADA	# RC	# REMISION	PROVEEDOR	UND.	CANT.	FECHA SALIDA	CANT.	DESTINO	RECIBE	CANT.
27/03/26		GR-F08	PARAISO -FERRET.	UND costal.	10.	27/03/26	10.	canaleta y antepecho	a [signature]	
06/04/26.			PROVIC-MATER. AGRES.	M^3.	2	07/04/26	2	canaleta.	x [signature]	0.
07/04/26		32000.	Provee materiales.	M^3	2 1/2	07/04/26	2 1/2	CAJA COLECTOR canaleta	x [signature]	0.

CONSORCIO CONSOLIDACIÓN GIRÓN	ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES	Código	GR-F-05
		Fecha	16/11/2021
		Versión	2
		Página	1 de 1

PROYECTO: VILLAS CABALLEROS

RESPONSABLE: Edson Portilla.

MATERIAL: TUBERIA - SANITA - 6" x 6mt

CARGO: ALMACENISTA

ENTRADA						SALIDA				SALDO
FECHA ENTRADA	# RC	# REMISION	PROVEEDOR	UND.	CANT.	FECHA SALIDA	CANT.	DESTINO	RECIBE	CANT.
20/03/26				UND	1	27/03/26	1	DESAGUE CAJA DISIPA		0

CONSORCIO CONSOLIDACIÓN GIRÓN	ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES	Código	GR-F-05
		Fecha	16/11/2021
		Versión	2
		Página	1 de 1

PROYECTO: CONSORCIO CONSOLIDACION GIRON.
RESPONSABLE: Edson Portilla A.

MATERIAL: TUBO SANITARIO PVC 2"x6mt.
CARGO: ALMACENISTA.

ENTRADA						SALIDA				SALDO
FECHA ENTRADA	# RC	# REMISION	PROVEEDOR	UND.	CANT.	FECHA SALIDA	CANT.	DESTINO	RECIBE	CANT.
12/02/26	137.	6373866	GYJ FERR	UND.	18.	24/02/26	7	PEGAGUE TALUD.	ANTONIO GU	11
						02/03/26	11	CASITAS	TRANSFERENCIA	0.
19/02/26.				2	UND.	02/03/26.	1	PASES MICRO CENTRAL	"	1.

CONSORCIO
CONSOLIDACIÓN DIRÓN

ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES

Código	GR-F-05
Fecha	16/11/2021
Versión	2
Página	1 de 1

PROYECTO: VILLAS CABALLEROS
RESPONSABLE: Edwin Portilla

MATERIAL: VARILLA 3/8 CORRUGADA
CARGO: ALMACENISTA

ENTRADA						SALIDA				SALDO
FECHA ENTRADA	# RC	# REMISION	PROVEEDOR	UND.	CANT.	FECHA SALIDA	CANT.	DESTINO	RECIBE	CANT.
						27/02/26	2	pines. Garella.	[illegible]	68
						27/02/26	8.	DISIPADOR.	[illegible]	60
						28/02/26	2	pines Garaña	[illegible]	58
						03/03/26	1	Pines malla.	[illegible]	57.
						03/03/26	6	DISIPADOR	[illegible]	51
						04/03/26	17	DISIPADOR	[illegible]	34.
						04/03/26	10	Pines canaleta	[illegible]	24.
						04/03/26	4	Pines canaleta	[illegible]	20.
						09/03/26	20	DISIPADOR	[illegible]	0.
16/03/26				UND	50.					50
						19/03/26	2	pines canaleta.	[illegible]	48.
						24/03/26	11.	Pines muro.	[illegible]	37.
						25/03/26	4	muro cerramiento	[illegible]	33
						26/03/26	5.	muro cerramiento	[illegible]	28
						27/03/26	2.	muro cerramiento	[illegible]	26.
						07/04/26	1.	pines canaleta alma	[illegible]	
						07/04/26	5	parrilla bardilla	[illegible]	20.


Anexo 4. Certificados de calidad y Resultados de laboratorio - ensayos PIE

	FORMATO DE GESTIÓN DE LABORATORIO	CÓDIGO	FT-GL-044
HSC HIDROSUELOS DE COLOMBIA	INFORME DE ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO INV E - 410 - 13	FECHA	9/06/2025
		VERSIÓN	6
		Página 1 de 1	


LABORATORIO DE SUELOS Y CONCRETOS HIDROSUELOS DE COLOMBIA S.A.S
CENTRO INDUSTRIAL Y LOGISTICO SAN JORGE KM 7 + 400 M ANILLO VIAL PALENQUE, DIAGONAL FLORIDABLANCA N° 22-31. BODEGA 16 - PISO 1, GIRON, SANTANDER, COLOMBIA.

FECHA DE INFORME	N° DE INFORME	FECHA DE INGRESO DE LA MUESTRA	N° DE ORDEN DE SERVICIO	FRENTE DE OBRA	INFORMACIÓN DEL CLIENTE
31/03/2026	1	4/03/2026	052-26	VILLA DE LOS CABALLEROS	CONSORCIO CONSOLIDACIÓN GIRON consolidacion.giron@gmail.com

# ID DEL CILINDRO	FECHA DE TOMA	FECHA DE ENSAYO	EDAD	ELEMENTO	DIÁMETRO (mm)			LONGITUD (mm)				ÁREA	RELACIÓN LONDITUD / DIÁMETRO	FACTOR DE CORRECCIÓN	DEFECTOS EN EL ESPÉCIMEN	PESO	DENSIDAD	CARGA MÁXIMA	RESISTENCIA ESPERADA POR EL CLIENTE	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN			PATRÓN DE FRACTURA
			(DÍAS)		Diámetro 1	Diámetro 2	Promedio	longitud 1	longitud 2	longitud 3	Promedio	(mm^2)				(g)	(kg/m^3)		(MPa)	(MPa)	(kg/cm^2)	(PSI)	
1	3/03/2026	10/03/2026	7	LANZADO	149,44	151,64	150,54	300	299	299	300	17799	2,0	1,00	NO PRESENTA	12186	2290	253,11	20,7	14,2	144	2054	3
1,1	3/03/2026	17/03/2026	14		150,20	151,66	150,93	298	297	297	297	17891	2,0	1,00	NO PRESENTA	12137	2280	349,59	20,7	19,5	198	2823	3
1,2	3/03/2026	31/03/2026	28		149,64	151,47	150,56	299	299	298	299	17802	2,0	1,00	NO PRESENTA	12294	2310	386,78	20,7	21,6	221	3139	4




Tipo 1
Conos razonablemente bien formados en ambos extremos




Tipo 2
Conos bien formados en un extremo pero no en el otro. Grietas verticales que llegan a los extremos.




Tipo 3
Agrietamiento vertical columnar que abarca ambos extremos. No hay conos bien formados.



Tipo 4
Fractura diagonal sin grietas a traves de los extremos. Se debe golpear con martillo para distinguirlo del tipo 1.



Tipo 5
Fracturas en las esquinas (usuales en cilindros sin refrendar).



Tipo 6
Similar al tipo 5, pero las grietas tienden a unirse en la superficie del cilindro.

OBSERVACIONES

- ESTE ENSAYO FUE REALIZADO EN LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO.
- INFORMACIÓN DEL CONCRETO: EL CLIENTE NO SUMINISTRÓ ESTA INFORMACIÓN.
- LOS RESULTADOS DE ESTE INFORME CORRESPONDEN UNICA Y EXCLUSIVAMENTE A LAS MUESTRAS ENSAYADAS.
- LOS DATOS DE FECHA DE TOMA, INFORMACIÓN DEL CONCRETO, ELEMENTO Y RESISTENCIA ESPERADA CORRESPONDEN A INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE. CUALQUIER OTRO DATO SUMINISTRADO POR ESTE SE INCLUIRÁ Y SE IDENTIFICARÁ EN EL INFORME CON EL CARÁCTER (*). HIDROSUELOS DE COLOMBIA S.A.S. NO SE RESPONSABILIZA POR LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE INCLUIDA EN ESTE INFORME Y QUE PUEDA AFECTAR LA VALIDEZ DE LOS RESULTADOS.

REVISÓ		APROBÓ	
			HSC HIDROSUELOS DE COLOMBIA
NOMBRE	WILLIAM EDUARDO CORTES	NOMBRE	
CARGO	COORDINADOR DE LABORATORIO	CARGO	GERENTE

Queda totalmente prohibida la reproducción parcial de este informe sin la previa autorización de HIDROSUELOS DE COLOMBIA SAS.

Este documento es valido cuando lleve la firma de quien lo revisó y lo aprobó.


FIN DEL INFORME

FORMATO DE GESTIÓN DE LABORATORIO	CÓDIGO	FT-GL-044
INFORME DE ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO INV E - 410 - 13	FECHA	9/06/2025
	VERSIÓN	6
	Página 1 de 1	


LABORATORIO DE SUELOS Y CONCRETOS HIDROSUELOS DE COLOMBIA S.A.S
CENTRO INDUSTRIAL Y LOGISTICO SAN JORGE KM 7 + 400 M ANILLO VIAL PALENQUE, DIAGONAL FLORIDABLANCA N° 22-31. BODEGA 16 - PISO 1, GIRON, SANTANDER, COLOMBIA.

FECHA DE INFORME	N° DE INFORME	FECHA DE INGRESO DE LA MUESTRA	N° DE ORDEN DE SERVICIO	FRENTE DE OBRA	INFORMACIÓN DEL CLIENTE
4/04/2026	1	5/03/2026	053-26	VILLA DE LOS CABALLEROS	CONSORCIO CONSOLIDACIÓN GIRON consolidacion.giron@gmail.com

# ID DEL CILINDRO	FECHA DE TOMA	FECHA DE ENSAYO	EDAD	ELEMENTO	DIÁMETRO (mm)			LONGITUD (mm)				ÁREA	RELACIÓN LONDITUD / DIÁMETRO	FACTOR DE CORRECCIÓN	DEFECTOS EN EL ESPÉCIMEN	PESO	DENSIDAD	CARGA MÁXIMA	RESISTENCIA ESPERADA POR EL CLIENTE	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN			PATRÓN DE FRACTURA
			(DÍAS)		Diámetro 1	Diámetro 2	Promedio	longitud 1	longitud 2	longitud 3	Promedio	(mm^2)				(g)	(kg/m^3)		(MPa)	(MPa)	(kg/cm^2)	(PSI)	
1	4/03/2026	11/03/2026	7	LANZADO CANALETA	150,17	150,78	150,48	301	301	302	301	17784	2,0	1,00	NO PRESENTA	12204	2280	250,07	20,7	14,1	143	2040	4
1,1	4/03/2026	18/03/2026	14		149,46	151,76	150,61	300	299	300	300	17815	2,0	1,00	NO PRESENTA	12153	2280	328,02	20,7	18,3	187	2660	4
1,2	4/03/2026	1/04/2026	28		151,65	151,84	151,75	300	299	299	299	18085	2,0	1,00	NO PRESENTA	12183	2250	394,11	20,7	21,7	221	3148	4




Tipo 1
Conos razonablemente bien formados en ambos extremos




Tipo 2
Conos bien formados en un extremo pero no en el otro. Grietas verticales que llegan a los extremos.




Tipo 3
Agrietamiento vertical columnar que abarca ambos extremos. No hay conos bien formados.



Tipo 4
Fractura diagonal sin grietas a traves de los extremos. Se debe golpear con martillo para distinguirlo del tipo 1.



Tipo 5
Fracturas en las esquinas (usuales en cilindros sin refrendar).



Tipo 6
Similar al tipo 5, pero las grietas tienden a unirse en la superficie del cilindro.

OBSERVACIONES

- ESTE ENSAYO FUE REALIZADO EN LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO.
- INFORMACIÓN DEL CONCRETO: EL CLIENTE NO SUMINISTRÓ ESTA INFORMACIÓN.
- LOS RESULTADOS DE ESTE INFORME CORRESPONDEN UNICA Y EXCLUSIVAMENTE A LAS MUESTRAS ENSAYADAS.
- LOS DATOS DE FECHA DE TOMA, INFORMACIÓN DEL CONCRETO, ELEMENTO Y RESISTENCIA ESPERADA CORRESPONDEN A INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE. CUALQUIER OTRO DATO SUMINISTRADO POR ESTE SE INCLUIRÁ Y SE IDENTIFICARÁ EN EL INFORME CON EL CARÁCTER (*). HIDROSUELOS DE COLOMBIA S.A.S. NO SE RESPONSABILIZA POR LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE INCLUIDA EN ESTE INFORME Y QUE PUEDA AFECTAR LA VALIDEZ DE LOS RESULTADOS.

REVISÓ		APROBÓ	
NOMBRE	WILLIAM EDUARDO CORTES	NOMBRE	MARTHA LILIANA BAYONA ORTIZ
CARGO	COORDINADOR DE LABORATORIO	CARGO	GERENTE

Queda totalmente prohibida la reproducción parcial de este informe sin la previa autorización de HIDROSUELOS DE COLOMBIA SAS.

Este documento es valido cuando lleve la firma de quien lo revisó y lo aprobó.


FIN DEL INFORME

	FORMATO DE GESTIÓN DE LABORATORIO	CÓDIGO	FT-GL-044
HSC HIDROSUELOS DE COLOMBIA	INFORME DE ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO INV E - 410 - 13	FECHA	9/06/2025
		VERSIÓN	6
		Página 1 de 1	


LABORATORIO DE SUELOS Y CONCRETOS HIDROSUELOS DE COLOMBIA S.A.S
CENTRO INDUSTRIAL Y LOGISTICO SAN JORGE KM 7 + 400 M ANILLO VIAL PALENQUE, DIAGONAL FLORIDABLANCA N° 22-31. BODEGA 16 - PISO 1, GIRON, SANTANDER, COLOMBIA.

FECHA DE INFORME	N° DE INFORME	FECHA DE INGRESO DE LA MUESTRA	N° DE ORDEN DE SERVICIO	FRENTE DE OBRA	INFORMACIÓN DEL CLIENTE
4/04/2026	1	6/03/2026	057-26	VILLA DE LOS CABALLEROS	CONSORCIO CONSOLIDACIÓN GIRON consolidacion.giron@gmail.com

# ID DEL CILINDRO	FECHA DE TOMA	FECHA DE ENSAYO	EDAD	ELEMENTO	DIÁMETRO (mm)			LONGITUD (mm)				ÁREA	RELACIÓN LONDITUD / DIÁMETRO	FACTOR DE CORRECCIÓN	DEFECTOS EN EL ESPÉCIMEN	PESO	DENSIDAD	CARGA MÁXIMA	RESISTENCIA ESPERADA POR EL CLIENTE	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN			PATRÓN DE FRACTURA
			(DÍAS)		Diámetro 1	Diámetro 2	Promedio	longitud 1	longitud 2	longitud 3	Promedio	(mm^2)				(g)	(kg/m^3)		(MPa)	(MPa)	(kg/cm^2)	(PSI)	
1	5/03/2026	12/03/2026	7	LANZADO	150,40	151,00	150,70	301	302	302	302	17837	2,0	1,00	NO PRESENTA	12228	2270	279,36	20,7	15,7	160	2272	4
1,1	5/03/2026	19/03/2026	14		150,69	150,86	150,78	303	302	302	302	17855	2,0	1,00	NO PRESENTA	12290	2280	342,21	20,7	19,2	195	2780	4
1,2	5/03/2026	2/04/2026	28		149,95	150,69	150,32	301	302	301	302	17747	2,0	1,00	NO PRESENTA	12297	2300	434,00	99,0	24,5	249	3547	4




Tipo 1
Conos razonablemente bien formados en ambos extremos




Tipo 2
Conos bien formados en un extremo pero no en el otro. Grietas verticales que llegan a los extremos.




Tipo 3
Agrietamiento vertical columnar que abarca ambos extremos. No hay conos bien formados.



Tipo 4
Fractura diagonal sin grietas a traves de los extremos. Se debe golpear con martillo para distinguirlo del tipo 1.



Tipo 5
Fracturas en las esquinas (usuales en cilindros sin refrendar).



Tipo 6
Similar al tipo 5, pero las grietas tienden a unirse en la superficie del cilindro.

OBSERVACIONES

- ESTE ENSAYO FUE REALIZADO EN LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO.
- INFORMACIÓN DEL CONCRETO: EL CLIENTE NO SUMINISTRÓ ESTA INFORMACIÓN.
- LOS RESULTADOS DE ESTE INFORME CORRESPONDEN UNICA Y EXCLUSIVAMENTE A LAS MUESTRAS ENSAYADAS.
- LOS DATOS DE FECHA DE TOMA, INFORMACIÓN DEL CONCRETO, ELEMENTO Y RESISTENCIA ESPERADA CORRESPONDEN A INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE. CUALQUIER OTRO DATO SUMINISTRADO POR ESTE SE INCLUIRÁ Y SE IDENTIFICARÁ EN EL INFORME CON EL CARÁCTER (*). HIDROSUELOS DE COLOMBIA S.A.S. NO SE RESPONSABILIZA POR LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE INCLUIDA EN ESTE INFORME Y QUE PUEDA AFECTAR LA VALIDEZ DE LOS RESULTADOS.

REVISÓ		APROBÓ	
NOMBRE	WILLIAM EDUARDO CORTES	NOMBRE	
CARGO	COORDINADOR DE LABORATORIO	CARGO	GERENTE

Queda totalmente prohibida la reproducción parcial de este informe sin la previa autorización de HIDROSUELOS DE COLOMBIA SAS.

Este documento es valido cuando lleve la firma de quien lo revisó y lo aprobó.


FIN DEL INFORME

	FORMATO DE GESTIÓN DE LABORATORIO	CÓDIGO	FT-GL-044
HSC HIDROSUELOS DE COLOMBIA	INFORME DE ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO INV E - 410 - 13	FECHA	9/06/2025
		VERSIÓN	6
		Página 1 de 1	


LABORATORIO DE SUELOS Y CONCRETOS HIDROSUELOS DE COLOMBIA S.A.S
CENTRO INDUSTRIAL Y LOGISTICO SAN JORGE KM 7 + 400 M ANILLO VIAL PALENQUE, DIAGONAL FLORIDABLANCA N° 22-31. BODEGA 16 - PISO 1, GIRON, SANTANDER, COLOMBIA.

FECHA DE INFORME	N° DE INFORME	FECHA DE INGRESO DE LA MUESTRA	N° DE ORDEN DE SERVICIO	FRENTE DE OBRA	INFORMACIÓN DEL CLIENTE
4/04/2026	1	9/03/2026	058-26	VILLA DE LOS CABALLEROS	CONSORCIO CONSOLIDACIÓN GIRON consolidacion.giron@gmail.com

# ID DEL CILINDRO	FECHA DE TOMA	FECHA DE ENSAYO	EDAD	ELEMENTO	DIÁMETRO (mm)			LONGITUD (mm)				ÁREA	RELACIÓN LONDITUD / DIÁMETRO	FACTOR DE CORRECCIÓN	DEFECTOS EN EL ESPÉCIMEN	PESO	DENSIDAD	CARGA MÁXIMA	RESISTENCIA ESPERADA POR EL CLIENTE	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN			PATRÓN DE FRACTURA
			(DÍAS)		Diámetro 1	Diámetro 2	Promedio	longitud 1	longitud 2	longitud 3	Promedio	(mm^2)				(g)	(kg/m^3)		(MPa)	(MPa)	(kg/cm^2)	(PSI)	
1	6/03/2026	13/03/2026	7	LANZADO	151,84	151,96	151,90	299	298	298	298	18122	2,0	1,00	NO PRESENTA	121253	22420	245,35	20,7	13,5	138	1956	4
1,1	6/03/2026	20/03/2026	14		150,58	150,60	150,59	298	297	297	297	17811	2,0	1,00	NO PRESENTA	11899	2250	321,35	20,7	18,0	183	2606	4
1,2	6/03/2026	3/04/2026	28		150,72	150,88	150,80	301	301	301	301	17860	2,0	1,00	NO PRESENTA	12130	2250	374,84	20,7	20,9	213	3032	4




Tipo 1
Conos razonablemente bien formados en ambos extremos




Tipo 2
Conos bien formados en un extremo pero no en el otro. Grietas verticales que llegan a los extremos.




Tipo 3
Agrietamiento vertical columnar que abarca ambos extremos. No hay conos bien formados.



Tipo 4
Fractura diagonal sin grietas a traves de los extremos. Se debe golpear con martillo para distinguirlo del tipo 1.



Tipo 5
Fracturas en las esquinas (usuales en cilindros sin refrendar).



Tipo 6
Similar al tipo 5, pero las grietas tienden a unirse en la superficie del cilindro.

OBSERVACIONES

- ESTE ENSAYO FUE REALIZADO EN LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO.
- INFORMACIÓN DEL CONCRETO: EL CLIENTE NO SUMINISTRÓ ESTA INFORMACIÓN.
- LOS RESULTADOS DE ESTE INFORME CORRESPONDEN UNICA Y EXCLUSIVAMENTE A LAS MUESTRAS ENSAYADAS.
- LOS DATOS DE FECHA DE TOMA, INFORMACIÓN DEL CONCRETO, ELEMENTO Y RESISTENCIA ESPERADA CORRESPONDEN A INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE. CUALQUIER OTRO DATO SUMINISTRADO POR ESTE SE INCLUIRÁ Y SE IDENTIFICARÁ EN EL INFORME CON EL CARÁCTER (*). HIDROSUELOS DE COLOMBIA S.A.S. NO SE RESPONSABILIZA POR LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE INCLUIDA EN ESTE INFORME Y QUE PUEDA AFECTAR LA VALIDEZ DE LOS RESULTADOS.

REVISÓ		APROBÓ	
NOMBRE	WILLIAM EDUARDO CORTES	NOMBRE	
CARGO	COORDINADOR DE LABORATORIO	CARGO	GERENTE

Queda totalmente prohibida la reproducción parcial de este informe sin la previa autorización de HIDROSUELOS DE COLOMBIA SAS.

Este documento es valido cuando lleve la firma de quien lo revisó y lo aprobó.

FIN DEL INFORME



REPORTE DE CALIDAD

CEMEX Uso General

Fecha de Emisión: 20-mar-26
Número de Reporte: IBG-UG-10-2026
Km 5 Vía Buenos Aires-Payandé, Tolima, Colombia
Planta Caracolito

Cemento Hidráulico Tipo UG


Fecha inicial* **1-mar-26** ..... **Fecha final*** **7-mar-26**

Resistencia a la compresión	Método de ensayo	Resultados	Requisitos norma
1 día	NTC 220	**10.3 MPa**	No especificado
3 días	NTC 220	**18.3 MPa**	Mínimo 8.0
7 días	NTC 220	**21.3 MPa**	Mínimo 15.0
28 días (+)	NTC 220	**27.1 MPa**	Mínimo 24.0

Otros parámetros físicos	Método de ensayo	Resultados
Retenido en Tamiz 45 µm	NTC 294	4.59 %
Superficie Específica Blaine	NTC 33	415 m²/kg
Tiempo de Fraguado Final	NTC 118	348 min


Otros parámetros físicos

Tiempo de Fraguado Inicial (min)




Resultado: 178 min
Método de ensayo: NTC 118

Contenido de Aire en Mortero (%)



Resultado: 8.8%
Método de ensayo: NTC 224

Expansión de Barra de Mortero a 14 días (%) (+)



Resultado: 0.001%
Método de ensayo: NTC 4927

Nuestros productos cumplen con la **Norma Técnica Colombiana NTC 121:2023 "ESPECIFICACIONES DE DESEMPEÑO PARA CEMENTO HIDRÁULICO".** Adicionalmente contamos con la certificación **ISO 9001 versión 2015** para "Producción de Cemento Hidráulico" emitida por el **ICONTEC,** el cual ejecuta auditorias periódicas de seguimiento a nuestro Sistema de Gestión de Calidad para verificar el cumplimiento de nuestros procesos y garantizar la calidad de nuestros productos.

* Este Reporte de Calidad corresponde a valores promedio de los análisis del producto entre las fechas del periodo indicado.
** El muestreo y análisis fueron realizados de acuerdo al procedimiento CGC-VIP-PT-05.
*** Este Reporte de Calidad no podrá ser reproducido parcial o totalmente sin la aprobación por escrito de Cemex Colombia S.A.
(+) Valores reportados del periodo mensual anterior.



Carlos Andrés Parra Bermúdez
Coordinador de Aseguramiento de Calidad

CEMEX COLOMBIA S.A. | Calle 99 # 9A - 54 Piso 7 | (571) 6039000 | (571) 6469000 | Bogotá, D.C. Colombia



REPORTE DE CALIDAD

CEMEX Uso General

Fecha de Emisión: 27-mar-26
Número de Reporte: IBG-UG-11-2026
Km 5 Vía Buenos Aires-Payandé, Tolima, Colombia
Planta Caracolito

Cemento Hidráulico Tipo UG


Fecha inicial* 8-mar-26 ····· **Fecha final*** 14-mar-26

Resistencia a la compresión	Método de ensayo	Resultados	Requisitos norma
1 día	NTC 220	**9.7 MPa**	No especificado
3 días	NTC 220	**17.6 MPa**	Mínimo 8.0
7 días	NTC 220	**20.6 MPa**	Mínimo 15.0
28 días (+)	NTC 220	**25.1 MPa**	Mínimo 24.0

Otros parámetros físicos	Método de ensayo	Resultados
Retenido en Tamiz 45 µm	NTC 294	6.33 %
Superficie Específica Blaine	NTC 33	423 m²/kg
Tiempo de Fraguado Final	NTC 118	376 min


Otros parámetros físicos

Tiempo de Fraguado Inicial (min)




Resultado: 186 min
Método de ensayo: NTC 118

Contenido de Aire en Mortero (%)



Resultado: 8.1%
Método de ensayo: NTC 224

Expansión de Barra de Mortero a 14 días (%) (+)



Resultado: 0.002%
Método de ensayo: NTC 4927

Nuestros productos cumplen con la **Norma Técnica Colombiana NTC 121:2023 "ESPECIFICACIONES DE DESEMPEÑO PARA CEMENTO HIDRÁULICO".** Adicionalmente contamos con la certificación **ISO 9001 versión 2015** para "Producción de Cemento Hidráulico" emitida por el **ICONTEC,** el cual ejecuta auditorias periódicas de seguimiento a nuestro Sistema de Gestión de Calidad para verificar el cumplimiento de nuestros procesos y garantizar la calidad de nuestros productos.

* Este Reporte de Calidad corresponde a valores promedio de los análisis del producto entre las fechas del periodo indicado.
** El muestreo y análisis fueron realizados de acuerdo al procedimiento CGC-VIP-PT-05.
*** Este Reporte de Calidad no podrá ser reproducido parcial o totalmente sin la aprobación por escrito de Cemex Colombia S.A.
(+) Valores reportados del periodo mensual anterior.



Carlos Andrés Parra Bermúdez
Coordinador de Aseguramiento de Calidad

CEMEX COLOMBIA S.A. | Calle 99 # 9A - 54 Piso 7 | (571) 6039000 | (571) 6469000 | Bogotá, D.C. Colombia

Certificado de Calidad 40000913386

Centro: CO2A

Material: LADCLM10619213
EUCOSHOT AF 600 x 250 KG
Grupo Art: ADMIXTURE
Fecha de fabricación: 19/12/2025
Lote: 2512156622

Toxement S.A por medio de este documento da constancia de conformidad al lote de fabricación referenciado, de acuerdo con los resultados obtenidos bajo procedimientos estandarizados del laboratorio. Así mismo, los datos registrados dan cumplimiento a los parámetros citados en la hoja técnica del producto.

Característica	Método	Especificación	Resultado
APARIENCIA	IM001		Aprobado
DENSIDAD	TX32E001	1.41 - 1.47 g/ml	1.44
FRAGUADO FINAL	IM001	240.00 - 360.00 s	280.00
FRAGUADO INICIAL	IM001	180.00 - 240.00 s	180.00
PH	TX32E004	1.30 - 3.30	2.86
SOLIDOS	TX32E002	47.00 - 53.00 %	51.54
TEMPERATURA	IM001	35.00 - 45.00 °C	41.30
VISCOSIDAD	TX32E003	0.00 - 4000.00 CPS	1400.00

Anexo 5. Ficha de indicadores.

	FICHA TÉCNICA INDICADORES DE GESTIÓN	CODIGO	SST-F-44
		FECHA	3/05/2021
		VERSIÓN	2
		PAGINA 1 DE 1	

1. DATOS DEL INDICADOR													
Objetivo del indicador	Evaluar el porcentaje de avance de obra ejecutado a lo largo del proyecto				**Nombre del indicador**	Avance de obra							
Interpretación del indicador	Porcentaje de avance de obra ejecutado vs proyectado				**Formula de calculo**	(% avance ejecutado / % avance proyectado)*100							
Fuente de información	Informes tecnicos mensuales de obra				**Tipo de indicador**	Cuantitativo							
Responsable de medición	Director de obra				**A quien se comunica**	Gerente general							
Frecuencia	Mensual	**Tendencia**	Ascendente	**Unidad**	Porcentaje	**Meta**	**100%**	**Nivel satisfactorio**	**90%**	**Nivel Critico**			**70%**

2. RESULTADOS 2025															
Periodo	**oct-25**	**nov-25**	**dic-25**	**ene-26**	**feb-26**	**mar-26**	**abr-26**	**may-26**	**jun-26**	**jul-26**	**ago-26**	**sep-26**	**oct-26**	**nov-26**	**Logro**
% AVANCE OBRA - EJECUTADO	0,56%	23,26%	45,87%	72,19%	86,39%	98,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	326,36%
% AVANCE OBRA - PROYECTADO	0,48%	13,72%	45,61%	70,02%	85,74%	98,83%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	314,40%
Resultado	**116,67%**	**169,53%**	**100,57%**	**103,10%**	**100,76%**	**99,25%**	**#¡DIV/0!**	**#¡DIV/0!**	**#¡DIV/0!**	**#¡DIV/0!**	**#¡DIV/0!**	**#¡DIV/0!**	**#¡DIV/0!**	**#¡DIV/0!**	**103,80%**



3. ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO
En el periodo del 15 y el 31 de octubre se evidencia el 116,67 % de avance general del proyecto donde se ejecutron actividades preliminares tales como el replanteo topográfico, la instalación de la valla informativa y el desmonte y limpieza a nivel superficial del talud intervenido.
Durante el periodo comprendido entre el 1 y el 30 de noviembre se registró un cumplimiento del 169,53% respecto a las actividades programadas, reflejando un avance significativo frente a lo previsto. Este resultado se debe principalmente al inicio anticipado de las perforaciones horizontales y la instalación de anclajes
Durante el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de diciembre se registró un cumplimiento del 100,57% respecto a las actividades programadas, reflejando un avance significativo frente a lo previsto. Este resultado se debe principalmente a las actividades de perforación horizontal y la instalación de los anclajes previstos.
Durante el período comprendido entre el 1 y el 31 de enero de 2026 se registró un cumplimiento del 103,10 % frente a las actividades programadas, evidenciando un desempeño superior a lo previsto en la planificación mensual, este resultado obedece principalmente a la operación simultánea de dos equipos de perforación horizontal para la instalación de anclajes, así como al inicio anticipado de las actividades de excavación de zapatas y la construcción de canaletas para el control de la escorrentía, conforme se detalla en el informe técnico correspondiente.
Durante el período comprendido entre el 1 y el 28 de febrero de 2026 se registra un avance físico acumulado ejecutado del 86,39 %, el cual supera el avance programado del 85,74 % reflejando un cumplimiento del 100,76% evidenciando un desempeño superior a lo previsto en la planificación mensual, evidenciando un cumplimiento favorable de la programación establecida para el proyecto. Este resultado refleja una adecuada planificación, coordinación de actividades y control operativo durante la ejecución de las obras.
Durante el período comprendido entre el 1 y el 31 de marzo de 2026 se registra un avance físico acumulado ejecutado del 98,09%, el cual supera el avance programado del 98,83 % reflejando un cumplimiento del 99.25% evidenciando un cumplimiento no favorable de la programación establecida para el proyecto. Este resultado refleja cumplimiento en el desarrollo de las actividades y control operativo durante la ejecución de las obras, pero no se obtiene el100% ejecutado de lo programado debido a la ejecución de actividades de pormenores no obstante el desempeño general de proyecto es positivo

4. PLAN DE ACCIÓN				
Actividad	**Plazo ejecución**	**Responsable**	**Proceso**	**Recursos**

5. OBSERVACIONES

	FICHA TÉCNICA INDICADORES DE GESTIÓN	CODIGO	SST-F-44
		FECHA	3/05/2021
		VERSIÓN	2
		PAGINA 1 DE 1	

1. DATOS DEL INDICADOR

Objetivo del indicador	Evaluar el porcentaje de quejas presentadas por periodo				**Nombre del indicador**	Atención de quejas					
Interpretación del indicador	Porcentaje de quejas mensuales respecto al periodo inmediatamente anterior				**Formula de calculo**	(N° de quejas mes anterior - N° de quejas mes actual/N° de quejas mes anterior)*100					
Fuente de información					**Tipo de indicador**	Cuantitativo					
Responsable de medición	Director de obra				**A quien se comunica**	Gerente general					
Frecuencia	Mensual	**Tendencia**	Descendente	**Unidad**	Porcentaje	**Meta**	**100%**	**Nivel satisfactorio**	**90%**	**Nivel Critico**	**75%**

2. RESULTADOS 2025/2026

Periodo	**oct-25**	**nov-25**	**dic-25**	**ene-26**	**feb-26**	**mar-26**	**abr-26**	**may-26**	**jun-26**	**jul-26**	**ago-26**	**sep-26**	**oct-26**	**nov-26**	**Logro**
N° de quejas recibidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
N° de quejas atendidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Resultado	**#¡DIV/0!**	**#¡DIV/0!**	**#¡DIV/0!**	**#¡DIV/0!**	**#¡DIV/0!**	**#¡DIV/0!**	**100%**	**#¡DIV/0!**	**#¡DIV/0!**	**#¡DIV/0!**	**#¡DIV/0!**	**#¡DIV/0!**	**#¡DIV/0!**	**#¡DIV/0!**	100%



3. ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO

En el periodo comprendido entre el 15 y 31 de octubre 2025 no se presentaron quejas por parte de las partes interesadas.
En el periodo comprendido entre el 1 y 30 de noviembre 2025 no se presentaron quejas por parte de las partes interesadas.
En el periodo comprendido entre el 1 y 31 de diciembre 2025 no se presentaron quejas por parte de las partes interesadas.
En el periodo comprendido entre el 1 y 31 de enero 2026 no se presentaron quejas por parte de las partes interesadas.
En el periodo comprendido entre el 1 y 28 de febrero 2026 no se presentaron quejas por parte de las partes interesadas.
En el periodo comprendido entre el 1 y 31 marzo 2026 se atendió 1 queja recibida por parte de las comunidad, la cual se le dio la respuesta respectiva deacuerdo a las peticiones recibidas, se adjunta RESPUESTA DE PQRS.

4. PLAN DE ACCIÓN

Actividad	**Plazo ejecución**	**Responsable**	**Proceso**	**Recursos**
n.a	n.a	n.a	n.a	n.a

5. OBSERVACIONES

	FICHA TÉCNICA INDICADORES DE GESTIÓN	CODIGO	SST-F-44
CONSORCIO CONSOLIDACIÓN GIRÓN		FECHA	3/05/2021
		VERSIÓN	2
		PAGINA 1 DE 1	

1. DATOS DEL INDICADOR

Objetivo del indicador	identificar el porcentaje de multas en los proyectos				**Nombre del indicador**		Multas en los proyectos						
Interpretación del indicador	Porcentaje de multas mensuales				**Formula de calculo**		(N° de multas mes anterior - N° de multas mes actual/N° de multas mes anterior)*100						
Fuente de información	Correspondencia de multas generadas en el periodo				**Tipo de indicador**		Cuantitativo						
Responsable de medición	Director de obra				**A quien se comunica**		Gerente general						
Frecuencia	Mensual	**Tendencia**	Ascendente	**Unidad**	Porcentaje	**Meta**	**100%**	**Nivel satisfactorio**	**95%**	**Nivel Critico**			**80%**

2. RESULTADOS 2025 / 2026

Periodo	**oct-25**	**nov-25**	**dic-25**	**ene-26**	**feb-26**	**mar-26**	**abr-26**	**may-26**	**jun-26**	**jul-26**	**ago-26**	**sep-26**	**oct-26**	**nov-26**	**Logro**
N° de multas mes anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N° de multas mes actual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado	**n.a**	**n.a**	**n.a**	**n.a**	**n.a**	**n.a**	**n.a**	**n.a**	**n.a**	**n.a**	**n.a**	**n.a**	**n.a**	**n.a**	#¡DIV/0!



3. ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO

En el periodo comprendido entre el 15 y el 31 de octubre no se presentaron multas que afecten el desarrollo del proyecto.
En el periodo comprendido entre el 1 y el 30 de noviembre no se presentaron multas que afecten el desarrollo del proyecto.
En el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de diciembre no se presentaron multas que afecten el desarrollo del proyecto.
En el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de enero no se presentaron multas que afecten el desarrollo del proyecto.
En el periodo comprendido entre el 1 y el 28 de febrero no se presentaron multas que afecten el desarrollo del proyecto.
En el periodo comprendido entre el 1 y el 31 marzo no se presentaron multas que afecten el desarrollo del proyecto.

4. PLAN DE ACCIÓN

Actividad	**Plazo ejecución**	**Responsable**	**Proceso**	**Recursos**
n.a	n.a	n.a	n.a	n.a

5. OBSERVACIONES

n.a


	FICHA TÉCNICA INDICADORES DE GESTIÓN	CODIGO	SST-F-44
		FECHA	3/5/2021
		VERSIÓN	2
		PAGINA 1 DE 1	

1. DATOS DEL INDICADOR

Objetivo del indicador	Medir el desempeño de los proveedores dentro de la organización				**Nombre del indicador**		Desempeño de proveedores				
Interpretación del indicador	Medir la eficacia de los proveedores				**Formula de calculo**		Calificación promedio de proveedores / Mayor calificación de proveedores				
Fuente de información	Evaluación de desempeño de proveedores				**Tipo de indicador**		Cuantitativo				
Responsable de medición	Coordinador de compras				**A quien se comunica**		Gerente general				
Frecuencia	Anual	**Tendencia**	Ascendente	**Unidad**	Porcentaje	**Meta**	**100%**	**Nivel satisfactorio**	**90%**	**Nivel Critico**	**70%**

2. RESULTADOS 2024/2025

Periodo	**may-25**
suma de calificación de proveedores	4,65
Mayor calificación	5,00
Resultado	**93%**

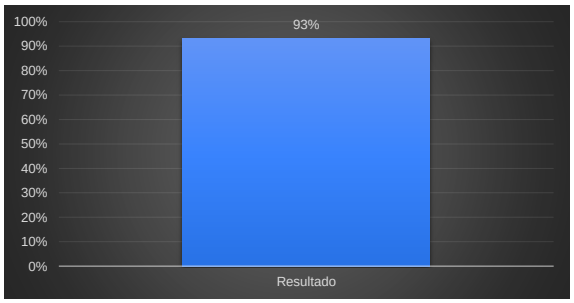

3. ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO

Se realiza evaluación de desempeño de los proveedores en el mes de Mayo de 2025 el cual da una puntuación satisfactoria (93% satisfactorio) de los proveedores involucrados, dicha evaluación es compartida a los proveedores con el fin de ponerlos en conocimiento y resaltar el compomiso para con la empresa.

4. PLAN DE ACCIÓN

Actividad	Plazo ejecución	Responsable	Proceso	Recursos
na	n.a	n.a	n.a	n.a

n.a

	FICHA TÉCNICA INDICADORES DE GESTIÓN	SST-F-44 3/05/2021 2

1. DATOS DEL INDICADOR												
Objetivo del indicador	Identificar el cumplimiento de plan de capacitación				**Nombre del indicador**		Cumplimiento del plan de capacitación organizacional					
Interpretación del indicador	capacitaciones				**Formula de calculo**		(N° de capacitaciones programadas/N° de camapcitaciones ejecutadas)*100					
Fuente de información	Plan de capacitación				**Tipo de indicador**		Cuantitativo					
Responsable de medición	Coordinador recursos humanos				**A quien se comunica**		Gerencia					
Frecuencia	mensual	**Tendencia**	Ascendente	**Unidad**	porcentaje	**Meta**	**100%**	**Nivel satisfactorio**	**80%**	**Nivel Critico**	**50%**	

2. RESULTADOS													
PERIODO 2025/2026													
Periodo	**oct-25**	**nov-25**	**dic-25**	**ene-26**	**feb-26**	**mar-26**	**abr-26**	**may-26**	**jun-26**	**jul-26**	**ago-26**	**sep-26**	**Logro**
# capacitaciones ejecutados	2,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
# capacitaciones programados	2,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
Resultado	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**#¡DIV/0!**	**#¡DIV/0!**	**#¡DIV/0!**	**#¡DIV/0!**	**#¡DIV/0!**	**#¡DIV/0!**	**#¡DIV/0!**	100%



3. ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO
Para el periodo se desarrollaron 2 capacitaciones. 1 del área SST; Salud peligros y riesgos 1 capacitación del área ambiental y social; Fortalecimiento de valores (trabajo en equipo), educación vial y oficina de atención a la comunidad.
Para el periodo se desarrollaron 4 capacitaciones. 2 del área SST; Actos y condiciones inseguras y Que es accidente de trabajo y que hacer en caso de que se presente. 1 capacitación del área ambiental; divulgación de la Política Ambiental y Política de Orden y Aseo. y 1 capacitación del área social; Atención a la comunidad y trabajadores en temas de información sobre cultura vial y participación comunitaria.
Para el periodo se desarrollaron 4 capacitaciones. 2 del área SST; Medidas de seguridad para realizar trabajo en altura y cuidado de las manos. 1 capacitación del área ambiental; Control De emisiones atmosféricas y 1 capacitación del área social; fortalecimiento de valores (emprendimiento), educación vial y oficina de atención a la comunidad
Para el periodo se desarrollaron 4 capacitaciones. 2 del área SST; Uso correcto, almacenamiento y mantenimiento de EPPS y seguridad vial – actores viales. 1 capacitación del área ambiental; Uso y Almacenamiento Adecuado de Materiales de Construcción y 1 capacitación del área social; fortalecimiento de valores (colaboración), educación vial y oficina de atención a la comunidad
Para el periodo del 01 al 28 febrero de 2026 se desarrollaron 4 capacitaciones. 2 del área SST; importancia de las pausas activas y hábitos y estilos de vida saludable 1 capacitación del área ambiental, prevención de sancudos y control de criaderos en obra y 1 capacitación del área social; fortalecimiento de valores (solidaridad), educación vial y oficina de atención a la comunidad
Para el periodo se desarrollaron 4 capacitaciones. 2 del área SST; prevención del riesgo mecánico y prevención del riesgo locativo, 1 capacitación del área ambiental; manejo de la vegetación, fauna y paisajismo y 1 capacitación del área social; fortalecimiento de valores (integridad), educación vial y oficina de atención a la comunidad, Los soportes de asistencia a las capacitaciones se presentan en los informes mensuales entregados a interventoría

4. PLAN DE ACCIÓN				
Actividad	**Plazo ejecución**	**Responsable**	**Proceso**	**Recursos**
n.a	n.a	n.a	n.a	n.a

5. OBSERVACIONES
n.a

Gmail **Consorcio Consolidación Giron <consolidacion.giron@gmail.com>**

Derecho de petición

1 mensaje

Marcos Martinez Sarmiento <marsanvan0420@gmail.com> 27 de marzo de 2026 a las 14:23
Para: "dir.ordenterritorial@giron-santander.gov.co" <dir.ordenterritorial@giron-santander.gov.co>, notificaciones.judiciales@cdmb.gov.co, info@cdmb.gov.co, santander@defensoria.gov.co, "consolidacion.giron@gmail.com" <consolidacion.giron@gmail.com>

Buenas tardes.De manera muy comedida me dirijo a ustedes referente ala obra de mitigación del riesgo que está siendo realizada por el consorcio consolidación Giron en el barrio Villa de los caballeros referente a demasiadas inconformidades que se están generando con dicho proyecto ya que en lugar de mitigar el riesgo nos pueden afectar un más el predio adjunto videos y fotos como evidencia.les solicitamos de manera muy respetuosa sean tomadas medidas pertinentes y correctivas

FEAF2DD0-66EC-4949-AD26-

FE490A584CA7.jpeg

227647F1-E308-4159-8C83-

5898878C5C5F.jpeg

IMG_0743.jpeg

IMG_0740.jpeg

IMG_0741.mov

IMG_0691.mov

IMG_0662.jpeg

IMG_0664.mov

5A48C1F8-6E11-4008-BA66-

6B10CBAF5033 Copy.mov

IMG_0667.mov

IMG_0742.jpeg

IMG_0741.mov

IMG_0743.jpeg

IMG_0737.jpeg

IMG_0739.jpeg

Bucaramanga, 09 abril del 2026

Señor(a):
MARCOS MARTINEZ SARMIENTO
RESIDENTE DE LA COMUNIDAD VILLA DE LOS CABALLEROS
Correo electrónico: marsanvan0420@gmail.com

REF: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 16225.6 con objeto: "CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACION PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN EL TALUD ORIENTAL DEL BARRIO VILLA DE LOS CABALLEROS EN EL MUNICIPIO DE GIRÓN, DEPARTAMENTO DE SANTANDER".

ASUNTO: Respuesta a Derecho de petición mediante correo electrónico con fecha del 27 de marzo del 2026.

Por medio de la presente y en virtud del contrato de referencia nos permitimos dar respuesta al oficio mencionado en el asunto, con relación a algunas inconformidades manifestada por el peticionario con relación a la ejecución del proyecto.

En atención a lo anterior, y una vez realizado el análisis de la información suministrada (registro fotográfico y videográfico), así como de su posterior verificación en campo el **CONSORCIO CONSOLIDACIÓN GIRÓN** se permite informar:

1. Respecto a lo aportado en el registro fotográfico con relación a la presencia de una fisura de tipo longitudinal en la fachada y una fisura transversal en un muro interno de la vivienda, es de precisar y como consta en acta de vecindad suscrita, previa a la intervención, la vivienda ya presentaba la misma patología en sus muros internos, las cuales fueron debidamente registradas.

   Ahora bien y como ya se había establecido con el peticionario en relación con parte de la evidencia aportada, durante la etapa de intervención se presentaron algunas nuevas fisuras, que como presunción se pueden aquejar en relación directa de la obra, siendo claros que este tipo de patologías en los elementos no estructurales, son normales y se pueden presentar como consecuencia de la contracción de los materiales antes los cambios de temperatura, los fenómenos naturales presentes en una zona de **alto riesgo sísmico** como lo es Giron y desviaciones propias de los procedimientos constructivos desarrollados. No obstante, se reconoce que el evento anteriormente descrito contribuyó a la ampliación de dichas fisuras.

   Dicho esto, y verificadas que no existían de acuerdo al acta de vecindad suscrita, en cumplimiento de las obligaciones contractuales y en atención al principio de responsabilidad social frente a terceros, el **CONSORCIO CONSOLIDACIÓN GIRÓN** procederá a ejecutar las actividades de reparación necesarias sobre las fisuras identificadas, con el fin de restituir las condiciones estéticas del inmueble. Estas intervenciones se encuentran programadas para ser ejecutadas durante el

mes de abril de 2026, garantizando la aplicación de procedimientos técnicos adecuados y materiales acordes a las características constructivas de la vivienda.

2. En relación con la imagen aportada, correspondiente a la ejecución de un bordillo perimetral localizado en la Calle 3B, se informa que dicha solución constructiva obedece a criterios técnicos previamente definidos en campo para el confinamiento del material en la parte baja de la obra y que previamente no existía, solicitado y conciliado con la comunidad y la JAC. En este sentido, y como resultado de los trabajos de conformación de la terraza generada durante la ejecución del proyecto, se estableció como alternativa técnica la definición de pendientes morfológicas dirigidas hacia la canaleta ubicada en el pie del talud, con el propósito de garantizar un adecuado manejo y evacuación de aguas superficiales, evitando procesos de escorrentía hacia la zona de las viviendas aledañas, por tal razón se determinó la necesidad de ejecutar un bordillo perimetral continuo en las zonas peatonales, el cual actúa como elemento de confinamiento y direccionamiento de flujos, contribuyendo a la durabilidad de la intervención y a la mitigación de riesgos asociados a la acumulación de agua. Cabe resaltar que la intervención mencionada se encuentra fuera del perímetro o área externa de la vivienda del peticionario por lo cual su construcción no tendría efecto alguno sobre queja.

   Por otro parte y dado que en el lugar existen calles sobre las cuales no hay más acceso o facilidad para automotores que por la zona de intervención, por petición de los mismos residentes, se construye la rampa de acceso como facilidad para ello, sin que genere ningún desviación o problemática, por el contrario, mejora las condiciones de accesibilidad para el lugar.

   Es importante precisar que esta solución fue socializada y concertada con el presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC), en representación de la comunidad del sector Villa de los Caballeros, sin que a la fecha se hayan presentado objeciones generalizadas por parte de los residentes, con excepción de la observación puntual realizada por el peticionario.

3. En atención al video aportado, relacionado con la construcción de una canaleta en un predio privado ubicado en la zona alta del talud, el **CONSORCIO CONSOLIDACIÓN GIRÓN** se permite informar lo siguiente:

   - Previo al inicio de las actividades constructivas en el sector Villa de los Caballeros, se evidenció que el área de intervención se encontraba en la parte baja de un predio de propiedad privada de la empresa **INGESOL LATINOAMÉRICA**, el cual no contaba con un sistema adecuado de manejo y conducción de aguas lluvias y escorrentías superficiales. Esta condición generaba que los flujos hídricos descendieran libremente hacia las zonas habitadas, ocasionando afectaciones a la comunidad y al terreno.

- Durante la fase inicial de ejecución, particularmente en las actividades de movimiento de tierras, se presentaron eventos de escorrentía superficial asociados a precipitaciones intensas. Debido a la configuración geométrica del sector y a la pendiente natural del terreno, estos flujos generaban procesos de erosión continua en el talud, así como aportes hídricos permanentes hacia la zona de obra, comprometiendo la estabilidad del terreno y las condiciones seguras de ejecución.

  En atención a esta problemática, y como medida de mitigación inmediata y de carácter provisional, se implementó un sistema de control pluvial consistente en la construcción de una canaleta en el predio mencionado, con el objetivo de interceptar, conducir y encauzar adecuadamente las aguas de escorrentía hacia una estructura de drenaje previa y existente que, por la información del propietario del predio **INGESOL LATINOAMÉRICA**, fue construida por la misma comunidad y entrega en el canal superior que descarga al disipador aportado en el video por el peticionario. De lo anterior y como se puede evidencia en el registro fílmico aportado, es fácil establecer que el canal hidráulico que viene recogiendo la mayor cantidad de agua y entrega a ese punto no fue construido por este **CONSORCIO**.





Finalmente, se aclara que la solución implementada tiene carácter provisional y estuvo orientada a garantizar condiciones adecuadas durante la ejecución del proyecto. Una vez finalizadas las actividades contractuales, la permanencia, modificación o retiro de esta infraestructura quedará sujeta a la decisión del propietario del predio, en concordancia con sus intereses y las condiciones particulares del mismo, así como el estudio de la problemática presentada por el peticionario.

4. En atención al video suministrado por el peticionario, correspondiente a un evento de fuertes lluvias ocurrido el día 18 de marzo de 2026, el **CONSORCIO CONSOLIDACIÓN GIRÓN** se permite emitir las siguientes precisiones técnicas:

    - En el material audiovisual aportado, se evidencia un disipador de energía preexistente que presenta condición de desbordamiento. Es importante precisar que dicha estructura no hace parte del alcance del contrato ejecutado por este Consorcio, toda vez que corresponde a una obra anterior a la intervención actual.

    - Frente a la afirmación realizada en el video respecto a que la obra ejecutada direcciona los flujos hacia un disipador existente, es pertinente aclarar que dicha apreciación no corresponde a la realidad técnica del proyecto. Lo manifestado es totalmente contrario a la evidencia física en campo y lo manifestado por el peticionario. Las obras ejecutadas en el marco del objeto contractual, no alteran negativamente el funcionamiento de las estructuras preexistentes dado que no se usan como direccionamiento de flujo de la escorrentía superficial para la misma como se puede observar en las siguientes imágenes:

	
Eventos de precipitación con flujo directo al disipador correspondiente a la pantalla existente	**Punto inicial de entrega del canal superior con restricción de continuidad de flujo hacia sistema existente.**

El sistema de manejo de aguas implementado en el área intervenida fue diseñado y ejecutado para garantizar la adecuada captación, conducción y descarga de las aguas de escorrentía superficial generadas dentro del alcance del proyecto. En este sentido, el control pluvial se realiza mediante la construcción de canaletas superior e inferior, integradas a una caja de inspección y asociadas a la pantalla de estabilización ejecutada, las cuales permiten interceptar y conducir los flujos hídricos de manera controlada. Estas estructuras hidráulicas direccionan el caudal en sentido **ESTE** (sentido de la obra construida), por lo cual no se entiende la afirmación contraria a lo anteriormente expresado.

- Adicionalmente, se debe señalar que parte del caudal observado proviene de áreas ubicadas en la zona alta del talud, correspondientes a predios privados externos al área de intervención. Estos aportes hídricos no hacen parte del alcance de responsabilidad del Consorcio, en la medida en que no es posible intervenir ni regular directamente las condiciones de drenaje de dichos predios sin la correspondiente autorización de sus propietarios.

Para terminar y dar claridad a lo manifestado, durante el mes de marzo y lo que va corrido de abril de 2026, estas estructuras fueron sometidas a condiciones reales de operación bajo eventos de precipitación de alta intensidad similares a los presentados en la evidencia fílmica, sin que se haya presentado eventos adversos, evidenciando un comportamiento hidráulico adecuado, sin presentar fallas funcionales ni observaciones técnicas, asegurando la descarga controlada hacia el disipador de energía construido como parte del objeto contractual.

Esperamos con lo anterior haber dado respuesta de forma y fondo a lo expresado por el peticionario, reiterando nuestra siempre disposición a atender de la mejor manera y en los mejores términos las observaciones de la comunidad.

Cordialmente.



ING. OSCAR ANDRÉS SÁNCHEZ JEREZ
Residente de Obra
CONSORCIO CONSOLIDACIÓN GIRÓN

ANEXOS: Actas de vecindad

CC: infocdmb@gmail.com
notificaciones.judiciales@cdmb.gov.co
construanlesas@gmail.com
dir.ordenterritorial@giron-santander.gov.co
santander@defensoria.gov.co

ANEXO No.06: ESTADO DEL TIEMPO

ESTADO DEL TIEMPO EN LA JORNADA LABORAL
(CONSORCIO CONSOLIDACIÓN GIRÓN)

CONTRATO: 210.16225.6 **MES:** MARZO **AÑO:** 2026

OBRA: CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACION PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN EL TALUD ORIENTAL DEL BARRIO VILLA DE LOS CABALLEROS EN EL MUNICIPIO DE GIRÓN, DEPARTAMENTO DE SANTANDER

CONDICIONES CLIMATICAS EN LA JORNADA LABORAL

SOLEADO	1	NUBLADO	2	LLUVIOSO	3	TORMENTA	4

MES: MARZO

HORAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M
6:00 a 7:00																															
7:00 a 8:00		1	1	1	1	3	1		1	2	3	1	1	1		1	3	4	1	1	1		3	2	4	1	1	1		1	1
8:00 a 9:00		1	1	1	1	3	1		1	2	3	1	1	1		1	3	4	1	1	1		2	2	3	1	1	1		1	1
9:00 a 10:00		1	1	1	1	3	1		1	2	3	1	1	1		1	3	3	1	1	1		2	2	3	1	1	1		1	1
10:00 a 11:00		1	1	1	1	2	1		1	1	2	1	1	1		1	2	3	1	1	1		2	1	3	1	1	1		1	1
11:00 a 12:00		1	1	1	1	2	1		1	1	2	1	1	1		1	1	3	1	1	1		1	1	2	1	1	1		1	1
12:00 a 13:00		1	1	1	1	2			1	1	2	1	1			1	1	2	1	1			1	1	2	1	1			1	1
13:00 a 14:00		1	1	1	1	2			1	1	1	1	1			1	1	2	1	1			1	1	2	1	1			1	1
14:00 a 15:00		1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	1	2	1	1			1	1	1	1	1			1	1
15:00 a 16:00		1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	2	2	1	1			1	1	1	1	1			1	1
16:00 a 17:00		1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	2	2	1	1			1	1	1	1	1			1	1
17:00 a 18:00																															
HORAS NO LABORADAS	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3	5	0	0	0	0	1	0	4	0	0	0	0	0	0	19

RESUMEN	
SECO	79,09%
NUBOSIDAD	12,27%
LLUVIA MODERADA	7,27%
LLUVIA INTENSA	1,36%



TOTAL HORAS LABORABLES DEL MES	
TOTAL HORAS NO LABORADAS POR LLUVIA	19
PORCENTAJE NO LABORADO POR LLUVIA	8,64%

ANEXO No.07 ACTAS DE REUNIÓN

	CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA – C.D.M.B.		
	ELABORÓ: Equipo Proceso Relaciones con Partes Interesadas	REVISÓ: REPRESENTANTE DIRECCIÓN SIGC	APROBÓ: DIRECTOR(A) GENERAL
CODIGO: A-PI-FO05	VERSION: 5	ACTA DE REUNIÓN	

TEMA:	VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES DE OBRA Y DAÑOS OCACIONADOS POR LLUVIAS DEL CONTRATO 210.16225.6" GRUPO 4: **CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACION PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN EL TALUD ORIENTAL DEL BARRIO VILLA DE LOS CABALLEROS EN EL MUNICIPIO DE GIRÓN, DEPARTAMENTO DE SANTANDER**"		**ACTA No.**	**FECHA**	
				DD	**MM**	**AA**
			10	18	03	2026
LUGAR:	Frente de Obra – Villa de los Caballeros		**Hora Inicio**	3:00 pm		
			Hora final	4:00 pm		

AGENDA		
No.	**ORDEN DEL DIA**	**RESPONSABLE**
1	Visita técnica para revisión de avance de actividades contractuales según programación de obra.	Contratista – Interventoría - CDMB
2	Revisión daños ocasionados por fuerte lluvia	Contratista – Interventoría -CDMB

No.	**DESARROLLO ORDEN DEL DÍA**
1	En el marco del comité de obra, se dio apertura a la reunión con la participación del equipo profesional del contratista, la Interventoría y el equipo técnico de la CDMB, con el propósito de efectuar un recorrido por el frente de trabajo y verificar en campo el estado de avance de las actividades contractuales, en concordancia con la programación de obra vigente. Durante el recorrido, se evidenció la ejecución total de la pantalla de concreto lanzado, con un área aproximada de 840 m². Asimismo, se constató la culminación de las estructuras de canalización de aguas, tanto en la corona como en el pie del talud, así como la finalización de las obras correspondientes al disipador de energía. Estas actividades fueron socializadas por el contratista, indicando que su ejecución se desarrolló conforme a lo previsto, sin presentarse contratiempos ni inconsistencias técnicas. En relación con el concreto suministrado, se abordó la verificación del cumplimiento de la edad mínima requerida para la evaluación de la resistencia a la compresión, con el fin de garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas del proyecto. Lo anterior, como condición previa para el inicio de las actividades de tensionamiento, las cuales se encuentran programadas para la primera semana de abril. De manera paralela, se informó sobre la ejecución de actividades preliminares, tales como el corte de mangueras y tuberías sobresalientes en los puntos de anclajes.

Durante la visita, se identificó un área denominada “terraza”, ubicada en el pie del talud, la cual ha presentado una ampliación respecto a sus condiciones iniciales como resultado de la ejecución de las actividades contractuales. En este sentido, se expuso su posible uso y tratamiento, contemplando la siembra de treinta y cinco (35) individuos arbóreos de especies con sistema radicular profundo, incluyendo especies frutales como pomarrosa, mango y limón. No obstante, considerando las dimensiones actuales del área, se precisó que no será posible la disposición total de los individuos en este sector, por lo cual se deberán definir áreas adicionales para completar la siembra. Como compromiso, se establece la realización de una reunión con el presidente de la Junta de Acción Comunal para concertar la localización definitiva.

Adicionalmente, en lo referente a la conformación geométrica de la terraza, se definió que los niveles se establecerán mediante pendientes controladas dirigidas hacia la canaleta ubicada en el pie del talud. Con el fin de controlar el material particulado y evitar el arrastre de sedimentos hacia las zonas peatonales, se contempla la construcción de bordillos perimetrales con una altura de 0,30 m.

En cuanto al manejo de las aguas de escorrentía superficial en la base del talud, se indicó que la canaleta construida contará con entregas a través de cajas de inspección profundas, que permitirán la conducción del flujo por rebose controlado. Posteriormente, el agua será transportada mediante tubería sanitaria de 8 pulgadas hacia dos puntos de descarga ubicados en zonas peatonales. Finalmente, se precisó que la canaleta proyectada en la base del talud tendrá continuidad hasta la peatonal 2B, permitiendo encauzar las aguas provenientes de la zona no estabilizada.

Adicionalmente, se informa a la entidad contratante que, con fecha de corte al 18 de marzo de 2026, el proyecto presenta un avance físico ejecutado del 98,10%, frente a un avance programado del 98,06%, evidenciando un adelanto del 0,40% respecto a la programación establecida.








2	En atención al evento de precipitación de alta intensidad registrado el día de hoy 18 de marzo de 2026, y conforme al material audiovisual suministrado por la comunidad, se evidenció la condición de desbordamiento de un disipador de energía preexistente. Al respecto, es preciso aclarar que dicha estructura hidráulica no forma parte del alcance del contrato ejecutado por el Consorcio, dado que corresponde a una obra construida con anterioridad a la intervención actual. Cabe mencionar que el presente evento hidrometeorológico extremo presenta una situación atípica en relación con los eventos registrados en los últimos meses, caracterizándose por la ocurrencia de precipitaciones de alta intensidad. Una vez ocurrido el evento, se realizó un recorrido técnico de verificación en campo, abarcando tanto la terraza intervenida como la zona superior del talud. Como resultado de esta inspección, se constató que las obras ejecutadas en el marco del contrato conducen adecuadamente los flujos de escorrentía superficial hacia un disipador realizado, sin generar afectaciones adicionales, es decir la canaleta construida en la parte superior de la pantalla no aporta agua al disipador preexistente y no presenta conexión con las obras ejecutadas, cabe aclarar que como medida de mitigación se construirá un antepecho que impida cualquier arrastre o conducción o aporte de agua al disipador. En este sentido, se deja constancia de que las obras desarrolladas no alteran negativamente el funcionamiento de las estructuras hidráulicas preexistentes, toda vez que no se emplean como elementos de direccionamiento directo de los flujos hacia dichas estructuras, lo cual se soporta en la evidencia gráfica correspondiente. 

	Cabe resaltar que el sistema de manejo de aguas implementado en el área intervenida fue diseñado y construido para garantizar la adecuada captación, conducción y descarga de las aguas de escorrentía superficial generadas dentro del alcance del proyecto. Este sistema está conformado por canaletas superior e inferior, integradas a una caja de inspección y vinculadas a la pantalla de estabilización ejecutada, permitiendo interceptar y conducir los flujos hídricos de manera controlada. Las estructuras hidráulicas proyectadas direccionan el caudal en sentido Este, conforme a la configuración y localización de la obra construida. Adicionalmente, se identificó que una fracción del caudal observado durante el evento de lluvia proviene de áreas ubicadas en la parte alta del talud, correspondientes a predios privados externos al área de intervención. Estos aportes hídricos no se encuentran bajo el alcance de responsabilidad del Consorcio, en tanto no es viable intervenir ni regular las condiciones de drenaje de dichos predios sin la debida autorización de sus propietarios. Finalmente, en lo que respecta al sistema de manejo de aguas contemplado dentro del alcance contractual, se verificó su desempeño bajo condiciones reales de operación asociadas a un evento de precipitación de alta intensidad, sin que se presentaran fallas funcionales ni observaciones técnicas. Lo anterior evidencia un comportamiento hidráulico adecuado, garantizando la captación, conducción y descarga controlada de los caudales hacia el disipador de energía contemplado dentro del objeto contractual.

No.	TAREAS	RESPONSABLE	FECHA
1	Se acuerda programar una próxima reunión de Comité, con el fin de determinar el lugar de siembra de los árboles de compensación y definir la entrega contractual de la obra	Interventoría-Contratista-CDMB	27/03/2026





PRÓXIMA REUNIÓN					
FECHA:	27/03/2026	**HORA:**	8:00 am	**LUGAR:**	Frente de Obra: Villa de los Caballeros

Elaboró Acta	Cargo	Firma
Oscar Andrés Sánchez Jerez	Residente de Obra	
Revisó Acta	**Cargo**	**Firma**
Julián Fernando Villamizar Durán	Residente de Interventoría	

1

TEMA:	VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES DE OBRA Y DAÑOS OCACIONADOS POR LLUVIAS DEL CONTRATO 210.16225.6" **CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACION PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN EL TALUD ORIENTAL DEL BARRIO VILLA DE LOS CABALLEROS EN EL MUNICIPIO DE GIRÓN, DEPARTAMENTO DE SANTANDER"**	**ACTA No.**	**FECHA**		
			DD	**MM**	**AA**
LUGAR:	Frente de Obra – Villa de los Caballeros	10	18	03	26

LISTADO DE ASISTENTES REUNIONES INTERNAS

No.	NOMBRE	GÉNERO		CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA
		M	F			
1	Oscar Andrés Sánchez Jerez	x		Residente de Contratista	Contratista	
2	Julián Fernando Villamizar Durán	x		Residente de Interventoría	Interventoría	
3	Clara Melissa Donado Arias		x	Profesional Siso	Contratista	
4	Edith Costanza Toloza Rojas		x	Especialista Ambiental	Interventoría	
5	Sandra Yolima Bermúdez Cala		X	Profesional Ambiental	Contratista	
7	Paula Emilia Fajardo Silgado		x	Profesional Siso	Interventoría	
8	Héctor Amado H.		X	Profesional Especializado CDMB- Apoyo supervisión	CDMB	
9	Gilberto Gómez O.		X	Profesional Especializado CDMB- Apoyo supervisión	CDMB	

	CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA – C.D.M.B.		
	ELABORÓ: Equipo Proceso Relaciones con Partes Interesadas	REVISÓ: REPRESENTANTE DIRECCIÓN SIGC	APROBÓ: DIRECTOR(A) GENERAL
CODIGO: A-PI-FO05	VERSION: 5	ACTA DE REUNIÓN	

TEMA:	VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES DE OBRA PARA DEFINIR FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO 210.16225.6" GRUPO 4: **CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACION PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN EL TALUD ORIENTAL DEL BARRIO VILLA DE LOS CABALLEROS EN EL MUNICIPIO DE GIRÓN, DEPARTAMENTO DE SANTANDER**"		**ACTA No.**	**FECHA**	
				DD	**MM**	**AA**
			11	27	03	2026
LUGAR:	Frente de Obra – Villa de los Caballeros		**Hora Inicio**	3:00 pm		
			Hora final	4:00 pm		

AGENDA		
No.	**ORDEN DEL DIA**	**RESPONSABLE**
1	Visita técnica para revisión de avance de actividades contractuales según programación de obra para definir fecha de terminación de la obra	Contratista – Interventoría - CDMB
2	Entrega de Acta parcial No.04 y Acta de recibo definitivo	Contratista – Interventoría


No.	**DESARROLLO ORDEN DEL DÍA**
1	En el marco del comité de obra, se dio apertura a la reunión con la participación del equipo profesional del contratista, la Interventoría y el equipo técnico de la CDMB, con el propósito de realizar una visita técnica al frente de trabajo, orientada a verificar en campo el estado de avance de las actividades contractuales, en concordancia con la proximidad de la fecha de terminación del contrato de obra pública. Durante el recorrido, se evidenció un avance físico y administrativo aproximado del noventa y ocho por ciento (98 %) del total contractual. Se informó que, previo a la culminación de las actividades, se encuentra en proceso el cumplimiento de la edad mínima requerida del concreto para la evaluación de su resistencia a la compresión, con el fin de verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas del proyecto. Una vez validado este requisito, se procederá con la ejecución de las actividades finales correspondientes al sistema de tensionamiento. Así mismo, se constató la ejecución de obras complementarias, tales como la construcción de bordillos perimetrales en las zonas peatonales adyacentes al área intervenida, así como la implementación de rampas de acceso vehicular, las cuales, según lo manifestado por el contratista, obedecen a requerimientos de la comunidad para garantizar el acceso a las viviendas aledañas. En cuanto a la programación, se proyecta terminar las actividades de obra en la fecha establecida contractualmente, contemplando dentro de las semanas restante la ejecución del sistema de tensionamiento. Previo a esta actividad, se realizará la instalación de los elementos requeridos en cada punto de anclaje, incluyendo platinas, polainas (o poporas) y cuñas, conforme a las especificaciones de diseño.

	Para la ejecución del tensionamiento, se dispondrá de una unidad hidráulica acoplada a un gato tensor tipo monotorónn, equipada con manómetro calibrado que permita el control preciso de la carga aplicada. El procedimiento se desarrollará bajo estricto control técnico, conforme a los parámetros de diseño, aplicando una carga total de treinta (30) toneladas por anclaje, equivalente a diez (10) toneladas por cada torón, hasta alcanzar el cien por ciento (100 %) de la carga de tensión establecida. Estas actividades permitirán garantizar la adecuada transferencia de esfuerzos al sistema de contención, contribuyendo a la estabilidad global del talud conforme a los criterios geotécnicos definidos en el diseño. Finalmente, se realizará el correspondiente control técnico del proceso de tensionamiento, incluyendo la verificación y registro de las elongaciones físicas obtenidas, como mecanismo de validación del comportamiento del sistema instalado. En atención a los compromisos establecidos en el comité anterior, se definió la ejecución de una adecuación consistente en la construcción de un tapón o antepecho en el punto inicial de la canaleta ubicada en la corona del talud. Esta medida fue adoptada como acción preventiva y de mitigación, con el propósito de impedir el arrastre y/o la conducción no controlada de aguas de escorrentía superficial hacia el disipador de energía preexistente, evitando así posibles afectaciones a su funcionamiento hidráulico. A continuación, se presenta la descripción de la obra ejecutada, en la cual se detallan las características técnicas, localización y función hidráulica de la estructura construida: 
2	En el marco de las actividades administrativas asociadas al cierre del contrato, se llevó a cabo la recopilación y consolidación de la información correspondiente a los informes semanales revisados con la Interventoría, así como del informe mensual del mes de marzo de 2026, incluyendo sus respectivos anexos: actas de comité, informe de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), informe de calidad e informe ambiental.

	Lo anterior, con el propósito de garantizar la trazabilidad, integridad y actualización de la información administrativa relacionada con las actividades ejecutadas en obra, permitiendo contar con los soportes requeridos para la radicación del Acta Parcial de Pago No. 04. Una vez consolidada la información correspondiente al mes de marzo, se proyecta de manera paralela la estructuración de la documentación administrativa del mes de abril de 2026, con el fin de gestionar oportunamente la radicación del Acta de Recibo Definitivo. Este proceso se desarrolla en cumplimiento de los lineamientos contractuales y administrativos establecidos, asegurando el cierre adecuado del contrato, tanto en términos técnicos como documentales, dentro de los plazos estipulados.

No.	TAREAS	RESPONSABLE	FECHA
1	Se acuerda programar una próxima reunión de Comité, con el fin de observar inspeccionar las actividades finales de obra.	Interventoría-Contratista	10/04/2026





PRÓXIMA REUNIÓN					
FECHA:	10/04/2026	**HORA:**	8:00 am	**LUGAR:**	Frente de Obra: Villa de los Caballeros

Elaboró Acta	Cargo	Firma
Oscar Andrés Sánchez Jerez	Residente de Obra	
Revisó Acta	**Cargo**	**Firma**
Julián Fernando Villamizar Durán	Residente de Interventoría	

1

TEMA:	VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES DE OBRA PARA DEFINIR FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO 210.16225.6" **CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACION PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN EL TALUD ORIENTAL DEL BARRIO VILLA DE LOS CABALLEROS EN EL MUNICIPIO DE GIRÓN, DEPARTAMENTO DE SANTANDER**"	**ACTA No.**	**FECHA**		
			DD	**MM**	**AA**
LUGAR:	Frente de Obra – Villa de los Caballeros	11	27	03	26

LISTADO DE ASISTENTES REUNIONES INTERNAS

No.	NOMBRE	GÉNERO		CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA
		M	F			
1	Oscar Andrés Sánchez Jerez	x		Residente de Contratista	Contratista	
2	Julián Fernando Villamizar Durán	x		Residente de Interventoría	Interventoría	
3	Clara Melissa Donado Arias		x	Profesional Siso	Contratista	
4	Edith Costanza Toloza Rojas		x	Especialista Ambiental	Interventoría	
5	Sandra Yolima Bermúdez Cala		X	Profesional Ambiental	Contratista	
7	Paula Emilia Fajardo Silgado		x	Profesional Siso	Interventoría	
8	Gilberto Gómez O.		X	Profesional Especializado CDMB- Apoyo supervisión	CDMB	

ANEXO NO.08 INFORME DE AVANCE DE GERENCIA

CONTRATO No. 210.16225.6 del 5 de septiembre del 2025



GRUPO 4: CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACION PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN EL TALUD ORIENTAL DEL BARRIO VILLA DE LOS CABALLEROS EN EL MUNICIPIO DE GIRÓN, DEPARTAMENTO DE SANTANDER.

INFORME MENSUAL DE GERENCIA DEL PROYECTO No.06

PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DEL 2026

Fecha	Elaboró	Aprobó
31/03/2026	Ing. Juan Carlos Rincon Lozano	Ing. Johanna Marcela Padierna Castiblanco

1. Contenido

1. INTRODUCCIÓN 4
2. OBJETIVO GENERAL 4
2.1 Objetivos Específicos 4
3. GESTIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO 4
3.1 Alcance Ejecutado Acta Corte 4
3.2 Revisión de Estabilidad De Alcance 6
3.2.1 Alcance del Objeto 6
3.2.2 Alcance del Proyecto 6
3.2.3 Alcance del Producto 6
4. COMPROMISOS ADQUIRIDOS 6
4.1 Gestión del Tiempo Del Proyecto 6
4.1.1 Plan de Gestión del Tiempo 6
I. Personas autorizadas a solicitar cambios en el Cronograma 6
II. Personas que aprueban requerimiento de cambio de cronograma 7
III. Proceso de control del Schedule (Cronograma) 7
IV. Procedimiento de Cambios en Cronograma 8
4.2 Línea Base Control del Tiempo 9
4.2.1 Hitos 9
4.2.1.1 Hitos del Proyecto 9
4.2.2 Cronograma Seguimiento a Fecha de Corte 13
5. CAUSAS DE ATRASO / ADELANTO 14
5.1 Medición Línea Base 14
5.2 Proyecciones sobre indicadores obtenidos 15
6. COMPROMISOS ADQUIRIDOS 16

7. GESTIÓN DE COSTOS DEL PROYECTO 16
7.1 Fórmulas de Pronóstico de Valor Ganado 16
7.2 Procesos de Gestión de Costos 17
7.3 Sistema Gestión de costo 17
7.4 Sistema de Control de Costos 17
8. Proyecciones sobre indicadores obtenidos 18
8.1 Sistema de Control de Cambios de Costos 18
9. LÍNEA BASE PRESUPUESTO 18
9.1 Presupuesto Inicial del Proyecto 18
9.2 Seguimiento a Programa de Inversiones Planeado /Actas Cobro 22
10. REVISIÓN DE ESTABILIDAD VALOR 22
11. Compromisos Adquiridos 23

1. INTRODUCCIÓN

Se ha comprobado que la aplicación de los procesos de dirección de proyectos de la Guía del PMBOK® Séptima Edición 2021 (Project Management Institute PMI) aumentan la probabilidad de éxito de los proyectos por esta razón, se hace indispensable que la empresa quiera adoptar y aplicar los conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades de los proyectos para el cumplimiento efectivo de los objetivos del mismo.

El Presente documento contiene el **informe de seguimiento N°6** al programa de gerencia de proyectos implementado y actualizado dentro del proyecto, y recopila desde cada una de las áreas de conocimientos, métricas, indicadores, desviaciones y trazabilidad del proyecto que describe cómo ha trascurrido su ejecución desde los lineamientos del Estándar de la guía del PMBOK® Séptima Edición 2017.

2. OBJETIVO GENERAL

El objetivo general de este seguimiento es gerencialmente y alineados con las buenas prácticas del PMI, revisar y realizar seguimiento al estado del programa de gerencia de proyectos implementados dentro del proyecto "**CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARMANGA- GRUPO 4: CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACION PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN EL TALUD ORIENTAL DEL BARRIO VILLA DE LOS CABALLEROS EN EL MUNICIPIO DE GIRÓN, DEPARTAMENTO DE SANTANDER**", recopilar los datos concernientes a la ejecución, procesarlos y establecer indicadores y estado en general tanto del proyecto como del programa de gerencia implementado.

2.1 Objetivos Específicos


Realizar seguimiento específico a cada una de las áreas del conocimiento contenidas en el programa para la gerencia de proyectos diseñado y actualizado para el proyecto en específico, actualización y control a indicadores provenientes de datos procesados del proyecto, y su respectiva comparación con los planes vigentes y las líneas bases correspondientes.

3. GESTIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO

3.1 Alcance Ejecutado Acta Corte

Avance en Ejecución: Facturado a la fecha 98,09% - $ 4.079.891.058,90

ALCANCE EJECUTADO ACTUAL:

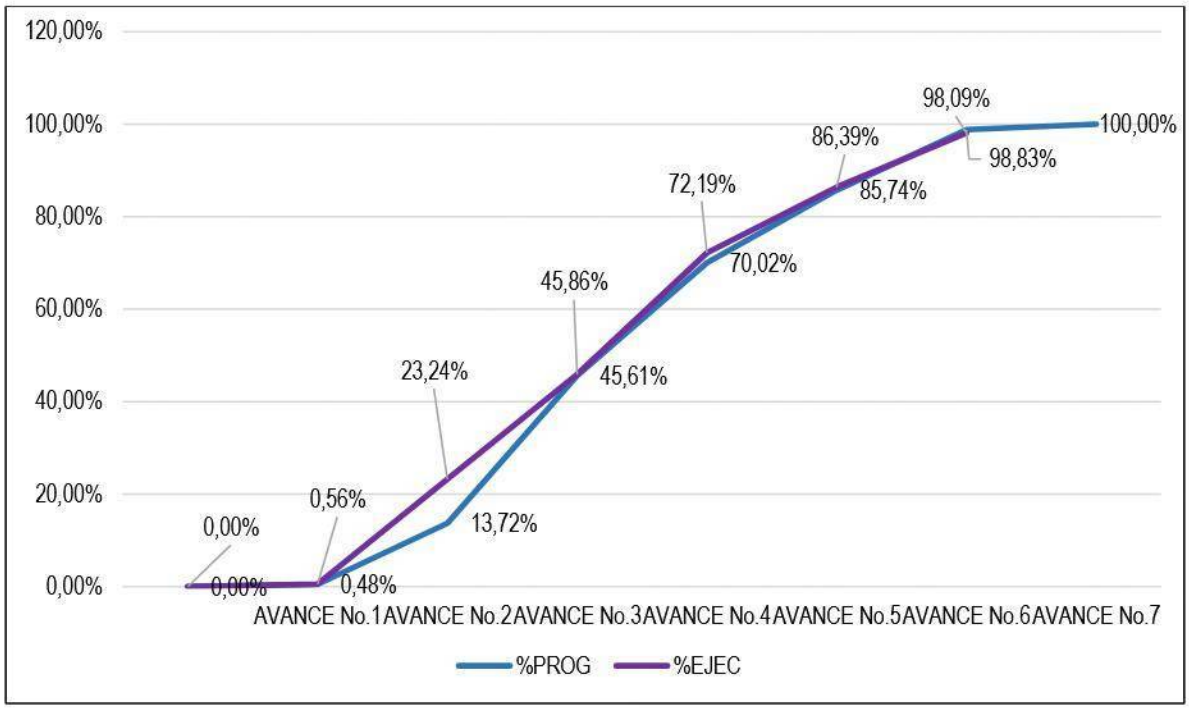

CURVA S PROGRAMADA



OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL
$ 20.105.033,46	$ 570.673.058,35	$ 1.897.182.775,53	$ 2.912.174.065,96	$ 3.566.051.716,69	$ 4.110.490.936,14	$ 4.159.344.710,65

3.2 Revisión de Estabilidad De Alcance

3.2.1 Alcance del Objeto

El alcance ejecutado se alinea en ejecución y objetivo de cumplir con el objeto del contrato, no se han surtido nuevos cambios contractuales que afecten o pongan en riesgo la obtención del fin último para el cual se ejecuta el contrato, ni para el contratante ni para el contratista, se han visto impactado en modificaciones de tipo técnico, de tiempo y de costo, pero estas no varían ni presentan desviación en el alcance del objeto contractual.

3.2.2 Alcance del Proyecto

El proyecto "**CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACION PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN EL TALUD ORIENTAL DEL BARRIO VILLA DE LOS CABALLEROS EN EL MUNICIPIO DE GIRÓN, DEPARTAMENTO DE SANTANDER**" no ha tenido adición en tiempo y presupuesto, se mantiene el alcance de rehabilitación, con lo cual la solución para dicha rehabilitación continúa siendo la misma.

3.2.3 Alcance del Producto

El producto final contenido en los paquetes de trabajo de la WBS del proyecto "**CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACION PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN EL TALUD ORIENTAL DEL BARRIO VILLA DE LOS CABALLEROS EN EL MUNICIPIO DE GIRÓN, DEPARTAMENTO DE SANTANDER**" no han tenido la inclusión de nuevos ítems no previstos.

4. COMPROMISOS ADQUIRIDOS

Reporte semanal de avance físico y presupuestal, en el que se consoliden las cantidades ejecutadas durante la semana, el acumulado a la fecha y su correspondiente ejecución financiera con el fin de efectuar el seguimiento y control del desempeño del proyecto, de igual manera se presente reporte mensual de avance con su respetiva cantidad ejecutada evidenciadas con registro fotográfico. Se realiza reuniones en obra para observar el avance ejecutado que ha tenido el proyecto y se deja plasmado en actas de visita.

4.1 Gestión del Tiempo Del Proyecto

4.1.1 Plan de Gestión del Tiempo

I. Personas autorizadas a solicitar cambios en el Cronograma

Nombre	Cargo	Ubicación
Johanna Marcela Padierna Castiblanco	Representante Legal	Oficina Contratista

Juan Carlos Rincon Lozano	Gerente de Proyecto	Oficina Contratista
Carlos Alberto Diaz Barrera	Subdirector SURYT-Supervisión- Entidad Contratante	CDMB
José Eliecer Álvarez Carreño	Director Interventoría	Oficina Interventoría Proyecto
Iban Gustabo Blanco Gonzales	RL Interventoría	Oficina Interventoría Proyecto

II. Personas que aprueban requerimiento de cambio de cronograma

En Escala de Aprobación.

Cargo	Integrante
Director de Proyecto	Contratista
Director Interventoría	Interventoría
Supervisor Proyecto	Contratante

III. Proceso de control del Schedule (Cronograma)

Dando continuidad al desarrollo del presente proyecto se continúa implementando un esquema estructurado de monitoreo y control del cronograma, que contempla un seguimiento quincenal conjunto con la Interventoría, orientado a la verificación del avance físico de las actividades y al análisis preliminar de su comportamiento frente a la programación vigente, en compañía de personal profesional de la interventoría, contratista y la CDMB.

De manera complementaria, se realizará un control mensual (cada 30 días) mediante el corte formal de cantidades y del presupuesto, consolidando la ejecución física y financiera del periodo. Este proceso dará lugar a la elaboración del informe mensual de avance de obra, dirigido a la Interventoría y a la entidad contratante, el cual incluirá el seguimiento al control de costos, así como el análisis comparativo entre lo programado y lo efectivamente ejecutado, con el fin de identificar desviaciones y definir oportunamente las acciones de ajuste requeridas.

Razones aceptables para cambios en cronograma del Proyecto	
Solicitud de cambio de alcance por parte del Cliente	Accidentes de trabajo.
Desastres naturales.	Cambio de sub-contratistas por fuerza mayor.
Huelgas y problemas de orden público	Incumplimiento del proveedor en la entrega de materiales.
Atrasos ocasionados por los sub-contratistas.	Mal establecimiento de la secuencia de actividades.

Cómo los cambios al Cronograma serán Administrados	
Designación de Responsabilidades	
Planificación	Ing Residente del proyecto / VoBo Gerente Proyecto
Ejecución	Ing Residente del Proyecto / VoBo Director Proyecto
Seguimiento y Control	Planeador / Director Proyecto

IV. Procedimiento de Cambios en Cronograma

Provenientes de Subcontratistas o resultantes de atraso de proveedores

- Cada semana se recibirán las solicitudes de cambio en el cronograma, las cuales deben ser presentadas por el representante del subcontratista
- Estas solicitudes serán revisadas por el equipo de proyecto para evaluar, en primera instancia, si es un cambio “viable” según el plan de gestión del alcance (No debe pasar del 5% del cronograma del proyecto).
- Las solicitudes de cambio de cronograma comenzarán a revisarse los días sábados de cada semana, teniendo un plazo máximo de 5 días para dar respuesta a la solicitud. La solicitud de cambio será aprobada con la firma del Director de Proyecto.

Cuando las solicitudes son realizadas por las personas autorizadas del equipo del proyecto, se procederá de la siguiente manera

- La Oficina de Proyectos luego de evaluar la causa de demora en el cronograma debido a un inconveniente, informará el Director del Proyecto la necesidad de realizar un cambio en el cronograma.
- El Gerente del Proyecto, junto con el equipo de proyecto, evaluará la situación para determinar la criticidad del cambio. Dependiendo de la misma se procederá de la siguiente manera:
- Si la solicitud de cambio del cronograma afecta el alcance del proyecto o sobrepasa los límites de atraso en el cronograma establecidos entonces se deberá presentar una solicitud a interventoría en donde se informe de manera clara y detallada de la situación.
- La Interventoría, dentro de sus procedimientos, deberá tener un tiempo fijo estipulado para la aprobación de la solicitud de cambio en el cronograma y posteriormente presentar la solicitud a la Subdirección de Gestión del Riesgo y Seguridad Territorial -SURYT (CDMB Entidad contratante)
- La Supervisión, dentro de sus procedimientos, también deberá contar con un tiempo estipulado pronunciarse acerca de los cambios de cronograma y adiciones en tiempo de ser necesarias, todo el procedimiento anterior será objeto de informe que soporta la solicitud de extensión de tiempo.

4.2 Línea Base Control del Tiempo

A continuación, se presentan las fechas de control, junto con los hitos a revisar en ejecución y las mediciones esperadas realizadas en las fechas hitos de medición a la programación y los respectivos porcentajes % de avance (en tiempo) Sobre las actividades programadas para cada fecha de control.

4.2.1 Hitos


4.2.1.1 Hitos del Proyecto

Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN EL TALUD ORIENTAL DEL BARRIO VILLA DE LOS CABALLEROS EN EL MUNICIPIO DE GIRÓN, DEPARTAMENTO DE SANTANDER (RA-OBRA-02)."	135 días	mié 15/10/25	mié 15/04/26
Inicio de obra	0 días	mié 15/10/25	mié 15/10/25
SECCIÓN PRIMERA	**134 días**	**mié 15/10/25**	**mar 14/04/26**
Replanteo, control y medición de obra	134 días	mié 15/10/25	mar 14/04/26
Vallas y señales especiales	0 días		
Valla tipo 1A (5,00m x 2,8m)	5 días	mié 15/10/25	mar 21/10/25
Desmonte y limpieza	20 días	vie 17/10/25	mié 12/11/25
Retiro de basuras y escombros	20 días	vie 17/10/25	mié 12/11/25
perfilado a mano descolgado de talud en roca	25 días	jue 13/11/25	mié 17/12/25
SECCIÓN SEGUNDA	**69 días**	**jue 13/11/25**	**sáb 14/02/26**
Excavación con acarreo libre en material granular	30 días	jue 13/11/25	mar 23/12/25
Excavación por acarreo libre en roca a cualquier profundidad	32 días	jue 13/11/25	vie 26/12/25
Excavación a mano con acarreo libre descolgado para zapata	28 días	vie 9/01/26	sáb 14/02/26

Sobreacarreos para acarreos totales mayores de 1.000,00 m	36 días	jue 13/11/25	vie 2/01/26
SECCION TERCERA	**83 días**	**lun 24/11/25**	**vie 13/03/26**
Suministro y colocación de concreto de 3000 psi con mezcla humeda para zapatas	10 días	lun 2/03/26	vie 13/03/26
Suministro y colocación de concreto lanzado con mezcla húmeda de espesor 10 cm	10 días	lun 2/03/26	vie 13/03/26
Llenado de inyeccion con lechada cementicia para anclajes	40 días	lun 24/11/25	sáb 17/01/26
SECCIÓN CUARTA	**107 días**	**jue 20/11/25**	**mar 14/04/26**
Suministro y colocación acero de refuerzo fy 4200 kg / cm2	28 días	mar 27/01/26	mar 3/03/26
Suministro e instalación de 3 cables Ø=1/2" de L=25m	65 días	jue 20/11/25	lun 16/02/26
Tensionamiento de anclajes	14 días	mié 25/03/26	mar 14/04/26
Malla electrosoldada 4mm y abertura de 0,15m x 0,15m	12 días	sáb 21/02/26	lun 9/03/26
Suministro e instalación de platina de 200mm x 200mm x 12mm con tres agujeros	14 días	mié 25/03/26	mar 14/04/26
Suministro e instalación de popora de 3 agujeros conicos para cuña de Ø=1/2"	14 días	mié 25/03/26	mar 14/04/26
Suministro e instalación de kit de cuñas de Ø=1/2" para anclaje	14 días	mié 25/03/26	mar 14/04/26
SECCIÓN QUINTA	**65 días**	**jue 20/11/25**	**lun 16/02/26**
Ejecución perforaciones horizontales en taludes con pendientes mayores a 1:1 (en roca) con equipo de perforación descolgado para anclajes de 0,00m a 15,00m	65 días	jue 20/11/25	lun 16/02/26
Ejecución de perforaciones horizontales en taludes con pendientes mayores a 1:1 (en roca) con equipo	65 días	jue 20/11/25	lun 16/02/26

de perforación descolgado para anclajes mayores a 15,00m			
SECCIÓN SEXTA	**24 días**	**jue 19/02/26**	**vie 20/03/26**
Canaleta (ancho = 1m; e =10cm)	15 días	mar 24/02/26	sáb 14/03/26
Estructura de disipación de energía	15 días	mar 3/03/26	vie 20/03/26
Sistema de abatimiento para líneas hidráulicas de infiltración interna y protección del trasdós de la estructura estabilizadora	8 días	jue 19/02/26	sáb 28/02/26

CONSORCIO CONSOLIDACIÓN GIRÓN	
	SEGUIMIENTO PROGRAMA DE GERENCIA N°06
	01 de marzo al 31 de marzo de 2026

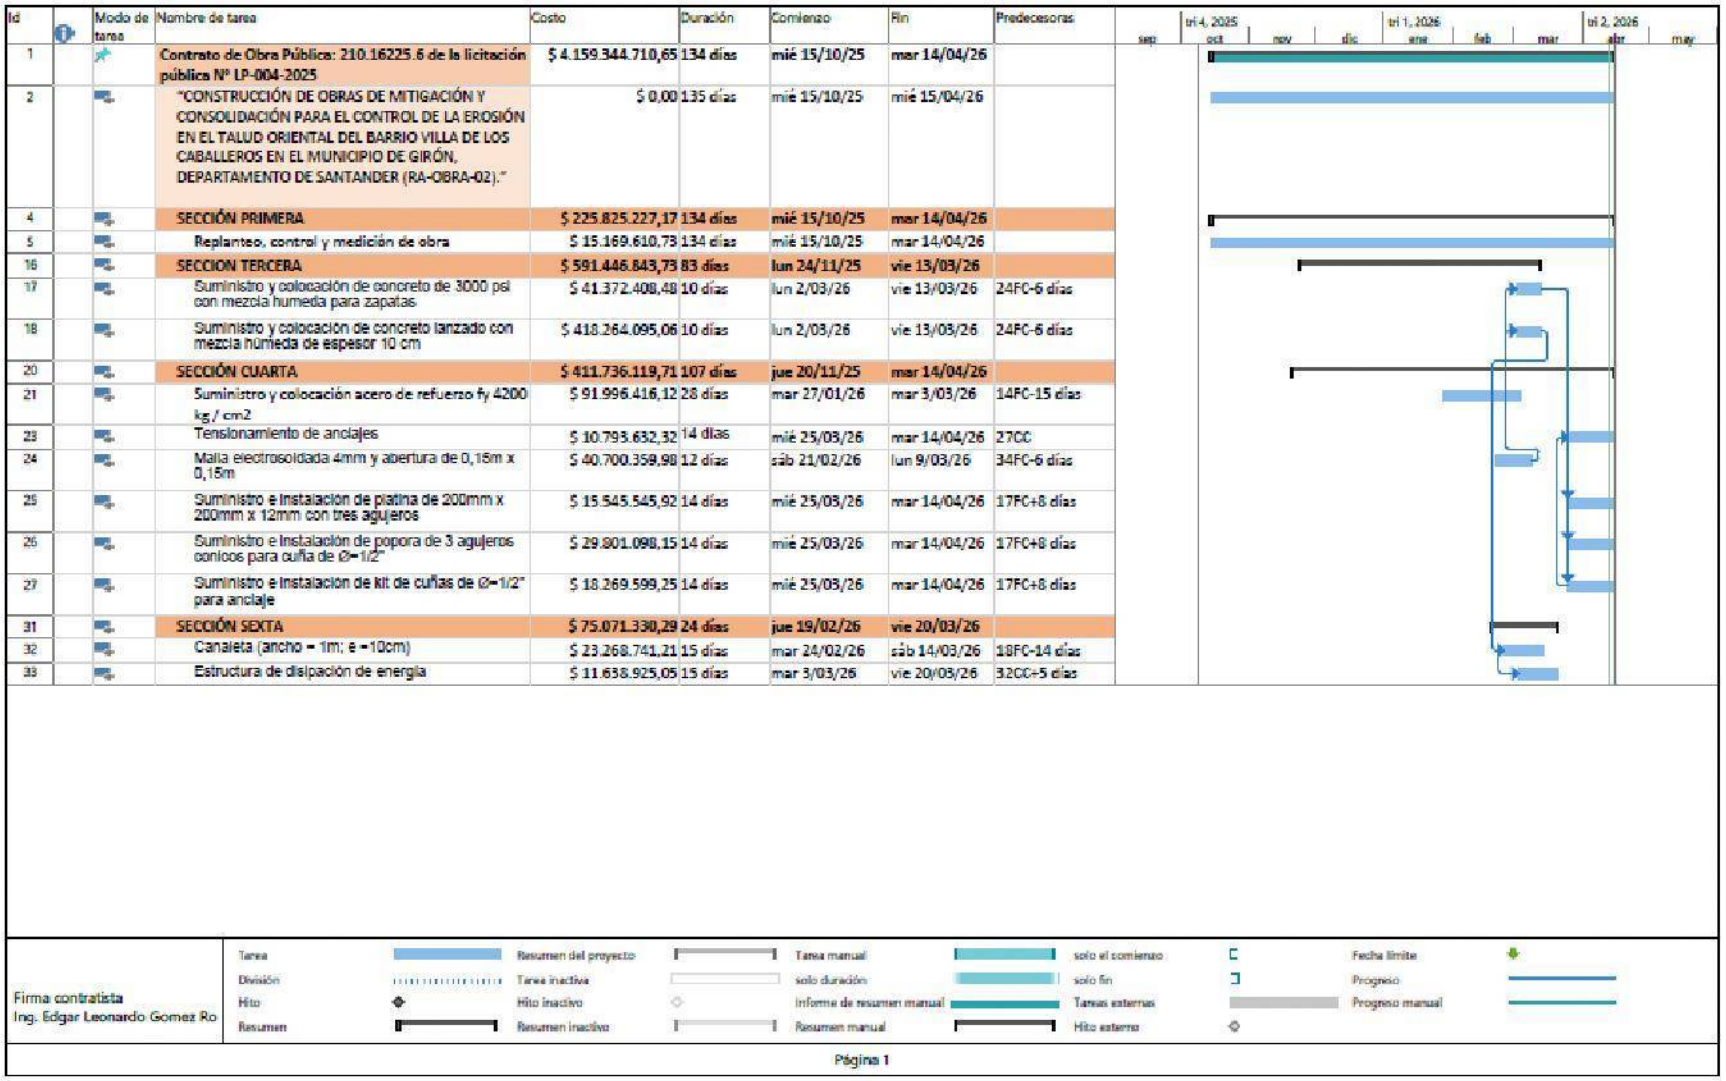


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1		**Contrato de Obra Pública: 210.16225.6 de la licitación pública N° LP-004-2025**	**$ 4.159.344.710,65**	**134 días**	**mié 15/10/25**	**mar 14/04/26**	
2		"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN EL TALUD ORIENTAL DEL BARRIO VILLA DE LOS CABALLEROS EN EL MUNICIPIO DE GIRÓN, DEPARTAMENTO DE SANTANDER (RA-OBRA-02)."	$ 0,00	135 días	mié 15/10/25	mié 15/04/26	
4		**SECCIÓN PRIMERA**	**$ 225.825.227,17**	**134 días**	**mié 15/10/25**	**mar 14/04/26**	
5		Replanteo, control y medición de obra	$ 15.169.610,73	134 días	mié 15/10/25	mar 14/04/26	
16		**SECCION TERCERA**	**$ 591.446.843,73**	**83 días**	**lun 24/11/25**	**vie 13/03/26**	
17		Suministro y colocación de concreto de 3000 psi con mezcla humeda para zapatas	$ 41.372.408,48	10 días	lun 2/03/26	vie 13/03/26	24FC-6 días
18		Suministro y colocación de concreto lanzado con mezcla humeda de espesor 10 cm	$ 418.264.095,06	10 días	lun 2/03/26	vie 13/03/26	24FC-6 días
20		**SECCIÓN CUARTA**	**$ 411.736.119,71**	**107 días**	**jue 20/11/25**	**mar 14/04/26**	
21		Suministro y colocación acero de refuerzo fy 4200 kg / cm2	$ 91.996.416,12	28 días	mar 27/01/26	mar 3/03/26	14FC-15 días
23		Tensionamiento de anclajes	$ 10.793.632,32	14 días	mié 25/03/26	mar 14/04/26	27CC
24		Malla electrosoldada 4mm y abertura de 0,15m x 0,15m	$ 40.700.359,98	12 días	sáb 21/02/26	lun 9/03/26	34FC-6 días
25		Suministro e instalación de platina de 200mm x 200mm x 12mm con tres agujeros	$ 15.545.545,92	14 días	mié 25/03/26	mar 14/04/26	17FC+8 días
26		Suministro e instalación de popora de 3 agujeros conicos para cuña de Ø=1/2"	$ 29.801.098,15	14 días	mié 25/03/26	mar 14/04/26	17FC+8 días
27		Suministro e instalación de kit de cuñas de Ø=1/2" para anclaje	$ 18.269.599,25	14 días	mié 25/03/26	mar 14/04/26	17FC+8 días
31		**SECCIÓN SEXTA**	**$ 75.071.330,29**	**24 días**	**jue 19/02/26**	**vie 20/03/26**	
32		Canaleta (ancho = 1m; e =10cm)	$ 23.268.741,21	15 días	mar 24/02/26	sáb 14/03/26	18FC-14 días
33		Estructura de disipación de energia	$ 11.638.925,05	15 días	mar 3/03/26	vie 20/03/26	32CC+5 días

Firma contratista
Ing. Edgar Leonardo Gomez Ro

Tarea · Resumen del proyecto · Tarea manual · solo el comienzo · Fecha límite
División · Tarea inactiva · solo duración · solo fin · Progreso
Hito · Hito inactivo · Informe de resumen manual · Tareas externas · Progreso manual
Resumen · Resumen inactivo · Resumen manual · Hito externo

Página 1


4.2.2 Cronograma Seguimiento a Fecha de Corte

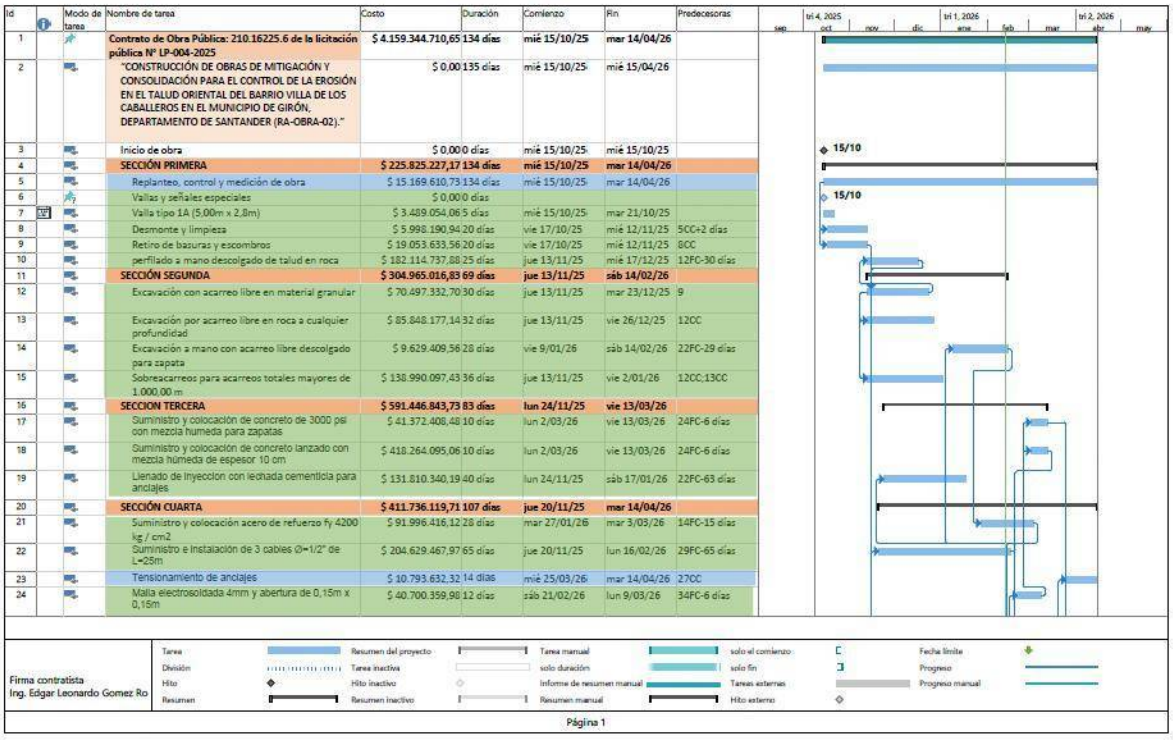

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1		**Contrato de Obra Pública: 210.16225.6 de la licitación pública N° LP-004-2025**	$ 4.159.344.710,65	134 días	mié 15/10/25	mar 14/04/26	
2		"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN EL TALUD ORIENTAL DEL BARRIO VILLA DE LOS CABALLEROS EN EL MUNICIPIO DE GIRÓN, DEPARTAMENTO DE SANTANDER (RA-OBRA-02)."	$ 0,00	135 días	mié 15/10/25	mié 15/04/26	
3		Inicio de obra	$ 0,00	0 días	mié 15/10/25	mié 15/10/25	
4		**SECCIÓN PRIMERA**	**$ 225.825.227,17**	**134 días**	**mié 15/10/25**	**mar 14/04/26**	
5		Replanteo, control y medición de obra	$ 15.169.610,73	134 días	mié 15/10/25	mar 14/04/26	
6		Vallas y señales especiales	$ 0,00	0 días			
7		Valla tipo 1A (5,00m x 2,8m)	$ 3.489.054,06	5 días	mié 15/10/25	mar 21/10/25	
8		Desmonte y limpieza	$ 5.998.190,94	20 días	vie 17/10/25	mié 12/11/25	5CC+2 días
9		Retiro de basuras y escombros	$ 19.053.633,56	20 días	vie 17/10/25	mié 12/11/25	8CC
10		perfilado a mano descolgado de talud en roca	$ 182.114.737,88	25 días	jue 13/11/25	mié 17/12/25	12FC-30 días
11		**SECCIÓN SEGUNDA**	**$ 304.965.016,83**	**69 días**	**jue 13/11/25**	**sáb 14/02/26**	
12		Excavación con acarreo libre en material granular	$ 70.497.332,70	30 días	jue 13/11/25	mar 23/12/25	9
13		Excavación por acarreo libre en roca a cualquier profundidad	$ 85.848.177,14	32 días	jue 13/11/25	vie 26/12/25	12CC
14		Excavación a mano con acarreo libre descolgado para zapata	$ 9.629.409,56	28 días	vie 9/01/26	sáb 14/02/26	22FC-29 días
15		Sobreacarreos para acarreos totales mayores de 1.000,00 m	$ 138.990.097,43	36 días	jue 13/11/25	vie 2/01/26	12CC;13CC
16		**SECCION TERCERA**	**$ 591.446.843,73**	**83 días**	**lun 24/11/25**	**vie 13/03/26**	
17		Suministro y colocación de concreto de 3000 psi con mezcla humeda para zapatas	$ 41.372.408,48	10 días	lun 2/03/26	vie 13/03/26	24FC-6 días
18		Suministro y colocación de concreto lanzado con mezcla húmeda de espesor 10 cm	$ 418.264.095,06	10 días	lun 2/03/26	vie 13/03/26	24FC-6 días
19		Llenado de inyeccion con lechada cementicia para anclajes	$ 131.810.340,19	40 días	lun 24/11/25	sáb 17/01/26	22FC-63 días
20		**SECCIÓN CUARTA**	**$ 411.736.119,71**	**107 días**	**jue 20/11/25**	**mar 14/04/26**	
21		Suministro y colocación acero de refuerzo fy 4200 kg / cm2	$ 91.996.416,12	28 días	mar 27/01/26	mar 3/03/26	14FC-15 días
22		Suministro e instalación de 3 cables Ø=1/2" de L=25m	$ 204.629.467,97	65 días	jue 20/11/25	lun 16/02/26	29FC-65 días
23		Tensionamiento de anclajes	$ 10.793.632,32	14 días	mié 25/03/26	mar 14/04/26	27CC
24		Malla electrosoldada 4mm y abertura de 0,15m x 0,15m	$ 40.700.359,98	12 días	sáb 21/02/26	lun 9/03/26	34FC-6 días

Firma contratista
Ing. Edgar Leonardo Gomez Ro

Página 1

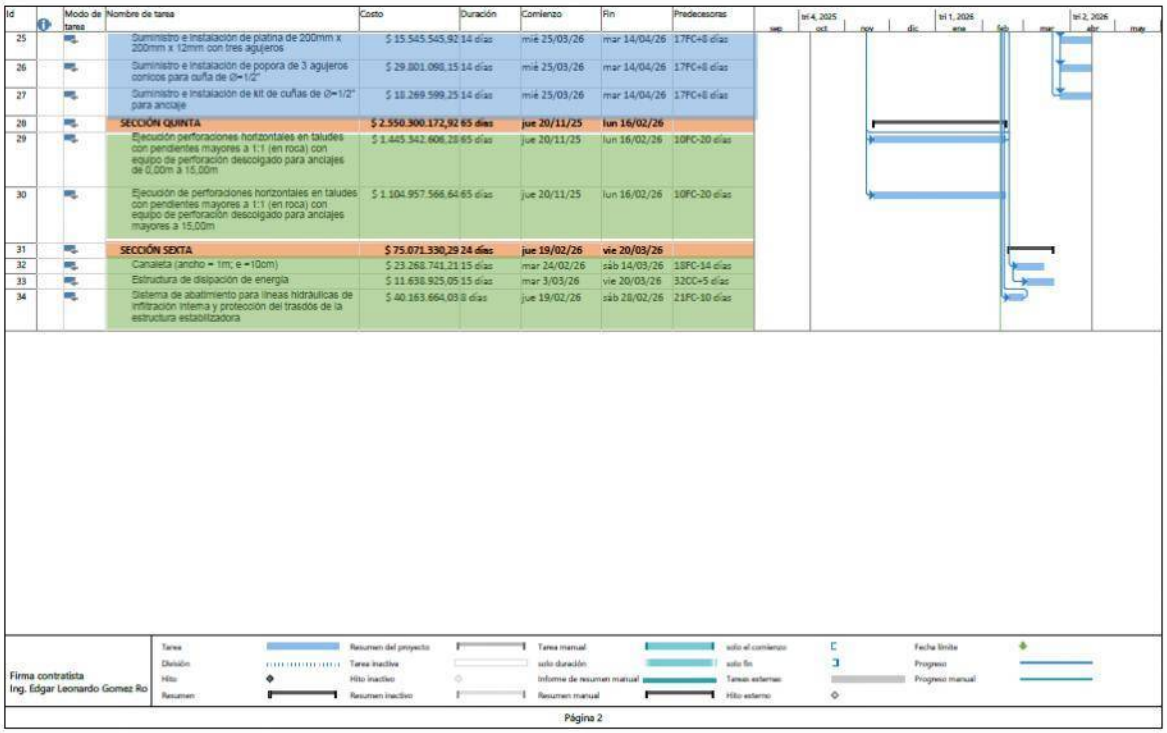

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
25		Suministro e instalación de platina de 200mm x 200mm x 12mm con tres agujeros	$ 15.545.545,92	14 días	mié 25/03/26	mar 14/04/26	17FC+8 días
26		Suministro e instalación de pospora de 3 agujeros conicos para cuña de Ø=1/2"	$ 29.801.098,15	14 días	mié 25/03/26	mar 14/04/26	17FC+8 días
27		Suministro e instalación de kit de cuñas de Ø=1/2" para anclaje	$ 18.269.599,25	14 días	mié 25/03/26	mar 14/04/26	17FC+8 días
28		**SECCIÓN QUINTA**	**$ 2.550.300.172,92**	**65 días**	**jue 20/11/25**	**lun 16/02/26**	
29		Ejecución perforaciones horizontales en taludes con pendientes mayores a 1:1 (en roca) con equipo de perforación descolgado para anclajes de 0,00m a 15,00m	$ 1.445.342.606,28	65 días	jue 20/11/25	lun 16/02/26	10FC-20 días
30		Ejecución de perforaciones horizontales en taludes con pendientes mayores a 1:1 (en roca) con equipo de perforación descolgado para anclajes mayores a 15,00m	$ 1.104.957.566,64	65 días	jue 20/11/25	lun 16/02/26	10FC-20 días
31		**SECCIÓN SEXTA**	**$ 75.071.330,29**	**24 días**	**jue 19/02/26**	**vie 20/03/26**	
32		Canaleta (ancho = 1m; e =10cm)	$ 23.268.741,21	15 días	mar 24/02/26	sáb 14/03/26	18FC-14 días
33		Estructura de disipación de energía	$ 11.638.925,05	15 días	mar 3/03/26	vie 20/03/26	32CC+5 días
34		Sistema de abatimiento para lineas hidráulicas de infiltración interna y protección del trasdós de la estructura estabilizadora	$ 40.163.664,03	8 días	jue 19/02/26	sáb 28/02/26	21FC-10 días

Firma contratista
Ing. Edgar Leonardo Gomez Ro

Página 2

Dentro del periodo correspondiente al presente informe, las actividades identificadas en la programación con color verde corresponden a aquellas ejecutadas al 100 %, en concordancia con lo establecido en el cronograma aprobado. Por su parte, las actividades resaltadas en color azul representan frentes iniciados y en desarrollo, cuya culminación se encuentra prevista para el próximo mes, donde se finaliza contractualmente el contraro. Con base en su desempeño actual, se estima que dichas actividades mantendrán un comportamiento favorable de avance respecto a la línea base del proyecto.

5. CAUSAS DE ATRASO / ADELANTO

Con base en el Acta de Corte vigente, el proyecto presenta un avance físico ejecutado del 98,09 %, frente a un avance programado acumulado del 98,83 % para la misma fecha de seguimiento. Esta diferencia corresponde a una leve desviación negativa, atribuida a que las actividades contractuales restantes son de alcance reducido, dado que las actividades de mayor peso dentro de la curva de avance ya han sido ejecutadas.

No obstante, dicha desviación se mantiene dentro de los rangos de control establecidos por la Gerencia del Proyecto, sin generar impactos en la secuencia constructiva ni en la adecuada asignación de recursos.

En este contexto, se proyecta la finalización de las actividades contractuales para el 14 de abril, correspondientes principalmente al proceso de tensionamiento, el cual quedó debidamente preparado durante el mes de marzo, garantizando las condiciones técnicas necesarias para su ejecución oportuna y el cumplimiento del objeto contractual.

5.1 Medición Línea Base

Se plantea comparación mensual con el % de avance en tiempo (por actividad) según lo expuesto en las hojas de ruta de medición anteriormente presentadas, la evaluación del SPI, de lo realmente ejecutado Vs lo planeado, este puede ser evaluado tanto actividad por actividad como en las actividades resumen (Capítulos) y el proyecto completo.

Los resultados deben ser interpretados como se presenta a continuación:

SPI - Schedule Performance Index. Es un índice que compara el EV (Valor Ganado), es decir lo avanzado, contra el PV (Valor Planeado) lo que se tenía pensado avanzar a un momento dado.

- Si el SPI es igual a 1, quiere decir que el entregable se está avanzando al ritmo previsto durante el presupuesto.
- Si el SPI es mayor a 1, quiere decir que el entregable se está avanzando a un ritmo mayor al previsto en el presupuesto.
- Si el SPI es menor a 1, quiere decir que se está avanzando a un ritmo peor que el previsto.

Procesos de Gestión de Tiempo	*Valor Actual*
EV- Valor Ganado	$ 4.079.891.058,90
PV - Valor Planeado	$ 4.110.490.936,14

SPI ACTUAL: 0.99– Ritmo menor a 1

Con base en los resultados obtenidos en la medición de la línea base, donde se evidencia un Índice de Desempeño de Cronograma (SPI) menor a 1, no se considera necesario reforzar el frente de obra actualmente establecido. Lo anterior se sustenta en que el rezago identificado corresponde principalmente a actividades de baja incidencia dentro del peso global del proyecto.

En la fase actual, el proyecto se encuentra en etapa de cierre, caracterizada por la ejecución de actividades menores, lo que naturalmente conlleva a una disminución en el ritmo de avance sin que ello represente una afectación significativa al cumplimiento del objetivo contractual.

En consecuencia, las condiciones operativas y de recursos existentes se consideran suficientes para culminar las actividades pendientes dentro del alcance previsto.

5.2 Proyecciones sobre indicadores obtenidos

- Estimado a la Conclusión Basado en Tiempo (Time Estimate at Completion, EAC t). Pronostica la duración del proyecto. Se recomienda obtenerla a partir de un análisis de la red del proyecto, aunque también se podría obtener un estimado aproximado de la duración final usando el SPI, en caso de que la tendencia continúe: EACt = (BAC / SPI) / (BAC / Duración de la PMB) = Duración de la PMB / SPI
- Variación a la Conclusión Basada en Tiempo (Time Variance at completion, VACt). VACt = Duración de la PMB – EACt

Procesos de Gestión de Costos	*Valor Actual*
BAC-Presupuesto a Completamiento	$ 4.159.344.710,65
EV- Valor Ganado	$ 4.079.891.058,90
PV - Valor Planeado	$ 4.110.490.936,14

Tipo de Pronostico	*Fórmula*	*Valor a Corte Seguimiento*
Variación de Costo	CV=EV-AC	0.0
Variación de Tiempo	SV=PV-AC	0.0

Índice Desempeño Costos	CPI=EV/AC	1.0
Índice Desempeño Tiempo	SPI=EV/PV	0.99
Estimado a la Conclusión Basado en Tiempo (Time Estimate at Completion, EAC t).	EACt = (BAC / SPI) / (BAC / Duración de la PMB) = Duración de la PMB / SPI	6 meses
Tiempo Faltante (Time to Complete)	TTC=EACt-Tiempo transcurrido	15,83 días
Variación a la Conclusión Basada en Tiempo (Time Variance at completion, VACt).	VACt = Duración de la PMB – EACt	-1.83 días

Con base en el ritmo actual de ejecución y el desempeño productivo registrado a la fecha, se proyecta mantener una tendencia de avance sostenida que permita culminar las actividades constructivas dentro del plazo contractual establecido. Lo anterior está condicionado a la continuidad de las condiciones técnicas, administrativas y operativas vigentes, así como a la no ocurrencia de factores externos que puedan afectar la programación prevista.

6. COMPROMISOS ADQUIRIDOS

- Continuar con la revisión de cantidades contractuales contra la implantación en obra para identificar el cumplimiento de los alcances con las cantidades presupuestadas.

7. GESTIÓN DE COSTOS DEL PROYECTO

7.1 Fórmulas de Pronóstico de Valor Ganado

Tipo de Pronostico	***Fórmula***	***Modo: Quien/Cómo/Cuando/Donde***
Variación de Costo	CV=EV-AC	Residente/Análisis de Datos/Cada mes/Reunión
Índice Desempeño Costos	CPI=EV/AC	Residente/Análisis de Datos/Cada mes/Reunión
Costo Estimado para Completar	ETC=BAC-EV	Residente/Análisis de Datos/Cada mes/Reunión
Costo Restante Proyectado	EAC=BAC/CPI	Residente/Análisis de Datos/Cada mes/Reunión
Eficiencia en costos necesaria Proyectada	TCPi=(BAC-EV)/(EAC-AC)	Residente/Análisis de Datos/Cada mes/Reunión

7.2 Procesos de Gestión de Costos

Procesos de Gestión de Costos	***Descripción***
AC-Costo Actual	Departamento Contable / Cuentas de Control / Mensual / Formato AC
EV-Valor Ganado	Ejecución (Residente/Director) / Mediciones de Avance o Actas de Corte / Mensual / Formato EV - Presupuesto
Gestión Compras	Departamento de Compras / Cuenta Control Insumos - Equipos / Mensual / Revisión vs presupuesto - cronograma Compras
Gestión Logística	Departamento de Transportes / Cuenta Control Transportes / Mensual / Revisión fletes vs presupuesto
Gestión Recurso Humano	Departamento de Compras / Cuenta Control Insumos - Equipos / Mensual / Revisión vs presupuesto - cronograma Compras

7.3 Sistema Gestión de costo

- Gestión de tiempos en campo / Medición y toma de datos de rendimientos en las actividades claves
- Gestión de tiempos en Oficina / Recopilación y procesamiento de datos recibidos para informes de tiempo
- Gestión de tiempos administrativos / Procesamiento de tiempos de contratación, compras.

7.4 Sistema de Control de Costos

- Gestión de costos en campo / Mediciones de avance o cortes de obra / Control de compras y consumos por actividad
- Gestión de costos en oficina / Alimentación de avance para estimación de EV / Recepción y procesamiento de datos del departamento contable para cálculo de AC / Elaboración de informes con información procesada y estimaciones realizadas con fórmulas de EV
- Gestión de Costos Administrativos / Evaluación de compras, contrataciones, costos administrativos

Procesos de Gestión de Costos	***Valor Actual***
AC- Costo Actual	$ 4.079.891.058,90
EV- Valor Ganado	$ 4.079.891.058,90

PV - Valor Planeado	$ 4.110.490.936,14
Gestión Compras	1.0
Gestión Logística	1.0
Gestión Recurso Humano	1.0

8. Proyecciones sobre indicadores obtenidos

Tipo de Pronostico	*Fórmula*	*Valor a Corte Seguimiento*
Variación de Costo	CV=EV-AC	0.0
Índice Desempeño Costos	CPI=EV/AC	1.0
Costo Estimado para Completar	ETC=BAC-EV	$ 79.453.651,75
Costo Restante Proyectado	EAC=BAC/CPI	$ 4.159.344.710,65
Eficiencia en costos necesaria Proyectada	TCPi=(BAC-EV)/(EAC-AC)	1.0

Lo cual demuestra estabilidad en costo.

8.1 Sistema de Control de Cambios de Costos

- Para mantener la integridad de la línea base se debe establecer como requisito la Solicitud formal externa o interna de Cambio, evaluación por el equipo del proyecto, estimación y presupuesto definitivo del mismo para aprobación conjunta con patrocinador y actualización de línea base.

9. LÍNEA BASE PRESUPUESTO

9.1 Presupuesto Inicial del Proyecto

CONDICIONES CONTRACTUALES					
ITEM	**CONCEPTO**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR PARCIAL**
SECCIÓN PRIMERA					
1,01	Replanteo, control y medición de la obra	mes	1,00	$ 11.584.277,00	$11.584.277,00
1,03	Vallas y señales especiales				
1.03.01. A	Valla tipo 1A (5,00m x 2,80 m)	und	1,00	$ 2.664.417,00	$ 2.664.417,00
1,04	Desmonte y limpieza	m2	840,00	$ 5.453,00	$ 4.580.520,00
1,05	Retiro de basuras y escombros	m3	168,00	$ 86.609,00	$14.550.312,00
1,07	Perfilado a mano descolgado de talud (en roca)	m3	539,21	$ 257.918,00	$139.071.964,78
				SUBTOTAL SECCIÓN PRIMERA:	**$172.451.490,78**
SECCIÓN SEGUNDA					
2.01	Excavación a tajo abierto en taludes				
2.01.A	Excavacion con acarreo libre				
2.01.A.02	Excavación con acarreo libre en material granular a cualquier profundidad	m3	1078,41	$ 49.921,00	$53.835.305,61
2.01.A.03	Excavación con acarreo libre en roca a cualquier profundidad	m3	718,94	$ 91.187,00	$65.557.981,78
2.01.A.04	Excavación a mano con acarreo libre descolgado para zapata	m3	29,00	$ 253.569,00	$7.353.501,00
2,03	Sobreacarreos para acarreos totales mayores de 1.000,00 m	m3-km	26614,80	$ 3.988,00	$106.139.822,40
				SUBTOTAL SECCIÓN SEGUNDA:	**$ 232.886.610,79**
SECCIÓN TERCERA					
3,00	Concretos				
3.01	Suministro y colocación de concreto de 3000 psi con mezcla	m3	29,00	$ 1.089.450,00	$31.594.050,00

	humeda para zapatas				
3,03	Suministro y colocación de concreto lanzado con mezcla humeda de espesor de 10cm	m2	840,00	$ 380.247,00	$ 319.407.480,00
3,08	Llenado de inyección con lechada cementicia para anclajes	m3	87,00	$ 1.156.977,00	$ 100.656.999,00
				SUBTOTAL SECCIÓN TERCERA:	**$ 451.658.529,00**
SECCIÓN CUARTA					
4,00	Aceros				
4,01	Suministro y colocación acero de refuerzo fy 4200 kg / cm2	kg	5807,00	$ 12.098,00	$ 70.253.086,00
4,02	Suministro y colocación de anclajes				
4.02.03	Suministro e instalación de 3 cables Ø=1/2" de L=25m	und	144,00	$ 1.085.176,00	$ 156.265.344,00
4,03	Tensionamiento de anclajes	und	144,00	$ 57.240,00	$ 8.242.560,00
4,04	Suministro y colocación				
4,04,01	Malla electrosoldada 4mm y abertura de 0,15m x 0,15m	m2	840,00	$ 37.001,00	$31.080.840,00
4,05	Suministro e instalación de platina de 200mm x 200mm x 12mm con tres agujeros	und	144,00	$ 82.440,00	$11.871.360,00
4,06	Suministro e instalación de popora de 3 agujeros cónicos para cuña de Ø=1/2"	und	144,00	$158.039,00	$22.757.616,00
4,07	Suministro e instalación de kit de cuñas de Ø=1/2" para anclaje	und	144,00	$ 96.886,00	$13.951.584,00
				SUBTOTAL SECCIÓN CUARTA:	**$ 314.422.390,00**
SECCIÓN QUINTA					

5,00	Perforaciones horizontales				
5,04	Ejecución perforación horizontal en taludes con pendientes mayores a 1:1 (en roca) con equipo de perforación descolgado para anclajes de 0,00m a 15,00m	m	2160,00	$ 510.989,00	$1.103.736.240,00
5,05	Ejecución de perforaciones horizontales en taludes con pendientes mayores a 1:1 (en roca) con equipo de perforación descolgado para anclajes mayores a 15,00m	m	1440,00	$ 585.973,00	$ 843.801.120,00
				SUBTOTAL SECCIÓN QUINTA:	**$1.947.537.360,00**
SECCIÓN SEXTA					
6,00	Varios				
6,02	Canaleta (ancho = 1m; e=10cm)	m	132,00	$ 134.615,00	$17.769.180,00
6,04	Estructura de disipación de energía	m	14,00	$ 634.862,00	$ 8.888.068,00
6,06	Sistema de abatimiento para líneas hidráulicas de infiltración interna y protección del trasdos de la estructura estabilizadora	m	408,00	$ 75.174,00	$30.670.992,00
				SUBTOTAL SECCIÓN SEXTA:	**$ 57.328.240,00**
				VALOR COSTOS DIRECTOS:	**$3.176.284.620,57**
	ADMINISTRACION	**ADMINISTRACIÓN:**		24%	$ 762.308.308,94
	IMPREVISTOS	**IMPREVISTOS:**		1%	$ 31.762.846,21
	UTILIDAD	**UTILIDAD:**		5%	$ 158.814.231,03

	A.I.U.	A.I.U:	30%	$ 952.885.386,18
	VALOR TOTAL SIN IVA			$4.129.170.006,75
	IVA de U.	IVA de U:	19%	$30.174.703,90
			VALOR TOTAL:	$4.159.344.710,65

9.2 Seguimiento a Programa de Inversiones Planeado /Actas Cobro



OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL
$ 20.105.033,46	$ 570.673.058,35	$ 1.897.182.775,53	$ 2.912.174.065,96	$ 3.566.051.716,69	$ 4.110.490.936,14	$ 4.159.344.710,65
$ 23.193.255,29	$ 966.804.519,53	$ 1.907.607.679,01	$ 3.002.748.251,44	$ 3.593.076.665,52	$ 4.079.891.058,90	

CURVA S ACUMULADO PROGRAMADO VS ACUMULADO EJECUTADO

10.REVISIÓN DE ESTABILIDAD VALOR

Tipo de Pronostico	*Fórmula*	*Valor a Corte Seguimiento*
Variación de Costo	CV=EV-AC	0.0
Índice Desempeño Costos	CPI=EV/AC	1.0
Costo Estimado para Completar	ETC=BAC-EV	$ 79.453.651,75
Costo Restante Proyectado	EAC=BAC/CPI	$ 4.159.344.710,65

11.Compromisos Adquiridos

Realizar el seguimiento y control al Programa de Inversiones, mediante la elaboración del Acta final de avance N.º 04, en la cual se consolide e incorpore la ejecución acumulada registrada a la fecha de finalización del proyecto de acuerdo a su cronograma inicial, garantizando la trazabilidad y consistencia de la información financiera y física del proyecto.

Juan Carlos Rincón Lozano
Gerente de Proyectos

ANEXO NO.09 EVIDENCIA HOJA DE VISITA

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA - CDMB		
ELABORÓ: Coordinador(a) Zona Piedemonte SUGAR	REVISÓ: Representante Dirección SIGC	APROBÓ: Director(a) General
CÓDIGO M-OA-F002 / VERSIÓN 03	**HOJA DE VISITA**	

MOTIVO DE LA VISITA: Visita de inspección para observar el avance que ha tenido la obra en el predio villa de los caballeros

FECHA DE VISITA		
DÍA	MES	AÑO
13	03	26

FINCA | VEREDA | MUNICIPIO: Girón, Santander | MICROCUENCA

COTA: - | 7°3'4.92559 | E: 73°9'49.49608

PROPIETARIO: | C.C / NIT.

DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA: Villa de los Caballeros, Girón Santander | TELÉFONO FIJO | CELULAR

QUIEN ATIENDE LA VISITA: Contratista | CELULAR

SITUACIÓN ENCONTRADA:

Se evidencia un avance positivo en las actividades de obra. Se observa la culminación de actividades de concreto lanzado y estructura de disipación de energía. Se observa culminación de cunetas superior e inferior para el manejo de aguas lluvias. A fecha se registra un avance 83%. Se observa cajas de inspección para recoger el agua. Como parte adicional se instala geomanto en una zona del talud descubierta, actividad adicional para poder mitigar la erosión del talud.

EVIDENCIAS:

Registro fotográfico, hoja de visita

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES:

El avance se encuentra en un 83% por encima del avance programado

QUIEN ATIENDE LA VISITA - FIRMA / CÉDULA

GILBERTO GOMEZ

NOMBRE Y FIRMA SERVIDOR PÚBLICO CDMB

OTROS - NOMBRE / FIRMA / CÉDULA

OTROS - NOMBRE / FIRMA / CÉDULA

CDMB	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA - CDMB		
	ELABORÓ: Coordinador(a) Zona Piedemonte SUGAR	REVISÓ: Representante Dirección SIGC	APROBÓ: Director(a) General
CÓDIGO M-OA-F002 / VERSIÓN 03	**HOJA DE VISITA**		

MOTIVO DE LA VISITA: VISITA DE INSPECCION PARA OBSERVAR EL AVANCE QUE HA TENIDO LA OBRA EN EL FRENTE VILLA DE LOS CABALLEROS

FECHA DE VISITA		
DÍA	MES	AÑO
18	03	2026

FINCA | VEREDA | MUNICIPIO: GIRON - STDER | MICROCUENCA

COTA | 7°3'4.92559 | E: 73°9'49.49608

PROPIETARIO: | C.C / NIT.

DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA: VILLA DE LOS CABALLEROS - GIRON STDER. | TELÉFONO FIJO | CELULAR

QUIEN ATIENDE LA VISITA: CONTRATISTA | CELULAR

SITUACIÓN ENCONTRADA: Se inicia recorrido de obra para observar las actividades contractuales, se observa finalización en las actividades de concreto lanzado, se espera el fraguado de concreto para las actividades de tensionamiento. Se continua actividades de construcción de cuneta para el control de aguas superficiales.

EVIDENCIAS:

Registro Fotografico y hoja de visita.

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES:

Se tiene previsto reunión para el día 19 de marzo con el presidente de la acción comunal para decidir dias complementarios para la reconformación de area intervenida del pie del talud. con el fin de definir de igual manera la compensación ambiental

QUIEN ATIENDE LA VISITA - FIRMA / CÉDULA

Hector Amado H.
NOMBRE Y FIRMA SERVIDOR PÚBLICO CDMB

OTROS - NOMBRE / FIRMA / CÉDULA Pos. Interv. Interventoría

GILBERTO GOMEZ O.
OTROS - NOMBRE / FIRMA / CÉDULA

CDMB	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA - CDMB		
	ELABORÓ: Coordinador(a) Zona Piedemonte SUGAR	REVISÓ: Representante Dirección SIGC	APROBÓ: Director(a) General
CÓDIGO M-OA-F002 / VERSIÓN 03	**HOJA DE VISITA**		

MOTIVO DE LA VISITA: Visita de Inspección para observar el avance de las actividades en obra ejecutados.

FECHA DE VISITA		
DÍA	MES	AÑO
27	03	26

FINCA | VEREDA | MUNICIPIO: Guéán | MICROCUENCA

COTA | 7°3'5.491 N | E: 73°9'49,748 W

PROPIETARIO: | C.C / NIT.: 901982571-5

DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA: Villa de los Caballeros - Guéán | TELÉFONO FIJO

CELULAR: 3012765665

QUIEN ATIENDE LA VISITA: Contratista | CELULAR: 3027937492

SITUACIÓN ENCONTRADA:

Se evidencia la ejecución de las actividades correspondiente a canalización de las aguas lluvias como lo son construcción de canaleta. Se inicia actividades de conformación de terraza para la conformación de zona verde. Se observo la construcción de bordillo en los peatonales con el fin de contener cualquier tipo de material a los peatonales. Se comenta que se esta esperando las edades mínimas para completar la resistencia y poder realizar actividades de tensionamiento.

EVIDENCIAS:

Registro Fotográfico - Hoja de Visita

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES:

Se registra un avance ejecutado del 98,12%.
Las actividades realizadas no son contractuales ni estan dentro del contrato. El contratista las ejecuta como beneficio y operación para dejar un buen terminado

QUIEN ATIENDE LA VISITA - FIRMA / CÉDULA

NOMBRE Y FIRMA SERVIDOR PÚBLICO CDMB

Melissa Mendoza Arias

OTROS - NOMBRE / FIRMA / CÉDULA

OTROS - NOMBRE / FIRMA / CÉDULA

ANEXO NO.10 ENSAYO DE LABORATORIOS

Certificado de Calidad 40000913386

Centro: CO2A

Material: LADCLM10619213
EUCOSHOT AF 600 x 250 KG
Grupo Art: ADMIXTURE
Fecha de fabricación: 19/12/2025
Lote: 2512156622

Toxement S.A por medio de este documento da constancia de conformidad al lote de fabricación referenciado, de acuerdo con los resultados obtenidos bajo procedimientos estandarizados del laboratorio. Así mismo, los datos registrados dan cumplimiento a los parámetros citados en la hoja técnica del producto.


Característica	Método	Especificación	Resultado
APARIENCIA	IM001		Aprobado
DENSIDAD	TX32E001	1.41 - 1.47 g/ml	1.44
FRAGUADO FINAL	IM001	240.00 - 360.00 s	280.00
FRAGUADO INICIAL	IM001	180.00 - 240.00 s	180.00
PH	TX32E004	1.30 - 3.30	2.86
SOLIDOS	TX32E002	47.00 - 53.00 %	51.54
TEMPERATURA	IM001	35.00 - 45.00 °C	41.30
VISCOSIDAD	TX32E003	0.00 - 4000.00 CPS	1400.00

	FORMATO DE GESTIÓN DE LABORATORIO	CÓDIGO	FT-GL-044
HSC HIDROSUELOS DE COLOMBIA	INFORME DE ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO INV E - 410 - 13	FECHA	9/06/2025
		VERSIÓN	6
		Página 1 de 1	


LABORATORIO DE SUELOS Y CONCRETOS HIDROSUELOS DE COLOMBIA S.A.S
CENTRO INDUSTRIAL Y LOGISTICO SAN JORGE KM 7 + 400 M ANILLO VIAL PALENQUE, DIAGONAL FLORIDABLANCA N° 22-31. BODEGA 16 - PISO 1, GIRON, SANTANDER, COLOMBIA.

FECHA DE INFORME	N° DE INFORME	FECHA DE INGRESO DE LA MUESTRA	N° DE ORDEN DE SERVICIO	FRENTE DE OBRA	INFORMACIÓN DEL CLIENTE
31/03/2026	1	4/03/2026	052-26	VILLA DE LOS CABALLEROS	CONSORCIO CONSOLIDACIÓN GIRON consolidacion.giron@gmail.com

# ID DEL CILINDRO	FECHA DE TOMA	FECHA DE ENSAYO	EDAD	ELEMENTO	DIÁMETRO (mm)			LONGITUD (mm)				ÁREA	RELACIÓN LONDITUD / DIÁMETRO	FACTOR DE CORRECCIÓN	DEFECTOS EN EL ESPÉCIMEN	PESO	DENSIDAD	CARGA MÁXIMA	RESISTENCIA ESPERADA POR EL CLIENTE	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN			PATRÓN DE FRACTURA
			(DÍAS)		Diámetro 1	Diámetro 2	Promedio	longitud 1	longitud 2	longitud 3	Promedio	(mm^2)				(g)	(kg/m^3)		(MPa)	(MPa)	(kg/cm^2)	(PSI)	
1	3/03/2026	10/03/2026	7	LANZADO	149,44	151,64	150,54	300	299	299	300	17799	2,0	1,00	NO PRESENTA	12186	2290	253,11	20,7	14,2	144	2054	3
1,1	3/03/2026	17/03/2026	14		150,20	151,66	150,93	298	297	297	297	17891	2,0	1,00	NO PRESENTA	12137	2280	349,59	20,7	19,5	198	2823	3
1,2	3/03/2026	31/03/2026	28		149,64	151,47	150,56	299	299	298	299	17802	2,0	1,00	NO PRESENTA	12294	2310	386,78	20,7	21,6	221	3139	4




Tipo 1
Conos razonablemente bien formados en ambos extremos




Tipo 2
Conos bien formados en un extremo pero no en el otro. Grietas verticales que llegan a los extremos.




Tipo 3
Agrietamiento vertical columnar que abarca ambos extremos. No hay conos bien formados.



Tipo 4
Fractura diagonal sin grietas a traves de los extremos. Se debe golpear con martillo para distinguirlo del tipo 1.



Tipo 5
Fracturas en las esquinas (usuales en cilindros sin refrendar).



Tipo 6
Similar al tipo 5, pero las grietas tienden a unirse en la superficie del cilindro.

OBSERVACIONES

- ESTE ENSAYO FUE REALIZADO EN LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO.
- INFORMACIÓN DEL CONCRETO: EL CLIENTE NO SUMINISTRÓ ESTA INFORMACIÓN.
- LOS RESULTADOS DE ESTE INFORME CORRESPONDEN UNICA Y EXCLUSIVAMENTE A LAS MUESTRAS ENSAYADAS.
- LOS DATOS DE FECHA DE TOMA, INFORMACIÓN DEL CONCRETO, ELEMENTO Y RESISTENCIA ESPERADA CORRESPONDEN A INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE. CUALQUIER OTRO DATO SUMINISTRADO POR ESTE SE INCLUIRÁ Y SE IDENTIFICARÁ EN EL INFORME CON EL CARÁCTER (*). HIDROSUELOS DE COLOMBIA S.A.S. NO SE RESPONSABILIZA POR LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE INCLUIDA EN ESTE INFORME Y QUE PUEDA AFECTAR LA VALIDEZ DE LOS RESULTADOS.

REVISÓ		APROBÓ	
			HSC HIDROSUELOS DE COLOMBIA
NOMBRE	WILLIAM EDUARDO CORTES	NOMBRE	
CARGO	COORDINADOR DE LABORATORIO	CARGO	GERENTE

Queda totalmente prohibida la reproducción parcial de este informe sin la previa autorización de HIDROSUELOS DE COLOMBIA SAS.

Este documento es valido cuando lleve la firma de quien lo revisó y lo aprobó.


FIN DEL INFORME

FORMATO DE GESTIÓN DE LABORATORIO	CÓDIGO	FT-GL-044
INFORME DE ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO INV E - 410 - 13	FECHA	9/06/2025
	VERSIÓN	6
	Página 1 de 1	


LABORATORIO DE SUELOS Y CONCRETOS HIDROSUELOS DE COLOMBIA S.A.S
CENTRO INDUSTRIAL Y LOGISTICO SAN JORGE KM 7 + 400 M ANILLO VIAL PALENQUE, DIAGONAL FLORIDABLANCA N° 22-31. BODEGA 16 - PISO 1, GIRON, SANTANDER, COLOMBIA.

FECHA DE INFORME	N° DE INFORME	FECHA DE INGRESO DE LA MUESTRA	N° DE ORDEN DE SERVICIO	FRENTE DE OBRA	INFORMACIÓN DEL CLIENTE
4/04/2026	1	5/03/2026	053-26	VILLA DE LOS CABALLEROS	CONSORCIO CONSOLIDACIÓN GIRON consolidacion.giron@gmail.com

# ID DEL CILINDRO	FECHA DE TOMA	FECHA DE ENSAYO	EDAD	ELEMENTO	DIÁMETRO (mm)			LONGITUD (mm)				ÁREA	RELACIÓN LONDITUD / DIÁMETRO	FACTOR DE CORRECCIÓN	DEFECTOS EN EL ESPÉCIMEN	PESO	DENSIDAD	CARGA MÁXIMA	RESISTENCIA ESPERADA POR EL CLIENTE	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN			PATRÓN DE FRACTURA
			(DÍAS)		Diámetro 1	Diámetro 2	Promedio	longitud 1	longitud 2	longitud 3	Promedio	(mm^2)				(g)	(kg/m^3)		(MPa)	(MPa)	(kg/cm^2)	(PSI)	
1	4/03/2026	11/03/2026	7	LANZADO CANALETA	150,17	150,78	150,48	301	301	302	301	17784	2,0	1,00	NO PRESENTA	12204	2280	250,07	20,7	14,1	143	2040	4
1,1	4/03/2026	18/03/2026	14		149,46	151,76	150,61	300	299	300	300	17815	2,0	1,00	NO PRESENTA	12153	2280	328,02	20,7	18,3	187	2660	4
1,2	4/03/2026	1/04/2026	28		151,65	151,84	151,75	300	299	299	299	18085	2,0	1,00	NO PRESENTA	12183	2250	394,11	20,7	21,7	221	3148	4




Tipo 1
Conos razonablemente bien formados en ambos extremos




Tipo 2
Conos bien formados en un extremo pero no en el otro. Grietas verticales que llegan a los extremos.




Tipo 3
Agrietamiento vertical columnar que abarca ambos extremos. No hay conos bien formados.



Tipo 4
Fractura diagonal sin grietas a traves de los extremos. Se debe golpear con martillo para distinguirlo del tipo 1.



Tipo 5
Fracturas en las esquinas (usuales en cilindros sin refrendar).



Tipo 6
Similar al tipo 5, pero las grietas tienden a unirse en la superficie del cilindro.

OBSERVACIONES

- ESTE ENSAYO FUE REALIZADO EN LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO.
- INFORMACIÓN DEL CONCRETO: EL CLIENTE NO SUMINISTRÓ ESTA INFORMACIÓN.
- LOS RESULTADOS DE ESTE INFORME CORRESPONDEN UNICA Y EXCLUSIVAMENTE A LAS MUESTRAS ENSAYADAS.
- LOS DATOS DE FECHA DE TOMA, INFORMACIÓN DEL CONCRETO, ELEMENTO Y RESISTENCIA ESPERADA CORRESPONDEN A INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE. CUALQUIER OTRO DATO SUMINISTRADO POR ESTE SE INCLUIRÁ Y SE IDENTIFICARÁ EN EL INFORME CON EL CARÁCTER (*). HIDROSUELOS DE COLOMBIA S.A.S. NO SE RESPONSABILIZA POR LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE INCLUIDA EN ESTE INFORME Y QUE PUEDA AFECTAR LA VALIDEZ DE LOS RESULTADOS.

REVISÓ		APROBÓ	
NOMBRE	WILLIAM EDUARDO CORTES	NOMBRE	MARTHA LILIANA BAYONA ORTIZ
CARGO	COORDINADOR DE LABORATORIO	CARGO	GERENTE

Queda totalmente prohibida la reproducción parcial de este informe sin la previa autorización de HIDROSUELOS DE COLOMBIA SAS.

Este documento es valido cuando lleve la firma de quien lo revisó y lo aprobó.


FIN DEL INFORME

	FORMATO DE GESTIÓN DE LABORATORIO	CÓDIGO	FT-GL-044
HSC HIDROSUELOS DE COLOMBIA	INFORME DE ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO INV E - 410 - 13	FECHA	9/06/2025
		VERSIÓN	6
		Página 1 de 1	


LABORATORIO DE SUELOS Y CONCRETOS HIDROSUELOS DE COLOMBIA S.A.S
CENTRO INDUSTRIAL Y LOGISTICO SAN JORGE KM 7 + 400 M ANILLO VIAL PALENQUE, DIAGONAL FLORIDABLANCA N° 22-31. BODEGA 16 - PISO 1, GIRON, SANTANDER, COLOMBIA.

FECHA DE INFORME	N° DE INFORME	FECHA DE INGRESO DE LA MUESTRA	N° DE ORDEN DE SERVICIO	FRENTE DE OBRA	INFORMACIÓN DEL CLIENTE
4/04/2026	1	6/03/2026	057-26	VILLA DE LOS CABALLEROS	CONSORCIO CONSOLIDACIÓN GIRON consolidacion.giron@gmail.com

# ID DEL CILINDRO	FECHA DE TOMA	FECHA DE ENSAYO	EDAD	ELEMENTO	DIÁMETRO (mm)			LONGITUD (mm)				ÁREA	RELACIÓN LONDITUD / DIÁMETRO	FACTOR DE CORRECCIÓN	DEFECTOS EN EL ESPÉCIMEN	PESO	DENSIDAD	CARGA MÁXIMA	RESISTENCIA ESPERADA POR EL CLIENTE	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN			PATRÓN DE FRACTURA
			(DÍAS)		Diámetro 1	Diámetro 2	Promedio	longitud 1	longitud 2	longitud 3	Promedio	(mm^2)				(g)	(kg/m^3)		(MPa)	(MPa)	(kg/cm^2)	(PSI)	
1	5/03/2026	12/03/2026	7	LANZADO	150,40	151,00	150,70	301	302	302	302	17837	2,0	1,00	NO PRESENTA	12228	2270	279,36	20,7	15,7	160	2272	4
1,1	5/03/2026	19/03/2026	14		150,69	150,86	150,78	303	302	302	302	17855	2,0	1,00	NO PRESENTA	12290	2280	342,21	20,7	19,2	195	2780	4
1,2	5/03/2026	2/04/2026	28		149,95	150,69	150,32	301	302	301	302	17747	2,0	1,00	NO PRESENTA	12297	2300	434,00	99,0	24,5	249	3547	4




Tipo 1
Conos razonablemente bien formados en ambos extremos




Tipo 2
Conos bien formados en un extremo pero no en el otro. Grietas verticales que llegan a los extremos.




Tipo 3
Agrietamiento vertical columnar que abarca ambos extremos. No hay conos bien formados.



Tipo 4
Fractura diagonal sin grietas a traves de los extremos. Se debe golpear con martillo para distinguirlo del tipo 1.



Tipo 5
Fracturas en las esquinas (usuales en cilindros sin refrendar).



Tipo 6
Similar al tipo 5, pero las grietas tienden a unirse en la superficie del cilindro.

OBSERVACIONES

- ESTE ENSAYO FUE REALIZADO EN LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO.
- INFORMACIÓN DEL CONCRETO: EL CLIENTE NO SUMINISTRÓ ESTA INFORMACIÓN.
- LOS RESULTADOS DE ESTE INFORME CORRESPONDEN UNICA Y EXCLUSIVAMENTE A LAS MUESTRAS ENSAYADAS.
- LOS DATOS DE FECHA DE TOMA, INFORMACIÓN DEL CONCRETO, ELEMENTO Y RESISTENCIA ESPERADA CORRESPONDEN A INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE. CUALQUIER OTRO DATO SUMINISTRADO POR ESTE SE INCLUIRÁ Y SE IDENTIFICARÁ EN EL INFORME CON EL CARÁCTER (*). HIDROSUELOS DE COLOMBIA S.A.S. NO SE RESPONSABILIZA POR LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE INCLUIDA EN ESTE INFORME Y QUE PUEDA AFECTAR LA VALIDEZ DE LOS RESULTADOS.

REVISÓ		APROBÓ	
NOMBRE	WILLIAM EDUARDO CORTES	NOMBRE	
CARGO	COORDINADOR DE LABORATORIO	CARGO	GERENTE

Queda totalmente prohibida la reproducción parcial de este informe sin la previa autorización de HIDROSUELOS DE COLOMBIA SAS.

Este documento es valido cuando lleve la firma de quien lo revisó y lo aprobó.


FIN DEL INFORME

	FORMATO DE GESTIÓN DE LABORATORIO	CÓDIGO	FT-GL-044
HSC HIDROSUELOS DE COLOMBIA	INFORME DE ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO INV E - 410 - 13	FECHA	9/06/2025
		VERSIÓN	6
		Página 1 de 1	


LABORATORIO DE SUELOS Y CONCRETOS HIDROSUELOS DE COLOMBIA S.A.S
CENTRO INDUSTRIAL Y LOGISTICO SAN JORGE KM 7 + 400 M ANILLO VIAL PALENQUE, DIAGONAL FLORIDABLANCA N° 22-31. BODEGA 16 - PISO 1, GIRON, SANTANDER, COLOMBIA.

FECHA DE INFORME	N° DE INFORME	FECHA DE INGRESO DE LA MUESTRA	N° DE ORDEN DE SERVICIO	FRENTE DE OBRA	INFORMACIÓN DEL CLIENTE
4/04/2026	1	9/03/2026	058-26	VILLA DE LOS CABALLEROS	CONSORCIO CONSOLIDACIÓN GIRON consolidacion.giron@gmail.com

# ID DEL CILINDRO	FECHA DE TOMA	FECHA DE ENSAYO	EDAD	ELEMENTO	DIÁMETRO (mm)			LONGITUD (mm)				ÁREA	RELACIÓN LONDITUD / DIÁMETRO	FACTOR DE CORRECCIÓN	DEFECTOS EN EL ESPÉCIMEN	PESO	DENSIDAD	CARGA MÁXIMA	RESISTENCIA ESPERADA POR EL CLIENTE	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN			PATRÓN DE FRACTURA
			(DÍAS)		Diámetro 1	Diámetro 2	Promedio	longitud 1	longitud 2	longitud 3	Promedio	(mm^2)				(g)	(kg/m^3)		(MPa)	(MPa)	(kg/cm^2)	(PSI)	
1	6/03/2026	13/03/2026	7	LANZADO	151,84	151,96	151,90	299	298	298	298	18122	2,0	1,00	NO PRESENTA	121253	22420	245,35	20,7	13,5	138	1956	4
1,1	6/03/2026	20/03/2026	14		150,58	150,60	150,59	298	297	297	297	17811	2,0	1,00	NO PRESENTA	11899	2250	321,35	20,7	18,0	183	2606	4
1,2	6/03/2026	3/04/2026	28		150,72	150,88	150,80	301	301	301	301	17860	2,0	1,00	NO PRESENTA	12130	2250	374,84	20,7	20,9	213	3032	4




Tipo 1
Conos razonablemente bien formados en ambos extremos




Tipo 2
Conos bien formados en un extremo pero no en el otro. Grietas verticales que llegan a los extremos.




Tipo 3
Agrietamiento vertical columnar que abarca ambos extremos. No hay conos bien formados.



Tipo 4
Fractura diagonal sin grietas a traves de los extremos. Se debe golpear con martillo para distinguirlo del tipo 1.



Tipo 5
Fracturas en las esquinas (usuales en cilindros sin refrendar).



Tipo 6
Similar al tipo 5, pero las grietas tienden a unirse en la superficie del cilindro.

OBSERVACIONES

- ESTE ENSAYO FUE REALIZADO EN LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO.
- INFORMACIÓN DEL CONCRETO: EL CLIENTE NO SUMINISTRÓ ESTA INFORMACIÓN.
- LOS RESULTADOS DE ESTE INFORME CORRESPONDEN UNICA Y EXCLUSIVAMENTE A LAS MUESTRAS ENSAYADAS.
- LOS DATOS DE FECHA DE TOMA, INFORMACIÓN DEL CONCRETO, ELEMENTO Y RESISTENCIA ESPERADA CORRESPONDEN A INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE. CUALQUIER OTRO DATO SUMINISTRADO POR ESTE SE INCLUIRÁ Y SE IDENTIFICARÁ EN EL INFORME CON EL CARÁCTER (*). HIDROSUELOS DE COLOMBIA S.A.S. NO SE RESPONSABILIZA POR LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE INCLUIDA EN ESTE INFORME Y QUE PUEDA AFECTAR LA VALIDEZ DE LOS RESULTADOS.

REVISÓ		APROBÓ	
NOMBRE	WILLIAM EDUARDO CORTES	NOMBRE	
CARGO	COORDINADOR DE LABORATORIO	CARGO	GERENTE

Queda totalmente prohibida la reproducción parcial de este informe sin la previa autorización de HIDROSUELOS DE COLOMBIA SAS.

Este documento es valido cuando lleve la firma de quien lo revisó y lo aprobó.

FIN DEL INFORME

GRUPO 4: CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACION PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN EL TALUD ORIENTAL DEL BARRIO VILLA DE LOS CABALLEROS EN EL MUNICIPIO DE GIRÓN, DEPARTAMENTO DE SANTANDER.



CONTRATO No. 210.16225.6 del 5 de septiembre del 2025

INFORME DE AVANCE DE OBRA No.07
PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 01 DE ABRIL AL 14 DE ABRIL DEL 2026

TABLA DE CONTENIDO

1. OBJETIVO GENERAL 4
1.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS 4
2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 5
3. INFORMACIÓN CONTRACTUAL 7
3.1 PRESUPUESTO INICIAL APROBADO 8
3.2 LEGALIZACIÓN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 210.16225.6 9
3.3 ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 210.16225.6 9
3.4 CONTROL DE GARANTÍAS – POLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA 9
3.5 ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 210.15225.6 10
4. RELACIÓN DE PERSONAL Y EQUIPO UTILIZADO POR CONSORCIO CONSOLIDACIÓN GIRÓN 10
5. INFORME AVANCE EJECUTADO POR EL CONSORCIO CONSOLIDACIÓN GIRÓN 12
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 12
5.1 SECCIÓN PRIMERA 14
5.1.1 Replanteo, Control y medición de Obra (mes) 14
5.2 SECCIÓN CUARTA 15
5.2.1 Tensionamiento de anclajes 15
5.2.2 Suministro e instalación de platina de 200mm x 200mm x 12mm con tres agujeros 16
5.2.3 Suministro e instalación de popora de 3 agujeros cónicos para cuña de Ø=1/2" 16
5.2.4 Suministro e instalación de de kit de cuñas de Ø=1/2" para anclaje 17
6. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS 18
6.1 OBRAS PROGRAMADAS, EJECUTADAS Y ACUMULADAS 19
6.2 RELACIÓN DE ACTAS DE REUNIÓN 19
6.3 BITACORA DE OBRA 20
6.4 AFILIACIONES SEGURIDAD SOCIAL 20
6.5 SEGUIMIENTO Y CONTROL 20
6.6 ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES, DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 20
7. ACTIVIDADES ACUMULADAS TOTALES 24
8. INFORME GENERAL DE ESTADO DEL TIEMPO 25
9. PROGRAMA DE GERENCIA 26
10. CONCLUSIONES. 26
11. ANEXOS 27

1. INTRODUCCIÓN

El Consorcio Consolidación Girón, identificado con NIT 901.982.571-5 conformado por INFRACORP S.A.S con un porcentaje de participación del 90%, CONAINCO S.A.S con un porcentaje de participación del 10%, representado legalmente por la Ingeniera Johanna Marcela Padierna Castiblanco, fue establecido para licitar y ejecutar el Contrato de Obra No 210.16225.6 del 5 de septiembre del 2025 cuyo objeto es: **CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARMANGA- GRUPO 4: CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACION PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN EL TALUD ORIENTAL DEL BARRIO VILLA DE LOS CABALLEROS EN EL MUNICIPIO DE GIRÓN, DEPARTAMENTO DE SANTANDER.**

El municipio de Girón se encuentra altamente poblado por lo cual ha obligado a la población a migrar y construir en las zonas que presentan amenazas por movimientos en masa, erosión e inundación; por tal motivo y en miras de proteger a la comunidad presente en dichos sectores se realizó la evaluación de los factores de amenaza con el fin de controlar los problemas que se puedan presentar. Se realizó un estudio geotécnico y geológico debido a la posible afectación de múltiples viviendas que en caso de emergencia podrían provocar grandes pérdidas materiales y sobre todo pérdida de un gran número de vidas que se encuentran en el sector.

Se desarrolló un estudio sobre la evaluación de vulnerabilidad realizada a los predios que comprenden la zona objeto de intervención. Los resultados evidencian que el índice de vulnerabilidad total de las edificaciones analizadas presenta una distribución proporcional entre los índices de vulnerabilidad alta y media. Esta condición se asocia principalmente a construcciones localizadas sobre las coronas y los pies de taludes con pendientes pronunciadas, entre 40° y 70°, donde la cobertura vegetal es limitada y se concentra hacia el costado sur de la zona de estudio. En consecuencia, se considera prioritario ejecutar la obra geotécnica propuesta, orientada a mitigar la amenaza por movimientos en masa. Lo anterior obedece a los altos niveles de erosión generados tanto por la escasa vegetación como por las características geotécnicas propias del sector, con el fin de salvaguardar la integridad de las viviendas asentadas en el área aferente al proyecto.

Se presenta el Informe de Avance de Obra No. 07, correspondiente al período comprendido entre el 1 y el 14 de abril de 2026, en el cual se describen de manera técnica, clara y detallada las actividades ejecutadas en la fase final del proyecto, tanto contractuales como complementarias.

Una vez verificados y aprobados los resultados de resistencia del concreto conforme a las especificaciones técnicas, se procedió con la instalación de los elementos del sistema de anclaje, incluyendo platinas, poporas y cuñas en cada punto, garantizando las condiciones necesarias para el adecuado proceso de tensionamiento. Esta actividad se ejecutó mediante el uso de una unidad

hidráulica eléctrica y un gato tensor tipo monotorón, equipado con manómetro calibrado, permitiendo el control preciso de las cargas aplicadas durante el proceso.

De manera complementaria, se desarrollaron actividades de conformación de terraza, no contempladas dentro del alcance contractual inicial, orientadas a mejorar las condiciones de estabilidad, funcionalidad y manejo urbanístico del área intervenida, contribuyendo así a la optimización integral de la obra ejecutada

1. OBJETIVO GENERAL

El propósito principal del actual informe de obra consiste en evidenciar y soportar técnicamente el desarrollo de las actividades de obra comprendidas en el CONTRATO No. 210.16225.6 del 5 de septiembre del 2025 cuyo objeto consiste en la "**CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACION PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN EL TALUD ORIENTAL DEL BARRIO VILLA DE LOS CABALLEROS EN EL MUNICIPIO DE GIRÓN, DEPARTAMENTO DE SANTANDER",** durante el periodo establecido entre el 01 de abril al 14 de abril del 2026.

Así mismo demostrar el avance de cada una de las actividades programadas, cantidades de obra ejecutadas, balance financiero, registros fotográficos evidenciando el avance de la ejecución de la obra, relación de equipos y herramientas utilizadas, fotocopia de la bitácora, resumen de las actividades realizas en el mes, relación de personal empleado en la ejecución de obra indicando el rol que cumple.

1.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Demostrar técnica y visualmente la ejecución de cada una de las actividades realizadas en el periodo de este informe.

- Ejecutar cada uno de los ítems contractuales, en cumplimiento a las especificaciones técnicas del Contrato.

- Realizar labores administrativas, de seguridad en el trabajo, ambientales y de calidad, demostrando los resultados más relevantes por medio de documentación, registros fotográficos y demás soportes que evidencian la gestión.

- Entregar de manera formal los respectivos soportes de seguridad social del personal que acompaña la ejecución de los trabajos.

- Realizar comités técnicos de los avances en las fases preliminar y ejecución.

2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El sector denominado Villa de los Caballeros se encuentra adscrito al municipio de Girón, que pertenece al Área Metropolitana de Bucaramanga. Específicamente se encuentra ubicado en el costado Sur del municipio, al Sur-Este del Barrio Mirador de Arenales (Figura 1. Ubicación general del área de estudio.)

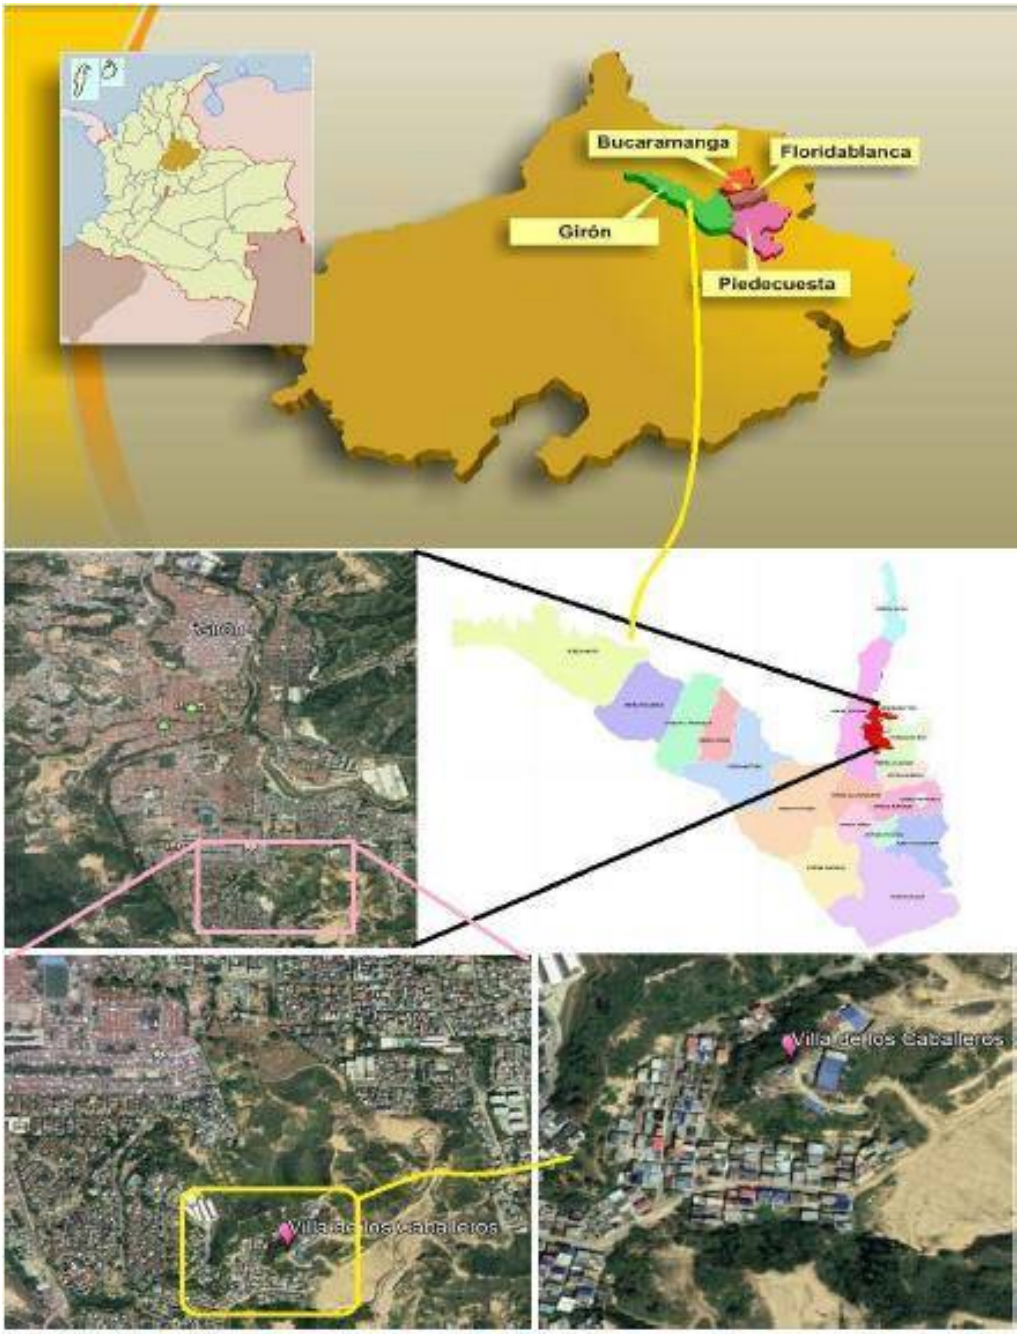


Figura 1. *Ubicación general del área de estudio*



***Figura 2**. Ubicación detallada del área de estudio. Tomado de Google Earth.*

3. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

Se relaciona la información del contrato de obra N°210.16225.6 suscrito para la ejecución del proyecto.

CONTRATO DE OBRA	N 210.16225.6 DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN EL TALUD ORIENTAL DEL BARRIO VILLA DE LOS CABALLEROS EN EL MUNICIPIO DE GIRÓN, DEPARTAMENTO DE SANTANDER (RA-OBRA-02).”
ENTIDAD CONTRATANTE	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA - CDMB
CONTRATISTA	CONSORCIO CONSOLIDACION GIRÓN
REPRESENTANTE LEGAL	JOHANNA MARCELA PEDIERNA CASTIBLANCO
NIT	901.982.571-5
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTER GRIÓN
REPRESENTANTE LEGAL	IBAN GUSTAVO BLANCO GONZALES
NIT	901.985.184-1
VALOR TOTAL DE LA INVERSION	$ 4.159.344.710.65
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	06 SEIS MESES
FECHA DE INICIO	15 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	14 DE ABRIL DE 2026
MUNICIPIO	GIRÓN, SANTANDER

3.1 PRESUPUESTO INICIAL APROBADO

PRESUPUESTO DE OBRA

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL BARRIO VILLA DE LOS CABALLEROS DEL MUNICIPIO DE GIRÓN, SANTANDER

CONDICIONES CONTRACTUALES

ITEM	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
SECCIÓN PRIMERA					
1.01	Replanteo, control y medición de la obra	mes	1,00	$11.584.277,00	$11.584.277,00
1.03.01.A	Valla tipo 1A (5,00m x 2,80 m)	und	1,00	$2.664.417,00	$2.664.417,00
1.04	Desmonte y limpieza	m^2	840,00	$5.453,00	$4.580.520,00
1.05	Retiro de basuras y escombros	m^3	168,00	$86.609,00	$14.550.312,00
1.07	Perfilado a mano descolgado de talud (en roca)	m^3	539,21	$257.918,00	$139.071.964,78
				SUBTOTAL SECCIÓN PRIMERA:	**$172.451.490,78**
SECCIÓN SEGUNDA					
2.01	Excavación a tajo abierto en taludes				
2.01.A	Excavación con acarreo libre				
2.01.A.02	Excavación con acarreo libre en material granular a cualquier profundidad	m^3	1.078,41	$49.921,00	$53.835.305,61
2.01.A.03	Excavación con acarreo libre en roca a cualquier profundidad	m^3	718,94	$91.187,00	$65.557.981,78
2.01.A.04	Excavación a mano con acarreo libre descolgado para zapata	m^3	29,00	$253.569,00	$7.353.501,00
2.03	Sobreacarreos para acarreos totales mayores de 1.000,00 m	m^3-km	26.614,8	$3.988,00	$106.139.822,40
				SUBTOTAL SECCIÓN SEGUNDA:	**$232.886.610,79**
SECCIÓN TERCERA					
3,00	Concretos				
3.01	Suministro y colocación de concreto de 3000 psi con mezcla humeda para zapatas	m^3	29,00	$1.089.450,00	$31.594.050,00
3.03	Suministro y colocación de concreto lanzado con mezcla húmeda de espesor 10 cm	m^2	840,00	$380.247,00	$319.407.480,00
3.08	Llenado de inyeccion con lechada cementicia para anclajes	m^3	87,00	$1.156.977,00	$100.656.999,00
				SUBTOTAL SECCIÓN TERCERA:	**$451.658.529,00**
SECCIÓN CUARTA					
4,00	Aceros				
4.01	Suministro y colocación acero de refuerzo fy 4200 kg / cm2	kg	5.807,00	$12.098,00	$70.253.086,00
4.02					
4.02.03	Suministro e instalación de 3 cables Ø=1/2" de L=25m	und	144,00	$1.085.176,00	$156.265.344,00
4.03	Tensionamiento de anclajes	und	144,00	$57.240,00	$8.242.560,00
4.04	Suministro y colocación				
4.04.01	Malla electrosoldada 4mm y abertura de 0,15m x 0,15m	m^2	840,00	$37.001,00	$31.080.840,00
4.05	Suministro e instalación de platina de 200mm x 200mm x 12mm con tres agujeros	und	144,00	$82.440,00	$11.871.360,00
4.06	Suministro e instalación de popora de 3 agujeros conicos para cuña de Ø=1/2"	und	144,00	$158.039,00	$22.757.616,00
4.07	Suministro e instalación de kit de cuñas de Ø=1/2" para anclaje	und	144,00	$96.886,00	$13.951.584,00
				SUBTOTAL SECCIÓN CUARTA:	**$314.422.390,00**
SECCIÓN QUINTA					
5,00	Perforaciones horizontales				
5.04	Ejecución perforaciones horizontales en taludes con pendientes mayores a 1:1 (en roca) con equipo de perforación descolgado para anclajes de 0,00m a 15,00m	m	2.160,00	$510.989,00	$1.103.736.240,00
5.05	Ejecución de perforaciones horizontales en taludes con pendientes mayores a 1:1 (en roca) con equipo de perforación descolgado para anclajes mayores a 15,00m	m	1.440,00	$585.973,00	$843.801.120,00
				SUBTOTAL SECCIÓN QUINTA:	**$1.947.537.360,00**
SECCIÓN SEXTA					
6,00	Varios				
6.02	Canaleta (ancho = 1m; e =10cm)	m	132,00	$134.615,00	$17.769.180,00
6.04	Estructura de disipación de energía	m	14,00	$634.862,00	$8.888.068,00
6.06	Sistema de abatimiento para líneas hidráulicas de infiltración interna y protección del trasdós de la estructura estabilizadora	m	408,00	$75.174,00	$30.670.992,00
				SUBTOTAL SECCIÓN SEXTA:	**$57.328.240,00**
	Presupuesto Costos directos				**$3.176.284.620,57**
	Administración:			24%	$762.308.308,94
	Imprevistos			1%	$31.762.846,21
	Utilidades:			5%	$158.814.231,03
	A.I.U.:			30%	$952.885.386,18
	I.V.A.			19%	$30.174.703,90
	Presupuesto total de obra				**$4.159.344.710,65**

3.2 LEGALIZACIÓN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 210.16225.6

El día 05 de septiembre de 2025, se perfecciona el Contrato de obra pública No 210.16225.6, celebrado entre la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA – CDMB y CONSORCIO CONSOLIDACION GIRÓN.

3.3 ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 210.16225.6

Se firma acta de inicio para el Contrato de obra, con fecha 15 de octubre de 2025, fijando un plazo de seis (06) meses para la ejecución de actividades.

3.4 CONTROL DE GARANTÍAS – POLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA

Tabla No. 2 *Cuadro control de pólizas del contrato N° 210.16225.6 a Acta de inicio*

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL A FIRMA DE ACTA DE INICIO			
ASEGURADORA			EQUIDAD SEGUROS
POLIZA No.	AB002685	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	23/10/2025
AMPAROS OTORGADOS	**VALOR**	**VIGENCIA**	
		DESDE	**HASTA**
Cumplimiento del contrato	$ 831.868.942,60	15/10/2025	15/08/2026
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnización laboral	$ 207.967.235,65	15/10/2025	15/04/2029
Estabilidad y calidad de la Obra	$ 831.868.942,60	15/04/2026	15/04/2031

POLIZA DE SEGURO RCE ENTIDAD ESTATAL A FIRMA DE ACTA DE INICIO			
ASEGURADORA			EQUIDAD SEGUROS
POLIZA No.	AB002686	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	23/10/2025
AMPAROS OTORGADOS	**VALOR**	**VIGENCIA**	
		DESDE	**HASTA**
Predios Labores y Operaciones	$ 569.400.000,00	15/10/2025	15/04/2026

3.5 ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 210.15225.6

Las obras fueron ejecutadas en su totalidad conforme a lo establecido en el alcance contractual, siendo recibidas a satisfacción por la interventoría, quien verifico el cumplimiento de las especificaciones técnicas y el adecuado funcionamiento de las mismas.

De igual manera, se llevó a cabo el proceso administrativo correspondiente a la suscripción del acta de recibo definitivo de obra con la entidad contratante formalizando el cumplimiento del objeto contractual con fecha 1 de abril de 2026. Se deja constancia de que las pólizas actualizadas con corte al acta de recibo definitivo fueron debidamente suscritas y, a la fecha, se encuentran en trámite de entrega.

4. RELACIÓN DE PERSONAL Y EQUIPO UTILIZADO POR CONSORCIO CONSOLIDACIÓN GIRÓN

A continuación, se presenta la relación de personal y equipo solicitado según pliego de condiciones, así mismo el ingreso y retiro de personal operativo para finalizar las actividades correspondientes a CAPITULO III: CONCRETOS. Se presentan las siguientes novedades:

PERSONAL SOLICITADO SEGÚN EL PLIEGO DE CONDICIONES O TÉRMINOS DE REFERENCIA						
ÍTEM	**NOMBRE**	**CÉDULA**	**CARGO**	**EMPRESA**	**INGRESO**	**RETIRO**
1	EDGAR LEONARDO GOMEZ RONCANCIO	72.254.372	DIRECTOR DE OBRA	CONAINCO	15/10/2025	14/04/2026
2	OSCAR ANDRES SANCHEZ JEREZ	1.098.756.647	RESIDENTE DE OBRA	INFRACORP	15/10/2025	14/04/2026
3	MARIA LUCIA HIGUERA PINO	1.095.700.657	GEOTECNISTA	INDEPENDIENTE	15/10/2025	14/04/2026
4	JOHANA PAOLA OSPINO RODELO	1.098.618.429	ASESOR AMBIENTAL	INDEPENDIENTE	15/10/2025	14/04/2026
5	CLARA MELISSA DONADO ARIAS	1.098.704.436	PROFESIONAL SISO	INFRACORP	15/10/2025	14/04/2026
6	JUAN CARLOS RINCON LOZANO	80.089.079	PMP	INDEPENDIENTE	15/10/2025	14/04/2026

Tabla No. 3 *Personal solicitado según pliego de condiciones*

PERSONAL UTILIZADO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO						
ÍTEM	**NOMBRE**	**CÉDULA**	**CARGO**	**EMPRESA**	**INGRESO**	**RETIRO**
1	SANDRA YOLIMA BERMUDEZ CALA	63.553.613	profesional ambiental	INFRACORP	1/11/2025	14/04/2026

2	EDSON ALEXANDER PORTILLA ARDILA	1.098.605.491	ALMACENISTA	CONSORCIO CONSOLIDACIÓN GIRÓN	24/11/2025	14/04/2026
3	ISAÍAS GARCÍA JAIMES	1.101.596.200	OPERADOR DE PERFORACIÓN I	CONSORCIO CONSOLIDACIÓN GIRÓN	8/10/2025	14/04/2026
4	JARRINSON STEVEN CAMARÓN CAICEDO	1.232.891.906	AYUDANTE DE PERFORACIÓN II	CONSORCIO CONSOLIDACIÓN GIRÓN	8/10/2025	14/04/2026
5	MIGUEL ANTONIO RANGEL FLORIÁN	1.124.048.478	AYUDANTE DE PERFORACIÓN II	CONSORCIO CONSOLIDACIÓN GIRÓN	8/10/2025	14/04/2026
6	JESÚS ALBERTO MAYORGA MAYORGA	1.101.520.618	AYUDANTE DE OBRA	CONSORCIO CONSOLIDACIÓN GIRÓN	8/10/2025	14/04/2026
7	WILLINTON ALARCÓN ASCANIO	91.479.571	AYUDANTE DE PERFORACIÓN II	CONSORCIO CONSOLIDACIÓN GIRÓN	5/11/2025	14/04/2026
8	MANUEL ENRIQUE CASTILLO FLÓREZ	1.082.871.247	AYUDANTE DE OBRA	CONSORCIO CONSOLIDACIÓN GIRÓN	6/11/2025	14/04/2026
9	GIOVANY SEBASTIAN PARRA FERRER	1.005.157.855	AYUDANTE DE OBRA	CONSORCIO CONSOLIDACIÓN GIRÓN	1/12/2025	14/04/2026
11	ALEX PRADA JEREZ	13.537.319	OFICIAL	INFRACORP	15/10/2025	14/04/2026
12	FABIAN ZAMBRANO LESMES	1.098.673.915	TOPOGRAFO	INFRACORP	15/10/2025	14/04/2026

Tabla No. 4 *Personal utilizado en la ejecución del contrato.*

EQUIPO		
ITEM	**MAQUINARIA / EQUIPO**	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
1	ESTACIÓN TOPOGRÁFICA	
2	UNIDAD DE TENSIONAMIENTO	

Tabla No. 5 *Equipo utilizado en la ejecución del contrato.*

5. INFORME AVANCE EJECUTADO POR EL CONSORCIO CONSOLIDACIÓN GIRÓN


DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Durante el período comprendido entre el 01 y el 14 de abril de 2026 se ejecutaron actividades correspondientes al proceso constructivo para la estabilización del talud. Una vez realizado el suministro e instalación de concreto y cumplida la edad de a resistencia fina a los 28 días, se dio inicio a las actividades de tensionamiento para cada anclaje a 30 toneladas de fuerza, y dejando un terminado armonioso para la pantalla.

Las actividades anteriormente descritas se ejecutaron bajo un estricto control técnico y de calidad de los materiales en cumplimiento a las especificaciones del proyecto. Para el proceso de tensionamiento,

se realizó previamente la instalación de los elementos necesarios para su tensionamiento (platina, popora y cuña) en cada punto de anclaje, garantizando las condiciones adecuadas para la aplicación de carga. Posteriormente, se llevo a cabo el control técnico de tensionamiento, cuyos registro y resultados serán anexados en el presente informe.

Adicionalmente, se con actividades complementarias no contempladas dentro del alcance contractual, orientadas al mejoramiento urbanístico y a la optimización de las condiciones funcionales del proyecto. Estas intervenciones se ejecutaron con el propósito de asegurar la adecuada integración de la obra con su entorno, así como garantizar su correcta operatividad y uso por parte de la comunidad

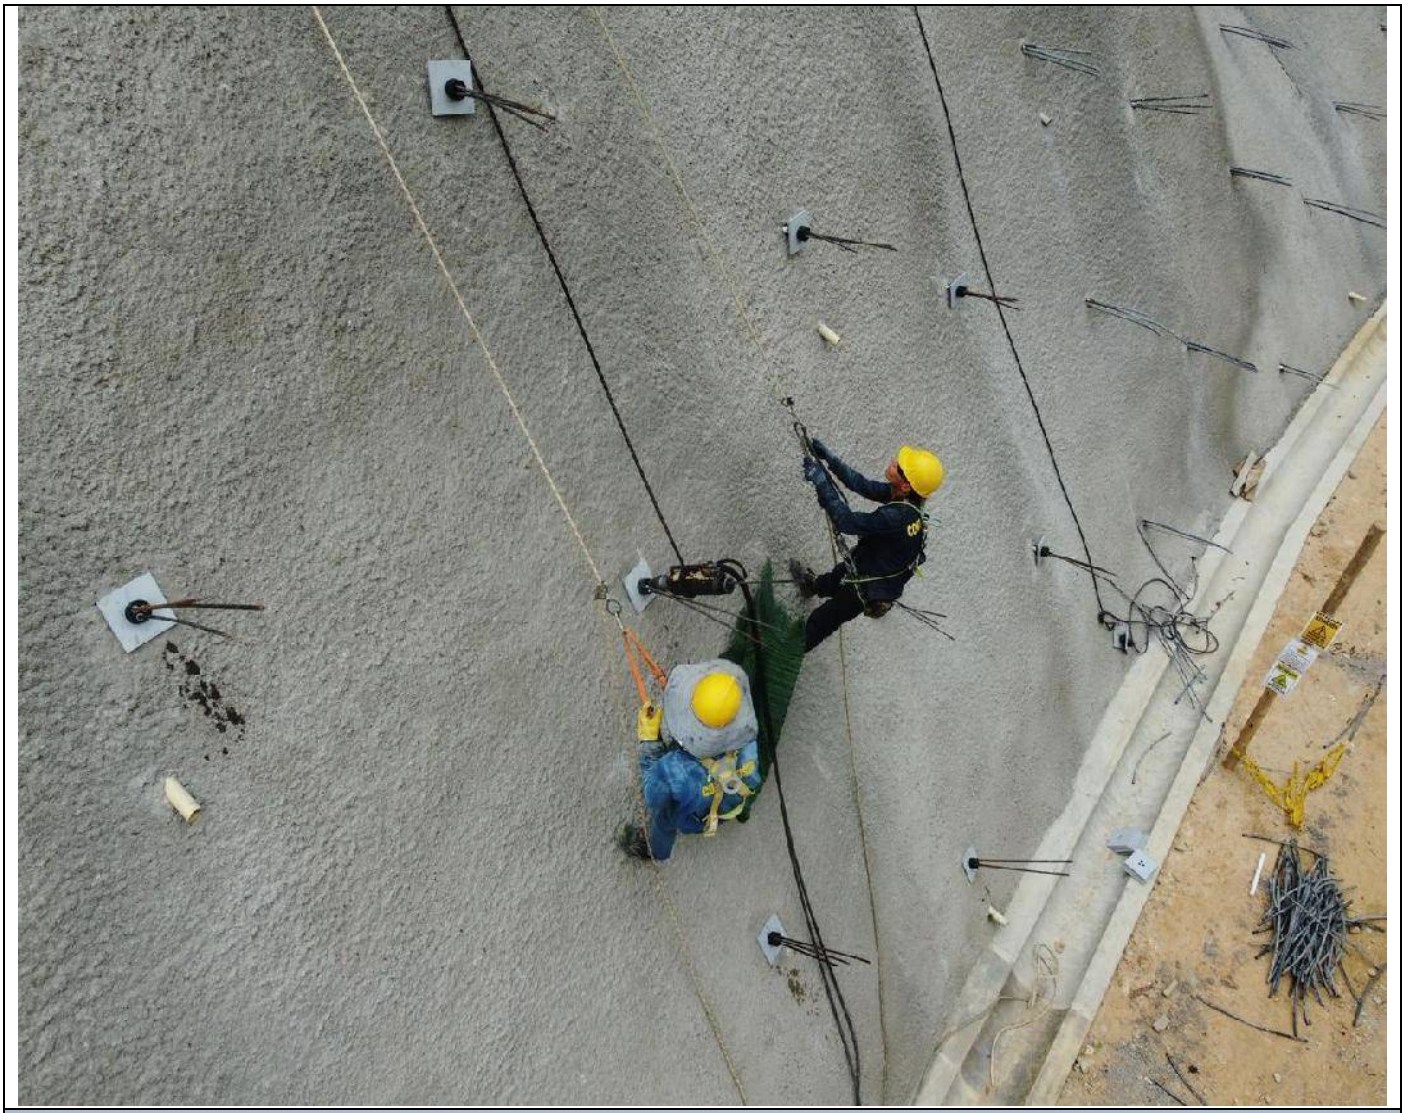

Trabajos en el frente de obra villa de los caballeros municipio de Girón.

5.1 SECCIÓN PRIMERA

5.1.1 Replanteo, Control y medición de Obra (mes)

Durante el último periodo de ejecución del contrato se llevaron a cabo actividades de medición, control y replanteo en las áreas intervenidas, empleando equipos de alta precisión tales como estación total, nivel de precisión y herramientas de apoyo fotogramétrico.

En este proceso se realizó el levantamiento topográfico detallado de la totalidad del área intervenida, incluyendo la terraza conformada en la base del talud, con el fin de obtener información confiable para el seguimiento y control de las obras ejecutadas.

Estas actividades constituyen un componente fundamental dentro del control técnico del proyecto, ya que permiten la verificación sistemática de las condiciones geométricas, hidráulicas y constructivas, asegurando su conformidad con las especificaciones técnicas, los planos de diseño y los criterios establecidos en los estudios previos.

DESCRIPCION ITEM	UND	CANTIDADES CONTRACTUALES	CANT. EJECUTADA ENEL PRESENTE INFORME 07	CANTIDADES ACUMULADAS	% DE EJECUCIÓN
SECCIÓN PRIMERA					
REPLANTEO, CONTROL Y MEDICIÓN DE OBRA	MES	1.00	0,015	1,00	100,00%



Replanteo, Control y medición de Obra



Replanteo, Control y medición de Obra

5.2 SECCIÓN CUARTA

5.2.1 Tensionamiento de anclajes

Durante la etapa final del proceso de estabilización, y una vez verificado que el concreto alcanzó la resistencia a la compresión especificada según resultados de ensayos, se procedió a la instalación de los elementos requeridos para el sistema de tensionamiento en cada punto de anclaje, incluyendo platinas, poporas y cuñas.

Posteriormente, se ejecutó el tensionamiento de los anclajes mediante el uso de una unidad hidráulica acoplada a un gato tensor tipo monotorón, equipado con manómetro calibrado para el control preciso de la carga aplicada. El proceso se llevó a cabo conforme a los parámetros de diseño, aplicando una carga total de 30 toneladas por anclaje (equivalente a 10 toneladas por cada guaya), alcanzando así el 100% de la carga de tensión establecida en el diseño. Estas actividades garantizan la adecuada transferencia de esfuerzos al sistema de contención, contribuyendo a la estabilidad global del talud conforme a los criterios geotécnicos definidos. Se realiza un control técnico de tensionamiento que tiene los resultados de su elongación física. **Ver Anexo 10. Control de tensionamiento**

DESCRIPCION ITEM	UND	CANTIDADES CONTRACTUALES	CANT. EJECUTADA ENEL PRESENTE INFORME 07	CANTIDADES ACUMULADAS	% DE EJECUCIÓN
SECCIÓN CUARTA					
TENSIONAMIENTO DE ANCLAJES	UND	144,00	144,00	144,00	100,00%



Tensionamiento de anclajes



Tensionamiento de anclajes

5.2.2 Suministro e instalación de platina de 200mm x 200mm x 12mm con tres agujeros

Durante el periodo comprendido en el presente informe se llevó a cabo la instalación de platinas de acero, conforme a las dimensiones y especificaciones establecidas en el ítem contractual y en las posiciones definidas en los planos aprobados, como parte integral del sistema de tensionamiento de anclajes.

Previo a su instalación, se realizó la inspección y limpieza de cada platina, verificando que las superficies de contacto se encontraran libres de contaminantes tales como suciedad, escamas de laminación, óxido excesivo, polvo, pintura, aceites u otras impurezas que pudieran afectar la adecuada transferencia de esfuerzos. Las platinas fueron dispuestas como elemento inicial dentro del conjunto de accesorios metálicos, cumpliendo la función de distribuir uniformemente las cargas generadas durante el proceso de tensionamiento.

DESCRIPCION ITEM	UND	CANTIDADES CONTRACTUALES	CANT. EJECUTADA ENEL PRESENTE INFORME 07	CANTIDADES ACUMULADAS	% DE EJECUCIÓN
SECCIÓN CUARTA					
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLATINA DE 200MM X 200MM X 12MM CON TRES AGUJEROS	UND	144,00	144,00	144,00	100,00%



Suministro de platina de 200mm x 200mm x 12mm con tres agujeros




Suministro de platina de 200mm x 200mm x 12mm con tres agujeros

5.2.3 Suministro e instalación de popora de 3 agujeros cónicos para cuña de Ø=1/2"

Durante el presente periodo se realizó la instalación de popora en acero, de acuerdo con las dimensiones y especificaciones definidas en el ítem contractual y en las ubicaciones establecidas en los planos aprobados, como parte del sistema de tensionamiento de anclajes.

Estos elementos fueron dispuestos como el segundo componente dentro del conjunto de accesorios metálicos, ubicándose sobre la platina previamente instalada. En cada popora o portacuñas se introdujeron los tres (3) torones correspondientes a cada anclaje, garantizando su correcta alineación y posicionamiento. Se instaló un conjunto por cada anclaje ejecutado en la pantalla de concreto lanzado.

DESCRIPCION ITEM	UND	CANTIDADES CONTRACTUALES	CANT. EJECUTADA ENEL PRESENTE INFORME 07	CANTIDADES ACUMULADAS	% DE EJECUCIÓN
SECCIÓN CUARTA					
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POPORA DE TRES AGUJEROS CÓNICOS PARA CUÑA DE ½"	UND	144,00	144,00	144,00	100,00%

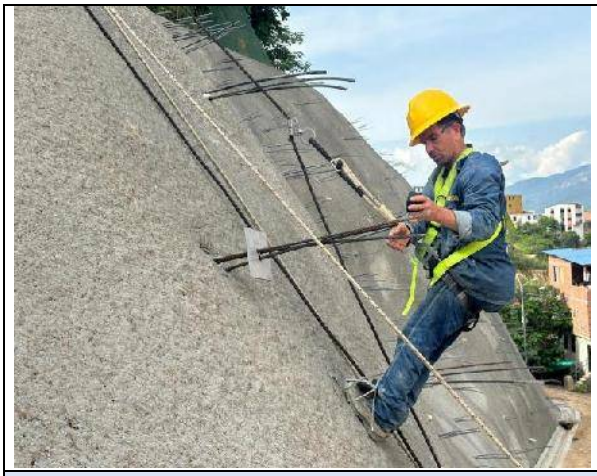

Suministro de poporas de tres agujeros para cuña de ½"



Suministro de poporas de tres agujeros para cuña de ½"

5.2.4 Suministro e instalación de de kit de cuñas de Ø=1/2" para anclaje

Durante el periodo evaluado se llevó a cabo el suministro e instalación de cuñas metálicas de 1/2", conforme a las especificaciones establecidas en el ítem contractual y como parte integral del sistema de tensionamiento de anclajes. Estas fueron colocadas en el interior de los portacuñas previamente instalados, asegurando su correcto acople sobre cada uno de los torones que conforman el anclaje.

Las cuñas fueron instaladas posterior al proceso de aplicación de carga mediante el gato tensor. Se dispuso un juego de cuñas por cada torón, garantizando así la adecuada transferencia y conservación de la carga aplicada. Este procedimiento asegura la estabilidad del sistema de anclaje, manteniendo la fuerza de tensionamiento dentro de los parámetros de diseño y contribuyendo al comportamiento estructural del sistema de contención del talud.

DESCRIPCION ITEM	UND	CANTIDADES CONTRACTUALES	CANT. EJECUTADA ENEL PRESENTE INFORME 07	CANTIDADES ACUMULADAS	% DE EJECUCIÓN
SECCIÓN TERCERA					
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT DE CUÑAS DE ½" PARA ANCLAJE	UND	144,00	144,00	144,00	100,00%



Suministro y instalación de kit de cuñas de ½" para anclaje



Suministro y instalación de kit de cuñas de ½" para anclaje

6. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Durante el periodo comprendido en la ejecución del contrato se elaboraron y tramitaron las correspondientes actas parciales de obra, en las cuales se registró y validó el avance físico y financiero del proyecto, conforme a las cantidades efectivamente ejecutadas y debidamente verificadas por la interventoría.

El acta final de obra comprende al periodo del 01 de marzo al 14 de abril de 2026, consolidando un valor total ejecutado de QUINIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS ($562.589.533,98). Como resultado del proceso de liquidación, se determinó un saldo a favor de la Entidad por valor de TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS ONCE PESOS CON QUINCE CENTAVOS ($3.678.511,15), equivalente al 0,09% del valor contractual.

Dicho saldo obedece a variaciones en las cantidades ejecutadas, particularmente en el ítem de movimiento de tierras, las cuales, al cierre del contrato, no coinciden exactamente con los valores decimales establecidos en el presupuesto contractual, en función de las condiciones reales de ejecución en campo.

RELACIÓN ACTAS			
ACTA	**FECHA**	**PERIODO**	**VALOR**
1	15/12/2025	Desde el 15/10/2025 hasta el 30/11/2025	$966.804.519,53
2	16/02/2026	Desde el 01/12/2025 hasta el 31/01/2026	$2.035.943.731,91
3	18/03/2026	Desde el 01/02/2026 hasta el 28/02/2026	$590.328.414,08
4	14/04/2026	Desde el 01/03/2026 hasta el 14/03/2026	$562.589.533,98

Tabla No. 6 *Relación actas*

6.1 OBRAS PROGRAMADAS, EJECUTADAS Y ACUMULADAS

Teniendo en cuenta la programación contractual, y las actividades técnicas ejecutadas en su totalidad y mencionadas anteriormente. En la tabla No.7 Se puede observar el porcentaje FINANCIERO de avance programado vs el ejecutado. El contratista finalizo la ejecución de todas las actividades del contrato, encontrándose la obra terminada.

INDICADORES	VALOR ACUMULADO	% PORCENTAJE ACUMULADO
Obra Programada	$ 4.159.344.710,65	100,00%
Obra Ejecutada	$ 4.155.666.199,50	100,00%

Tabla No. 7 *Porcentaje de avance*

6.2 RELACIÓN DE ACTAS DE REUNIÓN

Se elaboraron y suscribieron actas de reunión con la participación del equipo técnico del contratista, la interventoría y la supervisión CDMB, con el propósito de efectuar el seguimiento al avance físico del proyecto, verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y socializar las actividades ejecutadas durante el período evaluado.

Las actas de comité más recientes estuvieron orientadas a la revisión técnica integral del estado final de las obras, incluyendo el análisis, validación y concepto sobre su terminación con corte al 14 de abril de 2026. En dichas actas se deja constancia del cumplimiento satisfactorio de las actividades contractuales, conforme a los estudios, diseños y especificaciones técnicas del proyecto. **(Ver Anexo No. 07 – Actas de Comité).**

RELACIÓN DE COMITES TÉCNICOS REALIZADOS	
# COMITÉ	**FECHA**
Acta de Reunión No. 12	10/04/2026

Tabla No. 8 *Actas de reunión*

6.3 BITACORA DE OBRA

El contratista lleva un registro diario en un único libro de actas autorizado por la Interventoría en la que se describe diariamente cada una de las actividades realizadas, el personal directo que se encuentra en la obra, los equipos presentes usados en obra, al igual el clima durante el día y su noche anterior. Este registro es revisado por la interventoría y firmado para su aprobación, así mismo, se deja registros de las inspecciones oculares que realiza la entidad CDMB como agente contratante del presente contrato y se registran las firmas del personal profesional presente, con la finalidad de llevar un control detallado diario del proceso constructivo del proyecto. **Ver Anexo 1. Bitácora de Obra**

6.4 AFILIACIONES SEGURIDAD SOCIAL

El compromiso del contratista es mantener a todo el personal vinculado al desarrollo de la obra bajo el sistema de seguridad social, como lo indica el contrato. Para esto el contratista reunió la documentación necesaria de cada uno de los empleados, para tramitar ante la respectiva EPS y mantener actualizada, la información y pagos para su afiliación. El personal que se encuentra vinculado, se encuentra afiliado al sistema de seguridad social bajo la razón social **CONSORCIO CONSOLIDACIÓN GIRÓN**, sus consorciados **INFRACORP Y CONAINCO** a excepción de los asesores en sus distintas especialidades quienes están afiliados al sistema de seguridad social como independientes. El personal vinculado durante el periodo comprendido entre el 01 de marzo al 31 de marzo de 2026 se puede observar en la tabla 3 y 4 adjunta al presente informe. **Ver Anexo 2. Seguridad Social**

6.5 SEGUIMIENTO Y CONTROL

Se lleva a cabo por parte del contratista un control, análisis y seguimiento de cada una de las actividades que se realizaron durante el periodo comprendido entre el 01 de al 31 de marzo de 2026. Así mismo, se mantiene una comunicación permanente con la comunidad y con la interventoría **INTER GIRÓN** a través de su Residente y director de Interventoría; brindando información de interés acorde a cada ente y se gestionan sus requerimientos, mediante correos electrónicos y reuniones en las instalaciones tanto de los contratistas como de la interventoría.

6.6 ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES, DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

6.6.1 ACTIVIDADES COMPONENTE AMBIENTAL

Respecto a las actividades ambientales desarrolladas durante el periodo comprendido entre el 01 de marzo al 31 de marzo de 2026, ver anexo informe de cumplimiento plan de acción socio ambiental. **Ver anexo 3. Informe Ambiental**

6.6.2 ACTIVIDADES COMPOMNENTE SOCIAL

En el marco de la gestión social del proyecto y en articulación con la comunidad y la Junta de Acción Comunal (JAC), se concertaron e implementaron soluciones técnicas orientadas a mejorar las condiciones funcionales y de seguridad del área intervenida.

En este sentido, se ejecutó la construcción de bordillos perimetrales continuos en las zonas peatonales, decisión adoptada con base en criterios técnicos definidos en campo y previamente socializada y validada con la comunidad. Esta intervención responde a la necesidad de confinar el material dispuesto en la parte baja de la obra, condición que no existía previamente, y se complementa con la conformación de la terraza generada durante la ejecución del proyecto. El bordillo perimetral actúa, por tanto, como elemento de confinamiento y control hidráulico, contribuyendo a la durabilidad de la intervención y a la mitigación de riesgos asociados a la acumulación y flujo no controlado de agua.

Adicionalmente, y considerando que las vías existentes en el sector presentan limitaciones de acceso vehicular, siendo la zona de intervención el único punto de tránsito disponible, y atendiendo a la solicitud de los residentes, se ejecutó la construcción de una rampa de acceso. Esta solución mejora las condiciones de accesibilidad y movilidad, sin generar afectaciones a la funcionalidad de la obra ni impactos negativos en su operación.

Por otra parte, se llevó a cabo la instalación de geomanto en sectores donde el terreno presentaba condiciones de socavación y exposición, como medida de estabilización superficial y control de erosión. Asimismo, se ejecutó la construcción de una canaleta perimetral adicional y su respectiva caja de inspección en zonas aledañas donde no se contaba con este sistema, con el propósito de optimizar la conducción de aguas de escorrentía y garantizar condiciones adecuadas de drenaje en el área intervenida.

Finalmente, se informa que las actas de vecindad finales serán elaboradas una vez culminen en su totalidad las actividades contractuales, y serán debidamente anexadas al informe final de liquidación del contrato.





Construcción de canaleta perimetral en la zona aledaña a la obra	Conformación terraza
	
Conformación terraza	**Construcción de canaleta perimetral en la zona aledaña a la obra**
	
Conformación de bordillo perimetral	**Instalación de geomanto en el área adyacente a la obra**

6.6.3 ACTIVIDADES COMPONENTE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST)

El contratista durante el presente periodo realizó la entrega de elementos de protección personal empleado en obra y brindando elementos específicos según las actividades a desarrollar, entre estos, se encuentran: guantes, gafas, camisa, pantalón, botas de caucho, tapa oídos, cascos, etc. Siguiendo las políticas de prevención de accidentes laborales y el programa interno de cero accidentes laborales.

El contratista cuenta con personal capacitado que brinda regularmente charlas de seguridad laboral, pausas activas y demás. Esto con el fin de mantener un ambiente seguro de trabajo y empleados competentes ante cualquier imprevisto.

Algunas otras actividades realizadas por el contratista, fueron:

- Capacitación del personal
- Atención oportuna a los requerimientos y comunicaciones de la Interventoría con respecto a las medidas a tener en cuenta con el personal en alturas.
- Exigencia en el uso de los equipos y elementos de protección personal adecuados.
- Charlas, capacitaciones, inducciones y entrenamiento en obra.
- Inspección de herramientas y elementos de trabajo.

Ver anexo informe mensual de Gestión de seguridad y salud en el trabajo. **Ver anexo 4. Informe SST**

6.6.4 ACTIVIDADES DE CALIDAD

En el anexo se adjuntarán según la ejecución de la obra los certificados de aseguramiento de la calidad para los materiales utilizados y/o actividades desarrolladas durante el avance de la obra según el plan de calidad entregado a Interventoría. **Ver anexo No.05 Informe de Calidad**

7. ACTIVIDADES ACUMULADAS TOTALES

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL BARRIO VILLA DE LOS CABALLEROS DEL MUNICIPIO DE GIRÓN, SANTANDER					AVANCE No. 1 15/10/25 AL 31/10/25		ACUMULADO		%	AVANCE No. 2 01/11/25 AL 30/11/25		ACUMULADO		%	AVANCE No. 3 01/12/25 AL 31/12/25		ACUMULADO		%	AVANCE No. 4 01/01/26 AL 31/01/26		ACUMULADO		%	AVANCE No. 5 01/02/26 AL 28/02/26		ACUMULADO		%	AVANCE No. 6 01/03/26 AL 31/03/26		ACUMULADO		%	AVANCE No. 7 01/04/26 AL 14/04/26		ACUMULADO		%
CONDICIONES CONTRACTUALES																																								
ITEM	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL		CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL		CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL		CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL		CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL		CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL		CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	
SECCIÓN PRIMERA																																								
1.01	Replanteo, control y medición de la obra	mes	1,00	$11.584.277,00	$11.584.277,00	0,080	$ 926.742,16	0,080	$ 926.742,16	8,000%	0,17	$ 1.969.327,09	0,250	$ 2.896.069,25	25,000%	0,17	$ 1.969.327,09	0,42	$ 4.865.396,3400	42,00%	0,17	$ 1.969.327,09	0,59	6834723,43	59,0%	0,16	$ 1.853.484,32	0,750	$ 8.688.207,75	75,00%	0,16	$ 1.853.484,32	0,910	$ 10.541.692,070	91,000%	0,09	$ 1.042.584,93	1,00	11584277,00	100,00%
1.01.01.A	Valla tipo 1A (5.00m x 2.80 m)	und	1,00	$2.664.417,00	$2.664.417,00	1,00	$ 2.664.417,00	1,00	$ 2.664.417,00	100,00%		$ -	1,00	$ 2.664.417,0000	100,00%		$ -	1,00	2664417,00	100,00%		$ -	1,00	2664417,00	100,00%		$ -	1,00	2664417,00	100,00%		$ -	1,00	2664417,00	100,000%		$ -	1,00	2664417,00	100,00%
1.04	Basmonta y limpieza	m²	840,00	$5.453,00	$4.580.520,00	620,00	$ 3.380.860,00	620,00	$ 3.380.860,00	73,81%	220,0	$ 1.199.660,00	840,00	$ 4.580.520,00	100,00%		$ -	840,00	4580520,00	100,00%		$ -	840,00	4580520,00	100,00%		$ -	840,00	4580520,00	100,00%		$ -	840,00	4580520,00	100,000%		$ -	840,00	4580520,00	100,00%
1.05	Retiro de basuras y escombros	m³	168,00	$86.609,00	$14.550.312,00	124,00	$ 10.739.516,00	124,00	$ 10.739.516,00	73,81%	44,0	$ 3.810.796,00	168,00	$ 14.550.312,000	100,00%		$ -	168,00	14550312,00	100,00%		$ -	168,00	14550312,00	100,00%		$ -	168,00	14550312,00	100,00%		$ -	168,00	14550312,00	100,000%		$ -	168,00	14550312,00	100,00%
1.07	Perfilado a mano descolgado de talud (en roca)	m²	539,21	$257.918,00	$139.071.964,78		$ -	0,00	0,0,00	0,00%	539,2	$ 139.069.385,60	539,20	$ 139.069.385,600	100,00%		$ -	539,20	$ 139.069.385,6000	100,00%		$ -	539,20	139069385,60	100,00%		$ -	539,20	139069385,60	100,00%		$ -	539,20	139069385,60	100,000%		$ -	539,20	139069385,60	99,998%
				SUBTOTAL SECCIÓN PRIMERA:	$172.451.490,78		$ 17.711.535,16		$ 17.711.535,16	10,27%		$ 146.049.168,69		$ 163.760.703,85	94,96%		$ 1.969.327,09		$ 165.730.030,9400	96,10%		$ 1.969.327,09		$ 167.699.358,03	97,24%		$ 1.853.484,32		$ 169.552.842,3500	98,32%		$ 1.853.484,32		$ 171.406.326,6700	99,39%		$ 1.042.584,93		$ 172.448.911,60	100,00%
SECCIÓN SEGUNDA																																								
2.01	Excavación a tajo abierto en taludes																																							
2.01.A	Excavación con acarreo libre																																							
2.01.A.03	Excavación con acarreo libre en material granular a cualquier profundidad	m³	1.078,41	$49.921,00	$53.835.305,61						1075,20	$ 53.675.059,20	1075,20	$ 53.675.059,20	99,70%		$ -	1075,20	$ 53.675.059,20	99,70%		$ -	1075,20	53675059,20	99,70%		$ -	1075,20	$ 53.675.059,20	99,70%		$ -	1075,20	$ 53.675.059,20	99,70%		$ -	1075,20	$ 53.675.059,20	99,70%
2.01.A.02	Excavación con acarreo libre en roca a cualquier profundidad	m³	718,94	$91.187,00	$65.557.981,78						718,00	$ 65.472.266,00	718,00	$ 65.472.266,00	99,87%		$ -	718,00	$ 65.472.266,00	99,87%		$ -	718,00	65472266,00	99,87%		$ -	718,00	$ 65.472.266,00	99,87%		$ -	718,00	$ 65.472.266,00	99,87%		$ -	718,00	$ 65.472.266,00	99,87%
2.01.A.04	Excavación a mano con acarreo libre descolgado para zapata	m³	29,00	$253.569,00	$7.353.501,00							$ -				20,00	$ 5.071.380,00	20,00	5071380,00	68,97%	8,80	2231407,20	28,80	$ 7.302.787,20	99,31%		$ -	28,80	$ 7.302.787,20	99,31%		$ -	28,80	$ 7.302.787,20	99,31%		$ -	28,80	$ 7.302.787,20	99,31%
2.03	Sobreacarreos para acarreos totales mayores de 1.000,00 m	m³-km	26.614,8	$3.988,00	$106.139.822,40						26268,48	$ 104.758.698,24	26268,48	$ 104.758.698,24	98,70%		$ -	26268,48	$ 104.758.698,24	98,70%	208,00	$ 829.504,00	26360,00	105123680,00	99,04%	91,52	364981,76	26568,00	$ 105.953.184,00	99,82%		$ -	26568,00	$ 105.953.184,00	99,82%		$ -	26568,00	$ 105.953.184,00	99,82%
				SUBTOTAL SECCIÓN SEGUNDA:	$232.886.610,79		$ -		$ -	0,00%		$ 223.906.023,44		$ 223.906.023,44	96,14%		$ -		$ 223.906.023,44	96,14%		$ 5.900.884,00		$ 229.342.385,20	98,48%		$ 2.596.388,96		$ 232.403.296,40	99,79%		$ -		$ 232.403.296,40	99,79%		$ -		$ 232.403.296,40	99,79%
SECCIÓN TERCERA																																								
3.00	Concretos																																							
3.01	Suministro y colocación de concreto de 3000 psi con mezcla humeda para zapatas	m³	29,00	$1.080.450,00	$31.594.050,00																										28,8	$ 31.376.160,0	28,8	$ 31.376.160,00	99,31%		$ -	28,8	$ 31.376.160,00	99,31%
3.03	Suministro y colocación de concreto lanzado con mezcla húmeda de espesor 10 cm	m²	840,00	$380.247,00	$319.407.480,00																										840	$ 319.407.480,0	840	$ 319.407.480,00	100,00%		$ -	840	$ 319.407.480,00	100,00%
3.08	Llenado de inyeccion con lechada cementicia para anclajes	m³	87,00	$1.156.977,00	$100.656.999,00											38,4	$ 44.427.916,80	38,40	$ 44.427.916,80	44,14%	28,8	$ 33.320.937,60	67,20	77748854,40	77,24%	19,2	$ 22.213.958,40	86,40	$ 99.962.812,80	99,31%		$ -	86,40	$ 99.962.812,80	99,31%		$ -	86,40	$ 99.962.812,80	99,31%
				SUBTOTAL SECCIÓN TERCERA:	$451.658.529,00		$ -		$ -	0,00%		$ -		$ -	0,00%		$ 44.427.916,80		$ 44.427.916,80	9,84%		$ 33.320.937,60		$ 77.748.854,40	17,21%		$ 22.213.958,40		$ 99.962.812,80	22,13%		$ 350.783.640,00		$ 450.746.452,80	99,80%		$ -		$ 450.746.452,80	99,80%
SECCIÓN CUARTA																																								
4.00	Aceros						$ -		$ -			$ -		$ -			$ -		$ -			$ -		$ -			$ -		$ -			$ -					$ -			
4.01	Suministro y colocación acero de refuerzo fy 4200 kg / cm2	kg	5.807,00	$12.098,00	$70.253.086,00																2419,20	$ 29.267.481,60	2419,20	$ 29.267.481,60	41,66%	3386,88	$ 40.974.474,24	5806,080	$ 70.241.955,84	99,98%		$ -	5806,08	$ 70.241.955,84	99,98%		$ -	5806,08	$ 70.241.955,84	99,98%
4.02																																					$ -		$ 0,00	
4.02.03	Suministro e instalación de 3 cables Ø=1/2" de L=25m	und	144,00	$1.085.176,00	$156.265.344,00						24,00	$ 26.044.224,00	24,00	$ 26.044.224,00	16,67%	46,00	$ 49.918.096,00	70,000	$ 75.962.320,00	48,61%	52,00	$ 56.429.152,00	122,00	$ 132.391.472,00	84,72%	22,00	$ 23.873.872,00	144,00	$ 156.265.344,00	100,00%		$ -	144,000	$ 156.265.344,00	100,00%		$ -	144,00	$ 156.265.344,00	100,00%
4.03	Tensionamiento de anclajes	und	144,00	$57.240,00	$8.242.560,00																																$ -	144,00	$ 8.242.560,00	144,00	$ 8.242.560,00	
4.04	Suministro y colocación																																				$ -					
4.04.01	Malla electrosoldada 4mm y abertura de 0,15m x 0,15m	m²	840,00	$37.001,00	$31.080.840,00																					840,00	$ 31.080.840,00	840,00	$ 31.080.840,00	100,00%		$ -	840,00	$ 31.080.840,00	100,00%						
4.05	Suministro e instalación de platina de 200mm x 200mm x 12mm con tres agujeros	und	144,00	$82.440,00	$11.871.360,00																																	144,00	$ 11.871.360,00	144,00	$ 11.871.360,00	100,00%
4.06	Suministro e instalación de popora de 3 agujeros conicos para cuña de Ø=1/2"	und	144,00	$158.039,00	$22.757.616,00																																	144,00	$ 22.757.616,00	144,00	$ 22.757.616,00	100,00%
4.07	Suministro e instalación de kit de cuñas de Ø= 1/2" para anclaje	und	144,00	$96.886,00	$13.951.584,00																																	144,00	$ 13.951.584,00	144,00	$ 13.951.584,00	100,00%
				SUBTOTAL SECCIÓN CUARTA:	$314.422.390,00		$ -		$ -	0,00%		$ 26.044.224,00		$ 26.044.224,00	8,28%		$ 49.918.096,00		$ 75.962.320,00	24,16%		$ 85.696.633,60		$ 161.658.953,60	51,41%		$ 95.929.186,24		$ 257.588.139,84	81,92%		$ -		$ 257.588.139,84	81,92%		$ 56.823.120,00		$ 314.411.259,84	100,00%
SECCIÓN QUINTA																																								
5.00	Perforaciones horizontales																																							
5.04	Ejecución perforaciones horizontales en taludes con pendientes mayores a 1:1 (en roca) con equipo de perforación descolgado para anclajes de 0,00m a 15,00m	m	2.160,00	$510.989,00	$1.103.736.240,00						360,00	$ 183.956.040,00	360,000	$ 183.956.040,00	16,67%	690,00	$ 352.582.410,00	1050,00	$ 536.538.450,00	48,61%	780,00	$ 398.571.420,00	1830,00	$ 935.109.870,00	84,72%	330,00	$ 168.626.370,00	2160,0	$ 1.103.736.240,00	100,00%		$ -	2160,00	$ 1.103.736.240,00	100,00%		$ -	2160,00	$ 1.103.736.240,00	100,00%
5.05	Ejecución de perforaciones horizontales en taludes con pendientes mayores a 1:1 (en roca) con equipo de perforación descolgado para anclajes mayores a 15,00m	m	1.440,00	$585.973,00	$843.801.120,00						240,00	$ 140.633.520,00	240,000	$ 140.633.520,00	16,67%	460,00	$ 269.547.580,00	700,0	$ 410.181.100,00	48,61%	520,00	$ 304.705.960,00	1220,00	$ 714.887.060,00	84,72%	220,00	$ 128.914.060,00	1440,0	$ 843.801.120,00	100,00%		$ -	1440,00	$ 843.801.120,00	100,00%		$ -	1440,00	$ 843.801.120,00	100,00%
				SUBTOTAL SECCIÓN QUINTA:	$1.947.537.360,00		$ -		$ -	0,00%		$ 324.589.560,00		$ 324.589.560,00	16,67%		$ 622.129.990,00		$ 946.719.550,00	48,61%		$ 703.277.380,00		$ 1.649.996.930,00	84,72%		$ 297.540.430,00		$ 1.947.537.360,00	100,00%		$ -		$ 1.947.537.360,00	100,00%		$ -		$ 1.947.537.360,00	100,00%
SECCIÓN SEXTA																																								
6.00	Varios																																							
6.02	Canaleta (ancho = 1m; e =10cm)	m	132,00	$134.615,00	$17.769.180,00																45,60	$ 6.138.444,00	45,60	$ 6.138.444,00	34,55%		$ -	45,60	$ 6.138.444,00	34,55%	76,00	$ 10.230.740,00	121,60	$ 16.369.184,00	92,12%		$ -	121,60	$ 16.369.184,00	92,12%
6.04	Estructura de disipación de energia	m	14,00	$634.862,00	$8.888.068,00																										0,00		14,00	$ 8.888.068,00	100,00%		$ -	14,00	$ 8.888.068,00	100,00%
6.06	Sistema de abatimiento para lineas hidráulicas de infiltración interna y protección del trasdós de la estructura estabilizadora	m	408,00	$75.174,00	$30.670.992,00																					408,00	$ 30.670.992,00	408,00	$ 30.670.992,00	100,00%		$ -	408,00	$ 30.670.992,00	100,00%		$ -	408,00	$ 30.670.992,00	100,00%
				SUBTOTAL SECCIÓN SEXTA:	$57.328.240,00		$ -		$ -			$ -		$ -			$ -		$ -			$ 6.138.444,00		$ 6.138.444,00			$ 30.670.992,00		$ 36.809.436,00			$ 19.118.808,00		$ 55.928.244,00			$ -		$ 55.928.244,00	
	Presupuesto Costos directos				$3.176.284.620,57		$17.711.535,16		$17.711.535,16	0,56%		$720.588.976,13		$738.300.511,29	23,24%		$718.445.329,89		$1.456.745.841,18	45,86%		$836.303.606,29		$2.292.584.925,23	72,18%		$450.804.439,52		$2.743.853.887,39	86,39%		$371.755.932,32		$3.115.609.819,71	98,09%		$57.865.704,93		$3.173.475.524,64	99,91%
	Administración:			24%	$762.308.308,94		$4.250.768,44		$4.250.768,44			$172.941.354,27		$177.192.122,71			$172.426.879,17		$349.619.001,87			$200.712.865,51		$550.220.382,05			$108.193.065,58		$658.524.932,96			$89.221.423,76		$747.746.356,72			$13.887.769,18		$761.634.125,90	
	Imprevistos			1%	$31.762.846,21		$177.115,35		$177.115,35			$7.205.889,76		$7.383.005,11			$7.184.453,30		$14.567.458,41			$8.363.036,08		$22.925.849,25			$4.508.044,40		$27.438.538,87			$3.717.559,32		$31.156.098,19			$578.657,69		$31.734.755,25	
	Utilidades:			5%	$158.814.231,03		$885.576,76		$885.576,76			$36.029.448,81		$36.915.025,56			$35.922.266,49		$72.837.292,06			$41.815.180,31		$114.629.246,36			$22.540.222,00		$137.192.694,37			$18.587.796,62		$155.780.490,99			$2.893.285,24		$158.673.776,23	
	A.I.U.			30%	$952.885.386,18		$5.313.460,55		$5.313.460,55			$216.176.692,84		$221.490.153,38			$215.533.598,96		$437.023.752,34			$250.891.081,88		$687.775.477,56			$135.241.331,90		$823.156.166,20			$111.526.779,70		$934.682.945,90			$17.359.711,47		$952.042.657,38	
	I.V.A.			19%	$30.174.703,90		$168.259,58		$168.259,58			$6.845.595,27		$7.013.854,86			$6.825.230,63		$13.839.085,49			$7.944.884,26		$21.779.556,79			$4.282.642,18		$26.066.611,93			$3.531.681,39		$29.598.293,29			$549.724,26		$30.148.017,48	
	Presupuesto total de obra				**$4.159.344.710,65**		**$23.193.255,29**		**$23.193.255,290**	**0,56%**		**$943.611.264,24**		**$966.804.519,53**	**23,24%**		**$940.804.159,48**		**$1.907.608.679,01**	**45,86%**		**$1.095.139.572,45**		**$3.002.139.959,58**	**72,18%**		**$590.328.414,08**		**$3.593.076.665,52**	**86,39%**		**$486.814.393,38**		**$4.079.891.058,90**	**98,09%**		**$75.775.140,60**		**$4.155.666.199,50**	**99,91%**
							0,56%		0,56%			22,69%		23,24%			22,62%		45,86%			26,33%		72,18%			14,19%		86,39%			11,70%		98,09%			1,82%		99,91%	

8. INFORME GENERAL DE ESTADO DEL TIEMPO

Durante el período evaluado, en el área de ejecución del proyecto no se registraron eventos de precipitación. Las condiciones meteorológicas se mantuvieron estables, con predominio de cielo despejado durante la totalidad de las jornadas laborales, lo cual permitió el desarrollo continuo de las actividades sin interrupciones y conforme a la programación establecida.

Estas condiciones climáticas favorables contribuyeron al adecuado avance de las obras y al cumplimiento de los hitos previstos para su entrega. No obstante, debido a las altas temperaturas registradas, se implementaron medidas preventivas de seguridad y salud en el trabajo, tales como pausas activas y periodos de hidratación para el personal en obra, garantizando así condiciones laborales seguras y la continuidad operativa del proyecto.

En consecuencia, el desarrollo de las actividades contractuales se ejecutó de manera eficiente, permitiendo avanzar satisfactoriamente hacia la entrega programada para el 14 de abril de 2026.**Ver anexo 6 Estado del tiempo**



9. PROGRAMA DE GERENCIA

El presente documento corresponde al Informe del Programa de Gerencia del Proyecto, implementado y actualizado en el marco de la ejecución contractual. En él se consolida la información de seguimiento desde las distintas áreas de conocimiento de la gestión de proyectos, indicadores de desempeño, análisis de desviaciones y trazabilidad de la ejecución.

El informe describe el comportamiento del proyecto conforme a los lineamientos establecidos en el estándar del Project Management Institute –PMBOK®, Séptima Edición, constituyéndose en un instrumento de control y soporte para la toma de decisiones durante el desarrollo de la obra. **Ver. Anexo No.08 Informe de avance de gerencia**

10. CONCLUSIONES.

- Durante la etapa final del proceso de estabilización, y una vez verificado mediante ensayos que el concreto alcanzó la resistencia a la compresión especificada en diseño, se ejecutaron satisfactoriamente las actividades de tensionamiento en cada punto de anclaje. Este proceso incluyó la instalación y ajuste de los elementos correspondientes (platinas, polainas y cuñas), la aplicación de la carga de diseño y el registro de las elongaciones obtenidas en cada anclaje, conforme a los procedimientos técnicos establecidos. Los resultados fueron consignados en los formatos de control anexos al presente informe, evidenciando que la mayoría de los anclajes se encuentran dentro de los rangos óptimos definidos en los estudios y diseños.

- Al cierre del mes de abril, se registra un avance físico acumulado del 100%, con fecha de terminación de las obras el 14 de abril de 2026, en concordancia con el plazo contractual establecido. Se destaca el cumplimiento de la programación y la adecuada calidad en la ejecución y terminación de las actividades.

- Las obras fueron ejecutadas en su totalidad conforme al alcance contractual, siendo recibidas a satisfacción por la interventoría, quien verificó el cumplimiento de las especificaciones técnicas, así como el correcto funcionamiento de las soluciones implementadas. De igual manera, se solicita el proceso administrativo correspondiente a la suscripción del acta de recibo definitivo de obra con la entidad contratante, formalizando el cumplimiento del objeto contractual con fecha 14 de abril de 2026. Se deja constancia de que las pólizas actualizadas con corte al acta de recibo definitivo fueron debidamente suscritas y se encuentran en trámite de entrega.

- Las actividades complementarias, tales como la elaboración de actas de vecindad finales y la siembra de árboles correspondientes a la compensación forestal, se programaron para la semana comprendida entre el 12 y el 17 de abril de 2026. Las respectivas evidencias serán incorporadas en el informe de liquidación del contrato.

- Se gestionó la obtención de la paz y salvos correspondientes, así como la liquidación y recibo a satisfacción por parte de proveedores, personal vinculado y demás actores contractuales. Esta documentación será anexada como soporte dentro del proceso de liquidación del contrato.

11. ANEXOS

- ANEXO No. 1: Bitácora de Obra
- ANEXO No. 2: Seguridad Social
- ANEXO No. 3: Informe PASA
- ANEXO No. 4: Actividades SST
- ANEXO No. 5: Seguimiento plan de calidad
- ANEXO No. 6: Estado del tiempo
- ANEXO No. 7: Actas de comité
- ANEXO No. 8: Informe de avance de gerencia
- ANEXO No. 9: Evidencia hoja de visita
- ANEXO No.10: Control de tensionamiento

ANEXO No.01: BITACORA DE OBRA

confirmado la terraza con instalación de abono y semilla.
Se realiza actividades menores de obra para dejar organizado para antes de semana santa
- Personal: (2) Ingenieros Residentes; (1) SST; (1) Almacenista (1) Topografo; (1) Oficial; 6) Ayudantes
- Equipo: Mezcladora

30 de marzo del 2026
Estado del tiempo: Soleado
- Descripción: Se inician actividades de conformación de terraza generada por medio de las obras ineivendas. Se realiza bordillo en las peatonales con el fin de restringir cualquier sedimento. Se continua con el riego de abono en la zona de la terraza
- Personal: (2) Ingenieros Residentes; (1) SST; (1) Almacenista; (1) Oficial (6) Ayudantes; (1) Director de obra, (1) Ingeniera Ambiental
- Equipo: (1) Tiompo; (1) Estación total

paula Alguado

Melissa D.

31 de Marzo del 2026
- Estado del tiempo: Soleado
- Descripción Se inician actividades de construcción de bordillo perimetral en cada peatonal, dejando un terminado liso e instalando lloraderos para el desague del agua, y por solicitud de la comunidad se dejan rampas para el ingreso de motocicletas
- Personal: (2) Ingenieros Residentes; (1) SST; (1) Almacenista; (1) Topografo; (1) Oficial; (6) Ayudantes
- Equipo: Estación Topografica; (1) mezcladora

paula Alguado

01 de Abril del 2026
- Estado del tiempo Soleado
- Descripción. Se inician actividades de conformación de terraza en la parte baja del talud. Se replantea, se nivela y se compacta el terreno suelto presente. Se realizan actividades de inventario, orden y aseo para poder salir a receso de semana

Santa. Se retira maquinaria y materiales para dejar despejado el frente de obra, limpio, guardado y organizado

- Personal: (2) Ingenieros Residentes; (1) SST; (1) Almacenista; (1) Topografo (1) Oficial; (6) Ayudantes
- Equipo: N/A

02, 03, 04 y 05 de Abril (Semana Santa)

Observaciones: Se descansa estos días

06 de Abril del 2026

- Estado del tiempo: Soleado
- Descripción: Se inician actividades de conformación de terraza, se perfila el talud existente, se retira el material sobrante. Se instala y se riega abono con semilla para dejar un ambiente armonioso y ambientalista. Se retira el cerramiento perimetral que se había realizado previamente.
- Personal: (2) Ingenieros Residentes, (1) SST; (1) Almacenistas (1) Oficial; (6) Ayudantes de obra; (1) Director de obra
- Equipo: N/A

paulo edgardo Melissa D

07 de Abril del 2026

- Estado del tiempo: Soleado
- Descripción: Se inician actividades de fundido de cunetera en la zona posterior al lanzado con el objetivo de canalizar el agua. Se deja un buen terminado y se inicia con actividades de excavación y fundida de caja de inspección. Actividades sociales que se le realizan a la comunidad y que no son contractuales.
- Personal: (2) Ingenieros Residentes; (1) SST; (1) Almacenista; (1) Topografo; (1) Oficial; (6) Ayudantes
- Equipo (1) Mezcladora

paulo edgardo

08 de Abril del 2026

•Estado del tiempo: Soleado

• Descripción: Se inician actividades de fundida de caja de inspección el cual va a recolectar las aguas lluvias que se presentan en la zona donde no hubo estabilización, con el objetivo de ayudar a la comunidad en las filtraciones y empozamientos que se presentaban. Se continua con la fundida de canaleta

•Personal: (2) Ingenieros Residentes; (1) SST; (1) Almacenista; (1) Topografo; (1) Oficial; (6) Ayudantes

•Equipo: (1) Mezcladora

09 de Abril del 2026

•Estado del tiempo: Soleado

•Descripción: Se inician actividades de tensionamiento de anclajes con ayuda del gato de tensionamiento instalando previamente la platina, la poperia y la cuña de tres agujeros. Se le aplica la presión respectiva en los estudios y diseños, dejando un terminado correcto. Se realiza un control técnico registrando su elongación física como resultado del tensionamiento en cada anclaje.

•Personal: (2) Ingenieros Residentes; (1) SST; (1) Almacenista; (1) Topografo; (1) Oficial; (1) Operador; (6) Ayudantes

•Equipo: Unidad de tensionamiento

10 de Abril del 2026

•Estado del tiempo: Soleado

•Descripción: Durante la última etapa del proceso de estabilización y después de haber obtenido los resultados de las resistencias del concreto, se procede a realizar la instalación de la platina, poperia y cuña correspondiente en cada punto de anclaje, y realizar así el tensionamiento. Se utiliza un gato tensor Monotaron, el cual cuenta con un amperímetro para controlar la tensión

•Personal: (2) Ingenieros Residentes; (1) SST; (1) Almacenista; (1) Oficial (6) Ayudantes; (1) Operador.

Equipo: Unidad de tensionamiento

11 de Abril del 2026

•Estado del tiempo: Soleado

•Descripción: Se inician actividades de instalación de platina, paparia y cuña en cada punto de anclaje, asegurandola y nivelandola en su sitio. Se procede al proceso de tensionamiento controlando por medio de manometro la tensión aplicado y se registra la elongación presentada. Se realizo la actividad extendiendo el horario laboral junto con el Personal de obra para poder cumplir con los tiempos.

•Personal: (2) Ingenieros Residentes; (1) SST; (1) Almacenista; (1) Oficial (1) Maestro; (1) Operador; (6) Ayudantes

•Equipo: Unidad de tensionamiento

13 de Abril del 2026

•Estado del tiempo: Soleado

•Descripción: Se inician actividades de tensionamiento en los ultimos anclajes de la pantalla, instalando previamente la platina, paparia y cuñas. Se aplica la carga respectiva en cada anclaje y se lleva un control técnico para registrar la elongación respectiva. Se termino los terminados de las canaletas y disipador de energia realizando sus respectivas tapas. Se inicia proceso de limpieza y conformación de la terraza con el objetivo de realizar su debido entrega. Se comienza a lavar las casas aledañas a la obra para realizarles su limpieza y resane

•Personal: (2) Ingenieros Residentes; (1) SST; (1) Almacenista; (1) Topografo (1) maestro; (6) Ayudantes; (1) Oficial; (1) Director de obra; (1) Trabajadora Social; (1) Ingeniera Ambiental

•Equipo: (1) hidrolavadora; (1) Estación Total; (1) unidad de tensionamiento; (1) mezcladora;

14 de Abril del 2026

•Estado del tiempo: Soleado

-Descripción: Se dio inicio a actividades de tensionamiento en los anclajes faltantes, se instala la platina, paparia y cuña y se le aplica la

caiga correspondiente, se registra un control técnico y se lleva el resultado de su elongación. Se realizan actividades de siembra en el frente de obra en la terraza detenida, se realiza el ahoyado con previa marcación de los huecos, se aplica hidroretenedor y abono para la para del arbol, seguido de la siembra del arbol se le instala nuevamente abono y sustrato. Se realiza el mismo procedimiento en cada arbol sembrado. Se continua con la fundida de protección de los cilindros con tubería de 3" para dejar un terminado armonioso. Se instalar las tapas de las cajas y se comienza a hacer aseo. Se revisa las cuencas del agua número 4, se observa las obras locativas de la zona aledaña. Se verifica la entrega del acueducto construido para medio de captación de agua superficial. Se verifica el estado de los arboles. Se registra visita de la COMB para realizar la entrega respectiva

- Personal: (2) Ingenieros Residentes; (1) SST; (2) Ingenieras Ambientales (1) Director de obra; (1) Almacenista; (1) Topografo; (1) Maestro; (1) Ayudante; (1) Contratista de la COMB
- Equipo: (1) Unidad de herramientas para jagueado.

Melissa Dorado

ANEXO No.02: SEGURIDAD SOCIAL

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-04-14, 05:01:12 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1081281840

Periodo Cotización: abril de 2026 **Periodo Servicio:** mayo de 2026

PAGADO 14/04/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSORCIO CONSOLIDACION GIRON		
Documento	NI901982571	**Dirección**	CR 39 #51 - 31 AP 2405
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3012765665
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal	PADIERNA CASTIBLANCO JOHANNA MARCELA	**Identificación**	CC 1098682052
Total Afiliados	8	**ARP**	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1005157855	GIOVANY SEBASTIAN PARRA FERRER	01	00		X								X							0	10	10	10	10	(230301) PORVENIR	$ 663.222	$ 106.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 663.222	$ 26.600	6,960	$ 663.222	$ 46.200	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 576.622	$ 23.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 202.100
CC 1005157855	GIOVANY SEBASTIAN PARRA FERRER	01	00														X			0	5	5	5	5	(230301) PORVENIR	$ 296.293	$ 47.500	(EPS005) EPS SANITAS	$ 296.293	$ 11.900	0,000	$ 296.293	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 291.818	$ 11.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 71.100
CC 1082871247	MANUEL ENRIQUE CASTILLO FLOREZ	01	00		X								X							0	10	10	10	10	(230301) PORVENIR	$ 749.176	$ 119.900	(ESSC24) EPS-S COOSALUD	$ 749.176	$ 30.000	6,960	$ 749.176	$ 52.200	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 729.279	$ 29.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 231.300
CC 1082871247	MANUEL ENRIQUE CASTILLO FLOREZ	01	00														X			0	5	5	5	5	(230301) PORVENIR	$ 301.766	$ 48.300	(ESSC24) EPS-S COOSALUD	$ 301.766	$ 12.100	0,000	$ 301.766	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 291.818	$ 11.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 72.100
CC 1098605491	EDSON ALEXANDER PORTILLA ARDILA	01	00		X								X							0	10	10	10	10	(230301) PORVENIR	$ 719.697	$ 115.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 719.697	$ 28.800	6,960	$ 719.697	$ 50.100	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 649.141	$ 26.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 220.100
CC 1098605491	EDSON ALEXANDER PORTILLA ARDILA	01	00														X			0	5	5	5	5	(230301) PORVENIR	$ 321.165	$ 51.400	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 321.165	$ 12.900	0,000	$ 321.165	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 316.667	$ 12.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 77.000
CC 1101520618	JESUS ALBERTO MAYORGA MAYORGA	01	00										X							0	25	25	25	25	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.669.396	$ 267.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.669.396	$ 66.800	6,960	$ 1.669.396	$ 116.200	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.669.396	$ 66.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 517.000
CC 1101520618	JESUS ALBERTO MAYORGA MAYORGA	01	00														X			0	5	5	5	5	(25-14) COLPENSIONES	$ 310.057	$ 49.700	(EPS005) EPS SANITAS	$ 310.057	$ 12.500	0,000	$ 310.057	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 291.818	$ 11.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 73.900
CC 1101596200	ISAIAS GARCIA JAIMES	01	00		X															0	13	13	13	13	(230301) PORVENIR	$ 796.662	$ 127.500	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 796.662	$ 31.900	6,960	$ 796.662	$ 55.500	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.036.830	$ 41.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 256.400
CC 1101596200	ISAIAS GARCIA JAIMES	01	00														X			0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 128.831	$ 20.700	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 128.831	$ 5.200	0,000	$ 128.831	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 122.564	$ 5.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 30.900
CC 1124048478	MIGUEL ANTONIO RANGEL FLORIAN	01	00		X								X							0	10	10	10	10	(230301) PORVENIR	$ 663.222	$ 106.200	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 663.222	$ 26.600	6,960	$ 663.222	$ 46.200	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 712.953	$ 28.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 207.600
CC 1124048478	MIGUEL ANTONIO RANGEL FLORIAN	01	00														X			0	5	5	5	5	(230301) PORVENIR	$ 296.792	$ 47.500	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 296.792	$ 11.900	0,000	$ 296.792	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 291.818	$ 11.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 71.100
CC 1232891906	JARRINSON STEVEN CAMARON CAICEDO	01	00		X								X							0	10	10	10	10	(230301) PORVENIR	$ 769.072	$ 123.100	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 769.072	$ 30.800	6,960	$ 769.072	$ 53.600	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 819.144	$ 32.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 240.300
CC 1232891906	JARRINSON STEVEN CAMARON CAICEDO	01	00														X			0	5	5	5	5	(230301) PORVENIR	$ 291.818	$ 46.700	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 291.818	$ 11.700	0,000	$ 291.818	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 291.818	$ 11.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100
CC 91479571	WILLINGTONG ALARCON ASCANIO	01	00		X								X							0	10	10	10	10	(230301) PORVENIR	$ 673.170	$ 107.800	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 673.170	$ 27.000	6,960	$ 673.170	$ 46.900	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 655.811	$ 26.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000
CC 91479571	WILLINGTONG ALARCON ASCANIO	01	00														X			0	5	5	5	5	(230301) PORVENIR	$ 295.134	$ 47.300	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 295.134	$ 11.900	0,000	$ 295.134	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 291.818	$ 11.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.900

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 8.945.473	$ 8.945.473	$ 8.945.473	$ 9.039.315	$ 1.432.200	$ 358.600	$ 466.900	$ 362.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.619.900	$ 0	$ 2.619.900

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-04-14, 05:00:37 PM **Tipo Planilla:** Y: PLANILLA INDEPENDIENTES EMPRESAS **Numéro Planilla:** 1081282725

Periodo Cotización: abril de 2026 **Periodo Servicio:** abril de 2026

PAGADO 14/04/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSORCIO CONSOLIDACION GIRON		
Documento	NI901982571	**Dirección**	CR 39 #51 - 31 AP 2405
Tipo de Empresa	CONTRATANTE	**Teléfono**	3012765665
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal	PADIERNA CASTIBLANCO JOHANNA MARCELA	**Identificación**	CC 1098682052
Total Afiliados	3	**ARP**	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1095700657	MARIA LUCIA HIGUERA PINO	59	00		T															0	0	0	15	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	6,960	$ 875.453	$ 61.000	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 61.000
CC 1098618429	JOHANA PAOLA OSPINO RODELO	59	00		T															0	0	0	15	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	6,960	$ 875.453	$ 61.000	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 61.000
CC 80089079	JUAN CARLOS RINCON LOZANO	59	00		T															0	0	0	15	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	6,960	$ 875.453	$ 61.000	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 61.000

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 0	$ 0	$ 2.626.359	$ 0	$ 0	$ 0	$ 183.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 183.000	$ 0	$ 183.000

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

ANEXO No.03: INFORME AMBIENTAL

INFORME DE CUMPLIMIENTO
PLAN DE ACCION SOCIO AMBIENTAL

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN EL TALUD ORIENTAL DEL BARRIO VILLA DE LOS CABALLEROS EN EL MUNICIPIO DE GIRÓN, DEPARTAMENTO DE SANTANDER (RA-OBRA-02).”

ELABORADO POR:
CONSORCIO CONSOLIDACION GIRON

GIRON

01 AL 14 DE ABRIL

2026

1. CONSIDERACIONES GENERALES

1.1 INTRODUCCION

El presente documento, corresponde a la información obtenida por el **CONSORCIO CONSOLIDACION GIRON** durante la ejecución de las obras de intervención correctiva requeridas para mitigar el riesgo por movimientos en masa mediante la construcción de pantallas ancladas y obras de mitigación y consolidación para el control de la erosión en el talud oriental del Barrio Villa de Los Caballeros en el Municipio de Girón, Departamento de Santander (RA-Obra-02); teniendo claro que el proyecto no requiere de trámite de Licencia Ambiental, el CONSORCIO CONSOLIDACION GIRON en cumplimiento de su responsabilidad ambiental aplica los programas basados en los lineamientos establecidos en el Manual de Gestión Socio Ambiental para obras de construcción, el cual establece el Plan de Acción Socio Ambiental para proyectos que no requieren licenciamiento Ambiental.

El objetivo del Plan de acción socio ambiental, es definir las medidas de prevención y/o corrección de los impactos negativos directos e indirectos que se puedan generar durante las etapas de desarrollo de la obra, teniendo como base, las características del área y las actividades a realizar para cumplir con las especificaciones del proyecto, en el cual se dispone que el desarrollo del mismo mejorara la calidad de vida de los habitantes del área de influencia indirecta de la obra.

El Plan de acción se encuentra enmarcado en la normatividad legal vigente en el país, que requiere imponer una práctica apropiada del manejo del espacio físico y de todos sus recursos naturales, tratando de conservar, mejorar y recuperar la calidad ambiental que conlleva al desarrollo sustentable del área a intervenir.

Todos los proyectos que se desarrollan en el Departamento de Santander deben realizarse dentro de un marco de actuación respetuoso con el ambiente, garantizando el uso racional, sostenible de los recursos naturales renovables, que intervienen y que deben incluir, para la ejecución, la presentación del plan de acción socio ambiental a las Autoridades que lo exijan según el marco de sus competencias.

Para la ejecución de este proyecto, se hace indispensable el cumplimiento de la normativa establecida por la autoridad ambiental y la legislación correspondiente; por lo cual se busca disponer de las acciones de la ley 99 de 1993 para el manejo ambiental de los proyectos como parte del buen ejercicio de la ingeniería.

En este sentido, el Plan de acción socio ambiental, propone con el presente documento, la orientación en el cumplimiento de las normas ambientales, con el fin de ejercer control antes, durante y después de la ejecución de las obras civiles necesarias para construir y mejorar las áreas que se puedan ver afectadas con el desarrollo del proyecto.

La aplicación de las medidas planteadas en este Plan, optimizarán el uso racional y el usufructo de los recursos naturales en este sector, ayudarán a mejorar la gestión ambiental al interior de la ejecución de la obra, con el desarrollo de los programas establecidos según las necesidades y dinámica propia del proyecto, proporcionando el mejoramiento de la calidad de vida del entorno social, otorgando una mejor comprensión de la variable

ambiental en la ejecución del proyecto por parte del ejecutor, el cual es completamente conscientes de su significado e importancia.

Por último, se busca, unificar y armonizar los lenguajes ingenieril y ambiental, de tal manera que las actividades desarrolladas en el proyecto, sean compatibles con el entorno en el cual se ejecutan y de esta manera permitir la sostenibilidad de los recursos naturales, acorde con los lineamientos consagrados en la Constitución Nacional, la ley 99 de 1993 y demás normatividad para la protección del medio ambiente.

El objetivo principal de este Plan de Acción es formular los mecanismos que permitan aplicar oportunamente una medida, bien sea de manejo, prevención, mitigación, control, protección, vigilancia o compensación, en las áreas de interés humano y ecológico para la zona de influencia del proyecto.

Los principales aspectos relacionados con el manejo y protección ambiental que se deben considerar para la ejecución del proyecto, son los siguientes programas:

1. PROGRAMA PARA EL MANEJO DE RESIDUOS
2. PROGRAMA CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS
3. PROGRAMA USO Y ALMACENAMIENTO ADECUADO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
4. PROGRAMA PROTECCIÓN DEL SUELO – PREVENCIÓN DE PROCESOS EROSIVOS Y CONTROL SOBRE LA ESCORRENTÍA.
5. PROGRAMA PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DE CUERPOS DE AGUA Y REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS
6. PROGRAMA PARA EL MANEJO DE LA VEGETACION LA FAUNA Y EL PAISAJE.
7. PROGRAMA DE SEÑALIZACION
8. PROGRAMA DE ADECUACION DE CAMPAMENTOS.
9. PROGRAMA DE GESTION SOCIAL

Las medidas de manejo ambiental que se presentan a continuación, corresponden a las acciones que se implementaron para controlar, mitigar, prevenir y/o compensar los diferentes impactos que se pueden presentar con la ejecución con la construcción de las obras de mitigación y consolidación para el control de la erosión en el Talud Oriental del Barrio Villa de Los Caballeros en el Municipio de Girón, Departamento de Santander (RA-Obra-02).”

1.2 OBJETIVOS

1.2.1 Objetivo General

Implementar las medidas de manejo que se deben aplicar en el desarrollo de las actividades de la construcción de obras de mitigación y consolidación para el control de la erosión en el talud oriental del Barrio Villa de Los Caballeros en el Municipio de Girón, Departamento de Santander (Ra-Obra-02); con el fin de prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos o afectaciones que se pueden generar sobre los recursos naturales y el medio ambiente y así mismo realizar una adecuada gestión social en la población influenciada directamente por el proyecto.

1.2.2 Objetivos específicos

- Implementar las medidas de manejo ambiental para prevenir, mitigar, corregir y/o compensar los impactos identificados y analizados para el proyecto.

- Lograr satisfactoriamente el cumplimiento de los indicadores de seguimiento y monitoreo para las medidas de manejo planteadas.

2. INFORME MENSUAL

En el desarrollo de Construcción de las obras de mitigación y consolidación para el control de la erosión en el talud oriental del barrio villa de los caballeros en el municipio de Girón, departamento de Santander (RA-OBRA-02)", busca fomentar la educación ambiental e implementar políticas y acciones enfocadas al desarrollo sostenible dando cumplimiento a la normatividad ambiental vigente.

El presente informe está contemplado desde el 01 al 14 de Abril de 2026; se tiene en cuenta que en este primer periodo de ejecución se realizaron las siguientes actividades:

- ✓ Replanteo, control y medición de la obra
- ✓ Tensionamiento de anclajes
- ✓ Suministro e instalación de platina de 200mm x 200mm x 12mm con tres agujeros
- ✓ Suministro e instalación de popora de 3 agujeros cónicos para cuña de Ø=1/2"
- ✓ Suministro e instalación de kit de cuñas de Ø=1/2" para anclaje.

3. PROGRAMAS IMPLEMENTADOS EN EL CUMPLIMIENTO DEL MANEJO AMBIENTAL.

Las medidas de manejo ambiental que se presentan a continuación, corresponden a las acciones que se implementaron para controlar, mitigar, prevenir y/o compensar los diferentes impactos que se pueden presentar con la Construcción de las obras de mitigación y consolidación para el control de la erosión en el talud oriental del barrio villa de los caballeros en el municipio de Girón, departamento de Santander (RA-OBRA-02)", Las medidas ejecutadas abordan los aspectos físicos, bióticos y sociales que pueden ser impactados por el proyecto con el cumplimiento de sus indicadores para su seguimiento y monitoreo, además de los proyectos relacionados con la aplicación de la gestión ambiental.

Los principales aspectos relacionados con el manejo y protección ambiental que se consideran para la ejecución del proyecto, son:

3.1 PROGRAMA PARA EL MANEJO DE RESIDUOS

PROGRAMA PARA EL MANEJO DE RESIDUOS							PASA -01
OBJETIVO							
Prevenir y controlar la contaminación de los recursos: agua, suelo y aire, así como la afectación a la salud de las personas, mediante un manejo integral de los residuos sólidos convencionales y especiales que se generan durante el desarrollo de la obra.							
TIPO DE MEDIDA							
Control	X	Prevención	X	Mitigación		Compensación	
BENEFICIOS							
A través de un adecuado manejo de los residuos de la obra se logra: • Reducir la generación de emisiones atmosféricas. • Prevenir el aporte de sólidos en las redes de alcantarillado y corrientes superficiales. • Reducir el impacto visual de la obra y minimizar el área de afectación por presencia de residuos o escombros. • Minimizar las necesidades de transporte de residuos. • Asegurar el buen funcionamiento de las escombreras y maximizar su vida útil. • Reducir costos financieros. • Optimizar la administración de materiales. • Reducir riesgos inherentes al almacenamiento de residuos.							
• ACCIONES A EJECUTAR							
Durante las actividades de de intervención correctiva mediante la construcción de pantallas ancladas para mitigar el riesgo por deslizamiento y movimiento, se generarán diferentes tipos de residuos los cuales se consideran domésticos, reciclables y de disposición especial o peligrosa, los cuales recibirán el tratamiento adecuado.							

A continuación, se describe el procedimiento aplicado con el fin de dar cumplimiento al manejo integral de residuos sólidos, con lo cual se busca minimizar los impactos temporales que se puedan generar por su inadecuado manejo, estas son:

- Clasificar y reducir en la fuente.
- Recolectar y almacenar temporalmente.
- Disposición final adecuada.

Los residuos sólidos generados durante el proceso de construcción son de diversa naturaleza. Una adecuada gestión y clasificación de estos residuos resulta fundamental para identificar materiales que pueden ser reciclados o reutilizados, minimizando así la cantidad de desechos no aprovechables y favoreciendo prácticas más sostenibles en el desarrollo de las actividades; de esta forma, se reducen costos de disposición final, se optimiza el uso de los materiales y se alcanza un menor impacto ambiental.

Los residuos sólidos generados durante el periodo correspondiente del 01 al 14 de Abril de 2026, teniendo en cuenta las actividades del periodo son:

RESIDUOS ORDINARIOS	RESIDUOS RECICLABLES
3.2 Kg	1.5 Kg

(Ver Anexo No 1. Manejo de Residuos Sólidos)

En el periodo de ejecución se realizó la clasificación de los residuos sólidos generados en la ejecución de la obra, los cuales son dispuestos temporalmente en el punto ecológico adaptado, y posteriormente son entregados a la empresa de servicio de recolección de aseo de Girón (Veolia); esta empresa es responsable de la recolección y el transporte de residuos sólidos en la ciudad, de acuerdo con las rutas de recolección de aseo, son transportados y finalmente dispuestos en el relleno sanitario El Carrasco, único sitio autorizado a nivel regional para la disposición final de residuos sólidos, sitio que opera bajo la figura de emergencia sanitaria.

Generación de residuos reciclables.
En el periodo relacionado se generaron **1.5 Kg** de residuos sólidos reciclables, los cuales se encuentran en almacenamiento temporal hasta tener un volumen considerable para ser entregados a una empresa legalmente constituida para realizar el aprovechamiento de este tipo de residuos, promoviendo así la economía circular y reduciendo la cantidad de residuos enviados a los rellenos sanitarios. Este proceso facilita la reincorporación de los materiales reciclables en la cadena productiva, contribuyendo de manera significativa a la sostenibilidad y al cumplimiento de las políticas de gestión integral de residuos sólidos.

Generación de residuos sólidos especiales
En el periodo relacionado no se generaron residuos sólidos peligrosos, cuando se generen residuos peligrosos, estos serán entregados a un gestor autorizado para realizar su tratamiento y disposición final adecuada.

Manejo de material sobrante y RCD
De acuerdo con la planificación de la obra, durante el periodo de ejecución relacionado no se realizaron, actividades generadoras de RCD´s ni material sobrante.

Actividades de Capacitación

En el periodo relacionado se realizó capacitación en manejo y entrega adecuada de los residuos sólidos derivados del desmantelamiento de áreas de campamento y finalización de obra. (ver anexo No 2. Registro de Asistencia a capacitación).





Jornadas de orden y aseo





Actividades de Capacitación Ambiental

ETAPA			
PRECONSTRUCCIÓN		OPERACIÓN	X
CONSTRUCCIÓN	X	DESMANTELAMIENTO	X
LUGAR DE APLICACIÓN			
Frentes de obra Villa de Los Caballeros			

CRONOGRAMA DE EJECUCION

ACTIVIDADES	MESES DE EJECUCIÓN						
	1	2	3	4	5	6	7
Manejo para separación en la fuente de residuos sólidos							
Recolección de Residuos ordinarios y disposición final							
Recolección de residuos reciclables y especiales con disposición final							

–

RESPONSABLE DE LA EJACUCION

CONSORCIO CONSOLIDACION GIRON

Indicador

- Volumen de residuos ordinarios
- Volumen de residuos especiales
- Volumen de residuos reciclables

Descripción del Indicador

Cantidad de residuos ordinarios generados en la obra

Indicador de calificación

- Volumen residuos entregados gestor ambiental / Volumen residuos generados en el periodo X 100

3.2 / 3.2 *100 = 100%

- Volumen de RESPEL entregados a empresa autorizada/ Volumen RESPEL generado en el periodo X 100

No aplica, no se generaron residuos peligrosos

- Volumen residuos reciclables entregados a empresas recicladoras / Volumen residuos reciclables generados en el periodo X 100

No aplica, los residuos generados se encuentran en almacenamiento temporal

Frecuencia de verificación

Mensual a medida que la necesidad lo amerite, y las actividades de la obra los generen

Tipo de indicador

Cuantitativo.

Registro de cumplimiento

Informe mensual
Registro fotográfico

Cronograma

La aplicación de las medidas establecidas en el Plan de Acción Socio-Ambiental tiene el mismo tiempo y duración de las actividades constructivas, o el tiempo que sea necesario, con el fin de asegurar el manejo integral de los residuos sólidos durante la ejecución de la obra.

3.2 PROGRAMA CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS

Programa control de emisiones atmosféricas.								**PASA - 02**
OBJETIVO								
Controlar las emisiones de material particulado y gases a la atmósfera como resultado de los movimientos de tierra y operación de vehículos, equipos y maquinaria. Prevenir el incremento en los niveles de ruido durante las actividades constructivas del proyecto.								
Tipo de medida								
Control	X	Prevención	X	Mitigación	X	Compensación		
BENEFICIOS								
A través de la aplicación de las medidas ambientales se espera: • Minimizar los efectos adversos al medio ambiente controlando la generación de material particulado. • Controlar los niveles de ruido, durante la ejecución de la obra, garantizando que este se encuentre por debajo de los límites permisibles. • Minimizar las quejas y reclamos por parte de la comunidad durante la ejecución del proyecto.								
ACCIONES A EJECUTAR								
Durante el periodo del del 01 al 14 de Abril de 2026, se realizaron las siguientes actividades: ✓ Replanteo, control y medición de la obra ✓ Tensionamiento de anclajes ✓ Suministro e instalación de platina de 200mm x 200mm x 12mm con tres agujeros ✓ Suministro e instalación de popora de 3 agujeros cónicos para cuña de Ø=1/2" ✓ Suministro e instalación de kit de cuñas de Ø=1/2" para anclaje. Para dar cumplimiento a las acciones establecidas en el Plan de Acción Socio Ambiental se aplicaron durante el mes relacionado las siguientes medidas: • Dentro de la implementación de medidas de manejo para el uso de maquinaria y equipos de construcción se garantizan las condiciones óptimas de funcionamiento. • En el frente de obra está prohibido el uso de corneta, pitos ni sirenas de los vehículos que hacen parte del proyecto, salvo la alarma de reversa. • Se restringe la operación de los equipos y herramientas de construcción, perforación y compresión generadores de ruido ambiental en la zona con uso residenciales, en horarios comprendidos entre las 7:00 p.m. y las 7:00 a.m. de lunes a sábado, o en cualquier horario los días domingos y feriados. • Se prohíbe realizar quemas a cielo abierto de llantas, baterías, plásticos, lubricantes usados o cualquier otro elemento que emita contaminantes tóxicos al aire. • Se realiza limpieza mediante barrido con hidratación previa, del área de influencia directa del proyecto.								

- Los equipos y maquinaria presente en el frente de obra son sometidos a chequeos y mantenimientos preventivos con el fin de evitar afectaciones al medio ambiente y garantizar su buen funcionamiento.

- En el periodo de ejecución relacionado no se requirió el uso de vehículos tipo volqueta teniendo en cuenta que no fue necesario realizar retiro de material sobrante hasta sitios de disposición final.

En el periodo relacionado teniendo en cuenta la finalización de actividades constructiva se retira la lona del cerramiento perimetral de obra.

ETAPA			
PRECONSTRUCCIÓN		OPERACIÓN	X
CONSTRUCCIÓN	X	DESMANTELAMIENTO	X

LUGAR DE APLICACIÓN

Frentes de obra Villa de Los Caballeros

CRONOGRAMA DE EJECUCION

ACTIVIDADES	MESES DE EJECUCIÓN						
	1	2	3	4	5	6	7
Manejo adecuado de material de construcción							
Mantenimiento de vehículos y maquinaria							

_

RESPONSABLE DE LA EJECUCION

CONSORCIO CONSOLIDACION GIRON

Indicador

- Acopio de materiales
- Control de emisiones atmosféricas, generadas por los vehículos maquinaria y los equipos

Descripción del Indicador

- Manejo de acopio de materiales
- Verificación de estado de equipos y vehículos

Indicador de calificación

- Acopio de materiales autorizado / Número total de acopios

1 / 1 * 100 = 100%

- Vehículos con certificados técnico mecánico/ vehículos en obra x 100 = 100%

No Aplica en el periodo relacionado

Frecuencia de verificación

Mensual a medida que la necesidad lo amerite, y las actividades de la obra los generen.

Tipo de indicador

Cuantitativo.

Registro de cumplimiento

Informe mensual

Cronograma
Estas actividades tienen el mismo tiempo y duración de las actividades constructivas y en la etapa de desmantelamiento o el tiempo que sea necesario.

3.3 PROGRAMA USO Y ALMACENAMIENTO ADECUADO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Programa Uso y almacenamiento adecuado de materiales de construcción							PASA -03
OBJETIVO							
Establecer los procedimientos que serán implementados para el adecuado manejo del material de construcción, desde el almacenamiento temporal, transporte, uso hasta su disposición final, esto con fin de prevenir, controlar y minimizar los posibles impactos que se generen sobre el ambiente. Garantizar la mínima incidencia ambiental, producto del empleo de diferentes insumos, materiales, y dispositivos para las obras.							
TIPO DE MEDIDA							
Control	X	Prevención	X	Mitigación		Compensación	
Beneficios							
Al establecer un sistema de manejo adecuado para el transporte, cargue, descargue y manipulación de los materiales de construcción (arenas, grava, triturados, recebos, ladrillos, triturados de arcilla y otros) se evitan pérdidas del mismo y por lo tanto se generan múltiples ventajas de orden financiero, logístico y ambiental. Al mismo tiempo, se reduce la cantidad de escombros y residuos generados, y el aporte de sedimentos y otros contaminantes a las redes de servicios públicos y fuentes de agua.							
ACCIONES A EJECUTAR							
Se consideran materiales de construcción, los productos pétreos explotados en minas y canteras usados, generalmente, en la industria de la construcción como agregados en la fabricación de piezas de concreto, morteros, pavimentos, obras de tierra y otros productos similares. Durante las actividades de intervención correctiva mediante la construcción de pantallas ancladas para mitigar el riesgo por deslizamiento y movimiento, se requiere la utilización de cemento y concreto, los cuales serán adquiridos a través de proveedores externos que cuenten con los respectivos permisos mineros y ambientales. **Manejo de materiales de construcción:** El Consorcio CONSOLIDACION GIRON verificara que las empresas que suministren materiales de construcción cumplan con las exigencias normativas, así mismo se verificara que cuenten con el plan de contingencia establecido, el cual contempla todo el sistema de seguridad, prevención, organización de respuesta, equipos personales capacitado y presupuesto para la prevención y control de emisiones contaminantes y reparación de daños. **Medidas aplicadas para el manejo de concreto**							

- El cemento en sacos estará almacenado en sitios secos y aislados del suelo.
- El procedimiento para la mezcla y el vaciado del concreto y/o cemento, se realizará considerando una adecuada regulación de la mezcla.
- Se protegerá el suelo mediante material impermeable (plástico) evitando afectaciones temporales en el área de influencia directa de esta actividad.
- El personal de obra deberá utilizar los respectivos elementos de protección personal para la manipulación del cemento y concreto con el fin de prevenir accidentes de trabajo.
- En caso de derrame de mezcla se ha de limpiar la zona en forma inmediata, recogiendo y depositando el residuo en el sitio adecuado. Está prohibido depositar estas mezclas cerca de los cuerpos de agua, sobre zonas de cultivo y/o áreas verdes.
- Se prohíbe el lavado de mezcladoras de concreto en los frentes de obra o en cuerpos de agua.

Almacenamiento temporal de materiales

- Para el almacenamiento de materiales durante la construcción, se dispondrá de un área localizada de forma estratégica que favorezca la cercanía entre el sitio de almacenamiento y los sitios de obra.
- La zona de almacenamiento temporal estará señalizada, los materiales acopiados cubiertos completamente para evitar la contaminación y dispersión por efecto del agua o del viento.
- Se dispondrá de un sitio debidamente demarcado para el almacenamiento de materiales, el apilamiento de estos materiales no supera el 1.5 metros de altura.
- El sitio de almacenamiento en lo posible se establecerá en el área de influencia directa para facilitar su acceso y no interfiere con el tráfico vehicular y peatonal en la zona.
- Se prohíbe el almacenamiento temporal de materiales de construcción cerca a zonas verdes, ríos, quebradas, canales y caños.

Manejo de prefabricados

- En caso de ser necesario se dispondrá de uno a más sitios debidamente demarcados para el almacenamiento de prefabricados y tubería, y no se apilará a alturas superiores de 1.5 metros. Se verificará la estabilidad del sitio de acopio, previniendo que se generen accidentes de trabajo.
- Las varillas se han de proteger y/o aislar estas áreas mediante encerramiento con cinta, malla y con avisos que indiquen el peligro, de acuerdo con el programa de señalización.
- El hierro se protegerá para evitar que las condiciones climáticas afecten su estructura.

Teniendo en cuenta la finalización de actividades constructivas, en el periodo relacionado, no se requirieron cantidades de materiales de construcción.

_

ETAPA			
PRECONSTRUCCIÓN		OPERACIÓN	X
CONSTRUCCIÓN	X	DESMANTELAMIENTO	X

LUGAR DE APLICACIÓN

Frentes de obra Villa de Los Caballeros

CRONOGRAMA DE EJECUCION

ACTIVIDADES	MESES DE EJECUCIÓN						
	1	2	3	4	5	6	7
Identificación y obtención de los materiales de construcción							
Transporte y disposición de materiales							
Medidas de manejo para concretos							

_

RESPONSABLE DE LA EJECUCION

CONSORCIO CONSOLIDACION GIRON

Indicador

Cumplir con los procedimientos propuestos para el manejo de materiales de construcción durante el proyecto

Descripción del Indicador

1. Cumplir con el 100% de las acciones propuestas para el manejo de materiales de construcción.
2. Aprovechamiento de material de construcción

Indicador de calificación

1. Número de acciones realizadas en obra para el manejo de los materiales de construcción / Número de acciones establecidas*100

8 / 8 * 100 = 100%

2. Cantidad total de material utilizado en obra / Cantidad de material de fuentes autorizadas *100

No aplica en el periodo relacionado.

Frecuencia de verificación

Mensual

Tipo de indicador

Cuantitativo

Registro de cumplimiento

Informe mensual

Cronograma

Estas actividades tienen el mismo tiempo y duración de las actividades constructivas y en la etapa de desmantelamiento o el tiempo que sea necesario.

6.4 PROGRAMA PROTECCIÓN DEL SUELO – PREVENCIÓN DE PROCESOS EROSIVOS Y CONTROL SOBRE LA ESCORRENTÍA

Programa Protección del suelo – prevención de procesos erosivos y control sobre la escorrentía	PASA -04

OBJETIVO

Garantizar la mínima incidencia ambiental, producto de la remoción de cobertura vegetal necesaria para la ejecución de la obra.

Controlar los sedimentos generados por el retiro de materiales de recubrimiento en los sitios de obras que pueden ser arrastrados por la escorrentía, así mismo controlar la sedimentación y erosión causados por las obras hidráulicas requeridos por el proyecto, vertimientos de aguas con contenido de sedimentos, entre otros y evitar la aparición de focos erosivos en los frentes de obra.

TIPO DE MEDIDA

Control	X	Prevención	X	Mitigación		Compensación	

BENEFICIOS

El suelo es uno de los recursos que puede resultar más afectado a causa de las actividades asociadas con la construcción de obras civiles. La necesidad de retirar la cobertura vegetal y remover grandes volúmenes de tierra acelera procesos erosivos. Igualmente, el suelo se puede ver afectado por la compactación, manipulación inadecuada de ciertas sustancias contaminantes y el almacenamiento de escombros o materiales de construcción.

La acción de los agentes erosivos provoca una degradación progresiva de la estructura física del suelo lo que, a su vez, aumenta la vulnerabilidad de este a ser degradado y afecta al resto de las funciones del suelo. Por todo lo anterior, el suelo manifiesta una disminución progresiva en su capacidad de retención de agua y nutrientes disponibles para las plantas, lo que repercute en una reducción drástica de su fertilidad.

ACCIONES A EJECUTAR

La obra de intervención correctiva mediante la construcción de pantallas ancladas para mitigar el riesgo por deslizamiento y movimiento se presenta como respuesta al alto riesgo de ocurrencia de fenómenos de erosión (remoción en masa) que tiene como finalidad contrarrestar los altos nivel de deterioro del talud, el deficiente drenaje superficial, las altas pendientes y el aumento del área de expansión urbana.

Teniendo en cuenta lo anterior el objeto de la obra está conectado con la mitigación de impactos de erosión que presenta el suelo del sector; sin embargo, se plantea controlar los procesos de arrastre de sedimentos durante las actividades de obra mediante la protección y transporte inmediato de materiales resultantes de perfilado y pequeñas excavaciones para evitar el arrastre por lluvias y/o vientos.

El Consorcio Consolidación Girón implementara las siguientes acciones con el fin de proteger el suelo de procesos erosivos y control de la escorrentía:

- En cuanto al almacenamiento del ACPM necesario para proveer el combustible a maquinaria y equipos, se capacitará al personal que, en caso de presentar derrames accidentales, será

recogido inmediatamente; si el volumen derramado es superior a 5 galones, debe removerse el suelo contaminado en su totalidad y restaurar la zona afectada.

- Cuando el derrame se presenta en cantidades pequeñas, será utilizado materiales absorbentes, trapos, aserrín y arena; estos residuos deberán ser dispuestos separadamente en canecas de 55 galones hasta que sean entregados a un gestor autorizado por la Autoridad Ambiental.

- Para prevenir la contaminación del suelo se realizará la mezcla de concreto sobre una plataforma o geotextil.

- Se ha de evitar el derrame de aceite o combustible sobre el suelo. Serán instaladas barreras y se dispondrá la maquinaria sobre una superficie que permita la fácil recolección.

- El sitio para la ubicación del campamento y despachos (almacén y depósito), se realizará donde se necesitó menor intervención sobre el suelo.

- Mediante la ejecución de las actividades propias de la obra se asegura la estabilidad del talud intervenido mediante un adecuado diseño geotécnico, que especifica el diseño de las pendientes, anclajes, barreras contra la erosión, obras de drenaje. Esto teniendo en cuenta que los taludes son un elemento crítico en el desarrollo de las obras civiles por lo cual su conformación debe contar con un estudio riguroso y acompañamiento técnico.

- El ACPM usado es almacenado de manera temporal en recipiente metálico con capacidad para 55 galones.





Tensionamiento de anclajes y suministro de platinas

	
Suministro e Instalación de Poporas y kit de cuñas	

ETAPA			
PRECONSTRUCCIÓN		OPERACIÓN	X
CONSTRUCCIÓN	X	DESMANTELAMIENTO	

LUGAR DE APLICACIÓN

Frentes de obra Villa de Los Caballeros

CRONOGRAMA DE EJECUCION

ACTIVIDADES	MESES DE EJECUCIÓN					
	1	2	3	4	5	6
Cumplir con las acciones propuestas para manejo y disposición de material sobrante						

RESPONSABLE DE LA EJECUCION

CONSORCIO CONSOLIDACION GIRON

Indicador

- Cumplir con las acciones propuestas para manejo de la erosión y arrastre de sedimentos.
- Cumplir con los requerimientos ambientales

Descripción del Indicador

- Aplicación de acciones de manejo para el control de la erosión y arrastre de materiales

Indicador de calificación

- Número de acciones realizadas / Número de acciones establecidas en el PASA*100

7 / 7 * 100 = 100%

Frecuencia de verificación

Mensual

Tipo de indicador

Cuantitativo.

Cronograma
El proyecto tiene el mismo tiempo de las actividades del desarrollo del mismo, teniendo en cuenta la necesidad en la obra de mitigación del talud.

3.5. PROGRAMA PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DE CUERPOS DE AGUA Y REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS

Programa de prevención de la contaminación de cuerpos de agua y redes de servicios públicos	PASA-05

OBJETIVO

Implementar medidas ambientales que minimicen las afectaciones por arrastre de materiales hacia cuerpos hídricos o redes de servicios públicos.

TIPO DE MEDIDA

Control	X	Prevención	X	Mitigación	X	Compensación

_

BENEFICIOS

En las obras de construcción, el agua debe manejarse considerando los siguientes criterios de manejo:

- Reducir el consumo
- Prevenir la contaminación.
- Recolectar separadamente aguas grises, aguas residuales, aguas de escorrentía.
- Recircular aguas grises.
- Tratar las aguas grises antes de su descarga para retirar grasas y/o sedimentos.
- Verter las aguas residuales domésticas a las redes de alcantarillado o tratarlas en pozos sépticos.

ACCIONES A EJECUTAR

Para el periodo de ejecución del 01 al 14 de Abril de 2026, con el fin de dar cumplimiento al programa se ejecutaron las siguientes medidas de manejo:

- El abastecimiento de agua se realizará por medio de un punto de agua que se encuentra dentro de un predio privado contiguo a la obra y al área que se definió para adecuación y construcción de campamento; dicho punto de agua es abastecido por el acueducto metropolitano.

- Se prohíbe el vertimiento de residuos líquidos en las calles y zonas aledañas al frente de obra.

- Inicialmente se cuenta con una unidad sanitaria fija en el área destinada a campamento, del frente de obra, con el propósito de garantizar condiciones higiénicas adecuadas para los trabajadores. La unidad es sometida a jornadas de aseo y limpieza con lo cual se asegura las condiciones higiénicas para los trabajadores.

- El lavado de maquinaria, reparación y mantenimiento de vehículos está prohibido en el frente de obra con el fin de evitar verter aceites y residuos líquidos al suelo.

- No se registraron derrames o fugas de combustibles o residuos líquidos dentro o fuera del área de influencia, de presentarse un derrame este será recolectado, almacenado y enviado a tratamiento con una empresa autorizada para el tratamiento y disposición final de residuos peligrosos





Aseo y Limpieza de Unidad Sanitaria Fija y Lavamos para uso de los trabajadores

ETAPA			
PRECONSTRUCCIÓN		OPERACIÓN	X
CONSTRUCCIÓN	X	DESMANTELAMIENTO	

LUGAR DE APLICACIÓN

Frentes de obra Villa de Los Caballeros

CRONOGRAMA DE EJECUCION

ACTIVIDADES	MESES DE EJECUCIÓN						
	1	2	3	4	5	6	7
Transporte adecuado de ACPM							
Tanqueo de maquinaria con ACPM							
Aplicación del plan de contingencia							

RESPONSABLE DE LA EJECUCION

CONSORCIO CONSOLIDACION GIRON

SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y MONITOREO

Indicador

Cumplir con las actividades propuestas para controlar la totalidad de los vertimientos generados durante el proyecto

Descripción del Indicador

- Indicador servicio de baños.
- Manejo de Residuos líquidos, Domésticos e Industriales.

Indicador de calificación

- No de US utilizadas/ No de US requeridas*100

1 / 1 * 100 = 100%

Frecuencia de verificación
Mensual
Tipo de indicador
Cuantitativo.
Registro de cumplimiento
Informe Mensual Registro fotográfico
Cronograma
Este programa se ejecutará durante el periodo de construcción de la obra de mitigación.

6.6 PROGRAMA PARA EL MANEJO DE LA VEGETACION LA FAUNA Y EL PAISAJE.

Programa para el manejo de la vegetación la fauna y el paisaje.							PASA -06
OBJETIVO							
Implementar medidas ambientales que minimicen las alteraciones del paisaje debido a la ejecución de las obras civiles de mitigación.							
TIPO DE MEDIDA							
Control	X	Prevención	X	Mitigación	X	Compensación	
BENEFICIOS							
La intervención racional y la adecuación del paisaje posterior a la terminación de la obra, permitirá que la comunidad que habita la zona pueda disfrutar de la mejora de su entorno.							
ACCIONES A EJECUTAR							

Para el periodo de ejecución del 01 al 14 de Abril de 2026, se ejecutaron las siguientes acciones para dar cumplimiento al programa:

- Se realizó la intervención únicamente en las áreas establecidas en los diseños técnicos. Están prohibidas la quema a cielo abierto y la aplicación de herbicidas.
- Se encuentra prohibido el uso de árboles o arbustos para disponer elementos (alambres, carteles, sogas, cables, ropa, etc.).
- Está prohibido arrojar basuras, material sobrante de excavación en las zonas verdes, en la cobertura vegetal, ubicada en área de influencia de la obra.
- Se prohíbe el uso o porte de armas de fuego.
- Se prohíbe la caza y compra de especies de fauna silvestre.
- Se prohíbe el tránsito de maquinaria fuera de los frentes de obra.

Ahuyentamiento de fauna silvestre

- Teniendo en cuenta que las áreas a intervenir son zonas urbanizadas la presencia de fauna silvestre es baja, sin embargo, en caso de evidenciarse presencia de fauna dentro de los frentes

de obra su Ahuyentamiento será útil para animales tales como aves, serpientes y lagartijas. Su desplazamiento será dirigido hacia las coberturas de vegetación secundaria y rastrojo. La presencia de maquinaria pesada y todo lo relativo al inicio de las obras se constituye en una actividad de Ahuyentamiento por cuanto el instinto de conservación de los animales que aún quedan, hace que se desplacen hacia sitios que consideran más seguros.

- A partir de las condiciones identificadas en el área de Influencia directa se prevé que las acciones de rescate y relocalización serán muy poco frecuentes o nulas. En caso de requerirse si la situación lo amerita se pedirá asistencia a la autoridad ambiental o al cuerpo de bomberos en busca de minimizar las afectaciones a la fauna.

Actividades de Compensación Forestal
En consideración a la culminación de las actividades constructivas, se procederá con la ejecución de las medidas de compensación forestal establecidas en el permiso de intervención forestal, otorgado mediante Acta No. 01 del 04 de noviembre de 2025. El reporte correspondiente a dichas actividades será incluido en el informe de liquidación de la obra.

ETAPA			
PRECONSTRUCCIÓN		OPERACIÓN	X
CONSTRUCCIÓN	X	DESMANTELAMIENTO	

LUGAR DE APLICACIÓN

Frentes de obra Villa de Los Caballeros

CRONOGRAMA DE EJECUCION

ACTIVIDADES	MESES DE EJECUCIÓN						
	1	2	3	4	5	6	7
Manejos preventivos en la cobertura de vegetación natural							
Manejo de la vegetación que permanecerá							

—

RESPONSABLE DE LA EJECUCION

CONSORCIO CONSOLIDACION GIRON

SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y MONITOREO

Por parte del Interventor Ambiental

Descripción del Indicador

- Aplicación de acciones para el manejo de la vegetación presente en el área de influencia del proyecto.
- % de especies identificadas para intervención

Indicador de calificación

- No. de acciones de Manejo implementadas/No. de acciones de manejo propuestas X 100.

7/7 * 100 = 100%

- Especie forestales intervenidas / especies forestales solicitadas *100

No Aplica en el periodo relacionado

Frecuencia de verificación

Mensual

Tipo de indicador
Cuantitativo.
Cronograma
Este programa se ejecutará durante el periodo de construcción de la obra de mitigación.

6.7 PROGRAMA DE SEÑALIZACION

Programa de señalización							PASA-.07
OBJETIVO							
Prevenir los impactos que se puedan generar por la no señalización de los sitios donde se realice intervención por el desarrollo de la obra; a fin de garantizar la seguridad de los peatones y trabajadores.							
TIPO DE MEDIDA							
Control	X	Prevención	X	Mitigación	X	Compensación	
BENEFICIOS							
El adecuado manejo de tránsito evitará accidentes que se puedan generar en el periodo de ejecución del proyecto.							
ACCIONES A EJECUTAR							

Para el periodo del 01 al 14 de Abril de 2026, con el fin de dar cumplimiento al programa establecido se realizó la ejecución de las siguientes actividades:

- Se instala señalización requerida en áreas de campamento del frente de obra
- La señalización instalada corresponde a Seguridad y Salud en el Trabajo, atención a emergencias, evacuación y Gestión Ambiental





Señalización Frentes de trabajo





Señalización Frente de Obra

ETAPA			
PRECONSTRUCCIÓN		OPERACIÓN	X
CONSTRUCCIÓN	X	DESMANTELAMIENTO	

LUGAR DE APLICACIÓN

Frentes de obra Villa de Los Caballeros

CRONOGRAMA DE EJECUCION

ACTIVIDADES	MESES DE EJECUCIÓN						
	1	2	3	4	5	6	7
Señalización frentes de Obras, sitios temporales de almacenamiento y señalización vial cuando la obra lo amerite natural							

RESPONSABLE DE LA EJECUCION

CONSORCIO CONSOLIDACION GIRON

SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y MONITOREO

Por parte del Interventor Ambiental

Indicador

Cumplir con las medidas propuestas para la señalización adecuada del área de trabajo establecidas para las etapas de operación y desmantelamiento de las instalaciones temporales del proyecto.

Descripción del Indicador

Numero de áreas señalizadas en el área de ejecución del proyecto.

Indicador de calificación

- # de áreas señalizadas /# de áreas necesarias a señalizar

  1 / 1 * 100 = 100%

- # De acopios en obra / # de puntos de acopio señalizados.

  1 / 1 * 100 = 100%

Frecuencia de verificación
Mensual
Tipo de indicador
Cuantitativo.
Cronograma
Este programa se ejecutará durante el periodo de construcción de la obra de mitigación.

2.8 PROGRAMA DE ADECUACION DE CAMPAMENTOS.

PROGRAMA DE ADECUACION DE CAMPAMENTOS.							PASA-08
OBJETIVO							
Prevenir, minimizar y controlar los impactos generados por la operación de las instalaciones temporales para el almacenamiento de herramienta menor y maquinaria, y las instalaciones de infraestructura básica de saneamiento.							
TIPO DE MEDIDA							
Control	X	Prevención	X	Mitigación		Compensación	
BENEFICIOS							

- Pérdida de suelo
- Cambios en la calidad de los suelos
- Cambios en la calidad del aire
- Cambios en los niveles de ruido
- Alteración a las unidades de paisaje
- Cambios en la cobertura vegetal y alteración de hábitat
- Afectación de la fauna silvestre
- Generación de expectativas y conflictos
- Incomodidades a los residentes y establecimientos de la zona.

ACCIONES A EJECUTAR

En el periodo relacionado se realiza la adecuación y construcción de las áreas de campamento temporal, las cuales se adecuaron según las necesidades del personal y del frente de obra.

Se realizo un contrato de arrendamiento en un predio contiguo al área de intervención del talud, en el barrio Villa de los Caballeros, donde las partes acuerdan expresamente que el pago de la totalidad de este canon se realizará en especie, mediante la ejecución de obras de mampostería y mejoras no locativas que el ARRENDATARIO (CONSORCIO CONSOLIDACIÓN GIRÓN) se obliga a realizar en el inmueble arrendado. El área funcionará para almacenamiento temporal de materiales y herramienta menor, Vestier y área de alimentación para trabajadores, y oficina temporal para los profesionales del proyecto.

- El campamento se adecuó en un área que no requiere mayor intervención del suelo.

- Se inicia la instalación de la señalización de SST, Ambiental, emergencias, primeros auxilios y evacuación requerida.

- El campamento cuenta con equipos para control de incendios –extintores, ubicados en sitios estratégicos, señalizados y a la altura adecuada e igualmente material de primeros auxilios como botiquín y camilla.

- Los residuos sólidos generados en instalaciones temporal, serán separados teniendo en cuenta el tipo de residuos y de acuerdo al Programa de manejo de residuos sólidos convencionales para posteriormente realizar su adecuada disposición final o aprovechamiento.





Áreas de campamento temporal

ETAPA			
PRECONSTRUCCIÓN		OPERACIÓN	X
CONSTRUCCIÓN	X	DESMANTELAMIENTO	X

LUGAR DE APLICACIÓN

Frentes de obra Villa de Los Caballeros

CRONOGRAMA DE EJECUCION

ACTIVIDADES	MESES DE EJECUCIÓN						
	1	2	3	4	5	6	7
Instalación de infraestructura temporal							
Desmantelamiento de las instalaciones temporales							

RESPONSABLE DE LA EJECUCION

CONSORCIO CONSOLIDACION GIRON

SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y MONITOREO

Indicador

Cumplir con las medidas propuestas para reducir el impacto generado por la instalación, operación y desmantelamiento de las instalaciones temporales del proyecto.

Descripción del Indicador
• Número de sitios de uso temporal
Indicador de calificación
• Número sitios de uso temporal/Número de sitios desmantelados*100 **No Aplica En El Periodo Relacionado** • No de medidas ambientales ejecutadas / No de medias ambientales programadas*100 4 / 4 * 100 = 100%
Frecuencia de verificación
Mensual
Tipo de indicador
Cuantitativo.
Registro de cumplimiento
Informe mensual
Cronograma
Este programa se ejecutará durante el periodo de construcción de la obra de mitigación.

2.9 PROGRAMA DE GESTION SOCIAL

2.9.1. Proyecto de atención a la Comunidad

Proyecto de Atención a la Comunidad	**PGS-6.1-15**
OBJETIVO DEL PROYECTO	
Establecer las acciones necesarias para recibir, atender y dar respuesta oportuna a las solicitudes, peticiones, quejas, reclamos y sugerencias presentadas por la comunidad o autoridades competentes sobre el desarrollo del proyecto.	
ACCIONES DESARROLLADAS	
Instalación de la oficina de atención a la comunidad Ubicar y adecuar la oficina de atención a la comunidad en zona aferente al sector de construcción, con volante informativo que incluye número telefónico y correo electrónico, para recibir, atender y brindar, respuesta oportuna a las solicitudes, peticiones, quejas, reclamos y sugerencias presentadas por la comunidad o autoridades competentes sobre el desarrollo del proyecto. (ver anexos de registro fotográfico y volante informativo) Entregar el volante informativo de la oficina de atención a la comunidad, por correo electrónico, WhatsApp y físico, a quienes lo requieran, el cual incluye horario, días de atención, número telefónico y correo electrónico; en la oficina del Campamento del Contratista en zona aferente al barrio Villa de los Caballeros. Conforme las políticas de responsabilidad social y ambiental del Consorcio Consolidación Girón, se realizaron arreglos varios a la comunidad, entre ellos, ornato a andenes, accesos, bordillos, canales y arborización. (ver anexo de registro fotográfico)	
LUGAR DE APLICACIÓN	

Comunidad del área de influencia directa de la obra (AID) y actores sociales para la construcción de obras de mitigación y consolidación para el control de la erosión en el talud oriental del barrio Villa de los Caballeros en el municipio de Girón, departamento de Santander (RA-OBRA -02).”	
CRONOGRAMA DE EJECUCION	
ACTIVIDAD	Atención a la comunidad en temas de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias

EJECUCION (PERÍODOS)	1	2	3	4	5	6	7
ACTIVIDAD	X	X	X	X	X	X	X

RESPONSABLE DE EJECUCION	Profesional Social
SEGUIMIENTO Y MONITOREO	
Indicador:	Descripción del indicador:
Número de peticiones recibidas / número de peticiones atendidas * 100	Atención a PQRS
Número de peticiones atendidas / número de peticiones cerradas * 100	Cierre a reclamaciones recibidas
Tipo de indicador:	Cuantitativo.
Periodicidad de evaluación:	Mensual
Registro de cumplimiento:	Formatos de registro, recepción y seguimiento de PQRS, e Informes mensuales.

2.6.2. Proyecto de Información y Divulgación

Proyecto de Información y Divulgación	**PGS-6.2-16**
OBJETIVO DEL PROYECTO	
Informar de forma clara, veraz, oportuna y suficiente a la población que cubre las comunidades del área de influencia directa, a las autoridades locales, gremios, organizaciones, administración municipal, Concejo Municipal, Personería Municipal, Juntas de Acción Comunal y líderes comunitarios, vinculados con el desarrollo del proyecto y mantenerlos informados de los eventos de la obra constructiva. Ubicar en áreas lindantes a la obra, la valla informativa de la obra de mitigación y control a la erosión con los datos específicos requeridos para conocimiento de la comunidad de influencia directa de la obra, entidades y personas interesadas en esta información. Colocar y entregar el aviso inherente a la oficina de atención a la comunidad, con los datos de dirección, teléfono y correo electrónico, entre otros, para conocimiento de la comunidad del área de influencia de la obra.	
ACCIONES DESARROLLADAS	
Información a la comunidad El proyecto de mitigación y control a la erosión cuenta con valla informativa de la obra con los datos e información a lugar y aviso informativo de la oficina de atención a la comunidad, el cual contiene días y horario de atención, número telefónico y correo electrónico.	

La información es entregada a los actores sociales del proyecto, inmersos en las actividades a desarrollar, entre ellos, la Administración Municipal, Instituciones Educativas, empresas, funcionarios, unidades residenciales y otros, por medio físico, correo electrónico y WhatsApp, en caso de requerirse.

Se entrega volante informativo de la oficina de atención a la comunidad, a las personas que lo solicitan, en el campamento de la obra en el barrio Villa de Los Caballeros de Girón. (ver anexo de volante informativo) **.**

Atención a la comunidad en PQRS
Se entrega respuesta mediante comunicación escrita de fecha 9 de abril de 2026 al derecho de petición instaurado por el Señor Marcos Martínez Sarmiento, a quien le informan que el Consorcio Consolidación Girón va a responder por las nuevas fisuras presentadas en su predio, conforme el acta de vecindad inicial el predio ya contaba con fisuras, adecuación a realizarse en el mes de abril, pero las demás reclamaciones no son injerencia del Contratista, conforme se encuentran en predios privados, existentes antes del desarrollo de la obra, otras acciones obedecen a criterios técnicos y otras a acuerdos con la comunidad del sector en temas de movilidad de los residentes que cuentan con motocicletas.(ver anexo de respuesta y registro del derecho de petición).

LUGAR DE APLICACIÓN
Comunidad del área de influencia directa de la obra (AID) y actores sociales para la construcción de obras de mitigación y consolidación para el control de la erosión en el talud oriental del barrio Villa de los Caballeros en el municipio de Girón, departamento de Santander (RA-OBRA -02).”

CRONOGRAMA DE EJECUCION	
ACTIVIDAD 1	Realizar las reuniones informativas de inicio, de avance, de finalización de la obra y las extraordinarias que se requieran
ACTIVIDAD 2	Invitar a las comunidades y actores sociales de la obra de mitigación y control a la erosión
ACTIVIDAD 3	Distribución de comunicaciones (volantes, cartas, llamadas telefónicas, mensajes) para las invitaciones a las reuniones informativas y otros

EJECUCION (PERÍODOS)	1	2	3	4	5	6	7
ACTIVIDAD 1	X						
ACTIVIDAD 2	X						
ACTIVIDAD 3	X	X	X	X	X	X	X

RESPONSABLE DE EJECUCION	Profesional Social

SEGUIMIENTO Y MONITOREO	
Indicador:	Descripción del indicador:
Número de reuniones informativas programadas / número de reuniones realizadas * 100	Reuniones informativas efectuadas
Número de actores sociales invitados a las reuniones informativas / número de volantes, comunicaciones, mensajes entregados a los actores sociales * 100	Invitación a las reuniones informativas
Número de actores sociales asistentes a las reuniones informativas / número de actores sociales invitados * 100	Actores sociales presentes en las reuniones informativas

Tipo de indicador:	Cuantitativo
Periodicidad de evaluación:	Mensual
Registro de cumplimiento:	Actas de reuniones, listados de asistencia, registro fotográfico y comunicaciones de convocatoria, entre otros documentos.

2.6.3. Proyecto para el manejo de la Infraestructura de predios y Servicios Públicos

Proyecto para el manejo de la Infraestructura de predios y Servicios Públicos	**PGS-6.3-17**

OBJETIVO DEL PROYECTO

Registrar el estado físico de las construcciones e infraestructuras físicas que lo requieran, previo al inicio de las actividades edificativas a desarrollar.
Cumplir los compromisos establecidos con las comunidades del área de influencia directa del proyecto.

ACCIONES DESARROLLADAS

Levantamiento de actas de vecindad
El Contratista, realizó 18 (dieciocho) actas de vecindad de inicio, de forma conjunta entre el residente técnico del proyecto y el área social, conforme lo establece el protocolo y aplicando el formato establecido para ello; previamente se informó a la comunidad, la importancia de la participación del responsable de la unidad social o del dueño del predio y se contactó al propietario, residente y/o testigo de las viviendas objeto de esta labor. (ver anexo de registro de las actas de vecindad de inicio elaboradas)
El área social cuenta con el archivo digital y físico de las Actas de vecindad desarrolladas por la obra de mitigación y control a la erosión; para los casos de personas que no colaboraron con la elaboración del documento, el Contratista realizó la actividad con un testigo.
Manejo de la infraestructura de predios y servicios públicos.
Conforme el proyecto lo requiera, se debe informar cuando proceda, respecto a los cortes de agua, luz u otros servicios, para la obra constructiva, en caso de presentarse estas acciones.
Elaboración de actas de compromiso
Durante el presente período para la elaboración del presente informe no se realizaron actas de compromiso requeridos por la obra en proceso constructivo.

LUGAR DE APLICACIÓN

Comunidad del área de influencia directa de la obra (AID) y actores sociales para la construcción de obras de mitigación y consolidación para el control de la erosión en el talud oriental del barrio Villa de los Caballeros en el municipio de Girón, departamento de Santander (RA-OBRA -02).”

CRONOGRAMA DE EJECUCION

ACTIVIDAD 1	Realizar visitas domiciliarias para informar la elaboración de las actas de vecindad
ACTIVIDAD 2	Entrega de volantes informativos de la elaboración de actas de vecindad
ACTIVIDAD 3	Elaboración de actas de vecindad (iniciales, de seguimiento y cierre) conforme se requiera

EJECUCION (PERÍODOS)	1	2	3	4	5	6
ACTIVIDAD 1	X					
ACTIVIDAD 2	X					
ACTIVIDAD 3	X					

RESPONSABLE DE EJECUCION	Profesional Social
SEGUIMIENTO Y MONITOREO	
Indicador:	Descripción del indicador:
Número de informaciones sobre la elaboración de actas de vecindad en el AID de la obra / número de actas de vecindad realizadas * 100	Informar la elaboración de actas de vecindad
Número de volantes de elaboración de actas de vecindad entregados / número de actas de vecindad realizadas * 100	Entrega de información sobre la elaboración de actas de vecindad
Número de actas de vecindad realizadas / número de actas de vecindad cerradas * 100	Cierre de actas de vecindad elaboradas
Atención de PQRS relacionadas con daño a infraestructura = (# De quejas atendidas por daño a la infraestructura de predios / # de quejas por daño a infraestructura de predios presentadas) *100	Atención a PQRS, inherentes a afectaciones de predios
Tipo de indicador:	Cuantitativo
Periodicidad de evaluación:	Mensual
Registro de cumplimiento:	Actas de vecindad elaboradas, formatos de entrega de volantes, fichas socioeconómicas elaboradas e Informes mensuales.

6.4. Proyecto de recuperación del Derecho de vía (No aplica)

4. Proyecto de recuperación del Derecho de la vía	**PGS-6.4-18**
OBJETIVO DEL PROYECTO	
Recuperar el derecho de vía o área para la ejecución de las obras. Evitar conflictos con las comunidades.	
ACCIONES A DESARROLLAR	
Teniendo en cuenta que se están construyendo obras de mitigación y control de la erosión en el talud oriental del barrio Villa de los Caballeros de propiedad estatal, este proyecto no aplica.	
LUGAR DE APLICACIÓN	
Comunidad del área de influencia directa de la obra (AID) y actores sociales para la construcción de obras de mitigación y consolidación para el control de la erosión en el talud oriental del barrio Villa de los Caballeros en el municipio de Girón, departamento de Santander (RA-OBRA -02).”	

2.6.5. Proyecto de cultura vial y participación comunitaria

Proyecto de Cultura vial y participación comunitaria	**PGS-6.5-19**
OBJETIVO DEL PROYECTO	
Generar estrategias de apropiación del proyecto a través de procesos de educación y sensibilización con las comunidades educativas, población en general, líderes del AID y Comité de Participación Comunitaria.	
ACCIONES DESARROLLADAS	

Desarrollo de talleres pedagógicos de sostenibilidad Este proyecto aplica, conforme las actividades constructivas, en algunos momentos, implican acciones de cierre de vías o pasos restringidos y las tareas de obra se concentran en áreas de cerramiento, acciones presentes para algunos espacios en la construcción programada. Las inquietudes e información a la comunidad, en temas viales y otros, se ofrece a través de volantes informativos, de forma virtual, presencial o por teléfono en algunos momentos, brindando claridad en las actividades desarrolladas y por efectuar. En temas de educación y seguridad vial, los colaboradores vinculados a la obra de mitigación y control a la erosión, recibieron formación en temas de cultura vial, para mejor como usuarios de la vía y como auxiliares de tráfico en caso de requerir el desarrollo de estas tareas.								
LUGAR DE APLICACIÓN								
Comunidad del área de influencia directa de la obra (AID) y actores sociales para la construcción de obras de mitigación y consolidación para el control de la erosión en el talud oriental del barrio Villa de los Caballeros en el municipio de Girón, departamento de Santander (RA-OBRA -02).”								
CRONOGRAMA DE EJECUCION								
ACTIVIDAD	Atención a la comunidad y trabajadores en temas de información sobre cultura vial y participación comunitaria							
	EJECUCION (PERÍODOS)	1	2	3	4	5	6	7
	ACTIVIDAD 1	X	X	X	X	X	X	X
RESPONSABLE DE EJECUCION	Profesional Social							
SEGUIMIENTO Y MONITOREO								
Indicador:	Descripción del indicador:							
Número de informaciones elaboradas / número de informaciones entregadas * 100	Capacitación mensual a los trabajadores de la obra de mitigación y control a la erosión							
Tipo de indicador:	Cuantitativo.							
Periodicidad de evaluación:	Mensual							
Registro de cumplimiento:	Formatos de registro de asistencia a reuniones y formaciones en temas viales, registro fotográfico e Informes mensuales.							

2.6.6. Proyecto de Contratación de mano de obra

Proyecto de Contratación de mano de obra	**PGS-6.6-20**
OBJETIVO DEL PROYECTO	
Generar ingresos en los hogares de las comunidades del AID Evitar la migración de población foránea al AID para vincularse al proyecto Respaldar los compromisos generados con la comunidad para la construcción de la obra. Apoyar la mano de obra disponible conforme la información de la ARN (Agencia para la Reincorporación y la Normalización).	
ACCIONES DESARROLLADAS	
El Contratista se encuentra vinculando mano de obra requerida para el proyecto, conforme listados emitidos por la oficina de empleo de la Administración municipal. A las personas que envían las hojas de vida a través del correo del Contratista, se les solicita registrarla en la oficina de empleo del municipio de Girón o en la plataforma del SENA, Agencia pública de empleo,	

entidad estatal donde se deben postular los perfiles ocupacionales del tipo de trabajador en caso de requerirse de estas acciones.
Los colaboradores vinculados a la obra de mitigación y control a la erosión recibieron formación en valores y oficina de atención a la comunidad para mejorar como personas, trabajadores, miembros de una comunidad, de una familia y empresa.

LUGAR DE APLICACIÓN

Comunidad del área de influencia directa de la obra (AID) y actores sociales para la construcción de obras de mitigación y consolidación para el control de la erosión en el talud oriental del barrio Villa de los Caballeros en el municipio de Girón, departamento de Santander (RA-OBRA -02).”

CRONOGRAMA DE EJECUCION

ACTIVIDAD 1	Gestión con la Agencia Colombiana para la Reintegración y Normalización, respecto a la mano de obra no calificada disponible para laborar en el proyecto
ACTIVIDAD 2	Informar en la reunión de inicio la vinculación de mano de obra no calificada del AID del proyecto
ACTIVIDAD 3	Recepción de hojas de vida para la vinculación de mano de obra no calificada al proyecto
ACTIVIDAD 4	Inducciones y capacitaciones en diversos temas del área social al personal vinculado para trabajar en la obra
ACTIVIDAD 5	Coordinación con la bolsa de empleo de la Alcaldía de Girón y Junta de Acción Comunal local, para la vinculación de mano de obra no calificada.

EJECUCION (PERÍODOS)	1	2	3	4	5	6	7
ACTIVIDAD 1	X						
ACTIVIDAD 2	X						
ACTIVIDAD 3	X	X					
ACTIVIDAD 4	X	X	X	X	X	X	X
ACTIVIDAD 5	X	X					

RESPONSABLE DE EJECUCION	Profesional social

SEGUIMIENTO Y MONITOREO

Indicador:	Descripción del indicador:
# De personas contratadas como mano de obra no calificada que residen en área de influencia 5 / # total de personas registradas como mano de obra no calificada 7 * 100 = 71%	Mano de obra local y del sector del AID contratada para el proyecto
Registros afiliación de mano de obra local 5 / registro en planillas de pago de seguridad social de la mano de obra local 5 * 100 = 100%	Pago seguridad social de trabajadores locales contratados

Tipo de indicador:	Cuantitativo
Periodicidad de evaluación:	Mensual

Registro de cumplimiento:	Formatos de registro de mano de obra local, laborando en la obra

2.6.7. Proyectos productivos (No aplica)

7. Proyectos productivos	**PGS-6.7-21**
OBJETIVO DEL PROYECTO	
Apoyar a las comunidades organizadas en el desarrollo de proyectos productivos que contribuyan al mejoramiento del entorno y calidad de vida de la comunidad.	
ACCIONES A EJECUTAR	
Conforme se está desarrollando una obra de mitigacion y control de la erosión en el talud oriental del barrio Villa de los Caballeros en el municipio de Girón, departamento de Santander (RA-OBRA -02).", este proyecto no aplica, ni cuenta con rubro presupuestal.	
LUGAR DE APLICACIÓN	
Comunidad del área de influencia directa de la obra (AID) y actores sociales para la construcción de obras de mitigación y consolidación para el control de la erosión en el talud oriental del barrio Villa de los Caballeros en el municipio de Girón, departamento de Santander (RA-OBRA -02)."	

2.6.8. Proyecto protección al Patrimonio Arqueológico y Cultural (No aplica)

Proyecto de Protección al Patrimonio Arqueológico y Cultural	**PGS-6.8-22**
OBJETIVO DEL PROYECTO	
Proteger el Patrimonio Arqueológico y Cultural de la Nación. Atender los compromisos con la comunidad del Área de Influencia Directa del proyecto.	
ACCIONES A DESARROLLAR	
Acorde a lo sugerido por el ICANH, no se van a realizar excavaciones que impliquen algún hallazgo arqueológico o antropológico, por tanto, este proyecto no aplica para la construcción de obras de mitigación y consolidación para el control de la erosión en el talud oriental del barrio Villa de los Caballeros en el municipio de Girón, departamento de Santander (RA-OBRA -02)." En caso de encontrar restos de fósiles, cerámicas y demás, se contactará al antropólogo autorizado para acordonar la zona y demás acciones de recolección de estos elementos de interés para el ICANH.	
LUGAR DE APLICACIÓN	
Comunidad del área de influencia directa de la obra (AID) y actores sociales para la construcción de obras de mitigación y consolidación para el control de la erosión en el talud oriental del barrio Villa de los Caballeros en el municipio de Girón, departamento de Santander (RA-OBRA -02)."	

2.6.9. Proyecto de Gestión socio predial (no aplica)

Proyecto de Gestión socio predial	**PGS-6.9-23**
OBJETIVO DEL PROYECTO	
Mantener o mejorar las condiciones de vida, de las unidades sociales que deben ser trasladadas por la ejecución de las obras.	

ACCIONES A DESARROLLAR
Compra de unidades sociales requeridas para la construcción de la obra En el desarrollo de la actividad constructiva no se requiere la compra de predios o bienes inmuebles, conforme el área a construir son taludes de espacio público y propiedad de la entidad estatal.
LUGAR DE APLICACIÓN
Comunidad del área de influencia directa de la obra (AID) y actores sociales para la construcción de obras de mitigación y consolidación para el control de la erosión en el talud oriental del barrio Villa de los Caballeros en el municipio de Girón, departamento de Santander (RA-OBRA -02).”

ANEXOS

ANEXO No 1. MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

	REGISTRO DE MANEJO DE RESIDUOS	Código:	SST-F-96
		Fecha:	27/07/2021
		Versión:	1

PROYECTO: **CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN EL TALUD ORIENTAL DEL BARRIO VILLA DE LOS CABALLEROS** **EN EL MUNICIPIO DE GIRÓN**	TIPO DE RESIDUO :
LUGAR: Frente de obra Villa de Los Caballeros	ORDINARIO __X_____ RECICLAJE _____


FECHA	LIQUIDO	SÓLIDO	PESO (KG)	DESCRIPCIÓN DISPOSICIÓN FINAL
10/04/2026		X	2,2	Los residuos sólidos generados y acopiados en el punto ecológico son entregados a la empresa de aseo de Girón, de acuerdo con las rutas de recolección de aseo municipal.
14/04/2026		X	1,0	
		X		
TOTAL			3,2	

PROYECTO: **CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN EL TALUD ORIENTAL DEL BARRIO VILLA DE LOS CABALLEROS** **EN EL MUNICIPIO DE GIRÓN**	TIPO DE RESIDUO :
LUGAR: Frente de obra Villa de los Caballeros	ORDINARIO _____ RECICLAJE ___X_____

FECHA	LIQUIDO	SÓLIDO	PESO (KG)	DESCRIPCIÓN DISPOSICIÓN FINAL
14/04/2026		X	1,5	Los residuos reciclabes generados en el periodo son almacenados temporalmente con los de periodos anteriores para ser entregados a un gestor legalmente constituido para realizar su aprovechamiento.
TOTAL			1,5	

Revisó: Sandra Bermudez

Cargo: Ing. Ambiental

Firma: 

ANEXO No 2. REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACION

	FORMATO ASISTENCIA DE ENTRENAMIENTO, CHARLAS Y CAPACITACIONES	Código	RH-F-28
CONSORCIO CONSOLIDACIÓN GIRÓN		Fecha	31/10/2022
		Versión	2
		Página	1 de 1

ENTRENAMIENTO [ ] CAPACITACION [X] CHARLA [ ]

OBRA Consorcio Consolidación Girón

TEMA DE CAPACITACIÓN Manejo y entrega adecuada de Residuos Solidos por finalizacion de obra.

LUGAR: Frente de obra FECHA 3 de Abril 2026

CAPACITADOR Sandra Bermudez DURACIÓN 30 min

No.	PARTICIPANTE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Edson Portilla	1098605.491	ALMACENISTA	Edson Portilla
2	estiven caicedo	1232891906	AX perforacion	estiven caicedo
3	Sebastian Parra	1005157855	Ayudante	Sebastian Parra
4	Manuel Castillo	1082871247	ayudante	Manuel
5	willington Alarcon Ay	91.479574	Ay perforación	
6	Miguel Rangel	1124048478	ay. perforacion	Miguel Rangel
7	Mauricio Suarez P	1100890118	OP	
8	Alexander Prada	13537319	Oficial	
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

OBSERVACIONES:

CAPACITADOR

FIRMA

Powered by CamScanner

ANEXO No 3. GESTION SOCIAL

ANEXOS SOCIALES

ANEXO 1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERÍODO

<table>
<tr>
<td>

Volante informativo de la Oficina de Atención a la Comunidad en la zona de obras ubicado en el campamento del sector</td>
<td>

Valla informativa de la obra de intervención en Villa de los Caballeros de Girón, zona aferente a la obra en construcción</td>
</tr>
<tr>
<td>
Actividad de arbolización en zona verde aferente a la obra constructiva de mitigación y conslidación para el control a la erosión</td>
<td>
Adecuación a paso de motocicletas y de bordillos en el área de influencia de la obra constructiva, barrio Villa de los Caballeros</td>
</tr>
<tr>
<td>
Mejoramiento de la zona de espacio público con bordillos en áreas lindantes a la obra de control a la erosión</td>
<td>
Actividades de mejora a andenes en zona lindante a la obra de consolidación y mitigación e el barrio Villa de Los Caballeros</td>
</tr>
</table>

ANEXO 2. VOLANTE INFORMATIVO DE LA OFICINA DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD EN EL BARRIO VILLA DE LOS CABALLEROS DE GIRÓN

Volante: 02

INFORMACIÓN DE LA OFICINA DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD

La Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga y el Consorcio Consolidación Girón

Informa a los actores sociales, líderes, Alcaldía, Personería, sector comercial, financiero, comunidad y residentes del área de influencia directa de la obra de **CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN EL TALUD ORIENTAL DEL BARRIO VILLA DE LOS CABALLEROS EN EL MUNICIPIO DE GIRÓN, DEPARTAMENTO DE SANTANDER (RA-OBRA-02).",** la oficina de atención a la comunidad, así:

Dirección: Calle 2C No. 16F-02 Campamento de Obra, Consorcio Consolidación Girón, Barrio Villa de los Caballeros - Girón

Horario: De lunes a viernes

Hora: De 8 a 10:00 a.m.

En esta oficina usted puede presentar sus peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y demás, en temas civiles, ambientales y sociales para ser atendidos por el Consorcio Consolidación Girón.

MAYOR INFORMACIÓN
Contratista: CONSORCIO CONSOLIDACIÓN GIRÓN
Tel: 3115557728
Correo electrónico:: consolidacion.giron@gmail.com

ANEXO 3. RESPUESTA A DERECHO DE PETICIÓN INSTAURADO POR EL SEÑOR MARCOS MARTÍNEZ SARMIENTO, RESIDENTE EN EL BARRIO VILLA DE LOS CABALLEROS DE GIRÓN

CONSORCIO	**OFICIO**	Página 1 de 6

Bucaramanga, 09 abril del 2026

Señor(a):
MARCOS MARTINEZ SARMIENTO
RESIDENTE DE LA COMUNIDAD VILLA DE LOS CABALLEROS
Correo electrónico: marsanvan0420@gmail.com

REF: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 16225.6 con objeto: "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN EL TALUD ORIENTAL DEL BARRIO VILLA DE LOS CABALLEROS EN EL MUNICIPIO DE GIRÓN, DEPARTAMENTO DE SANTANDER".

ASUNTO: Respuesta a Derecho de petición mediante correo electrónico con fecha del 27 de marzo del 2026.

Por medio de la presente y en virtud del contrato de referencia nos permitimos dar respuesta al oficio mencionado en el asunto, con relación a algunas inconformidades manifestada por el peticionario con relación a la ejecución del proyecto.

En atención a lo anterior, y una vez realizado el análisis de la información suministrada (registro fotográfico y videográfico), así como de su posterior verificación en campo el **CONSORCIO CONSOLIDACIÓN GIRÓN** se permite informar:

1. Respecto a lo aportado en el registro fotográfico con relación a la presencia de una fisura de tipo longitudinal en la fachada y una fisura transversal en un muro interno de la vivienda, es de precisar y como consta en acta de vecindad suscrita, previa a la intervención, la vivienda ya presentaba la misma patología en sus muros internos, las cuales fueron debidamente registradas.

   Ahora bien y como ya se había establecido con el peticionario en relación con parte de la evidencia aportada, durante la etapa de intervención se presentaron algunas nuevas fisuras, que como presunción se pueden aquejar en relación directa de la obra, siendo claros que este tipo de patologías en los elementos no estructurales, son normales y se pueden presentar como consecuencia de la contracción de los materiales antes los cambios de temperatura, los fenómenos naturales presentes en una zona de **alto riesgo sísmico** como lo es Girón y desviaciones propias de los procedimientos constructivos desarrollados. No obstante, se reconoce que el evento anteriormente descrito contribuyó a la ampliación de dichas fisuras.

   Dicho esto, y verificadas que no existían de acuerdo al acta de vecindad suscrita, en cumplimiento de las obligaciones contractuales y en atención al principio de responsabilidad social frente a terceros, el **CONSORCIO CONSOLIDACIÓN GIRÓN** procederá a ejecutar las actividades de reparación necesarias sobre las fisuras identificadas, con el fin de restituir las condiciones estéticas del inmueble. Estas intervenciones se encuentran programadas para ser ejecutadas durante el

mes de abril de 2026, garantizando la aplicación de procedimientos técnicos adecuados y materiales acordes a las características constructivas de la vivienda.

2. En relación con la imagen aportada, correspondiente a la ejecución de un bordillo perimetral localizado en la Calle 3B, se informa que dicha solución constructiva obedece a criterios técnicos previamente definidos en campo para el confinamiento del material en la parte baja de la obra y que previamente no existía, solicitado y conciliado con la comunidad y la JAC. En este sentido, y como resultado de los trabajos de conformación de la terraza generada durante la ejecución del proyecto, se estableció como alternativa técnica la definición de pendientes morfológicas dirigidas hacia la canaleta ubicada en el pie del talud, con el propósito de garantizar un adecuado manejo y evacuación de aguas superficiales, evitando procesos de escorrentía hacia la zona de las viviendas aledañas, por tal razón se determinó la necesidad de ejecutar un bordillo perimetral continuo en las zonas peatonales, el cual actúa como elemento de confinamiento y direccionamiento de flujos, contribuyendo a la durabilidad de la intervención y a la mitigación de riesgos asociados a la acumulación de agua. Cabe resaltar que la intervención mencionada se encuentra fuera del perímetro o área externa de la vivienda del peticionario por lo cual su construcción no tendría efecto alguno sobre queja.

   Por otro parte y dado que en el lugar existen calles sobre las cuales no hay más acceso o facilidad para automotores que por la zona de intervención, por petición de los mismos residentes, se construye la rampa de acceso como facilidad para ello, sin que genere ningún desviación o problemática, por el contrario, mejora las condiciones de accesibilidad para el lugar.

   Es importante precisar que esta solución fue socializada y concertada con el presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC), en representación de la comunidad del sector Villa de los Caballeros, sin que a la fecha se hayan presentado objeciones generalizadas por parte de los residentes, con excepción de la observación puntual realizada por el peticionario.

3. En atención al video aportado, relacionado con la construcción de una canaleta en un predio privado ubicado en la zona alta del talud, el **CONSORCIO CONSOLIDACIÓN GIRÓN** se permite informar lo siguiente:

   - Previo al inicio de las actividades constructivas en el sector Villa de los Caballeros, se evidenció que el área de intervención se encontraba en la parte baja de un predio de propiedad privada de la empresa **INGESOL LATINOAMÉRICA**, el cual no contaba con un sistema adecuado de manejo y conducción de aguas lluvias y escorrentías superficiales. Esta condición generaba que los flujos hídricos descendieran libremente hacia las zonas habitadas, ocasionando afectaciones a la comunidad y al terreno.

- Durante la fase inicial de ejecución, particularmente en las actividades de movimiento de tierras, se presentaron eventos de escorrentía superficial asociados a precipitaciones intensas. Debido a la configuración geométrica del sector y a la pendiente natural del terreno, estos flujos generaban procesos de erosión continua en el talud, así como aportes hídricos permanentes hacia la zona de obra, comprometiendo la estabilidad del terreno y las condiciones seguras de ejecución.

  En atención a esta problemática, y como medida de mitigación inmediata y de carácter provisional, se implementó un sistema de control pluvial consistente en la construcción de una canaleta en el predio mencionado, con el objetivo de interceptar, conducir y encauzar adecuadamente las aguas de escorrentía hacia una estructura de drenaje previa y existente que, por la información del propietario del predio **INGESOL LATINOAMÉRICA**, fue construida por la misma comunidad y entrega en el canal superior que descarga al disipador aportado en el video por el peticionario. De lo anterior y como se puede evidencia en el registro fílmico aportado, es fácil establecer que el canal hidráulico que viene recogiendo la mayor cantidad de agua y entrega a ese punto no fue construido por este **CONSORCIO**.





Finalmente, se aclara que la solución implementada tiene carácter provisional y estuvo orientada a garantizar condiciones adecuadas durante la ejecución del proyecto. Una vez finalizadas las actividades contractuales, la permanencia, modificación o retiro de esta infraestructura quedará sujeta a la decisión del propietario del predio, en concordancia con sus intereses y las condiciones particulares del mismo, así como el estudio de la problemática presentada por el peticionario.

4. En atención al video suministrado por el peticionario, correspondiente a un evento de fuertes lluvias ocurrido el día 18 de marzo de 2026, el **CONSORCIO CONSOLIDACIÓN GIRÓN** se permite emitir las siguientes precisiones técnicas:

   - En el material audiovisual aportado, se evidencia un disipador de energía preexistente que presenta condición de desbordamiento. Es importante precisar que dicha estructura no hace parte del alcance del contrato ejecutado por este Consorcio, toda vez que corresponde a una obra anterior a la intervención actual.

   - Frente a la afirmación realizada en el video respecto a que la obra ejecutada direcciona los flujos hacia un disipador existente, es pertinente aclarar que dicha apreciación no corresponde a la realidad técnica del proyecto. Lo manifestado es totalmente contrario a la evidencia física en campo y lo manifestado por el peticionario. Las obras ejecutadas en el marco del objeto contractual, no alteran negativamente el funcionamiento de las estructuras preexistentes dado que no se usan como direccionamiento de flujo de la escorrentía superficial para la misma como se puede observar en las siguientes imágenes:



Eventos de precipitación con flujo directo al disipador correspondiente a la pantalla existente



Punto inicial de entrega del canal superior con restricción de continuidad de flujo hacia sistema existente.

El sistema de manejo de aguas implementado en el área intervenida fue diseñado y ejecutado para garantizar la adecuada captación, conducción y descarga de las aguas de escorrentía superficial generadas dentro del alcance del proyecto. En este sentido, el control pluvial se realiza mediante la construcción de canaletas superior e inferior, integradas a una caja de inspección y asociadas a la pantalla de estabilización ejecutada, las cuales permiten interceptar y conducir los flujos hídricos de manera controlada. Estas estructuras hidráulicas direccionan el caudal en sentido **ESTE** (sentido de la obra construida), por lo cual no se entiende la afirmación contraria a lo anteriormente expresado.

- Adicionalmente, se debe señalar que parte del caudal observado proviene de áreas ubicadas en la zona alta del talud, correspondientes a predios privados externos al área de intervención. Estos aportes hídricos no hacen parte del alcance de responsabilidad del Consorcio, en la medida en que no es posible intervenir ni regular directamente las condiciones de drenaje de dichos predios sin la correspondiente autorización de sus propietarios.

Para terminar y dar claridad a lo manifestado, durante el mes de marzo y lo que va corrido de abril de 2026, estas estructuras fueron sometidas a condiciones reales de operación bajo eventos de precipitación de alta intensidad similares a los presentados en la evidencia fílmica, sin que se haya presentado eventos adversos, evidenciando un comportamiento hidráulico adecuado, sin presentar fallas funcionales ni observaciones técnicas, asegurando la descarga controlada hacia el disipador de energía construido como parte del objeto contractual.

	OFICIO	
		Página 6 de 6


Esperamos con lo anterior haber dado respuesta de forma y fondo a lo expresado por el peticionario, reiterando nuestra siempre disposición a atender de la mejor manera y en los mejores términos las observaciones de la comunidad.

Cordialmente.

ING. OSCAR ANDRES SANCHEZ JEREZ
Residente de Obra
CONSORCIO CONSOLIDACIÓN GIRÓN

ANEXOS: Actas de vecindad

CC: lalocdmb@gmail.com
notificaciones.judiciales@cdmb.gov.co
construantesas@gmail.com
dir.ordenamiental@giron-santander.gov.co
santander@defensoria.gov.co

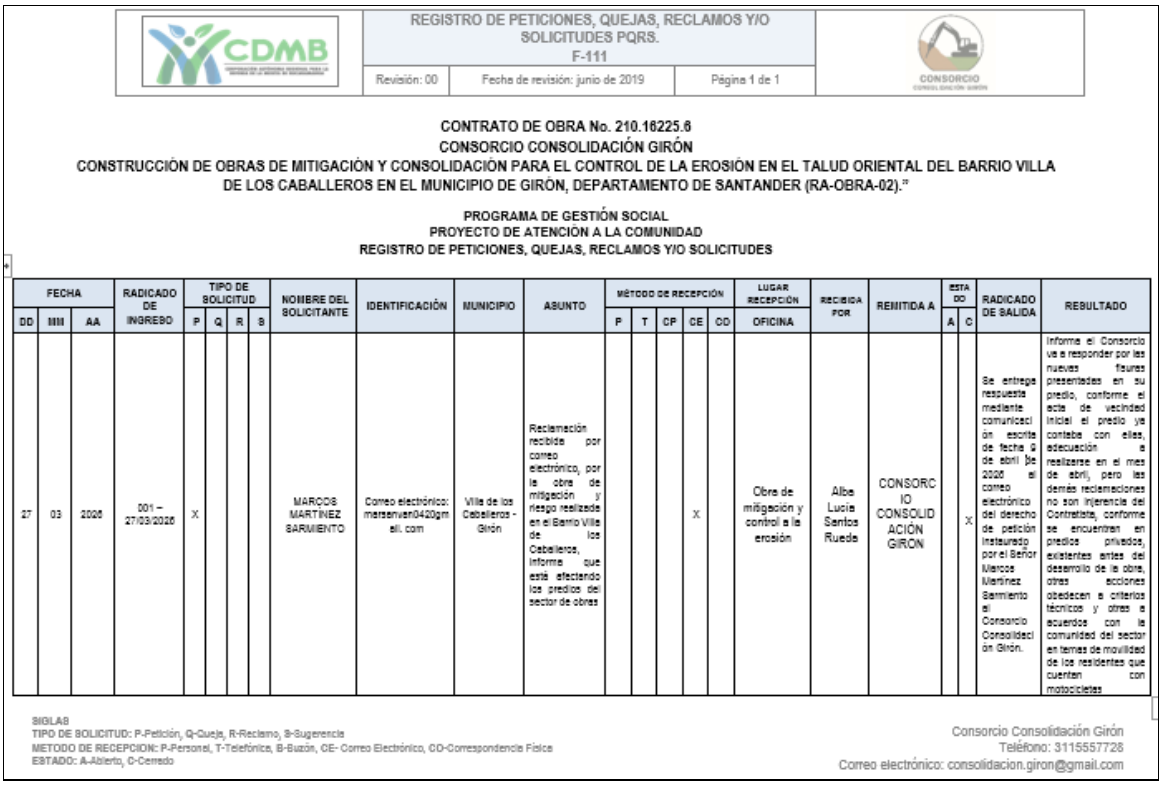

REGISTRO DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y/O SOLICITUDES PQRS.
F-111

Revisión: 00 | Fecha de revisión: junio de 2019 | Página 1 de 1

CONTRATO DE OBRA No. 210.16225.6
CONSORCIO CONSOLIDACIÓN GIRÓN
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN EL TALUD ORIENTAL DEL BARRIO VILLA DE LOS CABALLEROS EN EL MUNICIPIO DE GIRÓN, DEPARTAMENTO DE SANTANDER (RA-OBRA-02)."

PROGRAMA DE GESTIÓN SOCIAL
PROYECTO DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD
REGISTRO DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y/O SOLICITUDES

FECHA			RADICADO DE INGRESO	TIPO DE SOLICITUD				NOMBRE DEL SOLICITANTE	IDENTIFICACIÓN	MUNICIPIO	ASUNTO	MÉTODO DE RECEPCIÓN					LUGAR RECEPCIÓN	RECIBIDA POR	REMITIDA A	ESTADO		RADICADO DE SALIDA	RESULTADO
DD	MM	AA		P	Q	R	S					P	T	CP	CE	OD	OFICINA			A	C		
27	03	2026	001 – 27/03/2026	X				MARCOS MARTINEZ SARMIENTO	Correo electrónico: marsarven0420gmail. com	Villa de los Caballeros - Girón	Reclamación recibida por correo electrónico, por la obra de mitigación y riesgo realizada en el Barrio Villa de los Caballeros, informa que está afectando los predios del sector de obras				X		Obra de mitigación y control a la erosión	Albe Lucia Santos Rueda	CONSORCIO CONSOLIDACIÓN GIRON		X	Se entrega respuesta mediante comunicación escrita de fecha 9 de abril de 2026 al correo electrónico del derecho de petición instaurado por el Señor Marcos Martinez Sarmiento al Consorcio Consolidación Girón.	Informa el Consorcio ve a responder por las nuevas fisuras presentadas en su predio, conforme el acta de vecindad inicial el predio ya contaba con ellas, adecuación a realizarse en el mes de abril, pero las demás reclamaciones no son injerencia del Contratista, conforme se encuentran en predios privados, existentes antes del desarrollo de la obra, otras acciones obedecen a criterios técnicos y otras a acuerdos con la comunidad del sector en temas de movilidad de los residentes que cuentan con motocicletas

SIGLAS
TIPO DE SOLICITUD: P-Petición, Q-Queja, R-Reclamo, S-Sugerencia
METODO DE RECEPCION: P-Personal, T-Telefónica, B-Buzón, CE- Correo Electrónico, CO-Correspondencia Física
ESTADO: A-Abierto, C-Cerrado

Consorcio Consolidación Girón
Teléfono: 3115557728
Correo electrónico: consolidacion.giron@gmail.com

ANEXO 4. REGISTRO DE ACTAS DE VECINDAD DE INICIO ELABORADAS EN LOS BARRIOS VILLA DE LOS CABALLEROS DE GIRÓN

VILLA DE LOS CABALLEROS – GIRÓN

No.	Nombre	Dirección vivienda	Barrio	No. de Cédula de Ciudadanía	No. telefónico
1	ELISEO SÁNCHEZ CARVAJAL	Calle 3 No. 16 F - 03	Villa de los Caballeros	91.343.755	3005721236
2	JUAN CARLOS NÚÑEZ CHAPARRO	Calle 3 B pt No. 16 F - 02	Villa de los Caballeros	13.511.022	3173181136
3	ABEL JHAIR RUEDA VELASCO	Transv. 16 No. 4 - 08	Villa de los Caballeros	1.005.326.107	3103712981
4	JAVIER RODRÍGUEZ ROJAS	Calle 3 No. peatonal 16 F - 03	Villa de los Caballeros	91.478.561	3184134927
5	NANCY PINZÓN OLARTE	Carrera 16 F No. 2 A - 38	Villa de los Caballeros	63.525.898	3156270694
6	NOELIA GOITIA ROBERTIS	Calle 3 No. 16 - 09	Villa de los Caballeros	9809154	3023218065
7	GABRIEL ORLANDO PORRAS ARÉVALO	Calle 2 Lote 2 INGESOL LATINOAMÉRICA	Villa de los Caballeros	13.543.806	3103214912
8	WILSON SALAZAR DULCEY	Calle 4 No. 16 F - 03	Villa de los Caballeros	91.266.438	3003579595

No.	Nombre	Dirección vivienda	Barrio	No. de Cédula de Ciudadanía	No. telefónico
9	ENRIQUE GAMBOA	Calle 3 A pt No. 16 F - PAR SIN NOMENCLATURA	Villa de los Caballeros	91.280.103	3043550191
10	SANDRA MILENA CALDERÓN ANAYA	Calle 3 B No. 16 F - 03	Villa de los Caballeros	63.559.752	3115742491
11	JOSÉ DEL CARMEN ESPARZA MALAGÓN	Áreas de vías y entorno Villa de los Caballeros	Villa de los Caballeros	19.306.218	3175610423
11	MELISSA DONADO ARIAS	Calle 3 No. 16 - 08	Villa de los Caballeros	1.098.704.436	3135095842
12	MELISSA DONADO ARIAS	Calle 3 Pt 16 F - 02	Villa de los Caballeros	1.098.704.436	3135095842
13	MELISSA DONADO ARIAS	Carrera 16 E pt No. 2 B - 15	Villa de los Caballeros	1.098.704.436	3135095842
14	MELISSA DONADO ARIAS	Transv. 16 pt 4 - 14 - 16	Villa de los Caballeros	1.098.704.436	3135095842
15	MELISSA DONADO ARIAS	TRANSV 16 pt No. 4 - 02	Villa de los Caballeros	1.098.704.436	3135095842
16	MELISSA DONADO ARIAS	Transv 16 No. 4 - 26	Villa de los Caballeros	1.098.704.436	3135095842
17	JOSÉ DEL CARMEN ESPARZA MALAGÓN	Áreas de entorno, andenes, fachada y vías de acceso a la obra	Villa de los Caballeros	19.306.218	3175610423
18	SANDRA CALDERÓN	Calle 3 B No. 16 F - 03	Villa de los Caballeros	63.559.752	3115742491

ANEXO 5. REGISTRO DE LA MANO DE OBRA LOCAL PARA LA OBRA DE MITIGACIÓN Y CONTROL A LA EROSIÓN – PROGRAMA DE GENERACIÓN DE EMPLEO –

CONTRATO DE OBRA No. 210.16225.6
CONSORCIO CONSOLIDACIÓN GIRÓN
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN EL TALUD ORIENTAL DEL BARRIO VILLA DE LOS CABALLEROS EN EL MUNICIPIO DE GIRÓN, DEPARTAMENTO DE SANTANDER (RA-OBRA-02).”

No.	NOMBRE COMPLETO	C.C. No.	FECHA DE NACIMIENTO	LUGAR DE NACIMIENTO	DIRECCIÓN	NÚMERO TELEFÓNICO	CARGO
1	ISAÍ BAUTISTA PINZÓN	1096193312	25/11/1987	Carmen de Chucurí - Santander	Barrio Carrizal - Girón	3112094081	Operador
2	WILLINGTON ALARCÓN ASCANIO	31.479.571	5/10/1975	Bucaramanga - Santander	Barrio Rincón de Girón	3185916429	Ayudante de obra
3	MANUEL ENRIQUE CASTILLO FLÓREZ	1.082.871.247	31/10/2005	Santa Marta - Magdalena	Barrio Villa de los Caballeros - Girón	3107438575	Ayudante de obra
4	JHON ALEXÁNDER CÁCERES PABÓN	1.102.383.713	11/03/1997	Bucaramanga - Santander	Barrio Brisas del Río	3224057528	Ayudante de obra
5	SEBASTIÁN PARRA FERRER	1.005.157.855	24/03/2003	Girón - Santander	Barrio Paraiso Alto	3214025171	Ayudante de obra

ANEXO No.04: INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONSORCIO CONSOLIDACIÓN GIRÓN	**INFORME DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**	CDMB

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN EL TALUD ORIENTAL DEL BARRIO VILLA DE LOS CABALLEROS EN EL MUNICIPIO DE GIRÓN, DEPARTAMENTO DE SANTANDER.

INFORME SST N° 07

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSOLIDACIÓN GIRÓN

CONSORCIO
CONSOLIDACIÓN GIRÓN

Melissa Donado Arias

ELABORADO POR:
CLARA MELISSA DONADO ARIAS
PROFESIONAL SISO

PERIODO DEL INFORME
DEL 01 AL 14 DE ABRIL DE 2026

Tabla de contenido

1. INTRODUCCIÓN 3

2. OBJETIVOS DEL INFORME. 4

2.1 OBJETIVO GENERAL 4

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 4

3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 5

4. RELACIÓN DE PERSONAL Y NOVEDADES. 6

4.1 PERSONAL 6

4.2 NOVEDADES DE INGRESO. 8

5. PARTICIPACIÓN Y CONSULTA. 9

5.3 REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS. (RACI) 10

6. ENTREGA Y/O REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL. 10

7. PROCESOS DE FORMACIÓN. 10

8. INSPECCIONES DE SEGURIDAD 11

9. GESTIÓN DE LOS PELIGROS Y RIESGOS. 11

9.1 MEDIDAS PREVENTIVAS. 11

10. REPORTE DE INCIDENTES Y ACCIDENTES DE TRABAJO 12

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento describe la gestión en Seguridad y Salud en el trabajo del proyecto **"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN EL TALUD ORIENTAL DEL BARRIO VILLA DE LOS CABALLEROS EN EL MUNICIPIO DE GIRÓN, DEPARTAMENTO DE SANTANDER"** en el periodo comprendido entre el **01 AL 14 DE ABRIL DE 2026;** en el mismo se reflejan y relacionan actividades ejecutadas, registros fotográficos y evidencias necesarias para respaldar la conformidad del sistema de Gestión SST en el marco de la prevención de riesgos, cumplimiento legal y contractual aplicables.

La estructura del informe esta direccionada desde un objetivo general y el cumplimiento de cada uno de los objetivos específicos descritos en el mismo, dentro de los cuales se podrá encontrar la relación del personal disponible para la ejecución del proyecto, rotación durante el periodo, conformación de los diferentes comités, mecanismos de participación y consulta dirigidos hacia la prevención de riesgos laborales, entre otros mecanismos necesarios para el eficaz desempeño de las actividades realizadas y registros de afiliación a seguridad social de la población trabajadora.

Comprometidos con el bienestar de la población trabajadora y la prevención continua de riesgos y accidentes laborales, presentamos este documento para que sea un soporte y ayuda para verificar el cumplimiento del plan de trabajo direccionado desde el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

2. OBJETIVOS DEL INFORME.

2.1 OBJETIVO GENERAL

Soportar la ejecución de actividades y cumplimiento del plan de trabajo del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud el trabajo del proyecto "**CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN EL TALUD ORIENTAL DEL BARRIO VILLA DE LOS CABALLEROS EN EL MUNICIPIO DE GIRÓN, DEPARTAMENTO DE SANTANDER"** por medio de fotografías, actas, soportes y otros asociados al mejoramiento de la calidad de vida de la población trabajadora.

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Presentar los soportes de inducción y/o re inducción y seguridad social vigente de toda la población trabajadora del proyecto.
- Describir las actividades desarrolladas en los diferentes comités y demás mecanismos de participación y consulta en materia de Seguridad y salud en el trabajo.
- Soportar la entrega de elementos de protección personal especifico y acordes a los factores de riesgos expuestos, suministrados a los trabajadores involucrados en el proyecto.
- Comunicar el avance y ejecución de las actividades del Sistema de seguridad y salud en el trabajo.
- Establecer medidas de control preventivas con el fin de mitigar y minimizar los riesgos potenciales que pueden generar accidentes de trabajo o enfermedades laborales a los trabajadores.
- Sensibilización a los trabajadores del contrato en mención la importancia de mantener ambientes y conductas de trabajo seguro.
- Establecer lineamientos técnicos para el desarrollo de las actividades y la correcta ejecución.

3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

NOMBRE DE LA EMPRESA	CONSORCIO CONSOLIDACIÓN GIRÓN
NIT	901.982.571-5
REPRESENTANTE LEGAL	JOHANNA MARCELA PADIERNA CASTIBLANCO
CONTRATO	210.16225.6
OBJETO DEL CONTRATO	"**CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN EL TALUD ORIENTAL DEL BARRIO VILLA DE LOS CABALLEROS EN EL MUNICIPIO DE GIRÓN, DEPARTAMENTO DE SANTANDER**"
DIRECCIÓN	Carrera 39 N° 51 – 31, Apto 2405
TELÉFONO	3012765665
CLASE DE RIESGO	V
	Actividad económica: construcción de obras de ingeniería civil incluye solamente a empresas dedicadas a el montaje y/o reparación de oleoductos

4. RELACIÓN DE PERSONAL Y NOVEDADES.

En este numeral se presentan las relaciones del personal disponible, novedades de ingreso y retiro del personal dispuesto para la ejecución del proyecto en el periodo de tiempo descrito para el presente informe.

4.1 PERSONAL

A continuación, se presenta el personal vinculado para la ejecución del proyecto, en el periodo.

Tabla No. 1. Personal Staff

PERSONAL ACTIVO EN OBRA							
PERIODO: DEL 01 AL 14 DE ABRIL DE 2026							
CONTRATISTA: CONSORCIO CONSOLIDACIÓN GIRÓN							
NOMBRE COMPLETO	**NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN**	**CARGO**	**FECHA DE INGRESO**	**ARL**	**EPS**	**AFP**	**CCF**
María Lucia Higuera Pino	1.095.700.657	Geotecnista	15/10/2025	Axa Colpatria	Sura	Colpensiones	No Cotiza
Johana Paola Ospino Rodelo	1.098.618.429	Asesor ambiental	15/10/2025	Axa Colpatria	Sanitas	Colpensiones	No Cotiza
Juan Carlos Rincón Lozano	80.089.079	PMP	15/10/2025	Axa Colpatria	sanitas	Colfondos	No Cotiza
Isaías García Jaimes	1.101.596.200	Operador de perforación I	15/10/2025	Axa Colpatria	Nueva EPS	Porvenir	Comfenalco
Jarrinson Steven Camarón Caicedo	1.232.891.906	Ayudante de perforación II	15/10/2025	Axa Colpatria	Nueva EPS	Porvenir	Comfenalco
Miguel Antonio Rangel Florián	1.124.048.478	Ayudante de perforación II	15/10/2025	Axa Colpatria	Nueva EPS	Colpensiones	Comfenalco
Jesús Alberto Mayorga Mayorga	1.101.520.618	Ayudante de obra	15/10/2025	Axa Colpatria	Sanitas	Colpensiones	Comfenalco
Willington Alarcón Ascanio	91.479.571	Ayudante de perforación II	05/11/2025	Axa Colpatria	Nueva EPS	Porvenir	Comfenalco
Manuel Enrique Castillo Flórez	1.082.871.247	Ayudante de obra	06/11/2025	Axa Colpatria	Coosalud	Porvenir	Comfenalco

Edson Alexander Portilla Ardila	1.098.605.491	Almacenista	24/11/2025	Axa Colpatria	Salud Total	Porvenir	Comfenalco
Giovany Sebastián Parra Ferrer	1.005.157.855	Ayudante de obra	01/12/2025	Axa Colpatria	Sanitas	Porvenir	Comfenalco
TOTAL, PERSONAL CONTRATISTA					11		
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES CONAINCO S.A.S.							
NOMBRE COMPLETO	**NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN**	**CARGO**	**FECHA DE INGRESO**	**ARL**	**EPS**	**AFP**	**CCF**
Edgar Leonardo Gómez Roncancio	72.254.372	Director de obra	15/10/2025	Axa Colpatria	Sura	Colfondos	Cajasan
TOTAL, PERSONAL CONTRATISTA					1		
CONTRATISTA: INFRACORP S.A.S.							
NOMBRE COMPLETO	**NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN**	**CARGO**	**FECHA DE INGRESO**	**ARL**	**EPS**	**AFP**	**CCF**
Oscar Andrés Sánchez Jerez	1.098.756.647	Ingeniero residente	15/10/2025	Axa Colpatria	Sura	Protección	Comfenalco
Clara Melissa Donado Arias	1.098.704.436	Profesional SISO	15/10/2025	Axa Colpatria	Sura	Protección	Comfenalco
Alexander Prada Jerez	13.537.319	Oficial	15/10/2025	Axa Colpatria	Nueva EPS	Colfondos	Comfenalco
Fabián Leonardo Zambrano Lesmes	1.098.673.915	Topógrafo	15/10/2025	Axa Colpatria	Coosalud	Colpensiones	Comfenalco
Sandra Yolima Bermúdez Cala	63.553613	Profesional ambiental	01/11/2025	Axa Colpatria	Ecopetrol	Porvenir	Comfenalco
TOTAL, PERSONAL CONTRATISTA					5		
TOTAL, PERSONAL EN OBRA					**17**		

Para la ejecución de la obra se cuenta con personal de mano de obra calificado y no calificado. Todos se encuentran afiliados a ARL, EPS, AFP, conforme a las disposiciones laborales aplicables.

Ver anexo No 1. Afiliaciones y/o planilla de pagos de seguridad social.

4.2 NOVEDADES DE INGRESO.

Durante el periodo correspondiente al presente informe, no se presentaron novedades de ingreso de personal.

Tabla No 2. Novedades de Ingreso

NOVEDADES DE INGRESO			
PERIODO: DEL 01 AL 14 DE ABRIL DE 2026			
CONTRATISTA: CONSORCIO CONSOLIDACIÓN GIRÓN			
NOMBRE COMPLETO	**NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN**	**CARGO**	**FECHA DE INGRESO**
NA	NA	NA	NA

4.3 NOVEDADES DE RETIRO

Durante el periodo del informe, se presentaron las siguientes novedades de retiro de personal:

NOVEDADES DE RETIRO DE PERSONAL		
PERIODO: DEL 01 AL 14 DE ABRIL DE 2026		
NOMBRE COMPLETO	**NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN**	**FECHA DE RETIRO**
Isaías García Jaimes	1.101.596.200	14/04/2026
Jarrinson Steven Camarón Caicedo	1.232.891.906	14/04/2026
Miguel Antonio Rangel Florián	1.124.048.478	14/04/2026
Jesús Alberto Mayorga Mayorga	1.101.520.618	14/04/2026
Willington Alarcón Ascanio	91.479.571	14/04/2026
Manuel Enrique Castillo Flórez	1.082.871.247	14/04/2026
Edson Alexander Portilla Ardila	1.098.605.491	14/04/2026
Giovany Sebastián Parra Ferrer	1.005.157.855	14/04/2026

María Lucia Higuera Pino	1.095.700.657	14/04/2026
Johana Paola Ospino Rodelo	1.098.618.429	14/04/2026
Juan Carlos Rincón Lozano	80.089.079	14/04/2026

Ver anexo No 2. Novedades de retiro de personal.

Nota: los documentos de retiro complementarios se adjuntarán en el informe final SST.

4.4 PERSONAL ROTATIVO

Durante el periodo correspondiente al presente informe, no se requirió la presencia de personal rotativo en obra, teniendo en cuenta las actividades técnicas programadas.

5. PARTICIPACIÓN Y CONSULTA.

Dentro de los mecanismos de participación y consulta se encuentra el Comité Paritario de Seguridad y salud en el trabajo COPASST o Vigía, el comité de convivencia laboral CCL y mecanismos de notificación de riesgos por parte de la población trabajadora.

5.1 COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Para el informe en mención y dando cumplimiento a la Resolución 2013 de 1986, modificada por el Decreto 1295 de 1994 y el Decreto 1072 de 2015, se llevó a cabo reunión del comité paritario de seguridad y salud en el trabajo. Se adjunta acta de realizada el día 10 de abril de 2026.

Ver anexo N° 3. Acta de reunión Copasst.

5.2 COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL

La reunión del comité de convivencia laboral se llevó a cabo el día 10 de abril de 2026. Cabe resaltar que las reuniones y el informe de su gestión se presentará de manera mensual, teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en la normatividad legal vigente aplicable.

Ver anexo N° 4. Acta de reunión CCL.

5.3 REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS. (RACI)

Durante el periodo en reporte no se presentaron situaciones para reporte por parte de la población trabajadora los siguientes RACI.

6. ENTREGA Y/O REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL.

Es responsabilidad del empleador el suministro de los elementos de protección individual y dotación para la ejecución de las actividades de manera segura y de acuerdo a los perfiles del personal y las exigencias de las tareas a ejecutar; se realizó entrega de los elementos de protección de acuerdo a la vida útil del EPP y la necesidad del trabajador, a su vez se realizaron inspecciones periódicas de estos elementos con el fin de tener abastecido al personal.

Tabla 4. Entrega de dotación y EPP

ACTIVIDAD DESARROLLADA	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Entrega y/o reposición de elementos de protección personal	De acuerdo a la necesidad y desgaste normal de los elementos de protección, se realizó reposición de los mismos.

Ver anexo No 5. Registros de entrega de elementos de protección personal y dotación.

7. PROCESOS DE FORMACIÓN.

La formación es una estrategia indispensable para alcanzar los objetivos propuestos en el SGSST. Mediante estas se pretende lograr que todos los trabajadores involucrados en este proyecto, de todos los niveles, adquieran los conocimientos, actitudes y prácticas necesarios para generar ambientes de trabajos sanos, seguro y confortable.

Tabla N° 5. Capacitaciones SST en el periodo

CAPACITACIONES		
ITEM	**FECHA**	**TEMA**
1	07/04/2026	¿Qué es higiene postural?

Ver anexo No 6. Registro de asistencia a capacitaciones SST.

8. INSPECCIONES DE SEGURIDAD

Una de las herramientas más utilizadas para Identificar peligros, para posteriormente ser evaluados, son las Inspecciones a sitios de trabajo, pues determinan el tipo de peligro al que está expuesto el trabajador en su área, constituye una prueba real de las condiciones laborales ya que se basa en la verificación de las diferentes zonas con las cuales tiene contacto el trabajador, además permite encontrar las fallas que pueden acarrear algún tipo de accidente y los posibles causales de enfermedad laboral.

Tabla 6. Inspecciones de seguridad realizadas en el periodo

INSPECCIÓN DESARROLLADA	FECHA DE INSPECCIÓN
Inspección de Elementos de Protección Personal	08/04/2026
Inspección de botiquín y camilla	08/04/2026
Inspección de extintores	09/04/2026
Inspección locativa de obra	02/04/2026
Inspección de herramientas	Del 06 al 10 de abril de 2026

Ver anexo No 7. Inspecciones de Seguridad.

9. GESTIÓN DE LOS PELIGROS Y RIESGOS.

La gestión de los riesgos peligros prioritarios en el trabajo requiere mecanismos de prevención adicionales que permitan la gestión adecuada del riesgo, permitiendo ambientes de trabajo más seguros, en este numeral se relacionan las gestiones desarrolladas.

9.1 MEDIDAS PREVENTIVAS.

Tabla No. 9. Medidas preventivas adoptadas en el periodo

PELIGRO	GESTIÓN DE LOS PELIGROS	FECHA (S) DE REALIZACIÓN.

- Caídas, golpes, electrocución, heridas	- Señalización de riesgos y peligros; encerramiento - Inducción y/o reinducción SST - Diligenciamiento y aprobación de permisos de trabajo	Del 01 al 14 de abril de 2026

Ver anexo No 8. Registro Fotográfico

Ver anexo No 9. Medidas preventivas

10. REPORTE DE INCIDENTES Y ACCIDENTES DE TRABAJO

Se hace relación al número de incidentes/accidentes/enfermedad laboral registrados en el espacio del informe que sea por causa u ocasión de las labores desempeñadas dentro del área de trabajo o encomendadas por personal supervisor o subcontratista. Dentro del presente informe se presenta la relación del número de eventos presentados, la gestión y plan de trabajo se anexará dentro de las investigaciones pertinentes.

Para el periodo que corresponde al presente informe, no se presentaron eventos relacionados con accidentes de trabajo

Tabla No. 10. Consolidado de incidentes y/o accidentes:

N°	MES	N° AT			N° TRABAJ	DIAS INCAPACIDAD	DÍAS CARGADOS	TOTAL DIAS TRABAJADOS	TOTAL HORAS EXTRAS	HORAS HOMBRE TRABAJADAS	INDICES				
		SI	CI	TOTAL							MES	IF	IS	TASA	ILI
1	oct-25	0	0	0	14	0	0	14	0	1568	oct-25	0,00	0,00	0,00	0,00
2	nov-25	0	0	0	19	0	0	21	0	3192	nov-25	0,00	0,00	0,00	0,00
3	dic-25	0	0	0	19	0	0	22	0	3344	dic-25	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ene-26	0	0	0	19	0	0	24	0	3648	ene-26	0,00	0,00	0,00	0,00
5	feb-26	0	0	0	19	0	0	22	0	3344	feb-26	0,00	0,00	0,00	0,00
6	mar-26	0	0	0	18	0	0	23	0	3312	mar-26	0,00	0,00	0,00	0,00
7	abr-26	0	0	0	17	0	0	9	0	1224	abr-26	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0	0	0	17,9	0,0	0,0	57,0	0,0	19632,0	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Imagen 1. Distribución del índice de frecuencia

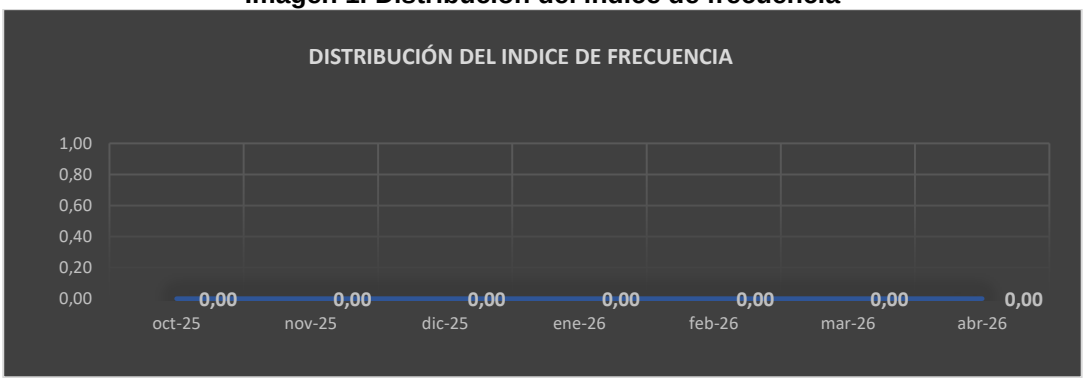


Imagen 2. Tasa de accidentalidad

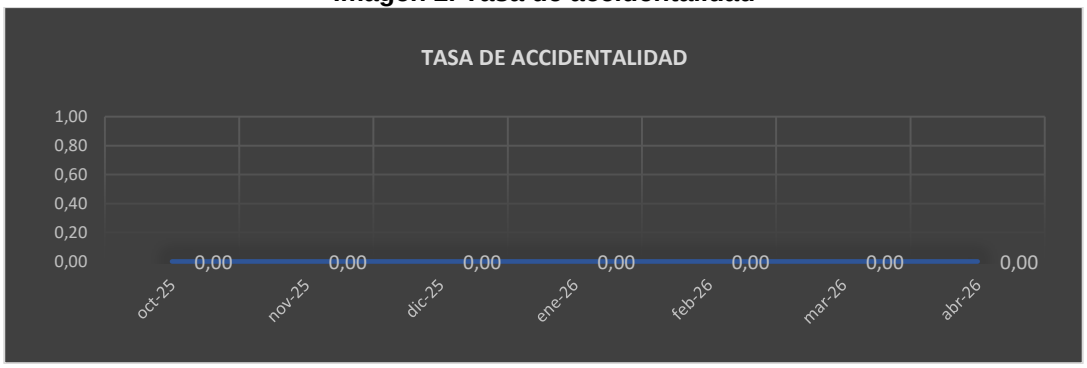


Imagen 3. Número de trabajadores mensual


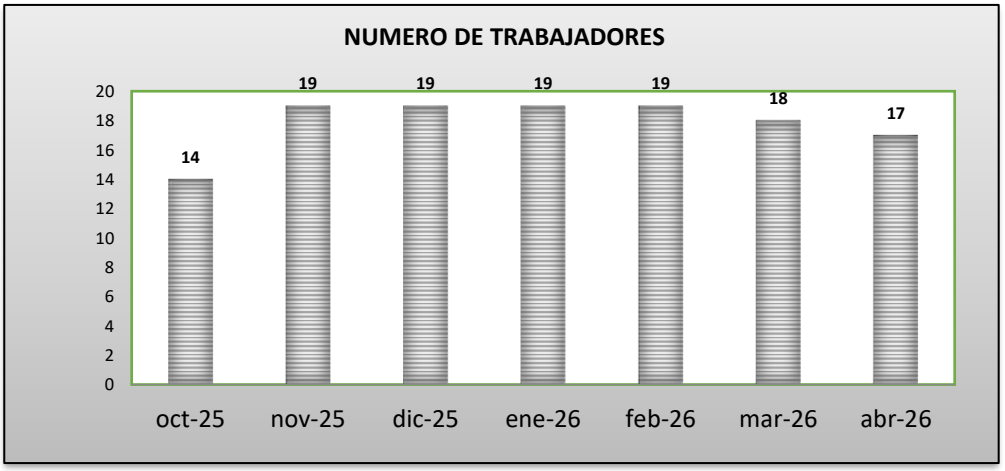


Imagen 4. Total, de accidentes de trabajo

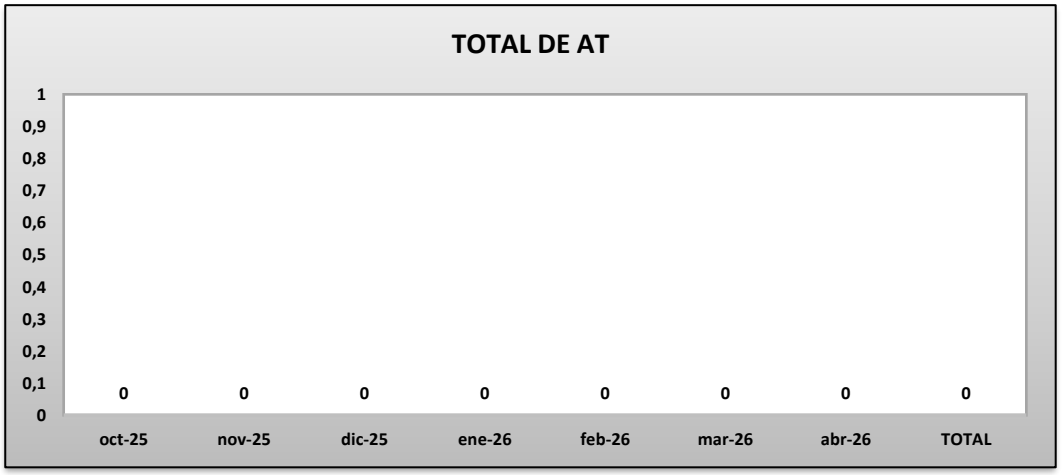

ANEXO N° 1
AFILIACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-04-14, 05:01:12 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1081281840

Periodo Cotización: abril de 2026 **Periodo Servicio:** mayo de 2026

PAGADO 14/04/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSORCIO CONSOLIDACION GIRON		
Documento	NI901982571	**Dirección**	CR 39 #51 - 31 AP 2405
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3012765665
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal	PADIERNA CASTIBLANCO JOHANNA MARCELA	**Identificación**	CC 1098682052
Total Afiliados	8	**ARP**	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1005157855	GIOVANY SEBASTIAN PARRA FERRER	01	00		X								X							0	10	10	10	10	(230301) PORVENIR	$ 663.222	$ 106.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 663.222	$ 26.600	6,960	$ 663.222	$ 46.200	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 576.622	$ 23.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 202.100
CC 1005157855	GIOVANY SEBASTIAN PARRA FERRER	01	00														X			0	5	5	5	5	(230301) PORVENIR	$ 296.293	$ 47.500	(EPS005) EPS SANITAS	$ 296.293	$ 11.900	0,000	$ 296.293	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 291.818	$ 11.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 71.100
CC 1082871247	MANUEL ENRIQUE CASTILLO FLOREZ	01	00		X								X							0	10	10	10	10	(230301) PORVENIR	$ 749.176	$ 119.900	(ESSC24) EPS-S COOSALUD	$ 749.176	$ 30.000	6,960	$ 749.176	$ 52.200	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 729.279	$ 29.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 231.300
CC 1082871247	MANUEL ENRIQUE CASTILLO FLOREZ	01	00														X			0	5	5	5	5	(230301) PORVENIR	$ 301.766	$ 48.300	(ESSC24) EPS-S COOSALUD	$ 301.766	$ 12.100	0,000	$ 301.766	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 291.818	$ 11.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 72.100
CC 1098605491	EDSON ALEXANDER PORTILLA ARDILA	01	00		X								X							0	10	10	10	10	(230301) PORVENIR	$ 719.697	$ 115.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 719.697	$ 28.800	6,960	$ 719.697	$ 50.100	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 649.141	$ 26.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 220.100
CC 1098605491	EDSON ALEXANDER PORTILLA ARDILA	01	00														X			0	5	5	5	5	(230301) PORVENIR	$ 321.165	$ 51.400	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 321.165	$ 12.900	0,000	$ 321.165	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 316.667	$ 12.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 77.000
CC 1101520618	JESUS ALBERTO MAYORGA MAYORGA	01	00										X							0	25	25	25	25	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.669.396	$ 267.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.669.396	$ 66.800	6,960	$ 1.669.396	$ 116.200	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.669.396	$ 66.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 517.000
CC 1101520618	JESUS ALBERTO MAYORGA MAYORGA	01	00														X			0	5	5	5	5	(25-14) COLPENSIONES	$ 310.057	$ 49.700	(EPS005) EPS SANITAS	$ 310.057	$ 12.500	0,000	$ 310.057	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 291.818	$ 11.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 73.900
CC 1101596200	ISAIAS GARCIA JAIMES	01	00		X															0	13	13	13	13	(230301) PORVENIR	$ 796.662	$ 127.500	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 796.662	$ 31.900	6,960	$ 796.662	$ 55.500	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.036.830	$ 41.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 256.400
CC 1101596200	ISAIAS GARCIA JAIMES	01	00														X			0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 128.831	$ 20.700	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 128.831	$ 5.200	0,000	$ 128.831	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 122.564	$ 5.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 30.900
CC 1124048478	MIGUEL ANTONIO RANGEL FLORIAN	01	00		X								X							0	10	10	10	10	(230301) PORVENIR	$ 663.222	$ 106.200	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 663.222	$ 26.600	6,960	$ 663.222	$ 46.200	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 712.953	$ 28.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 207.600
CC 1124048478	MIGUEL ANTONIO RANGEL FLORIAN	01	00														X			0	5	5	5	5	(230301) PORVENIR	$ 296.792	$ 47.500	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 296.792	$ 11.900	0,000	$ 296.792	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 291.818	$ 11.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 71.100
CC 1232891906	JARRINSON STEVEN CAMARON CAICEDO	01	00		X								X							0	10	10	10	10	(230301) PORVENIR	$ 769.072	$ 123.100	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 769.072	$ 30.800	6,960	$ 769.072	$ 53.600	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 819.144	$ 32.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 240.300
CC 1232891906	JARRINSON STEVEN CAMARON CAICEDO	01	00														X			0	5	5	5	5	(230301) PORVENIR	$ 291.818	$ 46.700	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 291.818	$ 11.700	0,000	$ 291.818	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 291.818	$ 11.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100
CC 91479571	WILLINGTONG ALARCON ASCANIO	01	00		X								X							0	10	10	10	10	(230301) PORVENIR	$ 673.170	$ 107.800	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 673.170	$ 27.000	6,960	$ 673.170	$ 46.900	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 655.811	$ 26.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000
CC 91479571	WILLINGTONG ALARCON ASCANIO	01	00														X			0	5	5	5	5	(230301) PORVENIR	$ 295.134	$ 47.300	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 295.134	$ 11.900	0,000	$ 295.134	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 291.818	$ 11.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.900

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 8.945.473	$ 8.945.473	$ 8.945.473	$ 9.039.315	$ 1.432.200	$ 358.600	$ 466.900	$ 362.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.619.900	$ 0	$ 2.619.900

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-04-14, 05:00:37 PM **Tipo Planilla:** Y: PLANILLA INDEPENDIENTES EMPRESAS **Numéro Planilla:** 1081282725

Periodo Cotización: abril de 2026 **Periodo Servicio:** abril de 2026

PAGADO 14/04/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSORCIO CONSOLIDACION GIRON		
Documento	NI901982571	**Dirección**	CR 39 #51 - 31 AP 2405
Tipo de Empresa	CONTRATANTE	**Teléfono**	3012765665
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal	PADIERNA CASTIBLANCO JOHANNA MARCELA	**Identificación**	CC 1098682052
Total Afiliados	3	**ARP**	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1095700657	MARIA LUCIA HIGUERA PINO	59	00		T															0	0	0	15	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	6,960	$ 875.453	$ 61.000	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 61.000
CC 1098618429	JOHANA PAOLA OSPINO RODELO	59	00		T															0	0	0	15	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	6,960	$ 875.453	$ 61.000	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 61.000
CC 80089079	JUAN CARLOS RINCON LOZANO	59	00		T															0	0	0	15	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	6,960	$ 875.453	$ 61.000	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 61.000

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 0	$ 0	$ 2.626.359	$ 0	$ 0	$ 0	$ 183.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 183.000	$ 0	$ 183.000

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

ANEXO N° 2
DOCUMENTOS DE RETIRO

CONSORCIO CONSOLIDACIÓN GIRÓN	**FINALIZACIÓN POR OBRA O LABOR**	**Código**	RH-F-16
		Fecha	29/07/2023
		Versión	2
		Pagina 1 de 1	

Bucaramanga, 13 de marzo de 2026

Señor(a)

Isaías Garcia Jaimes

Cédula de Ciudadanía 1.101.596.200

Operador de Perforación I

~~**Asunto: Notificación de terminación de contrato de trabajo por terminacion de la obra o labor contratada.**~~

Me permito manifestarle que la obra o labor para la cual fue Ud contratado, en la empresa **CONSORCIO CONSOLIDACION GIRON**, el **08 de octubre de 2025**, se encuentra finalizada, razón por la cual se procede a la liquidación definitiva de su contrato de trabajo de conformidad con el literal del articulo 61 del código sustantivo del trabajo, terminación que se hace efectiva el dia 14 **de abril de 2026.**

Agradecemos que al recibir esta notificación, contacte al área de gestión humana para iniciar el tramite correspondiente, indicarle el proceso para realizarse los exámenes de egreso, iniciar el tramite de su liquidación de prestaciones sociales y salario adeudados conforme a lo enunciado en el Código Sustantivo del Trabajo.

Es oportuno manifestarle nuestro agradecimiento por su labor prestada en la empresa, por lo que nos vemos en la obligación de resaltar y aplaudir su desempeño.

Atentamente,



JOHANNA MARCELA PADIERNA CASTIBLANCO

Representante Legal

Contacto: consolidacion.giron@gmail.com

Recibí:

Firmado electrónicamente por:

Nombre	Isaías Garcia Jaimes
Número de Documento	1.101.596.200
Email	isaias25043@gmail.com
Fecha	10/04/2026 a las 12:38
IP	127.0.0.1
Token	953779883edefa64f40a584022652b32

El código QR que se muestra a continuación es únicamente referencial y no tiene validez legal ni funcional

CONSORCIO CONSOLIDACIÓN GIRÓN	**FORMATO ORDEN EXAMEN DE RETIRO OCUPACIONAL**	**Código**	SST-F-37
		Fecha	22/08/2022
		Versión	2

Bucaramanga,

Isaías Garcia Jaimes

Cédula de Ciudadanía No. **1.101.596.200**

Operador de Perforación I

CONSORCIO CONSOLIDACION GIRON

Dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1072 de 2015, y en la Resolución 1443 de 2007, me permito notificarle que a partir de la fecha de terminación del vinculo laboral con **CONSORCIO CONSOLIDACION GIRON** dispone de 5 (cinco) días para presentarse a la práctica del correspondiente EVALUACIÓN MÉDICA OCUPACIONAL DE RETIRO, en:

IPS: Unisalud Salud Ocupacional ltda.

Dirección: CALLE 51A # 31 - 66 Bucaramanga - Santander

**Debe confirmar con el area de gestión humana previamente para asigar hora de la consulta.*

Finalizado tal tiempo sin que usted asista a la citación, se entenderá que renuncia a la práctica de tal, y la empresa no se hará responsable de las condiciones de salud que el trabajador reporte después del retiro.

La presente orden se expide digitalmente a los 14 días del mes de abril de 2026.

Melissa Donado Arias

Clara Melissa Donado

Coordinador SST

Contacto:

Firmado electrónicamente por:

Nombre	Isaías Garcia Jaimes
Número de Documento	1.101.596.200
Email	isaias25043@gmail.com
Fecha	10/04/2026 a las 12:05
IP	127.0.0.1
Token	d6f930035a11289907f50725d8f6f0c2

El código QR que se muestra a continuación es únicamente referencial y no tiene validez legal ni funcional



CONSORCIO CONSOLIDACIÓN GIRÓN	**FINALIZACIÓN POR OBRA O LABOR**	**Código**	RH-F-16
		Fecha	29/07/2023
		Versión	2
		Pagina 1 de 1	

Bucaramanga, 13 de marzo de 2026

Señor(a)

Jarrinson Steven Camaron Caicedo

Cédula de Ciudadanía 1.232.891.906

Ayudante de Perforación II

~~**Asunto: Notificación de terminación de contrato de trabajo por terminacion de la obra o labor contratada.**~~

Me permito manifestarle que la obra o labor para la cual fue Ud contratado, en la empresa **CONSORCIO CONSOLIDACION GIRON**, el **08 de octubre de 2025**, se encuentra finalizada, razón por la cual se procede a la liquidación definitiva de su contrato de trabajo de conformidad con el literal del articulo 61 del código sustantivo del trabajo, terminación que se hace efectiva el dia **14 de abril de 2026.**

Agradecemos que al recibir esta notificación, contacte al área de gestión humana para iniciar el tramite correspondiente, indicarle el proceso para realizarse los exámenes de egreso, iniciar el tramite de su liquidación de prestaciones sociales y salario adeudados conforme a lo enunciado en el Código Sustantivo del Trabajo.

Es oportuno manifestarle nuestro agradecimiento por su labor prestada en la empresa, por lo que nos vemos en la obligación de resaltar y aplaudir su desempeño.

Atentamente,



JOHANNA MARCELA PADIERNA CASTIBLANCO

Representante Legal

Contacto: consolidacion.giron@gmail.com

Recibí:

Firmado electrónicamente por:

Nombre	Jarrinson Steven Camaron Caicedo
Número de Documento	1.232.891.906
Email	caicedosteven54@gmail.com
Fecha	10/04/2026 a las 12:44
IP	127.0.0.1
Token	cd05f1093ef07cf8c93e2f92f60cd460

El código QR que se muestra a continuación es únicamente referencial y no tiene validez legal ni funcional

CONSORCIO CONSOLIDACIÓN GIRÓN	**FORMATO ORDEN EXAMEN DE RETIRO OCUPACIONAL**	**Código**	SST-F-37
		Fecha	22/08/2022
		Versión	2

Bucaramanga,

Jarrinson Steven Camaron Caicedo

Cédula de Ciudadanía No. **1.232.891.906**

Ayudante de Perforación II

CONSORCIO CONSOLIDACION GIRON

Dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1072 de 2015, y en la Resolución 1443 de 2007, me permito notificarle que a partir de la fecha de terminación del vinculo laboral con **CONSORCIO CONSOLIDACION GIRON** dispone de 5 (cinco) días para presentarse a la práctica del correspondiente EVALUACIÓN MÉDICA OCUPACIONAL DE RETIRO, en:

IPS: Unisalud Salud Ocupacional ltda.

Dirección: CALLE 51A # 31 - 66 Bucaramanga - Santander

**Debe confirmar con el area de gestión humana previamente para asigar hora de la consulta.*

Finalizado tal tiempo sin que usted asista a la citación, se entenderá que renuncia a la práctica de tal, y la empresa no se hará responsable de las condiciones de salud que el trabajador reporte después del retiro.

La presente orden se expide digitalmente a los 14 días del mes de abril de 2026.

Melissa Donado Arias

Clara Melissa Donado

Coordinador SST

Contacto:

Firmado electrónicamente por:

Nombre	Jarrinson Steven Camaron Caicedo
Número de Documento	1.232.891.906
Email	caicedosteven54@gmail.com
Fecha	10/04/2026 a las 12:08
IP	127.0.0.1
Token	64a0a7214da60c5cf28af0fc230e91d3

El código QR que se muestra a continuación es únicamente referencial y no tiene validez legal ni funcional



CONSORCIO CONSOLIDACIÓN GIRÓN	**FINALIZACIÓN POR OBRA O LABOR**	**Código**	RH-F-16
		Fecha	29/07/2023
		Versión	2
		Pagina 1 de 1	

Bucaramanga, 14 de marzo de 2026

Señor(a)

Miguel Antonio Rangel Florian

Cédula de Ciudadanía 1.124.048.478

Ayudante de Perforación II

Asunto: Notificación de terminación de contrato de trabajo por terminacion de la obra o labor contratada.

Me permito manifestarle que la obra o labor para la cual fue Ud contratado, en la empresa **CONSORCIO CONSOLIDACION GIRON**, el **08 de octubre de 2025**, se encuentra finalizada, razón por la cual se procede a la liquidación definitiva de su contrato de trabajo de conformidad con el literal del articulo 61 del código sustantivo del trabajo, terminación que se hace efectiva el dia **14 de abril de 2026.**

Agradecemos que al recibir esta notificación, contacte al área de gestión humana para iniciar el tramite correspondiente, indicarle el proceso para realizarse los exámenes de egreso, iniciar el tramite de su liquidación de prestaciones sociales y salario adeudados conforme a lo enunciado en el Código Sustantivo del Trabajo.

Es oportuno manifestarle nuestro agradecimiento por su labor prestada en la empresa, por lo que nos vemos en la obligación de resaltar y aplaudir su desempeño.

Atentamente,



JOHANNA MARCELA PADIERNA CASTIBLANCO

Representante Legal

Contacto: consolidacion.giron@gmail.com

Recibí:

Firmado electrónicamente por:

Nombre	Miguel Antonio Rangel Florian
Número de Documento	1.124.048.478
Email	miguelantonioranguel@gmail.com
Fecha	10/04/2026 a las 12:45
IP	127.0.0.1
Token	bbea1035a7b31fd34053f7c41538bbe5

El código QR que se muestra a continuación es únicamente referencial y no tiene validez legal ni funcional

CONSORCIO CONSOLIDACIÓN GIRÓN	**FORMATO ORDEN EXAMEN DE RETIRO OCUPACIONAL**	**Código**	SST-F-37
		Fecha	22/08/2022
		Versión	2

Bucaramanga,

Miguel Antonio Rangel Florian

Cédula de Ciudadanía No. **1.124.048.478**

Ayudante de Perforación II

CONSORCIO CONSOLIDACION GIRON

Dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1072 de 2015, y en la Resolución 1443 de 2007, me permito notificarle que a partir de la fecha de terminación del vinculo laboral con **CONSORCIO CONSOLIDACION GIRON** dispone de 5 (cinco) días para presentarse a la práctica del correspondiente EVALUACIÓN MÉDICA OCUPACIONAL DE RETIRO, en:

IPS: Unisalud Salud Ocupacional ltda.

Dirección: CALLE 51A # 31 - 66 Bucaramanga - Santander

**Debe confirmar con el area de gestión humana previamente para asigar hora de la consulta.*

Finalizado tal tiempo sin que usted asista a la citación, se entenderá que renuncia a la práctica de tal, y la empresa no se hará responsable de las condiciones de salud que el trabajador reporte después del retiro.

La presente orden se expide digitalmente a los 14 días del mes de abril de 2026.

Melissa Donado Arias

Clara Melissa Donado

Coordinador SST

Contacto:

Firmado electrónicamente por:

Nombre	Miguel Antonio Rangel Florian
Número de Documento	1.124.048.478
Email	miguelantonioranguel@gmail.com
Fecha	10/04/2026 a las 12:09
IP	127.0.0.1
Token	d2d1bfb59303b07519c6e9de87793544

El código QR que se muestra a continuación es únicamente referencial y no tiene validez legal ni funcional



CONSORCIO CONSOLIDACIÓN GIRÓN	**FINALIZACIÓN POR OBRA O LABOR**	**Código**	RH-F-16
		Fecha	29/07/2023
		Versión	2
		Pagina 1 de 1	

Bucaramanga, 14 de marzo de 2026

Señor(a)

Jesus Alberto Mayorga Mayorga

Cédula de Ciudadanía 1.101.520.618

Ayudante de Obra

Asunto: Notificación de terminación de contrato de trabajo por terminacion de la obra o labor contratada.

Me permito manifestarle que la obra o labor para la cual fue Ud contratado, en la empresa **CONSORCIO CONSOLIDACION GIRON**, el **08 de octubre de 2025**, se encuentra finalizada, razón por la cual se procede a la liquidación definitiva de su contrato de trabajo de conformidad con el literal del articulo 61 del código sustantivo del trabajo, terminación que se hace efectiva el dia **14 de abril de 2026.**

Agradecemos que al recibir esta notificación, contacte al área de gestión humana para iniciar el tramite correspondiente, indicarle el proceso para realizarse los exámenes de egreso, iniciar el tramite de su liquidación de prestaciones sociales y salario adeudados conforme a lo enunciado en el Código Sustantivo del Trabajo.

Es oportuno manifestarle nuestro agradecimiento por su labor prestada en la empresa, por lo que nos vemos en la obligación de resaltar y aplaudir su desempeño.

Atentamente,



JOHANNA MARCELA PADIERNA CASTIBLANCO

Representante Legal

Contacto: consolidacion.giron@gmail.com

Recibí:

Firmado electrónicamente por:

Nombre	Jesus Alberto Mayorga Mayorga
Número de Documento	1.101.520.618
Email	jesusalbertomayorgamayorga@gmail.com
Fecha	10/04/2026 a las 12:45
IP	127.0.0.1
Token	3dfc9798598636e41572cf6e7e08c443

El código QR que se muestra a continuación es únicamente referencial y no tiene validez legal ni funcional

CONSORCIO CONSOLIDACIÓN GIRÓN	**FORMATO ORDEN EXAMEN DE RETIRO OCUPACIONAL**	**Código**	SST-F-37
		Fecha	22/08/2022
		Versión	2

Bucaramanga,

Jesus Alberto Mayorga Mayorga

Cédula de Ciudadanía No. **1.101.520.618**

Ayudante de Obra

CONSORCIO CONSOLIDACION GIRON

Dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1072 de 2015, y en la Resolución 1443 de 2007, me permito notificarle que a partir de la fecha de terminación del vinculo laboral con **CONSORCIO CONSOLIDACION GIRON** dispone de 5 (cinco) días para presentarse a la práctica del correspondiente EVALUACIÓN MÉDICA OCUPACIONAL DE RETIRO, en:

IPS: Unisalud Salud Ocupacional ltda.

Dirección: CALLE 51A # 31 - 66 Bucaramanga - Santander

**Debe confirmar con el area de gestión humana previamente para asigar hora de la consulta.*

Finalizado tal tiempo sin que usted asista a la citación, se entenderá que renuncia a la práctica de tal, y la empresa no se hará responsable de las condiciones de salud que el trabajador reporte después del retiro.

La presente orden se expide digitalmente a los 14 días del mes de abril de 2026.

Melissa Donado Arias

Clara Melissa Donado

Coordinador SST

Contacto:

Firmado electrónicamente por:

Nombre	Jesus Alberto Mayorga Mayorga
Número de Documento	1.101.520.618
Email	jesusalbertomayorgamayorga@gmail.com
Fecha	10/04/2026 a las 12:24
IP	127.0.0.1
Token	981024d32e70f1e418c34003e6f56636

El código QR que se muestra a continuación es únicamente referencial y no tiene validez legal ni funcional



CONSORCIO CONSOLIDACIÓN GIRÓN	**FINALIZACIÓN POR OBRA O LABOR**	**Código**	RH-F-16
		Fecha	29/07/2023
		Versión	2
		Pagina 1 de 1	

Bucaramanga, 14 de marzo de 2026

Señor(a)

Willingtong Alarcon Ascanio

Cédula de Ciudadanía 91.479.571

Ayudante de Perforación II

Asunto: Notificación de terminación de contrato de trabajo por terminacion de la obra o labor contratada.

Me permito manifestarle que la obra o labor para la cual fue Ud contratado, en la empresa **CONSORCIO CONSOLIDACION GIRON**, el **05 de noviembre de 2025**, se encuentra finalizada, razón por la cual se procede a la liquidación definitiva de su contrato de trabajo de conformidad con el literal del articulo 61 del código sustantivo del trabajo, terminación que se hace efectiva el dia **14 de abril de 2026.**

Agradecemos que al recibir esta notificación, contacte al área de gestión humana para iniciar el tramite correspondiente, indicarle el proceso para realizarse los exámenes de egreso, iniciar el tramite de su liquidación de prestaciones sociales y salario adeudados conforme a lo enunciado en el Código Sustantivo del Trabajo.

Es oportuno manifestarle nuestro agradecimiento por su labor prestada en la empresa, por lo que nos vemos en la obligación de resaltar y aplaudir su desempeño.

Atentamente,



JOHANNA MARCELA PADIERNA CASTIBLANCO

Representante Legal

Contacto: consolidacion.giron@gmail.com

Recibí:

Firmado electrónicamente por:

Nombre	Willingtong Alarcon Ascanio
Número de Documento	91.479.571
Email	Wilintongalarcon0@gmail.com
Fecha	10/04/2026 a las 12:45
IP	127.0.0.1
Token	ae34e2df6a487158236e8990506f2ca2

El código QR que se muestra a continuación es únicamente referencial y no tiene validez legal ni funcional

CONSORCIO CONSOLIDACIÓN GIRÓN	**FORMATO ORDEN EXAMEN DE RETIRO OCUPACIONAL**	**Código**	SST-F-37
		Fecha	22/08/2022
		Versión	2

Bucaramanga,

Willingtong Alarcon Ascanio

Cédula de Ciudadanía No. **91.479.571**

Ayudante de Perforación II

CONSORCIO CONSOLIDACION GIRON

Dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1072 de 2015, y en la Resolución 1443 de 2007, me permito notificarle que a partir de la fecha de terminación del vinculo laboral con **CONSORCIO CONSOLIDACION GIRON** dispone de 5 (cinco) días para presentarse a la práctica del correspondiente EVALUACIÓN MÉDICA OCUPACIONAL DE RETIRO, en:

IPS: Unisalud Salud Ocupacional ltda.

Dirección: CALLE 51A # 31 - 66 Bucaramanga - Santander

**Debe confirmar con el area de gestión humana previamente para asigar hora de la consulta.*

Finalizado tal tiempo sin que usted asista a la citación, se entenderá que renuncia a la práctica de tal, y la empresa no se hará responsable de las condiciones de salud que el trabajador reporte después del retiro.

La presente orden se expide digitalmente a los 14 días del mes de abril de 2026.

Melissa Donado Arias

Clara Melissa Donado

Coordinador SST

Contacto:

Firmado electrónicamente por:

Nombre	Willingtong Alarcon Ascanio
Número de Documento	91.479.571
Email	Wilintongalarcon0@gmail.com
Fecha	10/04/2026 a las 12:25
IP	127.0.0.1
Token	b07e425a205751ae85c8de810fe94e1b

El código QR que se muestra a continuación es únicamente referencial y no tiene validez legal ni funcional



CONSORCIO CONSOLIDACIÓN GIRÓN	**FINALIZACIÓN POR OBRA O LABOR**	**Código**	RH-F-16
		Fecha	29/07/2023
		Versión	2
		Pagina 1 de 1	

Bucaramanga, 14 de marzo de 2026

Señor(a)

Manuel Enrique Castillo Florez

Cédula de Ciudadanía 1.082.871.247

Ayudante de Obra

Asunto: Notificación de terminación de contrato de trabajo por terminacion de la obra o labor contratada.

Me permito manifestarle que la obra o labor para la cual fue Ud contratado, en la empresa **CONSORCIO CONSOLIDACION GIRON**, el **06 de noviembre de 2025**, se encuentra finalizada, razón por la cual se procede a la liquidación definitiva de su contrato de trabajo de conformidad con el literal del articulo 61 del código sustantivo del trabajo, terminación que se hace efectiva el dia **14 de abril de 2026.**

Agradecemos que al recibir esta notificación, contacte al área de gestión humana para iniciar el tramite correspondiente, indicarle el proceso para realizarse los exámenes de egreso, iniciar el tramite de su liquidación de prestaciones sociales y salario adeudados conforme a lo enunciado en el Código Sustantivo del Trabajo.

Es oportuno manifestarle nuestro agradecimiento por su labor prestada en la empresa, por lo que nos vemos en la obligación de resaltar y aplaudir su desempeño.

Atentamente,



JOHANNA MARCELA PADIERNA CASTIBLANCO

Representante Legal

Contacto: consolidacion.giron@gmail.com

Recibí:

Firmado electrónicamente por:

Nombre	Manuel Enrique Castillo Florez
Número de Documento	1.082.871.247
Email	sharolstefhanyhernanadez18@gmail.com
Fecha	10/04/2026 a las 13:13
IP	127.0.0.1
Token	f57ed2a28e85524c0ce2068a058f69df

El código QR que se muestra a continuación es únicamente referencial y no tiene validez legal ni funcional



CONSORCIO CONSOLIDACIÓN GIRÓN	**FORMATO ORDEN EXAMEN DE RETIRO OCUPACIONAL**	**Código**	SST-F-37
		Fecha	22/08/2022
		Versión	2

Bucaramanga,

Manuel Enrique Castillo Florez

Cédula de Ciudadanía No. **1.082.871.247**

Ayudante de Obra

CONSORCIO CONSOLIDACION GIRON

Dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1072 de 2015, y en la Resolución 1443 de 2007, me permito notificarle que a partir de la fecha de terminación del vinculo laboral con **CONSORCIO CONSOLIDACION GIRON** dispone de 5 (cinco) días para presentarse a la práctica del correspondiente EVALUACIÓN MÉDICA OCUPACIONAL DE RETIRO, en:

IPS: Unisalud Salud Ocupacional ltda.

Dirección: CALLE 51A # 31 - 66 Bucaramanga - Santander

**Debe confirmar con el area de gestión humana previamente para asigar hora de la consulta.*

Finalizado tal tiempo sin que usted asista a la citación, se entenderá que renuncia a la práctica de tal, y la empresa no se hará responsable de las condiciones de salud que el trabajador reporte después del retiro.

La presente orden se expide digitalmente a los 14 días del mes de abril de 2026.

Melissa Donado Arias

Clara Melissa Donado

Coordinador SST

Contacto:

Firmado electrónicamente por:

Nombre	Manuel Enrique Castillo Florez
Número de Documento	1.082.871.247
Email	sharolstefhanyhernanadez18@gmail.com
Fecha	10/04/2026 a las 12:26
IP	127.0.0.1
Token	8c408507908d25d2d6bd1104dc72893e

El código QR que se muestra a continuación es únicamente referencial y no tiene validez legal ni funcional



CONSORCIO CONSOLIDACIÓN GIRÓN	**FINALIZACIÓN POR OBRA O LABOR**	**Código**	RH-F-16
		Fecha	29/07/2023
		Versión	2
		Pagina 1 de 1	

Bucaramanga, 14 de marzo de 2026

Señor(a)

Edson Alexander Portilla Ardila

Cédula de Ciudadanía 1.098.605.491

Almacenista

Asunto: Notificación de terminación de contrato de trabajo por terminacion de la obra o labor contratada.

Me permito manifestarle que la obra o labor para la cual fue Ud contratado, en la empresa **CONSORCIO CONSOLIDACION GIRON**, el **24 de noviembre de 2025**, se encuentra finalizada, razón por la cual se procede a la liquidación definitiva de su contrato de trabajo de conformidad con el literal del articulo 61 del código sustantivo del trabajo, terminación que se hace efectiva el dia **14 de abril de 2026.**

Agradecemos que al recibir esta notificación, contacte al área de gestión humana para iniciar el tramite correspondiente, indicarle el proceso para realizarse los exámenes de egreso, iniciar el tramite de su liquidación de prestaciones sociales y salario adeudados conforme a lo enunciado en el Código Sustantivo del Trabajo.

Es oportuno manifestarle nuestro agradecimiento por su labor prestada en la empresa, por lo que nos vemos en la obligación de resaltar y aplaudir su desempeño.

Atentamente,



JOHANNA MARCELA PADIERNA CASTIBLANCO

Representante Legal

Contacto: consolidacion.giron@gmail.com

Recibí:

Firmado electrónicamente por:

Nombre	Edson Alexander Portilla Ardila
Número de Documento	1.098.605.491
Email	edsonportilla@hotmail.com
Fecha	10/04/2026 a las 14:34
IP	127.0.0.1
Token	684a3af01e528f58f375f5cd36b95de1

El código QR que se muestra a continuación es únicamente referencial y no tiene validez legal ni funcional



CONSORCIO CONSOLIDACIÓN GIRÓN	**FORMATO ORDEN EXAMEN DE RETIRO OCUPACIONAL**	**Código**	SST-F-37
		Fecha	22/08/2022
		Versión	2

Bucaramanga,

Edson Alexander Portilla Ardila

Cédula de Ciudadanía No. **1.098.605.491**

Almacenista

CONSORCIO CONSOLIDACION GIRON

Dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1072 de 2015, y en la Resolución 1443 de 2007, me permito notificarle que a partir de la fecha de terminación del vinculo laboral con **CONSORCIO CONSOLIDACION GIRON** dispone de 5 (cinco) días para presentarse a la práctica del correspondiente EVALUACIÓN MÉDICA OCUPACIONAL DE RETIRO, en:

IPS: Unisalud Salud Ocupacional ltda.

Dirección: CALLE 51A # 31 - 66 Bucaramanga - Santander

**Debe confirmar con el area de gestión humana previamente para asigar hora de la consulta.*

Finalizado tal tiempo sin que usted asista a la citación, se entenderá que renuncia a la práctica de tal, y la empresa no se hará responsable de las condiciones de salud que el trabajador reporte después del retiro.

La presente orden se expide digitalmente a los 14 días del mes de abril de 2026.

Melissa Donado Arias

Clara Melissa Donado

Coordinador SST

Contacto:

Firmado electrónicamente por:

Nombre	Edson Alexander Portilla Ardila
Número de Documento	1.098.605.491
Email	edsonportilla@hotmail.com
Fecha	10/04/2026 a las 12:28
IP	127.0.0.1
Token	af4a2cd84e265145f8aa0274115dee72

El código QR que se muestra a continuación es únicamente referencial y no tiene validez legal ni funcional



CONSORCIO CONSOLIDACIÓN GIRÓN	**FINALIZACIÓN POR OBRA O LABOR**	**Código**	RH-F-16
		Fecha	29/07/2023
		Versión	2
		Pagina 1 de 1	

Bucaramanga, 14 de marzo de 2026

Señor(a)

Giovany Sebastian Parra Ferrer

Cédula de Ciudadanía 1.005.157.855

Ayudante de Obra

Asunto: Notificación de terminación de contrato de trabajo por terminacion de la obra o labor contratada.

Me permito manifestarle que la obra o labor para la cual fue Ud contratado, en la empresa **CONSORCIO CONSOLIDACION GIRON**, el **01 de diciembre de 2025**, se encuentra finalizada, razón por la cual se procede a la liquidación definitiva de su contrato de trabajo de conformidad con el literal del articulo 61 del código sustantivo del trabajo, terminación que se hace efectiva el dia **14 de abril de 2026.**

Agradecemos que al recibir esta notificación, contacte al área de gestión humana para iniciar el tramite correspondiente, indicarle el proceso para realizarse los exámenes de egreso, iniciar el tramite de su liquidación de prestaciones sociales y salario adeudados conforme a lo enunciado en el Código Sustantivo del Trabajo.

Es oportuno manifestarle nuestro agradecimiento por su labor prestada en la empresa, por lo que nos vemos en la obligación de resaltar y aplaudir su desempeño.

Atentamente,



JOHANNA MARCELA PADIERNA CASTIBLANCO

Representante Legal

Contacto: consolidacion.giron@gmail.com

Recibí:

Firmado electrónicamente por:

Nombre	Giovany Sebastian Parra Ferrer
Número de Documento	1.005.157.855
Email	giovanyparra24@gmail.com
Fecha	10/04/2026 a las 14:35
IP	127.0.0.1
Token	d64bfb1f283f42b426d7e973ff031e36

El código QR que se muestra a continuación es únicamente referencial y no tiene validez legal ni funcional

CONSORCIO CONSOLIDACIÓN GIRÓN	**FORMATO ORDEN EXAMEN DE RETIRO OCUPACIONAL**	**Código**	SST-F-37
		Fecha	22/08/2022
		Versión	2

Bucaramanga,

Giovany Sebastian Parra Ferrer

Cédula de Ciudadanía No. **1.005.157.855**

Ayudante de Obra

CONSORCIO CONSOLIDACION GIRON

Dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1072 de 2015, y en la Resolución 1443 de 2007, me permito notificarle que a partir de la fecha de terminación del vinculo laboral con **CONSORCIO CONSOLIDACION GIRON** dispone de 5 (cinco) días para presentarse a la práctica del correspondiente EVALUACIÓN MÉDICA OCUPACIONAL DE RETIRO, en:

IPS: Unisalud Salud Ocupacional ltda.

Dirección: CALLE 51A # 31 - 66 Bucaramanga - Santander

**Debe confirmar con el area de gestión humana previamente para asigar hora de la consulta.*

Finalizado tal tiempo sin que usted asista a la citación, se entenderá que renuncia a la práctica de tal, y la empresa no se hará responsable de las condiciones de salud que el trabajador reporte después del retiro.

La presente orden se expide digitalmente a los 14 días del mes de abril de 2026.

Melissa Donado Arias

Clara Melissa Donado

Coordinador SST

Contacto:

Firmado electrónicamente por:

Nombre	Giovany Sebastian Parra Ferrer
Número de Documento	1.005.157.855
Email	giovanyparra24@gmail.com
Fecha	10/04/2026 a las 12:33
IP	127.0.0.1
Token	19cc78f25233782c66bb633db4f31776

El código QR que se muestra a continuación es únicamente referencial y no tiene validez legal ni funcional



ANEXO N° 3
ACTA MENSUAL COPASST

CONSORCIO CONSOLIDACIÓN GIRÓN	ACTA DE REUNIÓN COMITÉS	Código	SST-F-28
		Fecha	12/07/2021
		Versión	3
		Página 1 de 2	

FECHA			LUGAR	HORA INICIO	HORA FIN	ACTA N°	TIPO REUNIÓN	
DD	MM	AA	Campamento	09:48 am	10:58 am	05	Mensual	x
10	04	2026					Trimestral	
							Extraordinaria	

Señalar con X el Comité a realizar:

COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	x	COMITÉ CONVIVENCIA LABORAL		Otro: _____	

En las instalaciones de la empresa, se reunieron los integrantes del Comité para tratar los siguientes temas:

ORDEN DEL DIA
1. Verificación del quórum 2. Revisión de Acta anterior 3. Incidentes y accidentes de trabajo / Eventos que involucran el comité 4. Otros 5. Compromisos

Asistentes Comité	Firmas
Oscar Andres Sanchez	Oscar Sanchez
Miguel Rangel	Miguel Rangel

TEMAS TRATADOS
1. Verificación del quórum Se procede a tomar asistencia para verificar Quorum y dar inicio a la reunión 2. Revisión de acta anterior Se realiza revisión de los compromisos establecidos en el acta anterior 3. Seguimiento al plan de formación Siguiendo el cronograma de capacitación, se capacitó a los miembros del COPPAST y a todo el personal en: • ¿Qué es higiene postural? 4. Inspecciones de lugares de trabajo Se observa la participación del comité en la realización de las inspecciones de seguridad del mes de abril de 2026: inspección locativa de obra, inspección preoperacional de herramienta menor, inspección de

elementos de protección personal, inspección de botiquín, camilla y extintores, de las cuales no se reportan hallazgos que requieran atención.

5. Incidentes y accidentes de trabajo, enfermedades laborales/Análisis de causas

Durante el mes de abril de 2026 no se presentaron accidentes de trabajo

Fecha	Nombre	Agente	Mecanismo	Parte del cuerpo afectada	Incapacidad

No se notificaron presuntos casos de enfermedad laboral.

6. Ausentismo

En el mes de abril de 2026 no se presentaron eventos de ausentismo de origen común o laboral.

7. Visitas o auditorías gubernamentales, ARL, clientes, proveedores

Durante el periodo no se registraron visitas de entes de control o partes interesadas, ni se recibieron informes de seguimiento relacionados con SST que requieran el planteamiento de medidas de control.

8. Sugerencias, recomendaciones, quejas o reclamos de los trabajadores

No se presentaron

9. Otros programas y actividades

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA
Dar cumplimiento y acompañamiento a las actividades programadas en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.	COPASST	Mayo de 2026

Fecha próxima reunión: mayo de 2026

Oscar Andres Sanchez
Firma presidente

Miguel Rangel.
Firma secretario

ANEXO N° 4
ACTA MENSUAL CCL

CONSORCIO CONSOLIDACIÓN GIRÓN	ACTA DE REUNIÓN COMITÉS	Código	SST-F-28
		Fecha	12/07/2021
		Versión	3
		Página 1 de 2	

FECHA			LUGAR	HORA INICIO	HORA FIN	ACTA NO.	TIPO REUNIÓN
DD	MM	AA	Oficina Principal San Jorge	3:15 pm	04:09 pm	04	Mensual x Trimestral Extraordinaria
10	04	2026					

Señalar con X el Comité a realizar:

COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		COMITÉ CONVIVENCIA LABORAL	X	Otro: _____	

En las instalaciones de la empresa, se reunieron los integrantes del Comité para tratar los siguientes temas:

ORDEN DEL DIA

1. Verificación del quórum
2. Revisión de Acta anterior
3. Quejas de Acoso laboral/ Eventos que involucran el comité
4. Casos no Resueltos
5. Otros Compromisos

Asistentes Comité	Firmas
Isaias Garcia	Isaias Garcia
Oscar Andres Sanchez	Oscar Sanchez.

TEMAS TRATADOS

1. Verificación del quórum

Se procede a tomar asistencia para verificar Quorum y se inicia la reunión al contar con el personal suficiente para la toma de decisiones.

2. Revisión de acta anterior

Se realiza la revisión del acta anterior para dar continuidad a los compromisos y actividades definidas anteriormente.

3. Quejas de Acoso Laboral:

Durante el periodo comprendido entre el 01 al 14 de abril de 2026 no se evidenciaron reportes de acoso laboral ni quejas de convivencia.

Estadísticas de las quejas del periodo:

- Número de quejas presentadas en el periodo: 0

- Número de quejas abiertas de periodos anteriores: 0
- Número de quejas abiertas al final del periodo: 0
- Número de quejas cerradas en el periodo:0

4. Casos No resueltos:

En el periodo no se presentaron casos no resueltos que deban remitirse a entidades externas.

5. Otros

No se presentaron.

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA
Dar cumplimiento y acompañamiento a las actividades programadas	COCOLA	Mayo de 2026

Fecha próxima reunión: mayo de 2026

Isaias Garcia
Presidente

Oscar Sanchez
Secretario

ANEXO N° 5
CAPACITACIONES SST

CONSORCIO CONSOLIDACIÓN GIRÓN	FORMATO ASISTENCIA DE ENTRENAMIENTO, CHARLAS Y CAPACITACIONES	Código	RH-F-28
		Fecha	31/10/2022
		Versión	2
		Página	1 de 1

ENTRENAMIENTO [ ] CAPACITACION [X] CHARLA [ ]

OBRA Consorcio Consolidación Girón

TEMA DE CAPACITACIÓN ¿Que es Higiene postural?

LUGAR: Campamento FECHA 07/04/2026

CAPACITADOR Melissa Donado DURACIÓN 40 minutos

No.	PARTICIPANTE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Alberto Mercado	1101520618	AJU.	
2	Manuel Castillo	1082871247	ayudante	Manuel
3	Isaias Garcia	7701596200	OPCIADOR	Isaias
4	Alexander Prada	13537319	OFICIAL	
5	willington Alcazar as.	91.479574	OY P.	
6	Edson A. Tortilla.	1098.605.491	ALMACENISTA	
7	Miguel A Rangel	1124048478	Ay. de perforación	Mi. guel Rangel
8	Jasrinson steven caicedo	1232894906	Ayudante Perforación	estiven caicedo
9	Sebastian Pena	1005157855	Ayudante	Sebastian Pena
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

OBSERVACIONES:

CAPACITADOR

Melissa Donado A.

FIRMA

ANEXO N° 6
INSPECCIONES DE SEGURIDAD

CONSORCIO
CONSOLIDACIÓN GIRÓN

INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Código	SST-F-26
Fecha	4/06/2021
Versión	2
Pagina 1 de 1	

NOMBRE DE QUIEN INSPECCIONA: Melissa Dorado Firma: Melissa Dorado CARGO: Profesional SISO

FRENTE DE OBRA Y/O PROYECTO: Villa de los Caballeros

Vo Bo COPASST (Nombre y firma): Oscar Sanchez CARGO: Ing - Residente

Tenga en cuenta que:

U: Uso y se califica con SI ó NO.

E: Estado y se califica como Excelente, Bueno, Regular ó Malo. (unicamente las letras iniciales)

Nota: La calificación se sujeta al momento de la obsevación

DATOS BÁSICOS		FECHA	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL																				OBSERVACIONES
			Casco		Protector Auditivo		Porteccion ocular		Protector Respiratorio		Dotación		Guantes		Botas		Barbuquejo		Otro		Otro		
NOMBRE	CARGO		U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	
Alexander prada	oficial	08/04/26	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	B	B	SI	B							
Miguel Rangel	Ayudante perf	08/04/26	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B							
Jesús Mayorga	Ayudante obra	08/04/26	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B							
Giovanny Parra	Ayudante obra	08/04/26	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B							
Isaias Garcia	Operador perf	08/04/26	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B							
Alexander Portilla	Almacenista	08/04/26	SI	B	/	/	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B							
Wellington Alarcon	Ayudante perf	08/04/26	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B							
Manuel castillo	Ayudante obra	08/04/26	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B							
Jarrinson Camaron	Ayudante perf	08/04/26	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B							

CONSORCIO CONSOLIDACIÓN GIRÓN	INSPECCIÓN DE EXTINTORES	Código	SST-F-15
		Fecha	15/08/2023
		Versión	3
		Pagina	1 de 1

FECHA: 09/01/2026 PROYECTO: Consorcio Consolidación Girón

INSPECCIÓN REALIZADA POR: Melissa Donado

V.B. BRIGADAS DE EMERGENCIA: Miguel Rangel

V.B. COPASST: Oscar Jaimes

No. Interno	Descripción Agente extintor	Ubicación	Capacidad	Último mantenimiento	Fecha de próximo mantenimiento	Pintura	Señalización	Acceso	Visibilidad	Manómetro	Presión	Pasador	Manguera	Boquilla	Envase	Tarjeta	Manija	Observaciones
1	PQS Multipropos.	Campamento	10 lbs	06/2025	06/2026	B	B	B	B	B	B	B	/	B	B	B	B	/

OBSERVACIONES:

Nota: Para el diligenciamiento del estado de los extintores colocar B (Bueno), R (Requiere) o M (Malo), según lo considere en la inspección

CONSORCIO CONSOLIDACIÓN GIRÓN	INSPECCIÓN DE BOTIQUINES Y CAMILLAS	Código	SST-F-14
		Fecha	19/05/2025
		Versión	4
		Página 1 de 1	

Inspección realizada por		
Nombre: Melissa Donado	Fecha inspección: 08/04/2026	Próxima inspección: 05/2026
Cargo: profesional SISO	Lugar: Girón	Firma: Melissa D.
Ubicación del botiquín: Almacen	Ubicación de la camilla: Almacen	
V.B. Copasst: Oscar sanchez	V.B. Brigadas de emergencia: Miguel Bangel	

Marque con una X según criterio — B = Bueno, R = Regular, M = Malo, NA = No aplica

Elementos	Parámetros a revisar				Integridad empaque				Plan de acción			
	Medida	Cantidad Stock	Cantidad Existente	Fecha vencimiento	B	R	M	NA	Acción Correctiva Propuesta	Fecha Propuesta	Fecha Ejecución	Responsable
Alcohol Antiséptico	Frasco	1	1	10/2026	✓							
Termómetro Digital	Unidad	1	1	NA	✓							
Algodón	Paquete	1	1	12/2029	✓							
Gasa Esteril	Paquete	8	11	31/07/27	✓							
Gasa Limpia	Unidad	20										
Aplicadores y/o copitos	Unidad	10	10	NA	✓							
Esparadrapo de tela	Unidad	1	1	01/09/27	✓							
Esparadrapo micropore	Unidad	1	1	08/07/27	✓							
Apósito ocular	Unidad	3	4	07/2027	✓							
Baja lenguas	Unidad	10	10	08/2026	✓							
Yodopovidona Espuma	Frasco	1	1	10/01/27	✓							
Clorhexidina (Jabón Quirurgico)	Frasco	1	1	17/01/27	✓							
Linterna con pilas	Unidad	1	1	NA	✓							
Inmolizador Miembros superiores	Unidad	1	1	NA	✓							
Inmolizador Cervical	Unidad	1	1	NA	✓							
Inmovilizador miebros inferiores	Unidad	1	1	NA	✓							
Solución salina 250 ml ó 500 ml	Bolsa	2	1	05/2027	✓							
Silbato de emergencias	Unidad	1	1	NA	✓							
Tijeras	Unidad	1	1	NA	✓							
Curitas	Unidad	10	6	23/10/27	✓							
Sales de Rehidratación Oral	Sobre	3	3	08/2026	✓							
Tapabocas desechable	Unidad	10	10	01/2028	✓							
Compresas Esterlles	Unidad	3	5	06/2026	✓							
Guantes de nitrilo / latex	Unidad	20	20	09/2029	✓							
Venda de algodón 3"X5 yardas	Unidad	1	1	02/2027	✓							
Vendas elástica 2"X5 yardas	Unidad	1	1	10/2029	✓							
Vendas elástica 3"X5 yardas	Unidad	1	1	02/2027	✓							
Vendas elástica 5"X5 yardas	Unidad	1	1	02/27	✓							
Mascarilla o Protector facial RCP	Unidad	1										
Manual primeros auxilios	Unidad	1	1	NA	✓							

INSPECCIÓN DE CAMILLA

La camilla debe ser plástica en polietileno de alta densidad, impermeable a todos los fluidos, de fácil manejo, con arnés tipo araña con reflectivos

Descripción	Estado				Observaciones
	B	R	M	NA	
Instalación (Sitio de ubicación con facil acceso)	✓				
Se encuentra señalizado	✓				
Estado del soporte	✓				
Estado de las correas de seguridad	✓				
Estado general (sin fisuras o fracturas, limpio y libre de polvo)	✓				
Juego de inmovilizadores de miembro inferior y superior	✓				

Conclusiones y Sugerencias:

CONSORCIO CONSOLIDACIÓN GIRÓN	FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTA MENOR	Código	SST-F-16
		Fecha	15/08/2023
		Versión	3
		Página	1 de 1

EMPRESA: Consorcio Consolidación Girón | INSPECCIONADO POR: Edson Alexander Portilla

FRENTE: Villa de las Caballeros | FECHA: Del 13 al 14 de Abril

¿Se realiza limpieza de herramientas? SI [X] NO [ ] | Periodicidad de la limpieza: Semanal

HERRAMIENTA	REVISION	CANTIDAD	LUNES		MARTES		MIERCOL		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Alicates	Mango, aislamiento	3	✓		✓											
Barras	Estado general	5	✓		✓											
Caretas para esmerilar	Acetato, tafilete		—	—	—	—										
Cinceles	Estado general		—	—	—	—										
Cinta métrica	Estado general	2	✓		✓											
Destornilladores	Mango, punta	3	✓		✓											
Extensiones	Mango	2	✓		✓											
Limas	Mango,estado general	1	✓		✓											
Llaves Expansivas	Estado general		—	—	—	—										
Machetes con funda	Mango	5	✓		✓											
Martillos de uña	Mango	2	✓		✓											
Palas	Cabo, hoja		—	—	—	—										
Paladragas	Cabo, cavadora	6	✓		✓											
Parasoles	Estado general		—	—	—	—										
Picas	Cabo		—	—	—	—										
Porras (9", 12", 18")	Mango	6	✓		✓											
Extensiones electricás	Clavija, contacto	2	✓		✓											
Tijeras industriales	Estado general	1	✓		✓											
Serruchos	Mango, hoja, marco	3	✓		✓											
Carretillas	Platon, mangos, neumáticos	4	✓		✓											
Taladro (Mandril 3/8")	Cable, broca, mandril, mango	2	✓		✓											
Cizalla (12", 24", 42")	Empuñadura, mango, pernos		—	—	—	—										
Pulidora Grande	Cable, swithc, mandril, disco		—	—	—	—										
Juego de Llaves	Estado general		—	—	—	—										
Llave de Tubo	Mordaza, regulador		—	—	—	—										
Nivel de Mano	Gota de nivel		—	—	—	—										
Hachas	Cabo - filo		—	—	—	—										
Tirfor	Guaya, palanca, carcasa, mordaza		—	—	—	—										

NOMBRE ALMACENISTA : Edson ALEXANDER PORTILLA

FIRMA : Edson Portilla

V.B. del Copasst y/o Vigia: Oscar Sanchez.

OBSERVACIONES:

CONSORCIO CONSOLIDACIÓN GIRÓN	INSPECCIÓN LOCATIVA DE OBRA	Código	SST-F-18
		Fecha	15/08/2023
		Versión	3
		Página 1 de 2	

Frente de Obra	Consorcio Consolidación Giron - Villa de los Caballeros	Fecha:	02/04/2026
Área Inspeccionada :	Almacen - Campamento - Baños	V.B. Copasst:	Oscar Andres Sanchez J

Marque según criterio:	B= Bueno R= Regular M= Malo NA= No aplica		
BUENO	REGULAR	MALO	NO APLICA
Cuando el ítem a revisar NO presenta algún daño, avería, riesgo (salud ocupacional, ambiental) y esta todo en perfecto orden.	Cuando alguno de los ítems inspeccionados presenta daño, avería, riesgo (salud ocupacional, ambiental) o no esta en orden y aseo.	Cuando la mayoría de los ítems inspeccionados presenta un daño, avería, riesgos y esta todo en desorden y deseado.	No es utilizado en alguna de las sedes.

PARAMETROS A INSPECCIONAR	B	R	M	NA	OBSERVACIONES	FECHA	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
ALMACENAMIENTO								
Las areas de almacenamiento estan señalizadas y demarcadas adecuadamente	✓							
Se tienen TODAS las hojas de seguridad de las sustancias químicas presentes en el área.	✓							
El almacenamiento de sustancias químicas esta acorde a las recomendaciones dadas en las hojas de seguridad o fichas tecnicas.	✓							
El arrume de productos es el recomendado	✓							
INSTALACIONES								
Los pisos tienen superficies seguras y adecuadas para el trabajo	✓							
Los pisos estan limpios, secos, sin desperdicios	✓							
Los pisos estan libres de obstaculos	✓							
Las areas de trabajo estan debidamente señalizadas y demarcadas	✓							
Los senderos son seguros y libres de obstaculos	✓							
Las vias de circulacion estan debidamente demarcadas	✓							
Los recipientes se encuentran debidamente rotulados o marcados con el contenido	✓							
En las instalaciones se cuenta con baterias sanitarias	✓							
Las áreas se encuentran libres o aseguradas de elementos que cuenten con	✓							
MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS								
La maquinaria y/o equipo estan debidamente protegidos	✓							
Las herramientas, maquinaria y equipos estan operativos para su uso	✓							
Los equipos y/o maquinaria se encuentran libres de fugas	✓							
El cable de alimentación de la herramienta y/o equipo está en buen estado? (libre de cortes)	✓							
ORDEN Y ASEO								

CONSORCIO CONSOLIDACIÓN GIRÓN	INSPECCIÓN LOCATIVA DE OBRA	Código	SST-F-18
		Fecha	15/08/2023
		Versión	3
		Página 2 de 2	

Frente de Obra	Consorcio Consolidación Girón	Fecha:	02/04/2026
Área Inspeccionada :	Campamento – Baños – Almacen	V.B. Copasst:	Oscar Andres Sanchez

El área y todas sus zonas se encuentran libres de objetos fuera de uso o que no pertenecen a este lugar.	✓							
En la áreas se cuenta con puntos ecologicos para la clasificación y disposición de los residuos	✓							
Se mantienen avisos alusivos al orden y aseo en lugares apropiados y se dictan charlas de sensibilización periódicas al personal sobre el orden y aseo.	✓							
Se aplica un programa de reciclaje y proteccion al medio ambiente	✓							
El sitio para el almacenamiento de residuos es el adecuado y esta ordenado	✓							
Los recipientes donde se disponen los residuos son adecuados en tamaño y número	✓							
Las baterias sanitarias se encuentran en condiciones adecuadas de orden y aseo	✓							
SISTEMA DE EMERGENCIA								
En el area hay disponibilidad de recursos para la atención de emergencias (botiquín, camilla, extintor)	✓							
Se organizaron y asignaron las responsabilidades de las brigadas de emergencias	✓							
Se encuentran definidas y señalizadas las rutas de evacuación y punto de encuentro	✓							
Se encuentran definidas y señalizadas las salidas de emergencia	✓							
Se encuentra establecido y en funcionamiento un sistema de comunicación oportuno en caso de emergencia	✓							
Se cuenta con MEDEVAC	✓							
Los extintores se encuentran recargados, señalizados y funcionales	✓							
PRIMEROS AUXILIOS								
El botiquin de primeros auxilios se encuentra dotado y es de fácil acceso	✓							
Se cuenta con camilla en el área	✓							
Se realiza control de los insumos que se utilizan para la atención de emergencias con el fin de realizar la reposición oportuna de los mismos	✓							

OBSERVACIONES	

Responsable de la Inspección:	Melissa Dorado Arias	Cargo:	profesional SISO

ANEXO N° 7
REGISTRO FOTOGRAFICO

CONSORCIO CONSOLIDACIÓN GIRÓN	**INFORME DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**	CDMB CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA





CAPACITACIONES SST





SEÑALIZACIÓN Y DELIMITACIÓN DE ÁREAS





ACOMPAÑAMIENTO A ACTIVIDADES

ANEXO N° 8
MEDIDAS PREVENTIVAS

ENSAMIENTO

CONSORCIO

PERMISO PARA TRABAJO EN ALTURAS

CÓDIGO	SST-F-SS
FECHA	15/03/2021
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1

1. FECHA DE INICIO Y HORA	DÍA 09	MES 04.	AÑO 2026	7:30.	3. CENTRO DE TRABAJO: VILLAS DE LOS CABALLEROS.
2. TERMINACIÓN DE LA TAREA	DÍA 11	MES 04	AÑO 2026	5:00pm	4. ALTURA APROXIMADA: 12 mts — 5. CONSECUTIVO:

6. PERSONAS AUTORIZADAS Y REQUERIMIENTOS

Trabajador No.	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACIÓN	CARGO	APTO EN EXAMEN DE ALTURAS Y	CURSO DE ALTURA VIGENTE Y	AFILIACIÓN VIGENTE SEGURIDAD SOCIAL Y
1	estiven cajedo	1128 91906	ayudante perforacion	si	si	si
2	manuel castillo	1082871 247	ayudante	si	si	si
3	willington g.	9479 571	ayudante	/	/	/
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

7. FIRMA DEL EJECUTOR O TRABAJADOR AUTORIZADO EN TA

FIRMA DEL TRABAJADOR

LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
06/04/26				10/04/26	11/04/26	
estiven				estiven	estiven	
				manuel	manuel	
				WILLINGTON	WILLINGTON	

8. SELECCIONE EL TIPO DE TRABAJO O TAREA

	7. ¿TRABAJO RUTINARIO? SI	NO
Desmonte de vegetación de talud		
Perfilamiento de talud manual y mecánico		
Topografía de marcación de puntos de anclaje		
Perforación de talud		
Llenado o inyección de los anclajes		
Elemento o concreto lanzado		
✓ Tensionamiento de talud		
Otros:		

8. SELECCIONE LAS HERRAMIENTAS Y EQUIPOS A UTILIZAR TENIENDO EN CUENTA LA TAREA A REALIZAR

8.1. SELECCIÓN DE HERRAMIENTAS

Pico		Pana de 24 libra	
Pala		Cizalla	
Azadón		Perros	
Polisraga		Taladro	
Machete		Polidora	
Llave de tubo		Silla	
Serrucho		Segueta	
Llave expansiva		Otros:	
Pana de 5 libras			

8.2. SELECCIÓN DE EQUIPOS

Compresor		Retroexcavadora	
Unidad hidráulica		Volqueta	
Tubos de perforación		Maquero de aire	
Barras de perforación			
Martillo de perforación			
Compresor			
Tirfor		Otros:	
Mandos de perforación			
Maquero hidráulica			

9. ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO ATS

DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE LA TAREA

Se anexan al presente documento los registros correspondientes en formato SST-F-SS Análisis de Trabajo Seguro

10. AUTOREPORTE DE CONDICIONES DE SALUD. ¿PRESENTA ALGUNO DE ÉSTOS SINTOMAS?

CONDICIONES DE SALUD ACTUAL



11. SELECCIONE E INSPECCIONE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PROPIOS DE LA TAREA SEGÚN CRITERIO

	✓	N/A
CASCO BARBUQUEJO: Sin fisuras, limpio, con barbuquejo		
GAFAS OSCURAS: Sin rayones, sin fisuras y con hilo sujetador		
GAFAS TRANSPARENTES: Sin rayones, sin fisuras y con hilo sujetador		
TAPA OIDO DE COPA: Sin desgaste, sin fracturas,		
TAPA OIDO INSERCCIÓN: Sin desgaste, sin fracturas,		
TAPABOCAS QUIRÚRGICO: Sin desgaste, libre de grasa, suciedad y polvo		
CAPUCHA: Sin oficios, libre de grasa, suciedad y polvo		
GUANTES DE CARNAZA: Sin oficios, libre de grasa, suciedad		
GUANTES DE PRECISIÓN: Sin oficios, libre de grasa, suciedad y polvo		
ZAPATOS SEGURIDAD: Sin agujeros, sin filtraciones de agua y amarrados	✓	
BOTAS PANTANERAS: Sin agujeros, sin filtaciones de agua		
CARETA: Sin rayones, sin fisuras y con sujetador		
TAPABOCAS N95: Sin desgaste, libre de grasa, suciedad y polvo	✓	
Otros:		

12. SELECCIONE E INSPECCIONE LOS EQUIPOS SEGÚN PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS PROPIOS DE LA TAREA, SEGÚN CRITERIO

	✓	N/A
RED DE SEGURIDAD: Instalada por persona calificada, en buen estado para su uso.		
ANCLAJE PORTÁTIL: Con etiqueta, Sin Oxidación, cortes, quemaduras, costuras sueltas y deformación		
LÍNEA DE VIDA VERTICAL: Con etiqueta, Abre y cierra correctamente, Sin Oxidación, cortes, desgaste, Torción, Rupturas.		
ESLINGA EN Y CON AMORTIGUADOR: Con etiqueta, Abre y cierra correctamente, Sin Oxidación, deformación, cortes, quemaduras, costuras sueltas.		
ESLINGA DE POSICIONAMIENTO: Con etiqueta, Abre y cierra correctamente, Sin Oxidación, deformación, cortes, quemaduras, costuras sueltas.		
ESLINGA DE RESTRICCIÓN: Abre y cierra correctamente, Sin Oxidación, deformación, cortes, quemaduras, costuras sueltas.		
SISTEMA DE IZAJE/ATE: Abre y cierra correctamente, Sin Oxidación, deformación, cortes, quemaduras, costuras sueltas.		
PUNTO DE ANCLAJE: Certificado, Sin Oxidación, deformación, desajustado, Identificado.		
LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL: Abre y cierra correctamente, Sin Oxidación, deformación, cortes, quemaduras, costuras sueltas		
ARNÉS: Con etiqueta, Sin Oxidación, cortes, quemaduras, costuras sueltas y deformación	✓	
MOSQUETÓN: Abre y cierra correctamente, Sin Oxidación, deformación,	✓	
DISPOSITIVOS RETRÁCTILES: Con etiqueta, Sin Oxidación, deformación, Bloquea correctamente.		
CONECTORES PARA TRÁNSITO (PARROS): Sin Oxidación, deformación, Abren y cierran correctamente		
Otros:		

PERMISO PARA TRABAJO EN ALTURAS

CÓDIGO	SST-P24
FECHA	15/08/2023
VERSIÓN	5
PÁGINA	1 DE 3

13. REPORTE DE CONDICIONES DE SALUD DIARIA. (SI CUENTA CON UN SI ESPECIFICAR EN OBSERVACIONES)

Trabajador No.	LUN.	MAR.	MIÉ.	JUE.	VIE.	SÁB.	DOM.
1	✓				✓		✓
2					✓		✓
3					✓		✓
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

Observaciones de su condición de salud actual:

11.1. INSPECCIÓN DIARIA DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL. ¿ CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE INSPECCIÓN ?

Nota: Si presenta dudas o realizar la inspección según criterios, preguntar al COORDINADOR DE TRABAJO DE ALTURAS

Trabajador No.	LUN.	MAR.	MIÉ.	JUE.	VIE.	SÁB.	DOM.
1	✓			✓	✓		
2				✓	✓		
3				✓	✓		
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

Observaciones de no cumplimiento de criterios EPP:

12.1. INSPECCIÓN DIARIA DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS ¿ CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE INSPECCIÓN ?

Trabajador No.	LUN.	MAR.	MIÉ.	JUE.	VIE.	SÁB.	DOM.
1	✓			✓	✓		
2				✓	✓		
3				✓	✓		
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

Observaciones de no cumplimiento de criterios EPCC:

14. SELECCIONE EL SISTEMA PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS A UTILIZAR SEGÚN ACTIVIDAD O TAREA

✓ NO

SELECCIONE EL SPCC A UTILIZAR	SISTEMA PASIVO	SISTEMAS ACTIVOS DE PROTECCIÓN												REQUERIMIENTO DE CLARIDAD EN METROS				
		MECANISMO DE ANCLAJE				ARNÉS DE CUERPO COMPLETO	CONECTORES											
							CONECTORES PARA DETENCIÓN Y PREVENCIÓN DE CAÍDA			OTROS		CONECTORES PARA TRÁNSITO (FRENOS)	SISTEMA DE RESCATE 4-1					
	RED DE SEGURIDAD	PUNTO DE ANCLAJE CERTIFICADO	ADAPTADORES DE ANCLAJE PORTATIL	LINEA DE VIDA HORIZONTAL	LINEA DE VIDA VERTICAL		MOSQUETÓN	ESLINGA CON AMORTIGUADOR DE CAÍDA	DISPOSITIVOS RETRACTILES	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO	ESLINGA DE RESTRICCION			ALTURA DE TRABAJO	OBSTACULO DE LA ESLINGA	DISTANCIA ABSORBEDOR	FACTOR DE SEGURIDAD	TOTAL
IMAGEN																		
1		✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓		✓						
2		✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓		✓						
3		✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓		✓						
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		

15. SELECCIONE LAS MEDIDAS COLECTIVAS DE PREVENCION A UTILIZAR VERIFIQUE LOS SIGUIENTES ASPECTOS:

DELIMITACIÓN DEL AREA



Delimita la zona de peligro de caída de los trabajadores y permite visibilidad de día y de noche si aplica

CUMPLE ☐ NO CUMPLE ☐

CONTROL DE SUPERFICIES ✓



Cuenta con demarcación, señalización, Delimitación, Cubierta, red de seguridad

CUMPLE ☐ NO CUMPLE ☐

SEÑALIZACIÓN



Cuenta con señalización visible para cualquier persona, en idioma español o extranjero, si aplica

CUMPLE ☐ NO CUMPLE ☐

SILLA PARA TRABAJO EN SUSPENSION



La silla conectada a lo seguta del anclaje indicado por el fabricante y el sistema de descenso certificado, y el trabajador estará asegurado con un segundo sistema de seguridad.

CUMPLE ☐ NO CUMPLE ☐

LÍNEA DE ADVERTENCIA ✓



Cuenta con ayudante de seguridad. Instalada en todos los lados no protegidos, resistencia a 8 KG. Distancia 1,80 m antes del borde, altura de 1 m y cuenta con banderines de colores intervalos de 1,80 m

CUMPLE ☐ NO CUMPLE ☐

MANEJO DE DESNIVELES



Con ángulo de inclinación de 15° a 30°, resistencia en la superficie por donde se transita de mínimo dos veces la carga máxima posible que pueda llegar a soportar

CUMPLE ☐ NO CUMPLE ☐

BARANDA



Cuenta con Resistencia horizontal de la baranda 200 lb. Altura 1 m mínimo. Altura de los rodapiés 8 cm. Ubicación de travesaños intermedios horizontales 48 cm entre sí, medidos al superior del rodapié

CUMPLE ☐ NO CUMPLE ☐

Otras Medidas Preventivas

CUMPLE ☐ NO CUMPLE ☐

16. SELECCIONE LOS SISTEMA DE ACCESO A UTILIZAR Y VERIFIQUE LOS SIGUIENTES ASPECTOS

ANDAMIOS MULTIDIRECCIONAL



Andamios certificados. Ausencia de corrosión o desgaste por sustancias o elementos que deterioren la estructura del mismo

CUMPLE ☐ NO CUMPLE ☐

ANEXO : Formato inspección andamios

ESCALERA



Escalera certificadas, ausencia de corrosión o desgaste por sustancias o elementos que deterioren la estructura del mismo

CUMPLE ☐ NO CUMPLE ☐

ANEXO: Formato inspección de escaleras

PRETALES



Uso como la última opción para acceso a postes. Si no hace indispensable la utilización de los pretales, deberá usar sistemas de protección contra caídas

CUMPLE ☐ NO CUMPLE ☐

ANEXO : Formato inspección de pretales

OTROS SISTEMAS DE ACCESO

SISTEMA DE ELAVADORES DE PERSONAS



Inspeccionados mínimo una vez al año por una persona calificada por el fabricante, o una persona calificada conforme a las recomendaciones del fabricante.

CUMPLE ☐ NO CUMPLE ☐

ANEXO : Formato inspección de sistema de elevadores de personas

SISTEMAS SUSPENDIDOS POR CABLES



Andamios con grado certificado, que garantice la seguridad de la operación. Los contrapesos usados son instalados según fabricante y/o contar con diseños de ingeniería aprobados por una persona calificada

CUMPLE ☐ NO CUMPLE ☐

ANEXO : Formato de inspección de sistema de suspensión por cable

Nota 1: El trabajo en sistemas de acceso debe incluir el análisis de riesgos para determinar los sistemas de prevención y protección contra caídas aplicables, considerando para su selección la compatibilidad de las conexiones al sistema de acceso y las instrucciones de los fabricantes.
Nota 2: El trabajador que tenga la función de realizar el armado y desarmado de andamios y el trabajador que opere equipos para elevación de personas, deben contar con capacitación específica enfocada en la seguridad durante las operaciones y atendiendo las instrucciones de los fabricantes y/o las normas nacionales o internacionales aplicables.

PERMISO PARA TRABAJO EN ALTURAS

CÓDIGO	SST-P-14
FECHA	07/01/2025
VERSIÓN	5
PÁGINA	1 DE 3

17. VALIDACIÓN, FIRMA DEL PERMISO DE TRABAJO

17.1. FIRMA PERSONA QUE AUTORIZA EL TRABAJO: He verificado el sitio de ejecución del trabajo, que todos los elementos necesarios para llevar a cabo la actividad son seguros y están contemplados en el análisis de riesgos y que los controles son pertinentes para ejecutar la actividad de forma segura.

Día:	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
Fecha:	06/04/2026				10/04/2026	11/04/2026	
Nombre:	Oscar Sanchez				Oscar Sanchez	Oscar Sanchez	
Firma:							
Hora:	7:30am				7:30am	7:30am	

17.2. FIRMA DEL COORDINADOR DE TRABAJO EN ALTURAS: He verificado en campo todos los controles establecidos por el análisis de riesgos realizado y considero seguro el desarrollo de la actividad

Día:	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
Nombre:	Melissa Donado				Melissa Donado	Melissa D	
Firma:	Melissa D				Melissa D	Melissa D	
Hora:	7:30am				7:30am	7:30am	

17.3. FIRMA PERSONA RESPONSABLE DE ACTIVAR EL PLAN DE EMERGENCIAS: He verificado en campo todos los controles establecidos por el análisis de riesgos realizado y considero seguro el desarrollo de la actividad

Día:	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
Nombre:	Edson Portilla				Edson Portilla	Edson Portilla	
Firma:	El Cuy				El Cuy	El Cuy	
Hora:	7:30am				7:30am	7:30am	

17.4. FIRMA AYUDANTE DE SEGURIDAD (Si aplica): He verificado en campo todos los controles establecidos por el análisis de riesgos realizado y considero seguro el desarrollo de la actividad

Día:	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
Nombre							
Firma:							
Hora:							

18. CANCELACIÓN, SUSPENSIÓN, CIERRE DEL PERMISO DE TRABAJO

18.1. PERSONAS AUTORIZADAS PARA LA CANCELACIÓN: EL QUE AUTORIZA EL TRABAJO, COORDINADOR DE ALTURAS, ENCARGADO DE ACTIVAR EL PLAN DE EMERGENCIA

CAUSALES DE CANCELACIÓN DEL PERMISO DE TRABAJO: Cuando se presente aquella condición del entorno, acto crítico o práctica irregular que por su potencial se espera una alta severidad en sus efectos inmediatos o a corto plazo, que puedan comprometer físicamente el cuerpo humano dando lugar a un accidente grave o causar la muerte. Ausencia de controles eficaces en términos de medidas de prevención y/o protección. Actos inseguros, ausencia de supervisión eficaz o condición insegura del trabajador (indicar otras causales si las hay).

NOMBRE Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	FIRMA	HORA DEL CIERRE	CAUSALES

18.2. PERSONAS AUTORIZADAS A LA SUSPENSIÓN: EL QUE AUTORIZA EL TRABAJO, COORDINADOR DE ALTURAS, ENCARGADO DE ACTIVAR EL PLAN DE EMERGENCIA

CAUSALES DE SUSPENSIÓN DEL PERMISO DE TRABAJO: (Clima temporal) Cambio de clima, Cambio de condiciones iniciales, atmosférico, inundaciones, La ocurrencia de una situación de alerta, Incendio, Señal de evacuación, Orden expresa de la persona que autoriza. (Indicar otras causales si las hay).

Día	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
Nombre:														
Firma:														
Causal:														
	CIERRE	APERTURA	CIERRE	APERTURA	CIERRE	APERTURA	CIERRE	APERTURA	CIERRE	APERTURA	CIERRE	APERTURA	CIERRE	APERTURA

18.3. PERSONAS AUTORIZADA DEL CIERRE DEL PERMISO: EL QUE AUTORIZA EL TRABAJO Y COORDINADOR DE ALTURAS

CAUSALES DE CIERRE DEL PERMISO: Finalización de la tarea, Cambio de turno, (Indicar otras causales si las hay).

Al cierre del permiso validar:	¿El sitio queda en condiciones seguras?	¿El área queda limpia y libre de desechos?	¿Ausencia de trabajadores en el área de trabajo?

Día	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
Nombre:	Melissa D				Melissa Donado	Melissa Donado	
Firma:	Melissa D				Melissa D	Melissa D	
Causal:	Fin Tareas				Fin Tareas	Fin Tareas	
Hora:	5:00pm				5:00 pm	12:00 m	

19. OBSERVACIONES

CONSORCIO CONSOLIDACIÓN GIRÓN	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO ATS	CÓDIGO:	SST-F-55
		FECHA:	15/08/2023
		VERSIÓN:	2
		PÁGINA:	1 DE 2

1. DATOS GENERALES

Empresa:	Consorcio Consolidación Girón	Ciudad:	Girón
Frente de obra:	Villa de los Caballeros		
Fecha de inicio :	06/04/2026	Fecha de finalización:	11/04/2026
Actividad a realizar:	ESTABILIZACIÓN DE TALUD		
Descripción de la tarea a realizar:	DESMONTE DE VEGETACIÓN DEL TALUD		
Herramientas, equipos e insumos a utilizar:	Machete, azadón, picas, guadaña, motosierra, retroexcavadora (cuando se requiere el uso de maquinaria).		
Elementos de Protección Personal requeridos:	Casco de seguridad, barbuquejo, protector auditivo, gafas de seguridad, tapabocas, guantes, botas de seguridad, dotación, Equipo de Protección Contra Caídas (cuando se requiera).		

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

Trabajo en alturas	X	Espacios confinados		Otro ¿Cuál?	
Excavación		Caliente			

2. ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

Paso a paso de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles requeridos
Alistamiento e inspección de maquinaria, herramientas y equipos a utilizar	Condiciones de seguridad: Locativo (terreno irregular)	Golpes, tropezones, caídas al mismo nivel	1.Inspección del área y herramientas de trabajo antes y durante la ejecución de actividades. 2. Reporte de actos y condiciones inseguras. 3.Trabajar en equipo. 4. Cumplir recomendaciones de seguridad. 5. Mantener condiciones de orden y aseo 6. Adoptar técnicas de manipulación manual de carga seguras. 7. Uso adecuado de EPP 8. Inducción al cargo y capacitación.
	Condiciones de seguridad: Mecánico (Manipulación de herramienta. Maquinaria y equipos)	Golpes, contusiones, aplastamiento, heridas.	
	Biomecánico: manipulación manual de cargas	Lesiones osteomusculares	
Inspección general del área de trabajo	Condiciones de seguridad: Locativo (superficies irregulares)	Golpes, tropezones, caídas al mismo nivel	1. Estar atento a las condiciones del entorno. 2. Reporte de actos y condiciones inseguras 3. Atender la señalización 4. Cumplir recomendaciones de seguridad. 5. Mantener condiciones de orden y aseo 6. Uso adecuado de EPI. 7. Inducción al cargo y capacitación.
	Biológico: picaduras y mordeduras	Alergias, irritación, afectaciones al estado de salud	
Desmonte manual de talud (desyerbe)	Condiciones de seguridad: Locativo (terreno irregular)	Golpes, tropezones, caídas al mismo nivel	1. Inspección del área de trabajo. 2. Inspecciones de herramientas, maquinaria y equipos 3. Reporte de actos y condiciones inseguras 4.Verificar puntos de anclajes 5.Diligenciamiento de permisos necesarios 6.Trabajar en equipo 7.Atender señalización y seguir recomendaciones de seguridad. 8. Mantener condiciones de orden y aseo. 9. Adoptar técnicas de manipulación manual de carga seguras. 10. Realizar pausas activas. 11.Inspeccion preoperacional de EPCC y EPI. 12. Uso adecuado de EPCC y EPI. 13. Personal idóneo para trabajo seguro en altura. 14. Inducción al cargo y capacitación.
	Condiciones de seguridad: Mecánico (Manipulación de herramienta. Maquinaria y equipos)	Golpes, contusiones, aplastamiento, heridas.	
	Biomecánico: manipulación manual de cargas	Lesiones osteomusculares	
	Condiciones de seguridad: trabajo en alturas	Golpes, caídas a distinto nivel, fracturas, politraumatismos	
	Biológico: picaduras y mordeduras	Alergias, irritación, afectaciones al estado de salud	
	Físico: ruido, radiaciones no ionizantes	Migraña, estrés, hipoacusia, golpe de calor, deshidratación, quemaduras 1er grado	

Desmonte manual de talud (Poda de arboles)	Condiciones de seguridad: Locativo (terreno irregular)	Golpes, tropezones, caidas al mismo nivel	1. Inspección del área de trabajo. 2. Inspecciones de herramientas, maquinaria y equipos 3. Reporte de actos y condiciones inseguras 4.Verificar puntos de anclajes 5.Diligenciamiento de permisos necesarios 6.Trabajar en equipo 7.Atender señalización y seguir recomendaciones de seguridad. 8. Mantener condiciones de orden y aseo. 9. Adoptar técnicas de manipulación manual de carga seguras. 10. Realizar pausas activas. 11.Inspeccion preoperacional de EPCC y EPI. 12. Uso adecuado de EPCC y EPI. 13. Personal idóneo para trabajo seguro en altura. 14. Inducción al cargo y capacitación.
	Condiciones de seguridad: Mecánico (Manipulación de herramienta. Maquinaria y equipos)	Golpes, contusiones, aplastamiento, heridas.	
	Biomecánico: manipulación manual de cargas	Lesiones osteomusculares	
	Físico: Vibraciones por manipulación de motosierra	Lesiones osteomusculares	
	Condiciones de seguridad: trabajo en alturas	Golpes, caidas a distinto nivel, fracturas, politraumatismos	
	Biológico: picaduras y mordeduras	Alergias, irritación, afectaciones al estado de salud	
	Físico: ruido, radiaciones no ionizantes	Migraña, estrés, hipoacusia, golpe de calor, deshidratación, quemaduras 1er grado	
Desmonte mecánico de talud (Retroexcavadora)	Condiciones de seguridad: Mecánico (Manipulación de herramienta. Maquinaria y equipos)	Golpes, contusiones, aplastamiento, heridas.	1.Inspección del área de trabajo. 2. Inspecciones de herramientas, maquinaria y equipos 3. Reporte de actos y condiciones inseguras 4.Diligenciamiento de permisos de trabajo necesario. 5. Demarcación de áreas seguras. 6. Atender señalización y seguir recomendaciones de seguridad. 7. Mantener áreas en orden y aseo. 8. Pausas activas. 9. Personal idóneo para maniobrar la retroexcavadora. 10. Inducción al cargo y capacitación.
	Condiciones de seguridad: Mecánico (Caida de objetos)	Golpes, contusiones, aplastamiento, heridas.	
	Químico: material particulado	Afecciones respiratorias	
	Biomecánico: posturas prolongadas (sedente)	Lesiones osteomusculares	
	Físico: ruido	Migraña, estrés, hipoacusia	
Acopio y cargue de residuos vegetales y otros	Condiciones de seguridad: Locativo (terreno irregular)	Golpes, tropezones, caidas al mismo nivel	1.Inspección del área de trabajo. 2. Inspecciones de herramientas, maquinaria y equipos 3. Reporte de actos y condiciones inseguras 4. Atender señalización y seguir recomendaciones de seguridad. 5. Mantener áreas en orden y aseo. 6. Pausas activas. 7. Inducción al cargo y capacitación.
	Biomecánico: Manipulación manual de cargas y posturas inadecuadas	Lesiones osteomusculares	
	Condiciones de seguridad: Mecánico (Manipulación de herramienta. Maquinaria y equipos)	Golpes, contusiones, aplastamiento, heridas.	
	Biológico: picaduras y mordeduras	Alergias, irritación, afectaciones al estado de salud	

Organización de herramientas y equipos, limpieza del área de trabajo	Condiciones de seguridad: Locativo (terreno irregular)	lesiones severas, perdidas humanas y materiales	1. Estar atento a las condiciones del entorno. 2. Reporte de actos y condiciones inseguras 3. Atender a señalización 4. Seguir recomendaciones e indicaciones de seguridad. 5. Mantener condiciones de orden y aseo 6. Uso adecuado de EPI. 7. Inducción al cargo y capacitación.
	Biológico: picaduras y mordeduras	Alergias, irritación, afectaciones al estado de salud	
Transporte de residuos a área de disposición final	Condiciones de seguridad: Mecánico (Manipulación de herramienta. Maquinaria y equipos)	Golpes, contusiones, aplastamiento, heridas.	1.Inspección del área de trabajo. 2. Inspecciones de herramientas, maquinaria y equipos 3. Reporte de actos y condiciones inseguras 4.Diligenciamiento de permisos de trabajo necesario. 5. Demarcación de áreas seguras. 6. Atender señalización y seguir recomendaciones de seguridad. 7. Mantener áreas en orden y aseo. 8. Pausas activas. 9. Personal idóneo para conducir vehiculo. 10. Inducción al cargo y capacitación. 11. Documentación del vehiculo vigente.
	Condiciones de seguridad: Riesgo vial o de transito	lesiones severas, perdidas humanas y materiales	
	Biomecánico: posturas prolongadas (sedente)	Lesiones osteomusculares	

Riesgos: todas las actividades: condiciones de seguridad (accidentes de tránsito, riesgo público); fenómenos naturales (sismos, derrumbes)

Controles generales: 1. Plan de emergencias y evacuación; 2. Conformación de brigadas de emergencias; 3. Disponibilidad de elementos para la atención de emergencias; 4. Verificar interferencia con trabajos adyacentes; 5. Emplear herramienta adecuada y en buen estado; 6. Realizar mantenimiento preventivo y/o correctivo de la maquinaria y equipos. 7. Fomentar cultura de autocuidado.

IDENTIFICACIÓN DE TRABAJADORES EJECUTORES

Nombres y Apellidos	No. de Identificación	Firma
X Willington Alarcón A.S.	91479571	W.A.A
X estiven caicedo	1232891906	estiven C
X Manuel Castillo	108287247	Manuel

IDENTIFICACIÓN RESPONSABLE DE LA TAREA (Residente de Obra, Auxiliar de Ingeniería, Supervisor)

Nombres y Apellidos	No. de Identificación	Firma
Oscar Andres Sanchez	1098756647	

IDENTIFICACIÓN DEL EMISOR (Responsable SST)

Nombres y Apellidos	No. de Identificación	Firma
Melissa Dorado Arias	1098704436	Melissa Dorado

NAMIENTO

CONSORCIO

PERMISO PARA TRABAJO EN ALTURAS

CÓDIGO	SST-F-24
FECHA	15/08/2023
VERSIÓN	5
PÁGINA	1 DE 1

1. FECHA DE INICIO Y HORA	13 (DÍA)	04 (MES)	2026 (AÑO)	7:30	
2. TERMINACIÓN DE LA TAREA	14 (DÍA)	04 (MES)	2026 (AÑO)	5:00 PM	
3. CENTRO DE TRABAJO	VILLAS DE LOS CABALLEROS.				
4. ALTURA APROXIMADA	12 mts				
5. CONSECUTIVO					

6. PERSONAS AUTORIZADAS Y REQUERIMIENTOS

Trabajador N.a.	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACIÓN	CARGO	APTO EN EXAMENES ALTURAS?	¿CURSO DE ALTURA VIGENTE?	AFILIACIÓN VIGENTE SEGURIDAD SOCIAL?
1	WAD	9144051	Ayudante per	✓	✓	✓
2	estiven Caicedo	72328 919 06	Ay perforacion	Si	Si	Si
3	Manuel Castillo	608 2871 247	Ayudante	Si	Si	Si
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

7. FIRMA DEL EJECUTOR O TRABAJADOR AUTORIZADO EN TA

FIRMA DEL TRABAJADOR

13/04/26	14/04/26					
+ LUNES	X MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
WAD	WAD	/	/	/	/	/
estiven	estiven					
Manuel	Manuel					

6. SELECCIONE EL TIPO DE TRABAJO O TAREA

	Desmonte de vegetación de talud
	Fortalecimiento de talud manual y mecánico
	Topografía de marcación de puntos de anclaje
	Perforación de talud
✓	Mallado e inyección de los anclajes
	Blancaje o concreto lanzado
	Tensionamiento de talud
	Otros:

7. ¿TRABAJO RUTINARIO?

SI	NO

8. SELECCIONE LAS HERRAMIENTAS Y EQUIPOS A UTILIZAR TENIENDO EN CUENTA LA TAREA A REALIZAR

8.1. SELECCIÓN DE HERRAMIENTAS

Pica		Perra de 14 libra	
Pala		Cizalla	
Azadón		Perros	
Palustraga		Taludo	
Machete		Pulidora	
Llave de tubo		Silla	
Serrucho		Segueta	
Llave expansiva		Otros: Gato	
Perra de 6 libras			


8.2. SELECCIÓN DE EQUIPOS

Compresor		Retroexcavadora	
Unidad hidráulica		Volqueta	
Torre de perforación		Maquera de aire	
Barras de perforación			
Martillo de perforación			
Compresor		Otros:	
Tubo			
Mandos de perforación			
Maquera hidráulica			

9. ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO TSA

DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE LA TAREA	Se anexa al presente documento los registros correspondientes en formato SST-F-55 Análisis de Trabajo Seguro

10. AUTOREPORTE DE CONDICIONES DE SALUD, ¿PRESENTA ALGUNO DE ÉSTOS SINTOMAS?

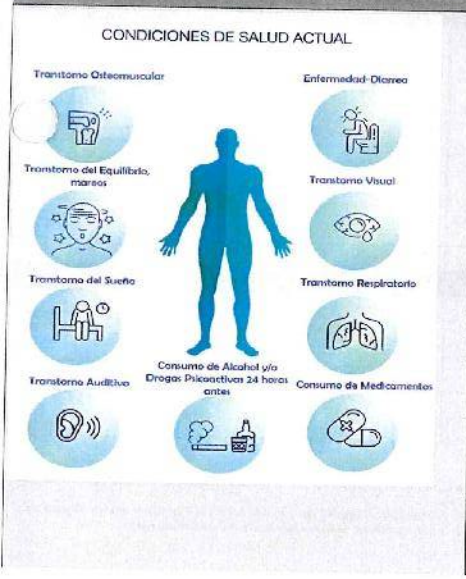

11. SELECCIONE E INSPECCIONE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PROPIOS DE LA TAREA SEGÚN CRITERIO

	✓	N/A
CASCO BARBUQUEJO	Sin fisuras, limpio, con barbuquejo	
GAFAS OSCURAS	Sin rayones, sin fisuras y con hilo sujetador	
GAFAS TRANSPARENTES	Sin rayones, sin fisuras y con hilo sujetador	
TAPA OIDO DE COPA	Sin desgaste, sin fracturas,	
TAPA OIDO INSERCCIÓN	Sin desgaste, sin fracturas,	
TAPABOCAS QUIRÚRCICO	Sin desgaste, libre de grasa, suciedad y polvo	
CAPUCHA	Sin oficios, libre de grasa, suciedad y polvo	
GUANTES DE CARNAZA	Sin oficios, libre de grasa, suciedad	
GUANTES DE PRECISIÓN	Sin oficios, libre de grasa, suciedad y polvo	
ZAPATOS SEGURIDAD	Sin agujeros, sin filtraciones de agua y enrrados	
BOTAS PANTANERAS	Sin agujeros, sin filtraciones de agua	
CARETA	Sin rayones, sin fisuras y con sujetador	
TAPABOCAS N95	Sin desgaste, libre de grasa, suciedad y polvo	
Otros:		

12. SELECCIONE E INSPECCIONE LOS EQUIPOS SEGÚN PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS PROPIOS DE LA TAREA, SEGÚN CRITERIO

	✓	N/A
RED DE SEGURIDAD	Instalada por persona calificada, en buen estado para su uso.	
ANCLAJE PORTÁTIL	Con etiqueta, Sin Oxidación, cortes, quemaduras, costuras sueltas y deformación	
LÍNEA DE VIDA VERTICAL	Con etiqueta, Abre y cierra correctamente, Sin Oxidación, cortes, desgate, Torcion, Rupturas.	
ESLINGA EN Y CON AMORTIGUADOR	Con etiqueta, Abre y cierra correctamente, Sin Oxidación, deformación, cortes, quemaduras, costuras sueltas.	
ESLINGA DE POSICIONAMIENTO	Con etiqueta, Abre y cierra correctamente, Sin Oxidación, deformación, cortes, quemaduras, costuras sueltas.	
ESLINGA DE RESTRICCIÓN	Abre y cierra correctamente, Sin Oxidación, deformación, cortes, quemaduras, costuras sueltas.	
SISTEMA DE RESCATE	Abre y cierra correctamente, Sin Oxidación, deformación, cortes, quemaduras, costuras sueltas.	
PUNTO DE ANCLAJE	Certificado, Sin Oxidación, deformación, desplazados, Identificado.	
LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL	Abre y cierra correctamente, Sin Oxidación, deformación, cortes, quemaduras, costuras sueltas.	✓
ARNÉS	Con etiqueta, Sin Oxidación, cortes, quemaduras, costuras sueltas y deformación	✓
MOSQUETÓN	Abre y cierra correctamente, Sin Oxidación, deformación,	✓
DISPOSITIVOS RETRÁCTILES	Con etiqueta, Sin Oxidación, deformación, Bloquea correctamente.	
CONECTORES PARA TRANSITO (FRENOS)	Sin Oxidación, deformación, Abren y cierran correctamente	✓
Otros:		

CONSORCIO

PERMISO PARA TRABAJO EN ALTURAS

CODIGO	SST-F-21
FECHA	15/03/2020
VERSIÓN	5
PÁGINA	1 DE 3

13. REPORTE DE CONDICIONES DE SALUD DIARIA. (SI CUENTA CON UN SI ESPECIFICAR EN OBSERVACIONES)

Trabajador No.	LUN.	MAR.	MIÉ.	JUE.	VIE.	SÁB.	DOM.
1	SI			NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
2	SI			NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
3	SI			NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
4	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
5	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
6	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
7	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
8	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
9	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
10	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

Observaciones de su condición de salud actual:

11.1. INSPECCIÓN DIARIA DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, ¿ CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE INSPECCIÓN ?

Nota: Si presenta dudas a realizar la inspección según criterios, preguntar al COORDINADOR DE TRABAJO DE ALTURAS

Trabajador No.	LUN.	MAR.	MIÉ.	JUE.	VIE.	SÁB.	DOM.
1	SI			NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
2	SI			NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
3	SI			NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
4	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
5	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
6	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
7	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
8	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
9	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
10	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

Observaciones de no cumplimiento de criterios EPP:

12.1. INSPECCIÓN DIARIA DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS ¿ CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE INSPECCIÓN ?

Trabajador No.	LUN.	MAR.	MIÉ.	JUE.	VIE.	SÁB.	DOM.
1	SI			NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
2	SI			NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
3	SI			NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
4	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
5	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
6	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
7	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
8	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
9	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
10	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

Observaciones de no cumplimiento de criterios EPCC:

14. SELECCIONE EL SISTEMA PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS A UTILIZAR SEGÚN ACTIVIDAD O TAREA

✓ = SI

SELECCIONE EL SPCC A UTILIZAR	SISTEMA PASIVO		SISTEMAS ACTIVOS DE PROTECCIÓN											REQUERIMIENTO DE CLARIDAD EN METE				
			MECANISMO DE ANCLAJE				CONECTORES											
							CONECTORES PARA DETENCIÓN Y PREVENCIÓN DE CAÍDA											
	RED DE SEGURIDAD	PUNTO DE ANCLAJE CERTIFICADO	ADAPTADORES DE ANCLAJE PORTATIL	LINEA DE VIDA HORIZONTAL	LINEA DE VIDA VERTICAL	ARNÉS DE CUERPO COMPLETO	MOSQUETÓN	ESLINGA CON ABSORBEDOR DE ENERGÍA	DISPOSITIVOS RETRÁCTILES	OTROS		CONECTORES PARA TRÁNSITO (FRENOS)	SISTEMA DE RESCATE 4-1					
										ESLINGA DE POSICIONAMIENTO	ESLINGA DE RESTRICCIÓN			ALTURA DEL TRABAJADOR	DISTANCIA DE LA CAÍDA	DISTANCIA ABSORBEDOR	FACTOR DE SEGURIDAD	TOTAL
IMAGEN																		
1				✓	✓	✓	✓			✓		✓						
2				✓	✓	✓	✓			✓		✓						
3				✓	✓	✓	✓			✓		✓						
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		

15. SELECCIONE LAS MEDIDAS COLECTIVAS DE PREVENCION A UTILIZAR VERIFIQUE LOS SIGUIENTES ASPECTOS:

DELIMITACIÓN DEL AREA ✓



Delimita la zona de peligro de caída de los trabajadores y permite visibilidad de día y de noche si aplica

CUMPLE ✓ | NO CUMPLE

CONTROL DE SUPERFICIES



Cuenta con demarcación, señalización, Delimitación, Cubierta, o red de seguridad

CUMPLE | NO CUMPLE

SEÑALIZACIÓN ✓



Cuenta con señalización visible para cualquier persona, en idioma español o extranjero, si aplica

CUMPLE ✓ | NO CUMPLE

SILLA PARA TRABAJO EN SUSPENSIÓN



La silla conectada a la angiria del arnés indicada por el fabricante y al sistema de anclaje certificado, y el trabajador estará asegurado a un segundo sistema de seguridad.

CUMPLE | NO CUMPLE

LÍNEA DE ADVERTENCIA



Cuenta con ayudante de seguridad. Instalada en todos los lados expuestos, resistente de 8 KG. Distancia 1,80 m antes del borde, altura de 1 m y cuenta con banderines de colores a intervalos de 1,00 m

CUMPLE | NO CUMPLE

MANEJO DE DESNIVELES



Con angulo de inclinación de 15° a 20°. Resistencia en la superficie por donde se transita de mínimo dos veces la carga máxima prevista que pueda llegar a soportar

CUMPLE | NO CUMPLE

BARANDA



Cumple con Resistencia estructural de la baranda 200 lb, Alturas 1 m mínima, Altura de los rodapiés 9 cm, Ubicación de travesaños intermedios horizontales de manera tal, red lonas si supera el rodapié

CUMPLE | NO CUMPLE

Otra Medidas Preventivas

CUMPLE | NO CUMPLE

16. SELECCIONE LOS SISTEMA DE ACCESO A UTILIZAR Y VERIFIQUE LOS SIGUIENTES ASPECTOS

ANDAMIOS MULTIDIRECCIONAL



Andamios certificados, Ausencia de corrosión o deposito por sustancias o elementos que deterioren la estructura del mismo.

CUMPLE | NO CUMPLE

ANEXO : Formato Inspección andamios

ESCALERA



Escaleras certificadas, ausencia de corrosión o deposito por sustancias o elementos que deterioren la estructura del mismo.

CUMPLE | NO CUMPLE

ANEXO: Formato Inspección de escaleras

PRETALES



Uso como alternativa para acceso a postes. Si no fuere indispensable la utilización de los pretales, deben usar sistemas de protección contra caídas

CUMPLE | NO CUMPLE

ANEXO Formato Inspección de pretales

OTROS SISTEMAS DE ACCESO

SISTEMA DE ELAVADORES DE PERSONAS



Inspeccionados mínimo una vez al año por una persona avalada por el fabricante, o una persona calificada conforme a las recomendaciones del fabricante.

CUMPLE | NO CUMPLE

ANEXO :Formato inspección de sistema de elevadores de personas

SISTEMAS SUSPENDIDOS POR CABLES



Andamio colgante certificado, que garantice la seguridad de la operación. Los contrapesos usados son instalados según fabricante y/o contar con diseños de ingeniería aprobados por una persona calificada

CUMPLE | NO CUMPLE

ANEXO: Formato de inspección de sistema de suspensión por cable

Nota 1: El trabajo en sistemas de acceso debe incluir el análisis de riesgos para determinar los sistemas de prevención y protección contra caídas aplicables, considerando para su selección la compatibilidad de las conexiones al sistema de acceso y las instrucciones de los fabricantes.
Nota 2: El trabajador que tenga la función de realizar el armado y desarmado de andamios y el trabajador que opere equipos para elevación de personas, deben contar con capacitación específica enfocada en la seguridad durante las operaciones y atendiendo las instrucciones de los fabricantes y/o las normas nacionales o internacionales aplicables.

CONSORCIO

PERMISO PARA TRABAJO EN ALTURAS

CÓDIGO	SST-F-23
FECHA	15/09/2023
VERSIÓN	3
PÁGINA	1 DE 3

17. VALIDACIÓN, FIRMA DEL PERMISO DE TRABAJO

17.1. FIRMA PERSONA QUE AUTORIZA EL TRABAJO: He verificado el sitio de ejecución del trabajo, que todos los elementos necesarios para llevar a cabo la actividad son seguros y están contemplados en el análisis de riesgos y que los controles son pertinentes para ejecutar la actividad de forma segura.

Día:	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
Fecha:	13/04/2026	14/04/2026					
Nombre:	Oscar Sanchez	Oscar Sanchez					
Firma:							
Hora:	7:30 am	7:30 am					

17.2. FIRMA DEL COORDINADOR DE TRABAJO EN ALTURAS: He verificado en campo todos los controles establecidos por el análisis de riesgos realizado y considero seguro el desarrollo de la actividad

Día:	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
Nombre:	Melissa D	Melissa D					
Firma:	Melissa D	Melissa D					
Hora:	7:30am	7:30am					

17.3. FIRMA PERSONA RESPONSABLE DE ACTIVAR EL PLAN DE EMERGENCIAS: He verificado en campo todos los controles establecidos por el análisis de riesgos realizado y considero seguro el desarrollo de la actividad

Día:	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
Nombre:	Edson Portillo	Edson Portillo					
Firma:	Edson Portillo	Edson Portillo					
Hora:	7:30am	7:30am					

17.4. FIRMA AYUDANTE DE SEGURIDAD (si aplica): He verificado en campo todos los controles establecidos por el análisis de riesgos realizado y considero seguro el desarrollo de la actividad

Día:	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
Nombre:							
Firma:							
Hora:							

18. CANCELACIÓN, SUSPENSIÓN, CIERRE DEL PERMISO DE TRABAJO

18.1. PERSONAS AUTORIZADAS PARA LA CANCELACIÓN: EL QUE AUTORIZA EL TRABAJO, COORDINADOR DE ALTURAS, ENCARGADO DE ACTIVAR EL PLAN DE EMERGENCIA

CAUSALES DE CANCELACIÓN DEL PERMISO DE TRABAJO: Cuando se presente aquella condición del entorno, acto crítico o práctica irregular que por su potencial se exprese una alta severidad de sus efectos inmediatos en corto plazo, que puedan comprometer física o mentalmente el cuerpo humano o dado lugar a un accidente grave o salvar la muerte. Ausencia de controles eficaces en términos de medidas de prevención y de protección. Actos inseguros, ausencia de supervisión eficaz o condición sentaria del trabajador (indicar otras causales si las hay).

NOMBRE Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	FIRMA	HORA DEL CIERRE	CAUSALES

18.2. PERSONAS AUTORIZADAS A LA SUSPENSIÓN: EL QUE AUTORIZA EL TRABAJO, COORDINADOR DE ALTURAS, ENCARGADO DE ACTIVAR EL PLAN DE EMERGENCIA

CAUSALES DE SUSPENSIÓN DEL PERMISO DE TRABAJO: (Clima temporal) Cambio de clima, Cambios de condiciones iniciales, simulacros, reuniones, La ocurrencia de una situación de alerta, Incendio, Señal de evacuación, Orden expresa de la persona que suspende. (indicar otras causales si las hay).

Día	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
Nombre:														
Firma:														
Causal:														
	CIERRE	APERTURA	CIERRE	APERTURA	CIERRE	APERTURA	CIERRE	APERTURA	CIERRE	APERTURA	CIERRE	APERTURA	CIERRE	APERTURA

18.3. PERSONAS AUTORIZADA DEL CIERRE DEL PERMISO: EL QUE AUTORIZA EL TRABAJO Y COORDINADOR DE ALTURAS

CAUSALES DE CIERRE DEL PERMISO: *Finalización de la tarea, Cambio de turno. (Indicar otras causales si las hay).*

Al cierre del permiso validar:	¿ El sitio queda en condiciones seguras?	¿El área queda limpia y libre de desechos?	¿Ausencia de trabajadores en el área de trabajo?

Día	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
Nombre:	Melissa D	Melissa D					
Firma:	Melissa D	Melissa D					
Causal:	Fin tareas	Fin Tareas					
Hora:	5:00 pm	5:00 pm					

OBSERVACIONES

CONSORCIO CONSOLIDACIÓN GIRÓN	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO ATS	CÓDIGO:	SST-F-55
		FECHA:	15/08/2023
		VERSIÓN:	2
		PÁGINA:	1 DE 2

1. DATOS GENERALES

Empresa:	Consorcio Consolidación Girón	Ciudad:	Girón
Frente de obra:	Villa de los Caballeros		
Fecha de inicio :	13/04/2026	Fecha de finalización:	14/04/2026
Actividad a realizar:	ESTABILIZACIÓN DE TALUD		
Descripción de la tarea a realizar:	DESMONTE DE VEGETACIÓN DEL TALUD		
Herramientas, equipos e insumos a utilizar:	Macheta, azadón, picas, guadaña, motosierra, retroexcavadora (cuando se requiere el uso de maquinaria).		
Elementos de Protección Personal requeridos:	Casco de seguridad, barbuquejo, protector auditivo, gafas de seguridad, tapabocas, guantes, botas de seguridad, dotación, Equipo de Protección Contra Caídas (cuando se requiera).		

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

Trabajo en alturas	✓	Espacios confinados		Otro ¿Cuál?
Excavación		Caliente		

2. ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

Paso a paso de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles requeridos
Alistamiento e inspección de maquinaria, herramientas y equipos a utilizar	Condiciones de seguridad: Locativo (terreno irregular)	Golpes, tropezones, caídas al mismo nivel	1.Inspección del área y herramientas de trabajo antes y durante la ejecución de actividades. 2. Reporte de actos y condiciones inseguras. 3.Trabajar en equipo. 4. Cumplir recomendaciones de seguridad. 5. Mantener condiciones de orden y aseo 6. Adoptar técnicas de manipulación manual de carga seguras. 7. Uso adecuado de EPP 8. Inducción al cargo y capacitación.
	Condiciones de seguridad: Mecánico (Manipulación de herramienta. Maquinaria y equipos)	Golpes, contusiones, aplastamiento, heridas.	
	Biomecánico: manipulación manual de cargas	Lesiones osteomusculares	
Inspección general del área de trabajo	Condiciones de seguridad: Locativo (superficies irregulares)	Golpes, tropezones, caídas al mismo nivel	1. Estar atento a las condiciones del entorno. 2. Reporte de actos y condiciones inseguras 3. Atender la señalización 4. Cumplir recomendaciones de seguridad. 5. Mantener condiciones de orden y aseo 6. Uso adecuado de EPI. 7. Inducción al cargo y capacitación.
	Biológico: picaduras y mordeduras	Alergias, irritación, afectaciones al estado de salud	
Desmonte manual de talud (desyerbe)	Condiciones de seguridad: Locativo (terreno irregular)	Golpes, tropezones, caídas al mismo nivel	1. Inspección del área de trabajo. 2. Inspecciones de herramientas, maquinaria y equipos 3. Reporte de actos y condiciones inseguras 4.Verificar puntos de anclajes 5.Diligenciamiento de permisos necesarios 6.Trabajar en equipo 7.Atender señalización y seguir recomendaciones de seguridad. 8. Mantener condiciones de orden y aseo. 9. Adoptar técnicas de manipulación manual de carga seguras. 10. Realizar pausas activas. 11.Inspeccion preoperacional de EPCC y EPI. 12. Uso adecuado de EPCC y EPI. 13. Personal idóneo para trabajo seguro en altura. 14. Inducción al cargo y capacitación.
	Condiciones de seguridad: Mecánico (Manipulación de herramienta. Maquinaria y equipos)	Golpes, contusiones, aplastamiento, heridas.	
	Biomecánico: manipulación manual de cargas	Lesiones osteomusculares	
	Condiciones de seguridad: trabajo en alturas	Golpes, caídas a distinto nivel, fracturas, politraumatismos	
	Biológico: picaduras y mordeduras	Alergias, irritación, afectaciones al estado de salud	
	Físico: ruido, radiaciones no ionizantes	Migraña, estrés, hipoacusia, golpe de calor, deshidratación, quemaduras 1er grado	

Desmonte manual de talud (Poda de arboles)	Condiciones de seguridad: Locativo (terreno irregular)	Golpes, tropezones, caídas al mismo nivel	1. Inspección del área de trabajo. 2. Inspecciones de herramientas, maquinaria y equipos 3. Reporte de actos y condiciones inseguras 4.Verificar puntos de anclajes 5.Diligenciamiento de permisos necesarios 6.Trabajar en equipo 7.Atender señalización y seguir recomendaciones de seguridad. 8. Mantener condiciones de orden y aseo. 9. Adoptar técnicas de manipulación manual de carga seguras. 10. Realizar pausas activas. 11.Inspeccion preoperacional de EPCC y EPI. 12. Uso adecuado de EPCC y EPI. 13. Personal idóneo para trabajo seguro en altura. 14. Inducción al cargo y capacitación.
	Condiciones de seguridad: Mecánico (Manipulación de herramienta. Maquinaria y equipos)	Golpes, contusiones, aplastamiento, heridas.	
	Biomecánico: manipulación manual de cargas	Lesiones osteomusculares	
	Físico: Vibraciones por manipulación de motosierra	Lesiones osteomusculares	
	Condiciones de seguridad: trabajo en alturas	Golpes, caídas a distinto nivel, fracturas, politraumatismos	
	Biológico: picaduras y mordeduras	Alergias, irritación, afectaciones al estado de salud	
	Físico: ruido, radiaciones no ionizantes	Migraña, estrés, hipoacusia, golpe de calor, deshidratación, quemaduras 1er grado	
Desmonte mecánico de talud (Retroexcavadora)	Condiciones de seguridad: Mecánico (Manipulación de herramienta. Maquinaria y equipos)	Golpes, contusiones, aplastamiento, heridas.	1.Inspección del área de trabajo. 2. Inspecciones de herramientas, maquinaria y equipos 3. Reporte de actos y condiciones inseguras 4.Diligenciamiento de permisos de trabajo necesario. 5. Demarcación de áreas seguras. 6. Atender señalización y seguir recomendaciones de seguridad. 7. Mantener áreas en orden y aseo. 8. Pausas activas. 9. Personal idóneo para maniobrar la retroexcavadora. 10. Inducción al cargo y capacitación.
	Condiciones de seguridad: Mecánico (Caída de objetos)	Golpes, contusiones, aplastamiento, heridas.	
	Químico: material particulado	Afecciones respiratorias	
	Biomecánico: posturas prolongadas (sedente)	Lesiones osteomusculares	
	Físico: ruido	Migraña, estrés, hipoacusia	
Acopio y cargue de residuos vegetales y otros	Condiciones de seguridad: Locativo (terreno irregular)	Golpes, tropezones, caídas al mismo nivel	1.Inspección del área de trabajo. 2. Inspecciones de herramientas, maquinaria y equipos 3. Reporte de actos y condiciones inseguras 4. Atender señalización y seguir recomendaciones de seguridad. 5. Mantener áreas en orden y aseo. 6. Pausas activas. 7. Inducción al cargo y capacitación.
	Biomecánico: Manipulación manual de cargas y posturas inadecuadas	Lesiones osteomusculares	
	Condiciones de seguridad: Mecánico (Manipulación de herramienta. Maquinaria y equipos)	Golpes, contusiones, aplastamiento, heridas.	
	Biológico: picaduras y mordeduras	Alergias, irritación, afectaciones al estado de salud	

Organización de herramientas y equipos, limpieza del área de trabajo	Condiciones de seguridad: Locativo (terreno irregular)	lesiones severas, perdidas humanas y materiales	1. Estar atento a las condiciones del entorno. 2. Reporte de actos y condiciones inseguras 3. Atender a señalización 4. Seguir recomendaciones e indicaciones de seguridad. 5. Mantener condiciones de orden y aseo 6. Uso adecuado de EPI. 7. Inducción al cargo y capacitación.
	Biológico: picaduras y mordeduras	Alergias, irritación, afectaciones al estado de salud	
Transporte de residuos a área de disposición final	Condiciones de seguridad: Mecánico (Manipulación de herramienta. Maquinaria y equipos)	Golpes, contusiones, aplastamiento, heridas.	1.Inspección del área de trabajo. 2. Inspecciones de herramientas, maquinaria y equipos 3. Reporte de actos y condiciones inseguras 4.Diligenciamiento de permisos de trabajo necesario. 5. Demarcación de áreas seguras. 6. Atender señalización y seguir recomendaciones de seguridad. 7. Mantener áreas en orden y aseo. 8. Pausas activas. 9. Personal idóneo para conducir vehículo. 10. Inducción al cargo y capacitación. 11. Documentación del vehículo vigente.
	Condiciones de seguridad: Riesgo vial o de transito	lesiones severas, perdidas humanas y materiales	
	Biomecánico: posturas prolongadas (sedente)	Lesiones osteomusculares	

Riesgos: todas las actividades: condiciones de seguridad (accidentes de tránsito, riesgo público); fenómenos naturales (sismos, derrumbes)

Controles generales: 1. Plan de emergencias y evacuación; 2. Conformación de brigadas de emergencias; 3. Disponibilidad de elementos para la atención de emergencias; 4. Verificar interferencia con trabajos adyacentes; 5. Emplear herramienta adecuada y en buen estado; 6. Realizar mantenimiento preventivo y/o correctivo de la maquinaria y equipos. 7. Fomentar cultura de autocuidado.

IDENTIFICACIÓN DE TRABAJADORES EJECUTORES

Nombres y Apellidos	No. de Identificación	Firma
X willy Leonardo Rubio RS.	91475771	WRR
X estiven caicedo	1232891906	estiven caicedo
X Manuel castillo	1082871247	Manuel

IDENTIFICACIÓN RESPONSABLE DE LA TAREA (Residente de Obra, Auxiliar de Ingeniería, Supervisor)

Nombres y Apellidos	No. de Identificación	Firma
Oscar Andres Sanchez	1098756047	

IDENTIFICACION DEL EMISOR (Responsable SST)

Nombres y Apellidos	No. de Identificación	Firma
Melissa Donado Arias	1098704436	Melissa D

ANEXO No.05: SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD

CONSORCIO
CONSOLIDACIÓN GIRÓN

INFORME PLAN DE CALIDAD 007

CONTRATO Nº 210.16225.6

Fecha	Elaboró	Revisó	Aprobó
14/04/2026	Ing. Oscar Sánchez	Ing. Edgar Gomez	Ing. Edgar Gomez

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 3
1. CONSIDERACIONES GENERALES 4
2. GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE APOYO 4
2.1 Talento humano 4
2.2 Infraestructura 5
2.3 Conocimiento y toma de conciencia 6
2.4 Comunicaciones 6
2.5 Información documentada 6
3. OPERACIÓN 8
3.1 Planificación y control operacional 8
3.2 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente 8
3.3 Control en la prestación del servicio 9
3.4 Liberación de productos y servicios. 9
3.5 Control de salidas no conformes. 10
3.6 Encuesta de satisfacción del cliente. 10
4. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 10
5. AUDITORIAS INTERNAS 11
6. REVISIÓN DE LA DIRECCIÓN 11
7. MEJORA CONTINUA 12
8. ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS 12
9. CONCLUSIONES 12

INTRODUCCIÓN

El CONSORCIO CONSOLIDACIÓN GIRÓN motivado a mejorar continuamente la eficacia de su sistema de gestión de calidad, se compromete en su participación directa, liderando, creando una cultura de calidad en la organización, fomentando la participación positiva de todo el personal en la ejecución del proyecto “CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACION PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN EL TALUD ORIENTAL DEL BARRIO VILLA DE LOS CABALLEROS EN EL MUNICIPIO DE GIRÓN, DEPARTAMENTO DE SANTANDER.”

El presente informe comprende el periodo entre el 01 y el 14 de abril 2026, describe el cumplimiento de las actividades propuestas en el aseguramiento y control de la calidad del proyecto contenidas en el plan de calidad del proyecto y el plan de inspección y ensayo. Los formatos utilizados para el seguimiento y control de este proyecto están acogidos al sistema de calidad de las empresas consorciadas.

Para el periodo comprendido entre el 01 y el 14 de abril 2026 se realizan las siguientes actividades:

- Replanteo, Control y medición de Obra (mes)
- Tensionamiento de anclajes
- Suministro e instalación de platina de 200mm x 200mm x 12mm con tres agujeros
- Suministro e instalación de popora de 3 agujeros cónicos para cuña de Ø=1/2"
- Suministro e instalación de de kit de cuñas de Ø=1/2" para anclaje

1. CONSIDERACIONES GENERALES

CONTRATO DE OBRA	N° 210.62225.6
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACION PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN EL TALUD ORIENTAL DEL BARRIO VILLA DE LOS CABALLEROS EN EL MUNICIPIO DE GIRÓN, DEPARTAMENTO DE SANTANDER.
ENTIDAD CONTRATANTE	CDMB – CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA.
CONTRATISTA	CONSORCIO CONSOLIDACIÓN GIRÓN
REPRESENTANTE LEGAL	JOHANNA MARCELA PEDIERNA CASTIBLANCO
NIT	901.982.51-5
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTER GIRÓN
REPRESENTANTE LEGAL	IBAN GUSTAVO BLANCO GONZALEZ
NIT	901.985.184-1
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	6 MESES
FECHA DE INICIO	15/10/2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	14/04/2026
MUNICIPIO	GIRÓN - SANTANDER

2. GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE APOYO

2.1 Talento humano

El CONSORCIO CONSOLIDACIÓN GIRÓN tiene establecido los perfiles y funciones de los cargos para el personal administrativo y obra. Para el periodo comprendido entre el 01 y el 14 de abril 2026 NO se realizaron ingresos de personal, se registraron los siguientes retiros como se relacionan en la siguiente tabla.

RETIRO DE PERSONAL	
NOMBRE	**CARGO**
Isaías García Jaimes	Operador De Perforación I
Jarrinson Steven Camarón Caicedo	Ayudante de Perforación II
Miguel Antonio Rangel Florian	Ayudante de Perforación II
Jesus Alberto Mayorga Mayorga	Ayudante de Obra

Willingtong Alarcon Ascanio	Ayudante de Perforación II
Manuel Enrique Castillo Florez	Ayudante de Obra
Edson Alexander Portilla Ardila	Almacenista
Giovany Sebastian Parra Ferrer	Ayudante de Obra

Ver anexo 1. Documentos soporte salida de personal.

El pago a los trabajadores hace parte de las obligaciones legales del CONSORCIO CONSOLIDACIÓN GIRÓN, realizándose en los términos pactados y dejando su correspondiente registro documental, los soportes de pago de seguridad social, para el periodo comprendido son verificadas en las entregas realizadas a interventoría en el informe SST.

2.2 Infraestructura

El CONSORCIO CONSOLIDACIÓN GIRÓN ha destinado como lugar de trabajo la oficina principal de la empresa INFRACORP, la cual se encuentra ubicada en la carrera 39 No. 51-31 Apartamento 2405, esta oficina cuenta con la estructura y los espacios necesarios para llevar a cabo las actividades de revisión y ajustes de diseños.

Adicionalmente, se realizan visitas a la zona de influencia del proyecto, donde se realizan estudios topográficos que permiten la revisión y ajuste de los diseños.

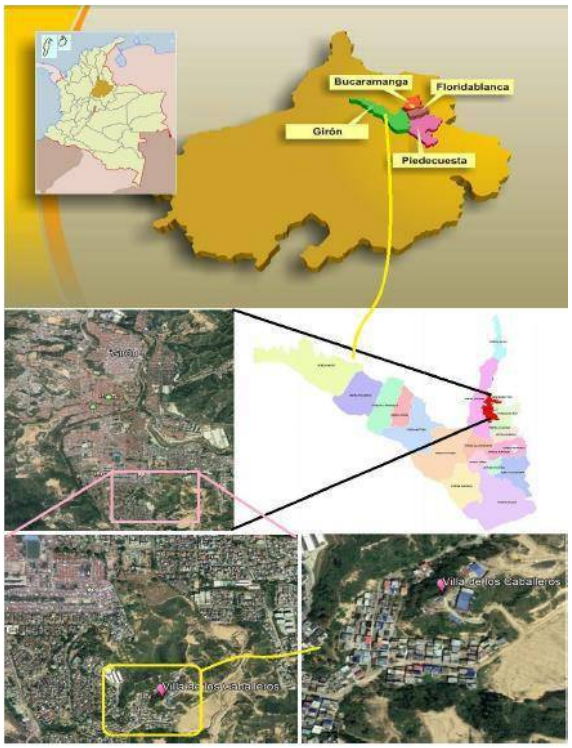


Tabla 3. Ubicación del proyecto

En el periodo comprendido se han requerido los siguientes equipos y maquinaría:

MAQUINARIA Y EQUIPO	
	
Unidad de Tensionamiento	Estación Topográfica

2.3 Conocimiento y toma de conciencia

El CONOSORCIO CONSOLIDACIÓN GIRÓN tiene dentro de sus responsabilidades la capacitación y formación del personal, para el periodo comprendido entre el 01 y el 14 de abril 2026 se presentaron 2 capacitaciones. 1 del área SST; ¿Qué es la higiene postural?, 1 capacitación del área ambiental; manejo y entrega adecuada de residuos sólidos por finalización de obra. Los soportes de asistencia a las capacitaciones se presentan en los informes mensuales entregados a interventoría.

2.4 Comunicaciones

La comunicación con las partes interesadas se realiza mediante, Bitácora de obra diaria, Comités técnicos, informes y control de la correspondencia y comunicaciones internas.

Durante el periodo establecido del 1 al 14 abril se realizaron 1 comité técnico, los soportes de los mismos están relacionados en el informe técnico.

RELACIÓN DE COMITES	
COMITÉ	**FECHA**
Acta de Reunión No. 12	10/04/2026

La comunicación con el personal vinculado durante este periodo se utilizaron medios tecnológicos aprobados por la gerencia como correo electrónico, mensajería instantánea y correspondencia interna para tener conocimiento de las actividades e información importante de la organización.

2.5 Información documentada

Los documentos internos y externos se mantienen controlados de acuerdo con lo establecido en el procedimiento de control de documentos y registros, disponiendo de un mecanismo sistemático para editarlo, adecuarlo, aprobarlo, almacenarlo, distribuirlo,

revisarlo, actualizarlo y generar un ciclo, los listados se entregan en los diferentes informes de SST y calidad.

Para el control documental del plan de calidad durante este periodo se utilizaron los siguientes procedimientos y formatos, los cuales se han tomado del sistema de gestión de calidad del contratista INFRACORP.

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS				
CODIGO	**NOMBRE**	**TIPO DE DOCUMENTO**	**VERSIÓN**	**FECHA**
RH-M-01	Manual de funciones y responsabilidades	Manual	6	28/05/2024
OB-P-31	Procedimiento de revisión y ajuste de diseños y desarrollo de proyectos	Procedimiento	2	30/06/2022
SST-F-02	Formato de inducción y reinducción	Formato	5	28/07/2025
SST-F-03	Evaluación de inducción y reinducción	Formato	5	28/07/2025
SST-F-06	Notificación de riesgos en seguridad y salud en el trabajo	Formato	3	02/01/2024
SST-F-44	Ficha de indicadores	Formato	2	03/05/2021
SST-P-15	Procedimiento de reporte e investigación de accidentes e incidentes de trabajo y enfermedades laborales	Procedimiento	3	01/11/2022
SST-P-19	Procedimiento para la entrega de Epp’s	Procedimiento	1	27/02/2022
SST-P-20	Procedimiento de capacitación y entrenamiento	Procedimiento	2	24/02/2022
SST-PR-10	Programa para trabajo seguro en alturas	Programa	3	01/11/2023
SST-PT-01	Política de seguridad y salud en el trabajo	Política	3	22/07/2025
SST-R-01	Reglamento de higiene y seguridad industrial	Reglamento	3	10/03/2021

Adicionalmente, se deben tener en cuenta los documentos externos que son sugeridos por el cliente y en algunos casos por la interventoría. A continuación, se presentan los documentos identificados a la fecha:

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS EXTERNOS	
NOMBRE	**TIPO DE DOCUMENTO**
Contrato de obra	Documento
Pólizas del contrato	Documento
Acta de inicio	Formato
Informe semanal de obra	Formato
Acta de comité técnico	Formato
Control de asistencia a reuniones	Formato

El CONSORCIO CONSOLIDACIÓN GIRÓN conservará los registros de calidad durante cinco (5) años; al cumplirse este período, y un mes antes de destruir dichos registros, se informará a la CDMB – CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA sobre tal acción, y si éste lo considera adecuado, podrá conservarlos, evitando así su destrucción.

Los documentos generados a la fecha se encuentran en custodia del director de Obra, quien realiza su respectiva conservación y control.

3. OPERACIÓN

3.1 Planificación y control operacional.

En este periodo entre el 1 al 14 abril 2026 se ejecutaron actividades conforme a la planificación establecida, garantizando la correcta ejecución de procesos como el replanteo, control y medición de obra, así como el tensionamiento de anclajes y la instalación de elementos asociados, incluyendo platinas, poporas y kits de cuñas. Estas actividades se desarrollaron bajo supervisión técnica, cumpliendo con los procedimientos definidos, especificaciones técnicas y criterios de calidad establecidos, asegurando la adecuada instalación, ajuste y funcionalidad de los sistemas de anclaje dentro del proyecto.

Para el periodo mencionado se avanza de acuerdo a la programación, en el informe técnico entregado a interventoría se desglosa de manera detallada cada una de las actividades realizadas. *(ver pdt anexo al informe técnico)*

3.2 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente

En el periodo se realizó la adquisición de los siguientes materiales ya que las actividades a ejecutar lo requieren.

LISTA DE MATERIALES
POPORAS
CEMENTO
PLATINAS
GEODREN

Para el periodo no se presenta evaluación de proveedores, ya que la selección de proveedores se realizó de acuerdo a la evaluación realizada en mayo 2025 por la empresa consorciada INFRACORP SAS el cual garantiza las actividades de compras involucradas con la ejecución del proyecto.

Anexo 2. Control de ingreso y salida de material.

3.3 Control en la prestación del servicio

Para la ejecución de la revisión y ajuste de diseños, se ha dado cumplimiento al procedimiento de desarrollo y ajuste de diseños, donde se especifican las actividades que componen este proceso, se tiene como soporte, control y trazabilidad de las actividades:

1. Informes semanales
2. Fotografías
3. Actas de comités
4. Carteras topográficas.
5. Bitácora de obra

Esta información se encuentra consignada en los informes de avance de obra.

3.4 Liberación de productos y servicios.

Para el control de los materiales y procesos constructivos se realiza seguimiento al plan de inspección y ensayo.

Para el periodo comprendido se realiza la revisión y ajuste de los diseños, donde se requiere de estudios y recolección de información para realizar los cambios que sean necesarios, el especialista encargado mediante documento escrito y reuniones periódicas, las cuales son evidenciadas en las actas de reunión, hace las respectivas aclaraciones y conciliaciones de los diseños.

Para el desarrollo de esta actividad se cuenta con un equipo de topografía el cual se encuentra calibrado de acuerdo a las especificaciones del equipo.

Anexo 3. Certificados de calidad.

3.5 Control de salidas no conformes.

Durante el periodo no se identificaron elementos que no cumplieran con los requisitos de conformidad, por lo que no fue necesario implementar ningún tratamiento de acuerdo con lo dispuesto en el procedimiento de producto no conforme.

3.6 Encuesta de satisfacción del cliente.

En el sector de la contratación con el Estado colombiano tanto los requisitos como la satisfacción del cliente se encuentran manifiestos de forma escrita, en el caso de los requisitos se manifiestan en los términos de referencia, contrato o especificaciones. Las actas de recibo parcial mensuales de avance de obra y acta de recibo definitivo revisadas, aceptadas y recibidas manifiestan la satisfacción del cliente a través de la interventoría y/o supervisor de la entidad, por lo cual para los proyectos de obra pública lo establecido por el CONSORCIO CONSOLIDACIÓN GIRÓN se convalida como demostración de satisfacción del cliente las actas parciales de avance aprobadas y el acta de recibo final.

A la fecha no se han recibido actas que manifiesten la no conformidad del cliente y por los avances en obra no se han realizado encuestas o comunicados que aprueben la satisfacción de las demás partes interesadas.

4. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

Para el seguimiento, medición, análisis y evaluación de la gestión de calidad del proyecto, para el periodo establecido se miden los siguientes indicadores a corte del 14 de abril 2026:

INDICADOR	FRECUENCIA	META	LOGRO
Cumplimiento del avance de obra	Mensual	>90%	100%
Atención de quejas	Mensual	100%	No se han presentado quejas
Desempeño de los proveedores externos	Anual	>80%	No se ha realizado la evaluación de proveedores
Multas en el período	Mensual	0	No se han presentado multas

Ejecución del Plan de Capacitación y Formación	Mensual	100%	No se tenían capacitaciones programadas

- Durante el periodo comprendido entre el 01 y el 14 abril 2026, se alcanzó el **100% de ejecución** de las actividades programadas, evidenciando el cumplimiento total del cronograma establecido. Este resultado refleja una adecuada planificación, control operacional y disponibilidad de recursos, garantizando el desarrollo oportuno de las actividades conforme a lo definido en el proyecto.
- Dentro del periodo establecido no se reportaron productos no conformes y/o presentación de quejas, manteniendo los indicadores satisfactorios.
- Durante el periodo no se presentan sanciones o multas al proyecto, por lo cual el indicador se mantiene satisfactorio.
- Para el periodo se desarrollaron presentaron 2 capacitaciones. 1 del área SST; ¿Qué es la higiene postural?, 1 capacitación del área ambiental; manejo y entrega adecuada de residuos sólidos por finalización de obra. Los soportes de asistencia a las capacitaciones se presentan en los informes mensuales entregados a interventoría.
- Los indicadores asociados a SST se encuentran establecidos en el informe SST del periodo.
- Los indicadores asociados al medio ambiente se encuentran establecidos en el PASA del proyecto.

Anexo 4. Ficha de indicadores.

5. AUDITORIAS INTERNAS

Para el periodo establecido no se realizaron auditorías internas, se tiene programado por parte del CONSORCIO CONSOLIDACIÓN GIRÓN realizar una auditoría interna pendiente definir fecha de realización.

6. REVISIÓN DE LA DIRECCIÓN

La revisión por parte de la dirección para temas organizacionales y de calidad se realiza anualmente, para el periodo establecido, no se ha hecho dicha revisión, se tiene previsto esta revisión para el mes de marzo del 2025.

Adicionalmente, se realiza revisión del contrato mediante comités de obra semanales o según lo establezca en conjunto con la interventoría donde se evaluará el avance del proyecto de acuerdo a la programación de obra, verificando tiempos de ejecución y

programa de inversión, a la fecha no se han evidenciado factores de preocupación en el desarrollo de la obra.

7. MEJORA CONTINUA

El CONSORCIO CONSOLIDACIÓN GIRÓN durante el periodo organizó con el equipo de trabajo encargado de la ejecución del proyecto un plan de mejora de procesos enfocado en identificar los eslabones débiles en la cadena de procesos o cuellos de botella que impiden el trabajo tanto administrativos, de apoyo como de construcción, y luego encontrar formas de rectificar esas ineficiencias.

A la fecha no se han identificado procesos o actividades que perjudiquen el avance en el proyecto.

8. ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

En este periodo no se presentan acciones correctivas y preventivas.

9. CONCLUSIONES

1. El proyecto se ejecutó conforme a los lineamientos del plan de calidad, cumpliendo con los requisitos técnicos, administrativos y contractuales establecidos.

2. Se alcanzó el 100% de ejecución de las actividades programadas, evidenciando un adecuado control operacional y gestión de los recursos.

3. No se presentaron no conformidades que afectaran la calidad del servicio, y se cuenta con los soportes documentales que garantizan la trazabilidad y cumplimiento del sistema de gestión de calidad

Anexo 1. Documentos soporte salida de personal.

CONSORCIO CONSOLIDACIÓN GIRÓN	**FINALIZACIÓN POR OBRA O LABOR**	**Código**	RH-F-16
		Fecha	29/07/2023
		Versión	2
		Pagina 1 de 1	

Bucaramanga, 13 de marzo de 2026

Señor(a)

Isaías Garcia Jaimes

Cédula de Ciudadanía 1.101.596.200

Operador de Perforación I

~~**Asunto: Notificación de terminación de contrato de trabajo por terminacion de la obra o labor contratada.**~~

Me permito manifestarle que la obra o labor para la cual fue Ud contratado, en la empresa **CONSORCIO CONSOLIDACION GIRON**, el **15 de octubre de 2025**, se encuentra finalizada, razón por la cual se procede a la liquidación definitiva de su contrato de trabajo de conformidad con el literal del articulo 61 del código sustantivo del trabajo, terminación que se hace efectiva el dia 14 **de abril de 2026.**

Agradecemos que al recibir esta notificación, contacte al área de gestión humana para iniciar el tramite correspondiente, indicarle el proceso para realizarse los exámenes de egreso, iniciar el tramite de su liquidación de prestaciones sociales y salario adeudados conforme a lo enunciado en el Código Sustantivo del Trabajo.

Es oportuno manifestarle nuestro agradecimiento por su labor prestada en la empresa, por lo que nos vemos en la obligación de resaltar y aplaudir su desempeño.

Atentamente,



JOHANNA MARCELA PADIERNA CASTIBLANCO

Representante Legal

Contacto: consolidacion.giron@gmail.com

Recibí:

Firmado electrónicamente por:

Nombre	Isaías Garcia Jaimes
Número de Documento	1.101.596.200
Email	isaias25043@gmail.com
Fecha	10/04/2026 a las 12:38
IP	127.0.0.1
Token	953779883edefa64f40a584022652b32

El código QR que se muestra a continuación es únicamente referencial y no tiene validez legal ni funcional

CONSORCIO CONSOLIDACIÓN GIRÓN	**FORMATO ORDEN EXAMEN DE RETIRO OCUPACIONAL**	**Código**	SST-F-37
		Fecha	22/08/2022
		Versión	2

Bucaramanga,

Isaías Garcia Jaimes

Cédula de Ciudadanía No. **1.101.596.200**

Operador de Perforación I

CONSORCIO CONSOLIDACION GIRON

Dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1072 de 2015, y en la Resolución 1443 de 2007, me permito notificarle que a partir de la fecha de terminación del vinculo laboral con **CONSORCIO CONSOLIDACION GIRON** dispone de 5 (cinco) días para presentarse a la práctica del correspondiente EVALUACIÓN MÉDICA OCUPACIONAL DE RETIRO, en:

IPS: Unisalud Salud Ocupacional ltda.

Dirección: CALLE 51A # 31 - 66 Bucaramanga - Santander

**Debe confirmar con el area de gestión humana previamente para asigar hora de la consulta.*

Finalizado tal tiempo sin que usted asista a la citación, se entenderá que renuncia a la práctica de tal, y la empresa no se hará responsable de las condiciones de salud que el trabajador reporte después del retiro.

La presente orden se expide digitalmente a los 14 días del mes de abril de 2026.

Melissa Donado Arias

Clara Melissa Donado

Coordinador SST

Contacto:

Firmado electrónicamente por:

Nombre	Isaías Garcia Jaimes
Número de Documento	1.101.596.200
Email	isaias25043@gmail.com
Fecha	10/04/2026 a las 12:05
IP	127.0.0.1
Token	d6f930035a11289907f50725d8f6f0c2

El código QR que se muestra a continuación es únicamente referencial y no tiene validez legal ni funcional



CONSORCIO CONSOLIDACIÓN GIRÓN	**FINALIZACIÓN POR OBRA O LABOR**	**Código**	RH-F-16
		Fecha	29/07/2023
		Versión	2
		Pagina 1 de 1	

Bucaramanga, 13 de marzo de 2026

Señor(a)

Jarrinson Steven Camaron Caicedo

Cédula de Ciudadanía 1.232.891.906

Ayudante de Perforación II

~~**Asunto: Notificación de terminación de contrato de trabajo por terminacion de la obra o labor contratada.**~~

Me permito manifestarle que la obra o labor para la cual fue Ud contratado, en la empresa **CONSORCIO CONSOLIDACION GIRON**, el **15 de octubre de 2025**, se encuentra finalizada, razón por la cual se procede a la liquidación definitiva de su contrato de trabajo de conformidad con el literal del articulo 61 del código sustantivo del trabajo, terminación que se hace efectiva el dia **14 de abril de 2026.**

Agradecemos que al recibir esta notificación, contacte al área de gestión humana para iniciar el tramite correspondiente, indicarle el proceso para realizarse los exámenes de egreso, iniciar el tramite de su liquidación de prestaciones sociales y salario adeudados conforme a lo enunciado en el Código Sustantivo del Trabajo.

Es oportuno manifestarle nuestro agradecimiento por su labor prestada en la empresa, por lo que nos vemos en la obligación de resaltar y aplaudir su desempeño.

Atentamente,



JOHANNA MARCELA PADIERNA CASTIBLANCO

Representante Legal

Contacto: consolidacion.giron@gmail.com

Recibí:

Firmado electrónicamente por:

Nombre	Jarrinson Steven Camaron Caicedo
Número de Documento	1.232.891.906
Email	caicedosteven54@gmail.com
Fecha	10/04/2026 a las 12:44
IP	127.0.0.1
Token	cd05f1093ef07cf8c93e2f92f60cd460

El código QR que se muestra a continuación es únicamente referencial y no tiene validez legal ni funcional

CONSORCIO CONSOLIDACIÓN GIRÓN	**FORMATO ORDEN EXAMEN DE RETIRO OCUPACIONAL**	**Código**	SST-F-37
		Fecha	22/08/2022
		Versión	2

Bucaramanga,

Jarrinson Steven Camaron Caicedo

Cédula de Ciudadanía No. **1.232.891.906**

Ayudante de Perforación II

CONSORCIO CONSOLIDACION GIRON

Dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1072 de 2015, y en la Resolución 1443 de 2007, me permito notificarle que a partir de la fecha de terminación del vinculo laboral con **CONSORCIO CONSOLIDACION GIRON** dispone de 5 (cinco) días para presentarse a la práctica del correspondiente EVALUACIÓN MÉDICA OCUPACIONAL DE RETIRO, en:

IPS: Unisalud Salud Ocupacional ltda.

Dirección: CALLE 51A # 31 - 66 Bucaramanga - Santander

**Debe confirmar con el area de gestión humana previamente para asigar hora de la consulta.*

Finalizado tal tiempo sin que usted asista a la citación, se entenderá que renuncia a la práctica de tal, y la empresa no se hará responsable de las condiciones de salud que el trabajador reporte después del retiro.

La presente orden se expide digitalmente a los 14 días del mes de abril de 2026.

Melissa Donado Arias

Clara Melissa Donado

Coordinador SST

Contacto:

Firmado electrónicamente por:

Nombre	Jarrinson Steven Camaron Caicedo
Número de Documento	1.232.891.906
Email	caicedosteven54@gmail.com
Fecha	10/04/2026 a las 12:08
IP	127.0.0.1
Token	64a0a7214da60c5cf28af0fc230e91d3

El código QR que se muestra a continuación es únicamente referencial y no tiene validez legal ni funcional



CONSORCIO CONSOLIDACIÓN GIRÓN	**FINALIZACIÓN POR OBRA O LABOR**	**Código**	RH-F-16
		Fecha	29/07/2023
		Versión	2
		Pagina 1 de 1	

Bucaramanga, 14 de marzo de 2026

Señor(a)

Miguel Antonio Rangel Florian

Cédula de Ciudadanía 1.124.048.478

Ayudante de Perforación II

Asunto: Notificación de terminación de contrato de trabajo por terminacion de la obra o labor contratada.

Me permito manifestarle que la obra o labor para la cual fue Ud contratado, en la empresa **CONSORCIO CONSOLIDACION GIRON**, el **15 de octubre de 2025**, se encuentra finalizada, razón por la cual se procede a la liquidación definitiva de su contrato de trabajo de conformidad con el literal del articulo 61 del código sustantivo del trabajo, terminación que se hace efectiva el dia **14 de abril de 2026.**

Agradecemos que al recibir esta notificación, contacte al área de gestión humana para iniciar el tramite correspondiente, indicarle el proceso para realizarse los exámenes de egreso, iniciar el tramite de su liquidación de prestaciones sociales y salario adeudados conforme a lo enunciado en el Código Sustantivo del Trabajo.

Es oportuno manifestarle nuestro agradecimiento por su labor prestada en la empresa, por lo que nos vemos en la obligación de resaltar y aplaudir su desempeño.

Atentamente,



JOHANNA MARCELA PADIERNA CASTIBLANCO

Representante Legal

Contacto: consolidacion.giron@gmail.com

Recibí:

Firmado electrónicamente por:

Nombre	Miguel Antonio Rangel Florian
Número de Documento	1.124.048.478
Email	miguelantonioranguel@gmail.com
Fecha	10/04/2026 a las 12:45
IP	127.0.0.1
Token	bbea1035a7b31fd34053f7c41538bbe5

El código QR que se muestra a continuación es únicamente referencial y no tiene validez legal ni funcional

CONSORCIO CONSOLIDACIÓN GIRÓN	**FORMATO ORDEN EXAMEN DE RETIRO OCUPACIONAL**	**Código**	SST-F-37
		Fecha	22/08/2022
		Versión	2

Bucaramanga,

Miguel Antonio Rangel Florian

Cédula de Ciudadanía No. **1.124.048.478**

Ayudante de Perforación II

CONSORCIO CONSOLIDACION GIRON

Dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1072 de 2015, y en la Resolución 1443 de 2007, me permito notificarle que a partir de la fecha de terminación del vinculo laboral con **CONSORCIO CONSOLIDACION GIRON** dispone de 5 (cinco) días para presentarse a la práctica del correspondiente EVALUACIÓN MÉDICA OCUPACIONAL DE RETIRO, en:

IPS: Unisalud Salud Ocupacional ltda.

Dirección: CALLE 51A # 31 - 66 Bucaramanga - Santander

**Debe confirmar con el area de gestión humana previamente para asigar hora de la consulta.*

Finalizado tal tiempo sin que usted asista a la citación, se entenderá que renuncia a la práctica de tal, y la empresa no se hará responsable de las condiciones de salud que el trabajador reporte después del retiro.

La presente orden se expide digitalmente a los 14 días del mes de abril de 2026.

Melissa Donado Arias

Clara Melissa Donado

Coordinador SST

Contacto:

Firmado electrónicamente por:

Nombre	Miguel Antonio Rangel Florian
Número de Documento	1.124.048.478
Email	miguelantonioranguel@gmail.com
Fecha	10/04/2026 a las 12:09
IP	127.0.0.1
Token	d2d1bfb59303b07519c6e9de87793544

El código QR que se muestra a continuación es únicamente referencial y no tiene validez legal ni funcional



CONSORCIO CONSOLIDACIÓN GIRÓN	**FINALIZACIÓN POR OBRA O LABOR**	**Código**	RH-F-16
		Fecha	29/07/2023
		Versión	2
		Pagina 1 de 1	

Bucaramanga, 14 de marzo de 2026

Señor(a)

Jesus Alberto Mayorga Mayorga

Cédula de Ciudadanía 1.101.520.618

Ayudante de Obra

Asunto: Notificación de terminación de contrato de trabajo por terminacion de la obra o labor contratada.

Me permito manifestarle que la obra o labor para la cual fue Ud contratado, en la empresa **CONSORCIO CONSOLIDACION GIRON**, el **15 de octubre de 2025**, se encuentra finalizada, razón por la cual se procede a la liquidación definitiva de su contrato de trabajo de conformidad con el literal del articulo 61 del código sustantivo del trabajo, terminación que se hace efectiva el dia **14 de abril de 2026.**

Agradecemos que al recibir esta notificación, contacte al área de gestión humana para iniciar el tramite correspondiente, indicarle el proceso para realizarse los exámenes de egreso, iniciar el tramite de su liquidación de prestaciones sociales y salario adeudados conforme a lo enunciado en el Código Sustantivo del Trabajo.

Es oportuno manifestarle nuestro agradecimiento por su labor prestada en la empresa, por lo que nos vemos en la obligación de resaltar y aplaudir su desempeño.

Atentamente,



JOHANNA MARCELA PADIERNA CASTIBLANCO

Representante Legal

Contacto: consolidacion.giron@gmail.com

Recibí:

Firmado electrónicamente por:

Nombre	Jesus Alberto Mayorga Mayorga
Número de Documento	1.101.520.618
Email	jesusalbertomayorgamayorga@gmail.com
Fecha	10/04/2026 a las 12:45
IP	127.0.0.1
Token	3dfc9798598636e41572cf6e7e08c443

El código QR que se muestra a continuación es únicamente referencial y no tiene validez legal ni funcional

CONSORCIO CONSOLIDACIÓN GIRÓN	**FORMATO ORDEN EXAMEN DE RETIRO OCUPACIONAL**	**Código**	SST-F-37
		Fecha	22/08/2022
		Versión	2

Bucaramanga,

Jesus Alberto Mayorga Mayorga

Cédula de Ciudadanía No. **1.101.520.618**

Ayudante de Obra

CONSORCIO CONSOLIDACION GIRON

Dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1072 de 2015, y en la Resolución 1443 de 2007, me permito notificarle que a partir de la fecha de terminación del vinculo laboral con **CONSORCIO CONSOLIDACION GIRON** dispone de 5 (cinco) días para presentarse a la práctica del correspondiente EVALUACIÓN MÉDICA OCUPACIONAL DE RETIRO, en:

IPS: Unisalud Salud Ocupacional ltda.

Dirección: CALLE 51A # 31 - 66 Bucaramanga - Santander

**Debe confirmar con el area de gestión humana previamente para asigar hora de la consulta.*

Finalizado tal tiempo sin que usted asista a la citación, se entenderá que renuncia a la práctica de tal, y la empresa no se hará responsable de las condiciones de salud que el trabajador reporte después del retiro.

La presente orden se expide digitalmente a los 14 días del mes de abril de 2026.

Melissa Donado Arias

Clara Melissa Donado

Coordinador SST

Contacto:

Firmado electrónicamente por:

Nombre	Jesus Alberto Mayorga Mayorga
Número de Documento	1.101.520.618
Email	jesusalbertomayorgamayorga@gmail.com
Fecha	10/04/2026 a las 12:24
IP	127.0.0.1
Token	981024d32e70f1e418c34003e6f56636

El código QR que se muestra a continuación es únicamente referencial y no tiene validez legal ni funcional



CONSORCIO CONSOLIDACIÓN GIRÓN	**FINALIZACIÓN POR OBRA O LABOR**	**Código**	RH-F-16
		Fecha	29/07/2023
		Versión	2
		Pagina 1 de 1	

Bucaramanga, 14 de marzo de 2026

Señor(a)

Willingtong Alarcon Ascanio

Cédula de Ciudadanía 91.479.571

Ayudante de Perforación II

Asunto: Notificación de terminación de contrato de trabajo por terminacion de la obra o labor contratada.

Me permito manifestarle que la obra o labor para la cual fue Ud contratado, en la empresa **CONSORCIO CONSOLIDACION GIRON**, el **05 de noviembre de 2025**, se encuentra finalizada, razón por la cual se procede a la liquidación definitiva de su contrato de trabajo de conformidad con el literal del articulo 61 del código sustantivo del trabajo, terminación que se hace efectiva el dia **14 de abril de 2026.**

Agradecemos que al recibir esta notificación, contacte al área de gestión humana para iniciar el tramite correspondiente, indicarle el proceso para realizarse los exámenes de egreso, iniciar el tramite de su liquidación de prestaciones sociales y salario adeudados conforme a lo enunciado en el Código Sustantivo del Trabajo.

Es oportuno manifestarle nuestro agradecimiento por su labor prestada en la empresa, por lo que nos vemos en la obligación de resaltar y aplaudir su desempeño.

Atentamente,



JOHANNA MARCELA PADIERNA CASTIBLANCO

Representante Legal

Contacto: consolidacion.giron@gmail.com

Recibí:

Firmado electrónicamente por:

Nombre	Willingtong Alarcon Ascanio
Número de Documento	91.479.571
Email	Wilintongalarcon0@gmail.com
Fecha	10/04/2026 a las 12:45
IP	127.0.0.1
Token	ae34e2df6a487158236e8990506f2ca2

El código QR que se muestra a continuación es únicamente referencial y no tiene validez legal ni funcional

CONSORCIO CONSOLIDACIÓN GIRÓN	**FORMATO ORDEN EXAMEN DE RETIRO OCUPACIONAL**	**Código**	SST-F-37
		Fecha	22/08/2022
		Versión	2

Bucaramanga,

Willingtong Alarcon Ascanio

Cédula de Ciudadanía No. **91.479.571**

Ayudante de Perforación II

CONSORCIO CONSOLIDACION GIRON

Dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1072 de 2015, y en la Resolución 1443 de 2007, me permito notificarle que a partir de la fecha de terminación del vinculo laboral con **CONSORCIO CONSOLIDACION GIRON** dispone de 5 (cinco) días para presentarse a la práctica del correspondiente EVALUACIÓN MÉDICA OCUPACIONAL DE RETIRO, en:

IPS: Unisalud Salud Ocupacional ltda.

Dirección: CALLE 51A # 31 - 66 Bucaramanga - Santander

**Debe confirmar con el area de gestión humana previamente para asigar hora de la consulta.*

Finalizado tal tiempo sin que usted asista a la citación, se entenderá que renuncia a la práctica de tal, y la empresa no se hará responsable de las condiciones de salud que el trabajador reporte después del retiro.

La presente orden se expide digitalmente a los 14 días del mes de abril de 2026.

Melissa Donado Arias

Clara Melissa Donado

Coordinador SST

Contacto:

Firmado electrónicamente por:

Nombre	Willingtong Alarcon Ascanio
Número de Documento	91.479.571
Email	Wilintongalarcon0@gmail.com
Fecha	10/04/2026 a las 12:25
IP	127.0.0.1
Token	b07e425a205751ae85c8de810fe94e1b

El código QR que se muestra a continuación es únicamente referencial y no tiene validez legal ni funcional



CONSORCIO CONSOLIDACIÓN GIRÓN	**FINALIZACIÓN POR OBRA O LABOR**	**Código**	RH-F-16
		Fecha	29/07/2023
		Versión	2
		Pagina 1 de 1	

Bucaramanga, 14 de marzo de 2026

Señor(a)

Manuel Enrique Castillo Florez

Cédula de Ciudadanía 1.082.871.247

Ayudante de Obra

Asunto: Notificación de terminación de contrato de trabajo por terminacion de la obra o labor contratada.

Me permito manifestarle que la obra o labor para la cual fue Ud contratado, en la empresa **CONSORCIO CONSOLIDACION GIRON**, el **06 de noviembre de 2025**, se encuentra finalizada, razón por la cual se procede a la liquidación definitiva de su contrato de trabajo de conformidad con el literal del articulo 61 del código sustantivo del trabajo, terminación que se hace efectiva el dia **14 de abril de 2026.**

Agradecemos que al recibir esta notificación, contacte al área de gestión humana para iniciar el tramite correspondiente, indicarle el proceso para realizarse los exámenes de egreso, iniciar el tramite de su liquidación de prestaciones sociales y salario adeudados conforme a lo enunciado en el Código Sustantivo del Trabajo.

Es oportuno manifestarle nuestro agradecimiento por su labor prestada en la empresa, por lo que nos vemos en la obligación de resaltar y aplaudir su desempeño.

Atentamente,



JOHANNA MARCELA PADIERNA CASTIBLANCO

Representante Legal

Contacto: consolidacion.giron@gmail.com

Recibí:

Firmado electrónicamente por:

Nombre	Manuel Enrique Castillo Florez
Número de Documento	1.082.871.247
Email	sharolstefhanyhernanadez18@gmail.com
Fecha	10/04/2026 a las 13:13
IP	127.0.0.1
Token	f57ed2a28e85524c0ce2068a058f69df

El código QR que se muestra a continuación es únicamente referencial y no tiene validez legal ni funcional



CONSORCIO CONSOLIDACIÓN GIRÓN	**FORMATO ORDEN EXAMEN DE RETIRO OCUPACIONAL**	**Código**	SST-F-37
		Fecha	22/08/2022
		Versión	2

Bucaramanga,

Manuel Enrique Castillo Florez

Cédula de Ciudadanía No. **1.082.871.247**

Ayudante de Obra

CONSORCIO CONSOLIDACION GIRON

Dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1072 de 2015, y en la Resolución 1443 de 2007, me permito notificarle que a partir de la fecha de terminación del vinculo laboral con **CONSORCIO CONSOLIDACION GIRON** dispone de 5 (cinco) días para presentarse a la práctica del correspondiente EVALUACIÓN MÉDICA OCUPACIONAL DE RETIRO, en:

IPS: Unisalud Salud Ocupacional ltda.

Dirección: CALLE 51A # 31 - 66 Bucaramanga - Santander

**Debe confirmar con el area de gestión humana previamente para asigar hora de la consulta.*

Finalizado tal tiempo sin que usted asista a la citación, se entenderá que renuncia a la práctica de tal, y la empresa no se hará responsable de las condiciones de salud que el trabajador reporte después del retiro.

La presente orden se expide digitalmente a los 14 días del mes de abril de 2026.

Melissa Donado Arias

Clara Melissa Donado

Coordinador SST

Contacto:

Firmado electrónicamente por:

Nombre	Manuel Enrique Castillo Florez
Número de Documento	1.082.871.247
Email	sharolstefhanyhernanadez18@gmail.com
Fecha	10/04/2026 a las 12:26
IP	127.0.0.1
Token	8c408507908d25d2d6bd1104dc72893e

El código QR que se muestra a continuación es únicamente referencial y no tiene validez legal ni funcional



CONSORCIO CONSOLIDACIÓN GIRÓN	**FINALIZACIÓN POR OBRA O LABOR**	**Código**	RH-F-16
		Fecha	29/07/2023
		Versión	2
		Pagina 1 de 1	

Bucaramanga, 14 de marzo de 2026

Señor(a)

Edson Alexander Portilla Ardila

Cédula de Ciudadanía 1.098.605.491

Almacenista

Asunto: Notificación de terminación de contrato de trabajo por terminacion de la obra o labor contratada.

Me permito manifestarle que la obra o labor para la cual fue Ud contratado, en la empresa **CONSORCIO CONSOLIDACION GIRON**, el **24 de noviembre de 2025**, se encuentra finalizada, razón por la cual se procede a la liquidación definitiva de su contrato de trabajo de conformidad con el literal del articulo 61 del código sustantivo del trabajo, terminación que se hace efectiva el dia **14 de abril de 2026.**

Agradecemos que al recibir esta notificación, contacte al área de gestión humana para iniciar el tramite correspondiente, indicarle el proceso para realizarse los exámenes de egreso, iniciar el tramite de su liquidación de prestaciones sociales y salario adeudados conforme a lo enunciado en el Código Sustantivo del Trabajo.

Es oportuno manifestarle nuestro agradecimiento por su labor prestada en la empresa, por lo que nos vemos en la obligación de resaltar y aplaudir su desempeño.

Atentamente,



JOHANNA MARCELA PADIERNA CASTIBLANCO

Representante Legal

Contacto: consolidacion.giron@gmail.com

Recibí:

Firmado electrónicamente por:

Nombre	Edson Alexander Portilla Ardila
Número de Documento	1.098.605.491
Email	edsonportilla@hotmail.com
Fecha	10/04/2026 a las 14:34
IP	127.0.0.1
Token	684a3af01e528f58f375f5cd36b95de1

El código QR que se muestra a continuación es únicamente referencial y no tiene validez legal ni funcional



CONSORCIO CONSOLIDACIÓN GIRÓN	**FORMATO ORDEN EXAMEN DE RETIRO OCUPACIONAL**	**Código**	SST-F-37
		Fecha	22/08/2022
		Versión	2

Bucaramanga,

Edson Alexander Portilla Ardila

Cédula de Ciudadanía No. **1.098.605.491**

Almacenista

CONSORCIO CONSOLIDACION GIRON

Dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1072 de 2015, y en la Resolución 1443 de 2007, me permito notificarle que a partir de la fecha de terminación del vinculo laboral con **CONSORCIO CONSOLIDACION GIRON** dispone de 5 (cinco) días para presentarse a la práctica del correspondiente EVALUACIÓN MÉDICA OCUPACIONAL DE RETIRO, en:

IPS: Unisalud Salud Ocupacional ltda.

Dirección: CALLE 51A # 31 - 66 Bucaramanga - Santander

**Debe confirmar con el area de gestión humana previamente para asigar hora de la consulta.*

Finalizado tal tiempo sin que usted asista a la citación, se entenderá que renuncia a la práctica de tal, y la empresa no se hará responsable de las condiciones de salud que el trabajador reporte después del retiro.

La presente orden se expide digitalmente a los 14 días del mes de abril de 2026.

Melissa Donado Arias

Clara Melissa Donado

Coordinador SST

Contacto:

Firmado electrónicamente por:

Nombre	Edson Alexander Portilla Ardila
Número de Documento	1.098.605.491
Email	edsonportilla@hotmail.com
Fecha	10/04/2026 a las 12:28
IP	127.0.0.1
Token	af4a2cd84e265145f8aa0274115dee72

El código QR que se muestra a continuación es únicamente referencial y no tiene validez legal ni funcional



CONSORCIO CONSOLIDACIÓN GIRÓN	**FINALIZACIÓN POR OBRA O LABOR**	**Código**	RH-F-16
		Fecha	29/07/2023
		Versión	2
		Pagina 1 de 1	

Bucaramanga, 14 de marzo de 2026

Señor(a)

Giovany Sebastian Parra Ferrer

Cédula de Ciudadanía 1.005.157.855

Ayudante de Obra

Asunto: Notificación de terminación de contrato de trabajo por terminacion de la obra o labor contratada.

Me permito manifestarle que la obra o labor para la cual fue Ud contratado, en la empresa **CONSORCIO CONSOLIDACION GIRON**, el **01 de diciembre de 2025**, se encuentra finalizada, razón por la cual se procede a la liquidación definitiva de su contrato de trabajo de conformidad con el literal del articulo 61 del código sustantivo del trabajo, terminación que se hace efectiva el dia **14 de abril de 2026.**

Agradecemos que al recibir esta notificación, contacte al área de gestión humana para iniciar el tramite correspondiente, indicarle el proceso para realizarse los exámenes de egreso, iniciar el tramite de su liquidación de prestaciones sociales y salario adeudados conforme a lo enunciado en el Código Sustantivo del Trabajo.

Es oportuno manifestarle nuestro agradecimiento por su labor prestada en la empresa, por lo que nos vemos en la obligación de resaltar y aplaudir su desempeño.

Atentamente,



JOHANNA MARCELA PADIERNA CASTIBLANCO

Representante Legal

Contacto: consolidacion.giron@gmail.com

Recibí:

Firmado electrónicamente por:

Nombre	Giovany Sebastian Parra Ferrer
Número de Documento	1.005.157.855
Email	giovanyparra24@gmail.com
Fecha	10/04/2026 a las 14:35
IP	127.0.0.1
Token	d64bfb1f283f42b426d7e973ff031e36

El código QR que se muestra a continuación es únicamente referencial y no tiene validez legal ni funcional

CONSORCIO CONSOLIDACIÓN GIRÓN	**FORMATO ORDEN EXAMEN DE RETIRO OCUPACIONAL**	**Código**	SST-F-37
		Fecha	22/08/2022
		Versión	2

Bucaramanga,

Giovany Sebastian Parra Ferrer

Cédula de Ciudadanía No. **1.005.157.855**

Ayudante de Obra

CONSORCIO CONSOLIDACION GIRON

Dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1072 de 2015, y en la Resolución 1443 de 2007, me permito notificarle que a partir de la fecha de terminación del vinculo laboral con **CONSORCIO CONSOLIDACION GIRON** dispone de 5 (cinco) días para presentarse a la práctica del correspondiente EVALUACIÓN MÉDICA OCUPACIONAL DE RETIRO, en:

IPS: Unisalud Salud Ocupacional ltda.

Dirección: CALLE 51A # 31 - 66 Bucaramanga - Santander

**Debe confirmar con el area de gestión humana previamente para asigar hora de la consulta.*

Finalizado tal tiempo sin que usted asista a la citación, se entenderá que renuncia a la práctica de tal, y la empresa no se hará responsable de las condiciones de salud que el trabajador reporte después del retiro.

La presente orden se expide digitalmente a los 14 días del mes de abril de 2026.

Melissa Donado Arias

Clara Melissa Donado

Coordinador SST

Contacto:

Firmado electrónicamente por:

Nombre	Giovany Sebastian Parra Ferrer
Número de Documento	1.005.157.855
Email	giovanyparra24@gmail.com
Fecha	10/04/2026 a las 12:33
IP	127.0.0.1
Token	19cc78f25233782c66bb633db4f31776

El código QR que se muestra a continuación es únicamente referencial y no tiene validez legal ni funcional



CONSORCIO CONSOLIDACIÓN GIRÓN	**FINALIZACIÓN POR OBRA O LABOR**	**Código**	RH-F-16
		Fecha	29/07/2023
		Versión	2
		Pagina 1 de 1	

Bucaramanga, 14 de marzo de 2026

Señor(a)

Maria Lucia Higuera Pino

Cédula de Ciudadanía 1.095.700.657

Geotecnista

Asunto: Notificación de terminación de contrato de trabajo por terminacion de la obra o labor contratada.

Me permito manifestarle que la obra o labor para la cual fue Ud contratado, en la empresa **CONSORCIO CONSOLIDACIÓN GIRÓN**, el **15 de octubre de 2025**, se encuentra finalizada, razón por la cual se procede a la liquidación definitiva de su contrato de trabajo de conformidad con el literal del articulo 61 del código sustantivo del trabajo, terminación que se hace efectiva el dia **14 de abril de 2026.**

Agradecemos que al recibir esta notificación, contacte al área de gestión humana para iniciar el tramite correspondiente, indicarle el proceso para realizarse los exámenes de egreso, iniciar el tramite de su liquidación de prestaciones sociales y salario adeudados conforme a lo enunciado en el Código Sustantivo del Trabajo.

Es oportuno manifestarle nuestro agradecimiento por su labor prestada en la empresa, por lo que nos vemos en la obligación de resaltar y aplaudir su desempeño.

Atentamente,



JOHANNA MARCELA PADIERNA CASTIBLANCO

Representante Legal

Contacto: contabinfracorp2024@gmail.com

Recibí:

Firmado electrónicamente por:

Nombre	Maria Lucia Higuera Pino
Número de Documento	1.095.700.657
Email	sasinsego@gmail.com
Fecha	13/04/2026 a las 11:54
IP	127.0.0.1
Token	c5726aea33d1c5ec8a8dfaa8719de8d7

El código QR que se muestra a continuación es únicamente referencial y no tiene validez legal ni funcional



CONSORCIO CONSOLIDACIÓN GIRÓN	**FORMATO ORDEN EXAMEN DE RETIRO OCUPACIONAL**	**Código**	SST-F-37
		Fecha	22/08/2022
		Versión	2

Bucaramanga, 14 de abril de 2026

Maria Lucia Higuera Pino

Cédula de Ciudadanía No. **1.095.700.657**

Director de Obra

ALIADOS SAS

Dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1072 de 2015, y en la Resolución 1443 de 2007, me permito notificarle que a partir de la fecha de terminación del vinculo laboral con **CONSORCIO CONSOLIDACIÓN GIRÓN** dispone de 5 (cinco) días para presentarse a la práctica del correspondiente EVALUACIÓN MÉDICA OCUPACIONAL DE RETIRO, en:

IPS: Unisalud Salud Ocupacional ltda.

Dirección: CALLE 51A # 31 - 66 Bucaramanga - Santander

**Debe confirmar con el area de gestión humana previamente para asigar hora de la consulta.*

Finalizado tal tiempo sin que usted asista a la citación, se entenderá que renuncia a la práctica de tal, y la empresa no se hará responsable de las condiciones de salud que el trabajador reporte después del retiro.

La presente orden se expide digitalmente a los 14 días del mes de abril de 2026.

Melissa Donado Arias

Clara Melissa Donado

Coordinador SST

Contacto:

Firmado electrónicamente por:

Nombre	Maria Lucia Higuera Pino
Número de Documento	1.095.700.657
Email	sasinsego@gmail.com
Fecha	13/04/2026 a las 11:45
IP	127.0.0.1
Token	1a19b29e0f3b6f11445071078a0adb85

El código QR que se muestra a continuación es únicamente referencial y no tiene validez legal ni funcional



CONSORCIO CONSOLIDACIÓN GIRÓN	**FINALIZACIÓN POR OBRA O LABOR**	**Código**	RH-F-16
		Fecha	29/07/2023
		Versión	2
		Pagina 1 de 1	

Bucaramanga, 14 de marzo de 2026

Señor(a)

Johanna Paola Ospino Rodelo

Cédula de Ciudadanía 1.098.618.429

Asesor Ambiental

Asunto: Notificación de terminación de contrato de trabajo por terminacion de la obra o labor contratada.

Me permito manifestarle que la obra o labor para la cual fue Ud contratado, en la empresa **CONSORCIO CONSOLIDACIÓN GIRÓN**, el **15 de octubre de 2025**, se encuentra finalizada, razón por la cual se procede a la liquidación definitiva de su contrato de trabajo de conformidad con el literal del articulo 61 del código sustantivo del trabajo, terminación que se hace efectiva el dia **14 de abril de 2026.**

Agradecemos que al recibir esta notificación, contacte al área de gestión humana para iniciar el tramite correspondiente, indicarle el proceso para realizarse los exámenes de egreso, iniciar el tramite de su liquidación de prestaciones sociales y salario adeudados conforme a lo enunciado en el Código Sustantivo del Trabajo.

Es oportuno manifestarle nuestro agradecimiento por su labor prestada en la empresa, por lo que nos vemos en la obligación de resaltar y aplaudir su desempeño.

Atentamente,



JOHANNA MARCELA PADIERNA CASTIBLANCO

Representante Legal

Contacto: contabinfracorp2024@gmail.com

Recibí:

Firmado electrónicamente por:

Nombre	Johana Paola Ospino Rodelo
Número de Documento	1.098.618.429
Email	sasinsego@gmail.com
Fecha	13/04/2026 a las 11:54
IP	127.0.0.1
Token	c5726aea33d1c5ec8a8dfaa8719de8d7

El código QR que se muestra a continuación es únicamente referencial y no tiene validez legal ni funcional



CONSORCIO CONSOLIDACIÓN GIRÓN	**FORMATO ORDEN EXAMEN DE RETIRO OCUPACIONAL**	**Código**	SST-F-37
		Fecha	22/08/2022
		Versión	2

Bucaramanga, 14 de marzo de 2026

Johana Paola Ospino Rodelo

Cédula de Ciudadanía No. **1.098.618.429**

Asesor Ambiental

Dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1072 de 2015, y en la Resolución 1443 de 2007, me permito notificarle que a partir de la fecha de terminación del vinculo laboral con **CONSORCIO CONSOLIDACIÓN GIRÓN** dispone de 5 (cinco) días para presentarse a la práctica del correspondiente EVALUACIÓN MÉDICA OCUPACIONAL DE RETIRO, en:

IPS: Unisalud Salud Ocupacional ltda.

Dirección: CALLE 51A # 31 - 66 Bucaramanga - Santander

**Debe confirmar con el area de gestión humana previamente para asigar hora de la consulta.*

Finalizado tal tiempo sin que usted asista a la citación, se entenderá que renuncia a la práctica de tal, y la empresa no se hará responsable de las condiciones de salud que el trabajador reporte después del retiro.

La presente orden se expide digitalmente a los 14 días del mes de abril de 2026.

Melissa Donado Arias

Clara Melissa Donado

Coordinador SST

Contacto:

Firmado electrónicamente por:

Nombre	**Johana Paola Ospino Rodelo**
Número de Documento	1.098.618.429
Email	sasinsego@gmail.com
Fecha	13/04/2026 a las 11:45
IP	127.0.0.1
Token	1a19b29e0f3b6f11445071078a0adb85

El código QR que se muestra a continuación es únicamente referencial y no tiene validez legal ni funcional



CONSORCIO CONSOLIDACIÓN GIRÓN	**FINALIZACIÓN POR OBRA O LABOR**	**Código**	RH-F-16
		Fecha	29/07/2023
		Versión	2
		Pagina 1 de 1	

Bucaramanga, 14 de marzo de 2026

Señor(a)

Juan Carlos Rincón Lozano

Cédula de Ciudadanía 80.089.079

PMP

Asunto: Notificación de terminación de contrato de trabajo por terminacion de la obra o labor contratada.

Me permito manifestarle que la obra o labor para la cual fue Ud contratado, en la empresa **CONSORCIO CONSOLIDACIÓN GIRÓN**, el **15 de octubre de 2025**, se encuentra finalizada, razón por la cual se procede a la liquidación definitiva de su contrato de trabajo de conformidad con el literal del articulo 61 del código sustantivo del trabajo, terminación que se hace efectiva el dia **14 de abril de 2026.**

Agradecemos que al recibir esta notificación, contacte al área de gestión humana para iniciar el tramite correspondiente, indicarle el proceso para realizarse los exámenes de egreso, iniciar el tramite de su liquidación de prestaciones sociales y salario adeudados conforme a lo enunciado en el Código Sustantivo del Trabajo.

Es oportuno manifestarle nuestro agradecimiento por su labor prestada en la empresa, por lo que nos vemos en la obligación de resaltar y aplaudir su desempeño.

Atentamente,



JOHANNA MARCELA PADIERNA CASTIBLANCO

Representante Legal

Contacto: contabinfracorp2024@gmail.com

Recibí:

Firmado electrónicamente por:

Nombre	Juan Carlos Rincón Lozano
Número de Documento	80.089.079
Email	sasinsego@gmail.com
Fecha	13/04/2026 a las 11:54
IP	127.0.0.1
Token	c5726aea33d1c5ec8a8dfaa8719de8d7

El código QR que se muestra a continuación es únicamente referencial y no tiene validez legal ni funcional



CONSORCIO CONSOLIDACIÓN GIRÓN	**FORMATO ORDEN EXAMEN DE RETIRO OCUPACIONAL**	**Código**	SST-F-37
		Fecha	22/08/2022
		Versión	2

Bucaramanga, 14 de marzo de 2026

Juan Carlos Rincón Lozano

Cédula de Ciudadanía No. **80.089.079**

PMP

Dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1072 de 2015, y en la Resolución 1443 de 2007, me permito notificarle que a partir de la fecha de terminación del vinculo laboral con **CONSORCIO CONSOLIDACIÓN GIRÓN** dispone de 5 (cinco) días para presentarse a la práctica del correspondiente EVALUACIÓN MÉDICA OCUPACIONAL DE RETIRO, en:

IPS: Unisalud Salud Ocupacional ltda.

Dirección: CALLE 51A # 31 - 66 Bucaramanga - Santander

**Debe confirmar con el area de gestión humana previamente para asigar hora de la consulta.*

Finalizado tal tiempo sin que usted asista a la citación, se entenderá que renuncia a la práctica de tal, y la empresa no se hará responsable de las condiciones de salud que el trabajador reporte después del retiro.

La presente orden se expide digitalmente a los 14 días del mes de abril de 2026.

Melissa Donado Arias

Clara Melissa Donado

Coordinador SST

Contacto:

Firmado electrónicamente por:

Nombre	Juan Carlos Rincón Lozano
Número de Documento	80.089.079
Email	sasinsego@gmail.com
Fecha	13/04/2026 a las 11:54
IP	127.0.0.1
Token	c5726aea33d1c5ec8a8dfaa8719de8d7

El código QR que se muestra a continuación es únicamente referencial y no tiene validez legal ni funcional



Anexo 2. Control de ingreso y salida de material.

CONSORCIO
CONSOLIDACIÓN GIRÓN

ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES

Código	GR-F-05
Fecha	16/11/2021
Versión	2
Página	1 de 1

PROYECTO: VILLAS DE LOS CABALLEROS
RESPONSABLE: Edson Portilla

MATERIAL: ARENA X BULTOS.
CARGO: ALMACENISTA

ENTRADA						SALIDA				SALDO
FECHA ENTRADA	# RC	# REMISION	PROVEEDOR	UND.	CANT.	FECHA SALIDA	CANT.	DESTINO	RECIBE	CANT.
26/03/26		1-208.	FRANKFURT.	UND	20.	26/03/26	20	MURO PERIMETRAL.		0.
07/04/26			MATERIALY AGREGA	m^3	2 1/2	07/04/26	2 1/2	Cancheta y caja colector		0.

CONSORCIO
CONSOLIDACIÓN CIRÓN

ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES

Código	GR-F-05
Fecha	16/11/2021
Versión	2
Página	1 de 1

PROYECTO: VILLAS CABALLEROS.
RESPONSABLE: Edson Portilla.

MATERIAL: ANTI-CORROSIVO GRIS
CARGO: ALMACEN

ENTRADA						SALIDA				SALDO
FECHA ENTRADA	# RC	# REMISION	PROVEEDOR	UND.	CANT.	FECHA SALIDA	CANT.	DESTINO	RECIBE	CANT.
12/03/26.		1-170.	FRANKFURT.	gl.	2	13/03/26	2	PLATINAS.	Miguel.	0.

CONSORCIO CONSOLIDACIÓN DIRÓN	ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES	Código	GR-F-05
		Fecha	16/11/2021
		Versión	2
		Página	1 de 1

PROYECTO: Consorcio Consolidacion Giron
RESPONSABLE: Sergio Rensel

MATERIAL: Alambre negro # 18
CARGO: Al Mecanista

ENTRADA						SALIDA				SALDO	
FECHA ENTRADA	# RC	# REMISION	PROVEEDOR	UND.	CANT.	FECHA SALIDA	CANT.	DESTINO	RECIBE	CANT.	
20/10/25	131 RVC	63725277	G y J		50 K	24/10/25	1K	barricada	[illegible]	149	
						29/10/25	24	Tortugas	[illegible]	25	
						30/10/25	20	Tortugas	[illegible]	5	
						12/11/25	1K.	Amarre refraccion edificio	[illegible]	4	
NO TRAJO FAC. 26/11/25.				Kg.	150.	27/11/25	25kg	AMARRES	[illegible]	125kg	
						01/12/25	25kg	AMARRES	[illegible]	100kg	
						01/12/25	50kg	AMARRES	[illegible]	50kg	
						02/12/25	25kg	AMARRES	Miguel Rangel	25kg	
						03/12/25	25kg	AMARRES	Miguel Rangel	0	
17-12-25		#. 137.	FERRET. GYJ	Kg	100.	17/12/25	25kg	AMARRES.	[illegible]	75.	
						19/12/25	25kg	AMARRES	Manuel	50	mal
						27/01/26	25kg	AMARRES PARRILLA.	Manuel	25kg	
28/01/26		63737597	FERRET. GYJ	Kg.	175.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	200kg	
						29/01/26	25kg	Amarres parrilla	[illegible]	175.	
						02/02/26	25kg	FABRICACION PANELAS - CONCR	a Caceres	150	Sebas
						02/02/26	25kg	AMARRES PARRILLA	a Caceres	125	
						03/02/26	25kg	AMARRE PARRILLA	a Caceres	100	
						04/02/26	25kg	AMARRES PARRILLA	a Caceres	75	
						06/02/26	25kg	Amarres parrilla	a EBAL	50.	
						13/02/26	25kg	AMARRES ANCLAJES.	Manuel	25.	
						02/03/26	25kg	Pines malla Fundida	Sebastian Ruiz	0	
27/03/26	137.	63739301	GYJ FERRET.	kg.	25	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	25	

CONSORCIO
CONSOLIDACIÓN GIRÓN

ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES

Código	GR-F-05
Fecha	16/11/2021
Versión	2
Página	1 de 1

PROYECTO: VILLAS CABALLEROS.

RESPONSABLE:

MATERIAL: Cemento.

CARGO: ALMACEN.

ENTRADA						SALIDA				SALDO
FECHA ENTRADA	# RC	# REMISION	PROVEEDOR	UND.	CANT.	FECHA SALIDA	CANT.	DESTINO	RECIBE	CANT.
				Bulto.		02/03/26	4.	DISIPADOR	+ Ramiro	63.
						03/03/26	4.	DISIPADOR.	+ Ramiro	59.
						04/03/26	1	ESMALTADO CANASTA	x	58
						04/03/26	4.	DISIPADOR.		54.
						05/03/26	2.	DISIPADOR.		52
						07/03/26	3.	DISIPADOR.		49.
						10/03/26	10.	DISIPADOR.		39.
						11/03/26	3.	DISIPADOR		36.
						12/03/26.	2	DISIPADOR		34.
						13/03/26	1	DISIPADOR.		33.
						13/03/26	2	BAÑERO cemento.	+ Manuel	31
						19/03/26	5.	cangleta para talud.	x Sonston Parra	26.
						24/03/26	3	CANASTA PARA-TALUD	x Sonston Parra	23
						24/03/26	3.	CANASTA PARA-TALUD	x Sonston Parra	20.
						25/03/26	5.	MURO cerramiento	x	15
						26/03/26	4.	MURO cerramiento	x	11
27/03/26	137.	63739301	GoJ Ferrete.	Bulto.	30.	—	—	—	—	41
						27/03/26	2	MURO cerramiento	x miguel	39 miguel
						28/03/26	6	MURO antepecho.	x miguel	33.
						06/04/26	2	RAMPA. Pechinglos	x WILLIAM	31 William
						07/04/26.	4.	cangleta Bordillo.	x WILLIAM	27.
						08/04/26	2.	PISO CALLE coleda	x estiven caicedo	25.
						08/04/26	5.	CAJA coleda	x	20.

CONSORCIO
CONSOLIDACIÓN GIRÓN

ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES

Código	GR-F-05
Fecha	16/11/2021
Versión	2
Página	1 de 1

PROYECTO: consorcio consolidacion Girón
RESPONSABLE: Sergio Rangel

MATERIAL: Disco corte metal 4 1/2
CARGO: Almacenista

ENTRADA						SALIDA				SALDO
FECHA ENTRADA	# RC	# REMISION	PROVEEDOR	UND.	CANT.	FECHA SALIDA	CANT.	DESTINO	RECIBE	CANT.
9/1/25		1-1491	FRONKFURT	1	1	10/11/25	1	Corte metal	A R	0
11/11/25		1-5085	Frank Furt.	2.	.	19/11/25	2	Pines anclajes	A R	0
27/11/25		1-5130		UNd.	2.					2
						03/02/26	1	corte alcubre	estiven	1
						27/02/26	1	corte alcubre	Caceres	0.
10/02/26.		1-66.	FRANKFURT SAS	UND	3.	10/02/26	1	Corte vanillo pin	Caceres	2
						10/02/26	1	Disco DISIPADOR	[illegible]	1
11/02/26		1-71	FRANKFURT.	UND	5.					6.
						11/02/26	1	Disco corte pines	[illegible]	5.
						17/02/26	1	corte pines soporte	A	4.
						18/02/26	1	corte VARIOS	A [illegible]	3.
						19/02/26	2	corte Recuder	[illegible]	1.
						23/02/26	1	corte pines Geotex	A	0
24/02/26		1-112.	FRANKFURT.	UND	10.					10.
						24/02/26	2	corte pines geomembrana	A Estiven.	8.
						25/02/26	2.	corte pines geomembrana	A Miguel Rangel	6.
						27/02/26	1	corte pines	A [illegible]	5.
						03/03/26	2	DISIPADOR	A	3.
						02/03/26	1	Pines mallas	A Sebastian Parra	2
						04/03/26	2	corte pines	A [illegible]	0
12/03/26				UND	7	12/03/26	1	DISIPADOR	A [illegible]	6.
						19/03/26	1	OFICIOS VARIOS	A [illegible]	5.
						24/03/26	1	corte AVISO PUBLICIDAD	A Miguel Rangel	4
						24/03/26	1	corte pines muros	A [illegible]	3.

CONSORCIO
CONSOLIDACIÓN DIRÓN

ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES

Código	GR-F-05
Fecha	16/11/2021
Versión	2
Página	1 de 1

PROYECTO: VILLAS CABALLEROS — GEOMATRIX.
RESPONSABLE: EDSON PORTILLA.
MATERIAL: TERRATRAC. TRAMO ~~1.5m x 3.5m~~ 3.50 x 50m
CARGO: ALMACENISTA.

ENTRADA						SALIDA				SALDO
FECHA ENTRADA	# RC	# REMISION	PROVEEDOR	UND.	CANT.	FECHA SALIDA	CANT.	DESTINO	RECIBE	CANT.
		042011.	GEOMATRIX.	mt.	50.	13/03/26	32mt	TALUD.	Isaias	18mt.
						14/03/26	11mt	TALUD.	a	7mt.

CONSORCIO
CONSOLIDACIÓN OIRÓN

ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES

Código	GR-F-05
Fecha	16/11/2021
Versión	2
Página	1 de 1

PROYECTO: VILLAS DE LOS CABALLEROS.
RESPONSABLE: Edson Portilla

MATERIAL: GEODREN. -
CARGO: ALMACENISTA.

ENTRADA						SALIDA				SALDO
FECHA ENTRADA	# RC	# REMISION	PROVEEDOR	UND.	CANT.	FECHA SALIDA	CANT.	DESTINO	RECIBE	CANT.
25/02/26		844.	GEO ANDES SAS	mts	360.	25/02/26	140m	INSTALACION TACUN.		190 +.
						02/03/26	30	Instalacion Tadeo.		160.
						04/03/26	160	TRANSFERENCIA x Frente ALCON		0.

CONSORCIO
CONSOLIDACIÓN GIRÓN

ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES

Código	GR-F-05
Fecha	16/11/2021
Versión	2
Página	1 de 1

PROYECTO: VILLAS DE LOS CABALLEROS
RESPONSABLE: Edson Portilla.

MATERIAL: PINTURA ESMALTE VERDE X 9L.
CARGO: ALMACENISTA.

ENTRADA						SALIDA				SALDO
FECHA ENTRADA	# RC	# REMISION	PROVEEDOR	UND.	CANT.	FECHA SALIDA	CANT.	DESTINO	RECIBE	CANT.
26/03/26				9L	2.					

CONSORCIO
CONSOLIDACIÓN GIRÓN

ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES

Código	GR-F-05
Fecha	16/11/2021
Versión	2
Página	1 de 1

PROYECTO: VILLAS CABALLEROS
RESPONSABLE: Edson Portillo

MATERIAL: PORTICLA ACERO 2 1/2
CARGO: ALMACEN

ENTRADA						SALIDA				SALDO
FECHA ENTRADA	# RC	# REMISION	PROVEEDOR	UND.	CANT.	FECHA SALIDA	CANT.	DESTINO	RECIBE	CANT.
26/02/26		20-5053	Mendivil Carrillo	Lb	2	—	—	—	—	2
						03/02/26	1 Lb.	OFICIOS VARIOS.	[illegible]	1
08/04/26				Lb	1					2

CONSORCIO
CONSOLIDACIÓN GIRÓN

ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES

Código	GR-F-05
Fecha	16/11/2021
Versión	2
Página	1 de 1

PROYECTO: Consorcio Consolidacion Giron
RESPONSABLE: Sergio Ruge Jose

MATERIAL: Pantilles 1/2 corriente
CARGO: Al Mocente

ENTRADA						SALIDA				SALDO
FECHA ENTRADA	# RC	# REMISION	PROVEEDOR	UND.	CANT.	FECHA SALIDA	CANT.	DESTINO	RECIBE	CANT.
9 10 25		1-4981	FRANKFURT	1	12	24/10/25	02	bodega de	Jesus Gon	02
						24/10/25	1	Entrenchito de concreto		1
28/10/25		1-5040	FRANKFURT	UND	2	—	—	—	—	3
						28/10/25	2	bodega	Alexander Prada	1
						09/12/25	1	KZ SEGURIDAD	Alexander	0
26/02/26		20-5053	mundial correa	UND	2					2

Alex.

CONSORCIO
CONSOLIDACIÓN GIRÓN

ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES

Código	GR-F-05
Fecha	16/11/2021
Versión	2
Página	1 de 1

PROYECTO: VILLAS DE LOS CABALLEROS
RESPONSABLE: Edson Portillo

MATERIAL: Semi-codo SANITA 10"
CARGO: ALMACENISTA

ENTRADA						SALIDA				SALDO
FECHA ENTRADA	# RC	# REMISION	PROVEEDOR	UND.	CANT.	FECHA SALIDA	CANT.	DESTINO	RECIBE	CANT.
27/03/26	137	63739296	GyJ Ferret.	UND	2					

CONSORCIO CONSOLIDACIÓN GIRÓN	ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES	Código	GR-F-05
		Fecha	16/11/2021
		Versión	2
		Página	1 de 1

PROYECTO: VILLAS DE LOS CABALLEROS.
RESPONSABLE: Edson Portilla.

MATERIAL: SEMI-CODO. SANIT. 6"
CARGO: ALMACENISTA

ENTRADA						SALIDA				SALDO
FECHA ENTRADA	# RC	# REMISION	PROVEEDOR	UND.	CANT.	FECHA SALIDA	CANT.	DESTINO	RECIBE	CANT.
27/03/26	63739296.	137-	GYJ FERRETE.	UND	1.	27/03/26	1	DESAGUE CAJA.	AK	0

CONSORCIO CONSOLIDACIÓN GIRÓN	ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES	Código	GR-F-05
		Fecha	16/11/2021
		Versión	2
		Página	1 de 1

PROYECTO: VILLAS DE LOS CABALLEROS.
RESPONSABLE: EDSON PORTILLA.

MATERIAL: SEMILLA BRACHARIA X KG.
CARGO: ALMACENISTA.

ENTRADA						SALIDA				SALDO
FECHA ENTRADA	# RC	# REMISION	PROVEEDOR	UND.	CANT.	FECHA SALIDA	CANT.	DESTINO	RECIBE	CANT.
26/03/26		41751	FEDERADO.	KG	2.	28/03/26	1.	Sendero.		1.

CONSORCIO CONSOLIDACION GIRÓN	ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES	Código	GR-F-05
		Fecha	16/11/2021
		Versión	2
		Página	1 de 1

PROYECTO: CONSORCIO CONSOLIDACION GIRON.
RESPONSABLE: Edson Portilla

MATERIAL: TABLAS - MADERA . 2,5 x 3mts
CARGO: ALMACENISTA .

ENTRADA						SALIDA				SALDO
FECHA ENTRADA	# RC	# REMISION	PROVEEDOR	UND.	CANT.	FECHA SALIDA	CANT.	DESTINO	RECIBE	CANT.
1/12/25		4346	LUBEGON.	UND	15.	26/01/26	6.	CANALETA.	[illegible]	9.
						28/01/26	2.	CANALETA.	[illegible]	7
						04/03/26	2.	CANALETA PARA TALUD	[illegible]	5.
07/04/26						07/04/26	6.	CAJA COLECTOR	[illegible]	0.
				UND	6.	08/04/26	6.	canaleta y caja	[illegible]	0.

15 ar
Beba

CONSORCIO
CONSOLIDACIÓN GIRÓN

ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES

Código	GR-F-05
Fecha	16/11/2021
Versión	2
Página	1 de 1

PROYECTO: VILLAS DE LOS CABALLEROS.
RESPONSABLE: Edson Portilla.
MATERIAL: TRITURADO 1/2.x bulto.
CARGO: ALMACENISTA.

ENTRADA						SALIDA				SALDO
FECHA ENTRADA	# RC	# REMISION	PROVEEDOR	UND.	CANT.	FECHA SALIDA	CANT.	DESTINO	RECIBE	CANT.
27/03/26		GR-F08	PARAISO -FERRET.	UND costal.	10.	27/03/26	10.	canaleta y antepecho	a [signature]	
06/04/26.			PROVIC-MATER. AGRES.	M^3.	2	07/04/26	2	canaleta.	x [signature]	0.
07/04/26		32000.	Provee materiales.	M^3	2 1/2	07/04/26	2 1/2	CAJA COLECTOR canaleta	x [signature]	0.

CONSORCIO CONSOLIDACIÓN GIRÓN	ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES	Código	GR-F-05
		Fecha	16/11/2021
		Versión	2
		Página	1 de 1

PROYECTO: VILLAS CABALLEROS

RESPONSABLE: Edson Portilla.

MATERIAL: TUBERIA - SANITA - 6" x 6mt

CARGO: ALMACENISTA

ENTRADA						SALIDA				SALDO
FECHA ENTRADA	# RC	# REMISION	PROVEEDOR	UND.	CANT.	FECHA SALIDA	CANT.	DESTINO	RECIBE	CANT.
20/03/26				UND	1	27/03/26	1	DESAGUE CAJA DISIPA		0

CONSORCIO CONSOLIDACIÓN GIRÓN	ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES	Código	GR-F-05
		Fecha	16/11/2021
		Versión	2
		Página	1 de 1

PROYECTO: CONSORCIO CONSOLIDACION GIRON.
RESPONSABLE: Edson Portilla A.

MATERIAL: TUBO SANITARIO PVC 2"x6mt.
CARGO: ALMACENISTA.

ENTRADA						SALIDA				SALDO
FECHA ENTRADA	# RC	# REMISION	PROVEEDOR	UND.	CANT.	FECHA SALIDA	CANT.	DESTINO	RECIBE	CANT.
12/02/26	137.	6373866	GYJ FERR	UND.	18.	24/02/26	7	PEGAGUE TALUD.	ANTONIO GU	11
						02/03/26	11	CASITAS	TRANSFERENCIA	0.
19/02/26.				2	UND.	02/03/26.	1	PASES MICRO CENTRAL	"	1.

CONSORCIO
CONSOLIDACIÓN DIRÓN

ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES

Código	GR-F-05
Fecha	16/11/2021
Versión	2
Página	1 de 1

PROYECTO: VILLAS CABALLEROS
RESPONSABLE: Edwin Portilla

MATERIAL: VARILLA 3/8 CORRUGADA
CARGO: ALMACENISTA

ENTRADA						SALIDA				SALDO
FECHA ENTRADA	# RC	# REMISION	PROVEEDOR	UND.	CANT.	FECHA SALIDA	CANT.	DESTINO	RECIBE	CANT.
						27/02/26	2	pines. Garella.	[illegible]	68
						27/02/26	8.	DISIPADOR.	[illegible]	60
						28/02/26	2	pines Garaña	[illegible]	58
						03/03/26	1	Pines malla.	[illegible]	57.
						03/03/26	6	DISIPADOR	[illegible]	51
						04/03/26	17	DISIPADOR	[illegible]	34.
						04/03/26	10	Pines canaleta	[illegible]	24.
						04/03/26	4	Pines canaleta	[illegible]	20.
						09/03/26	20	DISIPADOR	[illegible]	0.
16/03/26				UND	50.					50
						19/03/26	2	pines canaleta.	[illegible]	48.
						24/03/26	11.	Pines muro.	[illegible]	37.
						25/03/26	4	muro cerramiento	[illegible]	33
						26/03/26	5.	muro cerramiento	[illegible]	28
						27/03/26	2.	muro cerramiento	[illegible]	26.
						07/04/26	1.	pines canaleta alma	[illegible]	
						07/04/26	5	parrilla bardilla	[illegible]	20.

Anexo 3. Certificados de calidad.

ACEROS INDUSTRIALES

Cliente: 40V57 - CHEA INGENIERIA S.A.S
Dirección: KRA 13 # 22-32 BRR GIRARDOT
Factura: 69560
Fecha Fact.: 06/26/2024 **Orden de Compra:**

REGISTRO DE CALIDAD

FCA28
Versión 0
Oct. 2014

Material Entregado

Código	Material	Lote	Grado	Color	Kilos
200350	TORN RDO 3- 1/2 PG 1045	202406712	1045	Verde	701.00

Caracteristicas Mecánicas - Dimensionales

R.T.-Kg/mm²		R.F.-	Elongacion	Dureza			Tol. Dim.-mm		Oval.
Mín.	Máx.	Kg/mm²	%	Mín.	Máx.	Unid.	Mín.	Máx.	mm

R.T.:Resistencia a la Tracción - R.F.: Resistencia a la fluencia

Composición Química

Lote	Colada	Norma	%C	%Mn	%P	%S	%Si	%Cr	%Ni	%Mo	%Cu	%Sn	%V	%B	%Pb	%Fe	%Zn
202406712	VS161	ASTM A29	0.4400	0.7800	0.0300	0.0280	0.2000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

"Apreciado cliente, favor verificar previamente que las propiedades mecánicas y químicas del material cumplan con los requisitos de su aplicación. La organización no acepta devoluciones de material: procesado, cortado en tramos, fracciones o en deterioro evidente" Muchas gracias.

Tolerancias Dimensionales según Estados de Entrega Laminado en Caliente: Rdo. DIN1013-Cdo. DIN1014-Hex. DIN1015 / Premaquinado: Rdo. DIN1013 / Bonificado: Rdo. DIN1013 Calibrado: Rdo.-Cdo.-Hex.-Plat. ISO h11 / Torneado: Rdo. ISO h11

Certifica que los resultados de las pruebas mecánicas realizados a los Materiales Transformados-Calibrados/Trefilados - son correctos, y con base al resultado real realizado en muestras tomadas de acuerdo con el Plan de Calidad.

Los resultados de este informe solo aplican para el lote ensayado.

Inspector de Materiales
SOPORTE TÉCNICO

Medellín - Colombia
Calle 26 Nro 41-140 Itagüí
Teléfono:(604)372 12 12
correo: info@acerosindustriales.com

Bogotá - Colombia
Calle 15 Nro. 27 - 21 Paloquemao
Teléfono:(601)492 47 80
correo: ventabog@acerosindustriales.com

日钢营口中板有限公司
RIZHAO STEEL YINGKOU MEDIUM PLATE CO.,LTD.
辽宁省营口市老边区冶金街/115005
Yejinstreet,Laobiandistrict,Yingkou,Liaoning,P.R.China/115005
TEL:0417-3256081 FAX:0417-3256057 NO.:DT2101501/A

产品质量证明书
INSPECTION CERTIFICATE

订货单位 PURCHASER	Cheongfuli (Hong Kong) Company, Limited.	产品名称 PRODUCT	普通碳素结构钢 General carbon structural steel	
收货单位 CONSIGNEE	Cheongfuli (Hong Kong) Company, Limited.	合同编号 CONTRACT NO.	YGR1ZANN240685004	
技术标准/牌号 SPEC/GRADE	ASTM A36/A36M-2019	交货状态 DELIVERY CONDITION	热轧(AR)	签发日期 DATE OF ISSUE: 20240811
车号 TRAIN NO.		证明书号 CERTIFICATE NO.	240811Z00495	

炉号 HEAT NO.	批号 LOT NO.	钢板号 PLATE NO.	规格 MM DIMENSION	数量 QTY	重量 WEIGHT kg	分析区域 AA	化学成分 CHEMICAL ANALYSIS % C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Cu	Mo	V	Ti	Nb	CEV	A0A01 屈服强度 MPa Rp0.2	A0A02 抗拉强度 MPa Rm	A0A03 断后伸长率 % B5
							10^{-2}	10^{-1}	10^{-1}	10^{-4}	10^{-4}	10^{-3}	10^{-4}	10^{-3}	10^{-4}	10^{-3}	10^{-4}	10^{-4}	10^{-2}			
24306368A	2478500	24G9853001	12x2440x6096	1	1.401	L	16	22	54	24	6	5	28	9	7	1	2	2	27	282	439	28
24306368A	2478500	24G9853002	12x2440x6096	1	1.401	L	16	22	54	24	6	5	28	9	7	1	2	2	27	282	439	28
24306368A	2478500	24G9853003	12x2440x6096	1	1.401	L	16	22	54	24	6	5	28	9	7	1	2	2	27	282	439	28
24306368A	2478500	24G9853004	12x2440x6096	1	1.401	L	16	22	54	24	6	5	28	9	7	1	2	2	27	282	439	28
			合计(TOTAL)	4	5.604																	

注释 NOTES

L:熔炼成分 SMELTING COMPOSITION
拉伸标距(GAUGE LENGTH) Lo=200 mm
A0A01=YIELD STRENGTH
A0A02=TENSILE STRENGTH
A0A03=PRECENTAGE ELONGATION AFTER FRACTURE

According to EN 10204 3.1

本产品已按照标准要求进行制造和检验，其结果符合要求，特此证明。
WE HEREBY CERTIFY THAT MATERIAL DESCRIBED HAS MANUFACTURED AND TESTED WITH SATISFACTORY RESULTS IN ACCORDANCE WITH THE REQUIREMENTS OF THE ABOVE MATERIAL SPECIFICATION

冶金技术处处长
DIRECTOR OF METALLURGICAL DEPARTMENT

Scanned with CamScanner

日钢营口中板有限公司
RIZHAO STEEL YINGKOU MEDIUM PLATE CO.,LTD.
辽宁省营口市老边区冶金街/115005
Yejinstreet,Laobiandistrict,Yingkou,Liaoning,P.R.China/115005
TEL:0417-3256081 FAX:0417-3256057 NO.:DT2101501/A

产品质量证明书
INSPECTION CERTIFICATE

订货单位 PURCHASER	Cheongfuli (Hong Kong) Company, Limited.	产品名称 PRODUCT	普通碳素结构钢 General carbon structural steel	
收货单位 CONSIGNEE	Cheongfuli (Hong Kong) Company, Limited.	合同编号 CONTRACT NO.	YGR1ZANN240685004	
技术标准/牌号 SPEC/GRADE	ASTM A36/A36M-2019	交货状态 DELIVERY CONDITION	热轧(AR)	签发日期 DATE OF ISSUE: 20240729
车号 TRAIN NO.		证明书号 CERTIFICATE NO.	240729Z00423	

日钢营口中板分厂 质量专用章

炉号 HEAT NO.	批号 LOT NO.	钢板号 PLATE NO.	规格 (MM) DIMENSION	数量 QTY	重量 WEIGHT kg	分析区域 AA	化学成分 CHEMICAL ANALYSIS % C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Cu	Mo	V	Ti	Nb	CEV	A 0A01 屈服强度 MPa Rp0.2	A 0A02 抗拉强度 MPa Rm	A 0A03 断后伸长率 % B5
							×10⁻³	×10⁻²	×10⁻²	×10⁻³	×10⁻³	×10⁻²	×10⁻³	×10⁻³	×10⁻³	×10⁻³	×10⁻³	×10⁻³	×10⁻²			
24112275A	2476130	24GB097003	12x2440x6096	1	1.401	L	131	201	1040	260	66	33	110	8	60	2	40	20	31	293	459	28.5
24112275A	2476130	24GB097001	12x2440x6096	1	1.401	L	131	201	1040	260	66	33	110	8	60	2	40	20	31	293	459	28.5
24112275A	2476130	24GB098001	12x2440x6096	1	1.401	L	131	201	1040	260	66	33	110	8	60	2	40	20	31	293	459	28.5
24112275A	2476130	24GB098002	12x2440x6096	1	1.401	L	131	201	1040	260	66	33	110	8	60	2	40	20	31	293	459	28.5
24112275A	2476130	24GB098003	12x2440x6096	1	1.401	L	131	201	1040	260	66	33	110	8	60	2	40	20	31	293	459	28.5
24112275A	2476130	24GB098004	12x2440x6096	1	1.401	L	131	201	1040	260	66	33	110	8	60	2	40	20	31	293	459	28.5
			合计 (TOTAL)	6	8.406																	

注释 NOTES

L: 熔炼成分 SMELTING COMPOSITION
拉伸标距 (GAUGE LENGTH) Lo=200 mm
A0A01=YIELD STRENGTH
A0A02=TENSILE STRENGTH
A0A03=PRECENTAGE ELONGATION AFTER FRACTURE

According to EN 10204 3.1

野牛

本产品已按照标准要求进行制造和检验，其结果符合要求，特此证实。
WE HEREBY CERTIFY THAT MATERIAL DESCRIBED HAS MANUFACTURED AND TESTED WITH SATISFACTORY RESULTS IN ACCORDANCE WITH THE REQUIREMENTS OF THE ABOVE MATERIAL SPECIFICATION

冶金技术处处长
DIRECTOR OF METALLURGICAL DEPARTMENT

Scanned with CamScanner

JINGYE (YINGKOU) MEMPLATE CO.LTD.
Yejinstreet,Laobiandistrict,Yingkou,Liaoning,P.R.China/115005
TEL:0417-3256081 FAX:0417-3256057 NO.:DT2101501/A

产品质量证明书
INSPECTION CERTIFICATE

订货单位 PURCHASER	SMLINGSETCORPORATION	产品标准 IRDLICI	普通碳结构钢 General carbon structural steel
收货单位 CONSIGNEE	SMLINGSETCORPORATION	合同号 CONTRACTNO.	YGCAZANN250985001-02
技术规范牌号 SPECGRADE	ASIMA36/A36M-2019；ASIMA36	交货状态 DELIVERYCONDITION	热轧(AR)
		证明书编号 CERTIFICATE NO.	251030Z00816
车号 TRAINNO.			

炉号 HEATNO.	批号 LOTNO.	钢板号 PLATENO.	规格 MM DIMENSION	数量 QTY	重量 WEIGHT t	分析区域 A.A	化学成分 CHEMICAL ANALYSIS% C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Cu	Mo	V	Ti	Nb	CEV	A0A01 屈服强度 Mpa Rp0.2	A0A02 抗拉强度 Mpa Rm	A0A03 断后伸长率 % A5
							10^{-3}	10^{-3}	10^{-3}	10^{-4}	10^{-4}	10^{-3}	10^{-4}	10^{-3}	10^{-4}	10^{-3}	10^{-4}	10^{-4}	10^{-2}			
25120997A	2505772	25K9425002	12x2438x6096	1	1,400	L	178	178	562	170	96	74	320	8	30	1	30	20	29	308	454	24
25120997A	2505772	25K9425003	12x2438x6096	1	1,400	L	178	178	562	170	96	74	320	8	30	1	30	20	29	308	454	24
25120997A	2505772	25K9425004	12x2438x6096	1	1,400	L	178	178	562	170	96	74	320	8	30	1	30	20	29	308	454	24
			合(TOTAL):	3	4,200																	

注释 NOTES

L:熔炼分析MELTING COMPOSITION
拉伸GAUGE LENGTH) Lo=200 mm
A0A01=YIELD STRENGTH
A0A02=TENSILE STRENGTH
A0A03=PRECENTAGE ELONGATION AFTER FRACTURE

According to EN 10204 3.1

本品经检验符合标准及其技术条件规定，特此证明
WE HEREBY CERTIFY THAT MATERIAL DESCRIBED HASMANUFACURD AND TESTED WITH SATISFACTORY RESULTS IN ACCORDANCE WITH THE REQUIR EMENTS OF THE ABOVE MATERIAL SPECIFICATION Both BOHVISUAL AND DIMENSIONAL INSPECTION MEETTHE STANDARD REQUIREMENTS

技术中心 Technology Center

Scanned with CamScanner

敬业营口中板有限公司
JINGYE (YINGKOU) MEDIMPLATE CO.LTD.
营口市老边区叶近街115005
Yejinstreet,Laobiandistrict,Yingkou,Liaoning,P.R.China/115005
TEL:0417-3256081 FAX:0417-3256057 NO.:DT2101501/A

产品质量证明书
INSPECTION CERTIFICATE

质量专用章

订货单位 PURCHASER	SMLNGOSTCORPORATION	产品标准 IRCILCI	普通碳素结构钢 General carbon structural steel		
收货单位 CONSIGNEE	SMLNGOSTCORPORATION	合同号 TRACTNO.	YGCAZANN250985001-02		
钢号 SPECGRADE	ASIMA36/A36M-2019；ASIMA36	交货状态 DELIVERYCONDITION	热处理(AR)	发货日期 DATE OF ISSUE	20251028
		质量证明书编号 CERTIFICATE NO.	251028Z01073	是否保证 GUARANTEE ORNOT	是 YES
车号 TRAIN NO.					

炉号 HEAT NO.	批号 LOT NO.	钢板号 PLATE NO.	规格 MM DIMENSION	数量 QTY	重量 WEIGHT kg	分析区域 A.A	化学成分 CHEMICAL ANALYSIS % C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Cu	Mo	V	Ti	Nb	CEV	A0A01 屈服强度 MPa ReH	A0A02 抗拉强度 Rm	A0A03 断后伸长率 % A5
							10^{-3}	10^{-3}	10^{-3}	10^{-4}	10^{-4}	10^{-5}	10^{-4}	10^{-3}	10^{-4}	10^{-3}	10^{-4}	10^{-4}	10^{-2}			
25309867	C 2505654	25K9212001	12x2438x6096	1	1,400	L	180	215	532	160	113	47	310	9	30	1	40	30	28	300	457	26
25309867	C 2505654	25K9212002	12x2438x6096	1	1,400	L	180	215	532	160	113	47	310	9	30	1	40	30	28	300	457	26
25309867	C 2505654	25K9212003	12x2438x6096	1	1,400	L	180	215	532	160	113	47	310	9	30	1	40	30	28	300	457	26
25309867	C 2505654	25K9212004	12x2438x6096	1	1,400	L	180	215	532	160	113	47	310	9	30	1	40	30	28	300	457	26
			合计(TOTAL):	4	5,600																	

注释 NOTES

L:熔炼分析MELTING COMPOSITION
拉伸试验(GAUGE LENGTH) Lo=200 mm
A0A01=YIELD SIRENGIH
A0A02=TENSILE SIRENGIH
A0A03=PRECENTAGE ELONGATION AFTER FRACTURE

According to EN 10204 3.1

本厂保证上述材料经检验其结果符合订货合同及技术规范要求
WE HEREBY CERTIFY THAT MATERIAL DESCRIBED HAS MANUFACURD AND TESID WITH SATISFACTORY RESULTS IN ACCORDANCE WITH THE REQUIR EMENTS OF THE ABOVE MATERIAL SPECIFICATION Both BOTH VISUAL AND DIMENSIONAL INSPECTION MET THE STANDARD REQUIREMENTS

技术中心
Technology Center


Scanned with CamScanner

Anexo 4. Ficha de indicadores.

	FICHA TÉCNICA INDICADORES DE GESTIÓN	CODIGO	SST-F-44
		FECHA	3/05/2021
		VERSIÓN	2
		PAGINA 1 DE 1	

1. DATOS DEL INDICADOR											
Objetivo del indicador	Evaluar el porcentaje de avance de obra ejecutado a lo largo del proyecto				**Nombre del indicador**	Avance de obra					
Interpretación del indicador	Porcentaje de avance de obra ejecutado vs proyectado				**Formula de calculo**	(% avance ejecutado / % avance proyectado)*100					
Fuente de información	Informes tecnicos mensuales de obra				**Tipo de indicador**	Cuantitativo					
Responsable de medición	Director de obra				**A quien se comunica**	Gerente general					
Frecuencia	Mensual	**Tendencia**	Ascendente	**Unidad**	Porcentaje	**Meta**	**100%**	**Nivel satisfactorio**	**90%**	**Nivel Critico**	**70%**

2. RESULTADOS 2025/2026															
Periodo	**oct-25**	**nov-25**	**dic-25**	**ene-26**	**feb-26**	**mar-26**	**abr-26**								**Logro**
% AVANCE OBRA - EJECUTADO	0,56%	23,26%	45,87%	72,19%	86,39%	98,09%	100,00%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	426,36%
% AVANCE OBRA - PROYECTADO	0,48%	13,72%	45,61%	70,02%	85,74%	98,83%	100,00%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	414,40%
Resultado	**116,67%**	**169,53%**	**100,57%**	**103,10%**	**100,76%**	**99,25%**	**100,00%**	**#¡VALOR!**	**#¡VALOR!**	**#¡VALOR!**	**#¡VALOR!**	**#¡VALOR!**	**#¡VALOR!**	**#¡VALOR!**	**102,89%**

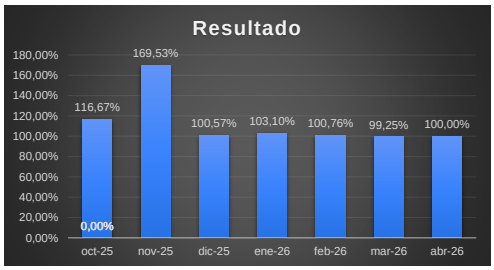

3. ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO
En el periodo del 15 y el 31 de octubre se evidencia el 116,67 % de avance general del proyecto donde se ejecutron actividades preliminares tales como el replanteo topográfico, la instalación de la valla informativa y el desmonte y limpieza a nivel superficial del talud intervenido.
Durante el periodo comprendido entre el 1 y el 30 de noviembre se registró un cumplimiento del 169,53% respecto a las actividades programadas, reflejando un avance significativo frente a lo previsto. Este resultado se debe principalmente al inicio anticipado de las perforaciones horizontales y la instalación de anclajes
Durante el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de diciembre se registró un cumplimiento del 100,57% respecto a las actividades programadas, reflejando un avance significativo frente a lo previsto. Este resultado se debe principalmente a las actividades de perforación horizontal y la instalación de los anclajes previstos.
Durante el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de enero de 2026 se registró un cumplimiento del 103,10 % frente a las actividades programadas, evidenciando un desempeño superior a lo previsto en la planificación mensual, este resultado obedece principalmente a la operación simultánea de dos equipos de perforación horizontal para la instalación de anclajes, así como al inicio anticipado de las actividades de excavación de zapatas y la construcción de canaletas para el control de la escorrentía, conforme se detalla en el informe técnico correspondiente.
Durante el período comprendido entre el 1 y el 28 de febrero de 2026 se registra un avance físico acumulado ejecutado del 86,39 %, el cual supera el avance programado del 85,74 % reflejando un cumplimiento del 100,76% evidenciando un desempeño superior a lo previsto en la planificación mensual, evidenciando un cumplimiento favorable de la programación establecida para el proyecto. Este resultado refleja una adecuada planificación, coordinación de actividades y control operativo durante la ejecución de las obras.
Durante el período comprendido entre el 1 y el 31 de marzo de 2026 se registra un avance físico acumulado ejecutado del 98,09%, el cual supera el avance programado del 98,83 % reflejando un cumplimiento del 99.25% evidenciando un cumplimiento no favorable de la programación establecida para el proyecto. Este resultado refleja cumplimiento en el desarrollo de las actividades y control operativo durante la ejecución de las obras, pero no se obtiene el100% ejecutado de lo programado debido a la ejecución de actividades de pormenores no obstante el desempeño general de proyecto es positivo
Durante el periodo comprendido entre el 01 y el 14 abril 2026, se alcanzó el 100% de ejecución de las actividades programadas, evidenciando el cumplimiento total del cronograma establecido. Este resultado refleja una adecuada planificación, control operacional y disponibilidad de recursos, garantizando el desarrollo oportuno de las actividades conforme a lo definido en el proyecto.

4. PLAN DE ACCIÓN				
Actividad	**Plazo ejecución**	**Responsable**	**Proceso**	**Recursos**

5. OBSERVACIONES


	FICHA TÉCNICA INDICADORES DE GESTIÓN	CODIGO	SST-F-44
		FECHA	3/05/2021
		VERSIÓN	2
		PAGINA 1 DE 1	

1. DATOS DEL INDICADOR

Objetivo del indicador	Evaluar el porcentaje de quejas presentadas por periodo				**Nombre del indicador**	Atención de quejas					
Interpretación del indicador	Porcentaje de quejas mensuales respecto al periodo inmediatamente anterior				**Formula de calculo**	(N° de quejas mes anterior - N° de quejas mes actual/N° de quejas mes anterior)*100					
Fuente de información					**Tipo de indicador**	Cuantitativo					
Responsable de medición	Director de obra				**A quien se comunica**	Gerente general					
Frecuencia	Mensual	**Tendencia**	Descendente	**Unidad**	Porcentaje	**Meta**	**100%**	**Nivel satisfactorio**	**90%**	**Nivel Critico**	**75%**

2. RESULTADOS 2025/2026

Periodo	**oct-25**	**nov-25**	**dic-25**	**ene-26**	**feb-26**	**mar-26**	**abr-26**							**Logro**
N° de quejas recibidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1,00
N° de quejas atendidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1,00
Resultado	**#¡DIV/0!**	**#¡DIV/0!**	**#¡DIV/0!**	**#¡DIV/0!**	**#¡DIV/0!**	100%	**#¡DIV/0!**	**#¡VALOR!**	**#¡VALOR!**	**#¡VALOR!**	**#¡VALOR!**	**#¡VALOR!**	**#¡VALOR!**	**#¡VALOR!**	100%

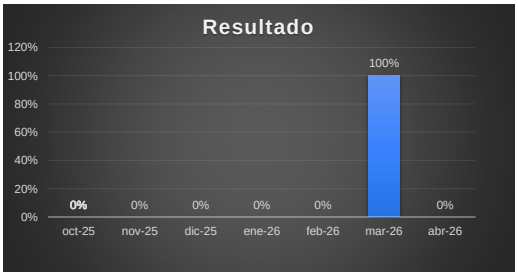

3. ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO

En el periodo comprendido entre el 15 y 31 de octubre 2025 no se presentaron quejas por parte de las partes interesadas.
En el periodo comprendido entre el 1 y 30 de noviembre 2025 no se presentaron quejas por parte de las partes interesadas.
En el periodo comprendido entre el 1 y 31 de diciembre 2025 no se presentaron quejas por parte de las partes interesadas.
En el periodo comprendido entre el 1 y 31 de enero 2026 no se presentaron quejas por parte de las partes interesadas.
En el periodo comprendido entre el 1 y 28 de febrero 2026 no se presentaron quejas por parte de las partes interesadas.
En el periodo comprendido entre el 1 y 31 marzo 2026 se atendió 1 queja recibida por parte de las comunidad, la cual se le dio la respuesta respectiva deacuerdo a las peticiones recibidas, se adjunta RESPUESTA DE PQRS.
En el periodo comprendido entre el 1 y 14 abril 2026 no se presentaron quejas por parte de las partes interesadas.

4. PLAN DE ACCIÓN

Actividad	**Plazo ejecución**	**Responsable**	**Proceso**	**Recursos**
n.a	n.a	n.a	n.a	n.a

5. OBSERVACIONES

	FICHA TÉCNICA INDICADORES DE GESTIÓN	CODIGO	SST-F-44
CONSORCIO CONSOLIDACIÓN GIRÓN		FECHA	3/05/2021
		VERSIÓN	2
		PAGINA 1 DE 1	

1. DATOS DEL INDICADOR

Objetivo del indicador	identificar el porcentaje de multas en los proyectos				**Nombre del indicador**		Multas en los proyectos						
Interpretación del indicador	Porcentaje de multas mensuales				**Formula de calculo**		(N° de multas mes anterior - N° de multas mes actual/N° de multas mes anterior)*100						
Fuente de información	Correspondencia de multas generadas en el periodo				**Tipo de indicador**		Cuantitativo						
Responsable de medición	Director de obra				**A quien se comunica**		Gerente general						
Frecuencia	Mensual	**Tendencia**	Ascendente	**Unidad**	Porcentaje	**Meta**	**100%**	**Nivel satisfactorio**	**95%**	**Nivel Critico**			**80%**

2. RESULTADOS 2025 / 2026

Periodo	**oct-25**	**nov-25**	**dic-25**	**ene-26**	**feb-26**	**mar-26**	**abr-26**								**Logro**
N° de multas mes anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0,00
N° de multas mes actual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0,00
Resultado	**#¡DIV/0!**	**#¡DIV/0!**	**#¡DIV/0!**	**#¡DIV/0!**	**#¡DIV/0!**	**#¡DIV/0!**	**#¡DIV/0!**	**n.a**	**n.a**	**n.a**	**n.a**	**n.a**	**n.a**	**n.a**	#¡DIV/0!



3. ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO

En el periodo comprendido entre el 15 y el 31 de octubre no se presentaron multas que afecten el desarrollo del proyecto.
En el periodo comprendido entre el 1 y el 30 de noviembre no se presentaron multas que afecten el desarrollo del proyecto.
En el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de diciembre no se presentaron multas que afecten el desarrollo del proyecto.
En el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de enero no se presentaron multas que afecten el desarrollo del proyecto.
En el periodo comprendido entre el 1 y el 28 de febrero no se presentaron multas que afecten el desarrollo del proyecto.
En el periodo comprendido entre el 1 y el 31 marzo no se presentaron multas que afecten el desarrollo del proyecto.
En el periodo comprendido entre el 1 y el 14 abril no se presentaron multas que afecten el desarrollo del proyecto.

4. PLAN DE ACCIÓN

Actividad	**Plazo ejecución**	**Responsable**	**Proceso**	**Recursos**
n.a	n.a	n.a	n.a	n.a

5. OBSERVACIONES

n.a


	FICHA TÉCNICA INDICADORES DE GESTIÓN	CODIGO	SST-F-44
		FECHA	3/5/2021
		VERSIÓN	2
		PAGINA 1 DE 1	

1. DATOS DEL INDICADOR

Objetivo del indicador	Medir el desempeño de los proveedores dentro de la organización				**Nombre del indicador**		Desempeño de proveedores				
Interpretación del indicador	Medir la eficacia de los proveedores				**Formula de calculo**		Calificación promedio de proveedores / Mayor calificación de proveedores				
Fuente de información	Evaluación de desempeño de proveedores				**Tipo de indicador**		Cuantitativo				
Responsable de medición	Coordinador de compras				**A quien se comunica**		Gerente general				
Frecuencia	Anual	**Tendencia**	Ascendente	**Unidad**	Porcentaje	**Meta**	**100%**	**Nivel satisfactorio**	**90%**	**Nivel Critico**	**70%**

2. RESULTADOS 2024/2025

Periodo	**may-25**
suma de calificación de proveedores	4,65
Mayor calificación	5,00
Resultado	**93%**

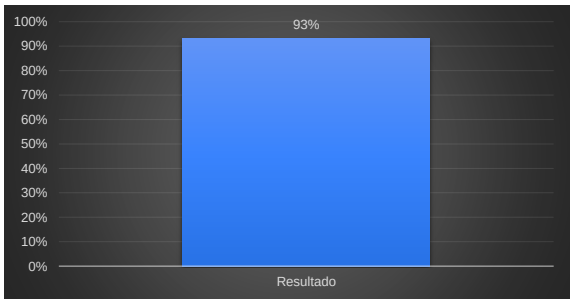

3. ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO

Se realiza evaluación de desempeño de los proveedores en el mes de Mayo de 2025 el cual da una puntuación satisfactoria (93% satisfactorio) de los proveedores involucrados, dicha evaluación es compartida a los proveedores con el fin de ponerlos en conocimiento y resaltar el compomiso para con la empresa.

4. PLAN DE ACCIÓN

Actividad	Plazo ejecución	Responsable	Proceso	Recursos
na	n.a	n.a	n.a	n.a

n.a

	FICHA TÉCNICA INDICADORES DE GESTIÓN	SST-F-44 3/05/2021 2

1. DATOS DEL INDICADOR												
Objetivo del indicador	Identificar el cumplimiento de plan de capacitación				**Nombre del indicador**		Cumplimiento del plan de capacitación organizacional					
Interpretación del indicador	capacitaciones				**Formula de calculo**		(N° de capacitaciones programadas/N° de camapcitaciones ejecutadas)*100					
Fuente de información	Plan de capacitación				**Tipo de indicador**		Cuantitativo					
Responsable de medición	Coordinador recursos humanos				**A quien se comunica**		Gerencia					
Frecuencia	mensual	**Tendencia**	Ascendente	**Unidad**	porcentaje	**Meta**	**100%**	**Nivel satisfactorio**	**80%**	**Nivel Critico**	**50%**	

2. RESULTADOS													
PERIODO 2025/2026													
Periodo	**oct-25**	**nov-25**	**dic-25**	**ene-26**	**feb-26**	**mar-26**	**abr-26**						**Logro**
# capacitaciones ejecutados	2,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	2,00	NA	NA	NA	NA	NA	24,00
# capacitaciones programados	2,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	2,00	NA	NA	NA	NA	NA	24,00
Resultado	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**#¡VALOR!**	**#¡VALOR!**	**#¡VALOR!**	**#¡VALOR!**	**#¡VALOR!**	100%



3. ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO
Para el periodo se desarrollaron 2 capacitaciones. 1 del área SST; Salud peligros y riesgos 1 capacitación del área ambiental y social; Fortalecimiento de valores (trabajo en equipo), educación vial y oficina de atención a la comunidad.
Para el periodo se desarrollaron 4 capacitaciones. 2 del área SST; Actos y condiciones inseguras y Que es accidente de trabajo y que hacer en caso de que se presente. 1 capacitación del área ambiental; divulgación de la Política Ambiental y Política de Orden y Aseo. y 1 capacitación del área social; Atención a la comunidad y trabajadores en temas de información sobre cultura vial y participación comunitaria.
Para el periodo se desarrollaron 4 capacitaciones. 2 del área SST; Medidas de seguridad para realizar trabajo en altura y cuidado de las manos. 1 capacitación del área ambiental; Control De emisiones atmosféricas y 1 capacitación del área social; fortalecimiento de valores (emprendimiento), educación vial y oficina de atención a la comunidad
Para el periodo se desarrollaron 4 capacitaciones. 2 del área SST; Uso correcto, almacenamiento y mantenimiento de EPPS y seguridad vial – actores viales. 1 capacitación del área ambiental; Uso y Almacenamiento Adecuado de Materiales de Construcción y 1 capacitación del área social; fortalecimiento de valores (colaboración), educación vial y oficina de atención a la comunidad
Para el periodo del 01 al 28 febrero de 2026 se desarrollaron 4 capacitaciones. 2 del área SST; importancia de las pausas activas y hábitos y estilos de vida saludable 1 capacitación del área ambiental, prevención de sancudos y control de criaderos en obra y 1 capacitación del área social; fortalecimiento de valores (solidaridad), educación vial y oficina de atención a la comunidad
Para el periodo se desarrollaron 4 capacitaciones. 2 del área SST; prevención del riesgo mecánico y prevención del riesgo locativo, 1 capacitación del área ambiental; manejo de la vegetación, fauna y paisajismo y 1 capacitación del área social; fortalecimiento de valores (integridad), educación vial y oficina de atención a la comunidad, Los soportes de asistencia a las capacitaciones se presentan en los informes mensuales entregados a interventoría
Para el periodo se desarrollaron presentaron 2 capacitaciones. 1 del área SST; ¿Qué es la higiene postural?, 1 capacitación del área ambiental; manejo y entrega adecuada de residuos sólidos por finalización de obra. Los soportes de asistencia a las capacitaciones se presentan en los informes mensuales entregados a interventoría.

4. PLAN DE ACCIÓN				
Actividad	**Plazo ejecución**	**Responsable**	**Proceso**	**Recursos**
n.a	n.a	n.a	n.a	n.a

5. OBSERVACIONES
n.a

ANEXO No.06: ESTADO DEL TIEMPO

ESTADO DEL TIEMPO EN LA JORNADA LABORAL
(CONSORCIO CONSOLIDACIÓN GIRÓN)

CONTRATO: 210.16225.6 **MES:** ABRIL **AÑO:** 2026

OBRA: CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACION PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN EL TALUD ORIENTAL DEL BARRIO VILLA DE LOS CABALLEROS EN EL MUNICIPIO DE GIRÓN, DEPARTAMENTO DE SANTANDER

CONDICIONES CLIMATICAS EN LA JORNADA LABORAL

SOLEADO	1	NUBLADO	2	LLUVIOSO	3	TORMENTA	4

MES: ABRIL

HORAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J
6:00 a 7:00																														
7:00 a 8:00	1					1	1	1	1	1	1		1	1																
8:00 a 9:00	1					1	1	1	1	1	1		1	1																
9:00 a 10:00	1					1	1	1	1	1	1		1	1																
10:00 a 11:00	1					1	1	1	1	1	1		1	1																
11:00 a 12:00	1					1	1	1	1	1	1		1	1																
12:00 a 13:00	1					1	1	1	1	1	1		1	1																
13:00 a 14:00	1					1	1	1	1	1	1		1	1																
14:00 a 15:00	1					1	1	1	1	1	1		1	1																
15:00 a 16:00	1					1	1	1	1	1	1		1	1																
16:00 a 17:00	1					1	1	1	1	1	1		1	1																
17:00 a 18:00																														
HORAS NO LABORADAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RESUMEN	
SECO	100,00%
NUBOSIDAD	0,00%
LLUVIA MODERADA	0,00%
LLUVIA INTENSA	0,00%



TOTAL HORAS LABORABLES DEL MES	
TOTAL HORAS NO LABORADAS POR LLUVIA	0
PORCENTAJE NO LABORADO POR LLUVIA	0,00%

ANEXO No.07 ACTAS DE REUNIÓN

	CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA – C.D.M.B.		
	ELABORÓ: Equipo Proceso Relaciones con Partes Interesadas	REVISÓ: REPRESENTANTE DIRECCIÓN SIGC	APROBÓ: DIRECTOR(A) GENERAL
CODIGO: A-PI-FO05	VERSION: 5	ACTA DE REUNIÓN	

TEMA:	VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES DE OBRA DEL CONTRATO 210.16225.6" GRUPO 4: **CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACION PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN EL TALUD ORIENTAL DEL BARRIO VILLA DE LOS CABALLEROS EN EL MUNICIPIO DE GIRÓN, DEPARTAMENTO DE SANTANDER**"		**ACTA No.**	**FECHA**	
				DD	**MM**	**AA**
			12	10	04	2026
LUGAR:	Frente de Obra – Villa de los Caballeros		**Hora Inicio**	8:00 am		
			Hora final	9:00 am		



AGENDA		
No.	**ORDEN DEL DIA**	**RESPONSABLE**
1	Visita técnica para revisión de avance de actividades contractuales y revisión de terraza formada en la base del talud	Contratista – Interventoría
2	Visita para el recibo definitivo de obra	Contratista – Interventoría -CDMB

No.	**DESARROLLO ORDEN DEL DÍA**
1	En el marco del comité de obra, se dio apertura a la reunión con la participación del equipo profesional del contratista y la Interventoría, con el propósito de definir técnicamente la solución para la terminación de la canaleta en la base del talud. Esta actividad se desarrolló mediante verificación en campo, considerando la proximidad de la fecha de terminación del contrato de obra pública. Durante el recorrido, se evidenció un avance físico satisfactorio, encontrándose las actividades contractuales ejecutadas próxima a su totalidad. Posteriormente, se realizó la inspección en el punto de terminación de la canaleta, localizado al final de la pantalla de estabilización, donde se presenta la integración hidráulica entre la canaleta superior, la canaleta inferior, un disipador de energía y una caja de inspección. Aguas abajo de estas estructuras, se identificó un área con presencia de procesos iniciales de erosión, la cual no cuenta con un sistema integral de estabilización, salvo una intervención puntual ejecutada por el Consorcio como apoyo a la comunidad, consistente en la instalación de geomanto para la protección superficial del terreno. Esta actividad fue socializada y contó con la aprobación de la comunidad y del presidente de la Junta de Acción Comunal. En función de las condiciones observadas en la zona no intervenida y con el fin de garantizar la continuidad hidráulica del sistema de drenaje, se determinó, de manera conjunta con la Interventoría, la necesidad de extender la canaleta contemplada contractualmente, con el objeto de captar las aguas de escorrentía superficial y conducirlas de forma controlada.

	En consecuencia, se definió la continuación de la construcción de veinticuatro (24) metros lineales de canaleta incluidos dentro de las cantidades contractuales, desde el punto de terminación de la pantalla de estabilización hasta la conexión con la red de drenaje ubicada en la calle 2C No. 16F-02. Dado que el terreno presenta una pendiente descendente, condiciones de socavación y la presencia de terrazas conformadas por estoraques, se estableció como solución técnica la conducción de las aguas por medio de una canaleta perimetral hasta una caja existente en la zona, la cual había sido construida de manera provisional por la comunidad. Dicha estructura será objeto de adecuación mediante la conformación en concreto con resistencia de 3000 psi, con el fin de garantizar su funcionalidad hidráulica y durabilidad. A partir de esta caja, se proyecta la descarga de las aguas mediante la instalación de tubería tipo Novafort de 8 pulgadas de diámetro, la cual permitirá redirigir el flujo hacia la zona peatonal de la calle 2C. Finalmente, la descarga se realizará con un ángulo aproximado de 45°, conectando con una canaleta existente de mayor capacidad hidráulica, la cual presenta condiciones adecuadas para el manejo de caudales, incluso bajo eventos de precipitación de alta intensidad, garantizando así una evacuación segura y controlada de las aguas.
2	En el marco del comité, el Contratista y la Interventoría adquieren el compromiso de culminar la totalidad de las actividades contractuales, tanto en su componente físico como administrativo, dentro del plazo establecido en el contrato de obra. En este sentido, se establece como prioridad la finalización de las actividades pendientes, correspondientes al sistema de tensionamiento, la ejecución de la canaleta y la siembra de especies arbóreas asociadas a las medidas de compensación ambiental. Se deja constancia de que la ejecución de las actividades contractuales será debidamente soportada mediante informes técnicos y sus respectivos anexos de calidad, garantizando que estas se desarrollen en conformidad con lo establecido en el contrato, bajo el cumplimiento de los lineamientos técnicos, administrativos y ambientales definidos. Así mismo, se precisa que las actividades han sido ejecutadas bajo la supervisión, seguimiento y control permanente por parte de la Interventoría, verificando el cumplimiento de las especificaciones técnicas, el adecuado uso de materiales, el avance físico conforme a la programación y la implementación de las medidas de seguridad y normatividad ambiental vigente. Finalmente, se establece como compromiso la realización de la entrega formal de la obra y la suscripción del Acta de Recibo Definitivo para el día martes 14 de abril de 2026, sujeto a la verificación final del cumplimiento integral de las obligaciones contractuales

No.	TAREAS	RESPONSABLE	FECHA
1	Recorrido de obras y entrega física del contrato de obra pública.	Interventoría-Contratista-CDMB	14/04/2026






PRÓXIMA REUNIÓN					
FECHA:	14/04/2026	**HORA:**	1:00 pm	**LUGAR:**	Frente de Obra: Villa de los Caballeros

Elaboró Acta	Cargo	Firma
Oscar Andrés Sánchez Jerez	Residente de Obra	
Revisó Acta	**Cargo**	**Firma**
Julián Fernando Villamizar Durán	Residente de Interventoría	

1

TEMA:	VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES DE OBRA PARA DEFINIR FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO 210.16225.6" **CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACION PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN EL TALUD ORIENTAL DEL BARRIO VILLA DE LOS CABALLEROS EN EL MUNICIPIO DE GIRÓN, DEPARTAMENTO DE SANTANDER"**	**ACTA No.**	**FECHA**		
		12	**DD**	**MM**	**AA**
LUGAR:	Frente de Obra – Villa de los Caballeros		10	04	26

LISTADO DE ASISTENTES REUNIONES INTERNAS

No.	NOMBRE	GÉNERO		CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA
		M	F			
1	Oscar Andrés Sánchez Jerez	x		Residente de Contratista	Contratista	
2	Julián Fernando Villamizar Durán	x		Residente de Interventoría	Interventoría	
3	Clara Melissa Donado Arias		x	Profesional Siso	Contratista	
4	Edith Costanza Toloza Rojas		x	Especialista Ambiental	Interventoría	
5	Sandra Yolima Bermúdez Cala		X	Profesional Ambiental	Contratista	
7	Paula Emilia Fajardo Silgado		x	Profesional Siso	Interventoría	
8	Gilberto Gómez O.		X	Profesional Especializado CDMB- Apoyo supervisión	CDMB	

	CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA – C.D.M.B.		
	ELABORÓ: Equipo Proceso Relaciones con Partes Interesadas	REVISÓ: REPRESENTANTE DIRECCIÓN SIGC	APROBÓ: DIRECTOR(A) GENERAL
CODIGO: A-PI-FO05	VERSION: 5	ACTA DE REUNIÓN	

TEMA:	RECORRIDO DE OBRA PARA REVISIÓN ENTREGA DEL CONTRATO 210.16225.6" **GRUPO 4: CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACION PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN EL TALUD ORIENTAL DEL BARRIO VILLA DE LOS CABALLEROS EN EL MUNICIPIO DE GIRÓN, DEPARTAMENTO DE SANTANDER**"		**ACTA No.**	**FECHA**	
				DD	**MM**	**AA**
			13	14	04	2026
LUGAR:	Frente de Obra – Villa de los Caballeros		**Hora Inicio**	1:00 pm		
			Hora final	2:00 pm		

AGENDA		
No.	**ORDEN DEL DÍA**	**RESPONSABLE**
1	Recorrido de obra para revisión de la entrega del proyecto	Contratista – Interventoría - CDMB

No.	**DESARROLLO ORDEN DEL DÍA**
1	Siendo la 1:00 p. m. del día 14 de abril de 2025, se dio inicio al comité de obra con la participación del equipo técnico de la interventoría, el personal profesional del contratista Consorcio Consolidación Girón y los representantes de la entidad contratante, CDMB, cuyo objeto fue llevar a cabo la inspección y verificación visual del estado final de las obras en el frente de trabajo villa de los caballeros. Durante la jornada se realizó un recorrido técnico detallado, evaluando las condiciones constructivas, el cumplimiento de las especificaciones técnicas, la calidad de los acabados, la correcta ejecución de las actividades programadas y la funcionalidad de las obras ejecutadas. Asimismo, se verificó la concordancia entre lo ejecutado en campo y lo establecido en los diseños, planos aprobados y documentos contractuales, identificando observaciones puntuales y definiendo las acciones requeridas para su respectivo mantenimiento. Lo anterior, con el fin de constatar la terminación integral del proyecto, garantizar el cabal cumplimiento del objeto contractual y validar la conformidad frente a la programación establecida para la entrega final del proyecto. La presente acta hace parte del registro técnico y contractual del proyecto, y la información consignada servirá como soporte para las evaluaciones y decisiones administrativas que correspondan en el marco del contrato de obra pública No. 210-16225-6. Como constancia de la visita, se anexa el registro fotográfico correspondiente.







No.	TAREAS	RESPONSABLE	FECHA
1	El contratista y la interventoría se comprometen a gestionar, consolidar y presentar la totalidad de la documentación requerida para la liquidación del contrato dentro de un plazo no mayor a dos meses (02) meses contados a partir de la fecha del presente comité, garantizando el cumplimiento de los requisitos técnicos, administrativos, financieros y legales establecidos para tal fin.	Contratista- Interventoría	14/04/2026

Elaboró Acta	Cargo	Firma
Oscar Andrés Sánchez Jerez	Residente de Obra	
Revisó Acta	**Cargo**	**Firma**
Julián Fernando Villamizar Durán	Residente de Interventoría	

1

TEMA:	RECORRIDO DE OBRA PARA REVISÓN ENTREGA DEL CONTRATO 210.16225.6" **GRUPO 4: CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACION PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN EL TALUD ORIENTAL DEL BARRIO VILLA DE LOS CABALLEROS EN EL MUNICIPIO DE GIRÓN, DEPARTAMENTO DE SANTANDER**", MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER (RA-OBRA-02)**".**	**ACTA No.**	**FECHA**		
			DD	**MM**	**AA**
LUGAR:	Frente de Obra – Villa de los Caballeros	13	14	04	26

LISTADO DE ASISTENTES REUNIONES INTERNAS

No.	NOMBRE	GÉNERO		CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA
		M	F			
1	Oscar Andrés Sánchez Jerez	x		Residente de Contratista	Contratista	
2	Julián Fernando Villamizar Durán	x		Residente de Interventoría	Interventoría	
3	Clara Melissa Donado Arias		x	Profesional Siso	Contratista	Melissa Donado Arias
4	Edith Costanza Toloza Rojas		x	Especialista Ambiental	Interventoría	
5	Sandra Yolima Bermúdez Cala		x	Profesional Ambiental	Contratista	
7	Paula Emilia Fajardo Silgado		x	Profesional Siso	Interventoría	
8	Gilberto Gómez O.		x	Profesional Especializado CDMB- Apoyo supervisión	CDMB	
9	Hector Amado H		X	Profesional Especializado CDMB- Apoyo supervisión	CDMB	

ANEXO NO.08 INFORME DE AVANCE DE GERENCIA

CONTRATO No. 210.16225.6 del 5 de septiembre del 2025



GRUPO 4: CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACION PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN EL TALUD ORIENTAL DEL BARRIO VILLA DE LOS CABALLEROS EN EL MUNICIPIO DE GIRÓN, DEPARTAMENTO DE SANTANDER.

INFORME MENSUAL DE GERENCIA DEL PROYECTO No.07

PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE MARZO DEL 2026

Fecha	Elaboró	Aprobó
14/04/2026	Ing. Juan Carlos Rincon Lozano	Ing. Johanna Marcela Padierna Castiblanco

1. Contenido

1. INTRODUCCIÓN 4
2. OBJETIVO GENERAL 4
2.1 Objetivos Específicos 4
3. GESTIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO 4
3.1 Alcance Ejecutado Acta Corte 4
3.2 Revisión de Estabilidad De Alcance 6
3.2.1 Alcance del Objeto 6
3.2.2 Alcance del Proyecto 6
3.2.3 Alcance del Producto 6
4. COMPROMISOS ADQUIRIDOS 6
4.1 Gestión del Tiempo Del Proyecto 7
4.1.1 Plan de Gestión del Tiempo 7
I. Personas autorizadas a solicitar cambios en el Cronograma 7
II. Personas que aprueban requerimiento de cambio de cronograma 7
III. Proceso de control del Schedule (Cronograma) 7
IV. Procedimiento de Cambios en Cronograma 8
4.2 Línea Base Control del Tiempo 9
4.2.1 Hitos 9
4.2.1.1 Hitos del Proyecto 9
4.2.2 Cronograma Seguimiento a Fecha de Corte 13
5. CAUSAS DE ATRASO / ADELANTO 14
5.1 Medición Línea Base 14
5.2 Proyecciones sobre indicadores obtenidos 15
6. COMPROMISOS ADQUIRIDOS 16

7. GESTIÓN DE COSTOS DEL PROYECTO 16
7.1 Fórmulas de Pronóstico de Valor Ganado 16
7.2 Procesos de Gestión de Costos 17
7.3 Sistema Gestión de costo 17
7.4 Sistema de Control de Costos 17
8. Proyecciones sobre indicadores obtenidos 18
8.1 Sistema de Control de Cambios de Costos 19
9. LÍNEA BASE PRESUPUESTO 19
9.1 Presupuesto Inicial del Proyecto 19
9.2 Seguimiento a Programa de Inversiones Planeado /Actas Cobro 22
10. REVISIÓN DE ESTABILIDAD VALOR 23
11. Compromisos Adquiridos 23

1. INTRODUCCIÓN

Se ha comprobado que la aplicación de los procesos de dirección de proyectos de la Guía del PMBOK® Séptima Edición 2021 (Project Management Institute PMI) aumentan la probabilidad de éxito de los proyectos por esta razón, se hace indispensable que la empresa quiera adoptar y aplicar los conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades de los proyectos para el cumplimiento efectivo de los objetivos del mismo.

El Presente documento contiene el **informe de seguimiento N°7** al programa de gerencia de proyectos implementado y actualizado dentro del proyecto, y recopila desde cada una de las áreas de conocimientos, métricas, indicadores, desviaciones y trazabilidad del proyecto que describe cómo ha trascurrido su ejecución desde los lineamientos del Estándar de la guía del PMBOK® Séptima Edición 2017.

2. OBJETIVO GENERAL

El objetivo general de este seguimiento es gerencialmente y alineados con las buenas prácticas del PMI, revisar y realizar seguimiento al estado del programa de gerencia de proyectos implementados dentro del proyecto "**CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARMANGA- GRUPO 4: CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACION PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN EL TALUD ORIENTAL DEL BARRIO VILLA DE LOS CABALLEROS EN EL MUNICIPIO DE GIRÓN, DEPARTAMENTO DE SANTANDER**", recopilar los datos concernientes a la ejecución, procesarlos y establecer indicadores y estado en general tanto del proyecto como del programa de gerencia implementado.

2.1 Objetivos Específicos


Realizar seguimiento específico a cada una de las áreas del conocimiento contenidas en el programa para la gerencia de proyectos diseñado y actualizado para el proyecto en específico, actualización y control a indicadores provenientes de datos procesados del proyecto, y su respectiva comparación con los planes vigentes y las líneas bases correspondientes.

3. GESTIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO

3.1 Alcance Ejecutado Acta Corte

Avance en Ejecución Final: Facturado a la fecha 99,91% - $ 4.155.666.199,5

ALCANCE EJECUTADO FINAL:

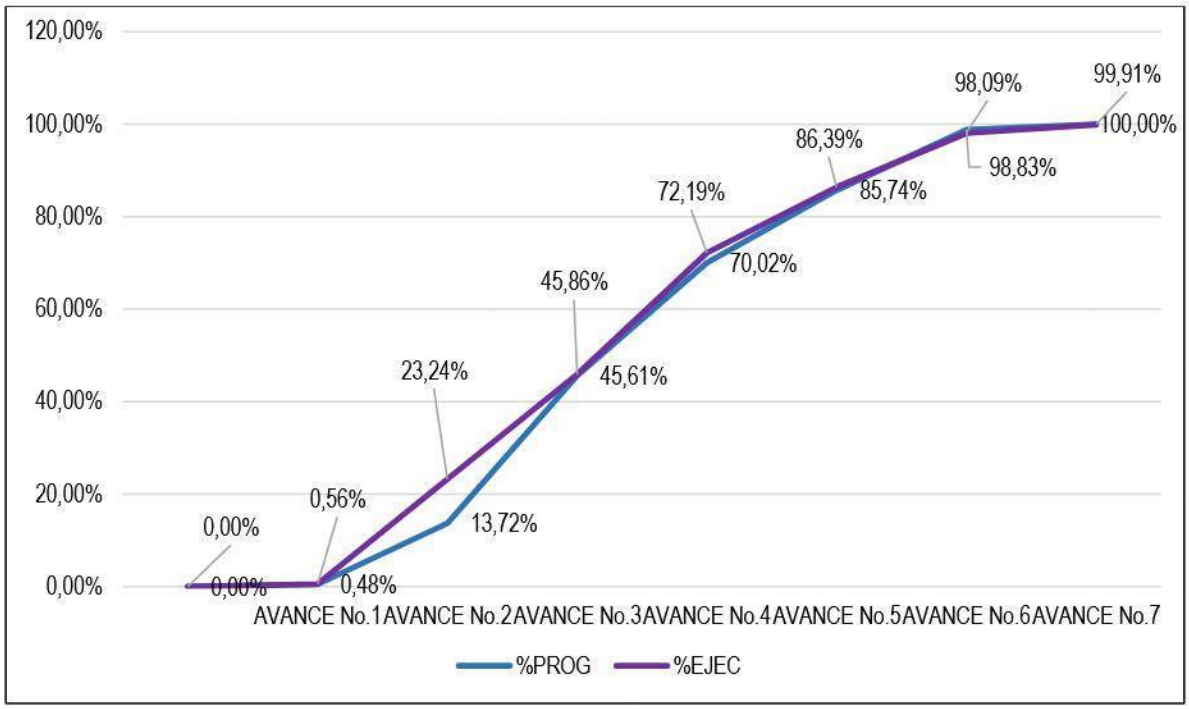

CURVA S PROGRAMADA



OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL
$ 20.105.033,46	$ 570.673.058,35	$ 1.897.182.775,53	$ 2.912.174.065,96	$ 3.566.051.716,69	$ 4.110.490.936,14	$ 4.159.344.710,65

3.2 Revisión de Estabilidad De Alcance

3.2.1 Alcance del Objeto

El alcance ejecutado se alinea en ejecución y objetivo de cumplir con el objeto del contrato, no se han surtido nuevos cambios contractuales que afecten o pongan en riesgo la obtención del fin último para el cual se ejecuta el contrato, ni para el contratante ni para el contratista, se han visto impactado en modificaciones de tipo técnico, de tiempo y de costo, pero estas no varían ni presentan desviación en el alcance del objeto contractual. Como Se puede observar en el presente avance final de informe de gerencia se ejecuto correctamente.

3.2.2 Alcance del Proyecto

El proyecto "**CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACION PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN EL TALUD ORIENTAL DEL BARRIO VILLA DE LOS CABALLEROS EN EL MUNICIPIO DE GIRÓN, DEPARTAMENTO DE SANTANDER**" no ha tenido adición en tiempo y presupuesto, se mantiene el alcance de rehabilitación, con lo cual la solución para dicha rehabilitación continúa siendo la misma.

3.2.3 Alcance del Producto

El producto final contenido en los paquetes de trabajo de la WBS del proyecto "**CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACION PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN EL TALUD ORIENTAL DEL BARRIO VILLA DE LOS CABALLEROS EN EL MUNICIPIO DE GIRÓN, DEPARTAMENTO DE SANTANDER**" no han tenido la inclusión de nuevos ítems no previstos.

4. COMPROMISOS ADQUIRIDOS

Reporte semanal de avance físico y presupuestal, en el que se consoliden las cantidades ejecutadas durante la semana, el acumulado a la fecha y su correspondiente ejecución financiera con el fin de efectuar el seguimiento y control del desempeño del proyecto, de igual manera se presente reporte mensual de avance con su respetiva cantidad ejecutada evidenciadas con registro fotográfico. Se realiza reuniones en obra para observar el avance ejecutado que ha tenido el proyecto y se deja plasmado en actas de visita. Correspondiente al periodo de ejecución del presente informe se realiza el avance de los catorce 14 días restantes contractuales para cumplir satisfactoriamente el objeto del presente contrato

4.1 Gestión del Tiempo Del Proyecto

4.1.1 Plan de Gestión del Tiempo

I. Personas autorizadas a solicitar cambios en el Cronograma

Nombre	Cargo	Ubicación
Johanna Marcela Padierna Castiblanco	Representante Legal	Oficina Contratista
Juan Carlos Rincon Lozano	Gerente de Proyecto	Oficina Contratista
Carlos Alberto Diaz Barrera	Subdirector SURYT-Supervisión- Entidad Contratante	CDMB
José Eliecer Álvarez Carreño	Director Interventoría	Oficina Interventoría Proyecto
Iban Gustabo Blanco Gonzales	RL Interventoría	Oficina Interventoría Proyecto

II. Personas que aprueban requerimiento de cambio de cronograma

En Escala de Aprobación.

Cargo	Integrante
Director de Proyecto	Contratista
Director Interventoría	Interventoría
Supervisor Proyecto	Contratante

III. Proceso de control del Schedule (Cronograma)

Dando continuidad al desarrollo del presente proyecto se continúa implementando un esquema estructurado de monitoreo y control del cronograma, que contempla un seguimiento quincenal conjunto con la Interventoría, orientado a la verificación del avance físico de las actividades y al análisis preliminar de su comportamiento frente a la programación vigente, en compañía de personal profesional de la interventoría, contratista y la CDMB.

De manera complementaria, se realizará un control mensual (quincenal 15 días) mediante el corte formal de cantidades y del presupuesto, consolidando la ejecución física y financiera del periodo. Este proceso dará lugar a la elaboración del informe mensual correspondiente a los 15 días de avance de obra, dirigido a la Interventoría y a la entidad contratante, el cual incluirá el seguimiento al control de costos, así como el análisis comparativo entre lo programado y lo efectivamente ejecutado, con el fin de identificar desviaciones y definir oportunamente las acciones de ajuste requeridas.

Razones aceptables para cambios en cronograma del Proyecto	
Solicitud de cambio de alcance por parte del Cliente	Accidentes de trabajo.
Desastres naturales.	Cambio de sub-contratistas por fuerza mayor.
Huelgas y problemas de orden público	Incumplimiento del proveedor en la entrega de materiales.
Atrasos ocasionados por los sub-contratistas.	Mal establecimiento de la secuencia de actividades.

Cómo los cambios al Cronograma serán Administrados	
Designación de Responsabilidades	
Planificación	Ing Residente del proyecto / VoBo Gerente Proyecto
Ejecución	Ing Residente del Proyecto / VoBo Director Proyecto
Seguimiento y Control	Planeador / Director Proyecto

IV. Procedimiento de Cambios en Cronograma

Provenientes de Subcontratistas o resultantes de atraso de proveedores

- Cada semana se recibirán las solicitudes de cambio en el cronograma, las cuales deben ser presentadas por el representante del subcontratista
- Estas solicitudes serán revisadas por el equipo de proyecto para evaluar, en primera instancia, si es un cambio “viable” según el plan de gestión del alcance (No debe pasar del 5% del cronograma del proyecto).
- Las solicitudes de cambio de cronograma comenzarán a revisarse los días sábados de cada semana, teniendo un plazo máximo de 5 días para dar respuesta a la solicitud. La solicitud de cambio será aprobada con la firma del Director de Proyecto.

Cuando las solicitudes son realizadas por las personas autorizadas del equipo del proyecto, se procederá de la siguiente manera

- La Oficina de Proyectos luego de evaluar la causa de demora en el cronograma debido a un inconveniente, informará el Director del Proyecto la necesidad de realizar un cambio en el cronograma.
- El Gerente del Proyecto, junto con el equipo de proyecto, evaluará la situación para determinar la criticidad del cambio. Dependiendo de la misma se procederá de la siguiente manera:
- Si la solicitud de cambio del cronograma afecta el alcance del proyecto o sobrepasa los límites de atraso en el cronograma establecidos entonces se deberá presentar una solicitud a interventoría en donde se informe de manera clara y detallada de la situación.
- La Interventoría, dentro de sus procedimientos, deberá tener un tiempo fijo estipulado para la aprobación de la solicitud de cambio en el cronograma y

posteriormente presentar la solicitud a la Subdirección de Gestión del Riesgo y Seguridad Territorial -SURYT (CDMB Entidad contratante)

- La Supervisión, dentro de sus procedimientos, también deberá contar con un tiempo estipulado pronunciarse acerca de los cambios de cronograma y adiciones en tiempo de ser necesarias, todo el procedimiento anterior será objeto de informe que soporta la solicitud de extensión de tiempo.

4.2 Línea Base Control del Tiempo

A continuación, se presentan las fechas de control, junto con los hitos a revisar en ejecución y las mediciones esperadas realizadas en las fechas hitos de medición a la programación y los respectivos porcentajes % de avance (en tiempo) Sobre las actividades programadas para cada fecha de control. Se puede observar que se ejecuto en su totalidad las actividades de obra contractuales en el tiempo establecido inicialmente, sin solicitar prorrogas adicionales o cualquier otra echo administrativo que modificara el contrato.

4.2.1 Hitos

4.2.1.1 Hitos del Proyecto

Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN EL TALUD ORIENTAL DEL BARRIO VILLA DE LOS CABALLEROS EN EL MUNICIPIO DE GIRÓN, DEPARTAMENTO DE SANTANDER (RA-OBRA-02)."	135 días	mié 15/10/25	mié 15/04/26
Inicio de obra	0 días	mié 15/10/25	mié 15/10/25
SECCIÓN PRIMERA	**134 días**	**mié 15/10/25**	**mar 14/04/26**
Replanteo, control y medición de obra	134 días	mié 15/10/25	mar 14/04/26
Vallas y señales especiales	0 días		
Valla tipo 1A (5,00m x 2,8m)	5 días	mié 15/10/25	mar 21/10/25
Desmonte y limpieza	20 días	vie 17/10/25	mié 12/11/25
Retiro de basuras y escombros	20 días	vie 17/10/25	mié 12/11/25
perfilado a mano descolgado de talud en roca	25 días	jue 13/11/25	mié 17/12/25


SECCIÓN SEGUNDA	69 días	jue 13/11/25	sáb 14/02/26
Excavación con acarreo libre en material granular	30 días	jue 13/11/25	mar 23/12/25
Excavación por acarreo libre en roca a cualquier profundidad	32 días	jue 13/11/25	vie 26/12/25
Excavación a mano con acarreo libre descolgado para zapata	28 días	vie 9/01/26	sáb 14/02/26
Sobreacarreos para acarreos totales mayores de 1.000,00 m	36 días	jue 13/11/25	vie 2/01/26
SECCION TERCERA	**83 días**	**lun 24/11/25**	**vie 13/03/26**
Suministro y colocación de concreto de 3000 psi con mezcla humeda para zapatas	10 días	lun 2/03/26	vie 13/03/26
Suministro y colocación de concreto lanzado con mezcla húmeda de espesor 10 cm	10 días	lun 2/03/26	vie 13/03/26
Llenado de inyeccion con lechada cementicia para anclajes	40 días	lun 24/11/25	sáb 17/01/26
SECCIÓN CUARTA	**107 días**	**jue 20/11/25**	**mar 14/04/26**
Suministro y colocación acero de refuerzo fy 4200 kg / cm2	28 días	mar 27/01/26	mar 3/03/26
Suministro e instalación de 3 cables Ø=1/2" de L=25m	65 días	jue 20/11/25	lun 16/02/26
Tensionamiento de anclajes	14 días	mié 25/03/26	mar 14/04/26
Malla electrosoldada 4mm y abertura de 0,15m x 0,15m	12 días	sáb 21/02/26	lun 9/03/26
Suministro e instalación de platina de 200mm x 200mm x 12mm con tres agujeros	14 días	mié 25/03/26	mar 14/04/26
Suministro e instalación de popora de 3 agujeros conicos para cuña de Ø=1/2"	14 días	mié 25/03/26	mar 14/04/26
Suministro e instalación de kit de cuñas de Ø=1/2" para anclaje	14 días	mié 25/03/26	mar 14/04/26

SECCIÓN QUINTA	65 días	jue 20/11/25	lun 16/02/26
Ejecución perforaciones horizontales en taludes con pendientes mayores a 1:1 (en roca) con equipo de perforación descolgado para anclajes de 0,00m a 15,00m	65 días	jue 20/11/25	lun 16/02/26
Ejecución de perforaciones horizontales en taludes con pendientes mayores a 1:1 (en roca) con equipo de perforación descolgado para anclajes mayores a 15,00m	65 días	jue 20/11/25	lun 16/02/26
SECCIÓN SEXTA	**24 días**	**jue 19/02/26**	**vie 20/03/26**
Canaleta (ancho = 1m; e =10cm)	15 días	mar 24/02/26	sáb 14/03/26
Estructura de disipación de energía	15 días	mar 3/03/26	vie 20/03/26
Sistema de abatimiento para líneas hidráulicas de infiltración interna y protección del trasdós de la estructura estabilizadora	8 días	jue 19/02/26	sáb 28/02/26

CONSORCIO CONSOLIDACIÓN GIRÓN

SEGUIMIENTO PROGRAMA DE GERENCIA N°07

01 de abril al 14 de abril de 2026

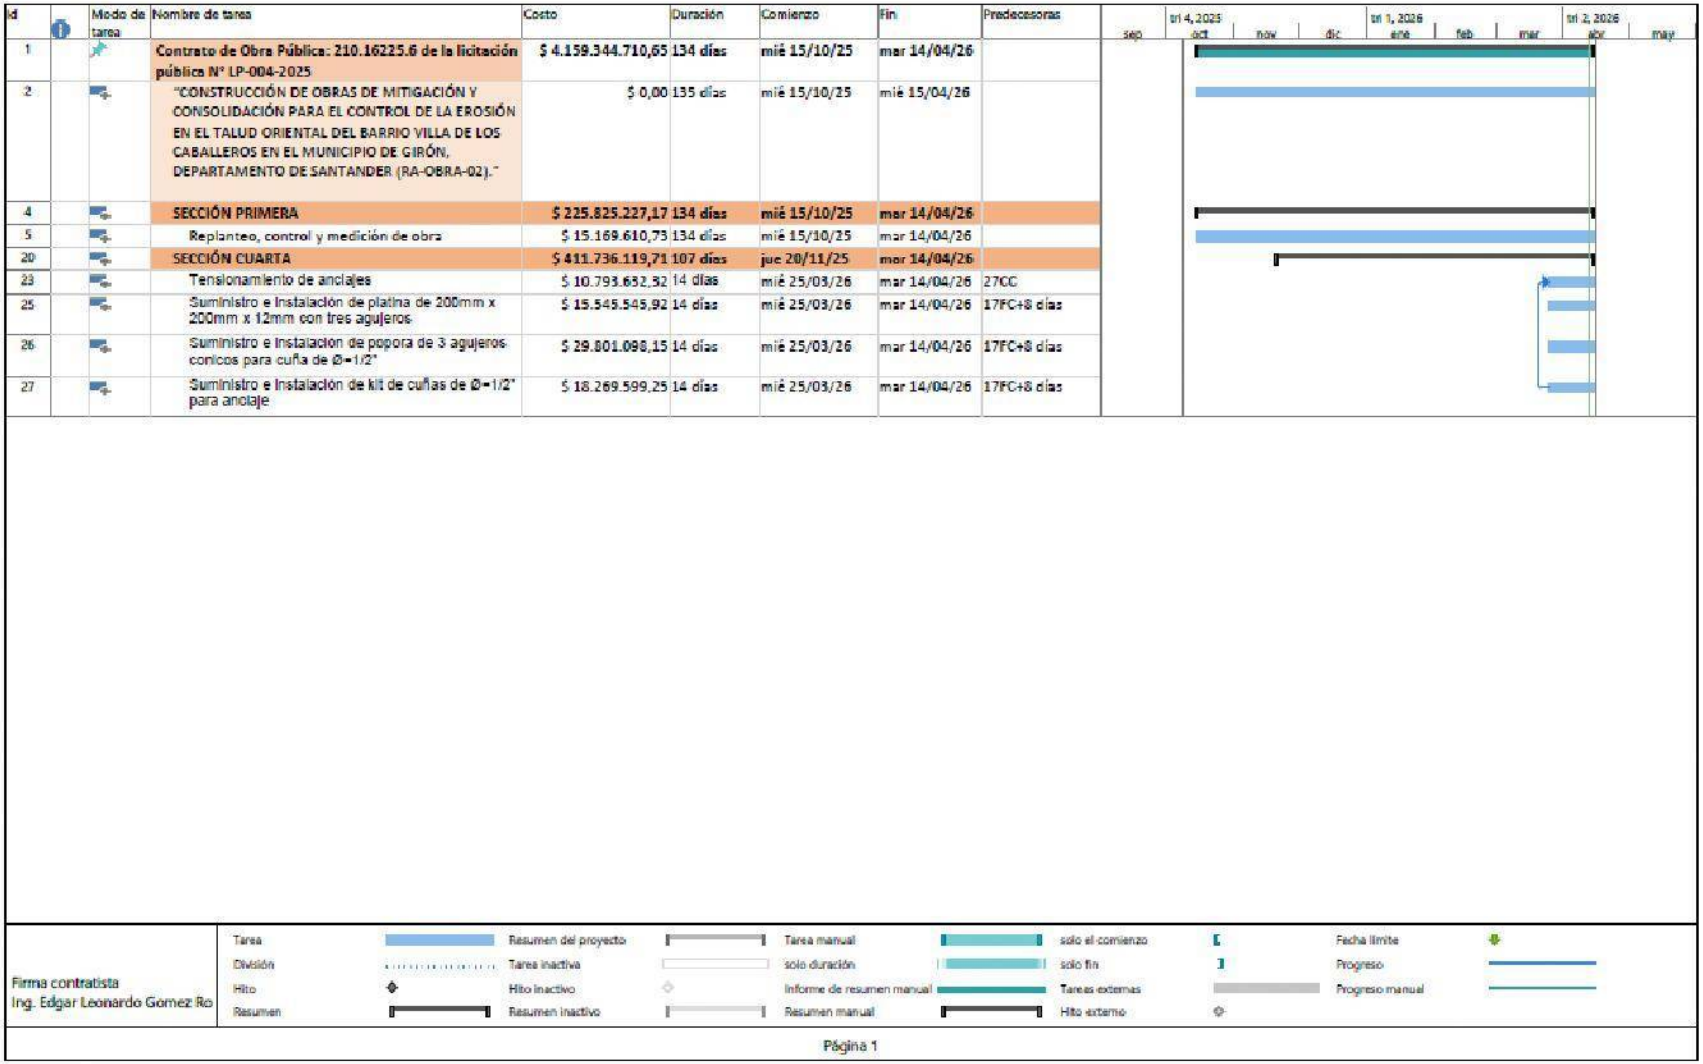


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1		**Contrato de Obra Pública: 210.16225.6 de la licitación pública N° LP-004-2025**	**$ 4.159.344.710,65**	**134 días**	**mié 15/10/25**	**mar 14/04/26**	
2		"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN EL TALUD ORIENTAL DEL BARRIO VILLA DE LOS CABALLEROS EN EL MUNICIPIO DE GIRÓN, DEPARTAMENTO DE SANTANDER (RA-OBRA-02)."	$ 0,00	135 días	mié 15/10/25	mié 15/04/26	
4		**SECCIÓN PRIMERA**	**$ 225.825.227,17**	**134 días**	**mié 15/10/25**	**mar 14/04/26**	
5		Replanteo, control y medición de obra	$ 15.169.610,73	134 días	mié 15/10/25	mar 14/04/26	
20		**SECCIÓN CUARTA**	**$ 411.736.119,71**	**107 días**	**jue 20/11/25**	**mar 14/04/26**	
23		Tensionamiento de anclajes	$ 10.793.632,32	14 días	mié 25/03/26	mar 14/04/26	27CC
25		Suministro e instalación de platina de 200mm x 200mm x 12mm con tres agujeros	$ 15.545.545,92	14 días	mié 25/03/26	mar 14/04/26	17FC+8 días
26		Suministro e instalacion de popora de 3 agujeros conicos para cuña de Ø=1/2"	$ 29.801.098,15	14 días	mié 25/03/26	mar 14/04/26	17FC+8 días
27		Suministro e instalación de kit de cuñas de Ø=1/2" para anclaje	$ 18.269.599,25	14 días	mié 25/03/26	mar 14/04/26	17FC+8 días

Firma contratista
Ing. Edgar Leonardo Gomez Ro

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual

Página 1


4.2.2 Cronograma Seguimiento a Fecha de Corte

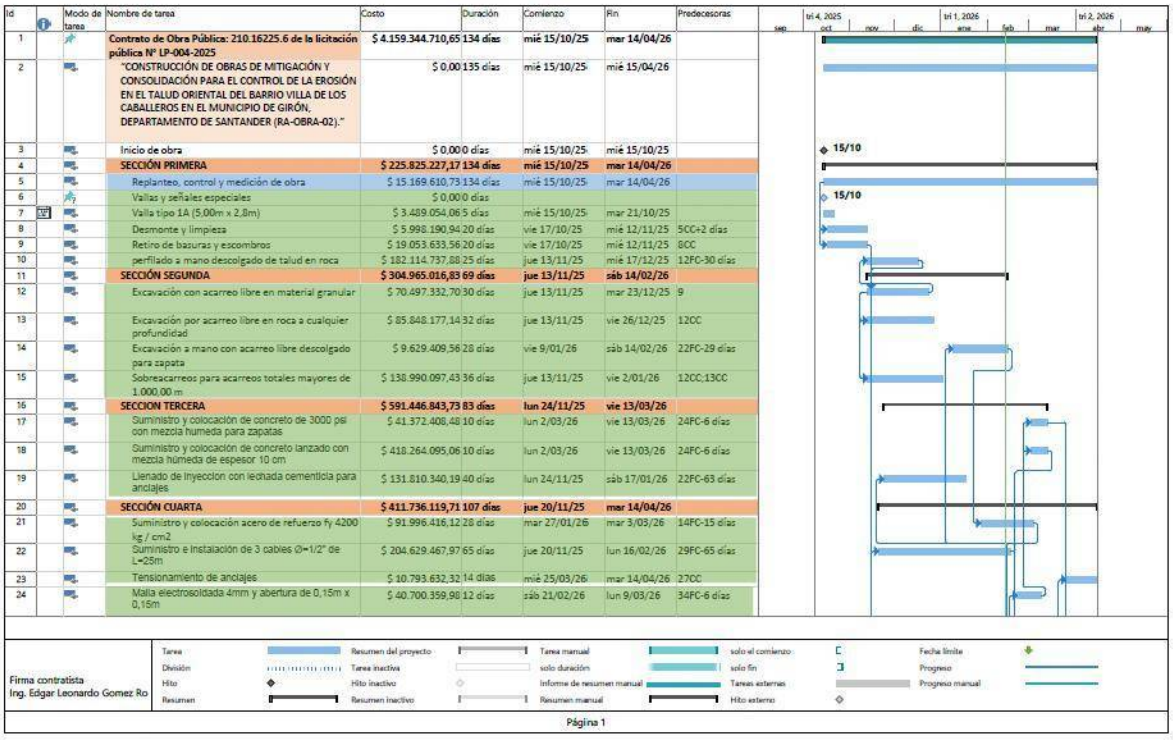

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1		**Contrato de Obra Pública: 210.16225.6 de la licitación pública N° LP-004-2025**	$ 4.159.344.710,65	134 días	mié 15/10/25	mar 14/04/26	
2		"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN EL TALUD ORIENTAL DEL BARRIO VILLA DE LOS CABALLEROS EN EL MUNICIPIO DE GIRÓN, DEPARTAMENTO DE SANTANDER (RA-OBRA-02)."	$ 0,00	135 días	mié 15/10/25	mié 15/04/26	
3		Inicio de obra	$ 0,00	0 días	mié 15/10/25	mié 15/10/25	
4		**SECCIÓN PRIMERA**	**$ 225.825.227,17**	**134 días**	**mié 15/10/25**	**mar 14/04/26**	
5		Replanteo, control y medición de obra	$ 15.169.610,73	134 días	mié 15/10/25	mar 14/04/26	
6		Vallas y señales especiales	$ 0,00	0 días			
7		Valla tipo 1A (5,00m x 2,8m)	$ 3.489.054,06	5 días	mié 15/10/25	mar 21/10/25	
8		Desmonte y limpieza	$ 5.998.190,94	20 días	vie 17/10/25	mié 12/11/25	5CC+2 días
9		Retiro de basuras y escombros	$ 19.053.633,56	20 días	vie 17/10/25	mié 12/11/25	8CC
10		perfilado a mano descolgado de talud en roca	$ 182.114.737,88	25 días	jue 13/11/25	mié 17/12/25	12FC-30 días
11		**SECCIÓN SEGUNDA**	**$ 304.965.016,83**	**69 días**	**jue 13/11/25**	**sáb 14/02/26**	
12		Excavación con acarreo libre en material granular	$ 70.497.332,70	30 días	jue 13/11/25	mar 23/12/25	9
13		Excavación por acarreo libre en roca a cualquier profundidad	$ 85.848.177,14	32 días	jue 13/11/25	vie 26/12/25	12CC
14		Excavación a mano con acarreo libre descolgado para zapata	$ 9.629.409,56	28 días	vie 9/01/26	sáb 14/02/26	22FC-29 días
15		Sobreacarreos para acarreos totales mayores de 1.000,00 m	$ 138.990.097,43	36 días	jue 13/11/25	vie 2/01/26	12CC;13CC
16		**SECCION TERCERA**	**$ 591.446.843,73**	**83 días**	**lun 24/11/25**	**vie 13/03/26**	
17		Suministro y colocación de concreto de 3000 psi con mezcla humeda para zapatas	$ 41.372.408,48	10 días	lun 2/03/26	vie 13/03/26	24FC-6 días
18		Suministro y colocación de concreto lanzado con mezcla húmeda de espesor 10 cm	$ 418.264.095,06	10 días	lun 2/03/26	vie 13/03/26	24FC-6 días
19		Llenado de inyeccion con lechada cementicia para anclajes	$ 131.810.340,19	40 días	lun 24/11/25	sáb 17/01/26	22FC-63 días
20		**SECCIÓN CUARTA**	**$ 411.736.119,71**	**107 días**	**jue 20/11/25**	**mar 14/04/26**	
21		Suministro y colocación acero de refuerzo fy 4200 kg / cm2	$ 91.996.416,12	28 días	mar 27/01/26	mar 3/03/26	14FC-15 días
22		Suministro e instalación de 3 cables Ø=1/2" de L=25m	$ 204.629.467,97	65 días	jue 20/11/25	lun 16/02/26	29FC-65 días
23		Tensionamiento de anclajes	$ 10.793.632,32	14 días	mié 25/03/26	mar 14/04/26	27CC
24		Malla electrosoldada 4mm y abertura de 0,15m x 0,15m	$ 40.700.359,98	12 días	sáb 21/02/26	lun 9/03/26	34FC-6 días

Firma contratista
Ing. Edgar Leonardo Gomez Ro

Página 1

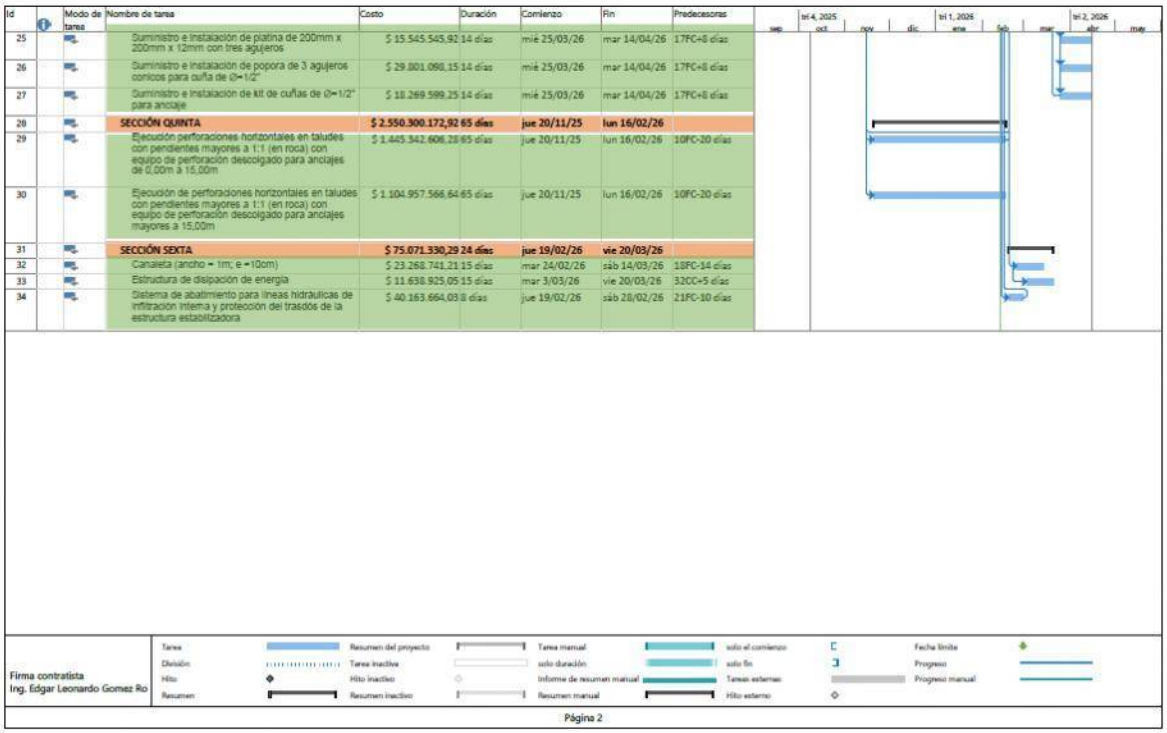

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
25		Suministro e instalación de platina de 200mm x 200mm x 12mm con tres agujeros	$ 15.545.545,92	14 días	mié 25/03/26	mar 14/04/26	17FC+8 días
26		Suministro e instalación de popora de 3 agujeros conicos para cuña de Ø=1/2"	$ 29.801.098,15	14 días	mié 25/03/26	mar 14/04/26	17FC+8 días
27		Suministro e instalación de kit de cuñas de Ø=1/2" para anclaje	$ 18.269.589,25	14 días	mié 25/03/26	mar 14/04/26	17FC+8 días
28		**SECCIÓN QUINTA**	**$ 2.550.300.172,92**	**65 días**	**jue 20/11/25**	**lun 16/02/26**	
29		Ejecución perforaciones horizontales en taludes con pendientes mayores a 1:1 (en roca) con equipo de perforación descolgado para anclajes de 0,00m a 15,00m	$ 1.445.342.606,28	65 días	jue 20/11/25	lun 16/02/26	10FC-20 días
30		Ejecución de perforaciones horizontales en taludes con pendientes mayores a 1:1 (en roca) con equipo de perforación descolgado para anclajes mayores a 15,00m	$ 1.104.957.566,64	65 días	jue 20/11/25	lun 16/02/26	10FC-20 días
31		**SECCIÓN SEXTA**	**$ 75.071.330,29**	**24 días**	**jue 19/02/26**	**vie 20/03/26**	
32		Canaleta (ancho = 1m; e =10cm)	$ 23.268.741,21	15 días	mar 24/02/26	sáb 14/03/26	18FC-14 días
33		Estructura de disipación de energía	$ 11.638.925,05	15 días	mar 3/03/26	vie 20/03/26	32CC+5 días
34		Sistema de abatimiento para líneas hidráulicas de infiltración interna y protección del trasdós de la estructura estabilizadora	$ 40.163.664,03	8 días	jue 19/02/26	sáb 28/02/26	21FC-10 días

Firma contratista
Ing. Edgar Leonardo Gomez Ro

Página 2

Durante el periodo correspondiente al presente informe, las actividades identificadas en la programación con color verde registran un avance del 100 %, en concordancia con el cronograma aprobado. Esto evidencia que las actividades contractuales han alcanzado su etapa de finalización, cumpliendo integralmente con el alcance definido.

En consecuencia, la ejecución del proyecto se llevó a cabo dentro de los plazos establecidos, sin requerir prórrogas, adiciones presupuestales ni modificaciones contractuales. Asimismo, es importante destacar que el desarrollo de las actividades de obra se realizó sin la ocurrencia de imprevistos que afectaran su normal ejecución.

5. CAUSAS DE ATRASO / ADELANTO

Con base en el Acta de Corte final, el proyecto presenta un avance físico ejecutado del 98,09 %, frente a un avance programado acumulado del 98,83 % para la misma fecha de seguimiento. Esta diferencia corresponde a una leve desviación negativa, atribuida a que las actividades contractuales restantes son de alcance reducido, dado que las actividades de mayor peso dentro de la curva de avance ya han sido ejecutadas.

No obstante, dicha desviación se mantiene dentro de los rangos de control establecidos por la Gerencia del Proyecto, sin generar impactos en la secuencia constructiva ni en la adecuada asignación de recursos.

En este contexto, se proyecta la finalización de las actividades contractuales para el 14 de abril, correspondientes principalmente al proceso de tensionamiento, el cual quedó debidamente preparado durante el mes de marzo, garantizando las condiciones técnicas necesarias para su ejecución oportuna y el cumplimiento del objeto contractual.

5.1 Medición Línea Base

Se plantea comparación mensual con el % de avance en tiempo (por actividad) según lo expuesto en las hojas de ruta de medición anteriormente presentadas, la evaluación del SPI, de lo realmente ejecutado Vs lo planeado, este puede ser evaluado tanto actividad por actividad como en las actividades resumen (Capítulos) y el proyecto completo.

Los resultados deben ser interpretados como se presenta a continuación:

SPI - Schedule Performance Index. Es un índice que compara el EV (Valor Ganado), es decir lo avanzado, contra el PV (Valor Planeado) lo que se tenía pensado avanzar a un momento dado.

- Si el SPI es igual a 1, quiere decir que el entregable se está avanzando al ritmo previsto durante el presupuesto.
- Si el SPI es mayor a 1, quiere decir que el entregable se está avanzando a un ritmo mayor al previsto en el presupuesto.
- Si el SPI es menor a 1, quiere decir que se está avanzando a un ritmo peor que el previsto.

Procesos de Gestión de Tiempo	*Valor Actual*
EV- Valor Ganado	$ 4.155.666.199,5
PV - Valor Planeado	$ 4.159.344.710,65

SPI ACTUAL: 1.00– Ritmo igual a 1 el cual se avanzó al ritmo previsto

Con base en los resultados obtenidos a partir de la medición de la línea base, se evidencia un Índice de Desempeño de Cronograma (SPI) igual a 1, lo cual indica que el proyecto se ejecutó conforme al cronograma establecido, cumpliendo con los tiempos previstos dentro del presupuesto aprobado.

En la fase actual, el proyecto presenta un avance físico del 100 %, con la totalidad de las actividades contractuales debidamente ejecutadas. No se registraron desviaciones, inconformidades ni incidencias que afectaran el desarrollo de las obras, garantizando el cumplimiento integral del alcance en los plazos definidos.

5.2 Proyecciones sobre indicadores obtenidos

- Estimado a la Conclusión Basado en Tiempo (Time Estimate at Completion, EAC t). Pronostica la duración del proyecto. Se recomienda obtenerla a partir de un análisis de la red del proyecto, aunque también se podría obtener un estimado aproximado de la duración final usando el SPI, en caso de que la tendencia continúe: EACt = (BAC / SPI) / (BAC / Duración de la PMB) = Duración de la PMB / SPI
- Variación a la Conclusión Basada en Tiempo (Time Variance at completion, VACt). VACt = Duración de la PMB – EACt

Procesos de Gestión de Costos	*Valor Actual*
BAC-Presupuesto a Completamiento	$ 4.159.344.710,65
EV- Valor Ganado	$ 4.155.666.199,5
PV - Valor Planeado	$ 4.159.344.710,65

Tipo de Pronostico	*Fórmula*	*Valor a Corte Seguimiento*
Variación de Costo	CV=EV-AC	0.0
Variación de Tiempo	SV=PV-AC	0.0
Índice Desempeño Costos	CPI=EV/AC	1.0

Índice Desempeño Tiempo	SPI=EV/PV	1.00
Estimado a la Conclusión Basado en Tiempo (Time Estimate at Completion, EAC t).	EACt = (BAC / SPI) / (BAC / Duración de la PMB) = Duración de la PMB / SPI	6 meses
Tiempo Faltante (Time to Complete)	TTC=EACt-Tiempo transcurrido	0 días
Variación a la Conclusión Basada en Tiempo (Time Variance at completion, VACt).	VACt = Duración de la PMB – EACt	0 días

Con base en los resultados obtenidos, se concluye que la obra fue ejecutada en un 100 % dentro del plazo establecido, sin requerir adiciones, prórrogas ni suspensiones contractuales. Este desempeño evidencia una adecuada planificación, programación y control de las actividades, permitiendo el cumplimiento integral del objeto contractual.

En términos de indicadores de gestión, se proyecta un comportamiento favorable, reflejado en la estabilidad del cronograma (SPI ≥ 1) y la eficiencia en la administración de recursos, lo que respalda la sostenibilidad de resultados positivos en proyectos de características similares.

6. COMPROMISOS ADQUIRIDOS

- Una vez terminada satisfactoriamente el objeto contractual en el tiempo establecido no queda ningún compromiso por adquirir.

7. GESTIÓN DE COSTOS DEL PROYECTO

7.1 Fórmulas de Pronóstico de Valor Ganado

Tipo de Pronostico	***Fórmula***	***Modo: Quien/Cómo/Cuando/Donde***
Variación de Costo	CV=EV-AC	Residente/Análisis de Datos/Cada mes/Reunión
Índice Desempeño Costos	CPI=EV/AC	Residente/Análisis de Datos/Cada mes/Reunión
Costo Estimado para Completar	ETC=BAC-EV	Residente/Análisis de Datos/Cada mes/Reunión
Costo Restante Proyectado	EAC=BAC/CPI	Residente/Análisis de Datos/Cada mes/Reunión

Eficiencia en costos necesaria Proyectada	TCPi=(BAC-EV)/(EAC-AC)	Residente/Análisis de Datos/Cada mes/Reunión

7.2 Procesos de Gestión de Costos

Procesos de Gestión de Costos	***Descripción***
AC-Costo Actual	Departamento Contable / Cuentas de Control / Mensual / Formato AC
EV-Valor Ganado	Ejecución (Residente/Director) / Mediciones de Avance o Actas de Corte / Mensual / Formato EV - Presupuesto
Gestión Compras	Departamento de Compras / Cuenta Control Insumos - Equipos / Mensual / Revisión vs presupuesto - cronograma Compras
Gestión Logística	Departamento de Transportes / Cuenta Control Transportes / Mensual / Revisión fletes vs presupuesto
Gestión Recurso Humano	Departamento de Compras / Cuenta Control Insumos - Equipos / Mensual / Revisión vs presupuesto - cronograma Compras

7.3 Sistema Gestión de costo

- Gestión de tiempos en campo / Medición y toma de datos de rendimientos en las actividades claves
- Gestión de tiempos en Oficina / Recopilación y procesamiento de datos recibidos para informes de tiempo
- Gestión de tiempos administrativos / Procesamiento de tiempos de contratación, compras.

7.4 Sistema de Control de Costos

- Gestión de costos en campo / Mediciones de avance o cortes de obra / Control de compras y consumos por actividad
- Gestión de costos en oficina / Alimentación de avance para estimación de EV / Recepción y procesamiento de datos del departamento contable para cálculo de AC / Elaboración de informes con información procesada y estimaciones realizadas con fórmulas de EV
- Gestión de Costos Administrativos / Evaluación de compras, contrataciones, costos administrativos

Procesos de Gestión de Costos	***Valor Actual***
AC- Costo Actual	$ 4.155.666.199,5

EV- Valor Ganado	$ 4.155.666.199,5
PV - Valor Planeado	$ 4.159.344.710,65
Gestión Compras	1.0
Gestión Logística	1.0
Gestión Recurso Humano	1.0

8. Proyecciones sobre indicadores obtenidos

Tipo de Pronostico	*Fórmula*	*Valor a Corte Seguimiento*
Variación de Costo	CV=EV-AC	0.0
Índice Desempeño Costos	CPI=EV/AC	1.0
Costo Estimado para Completar	ETC=BAC-EV	$ 3.678.511,15
Costo Restante Proyectado	EAC=BAC/CPI	$ 4.159.344.710,65
Eficiencia en costos necesaria Proyectada	TCPi=(BAC-EV)/(EAC-AC)	1.0

Lo cual demuestra estabilidad en costo.

El valor correspondiente al Costo Estimado para Completar (ETC) del presente contrato se proyecta a favor de la entidad, como resultado de la no ejecución de determinadas cantidades inicialmente previstas en el presupuesto. Estas actividades excedían el alcance del objeto contractual y, desde el punto de vista técnico, no fueron requeridas para garantizar el cumplimiento de las metas del proyecto.

En este sentido, las obras ejecutadas resultaron suficientes para cumplir integralmente con el objetivo de estabilización del área intervenida, definida por su índice de vulnerabilidad en el frente de obra Villa de los Caballeros. Esta optimización de recursos se refleja en indicadores de gestión favorables, evidenciando eficiencia en la planificación y control de costos (CPI ≥ 1), así como una proyección positiva en términos de ahorro y uso racional del presupuesto asignado, sin afectar la calidad ni el alcance técnico del proyecto.

8.1 Sistema de Control de Cambios de Costos

- Para mantener la integridad de la línea base se debe establecer como requisito la Solicitud formal externa o interna de Cambio, evaluación por el equipo del proyecto, estimación y presupuesto definitivo del mismo para aprobación conjunta con patrocinador y actualización de línea base.

9. LÍNEA BASE PRESUPUESTO

9.1 Presupuesto Inicial del Proyecto

CONDICIONES CONTRACTUALES					
ITEM	**CONCEPTO**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR PARCIAL**
SECCIÓN PRIMERA					
1,01	Replanteo, control y medición de la obra	mes	1,00	$ 11.584.277,00	$11.584.277,00
1,03	Vallas y señales especiales				
1.03.01.A	Valla tipo 1A (5,00m x 2,80 m)	und	1,00	$ 2.664.417,00	$ 2.664.417,00
1,04	Desmonte y limpieza	m2	840,00	$ 5.453,00	$ 4.580.520,00
1,05	Retiro de basuras y escombros	m3	168,00	$ 86.609,00	$14.550.312,00
1,07	Perfilado a mano descolgado de talud (en roca)	m3	539,21	$ 257.918,00	$139.071.964,78
				SUBTOTAL SECCIÓN PRIMERA:	**$172.451.490,78**
SECCIÓN SEGUNDA					
2.01	Excavación a tajo abierto en taludes				
2.01.A	Excavacion con acarreo libre				
2.01.A.02	Excavación con acarreo libre en material granular a cualquier profundidad	m3	1078,41	$ 49.921,00	$53.835.305,61
2.01.A.03	Excavación con acarreo libre en roca a cualquier profundidad	m3	718,94	$ 91.187,00	$65.557.981,78
2.01.A.04	Excavación a mano con acarreo libre	m3	29,00	$ 253.569,00	$7.353.501,00

	descolgado para zapata				
2,03	Sobreacarreos para acarreos totales mayores de 1.000,00 m	m3-km	26614,80	$ 3.988,00	$106.139.822,40
				SUBTOTAL SECCIÓN SEGUNDA:	**$ 232.886.610,79**
SECCIÓN TERCERA					
3,00	Concretos				
3.01	Suministro y colocación de concreto de 3000 psi con mezcla humeda para zapatas	m3	29,00	$ 1.089.450,00	$31.594.050,00
3,03	Suministro y colocación de concreto lanzado con mezcla humeda de espesor de 10cm	m2	840,00	$ 380.247,00	$ 319.407.480,00
3,08	Llenado de inyección con lechada cementicia para anclajes	m3	87,00	$ 1.156.977,00	$ 100.656.999,00
				SUBTOTAL SECCIÓN TERCERA:	**$ 451.658.529,00**
SECCIÓN CUARTA					
4,00	Aceros				
4,01	Suministro y colocación acero de refuerzo fy 4200 kg / cm2	kg	5807,00	$ 12.098,00	$ 70.253.086,00
4,02	Suministro y colocación de anclajes				
4.02.03	Suministro e instalación de 3 cables Ø=1/2" de L=25m	und	144,00	$ 1.085.176,00	$ 156.265.344,00
4,03	Tensionamiento de anclajes	und	144,00	$ 57.240,00	$ 8.242.560,00
4,04	Suministro y colocación				
4,04,01	Malla electrosoldada 4mm y abertura de 0,15m x 0,15m	m2	840,00	$ 37.001,00	$31.080.840,00
4,05	Suministro e instalación de platina de 200mm x	und	144,00	$ 82.440,00	$11.871.360,00

	200mm x 12mm con tres agujeros				
4,06	Suministro e instalación de popora de 3 agujeros cónicos para cuña de Ø=1/2"	und	144,00	$158.039,00	$22.757.616,00
4,07	Suministro e instalación de kit de cuñas de Ø=1/2" para anclaje	und	144,00	$ 96.886,00	$13.951.584,00
				SUBTOTAL SECCIÓN CUARTA:	**$ 314.422.390,00**
SECCIÓN QUINTA					
5,00	Perforaciones horizontales				
5,04	Ejecución perforación horizontal en taludes con pendientes mayores a 1:1 (en roca) con equipo de perforación descolgado para anclajes de 0,00m a 15,00m	m	2160,00	$ 510.989,00	$1.103.736.240,00
5,05	Ejecución de perforaciones horizontales en taludes con pendientes mayores a 1:1 (en roca) con equipo de perforación descolgado para anclajes mayores a 15,00m	m	1440,00	$ 585.973,00	$ 843.801.120,00
				SUBTOTAL SECCIÓN QUINTA:	**$1.947.537.360,00**
SECCIÓN SEXTA					
6,00	Varios				
6,02	Canaleta (ancho = 1m; e=10cm)	m	132,00	$ 134.615,00	$17.769.180,00
6,04	Estructura de disipación de energía	m	14,00	$ 634.862,00	$ 8.888.068,00

6,06	Sistema de abatimiento para líneas hidráulicas de infiltración interna y protección del trasdos de la estructura estabilizadora	m	408,00	$ 75.174,00	$30.670.992,00
				SUBTOTAL SECCIÓN SEXTA:	**$ 57.328.240,00**

			VALOR COSTOS DIRECTOS:	**$3.176.284.620,57**
	ADMINISTRACION	**ADMINISTRACIÓN:**	24%	$ 762.308.308,94
	IMPREVISTOS	**IMPREVISTOS:**	1%	$ 31.762.846,21
	UTILIDAD	**UTILIDAD:**	5%	$ 158.814.231,03
	A.I.U.	**A.I.U:**	30%	$ 952.885.386,18
	VALOR TOTAL SIN IVA			$4.129.170.006,75
	IVA de U.	**IVA de U:**	19%	$30.174.703,90
			VALOR TOTAL:	**$4.159.344.710,65**

9.2 Seguimiento a Programa de Inversiones Planeado /Actas Cobro



OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL
$ 20.105.033,46	$ 570.673.058,35	$ 1.897.182.775,53	$ 2.912.174.065,96	$ 3.566.051.716,69	$ 4.110.490.936,14	$ 4.159.344.710,65
$ 23.193.255,29	$ 966.804.519,53	$ 1.907.607.679,01	$ 3.002.748.251,44	$ 3.593.076.665,52	$ 4.079.891.058,90	$ 4.155.666.199,50

CURVA S ACUMULADO PROGRAMADO VS ACUMULADO EJECUTADO

Seguimiento programa de gerencia No.07

Abril 2026

10.REVISIÓN DE ESTABILIDAD VALOR

Tipo de Pronostico	*Fórmula*	*Valor a Corte Seguimiento*
Variación de Costo	CV=EV-AC	0.0
Índice Desempeño Costos	CPI=EV/AC	1.0
Costo Estimado para Completar	ETC=BAC-EV	$ 3.678.511,15
Costo Restante Proyectado	EAC=BAC/CPI	$ 4.159.344.710,65

11.Compromisos Adquiridos

Se establece como compromiso la elaboración y suscripción del Acta de Recibo Parcial N.° 04 y del Acta de Recibo Final, con el fin de gestionar la actualización de las pólizas contractuales correspondientes y proceder con la entrega formal de la obra, garantizando su recibo a satisfacción conforme a las condiciones técnicas, administrativas y contractuales establecidas

Juan Carlos Rincón Lozano
Gerente de Proyectos

ANEXO NO.09 EVIDENCIA HOJA DE VISITA

CDMB	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA - CDMB		
	ELABORÓ: Coordinador(a) Zona Piedemonte SUGAR	REVISÓ: Representante Dirección SIGC	APROBÓ: Director(a) General
CÓDIGO M-OA-F002 / VERSIÓN 03	**HOJA DE VISITA**		

MOTIVO DE LA VISITA: Visita de Inspección para observar el avance de las actividades en obra ejecutadas.

FECHA DE VISITA		
DÍA	MES	AÑO
08	04	26

FINCA | VEREDA | MUNICIPIO: GIRON | MICROCUENCA

COTA | 7°3'5.491 N | E: 73°9'49.748 W

PROPIETARIO: | C.C / NIT.: 901982571-5

DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA: VILLA DE LOS CABALLEROS - GIRON | TELÉFONO FIJO

CELULAR: 3012765665

QUIEN ATIENDE LA VISITA: Contratista | CELULAR: 3022932492

SITUACIÓN ENCONTRADA: Se evidencia la ejecución de las actividades correspondientes a la CANALIZACIÓN DE LAS AGUAS LLUVIAS como lo son Construcción de CANALETAS. se CONTINUA ACTIVIDADES DE CONFORMACIÓN DEL TERRENO PARA LA COMPOSICIÓN DE LA ZONA VERDE. Construcción de BORDILLOS para evitar cualquier tipo de material a las peatonales - Construcción de CAJA DE INSPECCIÓN - RECOLECTOR AGUAS LLUVIAS - PARA EL TENSIONAMIENTO SE ESTA ESPEZANDO SE CUMPLA LOS TIEMPOS REQUERIDOS Y PODER LLEVAR A CABO ESTE TENSIONAMIENTO.

EVIDENCIAS: HOJA DE VISITA - REGISTRO FOTOGRAFICO

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES: SE REGISTRA UN BUEN AVANCE DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 99% las actividades en Realización no son contractuales ni estan dentro del contrato. Se ejecutan como donación y BENEFICIO de la COMUNIDAD Y DEJAR TODO TERMINADO POR PARTE DEL CONTRATISTA

GILBERTO GOMEZ O.

QUIEN ATIENDE LA VISITA - FIRMA / CÉDULA

NOMBRE Y FIRMA SERVIDOR PÚBLICO CDMB

OTROS - NOMBRE / FIRMA / CÉDULA

OTROS - NOMBRE / FIRMA / CÉDULA

CDMB	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA - CDMB		
	ELABORÓ: Coordinador(a) Zona Piedemonte SUGAR	REVISÓ: Representante Dirección SIGC	APROBÓ: Director(a) General
CÓDIGO M-OA-F002 / VERSIÓN 03	HOJA DE VISITA		

MOTIVO DE LA VISITA: Visita de finalización de obra según radia 210.16225.6 para el recibo definitivo de obra.

FECHA DE VISITA		
DÍA	MES	AÑO
14	04	26

FINCA | VEREDA | MUNICIPIO: Girón | MICROCUENCA

COTA | 7°3'15.491"N | E: 73°9'49.74"W

PROPIETARIO: | C.C / NIT: 901982771-5

DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA: Villa de los Caballeros - Girón Santander | TELÉFONO FIJO | CELULAR: 3012765665

QUIEN ATIENDE LA VISITA: Contratista - Interventoria | CELULAR: 3022932492

SITUACIÓN ENCONTRADA:

Se dio inicio a recibido de obra en el frente Villa de los caballeros donde se evidencia la culminación de las actividades contractuales correspondiente a Tensionamiento de los anclajes. Se evidencia culminadas las actividades de anclajes, estructura de disipación de energía y canaleta realizada en la corona y el pie del talud. Las actividades contractuales se ejecutaron en el tiempo establecido y según las especificaciones tecnicas. El contrato se ejecuto en el tiempo establecido. Se observa la siembra de los arboles para su respectiva compensación

EVIDENCIAS:

Registro Fotografico, hoja de visita y Bitacora

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES:

La obra se encuentra terminada en su 100% en el tiempo establecido contractualmente

QUIEN ATIENDE LA VISITA - FIRMA / CÉDULA

NOMBRE Y FIRMA SERVIDOR PÚBLICO CDMB

OTROS - NOMBRE / FIRMA / CÉDULA


OTROS - NOMBRE / FIRMA / CÉDULA


ANEXO NO.10 CONTROL DE TENSIONAMIENTO

CONTROL TENSIONAMIENTO ANCLAJES

FECHA:	14/04/2026	**EQUIPO:**	REV DRILL	**CALIBRE TORON:**	1/2"
OBRA:	CONSORCIO CONSOLIDACIÓN GIRON	**MANOMETRO:**	MICRO PRE TEMP-MEC 164129J	**CARGA TENSION (Ton)**	10 TON
LOCALIZACION OBRA:	VILLA DE LOS CABALLEROS	**CERTIFICADO CALIBRACION:**	372A	**CARGA TENSION (PSI)**:	3547,80

PLATINA 20 cms x 20 cm ESPESOR 5/8"






GUAYA TORON 1/2"


ESQUEMA ANCLAJE	FECHA	ELEMENTO	N° ANCLAJE	CARGA DE TENSION %	N° CABLE	LONGITUD LIBRE (mts)	LONGITUD BULBO (mts)	LONGITUD TOTAL (mts)	ELONGACION TEORICA (cm)	ELONGACION FISICA (cm)	OBSERVACIONES
	9/04/2026	VILLA DE LOS CABALLEROS	1	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	6,0	
				100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	6,0	
				100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	6,2	
	9/04/2026	VILLA DE LOS CABALLEROS	2	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	2,0	
				100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	3,0	
				100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	3,5	
	9/04/2026	VILLA DE LOS CABALLEROS	3	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	7,0	
				100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	9,0	
				100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	7,5	
	9/04/2026	VILLA DE LOS CABALLEROS	4	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	6,0	
				100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	5,0	
				100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	5,5	
	9/04/2026	VILLA DE LOS CABALLEROS	5	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	2,5	
				100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	6,0	
				100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	5,0	
	9/04/2026	VILLA DE LOS CABALLEROS	6	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	8,0	
				100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	9,0	
				100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	7,5	
	9/04/2026	VILLA DE LOS CABALLEROS	7	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	2,5	
				100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	5,5	
				100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	4,5	
	9/04/2026	VILLA DE LOS CABALLEROS	8	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	7,0	
				100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	7,0	
				100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	7,5	
	9/04/2026	VILLA DE LOS CABALLEROS	144	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	5,5	
				100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	4,0	
				100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	4,5	
	9/04/2026	VILLA DE LOS CABALLEROS	9	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	5,5	
				100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	4,5	
				100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	4,0	

OBSERVACIONES GENERALES :

	INGENIERO RESIDENTE CONSTRATISTA	INGENIERA RESIDENTE INTERVENTORIA
FIRMA		
NOMBRE	**OSCAR ANDRES SANCHEZ JEREZ**	**JULIÁN VILLAMIZAR**

PLATINA 20 cms x 20 cm ESPESOR 5/8"






GUAYA TORON 1/2"


9/04/2026	VILLA DE LOS CABALLEROS	10	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	7,5	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	7,0	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	6,0	
9/04/2026	VILLA DE LOS CABALLEROS	11	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	8,5	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	8,0	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	6,0	
9/04/2026	VILLA DE LOS CABALLEROS	12	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	5,0	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	5,0	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	2,0	
9/04/2026	VILLA DE LOS CABALLEROS	13	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	6,0	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	4,5	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	8,0	
9/04/2026	VILLA DE LOS CABALLEROS	14	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	9,0	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	6,0	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	6,0	
9/04/2026	VILLA DE LOS CABALLEROS	15	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	4,5	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	7,0	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	7,0	
9/04/2026	VILLA DE LOS CABALLEROS	16	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	7,0	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	7,0	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	7,5	
9/04/2026	VILLA DE LOS CABALLEROS	17	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	9,0	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	7,0	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	7,5	
9/04/2026	VILLA DE LOS CABALLEROS	18	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	6,0	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	5,0	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	2,5	
9/04/2026	VILLA DE LOS CABALLEROS	19	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	4,0	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	5,0	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	1,5	
9/04/2026	VILLA DE LOS CABALLEROS	20	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	8,5	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	7,5	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	7,0	
9/04/2026	VILLA DE LOS CABALLEROS	21	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	6,5	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	9,5	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	7,0	
9/04/2026	VILLA DE LOS CABALLEROS	22	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	4,0	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	6,0	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	6,0	

OBSERVACIONES GENERALES :

	INGENIERO RESIDENTE CONSTRATISTA	INGENIERA RESIDENTE INTERVENTORIA
FIRMA		
NOMBRE	**OSCAR ANDRES SANCHEZ JEREZ**	**JULIÁN VILLAMIZAR**
FECHA	**10/04/2026**	**10/04/2026**

PLATINA 20 cms x 20 cm ESPESOR 5/8"





GUAYA TORON


9/04/2026	VILLA DE LOS CABALLEROS	23	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	6,0	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	6,0	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	4,5	
9/04/2026	VILLA DE LOS CABALLEROS	24	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	3,0	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	5,0	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	2,0	
9/04/2026	VILLA DE LOS CABALLEROS	25	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	3,0	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	3,0	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	4,0	
9/04/2026	VILLA DE LOS CABALLEROS	26	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	6,5	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	4,0	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	2,5	
9/04/2026	VILLA DE LOS CABALLEROS	27	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	2,5	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	5,0	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	1,5	
9/04/2026	VILLA DE LOS CABALLEROS	28	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	3,5	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	6,5	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	6,0	
9/04/2026	VILLA DE LOS CABALLEROS	29	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	4,0	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	4,5	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	3,0	
9/04/2026	VILLA DE LOS CABALLEROS	30	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	2,5	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	2,5	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	3,0	
9/04/2026	VILLA DE LOS CABALLEROS	31	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	6,0	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	3,0	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	4,0	
9/04/2026	VILLA DE LOS CABALLEROS	32	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	2,0	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	4,0	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	6,0	
9/04/2026	VILLA DE LOS CABALLEROS	33	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	5,5	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	4,0	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	6,0	
9/04/2026	VILLA DE LOS CABALLEROS	34	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	5,0	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	6,0	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	7,0	
9/04/2026	VILLA DE LOS CABALLEROS	35	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	1,5	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	8,0	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	6,0	


OBSERVACIONES GENERALES :

	INGENIERO RESIDENTE CONSTRATISTA	INGENIERA RESIDENTE INTERVENTORIA
FIRMA		
NOMBRE	**OSCAR ANDRES SANCHEZ JEREZ**	**JULIÁN VILLAMIZAR**
FECHA	**10/04/2026**	**10/04/2026**

PLATINA 20 cms x 20 cm ESPESOR 5/8"

PLATINA 20 cms x 20 cm ESPESOR 5/8"






GUATA TORON 1/2"


9/04/2026	VILLA DE LOS CABALLEROS	36	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	4,0	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	3,0	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	6,5	
9/04/2026	VILLA DE LOS CABALLEROS	37	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	2,0	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	3,5	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	5,0	
9/04/2026	VILLA DE LOS CABALLEROS	38	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	5,5	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	4,5	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	4,0	
9/04/2026	VILLA DE LOS CABALLEROS	39	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	3,0	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	4,5	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	6,0	
9/04/2026	VILLA DE LOS CABALLEROS	40	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	6,0	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	6,0	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	6,5	
9/04/2026	VILLA DE LOS CABALLEROS	41	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	5,0	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	3,5	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	6,0	
9/04/2026	VILLA DE LOS CABALLEROS	42	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	6,0	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	6,5	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	4,5	
9/04/2026	VILLA DE LOS CABALLEROS	43	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	3,0	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	5,5	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	5,5	
9/04/2026	VILLA DE LOS CABALLEROS	44	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	5,5	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	6,5	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	3,0	
9/04/2026	VILLA DE LOS CABALLEROS	45	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	3,5	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	4,5	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	4,5	
9/04/2026	VILLA DE LOS CABALLEROS	46	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	3,5	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	6,0	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	5,0	
9/04/2026	VILLA DE LOS CABALLEROS	144	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	5,8	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	5,7	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	5,4	
9/04/2026	VILLA DE LOS CABALLEROS	48	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	6,0	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	8,5	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	7,0	

OBSERVACIONES GENERALES :

	INGENIERO RESIDENTE CONSTRATISTA	INGENIERA RESIDENTE INTERVENTORIA
FIRMA		
NOMBRE	**OSCAR ANDRES SANCHEZ JEREZ**	**JULIÁN VILLAMIZAR**
FECHA	**10/04/2026**	**10/04/2026**

PLATINA 20 cms x 20 cm ESPESOR 5/8"






GUAYA TORON 1/2"


10/04/2026	VILLA DE LOS CABALLEROS	49	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	3,5	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	4,0	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	4,5	
10/04/2026	VILLA DE LOS CABALLEROS	50	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	7,0	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	6,0	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	5,5	
10/04/2026	VILLA DE LOS CABALLEROS	52	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	6,0	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	5,5	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	4,0	
10/04/2026	VILLA DE LOS CABALLEROS	53	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	5,5	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	3,0	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	4,0	
10/04/2026	VILLA DE LOS CABALLEROS	54	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	3,0	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	3,0	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	2,0	
10/04/2026	VILLA DE LOS CABALLEROS	55	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	7,5	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	6,0	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	1,0	
10/04/2026	VILLA DE LOS CABALLEROS	56	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	5,5	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	5,0	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	2,0	
10/04/2026	VILLA DE LOS CABALLEROS	57	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	5,0	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	2,0	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	3,0	
10/04/2026	VILLA DE LOS CABALLEROS	58	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	5,0	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	3,0	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	5,5	
10/04/2026	VILLA DE LOS CABALLEROS	59	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	6,0	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	4,0	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	4,0	
10/04/2026	VILLA DE LOS CABALLEROS	60	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	3,5	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	5,0	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	6,5	
10/04/2026	VILLA DE LOS CABALLEROS	61	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	4,0	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	4,0	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	4,5	
10/04/2026	VILLA DE LOS CABALLEROS	62	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	5,5	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	5,5	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	3,0	

OBSERVACIONES GENERALES :

	INGENIERO RESIDENTE CONSTRATISTA	INGENIERA RESIDENTE INTERVENTORIA
FIRMA		
NOMBRE	**OSCAR ANDRES SANCHEZ JEREZ**	**JULIÁN VILLAMIZAR**
FECHA	**11/04/2026**	**11/04/2026**

PLATINA 20 cms x 20 cm ESPESOR 5/8"






GUAYA TORON 1/2"


10/04/2026	VILLA DE LOS CABALLEROS	63	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	6,0	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	6,5	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	3,0	
10/04/2026	VILLA DE LOS CABALLEROS	64	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	3,5	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	4,0	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	6,0	
10/04/2026	VILLA DE LOS CABALLEROS	65	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	4,0	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	3,0	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	2,0	
10/04/2026	VILLA DE LOS CABALLEROS	66	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	5,0	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	5,2	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	6,5	
10/04/2026	VILLA DE LOS CABALLEROS	67	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	6,5	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	3,0	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	3,0	
10/04/2026	VILLA DE LOS CABALLEROS	68	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	8,0	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	5,0	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	4,0	
10/04/2026	VILLA DE LOS CABALLEROS	69	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	5,0	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	2,5	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	5,0	
10/04/2026	VILLA DE LOS CABALLEROS	70	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	3,0	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	4,0	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	4,5	
10/04/2026	VILLA DE LOS CABALLEROS	71	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	7,0	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	3,0	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	3,0	
10/04/2026	VILLA DE LOS CABALLEROS	72	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	4,5	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	4,0	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	6,0	
10/04/2026	VILLA DE LOS CABALLEROS	73	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	4,5	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	5,0	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	7,0	
10/04/2026	VILLA DE LOS CABALLEROS	74	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	6,0	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	5,0	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	2,0	

OBSERVACIONES GENERALES :

	INGENIERO RESIDENTE CONSTRATISTA	INGENIERA RESIDENTE INTERVENTORIA
FIRMA		
NOMBRE	**OSCAR ANDRES SANCHEZ JEREZ**	**JULIÁN VILLAMIZAR**
FECHA	**11/04/2026**	**11/04/2026**

PLATINA 20 cms x 20 cm ESPESOR 5/8"






GUAYA TORON 1/2"


11/04/2026	VILLA DE LOS CABALLEROS	75	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	7,0	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	6,0	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	3,5	
11/04/2026	VILLA DE LOS CABALLEROS	76	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	8,0	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	6,0	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	1,5	
11/04/2026	VILLA DE LOS CABALLEROS	77	100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	7,0	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	6,0	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	4,0	
11/04/2026	VILLA DE LOS CABALLEROS	78	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	6,5	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	5,0	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	6,0	
11/04/2026	VILLA DE LOS CABALLEROS	79	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	5,0	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	5,5	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	6,0	
11/04/2026	VILLA DE LOS CABALLEROS	80	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	3,5	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	4,0	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	6,0	
11/04/2026	VILLA DE LOS CABALLEROS	81	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	5,0	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	5,0	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	4,0	
11/04/2026	VILLA DE LOS CABALLEROS	82	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	7,0	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	3,0	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	8,0	
11/04/2026	VILLA DE LOS CABALLEROS	83	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	9,0	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	8,0	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	7,5	
11/04/2026	VILLA DE LOS CABALLEROS	84	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	6,0	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	6,0	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	4,0	
11/04/2026	VILLA DE LOS CABALLEROS	85	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	5,0	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	4,0	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	4,5	
11/04/2026	VILLA DE LOS CABALLEROS	86	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	10,0	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	8,0	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	8,0	
11/04/2026	VILLA DE LOS CABALLEROS	87	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	6,0	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	5,0	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	3,0	

OBSERVACIONES GENERALES :

	INGENIERO RESIDENTE CONSTRATISTA	INGENIERA RESIDENTE INTERVENTORIA
FIRMA		
NOMBRE	**OSCAR ANDRES SANCHEZ JEREZ**	**JULIÁN VILLAMIZAR**
FECHA	**13/04/2026**	**13/04/2026**

PLATINA 20 cms x 20 cm ESPESOR 5/8"






GUAYA TORON 1/2"


13/04/2025	VILLA DE LOS CABALLEROS	88	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	6,0	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	3,0	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	5,5	
13/04/2025	VILLA DE LOS CABALLEROS	89	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	6,0	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	5,0	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	4,5	
13/04/2025	VILLA DE LOS CABALLEROS	90	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	4,0	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	4,0	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	5,0	
13/04/2025	VILLA DE LOS CABALLEROS	91	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	6,0	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	4,0	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	3,5	
13/04/2025	VILLA DE LOS CABALLEROS	92	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	3,0	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	7,0	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	8,0	
13/04/2025	VILLA DE LOS CABALLEROS	93	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	4,0	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	4,0	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	3,5	
13/04/2025	VILLA DE LOS CABALLEROS	94	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	6,5	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	8,0	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	5,0	
13/04/2025	VILLA DE LOS CABALLEROS	95	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	6,0	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	3,0	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	4,0	
13/04/2025	VILLA DE LOS CABALLEROS	96	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	2,0	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	4,0	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	3,5	
13/04/2025	VILLA DE LOS CABALLEROS	97	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	6,0	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	5,5	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	3,5	
13/04/2025	VILLA DE LOS CABALLEROS	98	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	5,0	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	3,5	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	5,5	
13/04/2025	VILLA DE LOS CABALLEROS	99	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	6,0	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	3,0	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	5,0	
13/04/2025	VILLA DE LOS CABALLEROS	100	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	2,0	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	4,0	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	2,0	

OBSERVACIONES GENERALES :

	INGENIERO RESIDENTE CONSTRATISTA	INGENIERA RESIDENTE INTERVENTORIA
FIRMA		
NOMBRE	OSCAR ANDRES SANCHEZ JEREZ	JULIÁN VILLAMIZAR
FECHA	13/04/2026	13/04/2026

PLATINA 20 cms x 20 cm ESPESOR 5/8"






GUAYA TORON 1/2"


13/04/2025	VILLA DE LOS CABALLEROS	101	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	3,0	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	4,0	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	5,5	
13/04/2025	VILLA DE LOS CABALLEROS	102	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	3,0	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	5,0	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	6,0	
13/04/2025	VILLA DE LOS CABALLEROS	103	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	7,0	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	6,0	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	8,0	
13/04/2025	VILLA DE LOS CABALLEROS	104	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	6,0	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	6,0	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	4,5	
13/04/2025	VILLA DE LOS CABALLEROS	105	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	3,0	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	4,5	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	5,0	
13/04/2025	VILLA DE LOS CABALLEROS	106	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	4,0	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	5,3	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	3,5	
13/04/2025	VILLA DE LOS CABALLEROS	107	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	5,0	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	5,0	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	6,0	
13/04/2025	VILLA DE LOS CABALLEROS	108	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	4,0	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	4,0	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	3,5	
13/04/2025	VILLA DE LOS CABALLEROS	109	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	6,0	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	5,0	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	6,5	
13/04/2025	VILLA DE LOS CABALLEROS	110	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	6,0	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	7,0	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	7,5	
13/04/2025	VILLA DE LOS CABALLEROS	111	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	6,5	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	5,0	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	4,0	
13/04/2025	VILLA DE LOS CABALLEROS	112	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	6,0	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	7,0	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	4,5	
13/04/2025	VILLA DE LOS CABALLEROS	113	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	8,0	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	6,0	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	4,5	

OBSERVACIONES GENERALES :

	INGENIERO RESIDENTE CONSTRATISTA	INGENIERA RESIDENTE INTERVENTORIA
FIRMA		
NOMBRE	**OSCAR ANDRES SANCHEZ JEREZ**	**JULIÁN VILLAMIZAR**
FECHA	**13/04/2026**	**13/04/2026**

PLATINA 20 cms x 20 cm ESPESOR 5/8"






GUAYA TORON 1/2"


13/04/2025	VILLA DE LOS CABALLEROS	114	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	6,5	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	6,5	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	5,0	
13/04/2025	VILLA DE LOS CABALLEROS	115	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	6,5	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	3,0	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	3,5	
13/04/2025	VILLA DE LOS CABALLEROS	116	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	7,5	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	8,0	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	7,5	
13/04/2025	VILLA DE LOS CABALLEROS	117	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	5,3	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	6,0	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	7,0	
13/04/2025	VILLA DE LOS CABALLEROS	118	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	8,5	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	9,0	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	8,5	
13/04/2025	VILLA DE LOS CABALLEROS	119	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	7,5	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	8,5	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	9,0	
13/04/2025	VILLA DE LOS CABALLEROS	120	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	8,0	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	5,5	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	3,5	
13/04/2025	VILLA DE LOS CABALLEROS	121	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	6,5	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	5,0	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	4,5	
13/04/2025	VILLA DE LOS CABALLEROS	122	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	7,0	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	6,0	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	9,0	
13/04/2025	VILLA DE LOS CABALLEROS	123	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	5,5	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	5,5	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	9,0	
13/04/2025	VILLA DE LOS CABALLEROS	124	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	6,0	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	9,0	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	7,0	
13/04/2025	VILLA DE LOS CABALLEROS	125	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	8,5	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	6,0	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	7,0	
13/04/2025	VILLA DE LOS CABALLEROS	126	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	3,5	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	2,5	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	5,0	

OBSERVACIONES GENERALES :

	INGENIERO RESIDENTE CONSTRATISTA	INGENIERA RESIDENTE INTERVENTORIA
FIRMA		
NOMBRE	OSCAR ANDRES SANCHEZ JEREZ	JULIÁN VILLAMIZAR
FECHA	14/04/2026	14/04/2026

PLATINA 20 cms x 20 cm ESPESOR 5/8"






GUAYA TORON 1/2"


14/04/2025	VILLA DE LOS CABALLEROS	127	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	7,5	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	8,5	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	5,5	
14/04/2025	VILLA DE LOS CABALLEROS	128	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	5,5	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	7,5	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	4,0	
14/04/2025	VILLA DE LOS CABALLEROS	129	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	6,5	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	5,5	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	3,5	
14/04/2025	VILLA DE LOS CABALLEROS	130	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	8,0	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	7,5	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	5,0	
14/04/2025	VILLA DE LOS CABALLEROS	131	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	6,0	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	6,0	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	6,5	
14/04/2025	VILLA DE LOS CABALLEROS	132	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	7,5	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	7,0	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	6,0	
14/04/2025	VILLA DE LOS CABALLEROS	133	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	4,5	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	5,0	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	5,0	
14/04/2025	VILLA DE LOS CABALLEROS	134	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	5,0	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	5,0	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	5,5	
14/04/2025	VILLA DE LOS CABALLEROS	135	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	3,0	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	3,0	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	4,0	
14/04/2025	VILLA DE LOS CABALLEROS	136	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	6,5	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	7,0	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	7,0	
14/04/2025	VILLA DE LOS CABALLEROS	137	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	4,5	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	4,0	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	6,0	
14/04/2025	VILLA DE LOS CABALLEROS	138	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	7,0	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	6,0	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	6,5	
14/04/2025	VILLA DE LOS CABALLEROS	139	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	6,0	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	6,0	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	6,5	

OBSERVACIONES GENERALES :

	INGENIERO RESIDENTE CONSTRATISTA	INGENIERA RESIDENTE INTERVENTORIA
FIRMA		
NOMBRE	**OSCAR ANDRES SANCHEZ JEREZ**	**JULIÁN VILLAMIZAR**
FECHA	**14/04/2026**	**14/04/2026**

PLATINA 20 cms x 20 cm ESPESOR 5/8"





GUAYA TORON 1/2"

14/04/2025	VILLA DE LOS CABALLEROS	140	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	7,0	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	7,0	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	7,5	
14/04/2025	VILLA DE LOS CABALLEROS	141	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	8,0	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	7,5	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	7,0	
13/04/2025	VILLA DE LOS CABALLEROS	142	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	6,0	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	6,0	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	5,0	

ACEROS INDUSTRIALES

Cliente: 40V57 - CHEA INGENIERIA S.A.S
Dirección: KRA 13 # 22-32 BRR GIRARDOT
Factura: 69560
Fecha Fact.: 06/26/2024 **Orden de Compra:**

REGISTRO DE CALIDAD

FCA28
Versión 0
Oct. 2014

Material Entregado

Código	Material	Lote	Grado	Color	Kilos
200350	TORN RDO 3- 1/2 PG 1045	202406712	1045	Verde	701.00

Caracteristicas Mecánicas - Dimensionales

R.T.-Kg/mm²		R.F.-	Elongacion	Dureza			Tol. Dim.-mm		Oval.
Mín.	Máx.	Kg/mm²	%	Mín.	Máx.	Unid.	Mín.	Máx.	mm

R.T.:Resistencia a la Tracción - R.F.: Resistencia a la fluencia

Composición Química

Lote	Colada	Norma	%C	%Mn	%P	%S	%Si	%Cr	%Ni	%Mo	%Cu	%Sn	%V	%B	%Pb	%Fe	%Zn
202406712	VS161	ASTM A29	0.4400	0.7800	0.0300	0.0280	0.2000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

"Apreciado cliente, favor verificar previamente que las propiedades mecánicas y químicas del material cumplan con los requisitos de su aplicación. La organización no acepta devoluciones de material: procesado, cortado en tramos, fracciones o en deterioro evidente" Muchas gracias.

Tolerancias Dimensionales según Estados de Entrega Laminado en Caliente: Rdo. DIN1013-Cdo. DIN1014-Hex. DIN1015 / Premaquinado: Rdo. DIN1013 / Bonificado: Rdo. DIN1013 Calibrado: Rdo.-Cdo.-Hex.-Plat. ISO h11 / Torneado: Rdo. ISO h11

Certifica que los resultados de las pruebas mecánicas realizados a los Materiales Transformados-Calibrados/Trefilados - son correctos, y con base al resultado real realizado en muestras tomadas de acuerdo con el Plan de Calidad.

Los resultados de este informe solo aplican para el lote ensayado.

Inspector de Materiales
SOPORTE TÉCNICO

Medellín - Colombia
Calle 26 Nro 41-140 Itagüí
Teléfono:(604)372 12 12
correo: info@acerosindustriales.com

Bogotá - Colombia
Calle 15 Nro. 27 - 21 Paloquemao
Teléfono:(601)492 47 80
correo: ventabog@acerosindustriales.com

日钢营口中板有限公司
RIZHAO STEEL YINGKOU MEDIUM PLATE CO.,LTD.
辽宁省营口市老边区冶金街/115005
Yejinstreet,Laobiandistrict,Yingkou,Liaoning,P.R.China/115005
TEL:0417-3256081 FAX:0417-3256057 NO.:DT2101501/A

产品质量证明书
INSPECTION CERTIFICATE

订货单位 PURCHASER	Cheongfuli (Hong Kong) Company, Limited.	产品名称 PRODUCT	普通碳素结构钢 General carbon structural steel	
收货单位 CONSIGNEE	Cheongfuli (Hong Kong) Company, Limited.	合同编号 CONTRACT NO.	YGR1ZANN240685004	
技术标准/牌号 SPEC/GRADE	ASTM A36/A36M-2019	交货状态 DELIVERY CONDITION	热轧(AR)	签发日期 DATE OF ISSUE: 20240811
车号 TRAIN NO.		证明书号 CERTIFICATE NO.	240811Z00495	

炉号 HEAT NO.	批号 LOT NO.	钢板号 PLATE NO.	规格 MM DIMENSION	数量 QTY	重量 WEIGHT kg	分析区域 AA	化学成分 CHEMICAL ANALYSIS % C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Cu	Mo	V	Ti	Nb	CEV	A0A01 屈服强度 MPa Rp0.2	A0A02 抗拉强度 MPa Rm	A0A03 断后伸长率 % B5
							10^{-2}	10^{-1}	10^{-1}	10^{-4}	10^{-4}	10^{-3}	10^{-4}	10^{-3}	10^{-4}	10^{-3}	10^{-4}	10^{-4}	10^{-2}			
24306368A	2478500	24G9853001	12x2440x6096	1	1.401	L	16	22	54	24	6	5	28	9	7	1	2	2	27	282	439	28
24306368A	2478500	24G9853002	12x2440x6096	1	1.401	L	16	22	54	24	6	5	28	9	7	1	2	2	27	282	439	28
24306368A	2478500	24G9853003	12x2440x6096	1	1.401	L	16	22	54	24	6	5	28	9	7	1	2	2	27	282	439	28
24306368A	2478500	24G9853004	12x2440x6096	1	1.401	L	16	22	54	24	6	5	28	9	7	1	2	2	27	282	439	28
			合计(TOTAL)	4	5.604																	

注释 NOTES

L:熔炼成分 SMELTING COMPOSITION
拉伸标距(GAUGE LENGTH) Lo=200 mm
A0A01=YIELD STRENGTH
A0A02=TENSILE STRENGTH
A0A03=PRECENTAGE ELONGATION AFTER FRACTURE

According to EN 10204 3.1

本产品已按照标准要求进行制造和检验，其结果符合要求，特此证明。
WE HEREBY CERTIFY THAT MATERIAL DESCRIBED HAS MANUFACTURED AND TESTED WITH SATISFACTORY RESULTS IN ACCORDANCE WITH THE REQUIREMENTS OF THE ABOVE MATERIAL SPECIFICATION

冶金技术处处长
DIRECTOR OF METALLURGICAL DEPARTMENT

Scanned with CamScanner

日钢营口中板有限公司
RIZHAO STEEL YINGKOU MEDIUM PLATE CO.,LTD.
辽宁省营口市老边区冶金街/115005
Yejinstreet,Laobiandistrict,Yingkou,Liaoning,P.R.China/115005
TEL:0417-3256081 FAX:0417-3256057 NO.:DT2101501/A

产品质量证明书
INSPECTION CERTIFICATE

订货单位 PURCHASER	Cheongfuli (Hong Kong) Company, Limited.	产品名称 PRODUCT	普通碳素结构钢 General carbon structural steel	
收货单位 CONSIGNEE	Cheongfuli (Hong Kong) Company, Limited.	合同编号 CONTRACT NO.	YGR1ZANN240685004	
技术标准/牌号 SPEC/GRADE	ASTM A36/A36M-2019	交货状态 DELIVERY CONDITION	热轧(AR)	签发日期 DATE OF ISSUE: 20240729
车号 TRAIN NO.		证明书号 CERTIFICATE NO.	240729Z00423	

日钢营口中板分厂 质量专用章

炉号 HEAT NO.	批号 LOT NO.	钢板号 PLATE NO.	规格 (MM) DIMENSION	数量 QTY	重量 WEIGHT kg	分析区域 AA	化学成分 CHEMICAL ANALYSIS % C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Cu	Mo	V	Ti	Nb	CEV	A 0A01 屈服强度 MPa Rp0.2	A 0A02 抗拉强度 MPa Rm	A 0A03 断后伸长率 % B5
							×10⁻³	×10⁻²	×10⁻²	×10⁻³	×10⁻³	×10⁻²	×10⁻³	×10⁻³	×10⁻³	×10⁻³	×10⁻³	×10⁻³	×10⁻²			
24112275A	2476130	24GB097003	12x2440x6096	1	1.401	L	131	201	1040	260	66	33	110	8	60	2	40	20	31	293	459	28.5
24112275A	2476130	24GB097001	12x2440x6096	1	1.401	L	131	201	1040	260	66	33	110	8	60	2	40	20	31	293	459	28.5
24112275A	2476130	24GB098001	12x2440x6096	1	1.401	L	131	201	1040	260	66	33	110	8	60	2	40	20	31	293	459	28.5
24112275A	2476130	24GB098002	12x2440x6096	1	1.401	L	131	201	1040	260	66	33	110	8	60	2	40	20	31	293	459	28.5
24112275A	2476130	24GB098003	12x2440x6096	1	1.401	L	131	201	1040	260	66	33	110	8	60	2	40	20	31	293	459	28.5
24112275A	2476130	24GB098004	12x2440x6096	1	1.401	L	131	201	1040	260	66	33	110	8	60	2	40	20	31	293	459	28.5
			合计 (TOTAL)	6	8.406																	

注释 NOTES

L: 熔炼成分 SMELTING COMPOSITION
拉伸标距 (GAUGE LENGTH) Lo=200 mm
A0A01=YIELD STRENGTH
A0A02=TENSILE STRENGTH
A0A03=PRECENTAGE ELONGATION AFTER FRACTURE

According to EN 10204 3.1

野牛

本产品已按照标准要求进行制造和检验，其结果符合要求，特此证实。
WE HEREBY CERTIFY THAT MATERIAL DESCRIBED HAS MANUFACTURED AND TESTED WITH SATISFACTORY RESULTS IN ACCORDANCE WITH THE REQUIREMENTS OF THE ABOVE MATERIAL SPECIFICATION

冶金技术处处长
DIRECTOR OF METALLURGICAL DEPARTMENT

Scanned with CamScanner

JINGYE (YINGKOU) MEMPLATE CO.LTD.
Yejinstreet,Laobiandistrict,Yingkou,Liaoning,P.R.China/115005
TEL:0417-3256081 FAX:0417-3256057 NO.:DT2101501/A

产品质量证明书
INSPECTION CERTIFICATE

订货单位 PURCHASER	SMLINGSETCORPORATION	产品标准 IRDLICI	普通碳结构钢 General carbon structural steel
收货单位 CONSIGNEE	SMLINGSETCORPORATION	合同号 CONTRACTNO.	YGCAZANN250985001-02
技术规范牌号 SPECGRADE	ASIMA36/A36M-2019；ASIMA36	交货状态 DELIVERYCONDITION	热轧(AR)
		证明书编号 CERTIFICATE NO.	251030Z00816
车号 TRAINNO.			

炉号 HEATNO.	批号 LOTNO.	钢板号 PLATENO.	规格 MM DIMENSION	数量 QTY	重量 WEIGHT t	分析区域 A.A	化学成分 CHEMICAL ANALYSIS% C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Cu	Mo	V	Ti	Nb	CEV	A0A01 屈服强度 Mpa Rp0.2	A0A02 抗拉强度 Mpa Rm	A0A03 断后伸长率 % A5
							10^{-3}	10^{-3}	10^{-3}	10^{-4}	10^{-4}	10^{-3}	10^{-4}	10^{-3}	10^{-4}	10^{-3}	10^{-4}	10^{-4}	10^{-2}			
25120997A	2505772	25K9425002	12x2438x6096	1	1,400	L	178	178	562	170	96	74	320	8	30	1	30	20	29	308	454	24
25120997A	2505772	25K9425003	12x2438x6096	1	1,400	L	178	178	562	170	96	74	320	8	30	1	30	20	29	308	454	24
25120997A	2505772	25K9425004	12x2438x6096	1	1,400	L	178	178	562	170	96	74	320	8	30	1	30	20	29	308	454	24
			合(TOTAL):	3	4,200																	

注释 NOTES

L:熔炼分析MELTING COMPOSITION
拉伸GAUGE LENGTH) Lo=200 mm
A0A01=YIELD STRENGTH
A0A02=TENSILE STRENGTH
A0A03=PRECENTAGE ELONGATION AFTER FRACTURE

According to EN 10204 3.1

本品经检验符合标准及其技术条件规定，特此证明
WE HEREBY CERTIFY THAT MATERIAL DESCRIBED HASMANUFACURD AND TESTED WITH SATISFACTORY RESULTS IN ACCORDANCE WITH THE REQUIR EMENTS OF THE ABOVE MATERIAL SPECIFICATION Both BOHVISUAL AND DIMENSIONAL INSPECTION MEETTHE STANDARD REQUIREMENTS

技术中心 Technology Center

Scanned with CamScanner

敬业营口中板有限公司
JINGYE (YINGKOU) MEDIMPLATE CO.LTD.
营口市老边区叶近街115005
Yejinstreet,Laobiandistrict,Yingkou,Liaoning,P.R.China/115005
TEL:0417-3256081 FAX:0417-3256057 NO.:DT2101501/A

产品质量证明书
INSPECTION CERTIFICATE

质量专用章

订货单位 PURCHASER	SMLNGOSTCORPORATION	产品标准 IRCILCI	普通碳素结构钢 General carbon structural steel		
收货单位 CONSIGNEE	SMLNGOSTCORPORATION	合同号 TRACTNO.	YGCAZANN250985001-02		
钢号 SPECGRADE	ASIMA36/A36M-2019；ASIMA36	交货状态 DELIVERYCONDITION	热处理(AR)	发货日期 DATE OF ISSUE	20251028
		质量证明书编号 CERTIFICATE NO.	251028Z01073	是否保证 GUARANTEE ORNOT	是 YES
车号 TRAIN NO.					

炉号 HEAT NO.	批号 LOT NO.	钢板号 PLATE NO.	规格 MM DIMENSION	数量 QTY	重量 WEIGHT kg	分析区域 A.A	化学成分 CHEMICAL ANALYSIS % C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Cu	Mo	V	Ti	Nb	CEV	A0A01 屈服强度 MPa ReH	A0A02 抗拉强度 Rm	A0A03 断后伸长率 % A5
							10^{-3}	10^{-3}	10^{-3}	10^{-4}	10^{-4}	10^{-5}	10^{-4}	10^{-3}	10^{-4}	10^{-3}	10^{-4}	10^{-4}	10^{-2}			
25309867	C 2505654	25K9212001	12x2438x6096	1	1,400	L	180	215	532	160	113	47	310	9	30	1	40	30	28	300	457	26
25309867	C 2505654	25K9212002	12x2438x6096	1	1,400	L	180	215	532	160	113	47	310	9	30	1	40	30	28	300	457	26
25309867	C 2505654	25K9212003	12x2438x6096	1	1,400	L	180	215	532	160	113	47	310	9	30	1	40	30	28	300	457	26
25309867	C 2505654	25K9212004	12x2438x6096	1	1,400	L	180	215	532	160	113	47	310	9	30	1	40	30	28	300	457	26
			合计(TOTAL):	4	5,600																	

注释 NOTES

L:熔炼分析MELTING COMPOSITION
拉伸试验(GAUGE LENGTH) Lo=200 mm
A0A01=YIELD SIRENGIH
A0A02=TENSILE SIRENGIH
A0A03=PRECENTAGE ELONGATION AFTER FRACTURE

According to EN 10204 3.1

本厂保证上述材料经检验其结果符合订货合同及技术规范要求
WE HEREBY CERTIFY THAT MATERIAL DESCRIBED HAS MANUFACURD AND TESID WITH SATISFACTORY RESULTS IN ACCORDANCE WITH THE REQUIR EMENTS OF THE ABOVE MATERIAL SPECIFICATION Both BOTH VISUAL AND DIMENSIONAL INSPECTION MET THE STANDARD REQUIREMENTS

技术中心
Technology Center

Scanned with CamScanner
