NUMERO DEL INFORME: 11

CORRESPONDIENTE A LAS OBLIGACIONES DE LA INTERVENTORIA DURANTE EL PERIODO DEL (01/03/2026) AL (31/03/2026)

TABLA DE CONTENIDO:

1. **Información General de la Obra Pública**
   - **1.1.** Descripción general de la Obra Pública
   - **1.2.** Localización de la Obra Pública
   - **1.3.** Información básica de los contratos
     - **1.3.1.** Contrato de Obra
     - **1.3.2.** Contrato de Interventoría

2. **Informe Técnico del Seguimiento al Contrato de Obra Pública**
   - **2.1.** Control de ejecución
     - **2.1.1.** Análisis de cada una de las actividades de obra programadas de conformidad con el cronograma vigente vs actividades de obra efectivamente ejecutadas
   - **2.2.** Control y seguimiento al cumplimiento y vigencia de licencias, permisos y uso de servicios públicos
   - **2.3.** Seguimiento al estado del tiempo
   - **2.4.** Control del material en obra
   - **2.5.** Control de ensayos de laboratorio
   - **2.6.** Control de equipos en obra
   - **2.7.** Control de entrega y cambios de estudios y diseños

3. **Informe de monitoreo y seguimiento social, ambiental y de salud y seguridad en el trabajo, de los contratos de ejecución de Obra Pública**
   - **3.1.** Informe social
     - **3.1.1.** Actividades de la interventoría relacionadas con la verificación, monitoreo y seguimiento de la ejecución del componente social, en el contrato de ejecución de obra pública
     - **3.1.2.** Actividades de la interventoría relacionadas con la ejecución del componente social, al interior de su contrato
     - **3.1.3.** Consolidado de la gestión social
     - **3.1.4.** Observaciones, recomendaciones y conclusiones de la interventoría con relación a las labores realizadas por el contratista de obra en el desarrollo del componente social de su contrato de ejecución de la obra pública.
   - **3.2.** Informe ambiental
     - **3.2.1.** Programas del Plan de Acción ambiental de la Obra Pública
     - **3.2.2.** Programa de capacitaciones y/o inducciones realizadas
     - **3.2.3.** Plan de monitoreo y seguimiento (Formato indicadores)
     - **3.2.4.** Seguimiento al presupuesto ambiental (Formato vigente)
     - **3.2.5.** Observaciones, recomendaciones y conclusiones de la interventoría con relación a las labores realizadas por el contratista de obra en el desarrollo del componente ambiental de su contrato de ejecución de obra pública
     - **3.2.6.** Actividades de la interventoría relacionadas con la ejecución del componente ambiental, al interior de su contrato.
   - **3.3.** Informe de Salud y Seguridad en el Trabajo – SST

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (604) 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

3.3.1. Programa de salud y seguridad en el trabajo – SST (contratista de obra)

3.3.1.1. Observaciones, recomendaciones y conclusiones de la interventoría con relación a las labores realizadas por el contratista de obra en el desarrollo del componente de salud y seguridad en el trabajo de su contrato de ejecución de obra pública

3.3.2. Programa de salud y seguridad en el trabajo – SST (interventoría de obra)

4. **Informe administrativo de seguimiento al contrato de obra pública**
   - **4.1.** Control del personal del contratista de obra asociado al proyecto (administrativo y técnico) y de su pago de seguridad social integral
   - **4.2.** Control del cumplimiento de las responsabilidades del contratista de obra frente a la subcontratación
   - **4.3.** Informe de la materialización de riesgos previsibles del contrato de obra y su mitigación
   - **4.4.** Control a los compromisos definidos en los comités de obra
   - **4.5.** Correspondencia enviada y recibida
   - **4.6.** Copia de la Bitácora

5. **Informe Financiero y Contable**
   - **5.1.** Seguimiento financiero a la ejecución del contrato de obra
   - **5.2.** Relación de pagos y amortización de anticipo (si aplica) del contrato de obra
   - **5.3.** Control de inversión del anticipo y de los rendimientos financieros generados en el contrato de obra (si aplica)
   - **5.4.** Relación de las obligaciones en materia de impuestos y contribuciones.
   - **5.5.** Relación de los imprevistos causados, demostrados y facturados.

6. **Informe Jurídico**
   - **6.1.** Relación de reclamaciones
   - **6.2.** Relación de sanciones
   - **6.3.** Control al estado de las garantías del contrato de Obra

7. **Registro Fotográfico del avance de la obra**

8. **Recomendaciones y conclusiones generales de la Interventoría sobre el desarrollo del contrato de Obra.**

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (604) 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA OBRA PÚBLICA:

1.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA PÚBLICA:

El proyecto consiste en las demoliciones mayores por infracciones urbanísticas, invasiones de espacio público y apoyo a operativos de la Secretaría de Seguridad y Convivencia del Distrito de Medellín.

1.2. LOCALIZACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA:



La ubicación del proyecto comprende la zona urbana y rural del municipio de Medellín, Antioquia.

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (604) 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

1.3. INFORMACIÓN BÁSICA DE LOS CONTRATOS:

1.3.1. CONTRATO DE OBRA:

NÚMERO DEL CONTRATO:	4600104733 DE 2025
OBJETO:	"EJECUTAR LAS DEMOLICIONES, CERRAMIENTOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS REQUERIDAS POR LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA".
CONTRATISTA: (Si es un consorcio informar las personas o empresas que lo conforman y su % de participación)	HACE INGENIEROS SAS
CÉDULA O NIT:	800.129.789-11
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:	ANTONIO ESTEBAN SANCHEZ TORRES
DIRECCIÓN CONTRACTUAL:	AV EL DORADO 68C 61 OF 417 Bogotá D.C
TELÉFONOS DE CONTACTO:	3114805978
EMAIL:	contabilidad2016@haceingenieros.com
FECHA INICIO DEL CONTRATO:	25/04/2025
PLAZO INICIAL:	250 DIAS CALENDARIO
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2025
AMPLIACIONES A LA FECHA:	N/A
SUSPENSIONES A LA FECHA	N/A
PLAZO ACTUAL:	167 DIAS CALENDARIO
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	31/12/2025
VALOR INICIAL:	MIL DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS M.L ($1.200.000.0000) incluido AIU y excluido de IVA
ADICIONES A LA FECHA	N/A
VALOR ACTUAL:	MIL DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS M.L ($1.200.000.0000) incluido AIU y excluido de IVA
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:	N/A

1.3.2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA: N/A

2. INFORME TÉCNICO DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE LA OBRA PÚBLICA:

2.1. CONTROL DE EJECUCIÓN:

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (604) 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

2.1.1. ANÁLISIS DE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA PROGRAMADAS DE CONFORMIDAD CON EL CRONOGRAMA VIGENTE VS ACTIVIDADES DE OBRA EFECTIVAMENTE EJECUTADAS:

Para el mes de enero se realizan varias intervenciones, para un total de cinco (3) visitas para realizar reconocimiento y viabilidad de dichos predios.


Listado de obras realizadas en el mes de enero,

1	Parqueadero Frente universidad de Medellín	Medellín	DEMOLICION
2	Calle 112 # 67-38	Medellín	DEMOLICION
3	Calle 63a #37 Villa hermosa	Medellín	VISITAS DE INSPECCION
4	Calle 59a #21b-2	Medellín	VISITAS DE INSPECCION
5	CRA 36 #66d -53	Medellín	VISITAS DE INSPECCION
6	Calle 27 # 46-70	Medellín	VISITAS DE INSPECCION
7	Cra 76 # 53-215	Medellín	VISITAS DE INSPECCION
8	Cra 82 #104c-16	Medellín	VISITAS DE INSPECCION
9	Cra 77a 101bb 16	Medellín	VISITAS DE INSPECCION
10	Calle 101 aa76d 38	Medellín	VISITAS DE INSPECCION
11	Cra 104 74a 39	Medellín	VISITAS DE INSPECCION
12	Calle 104f 74-24	Medellín	VISITAS DE INSPECCION

2.2. CONTROL Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO Y VIGENCIA DE LICENCIAS, PERMISOS Y USO DE SERVICIOS PÚBLICOS:

No aplica para este contrato, ya que solo comprende demoliciones.

2.3. SEGUIMIENTO AL ESTADO DEL TIEMPO:

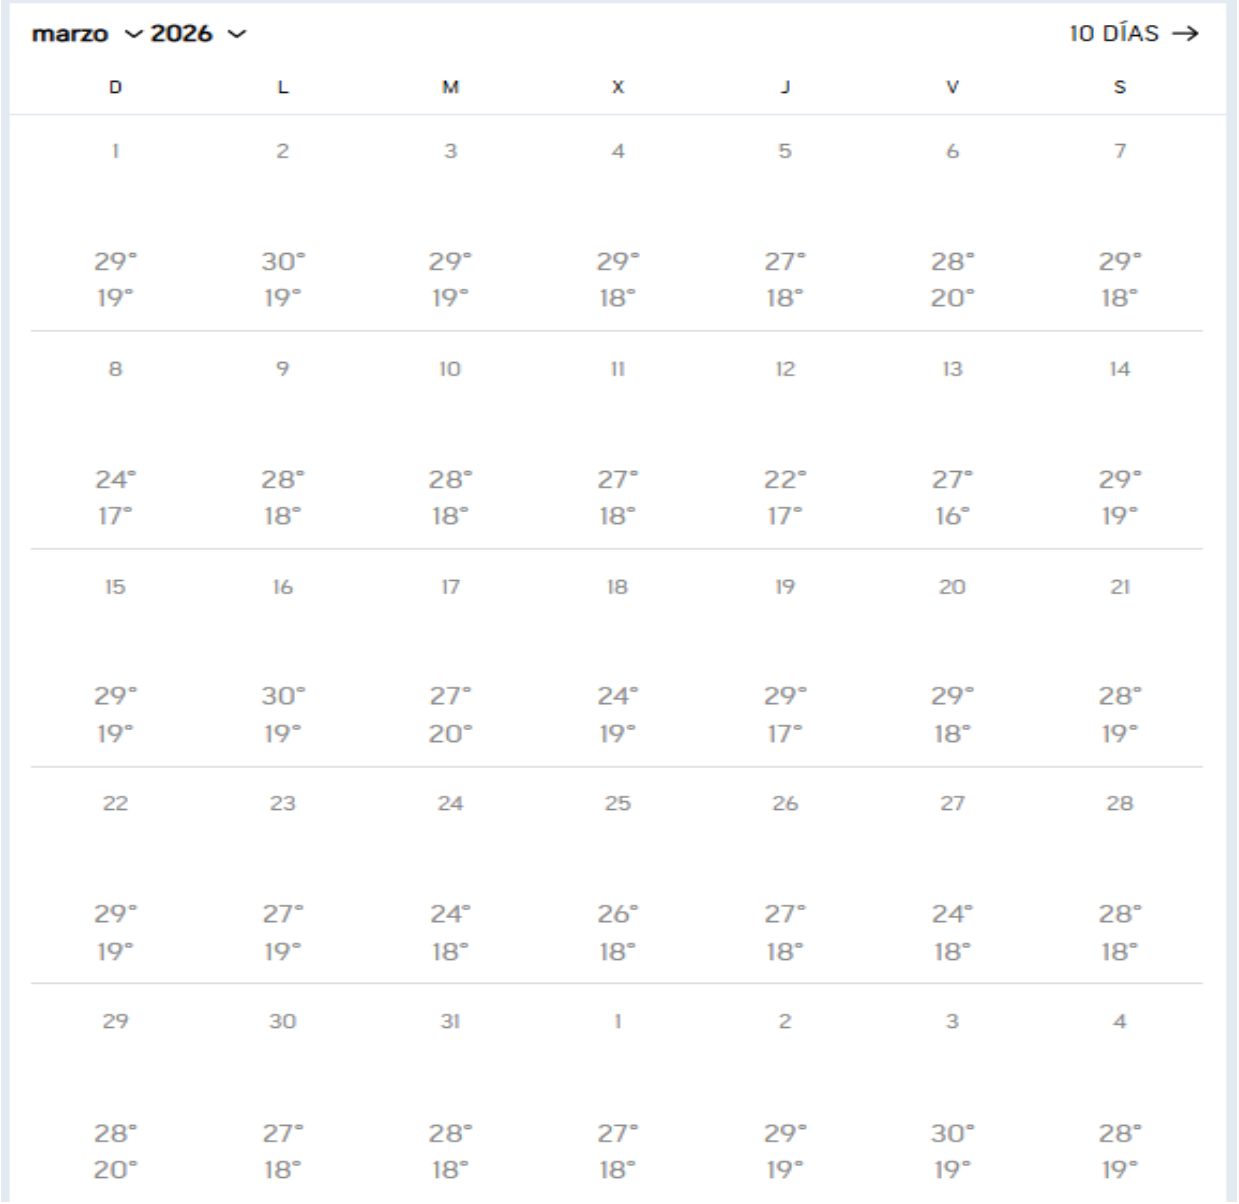

marzo 2026 — 10 DÍAS →

D	L	M	X	J	V	S
1	2	3	4	5	6	7
29° 19°	30° 19°	29° 19°	29° 18°	27° 18°	28° 20°	29° 18°
8	9	10	11	12	13	14
24° 17°	28° 18°	28° 18°	27° 18°	22° 17°	27° 16°	29° 19°
15	16	17	18	19	20	21
29° 19°	30° 19°	27° 20°	24° 19°	29° 17°	29° 18°	28° 19°
22	23	24	25	26	27	28
29° 19°	27° 19°	24° 18°	26° 18°	27° 18°	24° 18°	28° 18°
29	30	31	1	2	3	4
28° 20°	27° 18°	28° 18°	27° 18°	29° 19°	30° 19°	28° 19°

2.4. CONTROL DEL MATERIAL EN OBRA:

Para dar inicio al contrato solo hemos contado con predios que requieren su demolición, aun no se han presentado la elaboración de cerramientos o actividades requeridas adicionales. En los casos puntuales donde se requieran reparaciones y/o reconstrucciones al momento se describirá y se hará el protocolo descrito para esta actividad.

2.5. CONTROL DE ENSAYOS DE LABORATORIO:

Para efectos del contrato no se realizan ensayos de laboratorio, por comprender sólo demoliciones, en casos puntuales se harán los ensayos y se presentara a la supervisión.

2.6. CONTROL DE EQUIPOS EN OBRA:

Los controles se hacen para el equipo menor que es utilizado en la obra.

2.7. CONTROL DE ENTREGA Y CAMBIOS DE ESTUDIOS Y DISEÑOS:

No hay diseños a la fecha.

3. INFORME DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO, DE LOS CONTRATOS DE EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA:

Para este contrato se aplican todas las medidas y protocolos socio ambientales para procesos de demolición, los cuales se aplicarán al momento de realizar la demolición según los sitios aprobados por la supervisión del contrato.

Dentro la demolición realizada se ha dado el debido tratamiento a los escombros como ha sido el empacado y disposición en sitios autorizado para ellos.

3.1. INFORME SOCIAL:

3.1.1. ACTIVIDADES DE LA INTERVENTORÍA RELACIONADAS CON LA VERIFICACIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL COMPONENTE SOCIAL, EN EL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA

Igual como se describió las intervenciones en el numeral 2.1.1 a la fecha de cierre del informe se había realizado socialización de las direcciones con resolución y proceso en firme para demolición y restitución, el inspector encargado de la zona, ellos han notificado ya del proceso de restitución de la zona.

1	Parqueadero Frente universidad de Medellín	Medellín	DEMOLICION
2	Calle 112 # 67-38	Medellín	DEMOLICION
3	Calle 63a #37 Villa hermosa	Medellín	VISITAS DE INSPECCION
4	Calle 59a #21b-2	Medellín	VISITAS DE INSPECCION
5	CRA 36 #66d -53	Medellín	VISITAS DE INSPECCION
6	Calle 27 # 46-70	Medellín	VISITAS DE INSPECCION
7	Cra 76 # 53-215	Medellín	VISITAS DE INSPECCION
8	Cra 82 #104c-16	Medellín	VISITAS DE INSPECCION
9	Cra 77a 101bb 16	Medellín	VISITAS DE INSPECCION
10	Calle 101 aa76d 38	Medellín	VISITAS DE INSPECCION

11	Cra 104 74a 39	Medellín	VISITAS DE INSPECCION
12	Calle 104f 74-24	Medellín	VISITAS DE INSPECCION

3.1.2. ACTIVIDADES DE LA INTERVENTORÍA RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN DEL COMPONENTE SOCIAL, AL INTERIOR DE SU CONTRATO

La interventoría realizará una descripción detallada de las actividades ejecutadas para dar cumplimiento a la ejecución del componente social al interior de su contrato, de acuerdo a lo estimado por la guía de manejo socio ambiental y demás normas vigentes.

3.1.3. CONSOLIDADO DE LA GESTIÓN SOCIAL:

GESTION SOCIAL EN OBRA - APLICACIÓN GMSA																					
PERIODO DEL INFORME	CARTELERAS	BUZÓN	PIEZAS COMUNICACIONALES	REUNIÓN INICIO		REUNIÓN AVANCE		REUNIÓN FINAL		COMITÉ CIUDADANO DE OBRA – CCO		RECORRIDOS CON COMUNIDAD		PQRS ATENDIDAS	PQRS X ATENDER	CONTRATACIÓN DEM.O.	CONTRATACIÓN DEM.O. LOCAL	CAPACITACIONES		ACTIVIDADES DE SOSTENIBILIDAD		INFORMES
				# Reuniones	# Asistentes	# Reuniones	# Asistentes	# Reuniones	# Asistentes	# CCO	# Asistentes	# Recorridos	# Asistentes					# Recorridos	# Asistentes	# Actividades	# Asistentes	
Mes 3																X	X					X

Instructivo para diligenciar el Consolidado de gestión social:

- **Periodo del informe: 1 al 31 de MARZO de 2026**
- **Carteleras:** N/A.
- **Buzón:** N/A
- **Piezas Comunicacionales:** N/A
- **Reunión de Inicio:** 0
- **Reunión de Avance:** 0
- **Reunión Final:** N/A
- **Comité Ciudadano de Obra – CCO:** N/A
- **Recorridos con Comunidad:** N/A
- **PQRS Atendidas:** N/A **PQRS por Atender:** N/A
- **Contratación de Mano de Obra:** 10

- **Contratación de Mano de Obra Local:** N/A Debido a la dinámica del contrato, se dificulta contratar personal de la zona, porque se va ejecutando de acuerdo a los requerimientos de los inspectores o del supervisor del contrato, situación que requiere cambios constantes en los frentes de trabajo a intervenir.
- **Capacitaciones**: N/A
- **Actividades de Sostenibilidad:** N/A
- **Informes:** 11

3.1.4. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES DE LA INTERVENTORÍA CON RELACIÓN A LAS LABORES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA DE OBRA EN EL DESARROLLO DEL COMPONENTE SOCIAL DE SU CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA.

N/A

3.2. INFORME AMBIENTAL:

3.2.1. PROGRAMAS DEL PLAN DE ACCIÓN AMBIENTAL DE LA OBRA PÚBLICA:

Se debe diligenciar el siguiente formato:

Actividades de obra del periodo:
Se realizo contacto con los sitios de disposición final autorizados, además de tomar las medidas preventivas a minimizar las actividades que generan contaminación.

Plan de Manejo Ambiental en Obra			
Programa	**Gestión de la Interventoría**	**Soporte**	**Anexo o Formatos**
Programa para el manejo de los residuos sólidos (comunes, especiales y peligrosos)	**Dentro de la ejecución realizada este mes fue dispuesto los RDC en sitios debidamente autorizados.**	**N/A**	**ANEXO AL INFORME.**

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (604) 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Plan de Manejo Ambiental en Obra			
Programa	**Gestión de la Interventoría**	**Soporte**	**Anexo o Formatos**
Programa para el control de emisiones atmosféricas	**Para la ejecución realizada el material particulado se realiza cierre del área a demoler, medida que aplaca las emisiones de la demolición.**	Debido a que la demolición presente se realizó en condiciones abiertas y alejadas de otras viviendas, no fue necesario cerramiento.	**N/A**
Programa para el uso y almacenamiento adecuado de materiales de construcción	**PARA ESTA OBRA NO SE ALMACENAN MATERIALES**	**N/A**	**N/A**
Programa para la protección del suelo	**PARA ESTA OBRA NO HAY DEGRADACION O AFECTACION A SUELOS**	**N/A**	**N/A**

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (604) 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Plan de Manejo Ambiental en Obra			
Programa	**Gestión de la Interventoría**	**Soporte**	**Anexo o Formatos**
Programa para el manejo de sustancias químicas peligrosas en obra	**Se realiza rotulación de la sustancia quima que se utiliza en la obra**	**N/A**	**N/A**
Programa para el manejo de maquinaria, vehículos y equipos en la obra	**N/A. La mayor parte del contrato se ejecuta con demolición manual, en los casos puntuales que se requiere maquinaria se realiza una inspección ocular en campo debido a que no se cuenta con un equipo permanente para dichas actividades**	**N/A**	**N/A**

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (604) 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Plan de Manejo Ambiental en Obra			
Programa	**Gestión de la Interventoría**	**Soporte**	**Anexo o Formatos**
Programa de prevención de la Contaminación de Cuerpos de Agua y Redes de Servicio s Públicos	**La intervención que se realiza no se hace cerca de cuerpos de agua, se realiza demolición manual.**	**N/A**	**N/A**
Programa para la gestión de la fauna y flora	**Para esta obra**	**N/A**	**N/A**
Programa para el ahorro y uso eficiente de agua y energía	**N/A**	**N/A**	**N/A**

Plan de Manejo Ambiental en Obra			
Programa	**Gestión de la Interventoría**	**Soporte**	**Anexo o Formatos**
Programa para el manejo de campamentos e instalaciones temporales	**Para esta obra**	**N/A**	**N/A**

Formatos del contratista entregados a la interventoría		
Nombre del Anexo	**Cumplimiento**	
	Si	**No**
Informe Mensual del Contratista	**X**	
Consumo de agua y energía	**N/A**	
Control de sustancias químicas	**N/A**	
Planillas de escombro	**X**	
Planilla de residuos sólidos	**N/A**	
Registro de Capacitaciones	**N/A**	
Registro de tala y trasplante	**N/A**	
Suministro de material de construcción	**N/A**	
Calificaciones Mensual de la Gestión y Desempeño del Contratista		

1.1.1. PROGRAMA DE CAPACITACIONES Y/O INDUCCIONES REALIZADAS:
N/A para este contrato

1.1.2. PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO (FORMATO INDICADORES)
N/A para este contrato

1.1.3. SEGUIMIENTO AL PRESUPUESTO AMBIENTAL (FORMATO VIGENTE)
N/A para este contrato

1.1.4. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES DE LA INTERVENTORÍA CON RELACIÓN A LAS LABORES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA DE OBRA EN EL DESARROLLO DEL COMPONENTE AMBIENTAL DE SU CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA
N/A para este contrato

1.1.5. ACTIVIDADES DE LA INTERVENTORÍA RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN DEL COMPONENTE AMBIENTAL, AL INTERIOR DE SU CONTRATO.
La interventoría realizará una descripción detallada de las actividades ejecutadas para dar cumplimiento a la ejecución del componente ambiental al interior de su contrato, de acuerdo a lo estimado por la guía de manejo socio ambiental y demás normas vigentes. N/A.

1.2. INFORME DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO - SST:
La interventoría deberá verificar y garantizar que el contratista cumpla con la normatividad y requisitos legales vigentes asociados a la Seguridad y Salud en el Trabajo durante la ejecución de las obras.

Como soporte del cumplimiento de dicha verificación el interventor deberá diligenciar los siguientes ítems.

PROGRAMA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO – SST (CONTRATISTA DE OBRA) La interventoría realizará una descripción de las actividades de monitoreo y seguimiento realizadas para verificar el desarrollo del componente de Salud y Seguridad en el Trabajo por parte del contratista de Obra Pública. Debe incluir copia de los anexos referentes a la gestión del contratista, requeridos en el contrato y de acuerdo a lo estimado en el siguiente cuadro.

DATOS GENERALES	
Contratista: HACE INGENIEROS SAS	**Contrato de Obra:** 4600104733 DE 2025
Interventoría: N/A	**Contrato de Interventoría: N/A**
Periodo reportado: Mes: MARZO	Año**:** 2026

Objeto del Proyecto: EJECUTAR LAS DEMOLICIONES REQUERIDAS POR LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

ACTIVIDADES EN OBRA: Se realizaron actividades de demolición y limpieza en las obras.

INFORME MENSUAL SST			
Programa	**Gestión de la Interventoría**	**Soporte**	**Anexo o Formatos**
Reglamento de higiene y seguridad industrial	Tiene por objeto mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la salud en el trabajo, que conlleva la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones.		Anexo al informe – Asistencia a capacitaciones o pausas activas.

INFORME MENSUAL SST			
Programa	**Gestión de la Interventoría**	**Soporte**	**Anexo o Formatos**
Medicina preventiva y del trabajo	El objetivo es informar y sensibilizar a los empleados sobre prácticas seguras y riesgos potenciales en el entorno laboral. previniendo los accidentes e incidentes laborales.		Anexo al informe – Asistencia a capacitaciones y permiso
Entrega de dotación y elementos de protección personal	Se entrega EPP para el personal en las demoliciones cumpliendo con los lineamientos dados.		Anexo al Informe – Soporte de entrega EPP.

INFORME MENSUAL SST			
Programa	**Gestión de la Interventoría**	**Soporte**	**Anexo o Formatos**
Plan de Inducciones y Capacitaciones	Se realiza inducción al personal, con el objetivo de garantizar condiciones de trabajo seguro y saludable en el desarrollo de las distintas actividades, a través de la promoción, de la salud y de la identificación, evaluación y control del riesgo.		Anexo al Informe – Planilla de asistencia
Programa de Inspecciones	Las inspecciones, es identificar y evaluar condiciones y prácticas en el lugar de trabajo para asegurar que cumplan con los estándares de seguridad y salud. Comprobar que los equipos y maquinaria estén en buen estado y se utilicen correctamente para minimizar el riesgo de fallos o accidentes.		Anexo al Informe

INFORME MENSUAL SST			
Programa	**Gestión de la Interventoría**	**Soporte**	**Anexo o Formatos**
Orden y aseo frentes de trabajo	Mantener el orden y el aseo no solo contribuye a un entorno de trabajo más seguro y eficiente, sino que también ayuda a cumplir con las normativas legales y a promover una cultura de seguridad y responsabilidad.		No Aplica
Accidentes de trabajo – Ausentismo laboral	No se presentan incidentes, accidentes ni ausentismo durante las ejecuciones del mes	N/A	No Aplica
Afiliaciones sistema Seguridad Social	Se entrega planilla de seguridad social al día de la empresa, con el personal en la ciudad.	N/A	N/A

INFORME MENSUAL SST			
Programa	**Gestión de la Interventoría**	**Soporte**	**Anexo o Formatos**
Protocolo de Bioseguridad COVID – 19	N/A	N/A	N/A

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (604) 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Para hacerle seguimiento al programa de salud y seguridad en el trabajo – SST, es necesario diligenciar los siguientes formatos:

VERIFICACIÓN MENSUAL
REQUISITOS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA CONTRATISTAS

N° del contrato:	4600104733 DE 2025			**Empresa Contratista:**	HACE INGENIEROS SAS			
Objeto de contrato:	EJECUTAR LAS DEMOLICIONES							
Nombre del responsable:	MARIA ALEJANDRA GARCIA CANO							
Fecha de verificación:	31/03/2026	**N° Licencia en SST:**		2019060360210	**PLAN DE ACCION (Cuando no cumple)**			
Verificación previa ingreso del trabajador	**CUMPLE**			**OBSERVACIONES**	**DESCRIPCION**	**RESPONSABLE**	**FECHA PROGRAMADA**	**SEGUIMIENTO**
	SI= 5 – 3	**NO= 0**	**NA= 5**					
El contratista tiene afilados al Sistema de Seguridad Social, en la clase de riesgo que corresponda a todos sus trabajadores. (Se debe verificar el pago por el periodo trabajado)	**5**							
El personal cuenta con inducción en SST, para el contrato especifico (Según las normas y entrenamiento para el oficio). Y la respectiva evaluación.	**5**							
Se cuenta con examen médico de ingreso, periódico para el cargo a ocupar realizado por un profesional competente.	**5**							

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (604) 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Cuando deba ejecutar tareas de alto riesgo Alturas, se cuenta con la certificación de competencias del personal para ejecutar dicha actividad Nota: En el caso de alturas, la entidad/persona natural	**5**							

que expide el certificado debe contar con resolución aprobada y expedidas por el ministerio. En caso de actividades de alturas se debe contar con el certificado de aptitud médica para dicha actividad.	5							
En caso de ejecutar tareas de alto riesgo (Soldadura, Espacios Confinados, Eléctricos) se cuenta con la certificación de competencias del personal para ejecutar dicha actividad. En caso de actividades de espacios confinados se debe contar con el certificado de aptitud médica para dicha actividad.			**5**					
Solicitar registro de entrega de EPP. Se evidencia entrega y Uso de elementos de protección personal en las tareas a ejecutar (Ficha técnica del fabricante o proveedor).	**5**							
Cuenta con contrato laboral y fotocopia de la cédula. Nota: No se permitirá la subcontratación a través de cooperativas, empresas temporales, o personas naturales	**3**							
Verificación de ejecución del contrato								
Realiza oportunamente el reporte, la investigación de los accidentes y casi accidentes de trabajo conforme a la Resolución 1401 de 2007, define y monitorea los planes de acción			**5**					
Cuenta con personal formado en SST según las especificaciones del contrato y la resolución 0312 de 2019.	**5**							
Matriz de Peligros actualizada que identifique los peligros y riesgos relacionados con la tarea a realizar, su valoración y control implementado.	**5**							

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (604) 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Realiza seguimiento al cronograma o plan anual de actividades de seguridad y salud en el trabajo (debe incluir actividades de control para los riesgos prioritarios) y encontrarse acorde y aplicable para las actividades desarrolladas en el contrato)	**5**							
Cuenta con el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y este se encuentra publicado en lugares visibles en donde los trabajadores lo identifiquen fácilmente en la obra.			**5**					
Se consolidan indicadores de ausentismo, accidentalidad y mortales durante la ejecución de la obra. Se realiza el análisis estadístico.	**3**							
Se cuenta con control adecuado de vehículos que ingresan a la obra (Seguridad social, soat, licencias de operación según aplique)	**5**							
Asiste a las actividades convocadas por la alcaldía en el tema de SST.			5					
Los frentes de Obra cuentan orden y aseo de manera adecuada	**5**							
El programa de inspecciones de seguridad definido según los riesgos prioritarios (Maquinas, herramientas, materiales, equipos, instalaciones locativas, equipo de protección personal), se define e implementa en la obra.	**5**							
El programa de mantenimiento preventivo de las herramientas y equipos que se usan en desarrollo del contrato se implementa de manera adecuada.	**5**							
Están señalizados y rotulados los recipientes que contienen sustancias o productos químicos incluyendo los envases donde se realicen transvases y se tiene establecido e identificado un sitio de almacenamiento seguro para los mismos.			**5**					
Si requiere el uso de sustancias químicas, deberá Mantener disponibles las Fichas Técnicas u Hojas de Seguridad de las Sustancias o Productos			5					

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (604) 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Químicos. Y el respectivo registro de uso y manipulación.			5					
Las condiciones de seguridad para el almacenamiento de líquidos inflamables (gasolina y ACPM), es suficiente y adecuado y cuanta con la matriz de compatibilidad.			**5**					
El plan de emergencia para el proyecto cumple con lo requerido (se evidencia la capacitación de la brigada, procedimientos en caso de emergencia, señalización adecuada, etc.)			**5**					
Se tiene el registro de la socialización al personal del plan de emergencia			**5**					
Las conexiones eléctricas, cuenten con protección y están debidamente instaladas.			**5**					
Cuentan con botiquín de primeros auxilios dotado de acuerdo con los riesgos y la cantidad adecuada.	**5**							
En la obra el contratista tiene el control de los extintores y están ubicados estratégicamente de acuerdo con la obra.	**3**							
Tareas de Alto Riesgo - Tareas críticas								
Existen los procedimientos y los permisos para tareas de alto riesgo y/o críticas, identificadas, visibles y diligenciados acorde con las tareas rutinarias y no rutinarias, firmados. Se cuenta con el registro del personal según actividad a realizar.	**5**							
Cuenta con la capacitación, entrenamiento y certificación de las personas que realizan tareas de alto riesgo: Para trabajos en alturas y espacios confinados capacitación y concepto de aptitud médica según Resolución 1409 de 2012.	**5**							
Los equipos y EPP para las tareas de alto riesgo están certificados y cumplen con lo establecido en la Norma. Realizan inspecciones.	**3**							

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (604) 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Cuenta con el programa de protección contra caídas y lo implementa.	**5**							
Los andamios o estructuras para trabajar en alturas estén en perfecto estado de seguridad; anclados sobre una superficie sólida y segura y que estén certificados.			5					
Actividades post retiro de personal								
Cuentan con paz y salvo de salarios, liquidaciones y prestaciones sociales del personal.								

Puntaje Obtenido			***0***			
PUNTAJE FINAL		**PTOS**	**PORCENTAJE FINAL**	**81,25%**	**%**	**CONVENCIONES** > 80%OPTIMO ENTRE 50-80 % MEDIO < 50% NO CUMPLE
Nombre del Supervisor: María Alejandra García Cano			**Nombre del Contratista: HACE INGENIEROS SAS**			
cc 1.214.739.465 **firma:** Alejandra García			**cc 98.715.246** **firma** DIEGO A. RINAPO R.			
Fecha: 31/03/2026						

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (604) 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

1.2.1.1. **OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES DE LA INTERVENTORÍA CON RELACIÓN A LAS LABORES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA DE OBRA EN EL DESARROLLO DEL COMPONENTE DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO DE SU CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA.**

La interventoría formulará según aplique las observaciones, recomendaciones y/o conclusiones con relación al desempeño del contratista de obra en el cumplimiento de sus funciones en el desarrollo del componente de Salud y Seguridad en el trabajo del contrato de ejecución de la obra pública.

3.3.2 **PROGRAMA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO – SST (INTERVENTORÍA DE OBRA).**

- En caso de ejecutar tareas de alto riesgo (Alturas, Soldadura, espacios confinados) entregar la certificación de competencias del personal para ejecutar dicha actividad. Nota: En el caso de alturas, la entidad/persona natural que expide el certificado debe contar con resolución aprobada y expedidas por el ministerio.
- Solicitar registro de entrega y de uso de elementos de protección personal en las tareas a ejecutar.
- Realizar oportunamente el reporte, la investigación de los accidentes y casi accidentes de trabajo conforme a la resolución vigente, en caso de presentarse anexar el reporte.
- Consolidar indicadores de ausentismo, accidentalidad y mortales durante la ejecución de la obra de acuerdo con la formulación establecida por la norma.
- Presentar paz y salvo de salarios, liquidaciones y prestaciones sociales del personal.

2. **INFORME ADMINISTRATIVO DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA:**

4.1 CONTROL DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA ASOCIADO AL PROYECTO (ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO) Y DE SU PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL:

Cuadro que dé cuenta del personal de la obra, las novedades laborales presentadas durante el mes y la verificación del estado de pagos al Sistema de Seguridad Social Integral; con los análisis, observaciones y conclusiones de la interventoría.

Periodo de Cotización	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Total, pagado en el periodo
Salud Septiembre, pensiones agosto.	894445033	2.808.100	11.413.700	3.533.500	20.563.100
Salud Octubre, Pensiones septiembre	90320532	2.726.500	11.0087.800	3.416.800	19.957.600

Los valores de la planilla incluyen los del personal administrativo disponible para las ejecuciones.

4.2 CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA DE OBRA FRENTE A LA SUBCONTRATACIÓN:

N/A

4.3 INFORME DE LA MATERIALIZACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO DE OBRA Y SU MITIGACIÓN:

N/A

4.4 CONTROL A LOS COMPROMISOS DEFINIDOS EN LOS COMITÉS DE OBRA:

Este mes de diciembre estamos cumpliendo con los compromisos efectuados en las obras tales como visitas y demoliciones.

4.5 CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA:

Para el mes de diciembre, solo hace comunicación por correo electrónico, sin oficios enviados o recibidos.

4.6 COPIA DE LA BITÁCORA:

Se realizan informes por visitas y ejecución realizada, por tal motivo no se lleva bitácora.

5 INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

5.1 SEGUIMIENTO FINANCIERO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA:

- Relación de la Imputación del gasto:

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal (Pospre)	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido (Solpedido)	Registro Presupuestal (Pedido)

- Relación de los pagos realizados:

Registro Presupuestal (No. Pedido)	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción (Documento de Material)	Valor Facturado (valor Recibido)

- Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos:

Contrato	Registro Presupuestal (Pedido)	Grupo de compras	Denominación Grupo de Compras	Proyecto	Nombre del proyecto	Valor proyecto por pedido	Valor Facturado por proyecto del pedido	Saldo por proyecto del pedido

- Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	$1.200.000.000
Adiciones	$240.613.998
Total, valor del contrato más adiciones	$1.440.613.998
Pagos Realizados (Acumulado) al 30/09/2025	$ 179.969.731,84
Saldo del contrato al 04/03/2026	$802.052.290
Porcentaje de ejecución financiera	44%
Porcentaje de ejecución física	56%

5.2 RELACIÓN DE PAGOS Y AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO (SI APLICA) DEL CONTRATO DE OBRA:

Relación de pagos realizados en el numeral 5.1

5.3 CONTROL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO Y DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN EL CONTRATO DE OBRA (SI APLICA):

N/A, al contrato no aplica anticipos

5.4 RELACIÓN DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES:

El Interventor, deberá dejar evidenciado el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista en materia de impuestos y contribuciones aplicables al respectivo contrato.

5.5 RELACIÓN DE LOS IMPREVISTOS CAUSADOS, DEMOSTRADOS Y FACTURADOS:

N/A

6 INFORME JURÍDICO: A la fecha no se tienen reportes de incumplimiento, las garantías fueron actualizadas conforme a las modificaciones suscritas

6.1 RELACIÓN DE RECLAMACIONES:

N/A

6.2 RELACION DE SANCIONES:


N/A

6.3 CONTROL AL ESTADO DE LAS GARANTÍAS DEL CONTRATO DE OBRA:

Cuadros que dan cuenta de las condiciones iniciales y el estado de todas y cada una de las coberturas que amparan a la entidad, relacionadas con la ejecución del contrato de obra.

Nombre Aseguradora	N° Póliza y/o garantía	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
CHUBB SEGUROS COLOMBIA SA	78399	Cumplimiento de contrato	11-04-2025	01-07-2026	14-04-2025	$240.000.000
		Calidad del Servicio	11-04-2025	01-07-2026	14-04-2025	$240.000.000
		Salarios y Prestaciones Sociales	11-04-2025	01-07-2026	14-04-2025	$120.000.000
		Estabilidad de la obra	31-12-2025	31-12-2031	14-04-2025	$120.000.000
CHUBB SEGUROS COLOMBIA SA	71939	Responsabilidad civil extracontractual	11-04-2025	31-12-2025	14-04-2025	$284.700.000

7 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE VISITAS A PREDIOS Y DEL AVANCE DE LA OBRA:

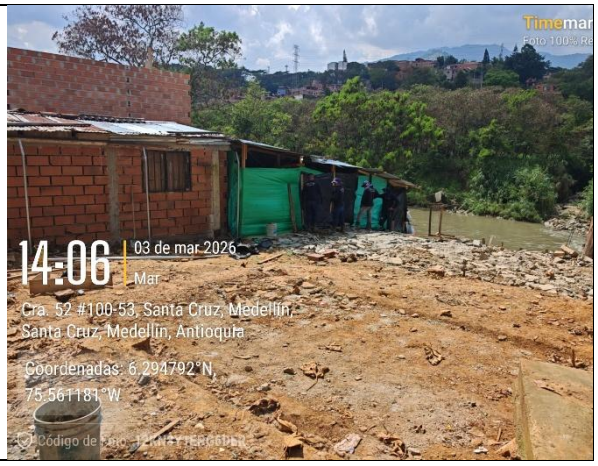
1	Cra 52 # 100 - 53	

		
2	Parqueadero Frente universidad de Medellín	 


3	Calle 112 # 67-38	 	
4	Calle 63a #37 Villa hermosa		

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (604) 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

5	Calle 59a #21b-2	
6	CRA 36 #66d -53	
7	Calle 27 # 46-70	

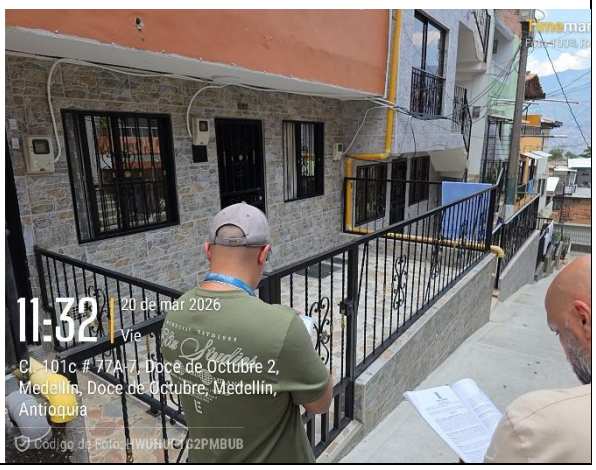8	Cra 76 # 53-215	
9	Cra 82 #104c-16	
10	Cra 77a 101bb 16	

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (604) 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

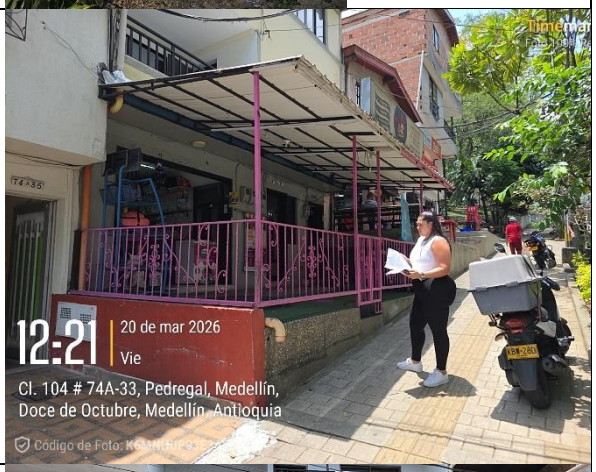11	Calle 101 aa76d 38	
12	Cra 104 74a 39	
13	Calle 104f 74-24	

8 RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES GENERALES DE LA INTERVENTORÍA SOBRE EL DESARROLLO DEL CONTRATO DE OBRA:

Con la ayuda de la supervisión del contrato ha sido muy importante la depuración de listas y ordenes de policía obteniendo información veraz y oportuna que nos ha permitido establecer un plan de intervenciones a ejecutar.

CHARLAS DE SEGURIDAD

Hace Ingenieros	ASISTENCIA REUNIONES Y CAPACITACIONES	Código: HI SST 013 – 3 V01 Fecha creación: 14/04/2022 Fecha actualización:

FECHA	03-03-2026
TEMA CONTENIDO	Importancia del orden y limpieza en la obra. Prevenir accidentes laborales mediante la implementación de buenas practicas de orden y aseo en el area de trabajo.

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO ID	CARGO	FIRMA
1	Alvaro Montoy	6004222	auxiliar	
2	Raul Guillermo Cast.	82263191	oficial	
3	Jhonathan Goya	1003526537	Auxiliar	
4	Diana Garcia	[illegible]	[illegible]	
5	CARLOS VILLOPA	1067936574	AUXILIAR	CARLOS VILLOPA
6	Carlos José Ruiz Cardenas	1038648020	Ayudante	
7	Sebastian Soto Quiroz	1003127621	Ayudante	
8				
9				
10				
11				
12				

Alexandra Garcia
RESPONSABLE DE LA CAPACITACIÓN:

Hate Ingenieros SAS	**ASISTENCIA REUNIONES Y CAPACITACIONES**	**Código: HI SST 013 – 3** **V01** **Fecha creación: 14/04/2022** **Fecha actualización:**


FECHA	17-03-2026
TEMA	Importancia y uso correcto de los EPP
CONTENIDO	Garantizar la seguridad de los trabajadores mediante el uso adecuado y permanente de los elementos de Protección Personal, Reduciendo el riesgo de accidentes.

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO ID	CARGO	FIRMA
1	Ronel Guillermo Carrillo	88263154	oficial	
2	Jhonathan daza	1003525537	AUXILIAR	
3	Henry Alvarez	1128451414	OFICIAL	
4	Fausto Alonso Santamaria	987058950	auxiliar	
5	Jason osorio	1078191864	conductor	
6	Javier Henao G	1174936 40	conductor	
7	José Modesto A	93300770	oficial	
8	Mauricio montoya S.	1.111.148.718	operador	
9	Carlos José Ruiz Cardona	1038643020	Auxiliar	Carlos Ruiz
10	CARLOS MARIO VILLORIA	1037476574	AUXILIAR	CARLOS VILLORIA
11	Yasson cardoba	1003978712	oficial	
12				

Alejandra García
RESPONSABLE DE LA CAPACITACIÓN:

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (604) 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

PERMISO EN CALIENTE

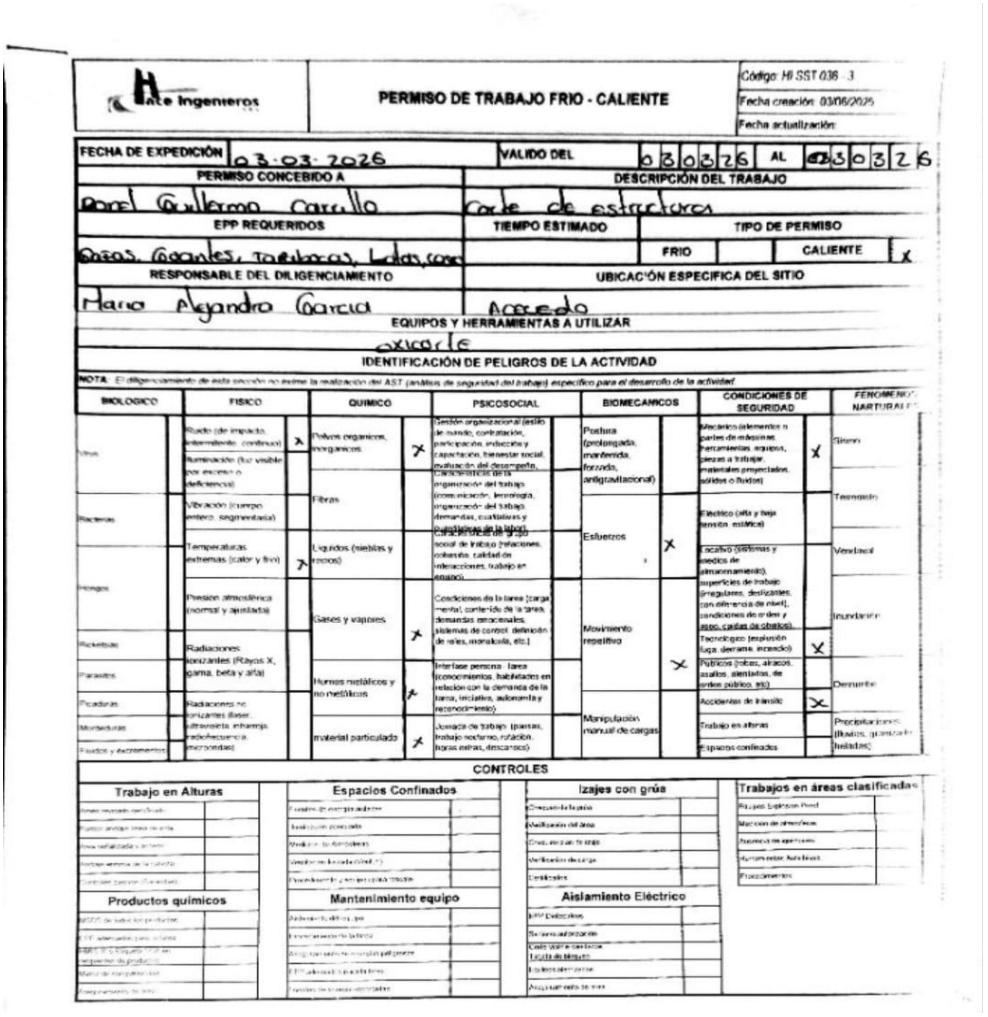

Hate Ingenieros

PERMISO DE TRABAJO FRIO - CALIENTE

Código: HI SST 036 .3
Fecha creación: 03/06/2025
Fecha actualización:

FECHA DE EXPEDICIÓN	03-03-2026	VALIDO DEL	030326	AL	030326
PERMISO CONCEBIDO A		DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO			
Oscar Guillermo Carrillo		Corte de estructuras			
EPP REQUERIDOS		TIEMPO ESTIMADO	TIPO DE PERMISO		
Gafas, Guantes, Tapabocas, Ladrascon			FRIO		CALIENTE	X
RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO		UBICACIÓN ESPECIFICA DEL SITIO			
Maria Alejandra Garcia		Acueducto			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

oxicorte

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS DE LA ACTIVIDAD


NOTA: *El diligenciamiento de esta sección no exime la realización del AST (análisis de seguridad del trabajo) específico para el desarrollo de la actividad*

BIOLOGICO	FISICO		QUIMICO		PSICOSOCIAL	BIOMECANICOS		CONDICIONES DE SEGURIDAD		FENOMENOS NATURALES	
Virus	Ruido (de impacto, intermitente, continuo)	X	Polvos organicos, inorganicos	X	Gestión organizacional (estilo de mando, contratación, participación, inducción y capacitación, bienestar social, evaluación del desempeño,	Postura (prolongada, mantenida, forzada, antigravitacional)		Mecanico (elementos o partes de máquinas, herramientas, equipos, vehiculos, materiales proyectados, sólidos o fluidos)	X	Sismo	
Bacterias	Iluminación (luz visible por exceso o deficiencia)		Fibras		Características de la organización del trabajo (comunicación, tecnología, organización del trabajo, demandas cualitativas y cuantitativas de la labor)			Eléctrico (alta y baja tensión, estática)		Tormenta	
Hongos	Vibración (cuerpo entero, segmentaria)				Características del grupo social de trabajo (relaciones, cohesión, calidad de interacciones, trabajo en equipo)	Esfuerzos	X	Locativo (sistemas y medios de almacenamiento, superficies de trabajo irregulares, deslizantes, con diferencia de nivel), condiciones de orden y aseo, caidas de objetos)		Vendaval	
Rickettsias	Temperaturas extremas (calor y frio)	X	Liquidos (nieblas y rocios)					Tecnológico (explosión fuga, derrame, incendio)	X	Inundación	
Parasitos	Presion atmosférica (normal y ajustada)		Gases y vapores	X	Condiciones de la tarea (carga mental, contenido de la tarea, demandas emocionales, sistemas de control, definición de roles, monotonía, etc.)	Movimiento repetitivo	X	Publicos (robos, ataques, asaltos, atentados, de orden público, etc)		Derrumbe	
Picaduras	Radiaciones ionizantes (Rayos X, gama, beta y alfa)		Humos metálicos y no metálicos	X	Interfase persona - tarea (conocimientos, habilidades en relación con la demanda de la tarea, iniciativa, autonomía y reconocimiento)			Accidentes de transito	X		
Mordeduras	Radiaciones no ionizantes (laser, ultravioleta, infrarroja, radiofrecuencia, microondas)		material particulado	X	Jornada de trabajo (pausas, trabajo nocturno, rotación, horas extras, descansos)	Manipulación manual de cargas		Trabajo en alturas		Precipitaciones (lluvias, granizadas, heladas)	
Fluidos y excrementos								Espacios confinados			

CONTROLES

Trabajo en Alturas		Espacios Confinados		Izajes con grúa		Trabajos en áreas clasificadas	
Productos químicos		Mantenimiento equipo		Aislamiento Eléctrico			

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (604) 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

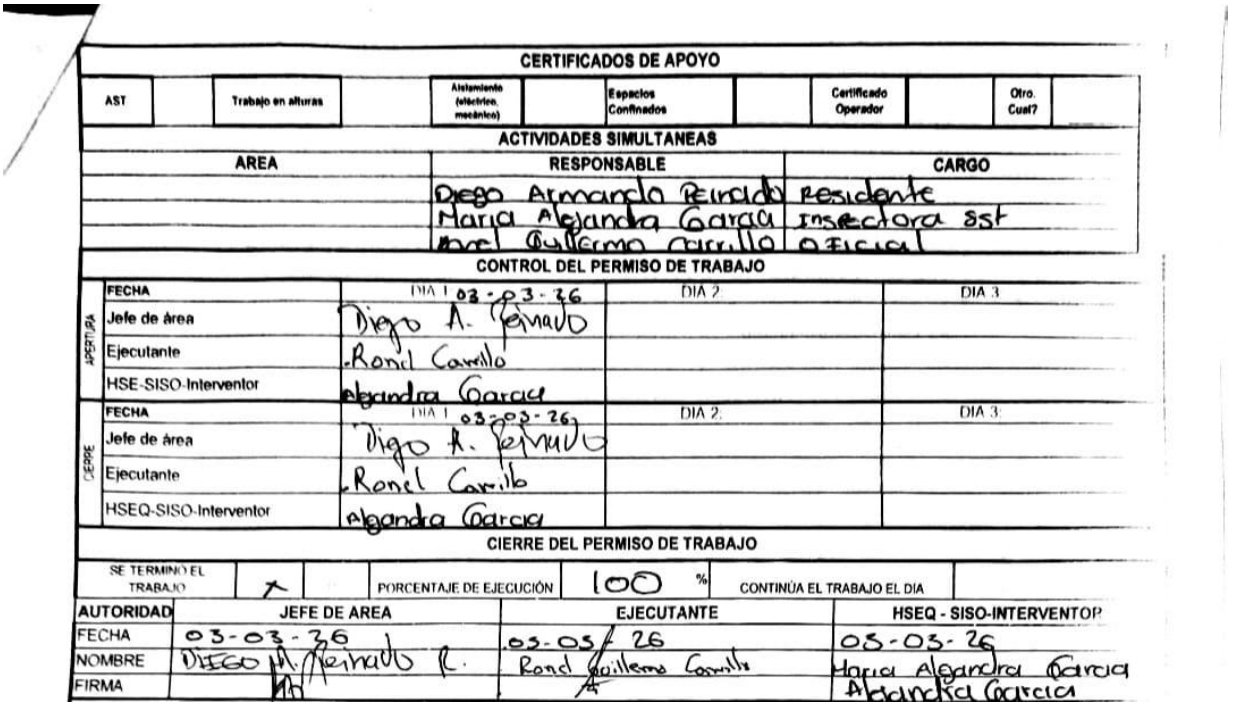

CERTIFICADOS DE APOYO

AST		Trabajo en alturas		Aislamiento (eléctrico, mecánico)		Espacios Confinados		Certificado Operador		Otro. Cual?	

ACTIVIDADES SIMULTANEAS

AREA	RESPONSABLE	CARGO
	Diego Armando Reinaldo	Residente
	Maria Alejandra Garcia	Inspectora SST
	Ronel Guillermo Carrillo	Oficial

CONTROL DEL PERMISO DE TRABAJO

APERTURA	FECHA	DIA 1 03-03-26	DIA 2	DIA 3
	Jefe de área	Diego A. Reinaldo		
	Ejecutante	Ronel Carrillo		
	HSE-SISO-Interventor	Alejandra Garcia		


CIERRE	FECHA	DIA 1 03-03-26	DIA 2	DIA 3
	Jefe de área	Diego A. Reinaldo		
	Ejecutante	Ronel Carrillo		
	HSEQ-SISO-Interventor	Alejandra Garcia		

CIERRE DEL PERMISO DE TRABAJO

SE TERMINÓ EL TRABAJO	X		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	100 %	CONTINÚA EL TRABAJO EL DIA	

AUTORIDAD	JEFE DE AREA	EJECUTANTE	HSEQ - SISO-INTERVENTOR
FECHA	03-03-26	03-03-26	03-03-26
NOMBRE	DIEGO A. Reinaldo R.	Ronel Guillermo Carrillo	Maria Alejandra Garcia Alejandra Garcia
FIRMA			

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (604) 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

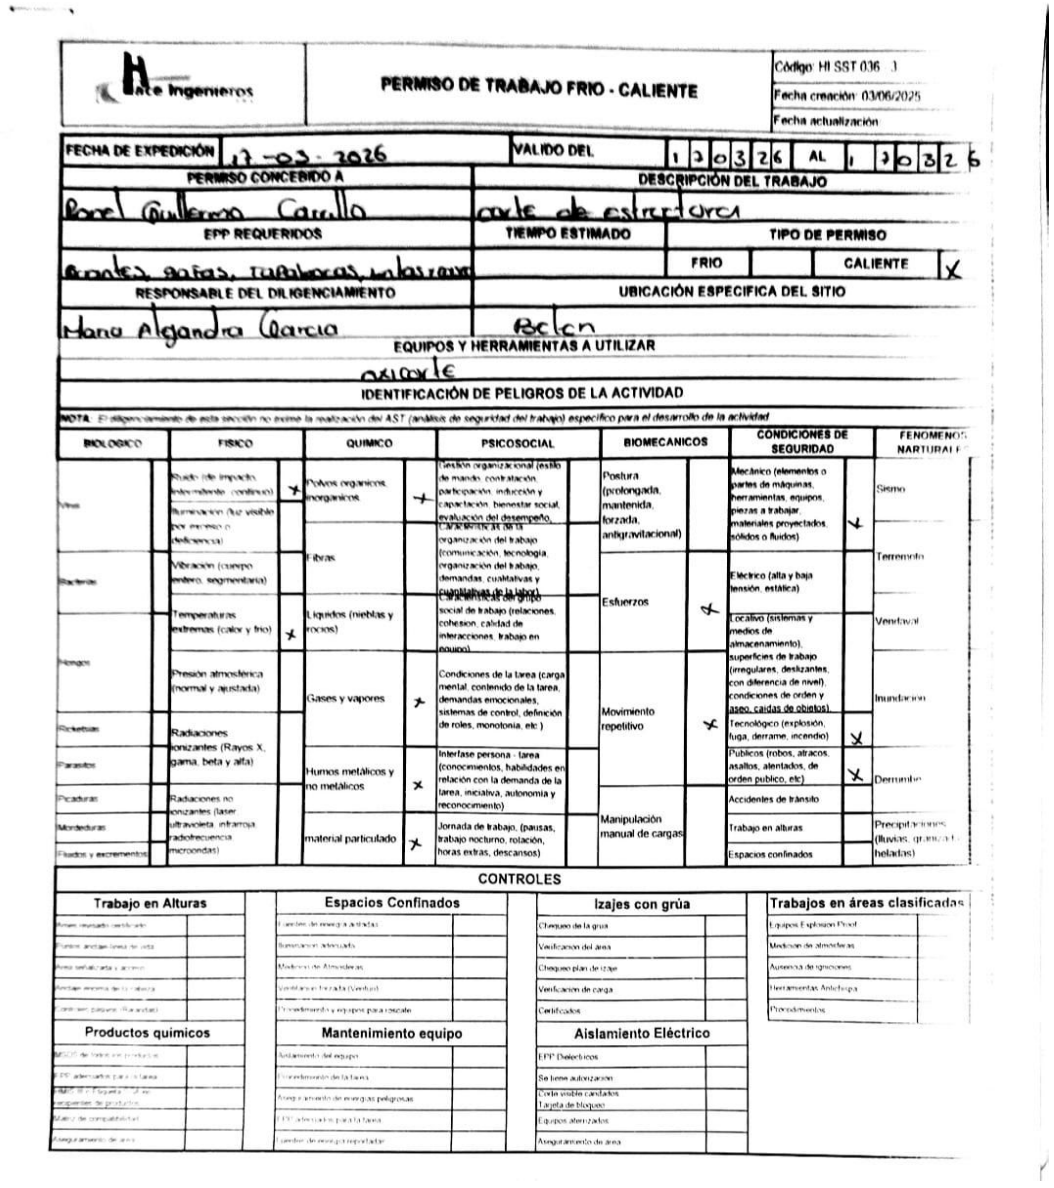

Hate Ingenieros

PERMISO DE TRABAJO FRIO - CALIENTE

Código: HI SST 036 .3
Fecha creación: 03/06/2025
Fecha actualización:

FECHA DE EXPEDICIÓN	17-03-2026	VALIDO DEL	17/03/26 AL 17/03/26
PERMISO CONCEBIDO A	Raul Guillermo Carrillo	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	corte de estructura
EPP REQUERIDOS	Guantes, gafas, tapabocas, botas rojas	TIEMPO ESTIMADO	TIPO DE PERMISO: FRIO [ ] CALIENTE [X]
RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO	Hana Alejandra Garcia	UBICACIÓN ESPECIFICA DEL SITIO	Belen

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR: oxicorte

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS DE LA ACTIVIDAD

NOTA: *El diligenciamiento de esta sección no exime la realización del AST (análisis de seguridad del trabajo) específico para el desarrollo de la actividad*

BIOLOGICO	FISICO		QUIMICO		PSICOSOCIAL		BIOMECANICOS		CONDICIONES DE SEGURIDAD		FENOMENOS NATURALES	
Virus	Ruido (de impacto, intermitente, continuo)	X	Polvos organicos, inorganicos	X	Gestión organizacional (estilo de mando, contratación, participación, inducción y capacitación, bienestar social, evaluación del desempeño,		Postura (prolongada, mantenida, forzada, antigravitacional)		Mecánico (elementos o partes de máquinas, herramientas, equipos, piezas a trabajar, materiales proyectados, sólidos o fluidos)	X	Sismo	
Bacterias	Iluminación (luz visible por exceso o deficiencia)		Fibras		Características de la organización del trabajo (comunicación, tecnología, organización del trabajo, demandas, cualitativas y cuantitativas de la labor)		Esfuerzos	X	Eléctrico (alta y baja tensión, estática)		Terremoto	
Hongos	Vibración (cuerpo entero, segmentaria)		Liquidos (nieblas y rocios)		Características del grupo social de trabajo (relaciones, cohesion, calidad de interacciones, trabajo en equipo)				Locativo (sistemas y medios de almacenamiento), superficies de trabajo (irregulares, deslizantes, con diferencia de nivel), condiciones de orden y aseo, caidas de objetos)		Vendaval	
Ricketsias	Temperaturas extremas (calor y frio)	X	Gases y vapores	X	Condiciones de la tarea (carga mental, contenido de la tarea, demandas emocionales, sistemas de control, definición de roles, monotonia, etc.)		Movimiento repetitivo	X	Tecnológico (explosión, fuga, derrame, incendio)	X	Inundacion	
Parasitos	Presión atmosférica (normal y ajustada)		Humos metálicos y no metálicos	X	Interfase persona - tarea (conocimientos, habilidades en relación con la demanda de la tarea, iniciativa, autonomia y reconocimiento)				Públicos (robos, atracos, asaltos, alentados, de orden público, etc)	X	Derrumbe	
Picaduras	Radiaciones ionizantes (Rayos X, gama, beta y alfa)								Accidentes de tránsito			
Mordeduras	Radiaciones no ionizantes (laser, ultravioleta, infarroja, radiofrecuencia, microondas)		material particulado	X	Jornada de trabajo, (pausas, trabajo nocturno, rotación, horas extras, descansos)		Manipulación manual de cargas		Trabajo en alturas		Precipitaciones (lluvias, granizo o heladas)	
Fluidos y excrementos									Espacios confinados			

CONTROLES

Trabajo en Alturas		Espacios Confinados		Izajes con grúa		Trabajos en áreas clasificadas	
Arnes anclado certificado		Cuerdas de energia activadas		Chequeo de la grua		Equipos Explosion Proof	
Puntos anclajes arnes no usa		Señalizacion adecuada		Verificacion del area		Medicion de atmosferas	
Area señalizada y aislada		Medicion de Atmosferas		Chequeo plan de izaje		Ausencia de ignicciones	
Anclaje arnes de la cabeza		Ventilacion forzada (Ventiducto)		Verificacion de carga		Herramientas Antichispa	
Cordones paraos (Rascados)		Procedimiento y equipos para rescate		Celifcados		Procedimientos	
Productos quimicos		**Mantenimiento equipo**		**Aislamiento Eléctrico**			
MSDS de todos los productos		Aislamiento del equipo		EPP Dieléctricos			
EPP adecuados para la tarea		Consignación de la fuente		Se tiene autorizacion			
Rombo de Peligrosidad (Arriba, izquierda, de productos		Aseguramiento de energias peligrosas		Cinta visible candados Tarjeta de bloqueo			
Matriz de compatibilidad		EPP adecuados para la tarea		Equipos aterrizados			
Aseguramiento de area		Cuerdas de energia reportadas		Aseguramiento de area			

CERTIFICADOS DE APOYO

AST		Trabajo en alturas		Aislamiento (electrico, mecanico)		Espacios Confinados		Certificado Operador		Otro Cual?	

ACTIVIDADES SIMULTANEAS

AREA	RESPONSABLE	CARGO
	Maria Alejandra Garcia	Inspectora SST
	Diego Armando Peinado	Ingeniero Residente
	Rafael Guillermo Carrillo	Oficial

CONTROL DEL PERMISO DE TRABAJO

	FECHA	DIA 1	DIA 2	DIA 3
APERTURA	Jefe de área	Diego Peinado		
	Ejecutante	Guillermo Carrillo		
	HSE-SISO-Interventor	Alejandra Garcia		
	FECHA	DIA 1	DIA 2	DIA 3
CIERRE	Jefe de área	Diego Peinado		
	Ejecutante	Guillermo Carrillo		
	HSEQ-SISO-Interventor	Alejandra Garcia		

CIERRE DEL PERMISO DE TRABAJO

SE TERMINÓ EL TRABAJO	x		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	100 %	CONTINÚA EL TRABAJO EL DIA	

AUTORIDAD	JEFE DE AREA	EJECUTANTE	HSEQ - SISO-INTERVENTOR
FECHA	17-03-2026	17-03-2026	17-03-2026
NOMBRE	Diego Peinado	Rafael Guillermo Carrillo	Maria Alejandra Garcia
FIRMA	Diego Peinado		Alejandra Garcia

SUSPENSIÓN DEL PERMISO DE TRABAJO

SE CANCELÓ EL PERMISO	SI		NO		MOTIVO	

JEFE DE AREA	EJECUTANTE	HSEQ - SISO	INTERVENTOR
Nombre:	*Nombre:*	*Nombre:*	*Nombre:*
Firma:	*Firma:*	*Firma:*	*Firma:*

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (604) 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

INAPECCION DE OXICORTE

Hace Ingenieros	INSPECCION EQUIPO OXICORTE	Código: HI SST 034 - 18 V01 Fecha creación: 06/06/2025 Fecha actualización:

Fecha:	03-03-2026	**Nombre del operador**	Ronel Guillermo
Ubicación	Acceso	**Nombre del ayudante:**	
N° Contrado	4600104733 de 2025	**Tipo de Equipo:**	
Nombre de la empresa:	Hace Ingenieros	**Responsable**	Alejandra Garcia

Item	Descripción	Estado			OBSERVACIÓN
		Bueno	Malo	No Aplica	
1	Carro porta tubos	✓			
2*	Señalización general	✓			
3	Soplete	✓			
4	Mangueras	✓			
5	Válvulas de seguridad	✓			
6*	Abrazaderas	✓			
7	Manómetros de oxigeno	✓			
8	Manómetros de gas	✓			
9*	Cilindros y traba cilindros	✓			
10	Tarjeta de revisión	✓			
11*	Arresta llamas	✓			
12*	Válvulas Check	✓			
13	Condiciones de las boquillas	✓			

Nota: *El incumplimiento de cualquiera de los ítems 2, 6, 9, 11 y/o 12 invalida la aprobación del equipo de oxicorte por parte del encargado. Para el resto de los ítems que se encuentren en observación (malo) el responsable del equipo debera gestionar su mantenimiento.

Conforme a la presente inspección se autoriza el uso del Equipo de Oxicorte:

SI ☒ No ☐

FIRMA RESIDENTE SST	Alejandra Garcia

Documento al que pertenece: *ITS 051 Seguridad con grúas y equipo pesado*

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (604) 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Hace Ingenieros	INSPECCION EQUIPO OXICORTE	Código: HI-SST-034 V01 Fecha creación: 06/06/2025 Fecha actualización:

Fecha:	17-03-2026	Nombre del operador	Abel carrillo
Ubicación	Belen	Nombre del ayudante:	
N° Contrato	4600104733 de 2025	Tipo de Equipo:	
Nombre de la empresa:	Hace Ingenieros	Responsable	Maria Alejandra Garcia

Item	Descripción	Estado Bueno	Malo	No Aplica	OBSERVACIÓN
1	Carro porta tubos	✓			
2*	Señalización general	✓			
3	Soplete	✓			
4	Mangueras	✓			
5	Válvulas de seguridad	✓			
6*	Abrazaderas	✓			
7	Manómetros de oxigeno	✓			
8	Manómetros de gas	✓			
9*	Cilindros y traba cilindros	✓			
10	Tarjeta de revisión	✓			
11*	Arresta llamas	✓			
12*	Válvulas Check	✓			
13	Condiciones de las boquillas	✓			

Nota: *El incumplimiento de cualquiera de los items 2, 6, 9, 11 y/o 12 invalida la aprobación del equipo de oxicorte por parte del encargado. Para el resto de los items que se encuentren en observación (malo) el responsable del equipo debera gestionar su mantenimiento.


Conforme a la presente inspección se autoriza el uso del Equipo de Oxicorte:

SI ☒ No ☐

FIRMA RESIDENTE SST	Alejandra Garcia

Documento al que pertenece: ITS 051 Seguridad con grúas y equipo pesado

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (604) 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

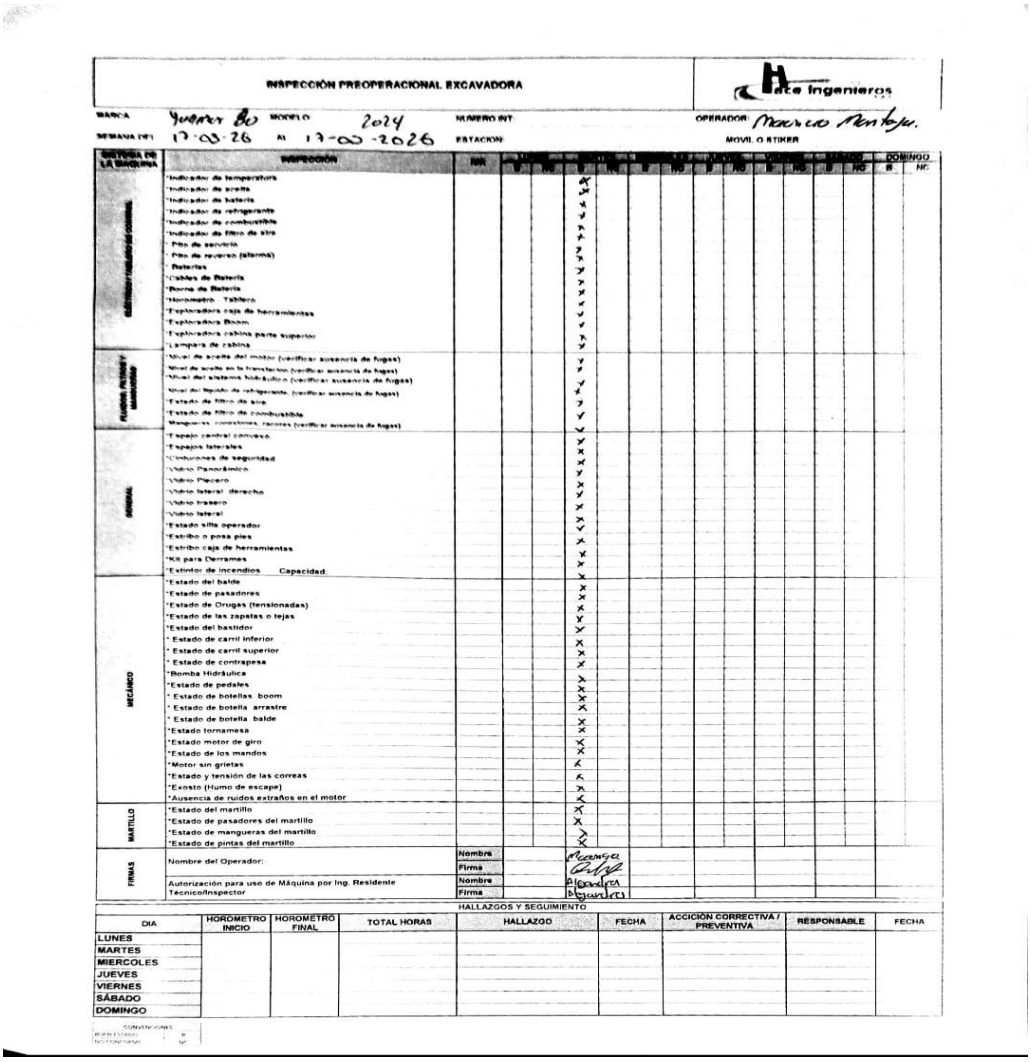

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL EXCAVADORA

Hace Ingenieros

MARCA: Yuchai Bo MODELO: 2024 NUMERO INT: OPERADOR: Marcelo Montoya.

SEMANA DEL: 17-03-26 AL 17-03-2026 ESTACION: MOVIL O ATIKER

CRITERIO DE LA DISCIPLINA	INSPECCIÓN	RTA	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	NC	B	NC	B	NC	B	NC	B	NC	B	NC	B	NC
ELEMENTOS REQUERIDOS EN CABINA	*Indicador de temperatura						X									
	*Indicador de aceite						X									
	*Indicador de bateria						X									
	*Indicador de refrigerante						X									
	*Indicador de combustible						X									
	*Indicador de filtro de aire						X									
	* Pito de servicio						X									
	* Pito de reversa (alarma)						X									
	* Baterias						X									
	*Cables de Bateria						X									
	*Borne de Bateria						X									
	*Horometro Tablero						X									
	*Explosadora caja de herramientas						X									
	*Explosadora Boom						X									
	*Explosadora cabina parte superior						X									
	Lampara de cabina						X									
FUGAS, ESTADO Y MANGUERAS	*Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)						X									
	*Nivel de aceite en la transmision (verificar ausencia de fugas)						X									
	*Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)						X									
	*Nivel del liquido de refrigerante. (verificar ausencia de fugas)						X									
	*Estado de filtro de aire						X									
	*Estado de filtro de combustible						X									
	Mangueras, conexiones, racores (verificar ausencia de fugas)						X									
GENERAL	*Tapajo central corrosa						X									
	*Tapajos laterales						X									
	*Cinturones de seguridad						X									
	*Vidrio Panorámico						X									
	*Vidrio Parabrisa						X									
	*Vidrio lateral derecho						X									
	*Vidrio trasero						X									
	*Vidrio lateral						X									
	*Estado silla operador						X									
	*Estribo o posa pies						X									
	*Estribo caja de herramientas						X									
	*Kit para Derrames						X									
	*Extintor de incendios Capacidad:						X									
MECÁNICO	*Estado del balde						X									
	*Estado de pasadores						X									
	*Estado de Orugas (tensionadas)						X									
	*Estado de las zapatas o tejas						X									
	*Estado del bastidor						X									
	* Estado de carril inferior						X									
	* Estado de carril superior						X									
	* Estado de contrapesa						X									
	*Bomba Hidráulica						X									
	*Estado de pedales						X									
	* Estado de botellas boom						X									
	* Estado de botella arrastre						X									
	* Estado de botella balde						X									
	*Estado tornamesa						X									
	*Estado motor de giro						X									
	*Estado de los mandos						X									
	*Motor sin grietas						X									
	*Estado y tensión de las correas						X									
	*Exosto (Humo de escape)						X									
	*Ausencia de ruidos extraños en el motor						X									
MARTILLO	*Estado del martillo						X									
	*Estado de pasadores del martillo						X									
	*Estado de mangueras del martillo						X									
	*Estado de pintas del martillo						X									
FIRMAS	Nombre del Operador:	Nombre					Marcelo Montoya									
		Firma														
	Autorización para uso de Máquina por Ing. Residente Técnico/Inspector	Nombre					Alejandra Higuita									
		Firma														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

DIA	HOROMETRO INICIO	HOROMETRO FINAL	TOTAL HORAS	HALLAZGO	FECHA	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA
LUNES								
MARTES								
MIERCOLES								
JUEVES								
VIERNES								
SÁBADO								
DOMINGO								

CONVENCIONES


B: BUEN ESTADO NC: NO CONFORME

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (604) 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Atentamente,



DIEGO A. PEINADO R.
Residente de obra de Obra – HACE INGENIEROS SAS
Nit: 800.129.789-1



María Alejandra García Cano
Licencia 2019060360210
Tecnóloga. Seguridad y salud en el trabajo

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (604) 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia
