REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO

Libertad y Orden

Alcaldía Municipal Santander de Quilichao

PREACTA – CUADRO DE MEMORIA DE CANTIDADES

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO PARA LA VEREDA LA CHAPA DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO"


CONTRATO N.º	030-2025	**Contratante**	MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA	**Supervisor**	GUSTAVO LEDESMA JIMENEZ
Contratista	CONSORCIO DOMINGUILLO	**Interventor**	CONSTRUCCIONES UNIVERSALES RLM SAS		
1.1.2	**Localizacion - replanteo cerramiento - varios**			**UNIDAD**	ML

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				UNIDAD	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	AREA	VOLUMEN		
PERIMETRO CERRAMIENTO PTAP	132,00				ML	132,00
*CARTERAS TOPOGRAFICAS					**TOTAL**	**132,00**

Cantidad Total Ejecutada: **132,00**
Cantidad a Pagar presente Acta: **132,00**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



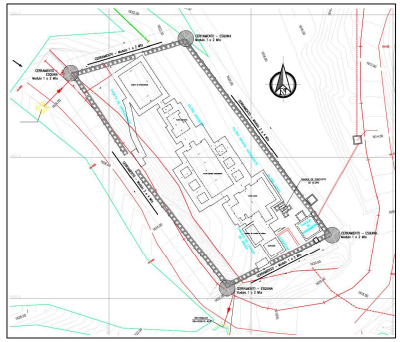

LUIS MIGUEL GRANJA B.
RESIDENTE DE OBRA

GIOVANNY ZUÑIGA GARCIA
DIRECTOR INTERVENTORIA.

Libertad y Orden

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO

Alcaldía Municipal Santander de Quilichao

PREACTA – CUADRO DE MEMORIA DE CANTIDADES

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO PARA LA VEREDA LA CHAPA DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO"

CONTRATO N.º	030-2025	**Contratante**	MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA	**Supervisor**	GUSTAVO LEDESMA JIMENEZ
Contratista	CONSORCIO DOMINGUILLO	**Interventor**	CONSTRUCCIONES UNIVERSALES RLM SAS		
ITEM 1.3.1	**Retiro de saldos en sitio**			**UNIDAD**	M3-KM

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				UNIDAD	TOTAL
	VOLUMEN	EXPANSIÓN	DISTANCIA			
EXCAVACIÓN	110,31					
DESCUENTO POR RELLENO						
RETIRO DE ESCOMBRO A CANTERA	110,31	30%	48,0		M3-KM	6883,34
					TOTAL	**6883,344**

Cantidad Total Ejecutada: **6883,34**
Cantidad a Pagar presente Acta: **6883,34**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



LUIS MIGUEL GRANJA B.
RESIDENTE DE OBRA

GIOVANNY ZUÑIGA GARCIA
DIRECTOR INTERVENTORIA.

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO

Libertad y Orden

Alcaldía Municipal Santander de Quilichao

PREACTA – CUADRO DE MEMORIA DE CANTIDADES

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO PARA LA VEREDA LA CHAPA DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO"

CONTRATO N.º	030-2025	**Contratante**	MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA	**Supervisor**	GUSTAVO LEDESMA JIMENEZ
Contratista	CONSORCIO DOMINGUILLO	**Interventor**	CONSTRUCCIONES UNIVERSALES RLM SAS		
ITEM 1.3.2	**Disposición de material**			**UNIDAD**	M3

LOCALIZACIÓN	**DIMENSIONES**				**UNIDAD**	**TOTAL**
				VOLUMEN		
DISTANCIA OBRA A GESTOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN VIA CANDELARIA - PUERTO TEJADA				300,44	M3	300,44
					TOTAL	**300,436**

Cantidad Total Ejecutada: **300,44**
Cantidad a Pagar presente Acta: **300,44**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



LUIS MIGUEL GRANJA B.
RESIDENTE DE OBRA

GIOVANNY ZUÑIGA GARCIA
DIRECTOR INTERVENTORIA.

Libertad y Orden **REPUBLICA DE COLOMBIA** **DEPARTAMENTO DEL CAUCA** **MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO** Alcaldía Municipal Santander de Quilichao	**PREACTA – CUADRO DE MEMORIA DE CANTIDADES** **OBJETO: "CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO PARA LA VEREDA LA CHAPA DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO"**

CONTRATO N.º	030-2025	**Contratante**	MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA	**Supervisor**	GUSTAVO LEDESMA JIMENEZ
Contratista	CONSORCIO DOMINGUILLO	**Interventor**	CONSTRUCCIONES UNIVERSALES RLM SAS		
ITEM 2.3.1	**Retiro de saldos en sitio**			**UNIDAD**	M3-KM

LOCALIZACIÓN	**DIMENSIONES**				**UNIDAD**	**TOTAL**
		VOLUMEN	**EXPANSIÓN**	**DISTANCIA**		
EXCAVACIÓN		67,16				
DESCUENTO POR RELLENO		4,06				
DISTANCIA OBRA A GESTOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN VIA CANDELARIA - PUERTO TEJADA		63,10	30%	48,0	M3-KM	3937,44
					TOTAL	**3937,44**

Cantidad Total Ejecutada: **3937,44**
Cantidad a Pagar presente Acta: **3937,44**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



LUIS MIGUEL GRANJA B. **RESIDENTE DE OBRA**	**GIOVANNY ZUÑIGA GARCIA** **DIRECTOR INTERVENTORIA.**

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO

Libertad y Orden

Alcaldía Municipal Santander de Quilichao

PREACTA – CUADRO DE MEMORIA DE CANTIDADES

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO PARA LA VEREDA LA CHAPA DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO"

CONTRATO N.º	030-2025	**Contratante**	MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA	**Supervisor**	GUSTAVO LEDESMA JIMENEZ
Contratista	CONSORCIO DOMINGUILLO	**Interventor**	CONSTRUCCIONES UNIVERSALES RLM SAS		
ITEM 2.3.2	**Disposición de material**			**UNIDAD**	M3

LOCALIZACIÓN	**DIMENSIONES**			**VOLUMEN**	**UNIDAD**	**TOTAL**
DISTANCIA OBRA A GESTOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN VIA CANDELARIA - PUERTO TEJADA				82,03	M3	82,03
					TOTAL	**82,03**

Cantidad Total Ejecutada: **82,03**
Cantidad a Pagar presente Acta: **82,03**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



LUIS MIGUEL GRANJA B.
RESIDENTE DE OBRA

GIOVANNY ZUÑIGA GARCIA
DIRECTOR INTERVENTORIA.

Libertad y Orden

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO

Alcaldía Municipal Santander de Quilichao

PREACTA – CUADRO DE MEMORIA DE CANTIDADES

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO PARA LA VEREDA LA CHAPA DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO"

CONTRATO N.º	030-2025	**Contratante**	MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA	**Supervisor**	GUSTAVO LEDESMA JIMENEZ
Contratista	CONSORCIO DOMINGUILLO	**Interventor**	CONSTRUCCIONES UNIVERSALES RLM SAS		
ITEM 2.5.2	**Suministro figurado y armado de acero de refuerzo 60000 psi**			**UNIDAD**	KG

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				UNIDAD	TOTAL
	LARGO	# VARILLA	KG/ML	CANT		
FILTRO DINAMICO				890,42	KG	890,42
CAJAS EXTERNAS						
#4 245	2,45	#4	1,00	84	KG	205,80
#4 235	2,35	#4	1,00	84	KG	197,40
#4 175	1,75	#4	1,00	42	KG	73,50
#4 185	1,85	#4	1,00	42	KG	77,70
#4 150	1,50	#4	1,00	84	KG	126,00
#4 140	1,40	#4	1,00	84	KG	117,60
#4 175	1,75	#4	1,00	42	KG	73,50
#4 185	1,85	#4	1,00	42	KG	77,70
FILTRO LENTO						
VERTEDEROS ENTRADA						
#3 135	1,35	#3	0,56	12,00	KG	9,07
#4 135	1,35	#4	1,00	6,00	KG	8,10
#4 250	2,50	#4	1,00	10,00	KG	25,00
#4 115	1,15	#4	1,00	14,00	KG	16,10
#4 250	2,50	#4	1,00	7,00	KG	17,50

REGISTRO FOTOGRÁFICO





#4 340	3,40	#4	1,00	10,00	KG	34,00
#4 145	1,45	#4	1,00	3,00	KG	4,35
#4 167	1,67	#4	1,00	6,00	KG	10,02
LOSA DE FONDO						
#5 450	4,50	#5	1,56	56,00	KG	393,12
#5 640	6,40	#5	1,56	40,00	KG	399,36
MURO TANQUE						
HORIZONTAL EJE X						
#4 415	4,15	#4	1,00	16,00	KG	66,40
VERTICAL EJE X						
#5 215	2,15	#5	1,56	38,00	KG	127,45
HORIZONTAL EJE Y						
#4 640	6,40	#4	1,00	19,00	KG	121,60
VERTICAL EJE Y						
#5 250	2,50	#5	1,56	60,00	KG	234,00
#5 230	2,30	#5	1,56	60,00	KG	215,28
CAMARA SALIDA						
#4 190	1,90	#4	1,00	11,00	KG	20,90
#4 220	2,20	#4	1,00	8,00	KG	17,60
#4 95	0,95	#4	1,00	8,00	KG	7,60
#4 180	1,80	#4	1,00	35,00	KG	63,00
#4 120	1,20	#4	1,00	8,00	KG	9,60
#4 410	4,10	#4	1,00	8,00	KG	32,80
#4 310	3,10	#4	1,00	8,00	KG	24,80
CAMARA LAVADO ARENA						
#4 220	2,20	#4	1,00	36,00	KG	79,20
#4 110	1,10	#4	1,00	11,00	KG	12,10
#4 435	4,35	#4	1,00	4,00	KG	17,40
#4 335	3,35	#4	1,00	4,00	KG	13,40
#4 365	2,65	#4	1,00	6,00	KG	15,90
#4 265	2,65	#4	1,00	6,00	KG	15,90
#4 110	1,10	#4	1,00	20,00	KG	22,00
#4 100	1,00	#4	1,00	10,00	KG	10,00
					TOTAL	**3883,17**

Cantidad Total Ejecutada: **3883,17**
Cantidad a Pagar presente Acta: **3883,17**





	
LUIS MIGUEL GRANJA B. **RESIDENTE DE OBRA**	**GIOVANNY ZUÑIGA GARCIA** **DIRECTOR INTERVENTORIA.**

Libertad y Orden

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO

Alcaldía Municipal Santander de Quilichao

PREACTA – CUADRO DE MEMORIA DE CANTIDADES

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO PARA LA VEREDA LA CHAPA DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO"

CONTRATO N.º	030-2025	**Contratante**	MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA	**Supervisor**	GUSTAVO LEDESMA JIMENEZ
Contratista	CONSORCIO DOMINGUILLO	**Interventor**	CONSTRUCCIONES UNIVERSALES RLM SAS		
2.5.3	**Concreto estructural de 4000 psi de baja permeabilidad**			**UNIDAD**	M3

LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES				CANTIDAD	TOTAL
		LONGITUD	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN		
FILTRO LENTO							
VERT ENTRADA		1,10	1,05	0,15	0,17	2	0,35
VERT ENTRADA		1,45	0,45	0,15	0,10	2	0,20
VERT ENTRADA		1,00	0,90	0,15	0,14	1	0,14
VERT ENTRADA		5,93	0,58	0,15	0,52	1	0,52
VERT ENTRADA		1,68	1,25	0,15	0,32	2	0,63
TANQUES PRINCPALES LOSA		6,00	4,00	0,25	6,00	1	6,00
TANQUES PRINCPALES MURO		6,00	2,00	0,20	2,40	1	2,40
TANQUES PRINCPALES MURO		6,00	2,00	0,20	2,40	1	2,40
TANQUES PRINCPALES MURO		3,70	1,74	0,20	1,29	3	3,86
CAMARA SALIDA		1,50	1,31	0,15	0,29	1	0,29
CAMARA SALIDA		3,83	0,70	0,15	0,40	1	0,40
CAMARA SALIDA		1,50	0,25	0,15	0,06	1	0,06
CAMARA SALIDA		2,36	1,50	0,25	0,89	1	0,89
CAMARA SALIDA		5,93	0,70	0,15	0,62	1	0,62
FILTRO DINAMICO							
CAJA VALVULAS	MUROS	0,90	1,06	0,15	0,14	3	0,43
	MUROS	1,34	1,06	0,15	0,21	2	0,43
	LF	0,60	0,60	0,15	0,05	2	0,11
VERTEDERO ENTRADA	MURO	0,95	2,50	0,15	0,36	1	0,36
	MURO	0,30	0,51	0,15	0,02	3	0,07
	MURO	0,45	0,64	0,15	0,04	1	0,04
FILTROS CENTRALES	MURO	0,80	2,03	0,15	0,24	1	0,24
		1,24	2,03	0,15	0,38	1	0,38
		0,64	1,24	0,15	0,12	3	0,36
TANQUE SALIDA	MUROS	9,50	2,20	0,25	5,23	1	5,23
	VT	0,87	1,74	0,15	0,23	1	0,23
	LF	1,24	2,58	0,25	0,80	1	0,80
LOSA SOPORTE VALVULAS		1,69	1,40	0,12	0,28	1	0,28
FILTRO GRUESO							
MUROS LONGIT FALTANTE		2,50	0,70	0,20	0,35	9	3,15
MUROS TRANSVER FALTANTE		4,63	0,73	0,20	0,68	3	2,03
MUROS TRANSVER FALTANTE VERTEDERO ENTRADA		4,63	1,08	0,20	1,00	1	1,00
VERTEDERO ENTRADA		3,10	0,70	0,15	0,33	1	0,33
VERTEDERO ENTRADA		0,56	1,22	0,15	0,10	1	0,10
VERTEDERO ENTRADA		0,55	0,25	0,17	0,02	2	0,05
VERTEDERO ENTRADA		0,60	1,05	0,15	0,09	2	0,19

REGISTRO FOTOGRÁFICO





VERTEDERO ENTRADA	2,00	0,71	0,15	0,21	2	0,43
VERTEDERO ENTRADA	0,46	0,46	0,15	0,03	2	0,06
VERTEDERO SALIDA MURO	3,22	0,80	0,15	0,39	1	0,39
VERTEDERO SALIDA LOSA	4,30	0,40	0,15	0,26	1	0,26
CAJAS EXTERNAS TIPO 1	4,40	1,40	0,15	0,92	3	2,77
LOSA CAJA TIP 1	1,20	1,20	0,15	0,22	3	0,65
CAJAS EXTERNAS TIPO 2	4,40	2,30	0,15	1,52	3	4,55
LOSA CAJA TIP 2	1,20	1,20	0,15	0,22	3	0,65
					TOTAL	**44,29**



Cantidad Total Ejecutada: **44,29**
Cantidad a Pagar presente Acta: **44,29**

LUIS MIGUEL GRANJA B. **RESIDENTE DE OBRA**	**GIOVANNY ZUÑIGA GARCIA** **DIRECTOR INTERVENTORIA.**

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO

Libertad y Orden

Alcaldía Municipal Santander de Quilichao

PREACTA – CUADRO DE MEMORIA DE CANTIDADES

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO PARA LA VEREDA LA CHAPA DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE

CONTRATO N.º	030-2025	**Contratante**	MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA	**Supervisor**	GUSTAVO LEDESMA JIMENEZ
Contratista	CONSORCIO DOMINGUILLO	**Interventor**	CONSTRUCCIONES UNIVERSALES RLM SAS		
2.6.1.4	**Suministro e instalación de codo 90° pvc-s d=4"**			**UNIDAD**	UND

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				UNIDAD	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ESPESOR	CANTIDAD		
SALIDA FILTRO DINAMICO				2,00	UND	2,00
UNION FILTRO DINAMICO				1,00	UND	1,00
ENTRADA FILTRO GRUESO				2,00	UND	2,00
SALIDA FILTRO GRUESO				3,00	UND	3,00
					TOTAL	**8,00**

Cantidad Total Ejecutada: **8,00**
Cantidad a Pagar presente Acta: **8,00**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



LUIS MIGUEL GRANJA B.
RESIDENTE DE OBRA

GIOVANNY ZUÑIGA GARCIA
DIRECTOR INTERVENTORIA.

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO

PREACTA – CUADRO DE MEMORIA DE CANTIDADES

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO PARA LA VEREDA LA CHAPA DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE

CONTRATO N.º	030-2025	**Contratante**	MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA	**Supervisor**	GUSTAVO LEDESMA JIMENEZ
Contratista	CONSORCIO DOMINGUILLO	**Interventor**	CONSTRUCCIONES UNIVERSALES RLM SAS		
2.6.1.7	**Suministro e instalación de codo 90° pvc-s d=3"**			**UNIDAD**	UND

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				UNIDAD	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ESPESOR	CANTIDAD		
FILTRO GRUESO DESAGUE VERTEDERO				2,00	UND	2,00
					TOTAL	**2,00**

Cantidad Total Ejecutada: **2,00**
Cantidad a Pagar presente Acta: **2,00**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



LUIS MIGUEL GRANJA B.
RESIDENTE DE OBRA

GIOVANNY ZUÑIGA GARCIA
DIRECTOR INTERVENTORIA.

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO

Libertad y Orden

Alcaldía Municipal Santander de Quilichao

PREACTA – CUADRO DE MEMORIA DE CANTIDADES

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO PARA LA VEREDA LA CHAPA DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO"

CONTRATO N.º	030-2025	**Contratante**	MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA	**Supervisor**	GUSTAVO LEDESMA JIMENEZ
Contratista	CONSORCIO DOMINGUILLO	**Interventor**	CONSTRUCCIONES UNIVERSALES RLM SAS		
2.6.1.9	**Pasamuro t1 hd d=4" l=0.15m**			**UNIDAD**	UND

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				UNIDAD	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ESPESOR	CANTIDAD		
PASAMURO FILTRO LENTO				2,00	UND	2,00
					TOTAL	**2,00**

Cantidad Total Ejecutada: **2,00**
Cantidad a Pagar presente Acta: **2,00**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



LUIS MIGUEL GRANJA B.
RESIDENTE DE OBRA

GIOVANNY ZUÑIGA GARCIA
DIRECTOR INTERVENTORIA.

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO

Libertad y Orden

Alcaldía Municipal Santander de Quilichao

PREACTA – CUADRO DE MEMORIA DE CANTIDADES

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO PARA LA VEREDA LA CHAPA DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE

CONTRATO N.º	030-2025	**Contratante**	MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA	**Supervisor**	GUSTAVO LEDESMA JIMENEZ
Contratista	CONSORCIO DOMINGUILLO	**Interventor**	CONSTRUCCIONES UNIVERSALES RLM SAS		
2.6.1.11	**Adaptador hembra pvc-s d=2"**			**UNIDAD**	UND

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				UNIDAD	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ESPESOR	CANTIDAD		
FILTRO DINAMICO				2,00	UND	2,00
					TOTAL	**2,00**

Cantidad Total Ejecutada: **2,00**
Cantidad a Pagar presente Acta: **2,00**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



LUIS MIGUEL GRANJA B.
RESIDENTE DE OBRA

GIOVANNY ZUÑIGA GARCIA
DIRECTOR INTERVENTORIA.

Libertad y Orden

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO

Alcaldía Municipal Santander de Quilichao

PREACTA – CUADRO DE MEMORIA DE CANTIDADES

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO PARA LA VEREDA LA CHAPA DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO"

CONTRATO N.º	030-2025	**Contratante**	MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA	**Supervisor**	GUSTAVO LEDESMA JIMENEZ
Contratista	CONSORCIO DOMINGUILLO	**Interventor**	CONSTRUCCIONES UNIVERSALES RLM SAS		
2.6.1.22	**Pasamuro T2 Hd D=6" L=0.15M**			**UNIDAD**	UND

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				UNIDAD	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ESPESOR	CANTIDAD		
FILTRO GRUESO				8,00	UND	8,00
					TOTAL	**8,00**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Cantidad Total Ejecutada: **8,00**
Cantidad a Pagar presente Acta: **8,00**

LUIS MIGUEL GRANJA B.
RESIDENTE DE OBRA

GIOVANNY ZUÑIGA GARCIA
DIRECTOR INTERVENTORIA.

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO

Libertad y Orden

Alcaldía Municipal Santander de Quilichao

PREACTA – CUADRO DE MEMORIA DE CANTIDADES

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO PARA LA VEREDA LA CHAPA DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE

CONTRATO N.º	030-2025	**Contratante**	MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA	**Supervisor**	GUSTAVO LEDESMA JIMENEZ
Contratista	CONSORCIO DOMINGUILLO	**Interventor**	CONSTRUCCIONES UNIVERSALES RLM SAS		
2.6.2.2	**Pasamuro T1 Hd D=2" L=0.15M**			**UNIDAD**	UN

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				UNIDAD	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ESPESOR	CANTIDAD		
ENTRADA Y SALIDA CAJA VALVULAS				4,00	UND	4,00
FILTRO DINAMICO						
					TOTAL	4,00

Cantidad Total Ejecutada: **4,00**
Cantidad a Pagar presente Acta: **4,00**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



LUIS MIGUEL GRANJA B.
RESIDENTE DE OBRA

GIOVANNY ZUÑIGA GARCIA
DIRECTOR INTERVENTORIA.

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO

Libertad y Orden

Alcaldía Municipal Santander de Quilichao

PREACTA – CUADRO DE MEMORIA DE CANTIDADES

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO PARA LA VEREDA LA CHAPA DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE

CONTRATO N.º	030-2025	**Contratante**	MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA	**Supervisor**	GUSTAVO LEDESMA JIMENEZ
Contratista	CONSORCIO DOMINGUILLO	**Interventor**	CONSTRUCCIONES UNIVERSALES RLM SAS		
2.6.2.6	**Suministro E Instalación De Codo 90° Pvc D=2"**			**UNIDAD**	UN

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				UNIDAD	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ESPESOR	CANTIDAD		
ENTRADA VERTEDERO FILT DINAMICO				2,00	UNIDAD	2,00
					TOTAL	2,00

Cantidad Total Ejecutada: **2,00**
Cantidad a Pagar presente Acta: **2,00**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



LUIS MIGUEL GRANJA B.
RESIDENTE DE OBRA

GIOVANNY ZUÑIGA GARCIA
DIRECTOR INTERVENTORIA.

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO

Libertad y Orden

Alcaldía Municipal Santander de Quilichao

PREACTA – CUADRO DE MEMORIA DE CANTIDADES

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO PARA LA VEREDA LA CHAPA DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE


CONTRATO N.º	030-2025	**Contratante**	MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA	**Supervisor**	GUSTAVO LEDESMA JIMENEZ
Contratista	CONSORCIO DOMINGUILLO	**Interventor**	CONSTRUCCIONES UNIVERSALES RLM SAS		
2.6.2.7	**Pasamuro Hd D=2"" L=0.15M**			**UNIDAD**	UN

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				UNIDAD	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ESPESOR	CANTIDAD		
ENTRADA VERTEDERO FILT DINAMICO				2,00	UNIDAD	2,00
					TOTAL	2,00

Cantidad Total Ejecutada: 2,00
Cantidad a Pagar presente Acta: 2,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO



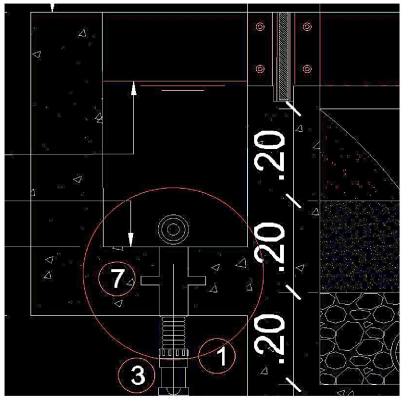

LUIS MIGUEL GRANJA B.
RESIDENTE DE OBRA

GIOVANNY ZUÑIGA GARCIA
DIRECTOR INTERVENTORIA.

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO

Libertad y Orden

Alcaldía Municipal Santander de Quilichao

PREACTA – CUADRO DE MEMORIA DE CANTIDADES

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO PARA LA VEREDA LA CHAPA DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE

CONTRATO N.º	030-2025	**Contratante**	MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA	**Supervisor**	GUSTAVO LEDESMA JIMENEZ
Contratista	CONSORCIO DOMINGUILLO	**Interventor**	CONSTRUCCIONES UNIVERSALES RLM SAS		
2.6.2.8	**Pasamuro Hd D=3"" L=0.15M**			**UNIDAD**	UN

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				UNIDAD	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ESPESOR	CANTIDAD		
VERTEDERO A CAMARA DE DESAGUE				1,00	UNIDAD	1,00
CAM DESAGUE VERT FILT DINAM				1,00	UNIDAD	1,00
					TOTAL	2,00

Cantidad Total Ejecutada: **2,00**
Cantidad a Pagar presente Acta: **2,00**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



LUIS MIGUEL GRANJA B.
RESIDENTE DE OBRA

GIOVANNY ZUÑIGA GARCIA
DIRECTOR INTERVENTORIA.

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO

Libertad y Orden

Alcaldía Municipal Santander de Quilichao

PREACTA – CUADRO DE MEMORIA DE CANTIDADES

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO PARA LA VEREDA LA CHAPA DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE

CONTRATO N.º	030-2025	**Contratante**	MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA	**Supervisor**	GUSTAVO LEDESMA JIMENEZ
Contratista	CONSORCIO DOMINGUILLO	**Interventor**	CONSTRUCCIONES UNIVERSALES RLM SAS		
2.6.2.16	**Niple Pvc-S D=2" L=0.55M**			**UNIDAD**	UN

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				UNIDAD	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ESPESOR	CANTIDAD		
SALIDA CAJA VALVULAS FILT DINAM				4,00	UNIDAD	4,00
					TOTAL	**4,00**

Cantidad Total Ejecutada: **4,00**
Cantidad a Pagar presente Acta: **4,00**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



LUIS MIGUEL GRANJA B.
RESIDENTE DE OBRA

GIOVANNY ZUÑIGA GARCIA
DIRECTOR INTERVENTORIA.

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO

Libertad y Orden

Alcaldía Municipal Santander de Quilichao

PREACTA – CUADRO DE MEMORIA DE CANTIDADES

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO PARA LA VEREDA LA CHAPA DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE

CONTRATO N.º	030-2025	**Contratante**	MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA	**Supervisor**	GUSTAVO LEDESMA JIMENEZ
Contratista	CONSORCIO DOMINGUILLO	**Interventor**	CONSTRUCCIONES UNIVERSALES RLM SAS		
2.6.2.24	**Pasamuro Hd D=4" L=0.25M**			**UNIDAD**	UN

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				UNIDAD	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ESPESOR	CANTIDAD		
SALIDA FILTRO DINAMIC				2,00	UNIDAD	2,00
SALIDA A FILTRO GRUESO				1,00	UNIDAD	1,00
					TOTAL	3,00

Cantidad Total Ejecutada: **3,00**
Cantidad a Pagar presente Acta: **3,00**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



LUIS MIGUEL GRANJA B.
RESIDENTE DE OBRA

GIOVANNY ZUÑIGA GARCIA
DIRECTOR INTERVENTORIA.

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO

Libertad y Orden

Alcaldía Municipal Santander de Quilichao

PREACTA – CUADRO DE MEMORIA DE CANTIDADES

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO PARA LA VEREDA LA CHAPA DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE

CONTRATO N.º	030-2025	**Contratante**	MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA	**Supervisor**	GUSTAVO LEDESMA JIMENEZ
Contratista	CONSORCIO DOMINGUILLO	**Interventor**	CONSTRUCCIONES UNIVERSALES RLM SAS		
2.6.2.31	**Niple Pvc-S D=4" L=1.10M**			**UNIDAD**	UN

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				UNIDAD	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ESPESOR	CANTIDAD		
FILTRO DINAMICO				2,00	UNIDAD	2,00
					TOTAL	**2,00**

Cantidad Total Ejecutada: **2,00**
Cantidad a Pagar presente Acta: **2,00**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



LUIS MIGUEL GRANJA B.
RESIDENTE DE OBRA

GIOVANNY ZUÑIGA GARCIA
DIRECTOR INTERVENTORIA.

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO

Libertad y Orden

Alcaldía Municipal Santander de Quilichao

PREACTA – CUADRO DE MEMORIA DE CANTIDADES

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO PARA LA VEREDA LA CHAPA DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE

CONTRATO N.º	030-2025	**Contratante**	MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA	**Supervisor**	GUSTAVO LEDESMA JIMENEZ
Contratista	CONSORCIO DOMINGUILLO	**Interventor**	CONSTRUCCIONES UNIVERSALES RLM SAS		
2.6.2.32	**Pasamuro Hd Roscado D=6" L=0.45M**			**UNIDAD**	UN

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				UNIDAD	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ESPESOR	CANTIDAD		
				1,00	UNIDAD	1,00
					TOTAL	**1,00**

Cantidad Total Ejecutada: **1,00**
Cantidad a Pagar presente Acta: **1,00**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



LUIS MIGUEL GRANJA B.
RESIDENTE DE OBRA

GIOVANNY ZUÑIGA GARCIA
DIRECTOR INTERVENTORIA.

Libertad y Orden

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO

Alcaldía Municipal Santander de Quilichao

PREACTA – CUADRO DE MEMORIA DE CANTIDADES


OBJETO: "CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO PARA LA VEREDA LA CHAPA DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO"

CONTRATO N.º	030-2025	**Contratante**	MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA	**Supervisor**	GUSTAVO LEDESMA JIMENEZ
Contratista	CONSORCIO DOMINGUILLO	**Interventor**	CONSTRUCCIONES UNIVERSALES RLM SAS		
3.1.1	**Localización Y Replanteo Estructuras Hidraulicas**			**UNIDAD**	M2

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				UNIDAD	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ESPESOR	CANTIDAD		
TANQUE CONT. CLORO	4,03	1,00		1,00	M2	4,03
					TOTAL	**4,03**

Cantidad Total Ejecutada: **4,03**
Cantidad a Pagar presente Acta: **4,03**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

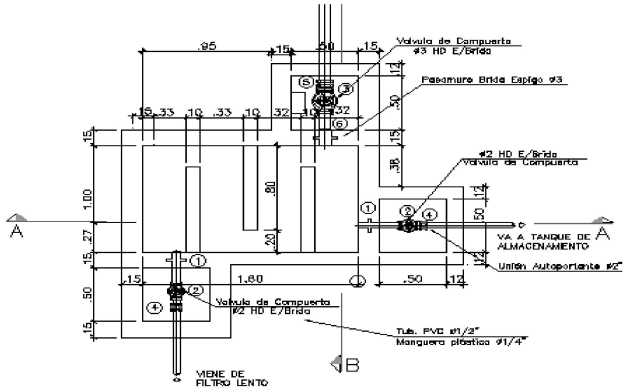

LUIS MIGUEL GRANJA B.
RESIDENTE DE OBRA

GIOVANNY ZUÑIGA GARCIA
DIRECTOR INTERVENTORIA.

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO

Libertad y Orden

Alcaldía Municipal Santander de Quilichao


PREACTA – CUADRO DE MEMORIA DE CANTIDADES

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO PARA LA VEREDA LA CHAPA DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE

CONTRATO N.º	030-2025	**Contratante**	MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA	**Supervisor**	GUSTAVO LEDESMA JIMENEZ
Contratista	CONSORCIO DOMINGUILLO	**Interventor**	CONSTRUCCIONES UNIVERSALES RLM SAS		
3.5.2	**Suministro Figurado Y Armado De Acero De Refuerzo 60000 Psi**			**UNIDAD**	KG

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				UNIDAD	TOTAL
	LARGO	# VARILLA	KG/ML	CANT		
TANQUE CONTACTO DE CLORO				305,30	KG	305,30
					TOTAL	**305,00**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

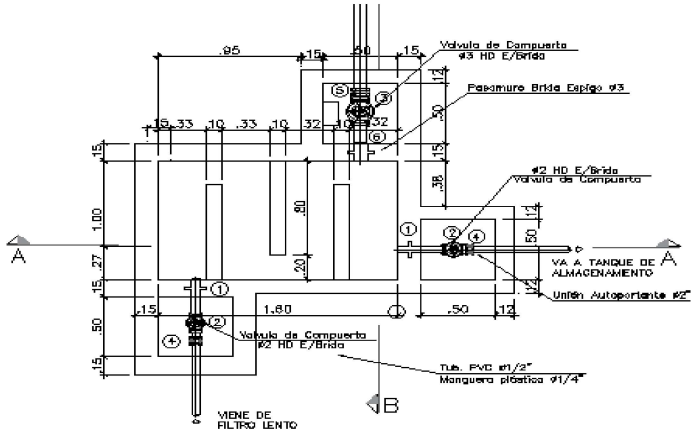

Cantidad Total Ejecutada: **305,00**
Cantidad a Pagar presente Acta: **305,00**

LUIS MIGUEL GRANJA B.
RESIDENTE DE OBRA

GIOVANNY ZUÑIGA GARCIA
DIRECTOR INTERVENTORIA.

Libertad y Orden

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO

Alcaldía Municipal Santander de Quilichao

PREACTA – CUADRO DE MEMORIA DE CANTIDADES

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO PARA LA VEREDA LA CHAPA DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO"

CONTRATO N.°	030-2025	**Contratante**	MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA	**Supervisor**	GUSTAVO LEDESMA JIMENEZ
Contratista	CONSORCIO DOMINGUILLO	**Interventor**	CONSTRUCCIONES UNIVERSALES RLM SAS		
4.5.2	**Suministro Figurado Y Armado De Acero De Refuerzo 60000 Psi**			**UNIDAD**	KG

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				UNIDAD	TOTAL
	LARGO	# VARILLA	KG/ML	CANT		
TANQUE DE ALMACENAMIENTO						
MURO #5 435	4,35	#5	1,56	33	KG	226,34
TAPA						
#5 380	3,45	#5	1,56	112	KG	602,78
#3 118	1,18	#3	0,56	112	KG	74,01
CAJA 1						
MURO						
#4 510	4,9	#4	1,00	6	KG	29,40
#4 540	5,4	#4	1,00	6	KG	32,40
#4 150	1,5	#4	1,00	48	KG	72,00
LOSA						
#4 195	1,95	#4	1,00	48	KG	93,60
CAJA 2						
MURO						
#4 500	5	#4	1,00	10	KG	50,00
LOSA						
#4 160	1,6	#4	1,00	64	KG	102,40
					TOTAL	**1283,00**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Cantidad Total Ejecutada: **1283,00**
Cantidad a Pagar presente Acta: **1283,00**

LUIS MIGUEL GRANJA B.
RESIDENTE DE OBRA

GIOVANNY ZUÑIGA GARCIA
DIRECTOR INTERVENTORIA.

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO

Libertad y Orden

Alcaldía Municipal Santander de Quilichao

PREACTA – CUADRO DE MEMORIA DE CANTIDADES

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO PARA LA VEREDA LA CHAPA DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO"

CONTRATO N.º	030-2025	**Contratante**	MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA	**Supervisor**	GUSTAVO LEDESMA JIMENEZ
Contratista	CONSORCIO DOMINGUILLO	**Interventor**	CONSTRUCCIONES UNIVERSALES RLM SAS		
4.5.3	**Concreto Estructural De 4000 Psi De Baja Permeabilidad**			**UNIDAD**	M3

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				CANTIDAD	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN		
TANQUE DE ALMACENAMIENTO(LOSA DE	3,50	3,5	0,25	3,06	1	3,06
TANQUE DE ALMACENAMIENTO(LOSA DE	1,90	1,9	0,15	0,54	1	0,54
TANQUE DE ALMACENAMIENTO(MUROS)	2,95	3,5	0,25	2,58	4	10,33
TANQUE DE ALMACENAMIENTO(TAPA)	3,50	3,5	0,15	1,84	1	1,84
CAJA 1	1,40	0,3	0,25	0,11	1	0,11
CAJA 1	1,26	1,5	0,15	0,28	1	0,28
CAJA 1	1,20	1,3	0,15	0,23	2	0,47
CAJA 2	1,20	1,3	0,25	0,39	1	0,39
CAJA 2	1,95	1,3	0,15	0,38	2	0,76
CAJA 2	1,95	1,0	0,15	0,29	2	0,58
					TOTAL	**18,35**

Cantidad Total Ejecutada: **18,35**
Cantidad a Pagar presente Acta: **18,35**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



LUIS MIGUEL GRANJA B.
RESIDENTE DE OBRA

GIOVANNY ZUÑIGA GARCIA
DIRECTOR INTERVENTORIA.

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO

Libertad y Orden

Alcaldía Municipal Santander de Quilichao

PREACTA – CUADRO DE MEMORIA DE CANTIDADES


OBJETO: "CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO PARA LA VEREDA LA CHAPA DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE

CONTRATO N.º	030-2025	**Contratante**	MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA	**Supervisor**	GUSTAVO LEDESMA JIMENEZ
Contratista	CONSORCIO DOMINGUILLO	**Interventor**	CONSTRUCCIONES UNIVERSALES RLM SAS		
4.6.20	**Suministro E Instalación De Pasamuro Hd Ø=3"**			**UNIDAD**	UN

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				UNIDAD	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ESPESOR	CANTIDAD		
PASAMURO 3" TANQUE ALMACENAMIENTO				2,00	UNIDAD	2,00
					TOTAL	**2,00**

Cantidad Total Ejecutada: **2,00**
Cantidad a Pagar presente Acta: **2,00**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

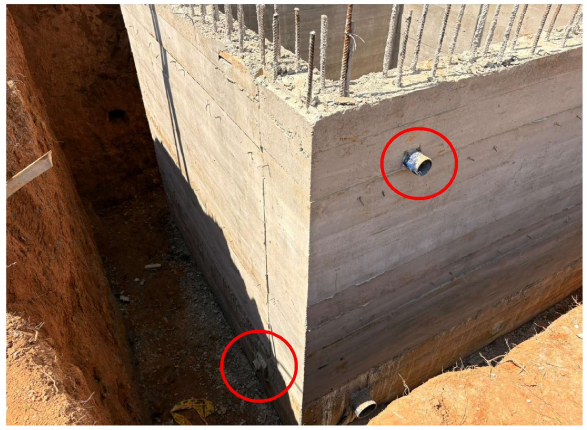

LUIS MIGUEL GRANJA B.
RESIDENTE DE OBRA

GIOVANNY ZUÑIGA GARCIA
DIRECTOR INTERVENTORIA.

Libertad y Orden

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO

Alcaldía Municipal Santander de Quilichao

PREACTA – CUADRO DE MEMORIA DE CANTIDADES

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO PARA LA VEREDA LA CHAPA DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO"

CONTRATO N.º	030-2025	**Contratante**	MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA	**Supervisor**	GUSTAVO LEDESMA JIMENEZ
Contratista	CONSORCIO DOMINGUILLO	**Interventor**	CONSTRUCCIONES UNIVERSALES RLM SAS		
INP - 1	**Cinta pvc v-10 para sello e impermeabilización**			**UNIDAD**	ML

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				UNIDAD	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ESPESOR	CANTIDAD		
TANQUE ALMACENAMIENTO	3,50			4,00	ML	14,00
					TOTAL	**14,00**

Cantidad Total Ejecutada: **14,00**
Cantidad a Pagar presente Acta: **14,00**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



LUIS MIGUEL GRANJA B.
RESIDENTE DE OBRA

GIOVANNY ZUÑIGA GARCIA
DIRECTOR INTERVENTORIA.

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO

Libertad y Orden

Alcaldía Municipal Santander de Quilichao

PREACTA – CUADRO DE MEMORIA DE CANTIDADES

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO PARA LA VEREDA LA CHAPA DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE


CONTRATO N.º	030-2025	**Contratante**	MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA	**Supervisor**	GUSTAVO LEDESMA JIMENEZ
Contratista	CONSORCIO DOMINGUILLO	**Interventor**	CONSTRUCCIONES UNIVERSALES RLM SAS		
INP-2	**Filtro tipo frances en geotextil no tejido 2000, incluye piedra para filtro. dimensiones 30 cm x 40 cm**			**UNIDAD**	ML

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				UNIDAD	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		
FILTRO LENTO	25,70			1,00	ML	25,70
TANQUE ALMACENAMIENTO	15,20			1,00	ML	15,20
					TOTAL	40,90

Cantidad Total Ejecutada: **40,90**
Cantidad a Pagar presente Acta: **40,90**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



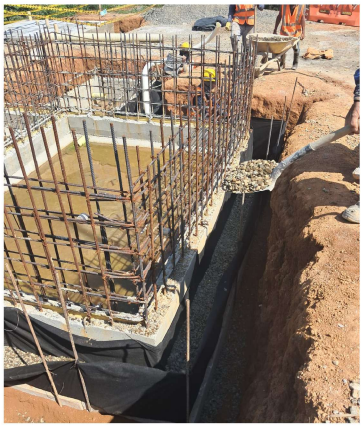

LUIS MIGUEL GRANJA B.
RESIDENTE DE OBRA

GIOVANNY ZUÑIGA GARCIA
DIRECTOR INTERVENTORIA.

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO

PREACTA – CUADRO DE MEMORIA DE CANTIDADES

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO PARA LA VEREDA LA CHAPA DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE

CONTRATO N.º	030-2025	**Contratante**	MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA	**Supervisor**	GUSTAVO LEDESMA JIMENEZ
Contratista	CONSORCIO DOMINGUILLO	**Interventor**	CONSTRUCCIONES UNIVERSALES RLM SAS		
6.3.1	**Retiro De Saldos En Sitio**			**UNIDAD**	M3-KM

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				UNIDAD	TOTAL
	VOLUMEN	ANCHO	EXPANSION	M3-KM		
CASETA OP	3,12		0,30	48,00		194,94
					TOTAL	**194,94**

Cantidad Total Ejecutada: **194,94**
Cantidad a Pagar presente Acta: **194,94**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



LUIS MIGUEL GRANJA B.
RESIDENTE DE OBRA

GIOVANNY ZUÑIGA GARCIA
DIRECTOR INTERVENTORIA.

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO

Libertad y Orden

Alcaldía Municipal Santander de Quilichao

PREACTA – CUADRO DE MEMORIA DE CANTIDADES

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO PARA LA VEREDA LA CHAPA DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE

CONTRATO N.º	030-2025	**Contratante**	MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA	**Supervisor**	GUSTAVO LEDESMA JIMENEZ
Contratista	CONSORCIO DOMINGUILLO	**Interventor**	CONSTRUCCIONES UNIVERSALES RLM SAS		
6.3.2	**Disposición De Material**			**UNIDAD**	M3

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				UNIDAD	TOTAL	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	VOLUMEN	ANCHO	EXPANSION	M3-KM			
CASETA OP	1,57		0,30			2,04	
					TOTAL	2,04	

Cantidad Total Ejecutada: **2,04**
Cantidad a Pagar presente Acta: **2,04**

LUIS MIGUEL GRANJA B. **RESIDENTE DE OBRA**	**GIOVANNY ZUÑIGA GARCIA** **DIRECTOR INTERVENTORIA.**

Libertad y Orden

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO

Alcaldía Municipal Santander de Quilichao

PREACTA – CUADRO DE MEMORIA DE CANTIDADES

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO PARA LA VEREDA LA CHAPA DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO"

CONTRATO N.º	030-2025	**Contratante**	MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA	**Supervisor**	GUSTAVO LEDESMA JIMENEZ
Contratista	CONSORCIO DOMINGUILLO	**Interventor**	CONSTRUCCIONES UNIVERSALES RLM SAS		
ITEM 6.5.1	**Concreto Clase F, 2000 Psi Para Solados Y Atraques**			**M3**	M3

LOCALIZACIÓN	**DIMENSIONES**				**UNIDAD**	**TOTAL**
	LONGITUD	**ANCHO**	**ALTURA**	**CANT**		
CASETA DE OPERACIONES						
ZAPATAS	0,80	0,80	0,05	6,00	M3	0,19
VIGAS DE CIMENTACIÓN	7,35	0,30	0,05	2,00	M3	0,22
	2,65	0,30	0,05	3,00	M3	0,12
					TOTAL	**0,53**

Cantidad Total Ejecutada: **0,53**
Cantidad a Pagar presente Acta: **0,53**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



LUIS MIGUEL GRANJA B.
RESIDENTE DE OBRA

GIOVANNY ZUÑIGA GARCIA
DIRECTOR INTERVENTORIA.

Libertad y Orden

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO

Alcaldía Municipal Santander de Quilichao

PREACTA – CUADRO DE MEMORIA DE CANTIDADES

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO PARA LA VEREDA LA CHAPA DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO"

CONTRATO N.º	030-2025	**Contratante**	MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA	**Supervisor**	GUSTAVO LEDESMA JIMENEZ
Contratista	CONSORCIO DOMINGUILLO	**Interventor**	CONSTRUCCIONES UNIVERSALES RLM SAS		
ITEM 6.5.2	**Suministro Figurado Y Armado De Acero De Refuerzo 60000 Psi**			**UNIDAD**	KG

LOCALIZACIÓN	**DIMENSIONES**				**UNIDAD**	**TOTAL**
	LARGO	**# VARILLA**	**KG/ML**	**CANT**		
CASETA DE OPERACIONES						
Zapatas						
#3 95U	0,95	#3	0,56	16,00	KG	8,51
Vigas de cimentación						
#4 350	3,50	#4	1,00	20,0	KG	70,00
#4 600	6,00	#4	1,00	8,00	KG	48,00
E#3 84	0,84	#3	0,56	343,00	KG	161,35
Columnas						
#4 508	5,08	#4	1,00	24,00	KG	121,92
#4 459	4,59	#4	1,00	24,00	KG	110,16
E#3 112	1,12	#3	0,56	453,00	KG	284,12
Vigas aereas						
#4 350	3,50	#4	1,00	8,00	KG	28,00
#4 357	3,57	#4	1,00	12,00	KG	42,84
#4 600	6,00	#4	1,00	8,00	KG	48,00
E#3 102	1,02	#3	0,56	296,00	KG	169,08
					TOTAL	**804,06**

Cantidad Total Ejecutada: **804,06**
Cantidad a Pagar presente Acta: **804,06**

REGISTRO FOTOGRÁFICO





LUIS MIGUEL GRANJA B. **RESIDENTE DE OBRA**	**GIOVANNY ZUÑIGA GARCIA** **DIRECTOR INTERVENTORIA.**

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO

Libertad y Orden

Alcaldía Municipal Santander de Quilichao

PREACTA – CUADRO DE MEMORIA DE CANTIDADES

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO PARA LA VEREDA LA CHAPA DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO"

CONTRATO N.º	030-2025	**Contratante**	MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA	**Supervisor**	GUSTAVO LEDESMA JIMENEZ
Contratista	CONSORCIO DOMINGUILLO	**Interventor**	CONSTRUCCIONES UNIVERSALES RLM SAS		
INP - 4	**Concreto de 21 mpa para cimentación y estructura**			**UNIDAD**	M3

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				UNIDAD	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTURA	CANT		
CASETA DE OPERACIONES						
ZAPATAS	0,80	0,80	0,30	6,00	M3	1,15
VIGAS DE CIMENTACIÓN	22,65	0,30	0,30	1,00	M3	2,04
COLUMNAS 30x30 CM	0,30	0,30	4,19	3,00	M3	1,13
	0,30	0,30	3,70	3,0	M3	1,00
VIGAS AEREAS 25x30 CM	10,00	0,25	0,30	1,00	M3	0,75
CONTRAPISO	8,30	3,30	0,10	1,00	M3	2,74
					TOTAL	**8,81**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Cantidad Total Ejecutada: **8,81**
Cantidad a Pagar presente Acta: **8,81**

LUIS MIGUEL GRANJA B.

GIOVANNY ZUÑIGA GARCIA

RESIDENTE DE OBRA	DIRECTOR INTERVENTORIA.

Libertad y Orden

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO

Alcaldía Municipal Santander de Quilichao

PREACTA – CUADRO DE MEMORIA DE CANTIDADES

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO PARA LA VEREDA LA CHAPA DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO"

CONTRATO N.º	030-2025	**Contratante**	MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA	**Supervisor**	GUSTAVO LEDESMA JIMENEZ
Contratista	CONSORCIO DOMINGUILLO	**Interventor**	CONSTRUCCIONES UNIVERSALES RLM SAS		
INP - 5	**Malla electrosoldada (incluye alambre de amarre, instalación y traslapo).**			**UNIDAD**	KG

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				UNIDAD	TOTAL
	LONGITUD	AREA	KG/M2	VOLUMEN		
MALLA 6 MM, 15 CM X 15 CM						
CASETA DE OPE		19,48	3,14		KG	61,21
CASETA DE CLOR		4,00	3,14		KG	12,57
CASETA DE BOM		4,77	3,14		KG	14,98
					TOTAL	**88,76**

Cantidad Total Ejecutada: **88,76**
Cantidad a Pagar presente Acta: **88,76**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



LUIS MIGUEL GRANJA B. RESIDENTE DE OBRA	GIOVANNY ZUÑIGA GARCIA DIRECTOR INTERVENTORIA.

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO

Libertad y Orden

Alcaldía Municipal Santander de Quilichao

PREACTA – CUADRO DE MEMORIA DE CANTIDADES

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO PARA LA VEREDA LA CHAPA DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE

CONTRATO N.º	030-2025	**Contratante**	MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA	**Supervisor**	GUSTAVO LEDESMA JIMENEZ
Contratista	CONSORCIO DOMINGUILLO	**Interventor**	CONSTRUCCIONES UNIVERSALES RLM SAS		
6.6.1	**Muro En Tolete Común 0.12M**			**UNIDAD**	M2

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				UNIDAD	TOTAL
	LONGITUD	ALTURA	AREA	CANTIDAD		
CASETA OP						
EJE B	3,70	1,70	6,29	1,00	M2	6,29
EJE A	2,77	1,05	2,91	1,00	M2	2,91
EJE A	1,41	1,38	1,95	1,00	M2	1,95
EJE 1	2,64	2,76	7,29	1,00	M2	7,29
DIV EJE 2	3,07	3,03	9,30	1,00	M2	9,30
DIV BAÑO	1,82	2,74	4,99	1,00	M2	4,99
EJE 3	2,64	2,76	7,29	1,00	M2	7,29
EJE A FRENTE	2,10	1,92	4,03	1,00	M2	4,03
EJE A FRENTE	0,78	0,51	0,40	1,00	M2	0,40
EJE B	3,63	2,50	9,08	1,00	M2	9,08
DIV BAÑO	1,00	2,60	2,60	1,00	M2	2,60
MURO MESON	1,20	0,60	0,72	2,00	M3	1,44
					TOTAL	**57,55**

Cantidad Total Ejecutada: **57,55**
Cantidad a Pagar presente Acta: **57,55**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



LUIS MIGUEL GRANJA B. RESIDENTE DE OBRA	GIOVANNY ZUÑIGA GARCIA DIRECTOR INTERVENTORIA.

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO

PREACTA – CUADRO DE MEMORIA DE CANTIDADES

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO PARA LA VEREDA LA CHAPA DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE

CONTRATO N.º	030-2025	**Contratante**	MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA	**Supervisor**	GUSTAVO LEDESMA JIMENEZ
Contratista	CONSORCIO DOMINGUILLO	**Interventor**	CONSTRUCCIONES UNIVERSALES RLM SAS		
6.6.2	**Pañete Liso Sobre Muros 1:4, E=1.5Cm**			**UNIDAD**	M2

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				UNIDAD	TOTAL
	LONGITUD	ALTURA	AREA	CANTIDAD		
CASETA OP						
EJE B	3,70	1,70	6,29	1,00	M2	6,29
EJE A	2,77	1,05	2,91	1,00	M2	2,91
EJE A	1,41	1,38	1,95	1,00	M2	1,95
EJE 1	2,64	2,76	7,29	1,00	M2	7,29
DIV EJE 2	3,07	3,03	9,30	2,00	M2	18,60
DIV BAÑO	1,82	2,74	4,99	2,00	M2	9,97
EJE 3	2,64	2,76	7,29	1,00	M2	7,29
EJE A FRENTE	2,10	1,92	4,03	1,00	M2	4,03
EJE A FRENTE	0,78	0,51	0,40	1,00	M2	0,40
EJE B	3,63	2,50	9,08	1,00	M2	9,08
DIV BAÑO	1,00	2,60	2,60	2,00	M2	5,20
MURO MESON	1,20	0,60	0,72	4,00	M2	2,88
					TOTAL	**75,88**

Cantidad Total Ejecutada: **75,88**
Cantidad a Pagar presente Acta: **75,88**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



LUIS MIGUEL GRANJA B.
RESIDENTE DE OBRA

GIOVANNY ZUÑIGA GARCIA
DIRECTOR INTERVENTORIA.

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO

Libertad y Orden

Alcaldía Municipal Santander de Quilichao

PREACTA – CUADRO DE MEMORIA DE CANTIDADES

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO PARA LA VEREDA LA CHAPA DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE

CONTRATO N.º	030-2025	**Contratante**	MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA	**Supervisor**	GUSTAVO LEDESMA JIMENEZ
Contratista	CONSORCIO DOMINGUILLO	**Interventor**	CONSTRUCCIONES UNIVERSALES RLM SAS		
6.6.3	**Estuco Plastico Para Muros**			**UNIDAD**	M2

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				UNIDAD	TOTAL
	LONGITUD	ALTURA	AREA	CANTIDAD		
CASETA OP						
EJE B	3,70	1,70	6,29	1,00	M2	6,29
EJE A	2,77	1,05	2,91	1,00	M2	2,91
EJE A	1,41	1,38	1,95	1,00	M2	1,95
EJE 1	2,64	2,76	7,29	1,00	M2	7,29
DIV EJE 2	3,07	3,03	9,30	2,00	M2	18,60
DIV BAÑO	1,82	2,74	4,99	2,00	M2	9,97
EJE 3	2,64	2,76	7,29	1,00	M2	7,29
EJE A FRENTE	2,10	1,92	4,03	1,00	M2	4,03
EJE A FRENTE	0,78	0,51	0,40	1,00	M2	0,40
EJE B	3,63	2,50	9,08	1,00	M2	9,08
DIV BAÑO	1,00	2,60	2,60	2,00	M2	5,20
MURO MESON	1,20	0,60	0,72	4,00	M2	2,88
					TOTAL	**75,88**

Cantidad Total Ejecutada: **75,88**
Cantidad a Pagar presente Acta: **75,88**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



LUIS MIGUEL GRANJA B.
RESIDENTE DE OBRA

GIOVANNY ZUÑIGA GARCIA
DIRECTOR INTERVENTORIA.

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO

Libertad y Orden

Alcaldía Municipal Santander de Quilichao

PREACTA – CUADRO DE MEMORIA DE CANTIDADES

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO PARA LA VEREDA LA CHAPA DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE

CONTRATO N.º	030-2025	**Contratante**	MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA	**Supervisor**	GUSTAVO LEDESMA JIMENEZ
Contratista	CONSORCIO DOMINGUILLO	**Interventor**	CONSTRUCCIONES UNIVERSALES RLM SAS		
6.6.4	**Pintura En Vinilo 3 Manos**			**UNIDAD**	M2

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				UNIDAD	TOTAL
	LONGITUD	ALTURA	AREA	CANTIDAD		
CASETA OP						
EJE B	3,70	1,70	6,29	1,00	M2	6,29
EJE A	2,77	1,05	2,91	1,00	M2	2,91
EJE A	1,41	1,38	1,95	1,00	M2	1,95
EJE 1	2,64	2,76	7,29	1,00	M2	7,29
DIV EJE 2	3,07	3,03	9,30	2,00	M2	18,60
DIV BAÑO	1,82	2,74	4,99	2,00	M2	9,97
EJE 3	2,64	2,76	7,29	1,00	M2	7,29
EJE A FRENTE	2,10	1,92	4,03	1,00	M2	4,03
EJE A FRENTE	0,78	0,51	0,40	1,00	M2	0,40
EJE B	3,63	2,50	9,08	1,00	M2	9,08
DIV BAÑO	1,00	2,60	2,60	2,00	M2	5,20
MURO MESON	1,20	0,60	0,72	4,00	M2	2,88
					TOTAL	**75,88**

Cantidad Total Ejecutada: **75,88**
Cantidad a Pagar presente Acta: **75,88**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



LUIS MIGUEL GRANJA B.
RESIDENTE DE OBRA

GIOVANNY ZUÑIGA GARCIA
DIRECTOR INTERVENTORIA.

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO

Libertad y Orden

Alcaldía Municipal Santander de Quilichao

PREACTA – CUADRO DE MEMORIA DE CANTIDADES

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO PARA LA VEREDA LA CHAPA DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE

CONTRATO N.º	030-2025	**Contratante**	MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA	**Supervisor**	GUSTAVO LEDESMA JIMENEZ
Contratista	CONSORCIO DOMINGUILLO	**Interventor**	CONSTRUCCIONES UNIVERSALES RLM SAS		
6.6.5	**Meson En Concreto 3000 Psi**			**UNIDAD**	M2

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				UNIDAD	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	AREA	CANTIDAD		
MESON			2,85	1,00	M2	2,85
					TOTAL	2,85

Cantidad Total Ejecutada: **2,85**
Cantidad a Pagar presente Acta: **2,85**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



LUIS MIGUEL GRANJA B.
RESIDENTE DE OBRA

GIOVANNY ZUÑIGA GARCIA
DIRECTOR INTERVENTORIA.

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO

Libertad y Orden

Alcaldía Municipal Santander de Quilichao

PREACTA – CUADRO DE MEMORIA DE CANTIDADES

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO PARA LA VEREDA LA CHAPA DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE

CONTRATO N.º	030-2025	**Contratante**	MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA	**Supervisor**	GUSTAVO LEDESMA JIMENEZ
Contratista	CONSORCIO DOMINGUILLO	**Interventor**	CONSTRUCCIONES UNIVERSALES RLM SAS		
6.7.5	**Suministro e instalación de sistema séptico inc. (trampa de grasas 105lt, tanque séptico 1000 lt y filtro fafa 1000 lt, incluye carriers plasticos), detalles según**			**UNIDAD**	UN

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				UNIDAD	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	AREA	CANTIDAD		
CASETA OP				1,00	UNIDAD	1,00
					TOTAL	**1,00**

Cantidad Total Ejecutada: **1,00**
Cantidad a Pagar presente Acta: **1,00**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



LUIS MIGUEL GRANJA B.
RESIDENTE DE OBRA

GIOVANNY ZUÑIGA GARCIA
DIRECTOR INTERVENTORIA.

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO

Libertad y Orden

Alcaldía Municipal Santander de Quilichao

PREACTA – CUADRO DE MEMORIA DE CANTIDADES

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO PARA LA VEREDA LA CHAPA DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE

CONTRATO N.º	030-2025	**Contratante**	MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA	**Supervisor**	GUSTAVO LEDESMA JIMENEZ
Contratista	CONSORCIO DOMINGUILLO	**Interventor**	CONSTRUCCIONES UNIVERSALES RLM SAS		
6.8.1	**Puerta Ventana. Suministro E Instalación - Lámina Cold Rolled Cal. 18 1.0 X 2.0 - Perfil Pts 40 X 40 Calibre 14, Cerradura Doble Y Esmalte Sintetico**			**UNIDAD**	UN

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				UNIDAD	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	AREA	CANTIDAD		
CASETA OP				1,00	UNIDAD	1,00
					TOTAL	**1,00**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Cantidad Total Ejecutada: **1,00**
Cantidad a Pagar presente Acta: **1,00**

LUIS MIGUEL GRANJA B.
RESIDENTE DE OBRA

GIOVANNY ZUÑIGA GARCIA
DIRECTOR INTERVENTORIA.

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO

Libertad y Orden

Alcaldía Municipal Santander de Quilichao

PREACTA – CUADRO DE MEMORIA DE CANTIDADES


OBJETO: "CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO PARA LA VEREDA LA CHAPA DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE

CONTRATO N.º	030-2025	**Contratante**	MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA	**Supervisor**	GUSTAVO LEDESMA JIMENEZ
Contratista	CONSORCIO DOMINGUILLO	**Interventor**	CONSTRUCCIONES UNIVERSALES RLM SAS		
6.8.2	**Puerta Tipo P-1. Suministro E Instalación - Perfil Pts 40 X 40 Calibre 14 - Doble Cerradura Y Esmalte Sintetico**			**UNIDAD**	UN

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				UNIDAD	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	AREA	CANTIDAD		
CASETA OP				1,00	UNIDAD	1,00
					TOTAL	**1,00**

Cantidad Total Ejecutada: **1,00**
Cantidad a Pagar presente Acta: **1,00**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

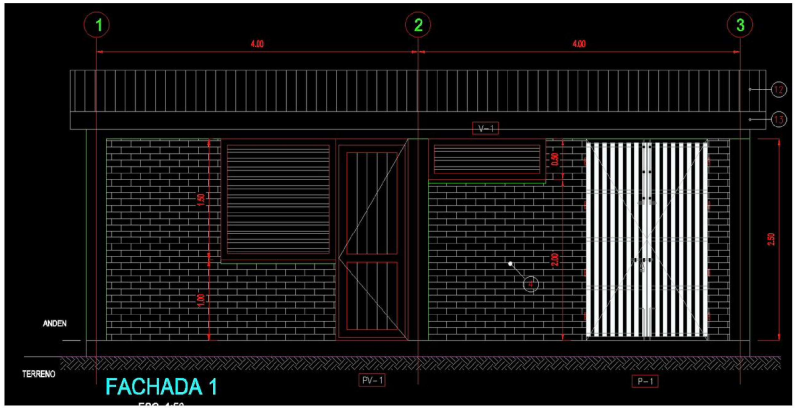

LUIS MIGUEL GRANJA B.
RESIDENTE DE OBRA

GIOVANNY ZUÑIGA GARCIA
DIRECTOR INTERVENTORIA.

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO

Libertad y Orden

Alcaldía Municipal Santander de Quilichao

PREACTA – CUADRO DE MEMORIA DE CANTIDADES


OBJETO: "CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO PARA LA VEREDA LA CHAPA DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE

CONTRATO N.º	030-2025	**Contratante**	MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA	**Supervisor**	GUSTAVO LEDESMA JIMENEZ
Contratista	CONSORCIO DOMINGUILLO	**Interventor**	CONSTRUCCIONES UNIVERSALES RLM SAS		
6.8.3	**Ventana Tipo V-1. Suministro E Instalación - Lámina Cold Rolled Cal. 18 1.0 X 2.0 - Perfil Pts 40 X 40 Calibre 14 Y Esmalte Sintetico**			**UNIDAD**	UN

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				UNIDAD	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	AREA	CANTIDAD		
CASETA OP				2,00	UNIDAD	2,00
					TOTAL	**2,00**

Cantidad Total Ejecutada: **2,00**
Cantidad a Pagar presente Acta: **2,00**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

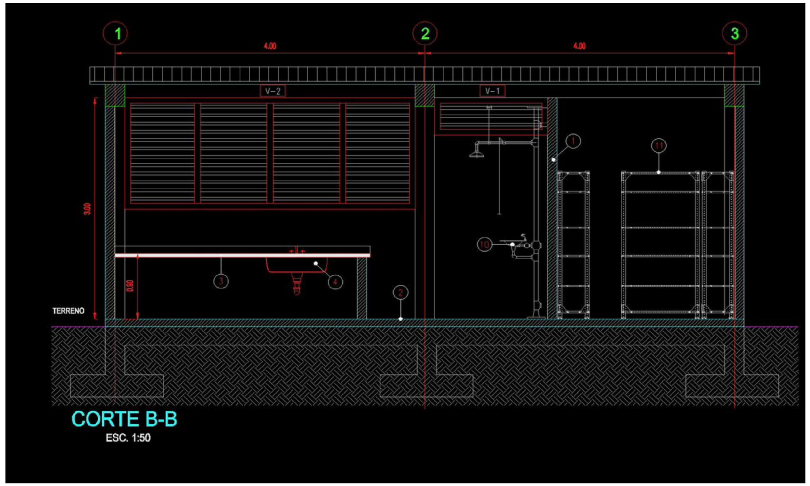

LUIS MIGUEL GRANJA B.
RESIDENTE DE OBRA

GIOVANNY ZUÑIGA GARCIA
DIRECTOR INTERVENTORIA.

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO

PREACTA – CUADRO DE MEMORIA DE CANTIDADES


OBJETO: "CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO PARA LA VEREDA LA CHAPA DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE

CONTRATO N.º	030-2025	**Contratante**	MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA	**Supervisor**	GUSTAVO LEDESMA JIMENEZ
Contratista	CONSORCIO DOMINGUILLO	**Interventor**	CONSTRUCCIONES UNIVERSALES RLM SAS		
6.8.4	**Ventana Tipo V-1. Suministro E Instalación - Lámina Cold Rolled Cal. 18 1.0 X 2.0 - Perfil Pts 40 X 40 Calibre 14 Y Esmalte Sintetico**			**UNIDAD**	UN

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				UNIDAD	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	AREA	CANTIDAD		
CASETA OP				1,00	UNIDAD	1,00
					TOTAL	1,00

Cantidad Total Ejecutada: 1,00
Cantidad a Pagar presente Acta: 1,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO

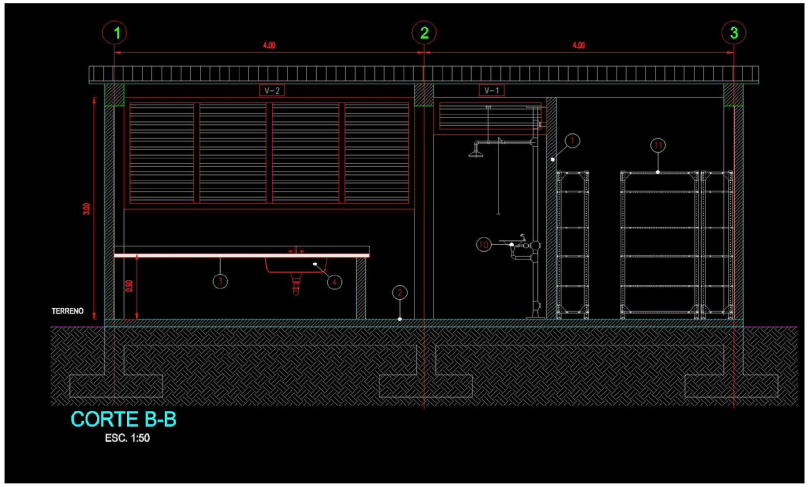

LUIS MIGUEL GRANJA B.
RESIDENTE DE OBRA

GIOVANNY ZUÑIGA GARCIA
DIRECTOR INTERVENTORIA.

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO

Libertad y Orden

Alcaldía Municipal Santander de Quilichao

PREACTA – CUADRO DE MEMORIA DE CANTIDADES

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO PARA LA VEREDA LA CHAPA DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE

CONTRATO N.º	030-2025	**Contratante**	MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA	**Supervisor**	GUSTAVO LEDESMA JIMENEZ
Contratista	CONSORCIO DOMINGUILLO	**Interventor**	CONSTRUCCIONES UNIVERSALES RLM SAS		
6.9.1	**Teja Termoacústica Incluye Correa**			**UNIDAD**	M2

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				UNIDAD	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	AREA	CANTIDAD		
CASETA OPERACIONES	9,00	4,80	43,20	1,00	M2	43,20
					TOTAL	43,20

Cantidad Total Ejecutada: **43,20**
Cantidad a Pagar presente Acta: **43,20**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



LUIS MIGUEL GRANJA B.
RESIDENTE DE OBRA

GIOVANNY ZUÑIGA GARCIA
DIRECTOR INTERVENTORIA.

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO

Libertad y Orden

Alcaldía Municipal Santander de Quilichao

PREACTA – CUADRO DE MEMORIA DE CANTIDADES

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO PARA LA VEREDA LA CHAPA DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE

CONTRATO N.º	030-2025	**Contratante**	MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA	**Supervisor**	GUSTAVO LEDESMA JIMENEZ
Contratista	CONSORCIO DOMINGUILLO	**Interventor**	CONSTRUCCIONES UNIVERSALES RLM SAS		
INP-7	**Estructura metalica grado 50. incluye anticorrosivo, esmalte y soldadura. según diseño**			**UNIDAD**	KG

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				UNIDAD	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	KG	CANTIDAD		
CASETA OPERACIONES			155,66	1,00	M2	155,66
					TOTAL	155,66

Cantidad Total Ejecutada: **155,66**
Cantidad a Pagar presente Acta: **155,66**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



LUIS MIGUEL GRANJA B.
RESIDENTE DE OBRA

GIOVANNY ZUÑIGA GARCIA
DIRECTOR INTERVENTORIA.

Libertad y Orden

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO

Alcaldía Municipal Santander de Quilichao

PREACTA – CUADRO DE MEMORIA DE CANTIDADES

OBJETO: "CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, OPTIMIZACION DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO PARA LA VEREDA LA CHAPA DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO"

CONTRATO N.º	030-2025	**Contratante**	MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA	**Supervisor**	GUSTAVO LEDESMA JIMENEZ
Contratista	CONSORCIO DOMINGUILLO	**Interventor**	CONSTRUCCIONES UNIVERSALES RLM SAS		
ITEM 7.1.1	**Localización y replanteo de estructuras hidraulicas**			**UNIDAD**	M2

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				UNIDAD	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ESPESOR	CANT.		
BATERIA SANITARIA						
EDGAR EMILIO BETANCOURTH MORA	3,60	1,80		1,00	M2	6,48
MILEIDY URBANO MENDEZ	3,60	1,80		1,00	M2	6,48
MARIA EUGENIA URBANO GOMEZ	3,60	1,80		1,00	M2	6,48
HECTOR HERNAN CHITO BEDOYA	3,60	1,80		1,00	M2	6,48
SEGUNDO PATROCINIO GOMEZ MARTINEZ	3,60	1,80		1,00	M2	6,48
JAIVER ANDRES VARGAS	3,60	1,80		1,00	M2	6,48
HECTOR CHITO	3,60	1,80		1,00	M2	6,48
ROSALINO MULCUE	3,60	1,80		1,00	M2	6,48
DOMINGA OSNAS	3,60	1,80		1,00	M2	6,48
EDGAR EMILIO BETANCOURTH SANTACRUZ	3,60	1,80		1,00	M2	6,48
					TOTAL	**64,80**

Cantidad Total Ejecutada: **64,80**
Cantidad a Pagar presente Acta: **64,80**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



LUIS MIGUEL GRANJA B.
RESIDENTE DE OBRA

GIOVANNY ZUÑIGA GARCIA
DIRECTOR INTERVENTORIA.

Libertad y Orden

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO

Alcaldía Municipal Santander de Quilichao

PREACTA – CUADRO DE MEMORIA DE CANTIDADES

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO PARA LA VEREDA LA CHAPA DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO"

CONTRATO N.º	030-2025	**Contratante**	MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA	**Supervisor**	GUSTAVO LEDESMA JIMENEZ
Contratista	CONSORCIO DOMINGUILLO	**Interventor**	CONSTRUCCIONES UNIVERSALES RLM SAS		
ITEM 7.2.1	**Excavación manual.tierra seca**			**UNIDAD**	M3

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				UNIDAD	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTURA	CANT		
BATERIAS SANITARIAS						
VCIM 1						
EDGAR EMILIO BETANCOURTH MORA	3,60	0,42	0,42	2,00	M3	1,27
MILEIDY URBANO MENDEZ	3,60	0,42	0,42	2,00	M3	1,27
MARIA EUGENIA URBANO GOMEZ	3,60	0,42	0,42	2,00	M3	1,27
HECTOR HERNAN CHITO BEDOYA	3,60	0,42	0,42	2,00	M3	1,27
SEGUNDO PATROCINIO GOMEZ MARTINEZ	3,60	0,42	0,42	2,00	M3	1,27
JAIVER ANDRES VARGAS	3,60	0,42	0,42	2,00	M3	1,27
ROSALINO MULCUE OSNAS	3,60	0,42	0,42	2,00	M3	1,27
DOMINGA OSNAS BALTAZAR	3,60	0,42	0,42	2,00	M3	1,27
EDGAR EMILIO BETANCOURTH SANTACRUZ	3,60	0,42	0,42	2,00	M3	1,27
GLORIA DEL CARMEN GOMEZ	3,60	0,42	0,42	2,00	M3	1,27
VCIM 2		0,42	0,42			
EDGAR EMILIO BETANCOURTH MORA	1,00	0,42	0,42	4,00	M3	0,71
MILEIDY URBANO MENDEZ	1,00	0,42	0,42	4,00	M3	0,71
MARIA EUGENIA URBANO GOMEZ	1,00	0,42	0,42	4,00	M3	0,71
HECTOR HERNAN CHITO BEDOYA	1,00	0,42	0,42	4,00	M3	0,71
SEGUNDO PATROCINIO GOMEZ MARTINEZ	1,00	0,42	0,42	4,00	M3	0,71
JAIVER ANDRES VARGAS	1,00	0,42	0,42	4,00	M3	0,71
ROSALINO MULCUE OSNAS	1,00	0,42	0,42	4,00	M3	0,71
DOMINGA OSNAS BALTAZAR	1,00	0,42	0,42	4,00	M3	0,71
EDGAR EMILIO BETANCOURTH SANTACRUZ	1,00	0,42	0,42	4,00	M3	0,71
GLORIA DEL CARMEN GOMEZ	1,00	0,42	0,42	4,00	M3	0,71
Descapote materia organica						
EDGAR EMILIO BETANCOURTH MORA	3,60	1,80	0,20	1,00	M3	1,30
MILEIDY URBANO MENDEZ	3,60	1,80	0,20	1,00	M3	1,30
MARIA EUGENIA URBANO GOMEZ	3,60	1,80	0,20	1,00	M3	1,30
HECTOR HERNAN CHITO BEDOYA	3,60	1,80	0,20	1,00	M3	1,30

REGISTRO FOTOGRÁFICO





SEGUNDO PATROCINIO GOMEZ MARTINEZ	3,60	1,80	0,20	1,00	M3	1,30
JAIVER ANDRES VARGAS	3,60	1,80	0,20	1,00	M3	1,30
ROSALINO MULCUE OSNAS	3,60	1,80	0,20	1,00	M3	1,30
DOMINGA OSNAS BALTAZAR	3,60	1,80	0,20	1,00	M3	1,30
EDGAR EMILIO BETANCOURTH SANTACRUZ	3,60	1,80	0,20	1,00	M3	1,30
GLORIA DEL CARMEN GOMEZ	3,60	1,80	0,20	1,00	M3	1,30
NIVELACION TERRENO EDGAR E MORA	2,00	3,55	0,20	1,00	M3	6,39
NIVELACION TERRENO EDGAR E SANTADRUZ	1,80	3,55	0,60	1,00	M4	3,83
					TOTAL	**42,95**



Cantidad Total Ejecutada: **42,95**
Cantidad a Pagar presente Acta: **42,95**

LUIS MIGUEL GRANJA B. **RESIDENTE DE OBRA**	**GIOVANNY ZUÑIGA GARCIA** **DIRECTOR INTERVENTORIA.**

Libertad y Orden

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO

Alcaldía Municipal Santander de Quilichao

PREACTA – CUADRO DE MEMORIA DE CANTIDADES

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO PARA LA VEREDA LA CHAPA DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO"

CONTRATO N.º	030-2025	**Contratante**	MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA	**Supervisor**	GUSTAVO LEDESMA JIMENEZ
Contratista	CONSORCIO DOMINGUILLO	**Interventor**	CONSTRUCCIONES UNIVERSALES RLM SAS		
ITEM 7.3.1	**Retiro de saldos en sitio**			**UNIDAD**	M3-KM

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				UNIDAD	TOTAL
		VOLUMEN	EXPANSIÓN	DISTANCIA		
BATERIAS SANITARIAS						
EDGAR EMILIO BETANCOURTH MORA		9,67	30%	48,00	M3-KM	603,41
MILEIDY URBANO MENDEZ		3,28	30%	48,00	M3-KM	204,67
MARIA EUGENIA URBANO GOMEZ		3,28	30%	48,00	M3-KM	204,67
HECTOR HERNAN CHITO BEDOYA		3,28	30%	48,00	M3-KM	204,67
SEGUNDO PATROCINIO GOMEZ MARTINEZ		3,28	30%	48,00	M3-KM	204,67
JAIVER ANDRES VARGAS		3,28	30%	48,00	M3-KM	204,67
ROSALINO MULCUE OSNAS		3,28	30%	48,00	M3-KM	204,67
DOMINGA OSNAS BALTAZAR		3,28	30%	48,00	M3-KM	204,67
EDGAR EMILIO BETANCOURTH SANTACRUZ		7,11	30%	48,00	M3-KM	443,66
GLORIA DEL CARMEN GOMEZ		3,28	30%	48,00	M3-KM	204,67
					TOTAL	**2684,45**

Cantidad Total Ejecutada: **2684,45**
Cantidad a Pagar presente Acta: **2684,45**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



LUIS MIGUEL GRANJA B.
RESIDENTE DE OBRA

GIOVANNY ZUÑIGA GARCIA
DIRECTOR INTERVENTORIA.

Libertad y Orden

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO

Alcaldía Municipal Santander de Quilichao

PREACTA – CUADRO DE MEMORIA DE CANTIDADES

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO PARA LA VEREDA LA CHAPA DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO"

CONTRATO N.º	030-2025	**Contratante**	MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA	**Supervisor**	GUSTAVO LEDESMA JIMENEZ
Contratista	CONSORCIO DOMINGUILLO	**Interventor**	CONSTRUCCIONES UNIVERSALES RLM SAS		
ITEM 7.3.2	**Disposición del material**			**UNIDAD**	M3

LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES			UNIDAD	TOTAL
		VOLUMEN	EXPANSIÓN	VOL SUELTO		
BATERIAS SANITARIAS						
EDGAR EMILIO BETANCOURTH MORA		9,67	30%	12,57	M3	12,57
MILEIDY URBANO MENDEZ		3,28	30%	4,26	M3	4,26
MARIA EUGENIA URBANO GOMEZ		3,28	30%	4,26	M3	4,26
HECTOR HERNAN CHITO BEDOYA		3,28	30%	4,26	M3	4,26
SEGUNDO PATROCINIO GOMEZ MARTINEZ		3,28	30%	4,26	M3	4,26
JAIVER ANDRES VARGAS		3,28	30%	4,26	M3	4,26
ROSALINO MULCUE OSNAS		3,28	30%	4,26	M3	4,26
DOMINGA OSNAS BALTAZAR		3,28	30%	4,26	M3	4,26
EDGAR EMILIO BETANCOURTH SANTACRUZ		7,11	30%	9,24	M3	9,24
GLORIA DEL CARMEN GOMEZ		3,28	30%	4,26	M3	4,26
					TOTAL	**55,93**

Cantidad Total Ejecutada: **55,93**
Cantidad a Pagar presente Acta: **55,93**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



LUIS MIGUEL GRANJA B.
RESIDENTE DE OBRA

GIOVANNY ZUÑIGA GARCIA
DIRECTOR INTERVENTORIA.

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO

Libertad y Orden

Alcaldía Municipal Santander de Quilichao

PREACTA – CUADRO DE MEMORIA DE CANTIDADES

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO PARA LA VEREDA LA CHAPA DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO"

CONTRATO N.º	030-2025	**Contratante**	MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA	**Supervisor**	GUSTAVO LEDESMA JIMENEZ
Contratista	CONSORCIO DOMINGUILLO	**Interventor**	CONSTRUCCIONES UNIVERSALES RLM SAS		
7.4.1	**Relleno Con Material Del Sitio Compactado Mecánicamente**			**UNIDAD**	M3

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				UNIDAD	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	VOLUMEN	CANT		
BATERIAS SANITARIAS						
TRINIDAD GRIJALBA			0,82	1,00	M2	0,82
AIDA LIBIA GRIJALBA			0,82	1,00	M1	0,82
MARIA BARBARA BURBANO DAZA			0,82	1,00	M0	0,82
LUIS MIGUEL SÁNCHEZ BURBANO			0,82	1,00	M1	0,82
MANUEL ISAIS BETANCOURTH			0,82	1,00	M2	0,82
EDGAR EMILIO BETANCOURTH MORA			0,82	1,00	M3	0,82
MILEIDY URBANO MENDEZ			0,82	1,00	M3	0,82
MARIA EUGENIA URBANO GOMEZ			0,82	1,00	M3	0,82
HECTOR HERNAN CHITO BEDOYA			0,82	1,00	M3	0,82
SEGUNDO PATROCINIO GOMEZ MARTINEZ			0,82	1,00	M3	0,82
JAIVER ANDRES VARGAS			0,82	1,00	M3	0,82
ROSALINO MULCUE OSNAS			0,82	1,00	M3	0,82
DOMINGA OSNAS BALTAZAR			0,82	1,00	M3	0,82
EDGAR EMILIO BETANCOURTH SANTACRUZ			0,82	1,00	M3	0,82
GLORIA DEL CARMEN GOMEZ			0,82	1,00	M3	0,82
					TOTAL	**12,30**

Cantidad Total Ejecutada: **12,30**
Cantidad a Pagar presente Acta: **12,30**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



LUIS MIGUEL GRANJA B.
RESIDENTE DE OBRA

GIOVANNY ZUÑIGA GARCIA
DIRECTOR INTERVENTORIA.

Libertad y Orden

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO

Alcaldía Municipal Santander de Quilichao

PREACTA – CUADRO DE MEMORIA DE CANTIDADES

OBJETO: "CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, OPTIMIZACION DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO PARA LA VEREDA LA CHAPA DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO"

CONTRATO N.º	030-2025	**Contratante**	MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA	**Supervisor**	GUSTAVO LEDESMA JIMENEZ
Contratista	CONSORCIO DOMINGUILLO	**Interventor**	CONSTRUCCIONES UNIVERSALES RLM SAS		
ITEM 7.5.1	**Concreto clase F, 2000 PSI para solados y atraques**			**UNIDAD**	M3

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				UNIDAD	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTURA	CANT		
BATERIAS SANITARIAS						
SOLADO VCIM 1 EJE 1 a 4						
TRINIDAD GRIJALBA	3,6	0,3	0,05	2	M3	0,11
AIDA LIBIA GRIJALBA	3,6	0,3	0,05	2	M3	0,11
MARIA BARBARA BURBANO DAZA	3,6	0,3	0,05	2	M3	0,11
LUIS MIGUEL SÁNCHEZ BURBANO	3,6	0,3	0,05	2	M3	0,11
MANUEL ISAIS BETANCOURTH	3,6	0,3	0,05	2	M3	0,11
EDGAR EMILIO BETANCOURTH MORA	3,6	0,3	0,05	2	M3	0,11
MILEIDY URBANO MENDEZ	3,6	0,3	0,05	2	M3	0,11
MARIA EUGENIA URBANO GOMEZ	3,6	0,3	0,05	2	M3	0,11
SEGUNDO PATROCINIO GOMEZ MARTINEZ	3,6	0,3	0,05	2	M3	0,11
JAIVER ANDRES VARGAS	3,6	0,3	0,05	2	M3	0,11
HECTOR HERNAN CHITO BEDOYA	3,6	0,3	0,05	2	M3	0,11
ROSALINO MULCUE OSNAS	3,6	0,3	0,05	2	M3	0,11
DOMINGA OSNAS BALTAZAR	3,6	0,3	0,05	2	M3	0,11
EDGAR EMILIO BETANCOURTH SANTACRUZ	3,6	0,3	0,05	2	M3	0,11
GLORIA DEL CARMEN GOMEZ	3,6	0,3	0,05	2	M3	0,11
SOLADO VCIM 2 EJE A a B						
TRINIDAD GRIJALBA	0,95	0,3	0,05	4	M3	0,06
AIDA LIBIA GRIJALBA	0,95	0,3	0,05	4	M3	0,06
MARIA BARBARA BURBANO DAZA	0,95	0,3	0,05	4	M3	0,06
LUIS MIGUEL SÁNCHEZ BURBANO	0,95	0,3	0,05	4	M3	0,06
MANUEL ISAIS BETANCOURTH	0,95	0,3	0,05	4	M3	0,06
EDGAR EMILIO BETANCOURTH MORA	0,95	0,3	0,05	4	M3	0,06
MILEIDY URBANO MENDEZ	0,95	0,3	0,05	4	M3	0,06
MARIA EUGENIA URBANO GOMEZ	0,95	0,3	0,05	4	M3	0,06
SEGUNDO PATROCINIO GOMEZ MARTINEZ	0,95	0,3	0,05	4	M3	0,06
JAIVER ANDRES VARGAS	0,95	0,3	0,05	4	M3	0,06
HECTOR HERNAN CHITO BEDOYA	0,95	0,3	0,05	4	M3	0,06
ROSALINO MULCUE OSNAS	0,95	0,3	0,05	4	M3	0,06
DOMINGA OSNAS BALTAZAR	0,95	0,3	0,05	4	M3	0,06
EDGAR EMILIO BETANCOURTH SANTACRUZ	0,95	0,3	0,05	4	M3	0,06
GLORIA DEL CARMEN GOMEZ	0,95	0,3	0,05	4	M3	0,06
					TOTAL	**2,48**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Cantidad Total Ejecutada: **2,48**
Cantidad a Pagar presente Acta: **2,48**

	
LUIS MIGUEL GRANJA B. **RESIDENTE DE OBRA**	**GIOVANNY ZUÑIGA GARCIA** **DIRECTOR INTERVENTORIA.**

Libertad y Orden

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO

Alcaldía Municipal Santander de Quilichao

PREACTA – CUADRO DE MEMORIA DE CANTIDADES

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO PARA LA VEREDA LA CHAPA DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO"

CONTRATO N.º	030-2025	**Contratante**	MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA	**Supervisor**	GUSTAVO LEDESMA JIMENEZ
Contratista	CONSORCIO DOMINGUILLO	**Interventor**	CONSTRUCCIONES UNIVERSALES RLM SAS		
ITEM 7.5.2	**Suministro figurado y armado de acero de refuerzo 60000 PSI**			**UNIDAD**	KG

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				UNIDAD	TOTAL
	LARGO	KG/ML	CANT x BATERIA	CANT BATERIAS		
BATERIAS SANITARIAS						
VCIM 1 ACERO #4	3,80	1,00	8,00	11,00	KG	334,40
VCIM 2 ACERO #4	1,83	1,00	16,00	11,00	KG	322,08
ESTRIBOS VCIM 1 ACERO #3	0,84	0,56	48,00	11,00	KG	248,37
ESTRIBOS VCIM 2 ACERO #3	0,84	0,56	52,00	11,00	KG	269,07
COLUMNA C1 ACERO #3	2,60	0,56	48,00	11,00	KG	768,77
ESTRIBOS COLUMNA C1 ACERO #2	0,84	0,25	192,00	11,00	KG	443,52
VGA 1 ACERO #3	3,95	0,56	4,00	11,00	KG	97,33
ESTRIBOS VGA 1 ACERO #2	0,78	0,25	29,00	11,00	KG	62,21
VGA 2 ACERO #3	3,95	0,56	4,00	11,00	KG	97,33
ESTRIBOS VGA 2 ACERO #2	0,78	0,25	29,00	11,00	KG	62,21
VGA 3 ACERO #3	2,15	0,56	8,00	11,00	KG	105,95
ESTRIBOS VGA 3 ACERO #2	0,78	0,25	26,00	11,00	KG	55,77
VGA 4 ACERO #3	2,15	0,56	4,00	11,00	KG	52,98
ESTRIBOS VGA 4 ACERO #2	0,78	0,25	15,00	11,00	KG	32,18
VGA 5 ACERO #3	2,15	0,56	4,00	11,00	KG	52,98
ESTRIBOS VGA 5 ACERO #2	0,78	0,25	15	11,00	KG	32,18
					TOTAL	**3037,30**

Cantidad Total Ejecutada: **3037,30**
Cantidad a Pagar presente Acta: **3037,30**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



LUIS MIGUEL GRANJA B.
RESIDENTE DE OBRA

GIOVANNY ZUÑIGA GARCIA
DIRECTOR INTERVENTORIA.

Libertad y Orden

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO

Alcaldía Municipal Santander de Quilichao

PREACTA – CUADRO DE MEMORIA DE CANTIDADES

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO PARA LA VEREDA LA CHAPA DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO"

CONTRATO N.º	030-2025	**Contratante**	MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA	**Supervisor**	GUSTAVO LEDESMA JIMENEZ
Contratista	CONSORCIO DOMINGUILLO	**Interventor**	CONSTRUCCIONES UNIVERSALES RLM SAS		
INP - 3	**Concreto de 21 MPA para cimentación y estructura**			**UNIDAD**	M3

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				CANT BATERIAS	TOTAL(M3)
	LONGITUD	ANCHO	ALTURA	CANT X BATERIA		
BATERIAS SANITARIAS						
VCIM 1	3,60	0,30	0,30	2,00	15	9,72
VCIM 2	0,98	0,30	0,30	4,00	15	5,29
COLUMNA C1	1,85	0,12	0,30	8,00	15	7,99
LOSA DE CONTRAPISO	3,50	1,50	0,10	1,00	15	7,88
VIGAS AEREAS	5,92	0,14	0,12	1,00	15	1,49
					TOTAL	**32,37**

Cantidad Total Ejecutada: **32,37**
Cantidad a Pagar presente Acta: **32,37**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



LUIS MIGUEL GRANJA B.
RESIDENTE DE OBRA

GIOVANNY ZUÑIGA GARCIA
DIRECTOR INTERVENTORIA.

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO

Libertad y Orden

Alcaldía Municipal Santander de Quilichao

PREACTA – CUADRO DE MEMORIA DE CANTIDADES

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO PARA LA VEREDA LA CHAPA DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO"

CONTRATO N.º	030-2025	**Contratante**	MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA	**Supervisor**	GUSTAVO LEDESMA JIMENEZ
Contratista	CONSORCIO DOMINGUILLO	**Interventor**	CONSTRUCCIONES UNIVERSALES RLM SAS		
INP - 4	**Losa aerea en concreto de 21 mpa**			**UNIDAD**	M2

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				UNIDAD	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTURA	CANT		
BATERIAS SANITARIAS						
LOSA VOLADO LAVADERO	0,84	0,40		15,00	M2	5,04
LOSA VOLADO SANITARIO	0,84	0,40		15,00	M2	5,04
LOSA VOLADO DUCHA	0,84	0,40		15,00	M2	5,04
LOSA VOLADO LAVADERO	1,16	1,03		15,00	M2	17,92
LOSA VOLADO SANITARIO	1,16	1,03		15,00	M2	17,92
LOSA VOLADO DUCHA	1,16	1,03		15,00	M2	17,92
VOLADO EXTERNO	0,06	0,12		15,00	M2	0,11
					TOTAL	69,00

Cantidad Total Ejecutada: **69,00**
Cantidad a Pagar presente Acta: **69,00**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



LUIS MIGUEL GRANJA B.
RESIDENTE DE OBRA

GIOVANNY ZUÑIGA GARCIA
DIRECTOR INTERVENTORIA.

Libertad y Orden

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO

Alcaldía Municipal Santander de Quilichao

PREACTA – CUADRO DE MEMORIA DE CANTIDADES

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO PARA LA VEREDA LA CHAPA DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO"

CONTRATO N.º	030-2025	**Contratante**	MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA	**Supervisor**	GUSTAVO LEDESMA JIMENEZ
Contratista	CONSORCIO DOMINGUILLO	**Interventor**	CONSTRUCCIONES UNIVERSALES RLM SAS		
ITEM 7.5.4	**Malla electrosoldada(incluye alambre de amarre, instalación traslapo)**			**UNIDAD**	KG

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				UNIDAD	TOTAL
	M2 NECESARIOS	KG/M2	CANT x BATERIA	CANT BATERIAS		
BATERIAS SANITARIAS						
MALLA ELECTROSOLDADA 6mm						
TRINIDAD GRIJALBA	7,8	2,79	1,00	1,00	KG	21,69
AIDA LIBIA GRIJALBA	7,8	2,79	1,00	1,00	KG	21,69
MARIA BARBARA BURBANO DAZA	7,8	2,79	1,00	1,00	KG	21,69
LUIS MIGUEL SÁNCHEZ BURBANO	7,8	2,79	1,00	1,00	KG	21,69
MANUEL ISAIS BETANCOURTH	7,8	2,79	1,00	1,00	KG	21,69
EDGAR EMILIO BETANCOURTH MORA	7,8	2,79	1,00	1,00	KG	21,69
MILEIDY URBANO MENDEZ	7,8	2,79	1,00	1,00	KG	21,72
MARIA EUGENIA URBANO GOMEZ	7,8	2,79	1,00	1,00	KG	21,69
SEGUNDO PATROCINIO GOMEZ MARTINEZ	7,8	2,79	1,00	1,00	KG	21,69
JAIVER ANDRES VARGAS	7,8	2,79	1,00	1,00	KG	21,69
HECTOR HERNAN CHITO BEDOYA	7,8	2,79	1,00	1,00	KG	21,69
ROSALINO MULCUE OSNAS	7,8	2,79	1,00	1,00	KG	21,69
DOMINGA OSNAS BALTAZAR	7,8	2,79	1,00	1,00	KG	21,69
EDGAR EMILIO BETANCOURTH SANTACRUZ	7,8	2,79	1,00	1,00	KG	21,69
GLORIA DEL CARMEN GOMEZ	7,8	2,79	1,00	1,00	KG	21,69
					TOTAL	**325,40**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Cantidad Total Ejecutada: **325,40**
Cantidad a Pagar presente Acta: **325,40**

LUIS MIGUEL GRANJA B.
RESIDENTE DE OBRA

GIOVANNY ZUÑIGA GARCIA
DIRECTOR INTERVENTORIA.

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO

Libertad y Orden

Alcaldía Municipal Santander de Quilichao

PREACTA – CUADRO DE MEMORIA DE CANTIDADES

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO PARA LA VEREDA LA CHAPA DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO"

CONTRATO N.º	030-2025	**Contratante**	MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA	**Supervisor**	GUSTAVO LEDESMA JIMENEZ
Contratista	CONSORCIO DOMINGUILLO	**Interventor**	CONSTRUCCIONES UNIVERSALES RLM SAS		
ITEM 7.6.1	**Muro en tolete comun 0.12M**			**UNIDAD**	M2

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				UNIDAD	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTURA	CANT BATERIAS		
BATERIAS SANITARIAS						
MURO A(1-2)		1,06	1,85	15,00	M2	29,39
MURO A-B EN 1		0,78	1,85	15,00	M2	21,65
MURO A-B EN 2		0,96	1,85	15,00	M2	26,64
MURO A-B EN 3		0,96	1,85	15,00	M2	26,64
MURO A-B EN 4		0,78	1,85	15,00	M2	21,65
MURO A(2-3)		0,95	1,85	15,00	M2	26,36
MURO A(3-4)		0,95	1,85	15,00	M2	26,36
					TOTAL	**178,68**

Cantidad Total Ejecutada: **178,68**
Cantidad a Pagar presente Acta: **178,68**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



LUIS MIGUEL GRANJA B.
RESIDENTE DE OBRA

GIOVANNY ZUÑIGA GARCIA
DIRECTOR INTERVENTORIA.

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO

PREACTA – CUADRO DE MEMORIA DE CANTIDADES

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO PARA LA VEREDA LA CHAPA DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE

CONTRATO N.º	030-2025	**Contratante**	MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA	**Supervisor**	GUSTAVO LEDESMA JIMENEZ
Contratista	CONSORCIO DOMINGUILLO	**Interventor**	CONSTRUCCIONES UNIVERSALES RLM SAS		
7.6.2	**Pañete Liso Sobre Muros 1:4, E=1.5Cm**			**UNIDAD**	

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				UNIDAD	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	CANTIDAD	SON		
BATERIAS SANITARIAS						
LAVADERO						
LOSA	1,25	1,00	1,00	15,00	M2	18,75
MUROS	3,40	1,99	1,00	15,00	M2	101,49
DUCHA						
LOSA	1,16	0,90	1,00	15,00	M2	15,66
MUROS	3,25	1,99	1,00	15,00	M2	97,01
SANITARIO						
LOSA	1,16	0,90	1,00	15,00	M2	15,66
MUROS	3,25	1,99	1,00	15,00	M2	97,14
					TOTAL	**345,72**

Cantidad Total Ejecutada: **345,72**
Cantidad a Pagar presente Acta: **345,72**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



LUIS MIGUEL GRANJA B.
RESIDENTE DE OBRA

GIOVANNY ZUÑIGA GARCIA
DIRECTOR INTERVENTORIA.

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO

Libertad y Orden

Alcaldía Municipal Santander de Quilichao

PREACTA – CUADRO DE MEMORIA DE CANTIDADES


OBJETO: "CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO PARA LA VEREDA LA CHAPA DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE

CONTRATO N.º	030-2025	**Contratante**	MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA	**Supervisor**	GUSTAVO LEDESMA JIMENEZ
Contratista	CONSORCIO DOMINGUILLO	**Interventor**	CONSTRUCCIONES UNIVERSALES RLM SAS		
7.6.3	**Estuco Plastico Para Muros**			**UNIDAD**	M2

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				UNIDAD	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	CANTIDAD	SON		
BATERIAS SANITARIAS						
LAVADERO						
LOSA	1,25	1,00	1,00	15,00	M2	18,75
MUROS	3,40	1,99	1,00	15,00	M2	101,49
DUCHA						
LOSA	1,16	0,90	1,00	15,00	M2	15,66
MUROS	3,25	1,99	1,00	15,00	M2	97,01
SANITARIO						
LOSA	1,16	0,90	1,00	15,00	M2	15,66
MUROS	3,25	1,99	1,00	15,00	M2	97,14
					TOTAL	**345,72**

Cantidad Total Ejecutada: **345,72**
Cantidad a Pagar presente Acta: **345,72**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

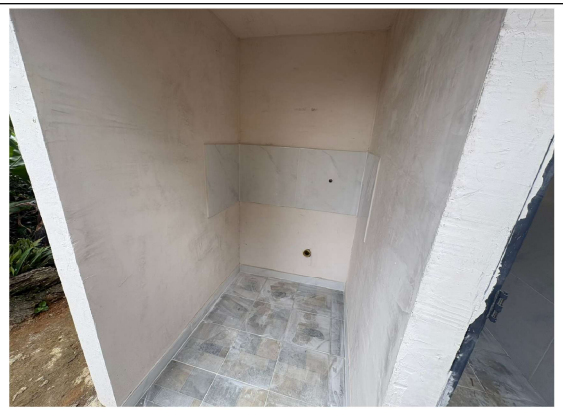

LUIS MIGUEL GRANJA B.
RESIDENTE DE OBRA

GIOVANNY ZUÑIGA GARCIA
DIRECTOR INTERVENTORIA.

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO

Libertad y Orden

Alcaldía Municipal Santander de Quilichao

PREACTA – CUADRO DE MEMORIA DE CANTIDADES

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO PARA LA VEREDA LA CHAPA DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE

CONTRATO N.º	030-2025	**Contratante**	MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA	**Supervisor**	GUSTAVO LEDESMA JIMENEZ
Contratista	CONSORCIO DOMINGUILLO	**Interventor**	CONSTRUCCIONES UNIVERSALES RLM SAS		
7.6.4	**Pintura En Vinilo 3 Manos**			**UNIDAD**	M2

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				UNIDAD	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	CANTIDAD	SON		
BATERIAS SANITARIAS						
LAVADERO						
LOSA	1,25	1,00	1,00	15,00	M2	18,75
MUROS	3,40	1,99	1,00	15,00	M2	101,49
DUCHA						
LOSA	1,16	0,90	1,00	15,00	M2	15,66
MUROS	3,25	1,99	1,00	15,00	M2	97,01
SANITARIO						
LOSA	1,16	0,90	1,00	15,00	M2	15,66
MUROS	3,25	1,99	1,00	15,00	M2	97,14
					TOTAL	**345,72**

Cantidad Total Ejecutada: **345,72**
Cantidad a Pagar presente Acta: **345,72**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



LUIS MIGUEL GRANJA B.
RESIDENTE DE OBRA

GIOVANNY ZUÑIGA GARCIA
DIRECTOR INTERVENTORIA.

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO

Libertad y Orden

Alcaldía Municipal Santander de Quilichao

PREACTA – CUADRO DE MEMORIA DE CANTIDADES


OBJETO: "CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO PARA LA VEREDA LA CHAPA DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE

CONTRATO N.º	030-2025	**Contratante**	MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA	**Supervisor**	GUSTAVO LEDESMA JIMENEZ
Contratista	CONSORCIO DOMINGUILLO	**Interventor**	CONSTRUCCIONES UNIVERSALES RLM SAS		
7.6.5	**Baldosa Cerámica Piso-Pared Calidad Primera**			**UNIDAD**	M2

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				UNIDAD	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	AREA	SON		
BATERIAS SANITARIAS						
PISO LAVADERO	1,25	1,00		12,00	M2	15,00
PISO DUCHA	1,16	0,90		12,00	M2	12,53
PISO SANITARIO	1,16	0,90		12,00	M2	12,53
PARED LAVADERO	0,50	2,00		12,00	M2	12,00
PARED DUCHA	2,50	1,50		12,00	M2	45,00
PARED BAÑO	2,00	1,00		12,00	M2	24,00
LAVAMANOS	0,50	0,50		12,00	M3	3,00
					TOTAL	**124,06**

Cantidad Total Ejecutada: **124,06**
Cantidad a Pagar presente Acta: **124,06**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

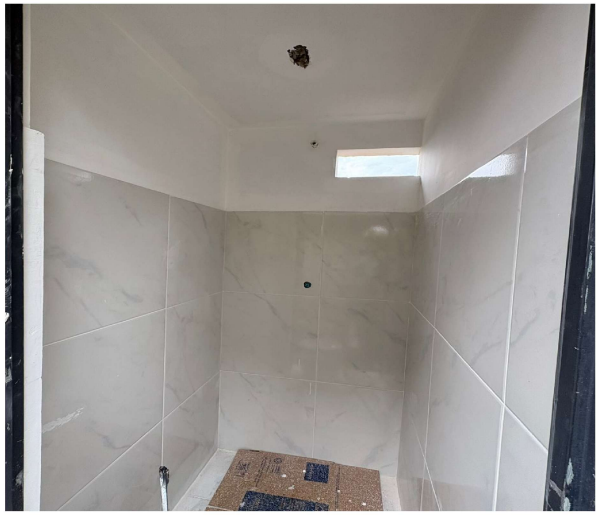

LUIS MIGUEL GRANJA B.
RESIDENTE DE OBRA

GIOVANNY ZUÑIGA GARCIA
DIRECTOR INTERVENTORIA.

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO

Libertad y Orden

Alcaldía Municipal Santander de Quilichao

PREACTA – CUADRO DE MEMORIA DE CANTIDADES

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO PARA LA VEREDA LA CHAPA DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO"

CONTRATO N.º	030-2025	**Contratante**	MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA	**Supervisor**	GUSTAVO LEDESMA JIMENEZ
Contratista	CONSORCIO DOMINGUILLO	**Interventor**	CONSTRUCCIONES UNIVERSALES RLM SAS		
INP-8	**Guardaescoba ceramico calidad primera**			**UNIDAD**	ML

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				UNIDAD	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	AREA	SON		
BATERIAS SANITARIAS						
LAVADERO	1,15			15,00		17,25
LAVADERO	1,15			15,00		17,25
LAVADERO	0,90			15,00		13,50
					TOTAL	**48,00**

Cantidad Total Ejecutada: **48,00**
Cantidad a Pagar presente Acta: **48,00**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



LUIS MIGUEL GRANJA B.
RESIDENTE DE OBRA

GIOVANNY ZUÑIGA GARCIA
DIRECTOR INTERVENTORIA.

Libertad y Orden

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO

Alcaldía Municipal Santander de Quilichao

PREACTA – CUADRO DE MEMORIA DE CANTIDADES

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO PARA LA VEREDA LA CHAPA DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO"

CONTRATO N.º	030-2025	**Contratante**	MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA	**Supervisor**	GUSTAVO LEDESMA JIMENEZ
Contratista	CONSORCIO DOMINGUILLO	**Interventor**	CONSTRUCCIONES UNIVERSALES RLM SAS		
ITEM 7.7.1	**Suministro E Instalación Sanitario Tanque (Incluye Grifería)**			**UNIDAD**	UN

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				UNIDAD	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTURA	CANT		
BATERIAS SANITARIAS						
TRINIDAD GRIJALBA				1,00	UN	1,00
AIDA LIBIA GRIJALBA				1,00	UN	1,00
MARIA BARBARA BURBANO DAZA				1,00	UN	1,00
LUIS MIGUEL SÁNCHEZ BURBANO				1,00	UN	1,00
MANUEL ISAIS BETANCOURTH				1,00	UN	1,00
EDGAR EMILIO BETANCOURTH MORA				1,00	UN	1,00
MILEIDY URBANO MENDEZ				1,00	UN	1,00
MARIA EUGENIA URBANO GOMEZ				1,00	UN	1,00
SEGUNDO PATROCINIO GOMEZ MARTINEZ				1,00	UN	1,00
JAIVER ANDRES VARGAS				1,00	UN	1,00
HECTOR HERNAN CHITO BEDOYA				1,00	UN	1,00
ROSALINO MULCUE OSNAS				1,00	UN	1,00
DOMINGA OSNAS BALTAZAR				1,00	UN	1,00
EDGAR EMILIO BETANCOURTH SANTACRUZ				1,00	UN	1,00
GLORIA DEL CARMEN GOMEZ				1,00	UN	1,00
					TOTAL	**15,00**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Cantidad Total Ejecutada: **15,00**
Cantidad a Pagar presente Acta: **15,00**

LUIS MIGUEL GRANJA B.
RESIDENTE DE OBRA

GIOVANNY ZUÑIGA GARCIA
DIRECTOR INTERVENTORIA.

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO

PREACTA – CUADRO DE MEMORIA DE CANTIDADES

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO PARA LA VEREDA LA CHAPA DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO"

CONTRATO N.º	030-2025	**Contratante**	MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA	**Supervisor**	GUSTAVO LEDESMA JIMENEZ
Contratista	CONSORCIO DOMINGUILLO	**Interventor**	CONSTRUCCIONES UNIVERSALES RLM SAS		
ITEM 7.7.2	**Instalación de tuberia PVC D= 4"**			**UNIDAD**	ML

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				UNIDAD	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTURA	CANT		
BATERIAS SANITARIAS						
TRINIDAD GRIJALBA	11,60			1,00	ML	11,60
AIDA LIBIA GRIJALBA	18,93			1,00	ML	18,93
MARIA BARBARA BURBANO DAZA	13,30			1,00	ML	13,30
LUIS MIGUEL SÁNCHEZ BURBANO	13,75			1,00	ML	13,75
MANUEL ISAIS BETANCOURTH	13,35			1,00	ML	13,35
EDGAR EMILIO BETANCOURTH MORA	13,70			1,00	ML	13,70
MILEIDY URBANO MENDEZ	13,12			1,00	ML	13,12
MARIA EUGENIA URBANO GOMEZ	7,30			1,00	ML	7,30
SEGUNDO PATROCINIO GOMEZ MARTINEZ	1,60			1,00	ML	1,60
JAIVER ANDRES VARGAS	7,40			1,00	ML	7,40
HECTOR HERNAN CHITO BEDOYA	7,40			1,00	ML	7,40
ROSALINO MULCUE OSNAS	7,40			1,00	ML	7,40
DOMINGA OSNAS BALTAZAR	7,40			1,00	ML	7,40
EDGAR EMILIO BETANCOURTH SANTACRUZ	7,40			1,00	ML	7,40
GLORIA DEL CARMEN GOMEZ	7,40			1,00	ML	7,40
					TOTAL	**151,05**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Cantidad Total Ejecutada: **151,05**
Cantidad a Pagar presente Acta: **151,05**

LUIS MIGUEL GRANJA B.
RESIDENTE DE OBRA

GIOVANNY ZUÑIGA GARCIA
DIRECTOR INTERVENTORIA.

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO

Libertad y Orden

Alcaldía Municipal Santander de Quilichao

PREACTA – CUADRO DE MEMORIA DE CANTIDADES

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO PARA LA VEREDA LA CHAPA DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO"

CONTRATO N.º	030-2025	**Contratante**	MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA	**Supervisor**	GUSTAVO LEDESMA JIMENEZ
Contratista	CONSORCIO DOMINGUILLO	**Interventor**	CONSTRUCCIONES UNIVERSALES RLM SAS		
ITEM 7.7.3	**Suministro de tuberia PVC sanitaria D=4"**			**UNIDAD**	ML

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				UNIDAD	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTURA	CANT		
BATERIAS SANITARIAS						
TRINIDAD GRIJALBA	11,60			1,00	ML	11,60
AIDA LIBIA GRIJALBA	18,93			1,00	ML	18,93
MARIA BARBARA BURBANO DAZA	13,30			1,00	ML	13,30
LUIS MIGUEL SÁNCHEZ BURBANO	13,75			1,00	ML	13,75
MANUEL ISAIS BETANCOURTH	13,35			1,00	ML	13,35
EDGAR EMILIO BETANCOURTH MORA	13,70			1,00	ML	13,70
MILEIDY URBANO MENDEZ	13,12			1,00	ML	13,12
MARIA EUGENIA URBANO GOMEZ	7,30			1,00	ML	7,30
SEGUNDO PATROCINIO GOMEZ MARTINEZ	1,60			1,00	ML	1,60
JAIVER ANDRES VARGAS	7,40			1,00	ML	7,40
HECTOR HERNAN CHITO BEDOYA	7,40			1,00	ML	7,40
ROSALINO MULCUE OSNAS	7,40			1,00	ML	7,40
DOMINGA OSNAS BALTAZAR	7,40			1,00	ML	7,40
EDGAR EMILIO BETANCOURTH SANTACRUZ	7,40			1,00	ML	7,40
GLORIA DEL CARMEN GOMEZ	7,40			1,00	ML	7,40
					TOTAL	**151,05**

Cantidad Total Ejecutada: **151,05**
Cantidad a Pagar presente Acta: **151,05**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



LUIS MIGUEL GRANJA B.
RESIDENTE DE OBRA

GIOVANNY ZUÑIGA GARCIA
DIRECTOR INTERVENTORIA.

Libertad y Orden

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO

Alcaldía Municipal Santander de Quilichao

PREACTA – CUADRO DE MEMORIA DE CANTIDADES

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO PARA LA VEREDA LA CHAPA DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO"

CONTRATO N.º	030-2025	**Contratante**	MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA	**Supervisor**	GUSTAVO LEDESMA JIMENEZ
Contratista	CONSORCIO DOMINGUILLO	**Interventor**	CONSTRUCCIONES UNIVERSALES RLM SAS		
ITEM 7.7.4	**Punto sanitario D=4"**			**UNIDAD**	UN

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				UNIDAD	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTURA	CANT		
BATERIAS SANITARIAS						
TRINIDAD GRIJALBA				1,00	UN	1,00
AIDA LIBIA GRIJALBA				1,00	UN	1,00
MARIA BARBARA BURBANO DAZA				1,00	UN	1,00
LUIS MIGUEL SÁNCHEZ BURBANO				1,00	UN	1,00
MANUEL ISAIS BETANCOURTH				1,00	UN	1,00
EDGAR EMILIO BETANCOURTH MORA				1,00	UN	1,00
MILEIDY URBANO MENDEZ				1,00	UN	1,00
MARIA EUGENIA URBANO GOMEZ				1,00	UN	1,00
SEGUNDO PATROCINIO GOMEZ MARTINEZ				1,00	UN	1,00
JAIVER ANDRES VARGAS				1,00	UN	1,00
HECTOR HERNAN CHITO BEDOYA				1,00	UN	1,00
ROSALINO MULCUE OSNAS				1,00	UN	1,00
DOMINGA OSNAS BALTAZAR				1,00	UN	1,00
EDGAR EMILIO BETANCOURTH SANTACRUZ				1,00	UN	1,00
GLORIA DEL CARMEN GOMEZ				1,00	UN	1,00
					TOTAL	**15,00**

Cantidad Total Ejecutada: **15,00**
Cantidad a Pagar presente Acta: **15,00**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



LUIS MIGUEL GRANJA B.
RESIDENTE DE OBRA

GIOVANNY ZUÑIGA GARCIA
DIRECTOR INTERVENTORIA.

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO

Libertad y Orden

Alcaldía Municipal Santander de Quilichao

PREACTA – CUADRO DE MEMORIA DE CANTIDADES

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO PARA LA VEREDA LA CHAPA DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO"

CONTRATO N.º	030-2025	**Contratante**	MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA	**Supervisor**	GUSTAVO LEDESMA JIMENEZ
Contratista	CONSORCIO DOMINGUILLO	**Interventor**	CONSTRUCCIONES UNIVERSALES RLM SAS		
ITEM 7.7.5	**Punto sanitario D= 3"**			**UNIDAD**	UN

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				UNIDAD	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTURA	CANT		
BATERIAS SANITARIAS						
TRINIDAD GRIJALBA				3,00	UN	3,00
AIDA LIBIA GRIJALBA				3,00	UN	3,00
MARIA BARBARA BURBANO DAZA				3,00	UN	3,00
LUIS MIGUEL SÁNCHEZ BURBANO				3,00	UN	3,00
MANUEL ISAIS BETANCOURTH				3,00	UN	3,00
EDGAR EMILIO BETANCOURTH MORA				3,00	UN	3,00
MILEIDY URBANO MENDEZ				3,00	UN	3,00
MARIA EUGENIA URBANO GOMEZ				3,00	UN	3,00
SEGUNDO PATROCINIO GOMEZ MARTINEZ				3,00	UN	3,00
JAIVER ANDRES VARGAS				3,00	UN	3,00
HECTOR HERNAN CHITO BEDOYA				3,00	UN	3,00
ROSALINO MULCUE OSNAS				3,00	UN	3,00
DOMINGA OSNAS BALTAZAR				3,00	UN	3,00
EDGAR EMILIO BETANCOURTH SANTACRUZ				3,00	UN	3,00
GLORIA DEL CARMEN GOMEZ				3,00	UN	3,00
					TOTAL	**45,00**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Cantidad Total Ejecutada: **45,00**
Cantidad a Pagar presente Acta: **45,00**

LUIS MIGUEL GRANJA B.
RESIDENTE DE OBRA

GIOVANNY ZUÑIGA GARCIA
DIRECTOR INTERVENTORIA.

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO

Libertad y Orden

Alcaldía Municipal Santander de Quilichao

PREACTA – CUADRO DE MEMORIA DE CANTIDADES

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO PARA LA VEREDA LA CHAPA DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE

CONTRATO N.º	030-2025	**Contratante**	MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA	**Supervisor**	GUSTAVO LEDESMA JIMENEZ
Contratista	CONSORCIO DOMINGUILLO	**Interventor**	CONSTRUCCIONES UNIVERSALES RLM SAS		
ITEM 7.7.6	**Suministro E Instalacion De Ducha Sencilla**			**UNIDAD**	UN

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				UNIDAD	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTURA	CANT		
BATERIAS SANITARIAS						
TRINIDAD GRIJALBA				1,00	UN	1,00
AIDA LIBIA GRIJALBA				1,00	UN	1,00
MARIA BARBARA BURBANO DAZA				1,00	UN	1,00
LUIS MIGUEL SÁNCHEZ BURBANO				1,00	UN	1,00
MANUEL ISAIS BETANCOURTH				1,00	UN	1,00
EDGAR EMILIO BETANCOURTH MORA				1,00	UN	1,00
MILEIDY URBANO MENDEZ				1,00	UN	1,00
MARIA EUGENIA URBANO GOMEZ				1,00	UN	1,00
SEGUNDO PATROCINIO GOMEZ MARTINEZ				1,00	UN	1,00
JAIVER ANDRES VARGAS				1,00	UN	1,00
HECTOR HERNAN CHITO BEDOYA				1,00	UN	1,00
ROSALINO MULCUE OSNAS				1,00	UN	1,00
DOMINGA OSNAS BALTAZAR				1,00	UN	1,00
EDGAR EMILIO BETANCOURTH SANTACRUZ				1,00	UN	1,00
GLORIA DEL CARMEN GOMEZ				1,00	UN	1,00
					TOTAL	**15,00**

Cantidad Total Ejecutada: **15,00**
Cantidad a Pagar presente Acta: **15,00**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



LUIS MIGUEL GRANJA B.
RESIDENTE DE OBRA

GIOVANNY ZUÑIGA GARCIA
DIRECTOR INTERVENTORIA.

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO

Libertad y Orden

Alcaldía Municipal Santander de Quilichao

PREACTA – CUADRO DE MEMORIA DE CANTIDADES

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO PARA LA VEREDA LA CHAPA DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE

CONTRATO N.º	030-2025	**Contratante**	MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA	**Supervisor**	GUSTAVO LEDESMA JIMENEZ
Contratista	CONSORCIO DOMINGUILLO	**Interventor**	CONSTRUCCIONES UNIVERSALES RLM SAS		
ITEM 7.7.7	**Suministro E Instalación De Tanque 1000Lt**			**UNIDAD**	UN

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				UNIDAD	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTURA	CANT		
BATERIAS SANITARIAS						
TRINIDAD GRIJALBA				1,00	UN	1,00
AIDA LIBIA GRIJALBA				1,00	UN	1,00
MARIA BARBARA BURBANO DAZA				1,00	UN	1,00
LUIS MIGUEL SÁNCHEZ BURBANO				1,00	UN	1,00
MANUEL ISAIS BETANCOURTH				1,00	UN	1,00
EDGAR EMILIO BETANCOURTH MORA				1,00	UN	1,00
MILEIDY URBANO MENDEZ				1,00	UN	1,00
MARIA EUGENIA URBANO GOMEZ				1,00	UN	1,00
SEGUNDO PATROCINIO GOMEZ MARTINEZ				1,00	UN	1,00
JAIVER ANDRES VARGAS				1,00	UN	1,00
HECTOR HERNAN CHITO BEDOYA				1,00	UN	1,00
ROSALINO MULCUE OSNAS				1,00	UN	1,00
DOMINGA OSNAS BALTAZAR				1,00	UN	1,00
EDGAR EMILIO BETANCOURTH SANTACRUZ				1,00	UN	1,00
GLORIA DEL CARMEN GOMEZ				1,00	UN	1,00
					TOTAL	**15,00**

Cantidad Total Ejecutada: **15,00**
Cantidad a Pagar presente Acta: **15,00**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



LUIS MIGUEL GRANJA B.
RESIDENTE DE OBRA

GIOVANNY ZUÑIGA GARCIA
DIRECTOR INTERVENTORIA.

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO

Libertad y Orden

Alcaldía Municipal Santander de Quilichao

PREACTA – CUADRO DE MEMORIA DE CANTIDADES

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO PARA LA VEREDA LA CHAPA DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO"

CONTRATO N.º	030-2025	**Contratante**	MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA	**Supervisor**	GUSTAVO LEDESMA JIMENEZ
Contratista	CONSORCIO DOMINGUILLO	**Interventor**	CONSTRUCCIONES UNIVERSALES RLM SAS		
ITEM 7.7.8	**Suministro E Instalación De Lavamanos**			**UNIDAD**	UN

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				UNIDAD	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTURA	CANT		
BATERIAS SANITARIAS						
TRINIDAD GRIJALBA				1,00	UN	1,00
AIDA LIBIA GRIJALBA				1,00	UN	1,00
MARIA BARBARA BURBANO DAZA				1,00	UN	1,00
LUIS MIGUEL SÁNCHEZ BURBANO				1,00	UN	1,00
MANUEL ISAIS BETANCOURTH				1,00	UN	1,00
EDGAR EMILIO BETANCOURTH MORA				1,00	UN	1,00
MILEIDY URBANO MENDEZ				1,00	UN	1,00
MARIA EUGENIA URBANO GOMEZ				1,00	UN	1,00
SEGUNDO PATROCINIO GOMEZ MARTINEZ				1,00	UN	1,00
JAIVER ANDRES VARGAS				1,00	UN	1,00
HECTOR HERNAN CHITO BEDOYA				1,00	UN	1,00
ROSALINO MULCUE OSNAS				1,00	UN	1,00
DOMINGA OSNAS BALTAZAR				1,00	UN	1,00
EDGAR EMILIO BETANCOURTH SANTACRUZ				1,00	UN	1,00
GLORIA DEL CARMEN GOMEZ				1,00	UN	1,00
					TOTAL	**15,00**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Cantidad Total Ejecutada: **15,00**
Cantidad a Pagar presente Acta: **15,00**

LUIS MIGUEL GRANJA B.
RESIDENTE DE OBRA

GIOVANNY ZUÑIGA GARCIA
DIRECTOR INTERVENTORIA.

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO

Libertad y Orden

Alcaldía Municipal Santander de Quilichao

PREACTA – CUADRO DE MEMORIA DE CANTIDADES

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO PARA LA VEREDA LA CHAPA DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO"

CONTRATO N.º	030-2025	**Contratante**	MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA	**Supervisor**	GUSTAVO LEDESMA JIMENEZ
Contratista	CONSORCIO DOMINGUILLO	**Interventor**	CONSTRUCCIONES UNIVERSALES RLM SAS		
ITEM 7.7.9	**Punto De Conexión Al Suministro De Agua En Pvc 1/2" Entre 5-15M**			**UNIDAD**	UN

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				UNIDAD	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTURA	CANT		
BATERIAS SANITARIAS						
TRINIDAD GRIJALBA				1,00	UN	1,00
AIDA LIBIA GRIJALBA				1,00	UN	1,00
MARIA BARBARA BURBANO DAZA				1,00	UN	1,00
LUIS MIGUEL SÁNCHEZ BURBANO				1,00	UN	1,00
MANUEL ISAIS BETANCOURTH				1,00	UN	1,00
EDGAR EMILIO BETANCOURTH MORA				1,00	UN	1,00
MILEIDY URBANO MENDEZ				1,00	UN	1,00
MARIA EUGENIA URBANO GOMEZ				1,00	UN	1,00
SEGUNDO PATROCINIO GOMEZ MARTINEZ				1,00	UN	1,00
JAIVER ANDRES VARGAS				1,00	UN	1,00
HECTOR HERNAN CHITO BEDOYA				1,00	UN	1,00
ROSALINO MULCUE OSNAS				1,00	UN	1,00
DOMINGA OSNAS BALTAZAR				1,00	UN	1,00
EDGAR EMILIO BETANCOURTH SANTACRUZ				1,00	UN	1,00
GLORIA DEL CARMEN GOMEZ				1,00	UN	1,00
					TOTAL	**15,00**

Cantidad Total Ejecutada: **15,00**
Cantidad a Pagar presente Acta: **15,00**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



LUIS MIGUEL GRANJA B.
RESIDENTE DE OBRA

GIOVANNY ZUÑIGA GARCIA
DIRECTOR INTERVENTORIA.

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO

Libertad y Orden

Alcaldía Municipal Santander de Quilichao

PREACTA – CUADRO DE MEMORIA DE CANTIDADES

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO PARA LA VEREDA LA CHAPA DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE

CONTRATO N.º	030-2025	**Contratante**	MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA	**Supervisor**	GUSTAVO LEDESMA JIMENEZ
Contratista	CONSORCIO DOMINGUILLO	**Interventor**	CONSTRUCCIONES UNIVERSALES RLM SAS		
ITEM 7.7.10	**Suministro E Instalacion De Punto Hidraulico 1/2"**			**UNIDAD**	UN

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				UNIDAD	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTURA	CANT		
BATERIAS SANITARIAS						
TRINIDAD GRIJALBA				5,00	UN	5,00
AIDA LIBIA GRIJALBA				5,00	UN	5,00
MARIA BARBARA BURBANO DAZA				5,00	UN	5,00
LUIS MIGUEL SÁNCHEZ BURBANO				5,00	UN	5,00
MANUEL ISAIS BETANCOURTH				5,00	UN	5,00
EDGAR EMILIO BETANCOURTH MORA				5,00	UN	5,00
MILEIDY URBANO MENDEZ				5,00	UN	5,00
MARIA EUGENIA URBANO GOMEZ				5,00	UN	5,00
SEGUNDO PATROCINIO GOMEZ MARTINEZ				5,00	UN	5,00
JAIVER ANDRES VARGAS				5,00	UN	5,00
HECTOR HERNAN CHITO BEDOYA				5,00	UN	5,00
ROSALINO MULCUE OSNAS				5,00	UN	5,00
DOMINGA OSNAS BALTAZAR				5,00	UN	5,00
EDGAR EMILIO BETANCOURTH SANTACRUZ				5,00	UN	5,00
GLORIA DEL CARMEN GOMEZ				5,00	UN	5,00
					TOTAL	**75,00**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Cantidad Total Ejecutada: **75,00**
Cantidad a Pagar presente Acta: **75,00**

LUIS MIGUEL GRANJA B.
RESIDENTE DE OBRA

GIOVANNY ZUÑIGA GARCIA
DIRECTOR INTERVENTORIA.

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO

Libertad y Orden

Alcaldía Municipal Santander de Quilichao

PREACTA – CUADRO DE MEMORIA DE CANTIDADES

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO PARA LA VEREDA LA CHAPA DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE

CONTRATO N.º	030-2025	**Contratante**	MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA	**Supervisor**	GUSTAVO LEDESMA JIMENEZ
Contratista	CONSORCIO DOMINGUILLO	**Interventor**	CONSTRUCCIONES UNIVERSALES RLM SAS		
ITEM 7.7.11	**Suministro E Instalacion De Registro De 1/2"**			**UNIDAD**	UN

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				UNIDAD	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTURA	CANT		
BATERIAS SANITARIAS						
TRINIDAD GRIJALBA				1,00	UN	1,00
AIDA LIBIA GRIJALBA				1,00	UN	1,00
MARIA BARBARA BURBANO DAZA				1,00	UN	1,00
LUIS MIGUEL SÁNCHEZ BURBANO				1,00	UN	1,00
MANUEL ISAIS BETANCOURTH				1,00	UN	1,00
EDGAR EMILIO BETANCOURTH MORA				1,00	UN	1,00
MILEIDY URBANO MENDEZ				1,00	UN	1,00
MARIA EUGENIA URBANO GOMEZ				1,00	UN	1,00
SEGUNDO PATROCINIO GOMEZ MARTINEZ				1,00	UN	1,00
JAIVER ANDRES VARGAS				1,00	UN	1,00
HECTOR HERNAN CHITO BEDOYA				1,00	UN	1,00
ROSALINO MULCUE OSNAS				1,00	UN	1,00
DOMINGA OSNAS BALTAZAR				1,00	UN	1,00
EDGAR EMILIO BETANCOURTH SANTACRUZ				1,00	UN	1,00
GLORIA DEL CARMEN GOMEZ				1,00	UN	1,00
					TOTAL	**15,00**

Cantidad Total Ejecutada: **15,00**
Cantidad a Pagar presente Acta: **15,00**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



LUIS MIGUEL GRANJA B.
RESIDENTE DE OBRA

GIOVANNY ZUÑIGA GARCIA
DIRECTOR INTERVENTORIA.

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO

Libertad y Orden

Alcaldía Municipal Santander de Quilichao

PREACTA – CUADRO DE MEMORIA DE CANTIDADES

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO PARA LA VEREDA LA CHAPA DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE

CONTRATO N.º	030-2025	**Contratante**	MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA	**Supervisor**	GUSTAVO LEDESMA JIMENEZ
Contratista	CONSORCIO DOMINGUILLO	**Interventor**	CONSTRUCCIONES UNIVERSALES RLM SAS		
ITEM 7.7.12	**Suministro E Instalación De Lavadero En Granito Pulido. Incluye Tanque**			**UNIDAD**	UN

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				UNIDAD	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTURA	CANT		
BATERIAS SANITARIAS						
TRINIDAD GRIJALBA				1,00	UN	1,00
AIDA LIBIA GRIJALBA				1,00	UN	1,00
MARIA BARBARA BURBANO DAZA				1,00	UN	1,00
LUIS MIGUEL SÁNCHEZ BURBANO				1,00	UN	1,00
MANUEL ISAIS BETANCOURTH				1,00	UN	1,00
EDGAR EMILIO BETANCOURTH MORA				1,00	UN	1,00
MILEIDY URBANO MENDEZ				1,00	UN	1,00
MARIA EUGENIA URBANO GOMEZ				1,00	UN	1,00
SEGUNDO PATROCINIO GOMEZ MARTINEZ				1,00	UN	1,00
JAIVER ANDRES VARGAS				1,00	UN	1,00
HECTOR HERNAN CHITO BEDOYA				1,00	UN	1,00
ROSALINO MULCUE OSNAS				1,00	UN	1,00
DOMINGA OSNAS BALTAZAR				1,00	UN	1,00
EDGAR EMILIO BETANCOURTH SANTACRUZ				1,00	UN	1,00
GLORIA DEL CARMEN GOMEZ				1,00	UN	1,00
					TOTAL	**15,00**

Cantidad Total Ejecutada: **15,00**
Cantidad a Pagar presente Acta: **15,00**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



LUIS MIGUEL GRANJA B.
RESIDENTE DE OBRA

GIOVANNY ZUÑIGA GARCIA
DIRECTOR INTERVENTORIA.

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO

Libertad y Orden

Alcaldía Municipal Santander de Quilichao

PREACTA – CUADRO DE MEMORIA DE CANTIDADES

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO PARA LA VEREDA LA CHAPA DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE

CONTRATO N.º	030-2025	**Contratante**	MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA	**Supervisor**	GUSTAVO LEDESMA JIMENEZ
Contratista	CONSORCIO DOMINGUILLO	**Interventor**	CONSTRUCCIONES UNIVERSALES RLM SAS		
ITEM 7.7.16	**Suministro E Instalación De Sistema Séptico Inc. (Trampa De Grasas 105Lt, Tanque Séptico 1000 Lt Y Filtro Fafa 1000 Lt, Incluye Carriers Plasticos), Detalles**			**UNIDAD**	UN

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				UNIDAD	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTURA	CANT		
BATERIAS SANITARIAS						
TRINIDAD GRIJALBA				1,00	UN	1,00
AIDA LIBIA GRIJALBA				1,00	UN	1,00
MARIA BARBARA BURBANO DAZA				1,00	UN	1,00
LUIS MIGUEL SÁNCHEZ BURBANO				1,00	UN	1,00
MANUEL ISAIS BETANCOURTH				1,00	UN	1,00
EDGAR EMILIO BETANCOURTH MORA				1,00	UN	1,00
MILEIDY URBANO MENDEZ				1,00	UN	1,00
MARIA EUGENIA URBANO GOMEZ				1,00	UN	1,00
SEGUNDO PATROCINIO GOMEZ MARTINEZ				1,00	UN	1,00
JAIVER ANDRES VARGAS				1,00	UN	1,00
HECTOR HERNAN CHITO BEDOYA				1,00	UN	1,00
ROSALINO MULCUE OSNAS				1,00	UN	1,00
DOMINGA OSNAS BALTAZAR				1,00	UN	1,00
EDGAR EMILIO BETANCOURTH SANTACRUZ				1,00	UN	1,00
GLORIA DEL CARMEN GOMEZ				1,00	UN	1,00
					TOTAL	**15,00**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Cantidad Total Ejecutada: **15,00**
Cantidad a Pagar presente Acta: **15,00**

LUIS MIGUEL GRANJA B.
RESIDENTE DE OBRA

GIOVANNY ZUÑIGA GARCIA
DIRECTOR INTERVENTORIA.

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO

PREACTA – CUADRO DE MEMORIA DE CANTIDADES

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO PARA LA VEREDA LA CHAPA DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE

CONTRATO N.º	030-2025	**Contratante**	MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA	**Supervisor**	GUSTAVO LEDESMA JIMENEZ
Contratista	CONSORCIO DOMINGUILLO	**Interventor**	CONSTRUCCIONES UNIVERSALES RLM SAS		
ITEM 7.7.17	**Caja De Inspección De 60X60 En Mamposteria**			**UNIDAD**	UN

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				UNIDAD	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTURA	CANT		
BATERIAS SANITARIAS						
TRINIDAD GRIJALBA				1,00	UN	1,00
AIDA LIBIA GRIJALBA				3,00	UN	3,00
MARIA BARBARA BURBANO DAZA				2,00	UN	2,00
LUIS MIGUEL SÁNCHEZ BURBANO				2,00	UN	2,00
MANUEL ISAIS BETANCOURTH				2,00	UN	2,00
EDGAR EMILIO BETANCOURTH MORA				1,00	UN	1,00
MILEIDY URBANO MENDEZ				1,00	UN	1,00
MARIA EUGENIA URBANO GOMEZ				1,00	UN	1,00
SEGUNDO PATROCINIO GOMEZ MARTINEZ				2,00	UN	2,00
JAIVER ANDRES VARGAS				1,00	UN	1,00
HECTOR HERNAN CHITO BEDOYA				1,00	UN	1,00
ROSALINO MULCUE OSNAS				2,00	UN	2,00
DOMINGA OSNAS BALTAZAR				2,00	UN	2,00
EDGAR EMILIO BETANCOURTH SANTACRUZ				1,00	UN	1,00
GLORIA DEL CARMEN GOMEZ				1,00	UN	1,00
					TOTAL	**23,00**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Cantidad Total Ejecutada: **23,00**
Cantidad a Pagar presente Acta: **23,00**

LUIS MIGUEL GRANJA B.
RESIDENTE DE OBRA

GIOVANNY ZUÑIGA GARCIA
DIRECTOR INTERVENTORIA.

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO

Libertad y Orden

Alcaldía Municipal Santander de Quilichao

PREACTA – CUADRO DE MEMORIA DE CANTIDADES

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO PARA LA VEREDA LA CHAPA DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO"

CONTRATO N.º	030-2025	**Contratante**	MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA	**Supervisor**	GUSTAVO LEDESMA JIMENEZ
Contratista	CONSORCIO DOMINGUILLO	**Interventor**	CONSTRUCCIONES UNIVERSALES RLM SAS		
ITEM 7.7.18	**Instalación de tuberia PVC D= 3"**			**UNIDAD**	ML

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				UNIDAD	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTURA	CANT		
BATERIAS SANITARIAS						
TRINIDAD GRIJALBA	2,32				ML	2,32
AIDA LIBIA GRIJALBA	2,32				ML	2,32
MARIA BARBARA BURBANO DAZA	2,32				ML	2,32
LUIS MIGUEL SÁNCHEZ BURBANO	2,32				ML	2,32
MANUEL ISAIS BETANCOURTH	2,32				ML	2,32
EDGAR EMILIO BETANCOURTH MORA	2,32				ML	2,32
MILEIDY URBANO MENDEZ	2,32				ML	2,32
MARIA EUGENIA URBANO GOMEZ	2,32				ML	2,32
SEGUNDO PATROCINIO GOMEZ MARTINEZ	2,32				ML	2,32
JAIVER ANDRES VARGAS	2,32				ML	2,32
HECTOR HERNAN CHITO BEDOYA	2,32				ML	2,32
ROSALINO MULCUE OSNAS	2,32				ML	2,32
DOMINGA OSNAS BALTAZAR	2,32				ML	2,32
EDGAR EMILIO BETANCOURTH SANTACRUZ	2,32				ML	2,32
GLORIA DEL CARMEN GOMEZ	2,32				ML	2,32
					TOTAL	**34,83**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Cantidad Total Ejecutada: **34,83**
Cantidad a Pagar presente Acta: **34,83**

LUIS MIGUEL GRANJA B.
RESIDENTE DE OBRA

GIOVANNY ZUÑIGA GARCIA
DIRECTOR INTERVENTORIA.

Libertad y Orden

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO

Alcaldía Municipal Santander de Quilichao

PREACTA – CUADRO DE MEMORIA DE CANTIDADES

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO PARA LA VEREDA LA CHAPA DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO"

CONTRATO N.º	030-2025	**Contratante**	MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA	**Supervisor**	GUSTAVO LEDESMA JIMENEZ
Contratista	CONSORCIO DOMINGUILLO	**Interventor**	CONSTRUCCIONES UNIVERSALES RLM SAS		
ITEM 7.7.19	**Suministro de tuberia PVC D=3"**			**UNIDAD**	ML

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				UNIDAD	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTURA	CANT		
BATERIAS SANITARIAS						
TRINIDAD GRIJALBA	2,32				ML	2,32
AIDA LIBIA GRIJALBA	2,32				ML	2,32
MARIA BARBARA BURBANO DAZA	2,32				ML	2,32
LUIS MIGUEL SÁNCHEZ BURBANO	2,32				ML	2,32
MANUEL ISAIS BETANCOURTH	2,32				ML	2,32
EDGAR EMILIO BETANCOURTH MORA	2,32				ML	2,32
MILEIDY URBANO MENDEZ	2,32				ML	2,32
MARIA EUGENIA URBANO GOMEZ	2,32				ML	2,32
SEGUNDO PATROCINIO GOMEZ MARTINEZ	2,32				ML	2,32
JAIVER ANDRES VARGAS	2,32				ML	2,32
HECTOR HERNAN CHITO BEDOYA	2,32				ML	2,32
ROSALINO MULCUE OSNAS	2,32				ML	2,32
DOMINGA OSNAS BALTAZAR	2,32				ML	2,32
EDGAR EMILIO BETANCOURTH SANTACRUZ	2,32				ML	2,32
GLORIA DEL CARMEN GOMEZ	2,32				ML	2,32
					TOTAL	**34,83**

Cantidad Total Ejecutada: **34,83**
Cantidad a Pagar presente Acta: **34,83**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



LUIS MIGUEL GRANJA B.
RESIDENTE DE OBRA

GIOVANNY ZUÑIGA GARCIA
DIRECTOR INTERVENTORIA.

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO

Libertad y Orden

Alcaldía Municipal Santander de Quilichao

PREACTA – CUADRO DE MEMORIA DE CANTIDADES

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO PARA LA VEREDA LA CHAPA DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE

CONTRATO N.º	030-2025	**Contratante**	MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA	**Supervisor**	GUSTAVO LEDESMA JIMENEZ
Contratista	CONSORCIO DOMINGUILLO	**Interventor**	CONSTRUCCIONES UNIVERSALES RLM SAS		
7.7.20	**Válvulas De Control Y Accesorios Menores D=1/2" Para Batería Sanitaria (Incliye Valvula De Bola 1/2"**			**UNIDAD**	UN

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				UNIDAD	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTURA	CANT		
BATERIAS SANITARIAS						
TRINIDAD GRIJALBA				1,00	UN	1,00
AIDA LIBIA GRIJALBA				1,00	UN	1,00
MARIA BARBARA BURBANO DAZA				1,00	UN	1,00
LUIS MIGUEL SÁNCHEZ BURBANO				1,00	UN	1,00
MANUEL ISAIS BETANCOURTH				1,00	UN	1,00
EDGAR EMILIO BETANCOURTH MORA				1,00	UN	1,00
MILEIDY URBANO MENDEZ				1,00	UN	1,00
MARIA EUGENIA URBANO GOMEZ				1,00	UN	1,00
SEGUNDO PATROCINIO GOMEZ MARTINEZ				1,00	UN	1,00
JAIVER ANDRES VARGAS				1,00	UN	1,00
HECTOR HERNAN CHITO BEDOYA				1,00	UN	1,00
ROSALINO MULCUE OSNAS				1,00	UN	1,00
DOMINGA OSNAS BALTAZAR				1,00	UN	1,00
EDGAR EMILIO BETANCOURTH SANTACRUZ				1,00	UN	1,00
GLORIA DEL CARMEN GOMEZ				1,00	UN	1,00
					TOTAL	**15,00**

Cantidad Total Ejecutada: **15,00**
Cantidad a Pagar presente Acta: **15,00**

REGISTRO FOTOGRÁFICO





LUIS MIGUEL GRANJA B.
RESIDENTE DE OBRA

GIOVANNY ZUÑIGA GARCIA
DIRECTOR INTERVENTORIA.

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO

Libertad y Orden

Alcaldía Municipal Santander de Quilichao

PREACTA – CUADRO DE MEMORIA DE CANTIDADES

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO PARA LA VEREDA LA CHAPA DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE

CONTRATO N.º	030-2025	**Contratante**	MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA	**Supervisor**	GUSTAVO LEDESMA JIMENEZ
Contratista	CONSORCIO DOMINGUILLO	**Interventor**	CONSTRUCCIONES UNIVERSALES RLM SAS		
ITEM 7.8,1	**Marco Y Puerta En Lamina Cal 18, Incluye Anticorrosivo**			**UNIDAD**	UN

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				UNIDAD	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTURA	CANT		
BATERIAS SANITARIAS						
TRINIDAD GRIJALBA	2,00				UN	2,00
AIDA LIBIA GRIJALBA	2,00				UN	2,00
MARIA BARBARA BURBANO DAZA	2,00				UN	2,00
LUIS MIGUEL SÁNCHEZ BURBANO	2,00				UN	2,00
MANUEL ISAIS BETANCOURTH	2,00				UN	2,00
EDGAR EMILIO BETANCOURTH MORA	2,00				UN	2,00
MILEIDY URBANO MENDEZ	2,00				UN	2,00
MARIA EUGENIA URBANO GOMEZ	2,00				UN	2,00
SEGUNDO PATROCINIO GOMEZ MARTINEZ	2,00				UN	2,00
JAIVER ANDRES VARGAS	2,00				UN	2,00
HECTOR HERNAN CHITO BEDOYA	2,00				UN	2,00
ROSALINO MULCUE OSNAS	2,00				UN	2,00
DOMINGA OSNAS BALTAZAR	2,00				UN	2,00
EDGAR EMILIO BETANCOURTH SANTACRUZ	2,00				UN	2,00
GLORIA DEL CARMEN GOMEZ	2,00				UN	2,00
					TOTAL	**30,00**

Cantidad Total Ejecutada: **30,00**
Cantidad a Pagar presente Acta: **30,00**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



LUIS MIGUEL GRANJA B.
RESIDENTE DE OBRA

GIOVANNY ZUÑIGA GARCIA
DIRECTOR INTERVENTORIA.

Libertad y Orden

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO

Alcaldía Municipal Santander de Quilichao

PREACTA – CUADRO DE MEMORIA DE CANTIDADES

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO PARA LA VEREDA LA CHAPA DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO"

CONTRATO N.º	030-2025	**Contratante**	MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA	**Supervisor**	GUSTAVO LEDESMA JIMENEZ
Contratista	CONSORCIO DOMINGUILLO	**Interventor**	CONSTRUCCIONES UNIVERSALES RLM SAS		
ITEM 7.9.1	**Instalaciones elctricas internas unidades sanitarias**			**UNIDAD**	UN

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				UNIDAD	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTURA	CANT		
INSTALACIONES ELECTRICAS					UNIDAD	
TRINIDAD GRIJALBA				1,00	UN	1,00
AIDA LIBIA GRIJALBA				1,00	UN	1,00
MARIA BARBARA BURBANO DAZA				1,00	UN	1,00
LUIS MIGUEL SÁNCHEZ BURBANO				1,00	UN	1,00
MANUEL ISAIS BETANCOURTH				1,00	UN	1,00
EDGAR EMILIO BETANCOURTH MORA				1,00	UN	1,00
MILEIDY URBANO MENDEZ				1,00	UN	1,00
MARIA EUGENIA URBANO GOMEZ				1,00	UN	1,00
SEGUNDO PATROCINIO GOMEZ MARTINEZ				1,00	UN	1,00
JAIVER ANDRES VARGAS				1,00	UN	1,00
HECTOR HERNAN CHITO BEDOYA				1,00	UN	1,00
ROSALINO MULCUE OSNAS				1,00	UN	1,00
DOMINGA OSNAS BALTAZAR				1,00	UN	1,00
EDGAR EMILIO BETANCOURTH SANTACRUZ				1,00	UN	1,00
GLORIA DEL CARMEN GOMEZ				1,00	UN	1,00
					TOTAL	**15,00**

Cantidad Total Ejecutada: **15,00**
Cantidad a Pagar presente Acta: **15,00**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



LUIS MIGUEL GRANJA B.
RESIDENTE DE OBRA

GIOVANNY ZUÑIGA GARCIA
DIRECTOR INTERVENTORIA.
