	FORMATO GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	CÓDIGO	MS-GP-FR-036
ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA CONTRATOS DE INTERVENTORÍA / CONSULTORÍA	VERSIÓN	0
		FECHA	26/04/2023

INFORME DE SUPERVISIÓN	38

1. INFORMACIÓN DE COMISIÓN

RESOLUCIÓN N°. _____

CONSECUTIVO N° _____

2. DESCRIPCION DE LOS CONTRATOS

CONTRATO (NUMERO)	ICCU 616 DE 2022 (OBRA)	**FECHA SUSCRIPCIÓN**	9/11/2022	**FECHA INICIO**	1/12/2022
	665 de 2022 (INTERVENTORÍA)	**FECHA SUSCRIPCIÓN**	11/11/2022	**FECHA INICIO**	1/12/2022
NOMBRE CONTRATISTA	CONTRATISTA DE OBRA		CONSORCIO VIADUCTO CTS	**NIT**	901.648.098-1
	CONTRATISTA DE INTERVENTORIA		CONSORCIO INTERVENTORIA GUAYABAL	**NIT**	901.649.599-4
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA	CONSTRUCCIÓN DEL VIADUCTO, SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE MITIGACIÓN DEL SITIO CRÍTICO LOS CHORROS.				
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO “CONSTRUCCIÓN DEL VIADUCTO, SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE MITIGACIÓN DEL SITIO CRITICO LOS CHORROS".				
PLAZO EJECUCIÓN OBRA	VEINTITRES (23) MESES (y/o hasta ejecutar el 100% del contrato de obra-según lo que se indique en la Clausula de Plazo). VEINTICINCO (25) MESES teniendo en cuenta el Modificatorio Nº 3. TREINTA (30) MESES teniendo en cuenta el Modificatorio Nº 4. TREINTA Y CINCO(35) MESES teniendo en cuenta el modificatorio Nº 5. TREINTA Y SIETE (37) MESES teniendo en cuenta el modificatorio Nº 7. TREINTA Y OCHO (38) MESES teniendo en cuenta el modificatorio Nº 8. TREINTA Y NUEVE (39) MESES teniendo en cuenta el modificatorio Nº 9.				
PLAZO EJECUCIÓN INTERVENTORÍA	VEINTICUATRO (24) MESES (y/o hasta ejecutar el 100% del contrato de interventoría-según lo que se indique en la Clausula de Plazo). VEINTICINCO (25) MESES teniendo en cuenta el Modificatorio Nº 2. TREINTA Y UN (31) MESES teniendo en cuenta el Modificatorio Nº 3. TREINTA Y DOS (32) MESES teniendo en cuenta el Modificatorio Nº 4. TREINTA Y CINCO (35) MESES teniendo en cuenta el Modificatorio Nº 5. TREINTA Y SIETE (37) MESES teniendo en cuenta el Modificatorio Nº 6. TREINTA Y NUEVE (39) MESES teniendo en cuenta el modificatorio Nº 7. CUARENTA (40) MESES teniendo en cuenta el modificatorio Nº 8.				
MODIFICACIONES AL CONTRATO (DetallaR Otrosies, modificatorios, etc)	Modificatoria N°1, CO1.CTRMOD.10617849 con fecha de aprobación 28/02/2023 (Contrato de obra) Modificatoria N°2, CO1.CTRMOD.10932934 con fecha de aprobación 17/04/2023 (Contrato de obra) Modificatoria N°3, CO1.CTRMOD.11112340 con fecha de aprobación 08/05/2023 (Contrato de obra) Modificatoria Nº 1, CO1CTRMOD.11692328 con fecha de aprobacion 11/07/2023 (Contrato de Interventoria) Modificatoria N°4,, CO1.CTRMOD.14210373 con fecha de aprobacion 27/12/2023 (Contrato de obra). Modificatoria Nº 2, CO1.CTRMOD.16545451 con fecha de aprobacion 30/08/2024 (Contrato de Interventoria). Modificatoria N°5, CO1.CTRMOD.17367018 con fecha de aprobacion 05/12/2024 (Contrato de obra). Modificatoria Nº 3, CO1.CTRMOD.17390240 con fecha de aprobacion 02/12/2024 (Contrato de Interventoria). Modificatoria N°6, CO1.CO1.CTRMOD.19226333 con fecha de aprobacion 31/05/2025 (Contrato de obra). Modificatoria Nº 4, CO1.CTRMOD.19471420 con fecha de aprobacion 27/06/2025. (Contrato de Interventoria). Modificatoria Nº 5, CO1.CTRMOD.19766733 con fecha de aprobacion 30/07/2025. (Contrato de Interventoria). Modificatoria N°7, CO1.CTRMOD.20313607 con fecha de aprobacion 26/09/2025 CESION (Contrato de obra). Modificatoria N°, CO1.CTRMOD.20741729 con fecha de aprobacion 31/10/2025 ADC+PR (Contrato de interventoria). Modificatoria Nº 8, CO1.CTRMOD.21459376 con fecha de aprobacion 29/12/2025 PR (Contrato de Obra). Modificatoria Nº 7, CO1.CTRMOD.21460944 con fecha de aprobacion 31/12/2025 PR (Contrato de Interventoria). Modificatoria Nº 9, CO1.CTRMOD.21754421 con fecha de aprobacion 31/01/2026 PR (Contrato de Obra). Modificatoria Nº 8, CO1.CTRMOD.21753911 con fecha de aprobacion 31/01/2026 PR (Contrato de Interventoria).				
PRORROGAS (Insertar filas necesarias)	**Obra:** Prorroga nº 1 de fecha 27 de diciembre de 2023: Ampliando plazo de ejecucion al 31 de diciembre de 2024. Prorroga nº 2 de fecha 26 de noviembre de 2024 : Ampliando plazo de ejecucion al 31 de mayo de 2025. Prorroga nº 3 de fecha 31 de mayo de 2025 : Ampliando plazo de ejecucion al 31 de octubre de 2025. Prorroga nº 4 de fecha 31 de Octubre de 2025 : Ampliando plazo de ejecucion al 31 de diciembre de 2025. Prorroga nº 5 de fecha 31 de diciembre de 2025 : Ampliando plazo de ejecucion al 31 de enero de 2026. Prorroga nº 6 de fecha 31 de enero de 2026 : Ampliando plazo de ejecucion al 28 de febrero de 2026. **Interventoría:** Prorroga nº 1 de fecha 30 de agosto de 2024: Ampliando plazo de ejecucion al 30 de diciembre de 2024. Prorroga nº 2 de fecha 27 de noviembre de 2024 : Ampliando plazo de ejecucion al 30 de junio de 2025. Prorroga nº 3 de fecha 27 de Junio de 2025 : Ampliando plazo de ejecucion al 31 de julio de 2025. Prorroga nº 4 de fecha 30 de Julio de 2025 : Ampliando plazo de ejecucion al 31 de octubre de 2025. Prorroga nº 5 de fecha 31 de Octubre de 2025 : Ampliando plazo de ejecucion al 31 de diciembre de 2025. Prorroga nº 6 de fecha 31 de diciembre de 2025 : Ampliando plazo de ejecucion al 28 de febrero de 2026. Prorroga nº 7 de fecha 31 de enero de 2026 : Ampliando plazo de ejecucion al 31 de marzo de 2026.				
SUSPENSIONES (Insertar filas necesarias)	N/A				
ADICIONES (Insertar filas necesarias)	**Obra:** Se realiza adicion Nº 1 por valor de DIEZ MIL MILLONES DE PESOS $10.000.000.000 MCTE en el modificatorio Nº 6 firmado el 31 de mayo de 2025. Se realiza adicion Nº 2 por valor de SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS $7.947.267.455.000.000 MCTE en el modificatorio Nº 7 firmado el 31 de octubre de 2025. **Interventoria:** Se realiza adicion Nº 1 por valor de OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES NOVECIENTO CINCUENTA Y UN MIL VEINTIUN PESOS $833.951.021 MCTE en el modificatorio Nº 5 firmado el 30 de Julio de 2025. Se realiza adicion Nº 2 por valor de QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS $548.132.779 MCTE en el modificatorio Nº 8 firmado el 31 de Octubre de 2025.				
FECHA DE TERMINACIÓN	Plazo de ejecución Contrato de Interventoria: 31 de marzo de 2026, segun Modifitario Nº 8. Plazo de ejecucion Contrato de Obra: 28 de febrero de 2026 segun Modifitario Nº 9.				

FORMA DE PAGO - OBRA	1. La Entidad entregará al contratista a titulo de anticipo un valor de DOCE MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS MCT/E ($ 12.500.000.000). 2. El valor restante del valor total del contrato se pagará mediante actas parciales mensuales de avance de obra sin que exceda el 95% del valor total del contrato. 3. Un pago final equivalente al 5% del contrato una vez recibida a satisfacción la obra y suscrita el acta de liquidación definitiva. 4. El presente contrato cuenta con formula de ajuste descrita en el anexo tecnico. 5. Teniendo en cuenta el modificatorio Nº 4, se realiza un segundo anticipo por $ 12.500.000.000 millones de pesos.	**VALOR DEL CONTRATO (incluir adiciones)**	$82.678.609.605,00
FORMA DE PAGO INTERVENTORIA	La entidad entregará al Interventor a título de ANTICIPO un valor equivalente a MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($1.500.000.000,00). 2. El valor restante del valor total del contrato se pagará mediante actas parciales mensuales sin que exceda el 95% del valor total del contrato, 3. El 5% restante del valor del contrato se pagará una vez finalizada la ejecución del contrato.	**VALOR DEL CONTRATO (incluir adiciones)**	$ 7.172.028.622,00

	PERIODO DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	01/01/2026 al 31/01/2026

3. GARANTÍAS CONTRACTUALES

Contrato de obra

Póliza:		**Vigencia: (Modificatorio Nº78)**		**Valor Amparado**
Amparo	**Número**	**Desde**	**Hasta**	
Cumplimiento	**Cumplimiento: BQ-100061304 ANEXO 18 No. CERTIFICADO 28440456 SEGUROS MUNDIAL CUMPLIMIENTO BQ-100016310 ANEXO 12 No. CERTIFICADO28440469 RCE**	**1/12/2022**	**30/07/2026**	**$ 8.267.860.960,60**
Prestaciones sociales		**1/12/2022**	**31/01/2029**	**$ 4.133.930.480,30**
Estabilidad de la obra		**31/01/2026**	**31/01/2031**	**$ 24.803.582.881,80**
Calidad del servicio		**31/03/2024**	**31/03/2031**	**$ 385.259.613,60**
Responsabilidad civil		**1/12/2022**	**31/01/2026**	**$ 4.133.930.480,30**
Buen manejo del anticipo		**1/12/2022**	**31/07/2026**	**$ 25.000.000.000,00**

Contrato de interventoría

Póliza:		**Vigencia : (Modificatorio Nº 6.)**		**Valor Amparado**
Amparo	**Número**	**Desde**	**Hasta**	
Cumplimiento	**BCH-100022730. ANEXO 9, CERTIFICADO 97141507 MUNDIAL DE SEGUROS**	**1/12/2022**	**31/08/2026**	**$ 1.075.804.293,30**
Prestaciones sociales		**1/12/2022**	**3/03/2029**	**$ 717.202.862,20**
Buen manejo del anticipo		**1/12/2022**	**31/08/2026**	**$ 1.500.000.000,00**
Calidad del servicio		**31/07/2025**	**28/02/2031**	**$ 1.434.405.724,40**

4. PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO (Cuando aplique)

Verificación Requisitos de personal Evaluación técnica (Adjuntar Formato Análisis y Aprobación Hojas de Vida MS-GP-FR-30 REVISIÓN HOJAS DE VIDA)	**Responsable diligenciamiento**	**WILSON GARZON CIFUENTES**
	Fecha diligenciamiento	26/05/2025

4. DESCRICIÓN DEL AVANCE

En el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de Enero de 2026 se realizaron las siguientes actividades:
- En apoyo N.º 1 se realizó lleno y compactación de sub base granular para conformación de llenos posteriores en estribo, adicionalmente ensayo y toma de densidades, con cono y arena.
- En disipador N.º 3 se realizó excavación mecánica y manual, instalación de geomembrana y conformación de zanja con sacos de suelo cemento para desvió del cauce y evacuación del agua empozada en la huella 16.
- En zanja de coronación 07 se realizó excavación manual, instalación de geomembrana y conformación de zanja con sacos de suelo cemento.
- En alcantarilla N.º 6 se realizó lleno, conformación y compactación de sub base granular en área perimetral de la caja 4.
- En zanja de coronación N.º 01 se realizó limpieza y corte de vegetación, excavación manual, instalación de geomembrana y conformación de zanja con sacos de suelo cemento.
- En MSR acceso cambao se realizó chequeo y control de niveles, instalación de geotextil y geomalla, lleno, conformación y compactación de sub base granular para la capa 11 de 30 cm, toma y ensayo de densidades.
- En MSR acceso Bogotá se realizó localización y replanteo chequeo y control de niveles, excavación mecánica demolición de carpeta asfáltica y concreto de las cunetas margen derecho desde la abscisa k0+515 a k0+571.
- En apoyo N.º 1 se realizó localización y replanteo de vértices, encofrado y escarificación de superficie para colocación de groutt de nivelación en zonas en donde se ubicarán las juntas.
- En cerramiento se realizó desmonte, retiro de vegetación, localización y replanteo de linderos, excavación e instalación de postes de concreto para conformación de cerca con alambre de púas.
- En apoyo N.º 1: se realizó colocación de groutt para resanes y revoques en área de juntas de expansión, para garantizar la distancia mínima requerida para la instalación de juntas tr-140.
- En disipador N.º 3 se realizó excavación manual, localización y replanteo, chequeo y control de niveles, amarre de acero de refuerzo, encofrado y vaciado de concreto para dentellón de anclaje del final de la zona de descole, desvío y manejo de aguas.
- En Pantalla f se realizó limpieza, retiro de impurezas y concreto suelto, aplicación de groutt para resanes y reparaciones en asentamientos sobre la superficie de la pantalla.
- En disipador N.º 4 se realizó excavación mecánica, llenos laterales con material común en estructura escalonada de gaviones.
- En apoyo N.º 5 se realizó localización y replanteo de vértices, encofrado y escarificación de superficie para colocación de groutt de nivelación en zonas en donde se ubicaran las juntas.
- En apoyo N.º 6 se realizó chequeo y control de niveles, replanteo de vértices e instalación de formaleta, encofrado y vaciado de concreto para new jersey de muro de acompañamiento costado izquierdo.
- En disipador N.º 3 se realizó excavación mecánica, movimiento de tierras y conformación de terrazas en área adyacente del descole.
- En apoyo N.º 1 se realizó excavación mecánica, lleno y compactación de sub base para mejoramiento del suelo en donde se construirá muro en gaviones en costado izquierdo.

En apoyo N.º 6 se realizó localización y replanteo de vértices, encofrado, escarificación de superficie en zonas en donde se ubicarán las juntas.
- En MSR acceso cambao se realizó chequeo y control de niveles, instalación de geotextil y geomalla, lleno, conformación y compactación de sub base granular para la capa 36 de 15 cm, inicio de conformación para la capa 37 de 15 cm toma de densidades en capas compactadas.
- En MSR acceso Bogotá se realizó retiro y reemplazo de material saturado, afectado por las lluvias, excavación mecánica, lleno y compactación de sub base, excavación mecánica para cuentas en el margen derecho desde la abscisa k0+550 a k0+571, toma de densidades en capas compactadas.
- El pasado viernes 30 de enero se realizo la reunion final de entrega de poryecto en el Municipio de Guayabal de Siquima.-
- El 31 de enero se suscriberon modificatorios a los dos contratos prorrogando por un mes mas, como se relaciona en la parte inicial del informe.

RELACIÓN PROGRAMADO/EJECUTADO: Una vez ajustado el cronograma de obra, a la fecha se cuenta con un 2% de atraso según lo programado vs lo ejecutado por el contratista Viaducto CTS.

5. BALANCE FINANCIERO DE LOS CONTRATOS		
NOMBRE CONTRATISTA	CONSORCIO VIADUCTO CTS	CONSORCIO INTERVENTORIA GUAYABAL
Anticipos (1 y 2)	$25.000.000.000,00	$1.500.000.000,00
saldo amortizado	$23.423.530.986,00	$1.500.000.000,00
saldo por amortizar	$1.576.469.014,00	$0,00
Pago No. 1	$155.486.979,00	$35.888.689,00
Pago No. 2	$155.486.979,00	$37.683.951,19
Pago No. 3	$551.515.732,41	$43.839.736,00
Pago No. 4	$ 227.530.249,00	$63.069.881,00
Pago No. 5	$220.402.276,67	$72.002.854,00
Pago No. 6	$238.545.812,00	$66.471.020,00
Pago No. 7	$311.372.463,00	$90.057.058,00
Pago No. 8	$308.334.417,00	$85.968.840,00
Pago No. 9	$1.275.737.886,00	$149.599.660,00
Pago No. 10	$2.050.812.454,00	$187.397.511,00
Pago No. 11	$2.954.673.730,00	$170.924.460,00
Pago No. 12	$5.681.815.252,00	$180.302.136,00
Pago No. 13	$6.410.426.093,00	$133.202.055,00
Pago No. 14	$7.497.238.433,00	$150.718.260,00
Pago No. 15	$6.579.647.059,00	$207.026.680,00
Pago No. 16	$1.694.798.491,00	$211.996.120,00
Pago No. 17	$4.949.725.826,00	$215.513.879,00
Pago No. 18	$2.224.974.622,00	$223.188.070,00
Pago No. 19	$1.237.068.861,00	$210.183.155,00
Pago No. 20	$2.895.041.458,00	$196.188.160,00
Pago No. 21	$3.001.030.518,00	$226.238.040,00
Pago No. 22	$5.002.277.843,00	$243.131.042,00
Pago No. 23	$5.047.536.404,00	$224.527.534,00
Pago No. 24	$4.034.665.229,00	$233.501.205,00
Pago No. 25	$1.675.474.434,00	$244.372.688,00
Pago No. 26	$2.311.285.272,00	$226.544.346,00
Pago No. 27	$1.908.204.214,00	$270.418.694,00
Pago No. 28	$1.416.991.908,00	$274.426.019,00
Pago No. 29	$0,00	$260.366.050,00
Pago No. 30	$0,00	$244.557.494,88
Pago No. 31	$0,00	$268.974.748,00
Pago No. 32	$0,00	$263.671.751,00
Pago No. 33	$0,00	$264.128.592,00
Pago No. 34	$0,00	$256.715.249,00
Pago No. 35	$0,00	$227.773.140,00
Pago No. 36	$0,00	$245.933.730,00
Valor Pagado Total	$72.018.100.895,00	$6.706.502.498,00
Saldo Pendiente por cancelar	$10.660.508.710,00	$465.526.124
Saldo financiero del proyecto	$9.084.039.696,00	$465.526.124
Porcentaje de ejecución	87,11%	93,51%

6. SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES		
Se verificó pago de seguridad social y parafiscales y se deja registro en el formato REVISIÓN SEGURIDAD SOCIAL SUPERVISORES.(Adjunto)	**Responsable diligenciamiento**	**WILSON GARZON CIFUENTES**
	Fecha diligenciamiento	**26/01/2026**

7. IMAGEN INSTITUCIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL				
Verificación del uso adecuado de la imagen institucional	**Vallas**	**SI**	**Chalecos**	**SI**
	Cascos	**SI**	**Otros**	**SI**
Se verifica el cumplimiento de los requisitos de Seguridad industrial	**SI**	**X**	**NO**	

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Registro fotografico del contrato de obra e interventoría....(Incluir comentarios generales a las fotografias)














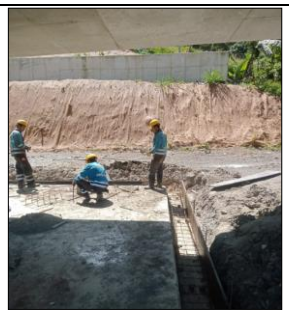





















9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Para el mes de enero de 2026, se encuentran en tramite ante la Entidad las actas correspondientes a los peridiodos de :
Obra: Nº 29 correspondiente al mes de Diciembre de 2025.
Interventoria: Nº 37 Correspondiente al mes de Diciembre de 2025.

De acuerdo a los reportes semanales de Interventoría, se evidencia un avance en las actividades de obra, en la etapa de cimentacion el proyecto se encuentra en un avance del 100% - adicional se encuentran realizando actividades de subestructura. Se sugiere tener controlado el cronograma para evitar retrasos y en dado caso implementar contingencias, este informe se realiza de a cuerdo a la entrega de informacion semanal presentada por el interventor donde se identifican los avances de las actividades de obra asi como los demas temas y gestiones ambientales, sociales y de seguridad industrial.

10- ANEXOS

FUNCIONARIOS / CONTRATISTAS

NOMBRE	CARGO	FIRMA - ELABORÓ
WILSON GARZON CIFUENTES	CONTRATISTA APOYO	
NOMBRE	**CARGO**	**FIRMA - SUPERVISOR(A)**
SANDRA ROCIO CASTILLO GUTIERREZ	SUBDIRECTORA TÉCNICA SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL	
FECHA DEL PRESENTE INFORME	miércoles, 4 de febrero de 2026	
