INFORME EJECUTIVO MENSUAL 1 (17 AL 30 DE OCTUBRE DE 2025)

MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS SEDES URIBE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL URIBE Y SAN ANTONIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PLINIO MENDOZA NEIRA, DEL MUNICIPIO DE TOCA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.





CONTRATO DE OBRA No. 083 DE 2025

CUYO OBJETO ES:

MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS SEDES URIBE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL URIBE Y SAN ANTONIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PLINIO MENDOZA NEIRA, DEL MUNICIPIO DE TOCA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

INGECOM S&D S.A.S
R/L NEIDER SUAREZ ALVARADO
CONTRATISTA

Calle 79 No. 1 A -15 Este
Cel: 3103191009 - 3112227854
Tel: 098-7473558
Email: ingecomsydsas@gmail.com

FICHA DE CONTROL

Proyecto: Mejoramiento y adecuación de la infraestructura de las sedes uribe de la institución educativa rafael uribe y san antonio de la institución educativa plinio mendoza neira, del municipio de Toca, departamento de Boyacá.
Contrato No.: 083 DE 2025
Objeto del Contrato: Mejoramiento y adecuación de la infraestructura de las sedes uribe de la institución educativa rafael uribe y san antonio de la institución educativa plinio mendoza neira, del municipio de Toca, departamento de Boyacá.
Ubicación: infraestructura de las sedes uribe de la institución educativa rafael uribe y san antonio de la institución educativa plinio mendoza neira, del municipio de Toca, departamento de Boyacá.
Fecha: 17 de octubre al 31 de octubre de 2025

1. Elaboración del Documento Técnico

Responsable: Ing. Julio Reynel Monroy Puerto
Cargo: Ingeniero Residente – INGECOM S&D S.A.S

2. Revisión Técnica

Responsable: Ing. Julio Reynel Monroy Puerto
Cargo: Ingeniero Residente – INGECOM S&D S.A.S

3. Aprobación por parte del Contratista

Responsable: Neider Suarez Alvarado
Cargo: Representante Legal – INGECOM S&D S.A.S

4. Revisión y Aprobación por parte de la Supervisión de Obra

Responsable: Martha Liliana Rachen Cely Cargo: secretaria de Planeación y Obras Públicas - Municipio de Toca Comentarios: Documento aprobado sin observaciones.
Estado: Aprobado

TABLA DE CONTENIDO

pág.

INTRODUCCIÓN 7
1 GENERALIDADES DEL CONTRATO 8
1.1 ANTECEDENTES 8
1.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 9
1.3 CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO 10
1.4 INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO 12
2 CONTROL ADMINISTRATIVO Y LEGAL 13
2.1 OBLIGACIONES DEL CONTRATO 13
2.2 PERSONAL UTILIZADO 18
2.3 EQUIPO UTILIZADO (PERIODO DEL INFORME) 18
2.4 MATERIAL UTILIZADO 18
2.5 CONTROL LEGAL DEL CONTRATO 18
2.6 BALANCE GENERAL 20
3 CONTROL TECNICO 21
3.1 CONDICIONES CONTRACTUALES 21
3.2 CONTROL DE AVANCE FISICO 22
3.3 ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL CONTRATO 23
3.4 CONTROL DE CALIDAD DE OBRA 23
3.5 ESTADO DEL TIEMPO 23
4 CONTROL DE CALIDAD 24
5 CONTROL PRESUPUESTAL FINANCIERO 24
5.1 CONTROL PRESUPUESTAL 24
5.2 CONTROL FINANCIERO 25
6 COMPONENTE MEDIO AMBIENTAL 28
6.1 SEGUIMIENTO AMBIENTAL 28
7 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 28
7.1 SEGURIDAD Y SALUD 28

7.2 SALUD OCUPACIONAL 28
7.3 SEGURIDAD SOCIAL 28
8 COMPONENTE SOCIAL 29
9 INCONVENIENTES PRESENTADOS 29
10 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 30
11 REFERENCIA BIBLIOGRAFICAS 31
12 ANEXOS 32

Calle 79 No. 1 A -15 Este
Cel: 3103191009 - 3112227854
Tel: 098-7473558
Email: ingecomsydsas@gmail.com

TABLA DE ILUSTRACIONES

pág.

Ilustración 1 Localización municipio de Toca 9
Ilustración 2 Localización de la Institución Educativa Técnica Rafael Uribe sede san Antonio 9
Ilustración 3 Localización del COLEGIO PLINIO MENDOZA NEIRA SEDE LA URIBE 10
Ilustración 4 Control de avance físico octubre..... 22
Ilustración 5 Estado del tiempo 23
Ilustración 6 Certificados de disponibilidad presupuestal del contrato 24
Ilustración 7 Certificados de registro presupuestal del contrato 24
Ilustración 8 Control de avance financiero Programado Vs Ejecutado octubre..... 26

LISTA DE TABLAS

pág.

Tabla 1 Cantidades Iniciales de Obra 11
Tabla 2 Condiciones de contrato de obra No 083 DE 2025 12
Tabla 3 Obligaciones del contratista 17
Tabla 4 Personal de obra 18
Tabla 5 Herramienta y equipos utilizados en Obra. 18
Tabla 6 Relación de actas 18
Tabla 7 Control de pólizas del contrato Anexo 0 No.083 DE 2025 19
Tabla 8 Control de pólizas del contrato Anexo 2 No.083 DE 2025 19
Tabla 9 Condiciones contractuales 21
Tabla 10 Control de avance físico octubre 22
Tabla 11 Presupuesto general del proyecto 25
Tabla 12 Relación de pagos y balance financiero del contrato octubre 26
Tabla 13 Control de avance financiero Programado Vs Ejecutado octubre 27

INTRODUCCIÓN

El presente informe mensual 1 (17 AL 30 DE OCTUBRE DE 2025) del **CONTRATO DE OBRA No. 083 DE 2025** contiene el resumen de los diferentes aspectos, técnicos, administrativos, financieros y de calidad para el contrato de obra cuyo objeto es la **MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS SEDES URIBE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL URIBE Y SAN ANTONIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PLINIO MENDOZA NEIRA, DEL MUNICIPIO DE TOCA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.**

En el presente informe mensual 1 (17 AL 30 DE OCTUBRE DE 2025) se tratan aspectos relevantes, generalidades del contrato de obra, estado parcial de la obra, seguimiento y construcción técnica, acompañada de un registro fotográfico.

1 GENERALIDADES DEL CONTRATO

1.1 ANTECEDENTES

La Administración Municipal de Toca, en desarrollo del Plan de Desarrollo Municipal "Toca por Buen Camino 2024–2027", incorpora dentro del eje estratégico "Desarrollo Social por Buen Camino" el programa "Fortalecimiento de la calidad y cobertura de la educación inicial, preescolar, básica, media y superior del municipio de Toca, Boyacá", orientado a la optimización de las condiciones físicas y funcionales de la infraestructura educativa oficial.

En el marco de dicho programa, se prioriza la intervención, mejoramiento y adecuación de los espacios destinados a la prestación del servicio de alimentación escolar, garantizando el cumplimiento de las condiciones técnicas, sanitarias y de seguridad requeridas para su adecuada operación. Estas acciones se fundamentan en los resultados de la inspección técnica realizada por la Secretaría de Planeación y Obras Públicas del municipio, la cual evidenció la necesidad de realizar intervenciones en las sedes Institución Educativa Técnica Rafael Uribe – Sede San Antonio y Colegio Plinio Mendoza Neira – Sede La Uribe, ubicadas en el municipio de Toca, departamento de Boyacá.

•Institución Educativa Técnica Rafael Uribe sede SAN ANTONIO:

La sede de san Antonio es de 15 niños, en donde una de las necesidades de la institución son la cocina y el comedor las cuales se encuentra en bastante deterioro por la falta de manteamiento como a continuación se describe:

El piso de la cocina y del comedor se encuentran en baldosín de color rojo, el cual no cumple con los requisitos para su funcionamiento, ya que debe ser piso antideslizante de color blanco. El cambio del piso de baldosín en la cocina del colegio es una medida esencial y justificada por múltiples razones, que abarcan desde la seguridad e higiene alimentaria hasta la funcionalidad, durabilidad y el cumplimiento de normativas sanitarias.

•COLEGIO PLINIO MENDOZA NEIRA SEDE LA URIBE

Las vigas canales del comedor y la cocina están presentando filtraciones porque las bajantes existentes no tienen la suficiente capacidad para evacuar el agua que se represa en el tejado y a que hay zonas que no drenan a las canales y empozan

mucha agua. Por lo que la pintura tanto de fachada como interna se encuentra deteriorada.

La presencia de humedad en las paredes del comedor y la cocina, sumada a la existencia de viga canales, es una señal inequívoca de que hay filtraciones de agua provenientes del techo o la cubierta, y que las vigas canales están fallando en su función de drenaje o su propia impermeabilización está comprometida. La impermeabilización de estas vigas canales se vuelve una prioridad.


1.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Proyecto localizado en las instituciones educativas del municipio de Toca - Boyacá.

El proyecto se encuentra localizado en el municipio de Toca – Boyacá



Ilustración 1 Localización municipio de Toca

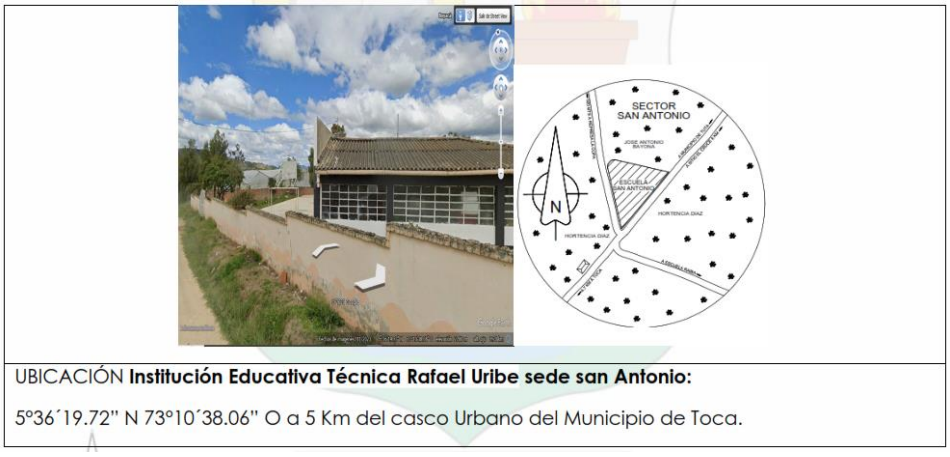

UBICACIÓN **Institución Educativa Técnica Rafael Uribe sede san Antonio:**

5°36´19.72" N 73°10´38.06" O a 5 Km del casco Urbano del Municipio de Toca.

Ilustración 2 Localización de la Institución Educativa Técnica Rafael Uribe sede san Antonio



Ilustración 3 Localización del COLEGIO PLINIO MENDOZA NEIRA SEDE LA URIBE

1.3 CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO

Proyecto con fundamento social de la alcaldía municipal de Toca (Boyacá), que busca mejorar la calidad de vida de los estudiantes mediante la mejoramiento y adecuación de la infraestructura de las sedes Uribe de la institución educativa Rafael Uribe y san Antonio de la institución educativa Plinio Mendoza Neira, del municipio de toca, departamento de Boyacá. Utilizando mano de obra calificada, materiales de primera calidad y debidamente certificados y equipos de primera calidad.

Proyecto que se viene desarrollando con criterios sociales de responsabilidad y calidad. Se adjunta la siguiente tabla que contiene las cantidades iniciales de obra como referencia a las características de este proyecto, actividades directamente relacionadas con el proyecto firmado entre la entidad contratante e INGECOM S&D SAS.

1.3.1 CANTIDADES INICIALES CONTRATADAS

PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTO								
ITEM	APU´S	FUENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	Vr. UNIT.	INC. DIST.	Vr. TOTAL OBRA CIVIL
	1		SAN ANTONIO					$ 9.597.742,00
	1,01		PISOS					$ 3.784.070,00
1.01.01	2.01.34	Gober.	DEMOLICIÓN DE PISO EN CERÁMICA + MORTERO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M2	46,33	$ 8.155,80		$ 377.875,00
1.01.02	2.05.19	Gober.	PISO EN CERÁMICA	M2	46,33	$ 73.517,11		$ 3.406.195,00
	1,02		MESON					$ 1.164.601,00
1.02.01	2.04.09	Gober.	MESONES EN CONCRETO A = 0.60 M. 17.5 MPa - (2500 PSI) INCLUYE REFUERZO, E = 0.10 M.	M2	1,89	$ 150.861,13		$ 284.600,00
1.02.02	2.05.19	Gober.	ENCHAPE EN CERAMICA PARA MESONES	M2	9,43	$ 73.517,11		$ 860.936,00
1.02.03	2.06.15	Gober.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REMATE BOCEL DE ALUMINIO "WIN"	ML	1,15	$ 16.578,19		$ 19.065,00
	1,03		PINTURA					$ 1.646.539,00
1.03.01	2.07.07	Gober.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO BAJO PLACA	M2	24,74	$ 12.280,88		$ 303.830,00
1.03.02	2.07.20	Gober.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA EPÓXICA PARA MUROS A DOS MANOS	M2	82,47	$ 16.281,77		$ 1.342.709,00
	1,04		TECHO					$ 2.409.037,00
1,04,01	2.01.46	Gober.	DESMONTE DE CIELO FALSO EN MADERA, (NO INCLUYE DESMONTE DE ESTRUCTURA). (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M2	33,54	$ 7.591,46		$ 254.618,00
1,04,02	2.09.01	Gober.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC DE 7 MM.	M2	33,54	$ 62.395,65		$ 2.092.750,00
1,04,03	2.10.177	Gober.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED CUADRADO DE INCRUSTAR DE 24 W	UND	2,00	$ 30.834,55		$ 61.669,00
	1,05							$ 593.495,00
1,05,01	2.01.70	01.70	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	0,25	$ 56.814,99		$ 14.317,00
1,05,02	3.03.12	Gober.	MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.).	M3	0,17	$ 113.017,02		$ 18.987,00
1,05,03	2.03.26	Gober.	PLACA MACIZA EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI) E = 0.10 M.	M2	1,68	$ 131.012,85		$ 220.102,00
1,05,04	2.04.30	Gober.	MURO EN LADRILLO TOLETE COMUN DE E = 0.10 M.	M2	2,85	$ 71.196,35		$ 202.910,00
1,05,05	2.15.09	Gober.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA TIPO BANCARIA EN VARILLA CUADRADA. (INCLUYE ANTICORROSIVO).	M2	1,05	$ 130.646,57		$ 137.179,00
	2		LA URIBE					$ 15.147.288,00
	2,01		TECHO COCINA Y COMEDOR					$ 7.236.690,00
2,01,01	2.08.32	Gober.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN IMPERMEABILIZACION EN MANTO ASFALTICO PARA CANALES Y VIGACANALES	ML	58,00	$ 82.936,06		$ 4.810.291,00
2,01,02	2.08.38	Gober.	SUMINISTRO E INTALACION CUBIERTA ARQUITECTONICA METALICA TIPO ACESCO O SIMILAR DE 0.73 M. X 3.00 M	M2	29,33	$ 35.370,19		$ 1.037.231,00
2,01,03	2.08.03	Gober.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE PVC DE AGUAS LLUVIA. (REF.AMAZONAS O SIMILAR)	ML	23,00	$ 60.398,61		$ 1.389.168,00
	2,02		PINTURA INTERNA					$ 3.946.497,00
2,02,01	2.07.07	Gober.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO BAJO PLACA	M2	156,07	$ 12.280,88		$ 1.916.659,00
2,02,02	2.07.14	Gober.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE O ESTUCO A TRES MANOS.	M2	222,96	$ 9.104,25		$ 2.029.838,00
	2,03		PINTURA FACHADA					$ 3.964.101,00
2,03,01	1.03.08	Gober.	PAÑETE LISO BAJO PLACA 1.4	M2	64,47	$ 29.575,39		$ 1.906.578,00
2,03,02	2.07.15	Gober.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA KORAZA O SIMILAR PARA FACHADAS TRES MANOS	M2	128,93	$ 15.958,45		$ 2.057.523,00

	COSTO DIRECTO OBRA CIVIL	$ 24.745.030,00
A. I. U. 30% DEL COSTO DIRECTO	ADMINISTRACION 22%	$ 5.443.907,00
	IMPREVISTOS 3%	$ 742.351,00
	UTILIDAD 5%	$ 1.237.252,00
	A.I.U. 30%	$ 7.423.510,00
	SUB-TOTAL CON AIU	$ 32.168.540,00
	COSTO TOTAL OBRA	$ 32.168.540,00

Tabla 1 Cantidades Iniciales de Obra

1.4 INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

A continuación, se muestra las condiciones del CONTRATO DE OBRA No. 083 DE 2025.

Modalidad de Contrato:	CONTRATO DE OBRA No. 083 DE 2025
Contratante:	MUNICIPIO DE TOCA, BOYACÁ
Contratista:	INGECOM S&D S.A.S
Supervisor:	MARTHA LILIANA RACHEN CELY
Objeto:	MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS SEDES URIBE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL URIBE Y SAN ANTONIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PLINIO MENDOZA NEIRA, DEL MUNICIPIO DE TOCA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.
Valor Inicial:	**TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE. ($32.168.540,00)**
Valor Definitivo:	**TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE. ($32.168.540,00)**
Plazo de Ejecución:	DOS (2) MESES
Fecha Acta de Inicio	17 DE OCTUBRE DE 2025
Fecha terminación	16 DE DICIEMBRE DE 2025

Tabla 2 Condiciones de contrato de obra No 083 DE 2025

2 CONTROL ADMINISTRATIVO Y LEGAL

2.1 OBLIGACIONES DEL CONTRATO

Nº	DESCRIPCION	CUMPLIEMIENTO DE LA ACTIVIDAD
1	Ceñirse a los estudios y diseños y productos de los estudios, diseños y especificaciones técnicas elaborados por el Municipio.	Se ejecutaron las actividades conforme a los estudios, diseños y especificaciones técnicas suministradas por el Municipio.
2	Desarrollar el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en el Contrato, incluyendo sus Anexos Técnicos y su Pliego de Condiciones.	Se desarrolló el objeto del contrato cumpliendo las condiciones de calidad, oportunidad y obligaciones establecidas en el contrato, pliego y anexos técnicos.
3	Colaborar con la Alcaldía de Toca en cualquier requerimiento que ella haga.	Se atendieron y apoyaron oportunamente los requerimientos realizados por la Alcaldía de Toca relacionados con el objeto contractual.
4	Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con la invitación y la oferta presentada.	Se garantizó la calidad de los bienes y servicios ejecutados, de acuerdo con la invitación y la oferta presentada.
5	Dar a conocer a la Alcaldía cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. Seguir las indicaciones que el supervisor del contrato realice por escrito.	Se informó oportunamente a la Alcaldía cualquier reclamación o situación que pudiera afectar el objeto del contrato y se acataron las instrucciones escritas del supervisor.
6	Mantener los precios ofrecidos fijos e informar oportunamente sobre cualquier irregularidad que advierta en el desarrollo del contrato.	Se mantuvieron fijos los precios ofertados y se informó oportunamente cualquier irregularidad detectada durante la ejecución.
7	Ejecutar las actividades de acuerdo con el programa general aprobado por la supervisión, realizar las entregas en las cantidades y sitios especificados	Las actividades se ejecutaron conforme al programa general aprobado, realizando las entregas en las cantidades y sitios establecidos.
8	Rendir y elaborar los informes, conceptos y demás trabajos que se le soliciten en desarrollo del contrato.	Se elaboraron y presentaron los informes, conceptos y demás documentos solicitados durante la ejecución del contrato.
9	Acatar las observaciones y recomendaciones del SUPERVISOR, dirigidas al adecuado cumplimiento del objeto de este acto.	Se atendieron y acataron las observaciones y recomendaciones formuladas por el supervisor del contrato.
10	No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley, con el fin de hacer u omitir algún hecho.	Se actuó conforme a la ley, sin acceder a peticiones o amenazas de personas ajenas al marco legal.

11	Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del contrato	Se mantuvo la reserva profesional sobre la información suministrada para el desarrollo del contrato.
12	Mantener vigentes todas las garantías que amparan el contrato en los términos del mismo, si estuviere obligado a ello.	Se mantuvieron vigentes las garantías contractuales en los términos establecidos.
13	Cumplir con las obligaciones laborales del personal contratado en la ejecución del contrato.	Se cumplieron las obligaciones laborales del personal vinculado a la ejecución del contrato.
14	Acreditar estar al día en el pago de los apartes al sistema de seguridad social integral en salud, en los términos consagrados en el Artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y Art. 2 de la ley 1562 de 2012 (Salud, Pensión y Riesgos Laborales).	Se acreditó estar al día en el pago de aportes al sistema de seguridad social integral en salud, pensión y riesgos laborales.
15	Será por cuenta del CONTRATISTA el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecución del contrato, igualmente la elaboración de los subcontratos necesarios, quedando claro que no existe ningún tipo de vínculo laboral del personal con el Municipio.	Se asumió el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, sin generar vínculo laboral con el Municipio.
16	Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilataciones y entrabamientos.	Se actuó con lealtad y buena fe en todas las etapas contractuales, evitando dilaciones injustificadas.
17	El CONTRATISTA será responsable ante las autoridades de los actos omisiones en el ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la Administración o a terceros.	Se asumió la responsabilidad por los actos u omisiones derivados de la ejecución del contrato que causaran perjuicio a la Administración o a terceros.
18	Coadyuvar el proceso de socialización con la comunidad previo inicio de las obras	Se realizó el proceso de socialización con la comunidad previo al inicio de las obras
19	Ejecutar los recursos asignados, exclusivamente para el objeto definido y dentro de los tiempos y términos establecidos.	Los recursos asignados fueron ejecutados exclusivamente para el objeto contractual y dentro de los plazos establecidos.
20	Ceñirse a los estudios y diseños y productos de los estudios, diseños y especificaciones técnicas elaboradas por el municipio.	La ejecución se realizó conforme a los estudios, diseños y especificaciones técnicas aprobadas por el Municipio.

21	En el desarrollo de las obras objeto del contrato se debe cumplir con norma de construcción sismo resistentes "NSR-2010 "y demás especificaciones y normas técnicas de obras civiles aplicables a la construcción de vivienda en el territorio colombiano.	Las obras se ejecutaron cumpliendo la norma NSR-2010 y demás normas técnicas aplicables.
22	Responder por cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.	Se atendieron y respondieron oportunamente las reclamaciones que pudieran afectar el objeto contractual.
23	Comunicarle al Municipio cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del contrato	Se informó al Municipio cualquier circunstancia que pudiera afectar la ejecución del contrato.
24	Suministrar y mantener durante la ejecución de la obra y hasta la entrega de la misma, el equipo de trabajo ofrecido en su propuesta. en caso de que el contratista requiera cambiar el profesional o personal propuestos, deberá hacerlo con otro de un perfil igual o superior al que se retiró, previo visto bueno la supervisión y aprobación del municipio	Se mantuvo el equipo de trabajo propuesto, y los cambios realizados contaron con aprobación de la supervisión y el Municipio.
25	EL CONTRATISTA responderá por el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecución de la obra, quedando claro que no existe ningún tipo de vínculo laboral del personal con el Municipio	Se asumió el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones del personal, sin vínculo laboral con el Municipio.
26	Presentar al municipio de toca los informes mensuales conforme lo establece de la minuta del contrato a realizarse y cuando lo solicite el contratante, la supervisor.	Se presento el informe mensual conforme a la minuta contractual y requerimientos de la supervisión.
27	Mantener la información técnica del proyecto en absoluta reserva de conformidad con el acuerdo de confidencialidad suscrito entre las partes.	Se mantuvo la confidencialidad de la información técnica del proyecto conforme al acuerdo suscrito.
28	Presentar en un plazo no mayor a cinco (5) días calendarios a la adjudicación el listado de precios de los insumos (materiales, equipo, herramienta y mano de obra) así como la totalidad de los análisis de precios unitarios, los cuales deben corresponder en forma idéntica con el listado de precios de	Se presentó oportunamente el listado de precios y análisis de precios unitarios conforme a la propuesta económica.

	los insumos y de los unitarios presentados en el formato de propuesta económica.	
29	Mantener informado al supervisor del contrato sobre el desarrollo de las actividades bajo su responsabilidad	Se mantuvo informado permanentemente al supervisor sobre el avance de las actividades.
30	No modificar unilateralmente el programa de general de obra acordado. la modificación del programa deberá fundarse en causas plenamente justificadas y requerirá la aprobación escrita previa del supervisor y la verificación por parte del municipio, en caso que el contratista no cumpla con el programa, el supervisor le podrá exigir por escrito el aumento del número de turnos, la jornada de trabajo y/o el equipo, y, en general, las acciones necesarias para el cumplimiento del programa de trabajo, sin que por la realización de tales acciones se genere costo adicional alguno para la entidad. la renuencia del contratista a adoptar las medidas exigidas se considera como incumplimiento de conformidad con lo establecido en el contrato	No se modificó el programa de obra sin autorización escrita del supervisor y del Municipio.
31	Llevar una memoria diaria de todos los acontecimientos, sucesos y decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, registrarse la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, y demás acontecimientos, debe permitir la comprensión general de la obra y desarrollo de las actividades de acuerdo con el cronograma de ejecución e inversión funcionarios que tengan que ver con el proyecto, y demás acontecimientos, debe permitir la compresión general de la obra y desarrollo de las actividades de acuerdo con el cronograma de inversión aprobado. Este documento debe estar firmado por el director de obra y el director de la supervisión ía y estar debidamente foliado.	Se llevó bitácora diaria de obra debidamente diligenciada, firmada y foliata.

	A esta bitácora, podrán acceder los funcionarios del municipio, el el supervisor	
32	Atender los requerimientos de información que sean realizados por los representantes del MUNICIPIO o de cualquiera de los entes de control.	Se atendieron oportunamente los requerimientos de información del Municipio y entes de control.
33	Atender los requerimientos hechos por la supervisión administrativa y financiera.	Se atendieron los requerimientos de la supervisión administrativa y financiera.
34	Constituir la garantía de cumplimiento que ampare la calidad de los materiales, la estabilidad de obra, y el pago de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones, así como la garantía de responsabilidad civil extracontractual en los términos que establece la Ley, incluyendo como asegurado a LA ENTIDAD TERRITORIAL.	Se constituyeron y mantuvieron vigentes las garantías contractuales exigidas, incluyendo la RCE.
35	Las demás inherentes a la naturaleza del contrato que contribuyan a garantizar el cabal cumplimiento y ejecución del servicio a prestar	Se cumplieron las obligaciones inherentes necesarias para el cabal desarrollo del contrato.
36	Practicar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas, de movimiento de maquinaria y medidas de seguridad industrial necesarias para no poner en peligro las personas ni las cosas ni el medio ambiente, respondiendo por los perjuicios que se causen.	Se aplicaron las medidas ambientales y de seguridad necesarias, respondiendo por los perjuicios causados.
37	Velar por el estricto cumplimiento de las normas relacionadas en el esquema de ordenamiento territorial (E.O.T.).	Se dio cumplimiento a las disposiciones del Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT).
38	Las demás inherentes al buen desarrollo del objeto contractual.	Se cumplieron las obligaciones necesarias para el adecuado desarrollo del objeto contractual.

Tabla 3 Obligaciones del contratista

2.2 PERSONAL UTILIZADO

Para el proyecto se contrató personal debidamente calificado.

CARGO	*NOMBRE*	*IDENTIFICACION*
RESIDENTE DE OBRA	*JULIO REYNEL MONROY PUERTO*	*4.288.493*

Tabla 4 Personal de obra

Fuente: Contratista de Obra

2.3 EQUIPO UTILIZADO (PERIODO DEL INFORME)

Para el proyecto se contó con herramientas adecuadas para facilitar la realización de las obras en el desarrollo del proyecto. A continuación, se muestran los equipos utilizados en el desarrollo efectivo y satisfactorio del proyecto No. 083 DE 2025.

RELACION DE EQUIPOS PRESENTES EN EL CONTRATO	
Nº	*NOMBRE*
1	Equipo computacional

Tabla 5 Herramienta y equipos utilizados en Obra.

2.4 MATERIAL UTILIZADO

- No se utilizaron materiales debido a que no se pudieron desarrollar actividades.

2.5 CONTROL LEGAL DEL CONTRATO

ACTAS GENERADAS (RELACION Y DESCRIPCION DE CADA ACTA GENERADA		
Nº	**DESCRIPCION**	**FECHA**
1	ACTA DE INICIO	17 DE OCTUBRE DE 2025

Tabla 6 Relación de actas

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

- Consecutivo 3628-2025 Remisión de documentos solicitados
- Consecutivo oficio Vu – 3644-2025 Respuesta a solicitud oficio Nº OFI-REM-MT-MC-01-2025

CORRESPONDENCIA ENVIADA

- OFI-REM-MT-MC-01-2025 SOLICITUD DE CAMBIO DE PROFESIONAL RESIDENTE DE OBRA DEL CONTRATO Nº 083 DE 2025.

2.5.1 CONTROL DE POLIZAS

A continuación, se muestra el control de pólizas del contrato de obra Nº 083 DE 2025 según póliza de cumplimiento No. **39-44-101176482**, póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No**. 39-40-101046350 .**

AMPAROS	VIGENCIA INICIAL	VIGENCIA FINAL	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	08/10/2025	09/04/2026	$6.433.708,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES.	09/10/2025	09/12/2028	$1.608.427,00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS	09/10/2025	09/10/2027	$3.216.854,00

Tabla 7 Control de pólizas del contrato Anexo 0 No.083 DE 2025

AMPAROS	VIGENCIA INICIAL	VIGENCIA FINAL	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	17/10/2025	18/04/2026	$6.433.708,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES.	17/10/2025	18/12/2028	$1.608.427,00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS	17/10/2025	17/10/2027	$3.216.854,00
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	17/10/2025	18/12/2025	$284.700.000,00

Tabla 8 Control de pólizas del contrato Anexo 2 No.083 DE 2025

2.6 BALANCE GENERAL

En el presente informe mensual 1 se puede constatar que las actividades contratadas en el contrato de obra No. 083 DE 2025. Cuyo objeto es la MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS SEDES URIBE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL URIBE Y SAN ANTONIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PLINIO MENDOZA NEIRA, DEL MUNICIPIO DE TOCA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. Fueron culminadas con éxito, encontrando trabajos de alta calidad.

3 CONTROL TECNICO

3.1 CONDICIONES CONTRACTUALES

ITEM	APU´S	FUENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT
	1		SAN ANTONIO		
	1,01		PISOS		
1.01.01	2.01.34	Gober.	DEMOLICIÓN DE PISO EN CERÁMICA + MORTERO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M2	46,33
1.01.02	2.05.19	Gober.	PISO EN CERÁMICA	M2	46,33
	1,02		MESON		
1.02.01	2.04.09	Gober.	MESONES EN CONCRETO A = 0.60 M. 17.5 MPa - (2500 PSI) INCLUYE REFUERZO, E = 0.10 M.	M2	1,89
1.02.02	2.05.19	Gober.	ENCHAPE EN CERAMICA PARA MESONES	M2	9,43
1.02.03	2.06.15	Gober.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REMATE BOCEL DE ALUMINIO "WIN"	ML	1,15
	1,03		PINTURA		
1.03.01	2.07.07	Gober.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO BAJO PLACA	M2	24,74
1.03.02	2.07.20	Gober.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA EPÓXICA PARA MUROS A DOS MANOS	M2	82,47
	1,04		TECHO		
1,04,01	2.01.46	Gober.	DESMONTE DE CIELO FALSO EN MADERA, (NO INCLUYE DESMONTE DE ESTRUCTURA). (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M2	33,54
1,04,02	2.09.01	Gober.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC DE 7 MM.	M2	33,54
1,04,03	2.10.177	Gober.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED CUADRADO DE INCRUSTAR DE 24 W	UND	2,00
	1,05				
1,05,01	2.01.70	01.70	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	0,25
1,05,02	3.03.12	Gober.	MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.).	M3	0,17
1,05,03	2.03.26	Gober.	PLACA MACIZA EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI) E = 0.10 M.	M2	1,68
1,05,04	2.04.30	Gober.	MURO EN LADRILLO TOLETE COMUN DE E = 0.10 M.	M2	2,85
1,05,05	2.15.09	Gober.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA TIPO BANCARIA EN VARILLA CUADRADA. (INCLUYE ANTICORROSIVO).	M2	1,05
	2		LA URIBE		
	2,01		TECHO COCINA Y COMEDOR		
2,01,01	2.08.32	Gober.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN IMPERMEABILIZACION EN MANTO ASFALTICO PARA CANALES Y VIGACANALES	ML	58,00
2,01,02	2.08.38	Gober.	SUMINISTRO E INTALACION CUBIERTA ARQUITECTONICA METALICA TIPO ACESCO O SIMILAR DE 0.73 M. X 3.00 M	M2	29,33
2,01,03	2.08.03	Gober.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE PVC DE AGUAS LLUVIA. (REF.AMAZONAS O SIMILAR)	ML	23,00
	2,02		PINTURA INTERNA		
2,02,01	2.07.07	Gober.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO BAJO PLACA	M2	156,07
2,02,02	2.07.14	Gober.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE O ESTUCO A TRES MANOS.	M2	222,96
	2,03		PINTURA FACHADA		
2,03,01	1.03.08	Gober.	PAÑETE LISO BAJO PLACA 1.4	M2	64,47
2,03,02	2.07.15	Gober.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA KORAZA O SIMILAR PARA FACHADAS TRES MANOS	M2	128,93

Tabla 9 Condiciones contractuales

3.2 CONTROL DE AVANCE FISICO

En el periodo comprendido entre el 17 de octubre de 2025 hasta el 31 de octubre de 2025 no se desarrollaron las siguientes actividades

- No se realizaron actividades durante este periodo, esto debido a que estas se deben ejecutar en las instalaciones donde los estudiantes están recibiendo el plan alimentario escolar PAE, estas instalaciones corresponden a las cocinas y restaurantes de las instituciones educativas. Además de que dichas actividades no se pueden desarrollar de corrido debido a que las instalaciones están en usos por los estudiantes y funcionarios del PAE.
- según personal de control del PAE que se encontraba en las instalaciones de la sede Uribe la alimentación escolar terminara de brindarse hasta el dia 17 de noviembre del año 2025, fecha en la cual se pueden comenzar el desarrollo de las actividades contratadas.

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO			
	% PROGRAMADO A LA FECHA	**% EJECUTADO A LA FECHA**	**DIFERENCIA**
ACUMULADO ANTERIOR	0,00%	0,00%	0,00%
DURANTE EL PERIODO	7,80%	0,00%	-7,80%
ACUMULADO ACTUAL	7,80%	0,00%	-7,80%

Tabla 10 Control de avance físico octubre

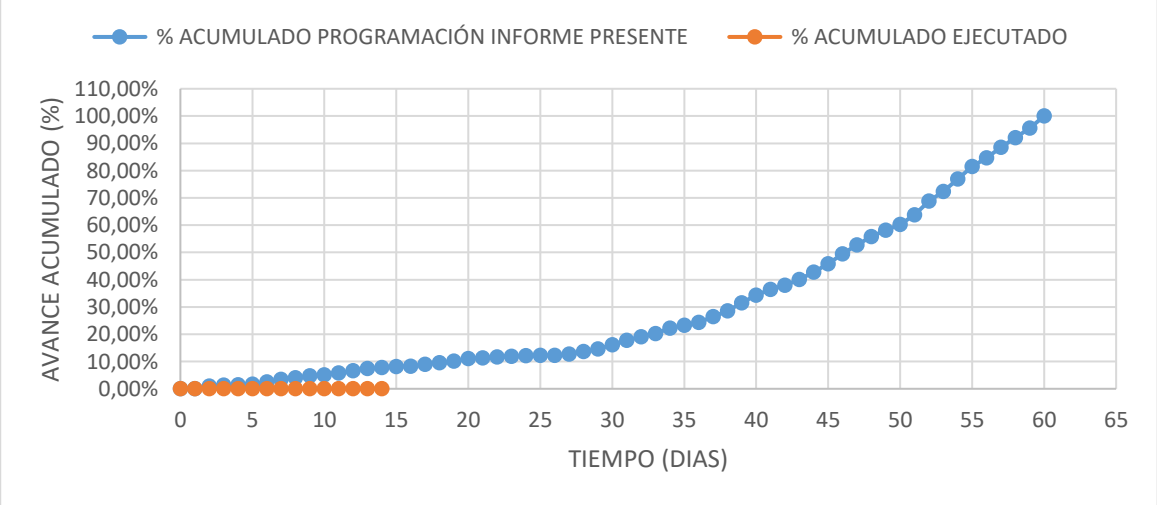


Ilustración 4 Control de avance físico octubre

3.3 ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL CONTRATO

Se realizaron las siguientes actividades:


- Visita de supervisión y contratista a las instituciones educativas con la finalidad de verificar las actividades a ejecutar en el contrato.
- Actividades administrativas para realizar balance de mayores y menores cantidades de obra para verificación y aprobación de la supervisión.

3.4 CONTROL DE CALIDAD DE OBRA

COMITÉ DE OBRA

No se realizaron comités de obra

3.5 ESTADO DEL TIEMPO

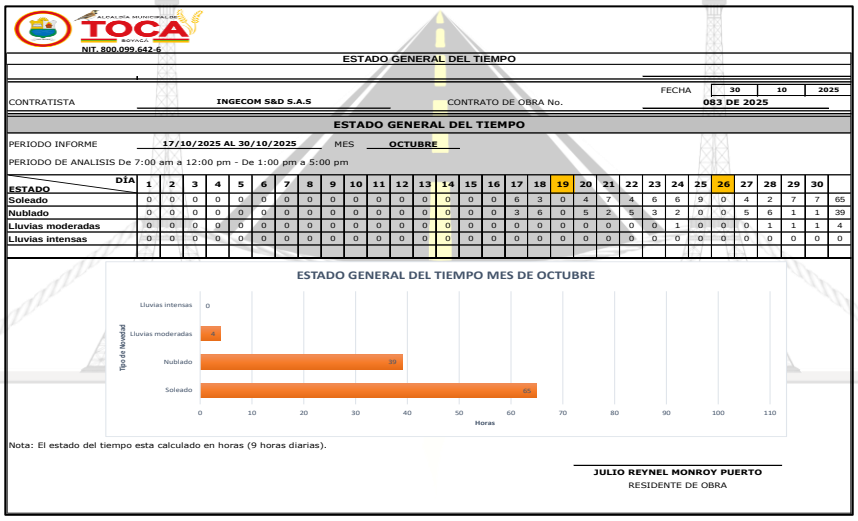

TOCA
NIT. 800.099.642-6

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

CONTRATISTA: INGECOM S&D S.A.S | CONTRATO DE OBRA No.: 083 DE 2025 | FECHA: 30 / 10 / 2025

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

PERIODO INFORME: 17/10/2025 AL 30/10/2025 | MES: OCTUBRE

PERIODO DE ANALISIS De 7:00 am a 12:00 pm - De 1:00 pm a 5:00 pm

ESTADO \ DÍA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Soleado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	3	0	4	7	4	6	6	9	0	4	2	7	7	65
Nublado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	0	5	2	5	3	2	0	0	5	6	1	1	39
Lluvias moderadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	4
Lluvias intensas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nota: El estado del tiempo esta calculado en horas (9 horas diarias).

JULIO REYNEL MONROY PUERTO
RESIDENTE DE OBRA

Ilustración 5 Estado del tiempo


4 CONTROL DE CALIDAD

Durante este periodo del mes de octubre no se realizaron ensayos de calidad

5 CONTROL PRESUPUESTAL FINANCIERO

5.1 CONTROL PRESUPUESTAL

5.1.1 Certificados de disponibilidad presupuestal del contrato

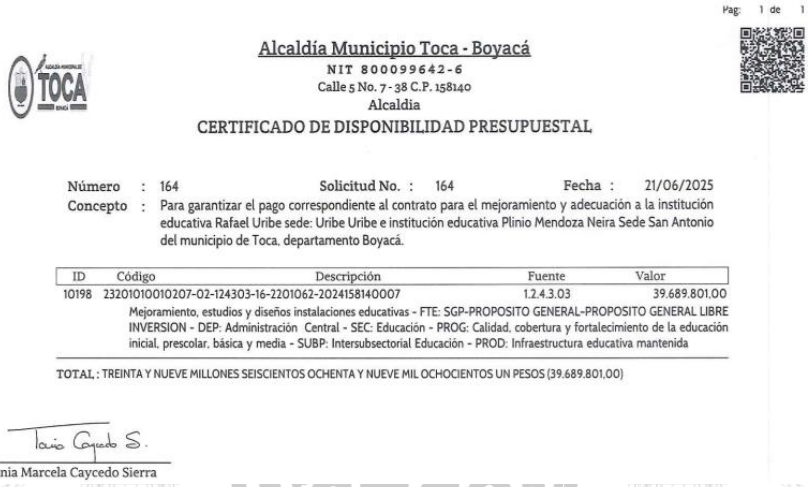

Pag: 1 de 1

Alcaldía Municipio Toca - Boyacá
NIT 800099642-6
Calle 5 No. 7 - 38 C.P. 158140
Alcaldia

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número : 164 Solicitud No. : 164 Fecha : 21/06/2025
Concepto : Para garantizar el pago correspondiente al contrato para el mejoramiento y adecuación a la institución educativa Rafael Uribe sede: Uribe Uribe e institución educativa Plinio Mendoza Neira Sede San Antonio del municipio de Toca, departamento Boyacá.

ID	Código	Descripción	Fuente	Valor
10198	232010100102O7-02-124303-16-2201062-2024158140007	Mejoramiento, estudios y diseños instalaciones educativas - FTE: SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION - DEP: Administración Central - SEC: Educación - PROG: Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media - SUBP: Intersubsectorial Educación - PROD: Infraestructura educativa mantenida	1.2.4.3.03	39.689.801,00

TOTAL : TREINTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS UN PESOS (39.689.801,00)

Tania Marcela Caycedo Sierra

Ilustración 6 Certificados de disponibilidad presupuestal del contrato

5.1.2 Certificados de registro presupuestal del contrato



Pag: 1 de 1

07/11/2025

Alcaldía Municipio Toca - Boyacá
NIT 800099642-6
Calle 5 No. 7 - 38 C.P. 158140
Alcaldia

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

Registro : 875 Disponibilidad : 164 Fecha : 09/10/2025
C.C/NIT. : 901366179 Nombre : INGECOM S&D SAS
Concepto : Para el pago correspondiente al contrato para el mejoramiento y adecuación a la institución educativa Rafael Uribe sede: Uribe Uribe e institución educativa Plinio Mendoza Neira Sede San Antonio del municipio de Toca, departamento Boyacá. Contrato 083 de 2025.

ID	Código	Descripción	Fuente	Valor
10198	232010100102O7-02-124303-16-2201062-2024158140007	Mejoramiento, estudios y diseños instalaciones educativas - FTE: SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION - DEP: Administración Central - SEC: Educación - PROG: Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media - SUBP: Intersubsectorial Educación - PROD: Infraestructura educativa mantenida	1.2.4.3.03	32.168.540,00

TOTAL : TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS (32.168.540,00)

Tania Marcela Caycedo Sierra

Ilustración 7 Certificados de registro presupuestal del contrato

PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTO								
ITEM	APU´S	FUENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	Vr. UNIT.	INC. DIST.	Vr. TOTAL OBRA CIVIL
	1		SAN ANTONIO					$ 9.597.742,00
	1,01		PISOS					$ 3.784.070,00
1.01.01	2.01.34	Gober.	DEMOLICIÓN DE PISO EN CERÁMICA + MORTERO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M2	46,33	$ 8.155,80		$ 377.875,00
1.01.02	2.05.19	Gober.	PISO EN CERÁMICA	M2	46,33	$ 73.517,11		$ 3.406.195,00
	1,02		MESON					$ 1.164.601,00
1.02.01	2.04.09	Gober.	MESONES EN CONCRETO A = 0.60 M. 17.5 MPa - (2500 PSI) INCLUYE REFUERZO, E = 0.10 M.	M2	1,89	$ 150.861,13		$ 284.600,00
1.02.02	2.05.19	Gober.	ENCHAPE EN CERAMICA PARA MESONES	M2	9,43	$ 73.517,11		$ 860.936,00
1.02.03	2.06.15	Gober.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REMATE BOCEL DE ALUMINIO "WIN"	ML	1,15	$ 16.578,19		$ 19.065,00
	1,03		PINTURA					$ 1.646.539,00
1.03.01	2.07.07	Gober.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO BAJO PLACA	M2	24,74	$ 12.280,88		$ 303.830,00
1.03.02	2.07.20	Gober.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA EPÓXICA PARA MUROS A DOS MANOS	M2	82,47	$ 16.281,77		$ 1.342.709,00
	1,04		TECHO					$ 2.409.037,00
1,04,01	2.01.46	Gober.	DESMONTE DE CIELO FALSO EN MADERA, (NO INCLUYE DESMONTE DE ESTRUCTURA). (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M2	33,54	$ 7.591,46		$ 254.618,00
1,04,02	2.09.01	Gober.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC DE 7 MM.	M2	33,54	$ 62.395,65		$ 2.092.750,00
1,04,03	2.10.177	Gober.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED CUADRADO DE INCRUSTAR DE 24 W	UND	2,00	$ 30.834,55		$ 61.669,00
	1,05							$ 593.495,00
1,05,01	2.01.70	01.70	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	0,25	$ 56.814,99		$ 14.317,00
1,05,02	3.03.12	Gober.	MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.).	M3	0,17	$ 113.017,02		$ 18.987,00
1,05,03	2.03.26	Gober.	PLACA MACIZA EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI) E = 0,10 M.	M2	1,68	$ 131.012,85		$ 220.102,00
1,05,04	2.04.30	Gober.	MURO EN LADRILLO TOLETE COMUN DE E = 0.10 M.	M2	2,85	$ 71.196,35		$ 202.910,00
1,05,05	2.15.09	Gober.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA TIPO BANCARIA EN VARILLA CUADRADA. (INCLUYE ANTICORROSIVO).	M2	1,05	$ 130.646,57		$ 137.179,00
	2		LA URIBE					$ 15.147.288,00
	2,01		TECHO COCINA Y COMEDOR					$ 7.236.690,00
2,01,01	2.08.32	Gober.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN IMPERMEABILIZACION EN MANTO ASFALTICO PARA CANALES Y VIGACANALES	ML	58,00	$ 82.936,06		$ 4.810.291,00
2,01,02	2.08.38	Gober.	SUMINISTRO E INTALACION CUBIERTA ARQUITECTONICA METALICA TIPO ACESCO O SIMILAR DE 0.73 M. X 3.00 M	M2	29,33	$ 35.370,19		$ 1.037.231,00
2,01,03	2.08.03	Gober.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE PVC DE AGUAS LLUVIA. (REF.AMAZONAS O SIMILAR)	ML	23,00	$ 60.398,61		$ 1.389.168,00
	2,02		PINTURA INTERNA					$ 3.946.497,00
2,02,01	2.07.07	Gober.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO BAJO PLACA	M2	156,07	$ 12.280,88		$ 1.916.659,00
2,02,02	2.07.14	Gober.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE O ESTUCO A TRES MANOS.	M2	222,96	$ 9.104,25		$ 2.029.838,00
	2,03		PINTURA FACHADA					$ 3.964.101,00
2,03,01	1.03.08	Gober.	PAÑETE LISO BAJO PLACA 1.4	M2	64,47	$ 29.575,39		$ 1.906.578,00
2,03,02	2.07.15	Gober.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA KORAZA O SIMILAR PARA FACHADAS TRES MANOS	M2	128,93	$ 15.958,45		$ 2.057.523,00

	COSTO DIRECTO OBRA CIVIL	$ 24.745.030,00
A. I. U. 30% DEL COSTO DIRECTO	ADMINISTRACION 22%	$ 5.443.907,00
	IMPREVISTOS 3%	$ 742.351,00
	UTILIDAD 5%	$ 1.237.252,00
	A.I.U. 30%	$ 7.423.510,00
	SUB-TOTAL CON AIU	$ 32.168.540,00
	COSTO TOTAL OBRA	$ 32.168.540,00

Tabla 11 Presupuesto general del proyecto

5.2 CONTROL FINANCIERO

5.2.1 Forma de pago

El valor del presente contrato se pagará de la siguiente forma:

1). Pagos parciales según avance de ejecución de las actividades de obra hasta completar el 90% del valor contratado, previa entrega total de los documentos de la etapa I, con la respectiva suscripción de acta parcial por parte de la supervisión previa aprobación del supervisor.

2). El porcentaje restante correspondiente al 10% se pagará a la entrega total del objeto contractual previa suscripción del acta de recibo a satisfacción suscrita por la supervisión, informe de actividades respectivo, acta de liquidación y pago de seguridad social integral.

5.2.2 Relación de pagos y balance financiero del contrato

CONCEPTO	VALOR
Valor del contrato	$ 32.168.540,00
Valor anticipo	$0,00
Valor Adicional	$0,00
Valor de la presente Acta Seguimiento y Recibo a satisfacción	$0,00
Valor actas pagadas	$0,00
Saldo por Ejecutar	$ 32.168.540,00
Valor actas mas saldo por ejecutar	$ 32.168.540,00

Tabla 12 Relación de pagos y balance financiero del contrato octubre

5.2.3 Tabla de control y grafico del avance financiero. Programado Vs Ejecutado del mes de octubre

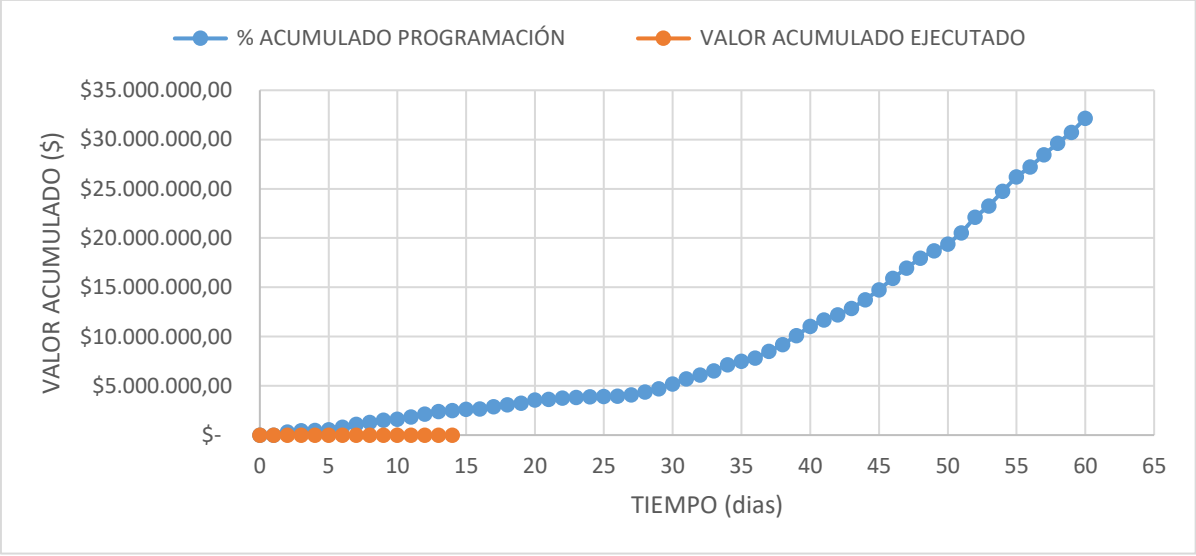


Ilustración 8 Control de avance financiero Programado Vs Ejecutado octubre

DIAS	% ACUMULADO PROGRAMACIÓN	% PROGRAMACIÓN	VALOR ACUMULADO EJECUTADO	% EJECUTADO
0	$ -	0,00%	$ -	0,00%
1	$ 16.084,27	0,05%	$ -	0,00%
2	$ 312.034,84	0,92%	$ -	0,00%
3	$ 440.709,00	0,40%	$ -	0,00%
4	$ 488.961,81	0,15%	$ -	0,00%
5	$ 559.732,60	0,22%	$ -	0,00%
6	$ 800.996,65	0,75%	$ -	0,00%
7	$ 1.103.380,93	0,94%	$ -	0,00%
8	$ 1.306.042,73	0,63%	$ -	0,00%
9	$ 1.531.222,51	0,70%	$ -	0,00%
10	$ 1.640.595,55	0,34%	$ -	0,00%
11	$ 1.859.341,62	0,68%	$ -	0,00%
12	$ 2.148.858,48	0,90%	$ -	0,00%
13	$ 2.409.423,65	0,81%	$ -	0,00%
14	$ 2.509.146,12	0,31%	$ -	0,00%
15	$ 2.621.736,01	0,35%		
16	$ 2.660.338,26	0,12%		
17	$ 2.891.951,75	0,72%		
18	$ 3.081.746,14	0,59%		
19	$ 3.258.673,11	0,55%		
20	$ 3.564.274,24	0,95%		
21	$ 3.631.828,17	0,21%		
22	$ 3.770.152,89	0,43%		
23	$ 3.837.706,82	0,21%		
24	$ 3.914.911,32	0,24%		
25	$ 3.927.778,74	0,04%		
26	$ 3.950.296,72	0,07%		
27	$ 4.091.838,30	0,44%		
28	$ 4.378.138,31	0,89%		
29	$ 4.709.474,27	1,03%		
30	$ 5.192.002,37	1,50%		
31	$ 5.713.132,72	1,62%		
32	$ 6.124.890,03	1,28%		
33	$ 6.520.563,07	1,23%		
34	$ 7.154.283,31	1,97%		
35	$ 7.501.703,54	1,08%		
36	$ 7.823.388,94	1,00%		
37	$ 8.508.578,84	2,13%		
38	$ 9.203.419,30	2,16%		
39	$ 10.117.005,84	2,84%		
40	$ 11.053.110,35	2,91%		
41	$ 11.709.348,57	2,04%		
42	$ 12.214.394,65	1,57%		
43	$ 12.880.283,43	2,07%		
44	$ 13.748.834,01	2,70%		
45	$ 14.739.625,04	3,08%		
46	$ 15.929.861,02	3,70%		
47	$ 16.965.688,01	3,22%		
48	$ 17.959.695,90	3,09%		
49	$ 18.699.572,32	2,30%		
50	$ 19.387.979,08	2,14%		
51	$ 20.533.179,10	3,56%		
52	$ 22.131.955,54	4,97%		
53	$ 23.261.071,29	3,51%		
54	$ 24.763.342,11	4,67%		
55	$ 26.220.576,97	4,53%		
56	$ 27.224.235,42	3,12%		
57	$ 28.475.591,63	3,89%		
58	$ 29.633.659,07	3,60%		
59	$ 30.733.823,14	3,42%		
60	$ 32.168.540,02	4,46%		

Tabla 13 Control de avance financiero Programado Vs Ejecutado octubre

6 COMPONENTE MEDIO AMBIENTAL

6.1 SEGUIMIENTO AMBIENTAL

- No se realizó un seguimiento ambiental debido a que no hay trabajadores en obra y no se a podido desarrollar las actividades contratadas.

7 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

7.1 SEGURIDAD Y SALUD

- No se realizó un seguimiento de seguridad y salud debido a que no hay trabajadores en obra y no se ha podido desarrollar las actividades contratadas.

7.2 SALUD OCUPACIONAL

- No se realizó un seguimiento en salud ocupacional debido a que no hay trabajadores en obra y no se ha podido desarrollar las actividades contratadas.

.

7.3 SEGURIDAD SOCIAL

- No se realizó un seguimiento en seguridad social ocupacional debido a que no hay trabajadores en obra y no se ha podido desarrollar las actividades contratadas.

8 COMPONENTE SOCIAL

Al iniciar el desarrollo de las actividades contratadas se realizó una socialización o charla con los docentes de cada escuela relacionada con el mantenimiento y adecuación de la infraestructura educativa de las sedes la Uribe y san Antonio del municipio de Toca, donde se identificaron las actividades a desarrollar en cada sede y el alcance del proyecto en mención. Durante la ejecución se a prestado el espacio para la recepción de alguna petición, queja o reclamo que se tenga sobre el presente contrato.

9 INCONVENIENTES PRESENTADOS

Dentro de los inconvenientes presentados para la ejecución del contrato de obra Nº 083 DE 2025 son los siguientes:

- Inconvenientes al momento de realizar las actividades contratadas toda vez que estas se deben ejecutar en las instalaciones donde los estudiantes están recibiendo el plan alimentario escolar PAE, estas instalaciones corresponden a las cocinas y restaurantes de las instituciones educativas. Además de que dichas actividades no se pueden desarrollar de corrido debido a que las instalaciones están en usos por los estudiantes y funcionarios del PAE.

- No se pueden garantizar la calidad de las actividades a desarrollar toda vez que los estudiantes pueden afectar la calidad de las obras realizadas.

- Se evidencian que hacen falta algunas actividades preliminares para la ejecución de algunas obras.

10 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- En el presente informe mensual 1 de ejecución, se da a conocer el estado actual del CONTRATO DE OBRA No. 083 DE 2025 el cual contiene el resumen de los diferentes aspectos, técnicos, administrativos, financieros y de calidad para el contrato de obra cuyo objeto es MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS SEDES URIBE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL URIBE Y SAN ANTONIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PLINIO MENDOZA NEIRA, DEL MUNICIPIO DE TOCA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

- El presente documento, es sustento de las actividades realizadas durante la ejecución del CONTRATO DE OBRA No. 083 DE 2025 y permite garantizar a la entidad contratante la calidad y buen desarrollo de la misma.

- De acuerdo a los inconvenientes presentados se ve la necesidad de comenzar el desarrollo de las actividades después del día 17 de Noviembre, ya que este día es el último día en que se presta el servicio de alimentación escolar en las instituciones. Esto teniendo en cuenta que se cuenta con la mano de obra calificada y no calificada para terminara las labores este este lapso de tiempo, dejando claridad que se puede realizar y terminar labores en este tiempo en condiciones normales tanto condiciones climáticas como de acceso a las instituciones.

NEIDER SUAREZ ALVARADO
R/L INGECOM S&D SAS
C.C. 23.292.660 de Sora, Boyacá
NIT. 901.366.179
ingecomsydsas@gmail.com

11 REFERENCIA BIBLIOGRAFICAS

- ✓ https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?notice=CO1.NTC.8866872. SECOP 2

12 ANEXOS

Se anexará la siguiente documentación:

- ✓ Formulario de Excel de equipo, personal de obra y tiempo u estado de clima octubre
- ✓ Formulario de control avance físico octubre
- ✓ Formulario de control avance financiero octubre
- ✓ Formato de control legal del contrato octubre
- ✓ Informes semanales de obra
- ✓ Planillas de seguridad social de octubre
- ✓ Bitácora de obra

Calle 79 No. 1 A -15 Este
Cel: 3103191009 - 3112227854
Tel: 098-7473558
Email: ingecomsydsas@gmail.com

CERTIFICADO DE AVAL DE CANTIDADES

Tunja, 31 de octubre de 2025

Señores
ALCALDÍA DE TOCA BOYACÁ
Arq. Martha Liliana Rachen Cely
Secretaria de Planeación
Toca, Boyacá

REFERENCIA: Certificado de aval del cumplimiento de especificaciones técnicas y normatividad técnica colombiana vigente - CONTRATO N° 083 DE 2025 "MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS SEDES URIBE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL URIBE Y SAN ANTONIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PLINIO MENDOZA NEIRA, DEL MUNICIPIO DE TOCA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"

Se certifica que durante el periodo de 17 de octubre al 31 de octubre del año 2025 no se realizaron actividades ni procesos constructivos en el CONTRATO N° 083 DE 2025, estas actividades no se ejecutaron conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el contrato y a la normatividad técnica colombiana vigente, sostenibilidad. garantizando el cumplimiento de los estándares de calidad, seguridad y funcionalidad. Esto debido a que en este tiempo se siguo con el calendario escolar y con la presencia de estudiantes en las instituciones educativas.

Atentamente

RESIDENTE DE OBRA
JULIO REYNEL MONROY PUERTO
C.C 4.288.493
MP. 15202-210156 BYC

ALCALDÍA MUNICIPAL DE TOCA BOYACÁ

NIT. 800.099.642-6

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

FECHA 30 | 10 | 2025


CONTRATISTA **INGECOM S&D S.A.S** CONTRATO DE OBRA No. **083 DE 2025**

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

PERIODO INFORME **17/10/2025 AL 30/10/2025** MES **OCTUBRE**

PERIODO DE ANALISIS De 7:00 am a 12:00 pm - De 1:00 pm a 5:00 pm

DÍA / ESTADO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Soleado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	3	0	4	7	4	6	6	9	0	4	2	7	7	65
Nublado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	0	5	2	5	3	2	0	0	5	6	1	1	39
Lluvias moderadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	4
Lluvias intensas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

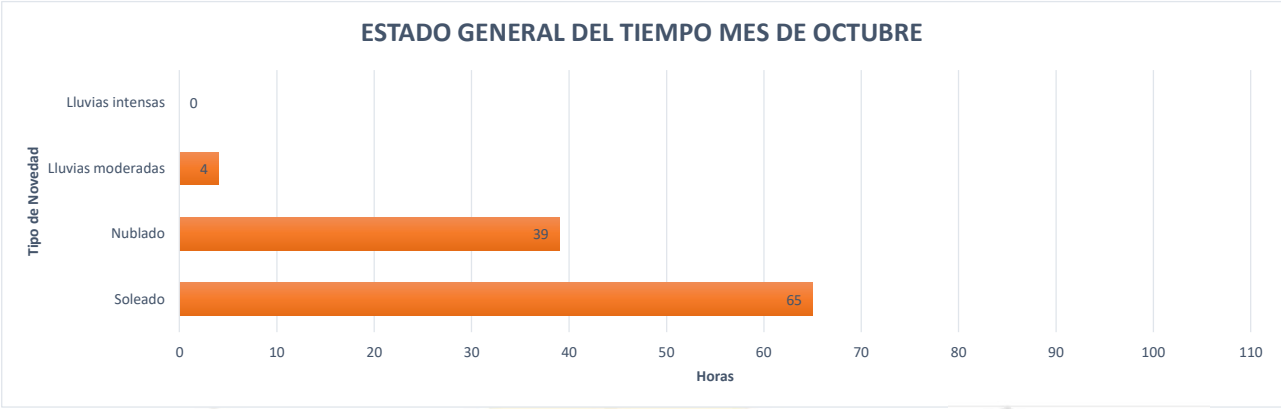

Nota: El estado del tiempo esta calculado en horas (9 horas diarias).

JULIO REYNEL MONROY PUERTO
RESIDENTE DE OBRA

EQUIPO DE OBRA	Pagina 1 de 1

FECHA: 30 / 10 / 2025

CONTRATISTA: **INGECOM S&D S.A.S** CONTRATO DE OBRA No.: **083 DE 2025**

CONTROL DIARIO DEL EQUIPO DEL CONTRATISTA DE OBRA

PERIODO INFORME: **17/10/2025 AL 30/10/2025** MES: **OCTUBRE** CONTRATO No.: **083 DE 2025**

CONTRATISTA: **INGECOM S&D S.A.S** R/L: **NEIDER SUAREZ ALVARADO**

DÍA / MAQUINA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Herramienta menor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Mezcladora 1 bulto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Camioneta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Vibrocompactador tipo rana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Vibrador de concretos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Andamios (secciones)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

CONVENCIONES

ACTIVO = **A**

REPARACIÓN = **R**

INACTIVO = **I**

SABADOS Y FESTIVOS

RESIDENTE DE OBRA
JULIO REYNEL MONROY PUERTO
C.C 4.288.493
MP. 15202-210156 BYC

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA	Pagina 1 de 1

FECHA: 30 / 10 / 2025

CONTRATISTA: **INGECOM S&D S.A.S** CONTRATO DE OBRA No.: **083 DE 2025**

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

PERIODO INFORME: **17/10/2025 AL 30/10/2025** MES: **OCTUBRE** CONTRATO No.: **083 DE 2025**

CONTRATISTA: **INGECOM S&D S.A.S** R/L: **NEIDER SUAREZ ALVARADO**

PERSONAL \ DÍA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
DIRECTOR OBRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESIDENTE DE OBRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MAESTRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OFICIALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AYUDANTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RESIDENTE DE OBRA
JULIO REYNEL MONROY PUERTO
C.C 4.288.493
MP. 15202-210156 BYC

ALCALDÍA MUNICIPAL DE TOCA BOYACÁ

NIT. 800.099.642-6

Secretaria de Planeación y Obras Publicas


CONTROL AVANCE FISICO DE OBRA

FECHA	30	OCTUBRE	2025

CONTRATO No: **083 DE 2025** CONTRATISTA **INGECOM S&D S.A.S** PERIODO: **17/10/2025 AL 31/10/2025**

OBJETO: MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS SEDES URIBE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL URIBE Y SAN ANTONIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PLINIO MENDOZA NEIRA, DEL MUNICIPIO DE TOCA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

CONTROL AVANCE FÍSICO CONTRATO DE OBRA (CUMPLIMIENTO PROGRAMACIÓN DE OBRA)

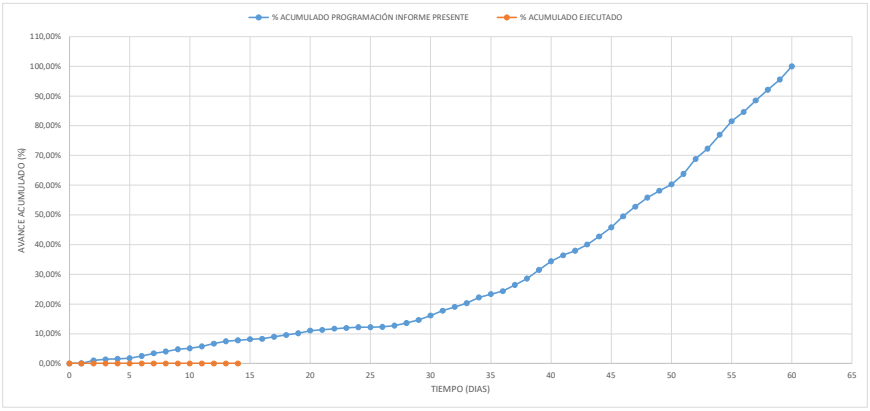

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO			
	% PROGRAMADO A LA FECHA	% EJECUTADO A LA FECHA	DIFERENCIA
ACUMULADO ANTERIOR	0,00%	0,00%	0,00%
DURANTE EL PERIODO	7,80%	0,00%	-7,80%
ACUMULADO ACTUAL	7,80%	0,00%	-7,80%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO			
DURACIÓN CONTRATO EN DÍAS	DÍAS TRANSCURRIDOS	DÍAS QUE FALTAN	RETRASO EN DÍAS
60,00	14,00	46	5,00

RESIDENTE DE OBRA

JULIO REYNEL MONROY PUERTO

C.C 4.288.493

MP. 15202-210156 BYC

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO			
	% PROGRAMADO A LA FECHA	% EJECUTADO A LA FECHA	DIFERENCIA
ACUMULADO ANTERIOR	0,00%	0,00%	0,00%
DURANTE EL PERIODO	0,00%	0,00%	0,00%
ACUMULADO ACTUAL	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO			
DURACIÓN CONTRATO EN DÍAS	DÍAS TRANSCURRIDOS	DÍAS QUE FALTAN	RETRASO EN DÍAS
60,00	0,00	60	0,00

,

DIAS	% ACUMULADO PROGRAMACIÓN INFORME PRESENTE	EJECUTADO EN EL PERIODO DEL INFORME	% ACUMULADO EJECUTADO	% EJECUTADO
0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1	0,05%	0,05%	0,00%	0,00%
2	0,97%	0,92%	0,00%	0,00%
3	1,37%	0,40%	0,00%	0,00%
4	1,52%	0,15%	0,00%	0,00%
5	1,74%	0,22%	0,00%	0,00%
6	2,49%	0,75%	0,00%	0,00%
7	3,43%	0,94%	0,00%	0,00%
8	4,06%	0,63%	0,00%	0,00%
9	4,76%	0,70%	0,00%	0,00%
10	5,10%	0,34%	0,00%	0,00%
11	5,78%	0,68%	0,00%	0,00%
12	6,68%	0,90%	0,00%	0,00%
13	7,49%	0,81%	0,00%	0,00%
14	7,80%	0,31%	0,00%	0,00%
15	8,15%	0,35%		
16	8,27%	0,12%		
17	8,99%	0,72%		
18	9,58%	0,59%		
19	10,13%	0,55%		
20	11,08%	0,95%		
21	11,29%	0,21%		
22	11,72%	0,43%		
23	11,93%	0,21%		
24	12,17%	0,24%		
25	12,21%	0,04%		
26	12,28%	0,07%		
27	12,72%	0,44%		
28	13,61%	0,89%		

,

29	14,64%	1,03%		
30	16,14%	1,50%		
31	17,76%	1,62%		
32	19,04%	1,28%		
33	20,27%	1,23%		
34	22,24%	1,97%		
35	23,32%	1,08%		
36	24,32%	1,00%		
37	26,45%	2,13%		
38	28,61%	2,16%		
39	31,45%	2,84%		
40	34,36%	2,91%		
41	36,40%	2,04%		
42	37,97%	1,57%		
43	40,04%	2,07%		
44	42,74%	2,70%		
45	45,82%	3,08%		
46	49,52%	3,70%		
47	52,74%	3,22%		
48	55,83%	3,09%		
49	58,13%	2,30%		
50	60,27%	2,14%		
51	63,83%	3,56%		
52	68,80%	4,97%		
53	72,31%	3,51%		
54	76,98%	4,67%		
55	81,51%	4,53%		
56	84,63%	3,12%		
57	88,52%	3,89%		
58	92,12%	3,60%		
59	95,54%	3,42%		
60	100,00%	4,46%		

JULIO REYNEL MONROY PUERTO
RESIDENTE DE OBRA
INGECOM S&D S.A.S

ALCALDÍA MUNICIPAL DE TOCA BOYACÁ
NIT. 800.099.642-6
Secretaria de Planeación y Obras Publicas


CONTROL DE AVANCE FINANCIERO

FECHA | 30 | OCTUBRE | 2025

CONTRATO No: 083 DE 2025 CONTRATISTA INGECOM S&D S.A.S PERIODO 17/10/2025 AL 30/10/2025

OBJETO: MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS SEDES URIBE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL URIBE Y SAN ANTONIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PLINIO MENDOZA NEIRA, DEL MUNICIPIO DE TOCA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

CONTROL AVANCE FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (CUMPLIMIENTO FLUJO DE INVERSIÓN)

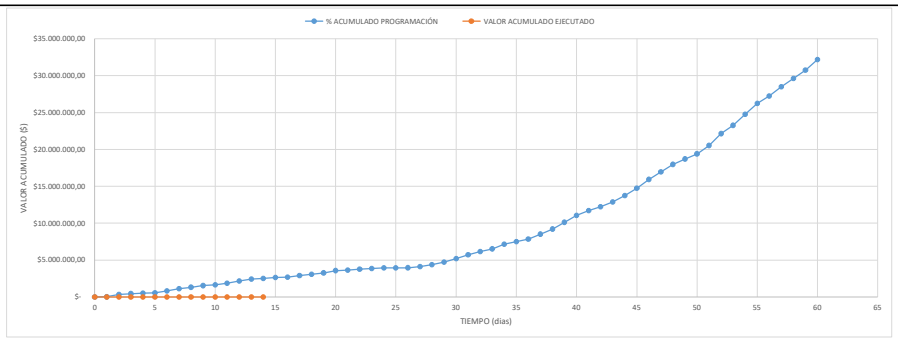

VALOR INICIAL DEL CONTRATO
$ 32.168.540,00

VALOR CONTRATO ADICIONAL
$ -

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO
$ 32.168.540,00

VALOR A MODIFICATORIA No. 01
$ -

DIAS	% ACUMULADO PROGRAMACIÓN	% PROGRAMACIÓN	VALOR ACUMULADO EJECUTADO	% EJECUTADO
0	$ -	0,00%	$ -	0,00%
1	$ 16.084,27	0,05%	$ -	0,00%
2	$ 312.034,84	0,92%	$ -	0,00%
3	$ 440.709,00	0,40%	$ -	0,00%
4	$ 488.961,81	0,15%	$ -	0,00%
5	$ 559.732,60	0,22%	$ -	0,00%
6	$ 800.996,65	0,75%	$ -	0,00%
7	$ 1.103.380,93	0,94%	$ -	0,00%
8	$ 1.306.042,73	0,63%	$ -	0,00%
9	$ 1.531.222,51	0,70%	$ -	0,00%
10	$ 1.640.595,55	0,34%	$ -	0,00%
11	$ 1.859.341,62	0,68%	$ -	0,00%
12	$ 2.148.858,48	0,90%	$ -	0,00%
13	$ 2.409.423,65	0,81%	$ -	0,00%
14	$ 2.509.146,12	0,31%	$ -	0,00%
15	$ 2.621.736,01	0,35%		
16	$ 2.660.338,26	0,12%		
17	$ 2.891.951,75	0,72%		
18	$ 3.081.746,14	0,59%		
19	$ 3.258.673,11	0,55%		
20	$ 3.564.274,24	0,95%		
21	$ 3.631.828,17	0,21%		
22	$ 3.770.152,89	0,43%		
23	$ 3.837.706,82	0,21%		
24	$ 3.914.911,32	0,24%		
25	$ 3.927.778,74	0,04%		
26	$ 3.950.296,72	0,07%		
27	$ 4.091.838,30	0,44%		
28	$ 4.378.138,31	0,89%		
29	$ 4.709.474,27	1,03%		
30	$ 5.192.002,37	1,50%		
31	$ 5.713.132,72	1,62%		
32	$ 6.124.890,03	1,28%		
33	$ 6.520.563,07	1,23%		
34	$ 7.154.283,31	1,97%		
35	$ 7.501.703,54	1,08%		
36	$ 7.823.388,94	1,00%		
37	$ 8.508.578,84	2,13%		
38	$ 9.203.419,30	2,16%		
39	$ 10.117.005,84	2,84%		
40	$ 11.053.110,35	2,91%		
41	$ 11.709.348,57	2,04%		
42	$ 12.214.394,65	1,57%		
43	$ 12.880.283,43	2,07%		
44	$ 13.748.834,01	2,70%		
45	$ 14.739.625,04	3,08%		
46	$ 15.929.861,02	3,70%		
47	$ 16.965.688,01	3,22%		
48	$ 17.959.695,90	3,09%		
49	$ 18.699.572,32	2,30%		
50	$ 19.387.979,08	2,14%		
51	$ 20.533.179,10	3,56%		
52	$ 22.131.955,54	4,97%		
53	$ 23.261.071,29	3,51%		
54	$ 24.763.342,11	4,67%		
55	$ 26.220.576,97	4,53%		
56	$ 27.224.235,42	3,12%		
57	$ 28.475.591,63	3,89%		
58	$ 29.633.659,07	3,60%		
59	$ 30.733.823,14	3,42%		
60	$ 32.168.540,02	4,46%		

JULIO REYNEL MONROY PUERTO
RESIDENTE DE OBRA

NIT. 800.099.642-6
Secretaria de Planeación y Obras Publicas

CONTROL DE LEGALIDAD

Contrato No. 083 DE 2025

DATOS GENERALES

OBJETO DEL CONTRATO
MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS SEDES URIBE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL URIBE Y SAN ANTONIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PLINIO MENDOZA NEIRA, DEL MUNICIPIO DE TOCA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

CONTRATISTA	INGECOM S&D S.A.S
INTERVENTOR	N.A
SUPERVISOR	ARQ. MARTHA LILIANA RACHEN CELY

DATOS ESPECÍFICOS

PÓLIZAS PRESENTADAS

TIPO DE PÓLIZA	NÚMERO	COMPAÑÍA ASEGURADORA	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	39-44-101176482	SEGUROS DEL ESTADO	$ 6.433.708,00	17/10/2025	18/04/2026
SALARIOS			$ 1.608.427,00	17/10/2025	18/12/2028
ESTABILIDAD			$ 3.216.854,00	17/10/2025	17/10/2027
RCE	39-40-101046350		$ 284.700.000,00	17/10/2025	18/12/2025

CONTRATOS ADICIONALES AL PLAZO

TIEMPO PRÓRROGA	NÚMERO	CAUSALES	FECHA PERFEC.
XX	XX	XX	XX
XX	XX	XX	XX

CONTRATOS ADICIONALES AL VALOR

VALOR ADICIÓN	NÚMERO	CAUSALES	FECHA PERFEC.
XX	XX	XX	XX
XX	XX	XX	XX

SANCIONES

RESOLUCIÓN No.	OBJETO	VALOR	FECHA
XX	XX	XX	XX
XX	XX	XX	XX

ACCIONES LEGALES

CLASE	ETAPA PROCESAL	FECHA	DESPACHO	No. EXPEDIENTE
XX	XX	XX	XX	XX
XX	XX	XX	XX	XX

ACTAS LEGALES TRAMITADAS

No.	OBJETO	FECHA	VALOR	OBSERVACIONES
1	ACTA DE INICIO	17/10/2025	XX	Iniciación de labores contractuales

PERIODO QUE COMPRENDE EL CONTROL DE LEGALIDAD:

DEL: 17 DE OCTUBRE DE 2025

AL: 30 DE OCTUBRE DE 2025

JULIO REYNEL MONROY PUERTO
RESIDENTE DE OBRA
INGECOM S&D S.A.S

INFORME SEMANAL DE OBRA

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	INGECOM S&D S.A.S	**Objeto**	MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS SEDES URIBE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL URIBE Y SAN ANTONIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PLINIO MENDOZA NEIRA, DEL MUNICIPIO DE TOCA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.
Contrato No.	083 DE 2025		
Valor Inicial:	$ 32.168.540,00		
Valor Actualizado:	$ 32.168.540,00	**Suspensión 1:**	N.A
Plazo Inicial:	DOS (2) MESES	**Suspensión 2:**	N.A
Prorroga No. 01:	N.A	**Ampliación a la suspensión 2:**	N.A
Plazo Actualizado:	DOS (2) MESES		
Fecha de Iniciación:	17 DE OCTUBRE DE 2025		
Fecha de Vencimiento:	16 DE DICIEMBRE DE 2025		

Semana Número: 1 Del: 17-oct Al: 19-oct Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 3 días


Nombre del Supervisor MARTHA LILIANA RACHEN CELY

AVANCE DEL CONTRATO

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	1,37%	1,37%	Obra Ejecutada (%)	0,00%	0,00%
Valor Obra programada:	$ 440.709,00	$ 440.709,00	Valor Obra Ejecutada:	$ -	$ -

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	0,00%	0,00%	
Durante el periodo	1,37%	0,00%	-1,37%
Acumulado actual	1,37%	0,00%	

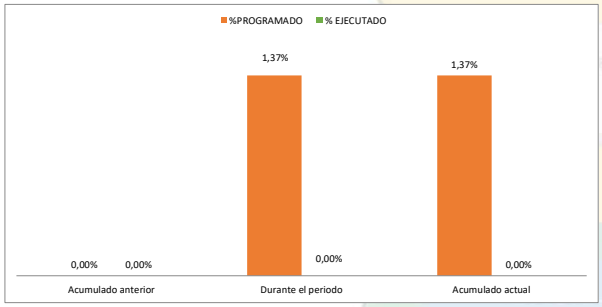

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DURANTE LA SEMANA

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

- No se realizaron actividades durante este periodo, esto debido a que estas se deben ejecutar en las instalaciones donde los estudiantes están recibiendo el plan alimentario escolar PAE, estas instalaciones corresponden a la cocinas y restaurantes de las instituciones educativas. Además de que dichas actividades no se pueden desarrollar de corrido debido a que las instalaciones están en usos por los estudiantes y funcionarios del PAE

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

- No se realizaron actividades durante este periodo, esto debido a que estas se deben ejecutar en las instalaciones donde los estudiantes están recibiendo el plan alimentario escolar PAE, estas instalaciones corresponden a la cocinas y restaurantes de las instituciones educativas. Además de que dichas actividades no se pueden desarrollar de corrido debido a que las instalaciones están en usos por los estudiantes y funcionarios del PAE

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

EL CONTRATO SE ENCUENTRA ACTUALMENTE EN EJECUCIÓN.

OBSERVACIONES

FIRMAS

Residente de Obra: _____
JULIO REYNEL MONROY PUERTO

Residente de supervisor: _____
MARTHA LILIANA RACHEN CELY

ALCALDÍA MUNICIPAL DE TOCA BOYACÁ

NIT. 800.099.642-6
Secretaria de Planeación y Obras Publicas

INFORME SEMANAL DE OBRA

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	INGECOM S&D S.A.S	**Objeto**	MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS SEDES URIBE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA RAFAEL URIBE Y SAN ANTONIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PLINIO MENDOZA NEIRA, DEL MUNICIPIO DE TOCA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.
Contrato No.	083 DE 2025		
Valor Inicial:	$ 32.168.540,00		
Valor Actualizado:	$ 32.168.540,00	**Suspensión 1:**	N.A
Plazo Inicial:	DOS (2) MESES	**Suspensión 2:**	N.A
Prorroga No. 01:	N.A	**Ampliación a la suspensión 2:**	N.A
Plazo Actualizado:	DOS (2) MESES		
Fecha de Iniciación:	17 DE OCTUBRE DE 2025		
Fecha de Vencimiento:	16 DE DICIEMBRE DE 2025		

Semana Número: 1 Del: 20-oct Al: 26-oct Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 10 días


Nombre del Supervisor MARTHA LILIANA RACHEN CELY

AVANCE DEL CONTRATO

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	3,73%	5,10%	Obra Ejecutada (%)	0,00%	0,00%
Valor Obra programada:	$ 1.199.887,00	$ 1.640.596,00	Valor Obra Ejecutada:	$ -	$ -

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	1,37%	0,00%	-5,10%
Durante el periodo	3,73%	0,00%	
Acumulado actual	5,10%	0,00%	

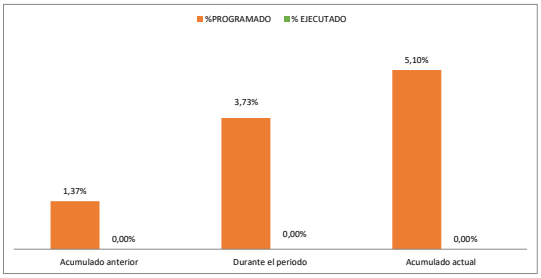

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DURANTE LA SEMANA

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

- No se realizaron actividades durante este periodo, esto debido a que estas se deben ejecutar en las instalaciones donde los estudiantes están recibiendo el plan alimentario escolar PAE, estas instalaciones corresponden a la cocinas y restaurantes de las instituciones educativas. Además de que dichas actividades no se pueden desarrollar de corrido debido a que las instalaciones están en usos por los estudiantes y funcionarios del PAE

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

- No se realizaron actividades durante este periodo, esto debido a que estas se deben ejecutar en las instalaciones donde los estudiantes están recibiendo el plan alimentario escolar PAE, estas instalaciones corresponden a la cocinas y restaurantes de las instituciones educativas. Además de que dichas actividades no se pueden desarrollar de corrido debido a que las instalaciones están en usos por los estudiantes y funcionarios del PAE

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

EL CONTRATO SE ENCUENTRA ACTUALMENTE EN EJECUCIÓN.

OBSERVACIONES

FIRMAS

Residente de Obra: _____
JULIO REYNEL MONROY PUERTO

Residente de supervisor: _____
MARTHA LILIANA RACHEN CELY

ALCALDÍA MUNICIPAL DE TOCA BOYACÁ

NIT. 800.099.642-6
Secretaria de Planeación y Obras Publicas

INFORME SEMANAL DE OBRA

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	INGECOM S&D S.A.S	**Objeto**	MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS SEDES URIBE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL URIBE Y SAN ANTONIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PLINIO MENDOZA NEIRA, DEL MUNICIPIO DE TOCA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.
Contrato No.	083 DE 2025		
Valor Inicial:	$ 32.168.540,00		
Valor Actualizado:	$ 32.168.540,00	**Suspensión 1:**	N.A
Plazo Inicial:	DOS (2) MESES	**Suspensión 2:**	N.A
Prorroga No. 01:	N.A	**Ampliación a la suspensión 2:**	N.A
Plazo Actualizado:	DOS (2) MESES		
Fecha de Iniciación:	17 DE OCTUBRE DE 2025		
Fecha de Vencimiento:	16 DE DICIEMBRE DE 2025		

Semana Número: 1 Del: 27-oct Al: 2-nov Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 17 días


Nombre del Supervisor MARTHA LILIANA RACHEN CELY

AVANCE DEL CONTRATO

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	3,89%	8,99%	Obra Ejecutada (%)	0,00%	0,00%
Valor Obra programada:	$ 1.251.356,00	$ 2.891.952,00	Valor Obra Ejecutada:	$ -	$ -

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	5,10%	0,00%	-8,99%
Durante el periodo	3,89%	0,00%	
Acumulado actual	8,99%	0,00%	

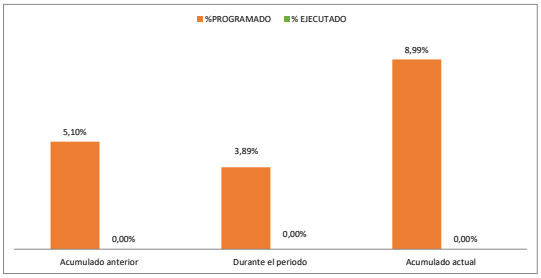

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DURANTE LA SEMANA

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

- No se realizaron actividades durante este periodo, esto debido a que estas se deben ejecutar en las instalaciones donde los estudiantes están recibiendo el plan alimentario escolar PAE, estas instalaciones corresponden a la cocinas y restaurantes de las instituciones educativas. Además de que dichas actividades no se pueden desarrollar de corrido debido a que las instalaciones están en usos por los estudiantes y funcionarios del PAE

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

- No se realizaron actividades durante este periodo, esto debido a que estas se deben ejecutar en las instalaciones donde los estudiantes están recibiendo el plan alimentario escolar PAE, estas instalaciones corresponden a la cocinas y restaurantes de las instituciones educativas. Además de que dichas actividades no se pueden desarrollar de corrido debido a que las instalaciones están en usos por los estudiantes y funcionarios del PAE

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

EL CONTRATO SE ENCUENTRA ACTUALMENTE EN EJECUCIÓN.

OBSERVACIONES

FIRMAS

Residente de Obra: _____
JULIO REYNEL MONROY PUERTO

Residente de supervisor: _____
MARTHA LILIANA RACHEN CELY

CERTIFICADO DE AVAL DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

Tunja, 31 de octubre de 2025

Señores
ALCALDÍA DE TOCA BOYACÁ
Arq. Martha Liliana Rachen Cely
Secretaria de Planeación
Toca, Boyacá

REFERENCIA: Certificado de aval del cumplimiento del pago de la seguridad social - CONTRATO N° 083 DE 2025 "MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS SEDES URIBE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL URIBE Y SAN ANTONIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PLINIO MENDOZA NEIRA, DEL MUNICIPIO DE TOCA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"

INGECOM S&D S.A.S certifica que durante el periodo de 17 de octubre al 31 de octubre del año 2025 del CONTRATO N° 083 DE 2025, todo el personal relacionado en la ejecución del contrato en mención estuvo debidamente afiliado y recibió el pago de las prestaciones sociales correspondientes, de acuerdo a la normativa vigente.

Atentamente

REPRESENTANTE LEGAL
NEIDER SUAREZ ALVARADO
C.C 23.292.660
INGECOM S&D S.A.S

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901366179	9	INGECOM S&D S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	TUNJA COMFABOY	CL 79 1 A 15 ESTE	TUNJA-BOYACA	3191009	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1910244126	9494489258	E	2025/11/21	2025/11/07	BANCOLOMBIA	0	$2,513,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Días	Codigo	Dias	Codigo	Días	Codigo	Días	Tarifa	Días	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: TUNJA COMFABOY (8 Afiliados)																																
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (6 Afiliados)																																
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (6 Afiliados)																																
1	CC	1049648253	CELY RINCON JUAN SEBASTIAN																			230301	30	EPS005	30	CCF10	30	14-11	30	6.960%	30	Si
2	CC	1049654120	GARZON GONZALEZ KAREN VIVIANA																			25-14	30	EPS005	30	CCF10	30	14-11	30	6.960%	30	Si
3	CC	7173173	RATIVA ROMERO LUIS ALEJANDRO		X																	230201	11	ESSC24	11	CCF10	11	14-11	11	6.960%	11	Si
4	CC	7162555	SUAREZ MORENO ANDRES	X	X																	230301	8	EPS017	8	CCF10	8	14-11	8	6.960%	8	Si
5	CC	23292660	SUAREZ ALVARADO NEIDER																			230301	30	EPS010	30	CCF10	30	14-11	30	6.960%	30	Si
6	CC	7163503	VARGAS AVILA FABIO																			230301	30	EPS010	30	CCF10	30	14-11	30	6.960%	30	Si
Centro de Trabajo: TUNJA OFICINA (2 Afiliados)																																
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (2 Afiliados)																																
7	CC	40022651	ALVARADO ACOSTA ODALINDA																				0	EPS010	30	CCF10	30	14-11	30	0.522%	30	Si
8	CC	1002698882	BOTIA FUENTES ANDRES FELIPE																			25-14	30	EPS010	30	CCF10	30	14-11	30	0.522%	30	Si
Total			**Afiliados(8)**																													

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901366179	9	INGECOM S&D S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	TUNJA COMFABOY	CL 79 1 A 15 ESTE	TUNJA-BOYACA	3191009	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1910244126	9494489258	E	2025/11/21	2025/11/07	BANCOLOMBIA	0	$2,513,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				7	$1,283,400	$0	$0	$1,283,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$455,600	$0	$0	$455,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$744,200	$0	$0	$744,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$83,600	$0	$0	$83,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$474,300	$0	$0	$474,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	8	$474,300	$0	$0	$474,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$378,100	$0	$0	$378,100
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	8	$378,100	$0	$0	$378,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				8	$378,100	$0	$0	$378,100
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$20,900	$0	$0	$20,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	4	$228,000	$0	$0	$228,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$15,200	$0	$0	$15,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$114,000	$0	$0	$114,000
TOTAL				8	$2,513,900	$0	$0	$2,513,900

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	4288493
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JULIO REYNEL MONROY PUERTO
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CENTRO	TELÉFONO:	7000000
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NO		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**4632599664**			TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES octubre AÑO 2025			PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES octubre AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	16				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/12/11			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9995083176

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.300	$ 0	$ 227.800	$ 2.300	$ 230.100
SUBTOTALES:										**$ 227.800**	**$ 2.300**	**$ 230.100**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 1.800	$ 0	$ 178.000	$ 1.800	$ 0	$ 179.800
SUBTOTALES:													**$ 178.000**	**$ 1.800**	**$ 0**	**$ 179.800**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES										
																													PENSIÓN									SALUD							ARP																		
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																														SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																													
1	CC 4288493	MONROY PUERTO JULIO REYNEL	INDEPEND		$ 4.300.000				NO								01-30										230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000			$ 0		$ 0	$ 0	$ 0		$ 0			$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 409.900

Planilla Pagada
