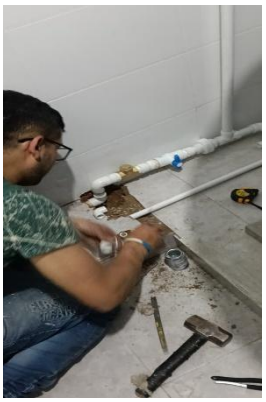

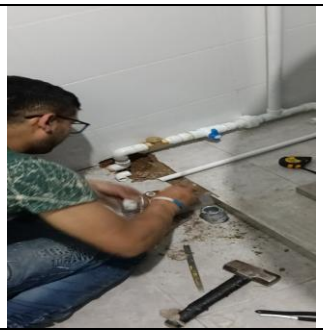
**INFORME MANTENIMIENTOS MENORES MARZO 2026**

| Acciones implementadas | Antes | Después |
|---|---|---|
| Se realizo exploración en piso área tanque de reserva, ya que se encontraba una mala instalación.<br><br>accesorios, salida del agua del tanque aéreo.<br><br>° Se realizó instalaciones de cheque de ½" a la entrada del edificio |  |  |
| Se realizó reforma de tubería de 1" y tubería de<br>½" con los siguientes cambios: cambio de cheque de 1" de registro de 1", 150 de tubería de 1", |  |  |
| En la entrada de agua hacia el tanque aéreo, se instalaron 1.50 de tubería de ½" con su respectivo registro, las universales y cambio de flotador de |  |  |
| entrada del tanque, ya que se encontraba deteriorado y no estaba dando el sellado adecuado |  |  |

**INFORME MANTENIMIENTOS MENORES MARZO 2026**
