INFORME FINAL DE INTERVENTORIA

REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL, ADMINISTRATIVA, TECNICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BASICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACION PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACA.

CONTRATISTA DE OBRA:
ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO

DICIEMBRE 2025

TOMO 2

MUNICIPIO DE PAYA

NIT 800065411-5
Calle 3 No 3 - 45 C.P. 155330
Administración Central

Fecha : 31/12/2025

Comprobante de Egreso No. 1872

C.C./NIT. : 901267589 **Beneficiario** : R. T. PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.
Cta. Cte. No. : 415163014632
Banco : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. - Cta. 4-1516-301-463-2 Maestra SGP Agua Potable
Referencias : CDP : 431, CRP : 1049, OP : 2077
Concepto : LIQUIDACION DEL ADICIONAL 01 AL CONTRATO MP-CMA-001 DE 2025. (22/09/2025). REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL, ADMINISTRATIVA, TECNICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BASICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACION PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACA.

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
240102	Proyectos de inversión	6.478.450,00	
111006	Cuenta de ahorro		6.478.450,00
Total Documento:		6.478.450,00	6.478.450,00

TOTAL : SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS (6.478.450,00)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
T.EL00239	TRANSF ELET. 41516301463-2	R. T. PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.	6.478.450,00

TOTAL DESCUENTOS APLICADOS

Descuentos	Base	Valor
RETENCION EN LA FUENTE A TITULO DE IVA	446.500,00	67.000,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	6.777.500,00	136.000,00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 4%	6.777.500,00	271.000,00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION - 2%	6.777.500,00	136.000,00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	6.777.500,00	135.550,00
Total Descuentos		745.550,00

* Nota: Los descuentos corresponden al total en la orden de pago más no al valor proporcional del egreso

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

ID	Código	Descripción	Valor
9190	23201010010316-03-1331000-01-40031400-202400000006862	Construcción y mejoramiento de unidades sanitarias - FTE: R.B. SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO -	7.224.000,00
Total Rubros			7.224.000,00

REPRESENTANTE LEGAL
o JEFE DE LA UNIDAD

GUILLERMO PARRA FUENTES
Secretaria de Hacienda

FIRMA BENEFICIARIO

1049619184.
Identidad: C.C o NIT
Cel. o Tel.

Documento elaborado por 4204692

MUNICIPIO DE PAYA

NIT 800065411-5
Calle 3 No 3 - 45 C.P. 155330
Administración Central

LIQUIDACIÓN DE CUENTAS

Fecha : 31/12/2025

Orden de Pago No. 2077

C.C/NIT. : 901267589
Beneficiario : R. T. PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.
Referencias : CDP : 431, CRP : 1049
Descripción : LIQUIDACION DEL ADICIONAL 01 AL CONTRATO MP-CMA-001 DE 2025. (22/09/2025). REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL, ADMINISTRATIVA, TECNICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BASICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACION PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACA.

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	6.777.500,00
Valor IVA	446.500,00
SubTotal	7.224.000,00
Descuentos	**Valor**
RETENCION EN LA FUENTE A TITULO DE IVA	67.000,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	136.000,00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 4%	271.000,00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION - 2%	136.000,00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	135.550,00
Total Descuentos	745.550,00
Neto a Pagar	6.478.450,00

TOTAL : SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS (6.478.450,00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 1049 Fecha : 22/09/2025

ID	Código	Descripción	Valor
9190	23201010010316-03-1331000-01-40031400-202400000006862	Construcción y mejoramiento de unidades sanitarias - FTE: R.B. SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - DEP: Alcaldia - SEC: Vivienda, Ciudad Y Territorio - PROG: Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico - SUBP: Intersubsectorial Vivienda y Desarrollo territorial	7.224.000,00

TESORERÍA

Cheque No. : _____ Fecha : _____

Banco : 415163014632 - Cta. 4-1516-301-463-2 Maestra SGP Agua Potable BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. - 410

REPRESENTANTE LEGAL
o JEFE DE LA UNIDAD

GUILLERMO PARRA FUENTES
Secretario de Hacienda

FIRMA BENEFICIARIO

1049619184.
Identidad: C.C o NIT
Cel. o Tel.

Documento elaborado por 4204692

R.T. PROYECTOS DE INGENIERÍA S.A.S

Factura Electrónica De Venta No

No. 73

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764094254166 que habilita desde 65 hasta 75. Vence 2026-06-10

R.T. PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S

Nit 901267589 0

Pertenecemos al Regimen Simple de Tributación
No somos Agentes de Retención de IVA
Actividad Económica ICA 7112 1000.00 X 1000

CLIENTE	MINICIPIO DE PAYA
NIT	800065411 5

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 3 3 45	Paya	3202838493

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
30/12/2025	30/12/2025

POR CONCEPTO DE

PAGO ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO MP-CMA-001 DE 2025 CUYO OBJETO ES: REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL, ADMINISTRATIVA, TECNICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
VENDEDOR 1	Credito

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
,00	BIENES Y SERVICIOS	1	2.350.000	19%	446.500,00	2.350.000
2,00	PERSONAL	1	4.427.500	0%	0,00	4.427.500

Total Items 2

Valor en Letras

SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**6.777.500,00**
IVA	**446.500,00**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**7.224.000,00**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 30/12/2025 07:44:05

CARRERA 3 23 20 BQ 5 APT 504 Teléfono 3138111742

Correo Electrónico proyectosjrt@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 0bf8f0461c70800b72d91bfc386d430f5099a2c96a4ab47a715735e9bec4b240f9c03ed2ce4c712bd9c2d206c75cae24 --Fecha y Hora de Expedición : 30/12/2025 10:41:00 a. m.

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

TUNJA, BOYACA, 18/07/2023

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **R.T. PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.** con **NIT 901.267.589-0** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número 108900043465

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CÁMARA DE COMERCIO DE TUNJA

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 01/10/2025 - 09:59:33
Recibo No. S001067886, Valor 11600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 4CNgsJyf64

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=38 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón Social : R.T. PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.
Nit : 901267589-0
Domicilio: Tunja, Boyacá

MATRÍCULA

Matrícula No: 169391
Fecha de matrícula: 21 de marzo de 2019
Ultimo año renovado: 2025
Fecha de renovación: 31 de marzo de 2025
Grupo NIIF : GRUPO III - MICROEMPRESAS

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal : CR 3 23 20BL 5AP 504
Barrio : FUENTE HIGUERAS
Municipio : Tunja, Boyacá
Correo electrónico : proyectosjrt@gmail.com
Teléfono comercial 1 : 3138111742
Teléfono comercial 2 : 3176326863
Teléfono comercial 3 : No reportó.

Dirección para notificación judicial : CR 3 23 20BL 5AP 504
Barrio : FUENTE HIGUERAS
Municipio : Tunja, Boyacá
Correo electrónico de notificación : proyectosjrt@gmail.com
Teléfono para notificación 1 : 3138111742
Teléfono para notificación 2 : 3176326863

La persona jurídica **SI** autorizó para recibir notificaciones personales a través del correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y del 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Por documento privado del 13 de marzo de 2019 de la Asamblea Constitutiva de Tunja, inscrito en esta Cámara de Comercio el 21 de marzo de 2019, con el No. 31562 del Libro IX, se constituyó la persona jurídica de naturaleza comercial denominada R.T. PROYECTOS

DE INGENIERIA S.A.S.

REFORMAS ESPECIALES

Por documento privado del 13 de marzo de 2019 de la Accionista Único de Tunja, inscrito en esta Cámara de Comercio el 21 de marzo de 2019, con el No. 31563 del Libro IX, se decretó la comunicación que se ha configurado una situación de control : SITUACIÓN DE CONTROL MATRIZ. CONTROLANTE JUAN RICARDO TORRES ORTIZ C.C. 7.178.662 POR POSEER EL 100% DEL CAPITAL SUSCRITO DE LA SOCIEDAD

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

Objeto social. Por la facultad que confiere la ley 1258 de 2008, la cual determina que las sociedades por acciones simplificadas podran tener un objeto social indefinido, se establece que la presente sociedad podra ejecutar por virtud de lo anterior toda clase actos mercantiles licitos, teniendo como su actividad principal la siguiente: A. Celebrar contratos para los estudios, diseños y consultoria de proyectos de ingenieria civil y de arquitectura. B. Celebrar contratos para interventoria integral y la supervision y control de proyectos de construccion de obras civiles y arquitectonicas, edificaciones, infraestructura de servicios publicos basicos, de obras de infraestructura vial, de obras de saneamiento basico, de acueductos y alcantarillados y de plantas de tratamiento, de obras de estabilizacion de suelos y de geotecnia en general. C. Celebrar contratos para los estudios, diseños e interventoria de proyectos de vivienda de interes social, prioritaria y en general todo tipo de vivienda. D. Celebrar contratos para la construccion de obras civiles, de arquitectura, de vivienda de interes social, prioritaria y en general todo tipo de vivienda. D. Celebrar contratos para servicios de planeamiento urbanistico y ordenacion del territorio, planes generales, normas subsidiarias de planeamiento, planes parciales, estudios de detalle, programas de actuacion urbanistica, proyectos de delimitacion de suelo urbano, proyectos de parcelacion, proyectos de delimitacion de poligonos o de unidades de ejecucion o de actuacion, proyectos de compensacion, planes territoriales, planes de accesibilidad y urbanizaciones, a nivel de construccion y juridico, asi como la comercializacion de al por mayor y al detal de articulos de materiales de construccion, articulos de ferreteria, pinturas y productos de vidrio en y madera. Asi mismo, esta sociedad podra realizar cualquier otra actividad economica licita tanto en colombia como en el extranjero. La sociedad podra llevar a cabo, en general, todas las operaciones, de cualquier naturaleza que ellas fueren, relacionadas con el objeto mencionado, asi como cualesquiera actividades similares, conexas o complementarias o que permitan facilitar o desarrollar el comercio o la industria de la sociedad.

CAPITAL

* CAPITAL AUTORIZADO *

Valor	$ 100.000.000,00
No. Acciones	200,00
Valor Nominal Acciones	$ 500.000,00

* CAPITAL SUSCRITO *

Valor	$ 50.000.000,00
No. Acciones	100,00
Valor Nominal Acciones	$ 500.000,00

* CAPITAL PAGADO *

Valor	$ 50.000.000,00
No. Acciones	100,00
Valor Nominal Acciones	$ 500.000,00

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

Facultades del representante legal. La representacion legal de la sociedad por acciones simplificada estara a cargo del accionista unico, quien no tendra suplentes, designado para el mismo termino de duracion de la sociedad, es decir por un termino indefinido. La sociedad sera gerenciada, administrada y representada legalmente ante terceros por el representante legal, quien no tendra restricciones de contratacion por razon de la naturaleza ni de la cuantia de los actos que celebre. Por lo tanto, se entendera que el representante legal podra celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad. El representante legal se entendera investido de los mas amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedara obligada por los actos y contratos celebrados por el representante legal.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta No. 02 del 29 de febrero de 2024 de la Asamblea General Extraordinaria De Accionistas, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 11 de marzo de 2024 con el No. 42260 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL	DANIEL ALBERTO TORRES ORTIZ	C.C. No. 1.049.619.184

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los Actos Administrativos de registro quedan en firme, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la CÁMARA DE COMERCIO DE TUNJA, los sábados **NO** son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los Actos Administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

SITUACIONES DE CONTROL Y GRUPOS EMPRESARIALES

Por documento privado del 13 de marzo de 2019 de la Accionista Único , inscrito en esta Cámara de Comercio el 21 de marzo de 2019, con el No. 31563 del Libro IX, se inscribió la comunicación que se ha configurado una situación de control : Situación de control matriz. Controlante juan ricardo torres ortiz c.C. 7.178.662 Por poseer el 100% del capital suscrito de la sociedad.
** **EMPRESA MATRIZ / CONTROLANTE** : JUAN RICARDO TORRES ORTIZ
SOCIO ACCIONISTA
Identificación: 7178662
Nacionalidad: COLOMBIANO/A
Domicilio: 15001 - Tunja
Dirección : Cra. 1 No. 23A 03 apartamento 1
País: Colombia
CIIU : M7112 - Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica
CIIU : F4220 - Construccion de proyectos de servicio publico
CIIU : F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
CIIU : F4111 - Construccion de edificios residenciales
Fecha de configuración de la situación: 13/03/2019
Presupuesto que da lugar a la situación de control y/o al grupo empresarial: "Artículo 2.2.2.41.6.1 Decreto 1074 de 2015 adicionado por el artículo 1 Decreto 667 de 2018" Numeral 1 Articulo 261 del Código de Comercio. Que se ha configurado una situación de control con la sociedad de la referencia.

** **EMPRESA SUBORDINADA / CONTROLADA** : R.T. PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.
Domicilio: Tunja, Boyacá

País: Colombia

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: M7112
Actividad secundaria Código CIIU: F4220
Otras actividades Código CIIU: F4290 F4111

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es MICRO EMPRESA.

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : $578.878.788,00
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : M7112.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DE TUNJA contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

DIXYE TATIANA
GUZMAN SANABRIA

*** FINAL DEL CERTIFICADO ***

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141171220151

(415)7707212489984(8020) 000014117122015 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 2 6 7 5 8 9	0	Impuestos y Aduanas de Tunja 2 0	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
R.T. PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Boyacá 1 5	Tunja 0 0 1

41. Dirección principal
CR 3 23 20 BL 5 AP 504

42. Correo electrónico proyectosjrt@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 3 8 1 1 1 7 4 2	3 1 7 6 3 2 6 8 6 3

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 1 9 0 3 2 1	4 2 2 0	2 0 1 9 0 3 2 1	7 0 1 0	4 1 1 1		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 7 14 42 47 48 52 55

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
47 - Régimen Simple de Tributación - SIM
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio 1	2	3
		57. Modo		
		58. CPC		

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre TORRES ORTIZ DANIEL ALBERTO

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 01-04-2025 09:32:52PM

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141171220151

(415)7707212489984(8020) 000014117122015 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 2 6 7 5 8 9	0	Impuestos y Aduanas de Tunja 2 0	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 1 9 0 3 1 3	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 9 0 3 2 1	
77. No. Matrícula mercantil	1 6 9 3 9 1	
78. Departamento	1 5	
79. Ciudad/Municipio	3 8	
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 9 0 3 2 1	
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 1 9 0 3 2 1		-
2	1 2 5	2 0 2 2 0 2 2 5		-
3	4 9	2 0 1 9 0 3 2 1		-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141171220151

(415)7707212489984(8020) 000014117122015 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 2 6 7 5 8 9	0	Impuestos y Aduanas de Tunja	2 0

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 4 0 3 1 1

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadani 1 3	1 0 4 9 6 1 9 1 8 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
TORRES	ORTIZ	DANIEL	ALBERTO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Página 4 de 4 Hoja 5

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141171220151

(415)7707212489984(8020) 000014117122015 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 2 6 7 5 8 9	0	Impuestos y Aduanas de Tunja	2 0

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 4 9 6 3 5 7 4 6	0	2 3 9 7 3 1 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
HERNANDEZ	BOSIGA	WINDY	NEYBRITH

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 3 0 3 0 1

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764094254166

(415)7707212489984(8020) 001876409425416 6

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 2 6 7 5 8 9	0				

11. Razón social
R.T. PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.

12. Dirección seccional
Impuestos y Aduanas de Tunja

Cód. 2 0

24. Dirección
CR 3 23 20 BL 5 AP 504

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Boyacá	Tunja

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 000165 del 01/11/2023, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

El formato oficial 1876 Autorización numeración de facturación es único e intransferible, solo surte efecto durante la vigencia para el titular del mismo, por ende, su custodia y divulgación es exclusiva responsabilidad del facturador. El uso no autorizado del formato o su adulteración puede tener consecuencias de tipo penal.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

Firma del funcionario autorizado

DIAN
2025-06-10 / 06:24:33 PM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia
990. Lugar administrativo SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres TORRES ORTIZ DANIEL ALBERTO
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación 1049619184 1004. DV 4
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización R.T. PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.

997. Fecha formalización 2025-06-10 18:24:33

AUTORIZADO

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764094254166

(415)7707212489984(8020) 001876409425416 6

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
901267589	0				

11. Razón social

R.T. PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	R.T. PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S. CR 3 23 20 BL 5 AP 504	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4		65	75	12	HABILITACIÓN	2
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901267589
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			R.T. PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CRA. 11 NO. 20 - 24 OF. 202	TELÉFONO:	7403188
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7992905500			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	octubre	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	noviembre	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	1						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/11/26			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1955836163		

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 300	$ 0	$ 320.000	$ 300	$ 320.300
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 113.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 100	$ 0	$ 113.900	$ 100	$ 114.000
SUBTOTALES:										$ 433.900	$ 400	$ 434.300

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 250.000	$ 0	$ 200	$ 0	$ 250.000	$ 200	$ 0	$ 250.200
SUBTOTALES:													$ 250.000	$ 200	$ 0	$ 250.200

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	2		$ 0	$ 0		$ 0	$ 146.700	$ 146.700	$ 100	$ 0	$ 146.800
SUBTOTALES:									$ 146.700	$ 100	$ 0	$ 146.800

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF10	CCF10-COMFABOY	2	$ 108.500	$ 100	$ 108.600
SUBTOTALES:			$ 108.500	$ 100	$ 108.600

TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
PAICBF	PAICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	1	$ 60.000	$ 100	$ 60.100
PASENA	PASENA - SENA	1	$ 40.000	$ 100	$ 40.100
SUBTOTALES:			$ 100.000	$ 200	$ 100.200

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																												PENSIÓN							SALUD						ARP										CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 7178662	TORRES ORTIZ JUAN RICARDO	DEPEND		$ 2.000.000	FIJO		NO																		230201-PROTECCION	30	$ 2.000.000	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 320.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.000.000	$ 250.000	$ 0	$ 250.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.000.000	$ 139.200	30	$ 2.000.000	CCF10-COMFABOY	$ 80.000	$ 40.000	$ 60.000	$ 0	$ 0
2	CC 74377300	DIAZ CIFUENTES FABIO NELSON	COT. TIEMPO PARCIAL		$ 1.423.500			NO																		25-14 COLPENSIONES	10	$ 711.750	$ 113.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 113.900			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500	$ 7.500	10	$ 711.750	CCF10-COMFABOY	$ 28.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 1.040.100

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901267589
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		R.T. PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S	
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CRA. 11 NO. 20 - 24 OF. 202	TELÉFONO:	7403188
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA							
NÚMERO PLANILLA:	7988173678			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES septiembre	AÑO 2025		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES octubre	AÑO 2025	
DÍAS DE MORA:	8						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/10/30			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1889280705		

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.600	$ 0	$ 320.000	$ 1.600	$ 321.600
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 113.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 600	$ 0	$ 113.900	$ 600	$ 114.500
SUBTOTALES:										$ 433.900	$ 2.200	$ 436.100

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 250.000	$ 0	$ 1.300	$ 0	$ 250.000	$ 1.300	$ 0	$ 251.300
SUBTOTALES:													$ 250.000	$ 1.300	$ 0	$ 251.300

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	2		$ 0	$ 0		$ 0	$ 146.700	$ 146.700	$ 800	$ 0	$ 147.500
SUBTOTALES:									$ 146.700	$ 800	$ 0	$ 147.500

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF10	CCF10-COMFABOY	2	$ 108.500	$ 600	$ 109.100
SUBTOTALES:			$ 108.500	$ 600	$ 109.100

TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
PAICBF	PAICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	1	$ 60.000	$ 300	$ 60.300
PASENA	PASENA - SENA	1	$ 40.000	$ 200	$ 40.200
SUBTOTALES:			$ 100.000	$ 500	$ 100.500

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES							
							COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN						SALUD						ARP						CCF			SENA	ICBF	ESAP	MINEDU	
																										FSP																											
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO																				ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 7178662	TORRES ORTIZ JUAN RICARDO	DEPEND		$ 2.000.000	FIJO			NO																230201-PROTECCION	30	$ 2.000.000	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 320.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.000.000	$ 250.000	$ 0	$ 250.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.000.000		$ 139.200	30	$ 2.000.000	CCF10-COMFABOY	$ 80.000	$ 40.000	$ 60.000	$ 0	$ 0
2	CC 74377300	DIAZ CIFUENTES FABIO NELSON	COT. TIEMPO PARCIAL		$ 1.423.500				NO																25-14 COLPENSIONES	10	$ 711.750	$ 113.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 113.900			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 7.500	10	$ 711.750	CCF10-COMFABOY	$ 28.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO:	$ 1.044.500

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901267589
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			R.T. PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CRA. 11 NO. 20 - 24 OF. 202	TELÉFONO:	7403188
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7984422088	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	agosto	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	septiembre	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:		4					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/09/23		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1795775207	

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 900	$ 0	$ 320.900		$ 320.900
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 113.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 300	$ 0	$ 113.900	$ 300	$ 114.200
SUBTOTALES:										$ 433.900	$ 1.200	$ 435.100

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 250.000	$ 0	$ 700	$ 0	$ 250.000	$ 700	$ 0	$ 250.700
SUBTOTALES:													$ 250.000	$ 700	$ 0	$ 250.700

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	2		$ 0	$ 0		$ 0	$ 146.700	$ 146.700	$ 400	$ 0	$ 147.100
SUBTOTALES:									$ 146.700	$ 400	$ 0	$ 147.100

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF10	CCF10-COMFABOY	2	$ 108.500	$ 300	$ 108.800
SUBTOTALES:			$ 108.500	$ 300	$ 108.800

TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
PAICBF	PAICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	1	$ 60.000	$ 200	$ 60.200
PASENA	PASENA - SENA	1	$ 40.000	$ 200	$ 40.200
SUBTOTALES:			$ 100.000	$ 400	$ 100.400

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																					PARAFISCALES					
																											PENSIÓN							SALUD							ARP													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 7178662	TORRES ORTIZ JUAN RICARDO	DEPEND		$ 2.000.000	FIJO			NO																		230201-PROTECCION	30	$ 2.000.000	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 320.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.000.000	$ 250.000	$ 0	$ 250.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.000.000		$ 139.200	30	$ 2.000.000	CCF10-COMFABOY	$ 80.000	$ 40.000	$ 60.000	$ 0	$ 0
2	CC 74377300	DIAZ CIFUENTES FABIO NELSON	COT. TIEMPO PARCIAL		$ 1.423.500				NO																		25-14 COLPENSIONES	10	$ 711.750	$ 113.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 113.900			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 7.500	10	$ 711.750	CCF10-COMFABOY	$ 28.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO:	$ 1.042.100

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901267589
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			R.T. PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CRA. 11 NO. 20 - 24 OF. 202	TELÉFONO:	7403188
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7980201435			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES julio	AÑO 2025		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES agosto	AÑO	2025
DÍAS DE MORA:	1						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/08/26			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1727129627		

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 300	$ 0	$ 320.000	$ 300	$ 320.300
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 113.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 100	$ 0	$ 113.900	$ 100	$ 114.000
SUBTOTALES:										$ 433.900	$ 400	$ 434.300

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 250.000	$ 0	$ 200	$ 0	$ 250.000	$ 200	$ 0	$ 250.200
SUBTOTALES:													$ 250.000	$ 200	$ 0	$ 250.200

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	2		$ 0	$ 0		$ 0	$ 146.700	$ 146.700	$ 100	$ 0	$ 146.800
SUBTOTALES:									$ 146.700	$ 100	$ 0	$ 146.800

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF10	CCF10-COMFABOY	2	$ 108.500	$ 100	$ 108.600
SUBTOTALES:			$ 108.500	$ 100	$ 108.600

TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
PAICBF	PAICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	1	$ 60.000	$ 100	$ 60.100
PASENA	PASENA - SENA	1	$ 40.000	$ 100	$ 40.100
SUBTOTALES:			$ 100.000	$ 200	$ 100.200

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES									
																										PENSIÓN								SALUD								ARP					CCF			SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 7178662	TORRES ORTIZ JUAN RICARDO	DEPEND		$ 2.000.000	FIJO			NO																	230201-PROTECCION	30	$ 2.000.000	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 320.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.000.000	$ 250.000	$ 0	$ 250.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.000.000		$ 139.200	30	$ 2.000.000	CCF10-COMFABOY	$ 80.000	$ 40.000	$ 60.000	$ 0	$ 0
2	CC 74377300	DIAZ CIFUENTES FABIO NELSON	COT. TIEMPO PARCIAL		$ 1.423.500				NO																	25-14 COLPENSIONES	10	$ 711.750	$ 113.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 113.900			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 7.500	10	$ 711.750	CCF10-COMFABOY	$ 28.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO:	$ 1.040.100

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901267589
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			R.T. PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CRA. 11 NO. 20 - 24 OF. 202	TELÉFONO:	7403188
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7976752613			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES junio	AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES julio	AÑO	2025
DÍAS DE MORA:	1						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/07/22			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1646472892		

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 113.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 100	$ 0	$ 113.900	$ 100	$ 114.000
230201	230201- PROTECCION	1	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 200	$ 0	$ 320.000	$ 200	$ 320.200
SUBTOTALES:										$ 433.900	$ 300	$ 434.200

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 250.000	$ 0	$ 200	$ 0	$ 250.000	$ 200	$ 0	$ 250.200
SUBTOTALES:													$ 250.000	$ 200	$ 0	$ 250.200

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	2		$ 0	$ 0		$ 0	$ 146.700	$ 146.700	$ 100	$ 0	$ 146.800
SUBTOTALES:									$ 146.700	$ 100	$ 0	$ 146.800

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF10	CCF10-COMFABOY	2	$ 108.500	$ 100	$ 108.600
SUBTOTALES:			$ 108.500	$ 100	$ 108.600

TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
PAICBF	PAICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	1	$ 60.000	$ 100	$ 60.100
PASENA	PASENA - SENA	1	$ 40.000	$ 100	$ 40.100
SUBTOTALES:			$ 100.000	$ 200	$ 100.200

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																											PENSIÓN							SALUD							ARP													
																													FSP		APORTES VOLUNTARIOS																CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	ICE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 7178662	TORRES ORTIZ JUAN RICARDO	DEPEND		$ 2.000.000	FIJO		NO																		230201-PROTECCION	30	$ 2.000.000	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 320.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.000.000	$ 250.000	$ 0	$ 250.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.000.000		$ 139.200	30	$ 2.000.000	CCF10-COMFABOY	$ 80.000	$ 40.000	$ 60.000	$ 0	$ 0
2	CC 74377300	DIAZ CIFUENTES FABIO NELSON	COT. TIEMPO PARCIAL		$ 1.423.500			NO																		25-14 COLPENSIONES	10	$ 711.750	$ 113.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 113.900			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 7.500	10	$ 711.750	CCF10-COMFABOY	$ 28.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 1.040.000

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901267589
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		R.T. PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S	
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CRA. 11 NO. 20 - 24 OF. 202	TELÉFONO:	7403188
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7972197666		TIPO DE PLANILLA:				E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	mayo AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	junio AÑO		2025
DÍAS DE MORA:	3						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/06/27		NÚMERO AUTORIZACIÓN:				1583184421

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 700	$ 0	$ 320.000	$ 700	$ 320.700
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 113.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 300	$ 0	$ 113.900	$ 300	$ 114.200
SUBTOTALES:										$ 433.900	$ 1.000	$ 434.900

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
CCFC55	CCFC55- CAJACOPI EPS S.A.S	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 250.000	$ 0	$ 500	$ 0	$ 250.000	$ 500	$ 0	$ 250.500
SUBTOTALES:													$ 250.000	$ 500	$ 0	$ 250.500

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	2		$ 0	$ 0		$ 0	$ 146.700	$ 146.700	$ 300	$ 0	$ 147.000
SUBTOTALES:									$ 146.700	$ 300	$ 0	$ 147.000

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF10	CCF10-COMFABOY	2	$ 108.500	$ 300	$ 108.800
SUBTOTALES:			$ 108.500	$ 300	$ 108.800

TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
PAICBF	PAICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	1	$ 60.000	$ 200	$ 60.200
PASENA	PASENA - SENA	1	$ 40.000	$ 100	$ 40.100
SUBTOTALES:			$ 100.000	$ 300	$ 100.300

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES										
																													PENSIÓN								SALUD						ARP						CCF			SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 7178662	TORRES ORTIZ JUAN RICARDO	DEPEND		$ 2.000.000	FIJO		NO																		230201-PROTECCION	30	$ 2.000.000	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 320.000	CCFC55-CAJACOPI EPS S.A.S	30	$ 2.000.000	$ 250.000	$ 0	$ 250.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.000.000		$ 139.200	30	$ 2.000.000	CCF10-COMFABOY	$ 80.000	$ 40.000	$ 60.000	$ 0	$ 0
2	CC 74377300	DIAZ CIFUENTES FABIO NELSON	COT. TIEMPO PARCIAL		$ 1.423.500			NO																		25-14 COLPENSIONES	10	$ 711.750	$ 113.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 113.900			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 7.500	10	$ 711.750	CCF10-COMFABOY	$ 28.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 1.041.500

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901267589
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		R.T. PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S	
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CRA. 11 NO. 20 - 24 OF. 202	TELÉFONO:	7403188
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7968662931	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS				
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES abril AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES mayo AÑO 2025				
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/05/20	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1494359334				

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 113.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 113.900	$ 0	$ 113.900
230201	230201- PROTECCION	1	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 320.000	$ 0	$ 320.000
SUBTOTALES:										$ 433.900	$ 0	$ 433.900

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
CCFC55	CCFC55- CAJACOPI EPS S.A.S	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 250.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 250.000	$ 0	$ 0	$ 250.000
SUBTOTALES:													$ 250.000	$ 0	$ 0	$ 250.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	2		$ 0	$ 0		$ 0	$ 146.700	$ 146.700	$ 0	$ 0	$ 146.700
SUBTOTALES:									$ 146.700	$ 0	$ 0	$ 146.700

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF10	CCF10-COMFABOY	2	$ 108.500	$ 0	$ 108.500
SUBTOTALES:			$ 108.500	$ 0	$ 108.500

TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
PAICBF	PAICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	1	$ 60.000	$ 0	$ 60.000
PASENA	PASENA - SENA	1	$ 40.000	$ 0	$ 40.000
SUBTOTALES:			$ 100.000	$ 0	$ 100.000

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																												PENSIÓN							SALUD						ARP					CCF			SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 7178662	TORRES ORTIZ JUAN RICARDO	DEPEND		$ 2.000.000	FIJO			NO																		230201-PROTECCION	30	$ 2.000.000	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 320.000	CCFC55-CAJACOPI EPS S.A.S	30	$ 2.000.000	$ 250.000	$ 0	$ 250.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.000.000		$ 139.200	30	$ 2.000.000	CCF10-COMFABOY	$ 80.000	$ 40.000	$ 60.000	$ 0	$ 0
2	CC 74377300	DIAZ CIFUENTES FABIO NELSON	COT. TIEMPO PARCIAL		$ 1.423.500				NO																		25-14 COLPENSIONES	10	$ 711.750	$ 113.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 113.900			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 7.500	10	$ 711.750	CCF10-COMFABOY	$ 28.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO:	$ 1.039.100

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 01 de diciembre de 2025, a las 09:13:57, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Número de identificación tributario
No. Identificación	9012675890
Código de Verificación	901267589025120109135 7

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

PROCURADURIA
GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 285292651

PIB
09:15:18

Bogotá DC, 01 de diciembre del 2025

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), la persona R.T. PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S. identificado(a) con NIT número 9012675890:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Carlos William Rodríguez Millán
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 09:16:26 AM horas del 01/12/2025, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía Nº 9012675890

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

DIJIN

Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-atc@policia.gov.co

Presidencia de la República
Ministerio de Defensa Nacional
Portal Único de Contratación
GOV.CO



REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 1.049.619.184

TORRES ORTIZ

APELLIDOS

DANIEL ALBERTO

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 24-ABR-1989

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.64 ESTATURA

O+ G.S. RH

M SEXO

27-DIC-2007 TUNJA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA

A-0700100-01318680-M-1049619184-20220914 0085270331A 1 8505209954

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 01 de diciembre de 2025, a las 08:47:05, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1049619184
Código de Verificación	1049619184251201084704

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 285291323

PIB
09:05:40

Bogotá DC, 01 de diciembre del 2025

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) DANIEL ALBERTO TORRES ORTIZ identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 1049619184:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Carlos William Rodríguez Millán
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 09:09:37 AM horas del 01/12/2025, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía Nº **1049619184**

Apellidos y Nombres: **TORRES ORTIZ DANIEL ALBERTO**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

DIJIN

Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-atc@policia.gov.co

Policía Nacional de Colombia

(Default.aspx)

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 01/12/2025 09:07:53 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. **1049619184 .**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **128003873** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir

ACTA DE LIQUIDACION

FECHA PRESENTE ACTA:	30 DE DICIEMBRE DE 2025
CONTRATO:	MP-CMA-001 DE 2025
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE PAYA
REPRESENTANTE LEGAL:	JUVENAL PEREZ VEGA
CARGO:	ALCALDE MUNICIPAL
NIT /C.C	800.065.411-5
CONTRATISTA:	R.T. PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.
NIT /C.C	901.267.589-0
R. LEGAL:	DANIEL ALBERTO TORRES ORTIZ
CEDULA:	1.049.619.184 de Tunja
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	LADY PAOLA GARAVITO MARIÑO Secretaria de Planeacion y Desarrollo Municipal
OBJETO:	REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL, ADMINISTRATIVA, TECNICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BASICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACION PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACA.
FECHA DE INICIO:	21 DE ABRIL DE 2025
VALOR INICIAL:	SETENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS ($ 72.325.680) M/CTE
VALOR ADICIONAL No. 1:	TREINTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS ($ 36.205.680,00) M/CTE
VALOR TOTAL:	CIENTO OCHO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS ($108.531.360,00)
PLAZO DE EJECUCION:	CINCO (5) MESES
PRORROGA No. 1:	DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DIAS
PRORROGA No. 2:	DIEZ (10) DIAS
DURACION TOTAL:	SIETE (7) MESES Y VEINTICINCO (25) DIAS
FECHA DE TERMINACIÓN:	15 DE DICIEMBRE DE 2025

En el municipio de Paya-Boyacá, a los treinta (30) días del mes de diciembre de 2025 se reunieron: El Doctor JUVENAL PEREZ VEGA en su condición de Alcalde, la Ingeniera LADY PAOLA GARAVITO MARIÑO, Secretaria de Planeación y Desarrollo en condición de supervisora del contrato y el señor DANIEL ALBERTO TORRES ORTIZ identificado con cedula de ciudadania No. 1.049.619.184 de Tunja representante legal de R.T. PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S. con Nit No. 901.267.589-0, en condicion de contratista con el fin de suscribir la presente:

ACTA DE LIQUIDACIÓN

VALOR TOTAL CONTRATADO		
Valor total contratado		$72.325.680,00
Valor adicional		$36.205.680,00
Valor acta parcial No. (1)	$72.325.680,00	
Valor acta parcial No. (2)	$28.981.680,00	
Valor acta de Liquidación	$7.224.000,00	
Valor NO ejecutado (-)	$0,00	
SUMAS IGUALES	$108.531.360,00	$108.531.360,00

BALANCE GENERAL		
Valor total contratado		$108.531.360,00
Valor total recibido	$101.307.360,00	
Valor saldo multas	0,00	
Valor saldo no ejecutado	$0,00	
Saldo a favor del contratista	**$7.224.000,00**	
Saldo en contra	0,00	
SUMAS IGUALES	$108.531.360,00	$108.531.360,00

Total a pagar presente acta DE LIQUIDACION:

SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS M. CTE. ($ 7.224.000,00)

En constancia se firma por los que en esta intervinieron:

JUVENAL PEREZ VEGA
CONTRATANTE

R.T. PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.
R/L DANIEL ALBERTO TORRES ORTIZ

LADY PAOLA GARAVITO MARIÑO
SUPERVISORA

Elaboro:	Reviso:	Aprobó:
LIZETH FERNANDA RANGEL LEGUIZAMÓN	LADY PAOLA GARAVITO MARIÑO	JUVENAL PEREZ VEGA
Profesional de Apoyo Secretaria de Planeación	Secretaria de Planeación y Desarrollo	Alcalde Municipal

INFORME DE SUPERVISIÓN

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN
AL CONTRATO DE INTERVENTORIA NUMERO MP-CMA-001 DE 2025

LUGAR Y FECHA: PAYA, Boyacá, 30 de diciembre de 2025.

ASUNTO: "REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL, ADMINISTRATIVA, TECNICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BASICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACION PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACA".

Se procedió con los siguientes resultados

1. ANTECEDENTES:

CONTRATO:	MP-CMA-001 DE 2025
FECHA:	ABRIL 11 DE 2025
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE PAYA
NIT:	800.065.411-5
CONTRATISTA.	R.T. PROYECTOS DE INGENIERÍA S.A.S.
NIT /CC:	901.267.589-0
REPRESENANTE LEGAL:	DANIEL ALBERTO TORRES ORTIZ
CEDULA DE CIUDADANÍA:	1.049.619.184 de Tunja
DURACIÓN:	CINCO (5) MESES
PRORROGA No. 1:	DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DIAS

Web: www.paya-boyaca.gov.co
Celular: 3202838493 – 3202838476, Dirección: calle 3 No. 3-45, Código postal. 151820-151827
E-mail: alcaldia@paya-boyaca.gov.co, planeacion@paya-boyaca.gov.co

PRORROGA No. 2:	DIEZ (10) DIAS
DURACION TOTAL:	SIETE (7) MESES Y VEINTICINCO (25) DIAS
VALOR INICIAL:	SETENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS ($ 72.325.680) M/CTE
VALOR ADICIONAL No. 1:	TREINTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS ($ 36.205.680,00) M/CTE
VALOR TOTAL:	CIENTO OCHO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS ($108.531.360,00)

A. **UBICACIÓN:** Municipio de Paya.
B. **ACTA DE INICIO:** Con fecha de 21 de abril de 2025.
C. **ADICIONAL Y PRORROGA No. 1:** 19 de septiembre de 2025.
D. **ACTA DE CUMPLIMIENTO PARCIAL No. 01:** 06 de octubre de 2025.
E. **ACTA DE CUMPLIMIENTO PARCIAL No. 02:** 01 de diciembre de 2025.
F. **PRORROGA No. 2:** 04 de diciembre de 2025.
G. **INFORME CONTRATISTA O BALANCE DEL SERVICIO:** El contratista presenta un informe para constatar la ejecución del objeto contractual y de acuerdo la supervisión lo revisa y da visto bueno, informe con fecha de radicación el día 30 de diciembre del 2025; el cual está contenido en fotografías de cada uno de los ítems acordados en el contrato de

Web: www.paya-boyaca.gov.co
Celular: 3202838493 – 3202838476, Dirección: calle 3 No. 3-45, Código postal. 151820-151827
E-mail: alcaldia@paya-boyaca.gov.co, planeacion@paya-boyaca.gov.co

interventoría, en el informe anexa soportes del cumplimiento del objeto del contrato.

H. **DOCUMENTOS A REALIZAR:** Acta de cumplimiento final (sabana de cantidades) y Acta de cumplimiento final.

2. SITUACIÓN ESPECÍFICA:

El presente documento corresponde al Informe de SUPERVISIÓN realizado al CONTRATO DE INTERVENTORIA NUMERO **MP-CMA-001 DE 2025** de la referencia y busca describir los ítems ejecutados por el contratista en cumplimiento del objeto del contrato de interventoría, de conformidad con el análisis documental de los soportes allegados, y visto bueno por parte de la secretaria de Planeación Municipal y acompañamiento constante en la realización de las actividades:

CANTIDADES EJECUTADAS

ITEM	PERFIL/ACTIVIDAD	UNIDAD	ACTA DE CUMPLIMIENTO FINAL			
			CANT	REND	VR UNITARIO	VR TOTAL
1,00	**PERSONAL PROFESIONAL Y ESPECIALIZADO**					
1,1	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MES	7,50	20%	$ 6.000.000,00	$ 9.000.000,00
1,2	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	MES	7,50	100%	$ 2.000.000,00	$ 15.000.000,00
1,3	PROFESIONAL HSEQ	MES	7,50	20%	$ 3.250.000,00	$ 4.875.000,00
					SUBTOTAL	**$28.875.000,00**
					Factor multiplicador	**2,30**
					SUBTOTAL	**$66.412.500,00**
					IVA 19%	**$0,00**
					TOTAL PERSONAL	**$66.412.500,00**
2,00	**BIENES Y SERVICIOS**	**UNIDAD**	**CANT**		**VR UNITARIO**	**VR TOTAL**

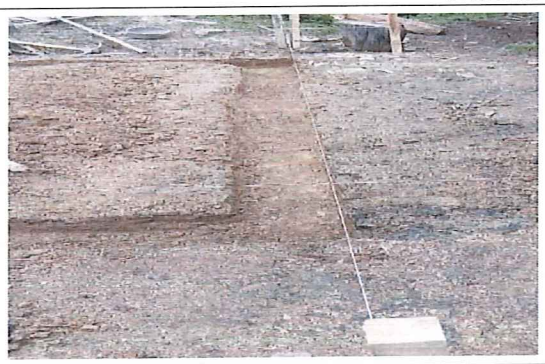
2,1	SERVICIO DE PLOTTER Y PAPELERIA	MES	7,50	$ 550.000,00	$ 4.125.000,00
2,2	ARRIENDO Y SERVICIOS PUBLICOS	MES	7,50	$ 1.000.000,00	$ 7.500.000,00
2,4	ALQUILER DE VEHICULO	MES	7,50	$ 1.600.000,00	$ 12.000.000,00
2,5	ALQUILER DE EQUIPOS DE TOPOGRAFIA	MES	7,50	$ 1.200.000,00	$ 9.000.000,00
2,6	ENSAYOS DE LABORATORIO	MES	7,50	$ 350.000,00	$ 2.625.000,00
2,7	POLIZAS	GL	2,00	$ 72.000,00	$ 144.000,00
				SUBTOTAL	**$35.394.000,00**
				IVA 19%	**$6.724.860,00**
				TOTAL BIENES Y SERVICIOS	**$42.118.860,00**

Costo Personal	$28.875.000,00
Factor multiplicador	$66.412.500,00
Bienes y Servicios	$35.394.000,00
IVA	$6.724.860,00
TOTAL PRESUPUESTO	**$108.531.360,00**

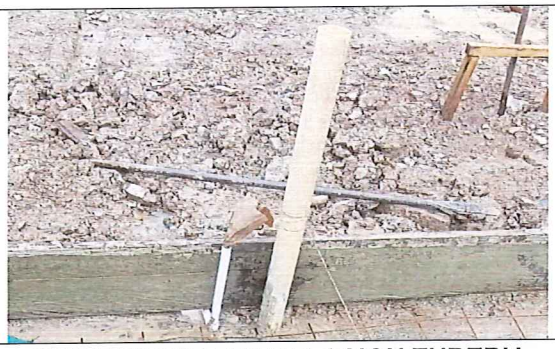
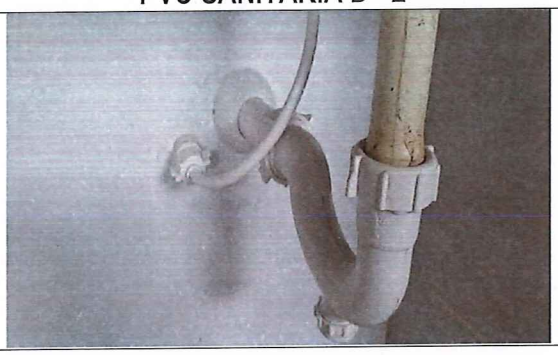
Por tanto, se concluye que el contratista ha cumplido TOTALMENTE con el objeto contractual estipulado en el CONTRATO DE INTERVENTORIA NUMERO MP-CMA-001 DE 2025.

Elaboró:	*Revisó:*	*Aprobó:*
Lady Paola Garavito Mariño	*Lady Paola Garavito Mariño*	*Juvenal Pérez Vega*
Secretaria de Planeación y Desarrollo	*Secretaria de Planeación y Desarrollo*	*Alcalde Municipal*

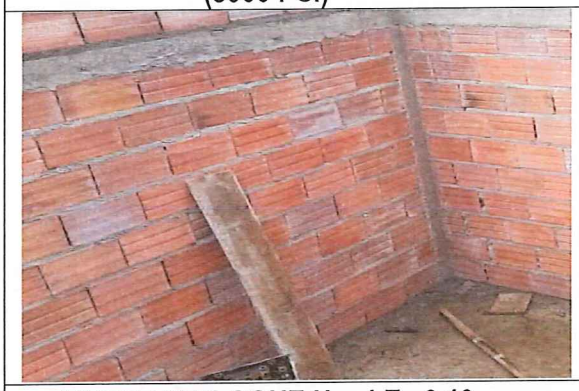
3. REGISTRO FOTOGRÁFICO

UNIDAD DE COCINA	
	
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)
	
CONCRETO CICLÓPEO 17.5MPa (2500 PSI) RELACIÓN 60C/40P	CONCRETO VIGA DE AMARRE 21,1 MPa, SECCION RECTANGULAR
	
SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa	PUNTO DE DESAGUES D=2"

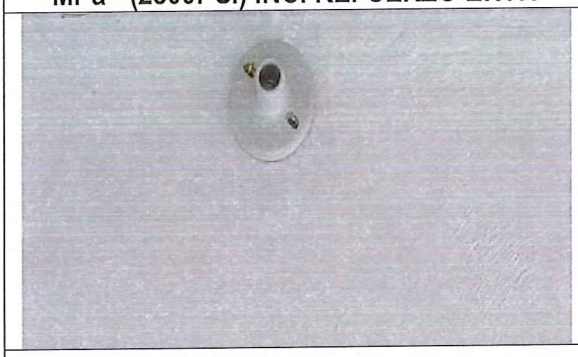
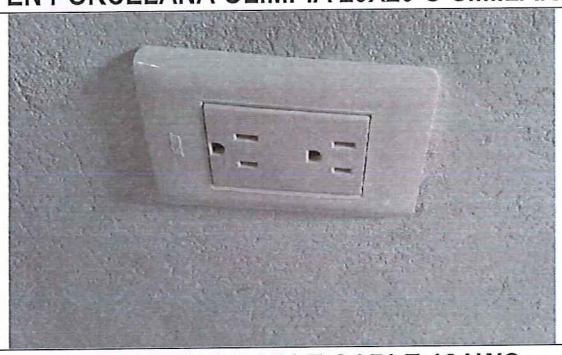
Web: www.paya-boyaca.gov.co
Celular: 3202838493 – 3202838476, Dirección: calle 3 No. 3-45, Código postal. 151820-151827
E-mail: alcaldia@paya-boyaca.gov.co, planeacion@paya-boyaca.gov.co

	
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA D= 2"	CAJAS DE INSPECCION DE 60x60x60 cm LADRILLO
	
PUNTO HIDRAULICO 1/2"	SUMINISTRO E INSTALACION DE RED SUMINISTRO TUBERIA PVC-P 1/2" RDE 9
	
SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE	COLUMNAS EN CONCRETO 21 MPa - (3000 PSI), ALTURA MENOR A TRES METROS-FORMALETA MADERA

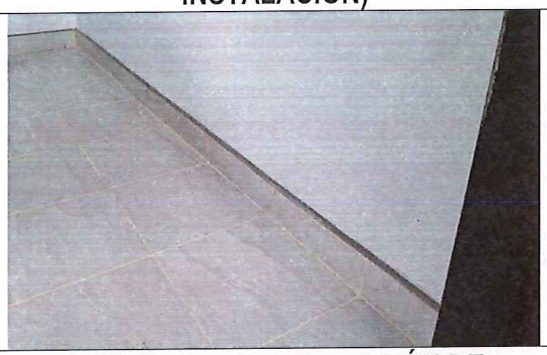

Elaboró:	*Revisó:*	*Aprobó:*
Lady Paola Garavito Mariño	*Lady Paola Garavito Mariño*	*Juvenal Pérez Vega*
Secretaria de Planeación y Desarrollo	*Secretaria de Planeación y Desarrollo*	*Alcalde Municipal*

	
VIGA AMARRE SOBRE MURO 21 MPa - (3000 PSI)	SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa
	
MURO EN BLOQUE No. 4 E= 0,10	PAÑETE LISO MUROS 1:4
	
FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES	VINILO TIPO II SOBRE PAÑETE DOS MANOS EN MUROS

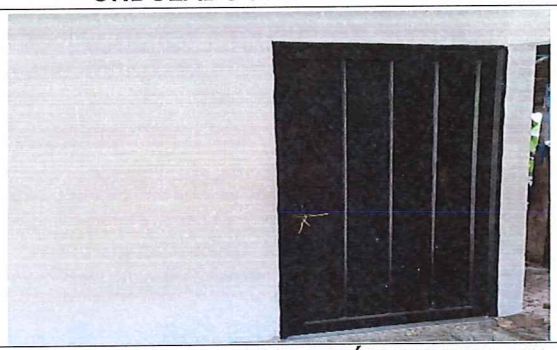
Elaboró:	*Revisó:*	*Aprobó:*
Lady Paola Garavito Mariño	*Lady Paola Garavito Mariño*	*Juvenal Pérez Vega*
Secretaria de Planeación y Desarrollo	*Secretaria de Planeación y Desarrollo*	*Alcalde Municipal*

	
MESONES EN CONCRETO A=0.60 mts. 17.5 MPa - (2500PSI) INC. REFUERZO E:0.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN PORCELANA OLIMPIA 20X20 O SIMILAR
	
SALIDA LÁMPARA TOMA PVC COMPLETA	SALIDA TOMA DOBLE CABLE 12AWG HFFR-LS PVC 1/2 COMPLETA
	
MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM.	PLACA BASE EN CONCRETO E= 0.10 2500 PSI

Elaboró:	*Revisó:*	*Aprobó:*
Lady Paola Garavito Mariño	*Lady Paola Garavito Mariño*	*Juvenal Pérez Vega*
Secretaria de Planeación y Desarrollo	*Secretaria de Planeación y Desarrollo*	*Alcalde Municipal*

	
MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 0.15 M D= 4MM (INCLUYE SUMINSITRO FIJACION E INSTALACION)	PISO CERAMICA 25*25 CM
	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA CERAMICA	ALISTADO PISO E= 4 CM - 1:5
	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO Nº. 8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERIA METALICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA. DIMENSIONES Y CALIBRES SEGÚN DISEÑO

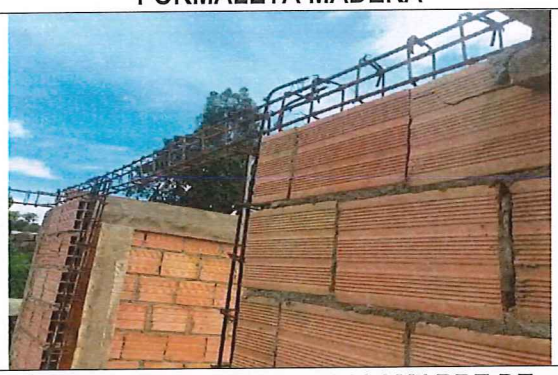
Elaboró:	*Revisó:*	*Aprobó:*
Lady Paola Garavito Mariño	*Lady Paola Garavito Mariño*	*Juvenal Pérez Vega*
Secretaria de Planeación y Desarrollo	*Secretaria de Planeación y Desarrollo*	*Alcalde Municipal*

	
PINTURA DE LA ESTRUCTURA METÁLICA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABALLETE ONDULADO FIBROCEMENTO
	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA LAMINA CAL. 18 CON VIDRIO INC. ANTICORROSIVO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA EN LAMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO
	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN MARCO EN LAMINA A=90 CM CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	MURO TOLETE COMUN E=0.10 mts.

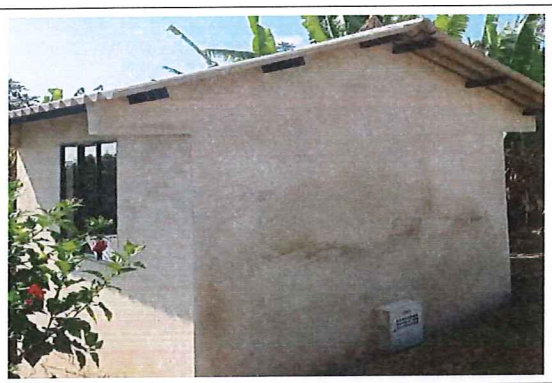
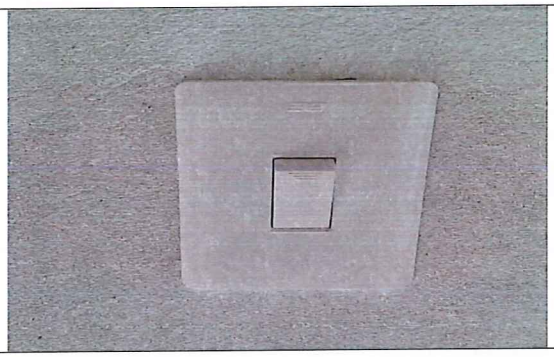
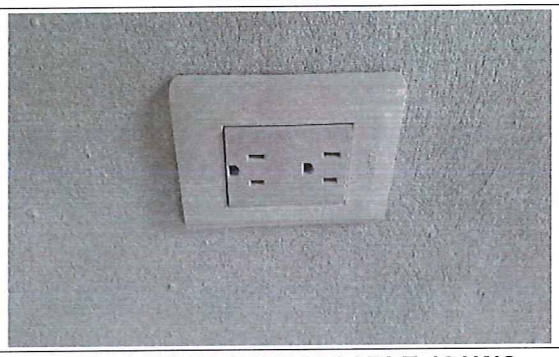
Elaboró:	*Revisó:*	*Aprobó:*
Lady Paola Garavito Mariño	*Lady Paola Garavito Mariño*	*Juvenal Pérez Vega*
Secretaria de Planeación y Desarrollo	*Secretaria de Planeación y Desarrollo*	*Alcalde Municipal*

	
JUEGO ESTUFA EN HIERRO FUNDIDO INCLUYE ACCESORIOS	BUITRON EN LAMINA CHIMENEA
UNIDAD DE HABITACION	
	
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)
	
CONCRETO CICLÓPEO 17.5MPa (2500 PSI) RELACIÓN 60C/40P	CONCRETO VIGA DE AMARRE 21,1 MPa, SECCION RECTANGULAR

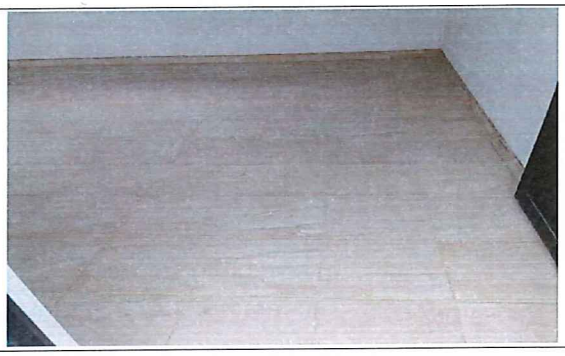
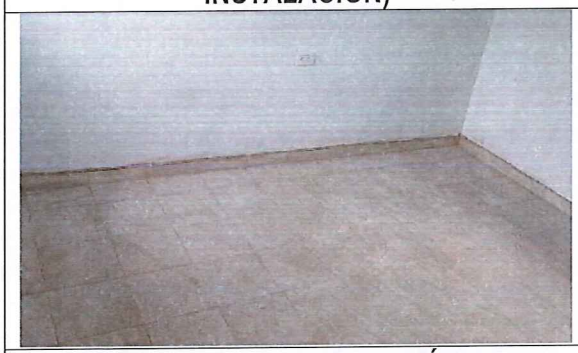
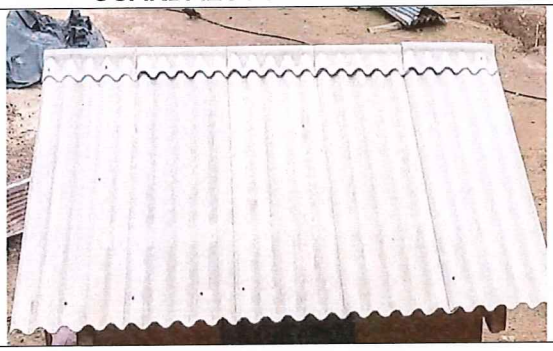
Elaboró:	*Revisó:*	*Aprobó:*
Lady Paola Garavito Mariño	*Lady Paola Garavito Mariño*	*Juvenal Pérez Vega*
Secretaria de Planeación y Desarrollo	*Secretaria de Planeación y Desarrollo*	*Alcalde Municipal*

	
SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa	**COLUMNAS EN CONCRETO 21 MPa - (3000 PSI), ALTURA MENOR A TRES METROS- FORMALETA MADERA**
	
VIGA AMARRE SOBRE MURO 21 MPa - (3000 PSI)	**SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa**
	
MURO EN BLOQUE No. 4 E= 0,10	**PAÑETE LISO MUROS 1:4**

Elaboró:	*Revisó:*	*Aprobó:*
Lady Paola Garavito Mariño	*Lady Paola Garavito Mariño*	*Juvenal Pérez Vega*
Secretaria de Planeación y Desarrollo	*Secretaria de Planeación y Desarrollo*	*Alcalde Municipal*

	
FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES	VINILO TIPO II SOBRE PAÑETE DOS MANOS EN MUROS
	
SALIDA LÁMPARA TOMA PVC COMPLETA	SALIDA TOMA DOBLE CABLE 12AWG HFFR-LS PVC 1/2 COMPLETA
	
MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM.	PLACA BASE EN CONCRETO E= 0.10 2500 PSI

Elaboró:	*Revisó:*	*Aprobó:*
Lady Paola Garavito Mariño	*Lady Paola Garavito Mariño*	*Juvenal Pérez Vega*
Secretaria de Planeación y Desarrollo	*Secretaria de Planeación y Desarrollo*	*Alcalde Municipal*

	
MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 0.15 M D= 4MM (INCLUYE SUMINSITRO FIJACION E INSTALACION)	**PISO CERAMICA 25*25 CM**
	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA CERAMICA	**ALISTADO PISO E= 4 CM - 1:5**
	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO Nº. 8	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERIA METALICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA. DIMENSIONES Y CALIBRES SEGÚN DISEÑO**



PINTURA DE LA ESTRUCTURA METÁLICA



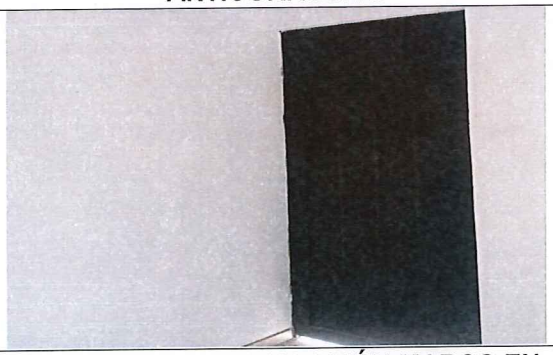
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABALLETE ONDULADO FIBROCEMENTO



SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA LAMINA CAL. 18 CON VIDRIO INC. ANTICORROSIVO

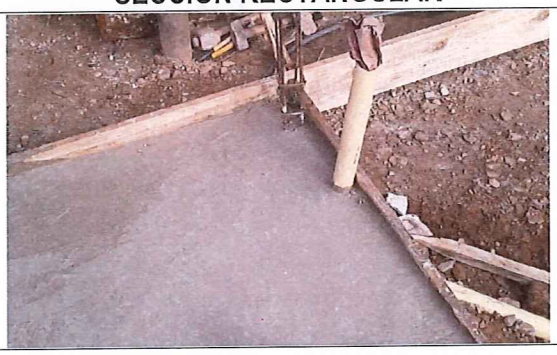


SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA EN LAMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO

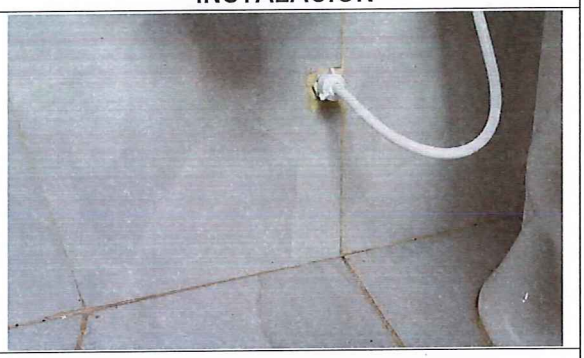
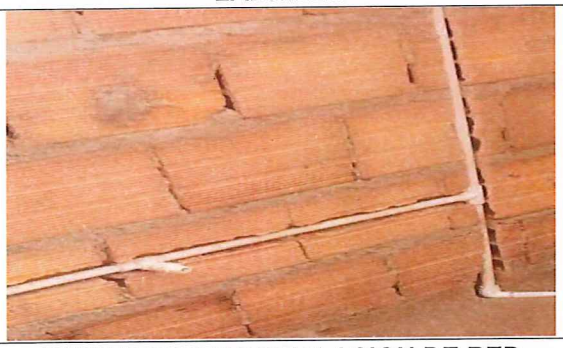


SUMINISTRO E INSTALACIÓN MARCO EN LAMINA A=90 CM CAL 18 INC. ANTICORROSIVO

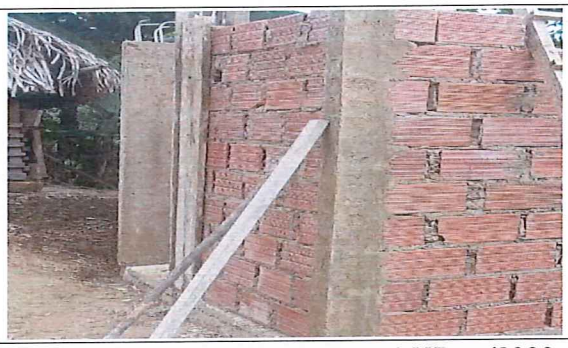
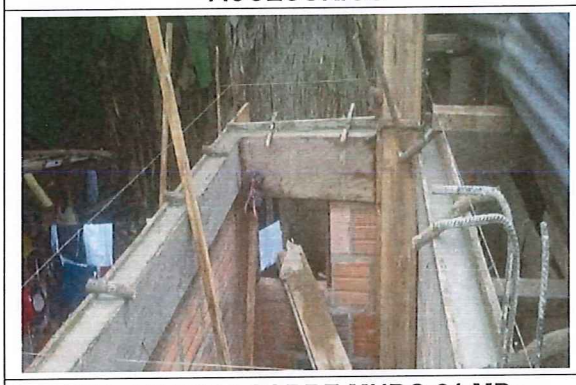
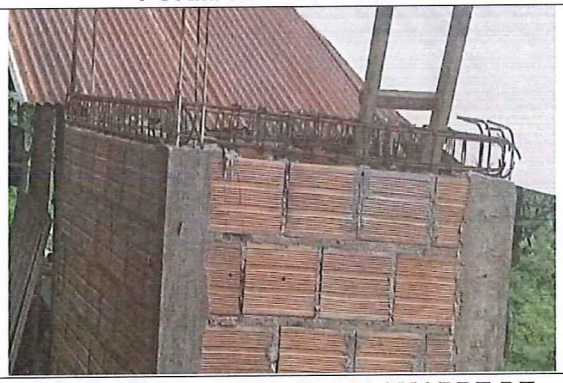
Elaboró:	*Revisó:*	*Aprobó:*
Lady Paola Garavito Mariño	*Lady Paola Garavito Mariño*	*Juvenal Pérez Vega*
Secretaria de Planeación y Desarrollo	*Secretaria de Planeación y Desarrollo*	*Alcalde Municipal*


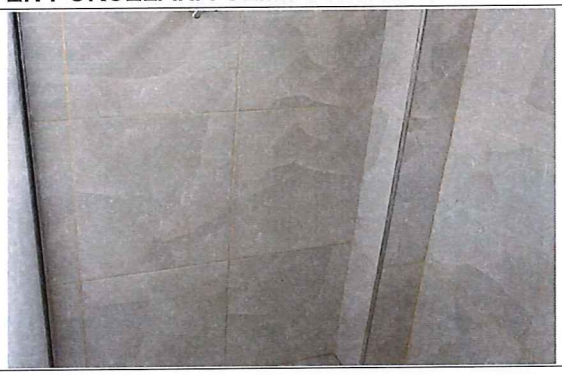
UNIDAD SANITARIA	
	
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)
	
CONCRETO CICLÓPEO 17.5MPa (2500 PSI) RELACIÓN 60C/40P	CONCRETO VIGA DE AMARRE 21,1 MPa, SECCION RECTANGULAR
	
SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa	PUNTO DE DESAGUES D=2"

Elaboró:	*Revisó:*	*Aprobó:*
Lady Paola Garavito Mariño	*Lady Paola Garavito Mariño*	*Juvenal Pérez Vega*
Secretaria de Planeación y Desarrollo	*Secretaria de Planeación y Desarrollo*	*Alcalde Municipal*

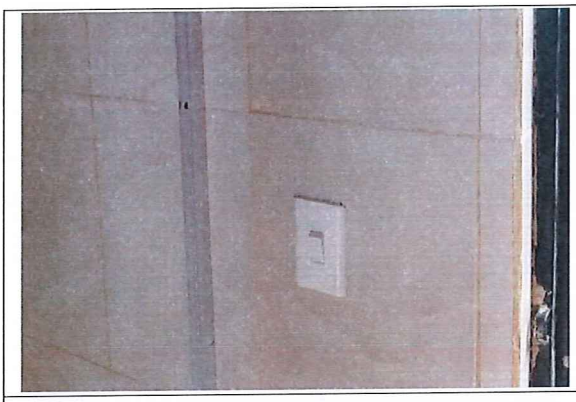
	
PUNTO DE DESAGUES PVC 3" Y 4"	TUBERIA DE 4`` PVC SANITARIA, INCLUYE INSTALACION
	
CAJAS DE INSPECCION DE 60x60x60 cm LADRILLO	PUNTO HIDRAULICO 1/2"
	
SUMINISTRO E INSTALACION DE RED SUMINISTRO TUBERIA PVC-P 1/2" RDE 9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO DE BOLA D = 1/2" TIPO LIVIANO

Elaboró:	*Revisó:*	*Aprobó:*
Lady Paola Garavito Mariño	*Lady Paola Garavito Mariño*	*Juvenal Pérez Vega*
Secretaria de Planeación y Desarrollo	*Secretaria de Planeación y Desarrollo*	*Alcalde Municipal*


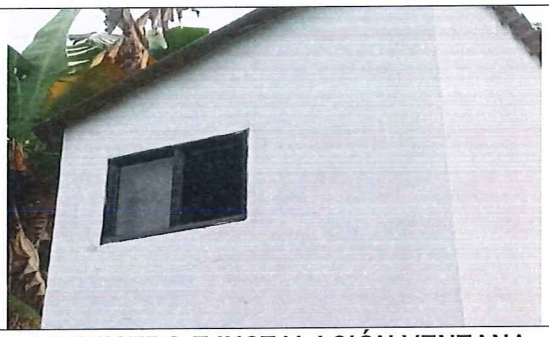
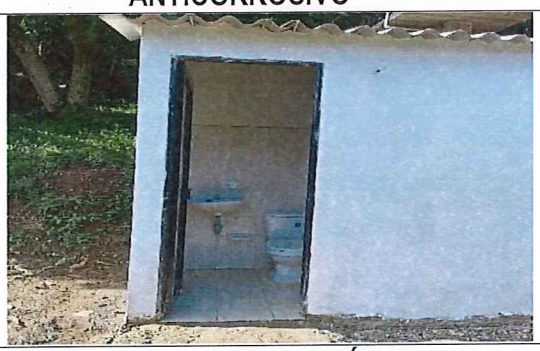
	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TANQUE ELEVADO PVC 250 LTS. INCLUYE ACCESORIOS	**COLUMNAS EN CONCRETO 21 MPa - (3000 PSI), ALTURA MENOR A TRES METROS- FORMALETA MADERA**
	
VIGA AMARRE SOBRE MURO 21 MPa - (3000 PSI)	**SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa**
	
PLACA MACIZA 21 MPa - (3000 PSI) E=0.10 MTS	**MURO EN BLOQUE No. 4 E= 0,10**

	
PAÑETE LISO MUROS 1:4	FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES
	
VINILO TIPO II SOBRE PAÑETE DOS MANOS EN MUROS	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN PORCELANA OLIMPIA 20X20 O SIMILAR
	
SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS PLASTICAS SOSCO	REMATE BOCEL ALUMINIO "WINGS"

Elaboró:	*Revisó:*	*Aprobó:*
Lady Paola Garavito Mariño	*Lady Paola Garavito Mariño*	*Juvenal Pérez Vega*
Secretaria de Planeación y Desarrollo	*Secretaria de Planeación y Desarrollo*	*Alcalde Municipal*

	
SALIDA LÁMPARA TOMA PVC COMPLETA	SALIDA TOMA GFCI CABLE12AWG THHN. PVC Ø 1/2 INCLUYE TOMA
	
MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM	PLACA BASE EN CONCRETO E= 0.10 2500 PSI
	
MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 0.15 M D= 4MM (INCLUYE SUMINSITRO FIJACION E INSTALACION)	PISO CERAMICA 25*25 CM

Elaboró:	*Revisó:*	*Aprobó:*
Lady Paola Garavito Mariño	*Lady Paola Garavito Mariño*	*Juvenal Pérez Vega*
Secretaria de Planeación y Desarrollo	*Secretaria de Planeación y Desarrollo*	*Alcalde Municipal*

	
ALISTADO PISO E= 4 CM - 1:5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO Nº. 6
	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA LAMINA CAL. 18 CON VIDRIO INC. ANTICORROSIVO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA EN LAMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO
	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN MARCO EN LAMINA A=90 CM CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	DIVISIONES PARA BAÑOS EN ALUMINIO Y ACRILICO 0.05 MM

Elaboró:	*Revisó:*	*Aprobó:*
Lady Paola Garavito Mariño	*Lady Paola Garavito Mariño*	*Juvenal Pérez Vega*
Secretaria de Planeación y Desarrollo	*Secretaria de Planeación y Desarrollo*	*Alcalde Municipal*

	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN COMBO ACUACER LAVAMANOS, SANITARIO, GRIFERIA E INCRUSTACIONES	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCHA SENCILLA**
	
ESPEJO 4 MM SIN BICEL	**TANQUE SEPTICO DE 500 LITROS**
	
TANQUE ANAEROBICO DE 500 LITROS	**RELLENO PARA REDES EN GRAVILLA DE 3/4, 1/2 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION)**

Web: www.paya-boyaca.gov.co
Celular: 3202838493 – 3202838476, Dirección: calle 3 No. 3-45, Código postal. 151820-151827
E-mail: alcaldia@paya-boyaca.gov.co, planeacion@paya-boyaca.gov.co



SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA DE DESAGUE PVC D=4"

4. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:

4.1. RESUMEN DEL ESTADO DEL CONTRATO:

VALOR TOTAL CONTRATADO		
Valor total contratado		$ 72.325.680,00
Valor adicional		$ 36.205.680,00
Valor acta parcial No. (1)	$ 72.325.680,00	
Valor acta parcial No. (2)	$ 28.981.680,00	
Valor acta de Liquidación	$ 7.224.000,00	
Valor NO ejecutado (-)	$ 0,00	
SUMAS IGUALES	$ 108.531.360,00	$ 108.531.360,00

BALANCE GENERAL		
Valor total contratado		$ 1.510.501.033,84
Valor total recibido	$ 101.307.360,00	
Valor saldo multas	$ 0,00	
Valor saldo no ejecutado	$ 0,00	

Saldo a favor del contratista	$ 7.224.000,00	
Saldo en contra	$ 0,00	
SUMAS IGUALES	$ 108.531.360,00	$ 108.531.360,00

4.2. VALOR ACTA DE CUMPLIMIENTO FINAL:

SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS M. CTE. ($ 7.224.000,00).

Teniendo en cuenta lo anterior esta supervisión **AUTORIZA Y RECOMIENDA EL ACTA DE CUMPLIMIENTO FINAL** de los compromisos adquiridos en el contrato en mención.

En constancia firma,

Ing. LADY PAOLA GARAVITO MARIÑO
Supervisora del contrato

Elaboró:	*Revisó:*	*Aprobó:*
Lady Paola Garavito Mariño	*Lady Paola Garavito Mariño*	*Juvenal Pérez Vega*
Secretaria de Planeación y Desarrollo	*Secretaria de Planeación y Desarrollo*	*Alcalde Municipal*

INFORME DE ACTIVIDADES

Paya (Boyacá), 30 de diciembre 2025.

Ingeniera:

LADY PAOLA GARAVITO MARIÑO

Secretaria de Planeación y Desarrollo

Supervisora

Alcaldía Municipal De Paya

Ref.: Informe final de actividades CONTRATO DE INTERVENTORIA NUMERO MP-CMA-001 DE 2025 cuyo objeto es REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL, ADMINISTRATIVA, TECNICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BASICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACION PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACA.

Yo, **DANIEL ALBERTO TORRES ORTIZ,** Identificado con cedula de ciudadanía No. 1.049.619.184 de Tunja como representante legal de R.T. PROYECTOS DE INGENIERÍA S.A.S. con Nit. No. 901.267.589-0 en mi calidad de contratista del Municipio de Paya, con contrato que corresponde a los siguientes datos:

CONTRATO:	MP-CMA-001 DE 2025
FECHA:	ABRIL 11 DE 2025
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE PAYA
NIT:	800.065.411-5

OBJETO:	REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL, ADMINISTRATIVA, TECNICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BASICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACION PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACA.
PLAZO INICIAL:	CINCO (5) MESES
PRORROGA No. 1:	DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DIAS
PRORROGA No. 2:	DIEZ (10) DIAS
DURACION TOTAL:	SIETE (7) MESES Y VEINTICINCO (25) DIAS
VALOR INICIAL:	SETENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS ($ 72.325.680) M/CTE
VALOR ADICIONAL No. 1:	TREINTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS ($ 36.205.680,00) M/CTE
VALOR TOTAL:	CIENTO OCHO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS ($108.531.360,00)

Manifiesto respetuosamente a usted señora Supervisora que presento informe de actividades en el cual da cuenta del cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contraídas en el contrato referido.

Atentamente,

R. T. PROYECTOS DE INGENIERÍA S.A.S.

R/ L DANIEL ALBERTO TORRES ORTIZ

C.C. 1.049.619.184 DE TUNJA

Elaboró:	*Revisó:*	*Aprobó:*
Daniel Alberto Torres Ortiz	*Lady Paola Garavito Mariño*	*Juvenal Pérez Vega*
R/L Contratista	*Secretaria de Planeación y Desarrollo*	*Alcalde Municipal*

INFORME DE ACTIVIDADES Informe presentado para suscripción del **ACTA DE CUMPLIMIENTO FINAL**	
DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO	
No. CONTRATO Y FECHA	MP-CMA-001 DE 2025, 11 DE ABRIL DE 2025
NOMBRE DEL CONTRATISTA	R.T. PROYECTOS DE INGENIERÍA S.A.S. R/L DANIEL ALBERTO TORRES ORTIZ
TELÉFONO DE CONTRATISTA	3138111742
PLAZO INICIAL	CINCO (5) MESES
PRORROGA No. 1	DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DIAS
PRORROGA No. 2	DIEZ (10) DIAS
DURACION TOTAL	SIETE (7) MESES Y VEINTICINCO (25) DIAS
VALOR INICIAL	SETENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS ($ 72.325.680) M/CTE
VALOR ADICIONAL No. 1	TREINTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS ($ 36.205.680,00) M/CTE
VALOR TOTAL	CIENTO OCHO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS ($108.531.360,00)
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	CDP: 551 de 23/10/2024 y 431 de 19/09/2025 RP: 370 de 11/04/2025 y 1049 de 22/09/2025

Elaboró:	***Revisó:***	***Aprobó:***
Daniel Alberto Torres Ortiz	*Lady Paola Garavito Mariño*	*Juvenal Pérez Vega*
R/L Contratista	*Secretaria de Planeación y Desarrollo*	*Alcalde Municipal*

FECHA ACTA DE INICIO	21 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE ESTA ACTA	30 DE DICIEMBRE DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL, ADMINISTRATIVA, TECNICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BASICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACION PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACA.
FORMA DE PAGO	Para la forma de pago una vez se suscriba el Contrato respectivo, la Administración Municipal de PAYA - Boyacá pagará la ejecución del objeto del contrato mediante actas parciales previa ejecución de obras, así mismo entrega del informe y, constancia de cumplido a satisfacción por parte del supervisor del contrato, constancia de pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos profesionales; si con la cuenta no se acompañan los documentos requeridos para el pago, será responsabilidad del

	CONTRATISTA y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza, si con la cuenta no se acompañan los documentos requeridos para el pago, será responsabilidad del CONTRATISTA y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza, dando cumplimiento al Artículo 19 de la Ley 1150 de Julio 16 de 2007. DEL DERECHO DE TURNO.
En cumplimiento del contrato número **MP-CMA-001 DE 2025** desarrollé las siguientes actividades.	**INDICO LA FORMA EN QUE SE DESARROLLARON LAS ACTIVIDADES.**

ITEM	PERFIL/ACTIVIDAD	UNIDAD	ACTA DE CUMPLIMIENTO FINAL			
			CANT	REND	VR UNITARIO	VR TOTAL
1,00	**PERSONAL PROFESIONAL Y ESPECIALIZADO**					
1,1	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MES	7,50	20%	$ 6.000.000,00	$ 9.000.000,00
1,2	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	MES	7,50	100%	$ 2.000.000,00	$ 15.000.000,00
1,3	PROFESIONAL HSEQ	MES	7,50	20%	$ 3.250.000,00	$ 4.875.000,00
				SUBTOTAL		**$28.875.000,00**
				Factor multiplicador		**2,30**
				SUBTOTAL		**$66.412.500,00**
				IVA 19%		**$0,00**
				TOTAL PERSONAL		**$66.412.500,00**

Elaboró:	*Revisó:*	*Aprobó:*
Daniel Alberto Torres Ortiz	*Lady Paola Garavito Mariño*	*Juvenal Pérez Vega*
R/L Contratista	*Secretaria de Planeación y Desarrollo*	*Alcalde Municipal*

2,00	**BIENES Y SERVICIOS**	**UNIDAD**	**CANT**	**VR UNITARIO**	**VR TOTAL**
2,1	SERVICIO DE PLOTTER Y PAPELERIA	MES	7,50	$ 550.000,00	$ 4.125.000,00
2,2	ARRIENDO Y SERVICIOS PUBLICOS	MES	7,50	$ 1.000.000,00	$ 7.500.000,00
2,4	ALQUILER DE VEHICULO	MES	7,50	$ 1.600.000,00	$ 12.000.000,00
2,5	ALQUILER DE EQUIPOS DE TOPOGRAFIA	MES	7,50	$ 1.200.000,00	$ 9.000.000,00
2,6	ENSAYOS DE LABORATORIO	MES	7,50	$ 350.000,00	$ 2.625.000,00
2,7	POLIZAS	GL	2,00	$ 72.000,00	$ 144.000,00
				SUBTOTAL	**$35.394.000,00**
				IVA 19%	**$6.724.860,00**
				TOTAL BIENES Y SERVICIOS	**$42.118.860,00**

Costo Personal	$28.875.000,00
Factor multiplicador	$66.412.500,00
Bienes y Servicios	$35.394.000,00
IVA	$6.724.860,00
TOTAL PRESUPUESTO	**$108.531.360,00**

VALOR CONTRATADO	**$ 72.325.680,00**
VALOR ADICIONAL	**$ 36.205.680,00**
VALOR TOTAL	**$ 108.531.360,00**
VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA	**$ 7.224.000,00**
VALOR ACTA PARCIAL N° 1	**$ 72.325.680,00**
VALOR ACTA PARCIAL N° 2	**$ 28.981.680,00**
VALOR PRESENTE ACTA FINAL (a pagar)	**$ 7.224.000,00**
VALOR NO EJECUTADO	**$ 0,00**
PORCENTAJE ACUMULADO EJECUTADO	**100,00%**

Elaboró:	***Revisó:***	***Aprobó:***
Daniel Alberto Torres Ortiz	*Lady Paola Garavito Mariño*	*Juvenal Pérez Vega*
R/L Contratista	*Secretaria de Planeación y Desarrollo*	*Alcalde Municipal*

Cumplimiento de aportes a salud y pensión:	De conformidad con la norma vigente, adjunto Comprobante De Recaudo Aportes correspondiente pago de salud, pensión y riesgos laborales de abril 2025 Planillas No. **7968662931**, mayo 2025 Planillas No. **7972197666**, junio 2025 Planillas No. **7976752613**, julio 2025 Planillas No. **7980201435**, agosto 2025 Planillas No. **7984422088**, septiembre 2025 Planillas No**. 7988173678**, octubre 2025 Planillas No**. 7992905500.**
DECLARACIÓN: Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del contrato y que las actividades mencionadas en el presente informe corresponden a las labores efectivamente desarrolladas en el periodo indicado, declarando que seré responsable por las afirmaciones contenidas en el presente documento, que sirve como soporte para certificar el cumplimiento del objeto del contrato.	
PAGO APORTES SALUD	**Empresa**: SANITAS S.A.
PAGO APORTES PENSIÓN	**Fondo de Pensiones**: COLPENSIONES, PROTECCION.

Elaboró:	*Revisó:*	*Aprobó:*
Daniel Alberto Torres Ortiz	*Lady Paola Garavito Mariño*	*Juvenal Pérez Vega*
R/L Contratista	*Secretaria de Planeación y Desarrollo*	*Alcalde Municipal*

PAGO ARL	**Administradora:** POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.
FIRMA CONTRATISTA	***R. T. PROYECTOS DE INGENIERÍA S.A.S.*** ***R/ L DANIEL ALBERTO TORRES ORTIZ*** ***C.C. 1.049.619.184 DE TUNJA***
APROBÓ: **FIRMA DEL SUPERVISOR:**	**LADY PAOLA GARAVITO MARIÑO** Secretaria de Planeación y Desarrollo

ANEXOS

ANEXO 1 – REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANEXO 2 – SOPORTE DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

ANEXO 3 – CUENTA DE COBRO

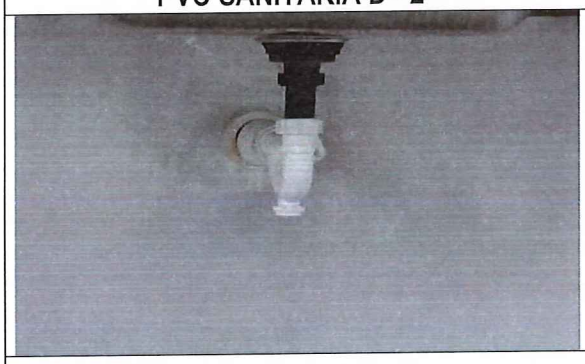
ANEXO 4 – SOPORTES (OFICIOS, PLANILLAS, ACTAS, ENTRE OTROS)

Elaboró:	*Revisó:*	*Aprobó:*
Daniel Alberto Torres Ortiz	*Lady Paola Garavito Mariño*	*Juvenal Pérez Vega*
R/L Contratista	*Secretaria de Planeación y Desarrollo*	*Alcalde Municipal*

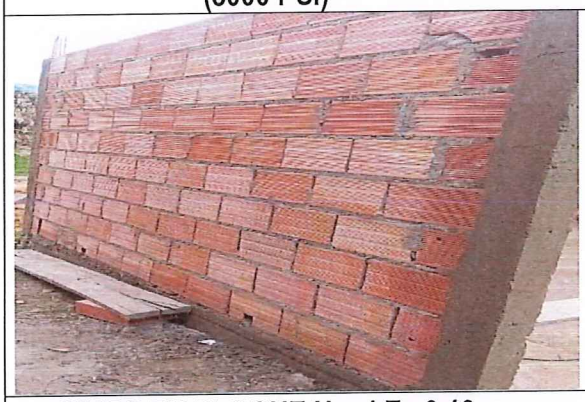
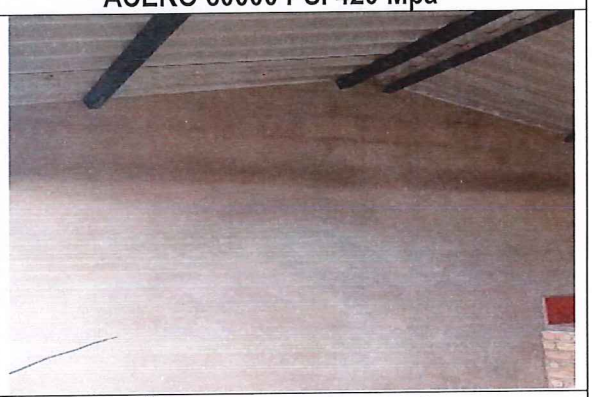
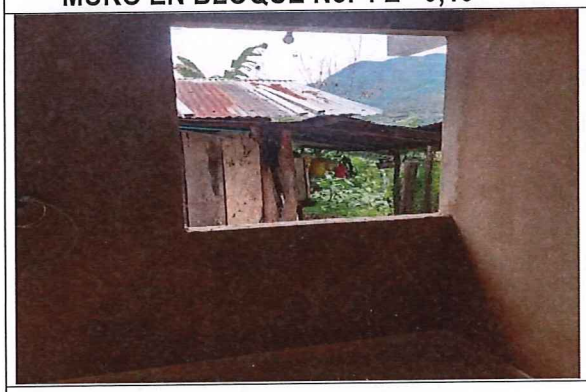
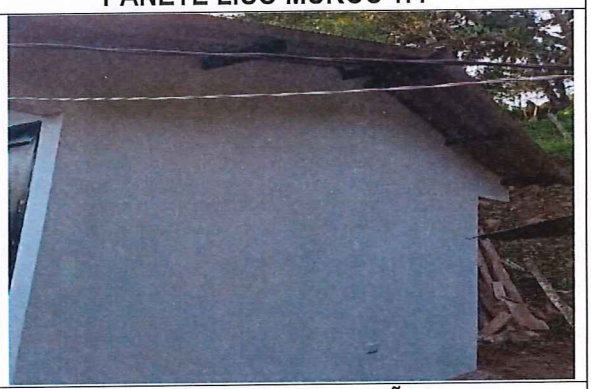
ANEXO 1 – REGISTRO FOTOGRÁFICO

UNIDAD DE COCINA	
	
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)
	
CONCRETO CICLÓPEO 17.5MPa (2500 PSI) RELACIÓN 60C/40P	CONCRETO VIGA DE AMARRE 21,1 MPa, SECCION RECTANGULAR
	
SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa	PUNTO DE DESAGUES D=2"


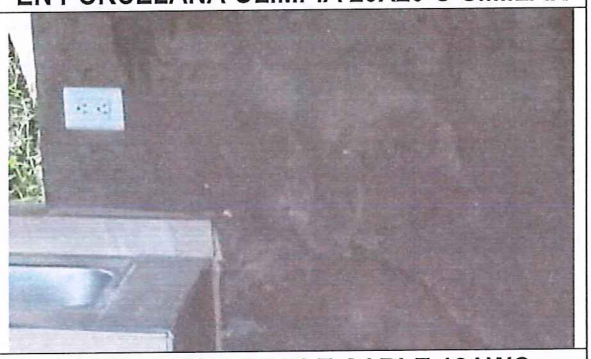
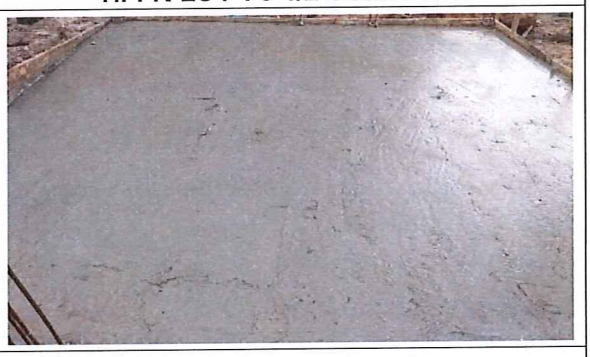
Elaboró:	*Revisó:*	*Aprobó:*
Daniel Alberto Torres Ortiz	*Lady Paola Garavito Mariño*	*Juvenal Pérez Vega*
R/L Contratista	*Secretaria de Planeación y Desarrollo*	*Alcalde Municipal*

	
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA D= 2"	CAJAS DE INSPECCION DE 60x60x60 cm LADRILLO
	
PUNTO HIDRAULICO 1/2"	SUMINISTRO E INSTALACION DE RED SUMINISTRO TUBERIA PVC-P 1/2" RDE 9
	
SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE	COLUMNAS EN CONCRETO 21 MPa - (3000 PSI), ALTURA MENOR A TRES METROS-FORMALETA MADERA

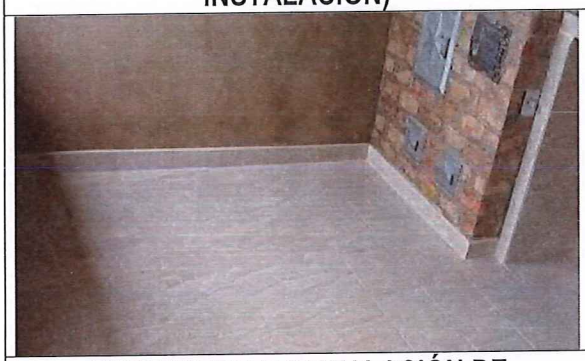
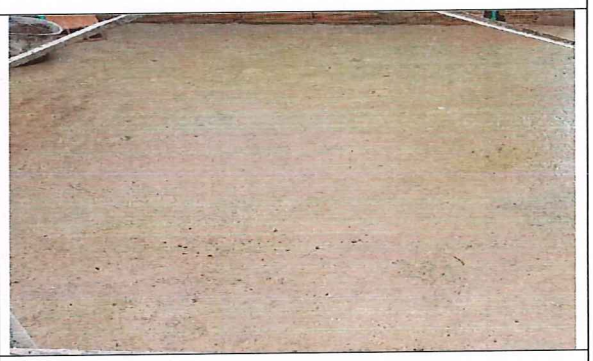
Elaboró:	*Revisó:*	*Aprobó:*
Daniel Alberto Torres Ortiz	*Lady Paola Garavito Mariño*	*Juvenal Pérez Vega*
R/L Contratista	*Secretaria de Planeación y Desarrollo*	*Alcalde Municipal*

	
VIGA AMARRE SOBRE MURO 21 MPa - (3000 PSI)	**SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa**
	
MURO EN BLOQUE No. 4 E= 0,10	**PAÑETE LISO MUROS 1:4**
	
FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES	**VINILO TIPO II SOBRE PAÑETE DOS MANOS EN MUROS**

Elaboró:	*Revisó:*	*Aprobó:*
Daniel Alberto Torres Ortiz	*Lady Paola Garavito Mariño*	*Juvenal Pérez Vega*
R/L Contratista	*Secretaria de Planeación y Desarrollo*	*Alcalde Municipal*

	
MESONES EN CONCRETO A=0.60 mts. 17.5 MPa - (2500PSI) INC. REFUERZO E:0.10	**SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN PORCELANA OLIMPIA 20X20 O SIMILAR**
	
SALIDA LÁMPARA TOMA PVC COMPLETA	**SALIDA TOMA DOBLE CABLE 12AWG HFFR-LS PVC 1/2 COMPLETA**
	
MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM.	**PLACA BASE EN CONCRETO E= 0.10 2500 PSI**

Elaboró:	*Revisó:*	*Aprobó:*
Daniel Alberto Torres Ortiz	*Lady Paola Garavito Mariño*	*Juvenal Pérez Vega*
R/L Contratista	*Secretaria de Planeación y Desarrollo*	*Alcalde Municipal*

	
MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 0.15 M D= 4MM (INCLUYE SUMINSITRO FIJACION E INSTALACION)	**PISO CERAMICA 25*25 CM**
	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA CERAMICA	**ALISTADO PISO E= 4 CM - 1:5**
	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO Nº. 8	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERIA METALICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA. DIMENSIONES Y CALIBRES SEGÚN DISEÑO**

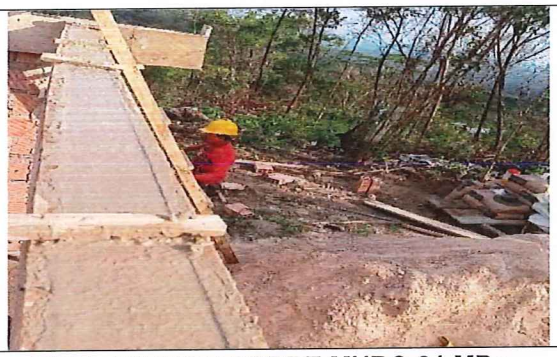
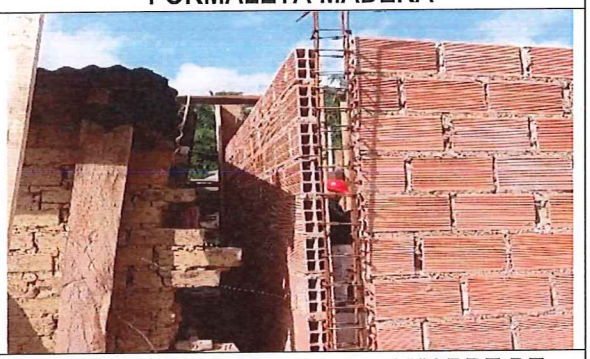
Elaboró:	*Revisó:*	*Aprobó:*
Daniel Alberto Torres Ortiz	*Lady Paola Garavito Mariño*	*Juvenal Pérez Vega*
R/L Contratista	*Secretaria de Planeación y Desarrollo*	*Alcalde Municipal*

	
PINTURA DE LA ESTRUCTURA METÁLICA	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABALLETE ONDULADO FIBROCEMENTO**
	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA LAMINA CAL. 18 CON VIDRIO INC. ANTICORROSIVO	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA EN LAMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO**
	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN MARCO EN LAMINA A=90 CM CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	**MURO TOLETE COMUN E=0.10 mts.**

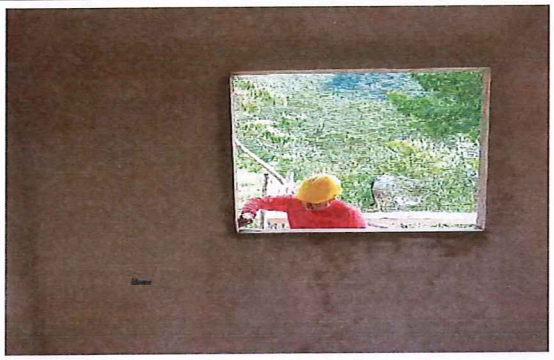
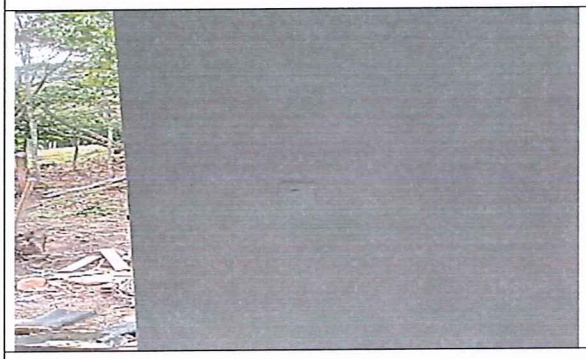
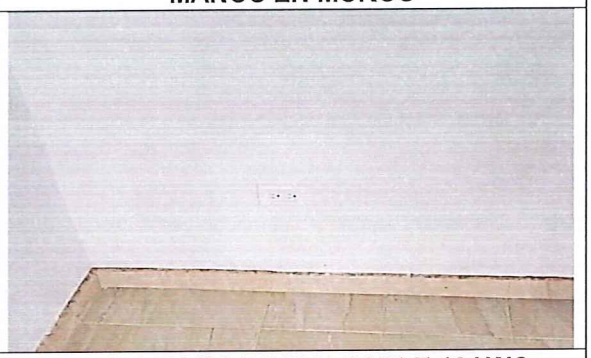
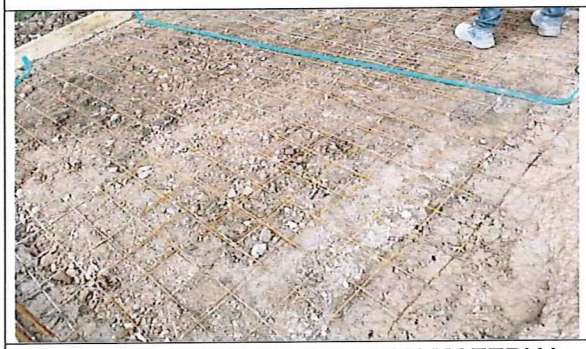
Elaboró:	*Revisó:*	*Aprobó:*
Daniel Alberto Torres Ortiz	*Lady Paola Garavito Mariño*	*Juvenal Pérez Vega*
R/L Contratista	*Secretaria de Planeación y Desarrollo*	*Alcalde Municipal*

	
JUEGO ESTUFA EN HIERRO FUNDIDO INCLUYE ACCESORIOS	**BUITRON EN LAMINA CHIMENEA**
UNIDAD DE HABITACION	
	
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA	**EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)**
	
CONCRETO CICLÓPEO 17.5MPa (2500 PSI) RELACIÓN 60C/40P	**CONCRETO VIGA DE AMARRE 21,1 MPa, SECCION RECTANGULAR**



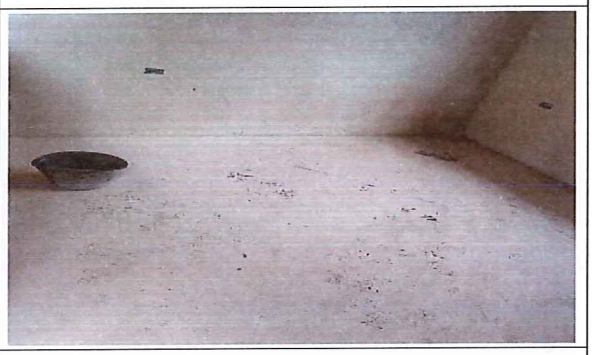
Elaboró:	*Revisó:*	*Aprobó:*
Daniel Alberto Torres Ortiz	*Lady Paola Garavito Mariño*	*Juvenal Pérez Vega*
R/L Contratista	*Secretaria de Planeación y Desarrollo*	*Alcalde Municipal*

	
SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa	**COLUMNAS EN CONCRETO 21 MPa - (3000 PSI), ALTURA MENOR A TRES METROS- FORMALETA MADERA**
	
VIGA AMARRE SOBRE MURO 21 MPa - (3000 PSI)	**SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa**
	
MURO EN BLOQUE No. 4 E= 0,10	**PAÑETE LISO MUROS 1:4**

Elaboró:	*Revisó:*	*Aprobó:*
Daniel Alberto Torres Ortiz	*Lady Paola Garavito Mariño*	*Juvenal Pérez Vega*
R/L Contratista	*Secretaria de Planeación y Desarrollo*	*Alcalde Municipal*

	
FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES	**VINILO TIPO II SOBRE PAÑETE DOS MANOS EN MUROS**
	
SALIDA LÁMPARA TOMA PVC COMPLETA	**SALIDA TOMA DOBLE CABLE 12AWG HFFR-LS PVC 1/2 COMPLETA**
	
MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM.	**PLACA BASE EN CONCRETO E= 0.10 2500 PSI**

Elaboró:	*Revisó:*	*Aprobó:*
Daniel Alberto Torres Ortiz	*Lady Paola Garavito Mariño*	*Juvenal Pérez Vega*
R/L Contratista	*Secretaria de Planeación y Desarrollo*	*Alcalde Municipal*

	
MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 0.15 M D= 4MM (INCLUYE SUMINSITRO FIJACION E INSTALACION)	**PISO CERAMICA 25*25 CM**
	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA CERAMICA	**ALISTADO PISO E= 4 CM - 1:5**
	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO Nº. 8	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERIA METALICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA. DIMENSIONES Y CALIBRES SEGÚN DISEÑO**

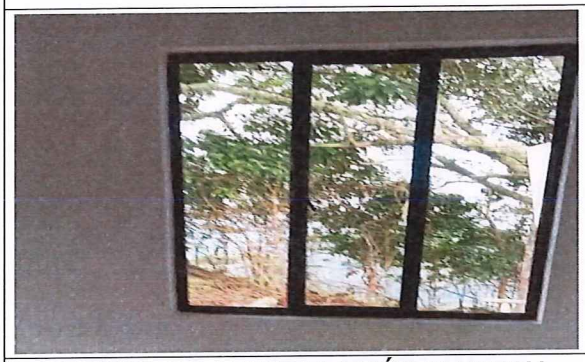
Elaboró:	*Revisó:*	*Aprobó:*
Daniel Alberto Torres Ortiz	*Lady Paola Garavito Mariño*	*Juvenal Pérez Vega*
R/L Contratista	*Secretaria de Planeación y Desarrollo*	*Alcalde Municipal*



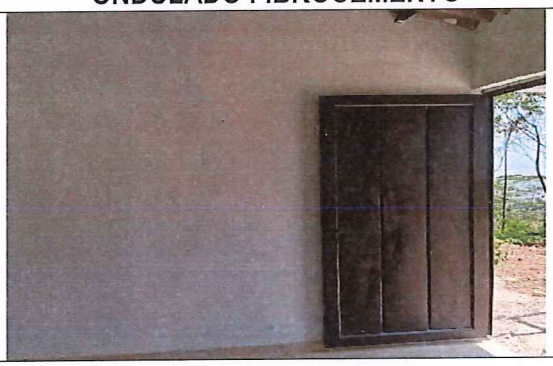
PINTURA DE LA ESTRUCTURA METÁLICA



SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABALLETE ONDULADO FIBROCEMENTO



SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA LAMINA CAL. 18 CON VIDRIO INC. ANTICORROSIVO



SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA EN LAMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO



SUMINISTRO E INSTALACIÓN MARCO EN LAMINA A=90 CM CAL 18 INC. ANTICORROSIVO

Elaboró:	*Revisó:*	*Aprobó:*
Daniel Alberto Torres Ortiz	*Lady Paola Garavito Mariño*	*Juvenal Pérez Vega*
R/L Contratista	*Secretaria de Planeación y Desarrollo*	*Alcalde Municipal*

UNIDAD SANITARIA



LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA



EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)



CONCRETO CICLÓPEO 17.5MPa (2500 PSI) RELACIÓN 60C/40P



CONCRETO VIGA DE AMARRE 21,1 MPa, SECCION RECTANGULAR

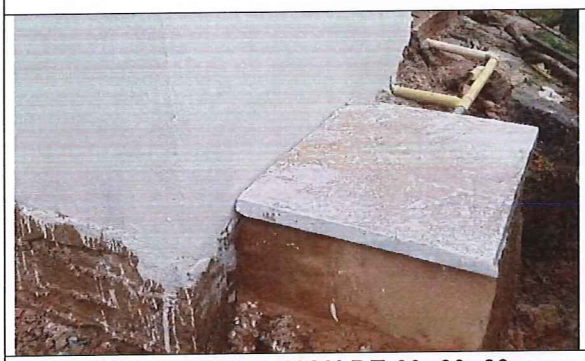
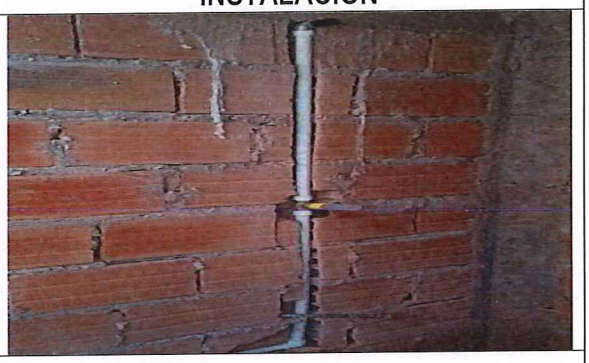
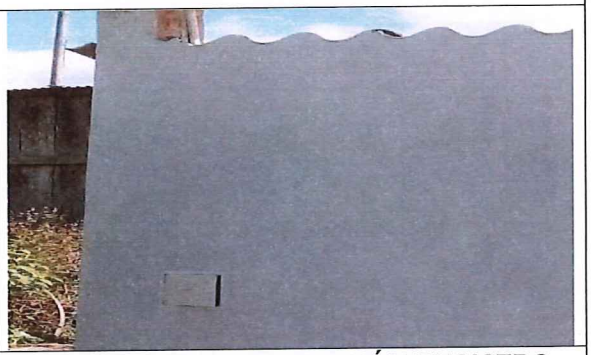


SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa

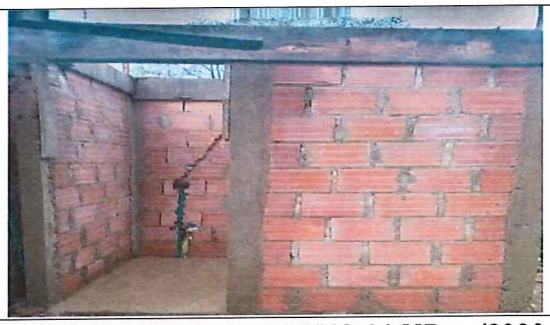
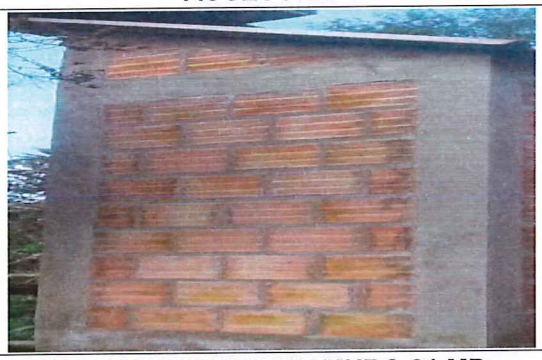
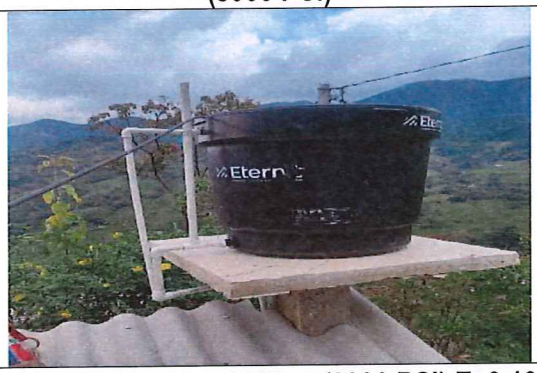
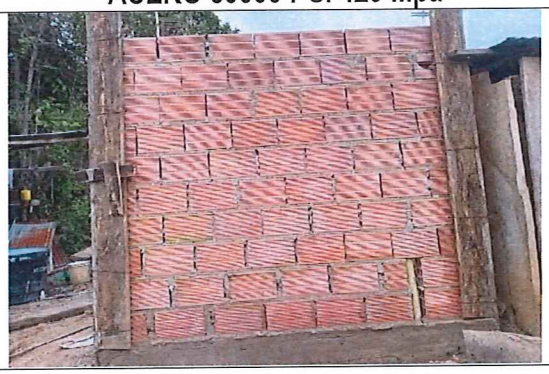


PUNTO DE DESAGUES D=2"

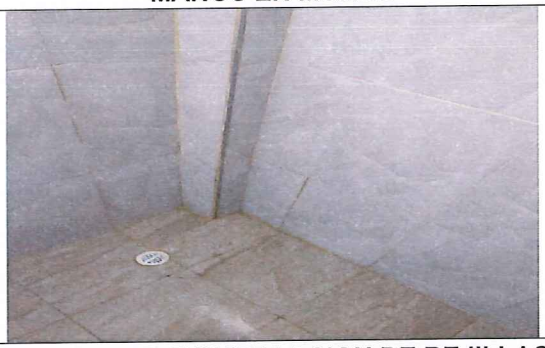
Elaboró:	*Revisó:*	*Aprobó:*
Daniel Alberto Torres Ortiz	*Lady Paola Garavito Mariño*	*Juvenal Pérez Vega*
R/L Contratista	*Secretaria de Planeación y Desarrollo*	*Alcalde Municipal*

	
PUNTO DE DESAGUES PVC 3" Y 4"	TUBERIA DE 4`` PVC SANITARIA, INCLUYE INSTALACION
	
CAJAS DE INSPECCION DE 60x60x60 cm LADRILLO	PUNTO HIDRAULICO 1/2"
	
SUMINISTRO E INSTALACION DE RED SUMINISTRO TUBERIA PVC-P 1/2" RDE 9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO DE BOLA D = 1/2" TIPO LIVIANO

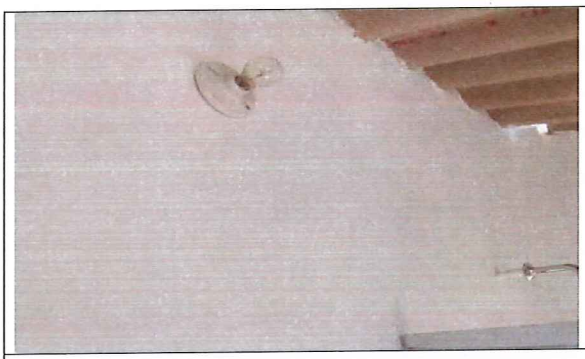
Elaboró:	*Revisó:*	*Aprobó:*
Daniel Alberto Torres Ortiz	*Lady Paola Garavito Mariño*	*Juvenal Pérez Vega*
R/L Contratista	*Secretaria de Planeación y Desarrollo*	*Alcalde Municipal*

	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TANQUE ELEVADO PVC 250 LTS. INCLUYE ACCESORIOS	**COLUMNAS EN CONCRETO 21 MPa - (3000 PSI), ALTURA MENOR A TRES METROS-FORMALETA MADERA**
	
VIGA AMARRE SOBRE MURO 21 MPa - (3000 PSI)	**SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa**
	
PLACA MACIZA 21 MPa - (3000 PSI) E=0.10 MTS	**MURO EN BLOQUE No. 4 E= 0,10**


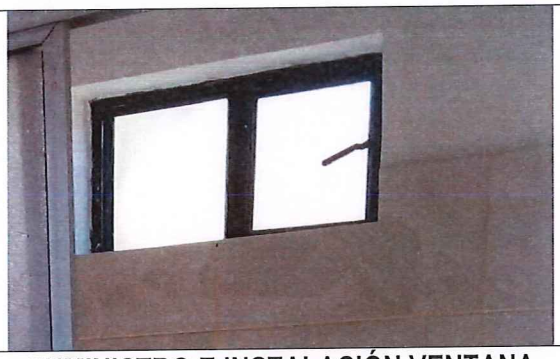
Elaboró:	*Revisó:*	*Aprobó:*
Daniel Alberto Torres Ortiz	*Lady Paola Garavito Mariño*	*Juvenal Pérez Vega*
R/L Contratista	*Secretaria de Planeación y Desarrollo*	*Alcalde Municipal*

	
PAÑETE LISO MUROS 1:4	FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES
	
VINILO TIPO II SOBRE PAÑETE DOS MANOS EN MUROS	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN PORCELANA OLIMPIA 20X20 O SIMILAR
	
SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS PLASTICAS SOSCO	REMATE BOCEL ALUMINIO "WINGS"

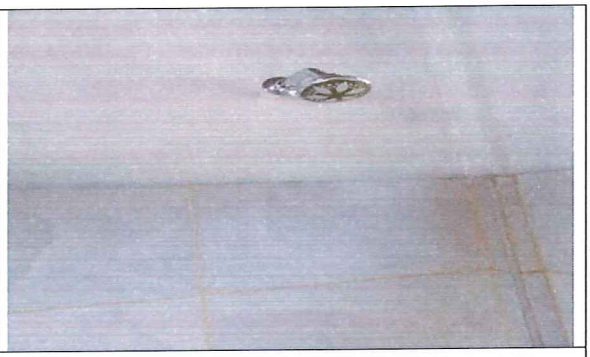
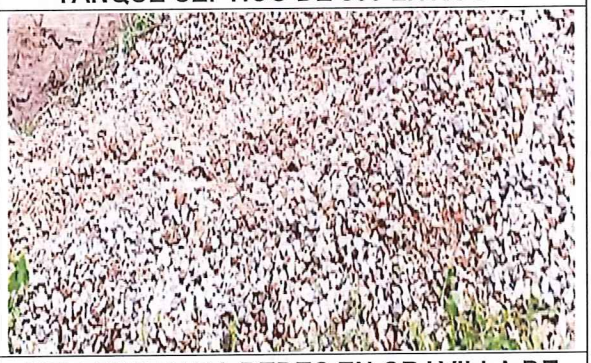
Elaboró:	*Revisó:*	*Aprobó:*
Daniel Alberto Torres Ortiz	*Lady Paola Garavito Mariño*	*Juvenal Pérez Vega*
R/L Contratista	*Secretaria de Planeación y Desarrollo*	*Alcalde Municipal*

	
SALIDA LÁMPARA TOMA PVC COMPLETA	SALIDA TOMA GFCI CABLE12AWG THHN. PVC Ø 1/2 INCLUYE TOMA
	
MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM	PLACA BASE EN CONCRETO E= 0.10 2500 PSI
	
MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 0.15 M D= 4MM (INCLUYE SUMINSITRO FIJACION E INSTALACION)	PISO CERAMICA 25*25 CM

Elaboró:	*Revisó:*	*Aprobó:*
Daniel Alberto Torres Ortiz	*Lady Paola Garavito Mariño*	*Juvenal Pérez Vega*
R/L Contratista	*Secretaria de Planeación y Desarrollo*	*Alcalde Municipal*

	
ALISTADO PISO E= 4 CM - 1:5	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO Nº. 6**
	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA LAMINA CAL. 18 CON VIDRIO INC. ANTICORROSIVO	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA EN LAMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO**
	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN MARCO EN LAMINA A=90 CM CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	**DIVISIONES PARA BAÑOS EN ALUMINIO Y ACRILICO 0.05 MM**

Elaboró:	*Revisó:*	*Aprobó:*
Daniel Alberto Torres Ortiz	*Lady Paola Garavito Mariño*	*Juvenal Pérez Vega*
R/L Contratista	*Secretaria de Planeación y Desarrollo*	*Alcalde Municipal*

	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN COMBO ACUACER LAVAMANOS, SANITARIO, GRIFERIA E INCRUSTACIONES	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCHA SENCILLA**
	
ESPEJO 4 MM SIN BICEL	**TANQUE SEPTICO DE 500 LITROS**
	
TANQUE ANAEROBICO DE 500 LITROS	**RELLENO PARA REDES EN GRAVILLA DE 3/4, 1/2 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION)**

Elaboró:	*Revisó:*	*Aprobó:*
Daniel Alberto Torres Ortiz	*Lady Paola Garavito Mariño*	*Juvenal Pérez Vega*
R/L Contratista	*Secretaria de Planeación y Desarrollo*	*Alcalde Municipal*



SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA DE DESAGUE PVC D=4"

Elaboró:	*Revisó:*	*Aprobó:*
Daniel Alberto Torres Ortiz	*Lady Paola Garavito Mariño*	*Juvenal Pérez Vega*
R/L Contratista	*Secretaria de Planeación y Desarrollo*	*Alcalde Municipal*

POLIZAS SEGÚN ACTA DE CUMPLIMIENTO FINAL INTERVENTORIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	AGENCIA MANDATARIA - PARQUE 93	62	62-44-101021308	7

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
19	12	2025	21	04	2025	00:00	20	12	2028	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN	TELÉFONO
R.T. PROYECTOS DE INGENIERIA SAS	NIT: 901.267.589-0	3138111742

DIRECCIÓN: CALLE 17 NO. 12 44 INT 108 — CIUDAD: TUNJA, BOYACA

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN	TELÉFONO
MUNICIPIO DE PAYA	NIT: 800.065.411-5	0986359360

DIRECCIÓN: CENTRO — CIUDAD: PAYA, BOYACA

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.MP-CMA-001 DE 2025 DE FECHA 11 DE ABRIL DE 2025 CELEBRADO POR LAS PARTES, RELACIONADO CON EJECUTAR POR PARTE DEL CONTRATISTA LAS ACTUACIONES CORRESPONDIENTES PARA DESARROLLAR CUYO OBJETO REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL, ADMINISTRATIVA, TECNICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BASICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACION PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACA.

SEGUN TERMINOS Y CONDICIONES EXPRESAS EN EL CONTRATO.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	21/04/2025	20/06/2026	$10,853,136.00	$10,853,136.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	21/04/2025	20/12/2028	$10,853,136.00	$10,853,136.00
CALIDAD DEL SERVICIO	15/12/2025	15/12/2028	$10,853,136.00	

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO, SE AJUSTA LA VIGENCIA DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVCIO, SEGUN ACTA DE CUMPLIMIENTO FINAL DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2025.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN SIN SER MODIFICADOS

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ *******32,559,408.00	CONTADO

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
OLC ASESORES C&C LTDA.	143739	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO

NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 11A NO. 93A - 62 OFC. 401 - TELEFONO: 7422342 - BOGOTA, D.C.

62-44-101021308

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Oleda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ACTA DE CUMPLIMIENTO FINAL INTERVENTORIA

MACROPROCESO: APOYO	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ MUNICIPIO DE PAYA NIT. 800.065.411-5 SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO	CÓDIGO: 210-GC-02.12 VERSIÓN: 5 FECHA: 18/dic/2024
PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL	**ACTA DE CUMPLIMIENTO FINAL**	Página 1 de 1

FECHA PRESENTE ACTA:	15 DE DICIEMBRE DE 2025
CONTRATO:	MP-CMA-001 DE 2025
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE PAYA
REPRESENTANTE LEGAL:	JUVENAL PEREZ VEGA
CARGO:	ALCALDE MUNICIPAL
NIT /C.C	800.065.411-5
CONTRATISTA:	R.T. PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.
NIT /C.C	901267589-0
R. LEGAL:	DANIEL ALBERTO TORRES ORTIZ
CEDULA:	1.049.619.184 de Tunja
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	LADY PAOLA GARAVITO MARIÑO Secretaria de Planeacion y Desarrollo Municipal
OBJETO:	REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL, ADMINISTRATIVA, TECNICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BASICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACION PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACA.
FECHA DE INICIO:	21 DE ABRIL DE 2025
VALOR INICIAL:	SETENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS ($ 72.325.680) M/CTE
VALOR ADICIONAL No. 1:	TREINTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS ($ 36.205.680,00) M/CTE
VALOR TOTAL:	CIENTO OCHO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS ($108.531.360,00)
PLAZO DE EJECUCION:	CINCO (5) MESES
PRORROGA No. 1:	DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DIAS
PRORROGA No. 2:	DIEZ (10) DIAS
PLAZO TOTAL:	SIETE (7) MESES Y VEINTICINCO (25) DIAS
FECHA DE TERMINACION REAL:	15 DE DICIEMBRE DE 2025

En el municipio de Paya-Boyacá, a los quince (15) días del mes de diciembre de 2025 se reunieron: El Doctor JUVENAL PEREZ VEGA en su condición de Alcalde, la Ingeniera LADY PAOLA GARAVITO MARIÑO, Secretaria de Planeación y Desarrollo en condición de supervisora del contrato y el señor DANIEL ALBERTO TORRES ORTIZ identificado con cedula de ciudadania No. 1.049.619.184 de Tunja representante legal de R.T. PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S. con Nit No. 901.267.589-0, en condicion de contratista con el fin de suscribir la presente:

ACTA DE CUMPLIMIENTO FINAL

DESCRIPCION	FECHA	VALOR PAGADO
VALOR CONTRATADO	11/04/2025	**$ 72.325.680,00**
VALOR ADICIONAL	19/09/2025	**$ 36.205.680,00**
VALOR ACTA PARCIAL N° 1	6/10/2025	**$ 72.325.680,00**
VALOR ACTA PARCIAL N° 2	1/12/2025	**$ 28.981.680,00**
VALOR PRESENTE ACTA FINAL (a pagar)	15/12/2025	**$ 7.224.000,00**
VALOR NO EJECUTADO		**$ 0,00**

Total a pagar presente ACTA DE CUMPLIMIENTO FINAL
SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS M. CTE. ($ 7.224.000,00)

En constancia se firma por los que en esta intervinieron:

JUVENAL PEREZ VEGA
CONTRATANTE

R.T. PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.
R/L DANIEL ALBERTO TORRES ORTIZ

LADY PAOLA GARAVITO MARIÑO
SUPERVISORA

Elaboro:	Reviso:	Aprobó:
LIZETH FERNANDA RANGEL LEGUIZAMÓN	LADY PAOLA GARAVITO MARIÑO	JUVENAL PEREZ VEGA
Profesional de Apoyo Secretaria de Planeación y Desarrollo	Secretaria de Planeación y Desarrollo	Alcalde Municipal

SABANA ACTA DE CUMPLIMIENTO FINAL INTERVENTORIA

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ MUNICIPIO DE PAYA NIT. 800.065.411-5 SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO	CÓDIGO: 210-GC-02.12
		VERSIÓN: 5
MACROPROCESO: APOYO		FECHA: 18/dic/2024
PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL	**ACTA DE CUMPLIMIENTO FINAL (SABANA DE CANTIDADES)**	Página 1 de 1

FECHA PRESENTE ACTA:	15 DE DICIEMBRE DE 2025
CONTRATO:	MP-CMA-001 DE 2025
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE PAYA
REPRESENTANTE LEGAL:	JUVENAL PEREZ VEGA
CARGO:	ALCALDE MUNICIPAL
NIT /C.C	800.065.411-5
CONTRATISTA:	R.T. PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.
NIT /C.C	901267569-0
R. LEGAL:	DANIEL ALBERTO TORRES ORTIZ
CEDULA:	1.049.619.184 de Tunja
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	LADY PAOLA GARAVITO MARIÑO Secretaria de Planeacion y Desarrollo Municipal
OBJETO:	REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL, ADMINISTRATIVA, TECNICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BASICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACION PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACA.
FECHA DE INICIO:	21 DE ABRIL DE 2025
VALOR INICIAL:	SETENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS ($ 72.325.680) M/CTE
VALOR ADICIONAL No. 1:	TREINTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS ($ 36.205.680,00) M/CTE
VALOR TOTAL:	CIENTO OCHO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS ($108.531.360,00)
PLAZO DE EJECUCION:	CINCO (5) MESES
PRORROGA No. 1:	DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DIAS
PRORROGA No. 2:	DIEZ (10) DIAS
PLAZO TOTAL:	SIETE (7) MESES Y VEINTICINCO (25) DIAS
FECHA DE TERMINACION:	15 DE DICIEMBRE DE 2025

En el municipio de Paya-Boyacá, a los quince (15) días del mes de diciembre de 2025 se reunieron: El Doctor JUVENAL PEREZ VEGA en su condición de Alcalde, la Ingeniera LADY PAOLA GARAVITO MARIÑO, Secretaria de Planeación y Desarrollo en condición de supervisora del contrato y el señor DANIEL ALBERTO TORRES ORTIZ identificado con cedula de ciudadanía No. 1.049.619.184 de Tunja representante legal de R.T. PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S. con Nit No. 901.267.569-0, en condicion de contratista con el fin de suscribir la presente:

ACTA DE CUMPLIMIENTO FINAL (SABANA DE CANTIDADES)

El contratista hace entrega de:

CONTRATO ORIGINAL							CONDICIONES ACTUALIZADAS ADICIONAL No. 1		ACUMULADO PARCIAL No. 01, PARCIAL No. 02		PRESENTE ACTA FINAL		ACUMULADO FINAL	
ITEM	PERFIL/ACTIVIDAD	UNIDAD	CANT	REND	VR UNITARIO	VR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1,00	PERSONAL PROFESIONAL Y ESPECIALIZADO													
1,1	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MES	5,00	20%	$ 6.000.000,00	$ 6.000.000,00	7,50	$ 9.000.000,00	7,00	$ 8.400.000,00	0,50	$ 600.000,00	7,50	$ 9.000.000,00
1,2	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	MES	5,00	100%	$ 2.000.000,00	$ 10.000.000,00	7,50	$ 15.000.000,00	7,00	$ 14.000.000,00	0,50	$ 1.000.000,00	7,50	$ 15.000.000,00
1,3	PROFESIONAL HSEQ	MES	5,00	20%	$ 3.250.000,00	$ 3.250.000,00	7,50	$ 4.875.000,00	7,00	$ 4.550.000,00	0,50	$ 325.000,00	7,50	$ 4.875.000,00
					SUBTOTAL	$ 19.250.000,00		$ 28.875.000,00		$ 26.950.000,00		$ 1.925.000,00		$ 28.875.000,00
					Factor multiplicador	2,30		2,30		2,30		2,30		2,30
					SUBTOTAL	$ 44.275.000,00		$ 66.412.500,00		$ 61.985.000,00		$ 4.427.500,00		$ 66.412.500,00
					IVA 19%	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
					TOTAL PERSONAL	$ 44.275.000,00		$ 66.412.500,00		$ 61.985.000,00		$ 4.427.500,00		$ 66.412.500,00
2,00	BIENES Y SERVICIOS	UNIDAD	CANT		VR UNITARIO	VR TOTAL								
2,1	SERVICIO DE PLOTTER Y PAPELERIA	MES	5,00		$ 550.000,00	$ 2.750.000,00	7,50	$ 4.125.000,00	7,00	$ 3.850.000,00	0,50	$ 275.000,00	7,50	$ 4.125.000,00
2,2	ARRIENDO Y SERVICIOS PUBLICOS	MES	5,00		$ 1.000.000,00	$ 5.000.000,00	7,50	$ 7.500.000,00	7,00	$ 7.000.000,00	0,50	$ 500.000,00	7,50	$ 7.500.000,00
2,4	ALQUILER DE VEHICULO	MES	5,00		$ 1.600.000,00	$ 8.000.000,00	7,50	$ 12.000.000,00	7,00	$ 11.200.000,00	0,50	$ 800.000,00	7,50	$ 12.000.000,00
2,5	ALQUILER DE EQUIPOS DE TOPOGRAFIA	MES	5,00		$ 1.200.000,00	$ 6.000.000,00	7,50	$ 9.000.000,00	7,00	$ 8.400.000,00	0,50	$ 600.000,00	7,50	$ 9.000.000,00
2,6	ENSAYOS DE LABORATORIO	MES	5,00		$ 350.000,00	$ 1.750.000,00	7,50	$ 2.625.000,00	7,00	$ 2.450.000,00	0,50	$ 175.000,00	7,50	$ 2.625.000,00
2,7	POLIZAS	GL	1,00		$ 72.000,00	$ 72.000,00	2,00	$ 144.000,00	2,00	$ 144.000,00		$ 0,00	2,00	$ 144.000,00
					SUBTOTAL	$ 23.572.000,00		$ 35.394.000,00		$ 33.044.000,00		$ 2.350.000,00		$ 35.394.000,00
					IVA 19%	$ 4.478.680,00		$ 6.724.860,00		$ 6.278.360,00		$ 446.500,00		$ 6.724.860,00
					TOTAL BIENES Y SERVICIOS	$ 28.050.680,00		$ 42.118.860,00		$ 39.322.360,00		$ 2.796.500,00		$ 42.118.860,00

	Costo Personal	$ 19.250.000,00		$ 28.875.000,00	$ 26.950.000,00	$ 1.925.000,00		$ 28.875.000,00
	Factor multiplicador	$ 44.275.000,00		$ 66.412.500,00	$ 61.985.000,00	$ 4.427.500,00		$ 66.412.500,00
	Bienes y Servicios	$ 23.572.000,00		$ 35.394.000,00	$ 33.044.000,00	$ 2.350.000,00		$ 35.394.000,00
	IVA	$ 4.478.680,00		$ 6.724.860,00	$ 6.278.360,00	$ 446.500,00		$ 6.724.860,00
	TOTAL PRESUPUESTO	$ 72.325.680,00		$ 108.531.360,00	$ 101.307.360,00	$ 7.224.000,00		$ 108.531.360,00

VALOR CONTRATADO	$ 72.325.680,00
VALOR ADICIONAL	$ 36.205.680,00
VALOR TOTAL	$ 108.531.360,00
VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA	$ 7.224.000,00
VALOR ACTA PARCIAL N° 1	$ 72.325.680,00
VALOR ACTA PARCIAL N° 2	$ 28.981.680,00
VALOR PRESENTE ACTA FINAL (a pagar)	$ 7.224.000,00
VALOR NO EJECUTADO	$ 0,00
PORCENTAJE ACUMULADO EJECUTADO	100,00%

En constancia se firma por los que en esta intervinieron:

JUVENAL PEREZ VEGA
CONTRATANTE

R.T. PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.
R/L DANIEL ALBERTO TORRES ORTIZ
CONTRATISTA

LADY PAOLA GARAVITO MARIÑO
SUPERVISORA

Elaboro:	Revisó:	Aprobó:
LIZETH FERNANDA RANGEL LEGUIZAMÓN	LADY PAOLA GARAVITO MARIÑO	JUVENAL PEREZ VEGA
Profesional de Apoyo Secretaria de Planeación y Desarrollo	Secretaria de Planeación y Desarrollo	Alcalde Municipal
