	FORMATO	Código: F-INF-17
	Informe de Visita Técnica	Versión: 04 Fecha: 01/08/2018
		Página 1 de 4

Armenia, 07 de abril de 2025

JEMAY ADOLFO ARIAS MORA
JEFE DE INSFRASTRUCTURA SOCIAL
DEPARTAMENTO DEL QUINDIO

Objeto de la visita: Evaluación para terminación de pavimentación

Lugar de desplazamiento: BARRIO LA ALAMEDA, MANZANA 3, CASA #1, PATIO BONITO ALTO DE LA CIUDAD DE ARMENIA

A petición: Sandra Liliana Mesa
Representante Legal

Medio de solicitud: verbal ____ escrito __X__ otro _____

Si la respuesta es otro: ¿Cuál? _____

LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCION



Realizar inspección técnica del área con el fin de identificar el estado actual de la vía/pavimentación y levantar un listado preliminar de materiales necesarios para la culminación de la obra.

INFORME

Scanned with CamScanner

CONCEPTO TÉCNICO

Durante la visita se evidenció que el tramo presenta condiciones mixtas en su superficie, las cuales se describen a continuación:

Existen sectores que ya cuentan con pavimentación en concreto, en condiciones variables.
Se identifican áreas con presencia de material pétreo (piedra) sin tratamiento estructural definido.
Se observan zonas con cobertura vegetal (pasto), lo que indica ausencia de intervención o deterioro del tramo.

Estas condiciones reflejan una vía parcialmente intervenida, que requiere unificación estructural para garantizar su funcionalidad y durabilidad.

RECOMENDACIONES CONCLUSIONES


Realizar limpieza y retiro de material vegetal (pasto) en las zonas no intervenidas.
Ejecutar excavación y conformación de subrasante en los tramos con piedra suelta o terreno natural.
Garantizar una adecuada compactación del terreno antes de colocar capas estructurales.
Instalar correctamente las capas de subbase y base granular para asegurar estabilidad.
Verificar el estado del concreto existente y determinar si requiere reparación o demolición parcial.
Implementar un adecuado sistema de drenaje, si se evidencian problemas de escorrentía.
Utilizar concreto con la resistencia adecuada según normatividad (ej. 3000 psi o según diseño).
Asegurar juntas de dilatación para evitar fisuras futuras.

ANEXOS

Scanned with CamScanner

	FORMATO	Código: F-INF-17
	Informe de Visita Técnica	Versión: 04 Fecha: 01/08/2018
		Página 3 de 4

REGISTRO FOTOGRAFICO

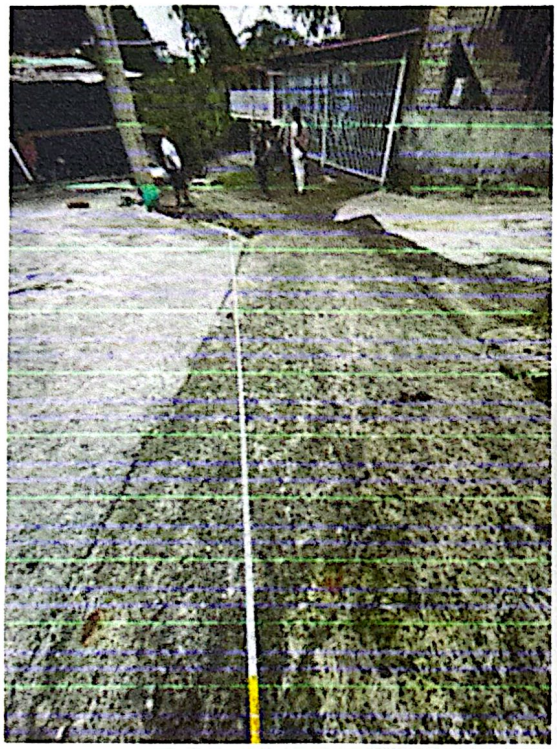





Scanned with CamScanner

JULIANA CATAÑO RODRIGUEZ
CONTRATISTA
Teléfono: 316 4201455
catanorodriguezj@gmail.com

Recibido

JEMAY ADOLFO ARIAS MORA
JEFE DE INSFRASTRUCTURA SOCIAL
DEPARTAMENTO DEL QUINDIO

Scanned with CamScanner
