	FORMATO	Código: F-INF-16
QUINDIO 1966	Registro de visita	Versión: 08 Fecha: 15/02/2022
		Página 1 de 3

FECHA DE VISITA :		26 de marzo de 2026
OBJETO DE LA SOLICITUD:		Revisión del sistema septico.
LOCALIZACION / MUNICIPIO :		Montenegro - Campo hermoso
FUNCIONARIO QUE REALIZA LA VISITA:		Jonatan Montes - Juan Cataño - Mateo García
CONTACTO	NOMBRE:	jose Eduardo Montoya Cifuentes
	DIRECCIÓN:	Campo hermoso - Vereda Calle larga
	TELÉFONO:	312 715 1938
	Email:	Comafis 70 @gmail.com.

REQUERIMIENTO DE LA VISITA: (Asunto de la solicitud)

Se efectuó la visita tecnica a la sede campo hermoso, con el fin de realizar la revision al sistema septico existente

DESCRIPCIÓN DE LA ZONA – SITUACIÓN ACTUAL

Se identificó que el sistema septico esta compuesto. Por unidades prefabricadas en material plastico, y se encontraron totalmente llenas, condicion de climatacion, no fue posible abrir la trampa de grasas. y la camara de inspeccion en concreto se encontraba a la mitad de la altura

VERIFICACIÓN DE ACCESOS:

Powered by CamScanner

	FORMATO	Código: F-INF-16
QUINDIO 1966	Registro de visita	Versión: 08 Fecha: 15/02/2022
		Página 2 de 3


VIAS DE ACCESO SI X NO ___

CATEGORIA DE LA VIA: Terciaria

TIPO DE VÍA: Asfalto X Concreto ___ Afirmado X Placa Huella ___ Otro _____

ESTADO: Bueno X Regular ___ Malo X

DIAGRAMA DE OBRAS

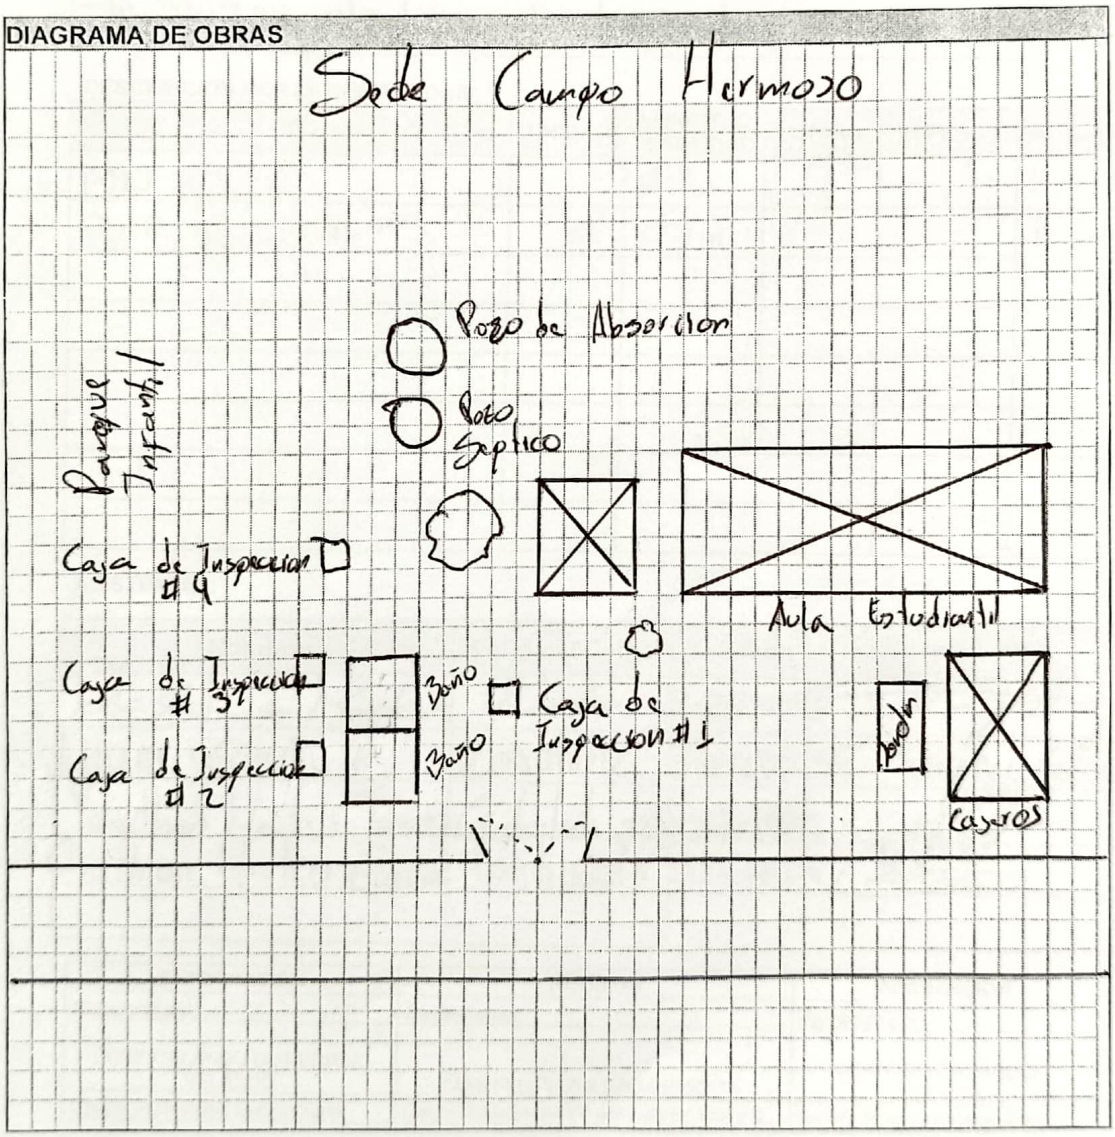

Powered by CamScanner

	FORMATO	Código: F-INF-16
QUINDIO 1966	Registro de visita	Versión: 08 Fecha: 15/02/2022
		Página 3 de 3

CONCEPTO TECNICO DE VIABILIDAD Y/O RECOMENDACIONES GENERALES

-se recomienda de manera urgente realizar el mantenimiento del pozo septico y del pozo de absorcion.
-se sugiere hacerle limpieza a la cámara de inspeccion
-se sugiere identificar la trampa de grasas

DESCRIPCION OBRAS REQUERIDAS

TIPO	UNIDAD	LONGITUD /CANTIDAD	ANCHO	ESPESOR	ALTURA
pozo septico.		ϕ=1m			H=1,m =0,79m^3
pozo absorcion		ϕ=1m			H=1m =0,79m^3

ASISTENTES:

Nombre	Entidad / Cargo	Teléfono	Firma
Jose Eduardo Montoya	Rector	3127151988	
Juliana Catano R.	Contratista	3164201455	Juliana Catano
Yonathan Montes Jimenez	Contratista SAS	3176991198	
Cristhian Mateo Garcia	Contratista	3129947529	

ELABORACION	REVISION	APROBACION
Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
JOSE ORLANDO GUTIERREZ VELASCO	LUIS FELIPE ZULUAGA PUERTA	JUAN MIGUEL GALVIS BEDOYA
Cargo: Profesional Universitario	Cargo: Director de Infraestructura Vial y S.	Cargo: Secretario Despacho

Powered by CamScanner

SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL

GOBIERNO DEL QUINDÍO

Municipio: Montenegro

Nombre de la Institucion Educativa: Marco fidel suarez

Nombre de la Sede: Campo hermoso

Dirección o Vereda: Vereda Calle larga

Accesos al lote / Predio

1 Aéreo
2 Cable o Teleferico
3 Fluvial
X Vía Terrestre
5 Otro

Condición			
4	3 X	2	1
Buenas condiciones de funcionamiento.	Regulares Condiciones (Requiriendo mantenimiento).	Malas condiciones (Requiriendo reconstruir parcialmente).	Críticas Condiciones (Requiriendo reconstruir totalmente).

Riesgos Naturales

1 Deslizamiento/Derrumbes
5 Incendio Forestal
6 Inundación
8 Sísmico

5.8 Calificación de Condición			
4	3 X	2	1
Existe afectación de riesgo con mitigación total.	Existe afectación parcial de riesgo con mitigación parcial.	Existe afectación de riesgo parcial sin ningún tipo de mitigación.	Existe afectación de riesgo total sin ningún tipo de mitigación.

Riesgos Antrópicos

no aplica

1 Almac. Químicos /Combustibles
2 Autopista/Vía Alto Tráfico/ Férrea.
3 Contaminación Auditiva
4 Contaminación de Aire
5 Edificaciones Estructuralmente Vulnerables
6 Lineas de Transmisión Eléctrica /Antenas Microondas
7 Minería
8 Orden Público
9 Rellenos Sanitarios / Cementerios
10 Otro

Calificación de Condición			
4	3	2	1
se encuentra ubicado a mas de la distancia mínima (Normativa) del riesgo identificado.	Se encuentra Ubicado a la distancia mínima (Normativa) del riesgo identificado.	Se encuentra ubicado por debajo de la distancia mínima (Normativa) del riesgo identificado, (afectaciones parciales).	Se encuentra ubicado por debajo de la distancia mínima (Normativa) del riesgo o identificado, (afectaciones totales).

Tipo de cerramiento o cerco perimetral:

1 Cerca en alambre
2 Lámina metálica
3 Madera
X Malla
X Muro
6 Otro

Calificación de Condición			
4	3 X	2	1
Se encuentra en condiciones normales y evidencia mantenimiento periódico.	Se encuentra con deterioro menor y requiere de mantenimiento preventivo.	Presenta daños parciales considerables y requieren de obras de mejoramiento (pueden causar accidentes).	Presenta daños considerables en su totalidad y requieren de obras de reconstrucción ó cambio (pueden causar accidentes)

Disponibilidad de servicios:

5.21 Calificación de Condición			
4	3 X	2	1
El servicio es permanente (100%) tiempo - mes, (atiende la cobertura total de la población escolar y usuarios).	El servicio no es Permanente (<100% y >70%) tiempo -mes, (limitando la cobertura total de la población escolar y usuarios).	El servicio no es permanente (<70% y >50% tiempo - mes, (afectando parcialmente la prestación del servicio educativo).	El servicio no es permanente (<50%) tiempo - mes, (afectando la prestación del servicio educativo).

Agua:	X Red Pública 6 Pozo Subterráneo	2 Acarreo Aljibe 7 Río o Quebrada	3 Acueducto Rural 8 Tanque de reserva	4 Agua Lluvia 9 Otro	5 Pila Pública
Energía Eléctrica:	1 Red Pública	2 Energía Eólica	3 Energía Solar	4 Plánta Electrica	5 Otro
Gas:	1 Red Pública	X Cilindro	3 Tanque Fijo	4 Otro	
Recolección de Basuras:	X Red Pública	2 Se Entierran	3 Se Queman	4 Otro	
Red Alcantarillado/Aguas Servidas:	1 Red Pública 6 Otro	2 Campo Infiltración	3 Mixta	4 Planta Tratamiento	X Pozo Séptico
Red Pluvial:	1 Red Pública	2 Campo Infiltración	X Superficial	4 Otro	
Internet:	1 ADSL 6 WiFi	2 Banda Ancha 7 Otro	3 Fibra Óptica	X Satélite	5 Telefónico
Teléfono:	1 Red Pública	X Celular - Móvil	3 Servicio Satelital	4 Otro	

Powered by CamScanner

TIPOLOGÍAS PARA MODULO 3 - EDIFICIOS

8.4 Tipo de Sistema Estructural:

En inspección visual se evidencia los elementos estructurales.

8.4 Calificación de Condición			
4	3 X	2	1
Condiciones normales: (no presentan deterioro estructural).	Deteriorado moderado parcial: (deterioros parciales físicos o roturas por oxidación o meteorización del material constructivo).	Deteriorado moderado en su totalidad: (deterioros físicos o roturas por oxidación o meteorización del material constructivo y/o la estructura se encuentra construida parcialmente.	Alto deterioro: (falta de secciones en los elementos estructurales principales, exposición de acero o varillas en el concreto, grietas, desplomes o cortes de sección en el edificio).

1 Estruct. Temporal Perecedera	4 Láminas Prefabricadas Asbesto	5 Láminas Prefabricadas Madera	6 Láminas Prefabricadas Metal
5 Muros de Carga Bloque Arcilla	6 Muros Carga Bloque Cemento	7 Muros de Carga de Ladrillo	8 Muros de Piedra, Adobe, Tapia
9 Muros Estructurales Concreto	10 Muros Estructurales Dovelas	11 Paredes Guadua, Bahareque	## Pórticos o Aporticado Concreto
13 Pórticos o Aporticado Madera	14 Pórticos o Aporticado Metálico en Perfil	15 Pórticos o Aporticado Metálico Tubular	## Otro

Materiales Predominantes en Edificios:

No aplica

(8.7 - 8.9) Calificación de Condición			
4	3	2	1
Se encuentra en condiciones normales y evidencia mantenimiento periódico.	Se encuentra con deterioro menor y requiere mantenimiento preventivo.	Presenta daños ó instalaciones parciales considerables que requieren de obras de mejoramiento, (pueden causar accidentes).	Presenta daños considerables en su totalidad que requieren de obras de mejoramiento y cambio de elementos, (pueden causar accidentes).

Material Predominante Muros de Fachadas:

1 Adobe Macizo	2 Bahareque	3 DryWall	4 Estructura Metálica Revestida
5 Estructura Metálica a la Vista	6 Hormigón Armado/Concreto	7 X Ladrillo/Bloque/Block	8 Madera
9 Malla	10 PVC Tipo AZEMBLA o RBS	11 Superboard	## Sin pared
13 Tabiquería Rellena de Adobillo	14 Zinc	15 Otro	

Material Predominante Acabado Muros / Fachadas:

1 Material propio del muro	2 Pañete sobre material muro	3 Pintura sobre material muro	4 X Pintura sobre pañete
5 Pulido	6 Repello	7 Otro	

~~Material Predominante en~~ Cubiertas:

1 Alusín	2 Aluzinc	3 Caña con Barro /Arcilla	4 Cubierta Material Vegetal
5 Concreto	6 Duralita o Canaleta	7 Estera	8 Lámina Esmaltada
9 Lámina Latón	10 Lamina Zinc/Galvanizado/Calamina	11 Palma/ Paja	## Sin Cubierta
13 Teja Asbesto Cemento	14 Teja de Barro o Arcilla	15 X Teja de Fibrocemento	## Teja Lámina Metálica
17 Teja termoacústica	18 Otro		

No aplica

Elementos Complementarios de Accesibilidad:

8.11 Calificación de Condición			
4	3	2	1
Se encuentra en condiciones normales y evidencia mantenimiento periódico.	Se encuentra con deterioro menor y requiere mantenimiento preventivo.	Presenta daños ó instalaciones parciales considerables que requieren de mantenimiento y/o cambio de elementos, ~~(pueden causar accidentes).~~	Presenta daños considerables en su totalidad que requieren de la reconstrucción o renovación del elemento, ~~(pueden causar accidentes).~~

1 Ascensor
2 Plataforma Salva Escalas
3 Rampa
4 Silla Oruga
5 Otro

No aplica

Sistema de Iluminación Exterior del Edificio:

~~Sistema de Cámaras al Exterior del~~ Edificio:

(8.16 - 8.17) Calificación de Condición			
4	3	2	1
El sistema da cobertura a la totalidad del exterior del edificio y funciona normalmente.	El sistema da cobertura parcial del exterior del edificio y funciona normalmente.	El sistema se encuentra instalado parcial o completamente, pero requiere de mantenimiento.	El sistema se encuentra instalado pero esta fuera de servicio

Tipologías de Espacios de Extensión

Sub Grupo D - Física Deportes
Espacios donde es posible practicar deportes o recrearse de manera individual o colectiva

59 Cancha de Baloncesto	60 Cancha de Beisbol	61 Cancha de Fútbol	62 Cancha de Fútbol S	
63 Cancha de Microfútbol	64 X Cancha Múltiple	65 Cancha de Voleyball	66 Gimnasio	
67 X Parque Infantil	68 Patio	69 Piscina	70 Pista Carreras a Caballo	
71 Polideportivo	72 Zona Lanzamiento Flecha	73 Otro Sub Grupo D		

Sub Grupo E - Física Expansiones Recreativas
Espacios que permiten la articulación, circulación y/o evacuación de espacios.

74 Circulación	75 Escalera	76 X Espacio Libre	77 Jardinera
78 Rampa	79 X Zona Verde	80 Otro Sub Grupo E	

Powered by CamScanner

Tipología de Espacios Complementarios

Sub Grupo I - Seguridad e información
Espacios de apoyo administrativo

98 Portería. | 99 X Vivienda Celador/Guardian. | 100 Otro Sub Grupo I

Sub Grupo L - Transporte
Espacios de apoyo administrativo

109 Garaje | 110 X Parqueadero Autos | 111 Parqueadero Buses | 112 X Parqueadero Motos
113 Otro Sub Grupo L

Sub Grupo N - Confort
Espacios de Bienestar Estudiantil y apoyo administrativo

116 Sala de Espera

117 Baño (Bateria Sanitaria) | 118 Baño Discapacitados | 119 Baño Docentes | 120 Baño Oficinas Administ.
121 Baño Preescolar | 122 X Baño Visitantes | 123 Camerinos | 124 Vestidores

128 Sala de profesores | 129 Cafetería | 130 Comedor Escolar | 131 Kiosco - Refresquería

132 Tienda Escolar | 133 Taller Mantenimiento | 134 Cuarto de Maquinas | 135 Lavandería

136 Otro Sub Grupo N

Abastecimiento y Procesamiento

Sub Grupo O - Abastecimiento y Procesamiento

137 Bodega | 138 Cuarto Basuras | 139 Cuarto Bombas | 140 Cuarto Reciclaje
141 Depósito Alimentos | 142 Depósito Baterías | 143 Depósito Combustibles | 144 Depósito General
145 Depósito Insumos Didácticos | 146 Extractores | 147 Generadores
148 Planta Generador Eléctrico | 149 Planta de Tratamiento | 150 Tanques

151 Bebederos | 152 Cafetería Docentes | 153 X Cocina | 154 Panadería

155 Otro Sub Grupo O

Conducción y Administración

Sub Grupo P - Conducción y Administración

156 Archivo | 157 Consejo Directivo | 158 X Coodinación | 159 Dirección
161 Oficina administrativa | 162 Pagaduría | 163 Prefectura | 164 Registro
165 Secretaría | 166 Subdirección | 167 Supervisión | 168 Tesorería
169 Otro Sub Grupo P

Funcionalidad Iluminación Natural:

9.10 Calificación de Condición			
4	3 X	2	1
La iluminación Normal.	La iluminación suficiente.	La iluminación insuficiente.	No existe iluminación.

Funcionalidad Ventilación Natural:

9.11 Calificación de Condición			
4	3 X	2	1
La Ventilación Normal.	La Ventilación suficiente.	La Ventilación insuficiente.	No existe Ventilación.

9.12 Funcionalidad Acústica:

9.12 Calificación de Condición			
4	3 X	2	1
La acústica es normal, no hay interrupción por ruidos exteriores.	La acústica se ve afectada en un nivel BAJO por ruidos exteriores.	La acústica se ve afectada en un nivel MEDIO por ruidos exteriores.	La acústica se ve afectada en un nivel ALTO por ruidos exteriores.

9.13 Aislamiento Térmico: no aplica

1 Piso | 2 Pared | 3 Ventana | 4 Techo

9.14 Funcionalidad Iluminación Artificial:

9.14 Calificación de Condición			
4	3 X	2	1
La iluminación es normal y funciona correctamente.	La iluminación es suficiente y funciona correctamente.	La iluminación es insuficiente, se encuentra instalado parcial o completamente, en el ambiente educativo pero requiere de mantenimiento.	No existe iluminación ó el sistema se encuentra fuera de servicio o no funciona.

Powered by CamScanner

Materiales Predominantes:

(9.15 - 9.20) Calificación de Condición			
4	3 X	2	1
Se encuentra en condiciones normales y evidencia mantenimiento periódico.	Se encuentra con deterioro menor y requiere mantenimiento preventivo.	Presenta daños ó instalaciones parciales considerables que requieren de obras de mejoramiento, (pueden causar accidentes).	Presenta daños considerables en su totalidad que requieren de obras de mejoramiento y cambio de elementos, (pueden causar accidentes).

9.15 Material Predominante Pisos:

1 Adoquín	2 Arena	3 Asfalto	6 Baldosas Cerámicas
5 Baldosa cemento	6 Concreto/Cemento Liquido	7 Granito	8 Grama Sintética
9 Madera	10 Piedra	11 Piso Sintético	## Sin piso
13 Tierra	14 Zona Verde/Pasto	15 Otro	

9.16 Material Predominantes Muros:

1 Adobe Macizo	2 Bahareque	3 DryWall	4 Estructura Metálica Revestida
5 Estructura Metálica a la Vista	6 Hormigón Armado/Concreto	X Ladrillo/Bloque/Block	8 Madera
9 Malla	10 PVC Tipo AZEMBLA o RBS	11 Superboard	## Sin pared
13 Tabiqueria Rellena de Adobillo	14 Zinc	15 Otro	

9.17 Material Predominante Acabado de Muros Interiores:

1 Acabado propio material muro	2 Enchape cerámico	3 Pañete sobre material muro	4 Papel colgadura
5 Pintura sobre estuco	X Pintura sobre material muro	7 Pintura sobre pañete	8 Sólo estuco
9 Otro			

9.18 Material Predominante Ventanas:

1 Aluminio tipo persiana	2 Celosía (Calado)	3 Marco Metálico y Vidrio	4 Marco Madera y Metal
5 Marco Madera y Vidrio	6 Marco Aluminio y Vidrio	7 Metal tipo persiana.	8 Sin Marco de Ventana
9 Sólo Aluminio	10 Sólo Madera	11 Sólo Metálico	## Sólo Reja o Barrotes.
13 Otro			

9.19 Material Predominante Puertas:

1 Madera	X Metal	3 Sin puerta	4 Vidrio
5 Otro			

9.20 Material Predominante Cielo Raso:

1 Drywall/Yeso	2 Fibrocemento	3 Icopor	4 Madera	5 Metal
6 Pañete	7 Panelit	8 Sin Cielo Raso	X Otro	

9.23 Mobiliario Escolar:

9.23 Calificación de Condición			
4	3 X	2	1
Se encuentra en condiciones normales y evidencia mantenimiento periódico.	Se encuentra con deterioro menor y requiere mantenimiento preventivo	Presenta daños ó instalaciones parciales considerables que requieren de mantenimiento, cambio y/o ajuste de elementos y/o presenta faltantes de piezas o partes.	Presenta daños considerables en su totalidad que requieren del reemplazo de los elementos, las condiciones actuales pueden causar accidentes o lesiones a los usuarios.

NOMBRE QUIEN DILIGENCIA EL FORMATO

Juliana Cotrino R.
Yonathan Mauricio Jimenez.
Mateo Garcia.

Powered by CamScanner

LISTA DE CHEQUEO

REVISIÓN SISTEMA SEPTICO, SEDES EDUCATIVAS RURALES DEL QUINDIO.

(Secretaria de Educación Departamental, Dirección de planeamiento Educativo)

campo hermoso

1. CUANTOS ESTUDIANTES TIENE LA INSTITUCIÓN: 11
2. CUANTOS PROFESORES TIENE LA INSTITUCION.: 1
3. CUANTAS PERSONAS VIVEN EN LA INSTITUCION: 8
4. LA INSTITUCION CUENTA CON TANQUE PARA DISTRIBUCION DE AGUA
   Si
5. CUANTAS BATERIAS SANITARIAS, LAVAMANOS , DUCHA , LAVADERO, LAVAPLATOS TIENE LA INSTITUCION:
   Baterias = 3 funciona 1 lavamanos: 2, ducha: 1 lavadero: 1 lavaplatos 1
6. EXISTE SISTEMA SEPTICO SI X, NO ___
7. SI LA RESPUESTA ES NO, DESCRIBA COMO SE VIERTEN LAS AGUAS RESIDUALES.
8. EL SISTEMA SEPTICO ES EN CONCRETO O EN PLASTICO
   plastico.
9. REALICE UNA PEQUEÑA DESCRIPCION DEL SISTEMA (ejemplo, sistema en concreto o plástico, las medidas son largo, ancho, profundo, tiene tapa en concreto o plástico, tiene trampa de grasas, el sistema está en buen estado o no de acuerdo a su observación, realice una inspección del tanque séptico con algún elemento para determinar la profundidad del tanque séptico y la altura de la nata, se encuentra funcionando, esta colmatado o es necesario realizar algún tipo de mantenimiento, el sistema recoge aguas residuales de la cocina y baños).si es el caso consulte con el profesor o casero si ha observado problemas con las redes sanitarias o el sistema séptico de la sede educativa.
   El sistema esta en plastico, no se pudo ubicar la trampa de grasas, pero la camara esta a media altura, El pozo septico y el de absorción totalmente llenos, se necesita mantenimiento.
10. LA DISPOSICIÓN FINAL SE HACE MEDIANTE POZO DE ABSORCIÓN O CAMPO DE INFIRLTRACION. pozo de absorcion
11. CUAL ES EL AREA DE INFILTRACION LARGO ____ , ANCHO ____
12. CUAL ES EL VOLUMEN DEL POZO DE ABSORCION. AREA DE LA TAPA 1,7m , PROFUNDIDAD DEL POZO 1m

r=0,5m
h=1m
$V = 3,1416\ (0,5)^2 \times 1 = 0,785 m^3$

Powered by CamScanner

13. EL POZO DE ABSORCION FUNCIONA SI X , NO ____, BREVE DESCRIPCION (ejemplo, no se encuentra colmatado, los líquidos tienen poca altura en el pozo, no se tiene acceso al pozo, el pozo colapso)

El poto estaba colmatado y el tanque de absorción, la (caja) eltan para mantenimiento preventivo


14. QUE ELEMENTOS DEL SISTEMA SEPTICO ES NECESARIO INTERVENIR

REDES SANITARIA ____, CAJA DE INSPECCION____, TRAMPA DE GRASAS X

TUBERIA DEDESAGUE____, TANQUEN SEPTICO X, FAFA____, POZO DE

ABSORCION X, CAMPO DE INFILTRACION____

15. REALICE UN PEQUEÑO BOSQUEJO DE LA DISTRIBUCION DEL SISTEMA SEPTICO (ejemplo, ubique la cocina, trampa de grasas, baños, lavadero y caja de inspección, tanque séptico y pozo de absorción o campo de infiltración).

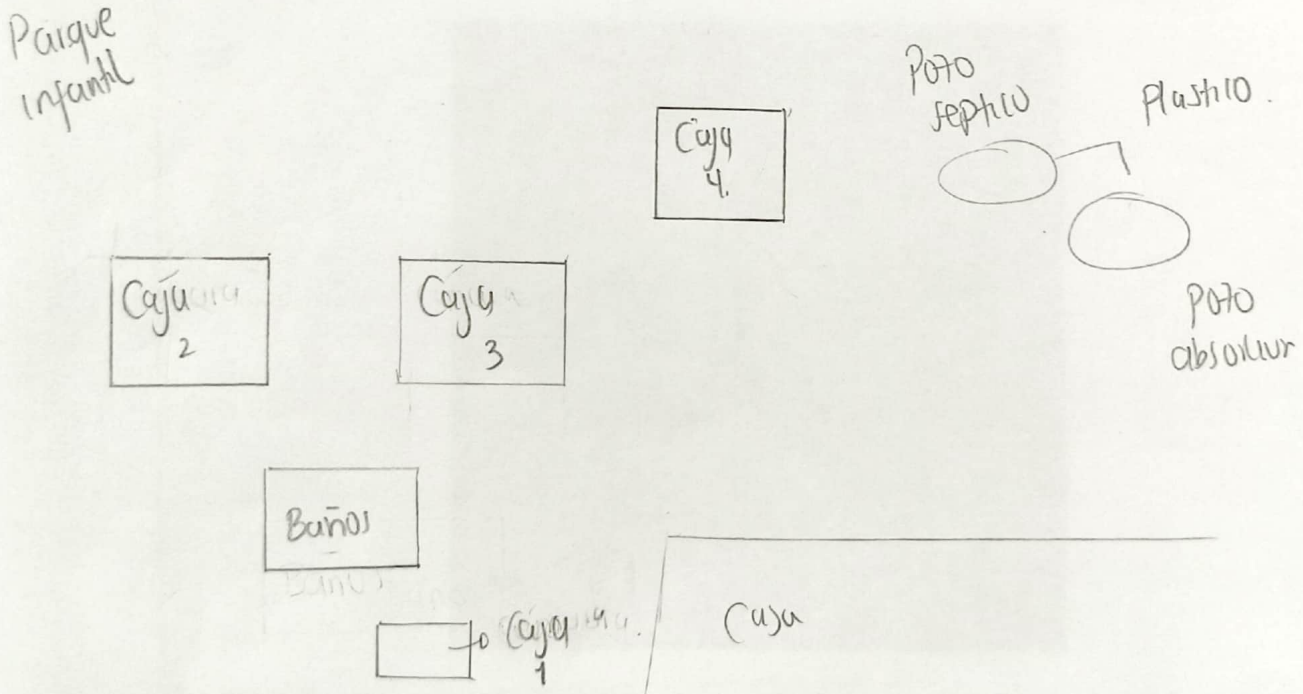

16. REGISTRO FOTOGRAFICO.

Laura Catuñ - Yonatan Montes - Mateo Garcia

NOMBRE DE QUIEN DILIGENCIA EL FORMATO

Powered by CamScanner

	FORMATO	Código: F-INF-17
	Informe de Visita Técnica	Versión: 04 Fecha: 01/08/2018
		Página 1 de 4

Armenia, 26 de Marzo de 2026

JEMAY ADOLFO ARIAS MORA
JEFE DE INSFRASTRUCTURA SOCIAL
DEPARTAMENTO DEL QUINDIO

Objeto de la visita: Apoyo a visita Técnica Sistemas sépticos

Lugar de desplazamiento: SEDE EL CAMPO HERMOSO - MONTENEGRO
A petición: José Eduardo Montoya Cifuentes
Rector.

Medio de solicitud: verbal ___ escrito __X__ otro _____

Si la respuesta es otro: ¿Cuál? _____

LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCION



En atención al requerimiento realizado, se efectuó apoyo visita técnica a la sede Campo Hermoso, con el fin de realizar la chequeo del sistema séptico existente.

Powered by CamScanner

INFORME

CONCEPTO TÉCNICO

Durante la inspección en sitio, se identificó que el sistema séptico está compuesto por unidades prefabricadas en material plástico.

Se lograron ubicar varias cajas de inspección, las cuales se encontró aproximadamente a baja altura de su capacidad, evidenciando acumulación de residuos y se recomienda mantenimiento preventivo urgente.

Asimismo, se localizaron el pozo séptico y el pozo de absorción, ambos con dimensiones aproximadas de 1,0 m de diámetro por 1,0 m de altura.

Al momento de la verificación, se evidenció que tanto el pozo séptico como el pozo de absorción se encuentran totalmente llenos, lo que indica una condición de colmatación y un inadecuado funcionamiento del sistema, así mismo el sistema de irrigacion no se ve en la zona pero se identifica que el agua que esta saliendo del pozo de absorción esta generando encharcamientos y generando malos olores en la desembocadura de su pendiente. También se ve una contaminación del terreno ya que la vegetación adyacente se encuentra seca y muerta.

No fue posible ubicar la trampa de grasas durante la visita.

RECOMENDACIONES CONCLUSIONES

Se recomienda realizar de manera urgente el mantenimiento (vaciado y limpieza) del pozo séptico y del pozo de absorción, debido a su estado de llenado total.
Se sugiere realizar limpieza de la cámara de inspección, dado su nivel de ocupación.
Se recomienda implementar un programa de mantenimiento periódico para evitar la colmatación del sistema.

Se sugiere ubicar e identificar la trampa de grasas, ya que es fundamental para el adecuado funcionamiento del sistema.

Se recomienda mantener accesibles y despejados los componentes del sistema séptico, para facilitar futuras labores de mantenimiento.

Powered by CamScanner

Se recomienda instalar el pozo séptico y el poso de absorción de 6mil litros o el que determinen para la población estudiantil actual.

Se recomienda demarcar con pintura amarilla epóxica las tapas para que sepan que es de riesgo estar cerca de ellas.

Por ultimo si se puede realizar un cerramiento para que los estudiantes se mantengan alejados seria lo ideal.

ANEXOS

REGISTRO FOTOGRAFICO

POZO SEPTICO COLMATADO



POZO ABSORCION COLMATADO



Powered by CamScanner

CAJAS DE INSPECCION





El apoyo a visita Técnica de Sistemas Sépticos, se realizó con acompañamiento del señor Rector de la Institución Educativa Marco Fidel Suárez – **SEDE CAMPO HERMOSO** – Montenegro Corregimiento Pueblo Tapado; José Edwardo Montoya. Teléfono: 3127151938 y personal adscrito a la Secretaria de Aguas e Infraestructura Departamental (S.A.I.D.).

JULIANA CATAÑO RODRIGUEZ
CONTRATISTA
Teléfono: 316 4201455
catanorodriguezj@gmail.com

YONATHAN MONTES JIMENEZ
CONTRATISTA
jrmontesjimenez88@gmail.com
Teléfono: 317 6991198

CRISTHIAN MATEO GARCÍA
Cargo: Contratista
Teléfono: 3125947529
mateogarciag0121@gmail.com

JEMAY ADOLFO ARIAS MORA
JEFE DE INSFRASTRUCTURA SOCIAL
DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
jefaturasocial@gobernacionquindio.gov.co

Powered by CamScanner
