	FORMATO	Código: F-INF-16
QUINDIO 1966	Registro de visita	Versión: 08 Fecha: 15/02/2022
		Página 1 de 3

FECHA DE VISITA :		26 de marzo de 2026
OBJETO DE LA SOLICITUD:		Revisión del sistema Septico
LOCALIZACION / MUNICIPIO :		Montenegro - sede manuel Mejia
FUNCIONARIO QUE REALIZA LA VISITA:		Jhonatan Montes - Juliana Catari - Mateo Garcia
CONTACTO	NOMBRE:	Jose Eduardo Montoya Cifuentes
	DIRECCIÓN:	vereda. el curio.
	TELÉFONO:	3127151938
	Email:	camafis70@gmail.com.

REQUERIMIENTO DE LA VISITA: (Asunto de la solicitud)

se efectuo la cita tecnica a la sede manuel Mejia, ubicado en la vereda El curio, con el fin de realizar la revision del sistema septico existente

DESCRIPCIÓN DE LA ZONA – SITUACIÓN ACTUAL

Durante la inspeccion, se presento un mayor grado de complejidad en comparacion con otras, debido a la dificultad Para la identificacion de los componentes del sistema septico. se logro mediante labores de excavacion y estaba en estado de colmatacion, no esta funcionando de manera adecuada.

VERIFICACIÓN DE ACCESOS:

Powered by CamScanner

	FORMATO	Código: F-INF-16
	Registro de visita	Versión: 08 Fecha: 15/02/2022
		Página 2 de 3


VIAS DE ACCESO SI X NO ____

CATEGORIA DE LA VIA: Terciaria

TIPO DE VÍA: Asfalto X Concreto ___ Afirmado X Placa Huella X Otro _____

ESTADO: Bueno X Regular ___ Malo X

DIAGRAMA DE OBRAS

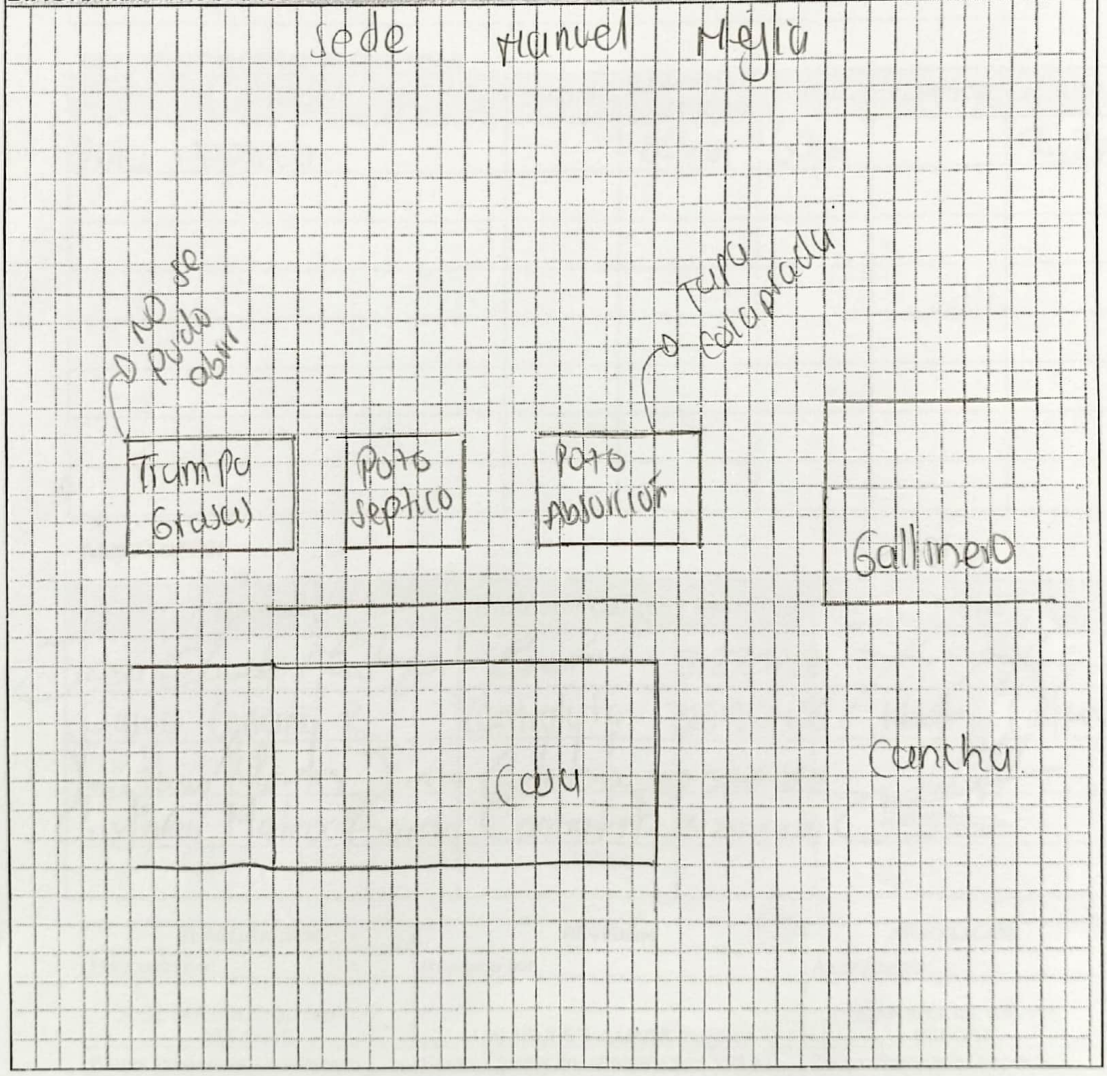

Powered by CamScanner

	FORMATO	Código: F-INF-16
QUINDIO 1966	Registro de visita	Versión: 08 Fecha: 15/02/2022
		Página 3 de 3

CONCEPTO TECNICO DE VIABILIDAD Y/O RECOMENDACIONES GENERALES
-se recomienda de manera preventiva el mantenimiento Limpieza y vaciado del pozo septico. - se sugiere llevar a cabo una inspección más detallada, y tener limpieza constante. para el mantenimiento.

DESCRIPCION OBRAS REQUERIDAS

TIPO	UNIDAD	LONGITUD /CANTIDAD	ANCHO	ESPESOR	ALTURA
Pozo septico.		60cm	60cm		2,2m

ASISTENTES:

Nombre	Entidad / Cargo	Teléfono	Firma
Jose Eduardo Montoya	Rector	3127151988	
Juliana Cataño R.	Contratista	3164201455	Juliana Cataño
Jonathan Montes Jimenez	Contratista SAPD	3176991998	
Cristhian Mateo Garcia	Contratista	3125947584	

ELABORACION	REVISION	APROBACION
Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
JOSE ORLANDO GUTIERREZ VELASCO	LUIS FELIPE ZULUAGA PUERTA	JUAN MIGUEL GALVIS BEDOYA
Cargo: Profesional Universitario	Cargo: Director de Infraestructura Vial y S.	Cargo: Secretario Despacho

Powered by CamScanner

SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL

GOBIERNO DEL QUINDÍO

Municipio: Montenegro

Nombre de la Institucion Educativa: Marco fidel Suarez

Nombre de la Sede: Manuel Mejia

Dirección o Vereda: Vereda el Cuzco.

Accesos al lote / Predio

1	Aéreo
2	Cable o Teleferico
3	Fluvial
4	Vía Terrestre
5	Otro

Condición			
4	3	2	1
Buenas condiciones de funcionamiento.	Regulares Condiciones (Requiriendo mantenimiento).	Malas condiciones (Requiriendo reconstruir parcialmente).	Criticas Condiciones (Requiriendo reconstruir totalmente).

Riesgos Naturales

1	Deslizamiento/Derrumbes
5	Incendio Forestal
6	Inundación
8	Sísmico

5.8 Calificación de Condición			
4	3	2	1
Existe afectación de riesgo con mitigación total.	Existe afectación parcial de riesgo con mitigación parcial.	Existe afectación de riesgo parcial sin ningún tipo de mitigación.	Existe afectación de riesgo total sin ningún tipo de mitigación.

Riesgos Antrópicos

1	Almac. Químicos /Combustibles
2	Autopista/Vía Alto Tráfico/ Férrea.
3	Contaminación Auditiva
4	Contaminación de Aire
5	Edificaciones Estructuralmente Vulnerables
6	Lineas de Transmisión Eléctrica /Antenas Microondas
7	Minería
8	Orden Público
9	Rellenos Sanitarios / Cementerios
10	Otro

no aplica

Calificación de Condición			
4	3	2	1
se encuentra ubicado a más de la distancia mínima (Normativa) del riesgo identificado.	Se encuentra Ubicado a la distancia mínima (Normativa) del riesgo identificado.	Se encuentra ubicado por debajo de la distancia mínima (Normativa) del riesgo identificado, (afectaciones parciales).	Se encuentra ubicado por debajo de la distancia mínima (Normativa) del riesgo o identificado, (afectaciones totales).

Tipo de cerramiento o cerco perimetral:

1	Cerca en alambre
2	Lámina metálica
3	Madera
4	Malla
5	Muro
6	Otro

Calificación de Condición			
4	3	2	1
Se encuentra en condiciones normales y evidencia mantenimiento periódico.	Se encuentra con deterioro menor y requiere de mantenimiento preventivo.	Presenta daños parciales considerables y requieren de obras de mejoramiento (pueden causar accidentes).	Presenta daños considerables en su totalidad y requieren de obras de reconstrucción ó cambio (pueden causar accidentes)

Disponibilidad de servicios:

5.21 Calificación de Condición			
4	3	2	1
El servicio es permanente (100%) tiempo - mes, (atiende la cobertura total de la población escolar y usuarios).	El servicio no es Permanente (<100% y >70%) tiempo -mes, (limitando la cobertura total de la población escolar y usuarios).	El servicio no es permanente (<70% y >50% tiempo - mes, (afectando parcialmente la prestación del servicio educativo).	El servicio no es permanente (<50%) tiempo - mes, (afectando la prestación del servicio educativo).

Agua:	1 Red Pública 6 Pozo Subterráneo	2 Acarreo Aljibe 7 Río o Quebrada	3 Acueducto Rural 8 Tanque de reserva	4 Agua Lluvia 9 Otro	5 Pila Pública
Energía Eléctrica:	1 Red Pública	2 Energía Eólica	3 Energía Solar	4 Plánta Electrica	5 Otro
Gas:	1 Red Pública	2 Cilindro	3 Tanque Fijo	4 Otro	
Recolección de Basuras:	1 Red Pública	2 Se Entierran	3 Se Queman	4 Otro	
Red Alcantarillado/Aguas Servidas:	1 Red Pública 6 Otro	2 Campo Infiltración	3 Mixta	4 Planta Tratamiento	5 Pozo Séptico
Red Pluvial:	1 Red Pública	2 Campo Infiltración	3 Superficial	4 Otro	
Internet:	1 ADSL 6 WiFi	2 Banda Ancha 7 Otro	3 Fibra Óptica	4 Satélite	5 Telefónico
Teléfono:	1 Red Pública	2 Celular - Móvil	3 Servicio Satelital	4 Otro	

Powered by CamScanner

TIPOLOGÍAS PARA MODULO 3 - EDIFICIOS

8.4 Tipo de Sistema Estructural:

En inspección visual se evidencia los elementos estructurales.

8.4 Calificación de Condición			
4	3	2	1
Condiciones normales: (no presentan deterioro estructural).	Deteriorado moderado parcial: (deterioros parciales físicos o roturas por oxidación o meteorización del material constructivo).	Deteriorado moderado en su totalidad: (deterioros físicos o roturas por oxidación o meteorización del material constructivo y/o la estructura se encuentra construida parcialmente.	Alto deterioro: (falta de secciones en los elementos estructurales principales, exposición de acero o varillas en el concreto, grietas, desplomes o cortes de sección en el edificio).

1 Estruct. Temporal Perecedera	2 Láminas Prefabricadas Asbesto	3 Láminas Prefabricadas Madera	4 Láminas Prefabricadas Metal
5 Muros de Carga Bloque Arcilla	6 Muros Carga Bloque Cemento	7 Muros de Carga de Ladrillo	8 Muros de Piedra, Adobe, Tapia
9 Muros Estructurales Concreto	10 Muros Estructurales Dovelas	11 Paredes Guadua, Bahareque	## Pórticos o Aporticado Concreto
13 Pórticos o Aporticado Madera	14 Pórticos o Aporticado Metálico en Perfil	15 Pórticos o Aporticado Metálico Tubular	## Otro

Materiales Predominantes en Edificios: no aplica

(8.7 - 8.9) Calificación de Condición			
4	3	2	1
Se encuentra en condiciones normales y evidencia mantenimiento periódico.	Se encuentra con deterioro menor y requiere mantenimiento preventivo.	Presenta daños ó instalaciones parciales considerables que requieren de obras de mejoramiento, (pueden causar accidentes).	Presenta daños considerables en su totalidad que requieren de obras de mejoramiento y cambio de elementos, (pueden causar accidentes).

Material Predominante Muros de Fachadas:

1 Adobe Macizo	2 Bahareque	3 DryWall	4 Estructura Metálica Revestida
5 Estructura Metálica a la Vista	6 Hormigón Armado/Concreto	7 Ladrillo/Bloque/Block	8 Madera
9 Malla	10 PVC Tipo AZEMBLA o RBS	11 Superboard	## Sin pared
13 Tablqueria Rellena de Adobillo	14 Zinc	15 Otro	

Material Predominante Acabado Muros / Fachadas:

1 Material propio del muro	2 Pañete sobre material muro	3 Pintura sobre material muro	4 Pintura sobre pañete
5 Pulido	6 Repello	7 Otro	

Material Predominante en Cubiertas:

1 Alusín	2 Aluzinc	3 Caña con Barro /Arcilla	4 Cubierta Material Vegetal
5 Concreto	6 Duralita o Canaleta	7 Estera	8 Lámina Esmaltada
9 Lámina Latón	10 Lamina Zinc/Galvanizado/Calamina	11 Palma/ Paja	## Sin Cubierta
13 Teja Asbesto Cemento	14 Teja de Barro o Arcilla	15 Teja de Fibrocemento	## Teja Lámina Metálica
17 Teja termoacústica	18 Otro		

no aplica

Elementos Complementarios de Accesibilidad:

1 Ascensor
2 Plataforma Salva Escalas
3 Rampa
4 Silla Oruga
5 Otro

8.11 Calificación de Condición			
4	3	2	1
Se encuentra en condiciones normales y evidencia mantenimiento periódico.	Se encuentra con deterioro menor y requiere mantenimiento preventivo.	Presenta daños ó instalaciones parciales considerables que requieren de mantenimiento y/o cambio de elementos, (pueden causar accidentes).	Presenta daños considerables en su totalidad que requieren de la reconstrucción o renovación del elemento, (pueden causar accidentes).

no aplica

Sistema de Iluminación Exterior del Edificio:

Sistema de Cámaras al Exterior del Edificio:

(8.16 - 8.17) Calificación de Condición			
4	3	2	1
El sistema da cobertura a la totalidad del exterior del edificio y funciona normalmente.	El sistema da cobertura parcial del exterior del edificio y funciona normalmente.	El sistema se encuentra instalado parcial o completamente, pero requiere de mantenimiento.	El sistema se encuentra instalado pero esta fuera de servicio

Tipologías de Espacios de Extensión

Sub Grupo D - Física Deportes
Espacios donde es posible practicar deportes o recrearse de manera individual o colectiva

59 Cancha de Baloncesto	60 Cancha de Beisbol	61 Cancha de Fútbol	62 Cancha de Fútbol 5
63 Cancha de Microfútbol	64 Cancha Múltiple	65 Cancha de Voleyball	66 Gimnasio
67 Parque Infantil	68 Patio	69 Piscina	70 Pista Carreras a Caballo
71 Polideportivo	72 Zona Lanzamiento Flecha	73 Otro Sub Grupo D	

Sub Grupo E - Física Expansiones Recreativas
Espacios que permiten la articulación, circulación y/o evacuación de espacios.

74 Circulación	75 Escalera	76 Espacio Libre	77 Jardinera
78 Rampa	79 Zona Verde	80 Otro Sub Grupo E	

Powered by CamScanner

Tipología de Espacios Complementarios

Sub Grupo I - Seguridad e Información
Espacios de apoyo administrativo

98 Portería. | 99 X Vivienda Celador/Guardian. | 100 Otro Sub Grupo I

Sub Grupo L - Transporte
Espacios de apoyo administrativo

109 Garaje | 110 Parqueadero Autos | 111 Parqueadero Buses | 112 Parqueadero Motos
113 Otro Sub Grupo L

no aplica

Sub Grupo N - Confort
Espacios de Bienestar Estudiantil y apoyo administrativo

116 Sala de Espera
117 X Baño (Bateria Sanitaria) | 118 Baño Discapacitados | 119 Baño Docentes | 120 Baño Oficinas Administ.
121 Baño Preescolar | 122 X Baño Visitantes | 123 Camerinos | 124 Vestidores
128 Sala de profesores | 129 Cafeteria | 130 X Comedor Escolar | 131 Kiosco - Refresquería
132 Tienda Escolar | 133 Taller Mantenimiento | 134 Cuarto de Maquinas | 135 X Lavandería
136 Otro Sub Grupo N

Abastecimiento y Procesamiento

Sub Grupo O - Abastecimiento y Procesamiento

137 Bodega | 138 Cuarto Basuras | 139 Cuarto Bombas | 140 Cuarto Reciclaje
141 X Depósito Alimentos | 142 Depósito Baterías | 143 Depósito Combustibles | 144 Depósito General
145 Depósito Insumos Didácticos | 146 Extractores | 147 Generadores
148 Planta Generador Eléctrico | 149 Planta de Tratamiento | 150 Tanques
151 Bebederos | 152 Cafeteria Docentes | 153 X Cocina | 154 Panadería
155 Otro Sub Grupo O

Conducción y Administración

Sub Grupo P - Conducción y Administración

156 Archivo | 157 Consejo Directivo | 158 Coodinación | 159 Dirección
161 Oficina administrativa | 162 Pagaduría | 163 Prefectura | 164 Registro
165 Secretaria | 166 Subdirección | 167 Supervisión | 168 Tesorería
169 Otro Sub Grupo P

no aplica

Funcionalidad Iluminación Natural:

9.10 Calificación de Condición			
4 X	3	2	1
La iluminación Normal.	La iluminación suficiente.	La iluminación Insuficiente.	No existe iluminación.

Funcionalidad Ventilación Natural:

9.11 Calificación de Condición			
4 X	3	2	1
La Ventilación Normal.	La Ventilación suficiente.	La Ventilación Insuficiente.	No existe Ventilación.

9.12 Funcionalidad Acústica:

9.12 Calificación de Condición			
4 X	3	2	1
La acústica es normal, no hay interrupción por ruidos exteriores.	La acústica se ve afectada en un nivel BAJO por ruidos exteriores.	La acústica se ve afectada en un nivel MEDIO por ruidos exteriores.	La acústica se ve afectada en un nivel ALTO por ruidos exteriores.

no aplica.

9.13 Aislamiento Térmico: 1 Piso | 2 Pared | 3 Ventana | 4 Techo

9.14 Funcionalidad Iluminación Artificial:

9.14 Calificación de Condición			
4	3 X	2	1
La iluminación es normal y funciona correctamente.	La iluminación es suficiente y funciona correctamente.	La iluminación es insuficiente, se encuentra instalado parcial o completamente, en el ambiente educativo pero requiere de mantenimiento.	No existe iluminación ó el sistema se encuentra fuera de servicio o no funciona.

Powered by CamScanner

Materiales Predominantes:

(9.15 - 9.20) Calificación de Condición			
4	3 X	2	1
Se encuentra en condiciones normales y evidencia mantenimiento periódico.	Se encuentra con deterioro menor y requiere mantenimiento preventivo.	Presenta daños ó instalaciones parciales considerables que requieren de obras de mejoramiento, (pueden causar accidentes).	Presenta daños considerables en su totalidad que requieren de obras de mejoramiento y cambio de elementos, (pueden causar accidentes).

9.15 Material Predominante Pisos:

1 Adoquín	2 Arena	3 Asfalto	4 X Baldosas Cerámicas
5 Baldosa cemento	6 Concreto/Cemento Liquido	7 Granito	8 Grama Sintética
9 Madera	10 Piedra	11 Piso Sintético	## Sin piso
13 Tierra	14 X Zona Verde/Pasto	15 Otro	

9.16 Material Predominantes Muros:

1 Adobe Macizo	2 Bahareque	3 DryWall	4 Estructura Metálica Revestida
5 Estructura Metálica a la Vista	6 Hormigón Armado/Concreto	7 X Ladrillo/Bloque/Block	8 Madera
9 Malla	10 PVC Tipo AZEMBLA o RBS	11 Superboard	## Sin pared
13 Tabiqueria Rellena de Adobillo	14 Zinc	15 Otro	

9.17 Material Predominante Acabado de Muros Interiores:

1 Acabado propio material muro	2 Enchape cerámico	3 Pañete sobre material muro	4 Papel colgadura
5 Pintura sobre estuco	7 X Pintura sobre material muro	7 Pintura sobre pañete	8 Sólo estuco
9 Otro			

9.18 Material Predominante Ventanas:

1 Aluminio tipo persiana	2 Celosía (Calado)	3 X Marco Metálico y Vidrio	4 Marco Madera y Metal
5 Marco Madera y Vidrio	6 Marco Aluminio y Vidrio	7 Metal tipo persiana.	8 Sin Marco de Ventana
9 Sólo Aluminio	10 Sólo Madera	11 Sólo Metálico	## Sólo Reja o Barrotes.
13 Otro			

9.19 Material Predominante Puertas:

1 Madera	2 X Metal	3 Sin puerta	4 X Vidrio
5 Otro			

9.20 Material Predominante Cielo Raso:

1 Drywall/Yeso	2 Fibrocemento	3 Icopor	4 Madera	5 Metal
6 Pañete	7 Panelit	8 Sin Cielo Raso	9 X Otro	

9.23 Mobiliario Escolar:

9.23 Calificación de Condición			
4	3 X	2	1
Se encuentra en condiciones normales y evidencia mantenimiento periódico.	Se encuentra con deterioro menor y requiere mantenimiento preventivo	Presenta daños ó instalaciones parciales considerables que requieren de mantenimiento, cambio y/o ajuste de elementos y/o presenta faltantes de piezas o partes.	Presenta daños considerables en su totalidad que requieren del reemplazo de los elementos, las condiciones actuales pueden causar accidentes o lesiones a los usuarios.

NOMBRE QUIEN DILIGENCIA EL FORMATO

Juliana Catari R
Yonathan Montes Jimenez
Mateo Garcia

Powered by CamScanner

Manuel mejia.

LISTA DE CHEQUEO

REVISIÓN SISTEMA SEPTICO, SEDES EDUCATIVAS RURALES DEL QUINDIO.

(Secretaria de Educación Departamental, Dirección de planeamiento Educativo)

1. CUANTOS ESTUDIANTES TIENE LA INSTITUCIÓN: 4
2. CUANTOS PROFESORES TIENE LA INSTITUCION.: 1
3. CUANTAS PERSONAS VIVEN EN LA INSTITUCION: 3
4. LA INSTITUCION CUENTA CON TANQUE PARA DISTRIBUCION DE AGUA Si
5. CUANTAS BATERIAS SANITARIAS, LAVAMANOS , DUCHA , LAVADERO, LAVAPLATOS TIENE LA INSTITUCION:
   Baterias: 4 lavamanos 5. ducha 1 lavadero 1 lavaplatos 3
6. EXISTE SISTEMA SEPTICO SI X, NO ___
7. SI LA RESPUESTA ES NO, DESCRIBA COMO SE VIERTEN LAS AGUAS RESIDUALES.
8. EL SISTEMA SEPTICO ES EN CONCRETO O EN PLASTICO
   Concreto
9. REALICE UNA PEQUEÑA DESCRIPCION DEL SISTEMA (ejemplo, sistema en concreto o plástico, las medidas son largo, ancho, profundo, tiene tapa en concreto o plástico, tiene trampa de grasas, el sistema está en buen estado o no de acuerdo a su observación, realice una inspección del tanque séptico con algún elemento para determinar la profundidad del tanque séptico y la altura de la nata, se encuentra funcionando, esta colmatado o es necesario realizar algún tipo de mantenimiento, el sistema recoge aguas residuales de la cocina y baños).si es el caso consulte con el profesor o casero si ha observado problemas con las redes sanitarias o el sistema séptico de la sede educativa.
   Sistema es de concreto, se pudo encontrar el pozo septico que esta colapsado con medidas 60x60cm con profundidad de 2,2m, no se pudo encontrar la trampa de grasa, las camaras porque estaban muy tapadas
10. LA DISPOSICIÓN FINAL SE HACE MEDIANTE POZO DE ABSORCIÓN O CAMPO DE INFIRLTRACION. pozo de absorcion
11. CUAL ES EL AREA DE INFILTRACION LARGO ____ , ANCHO _____
12. CUAL ES EL VOLUMEN DEL POZO DE ABSORCION. AREA DE LA TAPA 60cmx60cm PROFUNDIDAD DEL POZO 2,2m .

Powered by CamScanner

13. EL POZO DE ABSORCION FUNCIONA SI X , NO _____, BREVE DESCRIPCION (ejemplo, no se encuentra colmatado, los líquidos tienen poca altura en el pozo, no se tiene acceso al pozo, el pozo colapso)

El poto se encuentra colmatado, esta type: lleno, necesita mantenimiento, la trampa no se pudo abrir y el poto de absorción estaba colapsada.


14. QUE ELEMENTOS DEL SISTEMA SEPTICO ES NECESARIO INTERVENIR

REDES SANITARIA _____, CAJA DE INSPECCION_____, TRAMPA DE GRASAS X

TUBERIA DEDESAGUE_____, TANQUEN SEPTICO X, FAFA_____, POZO DE

ABSORCION X, CAMPO DE INFILTRACION_____

15. REALICE UN PEQUEÑO BOSQUEJO DE LA DISTRIBUCION DEL SISTEMA SEPTICO (ejemplo, ubique la cocina, trampa de grasas, baños, lavadero y caja de inspección, tanque séptico y pozo de absorción o campo de infiltración).

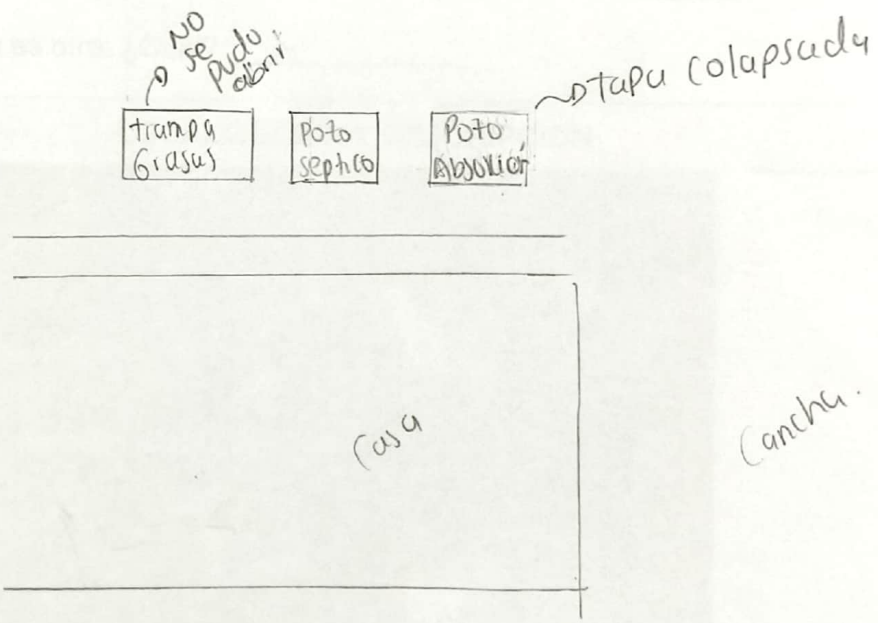

16. REGISTRO FOTOGRAFICO.

Yoadhan Montes Jimenez
Mateo Garcia
Juliana Cataño Rodriguez

NOMBRE DE QUIEN DILIGENCIA EL FORMATO

Powered by CamScanner

	FORMATO	Código: F-INF-17
	Informe de Visita Técnica	Versión: 04 Fecha: 01/08/2018
		Página 1 de 3

Armenia, 26 de Marzo de 2026

JEMAY ADOLFO ARIAS MORA
JEFE DE INSFRASTRUCTURA SOCIAL
DEPARTAMENTO DEL QUINDIO

Objeto de la visita: Apoyo a visita Técnica Sistemas sépticos.

Lugar de desplazamiento: **SEDE MANUEL MEJIA - MONTENEGRO**
A petición: José Eduardo Montoya Cifuentes
Rector.

Medio de solicitud: verbal ____ escrito __X__ otro _____

Si la respuesta es otro: ¿Cuál? _____

LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCION



En atención al requerimiento realizado, se efectuó apoyo a visita técnica a la Sede Manuel Mejía, ubicada en la vereda El Cusco, con el fin de realizar la verificación del sistema séptico existente.

Powered by CamScanner

INFORME

CONCEPTO TÉCNICO

Durante la inspección en sitio, esta sede presentó un mayor grado de complejidad en comparación con otras, debido a la dificultad para la identificación de los componentes del sistema séptico.

Únicamente fue posible ubicar el pozo séptico, el cual se logró identificar mediante labores de excavación. No fue posible localizar otros elementos del sistema, como cajas de inspección, campo de infiltración u otros componentes asociados.

Al momento de la verificación, se evidenció que el pozo séptico se encuentra en estado de colmatación, presentando un llenado total, lo que indica que el sistema no está funcionando de manera adecuada.

RECOMENDACIONES CONCLUSIONES

Se recomienda realizar de manera prioritaria el mantenimiento (limpieza y vaciado) del pozo séptico, debido a su estado de colmatación total.
Se sugiere llevar a cabo una inspección más detallada del sistema, que permita la ubicación de los demás componentes (cámaras de inspección, campo de infiltración, entre otros), con el fin de evaluar integralmente su funcionamiento.
Se recomienda implementar señalización o dejar accesibles los puntos del sistema séptico, para facilitar futuras labores de mantenimiento y evitar intervenciones invasivas como excavaciones.

ANEXOS

REGISTRO FOTOGRAFICO

POZO SEPTICO



POZO DE ABSORCION



Powered by CamScanner

SISTEMA SEPTICO Y TRAMPA DE GRASA QUE SE ENCUENTRA UBICADA DEBAJO DE LA CANAL DE AGUAS LLUVIAS IMPOSIBILITANDO EL CHEQUEO DE LA MISMA.





El apoyo a visita Técnica de Sistemas Sépticos, se realizó con acompañamiento del señor Rector de la Institución Educativa Marco Fidel Suárez – **SEDE MANUEL MEJIA** – Montenegro Corregimiento Pueblo Tapado; José Edwardo Montoya. Teléfono: 3127151938 y personal adscrito a la Secretaria de Aguas e Infraestructura Departamental (S.A.I.D.).

Juliana Cataño

JULIANA CATAÑO RODRIGUEZ
CONTRATISTA
Teléfono: 316 4201455
catanorodriguezj@gmail.com

YONATHAN MONTES JIMENEZ
CONTRATISTA
jrmontesjimenez88@gmail.com
Teléfono: 317 6991198

CRISTHIAN MATEO GARCÍA
Cargo: Contratista
Teléfono: 3125947529
mateogarciag0121@gmail.com

JEMAY ADOLFO ARIAS MORA
JEFE DE INSFRASTRUCTURA SOCIAL
DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
jefaturasocial@gobernacionquindio.gov.co

Powered by CamScanner
