	FORMATO	Código: F-INF-16
QUINDIO 1966	Registro de visita	Versión: 08 Fecha: 15/02/2022 Página 1 de 3

FECHA DE VISITA :		26 de marzo de 2026
OBJETO DE LA SOLICITUD:		Revision del Sistema Septico
LOCALIZACION / MUNICIPIO :		Montenegro - Sede Risaralda.
FUNCIONARIO QUE REALIZA LA VISITA:		Jhonatan Montes - Juliana Cataño - Mateo Garcia
CONTACTO	NOMBRE:	Jose eduardo Montoya Cifuentes
	DIRECCIÓN:	Vereda Risaralda
	TELÉFONO:	3127151938
	Email:	comafis70@gmail.com

REQUERIMIENTO DE LA VISITA: (Asunto de la solicitud)

Se realiza la visita Tecnica a la sede Risaralda de la Institucion educativa Mario fidel Suarez, con el fin de realizar la revision del Sistema septico existente

DESCRIPCIÓN DE LA ZONA – SITUACIÓN ACTUAL

Durante la inspeccion en sitio en horas de la mañana se logro identificar la ubicacion de 2 camaras de inspeccion, de las cuales se realizó la apertura de una de ellas, y el pozo de absorcion y campo de infiltracion, las cuales no presentan condiciones de colmatacion, pero no fue Posible ubicar la trampa de grasas.

VERIFICACIÓN DE ACCESOS:

Powered by CamScanner

	FORMATO	Código: F-INF-16
	Registro de visita	Versión: 08 Fecha: 15/02/2022
		Página 2 de 3


VIAS DE ACCESO SI X NO ___

CATEGORIA DE LA VIA: Terciaria

TIPO DE VÍA: Asfalto___ Concreto___ Afirmado X Placa Huella X Otro _____

ESTADO: Bueno ___ Regular X Malo X

DIAGRAMA DE OBRAS

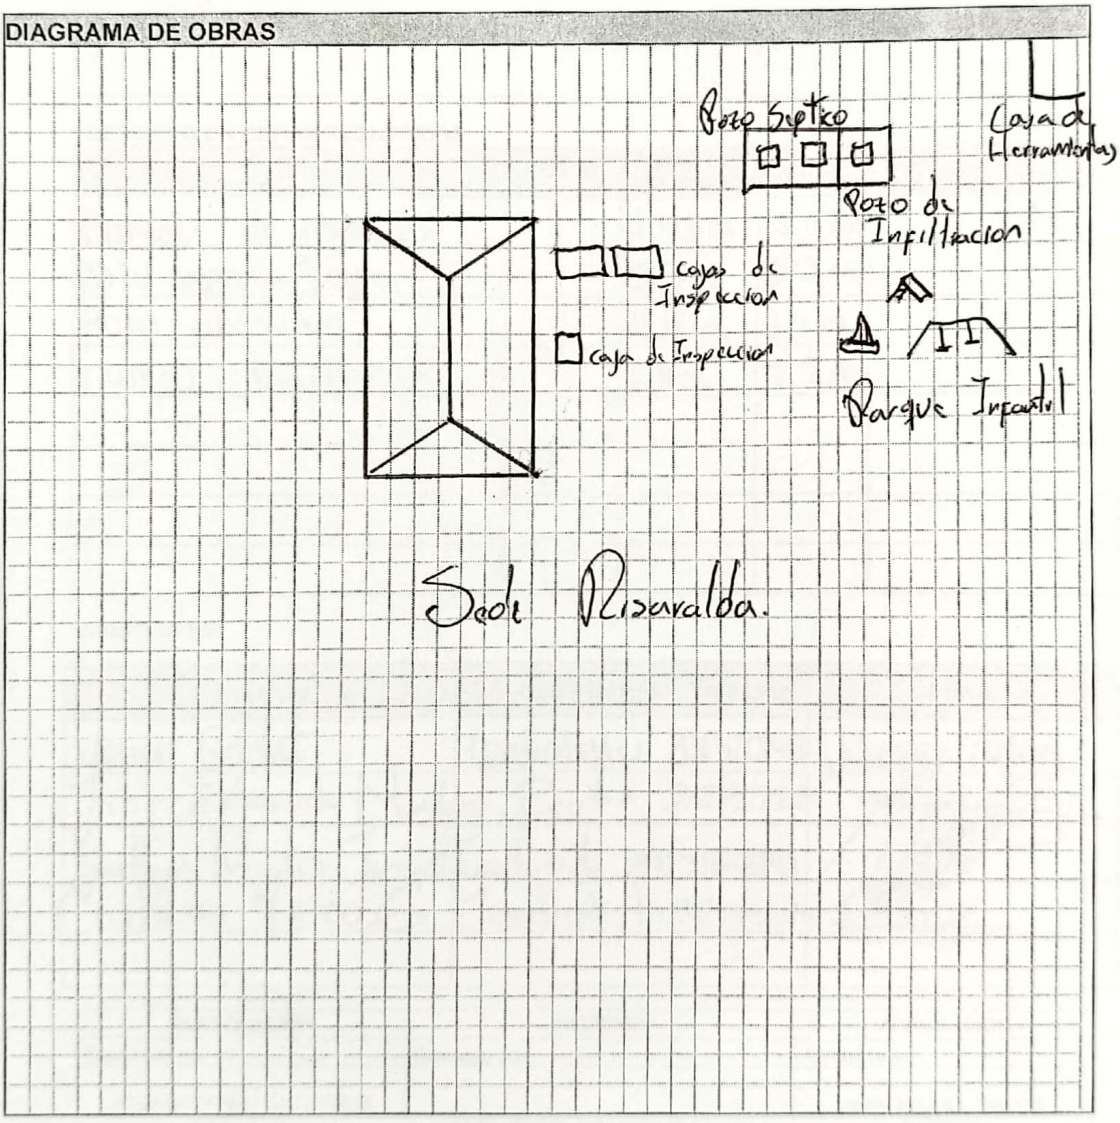

Powered by CamScanner

	FORMATO	Código: F-INF-16
	Registro de visita	Versión: 08 Fecha: 15/02/2022
		Página 3 de 3

CONCEPTO TECNICO DE VIABILIDAD Y/O RECOMENDACIONES GENERALES
- Se recomienda mantener despejadas las tapas de las cámaras, Pozos, debido a que toca realizar excavaciones y retirar vegetación. - Se sugiere realizar la ubicación de la trampa de grasa para su adecuado mantenimiento.

DESCRIPCION OBRAS REQUERIDAS

TIPO	UNIDAD	LONGITUD /CANTIDAD	ANCHO	ESPESOR	ALTURA
Ramáles de inspección		1,45m	1,55m		3m
Pozo septico. Tapa		50cm	50cm		
Pozo absorción		2,10m	1,2m		
Campo infiltración		1,4m	1,2m.		

ASISTENTES:

Nombre	Entidad / Cargo	Teléfono	Firma
Juliana Catañó	Contratista	3164201455	Juliana Catañó
Jose Eduardo Montoya	Rector	3127151988	
Jonathan Mauricio Jimenez	Contratista	3176991193	
Cristhian Mateo G.	Contratista	3125947324	

ELABORACION	REVISION	APROBACION
Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
JOSE ORLANDO GUTIERREZ VELASCO	LUIS FELIPE ZULUAGA PUERTA	JUAN MIGUEL GALVIS BEDOYA
Cargo: Profesional Universitario	Cargo: Director de Infraestructura Vial y S.	Cargo: Secretario Despacho

Powered by CamScanner

SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL

GOBIERNO DEL QUINDÍO

Municipio: Montenegro

Nombre de la Institucion Educativa: Marco fidel Suarez

Nombre de la Sede: Sede Risaralda

Dirección o Vereda: vereda Risaralda.

Accesos al lote / Predio

1 Aéreo
2 Cable o Teleferico
3 Fluvial
X Vía Terrestre
5 Otro

Condición			
4	3	2	1
Buenas condiciones de funcionamiento	Regulares Condiciones (Requiriendo mantenimiento).	Malas condiciones (Requiriendo reconstruir parcialmente).	Críticas Condiciones (Requiriendo reconstruir totalmente).

Riesgos Naturales

1 Deslizamiento/Derrumbes
5 Incendio Forestal
6 Inundación
X Sísmico

5.8 Calificación de Condición			
4	3 X	2	1
Existe afectación de riesgo con mitigación total.	Existe afectación parcial de riesgo con mitigación parcial.	Existe afectación de riesgo parcial sin ningún tipo de mitigación.	Existe afectación de riesgo total sin ningún tipo de mitigación.

Riesgos Antrópicos

no aplica

1 Almac. Químicos /Combustibles
2 Autopista/Vía Alto Tráfico/ Férrea.
3 Contaminación Auditiva
4 Contaminación de Aire
5 Edificaciones Estructuralmente Vulnerables
6 Lineas de Transmisión Eléctrica /Antenas Microondas
7 Minería
8 Orden Público
9 Rellenos Sanitarios / Cementerios
10 Otro

Calificación de Condición			
4	3	2	1
se encuentra ubicado por fuera de la distancia mínima (Normativa) del riesgo identificado.	Se encuentra Ubicado a la distancia mínima (Normativa) del riesgo identificado.	Se encuentra ubicado por debajo de la distancia mínima (Normativa) del riesgo identificado, (afectaciones parciales).	Se encuentra ubicado por debajo de la distancia mínima (Normativa) del riesgo o identificado, (afectaciones totales).

Tipo de cerramiento o cerco perimetral:

1 Cerca en alambre
2 Lámina metálica
3 Madera
4 Malla
5 Muro
6 Otro

Calificación de Condición			
4	3 X	2	1
Se encuentra en condiciones normales y evidencia mantenimiento periódico.	Se encuentra con deterioro menor y requiere de mantenimiento preventivo.	Presenta daños parciales considerables y requieren de obras de mejoramiento (pueden causar accidentes).	Presenta daños considerables en su totalidad y requieren de obras de reconstrucción ó cambio (pueden causar accidentes)

Disponibilidad de servicios:

5.21 Calificación de Condición			
4	3 X	2	1
El servicio es permanente (100%) tiempo - mes, (atiende la cobertura total de la población escolar y usuarios).	El servicio no es Permanente (<100% y >70%) tiempo -mes, (limitando la cobertura total de la población escolar y usuarios).	El servicio no es permanente (<70% y >50% tiempo - mes, (afectando parcialmente la prestación del servicio edurativo).	El servicio no es permanente (<50%) tiempo - mes, (afectando la prestación del servicio educativo).

Agua: X Red Pública; 6 Pozo Subterráneo; 2 Acarreo Aljibe; 7 Río o Quebrada; 3 Acueducto Rural; 8 Tanque de reserva; 4 Agua Lluvia; 9 Otro; 5 Pila Pública

Energía Eléctrica: X Red Pública; 2 Energía Eólica; 3 Energía Solar; 4 Planta Electrica; 5 Otro

Gas: 1 Red Pública; X Cilindro; 3 Tanque Fijo; 4 Otro

Recolección de Basuras: X Red Pública; 2 Se Entierran; 3 Se Queman; 4 Otro

Red Alcantarillado/Aguas Servidas: 1 Red Pública; 6 Otro; X Campo Infiltración; 3 Mixta; 4 Planta Tratamiento; X Pozo Séptico

Red Pluvial: 1 Red Pública; 2 Campo Infiltración; X Superficial; 4 Otro

Internet: 1 ADSL; 6 WiFi; 2 Banda Ancha; 7 Otro; 3 Fibra Óptica; X Satélite; 5 Telefónico

Teléfono: 1 Red Pública; X Celular - Móvil; 3 Servicio Satelital; 4 Otro

Powered by CamScanner

TIPOLOGÍAS PARA MODULO 3 - EDIFICIOS

8.4 Tipo de Sistema Estructural:

En inspección visual se evidencia los elementos estructurales.

8.4 Calificación de Condición			
4	3	2	1
Condiciones normales: (no presentan deterioro estructural).	Deterioro moderado parcial: (deterioros parciales físicos o roturas por oxidación o meteorización del material constructivo).	Deterioro moderado en su totalidad: (deterioros físicos o roturas por oxidación o meteorización del material constructivo y/o la estructura se encuentra construida parcialmente.	Alto deterioro: (falta de secciones en los elementos estructurales principales, exposición de acero o varillas en el concreto, grietas, desplomes o cortes de sección en el edificio).

1 Estruct. Temporal Perecedera	2 Láminas Prefabricadas Asbesto	3 Láminas Prefabricadas Madera	4 Láminas Prefabricadas Metal
5 Muros de Carga Bloque Arcilla	6 Muros Carga Bloque Cemento	7 Muros de Carga de Ladrillo	8 Muros de Piedra, Adobe, Tapia
9 Muros Estructurales Concreto	10 Muros Estructurales Dovelas	11 Paredes Guadua, Bahareque	## Pórticos o Aporticado Concreto
13 Pórticos o Aporticado Madera	14 Pórticos o Aporticado Metálico en Perfil	15 Pórticos o Aporticado Metálico Tubular	## Otro

Materiales Predominantes en Edificios:

no aplica.

(8.7 - 8.9) Calificación de Condición			
4	3	2	1
Se encuentra en condiciones normales y evidencia mantenimiento periódico.	Se encuentra con deterioro menor y requiere mantenimiento preventivo.	Presenta daños ó instalaciones parciales considerables que requieren de obras de mejoramiento, (pueden causar accidentes).	Presenta daños considerables en su totalidad que requieren de obras de mejoramiento y cambio de elementos, (pueden causar accidentes).

Material Predominante Muros de Fachadas:

1 Adobe Macizo	2 Bahareque	3 DryWall	4 Estructura Metálica Revestida
5 Estructura Metálica a la Vista	6 Hormigón Armado/Concreto	7 Ladrillo/Bloque/Block	8 Madera
9 Malla	10 PVC Tipo AZEMBLA o RBS	11 Superboard	## Sin pared
13 Tablqueria Rellena de Adobillo	14 Zinc	15 Otro	

Material Predominante Acabado Muros / Fachadas:

1 Material propio del muro	2 Pañete sobre material muro	3 Pintura sobre material muro	4 Pintura sobre pañete
5 Pulido	6 Repello	7 Otro	

Material Predominante en Cubiertas:

1 Alusin	2 Aluzinc	3 Caña con Barro /Arcilla	4 Cubierta Material Vegetal
5 Concreto	6 Duralita o Canaleta	7 Estera	8 Lámina Esmaltada
9 Lámina Latón	10 Lamina Zinc/Galvanizado/Calamina	11 Palma/ Paja	## Sin Cubierta
13 Teja Asbesto Cemento	14 Teja de Barro o Arcilla	15 Teja de Fibrocemento	## Teja Lámina Metálica
17 Teja termoacústica	18 Otro		

no aplica

Elementos Complementarios de Accesibilidad:

1 Ascensor
2 Plataforma Salva Escalas
3 Rampa
4 Silla Oruga
5 Otro

8.11 Calificación de Condición			
4	3	2	1
Se encuentra en condiciones normales y evidencia mantenimiento periódico.	Se encuentra con deterioro menor y requiere mantenimiento preventivo.	Presenta daños ó instalaciones parciales considerables que requieren de mantenimiento y/o cambio de elementos, (pueden causar accidentes).	Presenta daños considerables en su totalidad que requieren de la reconstrucción o renovación del elemento, (pueden causar accidentes).

no aplica.

Sistema de Iluminación Exterior del Edificio:

Sistema de Cámaras al Exterior del Edificio:

(8.16 - 8.17) Calificación de Condición			
4	3	2	1
El sistema da cobertura a la totalidad del exterior del edificio y funciona normalmente.	El sistema da cobertura parcial del exterior del edificio y funciona normalmente.	El sistema se encuentra instalado parcial o completamente, pero requiere de mantenimiento.	El sistema se encuentra instalado pero esta fuera de servicio

Tipologías de Espacios de Extensión

Sub Grupo D - Física Deportes
Espacios donde es posible practicar deportes o recrearse de manera individual o colectiva

59 Cancha de Baloncesto	60 Cancha de Beisbol	61 Cancha de Fútbol	62 Cancha de Fútbol 5
63 Cancha de Microfútbol	64 Cancha Múltiple	65 Cancha de Voleyball	66 Gimnasio
67 Parque Infantil	68 Patio	69 Piscina	70 Pista Carreras a Caballo
71 Polideportivo	72 Zona Lanzamiento Flecha	73 Otro Sub Grupo D	

Sub Grupo E - Física Expansiones Recreativas
Espacios que permiten la articulación, circulación y/o evacuación de espacios.

74 Circulación	75 Escalera	76 Espacio Libre	77 Jardinera
78 Rampa	79 Zona Verde	80 Otro Sub Grupo E	

Powered by CamScanner

Tipología de Espacios Complementarios

Sub Grupo I - Seguridad e información
Espacios de apoyo administrativo

98 Portería. | 99 X Vivienda Celador/Guardian. | 100 Otro Sub Grupo I

Sub Grupo L - Transporte
Espacios de apoyo administrativo

109 Garaje | 110 X Parqueadero Autos | 111 Parqueadero Buses | 112 X Parqueadero Motos
113 Otro Sub Grupo L

Sub Grupo N - Confort
Espacios de Bienestar Estudiantil y apoyo administrativo

116 Sala de Espera
117 X Baño (Bateria Sanitaria) | 118 Baño Discapacitados | 119 Baño Docentes | 120 Baño Oficinas Administ.
121 Baño Preescolar | 122 X Baño Visitantes | 123 Camerinos | 124 Vestidores
128 Sala de profesores | 129 Cafetería | 130 Comedor Escolar | 131 Kiosco - Refresquería
132 Tienda Escolar | 133 Taller Mantenimiento | 134 Cuarto de Maquinas | 135 Lavandería
136 Otro Sub Grupo N

Abastecimiento y Procesamiento

Sub Grupo O - Abastecimiento y Procesamiento

137 Bodega | 138 Cuarto Basuras | 139 Cuarto Bombas | 140 Cuarto Reciclaje
141 X Depósito Alimentos | 142 Depósito Baterías | 143 Depósito Combustibles | 144 Depósito General
145 Depósito Insumos Didácticos | 146 Extractores | 147 Generadores
148 Planta Generador Eléctrico | 149 Planta de Tratamiento | 150 Tanques
151 Bebederos | 152 Cafetería Docentes | 153 X Cocina | 154 Panadería
155 Otro Sub Grupo O

Conducción y Administración

Sub Grupo P - Conducción y Administración

156 Archivo | 157 Consejo Directivo | 158 Coodinación | 159 Dirección
161 Oficina administrativa | 162 Pagaduría | 163 Prefectura | 164 Registro
165 Secretaría | 166 Subdirección | 167 Supervisión | 168 Tesorería
169 Otro Sub Grupo P

no aplica

Funcionalidad Iluminación Natural:

9.10 Calificación de Condición			
4 X	3	2	1
La iluminación Normal.	La iluminación suficiente.	La iluminación Insuficiente.	No existe iluminación.

Funcionalidad Ventilación Natural:

9.11 Calificación de Condición			
4 X	3	2	1
La Ventilación Normal.	La Ventilación suficiente.	La Ventilación Insuficiente.	No existe Ventilación.

9.12 Funcionalidad Acústica:

9.12 Calificación de Condición			
4 X	3	2	1
La acústica es normal, no hay interrupción por ruidos exteriores.	La acústica se ve afectada en un nivel BAJO por ruidos exteriores.	La acústica se ve afectada en un nivel MEDIO por ruidos exteriores.	La acústica se ve afectada en un nivel ALTO por ruidos exteriores.

no aplica.

9.13 Aislamiento Térmico: 1 Piso | 2 Pared | 3 Ventana | 4 Techo

9.14 Funcionalidad Iluminación Artificial:

9.14 Calificación de Condición			
4	3 X	2	1
La iluminación es normal y funciona correctamente.	La iluminación es suficiente y funciona correctamente.	La iluminación es insuficiente, se encuentra instalado parcial o completamente, en el ambiente educativo pero requiere de mantenimiento.	No existe iluminación ó el sistema se encuentra fuera de servicio o no funciona.

Powered by CamScanner

Materiales Predominantes:

(9.15 - 9.20) Calificación de Condición			
4	3 X	2	1
Se encuentra en condiciones normales y evidencia mantenimiento periódico.	Se encuentra con deterioro menor y requiere mantenimiento preventivo.	Presenta daños ó instalaciones parciales considerables que requieren de obras de mejoramiento, (pueden causar accidentes).	Presenta daños considerables en su totalidad que requieren de obras de mejoramiento y cambio de elementos, (pueden causar accidentes).

9.15 Material Predominante Pisos:

1	Adoquín	2	Arena	3	Asfalto	4 X	Baldosas Cerámicas
5	Baldosa cemento	6	Concreto/Cemento Liquido	7	Granito	8	Grama Sintética
9	Madera	10	Piedra	11	Piso Sintético	###	Sin piso
13	Tierra	14 X	Zona Verde/Pasto	15	Otro		

9.16 Material Predominantes Muros:

1	Adobe Macizo	2	Bahareque	3	DryWall	4	Estructura Metálica Revestida
5	Estructura Metálica a la Vista	6	Hormigón Armado/Concreto	7 X	Ladrillo/Bloque/Block	8	Madera
9	Malla	10	PVC Tipo AZEMBLA o RBS	11	Superboard	###	Sin pared
13	Tabiqueria Rellena de Adobillo	14	Zinc	15	Otro		

9.17 Material Predominante Acabado de Muros Interiores:

1	Acabado propio material muro	2	Enchape cerámico	3	Pañete sobre material muro	4	Papel colgadura
5	Pintura sobre estuco	6 X	Pintura sobre material muro	7	Pintura sobre pañete	8	Sólo estuco
9	Otro						

9.18 Material Predominante Ventanas:

1	Aluminio tipo persiana	2	Celosía (Calado)	3 X	Marco Metálico y Vidrio	4	Marco Madera y Metal
5	Marco Madera y Vidrio	6	Marco Aluminio y Vidrio	7	Metal tipo persiana.	8	Sin Marco de Ventana
9	Sólo Aluminio	10	Sólo Madera	11	Sólo Metálico	###	Sólo Reja o Barrotes.
13	Otro						

9.19 Material Predominante Puertas:

1	Madera	2 X	Metal	3	Sin puerta	4 X	Vidrio
5	Otro						

9.20 Material Predominante Cielo Raso:

1	Drywall/Yeso	2	Fibrocemento	3	Icopor	4	Madera	5	Metal
6	Pañete	7	Panelit	8	Sin Cielo Raso	9 X	Otro		

9.23 Mobiliario Escolar:

9.23 Calificación de Condición			
4	3 X	2	1
Se encuentra en condiciones normales y evidencia mantenimiento periódico.	Se encuentra con deterioro menor y requiere mantenimiento preventivo	Presenta daños ó instalaciones parciales considerables que requieren de mantenimiento, cambio y/o ajuste de elementos y/o presenta faltantes de piezas o partes.	Presenta daños considerables en su totalidad que requieren del reemplazo de los elementos, las condiciones actuales pueden causar accidentes o lesiones a los usuarios.

NOMBRE QUIEN DILIGENCIA EL FORMATO

Juliana Cutaño R.
Mateo Garcia
Jonatan Montes

Powered by CamScanner

LISTA DE CHEQUEO

REVISIÓN SISTEMA SEPTICO, SEDES EDUCATIVAS RURALES DEL QUINDIO. vereda Risaralda

(Secretaria de Educación Departamental, Dirección de planeamiento Educativo)

1. CUANTOS ESTUDIANTES TIENE LA INSTITUCIÓN: 4
2. CUANTOS PROFESORES TIENE LA INSTITUCION.: 1
3. CUANTAS PERSONAS VIVEN EN LA INSTITUCION: 4
4. LA INSTITUCION CUENTA CON TANQUE PARA DISTRIBUCION DE AGUA
   Si
5. CUANTAS BATERIAS SANITARIAS, LAVAMANOS , DUCHA , LAVADERO, LAVAPLATOS TIENE LA INSTITUCION:
   lavaplatos 2, Ducha 1 Baterias 4, lavamanos 2 lavadero no tiene
6. EXISTE SISTEMA SEPTICO SI X, NO ___
7. SI LA RESPUESTA ES NO, DESCRIBA COMO SE VIERTEN LAS AGUAS RESIDUALES.
8. EL SISTEMA SEPTICO ES EN CONCRETO O EN PLASTICO
   Concreto
9. REALICE UNA PEQUEÑA DESCRIPCION DEL SISTEMA (ejemplo, sistema en concreto o plástico, las medidas son largo, ancho, profundo, tiene tapa en concreto o plástico, tiene trampa de grasas, el sistema está en buen estado o no de acuerdo a su observación, realice una inspección del tanque séptico con algún elemento para determinar la profundidad del tanque séptico y la altura de la nata, se encuentra funcionando, esta colmatado o es necesario realizar algún tipo de mantenimiento, el sistema recoge aguas residuales de la cocina y baños).si es el caso consulte con el profesor o casero si ha observado problemas con las redes sanitarias o el sistema séptico de la sede educativa.
   El sistema se encuentra en concreto, no se pudo encontrar la trampa de grasa, el sistema está en buen estado, la altura de pozo es de 3m y el area 50 x 50cm, el mantenimiento fue realizado hace 2 años, no se tiene problemas con las redes sanitarias
10. LA DISPOSICIÓN FINAL SE HACE MEDIANTE POZO DE ABSORCIÓN O CAMPO DE INFIRLTRACION. pozo de absorcion
11. CUAL ES EL AREA DE INFILTRACION LARGO 1,4m, ANCHO 1,2m
12. CUAL ES EL VOLUMEN DEL POZO DE ABSORCION. AREA DE LA TAPA 50x50cm PROFUNDIDAD DEL POZO 3m

Powered by CamScanner

13. EL POZO DE ABSORCION FUNCIONA SI X , NO _____, BREVE DESCRIPCION (ejemplo, no se encuentra colmatado, los líquidos tienen poca altura en el pozo, no se tiene acceso al pozo, el pozo colapso)


no se encuentra colmatado, la altura del pozo es de 3m, y se tiene acceso

14. QUE ELEMENTOS DEL SISTEMA SEPTICO ES NECESARIO INTERVENIR

REDES SANITARIA _____, CAJA DE INSPECCION_____, TRAMPA DE GRASAS X

TUBERIA DEDESAGUE_____, TANQUEN SEPTICO _____, FAFA_____, POZO DE ABSORCION_____, CAMPO DE INFILTRACION_____

15. REALICE UN PEQUEÑO BOSQUEJO DE LA DISTRIBUCION DEL SISTEMA SEPTICO (ejemplo, ubique la cocina, trampa de grasas, baños, lavadero y caja de inspección, tanque séptico y pozo de absorción o campo de infiltración).

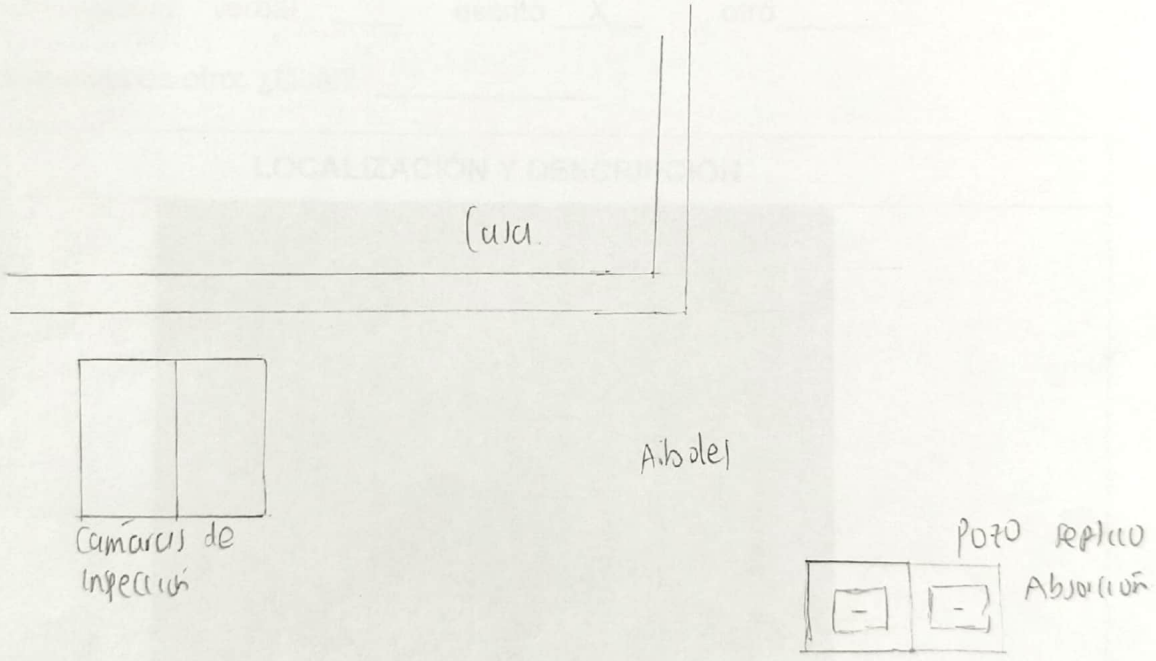

16. REGISTRO FOTOGRAFICO.

Mateo Garcia - Jonatan Montes
Juliana Catalina Rodriguez
NOMBRE DE QUIEN DILIGENCIA EL FORMATO

Powered by CamScanner

	FORMATO	Código: F-INF-17
	Informe de Visita Técnica	Versión: 04 Fecha: 01/08/2018
		Página 1 de 3

Armenia, 26 de Marzo de 2026

JEMAY ADOLFO ARIAS MORA
JEFE DE INSFRASTRUCTURA SOCIAL
DEPARTAMENTO DEL QUINDIO

Objeto de la visita: Revisión del sistema séptico

Lugar de desplazamiento: SEDE RISARALDA - MONTENEGRO

A petición: José Eduardo Montoya Cifuentes
Representante Legal

Medio de solicitud: verbal ____ escrito __X__ otro _____

Si la respuesta es otro: ¿Cuál? _____

LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCION



En atención al requerimiento realizado, se efectuó visita técnica a la sede Risaralda de la Institución Educativa Marco Fidel Suárez, con el fin de realizar la revisión del sistema séptico existente.

Powered by CamScanner

INFORME

CONCEPTO TÉCNICO

Durante la inspección en sitio, se logró identificar la ubicación de varias cámaras de inspección, de las cuales fue posible realizar la apertura de una de ellas, evidenciando que se encuentra en buen estado.

Posteriormente, se localizó el pozo de séptico y pozo de absorción, los cuales no presentan condiciones de colmatación, indicando un funcionamiento adecuado del sistema en la actualidad.

Según información suministrada, hace aproximadamente dos (2) años se realizó mantenimiento al sistema séptico.

No obstante, durante la visita no fue posible ubicar la trampa de grasas, lo cual dificulta la verificación completa del sistema.

RECOMENDACIONES CONCLUSIONES

Se recomienda mantener despejadas las tapas de las cámaras de inspección, ya que durante la visita fue necesario realizar excavaciones y retirar vegetación, zonas verdes y material de cobertura (tierra), lo cual representa un obstáculo para la ejecución de labores de mantenimiento.

Se sugiere realizar la ubicación e identificación de la trampa de grasas, con el fin de garantizar su adecuado mantenimiento y funcionamiento dentro del sistema séptico.

También se requiere pintura amarilla para la señalización de las tapas y cajas y un cerramiento para que los niños no corran peligro al estar cerca de las tapas del pozo.

ANEXOS

REGISTRO FOTOGRAFICO





Powered by CamScanner



JULIANA CATAÑO RODRIGUEZ
CONTRATISTA
Teléfono: 316 4201455
catanorodriguezj@gmail.com

YONATHAN MONTES JIMENEZ
CONTRATISTA
jrmontesjimenez88@gmail.com
Teléfono: 317 6991198

CRISTHIAN MATEO GARCÍA
Contratista
Teléfono: 3125947529
mateogarciag0121@gmail.com

JEMAY ADOLFO ARIAS MORA
JEFE DE INFRASTRUCTURA SOCIAL
DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
jefaturasocial@gobernacionquindio.gov.co

Powered by CamScanner
