CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.

CONTRATO 976-2021
OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

INTERVENTOR

CARTERAS TOPOGRAFICAS

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	1 de enero de 2026	31 de enero de 2026

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
22	Relleno para estructuras con recebo	39.00	m3

ABSCISAS		DIMENSIONES					OBSERVACIONES
INICIO	FIN	LONGITUD (m)	AREA ABSCISA INICIO (m2)	AREA ABSCISA FIN (m2)	AREA PROMEDIO (m2)	CANTIDAD (m3)	
PR35+410	PR35+405	5	2.24	2.24	2.24	11.20	Llleno paraacceso M.Derecha
PR33+600	PR33+595	5	5.60	5.60	5.60	28.00	lleno de ODT -Escuela Caño Raya . M izquierda
					TOTAL (m3)	39.00	

CAMILO HERNANDO SANCHEZ
Topografo Contratista Consorcio DSC
MP: 01-20551 C.P.N.T

OSCAR FERNANDO ALVARADO DIAZ
Director de Interventoria
MP: 15202-172889 BYC

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 56

PERIODO PRE-ACTA	01/enero/2026	31/enero/2026

No. DE ORDEN		DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
23		Concreto clase 28 MPA	18,00	m3

ABSCISA		DIMENSIONES							OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	ALTO (m)	ANCHO (m)		LARGO (m)	ESPESOR (m)	ÁREA	VOLUMEN (m3)	
			ANCHO 1 (m)	ANCHO 2 (m)					
PR37+565			0,3		6,1	0,4		0,73	Dentellon de muro de proteccion en estribo No 2 Norte M.izquierda
			2,1		6,1	0,30		3,84	zarpa de muro de protecciòn estribo No 2 Sur M.izquierda
		2,80			6,1	0,35		5,98	Vastago de muro de proteccion en estribo No 2 Sur M.izquierda
PR35+860			5,1		4,1	0,20		4,18	Losa de acceso vehicular a predio
PR40+050			1		5,4	0,25		1,35	Fundicion de zarpa de muro proteccion - encole M.derecho
			0,3		5,4	0,25		0,41	Fundicion de Dentellon de muro proteccion - encole M.derecho
			1		5	0,25		1,25	Fundicion de vastago de muro proteccion en encole M.derecho
							TOTAL	**18,00**	





FIRMA			FIRMA	
NOMBRE		EDWIN BUSTOS IBARRA	NOMBRE	OSCAR FERNANDO ALVARADO DIAZ
MATRICULA N°		52202-142431	MATRICULA N°	15202-172889BYC
CARGO		DIRECTOR DE OBRA	CARGO	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
ENTIDAD		CONSORCIO DSC	ENTIDAD	CONSORCIO ECOVISIÓN 190

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 56

PERIODO PRE-ACTA	01/enero/2026	31/enero/2026

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
24	Concreto clase 21 MPA	39,00	m3

UBICACIÓN		DIMENSIONES							VOLUMEN (m3)	OBSERVACIONES
ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN	MARGEN	LARGO	ANCHO 1 Y/O ALTO	AREA	ESPESOR (m)	CANTIDAD	ÁREA DEL TUBO		
PR43+180		Izquierda	2,48	0,79		0,15			0,29	Construccion de descole
			1,76	0,74		0,15			0,20	
PR38+050	PR38+030	Derecho	20,34	0,75		0,13			1,98	Construcción de losa de cuneta
			20,34	0,23		0,15			0,70	Construcción de bordillo para cuneta
PR38+030	PR38+022	Derecho	8,00	2,54		0,15			3,05	Construcción de canal traezoidal
PR38+022	PR38+021	Derecho	1,17	2,36		0,15			0,41	Construccion de sobreancho
PR38+021	PR38+016	Derecho	5,12	4,00		0,20			4,10	Construccion acceso a predio
PR38+016	PR38+014	Derecho	1,92	3,68		0,15			1,06	Construccion de sobreancho hacia canal
PR38+014	PR38+008	Derecho	5,98	3,29		0,15			2,95	Construcción de canal trapezoidal
PR38+008	PR38+000	Derecho	7,95	3,15		0,15			3,76	
PR38+000	PR37+994	Derecho	6,01	2,84		0,15			2,56	
PR37+994	PR37+978	Derecho	15,60	3,60		0,15			8,42	
PR37+978	PR37+976	Derecho	2,00	3,11		0,15			0,93	Construccion de descole
			1,79	1,30		0,15			0,35	
PR33+600		izquierda	1,40	1,40		0,18	2,00	0,95	0,36	Cabezales de descole --Acceso Escuela Caño Raya
			2,00	1,05		0,15	2,00		0,63	zarpas de cabezales -Acceso Escuela Caño Raya
			1,00	1,25		0,15	4,00		0,75	Aletas de descole y encole -Acceso Escuela Caño Raya
			4,90	1,50		1,25		0,95	4,53	Atraque de tuberia del 36"-Acceso Escuela Caño Raya
			4,90	1,50		0,13			0,96	losa superior para tuberia de 36" Acceso Escuela Caño Raya
PR32+620		Derecho	4,75		0,31				1,47	Atraque a 1/3 de tuberia de 36" para ODT
								TOTAL	39,00	

REGISTRO FOTOGRÁFICO.









FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	EDWIN BUSTOS IBARRA	NOMBRE	OSCAR FERNANDO ALVARADO DIAZ
MATRICULA N°	52202-142431	MATRICULA N°	15202-172809BYC
CARGO	DIRECTOR DE OBRA	CARGO	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	ENTIDAD	CONSORCIO ECOVISIÓN 190

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 56

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/enero/2026	31/enero/2026

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
25	Concreto clase 14 MPA	1,00	m3

ALCANTARILLAS Y/O CUNETAS Y/O CANALES DE VIA		DIMENSIONES					OBSERVACIONES
ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	LARGO (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	AREA DE CAISSON	VOLUMEN (m3)	
PR32+620		4,75	1,70	0,10		0,81	Concreto de limpieza para instalacion de tuberia -ODT M.Derecha
		2,05	1,50	0,05		0,15	Concreto de limpieza para descole -ODT M.Derecha
					TOTAL	1,00	

REGISTRO FOTOGRÁFICO.



FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	EDWIN BUSTOS IBARRA	NOMBRE	OSCAR FERNANDO ALVARADO DIAZ
MATRICULA N°	52202-142431	MATRICULA N°	15202-172889PYC
CARGO	DIRECTOR DE OBRA	CARGO	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	ENTIDAD	CONSORCIO ECOVISIÓN 190

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 56

PERIODO PRE-ACTA	DESDE 01/enero/2026	HASTA 31/enero/2026

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
26	Acero de refuerzo Y=420 Mpa.	4.903,00	kg

ALCANTARILLAS Y/O CUNETAS DE VIA			DIMENSIONES					OBSERVACIONES
ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN	MARGEN	DIÁMETRO	LONGITUD (m)	CANTIDAD	PESO KG	PESO (kg)	
PR43+180		izqquierdo	1/2"	2,38	4	0,996	9,48	Acero de refuerzo longitudinal para descole
				0,64	9	0,996	5,74	Acero de refuerzo transversal para descole
				1,66	4	0,996	6,61	Acero de refuerzo longitudinal para descole
				0,64	7	0,996	4,46	Acero de refuerzo transversal para descole
PR40+050		derecho	1/2"	1,50	42	0,996	62,75	Acero de refuerzo longitudinal para vastago de muro de proteccion
			1/2"	1,10	64	0,996	70,12	Acero de refuerzo longitudinal para Zarpa de muro de proteccion
			1/2"	5,00	18	0,996	89,64	Acero de refuerzo Transversal para de muro de proteccion
PR38+050	PR38+030	Derecho	1/2"	20,24	5	0,996	100,80	Acero de refuerzo longitudinal para construccion de cuneta tipo 1
				1,2	68	0,996	81,27	Acero de refuerzo transversal para construccion de cuneta tipo 1
PR38+030	PR38+022	Derecho	1/2"	7,90	10	0,996	78,68	Acero de refuerzo longitudinal para canal trapezoidal
				2,4	27	0,996	64,54	Acero de refuerzo transversal para para canal trapezoidal
PR38+022	PR38+021	Derecho	1/2"	1,07	10	0,996	10,66	Acero de refuerzo longitudinal para construccion sobreancho
				3,46	5	0,996	17,23	Acero de refuerzo transversal para para sobreancho
PR38+021	PR38+016	Derecho	1/2"	5,02	21	0,996	105,00	Acero de refuerzo longitudinal para acceso
				3,90	26	0,996	100,99	Acero de refuerzo transversal para acceso
PR38+016	PR38+014	Derecho	1/2"	1,82	10	0,996	18,13	Acero de refuerzo longitudinal para construccion sobreancho hacia canal
				3,58	7	0,996	24,96	Acero de refuerzo transversal para construccion sobreancho hacia canal
PR38+014	PR38+008	Derecho	1/2"	5,88	10	0,996	58,56	Acero de refuerzo longitudinal para canal trapezoidal
				3,19	21	0,996	66,72	Acero de refuerzo transversal para canal trapezoidal
PR38+008	PR38+000	Derecho	1/2"	7,85	10	0,996	78,19	Acero de refuerzo longitudinal para canal trapezoidal
				3,05	27	0,996	82,02	Acero de refuerzo transversal para canal trapezoidal
PR38+000	PR37+994	Derecho	1/2"	5,91	10	0,996	58,86	Acero de refuerzo longitudinal para canal trapezoidal
				2,74	21	0,996	57,31	Acero de refuerzo transversal para canal trapezoidal
PR37+994	PR37+978	Derecho	1/2"	15,50	12	0,996	185,26	Acero de refuerzo longitudinal para canal trapezoidal
				3,50	53	0,996	184,76	Acero de refuerzo transversal para canal trapezoidal
PR37+978	PR37+976	Derecho	1/2"	1,90	7	0,996	13,25	Acero de refuerzo longitudinal para descole
				3,01	7	0,996	20,99	Acero de refuerzo transversal para descole
PR37+565		IZQUIERDA	1/2"	2,10	31	0,996	64,84	Acero de refuerzo para muro de proteccion (Refuerzo ·1) Estribo 2
			1/2"	2,10	31	0,996	64,84	Acero de refuerzo para muro de proteccion (Refuerzo ·2) Estribo 2
			1/2"	3,45	11	0,996	37,8	Acero de refuerzo para muro de proteccion (Refuerzo ·3) Estribo 2
			1/2"	2,5	11	0,996	27,39	Acero de refuerzo para muro de proteccion (Refuerzo ·4) Estribo 2
			1/2"	1,4	11	0,996	15,34	Acero de refuerzo para muro de proteccion (Refuerzo ·5) Estribo 2
			1/2"	3,45	25	0,996	85,91	Acero de refuerzo para muro de proteccion (Refuerzo ·6) Estribo 2
			1/2"	6	19	0,996	113,54	Acero de refuerzo superior e inferior para zarpa de muro de proteccion (Refuerzo ·7)
			1/2"	6	25	0,996	149,4	Acero de refuerzo para vastago de muro de proteccion (Refuerzo ·7) Estribo 2
			1/2"	6	4	0,996	23,9	Acero de refuerzo longitudinal para dentellon Estribo 2
PR37+565		DERECHA	1/2	9	60	0,996	537,84	Acero de refuerzo Tablero de puente 2C- Carril Derecho
			3/4	2,6	269	2,25	1573,65	Acero de refuerzo Tablero de puente 3A- Carril Derecho
			1/2	0,66	10	0,996	6,57	Acero de refuerzo para soporte de parrilla superior losa de aproximacion estribo # 1 M.I pendient cobro acta 52
			1/2	0,66	20	0,996	13,15	Acero de refuerzo para soporte de parrilla superior losa de aproximacion estribo # 2 M.I pendient cobro acta 52
			5/8	0,75	116	1,56	135,72	Acero de refuerzo adicional para losa de aproximacion estribo No 1 Norte 14B-Carril Derecho pendiente de cobro acta 52
PR35+860		Derecha	1/2"	26,00	4	0,996	103,58	Acero de refuerzo longitudinal Batea de Acceso
			1/2"	21,00	5	0,996	104,58	Acero de refuerzo Transversal para Batea de Acceso

PR35+430	DERECHA	5/8	2,44	4	1,556	15,19	Acero de refuerzo longitudinal y transversa para cabezales en acceso a predio (son dos)
		5/8	0,65	2	2,556	3,32	
		5/8	3,75	8	1,556	46,68	
		5/8	2,54	4	1,556	15,81	
		5/8	4,20	4	1,556	26,14	
		5/8	1,2	6	1,556	11,2	
PR33+600	IZQUIERDA	1/2"	5,00	6	0,996	29,88	Acero de refuerzo longitudinal losa superior ODT-escuela Caño Raya
		5/8"	1,50	17	1,556	39,68	Acero de refuerzo Transversal losa superior ODT-escuela Caño Raya
					TOTAL (KG)	4903,00	

REGISTRO FOTOGRÁFICO













FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	**EDWIN BUSTOS IBARRA**	**NOMBRE**	**OSCAR FERNANDO ALVARADO DIAZ**
MATRICULA N°	52202-142431	**MATRICULA N°**	15202-172889902
CARGO	DIRECTOR DE OBRA	**CARGO**	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	**ENTIDAD**	CONSORCIO ECOVISION 190

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 56

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	
	01/enero/2026	31/enero/2026

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
27	Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	10,00	ml

ALCANTARILLAS	DIMENSIONES				OBSERVACIONES
ABSCISA	CANTIDAD	LARGO (m)	ALTO (m)	LONGITUD (ml)	
PR33+600	5,00	1	1	5,00	Instalacion de tuberia para acceso de escuela Caño Raya
PR32+620	5,00	1	1	5,00	Instalacion de tuberia para ODT-M.Derecha
			TOTAL	10,00	

REGISTRO FOTOGRÁFICO.





FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	EDWIN BUSTOS IBARRA	NOMBRE	OSCAR FERNANDO ALVARADO DIAZ
MATRICULA N°	52202-142431	MATRICULA N°	15202-172889XIC
CARGO	DIRECTOR DE OBRA	CARGO	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	ENTIDAD	CONSORCIO ECOVISIÓN 190

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 56

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/enero/2026	31/enero/2026

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EIECUTADA	UND.
33	Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	66,00	unidad

UBICACIÓN	CÓDIGO DE SEÑAL	CANTIDAD	COSTADO		TOTAL (unidad)	OBSERVACIONES
PR39+970,00	SR-01	1	DERECHA		1	Instalación de señal Reglamentaria corredor vial EL Retorno -Calamar
PR39+390,00	SP-46	1	IZQUIERDA		1	Instalación de señal Preventiva corredor vial EL Retorno -Calamar
PR39+120,00	SI-04	1	DERECHA		1	Instalación de señal Informativa corredor vial EL Retorno -Calamar
PR39+120,00	SI-04	1	IZQUIERDA		1	Instalación de señal Informativa corredor vial EL Retorno -Calamar
PR38+830,00	SP-46	1	DERECHA		1	Instalación de señal Preventiva corredor vial EL Retorno -Calamar
PR38+800,00	SP-49	1	IZQUIERDA		1	Instalación de señal Preventiva corredor vial EL Retorno -Calamar
PR38+750,00	SP-49	1	DERECHA		1	Instalación de señal Preventiva corredor vial EL Retorno -Calamar
PR38+430,00	SR-01	1	IZQUIERDA		1	Instalación de señal Reglamentaria corredor vial Calamar-El retorno
PR38+340,00	SR-30	1	DERECHA		1	Instalación de señal Reglamentaria corredor vial Calamar-El retorno
PR38+340,00	SR-30	1	IZQUIERDA		1	Instalación de señal Reglamentaria corredor vial Calamar-El retorno
PR38+000,00	SI-04	1	DERECHA		1	Instalación de señal Informativa corredor vial EL Retorno -Calamar
PR39+000,00	SI-04	1	IZQUIERDA		1	Instalación de señal Informativa corredor vial EL Retorno -Calamar
P36+830 -PR36+950	SP-75	12	IZQUIERDA		12	Instalación de señal Preventiva corredor vial EL Retorno -Calamar
PR37+490 -PR37+670	SP-75	16	DERECHA		16	Instalación de señal Preventiva corredor vial EL Retorno -Calamar
PR00+900,00	SR-01	1	DERECHA		1	Instalación de señal Reglamentaria corredor vial Calamar-El retorno
PR00+950,00	SI-06	1	DERECHA		1	Instalación de señal Informativa corredor vial EL Retorno -Calamar
PR00+990,00	SR-30	1	DERECHA		1	Instalación de señal Reglamentaria corredor vial Calamar-El retorno
PR01+000,00	SR-30	1	IZQUIERDA		1	Instalación de señal Reglamentaria corredor vial Calamar-El retorno
PR00+970,00	SP-46	1	IZQUIERDA		1	Instalación de señal Preventiva corredor vial EL Retorno -Calamar
PR01+500,00	SI-06	1	IZQUIERDA		1	Instalación de señal Informativa corredor vial EL Retorno -Calamar
PR0+970-PR1+120	SP-75	20	DERECHA		20	Instalación de señal Preventiva corredor vial EL Retorno -Calamar
				TOTAL	66,00	

REGISTRO FOTOGRÁFICO.















FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	**EDWIN BUSTOS IBARRA**	**NOMBRE**	**OSCAR FERNANDO ALVARADO DIAZ**
MATRICULA N°	52202-142431	**MATRICULA N°**	15202-17-2889BYC
CARGO	RESIDENTE DE OBRA	**CARGO**	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	**ENTIDAD**	CONSORCIO ECOVISION 190

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 56

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/enero/2026	31/enero/2026

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
39	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	72,00	m3-km

ABSCISAS		DIMENSIONES						
INICIO	FIN	LONGITUD TRANSPORTE	AREA (m2)	ALTO (m)	VOLUMEN DESCAPOTE (m^3)	VOLUMEN EXCAVACIONES (m^3)	VOLUMEN (m^3-Km)	OBSERVACIONES
PR37+565	PR35+750	1,72				42	72,03	material para paisajismo
						TOTAL	72,00	

REGISTRO FOTOGRÁFICO.



FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	EDWIN BUSTOS IBARRA	NOMBRE	OSCAR FERNANDO ALVARADO DIAZ
MATRICULA N°	52202-142431	MATRICULA N°	15202-172889 BYC
CARGO	DIRECTOR DE DE OBRA	CARGO	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	ENTIDAD	CONSORCIO ECOVISIÓN 190

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 56


PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/enero/2026	31/enero/2026

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
40	Transporte de materiales de sub-base y base granular, compactos	87.322,00	m3-km

ABSCISAS				DIMENSIONES				
INICIO	LONGITUD AL PR45+450 (Km)	COLOCACION		LONGITUD EN OBRA	LONGITUD TRANSPORTE	CANTIDAD DE MATERIAL	VOLUMEN (m^3-Km)	OBSERVACIONES
UBICACIÓN	DISTANCIA	INICIO	FIN	LO	218,5 KM + LO			
TRANSPORTE DE MATERIALES EJECUTADOS EN EL PERÍODO								
SUBBASE GRANULAR								
	241,00	PR39+742	PR39+512	6,05	247,05	34,50	8.523,33	Transporte de material
	241,00	PR39+847	PR39+740	5,76	246,76	16,05	3.960,55	Transporte de material
	241,00	PR37+600	PR37+576	7,89	248,89	59,47	14.801,25	Transporte de material
	241,00	PR37+556	PR37+520	7,95	248,95	85,98	21.404,55	Transporte de material
BASE GRANULAR								
	241,00	PR37+600	PR37+567	7,90	248,90	33,00	8.213,68	Transporte de material
	241,00	PR37+600	PR37+576	7,89	248,89	49,17	12.237,72	Transporte de material
	241,00	PR37+556	PR37+520	7,95	248,95	73,03	18.180,67	Transporte de material
					TOTAL VOLUMEN (m3)	351,20	87.322,00	

REGISTRO FOTOGRAFICO



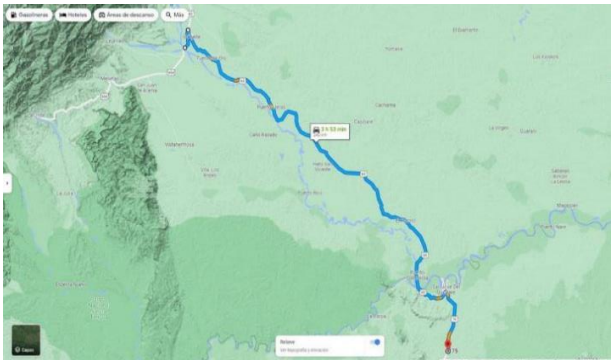

FUENTE DE MATERIALES SUBBASE GRANULAR Y BASE GRANULAR CLASE A 241 KM DE PR45+450

FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	EDWIN BUSTOS IBARRA	NOMBRE	OSCAR FERNANDO ALVARADO DIAZ
MATRICULA N°	52202-142431	MATRICULA N°	15202-172009YC
CARGO	DIRECTOR DE OBRA	CARGO	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	ENTIDAD	CONSORCIO ECOVISIÓN 190

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 56

PERIODO PRE-ACTA	01/enero/2026	31/enero/2026

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
41	Transporte de mezcla asfáltica, compactos	19.095,00	m3-km

ABSCISAS			DIMENSIONES							
INICIO	COLOCACION		LONGITUD EN OBRA	LONGITUD EN ZONA INDUSTRIAL PR43+580	LONGITUD AL PR45+450	MEZCLA ASFALTICA				OBSERVACIONES
	INICIO	FIN	LO	LZ	241 KM + LO	PORCENTAJE ASFALTO (%)	VOLUMEN MATERIALES (m^3)	VOLUMEN DE AGREGADOS (m3)	VOLUMEN (m^3-Km)	
	PR34+290	PR34+000	11,60	1,86	254,46	5,0%	72,21	68,60	17.455,49	Instalación de mezcla asfaltica tipo MDC-19 para carpeta de rodadura Calzada M.derecho
	PR71+100	PR73+250	26,73	1,86	269,59	5,0%	4,80	4,56	1.229,31	plasteo san joe
	PR71+500	PR72+800	26,70	1,86	269,56	5,0%	1,60	1,52	409,73	plasteo san joe
						TOTAL VOLUMEN DE ASFALTO	79,00		19.095,00	

REGISTRO FOTOGRÁFICO.



FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	EDWIN BUSTOS IBARRA	NOMBRE	OSCAR FERNANDO ALVARADO DIAZ
MATRICULA N°	52202-112431	MATRICULA N°	25202137488CND
CARGO	DIRECTOR DE OBRA	CARGO	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	ENTIDAD	CONSORCIO ECOVISIÓN 190

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	CONTRATO 976-2021 OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 56

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/enero/2026	31/enero/2026

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
NP-7	Material Granular Drenante	327,00	m3

ABSCISAS		DIMENSIONES					
INICIO	FIN	LONGITUD	AREA ABSCISA INICIO (m2)	AREA ABSCISA FIN (m2)	ÁREA PROMEDIO (m2)	CANTIDAD (m3)	OBSERVACIONES
PR38+709	PR38+440	268,60	0,54	0,54	0,54	145,04	Elaboracion de filtro Frances M.D
PR39+742	PR39+512	230,00	0,54	0,54	0,54	124,20	Elaboracion de filtro Frances M.D
PR39+847	PR39+740	107,00	0,54	0,54	0,54	57,78	Elaboracion de filtro Frances M.I
					TOTAL (m3)	327,00	

REGISTRO FOTOGRÁFICO.





FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	EDWIN BUSTOS IBARRA	NOMBRE	OSCAR FERNANDO ALVARADO DIAZ
MATRICULA N°	52202-142431	MATRICULA N°	2520212374888CND
CARGO	DIRECTOR DE OBRA	CARGO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	ENTIDAD	CONSORCIO ECOVISIÓN 190

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.

CONTRATO 976-2021
OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

INTERVENTOR

CARTERAS TOPOGRAFICAS

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	1 de enero de 2026	31 de enero de 2026

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
NP-7	Material Granular Drenante	327.00	m3

ABSCISAS		DIMENSIONES					
INICIO	FIN	LONGITUD (m)	AREA ABSCISA INICIO (m2)	AREA ABSCISA FIN (m2)	AREA PROMEDIO (m2)	CANTIDAD (m3)	OBSERVACIONES
PR38+709	PR38+440	268.60	0.54	0.54	0.54	145.04	Elaboracion de filtro M. derecha
PR39+742	PR39+512	230.00	0.54	0.54	0.54	124.20	Elaboracion de filtro M. derecha
PR39+847	PR39+740	107.00	0.54	0.54	0.54	57.78	Elaboracion de filtro M. derecha
					TOTAL VOLUMEN (m3)	327.00	

CAMILO HERNANDO SANCHEZ
Topografo Contratista Consorcio DSC
MP: 01-20551 C.P.N.T

OSCAR FERNANDO ALVARADO DIAZ
Director de interventoria
MP: 15202-172889 BYC

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	CONTRATO 976-2021 OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 56

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/enero/2026	31/enero/2026

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
NP-8	Tubería de Plástico Tipo corrugada de Diámetro 100mm.	613,00	m

ABSCISAS		DIMENSIONES					OBSERVACIONES
INICIO	FIN	COSTADO			DESCUENTO	LONGITUD (m)	
PR38+716	PR38+440	DERECHA				275,60	Elaboracion de filtro Frances M.D
PR39+742	PR39+512	DERECHA				230,00	Elaboracion de filtro Frances M.D
PR39+847	PR39+740	IZQUIERDA				107,00	Elaboracion de filtro Frances M.I
					TOTAL (m)	613,00	

REGISTRO FOTOGRÁFICO.







FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	EDWIN BUSTOS IBARRA	NOMBRE	OSCAR FERNANDO ALVARADO DIAZ
MATRICULA N°	52202-142431	MATRICULA N°	252021374880ND
CARGO	DIRECTOR DE OBRA	CARGO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	ENTIDAD	CONSORCIO ECOVISIÓN 190

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	CONTRATO 976-2021 OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

CARTERAS TOPOGRAFICAS

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	1 de enero de 2026	31 de enero de 2026

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
NP-8	Tuberia de plastico tipo corrugada de diametro 100mm	613.00	m

ALCANTARILLAS		DIMENSIONES				
ABSCISA INICIAL	ABCISA FINAL	CARRIL			LONGITUD (m)	OBSERVACIONES
PR38+716	PR38+440	DERECHA			275.60	Elaboracion de filtro M. derecha
PR39+742	PR39+512	DERECHA			230.00	Elaboracion de filtro M. derecha
PR39+847	PR39+740	IZQUIERDA			107.00	Elaboracion de filtro M. izquierda
				TOTAL LONGITUD (m)	613.00	

CAMILO HERNANDO SANCHEZ
Topografo Contratista Consorcio DSC
MP: 01-20551 C.P.N.T

OSCAR FERNANDO ALVARADO DIAZ
Director de interventoria
MP: 15202-172889 BYC

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	CONTRATO 976-2021 OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 56

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/enero/2026	31/enero/2026

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
NP-9	Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido.	3.741,00	m2

ABSCISAS		DIMENSIONES				OBSERVACIONES
INICIO	FIN	LONGITUD (m)	ANCHO	CARRIL	ÁREA (m2)	
PR38+709	PR38+440	268,60	3,80	DERECHA	1020,68	Elaboracion de filtro Frances M.D
PR39+742	PR39+512	230,00	3,80	DERECHA	874,00	Elaboracion de filtro Frances M.D
PR39+847	PR39+740	107,00	3,80	DERECHA	406,60	Elaboracion de filtro Frances M.I
PR33+000	PR32+990	10,00	7,6	DERECHA E IZQUIERDA	76,00	Separacion de capas -Mejoramiento sub rasante
PR32+990	PR32+980	10,00	7,6	DERECHA E IZQUIERDA	76,00	
PR32+980	PR32+970	10,00	8,6	DERECHA E IZQUIERDA	86,00	
PR32+970	PR32+960	10,00	8,9	DERECHA E IZQUIERDA	89,00	
PR32+960	PR32+950	10,00	9,8	DERECHA E IZQUIERDA	98,00	
PR32+950	PR32+940	10,00	9,8	DERECHA E IZQUIERDA	98,00	
PR32+940	PR32+930	10,00	9,67	DERECHA E IZQUIERDA	96,70	
PR32+930	PR32+920	10,00	10,35	DERECHA E IZQUIERDA	103,50	
PR32+920	PR32+910	10,00	10,01	DERECHA E IZQUIERDA	100,10	
PR32+910	PR32+900	10,00	10,16	DERECHA E IZQUIERDA	101,60	
PR32+900	PR32+890	10,00	10,55	DERECHA E IZQUIERDA	105,50	
PR32+890	PR32+880	10,00	11,06	DERECHA E IZQUIERDA	110,60	
PR32+880	PR32+870	10,00	10,77	DERECHA E IZQUIERDA	107,70	
PR32+870	PR32+860	10,00	9,55	DERECHA E IZQUIERDA	95,50	
PR32+860	PR32+850	10,00	9,56	DERECHA E IZQUIERDA	95,60	
				TOTAL (m2)	3.741,00	

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	CONTRATO 976-2021 OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 56

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/enero/2026	31/enero/2026

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
NP-9	Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido.	3.741,00	m2

ABSCISAS		DIMENSIONES				OBSERVACIONES
INICIO	FIN	LONGITUD (m)	ANCHO	CARRIL	ÁREA (m2)	

REGISTRO FOTOGRAFICO









FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	EDWIN BUSTOS IBARRA	NOMBRE	OSCAR FERNANDO ALVARADO DIAZ
MATRICULA N°	52202-142431	MATRICULA N°	15202-172889YC
CARGO	DIRECTOR DE OBRA	CARGO	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	ENTIDAD	CONSORCIO ECOVISIÓN 190

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	CONTRATO 976-2021 OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

CARTERAS TOPOGRAFICAS

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	1 de enero de 2026	31 de enero de 2026

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
NP-9	Geotextil tipo NT-2500 o similar no tejido	3,741.00	m2

ALCANTARILLAS		DIMENSIONES				
ABSCISA INICIAL	ABCISA FINAL	LONGITUD	ANCHO (m)	CARRIL	ÁREA (m2)	OBSERVACIONES
PR38+709	PR38+440	268.60	3.80	DERECHA	1020.68	Elaboracion de filtro Frances M.D
PR39+742	PR39+512	230.00	3.80	DERECHA	874.00	Elaboracion de filtro Frances M.D
PR39+847	PR39+740	107.00	3.80	DERECHA	406.60	Elaboracion de filtro Frances M.I
PR33+000	PR32+990	10.00	7.6	derecha e izquierda	76.00	Mejoramiento sub rasante, Margen derecha e izquierda
PR32+990	PR32+980	10.00	7.6		76.00	
PR32+980	PR32+970	10.00	8.6		86.00	
PR32+970	PR32+960	10.00	8.9		89.00	
PR32+960	PR32+950	10.00	9.8		98.00	
PR32+950	PR32+940	10.00	9.8		98.00	
PR32+940	PR32+930	10.00	9.67		96.70	
PR32+930	PR32+920	10.00	10.35		103.50	
PR32+920	PR32+910	10.00	10.01		100.10	
PR32+910	PR32+900	10.00	10.16		101.60	
PR32+900	PR32+890	10.00	10.55		105.50	
PR32+890	PR32+880	10.00	11.06		110.60	
PR32+880	PR32+870	10.00	10.77		107.70	
PR32+870	PR32+860	10.00	9.55		95.50	
PR32+860	PR32+850	10.00	9.56		95.60	
				TOTAL AREA (m2)	3,741.00	

CAMILO HERNANDO SANCHEZ
Topografo Contratista Consorcio DSC
MP: 01-20551 C.P.N.T

OSCAR FERNANDO ALVARADO DIAZ
Director de interventoria
MP: 15202-172889 BYC

CONSORCIO DSC	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 56

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/enero/2026	31/enero/2026

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
NP-13	Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales (Canto rodado de rio)	923,00	m3

ABSCISAS		DIMENSIONES					
INICIO	FIN	LONGITUD (m)	AREA ABSCISA INICIO (m2)	AREA ABSCISA FIN (m2)	AREA PROMEDIO (m2)	VOLUMEN (m3)	OBSERVACIONES
PR10+270	PR10+290	20	0,56	0,56	0,56	11,20	Mejoramiento subrasante existente
PR37+600	PR37+567	33	0,41	0,41	0,41	13,44	Ampliacion de terraplen M.izquierdo
PR37+546	PR37+520	26	1,03	1,03	1,03	26,78	Ampliacion de terraplen M.izquierdo
PR22+700	PR22+750	50	0,35	0,35	0,35	17,62	Mejoramiento subrasante existente
PR33+000	PR32+990	10	4,19	4,1948	4,19	41,94	Mejoramiento sub rasante, Margen derecha e izquierda
PR32+990	PR32+980	10	4,1948	4,439	4,32	43,17	
PR32+980	PR32+970	10	4,439	5,227	4,83	48,33	
PR32+970	PR32+960	10	5,227	5,3859	5,31	53,06	
PR32+960	PR32+950	10	5,3859	6,0608	5,72	57,23	
PR32+950	PR32+940	10	6,0608	6,0251	6,04	60,43	
PR32+940	PR32+930	10	6,0251	6,5356	6,28	62,80	
PR32+930	PR32+920	10	6,5356	6,486	6,51	65,11	
PR32+920	PR32+910	10	6,486	6,8182	6,65	66,52	
PR32+910	PR32+900	10	6,8182	7,4872	7,15	71,53	
PR32+900	PR32+890	10	7,4872	6,2065	6,85	68,47	
PR32+890	PR32+880	10	6,2065	5,7038	5,96	59,55	
PR32+880	PR32+870	10	5,7038	5,6992	5,70	57,02	
PR32+870	PR32+860	10	5,6992	5,0598	5,38	53,80	
PR32+860	PR32+850	10	5,0598	4,0052	4,53	45,33	
					TOTAL (m3)	923,00	

CONSORCIO DSC	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 56

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/enero/2026	31/enero/2026

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
NP-13	Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales (Canto rodado de rio)	923,00	m3

REGISTRO FOTOGRÁFICO







FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	EDWIN BUSTOS IBARRA	NOMBRE	OSCAR FERNANDO ALVARADO DIAZ
MATRICULA N°	52202-142431	MATRICULA N°	15202-172686YC
CARGO	DIRECTOR DE OBRA	CARGO	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	ENTIDAD	CONSORCIO ECOVISIÓN 190

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	CONTRATO 976-2021 OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

CARTERAS TOPOGRAFICAS

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	1 de enero de 2026	31 de enero de 2026

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
NP-13	Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales (Canto rodado de rio)	923.00	m3

ABSCISAS		DIMENSIONES					OBSERVACIONES
INICIO	FIN	LONGITUD (m)	AREA ABSCISA INICIO (m2)	AREA ABSCISA FIN (m2)	AREA PROMEDIO (m2)	CANTIDAD (m3)	
PR10+270	PR10+290	20	0.56	0.56	0.56	11.20	Mejoramiento subrasante existente
PR37+600	PR37+567	33	0.41	0.41	0.41	13.44	Ampliacion de terraplen M.izquierdo
PR37+546	PR37+520	26	1.03	1.03	1.03	26.78	Ampliacion de terraplen M.izquierdo
PR22+700	PR22+750	50	0.35	0.35	0.35	17.62	Mejoramiento subrasante existente
PR33+000	PR32+990	10.00	4.19	4.1948	4.19	41.94	Mejoramiento sub rasante, Margen derecha e izquierda
PR32+990	PR32+980	10.00	4.1948	4.439	4.32	43.17	
PR32+980	PR32+970	10.00	4.439	5.227	4.83	48.33	
PR32+970	PR32+960	10.00	5.227	5.3859	5.31	53.06	
PR32+960	PR32+950	10.00	5.3859	6.0608	5.72	57.23	
PR32+950	PR32+940	10.00	6.0608	6.0251	6.04	60.43	
PR32+940	PR32+930	10.00	6.0251	6.5356	6.28	62.80	
PR32+930	PR32+920	10.00	6.5356	6.486	6.51	65.11	
PR32+920	PR32+910	10.00	6.486	6.8182	6.65	66.52	
PR32+910	PR32+900	10.00	6.8182	7.4872	7.15	71.53	
PR32+900	PR32+890	10.00	7.4872	6.2065	6.85	68.47	
PR32+890	PR32+880	10.00	6.2065	5.7038	5.96	59.55	
PR32+880	PR32+870	10.00	5.7038	5.6992	5.70	57.02	
PR32+870	PR32+860	10.00	5.6992	5.0598	5.38	53.80	
PR32+860	PR32+850	10.00	5.0598	4.0052	4.53	45.33	
TOTAL VOLUMEN (m3)						923.00	

CAMILO HERNANDO SANCHEZ
Topografo Contratista Consorcio DSC
MP: 01-20551 C.P.N.T

OSCAR FERNANDO ALVARADO DIAZ
Director de interventoria
MP: 15202-172889 BYC

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	CONTRATO 976-2021 OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 56

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/enero/2026	31/enero/2026

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
NP-21	Montaje y pintura de estructura metálica	8.273,00	Kg

ABSCISA	LONGITUD	DIMENSIONES				OBSERVACIONES
INICIO		ALTURA (m)	LUZ (m)	KG*ML	Kg	
PR37+565	40,80			178,19	7270,36	Vigas para puente Tula
	17,88			63,58	1136,88	Vigas riostras entre viga 2,3 y 4 para puente tula
		4,00		19,13	76,52	Platina anclaje Neopreno
		12,00		11,34	136,08	Rigilizador en apoyos e intermedio de vano
		164,00		3,30	541,2	Conectores de cortante
	20,40			-43,5148	-887,7	descuento por actividad de pintura (5%)
				TOTAL (m3)	8.273,00	

REGISTRO FOTOGRÁFICO.







FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	EDWIN BUSTOS IBARRA	NOMBRE	OSCAR FERNANDO ALVARADO DIAZ
MATRICULA N°	52202-142431	MATRICULA N°	15202-172809BYC
CARGO	DIRECTOR DE OBRA	CARGO	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	ENTIDAD	CONSORCIO ECOVISIÓN 190

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	CONTRATO 976-2021 OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 56

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/enero/2026	31/enero/2026

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
NP-25	Cerca de alambre de púas con postes de concreto	85,00	m

ABSCISAS		DIMENSIONES				OBSERVACIONES
INICIO	FIN	LARGO	CANTIDAD	ANCHO	LONGITUD (ml)	
PR33+850	PR33+765	85,00			85,00	Instalación de cerca M. Izquierda
				TOTAL (m)	85,00	

REGISTRO FOTOGRÁFICO.



FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	EDWIN BUSTOS IBARRA	NOMBRE	OSCAR FERNANDO ALVARADO DIAZ
MATRICULA N°	52202-142431	MATRICULA N°	18202-172889BYC
CARGO	DIRECTOR DE OBRA	CARGO	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	ENTIDAD	CONSORCIO ECOVISIÓN 190
