CONSORCIO DSC	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 58

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA	
	01/marzo/2026	31/marzo/2026	

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM		CANTIDAD EJECUTADA	UND.
16	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 (No incluye Transporte)		2,00	m3

ABSCISAS		DIMENSIONES					
INICIO	FIN	LONGITUD INTERVENIDA	AREA ABSCISA INICIO (m2)	AREA ABSCISA FIN (m2)	AREA PROMEDIO (m2)	VOLUMEN (m^3)	OBSERVACIONES
PR71+500	PR72+800	1300,00	0,002	0,002	0,002	1,99	Tapa huecos de emergencia, San José
					VOLUMEN TOTAL (m3)	2,00	

REGISTRO FOTOGRÁFICO





FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	EDWIN BUSTOS IBARRA	NOMBRE	OSCAR FERNANDO ALVARADO DIAZ
MATRICULA N°	52202-142431	MATRICULA N°	13202-172889BYC
CARGO	DIRECTOR DE OBRA	CARGO	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	ENTIDAD	CONSORCIO ECOVISIÓN

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	CONTRATO 976-2021 OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

CARTERAS TOPOGRAFICAS

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	1 de marzo de 2026	31 de marzo de 2026

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
16	mezcla densa en caliente tipoMDC-19 (No incluye transporte)	2,00	m3

ABSCISAS		DIMENSIONES					OBSERVACIONES
INICIO	FIN	LONGITUD (m)	AREA ABSCISA INICIO (m2)	AREA ABSCISA FIN (m2)	AREA PROMEDIO (m2)	CANTIDAD (m3)	
PR71+500	PR72+800	1300,00	0,002	0,002	0,002	1,99	Tapa huecos de emergencia, San José
					TOTAL VOLUMEN (m3)	2,00	

CAMILO HERNANDO SANCHEZ
Topografo Contratista Consorcio DSC
MP: 01-20551 C.P.N.T

HENRY ARMANDO SANABRIA FERNANDEZ
topografo interventoria consorcio ecovision 190
MP: 01- 17315 C.P.N.T

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 58

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/marzo/2026	31/marzo/2026

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM		CANTIDAD EJECUTADA	UND.
18	Excavaciones varias sin clasificar		28,00	m3

ALCANTARILLAS		DIMENSIONES					
ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN	LONGITUD (m)	AREA ABSCISA INICIO (m2)	AREA ABSCISA FIN (m2)	AREA PROMEDIO EXCAVACION (m2)	CANTIDAD (m3)	OBSERVACIONES
PR32+620		8,00	3,00	4,00	3,50	28,00	Excavacion de obra de drenaje transversal M.I
					VOLUMEN TOTAL (m3)	28,00	

REGISTRO FOTOGRÁFICO.





FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	EDWIN BUSTOS IBARRA	NOMBRE	OSCAR FERNANDO ALVARADO DIAZ
MATRICULA N°	52202-142431	MATRICULA N°	15202-172889BYC
CARGO	DIRECTOR DE OBRA	CARGO	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	ENTIDAD	CONSORCIO ECOVISIÓN 190

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	**CONTRATO 976-2021** **OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"**	INTERVENTOR

CARTERAS TOPOGRAFICAS

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	1 de marzo de 2026	31 de marzo de 2026

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM		
18	Excavaciones varias sin clasificar	28,00	m3

ABSCISAS		DIMENSIONES					OBSERVACIONES
INICIO	FIN	LONGITUD (m)	AREA ABSCISA INICIO (m2)	AREA ABSCISA FIN (m2)	AREA PROMEDIO EXCAVACION (m2)	CANTIDAD (m3)	
PR32+620		8,00	3,00	4,00	3,50	28,00	Excavacion de obra de drenaje transversal M.I

TOTAL (m3)	**28,00**	

CAMILO HERNANDO SANCHEZ
Contratista Consorcio DSC
MP: 01-20551 C.P.N.T

HENRY ARMANDO SANABRIA FERNANDEZ Topografo
topografo interventoria consorcio ecovision 190
MP: 01- 17315 C.P.N.T

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 58

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/marzo/2026	31/marzo/2026

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
21	Rellenos para Estructuras con suelo	28,00	m3

ABSCISAS							
INICIO	FIN	LONGITUD (m)	AREA ABSCISA INICIO (m2)	AREA ABSCISA FIN (m2)	AREA PROMEDIO EXCAVACION (m2)	CANTIDAD (m3)	OBSERVACIONES
PR36+870		5,00	1,12	1,12	1,12	5,60	Lleno para confinamiento de via
PR39+100		10,00	2,24	2,24	2,24	22,40	Adecuacion para manejo de aguas Pluviales -Acceso viviendas M.IZ
					TOTAL (m3)	28,00	

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	EDWIN BUSTOS IBARRA	NOMBRE	OSCAR FERNANDO ALVARADO DIAZ
MATRICULA N°	52202-112431	MATRICULA N°	15202-172889BYC
CARGO	DIRECTOR DE OBRA	CARGO	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	ENTIDAD	CONSORCIO ECOVISIÓN 190

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	**CONTRATO 976-2021** **OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"**	INTERVENTOR

CARTERAS TOPOGRAFICAS

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	1 de marzo de 2026	31 de marzo de 2026

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
21	Rellenos para Estructuras con suelo	28,00	m3

ABSCISAS		DIMENSIONES					OBSERVACIONES
INICIO	FIN	LONGITUD (m)	AREA ABSCISA INICIO (m2)	AREA ABSCISA FIN (m2)	AREA PROMEDIO (m2)	CANTIDAD (m3)	
PR36+870		5,00	1,12	1,12	1,12	5,60	Lleno para confinamiento de via
PR39+100		10,00	2,24	2,24	2,24	22,40	Adecuacion para manejo de aguas Pluviales -Acceso viviendas M.IZ
					TOTAL (m3)	**28,00**	

CAMILO HERNANDO SANCHEZ
Topografo Contratista Consorcio DSC
MP: 01-20551 C.P.N.T

HENRY ARMANDO SANABRIA FERNANDEZ
topografo interventoria consorcio ecovision 190
MP: 01- 17315 C.P.N.T

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 58

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/marzo/2026	31/marzo/2026

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
22	Relleno para estructuras con recebo	95,00	m3

ABSCISAS							
INICIO	FIN	LONGITUD (m)	AREA ABSCISA INICIO (m2)	AREA ABSCISA FIN (m2)	AREA PROMEDIO EXCAVACION (m2)	CANTIDAD (m3)	OBSERVACIONES
PR32+620		5,00	2,24	2,24	2,24	11,20	Llleno encole alcantarilla M izquierda
PR33+970		4,00	2,80	2,80	2,80	11,20	Adecuacion de acceso a finca MI
PR39+100		10,00	5,04	5,04	5,04	50,40	Adecuacion para manejo de aguas Pluviales - Acceso viviendas M.I
PR32+885		5,00	4,48	4,48	4,48	22,40	Mejoramiento acceso finca ,Margen derecha
					VALOR TOTAL	95,00	

REGISTRO FOTOGRÁFICO





FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	EDWIN BUSTOS IBARRA	NOMBRE	ÓSCAR FERNANDO ALVARADO DIAZ
MATRICULA N°	52202-142431	MATRICULA N°	15202-172889BYC
CARGO	DIRECTOR DE OBRA	CARGO	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	ENTIDAD	CONSORCIO ECOVISIÓN 190

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	CONTRATO 976-2021 OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

CARTERAS TOPOGRAFICAS

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	1 de marzo de 2026	31 de marzo de 2026

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
22	Relleno para estructuras con recebo	95.00	m3

ABSCISAS		DIMENSIONES					OBSERVACIONES
INICIO	FIN	LONGITUD (m)	AREA ABSCISA INICIO (m2)	AREA ABSCISA FIN (m2)	AREA PROMEDIO (m2)	CANTIDAD (m3)	
PR32+620		5.00	2.24	2.24	2.24	11.20	Llleno encole alcantarilla M izquierda
PR33+970		4.00	2.80	2.80	2.80	11.20	Adecuacion de acceso a finca MI
PR39+100		10.00	5.04	5.04	5.04	50.40	Adecuacion para manejo de aguas Pluviales -Acceso viviendas M.I
PR32+885		5.00	4.48	4.48	4.48	22.40	Mejoramiento acceso finca ,Margen derecha
					TOTAL (m3)	95.00	

CAMILO HERNANDO SANCHEZ
Topografo Contratista Consorcio DSC
MP: 01-20551 C.P.N.T

HENRY ARMANDO SANABRIA FERNANDEZ
topografo interventoria consorcio ecovision 190
MP: 01- 17315 C.P.N.T

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 58

PERIODO PRE-ACTA	01/marzo/2026	31/marzo/2026

No. DE ORDEN		DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
23		Concreto clase 28 MPA	6,00	m3

ABSCISA		DIMENSIONES							OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	ALTO (m)	ANCHO (m)		LARGO (m)	ESPESOR (m)	ÁREA	VOLUMEN (m3)	
			ANCHO 1 (m)	ANCHO 2 (m)					
PR32+620		1,68	5,1	2,3		0,30	6,216	1,86	Zarpa de la alcantarilla, lado izquierdo
		0,30			4,9	0,30	1,47	0,44	Dentellon de la zarpa, lado izquierdo
		1,93	2,4	2,17		0,25	8,8201	2,21	Aleta 1 y aleta 2, lado izquierdo
		2,80			1,815	0,29	4,132	1,20	Muro cabezal , lado izquierdo
							TOTAL	6,00	

REGISTRO FOTOGRÁFICO.





FIRMA			FIRMA	
NOMBRE		EDWIN BUSTOS IBARRA	NOMBRE	OSCAR FERNANDO ALVARADO DIAZ
MATRICULA N°		52202-142431	MATRICULA N°	15202-172869BYC
CARGO		DIRECTOR DE OBRA	CARGO	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
ENTIDAD		CONSORCIO DSC	ENTIDAD	CONSORCIO ECOVISIÓN 190

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 58

PERIODO PRE-ACTA	01/marzo/2026	31/marzo/2026

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
24	Concreto clase 21 MPA	31,00	m3

UBICACIÓN		DIMENSIONES							VOLUMEN (m3)	OBSERVACIONES
ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN	MARGEN	LARGO	ANCHO 1 Y/O ALTO	AREA	ESPESOR (m)	CANTIDAD	ÁREA DEL TUBO		
PR37+980	PR37+844	DERECHO	135,80		0,18		1,00		24,44	Cunetas lado derecho
		DERECHO	3,17		0,92	0,15	1,00		0,14	Descole lado cerca
		DERECHO	3,17		0,95	0,15	1,00		0,14	Descole lado via
		DERECHO	3,17	0,50	1,59	0,15	1,00		0,24	Descole area piso
		DERECHO	2,70	0,88	1,19	0,15	1,00		0,18	Area triangular
		DERECHO	1,90	0,90	1,71	0,15	1,00		0,26	Losa frente a cabezote de alcantarilla
PR44+050		DERECHO			2,36	0,20	1,00		0,47	Concreto (descole de alcantarilla) escalon 1
		DERECHO			1,19	0,20	1,00		0,24	Cncreto (descole de alcantarilla) escalon 2
PR32+620		IZQUIERDO	5,75		0,37		1,00		2,12	Atraque para tuberia de alcantarilla (L=5 m h=0,37 m)
PR36+870		IZQUIERDO			11,28	0,15	1,00		1,69	Concreto encole de acantarilla
			2,98	1,31	3,90	0,10	1,00		0,39	Recubrimiento de gavion
			0,80	0,39	0,31	0,10	1,00		0,03	Recubrimiento de gabion (tramo con menos altura)
			3,15	1,36	4,28	0,10	1,00		0,43	Recubrimiento de gavion
								TOTAL	31,00	

REGISTRO FOTOGRÁFICO.





FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	EDWIN BUSTOS IBARRA	NOMBRE	OSCAR FERNANDO ALVARADO DIAZ
MATRICULA N°	52202-142431	MATRICULA N°	15202-172809BYC
CARGO	DIRECTOR DE OBRA	CARGO	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	ENTIDAD	CONSORCIO ECOVISIÓN 190

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 58

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/marzo/2026	31/marzo/2026

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
25	Concreto clase 14 MPA	1,00	m3

ALCANTARILLAS Y/O CUNETAS Y/O CANALES DE VIA		DIMENSIONES					OBSERVACIONES
ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	LARGO (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	AREA DE CAISSON	VOLUMEN (m3)	
PR32+620		5,75	1,80	0,10		1,04	Concreto para solado de tuberia alcantarilla
					TOTAL	1,00	

REGISTRO FOTOGRÁFICO.





FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	EDWIN BUSTOS IBARRA	NOMBRE	OSCAR FERNANDO ALVARADO DIAZ
MATRICULA N°	52202-142431	MATRICULA N°	15202-172889BYC
CARGO	DIRECTOR DE OBRA	CARGO	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	ENTIDAD	CONSORCIO ECOVISIÓN 190

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 58

PERIODO PRE-ACTA	DESDE 01/marzo/2026	HASTA 31/marzo/2026

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
26	Acero de refuerzo Y=420 Mpa.	1.675,00	kg

ALCANTARILLAS Y/O CUNETAS DE VIA			DIMENSIONES					OBSERVACIONES
ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN	MARGEN	DIÁMETRO	LONGITUD (m)	CANTIDAD	PESO KG	PESO (kg)	
PR37+980	PR37+884	Derecho	1/2"	95,90	5	0,996	477,58	Acero de refuerzo longitudianal cunetas M.D
				1,40	321	0,996	447,60	Acero de refuerzo transversal cunetas M.D
PR37+884	PR37+844	Derecho	3/8"	39,70	6	0,560	133,39	Acero de refuerzo longitudianal cunetas M.D
				1,40	133	0,560	104,27	Acero de refuerzo transversal cunetas M.D
PR37+844		Derecho	3/8"	3,17	6	0,560	10,65	Acero de refuerzo longitudianal (Zona de descole)
				1,00	9	0,560	5,04	Acero de refuerzo transversal (Zona de descole)
PR37+844		Derecho	3/8"	1,8	4	0,560	4,03	Acero de refuerzo longitudianal (Frente a cabezote)
				0,8	7	0,560	3,14	Acero de refuerzo transversal (Frente a cabezote)
PR32+620		IZQUIERDO	1/2"	3,1	20	0,996	61,75	Muro (Verticales + Ganchos)
				1,8	30	0,996	53,78	Muro (Horizontales)
				2,58	40	0,996	102,79	Aletas (Verticales + Ganchos)
				1,84	48	0,996	87,97	Aletas (Horizontales)
				4,6	16	0,996	73,31	Piso (Transversal)
				1,9	48	0,996	90,84	Piso (Longitudinal)
				4,8	4	0,996	19,12	dentellon
						TOTAL (KG)	1675,00	

REGISTRO FOTOGRÁFICO





FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	EDWIN BUSTOS IBARRA	NOMBRE	OSCAR FERNANDO ALVARADO DIAZ
MATRICULA N°	52202-142451	MATRICULA N°	18202-172484 STC
CARGO	DIRECTOR DE OBRA	CARGO	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	ENTIDAD	CONSORCIO ECOVISION 190

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 58

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	
	01/marzo/2026	31/marzo/2026

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
27	Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	6,00	ml

ALCANTARILLAS	DIMENSIONES				OBSERVACIONES
ABSCISA	CANTIDAD	LARGO (m)	ALTO (m)	LONGITUD (ml)	
PR32+620	6,00	1		6,00	Tuberia 36" margen izquierdo
			TOTAL	6,00	

REGISTRO FOTOGRÁFICO.



FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	EDWIN BUSTOS IBARRA	NOMBRE	OSCAR FERNANDO ALVARADO DIAZ
MATRICULA N°	52202-142431	MATRICULA N°	15202-172809DYC
CARGO	DIRECTOR DE OBRA	CARGO	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	ENTIDAD	CONSORCIO ECOVISIÓN 190

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 58

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/marzo/2026	31/marzo/2026

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
39	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	330,00	m3-km

ABSCISAS		DIMENSIONES						
INICIO	FIN	LONGITUD TRANSPORTE	AREA (m2)	ALTO (m)	VOLUMEN DESCAPOTE (m^3)	VOLUMEN EXCAVACIONES (m^3)	VOLUMEN (m^3-Km)	OBSERVACIONES
PR51+000	PR39+100	11,80				28	330,40	Material de excavacion de resaltos
						TOTAL	330,00	

REGISTRO FOTOGRÁFICO.



FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	EDWIN BUSTOS IBARRA	NOMBRE	OSCAR FERNANDO ALVARADO DIAZ
MATRICULA N°	52202-142431	MATRICULA N°	15202-172809 BYC
CARGO	DIRECTOR DE DE OBRA	CARGO	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	ENTIDAD	CONSORCIO ECOVISIÓN 190

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 58


PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/marzo/2026	31/marzo/2026

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
40	Transporte de materiales de sub-base y base granular, compactos	230.541,00	m3-km

ABSCISAS				DIMENSIONES				
INICIO	LONGITUD AL PR45+450 (Km)	COLOCACION		LONGITUD EN OBRA	LONGITUD TRANSPORTE	CANTIDAD DE MATERIAL	VOLUMEN (m^3-Km)	OBSERVACIONES
UBICACIÓN	DISTANCIA	INICIO	FIN	LO	218,5 KM + LO			
TRANSPORTE DE MATERIALES EJECUTADOS EN EL PERÍODO								
SUBBASE GRANULAR								
	241,00	PR32+850	PR32+650	12,90	253,90	518,00	131.520,20	Transporte de material de subbase
BASE GRANULAR								
	241,00	PR32+850	PR32+650	12,90	253,90	390,00	99.021,00	Transporte de material de base
					TOTAL VOLUMEN (m3)	908,00	230.541,00	

REGISTRO FOTOGRAFICO



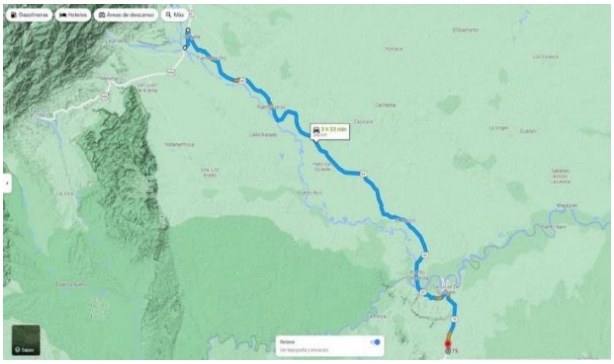

FUENTE DE MATERIALES SUBBASE GRANULAR Y BASE GRANULAR CLASE A 241 KM DE PR45+450

FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	EDWIN BUSTOS IBARRA	NOMBRE	OSCAR FERNANDO ALVARADO DIAZ
MATRICULA N°	52202-142431	MATRICULA N°	15202-172889814
CARGO	DIRECTOR DE OBRA	CARGO	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	ENTIDAD	CONSORCIO ECOVISIÓN 190
