Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes

LA DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA DEL MINISTERIO DE CULTURA

CERTIFICA QUE

CONSORCIO RYU-GD PATRIMONIAL, identificado con **CC** No. **901902403**, cumplió a satisfacción técnica, administrativa, financiera y jurídicamente con el objeto y las obligaciones del contrato de **Interventoría No. 4383/2024**, en la forma y oportunidad pactadas.

En caso que se haya generado un pago anterior en virtud del contrato, CERTIFICO que el informe de ejecución correspondiente a dicho periodo se encuentra publicado en SECOP II.(1)

Por lo anterior, se genera registro de reevaluación al proveedor donde autoriza cancelar la suma de **$ 86.650.191,76 "OCHENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO NOVENTA Y UNO CON 76/100 PESOS M/Cte.";** correspondientes al **Undecimo Pago** y tras previa verificación del cumplimiento de sus obligaciones con los sistemas de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos profesionales) y parafiscales.

Afecta los siguientes usos presupuestales:

No. COMPROMISO	RUBRO	USO	VALOR
32325	C-3302-1603-15-20302B1-3302073-02	A-02-02-02-008-003-01-1	$ 86.650.191,76
T O T A L			**$ 86.650.191,76**

Se expide en Bogotá, D.C. a los 26 días del mes de diciembre de 2025



MONICA ORDUÑA MONSALVE
DIRECTORA DE PATRIMONIO Y MEMORIA
Supervisor

Vo. Bo.: DANIEL RICARDO CEPEDA HERNÁNDEZ
MARÍA CAROLINA ESCOBAR SOLANO

(1) Solo aplica para contratos que están publicados en SECOP II

MINISTERIO DE CULTURA
INFORME DE ACTIVIDADES

CONTRATO No.:
PERIODO DEL INFORME:
VIGENCIA DEL CONTRATO:
CONTRATISTA:
OBJETO:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ESPECÍFICAS PARA EL PERIODO EN MENCIÓN

Para el cumplimiento del objeto del contrato desarrolle las siguientes actividades acorde con el contrato en mención:

No.	Tipo	Obligación	Actividad	Porcentaje Avance	Soporte

Fecha de Entrega:

MINISTERIO DE CULTURA
INFORME DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES ADICIONALES

No.	Actividad

Cordial saludo,

En mi calidad de contratista me comprometo a publicar el presente informe y la certificación de cumplimiento en el SECOP II dentro de los 3 días hábiles siguientes a la aprobación del mismo.(1)

CONTRATISTA

Vo. Bo.:

Ministerio de Cultura
Supervisor

(1) Solo aplica para contratos que están publicados en SECOP II

Fecha de Entrega:

CONSORCIO RYU-GD PATRIMONIAL

EL REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE Y LA CONTADORA PÚBLICA DEL CONSORCIO

Certifican bajo gravedad de juramento que el **CONSORCIO RYU-GD PATRIMONIAL**, identificado con Nit. 901.902.403-4, ha efectuado en forma correcta y oportuna durante el período del 7 de octubre al 6 de noviembre de 2025, el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral (Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales) y Parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje); de conformidad con el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por el Artículo 1º de la Ley 828 de 2003, de todos sus empleados vinculados por el **CONSORCIO** para el desarrollo del Contrato de Interventoría No. 4383-2024 celebrado con el **MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES** para la Interventoría integral al Contrato de Obra derivado del proceso de licitación pública MC-LP-007-2024 cuyo objeto es "Realizar las obras de intervención integral del edificio Siberia que hace parte del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil, en la ciudad de Bogotá D.C., declarado Bien de Interés Cultural del Ámbito Nacional".


Para constancia se firma en Bogotá D.C., a los cuatro (4) días del mes de diciembre de 2025.


CONSORCIO RYU-GD PATRIMONIAL

ALEJANDRO RESTREPO GÓMEZ
C.C. 79.155.746 de Bogotá
Representante Legal Suplente

SANDRA JULIET CORTÉS ORJUELA
C.C. 52.073.213 de Bogotá
Tarjeta Profesional Nº 78420-T
Contadora Pública del Consorcio

JCV/FCR

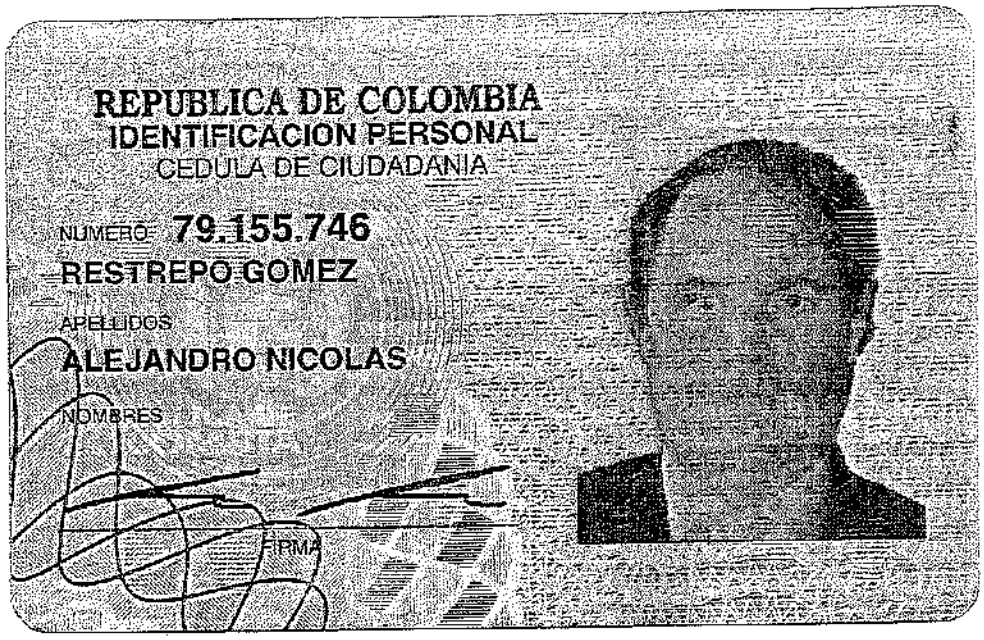
REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 79.155.746
RESTREPO GOMEZ
APELLIDOS
ALEJANDRO NICOLAS
NOMBRES
FIRMA

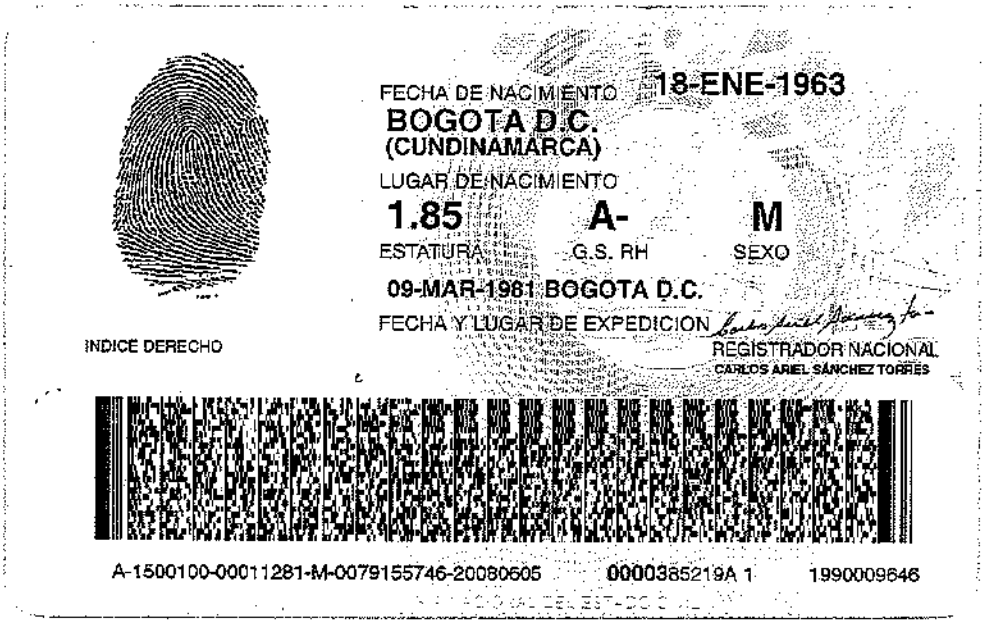
FECHA DE NACIMIENTO 18-ENE-1963
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.85
A-
M
ESTATURA
G.S. RH
SEXO
09-MAR-1981 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
INDICE DERECHO
A-1500100-00011281-M-0079155746-20080605 0000385219A 1 1990009646

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **52.073.213**

CORTES ORJUELA

APELLIDOS

SANDRA JULIET

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **12-ABR-1972**

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.53	**A+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

23-NOV-1990 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00209509-F-0052073213-20100113 0020048695A 1 1110614685

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



7842O-T

SANDRA JULIET
CORTES ORJUELA
C.C. 52073213
RESOLUCION INSCRIPCION 64 FECHA 10/05/2001
UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA

PRESIDENTE JAIME A. HERNANDEZ V. 88489

FGSA EA 04/2001-25034

038375

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

8 3 0 2 5 0 3 8 2 0 2 3 6 9 9 1

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
RESTREPO Y URIBE S.A.S.

Que el contador público **SANDRA JULIET CORTES ORJUELA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52073213 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 78420-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

PILAR DEL ROCIO PRADA DUARTE, mayor de edad, domiciliada en la ciudad de Bogotá, identificada con la cedula de ciudadanía 52.427.735 de Bogotá D.C., con Tarjeta Profesional 141758-T, en calidad de Revisora Fiscal de la Empresa **RESTREPO Y URIBE S.A.S.** identificada con Nit. 860.009.250-6, por medio del presente escrito:

CERTIFICO

Que según registros contables de la Empresa **RESTREPO Y URIBE S.A.S.** identificada con Nit. 860.009.250-6, durante los últimos seis meses, ha realizado en forma oportuna el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral (Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales) y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje) de todos sus empleados, en cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por el Artículo 1º de la Ley 828 de 2003.

Adicionalmente, se confirma que la Empresa se encuentra a paz y salvo con las obligaciones laborales de todos sus empleados.

Para constancia se firma en Bogotá D.C., a los cuatro (4) días del mes de diciembre de 2025.

Cordialmente,



PILAR DEL ROCIO PRADA DUARTE
Revisora Fiscal
C.C. 52.427.735 de Bogotá D.C.
Tarjeta Profesional 141758-T



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO: 52.427.735
PRADA DUARTE
APELLIDOS
PILAR DEL ROCIO
NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 07-MAY-1978
EL PEÑON
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.55 ESTATURA
O+ G.S. RH
F SEXO
25-SEP-1996 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00211586-F-0052427735-20100129 0020436890A 2 1160114084

REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



141758-T

PILAR DEL ROCIO
PRADA DUARTE
C.C. 52427735
RESOLUCION INSCRIPCION 114 FECHA 14/05/2009
UNIVERSIDAD FUND. UNIV. SAN MARTIN

PRESIDENTE

LUIS ALONSO COLMENARES RODRIGUEZ 152323

23 ABR 2010

FIRMA DEL TITULAR 65460

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

1831A8A1021FD89

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
RESTREPO Y URIBE S.A.S.

Que el contador público **PILAR DEL ROCIO PRADA DUARTE** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52427735 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 141758-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *


EL REVISOR FISCAL DE GUTIERREZ DÍAZ SAS

NIT. # 860.505.064-1

CERTIFICA QUE:

La sociedad Gutiérrez Díaz SAS ha realizado la presentación y pago correspondiente a los últimos 6 meses de los aportes a: Los Sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

La anterior certificación se expide para dar cumplimiento al artículo 50 de la ley 789 de 2002, modificado por el Artículo 1°. de la Ley 828 de 2.003 al tercer (03) día del mes de diciembre del año dos mil veinticinco (2025).



ALEJANDRO SOLER MENDOZA
T.P. 8340-T

Nota: De acuerdo al decreto 923 de mayo de 2017 del Ministerio de Protección Social, la Sociedad debe cancelar sus aportes a los sistemas de seguridad social y Parafiscal hasta el DECIMO PRIMER (11) día hábil de cada mes.



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
19.426.293
NUMERO
SOLER MENDOZA
APELLIDOS
ALEJANDRO
NOMBRES
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 25-OCT-1960
BUCARAMANGA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.69
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

30-ABR-1979 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL

A-1500102-42136085-M-0019426293-20050912 02186 05252B 02 179876653

NO SIRVE COMO DOCUMENTO DE IDENTIFICACION

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

8340-T



ALEJANDRO
SOLER MENDOZA
C.C. 19426893
RESOLUCION INSCRIPCION 298 FECHA 04/04/83
UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO

Presidente

00015666

Juan Carlos Vargas Jaramillo
NOTARIO CUARENTA Y DOS
DEL CIRCULO DE BOGOTA - COLOMBIA

02 MAY 2012

ESTE DOCUMENTO
ES COPIA DEL ORIGINAL
QUE FUE PRESENTADO PARA ESTA
DILIGENCIA DE AUTENTICACION

NO SIRVE COMO DOCUMENTO DE IDENTIFICACION

DUPLICADO

Firma del Titular

Esta tarjeta no es un documento que acredite como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.

000894

Juan Carlos Vargas Jaramillo
NOTARIO CUARENTA Y DOS
DEL CIRCULO DE BOGOTA - COLOMBIA

02 MAY 2012

ESTE DOCUMENTO
ES COPIA DEL ORIGINAL
QUE FUE PRESENTADO PARA ESTA
DILIGENCIA DE AUTENTICACION

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

8F3002EEDC4970 5

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ALEJANDRO SOLER MENDOZA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 19426293 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 8340-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-12-09, 11:25:52 AM **Tipo Planilla:** N: PLANILLA CORRECCIONES **Numéro Planilla:** 82095824

Nro Planilla Corregida: 82019813 **Periodo Cotización:** noviembre de 2025 **Periodo Servicio:** diciembre de 2025

PAGADO 09/12/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSORCIO RYU GD PATRIMONIAL	**Nombre Sucursal**	BOGOTA	**Código Sucursal**	02
Documento	NI901902403	**Dirección**	CL 95 #15 - 47 PISO 6		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	6016225099		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL		
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal	CARO RIVERA FERNANDO	**Identificación**	CC 19432302		
Total Afiliados	2	**ARP**	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1014211232	ANGIE PAOLA AVILA AGUACIA	01	00									A								0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 4.000.000	$ 640.000	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 4.000.000	$ 160.000	4,350	$ 4.000.000	$ 174.000	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 4.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.134.000
CC 1014211232	ANGIE PAOLA AVILA AGUACIA	01	00									C								0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 4.000.000	$ 640.000	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 4.000.000	$ 160.000	6,960	$ 4.000.000	$ 278.400	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 4.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.238.400
CC 1019035188	JUAN CAMILO MONTERO RODRIGUEZ	01	00									A								0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 4.500.000	$ 720.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 4.500.000	$ 180.000	4,350	$ 4.500.000	$ 195.800	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 4.500.000	$ 180.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.275.800
CC 1019035188	JUAN CAMILO MONTERO RODRIGUEZ	01	00									C								0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 4.500.000	$ 720.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 4.500.000	$ 180.000	6,960	$ 4.500.000	$ 313.200	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 4.500.000	$ 180.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.393.200

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 221.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 221.800	$ 1.000	$ 222.800

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2025-12-02, 02:04:26 p. m. **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 82019813

Periodo Cotización 202511 **Periodo Servicio** 202512

PAGADA 2025-12-02 12:59:10.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSORCIO RYU GD PATRIMONIAL				
Documento	NI 901902403	**Dirección**	CL 95 #15 - 47 PISO 6		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	6016225099		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL	**Total Afiliados**	8
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal	CARO RIVERA FERNANDO	**Identificación**	CC 19432302		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 42131984		**Residente**		**Exonerado**	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					CHILITO AMAYA MAGDA LORENA	11001000 - 11		BOGOTA D.C.

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																						**Extranjero**	**Tipo salario**	**Salario**	**Pensión**							**Salud**						**Riesgos**					**Caja**				**Parafiscales**			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				**Código AFP**	**Código Tras. AFP**	**Tarifa AFP**	**IBC**	**Total Aporte AFP**	**Total Aporte FSP**	**Total Aporte FSPS**	**Código EPS**	**Código Tras. EPS**	**Tarifa EPS**	**IBC EPS**	**Aporte Salud**	**Aporte UPC**	**Código ARL**	**Clase Riesgo**	**Tarifa ARL**	**IBC ARL**	**Aporte Riesgos**	**Código CCF**	**Tarifa CCF**	**IBC CCF**	**Aporte Caja**	**Tarifa SENA**	**Aporte SENA**	**Tarifa ICBF**	**Aporte ICBF**
															0	30	30	30	30		F	$ 6.000.000	25-14		16 %	$ 6.000.000	$ 960.000	$ 30.000	$ 30.000	EPS010		4 %	$ 6.000.000	$ 240.000	$ 0	14-25	5	6,960 %	$ 6.000.000	$ 417.600	CCF22	4 %	$ 6.000.000	$ 240.000	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SURA	COLMENA VIDA Y RIESGOS	COLSUBSIDIO	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 960.000	$ 30.000	$ 30.000	$ 240.000	$ 417.600	$ 240.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.917.600

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2025-12-02, 02:05:37 p. m. **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 82019813

Periodo Cotización 202511 **Periodo Servicio** 202512

PAGADA 2025-12-02 12:59:10.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSORCIO RYU GD PATRIMONIAL				
Documento	NI 901902403	**Dirección**	CL 95 #15 - 47 PISO 6		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	6016225099		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL	**Total Afiliados**	8
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal	CARO RIVERA FERNANDO	**Identificación**	CC 19432302		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1007327268		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					GIL AREVALO MARIA ALEJANDRA	11001000 - 11		BOGOTA D.C.

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																							**Extranjero**	**Tipo salario**	**Salario**	**Pensión**							**Salud**						**Riesgos**					**Caja**				**Parafiscales**			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF						Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	30					F	$ 2.700.000	230201		16 %	$ 2.700.000	$ 432.000	$ 0	$ 0	EPS008		4 %	$ 2.700.000	$ 108.000	$ 0	14-25	5	6,960 %	$ 2.700.000	$ 188.000	CCF22	4 %	$ 2.700.000	$ 108.000	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PROTECCION	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	COMPENSAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS	COLSUBSIDIO	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 432.000	$ 0	$ 0	$ 108.000	$ 188.000	$ 108.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 836.000

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-12-09, 11:25:52 AM **Tipo Planilla:** N: PLANILLA CORRECCIONES **Numéro Planilla:** 82095824

Nro Planilla Corregida: 82019813 **Periodo Cotización:** noviembre de 2025 **Periodo Servicio:** diciembre de 2025

PAGADO 09/12/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSORCIO RYU GD PATRIMONIAL	**Nombre Sucursal**	BOGOTA	**Código Sucursal**	02
Documento	NI901902403	**Dirección**	CL 95 #15 - 47 PISO 6		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	6016225099		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL		
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal	CARO RIVERA FERNANDO	**Identificación**	CC 19432302		
Total Afiliados	2	**ARP**	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1014211232	ANGIE PAOLA AVILA AGUACIA	01	00									A								0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 4.000.000	$ 640.000	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 4.000.000	$ 160.000	4,350	$ 4.000.000	$ 174.000	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 4.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.134.000
CC 1014211232	ANGIE PAOLA AVILA AGUACIA	01	00									C								0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 4.000.000	$ 640.000	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 4.000.000	$ 160.000	6,960	$ 4.000.000	$ 278.400	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 4.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.238.400
CC 1019035188	JUAN CAMILO MONTERO RODRIGUEZ	01	00									A								0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 4.500.000	$ 720.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 4.500.000	$ 180.000	4,350	$ 4.500.000	$ 195.800	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 4.500.000	$ 180.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.275.800
CC 1019035188	JUAN CAMILO MONTERO RODRIGUEZ	01	00									C								0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 4.500.000	$ 720.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 4.500.000	$ 180.000	6,960	$ 4.500.000	$ 313.200	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 4.500.000	$ 180.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.393.200

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 221.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 221.800	$ 1.000	$ 222.800

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2025-12-02, 02:01:12 p. m. **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 82019813

Periodo Cotización 202511 **Periodo Servicio** 202512

PAGADA 2025-12-02 12:59:10.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSORCIO RYU GD PATRIMONIAL				
Documento	NI 901902403	**Dirección**	CL 95 #15 - 47 PISO 6		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	6016225099		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL	**Total Afiliados**	8
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal	CARO RIVERA FERNANDO	**Identificación**	CC 19432302		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1085259377		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					MONTENEGRO ROSERO NATHALIA ANDREA	11001000 - 11		BOGOTA D.C.

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	30			F	$ 4.000.000	230301		16 %	$ 4.000.000	$ 640.000	$ 0	$ 0	EPS008		4 %	$ 4.000.000	$ 160.000	$ 0	14-25	5	6,960 %	$ 4.000.000	$ 278.400	CCF22	4 %	$ 4.000.000	$ 160.000	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	COMPENSAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS	COLSUBSIDIO	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 640.000	$ 0	$ 0	$ 160.000	$ 278.400	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.238.400

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2025-12-02, 01:56:31 p. m. **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 82019813

Periodo Cotización 202511 **Periodo Servicio** 202512

PAGADA 2025-12-02 12:59:10.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSORCIO RYU GD PATRIMONIAL				
Documento	NI 901902403	**Dirección**	CL 95 #15 - 47 PISO 6		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	6016225099		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL	**Total Afiliados**	8
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal	CARO RIVERA FERNANDO	**Identificación**	CC 19432302		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 52843127		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					NUÑEZ BURGOS YOLANDA PATRICIA	11001000 - 11		BOGOTA D.C.

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																						Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	30			F	$ 3.800.000	231001		16 %	$ 3.800.000	$ 608.000	$ 0	$ 0	EPS008		4 %	$ 3.800.000	$ 152.000	$ 0	14-25	5	6,960 %	$ 3.800.000	$ 264.500	CCF22	4 %	$ 3.800.000	$ 152.000	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLFONDOS	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	COMPENSAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS	COLSUBSIDIO	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 608.000	$ 0	$ 0	$ 152.000	$ 264.500	$ 152.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.176.500

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2025-12-02, 02:02:23 p. m. **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 82019813

Periodo Cotización 202511 **Periodo Servicio** 202512

PAGADA 2025-12-02 12:59:10.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSORCIO RYU GD PATRIMONIAL				
Documento	NI 901902403	**Dirección**	CL 95 #15 - 47 PISO 6		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	6016225099		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL	**Total Afiliados**	8
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal	CARO RIVERA FERNANDO	**Identificación**	CC 19432302		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 79684215		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					ROMERO CAPERA SERGIO ALBERTO	11001000 - 11		BOGOTA D.C.

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																							**Extranjero**	**Tipo salario**	**Salario**	**Pensión**							**Salud**						**Riesgos**					**Caja**				**Parafiscales**			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF						Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	30					F	$ 5.350.000	25-14		16 %	$ 5.350.000	$ 856.000	$ 0	$ 0	EPS005		4 %	$ 5.350.000	$ 214.000	$ 0	14-25	5	6,960 %	$ 5.350.000	$ 372.400	CCF22	4 %	$ 5.350.000	$ 214.000	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS	COLSUBSIDIO	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 856.000	$ 0	$ 0	$ 214.000	$ 372.400	$ 214.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.656.400

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2025-12-02, 01:54:48 p. m. **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 82019813

Periodo Cotización 202511 **Periodo Servicio** 202512

PAGADA 2025-12-02 12:59:10.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSORCIO RYU GD PATRIMONIAL				
Documento	NI 901902403	**Dirección**	CL 95 #15 - 47 PISO 6		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	6016225099		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL	**Total Afiliados**	8
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal	CARO RIVERA FERNANDO	**Identificación**	CC 19432302		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 19398971		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	01					TIRADO TRIANA CARLOS ALBERTO	11001000 - 11		BOGOTA D.C.

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																							**Extranjero**	**Tipo salario**	**Salario**	**Pensión**							**Salud**						**Riesgos**					**Caja**				**Parafiscales**			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF						Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	0	30	30	30			F	$ 6.000.000	NIN-AF		0 %	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	EPS008		4 %	$ 6.000.000	$ 240.000	$ 0	14-25	5	6,960 %	$ 6.000.000	$ 417.600	CCF22	4 %	$ 6.000.000	$ 240.000	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
NINGUNA AFP	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	COMPENSAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS	COLSUBSIDIO	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 0	$ 0	$ 0	$ 240.000	$ 417.600	$ 240.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 897.600

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2025-12-02, 02:03:22 p. m. **Tipo Planilla** Y **Número Planilla** 82024893

Periodo Cotización 202511 **Periodo Servicio** 202511

PAGADA 2025-12-02 13:01:16.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSORCIO RYU GD PATRIMONIAL				
Documento	NI 901902403	**Dirección**	CL 95 #15 - 47 PISO 6		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	6016225099		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL	**Total Afiliados**	4
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal	CARO RIVERA FERNANDO	**Identificación**	CC 19432302		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 19304971		Residente		Exonerado	N	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	59	00					CISNEROS GARAVITO GONZALO FERNANDO	11001000 - 11		BOGOTA D.C.

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																							**Extranjero**	**Tipo salario**	**Salario**	**Pensión**							**Salud**						**Riesgos**					**Caja**				**Parafiscales**			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF						Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	0	0	30	0				$ 1.423.500	NIN-AF		0 %	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	NIN-EP		0 %	$ 0	$ 0	$ 0	14-25	5	6,960 %	$ 1.423.500	$ 99.100	NIN-CC	0 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
NINGUNA AFP	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	NINGUNA EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 99.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 99.100

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

EXPERTOS en PILA

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	19304971
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			GONZALO FERNANDO CISNEROS GARAVITO
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CLL 128B 18 51	TELÉFONO:	6269076
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otros trabajos de edición.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	001 - CONTRATO 2
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7994115647**			TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES noviembre	AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre	AÑO	2025
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/11/07			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1911505016		

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 178.000
SUBTOTALES:													**$ 178.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 178.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 7.500	$ 7.500	$ 0	$ 0	$ 7.500
SUBTOTALES:									**$ 7.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 7.500**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES														
																										PENSIÓN									SALUD							ARP																						
																													FSP		APORTES VOLUNTARIOS																																		
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	SENA	TOTAL APORTE	ICBF	TOTAL APORTE	ESAP	TOTAL APORTE	MINEDU	TOTAL APORTE
1	CC 19304971	CISNEROS GARAVITO GONZALO FERNANDO	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	REQ CUMP PENS	$ 1.423.500				NO								01-30												$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500	19304971	$ 7.500		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 185.500

Planilla Pagada

Certificados de Aportes

Se certifica que GUTIERREZ DIAZ S.A.S identificado(a) con NI 860505064 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para JORGE IVAN GARCIA MANCILLA identificado(a) con CC 9771029

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	
9495884681	1999765163	E	2025-12-11	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	4%	$320,000
9495884681	1999765163	E	2025-12-11	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	16%	$1,280,000
9495884681	1999765163	E	2025-12-11	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-11	30																		$40,000
9495884681	1999765163	E	2025-12-11	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-11	30																		$40,000
9495884681	1999765163	E	2025-12-11	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-11	30																	0%	$0
9495884681	1999765163	E	2025-12-11	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-11	30																	0%	$0
9495884681	1999765163	E	2025-12-11	ARL	14-25	COLMENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	6.96%	$556,800
9495884681	1999765163	E	2025-12-11	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	4%	$320,000

Este certificado se expide el día 2025-12-12 a las 10:19.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900429126	7	CIMEL INGENIERIA ELECTRICA S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 11 # 71 - 41 OF 205	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3099299	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	1985665787	9495084331	E	2025/12/05	2025/12/05	BANCO DAVIVIENDA	0	$464,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES	
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	Codigo	Dias	Codigo	Días	Codigo	Días	Tarifa	Días	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																													
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (1 Afiliados)																													
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																													
1	CC	91240612	GUTIERREZ RIVERA JOSE LUIS																	25-14	30	EPS017	30	CCF22	30	14-23	30	6.960%	30	Si
Total		**Afiliados(1)**																											

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900429126	7	CIMEL INGENIERIA ELECTRICA S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 11 # 71 - 41 OF 205	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3099299	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	1985665787	9495084331	E	2025/12/05	2025/12/05	BANCO DAVIVIENDA	0	$464,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$240,000	$0	$0	$240,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$240,000	$0	$0	$240,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$104,400	$0	$0	$104,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$104,400	$0	$0	$104,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$60,000	$0	$0	$60,000
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	1	$60,000	$0	$0	$60,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$60,000	$0	$0	$60,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$60,000	$0	$0	$60,000
TOTAL				1	$464,400	$0	$0	$464,400

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2025-12-02, 03:04:49 p. m. **Tipo Planilla** Y **Número Planilla** 82024893

Periodo Cotización 202511 **Periodo Servicio** 202511

PAGADA 2025-12-02 13:01:16.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSORCIO RYU GD PATRIMONIAL				
Documento	NI 901902403	**Dirección**	CL 95 #15 - 47 PISO 6		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	6016225099		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL	**Total Afiliados**	4
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal	CARO RIVERA FERNANDO	**Identificación**	CC 19432302		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1015439375		Residente		Exonerado	N	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	59	00					CAMPO NAVARRO JUAN PABLO	11001000 - 11		BOGOTA D.C.

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																							**Extranjero**	**Tipo salario**	**Salario**	**Pensión**							**Salud**						**Riesgos**					**Caja**				**Parafiscales**			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF						Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	0	0	30	0				$ 1.423.500	NIN-AF		0 %	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	NIN-EP		0 %	$ 0	$ 0	$ 0	14-25	5	6,960 %	$ 1.423.500	$ 99.100	NIN-CC	0 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
NINGUNA AFP	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	NINGUNA EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 99.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 99.100

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

EXPERTOS en PILA

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1015439375		CAMPO NAVARRO JUAN PABLO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 13A # 150-06	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	2008529578	9496432036	I	2025/12/17	2025/12/15	LULO BANK		$912,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1015439375	CAMPO NAVARRO JUAN PABLO																		25-14	30	$3,200,000	$512,000	EPS005	30	$3,200,000	$400,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0	No	$912,000
Total	**Afiliados(1)**																						$3,200,000	$512,000			$3,200,000	$400,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0		$912,000

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1015439375		CAMPO NAVARRO JUAN PABLO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 13A # 150-06	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	2008529578	9496432036	I	2025/12/17	2025/12/15	LULO BANK		$912,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$512,000	$0	$512,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$512,000	$0	$512,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$400,000	$0	$400,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$400,000	$0	$400,000
TOTAL				**1**	**$912,000**	**$0**	**$912,000**

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-12-12, 11:40:54 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 81936370

Periodo Cotización: noviembre de 2025 **Periodo Servicio:** noviembre de 2025

PAGADO 12/12/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MARCELA SALCEDO QUIJANO		
Documento	CC51883545	**Dirección**	CRA 5 67 50
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3104759
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	NINGUNA ARP

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 51883545	MARCELA SALCEDO QUIJANO	03	04																	0	0	30	0	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.423.500	$ 178.000	0,000	$ 0	$ 0	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 0	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 200	$ 178.200

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2025-12-02, 03:27:15 p. m. **Tipo Planilla** Y **Número Planilla** 82024893

Periodo Cotización 202511 **Periodo Servicio** 202511

PAGADA 2025-12-02 13:01:16.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSORCIO RYU GD PATRIMONIAL				
Documento	NI 901902403	**Dirección**	CL 95 #15 - 47 PISO 6		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	6016225099		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL	**Total Afiliados**	4
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal	CARO RIVERA FERNANDO	**Identificación**	CC 19432302		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 51883545		Residente		Exonerado	N	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	59	00					SALCEDO QUIJANO MARCELA	11001000 - 11		BOGOTA D.C.

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
X																0	0	0	30	0			$ 1.423.500	NIN-AF		0 %	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	NIN-EP		0 %	$ 0	$ 0	$ 0	14-25	5	6,960 %	$ 1.423.500	$ 99.100	NIN-CC	0 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
NINGUNA AFP	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	NINGUNA EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 99.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 99.100

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

EXPERTOS en PILA

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2025-12-02, 02:05:37 p. m. **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 82019813

Periodo Cotización 202511 **Periodo Servicio** 202512

PAGADA 2025-12-02 12:59:10.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSORCIO RYU GD PATRIMONIAL				
Documento	NI 901902403	**Dirección**	CL 95 #15 - 47 PISO 6		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	6016225099		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL	**Total Afiliados**	8
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal	CARO RIVERA FERNANDO	**Identificación**	CC 19432302		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1007327268		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					GIL AREVALO MARIA ALEJANDRA	11001000 - 11		BOGOTA D.C.

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																							**Extranjero**	**Tipo salario**	**Salario**	**Pensión**							**Salud**						**Riesgos**					**Caja**				**Parafiscales**			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF						Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	30					F	$ 2.700.000	230201		16 %	$ 2.700.000	$ 432.000	$ 0	$ 0	EPS008		4 %	$ 2.700.000	$ 108.000	$ 0	14-25	5	6,960 %	$ 2.700.000	$ 188.000	CCF22	4 %	$ 2.700.000	$ 108.000	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PROTECCION	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	COMPENSAR EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS	COLSUBSIDIO	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 432.000	$ 0	$ 0	$ 108.000	$ 188.000	$ 108.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 836.000

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

PAGOSIMPLE I

AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-12-01, 03:23:36 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla**

Periodo Cotización: noviembre de 2025 **Periodo Servicio:** noviembre de 2025

PAGADO 01/12/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	PAULA ANDREA GIL ACOSTA		
Documento	CC1020763655	**Dirección**	CR 4 #26 B - 51 APTO 305
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3002361279
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas	
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	I C
CC 1020763655	PAULA ANDREA GIL ACOSTA	59	00																	0	30	30	30	0	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.925.200	$ 468.100	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.925.200	$ 365.700	0,522	$ 2.925.200	$ 15.300	(NIN-CC) NINGUNA CCF	

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUB INT
$ 2.925.200	$ 2.925.200	$ 2.925.200	$ 0	$ 468.100	$ 365.700	$ 15.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901443029-2	CVT PROYECTOS SAS	CARRERA 8 #172 A-85 TORRE 2 APTO 1103	3003468794	gerencia@cvt.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					13	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-11	E	09/12/2025	92123159	$9.853.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	280.000	0		0		0	0	0	0	280.000	1
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	417.000	0		0		0	0	0	0	417.000	3
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	361.700	0		0		0	0	0	0	361.700	3
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	11.800	0		0		0	0	0	0	11.800	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	24.700	0		0		0	0	0	0	24.700	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	229.600	0		0		0	0	0	0	229.600	3
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	5.700	0		0		0	0	0	0	5.700	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	2.451.600	0	0	35.000	35.000	0	0		2.521.600	6
230301	Porvenir	800224808-8	530.800	0	0	0	0	0	0		530.800	3
231001	Colfondos	800227940-6	1.760.000	0	0	35.000	35.000	0	0		1.830.000	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	578.700	0	0	0	0	0	0		578.700	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	1.708.300				1.708.300	0	0	1.708.300			17.083	1.708.300	13

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF10	Comfaboy	891800213-8	64.000	0	0	64.000	1
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	1.289.800	0	0	1.289.800	12

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901443029-2	CVT PROYECTOS SAS	CARRERA 8 #172 A-85 TORRE 2 APTO 1103	3003468794	gerencia@cvt.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					13	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-11	E	09/12/2025	92123159	$9.853.700	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	7	1.330.500	1.330.500
Pensión	4	5.461.100	5.461.100
Riesgos Laborales	1	1.708.300	1.708.300
CCF	2	1.353.800	1.353.800
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	14	9.853.700	9.853.700

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901443029-2	CVT PROYECTOS SAS		CARRERA 8 #172 A-85 TORRE 2 APTO 1103	3003468794	gerencia@cvt.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					13	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-11	E	09/12/2025	92123159	$9.853.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																			PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1002448286	CAJAR CORREA ROSENBER	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-4	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
2	CC	1013579861	MONTOYA CASTRO DEISSY ALEXANDRA	1	0			S																	230201	5.000.000	800.000	0	0	0	0	EPS002	5.000.000	200.000	14-4	5.000.000	5	348.000	CCF24	5.000.000	200.000	0	0	0	0	0
3	CC	1019047809	BENAVIDES MONROY JERSSON OSWALDO	1	0			S	X																230201	616.850	98.700	0	0	0	0	EPS017	616.850	24.700	14-4	616.850	5	43.000	CCF24	616.850	24.700	0	0	0	0	0
4	CC	1057583742	AVELLA PRECIADO KAREN LILIANA	1	0			S																	230301	1.600.000	256.000	0	0	0	0	EPS037	1.600.000	64.000	14-4	1.600.000	1	8.400	CCF10	1.600.000	64.000	0	0	0	0	0
5	CC	1070780813	CORREA BERMUDEZ JESUS MANUEL	1	0			S	X																230201	142.350	22.800	0	0	0	0	EPSC34	142.350	5.700	14-4	142.350	5	10.000	CCF24	142.350	5.700	0	0	0	0	0
6	CC	1070966893	TOCANCIPA GARCIA VANESSA	1	0			S												X					230201	7.000.000	1.120.000	0	0	35.000	35.000	EPS001	7.000.000	280.000	14-4	7.000.000	5	0	CCF24	7.000.000	280.000	0	0	0	0	0
7	CC	79693634	GALLEGO ARBELAEZ GERMAN DARIO	1	0			S	X																25-14	616.850	98.700	0	0	0	0	EPS005	616.850	24.700	14-4	616.850	5	43.000	CCF24	616.850	24.700	0	0	0	0	0
8	CC	80074318	VELASQUEZ PUENTES CESAR HERNANDO	1	0			S																	231001	7.000.000	1.120.000	0	0	35.000	35.000	EPS005	7.000.000	280.000	14-4	7.000.000	5	487.200	CCF24	7.000.000	280.000	0	0	0	0	0
9	CC	1077432789	IBARGUEN IBARGUEN YERLIN	1	0			S		X															230201	901.550	144.300	0	0	0	0	EPS037	901.550	36.100	14-4	901.550	5	62.800	CCF24	1.484.710	59.400	0	0	0	0	0
10	CC	1077432789	IBARGUEN IBARGUEN YERLIN	1	0			S													L				230201	237.250	38.000	0	0	0	0	EPS037	237.250	9.500	14-4	237.250	5	0	CCF24	237.250	9.500	0	0	0	0	0
11	CC	1091655185	BOHORQUEZ CASTILLO YAN CARLOS	1	0			S																	231001	4.000.000	640.000	0	0	0	0	EPS002	4.000.000	160.000	14-4	4.000.000	5	278.400	CCF24	4.000.000	160.000	0	0	0	0	0
12	CC	1110515104	BEDOYA RODRIGUEZ JEFFERSON DAVID	1	0			S																	25-14	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS037	3.000.000	120.000	14-4	3.000.000	5	208.800	CCF24	3.000.000	120.000	0	0	0	0	0
13	CC	52267686	CORTES MEDINA GLADYS MAGDALENA	1	0			S	X																230301	293.334	47.000	0	0	0	0	EPS008	293.334	11.800	14-4	293.334	5	20.500	CCF24	293.334	11.800	0	0	0	0	0
14	CC	52634813	QUINTERO LEYVA CARMENZA	1	0			S																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-4	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900429126	7	CIMEL INGENIERIA ELECTRICA S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 11 # 71 - 41 OF 205	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3099299	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1917896206	9493569014	E	2025/11/10	2025/11/10	BANCO DAVIVIENDA	0	$464,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																							$1,500,000	$240,000			$1,500,000	$60,000			$1,500,000	$60,000			$1,500,000		$104,400		$0	$0		$464,400
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (1 Afiliados)																							$1,500,000	$240,000			$1,500,000	$60,000			$1,500,000	$60,000			$1,500,000		$104,400		$0	$0		$464,400
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																							$1,500,000	$240,000			$1,500,000	$60,000			$1,500,000	$60,000			$1,500,000		$104,400		$0	$0		$464,400
1	CC	91240612	GUTIERREZ RIVERA JOSE LUIS																		25-14	30	$1,500,000	$240,000	EPS017	30	$1,500,000	$60,000	CCF22	30	$1,500,000	$60,000	14-23	30	$1,500,000	6.960%	$104,400	30	$0	$0	Si	$464,400
Total		**Afiliados(1)**																					$1,500,000	$240,000			$1,500,000	$60,000			$1,500,000	$60,000			$1,500,000		$104,400		$0	$0		$464,400

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900429126	7	CIMEL INGENIERIA ELECTRICA S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 11 # 71 - 41 OF 205	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3099299	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1917896206	9493569014	E	2025/11/10	2025/11/10	BANCO DAVIVIENDA	0	$464,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$240,000	$0	$0	$240,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$240,000	$0	$0	$240,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$104,400	$0	$0	$104,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$104,400	$0	$0	$104,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$60,000	$0	$0	$60,000
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	1	$60,000	$0	$0	$60,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$60,000	$0	$0	$60,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$60,000	$0	$0	$60,000
TOTAL				1	$464,400	$0	$0	$464,400

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901443029-2	CVT PROYECTOS SAS	CARRERA 8 #172 A-85 TORRE 2 APTO 1103	3003468794	gerencia@cvt.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					10	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-10	E	11/11/2025	91160645	$9.125.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	280.000	0		0		0	0	0	0	280.000	1
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	420.800	0		0		0	0	0	0	420.800	4
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	337.000	0		0		0	0	0	0	337.000	2
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	241.000	0		0		0	0	0	0	241.000	3

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	1.575.700	0	0	35.000	35.000	0	0		1.645.700	3
230301	Porvenir	800224808-8	1.299.000	0	0	0	0	0	0		1.299.000	4
231001	Colfondos	800227940-6	1.760.000	0	0	35.000	35.000	0	0		1.830.000	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	480.000	0	0	0	0	0	0		480.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	1.608.400				1.608.400	0	0	1.608.400			16.084	1.608.400	10

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF10	Comfaboy	891800213-8	64.000	0	0	64.000	1
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	919.600	0	0	919.600	9

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901443029-2	CVT PROYECTOS SAS		CARRERA 8 #172 A-85 TORRE 2 APTO 1103	3003468794	gerencia@cvt.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					10	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-10	E	11/11/2025	91160645	$9.125.500	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	1.278.800	1.278.800
Pensión	4	5.254.700	5.254.700
Riesgos Laborales	1	1.608.400	1.608.400
CCF	2	983.600	983.600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	11	9.125.500	9.125.500

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	**NÚMERO**	**NOMBRE APORTANTE**		**DIRECCIÓN**	**TELÉFONO**	**CORREO**
NI	901443029-2	CVT PROYECTOS SAS		CARRERA 8 #172 A-85 TORRE 2 APTO 1103	3003468794	gerencia@cvt.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	**FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)**	**TIPO PLANILLA**	**FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)**	**NÚMERO PLANILLA**	**CANTIDAD**	
					EMPLEADOS	**UPC**
					10	0
PERIODO SALUD	**PERIODO PENSIONES**				**TOTAL A PAGAR**	
2025-11	2025-10	E	11/11/2025	91160645	$9.125.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	**Tipo**	**No. de Identificación**	**Apellidos y Nombres**	**Cotizante**	**Subtipo**	**Extranjero**	**Colom. exterior**	**Estudiante**	**ING**	**RET**	**TDE**	**TAE**	**TDP**	**TAP**	**VSP**	**VST**	**SLN**	**IGE**	**LMA**	**VAC**	**AVP**	**VCT**	**IRL**	**CORRECCIÓN**	**Cód. AFP**	**IBC AFP**	**Cotización**	**Voluntario Afiliado**	**Voluntario Aportante**	**Fondo pensional de solidaridad**	**Fondo pensional de subsistencia**	**Cód. EPS**	**IBC EPS**	**Cotización / Valor UPC**	**Cód. ARL**	**IBC ARL**	**Clase de Riesgo**	**Cotización**	**Código CCF**	**IBC CCF**	**Aporte CCF**	**IBC otros parafiscales**	**Aporte SENA**	**Aporte ICBF**	**Aporte ESAP**	**Aporte MEN**
1	CC	1002448286	CAJAR CORREA ROSENBER	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-4	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
2	CC	1013579861	MONTOYA CASTRO DEISSY ALEXANDRA	1	0			S																	230301	5.000.000	800.000	0	0	0	0	EPS002	5.000.000	200.000	14-4	5.000.000	5	348.000	CCF24	5.000.000	200.000	0	0	0	0	0
3	CC	1020822950	DUARTE CELIS GERMAN ALIRIO	1	0			S	X	X															230301	94.900	15.200	0	0	0	0	EPS002	94.900	3.800	14-4	94.900	5	6.700	CCF24	94.900	3.800	0	0	0	0	0
4	CC	1057583742	AVELLA PRECIADO KAREN LILIANA	1	0			S																	230301	1.600.000	256.000	0	0	0	0	EPS037	1.600.000	64.000	14-4	1.600.000	1	8.400	CCF10	1.600.000	64.000	0	0	0	0	0
5	CC	1070966893	TOCANCIPA GARCIA VANESSA	1	0			S												X					230201	7.000.000	1.120.000	0	0	35.000	35.000	EPS001	7.000.000	280.000	14-4	7.000.000	5	0	CCF24	7.000.000	0	0	0	0	0	0
6	CC	1077432789	IBARGUEN IBARGUEN YERLIN	1	0			S																	230201	1.043.900	167.100	0	0	0	0	EPS037	1.043.900	41.800	14-4	1.043.900	5	72.700	CCF24	1.043.900	41.800	0	0	0	0	0
7	CC	1077432789	IBARGUEN IBARGUEN YERLIN	1	0			S												X					230201	379.600	60.800	0	0	0	0	EPS037	379.600	15.200	14-4	379.600	5	0	CCF24	379.600	0	0	0	0	0	0
8	CC	1091655185	BOHORQUEZ CASTILLO YAN CARLOS	1	0			S																	231001	4.000.000	640.000	0	0	0	0	EPS002	4.000.000	160.000	14-4	4.000.000	5	278.400	CCF24	4.000.000	160.000	0	0	0	0	0
9	CC	1110515104	BEDOYA RODRIGUEZ JEFFERSON DAVID	1	0			S																	25-14	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS037	3.000.000	120.000	14-4	3.000.000	5	208.800	CCF24	3.000.000	120.000	0	0	0	0	0
10	CC	52634813	QUINTERO LEYVA CARMENZA	1	0			S																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-4	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
11	CC	80074318	VELASQUEZ PUENTES CESAR HERNANDO	1	0			S																	231001	7.000.000	1.120.000	0	0	35.000	35.000	EPS005	7.000.000	280.000	14-4	7.000.000	5	487.200	CCF24	7.000.000	280.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-11-07, 03:53:21 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 81288082

Periodo Cotización: octubre de 2025 **Periodo Servicio:** noviembre de 2025

PAGADO 07/11/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LFO INGENIEROS DE SUELOS SAS	**Nombre Sucursal**	INGENIERIA	**Código Sucursal**	003
Documento	NI830121413	**Dirección**	CR 5 #67 - 50		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3104759		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL		
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal	OROZCO ROJAS LUIS FERNANDO	**Identificación**	CC 17178409		
Total Afiliados	4	**ARP**	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																			Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 17178409	LUIS FERNANDO OROZCO ROJAS	01	01																	0	0	30	30	30	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 10.431.000	$ 417.300	6,960	$ 10.431.000	$ 726.000	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 10.431.000	$ 417.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.560.600
CC 51883545	MARCELA SALCEDO QUIJANO	01	04												X					0	0	4	4	4	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS005) EPS SANITAS	$ 3.583.467	$ 448.000	0,000	$ 3.583.467	$ 0	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 3.583.467	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 448.000
CC 51883545	MARCELA SALCEDO QUIJANO	01	04																	0	0	26	26	26	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS005) EPS SANITAS	$ 23.292.534	$ 2.911.600	6,960	$ 23.292.534	$ 1.621.200	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 23.292.534	$ 931.800	$ 465.900	$ 698.800	$ 0	$ 0	$ 6.629.300
CC 52050757	MARIA CATALINA OROZCO PERDOMO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 14.235.000	$ 2.420.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 14.235.000	$ 1.779.400	0,522	$ 14.235.000	$ 74.400	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 14.235.000	$ 569.400	$ 284.700	$ 427.100	$ 0	$ 0	$ 5.555.000
CC 79592373	PEDRO IGNACIO VELANDIA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 17.082.000	$ 2.904.200	(EPS001) ALIANSALUD	$ 17.082.000	$ 2.135.300	6,960	$ 17.082.000	$ 1.189.000	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 17.082.000	$ 683.300	$ 341.700	$ 512.500	$ 0	$ 0	$ 7.766.000

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 31.317.000	$ 68.624.001	$ 68.624.001	$ 68.624.001	$ 5.324.200	$ 7.691.600	$ 3.610.600	$ 2.601.800	$ 1.092.300	$ 1.638.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 21.958.900	$ 14.300	$ 21.973.200

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

INTERVENTORIA							
NOMBRE	**CARGO**	**DEDICACION**	**FECHA DE CONTRATACIÓN**	**SALARIO**	**HONORARIOS MENSUALES**	**TIPO DE CONTRATO**	**EMPRESA**
SERGIO ROMERO	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	50%	7/02/2025	$ 5.350.000		CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO A TERMINO FIJO INFERIOR A UN AÑO	
CARLOS TIRADO	RESIDENTE	100%	18/02/2025	$ 6.000.000		CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO A TERMINO FIJO INFERIOR A UN AÑO	
JUAN CAMILO MONTERO	COORDINADOR BIM	100%	4/03/2025	$ 4.500.000		CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO A TERMINO FIJO INFERIOR A UN AÑO	
ANGIE PAOLA ÁVILA	ESPECIALISTA EN GESTIÓN AMBIENTAL	100%	4/03/2025	$ 4.000.000		CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO A TERMINO FIJO INFERIOR A UN AÑO	
YOLANDA PATRICIA NÚÑEZ B	PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	100%	4/03/2025	$ 3.800.000		CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO A TERMINO FIJO INFERIOR A UN AÑO	
NATALIA MONTENEGRO	TRABAJADORA SOCIAL	100%	4/03/2025	$ 4.000.000		CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO A TERMINO FIJO INFERIOR A UN AÑO	
MAGDA LORENA CHILITO	REVISOR ESTRUCTURAL INDEPENDIENTE	100%	3/06/2025	$ 6.000.000		CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO A TERMINO FIJO INFERIOR A UN AÑO	
JORGE IVAN GARCÍA	ASESOR ESTRUCTURAL	30%	28/02/2025		$ 2.415.000	CONTRATO POR OBRA Y LABOR	
JUAN PABLO CAMPO	ASESOR DE ARQUEOLOGÍA.	25%	28/02/2025		$ 1.500.000	PRESTACIÓN SE DE SERVICIO	
VANESSA TOCANCIPÁ	ASESOR HIDRO SANITARIO - RED CONTRA INCENDIO Y GAS	30%	26/02/2025		$ 2.500.000	PRESTACIÓN SE DE SERVICIO	CVT PROYECTOS S.A.S.
MARIA ALEJANDRA GIL	RESIDENTE ADMINISTRATIVO	100%	7/07/2025	$ 2.700.000		CONTRATO POR OBRA Y LABOR	
PAULA ANDREA GIL	ASESOR MUSEOLÓGICO	25%	28/02/2025		$ 1.500.000	PRESTACIÓN SE DE SERVICIO	
JOSÉ LUIS GUTIÉRREZ	ASESOR REDES ELÉCTRICAS	25%	26/02/2025		$ 3.500.000	PRESTACIÓN SE DE SERVICIO -	CIMEL INGENIERIA ELECTRICA S.A.S.
MARCELA SALCEDO	ASESOR GEOTECNIA	25%	26/02/2025		$ 1.300.000	PRESTACIÓN SE DE SERVICIO	LFO INGENIEROS DE SUELOS SAS.
GONZALO CISNEROS	ASESOR AIRE ACONDICIONADO	20%	3/04/2025		$ 2.800.000	PRESTACIÓN SE DE SERVICIO	

Culturas

Código TRD: 1110-2025

Bogotá, 15 de diciembre de 2025

LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 4383 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES Y EL CONSORCIO RYU – GD PATRIMONIAL

CERTIFICA QUE

El CONSORCIO RYU–GD PATRIMONIAL identificado con NIT 901.902.403-4, representado legalmente por Marcela Gutiérrez Díaz identificado con cédula de ciudadanía N° 51.716.541, dio cumplimiento con lo establecido a la Cláusula 7 – Forma de pago del Contrato de Interventoría N° 4383 de 2024, remitiendo a través del comunicado el Informe Mensual de Interventoría N° 10 que contiene las actividades ejecutadas del Contrato de Obra N° 4349 de 2024 y de las actividades propias de la interventoría, del período comprendido entre el 07 de noviembre al 06 de diciembre de 2025.

Dado lo anterior, es procedente efectuar el pago de la décima cuota parcial mensual del contrato de la interventoría, que tal y como quedó contenido en la forma de pago corresponde a la décima de las dieciséis (16) partes iguales que conforman el 65% del valor total del contrato de interventoría, por la suma de OCHENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO NOVENTA Y UN PESOS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS MCTE (**$ 86.650.191,76).**

Lo anterior tras previa verificación por parte del equipo de apoyo a la supervisión del cumplimiento de las obligaciones con los sistemas de seguridad social integral (salud y pensión) y parafiscales (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF) de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente.

Para dicho pago se debe tener en cuenta el siguiente uso presupuestal:

N°. CONTRATO:	**4383-2024**
No. COMPROMISO:	32325
RUBRO:	C-3302-1603-15-20302B1-3302073-02

USO: A-02-02-02-008-003-01-1
VALOR: $ 86.650.191,76

Sin otro particular y agradeciendo la atención brindada.

Cordialmente,

MÓNICA ORDUÑA MONSALVE
Directora de Patrimonio y Memoria
Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes

Anexos: Documentos de soporte

Proyectó: Diana Marcela Alvarez, Contratista Profesional de la Dirección de Patrimonio y Memoria.

Revisó: Julián López Velandia, Abogado3 Contratista de la Dirección de Patrimonio y Memoria.

Revisó: Daniel Ricardo Cepeda Hernández, Contratista de la Dirección de Patrimonio y Memoria.

Culturas

Culturas
Al contestar y/o consultar por favor cite este N°

Fecha: 2025-12-23 14:19:40

Radicado: MC05217I2025

Remitente: Mónica Orduña Monsalve
Destinatario: JENNY CAROLINA VELANDIA MARTINEZ
Tipo Tramite: Comunicación Oficial Interna
Asunto: Pago 11 Cto intervetoría
Anexos: LO ENUNCIADO Folios: 2

Código TRD: 1110-2025

MEMORANDO

PARA: Jenny Carolina Velandia Martínez, Coordinadora del Grupo de Convenios y Contratos.

DE: Mónica Orduña Monsalve, Directora de Patrimonio y Memoria.

ASUNTO: Remisión de documentos Informe de interventoría N° 10 del contrato N° 4383 de 2024, suscrito con el CONSORCIO RYU-GD PATRIMONIAL, cuyo objeto es: Contratar la interventoría integral al contrato de obra derivado del proceso de licitación pública MC-LP-007-2024 cuyo objeto es "Realizar las obras de intervención integral del edificio Siberia que hace parte del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil, en la ciudad de Bogotá D.C., declarado Bien de Interés Cultural del Ámbito Nacional"**.**

FECHA: 15 de diciembre de 2025.

Respetada Jenny,

Atentamente remito para la carpeta del expediente del contrato del asunto, copia en formato digital de los siguientes documentos que hacen parte del Informe de interventoría N° 10 correspondiente al período comprendido del 7 de noviembre de 2025 al 6 de diciembre de 2025:

- Copia de la comunicación de la interventoría oficio N° 479-GDP-CC01-301 e Informe de trasmisión N° 1829 del 15 de diciembre de 2025, de la plataforma AUTODESK Construction Cloud en 1 folios.
- Informe mensual N° 10 del contrato de interventoría, en 97 folios.
- Certificación del décimo pago por avance emitida por la Supervisión, en 2 folios.
- Copia de Factura electrónica F-11, por valor de **$ 86.650.191,76**; en 1 folio.
- Acta de corte parcial N° 11 de interventoría, en 1 folio
- Certificación pago de parafiscales de interventoría y consorciados, en 10 folios.
- Planillas de pago de parafiscales de interventoría, en 27 folios.

- Anexos técnicos del informe mensual

Debido al volumen de la información, los anexos del informe han sido cargados en la plataforma Onedrive en el siguiente link:

N° 10

Sin otro particular y agradeciendo la atención brindada.

Cordialmente,

MÓNICA ORDUÑA MONSALVE
Directora de Patrimonio y Memoria
Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes

Anexos: Lo enunciado

Proyectó: Diana Marcela Alvarez, Contratista de la Dirección de Patrimonio y Memoria.

Revisó: Julián López Velandia, Abogado Contratista de la Dirección de Patrimonio y Memoria.

Revisó: Daniel Ricardo Cepeda Hernández, Contratista de la Dirección de Patrimonio y Memoria.

Culturas

ACTA DE PAGO PARCIAL DE INTERVENTORÍA Y/O CONSULTORÍA

☒ Público ☐ Clasificado ☐ Reservado

Código: F-GIN-101
Versión: 4
Fecha: 10/Dic/2021

CONTRATO No:	**4383-2024**	FECHA DE INICIACIÓN:	**7/02/2025**		
		PLAZO:	**16 meses**		
OBJETO:	Contratar la interventoría integral al contrato de obra derivado del proceso de licitación pública MC-LP-007-2024 cuyo objeto es "Realizar las obras de intervención integral del edificio Siberia que hace parte del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil, en la ciudad de Bogotá D.C., declarado Bien de Interés Cultural del Ámbito Nacional"	PRORROGA:		ACTA No.	**11**
		FECHA DE SUSPENSIÓN:		VALOR ACTA:	**$ 86.650.191,76**
		FECHA DE REINICIACIÓN:			
		FECHA TERMINACIÓN :	**6/06/2026**	FECHA :	**16/12/2025**
INTERVENTOR:	CONSORCIO RYU-GD PATRIMONIAL	VALOR Inicial (incluido IVA) :	**$ 2.132.927.797,0**	PERIODO PAGO MES:	**Décimo pago fijo mensual del 7 de noviembre al 6 de diciembre de 2025**
ACTA DE PAGO PARCIAL DE INTERVENTORIA Y/O CONSULTORÍA		VALOR ADICIÓN:	**$ 0,0**		
		VALOR TOTAL:	**$ 2.132.927.797,0**		

	CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES				PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO		
FORMA DE PAGO (Acorde al contrato)	**UNIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**PORCENTAJE PAGADO**
Cargos fijos											
65% del valor del Contrato	MES	$ 72.815.287,19	16,00	$ 1.165.044.595	1,00	$ 72.815.287,19	9,00	$ 655.337.584,71	10,00	$ 728.152.871,90	**62,50%**
Pagos por avance											
30% del valor del Contrato	%	$ 537.712.890,0	100,00%	$ 537.712.890			4,47%	$ 24.035.766,18	0,0447	$ 24.035.766,18	**4,47%**
Acta de pago final											
5% del valor del Contrato	Und.	$ 89.618.815,0	1,00	$ 89.618.815							
			SUBTOTAL	$ 1.792.376.300		$ 72.815.287,19		$ 679.373.350,89		$ 752.188.638,08	
			IVA **19,00%**	$ 340.551.497		$ 13.834.904,57		$ 129.080.936,67		$ 142.915.841,24	
			VALOR TOTAL	$ 2.132.927.797		**$ 86.650.191,76**		**$ 808.454.287,56**		**$ 895.104.479,32**	**41,97%**
						4,06%		**37,90%**			

SON: OCHENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO NOVENTA Y UN PESOS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE.

MARCELA GUTIÉRREZ DÍAZ
Representante Legal Interventoria
CONSORCIO RYU-GD PATRIMONIAL

MÓNICA ORDUÑA MONSALVE
SUPERVISIÓN
DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

Banco de Bogotá


EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa CONSORCIO RYU GD PATRIMONIAL identificado(a) con NITPJ 9019024034 está vinculado(a) al BANCO DE BOGOTA a través de la CTA CORRIENTE CC Cuentas comerciales No. 500299011 desde el 03 de marzo de 2025, este producto se encuentra Vigente.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 01 de diciembre de 2025, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,



Olga Yanira Otálora Guerrero

Gerencia de Soluciones para el Cliente

Banco de Bogota

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141187378403

(415)7707212489984(8020) 000014118737840 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 9 0 2 4 0 3	4	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO RYU-GD PATRIMONIAL

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 95 15 47 P 6

42. Correo electrónico contabilidad@ryu.com.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
1 1 0 1 1 1	6 0 1 6 2 2 5 0 9 9	3 1 3 2 8 2 6 4 6 0

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 2 4 1 2 0 2							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5															

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre RESTREPO GOMEZ ALEJANDRO NICOLAS

985. Cargo Representante Legal Suplente Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141187378403

(415)7707212489984(8020) **000014118737840 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 9 0 2 4 0 3	4	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	7	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 4 1 2 0 2	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro		
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 4 1 2 0 2	
81. Hasta	2 0 2 7 0 5 2 7	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 2 4 1 2 3 1		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 5 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141187378403

(415)7707212489984(8020) **000014118737840 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 9 0 2 4 0 3	4	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 4 1 2 0 2

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	5 1 7 1 6 5 4 1		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
GUTIERREZ	DIAZ	MARCELA	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 4 1 2 0 2

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 9 4 3 2 3 0 2		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
CARO	RIVERA	FERNANDO	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 5 0 1 0 9

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	7 9 1 5 5 7 4 6		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
RESTREPO	GOMEZ	ALEJANDRO	NICOLAS

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141187378403

(415)7707212489984(8020) **000014118737840 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 9 0 2 4 0 3	4	Impuestos de Bogotá 3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	8 6 0 5 0 5 0 6 4	1	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: GUTIERREZ DIAZ SAS

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
0		5 0 2 0 2 4 1 2 0 2	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	8 6 0 0 0 9 2 5 0	6	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: RESTREPO Y URIBE S A S

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
0		5 0 2 0 2 4 1 2 0 2	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141188938418

(415)7707212489984(8020) 000014118893841 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 6 0 0 0 9 2 5 0	6	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
RESTREPO Y URIBE S A S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 95 15 47 P 6

42. Correo electrónico contabilidad@ryu.com.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 1 6 2 2 5 0 9 9	3 1 3 2 8 2 6 4 6 0

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 1 3 0 2 0 9	7 7 1 0	2 0 1 3 0 2 0 9	7 7 3 0				

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	3	5	7	8	9	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5											

03- Impuesto al patrimonio
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre RESTREPO GOMEZ ALEJANDRO NICOLAS

985. Cargo Representante Legal Suplente Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141188938418

(415)7707212489984(8020) **000014118893841 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 6 0 0 0 9 2 5 0	6	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 1
72. Número	4 5 8 1	1 2
73. Fecha	1 9 5 6 0 8 2 4	2 0 1 8 0 4 0 6
74. Número de notaría	4	
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	1 9 5 6 0 9 0 4	2 0 1 8 0 4 0 6
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 1 5 0 1 7	0 0 1 5 0 1 7
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	4
Vigencia		
80. Desde	1 9 5 6 0 8 2 4	2 0 1 8 0 4 0 6
81. Hasta	2 0 3 0 0 5 0 4	2 9 9 9 0 8 2 4

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6 0 1 3 1		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 4 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141188938418

(415)7707212489984(8020) **000014118893841 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 6 0 0 0 9 2 5 0	6	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 6 0 4 2 7

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 9 4 3 2 3 0 2		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
CARO	RIVERA	FERNANDO	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 6 0 4 2 7

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 7 1 7 5 9 5 6		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
GOMEZ	TURRIAGO	GERMAN	DARIO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 6 0 4 2 7

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	7 9 1 5 5 7 4 6		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
RESTREPO	GOMEZ	ALEJANDRO	NICOLAS

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141188938418

(415)7707212489984(8020) **000014118893841 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 6 0 0 0 0 9 2 5 0	6	Impuestos de Bogotá 3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	5 2 4 2 7 7 3 5		1 4 1 7 5 8 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
PRADA	DUARTE	PILAR	DEL ROCIO

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada
9 0 0 5 3 1 8 6 1	8	CCA CONTADORES CONSULTORES ASESORES SAS

135. Fecha de nombramiento: 2 0 1 8 0 9 0 7

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	5 2 5 4 7 1 3 8		1 3 6 5 0 5 T

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
TUTA	PEÑA	DIANA	EMPERATRIZ

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada
9 0 0 5 3 1 8 6 1	8	CCA CONTADORES CONSULTORES ASESORES SAS

147. Fecha de nombramiento: 2 0 1 5 0 3 2 7

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	5 2 0 7 3 2 1 3		7 8 4 2 0 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
CORTES	ORJUELA	SANDRA	JULIET

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento: 2 0 2 2 0 8 3 0

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141187378403

(415)7707212489984(8020) **000014118737840 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 9 0 2 4 0 3	4	Impuestos de Bogotá 3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	5 2 0 7 3 2 1 3		7 8 4 2 0 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
CORTES	ORJUELA	SANDRA	JULIET

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 4 1 2 0 2

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 141176227865

(415)7707212489984(8020) 000014117622786 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 6 0 5 0 5 0 6 4	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
GUTIERREZ DIAZ SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 127 13 A 32 P 3

42. Correo electrónico contabilidad@gutierrezdiaz.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 0 2 4 9 6 0 0 1	6 0 1 6 2 9 0 0 2 0

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
7 7 1 1	1 9 8 1 1 0 2 3	7 7 1 2	1 9 8 1 1 0 2 3			

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	8	9	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5												

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

CONSORCIO RYU - GD PATRIMONIAL



CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4383-2024: INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA MC-LP-007-2024 CUYO OBJETO ES "REALIZAR LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN INTEGRAL DEL EDIFICIO SIBERIA QUE HACE PARTE DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL"


Contiene:

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 10

PERIODO

7 DE NOVIEMBRE AL 6 DE DICIEMBRE DEL 2025

CONTROL DE REVISIÓN DE DOCUMENTOS

VERSIÓN	FECHA	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ	RECIBIDO
V0	15/12/2025	Equipo de Interventoría			
V1	16/12/2025		SERGIO ROMERO	SERGIO ROMERO	DANIEL CEPEDA
			Director de Interventoría	Coordinador de Interventoría	Coordinador Equipo de Supervisión Obras Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes

Contenido

INTRODUCCIÓN 6

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO: 6

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO 9

2. INFORME TÉCNICO 18

2.1 Avance de obra (componente de estudios y diseños y componente de ejecución de obra) 18

2.1.1 Control de programación 19

2.1.2 Gráfica de avance de obra curva “S” 21

2.1.3 Histograma programado vs ejecutado 22

2.1.4 Descripción de actividades de obra 22

2.2 Informe administrativo: costos y presupuesto 34

3. COMPONENTE BIM 35

3.1 Implementación BIM-Actividades Realizadas: 35

3.2 Matriz de seguimiento y control 38

3.3 BEP (Plan de Ejecución BIM) 38

3.4 Modelos de obra 38

3.5 Implementación 4D y 5D 39

4. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 39

4.1 Seguridad industrial 39

4.2 Accidentalidad: 41

4.3 Actividades actuales de control 42

Personal de Administración y Obra 42

4.4 Hallazgos 47

4.5 Evaluación mensual al Contratista SST 51

5. GESTIÓN AMBIENTAL 52

5.1 Seguimiento programas de manejo ambiental 53

5.2 Seguimiento a permisos ambientales 70

5.3 Charlas y Capacitaciones 73

5.4 Reuniones 74

5.5 Evaluación mensual al Contratista en Gestión Ambiental 75

6. GESTIÓN SOCIAL 76

6.1 Actividades Previas 76

6.2 Programa De Comunicación, Divulgación E Información 77

6.3 Programa De Participación 79

6.4 Programa de atención al Ciudadano 82

6.5 Programa De Contratación De Mano De Obra De La Región (No Calificada Y Calificada): 83

6.6 Programa De Acompañamiento A Actividades Técnicas Y Sociales En Obra 84

6.7 Programa De Sostenibilidad 84

6.8 Seguimiento 84

6.9 Evaluación mensual al Contratista en Gestión Social 85

7. INFORMES DE ESPECIALISTAS 87

7.1 ARQUEOLOGÍA 87

7.2 MUSEOGRAFÍA 88

7.3 OTRAS ESPECIALIDADES 89

8. IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS 89

9. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES 92

ANEXOS INFORMACIÓN DOCUMENTADA

ANEXO 1. IM10 CONTRATISTA

ANEXO 2. PLANILLAS

ANEXO 3. CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

ANEXO 4. ACTAS DE COMITÉ

ANEXO 5. CRONOGRAMA APROBADO

ANEXO 6. ACTA DE REMUNERACIÓN

ANEXO 7. CALIFICACIÓN SIBERIA SST-AMB-SOCIAL

ANEXO 8. CAPACITACIONES

ANEXO 9. BITÁCORA DE OBRA

ANEXO 10. INFORME DE RENDIMIENTOS Y MANEJO DE ANTICIPO

ANEXO 11. INFORME SUPERVISIÓN TÉCNICA INDEPENDIENTE

ANEXO 12. CONTROL DE LLUVIAS

ANEXO 13. INFORMES OTRAS ESPECIALIDADES

INTRODUCCIÓN

El presente informe contiene el desarrollo de las actividades técnicas, de Seguridad y Salud en el Trabajo, ambientales, BIM, sociales, control de calidad y demás especialidades que se produjeron durante el periodo 7 de noviembre al 6 de diciembre de 2025; en el contenido del informe se dan a conocer las actividades de seguimiento realizadas por el contratista de obra y el control que se asumió para llevar a cabo las mismas de acuerdo con los parámetros establecidos por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes a través del contrato de interventoría No. 4383-2024 cuyo objeto es "Interventoría integral al contrato de obra derivado del proceso de Licitación Pública MC-LP-007-2024 Cuyo Objeto es "Realizar Las Obras De Intervención Integral Del Edificio Siberia Que Hace Parte Del Hospital San Juan De Dios E Instituto Materno Infantil, En La Ciudad De Bogotá D.C., Declarado Bien De Interés Cultural Del Ámbito Nacional".

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO:

El proyecto corresponde a la ejecución de las obras faltantes y complementarias para la intervención en la modalidad de reparaciones, locativas, reforzamiento estructural, adecuación, restauración, liberación y reintegración en el edificio SIBERIA, localizado en el área afectada del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil, declarado monumento nacional, hoy bien de interés cultural del ámbito nacional. El proyecto se enmarca en el contexto relativo a que el inmueble, hace parte de un Bien de Interés Cultural del ámbito Nacional, por consiguiente, los productos a desarrollar deberán tener como eje transversal el componente patrimonial, implementando los diferentes conceptos normativos y teóricos que se requieren acorde a esta característica. El uso principal del edificio Siberia contemplado en el PEMP es Docencia e Investigación II y su uso alternativo es Arte y Cultura IV. En el marco de las mesas de uso llevadas a cabo en el año 2021 por la Dirección de Patrimonio y Memoria del Ministerio de la Cultura hoy

Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, se estableció la ocupación del Edificio Siberia con el Laboratorio Museo de la Medicina y la Salud.
El detalle de las necesidades de intervención se encuentra contemplado en el Anexo Técnico y en sus Apéndices, de los contratos de obra e interventoría.

Localización

La obra se desarrolla en la Carrera 10 # 1-59 Sur de la ciudad de Bogotá D.C. en donde se localiza el Hospital San Juan de Dios. Específicamente en la localidad Antonio Nariño, barrio Ciudad Berna, UPZ Ciudad Jardín. El sector hace parte de la zona urbana, en donde se cuenta con todos los servicios públicos domiciliarios básicos como lo son agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, telecomunicaciones (internet y teléfono), recolección de basuras, etc.


Así mismo, el Complejo Hospitalario San Juan de Dios, lugar del que hace parte el Edificio Siberia limita al nororiente con la Avenida la Hortúa (Calle 1), al suroriente con la Avenida Fernando Mazuera (Carrera 10), al noroccidente con la Avenida Caracas (Carrera 14) y al suroccidente con la Calle 1 C sur y Calle 2da sur, las cuales a su vez son las principales vías de acceso al proyecto y facilitan la llegada a la obra desde distintos sitios de la ciudad.

Ilustración 1. Plano de ubicación geográfica.



Fuente: Imagen tomada de Google Earth, 2025.

Ilustración 2. Área de trabajo Edificio Siberia

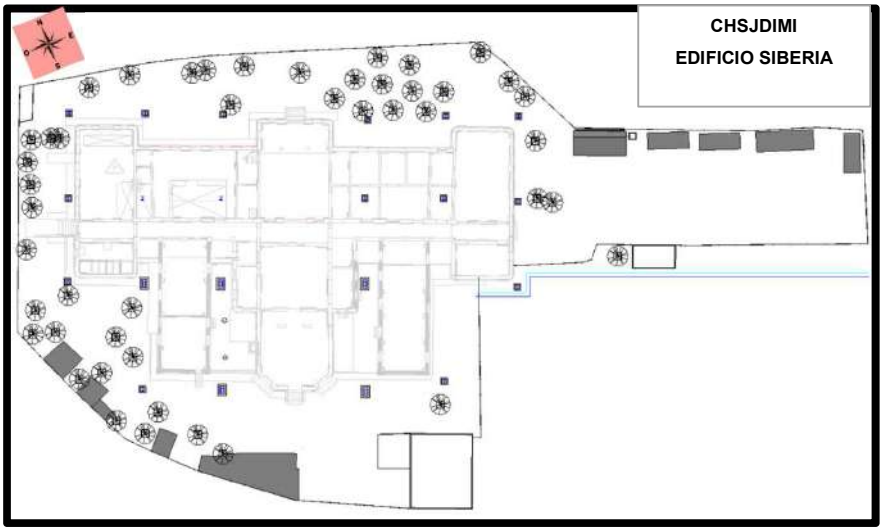

Fuente: Elaboración propia, 2025.

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO

Información general del contrato

A continuación, se indican los principales datos del contrato de obra:

Tabla 1. Datos del contrato

CONTRATO DE OBRA		**CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SIBERIA		**CONSORCIO RYU - GD PATRIMONIAL**	
Contrato No.	**4349 - 2024**	**Contrato No.**	**4383 - 2024**
VALOR TOTAL CONTRATO	**$ 17.153.591.635,00**	**VALOR TOTAL CONTRATO**	**$ 2.132.927.797,00**
Anticipo	**$ 7.841.653.537,00**	**Valor facturado**	**$ 779,851.725,80**
Plazo Inicial del Contrato (MES)	**15 MESES**	Plazo Inicial del Contrato (MES)	**16 MESES**
Plazo Fase 01 (MES) PRECONSTRUCCIÓN	**2 MESES**	Plazo Fase 01 (MES)	**2 MESES**
Plazo Fase 02 (MES) CONSTRUCCIÓN	**12 MESES**	Plazo Fase 02 (MES)	**12 MESES**
Plazo Fase 03 (MES) ALISTAMIENTO	**1 MESES**	Plazo Fase 03 (MES)	**2 MESES**
Valor estimado de la retribución	**$ 16.003.374.566,00**	Valor estimado de la retribución	**N/A**
Valor para ajuste previsto en el contrato (IPC)	**$ 1.150.217.069,00**	Valor para ajuste previsto en el contrato (IPC)	**N/A**
Fecha de Inicio contrato	**7-feb-25**	Fecha de Inicio contrato	**7-feb-25**
Fecha de Proyección de Terminación inicial	**6-may-26**	Fecha de Proyección de Terminación Inicial	**6-jun-26**

NOTA IMPORTANTE: El plazo inicial de la etapa de apropiación de los diseños, se vio afectada por demoras en la entrega de la información completa, entrega del predio, ajustes de los diseños y presentación de los planes de ARQUEOLOGÍA y MUSEOGRAFÍA. La fase de preconstrucción establecida inicialmente debería haber

terminado el 6 de abril de 2025, no obstante, de acuerdo con el compromiso del CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SIBERIA, debió terminar el 6 de agosto de 2025, con la firma del ACTA DE DISPOSICIÓN DEL ÁREA.

Acerca de la revisión del presupuesto actualizado una vez se finalizó con la etapa de apropiación de los diseños, está en proceso de cierre, debido a varias observaciones realizadas por el Ministerio de las Culturas. Así mismo, durante este mes se revisó conjuntamente la solicitud del cambio de la forma de pago establecida en el contrato, con la inclusión de más componentes y dividiendo el edificio por zonas. Lo anterior con el objeto de mejorar el flujo de caja del proyecto y que el pago de la obra, se pueda alinear con su avance, lo cual debe finalizar con la presentación del corte de obra No. 1.

Aspectos legales y revisión de pólizas: Se relaciona en la tabla 2. Control de pólizas, las Pólizas de Seguro de Cumplimiento Entidad a favor de entidades de entidades estatales No. SGPL-179758555-1 de seguro de responsabilidad civil extracontractual derivada de cumplimiento No. LBCO-179762986-1

Tabla 2. Control de pólizas

PÓLIZAS CONTRATO DE OBRA			
Zúrich Colombia Seguros SA	**SGPL-179758555-1**		
Cumplimiento del contrato			
Descripción	**Vigencias**	**Valor asegurado COP $**	**Estado**
Cumplimiento del contrato	27/12/2024 - 27/09/2026	3.430.718.327,00	Vigente
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	27/12/2024 - 27/07/2026	7.841.653.536,99	Vigente
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	27/12/2024 - 27/03/2029	857.679.581,75	Vigente
Estabilidad y calidad de las obras	27/03/2026 - 27/03/2031	3.430.718.327,00	Vigente
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	27/03/2026 - 27/03/2028	857.679.581,75	Vigente

Responsabilidad civil			
Zúrich Colombia Seguros SA	**LBCO-179762986-1**		
Descripción	**Vigencias**	**Valor asegurado COP $**	**Estado**
Predios, Labores y Operaciones	27/12/2024 - 27/03/2026	857.679.581,75	Vigente
Daño Moral	27/12/2024 - 27/03/2026	857.679.581,75	Vigente
Lucro Cesante	27/12/2024 - 27/03/2026	857.679.581,75	Vigente
RC Contratistas y subcontratistas independientes	27/12/2024 - 27/03/2026	857.679.581,75	Vigente
RC Patronal	27/12/2024 - 27/03/2026	857.679.581,75	Vigente

PÓLIZAS CONTRATO INTERVENTORÍA			
Seguros del Estado	11-44-10124579		
Cumplimiento del contrato			
Descripción	**Vigencias**	**Valor asegurado COP $**	**Estado**
Cumplimiento del contrato	31/12/2024 - 31/10/2026	426,585,559.40	Vigente
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	31/12/2024 - 30/04/2029	426,585,559.40	Vigente
Calidad del servicio	30/04/2026 - 30/04/2031	426,585,559.40	Vigente

Informe Jurídico

Control De Obligaciones Contractuales Del Constructor General – Etapa de Preconstrucción.

a) Cumplir cabalmente y en los plazos previstos con las obligaciones a su cargo durante la Etapa de Preconstrucción: El contratista realizó la entrega de la totalidad de los planes de inicio, incluyendo la aprobación del PMT.

(b) Realizar y presentar el informe correspondiente a la apropiación de diseños: Se encuentra en elaboración de parte del contratista. Se hizo entrega del informe final de apropiación el 7 de agosto de 2025.

(c) Realizar y presentar el informe de apropiación de las decisiones y modificaciones a los diseños aprobadas en la obra previamente ejecutada, por la interventoría y la supervisión mediante actas, bitácora, reuniones, etc.: Se hizo entrega del informe final de apropiación, el 7 de agosto de 2025.

(d) Evaluar las obras ejecutadas en el marco en el contrato de obra 090 de 2023, realizar las pruebas y ensayos que se determinen, de las obras ejecutadas parcialmente y elaborar un informe que indique los procedimientos a seguir: El Consorcio Infraestructura Siberia ha informado que no requiere la ejecución de ensayos y pruebas, sin embargo, la Interventoría le ha solicitado revisar su necesidad en cuanto a los elementos en concreto existentes. Lo cual consta en las actas del comité de obra.

(e) Revisar y pronunciarse sobre la adecuación de las Especificaciones Técnicas para obtener los resultados del Contrato, de acuerdo con lo previsto en el numeral 21.1 de la CLÁUSULA 21 de este Contrato: Se hizo entrega del informe final de apropiación, el 7 de agosto de 2025.

(f) Cumplir con las obligaciones relacionadas con el manejo de Redes, de acuerdo con lo señalado en el numeral 21.2, la CLÁUSULA 29 y en el Anexo Técnico: No se ha iniciado.

(g) Suscribir el Acta de Puesta a Disposición del Área, de acuerdo con lo señalado en la CLÁUSULA 19: ACTA DE DISPOSICIÓN DEL ÁREA, firmada por el Consorcio Infraestructura Siberia y Consorcio RYU-GD Patrimonial el 6 de agosto de 2025.

(h) Entregar al Interventor los planes y programas previstos en el Anexo Técnico, en los plazos y con el contenido allí previstos: Programas aprobados.

(i) Tramitar y obtener ante las Autoridades Públicas todas las Licencias y Permisos que se requieran para la ejecución de las Intervenciones y que no hubieran sido expedidos al momento de la celebración de este Contrato, incluyendo aquellos para el uso y aprovechamiento de recursos naturales y para el depósito de materiales: PMT aprobado, el 1 de Mayo de 2025.

(j) Tramitar y obtener ante las Autoridades Públicas las modificaciones, prórrogas, extensiones y revalidaciones de cualesquiera Licencias y Permisos que se requieran como consecuencia de la revisión de las Especificaciones Técnicas prevista en la CLÁUSULA 21 o por cualquier otra causa, durante la ejecución del Contrato: Se presentó solicitud de prórroga de la licencia de construcción de la cual se recibió como respuesta segunda prórroga mediante la resolución No. 11001-1-25-1133 del 11 de agosto de 2025, por un periodo de doce (12) meses adicionales contados a partir del 10 de agosto de 2025.

(k) Cumplir con las obligaciones para la constitución del Patrimonio Autónomo para el manejo del Anticipo, de acuerdo con lo previsto en el numeral 9.3 de la CLÁUSULA 9: CUMPLIDO. Se cuenta con contrato de fiducia aprobado.

(l) Planear y ejecutar las actividades preliminares para preparar el inicio de ejecución de las Intervenciones, de acuerdo con el Cronograma de Obra, el cual deberá permitir cumplir con las obligaciones contractuales en los plazos previstos en el presente Contrato y el Anexo Técnico: El contratista hizo entrega del cronograma de obra, que fue aprobado por la Interventoría.

(m) Notificar que dispone del equipo y del personal necesario para iniciar de inmediato la ejecución de las Intervenciones, de acuerdo con lo previsto en la CLÁUSULA 22: CUMPLIDO.
(n) Ejecutar las Intervenciones que, de acuerdo con lo previsto en el Anexo Técnico, corresponden a las Intervenciones Preliminares, de conformidad con lo previsto en el Cronograma de Obra y de manera concomitante a las demás obligaciones previstas en este Contrato, en su Anexo Técnico y en sus Apéndices para la Etapa de Pre construcción: CUMPLIDO.

Control De Obligaciones Contractuales Del Constructor General – Etapa de Construcción.

a) Cumplir cabalmente y en los plazos previstos con las obligaciones a su cargo durante la etapa de construcción: El contratista ha cumplido con las actividades de la etapa de construcción.
b) Ejecutar las Intervenciones de acuerdo con los tiempos de ejecución, calidades, resistencia, durabilidad, funcionalidad y estética y demás especificaciones definidas en el Contrato y sus Anexos, así como con el Cronograma de Obra: Se han realizado observaciones acerca de la ejecución de los concretos. Se realiza el seguimiento con los comités de obra, su respectivo control de formatos y el libro de revisiones.
c) No ejecutar Intervenciones en exceso del Valor Estimado de la Retribución, sin la instrucción previa de la Entidad y del Interventor y, de ser requerido, hasta tanto exista la efectiva disponibilidad adicional en el presupuesto de la Entidad y se hayan cumplido los trámites legales necesarios para perfeccionar el respectivo compromiso presupuestal: No se han presentado observaciones.

d) Cumplir a cabalidad con las obligaciones ambientales y de gestión social contenidas en el Anexo Técnico, en este Contrato y en la Ley Aplicable: Se han cumplido, revisar informe de gestión social y ambiental.

e) Abstenerse de utilizar elementos y productos que contengan la fibra asbesto y/o sus derivados. El Contratista promoverá el uso de materias primas que no atenten contra la salud pública de conformidad con la Ley Aplicable: Cumplido.

f) Coordinar con la Entidad y con el Propietario del Predio los trámites ante las empresas de servicios públicos domiciliarios o de telecomunicaciones propietarias de las Redes eventualmente afectadas, para que se efectúen las intervenciones a que hubiere lugar: No se ha requerido.

g) Cumplir los criterios sostenibles que se implementarán en el desarrollo de las Intervenciones de acuerdo con lo previsto en el numeral 7 del Anexo 1 – Anexo Técnico: Cumplido.

h) Tramitar y obtener ante las respectivas empresas de servicios públicos el recibo y paz y salvo a satisfacción de las Intervenciones ejecutadas en las Redes y accesorios de servicios públicos, de acuerdo con las especificaciones técnicas respectivas y lo establecido en este Contrato y en el Anexo Técnico: No se ha requerido.

i) Responder y mantener indemne a la Entidad y al Propietario del Predio por los vicios que afecten las Intervenciones sobre el Edificio, en los términos del artículo 2060 del Código Civil: No se ha requerido.

j) Remitir al Ente Gestor y al propietario del Predio los informes mensuales una vez sean verificados por el Interventor: Se han entregado como parte del informe mensual de interventoría.

Control De Obligaciones Contractuales De La Interventoría

- **Reportes y Productos:** Atendiendo lo dispuesto dentro las obligaciones contractuales de la interventoría, el presente informe mensual No. 10, correspondiente al periodo comprendido del 07 de noviembre al 06 de diciembre del 2025 y se está radicando dentro de los diez primeros días del corte. Se han presentado los correspondientes informes semanales, dentro de este periodo, las presentaciones y actas de comité correspondientes.
- **Control General De Correspondencia:** Durante el presente periodo, se realizó el seguimiento a la gestión de la correspondencia generada por parte del Consorcio Constructor y la Interventoría, tanto hacia el cliente (Ministerio de las Culturas) como entre las partes intervinientes en el contrato.
- **Comunicaciones entre Interventoría y Contratista:** Se generaron 30 comunicaciones por parte de la Interventoría dirigidas al Consorcio, de las cuales 04 requerían respuesta. El Consorcio remitió 25 comunicaciones a la Interventoría, de carácter informativo o de reporte.
- **Comunicaciones entre Interventoría y Cliente (Ministerio):** La Interventoría generó 14 comunicaciones de manera informativa para el Ministerio, Por parte del Ministerio se recibieron 18 comunicaciones, de carácter informativo.

Licencias y permisos

LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: Para las obras y labores objeto de este contrato, se expide la licencia de construcción No. 11001-1-22-2317, del 11 de julio de 2022, por la Curaduría Urbana No. 1. Prórroga: Expediente No 24-11971 del 28 de junio del 2024, por el cual se prorroga el término de vigencia de la licencia de construcción otorgada por acto administrativo No. 11001-1-22-2317, del 11 de Julio de 2022 hasta 10 de agosto 2025. Ante el vencimiento de la vigencia de la Licencia Construcción, El Consorcio

Infraestructura Siberia, el día 8 de Agosto de 2025, radicó la solicitud de prórroga de la Licencia de Construcción, ante la Curaduría No. 1, con resolución No. 11001-1-25-1133 del 11 de agosto de 2025, obteniendo la prórroga de la Licencia de Construcción por 1 año más, es decir, hasta el 10 de Agosto de 2026.

En cuanto a licencias y permisos, a continuación, se describe el estado actual de las mismas.

Tabla 3. Avance del contrato

TIPO DE PERMISO	DOCUMENTO	FECHA	OBSERVACIÓN
Licencia de Construcción	11001-1-22-2317 11001-1-24-1119 (Prórroga) 11001-1-25-1133 (Prórroga No.2)	11 de julio de 2022 23 de julio de 2024 11 de agosto de 2025	Vigencia (10/08/2025 al 10/08/2026).
PMT	COI 18	30 de abril de 2025	Vigencia (1/05/2025 al 26/02/2026).
Provisionales	Energía	14 de marzo de 2025 (Disposición del lote)	Conexión al transformador 400 kva, compartido con otros edificios, no se ha definido la acometida independiente.
	Agua	14 de marzo de 2025 (Disposición del lote)	EAAB autorizó la acometida general con 2 derivaciones para 8 edificios, Siberia lote 008. Pasamos de un contador institucional a uno Industrial.
	Sanitaria	14 de marzo de 2025 (Disposición del lote)	Conexión provisional red existente del CHSJD.
Permiso de Aprovechamiento Forestal	Radicado 2025EE179207	10 de Agosto de 2025	Pronunciamiento SDA: Se da por subsanado el requerimiento documental. Pendiente la respuesta

TIPO DE PERMISO	DOCUMENTO	FECHA	OBSERVACIÓN
			de los tratamientos solicitados (1 Traslado y 4 Poda de manejo).
Permiso de Publicidad Exterior Visual	Respuesta SDA	16 de abril de 2025	La valla no es sujeto de registro (< 8m²) Acuerdo Distrital 927 de 2024, Art 227

Seguimiento plan de calidad

Relación de comités de obra: Se tiene establecido la ejecución de comités de obra semanalmente. En la tabla 4 se relaciona fecha del comité, asistentes, lugar donde se llevó a cabo y temas tratados.

Tabla 4. Relación comités de obra.

Fecha	No. De Comité	Estado
10-11-2025	39	Aprobado
17-11-2025	40	Aprobado
24-11-2025	41	En revisión
01-12-2025	42	En revisión

Nota: En el **Anexo No. 4.**

2. INFORME TÉCNICO

2.1 Avance de obra (componente de estudios y diseños y componente de ejecución de obra)

2.1.1 Control de programación

Para la presentación del presente informe, se da uso a la programación actualizada por el CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SIBERIA, que incluye las afectaciones generadas al inicio del contrato.

Así mismo, se incluye el balance de las actividades con base en el presupuesto balanceado al valor del contrato.

Lo anterior con el objeto de medir la programación con base en un programa más acorde con la ejecución de la obra.

Sin embargo, a pesar del ajuste en el programa, como ha sido un requerimiento explícito de la interventoría al contratista de obra, se requiere que el proyecto cuente con un avance semanal, superior al mostrado durante el mes de Octubre de 2025, considerando que se ha llegado al 65% del tiempo transcurrido del contrato y únicamente se ha alcanzado el 32% de ejecución física, lo cual es preocupante.

Es por esto que, la Interventoría ha conminado al contratista de obra a:

1. Aplicar el plan de contingencia para la mejora de rendimientos semanales.
2. Continuar con las actividades de pañetes, restauración de la cubierta y estructura metálica.
3. Finalizar las actividades de reforzamiento estructural.
4. Incluir el personal necesario para la ejecución de estas actividades.
5. Hacer uso del anticipo dado al contratista, el cual se encuentra en el 38%.

Solo de esta manera, el avance semanal podrá verse mejorado, orientado a la finalización de las actividades al 6 de mayo de 2026.

Tabla 5. Control de programación

PORCENTAJE PONDERADO EN OBRA				
PROGRAMADO MES	**EJECUTADO MES**	**DIFERENCIA**	**DÍAS**	**ESTADO**
2.18%	2.38%	0.20%	0	Al día
PROGRAMADO ACUMULADO	**EJECUTADO ACUMULADO**	**ADELANTO/ATRASO**	**DÍAS**	**ESTADO**
31.50%	31.70%	0.20%	0	Al día
CANT. DÍAS	**TOTAL DÍAS**	**FECHA TERMINACIÓN**	**% TIEMPO TRANSCURRIDO**	
CONTRACTUAL	**453**	**6-may-26**	**100%**	
ANTERIOR	**273**	**6-may-26**	**60%**	
ACTUAL	**294**	**6-may-26**	**65%**	

NOTA: **Con base en la programación ACTUALIZADA, se cuenta con un 31.70% ejecutado vs un programado del 31.50%.**


Como se le ha insistido al contratista de obra, las actividades que requieren iniciar de inmediato corresponden a la restauración de la cubierta, la ejecución de los pañetes y la ejecución de la estructura metálica.

Así mismo, una actividad que debe terminar es el reforzamiento de la estructura que se realiza en concreto y placa de contra piso del sótano.

2.1.2 Gráfica de avance de obra curva "S"

Gráfico 1. Curvas programado vs ejecutado

Fuente: Elaboración propia.

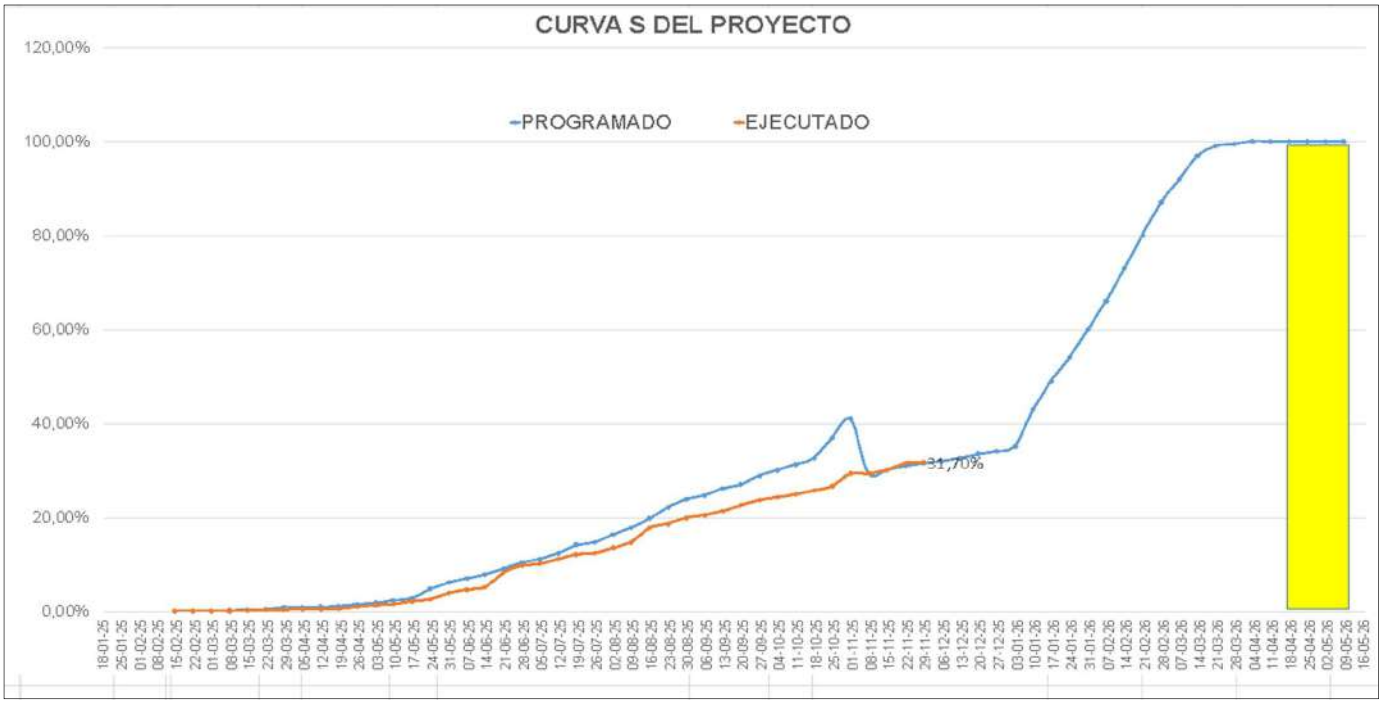


La gráfica demuestra la reprogramación realizada, ajustando las actividades a las que se van a desarrollar, considerando el balance presupuestal que debe quedar en lo contratado.

Así mismo demuestra claramente la preocupación de la Interventoría acerca del avance físico 31,70%, con respecto a tiempo transcurrido del proyecto 65%, lo cual quiere decir que, se debe ejecutar el 68,30% de la obra, en el 35% de tiempo restante para cumplir con la fecha de 6 de mayo de 2026.

2.1.3 Histograma programado vs ejecutado

Gráfico 2. Histograma programado vs ejecutado

Fuente: Elaboración propia.

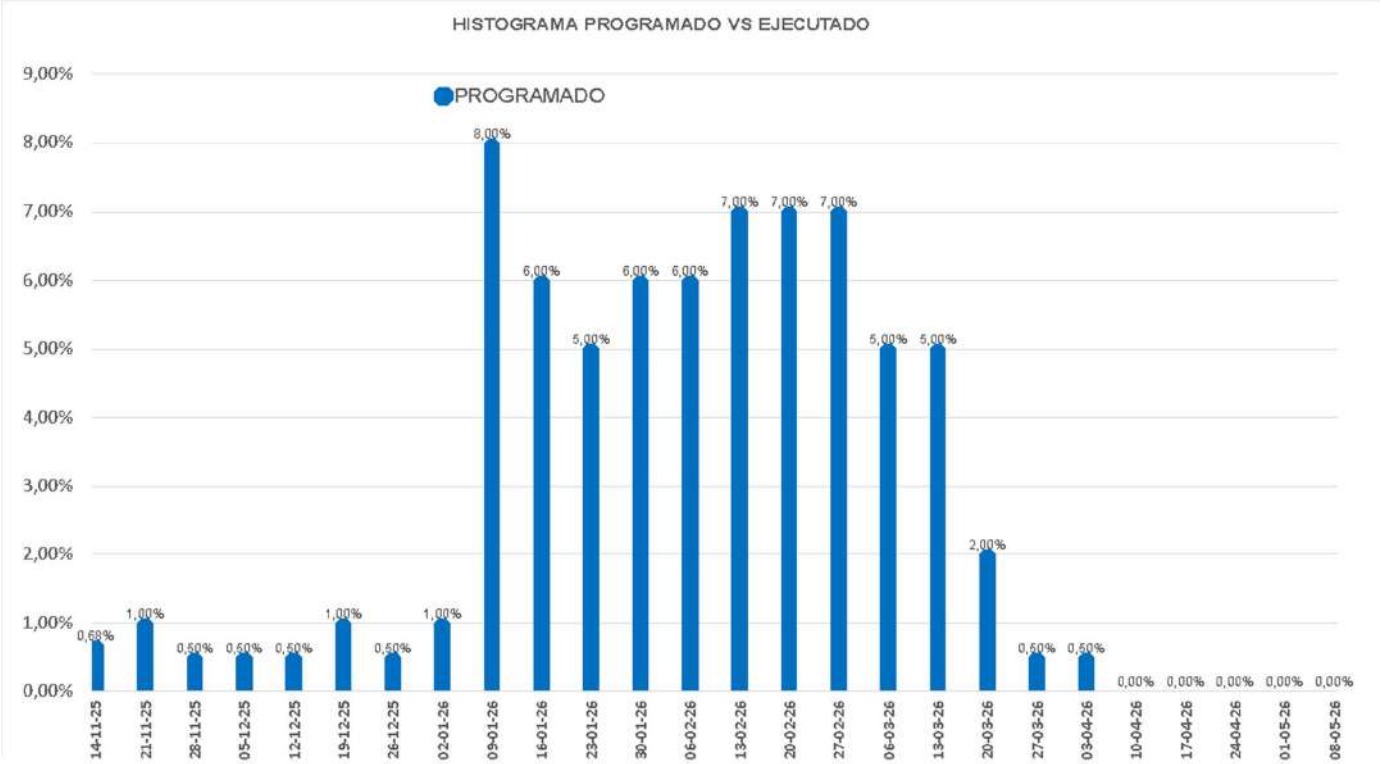

Esta es gráfica, muestra el histograma de la última etapa de ejecución de la obra, en donde se pueden evidenciar los rendimientos semanales esperados, para la finalización de la obra.

2.1.4 Descripción de actividades de obra

A continuación, se describen las actividades desarrolladas en el presente periodo:

Tabla 6. Seguimiento de actividades de obra

Período	Ítem	Descripción actividad.	Observaciones.
noviembre 2025	03-01-20	Liberación de pisos en listón machiembrado. espacios 101, 102 y 104.	Desmonte controlado de elementos en madera en machimbre para liberar el entrepiso de este material a reemplazar.
Riesgo: Alto/Medio/Bajo			
Programación	**Bajo**	Esta actividad se adelantó dentro de los tiempos previstos y no tiene mayor incidencia dentro de la programación.	
Presupuesto	**Bajo**	Los costos están contemplados dentro de las cantidades y costos originales del contrato.	
Técnico	**Bajo**	Se realizó con la técnica que requiere la actividad sin que se presentaran daños o acciones riesgosas para el personal operario o la edificación.	

Período	Ítem	Descripción actividad.	Observaciones.
noviembre 2025	03-01-30	Liberación de bajantes de agua lluvia…	Desmonte controlado de tuberías parásitas de aguas lluvias, embebidas o sobrepuestas en muros preferentemente de fachadas.
Riesgo: Alto/Medio/Bajo			
Programación	**Bajo**	Esta actividad se adelantó en su totalidad y no tenía mayor incidencia dentro de la programación.	
Presupuesto	**Bajo**	Los costos están contemplados dentro de las cantidades y costos originales del contrato.	

Técnico	**Bajo**	Se realizó con la técnica que requiere la actividad sin que se presentaran daños o acciones riesgosas para los operarios o la edificación.

Período	**Ítem**	**Descripción actividad.**	**Observaciones.**
noviembre 2025	05-01-01	Concreto de limpieza 2.100 PSI	Se realizó para poder ejecutar las vigas de reforzamiento en los espacios 121 y 126 en donde se encuentran los hallazgos arqueológicos.
Riesgo: Alto/Medio/Bajo			
Programación	**Alto**	Todas las actividades que directa o indirectamente tienen que ver con el reforzamiento estructural del edificio, y que preceden necesariamente otras de igual importancia presentan un riesgo alto para el cumplimiento de la programación de las obras.	
Presupuesto	**Medio**	Surge la necesidad de crear nuevos ítems no previstos, para soterrar al lado de estos reforzamientos estructurales, los hallazgos arqueológicos que se van a preservar soterrados.	
Técnico	**Alto**	Se requiere de una operación de reforzado estructural muy cuidadosa que no afecte los hallazgos arqueológicos que se encuentran en los espacios 121 y 126.	

Período	Ítem	Descripción actividad.	Observaciones.
noviembre 2025	08-01-06	Reintegración de faltantes de ladrillo en muro…espacios… 112, 115, 116, 117, 118, 120, 123, 127 y 128.	Se continúa restituyendo muros con faltantes o piezas de mampostería en mal estado.
Riesgo: Alto/Medio/Bajo			
Programación	**Bajo**	Actividad ajustada dentro de lo programado.	
Presupuesto	**Bajo**	La actividad se encuentra presupuestada contractualmente.	
Técnico	**Bajo**	Se realizó con la técnica requerida para esta actividad.	

Período	Ítem	Descripción actividad.	Observaciones.
noviembre 2025	12-01-01 12-01-02	Pañete en cal y arena para muros	En los muros que se encuentran sin pañete, se están adelantando los revoques en cal y arena en proporción 1:3.
Riesgo: Alto/Medio/Bajo			
Programación	**Bajo**	Actividad con retraso dentro de la programación, que se puede adelantar de todas maneras dentro del cronograma contractual siempre y cuando se coloquen varios frentes de trabajo.	
Presupuesto	**Bajo**	La actividad se encuentra presupuestada contractualmente.	
Técnico	**Bajo**	Se realiza con la técnica requerida para esta actividad.	

Período	Ítem	Descripción actividad.	Observaciones.

noviembre 2025	Componente 7	Se comenzó en este período a realizar el andamiaje para tratar las maderas existentes.	Para tratar las maderas que no se van a desmontar se está realizando una plataforma que permita trabajar con seguridad y más comodidad cada elemento a tratar.
Riesgo: Alto/Medio/Bajo			
Programación	**Alto**	Actividad que se debió comenzar por lo menos en agosto de 2025.	
Presupuesto	**Medio**	La actividad se requiere.	
Técnico	**Bajo**	Se realizó con la técnica requerida para esta actividad.	

Período	**Ítem**	**Descripción actividad.**	**Observaciones.**
noviembre 2025	Componente 9	Se está adelantando un inventario de la carpintería en madera, para retirarla del complejo y trabajarla en un taller externo.	
Riesgo: Alto/Medio/Bajo			
Programación	**Bajo**	Actividad ajustada dentro de lo programado.	
Presupuesto	**Bajo**	La actividad se encuentra presupuestada contractualmente.	
Técnico	**Bajo**	Se realizará con la técnica requerida para esta actividad.	

Período	**Ítem**	**Descripción actividad.**	**Observaciones.**
noviembre 2025	04-01-02	Excavación manual en tierra o material común… espacios exteriores norte, oriente, sur y occidente para redes de filtros, aguas lluvias y aguas residuales.	Se vienen realizando estos trabajos de redes al exterior del edificio para

			adelantar estas actividades e ir cerrando las excavaciones correspondientes a medidas que se avanza en ellas.
Riesgo: Alto/Medio/Bajo			
Programación	**Bajo**	Actividad realizada dentro de lo programado.	
Presupuesto	**Bajo**	Los costos están dentro de lo presupuestado,	
Técnico	**Bajo**	Se cuenta con el material en planos de consulta para su trazado y construcción.	

Período	**Ítem**	**Descripción actividad.**	**Observaciones.**
Noviembre 2025	Varios del componente No. 5	Figurado de acero en menor proporción para medidas irregulares halladas en obra, encofrado y desencofrado para muros pantalla y vigas de cimentación y de corona.	Estas actividades se realizarán hasta tanto se sigan las actividades de reforzamiento estructural.
Riesgo: Alto/Medio/Bajo			
Programación	**Medio**	Del avance de esta actividad dependen otras actividades de acabados como pañetes y pinturas por lo que se vuelve parte de la ruta crítica del proyecto.	
Presupuesto	**Bajo**	Contemplados dentro de cada actividad propuesta.	
Técnico	**Bajo**	Se cuenta con los diseños que cumplen con lo requerido para este tipo de actividad.	

Período	**Ítem**	**Descripción actividad.**	**Observaciones.**

Noviembre 2025	04-01-02	Continúa la excavación manual en tierra o material común, profundidad de .51 a 1.50 m. Interior: en sótano, cuarto de planta de emergencia, cuarto HVAC, espacios S,102 A, B y C.	Se han realizado para la construcción de vigas de cimentación y placas de piso.
Riesgo: Alto/Medio/Bajo			
Programación	**Medio**	Se ha requerido el acompañamiento permanente en estas actividades de los especialistas en la actividad, porque se han presentado dudas sobre lo que se encontró ejecutado y la forma y pasos a seguir frente a estos antecedentes de obra en lo estructural.	
Presupuesto	**Medio**	Los costos por mayor cantidad de ejecución no están de acuerdo con lo revisado hasta el momento, afectando este capítulo de manera representativa, puesto que se está construyendo con lo pautado contractualmente.	
Técnico	**Bajo**	Se cuenta con la información técnica requerida para la ejecución de estas actividades constructivas.	

Período	**Ítem**	**Descripción actividad.**	**Observaciones.**
Noviembre 2025	04-01-04	Continúa la excavación manual red hidrosanitaria espacios exteriores por los cuatro costados.	Se realiza para inspeccionar las redes sanitarias existentes y realizar pruebas de estanqueidad, pendientes y replanteo.
Riesgo: Alto/Medio/Bajo			
Programación	**Medio**	Este ítem va acompañado de todo un sistema hidráulico que tiene que ir acompañado del tanque de reserva por lo que es imperante tener coordinado todo este componente hasta la etapa de pruebas.	
Presupuesto	**Bajo**	Los costos por ejecución se mantienen, de acuerdo con el presupuesto inicialmente pactado.	

Técnico	**Bajo**	Se cuenta con la planimetría y especificaciones constructivas.

Período	**Ítem**	**Descripción actividad.**	**Observaciones.**
Noviembre 2025	04-02-0104-02-05 04-03-01	Se continúa con los rellenos con arena de peña y material seleccionado excavado. Retiro de material excavado, disposición y reutilización… en espacios de terrazas o balcones exteriores y espacios 126 (hallazgos arqueológicos)	Para la cimentación de refuerzo, filtros, e instalaciones sanitarias se han realizado excavaciones, retiros y reutilización de este tipo de material.
Riesgo: Alto/Medio/Bajo			
Programación	**Bajo**	Se desarrollan estas actividades dentro de los plazos programados contractualmente, algunas actividades se volverán a ejecutar cuando se construya el tanque de reserva y se esté construyendo los baños.	
Presupuesto	**Bajo**	Los costos por mayor cantidad de ejecución se incrementan levemente hasta el momento, afectando el presupuesto inicialmente pactado de forma leve.	
Técnico	**Bajo**	Se cuenta con los estudios e información necesaria para su ejecución sin contratiempos a la vista.	

Período	**Ítem**	**Descripción actividad.**	**Observaciones.**
Noviembre 2025	05-01-02 05-02-02 05-02-04 05-02-05 05-06-01 05-06-03 05-06-04 05-06-05 05-06-06 05-06-07	Se continúa con las estructuras de concreto y aceros de refuerzo…en zapatas, muros de concreto, columnas, vigas de varios tipos, aceros de refuerzo, anclajes con epóxico y mallas electrosoldadas. espacios 117, 118, 123, 125 y 128.	Se vienen realizando trabajos de reforzamiento estructural que contemplan los anteriores componentes.

Riesgo: Alto/Medio/Bajo		
Programación	**Alto**	Se viene ejecutando esta actividad de forma consecutiva por espacios, pero también se puede realizar de forma simultánea en diferentes frentes de obra, reduciendo tiempos de ejecución, puesto que son actividades que preceden otras que no se pueden ejecutar sin que se haya realizado el reforzamiento estructural.
Presupuesto	**Medio**	Los costos si bien es cierto se han incrementado en este aspecto, se mantienen dentro de un rango aceptable que no desbordan el presupuesto inicial.
Técnico	**Bajo**	Se cuenta con los planos de detalles, memorias y especificaciones para el desarrollo de estas actividades.

Período	Ítem	Descripción actividad.	Observaciones.
Noviembre 2025	Componente No. 4 (04.01 y 04.02)	Excavaciones y lleno para filtros y red hidrosanitaria.	Excavaciones manuales, rellenos en arena, gravillas, geotextil y material retirado seleccionado.
Riesgo: Alto/Medio/Bajo			
Programación	**Medio**	Se vienen adelantando dentro de los rangos de programación aceptables.	
Presupuesto	**Medio**	En especial en lo referente a filtros, se presenta la necesidad de reemplazarlos casi en su totalidad por el mal estado en los que se hallaron los existentes.	
Técnico	**Bajo**	Se cuenta con las especificaciones técnicas correspondientes y necesarias.	

Período	Ítem	Descripción actividad.	Observaciones.
Noviembre 2025	05-06-05 05-06-06	Mallas electrosoldadas	Se han utilizado para el reforzamiento estructural tanto en placas de piso, como en muros de concreto para reforzamiento
Riesgo: Alto/Medio/Bajo			

Programación	**Alto**	Actividades dentro de la ruta crítica de la programación, que anteceden otra igualmente importantes que ya está siendo objeto de retrasos, como estructura de cubierta y acabados.
Presupuesto	**bajo**	Actividad contemplada dentro del presupuesto inicial.
Técnico	**Bajo**	Se ha realizado con la técnica que se requiere en esta actividad.

Período	**Ítem**	**Descripción actividad.**	**Observaciones.**
noviembre 2025	05-06-03 05-06-04	Anclajes epóxicos de ⅜ y ½ .	Se realizan para entrelazar el muro existente en mampostería con las pantallas de refuerzo en concreto.
Riesgo: Alto/Medio/Bajo			
Programación	**Alto**	Todo lo correspondiente a refuerzo estructural, es sinónimo de ruta crítica dentro de la programación de la obra, y estos ítem de reforzamiento están presentando atraso, porque preceden más actividades de importancia.	
Presupuesto	**Bajo**	Actividad contemplada originalmente dentro del presupuesto.	
Técnico	**Bajo**	Actividad realizada dentro de los parámetros establecidos para tal fin.	

A continuación, se anexa registro fotográfico de las actividades técnicas más relevantes efectuadas en el periodo reportado:



Ilustración TEC 1. Remate viga corona espacio 118



Ilustración TEC 2. Restitución de muros espacio 118



Ilustración TEC 3. Armado de plataforma para tratamiento de madera



Ilustración TEC 4. Retiro de machimbre de entrepiso espacio 101



Ilustración TEC 5. Puentes de conexión en estructura de cimentación



Ilustración TEC 6. Armado columnas para reforzamiento estructural espacio 126

Fuente: CONSORCIO RYU-GD PATRIMONIAL

Tabla 7. Controles Técnicos De Calidad, Ejecutados Por La Interventoría

No.	Actividades Actuales De Control	Concepto	Observaciones
1	Aprobación De Un Programa De Control De Calidad De La Construcción De Los Edificios Y Obras De Urbanismo	Satisfactorio	El Plan de Calidad correspondiente al proyecto REALIZAR LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN INTEGRAL DEL EDIFICIO SIBERIA QUE HACE PARTE DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL se encuentra Aprobado. (ANEXO No. 11 - INFORME STI).
2	Aprobación De Laboratorios Que Realizan Los Ensayos De Control De Calidad	Satisfactorio	° El laboratorio Concrelab está aprobado y cuenta con la respectiva certificación ONAC para ensayos de cilindros de concreto. (ANEXO No.11 - INFORME STI)

2.2 Informe administrativo: costos y presupuesto

Como control de presupuesto e informe de manejo de anticipo se presenta un anexo con los manejos durante el mes y su respectivo seguimiento adicional la tabla actualizada por componentes del presupuesto. **Ver Anexo 10.**

Nota: El valor presentado corresponde al presupuesto proyectado resultante de la etapa de apropiación de diseños. Sin embargo, se están ejecutando las actividades de acuerdo al valor contractual.

- **EXTRACTOS ENTRE FIDUCIA E INFORME DE INTERVENTORÍA:**

DESCRIPCION	*VALOR ($)*
Orden de Giro No.1	$ 232.191.192,66
Orden de Giro No.2	$ 438.960.584,00
Orden de Giro No.3	$ 93.703.783,00
Orden de Giro No.4	$ 131.403.907,43
Orden de Giro No.5	$ 236.523.618,00
Orden de Giro No.6	$ 131.403.907,43
Orden de Giro No.7	$ 898.095.621,00
Orden de Giro No.8	$ 108.781.782,00
Orden de Giro No.9	$ 408.112.730,00
Orden de Giro No.10	$ 318.068.391,00
Orden de Giro No.11	$ 70.483.130,00
Valor Invertido	**$ 3’014.897.769,09**

- **Estado de Anticipo en FIDUCIA:**

Órdenes de giro desembolsadas: 11

Nota: El anticipo a la fecha se encuentra desembolsado en un 38.45%.

3. COMPONENTE BIM

3.1 Implementación BIM-Actividades Realizadas:

DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
● 07-11-2025 El Consorcio Infraestructura Siberia comparte modelo de estructura en concreto, informe quincenal 18 y avance de programación ajustada. ● 10-11-2025 El Consorcio Infraestructura Siberia continúa compartiendo actualización de actas, soportes de Arquímedes y otros documentos para el corte 1. ● 12-11-2025 El Consorcio Infraestructura Siberia comparte subsanación de documentos de corte 1, incluyendo actas, soporte de Arquímedes y actualización de modelo de desagües. ● 12-11-2025 Se sostiene reunión con el apoyo a la supervisión sobre el corte 1. ● 12-11-2025 Interventoría comparte informes de interferencias al contratista según la actualización de modelos del periodo anterior. ● 13-11-2025 El Consorcio Infraestructura Siberia comparte la primera versión del	En el presente periodo se da un trabajo continuo sobre el avance de la obra y los modelos de avance de obra. El contratista ha estado adelantando los modelos de avance de obra de preliminares, estructura en aceros, estructura en concreto, excavaciones y rellenos, liberaciones y demoliciones, desagües e iluminación. También dos modelos de proyección, el de estructura en madera y la red de suministro. En el periodo se logra generar los presupuestos de apropiación y de balance con 74 componentes, así mismo se gestiona el primer corte de obra donde se cobraran el

modelo de arquitectura de acabados, estructura de concreto y aceros. ● 14-11-2025 El Consorcio Infraestructura Siberia comparte documentación de apropiación de diseño y ajustes al corte. Se comparte también el plano de redes externas solicitado por el apoyo a la supervisión. ● 18-11-2025 Se sostiene reunión con el apoyo a la supervisión, donde se hacen observaciones a plano compartido. Se comparte por parte del contratista el plano subsanado de redes externas. ● 14-10-2025 Se sostiene reunión con el apoyo de la supervisión, el contratista, y el equipo del proyecto del IMI para socialización de metodología del corte de obra. ● 19-11-2025 El Consorcio Infraestructura Siberia comparte radicación de corte 1 subsanado. También comparten actualización de modelos proyectados de acabados, comunicaciones, potencia e iluminación. ● 19-11-2025 Interventoría comparte el corte 1 al apoyo a la supervisión para revisión. Se adelanta generación de matriz de interferencias para medición de kpi de coordinación.	componente 1 que contiene preconstrucción y preliminares. El periodo se cierra con varias observaciones abiertas a estos documentos. Se han dado los primeros avances en simulación 4D, se han comunicado varias observaciones. Las simulaciones deben adelantarse a la obra y volverse la programación modelada. También al estar cerrando presupuesto ya se debe ir adelantando la vinculación 5D con el nuevo presupuesto. Se da cambio del profesional del modelador BIM el cual se encargará de la gestión de los modelos arquitectónicos. El periodo culmina en la matriz de seguimiento para la etapa de construcción con un 33% de

• 20-11-2025 El Consorcio Infraestructura Siberia comparte modelo de desagües, acabados y estructura en concreto. • 21-11-2025 El Consorcio Infraestructura Siberia comparte modelo de estructura en concreto. • 22-11-2025 El Consorcio Infraestructura Siberia comparte el modelo de acabados de arquitectura y de desagües. • 24-11-2025 El Consorcio Infraestructura Siberia comparte el modelo de acabados de arquitectura de desmontes y liberaciones. • 25-11-2025 Se sostiene mesa de trabajo con el apoyo a la supervisión y el contratista sobre verificación de documentos del CDE. • 25-11-2025 El Consorcio Infraestructura Siberia comparte el modelo de acabados de arquitectura de desmontes y liberaciones, también planos de taller de los diafragmas. • 26-11-2025 El Consorcio Infraestructura Siberia comparte el modelo de excavaciones e informe quincenal. • 24-11-2025 a 27-11-2025 La interventoría ha colocado incidencias a memorias de corte 2 de excavaciones, estructura en concreto y demoliciones y liberaciones.	avance sobre un 37% programado.

● 27-11-2025 El Consorcio Infraestructura Siberia comparte el modelo de excavaciones con memorias de excavaciones y rellenos. También comparte modelo de demoliciones y liberaciones.	

3.2 Matriz de seguimiento y control

La matriz de seguimiento y control BIM cerró el periodo anterior con un avance de 33% sobre un 37% programado, para el presente periodo se avanza hasta el 34% ejecutado sobre un 36% programado. Se aclara que el cambio en el porcentaje programado se da porque se está teniendo en cuenta la nueva programación de obra del contratista. Sin embargo, el componente BIM aún reciente atrasos por la baja ejecución de obra en el presente periodo.

3.3 BEP (Plan de Ejecución BIM)

El BEP y varios de sus anexos no han surtido actualización en el presente periodo, de todas maneras, se hace un paso a la carpeta de publicado del estado actual del BEP y sus anexos como una aprobación parcial ya que se trata de un documento vivo que puede surtir cambios a futuro.

3.4 Modelos de obra

Actualmente se llevan modelos de actividades de obras preliminares, estructura en concreto, estructura en acero, desagües, excavaciones y rellenos, demoliciones y liberaciones, desagües e iluminación. También modelos de proyección de red de suministro, potencia, comunicaciones, acabados y estructura en madera. Los modelos se han actualizado con unos cuantos pendientes menores e interferencias que aún se mantienen pendientes por resolver.

3.5 Implementación 4D y 5D

El contratista viene en el proceso de cierre de presupuesto y programación, al cerrar presupuesto deben empezar la vinculación 5d de dicho presupuesto de 74 componentes con el programa Arquimedes y los modelos de obra. Respecto a las simulaciones 4D se han generado avances donde se han simulado actividades de preliminares, excavaciones y estructura. Dichas simulaciones aún tienen observaciones comunicadas y estas simulaciones deben sobrepasar a la obra y volverse la proyección de la obra y su programación.

Al presente informe se anexa el informe BIM mensual HSJD-CRP-SIB-INM-BIM-10. **Ver Anexo 4**.

4. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

4.1 Seguridad industrial

A continuación, informamos la gestión SST realizada durante el mes de noviembre - diciembre del año en curso:

Durante el mes, se realizó la actualización de las planillas de seguridad social del personal del Edificio Siberia, según dígito de verificación; de igual manera, se compartieron ante el Ministerio de las Culturas, las certificaciones de la ARL y el listado del proyecto, con el fin de solicitar la autorización para el ingreso al Complejo Hospitalario durante el mes de diciembre de 2025.

Se recibió el SG-SST de la empresa IDEAL y los documentos del nuevo director de Obra, esto con el fin de dar cumplimiento a los términos contractuales.

El día 13 de noviembre, se envió correo 479-GDP-CC03-566 al contratista, solicitando garantizar los entibados en las actividades de excavación, las cuales, según lo

evidenciado no garantizaban en su totalidad la integridad del personal; cabe aclarar, que el contratista tomó los correctivos de manera inmediata, con el fin de avanzar de manera segura estos procesos que se ejecutan en varias áreas del edificio , lo que a su vez evitará afectaciones al personal durante la ejecución de actividades; por otro lado, la Interventoría expresó su inconformidad ante el Contratista, con relación a las planillas de seguridad presentadas de los visitantes que ingresan al edificio, las cuales se estaban entregando incompletas, generando incumplimiento a lo descrito en la Ley 100 de 1993; es de aclarar, que el contratista acató las observaciones de manera inmediata y que, a fecha de cierre de este informe, no se ha generado más observaciones al respecto.

EL 18 de noviembre, en informe de transmisión 1473 y 1475, se dio aprobación por parte SST al procedimiento de Pañetes en muros y dilataciones; se aclara que, a la fecha se dio el inicio con las preliminares de esta actividad;

El día 19 de noviembre, en informe de transmisión 1493, se dio aprobación por parte SST al procedimiento de Restauración y reposición de estructura de cubierta en madera; esta actividad es ejecutada por el subcontratista Telval Hebo, quién está en proceso de armado de la estructura, para posterior instalación del encamillado.

El 20 de noviembre, se envió correo 479-GDP-CC03-574, solicitando al contratista la implementación de los campamentos para los nuevos subcontratistas que están ingresando al proyecto; esta solicitud, quedó subsanada el día 25 de noviembre del año en curso; de igual manera, se envió correo 479-GDP-CC03-577, solicitando al contratista reforzar la iluminación del proyecto, con el fin garantizar la integridad física y visual del personal; este requerimiento, ya había sido solicitado por parte de la Interventoría y el mismo fue subsanado por parte del contratista, sin embargo, nuevamente se evidenció déficit de iluminación en varias partes del edificio, lo que puede acarrear incidentes y/o accidentes laborales; cabe resaltar, que estamos a la espera del cierre de esta no

conformidad; el mismo día, se envió correo 479-GDP-CC03-578, socializando al contratista los requerimientos del Ministerio de las Culturas, con relación a los controles de orden, comportamiento y seguridad de los proyectos, a fin de que sea garantizado su cumplimiento y tomar los correctivos que den a lugar.

El 24 de noviembre, en informe de transmisión # 1564, se dio aprobación al SG-SST del subcontratista INTERACTUA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS; por otro lado, en informe de transmisión # 1562, además, el día 25 de noviembre, se dio aprobación por parte del área SST al Procedimiento de Instalación de Diafragma; de igual manera, se aprobaron los EPCC de Telval y el Subcontratista Telval Hebo, sin embargo, se aclara que el contratista Hebo no ha presentado los certificados de los Sistemas de acceso (andamio) según lo establecido en la Res. 4272 de 202, lo que ha generado afectaciones para el uso de estos elementos.

Para el 27 de noviembre, nuevamente se envió correo 479-GDP-CC03-577 al contratista, solicitando reforzar la iluminación en el edificio, fecha límite sábado 29 de noviembre de 2025; de igual manera, se envió correo 479-GDP-CC01-297 al Ministerio de la Culturas el listado y la seguridad social del personal del Edificio Siberia, para autorización de ingreso durante el mes de diciembre del 2025.

4.2 Accidentalidad:


A la fecha de corte del presente informe, no se han presentado incidentes ni accidentes laborales, en el Edificio Siberia; a continuación, relacionamos la gráfica con esta información:

Tabla 10. Incidentes y/o accidentes de trabajo en obra

TOTAL ACCIDENTES EN EL PROYECTO	0
ÚLTIMO ACCIDENTE	N/A

EMPRESA:	N/A
DÍAS SIN ACCIDENTE:	292
DÍAS RECORD:	292
FECHA ACTUAL:	06/12/2025

Gráfico 3. Incidentes y/o accidentes de trabajo en obra

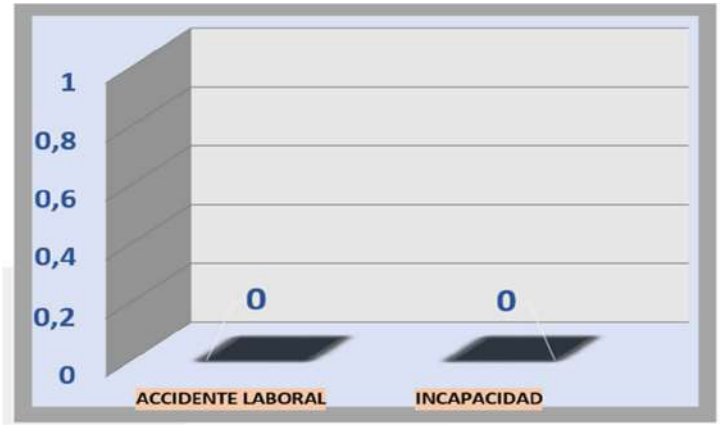

4.3 Actividades actuales de control

Personal de Administración y Obra

Durante el mes de noviembre, el Proyecto contó con las siguientes personas del área Administrativa y Operativa de la Interventoría Consorcio Ryu GD Patrimonial y del Consorcio Infraestructura Siberia, el total de trabajadores fue de 103.

Tabla 11. Listado de personal Contratista Consorcio Infraestructura Siberia

CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SIBERIA	NOMBRE	CANTIDAD PROMEDIO (ANTERIOR)	CANTIDAD PROMEDIO (ACTUAL)	DIFERENCIA
PRESIDENTE		GABRIEL HUMBERTO VALDERRAMA	1	1	0
GERENTE GENERAL		LUIS ALEJANDRO PIÑEROS	1	1	0
RESIDENTE ADMINISTRATIVO 100%		CINDY LORENA ARIAS	1	1	0
DIRECTOR DE OBRA 50%		VICTOR FORERO GIL	1	1	0
RESIDENTE DE OBRA ESPECIALISTA EN RESTAURACIÓN Y/ AFINES 100%		MABEL CRISTINA FERRUCHO GONZÁLEZ	1	1	0
ASESOR ESTRUCTURAL 50%		GERMAN CAMILO ALFONSO	1	1	0
ASESOR GEOTECNIA 30%		MAXIMILIANO VILLADIEGO	1	1	0
ASESOR EN REDES ELÉCTRICAS, TELEFÓNICAS, VOZ Y DATOS. 30%		LUIS ADRIANO MORA	1	1	0
ASESOR HIDROSANITARIO - RED CONTRA INCENDIO Y GAS 30%		JULIÁN SALAMANCA	1	1	0
ASESOR DE OBRA EN SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO Y SISTEMAS DE VENTILACIÓN MECÁNICA 30%		NILKAR SANTAMARÍA DÍAZ	1	1	0
ASESOR EN ARQUEOLOGÍA 50%		FELIPE GAITÁN	1	1	0
ASESOR EN MUSEOGRAFÍA 50%		SANDRA ESTHER MENDOZA	1	1	0
COORDINADOR BIM 100%		DIEGO ALEJANDRO VANEGAS TORRES	1	1	0
RESIDENTE BIM		JUAN CARLOS RUIZ CUELLAR	1	1	0
MODELADOR BIM 100%		MIGUEL ANGEL QUINTERO	1	1	0
MODELADOR BIM 100%		JOSÉ LEANDRO ESPITIA SANTANA	1	1	0
ASESOR AMBIENTAL DE OBRA 100%		LAURA LIZARAZO	1	1	0
PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SST 100%		ANA MARIA AROCA	1	1	0

PERSONAL CALIFICADO PARA ATENCIÓN A LA COMUNIDAD - TRABAJADOR SOCIAL OBRA 50%	CHRISABELL MERCEDES GRACIA ESCOBAR	1	1	0
CONTRATISTA ELÉCTRICO	JORGE ENRIQUE GARZON	1	1	0
ADMINISTRATIVA	MARCELA DAZA	1	1	1
SUPERVISOR DE OBRA DE SUBCONTRATISTA		2	2	0
INSPECTORA SST DE SUBCONTRATISTA		3	5	2
OFICIALES		11	15	4
AYUDANTES		25	30	5
ANALISTA DE INGENIERIA		1	1	0
BOAL		3	3	0
COORDINADORA JUNIOR DE COSTOS		1	1	0
GERENTE GENERAL SUBCONTRATISTA		1	1	0
OPERARIO		1	1	1
HERRERO		1	1	1
AUXILIAR ELÉCTRICO		2	2	0
SOLDADOR		0	1	1
TOPÓGRAFO		0	1	1
CADENERO		0	1	1
TOTAL		**72**	**86**	**17**

Tabla 12. Listado de personal Interventoría

CONSORCIO RYU GD PATRIMONIAL	NOMBRE	CANTIDAD PROMEDIO (ANTERIOR)	CANTIDAD PROMEDIO (ACTUAL)	DIFERENCIA
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO RYU GD PATRIMONIAL	MARCELA GUTIÉRREZ DÍAZ	1	1	0
GERENTE TÉCNICO GUTIÉRREZ DÍAZ	DANIEL GUTIÉRREZ DÍAZ	1	1	0
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	SERGIO ALBERTO ROMERO CAPERA	1	1	0
RESIDENTE	CARLOS ALBERTO TIRADO T.	1	1	0
COORDINADOR BIM	JUAN CAMILO MONTERO	1	1	0
ASESOR ESTRUCTURAL	JORGE IVÁN GARCÍA	1	1	0
ASESOR DE ARQUEOLOGÍA.	JUAN PABLO CAMPO	1	1	0
ASESOR HIDROSANITARIO - RED CONTRA INCENDIO Y GAS	VANESSA TOCANCIPÁ	1	1	0
ESPECIALISTA EN GESTIÓN AMBIENTAL	ANGIE PAOLA ÁVILA	1	1	0
PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	YOLANDA PATRICIA NÚÑEZ B	1	1	0
TRABAJADORA SOCIAL	NATALIA MONTENEGRO	1	1	0
RESIDENTE ADMINISTRATIVO	MARIA ALEJANDRA GIL	1	1	0
ASESOR MUSEOLÓGICO	PAULA ANDREA GIL	1	1	0
ASESOR GEOTECNIA	MARCELA SALCEDO	1	1	0
ASESOR REDES ELÉCTRICAS	JOSE LUIS GUTIERREZ	1	1	0
ASESOR AIRE ACONDICIONADO	GONZALO CISNEROS	1	1	0
REVISOR ESTRUCTURAL INDEPENDIENTE	MAGDA LORENA CHILITO AMAYA	1	1	0
TOTAL		**17**	**17**	**0**

Gráfico 4. Personas Vs Cargos Consorcio infraestructura Siberia

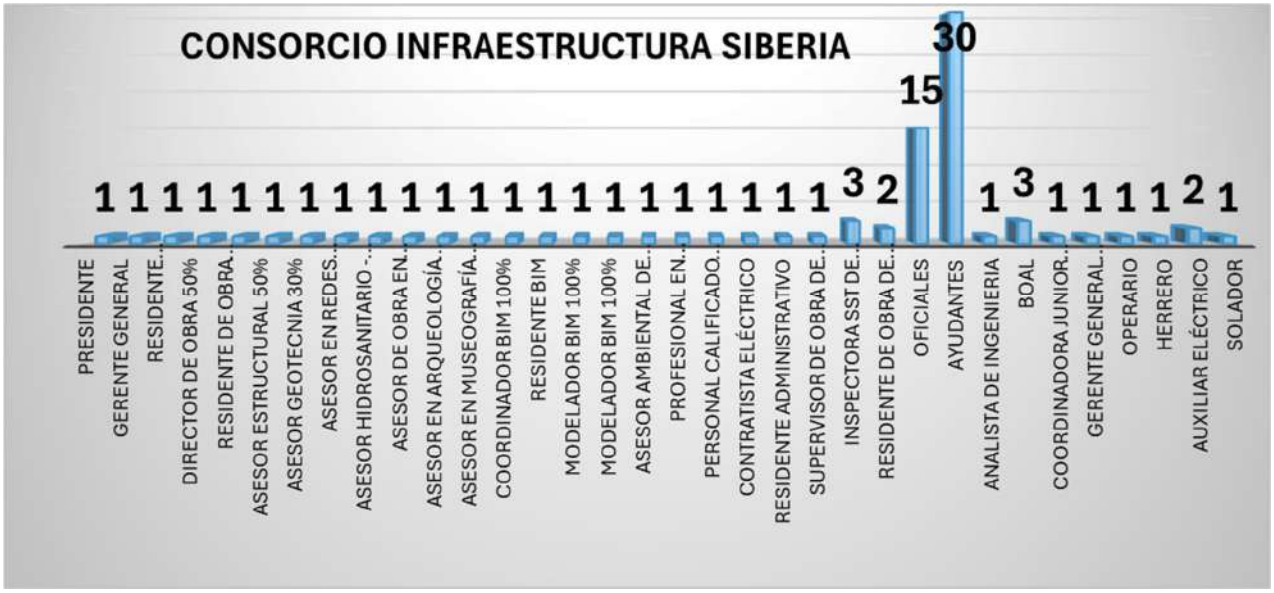


Gráfico 5. Personas Vs Cargos Consorcio RYU-GD Patrimonial

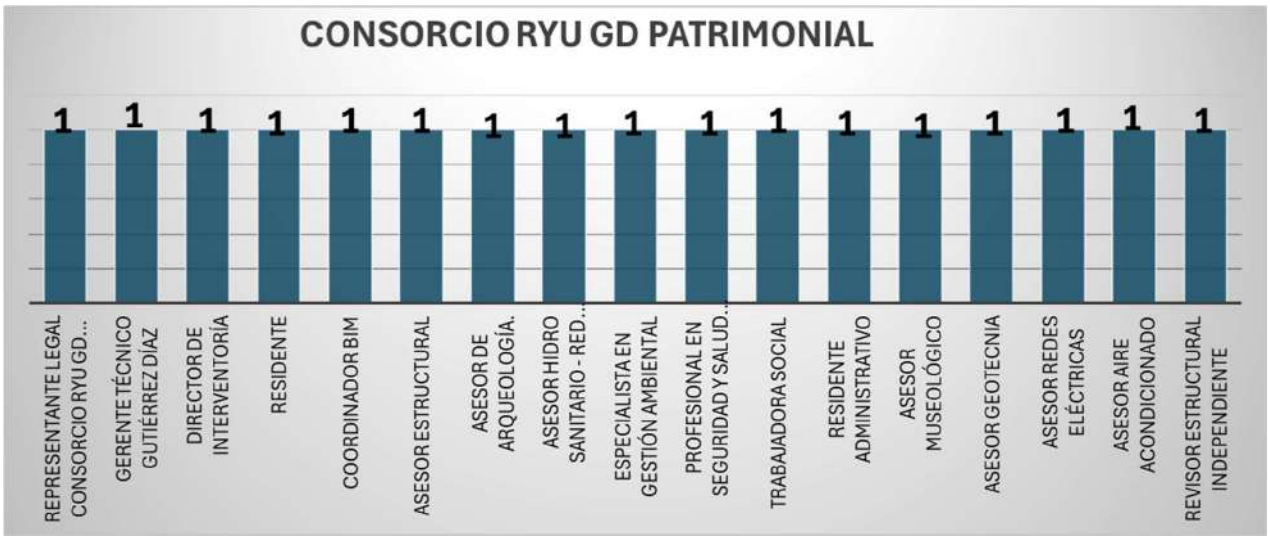


Tabla 13. Listado de equipos usados en obra

EQUIPO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD PROMEDIO (ANTERIOR)	CANTIDAD PROMEDIO (ACTUAL)
MOTOBOMBA	1	1	1
ANDAMIO	1	1	1
VIBRADOR	1	1	1
CANGURO	1	1	1
MEZCLADOR E INYECTOR DE CEMENTO	1	0	1

Gráfico 6. Equipos en obra



4.4 Hallazgos

Hallazgos Negativos

A continuación, adjuntamos registro fotográfico de las condiciones más relevantes de seguridad evidenciadas durante el mes en el proyecto.



Ilustración SST 01.Falta de implementación de tarjeta roja para los sistemas de acceso que no están habilitados.



Ilustración SST 02.Falta de aseguramiento en los apuntalamientos del edificio.



Ilustración SST 03. No uso de la carpa para todo el personal que ejecuta actividades durante la lluvia.



Ilustración SST 04. Personal sin hacer uso correspondiente del casco

Fuente: CONSORCIO RYU-GD PATRIMONIAL

Hallazgos positivos

A continuación, se anexa registro fotográfico de la gestión SST realizada durante el mes.



Ilustración SST 05. Capacitaciones



Ilustración SST 06. Inspección Sistemas de acceso



Ilustración SST 07. Orden y aseo



Ilustración SST 08. Señalización de áreas



Ilustración SST 09. Uso adecuado de EPP



Ilustración SST 10. Apuntalamientos de estructura



Ilustración SST 11. Pausas Activas



Ilustración SST 12. Entrega de EPP



Ilustración SST 13. Protección cajas



Ilustración SST 14. Señalización pasos peatonales

Fuente: CONSORCIO RYU-GD PATRIMONIAL

4.5 Evaluación mensual al Contratista SST

Gráfico 7. Calificación mensual Contratista SST



Observaciones: Durante el mes de noviembre-diciembre se presentaron las siguientes condiciones inseguras, las cuales no garantizaron la seguridad del personal y el adecuado proceso constructivo.

Falta de aseguramiento a los entibados de las excavaciones, falta de iluminación en varias zonas del edificio, entrega incompleta de las planillas de seguridad del personal visitante, falta de entrega de campamento a los subcontratistas.

Estas condiciones mencionadas anteriormente, no dan la garantía correspondiente a lo establecido en la normativa ni en los términos contractuales; además, su materialización pudo acarrear accidentes graves y afectaciones legales para el edificio.

Ante los sucesos mencionados en el presente informe, la Interventoría solicitó medidas de acción inmediatas que garantizaran la integridad del personal, cumplimiento de los requisitos legales y normativos; además, de la prevención de incidentes y/o accidentes laborales.

De acuerdo con las observaciones anteriormente informadas, para este mes la calificación total quedó en el **98%.**

5. GESTIÓN AMBIENTAL

Durante el periodo de reporte, se realizó seguimiento y control a las actividades ambientales ejecutadas por el Contratista de obra Consorcio Infraestructura Siberia, con el fin de garantizar el cumplimiento de los programas de manejo ambiental establecidos en el Plan de Manejo Ambiental V2, aprobado mediante el comunicado 479-GDP-CC03-076 (03/04/2025) y remitido al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes en el oficio 479-GDP-CC01-039 (03/04/2025). Asimismo, se dio aprobación en el CDE, mediante el informe de transmisión No.160 el día 10/06/2025.Y se cargó como Informe de Revisión No. 55 el día 28/08/2025, de igual manera el Plan de Gestión de RCD mediante el número 56. Se realizó actualización de la matriz de aspectos e impactos ambientales ajustada a la etapa constructiva (Acta de reunión No. 26 del 01/10/2025).

5.1 Seguimiento programas de manejo ambiental

Informes del Contratista

- **INFORME MENSUAL OCTUBRE V1:** El día 15 de noviembre de 2025 se revisó la carpeta del Informe Ambiental No.9 (Octubre 2025), sin embargo, no se evidenció información por parte del Contratista, por lo cual se envió Informe Transmisión No. 1461 notificando que estaba pendiente por radicación el Informe Mensual No. 9.

- Del 19 al 21 de noviembre, se llevó a cabo mesa de trabajo (Acta Reunión No. 34), en donde se socializaron las observaciones del informe mensual ambiental, razón por la cual el Contratista envió subsanado mediante el Informe Transmisión No. 1588 (CIS)**:** Informe Mensual Ambiental V2.

- **INFORME MENSUAL OCTUBRE V2:** Aprobado Informe Transmisión No. 1590 (CRP).

- **Manejo y control de materiales e insumos**

Los proveedores de materiales cuentan con los permisos ambientales requeridos por la Autoridad Ambiental. Se realizó la validación de los vales y certificados emitidos al Contratista.

En el siguiente cuadro se encuentra la información de los proveedores aprobados por la Interventoría.

Tabla 14. Proveedores de materiales de obra

PROVEEDOR	MATERIAL	RECIBIDO	REVISADO
Polimix	Concreto	Correo electrónico 16/07/2025	479-GDP-CC03-316 Revisión 16/07/2025

PROVEEDOR	MATERIAL	RECIBIDO	REVISADO
Ternium	Acero	Informe Transmisión No. 399	Informe Transmisión No. 425
Constriturar	B-200	Informe Transmisión No. 15/07/2025	Informe Transmisión No. 479-GDP-CC03-309 Revisión 15/07/2025
Cemex	Cemento	Informe Transmisión No. 546	Informe Transmisión No. 547
El Pencal	Arena de peña	Informe Transmisión No. 726	Informe Transmisión No. 734
Villa Paula	B-200	Informe Transmisión No. 733 y 754	Informe Transmisión No. 734
Orión – Sol de Sinaí	Grava	Informe Transmisión No. 768	Informe Transmisión No. 771
Cementos Oriente	Cemento	Informe Transmisión No. 1216	Informe Transmisión No. 1246
Geomineral	Granular	Informe Transmisión No. 1390	Informe Transmisión No.1397
Argos	Cemento	Informe Transmisión No. 1404	Informe Transmisión No. 1444
Cales Boyacá	Cal	Informe Transmisión No. 1575	Informe Transmisión No. 1576

Para el periodo de reporte del 07 de octubre al 06 de noviembre de 2025 el Contratista adquirió el siguiente material:

- Contriturar: 49 m³ (B-200)
- El Pencal: 15 m³ (B-200), 23 m³ (Arena Peña)
- Geomineral: 6 m³ (Arena Peña)
- Polimix: 26 m³ (Concreto alta densidad)
- Ternium: 10.509 kg (Barra corrugada, platinas y estructura rectangular)

- Cemex: 5.000 kg (Cemento)

Se verificó que el material pétreo estuviera cubierto, señalizado y delimitado una vez descargado en el proyecto. Para el manejo de concreto, el Contratista garantizó la protección del suelo para evitar la contaminación del mismo. Solicitudes realizadas en recorridos de obra al Contratista.

Se evidenció la reutilización de ladrillos en la restauración de muros, la cantidad se reportará en el Informe de Aprovechamiento In Situ del mes correspondiente, que presenta el Contratista Consorcio Infraestructura Siberia.



Ilustración AMB 1. Ingreso de material metálico



Ilustración AMB 2. Concreto ingresado en Mixer



Ilustración AMB 3. Verificación de protección y señalización de material



Ilustración AMB 4. Verificación de protección y señalización de material



Ilustración AMB 5. Acopio de tubería



Ilustración AMB 6. Acopio varilla metálica

Fuente: CONSORCIO RYU-GD PATRIMONIAL

- **Manejo y control de productos químicos**

El Contratista cuenta con kit para atención de derrames, el cual se localiza en el campamento como una manera preventiva en caso de que ocurra un derrame con el fin de garantizar una pronta atención. En el presente periodo no hubo generación de residuos peligrosos. Sin embargo, el día 4 de noviembre de 2025 se entregó **30,9 kg** de residuos especiales al Gestor RECICLAJE MAJITO SAS, para que ellos a su vez hagan la entrega al gestor de RESPEL VEOLIA.

El recorridos habituales de obra, se inspecciona el punto de acopio provisional de sustancias químicas, el cual cuenta con una estructura hecha con bloque y cemento, cerramiento en malla metálica, por lo que cuenta con buena ventilación, asimismo, se hace la verificación de la matriz de compatibilidad, las fichas de datos de seguridad de las sustancias para la limpieza como de las sustancias requeridas en las actividades de obra.



Ilustración AMB 7. Inspección de punto de acopio de sustancias



Ilustración AMB 8. Inspección de punto de acopio de sacos de cemento



Ilustración AMB 9. Verificación de señalización acopio de sustancias



Ilustración AMB 10. Señalización de acopio de cemento

Fuente: CONSORCIO RYU-GD PATRIMONIAL

Respecto al manejo de bolsas de cemento, estas se dispondrán por el Contratista como residuos especiales o en el caso de que el proveedor cuente con algún programa para logística inversa para reciclar y reutilizar los sacos de cemento vacíos de las obras, cuyo propósito es extender la vida útil de los empaques, reducir la cantidad de residuos que terminan en el medio ambiente y fomentar la economía circular.

En cumplimiento a lo solicitado por la Interventoría, el pasado 28 de noviembre de 2025, el Contratista realizó socialización a los trabajadores sobre el manejo de productos químicos para este caso, sobre la Cal apagada, manejo de sustancias peligrosas, uso de EPP, correcta lectura de etiquetas y Ficha de Datos de Seguridad (FDS), con el fin de garantizar un manejo seguro de los productos químicos en el lugar de trabajo.

- **Gestión integral de residuos (aprovechables, no aprovechables y peligrosos)**

Durante el presente periodo se realizó inspección y verificación de la clasificación de los residuos de acuerdo con el código de colores. El proyecto cuenta con **tres (3) puntos** ecológicos, además de dos (2) canecas ubicadas en el comedor, lo anterior permitió separar los residuos aprovechables y no aprovechables, cumpliendo con el manejo adecuado de los mismos.

No Aprovechables: El Contratista realizó entrega de **147,34 kg** de estos residuos entre el 01 al 30 de noviembre de 2025, a la empresa de aseo del sector LIME, dichos residuos se llevaron al punto de acopio asignado por la SDS y Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, en el punto de acopio temporal ubicado en la entrada de la Calle 2 sur, mientras se habilita el shut de la Carrera 10. En las fechas y horarios establecidos: martes, jueves y sábado.

Aprovechables orgánicos: el día 04 de noviembre de 2025, el Contratista gestionó el retiro de los residuos de madera con RECICLAJES MAJITO SAS **3420 Kg de madera**.

La MADERA es seleccionada y almacenada temporalmente en el acopio de MAJITO SAS, para luego ser transportada y entregada en las plantas de PRIMADERA S.A.S, la cual fabrica tableros de partículas de madera aglomerados MDP, crudos y melamínicos.

Aprovechables: el día 04 de noviembre de 2025 fueron entregados los residuos aprovechables al proveedor RECICLAJES MAJITO SAS, **170 kg** Chatarra y **60** kg de Plástico.



Ilustración AMB 11. Entrega de reciclaje



Ilustración AMB 12. Acopio de residuos de madera



Ilustración AMB 13. Punto de acopio de reciclaje



Ilustración AMB 14. Punto de acopio de reciclaje



Ilustración AMB 15. Pesaje de residuos no aprovechables



Ilustración AMB 16. Pesaje de residuos no aprovechables



Ilustración AMB 17. Inspección de puntos ecológicos



Ilustración AMB 18. Inspección de puntos ecológicos



Ilustración AMB 19. Jornada de orden y aseo áreas comunes



Ilustración AMB 20. Jornada de orden y aseo áreas comunes



Ilustración AMB 21. Jornada de orden y aseo interno al edificio



Ilustración AMB 22. Jornada de orden y aseo área de baños

Fuente: CONSORCIO RYU-GD PATRIMONIAL

- **Gestión de Residuos de Construcción y Demolición – RCD**

El Programa de manejo de RCD cuenta con PIN de Generador de RCD No. 26892 asignado por la SDA el 21/02/2025, el cual se encuentra vigente hasta la finalización del proyecto.

Retiro y manejo de RCD en obra: Según fue solicitado, el Contratista realizó jornadas de retiro de residuos de excavación (Máquinas Amarillas y Cemex) y demolición (Greco),

se reforzó la protección total de los acopios con plástico. Se dispusieron los residuos de la siguiente manera:

- Greco: 21 m³ (26,88 t)
- Cemex: 7 m³ (8,96 t)
- Maquinas Amarillas: 42 m³ (80,76 t)

Los certificados son revisados en las entregas de los informes mensuales del Contratista, sin embargo, durante el mes se verifican los vales en el control diario.

Transporte de RCD: Las volquetas usadas por el contratista para el retiro de los RCD cuentan con PIN de Transportador, verificado previamente por la Interventoría en el directorio publicado por la SDA en la página web.

Tabla 15. Vehículos autorizados para transporte de RCD

PLACA	PIN-TRANS
OAI775	10310
GNB378	22319

Nota: El reporte de los retiros de RCD del presente informe son del 01 al 30 de noviembre de 2025.

Reporte mensual de RCD:

El día 04 de noviembre de 2025, se recibe del Contratista Informe Transmisión No. 1320: Reporte de RCD septiembre 2025, se hace la respectiva revisión y se generan observaciones que son socializadas al Contratista de manera presencial.

Reutilización de RCD: En primera instancia se verificó la correcta clasificación y acopio de los RCD susceptibles de aprovechamiento, posteriormente se realizó seguimiento a la actividad de reutilización de RCD para este periodo, se usaron los ladrillos desmontados en la construcción cajas de inspección para desagües de aguas lluvias y filtros, además se usaron en la restitución de muros dentro del edificio Siberia. El día 13 de noviembre de 2025, Recorrido de obra, se solicitó el retiro completo de los RCD y cumplir con las metas de aprovechamiento (50%) y circularidad (8%) del Decreto 507 de 2023, quedando establecido en Acta de reunión No. 33. El día 21/11/2025 en Acta No. 35, se llevó a cabo el protocolo a seguir, para el trámite de la donación del ladrillo desmontado a otros proyectos del CHSJD, recalcando la prioridad del uso dentro del edificio Siberia.

En cuanto al material aprovechado (ladrillos), el Contratista reportará las cantidades en el Informe de Aprovechamiento In Situ del mes de noviembre, el cual será verificado previamente por la Interventoría.



Ilustración AMB 23. Retiro de RCD



Ilustración AMB 24. Retiro de RC



Ilustración AMB 25. Retiro de RCD con platón carpado



Ilustración AMB 26. Retiro de RCD



Ilustración AMB 27. Reutilización de ladrillos en cajas de inspección



Ilustración AMB 28. Reutilización de ladrillos en cajas de inspección

Fuente: CONSORCIO RYU-GD PATRIMONIAL

Control de emisiones atmosféricas

El Contratista garantizó la protección del material granular acopiado en la obra, con el fin de evitar la dispersión de partículas al ambiente por la acción del viento, se solicitó hacer la sustitución las lonas por plástico para cubrir los materiales, para lo cual, el Contratista tomó las acciones. Se realizó humectación en las actividades de barrido y en general dentro del edificio para disminuir la dispersión de material particulado.



Ilustración AMB 29. Humectación en actividades de barrido



Ilustración AMB 30. Humectación en actividades de barrido



Ilustración AMB 31. Protección de platón de volqueta antes de salir.



Ilustración AMB 32. Humectación en zonas comunes.



Ilustración AMB 33. Protección de platón.



Ilustración AMB 34. Limpieza de llantas previo a la salida de la volqueta.



Ilustración AMB 35. Protección de material con plástico negro.



Ilustración AMB 36. Protección de RDC con plástico negro.

Fuente: CONSORCIO RYU-GD PATRIMONIAL

- **Prevención de la contaminación de cuerpos de agua y redes**

Protección de sumideros: Se inspeccionaron los 6 sumideros, de acuerdo con lo solicitado al Contratista, el día 28/12/2025 el Contratista realizó mantenimiento a los sumideros (limpieza de malla). Lo anterior, permitió que el material no se filtre en la red de alcantarillado del edificio.



Ilustración AMB 37. Jornada de mantenimiento de sumideros



Ilustración AMB 38. Jornada de mantenimiento de sumideros



Ilustración AMB 39. Jornada de mantenimiento de sumideros



Ilustración AMB 40. Jornada de mantenimiento de sumideros

Fuente: CONSORCIO RYU-GD PATRIMONIAL

- **Uso eficiente del agua y de la energía**

Las actividades relacionadas a este programa se relacionan a continuación:

Manejo de agua (Escorrentía y Residuales**):** Se verifica la limpieza de las unidades sanitarias fijas diariamente. Las cuales están conectadas a la red de alcantarillado existente del complejo hospitalario y estas a su vez al sistema de alcantarillado de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB-ESP. Se garantiza la protección con malla en las actividades de bombeo para los días 19, 20 y 24 de noviembre de 2025.



Ilustración AMB 42. Actividades de bombeo



Ilustración AMB 43. Limpieza de unidades sanitarias fijas



Ilustración AMB 44. Limpieza de unidades sanitarias



Ilustración AMB 45. Limpieza de unidades sanitarias

Fuente: CONSORCIO RYU-GD PATRIMONIAL

Captación de agua: Superficial y/o subterránea: El contratista realizó la captación y almacenamiento de agua lluvia, la recolección de agua lluvia de la bajante de la cubierta, y se usó en las actividades de obra (baños, aseo de zonas comunes y humectación). Asimismo, se realizó bombeo del agua lluvia almacenada en las excavaciones hacia los

pozos y cajas existentes, garantizando la protección con malla, para evitar la filtración de materiales de arrastre.

- **Control de roedores**

El día 20 de noviembre de 2025 la Secretaría Distrital de Salud realizó fumigación en todos los edificios del Complejo hospitalario, actividad llevada a cabo de manera satisfactoria, en el correo remitido por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes.

Se solicitó al Contratista realizar la reubicación de cebos por lo cual el día 28 de noviembre de 2025, se inspeccionaron y ubicaron los 10 cebos al interior del edificio y en sus alrededores, en la verificación no se encontraron roedores, ni tampoco se han visualizado en la obra o sus alrededores.



Ilustración AMB 46. Inspección de cebos



Ilustración AMB 47. Inspección de cebos



Ilustración AMB 48. Inspección de cebos



Ilustración AMB 49. Inspección de cebos



Ilustración AMB 50. Inspección de cebos



Ilustración AMB 51. Inspección de cebos

Fuente: CONSORCIO RYU-GD PATRIMONIAL

5.2 Seguimiento a permisos ambientales

- **Permiso de aprovechamiento forestal**

Durante el presente periodo se realizaron inspecciones diarias a los 45 individuos arbóreos inventariados, razón por la cual, el día 13 de noviembre de 2025 se solicitó al Contratista realizar mantenimiento a la protección de 4 árboles, lo cual quedó establecido en el Acta No. 33. Por lo anterior los días 21, 24 y 29 se realizó el mantenimiento correspondiente a las protecciones arbóreas.

Trazabilidad trámite inicial permiso forestal:

En cuanto a la solicitud del permiso de aprovechamiento forestal, es importante mencionar que la primera solicitud se realizó mediante Radicado 2025ER130484 (18/06/2025) ante la SDA en el cual, el Contratista solicitó la intervención a cinco (5) individuos arbóreos, cuatro (4) para Poda de Manejo y uno (1) para Bloqueo y Traslado, en vista del pronunciamiento de la SDA Radicado SDA. 2025EE183100 desistimiento tácito, asimismo el Radicado 2025EE207419 del 09/09/2025 frente a la respuesta del Derecho de Petición radicado No. 2025ER187202 (20/08/2025), la autoridad evidenció que se no aportó la totalidad de la documentación solicitada. Por lo anterior, el día 22/09/2025 el Contratista radicó la Acción de Tutela con Radicado No. 3174488, como resultado se concluye que se debe radicar nuevamente la información con la documentación solicitada por la SDA e iniciar un nuevo trámite.

Trazabilidad nuevo trámite permiso de aprovechamiento forestal:

El día 04/11/2025 el Consorcio Infraestructura Siberia envió Informe Transmisión No. 1310 en el cual remite el radicado 2025ER260592 (04/11/2025) ante la SDA, para solicitud del trámite para el permiso de aprovechamiento forestal, Poda Controlada cuatro (4) individuos arbóreos: S-8 (Jazmin), S-30 (Sauco), S-36 (Sauco) y S-45 (Sauco).

En informe de Transmisión No. 1649 (CIS): el Contratista envió el Radicado No. 2025EE276007 del 20/11/2025, respuesta al Radicado SDA 2025ER260592 (04/11/2025) – solicitud de Poda Controlada cuatro (4) individuos arbóreos: S-8 (Jazmin), S-30 (Sauco), S-36 (Sauco) y S-45 (Sauco).

El día 26/11/2025: Se asistió junto con el Contratista a la reunión convocada por los profesionales ambientales y forestales de la SDS, con el fin de revisar la documentación

para los trámites forestales de todos los edificios que conforman el Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

El día 27/11/2025: Por solicitud del Contratista en Derecho de Petición ante la SDA, se programó y llevó a cabo capacitación de los formatos para el trámite de aprovechamiento forestal, en la cual asistió la profesional ambiental del Contratista y la Interventoría.



Ilustración AMB 52. Verificación de protección arbórea



Ilustración AMB 53. Verificación de protección arbórea



Ilustración AMB 54. Verificación de protección arbórea



Ilustración AMB 55. Verificación de protección arbórea



Ilustración AMB 56. Verificación de protección arbórea



Ilustración AMB 57. Verificación de protección arbórea

Fuente: CONSORCIO RYU-GD PATRIMONIAL

- **Permiso de publicidad exterior visual – PEV**

Registro: No se requiere "Registro": Notificación 479-GDP-CC01-071 (05/05/2025) al Ministerio de las Culturas según lo informado por la SDA (Acuerdo Distrital 927 de 2024 en el Artículo 227).

Arte de la valla: La Valla fue instalada por el Contratista el día 23/07/2025.

5.3 Charlas y Capacitaciones

El día 28/11/2025 se llevó a cabo capacitación ambiental sobre la socialización de los aspectos e impactos ambientales relacionados en el Plan de Manejo Ambiental, de igual manera se socializa la ficha de datos de seguridad de la Cal apagada.



Ilustración AMB 76. Capacitación ambiental – Contratista



Ilustración AMB 77. Capacitación ambiental – Contratista

Fuente: CONSORCIO RYU-GD PATRIMONIAL

5.4 Reuniones

- Acta de reunión No. 33 - HSJD-CRP-SIB-AC-AMB-33-2025.11.13: Se solicitó al Contratista retirar el material que se encuentra sobre la protección del árbol, gestionar el retiro de ladrillos y mejorar el acopio de estos. De igual manera, mejorar las protecciones de tres (3) individuos arbóreos. Se requiere realizar jornada de orden y aseo en algunas áreas colindantes al edificio, recolección de residuos y acopiar la madera. En lo que respecta a las actividades de limpieza y retiro de polvo se solicitó realizar humectación previa, para evitar la dispersión de material particulado al ambiente. Así mismo se solicitó gestionar el retiro de RCD y cumplir con las metas de aprovechamiento y circularidad establecidos en el Decreto 507 de 2023.
- Acta de reunión No. 34 - HSJD-CRP-SIB-AC-AMB-34-2025.11.21: Se inicia con la revisión del informe mensual V1. El día 19/11/2025 y se da por terminada la revisión el día 21/11/2025. Se recuerda al Contratista subir al CDE el informe mensual, en las fechas establecidas en el comunicado TC-191-344-2025 enviado por el contratista el pasado 24 de julio del presente año. Lo anterior por cuanto se

cargó el día 18/11/2025 las carpetas ambientales, tener en cuenta que para el día 16 de cada mes, este informe debe estar debidamente aprobado por esta Interventoría, ya que es uno de los anexos que se le deben presentar al Ministerio de las Culturas, en consecuencia, esta situación afecta a la Interventoría por cuanto condiciona la aprobación del informe mensual entregado al Cliente.

- Acta de reunión No. 35 - HSJD-CRP-SIB-AC-AMB-35-2025.11.21: Se dejó establecido el procedimiento para el manejo del ladrillo desmontado en cuanto a la donación de ladrillos a otros proyectos del complejo hospitalario, además se solicitó dar prioridad al uso de ladrillos dentro del edificio Siberia.

5.5 Evaluación mensual al Contratista en Gestión Ambiental

A continuación, se detalla los porcentajes obtenidos de la calificación ambiental en cada semana de acuerdo con el formato 479-FT-HSEQ-13 Calificación Gestión SSTAS Contratista V0.

Gráfico 8. Calificación mensual Contratista Ambiental



Fuente: Elaboración propia

Observaciones: Se realizó la gestión de retiro de RCD, sin embargo, sigue pendiente el traslado de los ladrillos del costado occidental hacia el punto de acopio. Se mantienen debidamente protegidos los individuos arbóreos. Se solicita atender oportunamente las observaciones de la SDA Radicado 2025EE276007 del 20/11/2025, respecto a la documentación presentada para la obtención del permiso de aprovechamiento forestal Radicado 2025ER260592 del 04/11/2025. En cuanto a la gestión documental, está pendiente el certificado de actos sancionatorios de Cementos Oriente SAS y Cales Boyacá. Ver **ANEXO 7. CALIFICACIÓN SIBERIA SST-AMB-SOCIAL.**

6. GESTIÓN SOCIAL

A continuación, se describen las actividades de seguimiento adelantadas, en el periodo reportado, por parte de la interventoría, respecto a las actividades efectuadas por el contratista en el componente social en cada uno de sus programas, así:

6.1 Actividades Previas

Valla Informativa

Instalada desde el mes de julio de 2025, para este periodo se tiene que la valla no fue actualizada en la semana del 4 de noviembre al 8 de noviembre de 2025, por ello, el día 10 de noviembre de 2025, la interventoría remite el correo 479-GDP-CC03-560 con la solicitud de dar cumplimiento a la actividad que semanalmente venía ejecutando el contratista. En esta misma fecha el contratista remite en respuesta el oficio TC-291-344/2025 en el que reportan que ya se había procedido con la actividad.



Ilustración SOC 1. Valla actualizada



Ilustración SOC 2. Valla actualizada

Fuente: CONSORCIO RYU-GD PATRIMONIAL

6.2 Programa De Comunicación, Divulgación E Información

Piezas Comunicativas

En cuanto a **volante de inicio**, para este periodo, se tiene que después de algunos impases con el proveedor, el día 20 de noviembre de 2025 el contratista recibe las piezas y el día 24 de noviembre procede con la distribución de las mismas, en los predios de comunidad aledaña y otras fueron distribuidas en los PSI.

Se distribuyen en total 52 volantes de inicio en predios y en los sitios en donde se ubican los puntos satélites.



Ilustración SOC 3. Distribución de Volantes de inicio



Ilustración SOC 4. Distribución de Volantes de inicio

Fuente: CONSORCIO RYU-GD PATRIMONIAL

Punto satélite de información-PSI:

En cuanto a los dos (2) puntos satélites, para este periodo se tiene que el contratista el día 25 de noviembre de 2025, realizó la actualización de los dos (2) PSI con la fijación del volante informativo de inicio de actividades de obra, igualmente dejaron piezas para la comunidad aledaña de estos dos puntos pueda obtener información del proyecto.



Ilustración SOC 5. Actualización de PSI administración Unidad Residencial



Ilustración SOC 6. Actualización PSI portería norte Unidad Residencial



Ilustración SOC 7. Actualización PSI panadería

Fuente: CONSORCIO RYU-GD PATRIMONIAL

6.3 Programa De Participación

Comité de Acompañamiento Ciudadano- CAC

Teniendo en cuenta la importancia de la planeación necesaria de la sesión CAC efectuada el día 4 de diciembre, se llevó a cabo el día 11 de noviembre de 2025, reunión virtual en conjunto con la profesional social de obra y el Coordinador social del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, en este espacio se acuerda que al interior del contratista plantearán los temas y plasmarán la información en una presentación que deberán remitir con antelación para revisión de la interventoría en conjunto con la coordinación social y supervisión técnica de la entidad.

En este sentido, el día 21 de noviembre se remite al contratista el correo electrónico 479-GDP-CC03-580 Solicitud Presentación para sesión CAC, en el cual se especifican aspectos como tiempo estimado para la presentación, número de diapositivas y fecha límite de entrega de la presentación, en respuesta el contratista propone mediante correo

electrónico del 24 de noviembre de 2025, una mesa de trabajo presencial para el día 25 de noviembre de 2025.

En consecuencia, el día 25 de noviembre de 2025, se efectúa esta mesa de trabajo entre las profesionales sociales de obra e interventoría, en este espacio se revisa la propuesta inicial del contratista sobre los temas e información a presentar en la sesión con la comunidad. Inicialmente, el contratista propone dar a conocer el estado de avance en el componente de arqueología, no obstante y dada la ausencia del especialista de esa área para esa fecha, el contratista decide que presentará avances en obra desde el componente técnico, avance en los componentes SST, ambiental y social. La interventoría sugiere presentar el tema de las baldosas que se van a poder recuperar en los pisos de ciertas áreas del edificio.

Por otro lado, la profesional de apoyo a la supervisión del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, durante comité de obra No. 41 del 24 de noviembre de 2025, indica que remitirá correo electrónico respecto a refrigerios a suministrar en sesiones con comunidad.

El día 25 de noviembre de 2025, la profesional de apoyo a la supervisión remite correo electrónico con lineamientos sobre actividades no autorizadas, entre otras, actividades como rifas, juegos, integraciones, celebraciones de fin de año, o cualquier otra que no corresponda a las obligaciones contractuales. En este sentido, se aclara que no está permitido gestionar, con cargo a los contratos, refrigerios y/o almuerzos para actividades que se encuentren por fuera de su alcance. A fin de solicitar claridad en cuanto al suministro de refrigerios, la interventoría remite en esta misma fecha correo electrónico 479-GDP-CC01-297, como respuesta a la entidad, dejando claro que el tema de suministro de refrigerios es contractual según lo establecido en el numeral 6.4.12.1 del

anexo técnico del contrato de obra y que la interventoría quedaba a la espera de directrices.

Por su parte la entidad, en esta misma fecha, desde la coordinación social remite correo electrónico, en el cual refieren que la disposición de refrigerios en el marco de las reuniones de inicio y avance, socializaciones y capacitaciones a la comunidad y en las sesiones del Comité de Acompañamiento Ciudadano están avaladas y son preceptivas en el marco de los contratos de obra.

El día 27 de noviembre de 2025, se participa en la sesión CAC No. 10 a cargo de los edificios Cundifarma y San Roque, en este los profesionales dan a conocer los avances en lo que respecta a dichos edificios.

En cuanto a la presentación, esta fue remitida por el contratista para revisión de la interventoría, se realizan ajustes de forma y avalada por la interventoría y la entidad.

El día 4 de diciembre se lleva a cabo la sesión CAC No. 11 a cargo de los edificios Siberia e Instituto Materno Infantil, en esta reunión participan los integrantes del comité de acompañamiento ciudadano. Los profesionales del edificio Siberia dan a conocer los aspectos relevantes a la comunidad, en lo que respecta a las áreas técnica, SST, ambiental y social.



Ilustración SOC 5. Sesión No. 10 Comité acompañamiento ciudadano edificios San Roque -Cundifarma

Fuente: CONSORCIO RYU-GD PATRIMONIAL

6.4 Programa de atención al Ciudadano

Punto de Atención A la Ciudadanía- PAC

Durante el periodo reportado, la interventoría realizó seguimiento a la atención del Punto PAC por parte de la profesional social de obra durante los días martes de 9:00 am a 12: 00 m y viernes de 1: 00 pm a 4:00 pm, correspondiente a las siguientes fechas: 7 de noviembre, 11 de noviembre, 14 de noviembre, 18 de noviembre, 21 de noviembre, 25 de noviembre, 28 de noviembre, 2 de diciembre y 5 de diciembre de 2025.

Dada la solicitud de la coordinación social del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, el día 25 de noviembre de 2025 se remite al correo de la coordinación los certificados de ARL de las profesionales sociales de obra e interventoría para tramitar el acceso a las instalaciones del PAC para el mes de diciembre de 2025.

PQRSD

Durante este periodo el contratista no recibió PQRSD. A la fecha el proyecto solo ha recibido una, correspondiente a la peticionaria Diana Paola Guerrero, a quien el Ministerio de las Culturas, le emitió comunicado el día 6 de noviembre de 2025.

6.5 Programa De Contratación De Mano De Obra De La Región (No Calificada Y Calificada):

Mano de Obra no Calificada de la Región- MONCR

Para el presente periodo a reportar, comprendido entre el 7 de noviembre y el 6 de diciembre de 2025, según verificación del listado de personal en mesa de trabajo con la profesional social de obra, en dicho periodo hubo un total de 35 personas MONC, de los cuales 33 corresponden a MONCR equivalente a un 94%, superando el 50% establecido contractualmente, 32 de estas personas corresponden a hombres y 3 son mujeres, porcentaje de vinculación de mujeres del 8%, con lo cual cumplen con el porcentaje contractual requerido

Mano de obra Calificada -MOC
Cumplimiento del decreto 332 de 2020

Para el presente periodo a reportar, comprendido entre el 7 de noviembre y el 6 de noviembre de 2025, según verificación de listado de personal del contratista, contó con un total de 52 personas vinculadas, de las cuales 14 son mujeres equivalentes a un 26%, superando el 13.8% estipulado en el decreto.

En cuanto a la interventoría, se mantiene el total de 17 personas, de las cuales 8 son mujeres, equivalente a un 47% (sin variación respecto al mes pasado) superando el

13.8% estipulado en el citado decreto.

6.6 Programa De Acompañamiento A Actividades Técnicas Y Sociales En Obra

Actas de vecindad

Nueve (9) actas de vecindad levantadas en meses pasados, cargadas en el CDE en carpeta publicado y en la nube, en la carpeta dispuesta por la coordinación social del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, para consulta de los demás contratistas o de ser el caso de la entidad contratante. Sin novedades para este periodo.

6.7 Programa De Sostenibilidad

Se realizarán (2) dos sesiones pedagógicas; una alcanzado el 50% del avance de la ejecución de obra y otra al finalizar. Los espacios pedagógicos estarán dirigidos a líderes de la zona, comunidad interesada y convocada puerta a puerta y miembros del CAC. Para el presente periodo no aplica dicha actividad.

6.8 Seguimiento

Para este periodo, en el componente social se realizaron mesas de trabajo y reuniones para abordar varios temas, las fechas y los temas tratados se relacionan a continuación:

Reuniones:

7/11/2025 Se realiza mesa de trabajo con la profesional social de obra, con el fin de revisar la información de personal para sustraer el dato de mano de obra no calificada y vinculación de fuerza laboral femenina.

11/11/2025 Se realiza reunión virtual en conjunto con la profesional social de obra y el Coordinador social del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, con el fin de dar reporte de las actividades desarrolladas a la fecha en el marco de los programas del

Plan de Gestión Social, igualmente, se realiza con el fin de planear la sesión CAC del día 4 de diciembre de 2025.

25/11/2025 Se realiza mesa de trabajo con la profesional social de obra, en este espacio se revisa la propuesta inicial del contratista en cuanto a la información a suministrar a la comunidad en sesión de CAC.

28/11/2025 Mesa de trabajo presencial, revisión lista de asistencia de personal de obra, para sustraer los datos de mano de obra no calificada y total de personal femenino, para elaboración de informe mensual del periodo del 7 de noviembre y 6 de diciembre de 2025.

5/12/2025 Comité de seguimiento social con los equipos sociales de las obras e interventorías, sesión liderada por el coordinador social del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes.

Ver anexo 4.

6.9 Evaluación mensual al Contratista en Gestión Social

Calificación: Para el periodo reportado en el presente informe se tiene que las calificaciones por semana fueron las siguientes:

Semana 1 del 3 de noviembre al 8 de noviembre, obteniendo un 100% de cumplimiento.

Semana 2 del 10 de noviembre al 15 de noviembre, obteniendo un 100% de cumplimiento


Semana 3 del 17 de noviembre al 22 de noviembre, obteniendo un 100% de cumplimiento

Semana 4 del 24 de noviembre al 29 de noviembre, obteniendo un 100% de cumplimiento

Para este mes, la calificación promedio es del 100 % de cumplimiento según las actividades e ítems calificables en las cuatro (4) semanas mencionadas anteriormente, por ende el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Las calificaciones fueron socializadas semanalmente con la profesional social del contratista, en las siguientes fechas: 8 de noviembre, 15 de noviembre, 22 de noviembre y 29 de noviembre. **Ver Anexo No. 7**

Gráfico 9. Calificación Social mensual Contratista

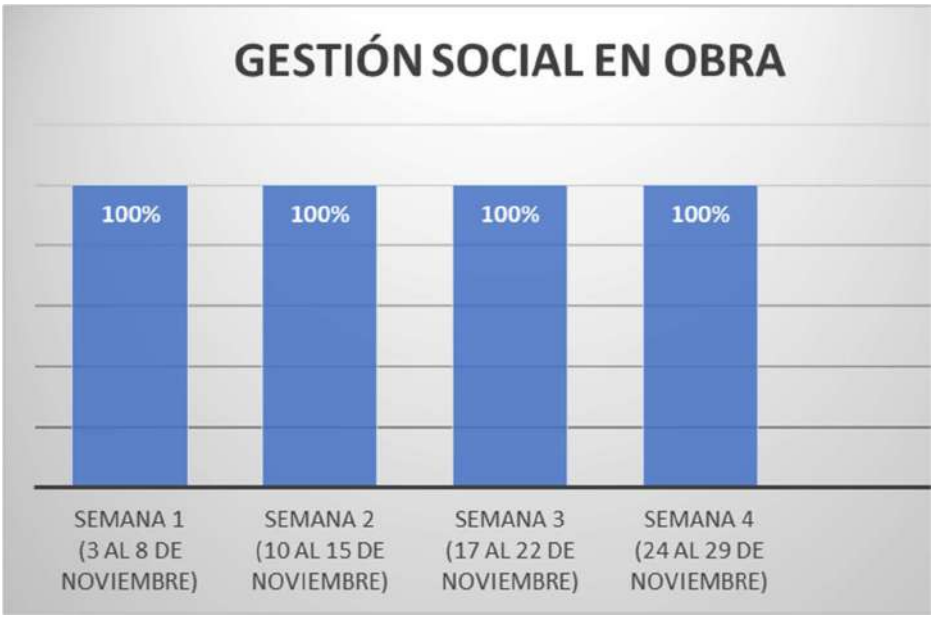

Fuente: Elaboración propia

Observaciones: Desde el componente social para el periodo reportado, se continuó con la ejecución por parte del contratista, de las actividades previstas en los programas del Plan de Gestión Social, en coordinación con los equipos sociales de los demás proyectos del complejo hospitalario San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil, lo que permite la obtención de un resultado óptimo y favorable en cuanto a los indicadores de gestión que

mensualmente se reportan. La calificación social durante las cuatro semanas fue de 100%, acorde con el cumplimiento de las obligaciones contractuales en este componente.

7. INFORMES DE ESPECIALISTAS

7.1 ARQUEOLOGÍA

Durante el periodo objeto de este informe el Componente de Arqueología no tuvo actividades significativas, debido a que, en primer lugar, las labores de registro y monitoreo arqueológico a las obras ya fueron concluidas por parte del Contratista y, segundo, el profesional en arqueología del Contratista no ha podido radicar la segunda versión del Plan de Manejo Arqueológico a espera de confirmación de la tenencia de la colección arqueológica por parte de la Secretaría Distrital de Salud.

Es importante recalcar que el ICANH emitió observaciones a la primera versión del Plan de Manejo Arqueológico radicado por el Contratista de Obra, siendo una de ellas, y la única que falta por ser atendida, los soportes sobre la gestión con la entidad que vaya a encargarse de la tenencia de la colección arqueológica. Según lo solicitado por el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, la entidad encargada sería la Secretaria Distrital de Salud, la cual deberá emitir, mediante oficio, su intención de administrar la tenencia y exponer que cumple con los requerimientos, técnicos, logísticos y operativos que exige el ICANH para tales fines. Esta carta, no obstante, no ha sido recibida hasta el cierre de este informe, imposibilitando al Contratista de Obra adelantar las gestiones correspondientes.

A pesar de que los profesionales en arqueología del Contratista de Obra y de esta Interventoría han mantenido comunicación con el IDPC, indagando sobre este aspecto, no se ha contado con una respuesta satisfactoria.

De esta manera, el componente de arqueología está a la espera de la resolución de esta situación para poder continuar con el adecuado cumplimiento de sus obligaciones contractuales y legales en materia arqueológica.

7.2 MUSEOGRAFÍA

Para el cierre de la etapa de apropiación del proyecto en el componente de Museografía, la Interventoría ha realizado el acompañamiento al Consorcio Infraestructura Siberia por medio de mesas de trabajo en las cuales se han discutido los lineamientos para la construcción de la propuesta a partir de la discusión y consenso de la manera de abordar la vinculación de los hallazgos arqueológicos con la visión del Laboratorio Museo de la Medicina LabMes.

A lo cual se han revisado los productos anexos como la propuesta de guion museográfico y plan de conservación, para la implantación la propuesta museográfica desde una postura de carácter histórico y arquitectónico de relevancia en el edificio Siberia para la presentación de los hallazgos arqueológicos que se encontraron en esta locación.

Así mismo, se ha realizado la revisión de la propuesta museográfica volumen 1 y 2, en donde resta para su conclusión la articulación con las demás especialidades del proyecto para su revisión desde los componentes de diseño y técnico con el fin de prever el desarrollo de la propuesta en una etapa posterior, no correspondiente al alcance del objeto del contrato actual. Adicionalmente, se recibe por parte del Consorcio Siberia el anexo correspondiente al presupuesto que compone todos los elementos de mobiliario y sistema de iluminación museográfica, junto al documento se incluyen dos cotizaciones de proponentes.

7.3 OTRAS ESPECIALIDADES

Los informes de las demás especialidades se encuentran en el Anexo No. 13 del presente informe.

8. IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS

A continuación, se describen los problemas identificados en cada uno de los componentes durante el periodo a reportar.

Tabla 16. Identificación de problemas por componentes

Componente	Descripción
Técnico	- Aún no se termina el reforzamiento estructural del edificio, el tratamiento de las maderas de la estructura de cubierta no se pudo comenzar en este mes de noviembre, los pañetes se están comenzando pero con un solo frente de trabajo. Todas estas actividades son críticas y la no ejecución oportuna, puede retrasar toda la programación de la obra.
Administrativo	- Para este mes el personal encargado del presupuesto por parte del Consorcio Infraestructura Siberia, han compartido los respectivos archivos para una revisión y aprobación con los cambios efectuados en balance y actas, no obstante, se evidencia que el presupuesto y sus anexos, tuvieron hallazgos que generaron atrasos y un constante reproceso en el cierre de dichas tareas.
BIM	- El contratista debe coordinarse de manera que logre cerrar las actas y memorias para corte 2 el cual tiene fecha límite para ser aprobado por el apoyo de la supervisión el 5 de diciembre.

Componente	Descripción
	- Se debe mantener el ritmo de actualización de modelos de obra y también empezar a coordinar con el área técnica del contratista para que la obra genere mayor avance y no atrase el componente BIM. - Las simulaciones 4D deben ser la proyección visual de la programación por lo que se debe seguir avanzando con dicha actividad. - Se debe adelantar la vinculación 5D con los presupuestos de 74 componentes los cuales ya fueron aprobados y llevar el control presupuestal desde el software Arquimedes.
SST	- Para este periodo se presentaron una serie de condiciones inseguras, las cuales pusieron en riesgo la integridad del personal que ejecuta actividades en el proyecto; la interventoría siempre ha sido reiterativa con la solicitud al contratista sobre el cumplimiento en temas de seguridad, además del cumplimiento contractual y así prevenir incidentes y/o accidentes laborales en el edificio; de igual manera, es de aclarar que el no aseguramiento de áreas y espacios pueden acarrear daños a materiales y que a su vez puede generar implicaciones legales y civiles.
AMBIENTAL	- **Porcentaje de aprovechamiento de RCD:** En el presente periodo el Contratista utilizó ladrillos desmontados para

Componente	Descripción
	restitución de muros, sin embargo, se está a la espera de la confirmación de la capacitación con la SDA para la explicación de las metas de aprovechamiento y poder dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 507 de 2023. - **Reporte de RCD:** Se presentaron observaciones a los reportes de RCD entregados por el Contratista (Febrero a Octubre de 2025), se evidencian errores en el diligenciamiento de los formatos, lo cual ha demorado el cargue en la plataforma webfile, por lo cual, el Contratista envió el Informe de transmisión No. 1631 el 17/11/2025 con la subsanación. - **Permiso de aprovechamiento forestal:** A la fecha no se cuenta con el permiso de aprovechamiento forestal, el Contratista envió el Radicado No. 2025EE276007 del 20/11/2025, respuesta al Radicado SDA 2025ER260592 (04/11/2025) – solicitud de Poda Controlada cuatro (4) individuos arbóreos: S-8 (Jazmin), S-30 (Sauco), S-36 (Sauco) y S-45 (Sauco).
SOCIAL	- Pieza informativa inicio de actividades de obra, las demoras e imprevistos con el proveedor encargado de la impresión de dichos volantes, atrasó aún más la distribución de las piezas por parte del contratista.
ARQUEOLOGÍA	- Durante el periodo objeto de este informe el Componente de Arqueología del Contratista de Obra no pudo concluir la subsanación del Plan de Manejo Arqueológico, dado que aún no cuenta con los soportes documentales que demuestren la intención de alguna entidad de encargarse de la tenencia de la colección arqueológica. Esto debido a que no se ha recibido

Componente	Descripción
	oficio de la Secretaría Distrital de Salud manifestando tales intenciones. Así, a pesar de que las intervenciones arqueológicas en el Edificio han sido concluidas, documentalmente no se ha podido cumplir con los requerimientos del ICANH.
MUSEOGRAFÍA	- Articulación de la propuesta museográfica desde los componentes de diseño y técnico con el fin de prever el desarrollo de la propuesta en una etapa posterior, no correspondiente al alcance del objeto del contrato actual. - Articulación de la propuesta museográfica con los guiones curatoriales del Museo de Laboratorio de la Medicina LAbMEs de la Universidad Nacional, y los hallazgos arqueológicos identificados en los espacios 121, 126 y 130.

9. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES

Desde la Interventoría se realizan los siguientes comentarios y recomendaciones para cada uno de los componentes.

Tabla 17. Comentarios y recomendaciones por parte de cada componente de Interventoría

Componente	Descripción
Alcance, costo y tiempo	- Se cuenta con el 32% de ejecución y el 65% del tiempo transcurrido, lo cual sigue siendo preocupante, por lo que se le ha solicitado al contratista de obra, que dé inicio a las actividades de restauración de la estructura de madera

	existente, se finalice el reforzamiento estructural y se ejecute la placa de contrapiso del sótano. - Con base en el presupuesto balanceado, se requiere incluir actividades como el cambio de especificación del manto de cubierta y el cambio propuesta de la madera nueva para la estructura, lo cual servirá para balancear el presupuesto y poder entregar más actividades del alcance para la restauración del edificio. - Durante este mes se presentó el corte No. 1 por avance en las actividades de apropiación y preliminares.
Jurídico	- La Interventoría ha emitido conceptos acerca de las presentación del cambio en la fórmula de amortización del anticipo y el cambio propuesto de la forma de pago, que fue autorizada según otro sí No. 1 al contrato de obra.
Técnico	- Se continúa solicitando al Consorcio Constructor el incremento de frentes de trabajo, al igual que de cuadrillas, tendientes a mejorar los tiempos de ejecución en el reforzamiento estructural del edificio, el tratamiento de las maderas que se van a preservar, y en la ejecución de pañetes.
Administrativo	- Se le recomienda al contratista ser más rigurosos con la información compartida, implementando un plan de revisión previo a la entrega para evitar reprocesos y así poder avanzar en otras actividades.
BIM	- Tal y como se ha dicho en diferentes mesas de trabajo y capacitaciones, cada vez que se generen actualizaciones a documentación que está en revisión ya sea por interventoría o apoyo a la supervisión se debe dar aviso a modo de

	informes de transmisión con el fin de que no se pierda la trazabilidad de la información y los procesos BIM. - En comités BIM ya se ha mencionado la importancia del control de cambios el cual ya se ha visto en el modelo de desagües. Se recomienda que los otros modelos lo actualicen e implementen. - Como se ha mencionado en comités BIM, se recomienda atender las interferencias de especialidades que aún no ejecutan obra con el fin de que dicha solución sea antes de las actividades en campo y no se generan reprocesos
SST	- Durante el presente periodo se mejoraron varias condiciones de seguridad dentro del proyecto, lo que, a su vez evitar accidentes al personal que ejecuta actividades; sin embargo, es de vital importancia reforzar los controles en los entibados del edificio, de igual manera, la implementación de más luminarias dentro de la obra, esto con el fin de garantizar la integridad del personal y el buen avance del proyecto de manera segura. - Se recomienda que los EPCC, sistemas de acceso y demás .que se requieran para realizar actividades de alturas, cuenten con todos los certificados de acuerdo con lo establecido por la Re. 4272 de 2021 y que los mismos sean presentados a la Interventoría el mismo día de ingreso de los elementos a obra, de esta manera, no se genera atrasos en las actividades proyectadas durante la semana.

AMBIENTAL	- Durante el presente periodo el Contratista cumplió con el retiro de RCD, se recomienda garantizar la adecuada clasificación y disposición con los gestores y plantas de tratamiento y aprovechamiento autorizados por la Autoridad Ambiental. - Se recomienda al Contratista hacer la entrega oportuna de los certificados de disposición de RCD y materiales dentro de los primeros 15 días, finalizado el mes de reporte. - Se recomienda dar respuesta oportuna a las observaciones de la SDA referente al permiso de aprovechamiento forestal dentro de los tiempos establecidos, de esta manera evitar que la SDA nuevamente emita desistimiento tácito. - La trazabilidad de la documentación ambiental se ha venido manejando en el CDE, de esta manera se lleva la trazabilidad de la gestión documental del componente ambiental.
SOCIAL	- Retomar los espacios de diálogo ciudadano como son los comités de acompañamiento ciudadano, hacen que la comunidad pueda recibir de primera mano la información en lo que respecta a las obras y el estado de las mismas.
ARQUEOLOGÍA	- Teniendo en cuenta que la figura legal que reglamenta el manejo arqueológico del proyecto es una AIA, en la cual la titularidad es del profesional en arqueología y no del Contratista de Obra, las comunicaciones con el ICANH se efectúan directamente con él. Así, la recomendación de esta Interventoría es que la supervisión técnica del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes mantenga una comunicación interna fluida con el ICANH con el objetivo de

	alinear las necesidades arqueológicas y técnicas del proyecto con la realidad legal y contractual de la AIA al momento de que ese Instituto emita conceptos y aprobaciones sobre los productos arqueológicos del Proyecto. - Es fundamental y urgente que, desde el apoyo a la supervisión técnica del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes se allegue a esta interventoría la información detallada sobre las instancias de la Secretaría Distrital de Salud a las que el Contratista de Obra deberá dirigirse para gestionar la tenencia de la colección arqueológica del Edificio. Con ello se contará con los insumos suficientes para radicar ante el ICANH la segunda versión del Plan de Manejo Arqueológico de los espacios 121, 126 y 130.
MUSEOGRAFÍA	- Teniendo en cuenta que la versión actualizada de la propuesta museográfica ya se encuentra en un estado de cierre, se recomienda obtener respuesta del Ministerio de las Culturas y los Saberes con las observaciones y recomendaciones que tengan de la misma. Para el periodo de este informe se ha solicitado al Consorcio infraestructura Siberia la posibilidad de incluir una tercera cotización al presupuesto que se ha presentado.
SUPERVISIÓN TÉCNICA INDEPENDIENTE	- Durante el periodo se vaciaron elementos de concreto de los muros pantalla y vigas de coronación, columnas del hallazgo arqueológico de la fuente y la cimentación del hallazgo arqueológico de cocinas; para el control de la calidad del concreto se tomaron muestras para ser ensayadas a las edades de 7, 14 y 28 días, además de los testigos; el

	suministro para concretos de 35 MPa fue de 20.50 m3 y 28 MPa de 5.50 m3. De acuerdo con los informes remitidos por Concrelab, para las muestras con edades de 28 días, el promedio de las resistencias para concreto de 35 MPa fue de 143.90% (50.38 MPa), para concreto de 28 MPa fue de 101.05% (28.30 MPa), y para concretos de 21 MPa la resistencia promedio fue de 143.10% (30.05 MPa), concluyendo el cumplimiento de las muestras para la resistencia nominal de diseño de 35 MPa, 28 MPa y 21 MPa, respectivamente.

Bogotá, 15 de diciembre de 2025

SIBERIA

VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS GENERALES PARA EL PAGO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	
Contrato N°	**4383 de 2024**
Contratante	Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes
Contratista	Consorcio RYU-GD PATRIMONIAL
Integrantes	• GUTIERREZ DIAZ S.A.S.: 50% • RESTREPO Y URIBE S.A.S.: 50%
Representante Legal	MARCELA GUTIÉRREZ DÍAZ
Objeto	Contratar la interventoría integral al contrato de obra derivado del proceso de licitación pública MC-LP-007-2024 cuyo objeto es *"Realizar las obras de intervención integral del edificio Siberia que hace parte del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil, en la ciudad de Bogotá D.C., declarado Bien de Interés Cultural del Ámbito Nacional".*
Plazo	16 meses
Valor	$ 2.132.927.797,00
Fecha de inicio	7 de febrero de 2025
Fecha de terminación	6 de junio de 2026

El Consorcio RYU-GD PATRIMONIAL a través del oficio N° 479-GDP-CC01- 301 del 2 de diciembre de 2025, remite al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes el informe mensual N° 10 correspondiente al período del 7 de noviembre al 6 diciembre de 2025, procediendo por parte del equipo de apoyo a la supervisión con su verificación, así como de sus documentos anexos generándose observaciones que fueron trasmitidas mediante incidencia N° 818 del Entorno Común de Datos Autodesk Construction Cloud del 11 de diciembre de 2025, quien procedió a atenderlas a través del informe de trasmisión N° 1829 del 15 de diciembre de 2025.

A continuación, se relacionan los documentos soporte del informe mensual:

N°	**DESCRIPCIÓN**
1	INFORME MENSUAL
	DATOS GENERALES
	ASPECTOS LEGALES POLIZAS
	LICENCIAS Y PERMISOS
	ASPECTOS JURIDICOS
	SEGUIMIENTO PLAN DE CALIDAD
	TRÁMITES DE SERVICIOS PÚBLICOS
	INFORME TÉCNICO
	CONTROL DE PROGRAMACIÓN
	AVANCE DE OBRA


	INFORME ADMINISTRATIVO: COSTOS Y PRESUPUESTO
	INFORME BIM
	SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD EN EL TRABAJO
	INFORME AMBIENTAL
	INFORME SOCIAL
	INFORME DE ESPECIALISTAS
	IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS
	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
2	**DOCUMENTOS ANEXOS DEL INFORME**
	Informe mensual del Contrato de obra
	Planillas de seguridad
	Correspondencia Enviada y Recibida
	Actas de comité
	Cronograma de obra aprobado
	Calificación SST-Ambiental- Social
	Capacitaciones
	Bitácora de Obra
	Informe del anticipo
	Informe supervisión técnica independiente
	Control mensual de lluvias
	Informes técnicos de especialistas
3	**DOCUMENTOS ANEXOS PARA EL PAGO**
	Acta de Pago N° 11
	Factura original
	Certificado de Pago al sistema de salud y Pensión

De acuerdo con lo establecido en la cláusula 7. Forma de Pago del Contrato de Interventoría N° 4383 de 2024, el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes pagará al Consorcio jRYU-GD PATRIMONIAL el acta de pago parcial (Mensual) correspondiente, previo giro del PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

DANIEL RICARDO CEPEDA HERNANDEZ
Coordinador de Obras San Juan de Dios
Dirección de Patrimonio y Memoria

DIANA MARCELA ALVAREZ
Apoyo a la Supervisión
Dirección de Patrimonio y Memoria

CONTRATO DE INTERVENTORÍA NÚMERO 4383-2024
PAGO INTERVENTORÍA 10, PERÍODO DEL 7-FEB-2025 AL 6-OCT-2025
PANTALLAZO DEL CARGUE EN SECOP II

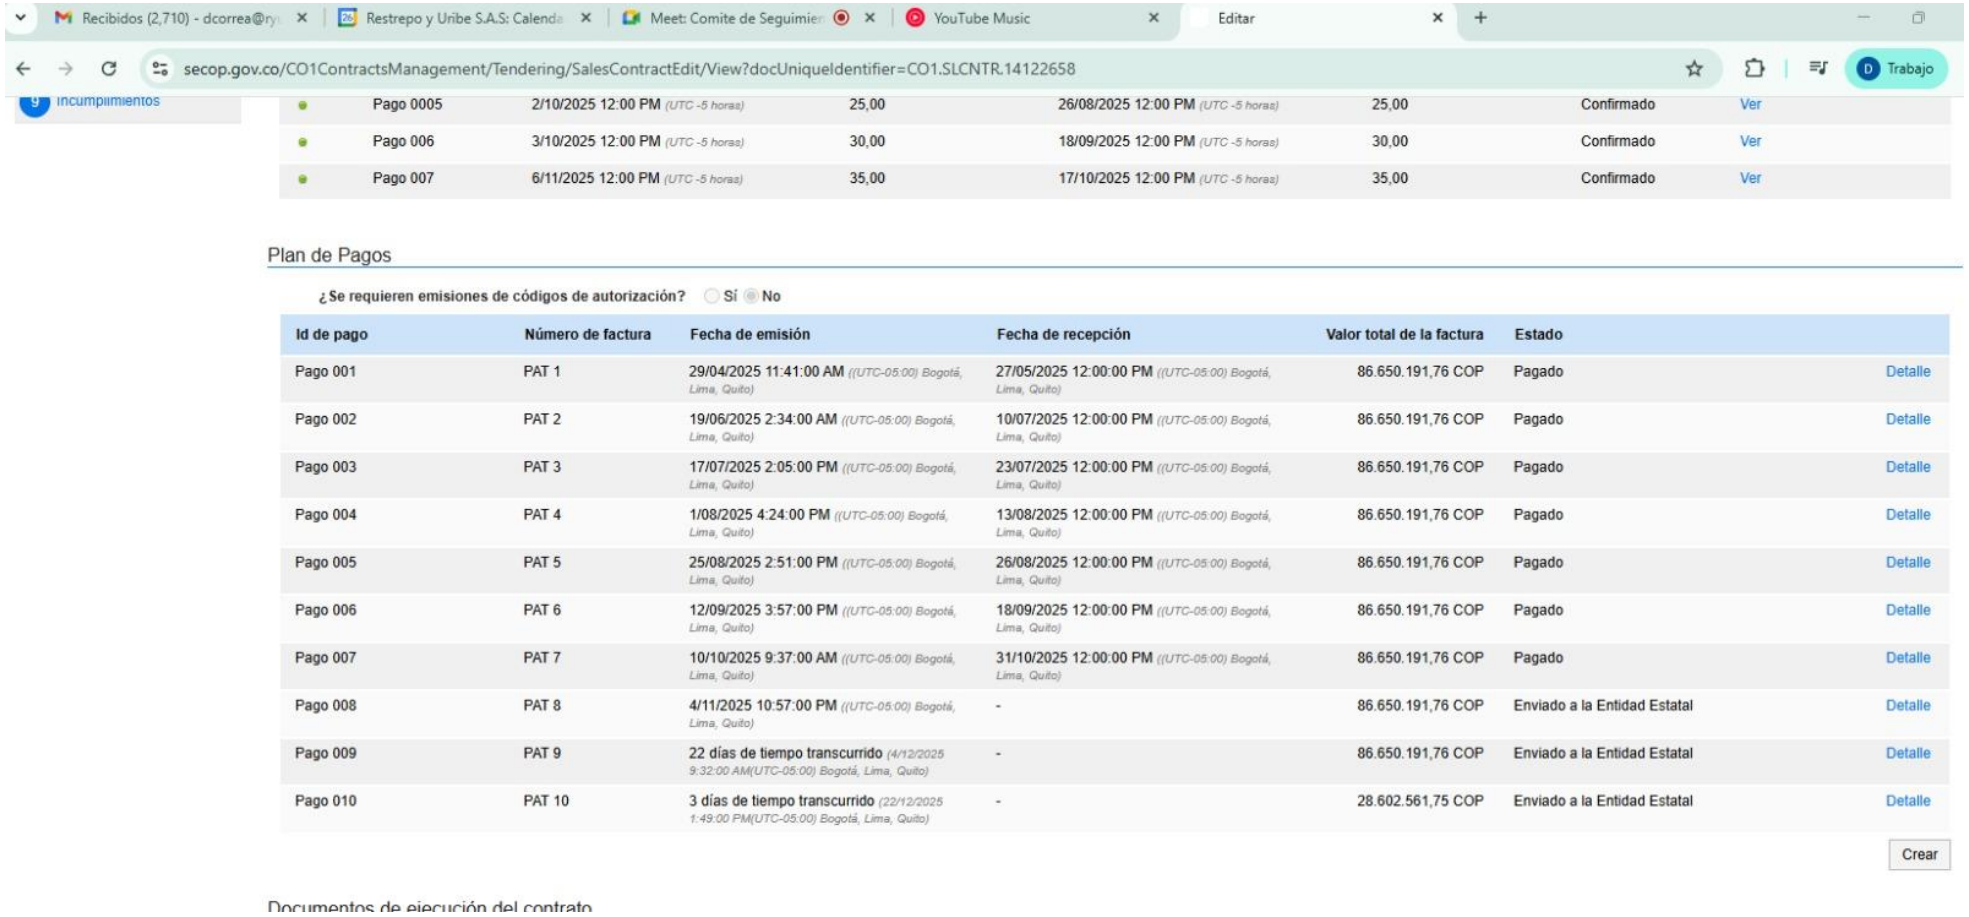

Recibidos (2,710) - dcorrea@ry | Restrepo y Uribe S.A.S: Calenda | Meet: Comite de Seguimier | YouTube Music | Editar

secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/SalesContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.SLCNTR.14122658

Trabajo

Incumplimientos

Pago 0005	2/10/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	25,00	26/08/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	25,00	Confirmado	Ver
Pago 006	3/10/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	30,00	18/09/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	30,00	Confirmado	Ver
Pago 007	6/11/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	35,00	17/10/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	35,00	Confirmado	Ver

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? Sí No

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
Pago 001	PAT 1	29/04/2025 11:41:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	27/05/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	86.650.191,76 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	PAT 2	19/06/2025 2:34:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	10/07/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	86.650.191,76 COP	Pagado	Detalle
Pago 003	PAT 3	17/07/2025 2:05:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	23/07/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	86.650.191,76 COP	Pagado	Detalle
Pago 004	PAT 4	1/08/2025 4:24:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	13/08/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	86.650.191,76 COP	Pagado	Detalle
Pago 005	PAT 5	25/08/2025 2:51:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	26/08/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	86.650.191,76 COP	Pagado	Detalle
Pago 006	PAT 6	12/09/2025 3:57:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	18/09/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	86.650.191,76 COP	Pagado	Detalle
Pago 007	PAT 7	10/10/2025 9:37:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	31/10/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	86.650.191,76 COP	Pagado	Detalle
Pago 008	PAT 8	4/11/2025 10:57:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	86.650.191,76 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 009	PAT 9	22 días de tiempo transcurrido (4/12/2025 9:32:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	86.650.191,76 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 010	PAT 10	3 días de tiempo transcurrido (22/12/2025 1:49:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	28.602.561,75 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle

Crear

Documentos de ejecución del contrato


CONTRATO DE INTERVENTORÍA NÚMERO 4383-2024
PAGO INTERVENTORÍA 10, PERÍODO DEL 7-FEB-2025 AL 6-OCT-2025
PANTALLAZO DEL CARGUE EN SECOP II

Id de pago	Pago 010
Obligado a facturar electrónicamente	Si / No *
CUFE	dc284622d170ac5aebf7fcfd9ee652ccdd37f6fbddbcbe914a6dcb9d4f590291d159073b0bfa9b709d2b850eb5abe17e — Factura validada
	Consultar los detalles de la factura
Número de factura	PAT 10
Fecha de emisión	3 días de tiempo transcurrido *(22/12/2025 1:49:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de vencimiento	5/02/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Valor neto	24.035.766,18 COP Valor antes de IVA
Valor total	28.602.561,75 COP
Notas	Pago 010 Contrato 4383-2024
Fecha de recepción original	4 días de tiempo transcurrido *(22/12/2025 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número de radicación	Pago 010 Contrato 4383-2024

Descripción	Nombre del documento		
Cto 4383-2024_Acta Parcial Interventoría 10_07022025-06102025_Fev PAT 10.pdf	Cto 4383-2024_Acta Parcial Interventoría 10_07022025-06102025_Fev PAT 10.pdf	Descargar	Detalle

Estado	Enviado a la Entidad Estatal

CONTRATO DE INTERVENTORÍA NÚMERO 4383-2024
PAGO INTERVENTORÍA 10, PERÍODO DEL 7-FEB-2025 AL 6-OCT-2025
PANTALLAZO DEL CARGUE EN SECOP II

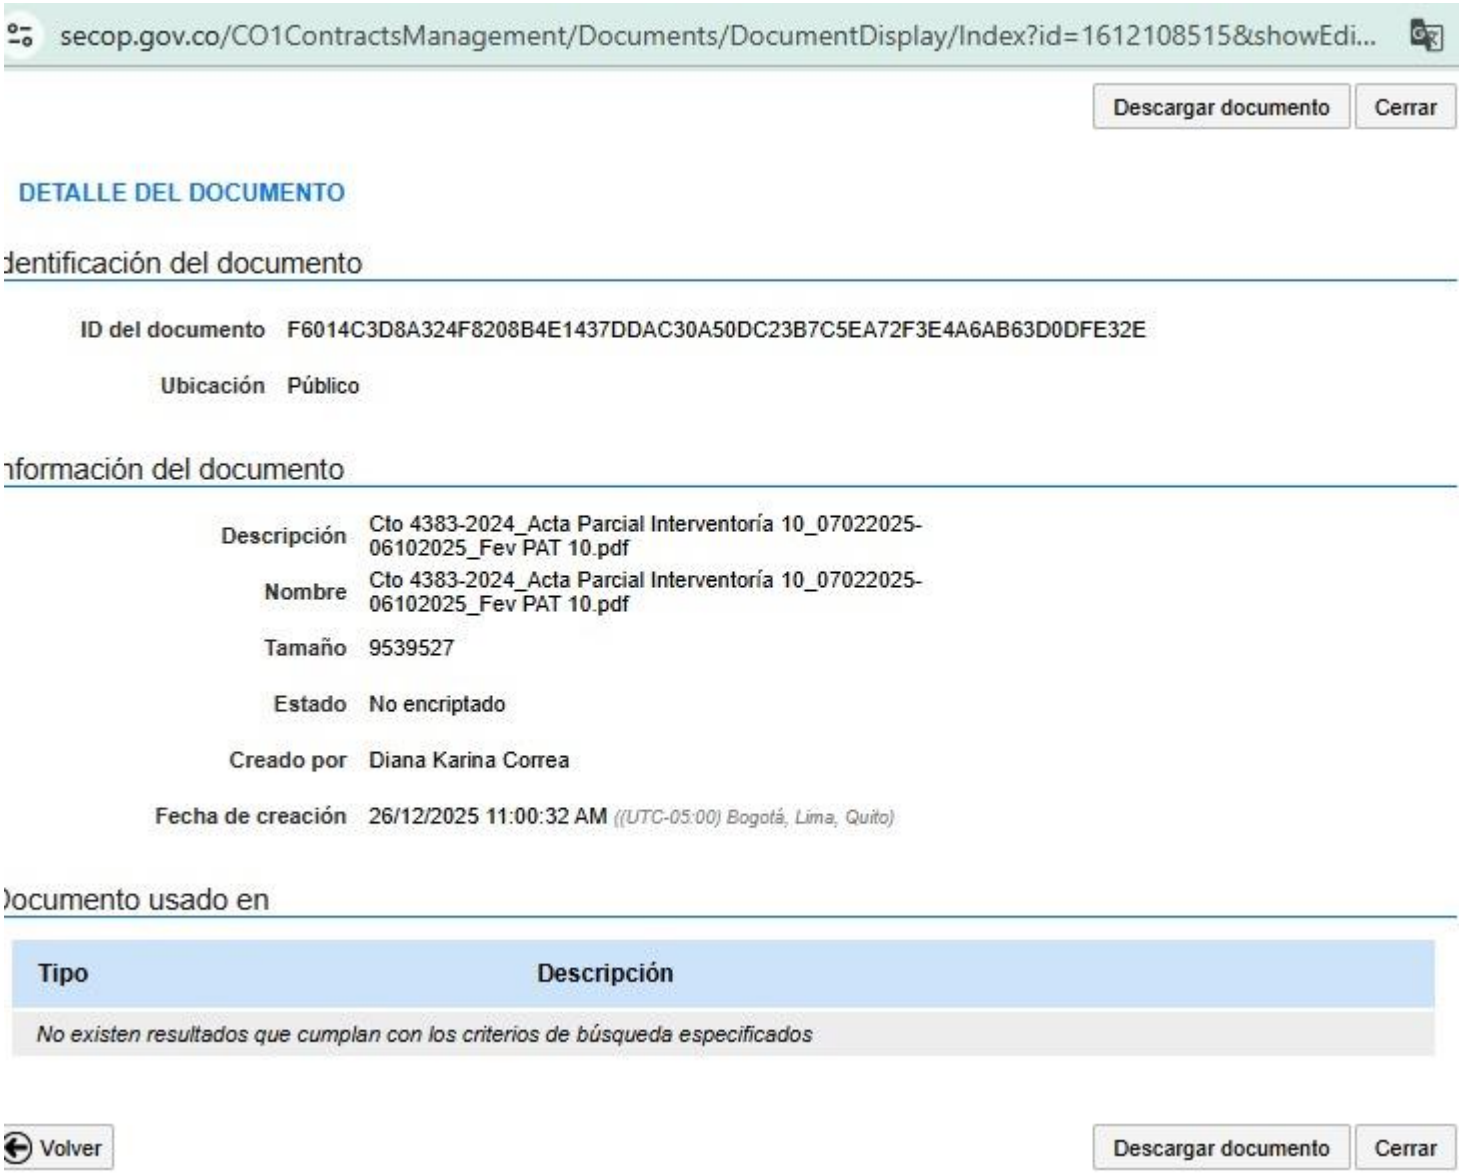

CONSORCIO RYU GD PATRIMONIAL
NIT 901.902.403-4
Calle 95 No. 15 - 47, piso 6
Tel: (601) 66225099 - Ext. 1109
Bogotá - Colombia
contabilidad@ryu.com.co

Factura electrónica de venta
No. PAT 11

Señores	MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES		
NIT	830.034.348-5	**Teléfono**	(601) 3424100
Dirección	Carrera 8 No. 8 - 55, Bogotá D.C.	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	23/12/2025, 10:58
Expedición	23/12/2025, 10:59
Vencimiento	06/02/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto
1	Por concepto del valor del Acta de Pago Parcial de Interventoría Nº 11, causado en desarrollo del Contrato de Interventoría No. 4383-2024 celebrado entre Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y el Consorcio RYU-GD Patrimonial para la Realizar las obras de intervención integral del edificio Siberia que hace parte del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil, en la ciudad de Bogotá D.C., declarado Bien de Interés Cultural del Ámbito Nacional, de acuerdo con el siguiente detalle: 1. VALOR DEL PAGO DE INTERVENTORÍA, INCLUIDO IVA: 1.1 Valor del Pago Fijo Nº 10, del 7 de noviembre al 6 de diciembre de 2025 = $ 86.650.191,76	1.00	72,815,287.19

Total items: 1

Total Bruto	72,815,287.19
IVA 19%	13,834,904.57
Total a Pagar	86,650,191.76

Valor en Letras:
Ochenta y seis millones seiscientos cincuenta mil ciento noventa y un pesos m/cte con setenta y seis cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-02-06 por $ 86,650,191.76

Observaciones:
#$33-01-01;Contrato 4383-2024;morduna@mincultura.gov.co#$

Favor realizar transferencia electrónica a la Cuenta de Corriente número 500299011 del Banco de Bogotá a nombre del CONSORCIO RYU-GD PATRIMONIAL

CONSORCIO RYU-GD PATRIMONIAL, Nit. 901.902.403-4 integrado por: GUTIÉRREZ DIAZ S.A.S., Nit.860.505.064-1, participación 50% y RESTREPO Y URIBE S.A.S., Nit. 860.009.250-6, participación 50%

ALEJANDRO RESTREPO GÓMEZ, Representante Legal Suplente

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764090351254 aprobado en 20250312 prefijo PAT desde el número 1 al 100 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica Tarifa 8.66
CUFE: f4eef07272b905f9e141221cf524e5fc9acf88bb2f01ebb52c7316622a43693aa0b45bd84eb39cd265d3a82e5d540f38

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML
