Gobierno de CALDAS	GOBERNACIÓN DE CALDAS Secretaría de Infraestructura	Hoja No 1 de 1
	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSON, RUTA DEL REMACHIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS	


PLANILLA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSON, RUTA DEL REMACHIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

PLANILLA DE OBRA No:	28 - SOBRANTE 3	FECHA:	31/03/2026
PERIODO:	1 AL 31 DE MARZO DE 2026		
CONTRATO DE OBRA No:	2903202I-1656	CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	1071 DE 2022	INTERVENTORÍA:	MAB INGENIERÍA DE VALOR

ITEM:	37	UNIDAD
673.3.3 T:	MATERIAL DE COBERTURA TIPO SUB- BASE CLASE C INV-20	m3

Abscisa Inicial	Abscisa Final	Largo (m)	Alto (m)	Area (m2)/Ancho (m)	Cantidad	Margen	Descripción
ACTA PARCIAL DE COBRO NO.28							
CUNETAS REGULARES							
K24+500.00	K24+506.00	6.00		0.20	1.20	D	MATERIAL DE COBERTURA
K24+723.00	K24+756.70	31.70		0.20	6.34	D	MATERIAL DE COBERTURA
K24+755.00	K24+772.70	17.70		0.20	3.54	D	MATERIAL DE COBERTURA
K24+880.40	K24+898.60	18.20		0.20	3.64	D	MATERIAL DE COBERTURA
K24+935.70	K24+988.20	52.50		0.20	10.50	D	MATERIAL DE COBERTURA
K25+000.00	K25+017.80	17.80		0.20	3.56	D	MATERIAL DE COBERTURA
CUNETAS IRREGULARES							
K24+500.00	K24+513.00	160.92		0.20	20.00	D	MATERIAL DE COBERTURA
CUNETAS REGULARES							
K25+529.40	K25+543.00	13.60	1.16	0.10	1.58	I	MATERIAL DE COBERTURA
K25+455.20	K25+488.40	32.10	1.16	0.10	3.84	I	MATERIAL DE COBERTURA
K24+637.40	K24+754.00	66.60	1.16	0.10	7.73	I	MATERIAL DE COBERTURA
K24+616.20	K24+666.50	50.30	1.16	0.10	5.85	I	MATERIAL DE COBERTURA
K24+574.40	K24+593.80	19.40	1.16	0.10	2.25	I	MATERIAL DE COBERTURA
K24+557.80	K24+569.40	11.60	1.16	0.10	1.35	I	MATERIAL DE COBERTURA
K24+512.30	K24+555.80	43.50	1.16	0.10	5.07	I	MATERIAL DE COBERTURA
K24+500.00	K24+506.30	6.30	1.16	0.10	1.10	I	MATERIAL DE COBERTURA
CUNETAS IRREGULARES							
K24+553.00	K24+542.71	112.12	1.16	0.12	15.61	I	MATERIAL DE COBERTURA
SUB TOTAL ACTA PARCIAL NO. 28					95.60		



ACTA PARCIAL NO. 1	
ACTA PARCIAL NO. 2	
ACTA PARCIAL NO. 3	
ACTA PARCIAL NO. 4	
ACTA PARCIAL NO. 5	
ACTA PARCIAL NO. 6	
ACTA PARCIAL NO. 7	
ACTA PARCIAL NO. 8	
ACTA PARCIAL NO. 9	
ACTA PARCIAL NO. 10	
ACTA PARCIAL NO. 11	
ACTA PARCIAL NO. 12	
ACTA PARCIAL NO. 13	
ACTA PARCIAL NO. 14	
ACTA PARCIAL NO. 15	
ACTA PARCIAL NO. 16	
ACTA PARCIAL NO. 17	
ACTA PARCIAL NO. 18	
ACTA PARCIAL NO. 19	
ACTA PARCIAL NO. 20	
ACTA PARCIAL NO. 21	
ACTA PARCIAL NO. 22	
ACTA PARCIAL NO. 23	
ACTA PARCIAL NO. 24	
ACTA PARCIAL NO. 25	
ACTA PARCIAL NO. 26	186.3
ACTA PARCIAL NO. 27	**382.0**
ACTA PARCIAL NO. 28	**95.6**
TOTAL ACUMULADO	665.9

ING. SEBASTIAN GOMEZ VERGARA
MAB INGENIERIA DE VALOR
INTERVENTORIA

ING. EDWARD ANDRES SANCHEZ MACIAS
CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA

Gobierno de CALDAS

GOBERNACIÓN DE CALDAS

Secretaría de Infraestructura

Hoja no 1 de 1

MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL REMACHEMENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

ACTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL REMACHEMENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS		
ACTA DE OBRA No:	21° DICIEMBRE	FECHA:	31/03/2024
PERIODO:	1 AL 31 MARZO DE 2024		
CONTRATO DE OBRA No:	2909202-1456	CONTRATISTA	CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	1071 DE 2022	INTERVENTOR	MAB INGENIERIA DE VALOR
ITEM	55		UNIDAD
523.1.2	ANCLAJE PARA REMACHE		M

Abscisa Inicial	Abscisa Final	Largo (m)	Alto (m)	Unidades	Cantidad	Margen	Descripción
ACTA PARCIAL DE COBRO Nº 28							
REMACHES							
K24+880.00	K24+880.00	0.15		40	6.40		Realce de estructura existente
K24+920.00	K24+920.00	0.15		122	18.30		Realce de estructura existente
K24+980.00	K24+980.00	0.15		60	10.20		Realce de estructura existente
K24+985.00	K24+985.00	0.15		139.00	20.85		Realce de estructura existente
K25+080.00	K25+080.00	0.15		54.00	8.10		Realce de estructura existente
K25+317.00	K25+110.00	0.15		24.00	3.60		Realce de estructura existente
K25+310.00	K25+310.00	0.15		20.00	3.00		Realce de estructura existente
K25+360.00	K25+360.00	0.15		44.00	6.60		Realce de estructura existente
K25+460.00	K25+460.00	0.15		24.00	3.60		Realce de estructura existente
K25+540.00	K25+540.00	0.15		28.00	4.20		Realce de estructura existente
K25+650.00	K25+650.00	0.15		22.00	3.30		Realce de estructura existente
K25+840.00	K25+840.00	0.15		22.00	3.30		Realce de estructura existente
K25+980.00	K25+980.00	0.15		22.00	3.30		Realce de estructura existente
K26+080.00	K26+080.00	0.15		66.00	9.90		Realce de estructura existente
K26+242.00	K26+242.00	0.15		44.00	6.60		Realce de estructura existente
K26+360.00	K26+360.00	0.15		44.00	6.60		Realce de estructura existente
K26+440.00	K26+440.00	0.15		44.00	6.60		Realce de estructura existente
K26+580.00	K26+580.00	0.15		24.00	3.60		Realce de estructura existente
Cierre de zanja							
K24+980.00	K24+985.00	0.15		27	4.05	IZQUIERDA	Cierre de zanja estructura nueva
SUB TOTAL ACTA PARCIAL 28				129.3			

ACTA PARCIAL NO. 1	
ACTA PARCIAL NO. 2	
ACTA PARCIAL NO. 3	
ACTA PARCIAL NO. 4	
ACTA PARCIAL NO. 5	
ACTA PARCIAL NO. 6	
ACTA PARCIAL NO. 7	
ACTA PARCIAL NO. 8	
ACTA PARCIAL NO. 9	
ACTA PARCIAL NO. 10	
ACTA PARCIAL NO. 11	
ACTA PARCIAL NO. 12	
ACTA PARCIAL NO. 13	
ACTA PARCIAL NO. 14	
ACTA PARCIAL NO. 15	
ACTA PARCIAL NO. 16	
ACTA PARCIAL NO. 17	0.00
ACTA PARCIAL NO. 18	0.00
ACTA PARCIAL NO. 19	0.00
ACTA PARCIAL NO. 20	0.00
ACTA PARCIAL NO. 21	0.00
ACTA PARCIAL NO. 22	0.00
ACTA PARCIAL NO. 23	0.00
ACTA PARCIAL NO. 24	0.00
ACTA PARCIAL NO. 25	0.00
ACTA PARCIAL NO. 26	0.00
ACTA PARCIAL NO. 27	59.7
ACTA PARCIAL NO. 28	**129.3**
TOTAL ACCUMULADO	189.0

ING. SEBASTIAN GOMEZ TERRANA
MAB INGENIERIA DE VALOR
INTERVENTORIA

ING. EDWARD ANDRES SANCHEZ MACIAS
CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA

Gobernación de CALDAS

GOBERNACIÓN DE CALDAS

Secretaría de Infraestructura

Hoja No 1 de 1

MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA – SONSÓN, RUTA DEL RESARCIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

PLANILLA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN RUTA DEL RESARCIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

PLANILLA DE OBRA No:	28 - 00019480)	FECHA:	31/03/2026
PERIODO:	1 AL 12 DE MARZO 2026		
CONTRATO DE OBRA No:	2950Z1003-1056	CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS MINERAL
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	1071 DE 2022	INTERVENTOR:	VÍAS TERRITORIOS DE VALOR UNITARIO S.A.

ITEM	65					
720.3.3	RENAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SR, SP Y/O SI, TAMAÑO DE LAMINA CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO IV (TIMITE de)					
Abscisa Inicial	Abscisa Final	Largo (m)	Ancho (m)	Junto (m)	Cantidad	Unidad	Descripción
ACTA PARCIAL DE COBRO NO.28							
24+561	24+10				1.00	UNIDAD	Renal vertical en lado de vía
24+550	24+30 (20)				1.00	UNIDAD	Renal vertical en lado de vía
24+560	24+30 (20)				1.00	UNIDAD	Renal vertical en lado de vía
24+560	24+28				1.00	UNIDAD	Renal vertical en lado de vía
24+560	24+26				1.00	UNIDAD	Renal vertical en lado de vía
24+800	24+67				1.00	UNIDAD	Renal vertical en lado de vía
24+800	24+65				1.00	UNIDAD	Renal vertical en lado de vía
24+800	24+30				1.00	UNIDAD	Renal vertical en lado de vía
24+720	24+55				1.00	UNIDAD	Renal vertical en lado de vía
24+660	24+54				1.00	UNIDAD	Renal vertical en lado de vía
24+640	24+45				1.00	UNIDAD	Renal vertical en lado de vía
24+620	24+41				1.00	UNIDAD	Renal vertical en lado de vía
24+540	24+35				1.00	UNIDAD	Renal vertical en lado de vía
24+520	24+04				1.00	UNIDAD	Renal vertical en lado de vía
24+500	24+02				1.00	UNIDAD	Renal vertical en lado de vía
24+360	24+01				1.00	UNIDAD	Renal vertical en lado de vía
24+020	23+93 (2				1.00	UNIDAD	Renal vertical en lado de vía
23+955	23+91				1.00	UNIDAD	Renal vertical en lado de vía
23+880	23+83				1.00	UNIDAD	Renal vertical en lado de vía
23+780	23+69				1.00	UNIDAD	Renal vertical en lado de vía
23+720	23+64				1.00	UNIDAD	Renal vertical en lado de vía
23+640	23+62				1.00	UNIDAD	Renal vertical en lado de vía
23+560	23+55				1.00	UNIDAD	Renal vertical en lado de vía
23+520	23+46				1.00	UNIDAD	Renal vertical en lado de vía
23+480	23+42				1.00	UNIDAD	Renal vertical en lado de vía
23+360	23+40				1.00	UNIDAD	Renal vertical en lado de vía
23+320	23+34				1.00	UNIDAD	Renal vertical en lado de vía
23+280	23+30				1.00	UNIDAD	Renal vertical en lado de vía
23+240	23+23				1.00	UNIDAD	Renal vertical en lado de vía
23+200	23+19				1.00	UNIDAD	Renal vertical en lado de vía
23+160	23+13				1.00	UNIDAD	Renal vertical en lado de vía
23+120	23+10				1.00	UNIDAD	Renal vertical en lado de vía
23+080	23+06				1.00	UNIDAD	Renal vertical en lado de vía
23+040	23+03				1.00	UNIDAD	Renal vertical en lado de vía
23+000	22+99				1.00	UNIDAD	Renal vertical en lado de vía
22+960	22+95				1.00	UNIDAD	Renal vertical en lado de vía
22+920	22+91				1.00	UNIDAD	Renal vertical en lado de vía
22+880	22+87				1.00	UNIDAD	Renal vertical en lado de vía
22+840	22+83				1.00	UNIDAD	Renal vertical en lado de vía
22+800	22+79				1.00	UNIDAD	Renal vertical en lado de vía
22+760	22+75				1.00	UNIDAD	Renal vertical en lado de vía
22+720	22+71				1.00	UNIDAD	Renal vertical en lado de vía
22+680	22+67				1.00	UNIDAD	Renal vertical en lado de vía
22+640	22+63				1.00	UNIDAD	Renal vertical en lado de vía
22+600	22+59				1.00	UNIDAD	Renal vertical en lado de vía
22+560	22+55				1.00	UNIDAD	Renal vertical en lado de vía
22+520	22+51				1.00	UNIDAD	Renal vertical en lado de vía
22+480	22+47				1.00	UNIDAD	Renal vertical en lado de vía
22+440	22+43				1.00	UNIDAD	Renal vertical en lado de vía
22+400	22+39				1.00	UNIDAD	Renal vertical en lado de vía
22+360	22+35				1.00	UNIDAD	Renal vertical en lado de vía
22+320	22+31				1.00	UNIDAD	Renal vertical en lado de vía
22+280	22+27				1.00	UNIDAD	Renal vertical en lado de vía
22+240	22+23				1.00	UNIDAD	Renal vertical en lado de vía
22+200	22+19				1.00	UNIDAD	Renal vertical en lado de vía
22+160	22+15				1.00	UNIDAD	Renal vertical en lado de vía
22+120	22+11				1.00	UNIDAD	Renal vertical en lado de vía
22+080	22+07				1.00	UNIDAD	Renal vertical en lado de vía
22+040	22+03				1.00	UNIDAD	Renal vertical en lado de vía
22+000	21+99				1.00	UNIDAD	Renal vertical en lado de vía
21+960	21+95				1.00	UNIDAD	Renal vertical en lado de vía
21+920	21+91				1.00	UNIDAD	Renal vertical en lado de vía
21+880	21+87				1.00	UNIDAD	Renal vertical en lado de vía
21+840	21+83				1.00	UNIDAD	Renal vertical en lado de vía
21+800	21+79				1.00	UNIDAD	Renal vertical en lado de vía
21+760	21+75				1.00	UNIDAD	Renal vertical en lado de vía
21+720	21+71				1.00	UNIDAD	Renal vertical en lado de vía
21+680	21+67				1.00	UNIDAD	Renal vertical en lado de vía
21+640	21+63				1.00	UNIDAD	Renal vertical en lado de vía
21+600	21+59				1.00	UNIDAD	Renal vertical en lado de vía
21+560	21+55				1.00	UNIDAD	Renal vertical en lado de vía
21+520	21+51				1.00	UNIDAD	Renal vertical en lado de vía
21+480	21+47				1.00	UNIDAD	Renal vertical en lado de vía
21+440	21+43				1.00	UNIDAD	Renal vertical en lado de vía
21+400	21+39				1.00	UNIDAD	Renal vertical en lado de vía
21+360	21+35				1.00	UNIDAD	Renal vertical en lado de vía
21+320	21+31				1.00	UNIDAD	Renal vertical en lado de vía
21+280	21+27				1.00	UNIDAD	Renal vertical en lado de vía
21+240	21+23				1.00	UNIDAD	Renal vertical en lado de vía
21+200	21+19				1.00	UNIDAD	Renal vertical en lado de vía
21+160	21+15				1.00	UNIDAD	Renal vertical en lado de vía
21+120	21+11				1.00	UNIDAD	Renal vertical en lado de vía
21+080	21+07				1.00	UNIDAD	Renal vertical en lado de vía
21+040	21+03				1.00	UNIDAD	Renal vertical en lado de vía
21+000	20+99				1.00	UNIDAD	Renal vertical en lado de vía
20+960	20+95				1.00	UNIDAD	Renal vertical en lado de vía
20+920	20+91				1.00	UNIDAD	Renal vertical en lado de vía
20+880	20+87				1.00	UNIDAD	Renal vertical en lado de vía
20+840	20+83				1.00	UNIDAD	Renal vertical en lado de vía
20+800	20+79				1.00	UNIDAD	Renal vertical en lado de vía
20+760	20+75				1.00	UNIDAD	Renal vertical en lado de vía
20+720	20+71				1.00	UNIDAD	Renal vertical en lado de vía
20+680	20+67				1.00	UNIDAD	Renal vertical en lado de vía
20+640	20+63				1.00	UNIDAD	Renal vertical en lado de vía
20+600	20+59				1.00	UNIDAD	Renal vertical en lado de vía
20+560	20+55				1.00	UNIDAD	Renal vertical en lado de vía
20+520	20+51				1.00	UNIDAD	Renal vertical en lado de vía
20+480	20+47				1.00	UNIDAD	Renal vertical en lado de vía
20+440	20+43				1.00	UNIDAD	Renal vertical en lado de vía
20+400	20+39				1.00	UNIDAD	Renal vertical en lado de vía
20+360	20+35				1.00	UNIDAD	Renal vertical en lado de vía
20+320	20+31				1.00	UNIDAD	Renal vertical en lado de vía
20+280	20+27				1.00	UNIDAD	Renal vertical en lado de vía
20+240	20+23				1.00	UNIDAD	Renal vertical en lado de vía
20+200	20+19				1.00	UNIDAD	Renal vertical en lado de vía
20+160	20+15				1.00	UNIDAD	Renal vertical en lado de vía
20+120	20+11				1.00	UNIDAD	Renal vertical en lado de vía
20+080	20+07				1.00	UNIDAD	Renal vertical en lado de vía
20+040	20+03				1.00	UNIDAD	Renal vertical en lado de vía
20+000	19+99				1.00	UNIDAD	Renal vertical en lado de vía
19+960	19+95				1.00	UNIDAD	Renal vertical en lado de vía
19+920	19+91				1.00	UNIDAD	Renal vertical en lado de vía
19+880	19+87				1.00	UNIDAD	Renal vertical en lado de vía
19+840	19+83				1.00	UNIDAD	Renal vertical en lado de vía
19+800	19+79				1.00	UNIDAD	Renal vertical en lado de vía
19+760	19+75				1.00	UNIDAD	Renal vertical en lado de vía
19+720	19+71				1.00	UNIDAD	Renal vertical en lado de vía
19+680	19+67				1.00	UNIDAD	Renal vertical en lado de vía
19+640	19+63				1.00	UNIDAD	Renal vertical en lado de vía
19+600	19+59				1.00	UNIDAD	Renal vertical en lado de vía
19+560	19+55				1.00	UNIDAD	Renal vertical en lado de vía
19+520	19+51				1.00	UNIDAD	Renal vertical en lado de vía
19+480	19+47				1.00	UNIDAD	Renal vertical en lado de vía
19+440	19+43				1.00	UNIDAD	Renal vertical en lado de vía
ACTA PARCIAL NO. 28					70.0		

ACTA PARCIAL NO. 1	
ACTA PARCIAL NO. 2	
ACTA PARCIAL NO. 3	
ACTA PARCIAL NO. 4	
ACTA PARCIAL NO. 5	
ACTA PARCIAL NO. 6	
ACTA PARCIAL NO. 7	
ACTA PARCIAL NO. 8	
ACTA PARCIAL NO. 9	
ACTA PARCIAL NO. 10	
ACTA PARCIAL NO. 11	
ACTA PARCIAL NO. 12	
ACTA PARCIAL NO. 13	
ACTA PARCIAL NO. 14	
ACTA PARCIAL NO. 15	
ACTA PARCIAL NO. 16	
ACTA PARCIAL NO. 17	
ACTA PARCIAL NO. 18	
ACTA PARCIAL NO. 19	
ACTA PARCIAL NO. 20	
ACTA PARCIAL NO. 21	
ACTA PARCIAL NO. 22	
ACTA PARCIAL NO. 23	
ACTA PARCIAL NO. 24	
ACTA PARCIAL NO. 25	
ACTA PARCIAL NO. 26	
ACTA PARCIAL NO. 27	
ACTA PARCIAL NO. 28	**70.0**
TOTAL ACUMULADO	70.0

ING. SEBASTIAN GOMEZ VERGARA
VIAS TERRITORIOS DE VALOR
INTERVENTORIA

ING. EDWARD ANDRES SANCHEZ MATIAS
CONSORCIO VIAS MINERAL
CONTRATISTA

Gobernación de Caldas

Secretaría de Infraestructura

Hoja No 1 de 1

MEJORAMIENTO DE LA VIA DORADA - GUARIN, ENTRE EL ASENTAMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

PLANILLA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA VIA DORADA - GUARIN, ENTRE EL ASENTAMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

PLANILLA DE OBRA No:	28- SEPTIMO 7	FECHA:	31/08/2026
PERIODO:	1 AL 31 DE AGOSTO 2026		
CONTRATO DE OBRA No:	1333-2021 2456	CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS MIGUEL
CONTRATO DE INTERVENTORIA No:	2071 DE 2022	INTERVENTOR:	UNA INGENIERIA DE VALOR

ITEM	01	UNIDAD
758.3.5	SEÑAL VERTICAL DE VELOCIDAD TIPO PREVENTIVA DELINEADOR DE CURVA HORIZONTAL SV-35. REFLECTIVO TIPO IV (TERCERO).	M

Abscisa Inicial	Abscisa Final	Largo (m)	Ancho (m)	Area (m)	Cantidad	Marcas	Descripción
ACTA PARCIAL DE COBRO NO.28							
24+810	DCH X 2				2.00	DCH(2.0)	Señal Vertical en Borde de Via
24+680	DCH X 2				2.00	DCH(2.0)	Señal Vertical en Borde de Via
24+630	DCH X 2				2.00	DCH(2.0)	Señal Vertical en Borde de Via
24+700	DCH X 2				2.00	DCH(2.0)	Señal Vertical en Borde de Via
24+720	DCH X 2				2.00	DCH(2.0)	Señal Vertical en Borde de Via
24+730	DCH X 2				2.00	DCH(2.0)	Señal Vertical en Borde de Via
24+740	DCH X 2				2.00	DCH(2.0)	Señal Vertical en Borde de Via
24+750	DCH X 2				2.00	DCH(2.0)	Señal Vertical en Borde de Via
24+760	DCH X 2				2.00	DCH(2.0)	Señal Vertical en Borde de Via
24+840	DCH X 2				2.00	DCH(2.0)	Señal Vertical en Borde de Via
24+870	DCH X 2				2.00	DCH(2.0)	Señal Vertical en Borde de Via
24+880	DCH X 2				2.00	DCH(2.0)	Señal Vertical en Borde de Via
24+950	DCH X 2				2.00	DCH(2.0)	Señal Vertical en Borde de Via
24+970	DCH X 2				2.00	DCH(2.0)	Señal Vertical en Borde de Via
24+990	DCH X 2				2.00	DCH(2.0)	Señal Vertical en Borde de Via
25+010	DCH X 2				2.00	DCH(2.0)	Señal Vertical en Borde de Via
25+030	DCH X 2				2.00	DCH(2.0)	Señal Vertical en Borde de Via
25+050	DCH X 2				2.00	DCH(2.0)	Señal Vertical en Borde de Via
25+070	DCH X 2				2.00	DCH(2.0)	Señal Vertical en Borde de Via
25+090	DCH X 2				2.00	DCH(2.0)	Señal Vertical en Borde de Via
25+110	DCH X 2				2.00	DCH(2.0)	Señal Vertical en Borde de Via
25+130	DCH X 2				2.00	DCH(2.0)	Señal Vertical en Borde de Via
25+150	DCH X 2				2.00	DCH(2.0)	Señal Vertical en Borde de Via
25+170	DCH X 2				2.00	DCH(2.0)	Señal Vertical en Borde de Via
25+190	DCH X 2				2.00	DCH(2.0)	Señal Vertical en Borde de Via
25+210	DCH X 2				2.00	DCH(2.0)	Señal Vertical en Borde de Via
25+230	DCH X 2				2.00	DCH(2.0)	Señal Vertical en Borde de Via
25+250	DCH X 2				2.00	DCH(2.0)	Señal Vertical en Borde de Via
25+270	DCH X 2				2.00	DCH(2.0)	Señal Vertical en Borde de Via
25+290	DCH X 2				2.00	DCH(2.0)	Señal Vertical en Borde de Via
25+310	DCH X 2				2.00	DCH(2.0)	Señal Vertical en Borde de Via
25+330	DCH X 2				2.00	DCH(2.0)	Señal Vertical en Borde de Via
25+350	DCH X 2				2.00	DCH(2.0)	Señal Vertical en Borde de Via
25+370	DCH X 2				2.00	DCH(2.0)	Señal Vertical en Borde de Via
25+390	DCH X 2				2.00	DCH(2.0)	Señal Vertical en Borde de Via
25+410	DCH X 2				2.00	DCH(2.0)	Señal Vertical en Borde de Via
25+430	DCH X 2				2.00	DCH(2.0)	Señal Vertical en Borde de Via
25+450	DCH X 2				2.00	DCH(2.0)	Señal Vertical en Borde de Via
25+470	DCH X 2				2.00	DCH(2.0)	Señal Vertical en Borde de Via
25+490	DCH X 2				2.00	DCH(2.0)	Señal Vertical en Borde de Via
25+510	DCH X 2				2.00	DCH(2.0)	Señal Vertical en Borde de Via
25+530	DCH X 2				2.00	DCH(2.0)	Señal Vertical en Borde de Via
25+550	DCH X 2				2.00	DCH(2.0)	Señal Vertical en Borde de Via
25+570	DCH X 2				2.00	DCH(2.0)	Señal Vertical en Borde de Via
25+590	DCH X 2				2.00	DCH(2.0)	Señal Vertical en Borde de Via
25+610	DCH X 2				2.00	DCH(2.0)	Señal Vertical en Borde de Via
25+630	DCH X 2				2.00	DCH(2.0)	Señal Vertical en Borde de Via
25+650	DCH X 2				2.00	DCH(2.0)	Señal Vertical en Borde de Via
25+670	DCH X 2				2.00	DCH(2.0)	Señal Vertical en Borde de Via
25+690	DCH X 2				2.00	DCH(2.0)	Señal Vertical en Borde de Via
25+710	DCH X 2				2.00	DCH(2.0)	Señal Vertical en Borde de Via
25+730	DCH X 2				2.00	DCH(2.0)	Señal Vertical en Borde de Via
25+750	DCH X 2				2.00	DCH(2.0)	Señal Vertical en Borde de Via
25+770	DCH X 2				2.00	DCH(2.0)	Señal Vertical en Borde de Via
25+790	DCH X 2				2.00	DCH(2.0)	Señal Vertical en Borde de Via
SUB TOTAL ACTA PARCIAL NO. 28					66.0		

ACTA PARCIAL NO. 1	
ACTA PARCIAL NO. 2	
ACTA PARCIAL NO. 3	
ACTA PARCIAL NO. 4	
ACTA PARCIAL NO. 5	
ACTA PARCIAL NO. 6	
ACTA PARCIAL NO. 7	
ACTA PARCIAL NO. 8	
ACTA PARCIAL NO. 9	
ACTA PARCIAL NO. 10	
ACTA PARCIAL NO. 11	
ACTA PARCIAL NO. 12	
ACTA PARCIAL NO. 13	
ACTA PARCIAL NO. 14	
ACTA PARCIAL NO. 15	
ACTA PARCIAL NO. 16	
ACTA PARCIAL NO. 17	
ACTA PARCIAL NO. 18	
ACTA PARCIAL NO. 19	
ACTA PARCIAL NO. 20	
ACTA PARCIAL NO. 21	
ACTA PARCIAL NO. 22	
ACTA PARCIAL NO. 23	
ACTA PARCIAL NO. 24	
ACTA PARCIAL NO. 25	
ACTA PARCIAL NO. 26	
ACTA PARCIAL NO. 27	
ACTA PARCIAL NO. 28	**66.0**
TOTAL ACUMULADO	66.0

ING. SEBASTIAN OCHOA VERGARA
UNA INGENIERIA DE VALOR
INTERVENTORIA

ING. GERARD ANDRES JARAMILLO MACIAS
CONSORCIO VIAS
CONTRATISTA

GOBERNACIÓN DE CALDAS

Secretaría de Infraestructura

Hoja No 1 de 1

MEJORAMIENTO DE LA VIA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

PLANILLA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA VIA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS		
PLANILLA DE OBRA No:	28 SUBTRAMO 3	FECHA:	31/03/2026
PERIODO:	1 AL 31 DE MARZO 2026		
CONTRATO DE OBRA No:	LP-ZF-004-2023	CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATO DE INTERVENTORIA No:	1371 DE 2023	INTERVENTORIA:	NSR INGENIERIA DE VALOR

ITEM								UNIDAD
3.2	211.1	EXCAVACIÓN DE DERRUMBES						m3
Abscisa Inicial	Abscisa Final	Largo (m)	VIAJES	VOLUMEN (M3)	Expansión	Volumen (m3)	Margen	Descripción
ACTA PARCIAL DE OBRA NO.28								
PK26+700.00	PK26+650.00		1	7,00		7,00	DERECHA	Derrumbe
PK26+600.00	PK26+650.00		1	7,00		7,00	DERECHA	Derrumbe
PK26+600.00	PK26+650.00		2	14,00		14,00	AMBAS MARGEN	Derrumbe
PK26+720.00	PK26+670.00		1	7,00		7,00	DERECHA	Derrumbe
PK26+620.00	PK26+670.00		1	7,00		7,00	AMBAS MARGEN	Derrumbe
SUB TOTAL ACTA PARCIAL NO. 28				42,00				

ACTA PARCIAL NO. 1		0,00
ACTA PARCIAL NO. 2		0,00
ACTA PARCIAL NO. 3		0,00
ACTA PARCIAL NO. 4		0,00
ACTA PARCIAL NO. 5		0,00
ACTA PARCIAL NO. 6		0,00
ACTA PARCIAL NO. 7		0,00
ACTA PARCIAL NO. 8		0,00
ACTA PARCIAL NO. 9		0,00
ACTA PARCIAL NO. 10		0,00
ACTA PARCIAL NO. 11		0,00
ACTA PARCIAL NO. 12		0,00
ACTA PARCIAL NO. 13		0,00
ACTA PARCIAL NO. 14		0,00
ACTA PARCIAL NO. 15		0,00
ACTA PARCIAL NO. 16		0,00
ACTA PARCIAL NO. 17		0,00
ACTA PARCIAL NO. 18		0,00
ACTA PARCIAL NO. 19		0,00
ACTA PARCIAL NO. 20		0,00
ACTA PARCIAL NO. 21		0,00
ACTA PARCIAL NO. 22		29,00
ACTA PARCIAL NO. 23		0,00
ACTA PARCIAL NO. 24		0,00
ACTA PARCIAL NO. 25		0,00
ACTA PARCIAL NO. 26		0,00
ACTA PARCIAL NO. 27		0,00
ACTA PARCIAL NO. 28		**42,00**
TOTAL ACUMULADO		71,0

ING. SEBASTIAN GOMEZ VERGARA
NSR INGENIERIA DE VALOR
INTERVENTORIA

ING. EDWARD ESTEBAN SANCHEZ MACIAS
CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA

Gobierno de CALDAS

DEPARTAMENTO DE CALDAS

Secretaría de Infraestructura

Hoja No 1 de 1

MEJORAMIENTO DE LA VIA DORADA - SONSON, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

PLANILLA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA VIA DORADA – SONSON, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS		
PLANILLA DE OBRA No:	29- SEPTIMO 3	FECHA:	28/03/2024
PERIODO:	1 de 01 de Abril 2024		
CONTRATO DE OBRA No:	APP-CI-004-2023	CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS MILENIO
CONTRATO DE INTERVENTORIA No:	1071 DE 2022	INTERVENTORIA:	VIAS INGENIERIA DE VALOR

ITEM	78	UNIDAD
RE 300.3.2	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE DERRUMBES, MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	m3/KM

Abscisa Inicial	Abscisa Final	DISTANCIA (KM)	CENTRO DE GRAVEDAD	VIAJES	VOLUMEN (M3)	Expansion	Volumen (m3)	Margen	Descripción
ACTA PARCIAL DE COBRO NO.29									
K24+100.00	K39+850.00	14.90	K24+703.05	1	7.00	1.00	104.30	DERECHA	proveniente de derrumbe
K24+810.14	K39+850.00	14.80	K25+016.07	1	7.00	1.00	103.60	DERECHA	proveniente de derrumbe
K24+920.00	K39+850.00	14.70	K25+100.10	1	7.00	1.00	102.90	AMBAS MARGEN	proveniente de derrumbe
K24+720.00	K39+850.00	14.90	K24+720.05	1	7.00	1.00	103.60	DERECHA	proveniente de derrumbe
K24+620.36	K39+850.00	14.90	K24+620.63	1	7.00	1.00	104.30	AMBAS MARGEN	proveniente de derrumbe
SUB TOTAL ACTA PARCIAL NO. 29					420.00				

ACTA PARCIAL NO. 1		0.00
ACTA PARCIAL NO. 2		0.00
ACTA PARCIAL NO. 3		0.00
ACTA PARCIAL NO. 4		0.00
ACTA PARCIAL NO. 5		0.00
ACTA PARCIAL NO. 6		0.00
ACTA PARCIAL NO. 7		0.00
ACTA PARCIAL NO. 8		0.00
ACTA PARCIAL NO. 9		0.00
ACTA PARCIAL NO. 10		0.00
ACTA PARCIAL NO. 11		0.00
ACTA PARCIAL NO. 12		0.00
ACTA PARCIAL NO. 13		0.00
ACTA PARCIAL NO. 14		0.00
ACTA PARCIAL NO. 15		0.00
ACTA PARCIAL NO. 16		0.00
ACTA PARCIAL NO. 17		0.00
ACTA PARCIAL NO. 18		0.00
ACTA PARCIAL NO. 19		0.00
ACTA PARCIAL NO. 20		0.00
ACTA PARCIAL NO. 21		0.00
ACTA PARCIAL NO. 22		0.00
ACTA PARCIAL NO. 23		0.00
ACTA PARCIAL NO. 24		0.00
ACTA PARCIAL NO. 25		0.00
ACTA PARCIAL NO. 26		0.00
ACTA PARCIAL NO. 27		0.00
ACTA PARCIAL NO. 28		**420.00**
TOTAL ACTUTADO		420.0

ING. SEBASTIAN GOMEZ VENGARA
VIAS INGENIERIA DE VALOR
INTERVENTORIA

ING. EDWARD ANDRES CASTORES MACIAS
CONSORCIO VIAS MILENIO
CONTRATISTA

Gobierno de CALDAS

GOBERNACIÓN DE CALDAS

Secretaría de Infraestructura

Hoja No 1 de 1

MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

PLANILLA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

PLANILLA DE OBRA No:	26 - 20817AMO 3	FECHA:	31/03/2026
PERIODO:	2 AL 31 DE MARZO DE 2026		
CONTRATO DE OBRA No:	2530982501656	CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	1371 DE 2022	INTERVENTORÍA:	MAB INGENIERÍA DE VALOR

ITEM	06	UNIDAD
NP630.4.2 T1	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (C) - ESTRIADO EN OBRA TRAMO 1	m3

Abscisa Inicial	Abscisa Final	Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Cantidad	Margen	Descripción
ACTA PARCIAL DE COBRO NO.28							
Realces							
K24+880.00	K24+880.00	1.65	0.39	0.28	0.18	DERECHO	Realces estructuras existentes
K24+880.00	K24+880.00	1.45	0.48	0.28	0.20	IZQUIERDA	Realces estructuras existentes
K24+920.00	K24+920.00	1.65	0.40	0.25	0.16	DERECHO	Realces estructuras existentes
K24+920.00	K24+920.00	1.81	0.43	0.30	0.23	IZQUIERDA	Realces estructuras existentes
K24+980.00	K24+980.00	4.63	0.80	0.30	1.11	IZQUIERDA	Realces estructuras existentes
K24+985.00	K24+985.00	10.90	0.95	0.30	3.11	IZQUIERDA	Realces estructuras existentes
K25+080.00	K25+080.00	1.80	0.43	0.29	0.22	DERECHO	Realces estructuras existentes
K25+080.00	K25+080.00	1.80	0.60	0.30	0.32	IZQUIERDA	Realces estructuras existentes
K25+210.00	K25+110.00	2.81	0.46	0.30	0.25	DERECHO	Realces estructuras existentes
K25+310.00	K25+310.00	1.61	0.48	0.30	0.23	DERECHO	Realces estructuras existentes
K25+360.00	K25+360.00	1.64	0.43	0.30	0.21	DERECHO	Realces estructuras existentes
K25+360.00	K25+360.00	1.83	0.59	0.30	0.21	IZQUIERDA	Realces estructuras existentes
K25+460.00	K25+480.00	1.62	0.48	0.30	0.24	IZQUIERDA	Realces estructuras existentes
K25+480.00	K25+480.00	0.78	0.62	0.30	0.06	IZQUIERDA	Realces estructuras existentes
K25+540.00	K25+540.00	1.27	0.38	0.20	0.07	IZQUIERDA	Realces estructuras existentes
K25+540.00	K25+540.00	1.62	0.42	0.30	0.20	DERECHO	Realces estructuras existentes
K25+650.00	K25+650.00	1.91	0.45	0.29	0.21	DERECHO	Realces estructuras existentes
K25+840.00	K25+840.00	1.78	0.48	0.30	0.21	IZQUIERDA	Realces estructuras existentes
K25+930.00	K25+930.00	1.41	0.48	0.30	0.21	IZQUIERDA	Realces estructuras existentes
K26+080.00	K26+080.00	1.55	0.44	0.20	0.19	DERECHO	Realces estructuras existentes
K26+080.00	K26+080.00	1.83	0.36	0.30	0.27	IZQUIERDA	Realces estructuras existentes
K26+242.00	K26+242.00	1.62	0.34	0.29	0.18	DERECHO	Realces estructuras existentes
K26+242.00	K26+242.00	1.82	0.41	0.30	0.22	IZQUIERDA	Realces estructuras existentes
K26+360.00	K26+360.00	1.80	0.42	0.29	0.22	IZQUIERDA	Realces estructuras existentes
K26+360.00	K26+360.00	1.87	0.40	0.28	0.21	DERECHO	Realces estructuras existentes
K26+440.00	K26+440.00	1.77	0.40	0.30	0.21	IZQUIERDA	Realces estructuras existentes
K26+440.00	K26+440.00	1.60	0.40	0.30	0.19	DERECHO	Realces estructuras existentes
K26+580.00	K26+580.00	1.80	0.20	0.30	0.22	IZQUIERDA	Realces estructuras existentes
cierre de cuneta							
K24+985.00	K24+985.00	0.84	0.60	0.11	0.04	IZQUIERDA	cierre de cuneta a muro existente
Disipadores							
K24+740.00	K24+740.00	0.85	0.27	0.45	0.09		bordillo cuneta entrega
K24+740.00	K24+740.00	0.60	0.17	0.45	0.05		bordillo cuneta entrega
K24+740.00	K24+740.00	1.34	0.42	0.11	0.05		losa de entrega parte 1
K24+740.00	K24+740.00	1.30	0.60	0.11	0.09		losa de entrega parte 2
K24+740.00	K24+740.00	0.60	1.15	0.15	0.27		muro 1
K24+740.00	K24+740.00	0.80	1.16	0.20	0.19		muro 2
K24+740.00	K24+740.00	0.79	0.89	0.15	0.11		muro 3
K24+740.00	K24+740.00	0.91	1.14	0.15	0.18		placa 1
K24+740.00	K24+740.00	0.98	1.05	0.15	0.16		muro 4
K24+740.00	K24+740.00	0.60	0.09	0.15	0.12		placa 2
K25+560.00	K25+560.00	1.26	1.20	0.11	0.17		losa de entrega
K25+560.00	K25+560.00	0.92	0.68	0.20	0.19		muro 1
K25+560.00	K25+560.00	1.27	0.69	0.18	0.16		muro 2
K25+560.00	K25+560.00	1.48	0.97	0.15	0.22		placa 1
K25+560.00	K25+560.00	1.23	0.26	0.15	0.05		muro 3
K25+560.00	K25+560.00	0.63	0.83	0.15	0.07		muro 4
Carcamos							
K24+880.00	K24+880.00	7.92	0.10	0.68	0.36		muro 1
K24+880.00	K24+880.00	6.90	0.10	0.48	0.33		muro 2
K24+880.00	K24+880.00	0.20	0.66	0.10	0.90		Placa 1
K24+880.00	K24+880.00	0.27	0.66	0.10	0.02		Placa 2
K24+950.00	K24+950.00	32.93	0.80	0.10	2.63		losa 1
K24+950.00	K24+950.00	37.83	0.78	0.10	2.95		muro 1
K24+950.00	K24+950.00	32.33	0.30	0.10	0.97		muro 2
K24+950.00	K24+950.00	0.41	0.20	0.10	-0.01		Descuento ventana
K24+950.00	K24+950.00	0.33	0.20	0.10	-0.01		Descuento ventana
K24+950.00	K24+950.00	0.40	0.20	0.10	-0.01		Descuento ventana
K25+540.00	K25+540.00	22.90	0.80	0.10	1.75		Placa
K25+540.00	K25+540.00	10.30	0.70	0.10	1.43		Muro 1
K25+540.00	K25+540.00	3.60	0.70	0.10	0.25		Muro 2
K25+540.00	K25+540.00	3.60	0.70	0.10	0.25		Muro 3
K25+540.00	K25+540.00	19.30	0.52	0.10	0.99		Muro 4
K25+540.00	K25+540.00	18.30	0.50	0.12	0.66		Placa borde via
K25+540.00	K25+540.00	2.97	0.80	0.11	0.17		Placa borde via
K25+540.00	K25+540.00	2.47	1.43	0.11	0.22		Placa borde via
K25+540.00	K25+540.00	0.27	0.40	-0.10	-0.01		Descuento ventana
K25+540.00	K25+540.00	0.25	0.44	-0.10	-0.01		Descuento ventana
K25+540.00	K25+540.00	0.23	0.45	-0.10	-0.01		Descuento ventana
SUB TOTAL ACTA PARCIAL NO. 28					**24.60**		

ACTA PARCIAL NO. 1	0.00
ACTA PARCIAL NO. 2	0.00
ACTA PARCIAL NO. 3	0.00
ACTA PARCIAL NO. 4	0.00
ACTA PARCIAL NO. 5	0.00
ACTA PARCIAL NO. 6	0.00
ACTA PARCIAL NO. 7	0.00
ACTA PARCIAL NO. 8	0.00
ACTA PARCIAL NO. 9	0.00
ACTA PARCIAL NO. 10	0.00
ACTA PARCIAL NO. 11	0.00
ACTA PARCIAL NO. 12	0.00
ACTA PARCIAL NO. 13	0.00

Gobierno de CALDAS	GOBERNACIÓN DE CALDAS Secretaría de Infraestructura MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA – SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS	Hoja No 1 de 1

PRE ACTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA – SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

PRE ACTA DE OBRA No:	26 – SEGUNDO [illegible]	FECHA:	31/03/2024
PERIODO:	[illegible] AL 31 DE MARZO DE 2024		
CONTRATO DE OBRA No:	2022000215458	CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATO DE INTERVENTORIA No:	1071 DE 2022	INTERVENTORIA:	MAS INGENIERIA DE VALOR

ITEM	86	UNIDAD
NP630.4.2 T1	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (C) - PREPARADO EN OBRA TIPO 1	m3

Abscisa Inicial	Abscisa Final	Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Cantidad	Margen	Descripción
					ACTA PARCIAL NO. 14		0.03
					ACTA PARCIAL NO. 15		0.03
					ACTA PARCIAL NO. 16		0.03
					ACTA PARCIAL NO. 17		0.03
					ACTA PARCIAL NO. 18		0.03
					ACTA PARCIAL NO. 19		0.30
					ACTA PARCIAL NO. 20		0.30
					ACTA PARCIAL NO. 21		0.30
					ACTA PARCIAL NO. 22		24.50
					ACTA PARCIAL NO. 23		0.30
					ACTA PARCIAL NO. 24		0.30
					ACTA PARCIAL NO. 25		0.00
					ACTA PARCIAL NO. 26		0.00
					ACTA PARCIAL NO. 27		9.60
					ACTA PARCIAL NO. 28		**24.60**
					TOTAL ACUMULADO		58.7

ING. SEBASTIAN GOMEZ VERGARA
MAS INGENIERIA DE VALOR
INTERVENTORIA

ING. EDWARD ANDRES SANCHEZ MACIAS
CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA

Gobierno de CALDAS

GOBERNACIÓN DE CALDAS

Secretaría de Infraestructura

Hoja No 1 de 1

MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

PREACTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

PREACTA DE OBRA No:	28 - SUBTRAMO 3	FECHA:	31/03/2026
PERIODO:	1 AL 31 DE MARZO DE 2026		
CONTRATO DE OBRA No:	20092021-1456	CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	1071 DE 2022	INTERVENTORÍA:	MAR INGENIERIA DE VALOR

ITEM	89	UNIDAD
NP630.1.7 C)	CONCRETO CICLOPEO RESISTENCIA 21MPa (D) - PREPARADO EN OBRA TRAMO 3	m3

Abscisa Inicial	Abscisa Final	Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Cantidad	Margen	Descripción
ACTA PARCIAL DE OBRA NO.28							
cierres aletas							
K24+985.00	K24+985.00	1.29	0.84	0.24	0.29	DERECHA	cierre aleta
K24+985.00	K24+985.00	1.65	1.48	0.35	0.85	DERECHA	cierre aleta
concreto ciclopeo descole							
K24+820.00	K24+820.00	1.25	0.40	0.11	0.06	DERECHA	Carcamo
K24+880.00	K24+880.00	1.10	0.82	0.12	0.11	DERECHA	Carcamo
Encoles Y Descoles							
K25+180.00	K25+180.00	1.76	0.67	0.11	0.13	DERECHA	concreto ciclopeo encole
K25+180.00	K25+180.00	1.87	1.92	0.11	0.39	DERECHA	concreto ciclopeo encole
K25+180.00	K25+180.00	1.60	0.50	0.12	0.09	DERECHA	concreto ciclopeo encole
K25+180.00	K25+180.00	3.10	2.14	0.11	0.73	DERECHA	concreto ciclopeo encole
K25+180.00	K25+180.00	1.85	3.58	0.13	0.71	DERECHA	concreto ciclopeo encole
K25+440.00	K25+440.00	1.54	1.15	0.11	0.18	DERECHA	concreto ciclopeo encole
K25+720.00	K25+720.00	1.95	1.52	0.11	0.33	DERECHA	concreto ciclopeo encole
K25+720.00	K25+720.00	1.60	1.20	0.11	0.25	DERECHA	concreto ciclopeo encole
K25+730.00	K25+730.00	4.36	2.10	0.11	0.53	DERECHA	descole cuneta
K24+700.00	K24+700.00	3.20	1.20	0.11	0.42	DERECHA	descole cuneta
K26+455.00	K26+455.00	1.42	1.60	0.11	0.25	IZQUIERDA	descole cuneta
SUB TOTAL ACTA PARCIAL NO. 28					5.30		

ACTA PARCIAL NO. 1	
ACTA PARCIAL NO. 2	
ACTA PARCIAL NO. 3	
ACTA PARCIAL NO. 4	
ACTA PARCIAL NO. 5	
ACTA PARCIAL NO. 6	
ACTA PARCIAL NO. 7	
ACTA PARCIAL NO. 8	
ACTA PARCIAL NO. 9	
ACTA PARCIAL NO. 10	
ACTA PARCIAL NO. 11	
ACTA PARCIAL NO. 12	
ACTA PARCIAL NO. 13	
ACTA PARCIAL NO. 14	
ACTA PARCIAL NO. 15	
ACTA PARCIAL NO. 16	
ACTA PARCIAL NO. 17	
ACTA PARCIAL NO. 18	2.70
ACTA PARCIAL NO. 19	
ACTA PARCIAL NO. 20	
ACTA PARCIAL NO. 21	
ACTA PARCIAL NO. 22	
ACTA PARCIAL NO. 23	
ACTA PARCIAL NO. 24	
ACTA PARCIAL NO. 25	
ACTA PARCIAL NO. 26	
ACTA PARCIAL NO. 27	10.0
ACTA PARCIAL NO. 28	**5.3**
TOTAL ACUMULADO	18.0

ING. SEBASTIAN GOMEZ VERGARA
MAR INGENIERIA DE VALOR
INTERVENTORIA

ING. EDWARD ANDRES SANCHEZ MACIAS
CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA

Gobierno de CALDAS	GOBERNACIÓN DE CALDAS Secretaría de Infraestructura	Hoja No 1 de 1
	MEJORAMIENTO DE LA VIA DORADA – SONSON, RUTA DEL RESCATAMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS	

PREACTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA VIA DORADA – SONSON, RUTA DEL RESCATAMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

PREACTA DE OBRA No:	20 - BORRADOR 3	FECHA:	31/03/2026
PERIODO:	1 AL 31 DE MARZO DE 2026		
CONTRATO DE OBRA No:	2019203-1456	CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	1671 DE 2022	INTERVENTORIA:	MGD INGENIERIA DE VALOR

ITEM:	92	UNIDAD
925	CORTE DE PAVIMENTO CON CORTADORA	ML

Abscisa Inicial	Abscisa Final	Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Margen	Total	Descripcion
ACTA PARCIAL DE COBRO N° 20							
K24+500.00	K25+017.80	142.90			IZQUIERDO	142.90	Corte de pavimento para la construcci n de cuneta re ular
K25+529.00	K24+500.30	284.60			IZQUIERDO	284.60	Corte de pavimento para la construcci n de cuneta re ular
K24+500.00	FE	100.02			DERECHO	100.02	Corte de pavimento para la construcci n de cuneta irre ular
K25+563.00	K0+000.00	112.12			IZQUIERDO	112.12	Corte de pavimento para la construcci n de cuneta irre ular
K24+517.00	K24+538.90	21.90			DERECHO	21.90	Corte de pa i ento para construcci n de cazuela
K24+976.00	K24+992.03	32.63			DERECHO	32.63	Corte de pa i ento para construcci n de cazuela
SUB TOTAL ACTA PARCIAL NO. 20					655.30		

ACTA PARCIAL NO. 1	
ACTA PARCIAL NO. 2	
ACTA PARCIAL NO. 3	
ACTA PARCIAL NO. 4	
ACTA PARCIAL NO. 5	
ACTA PARCIAL NO. 6	
ACTA PARCIAL NO. 7	
ACTA PARCIAL NO. 8	
ACTA PARCIAL NO. 9	
ACTA PARCIAL NO. 10	
ACTA PARCIAL NO. 11	
ACTA PARCIAL NO. 12	
ACTA PARCIAL NO. 13	
ACTA PARCIAL NO. 14	
ACTA PARCIAL NO. 15	
ACTA PARCIAL NO. 16	
ACTA PARCIAL NO. 17	
ACTA PARCIAL NO. 18	
ACTA PARCIAL NO. 19	
ACTA PARCIAL NO. 20	
ACTA PARCIAL NO. 21	
ACTA PARCIAL NO. 22	
ACTA PARCIAL NO. 23	
ACTA PARCIAL NO. 24	
ACTA PARCIAL NO. 25	
ACTA PARCIAL NO. 26	1597.60
ACTA PARCIAL NO. 27	2300.50
ACTA PARCIAL NO. 28	**655.30**
TOTAL ACUMULADO	4553.7

ING. SEBASTIAN OSPEZ VERGARA
MGD INGENIERIA DE VALOR
INTERVENTORIA

Ing. EDWARD ANDRES SANCHEZ MACIAS
CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA

Gobierno de CALDAS	GOBERNACIÓN DE CALDAS Secretaría de Infraestructura	Hoja No 1 de 1
	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS	

PREACTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

PREACTA DE OBRA No:	26 - TRAMO 1	FECHA:	31/03/2026
PERIODO:	1 AL 31 DE MARZO DE 2026		
CONTRATO DE OBRA No:	2909202S-2456	CONTRATISTA	CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATO DE INTERVENTORIA No:	1071 DE 2022	INTERVENTOR	MAR INGENIERIA DE VALOR
ITEM	93		UNIDAD
APU T1	CUNETA DE CONCRETO CLASE D, VACIADA IN SITU; NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO TRAMO 1		M2

Abscisa Inicial	Abscisa Final	Largo (M)	Ancho (m)	Alto (m)	Margen	Total	Descripcion
ACTA PARCIAL DE OBRA N° 23							
CUNETAS TIPICAS COSTADO DERECHO							
K24+560.00	K24+586.00	6.50	0.930	0.11	Derecha	0.61	Placa de cuneta
			0.170	0.45		0.46	Espaldar de cuneta
K24+725.00	K24+756.70	31.70	0.930	0.11	Derecha	3.04	Placa de cuneta
			0.170	0.45		2.43	Espaldar de cuneta
K24+755.00	K24+772.70	17.70	0.930	0.11	Derecha	1.81	Placa de cuneta
			0.170	0.45		1.35	Espaldar de cuneta
K24+860.40	K24+899.60	39.20	0.930	0.11	Derecha	1.06	Placa de cuneta
			0.170	0.45		1.39	Espaldar de cuneta
K24+935.20	K24+988.20	53.56	0.930	0.11	Derecha	5.27	Placa de cuneta
			0.170	0.45		4.02	Espaldar de cuneta
K25+000.00	K25+017.00	17.06	0.930	0.11	Derecha	1.52	Placa de cuneta
			0.170	0.45		1.36	Espaldar de cuneta
CUNETAS TIPICAS COSTADO IZQUIERDO							
K25+529.80	K25+543.00	13.60	0.930	0.11	Izquierda	1.29	Placa de cuneta
			0.170	0.45		1.44	Espaldar de cuneta
K25+455.30	K25+488.40	33.10	0.930	0.11	Izquierda	3.29	Placa de cuneta
			0.170	0.45		2.53	Espaldar de cuneta
K24+687.80	K24+754.00	66.20	0.930	0.11	Izquierda	6.81	Placa de cuneta
			0.170	0.45		5.04	Espaldar de cuneta
K24+616.20	K24+666.50	50.30	0.930	0.11	Izquierda	5.15	Placa de cuneta
			0.170	0.45		3.85	Espaldar de cuneta
K24+574.40	K24+593.60	19.20	0.930	0.11	Izquierda	1.58	Placa de cuneta
			0.170	0.45		1.46	Espaldar de cuneta
K24+557.80	K24+569.40	11.60	0.930	0.11	Izquierda	1.19	Placa de cuneta
			0.170	0.45		0.89	Espaldar de cuneta
K24+513.30	K24+555.80	42.50	0.930	0.11	Izquierda	4.45	Placa de cuneta
			0.170	0.45		3.33	Espaldar de cuneta
K24+500.00	K24+506.50	6.50	0.930	0.11	Izquierda	0.64	Placa de cuneta
			0.170	0.45		0.48	Espaldar de cuneta
CUNETAS IRREGULARES COSTADO IZQUIERDO							
K25+553.00	K25+551.00	2.00	0.940	0.11	Izquierda	0.21	Placa de cuneta
K25+551.00	K25+549.22	1.78	0.900	0.11	Izquierda	0.18	Placa de cuneta
K25+549.22	K25+547.04	2.18	0.900	0.11	Izquierda	0.22	Placa de cuneta
K25+547.04	K25+544.99	2.05	0.880	0.11	Izquierda	0.20	Placa de cuneta
K25+544.99	K25+542.71	2.28	0.930	0.11	Izquierda	0.23	Placa de cuneta
		2.40	0.170	0.37		0.16	Espaldar de cuneta
K25+529.00	K25+526.52	2.48	1.180	0.11	Izquierda	0.32	Placa de cuneta
		2.48	0.170	0.37		0.16	Espaldar de cuneta
K25+526.52	K25+524.05	2.47	1.600	0.11	Izquierda	0.43	Placa de cuneta
K25+524.05	K25+521.77	2.28	1.600	0.11	Izquierda	0.40	Placa de cuneta
K25+521.77	K25+519.92	1.85	1.630	0.11	Izquierda	0.33	Placa de cuneta
K25+519.92	K25+518.17	1.75	0.660	0.11	Izquierda	0.12	Placa de cuneta
K25+518.17	K25+516.01	1.96	2.000	0.11	Izquierda	0.39	Placa de cuneta
K25+516.01	K25+514.91	1.96	1.400	0.11	Izquierda	0.29	Placa de cuneta
K25+514.91	K25+512.92	1.99	1.260	0.11	Izquierda	0.28	Placa de cuneta
K25+512.92	K25+510.62	2.30	1.240	0.11	Izquierda	0.31	Placa de cuneta
K25+510.62	K25+508.28	2.34	1.330	0.11	Izquierda	0.32	Placa de cuneta
K25+508.28	K25+506.06	2.22	1.320	0.11	Izquierda	0.30	Placa de cuneta
K25+506.06	K25+503.84	2.22	1.255	0.11	Izquierda	0.31	Placa de cuneta
K25+503.84	K25+502.12	1.72	1.280	0.11	Izquierda	0.24	Placa de cuneta
K25+502.12	K25+500.67	1.45	1.350	0.11	Izquierda	0.22	Placa de cuneta
K25+500.67	K25+498.24	2.23	1.560	0.15	Izquierda	0.52	Placa de cuneta
K25+498.24	K25+496.16	2.08	2.040	0.29	Izquierda	0.85	Placa de cuneta
K25+496.16	K25+494.10	2.06	2.040	0.29	Izquierda	0.84	Placa de cuneta
K25+494.10	K25+491.76	2.34	2.040	0.29	Izquierda	0.95	Placa de cuneta
K25+491.76	K25+489.44	2.32	2.040	0.29	Izquierda	0.93	Placa de cuneta
K25+489.49	K25+487.49	2.00	1.500	0.15	Izquierda	0.45	Placa de cuneta
		2.20	0.170	0.37		0.14	Espaldar de cuneta
K25+487.49	K25+486.45	1.04	0.920	0.11	Izquierda	0.11	Placa de cuneta
		1.20	0.170	0.45		0.24	Espaldar de cuneta
K24+760.00	K24+758.56	1.44	1.100	0.11	Izquierda	0.17	Placa de cuneta
		1.60	0.170	0.45		0.30	Espaldar de cuneta
K24+758.56	K24+755.31	3.25	0.800	0.11	Izquierda	0.29	Placa de cuneta
K24+758.56	K24+755.31	3.52	0.170	0.45	Izquierda	0.28	Espaldar de cuneta
K24+758.56	K24+755.31	3.00	0.170	0.45	Izquierda	0.23	BORDILLO
K24+755.31	K24+752.36	2.95	1.000	0.11	Izquierda	0.32	Placa de cuneta
		2.77	0.170	0.45		0.17	Espaldar de cuneta
K24+687.00	K24+684.43	2.57	1.040	0.11	Izquierda	0.29	Placa de cuneta
		2.74	0.170	0.45		0.26	Espaldar de cuneta
K24+684.43	K24+682.25	2.18	1.150	0.11	Izquierda	0.28	Placa de cuneta
		2.35	0.170	0.45		0.16	Espaldar de cuneta
K24+682.25	K24+680.75	1.50	1.270	0.11	Izquierda	0.21	Placa de cuneta
K24+680.75	K24+678.64	2.11	2.400	0.11	Izquierda	0.56	Placa de cuneta
		2.62	0.170	0.45		0.17	Espaldar de cuneta
K24+678.64	K24+676.39	2.25	1.430	0.11	Izquierda	0.35	Placa de cuneta

MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL REPACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

PREACTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL REPACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

PREACTA DE OBRA No:	24 - OBRA 1	FECHA:	31/03/2026
PERIODO:	1 AL 31 DE MARZO DE 2026		
CONTRATO DE OBRA No:	1092023-1456	CONTRATISTA	CONSORCIO RAS MIGUEL
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	1671 DE 2022	INTERVENTOR	MAR INGENIERIA DE VALOR
ITEM	93	UNIDAD	
APU TI	CUNETA DE CONCRETO CLASE D, VACIADA IN SITU; NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO TRAMO 1		MD

Abscisa Inicial	Abscisa Final	Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Margen	Total	Descripción
ACTA PARCIAL DE COBRO N° 28							
		2.80	0.170	0.45		0.14	Espaldar de cuneta
K24+616.00	K24+611.46	1.54	0.760	0.11	Izquierda	0.13	Placa de cuneta
		1.54	0.170	0.45		0.12	Espaldar de cuneta
K24+614.46	K24+612.51	1.95	0.620	0.11	Izquierda	0.13	Placa de cuneta
K24+612.51	K24+610.54	1.97	0.620	0.11	Izquierda	0.13	Placa de cuneta
K24+610.54	K24+608.54	2.00	0.620	0.11	Izquierda	0.14	Placa de cuneta
K24+608.54	K24+606.54	2.00	0.620	0.11	Izquierda	0.14	Placa de cuneta
K24+606.54	K24+604.86	1.68	0.500	0.11	Izquierda	0.09	Placa de cuneta
K24+604.86	K24+602.81	2.05	0.500	0.11	Izquierda	0.11	Placa de cuneta
K24+602.81	K24+600.81	2.00	0.620	0.11	Izquierda	0.14	Placa de cuneta
K24+600.81	K24+599.13	1.68	0.790	0.11	Izquierda	0.15	Placa de cuneta
K24+599.13	K24+597.95	1.18	0.920	0.11	Izquierda	0.12	Placa de cuneta
K24+597.95	K24+596.45	1.50	1.010	0.11	Izquierda	0.30	Placa de cuneta
		1.83	0.170	0.45		0.14	Espaldar de cuneta
K24+596.45	K24+594.10	2.35	1.250	0.11	Izquierda	0.32	Placa de cuneta
		2.22	0.170	0.45		0.17	Espaldar de cuneta
K24+594.10	K24+593.04	1.06	1.200	0.11	Izquierda	0.14	Placa de cuneta
		1.10	0.170	0.45		0.08	Espaldar de cuneta
K24+593.04	K24+591.26	1.78	1.370	0.11	Izquierda	0.27	Placa de cuneta
K24+591.26	K24+589.04	2.22	1.150	0.11	Izquierda	0.28	Placa de cuneta
		2.22	0.170	0.45		0.17	Espaldar de cuneta
K24+569.00	K24+567.11	1.89	0.920	0.11	Izquierda	0.19	Placa de cuneta
K24+567.11	K24+565.31	1.80	1.420	0.11	Izquierda	0.29	Placa de cuneta
		2.14	0.170	0.45		0.16	Espaldar de cuneta
K24+512.00	K24+510.22	1.78	1.100	0.11	Izquierda	0.22	Placa de cuneta
		1.80	0.170	0.45		0.14	Espaldar de cuneta
K24+510.22	K24+508.42	1.80	1.270	0.11	Izquierda	0.25	Placa de cuneta
K24+508.42	K24+506.54	1.88	1.620	0.11	Izquierda	0.34	Placa de cuneta
		2.17	0.170	0.45		0.17	Espaldar de cuneta
K24+506.54	K24+505.34	1.20	0.930	0.11	Izquierda	0.12	Placa de cuneta
		1.20	0.170	0.45		0.09	Espaldar de cuneta
							Placa de cuneta
CUNETAS IRREGULARES COSTADO DERECHO							
K24+500.00	K24+502.00	2.00	1.240	0.11	Derecha	0.27	Placa de cuneta
		2.10	0.170	0.45		0.16	Espaldar de cuneta
K24+502.00	K24+503.84	1.84	0.520	0.11	Derecha	0.09	Placa de cuneta
K24+503.84	K24+505.88	2.04	0.80	0.11	Derecha	0.20	placa sin espaldar
		2.04	0.17	0.45	Derecha	0.17	placa sin espaldar
K24+505.88	K24+513.00	1.45	0.92	0.11	Derecha	0.15	placa sin espaldar
		1.45	0.17	0.45	Derecha	0.11	placa sin espaldar
K24+545.00	K24+546.80	1.80	1.55	0.11	Derecha	0.31	placa sin espaldar
		2.20	0.17	0.45	Derecha	0.17	placa sin espaldar
K24+546.80	K24+548.63	1.83	0.930	0.11	Derecha	0.19	Placa de cuneta
K24+548.63	K24+550.08	1.45	0.92	0.11	Derecha	0.15	placa sin espaldar
		1.45	0.17	0.45	Derecha	0.11	placa sin espaldar
K24+567.00	K24+568.87	1.87	1.26	0.11	Derecha	0.26	placa sin espaldar
		2.13	0.17	0.45	Derecha	0.16	placa sin espaldar
K24+568.87	K24+570.44	1.57	0.560	0.11	Derecha	0.10	Placa de cuneta
K24+570.44	K24+572.64	2.20	0.79	0.11	Derecha	0.18	placa sin espaldar
		2.20	0.17	0.45	Derecha	0.17	placa sin espaldar
K24+572.64	K24+574.99	2.35	1.38	0.11	Derecha	0.36	placa sin espaldar
		2.30	0.17	0.45	Derecha	0.18	placa sin espaldar
K24+574.99	K24+576.69	1.70	1.056	0.11	Derecha	0.20	Placa de cuneta
K24+576.69	K24+578.69	2.00	1.05	0.11	Derecha	0.23	placa sin espaldar
		2.00	0.17	0.45	Derecha	0.15	placa sin espaldar
K24+597.00	K24+599.00	2.00	1.45	0.11	Derecha	0.32	placa sin espaldar
		2.10	0.17	0.45	Derecha	0.16	placa sin espaldar
K24+599.00	K24+601.37	2.37	0.720	0.11	Derecha	0.19	Placa de cuneta
K24+601.37	K24+603.57	2.20	0.720	0.11	Derecha	0.17	Placa de cuneta
K24+603.57	K24+605.62	2.05	0.80	0.11	Derecha	0.18	placa sin espaldar
		2.05	0.17	0.45	Derecha	0.16	placa sin espaldar
K24+910.00	K24+912.48	2.48	0.910	0.11	Derecha	0.25	Placa de cuneta
K24+912.48	K24+915.02	2.54	0.890	0.11	Derecha	0.25	Placa de cuneta
K24+915.02	K24+917.54	2.52	0.950	0.11	Derecha	0.26	Placa de cuneta
K24+917.54	K24+919.06	1.52	1.020	0.11	Derecha	0.17	Placa de cuneta
K24+740.00	K24+738.00	1.98	1.09	0.11	Derecha	0.14	Placa cuneta
K24+740.00	K24+740.00	0.83	0.45	0.17	Derecha	0.06	Bordillo cuneta
K24+740.00	K24+740.00	0.45	1.10	0.11	Derecha	0.05	Placa cuneta
K24+740.00	K24+740.00	0.83	0.450	0.17	Derecha	0.05	Bordillo cuneta
K24+910.00	K24+910.00	1.82	0.40	0.11	Derecha	0.08	Placa cuneta
K24+910.00	K24+910.00	0.75	0.44	0.11	Derecha	0.04	Placa cuneta
K24+910.00	K24+900.00	0.75	0.49	0.11	Derecha	0.04	Placa cuneta
K24+930.00	K24+930.00	1.50	0.82	0.11	Derecha	0.14	Placa cuneta
K24+930.00	K24+930.00	2.42	0.570	0.11	Derecha	0.15	Placa cuneta
K24+930.00	K24+930.00	29.01	0.37	0.11	Derecha	1.18	Placa cuneta
K24+970.00	K24+970.00	4.89	0.81	0.11	Derecha	0.44	Placa cuneta

Gobierno de CALDAS

GOBERNACIÓN DE CALDAS

Secretaría de Infraestructura

Hoja No 1 de 1

MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA – SONSÓN, RUTA DEL REMACINCIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

PRESACTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA VIA DORADA – SONSÓN, RUTA DEL REMACINCIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

PRESACTA DE OBRA No:	24 - TRAMO 1	FECHA:	31/03/2026
PERIODO:	DEL 01 DE MARZO DE 2026		
CONTRATO DE OBRA No:	1309/2023-2456	CONTRATIS	CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	1091 DE 2022	INTERVENTO	MAR INGENIERIA DE VALOR

ITEM:	93	UNIDAD
RPG T1	CUNETA DE CONCRETO CLASE D, VACIADA IN SITU; NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO TRAMO 1	M3

Abscisa Inicial	Abscisa Final	Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Margen	Total	Descripcion
ACTA PARCIAL DE OBRA N° 25							
K24+920.00	K24+980.00	2.27	1.69	0.11	Derecha	0.26	Placa cuneta
K24+960.00	K24+980.00	2.12	1.62	0.11	Derecha	0.26	Placa cuneta
K24+980.00	K24+980.00	2.14	0.980	0.11	Derecha	0.23	Placa cuneta
K24+980.00	K24+980.00	2.11	0.860	0.11	Derecha	0.20	Placa cuneta
K24+980.00	K24+980.00	1.61	0.88	0.11	Derecha	0.16	Placa cuneta
K24+980.00	K24+980.00	1.74	0.96	0.11	Derecha	0.18	Placa cuneta
K24+980.00	K24+980.00	1.84	1.440	0.11	Derecha	0.24	Placa cuneta
K24+680.00	K24+711.00	1.26	1.700	0.11	Derecha	0.17	Placa de Cuneta
K25+840.00	K25+840.00	2.17	1.400	0.11	Derecha	0.26	Placa de cuneta
K25+840.00	K25+840.00	2.00	0.450	0.17	Derecha	0.15	Bordillo
SUB TOTAL ACTA PARCIAL NO. 25					100.00		

ACTA PARCIAL NO. 1	
ACTA PARCIAL NO. 2	
ACTA PARCIAL NO. 3	
ACTA PARCIAL NO. 4	
ACTA PARCIAL NO. 5	
ACTA PARCIAL NO. 6	
ACTA PARCIAL NO. 7	
ACTA PARCIAL NO. 8	
ACTA PARCIAL NO. 9	
ACTA PARCIAL NO. 10	
ACTA PARCIAL NO. 11	
ACTA PARCIAL NO. 12	
ACTA PARCIAL NO. 13	
ACTA PARCIAL NO. 14	
ACTA PARCIAL NO. 15	
ACTA PARCIAL NO. 16	
ACTA PARCIAL NO. 17	
ACTA PARCIAL NO. 18	
ACTA PARCIAL NO. 19	
ACTA PARCIAL NO. 20	
ACTA PARCIAL NO. 21	
ACTA PARCIAL NO. 22	
ACTA PARCIAL NO. 23	
ACTA PARCIAL NO. 24	
ACTA PARCIAL NO. 25	
ACTA PARCIAL NO. 26	364.50
ACTA PARCIAL NO. 27	498.50
ACTA PARCIAL NO. 28	**100.00**
TOTAL ACUMULADO	967.0

ING. SEBASTIAN GOMEZ VERGARA
MAR INGENIERIA DE VALOR
INTERVENTORIA

ING. EDWARD ARDILA SANCHEZ MACIAS
CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA

ANEXOS

REGISTRO FOTOGRAFICO


TRAMO ST3

GOBIERNO DE CALDAS	GOBERNACIÓN DE CALDAS	Hoja No 1 de 1
	Secretaría de Infraestructura	
	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS. CONTRATO - 29092023-1456	

REGISTRO FOTOGRAFICO ACTA PARCIAL DE OBRA N°28

CONCRETO DE 14 MPA, 21 MPA Y CICLOPEO DE 21 MPA



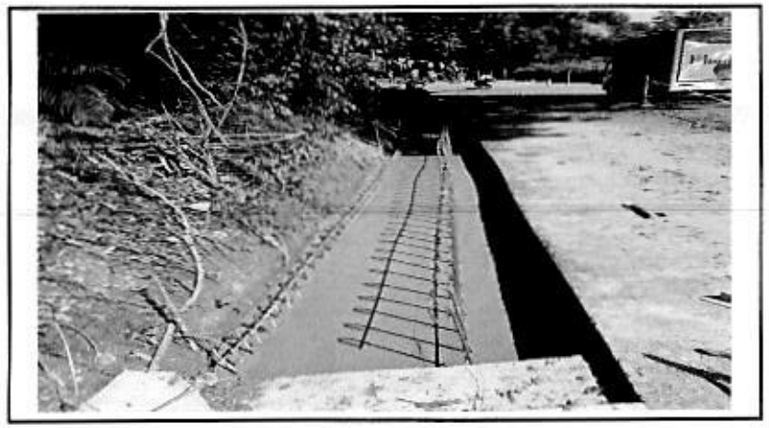






GOBIERNO DE CALDAS	GOBERNACIÓN DE CALDAS	Hoja No 1 de 1
	Secretaría de Infraestructura	
	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS. CONTRATO - 29092023-1456	

REGISTRO FOTOGRAFICO ACTA PARCIAL DE OBRA N°28

ACERO DE REFUERZO





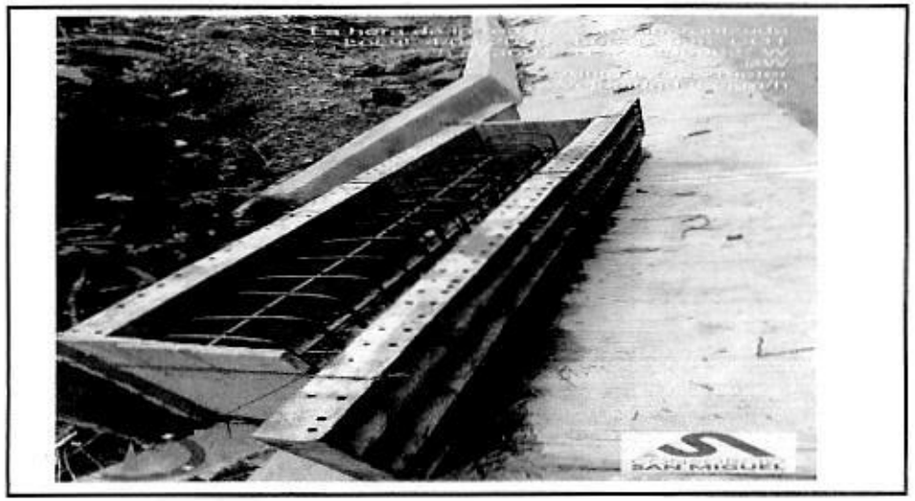




GOBIERNO DE CALDAS	GOBERNACIÓN DE CALDAS Secretaria de Infraestructura	Hoja No 1 de 1
	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS. CONTRATO - 29092023-1456	


REGISTRO FOTOGRAFICO ACTA PARCIAL DE OBRA N°28

MATERIAL DE COBERTURA TIPO SUBBASE GRANULAR

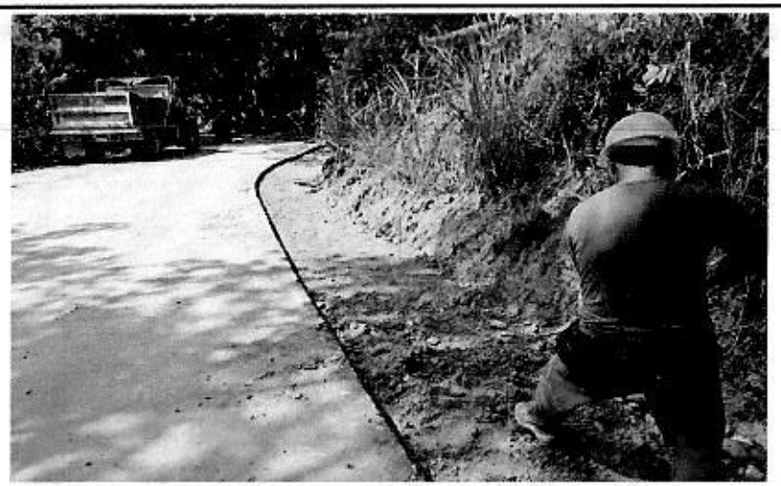





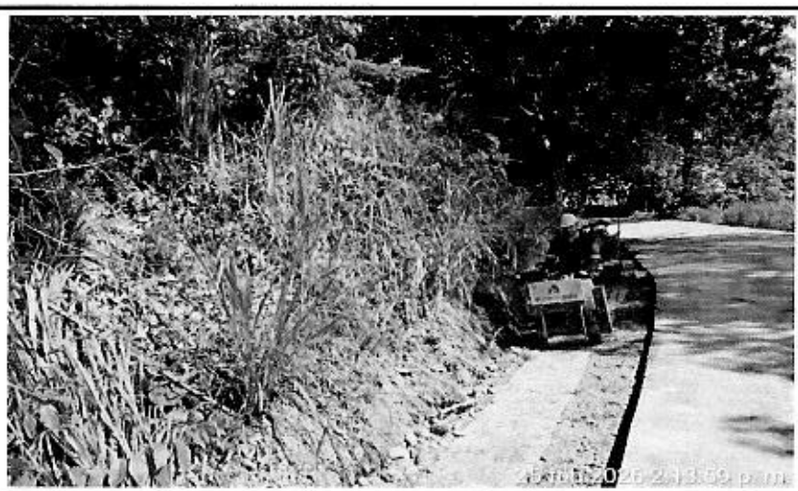

GOBIERNO DE CALDAS

GOBERNACIÓN DE CALDAS


Secretaría de Infraestructura

Hoja No 1 de 1


MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS. CONTRATO - 29092023-1456

REGISTRO FOTOGRAFICO ACTA PARCIAL DE OBRA N°28

ANCLAJES

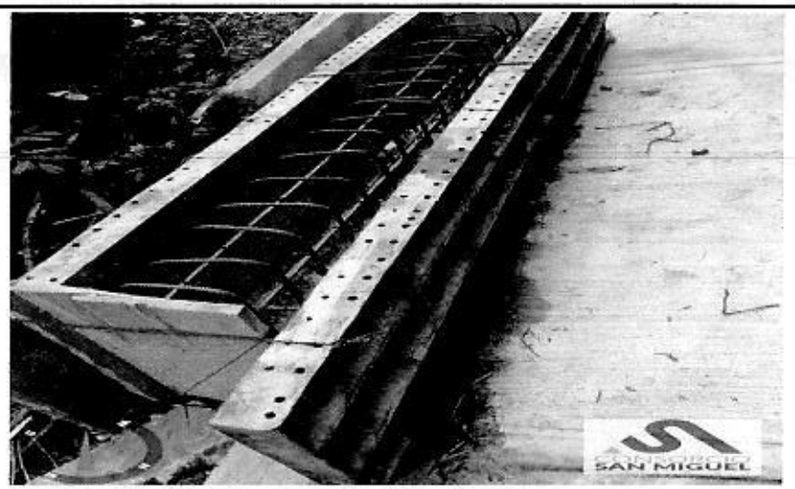



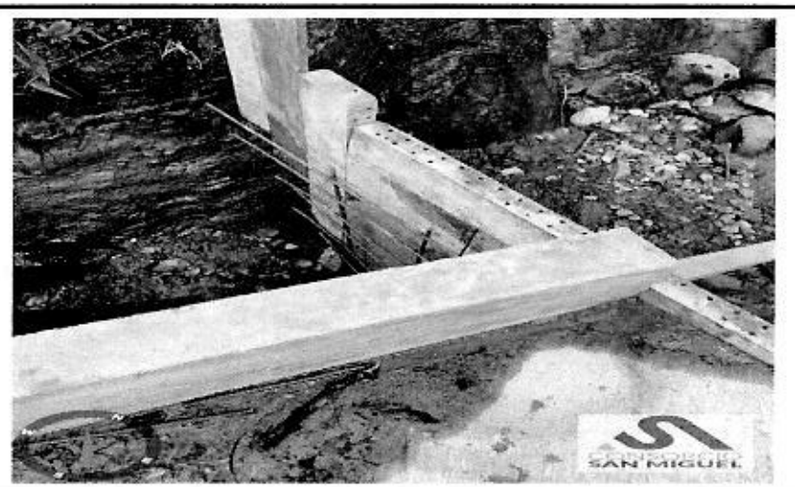



GOBIERNO DE CALDAS	GOBERNACIÓN DE CALDAS	Hoja No 1 de 1
	Secretaría de Infraestructura	
	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS. CONTRATO - 29092023-1456	


REGISTRO FOTOGRAFICO ACTA PARCIAL DE OBRA N°28

SEÑALIZACION VERTICAL







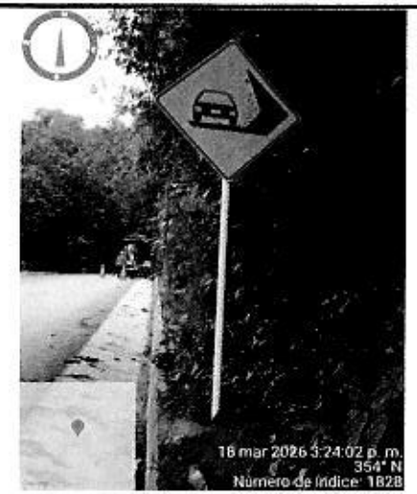


GOBIERNO DE CALDAS	GOBERNACIÓN DE CALDAS	Hoja No 1 de 1
	Secretaría de Infraestructura	
	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS. CONTRATO - 29092023-1456	

REGISTRO FOTOGRAFICO ACTA PARCIAL DE OBRA N°28

REMOCION DE DERRUMBES



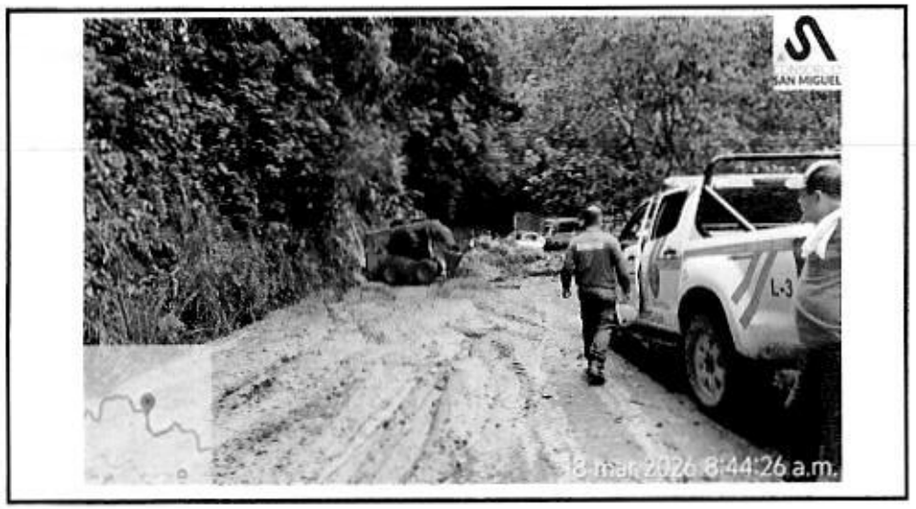





GOBIERNO DE CALDAS	GOBERNACIÓN DE CALDAS	Hoja No 1 de 1
	Secretaria de Infraestructura	
	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS. CONTRATO - 29092023-1456	

REGISTRO FOTOGRAFICO ACTA PARCIAL DE OBRA N°28

CORTE DE PAVIMENTO PARA CUNETAS



S








GOBIERNO DE CALDAS	GOBERNACIÓN DE CALDAS Secretaria de Infraestructura	Hoja No 1 de 1
	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS. CONTRATO - 29092023-1456	

REGISTRO FOTOGRAFICO ACTA PARCIAL DE OBRA N°28

CONCRETO DE CUNETAS





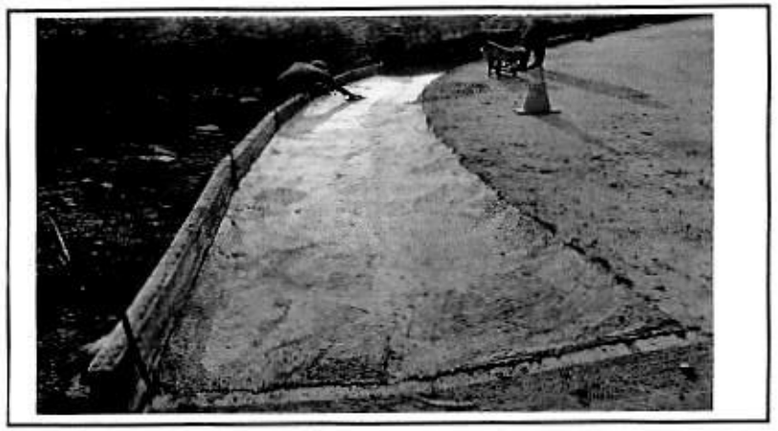



GOBIERNO DE CALDAS

GOBERNACIÓN DE CALDAS

Secretaria de Infraestructura

Hoja No 1 de 1

MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS. CONTRATO - 29092023-1456

REGISTRO FOTOGRAFICO ACTA PARCIAL DE OBRA N°28

EXCAVACION CUNETAS









PRE-ACTA TRAMO 3

Gobierno de CALDAS

GOBERNACIÓN DE CALDAS

Secretaría de Infraestructura

Hoja No 1 de 1

MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

PREACTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

PREACTA DE OBRA No:	28 TRAMO 3	FECHA:	28/03/2026
PERIODO:	28 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO DEL 2026		
CONTRATO DE OBRA No:	29092623-1456	CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	1871 DE 2022	INTERVENTORÍA:	MAB INGENIERIA DE VALOR

ITEM	7						UNIDAD
341.2 T4	BASE ESTABILIZADA CON MEZCLA ASFALTICA NATURAL EMAN						m2
Abscisa Inicial	Abscisa Final	Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Cantidad	Margen	Descripción
ACTA PARCIAL DE COBRO NO. 28							
K98+742.50	K98+825.00	83.00	3.90	0.10	24.9	D	Para instalación de bermas
K98+742.50	K98+770.00	28.00	3.90	0.10	8.4	I	Para instalación de bermas
K98+770.00	K98+790.00	20.00	1.80	0.10	3.6	I	Para instalación de bermas
K98+790.00	K98+825.00	35.00	3.90	0.10	10.5	I	Para instalación de bermas
SUB TOTAL ACTA PARCIAL NO. 28				47.40			

ACTA PARCIAL NO. 1	
ACTA PARCIAL NO. 2	
ACTA PARCIAL NO. 3	
ACTA PARCIAL NO. 4	
ACTA PARCIAL NO. 5	
ACTA PARCIAL NO. 6	
ACTA PARCIAL NO. 7	
ACTA PARCIAL NO. 8	
ACTA PARCIAL NO. 9	
ACTA PARCIAL NO. 10	
ACTA PARCIAL NO. 11	
ACTA PARCIAL NO. 12	
ACTA PARCIAL NO. 13	
ACTA PARCIAL NO. 14	
ACTA PARCIAL NO. 15	
ACTA PARCIAL NO. 16	
ACTA PARCIAL NO. 17	
ACTA PARCIAL NO. 18	
ACTA PARCIAL NO. 19	
ACTA PARCIAL NO. 20	
ACTA PARCIAL NO. 21	
ACTA PARCIAL NO. 22	
ACTA PARCIAL NO. 23	
ACTA PARCIAL NO. 24	
ACTA PARCIAL NO. 25	
ACTA PARCIAL NO. 26	
ACTA PARCIAL NO. 27	
ACTA PARCIAL NO. 28	**47.40**
TOTAL ACUMULADO	47.40

ING. SEBASTIAN GOMEZ VERGARA
MAB INGENIERIA DE VALOR
INTERVENTORIA

ING. EDWARD ANDRES SANCHEZ
CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA

Gobierno de CALDAS

GOBERNACIÓN DE CALDAS

Secretaria de Infraestructura

Hoja No 1 de 1

MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

PREACTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

PREACTA DE OBRA No:	28 LOTE 3	FECHA:	28/03/2026
PERIODO:	28 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO DEL 2026		
CONTRATO DE OBRA No:	29082023-1456	CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	1071 DE 2022	INTERVENTORÍA:	MAB INGENIERIA DE VALOR

ITEM				10			UNIDAD
420.2			RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSION ASFALTICA CRL-1				m2
Abscisa Inicial	Abscisa Final	Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Cantidad	Margen	Descripción
ACTA PARCIAL DE COBRO NO. 28							
AJUSTE ACTA 27							
K98+740.00	K98+742.00	2.00	3.00		6	D	Corrección abscisa, inicia de hecho en la K98+742
K98+740.00	K98+742.00	2.00	3.00		6	I	Corrección abscisa, inicia de hecho en la K98+742
ACTA 28							
K97+990.00	K98+170.00	180.00	3.00		540	D	Para instalación de mezcla
K97+990.00	K98+170.00	180.00	3.00		540	D	Para instalación de mezcla
K99+655.00	K101+425.00	1770.00	3.00		5310	D	Para instalación de mezcla
K99+693.00	K101+440.00	1747.00	3.00		5241	I	Para instalación de mezcla
SUB TOTAL ACTA PARCIAL NO. 28				11643.00			

ACTA PARCIAL NO. 1	
ACTA PARCIAL NO. 2	
ACTA PARCIAL NO. 3	
ACTA PARCIAL NO. 4	
ACTA PARCIAL NO. 5	
ACTA PARCIAL NO. 6	
ACTA PARCIAL NO. 7	
ACTA PARCIAL NO. 8	
ACTA PARCIAL NO. 9	
ACTA PARCIAL NO. 10	
ACTA PARCIAL NO. 11	
ACTA PARCIAL NO. 12	
ACTA PARCIAL NO. 13	
ACTA PARCIAL NO. 14	
ACTA PARCIAL NO. 15	
ACTA PARCIAL NO. 16	
ACTA PARCIAL NO. 17	
ACTA PARCIAL NO. 18	
ACTA PARCIAL NO. 19	
ACTA PARCIAL NO. 20	
ACTA PARCIAL NO. 21	
ACTA PARCIAL NO. 22	
ACTA PARCIAL NO. 23	
ACTA PARCIAL NO. 24	
ACTA PARCIAL NO. 25	
ACTA PARCIAL NO. 26	
ACTA PARCIAL NO. 27	8514.00
ACTA PARCIAL NO. 28	11643.00
TOTAL ACUMULADO	20157.00

ING. SEBASTIAN GOMEZ VERGARA
MAB INGENIERIA DE VALOR
INTERVENTORIA

ING. EDWARD ANDRES SANCHEZ
CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA

Gobierno de CALDAS

GOBERNACIÓN DE CALDAS

Secretaría de Infraestructura

Hoja No 1 de 1

MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA – SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

PRACTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA – SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

PRACTA DE OBRA No:	27 TRAMO 3	FECHA:	28/02/2026
PERIODO:	26 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO		
CONTRATO DE OBRA No:	2989/2023-1456	CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	1971 DE 2022	INTERVENTORÍA:	SGAS INGENIERIA DE VALOR

ITEM	16						UNIDAD
600.2.3	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO						m3
Abscisa Inicial	Abscisa Final	Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m) -Area(m2)	Cantidad	Margen	Descripción
ACTA PARCIAL DE OBRA NO. 28							
FILTROS							
Abscisa Inicial	Abscisa Final	Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Margen	Cantidad	Descripción
K101+452	K101+673	93.32	0.50	0.80	I	37.33	Excavación filtros
CUNETAS							
K97+990	K98+092	2.48		0.04	I	0.09	Placa cuneta irregular
K97+990	K98+092	87.40		0.04	I	3.32	Cuneta regular
K97+990	K98+092	4.26		0.04	I	0.16	Placa cuneta irregular
K98+092	K98+160	12.10		0.04	I	0.46	Placa cuneta irregular
K98+092	K98+160	83.60		0.04	I	1.92	Placa cuneta regular
K98+092	K98+160	2.15		0.04	I	0.08	Placa cuneta irregular
K98+162	K98+250	3.83		0.04	I	0.15	Placa cuneta irregular
K98+162	K98+250	82.80		0.04	I	3.15	Cuneta regular
K98+162	K98+250	4.58		0.04	I	0.17	Placa cuneta irregular
K98+260	K98+270	11.56		0.04	I	0.44	Placa cuneta regular
K98+260	K98+270	3.78		0.04	I	0.14	Placa cuneta irregular
K98+282	K98+370	62.10		0.04	I	2.36	Cuneta regular
K98+282	K98+370	4.56		0.04	I	0.17	Placa cuneta irregular
K98+370	K98+502	4.38		0.04	I	0.17	Placa cuneta irregular
K98+370	K98+502	46.00		0.04	I	1.75	Cuneta regular
K98+370	K98+502	31.78		0.04	I	1.21	Batea
K98+370	K98+502	46.00		0.04	I	1.75	Cuneta regular
K98+370	K98+502	9.52		0.04	I	0.36	Placa cuneta irregular
K98+502	K98+613	4.02		0.04	I	0.15	Batea
K98+502	K98+613	38.00		0.04	I	1.46	Cuneta regular
K98+502	K98+613	4.76		0.04	I	0.18	Placa cuneta irregular
K98+502	K98+613	4.74		0.04	I	0.18	Batea
K98+502	K98+613	46.00		0.04	I	1.75	Cuneta regular
K98+502	K98+613	6.96		0.04	I	0.26	Placa cuneta irregular
K98+613	K98+673	58.60		0.04	I	2.62	Cuneta regular
K98+613	K98+673	6.60		0.04	I	0.25	Placa cuneta irregular
K98+673	K98+740	59.80		0.04	I	2.29	Cuneta regular
K98+673	K98+740	8.00		0.04	I	0.30	Placa cuneta irregular
K98+825	K98+907	69.00		0.04	I	2.62	Cuneta regular
K98+825	K98+907	5.88		0.04	I	0.22	Placa cuneta irregular
K98+030	K98+090	52.67		0.07	D	3.53	Batea
K98+030	K98+090	6.99		0.07	D	0.47	Placa acceso canión
K98+030	K98+090	6.87		0.07	D	0.46	Batea
K98+090	K98+160	48.09		0.07	D	3.22	Batea
K98+090	K98+160	4.32		0.07	D	0.29	Placa cuneta irregular
K98+090	K98+160	18.40		0.07	D	1.23	Cuneta regular
K98+160	K98+250	2.28		0.07	D	0.15	Placa cuneta irregular
K98+160	K98+250	87.40		0.07	D	5.86	Cuneta regular
K98+282	K98+370	2.48		0.07	D	0.17	Placa cuneta irregular
K98+282	K98+370	64.40		0.07	D	4.31	Cuneta regular
K98+282	K98+370	26.51		0.07	D	1.78	Batea
K98+372	K98+500	119.60		0.07	D	8.01	Cuneta regular
K98+372	K98+500	4.20		0.07	D	0.27	Placa cuneta irregular
K98+372	K98+500	2.10		0.07	D	0.14	Placa cuneta irregular
K98+672	K98+745	2.12		0.07	D	0.14	Placa sobre muro
K98+672	K98+745	43.70		0.07	D	2.93	Cuneta regular
K98+672	K98+745	34.24		0.07	D	2.29	Placa sobre muro
K98+825	K98+910	4.66		0.07	D	0.31	Cuneta regular
K98+825	K98+910	2.37		0.07	D	0.16	Placa cuneta irregular
K98+825	K98+910	16.03		0.07	D	1.07	Batea
K98+825	K98+910	55.26		0.07	D	3.70	Cuneta regular
K98+825	K98+910	6.38		0.07	D	0.43	Placa cuneta irregular

Gobierno de CALDAS	GOBERNACIÓN DE CALDAS	Hoja No 1 de 1
	Secretaría de Infraestructura	
	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS	

PREACTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

PREACTA DE OBRA No:	27 TRAMO 3	FECHA:	28/02/2026
PERIODO:	26 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO		
CONTRATO DE OBRA No:	25092023-1456	CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	1071 DE 2022	INTERVENTORÍA:	MAB INGENIERIA DE VALOR

ITEM	16						UNIDAD
600.2.3	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO						m3
Abscisa Inicial	Abscisa Final	Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m) -Area(m2)	Cantidad	Margen	Descripción
K98+950	K99+060	3.58		0.07	E	0.27	Placa cuneta irregular
K98+950	K99+060	41.40		0.07	E	2.97	Cuneta regular
K98+950	K99+060	2.37		0.07	E	0.16	Placa sobre muro
K98+950	K99+060	29.90		0.07	E	2.09	Placa sobre muro
K98+950	K99+060	11.50		0.07	E	0.77	Placa cuneta irregular
K98+950	K99+060	32.20		0.07	E	2.16	Cuneta regular
K98+950	K99+060	19.71		0.07	E	1.32	Placa sobre muro
K98+950	K99+060	3.25		0.07	D	0.22	Placa cuneta irregular





SUB TOTAL ACTA PARCIAL NO. 28	117.20			

ACTA PARCIAL NO. 1	
ACTA PARCIAL NO. 2	
ACTA PARCIAL NO. 3	
ACTA PARCIAL NO. 4	
ACTA PARCIAL NO. 5	
ACTA PARCIAL NO. 6	155.60
ACTA PARCIAL NO. 7	201.20
ACTA PARCIAL NO. 8	354.70
ACTA PARCIAL NO. 9	418.30
ACTA PARCIAL NO. 10	627.70
ACTA PARCIAL NO. 11	419.90
ACTA PARCIAL NO. 12	418.12
ACTA PARCIAL NO. 13	370.31
ACTA PARCIAL NO. 14	65.57
ACTA PARCIAL NO. 15	0.00
ACTA PARCIAL NO. 16	0.00
ACTA PARCIAL NO. 17	141.20
ACTA PARCIAL NO. 18	181.90
ACTA PARCIAL NO. 19	152.40
ACTA PARCIAL NO. 20	85.63
ACTA PARCIAL NO. 21	368.80
ACTA PARCIAL NO. 22	338.80
ACTA PARCIAL NO. 23	374.80
ACTA PARCIAL NO. 24	489.80
ACTA PARCIAL NO. 25	202.10
ACTA PARCIAL NO. 26	338.50
ACTA PARCIAL NO. 27	146.40
ACTA PARCIAL NO. 28	**117.20**
TOTAL ACUMULADO	5935.10

ING. SEBASTIAN GOMEZ VERGARA
MAB INGENIERIA DE VALOR
INTERVENTORIA

ING. EDWARD ANDRES SANCHEZ
CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA

Gobierno de CALDAS

GOBERNACIÓN DE CALDAS

Secretaría de Infraestructura

Hoja No 1 de 1

MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

PREACTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

PREACTA DE OBRA No:	27 TRAMO 3	FECHA:	28/02/2026
PERIODO:		26 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO	
CONTRATO DE OBRA No:	29092021-1454	CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	1971 DE 2022	INTERVENTORÍA:	MAS INGENIERIA DE VALOR

ITEM			28				UNIDAD
640.1 E3			ACERO DE REFUERZO Fy 4200 MPa				kg
Abscisa Inicial	ESTRUCTURA	CANTIDAD	LONGITUD	CALIBRE	PESO (Kg-m)	PESO TOTAL	Descripción
ALCANTARILLAS							
ACTA PARCIAL DE COBRO No. 28							
ALCANTARILLAS							
K101+260.00	K101+260.00	1	132.40	3/8"	0.560	74.14	Acero de refuerzo para aletas descole en- Ver cartilla de despiece
		1	194.65	1/2"	0.994	193.28	
CUNETAS							
K97+950.00	K98+092.00	1	1044.96	3/8"	0.560	585.19	Acero de refuerzo para cuneta izquierda en- Ver cartilla de despiece
K98+092.00	K98+160.00	1	692.56	3/8"	0.560	387.83	Acero de refuerzo para cuneta izquierda en- Ver cartilla de despiece
K98+162.00	K98+250.00	1	984.04	3/8"	0.560	551.06	Acero de refuerzo para cuneta izquierda en- Ver cartilla de despiece
K98+260.00	K98+270.00	1	165.26	3/8"	0.560	92.53	Acero de refuerzo para cuneta izquierda en- Ver cartilla de despiece
K98+292.00	K98+570.00	1	746.20	3/8"	0.560	417.87	Acero de refuerzo para cuneta izquierda en- Ver cartilla de despiece
K98+370.00	K98+502.00	1	1412.66	3/8"	0.560	791.09	Acero de refuerzo para cuneta izquierda en- Ver cartilla de despiece
K98+502.00	K98+613.00	1	1087.66	3/8"	0.560	609.08	Acero de refuerzo para cuneta izquierda en- Ver cartilla de despiece
K98+613.00	K98+673.00	1	638.69	3/8"	0.560	357.67	Acero de refuerzo para cuneta izquierda en- Ver cartilla de despiece
K98+673.00	K98+745.00	1	805.45	3/8"	0.560	451.05	Acero de refuerzo para cuneta izquierda en- Ver cartilla de despiece
K98+825.00	K98+907.00	1	848.65	3/8"	0.560	475.24	Acero de refuerzo para cuneta izquierda en- Ver cartilla de despiece
K98+090.00	K98+098.00	1	563.16	3/8"	0.560	315.37	Acero de refuerzo para placa ingreso camión derecha en- Ver cartilla de despiece
		1	89.49	1/2"	0.994	88.95	
K98+090.00	K98+160.00	1	727.14	3/8"	0.560	407.20	Acero de refuerzo para batea derecha en- Ver cartilla de despiece
K98+160.00	K98+250.00	1	975.95	3/8"	0.560	546.53	Acero de refuerzo para cuneta derecha en- Ver cartilla de despiece
K98+282.00	K98+370.00	1	1017.53	3/8"	0.560	569.82	Acero de refuerzo para cuneta derecha en- Ver cartilla de despiece
K98+372.00	K97+500.00	1	1378.92	3/8"	0.560	770.52	Acero de refuerzo para cuneta derecha en- Ver cartilla de despiece
K98+672.00	K98+745.00	1	720.44	3/8"	0.560	403.45	Acero de refuerzo para cuneta derecha en- Ver cartilla de despiece
K98+825.00	K98+910.00	1	908.91	3/8"	0.560	508.99	Acero de refuerzo para cuneta derecha en- Ver cartilla de despiece
K98+950.00	K99+060.00	1	1414.37	3/8"	0.560	792.05	Acero de refuerzo para cuneta derecha en- Ver cartilla de despiece
SUB TOTAL ACTA PARCIAL NO. 28				9389.00			



ACTA PARCIAL NO. 1	
ACTA PARCIAL NO. 2	
ACTA PARCIAL NO. 3	
ACTA PARCIAL NO. 4	
ACTA PARCIAL NO. 5	
ACTA PARCIAL NO. 6	399.00
ACTA PARCIAL NO. 7	2039.00
ACTA PARCIAL NO. 8	49256.00
ACTA PARCIAL NO. 9	18419.00
ACTA PARCIAL NO. 10	48136.00
ACTA PARCIAL NO. 11	168.00
ACTA PARCIAL NO. 12	1379.00
ACTA PARCIAL NO. 13	740.00
ACTA PARCIAL NO. 14	1588.00
ACTA PARCIAL NO. 15	1346.00
ACTA PARCIAL NO. 16	293.54
ACTA PARCIAL NO. 17	2180.00
ACTA PARCIAL NO. 18	2490.20
ACTA PARCIAL NO. 19	2166.00
ACTA PARCIAL NO. 20	1870.00
ACTA PARCIAL NO. 21	1336.40
ACTA PARCIAL NO. 22	1942.00
ACTA PARCIAL NO. 23	3159.00
ACTA PARCIAL NO. 24	3542.00
ACTA PARCIAL NO. 25	1742.00
ACTA PARCIAL NO. 26	3455.00
ACTA PARCIAL NO. 27	2492.00
ACTA PARCIAL NO. 28	**9389.00**
TOTAL ACUMULADO	153223.3

ING. SEBASTIAN GOMEZ VERGARA
MAS INGENIERIA DE VALOR
INTERVENTORIA

ING. EDWARD ANDRES SANCHEZ
CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA

CANTIDADES ACERO FIGURADO

Proyecto: INVIAS 1071-2022 LA DORADA-SONSON
No. del Contrato: LP-SI-004-2023
Localización: ALETAS DE ENTRADA EN ODT K100+420 CI
Fecha: Marzo, 2026



Figura	Cantidad	Longitud de corte	6 mm	8 mm	1/4"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	7/8"	1"	1 1/8"	1 1/4"
			6M	8M	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5	No. 6	No. 7	No. 8	No. 9	No. 10
	5	1.6					8						
	4	1.2					4.8						
	8	2.75					22						
	4	1.85				7.4							
	6	6.95					41.7						
	7	6.95					48.65						
	14	2.60					36.4						
	14	1.85					25.9						
	4	1.75					7						
	8	1.50				12							
	4	2.00				8							
	6	2.00				12							
	6	2.60				15.6							
	6	6.00				35							
	6	6.90				41.4							
Peso nominal varilla de acero (kg/m)			0.222	0.394	0.250	0.560	0.994	1.552	2.235	3.042	3.973	5.060	6.404
Metros lineales						132.40	194.45						
Peso en kilos						74.14	193.28						
Peso total (kg)			267.43										

	Nombre		
INGENIERO	ING EDWARD ANDRES SANCHEZ		

CANTIDADES ACERO FIGURADO

CONSORCIO SAN MIGUEL

Proyecto: INVIAS 1071-2022 LA DORADA-SONSON
No. del Contrato LP-SI-004-2023
Localización: CUNETAS
Fecha: Marzo, 2026 Abscisas: CUNETAS K98+092-160 I

Figura	Cantidad	Longitud de corte	6 mm	8 mm	1/4"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	7/8"	1"	1 1/8"	1 1/4"	
			6M	8M	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5	No. 6	No. 7	No. 8	No. 9	No. 10	
	50	1.13				56.5								CUNETA IRREGULAR
	25	2.32				58								
	198	1.30				257.4								CUNETA REGULAR
	132	2.20				290.4								
	8	1.53				12.24								CUNETA IRREGULAR
	6	2.15				12.9								
	7	0.24				1.68								PLACA OBRA
	2	1.72				3.44								
Peso nominal varilla de acero (kg/m)			0.222	0.394	0.250	0.560	0.994	1.552	2.235	3.042	3.973	5.060	6.404	
Metros lineales						692.56	0.00							
Peso en kilos						387.83	0.00							
Peso total (kg)			387.83											

	Nombre	FIRMA CONTRATISTA	FIRMA INTERVENTOR
INGENIERO	ING EDWARD ANDRES SANCHEZ		

CANTIDADES ACERO FIGURADO

CONSORCIO SAN MIGUEL

Proyecto: INVIAS 1071-2022 LA DORADA-SONSON

No. del Contrato: LP-SI-004-2023

Localización: CUNETAS

Fecha: Marzo, 2026 Abscisas: CUNETAS K97+990- K98+092 I

Figura	Cantidad	Longitud de corte	6 mm	8 mm	1/4"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	7/8"	1"	1 1/8"	1 1/4"	
			6M	8M	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5	No. 6	No. 7	No. 8	No. 9	No. 10	
	8	0.50				4								PLACA OBRA
	2	1.73				3.46								
	12	1.23				14.76								CUNETA IRREGULAR
	12	1.14				13.68								
	342	1.30				444.6								CUNETA REGULAR
	228	2.20				501.6								
	16	1.92				30.72								CUNETA IRREGULAR
	16	2.01				32.16								
Peso nominal varilla de acero (kg/m)			0.222	0.394	0.250	0.560	0.994	1.552	2.235	3.042	3.973	5.060	6.404	
Metros lineales						1044.80	0.00							
Peso en kilos						585.18	0.00							
Peso total (kg)			585.19											

	Nombre	FIRMA CONTRATISTA	FIRMA INTERVENTOR
INGENIERO	ING EDWARD ANDRES SANCHEZ		

CANTIDADES ACERO FIGURADO

CONSORCIO SAN MIGUEL

Proyecto: INVIAS 1071-2022 LA DORADA-SONSON

No. del Contrato: LP-SI-004-2023

Localización: CUNETAS

Fecha: Marzo, 2026 Abscisas: CUNETAS KS8+162-250 I

Figura	Cantidad	Longitud de corte	6 mm	8 mm	1/4"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	7/8"	1"	1 1/8"	1 1/4"	
			6M	8M	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5	No. 6	No. 7	No. 8	No. 9	No. 10	
	16	1.14				18.24								CUNETA IRREGULAR
	10	1.81				18.1								
	324	1.30				421.2								CUNETA REGULAR
	216	2.20				475.2								
	18	1.39				25.02								CUNETA IRREGULAR
	12	2.19				26.28								
Peso nominal varilla de acero (kg/m)			0.222	0.394	0.250	0.560	0.994	1.552	2.235	3.042	3.973	5.060	6.404	
Metros lineales						984.04	0.00							
Peso en kilos						551.06	0.00							
Peso total (kg)			551.06											

	Nombre	FIRMA CONTRATISTA	PIRMA INTERVENTOR
INGENIERO	ING EDWARD ANDRES SANCHEZ		

CANTIDADES ACERO FIGURADO

CONSORCIO SAN MIGUEL

Proyecto: INVIAS 1071-2022 LA DORADA-SONSON
No. del Contrato: LP-SI-004-2023
Localización: CUNETAS
Fecha: Marzo, 2026 Abscisas: CUNETAS K9I+950-K99+060 D

Figura	Cantidad	Longitud de corte	6 mm 6M	8 mm 8M	1/4" No. 2	3/8" No. 3	1/2" No. 4	5/8" No. 5	3/4" No. 6	7/8" No. 7	1" No. 8	1 1/8" No. 9	1 1/4" No. 10	
	8	1.71				13.68								PLACA OBRA
	8	2.08				16.64								
	16	2.53				24.48								CUNETA IRREGULAR
	14	1.99				26.46								
	142	1.38				210.6								CUNETA REGULAR
	106	2.20				237.9								
	5	1.28				8.4								PLACA SOBRE MURO
	1	1.17				1.17								
	3	2.28				6.84								
	117	0.87				101.79								PLACA SOBRE MURO
	52	2.20				114.4								
	45	1.30				58.5								CUNETA IRREGULAR
	30	2.20				66								
	126	1.30				163.8								CUNETA REGULAR
	84	2.20				184.8								
	72	0.87				62.64								PLACA SOBRE MURO
	36	2.09				75.24								
	11	1.68				18.48								CUNETA IRREGULAR
	7	3.15				22.05								
	1	2.68				2.8								
Peso nominal varilla de acero (kg/m)			0.222	0.394	0.250	0.560	0.994	1.552	2.235	3.042	3.973	5.060	6.404	
Metros lineales						1414.37	0.00							
Peso en kilos						792.05	0.00							
Peso total (kg)			792.05											

	Nombre	FIRMA CONTRATISTA	FIRMA INTERVENTOR
INGENIERO	ING EDWARD ANDRES SANCHEZ		

CANTIDADES ACERO FIGURADO

CONSORCIO SAN MIGUEL

Proyecto: INVIAS 1071-2022 LA DORADA-SONSON
No. del Contrato LP-SI-004-2023
Localización: CUNETAS
Fecha: Marzo, 2026 Abscisas: CUNETAS K98+825-910 D

Figura	Cantidad	Longitud de corte	6 mm 6M	8 mm 8M	1/4" No. 2	3/8" No. 3	1/2" No. 4	5/8" No. 5	3/4" No. 6	7/8" No. 7	1" No. 8	1 1/8" No. 9	1 1/4" No. 10	
	18	1.30				23.4								CUNETA REGULAR
	12	2.20				26.4								
	9	1.30				11.7								CUNETA IRREGULAR
	6	2.27				13.62								
	63	1.10				69.3								BATEA
	35	2.19				76.65								
	216	1.30				280.8								CUNETA REGULAR
	144	2.20				316.8								
	24	1.86				44.64								CUNETA IRREGULAR
	24	1.90				45.6								
Peso nominal varilla de acero (kg/m)			0.222	0.394	0.250	0.560	0.994	1.552	2.235	3.042	3.973	5.060	6.404	
Metros lineales						908.91	0.00							
Peso en kilos						508.99	0.00							
Peso total (kg)			508.99											

	Nombre	FIRMA CONTRATISTA	FIRMA INTERVENTOR
INGENIERO	ING EDWARD ANDRES SANCHEZ		

CANTIDADES ACERO FIGURADO

CONSORCIO SAN MIGUEL

Proyecto: INVIAS 1071-2022 LA DORADA-SONSON
No. del Contrato LP-SI-004-2023
Localización: CUNETAS
Fecha: Marzo, 2026 Abscisas: CUNETAS K98+672-745 D

Figura	Cantidad	Longitud de corte	6 mm 6M	8 mm 8M	1/4" No. 2	3/8" No. 3	1/2" No. 4	5/8" No. 5	3/4" No. 6	7/8" No. 7	1" No. 8	1 1/8" No. 9	1 1/4" No. 10	
	8	0.56				4.48								PLACA SOBRE MURO
	3	2.02				6.06								
	171	1.30				222.3								CUNETA REGULAR
	114	2.20				250.8								
	128	0.83				106.24								PLACA SOBRE MURO
	64	2.04				130.56								
Peso nominal varilla de acero (kg/m)			0.222	0.394	0.250	0.560	0.994	1.552	2.235	3.042	3.973	5.060	6.404	
Metros lineales						720.44	0.00							
Peso en kilos						403.45	0.00							
Peso total (kg)			403.45											

	Nombre	FIRMA CONTRATISTA	FIRMA INTERVENTOR
INGENIERO	ING EDWARD ANDRES SANCHEZ		

CANTIDADES ACERO FIGURADO

CONSORCIO SAN MIGUEL

Proyecto: INVIAS 1071-2022 LA DORADA-SONSON
No. del Contrato LP-SI-004-2023
Localización: CUNETAS
Fecha: Marzo, 2026 Abscisas: CUNETAS K98+372-500 D

Figura	Cantidad	Longitud de corte	6 mm 6M	8 mm 8M	1/4" No. 2	3/8" No. 3	1/2" No. 4	5/8" No. 5	3/4" No. 6	7/8" No. 7	1" No. 8	1 1/8" No. 9	1 1/4" No. 10	
	468	1.30				608.4								CUNETA REGULAR
	312	2.20				686.4								
	16	1.90				30.4								CUNETA IRREGULAR
	16	1.95				31.2								
	8	1.19				9.52								CUNETA IRREGULAR
	5	2.00				10								
Peso nominal varilla de acero (kg/m)			0.222	0.394	0.250	0.560	0.994	1.552	2.235	3.042	3.973	5.060	6.404	
Metros lineales						1375.92	0.00							
Peso en kilos						770.52	0.00							
Peso total (kg)			770.52											

	Nombre	FIRMA CONTRATISTA	FIRMA INTERVENTOR
INGENIERO	ING EDWARD ANDRES SANCHEZ		

CANTIDADES ACERO FIGURADO

CONSORCIO SAN MIGUEL

Proyecto: INVIAS 1071-2022 LA DORADA-SONSON
No. del Contrato LP-SI-004-2023
Localización: CUNETAS
Fecha: Marzo, 2026 Abscisas: CUNETAS K98+282-370 D

Figura	Cantidad	Longitud de corte	6 mm 6M	8 mm 8M	1/4" No. 2	3/8" No. 3	1/2" No. 4	5/8" No. 5	3/4" No. 6	7/8" No. 7	1" No. 8	1 1/8" No. 9	1 1/4" No. 10	
	9	1.55				13.95								CUNETA IRREGULAR
	6	2.38				14.28								
	252	1.30				327.6								CUNETA REGULAR
	168	2.20				369.6								
	99	1.29				127.71								BATEA
	66	2.31				152.46								
	8	0.76				6.08								PLACA OBRA
	3	1.95				5.85								
Peso nominal varilla de acero (kg/m)			0.222	0.394	0.250	0.560	0.994	1.552	2.235	3.042	3.973	5.060	6.404	
Metros lineales						1017.53	0.00							
Peso en kilos						569.82	0.00							
Peso total (kg)			569.82											

	Nombre	FIRMA CONTRATISTA	FIRMA INTERVENTOR
INGENIERO	ING EDWARD ANDRES SANCHEZ		

CANTIDADES ACERO FIGURADO

CONSORCIO SAN MIGUEL

Proyecto: INVIAS 1071-2022 LA DORADA-SONSON
No. del Contrato: LP-SI-004-2023
Localización: CUNETAS
Fecha: Marzo, 2026 Abscisas: CUNETAS K98+160-250 D

Figura	Cantidad	Longitud de corte	6 mm 6M	8 mm 8M	1/4" No. 2	3/8" No. 3	1/2" No. 4	5/8" No. 5	3/4" No. 6	7/8" No. 7	1" No. 8	1 1/8" No. 9	1 1/4" No. 10	
	9	1.61				14.49								CUNETA IRREGULAR
	7	2.18				15.26								
	342	1.30				444.6								CUNETA REGULAR
	228	2.20				501.6								
						0								
						0								
						0								
						0								
Peso nominal varilla de acero (kg/m)			0.222	0.394	0.250	0.560	0.994	1.552	2.235	3.042	3.973	5.060	6.404	
Metros lineales						975.95	0.00							
Peso en kilos						546.53	0.00							
Peso total (kg)			546.53											

	Nombre	FIRMA CONTRATISTA	FIRMA INTERVENTOR
INGENIERO	ING EDWARD ANDRES SANCHEZ		

CANTIDADES ACERO FIGURADO

CONSORCIO SAN MIGUEL

Proyecto: INVIAS 1071-2022 LA DORADA-SONSON
No. del Contrato: LP-SI-004-2023
Localización: CUNETAS
Fecha: Marzo, 2026 Abscisas: CUNETAS K98+090-160 D

Figura	Cantidad	Longitud de corte	6 mm	8 mm	1/4"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	7/8"	1"	1 1/8"	1 1/4"	
			6M	8M	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5	No. 6	No. 7	No. 8	No. 9	No. 10	
	189	1.19				224.91								BATEA
	105	2.19				229.95								
	12	1.50				18								CUNETA IRREGULAR
	9	1.14				10.26								
	12	2.06				24.72								
	72	1.30				93.6								CUNETA REGULAR
	48	2.20				105.6								
	6	2.18				13.08								PLACA OBRA
	9	0.78				7.02								
Peso nominal varilla de acero (kg/m)			0.222	0.394	0.250	0.560	0.994	1.552	2.235	3.042	3.973	5.060	6.404	
Metros lineales						727.14	0.00							
Peso en kilos						407.20	0.00							
Peso total (kg)			407.20											

	Nombre	FIRMA CONTRATISTA	FIRMA INTERVENTOR
INGENIERO	ING EDWARD ANDRES SANCHEZ		

CANTIDADES ACERO FIGURADO

CONSORCIO SAN MIGUEL

Proyecto: INVIAS 1071-2022 LA DORADA-SONSON

No. del Contrato LP-SI-004-2023

Localización: CUNETAS

Fecha: Marzo, 2026 Abscisas: CUNETAS K98+030-090 D

Figura	Cantidad	Longitud de corte	6 mm	8 mm	1/4"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	7/8"	1"	1 1/8"	1 1/4"	
			6M	8M	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5	No. 6	No. 7	No. 8	No. 9	No. 10	
	207	1.19				246.33								BATEA
	115	2.19				251.85								
	27	1.58					42.66							PLACA ACCESO CAMIÓN
	21	2.23					46.83							
	27	1.19				32.13								BATEA
	15	2.19				32.85								
Peso nominal varilla de acero (kg/m)			0.222	0.394	0.250	0.560	0.994	1.552	2.235	3.042	3.973	5.060	6.404	
Metros lineales						563.16	89.49							
Peso en kilos						315.37	88.95							
Peso total (kg)			404.32											

	Nombre	FIRMA CONTRATISTA	FIRMA INTERVENTOR
INGENIERO	ING EDWARD ANDRES SANCHEZ		

CANTIDADES ACERO FIGURADO


CONSORCIO SAN MIGUEL

Proyecto: INVIAS 1071-2022 LA DORADA-SONSON

No. del Contrato LP-SI-004-2023

Localización: CUNETAS

Fecha: Marzo, 2026 Abscisas: CUNETAS KS8+825-907 I

Figura	Cantidad	Longitud de corte	6 mm 6M	8 mm 8M	1/4" No. 2	3/8" No. 3	1/2" No. 4	5/8" No. 5	3/4" No. 6	7/8" No. 7	1" No. 8	1 1/8" No. 9	1 1/4" No. 10	
	270	1.30				351								CUNETA REGULAR
	180	2.20				396								
	24	2.07				49.68								CUNETA IRREGULAR
	24	1.86				44.64								
	7	0.55				3.85								PLACA OBRA
	2	1.74				3.48								
Peso nominal varilla de acero (kg/m)			0.222	0.394	0.250	0.560	0.994	1.552	2.235	3.042	3.973	5.060	6.404	
Metros lineales						848.66	0.00							
Peso en kilos						475.24	0.00							
Peso total (kg)			475.24											

	Nombre	FIRMA CONTRATISTA	FIRMA INTERVENTOR
INGENIERO	ING EDWARD ANDRES SANCHEZ		

CANTIDADES ACERO FIGURADO

CONSORCIO SAN MIGUEL

Proyecto: INVIAS 1071-2022 LA DORADA-SONSON

No. del Contrato: LP-SI-004-2023

Localización: CUNETAS

Fecha: Marzo, 2026 Abscisas: CUNETAS K98+673-740 I

Figura	Cantidad	Longitud de corte	6 mm 6M	8 mm 8M	1/4" No. 2	3/8" No. 3	1/2" No. 4	5/8" No. 5	3/4" No. 6	7/8" No. 7	1" No. 8	1 1/8" No. 9	1 1/4" No. 10	
						0								
						0								
	234	1.30				304.2								CUNETA REGULAR
	156	2.20				343.2								
	28	2.15				60.2								CUNETA IRREGULAR
	32	1.90				60.8								
	13	1.41				18.33								PLACA OBRA
	6	3.12				18.72								
Peso nominal varilla de acero (kg/m)			0.222	0.394	0.250	0.560	0.994	1.552	2.235	3.042	3.973	5.060	6.404	
Metros lineales						805.45	0.00							
Peso en kilos						451.05	0.00							
Peso total (kg)			451.05											

	Nombre	FIRMA CONTRATISTA	FIRMA INTERVENTOR
INGENIERO	ING EDWARD ANDRES SANCHEZ		

CANTIDADES ACERO FIGURADO

CONSORCIO SAN MIGUEL

Proyecto: INVIAS 1071-2022 LA DORADA-SONSON
No. del Contrato LP-SI-004-2023
Localización: CUNETAS
Fecha: Marzo, 2026 Abscisas: CUNETAS K98+613-673 I

Figura	Cantidad	Longitud de corte	6 mm	8 mm	1/4"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	7/8"	1"	1 1/8"	1 1/4"	
			6M	8M	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5	No. 6	No. 7	No. 8	No. 9	No. 10	
						0								
						0								
	198	1.30				257.4								CUNETA REGULAR
	132	2.20				290.4								
	21	1.85				38.85								CUNETA IRREGULAR
	24	1.90				45.6								
	6	0.50				3								PLACA OBRA
	2	1.72				3.44								
Peso nominal varilla de acero (kg/m)			0.222	0.394	0.250	0.560	0.994	1.552	2.235	3.042	3.973	5.060	6.404	
Metros lineales						638.69	0.00							
Peso en kilos						357.67	0.00							
Peso total (kg)			357.67											

	Nombre	FIRMA CONTRATISTA	FIRMA INTERVENTOR
INGENIERO	ING EDWARD ANDRES SANCHEZ		

CANTIDADES ACERO FIGURADO

CONSORCIO SAN MIGUEL

Proyecto: INVIAS 1071-2022 LA DORADA-SONSON
No. del Contrato: LP-SI-004-2023
Localización: CUNETAS
Fecha: Marzo, 2026 Abscisas: CUNETAS K98+502-613 I

Figura	Cantidad	Longitud de corte	6 mm 6M	8 mm 8M	1/4" No. 2	3/8" No. 3	1/2" No. 4	5/8" No. 5	3/4" No. 6	7/8" No. 7	1" No. 8	1 1/8" No. 9	1 1/4" No. 10	
	16	0.95				15.2								BATEA
	8	1.91				15.28								
	144	1.30				187.2								CUNETA REGULAR
	96	2.20				211.2								
	16	1.22				21.96								CUNETA IRREGULAR
	12	2.28				27.36								
	10	1.16				20.88								BATEA
	10	2.27				22.7								
	180	1.30				234								CUNETA REGULAR
	123	2.20				264								
	27	1.09				29.43								CUNETA IRREGULAR
	15	2.18				32.7								
	6	0.39				2.34								PLACA OBRA
	2	1.70				3.4								
Peso nominal varilla de acero (kg/m)			0.222	0.394	0.250	0.560	0.994	1.552	2.235	3.042	3.973	5.060	6.404	
Metros lineales						1087.65	0.00							
Peso en kilos						609.08	0.00							
Peso total (kg)			609.08											

	Nombre	FIRMA CONTRATISTA	FIRMA INTERVENTOR
INGENIERO	ING EDWARD ANDRES SANCHEZ		

CANTIDADES ACERO FIGURADO

Proyecto: INVIAS 1071-2022 LA DORADA-SONSON
No. del Contrato: LP-SI-004-2023
Localización: CUNETAS
Fecha: Marzo, 2026 Abscisas: CUNETAS K98+370-502 I

CONSORCIO SAN MIGUEL

Figura	Cantidad	Longitud de corte	6 mm 6M	8 mm 8M	1/4" No. 2	3/8" No. 3	1/2" No. 4	5/8" No. 5	3/4" No. 6	7/8" No. 7	1" No. 8	1 1/8" No. 9	1 1/4" No. 10	
	18	1.17				21.06								CUNETA IRREGULAR
	12	2.19				26.28								
	180	1.30				234								CUNETA REGULAR
	120	2.20				264								
	176	0.52				115.92								BATEA
	56	2.17				121.52								
	180	1.30				234								CUNETA REGULAR
	120	2.20				264								
	36	1.63				58.68								CUNETA IRREGULAR
	28	2.28				63.84								
	6	0.71				4.26								PLACA OBRA
	3	1.70				5.1								
Peso nominal varilla de acero (kg/m)			0.222	0.394	0.250	0.560	0.994	1.552	2.235	3.042	3.973	5.060	6.404	
Metros lineales						1412.66	0.00							
Peso en kilos						791.09	0.00							
Peso total (kg)			791.09											

	Nombre	FIRMA CONTRATISTA	FIRMA INTERVENTOR
INGENIERO	ING EDWARD ANDRES SANCHEZ		

CANTIDADES ACERO FIGURADO

CONSORCIO SAN MIGUEL

Proyecto: INVIAS 1071-2022 LA DORADA-SONSON
No. del Contrato LP-SI-004-2023
Localización: CUNETAS
Fecha: Marzo, 2026 Abscisas: CUNETAS K98+292-370 I

Figura	Cantidad	Longitud de corte	6 mm	8 mm	1/4"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	7/8"	1"	1 1/8"	1 1/4"	
			6M	8M	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5	No. 6	No. 7	No. 8	No. 9	No. 10	
	243	1.30				315.9								CUNETA REGULAR
	162	2.20				356.4								
	18	1.69				30.42								CUNETA IRREGULAR
	16	2.18				34.88								
	7	0.50				3.5								PLACA OBRA
	3	1.70				5.1								
Peso nominal varilla de acero (kg/m)			0.222	0.394	0.250	0.560	0.994	1.552	2.235	3.042	3.973	5.060	6.404	
Metros lineales						746.20	0.00							
Peso en kilos						417.87	0.00							
Peso total (kg)			417.87											

	Nombre	FIRMA CONTRATISTA	FIRMA INTERVENTOR
INGENIERO	ING EDWARD ANDRES SANCHEZ		

CANTIDADES ACERO FIGURADO

CONSORCIO SAN MIGUEL

Proyecto: INVIAS 1071-2022 LA DORADA-SONSON

No. del Contrato LP-SI-004-2023

Localización: CUNETAS

Fecha: Marzo, 2026 Abscisas: CUNETAS K98+260-270 I

Figura	Cantidad	Longitud de corte	6 mm 6M	8 mm 8M	1/4" No. 2	3/8" No. 3	1/2" No. 4	5/8" No. 5	3/4" No. 6	7/8" No. 7	1" No. 8	1 1/8" No. 9	1 1/4" No. 10	
	45	1.30				58.5								CUNETA REGULAR
	30	2.20				66								
	14	1.41				19.74								CUNETA IRREGULAR
	12	1.75				21								
Peso nominal varilla de acero (kg/m)			0.222	0.394	0.250	0.560	0.994	1.552	2.235	3.042	3.973	5.060	6.404	
Metros lineales						165.24	0.00							
Peso en kilos						92.53	0.00							
Peso total (kg)			92.53											

	Nombre	FIRMA CONTRATISTA	FIRMA INTERVENTOR
INGENIERO	ING EDWARD ANDRES SANCHEZ		

Gobierno de CALDAS

GOBERNACIÓN DE CALDAS

Secretaría de Infraestructura

Hoja No 1 de 1

MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

ACTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

ACTA DE OBRA No:	28 TRAMO 3	FECHA:	28/03/2026
PERIODO:	28 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO DEL 2026		
CONTRATO DE OBRA No:	2909202S-1454	CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	1971 DE 2022	INTERVENTORÍA:	NAD INGENIERIA DE VALOR

ITEM	38	UNIDAD
673.3.3 73	MATERIAL DE COBERTURA TIPO SUB- BASE CLASE C SBS-20	m3

Abscisa Inicial	Abscisa Final	Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m) -Area(m2)	Cantidad	Margen	Descripción
ACTA PARCIAL DE COBRO NO. 28							
FILTROS							
K101+452.00	K101+675.00	238.90	0.50	0.10	11.67	I	LLEKO DE COBERTURA SOBRE FILTRO CON BASE GRANULAR
K101+676.00	K101+755.00	74.40	0.50	0.10	3.72	I	LLEKO DE COBERTURA SOBRE FILTRO CON BASE GRANULAR
CUNETAS							
K97+980.00	K98+092.00	2.48		0.04	0.10	I	Placa cuneta irregular
K97+980.00	K98+092.00	87.40		0.04	3.50	I	Cuneta regular
K97+980.00	K98+092.00	4.25		0.04	0.17	I	Placa cuneta irregular
K98+092.00	K98+160.00	12.10		0.04	0.48	I	Placa cuneta irregular
K98+092.00	K98+160.00	50.50		0.04	2.02	I	Placa cuneta regular
K98+092.00	K98+160.00	2.13		0.04	0.09	I	Placa cuneta irregular
K98+160.00	K98+250.00	3.69		0.04	0.15	I	Placa cuneta irregular
K98+160.00	K98+250.00	82.80		0.04	3.31	I	Cuneta regular
K98+160.00	K98+250.00	4.50		0.04	0.18	I	Placa cuneta irregular
K98+260.00	K98+270.00	11.50		0.04	0.46	I	Placa cuneta regular
K98+260.00	K98+270.00	3.75		0.04	0.15	I	Placa cuneta irregular
K98+282.00	K98+370.00	52.10		0.04	2.42	I	Cuneta regular
K98+282.00	K98+370.00	4.50		0.04	0.18	I	Placa cuneta irregular
K98+370.00	K98+502.00	4.58		0.04	0.18	I	Placa cuneta irregular
K98+370.00	K98+502.00	46.50		0.04	1.84	I	Cuneta regular
K98+370.00	K98+502.00	31.78		0.04	1.27	I	Batea
K98+370.00	K98+502.00	46.00		0.04	1.84	I	Cuneta regular
K98+370.00	K98+502.00	9.52		0.04	0.38	I	Placa cuneta irregular
K98+502.00	K98+613.00	4.02		0.04	0.16	I	Batea
K98+502.00	K98+613.00	36.90		0.04	1.47	I	Cuneta regular
K98+502.00	K98+613.00	4.75		0.04	0.19	I	Placa cuneta irregular
K98+502.00	K98+613.00	4.74		0.04	0.19	I	Batea
K98+502.00	K98+613.00	48.00		0.04	1.94	I	Cuneta regular
K98+502.00	K98+613.00	6.84		0.04	0.27	I	Placa cuneta irregular
K98+613.00	K98+673.00	50.60		0.04	2.02	I	Cuneta regular
K98+613.00	K98+673.00	6.00		0.04	0.24	I	Placa cuneta irregular
K98+673.00	K98+740.00	59.80		0.04	2.39	I	Cuneta regular
K98+673.00	K98+740.00	8.00		0.04	0.32	I	Placa cuneta irregular
K98+825.00	K98+907.00	68.00		0.04	2.76	I	Cuneta regular
K98+825.00	K98+907.00	9.85		0.04	0.24	I	Placa cuneta irregular
K98+030.00	K98+090.00	52.87		0.07	3.53	D	Batea
K98+030.00	K98+090.00	6.99		0.07	0.47	D	Placa anoseo camion
K98+030.00	K98+090.00	6.87		0.07	0.46	D	Batea
K98+090.00	K98+160.00	45.09		0.07	3.22	D	Batea
K98+090.00	K98+160.00	4.32		0.07	0.29	D	Placa cuneta irregular
K98+090.00	K98+160.00	18.40		0.07	1.23	D	Cuneta regular
K98+160.00	K98+250.00	2.26		0.07	0.15	D	Placa cuneta irregular
K98+160.00	K98+250.00	87.40		0.07	5.86	D	Cuneta regular
K98+282.00	K98+370.00	2.48		0.07	0.17	D	Placa cuneta irregular
K98+282.00	K98+370.00	64.40		0.07	4.31	D	Cuneta regular
K98+282.00	K98+370.00	26.56		0.07	1.78	D	Batea
K98+372.00	K98+500.00	119.60		0.07	8.01	D	Cuneta regular
K98+372.00	K98+500.00	4.10		0.07	0.27	D	Placa cuneta irregular
K98+372.00	K98+500.00	2.50		0.07	0.16	D	Placa cuneta irregular
K98+672.00	K98+745.00	2.12		0.07	0.14	D	Placa sobre muro
K98+672.00	K98+745.00	43.70		0.07	2.93	D	Cuneta regular
K98+672.00	K98+745.00	34.24		0.07	2.29	D	Placa sobre muro
K98+825.00	K98+910.00	4.60		0.07	0.31	D	Cuneta regular
K98+825.00	K98+910.00	2.37		0.07	0.16	D	Placa cuneta irregular
K98+825.00	K98+910.00	18.00		0.07	1.03	D	Batea
K98+825.00	K98+910.00	55.20		0.07	3.70	D	Cuneta regular
K98+825.00	K98+910.00	8.60		0.07	0.46	D	Placa cuneta irregular
K98+950.00	K99+060.00	3.93		0.07	0.27	D	Placa cuneta irregular
K98+950.00	K99+060.00	41.40		0.07	2.77	D	Cuneta regular
K98+950.00	K99+060.00	2.37		0.07	0.16	D	Placa sobre muro
K98+950.00	K99+060.00	29.90		0.07	2.00	D	Placa sobre muro
K98+950.00	K99+060.00	11.50		0.07	0.77	D	Placa cuneta irregular
K98+950.00	K99+060.00	32.20		0.07	2.16	D	Cuneta regular

Gobierno de CALDAS	GOBERNACIÓN DE CALDAS Secretaría de Infraestructura	Hoja No 1 de 1
	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL REENCUENTRO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS	

PREACTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL REENCUENTRO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

PREACTA DE OBRA No:	28 PARCIAL 3	FECHA:	28/03/2026
PERIODO:	28 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO DEL 2026		
CONTRATO DE OBRA No:	2909202S-1456	CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATO DE INTERVENTORIA No:	1071 DE 2022	INTERVENTORÍA:	MAS INGENIERIA DE VALOR

ITEM:	38	UNIDAD
673.3.3 f3	MATERIAL DE CORRETURA TIPO SUB- BASE CLASE C SBG-20	m3

Abscisa Inicial	Abscisa Final	Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m) -Area(m2)	Cantidad	Margen	Descripción
K36+930.00	K36+980.00	19.7		0.37	1.11	D	Placa sobre suro
K36+930.00	K36+980.00	9.25		0.37	0.22	D	Placa cuneta irregular





SUB TOTAL ACTA PARCIAL NO. 28	94.9			

ACTA PARCIAL NO. 1	
ACTA PARCIAL NO. 2	
ACTA PARCIAL NO. 3	
ACTA PARCIAL NO. 4	
ACTA PARCIAL NO. 5	
ACTA PARCIAL NO. 6	
ACTA PARCIAL NO. 7	
ACTA PARCIAL NO. 8	
ACTA PARCIAL NO. 9	
ACTA PARCIAL NO. 10	
ACTA PARCIAL NO. 11	
ACTA PARCIAL NO. 12	
ACTA PARCIAL NO. 13	
ACTA PARCIAL NO. 14	
ACTA PARCIAL NO. 15	
ACTA PARCIAL NO. 16	
ACTA PARCIAL NO. 17	
ACTA PARCIAL NO. 18	
ACTA PARCIAL NO. 19	
ACTA PARCIAL NO. 20	
ACTA PARCIAL NO. 21	
ACTA PARCIAL NO. 22	
ACTA PARCIAL NO. 23	
ACTA PARCIAL NO. 24	
ACTA PARCIAL NO. 25	
ACTA PARCIAL NO. 26	
ACTA PARCIAL NO. 27	18.90
ACTA PARCIAL NO. 28	**94.90**
TOTAL ACUMULADO	113.8

ING. SEBASTIAN GOMEZ VERGARA
MAS INGENIERIA DE VALOR
INTERVENTORIA

ING. EDWARD ANDRES SANCHEZ
CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA

Gobierno de CALDAS	GOBERNACION DE CALDAS	Hoja No 1 de 1
	Secretaria de Infraestructura	
	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS	

PREACTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

PREACTA DE OBRA No:	28 TRAMO 3	FECHA:	28/03/2026
PERIODO:	28 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO DEL 2026		
CONTRATO DE OBRA No:	29092023-1456	CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	1071 DE 2022	INTERVENTORÍA:	MAB INGENIERIA DE VALOR

ITEM	39	UNIDAD
673.1.1	GEOTEXTIL TIPO NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSIÓN GRAB MÍNIMA DE 700 N APROXIMADAMENTE	m2

Abscisa Inicial	Abscisa Final	Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Cantidad	Margen	Descripción
ACTA PARCIAL DE COBRO No. 28							
Abscisa Inicial	Abscisa Final	Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Margen	Cantidad	Descripción
FILTROS							
K101+452.00	K101+673.30	233.30	0.60		I	139.98	Proteccion de filtros
K101+675.00	K101+755.00	74.40	0.60		I	44.64	Proteccion de filtros
SUB TOTAL ACTA PARCIAL NO. 28				184.60			

ACTA PARCIAL NO. 1	
ACTA PARCIAL NO. 2	
ACTA PARCIAL NO. 3	
ACTA PARCIAL NO. 4	
ACTA PARCIAL NO. 5	
ACTA PARCIAL NO. 6	
ACTA PARCIAL NO. 7	
ACTA PARCIAL NO. 8	
ACTA PARCIAL NO. 9	
ACTA PARCIAL NO. 10	
ACTA PARCIAL NO. 11	0.00
ACTA PARCIAL NO. 12	0.00
ACTA PARCIAL NO. 13	0.00
ACTA PARCIAL NO. 14	0.00
ACTA PARCIAL NO. 15	0.00
ACTA PARCIAL NO. 16	0.00
ACTA PARCIAL NO. 17	0.00
ACTA PARCIAL NO. 18	0.00
ACTA PARCIAL NO. 19	0.00
ACTA PARCIAL NO. 20	0.00
ACTA PARCIAL NO. 21	431.20
ACTA PARCIAL NO. 22	556.80
ACTA PARCIAL NO. 23	387.90
ACTA PARCIAL NO. 24	601.30
ACTA PARCIAL NO. 25	300.20
ACTA PARCIAL NO. 26	268.20
ACTA PARCIAL NO. 27	350.10
ACTA PARCIAL NO. 28	**184.60**
TOTAL ACUMULADO	3280.3

ING. SEBASTIAN GOMEZ VERGARA
MAB INGENIERIA DE VALOR
INTERVENTORIA

ING. EDWARD ANDRES SANCHEZ
CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA

Gobierno de CALDAS	GOBERNACIÓN DE CALDAS Secretaria de Infraestructura	Hoja No 1 de 1
	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS	

PRACIA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

PRZACTA DE OBRA No:	28 TRAMO 3	FECHA:	28/03/2026
PERIODO:	28 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO DEL 2026		
CONTRATO DE OBRA No:	20092023-1656	CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	1671 DE 2022	INTERVENTORÍA:	NAB INGENIERIA DE VALOR

ITEM	49					UNIDAD
640.1 Z3	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 MPa					kg
Abscisa Inicial	ESTRUCTURA	CANTIDAD	LONGITUD	CALIBRE	PESO (KG-M)	PESO TOTAL	Descripción
MUROS							
ACTA PARCIAL DE COBRO No. 28							
K100+426.06	K100+420.00	1	583.30	1/2"	0.994	579.80	Acero de refuerzo muro en K100+420 modulo 1- Ver cartilla de despiece
K100+300.00	K100+300.00	1	252.00	1/2"	0.994	250.45	Acero de refuerzo Realce muro existente K100+300- Ver cartilla de despiece
K102+400.00	K102+400.00	1	29.80	1/2"	0.994	29.62	Acero de refuerzo muro de cierre K102+400- Ver cartilla de despiece
K102+550.00	K102+550.00	1	28.80	1/2"	0.994	28.63	Acero de refuerzo muro de cierre K102+550- Ver cartilla de despiece
SUB TOTAL ACTA PARCIAL NO. 28			888.00				

16105

ACTA PARCIAL NO. 1	
ACTA PARCIAL NO. 2	
ACTA PARCIAL NO. 3	
ACTA PARCIAL NO. 4	
ACTA PARCIAL NO. 5	
ACTA PARCIAL NO. 6	389.00
ACTA PARCIAL NO. 7	2039.00
ACTA PARCIAL NO. 8	49255.00
ACTA PARCIAL NO. 9	12919.00
ACTA PARCIAL NO. 10	48136.00
ACTA PARCIAL NO. 11	168.00
ACTA PARCIAL NO. 12	1379.00
ACTA PARCIAL NO. 13	740.00
ACTA PARCIAL NO. 14	1588.00
ACTA PARCIAL NO. 15	0.00
ACTA PARCIAL NO. 16	5527.00
ACTA PARCIAL NO. 17	6176.00
ACTA PARCIAL NO. 18	4280.00
ACTA PARCIAL NO. 19	5231.00
ACTA PARCIAL NO. 20	8759.00
ACTA PARCIAL NO. 21	9427.00
ACTA PARCIAL NO. 22	9083.00
ACTA PARCIAL NO. 23	14155.00
ACTA PARCIAL NO. 24	9687.00
ACTA PARCIAL NO. 25	16555.00
ACTA PARCIAL NO. 26	10521.00
ACTA PARCIAL NO. 27	16399.00
ACTA PARCIAL NO. 28	**888.00**
TOTAL ACUMULADO	233712.1

ING. SEBASTIAN GOMEZ VERGARA
NAB INGENIERIA DE VALOR
INTERVENTORIA

ING. EDWARD ARDILA SANCHEZ
CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA

CANTIDADES ACERO FIGURADO

Proyecto: INVIAS 1071-2022 LA DORADA-SONSON
No. del Contrato LP-SI-004-2023
Localización: MURO DE CONTENCIÓN EN EL K100+420 MODULO 1
Fecha: Febrero, 2026

CONSORCIO SAN MIGUEL

Figura	Cantidad	Longitud de corte	6 mm	8 mm	1/4"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	7/8"	1"	1 1/8"	1 1/4"
			6M	8M	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5	No. 6	No. 7	No. 8	No. 9	No. 10
Ref 1 Zarpa	25	2.90					72.5						
Ref 2 Zarpa	25	2.90					72.5						
Ref 3 y 6	29	3.50					101.5						
Ref 4	5	2.50					12.5						
Ref 5	5	1.30					6.5						
Ref 7 Zarpa	18	8.90					160.2						
Ref long vastago	12	8.40					100.8						
Ref long vastago	8	3.60					28.8						
Ref long vastago	8	1.50					12						
	16	1.00					16						
Peso nominal varilla de acero (kg/m)			0.222	0.394	0.250	0.560	0.994	1.552	2.235	3.042	3.973	5.060	6.404
Metros lineales						0.00	583.30						
Peso en kilos						0.00	579.80						
Peso total (kg)			579.80										

	Nombre	
INGENIERO	ING EDWARD ANDRES SANCHEZ	

CANTIDADES ACERO FIGURADO

Proyecto: INVIAS 1071-2022 LA DORADA-SONSON
No. del Contrato: LP-SI-004-2023
Localización: REALCE MURO EXISTENTE K100+300 CD
Fecha: Marzo, 2026

CONSORCIO SAN MIGUEL

Figura	Cantidad	Longitud de corte	6 mm	8 mm	1/4"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	7/8"	1"	1 1/8"	1 1/4"
			6M	8M	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5	No. 6	No. 7	No. 8	No. 9	No. 10
	92	1.70					122.4						
	16	6.00					98						
	8	2.80					22.4						
	8	1.40					11.2						
							0						
							0						
Peso nominal varilla de acero (kg/m)			0.222	0.394	0.250	0.560	0.994	1.552	2.235	3.042	3.973	5.060	6.404
Metros lineales						0.00	253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Peso en kilos						0.00	250.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Peso total (kg)			250.40										

	Nombre
INGENIERO	ING EDWARD ANDRES SANCHEZ

CANTIDADES ACERO FIGURADO

Proyecto: INVIAS 1071-2022 LA DORADA-SONSON
No. del Contrato: LP-SI-004-2023
Localización: MURO DE CIERRE K102+550
Fecha: Marzo, 2026

CONSORCIO SAN MIGUEL

Figura	Cantidad	Longitud de corte	6 mm	8 mm	1/4"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	7/8"	1"	1 1/8"	1 1/4"
			6M	8M	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5	No. 6	No. 7	No. 8	No. 9	No. 10
	8	1.80					14.4						
	8	1.80					14.4						
Peso nominal varilla de acero (kg/m)			0.222	0.394	0.250	0.560	0.994	1.552	2.235	3.042	3.973	5.060	6.404
Metros lineales						0.00	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Peso en kilos						0.00	28.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Peso total (kg)			28.63										

	Nombre	
INGENIERO	ING EDWARD ANDRES SANCHEZ	

CANTIDADES ACERO FIGURADO

Proyecto: INVIAS 1071-2022 LA DORADA-SONSON
No. del Contrato: LP-SI-004-2023
Localización: MURO DE CIERRE K102+400
Fecha: Marzo, 2026

CONSORCIO SAN MIGUEL

Figura	Cantidad	Longitud de corte	6 mm	8 mm	1/4"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	7/8"	1"	1 1/8"	1 1/4"
			6M	8M	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5	No. 6	No. 7	No. 8	No. 9	No. 10
	8	1.80					14.4						
	8	1.90					15.2						
Peso nominal varilla de acero (kg/m)			0.222	0.394	0.250	0.560	0.994	1.552	2.235	3.042	3.973	5.060	6.404
Metros lineales						0.00	29.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Peso en kilos						0.00	29.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Peso total (kg)			29.42										

	Nombre	
INGENIERO	ING EDWARD ANDRES SANCHEZ	

Gobierno de CALDAS	GOBERNACIÓN DE CALDAS Secretaria de Infraestructura	Hoja No 1 de 1
	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS	

PREACTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

PREACTA DE OBRA No:	28 TRAMO 3	FECHA:	28/03/2026
PERIODO:	20 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO DEL 2026		
CONTRATO DE OBRA No:	29092023-1456	CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	1071 DE 2022	INTERVENTORÍA:	MAB INGENIERIA DE VALOR

ITEM	53	UNIDAD
673.1.1	GEOTEXTIL TIPO NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSIÓN GRAB MÍNIMA DE 700 N APROXIMADAMENTE	m2

Abscisa Inicial	Abscisa Final	Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Cantidad	Margen	Descripción
ACTA PARCIAL DE COBRO No. 28							
MUROS							
K100+420.00	K100+420.00	7.76	0.20	1.30	23.28	DERECEA	Filtro longitudinal muro
K102+420.00	K102+420.00	13.00	0.20	1.44	42.64	DERECEA	Filtro longitudinal muro
K102+550.00	K102+550.00	14.30	0.20	1.75	55.77	DERECEA	Filtro longitudinal muro
SUB TOTAL ACTA PARCIAL NO. 28				121.70			

ACTA PARCIAL NO. 1	
ACTA PARCIAL NO. 2	
ACTA PARCIAL NO. 3	
ACTA PARCIAL NO. 4	
ACTA PARCIAL NO. 5	
ACTA PARCIAL NO. 6	
ACTA PARCIAL NO. 7	
ACTA PARCIAL NO. 8	
ACTA PARCIAL NO. 9	
ACTA PARCIAL NO. 10	
ACTA PARCIAL NO. 11	0,00
ACTA PARCIAL NO. 12	0,00
ACTA PARCIAL NO. 13	0,00
ACTA PARCIAL NO. 14	0,00
ACTA PARCIAL NO. 15	0,00
ACTA PARCIAL NO. 16	0,00
ACTA PARCIAL NO. 17	0,00
ACTA PARCIAL NO. 18	0,00
ACTA PARCIAL NO. 19	525.20
ACTA PARCIAL NO. 20	419.30
ACTA PARCIAL NO. 21	224.40
ACTA PARCIAL NO. 22	428.50
ACTA PARCIAL NO. 23	141,10
ACTA PARCIAL NO. 24	148.90
ACTA PARCIAL NO. 25	589.70
ACTA PARCIAL NO. 26	430.90
ACTA PARCIAL NO. 27	432.60
ACTA PARCIAL NO. 28	**121.70**
TOTAL ACUMULADO	3421.3

ING. SEBASTIAN GOMEZ VERGARA
MAB INGENIERIA DE VALOR
INTERVENTORIA

ING. EDWARD ANDRES SANCHEZ
CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRACTISTA

Gobierno de CALDAS	GOBERNACIÓN DE CALDAS	Hoja No 1 de 1
	Secretaría de Infraestructura	
	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS	

PREACTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

PREACTA DE OBRA No:	28 TRAMO 3	FECHA:	28/03/2026
PERIODO:	28 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO DEL 2026		
CONTRATO DE OBRA No:	29092023-1456	CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	1071 DE 2022	INTERVENTORÍA:	MAB INGENIERIA DE VALOR

ITEM	54	UNIDAD
663.1.1	TUBERÍA DE PVC 4"	m

Abscisa Inicial	Abscisa Final	Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Cantidad	Margen	Descripción
ACTA PARCIAL DE COBRO No. 28							
MUROS							
K100+420.00	K100+420.00	7.76			7.76	DERECHA	Filtro longitudinal muro
K102+420.00	K102+420.00	13.00			13.00	DERECHA	Filtro longitudinal muro
K102+550.00	K102+550.00	14.30			14.30	DERECHA	Filtro longitudinal muro
SUB TOTAL ACTA PARCIAL NO. 28				35.10			

ACTA PARCIAL NO. 1	
ACTA PARCIAL NO. 2	
ACTA PARCIAL NO. 3	
ACTA PARCIAL NO. 4	
ACTA PARCIAL NO. 5	
ACTA PARCIAL NO. 6	
ACTA PARCIAL NO. 7	
ACTA PARCIAL NO. 8	
ACTA PARCIAL NO. 9	
ACTA PARCIAL NO. 10	
ACTA PARCIAL NO. 11	0.00
ACTA PARCIAL NO. 12	0.00
ACTA PARCIAL NO. 13	0.00
ACTA PARCIAL NO. 14	0.00
ACTA PARCIAL NO. 15	0.00
ACTA PARCIAL NO. 16	0.00
ACTA PARCIAL NO. 17	0.00
ACTA PARCIAL NO. 18	0.00
ACTA PARCIAL NO. 19	137.00
ACTA PARCIAL NO. 20	113.70
ACTA PARCIAL NO. 21	56.70
ACTA PARCIAL NO. 22	134.00
ACTA PARCIAL NO. 23	58.30
ACTA PARCIAL NO. 24	48.60
ACTA PARCIAL NO. 25	0.00
ACTA PARCIAL NO. 26	80.00
ACTA PARCIAL NO. 27	70.90
ACTA PARCIAL NO. 28	**35.10**
TOTAL ACUMULADO	734.3

ING. SEBASTIAN GOMEZ VERGARA
MAB INGENIERIA DE VALOR
INTERVENTORIA

ING. EDUARD ANDRES SANCHEZ
CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA

Gobierno de CALDAS	GOBERNACIÓN DE CALDAS	Hoja No 1 de 1
	Secretaría de Infraestructura	
	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS	

PREACTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

PREACTA DE OBRA No:	28 TRAMO 3	FECHA:	28/03/2026
PERIODO:	20 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO DEL 2026		
CONTRATO DE OBRA No:	29052023-1456	CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	1071 DE 2022	INTERVENTORÍA:	MAJ INGENIERIA DE VALOR

ITEM	56	UNIDAD
623.1.2	ANCLAJE PARA REALCE	m

Abscisa Inicial	Abscisa Final	Unidad	Longitud (m)		Cantidad	Margen	Descripción	
ACTA PARCIAL DE COBRO No. 28								
MUROS								
K101+260.00	K101+260.00	14.00	0.15		2.10	IZQUIERDA	Cabezal entrada box	
K100+470.00	K100+470.00	144.00	0.15		21.60	DERECHA	Realce muro	
K100+610.00	K100+610.00	8.00	0.15		1.20	DERECHA	Muro de cierre	
K100+575.00	K100+575.00	8.00	0.15		1.20	DERECHA	Muro de cierre	
SUB TOTAL ACTA PARCIAL NO. 28				26.10				

ACTA PARCIAL NO. 1	
ACTA PARCIAL NO. 2	
ACTA PARCIAL NO. 3	
ACTA PARCIAL NO. 4	
ACTA PARCIAL NO. 5	
ACTA PARCIAL NO. 6	
ACTA PARCIAL NO. 7	
ACTA PARCIAL NO. 8	
ACTA PARCIAL NO. 9	
ACTA PARCIAL NO. 10	
ACTA PARCIAL NO. 11	0.00
ACTA PARCIAL NO. 12	0.00
ACTA PARCIAL NO. 13	0.00
ACTA PARCIAL NO. 14	0.00
ACTA PARCIAL NO. 15	0.00
ACTA PARCIAL NO. 16	0.00
ACTA PARCIAL NO. 17	0.00
ACTA PARCIAL NO. 18	0.00
ACTA PARCIAL NO. 19	0.00
ACTA PARCIAL NO. 20	0.00
ACTA PARCIAL NO. 21	0.00
ACTA PARCIAL NO. 22	0.00
ACTA PARCIAL NO. 23	0.00
ACTA PARCIAL NO. 24	15.90
ACTA PARCIAL NO. 25	0.00
ACTA PARCIAL NO. 26	3.30
ACTA PARCIAL NO. 27	29.10
ACTA PARCIAL NO. 28	**26.10**
TOTAL ACUMULADO	74.4

ING. SEBASTIAN GOMEZ VERGARA
MAJ INGENIERIA DE VALOR
INTERVENTORIA

ING. EDWARD ANDRES SANCHEZ
CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA

Gobierno de CALDAS	GOBERNACIÓN DE CALDAS Secretaría de Infraestructura	Hoja No 1 de 1
	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL REMACHE ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS	
	PREACTA DE OBRA	
OBJETO DEL CONTRATO:		

PREACTA DE OBRA No:	5 TRAMO 3	FECHA:	20/03/2026
PERIODO:	29 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO DEL 2026		
CONTRATO DE OBRA No:		CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:		INTERVENTORÍA:	MAB INGENIERIA DE VALOR

ITEM	62	UNIDAD
900.2.1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	m3/km

ACTA PARCIAL DE OBRA NO. 28							
ABSCISA DE MATERIAL DE PRESTAMO	K107+220.00						
ABSCISA INI	ABSCISA FIN	CENTRO DE GRAV	VOLUMEN BANCO (M3)	MARGEN	DISTANCIA (KM)	TRANSPORTE (M3/KM)	Descripción
LLENO DE MUROS							
K107+220.00	K100+420.00	K100+420.00	24.83	D/I	6.72	166.97	Transporte material de prestamo para lleno de muro en el K100+420.00
K107+220.00	K100+420.00	K100+420.00	-2.02	D/I	6.72	-13.52	Transporte material de prestamo para lleno de muro en el K100+420.00
K107+220.00	K102+420.00	K102+420.00	21.67	D/I	6.72	145.64	Transporte material de prestamo para lleno de muro en el K102+420.00
K107+220.00	K102+420.00	K102+420.00	-3.74	D/I	4.72	-17.66	Transporte material de prestamo para lleno de muro en el K102+420.00
K107+220.00	K102+550.00	K102+550.00	43.89	D/I	4.62	202.27	Transporte material de prestamo para lleno de muro en el K102+550.00
K107+220.00	K102+550.00	K102+550.00	-5.01	D/I	4.62	-23.02	Transporte material de prestamo para lleno de muro en el K102+550.00
MEJORAMIENTO							
K107+220.00	K98+670.50	K98+670.50	163.30	D/I	9.00	1469.97	Transporte material de prestamo para mejoramiento de via K98+670.50
K107+220.00	K98+150.00	K98+150.00	10.77	D/I	9.00	96.93	Transporte material de prestamo para mejoramiento de via K98+150.00
K107+220.00	K98+360.00	K98+360.00	471.36	D/I	8.80	4147.97	Transporte material de prestamo para mejoramiento de via K98+360.00
K107+220.00	K98+590.00	K98+590.00	66.24	D/I	8.50	563.04	Transporte material de prestamo para mejoramiento de via K98+590.00
K107+221.00	K98+652.50	K98+652.50	354.44	D/I	8.50	3012.74	Transporte material de prestamo para mejoramiento de via K98+652.50
SUB TOTAL ACTA PARCIAL NO. 28			1060a.00				

ACTA PARCIAL NO. 1	
ACTA PARCIAL NO. 2	
ACTA PARCIAL NO. 3	
ACTA PARCIAL NO. 4	
ACTA PARCIAL NO. 5	
ACTA PARCIAL NO. 6	500.00
ACTA PARCIAL NO. 7	2593.00
ACTA PARCIAL NO. 8	59256.00
ACTA PARCIAL NO. 9	12919.00
ACTA PARCIAL NO. 10	48736.00
ACTA PARCIAL NO. 11	143.00
ACTA PARCIAL NO. 12	1573.00
ACTA PARCIAL NO. 13	-910.00
ACTA PARCIAL NO. 14	0.00
ACTA PARCIAL NO. 15	0.00
ACTA PARCIAL NO. 16	0.00
ACTA PARCIAL NO. 17	0.00
ACTA PARCIAL NO. 18	0.00
ACTA PARCIAL NO. 19	4447.00
ACTA PARCIAL NO. 20	15025.00
ACTA PARCIAL NO. 21	11979.00
ACTA PARCIAL NO. 22	-403.00
ACTA PARCIAL NO. 24	1020.00
ACTA PARCIAL NO. 26	4397.00
ACTA PARCIAL NO. 25	318.00
ACTA PARCIAL NO. 26	16907.00
ACTA PARCIAL NO. 27	2407.00
ACTA PARCIAL NO. 28	**10604.00**
TOTAL ACUMULADO	160150.0

ING. SEBASTIAN GOMEZ VERGARA
MAB INGENIERIA DE VALOR
INTERVENTORIA

ING. EDWARD TORRES SANCHEZ
CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA

Gobierno de CALDAS	GOBERNACION DE CALDAS Secretaría de Infraestructura	Hoja No 1 de 1
	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - NORÁN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS	

PRACTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - NORÁN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS


PRACTA DE OBRA No:	28 PARCIAL 1	FECHA:	26/03/2026
PERIODO:	21 DE FEBRERO AL 10 DE MARZO DEL 2026		
CONTRATO DE OBRA No:	2309/2021-1473	CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	1001 DE 2022	INTERVENTORÍA:	MAR INGENIERIA DE VALOR

ITEM	69							UNIDAD
NPZ	INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL DE APORTE DE LA ZONA, NO INCLUYE SUMINISTRO NI TRANSPORTE DE MATERIAL							m3
Abscisa Inicial	Abscisa Final	Longitud	Volumen suelto	Factor de compactación		Volumen compacto	Margen	Descripción
ACTA PARCIAL DE COBRO NO: 28								
KD56+001	K58-140.00	139.00				163.33	D/I	Material de aporte a subrasante - Ver cartera topografica
KD56+145	K58-155.00	10.00				20.77	D/I	Material de aporte a subrasante - Ver cartera topografica
KD56+355	K58-565.00	410.00				471.36	D/I	Material de aporte a subrasante - Ver cartera topografica
KD56+570	K58-610.00	40.00				66.24	D/I	Material de aporte a subrasante - Ver cartera topografica
KD56+610	K58-695.00	85.00				454.44	D/I	Material de aporte a subrasante - Ver cartera topografica
SUB TOTAL ACTA PARCIAL NO. 28				1166.00				

ACTA PARCIAL NO. 1	
ACTA PARCIAL NO. 2	
ACTA PARCIAL NO. 3	
ACTA PARCIAL NO. 4	
ACTA PARCIAL NO. 5	
ACTA PARCIAL NO. 6	
ACTA PARCIAL NO. 7	
ACTA PARCIAL NO. 8	3927.00
ACTA PARCIAL NO. 9	3895.00
ACTA PARCIAL NO. 10	6392.00
ACTA PARCIAL NO. 11	0.00
ACTA PARCIAL NO. 12	0.00
ACTA PARCIAL NO. 13	0.00
ACTA PARCIAL NO. 14	0.00
ACTA PARCIAL NO. 15	0.00
ACTA PARCIAL NO. 16	0.00
ACTA PARCIAL NO. 17	0.00
ACTA PARCIAL NO. 18	0.00
ACTA PARCIAL NO. 19	2126.00
ACTA PARCIAL NO. 20	3666.00
ACTA PARCIAL NO. 21	1992.00
ACTA PARCIAL NO. 22	-1510.00
ACTA PARCIAL NO. 23	0.00
ACTA PARCIAL NO. 24	1019.00
ACTA PARCIAL NO. 25	0.00
ACTA PARCIAL NO. 26	612.00
ACTA PARCIAL NO. 27	0.00
ACTA PARCIAL NO. 28	**1166.00**
TOTAL ACUMULADO	22901.0

ING. SEBASTIAN SUAREZ VERGARA
MAR INGENIERIA DE VALOR
INTERVENTORIA

ING. EDWARD ALCIRES SANCHEZ
CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA

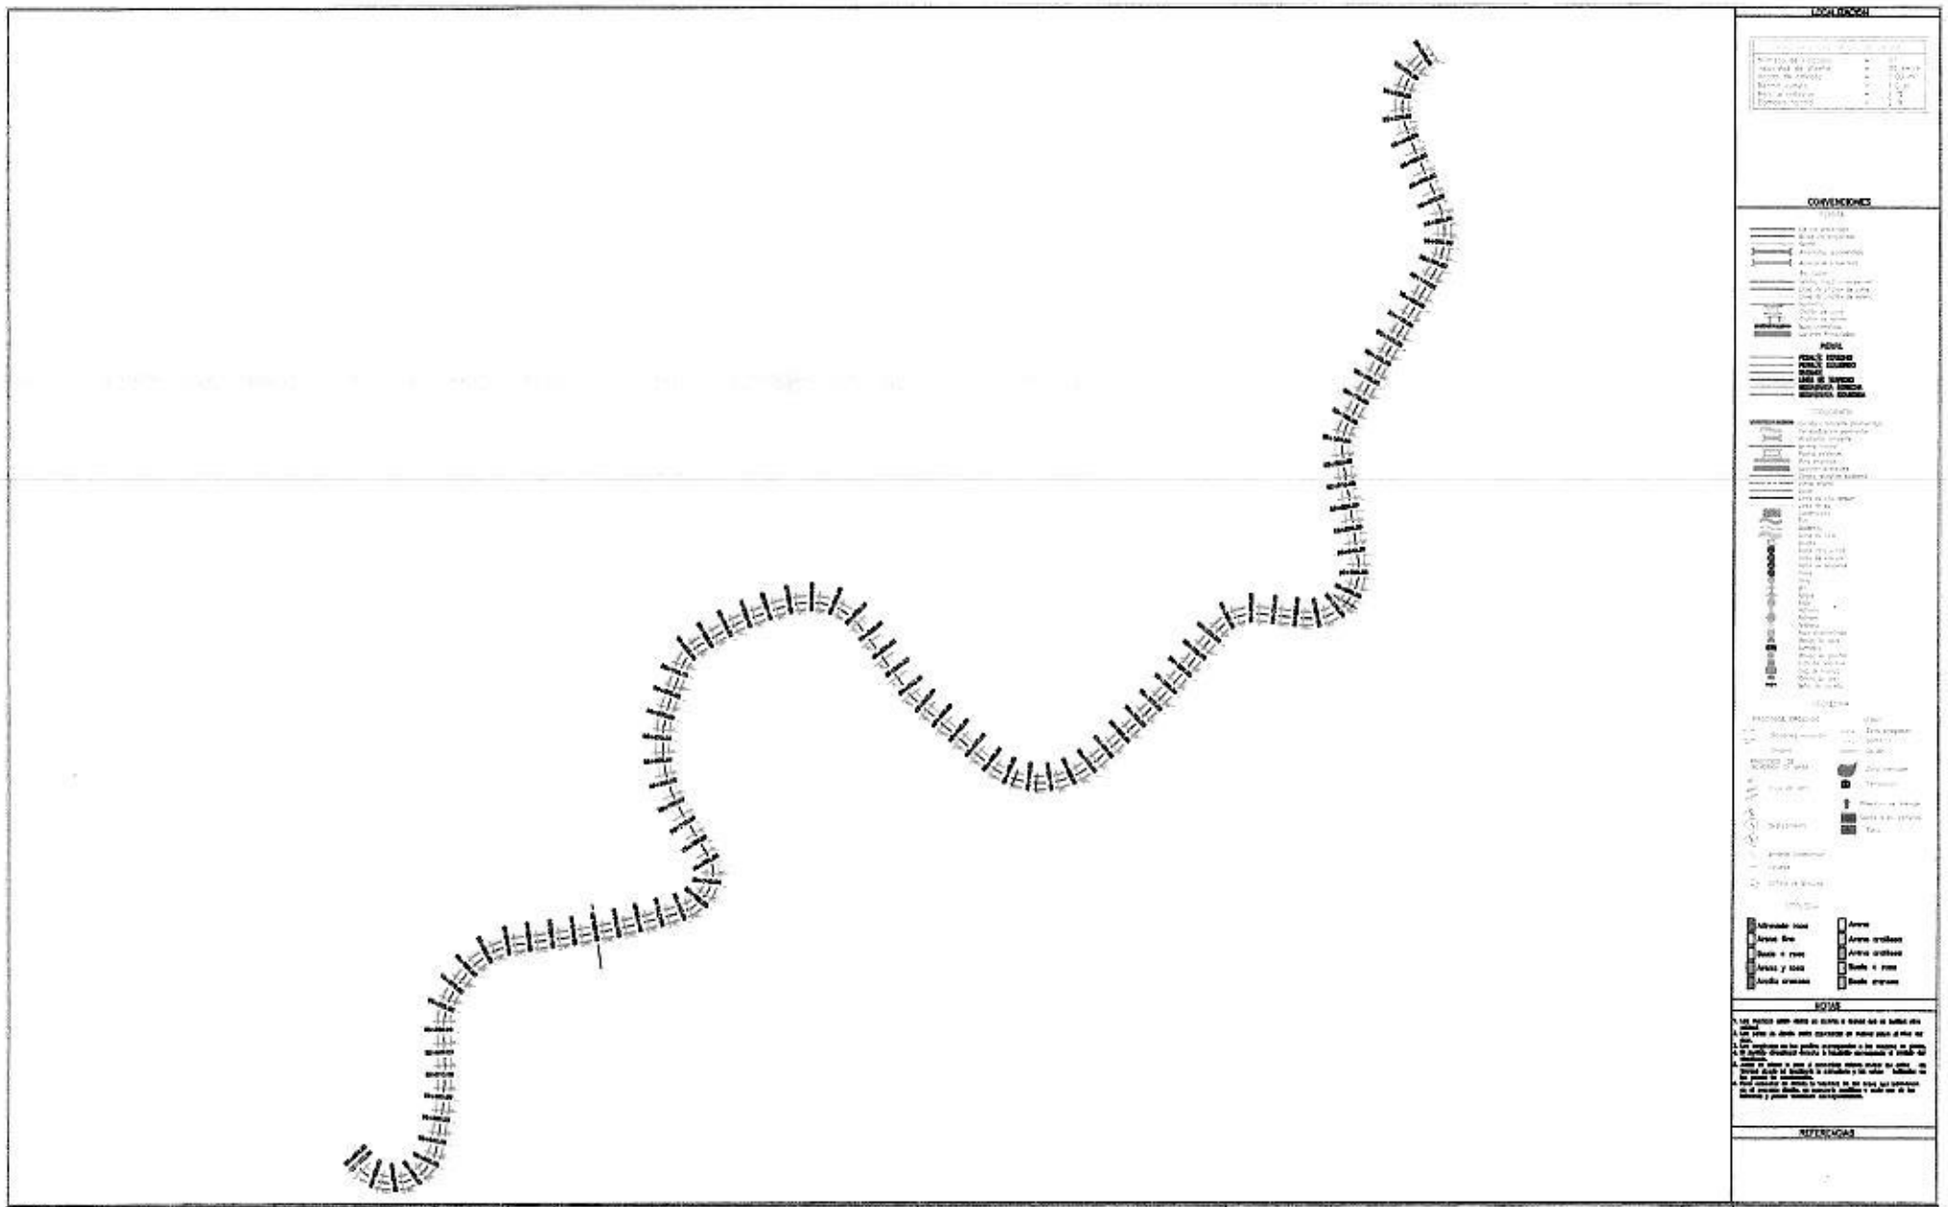

LOCALIZACIÓN

CONVENCIONES


NOTAS

REFERENCIAS


DISEÑO:	DIBUJÓ: A.P.C.	PROYECTO: RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS PK80+000 – PK106+000	CONTIENE: SECCIONES TRANSVERSALES MATERIAL DE MEJORAMIENTO K98+000 K98+000 TRAMO 3	ESCALA: V: 100 H: 1000	PLANOS 1 DE X
	REVISÓ:			FECHA: Marzo 2025	ARCHIVO:

INGENIERIA DE VALOR


SAN MIGUEL

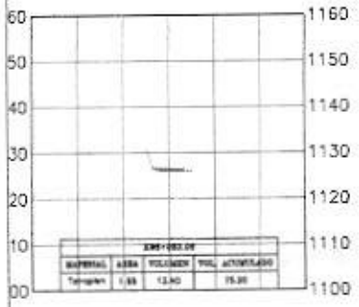


98+080

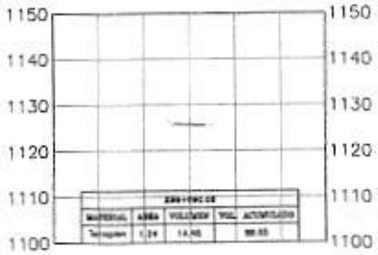


98+090

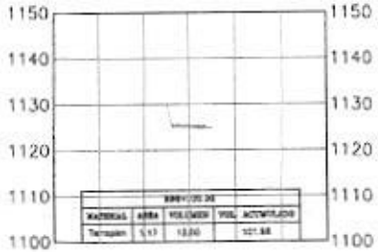

98+100

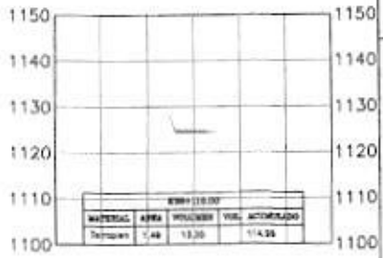


98+110

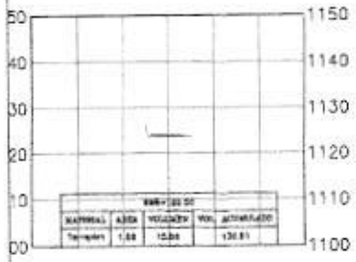

98+120




98+130

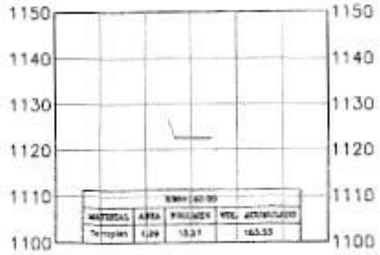


98+140




	mab INGENIERIA DE VALOR	SAN MIGUEL	DIBUJO: A.P.C. REVISÓ:		PROYECTO: RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS PK90+000 – PK106+000	CONTIENE: SECCIONES TRANSVERSALES MATERIAL DE MEJORAMIENTO K98+000 K99+140 TRAMO 3	ESCALA: V: 100 H: 1000	PLANOS 1 DE X
							FECHA: Marzo 2026	ARCHIVO:

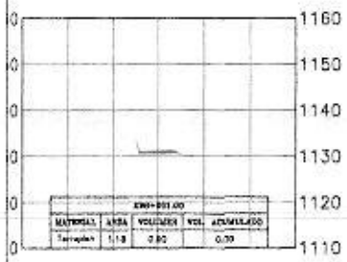


98+001

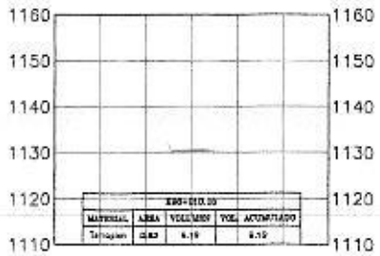


98+010

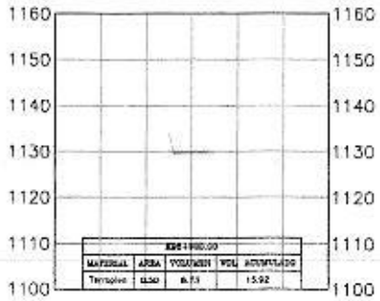


98+020

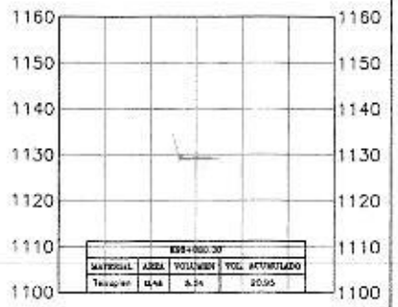


98+030

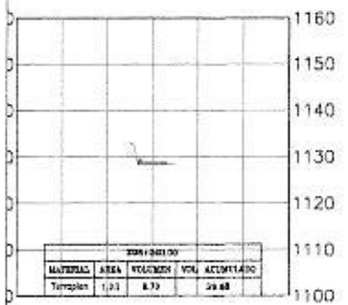


98+040

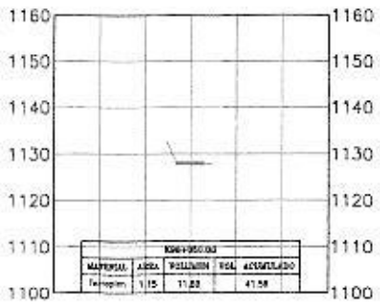

98+050

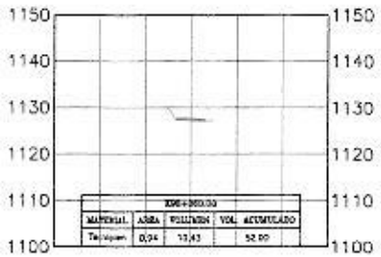

98+060

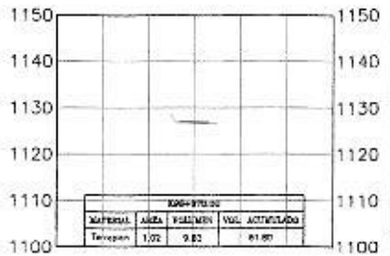


98+070




	INGENIERÍA DE VALOR		DIBUJÓ: A.P.C. REVISÓ:		PROYECTO: RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS PK90+000 – PK108+000	CONTIENE: SECCIONES TRANSVERSALES MATERIAL DE MEJORAMIENTO K98+000 K99+140 TRAMO 3	ESCALA: V: 1:100 H: 1:1000	PLANOS 1 DE X FECHA: Marzo 2026 ARCHIVO:


E EMPALME K98+145-155

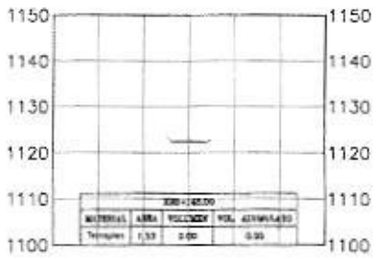

98+145

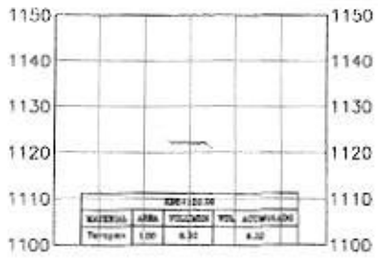


98+150

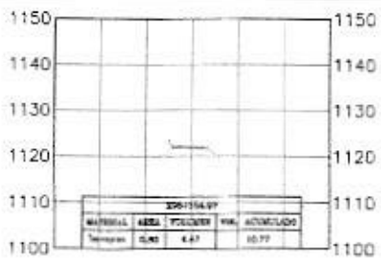


98+155




	DIBUJÓ A.P.C.	PROYECTO: RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS PK90+000 – PK105+000	CONTIENE: SECCIONES TRANSVERSALES MATERIAL DE MEJORAMIENTO K98+000 K98+140 TRAMO 3	ESCALA: H: 1:100 V: 1:100	PLANOS 1 DE X
				FECHA: Marzo 2025	ARCHIVO:

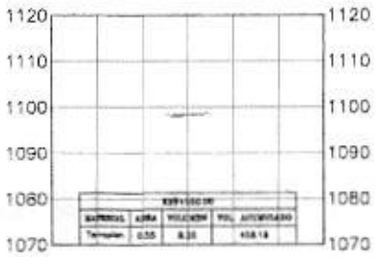

98+550

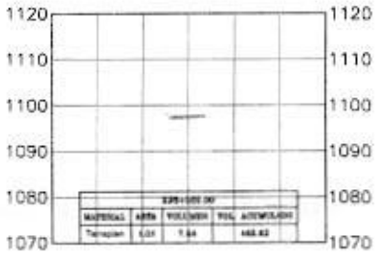

98+560

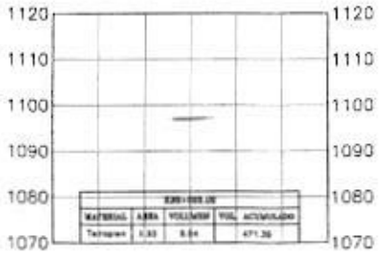

98+565


ESCALIZACIÓN

CONVENCIONES


NOTAS

REFERENCIAS


	DISEÑO: A.P.C.	PROYECTO: RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS PK90+000 – PK106+000	CONTIENE: SECCIONES TRANSVERSALES MATERIAL DE MEJORAMIENTO 98+610 K98+995 TRAMO 3	ESCALA: V: 1/00 H: 1/00	PLANOS 1 DE X
				FECHA: Marzo 2025	ARCHIVO:

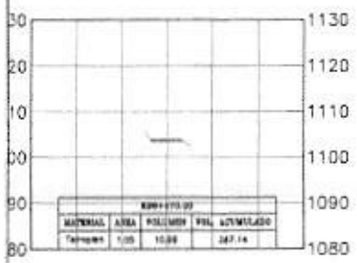


98+470

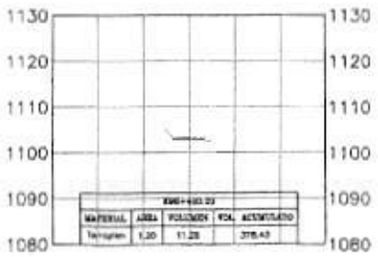


98+480

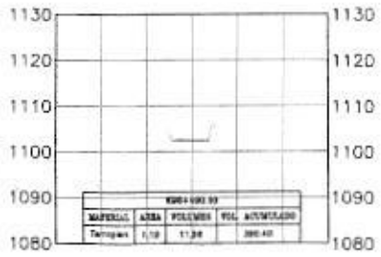


98+490

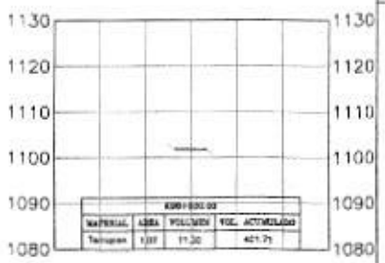


98+500

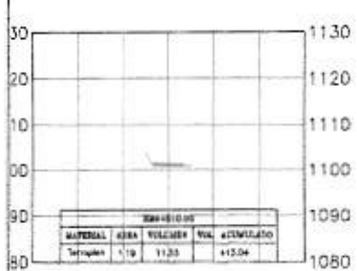


98+510

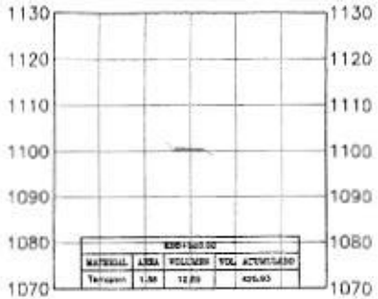

98+520

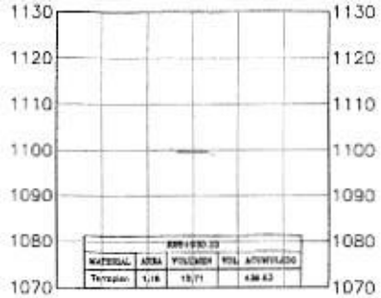

98+530

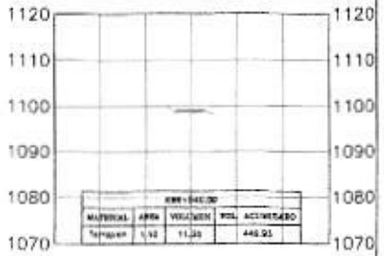

98+540


UBICACIÓN

CONVENCIONES


NOTAS

REFERENCIAS


	INGENIERÍA DE VALOR	SAN MIGUEL	DIBUJÓ A.P.C. revisó	PROYECTO: RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS PK90+000 – PK106+000	CONTIENE: SECCIONES TRANSVERSALES MATERIAL DE MEJORAMIENTO 98+510 K96+995 TRAMO 3	ESCALA: V: 1:00 H: 1:00	PLANOS 1 DE X FECHA: Marzo 2026

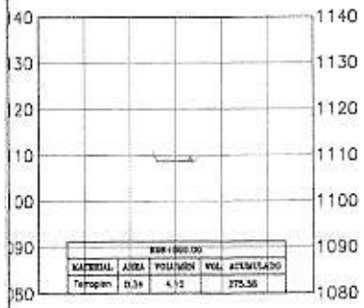


98+390

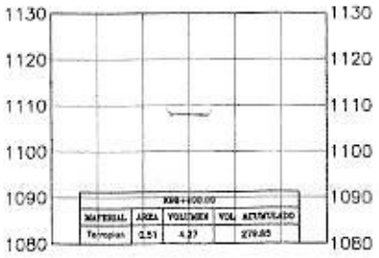


98+400

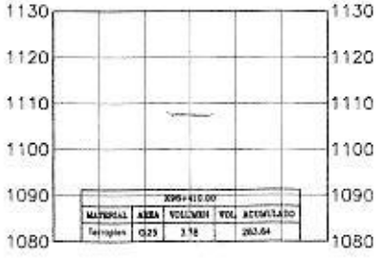


98+410

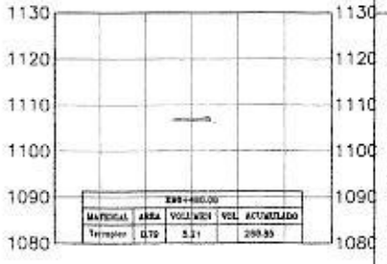


98+420

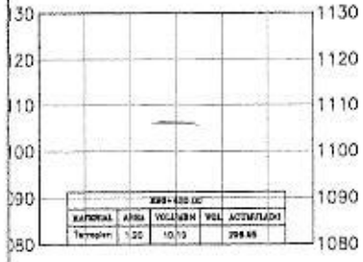


98+430

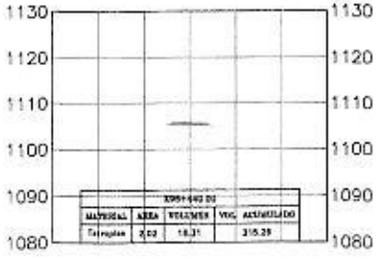

98+440

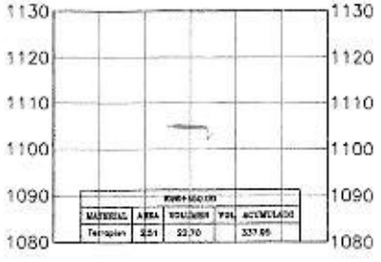

98+450

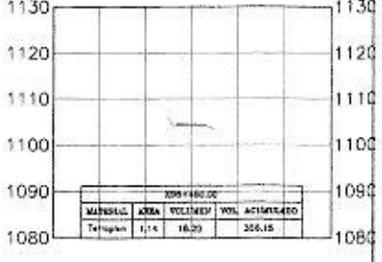

98+460


LOCALIZACIÓN

CONVENCIONES


NOTAS

REFERENCIAS


INTERVENTOR: INGENIERÍA DE VALOR	CONSTRUCTOR: SAN MIGUEL	DIBUJÓ: A.P.C.	PROYECTO: RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS PK90+000 – PK105+000	CONTIENE: SECCIONES TRANSVERSALLS MATERIAL DE MEJORAMIENTO 98+610 K98+995 TRAMO 3
			ESCALA: V: 100 H: 1000	PLANOS 1 DE X
			FECHA: Marzo 2026	ARCHIVO:

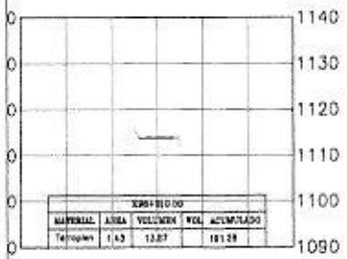


98+310

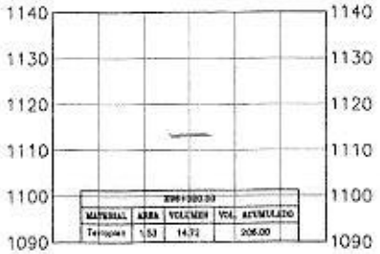


98+320

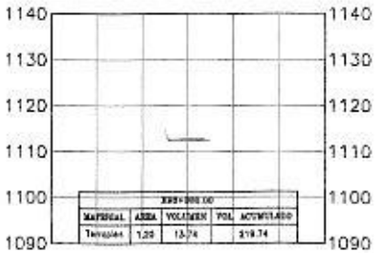


98+330

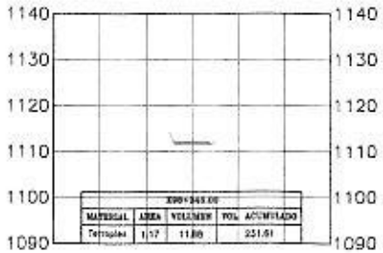


98+340

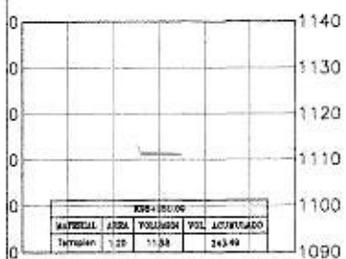


98+350

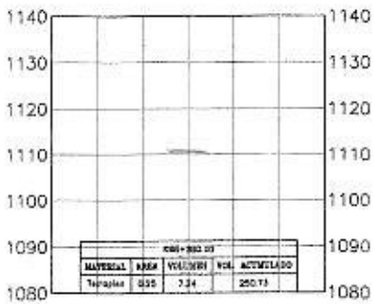

98+360

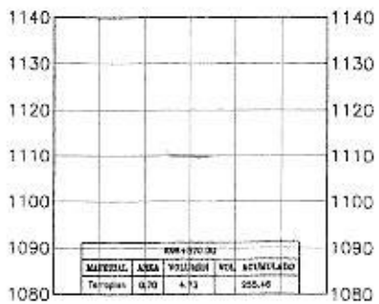

98+370

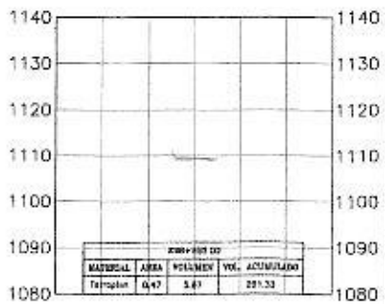

98+380

UBICACIÓN

CONVENCIONES

NOTAS

REFERENCIAS

INGENIERIA DE VALOR

DIBUJÓ: A.P.C.

PROYECTO: RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS PK90+000 – PK105+000


CONTIENE: SECCIONES TRANSVERSALES MATERIAL DE MEJORAMIENTO K98+000 K98+140 TRAMO 3

ESCALA: V: 1:100 H: 1:1000


PLANOS 1 DE X

FECHA: Marzo 2026


ARCHIVO:

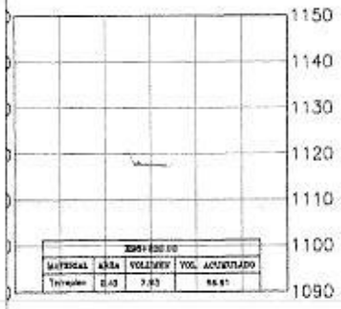


98+230

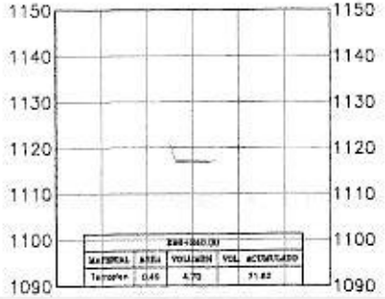


98+240

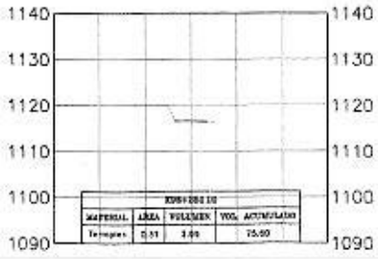


98+250

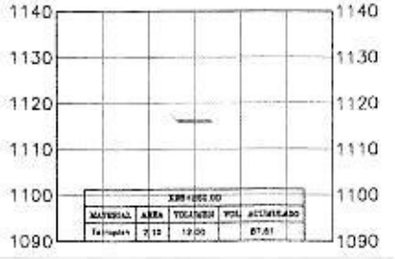


98+260

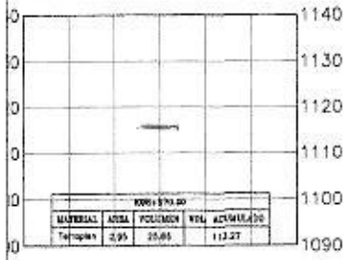


98+270

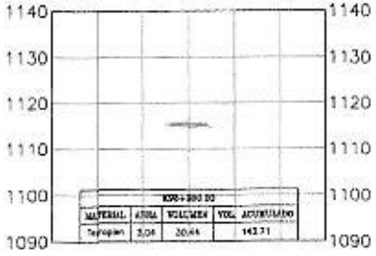

98+280

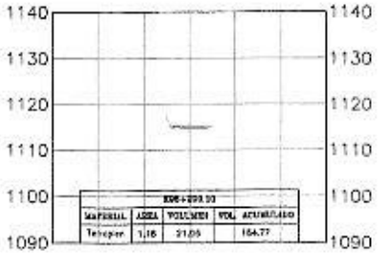

98+290

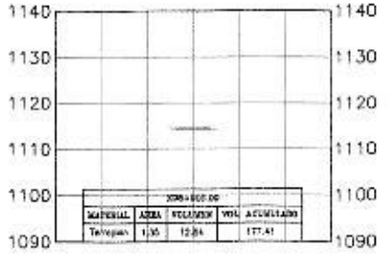

98+300

LOCALIZACIÓN

CONVENCIONES


NOTAS

REFERENCIAS


		DIBUJÓ: A.P.C.	PROYECTO: RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS PK90+000 -- PK105+000	CONTIENE: SECCIONES TRANSVERSALES MATERIAL DE MEJORAMIENTO K98+000 K99+140 TRAMO 3	ESCALA V: 1:100 H: 1:000
		REVISÓ:			FECHA: Marzo 2026

PLANOS 1 DE X


ARCHIVO:

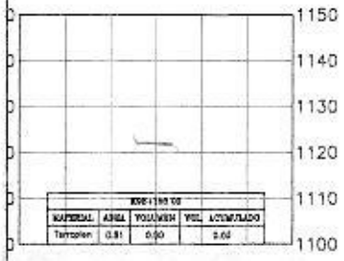


98+155

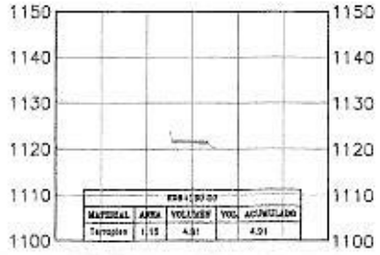


98+160

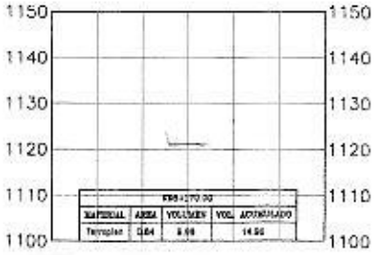


98+170

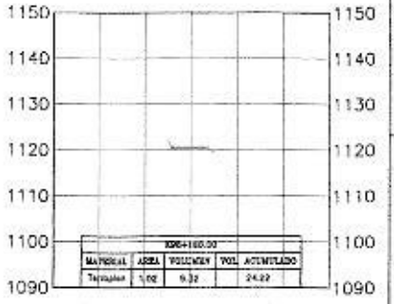


98+180

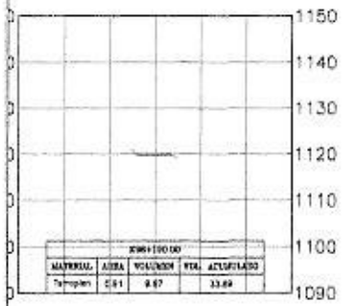


98+190

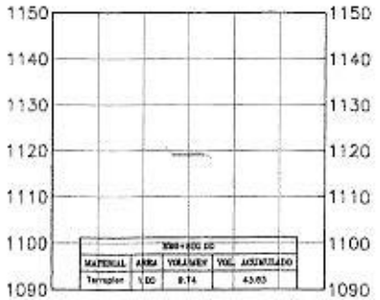

98+200

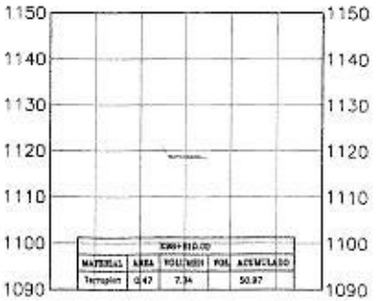

98+210

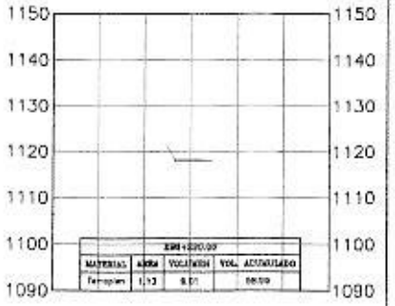

98+220

UBICACIÓN

CONVENCIONES

NOTAS

REFERENCIAS

INTERVENTOR: INGENIERÍA DE VALOR

CONSTRUCTOR: SAN MIGUEL

DIBUJÓ: A.P.C.

PROYECTO: RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS PK90+000 – PK106+000

CONTIENE: SECCIONES TRANSVERSALES MATERIAL DE MEJORAMIENTO K98+000 K99+140 TRAMO 3


ESCALA: V: 1:100 H: 1:100

PLANOS 1 DE X


FECHA: Marzo 2025

ARCHIVO:


E EMPALME K98+570-609

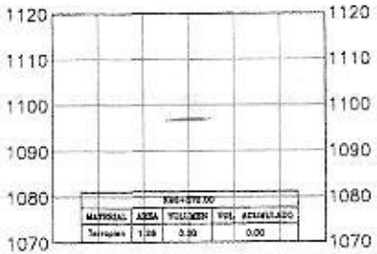


98+570

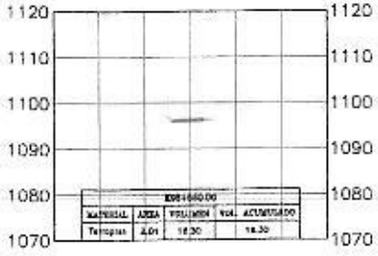


98+580

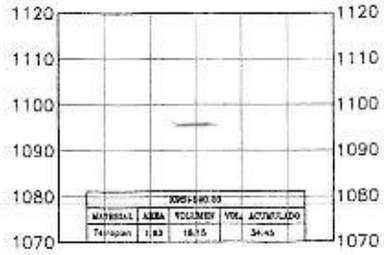

98+590

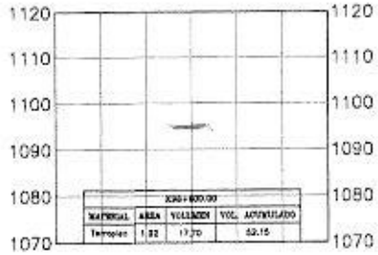

98+600

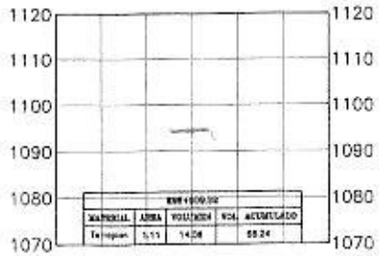

98+609


UBICACIÓN

CONVENCIONES


NOTAS

REFERENCIAS


			DIBUJÓ: A.P.C.		PROYECTO: RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS PK90+000 – PK105+000	CONTIENE: SECCIONES TRANSVERSALES MATERIAL DE MEJORAMIENTO E EMPALMES98+570 K98+610 TRAMO 3	ESCALA: H: 1000 V: 100
			REVISÓ:				PLANOS 1 DE X
							FECHA: Marzo 2025 ARCHIVO:

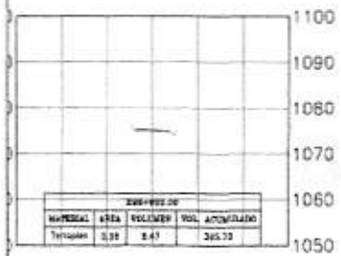


98+930

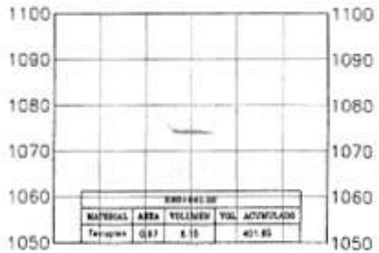


98+940

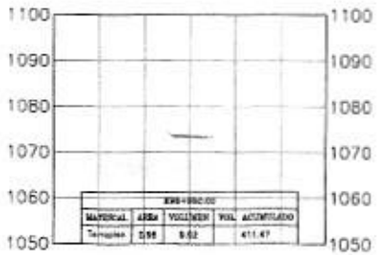


98+950

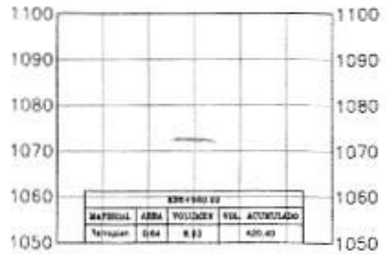


98+960

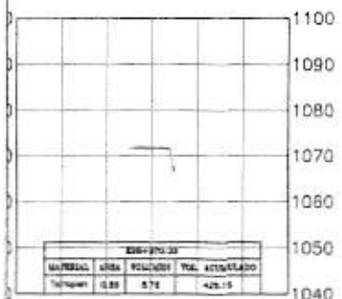


98+970

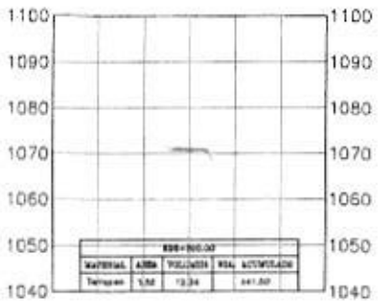

98+980

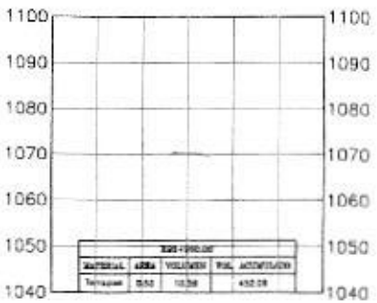

98+990

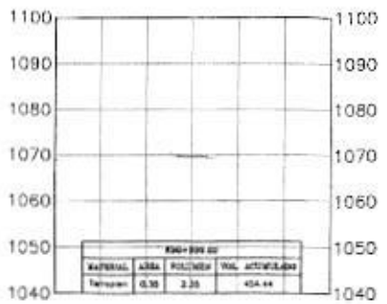

98+995


LOCALIZACIÓN

CONVENCIONES


NOTAS

REFERENCIAS


	INGENIERÍA DE VALOR	SAN MIGUEL	DISEÑO: A.P.C.		PROYECTO: RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS PK90+000 – PK105+000	CONTIENE: SECCIONES TRANSVERSALES MATERIAL DE MEJORAMIENTO 98+810 K98+995 TRAMO 3	ESCALA: V: 100 H: 1000	PLANOS 1 DE X FECHA: Marzo 2026 ARCHIVO:

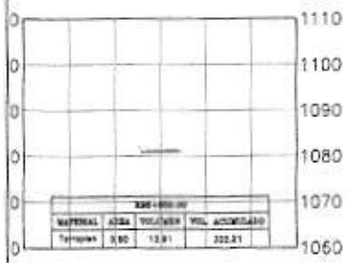


98+850

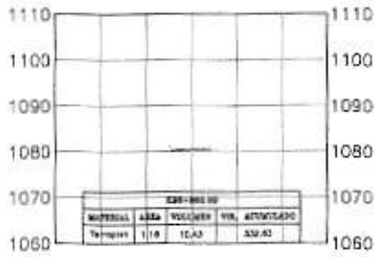


98+860

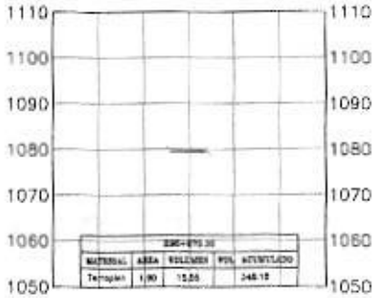


98+870

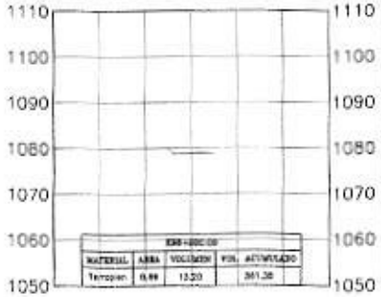


98+880

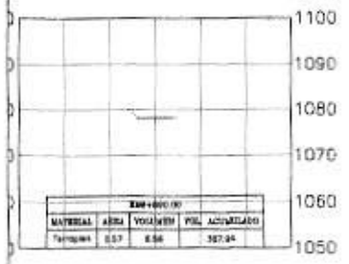


98+890

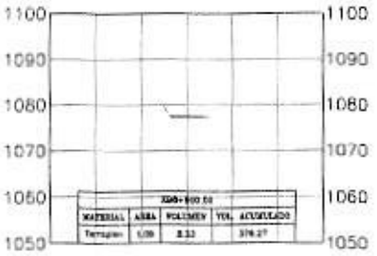

98+900

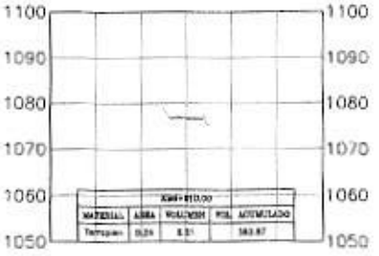

98+910

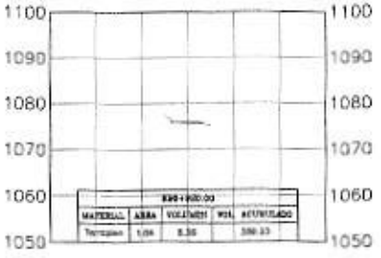

98+920



DIBUJÓ: A.P.C.

PROYECTO: RUTA DEL RENACIMIENTO
ENTRE LOS
DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS
PK90+000 – PK106+000


CONTIENE: SECCIONES TRANSVERSALES
MATERIAL DE MEJORAMIENTO
98+510 K98+995 TRAMO 3

ESCALA: V: 100 H: 1000


PLANOS 1 DE X

FECHA: Marzo 2026


ARCHIVO:

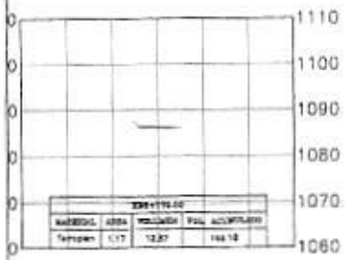


98+770

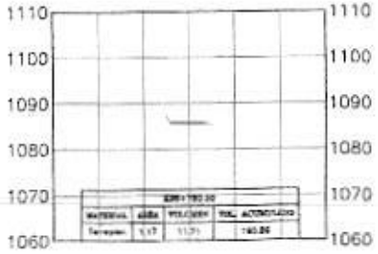


98+780

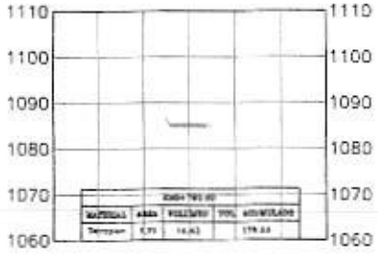


98+790

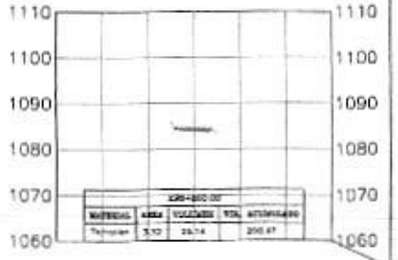


98+800

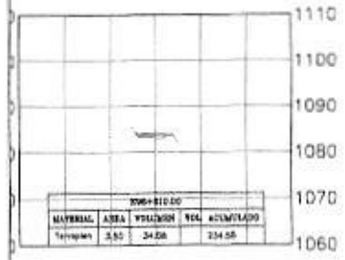


98+810

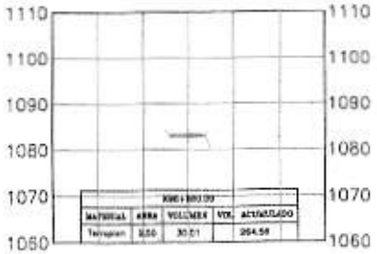

98+820

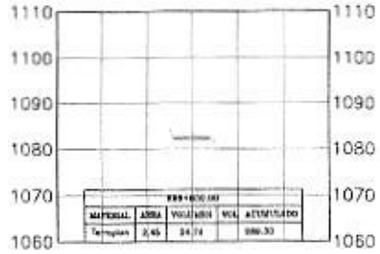

98+830

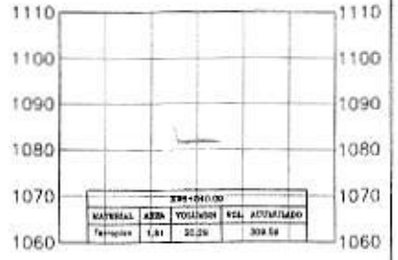

98+840


PROYECTO: RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS PK90+000 – PK106+000

CONTIENE: SECCIONES TRANSVERSALES MATERIAL DE MEJORAMIENTO 98+610 K98+995 TRAMO 3


ESCALA V: 1:100 H: 1:000

PLANOS 1 DE X


FECHA: Marzo 2026

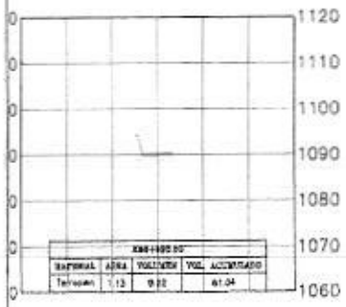


98+690

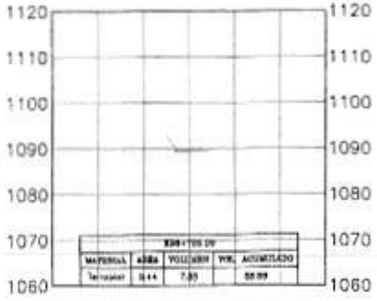


98+700

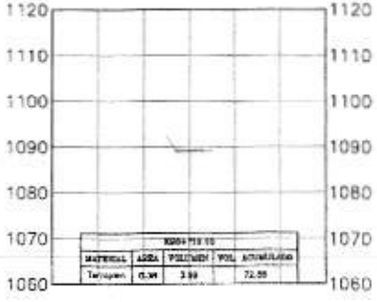


98+710

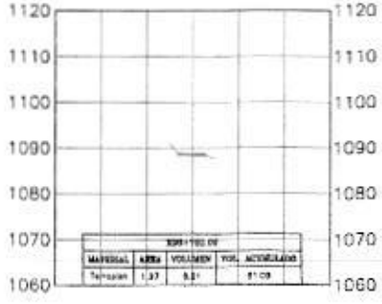


98+720

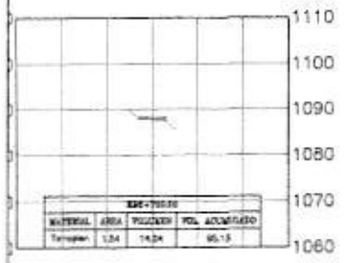


98+730

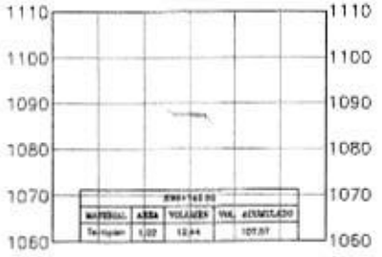

98+740

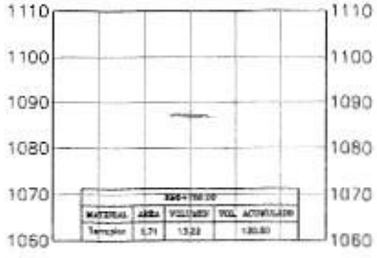

98+750

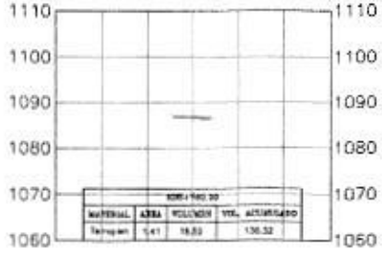

98+760

UBICACIÓN

CONVENCIONES

NOTAS

REFERENCIAS

INTERVENTORÍA: INGENIERÍA DE VALOR

CONSTRUCTOR: SAN MIGUEL

DIBUJÓ: A.P.C.
revisó:

PROYECTO: RUTA DEL RENACIMIENTO
ENTRE LOS
DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS
PK90+000 – PK106+000


CONTIENE: SECCIONES TRANSVERSALES
MATERIAL DE MEJORAMIENTO
98+610 K98+995 TRAMO 3

ESCALA: V: 100 H: 1000


PLANOS 1 DE X

FECHA: Marzo 2026


ARCHIVO:

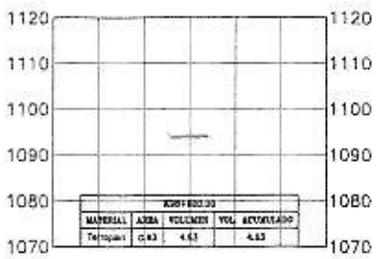


98+620

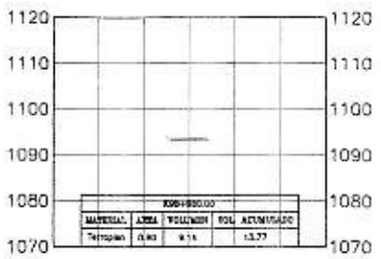


98+630

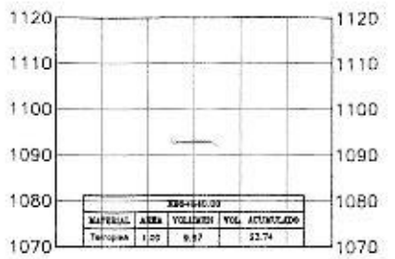


98+640

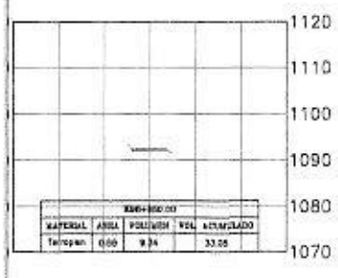


98+650

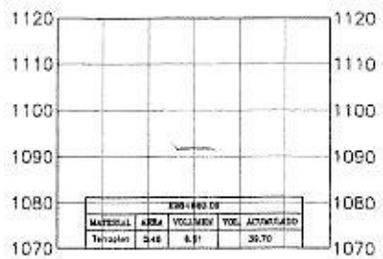

98+660

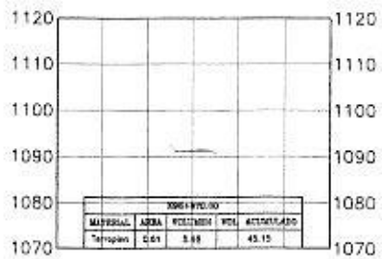

98+670

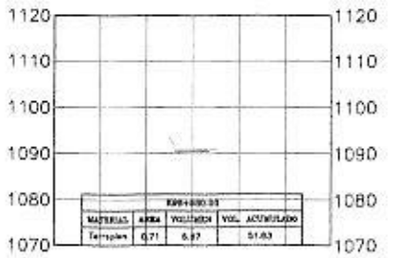

98+680

LOCALIZACIÓN

CONVENCIONES

NOTAS

REFERENCIAS

INTERVENTORÍA

CONSULTORES

DIBUJÓ: A.P.C.

PROYECTO: RUTA DEL RENACIMIENTO
ENTRE LOS
DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS
PK90+000 – PK105+000

CONTIENE: SECCIONES TRANSVERSALES
MATERIAL DE MEJORAMIENTO
98+610 K98+995 TRAMO 3

ESCALA: V: 100 H: 1000

PLANOS 1 DE X

FECHA: Marzo 2026

ARCHIVO:

Gobierno de CALDAS	GOBERNACION DE CALDAS	Hoja No 1 de 1
	Secretaría de Infraestructura	
	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS	

PREACTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

PREACTA DE OBRA No:	29 (veinte y 9	FECHA:	25/03/2026
PERIODO:	26 DE FEBRERO AL 25 DE MARZO DE 2026.		
CONTRATO DE OBRA No:	2302023-1456	CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	1071 28 2022	INTERVENTORÍA:	MAR INGENIERIA DE VALOR
ITEM	70		UNIDAD
MP 211.1	REMOCION DE DERRUMBES		M3

ACTA PARCIAL DE OBRA NO. 28

ABS INICIAL	ABS FINAL	VIAJES	VOLUMEN	TOTAL	MARGEN	DESCRIPCION	
DERRUMBE EN VIA							
K102+800	K102+800	8	14	112.00	D/I	Derrumbe en Vía	K102+800.00
K098+450	K098+450	5	14	70.00	D/I	Derrumbe en Vía	K98+450.00
K102+800	K102+800	16	14	224.00	D/I	Derrumbe en Vía	K102+800.00
K102+470	K102+470	4	14	56.00	D/I	Derrumbe en Vía	K102+470.00
K102+800	K102+800	2	14	28.00	D/I	Derrumbe en Vía	K102+800.00
K104+630	K104+630	32	14	448.00	D/I	Derrumbe en Vía	K104+630.00
K104+630	K104+630	2	14	28.00	D/I	Derrumbe en Vía	K104+630.00
K098+500	K098+500	3	14	42.00	D/I	Derrumbe en Vía	K98+500.00
K104+630	K104+630	9	14	126.00	D/I	Derrumbe en Vía	K104+630.00
K098+400	K098+400	4	14	56.00	D/I	Derrumbe en Vía	K98+400.00
K098+500	K098+500	6	14	84.00	D/I	Derrumbe en Vía	K98+500.00
K104+630	K104+630	17	14	238.00	D/I	Derrumbe en Vía	K104+630.00
K102+320	K102+320	28	14	392.00	D/I	Derrumbe en Vía	K102+320.00
K104+630	K104+630	5	14	70.00	D/I	Derrumbe en Vía	K104+630.00
K102+320	K102+320	30	14	420.00	D/I	Derrumbe en Vía	K102+320.00
K102+320	K102+320	12	14	168.00	D/I	Derrumbe en Vía	K102+320.00
K102+790	K102+790	1	14	14.00	D/I	Derrumbe en Vía	K102+790.00
K102+800	K102+800	4	14	56.00	D/I	Derrumbe en Vía	K102+800.00
K102+830	K102+830	4	14	56.00	D/I	Derrumbe en Vía	K102+830.00
K102+320	K102+320	4	14	56.00	D/I	Derrumbe en Vía	K102+320.00
K104+000	K104+000	7	14	98.00	D/I	Derrumbe en Vía	K104+000.00
K104+630	K104+630	17	14	238.00	D/I	Derrumbe en Vía	K104+630.00
K103+950	K103+950	2	14	28.00	D/I	Derrumbe en Vía	K103+950.00
K104+000	K104+000	19	14	266.00	D/I	Derrumbe en Vía	K104+000.00
K097+000	K104+000	14	13.8	193.6	D/I	Derrumbe (Habilitar vía)	K97+000.00
SUB TOTAL ACTA PARCIAL NO. 28			3568.00				

ACTA PARCIAL NO. 1	
ACTA PARCIAL NO. 2	
ACTA PARCIAL NO. 3	
ACTA PARCIAL NO. 4	
ACTA PARCIAL NO. 5	
ACTA PARCIAL NO. 6	
ACTA PARCIAL NO. 7	3018.00
ACTA PARCIAL NO. 8	3023.00
ACTA PARCIAL NO. 9	2173.00
ACTA PARCIAL NO. 10	48136.00
ACTA PARCIAL NO. 11	168.00
ACTA PARCIAL NO. 12	5119.00
ACTA PARCIAL NO. 13	6758.43
ACTA PARCIAL NO. 14	13760.00
ACTA PARCIAL NO. 15	4238.00
ACTA PARCIAL NO. 16	3556.00
ACTA PARCIAL NO. 17	1638.00
ACTA PARCIAL NO. 18	671.40
ACTA PARCIAL NO. 19	6941.00
ACTA PARCIAL NO. 20	2774.00
ACTA PARCIAL NO. 21	5713.00
ACTA PARCIAL NO. 22	9033.00
ACTA PARCIAL NO. 23	18003.00
ACTA PARCIAL NO. 24	2633.00
ACTA PARCIAL NO. 25	303.00
ACTA PARCIAL NO. 26	3626.00
ACTA PARCIAL NO. 27	7560.00
ACTA PARCIAL NO. 28	**3568.00**
TOTAL ACUMULADO	155734.8

ING. SEBASTIAN GOMEZ VERGARA
MAR INGENIERIA DE VALOR
INTERVENTORIA

ING. LEONEL ARCOS SANCHEZ
CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA

Gobierno de CALDAS	GOBERNACIÓN DE CALDAS Secretaría de Infraestructura MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA – SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS	Hoja No 1 de 1

PREACTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA – SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

PREACTA DE OBRA No:	28 TRAMO 3	FECHA:	28/03/2026
PERIODO:	28 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO DEL 2026		
CONTRATO DE OBRA No:	29092023-1456	CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	1071 DE 2022	INTERVENTORÍA:	MAB INGENIERIA DE VALOR
ITEM	75		UNIDAD
NP 610.2	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE PRESTAMO,EXCAVACIONES Y/O DERRUMBES		m3

Abscisa Inicial	Abscisa Final	Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Cantidad	Margen	Descripción
ACTA PARCIAL DE COBRO NO. 28							
MUROS							
K100+420.00	K100+420.00	7.75	2.00	1.60	24.83	DERECHA	Relleno de MURO con material de prestamo
K100+420.00	K100+420.00	7.75	0.20	1.30	-2.02	DERECHA	Descuento filtro muro
K102+420.00	K102+420.00	13.00	1.40	1.74	31.67	DERECHA	Rellano de MURO con material de prestamo
K102+420.00	K102+420.00	13.00	0.20	1.44	-3.74	DERECHA	Descuento filtro muro
K102+560.00	K102+560.00	14.30	1.50	2.05	43.97	DERECHA	Relleno de MURO con material de prestamo
K102+560.00	K102+560.00	14.30	0.20	1.75	-5.01	DERECHA	Descuento filtro muro
SUB TOTAL ACTA PARCIAL NO. 28				88.7			

ACTA PARCIAL NO. 1	
ACTA PARCIAL NO. 2	
ACTA PARCIAL NO. 3	
ACTA PARCIAL NO. 4	
ACTA PARCIAL NO. 5	
ACTA PARCIAL NO. 6	
ACTA PARCIAL NO. 7	628.30
ACTA PARCIAL NO. 8	759.30
ACTA PARCIAL NO. 9	705.90
ACTA PARCIAL NO. 10	714.00
ACTA PARCIAL NO. 11	231.30
ACTA PARCIAL NO. 12	427.60
ACTA PARCIAL NO. 13	223.30
ACTA PARCIAL NO. 14	29.90
ACTA PARCIAL NO. 15	0.00
ACTA PARCIAL NO. 16	0.00
ACTA PARCIAL NO. 17	0.00
ACTA PARCIAL NO. 18	99.20
ACTA PARCIAL NO. 19	695.00
ACTA PARCIAL NO. 20	628.30
ACTA PARCIAL NO. 21	283.00
ACTA PARCIAL NO. 22	745.50
ACTA PARCIAL NO. 23	253.90
ACTA PARCIAL NO. 24	267.20
ACTA PARCIAL NO. 25	25.00
ACTA PARCIAL NO. 26	1696.66
ACTA PARCIAL NO. 27	391.80
ACTA PARCIAL NO. 28	**88.70**
TOTAL ACUMULADO	8881.6

ING. SEBASTIAN GOMEZ VERGARA
MAB INGENIERIA DE VALOR
INTERVENTORIA

ING. EDWARD ARDILES SANCHEZ
CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA

Gobierno de CALDAS

GOBERNACIÓN DE CALDAS

Secretaría de Infraestructura

Hoja No 1 de 1

MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

PLANILLA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

PLANILLA DE OBRA No:	28 PARCIAL 3	FECHA:	28/03/2026
PERIODO:	25 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2026		
CONTRATO DE OBRA No:	2809202-1456	CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	1071 DE 2022	INTERVENTORÍA:	MAR INGENIERIA DE VALOR

ITEM		UNIDAD
NP 900.9.2	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE DERRUMBES, MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	m3/km

ACTA PARCIAL DE OBRA NO. 28

DESCRIPCIÓN DE VÍA								
ABSCISA INICIAL VÍA	K107+580.00							
ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN	UNID/LONG/KG	CENTRO DE GRAV	VOLUMEN SUELTO (M3)	MASADA	DISTANCIA (KM)	TRANSPORTE (M3/KM)	Descripción
K107+600,00	K107+580,00		K107+590,00	110,00	LV1	4,27	526,85	Traslado mat. derrumbe
K98+130,00	K107+580,00		K103+855,00	70,00	LV1	9,80	630,00	Traslado mat. derrumbe
K106+480,00	K107+580,00		K107+030,00	126,00	LV1	4,55	1052,80	Traslado mat. derrumbe
K106+483,20	K107+580,20		K106+436,60	58,00	LV1	5,05	260,00	Traslado mat. derrumbe
K102+580,00	K107+580,20		K103+810,00	28,00	LV1	4,30	151,40	Traslado mat. derrumbe
K104+610,00	K107+580,20		K106+030,00	448,50	LV1	2,50	1209,20	Traslado mat. derrumbe
K104+530,00	K107+580,20		K106+030,00	70,00	LV1	2,50	81,20	Traslado mat. derrumbe
99+580,00	K107+580,00		0+080,20	42,00	LV1	3,30	370,00	Traslado mat. derrumbe
K114+630,00	K107+580,00		K114+632,20	126,00	LV1	7,30	385,80	Traslado mat. derrumbe
K98+600,00	K107+580,00		K100+607,20	54,00	LV1	3,10	569,60	Traslado mat. derrumbe
K98+530,00	K107+580,00		K98+107,20	84,00	LV1	9,80	798,80	Traslado mat. derrumbe
K104+624,00	K107+580,00		K104+613,00	280,00	LV1	5,95	490,00	Traslado mat. derrumbe
K102+727,00	K107+530,00		K104+613,00	392,00	LV1	5,25	2038,40	Traslado mat. derrumbe
K104+637,00	K107+530,00		K104+613,00	70,00	LV1	2,90	203,00	Traslado mat. derrumbe
K102+727,00	K107+530,00		K104+613,00	520,00	LV1	5,20	2704,00	Traslado mat. derrumbe
K102+713,00	K107+580,20		K104+613,00	168,00	LV1	5,20	873,60	Traslado mat. derrumbe
K102+798,00	K107+580,20		K102+798,00	14,00	LV1	4,70	65,80	Traslado mat. derrumbe
K102+858,00	K107+580,20		K102+858,00	58,00	LV1	4,70	272,60	Traslado mat. derrumbe
K97+838,80	K107+580,20		K97+838,80	56,00	LV1	4,90	274,40	Traslado mat. derrumbe
K97+538,80	K107+580,20		K97+538,80	56,00	LV1	5,00	280,00	Traslado mat. derrumbe
K92+878,10	K107+580,00		K92+887,20	98,00	LV1	5,00	490,00	Traslado mat. derrumbe
K102+630,10	K107+580,00		K104+613,20	168,00	LV1	2,90	490,20	Traslado mat. derrumbe
K102+590,10	K107+580,00		K104+607,20	28,00	LV1	5,25	98,00	Traslado mat. derrumbe
K104+60,10	K107+580,00		K104+63,00	266,00	LV1	3,90	931,00	Traslado mat. derrumbe
K105+580,00	K107+580,00		K104+603,00	197,62	LV1	7,60	1353,34	Traslado mat. derrumbe
SUB TOTAL ACTA PARCIAL NO. 28				3630,00				

ACTA PARCIAL NO. 1	
ACTA PARCIAL NO. 2	
ACTA PARCIAL NO. 3	
ACTA PARCIAL NO. 4	
ACTA PARCIAL NO. 5	
ACTA PARCIAL NO. 6	
ACTA PARCIAL NO. 7	6387,50
ACTA PARCIAL NO. 8	7168,00
ACTA PARCIAL NO. 9	3303,00
ACTA PARCIAL NO. 10	4830,00
ACTA PARCIAL NO. 11	812,00
ACTA PARCIAL NO. 12	1330,00
ACTA PARCIAL NO. 13	20338,03
ACTA PARCIAL NO. 14	7611,50
ACTA PARCIAL NO. 15	8057,50
ACTA PARCIAL NO. 16	3500,50
ACTA PARCIAL NO. 17	1680,00
ACTA PARCIAL NO. 18	4452,00
ACTA PARCIAL NO. 19	1.932,00
ACTA PARCIAL NO. 20	13421,00
ACTA PARCIAL NO. 21	24146,00
ACTA PARCIAL NO. 22	5042,00
ACTA PARCIAL NO. 23	42344,00
ACTA PARCIAL NO. 24	8952,50
ACTA PARCIAL NO. 25	2821,50
ACTA PARCIAL NO. 26	26893,50
ACTA PARCIAL NO. 27	32243,00
ACTA PARCIAL NO. 28	10340,00
TOTAL ACUMULADO	436151,53

ING. SEBASTIAN GOMEZ VERGARA
MAR INGENIERIA DE VALOR
INTERVENTORIA

ING. EDWARD ANDRES SANCHEZ
CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA

Gobierno de CALDAS	GOBERNACION DE CALDAS Secretaria de Infraestructura	Hoja No 1 de 1
	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS	

PREACTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

PREACTA DE OBRA No:	28 TRAMO 3	FECHA:	28/03/2026
PERIODO:	28 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO DEL 2026		
CONTRATO DE OBRA No:	29092023-1456	CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	1071 DE 2022	INTERVENTORÍA:	MAS INGENIERIA DE VALOR

ITEM		UNIDAD
NP 600.2.1	EXCAVACIONES EN ROCA PARA ESTRUCTURAS INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN EN ZONAS DE DEPOSITO AUTORIZADAS	m3

ACTA PARCIAL DE COBRO NO. 28

FILTROS							
Abscisa Inicial	Abscisa Final	Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Margen	Cantidad	Descripción
101+452	101+673	139.98	0.50	0.80	I	55.99	Excavación filtros
101+675	101+755	74.40	0.50	0.80	I	29.76	Excavación filtros
SUB TOTAL ACTA PARCIAL NO. 28					85.80		

ACTA PARCIAL NO. 1	
ACTA PARCIAL NO. 2	
ACTA PARCIAL NO. 3	
ACTA PARCIAL NO. 4	
ACTA PARCIAL NO. 5	
ACTA PARCIAL NO. 6	
ACTA PARCIAL NO. 7	
ACTA PARCIAL NO. 8	
ACTA PARCIAL NO. 9	
ACTA PARCIAL NO. 10	
ACTA PARCIAL NO. 11	0.00
ACTA PARCIAL NO. 12	0.00
ACTA PARCIAL NO. 13	532.10
ACTA PARCIAL NO. 14	16.12
ACTA PARCIAL NO. 15	0.00
ACTA PARCIAL NO. 16	0.00
ACTA PARCIAL NO. 17	37.10
ACTA PARCIAL NO. 18	38.50
ACTA PARCIAL NO. 19	0.00
ACTA PARCIAL NO. 20	0.00
ACTA PARCIAL NO. 21	138.30
ACTA PARCIAL NO. 22	147.20
ACTA PARCIAL NO. 23	6.50
ACTA PARCIAL NO. 24	81.10
ACTA PARCIAL NO. 25	99.40
ACTA PARCIAL NO. 26	69.80
ACTA PARCIAL NO. 27	253.30
ACTA PARCIAL NO. 28	**85.80**
TOTAL ACUMULADO	1563.7

ING. SEBASTIÁN GOMEZ VERGARA
MAS INGENIERIA DE VALOR
INTERVENTORIA

ING. EDWARD ANDRES SANCHEZ
CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA

Gobierno de CALDAS	GOBERNACIÓN DE CALDAS	Hoja No 1 de 1
	Secretaría de Infraestructura	
	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS	

PREACTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS		
PREACTA DE OBRA No:	28 TRAMO 3	FECHA:	28/03/2026
PERIODO:	28 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO DEL 2026		
CONTRATO DE OBRA No:	29092023-1456	CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	1071 DE 2022	INTERVENTORÍA:	MAD INGENIERIA DE VALOR

ITEM	92	UNIDAD
995	CORTE DE PAVIMENTO CON CORTADORA	ml

Abscisa Inicial	Abscisa Final	Modulos (Und)	Largo (m)	Alto (m)	Margen	Cantidad	Descripción
K98+825	K98+910	2.00	2.30		D	4.6	Cuneta regular
K98+825	K98+910	1.00	2.37		D	2.37	Placa cuneta irregular
K98+825	K98+910	7.00	2.23		D	16.03	Batea
K98+825	K98+910	24.00	2.30		D	55.2	Cuneta regular
K98+825	K98+910	3.00	2.00		D	6	Placa cuneta irregular
					D		
K98+930	K99+060	1.00	2.10		D	2.18	Placa obra
K98+930	K99+060	2.00	1.99		D	3.98	Placa cuneta irregular
K98+930	K99+060	18.00	2.30		D	41.4	Cuneta regular
K98+930	K99+060	1.00	2.37		D	2.37	Placa sobre muro
K98+930	K99+060	13.00	2.30		D	29.9	Placa sobre muro
K98+930	K99+060	5.00	2.30		D	11.5	Placa cuneta irregular
K98+930	K99+060	16.00	2.30		D	32.2	Cuneta regular
K98+930	K99+060	9.00	2.19		D	19.71	Placa sobre muro
K98+930	K99+060	1.00	3.25		D	3.25	Placa cuneta irregular
SUB TOTAL ACTA PARCIAL NO. 28					1547.00		

ACTA PARCIAL NO. 1	
ACTA PARCIAL NO. 2	
ACTA PARCIAL NO. 3	
ACTA PARCIAL NO. 4	
ACTA PARCIAL NO. 5	
ACTA PARCIAL NO. 6	
ACTA PARCIAL NO. 7	
ACTA PARCIAL NO. 8	
ACTA PARCIAL NO. 9	
ACTA PARCIAL NO. 10	
ACTA PARCIAL NO. 11	
ACTA PARCIAL NO. 12	
ACTA PARCIAL NO. 13	
ACTA PARCIAL NO. 14	
ACTA PARCIAL NO. 15	
ACTA PARCIAL NO. 16	
ACTA PARCIAL NO. 17	
ACTA PARCIAL NO. 18	
ACTA PARCIAL NO. 19	
ACTA PARCIAL NO. 20	
ACTA PARCIAL NO. 21	
ACTA PARCIAL NO. 22	
ACTA PARCIAL NO. 23	
ACTA PARCIAL NO. 24	
ACTA PARCIAL NO. 25	
ACTA PARCIAL NO. 26	
ACTA PARCIAL NO. 27	
ACTA PARCIAL NO. 28	**1547.00**
TOTAL ACUMULADO	1547.0

ING. SEBASTIAN GOMEZ VERGARA
MAD INGENIERIA DE VALOR
INTERVENTORIA

ING. EDWARD ANDRES SANCHEZ
CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA

Gobierno de CALDAS	GOBERNACIÓN DE CALDAS	Hoja No 1 de 1
	Secretaria de Infraestructura	
	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS	

PREACTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

PREACTA DE OBRA No:	28 TRAMO 3	FECHA:	28/03/2026
PERIODO:	28 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO DEL 2026		
CONTRATO DE OBRA No:	29092023-1456	CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	1071 DE 2022	INTERVENTORÍA:	MAB INGENIERIA DE VALOR
ITEM	101		UNIDAD
NP11	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEODREN VIAL PARA FILTROS ALTURA TOTAL 0.71 M, INCLUYE BOLSILLO PARA TUBERIA DE 6"		ML

ACTA PARCIAL DE COBRO No. 28

Abscisa Inicial	Abscisa Final	Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Cantidad	Margen	Descripción
FILTROS							
K101+452.30	K101+673.00	233.30			233.30	I	INSTALACION DE FILTROS
K101+675.30	K101+755.00	74.40			74.40	I	INSTALACION DE FILTROS
SUB TOTAL ACTA PARCIAL NO. 28				307.70			

ACTA PARCIAL NO. 1	
ACTA PARCIAL NO. 2	
ACTA PARCIAL NO. 3	
ACTA PARCIAL NO. 4	
ACTA PARCIAL NO. 5	
ACTA PARCIAL NO. 6	
ACTA PARCIAL NO. 7	
ACTA PARCIAL NO. 8	
ACTA PARCIAL NO. 9	
ACTA PARCIAL NO. 10	
ACTA PARCIAL NO. 11	0.00
ACTA PARCIAL NO. 12	0.00
ACTA PARCIAL NO. 13	0.00
ACTA PARCIAL NO. 14	0.00
ACTA PARCIAL NO. 15	0.00
ACTA PARCIAL NO. 16	0.00
ACTA PARCIAL NO. 17	0.00
ACTA PARCIAL NO. 18	0.00
ACTA PARCIAL NO. 19	0.00
ACTA PARCIAL NO. 20	0.00
ACTA PARCIAL NO. 21	1052.00
ACTA PARCIAL NO. 22	928.00
ACTA PARCIAL NO. 23	646.50
ACTA PARCIAL NO. 24	1002.10
ACTA PARCIAL NO. 25	500.30
ACTA PARCIAL NO. 26	447.00
ACTA PARCIAL NO. 27	583.50
ACTA PARCIAL NO. 28	307.70
TOTAL ACUMULADO	5467.1

ING. SEBASTIAN GOMEZ VERGARA
MAB INGENIERIA DE VALOR
INTERVENTORIA

ING. EDWARD ANDRES SANCHEZ
CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA

Gobierno de CALDAS	GOBERNACIÓN DE CALDAS	Hoja No 1 de 1
	Secretaria de Infraestructura	
	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS	

PREACTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

PREACTA DE OBRA No:	28 TRAMO 3				FECHA:	28/03/2026
PERIODO:	28 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO DEL 2026					
CONTRATO DE OBRA No:	29092023-1456				CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	1071 DE 2022				INTERVENTORÍA:	MAB INGENIERIA DE VALOR
ITEM	102					UNIDAD
NP12	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC DE 6" PARA DRENAJE					ML
Abscisa Inicial	Abscisa Final	Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Cantidad	Margen	Descripción
ACTA PARCIAL DE COBRO No. 28							
FILTROS							
K101+452.00	K101+673.03	233.30			233.30	I	Instalación de tubería para filtro
K101+675.00	K101+755.00	74.40			74.40	I	Instalación de tubería para filtro
SUB TOTAL ACTA PARCIAL NO. 28				307.70			

ACTA PARCIAL NO. 1	
ACTA PARCIAL NO. 2	
ACTA PARCIAL NO. 3	
ACTA PARCIAL NO. 4	
ACTA PARCIAL NO. 5	
ACTA PARCIAL NO. 6	
ACTA PARCIAL NO. 7	
ACTA PARCIAL NO. 8	
ACTA PARCIAL NO. 9	
ACTA PARCIAL NO. 10	
ACTA PARCIAL NO. 11	0.00
ACTA PARCIAL NO. 12	0.00
ACTA PARCIAL NO. 13	0.00
ACTA PARCIAL NO. 14	0.00
ACTA PARCIAL NO. 15	0.00
ACTA PARCIAL NO. 16	0.00
ACTA PARCIAL NO. 17	0.00
ACTA PARCIAL NO. 18	0.00
ACTA PARCIAL NO. 19	0.00
ACTA PARCIAL NO. 20	0.00
ACTA PARCIAL NO. 21	1052.00
ACTA PARCIAL NO. 22	928.00
ACTA PARCIAL NO. 23	646.50
ACTA PARCIAL NO. 24	1002.10
ACTA PARCIAL NO. 25	500.30
ACTA PARCIAL NO. 26	647.00
ACTA PARCIAL NO. 27	618.50
ACTA PARCIAL NO. 28	**307.70**
TOTAL ACUMULADO	5502.1

ING. SEBASTIAN GOMEZ VERGARA
MAB INGENIERIA DE VALOR
INTERVENTORIA

ING. EDWARD ANDRES SANCHEZ
CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA

Gobierno de CALDAS	GOBERNACIÓN DE CALDAS	Hoja No 1 de 1
	Secretaria de Infraestructura	
	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS	

PREACTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

PREACTA DE OBRA No:	28 TRAMO 3	FECHA:	29/03/2026
PERIODO:	28 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO DEL 2026		
CONTRATO DE OBRA No:	29092023-1456	CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	1071 DE 2022	INTERVENTORÍA:	MAB INGENIERIA DE VALOR

ITEM	106	UNIDAD
NP16	CONCRETO RESISTENCIA 28MPa (C) - PREPARADO EN OBRA, GRANULARES PUESTOS EN OBRA PARA TRAMO 3 Y TRAMO 4	m3

Abscisa Inicial	Abscisa Final	Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Cantidad	Margen	Descripción
ACTA PARCIAL DE COBRO No. 28							
ALCANTARILLAS							
K101+260.00	K101+260.00	1.70	2.15	0.25	0.91	IZQUIERDA	Losa cabezal de entrada
K101+260.00	K101+260.00	2.10	0.45	2.93	2.77	IZQUIERDA	Aleta 1 cabezal de entrada
K101+260.00	K101+260.00	1.00	-0.23	0.40	-0.09	IZQUIERDA	Descuento entrada cuneta
K101+260.00	K101+260.00	1.50	0.45	2.73	1.94	IZQUIERDA	Aleta 2 cabezal de entrada
K101+260.00	K101+260.00	1.35	0.25	1.70	0.57	IZQUIERDA	Muro cabezal de entrada
K101+260.00	K101+260.00	0.62	0.35	1.65	0.36	IZQUIERDA	Muro de cierre derecho
K101+260.00	K101+260.00	0.71	0.35	1.73	0.43	IZQUIERDA	Muro de cierre izquierdo
K101+260.00	K101+260.00	3.14	0.08	0.45	-0.01	IZQUIERDA	Descuento tubería de 6"
SUB TOTAL ACTA PARCIAL NO. 28				6.90			

ACTA PARCIAL NO. 1	
ACTA PARCIAL NO. 2	
ACTA PARCIAL NO. 3	
ACTA PARCIAL NO. 4	
ACTA PARCIAL NO. 5	
ACTA PARCIAL NO. 6	
ACTA PARCIAL NO. 7	
ACTA PARCIAL NO. 8	
ACTA PARCIAL NO. 9	
ACTA PARCIAL NO. 10	
ACTA PARCIAL NO. 11	
ACTA PARCIAL NO. 12	
ACTA PARCIAL NO. 13	
ACTA PARCIAL NO. 14	
ACTA PARCIAL NO. 15	
ACTA PARCIAL NO. 16	
ACTA PARCIAL NO. 17	
ACTA PARCIAL NO. 18	
ACTA PARCIAL NO. 19	
ACTA PARCIAL NO. 20	
ACTA PARCIAL NO. 21	
ACTA PARCIAL NO. 22	
ACTA PARCIAL NO. 23	234.60
ACTA PARCIAL NO. 24	90.40
ACTA PARCIAL NO. 25	44.80
ACTA PARCIAL NO. 26	94.00
ACTA PARCIAL NO. 27	57.30
ACTA PARCIAL NO. 28	**6.90**
TOTAL ACUMULADO	478.0

ING. SEBASTIAN GOMEZ VERGARA
MAB INGENIERIA DE VALOR
INTERVENTORIA

ING. EDWARD ANDRES SANCHEZ
CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA

Gobierno de CALDAS	GOBERNACIÓN DE CALDAS	Hoja No 1 de 1
	Secretaría de Infraestructura	
	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS	

PREACTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

PREACTA DE OBRA No:	28 TRAMO 3	FECHA:	28/03/2026
PERIODO:	28 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO DEL 2026		
CONTRATO DE OBRA No:	29092023-1456	CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	1091 DE 2022	INTERVENTORÍA:	MAB INGENIERIA DE VALOR

ITEM	107	UNIDAD
NP17	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - PREPARADO EN OBRA, GRANULARES PUESTOS EN OBRA PARA TRAMO 3 Y TRAMO 4	m3

Abscisa Inicial	Abscisa Final	Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Cantidad	Margen	Descripción
ACTA PARCIAL DE COBRO No. 28							
MUROS							
K100+420.00	K100+420.00	7.76	2.40	0.45	8.38	DERECHA	Zarpa Módulo 1 de muro de contención
K100+420.00	K100+420.00	7.76	0.30	2.30	5.35	DERECHA	Vástago Módulo 1 de muro de contención
K100+420.00	K100+420.00	3.14	0.49	0.30	-0.23	DERECHA	Descuento de tubería de 36"
K100+420.00	K100+420.00	3.14	0.49	0.30	-0.23	DERECHA	Descuento de tubería de 36"
K100+420.00	K100+420.00	3.14	0.050	0.30	-0.002	DERECHA	Descuento tubería de 4"
K100+420.00	K100+420.00	3.14	0.050	0.30	-0.002	DERECHA	Descuento tubería de 4"
K100+470.00	K100+470.00	15.00	0.77	0.30	3.47	DERECHA	Realce de muro existente
K100+610.00	K100+610.00	1.90	0.20	1.80	0.65	DERECHA	Muro de cierre muro
K100+578.00	K100+578.00	1.97	0.20	1.80	0.71	DERECHA	Muro de cierre muro
SUB TOTAL ACTA PARCIAL NO. 28				18.10			

ACTA PARCIAL NO. 1	
ACTA PARCIAL NO. 2	
ACTA PARCIAL NO. 3	
ACTA PARCIAL NO. 4	
ACTA PARCIAL NO. 5	
ACTA PARCIAL NO. 6	
ACTA PARCIAL NO. 7	
ACTA PARCIAL NO. 8	
ACTA PARCIAL NO. 9	
ACTA PARCIAL NO. 10	
ACTA PARCIAL NO. 11	
ACTA PARCIAL NO. 12	
ACTA PARCIAL NO. 13	
ACTA PARCIAL NO. 14	
ACTA PARCIAL NO. 15	
ACTA PARCIAL NO. 16	
ACTA PARCIAL NO. 17	
ACTA PARCIAL NO. 18	
ACTA PARCIAL NO. 19	
ACTA PARCIAL NO. 20	
ACTA PARCIAL NO. 21	
ACTA PARCIAL NO. 22	
ACTA PARCIAL NO. 23	1010.90
ACTA PARCIAL NO. 24	121.90
ACTA PARCIAL NO. 25	195.50
ACTA PARCIAL NO. 26	159.00
ACTA PARCIAL NO. 27	222.50
ACTA PARCIAL NO. 28	**18.10**
TOTAL ACUMULADO	18.1

ING. SEBASTIAN GOMEZ VERGARA
MAB INGENIERIA DE VALOR
INTERVENTORIA

ING. EDWARD ANDRES SANCHEZ
CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA

Gobierno de CALDAS

GOBERNACIÓN DE CALDAS

Secretaría de Infraestructura

Hoja No 1 de 1

MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

PREACTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:		MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS		
PREACTA DE OBRA No:		0.00	FECHA:	0/01/1900
PERIODO:			0.00	
CONTRATO DE OBRA No:		29092023-1456	CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:		1071 DE 2022	INTERVENTORÍA:	HAB INGENIERIA DE VALOR

ITEM	109	UNIDAD
NP19	CUNETA DE CONCRETO CLASE D, VACIADA IN SITU: NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO PREPARADO EN OBRA, GRANULARES PUESTOS EN OBRA PARA TRAMO 3 Y TRAMO 4	m2

Abscisa Inicial	Abscisa Final	Modulos (und)	Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Cantidad	Margen	Descripción
ACTA PARCIAL DE COBRO No. 28								
CUNETAS								
K97+980.00	K98+092.00	1.00	1.83	0.60	0.10	0.11	I	Placa obra
K97+990.00	K98+092.00	2.00	1.24	1.33	0.10	0.33	I	Placa cuneta irregular
K97+990.00	K98+092.00	38.00	2.39	1.40	0.10	12.24	I	Cuneta regular
K97+990.00	K98+092.00	2	2.02	2.02	0.10	0.86	I	Placa cuneta irregular
K98+092.00	K98+160.00	5.00	2.42	1.23	0.10	1.49	I	Placa cuneta irregular
K98+092.00	K98+160.00	22.00	2.39	1.40	0.10	7.08	I	Placa cuneta regular
K98+092.00	K98+160.00	1.00	2.15	1.63	0.10	0.35	I	Placa cuneta irregular
K98+092.00	K98+160.00	1.00	1.82	0.36	0.10	0.06	I	Placa obra
K98+162.00	K98+250.00	2.00	1.91	1.24	0.10	0.47	I	Placa cuneta irregular
K98+162.00	K98+250.00	36.00	2.30	1.40	0.10	11.59	I	Cuneta regular
K98+162.00	K98+250.00	2.00	2.29	1.49	0.10	0.68	I	Placa cuneta irregular
K98+260.00	K98+270.00	5.00	2.30	1.40	0.10	1.61	I	Placa cuneta regular
K98+260.00	K98+270.00	2.00	1.85	1.51	0.10	0.56	I	Placa cuneta irregular
K98+292.00	K98+370.00	27.00	2.30	1.40	0.10	8.69	I	Cuneta regular
K98+292.00	K98+370.00	2.00	2.20	1.79	0.10	0.82	I	Placa cuneta irregular
K98+292.00	K98+370.00	1.00	1.80	0.60	0.10	0.11	I	Placa obra
K98+370.00	K98+502.00	2.00	2.29	1.27	0.10	0.58	I	Placa cuneta irregular
K98+370.00	K98+502.00	20.00	2.30	1.40	0.10	6.44	I	Cuneta regular
K98+370.00	K98+502.00	14.00	2.27	1.02	0.10	3.24	I	Batea
K98+370.00	K98+502.00	20.00	2.30	1.40	0.10	6.44	I	Cuneta regular
K98+370.00	K98+502.00	4.00	2.38	1.73	0.10	1.65	I	Placa cuneta irregular
K98+370.00	K98+502.00	1.00	1.80	0.81	0.10	0.15	I	Placa obra
K98+502.00	K98+613.00	2.00	2.61	1.05	0.10	0.42	I	Batea
K98+502.00	K98+613.00	16.00	2.30	1.40	0.10	5.15	I	Cuneta regular
K98+502.00	K98+613.00	2.00	2.38	1.32	0.10	0.63	I	Placa cuneta irregular
K98+502.00	K98+613.00	2.00	2.37	1.26	0.10	0.60	I	Batea
K98+502.00	K98+613.00	20.00	2.30	1.40	0.10	6.44	I	Cuneta regular
K98+502.00	K98+613.00	3.00	2.28	1.19	0.10	0.81	I	Placa cuneta irregular
K98+606.70	K98+613.00	1.00	1.80	0.49	0.10	0.09	I	Placa obra
K98+613.00	K98+673.00	22.00	2.30	1.40	0.10	7.08	I	Cuneta regular
K98+613.00	K98+673.00	3.00	2.80	1.95	0.10	1.17	I	Placa cuneta irregular
K98+613.00	K98+673.00	1.00	0.60	1.82	0.10	0.11	I	Placa obra
K98+673.00	K98+740.00	26.00	2.30	1.40	0.10	8.37	I	Cuneta regular
K98+673.00	K98+740.00	4.00	2.90	2.25	0.10	1.80	I	Placa cuneta irregular
K98+673.00	K98+740.00	1.00	3.22	1.51	0.10	0.49	I	Placa obra
K98+825.00	K98+907.00	30.00	2.30	1.40	0.10	9.66	I	Cuneta regular
K98+825.00	K98+907.00	3.00	1.96	2.17	0.10	1.28	I	Placa cuneta irregular
K98+825.00	K98+907.00	1.00	1.84	0.55	0.10	0.10	I	Placa obra
K98+030.00	K98+090.00	23.00	2.29	1.29	0.10	6.79	D	Batea
K98+030.00	K98+090.00	3.00	2.33	1.68	0.20	2.35	D	Placa acceso camión
K98+030.00	K98+090.00	3.00	2.29	1.29	0.10	0.89	D	Batea
K98+090.00	K98+160.00	21.00	2.29	1.29	0.10	6.20	D	Batea
K98+090.00	K98+160.00	2.00	2.16	1.60	0.10	0.69	D	Placa cuneta irregular
K98+090.00	K98+160.00	8.00	2.30	1.40	0.10	2.58	D	Cuneta regular
K98+090.00	K98+160.00	1.00	0.88	2.28	0.10	0.20	D	Placa obra
K98+160.00	K98+250.00	1.00	2.28	1.71	0.10	0.39	D	Placa cuneta irregular
K98+160.00	K98+250.00	38.00	2.30	1.40	0.10	12.24	D	Cuneta regular
K98+282.00	K98+370.00	1.00	2.48	1.65	0.10	0.41	D	Placa cuneta irregular
K98+282.00	K98+370.00	28.00	2.30	1.40	0.10	9.02	D	Cuneta regular
K98+282.00	K98+370.00	11.00	2.41	1.39	0.10	3.68	D	Batea
K98+282.00	K98+370.00	1.00	2.45	0.86	0.10	0.18	D	Placa obra

Gobierno de CALDAS

GOBERNACIÓN DE CALDAS

Secretaría de Infraestructura

Hoja No 1 de 1

MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

PREACTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:		MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

PREACTA DE OBRA No:		0.00	FECHA:	0/01/1900	
PERIODO:			0.00		
CONTRATO DE OBRA No:		29092023-1496	CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:		1071 DE 2022	INTERVENTORÍA:	MAS INGENIERIA DE VALOR	
ITEM	109				UNIDAD
NP19	CUNETA DE CONCRETO CLASE D, VACIADA IN SITU; NO INCLUYE LA CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO PREPARADO EN OBRA, GRANULARES PUESTOS EN OBRA PARA TRAMO 3 Y TRAMO 4				m3

Abscisa Inicial	Abscisa Final	Modulos (und)	Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Cantidad	Margen	Descripción
K98+372.00	K98+500.00	32.00	2.30	1.40	0.10	16.74	D	Cuneta regular
K98+372.00	K98+500.00	2.00	2.05	2.00	0.10	0.82	D	Placa cuneta irregular
K98+372.00	K98+500.00	1.00	2.10	1.29	0.10	0.27	D	Placa cuneta irregular
K98+672.00	K98+745.00	1.00	2.12	0.66	0.19	0.14	D	Placa sobre muro
K98+672.00	K98+745.00	18.00	2.23	1.40	0.10	6.12	D	Cuneta regular
K98+672.00	K98+745.00	16.00	2.14	0.93	0.10	3.18	D	Placa sobre muro
K98+825.00	K98+910.00	2.00	2.30	1.40	0.10	0.64	D	Cuneta regular
K98+825.00	K98+910.00	1.00	2.37	1.40	0.10	0.33	D	Placa cuneta irregular
K98+825.00	K98+910.00	5.00	2.29	1.20	0.10	1.92	D	Bloba
K98+825.00	K98+910.00	24.00	2.38	1.40	0.10	7.73	D	Cuneta regular
K98+825.00	K98+910.00	3.00	2.09	1.96	0.19	1.18	D	Placa cuneta irregular
K98+950.00	K99+060.00	1.00	2.15	1.01	0.10	0.30	D	Placa otra
K98+950.00	K99+060.00	2.00	1.99	1.63	0.10	0.65	D	Placa cuneta irregular
K98+950.00	K99+060.00	20.00	2.36	1.40	0.10	5.80	D	Cuneta regular
K98+950.00	K99+060.00	1.00	2.37	0.93	0.10	0.22	D	Placa sobre muro
K98+950.00	K99+060.00	13.00	2.30	0.97	0.10	2.90	D	Placa sobre muro
K98+950.00	K99+060.00	5.00	2.30	1.39	0.10	1.60	D	Placa cuneta irregular
K98+950.00	K99+060.00	14.00	2.39	1.40	0.10	4.51	D	Cuneta regular
K98+950.00	K99+060.00	9.00	2.19	0.97	0.19	1.91	D	Placa sobre muro
K98+950.00	K99+060.00	1.00	3.25	1.78	0.10	0.58	D	Placa cuneta irregular
SUB TOTAL ACTA PARCIAL NO. 28					213.00			

ACTA PARCIAL NO. 1	
ACTA PARCIAL NO. 2	
ACTA PARCIAL NO. 3	
ACTA PARCIAL NO. 4	
ACTA PARCIAL NO. 5	
ACTA PARCIAL NO. 6	
ACTA PARCIAL NO. 7	
ACTA PARCIAL NO. 8	
ACTA PARCIAL NO. 9	
ACTA PARCIAL NO. 10	
ACTA PARCIAL NO. 11	
ACTA PARCIAL NO. 12	
ACTA PARCIAL NO. 13	
ACTA PARCIAL NO. 14	
ACTA PARCIAL NO. 15	
ACTA PARCIAL NO. 16	
ACTA PARCIAL NO. 17	
ACTA PARCIAL NO. 18	
ACTA PARCIAL NO. 19	
ACTA PARCIAL NO. 20	
ACTA PARCIAL NO. 21	
ACTA PARCIAL NO. 22	
ACTA PARCIAL NO. 23	
ACTA PARCIAL NO. 24	
ACTA PARCIAL NO. 25	
ACTA PARCIAL NO. 26	
ACTA PARCIAL NO. 27	
ACTA PARCIAL NO. 28	**213.00**
TOTAL ACUMULADO	213.0

ING. SEBASTIAN GOMEZ VERGARA
MAS INGENIERIA DE VALOR
INTERVENTORIA

ING. EDWARD ANDRES SANCHEZ
CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA

Gobierno de CALDAS	GOBERNACIÓN DE CALDAS	Hoja No 1 de 1
	Secretaria de Infraestructura	
	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA – SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS	

PREACTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA – SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

PREACTA DE OBRA No:	28 TRAMO 3	FECHA:	28/03/2026
PERIODO:	28 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO DEL 2026		
CONTRATO DE OBRA No:	29092023-1456	CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	1071 DE 2022	INTERVENTORÍA:	MAB INGENIERIA DE VALOR

ITEM	110	UNIDAD
NP20	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F) PREPARADO EN OBRA, GRANULARES PUESTOS EN OBRA PARA TRAMO 3 Y TRAMO 4	m3

Abscisa Inicial	Abscisa Final	Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Cantidad	Margen	Descripción
ACTA PARCIAL DE COBRO No. 28							
ALCANTARILLAS							
K101+260.00	K101+260.00	2.70	2.15	0.05	0.28	IZQUIERDA	Solado para descole
K101+260.00	K101+260.00	2.10	0.70	0.05	0.07	IZQUIERDA	Solado para descole aleta hacia menores
K101+260.00	K101+260.00	2.58	0.70	0.05	0.08	IZQUIERDA	Solado para descole aleta hacia mayores
MUROS							
K100+420.00	K100+420.00	7.80	2.50	0.05	0.98	DERECHA	Solado de muro en modulo 1
SUB TOTAL ACTA PARCIAL NO. 28				1.30			

ACTA PARCIAL NO. 1	
ACTA PARCIAL NO. 2	
ACTA PARCIAL NO. 3	
ACTA PARCIAL NO. 4	
ACTA PARCIAL NO. 5	
ACTA PARCIAL NO. 6	
ACTA PARCIAL NO. 7	
ACTA PARCIAL NO. 8	
ACTA PARCIAL NO. 9	
ACTA PARCIAL NO. 10	
ACTA PARCIAL NO. 11	
ACTA PARCIAL NO. 12	
ACTA PARCIAL NO. 13	
ACTA PARCIAL NO. 14	
ACTA PARCIAL NO. 15	
ACTA PARCIAL NO. 16	
ACTA PARCIAL NO. 17	
ACTA PARCIAL NO. 18	
ACTA PARCIAL NO. 19	
ACTA PARCIAL NO. 20	
ACTA PARCIAL NO. 21	
ACTA PARCIAL NO. 22	
ACTA PARCIAL NO. 23	67.10
ACTA PARCIAL NO. 24	4.10
ACTA PARCIAL NO. 25	12.60
ACTA PARCIAL NO. 26	13.40
ACTA PARCIAL NO. 27	12.80
ACTA PARCIAL NO. 28	**1.30**
TOTAL ACUMULADO	109.3

ING. SEBASTIAN GOMEZ VERGARA
MAB INGENIERIA DE VALOR
INTERVENTORIA

ING. EDWARD ANDRES SANCHEZ
CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA

Gobierno de CALDAS	GOBERNACIÓN DE CALDAS Secretaría de Infraestructura	Hoja No 1 de 1
	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS	

PREACTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

PREACTA DE OBRA No:	28 TRAMO 3	FECHA:	28/03/2026
PERIODO:	28 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO DEL 2026		
CONTRATO DE OBRA No:	29092023-1456	CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	1071 DE 2022	INTERVENTORÍA:	MAB INGENIERIA DE VALOR

ITEM	111						UNIDAD
NP21	MATERIAL GRANULAR DRENANTE PUESTO EN OBRA PARA TRAMO 3 Y TRAMO 4						m3
Abscisa Inicial	Abscisa Final	Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Cantidad	Margen	Descripción
ACTA PARCIAL DE COBRO No. 28							
FILTRO EN MUROS							
K100+420.00	K100+420.00	7.76	0.23	1.30	2.02	DERECHA	Filtro longitudinal muro
K100+420.00	K100+420.00	7.76	3.14	0.05	-0.06	DERECHA	Descuento tubería de 4"
K102+420.00	K102+420.00	13.00	0.20	1.44	3.74	DERECHA	Filtro longitudinal muro
K102+420.00	K102+420.00	13.00	3.14	0.05	-0.20	DERECHA	Descuento tubería de 4"
K102+550.00	K102+550.00	24.30	0.20	1.75	5.01	DERECHA	Filtro longitudinal muro
K102+550.00	K102+550.00	24.30	3.14	0.05	-0.11	DERECHA	Descuento tubería de 4"
FILTRO LATERAL EN VIA							
K101+452.30	K101+673.00	233.30	0.50	0.70	81.66	DERECHA	Filtro lateral en via
K101+452.30	K101+673.00	233.30	-3.14	0.08	-4.69	DERECHA	Descuento tubería de 6"
K101+675.00	K101+755.00	74.40	0.50	0.70	26.04	DERECHA	Filtro lateral en via
K101+675.00	K101+755.00	74.40	-3.14	0.08	-1.50	DERECHA	Descuento tubería de 6"
SUB TOTAL ACTA PARCIAL NO. 28				112.00			

ACTA PARCIAL NO. 1	
ACTA PARCIAL NO. 2	
ACTA PARCIAL NO. 3	
ACTA PARCIAL NO. 4	
ACTA PARCIAL NO. 5	
ACTA PARCIAL NO. 6	
ACTA PARCIAL NO. 7	
ACTA PARCIAL NO. 8	
ACTA PARCIAL NO. 9	
ACTA PARCIAL NO. 10	
ACTA PARCIAL NO. 11	
ACTA PARCIAL NO. 12	
ACTA PARCIAL NO. 13	
ACTA PARCIAL NO. 14	
ACTA PARCIAL NO. 15	
ACTA PARCIAL NO. 16	
ACTA PARCIAL NO. 17	
ACTA PARCIAL NO. 18	
ACTA PARCIAL NO. 19	
ACTA PARCIAL NO. 20	
ACTA PARCIAL NO. 21	
ACTA PARCIAL NO. 22	
ACTA PARCIAL NO. 23	1013.60
ACTA PARCIAL NO. 24	342.30
ACTA PARCIAL NO. 25	218.20
ACTA PARCIAL NO. 26	193.60
ACTA PARCIAL NO. 27	265.00
ACTA PARCIAL NO. 28	**112.00**
TOTAL ACUMULADO	2134.7

ING. SEBASTIAN GOMEZ VERGARA
MAB INGENIERIA DE VALOR
INTERVENTORIA

ING. EDWARD ANDRES SANCHEZ
CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA

Gobierno de CALDAS

GOBERNACIÓN DE CALDAS

Secretaría de Infraestructura

Hoja No 1 de 1

MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

PREACTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

PREACTA DE OBRA No:	28 TRAMO 3	FECHA:	28/03/2026
PERIODO:	28 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO DEL 2026		
CONTRATO DE OBRA No:	20092023-1456	CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	1071 DE 2022	INTERVENTORÍA:	MAB INGENIERIA DE VALOR

ITEM	112	UNIDAD
NP330.3.2 T3 Y T4	BASE GRANULAR CLASE C PUESTO EN OBRA PARA TRAMO 3 Y TRAMO 4	m3

Abscisa Inicial	Abscisa Final	Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Cantidad	Margen	Descripción
ACTA PARCIAL DE COBRO No. 28							
K100+130.00	K100+140.00	10.00	6.55	0.20	13.10	D/I	Cuneta a ambos costados
K100+140.00	K100+150.00	10.00	6.55	0.20	13.10	D/I	Cuneta a ambos costados
K100+150.00	K100+160.00	10.00	6.55	0.20	13.10	D/I	Cuneta a ambos costados
K100+160.00	K100+170.00	10.00	6.55	0.20	13.10	D/I	Cuneta a ambos costados
K100+170.00	K100+180.00	10.00	6.55	0.20	13.10	D/I	Cuneta a ambos costados
K100+180.00	K100+190.00	10.00	6.55	0.20	13.10	D/I	Cuneta a ambos costados
K100+190.00	K100+200.00	10.00	6.55	0.20	13.10	D/I	Cuneta a ambos costados
K100+200.00	K100+210.00	10.00	6.55	0.20	13.10	D/I	Cuneta a ambos costados
K100+210.00	K100+220.00	10.00	6.55	0.20	13.10	D/I	Cuneta a ambos costados
K100+220.00	K100+230.00	10.00	6.55	0.20	13.10	D/I	Cuneta a ambos costados
K100+230.00	K100+240.00	10.00	6.55	0.20	13.10	D/I	Cuneta a ambos costados
K100+240.00	K100+250.00	10.00	6.55	0.20	13.10	D/I	Cuneta a ambos costados
K100+250.00	K100+260.00	10.00	6.55	0.20	13.10	D/I	Cuneta a ambos costados
K100+260.00	K100+270.00	10.00	6.55	0.20	13.10	D/I	Cuneta a ambos costados
K100+270.00	K100+280.00	10.00	6.55	0.20	13.10	D/I	Cuneta a ambos costados
K100+280.00	K100+290.00	10.00	6.55	0.20	13.10	D/I	Cuneta a ambos costados
K100+290.00	K100+300.00	10.00	6.55	0.20	13.10	D/I	Cuneta a ambos costados
K100+300.00	K100+310.00	10.00	6.55	0.20	13.10	D/I	Cuneta a ambos costados
K100+310.00	K100+320.00	10.00	6.55	0.20	13.10	D/I	Cuneta a ambos costados
K100+320.00	K100+330.00	10.00	6.55	0.20	13.10	D/I	Cuneta a ambos costados
K100+330.00	K100+340.00	10.00	6.55	0.20	13.10	D/I	Cuneta a ambos costados
K100+340.00	K100+350.00	10.00	6.55	0.20	13.10	D/I	Cuneta a ambos costados
K100+350.00	K100+360.00	10.00	6.55	0.20	13.10	D/I	Cuneta a ambos costados
K100+360.00	K100+370.00	10.00	6.55	0.20	13.10	D/I	Cuneta a ambos costados
K100+370.00	K100+380.00	10.00	6.55	0.20	13.10	D/I	Cuneta a ambos costados
K100+380.00	K100+390.00	10.00	6.55	0.20	13.10	D/I	Cuneta a ambos costados
K100+390.00	K100+400.00	10.00	6.55	0.20	13.10	D/I	Cuneta a ambos costados
K100+400.00	K100+410.00	10.00	6.55	0.20	13.10	D/I	Cuneta a ambos costados
K100+410.00	K100+420.00	10.00	6.55	0.20	13.10	D/I	Cuneta a ambos costados
K100+420.00	K100+430.00	10.00	6.29	0.20	12.55	D/I	Bordillo costado derecho, cuneta costado izquierdo
K100+430.00	K100+440.00	10.00	6.29	0.20	12.55	D/I	Bordillo costado derecho, cuneta costado izquierdo
K100+440.00	K100+450.00	10.00	6.28	0.20	12.55	D/I	Bordillo costado derecho, cuneta costado izquierdo
K100+450.00	K100+460.00	10.00	6.28	0.20	12.55	D/I	Bordillo costado derecho, cuneta costado izquierdo
K100+460.00	K100+470.00	10.00	6.28	0.20	12.55	D/I	Bordillo costado derecho, cuneta costado izquierdo
K100+470.00	K100+480.00	10.00	6.28	0.20	12.55	D/I	Bordillo costado derecho, cuneta costado izquierdo
K100+480.00	K100+490.00	10.00	6.28	0.20	12.55	D/I	Bordillo costado derecho, cuneta costado izquierdo
K100+490.00	K100+500.00	10.00	6.28	0.20	12.55	D/I	Bordillo costado derecho, cuneta costado izquierdo
K100+500.00	K100+510.00	10.00	6.28	0.20	12.55	D/I	Bordillo costado derecho, cuneta costado izquierdo
K100+510.00	K100+520.00	10.00	6.55	0.20	13.10	D/I	Cuneta a ambos costados
K100+520.00	K100+530.00	10.00	6.55	0.20	13.10	D/I	Cuneta a ambos costados
K100+530.00	K100+540.00	10.00	6.55	0.20	13.10	D/I	Cuneta a ambos costados
K100+540.00	K100+550.00	10.00	6.55	0.20	13.10	D/I	Cuneta a ambos costados
K100+550.00	K100+560.00	10.00	6.55	0.20	13.10	D/I	Cuneta a ambos costados
K100+560.00	K100+570.00	10.00	6.55	0.20	13.10	D/I	Cuneta a ambos costados
K100+570.00	K100+580.00	10.00	6.55	0.20	13.10	D/I	Cuneta a ambos costados
K100+580.00	K100+590.00	10.00	6.55	0.20	13.10	D/I	Cuneta a ambos costados
K100+590.00	K100+600.00	10.00	6.55	0.20	13.10	D/I	Cuneta a ambos costados
K100+600.00	K100+610.00	10.00	6.55	0.20	13.10	D/I	Cuneta a ambos costados
K100+610.00	K100+620.00	10.00	6.55	0.20	13.10	D/I	Cuneta a ambos costados
K100+620.00	K100+630.00	10.00	6.55	0.20	13.10	D/I	Cuneta a ambos costados
K100+630.00	K100+640.00	10.00	6.55	0.20	13.10	D/I	Cuneta a ambos costados
K100+640.00	K100+650.00	10.00	6.55	0.20	13.10	D/I	Cuneta a ambos costados
K100+650.00	K100+660.00	10.00	6.55	0.20	13.10	D/I	Cuneta a ambos costados
K100+660.00	K100+670.00	10.00	6.55	0.20	13.10	D/I	Cuneta a ambos costados
K100+670.00	K100+680.00	10.00	6.55	0.20	13.10	D/I	Cuneta a ambos costados
K100+680.00	K100+690.00	10.00	6.55	0.20	13.10	D/I	Cuneta a ambos costados
K100+690.00	K100+700.00	10.00	6.55	0.20	13.10	D/I	Cuneta a ambos costados
K100+700.00	K100+710.00	10.00	6.55	0.20	13.10	D/I	Cuneta a ambos costados
K100+710.00	K100+720.00	10.00	6.55	0.20	13.10	D/I	Cuneta a ambos costados
K100+720.00	K100+730.00	10.00	6.55	0.20	13.10	D/I	Cuneta a ambos costados
K100+730.00	K100+740.00	10.00	6.55	0.20	13.10	D/I	Cuneta a ambos costados
K100+740.00	K100+750.00	10.00	6.55	0.20	13.10	D/I	Cuneta a ambos costados
K100+750.00	K100+760.00	10.00	6.55	0.20	13.10	D/I	Cuneta a ambos costados
K100+760.00	K100+770.00	10.00	6.55	0.20	13.10	D/I	Cuneta a ambos costados
K100+770.00	K100+780.00	10.00	6.55	0.20	13.10	D/I	Cuneta a ambos costados
K100+780.00	K100+790.00	10.00	6.55	0.20	13.10	D/I	Cuneta a ambos costados
K100+790.00	K100+800.00	10.00	6.55	0.20	13.10	D/I	Cuneta a ambos costados
K100+800.00	K100+810.00	10.00	6.55	0.20	13.10	D/I	Cuneta a ambos costados
K100+810.00	K100+820.00	10.00	6.55	0.20	13.10	D/I	Cuneta a ambos costados
K100+820.00	K100+830.00	10.00	6.55	0.20	13.10	D/I	Cuneta a ambos costados
K100+830.00	K100+840.00	10.00	6.55	0.20	13.10	D/I	Cuneta a ambos costados
K100+840.00	K100+850.00	10.00	6.55	0.20	13.10	D/I	Cuneta a ambos costados
K100+850.00	K100+860.00	10.00	6.55	0.20	13.10	D/I	Cuneta a ambos costados
K100+860.00	K100+870.00	10.00	6.55	0.20	13.10	D/I	Cuneta a ambos costados
K100+870.00	K100+880.00	10.00	6.55	0.20	13.10	D/I	Cuneta a ambos costados
K100+880.00	K100+890.00	10.00	6.55	0.20	13.10	D/I	Cuneta a ambos costados
K100+890.00	K100+900.00	10.00	6.55	0.20	13.10	D/I	Cuneta a ambos costados
K100+900.00	K100+910.00	10.00	6.55	0.20	13.10	D/I	Cuneta a ambos costados
K100+910.00	K100+920.00	10.00	6.55	0.20	13.10	D/I	Cuneta a ambos costados
K100+920.00	K100+930.00	10.00	6.55	0.20	13.10	D/I	Cuneta a ambos costados
K100+930.00	K100+940.00	10.00	6.55	0.20	13.10	D/I	Cuneta a ambos costados
K100+940.00	K100+950.00	10.00	6.55	0.20	13.10	D/I	Cuneta a ambos costados
K100+950.00	K100+960.00	10.00	6.55	0.20	13.10	D/I	Cuneta a ambos costados
K100+960.00	K100+970.00	10.00	6.55	0.20	13.10	D/I	Cuneta a ambos costados
K100+970.00	K100+980.00	10.00	6.55	0.20	13.10	D/I	Cuneta a ambos costados
K100+980.00	K100+990.00	10.00	6.55	0.20	13.10	D/I	Cuneta a ambos costados
K100+990.00	K101+000.00	10.00	6.55	0.20	13.10	D/I	Cuneta a ambos costados
K101+000.00	K101+010.00	10.00	6.55	0.20	13.10	D/I	Cuneta a ambos costados
K101+010.00	K101+020.00	10.00	6.55	0.20	13.10	D/I	Cuneta a ambos costados
K101+020.00	K101+030.00	10.00	6.55	0.20	13.10	D/I	Cuneta a ambos costados
K101+030.00	K101+040.00	10.00	6.55	0.20	13.10	D/I	Cuneta a ambos costados
K101+040.00	K101+050.00	10.00	6.55	0.20	13.10	D/I	Cuneta a ambos costados
K101+050.00	K101+060.00	10.00	6.55	0.20	13.10	D/I	Cuneta a ambos costados
K101+060.00	K101+070.00	10.00	6.55	0.20	13.10	D/I	Cuneta a ambos costados
K101+070.00	K101+080.00	10.00	6.55	0.20	13.10	D/I	Cuneta a ambos costados
K101+080.00	K101+090.00	10.00	6.55	0.20	13.10	D/I	Cuneta a ambos costados

Gobierno de CALDAS	GOBERNACIÓN DE CALDAS	Hoja No 1 de 1
	Secretaría de Infraestructura	
	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS	

PREACTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

PREACTA DE OBRA No:	28 TRAMO 3	FECHA:	28/03/2026
PERIODO:	29 DE FEBRERO AL 26 DE MARZO DEL 2026		
CONTRATO DE OBRA No:	29392023-1456	CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	1071 DE 2022	INTERVENTORÍA:	MAB INGENIERIA DE VALOR

ITEM	112					UNIDAD
NP330.3.2 T3 Y T4	BASE GRANULAR CLASE C PUESTO EN OBRA PARA TRAMO 3 Y TRAMO 4					m3
Abscisa Inicial	Abscisa Final	Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Cantidad	Margen	Descripción
K101+090.00	K101+100.00	10.00	6.55	0.20	13.10	D/I	Cuneta a ambos costados
K101+100.00	K101+110.00	10.00	6.55	0.20	13.10	D/I	Cuneta a ambos costados
K101+110.00	K101+120.00	10.00	6.55	0.20	13.10	D/I	Cuneta a ambos costados
K101+120.00	K101+130.00	10.00	6.55	0.20	13.10	D/I	Cuneta a ambos costados
K101+130.00	K101+140.00	10.00	6.55	0.20	13.10	D/I	Cuneta a ambos costados
K101+140.00	K101+150.00	10.00	6.55	0.20	13.10	D/I	Cuneta a ambos costados
K101+150.00	K101+160.00	10.00	6.55	0.20	13.10	D/I	Cuneta a ambos costados
K101+160.00	K101+170.00	10.00	6.55	0.20	13.10	D/I	Cuneta a ambos costados
K101+170.00	K101+180.00	10.00	6.55	0.20	13.10	D/I	Cuneta a ambos costados
K101+180.00	K101+190.00	10.00	6.55	0.20	13.10	D/I	Cuneta a ambos costados
K101+190.00	K101+200.00	10.00	6.55	0.20	13.10	D/I	Cuneta a ambos costados
K101+200.00	K101+210.00	10.00	6.55	0.20	13.10	D/I	Cuneta a ambos costados
K101+210.00	K101+220.00	10.00	6.55	0.20	13.10	D/I	Cuneta a ambos costados
K101+220.00	K101+230.00	10.00	6.55	0.20	13.10	D/I	Cuneta a ambos costados
K101+230.00	K101+240.00	10.00	6.55	0.20	13.10	D/I	Cuneta a ambos costados
K101+240.00	K101+250.00	10.00	6.55	0.20	13.10	D/I	Cuneta a ambos costados
K101+250.00	K101+260.00	10.00	6.55	0.20	13.10	D/I	Cuneta a ambos costados
K101+260.00	K101+270.00	10.00	6.55	0.20	13.10	D/I	Cuneta a ambos costados
K101+270.00	K101+280.00	10.00	6.55	0.20	13.10	D/I	Cuneta a ambos costados
K101+280.00	K101+290.00	10.00	6.55	0.20	13.10	D/I	Cuneta a ambos costados
K101+290.00	K101+300.00	10.00	6.55	0.20	13.10	D/I	Cuneta a ambos costados
K101+300.00	K101+310.00	10.00	6.55	0.20	13.10	D/I	Cuneta a ambos costados
K101+310.00	K101+320.00	10.00	6.55	0.20	13.10	D/I	Cuneta a ambos costados
K101+320.00	K101+330.00	10.00	6.55	0.20	13.10	D/I	Cuneta a ambos costados
K101+330.00	K101+340.00	10.00	6.55	0.20	13.10	D/I	Cuneta a ambos costados
K101+340.00	K101+350.00	10.00	6.55	0.20	13.10	D/I	Cuneta a ambos costados
K101+350.00	K101+360.00	10.00	6.55	0.20	13.10	D/I	Cuneta a ambos costados
K101+360.00	K101+370.00	10.00	6.55	0.20	13.10	D/I	Cuneta a ambos costados
K101+370.00	K101+380.00	10.00	6.55	0.20	13.10	D/I	Cuneta a ambos costados
K101+380.00	K101+390.00	10.00	6.55	0.20	13.10	D/I	Cuneta a ambos costados
K101+390.00	K101+400.00	10.00	6.55	0.20	13.10	D/I	Cuneta a ambos costados
K101+400.00	K101+410.00	10.00	6.55	0.20	13.10	D/I	Cuneta a ambos costados
K101+410.00	K101+420.00	10.00	6.55	0.20	13.10	D/I	Cuneta a ambos costados
K101+420.00	K101+430.00	10.00	6.55	0.20	13.10	D/I	Cuneta a ambos costados
K101+430.00	K101+440.00	10.00	6.55	0.20	13.10	D/I	Cuneta a ambos costados
K101+440.00	K101+450.00	10.00	6.55	0.20	13.10	D/I	Cuneta a ambos costados
K101+450.00	K101+460.00	10.00	6.55	0.20	13.10	D/I	Cuneta a ambos costados
K101+460.00	K101+470.00	10.00	6.55	0.20	13.10	D/I	Cuneta a ambos costados
K101+470.00	K101+480.00	10.00	6.55	0.20	13.10	D/I	Cuneta a ambos costados
K101+480.00	K101+490.00	10.00	6.55	0.20	13.10	D/I	Cuneta a ambos costados
K101+490.00	K101+500.00	10.00	6.55	0.20	13.10	D/I	Cuneta a ambos costados
K101+500.00	K101+510.00	10.00	6.55	0.20	13.10	D/I	Cuneta a ambos costados
K101+510.00	K101+520.00	10.00	6.55	0.20	13.10	D/I	Cuneta a ambos costados
K101+520.00	K101+530.00	10.00	6.55	0.20	13.10	D/I	Cuneta a ambos costados
K101+530.00	K101+540.00	10.00	6.55	0.20	13.10	D/I	Cuneta a ambos costados
K101+540.00	K101+550.00	10.00	6.55	0.20	13.10	D/I	Cuneta a ambos costados
K101+550.00	K101+560.00	10.00	6.55	0.20	13.10	D/I	Cuneta a ambos costados
K101+560.00	K101+570.00	10.00	6.55	0.20	13.10	D/I	Cuneta a ambos costados
K101+570.00	K101+580.00	10.00	6.55	0.20	13.10	D/I	Cuneta a ambos costados
K101+580.00	K101+590.00	10.00	6.55	0.20	13.10	D/I	Cuneta a ambos costados
K101+590.00	K101+600.00	10.00	6.55	0.20	13.10	D/I	Cuneta a ambos costados
K101+600.00	K101+610.00	10.00	6.55	0.20	13.10	D/I	Cuneta a ambos costados
K101+610.00	K101+620.00	10.00	6.55	0.20	13.10	D/I	Cuneta a ambos costados
K101+620.00	K101+630.00	10.00	6.55	0.20	13.10	D/I	Cuneta a ambos costados
K101+630.00	K101+640.00	10.00	6.55	0.20	13.10	D/I	Cuneta a ambos costados
SUB TOTAL ACTA PARCIAL NO. 28				1973.10			


ACTA PARCIAL NO. 1	
ACTA PARCIAL NO. 2	
ACTA PARCIAL NO. 3	
ACTA PARCIAL NO. 4	
ACTA PARCIAL NO. 5	
ACTA PARCIAL NO. 6	
ACTA PARCIAL NO. 7	
ACTA PARCIAL NO. 8	
ACTA PARCIAL NO. 9	
ACTA PARCIAL NO. 10	
ACTA PARCIAL NO. 11	
ACTA PARCIAL NO. 12	
ACTA PARCIAL NO. 13	
ACTA PARCIAL NO. 14	
ACTA PARCIAL NO. 15	
ACTA PARCIAL NO. 16	
ACTA PARCIAL NO. 17	
ACTA PARCIAL NO. 18	
ACTA PARCIAL NO. 19	
ACTA PARCIAL NO. 20	
ACTA PARCIAL NO. 21	
ACTA PARCIAL NO. 22	
ACTA PARCIAL NO. 23	
ACTA PARCIAL NO. 24	
ACTA PARCIAL NO. 25	
ACTA PARCIAL NO. 26	1843.10
ACTA PARCIAL NO. 27	878.90
ACTA PARCIAL NO. 28	**1973.10**
TOTAL ACUMULADO	4695.1


ING. SEBASTIAN GOMEZ VERGARA
MAB INGENIERIA DE VALOR
INTERVENTORIA


ING. EDWARD ANDRES SANCHEZ
CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA

SECCION DE 6.55 m CON CUNETA

K100+130 AL K100+410 K100+510 AL K101+630

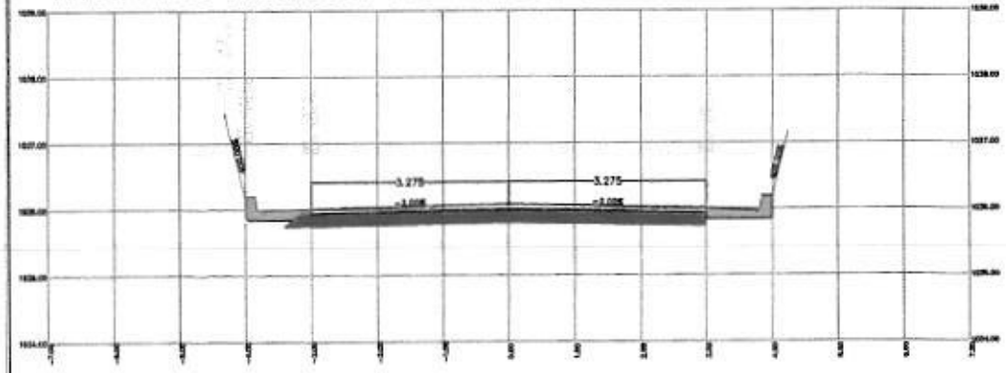

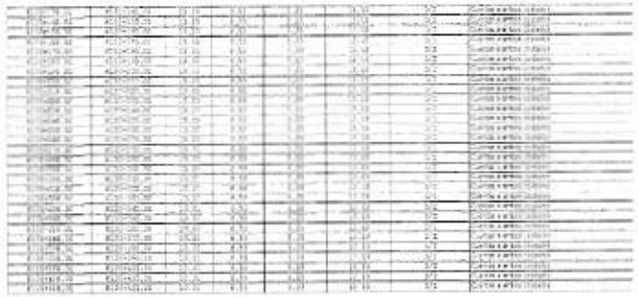

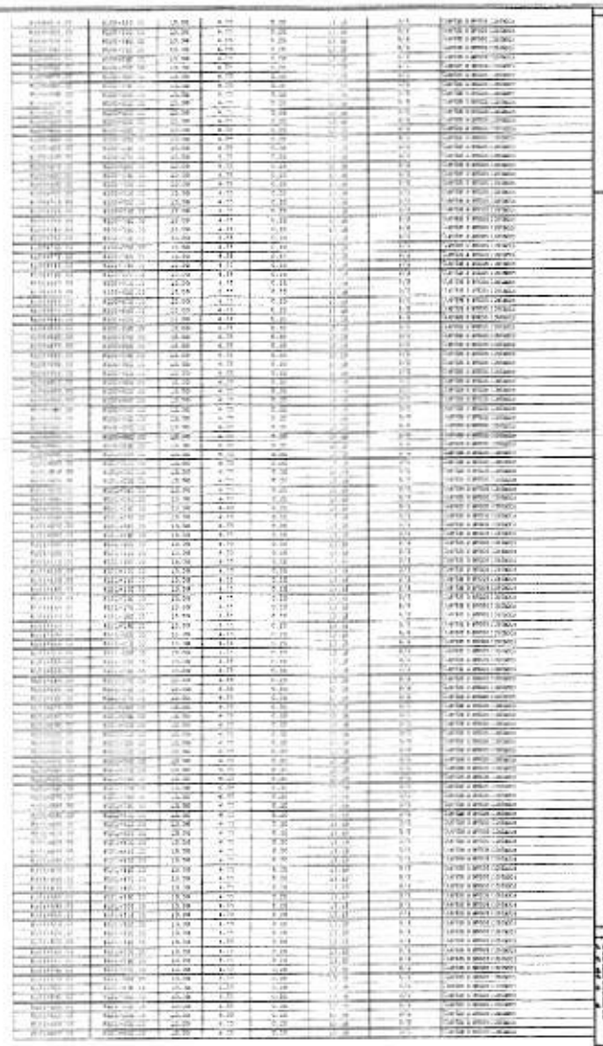




VOLUMEN DE BASE 1860.20 m3

	DIBUJÓ: A.P.G.		PROYECTO: RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS PK90+000 - PK106+000	CONTENIDO: SECCIONES TRANSVERSALES INSTALACIÓN BASE ACTA MARZO SECCIÓN A 6.55 m TRAMO 3	ESCALA: V: 100 H: 1000	PLANOS 1 DE X	
						FECHA: Marzo 2025	ARCHIVO:

SECCION DE 6.28 m CON BORDILLO

K100+420 AL K100+500

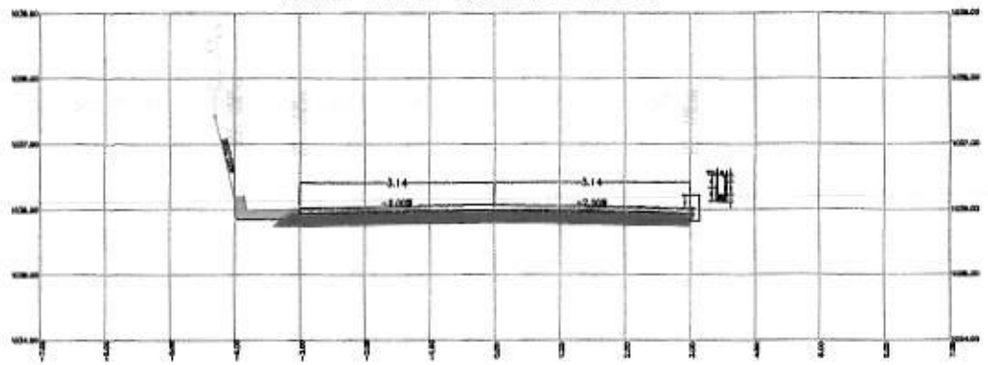

K100+420.00	K100+430.00	10.00	6.28	0.25	17.55	Bordillo costado derecho, cuneta costado izquierdo
K100+430.00	K100+440.00	10.00	6.28	0.25	17.55	Bordillo costado derecho, cuneta costado izquierdo
K100+440.00	K100+450.00	10.00	6.28	0.25	17.55	Bordillo costado derecho, cuneta costado izquierdo
K100+450.00	K100+460.00	10.00	6.28	0.25	17.55	Bordillo costado derecho, cuneta costado izquierdo
K100+460.00	K100+470.00	10.00	6.28	0.25	17.55	Bordillo costado derecho, cuneta costado izquierdo
K100+470.00	K100+480.00	10.00	6.28	0.25	17.55	Bordillo costado derecho, cuneta costado izquierdo
K100+480.00	K100+490.00	10.00	6.28	0.25	17.55	Bordillo costado derecho, cuneta costado izquierdo
K100+490.00	K100+500.00	10.00	6.28	0.25	17.55	Bordillo costado derecho, cuneta costado izquierdo
K100+500.00	K100+510.00	10.00	6.28	0.25	17.55	Bordillo costado derecho, cuneta costado izquierdo

VOLUMEN DE BASE 112.95 m3

			DIBUJO: A.P.C. REVISO:		PROYECTO: RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS PK90+000 - PK106+000	CONTIENE: SECCIONES TRANSVERSALES INSTALACIÓN BASE ACTA MARZO SECCIÓN A 6.28 m TRAMO 3	ESCALA: V: 1:00 H: 1:000

PLANOS 1 DE X

FECHA: Marzo 2026

Gobierno de CALDAS	GOBERNACIÓN DE CALDAS	Hoja No 1 de 1
	Secretaria de Infraestructura	
	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS	

PREACTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

PREACTA DE OBRA No:	28 TRAMO 3	FECHA:	28/03/2026
PERIODO:	28 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO DEL 2026		
CONTRATO DE OBRA No:	2909323-1456	CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	1091 DE 2022	INTERVENTORÍA:	MAB INGENIERIA DE VALOR
ITEM	113		UNIDAD
NP450.2P T3 Y T4	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 ASFALTO MODIFICADO TIPO 3 PUESTO EN OBRA PARA TRAMO 3 Y TRAMO 4		m3

Abscisa Inicial	Abscisa Final	Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Cantidad	Margen	Descripción
ACTA PARCIAL DE COBRO No. 28							
AJUSTE ACTA 27							
K98+740.00	K98+742.00	2.00	3.00	0.075	0.45	D	Correción abscisa inicio de beman es la K98+742
K98+740.00	K98+742.00	2.00	3.00	0.075	0.45	I	Correción abscisa inicio de beman es la K98+742
ACTA 28							
K97+990.00	K98+170.00	180.00	3.00	0.075	40.50	D	Instalación de mezcla
K97+990.00	K98+170.00	180.00	3.00	0.075	40.50	I	Instalación de mezcla
K99+655.00	K100+625.00	1773.00	3.00	0.075	398.25	D	Instalación de mezcla
K99+693.00	K100+440.00	1961.00	3.00	0.075	383.075	I	Instalación de mezcla
AJUSTE AL MDRC							
K100+413.00	K100+413.00	25.50	0.60	0.075	1.30	D	Ajuste pavimento muros
K100+362.00	K100+362.00	10.50	0.49	0.075	0.39	D	Ajuste pavimento muros
K100+275.00	K100+275.00	31.30	0.79	0.075	1.81	D	Ajuste pavimento muros
K99+749.00	K99+749.00	7.00	0.51	0.075	0.27	D	Ajuste pavimento muros
K98+250.00	K98+250.00	21.70	0.39	0.075	0.63	D	Ajuste pavimento muros
SUB TOTAL ACTA PARCIAL NO. 28				877.60			

ACTA PARCIAL NO. 1	
ACTA PARCIAL NO. 2	
ACTA PARCIAL NO. 3	
ACTA PARCIAL NO. 4	
ACTA PARCIAL NO. 5	
ACTA PARCIAL NO. 6	
ACTA PARCIAL NO. 7	
ACTA PARCIAL NO. 8	
ACTA PARCIAL NO. 9	
ACTA PARCIAL NO. 10	
ACTA PARCIAL NO. 11	
ACTA PARCIAL NO. 12	
ACTA PARCIAL NO. 13	
ACTA PARCIAL NO. 14	
ACTA PARCIAL NO. 15	
ACTA PARCIAL NO. 16	
ACTA PARCIAL NO. 17	
ACTA PARCIAL NO. 18	
ACTA PARCIAL NO. 19	
ACTA PARCIAL NO. 20	
ACTA PARCIAL NO. 21	
ACTA PARCIAL NO. 22	
ACTA PARCIAL NO. 23	
ACTA PARCIAL NO. 24	
ACTA PARCIAL NO. 25	
ACTA PARCIAL NO. 26	
ACTA PARCIAL NO. 27	638.60
ACTA PARCIAL NO. 28	**877.60**
TOTAL ACUMULADO	1516.2


ING. SEBASTIAN GOMEZ VERGARA
MAB INGENIERIA DE VALOR
INTERVENTORÍA

ING. EDWARD ANDRES SANCHEZ
CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA

SECCION ASFALTO 3.00m

K97+990 AL K98+170 MD-MI
K99+655 AL K101+425 MD
K99+693 AL K101+440 MI

K98+98+740-742 MD-MI

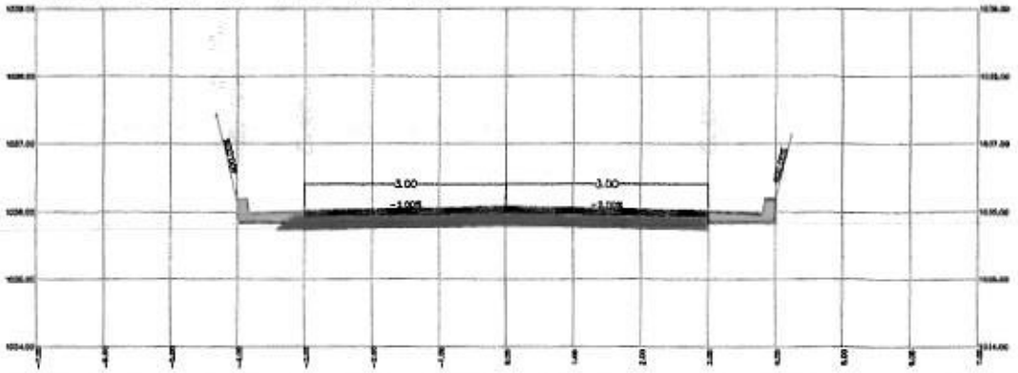

ITEM	113						UNIDAD
MP450.39 T1 Y T4	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC 19 ASFALTO MODIFICADO TIPO 3 PUESTO EN OBRA BAJA TRAMO 3 Y TRAMO 4						m3
Abscisa Inicial	Abscisa Final	Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Cantidad	Margen	Descripción
ACTA PARCIAL DE COBRO No. 28							
AJUSTE K/98 2?							
K98+740.00	K98+742.00	2.00	3.00	0.075	0.45	D	Instalación de parcha
K98+740.00	K98+742.00	2.00	3.00	0.075	0.45	I	Instalación de parcha
ACTA 28							
K97+990.00	K98+170.00	180.00	3.00	0.075	40.50	I	Instalación de parcha
K97+990.00	K98+170.00	180.00	3.00	0.075	40.50	I	Instalación de parcha
K99+655.00	K101+425.00	1770.00	3.00	0.075	398.25	D	Instalación de parcha
K99+693.00	K101+440.00	1747.00	3.00	0.075	393.075	I	Instalación de parcha
AJUSTE AL MDC							
K100+413.00	K100+433.00	20.00	0.60	0.075	1.20	D	Ajuste pavimento curva
K100+262.00	K100+282.00	10.50	0.40	0.075	0.30	D	Ajuste pavimento curva
K100+276.00	K100+276.00	31.22	0.15	0.075	1.61	D	Ajuste pavimento curva
K98+749.00	K98+749.00	5.00	0.35	0.075	0.26	D	Ajuste pavimento curva
K98+250.00	K98+250.00	22.50	0.38	0.075	0.63	D	Ajuste pavimento curva
SUB TOTAL ACTA PARCIAL NO. 28				877.60			

VOLUMEN DE MDC 877.60 m3

		DIBUJO: A.P.C.		PROYECTO: RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS PK90+000 - PK106+000	CONTENIDO: SECCIONES TRANSVERSALES INSTALACIÓN MDC ASFALTO ACTA FEBRERO SECCIÓN A 3.00 m TRAMO 3	ESCALA: H: 1/00 H: 1/000	PLANOS 1 DE X
						FECHA: Febrero 2025	

ANEXOS


REGISTRO FOTOGRAFICO


TRAMO 3

GOBIERNO DE CALDAS	GOBERNACIÓN DE CALDAS	Hoja No 1 de 1
	Secretaría de Infraestructura	
	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS. CONTRATO - 29092023-1456	
	REGISTRO FOTOGRAFICO ACTA PARCIAL DE OBRA NRO 28 TRAMO 3	

Estructura de pavimento

341.2 T3 BASE ESTABILIZADA CON MEZCLA ASFALTICA NATURAL BEMAN

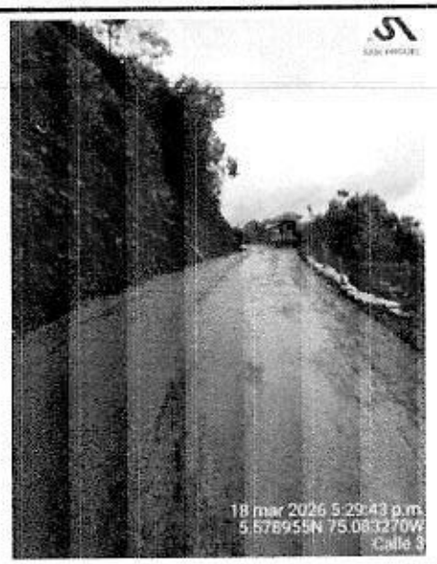

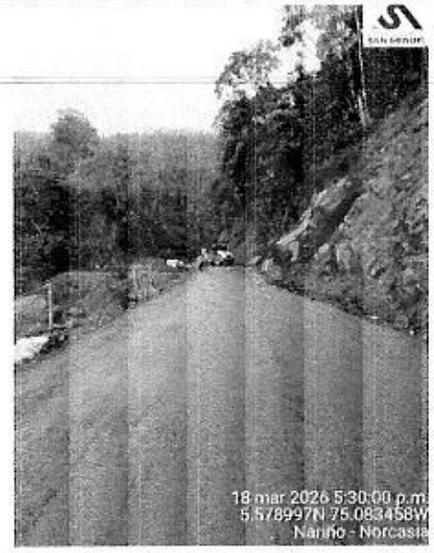


GOBIERNO DE CALDAS	GOBERNACIÓN DE CALDAS	Hoja No 1 de 1
	Secretaria de Infraestructura	
	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS. CONTRATO - 29092023-1456	
	REGISTRO FOTOGRAFICO ACTA PARCIAL DE OBRA NRO 28 TRAMO 3	

Estructura de pavimento

420,2 RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1





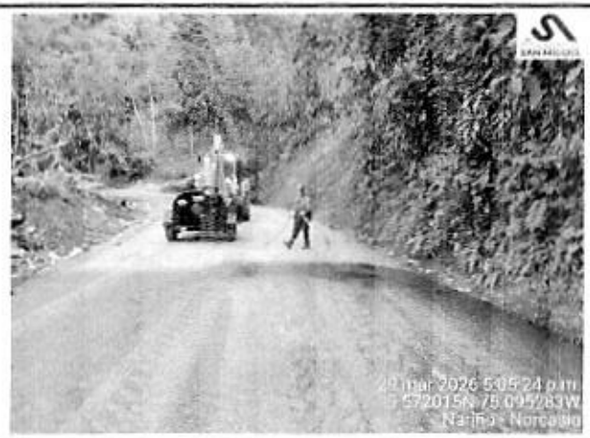



GOBIERNO DE CALDAS	GOBERNACIÓN DE CALDAS	Hoja No 1 de 1
	Secretaria de Infraestructura	
	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS. CONTRATO - 29092023-1456	
	REGISTRO FOTOGRAFICO ACTA PARCIAL DE OBRA NRO 28 TRAMO 3	

Estructuras de drenaje

600.2.3 EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO











GOBIERNO DE CALDAS	GOBERNACIÓN DE CALDAS	Hoja No 1 de 1
	Secretaria de Infraestructura	
	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS. CONTRATO - 29092023-1456	
REGISTRO FOTOGRAFICO ACTA PARCIAL DE OBRA NRO 27 TRAMO 3		


Estructuras de drenaje

640.1 T4 ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa



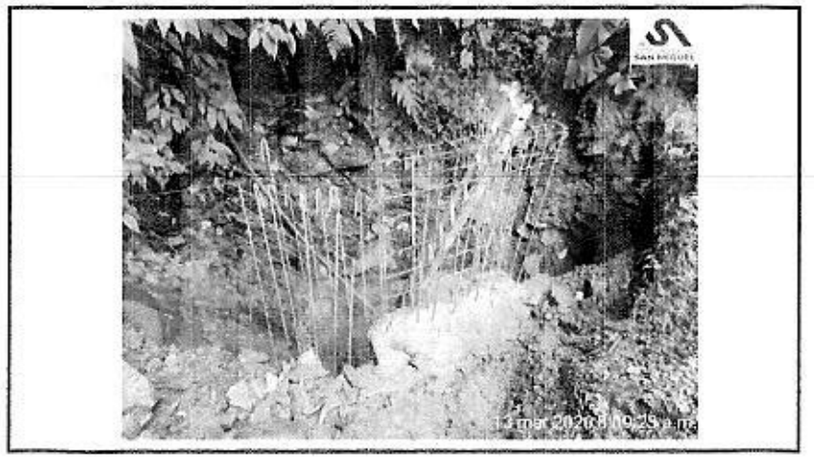

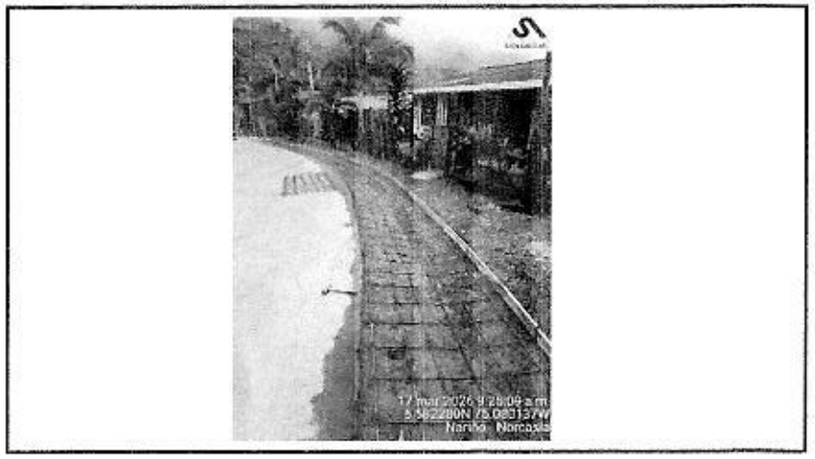

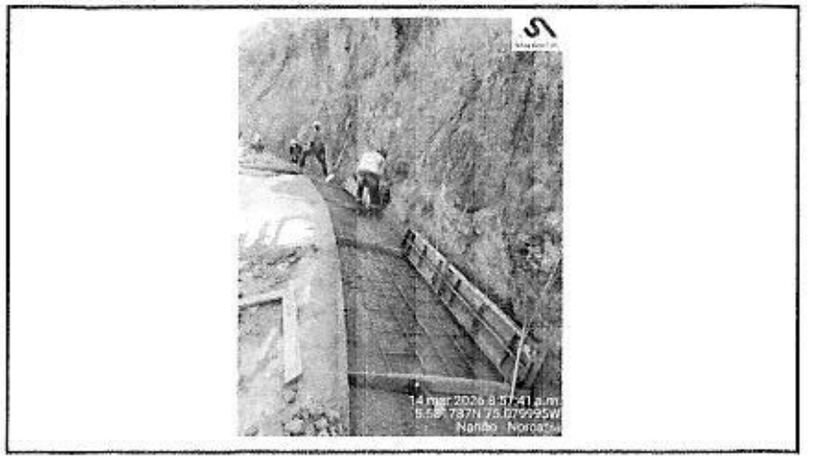

GOBIERNO DE CALDAS	GOBERNACIÓN DE CALDAS	Hoja No 1 de 1
	Secretaría de Infraestructura	
	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS. CONTRATO - 29092023-1456	
	REGISTRO FOTOGRAFICO ACTA PARCIAL DE OBRA NRO 28 TRAMO 3	

Estructuras de drenaje

673.3.3 T3 MATERIAL DE COBERTURA TIPO SUB- BASE CLASE C SBG-20











GOBIERNO DE CALDAS	GOBERNACIÓN DE CALDAS	Hoja No 1 de 1
	Secretaria de Infraestructura	
	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS. CONTRATO - 29092023-1456	

REGISTRO FOTOGRAFICO ACTA PARCIAL DE OBRA NRO 28 TRAMO 3

Obras de estabilización

640.1 T3 ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa

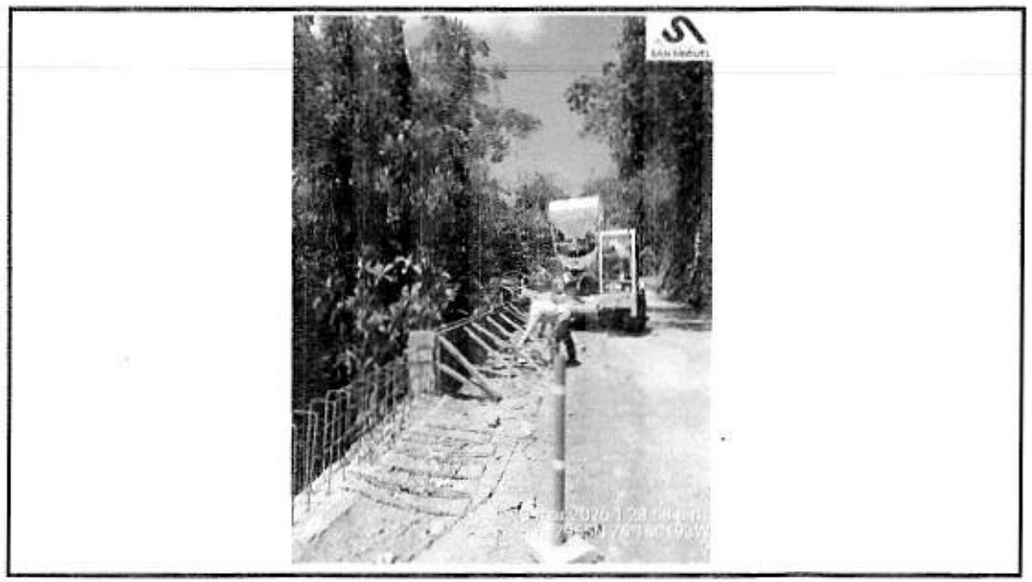

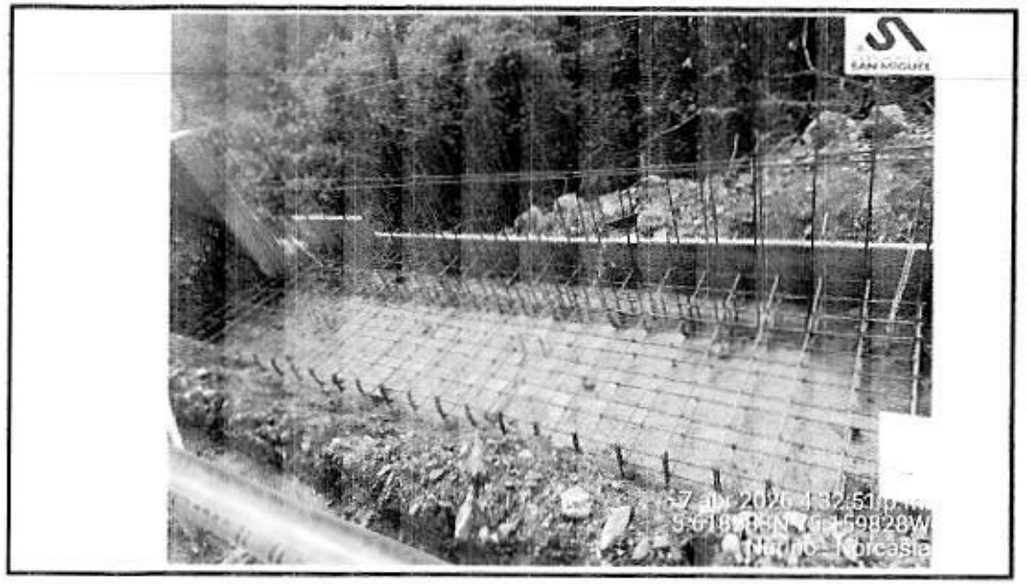

GOBIERNO DE CALDAS	GOBERNACIÓN DE CALDAS	Hoja No 1 de 1
	Secretaria de Infraestructura	
	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS. CONTRATO - 29092023-1456	
	REGISTRO FOTOGRAFICO ACTA PARCIAL DE OBRA NRO 28 TRAMO 3	

Transporte

900.2.1 TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)






GOBIERNO DE CALDAS	GOBERNACIÓN DE CALDAS	Hoja No 1 de 1
	Secretaría de Infraestructura	
	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS. CONTRATO - 29092023-1456	
	REGISTRO FOTOGRAFICO ACTA PARCIAL DE OBRA NRO 28 TRAMO 3	

Transporte

NP2 INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL DE APORTE DE LA ZONA, NO INCLUYE SUMINISTRO NI TRANSPORTE DE MATERIAL

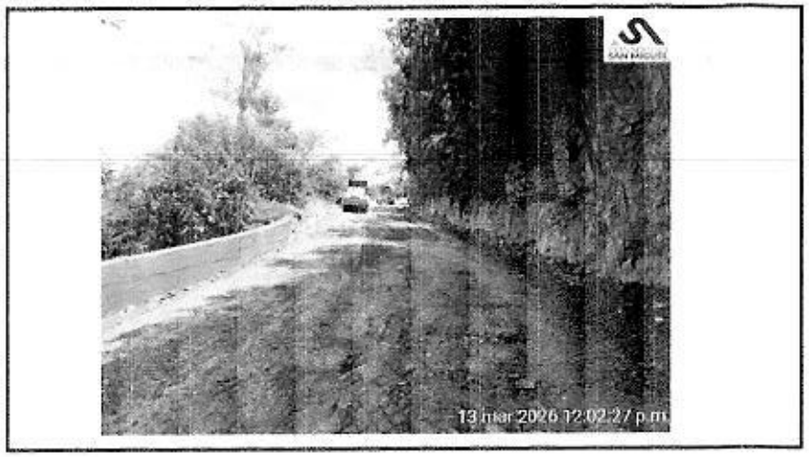








GOBIERNO DE CALDAS	GOBERNACIÓN DE CALDAS	Hoja No 1 de 1
	Secretaria de Infraestructura	
	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS. CONTRATO - 29092023-1456	
	REGISTRO FOTOGRAFICO ACTA PARCIAL DE OBRA NRO 28 TRAMO 3	

No previstos

NP 211.1 Remoción de derrumbes



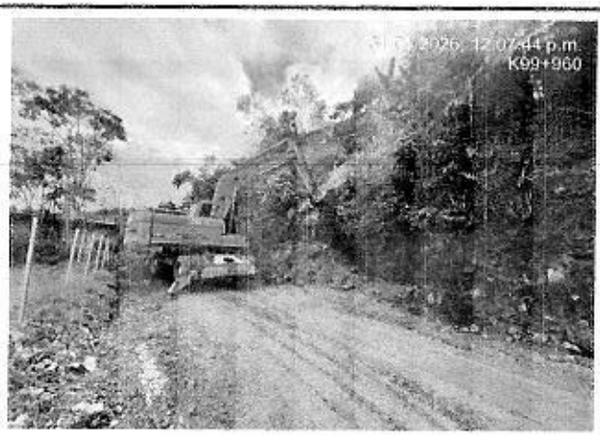





No previstos

NP 610.2 **Rellenos para estructuras con material de préstamo, excavaciones y/o derrumbes**





No previstos

NP 900.3.2 Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100 m)





GOBIERNO DE CALDAS	GOBERNACIÓN DE CALDAS	Hoja No 1 de 1
	Secretaria de Infraestructura	
	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS. CONTRATO - 29092023-1456	
REGISTRO FOTOGRAFICO ACTA PARCIAL DE OBRA NRO 28 TRAMO 3		

No previstos

NP 600.2.1 EXCAVACIONES EN ROCA PARA ESTRUCTURAS INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN EN ZONAS DE DEPOSITO AUTORIZADAS







GOBIERNO DE CALDAS	GOBERNACIÓN DE CALDAS	Hoja No 1 de 1
	Secretaría de Infraestructura	
	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS. CONTRATO - 29092023-1456	
REGISTRO FOTOGRAFICO ACTA PARCIAL DE OBRA NRO 28 TRAMO 3		

No previstos

NP11 SUMINISTRO E INSTALACION DE GEODREN VIAL PARA FILTROS ALTURA TOTAL 0.71 M INCLUYE BOLSILLO PARA TUBERIA DE 6"

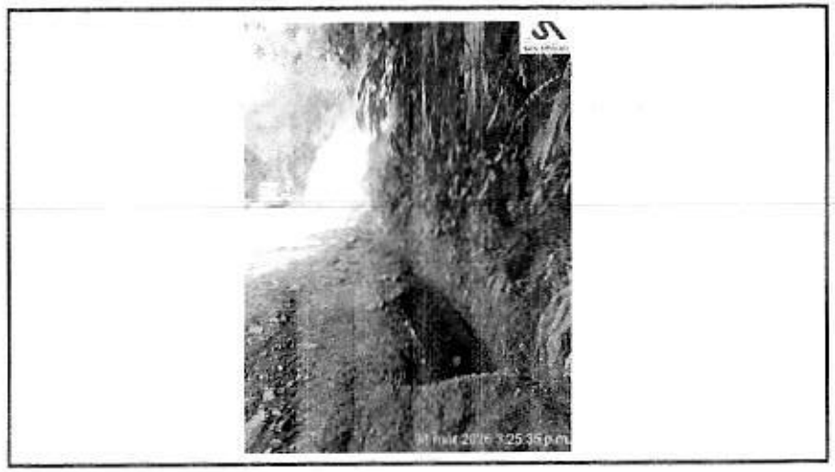

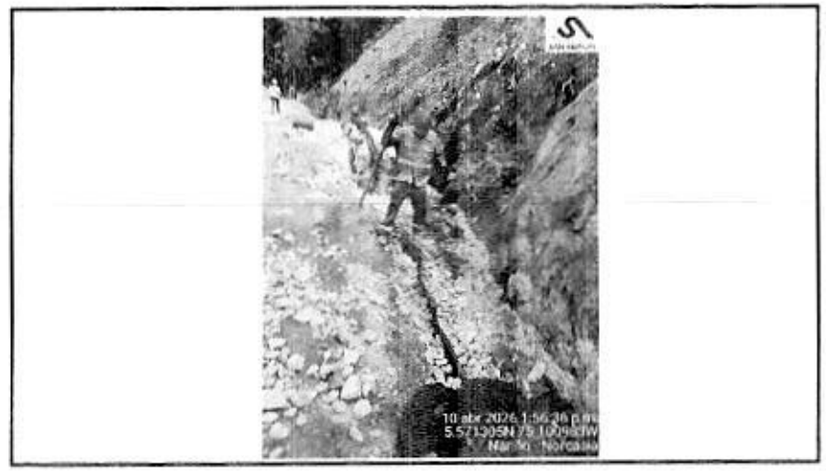





GOBIERNO DE CALDAS	GOBERNACIÓN DE CALDAS	Hoja No 1 de 1
	Secretaria de Infraestructura	
	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS. CONTRATO - 29092023-1456	
REGISTRO FOTOGRAFICO ACTA PARCIAL DE OBRA NRO 28 TRAMO 3		

No previstos

NP16 CONCRETO RESISTENCIA 28MPa (C) - PREPARADO EN OBRA, GRANULARES PUESTOS EN OBRA PARA TRAMO 3 Y TRAMO 4





GOBIERNO DE CALDAS	GOBERNACIÓN DE CALDAS	Hoja No 1 de 1
	Secretaria de Infraestructura	
	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS. CONTRATO - 29092023-1456	
REGISTRO FOTOGRAFICO ACTA PARCIAL DE OBRA NRO 28 TRAMO 3		


No previstos

NP17 CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - PREPARADO EN OBRA, GRANULARES PUESTOS EN OBRA PARA TRAMO 3 Y TRAMO 4







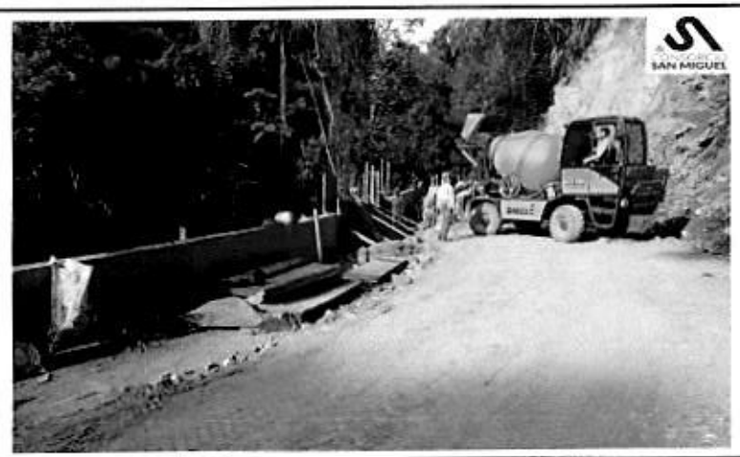

GOBIERNO DE CALDAS	GOBERNACIÓN DE CALDAS	Hoja No 1 de 1
	Secretaría de Infraestructura	
	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS. CONTRATO - 29092023-1456	
REGISTRO FOTOGRAFICO ACTA PARCIAL DE OBRA NRO 28 TRAMO 3		


No previstos

N°19 CUNETA DE CONCRETO CLASE D, VACIADA IN SITU, NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO PREPARADO EN OBRA, GRANULARES PUESTOS EN OBRA PARA TRAMO 3 Y TRAMO 4







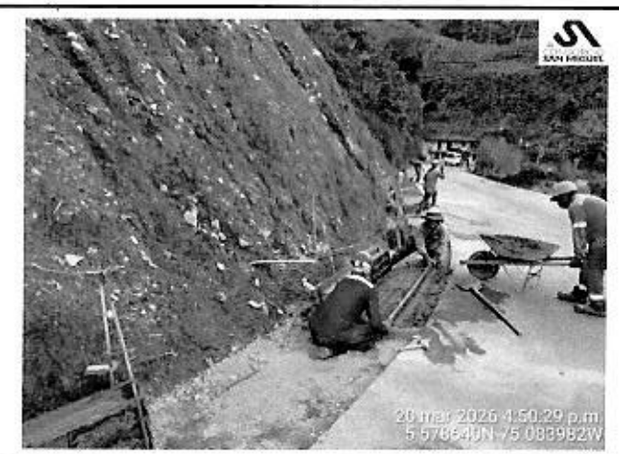

GOBIERNO DE CALDAS	GOBERNACIÓN DE CALDAS	Hoja No 1 de 1
	Secretaria de Infraestructura	
	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS. CONTRATO - 29092023-1456	
	REGISTRO FOTOGRAFICO ACTA PARCIAL DE OBRA NRO 28 TRAMO 3	

No previstos

NP21 MATERIAL GRANULAR DRENANTE PUESTO EN OBRA PARA TRAMO 3 Y TRAMO 4





GOBIERNO DE CALDAS	GOBERNACIÓN DE CALDAS	Hoja No 1 de 1
	Secretaria de Infraestructura	
	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS. CONTRATO - 29092023-1456	
REGISTRO FOTOGRAFICO ACTA PARCIAL DE OBRA NRO 28 TRAMO 3		

No previstos

NP330.3.2 T3 Y T4 BASE GRANULAR CLASE C PUESTO EN OBRA PARA TRAMO 3 Y TRAMO 4











GOBIERNO DE CALDAS	GOBERNACIÓN DE CALDAS	Hoja No 1 de 1
	Secretaría de Infraestructura	
	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS. CONTRATO - 29092023-1456	
REGISTRO FOTOGRAFICO ACTA PARCIAL DE OBRA NRO 28 TRAMO 3		


No previstos

NP450.2P T3 Y T4 MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 ASFALTO MODIFICADO TIPO 3 PUESTO EN OBRA PARA TRAMO 3 Y TRAMO 4

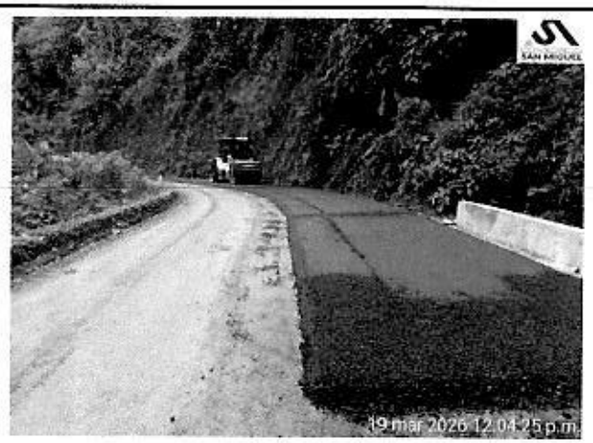



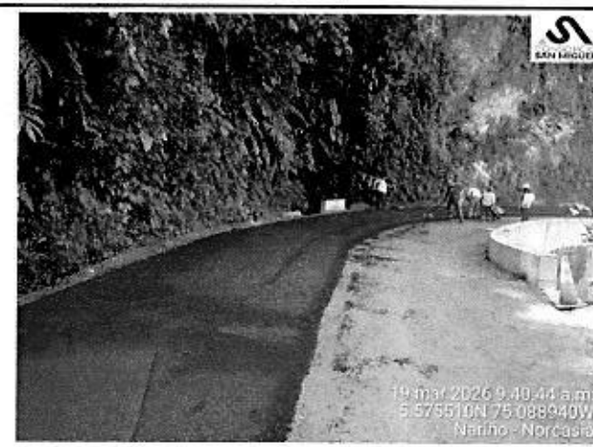

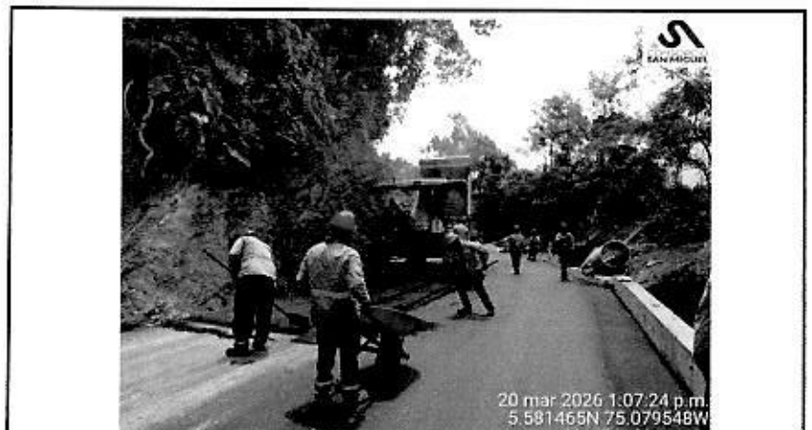

PRE-ACTA TRAMO 4

Gobierno de CALDAS	GOBERNACIÓN DE CALDAS Secretaría de Infraestructura	Hoja No 1 de 1
	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA – SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS	

PRACTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA – SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

PRACTA DE OBRA No:	28 TRAMO 4	FECHA:	28/01/2026
PERIODO:	1 DE MARZO AL 28 DE MARZO DEL 2024		
CONTRATO DE OBRA No:	2908/2023-3454	CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	3073 DE 2022	INTERVENTORIA:	MAS INGENIERIA DE VALOR


ITEM	2					UNIDAD
210.2.1	EXCAVACIÓN EN ROCA DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES					m3
Abscisa Inicial	Abscisa Final	Largo (m)	Area corte (m2)		Volumen corte	Margen	Descripción
ACTA PARCIAL DE OBRA NO. 28							
K108+267.00	K108+532.00				285.81	D/I	Corte para ampliación de vía- Ver Anexo de topografía
SUB TOTAL ACTA PARCIAL NO. 28					285.81		

ACTA PARCIAL NO. 1	
ACTA PARCIAL NO. 2	
ACTA PARCIAL NO. 3	
ACTA PARCIAL NO. 4	
ACTA PARCIAL NO. 5	
ACTA PARCIAL NO. 6	
ACTA PARCIAL NO. 7	
ACTA PARCIAL NO. 8	
ACTA PARCIAL NO. 9	126.00
ACTA PARCIAL NO. 10	275.40
ACTA PARCIAL NO. 11	44.76
ACTA PARCIAL NO. 12	724.42
ACTA PARCIAL NO. 13	-531.00
ACTA PARCIAL NO. 14	0.00
ACTA PARCIAL NO. 15	0.00
ACTA PARCIAL NO. 16	0.00
ACTA PARCIAL NO. 17	0.00
ACTA PARCIAL NO. 18	0.00
ACTA PARCIAL NO. 19	0.00
ACTA PARCIAL NO. 20	0.00
ACTA PARCIAL NO. 21	0.00
ACTA PARCIAL NO. 22	1431.80
ACTA PARCIAL NO. 23	0.00
ACTA PARCIAL NO. 24	426.45
ACTA PARCIAL NO. 25	0.00
ACTA PARCIAL NO. 26	0.00
ACTA PARCIAL NO. 27	0.00
ACTA PARCIAL NO. 28	285.81
TOTAL ACUMULADO	2979.2

ING. SEBASTIAN GOMEZ VERGARA
MAS INGENIERIA DE VALOR
INTERVENTORIA

ING. EDWARD ANDRES SANCHEZ
CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA


1 Marzo

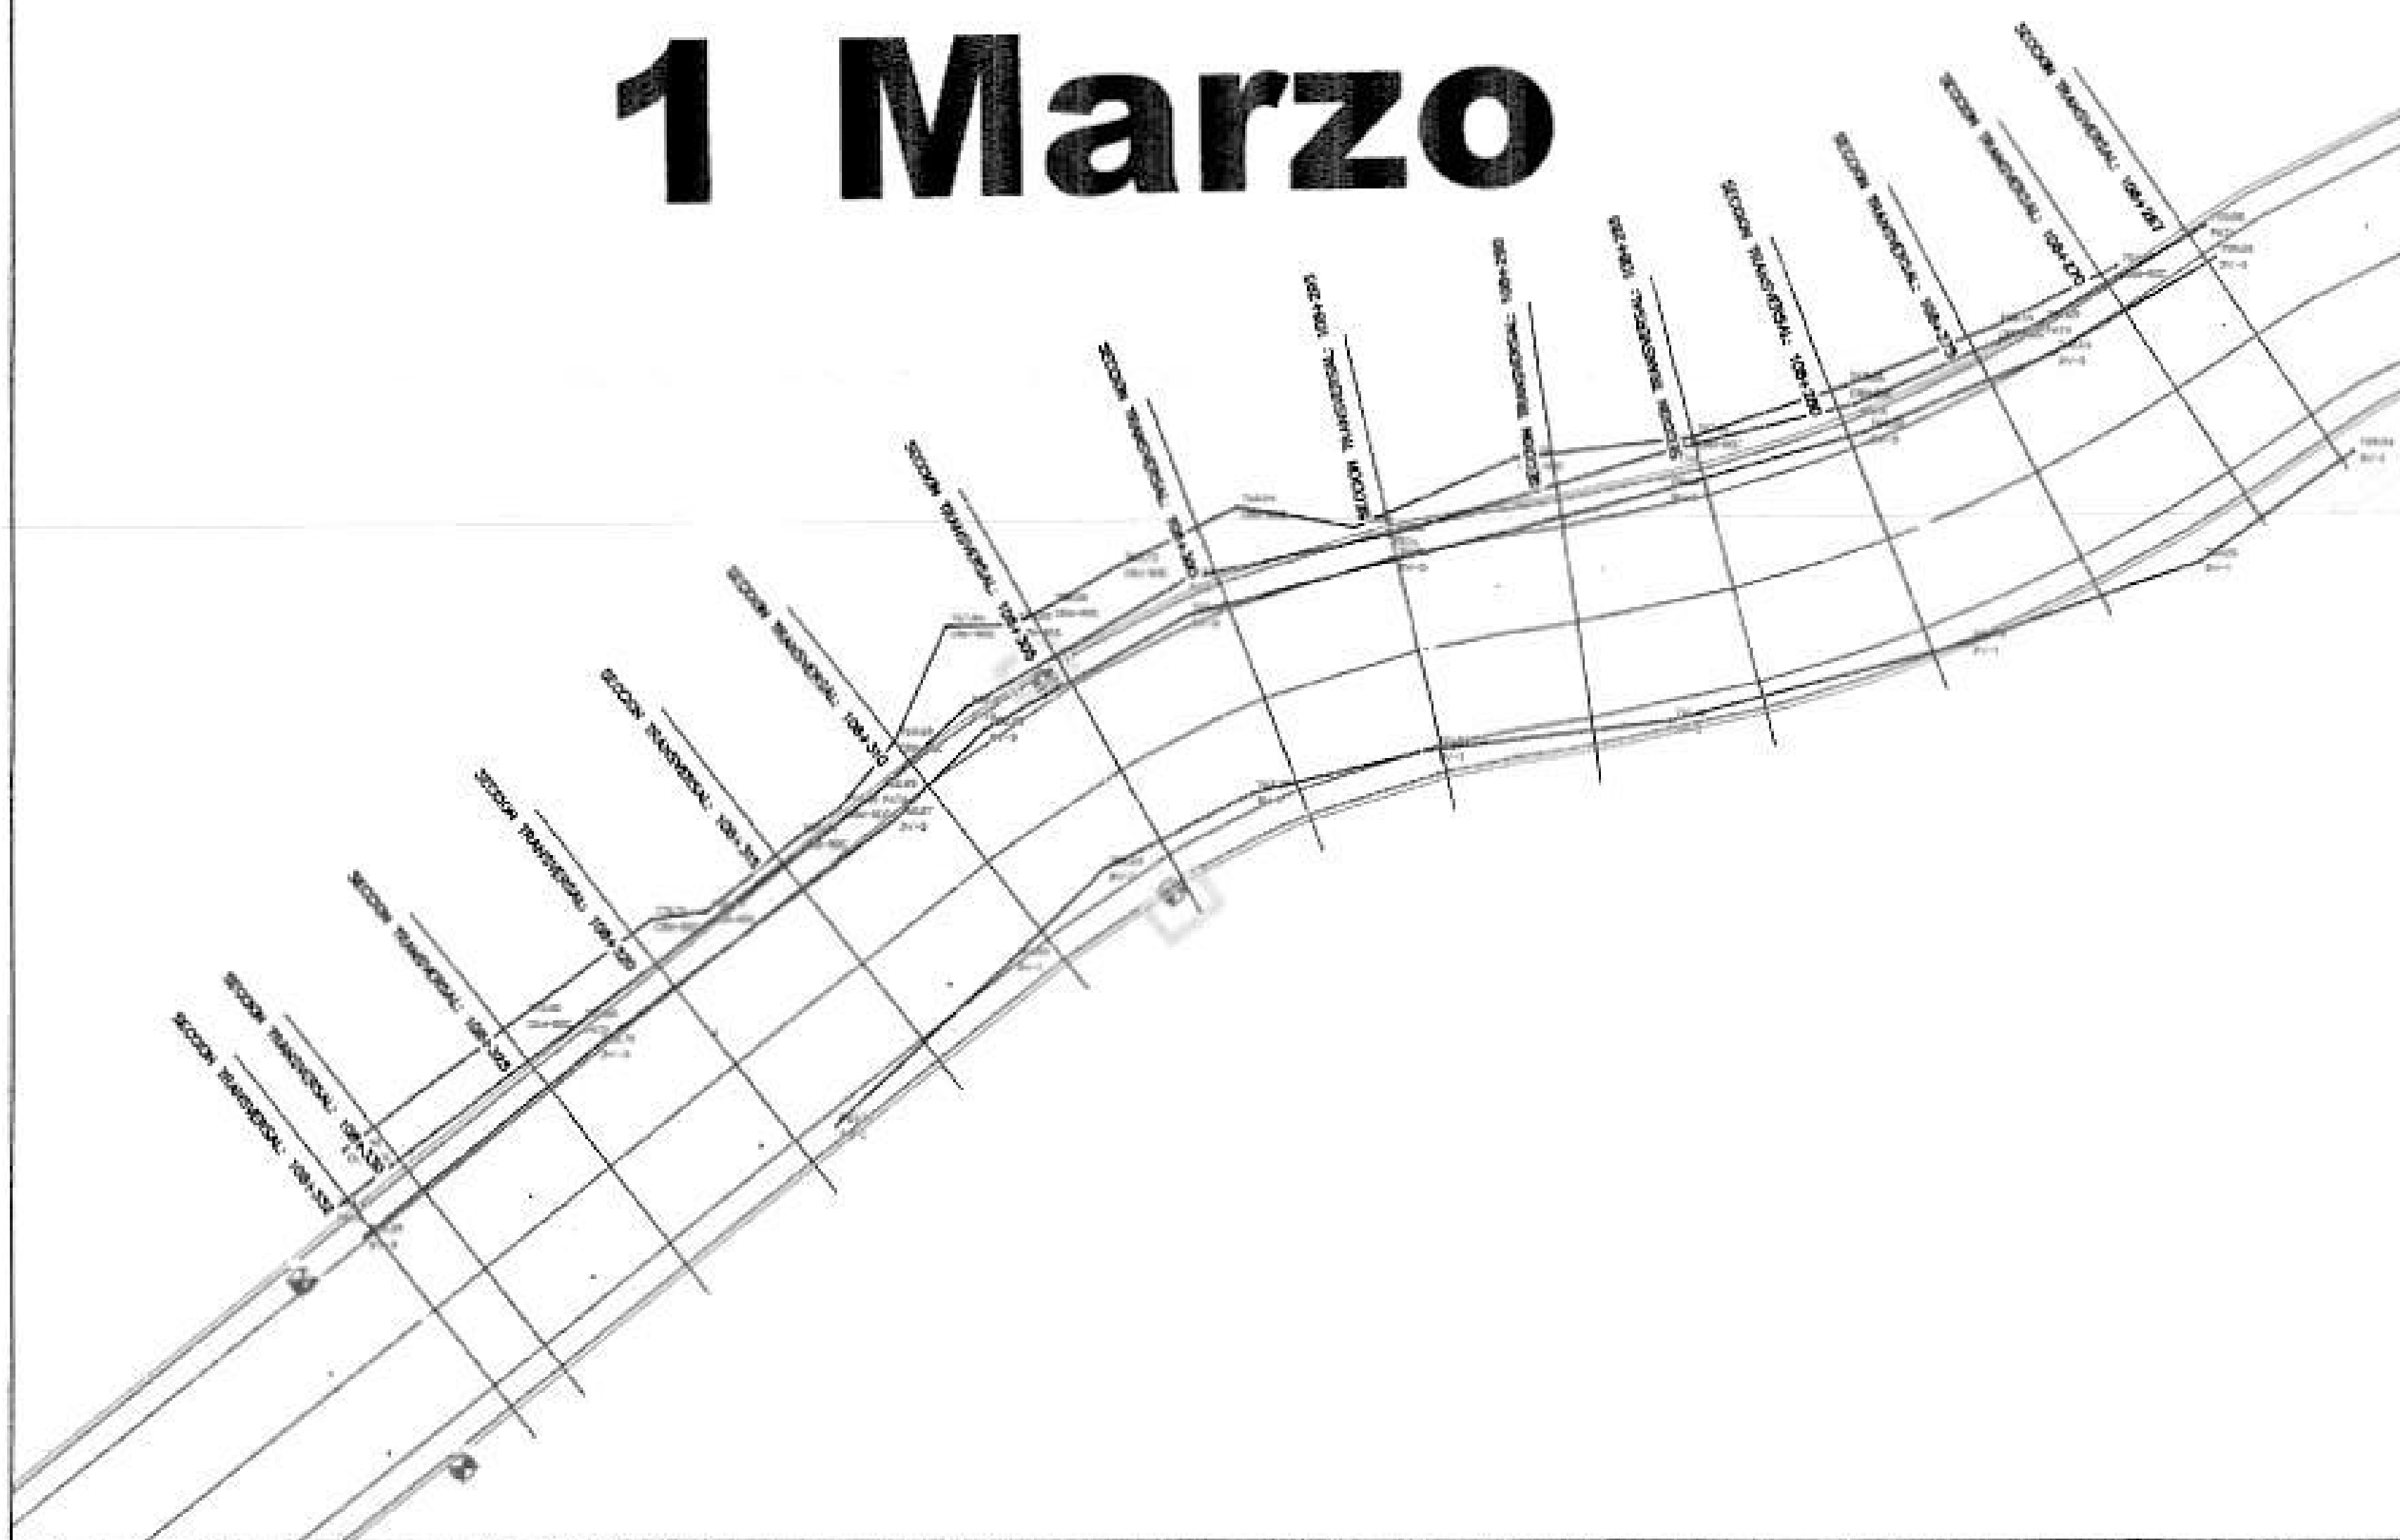


DIBUJO: A.P.C.	PROYECTO: RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS PK106+000 – PK120+000	CONTIENE: SECCIONES TRANSVERSALES EXCAVACIÓN AMPLIACIÓN K108+267–332 TRAMO 4	ESCALA: V: 100 H: 1000	PLANOS 1 DE X
				FECHA: Marzo 2026

INGENIERIA DE KALED · SAN MIGUEL


SECCION TRANSVERSAL
108+267.00

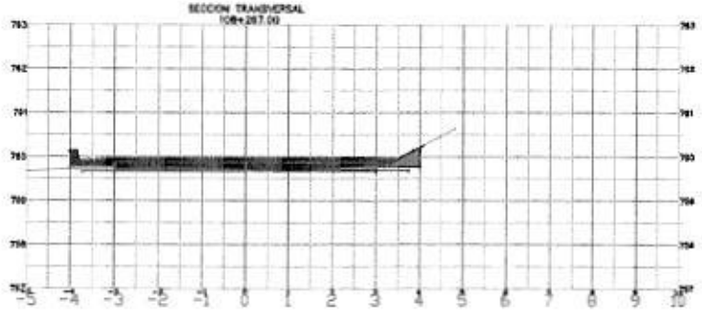

SECCION TRANSVERSAL
108+270.00

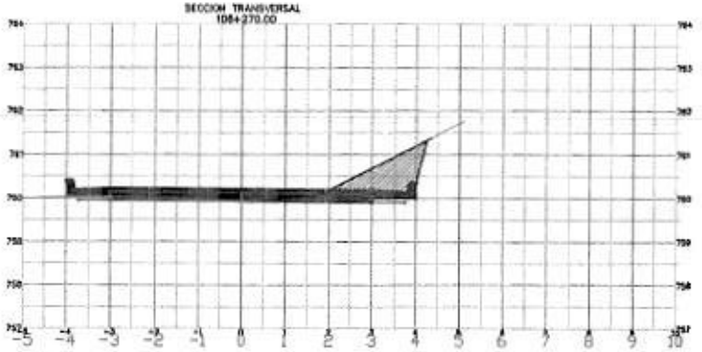

PROYECTO:	RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS PK108+000 – PK120+000	CONTENIDO:	SECCIONES TRANSVERSALES EXCAVACIÓN AMPLIACIÓN k108+267–332 TRAMO 4	ESCALA: V: 100 H: 1000	PLANOS 1 DE X
				FECHA: Marzo 2026	ARCHIVO:

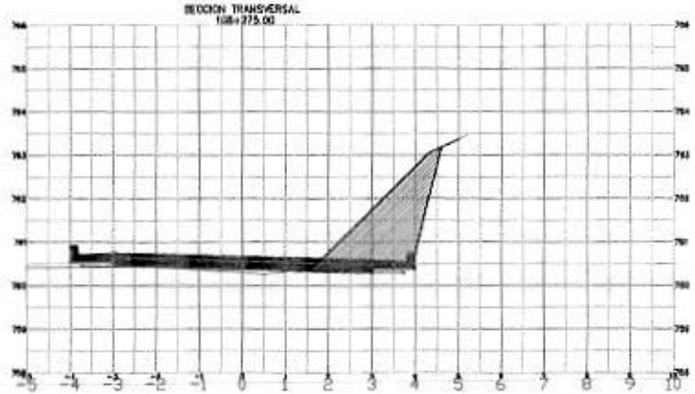

Diferencia en cantidad PK108+000			
Capa	Área	Volumen	Volumen Acumulado
Excavación Ampliación	0.00	0.00	0.00


UBICACIÓN

CONVENCIONES

NOTAS

REVISIONES

		DIBUJO: A.P.C.			PROYECTO: RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS PK108+000 – PK120+000	CONTIENE: SECCIONES TRANSVERSALES EXCAVACIÓN AMPLIACIÓN k108+267–332 TRAMO 4	ESCALA: V: 1:100 H: 1:1000	PLANOS 1 DE X FECHA: Marzo 2025

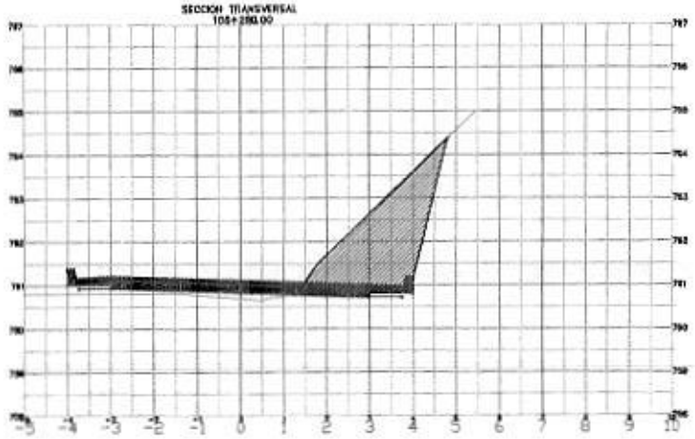

Calculos en Abscisa K108+280.00			
Nombre	Área	Volumen	Volumen Acumulado
Área Relleno	0.00	0.000	42.767

UBICACIÓN


CONVENCIONES

NOTAS

REVISIONES

		DIBUJÓ: A.P.G.			PROYECTO: RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS PK108+000 – PK120+000	CONTIENE: SECCIONES TRANSVERSALES EXCAVACIÓN AMPLIACIÓN k108+267–332 TRAMO 4	ESCALA: V: 1:50 H: 1:200	PLANOS 1 DE X
								FECHA: Marzo 2025

SECCION TRANSVERSAL
108+285.00

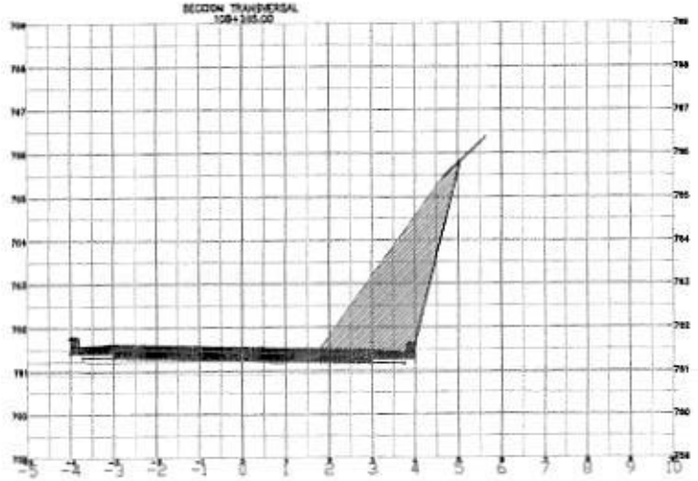


LOCALIZACIÓN

CONVENCIONES

NOTAS

REFERENCIAS

DISEÑO: A.P.C.	PROYECTO: RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS PK106+000 – PK120+000	CONTIENE: SECCIONES TRANSVERSALES EXCAVACIÓN AMPLIACIÓN k108+287–332 TRAMO 4	ESCALAS: V: 100 H: 1000	PLANOS 1 DE X	
				FECHA: Marzo 2026	

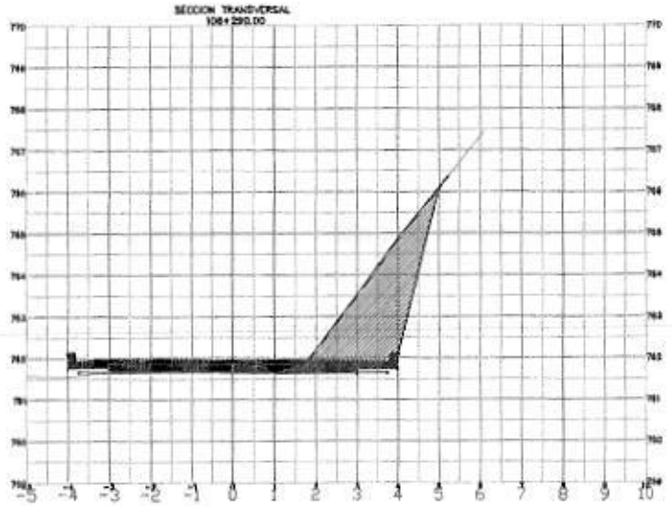

UBICACION


CONVENCIONES

NOTAS

REFERENCIAS

DIBUJO: A.P.C.	PROYECTO: RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS PK106+000 – PK120+000	CONTIENE: SECCIONES TRANSVERSALES EXCAVACIÓN AMPLIACIÓN K108+267–332 TRAMO 4	ESCALA: V: 100 H: 1000	PLANOS 1 DE X	
				FECHA: Mayo 2025	

SECCION TRANSVERSAL
109+225.00

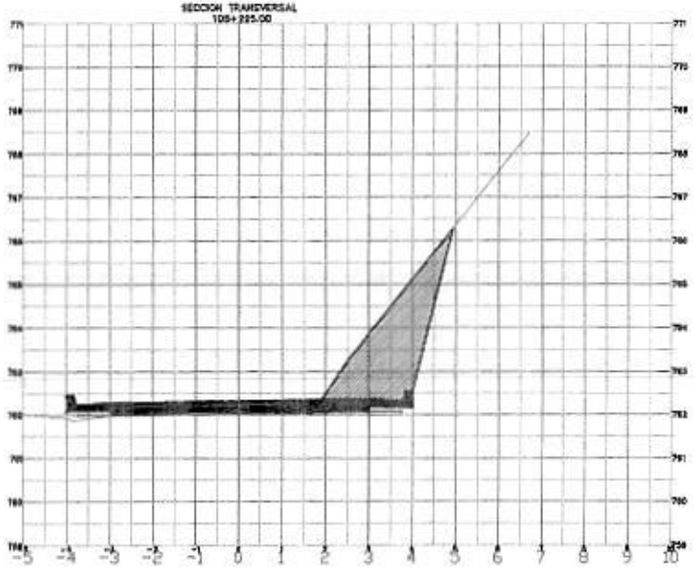


Volumen proyectado 109+225.00			
Acumulado	Area	Volumen	Volumen Acumulado
Abscisa Topográfica	0.00	0.0	0.00

CONVENCIONES

NOTAS

REFERENCIAS

DISEÑO:		PROYECTO: RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS PK106+000 – PK120+000	CONTIENE: SECCIONES TRANSVERSALES EXCAVACIÓN AMPLIACIÓN k108+257–332 TRAMO 4	ESCALA: V: 100 H: 1000	PLANOS 1 DE X	
DIBUJÓ: A.P.C.					FECHA: Marzo 2026	ARCHIVO:

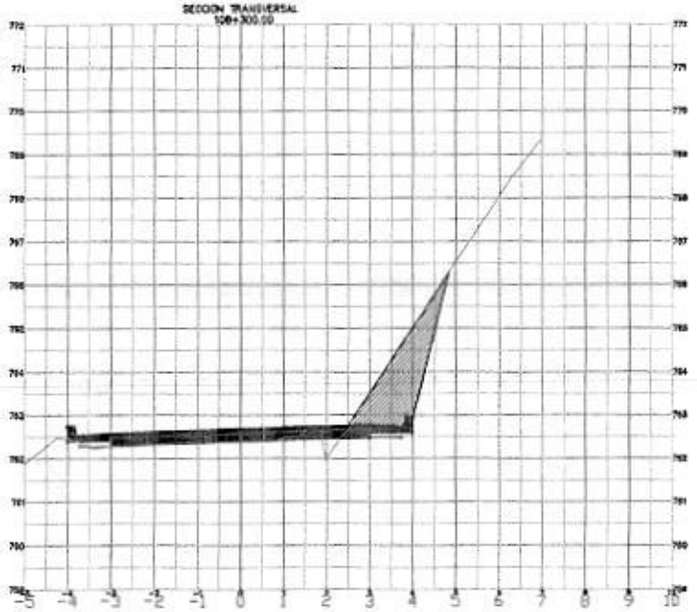

DISEÑO
A.P.C.

PROYECTO: RUTA DEL RENACIMIENTO
ENTRE LOS
DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS
PK1064000 - PK120+000


CONTENIDO: SECCIONES TRANSVERSALES
EXCAVACIÓN AMPLIACIÓN
k100+267-332
TRAMO 4

ESCALA: V: 100 H: 1000

PLANOS 1 DE X

FECHA: Marzo 2025

SECCION TRANSVERSAL
108+105.00

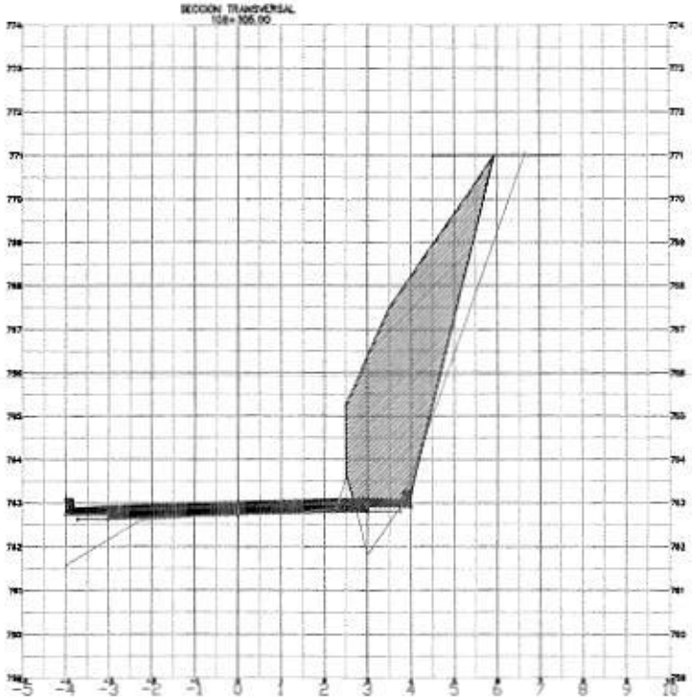


LOCALIZACIÓN

CONVENCIONES

NOTAS

REFERENCIAS

		DIBUJÓ: A.P.G.		PROYECTO: RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS PK1064+000 – PK1120+000	CONTENIDO: SECCIONES TRANSVERSALES EXCAVACIÓN AMPLIACIÓN k108+257–332 TRAMO 4	ESCALA: V: 100 H: 1000	PLANOS 1 DE X	
							FECHA: Marzo 2020	ARCHIVO:

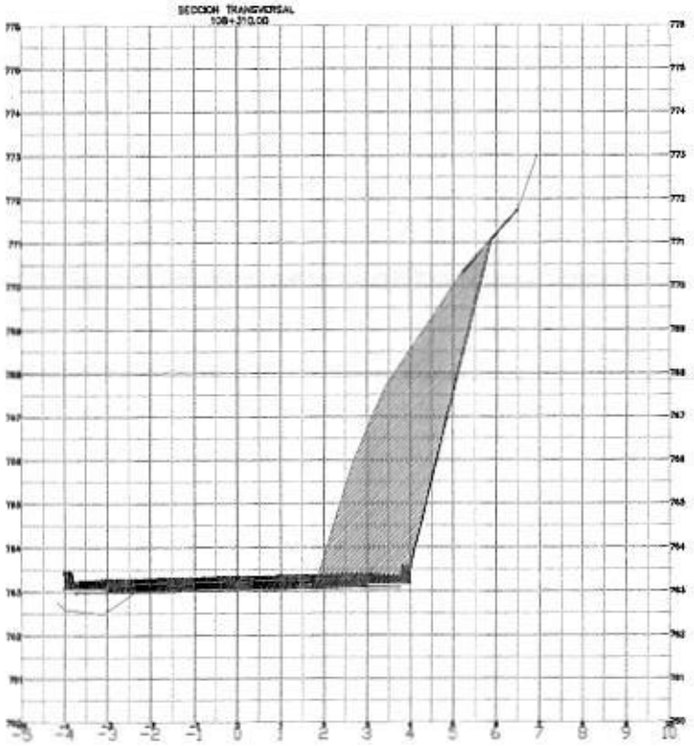

LOCALIZACION


CONVENCIONES

NOTAS

1. Las cotas están dadas en metros y rigen en el sitio de las obras.
2. Los taludes de corte están indicados en tablas (1H:1V o 1H:2V).
3. Las pendientes de los taludes corresponden a los cortes realizados en suelos residuales, roca y taludes conformados a partir de rellenos.
4. Para el diseño de los taludes se tuvo en cuenta el estudio geotécnico realizado por [illegible].
5. Para cualquier duda o cambio en la obra por favor consultar con el ingeniero [illegible].

REFERENCIAS

DIBUJÓ: A.P.C.	PROYECTO: RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS PK1064+000 – PK1204+000	CONTENIDO: SECCIONES TRANSVERSALES EXCAVACIÓN AMPLIACIÓN k1084+267–332 TRAMO 4	ESCALA: V: 100 H: 1000	PLANOS 1 DE X	
				FECHA: Marzo 2020	ARCHIVO:

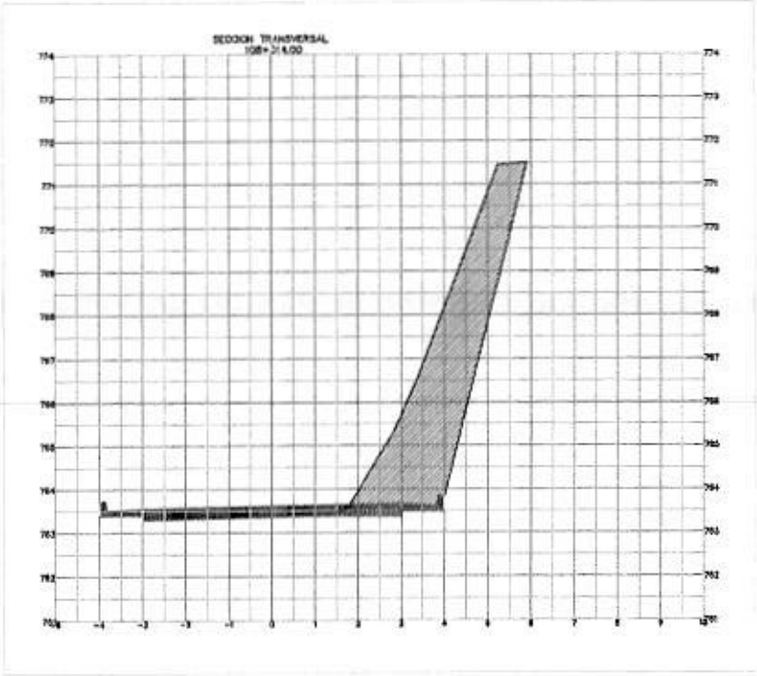

		DIBUJO: A.P.C.		PROYECTO: RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS PK106+000 – PK120+000	CONTENIDO: SECCIONES TRANSVERSALES EXCAVACIÓN AMPLIACIÓN k108+267–314 TRAMO 4	ESCALA: V: 100 H: 1000	PLANOS 1 DE X
							FECHA: Marzo 2025 ARCHIVO:

Gobierno de CALDAS	GOBERNACION DE CALDAS Secretaría de Infraestructura	Hoja No 1 de 1
	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS	

PREACTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA – SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

PREACTA DE OBRA No:	28 TRAMO 4	FECHA:	28/03/2026
PERIODO:	1 DE MARZO AL 28 DE MARZO DEL 2026		
CONTRATO DE OBRA No:	25052023-1456	CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	1371 DE 2022	INTERVENTORÍA:	MAB INGENIERIA DE VALOR

ITEM	3						UNIDAD
201.7	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS						m3
Abscisa Inicial	Abscisa Final	Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Cantidad	Margen	Descripción
ACTA PARCIAL DE COBRO NO. 28							
ALCANTARILLA							
K100+300	K100+300	32.00	0.50	3.00	48.00	I	Demolición muro existente
SUB TOTAL ACTA PARCIAL NO. 28				48.00			

ACTA PARCIAL NO. 1	
ACTA PARCIAL NO. 2	
ACTA PARCIAL NO. 3	
ACTA PARCIAL NO. 4	
ACTA PARCIAL NO. 5	
ACTA PARCIAL NO. 6	
ACTA PARCIAL NO. 7	
ACTA PARCIAL NO. 8	
ACTA PARCIAL NO. 9	0.00
ACTA PARCIAL NO. 10	0.00
ACTA PARCIAL NO. 11	0.00
ACTA PARCIAL NO. 12	0.00
ACTA PARCIAL NO. 13	0.00
ACTA PARCIAL NO. 14	0.00
ACTA PARCIAL NO. 15	0.00
ACTA PARCIAL NO. 16	0.00
ACTA PARCIAL NO. 17	0.00
ACTA PARCIAL NO. 18	0.00
ACTA PARCIAL NO. 19	0.00
ACTA PARCIAL NO. 20	0.00
ACTA PARCIAL NO. 21	0.00
ACTA PARCIAL NO. 22	0.00
ACTA PARCIAL NO. 23	0.00
ACTA PARCIAL NO. 24	0.00
ACTA PARCIAL NO. 25	0.00
ACTA PARCIAL NO. 26	0.00
ACTA PARCIAL NO. 27	0.00
ACTA PARCIAL NO. 28	**48.00**
TOTAL ACUMULADO	48.00

ING. SEBASTIAN GOMEZ VERGARA
MAB INGENIERIA DE VALOR
INTERVENTORIA

ING. EDWARD ANDRES SANCHEZ
CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA

Gobierno de CALDAS	GOBERNACIÓN DE CALDAS Secretaría de Infraestructura	Hoja No 1 de 1
	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS	

PREACTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

PREACTA DE OBRA No:	28 TRAMO 4	FECHA:	28/03/2026
PERIODO:	1 DE MARZO AL 28 DE MARZO DEL 2026		
CONTRATO DE OBRA No:	29092023-1456	CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	1071 DE 2022	INTERVENTORÍA:	MAB INGENIERIA DE VALOR

ITEM	16					UNIDAD
600.2.3	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO					m3
Abscisa Inicial	Abscisa Final	Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Margen	Cantidad	Descripción
ACTA PARCIAL DE COBRO NO. 28							
ALCANTARILLA							
K109+270	K109+270	3.30	2.20	2.00	D	13.20	Excavación poceta encole
ODT							
K106+800	K106+800	9.24	2.82	2.05	D/I	52.84	Excavación de ODT pendiente de cobro
SUB TOTAL ACTA PARCIAL NO. 28				66.00			

ACTA PARCIAL NO. 1	
ACTA PARCIAL NO. 2	
ACTA PARCIAL NO. 3	
ACTA PARCIAL NO. 4	
ACTA PARCIAL NO. 5	
ACTA PARCIAL NO. 6	
ACTA PARCIAL NO. 7	
ACTA PARCIAL NO. 8	
ACTA PARCIAL NO. 9	119,00
ACTA PARCIAL NO. 10	297,50
ACTA PARCIAL NO. 11	450,00
ACTA PARCIAL NO. 12	220,70
ACTA PARCIAL NO. 13	215,80
ACTA PARCIAL NO. 14	282,50
ACTA PARCIAL NO. 15	0,00
ACTA PARCIAL NO. 16	123,30
ACTA PARCIAL NO. 17	53,10
ACTA PARCIAL NO. 18	23,30
ACTA PARCIAL NO. 19	0,00
ACTA PARCIAL NO. 20	0,00
ACTA PARCIAL NO. 21	37,50
ACTA PARCIAL NO. 22	0,00
ACTA PARCIAL NO. 23	15,80
ACTA PARCIAL NO. 24	55,10
ACTA PARCIAL NO. 25	229,60
ACTA PARCIAL NO. 26	109,10
ACTA PARCIAL NO. 27	192,40
ACTA PARCIAL NO. 28	**66,00**
TOTAL ACUMULADO	2498,60

ING. SEBASTIÁN GOMEZ VERGARA
MAB INGENIERIA DE VALOR
INTERVENTORIA

ING. EDWARD ANDRES SANCHEZ
CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA

Gobierno de CALDAS	GOBERNACIÓN DE CALDAS Secretaria de Infraestructura	Hoja No 1 de 1
	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS	

PREACTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

PREACTA DE OBRA No:	28 TRAMO 4	FECHA:	28/03/2026
PERIODO:	1 DE MARZO AL 28 DE MARZO DEL 2026		
CONTRATO DE OBRA No:	29092023-1456	CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	107 DE 2022	INTERVENTORÍA:	MAB INGENIERIA DE VALOR

ITEM	29	UNIDAD
640.1 T4	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 MPa	kg

Abscisa Inicial	ESTRUCTURA	CANTIDAD	LONGITUD	CALIBRE	PESO (KG-M)	PESO TOTAL	Descripción
ALCANTARILLAS							
ACTA PARCIAL DE COBRO NO. 28							
K108+270.00	K108+270.00	1	77.85	3/8"	0.559	43.48	Acero de refuerzo para caja encole en- Ver cartilla de despiece
			122.55	1/2"	0.994	121.81	
K107+500.00	K107+500.00	1	69.20	3/8"	0.559	38.70	Acero de refuerzo para caja encole en- Ver cartilla de despiece
			118.35	1/2"	0.994	117.64	
SUB TOTAL ACTA PARCIAL NO. 28					322.00		

ACTA PARCIAL NO. 1	
ACTA PARCIAL NO. 2	
ACTA PARCIAL NO. 3	
ACTA PARCIAL NO. 4	
ACTA PARCIAL NO. 5	
ACTA PARCIAL NO. 6	
ACTA PARCIAL NO. 7	
ACTA PARCIAL NO. 8	
ACTA PARCIAL NO. 9	
ACTA PARCIAL NO. 10	
ACTA PARCIAL NO. 11	
ACTA PARCIAL NO. 12	
ACTA PARCIAL NO. 13	
ACTA PARCIAL NO. 14	750.00
ACTA PARCIAL NO. 15	161.00
ACTA PARCIAL NO. 16	1474.00
ACTA PARCIAL NO. 17	2263.00
ACTA PARCIAL NO. 18	510.00
ACTA PARCIAL NO. 19	0.00
ACTA PARCIAL NO. 20	0.00
ACTA PARCIAL NO. 21	437.00
ACTA PARCIAL NO. 22	153.60
ACTA PARCIAL NO. 23	943.00
ACTA PARCIAL NO. 24	459.00
ACTA PARCIAL NO. 25	355.00
ACTA PARCIAL NO. 26	350.00
ACTA PARCIAL NO. 27	886.00
ACTA PARCIAL NO. 28	**322.00**
TOTAL ACUMULADO	9605.6

ING. SEBASTIAN GOMEZ VERGARA
MAB INGENIERIA DE VALOR
INTERVENTORIA

ING. EDWARD ANDRES SANCHEZ
CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA

CANTIDADES ACERO FIGURADO

Proyecto: INVIAS 1071-2022 LA DORADA-SONSON
No. del Contrato: LP-SI-004-2023
Localización: CAJA DE ENTRDA EN ODT K109+270 CD
Fecha: Marzo, 2026

CONSORCIO SAN MIGUEL

Figura	Cantidad	Longitud de corte	6 mm	8 mm	1/4"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	7/8"	1"	1 1/8"	1 1/4"
			6M	8M	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5	No. 6	No. 7	No. 8	No. 9	No. 10
	5	6.85				34.25							
						0.00							
	4	5.30				21.2							
	2	1.90				3.8							
	5	4.85					24.25						
	5	2.20					11						
	4	8.10					32.4						
	5	7.30					36.5						
	4	1.00					4						
	2	7.20					14.4						
	2	6.90				13.8							
	2	2.30				4.6							
Peso nominal varilla de acero (kg/m)			0.222	0.394	0.250	0.560	0.994	1.552	2.235	3.042	3.973	5.060	6.404
Metros lineales						77.65	122.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Peso en kilos						43.48	121.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Peso total (kg)			165.30										

	Nombre		
INGENIERO	ING. EDWARD SANCHEZ		

CANTIDADES ACERO FIGURADO

Proyecto: INVIAS 1071-2022 LA DORADA-SONSON
No. del Contrato: LP-SI-004-2023
Localización: CAJA DE ENTRDA EN ODT K107+500 CD
Fecha: Marzo, 2026

CONSORCIO SAN MIGUEL

Figura	Cantidad	Longitud de corte	6 mm	8 mm	1/4"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	7/8"	1"	1 1/8"	1 1/4"
			6M	8M	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5	No. 6	No. 7	No. 8	No. 9	No. 10
	4	6.85				27.40							
	2	1.90				3.80							
	4	5.30				21.2							
						0							
	5	4.65					23.25						
	5	2.00					10						
	4	7.90					31.6						
	5	7.10					35.5						
	4	1.00					4						
	2	7.00					14						
	2	6.10				12.2							
	2	2.30				4.6							
Peso nominal varilla de acero (kg/m)			0.222	0.394	0.250	0.560	0.994	1.552	2.235	3.042	3.973	5.060	6.404
Metros lineales						69.20	118.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Peso en kilos						38.75	117.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Peso total (kg)			156.39										

	Nombre		
INGENIERO	ING. EDWARD SANCHEZ		

Gobierno de CALDAS

GOBERNACIÓN DE CALDAS

Secretaria de Infraestructura

Hoja No 1 de 1

MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

PREACTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA VIA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

PREACTA DE OBRA No:	28 TRAMO 4	FECHA:	28/03/2026
PERIODO:	1 DE MARZO AL 28 DE MARZO DEL 2026		
CONTRATO DE OBRA No:	29092023-1456	CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	1671 DE 2022	INTERVENTORÍA:	MAB INGENIERIA DE VALOR

ITEM	42	UNIDAD
600.2.3	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN EN SECO	m3


Abscisa Inicial	Abscisa Final	Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Cantidad	Margen	Descripción
ACTA PARCIAL DE COBRO NO: 28							
K109+270.00	K109+270.00				82.77	IZQUIERDA	Excavacion Euro Ver anexo cuneta topo.
K109+270.00	K109+270.00	8.00	0.45	0.80	2.88	IZQUIERDA	Excavacion dentellon Mi
K109+380.00	K109+380.00	3.30	0.45	0.80	1.91	IZQUIERDA	Excavacion dentellon Mi pendiente cuneo
K106+800.00	K106+800.00	425	282	205	-24.57	D/I	Descuento acta 22, parte de la excavación de la ODT se cobro por excavación de muro, se carriga pasando completa por item 16.
SUB TOTAL ACTA PARCIAL NO. 28				63.00			

ACTA PARCIAL NO. 1	
ACTA PARCIAL NO. 2	
ACTA PARCIAL NO. 3	
ACTA PARCIAL NO. 4	
ACTA PARCIAL NO. 5	
ACTA PARCIAL NO. 6	
ACTA PARCIAL NO. 7	
ACTA PARCIAL NO. 8	
ACTA PARCIAL NO. 9	
ACTA PARCIAL NO. 10	
ACTA PARCIAL NO. 11	
ACTA PARCIAL NO. 12	
ACTA PARCIAL NO. 13	
ACTA PARCIAL NO. 14	
ACTA PARCIAL NO. 15	
ACTA PARCIAL NO. 16	
ACTA PARCIAL NO. 17	
ACTA PARCIAL NO. 18	
ACTA PARCIAL NO. 19	
ACTA PARCIAL NO. 20	
ACTA PARCIAL NO. 21	210.10
ACTA PARCIAL NO. 22	579.60
ACTA PARCIAL NO. 23	617.30
ACTA PARCIAL NO. 24	555.40
ACTA PARCIAL NO. 25	264.70
ACTA PARCIAL NO. 26	337.20
ACTA PARCIAL NO. 27	376.80
ACTA PARCIAL NO. 28	**63.00**
TOTAL ACUMULADO	3004.10

ING. SEBASTIAN GOMEZ VERGARA
MAB INGENIERIA DE VALOR
INTERVENTORIA

ING. EDWARD ANDRES SERNA
CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA

1-Marzo

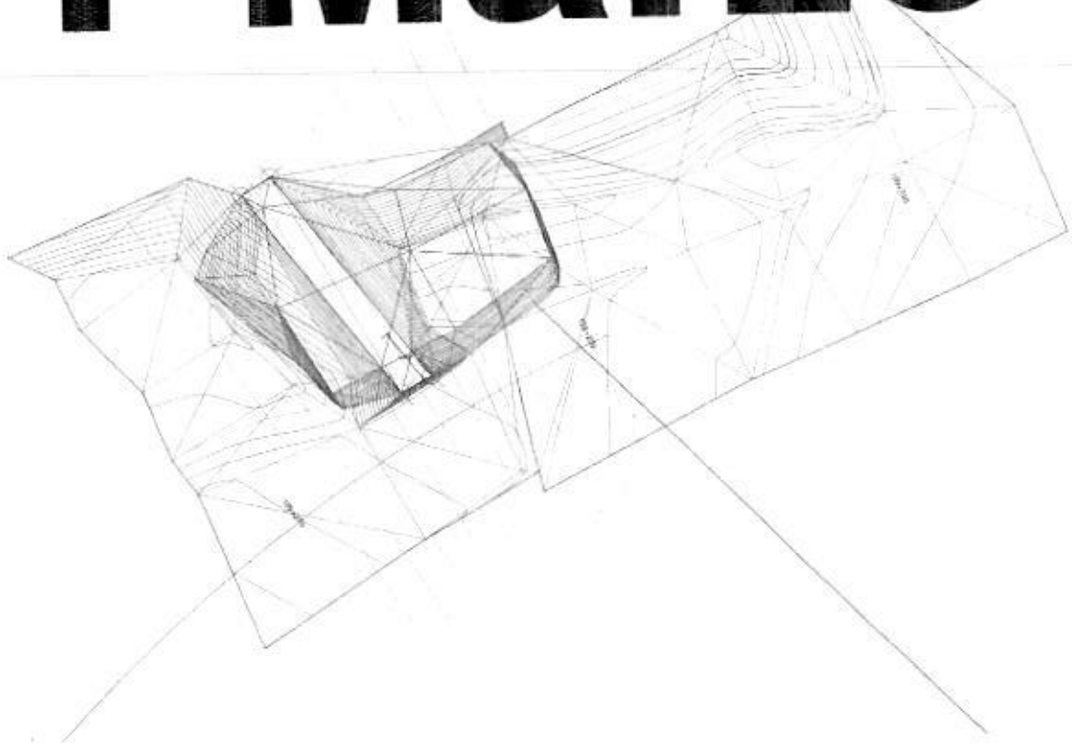

PROYECTO: RUTA DEL VENACIMIENTO
ENTRE LOS
DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS
PK1+264.520 PK120+000

CONTIENE:
SECCIONES TRANSVERSALES
EXCAVACION TURBINA K1+024.345
TRAMO 4


ESCALA:
H: 1:100
V: 1:100

PLANOS 1 DE X


FECHA: Marzo 2022

ARCHIVO:


1-Marzo




109+279




109+280




109+275




109+276



109+277




109+278




109+271



109+272



109+273



109+274



PROYECTO: RUTA DEL RENACIMIENTO
ENTRE LOS
DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS
PK106+020 - PK120+000

CONTIENE:
SECCIONES TRANSVERSALES
LXCV ADICIÓN TUBERÍA K109+275
TRAMO 4

ESCALA:
H: 1:100
V: 1:1000

PLANOS 1 DE X

FECHA: Marzo 2019

Gobierno de CALDAS	GOBERNACIÓN DE CALDAS Secretaría de Infraestructura	Hoja No 1 de 1
	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA – SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS	

PREACTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA – SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

PREACTA DE OBRA No:	28 TRAMO 4	FECHA:	20/03/2026
PERIODO:	1 DE MARZO AL 28 DE MARZO DEL 2026		
CONTRATO DE OBRA No:	29092023-1456	CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	1071 DE 2022	INTERVENTORÍA:	MAB INGENIERIA DE VALOR

ITEM	50					UNIDAD
640.1 T4	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 MPa					kg
Abscisa Inicial	ESTRUCTURA	CANTIDAD	LONGITUD	CALIBRE	PESO (KG-M)	PESO TOTAL	Descripción
MUROS DE CONTENCIÓN							
ACTA PARCIAL DE COBRO NO. 28							
K108+300.00	K108+300.00	1.00	645.90	5/8"	1.552	1002.282	Acero de refuerzo en módulo 4 muro - Ver cartilla de despiece
K108+300.00	K108+300.00	1.00	541.64	5/8"	1.552	840.63	Acero de refuerzo en módulo 5 muro - Ver cartilla de despiece
		1.00	151.20	3/4"	2.235	337.93	
K108+300.00	K108+300.00	1.00	522.76	5/8"	1.552	811.32	Acero de refuerzo en módulo 6 muro - Ver cartilla de despiece
		1.00	86.24	3/4"	2.235	192.75	
		1.00	168.30	7/8"	3.042	511.84	
K108+300.00	K108+300.00	1.00	526.90	5/8"	1.552	817.75	Acero de refuerzo en módulo 7 muro - Ver cartilla de despiece
		1.00	145.60	3/4"	2.235	325.42	
K108+300.00	K108+300.00	1.00	6.00	1/2"	0.994	7.952	Acero de refuerzo en módulo 8 muro - Ver cartilla de despiece
		1.00	601.51	5/8"	1.552	933.544	
K109+270.00	K109+270.00	1.00	775.60	5/8"	1.552	1203.731	Acero de refuerzo en módulo 1 muro - Ver cartilla de despiece
		1.00	196.40	3/4"	2.235	438.954	
		1.00	8.00	1/2"	0.994	7.952	
K109+300.00	K109+300.00	1.00	486.89	5/8"	1.552	755.60	Acero de refuerzo en módulo 2 muro - Ver cartilla de despiece
		1.00	69.00	3/4"	2.235	154.215	
		1.00	158.72	7/8"	3.042	482.826	
		1.00	8.00	1/2"	0.994	7.952	
SUB TOTAL ACTA PARCIAL NO. 28					8852.00		

ACTA PARCIAL NO. 1	
ACTA PARCIAL NO. 2	
ACTA PARCIAL NO. 3	
ACTA PARCIAL NO. 4	
ACTA PARCIAL NO. 5	
ACTA PARCIAL NO. 6	
ACTA PARCIAL NO. 7	
ACTA PARCIAL NO. 8	
ACTA PARCIAL NO. 9	
ACTA PARCIAL NO. 10	
ACTA PARCIAL NO. 11	
ACTA PARCIAL NO. 12	
ACTA PARCIAL NO. 13	
ACTA PARCIAL NO. 14	
ACTA PARCIAL NO. 15	
ACTA PARCIAL NO. 16	
ACTA PARCIAL NO. 17	
ACTA PARCIAL NO. 18	
ACTA PARCIAL NO. 19	
ACTA PARCIAL NO. 20	
ACTA PARCIAL NO. 21	832.60
ACTA PARCIAL NO. 22	4117.00
ACTA PARCIAL NO. 23	6322.00
ACTA PARCIAL NO. 24	4904.00
ACTA PARCIAL NO. 25	7361.00
ACTA PARCIAL NO. 26	6427.00
ACTA PARCIAL NO. 27	9223.00
ACTA PARCIAL NO. 28	**8852.00**
TOTAL ACUMULADO	47418.6

ING. SEBASTIAN GOMEZ VENGARA
MAB INGENIERIA DE VALOR
INTERVENTORIA

ING. EDWAR ANDRES SANCHEZ
CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA

CANTIDADES ACERO FIGURADO

CONSORCIO SAN MIGUEL

Proyecto: INVIAS 1071-2022 LA DORADA-SONSON

No. del Contrato LP-SI-004-2023

Localización: MURO DE CONTENCIÓN EN EL K108+300 M4

Fecha: Marzo, 2026

Figura	Cantidad	Longitud de corte	6 mm	8 mm	1/4"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	7/8"	1"	1 1/8"	1 1/4"
			6M	8M	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5	No. 6	No. 7	No. 8	No. 9	No. 10
Ref 1 y ref 2. Zarpa	38	2.78						105.64					
Ref long zarpa	16	6						96					
Ref. 3 Trasdos Vastago	38	3						114					
Ref 3 Intrados Vastago	38	3						114					
REF VERTICAL INTRADOS	19	1.86						35.34					
Ref. 4 Vertical Vastago	27	1.86						50.22					
Ref. Longitudinal Dentellón	6	6						36					
Ref. Longitudinal Vastago	16	5.6						89.6					
Ref. Longitudinal Vastago	2	2.5						5					
Peso nominal varilla de acero (kg/m)			0.222	0.394	0.250	0.560	0.994	1.552	2.235	3.042	3.973	5.060	6.404
Metros lineales						0	0	646.8	0	0	0	0	0
Peso en kilos						0	0	1002.282	0	0	0	0	
Peso total (kg)			1002.3										

	Nombre		
INGENIERO	ING. EDWARD SANCHEZ		

CANTIDADES ACERO FIGURADO

Proyecto: INVIAS 1071-2022 LA DORADA-SONSON
No. del Contrato LP-SI-004-2023
Localización: MURO DE CONTENCIÓN EN EL K108+300 M5
Fecha: Marzo, 2026

Figura	Cantidad	Longitud de corte	6 mm	8 mm	1/4"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	7/8"	1"	1 1/8"	1 1/4"
			6M	8M	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5	No. 6	No. 7	No. 8	No. 9	No. 10
Ref 1 y ref 2. Zarpa	49	2.96						145.04					
Ref long zarpa	18	6						108					
Ref. 3 Trasdos Vastago	28	2.7							75.6				
Ref 3 Intrados Vastago	28	2.7							75.6				
REF VERTICAL INTRADOS	20	2.8						56					
Ref. 4 Vertical Vastago	29	2.8						81.2					
Ref. Longitudinal Dentellón	6	6						36					
Ref. Longitudinal Vastago	20	5.77						115.4					
Peso nominal varilla de acero (kg/m)			0.222	0.394	0.250	0.560	0.994	1.552	2.235	3.042	3.973	5.060	6.404
Metros lineales						0	0	541.64	151.2	0	0	0	0
Peso en kilos						0	0	840.6253	337.932	0	0	0	
Peso total (kg)			1178.6										

	Nombre		
INGENIERO	ING. EDWARD SANCHEZ		

CANTIDADES ACERO FIGURADO

CONSORCIO SAN MIGUEL

Proyecto: INVIAS 1071-2022 LA DORADA-SONSON

No. del Contrato LP-SI-004-2023

Localización: MURO DE CONTENCIÓN EN EL K108+300 MODULO 6

Fecha: Marzo, 2026

Figura	Cantidad	Longitud de corte	6 mm	8 mm	1/4"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	7/8"	1"	1 1/8"	1 1/4"
			6M	8M	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5	No. 6	No. 7	No. 8	No. 9	No. 10
Ref 1 y ref 2. Zarpa	56	3.21						179.76					
Ref long zarpa	20	6						120					
Ref. 3 Trasdos Vastago	28	3								84			
Ref 3 Intrados Vastago	28	3								84			
REF VERTICAL INTRADOS	20	3.08						61.6					
Ref. 4 Vertical Vastago	28	3.08							86.24				
Ref. Longitudinal Dentellón	6	6						36					
Ref. Longitudinal Vastago	22	5.7						125.4					
Peso nominal varilla de acero (kg/m)			0.222	0.394	0.250	0.560	0.994	1.552	2.235	3.042	3.973	5.060	6.404
Metros lineales						0	0	522.76	86.24	168	0	0	0
Peso en kilos						0	0	811.3235	192.7464	511.056	0	0	
Peso total (kg)			1515.1										

	Nombre		
INGENIERO	ING. EDWARD SANCHEZ		

CANTIDADES ACERO FIGURADO

CONSORCIO SAN MIGUEL

Proyecto: INVIAS 1071-2022 LA DORADA-SONSON

No. del Contrato LP-SI-004-2023

Localización: MURO DE CONTENCIÓN EN EL K108+300M7

Fecha: Marzo, 2026

Figura	Cantidad	Longitud de corte	6 mm	8 mm	1/4"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	7/8"	1"	1 1/8"	1 1/4"
			6M	8M	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5	No. 6	No. 7	No. 8	No. 9	No. 10
Ref 1 y ref 2. Zarpa	47	2.96						139.12					
Ref long zarpa	18	6						108					
Ref. 3 Trasdos Vastago	28	2.6							72.8				
Ref 3 Intrados Vastago	28	2.6							72.8				
REF VERTICAL INTRADOS	20	3						60					
Ref. 4 Vertical Vastago	27	3						81					
Ref. Longitudinal Dentellón	6	6						36					
Ref. Longitudinal Vastago	18	5.71						102.78					
Peso nominal varilla de acero (kg/m)			0.222	0.394	0.250	0.560	0.994	1.552	2.235	3.042	3.973	5.060	6.404
Metros lineales						0	0	526.9	145.6	0	0	0	0
Peso en kilos						0	0	817.7488	325.416	0	0	0	
Peso total (kg)			1143.2										

	Nombre		
INGENIERO	ING. EDWARD SANCHEZ		

CANTIDADES ACERO FIGURADO

CONSORCIO SAN MIGUEL

Proyecto: INVIAS 1071-2022 LA DORADA-SONSON

No. del Contrato LP-SI-004-2023

Localización: MURO DE CONTENCIÓN EN EL K108+300 MODULO 8

Fecha: Marzo, 2026

Figura	Cantidad	Longitud de corte	6 mm	8 mm	1/4"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	7/8"	1"	1 1/8"	1 1/4"
			6M	8M	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5	No. 6	No. 7	No. 8	No. 9	No. 10
Ref 1 y ref 2. Zarpa	38	2.96						112.48					
Ref long zarpa	16	6						96					
Ref. 3 Trasdos Vastago	34	2.06						70.04					
Ref 3 Intrados Vastago	26	2.06						53.56					
REF VERTICAL INTRADOS	18	2.63						47.34					
REF VERTICAL INTRADOS	3	1.56						4.68					
Ref. 4 Vertical	27	2.63						71.01					
Ref. 4 Vertical	5	1.56						7.8					
Ref. Longitudinal Dentellón	6	6						36					
Ref. Longitudinal Vastago	12	6						72					
Ref. Longitudinal Vastago	6	3.7						22.2					
Ref. Longitudinal Vastago	6	1.4						8.4					
	8	1					8						
Peso nominal varilla de acero (kg/m)			0.222	0.394	0.250	0.560	0.994	1.552	2.235	3.042	3.973	5.060	6.404
Metros lineales						0	8	601.51	0	0	0	0	0
Peso en kilos						0	7.952	933.5435	0	0	0	0	
Peso total (kg)			941.5										

	Nombre	
INGENIERO	ING. EDWARD SANCHEZ	

CANTIDADES ACERO FIGURADO

CONSORCIO SAN MIGUEL

Proyecto: INVIAS 1071-2022 LA DORADA-SONSON

No. del Contrato LP-SI-004-2023

Localización: MURO DE CONTENCIÓN EN EL K109+270 MODULO 1

Fecha: Marzo, 2026

Figura	Cantidad	Longitud de corte	6 mm	8 mm	1/4"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	7/8"	1"	1 1/8"	1 1/4"
			6M	8M	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5	No. 6	No. 7	No. 8	No. 9	No. 10
Ref 1 y ref 2. Zarpa	67	2.96						198.32					
Ref long zarpa	18	9.21						165.78					
Ref. 3 Trasdos Vastago	35	2.63							92.05				
Ref. 3 Trasdos Vastago	10	1.23							12.3				
Ref 3 Intrados Vastago	35	2.63							92.05				
REF VERTICAL INTRADOS	23	3.15						72.45					
REF VERTICAL INTRADOS	3	2.05						6.15					
Ref. 4 Vertical	35	3.15						110.25					
Ref. 4 Vertical	5	2.05						10.25					
Ref. Longitudinal Dentellón	6	8.55						51.3					
Ref. Longitudinal Vastago	14	8.55						119.7					
Ref. Longitudinal Vastago	6	1.4						8.4					
Ref. Longitudinal Vastago	6	5.5						33					
	8	1					8						
Peso nominal varilla de acero (kg/m)			0.222	0.394	0.250	0.560	0.994	1.552	2.235	3.042	3.973	5.060	6.404
Metros lineales						0	8	776.6	196.4	0	0	0	0
Peso en kilos						0	7.952	1203.731	438.954	0	0	0	
Peso total (kg)			1650.6										

	Nombre		
INGENIERO	ING. EDWARD SANCHEZ		

CANTIDADES ACERO FIGURADO

CONSORCIO SAN MIGUEL

Proyecto: INVIAS 1071-2022 LA DORADA-SONSON
No. del Contrato LP-SI-004-2023
Localización: MURO DE CONTENCIÓN EN EL K109+380 MODULO 2
Fecha: Marzo, 2026

Figura	Cantidad	Longitud de corte	6 mm	8 mm	1/4"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	7/8"	1"	1 1/8"	1 1/4"
			6M	8M	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5	No. 6	No. 7	No. 8	No. 9	No. 10
Ref 1 y ref 2. Zarpa	53	3.21						170.13					
Ref long zarpa	20	5.72						114.4					
Ref. 3 Trasdos Vastago	20	3.44								68.8			
Ref. 3 Trasdos Vastago	6	1.76								10.56			
Ref 3 Intrados	20	3.44								68.8			
Ref 3 Intrados	6	1.76								10.56			
REF VERTICAL INTRADOS	15	3.4						51					
REF VERTICAL INTRADOS	4	1.5						6					
Ref. 4 Vertical	20	3							60				
Ref. 4 Vertical	6	1.5							9				
Ref. Longitudinal Dentellón	6	5.16						30.96					
Ref. Longitudinal Vastago	16	5.3						84.8					
Ref. Longitudinal Vastago	2	2.65						5.3					
Ref. Longitudinal Vastago	6	2.15						12.9					
Ref. Longitudinal Vastago	6	1.9						11.4					
	8	1					8						
Peso nominal varilla de acero (kg/m)			0.222	0.394	0.250	0.560	0.994	1.552	2.235	3.042	3.973	5.060	6.404
Metros lineales						0	8	486.88	69	158.72	0	0	0
Peso en kilos						0	7.952	755.6533	154.215	482.8262	0	0	
Peso total (kg)			1400.6										

	Nombre		
INGENIERO	ING. EDWARD SANCHEZ		

Gobierno de CALDAS

GOBERNACIÓN DE CALDAS

Secretaría de Infraestructura

Hoja No 1 de 1

MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

FRENTE DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

FRENTE DE OBRA No:	2F TRAMO 4	FECHA:	28/03/2026
PERIODO:	1 DE MARZO AL 28 DE MARZO DEL 2026		
CONTRATO DE OBRA No:	29092023-1456	CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	1071 DE 2022	INTERVENTORÍA:	MAB INGENIERIA DE VALOR

ITEM		UNIDAD
900.2.1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	m3/km

ACTA PARCIAL DE COBRO NO. 28

ABSCISA INC	ABSCISA FIN	CENTRO DE GRAV	VOLUMEN BANCO (M3)	MARGEN	DISTANCIA (KM)	TRANSPORTE (M3/KM)	Descripción
Recuperación de apoyos							
K193+299.58	K194+058.06	K194+058.30	285.41	D/I	2.10	600.24	transporte material proveniente de ampliación en roca
SUB TOTAL ACTA PARCIAL NO. 28			600.00				

ACTA PARCIAL NO. 1	
ACTA PARCIAL NO. 2	
ACTA PARCIAL NO. 3	
ACTA PARCIAL NO. 4	
ACTA PARCIAL NO. 5	
ACTA PARCIAL NO. 6	
ACTA PARCIAL NO. 7	
ACTA PARCIAL NO. 8	
ACTA PARCIAL NO. 9	1500.00
ACTA PARCIAL NO. 10	4367.00
ACTA PARCIAL NO. 11	2308.00
ACTA PARCIAL NO. 12	392.00
ACTA PARCIAL NO. 13	-983.00
ACTA PARCIAL NO. 14	6745.00
ACTA PARCIAL NO. 15	0.00
ACTA PARCIAL NO. 16	10478.00
ACTA PARCIAL NO. 17	61833.32
ACTA PARCIAL NO. 18	438.00
ACTA PARCIAL NO. 19	5180.80
ACTA PARCIAL NO. 20	7817.30
ACTA PARCIAL NO. 21	0.00
ACTA PARCIAL NO. 22	1599.00
ACTA PARCIAL NO. 23	37.00
ACTA PARCIAL NO. 24	949.00
ACTA PARCIAL NO. 25	36.00
ACTA PARCIAL NO. 26	397.00
ACTA PARCIAL NO. 27	147.00
ACTA PARCIAL NO. 28	600.00
TOTAL ACUMULADO	132838.4

ING. SEBASTIAN GOMEZ VERGARA
MAB INGENIERIA DE VALOR
INTERVENTORIA

ING. EDWARD ANDRES SANCHEZ
CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA

Gobierno de CALDAS

GOBERNACIÓN DE CALDAS

Secretaría de Infraestructura

Hoja No 1 de 1

MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL REMACHIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

PRESACTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL REMACHIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

PRESACTA DE OBRA No:	28 TRAMO 4	FECHA:	28/03/2024
PERIODO:	1 DE MARZO AL 28 DE MARZO DEL 2024		
CONTRATO DE OBRA No:	29092023-1456	CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	1071 DE 2022	INTERVENTORIA:	MAB INGENIERIA DE VALOR
ITEM	70		UNIDAD
NP 211.1	REMOCIÓN DE DERRUMBES		m3

Abscisa Inicial	Abscisa Final	Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Cantidad	Volumen suelto	Margen	Descripción	
ACTA PARCIAL DE COBRO NO. 28									
ABS INICIAL	ABS FINAL		VIAJES	VOLUMEN		TOTAL	MARGEN	DESCRIPCION	
DERRUMBE EN VIA									
K109+200.00	K109+200.00		5.00	14.00		70.00	D/I	Derrumbe en vía	K109+200.00
K109+700.00	K109+700.00		1.00	14.00		14.00	D/I	Derrumbe en vía	K109+700.00
K109+200.00	K109+200.00		3.00	14.00		42.00	D/I	Derrumbe en vía	K109+200.00
K109+200.00	K109+200.00		5.00	14.00		70.00	D/I	Derrumbe en vía	K109+200.00
K109+380.00	K109+380.00		10.00	14.00		140.00	D/I	Derrumbe en vía	K109+380.00
K109+700.00	K109+700.00		13.00	14.00		182.00	D/I	Derrumbe en vía	K109+700.00
K107+760.00	K107+760.00		1.00	14.00		14.00	D/I	Derrumbe en vía	K107+760.00
K109+380.00	K109+380.00		5.00	14.00		70.00	D/I	Derrumbe en vía	K109+380.00
K109+380.00	K109+380.00		4.00	14.00		56.00	D/I	Derrumbe en vía	K109+380.00
K109+200.00	K109+200.00		4.00	14.00		56.00	D/I	Derrumbe en vía	K109+200.00
K109+700.00	K109+700.00		13.00	14.00		182.00	D/I	Derrumbe en vía	K109+700.00
K109+700.00	K109+700.00		28.00	14.00		392.00	D/I	Derrumbe en vía	K109+700.00
K109+700.00	K109+700.00		27.00	14.00		378.00	D/I	Derrumbe en vía	K109+700.00
K109+700.00	K109+700.00		10.00	14.00		140.00	D/I	Derrumbe en vía	K109+700.00
K108+720.00	K108+720.00		10.00	14.00		140.00	D/I	Derrumbe en vía	K108+720.00
K108+840.00	K108+840.00		15.00	14.00		210.00	D/I	Derrumbe en vía	K108+840.00
K106+600.00	K120+000.00		3.00	10.40		31.80	D/I	Derrumbe en vía	K106+000.00
SUB TOTAL ACTA PARCIAL NO. 28				2188.00					

ACTA PARCIAL NO. 1	
ACTA PARCIAL NO. 2	
ACTA PARCIAL NO. 3	
ACTA PARCIAL NO. 4	
ACTA PARCIAL NO. 5	
ACTA PARCIAL NO. 6	
ACTA PARCIAL NO. 7	
ACTA PARCIAL NO. 8	
ACTA PARCIAL NO. 9	143.00
ACTA PARCIAL NO. 10	220.00
ACTA PARCIAL NO. 11	448.00
ACTA PARCIAL NO. 12	151.00
ACTA PARCIAL NO. 13	314.00
ACTA PARCIAL NO. 14	1831.00
ACTA PARCIAL NO. 15	23204.00
ACTA PARCIAL NO. 16	4998.00
ACTA PARCIAL NO. 17	3452.00
ACTA PARCIAL NO. 18	17654.00
ACTA PARCIAL NO. 19	1775.00
ACTA PARCIAL NO. 20	399.00
ACTA PARCIAL NO. 21	2716.00
ACTA PARCIAL NO. 22	5534.00
ACTA PARCIAL NO. 23	7607.00
ACTA PARCIAL NO. 24	6428.00
ACTA PARCIAL NO. 25	770.00
ACTA PARCIAL NO. 26	7266.00
ACTA PARCIAL NO. 27	9072.00
ACTA PARCIAL NO. 28	2188.00
TOTAL ACUMULADO	91211.0

ING. SEBASTIAN GOMEZ VERGARA
MAB INGENIERIA DE VALOR
INTERVENTORIA

ING. HUMAN ANDRES SANCHEZ
CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA

Gobierno de CALDAS

GOBERNACIÓN DE CALDAS

Secretaría de Infraestructura

Hoja No 1 de 1

MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

PLANILLA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

PLANILLA DE OBRA No:	27 TRAMO 4	FECHA:	28/02/2026
PERIODO:	25 DE ENERO 2026 AL 28 DE FEBRERO 2026		
CONTRATO DE OBRA No:	2909202S-1436	CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	1071 DE 2022	INTERVENTORÍA:	MAS INGENIERIA DE VALOR

ITEM	75	UNIDAD
NP 610.2	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE PRESTAMO,EXCAVACIONES Y/O DERRUMBES	m3

Abscisa Inicial	Abscisa Final	Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Cantidad	Margen	Descripción
ACTA PARCIAL DE COBRO NO. 27							
ALCANTARILLA							
K106+800.00	K106+800.00	8.14	2.82	2.05	52.84	D/I	Relleno de ODT con Material del K107+220
K106+800.00	K106+800.00	8.82	3.14	0.45	-6.65	D/I	Descuento de tuberia 36"
K106+800.00	K106+800.00	8.82	3.14	0.45	-6.65	D/I	Descuento de tuberia 36"
NOTA: Lleno de la ODT corresponde al valor total de la excavación (Ver item 16) menos las dos tuberias de 36"							
SUB TOTAL ACTA PARCIAL NO. 27				39.50			

ACTA PARCIAL NO. 1	
ACTA PARCIAL NO. 2	
ACTA PARCIAL NO. 3	
ACTA PARCIAL NO. 4	
ACTA PARCIAL NO. 5	
ACTA PARCIAL NO. 6	
ACTA PARCIAL NO. 7	
ACTA PARCIAL NO. 8	
ACTA PARCIAL NO. 9	343.00
ACTA PARCIAL NO. 10	571.00
ACTA PARCIAL NO. 11	196.30
ACTA PARCIAL NO. 12	112.10
ACTA PARCIAL NO. 13	0.00
ACTA PARCIAL NO. 14	0.00
ACTA PARCIAL NO. 15	0.00
ACTA PARCIAL NO. 16	0.00
ACTA PARCIAL NO. 17	0.00
ACTA PARCIAL NO. 18	0.00
ACTA PARCIAL NO. 19	0.00
ACTA PARCIAL NO. 20	0.00
ACTA PARCIAL NO. 21	0.00
ACTA PARCIAL NO. 22	111.10
ACTA PARCIAL NO. 23	188.70
ACTA PARCIAL NO. 24	108.90
ACTA PARCIAL NO. 25	173.60
ACTA PARCIAL NO. 26	355.20
ACTA PARCIAL NO. 27	**39.50**
TOTAL ACUMULADO	2199.4

ING. SEBASTIAN GOMEZ VERGARA
MAS INGENIERIA DE VALOR
INTERVENTORIA

ING. EDWARD ANDRES SANCHEZ
CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA

Gobierno de CALDAS	GOBERNACIÓN DE CALDAS	Hoja No 1 de 1
	Secretaría de Infraestructura	
	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL REMACHIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS	

PRE ACTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL REMACHIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

PRE ACTA DE OBRA No:	28 TRAMO 4	FECHA:	28/03/2026
PERIODO:	1 DE MARZO AL 28 DE MARZO DEL 2026		
CONTRATO DE OBRA No:	29092023-1456	CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	1071 DE 2022	INTERVENTORÍA:	SAS INGENIERIA DE VALOR

ITEM	78	UNIDAD
ND 900.3.2	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE DERRUMBES, MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	m3/km

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 28

ABSCISA 2(SMR TRA	K106+050.00							
ABSCISA INC	ABSCISA FIN	UNID/LON G/KG	CENTRO DE GRAV	VOLUMEN SUELTO (M3)	MASAS	DISTANCIA (KM)	TRANSPORTE (M3/KM)	Descripción
K109+200.00	K106+050.00		K.09+200.00	70.00	S/I	3.10	217.00	Traslado mat. derrumbe K109+200.00
K109+100.00	K106+050.00		K.09+100.00	14.00	S/I	3.60	50.40	Traslado mat. derrumbe K109+720.00
K109+420.00	K106+050.00		K.09+420.00	42.00	S/I	3.10	130.20	Traslado mat. derrumbe K109+210.00
K109+200.00	K106+050.00		K.09+200.00	70.00	S/I	3.10	217.00	Traslado mat. derrumbe K109+200.00
K109+380.00	K106+050.00		K.09+380.00	140.00	S/I	3.20	448.00	Traslado mat. derrumbe K109+380.00
K109+700.00	K106+050.00		K.09+700.00	182.00	S/I	3.60	655.20	Traslado mat. derrumbe K109+700.00
K107+140.00	K106+050.00		K.07+140.00	14.00	S/I	1.60	22.40	Traslado mat. derrumbe K107+760.00
K109+330.00	K106+050.00		K.09+330.00	70.00	S/I	3.20	224.00	Traslado mat. derrumbe K109+380.00
K109+330.00	K106+050.00		K.09+330.00	56.00	S/I	3.20	179.20	Traslado mat. derrumbe K109+380.00
K109+200.00	K106+050.00		K.09+200.00	56.00	S/I	3.10	173.60	Traslado mat. derrumbe K109+200.00
K109+700.00	K106+050.00		K.09+700.00	182.00	S/I	3.60	655.20	Traslado mat. derrumbe K109+700.00
K109+700.00	K106+050.00		K.09+700.00	392.00	S/I	3.60	1411.20	Traslado mat. derrumbe K109+700.00
K109+700.00	K106+050.00		K.09+700.00	378.00	S/I	3.60	1360.80	Traslado mat. derrumbe K109+700.00
K109+700.00	K106+050.00		K.09+700.00	140.00	S/I	3.60	504.00	Traslado mat. derrumbe K109+700.00
K108+120.00	K106+050.00		K.08+120.00	140.00	S/I	2.60	364.00	Traslado mat. derrumbe K108+720.00
K108+530.00	K106+050.00		K.08+480.00	210.00	S/I	2.70	567.00	Traslado mat. derrumbe K108+840.00
K113+020.00	K106+050.00		K.13+020.00	31.80	S/I	6.90	219.42	Traslado mat. derrumbe K113+020.00
SUB TOTAL ACTA PARCIAL No. 28				7399.00				

ACTA PARCIAL NO. 1	
ACTA PARCIAL NO. 2	
ACTA PARCIAL NO. 3	
ACTA PARCIAL NO. 4	
ACTA PARCIAL NO. 5	
ACTA PARCIAL NO. 6	
ACTA PARCIAL NO. 7	
ACTA PARCIAL NO. 8	
ACTA PARCIAL NO. 9	140.00
ACTA PARCIAL NO. 10	590.00
ACTA PARCIAL NO. 11	1841.50
ACTA PARCIAL NO. 12	805.00
ACTA PARCIAL NO. 13	1130.50
ACTA PARCIAL NO. 14	573.50
ACTA PARCIAL NO. 15	37149.00
ACTA PARCIAL NO. 16	23136.20
ACTA PARCIAL NO. 17	2254.20
ACTA PARCIAL NO. 18	32122.20
ACTA PARCIAL NO. 19	4057.50
ACTA PARCIAL NO. 20	432.00
ACTA PARCIAL NO. 21	2537.50
ACTA PARCIAL NO. 22	2219.80
ACTA PARCIAL NO. 23	14539.00
ACTA PARCIAL NO. 24	18160.20
ACTA PARCIAL NO. 25	2057.50
ACTA PARCIAL NO. 26	206.20
ACTA PARCIAL NO. 27	10957.50
ACTA PARCIAL NO. 28	7399.00
TOTAL ACUMULADO	211276.8

ING. SEBASTIAN GOMEZ VERGARA
SAS INGENIERIA DE VALOR
INTERVENTORIA

ING. EDWARD ANDRES SANCHEZ
CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA

Gobierno de CALDAS	GOBERNACION DE CALDAS Secretaria de Infraestructura	Hoja No 1 de 1
	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS	

PRESACTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

PRESACTA DE OBRA No:	28 FRENTE 4	FECHA:	28/03/2026
PERIODO:	1 DE MARZO AL 28 DE MARZO DEL 2026		
CONTRATO DE OBRA No:	2929E023-1456	CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	4071 DE 2022	INTERVENTORÍA:	MAB INGENIERIA DE VALOR

ITEM:	80					UNIDAD	
NP 210.2.2	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES						m3
Abscisa Inicial	Abscisa Final	Largo (m)	Area corte (m2)		Volumen corte	Margen	Descripción
ACTA PARCIAL DE COBRO NO. 25							
K109+250.00	K109+384.00	134.00			-341,95	D/I	Descuento por mismo cobro en acta 25 y 26
SUB TOTAL ACTA PARCIAL NO. 25				-342,00			

ACTA PARCIAL NO. 1	
ACTA PARCIAL NO. 2	
ACTA PARCIAL NO. 3	
ACTA PARCIAL NO. 4	
ACTA PARCIAL NO. 5	
ACTA PARCIAL NO. 6	
ACTA PARCIAL NO. 7	
ACTA PARCIAL NO. 8	
ACTA PARCIAL NO. 9	
ACTA PARCIAL NO. 10	
ACTA PARCIAL NO. 11	
ACTA PARCIAL NO. 12	1482.10
ACTA PARCIAL NO. 13	198.30
ACTA PARCIAL NO. 14	0.00
ACTA PARCIAL NO. 15	0.00
ACTA PARCIAL NO. 16	0.00
ACTA PARCIAL NO. 17	0.00
ACTA PARCIAL NO. 18	0.00
ACTA PARCIAL NO. 19	0.00
ACTA PARCIAL NO. 20	0.00
ACTA PARCIAL NO. 21	0.00
ACTA PARCIAL NO. 22	756.20
ACTA PARCIAL NO. 23	1324.80
ACTA PARCIAL NO. 24	154.60
ACTA PARCIAL NO. 25	342.00
ACTA PARCIAL NO. 26	3251.30
ACTA PARCIAL NO. 27	0.00
ACTA PARCIAL NO. 28	**-342.00**
TOTAL ACUMULADO	7545.9

ING. SEBASTIAN GOMEZ VERGARA
MAB INGENIERIA DE VALOR
INTERVENTORIA

ING. EDWARD ANDRES [illegible]
CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA

Gobierno de CALDAS

GOBERNACIÓN DE CALDAS

Secretaría de Infraestructura

Hoja No 1 de 1

MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA – NORTE, RUTA DEL REMATCHENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

PRESTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA – NORTE, RUTA DEL REMATCHENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

PRESTA DE OBRA No:	4 TRAMO 4	FECHA:	28/05/2024
PERIODO:	1 DE MAYO AL 28 DE MAYO DEL 2024		
CONTRATO DE OBRA No:	2019-000-1476	CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	1071 DE 2022	INTERVENTORÍA:	MAR INGENIERÍA DE VALOR

ITEM	01	UNIDAD	
300	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE PRÉSTAMO, NO INCLUYE COMPENSACIÓN EN ZONAS DE DEPÓSITO NI TRANSPORTE	m3	

Abscisa Inicial	Abscisa Final	Longitud	Espesor	Ancho		Volumen	Margen	Descripción	Días de ejecución
ACTA PARCIAL DE CORTE No. 28									
CAT T4									
K105+500.00	K105+600.00	9.54	2.82	2.95		52.84	DERECHA	Relleno de CAT con material de prestamo	mar-24
K105+500.00	K105+600.00	9.82	3.54	1.40		-13.00	DERECHA	Descuento talud a 1H:1V	mar-24
K105+500.00	K105+600.00	9.82	3.54	1.40		-13.50	DERECHA	Descuento talud a 1H:1V	mar-24
LLENO MUROS T5									
K102+603.00	K102+620.00	7.70	2.00	1.50		14.03	IZQUIERDA	Relleno de MSE con material de prestamo	mar-24
K102+603.00	K102+620.00	7.70	0.20	0.20		-0.31	DERECHA	Descuento filtro seco	mar-24
K102+603.00	K102+620.00	13.53	1.80	1.50		33.63	DERECHA	Relleno de MSE con material de prestamo	mar-24
K102+603.00	K102+620.00	13.20	0.20	1.44		-3.04	DERECHA	Descuento filtro seco	mar-24
K102+550.00	K102+580.00	14.90	1.90	1.95		43.97	DERECHA	Relleno de MSE con material de prestamo	mar-24
K102+550.00	K102+580.00	14.90	0.20	2.15		-4.68	DERECHA	Descuento filtro seco	mar-24
MATERIAL DE APORTE A LA MEJORAMIENTO T5									
K98+060	K98+140.00	1198.90				182.93	D/I	Material de aporte a mejoramiento - Ver cartera topografia	mar-24
K98+145	K98+155.00	1198.90				38.57	D/I	Material de aporte a mejoramiento - Ver cartera topografia	mar-24
K98+255	K98+505.00	1196.91				471.96	D/I	Material de aporte a mejoramiento - Ver cartera topografia	mar-24
K98+570	K98+610.00	3195.51				66.24	D/I	Material de aporte a mejoramiento - Ver cartera topografia	mar-24
K98+610	K98+695.00	3191.51				451.44	D/I	Material de aporte a mejoramiento - Ver cartera topografia	mar-24
SUB TOTAL ACTA PARCIAL No. 28						**1269.49**			

ACTA PARCIAL No. 1	
ACTA PARCIAL No. 2	
ACTA PARCIAL No. 3	
ACTA PARCIAL No. 4	
ACTA PARCIAL No. 5	
ACTA PARCIAL No. 6	
ACTA PARCIAL No. 7	
ACTA PARCIAL No. 8	
ACTA PARCIAL No. 9	
ACTA PARCIAL No. 10	934.03
ACTA PARCIAL No. 11	756.30
ACTA PARCIAL No. 12	67.90
ACTA PARCIAL No. 13	264.90
ACTA PARCIAL No. 14	282.70
ACTA PARCIAL No. 15	0.00
ACTA PARCIAL No. 16	958.00
ACTA PARCIAL No. 17	4300.15
ACTA PARCIAL No. 18	0.00
ACTA PARCIAL No. 19	5021.44
ACTA PARCIAL No. 20	5915.50
ACTA PARCIAL No. 21	1396.19
ACTA PARCIAL No. 22	1353.47
ACTA PARCIAL No. 23	447.81
ACTA PARCIAL No. 24	1335.19
ACTA PARCIAL No. 25	196.63
ACTA PARCIAL No. 26	2057.60
ACTA PARCIAL No. 27	5013.66
ACTA PARCIAL No. 28	**1269.49**
TOTAL ACUMULADO	37187.7

ING. FRANCISCO JAVIER HERRERA
MAR INGENIERÍA DE VALOR
INTERVENTORÍA

ING. ROMULO ARCILA SANCHEZ
CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA

Gobierno de CALDAS

GOBERNACIÓN DE CALDAS

Secretaría de Infraestructura

MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

PREACTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

PREACTA DE OBRA No:	28 TRAMO 6	FECHA:	28/03/2026
PERIODO:	1 DE MARZO AL 28 DE MARZO DEL 2026		
CONTRATO DE OBRA No:	29092023-1656	CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	1071 DE 2022	INTERVENTORÍA:	MAB INGENIERIA DE VALOR

ITEM	02	UNIDAD
NF 600.2.1	EXCAVACIONES EN ROCA PARA ESTRUCTURAS INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN EN ZONAS DE DEPOSITO AUTORIZADAS	m3

Abscisa Inicial	Abscisa Final	Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Margen	Cantidad	Descripción
ACTA PARCIAL DE CORTE NO. 28							
ALCANTARILLAS							
K107+500	K107+500	3.00	2.20	1.85	I	12.21	Excavacion CDT
MUROS							
K108+300.00	K108+300.00	5.80	0.45	0.50	I	1.31	Excavacion dentellon M4
K108+300.00	K108+300.00	6.00	0.45	0.50	I	1.35	Excavacion dentellon M5
K108+300.00	K108+300.00	5.70	0.45	0.50	I	1.28	Excavacion dentellon M6
K108+300.00	K108+300.00	5.65	0.45	0.80	I	2.03	Excavacion dentellon M7
K108+300.00	K108+300.00	5.70	0.45	0.80	I	2.05	Excavacion dentellon M8
SUB TOTAL ACTA PARCIAL NO. 28						20.20	

ACTA PARCIAL NO. 1	
ACTA PARCIAL NO. 2	
ACTA PARCIAL NO. 3	
ACTA PARCIAL NO. 4	
ACTA PARCIAL NO. 5	
ACTA PARCIAL NO. 6	
ACTA PARCIAL NO. 7	
ACTA PARCIAL NO. 8	
ACTA PARCIAL NO. 9	
ACTA PARCIAL NO. 10	
ACTA PARCIAL NO. 11	
ACTA PARCIAL NO. 12	
ACTA PARCIAL NO. 13	540.10
ACTA PARCIAL NO. 14	74.90
ACTA PARCIAL NO. 15	0.00
ACTA PARCIAL NO. 16	0.00
ACTA PARCIAL NO. 17	79.60
ACTA PARCIAL NO. 18	0.00
ACTA PARCIAL NO. 19	0.00
ACTA PARCIAL NO. 20	0.00
ACTA PARCIAL NO. 21	45.20
ACTA PARCIAL NO. 22	12.70
ACTA PARCIAL NO. 23	0.00
ACTA PARCIAL NO. 24	128.60
ACTA PARCIAL NO. 25	27.70
ACTA PARCIAL NO. 26	223.70
ACTA PARCIAL NO. 27	101.40
ACTA PARCIAL NO. 28	**20.20**
TOTAL ACUMULADO	1258.9

ING. SEBASTIAN GOMEZ VERGARA
MAB INGENIERIA DE VALOR
INTERVENTORIA

ING. EDWARD ANDRES SANCHEZ
CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA

Gobierno de CALDAS	GOBERNACIÓN DE CALDAS Secretaria de Infraestructura	Hoja No 1 de 1
	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS	

PREACTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

PREACTA DE OBRA No:			28 TRAMO 4			FECHA:	28/03/2026
PERIODO:			1 DE MARZO AL 28 DE MAREC DEL 2026				
CONTRATO DE OBRA No:			20092923-1456			CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATO DE INTSEVENTORIA No.			1871 DE 2022			INTERVENTORÍA:	MAB INGENIERIA DE VALOR
ITEM	105						UNIDAD
NP15	Suministro, fabricacion y montaje de refuerzo en Puente Linda localizado en el K106+000 via Dorada - Sonson, Municipios de Samana - Caldas y Nariño - Antioquia, según relación anexa.						Un
Abscisa Inicial	Abscisa Final	Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Cantidad	Margen	Descripción
ACTA PARCIAL DE COBRO NO. 28							
FILTROS							
K106+060,00	K106+060.00	1.00			0.30	D/I	Reforzamiento Puente Linda
SUB TOTAL ACTA PARCIAL NO. 28				0.30			

ACTA PARCIAL NO. 1	
ACTA PARCIAL NO. 2	
ACTA PARCIAL NO. 3	
ACTA PARCIAL NO. 4	
ACTA PARCIAL NO. 5	
ACTA PARCIAL NO. 6	
ACTA PARCIAL NO. 7	
ACTA PARCIAL NO. 8	
ACTA PARCIAL NO. 9	
ACTA PARCIAL NO. 10	
ACTA PARCIAL NO. 11	
ACTA PARCIAL NO. 12	
ACTA PARCIAL NO. 13	
ACTA PARCIAL NO. 14	
ACTA PARCIAL NO. 15	
ACTA PARCIAL NO. 16	
ACTA PARCIAL NO. 17	
ACTA PARCIAL NO. 18	
ACTA PARCIAL NO. 19	
ACTA PARCIAL NO. 20	
ACTA PARCIAL NO. 21	
ACTA PARCIAL NO. 22	
ACTA PARCIAL NO. 23	
ACTA PARCIAL NO. 24	
ACTA PARCIAL NO. 25	
ACTA PARCIAL NO. 26	
ACTA PARCIAL NO. 27	
ACTA PARCIAL NO. 28	**0.30**
TOTAL ACUMULADO	0,3

ING. SEBASTIAN GOMEZ VERGARA
MAB INGENIERIA DE VALOR
INTERVENTORIA

ING. EDWARD ANDRES SANCHEZ
CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA

Gobierno de CALDAS	GOBERNACIÓN DE CALDAS	Hoja No 1 de 1
	Secretaria de Infraestructura	
	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS	

PREACTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

PREACTA DE OBRA No:	28 TRAMO 4	FECHA:	28/03/2026
PERIODO:	DE MARZO AL 28 DE MARZO DEL 2026		
CONTRATO DE OBRA No:	29092023-1456	CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	1071 DE 2022	INTERVENTORÍA:	MAB INGENIERIA DE VALOR

ITEM	106	UNIDAD
NP16	CONCRETO RESISTENCIA 28MPa (C) - PREPARADO EN OBRA, GRANULARES PUESTOS EN OBRA PARA TRAMO 3 Y TRAMO 4	m3

Abscisa Inicial	Abscisa Final	Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Cantidad	Margen	Descripción
ACTA PARCIAL DE COBRO NO. 28							
ALCANTARILLAS							
K109+270.00	K109+270.00	1.80	1.80	0.25	0.81	DERECHA	Losa inferior de caja en encole
K109+270.00	K109+270.00	1.40	0.20	2.60	0.73	DERECHA	Muro lateral hacia mayores caja encole
K109+270.00	K109+270.00	1.40	0.20	2.15	0.60	DERECHA	Muro lateral hacia menores caja encole
K109+270.00	K109+270.00	1.80	0.20	2.70	0.97	DERECHA	Muro posterior caja encole
K109+270.00	K109+270.00	1.80	0.20	2.60	0.94	DERECHA	Muro frontal caja encole
K109+270.00	K109+270.00	0.96	-0.20	0.55	-0.11	DERECHA	Descuento entrada cuneta
K109+270.00	K109+270.00	3.14	-0.20	0.49	-0.15	DERECHA	Descuento de tuberia de 36"
K109+270.00	K109+270.00	3.14	-0.20	0.08	-0.004	DERECHA	Descuento tuberia de 6"
K107+500.00	K107+500.00	1.80	1.80	0.25	0.81	DERECHA	Losa inferior de caja en encole
K107+500.00	K107+500.00	1.40	0.20	2.35	0.66	DERECHA	Muro lateral hacia mayores caja encole
K107+500.00	K107+500.00	1.40	0.20	1.97	0.55	DERECHA	Muro lateral hacia menores caja encole
K107+500.00	K107+500.00	1.80	0.20	2.35	0.85	DERECHA	Muro posterior caja encole
K107+500.00	K107+500.00	1.80	0.20	2.40	0.86	DERECHA	Muro frontal caja encole
K107+500.00	K107+500.00	0.90	-0.20	0.50	-0.09	DERECHA	Descuento entrada cuneta
K107+500.00	K107+500.00	3.14	-0.20	0.49	-0.15	DERECHA	Descuento de tuberia de 36"
K107+500.00	K107+500.00	3.14	-0.20	0.08	-0.004	DERECHA	Descuento tuberia de 6"
SUB TOTAL ACTA PARCIAL NO. 28				7.30			

ACTA PARCIAL NO. 1	
ACTA PARCIAL NO. 2	
ACTA PARCIAL NO. 3	
ACTA PARCIAL NO. 4	
ACTA PARCIAL NO. 5	
ACTA PARCIAL NO. 6	
ACTA PARCIAL NO. 7	
ACTA PARCIAL NO. 8	
ACTA PARCIAL NO. 9	
ACTA PARCIAL NO. 10	
ACTA PARCIAL NO. 11	
ACTA PARCIAL NO. 12	
ACTA PARCIAL NO. 13	
ACTA PARCIAL NO. 14	
ACTA PARCIAL NO. 15	
ACTA PARCIAL NO. 16	
ACTA PARCIAL NO. 17	
ACTA PARCIAL NO. 18	
ACTA PARCIAL NO. 19	
ACTA PARCIAL NO. 20	
ACTA PARCIAL NO. 21	
ACTA PARCIAL NO. 22	
ACTA PARCIAL NO. 23	25.10
ACTA PARCIAL NO. 24	3.90
ACTA PARCIAL NO. 25	3.20
ACTA PARCIAL NO. 26	16.30
ACTA PARCIAL NO. 27	19.30
ACTA PARCIAL NO. 28	7.30
TOTAL ACUMULADO	75.1

ING. SEBASTIAN GOMEZ VERGARA
MAB INGENIERIA DE VALOR
INTERVENTORIA

ING. EDWARD ANDRES SANCHEZ
CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA

Gobierno de CALDAS	GOBERNACIÓN DE CALDAS	Hoja No 1 de 1
	Secretaría de Infraestructura	
	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS	

PREACTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

PREACTA DE OBRA No:	28 TRAMO 4	FECHA:	28/03/2026
PERIODO:	1 DE MARZO AL 28 DE MARZO DEL 2026		
CONTRATO DE OBRA No:	29892023-1456	CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	1871 DE 2022	INTERVENTORÍA:	MAS INGENIERIA DE VALOR

ITEM	107	UNIDAD
NP17	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - PREPARADO EN OBRA, GRANULARES PUESTOS EN OBRA PARA TRAMO 3 Y TRAMO 4	m3

Abscisa Inicial	Abscisa Final	Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Cantidad	Margen	Descripción
ACTA PARCIAL DE COBRO NO. 28							
MUROS							
K108+300.00	K108+300.00	5.80	0.45	0.50	1.31	IZQUIERDA	Dentellón Módulo 4 de muro de contención
K108+300.00	K108+300.00	5.80	2.35	0.45	6.13	IZQUIERDA	Zarpa Módulo 4 de muro de contención
K108+300.00	K108+300.00	5.75	0.35	2.60	5.23	IZQUIERDA	Vástago Módulo 4 de muro de contención
K108+300.00	K108+300.00	6.00	0.45	0.50	1.35	IZQUIERDA	Dentellón Módulo 5 de muro de contención
K108+300.00	K108+300.00	6.00	2.55	0.45	6.89	IZQUIERDA	Zarpa Módulo 5 de muro de contención
K108+300.00	K108+300.00	5.95	0.35	3.00	6.25	IZQUIERDA	Vástago Módulo 5 de muro de contención
K108+300.00	K108+300.00	5.70	0.45	0.50	1.28	IZQUIERDA	Dentellón Módulo 6 de muro de contención
K108+300.00	K108+300.00	5.70	2.80	0.45	7.18	IZQUIERDA	Zarpa Módulo 6 de muro de contención
K108+300.00	K108+300.00	5.85	0.35	3.30	6.76	IZQUIERDA	Vástago Módulo 6 de muro de contención
K108+300.00	K108+300.00	5.65	0.45	0.80	2.03	IZQUIERDA	Dentellón Módulo 7 de muro de contención
K108+300.00	K108+300.00	5.65	2.55	0.45	6.48	IZQUIERDA	Zarpa Módulo 7 de muro de contención
K108+300.00	K108+300.00	5.86	0.35	3.08	6.32	IZQUIERDA	Vástago Módulo 7 de muro de contención
K108+300.00	K108+300.00	5.70	0.45	0.80	2.05	IZQUIERDA	Dentellón Módulo 8 de muro de contención
K108+300.00	K108+300.00	5.70	2.35	0.45	6.03	IZQUIERDA	Zarpa Módulo 8 de muro de contención
K108+300.00	K108+300.00	6.65	0.35	2.80	6.52	IZQUIERDA	Vástago Módulo 8 de muro de contención
K108+300.00	K108+300.00	3.14	0.45	0.35	-0.22	IZQUIERDA	Descuento tubería de 36"
K108+300.00	K108+300.00	3.14	0.05	0.35	0.00	IZQUIERDA	Descuento tubería de 4" filtro
K108+300.00	K108+300.00	3.14	0.05	0.35	0.00	IZQUIERDA	Descuento tubería de 4" filtro
K109+270.00	K109+270.00	8.00	0.45	0.80	2.88	IZQUIERDA	Dentellón Módulo 1 de muro de contención
K109+270.00	K109+270.00	8.00	2.55	0.45	9.18	IZQUIERDA	Zarpa Módulo 1 de muro de contención
K109+270.00	K109+270.00	7.85	0.35	3.22	8.65	IZQUIERDA	Vástago Módulo 1 de muro de contención
K109+270.00	K109+270.00	3.14	0.05	0.35	0.00	IZQUIERDA	Descuento tubería de 4" filtro
K109+270.00	K109+270.00	3.14	0.05	0.35	0.00	IZQUIERDA	Descuento tubería de 4" filtro
K109+380.00	K109+380.00	5.30	0.45	0.80	1.91	IZQUIERDA	Dentellón Módulo 2 de muro de contención
K109+380.00	K109+380.00	5.30	2.80	0.45	6.68	IZQUIERDA	Zarpa Módulo 2 de muro de contención
K109+380.00	K109+380.00	5.40	0.35	3.52	6.65	IZQUIERDA	Vástago Módulo 2 de muro de contención
K109+270.00	K109+270.00	3.14	0.05	0.35	0.00	IZQUIERDA	Descuento tubería de 4" filtro
K109+270.00	K109+270.00	3.14	0.05	0.35	0.00	IZQUIERDA	Descuento tubería de 4" filtro
SUB TOTAL ACTA PARCIAL NO. 28				107.70			

ACTA PARCIAL NO. 1	
ACTA PARCIAL NO. 2	
ACTA PARCIAL NO. 3	
ACTA PARCIAL NO. 4	
ACTA PARCIAL NO. 5	
ACTA PARCIAL NO. 6	
ACTA PARCIAL NO. 7	
ACTA PARCIAL NO. 8	
ACTA PARCIAL NO. 9	
ACTA PARCIAL NO. 10	
ACTA PARCIAL NO. 11	
ACTA PARCIAL NO. 12	
ACTA PARCIAL NO. 13	
ACTA PARCIAL NO. 14	
ACTA PARCIAL NO. 15	
ACTA PARCIAL NO. 16	
ACTA PARCIAL NO. 17	
ACTA PARCIAL NO. 18	
ACTA PARCIAL NO. 19	
ACTA PARCIAL NO. 20	
ACTA PARCIAL NO. 21	
ACTA PARCIAL NO. 22	
ACTA PARCIAL NO. 23	254.70
ACTA PARCIAL NO. 24	73.40
ACTA PARCIAL NO. 25	75.50
ACTA PARCIAL NO. 26	86.70
ACTA PARCIAL NO. 27	110.70
ACTA PARCIAL NO. 28	**107.70**
TOTAL ACUMULADO	708.7

ING. SEBASTIÁN GOMEZ VENGARA
MAS INGENIERIA DE VALOR
INTERVENTORIA

ING. EDWARD ANDRES SANCHEZ
CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA

Gobierno de CALDAS	GOBERNACIÓN DE CALDAS Secretaria de Infraestructura	Hoja No 1 de 1
	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS	

PREACTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

PREACTA DE OBRA No:	28 TRAMO 4	FECHA:	28/03/2026
PERIODO:	1 DE MARZO AL 28 DE MARZO DEL 2026		
CONTRATO DE OBRA No:	20092023-1456	CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	1391 DE 2022	INTERVENTORÍA:	MAB INGENIERIA DE VALOR

ITEM	108	UNIDAD
NP18	CONCRETO CICLOPEO RESISTENCIA 21MPa (D) - PREPARADO EN OBRA, GRANULARES PUESTOS EN OBRA PARA TRAMO 3 Y TRAMO 4	m3

Abscisa Inicial	Abscisa Final	Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Cantidad	Margen	Descripción
ACTA PARCIAL DE COBRO NO. 28							
ACTA N° 26							
MUROS							
K108+300.00	K108+300.00	1.44	0.38	1.20	0.66	IZQUIERDA	Soporte zarpa modulo 7
K108+300.00	K108+300.00	5.60	0.30	0.30	0.50	IZQUIERDA	Soporte zarpa modulo 8
K108+300.00	K108+300.00	2.40	0.40	0.50	0.48	IZQUIERDA	Soporte zarpa modulo 8
SUB TOTAL ACTA PARCIAL NO. 28				1.60			

ACTA PARCIAL NO. 1	
ACTA PARCIAL NO. 2	
ACTA PARCIAL NO. 3	
ACTA PARCIAL NO. 4	
ACTA PARCIAL NO. 5	
ACTA PARCIAL NO. 6	
ACTA PARCIAL NO. 7	
ACTA PARCIAL NO. 8	
ACTA PARCIAL NO. 9	
ACTA PARCIAL NO. 10	
ACTA PARCIAL NO. 11	
ACTA PARCIAL NO. 12	
ACTA PARCIAL NO. 13	
ACTA PARCIAL NO. 14	
ACTA PARCIAL NO. 15	
ACTA PARCIAL NO. 16	
ACTA PARCIAL NO. 17	
ACTA PARCIAL NO. 18	
ACTA PARCIAL NO. 19	
ACTA PARCIAL NO. 20	
ACTA PARCIAL NO. 21	
ACTA PARCIAL NO. 22	
ACTA PARCIAL NO. 23	85.20
ACTA PARCIAL NO. 24	13.70
ACTA PARCIAL NO. 25	7.60
ACTA PARCIAL NO. 26	6.20
ACTA PARCIAL NO. 27	11.79
ACTA PARCIAL NO. 28	**1.60**
TOTAL ACUMULADO	125.0

ING. SEBASTIAN GOMEZ VERGARA
MAB INGENIERIA DE VALOR
INTERVENTORIA

ING. EDWARD ANDRES SANCHEZ
CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA

ANEXOS

- # REGISTRO FOTOGRAFICO


TRAMO 4

-

GOBIERNO DE CALDAS	GOBERNACIÓN DE CALDAS	Hoja No 1 de 1
	Secretaria de Infraestructura	
	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS, CONTRATO - 29092023-1456	
	REGISTRO FOTOGRAFICO ACTA PARCIAL DE OBRA NRO 28 TRAMO 4	

Estructuras de drenaje

640.1 T4 ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa

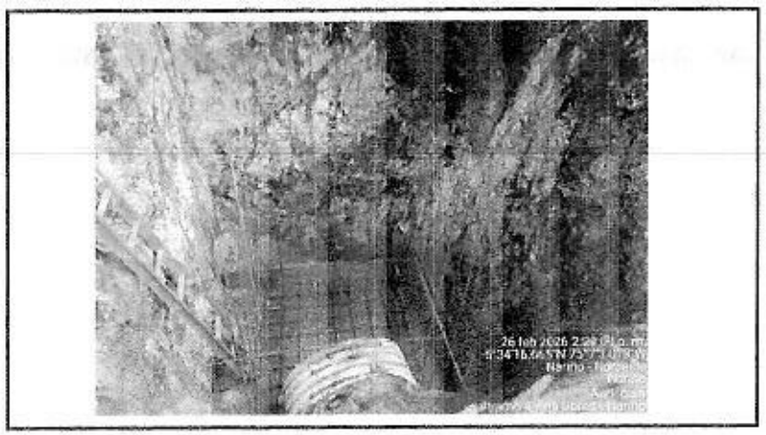









GOBIERNO DE CALDAS	GOBERNACIÓN DE CALDAS	Hoja No 1 de 1
	Secretaria de Infraestructura	
	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS. CONTRATO - 29092023-1456	
	REGISTRO FOTOGRAFICO ACTA PARCIAL DE OBRA NRO 28 TRAMO 4	

Obras de estabilización

600.2.3 EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO

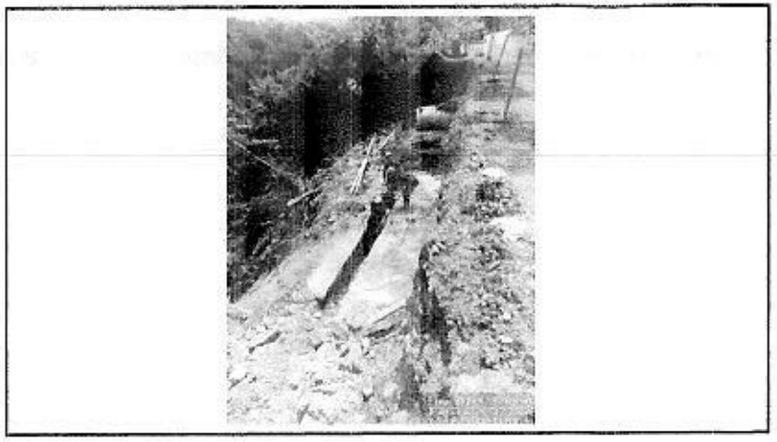

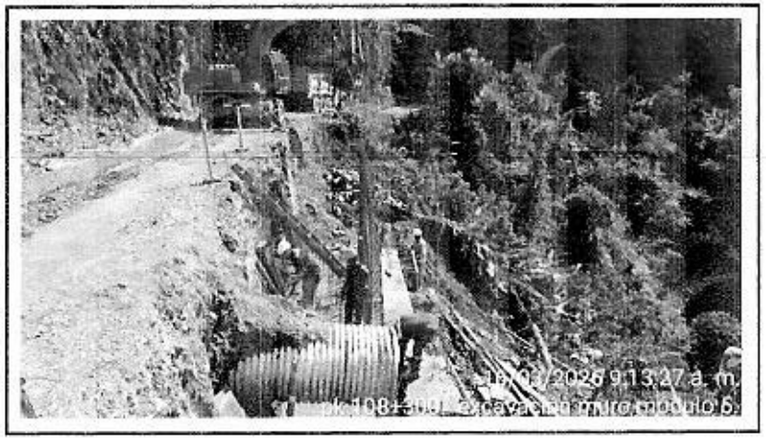

GOBIERNO DE CALDAS	GOBERNACIÓN DE CALDAS	Hoja No 1 de 1
	Secretaria de Infraestructura	
	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS. CONTRATO - 29302023-1456	
	REGISTRO FOTOGRAFICO ACTA PARCIAL DE OBRA NRO 28 TRAMO 4	

Obras de estabilización

640.1 T4 ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa











GOBIERNO DE CALDAS	GOBERNACIÓN DE CALDAS	Hoja No 1 de 1
	Secretaria de Infraestructura	
	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS. CONTRATO - 29092023-1456	
	REGISTRO FOTOGRAFICO ACTA PARCIAL DE OBRA NRO 28 TRAMO 4	

Transporte

900.2.1 TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)

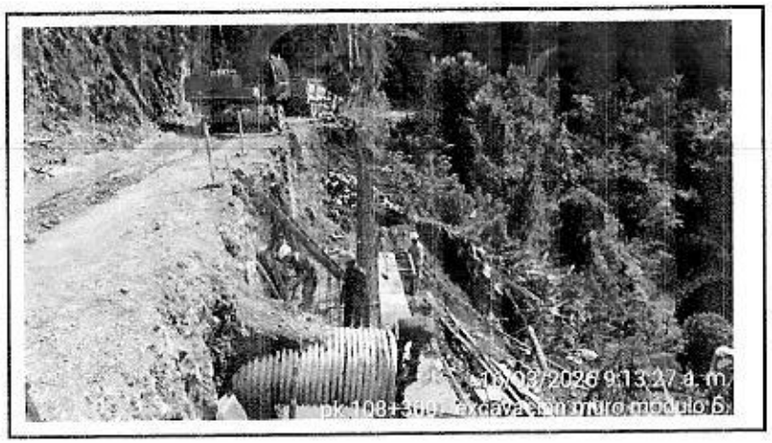

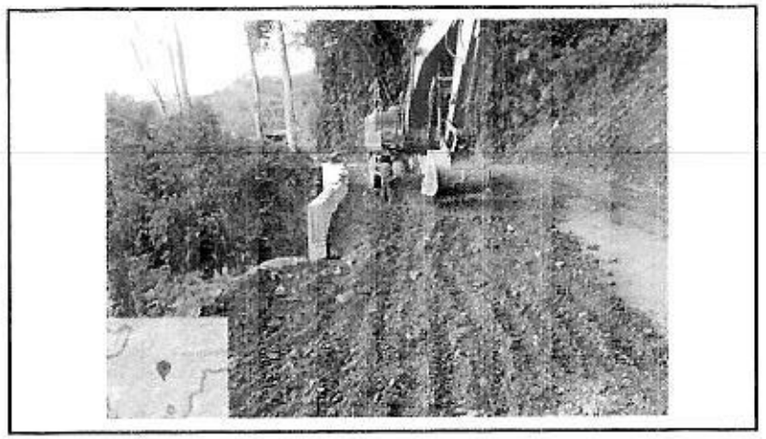


GOBIERNO DE CALDAS	GOBERNACIÓN DE CALDAS	Hoja No 1 de 1
	Secretaria de Infraestructura	
	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS. CONTRATO - 25052023-1456	
REGISTRO FOTOGRAFICO ACTA PARCIAL DE OBRA NRO 28 TRAMO 4		

No previstos

NP 211.1 Remoción de derrumbes









GOBIERNO DE CALDAS	GOBERNACIÓN DE CALDAS	Hoja No 1 de 1
	Secretaria de Infraestructura	
	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - NORDÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS. CONTRATO - 29092023-1456	
	REGISTRO FOTOGRAFICO ACTA PARCIAL DE OBRA NRO 28 TRAMO 4	

No previstos

NP 900.3.2 Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100 m)







GOBIERNO DE CALDAS	GOBERNACIÓN DE CALDAS	Hoja No 1 de 1
	Secretaría de Infraestructura	
	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS. CONTRATO - 29092023-1456	
	REGISTRO FOTOGRAFICO ACTA PARCIAL DE OBRA NRO 28 TRAMO 4	


No previstos

MEJ EXCAVACION EN MATERIAL COMUN DE LA EXPLANACION Y PRESTAMOS, NO INCLUYE CONFORMACION EN ZONAS DE DEPOSITO NI TRANSPORTE, APLICA PARA LOS MATERIALES DE PRESTAMO SECTOR DULCE NOMBRE K69



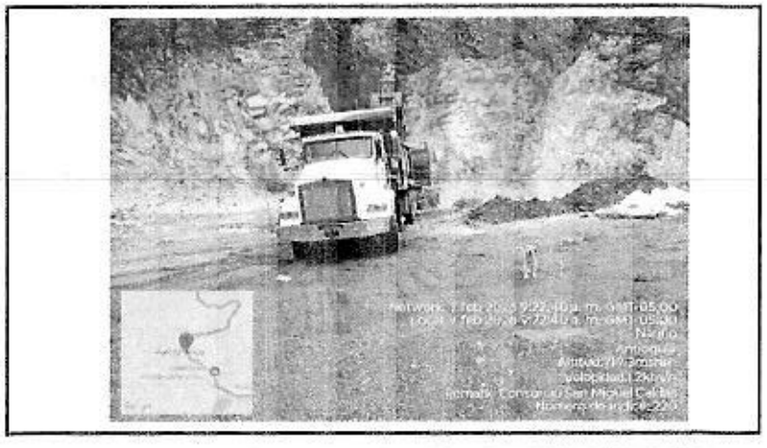

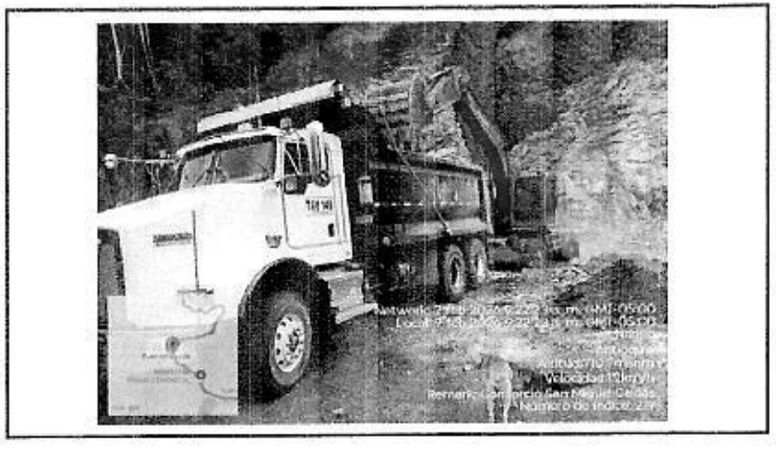


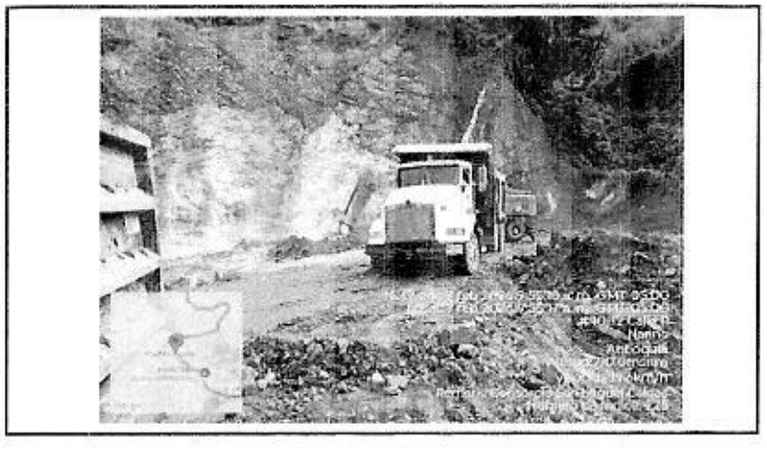

GOBIERNO DE CALDAS	GOBERNACIÓN DE CALDAS	Hoja No 1 de 1
	Secretaria de Infraestructura	
	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS. CONTRATO - 29092023-1456	
	REGISTRO FOTOGRAFICO ACTA PARCIAL DE OBRA NRO 28 TRAMO 4	


No previstos

NP15 SUMINISTRO. FABRICACIÓN Y MONTAJE DE REFUERZO EN PUENTE LINDA LOCALIZADO EN EL K106+00 VIA DORADA-SONSON

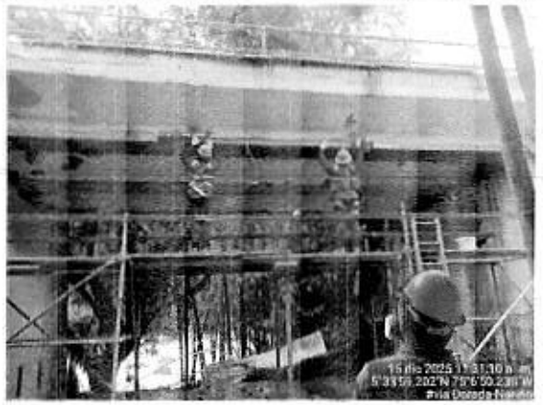





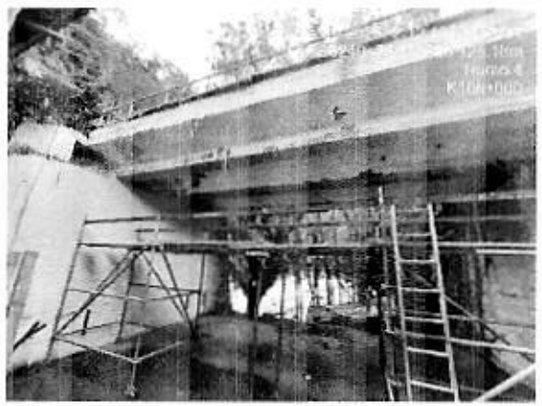

GOBIERNO DE CALDAS	GOBERNACIÓN DE CALDAS	Hoja No 1 de 1
	Secretaría de Infraestructura	
	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS. CONTRATO - 29092023-1456	
REGISTRO FOTOGRAFICO ACTA PARCIAL DE OBRA NRO 28 TRAMO 4		

No previstos

NP16 CONCRETO RESISTENCIA 28MPa (C) - PREPARADO EN OBRA, GRANULARES PUESTOS EN OBRA PARA TRAMO 3 Y TRAMO 4






GOBIERNO DE CALDAS	GOBERNACIÓN DE CALDAS	Hoja No 1 de 1
	Secretaria de Infraestructura	
	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS. CONTRATO - 29092023-1456	
	REGISTRO FOTOGRAFICO ACTA PARCIAL DE OBRA NRO 28 TRAMO 4	

No previstos

NP17 CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - PREPARADO EN OBRA, GRANULARES PUESTOS EN OBRA PARA TRAMO 3 Y TRAMO 4

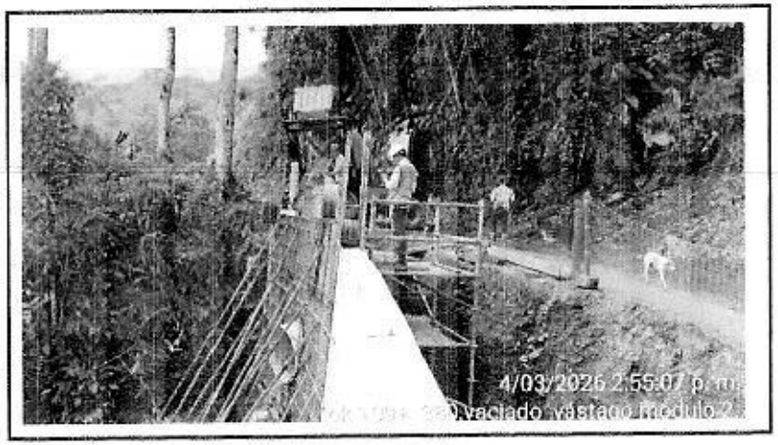









GOBIERNO DE CALDAS	GOBERNACIÓN DE CALDAS	Hoja No 1 de 1
	Secretaria de Infraestructura	
	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS. CONTRATO - 29092023-1456	
	REGISTRO FOTOGRAFICO ACTA PARCIAL DE OBRA NRO 28 TRAMO 4	

No previstos

NP20 CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F) PREPARADO EN OBRA, GRANULARES PUESTOS EN OBRA PARA TRAMO 3 Y TRAMO 4

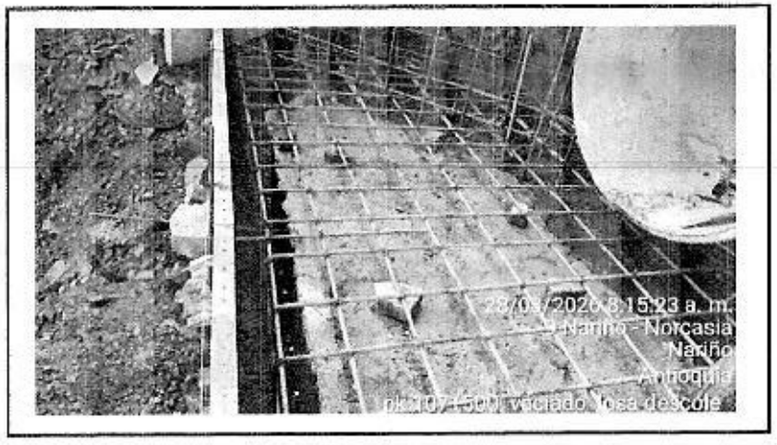

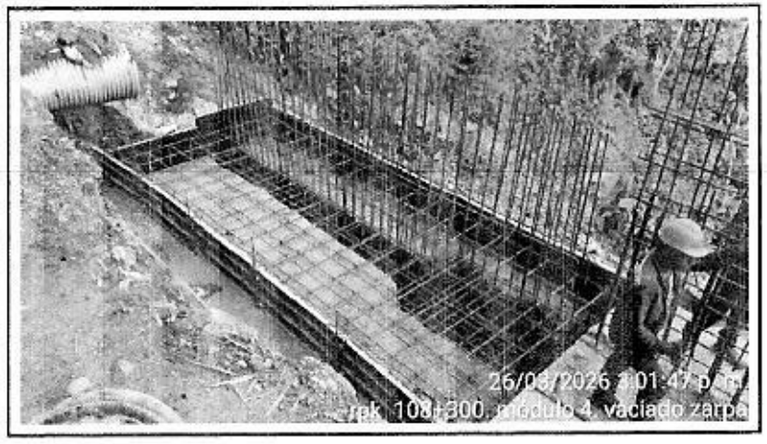

GOBERNACIÓN DE CALDAS

ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA

PÁGINA

FECHA: 13/01/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: ENCN GRUPO SUR OCCIDENTE | DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS | ACTA No.: 18 (Número de manera consecutiva) | POR CANTIDADES DE OBRA: ☑ | POR CONTRATO ADICIONAL: ☐ No. (Indicar No. y fecha)

CONTRATO No.: 2992023-1456 (Indique número y año)

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA LA DORADA – SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN MIGUEL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 071-2022 | INTERVENTOR: MAB INGENIERIA DE VALOR

PLAZO INICIAL: 60 (En meses según contrato principal) | PLAZO ACUMULADO: 60 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 12/10/2023 (Indique día/mes/año) | FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 11/10/2028 (Incluidas las suspensiones. Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) | FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (+ incluido IVA) (A): $ 93,499,614,147.20 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 107,319,614,847.20 | VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 13,820,000,000

No. DE ORDEN	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN GR.	ESPECIFICACIÓN PART.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA No. 17 FECHA 04/12/2025 CANTIDAD	VALOR	MODIFICACIONES: PRESENTES +/-	CANTIDAD	VALOR	EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 25 de fecha 10 de diciembre de 2025 CANTIDAD	VALOR	CONDICIONES ACTUALIZADAS CANTIDAD	VALOR
C1				Capítulo 1, Actividades Preliminares													
1	600.2.3			EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	M3	109521.00	$ 43,112.00	$ 4,721,669,352.00	0.00	$ -		0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
2	210.2.1			EXCAVACIÓN EN ROCA DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	M3	31135.00	$ 54,670.00	$ 1,691,286,090.00	2857.46	$ 161,412,251.84	+	3364.20	$ 178,238,065.60	2,886.83	$ 106,106,752.00	6222.66	$ 339,620,937.48
3	201.7			DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	M3	342.00	$ 213,374.00	$ 72,973,908.00	0.00	$ -		0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
4	220.1			TERRAPLENES	M3	53499.00	$ 16,887.00	$ 452,717,613.00	0.00	$ -		0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
5	220.2			DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONAS NO BOSCOSAS	HA	5.00	$ 1,064,469.00	$ 5,322,345.00	7.50	$ 7,983,517.50		0.00	$ -	3.10	$ 4,044,982.00	7.50	$ 7,983,517.50
C2				Capítulo 2, Estructura de Pavimento								0.00					
6	341.2 T1			BASE ESTABILIZADA CON MEZCLA ASFALTICA NATURAL BEIWAN	M3	11260.00	$ 329,188.00	$ 4,063,032,880.00	6625.65	$ 2,181,150,726.56	-	-463.00	$ (152,085,274.76)	6,057.00	$ 1,993,921,343.00	6163.65	$ 2,029,065,453.80
7	341.2 T4			BASE ESTABILIZADA CON MEZCLA ASFALTICA NATURAL BEIWAN	M3	6400.00	$ 474,887.00	$ 3,039,162,800.00	0.00	$ -		0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
8	310.1			CONFORMACION DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	84200.00	$ 1,743.00	$ 153,712,600.00	109950.00	$ 191,651,585.00	+	-70157.00	$ (122,301,429.63)	18,167.00	$ 31,701,335.00	39767.80	$ 69,350,135.40
9	320.3.1 T4			SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-60	M3	13545.00	$ 354,264.00	$ 4,800,111,180.00	0.00	$ -		0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
10	420.2			RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFALTICA CRL-1	M2	216000.00	$ 3,945.00	$ 852,120,000.00	82800.00	$ 326,646,000.00		0.00	$ -	0.00	$ -	82800.00	$ 326,646,000.00
11	450.2P T1			MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC 19 – COMPRA DE MEZCLA	M3	2520.00	$ 1,287,314.00	$ 3,243,231,280.00	0.00	$ -		0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
12	450.2P T3			MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC 19 – COMPRA DE MEZCLA	M3	6720.00	$ 1,443,147.00	$ 9,697,647,840.00	0.00	$ -		0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
13	450.2P T4			MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC 19 – COMPRA DE MEZCLA	M3	5560.00	$ 1,443,147.00	$ 8,025,704,360.00	0.00	$ -		0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
C3				Capítulo 3, Estructuras de Drenaje								0.00					
14	201.7			DEMOLICION DE ESTRUCTURAS	M3	230.00	$ 213,374.00	$ 49,075,020.00	3331.50	$ 710,855,481.00		0.00	$ -	3,334.10	$ 700,720,216.00	3331.50	$ 710,855,481.00
15	201.15			REMOCION DE ALCANTARILLAS	ML	387.00	$ 104,053.00	$ 41,309,841.00	1275.00	$ 132,667,575.00		0.00	$ -	1,225.50	$ 127,548,169.00	1275.00	$ 132,667,575.00
16	600.2.3			EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	M3	31852.00	$ 43,112.00	$ 1,531,173,424.00	24703.33	$ 1,065,008,689.60		0.00	$ -	17,390.50	$ 745,014,158.00	24703.30	$ 1,065,008,689.60
17	610.1			RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	M3	9583.00	$ 79,074.00	$ 757,706,142.00	3652.00	$ 288,794,052.80		0.00	$ -	9,338.00	$ 383,602,035.00	3667.30	$ 288,794,052.80
18	630.3.2			CONCRETO RESISTENCIA 2 MPa (C) – COMPRA DE MEZCLA	M3	1265.00	$ 1,381,561.00	$ 1,775,645,585.00	0.00	$ -		0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
19	630.4.2 T1			CONCRETO RESISTENCIA 21 MPa (D) – COMPRA DE MEZCLA	M3	621.00	$ 1,023,749.00	$ 840,467,929.00	0.00	$ -		0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
20	630.4.2 T3			CONCRETO RESISTENCIA 21 MPa (D) – COMPRA DE MEZCLA	M3	665.00	$ 1,146,249.00	$ 762,255,585.00	0.00	$ -		0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
21	630.4.2 T4			CONCRETO RESISTENCIA 21 MPa (D) – COMPRA DE MEZCLA	M3	1588.00	$ 1,146,249.00	$ 1,820,443,412.00	0.00	$ -		0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
22	630.6 T1			CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F)	M3	486.00	$ 595,165.00	$ 294,500,190.00	70.50	$ 41,954,132.50		0.00	$ -	58.77	$ 34,987,931.00	70.50	$ 41,954,132.50
23	630.6 T3			CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F)	M3	566.00	$ 756,665.00	$ 428,212,390.00	17.60	$ 13,317,304.00		0.00	$ -	17.60	$ 13,317,304.00	17.60	$ 13,317,304.00
24	630.6 T4			CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F)	M3	57.00	$ 756,665.00	$ 43,129,905.00	7.10	$ 5,372,323.50		0.00	$ -	7.10	$ 5,372,323.00	7.10	$ 5,372,323.50
25	630.5			CONCRETO RESISTENCIA 17,5 MPa (E)	M3	464.00	$ 965,074.00	$ 632,823,936.00	0.00	$ -		0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
26	661.1			TUBERÍA DE PLASTICO TIPO PVC NORMA NTC-5055 DE DIAMETRO 900 mm	ML	1559.00	$ 2,481,462.00	$ 3,372,006,858.00	2689.00	$ 6,672,651,318.00		0.00	$ -	2,695.26	$ 6,440,059,070.00	2689.00	$ 6,672,651,318.00
27	640.1 T1			ACERO DE REFUERZO Fy 4200 MPa	KG	2884.00	$ 8,763.00	$ 18,606,692.00	209318.00	$ 2,193,545,203.00	-	-15030.00	$ (131,445,000.00)	149,604.54	$ 1,312,740,729.00	209319.00	$ 2,062,100,297.00
28	640.1 T3			ACERO DE REFUERZO Fy 4200 MPa	KG	56200.00	$ 8,763.00	$ 492,181,640.00	45280.03	$ 396,788,640.00	+	134720.00	$ 1,180,591,560.00	25,043.30	$ 223,635,954.00	180000.03	$ 1,577,380,200.00
29	640.1 T4			ACERO DE REFUERZO Fy 4200 MPa	KG	157143.00	$ 8,763.00	$ 1,377,044,109.00	57143.03	$ 500,744,100.00	+	21348.00	$ 187,072,524.00	7,546.14	$ 66,125,598.00	78491.00	$ 687,816,633.00
30	642.2P			MALLA ELECTROSOLDADA >= 15cm	M2	657.00	$ 13,853.00	$ 7,716,121.00	0.00	$ -		0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
31	671.1 T1			CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU, NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M3	2142.00	$ 709,340.00	$ 1,519,406,280.00	0.00	$ -		0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
32	671.1 T3			CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU, NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M3	5120.00	$ 827,172.00	$ 4,235,120,640.00	0.00	$ -		0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
33	671.1 T4			CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU, NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M3	1240.00	$ 827,172.00	$ 1,025,693,280.00	0.00	$ -		0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -

GOBIERNO DE CALDAS

GOBERNACIÓN DE CALDAS

ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA

PÁGINA

FECHA: 13/01/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: EMCN GRUPO SUR OCCIDENTE — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS — ACTA No. 16 (Número de la acta consecutivo)

POR CANTIDADES DE OBRA: ☐

POR CONTRATO ADICIONAL: ☐ No. (Indicar No. y fecha)

CONTRATO No.: 20260023-1456 (Indique número y año)

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA LA DORADA - SONSON, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

CONTRATISTA/CONSORCIO: CONSORCIO SAN MIGUEL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 071-2022 — INTERVENTOR: MAS INGENIERIA DE VALOR

PLAZO INICIAL: 60 (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 12/10/2023 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indicar la suspensión a que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 93,499,614,147.00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 107,319,614,817.00

PLAZO ACUMULADO: 60 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 11/10/2026 (Incluidas las suspensiones. Indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 13,820,000,000

No. DE ORDEN	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA No. 17 FECHA 14/12/2025		+/-	PRESENTES		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 25 de fecha 10 de diciembre de 2025		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		GR.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR		CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
34	673.2 T1			MATERIAL GRANULAR DRENANTE	M3	3154.00	$ 157,554.00	$ 496,9[illegible]5,316.00	7024.10	$ 1,106,675,051.40		0.00	$ -	7,024.10	$ 1,104,248,728.00	7024.10	$ 1,106,675,051.40
35	673.2 T3			MATERIAL GRANULAR DRENANTE	M3	10368.00	$ 281,223.00	$ 2,915,468,960.00	0.00	$ -		0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
36	673.2 T4			MATERIAL GRANULAR DRENANTE	M3	9228.00	$ 281,223.00	$ 2,595,096,360.00	0.00	$ -		0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
37	673.3.3 T1			MATERIAL DE COBERTURA TIPO SUB- BASE CLASE C SBG-20	M3	364.00	$ 188,881.00	$ 74,409,112.00	3097.30	$ 577,378,137.84	+	350.00	$ 66,096,830.00	3,025.10	$ 511,284,273.00	3497.33	$ 641,467,459.84
38	673.3.3 T3			MATERIAL DE COBERTURA TIPO SUB- BASE CLASE C SBG-20	M3	1866.00	$ 334,693.00	$ 631,8[illegible]5,840.00	159.89	$ 53,511,365.20		0.00	$ -	0.00	$ -	159.89	$ 53,511,365.20
39	673.1.1			GEOTEXTIL TIPO NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSIÓN GRAS MÍNIMA DE 700 N APROXIMADAMENTE	M2	88433.00	$ 11,416.00	$ 1,009,[illegible]51,928.00	51930.20	$ 592,835,[illegible]62.20		0.00	$ -	41,870.68	$ 477,485,662.00	51930.20	$ 592,835,162.20
40	663.1.1			TUBERÍA DE PVC 4"	ML	37684.00	$ 47,30[illegible].00	$ 1,782,143,894.00	12356.50	$ 584,474,106.50		0.00	$ -	11,859.40	$ 560,772,276.00	12356.50	$ 584,474,606.50
41	672.2			BORDILLO DE PIEZA PREFABRICADA DE CONCRETO, NO INCLUYE LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	14598.00	$ 50,240.00	$ 733,303,040.00	0.00	$ -		0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
C4				Capítulo 4. Obras de Estabilización								0.00					
42	600.2.3			EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	M3	5265.00	$ 43,110.00	$ 227,[illegible]14,016.00	13682.23	$ 589,867,006.40	+	1298.50	$ 55,980,832.00	10,477.10	$ 460,345,824.00	14980.70	$ 645,847,938.40
43	610.1			RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	M3	4707.50	$ 79,070.00	$ 372,[illegible]1,318.00	1864.20	$ 155,[illegible]3,476.72	+	416.22	$ 32,512,180.28	1,836.10	$ 145,219,401.00	2280.10	$ 188,239,657.00
44	630.3.2			CONCRETO RESISTENCIA 2xMPa (C) - COMPRA DE MEZCLA	M3	516.00	$ 1,381,981.00	$ 713,[illegible]2,196.00	0.00	$ -		0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
45	630.4.2 T3			CONCRETO RESISTENCIA 2 MPa (D) - COMPRA DE MEZCLA	M3	1368.00	$ 1,146,219.00	$ 1,602,456,192.00	0.00	$ -		0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
46	630.4.2 T4			CONCRETO RESISTENCIA 2 MPa (D) - COMPRA DE MEZCLA	M3	101.00	$ 1,146,219.00	$ 115,[illegible]1,149.00	0.00	$ -		0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
47	630.6 T3			CONCRETO RESISTENCIA 1 MPa (F)	M3	182.00	$ 756,665.00	$ 137,713,030.00	23.90	$ 18,084,293.50		0.00	$ -	23.90	$ 18,084,294.00	23.90	$ 18,084,293.50
48	630.6 T4			CONCRETO RESISTENCIA 1 MPa (F)	M3	29.00	$ 756,665.00	$ 21,943,285.00	0.00	$ -		0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
49	640.1 T3			ACERO DE REFUERZO Fy 4200 MPa	KG	84893.00	$ 6,762.00	$ 742,[illegible]4,759.00	99734.01	$ 674,407,630.15	+	1670.00	$ 164,455,221.00	66,881.14	$ 778,865,240.00	116551.05	$ 1,028,862,551.15
50	640.1 T4			ACERO DE REFUERZO Fy 4200 MPa	KG	29896.00	$ 6,762.00	$ 261,[illegible]8,648.00	29896.03	$ 261,078,648.00	+	22659.00	$ 188,[illegible]9,512.00	22,836.00	$ 260,586,168.00	52555.00	$ 460,339,465.00
51	673.2 T3			MATERIAL GRANULAR DRENANTE	M3	516.00	$ 281,223.00	$ 145,[illegible]2,220.00	0.00	$ -		0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
52	673.2 T4			MATERIAL GRANULAR DRENANTE	M3	191.00	$ 281,223.00	$ 53,713,020.00	0.00	$ -		0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
53	673.3.1			GEOTEXTIL TIPO NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSIÓN GRAS MÍNIMA DE 700 N APROXIMADAMENTE	M2	5128.00	$ 11,416.00	$ 58,541,248.00	5366.50	$ 61,283,364.00		0.00	$ -	4,622.27	$ 52,768,575.00	5366.50	$ 61,283,364.00
54	663.1.1			TUBERÍA DE PVC 4"	ML	216.00	$ 47,30[illegible].00	$ 10,217,016.00	2944.30	$ 139,269,334.30		0.00	$ -	1,297.80	$ 56,515,593.00	2944.30	$ 139,269,334.30
55	621.1.2			PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU, DE DIAMETRO 1.2 m, INCLUYE EXCAVACIÓN EN ROCA, BAJO AGUA	ML	364.00	$ 4,213,765.00	$ 1,534,145,740.00	0.00	$ -		0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
56	623.1.2			ANCLAJE PARA REALCE	ML	679.00	$ 45,88[illegible].00	$ 31,153,[illegible]0.00	679.00	$ 31,153,190.00		0.00	$ -	360.00	$ 16,517,161.00	679.00	$ 31,153,189.00
57	623.1			ANCLAJE TIPO pasivo con acero #8, inyección de mortero perforación D=7.5cm perforación en material común	ML	4313.00	$ 156,255.00	$ 673,[illegible]7,615.00	0.00	$ -		0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
C5				Capítulo 5. Señalización y Demarcación Vial								0.00					
58	700.1			LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	ML	153000.00	$ 2,880.00	$ 374,[illegible]0,000.00	82550.43	$ 237,745,[illegible]52.00		0.00	$ -	0.00	$ -	82550.40	$ 237,745,152.00
59	701.1.2			TACHA REFLECTIVA - ADHESIVO EPOXICO	UND	15642.00	$ 10,621.00	$ 166,[illegible]1,882.00	8687.50	$ 92,317,[illegible]3.40		0.00	$ -	0.00	$ -	8687.50	$ 92,317,535.40
60	710.1.1			SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SR, SP Y/O DI, TAELER O EN LAMINA CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO IV (75X75 cm)	UND	305.00	$ 757,731.00	$ 228,[illegible]2,955.00	458.00	$ 367,332,726.00		0.00	$ -	61.00	$ 45,816,591.00	458.00	$ 367,332,726.00
61	710.1.5			SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO PREVENTIVA DELINEADOR DE CURVA HORIZONTAL SP-76, REFLECTIVO TIPO IV (75X600 m)	UND	1302.00	$ 698,365.00	$ 870,[illegible]5,130.00	1357.00	$ 906,975,176.00		0.00	$ -	42.00	$ 28,071,456.00	1357.00	$ 906,975,176.00
C6				Capítulo 6. Transportes								0.00					
62	900.2.1			TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1,000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	M3/KM	1047841.00	$ 1,536.00	$ 1,609,[illegible]3,776.00	420645.67	$ 615,328,040.80	-	-1000.01	$ (1,536,007.94)	253,734.43	$ 388,200,976.00	420645.86	$ 453,792,040.86
C7				Capítulo 7 Obras estabilización tramo 1								0.00					

GOBIERNO DE CALDAS

GOBERNACIÓN DE CALDAS

ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA

PÁGINA

FECHA: 13/01/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMON GRUPO SUR OCCIDENTE | DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS | ACTA No: 16 (Numerar de manera consecutiva) | POR CANTIDADES DE OBRA ☒ | POR CONTRATO ADICIONAL ☐ No. 3 de 5 (Indicar No. y fecha)

CONTRATO No: 2903/2023-1454 (Indique número y año)

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA LA DORADA - SONSON, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN MIGUEL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 071-2022 | INTERVENTOR: MAR INGENIERÍA DE VALOR

PLAZO INICIAL: 60 (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 12/10/2023 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 93,458,614,047.00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 107,313,614,047.00

PLAZO ACUMULADO: 60 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 13/10/2028 (Incluidas las suspensiones. Indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 13,855,000,000

No. DE ORDEN	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN GR.	ESPECIFICACIÓN PART.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA No. 17 FECHA (4/12/2025) CANTIDAD	VALOR	MODIFICACIONES: PRESENTES +/-	CANTIDAD	VALOR	EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 20 de fecha 10 de diciembre de 2025 CANTIDAD	VALOR	CONDICIONES ACTUALIZADAS CANTIDAD	VALOR
63	201.7			DEMOLICION DE ESTRUCTURAS	m3	0.00	$ 213,374.00	$ 0.00	55.00	$ 11,735,570.00		0.00	$ -	40.00	$ 8,538,973.00	55.00	$ 11,735,570.00
64	630.4.2 T1			CONCRETO RESISTENCIA 21 MPa (D) - COMPRA DE MEZCLA	m3	0.00	$ 1,023,749.00	$ 0.00	0.00	$ -		0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
65	630.5 T1			CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F)	m3	0.00	$ 565,165.00	$ 0.00	57.64	$ 32,728,910.60		0.00	$ -	56.20	$ 32,866,276.00	57.64	$ 32,728,910.60
66	640.1 T1			ACERO DE REFUERZO Fy 420 MPa	kg	0.00	$ 5,763.00	$ 0.00	50067.23	$ 436,738,673.60	-	-1500.00	$ (13,144,500.00)	48,067.45	$ 420,869,284.00	48567.23	$ 423,594,173.60
67	673.2 T1			MATERIAL GRANULAR DRENANTE	m3	0.00	$ 157,054.00	$ 0.00	151.70	$ 23,820,941.80		0.00	$ -	143.60	$ 22,554,764.00	151.70	$ 23,820,941.80
CB				Cobro a Obras no previstas								0.00					
65	NP 1 T1			LIMPIEZA MANUAL DE ALCANTARILLAS DIAMETRO 30" A 36" TRAMO 1, INCLUYE CARGUE TRANSPORTE Y DISPOCICION FINAL DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA	m	0.00	$ 97,743.00	$ 0.00	733.30	$ 71,674,941.90		0.00	$ -	266.00	$ 25,999,838.00	733.30	$ 71,674,941.90
69	NP2			INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL DE APORTE DE LA ZONA, NO INCLUYE SUMINISTRO NI TRANSPORTE DE MATERIAL	m3	0.00	$ 24,174.00	$ 0.00	41150.03	$ 994,760,100.00		0.00	$ -	31,950.00	$ 772,371,387.00	41150.00	$ 994,760,100.00
70	NP 211.1			REMOCIÓN DE DERRUMBES	m3	0.00	$ 23,800.00	$ 0.00	171742.73	$ 3,535,415,466.19	+	36304.77	$ 747,987,176.31	169,125.50	$ 3,484,493,876.00	208047.50	$ 4,286,402,642.50
71	NP421.1 T1			RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 T1	m3	0.00	$ 3,101.00	$ 0.00	79920.73	$ 247,834,990.70	-	-2318.23	$ (7,188,735.20)	72,512.00	$ 224,923,263.00	77602.50	$ 240,645,192.50
72	NP 461P			RECICLADO DE PAVIMENTOS ASFALTICOS EXISTENTES IN ESTU SIN ADICIÓN DE MATERIAL CEMENTANTE	m3	0.00	$ 139,069.00	$ 0.00	12295.53	$ 1,709,910,594.00		0.00	$ -	12,264.40	$ 1,705,585,579.00	12295.50	$ 1,709,910,594.00
73	NP442P			MEZCLA ASFALTICA NATURAL DE APORTE PARA TRAMOS SIN CARPETA EXISTENTE	m3	0.00	$ 575,283.00	$ 0.00	152.55	$ 87,759,559.20		0.00	$ -	152.60	$ 87,788,558.00	152.60	$ 87,788,558.20
74	NP450.2P T1			MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC 19 ASFALTO MODIFICADO TIPO 3 - COMPRA DE MEZCLA TRAMO 1	m3	0.00	$ 1,660,013.00	$ 0.00	8675.14	$ 14,444,220,876.82		0.00	$ -	8,118.00	$ 13,517,075,034.00	8675.14	$ 14,444,220,876.82
75	NP 610.2			RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE PRESTAMO EXCAVACIONES Y/O DERRUMBES	m3	0.00	$ 24,630.00	$ 0.00	12764.63	$ 316,696,718.50	+	594.00	$ 14,745,020.00	9,103.00	$ 226,784,605.00	13349.50	$ 331,445,738.00
76	NP 610.3 T1			RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL GRANULAR TIPO SBG-50 TRAMO 1	m3	0.00	$ 212,901.00	$ 0.00	476.00	$ 101,340,276.00		0.00	$ -	405.70	$ 97,857,600.00	476.00	$ 101,340,276.00
77	NP 900.3.2			TRANSPORTE DE MATERIALES A DISTANCIAS MAYORES A MIL METROS (1000M), APLICA PARA MATERIALES USADOS EN EL ITEM 610.1 RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	M3/KM	0.00	$ 1,536.00	$ 0.00	94195.71	$ 144,684,672.00	+	1512.00	$ 2,322,432.00	93,528.00	$ 143,559,006.00	95707.75	$ 147,114,624.00
78	NP 900.3.2			TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE DERRUMBES, MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	M3/KM	0.00	$ 2,000.00	$ 0.00	548473.61	$ 1,029,406,701.61	+	152909.416	$ 286,921,741.42	941,701.00	$ 1,059,942,701.00	952383.03	$ 1,305,416,443.03
79	NP3			DEMOLICIÓN EN ROCA A CIELO ABIERTO, CON CUÑA HIDRAULICA Y/O CEMENTO EXPASIVO PARA ATENCION SITIO CRITICO UBICADO EN EL SECTOR CORINTO K68+550 AL K69+000 (INCLUYE EQUIPO NEUMATICO, PERFORADORA, CILINDRO HIDRAULICO, UNIDAD DE FUERZA Y CEMENTO EXPANSIVO, NO INCLUYE DISPOSICION FINAL NI TRANSPORTE)	m3	0.00	$ 509,165.00	$ 0.00	730.00	$ 371,690,450.00		0.00	$ -	730.00	$ 371,690,450.00	730.00	$ 371,690,450.00
80	NP 210.2.2			EXCAVACION EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	m3	0.00	$ 43,112.00	$ 0.00	63519.27	$ 2,736,442,608.40	-	-100.01	$ (4,311,471.28)	40,109.68	$ 1,731,372,747.00	63419.26	$ 2,734,131,137.12
81	NP4			EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE PRESTAMOS, NO INCLUYE CONFORMACIÓN EN ZONAS DE DEPOSITO NI TRANSPORTE	m3	0.00	$ 23,321.00	$ 0.00	48073.03	$ 1,121,110,433.00	+	2167.00	$ 50,536,637.00	49,904.52	$ 953,949,934.00	50240.03	$ 1,171,647,040.00
82	NP 630.2.1			EXCAVACIONES EN ROCA PARA ESTRUCTURAS INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN EN ZONAS DE DEPOSITO AUTORIZADAS	M3	0.00	$ 166,984.00	$ 0.00	6020.30	$ 1,005,293,775.20		0.00	$ -	3,893.50	$ 643,472,845.00	6020.30	$ 1,005,293,775.20
83	NP630.3.2 T1			CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - PREPARADO EN OBRA TRAMO 1	M3	0.00	$ 1,439,313.00	$ 0.00	747.17	$ 1,074,864,324.21		0.00	$ -	701.50	$ 1,009,976,570.00	747.17	$ 1,074,864,324.21

GOBIERNO DE CALDAS

GOBERNACIÓN DE CALDAS

ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA

PAGINA

FECHA: 13/01/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: EMCV GRUPO SUR OCCIDENTE | DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS | ACTA No: 16 (Numerar en forma consecutiva)

POR CANTIDADES DE OBRA: SI

POR CONTRATO ADICIONAL: NO (Indicar No. y fecha)

CONTRATO No : 2908-023-1456 (Indique número y año)

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA LA DORADA - SONSON, RUTA DEL RENACIMIENTO (ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

CONTRATISTA CONSORCIO SAN MIGUEL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA 071-2022 | INTERVENTOR: MAB INGENIERIA DE VALOR

PLAZO INICIAL: 60 (En meses según contrato principal) | PLAZO ACUMULADO: 65 (En meses según las prórrogas con suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 12/05/2023 (Indique día/mes/año) | FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 13/10/2026 (Incluidas las suspensiones. Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo (último acta)) | FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 93,499,611,647.00 (Según contrato principal) | VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 13,820,000,000

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 107,319,611,647.00

No. DE ORDEN	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN GR.	ESPECIFICACIÓN PART.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) DESCRIPCIÓN ITEM	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR No. 15 FECHA 04/12/2025 CANTIDAD	VALOR	MODIFICACIONES: PRESENTES +/-	CANTIDAD	VALOR	EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 25 de fecha 12 de diciembre de 2025 CANTIDAD	VALOR	CONDICIONES ACTUALIZADAS CANTIDAD	VALOR
84	NP630.3.2 T3			CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (C) - PREPARADO EN OBRA TRAMO 3	M3	0.00	$ 1,569,243.00	$ 0.00	341.20	$ 542,249,711.65	-	-68.10	$ (106,227,466.30)	273.10	$ 434,022,245.00	273.10	$ 434,022,245.35
85	NP630.3.2 T4			CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (C) - PREPARADO EN OBRA TRAMO 4	M3	0.00	$ 1,919,479.00	$ 0.00	118.30	$ 181,584,265.20	-	-10.80	$ (17,490,373.20)	107.50	$ 174,093,892.00	107.50	$ 174,093,892.00
86	NP630.4.2 T1			CONCRETO RESISTENCIA 2` MPa (D) - PREPARADO EN OBRA TRAMO 1	M3	0.00	$ 1,304,906.00	$ 0.00	1026.20	$ 1,341,704,349.20	+	30.00	$ 39,147,180.00	1,056.20	$ 1,380,673,859.00	1056.20	$ 380,851,529.20
87	NP630.4.2 T3			CONCRETO RESISTENCIA 2` MPa (D) - PREPARADO EN OBRA TRAMO 3	M3	0.00	$ 1,465,062.00	$ 0.00	695.40	$ 1,019,804,114.80	-	-428.40	$ (627,632,560.80)	267.00	$ 391,171,554.00	267.00	$ 391,171,554.00
88	NP630.4.2 T4			CONCRETO RESISTENCIA 2` MPa (D) - PREPARADO EN OBRA TRAMO 4	M3	0.00	$ 1,497,363.00	$ 0.00	0.00	$ -		0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
89	NP630.1.7 T1			CONCRETO CICLOPEO RESISTENCIA 21MPa (D) - PREPARADO EN OBRA TRAMO 1	M3	0.00	$ 897,704.00	$ 0.00	84.00	$ 84,464,448.00	-	-15.00	$ (14,505,560.00)	61.10	$ 69,958,875.00	70.00	$ 69,839,280.00
90	NP630.1.7 T3			CONCRETO CICLOPEO RESISTENCIA 21MPa (D) - PREPARADO EN OBRA TRAMO 3	M3	0.00	$ 1,129,320.00	$ 0.00	84.10	$ 94,975,812.00	-	-53.90	$ (60,870,348.00)	30.20	$ 34,105,464.00	30.20	$ 34,105,464.00
91	NP630.1.7 T4			CONCRETO CICLOPEO RESISTENCIA 21MPa (D) - PREPARADO EN OBRA TRAMO 4	M3	0.00	$ 1,158,525.00	$ 0.00	1.60	$ 1,853,640.00		0.00	$ -	1.60	$ 1,853,640.00	1.60	$ 1,853,640.00
92	NP5			CORTE DE PAVIMENTO CON CORTADORA	M	0.00	$ 5,000.00	$ 0.00	49626.40	$ 437,637,600.00		0.00	$ -	17,489.30	$ 117,034,700.00	49626.40	$ 437,637,600.00
93	NP6 T1			CUNETA DE CONCRETO CLASE D, VACIADA IN SITU, NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO TRAMO 1	M3	0.00	$ 681,142.00	$ 0.00	4227.10	$ 3,81...,789,549.20		0.00	$ -	3,139.10	$ 2,712,469,288.00	4227.10	$ 3,812,709,548.20
94	NP6 T3			CUNETA DE CONCRETO CLASE D, VACIADA IN SITU, NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO TRAMO 3	M3	0.00	$ 1,026,700.00	$ 0.00	0.00	$ -		0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
95	NP6 T4			CUNETA DE CONCRETO CLASE D, VACIADA IN SITU, NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO TRAMO 4	M3	0.00	$ 1,059,007.00	$ 0.00	0.00	$ -		0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
96	NP7			RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 PARA LA INSTALACION DE MEZCLA ASFALTICA SOBRE CAPAS DE RECICLADAS CON ASFALTO NATURAL TRAMO 1	M2	0.00	$ 4,252.00	$ 0.00	81451.70	$ 346,332,628.40		0.00	$ -	75,224.30	$ 319,803,722.00	81451.70	$ 346,332,628.40
97	NP8			Suministro, fabricacion y montaje de tablero en el el puente Hierro localizado en la municipalidad de Narcaria, Carretera Dorada Narcaria, según rels con anexo.	Un	0.00	$ 426,509,511.00	$ 0.00	1.00	$ 426,509,511.00		0.00	$ -	0.90	$ 383,858,560.00	1.00	$ 426,509,511.00
98	NP9			PERFILADO MECANICO PARA MANTENIMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	0.00	$ 1,613.00	$ 0.00	226439.00	$ 361,246,107.00	-	-18053.20	$ (29,119,611.60)	208,385.80	$ 316,126,295.00	208385.80	$ 316,126,295.40
99	NP10			Suministro e instalacion de obra falsa para la demolición y construccion de losas de concreto de Puente Hierro K33+749, Incluye lavado y pintura estructura metalica e incluye obras de proteccion ambiental	Un	0.00	$ 307,189,400.00	$ 0.00	1.00	$ 307,189,400.00		0.00	$ -	1.00	$ 307,189,400.00	1.00	$ 307,189,400.00

GOBIERNO DE CALDAS

GOBERNACIÓN DE CALDAS

ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA

PÁGINA

FECHA: 13/01/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: APIC Y GRUPO DUR OCCIDENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS

ACTA No. 18 (Numerar de manera consecutiva)

POR CANTIDADES DE OBRA: [ ]

POR CONTRATO ADICIONAL: [ ] No. (Indicar No. y fecha)

CONTRATO No.: 2909-333-1456 (Indique número y año)

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA LA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL REMACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

CONTRATISTA: BONBORCO SAN MIGUEL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 9071-2324 INTERVENTOR: MAB INGENIERIA DE VALOR

PLAZO INICIAL: 60 (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 12/10/2023 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión aun cuando esta conste con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 93,819,611,647.69 (Según contrato - principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (E=A+B): $ 107,319,614,647.69

PLAZO ACUMULADO: 66 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 11/10/2029 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B): $ 13,500,000,000

No. DE ORDEN	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN GR.	ESPECIFICACIÓN PART.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA No. 17 FECHA 04/12/2025 CANTIDAD	VALOR	+/-	PRESENTES CANTIDAD	PRESENTES VALOR	EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 25 de fecha 10 de diciembre de 2025 CANTIDAD	EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 25 de fecha 10 de diciembre de 2025 VALOR	CONDICIONES ACTUALIZADAS CANTIDAD	CONDICIONES ACTUALIZADAS VALOR
100	NP630.3.2 PH			SUMINISTRO E INSTALACIÓN CRTO. PLASTICO R. A/MC. ASENT. 6"+61" 045 (4000 PSI) TM 1" A 7 DIAS RECORRIDO 2-4 HRS PUESTO EN OBRA - PREMEZCLADO PARA LOSAS PUENTE HIERRO	M3	0.00	$ 2,289,377.00	$ 0.00	58.20	$ 133,241,741.40		0.00	$ -	58.20	$ 133,241,741.00	58.20	$ 133,241,741.40
101	NP11			SUMINISTRO E INSTALACION DE GEODRE 4 VIAS PARA FILTROS ALTURA TOTAL 0,71 M INCLUYE BOQUILLO PARA TUBERIA DE 6"	M	0.00	$ 38,043.00	$ 0.00	14000.00	$ 532,600,000.00		0.00	$ -	4,653.70	$ 177,045,710.00	14000.00	$ 532,600,000.00
102	NP12			SUMINISTRO E INSTALACION TUBERÍA DE PVC DE 6" PARA DRENAJE	M	0.00	$ 86,072.00	$ 0.00	14000.00	$ 1,201,023,000.00		0.00	$ -	5,001.60	$ 430,502,718.00	14000.00	$ 1,205,023,000.00
103	NP13			PILOTE DE CONCRETO TIPO CAISSON, VACIADO IN SITU, DE DIAMETRO 1,2 m , INCLUYE ACERO DE REFUERZO, EXCAVACION EN MATERIAL COMUN Y ANILLOS DE CONCRETO SIMPLE ESPESOR 0,10m, DIAMETRO TOTAL EXCAVACION 1.4m, NO INCLUYE RETIRO DEL MATERIAL EXCAVADO, APLICA PARA TRAMO 1	M	0.00	$ 4,752,593.00	$ 0.00	84.80	$ 403,019,886.40		0.00	$ -	84.80	$ 403,019,886.00	84.80	$ 403,019,886.40
104	NP14			CONFORMACION DE LA CALZADA EXISTENTE CON CAPA DE ASFALTO NATURAL REMANENTE	M2	0.00	$ 10,797.00	$ 0.00	13905.00	$ 150,094,022.00		0.00	$ -	13,905.00	$ 150,094,022.00	13905.00	$ 150,094,022.00
105	NP15			Suministro, fabricación y montaje de refuerzo en Puente Unifa localizado en el K160+003 vía Dorada - Sonson, Municipio de Samaria - Caldas y Nariño - Antioquia, según relacion anexa.	Un	0.00	$ 660,545,189.00	$ 0.00	1.00	$ 660,545,189.00		0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 660,545,189.00
106	NP16			CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (C) - PREPARADO EN OBRA, GRANULARES PUESTOS EN OBRA PARA TRAMO 3 Y TRAMO 4	M3	0.00	$ 1,616,675.00	$ 0.00	1682.50	$ 2,720,607,437.50		0.00	$ -	372.00	$ 602,147,101.00	1682.50	$ 2,720,607,437.50
107	NP17			CONCRETO RESISTENCIA 21 MPa (D) - PREPARADO EN OBRA, GRANULARES PUESTOS EN OBRA PARA TRAMO 3 Y TRAMO 4	M3	0.00	$ 1,496,513.00	$ 0.00	1817.60	$ 2,720,062,028.80	+	440.36	$ 659,034,454.68	1,731.90	$ 2,591,810,860.00	2257.96	$ 3,379,096,483.48
108	NP18			CONCRETO CICLOPEO RESISTENCIA 21MPa (D) - PREPARADO EN OBRA, GRANULARES PUESTOS EN OBRA PARA TRAMO 3 Y TRAMO 4	M3	0.00	$ 1,157,832.00	$ 0.00	514.30	$ 595,472,997.60		0.00	$ -	437.00	$ 505,972,583.00	514.30	$ 595,472,997.60
109	NP19			CUNETA DE CONCRETO CLASE D, VACIADA IN SITU, NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO PREPARADO EN OBRA, GRANULARES PUESTOS EN OBRA PARA TRAMO 3 Y TRAMO 4	M3	0.00	$ 1,058,157.00	$ 0.00	4320.00	$ 4,571,238,240.00		0.00	$ -	0.00	$ -	4320.00	$ 4,571,238,240.00
110	NP20			CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F) PREFABADO EN OBRA, GRANULARES PUESTOS EN OBRA PARA TRAMO 3 Y TRAMO 4	M3	0.00	$ 287,144.00	$ 0.00	172.00	$ 153,052,766.40		0.00	$ -	111.00	$ 99,582,983.00	172.00	$ 153,052,766.40
111	NP21			MATERIAL GRANULAR DRENANTE PUESTO EN OBRA PARA TRAMO 3 Y TRAMO 4	M3	0.00	$ 280,500.00	$ 0.00	6938.00	$ 1,946,566,906.00		0.00	$ -	1,890.00	$ 530,466,623.00	6938.00	$ 1,946,566,906.00
112	NP630.3.2 T3 Y T4			BASE GRANULAR CLASE C PUESTO EN OBRA PARA TRAMO 3 Y TRAMO 4	M3	0.00	$ 466,561.00	$ 0.00	16716.58	$ 7,831,737,441.38	-	2372.24	$ (1,111,539,146.64)	0.00	$ -	14344.34	$ 6,721,198,294.74

GOBERNACIÓN DE CALDAS

ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA

PÁGINA

FECHA: 13/01/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMOV GRUPO AIR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS **ACTA No:** 18 (Numerar de manera consecutiva)

POR CANTIDADES DE OBRA: X

POR CONTRATO ADICIONAL: No. (Indicar No. y fecha)

CONTRATO No.: 2902-1223-1456 (Indique número y año)

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VIA LA DORADA - SONSON, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN MIGUEL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 021-2022 INTERVENTOR: MAB INGENIERIA DE VALOR

PLAZO INICIAL: 60 (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 12/10/2023 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 83,658,610,647.00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 167,319,614,647.00

PLAZO ACUMULADO: 60 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 11/10/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 13,820,000,000

No. DE ORDEN	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓ		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					MODIFICACIONES						EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 25 de fecha 10 de diciembre de 2025		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
									CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA No. 17 FECHA 04/12/2025		PRESENTES						
		GR.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	+/-	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
113	NP450.2P T3 Y T4			MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC 19 ASFALTO MODIFICADO TIPO 3 PUESTO EN OBRA PARA TRAMO 3 Y TRAMO 4	M3	0.00	$ 1,897,126.00	$ 0.00	5560.71	$ 10,549,923,539.46	-	-759.29	$ (1,440,514,739.54)	0.00	$ -	4801.42	$ 9,109,378,800.92
114	NP330.3.2 T1			BASE GRANULAR CLASE C TRAMO 1	M3	0.00	$ 278,641.00	$ 0.00	1644.00	$ 458,118,684.00		0.00	$ -	1,644.00	$ 458,118,684.00	1644.00	$ 458,118,684.00
115	NP730.1			Suministro, transporte y colocación de Defensa metálica Galvanizado en Caliente, Instalación sobre terreno natural.	M	0.00	$ 316,607.00	$ 0.00	0.00	$ -	+	132.00	$ 41,554,524.00	0.00	$ -	132.00	$ 41,554,524.00
116	NP730.2			Suministro, transporte y colocación de Defensa metálica Galvanizado en Caliente, Instalación sobre muro.	M	0.00	$ 402,131.00	$ 0.00	0.00	$ -	+	18.00	$ 7,238,358.00	0.00	$ -	18.00	$ 7,238,358.00
117	NP730.3			SECCION FINAL PARA DEFENSA METALICA	U	0.00	$ 832,954.00	$ 0.00	0.00	$ -	+	12.00	$ 9,995,448.00	0.00	$ -	12.00	$ 9,995,448.00
				Ajuste al peso						$ 8.74			$ 8.57				$ 15.31
*				TOTAL COSTOS DE OBRA				$ 84,547,874,037.00		$ 95,403,793,269.00			$ 0.00		$ 58,371,455,769.00		$ 95,403,793,269.00
*				REAJUSTE DE OBRA				$ 7,572,940,907.00		$ 8,260,167,454.00			$ 0.00		$ 2,404,831,592.10		$ 8,260,167,454.00
*				PLAN DE MANEJO DE TRAMITO				$ 235,032,250.00		$ 1,716,354,377.00			$ 0.00		$ 1,415,488,040.00		$ 1,716,354,377.00
*				PAGA				$ 465,319,280.00		$ 582,124,917.00			$ 0.00		$ 492,133,324.00		$ 582,124,917.00
*				AJUSTE A DINEROS				$ 885,448,173.00		$ 1,537,184,630.00			$ 0.00		$ 904,543,785.00		$ 1,537,184,630.00
*				VALOR TOTAL OBRA CONTRATADA				$ 83,658,610,647.00		$ 167,319,614,647.00			$ 0.00		$ 58,148,452,506.10		$ 167,319,614,647.00

* Estos conceptos deben ser relacionados en la propuesta económica aprobada.

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN: Se genera esta acta de modificación para la inclusión de ítem no previsto NP730.1 "Suministro, transporte y colocación de Defensa metálica Galvanizado en Caliente. Instalación sobre terreno natural", NP730.2 "Suministro, transporte y colocación de Defensa metálica Galvanizado en Caliente, Instalación sobre muro" y NP 730.3 "seccion final para defensa metalica", y adicional se ajustan las cantidades de algunos ítems de acuerdo a las obras que se proyectan ejecutar.

Firma:
Nombre: [illegible]
Director de obra
Contratista
Matrícula Profesional No.: 17202-124680 CLD

Firma:
Nombre: MONICA GARCIA GIRALDO
Director de Interventoría
Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-48296 CAU

GOBIERNO DE CALDAS	INFORME DE INTERVENTORIA CONTRATO	Código: FO-FT-02-005 Versión: 07 Fecha de modificación: 19/01/2016

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO

INFORME DE INTERVENTORIA 28 PARCIAL

CONTRATO	2909/2023-1456	RADICADO JURID. NRO	2909/2023-1456		
OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VIA LA DORADA - SONSON, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS				
NOMBRE DEL CONTRATISTA	CONSORCIO SAN MIGUEL CONFORMADO POR: HARINSA NAVASFALT CONSTRUCCIONES S.A.S (PARTICIPACIÓN 10%), MINOCA INGENIERIA S.A.S. (PARTICIPACIÓN 45%) Y INGENIERIA TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S. (PARTICIPACIÓN 45%)				
NOMBRE DEL INTERVENTOR	MAB INGENIERIA DE VALOR (A CARGO DE INVIAS)				
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	SESENTA (60) MESES DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO				
VALOR DEL CONTRATO	$ 95,403,763,269	**AJUSTES**	$ 8,080,167,454	**MANEJO TRANSITO**	$ 1,716,354,377.00
VALOR TOTAL	$ 107,315,614,647	**DISEÑOS**	$ 1,537,184,630	**PAGA**	$ 582,124,917.00

OBRA CONTRATADA				DIFER.	OBRA EJECUTADA		
DESCRIPCION	**CANT.**	**VALOR PARCIAL**	**PESO %**	**%**	**CANT.**	**VALOR**	**PESO %**
Capitulo 1. Actividades Preliminares							
EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXCAVACIÓN EN ROCA DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	6,222.66	339,620,337.48	0.36	-0.17	3,182.75	173,737,684.00	0.18
DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	-	0.00	0.00	0.01	48.00	10,241,952.00	0.01
TERRAPLENES	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONAS NO BOSCOSAS	7.50	7,983,517.50	0.01	0.00	3.80	4,044,962.00	0.00
Capitulo 2. Estructura de Pavimento							
BASE ESTABILIZADA CON MEZCLA ASFALTICA NATURAL BEMAN	6,163.85	2,020,065,453.80	2.13	0.04	6,271.29	2,064,433,413.00	2.16
BASE ESTABILIZADA CON MEZCLA ASFALTICA NATURAL BEMAN	-	0.00	0.00	0.02	47.40	22,508,696.00	0.02
CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	39,787.80	69,350,135.40	0.07	-0.04	16,187.80	31,701,335.00	0.03
SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSION ASFÁLTICA CRL-1	82,800.00	326,646,000.00	0.34	-0.23	26,476.00	104,455,710.00	0.11
MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC 19 - COMPRA DE MEZCLA	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC 19 - COMPRA DE MEZCLA	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC 19 - COMPRA DE MEZCLA	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capitulo 3. Estructuras de Drenaje							
DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	3,331.50	710,855,481.00	0.75	0.01	3,360.10	716,957,978.00	0.75
REMOCIÓN DE ALCANTARILLAS	1,275.00	132,667,575.00	0.14	-0.01	1,225.80	127,548,169.00	0.13
EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	24,703.30	1,065,008,669.60	1.12	-0.28	18,615.90	802,568,678.00	0.84
RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	3,652.20	268,794,062.80	0.30	-0.03	3,336.90	263,862,033.00	0.28
CONCRETO RESISTENCIA 28MPa (C) - COMPRA DE MEZCLA	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - COMPRA DE MEZCLA	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - COMPRA DE MEZCLA	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - COMPRA DE MEZCLA	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F)	70.50	41,254,132.50	0.04	0.00	70.67	41,351,396.00	0.04
CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F)	17.60	13,317,304.00	0.01	0.00	17.60	13,317,300.00	0.01
CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F)	7.10	5,372,321.50	0.01	0.00	7.10	5,372,323.00	0.01
CONCRETO RESISTENCIA 17,5 MPa (E)	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TUBERIA DE PLASTICO TIPO PVC NORMA NTC-5055 DE DIAMETRO 900 (m)	2,689.00	6,672,651,318.00	6.99	-0.13	2,638.66	6,547,734,521.00	6.86
ACERO DE REFUERZO Fy 4200 MPa	235,319.00	2,062,100,397.00	2.16	-0.44	187,298.74	1,641,286,901.00	1.72
ACERO DE REFUERZO Fy 4200 MPa	180,000.00	1,577,340,000.00	1.65	-1.28	40,879.30	358,225,322.00	0.38
ACERO DE REFUERZO Fy 4200 MPa	78,491.00	687,816,833.00	0.72	-0.63	9,606.00	84,177,378.00	0.09
MALLA ELECTROSOLDADA e= 15cm	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU, NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU, NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU, NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIAL GRANULAR DRENANTE	7,024.10	1,106,675,051.40	1.16	0.00	7,006.70	1,104,246,720.00	1.16
MATERIAL GRANULAR DRENANTE	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIAL GRANULAR DRENANTE	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIAL DE COBERTURA TIPO SUB- BASE CLASE C SBG-20	3,407.33	643,467,455.84	0.67	0.06	3,716.20	701,797,126.00	0.74
MATERIAL DE COBERTURA TIPO SUB- BASE CLASE C SBG-20	159.89	53,511,985.20	0.06	-0.01	122.00	40,830,980.00	0.04
GEOTEXTIL TIPO NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSIÓN GRAB MINIMA DE 700 N APROXIMADAMENTE	51,930.20	592,635,163.20	0.62	-0.09	44,431.78	507,233,201.00	0.53
TUBERÍA DE PVC 4"	12,356.50	564,474,806.50	0.61	-0.02	11,655.40	560,772,276.00	0.59

GOBIERNO DE CALDAS	INFORME DE INTERVENTORIA CONTRATO	Código: FO-FT-02-005 Versión: 07 Fecha de modificación: 19/01/2016

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO

INFORME DE INTERVENTORIA 28 PARCIAL

CONTRATO	28092023-1456	RADICADO JURID. NRO	28092023-1456
OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VIA LA DORADA - SONSON, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS		
NOMBRE DEL CONTRATISTA	CONSORCIO SAN MIGUEL CONFORMADO POR: HARINSA NAVASFALT CONSTRUCCIONES S.A.S (PARTICIPACION 10%), MINCICA INGENIERIA S.A.S (PARTICIPACIÓN 45%) Y INGENIERIA TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S. (PARTICIPACION 45%)		
NOMBRE DEL INTERVENTOR	MAB INGENIERIA DE VALOR (A CARGO DE INVIAS)		
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	SESENTA (60) MESES DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO		

VALOR DEL CONTRATO	$ 95,405,783,269	**AJUSTES**	$ 8,080,167,454	**MANEJO TRANSITO**	$ 1,716,354,377.00
VALOR TOTAL	$ 107,319,914,647	**DISEÑOS**	$ 1,537,164,630	**PAGA**	$ 582,124,917.00

OBRA CONTRATADA				DIFER.	OBRA EJECUTADA		
DESCRIPCION	**CANT.**	**VALOR PARCIAL**	**PESO %**	**%**	**CANT.**	**VALOR**	**PESO %**
BORDILLO DE PIEZA PREFABRICADA DE CONCRETO; NO INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capitulo 4. Obras de Estabilización							
EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	14,980.70	645,847,938.40	0.68	-0.08	13,243.10	570,936,527.00	0.60
RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	2,380.50	169,230,657.00	0.20	-0.05	1,836.50	145,219,401.00	0.15
CONCRETO RESISTENCIA 28MPa (C) - COMPRA DE MEZCLA	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - COMPRA DE MEZCLA	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - COMPRA DE MEZCLA	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F)	23.90	18,084,293.50	0.02	0.00	23.90	18,084,294.00	0.02
CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F)	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACERO DE REFUERZO Fy 4200 MPa	118,551.05	1,038,862,851.15	1.09	-0.01	117,089.12	1,026,051,944.00	1.08
ACERO DE REFUERZO Fy 4200 MPa	50,550.00	469,039,469.00	0.49	0.05	47,418.00	415,523,934.00	0.44
MATERIAL GRANULAR DRENANTE	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIAL GRANULAR DRENANTE	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GEOTEXTIL TIPO NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GRAB MINIMA DE 700 N APROXIMADAMENTE	5,366.50	61,263,984.00	0.06	0.01	5,973.07	68,195,567.00	0.07
TUBERIA DE PVC 4"	2,944.30	139,288,334.30	0.15	-0.07	1,508.69	71,352,544.00	0.07
PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU, DE DIAMETRO 1.2 m INCLUYE EXCAVACIÓN EN ROCA BAJO AGUA	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ANCLAJE PARA REALCE	679.00	31,153,199.00	0.03	0.01	817.90	37,526,071.00	0.04
ANCLAJE TIPO pasivos con acero #6, inyección de mortero perforación D=7.5cm perforación en material común	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capitulo 5. Señalización y Demarcación Vial							
LINEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRIO	82,550.40	237,745,152.00	0.25	-0.19	20,461.00	58,965,280.00	0.06
TACHA REFLECTIVA - ADHESIVO EPÓXICO	8,687.90	92,317,625.40	0.10	-0.08	1,134.00	12,049,884.00	0.01
SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SR, SP Y/O SI, TABLERO EN LAMINA CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO IV (75X75 cm)	488.00	387,332,726.00	0.39	-0.15	206.00	222,800,376.00	0.23
SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO PREVENTIVA DELINEADOR DE CURVA HORIZONTAL SP-75 REFLECTIVO TIPO IV (75X60cm).	1,357.00	905,975,376.00	0.95	-0.68	382.00	255,316,576.00	0.27
Capitulo 6. Transportes							
TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACION, CANALES Y PRESTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	425,645.88	653,792,040.96	0.69	-0.23	283,996.42	436,218,508.00	0.46
Capitulo 7 Obras estabilización tramo 1							
DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	55.00	11,735,570.00	0.01	0.00	40.30	8,599,973.00	0.01
CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - COMPRA DE MEZCLA	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F)	57.64	33,726,910.60	0.04	0.00	56.20	32,886,276.00	0.03
ACERO DE REFUERZO Fy 4200 MPa	48,567.20	425,594,373.60	0.45	-0.01	48,007.45	420,689,284.00	0.44
MATERIAL GRANULAR DRENANTE	151.70	23,900,941.80	0.03	0.00	143.60	22,624,754.00	0.02
Capitulo 8 Obras no previstas							
LIMPIEZA MANUAL DE ALCANTARILLAS DIAMETRO 30" A 36" TRAMO 1, INCLUYE CARGUE TRANSPORTE Y DISPOCICIÓN FINAL DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA.	733.30	71,674,941.90	0.08	-0.05	268.00	25,999,839.00	0.03
INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL DE APORTE DE LA ZONA, NO INCLUYE SUMINISTRO NI TRANSPORTE DE MATERIAL	41,150.00	994,760,100.00	1.04	-0.19	33,750.50	815,884,587.00	0.86
REMOCIÓN DE DERRUMBES	208,047.50	4,266,402,842.50	4.46	-0.12	202,707.50	4,176,382,622.00	4.38
RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 T1	77,602.50	240,645,352.50	0.25	-0.01	74,982.50	232,520,733.00	0.24
RECICLADO DE PAVIMENTOS ASFALTICOS EXISTENTES IN SITU SIN ADICION DE MATERIAL CEMENTANTE	12,295.50	1,709,910,594.00	1.79	-0.01	12,233.60	1,701,302,285.00	1.78
MEZCLA ASFALTICA NATURAL DE APORTE PARA TRAMOS SIN CARPETA EXISTENTE	152.60	87,789,559.20	0.09	0.00	152.60	87,789,559.00	0.09
MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC 19 ASFALTO MODIFICADO TIPO 3 - COMPRA DE MEZCLA TRAMO 1	8,675.14	14,444,220,876.62	15.14	-0.50	8,387.90	13,965,962,543.00	14.64
RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE PRESTAMO,EXCAVACIONES Y/O DERRUMBES.	13,348.60	331,445,738.00	0.35	-0.04	11,815.40	293,376,382.00	0.31

GOBIERNO DE CALDAS

INFORME DE INTERVENTORIA CONTRATO

Código: FO-FT-02-025
Versión: 07
Fecha de modificación: 19/01/2016

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO

INFORME DE INTERVENTORIA 26 PARCIAL

CONTRATO	28092023-1456	RADICADO JURID. NRO.	28092023-1456
OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VIA LA DORADA - SONSON, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS		
NOMBRE DEL CONTRATISTA	CONSORCIO SAN MIGUEL CONFORMADO POR: HARINSA NAVASFALT CONSTRUCCIONES S.A.S (PARTICIPACION 10%), MINOICA INGENIERIA S.A.S. (PARTICIPACION 45%) Y INGENIERIA TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S. (PARTICIPACIÓN 45%)		
NOMBRE DEL INTERVENTOR	MAB INGENIERIA DE VALOR (A CARGO DE INVIAS)		
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	SESENTA (60) MESES DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO		

VALOR DEL CONTRATO	$ 95,403,793,269	**AJUSTES**	$ 8,080,167,454	**MANEJO TRANSITO**	$ 1,716,354,377.00
VALOR TOTAL	$ 107,319,814,847	**DISEÑOS**	$ 1,537,164,630	**PAGA**	$ 582,124,917.00

OBRA CONTRATADA				DIFER.	OBRA EJECUTADA		
DESCRIPCION	**CANT.**	**VALOR PARCIAL**	**PESO %**	**%**	**CANT.**	**VALOR**	**PESO %**
RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL GRANULAR TIPO SBG-50 TRAMO 1	476.00	101,340,876.00	0.11	0.00	458.70	97,657,690.00	0.10
TRANSPORTE DE MATERIALES A DISTANCIAS MAYORES A MIL METROS (1000M). APLICA PARA MATERIALES USADOS EN EL ITEM 610.1 RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	95,777.75	147,114,624.00	0.15	0.00	93,528.00	143,659,006.00	0.15
TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE DERRUMBES, MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	852,383.03	1,325,418,443.03	1.37	0.10	700,886.00	1,402,472,886.00	1.47
DEMOLICION EN ROCA A CIELO ABIERTO CON CUÑA HIDRAULICA Y/O CEMENTO EXPASIVO PARA ATENCION SITIO CRITICO UBICADO EN EL SECTOR CORINTO K88+500 AL K90+000 (INCLUYE EQUIPO NEUMATICO, PERFORADORA, CILINDRO HIDRAULICO, UNIDAD DE FUERZA Y CEMENTO EXPANSIVO, NO INCLUYE DISPOSICION FINAL NI TRANSPORTE)	730.00	371,690,450.00	0.39	0.00	730.00	371,690,450.00	0.39
EXCAVACION EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	63,419.28	2,734,131,137.12	2.87	-0.85	44,869.68	1,925,368,125.00	2.02
EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE PRESTAMOS, NO INCLUYE CONFORMACION EN ZONAS DE DEPOSITO NI TRANSPORTE	50,240.00	1,171,647,040.00	1.23	-0.13	44,740.92	1,043,402,890.00	1.09
EXCAVACIONES EN ROCA PARA ESTRUCTURAS INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICION EN ZONAS DE DEPOSITO AUTORIZADAS	6,020.30	1,005,293,775.20	1.05	-0.25	4,612.70	770,247,098.00	0.81
CONCRETO RESISTENCIA 28MPa (C) - PREPARADO EN OBRA TRAMO 1	747.17	1,074,664,324.21	1.13	-0.04	717.40	1,031,845,747.00	1.08
CONCRETO RESISTENCIA 28MPa (C) - PREPARADO EN OBRA TRAMO 3	273.10	434,022,263.30	0.45	0.00	273.10	434,022,264.00	0.45
CONCRETO RESISTENCIA 28MPa (C) - PREPARADO EN OBRA TRAMO 4	107.50	174,093,992.50	0.18	0.00	107.50	174,093,993.00	0.18
CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - PREPARADO EN OBRA TRAMO 1	1,059.20	1,360,851,529.20	1.45	0.08	1,117.60	1,458,362,947.00	1.53
CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - PREPARADO EN OBRA TRAMO 3	267.00	391,171,554.00	0.41	0.00	267.00	391,171,554.00	0.41
CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - PREPARADO EN OBRA TRAMO 4	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCRETO CICLOPEO RESISTENCIA 21MPa (D) - PREPARADO EN OBRA TRAMO 1	70.00	59,839,280.00	0.07	0.01	80.30	60,115,631.00	0.06
CONCRETO CICLOPEO RESISTENCIA 21MPa (D) - PREPARADO EN OBRA TRAMO 3	30.20	34,105,464.00	0.04	0.00	30.20	34,105,464.00	0.04
CONCRETO CICLOPEO RESISTENCIA 21MPa (D) - PREPARADO EN OBRA TRAMO 4	1.60	1,853,640.00	0.00	0.00	1.60	1,853,640.00	0.00
CORTE DE PAVIMENTO CON CORTADORA	48,626.40	437,637,600.00	0.46	-0.23	24,197.40	217,776,600.00	0.23
CUNETA DE CONCRETO CLASE D, VACIADA IN SITU, NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO TRAMO 1	4,327.10	3,912,789,548.20	4.00	-0.29	4,013.00	3,536,022,846.00	3.71
CUNETA DE CONCRETO CLASE D, VACIADA IN SITU, NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO TRAMO 3	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUNETA DE CONCRETO CLASE D, VACIADA IN SITU, NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO TRAMO 4	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 PARA LA INSTALACION DE MEZCLA ASFALTICA SOBRE CAPAS DE RECICLADAS CON ASFALTO NATURAL TRAMO 1	81,451.70	346,332,628.40	0.36	-0.04	73,123.30	310,920,271.00	0.33
Suministro, fabricación y montaje de refuerzo en el el puente Hierro localizado en la municipalidad de Norcasia, Carretera Dorada-Norcasia, según relación anexa.	1.00	426,509,511.00	0.45	0.00	1.00	426,509,511.00	0.45
PERFILADO MECANICO PARA MANTENIMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE	208,385.80	336,126,295.40	0.35	0.00	208,385.80	336,126,295.00	0.35
Suministro e instalacion de obra falsa para la demolición y construccion de losas de concreto de Puente Hierro K33+740, Incluye lavado y pintura estructura metalica e incluye obras de proteccion ambiental	1.00	307,169,400.00	0.32	0.00	1.00	307,169,400.00	0.32
SUMINISTRO E INSTALACION CRTO. PLASTICO R. A/MC ASENT. 6"+/-1" 045 (4000 PSI) TM 1" A 7 CIAS RECORRIDO 2-4 HRS PUESTO EN OBRA - PREMEZCLADO PARA LOSAS PUENTE HIERRO	58.20	133,241,741.40	0.14	0.00	58.20	133,241,741.00	0.14
SUMINISTRO E INSTALACION DE GEODREN VIAL PARA FILTROS ALTURA TOTAL 0.71 M INCLUYE BOLSILLO PARA TUBERIA DE 6"	14,000.00	532,602,000.00	0.56	-0.30	6,454.00	245,529,523.00	0.26
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE PVC DE 6" PARA DRENAJE	14,000.00	1,205,022,000.00	1.26	-0.60	7,313.30	629,477,872.00	0.66

GOBIERNO DE CALDAS	INFORME DE INTERVENTORIA CONTRATO	Código: FO-FT-02.005 Versión: 07 Fecha de modificación: 19/01/2016

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO

INFORME DE INTERVENTORIA 28 PARCIAL

CONTRATO	29092023-1456	RADICADO JURID. NRO:	29092023-1456
OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VIA LA DORADA - SONSON, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS		
NOMBRE DEL CONTRATISTA	CONSORCIO SAN MIGUEL CONFORMADO POR HARINSA NAVASFALT CONSTRUCCIONES S.A.S (PARTICIPACION 10%), MINOICA INGENIERIA S.A.S. (PARTICIPACION 45%) Y INGENIERIA TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S. (PARTICIPACION 45%)		
NOMBRE DEL INTERVENTOR	MAB INGENIERIA DE VALOR (A CARGO DE INVIAS)		
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	SESENTA (60) MESES DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO		

VALOR DEL CONTRATO	$ 95,403,783,269	**AJUSTES**	$ 8,080,167,454	**MANEJO TRANSITO**	$ 1,716,354,377.00
VALOR TOTAL	$ 107,319,614,647	**DISEÑOS**	$ 1,537,184,630	**PAGA**	$ 582,124,917.00

OBRA CONTRATADA				DIFER.	OBRA EJECUTADA		
DESCRIPCION	**CANT.**	**VALOR PARCIAL**	**PESO %**	**%**	**CANT.**	**VALOR**	**PESO %**
PILOTE DE CONCRETO TIPO CAISSON, VACIADO IN SITU DE DIAMETRO 1.2 m , INCLUYE ACERO DE REFUERZO, EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMUN Y ANILLOS DE CONCRETO SIMPLE ESPESOR 0.10m DIAMETRO TOTAL EXCAVACION 1.4m, NO INCLUYE	84.80	403,019,886.40	0.42	0.00	84.80	403,019,896.00	0.42
CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE CON CAPA DE ASFALTO NATURAL REMANENTE	13,906.00	150,004,022.00	0.16	0.00	13,906.00	150,004,022.00	0.16
Suministro, fabricación y montaje de refuerzo en Puente Linda localizado en el K106+000 via Dorada - Sonson, Municipios de Samana - Caldas y Narino - Antioquia, segun relación anexa.	1.00	669,545,169.00	0.70	0.00	1.00	669,545,169.00	0.70
CONCRETO RESISTENCIA 28MPa (C) - PREPARADO EN OBRA, GRANULARES PUESTOS EN OBRA PARA TRAMO 3 Y TRAMO 4	1,692.50	2,739,607,437.50	2.87	-1.93	553.10	895,269,144.00	0.94
CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - PREPARADO EN OBRA, GRANULARES PUESTOS EN OBRA PARA TRAMO 3 Y TRAMO 4	2,257.96	3,379,066,493.48	3.54	0.28	2,436.60	3,645,403,575.00	3.82
CONCRETO CICLOPEO RESISTENCIA 21MPa (D) - PREPARADO EN OBRA, GRANULARES PUESTOS EN OBRA PARA TRAMO 3 Y TRAMO 4	514.30	595,472,997.60	0.62	-0.04	460.40	556,222,401.00	0.58
CUNETA DE CONCRETO CLASE D, VACIADA IN SITU, NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO PREPARADO EN OBRA, GRANULARES PUESTOS EN OBRA PARA TRAMO 3 Y TRAMO 4	4,320.00	4,071,238,240.00	4.79	-4.56	213.00	225,387,441.00	0.24
CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F) PREPARADO EN OBRA, GRANULARES PUESTOS EN OBRA PARA TRAMO 3 Y TRAMO 4	170.60	153,052,766.40	0.16	-0.02	152.30	136,635,030.00	0.14
MATERIAL GRANULAR DRENANTE PUESTO EN OBRA PARA TRAMO 3 Y TRAMO 4	6,938.00	1,946,566,908.00	2.04	-1.15	3,015.00	845,906,460.00	0.89
BASE GRANULAR CLASE C PUESTO EN OBRA PARA TRAMO 3 Y TRAMO 4	14,344.34	6,721,196,294.74	7.05	-4.74	4,695.10	2,199,940,751.00	2.31
MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC 19 ASFALTO MODIFICADO TIPO 3 PUESTO EN OBRA PARA TRAMO 3 Y TRAMO 4	4,801.42	9,109,378,860.92	9.55	-6.53	1,515.20	2,876,574,092.00	3.02
BASE GRANULAR CLASE C TRAMO 1	1,644.00	456,118,684.00	0.48	-0.03	1,550.00	431,924,550.00	0.45
Suministro, transporte y colocación de Defensa metálica Galvanizado en Caliente, Instalación sobre terreno natural	132.00	41,554,524.00	0.04	0.00	127.40	40,106,412.00	0.04
Suministro, transporte y colocación de Defensa metálica Galvanizado en Caliente, Instalación sobre muro	18.00	7,238,358.00	0.01	0.00	12.60	5,066,851.00	0.01
SECCION FINAL PARA DEFENSA METALICA	12.00	9,995,448.00	0.01	0.00	16.00	13,327,264.00	0.01
Ajuste al peso		15.31					

TOTAL COSTOS DE OBRA	**95,403,783,269.00**	**$ 69,648,896,205.00**
REAJUSTES DE OBRA	**8,080,167,454.00**	**$ 3,775,198,389.10**
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	**1,716,354,377.00**	**$ 1,655,030,666.00**
PAGA	**582,124,917.00**	**$ 452,133,324.00**
AJUSTE A DISEÑOS	**1,537,184,630.00**	**$ 1,046,246,217.00**
VALOR TOTAL	**107,319,614,647.00**	**$ 76,577,504,801.10**

INFORMACIÓN DE CONTRATO	INTERVENTORIA/SUPERVISION

GOBIERNO DE CALDAS	INFORME DE INTERVENTORIA CONTRATO	Código: FO-FT-02-005 Versión: 07 Fecha de modificación: 19/01/2016

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO

INFORME DE INTERVENTORIA 28 PARCIAL

CONTRATO	2909/2023-1456	RADICADO JURID. NRO:	2909/2023-1456		
OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA LA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS				
NOMBRE DEL CONTRATISTA	CONSORCIO SAN MIGUEL CONFORMADO POR: HARINSA NAVASFALT CONSTRUCCIONES S.A.S (PARTICIPACION 10%); MINDICA INGENIERIA S.A.S. (PARTICIPACIÓN 45%) Y INGENIERIA TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S. (PARTICIPACIÓN 45%)				
NOMBRE DEL INTERVENTOR	MAB INGENIERIA DE VALOR (A CARGO DE INVIAS)				
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	SESENTA (60) MESES DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO				
VALOR DEL CONTRATO	$ 95,403,763,269	**AJUSTES**	$ 8,080,187,454	**MANEJO TRANSITO**	$ 1,716,364,377.00
VALOR TOTAL	$ 107,319,614,647	**DISEÑOS**	$ 1,537,184,630	**PAGA**	$ 562,124,917.00

OBRA CONTRATADA				DIFER.	OBRA EJECUTADA		
DESCRIPCION	**CANT.**	**VALOR PARCIAL**	**PESO %**	**%**	**CANT.**	**VALOR**	**PESO %**
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN MIGUEL CONFORMADO POR: HARINSA NAVASFALT CONSTRUCCIONES S.A.S (PARTICIPACIÓN 10%); MINDICA INGENIERIA S.A.S. (PARTICIPACIÓN 45%) Y INGENIERIA TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S. (PARTICIPACIÓN 45%)				LA INTERVENTORIA EXTERNA ES REALIZADA POR MAB INGENIERIA DE VALOR A CARGO DEL INVIAS		
VALOR DEL CONTRATO		$ 93,499,614,647					
VALOR ADICIONAL		$ 13,820,000,000					
VALOR TOTAL		$ 107,319,614,647					
PLAZO INICIAL	SESENTA (60) MESES DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO						
FECHA INICIACION	12/10/2023						
FECHA TERMINACION	11/10/2028						
FECHA DEL ACTA	17/04/2026						

ACTIVIDADES REALIZADAS

TRAMO 1: Las actividades realizadas a la fecha de la presente acta corresponden a: Ejecución de reemplazo de alcantarillas existentes de 24" a 36", instalación aceros y vaciado concretos estructuras de entrada y descole alcantarillas, construcción de muros de contención, recortado del pavimento existente e instalación de mezcla asfaltica y construcción de cunetas laterales reales de obras existentes, instalacion señalización vertical, instalacion defensas viales y demarcación horizontal.

SUBTRAMO 1 TRAMO 1: Reemplazo de alcantarillas existentes, construccion de filtros longitudinales y obras de entrada y salida de alcantarillas, muros, conformacion de calzada, instalación BEMAN, instalacion mezcla asfaltica, construccion de cunetas, instalación señalización horizontal y demarcación vial.

SUBTRAMO 3 TRAMO 1: Se realizo limpieza de alcantarillas, reemplazo de las existentes que lo requieren, construccion de filtros, estructuras de entrada y salida de las obras reemplazadas, instalación BEMAN, instalacion base granular, instalacion mezcla asfaltica y se adelanta la construccion de cunetas laterales.

TRAMO 3: Las actividades realizadas a la fecha de la presente acta corresponden a: Ejecución de reemplazo de alcantarillas existentes de 24" a 36", instalación aceros y vaciado concretos estructuras de entrada y descole alcantarillas, construccion de muros de contencion, recuperación de anchos de vía, construccion de filtros, excavacion de la subrasante y aporte de material primera capa estructura de pavimento, instalación de base granula, instalacion mezcla asfaltica y se adelanta la construccion de cunetas laterales, retiro de derrumbes y se realizo mantenimiento del tramo comprendido entre el K76+650 al K90+000.

TRAMO 4: Las actividades realizadas a la fecha de la presente acta corresponden a: Ejecución de reemplazo de alcantarillas existentes de 24" a 36", instalación aceros y vaciado concretos estructuras de entrada y descole alcantarillas, construccion de muros, recuperación de anchos de vía, construccion de filtros, retiro de derrumbes, se realizo el mantenimiento y reforzamiento de Puente Linca ubicado en el K105+000 y se realizo el mantenimiento vía entre el K106+030 al K120+000.

ARIEL ALBERTO CORREDOR GÓMEZ
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTOR EXTERNO
MAB INGENIERIA DE VALOR

GOBIERNO DE CALDAS	INFORME DE INTERVENTORIA CONTRATOS DE OBRA SIGC	Código: FO-FT-02-005 Versión: 07 Fecha de Modificación: 19/01/2016

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

FECHA
17/04/2026

ACTA NRO. 28 PARCIAL — **INFORME AMBIENTAL DE INTERVENTORIA**

CONTRATO	29092023-1456	CONSULTORIA		OBRA:	X
Nro. CONTRATO RADICADO:	29092023-1456				

OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA VIA LA DORADA - SONSON, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS
INTERVENTOR (EXTERNO)	MAB INGENIERIA DE VALOR (A CARGO DE INVIAS)

PREGUNTAS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
El personal que labora en la obra utiliza uniformes y equipos de protección personal	X			
Los vehiculos que transportan los sobrantes y escombros de construcción cuentan con el distintivo en las puertas laterales donde se indica el nombre de contratista, la entidad contratante y la obra para la cual labora			X	
La via en el sector donde se realizan las obras se encuentran libres de escombros	X			Se realizan jornadas de recolección y posterior dispoción en los sitios autorizados
Se acumulan escombros, sobrantes de excavación y materiales en zonas verdes o sobre las cunetas.		X		
Los escombros de construcción permanecen en la obra por mas de 24 horas		X		
Se cubren los materiales almacenados temporalmente con un material impermeable	X			
Existe un cerramiento con malla fina sintética o doble cinta reflectiva para los materiales almacenados temporalmente en la obra	X			
Se lleva a cabo una recolección periódica de basuras y desperdicios	X			
Existe un cerramiento del frente de la obra con malla fina sintética o cinta reflectiva	X			
La obra cuenta con valla publicitaria	X			
Se instalaron vallas informativas al transito vehicular 100 metros antes de la llegada a la obra	X			
La disolución de la liga asfáltica se realiza con calentadores portátiles que utilicen gas como combustible o por el contrario debidamente adecuados con resistencias electricas			X	
En la obra se realizan quemas a cielo abierto		X		
Se mezclan concretos en plataformas metálicas o geotextil	X			
Las baterias de las maquinas son reemplazadas en un taller autorizado			X	El cambio de las baterias se realizan en el área de mantenimiento estipulada en el proyecto.
El cambio de aceites se realiza en la obra	X			El cambio del aceite de los equipos se realiza en el área de mantenimiento estipulada en el proyecto.
Se utilizan compresores neumáticos para la limpieza de la superficie de la obra	X			
El establecimiento de la maquinaria o el almacenamiento de combustibles se realizó en zonas publicas		X		
Las labores de reparación y mantenimiento de maquinaria se realiza en centros autorizados	X			
Se usan baños portátiles	X			
Se entrega volantes informativos para la comunidad	X			
Se tiene el manual de minimas implicaciones ambientales en la obra	X			Se han divulgado los lineamientos ambientales de manera constante en los canales de información establecidos
Se afectan corredores de fauna nativa		X		
Se afecta el hábitat de fauna y flora propia de la región		X		
Se hace control de emisión de gases a equipos mecánicos utilizados en obra	X			
Se hace control a la posible quema de desechos de materiales provenientes de la obra			X	
Se hace control en vaciados de concreto (esparcimiento de particulas de cemento)	X			Se toman medidas estipuladas
Se hace control de desechos tóxicos que puedan generar contaminación del aire	X			Se realizó disposición de
Se hace control de desechos orgánicos que puedan producir CO2 por descomposición			X	
Se requiere concesión de aguas para aprovechamiento en la obra	X			El abastecimiento del recurso se hace a través de un proveedor o tercero.
Se alteran los valores escénicos de la unidad paisajistica de la región		X		

OBSERVACIONES:

Firma

ARIEL ALBERTO CORREDOR GÓMEZ
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTOR EXTERNO

GOBIERNO DE CALDAS

INFORME DE INTERVENTORIA CONTRATOS DE OBRA

Código: FO-FT-02-005
Versión: 07
Fecha de modificación: 19/01/2016

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

FECHA: 17/04/2026

TRAMO 1: Las actividades realizadas a la fecha de la presente acta corresponden a: Ejecución de reemplazo de alcantarillas existentes de 24" a 36", instalación aceros y vaciado concretos estructuras de encole y descole alcantarillas, construcción de muros de contención, reciclado del pavimento existente e instalación de mezcla asfaltica y construccion de cunetas laterales realces de obras existentes, instalacion señalización vertical, instalacion defensas viales y demarcación horizontal.

SUBTRAMO 1 TRAMO 1: Reemplazo de alcantarillas existentes, construccion de filtros longitudinales y obras de entrada y salida de alcantarillas, muros, conformacion de calzada, instalación BEMAN, instalacion mezcla asfaltica, construccion de cunetas, instalación señalización horizontal y demarcación vial.

SUBTRAMO 3 TRAMO 1: Se realizo limpieza de alcantarillas, reemplazo de las existentes que lo requieren, construccion de filtros, estructuras de entrada y salida de las obras reemplazadas, instalación BEMAN, instalacion base granular, instalacion mezcla asfaltica y se adelanta la construccion de cunetas laterales.

TRAMO 3: Las actividades realizadas a la fecha de la presente acta corresponden a: Ejecución de reemplazo de alcantarillas existentes de 24" a 36", instalación aceros y vaciado concretos estructuras de encole y descole alcantarillas, construccion de muros de contencion, recuperación de anchos de vía, construccion de filtros, excavacion de la subrasante y aporte de material primera capa estructura de pavimento, instalación de base granular, instalacion mezcla asfaltica y se adelanta la construccion de cunetas laterales., retiro de derrumbes y se realizo mantenimiento del tramo comprendido entre el K76+680 al K90+000.

TRAMO 4: Las actividades realizadas a la fecha de la presente acta corresponden a: Ejecución de reemplazo de alcantarillas existentes de 24" a 36", instalación aceros y vaciado concretos estructuras de encole y descole alcantarillas, construccion de muros, recuperación de anchos de vía, construccion de filtros, retiro de derrumbes, se realizo el mantenimiento y reforzamiento de Puente Linda ubicado en el K106+000 y se realizo el mantenimiento vía entre el K106+030 al K120+000.

TIPO DE CONTRATO	CONSULTORIA		OBRA	X

Nº CONTRATO RADICADO:	29092023-1456
OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA LA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN MIGUEL CONFORMADO POR: HARINSA NAVASFALT CONSTRUCCIONES S.A.S (PARTICIPACIÓN 10%), MINOICA INGENIERIA S.A.S. (PARTICIPACION 45%) Y INGENIERIA TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S. (PARTICIPACIÓN 45%)
INTERVENTOR EXTERNO	MAB INGENIERIA DE VALOR (A CARGO DE INVIAS)

FIANZAS (POLIZAS) NRO. 400050790 Y 400050802	$ ASEGURADO	VIGENCIA	ASEGURADORA
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	$ 5,365,980,732.35	12/10/2023 A 12/10/2028	NACIONAL DE SEGUROS
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$ 21,463,922,929.40	12/10/2023 A 11/04/2029	NACIONAL DE SEGUROS
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS	$ 32,195,884,394.10	12/10/2028 A 12/10/2033	NACIONAL DE SEGUROS
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	$ 9,349,961,464.70	12/10/2023 A 11/04/2029	NACIONAL DE SEGUROS
PAGO DE SALARIOS	$ 21,463,922,929.40	12/10/2023 A 12/10/2031	NACIONAL DE SEGUROS
CALIDAD DEL SERVICIO	$ 208,192,182.00	12/10/2028 A 12/10/2033	NACIONAL DE SEGUROS

RECIBO DE PAGO ESTAMPILLAS	DESCONTADAS ACTAS	PLANILLAS SALUD	SI
RECIBO PAGO CAJA, SENA, ICBF	NO	PAZ Y SALVO MINTRAB.	NO
RECIBO PAGO SENA (FIC)	NO	INF. SUPERVISION	SI

NOTA: LOS PAZ Y SALVOS DE SENA, ICBF, CAJA COMPENSACION FAMILIAR SE ANEXARAN A LA LIQUIDACION DEL CONTRATO, LOS VALORES CORRESPONDIENTES AL COSTO DEL IMPUESTO DE LAS DIFERENTES ESTAMPILLAS SERAN DESCONTADAS DE LA PRESENTE ACTA POR PARTE DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL DEPARTAMENTO.

ESTADO DEL TIEMPO

FECHA	MES	ESTADO	OBSERVACIONES
12 AL 31	OCTUBRE	HUMEDO	LLUVIAS FRECUENTES
01 AL 30	NOVIEMBRE	HUMEDO	LLUVIAS FRECUENTES
01 AL 31	DICIEMBRE	HUMEDO	LLUVIAS FRECUENTES
01 AL 31	ENERO	SECO	LLUVIAS POCO FRECUENTES
01 al 29	FEBRERO	SECO	LLUVIAS POCO FRECUENTES
01 AL 31	MARZO	HUMEDO	LLUVIAS FRECUENTES
01 AL 30	ABRIL	LLUVIOSO	LLUVIAS CON FRECUENCIA ALTA
01 AL 31	MAYO	LLUVIOSO	LLUVIAS CON FRECUENCIA ALTA
01 AL 30	JUNIO	HUMEDO	LLUVIAS FRECUENTES DURANTE LA NOCHE
01 AL 31	JULIO	SECO	LLUVIAS POCO FRECUENTES
01 AL 30	AGOSTO	HUMEDO	LLUVIAS CON FRECUENCIA ALTA
01 AL 31	SEPTIEMBRE	HUMEDO	LLUVIAS FRECUENTES DURANTE LA NOCHE
01 AL 31	OCTUBRE	HUMEDO	LLUVIAS FRECUENTES DURANTE LA NOCHE
01 AL 30	NOVIEMBRE	HUMEDO	LLUVIAS CON FRECUENCIA ALTA
01 AL 30	DICIEMBRE	HUMEDO	LLUVIAS CON FRECUENCIA ALTA
01 AL 31	ENERO	HUMEDO	LLUVIAS CON FRECUENCIA ALTA
01 AL 28	FEBRERO	HUMEDO	LLUVIAS CON FRECUENCIA ALTA
01 AL 31	MARZO	LLUVIOSO	LLUVIAS CON FRECUENCIA ALTA
01 AL 30	ABRIL	LLUVIOSO	LLUVIAS CON FRECUENCIA ALTA
01 AL 31	MAYO	LLUVIOSO	LLUVIAS CON FRECUENCIA ALTA
01 AL 30	JUNIO	LLUVIOSO	LLUVIAS CON FRECUENCIA ALTA
01 AL 30	JULIO	HUMEDO	LLUVIAS FRECUENTES
01 AL 31	AGOSTO	HUMEDO	LLUVIAS FRECUENTES DURANTE LA NOCHE
01 AL 30	SEPTIEMBRE	HUMEDO	LLUVIAS FRECUENTES DURANTE LA NOCHE
01 AL 31	OCTUBRE	HUMEDO	LLUVIAS FRECUENTES
01 AL 30	NOVIEMBRE	HUMEDO	LLUVIAS FRECUENTES
01 AL 31	DICIEMBRE	HUMEDO	LLUVIAS FRECUENTES
01 AL 31	ENERO	LLUVIOSO	LLUVIAS CON FRECUENCIA ALTA
01 AL 28	FEBRERO	LLUVIOSO	LLUVIAS CON FRECUENCIA ALTA
01 AL 31	MARZO	LLUVIOSO	LLUVIAS FRECUENTES
01 AL 17	ABRIL	LLUVIOSO	LLUVIAS FRECUENTES

OBSERVACIONES	INTERVENTOR/SUPERVISOR
	ARIEL ALBERTO CORREDOR GÓMEZ REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTOR EXTERNO MAB INGENIERIA DE VALOR
