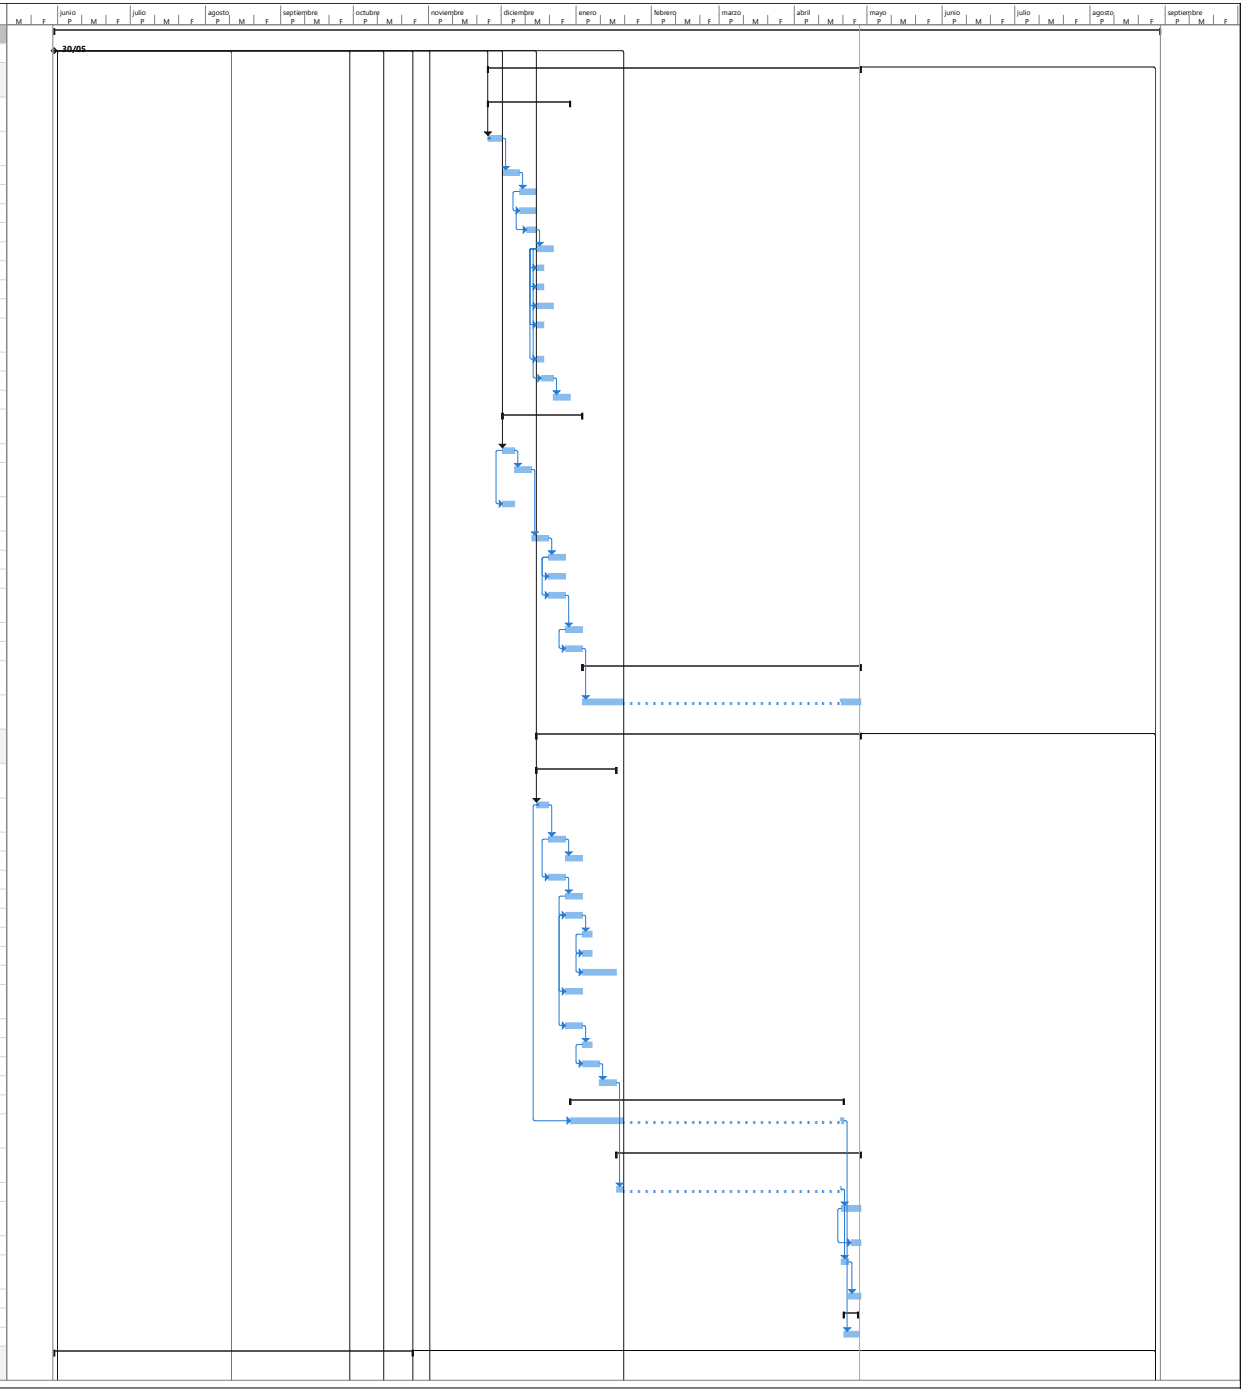
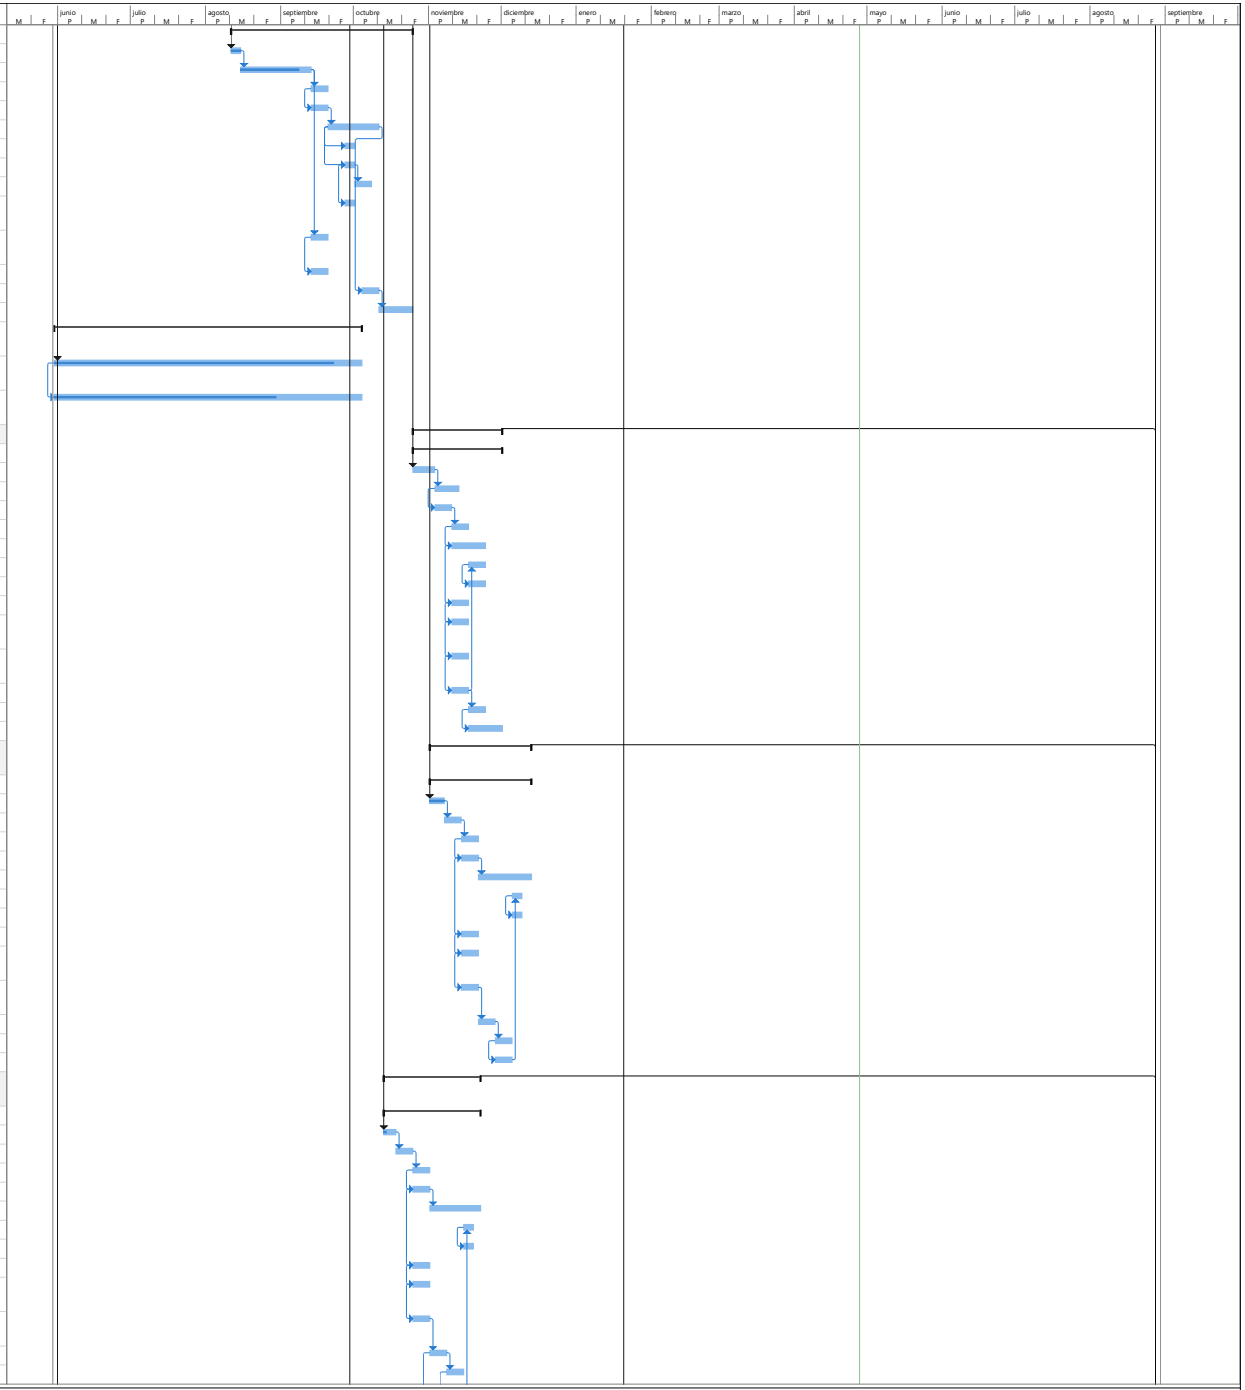
| Id | Modo de tarea | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Costo | Predecesoras | % Programado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | **CONTRATO DE OBRA No. CAR-LP-1807-2025** | **391,38 días** | **vie 30/05/25** | **sáb 29/08/26** | **$ 7.823.281.296,00** | | **21%** |
| 2 | | **ACTA DE INICIO** | 0 días | vie 30/05/25 | vie 30/05/25 | $ 0,00 | | 100% |
| 3 | | **PUNTO DENOMINADO PUENTE LA VIRGEN (SUBA/BTÁ)** | **131,63 días** | **mar 25/11/25** | **mar 28/04/26** | **$ 677.502.696,00** | | **0%** |
| 4 | | **GARITA DE SEGURIDAD (ESTRUCTURAS NUEVAS) N/AA** | **29 días** | **mar 25/11/25** | **lun 29/12/25** | **$ 242.648.358,00** | | **0%** |
| 5 | | PRELIMINARES Y EXCAVACIONES (OBRA NUEVA) | 5 días | mar 25/11/25 | lun 1/12/25 | $ 10.971.423,00 | 2FC+153 días | 0% |
| 6 | | CIMENTACIÓN | 6 días | lun 1/12/25 | lun 8/12/25 | $ 20.917.884,00 | 5 | 0% |
| 7 | | BAMBÚ | 6 días | lun 8/12/25 | lun 15/12/25 | $ 90.540.794,00 | 6 | 0% |
| 8 | | CONEXIONES | 6 días | lun 8/12/25 | lun 15/12/25 | $ 7.571.390,00 | 7CC | 0% |
| 9 | | MANEJO DE AGUAS LLUVIAS | 3 días | jue 11/12/25 | lun 15/12/25 | $ 9.306.952,00 | 8CC+3 días | 0% |
| 10 | | MANEJO DE AGUAS NEGRAS | 6 días | lun 15/12/25 | lun 22/12/25 | $ 1.363.000,00 | 9 | 0% |
| 11 | | VENTANERIA | 3 días | lun 15/12/25 | jue 18/12/25 | $ 4.137.000,00 | 10CC | 0% |
| 12 | | CARPINTERÍA METÁLICA | 3 días | lun 15/12/25 | jue 18/12/25 | $ 1.054.800,00 | 10CC | 0% |
| 13 | | ACABADOS ARQUITECTÓNICOS | 6 días | lun 15/12/25 | lun 22/12/25 | $ 93.066.535,00 | 10CC | 0% |
| 14 | | ACCESORIOS Y TUBERÍAS HIDROSANITARIAS | 3 días | lun 15/12/25 | jue 18/12/25 | $ 1.622.625,00 | 10CC | 0% |
| 15 | | APARATOS HIDROSANITARIOS | 3 días | lun 15/12/25 | jue 18/12/25 | $ 673.000,00 | 10CC | 0% |
| 16 | | LUMINARIAS SOLARES | 4 días | mié 17/12/25 | lun 22/12/25 | $ 760.000,00 | 10CC+2 días | 0% |
| 17 | | ACABADOS DE MUROS | 6 días | lun 22/12/25 | lun 29/12/25 | $ 662.955,00 | 16 | 0% |
| 18 | | **CUBIERTA EMBARCADERO (ESTRUCTURAS NUEVAS)** | **29 días** | **lun 1/12/25** | **sáb 3/01/26** | **$ 153.991.554,00** | | **0%** |
| 19 | | PRELIMINARES Y EXCAVACIONES | 5 días | lun 1/12/25 | sáb 6/12/25 | $ 1.133.990,00 | 2FC+158 días | 0% |
| 20 | | ESCARIFICACIÓN DE CONCRETO EXISTENTE Y ACERO FIGURADO | 6 días | sáb 6/12/25 | sáb 13/12/25 | $ 5.039.262,00 | 19 | 0% |
| 21 | | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FORMALETA | 5 días | lun 1/12/25 | sáb 6/12/25 | $ 569.043,00 | 19CC | 0% |
| 22 | | CONCRETO DE CIMENTACIÓN | 6 días | sáb 13/12/25 | sáb 20/12/25 | $ 13.446.400,00 | 20 | 0% |
| 23 | | CONEXIONES | 6 días | sáb 20/12/25 | sáb 27/12/25 | $ 6.973.350,00 | 22 | 0% |
| 24 | | PERFILERÍA METÁLICA | 6 días | sáb 20/12/25 | sáb 27/12/25 | $ 3.304.175,00 | 23CC | 0% |
| 25 | | MODIFICACIONES PLATAFORMA METÁLICA EXISTENTE | 6 días | sáb 20/12/25 | sáb 27/12/25 | $ 19.152,00 | 23CC | 0% |
| 26 | | BAMBÚ | 6 días | sáb 27/12/25 | sáb 3/01/26 | $ 115.519.582,00 | 25 | 0% |
| 27 | | ACABADOS DE CUBIERTA | 6 días | sáb 27/12/25 | sáb 3/01/26 | $ 7.986.600,00 | 26CC | 0% |
| 28 | | **LABORES DE MANTENIMIENTO DE PLATAFORMA EN MADERA** | **97,63 días** | **sáb 3/01/26** | **mar 28/04/26** | **$ 280.862.784,00** | | **0%** |
| 29 | | PLATAFORMA CON ACABADO EN MADERA | 21 días | sáb 3/01/26 | mar 28/04/26 | $ 280.862.784,00 | 27 | 0% |
| 30 | | **PUNTO DENOMINADO PUENTE GUADUA (ENGATIVÁ/BTÁ)** | **114,63 días** | **lun 15/12/25** | **mar 28/04/26** | **$ 1.069.270.978,00** | | **0%** |
| 31 | | **GARITA DE SEGURIDAD (ESTRUCTURAS NUEVAS) N/AA** | **29 días** | **lun 15/12/25** | **sáb 17/01/26** | **$ 239.123.018,00** | | **0%** |
| 32 | | PRELIMINARES Y EXCAVACIONES (OBRA NUEVA) | 5 días | lun 15/12/25 | sáb 20/12/25 | $ 10.971.423,00 | 2FC+170 días | 0% |
| 33 | | CIMENTACIÓN | 6 días | sáb 20/12/25 | sáb 27/12/25 | $ 20.918.188,00 | 32 | 0% |
| 34 | | BAMBÚ | 6 días | sáb 27/12/25 | sáb 3/01/26 | $ 85.955.950,00 | 33 | 0% |
| 35 | | CONEXIONES | 6 días | sáb 20/12/25 | sáb 27/12/25 | $ 7.571.390,00 | 33CC | 0% |
| 36 | | MANEJO DE AGUAS LLUVIAS | 6 días | sáb 27/12/25 | sáb 3/01/26 | $ 9.306.952,00 | 35 | 0% |
| 37 | | MANEJO DE AGUAS NEGRAS | 6 días | sáb 27/12/25 | sáb 3/01/26 | $ 1.363.000,00 | 36CC | 0% |
| 38 | | VENTANERIA | 3 días | sáb 3/01/26 | mié 7/01/26 | $ 4.137.000,00 | 37 | 0% |
| 39 | | CARPINTERÍA METÁLICA | 3 días | sáb 3/01/26 | mié 7/01/26 | $ 1.054.800,00 | 38CC | 0% |
| 40 | | ACABADOS ARQUITECTÓNICOS | 12 días | sáb 3/01/26 | sáb 17/01/26 | $ 93.066.535,00 | 39CC | 0% |
| 41 | | ACCESORIOS Y TUBERÍAS HIDROSANITARIAS | 6 días | sáb 27/12/25 | sáb 3/01/26 | $ 1.622.625,00 | 37CC | 0% |
| 42 | | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | 6 días | sáb 27/12/25 | sáb 3/01/26 | $ 673.000,00 | 37CC | 0% |
| 43 | | LUMINARIAS SOLARES | 3 días | sáb 3/01/26 | mié 7/01/26 | $ 760.000,00 | 42 | 0% |
| 44 | | INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 6 días | sáb 3/01/26 | sáb 10/01/26 | $ 1.059.200,00 | 43CC | 0% |
| 45 | | ACABADOS DE MUROS | 6 días | sáb 10/01/26 | sáb 17/01/26 | $ 662.955,00 | 44 | 0% |
| 46 | | **LABORES DE MANTENIMIENTO** | **96,63 días** | **lun 29/12/25** | **mar 21/04/26** | **$ 730.127.492,00** | | **0%** |
| 47 | | MANTENIMIENTO EMBARCADERO CALLE 80 (MANTENIMIENTO) | 20 días | lun 29/12/25 | mar 21/04/26 | $ 730.127.492,00 | 32CC+12 días | 0% |
| 48 | | **MANTENIMIENTO BAÑOS CALLE 80 (MANTENIMIENTO)** | **85,63 días** | **sáb 17/01/26** | **mar 28/04/26** | **$ 98.997.218,00** | | **0%** |
| 49 | | PRELIMINARES Y EXCAVACIONES | 2 días | sáb 17/01/26 | lun 20/04/26 | $ 2.648.778,00 | 45 | 0% |
| 50 | | GUADUA ANGUSTIFOLIA. KUNTH, TIPO MACANA | 7 días | lun 20/04/26 | mar 28/04/26 | $ 71.257.760,00 | 49 | 0% |
| 51 | | MANEJO DE AGUAS LLUVIAS | 3 días | vie 24/04/26 | mar 28/04/26 | $ 8.204.072,00 | 50CC+4 días | 0% |
| 52 | | ACCESORIOS Y TUBERÍAS HIDROSANITARIAS | 3 días | lun 20/04/26 | jue 23/04/26 | $ 3.093.628,00 | 49 | 0% |
| 53 | | ACABADOS ARQUITECTÓNICOS | 4 días | jue 23/04/26 | mar 28/04/26 | $ 13.792.980,00 | 52 | 0% |
| 54 | | **KIOSCO CALLE 80 (MANTENIMIENTO)** | **5 días** | **mar 21/04/26** | **lun 27/04/26** | **$ 1.023.250,00** | | **0%** |
| 55 | | CONEXIONES | 5 días | mar 21/04/26 | lun 27/04/26 | $ 1.023.250,00 | 47 | 0% |
| 56 | | **PUNTO DESEMBOCADURA RIO SOACHA Y CANAL TIBANICA (MUNICIPIO DE SOACHA)** | **127 días** | **vie 30/05/25** | **sáb 25/10/25** | **$ 1.674.737.616,00** | | **55%** |



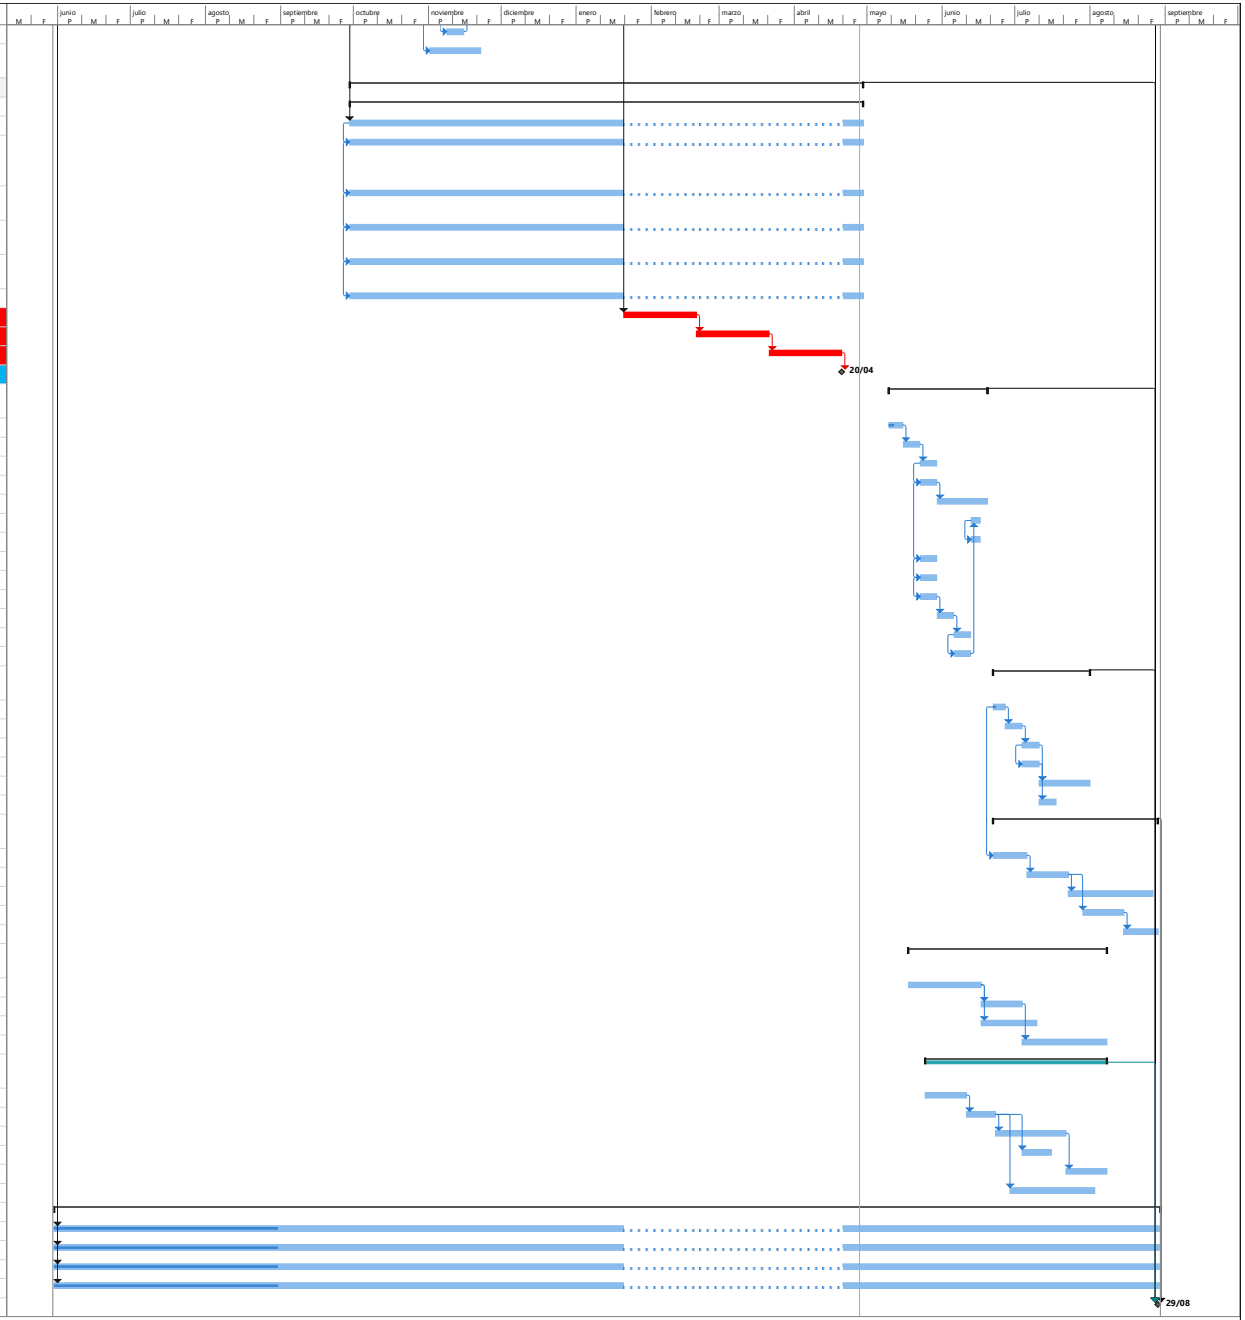

Proyecto: Cronograma de Obra
Fecha: mar 28/04/26

Tarea · División · Hito · Resumen · Resumen del proyecto · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Tarea manual · solo duración · Informe de resumen manual · Resumen manual · solo el comienzo · solo fin · Tareas externas · Hito externo · Fecha límite · Progreso · Progreso manual

| Id | Modo de tarea | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Costo | Predecesoras | % Programado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | | **GARITA DE SEGURIDAD (SOACHA)** | **65 días** | **lun 11/08/25** | **sáb 25/10/25** | **$ 238.411.841,00** | | **17%** |
| 58 | | PRELIMINARES Y EXCAVACIONES | 4 días | lun 11/08/25 | vie 15/08/25 | $ 14.313.521,00 | 2FC+62 días | 100% |
| 59 | | CIMENTACIÓN | 25 días | vie 15/08/25 | sáb 13/09/25 | $ 17.638.701,00 | 58 | 54% |
| 60 | | BAMBÚ | 6 días | sáb 13/09/25 | sáb 20/09/25 | $ 85.418.587,00 | 59 | 0% |
| 61 | | CONEXIONES | 6 días | sáb 13/09/25 | sáb 20/09/25 | $ 7.384.550,00 | 60CC | 0% |
| 62 | | ACABADOS ARQUITECTÓNICOS | 18 días | sáb 20/09/25 | sáb 11/10/25 | $ 96.393.298,00 | 61 | 0% |
| 63 | | VENTANERIA | 3 días | sáb 27/09/25 | mié 1/10/25 | $ 3.925.200,00 | 62CC+6 días | 0% |
| 64 | | CARPINTERÍA METÁLICA | 3 días | sáb 27/09/25 | mié 1/10/25 | $ 1.002.240,00 | 62CC+6 días | 0% |
| 65 | | MANEJO DE AGUAS LLUVIAS | 6 días | mié 1/10/25 | mié 8/10/25 | $ 7.416.744,00 | 64 | 0% |
| 66 | | MANEJO Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS | 3 días | sáb 27/09/25 | mié 1/10/25 | $ 1.337.000,00 | 64CC | 0% |
| 67 | | ACCESORIOS Y TUBERÍAS HIDROSANITARIAS | 6 días | sáb 13/09/25 | sáb 20/09/25 | $ 1.533.850,00 | 59 | 0% |
| 68 | | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | 6 días | sáb 13/09/25 | sáb 20/09/25 | $ 635.500,00 | 67CC | 0% |
| 69 | | LUMINARIAS SOLARES | 6 días | sáb 4/10/25 | sáb 11/10/25 | $ 760.000,00 | 62FC-6 días | 0% |
| 70 | | ACABADOS DE MUROS | 12 días | sáb 11/10/25 | sáb 25/10/25 | $ 652.650,00 | 69 | 0% |
| 71 | | **LABORES DE MANTENIMIENTO PASOS ELEVADOS** | **109 días** | **vie 30/05/25** | **sáb 4/10/25** | **$ 1.436.325.775,00** | | **73%** |
| 72 | | MANTENIMIENTO PASO ELEVADO SOACHA | 109 días | vie 30/05/25 | sáb 4/10/25 | $ 554.744.308,00 | 2 | 73% |
| 73 | | MANTENIMIENTO PASO ELEVADO CANAL TIBANICA | 109 días | vie 30/05/25 | sáb 4/10/25 | $ 881.581.467,00 | 72CC | 73% |
| 74 | | **PUNTO VUELTA GRANDE (LOCALIDAD BOSA)** | **31 días** | **sáb 25/10/25** | **lun 1/12/25** | **$ 240.499.888,00** | | **0%** |
| 75 | | **GARITA DE SEGURIDAD VUELTA GRANDE** | **31 días** | **sáb 25/10/25** | **lun 1/12/25** | **$ 240.499.888,00** | | **0%** |
| 76 | | PRELIMINARES Y EXCAVACIONES | 7 días | sáb 25/10/25 | lun 3/11/25 | $ 10.971.423,00 | 2FC+127 días | 0% |
| 77 | | CIMENTACIÓN | 9 días | lun 3/11/25 | jue 13/11/25 | $ 20.917.884,00 | 76 | 0% |
| 78 | | BAMBÚ | 6 días | lun 3/11/25 | lun 10/11/25 | $ 88.392.324,00 | 77CC | 0% |
| 79 | | CONEXIONES | 6 días | lun 10/11/25 | lun 17/11/25 | $ 7.571.390,00 | 78 | 0% |
| 80 | | ACABADOS ARQUITECTÓNICOS | 12 días | lun 10/11/25 | lun 24/11/25 | $ 93.066.535,00 | 79CC | 0% |
| 81 | | VENTANERIA | 6 días | lun 17/11/25 | lun 24/11/25 | $ 4.137.000,00 | 86 | 0% |
| 82 | | CARPINTERÍA METÁLICA | 6 días | lun 17/11/25 | lun 24/11/25 | $ 1.054.800,00 | 81CC | 0% |
| 83 | | MANEJO DE AGUAS LLUVIAS | 6 días | lun 10/11/25 | lun 17/11/25 | $ 9.306.952,00 | 80CC | 0% |
| 84 | | MANEJO Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS | 6 días | lun 10/11/25 | lun 17/11/25 | $ 1.363.000,00 | 83CC | 0% |
| 85 | | ACCESORIOS Y TUBERÍAS HIDROSANITARIAS | 6 días | lun 10/11/25 | lun 17/11/25 | $ 1.622.625,00 | 84CC | 0% |
| 86 | | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | 6 días | lun 10/11/25 | lun 17/11/25 | $ 673.000,00 | 85CC | 0% |
| 87 | | LUMINARIAS SOLARES | 6 días | lun 17/11/25 | lun 24/11/25 | $ 760.000,00 | 86 | 0% |
| 88 | | ACABADOS DE MUROS | 12 días | lun 17/11/25 | lun 1/12/25 | $ 662.955,00 | 87CC | 0% |
| 89 | | **PUNTO DEL TEQUENDAMA (MUNICIPIO DE SOACHA)** | **36 días** | **sáb 1/11/25** | **sáb 13/12/25** | **$ 240.464.533,00** | | **0%** |
| 90 | | **GARITA DE SEGURIDAD TEQUENDAMA** | **36 días** | **sáb 1/11/25** | **sáb 13/12/25** | **$ 240.464.533,00** | | **0%** |
| 91 | | PRELIMINARES Y EXCAVACIONES | 5 días | sáb 1/11/25 | vie 7/11/25 | $ 10.286.773,00 | 2FC+133 días | 0% |
| 92 | | CIMENTACIÓN | 6 días | vie 7/11/25 | vie 14/11/25 | $ 17.638.701,00 | 91 | 0% |
| 93 | | BAMBÚ | 6 días | vie 14/11/25 | vie 21/11/25 | $ 93.667.067,00 | 92 | 0% |
| 94 | | CONEXIONES | 6 días | vie 14/11/25 | vie 21/11/25 | $ 7.384.550,00 | 93CC | 0% |
| 95 | | ACABADOS ARQUITECTÓNICOS | 19 días | vie 21/11/25 | sáb 13/12/25 | $ 92.512.258,00 | 94 | 0% |
| 96 | | VENTANERIA | 3 días | vie 5/12/25 | mar 9/12/25 | $ 3.925.200,00 | 103 | 0% |
| 97 | | CARPINTERÍA METÁLICA | 3 días | vie 5/12/25 | mar 9/12/25 | $ 1.002.240,00 | 96CC | 0% |
| 98 | | MANEJO DE AGUAS LLUVIAS | 6 días | vie 14/11/25 | vie 21/11/25 | $ 9.128.744,00 | 94CC | 0% |
| 99 | | MANEJO Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS | 6 días | vie 14/11/25 | vie 21/11/25 | $ 1.337.000,00 | 98CC | 0% |
| 100 | | ACCESORIOS Y TUBERÍAS HIDROSANITARIAS | 6 días | vie 14/11/25 | vie 21/11/25 | $ 1.533.850,00 | 99CC | 0% |
| 101 | | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | 6 días | vie 21/11/25 | vie 28/11/25 | $ 635.500,00 | 100 | 0% |
| 102 | | LUMINARIAS SOLARES | 6 días | vie 28/11/25 | vie 5/12/25 | $ 760.000,00 | 101 | 0% |
| 103 | | ACABADOS DE MUROS | 6 días | vie 28/11/25 | vie 5/12/25 | $ 652.650,00 | 102CC | 0% |
| 104 | | **PUNTO CANOAS- INDUMIL (MUNICIPIO DE SOACHA)** | **35 días** | **lun 13/10/25** | **sáb 22/11/25** | **$ 238.684.656,00** | | **0%** |
| 105 | | **GARITA DE SEGURIDAD CANOAS-INDUMIL** | **35 días** | **lun 13/10/25** | **sáb 22/11/25** | **$ 238.684.656,00** | | **0%** |
| 106 | | PRELIMINARES Y EXCAVACIONES | 5 días | lun 13/10/25 | sáb 18/10/25 | $ 10.286.773,00 | 2FC+116 días | 0% |
| 107 | | CIMENTACIÓN | 6 días | sáb 18/10/25 | sáb 25/10/25 | $ 17.638.701,00 | 106 | 0% |
| 108 | | BAMBÚ | 6 días | sáb 25/10/25 | sáb 1/11/25 | $ 90.705.280,00 | 107 | 0% |
| 109 | | CONEXIONES | 6 días | sáb 25/10/25 | sáb 1/11/25 | $ 7.384.550,00 | 108CC | 0% |
| 110 | | ACABADOS ARQUITECTÓNICOS | 18 días | sáb 1/11/25 | sáb 22/11/25 | $ 92.512.258,00 | 109 | 0% |
| 111 | | VENTANERIA | 3 días | sáb 15/11/25 | mié 19/11/25 | $ 3.925.200,00 | 118 | 0% |
| 112 | | CARPINTERÍA METÁLICA | 3 días | sáb 15/11/25 | mié 19/11/25 | $ 1.002.240,00 | 111CC | 0% |
| 113 | | MANEJO DE AGUAS LLUVIAS | 6 días | sáb 25/10/25 | sáb 1/11/25 | $ 9.128.744,00 | 109CC | 0% |
| 114 | | MANEJO Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS | 6 días | sáb 25/10/25 | sáb 1/11/25 | $ 1.337.000,00 | 113CC | 0% |
| 115 | | ACCESORIOS Y TUBERÍAS HIDROSANITARIAS | 6 días | sáb 25/10/25 | sáb 1/11/25 | $ 1.533.850,00 | 114CC | 0% |
| 116 | | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | 6 días | sáb 1/11/25 | sáb 8/11/25 | $ 635.500,00 | 115 | 0% |
| 117 | | LUMINARIAS SOLARES | 6 días | sáb 8/11/25 | sáb 15/11/25 | $ 760.000,00 | 116 | 0% |



| Id | Modo de tarea | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Costo | Predecesoras | % Programado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 | | ACABADOS DE MUROS | 6 días | sáb 8/11/25 | sáb 15/11/25 | $ 0,00 | 117CC | 0% |
| 119 | | INGRESO VEHICULAR CANOAS-INDUMIL | 18 días | sáb 1/11/25 | sáb 22/11/25 | $ 1.834.560,00 | 116CC | 0% |
| 120 | | **MANTENIMIENTO A SENDERO** | **181,63 días** | **lun 29/09/25** | **mié 29/04/26** | **$ 278.745.600,00** | | **0%** |
| 121 | | **MANTENIMIENTO A SENDEROS EXISTENTE** | **181,63 días** | **lun 29/09/25** | **mié 29/04/26** | **$ 278.745.600,00** | | **0%** |
| 122 | | DEMOLICIÓN DE ADOQUINES | 104 días | lun 29/09/25 | mié 29/04/26 | $ 4.352.000,00 | 2FC+104 días | 0% |
| 123 | | RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM (INCLUYE CARGUE) | 104 días | lun 29/09/25 | mié 29/04/26 | $ 6.032.000,00 | 122CC | 0% |
| 124 | | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADOQUINES AFECTADOS | 104 días | lun 29/09/25 | mié 29/04/26 | $ 100.214.400,00 | 123CC | 0% |
| 125 | | RECONFORMACIÓN JUNTAS EN ARENA DE PEÑA | 104 días | lun 29/09/25 | mié 29/04/26 | $ 6.710.080,00 | 124CC | 0% |
| 126 | | SUMINISTRO DE SUB BASE GRANULAR E=20CM | 104 días | lun 29/09/25 | mié 29/04/26 | $ 28.421.120,00 | 125CC | 0% |
| 127 | | SARDINEL PREFABRICADO A-10 | 104 días | lun 29/09/25 | mié 29/04/26 | $ 133.016.000,00 | 126CC | 0% |
| 128 | | **SUSPENSIÓN No. 1** | **26 días** | **mar 20/01/26** | **jue 19/02/26** | **$ 0,00** | **2FC+201 días** | |
| 129 | | **AMPLIACIÓN No. 1 a la SUSPENSIÓN No. 1** | **26 días** | **jue 19/02/26** | **sáb 21/03/26** | **$ 0,00** | **128** | |
| 130 | | **AMPLIACIÓN No. 2 a la SUSPENSIÓN No. 1** | **25 días** | **sáb 21/03/26** | **lun 20/04/26** | **$ 0,00** | **129** | |
| 131 | | **REINICIO No. 1** | **0 días** | **lun 20/04/26** | **lun 20/04/26** | **$ 0,00** | **130** | |
| 132 | | **GARITA DE SEGURIDAD SECTOR LA RAMADA FUNZA** | **35 días** | **dom 10/05/26** | **vie 19/06/26** | **$ 228.597.084,00** | | **0%** |
| 133 | | PRELIMINARES Y EXCAVACIONES | 5 días | dom 10/05/26 | vie 15/05/26 | $ 13.925.558,00 | | 0% |
| 134 | | CIMENTACIÓN | 6 días | sáb 16/05/26 | vie 22/05/26 | $ 13.165.882,00 | 133 | 0% |
| 135 | | BAMBÚ | 6 días | sáb 23/05/26 | vie 29/05/26 | $ 57.664.000,00 | 134 | 0% |
| 136 | | CONEXIONES | 6 días | sáb 23/05/26 | vie 29/05/26 | $ 10.512.915,00 | 135CC | 0% |
| 137 | | ACABADOS ARQUITECTÓNICOS | 18 días | sáb 30/05/26 | vie 19/06/26 | $ 103.333.285,00 | 136 | 0% |
| 138 | | VENTANERIA | 3 días | sáb 13/06/26 | mar 16/06/26 | $ 3.454.176,00 | 145 | 0% |
| 139 | | CARPINTERÍA METÁLICA | 3 días | sáb 13/06/26 | mar 16/06/26 | $ 890.880,00 | 138CC | 0% |
| 140 | | MANEJO DE AGUAS LLUVIAS | 6 días | sáb 23/05/26 | vie 29/05/26 | $ 7.416.744,00 | 136CC | 0% |
| 141 | | MANEJO Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRA | 6 días | sáb 23/05/26 | vie 29/05/26 | $ 1.337.000,00 | 140CC | 0% |
| 142 | | ACCESORIOS Y TUBERÍAS HIDROSANITARIAS | 6 días | sáb 23/05/26 | vie 29/05/26 | $ 1.533.850,00 | 141CC | 0% |
| 143 | | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | 6 días | sáb 30/05/26 | vie 5/06/26 | $ 635.500,00 | 142 | 0% |
| 144 | | LUMINARIAS SOLARES | 6 días | sáb 6/06/26 | vie 12/06/26 | $ 13.973.982,00 | 143 | 0% |
| 145 | | ACABADOS DE MUROS | 6 días | sáb 6/06/26 | vie 12/06/26 | $ 753.312,00 | 144CC | 0% |
| 146 | | **MIRADOR AMBIENTAL SECTOR COTA PUENTE LA VIRGEN** | **35 días** | **lun 22/06/26** | **sáb 1/08/26** | **$ 209.938.824,00** | | **0%** |
| 147 | | PRELIMINARES Y EXCAVACIONES | 5 días | lun 22/06/26 | sáb 27/06/26 | $ 13.925.608,00 | | 0% |
| 148 | | CIMENTACIÓN | 6 días | sáb 27/06/26 | sáb 4/07/26 | $ 13.426.811,00 | 147 | 0% |
| 149 | | BAMBÚ | 6 días | sáb 4/07/26 | sáb 11/07/26 | $ 69.896.955,00 | 148 | 0% |
| 150 | | CONEXIONES | 6 días | sáb 4/07/26 | sáb 11/07/26 | $ 7.753.875,00 | 149CC | 0% |
| 151 | | ACABADOS ARQUITECTÓNICOS | 18 días | sáb 11/07/26 | sáb 1/08/26 | $ 104.175.575,00 | 150 | 0% |
| 152 | | LUMINARIAS SOLARES | 6 días | sáb 11/07/26 | sáb 18/07/26 | $ 760.000,00 | 149 | 0% |
| 153 | | **PASO ELEVADO CONEXIÓN SENDERO SECTOR COTA PUENTE LA VIRGEN** | **59 días** | **lun 22/06/26** | **sáb 29/08/26** | **$ 452.820.052,00** | | |
| 154 | | PRELIMINARES Y EXCAVACIONES | 12 días | lun 22/06/26 | lun 6/07/26 | $ 35.727.718,00 | 147CC | |
| 155 | | CIMENTACION | 15 días | lun 6/07/26 | jue 23/07/26 | $ 65.165.311,00 | 154 | |
| 156 | | BAMBÚ | 30 días | jue 23/07/26 | jue 27/08/26 | $ 192.256.300,00 | 155 | |
| 157 | | CONEXIONES | 15 días | mié 29/07/26 | sáb 15/08/26 | $ 48.768.000,00 | 155FC+5 días | |
| 158 | | ACABADOS ARQUITECTONICOS | 12 días | sáb 15/08/26 | sáb 29/08/26 | $ 110.902.723,00 | 157 | |
| 159 | | **CONSTRUCCIÓN SENDERO PEATONAL SECTOR COTA PUENTE LA VIRGEN** | **71 días** | **lun 18/05/26** | **sáb 8/08/26** | **$ 563.093.527,00** | | |
| 160 | | PRELIMINARES Y EXCAVACIONES | 26 días | lun 18/05/26 | mié 17/06/26 | $ 157.567.295,00 | | |
| 161 | | RELLENOS | 15 días | mié 17/06/26 | sáb 4/07/26 | $ 39.870.620,00 | 160 | |
| 162 | | SARDINEL | 20 días | mié 17/06/26 | vie 10/07/26 | $ 179.060.000,00 | 160 | |
| 163 | | ADOQUINES | 30 días | sáb 4/07/26 | sáb 8/08/26 | $ 186.595.612,00 | 161 | |
| 164 | | **AMPLIACIÓN DE CUBIERTA EMBARCADERO CALLE 80** | **65 días** | **lun 25/05/26** | **sáb 8/08/26** | **$ 210.486.496,00** | | |
| 165 | | PRELIMINARES Y EXCAVACIONES | 15 días | lun 25/05/26 | jue 11/06/26 | $ 13.154.351,00 | | |
| 166 | | CIMENTACION | 10 días | jue 11/06/26 | mar 23/06/26 | $ 13.445.191,00 | 165 | |
| 167 | | BAMBÚ | 25 días | mar 23/06/26 | mié 22/07/26 | $ 97.284.270,00 | 166 | |
| 168 | | CONEXIONES | 10 días | sáb 4/07/26 | jue 16/07/26 | $ 23.683.500,00 | 166FC+10 días | |
| 169 | | ACABADOS ARQUITECTONICOS | 15 días | mié 22/07/26 | sáb 8/08/26 | $ 27.055.132,00 | 167 | |
| 170 | | ADOQUINADO | 30 días | lun 29/06/26 | lun 3/08/26 | $ 35.864.052,00 | 166FC+5 días | |
| 171 | | **AIU** | **391,38 días** | **vie 30/05/25** | **sáb 29/08/26** | **$ 1.738.439.346,00** | | **38%** |
| 172 | | ADMINISTRACIÓN (24%) | 313,75 días | vie 30/05/25 | sáb 29/08/26 | $ 1.460.362.068,00 | 2 | 38% |
| 173 | | IMPREVISTOS (1%) | 313,75 días | vie 30/05/25 | sáb 29/08/26 | $ 60.848.420,00 | 2 | 38% |
| 174 | | UTILIDAD (3%) | 313,75 días | vie 30/05/25 | sáb 29/08/26 | $ 182.545.259,00 | 2 | 38% |
| 175 | | IVA (19%) | 313,75 días | vie 30/05/25 | sáb 29/08/26 | $ 34.683.599,00 | 2 | 38% |
| 176 | | **ACTA DE TERMINACIÓN** | 0 días | sáb 29/08/26 | sáb 29/08/26 | $ 0,00 | 3;30;56;74;89;10 | 0% |




Proyecto: Cronograma de Obra
Fecha: mar 28/04/26

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · solo el comienzo · Tareas externas · Fecha límite · Progreso manual
División · Resumen · Tarea inactiva · Resumen inactivo · solo duración · Resumen manual · solo fin · Hito externo · Progreso
