	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Contrato de Obra No. 4614 de 2023- 4664-2023 **Contratista:** JAC VEREDA LA PRIMAVERA- JAC SANTA LUCIA

Contrato de Interventoría No. 5001 de 2023 **Interventoría:** MISAEL VILLALBA GUAYARA

Objeto Contrato de Obra:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA PRIMAVERA DEL MUNICIPIO PUERTO RICO, DEPARTAMENTO DE META, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SANTA LUCIA DEL MUNICIPIO PUERTO RICO, DEPARTAMENTO DE META, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ

INFORME MENSUAL No. 9 **MES O PERIODO:** 1/08/2024 al 31/08/2024

No.	CONTENIDO	FORMATO	PAGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	1
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	2
1	**INTRODUCCION**		4
2	**DESCRIPCION DEL PROYECTO**		4
2.1	Localización		4
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		5
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		5
2.4	Características técnicas del proyecto		5
3	**INFORMACION CONTRATO DE OBRA**		6
3.1	Información general del contrato		6
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		8
3.3	Seguimiento Items no previstos		8
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		8
4	**REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		10
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	10
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	31
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	33
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	36
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	41
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	44
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	47
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	52
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		53
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1 MEPI-MN-IN-2-FR-2	
	• Seguimiento Programa de Obra		
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1 MEPI-MN-IN-6-FR-2	
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	
5	**INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA**		53
5.1	Información general del contrato		53
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		54
5.3	Informes especialistas y profesionales		56
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		56
5.5	Informe matriz de riesgos.		56
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		61
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de		
6	**REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA**		61
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	61
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	63
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	65
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	67
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	72
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		74
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1 MEPI-MN-IN-3-FR-2	
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	
7	**Conclusiones y recomendaciones**		75
8	**Anexos**		75
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia,		75
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		81
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad		86
8.4	Copia de la Bitacora del mes correspondiente		86

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:
Nombre: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Resolución de designación No.2023S-VMET-031554 de fecha 23/12/2023

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 03/09/2024 (Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCION TERRITORIAL:** META **PERIODO MES:** 1/08/2024 AL 31/08/2024

CONTRATO DE OBRA No.: 4614 DE 2023

OBJETO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA PRIMAVERA DEL MUNICIPIO PUERTO RICO, DEPARTAMENTO DE META, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA PRIMAVERA

PLAZO INICIAL: 31/12/2023
FECHA DE INICIO: 22/12/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN: NA
FECHA DE REANUDACIÓN: NA
FECHA DE VENCIMIENTO: 31/12/2023
PLAZO ACUMULADO: 15/09/2024

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 187.175.193,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA) $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 187.175.193,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 5001 DE 2023 **INTERVENTOR:** MISAEL VILLALBA GUAYARA **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:** CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción		
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	Placa huella	m	92
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULAD
Pavimentación	Construcción			
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Placa huella	m	27,4	92
Otros (Especificar cuales)	Alcantarilla tipo III	Unidad	0	0

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 138.950.825,00	$ -	$ 138.950.825,00
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES		$ -	
APORTE JAC	$ 1.000.000,00	$ -	$ 1.000.000,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 43.055.843,00	$ -	$ 43.055.843,00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD	$ 4.168.525,00	$ -	$ 4.168.525,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 187.175.193,00	$ -	$ 187.175.193,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ 23.087.980,14		$ 23.087.980,14	$ 113.443.309,87
AJUSTES				
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES				
APORTE JAC	$ -			
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 4.417.381,79		$ 4.417.381,79	$ 22.735.376,32
PAGA	$ -		$ -	$ -
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)				
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)				
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)				
VALOR EJECUTADO	$ 27.505.361,93	$ -	$ 27.505.361,93	$ 136.178.686,19

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 113.443.309,87
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 113.443.309,87
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 60,61%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 2
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 7

REGISTRO FOTOGRÁFICO





Reunión para cambio de firmas de la cuenta conjunta

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Ninguno

Firma
Nombre MARIANA ROZO MORENO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 091037-0539458 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	
FECHA	03/09/2024 (Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCION TERRITORIAL:** META **PERIODO MES:** 1/08/2024 AL 31/08/2024

CONTRATO DE OBRA No.: 4664 DE 2023

OBJETO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SANTA LUCIA DEL MUNICIPIO PUERTO RICO, DEPARTAMENTO DE META, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SANTA LUCIA

PLAZO INICIAL: 31/12/2023
FECHA DE INICIO: 22/12/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN: NA
FECHA DE REANUDACIÓN: NA
FECHA DE VENCIMIENTO: 31/12/2023
PLAZO ACUMULADO: 15/09/2024

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 186.874.936,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA) $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 186.874.936,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 5001 DE 2023 **INTERVENTOR:** MISAEL VILLALBA GUAYARA **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:** CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción		
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	Placa huella	m	72,2
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULAD
Pavimentación	Construcción			
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Placa huella	m	0,69	72,2
Otros (Especificar cuales)	Alcantarilla tipo III	Unidad	0	0

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 138.660.441,00	$ -	$ 138.660.441,00
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES		$ -	
APORTE JAC	$ 1.000.000,00	$ -	$ 1.000.000,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 43.054.682,00	$ -	$ 43.054.682,00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD	$ 4.159.813,00	$ -	$ 4.159.813,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 186.874.936,00	$ -	$ 186.874.936,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ 29.416.263,45		$ 29.416.263,45	$ 136.877.624,85
AJUSTES				
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES				
APORTE JAC	$ -			
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 1.582.019,59		$ 1.582.019,59	$ 23.003.359,10
PAGA	$ -		$ -	$ -
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)				
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)				
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)				
VALOR EJECUTADO	$ 30.998.283,04	$ -	$ 30.998.283,04	$ 159.880.983,95

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 136.877.624,85
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 136.877.624,85
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 73,25%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 2
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 7

REGISTRO FOTOGRÁFICO





Reunión para cambio de firmas de la cuenta conjunta

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Ninguno

Firma
Nombre MARIANA ROZO MORENO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 091037-0539458 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

1. INTRODUCCIÓN


Caminos Comunitarios de la Paz Total surgió en septiembre de 2022 como una iniciativa con vocación de convertirse en un programa de inversión de alta prioridad dentro de la agenda de desarrollo del Gobierno 2022 - 2026, fundamentado en el Plan Nacional de Desarrollo “Colombia, Potencia Mundial de la Vida”, dentro del componente Proyectos Estratégicos de Impacto Regional.

Mediante la invitación pública **IP-ID-MET-028-2023,** surtió el contrato No.5001 -2023 cuyo objeto es ***INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO RICO DEPARTAMENTO DEL META DEL PROGRAMA “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL***, el cual tiene a cargo el seguimiento de los convenios 4614-2023; 4664-2023.

2. DESCRIPCION DEL PROYECTO

2.1. Localización

Los convenios 4614-2023; 4664-2023, se encuentran localizados en el municipio de Puerto Rico, departamento del Meta.

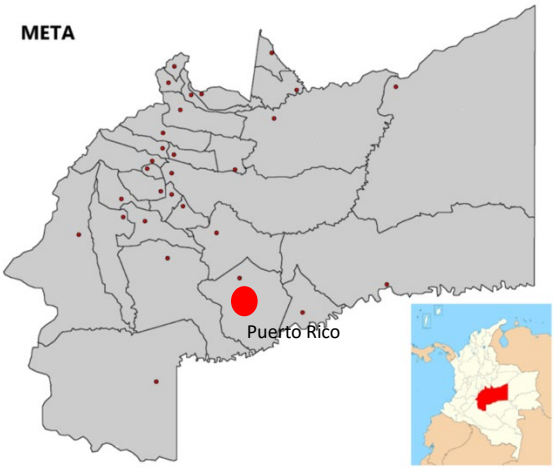

Convenio 4614 DE 2023:

La obra se llevará a cabo en la zona rural del municipio de Puerto Rico, ubicado en el departamento del Meta, específicamente en la vereda La Primavera. El punto de referencia para esta obra es la "LOMA CARRO QUEMADO", y el tramo inicial se encuentra en las coordenadas 2°56’26.99’’N 73°12’15.98’’O, extendiéndose hasta las coordenadas 2°56’37.50’’N 73°10’56.42’’O.

Convenio 4664 DE 2023:

La obra se llevará a cabo en la zona rural del municipio de Puerto Rico, ubicado en el departamento del Meta, específicamente en la vereda Santa Lucia. El punto de referencia para esta obra es la "LOMA MATECOCO", en la vía que comunica a la vereda caño Danta con la vereda Santa Lucia, iniciando el tramo en las coordenadas -73.389670°, 2.812187° extendiéndose hasta las coordenadas -73°3963092°, 2°8308440°.

2.2. Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto.

El municipio de Puerto Rico limita al norte con el Municipio de Puerto Lleras (Meta), al este con el municipio de Puerto Concordia (Meta), al sur con el departamento del Guaviare y al oeste con el municipio de Vista Hermosa (Meta). Esta delimitación geográfica sitúa a Puerto Rico en una posición estratégica dentro de la región, favoreciendo la interacción con municipios circundantes y facilitando el acceso a diversas zonas del departamento y del país.

2.3. Inventario y estado inicial de la vía

Convenio 4614 de 2023

El convenio implica la intervención de la vía mediante la construcción de 92 metros lineales de placa huella. Esta iniciativa busca mejorar significativamente la infraestructura vial en la zona, proporcionando una solución duradera que facilite el tránsito y la conectividad para los residentes y usuarios de la vía.

Convenio 4664 de 2023:

El convenio implica la intervención de la vía mediante la construcción de 72,2 metros lineales de placa huella. Esta iniciativa tiene como objetivo mejorar significativamente la infraestructura vial en la zona, ofreciendo una solución duradera que facilite tanto el tránsito liviano como el pesado que atraviesa el área. Con esta obra, se busca optimizar la seguridad vial y promover un flujo de tráfico más eficiente, beneficiando a la comunidad local y a los usuarios de la vía en general.

2.4. Características técnicas del proyecto

Convenio 4614 de 2023

ALCANCE PROYECTADO	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Placa Huella	ml	92	

Limpieza de alcantarillas	ml	6	
Desmonte y limpieza de zonas boscosas	Ha	1,54	

Convenio 4664 de 2023:

ALCANCE PROYECTADO	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Placa Huella	ml	72,20	
Limpieza de alcantarillas	ml	6	
Desmonte y limpieza de zonas boscosas	Ha	0,94	

3. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

3.1. Convenio 4614 de 2023

- **Información general del contrato**

No. DE PROCESO	SPSC-CD-CS-994- 2023
ID	CO1.PCCNTR.5590955
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA PRIMAVERA DEL MUNICIPIO PUERTO RICO, DEPARTAMENTO DE META, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
CONTRATISTA	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA PRIMAVERA NIT 900.919.431-1 RL: JHON WILMER DELGADO ACOSTA C.C 17.282.105
VALOR	$ 187.175.193,00
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	22/12/2023
FECHA DE INICIO	22/12/2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31/12/2023
FECHA PRORROGA No.1	30/04/2024
FECHA PRORROGA No.2	30/07/2024
FECHA PRORROGA No.3	15/09/2024
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA	15/09/2024

3.1.1 Descripción de las actividades ejecutadas en el mes

Durante el avance de la obra, se ejecutaron diversas actividades clave para asegurar el cumplimiento de los plazos y los estándares técnicos establecidos en el proyecto. Se colocó y amarró el acero de refuerzo para las secciones de cunetas y se procedió con la fundición de concreto de alta resistencia. Tras el fraguado del concreto, se desarmaron las formaletas de las huellas y cunetas fundidas, y se continuó con la preparación de nuevas mezclas de concreto para continuar con el vaciado de más cunetas y secciones de ciclópeo.

También se realizaron trabajos de excavación y nivelación de la subbase en las áreas necesarias para la colocación de las formaletas de las placas huella y vigas riostras. Se procedió con la fundición de estas estructuras, asegurando que se cumplieran los requerimientos de resistencia y durabilidad. Para ello, se utilizó concreto con características específicas para cada tipo de elemento, y se trabajó de manera precisa en la disposición del acero de refuerzo y el vaciado de las mezclas.

Además, se continuó con la ejecución de las obras de ciclópeo, colocando la piedra y realizando las mezclas de concreto necesarias para completar las secciones correspondientes. Se desarmaron las formaletas de las secciones ya fundidas y se prepararon nuevas áreas para la colocación de los bordillos, los cuales fueron formaleteados y reforzados adecuadamente. Con el concreto preparado según el diseño de mezcla, se procedió con el vaciado de las secciones de bordillo en ambos márgenes de la vía, asegurando un acabado adecuado.

Durante el proceso, también se realizó la limpieza de las dilataciones y la supervisión constante del fraguado del concreto, garantizando que todos los trabajos se realizaran conforme a las especificaciones técnicas y los estándares de calidad. Finalmente, se llevaron a cabo tareas de limpieza general en el sitio de obra, organizando los desechos y material sobrante, y asegurando que la zona de trabajo permaneciera ordenada y lista para la siguiente fase de ejecución.

3.1.2 Seguimiento de ítems no previstos

- N/A

3.1.3 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la interventoría

Durante el periodo comprendido entre el 01/08/2024 y el 31/08/2024, la interventoría llevó a cabo la supervisión integral de la construcción de la placa

huella, realizando un seguimiento detallado a las actividades de ejecución y asegurando el cumplimiento de los estándares técnicos y normativos establecidos en los planos y especificaciones del proyecto. Asimismo, se coordinaron y ejecutaron las tomas de muestras representativas de los materiales empleados en la obra, con el objetivo de ser sometidas a ensayos en laboratorio para su posterior análisis. Los resultados de estos ensayos permitirán verificar la calidad y características de los materiales, asegurando su idoneidad para garantizar la durabilidad y seguridad de la infraestructura. Esta labor de supervisión es esencial para asegurar que la construcción de la placa huella se realice conforme a los más altos estándares de calidad, contribuyendo al desarrollo y bienestar de la comunidad de la vereda La Primavera.

3.2. Convenio 4664 de 2023:

4. Información general del contrato

No. DE PROCESO	SPSC-CD-CS-1030-2023
ID	CO1.PCCNTR.5594194
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SANTA LUCÍA DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO EN EL DEPARTAMENTO DEL META PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
CONTRATISTA	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SANTA LUCIA NIT 900.140.045-6 RL: JOSE ALEXANDER REMOLINA JEREZ C.C 1.116.493.600
VALOR	$ 186.874.936,00
FECHA DE SUSCRIPCION	22/12/2023
FECHA DE INICIO	22/12/2023
FECHA DE TERMINACION INICIAL	31/12/2023
FECHA PRORROGA No.1	30/04/2024
FECHA PRORROGA No.2	30/07/2024
FECHA PRORROGA No.3	15/09/2024
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA	15/09/2024

3.2.1 Descripción de las actividades ejecutadas en el mes

Durante el desarrollo de la obra, se realizaron varias actividades clave para avanzar en la construcción de las infraestructuras viales. Se llevó a cabo el

vaciado de concreto para el ciclópeo, con la correcta instalación de las piedras en las secciones correspondientes. Una vez completada esta actividad, se realizó la dilatación de las secciones fundidas, asegurando la correcta expansión y contracción del concreto. Seguidamente, se instaló el concreto para la placa huella y se montaron las formaletas para la cuarta sección que se fundiría, siguiendo los pasos establecidos en el diseño.

Se continuaron con las labores de vaciado de concreto, fundiendo más volumen de placa huella y cunetas, en conjunto con las vigas riostras. Además, se ejecutaron los labrados en las huellas y cunetas, asegurando la correcta textura y acabado de las superficies. Durante este proceso, se aplicó agua para mantener la hidratación del concreto y evitar fisuras. Posteriormente, se continuó con la instalación de la placa huella, y se fundieron más secciones de cuneta, huella y riostras, cumpliendo con los parámetros establecidos en el proyecto.

Una vez completado el vaciado y fraguado de las secciones, se procedió al retiro de las formaletas y su reorganización para continuar con la instalación en otras áreas. Esto permitió formaletear nuevas secciones de cunetas y vigas, preparándolas para el vaciado de concreto al día siguiente. En este proceso, se verificó que el acero de refuerzo estuviera correctamente colocado para garantizar la resistencia de las estructuras. La fundición de las secciones se completó, distribuyendo el concreto entre las cunetas, huellas y vigas riostras.

Además, se fundieron 20 metros lineales de bordillo en el costado izquierdo de la vía, sumando un total de 35 ml fundidos en ese margen, mientras que en el costado derecho se completaron 18 ml. Se instaló la formaleta para los bordillos en ambos costados, y se realizaron las dilataciones correspondientes, aplicando agua para evitar fisuras en el concreto recién vaciado. El proceso de fundición se extendió a lo largo de toda la obra, asegurando la correcta ejecución de las actividades planificadas.

Por último, se retiraron los sobrantes de excavación y concreto de los bordillos, y se realizó el retiro de material en las rampas de acero hacia la placa huella, rellenando los aproches necesarios. Se realizaron las respectivas labores de limpieza, se recogió escombros y residuos de excavación, los cuales fueron dispuestos en los sitios de acopio autorizados por la junta de acción comunal. Con estos trabajos finalizados, se dio por concluida las actividades en la obra de la vereda Santa Lucía.

3.2.2 Seguimiento de ítems no previstos

- N/A

3.2.3 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la interventoría

Durante el periodo comprendido entre el 01/08/2024 y el 31/08/2024, la interventoría llevó a cabo la supervisión integral de la construcción de la placa huella, realizando un seguimiento detallado a las actividades de ejecución y asegurando el cumplimiento de los estándares técnicos y normativos establecidos en los planos y especificaciones del proyecto. Asimismo, se coordinaron y ejecutaron las tomas de muestras representativas de los materiales empleados en la obra, con el objetivo de ser sometidas a ensayos en laboratorio para su posterior análisis. Los resultados de estos ensayos permitirán verificar la calidad y características de los materiales, asegurando su idoneidad para garantizar la durabilidad y seguridad de la infraestructura. Esta labor de supervisión es esencial para asegurar que la construcción de la placa huella se realice conforme a los más altos estándares de calidad, contribuyendo al desarrollo y bienestar de la comunidad de la vereda Santa Lucía.

4 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

4.1. INFORMES SEMANALES DURANTE EL PRESENTE PERIODO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 3/08/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: META | SEMANA No.: 32 del 28 al 3 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI ☑

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA PRIMAVERA DEL MUNICIPIO PUERTO RICO, DEPARTAMENTO DE META, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El proyecto a desarrollar en virtud del convenio aborda el mejoramiento de la vía terciaria situada en la zona de influencia dentro del municipio de Puerto Rico, en el departamento de Menta, específicamente en la vereda La Primavera, con "LOMA CARRO QUEMADO" como punto de referencia.
El propósito principal de este proyecto es la construcción de 110 metros lineales de placa huella y la construcción de una alcantarilla de tipo III.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Se programará la primera visita técnica al punto de referencia con el objetivo de precisar las cantidades reales que se llevarán a cabo en el marco del proyecto. Durante esta visita, se realizará una evaluación del área, permitiendo una definición más precisa de las dimensiones y alcances contemplados en el objeto del proyecto, optimizando así la ejecución del proyecto y asegurando la congruencia entre las metas previstas y la realidad del sitio de intervención.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA PRIMAVERA

CONVENIO No. 4614 de 2023 | VALOR INICIAL: $ 187.175.193,00
FECHA DE INICIO: 22 de diciembre de 2023 | VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 de diciembre de 2023 | VALOR ACUMULADO: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 15 de septiembre de 2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: MISAEL VILLALBA GUAYARA
INTEGRANTES:

CONTRATO No. 5001 de 2023 | VALOR INICIAL: $ 65.909.578,00
FECHA DE INICIO: 22 de diciembre de 2023 | VALOR ADICIONES: $ 32.852.568
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 de diciembre de 2023 | VALOR ACUMULADO: $ 98.762.146
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 15 de septiembre de 2024 | VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 186.175.193	$ 186.175.193		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ 127.950.941		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 186.175.193	$ 58.224.252		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 65.909.578	$ 98.079.562		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 682.584,00	$ 65.514.981		$ -
	SALDO DE VIGENCIA	$ 65.226.994	$ 32.564.581		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 138.950.825,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 106.715.629,87	57%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 106.715.629,87	57%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 21.235.310,78	11%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 127.950.940,65	69%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 127.950.940,65	69%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 19.277.797,04	10%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 19.277.797,04	10%

Observaciones: Se realizó el pago de los rendimientos del mes de Junio y pagos relacionados con el rubro de obra como ferreteria 2 y la nómina de Julio.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 66.197.565,14	67,03%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 66.197.565,14	67,03%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 4.474.321,70	4,53%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 4.474.321,70	4,53%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	Placa huella	m	92
*			
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ..... NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ..... NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A .....
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A .....
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A .....
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A .....
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A .....
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A .....
EMISIONES:	SI	NO	N/A .....
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A .....

OBSERVACIONES: El 20 de febrero el Instituto Nacional de Vias (INVIAS) mediante el oficio con numero de radicado 2024S-VMET-008893, solicito la implementacion de un modelo paga. Esto ultimo, informandose a la JAC para iniciar su respectiva implementacion.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL)

ESTADO: .....

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	5	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 9

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: .....

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: .....

OBSERVACIONES: La interventoría aprueba los perfiles de ingeniero residente, maestro y contados, mediante un oficio emitio el 23 de enero de 2024.


VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se realizaron revisiones parciales de precios unitarios, memorias de cálculo y memorias de cantidades.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Pendiente el inicio de la la realización de apiques a cielo abierto y perfil estratigráfico, levantamiento topográfico,cartera, informe y georreferenciación, estudio hidrológico e hidráulico y diseño geométrico y diseño de mezcla, lo anterior por insuficiencia de recursos.

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

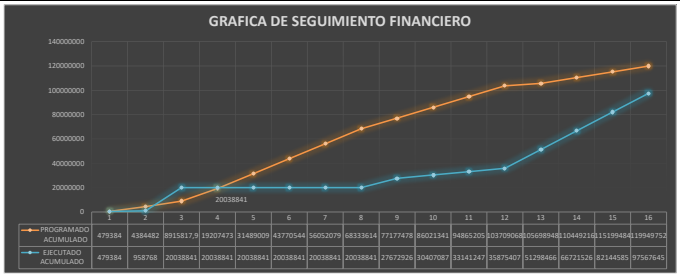

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Aprobación de precios unitarios y memorias de cálculo

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA .....

NOMBRE MARIANA ROZO MORENO

Matrícula Profesional No.: 091037-0539458 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 10/08/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: META — SEMANA No.: 33 del 4 al 10 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☑

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA PRIMAVERA DEL MUNICIPIO PUERTO RICO, DEPARTAMENTO DE META, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El proyecto a desarrollar en virtud del convenio aborda el mejoramiento de la vía terciaria situada en la zona de influencia dentro del municipio de Puerto Rico, en el departamento de Menta, específicamente en la vereda La Primavera, con "LOMA CARRO QUEMADO" como punto de referencia.
El propósito principal de este proyecto es la construcción de 110 metros lineales de placa huella y la construcción de una alcantarilla de tipo III.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Se programará la primera visita técnica al punto de referencia con el objetivo de precisar las cantidades reales que se llevarán a cabo en el marco del proyecto. Durante esta visita, se realizará una evaluación del área, permitiendo una definición más precisa de las dimensiones y alcances contemplados en el objeto del proyecto, optimizando así la ejecución del proyecto y asegurando la congruencia entre las metas previstas y la realidad del sitio de intervención.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA PRIMAVERA

CONVENIO No. 4614 de 2023 — VALOR INICIAL: $ 187.175.193,00
FECHA DE INICIO: 22 de diciembre de 2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 de diciembre de 2023 — VALOR ACUMULADO: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 15 de septiembre de 2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: MISAEL VILLALBA GUAYARA
INTEGRANTES:

CONTRATO No. 5001 de 2023 — VALOR INICIAL: $ 65.909.578,00
FECHA DE INICIO: 22 de diciembre de 2023 — VALOR ADICIONES: $ 32.852.568
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 de diciembre de 2023 — VALOR ACUMULADO: $ 98.762.146
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 15 de septiembre de 2024 — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 186.175.193	$ 186.175.193		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ 127.950.941		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 186.175.193	$ 58.224.252		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 65.909.578	$ 98.079.562		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 682.584,00	$ 72.510.460		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 65.226.994	$ 25.569.102		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 138.950.825,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 106.715.629,87	57%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 106.715.629,87	57%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 21.235.310,78	11%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 127.950.940,65	69%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 127.950.940,65	69%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

Observaciones: En esta semana no se realizaron pagos, ni descuentos del banco por comisión.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 73.193.043,61	74,11%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 73.193.043,61	74,11%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 6.995.478,47	7,08%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 6.995.478,47	7,08%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	Placa huella	m	92
*			
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ..... NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ..... NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A .....
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A .....
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A .....
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A .....
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A .....
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A .....
EMISIONES:	SI	NO	N/A .....
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A .....

OBSERVACIONES: El 20 de febrero el Instituto Nacional de Vias (INVIAS) mediante el oficio con numero de radicado 2024S-VMET-008893, solicito la implementacion de un modelo paga. Esto ultimo, informandose a la JAC para iniciar su respectiva implementacion.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL)

ESTADO: .....

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	5	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 9

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: .....

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: .....

OBSERVACIONES: La interventoría aprueba los perfiles de ingeniero residente, maestro y contados, mediante un oficio emitio el 23 de enero de 2024.


VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se realizaron revisiones parciales de precios unitarios, memorias de cálculo y memorias de cantidades.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Pendiente el inicio de la la realización de apiques a cielo abierto y perfil estratigráfico, levantamiento topográfico,cartera, informe y georreferenciación, estudio hidrológico e hidráulico y diseño geométrico y diseño de mezcla, lo anterior por insuficiencia de recursos.

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

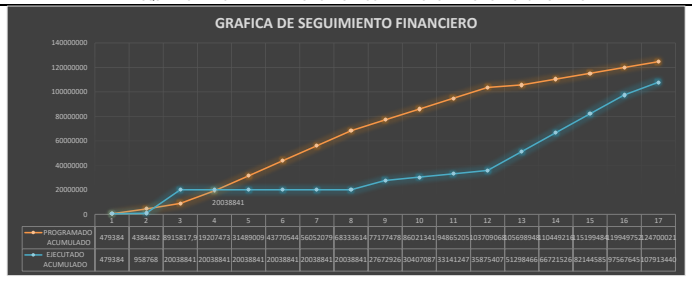

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Aprobación de precios unitarios y memorias de cálculo

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA .....

NOMBRE MARIANA ROZO MORENO

Matrícula Profesional No.: 091037-05394458 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 18/08/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: META | SEMANA No.: 34 del 11 al 17 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI ☑

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA PRIMAVERA DEL MUNICIPIO PUERTO RICO, DEPARTAMENTO DE META, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El proyecto a desarrollar en virtud del convenio aborda el mejoramiento de la vía terciaria situada en la zona de influencia dentro del municipio de Puerto Rico, en el departamento de Menta, específicamente en la vereda La Primavera, con "LOMA CARRO QUEMADO" como punto de referencia.
El propósito principal de este proyecto es la construcción de 110 metros lineales de placa huella y la construcción de una alcantarilla de tipo III.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Se programará la primera visita técnica al punto de referencia con el objetivo de precisar las cantidades reales que se llevarán a cabo en el marco del proyecto. Durante esta visita, se realizará una evaluación del área, permitiendo una definición más precisa de las dimensiones y alcances contemplados en el objeto del proyecto, optimizando así la ejecución del proyecto y asegurando la congruencia entre las metas previstas y la realidad del sitio de intervención.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA PRIMAVERA

CONVENIO No. 4614 de 2023 | VALOR INICIAL: $ 187.175.193,00
FECHA DE INICIO: 22 de diciembre de 2023 | VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 de diciembre de 2023 | VALOR ACUMULADO: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 15 de septiembre de 2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: MISAEL VILLALBA GUAYARA
INTEGRANTES:

CONTRATO No. 5001 de 2023 | VALOR INICIAL: $ 65.909.578,00
FECHA DE INICIO: 22 de diciembre de 2023 | VALOR ADICIONES: $ 32.852.568
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 de diciembre de 2023 | VALOR ACUMULADO: $ 98.762.146
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 15 de septiembre de 2024 | VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 186.175.193	$ 186.175.193		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ 127.950.941		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 186.175.193	$ 58.224.252		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 65.909.578	$ 98.079.562		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 682.584,00	$ 79.505.938		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 65.226.994	$ 18.573.624		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 138.950.825,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 106.715.629,87	57%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 106.715.629,87	57%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 21.235.310,78	11%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 127.950.940,65	69%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 127.950.940,65	69%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

Observaciones: En esta semana no se realizaron pagos, ni descuentos del banco por comisión.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 80.188.522,07	81,19%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 80.188.522,07	81,19%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 6.995.478,47	7,08%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 6.995.478,47	7,08%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	Placa huella	m	92
*			
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES: El 20 de febrero el Instituto Nacional de Vias (INVIAS) mediante el oficio con numero de radicado 2024S-VMET-008893, solicito la implementacion de un modelo paga. Esto ultimo, informandose a la JAC para iniciar su respectiva implementacion.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	5	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 9

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: La interventoría aprueba los perfiles de ingeniero residente, maestro y contados, mediante un oficio emitio el 23 de enero de 2024.


VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se realizaron revisiones parciales de precios unitarios, memorias de cálculo y memorias de cantidades.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Pendiente el inicio de la la realización de apiques a cielo abierto y perfil estratigráfico, levantamiento topográfico,cartera, informe y georreferenciación, estudio hidrológico e hidráulico y diseño geométrico y diseño de mezcla, lo anterior por insuficiencia de recursos.

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

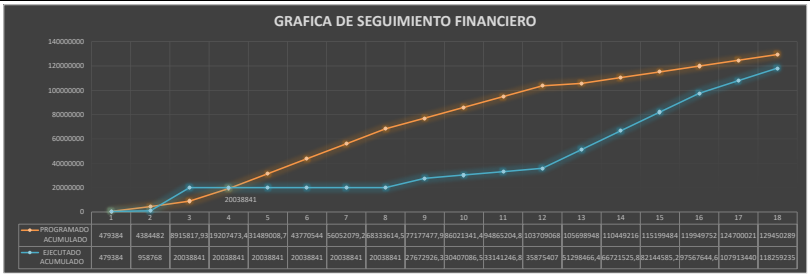

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Aprobación de precios unitarios y memorias de cálculo

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE MARIANA ROZO MORENO

Matrícula Profesional No.: 091037-05394158 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 25/08/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: META | SEMANA No.: 35 del 18 al 24 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI ☑

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA PRIMAVERA DEL MUNICIPIO PUERTO RICO, DEPARTAMENTO DE META, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El proyecto a desarrollar en virtud del convenio aborda el mejoramiento de la vía terciaria situada en la zona de influencia dentro del municipio de Puerto Rico, en el departamento de Menta, específicamente en la vereda La Primavera, con "LOMA CARRO QUEMADO" como punto de referencia.
El propósito principal de este proyecto es la construcción de 110 metros lineales de placa huella y la construcción de una alcantarilla de tipo III.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Se programará la primera visita técnica al punto de referencia con el objetivo de precisar las cantidades reales que se llevarán a cabo en el marco del proyecto. Durante esta visita, se realizará una evaluación del área, permitiendo una definición más precisa de las dimensiones y alcances contemplados en el objeto del proyecto, optimizando así la ejecución del proyecto y asegurando la congruencia entre las metas previstas y la realidad del sitio de intervención.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA PRIMAVERA

CONVENIO No. 4614 de 2023 | VALOR INICIAL: $ 187.175.193,00
FECHA DE INICIO: 22 de diciembre de 2023 | VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 de diciembre de 2023 | VALOR ACUMULADO: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 15 de septiembre de 2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: MISAEL VILLALBA GUAYARA
INTEGRANTES:

CONTRATO No. 5001 de 2023 | VALOR INICIAL: $ 65.909.578,00
FECHA DE INICIO: 22 de diciembre de 2023 | VALOR ADICIONES: $ 32.852.568
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 de diciembre de 2023 | VALOR ACUMULADO: $ 98.762.146
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 15 de septiembre de 2024 | VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 186.175.193	$ 186.175.193		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ 136.179.152		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 186.175.193	$ 49.996.041		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 65.909.578	$ 98.079.562		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 682.584,00	$ 86.501.417		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 65.226.994	$ 11.578.145		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 138.950.825,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 113.443.309,87	61%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 113.443.309,87	61%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 22.735.842,50	12%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 136.179.152,37	73%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 136.179.152,37	73%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 8.228.211,72	4%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 8.228.211,72	4%

Observaciones: Se realizó pago administrativo correspondiente al pago de contador 5 y también se realizaron pagos relacionados con el rubro de obra como el pago de caja menor 4, triturado, transporte indesk y alquiler de equipos.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 87.184.000,54	88,28%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 87.184.000,54	88,28%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 6.995.478,47	7,08%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 6.995.478,47	7,08%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %:
Meta Física Ejecutada %:
Avance o Atraso Físico %:

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	Placa huella	m	92
*			
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	Fuente de Oro, Meta	PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES: EL 20 de agosto de 2024, se realizo pagos de agregados ante la empresa TRITURADOS DEL ARIARI – ROJAS RAMON NIT. 97.612.638-8

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A
EMISIONES:	SI		NO		N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A

OBSERVACIONES: El 20 de febrero el Instituto Nacional de Vias (INVIAS) mediante el oficio con numero de radicado 2024S-VMET-008893, solicito la implementacion de un modelo paga. Esto ultimo, informandose a la JAC para iniciar su respectiva implementacion.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	5	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 9

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: La interventoría aprueba los perfiles de ingeniero residente, maestro y contados, mediante un oficio emitio el 23 de enero de 2024.


VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se realizaron revisiones parciales de precios unitarios, memorias de cálculo y memorias de cantidades.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Pendiente el inicio de la la realización de apiques a cielo abierto y perfil estratigráfico, levantamiento topográfico,cartera, informe y georreferenciación, estudio hidrológico e hidráulico y diseño geométrico y diseño de mezcla, lo anterior por insuficiencia de recursos.

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

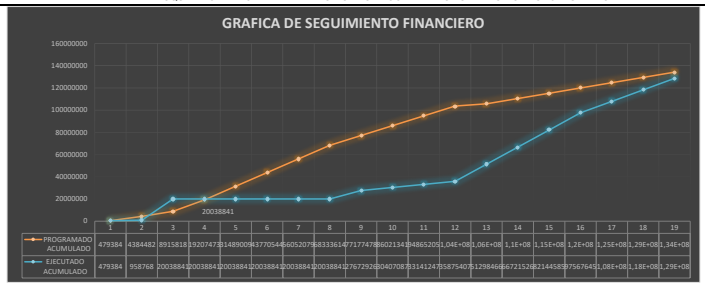

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Aprobación de precios unitarios y memorias de cálculo

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE MARIANA ROZO MORENO

Matrícula Profesional No.: 091037-053458 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 2/09/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: META — SEMANA No.: 36 del 25 al 30 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☑

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA PRIMAVERA DEL MUNICIPIO PUERTO RICO, DEPARTAMENTO DE META, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El proyecto a desarrollar en virtud del convenio aborda el mejoramiento de la vía terciaria situada en la zona de influencia dentro del municipio de Puerto Rico, en el departamento de Menta, específicamente en la vereda La Primavera, con "LOMA CARRO QUEMADO" como punto de referencia.
El propósito principal de este proyecto es la construcción de 110 metros lineales de placa huella y la construcción de una alcantarilla de tipo III.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Se programará la primera visita técnica al punto de referencia con el objetivo de precisar las cantidades reales que se llevarán a cabo en el marco del proyecto. Durante esta visita, se realizará una evaluación del área, permitiendo una definición más precisa de las dimensiones y alcances contemplados en el objeto del proyecto, optimizando así la ejecución del proyecto y asegurando la congruencia entre las metas previstas y la realidad del sitio de intervención.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA PRIMAVERA

CONVENIO No. 4614 de 2023 — VALOR INICIAL: $ 187.175.193,00
FECHA DE INICIO: 22 de diciembre de 2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 de diciembre de 2023 — VALOR ACUMULADO: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 15 de septiembre de 2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: MISAEL VILLALBA GUAYARA
INTEGRANTES:

CONTRATO No. 5001 de 2023 — VALOR INICIAL: $ 65.909.578,00
FECHA DE INICIO: 22 de diciembre de 2023 — VALOR ADICIONES: $ 32.852.568
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 de diciembre de 2023 — VALOR ACUMULADO: $ 98.762.146
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 15 de septiembre de 2024 — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 186.175.193	$ 186.175.193		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ 136.178.686		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 186.175.193	$ 49.996.506,81		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 65.909.578	$ 98.079.562		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 682.584,00	$ 92.497.541		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 65.226.994	$ 5.582.021		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 138.950.825,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 113.443.309,87	61%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 113.443.309,87	61%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 22.735.376,32	12%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 136.178.686,19	73%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 136.178.686,19	73%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

Observaciones: En esta semana no se realizaron pagos, ni descuentos del banco por comisión.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 93.180.124,94	94,35%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 93.180.124,94	94,35%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 5.996.124,40	6,07%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 5.996.124,40	6,07%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	Placa huella	m	92
*			
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A
EMISIONES:	SI		NO		N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A

OBSERVACIONES: El 20 de febrero el Instituto Nacional de Vias (INVIAS) mediante el oficio con numero de radicado 2024S-VMET-008893, solicito la implementacion de un modelo paga. Esto ultimo, informandose a la JAC para iniciar su respectiva implementacion.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	5	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 9

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: La interventoría aprueba los perfiles de ingeniero residente, maestro y contados, mediante un oficio emitio el 23 de enero de 2024.


VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se realizaron revisiones parciales de precios unitarios, memorias de cálculo y memorias de cantidades.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Pendiente el inicio de la la realización de apiques a cielo abierto y perfil estratigráfico, levantamiento topográfico,cartera, informe y georreferenciación, estudio hidrológico e hidráulico y diseño geométrico y diseño de mezcla, lo anterior por insuficiencia de recursos.

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

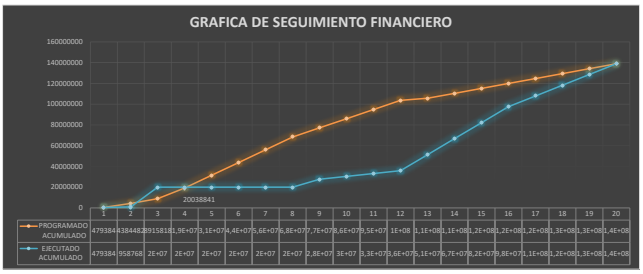

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Aprobación de precios unitarios y memorias de cálculo

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE MARIANA ROZO MORENO

Matrícula Profesional No.: 091037-05394 58 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 3/08/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: META — SEMANA No.: 32 del 28 al 3 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☑

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SANTA LUCIA DEL MUNICIPIO PUERTO RICO, DEPARTAMENTO DE META, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El proyecto a desarrollar en virtud del convenio aborda el mejoramiento de la vía terciaria situada en la zona de influencia dentro del municipio de Puerto Rico, en el departamento de Menta, específicamente en la vereda Santa Lucia, con "LOMA MATECOCO" como punto de referencia. El propósito principal de este proyecto es la construcción de 94 metros lineales de placa huella y la construcción de una alcantarilla de tipo III.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Se programará la primera visita técnica al punto de referencia con el objetivo de precisar las cantidades reales que se llevarán a cabo en el marco del proyecto. Durante esta visita, se realizará una evaluación del área, permitiendo una definición más precisa de las dimensiones y alcances contemplados en el objeto del proyecto, optimizando así la ejecución del proyecto y asegurando la congruencia entre las metas previstas y la realidad del sitio de intervención.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SANTA LUCIA

CONVENIO No. 4664 de 2023 — VALOR INICIAL: $ 186.874.936,00

FECHA DE INICIO: 22 de diciembre de 2023 — VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 de diciembre de 2023 — VALOR ACUMULADO: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 15 de septiembre de 2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: MISAEL VILLALBA GUAYARA

INTEGRANTES:

CONTRATO No. 5001 de 2023 — VALOR INICIAL: $ 65.909.578,00

FECHA DE INICIO: 22 de diciembre de 2023 — VALOR ADICIONES: $ 32.852.568

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 de diciembre de 2023 — VALOR ACUMULADO: $ 98.762.146

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 15 de septiembre de 2024 — VALOR ANTICIPO: $ -

VALOR AMORTIZADO: $ -

SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 185.874.936	$ 185.874.936		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ 128.887.421		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 185.874.936	$ 56.987.515		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 65.909.578	$ 98.079.562		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 682.584,00	$ 65.514.981		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 65.226.994	$ 32.564.581		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 138.950.825,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 110.270.074,40	59%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 110.270.074,40	59%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 18.617.346,23	10%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 128.887.420,63	69%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 128.887.420,63	69%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 10.014.248,00	5%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 10.014.248,00	5%

Observaciones: En esta semana se realizo el pago relacionado con el rubro de obra correspondiente a la nómina del mes de Julio.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 66.197.565,14	67,03%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 66.197.565,14	67,03%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 4.474.321,70	4,53%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 4.474.321,70	4,53%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %

Meta Física Ejecutada %

Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	Placa huella	m	72,2
*			
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES: El 20 de febrero el Instituto Nacional de Vias (INVIAS) mediante el oficio con numero de radicado 2024S-VMET-008893, solicito la implementacion de un modelo paga. Esto ultimo, informandose a la JAC para iniciar su respectiva implementacion.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	5	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 11

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: La interventoría aprueba los perfiles de ingeniero residente, maestro y contados, mediante un oficio emitio el 23 de enero de 2024.


VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se realizaron revisiones parciales de precios unitarios, memorias de cálculo y memorias de cantidades.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Pendiente el inicio de la la realización de apiques a cielo abierto y perfil estratigráfico, levantamiento topográfico,cartera, informe y georreferenciación, estudio hidrológico e hidráulico y diseño geométrico y diseño de mezcla, lo anterior por insuficiencia de recursos.

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

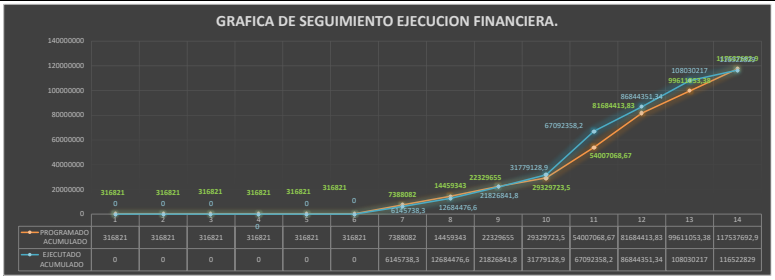

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
PROGRAMADO ACUMULADO	316821	316821	316821	316821	316821	316821	7388082	14459343	22329655	29329723,5	54007068,67	81684413,83	99611053,38	117537692,9
EJECUTADO ACUMULADO	0	0	0	0	0	0	6145738,3	12684476,6	21826841,8	31779128,9	67092358,2	86844351,34	108030217	116522829

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTO 1

Indicar localización y actividad

FOTO 2

Indicar localización y actividad

FOTO 3

Indicar localización y actividad

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Aprobación de precios unitarios y memorias de cálculo

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE MARIANA ROZO MORENO

Matrícula Profesional No.: 091037-05394458 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 10/08/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: META — SEMANA No.: 33 del 4 al 10 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☑

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SANTA LUCIA DEL MUNICIPIO PUERTO RICO, DEPARTAMENTO DE META, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El proyecto a desarrollar en virtud del convenio aborda el mejoramiento de la vía terciaria situada en la zona de influencia dentro del municipio de Puerto Rico, en el departamento de Menta, específicamente en la vereda Santa Lucia, con "LOMA MATECOCO" como punto de referencia. El propósito principal de este proyecto es la construcción de 94 metros lineales de placa huella y la construcción de una alcantarilla de tipo III.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Se programará la primera visita técnica al punto de referencia con el objetivo de precisar las cantidades reales que se llevarán a cabo en el marco del proyecto. Durante esta visita, se realizará una evaluación del área, permitiendo una definición más precisa de las dimensiones y alcances contemplados en el objeto del proyecto, optimizando así la ejecución del proyecto y asegurando la congruencia entre las metas previstas y la realidad del sitio de intervención.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SANTA LUCIA

CONVENIO No.	4664 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 186.874.936,00
FECHA DE INICIO:	22 de diciembre de 2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 de diciembre de 2023	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	15 de septiembre de 2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: MISAEL VILLALBA GUAYARA

INTEGRANTES:

CONTRATO No.	5001 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 65.909.578,00
FECHA DE INICIO:	22 de diciembre de 2023	VALOR ADICIONES:	$ 32.852.568
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 de diciembre de 2023	VALOR ACUMULADO:	$ 98.762.146
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	15 de septiembre de 2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 185.874.936	$ 185.874.936		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ 128.887.421		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 185.874.936	$ 56.987.515		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 65.909.578	$ 98.079.562		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 682.584,00	$ 72.510.460		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 65.226.994	$ 25.569.102		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 138.950.825,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 110.270.074,40	59%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 110.270.074,40	59%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 18.617.346,23	10%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 128.887.420,63	69%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 128.887.420,63	69%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

Observaciones: En esta semana no se realizaron pagos, ni descuentos del banco por comisión.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 73.193.043,61	74,11%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 73.193.043,61	74,11%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 6.995.478,47	7,08%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 6.995.478,47	7,08%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %

Meta Física Ejecutada %

Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	Placa huella	m	72,2
*			
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES: El 20 de febrero el Instituto Nacional de Vias (INVIAS) mediante el oficio con numero de radicado 2024S-VMET-008893, solicito la implementacion de un modelo paga. Esto ultimo, informandose a la JAC para iniciar su respectiva implementacion.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	5	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 11

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: La interventoría aprueba los perfiles de ingeniero residente, maestro y contados, mediante un oficio emitio el 23 de enero de 2024.


VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se realizaron revisiones parciales de precios unitarios, memorias de cálculo y memorias de cantidades.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Pendiente el inicio de la la realización de apiques a cielo abierto y perfil estratigráfico, levantamiento topográfico,cartera, informe y georreferenciación, estudio hidrológico e hidráulico y diseño geométrico y diseño de mezcla, lo anterior por insuficiencia de recursos.

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

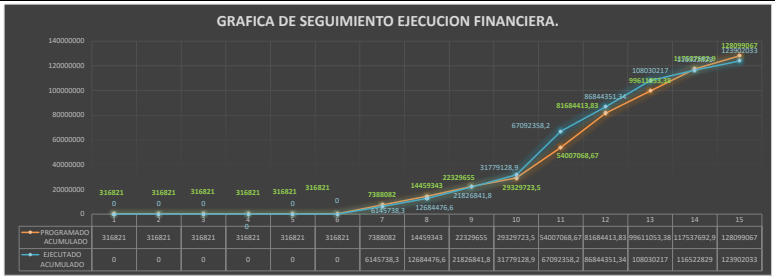

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
PROGRAMADO ACUMULADO	316821	316821	316821	316821	316821	316821	7388082	14459343	22329655	29329723,5	54007068,67	81684413,83	99611053,38	117537692,9	128099067
EJECUTADO ACUMULADO	0	0	0	0	0	0	6145738,3	12684476,6	21826841,8	31779128,9	67092358,2	86844351,34	108030217	116522829	123902033

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Aprobación de precios unitarios y memorias de cálculo

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE MARIANA ROZO MORENO

Matrícula Profesional No.: 091037-0539458 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 18/08/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: META — SEMANA No.: 34 del 11 al 17 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☑

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SANTA LUCIA DEL MUNICIPIO PUERTO RICO, DEPARTAMENTO DE META, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El proyecto a desarrollar en virtud del convenio aborda el mejoramiento de la vía terciaria situada en la zona de influencia dentro del municipio de Puerto Rico, en el departamento de Menta, específicamente en la vereda Santa Lucia, con "LOMA MATECOCO" como punto de referencia. El propósito principal de este proyecto es la construcción de 94 metros lineales de placa huella y la construcción de una alcantarilla de tipo III.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Se programará la primera visita técnica al punto de referencia con el objetivo de precisar las cantidades reales que se llevarán a cabo en el marco del proyecto. Durante esta visita, se realizará una evaluación del área, permitiendo una definición más precisa de las dimensiones y alcances contemplados en el objeto del proyecto, optimizando así la ejecución del proyecto y asegurando la congruencia entre las metas previstas y la realidad del sitio de intervención.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SANTA LUCIA

CONVENIO No. 4664 de 2023 — VALOR INICIAL: $ 186.874.936,00

FECHA DE INICIO: 22 de diciembre de 2023 — VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 de diciembre de 2023 — VALOR ACUMULADO: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 15 de septiembre de 2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: MISAEL VILLALBA GUAYARA

INTEGRANTES:

CONTRATO No. 5001 de 2023 — VALOR INICIAL: $ 65.909.578,00

FECHA DE INICIO: 22 de diciembre de 2023 — VALOR ADICIONES: $ 32.852.568

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 de diciembre de 2023 — VALOR ACUMULADO: $ 98.762.146

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 15 de septiembre de 2024 — VALOR ANTICIPO: $ -

VALOR AMORTIZADO: $ -

SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 185.874.936	$ 185.874.936		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ 128.887.421		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 185.874.936	$ 56.987.515		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 65.909.578	$ 98.079.562		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 682.584,00	$ 79.505.938		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 65.226.994	$ 18.573.624		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 138.950.825,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 110.270.074,40	59%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 110.270.074,40	59%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 18.617.346,23	10%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 128.887.420,63	69%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 128.887.420,63	69%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

Observaciones: En esta semana no se realizaron pagos, ni descuentos del banco por comisión.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 80.188.522,07	81,19%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 80.188.522,07	81,19%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 6.995.478,47	7,08%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 6.995.478,47	7,08%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %

Meta Física Ejecutada %

Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	Placa huella	m	72,2
*			
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A
EMISIONES:	SI		NO		N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A

OBSERVACIONES: El 20 de febrero el Instituto Nacional de Vias (INVIAS) mediante el oficio con numero de radicado 2024S-VMET-008893, solicito la implementacion de un modelo paga. Esto ultimo, informandose a la JAC para iniciar su respectiva implementacion.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	5	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 11

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: La interventoría aprueba los perfiles de ingeniero residente, maestro y contados, mediante un oficio emitio el 23 de enero de 2024.


VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se realizaron revisiones parciales de precios unitarios, memorias de cálculo y memorias de cantidades.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Pendiente el inicio de la la realización de apiques a cielo abierto y perfil estratigráfico, levantamiento topográfico,cartera, informe y georreferenciación, estudio hidrológico e hidráulico y diseño geométrico y diseño de mezcla, lo anterior por insuficiencia de recursos.

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

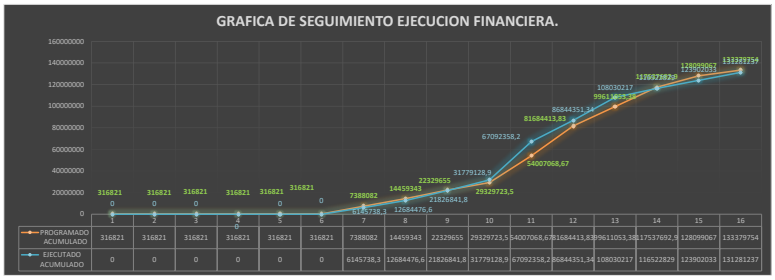

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PROGRAMADO ACUMULADO	316821	316821	316821	316821	316821	316821	7388082	14459343	22329655	29329723,5	54007068,67	81684413,83	99611053,38	117537692,9	128099067	133379754
EJECUTADO ACUMULADO	0	0	0	0	0	0	6145738,3	12684476,6	21826841,8	31779128,9	67092358,2	86844351,34	108030217	116522829	123902033	131281237

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Aprobación de precios unitarios y memorias de cálculo

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE MARIANA ROZO MORENO

Matrícula Profesional No.: 091037-053458 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 25/08/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: META — SEMANA No.: 35 del 18 al 24 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☑

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SANTA LUCIA DEL MUNICIPIO PUERTO RICO, DEPARTAMENTO DE META, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El proyecto a desarrollar en virtud del convenio aborda el mejoramiento de la vía terciaria situada en la zona de influencia dentro del municipio de Puerto Rico, en el departamento de Menta, específicamente en la vereda Santa Lucia, con "LOMA MATECOCO" como punto de referencia. El propósito principal de este proyecto es la construcción de 94 metros lineales de placa huella y la construcción de una alcantarilla de tipo III.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Se programará la primera visita técnica al punto de referencia con el objetivo de precisar las cantidades reales que se llevarán a cabo en el marco del proyecto. Durante esta visita, se realizará una evaluación del área, permitiendo una definición más precisa de las dimensiones y alcances contemplados en el objeto del proyecto, optimizando así la ejecución del proyecto y asegurando la congruencia entre las metas previstas y la realidad del sitio de intervención.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SANTA LUCIA

CONVENIO No. 4664 de 2023 — VALOR INICIAL: $ 186.874.936,00

FECHA DE INICIO: 22 de diciembre de 2023 — VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 de diciembre de 2023 — VALOR ACUMULADO: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 15 de septiembre de 2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: MISAEL VILLALBA GUAYARA

INTEGRANTES:

CONTRATO No. 5001 de 2023 — VALOR INICIAL: $ 65.909.578,00

FECHA DE INICIO: 22 de diciembre de 2023 — VALOR ADICIONES: $ 32.852.568

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 de diciembre de 2023 — VALOR ACUMULADO: $ 98.762.146

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 15 de septiembre de 2024 — VALOR ANTICIPO: $ -

VALOR AMORTIZADO: $ -

SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 185.874.936	$ 185.874.936		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ 159.881.365		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 185.874.936	$ 25.993.571		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 65.909.578	$ 98.079.562		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 682.584,00	$ 86.501.417		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 65.226.994	$ 11.578.145		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 138.950.825,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 139.686.337,40	75%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 139.686.337,40	75%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 20.195.028,08	11%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 159.881.365,48	86%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 159.881.365,48	86%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 30.993.945,00	17%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 30.993.945,00	17%

Observaciones: Se realizó el pago 5 a la contadora y pagos correspondintes al rubro de obra como el transporte de agregados, transporte Indesk y ferreteria.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 87.184.000,54	88,28%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 87.184.000,54	88,28%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 6.995.478,47	7,08%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 6.995.478,47	7,08%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: — Avance o Atraso Físico %:

Meta Física Ejecutada %:

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	Placa huella	m	72,2
*			
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: — TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES: El 20 de febrero el Instituto Nacional de Vias (INVIAS) mediante el oficio con numero de radicado 2024S-VMET-008893, solicito la implementacion de un modelo paga. Esto ultimo, informandose a la JAC para iniciar su respectiva implementacion.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	5	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 11

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: La interventoría aprueba los perfiles de ingeniero residente, maestro y contados, mediante un oficio emitio el 23 de enero de 2024.


VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se realizaron revisiones parciales de precios unitarios, memorias de cálculo y memorias de cantidades.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Pendiente el inicio de la la realización de apiques a cielo abierto y perfil estratigráfico, levantamiento topográfico,cartera, informe y georreferenciación, estudio hidrológico e hidráulico y diseño geométrico y diseño de mezcla, lo anterior por insuficiencia de recursos.

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

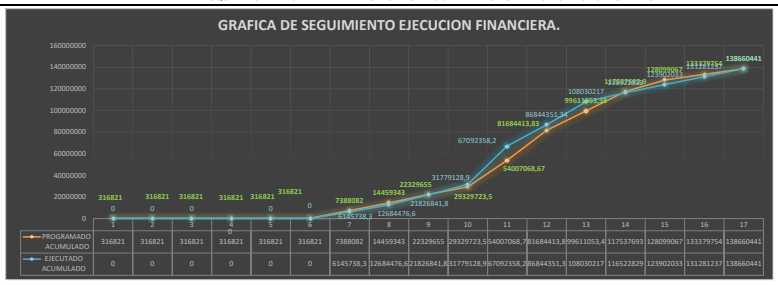

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
PROGRAMADO ACUMULADO	316821	316821	316821	316821	316821	316821	7388082	14459343	22329655	29329723,5	54007068,7	81684413,8	99611053,4	117537693	128099067	133379754	138660441
EJECUTADO ACUMULADO	0	0	0	0	0	0	6145738,3	12684476,6	21826841,8	31779128,9	67092358,2	86844351,3	108030217	116522829	123902033	131281237	138660441

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTO 1

Indicar localización y actividad

FOTO 2

Indicar localización y actividad

FOTO 3

Indicar localización y actividad

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Aprobación de precios unitarios y memorias de cálculo

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE MARIANA ROZO MORENO

Matrícula Profesional No.: 091037-05394S8 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 2/09/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: META — SEMANA No.: 36 del 25 al 30 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☑

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SANTA LUCIA DEL MUNICIPIO PUERTO RICO, DEPARTAMENTO DE META, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El proyecto a desarrollar en virtud del convenio aborda el mejoramiento de la vía terciaria situada en la zona de influencia dentro del municipio de Puerto Rico, en el departamento de Menta, específicamente en la vereda Santa Lucia, con "LOMA MATECOCO" como punto de referencia. El propósito principal de este proyecto es la construcción de 94 metros lineales de placa huella y la construcción de una alcantarilla de tipo III.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Se programará la primera visita técnica al punto de referencia con el objetivo de precisar las cantidades reales que se llevarán a cabo en el marco del proyecto. Durante esta visita, se realizará una evaluación del área, permitiendo una definición más precisa de las dimensiones y alcances contemplados en el objeto del proyecto, optimizando así la ejecución del proyecto y asegurando la congruencia entre las metas previstas y la realidad del sitio de intervención.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SANTA LUCIA

CONVENIO No.	4664 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 186.874.936,00
FECHA DE INICIO:	22 de diciembre de 2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 de diciembre de 2023	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	15 de septiembre de 2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: MISAEL VILLALBA GUAYARA

INTEGRANTES:

CONTRATO No.	5001 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 65.909.578,00
FECHA DE INICIO:	22 de diciembre de 2023	VALOR ADICIONES:	$ 32.852.568
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 de diciembre de 2023	VALOR ACUMULADO:	$ 98.762.146
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	15 de septiembre de 2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 185.874.936	$ 185.874.936		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ 159.880.984		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 185.874.936	$ 25.993.952		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 65.909.578	$ 98.079.562		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 682.584,00	$ 92.497.541		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 65.226.994	$ 5.582.021		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 138.950.825,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 139.686.337,40	75%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 139.686.337,40	75%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 20.194.647,08	11%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 159.880.984,48	86%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 159.880.984,48	86%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

Observaciones: En esta semana no se realizaron pagos, ni descuentos del banco por comisión.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 93.180.124,94	94,35%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 93.180.124,94	94,35%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 5.996.124,40	6,07%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 5.996.124,40	6,07%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %

Meta Física Ejecutada %

Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	Placa huella	m	72,2
*			
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A
EMISIONES:	SI		NO		N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A

OBSERVACIONES: El 20 de febrero el Instituto Nacional de Vias (INVIAS) mediante el oficio con numero de radicado 2024S-VMET-008893, solicito la implementacion de un modelo paga. Esto ultimo, informandose a la JAC para iniciar su respectiva implementacion.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	5	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 11

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: La interventoría aprueba los perfiles de ingeniero residente, maestro y contados, mediante un oficio emitio el 23 de enero de 2024.

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se realizaron revisiones parciales de precios unitarios, memorias de cálculo y memorias de cantidades.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Pendiente el inicio de la la realización de apiques a cielo abierto y perfil estratigráfico, levantamiento topográfico,cartera, informe y georreferenciación, estudio hidrológico e hidráulico y diseño geométrico y diseño de mezcla, lo anterior por insuficiencia de recursos.

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTO 1	**FOTO 2**	**FOTO 3**
Indicar localización y actividad	**Indicar localización y actividad**	**Indicar localización y actividad**

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Aprobación de precios unitarios y memorias de cálculo

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE MARIANA ROZO MORENO

Matrícula Profesional No.: 091037-0539458 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

4.2. MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA:

En el transcurso del mes en curso, no se registró el uso de maquinaria amarilla en las actividades correspondientes para los Convenios 4614.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 03/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: 01/08/2024 AL 30/08/2024

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SANTA LUCIA DEL MUNICIPIO PUERTO RICO, DEPARTAMENTO DE META, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO No. 4664 DE 2023

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SANTA LUCIA

CONTRATO INTERVENTORÍA No 5001 DE 2023

INTERVENTORÍA: MISAEL VILLALBA GUAYARA

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																													
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Retroexcavadora	John Deere Linea 510D modelo 1988	0,8 M3	Vda Santa Lucia																														A	
																																	1	
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO																																	1	
TOTAL ACTIVO																																		
TOTAL EN REPARACION																																		
TOTAL INACTIVO																																		

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1	100%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	1	100%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R		0%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I		0%

CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimien
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cump
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: DIEGO FERNANDO HERNANDEZ MUÑOZ
Residente de Obra
Matrícula Profesional No. 25202-425694 CND

Firma Astrid Lorena Bravo H
Nombre: ASTRID LORENA BRAVO HERNANDEZ
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 091037-0592169 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.3. PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL DE OBRA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	05/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: META

CONTRATO DE OBRA No: 4614 DE 2023

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA PRIMAVERA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: AGOSTO DE 2024

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA PRIMAVERA DEL MUNICIPIO PUERTO RICO, DEPARTAMENTO DE META, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 5001 DE 2023

INTERVENTOR: MISAEL VILLALBA GUAYARA

NOMBRE ARL: N/A

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: N/A

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes (1 a 31)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
								Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	JORGE ARIEL BERNAL ARBOLEDA	86006587	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.300.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	OAC	$ 1.300.000,00	$ 90.500	V	CAPITAL SALUD	9472922610	$ 162.500	PORVENIR	9472922610	$ 338.000	$ 52.000	$ 26.000	$ 39.000	
2	JIMENEZ JIMENEZ ALEXANDER	7843726	MAESTRO DE OBRA	$ 2.320.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	OAC	$ 1.300.000,00	$ 90.500	V	CAPITAL SALUD	9472922610	$ 162.500	PORVENIR	9472922610	$ 338.000	$ 52.000	$ 26.000	$ 39.000	
3	JIMENEZ SANCHEZ FABIAN FELIPE	1123800617	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.300.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	OAC	$ 1.300.000,00	$ 90.500	V	CAPITAL SALUD	9472922610	$ 162.500	PORVENIR	9472922610	$ 338.000	$ 52.000	$ 26.000	$ 39.000	
4	SALAS MORALES LUIS ALBERTO	1121417008	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.300.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	OAC	$ 1.300.000,00	$ 90.500	V	CAPITAL SALUD	9472922610	$ 162.500	PORVENIR	9472922610	$ 338.000	$ 52.000	$ 26.000	$ 39.000	
5	ZARATE GONZALES WILLIAM FERNANDO	1057919054	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.300.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	OAC	$ 1.300.000,00	$ 90.500	V	CAPITAL SALUD	9472922610	$ 162.500	PORVENIR	9472922610	$ 338.000	$ 52.000	$ 26.000	$ 39.000	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

Durante el presente mes surtieron trámites administrativos, por tanto no se llevaron a cabo actividades de obra. Así mismo, el Instituto Nacional de vías recomendo no contratar el personal descrito en los gastos administrativos, toda vez que se gastaba el recurso para el seguimiento a las actividades de obra en actividades administrativas. Así las cosas, la comunicación ha sido con el presidente de la JAC.

El contratista adjunta la certificación de fecha _____ a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: MARIANO ROZO MORENO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 091037-0539458 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	05/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

CONTRATO DE OBRA No: 4664 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SANTA LUCIA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: AGOSTO DE 2024 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SANTA LUCIA DEL MUNICIPIO PUERTO RICO, DEPARTAMENTO DE META, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 5001 DE 2023 **INTERVENTOR:** MISAEL VILLALBA GUAYARA

NOMBRE ARL: N/A **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** N/A

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																													Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	DIAZ FERNANDO	93.293.200	Maestro de obra	$ 1.237.333,00											X	X	X	X	X	X															OAC	$ 693.334,00	$ 48.300	V	CAPITAL SALUD	9471961563	$ 86.700	PORVENIR	9471961563	$ 180.300	$ 27.800	$ 13.900	$ 20.900	
2	FONSECA JOSE SALATIEL	11.519.454	Ayudante	$ 693.333,00											X	X	X	X	X	X															OAC	$ 693.334,00	$ 48.300	V	CAPITAL SALUD	9471961563	$ 86.700	PORVENIR	9471961563	$ 180.300	$ 27.800	$ 13.900	$ 20.900	
3	GOMEZ ORLANDO ANTONIIO	75.143.822	Ayudante	$ 693.333,00											X	X	X	X	X	X															OAC	$ 693.334,00	$ 48.300	V	CAPITAL SALUD	9471961563	$ 86.700	PORVENIR	9471961563	$ 180.300	$ 27.800	$ 13.900	$ 20.900	
4	SANABRIA BUSTOS JOSE ISRAEL	86.036.046	Ayudante	$ 693.333,00											X	X	X	X	X	X															OAC	$ 693.334,00	$ 48.300	V	CAPITAL SALUD	9471961563	$ 86.700	COLPENSIONES	9471961563	$ 180.300	$ 27.800	$ 13.900	$ 20.900	
5	USUGA GONZALES VERONICA JOHANA	1.038.334.110	Ayudante	$ 693.333,00											X	X	X	X	X	X															OAC	$ 693.334,00	$ 48.300	V	CAPITAL SALUD	9471961563	$ 86.700	PROTECCION	9471961563	$ 180.300	$ 27.800	$ 13.900	$ 20.900	
No.																																												

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:
Durante el presente mes surtieron trámites administrativos, por tanto no se llevaron a cabo actividades de obra. Así mismo, el Instituto Nacional de vías recomendo no contratar el personal descrito en los gastos administrativos, toda vez que se gastaba el recurso para el seguimiento a las actividades de obra en actividades administrativas. Así las cosas, la comunicación ha sido con el presidente de la JAC.

El contratista adjunta la certificación de fecha _____ a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:
1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: MARIANA ROZO MORENO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 091037-0539458 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.4. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO CONVENIOS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 02/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES, CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

DIRECCIÓN TERRITORIAL: META

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. 7 **MES:** AGOSTO **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO** ☐

CONVENIO No. 4614-2023 (Indicar número y año)

DESEMBOLSO OTORGADO: 100 **%**

VALOR DEL DESEMBOLSO OTORGADO: **$ 186.175.193,00** **(M/CTE)**

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA PRIMAVERA DEL MUNICIPIO PUERTO RICO, DEPARTAMENTO DE META, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ORGANIZACIÓN DE ACCIÓN COMUNAL JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA PRIMAVERA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5001-2023 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: MISAEL VILLALBA GUAYARA

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

DOCUMENTO DE EGRESO No.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR FACTURA CON IVA	VALOR ANTICIPO	DESCUENTO RETENCIÓN EN LA FUENTE	DESCUENTO RETENCIÓN ICA	VALOR A PAGAR O VALOR GIRADO	RUBRO No.	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO
ORDEN NO.35	1/08/2024	LEONARDO TRUJILLO	FERRETERIA 2	$ 9.212.312,14	$ -	$ -	$ -	$ 9.212.312,14	1	OBRA
ORDEN NO.34	1/08/2024	JAC LA PRIMAVERA	NOMINA DE JULIO AYUDANTES	$ 7.147.988,00	$ -	$ -	$ -	$ 7.147.988,00	1	OBRA
ORDEN NO.34	1/08/2024	JAC LA PRIMAVERA	NOMINA DE JULIO OBRA	$ 2.808.713,00	$ -	$ -	$ -	$ 2.808.713,00	3	ADMINISTRATIVO
	1/08/2024	AV VILLAS	COBRO MENSUAL DE NOTIFICACIONES	$ 3.950,00	$ -	$ -	$ -	$ 3.950,00	3	COBRO MENSUAL DE NOTIFICACIONES
	1/08/2024	AV VILLAS	NOTA DEBITO IVA	$ 750,00	$ -	$ -	$ -	$ 750,00	3	NOTA DEBITO IVA
	1/08/2024	AV VILLAS	COMISION TRANSF ACH OFICINA	$ 13.550,00	$ -	$ -	$ -	$ 13.550,00	3	COMISION TRANSF ACH OFICINA
	1/08/2024	AV VILLAS	COMISION TRANSF ACH OFICINA	$ 13.550,00	$ -	$ -	$ -	$ 13.550,00	3	COMISION TRANSF ACH OFICINA
	1/08/2024	AV VILLAS	NOTA DEBITO 4X1000	$ 76.803,25	$ -	$ -	$ -	$ 76.803,25	3	NOTA DEBITO 4X1000
ORDEN NO.37	20/08/2024	JAC LA PRIMAVERA	CAJA MENOR 4	$ 500.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 500.000,00	1	OBRA
ORDEN NO.38	20/08/2024	YEIMY GONZALES	PAGO CONTADORA 5	$ 1.400.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 1.400.000,00	3	ADMINISTRATIVO
ORDEN NO.40	20/08/2024	RAMON ROJAS	TRITURADO	$ 2.087.680,00	$ -	$ -	$ -	$ 2.087.680,00	1	OBRA
ORDEN NO.41	20/08/2024	INDESK LABORATORIO	TRANSPORTE INDESK	$ 280.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 280.000,00	1	OBRA
ORDEN NO.39	20/08/2024	LEONARDO TRUJILLO	ALQUILER DE EQUIPOS	$ 3.860.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 3.860.000,00	1	OBRA
	20/08/2024	AV VILLAS	COMISION TRANSF ACH OFICINA	$ 13.550,00	$ -	$ -	$ -	$ 13.550,00	3	COMISION TRANSF ACH OFICINA
	20/08/2024	AV VILLAS	COMISION TRANSF ACH OFICINA	$ 13.550,00	$ -	$ -	$ -	$ 13.550,00	3	COMISION TRANSF ACH OFICINA
	20/08/2024	AV VILLAS	COMISION TRANSF ACH OFICINA	$ 13.550,00	$ -	$ -	$ -	$ 13.550,00	3	COMISION TRANSF ACH OFICINA
	20/08/2024	AV VILLAS	COMISION TRANSF ACH OFICINA	$ 13.550,00	$ -	$ -	$ -	$ 13.550,00	3	COMISION TRANSF ACH OFICINA
	20/08/2024	AV VILLAS	COMISION TRANSF ACH OFICINA	$ 13.550,00	$ -	$ -	$ -	$ 13.550,00	3	COMISION TRANSF ACH OFICINA
	20/08/2024	AV VILLAS	NOTA DEBITO 4X1000	$ 32.781,72	$ -	$ -	$ -	$ 32.781,72	3	NOTA DEBITO 4X1000
	31/08/2024	DTN RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y ENTIDADES VARIAS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$ 466,18	$ -	$ -	$ -	$ (466,18)	3	RENDIMIENTOS FINANCIEROS

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).

** Indicar el número del rubro según la numeración establecida en el Plan de Inversión del desembolso Mensualizado del convenio.

NOTA:
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de desembolso y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del desembolso,

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL CONVENIO POR RUBRO

RUBRO No.	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO DESEMBOLSO ACTUAL (A-D)
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA	$ 138.950.825,00	$ 90.355.329,73	$ 23.087.980,14	$ 113.443.309,87	$ 25.507.515,13
2	GASTOS GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL	$ 4.168.525,00	$ -	$ -	$ -	$ 4.168.525,00
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 43.055.843,00	$ 18.317.994,53	$ 4.417.381,79	$ 22.735.376,32	$ 20.320.466,68
	TOTALES	$ 186.175.193,00				$ 49.996.506,81

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DEL INFORME **(AGOSTO) :** (Indicar el mes) $ 466,18 (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ 6.340,71 (Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO
118023486	$ 761,87	$ -	FEBRERO	5/07/2024	$ 761,87
118023486	$ 1.425,92	$ -	MARZO	5/07/2024	$ 2.187,79
118023486	$ 1.125,54	$ -	ABRIL	5/07/2024	$ 3.313,33
118023486	$ 989,71	$ -	MAYO	5/07/2024	$ 4.303,04
118259980	$ 874,32	$ -	JUNIO	29/07/2024	$ 5.177,36
EN TRAMITE	$ 697,17	$ -	JULIO		$ 5.874,53
EN TRAMITE	$ 466,18	$ -	AGOSTO		$ 6.340,71

OBSERVACIONES:

NOTA:

Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica de remitir mensualmente copia a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del desembolso otorgado, el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)**

Firma:
Nombre: WILMER DELGADO
Representante Legal OAC

Firma:
Nombre: YEIMI GONZALES
Contador de la OAC
Tarjeta Profesional No.: 196772-T

Firma:
Nombre: MISAEL VILLALBA GUAYARA
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202093652CND

Firma:
Nombre: YEINER EDUARDO PINILLA
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Etnica
Matrícula Profesional No.: 091037-0516940 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO CONVENIOS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 06/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES, CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

DIRECCIÓN TERRITORIAL: META

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. 6 **MES:** AGOSTO **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO** ☐

CONVENIO No. 4664-2023 (Indicar número y año)

DESEMBOLSO OTORGADO: 100 %

VALOR DEL DESEMBOLSO OTORGADO: $ 185.874.936,00 (M/CTE)

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SANTA LUCÍA DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO EN EL DEPARTAMENTO DEL META PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ORGANIZACIÓN DE ACCIÓN COMUNAL JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SANTA LUCIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5001-2023 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: MISAEL VILLALBA GUAYARA

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

DOCUMENTO DE EGRESO No.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR FACTURA CON IVA	VALOR ANTICIPO	DESCUENTO RETENCIÓN EN LA FUENTE	DESCUENTO RETENCIÓN ICA	VALOR A PAGAR O VALOR GIRADO	RUBRO No.	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO
	1/08/2024	BANCO AVVILLAS	COBRO MENSUAL DE NOTIFICACIONES	$ 3.950,00	$ -	$ -	$ -	$ 3.950	3	COBRO NOTIFICACIONES
	1/08/2024	BANCO AVVILLAS	NOTA DEBITO I.V.A.	$ 750,00	$ -	$ -	$ -	$ 750	3	I.V.A.
	1/08/2024	BANCO AVVILLAS	NOTA DEBITO	$ 18,80	$ -	$ -	$ -	$ 19	3	NOTA BANCARIA
ORDEN NO.30	20/08/2024	YEIMY GONZALES	CONTADORA 5	$ 1.400.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 1.400.000	3	ADMINISTRATIVO
ORDEN NO.31	20/08/2024	DIEGO CAICEDO	TRANSPORTE DE AGREGADOS	$ 12.276.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 12.276.000	1	OBRA
ORDEN NO.29	20/08/2024	LEONARDO TRUJILLO	FERRETERIA	$ 16.860.263,45	$ -	$ -	$ -	$ 16.860.263	1	OBRA
ORDEN NO.32	20/08/2024	INDESK LABORATORIO	TRANSPORTE INDESK	$ 280.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 280.000	1	OBRA
	20/08/2024	BANCO AVVILLAS	COMISION BANCARIA	$ 13.550,00	$ -	$ -	$ -	$ 13.550	3	COMISION BANCO
	20/08/2024	BANCO AVVILLAS	COMISION BANCARIA	$ 13.550,00	$ -	$ -	$ -	$ 13.550	3	COMISION BANCO
	20/08/2024	BANCO AVVILLAS	COMISION BANCARIA	$ 13.550,00	$ -	$ -	$ -	$ 13.550	3	COMISION BANCO
	20/08/2024	BANCO AVVILLAS	COMISION BANCARIA	$ 13.550,00	$ -	$ -	$ -	$ 13.550	3	COMISION BANCO
	20/08/2024	BANCO AVVILLAS	NOTA DEBITO	$ 123.481,85	$ -	$ -	$ -	$ 123.482	3	NOTA BANCARIA
	31/08/2024	DTN RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y ENTIDADES VARIAS	RENDIMIENTO FINANCIERO	$ 381,06	$ -	$ -	$ -	$ (381)	3	RENDIMIENTO

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).

** Indicar el número del rubro según la numeración establecida en el Plan de Inversión del desembolso Mensualizado del convenio.

NOTA:
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de desembolso y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del desembolso,

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL CONVENIO POR RUBRO

RUBRO No.	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO DESEMBOLSO ACTUAL (A-D)
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA	$ 138.660.441,00	$ 107.461.361	$ 29.416.263	$ 136.877.624,85	$ 1.782.816,15
2	GASTOS GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL	$ 4.159.813,00	$ -	$ -	$ -	$ 4.159.813,00
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 43.054.682,00	$ 21.421.340	$ 1.582.020	$ 23.003.359,10	$ 20.051.322,90
	TOTALES	$ 185.874.936,00				$ 25.993.952,05

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DEL INFORME **(AGOSTO)** (Indicar el mes) $ 381,06 (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ 4.924,36 (Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO
118067294	$ 852,88	$ -	MARZO	10/07/2024	$ 852,88
118067294	$ 1.201,27	$ -	ABRIL	10/07/2024	$ 2.054,15
118067294	$ 1.026,28	$ -	MAYO	10/07/2024	$ 3.080,43
118243221	$ 859,54	$ -	JUNIO	26/07/2024	$ 3.939,97
EN TRAMITE	$ 603,33	$ -	JULIO		$ 4.543,30
EN TRAMITE	$ 381,06	$ -	AGOSTO		$ 4.924,36

OBSERVACIONES:

NOTA:
Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica de remitir mensualmente copia a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del desembolso otorgado, el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)**

Firma: José Remolina Jerez
Nombre: JOSE ALEXANDER REMOLINA JEREZ
Representante Legal OAC

Firma:
Nombre: YEIMY GONZALES
Contador de la OAC
Tarjeta Profesional No.: 196772-T

Firma:
Nombre: MISAEL VALLALBA GUYARA
Representante Legal o Delegado Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202093652CND

Firma:
Nombre: DIEGO FERNANDO HERNANDEZ MUÑOZ
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.: 25202-425694 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

4.5. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO: MEPI-MN1-IN-15-FR-10 VERSIÓN: 1 PÁGINA:

FECHA: 2/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCION TERRITORIAL:** META

CONTRATO DE OBRA No: 4614 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA PRIMAVERA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: AGOSTO DE 2024 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA PRIMAVERA DEL MUNICIPIO PUERTO RICO, DEPARTAMENTO DE META, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL


CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 5001 DE 2023 **INTERVENTOR:** MISAEL VILLALBA GUAYARA

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco		24	24		24	24	24	12	24	24		24	24	24		12	24		24	24	12	24	24	24		24	24	24	24	24	25	565
Lluvias moderadas	24							12							24	12					12											84
Lluvias intensas																																0
Total horas	24	24	24	0	24	24	24	24	24	24	0	24	24	24	24	24	24	0	24	24	24	24	24	24	0	24	24	24	24	24	25	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NUMERO DE HORAS POR DIA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DIA.

NOTA: Datos obtenidos de la estacion Puerto Rico del IDEAM

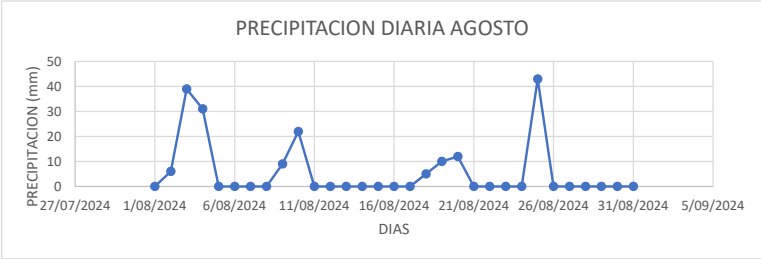

OBSERVACIONES:

Según bítacora de obra los días 4,11,18 y 25 de Agosto; no se desarrollaron actividades, pues no corresponden a días laborales.

Firma

Nombre:
Residente de Obra: Yeiner Eduardo Pinilla Amaya.
Matrícula Profesiona 091037-0516940 CND

Firma Astrid Lorena Bravo H

Nombre: ASTRID LORENA BRAVO HERNANDEZ
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 091037-0592169 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 2/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

CONTRATO DE OBRA No: 4664 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SANTA LUCIA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: AGOSTO DE 2024 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SANTA LUCÍA DEL MUNICIPIO PUERTO RICO, DEPARTAMENTO DE META, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL


CONTRATO DE INTERVENTORIA No: 5001 DE 2023 **INTERVENTOR:** MISAEL VILLALBA GUAYARA

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																													
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	24	24	24		24	24	24	24	24	24		24	24	24	24	24	24		24	24	24	24	24	24		24	24	24	24	24	24	648
Lluvias moderadas																																0
Lluvias intensas																																0
Total horas	24	24	24	0	24	24	24	24	24	24	0	24	24	24	24	24	24	0	24	24	24	24	24	24	0	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NUMERO DE HORAS POR DIA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DIA.

NOTA: Datos obtenidos de la estacion Puerto Rico del IDEAM

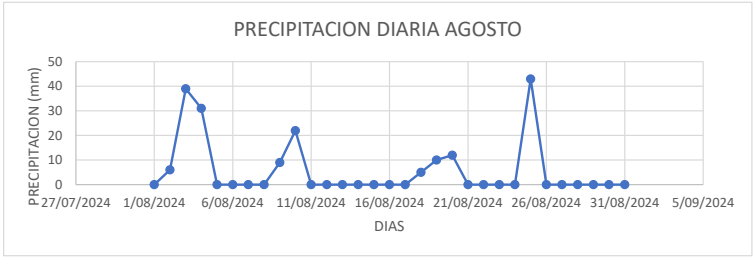

OBSERVACIONES:

Según bítacora de obra los días 4,11,18 y 25 de Agosto; no se desarrollaron actividades, pues no corresponden a días laborales.

Firma
Nombre:
Residente de Obra: DIEGO FERNANDO HERNANDEZ MUÑOZ
Matrícula Profesiona 25202-425694 CND

Firma Astrid Lorena Bravo H
Nombre: ASTRID LORENA BRAVO HERNANDEZ
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 091037-0592169 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.6. RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA 2/09/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCION TERRITORIAL:** META

CONTRATO DE OBRA No.: 4614 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA PRIMAVERA

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA PRIMAVERA DEL MUNICIPIO PUERTO RICO, DEPARTAMENTO DE META, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL

MES Y AÑO DEL INFORME MENSU AGOSTO DE 2024 **PROYECTO:** PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA N 5001 DE 2023 **INTERVENTOR:** MISAEL VILLALBA GUAYARA

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
5	12/08/2024	Ensayo de resistencia a la compresión	NTC 673 - 1513; INV E-	Huella seccion 21	4	3000 PSI	3094 PSI	SI	Concreto de 3000 PSI
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORIA									
5	10/08/2024	Ensayo de resistencia a la compresión	INV E-410	HUELLA SECCION 21	4	3000 PSI	3087 PSI	SI	Concreto de 3000 PSI

OBSERVACIONES:

Actualmente, no se han llevado a cabo ensayos debido a que el convenio aún se encuentra en trámites administrativos para su inicio

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: MARIANA ROZO MORENO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 091037 - 0539458 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA: 2/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCION TERRITORIAL:** META

CONTRATO DE OBRA No.: 4664 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SANTA LUCIA

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SANTA LUCIA DEL MUNICIPIO PUERTO RICO, DEPARTAMENTO DE META, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL

MES Y AÑO DEL INFORME MENSU JULIO DE 2024 **PROYECTO:** PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA N 5001 DE 2023 **INTERVENTOR:** MISAEL VILLALBA GUAYARA

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
8	1/08/2024	Ensayo de resistencia a la compresión	NTC 673 - 1513; INV E-	Concreto Ciclopeo	3	3000 PSI	3223,6 PSI	SI	Concreto de 3000 PSI
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORIA									

OBSERVACIONES:

Actualmente, no se han llevado a cabo ensayos debido a que el convenio aún se encuentra en trámites administrativos para su inicio

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: MARIANA RODZO MORENO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 091037 - 0539458 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.7. SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5 (Día) 8 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

CONTRATO DE OBRA No. 4614 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA PRIMAVERA

OBJETO DEL CONTRATO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA PRIMAVERA DEL MUNICIPIO PUERTO RICO, DEPARTAMENTO DE META, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO: 22/12/2023
PLAZO INICIAL: 31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 15/09/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL: $ 187.175.193,00
VALOR ACUMULADO: $ 187.175.193,00 (Incluye adiciones)
VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 6.500.000,00
VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 6.500.000,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5001 DE 2023 **INTERVENTOR:** MISAEL VILLALBA GUAYARA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	20%	$ 37.435.038,60	27	11	2023	31/10/2024		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.A	N.A	Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 9.358.759,65	27	11	2023	31	12	2026
Calidad de Estudios y Diseños	N.A	N.A	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 56.152.557,90	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CV-100037906
Certificado de modificación o anexo No.: 24118394
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: MUNDIAL DE SEGUROS
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 19/12/2023

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	27	11	2024	31	12	2023
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No CV-100010068 **OTRAS PÓLIZAS No.**
Certificado de modificación o anexo No.: 24118395
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: MUNDIAL DE SEGUROS
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 19/12/2023

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ORDEN DE INICIO Y PRORROGA No.1

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRORROGA No.:** 1 **MODIFICACION No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	20%	$ 37.435.038,60	30	12	2023	30	4	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 9.358.759,65	30	12	2023	30	4	2027
Calidad de Estudios y Diseños			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 56.152.557,90	30	4	2024	30	4	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CV-100037906
Certificado de modificación o anexo No.: 24121936
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)
Razón Social Compañía Aseguradora: MUNDIAL DE SEGUROS
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 10/04/2024

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDOSEGUN ORDEN DE INICIO Y PRORROGA No.1

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado	VIGENCIA

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMLV	$ 260.000.000,00	27	11	2023	30	4	2024
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No CV-100010068 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No. 24121949
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: MUNDIAL DE SEGUROS

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 10/04/2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO SEGÚN ORDEN DE INICIO Y PRORROGA No.2

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	20%	$ 37.435.038,60	30	4	2024	30	7	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales	5%	$ 9.358.759,65	30	4	2024	30	7	2027
Calidad de Estudios y Diseños			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 56.152.557,90	30	7	2024	30	7	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CV-100037906

Certificado de modificación o anexo No.: 241299955
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: MUNDIAL DE SEGUROS

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 8/07/2024

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDOSEGUN ORDEN DE INICIO Y PRORROGA No.2

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMLV	$ 260.000.000,00	27	11	2023	30	7	2024
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No CV-100010068 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No. 241129567
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: MUNDIAL DE SEGUROS

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 8/07/2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO SEGÚN ORDEN DE INICIO Y PRORROGA No.3

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No** 3 **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	20%	$ 37.435.038,60	30	7	2024	15	9	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales	5%	$ 9.358.759,65	30	7	2024	15	9	2027
Calidad de Estudios y Diseños			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 56.152.557,90	15	9	2024	15	9	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CV-100037906

Certificado de modificación o anexo No.: 24134188
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: MUNDIAL DE SEGUROS

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: EN TRAMITE

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDOSEGUN ORDEN DE INICIO Y PRORROGA No.3

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No** 3 **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMLV	$ 260.000.000,00	27	11	2023	15	9	2024
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No CV-100010068 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No. 24134189
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: MUNDIAL DE SEGUROS

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: EN TRAMITE

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre MARIANA ROZO MORENO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 091037-0539458 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5 (Día) 8 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

CONTRATO DE OBRA No. 4664 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SANTA LUCIA

OBJETO DEL CONTRATO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SANTA LUCIA DEL MUNICIPIO PUERTO RICO, DEPARTAMENTO DE META, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO: 22/12/2023
PLAZO INICIAL: 31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 15/09/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL: $ 187.175.193,00
VALOR ACUMULADO: $ 187.175.193,00 (Incluye adiciones)
VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 6.500.000,00
VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 6.500.000,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5001 DE 2023 **INTERVENTOR:** MISAEL VILLALBA GUAYARA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	20%	$ 37.374.987,20	29	11	2023	31/10/2024		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.A	N.A	Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 9.343.746,80	29	11	2023	31	12	2026
Calidad de Estudios y Diseños	N.A	N.A	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 56.062.480,80	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CV-100037904
Certificado de modificación o anexo No.: 24118390
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: MUNDIAL DE SEGUROS
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 19/12/2023

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	29	11	2023	31	12	2023
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No CV-100010066 **OTRAS PÓLIZAS No.**
Certificado de modificación o anexo No.: 24118391
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: MUNDIAL DE SEGUROS
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 19/12/2023

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ORDEN DE INICIO Y PRORROGA No.1

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRORROGA No.:** 1 **MODIFICACION No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	20%	$ 37.374.987,20	19	1	2024	30	8	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.A	N.A	Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 9.343.746,80	19	1	2024	30	4	2027
Calidad de Estudios y Diseños	N.A	N.A	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 56.062.480,80	30	4	2024	30	4	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CV-100037904
Certificado de modificación o anexo No.: 24125665
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)
Razón Social Compañía Aseguradora: MUNDIAL DE SEGUROS
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 10/04/2024

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDOSEGUN ORDEN DE INICIO Y PRORROGA No.1

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado	VIGENCIA

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMLV	$ 260.000.000,00	29	11	2023	30	4	2024
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CV-100010066 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No. 24126697
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: MUNDIAL DE SEGUROS

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 10/04/2024

OBSERVACIONES:

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:2** **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	20%	$ 37.374.987,20	30	4	2024	30	11	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.A	N.A	Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales	5%	$ 9.343.746,80	30	4	2024	30	7	2027
Calidad de Estudios y Diseños	N.A	N.A	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 56.062.480,80	30	7	2024	30	7	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CV-100037904

Certificado de modificación o anexo No.: 24129956
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: MUNDIAL DE SEGUROS

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 8/07/2024

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDOSEGUN ORDEN DE INICIO Y PRORROGA No.2

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:2** **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMLV	$ 260.000.000,00	27	11	2023	30	7	2024
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CV-100010066 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No. 24129572
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: MUNDIAL DE SEGUROS

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 8/07/2024

OBSERVACIONES:

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No** 3 **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	20%	$ 37.374.987,20	30	7	2024	16	1	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales	5%	$ 9.343.746,80	30	7	2024	16	9	2027
Calidad de Estudios y Diseños			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 56.062.480,80	15	9	2024	15	9	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CV-100037904

Certificado de modificación o anexo No.: 24134474
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: MUNDIAL DE SEGUROS

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: EN TRAMITE

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDOSEGUN ORDEN DE INICIO Y PRORROGA No.3

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No** 3 **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMLV	$ 260.000.000,00	29	11	2023	15	9	2024
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CV-100010066 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No. 24134475
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: MUNDIAL DE SEGUROS

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: EN TRAMITE

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre MARIANA ROZO MORENO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 091037-0539458 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

4.8. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA

teniendo en cuenta las características de las obras, no se exigió presentar un plan de calidad a la OAC, se aplicó de manera conjunta con la interventoría el control de calidad de la obra, para garantizar el cumplimiento de las especificaciones, a través de ensayos de laboratorio

4.9. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

4614-2023:

Tabla de Avance Placa Huella		
Mes	**PH Construida (ml)**	**PH Construida Acum. (ml)**
Abril	0,00	0,00
Mayo	0,00	0,00
Junio	19,60	19,60
Julio	45,00	64,60
Agosto	27,40	92,00

4664-2023:

Tabla de Avance Placa Huella		
Mes	**PH Construida (ml)**	**PH Construida Acum. (ml)**
Mayo	0,00	0,00
Junio	11,37	11,37
Julio	60,15	71,51
Agosto	0,69	72,2

5 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORIA

5.1. información general del contrato

No. DE PROCESO	IP-DT-MET-026-2023
ID	CO1.SLCNTR.11753104
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO RICO DEPARTAMENTO DEL META DEL PROGRAMA “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".
CONTRATISTA	MISAEL VILLALBA GUAYARA C.C 86.058.561
VALOR	$ 65.909.578,00
ADICIÓN	$ 32.852.568
VALOR ACTUALIZADO	$ 98.762.146
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	22/12/2023
FECHA DE INICIO	22/12/2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31/12/2023
FECHA PRORROGA No.1	31/03/2024
FECHA PRORROGA No.2	30/04/2024

FECHA PRORROGA No.3	15/05/2024
FECHA PRORROGA No.4	31/05/2024
FECHA PRORROGA No.5	20/06/2024
FECHA PRORROGA No.6	15/09/2024
SUSPENSIÓN 1	20/06/2024 AL 04/07/2024
REINICIO	05/07/2024
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA	15/09/2024

5.2 Descripción de actividades realizadas por el Interventor

ACTIVIDADES PACTADAS	ACTIVIDADES
Revisar todos los documentos contractuales de los convenios solidarios, de los cuales se derivan las obras a realizar interventoría, objeto del presente proceso de selección de Interventoría, incluida la cartilla de obras menores y estructuras viales.	Durante el presente mes se revisaron los documentos contractuales de los convenios 4614-2023 y 4664-2023. Así mismo, se revisó la cartilla de obras menores suministrada en la pagina https://caminoscomunitarios.invias.gov.co/caja-herramientas.php
Las mediciones de las cantidades de obra realmente ejecutadas y aprobadas por la Interventoría son de exclusiva responsabilidad la junta u organismos de acción comunal- OAC y del Interventor. Estas mediciones deben desarrollarse detalladamente y servirán como soporte a la respectiva Pre-acta y Acta Recibo Parcial de Obra, información que serán incluidas en los respectivos informes de Interventoría. La interventoría y el instituto determinará de manera conjunta entre el o los Organismo de Acción Comunal, con fundamento en los resultados que arroje la aplicación de lo establecido en la especificación particular del proyecto "REVISIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL CONTENIDO DE LA CARTILLA DE OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS VIALES DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS", para lo cual se deberá tener en cuenta la visita técnica realizada por los profesionales designados del INVIAS en conjunto con el Representante legal del Organismo de Acción Comunal - OAC, en donde se realizó una concertación de las obras a ejecutar,	Durante el presente periodo, consultores de la OAC iniciaron de los estudios de apique a cielo abierto y perfil estratigráfico, así como el levantamiento topográfico, cartera, informe y georreferenciación. además del estudio hidrológico e hidráulico, junto con el diseño geométrico y el diseño de mezcla.

utilizando los diseños tipo establecidos en la Cartilla de Obras de Drenaje y Estructurales Viales, necesarias y suficientes para llevar a cabo el objeto del convenio y para garantizar la transitabilidad del sector a intervenir.	
El interventor deberá aprobar una vez se verifiquen las actividades tales como condiciones del terreno donde se ejecutarán las obras, verificando entre otras actividades; el estado de la subrasante (caracterización del suelo), pendiente, drenajes requeridos y condiciones particulares para la construcción de la estructura de pavimento (Pavimento convencional o placa huella), obras de drenajes, obras de contención de baja complejidad, etc	Inició el proceso de revisión y aprobación de los estudios y diseños por los especialistas de la interventoría, con el fin de dar inicio a la ejecución de la obra.
El interventor deberá verificar que la OAC deberá obtener los datos sobre condiciones locales, características de los materiales, ensayos de laboratorio de suelos y concretos, tránsito, levantamiento topográfico, etc., así como los conceptos de profesionales especializados de acuerdo con las obras estimadas en el desarrollo del convenio para garantizar su estabilidad y calidad.	Durante el presente periodo, la interventoría realizó la revisión de las observaciones de los estudios y diseños realizados por los consultores de la OAC. Se atendió la invitación realizada por el concejo municipal de Puerto Rico, con el objetivo de darle a conocer a la administración y a la comunidad el avance del proyecto que propende mejorar la calidad de vida de la comunidad de la vereda Santa Lucia y La Primavera.
El interventor deberá garantizar que el Organismo de Acción Comunal - **OAC** efectué todas las gestiones sociales, prediales y ambientales que apliquen y que se reglamenten, de conformidad con lo dispuesto en las especificaciones generales de construcción de carreteras y de la legislación ambiental vigente.	Se ha sugerido a las OAC establecer comunicaciones con los actores implicados en la intervención principal, para su conocimiento y apoyo durante la ejecución de la obra.
El Interventor deberá verificar que durante el plazo del convenio, el Organismo de Acción Comunal - OAC tome las medidas necesarias a fin de garantizar la seguridad vial del usuario en el sector a intervenir	Los convenios no cuentan con un rubro establecido para el plan de manejo de tránsito, no obstante, se establecen medidas mínimas para la seguridad vial al momento de iniciar obra.

El contenido y características de los informes mensuales debe ser de acuerdo con lo establecido en el Manual de Interventoría aplicado al programa de CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL vigente, no obstante, lo anterior, la interventoría se obliga a presentar los informes que requiera el INVIAS. Para cumplir con el objeto y metas contractuales, las actividades que ejecutará el INTERVENTOR están establecidas en el Manual de Interventoría aplicado al programa de CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL vigente, o el que lo modifique o lo sustituya del Instituto Nacional de Vías.	Se proyecta informe mensual, de acuerdo a lo indicado por el Instituto Nacional de vías.
Sin limitarse a lo anterior, el interventor debe cumplir sus obligaciones derivadas de la Ley 80 de 1993 y 1474 de 2011.	Se ha llevado a cabo el acompañamiento contractual a los convenios objeto de seguimiento, en lo que respecta a la actualización de pólizas según modificaciones realizadas.

5.3. Informes especialistas y profesionales

Durante el presente periodo no se requirió.

5.4. Informe programa anual de caja- PAC

N/A

5.5. informe matriz de riesgos

No.	RIESGO	SEGUIMIENTO
1	Factor Multiplicador y Precios Por debajo del Presupuesto Oficial en la propuesta del PROPONENTE y/o INTERVENTOR	El salario del inspector y del inspector SST fue calculado con base en el salario mínimo legal de 2022; sin embargo, con el aumento, hay una diferencia de $130.000 en cada uno.
2	Riesgo presentado por la terminación anticipada de la Interventoría, por estar ligada contractualmente al desarrollo de las obras desagregadas de los convenios solidarios, de tal manera que, si éste llegare a terminarse por	Actualmente, la interventoría supervisa simultáneamente los convenios 4614-2023 y 4664-2023. Por lo tanto, no se espera una finalización anticipada, a pesar de que las obras estén divididas en partes.

	cualquiera de las causales previstas en los convenios o por la Ley, el contrato de interventoría producto del presente concurso de méritos, será liquidado por terminación de su objeto, sin lugar a indemnización. Riesgo que asume el INTERVENTOR.	
3	Riesgo por la deficiente Interventoría al Ajuste y/o Actualización y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios realizados por las Juntas u organismos de acción comunal, que resultaren deficientes y/o incompletos y/o adversos para el proyecto, y que fueron revisados y aprobados por el Interventor. Riesgo que asume el INTERVENTOR	El alcance del proyecto fue actualizado conforme a las condiciones específicas de la zona, considerando la disponibilidad y costos de materiales, mano de obra local y presupuesto ajustado al mercado regional. Se realizaron ajustes técnicos en los estudios y diseños para adaptarlos a las características del entorno, garantizando su viabilidad técnica y económica.
4	Riesgo presentado por la deficiente Interventoría, que conlleve a generar problemas a causa del no inicio de las obras y/o parálisis de la mismas por demoras ocasionadas por la revisión y aprobación por parte del INTERVENTOR, de los cálculos estructurales y/o estudios y/o diseños definitivos para la obra de los convenios solidarios, elaborados por las Juntas u organismos de acción comunal. Riesgo que asume el INTERVENTOR	Cada una de las revisiones han sido realizadas en el menor tiempo posible.
5	Riesgo presentado por la deficiente Interventoría, por autorizar y/o aprobar por parte de la INTERVENTORIA, la ejecución de obras que contravienen los cálculos y/o estudios y/o diseños aprobados; Por autorizar y/o aprobar la construcción de obras con cálculos y/o estudios y/o diseños deficientes realizados por las juntas u organismos de acción	Cada una de las revisiones han sido realizadas en el menor tiempo posible.

	comunal. Riesgo que asume el INTERVENTOR	
6	Riesgo por la deficiente Interventoría, por autorizar y/o aprobar el personal de la Junta y organización comunal, sin que cumpla requisitos de acuerdo con las exigencias del convenio solidario y la normatividad vigente. Por permitir que las juntas u organismos de acción comunal ejecute los trabajos sin un Ingeniero Residente y/o Director, y/o Especialistas, y/o Personal Profesional, debidamente aprobado. Riesgo que asume el INTERVENTOR	Cada una de las revisiones han sido realizadas en el menor tiempo posible y en cumplimiento de los requisitos establecidos por el Instituto Nacional de vias.
7	Riesgo por la deficiente Interventoría, por mediciones erróneas de las cantidades de obra ejecutadas por las Juntas u organismos de acción comunal y medidas por el INTERVENTOR. Riesgo que asume el INTERVENTOR	El alcance del proyecto fue ajustado y actualizado considerando las condiciones especificas de la zona, incluyendo la disponibilidad y costos de materiales, mano de obra local y el presupuesto vigente en el mercado regional. Este proceso incluyó una revisión detallada de las mediciones realizadas, con el fin de corregir posibles inconsistencias en las cantidades de obra ejecutas por la junta u organismo de acción comunal, asimismo, se implementaron mecanismos de control y verificación para garantizar que las mediciones efectuadas por el interventor sean precisas, coherentes con los diseños aprobados y acorde con las necesidades del proyecto, mitigando así los riesgos asociados a errores en interventoría.
8	Riesgo por la deficiente Interventoría en el control y seguimiento a la señalización preventiva en obra, falta o deficiencia en la señalización de aproximación e iluminación,	Se aclara que el presupuesto inicial no incluyó un monto específico para el plan de manejo de tránsito; sin embargo, se están considerando algunas

	equipos de radio para cierres parciales, temporales y demás señalización necesaria, y de seguridad industrial y de señalización y dotación de los operarios y trabajadores ,etc., a cargo de la Junta u organización comunal que pueda ocasionar accidentes y/o perjuicios, que debió ser observada y corregida por el INTERVENTOR. Riesgo que asume el INTERVENTOR.	señalizaciones básicas para realizar la obra. Además, se ha realizado la cotización de la dotación para el personal de obra.
9	Riesgo por la deficiente Interventoría en el control y seguimiento a la programación de actividades en obra que pudieran llevar a obras discontinuas, inconclusas ó con problemas para garantizar la estabilidad de obra ejecutada. Riesgo que asume el INTERVENTOR	Se está llevando a cabo el control y seguimiento suficiente a la programación.
10	Riesgo por la deficiente Interventoría en el control y seguimiento de la Interventoría a los frentes obligatorios de obra. Riesgo que asume el INTERVENTOR	A la fecha no hay frentes obligatorios de obra.
11	Riesgo por la deficiente Interventoría, que genere demora o ausencia en la toma de decisiones correspondientes al Interventor, que llegaren a generar efectos económicos al proyecto. Riesgo que asume el INTERVENTOR.	La interventoría está tomando las decisiones requeridas en el tiempo previsto; sin embargo, el Instituto Nacional de Vías creó un comité operativo para la aprobación, toma de decisiones y recomendaciones, lo que ha complicado el proceso decisional. Además, debido a la ubicación de cada convenio, es difícil mantener una comunicación fluida con los veedores.
12	Riesgo presentado por la deficiente Interventoría, en lo de su competencia, en los casos de procesos administrativos y/o judiciales con ocasión de la ejecución de las obras, tanto en la etapa contractual como en la	A la fecha la interventoría ha cumplido con cada uno de los procesos administrativos.

	poscontractual, ya sea por procesos de multas, sanciones, reparación directa, etc., o siniestros por estabilidad de obra ejecutada por la junta u organización comunal y/o siniestros por calidad del servicio de interventoría. Riesgo que asume el INTERVENTOR.	
13	Riesgo presentado por la no oportuna celebración de los convenios solidarios, correspondiente a este proceso de Interventoría. Riesgo que asume el PROPONENTE Y/O INTERVENTOR, hasta seis (6) meses después de suscrito el convenio solidario, teniendo en cuenta que es un proceso independiente, que podría presentar demoras por trámites administrativos. Riesgo que asume INVIAS después de seis (6) meses de adjudicado el contrato de Interventoría.	A la fecha, los convenios llevan una ejecución sin novedad.
14	Expedición y/o modificación de normas: Ocurre por cambios normativos o por la expedición de normas posteriores al cierre del proceso de concurso de méritos, que afecten las condiciones económicas y/o técnicas inicialmente pactadas.	N/A
15	Riesgo por la deficiente Interventoría, causado por inadecuadas prácticas en el proceso constructivo que puedan generar daños técnicos y/o ambientales, autorizadas y/o aprobadas por el Interventor. Riesgo que asume el INTERVENTOR.	Se espera acompañar, asesorar y vigilar los diferentes procesos constructivos de las obras a realizar.
16	Presencia de Riesgos Biológicos. Se refiere a la posibilidad que, durante la ejecución del contrato, los colaboradores del Interventor, presenten síntomas de	A la fecha, no existe vinculación de personal.

	enfermedades altamente contagiosas y que afecten y deterioren la Salud del Personal.	
17	Disponibilidad de los Elementos de Protección Personal. Se refiere a la posibilidad de que el Interventor no disponga o suministre a sus colaboradores y demás, los Elementos de Protección Personal EPP y los de Riesgo Bilógico.	Se dará estricto cumplimiento.
18	Orden público: Posible ocurrencia de actos terroristas, paros, huelgas, manifestaciones, disturbios y demás que afecten el orden público y se ubiquen en las zonas de influencia de las obras.	A la fecha, la comunidad no ha reportado situaciones vandálicas
19	Gestión Indebida y dolosa de los Recursos Financieros, de Insumos y Obras. Se refiere a la posibilidad de que las juntas u organismos de acción comunal, de la Interventoría y de funcionarios de Invias, promuevan y participen de acciones fraudulentas en el manejo de los recursos destinados a las obras tanto en los aspectos financieros (anticipos), facturación, calidad y cantidad de materiales e insumos, diseños y obras sin justificar.	A la fecha, se han realizado desembolsos en las actividades de obra, gastos administrativos y PAGA

5.6. Información otros programas

Se realizó un seguimiento detallado de la programación del convenio 4614-2023 utilizando el software Project. A través de esta herramienta, se monitorearon los avances y el cumplimiento de las actividades planificadas, permitiendo un control efectivo de los tiempos, la asignación de recursos y la identificación oportuna de posibles retrasos o ajustes necesarios en la ejecución del convenio.

6 REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

6.1. Equipo y vehículos del contrato de interventoría

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 03/09/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCION TERRITORIAL:** META

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: AGOSTO DE 2024 **PROYECTO:** CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

CONTRATO INTERVENTORIA No 5001 DE 2023 **INTERVENTORIA:** MISAEL VILLALBA GUAYARA

CONTRATO DE OBRA No. 4664 Y 4614 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SANTA LUCIA

EQUIPOS Y VEHÍCULOS	DESCRIPCIÓN	DÍAS DEL MES																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
PLW42G	Motocicleta	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A

CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: A la fecha se empiezan con actividades preliminares de ejecucion de obra

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:

EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.

NOTAS:
1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.
2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.
3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

Firma
Nombre MARIANA ROZO MORENO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 091037-0539458 CND

Firma
Nombre: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula Profesional No.: 25202-250038 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

6.2. Personal, Control aportes legales y seguridad social contrato de interventoría

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-7
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	05/09/2024 (Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5001-2023 **INTERVENTOR:** MISAEL VILLALBA GUAYARA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: AGOSTO DE 2024 **PROYECTO:** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO RICO DEPARTAMENTO DEL META DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE OBRA No.: 4614 - 2023; 4664 - 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA PRIMAVERA; JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SANTA LUCIA

NOMBRE ARL: ARL SURA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COFREM

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes - MARZO																																			Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	% Dedicación en el mes			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	ASTRID LORENA BRAVO HERNANDEZ	1122141089	RESIDENTE	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50%	ASTRID LORENA BRAVO HERNANDEZ	$ 1.300.000,00	$ 90.480	V	SANITAS	1951771311-9647721459	$ 162.500	PORVENIR	1951771311-9647721459	$ 208.000	N/A	N/A	N/A	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
2	MARIANA ROZO MORENO	1121954815	DIRECTORA	$ 580.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10%	MARIANA ROZO MORENO	$ 580.000,00	$ 40.368	V	SANITAS	29814046-9647721459	$ 72.500	PORVENIR	29814046-9647721459	$ 92.800	N/A	N/A	N/A	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
4																																																	
5																																																	
6																																																	
7																																																	
8																																																	
9																																																	
10																																																	
N																																																	

6.3. Informe financiero y presupuestal del contrato de interventoría

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 03/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: META

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5001-2023

INTERVENTOR: MISAEL VILLALBA GUAYARA

MES INFORME MENSUAL: 01/08/2024 a 30/08/2024

PROYECTO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO RICO DEPARTAMENTO DEL META DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE OBRA No: 4664-2023; 4614-2023

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SANTA LUCIA- JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA PRIMAVERA

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORIA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	1395123	ADQUISION DE SERVICIOS- VIA TERCIARIA MEJORADA- MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL NACIONAL	10	NACION	PRINCIPAL	$ 65.909.578	$ 2.710.075
2024	611624	MEJORADA -5 CONVERGENCIA REGIONAL / A	16	NACION	ADICIONAL	$ 32.852.568	$ 32.852.568
			TOTAL			$ 98.762.146	$ 35.562.643

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 98.762.146**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
1	22/12/2023 al 21/01/2024	$ 4.595.800,00	$ 873.202,00	$ 5.469.002,00	N/A	N/A	N/A	1395123 - 2023	$ 65.909.578,00	$ 60.440.576,00	5/04/2024	En tramite
2	22/01/2024 al 31/01/2024	$ 1.723.800,00	$ 327.522,00	$ 2.051.322,00	N/A	N/A	N/A	1395123 - 2023	$ 60.440.576,00	$ 58.389.254,00	6/04/2024	En tramite
3	01/02/2024 al 29/02/2024	$ 5.793.400,00	$ 1.100.746,00	$ 6.894.146,00	N/A	N/A	N/A	1395123 - 2023	$ 58.389.254,00	$ 51.495.108,00	7/04/2024	En tramite
4	01/03/2024 al 31/03/2024	$ 8.463.200,00	$ 1.608.008,00	$ 10.071.208,00	N/A	N/A	N/A	1395123 - 2023	$ 51.495.108,00	$ 41.423.900,00	28/04/2024	En tramite
5	01/04/2024 al 30/04/2024	$ 5.483.400,00	$ 1.041.846,00	$ 6.525.246,00	N/A	N/A	N/A	1395123 - 2023	$ 41.423.900,00	$ 34.898.654,00	9/07/2024	En tramite
6	01/05/2024 al 31/05/2024	$ 5.296.000,00	$ 1.006.240,00	$ 6.302.240,00	N/A	N/A	N/A	1395123 - 2023	$ 34.898.654,00	$ 28.596.414,00	9/07/2024	En tramite
7	01/06/2024 al 19/06/2024	$ 9.347.684,00	$ 1.776.059,96	$ 11.123.743,96	N/A	N/A	N/A	1395123 - 2023	$ 28.596.414,00	$ 17.472.670,04	24/09/2024	En tramite
8	05/07/2024 al 31/07/2024	$ 12.405.542,00	$ 2.357.052,98	$ 14.762.594,98	N/A	N/A	N/A	1395123 - 2023	$ 17.472.670,04	$ 2.710.075,06	24/09/2024	En tramite
9	01/08/2024 al 03/08/2024	$ 2.277.374,00	$ 432.701,06	$ 2.710.075,06	N/A	N/A	N/A	1395123 - 2023	$ 2.710.075	$ -	24/09/2024	En tramite
10	04/08/2024 al 30/08/2024	$ 22.916.426,00	$ 4.354.120,94	$ 27.270.546,94	N/A	N/A	N/A	611624 - 2024	$ 32.852.568	$ 5.582.021	24/09/2024	Saldo del registro presupuestal de la adicional
TOTALES		**$ 78.302.626**	**$ 14.877.499**	**$ 93.180.124,94**					**$ -**			

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL	$ 61.019.200,00	$ 11.593.648,00	$ 72.612.848,00
OTROS COSTOS DIRECTOS	$ 17.283.426,00	$ 3.283.850,94	$ 20.567.276,94
VALOR TOTAL	**$ 78.302.626,00**	**$ 14.877.498,94**	**$ 93.180.124,94**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: MARIANA ROZO MORENO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 091037 - 0539458 CND

Firma
Nombre: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-250038 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

$ -

6.4. Seguimiento garantías contrato de interventoría

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 27/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5001-2023 **INTERVENTOR:** MISAEL VILLALBA GUAYARA

OBJETO DEL CONTRATO:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO RICO DEPARTAMENTO DEL META DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO: 22/12/2023

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 15/09/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 65.909.578,00

VALOR ACUMULADO: $ 98.762.146,00 (Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 6.590.957	15	12	2023	1/07/2024		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 13.181.915,60	15	12	2023	31	12	2026
Calidad del servicio	30%	$ 19.772.873,40	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100299994

Certificado de modificación o anexo No.: 71820421

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 19/12/2023

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO DE ACUERDO A ORDEN DE INICIO

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 6.590.957	15	12	2023	1/07/2024		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
Pago de Salarios, prestaciones sociales	20%	$ 13.181.915,60	15	12	2023	21	12	2026
Calidad del servicio	30%	$ 19.772.873,40	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100299994

Certificado de modificación o anexo No.: 71831818

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 27/12/2023

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 27/09/2024
(Día / Mes / Año)

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO DE ACUERDO A PRORROGA No.1

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 6.590.957	15	12	2023	1/10/2024		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 13.181.915,60	15	12	2023	31	3	2027
Calidad del servicio	30%	$ 19.772.873,40	31	3	2024	31	3	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100299994

Certificado de modificación o anexo No.: 71833669
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 18/03/2024

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO DE ACUERDO A PRORROGA No.2

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 6.590.957	27	3	2023	1/10/2024		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
Pago de Salarios, prestaciones sociales	20%	$ 13.181.915,60	27	3	2024	30	4	2027
Calidad del servicio	30%	$ 19.772.873,40	30	4	2024	30	4	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100299994

Certificado de modificación o anexo No.: 71919156
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 16/04/2024

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO DE ACUERDO A PRORROGA No.3

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 6.590.957	27	3	2023	15/11/2024		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
Pago de Salarios, prestaciones sociales	20%	$ 13.181.915,60	27	3	2024	15	5	2027
Calidad del servicio	30%	$ 19.772.873,40	30	4	2024	30	4	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100299994

Certificado de modificación o anexo No.: 71946113
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 20/05/2024

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO DE ACUERDO A PRORROGA No.4

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 27/09/2024

(Día / Mes / Año)

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 6.590.957	27	3	2023	1/11/2024		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
Pago de Salarios, prestaciones sociales	20%	$ 13.181.915,60	27	3	2024	30	4	2027
Calidad del servicio	30%	$ 19.772.873,40	30	4	2024	30	4	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100299994

Certificado de modificación o anexo No.: 71991556

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 20/05/2024

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO DE ACUERDO A PRORROGA No.5

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 6.590.957,80	27	3	2024	20/12/2024		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
Pago de Salarios, prestaciones sociales	20%	$ 13.181.915,60	27	3	2024	20	6	2027
Calidad del servicio	30%	$ 19.772.873,40	20	6	2024	20	6	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100299994

Certificado de modificación o anexo No.: 71975346

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 06/06/2024

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO DE ACUERDO A PRORROGA No.6 Y ADICION

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 9.876.214,60	20	6	2024	15/03/2025		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
Pago de Salarios, prestaciones sociales	20%	$ 19.752.429,20	20	6	2024	15	9	2027
Calidad del servicio	30%	$ 29.628.643,80	15	9	2024	15	9	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100299994

Certificado de modificación o anexo No.: 72029816

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: EN TRAMITE

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO DE ACUERDO A SUSPENSION No.1

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 9.876.214,60	20	6	2024	15/03/2025		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
Pago de Salarios, prestaciones sociales	20%	$ 19.752.429,20	20	6	2024	15	9	2027
Calidad del servicio	30%	$ 29.628.643,80	15	9	2024	15	9	2029

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 27/09/2024
(Día / Mes / Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100299994

Certificado de modificación o anexo No.: 72072675
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: EN TRAMITE

OBSERVACIONES:
NINGUNA

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
Nombre: MARIANA ROZO MORENO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 091037-0539458

Firma
Nombre: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:25202-250038

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

6.5. Seguimiento al plan de calidad contrato de interventoría

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA 2/09/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCION TERRITORIAL:** META

CONTRATO DE OBRA No.: 4614 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA PRIMAVERA

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA PRIMAVERA DEL MUNICIPIO PUERTO RICO, DEPARTAMENTO DE META, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL

MES Y AÑO DEL INFORME MENSU AGOSTO DE 2024 **PROYECTO:** PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA N 5001 DE 2023 **INTERVENTOR:** MISAEL VILLALBA GUAYARA

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
5	12/08/2024	Ensayo de resistencia a la compresión	NTC 673 - 1513; INV E-	Huella seccion 21	4	3000 PSI	3094 PSI	SI	Concreto de 3000 PSI
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORIA									
5	10/08/2024	Ensayo de resistencia a la compresión	INV E-410	HUELLA SECCION 21	4	3000 PSI	3087 PSI	SI	Concreto de 3000 PSI

OBSERVACIONES:

Actualmente, no se han llevado a cabo ensayos debido a que el convenio aún se encuentra en trámites administrativos para su inicio

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: MARIANA ROZO MORENO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 091037 - 0539458 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

6.6. Otros documentos seguimiento mensual

MES	COSTO PROGRAMADO	COSTO EJECUTADO	COSTO PROGRAMADO ACUMULADO	COSTO EJECUTADO ACUMULADO
Diciembre	$ 911.064	$ 682.584	$ 911.064	$ 682.584
Enero	$ 25.204.120	$ 6.837.740	$ 26.115.184	$ 7.520.324
Febrero	$ 22.411.588	$ 6.894.146	$ 48.526.772	$ 14.414.470
Marzo	$ 17.382.806	$ 10.071.208	$ 65.909.578	$ 24.485.678
Abril	$ 23.941.134	$ 6.525.246	$ 89.850.712	$ 31.010.924
Mayo	$ 6.302.240	$ 6.302.240	$ 96.152.952	$ 37.313.164
Junio	$ 11.123.744	$ 11.123.744	$ 107.276.696	$ 48.436.908
Julio	$ 14.762.595	$ 14.762.595	$ 122.039.291	$ 63.199.503
Agosto	$ 29.980.622	$ 29.980.622	$ 152.019.913	$ 93.180.125

7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Durante el mes, se realizaron avances significativos en la construcción de elementos estructurales como cunetas, ciclopeo y vigas riostras, utilizando concreto de alta calidad.
- Se llevaron a cabo actividades de preparación y colocación de acero de refuerzo, mezcla y vaciado de concreto, y desencofrado de elementos estructurales.
- La construcción de ciclopeo y cunetas avanza según lo planeado.
- Se tomaron muestras de concreto para ensayos de laboratorio, lo que garantiza la calidad y resistencia del material utilizado.
- Según la actividad se realiza limpieza de material residual
- En general, el proyecto avanza según lo planeado, con un enfoque en la calidad, la seguridad y la eficiencia.
- Se da por terminado las actividades ejecutadas en la vereda

8 ANEXOS

Ninguno

8.1. Relación de correspondencia

FECHA	No. DE OFICIO	REMITENTE	DESCRIPCIÓN
19/12/2023	PR-IP-28-01	INVIAS	Entrega hojas de vida
26/12/2023	PR-IP-28-02	INVIAS	Solicitud de prorroga No. 01
29/12/2023	PR-IP-28-03	INVIAS	Autorización registro de firma para manejo de cuenta convenio 4664 de 2023
29/12/2023	PR-IP-28-04	INVIAS	Autorización registro de firma para manejo de cuenta convenio 4614 de 2023
04/01/2024	PR-IP-28-06	INVIAS	Solicitud inclusión de otros costos

09/01/2023	PR-IP-28-08	INVIAS	Aprobación hojas de vida convenio 4664 de 2023
09/01/2023	PR-IP-28-09	INVIAS	Aprobación hojas de vida convenio 4614 de 2023
16/01/2023	PR-IP-28-10	INVIAS	Aprobación de informes semanales No. 1,2 y 3 convenio 4614 de 2023
16/01/2023	PR-IP-28-11	INVIAS	Aprobación del informe semanal No. 1 convenio 4664 de 2023
18/01/2023	PR-IP-28-12	INVIAS	Insuficiencia de fondos
22/01/2023	PR-IP-28-13	INVIAS	Aprobación de informes semanales No. 4 convenio 4614 de 2023
23/01/2024	PR-IP-28-14	JHON WILMER DELGADO ACOSTA	Aprobación hojas de vida convenio 4614-2023
22/01/2024	PR-IP-28-15	JOSE ALEXANDER REMOLINA JEREZ	Aprobación hojas de vida convenio 4664-2023
26/01/2024	PR-IP-28-16	INVIAS	Aprobación informes semanales
3/02/2024	PR-IP-28-17	JHON WILMER DELGADO ACOSTA	Aporte de la JAC correspondiente a la herramienta menor, convenio 4614 de 2023
3/02/2024	PR-IP-28-18	JOSE ALEXANDER REMOLINA JEREZ	Aporte de la JAC correspondiente a la herramienta menor, convenio 4664 de 2023
3/02/2024	PR-IP-28-19	INVIAS	Aprobación informes semanales
4/02/2024	PR-IP-28-20	JOSE ALEXANDER REMOLINA JEREZ	Aprobación hojas de vida convenio 4664-2023

5/02/2024	PR-IP-28-21	INVIAS	Solicitud de realización de reuniones virtuales
20/02/2024	PR-IP-28-22	INVIAS	Aprobación informes semanales
26/02/2024	PR-IP-28-23	INVIAS	Aprobación informes semanales
6/03/2024	PR-IP-28-24	INVIAS	Solicitud diseño de valla
14/03/2024	PR-IP-28-25	JHON WILMER DELGADO ACOSTA	Requerimiento de formatos
14/03/2024	PR-IP-28-26	JOSE ALEXANDER REMOLINA JEREZ	Requerimiento de formatos
20/03/2024	PR-IP-28-27	JOSE ALEXANDER REMOLINA JEREZ	Requerimiento información de transito
20/03/2024	PR-IP-28-28	JOSE ALEXANDER REMOLINA JEREZ	Requerimientos certificados de residencia
20/03/2024	PR-IP-28-30	INVIAS	Solicitud de ingreso ingeniero residente
31/03/2024	PR-IP-28-31	INVIAS	Aprobación informes semanales
1/04/2024	PR-IP-28-32	INVIAS	Aprobación informes semanales
2/04/2024	Sin radicado	SEGUROS MUNDIAL	Carta de no siniestro
4/04/2024	PR-IP-28-33	INVIAS	Solicitud de ajuste al plan de cargas
5/04/2024	PR-IP-28-34	INVIAS	Solicitud de aprobación hojas de vida
10/04/2024	PR-IP-28-35	INVIAS	Solicitud de prorroga No. 3 y adición No. 1
17/04/2024	PR-IP-28-36	JOYFER JAVIER BARRETO ORTIZ	Invitación socialización de inicio de Convenios Solidarios para el mejoramiento y

			mantenimiento vial- Juntas de Acción Comunal de las Veredas La Primavera y Santa Lucía en el Municipio de Puerto Rico – Meta.
17/04/2024	PR-IP-28-37	IVAN ANDRES PUENTES MOLINA ALCALDE MUNICIPAL	Invitación socialización de inicio de Convenios Solidarios para el mejoramiento y mantenimiento vial - Juntas de Acción Comunal de las Veredas La Primavera y Santa Lucía en el Municipio de Puerto Rico – Meta.
22/04/2024	PR-IP-28-38	JHON WILMER DELGADO ACOSTA	Requerimiento control estricto de obra
22/04/2024	PR-IP-28-39	JOSE ALEXANDER REMOLINA JEREZ	Requerimiento control estricto de obra
22/04/2024	PR-IP-28-40	INVIAS	Aprobación informes semanales
26/04/2024	PR-IP-28-43	INVIAS	Aprobación informes semanales
2/05/2024	PR-IP-28-44	JHON WILMER DELGADO ACOSTA Y JOSE ALEXANDER REMOLINA JEREZ	Informe de revisión de los estudios hidrológicos e hidráulicos
2/05/2024	PR-IP-28-45	JHON WILMER DELGADO ACOSTA Y JOSE ALEXANDER REMOLINA JEREZ	Informe de revisión del diseño geométrico
8/05/2024	PR-IP-28-46	JHON WILMER DELGADO ACOSTA Y JOSE ALEXANDER REMOLINA JEREZ	Suspensión de Pagos, Retiro de Personal y Convocatoria a Comité

23/05/2024	PR-IP-28-47	INVIAS	Aprobación informes semanales
30/05/2024	PR-IP-28-48	INVIAS	Solicitud de prorroga No. 5
7/06/2024	PR-IP-28-50	BANCO AVVILLAS	Solicitud de extractos bancarios, saldos y movimientos convenio 4614-2023
7/06/2024	PR-IP-28-49	BANCO AVVILLAS	Solicitud de extractos bancarios, saldos y movimientos convenio 4614-2023
17/06/2024	PR-IP-28-51	INVIAS	Aprobación informes semanales
25/06/2024	PR-IP-28-53	JHON WILMER DELGADO ACOSTA	Actividad de cierre
02/07/2024	PR-IP-28-54	JOSE ALEXANDER REMOLINA JEREZ	Rendimientos financieros
02/07/2024	PR-IP-28-55	JHON WILMER DELGADO ACOSTA	Rendimientos financieros
02/07/2024	PR-IP-28-56	BANCO AVVILLAS	Solicitud de extractos bancarios, saldos y movimientos convenio 4614-2023
02/07/2024	PR-IP-28-57	BANCO AVVILLAS	Solicitud de extractos bancarios, saldos y movimientos convenio 4664-2023
03/07/2024	PR-IP-28-58	JOSE ALEXANDER REMOLINA JEREZ	Solicitud de estudios y diseños
05/07/2024	PR-IP-28-59	BANCO AVVILLAS	Solicitud de transferencia sebra - rendimientos financieros
05/07/2024	PR-IP-28-60	BANCO AVVILLAS	Solicitud de transferencia sebra - rendimientos financieros

05/07/2024	PR-IP-28-61	INVIAS	Solicitud de prorroga No.6 y Adición No.1
06/07/2024	PR-IP-28-62	INVIAS	Entrega de estudios y diseños de convenios solidarios
09/07/2024	PR-IP-28-63	INVIAS	Entrega de pagos parciales del mes de Abril y Mayo
12/07/2024	PR-IP-28-64	JHON WILMER DELGADO ACOSTA	Presentación orden de compra - caja menor
12/07/2024	PR-IP-28-65	JOSE ALEXANDER REMOLINA JEREZ	Presentación orden de compra - caja menor
22/07/2024	PR-IP-28-66	JOSE ALEXANDER REMOLINA JEREZ	Documentación del personal
22/07/2024	PR-IP-28-67	JHON WILMER DELGADO ACOSTA	Documentación del personal
29/07/2024	PR-IP-28-68	BANCO AVVILLAS	Solicitud de transferencia sebra - rendimientos financieros
29/07/2024	PR-IP-28-69	BANCO AVVILLAS	Solicitud de transferencia sebra - rendimientos financieros
30/07/2024	PR-IP-28-70	INVIAS	Solicitud de prorroga No.3
30/07/2024	PR-IP-28-71	INVIAS	Solicitud de prorroga No.3
07/08/2024	PR-IP-28-72	BANCO AVVILLAS	Solicitud de extractos bancarios, saldos y movimientos convenio 4614-2023
07/08/2024	PR-IP-28-73	BANCO AVVILLAS	Solicitud de extractos bancarios, saldos y movimientos convenio 4664-2023
08/08/2024	PR-IP-28-74	INVIAS	Solicitud de cambio de residente de interventoría

21/08/2024	PR-IP-28-75	INVIAS	Oficio Aclaratorio
21/08/2024	PR-IP-28-76	INVIAS	Oficio Aclaratorio
21/08/2024	PR-IP-28-77	INVIAS	Entrega I – plan de gestión social
21/08/2024	PR-IP-28-78	INVIAS	Entrega I – plan de gestión social
21/08/2024	PR-IP-28-79	INVIAS	Aprobación de actividad de socialización de cierre del convenio No.4614-2023.
21/08/2024	PR-IP-28-80	INVIAS	Aprobación de actividad de socialización de cierre del convenio No.4664-2023.

8.2. Registro fotográfico y video del avance de las obras


4614-2023:





Actividades preliminares



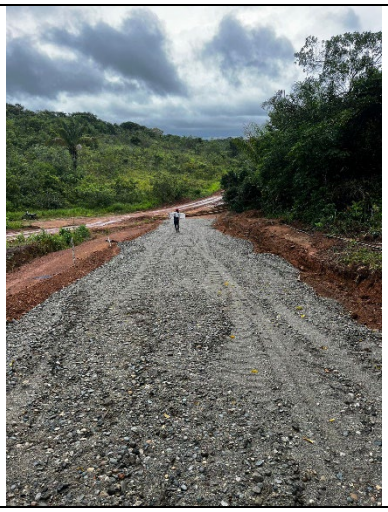

Extendido de subbase





Señalización del proyecto





Figurado y armado de acero






Fundición de vigas riostras y huellas





Detallado final (Pintura)

4664-2023:
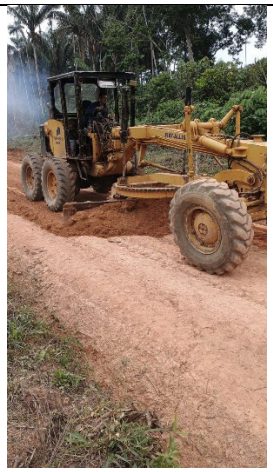
<table>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">Creación del campamento</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">Actividades preliminares</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
</table>

Nivelación de rasante y extendido de subbase





Figurado y armado de acero





Fundición de vigas riostras y huellas





Procesos finales de construcción de placa huella

8.3. Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas.

<table>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">Actividades sociales y ambientales</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
</table>

8.4 Copia de la bitácora



BITÁCORA DE OBRA

Contrato No. 4614 de 2023

"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA PRIMAVERA DEL MUNICIPIO PUERTO RICO, DEPARTAMENTO DE META, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

INVIAS

J.A.C. VEREDA LA PRIMAVERA

2024

Interventoría:

Misael Villalba Guayara

Contrato No. 5001 de 2023

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

Powered by CamScanner

Jueves 01 de Agosto de 2024

Clima: Lluvioso

EPP: ✓Casco ✓Overol ✓Botas ✓Tapaoidos ✓Gafas ✓Guantes

Personal: - 1 maestro
- 4 Ayudantes

Herramientas y Equipos: - Herramienta menor
- Mezcladora de concreto.

Actividades Ejecutadas:

- Se coloca el acero de refuerzo para dos secciones de cunetas, es decir cuatro elementos de (3,0 x 0,8 x 0,2 m).

- Se realiza la mezcla de concreto de 3000 Psi para un total de Volumen de 1.92 m3.

- Se vacia el concreto y se funden las (04) cunetas.

- Se Desformaletean las Huellas.

Nota: Se toman muestras (02 Cilindros) para ensayos de laboratorio.

Observaciones:

Ing. Yeiner Pinilla
Residente de obra

Viernes 02 de Agosto de 2024.

Clima: Soleado

EPP: ✓Casco ✓Overol ✓Botas ✓Tapaoidos ✓Guantes ✓Gafas

Personal: - 1 maestro
- 4 Ayudantes

Herramienta y Equipos: - Herramienta menor
- Vibrador de concreto
- Mezclador de concreto.

Actividades Ejecutadas:

- Se desencofra los elementos formuleteados y ya fraguados

- Se coloca el acero de refuerzo y se amarra en las siguientes secciones de cunetas.

- Se mezcla un volumen de concreto de 2,88. m^3.

- Se vacía y se funden 16) cunetas.

- Se desplaza la piedra para ciclópeo y se prepara la superficie de la subbase para fundirlo.

Observaciones:

Ing. Yeiner Pinilla.
Residente de Obra

Powered by CamScanner

Sábado 03 de Agosto de 2024.

Clima: Soleado

Personal: -1 maestro
-4 Ayudantes

EPP: /Casco /Overol
/Botas /Tapaoidos
/Guantes
/Gafas

Herramienta y Equipos: - Herramienta menor
- Mezcladora de concreto.

Actividades Ejecutadas:

- Se desencofran las secciones de cunetas.
- Se prepara mezcla de concreto para ciclópeo, un volumen total de 2,16 m3 para cuatro secciones de ciclopeo central y 1,62 m3 para ciclópeo lateral.
- Se dispone la piedra para el concreto ciclopeo.
- Se funden (4) secciones de ciclopeo central
- Se funden (06) Secciones de ciclópeo lateral.

Observaciones:

Ing. Yeiner Pinilla.
Residente de obra.

Powered by CamScanner

Semana 9.

Lunes 05 de Agosto de 2024.

Clima: Soleado

EPP: ✓Casco ✓Overol ✓Botas ✓Tapaoidas ✓Guantes ✓Gafas

Personal: - 1 maestro
- 4 Ayudantes

Herramientas y Equipos: - Herramientas y Equipos

Actividades Ejecutadas:

- Se alista y organiza la madera para las formaletas.
- Se nivela con excavación manual y relleno de subbase para fundir nuevas secciones de Placa Huella.
- Se arman las formaletas para vigas riostras y Placa Huellas.
- Se coloca y amarra el acero de refuerzo para (6) vigas riostras.

Observaciones:

Ing. Yelner Pinilla.
Residente de obra.

Powered by CamScanner

Martes 06 de Agosto. de 2024.

Clima: Soleado.

EPP: ✓Casco ✓Overol
✓Botas ✓Tapaoidos
✓Guantes
✓Gafas

Personal: -1 maestro
-4 Ayudantes

Herramientas y Equipos: - Herramienta menor
- Mezcladora de concreto
- Vibrador de concreto.

Actividades Ejecutadas:

- Se prepara la mezcla para 2,18 m³ de concreto 3000 psi.
- Se vacia el concreto para fundir un total de (06) Vigas mostras.
- Se coloca y se amarran las parrillas de acero de refuerzo para las secciones de Huella.

Nota: Se toma cilindro como muestra para ensayo de laboratorio.

Observaciones:

Ing. Yeiner Pinilla.
Residente de Obra.

Powered by CamScanner

Miércoles 07 de Agosto de 2024.

Clima: Soleado.

EPP: ✓Casco ✓Overol
✓Botas ✓Tapaoídos
✓Gafas
✓Guantes

Personal: -1 maestro
-4 Ayudantes.

Herramienta y Equipos: - Herramienta menor
- Mezcladora de concreto
- Vibrador de concreto

Actividades Ejecutadas:

-Se desencofran las vigas nuestras.

-Se preparan los materiales para mezclar 4,32 m3 de concreto de 3000 Psi.

-Se coloca y se amarra el acero de refuerzo para las huellas que se van a fundir (08 Huellas)

-Se vacia el concreto y se funden (04) secciones de huellas es decir (08) Huellas en total.

-Una vez comienza el fraguado, se marcan las huellas.

Observaciones:

Ing. Yeiner Pinilla.
Residente de Obra

Jueves 08 de Agosto de 2024

Clima: Nublado - Lloviznas

EPP: ✓Casco ✓Overol ✓Botas ✓Tapaoidos ✓Guantes

Personal: - 1 maestro
- 4 Ayudantes

Herramientas y Equipos: - Herramienta menor
- Mezcladora de concreto
- Vibrador de concreto.

Actividades Ejecutadas:

- Se desencofran las huellas

- Se dispone la madera y se encofran y formaletean las cunetas a fundir, Diez (10) en total.

- Se figura, coloca y amarra el acero de refuerzo de las cunetas a fundir.

Observaciones:

Ing. Yeiner Pinilla.
Residente de Obra.

Powered by CamScanner

Viernes 09 de Agosto de 2024.

Clima: Soleado

EPP: ✓Casco ✓Overol
✓Botas ✓Tapaoidos
✓Gafas
✓Guantes

Personal: - 1 maestro
- 4 Ayudantes

Herramientas y Equipos: - Herramienta menor
- Mezcladora de concreto

Actividades Ejecutadas:

- Se preparan las cantidades de material de acuerdo al diseño de mezcla para fundir 4,8 m^3 de concreto de 3000 Psi.

- Se funden los 4,8 m^3 de concreto 3000 Psi para diez (10) secciones de cunetas.

- Una vez comienza a fraguar el concreto, se limpian las dilataciones, se marcan y se barre la superficie.

Observaciones:

Ing. Yeiner Pinilla.
Residente de Obra.

Powered by CamScanner

Sábado 10 de Agosto de 2024.

Clima: Soleado

EPP: ✓Casco ✓Overol ✓Botas ✓Tapaoidos ✓Guantes ✓Gafas

Personal: - 1 maestro
- 4 Ayudantes

Herramientas y Equipos: - Herramienta menor
- Mezcladora de concreto.

Actividades Ejecutadas:

- Se desencofran las cunetas fundidas.
- Se trasladan las piedras para el ciclopeo.
- Se prepara la mezcla de concreto para fundir ciclopeo.
- Se funden 2,7 m^3 de concreto ciclopeo en cinco (05) secciones de ciclópeo central. (0,9 x 0,2 x 3 m)
- Se funden 2,7 m^3 de concreto ciclópeo en Diez (10) secciones de ciclópeo lateral (3 x 0,45 x 0,2 m).

Observaciones:

Nota: Se toma cilindro de muestra para ensayo de laboratorio.

Ing. Yeiner Pinilla.
Residente de Obra

Semana 10.

Lunes 12 de Agosto. de 2024.

Clima: Soleado

EPP: Casco ✓ Overol
Botas ✓ Tapaoidos
Guantes
Gafas

Personal: - 1 maestro
- 4 Ayudantes

Herramientas y Equipos: - Herramienta menor
- Mezcladora de concreto.

Actividades Ejecutadas

- Se dispone y corta la madera para encofrar y formaletear 35,4 ml de bordillo en la margen izquierda y 51,0 ml de bordillo en la margen derecha de la vía.

- Se prepara mezcla de concreto equivalente a 3,24 m^3

- Se coloca y amarra acero de refuerzo en tres (03) secciones de Huella.

- Se funden (06) Huellas (3,0 x 0,1 x 0,2 m) de concreto de 3000 Psi.

Observaciones:

Ing. Yeiner Pinilla.
Residente de obra

Martes 13 de Agosto de 2024

Clima: Soleado

EPP: ✓Casco ✓Overol
✓Botas ✓Tapa oidos
✓Gafas
✓Guantes

Personal: - 1 maestro
- 4 Ayudantes

Herramientas y Equipos: - Herramienta menor
- Mezcladora de Concreto.

Actividades Ejecutadas:

- Se disponen los materiales según diseño de mezcla para mezclar 1,73 m3 de concreto de 3000 psi

- Se comienza a vaciar la mezcla de concreto en las formaletas de los bordillos donde previamente se habia colocado el acero de refuerzo debidamente amarrado.

- Una vez vaciado el concreto este se vibra adecuadamente para desairar correctamente el concreto y evitar porosidades

- Una vez comienza el fraguado, se limpia el concreto y se barre su superficie.

- Se funden en total 86,4 ml de bordillo.

Observaciones:

Ing Yeiner Pinilla.
Residente de Obra.

Powered by CamScanner

Miércoles 14 de Agosto de 2024.

Clima: Soleado

EPP: ✓Casco ✓Overol
Botas Tapa oídos
✓Guantes
✓Gafas

Personal: - 1 maestro
- 4 Ayudantes

Herramientas y Equipos: - Herramienta menor.
- vibrador de concreto
- Mezcladora.

Actividades Ejecutadas:

- Se prepara el encofrado para fundir (3) secciones de Huellas, es decir (06) en total. y dos cunetas.

- Se desmonta la formaleta usada para fundir los bordillas.

- Se prepara un Volumen de mezcla de concreto 3000 Ps. de 4.2 m³ de concreto.

- Se coloco y amarra el acero de refuerzo.

- Se vacia y se funden Seis (06) Huellas y dos (02) Cunetas.

- Una vez fraguado inicialmente el concreto, se marcan dilataciones, se marcan las huellas, y se barre la superfie.

Observaciones:

Ing. Yeiner Pinilla.
Ressdente de Obra.

Powered by CamScanner

Jueves 15 de Agosto de 2024.

Clima: Lluvioso

EPP: /Casco /Overol /Botas ✓Tapaoidos /Guantes /Gafas

Personal: - 1 maestro
- 4 Ayudantes.

Herramientas y Equipos: - Herramienta menor
- Mezcladora de Concreto.

Actividades Ejecutadas:

- Se desplaza la piedra del ciclopeo hasta el punto de ejecucion
- Se descargan las Huellas y cunetas.
- Se prepara la mezcla de concreto para ciclopeo de 2000 Psi
- Se fonden dos (02) secciones de ciclópeo central y cuatro (04) de ciclópeo lateral. para un total de volumen de 2,16 m^3
- Se limpian las piedras que quedan a la vista.

Observaciones:

Ing. Yeiner Pinilla
Residente de Obra.

Powered by CamScanner

Viernes 16 de Agosto de 2024.

Clima: Soleado - 1 lloviznas EPP: ✓Casco ✓Overol
✓Botas ✓Tapaoidas
Personal: - 1 maestro ✓Gafas
- 4 Ayudantes ✓Guantes

Herramientas y Equipos: - Herramienta menor
- Mezcladora de concreto

Actividades Ejecutadas:

- Se comienza a excavar la rasante natural para nivelar y preparar la base para cinco (05) secciones más de placa Huella.

- Se prepara mezcla de concreto de 2000 psi para fundir concreto ciclópeo en ocho (08) secciones laterales.

- Se vacía y se funde un volumen de 2,16 m^3 de concreto ciclópeo.

- Una vez fundido, se limpian las piedras expuestas a la vista.

Observaciones:

Ing. Yeiner Pinilla
Residente de obra

Sábado 17 de Agosto de 2024.

Clima: Soleado.

Personal: - 1 maestro
- 4 Ayudantes.

EPP: /Casco /Overol
/Botas /Tapaoidos
/Gafas
/Guantes

Herramientas y Equipos: - Herramienta menor

Actividades Ejecutadas:

- Se realiza excavación manual en 15,00 ml de la rasante de la ora para nivelar según diseño

- Se realiza movimiento de material de subbase para nivelación antes de iniciar a fundir.

- Se comienzan a preparar las formaletas para fundir las siguientes cinco (05) Vigas riostras.

Observaciones:

Ing. Yeiner Pinilla.
Residente de Obra.

Powered by CamScanner

Semana 11

Lunes 19 de Agosto de 2024.

Clima: Soleado

EPP: ✓Casco ✓Overol
Botas ✓Tapaoidos
✓Guantes
✓Gafas.

Personal: - 1 maestro
- 4 Ayudantes

Herramientas: - Herramienta menor.

Actividades Ejecutadas:

- Se instalan las formaletas para fundir cinco (05) vigas riostras.

- Asi mismo, se instalan formaletas para fundir cinco (05) secciones de huellas y sus respectivas cunetas.

- Se coloca y se amarra el acero de refuerzo de las vigas riostras como de las huellas

Observaciones:

Ing. Yeiber Panilla.
Residente de obra.

Powered by CamScanner

Martes 20 de Agosto de 2024.

Clima: Soleado

EPP: ✓Casco ✓Overol ✓Botas ✓Tapaoidos Guantes: ✓Gafas

Personal: -1 maestro
- 4 Ayudantes

Herramientas y Equipos: -Herramienta menor
- Mezcladora de concreto
- Vibrador de concreto.

Actividades Ejecutadas:

- Se alistan los agregados de acuerdo al diseño de mezcla, para preparar 7,22 m^3 de Concreto de 3000 Psi:

- Listas las formaletas, se vacian 1,82 m^3 para fundir cinco (05) Vigas riostras.

- Para las huellas se vacian 5,4 m^3 de concreto de 3000 Psi para fundir Diez Huellas en cinco (05) secciones.

- Una vez inia a fraguar el concreto, se limpian las dilataciones se marcan las huellas y se barre el concreto.

Observaciones:

Ing. Yeiner Pinilla.
Residente de Obra.

Powered by CamScanner

Miercoles 21 de Agosto de 2024.

Clima: Lloviznas - Nublado

EPP: ✓Casco ✓Overol
✓Botas ✓Tapaoidos
✓Guantes
✓Gafas

Personal: - 1 maestro
- 4 Ayudantes

Herramienta y Equipos: - Herramienta menor
- Mezcladora de concreto
- Vibrador de concreto.

Actividades Ejecutadas:

- Se preparan los agregados y materiales de acuerdo al diseño de mezcla para preparar 4,8 m³ de concreto de 3000 Psi.

- Se vacian los 4,8 m³ de concreto 3000 Psi para fundir Diez (10) cunetas en cinco (05) secciones de Placa Huella.

- Una vez inicia el fraguado del concreto, se limpian las dilataciones, y se barre el concreto.

- Se retira la formaleta de los elementos fundidos en dias anteriores (vigas riostras y Huellas)

Observaciones:

Ing. Yeiner Pinilla.
Residente de Obra.

Powered by CamScanner

Jueves 22 de Agosto de 2024.

Clima: Soleado. EPP: ✓Casco ✓Overol
✓Botas ✓Tapa oidos
Personal: - 1 maestro ✓Guantes
- 4 Ayudantes ✓Gafas

Herramienta y Equipos: - Herramienta menor
- Mezcladora de concreto
- Vibrador de Concreto.

Actividades Ejecutadas:

- Se desencofran las cunetas fundidas previamente.

- Se desplazan las piedras para el concreto ciclópeo hasta el punto de obra.

- Se formalea y dispone la madera para encofrar la placa de acceso a la placa huella.

- Se cobca y amarra el acero de refuerzo requerido para la Placa de acceso. de 1.5 m de largo.

- Se mezclan los insumos para obtener una mezcla de Concreto de 3000 Psi equivalente a 1,94 m^3.

- Se vacia el volumen de concreto para fundir la placa de acceso, cuya área superficial es de 9,60 m^2 con un espesor de 20 cm.

Observaciones:

Ing. Yener Pinilla.
Residente de Obra.

Powered by CamScanner

Viernes 23 de Agosto de 2024.

Clima: Soleado

EPP: ✓Casco ✓Overol
Botas ✓Tapaoídos
Guantes
✓Gafas

Personal: - 1 maestro
- 4 Ayudantes.

Herramientas y Equipos: -Herramienta menor
-Mezcladora de concreto.

Actividades Ejecutadas:

-Se prepara la subbase y la piedra para mezclar y fundir el ciclópeo.

-Se preparan los agregados para fundir 5,4 m3 de concreto ciclópeo.

-Se vacía un volumen de 2,7 m3 de concreto para fundir junto con la piedra el total de cinco (05) secciones de ciclópeo central.

-Se vacía el volumen de 2,7 m3 de concreto para fundir Diez (10) secciones de ciclópeo lateral.

Observaciones:

Ing. Yeiner Phillo.
Residente de obra.

Sábado 24 de Agosto de 2024

Clima: Soleado.

EPP: ✓Casco ✓Overol ✓Botas ✓Tapaoidos ✓Gafas ✓Guantes

Personal: -1 maestro
-4 Ayudantes

Herramientas y Equipos: -Herramienta menor.

Actividades Ejecutadas:

- Se realiza excavación manual y movimiento de material de subbase para nivelar los siguientes 15 ml de la rasante de la vía.

- Se dispone la madera para formaletear tres (03) vigas riostras siguientes.

- Se corta madera y se perfila para formaletear los bordillos

- Se coloca la madera y se encofran 35,2 ml de bordillos a cada margen de la PH.

- Se coloca y amarra el acero de refuerzo para los bordillos.

Observaciones:

Ing. Yeiner Pinilla
Residente de Obra.

Powered by CamScanner

Semana 12.

Lunes 26 de Agosto de 2024.

Clima: Soleado

EPP: ✓Casco ✓Overol
✓Botas ✓Tapaoidos
✓Gafas.
✓Guantes

Personal: - 1 maestro
- 4 Ayudantes

Herramientas y Equipos: - Herramienta menor
- Mezcladora de concreto
- Vibrador de concreto.

Actividades Ejecutadas:

- Disponer la madera para formaletear tres (03) Secciones de Huellas.

- Se coloca y amarra el acero de refuerzo para tres (03) vigas riostras y seis (06) Huellas.

- Se prepara la mezcla, de acuerdo al diseño para concreto 3000 Psi, un volumen equivalente a 4,33 m^3

- Se vacian 1,09 m^3 de concreto y se funden tres (03) vigas riostras.

- Se vacian 3,24 m^3 de concreto y se funden seis (06) secciones de huella.

- Una vez inicia el fraguado, se limpian dilataciones, se marcan las huellas y se barre el concreto para el acabado

Observaciones:

Ing. Yeiner Pinilla
Residente de Obra

Powered by CamScanner

Martes 27 de Agosto de 2024.

Clima: Soleado.

EPP: ✓Casco ✓Overol
✓Botas ✓Tapaoidos
✓Gafas
✓Guantes

Personal: - 1 maestro
- 4 Ayudantes

Herramienta y Equipos: - Herramienta menor
- Mezcladora de concreto

Actividades Ejecutadas:

- Se instala la formaleta para encofrar tres secciones de cunetas.
- Se coloca y amarra el acero de refuerzo de las cunetas
- Se mezclan 2,98 m^3 de concreto 3000 Psi para las cunetas.
- Se vacía el concreto y se funden seis (06) cunetas
- Una vez inicia el fraguado, se limpian las dilataciones y se borre el concreto para darle acabado

Observaciones:

Ing. Yeiner Pinilla.
Residente de Obra

Powered by CamScanner

Miercoles 28 de Agosto de 2024:

Clima: Soleado

EPP: ✓Casco ✓Overol
Botas ✓Tapaoidos
Gafas
✓Guantes

Personal: -1 maestro
-4 Ayudantes

Herramientas y Equipo: -Herramienta menor
-Mezcladora de concreto.

Actividades Ejecutadas:

- Se retiran las formaletas.
- se desplaza material de piedra para el ciclopeo.
- Se prepara mezcla de concreto para ciclopeo.
- Se funden tres secciones centrales de concreto ciclopeo.
- Se funden seis secciones laterales de concreto ciclopeo.
- Una vez fundido el ciclopeo, se limpian dilataciones y se limpian las piedras expuestas a la vista.

Observaciones:

Ing. Yeiner Pinilla.
Residente de Obra

Powered by CamScanner

Jueves 29 de Agosto de 2024.

Clima: Soleado

EPP: Casco / Overol / Botas / Tapaoidos / Gafas / Guantes

Personal: -1 maestro
-4 Ayudantes

Herramienta y Equipos: - Herramienta menor
- Mezcladora de concreto.

Actividades Ejecutadas:

- Se alistan los materiales y agregados de acuerdo al diseño de mezcla para un equivalente de: 1,11 m^3 de concreto de 3000 Psi.

- Se alinean las formaletas para los bordillos, previamente instaladas.

- Se funden 0,709 m^3 de concreto para 35,2 ml de bordillo al margen izquierdo de la vía.

- Se vacian 0,4 m^3 de concreto 3000 Psi para fundir 20 ml de bordillo al margen derecho de la vía.

- Una vez inicia a fraguar el concreto se limpian los acabados.

Observaciones:

Ing. Yeiner Pinilla.
Residente de Obra.

Powered by CamScanner

Viernes 30 de Agosto de 2024.

Clima: Soleado

EPP: ✓Casco ✓Overol
Botas ✓Tapa oídos
Personal: – 1 maestro Guantes
– 4 Ayudantes ✓Gafas

Herramientas y Equipos: – Herramienta menor
– Mezcladora de concreto.

Actividades Ejecutadas:

- Se dispone la madera y se alinea para encofrar 3,6 ml de bordillo restante a cada lado de la vía.

- Se coloca el acero de refuerzo en el bordillo restante (3,6 ml) y se amarra.

- Se prepara una mezcla de concreto de 3000 Psi equivalente a 0,45 m^3 para 22,4 ml de bordillo.

- Se vacian 0,072 m^3 de concreto para fundir 3,6 ml al margen izquierdo.

- Se vacian 0,376 m^3 de concreto para fundir 18,8 ml de bordillo al margen derecho de la vía.

Observaciones:

Ing. Yeiner Pinilla
Residente de Obra.

Powered by CamScanner

Sábado 31 de Agosto de 2024.

Clima: Soleado

EPP: /Casco /Overol
/Botas /Tapa oídos
/Guantes
/Gafas

Personal: - 1 maestro
- 4 Ayudantes

Herramientas y Equipos: - Herramienta menor
- Polidora de Disco

Actividades Ejecutadas:

- Se retiran las formaletas de los bordillos.

- Se realizan con polidora la demarcación de las dilataciones en algunas secciones.

- Se realiza aseo a la obra, recogiendo residuos y sobrantes

- Se organizan los desechos y material excedente de las formaletas y herramientas, debidamente en el campamento.

- Se realiza relleno con el material de excavación en algunos puntos laterales al margen derecho de la Placa Huella para evitar socavación.

Observaciones:

Ing. Yeiner Pinilla.
Residente de Obra.

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SANTA LUCIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO EN EL DEPARTAMENTO DEL META PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Junta de accion comunal Vereda
Santa Lucia

Puerto Rico
META

Powered by CamScanner

Miercoles 31 de Julio 2024
Estado de tiempo: Soleado
Personal: 1 resd obra, 1 resd interv, maestro, 4 ayudantes
Herramienta y equipo: Herramienta menor, Revolvedora

Se han realizado actividades de Fundido de Concreto ciclopeo, a la fecha se tiene una longitud de concreto ciclopeo de 12 mL de este y se fundieron 3 metros mas, para un total de 15 mL de concreto ciclopeo, se realizaron actividades de dilataciones en la placa.

Residente de Obra
Diego Hernandez

Jueves 1 de Agosto 2024
Estado de tiempo: Soleado
Personal 1 resd obra, 1 resd interv, maestro, 4 ayudantes
Herramienta y equipo: Herramienta menor, Revolvedora

Se realizaron actividades de vaciados de 3 mL mas de concreto ciclopeo, el personal realizo la correcta instalacion de la piedra para el ciclopeo, el personal una vez terminada la actividad, realizo las dilataciones correspondientes en las secciones fundidas.

Residente de obra
Diego Hernandez

Powered by CamScanner

Viernes 2 de Agosto 2024
Estado de tiempo: Soleado
Personal: 1 resd obra, 1 resd interv, maestro, 4 ayudantes
Herramienta y equipo: Herramienta menor, mezcladora.

El personal realizo la instalación del concreto para placa huella, se instalaron formaletas en la 4ta sección que será fundida en la placa huella, se realizaron las labrados en las huellas y en las contetas, una vez terminadas las actividades se aplica agua

Residente de obra
Diego Hernandez

Sabado 3 de Agosto, 2024
Estado de tiempo: soleado
Personal: 1 resd, 1 resd obra, maestro
Herramienta y equipo: herramienta menor, Mezcladora

Se siguen realizando actividades de vaciado de concreto en la 4ta sección de la placa huella, se funden 3,20 mL mas de placa huella y contetas, con ello se registra un total fundido hoy de 3,20 mL de placa huella, las actividades se terminan a las 4:30 pm.

Residente de obra
Diego Hernandez

Powered by CamScanner

lunes 5 de Agosto 2024
Estado de tiempo: Soleado
Personal 1 resid chofer, 1 resid inter, maestro, 4 ayudantes
Herramienta y equipo: Herramienta menor, revolvedora

Se continúa con la instalación de las actividades de concreto de la placa huellas, el día de hoy se fundieron 3 m³ de placa de huella y cunetas, se fundió una rampa.

Residente de obra
Diego Hernandez

Martes 6 de Agosto 2024
Estado de tiempo: Soleado
Personal:
Herramienta y equipo: Herramienta menor, Machacas

El personal realizo la terminación de la instalación del faltante de 3,20 m³ de huellas y cunetas en concreto, a la fecha se tiene instalado 51,4 m³ de concreto entre huellas y cunetas con rastra, se tiene fundido 12 m³ de ciclopeo el cual una vez se termine de fundir las secciones de huellas y vigas y cunetas se fundirá en secciones.

Residente de obra
Diego Hernandez

Powered by CamScanner

Miercoles 7 de Agosto 2024
Estado de tiempo: Soleado
Personal: 1 residente, 1 resid inter, Maestro, 4 ayudantes
Herramienta y equipo: Herramienta M, Mezcladora

Se realizan actividades de retiro de formaleta, se organiza nuevamente y se instalan en el siguiente puesto, con esto se vuelve a formaleta tear una seccion completa de 12,8 ml de cunetas y vigas con las huellas, se organizan aceros para fundir el dia siguiente.

Residente de obra
Diego Hernandez

Jueves 8 de Agosto 2024
Estado de tiempo: Soleado
Personal: 1 resd obra, 1 resd inter, Maestro, 4 ayudantes
Herramienta y equipo: Herramienta menor, Mezcladora

Se fundan 3,2 ml de concreto el cual se distribuye en las cunetas, viga nostra y huellas, las huella con anchos de 90 cm, viga de anchos de 5,20 m y cunetas con anchos de 80 cm el espesor es de 20 cm, se verifican aceros para iniciar actividades de vaciado de concreto, una vez terminado este, se realizan los labrados en las huellas y dilataciones en las cunetas de la placa huella.

Residente de obra
Diego Hernandez

Powered by CamScanner

Viernes 9 de Agosto 2024
Estado de tiempo: Nublado
Personal: 1 resd obra, 1 resd interv, 1 maestro, 4 ayudantes
Herramienta y equipo: herramienta menor, Mezcladora

Se realiza la fundida de dos 3,2 mL de Concreto distribuidos en huellas, cunetas y viga cintas, las actividades terminan a las 4 pm.

Residente de obra
Diego Hernandez

Sabado 10 de Agosto 2024
Estado de tiempo
Personal: 1 res obra, 1 residente, 1 maestro, 4 ayudantes
Herramienta y equipo: HM, mezcladora

Se realizan actividades de fundida de 3,2 mL de placa huella distribuidas en huellas y cunetas con viga riostras, las actividades inician a las 8:00 am y se terminan a las 4:30 pm.

Residente de obra
Diego Hernandez

Powered by CamScanner

Lunes 12 de Agosto 2024
Estado de tiempo: Soleado
Personal: 1 res obra, 1 res interv, Maestro, Ayudantes
Herramienta y equipo: HM, Mezcladora

Se realizan actividades de fundida de concreto de placa huella, se funden 3.2 mL de huellas y ~~6~~ cunetes con viga riostra, se verifican aceros de refuerzo para iniciar procesos de fundida, se revisan aceros de las huellas, cunetes y los bordillos.

Residente de obra
Diego Hernandez

Martes 13 de Agosto 2024
Estado de tiempo: Soleado
Personal: 1 resd obra, 1 resd interv, Maestro, 4 ayudantes
Herramienta y equipo: HM, mezcladora

Se terminan las actividades de fundida de la 5ta seccion para un total de fundida de huellas y cunetes con riostras de 64.2 mL de huellas y cunetes, se realizan actividades de aplicacion de agua en los concretos para evitar ~~actividades~~ fisuras y daños por perdida de agua

Residente de obra
Diego Hernandez

Miercoles 14 de Agosto 2024
Estado de tiempo: soleado
Personal: 1 resd obra, 1 resd interv, Maestro, 4 ayudantes
Herramienta y equipo: H.M., Mezcladora

Se retira la formaleteo de la seccion ya fenclida, se organiza y se aplica aceite quemado para evitar que se pegue al concreto, se instalan en los aproches de acceso y salida de la placa huella, se apuntala y se deja listo para fundir al dia siguiente.

Diego Hernandez

Jueves 15 de Agosto 2024
Estado de tiempo: Soleado
Personal: 1 resd obra, 1 resd. interv., Maestro, 4 ayudantes.
Herramienta y equipo: HM., Mezcladora

Se funden los aproches de acceso y salida de la placahuella, con una longitud total de 7ml, se continuara con la fundida de los ciclopeos y los bordillos de las cunetas.

Residente obra.
Diego Hernandez

Powered by CamScanner

Viernes 16 de Agosto 2024
Estado de tiempo: Soleado.
Personal y equipo: H.M., mezcladora

Se realizan actividades de fundida de 6 mL de concreto ciclopeo, se realizaron los entrelazamientos de piedras en cada una de las secciones se realizan dilataciones y una vez terminadas estas actividades se hacen riegos con agua para ayudar al fraguado de esto.

Diego Hernandez

Sabado 17 de Agosto 2024
Estado de tiempo: Soleado
Personal: 1 resd obra, 1 resd interv, Maestro, 4 ayudantes
Herramienta y equipo: HM, Mezcladora

Se realizan actividades de fundida de otros 6 mL de concreto ciclopeo, se realizan las instalaciones de piedras en las secciones de la placa huella se realizaron actividades de dilataciones, de cada una de las secciones fundidas.

Diego Hernandez

Lunes 19 de Agosto 2024
Estado de tiempo: Soleado
Personal: 1 resd obra, 1 resd interv, Maestro, 4 ayudantes
Herramienta y equipo: HM., Revolvedora

Se fenden 9 ml mas de cuneta cuelepeo, se realizan las instalaciones de piedras en cada una de las secciones fendidas, se realizan adecuaciones para ir organizando las fondas de los bordillos, se dejan organizadas las formaletas en madera, para un total de 30 ml organizados.

Res. obra
Diego Hernandez

Martes 20 de Agosto 2024
Estado de tiempo: Soleado
Personal: 1 resd obra, 1 residente, Maestro, 4 ayudantes
Herramienta y equipo: HM, Revolvedora

Se fenden 12 ml de concreto ciclopeo, el personal realiza las instalaciones de ~~concreto~~ piedra en las 3 secciones que se fendieron, se realizaron las adecuaciones correspondientes, se terminan actividades a las 4:30 pm.

Residente obra
Diego Hernandez

Powered by CamScanner

Miercoles 21 de Agosto 2024
Estado de tiempo: Soleado
Personal: 4 resd chra, 1 resd interv, maestra, 4 ayudantes
Herramienta y equipo: HH, Mezcladora.

Se funden 12 ml de concreto ciclopeo, se realizaron las instalaciones de piedra en las secciones fendidas, una vez terminadas las actividades se realizaron actividades de dilatación de los concretos de ciclopeos y se remarcan huellas y cunetas.

Residente chra
Diego Hernandez

Jueves 22 de Agosto 2024
Estado de tiempo y soleado
Personal: 4 resd chra, 4 resd interv, maestro, 4 ayudantes
Herramienta y equipo: HH, mezcladora

Se funden 12 ml de concreto ciclopeo, el concreto ciclopeo tiene un espesor igual a la placa, de 20cm se realizaron las correctas instalaciones de las piedras en las secciones de los ciclopeos fendidos, Se instalan 12 mts de fermaletas en los bordillos del costado derecho, se dilatan las secciones de cunetas, ciclopes y huellas.

Residente chra
Diego Hernandez

Viernes 23 de Agosto 2024
Estado de tiempo: Soleado
Personal: 1 resd chia, 1 resd. intec,
Herramienta y equipo: HM, mezcladora.

Se fenden 18 mL de concreto ciclopeo en sitio, se realizaron las conexiones instalaciones de las piedras para fendir estas, cuando se terminen estas, se procedio a fendir los bordillos, se revisan alturas y longitudes, se fenden 15 mL de bordillo al costado izq.

Diego Hernandez

Sabado 24 de Agosto 2024
Estado de tiempo: Soleado
Personal:
Herramienta y equipo: HM, Mezcladora

Se fenden los 3 metros faltantes de ciclope en el sitio, con eso se completa toda la estructura fendida, se tienen 70 mL de placa, huella fendida totalmente, se fenden otros 20 mL de bordillo del costado izquierdo para un total de 35 mL. del costado izq fendidos y 18 mL del costado derecho fendidos.

Diego Hernandez

Powered by CamScanner

Lunes 26 de Agosto 2024
Estado de tiempo: Soleado
Personal: 1 residente, 1 residente interno, maestro, 4 ayudantes
Herramienta y equipo: HM, Mezcladora.

Se realiza la instalación de 20 ml del formaleta para bordillo en el costado izquierdo y 15 ml en el costado derecho se funden en horas de la tarde los bordillos, se realizan dilataciones, se obtienen 55 ml fundidos costado izq. y 30 ml fundidos costado derecho

Diego Hernandez

Martes 27 de Agosto 2024
Estado de tiempo:
Personal:
Herramienta y equipo:

Se realiza instalación de 20 ml de formaleta al costado derecho y 15 ml de formaleta costado izq, se funde todo el margen izquierdo para un total de 70 ml y el margen derecho una longitud de 50 ml, se realizan dilataciones y aplicaciones de agua para evitar fisuras.

Residente de obra
Diego Hernandez

Miercoles 28 de Agosto 2024
Estado de tiempo: Soleado
Personal: 1 resd.obra, 1 resd interv, maestro, 4 ayudantes
Herramienta y equipo: HH, Mezcladora.

Se fundan los 20 mts lineales de bordillo faltante por fundir en el sitio, las dimensiones y especeres de los bordillos son acordes a los estipulados en los diseños, se realizan rellenos en los costados de la vía y detras de los concretos.

Jueves 29 de Agosto 2024
Estado de tiempo:
Personal: 1 resd obra, 1 resd interv, maestro, 4 ayudantes
Herramienta y equipo.: Herramienta menor, Mezcladora

Se realiza el retiro de la formaleta correspondiente a los ultimos metros de bordillo de los concretos, se realizan retiros de sobrantes de excavacion y de rebabas que quedan del sobrante de los concretos de los bordillos, de igual forma se retiran formaletas en los ramperes de acceso a la placa huella y se rellenan dichos apoyos.

Residente de obra
Deyo Hernandez

Powered by CamScanner

Viernes 30 de Agosto 2024
Estado de tiempo : Soleado
Personal: N/A
Herramienta y equipo: N/A

la comunidad en un trabajo menecmuedo realizar labores de Imprevistos en el sitio, se recogen escombros, sobrantes de excavaciones y demas, todas las recolecciones son dispuestas en sitios de acopio autorizados por la junta de accion comunal.

Residente de obra
Diego Hernandez

Sabado 31 de Agosto 2024
Estado de tiempo : Soleado.
personal: N/A
Herramienta y equipo. N/A

Se da terminacion a las actividades ejecutadas en la vereda.

Residente de obra
Diego Hernandez.

Powered by CamScanner
