	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Contrato de Obra No. 4614 de 2023- 4664-2023 **Contratista:** JAC VEREDA LA PRIMAVERA- JAC SANTA LUCIA

Contrato de Interventoría No. 5001 de 2023 **Interventoría:** MISAEL VILLALBA GUAYARA

Objeto Contrato de Obra:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA PRIMAVERA DEL MUNICIPIO PUERTO RICO, DEPARTAMENTO DE META, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SANTA LUCIA DEL MUNICIPIO PUERTO RICO, DEPARTAMENTO DE META, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ

INFORME MENSUAL No. 10 **MES O PERIODO:** 1/09/2024 al 15/09/2024

No.	CONTENIDO	FORMATO	PAGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	1
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	2
1	**INTRODUCCION**		4
2	**DESCRIPCION DEL PROYECTO**		4
2.1	Localización		4
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		5
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		5
2.4	Características técnicas del proyecto		5
3	**INFORMACION CONTRATO DE OBRA**		6
3.1	Información general del contrato		6
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		8
3.3	Seguimiento Items no previstos		8
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		8
4	**REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		10
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	10
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	23
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	23
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	23
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	28
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	28
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	28
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	28
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		28
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1 MEPI-MN-IN-2-FR-2	
	• Seguimiento Programa de Obra		
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1 MEPI-MN-IN-6-FR-2	
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	
5	**INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA**		29
5.1	Información general del contrato		29
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		30
5.3	Informes especialistas y profesionales		32
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		32
5.5	Informe matriz de riesgos.		32
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		37
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de		
6	**REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA**		37
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	37
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	37
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	39
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	41
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	46
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		46
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1 MEPI-MN-IN-3-FR-2	
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	
7	**Conclusiones y recomendaciones**		47
8	**Anexos**		47
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia,		47
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		54
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad		58
8.4	Copia de la Bitacora del mes correspondiente		59

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:
Nombre: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Resolución de designación No.2023S-VMET-031554 de fecha 23/12/2023

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 16/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCION TERRITORIAL:** META **PERIODO MES:** 1/09/2024 AL 15/09/2024

CONTRATO DE OBRA No.: 4614 DE 2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA PRIMAVERA DEL MUNICIPIO PUERTO RICO, DEPARTAMENTO DE META, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA PRIMAVERA

PLAZO INICIAL: 31/12/2023
FECHA DE INICIO: 22/12/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN: NA
FECHA DE REANUDACIÓN: NA
FECHA DE VENCIMIENTO: 31/12/2023
PLAZO ACUMULADO: 15/09/2024

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 187.175.193,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA) $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 187.175.193,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 5001 DE 2023 **INTERVENTOR:** MISAEL VILLALBA GUAYARA **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:** CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción		
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	Placa huella	m	92
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULAD
Pavimentación	Construcción			
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Placa huella	m	0	92
Otros (Especificar cuales)	Alcantarilla tipo III	Unidad	0	0

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 138.950.825,00	$ -	$ 138.950.825,00
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES		$ -	
APORTE JAC	$ 1.000.000,00	$ -	$ 1.000.000,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 43.055.843,00	$ -	$ 43.055.843,00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD	$ 4.168.525,00	$ -	$ 4.168.525,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 187.175.193,00	$ -	$ 187.175.193,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ 30.335.187,08		$ 30.335.187,08	$ 143.778.496,95
AJUSTES				
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES				
APORTE JAC	$ -			
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 4.882.711,25		$ 4.882.711,25	$ 27.618.087,57
PAGA	$ -		$ -	$ -
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)				
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)				
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)				
VALOR EJECUTADO	$ 35.217.898,33	$ -	$ 35.217.898,33	$ 171.396.584,52

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 143.778.496,95
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 143.778.496,95
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 76,81%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 2
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 2

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 1

Foto 2

Reunión para cambio de firmas de la cuenta conjunta

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Ninguno

Firma
Nombre MARIANA ROZO MORENO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 091037-0539458 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 16/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCION TERRITORIAL:** META **PERIODO MES:** 1/09/2024 AL 15/09/2024

CONTRATO DE OBRA No.: 4664 DE 2023

OBJETO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SANTA LUCIA DEL MUNICIPIO PUERTO RICO, DEPARTAMENTO DE META, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SANTA LUCIA

PLAZO INICIAL: 31/12/2023
FECHA DE INICIO: 22/12/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN: NA
FECHA DE REANUDACIÓN: NA
FECHA DE VENCIMIENTO: 31/12/2023
PLAZO ACUMULADO: 15/09/2024

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 186.874.936,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA) $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 186.874.936,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 5001 DE 2023 **INTERVENTOR:** MISAEL VILLALBA GUAYARA **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:** CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción		
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	Placa huella	m	72,2
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULAD
Pavimentación	Construcción			
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Placa huella	m	0	72,2
Otros (Especificar cuales)	Alcantarilla tipo III	Unidad	0	0

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 138.660.441,00	$ -	$ 138.660.441,00
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES		$ -	
APORTE JAC	$ 1.000.000,00	$ -	$ 1.000.000,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 43.054.682,00	$ -	$ 43.054.682,00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD	$ 4.159.813,00	$ -	$ 4.159.813,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 186.874.936,00	$ -	$ 186.874.936,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ 10.958.353,00		$ 10.958.353,00	$ 147.835.977,85
AJUSTES				
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES				
APORTE JAC	$ -			
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 2.878.009,35		$ 2.878.009,35	$ 25.881.368,45
PAGA	$ -		$ -	$ -
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)				
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)				
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)				
VALOR EJECUTADO	$ 13.836.362,35	$ -	$ 13.836.362,35	$ 173.717.346,30

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 147.835.977,85
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 147.835.977,85
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 79,11%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 2
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 2

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 1

Foto 2

Reunión para cambio de firmas de la cuenta conjunta

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Ninguno

Firma
Nombre MARIANA ROZO MORENO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 091037-0539458 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

1. INTRODUCCIÓN


Caminos Comunitarios de la Paz Total surgió en septiembre de 2022 como una iniciativa con vocación de convertirse en un programa de inversión de alta prioridad dentro de la agenda de desarrollo del Gobierno 2022 - 2026, fundamentado en el Plan Nacional de Desarrollo “Colombia, Potencia Mundial de la Vida”, dentro del componente Proyectos Estratégicos de Impacto Regional.

Mediante la invitación pública **IP-ID-MET-028-2023,** surtió el contrato No.5001 -2023 cuyo objeto es ***INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO RICO DEPARTAMENTO DEL META DEL PROGRAMA “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL***, el cual tiene a cargo el seguimiento de los convenios 4614-2023; 4664-2023.

2. DESCRIPCION DEL PROYECTO

2.1. Localización

Los convenios 4614-2023; 4664-2023, se encuentran localizados en el municipio de Puerto Rico, departamento del Meta.

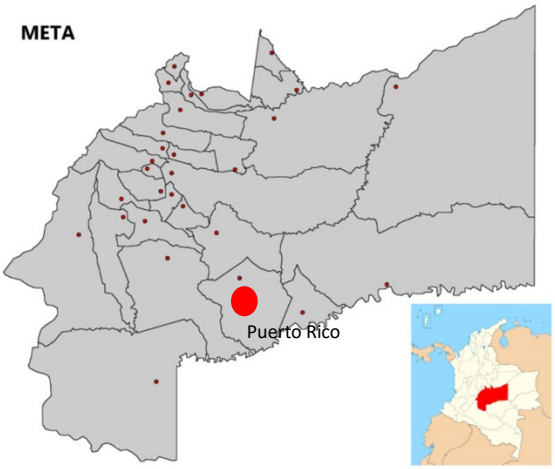

Convenio 4614 DE 2023:

La obra se llevará a cabo en la zona rural del municipio de Puerto Rico, ubicado en el departamento del Meta, específicamente en la vereda La Primavera. El punto de referencia para esta obra es la "LOMA CARRO QUEMADO", y el tramo inicial se encuentra en las coordenadas 2°56’26.99’’N 73°12’15.98’’O, extendiéndose hasta las coordenadas 2°56’37.50’’N 73°10’56.42’’O.

Convenio 4664 DE 2023:

La obra se llevará a cabo en la zona rural del municipio de Puerto Rico, ubicado en el departamento del Meta, específicamente en la vereda Santa Lucia. El punto de referencia para esta obra es la "LOMA MATECOCO", en la vía que comunica a la vereda caño Danta con la vereda Santa Lucia, iniciando el tramo en las coordenadas -73.389670°, 2.812187° extendiéndose hasta las coordenadas -73°3963092°, 2°8308440°.

2.2. Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto.

El municipio de Puerto Rico limita al norte con el Municipio de Puerto Lleras (Meta), al este con el municipio de Puerto Concordia (Meta), al sur con el departamento del Guaviare y al oeste con el municipio de Vista Hermosa (Meta). Esta delimitación geográfica sitúa a Puerto Rico en una posición estratégica dentro de la región, favoreciendo la interacción con municipios circundantes y facilitando el acceso a diversas zonas del departamento y del país.

2.3. Inventario y estado inicial de la vía

Convenio 4614 de 2023

El convenio implica la intervención de la vía mediante la construcción de 92 metros lineales de placa huella. Esta iniciativa busca mejorar significativamente la infraestructura vial en la zona, proporcionando una solución duradera que facilite el tránsito y la conectividad para los residentes y usuarios de la vía.

Convenio 4664 de 2023:

El convenio implica la intervención de la vía mediante la construcción de 72,2 metros lineales de placa huella. Esta iniciativa tiene como objetivo mejorar significativamente la infraestructura vial en la zona, ofreciendo una solución duradera que facilite tanto el tránsito liviano como el pesado que atraviesa el área. Con esta obra, se busca optimizar la seguridad vial y promover un flujo de tráfico más eficiente, beneficiando a la comunidad local y a los usuarios de la vía en general.

2.4. Características técnicas del proyecto

Convenio 4614 de 2023

ALCANCE PROYECTADO	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Placa Huella	ml	92	

Limpieza de alcantarillas	ml	6	
Desmonte y limpieza de zonas boscosas	Ha	1,54	

Convenio 4664 de 2023:

ALCANCE PROYECTADO	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Placa Huella	ml	72,20	
Limpieza de alcantarillas	ml	6	
Desmonte y limpieza de zonas boscosas	Ha	0,94	

3. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

3.1. Convenio 4614 de 2023

- **Información general del contrato**

No. DE PROCESO	SPSC-CD-CS-994- 2023
ID	CO1.PCCNTR.5590955
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA PRIMAVERA DEL MUNICIPIO PUERTO RICO, DEPARTAMENTO DE META, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
CONTRATISTA	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA PRIMAVERA NIT 900.919.431-1 RL: JHON WILMER DELGADO ACOSTA C.C 17.282.105
VALOR	$ 187.175.193,00
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	22/12/2023
FECHA DE INICIO	22/12/2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31/12/2023
FECHA PRORROGA No.1	30/04/2024
FECHA PRORROGA No.2	30/07/2024
FECHA PRORROGA No.3	15/09/2024
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA	15/09/2024

3.1.1 Descripción de las actividades ejecutadas en el mes

Durante las últimas fases del proyecto, se realizó la aplicación de pintura en las superficies necesarias, utilizando productos específicos para garantizar la durabilidad y la resistencia de los acabados. Se procedió con la señalización de la vía, aplicando pintura reflectante para la correcta visibilidad y seguridad vial, siguiendo las especificaciones del diseño.

Una vez concluida la colocación y el vaciado de las placas huella, se efectuaron trabajos de limpieza y revisión de la obra para asegurar que las estructuras cumplieran con los requerimientos establecidos. Las juntas de las placas fueron selladas correctamente para evitar filtraciones y asegurar su estabilidad a largo plazo. Se verificó el adecuado fraguado y endurecimiento del concreto, realizando las pruebas de resistencia necesarias en las diferentes secciones de la obra.

Al mismo tiempo, se continuó con la supervisión de la calidad de los trabajos realizados, comprobando que el acero de refuerzo estuviera correctamente dispuesto y que el concreto utilizado cumpliera con las especificaciones técnicas. Tras la finalización de las labores de pintura y señalización, se procedió al cierre del proyecto, con la organización final del área de trabajo. Esto incluyó la recolección de materiales sobrantes, la disposición adecuada de desechos y la limpieza de las instalaciones. Se realizó una inspección final para verificar que todas las tareas se ejecutaran de acuerdo a los planes y sin contratiempos. Con esto, se dio por concluida la ejecución de la obra y se dejó la zona lista para su entrega.

3.1.2 Seguimiento de ítems no previstos

- N/A

3.1.3 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la interventoría

Durante el periodo comprendido entre el 01/09/2024 y el 30/09/2024, la interventoría centró sus actividades en la supervisión posterior a la ejecución de la construcción de la placa huella. En esta etapa, se realizó una revisión detallada del cumplimiento de los estándares técnicos y normativos establecidos en los planos y especificaciones del proyecto, evaluando el estado final de la obra.

Asimismo, se ejecutaron las tomas de muestras representativas de los materiales empleados durante la construcción, con el objetivo de someterlas a ensayos en laboratorio para su análisis final. Estos resultados permitirán verificar y documentar

la calidad de los materiales utilizados y confirmar su idoneidad para garantizar la durabilidad y seguridad de la infraestructura.

3.2. Convenio 4664 de 2023:

4. Información general del contrato

No. DE PROCESO	SPSC-CD-CS-1030-2023
ID	CO1.PCCNTR.5594194
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SANTA LUCÍA DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO EN EL DEPARTAMENTO DEL META PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
CONTRATISTA	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SANTA LUCIA NIT 900.140.045-6 RL: JOSE ALEXANDER REMOLINA JEREZ C.C 1.116.493.600
VALOR	$ 186.874.936,00
FECHA DE SUSCRIPCION	22/12/2023
FECHA DE INICIO	22/12/2023
FECHA DE TERMINACION INICIAL	31/12/2023
FECHA PRORROGA No.1	30/04/2024
FECHA PRORROGA No.2	30/07/2024
FECHA PRORROGA No.3	15/09/2024
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA	15/09/2024

3.2.1 Descripción de las actividades ejecutadas en el mes

Al concluir el proceso de ejecución de la placa huella, se llevaron a cabo las últimas actividades que aseguraron la correcta terminación de la obra. Una vez completada la fundición de las secciones de la placa huella, se procedió con el retiro de las formaletas de las últimas áreas fundidas. Este procedimiento fue realizado de manera meticulosa, asegurando que no se presentaran daños en las superficies de concreto y que las secciones quedaran libres de imperfecciones.

En paralelo, se ejecutaron las tareas de consolidación del concreto, con un seguimiento del curado para garantizar que el fraguado se completara adecuadamente. Se aplicó agua de manera controlada sobre las áreas

fundidas para evitar la aparición de fisuras, siguiendo las recomendaciones técnicas para mantener la humedad del concreto durante el proceso de secado. Este paso fue crucial para asegurar la durabilidad de la infraestructura.

Una vez completadas las actividades de curado, se verificó que todas las secciones de la placa huella tuvieran la resistencia requerida según los parámetros establecidos en el proyecto. Se inspeccionaron los bordes y las juntas para garantizar que la expansión y contracción del concreto no afectaran la integridad de las obras.

Posteriormente, se realizaron trabajos de limpieza y de remoción de sobrantes de excavación y materiales residuales, que incluían restos de concreto y tierra, dejándolos en los sitios de acopio establecidos por las autoridades locales. También se nivelaron las áreas adyacentes a la placa huella, asegurando una integración adecuada de la vía con el terreno circundante, y se procedió con la instalación de los últimos elementos de señalización y seguridad vial, como los bordillos y las cunetas.

Finalmente, se llevaron a cabo las pruebas de resistencia y funcionalidad en las secciones ya terminadas para verificar que la estructura cumpliera con las especificaciones técnicas. Con la realización de estos controles, se dio por finalizado el proceso de ejecución de la placa huella, con el cumplimiento total de los estándares de calidad y la satisfacción de los requerimientos del proyecto.

3.2.2 Seguimiento de ítems no previstos

- N/A

3.2.3 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la interventoría

Durante el periodo comprendido entre el 01/09/2024 y el 30/09/2024, la interventoría centró sus actividades en la supervisión posterior a la ejecución de la construcción de la placa huella. En esta etapa, se realizó una revisión detallada del cumplimiento de los estándares técnicos y normativos establecidos en los planos y especificaciones del proyecto, evaluando el estado final de la obra.

Asimismo, se ejecutaron las tomas de muestras representativas de los materiales empleados durante la construcción, con el objetivo de someterlas a ensayos en laboratorio para su análisis final. Estos resultados permitirán

verificar y documentar la calidad de los materiales utilizados y confirmar su idoneidad para garantizar la durabilidad y seguridad de la infraestructura.

4 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

4.1. INFORMES SEMANALES DURANTE EL PRESENTE PERIODO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 8/09/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: META — SEMANA No.: 37 del 1 al 7 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☑

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA PRIMAVERA DEL MUNICIPIO PUERTO RICO, DEPARTAMENTO DE META, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El proyecto a desarrollar en virtud del convenio aborda el mejoramiento de la vía terciaria situada en la zona de influencia dentro del municipio de Puerto Rico, en el departamento de Menta, específicamente en la vereda La Primavera, con "LOMA CARRO QUEMADO" como punto de referencia.
El propósito principal de este proyecto es la construcción de 110 metros lineales de placa huella y la construcción de una alcantarilla de tipo III.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Se programará la primera visita técnica al punto de referencia con el objetivo de precisar las cantidades reales que se llevarán a cabo en el marco del proyecto. Durante esta visita, se realizará una evaluación del área, permitiendo una definición más precisa de las dimensiones y alcances contemplados en el objeto del proyecto, optimizando así la ejecución del proyecto y asegurando la congruencia entre las metas previstas y la realidad del sitio de intervención.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA PRIMAVERA

CONVENIO No. 4614 de 2023 — VALOR INICIAL: $ 187.175.193,00
FECHA DE INICIO: 22 de diciembre de 2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 de diciembre de 2023 — VALOR ACUMULADO: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 15 de septiembre de 2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: MISAEL VILLALBA GUAYARA
INTEGRANTES:

CONTRATO No. 5001 de 2023 — VALOR INICIAL: $ 65.909.578,00
FECHA DE INICIO: 22 de diciembre de 2023 — VALOR ADICIONES: $ 32.852.568
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 de diciembre de 2023 — VALOR ACUMULADO: $ 98.762.146
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 15 de septiembre de 2024 — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 186.175.193	$ 186.175.193		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ 158.377.981		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 186.175.193	$ 27.797.212		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 65.909.578	$ 98.079.562		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 682.584,00	$ 95.102.484		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 65.226.994	$ 2.977.078		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 138.950.825,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 131.540.345,87	71%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 131.540.345,87	71%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 26.837.634,72	14%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 158.377.980,59	85%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 158.377.980,59	85%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 22.199.294,40	12%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 22.199.294,40	12%

Observaciones: Durante la semana no se generaron pagos a proveedores, los gastos relacionados corresponden a los gastos bancarios.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 95.785.068,10	96,99%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 95.785.068,10	96,99%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 2.604.943,16	2,64%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 2.604.943,16	2,64%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %:
Meta Física Ejecutada %:
Avance o Atraso Físico %:

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	Placa huella	m	92
*			
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A
EMISIONES:	SI		NO	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A

OBSERVACIONES: El 20 de febrero el Instituto Nacional de Vias (INVIAS) mediante el oficio con numero de radicado 2024S-VMET-008893, solicito la implementacion de un modelo paga. Esto ultimo, informandose a la JAC para iniciar su respectiva implementacion.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 2

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: La interventoría aprueba los perfiles de ingeniero residente, maestro y contados, mediante un oficio emitio el 23 de enero de 2024.

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se realizaron revisiones parciales de precios unitarios, memorias de cálculo y memorias de cantidades.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Pendiente el inicio de la la realización de apiques a cielo abierto y perfil estratigráfico, levantamiento topográfico,cartera, informe y georreferenciación, estudio hidrológico e hidráulico y diseño geométrico y diseño de mezcla, lo anterior por insuficiencia de recursos.

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTO 1	**FOTO 2**	**FOTO 3**
Indicar localización y actividad	**Indicar localización y actividad**	**Indicar localización y actividad**

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
Aprobación de precios unitarios y memorias de cálculo	FIRMA NOMBRE MARIANA ROZO MORENO Matrícula Profesional No.: 09103-0539458 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 15/09/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: META | SEMANA No.: 38 del 8 al 14 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI ☑

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA PRIMAVERA DEL MUNICIPIO PUERTO RICO, DEPARTAMENTO DE META, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El proyecto a desarrollar en virtud del convenio aborda el mejoramiento de la vía terciaria situada en la zona de influencia dentro del municipio de Puerto Rico, en el departamento de Menta, específicamente en la vereda La Primavera, con "LOMA CARRO QUEMADO" como punto de referencia.
El propósito principal de este proyecto es la construcción de 110 metros lineales de placa huella y la construcción de una alcantarilla de tipo III.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Se programará la primera visita técnica al punto de referencia con el objetivo de precisar las cantidades reales que se llevarán a cabo en el marco del proyecto. Durante esta visita, se realizará una evaluación del área, permitiendo una definición más precisa de las dimensiones y alcances contemplados en el objeto del proyecto, optimizando así la ejecución del proyecto y asegurando la congruencia entre las metas previstas y la realidad del sitio de intervención.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA PRIMAVERA

CONVENIO No.	4614 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 187.175.193,00
FECHA DE INICIO:	22 de diciembre de 2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 de diciembre de 2023	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	15 de septiembre de 2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: MISAEL VILLALBA GUAYARA

INTEGRANTES:

CONTRATO No.	5001 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 65.909.578,00
FECHA DE INICIO:	22 de diciembre de 2023	VALOR ADICIONES:	$ 32.852.568
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 de diciembre de 2023	VALOR ACUMULADO:	$ 98.762.146
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	15 de septiembre de 2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 186.175.193	$ 186.175.193		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ 158.545.358		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 186.175.193	$ 27.629.835		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 65.909.578	$ 98.079.562		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 682.584,00	$ 97.707.427		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 65.226.994	$ 372.135		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 138.950.825,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 131.540.345,87	71%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 131.540.345,87	71%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 27.005.012,52	15%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 158.545.358,39	85%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 158.545.358,39	85%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 167.377,80	0%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 167.377,80	0%

Observaciones: Durante la semana no se generaron pagos a proveedores, los gastos relacionados corresponden a los gastos bancarios.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 98.390.011,26	99,62%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 98.390.011,26	99,62%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 2.604.943,16	2,64%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 2.604.943,16	2,64%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %

Meta Física Ejecutada %

Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	Placa huella	m	92
*			
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ..... NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ..... NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A .....
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A .....
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A .....
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A .....
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A .....
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A .....
EMISIONES:	SI	NO	N/A .....
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A .....

OBSERVACIONES: El 20 de febrero el Instituto Nacional de Vias (INVIAS) mediante el oficio con numero de radicado 2024S-VMET-008893, solicito la implementacion de un modelo paga. Esto ultimo, informandose a la JAC para iniciar su respectiva implementacion.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL)

ESTADO: .....

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 2

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: .....

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: .....

OBSERVACIONES: La interventoría aprueba los perfiles de ingeniero residente, maestro y contados, mediante un oficio emitio el 23 de enero de 2024.

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se realizaron revisiones parciales de precios unitarios, memorias de cálculo y memorias de cantidades.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Pendiente el inicio de la la realización de apiques a cielo abierto y perfil estratigráfico, levantamiento topográfico,cartera, informe y georreferenciación, estudio hidrológico e hidráulico y diseño geométrico y diseño de mezcla, lo anterior por insuficiencia de recursos.

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTO 1	**FOTO 2**	**FOTO 3**
Indicar localización y actividad	**Indicar localización y actividad**	**Indicar localización y actividad**

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Aprobación de precios unitarios y memorias de cálculo

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA .....

NOMBRE MARIANA ROZO MORENO

Matrícula Profesional No.: 091037-0139458 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 16/09/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: META | SEMANA No.: 39 del 15 al ____ (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI ☑

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA PRIMAVERA DEL MUNICIPIO PUERTO RICO, DEPARTAMENTO DE META, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El proyecto a desarrollar en virtud del convenio aborda el mejoramiento de la vía terciaria situada en la zona de influencia dentro del municipio de Puerto Rico, en el departamento de Menta, específicamente en la vereda La Primavera, con "LOMA CARRO QUEMADO" como punto de referencia.
El propósito principal de este proyecto es la construcción de 110 metros lineales de placa huella y la construcción de una alcantarilla de tipo III.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Se programará la primera visita técnica al punto de referencia con el objetivo de precisar las cantidades reales que se llevarán a cabo en el marco del proyecto. Durante esta visita, se realizará una evaluación del área, permitiendo una definición más precisa de las dimensiones y alcances contemplados en el objeto del proyecto, optimizando así la ejecución del proyecto y asegurando la congruencia entre las metas previstas y la realidad del sitio de intervención.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA PRIMAVERA

CONVENIO No. 4614 de 2023 | VALOR INICIAL: $ 187.175.193,00
FECHA DE INICIO: 22 de diciembre de 2023 | VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 de diciembre de 2023 | VALOR ACUMULADO: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 15 de septiembre de 2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: MISAEL VILLALBA GUAYARA
INTEGRANTES:

CONTRATO No. 5001 de 2023 | VALOR INICIAL: $ 65.909.578,00
FECHA DE INICIO: 22 de diciembre de 2023 | VALOR ADICIONES: $ 32.852.568
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 de diciembre de 2023 | VALOR ACUMULADO: $ 98.762.146
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 15 de septiembre de 2024 | VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 186.175.193	$ 186.175.193		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ 158.545.358		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 186.175.193	$ 27.629.835		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 65.909.578	$ 98.079.562		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 682.584,00	$ 98.079.562		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 65.226.994	$ -		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 138.950.825,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 131.540.345,87	71%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 131.540.345,87	71%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 27.005.012,52	15%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 158.545.358,39	85%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 158.545.358,39	85%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

Observaciones: En esta semana no se realizaron pagos, ni descuentos del banco por comisión.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 98.762.146,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 98.762.146,00	100,00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 372.134,74	0,38%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 372.134,74	0,38%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	Placa huella	m	92
*			
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ..... NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ..... NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES: El 20 de febrero el Instituto Nacional de Vias (INVIAS) mediante el oficio con numero de radicado 2024S-VMET-008893, solicito la implementacion de un modelo paga. Esto ultimo, informandose a la JAC para iniciar su respectiva implementacion.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL)

ESTADO: .....

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 2

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: .....

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: .....

OBSERVACIONES: La interventoría aprueba los perfiles de ingeniero residente, maestro y contados, mediante un oficio emitio el 23 de enero de 2024.

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se realizaron revisiones parciales de precios unitarios, memorias de cálculo y memorias de cantidades.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Pendiente el inicio de la la realización de apiques a cielo abierto y perfil estratigráfico, levantamiento topográfico,cartera, informe y georreferenciación, estudio hidrológico e hidráulico y diseño geométrico y diseño de mezcla, lo anterior por insuficiencia de recursos.

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTO 1	**FOTO 2**	**FOTO 3**
Indicar localización y actividad	**Indicar localización y actividad**	**Indicar localización y actividad**

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Aprobación de precios unitarios y memorias de cálculo

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA .....

NOMBRE MARIANA ROZO MORENO

Matrícula Profesional No.: 091037-05959458 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 8/09/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: META — SEMANA No.: 37 del 1 al 7 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☑

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SANTA LUCIA DEL MUNICIPIO PUERTO RICO, DEPARTAMENTO DE META, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El proyecto a desarrollar en virtud del convenio aborda el mejoramiento de la vía terciaria situada en la zona de influencia dentro del municipio de Puerto Rico, en el departamento de Menta, específicamente en la vereda Santa Lucia, con "LOMA MATECOCO" como punto de referencia. El propósito principal de este proyecto es la construcción de 94 metros lineales de placa huella y la construcción de una alcantarilla de tipo III.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Se programará la primera visita técnica al punto de referencia con el objetivo de precisar las cantidades reales que se llevarán a cabo en el marco del proyecto. Durante esta visita, se realizará una evaluación del área, permitiendo una definición más precisa de las dimensiones y alcances contemplados en el objeto del proyecto, optimizando así la ejecución del proyecto y asegurando la congruencia entre las metas previstas y la realidad del sitio de intervención.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SANTA LUCIA

CONVENIO No.	4664 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 186.874.936,00
FECHA DE INICIO:	22 de diciembre de 2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 de diciembre de 2023	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	15 de septiembre de 2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: MISAEL VILLALBA GUAYARA

INTEGRANTES:

CONTRATO No.	5001 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 65.909.578,00
FECHA DE INICIO:	22 de diciembre de 2023	VALOR ADICIONES:	$ 32.852.568
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 de diciembre de 2023	VALOR ACUMULADO:	$ 98.762.146
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	15 de septiembre de 2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 185.874.936	$ 185.874.936		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ 171.017.483		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 185.874.936	$ 14.857.453		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 65.909.578	$ 98.079.562		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 682.584,00	$ 95.102.484		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 65.226.994	$ 2.977.078		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 138.950.825,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 148.362.090,40	80%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 148.362.090,40	80%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 22.655.393,08	12%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 171.017.483,48	92%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 171.017.483,48	92%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 11.136.499,00	6%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 11.136.499,00	6%

Observaciones: Durante esta semana se realizaron pagos relacionados al rubro de obra como; el pago de la nómina y liquidación, transporte de cemento y alquiler de maquinaria y, la seguridad social del mes de Julio.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 95.785.068,10	96,99%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 95.785.068,10	96,99%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 2.604.943,16	2,64%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 2.604.943,16	2,64%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: Avance o Atraso Físico %:

Meta Física Ejecutada %:

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	Placa huella	m	72,2
*			
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ..... NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ..... NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES: El 20 de febrero el Instituto Nacional de Vias (INVIAS) mediante el oficio con numero de radicado 2024S-VMET-008893, solicito la implementacion de un modelo paga. Esto ultimo, informandose a la JAC para iniciar su respectiva implementacion.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL)

ESTADO: .....

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 2

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: .....

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: .....

OBSERVACIONES: La interventoría aprueba los perfiles de ingeniero residente, maestro y contados, mediante un oficio emitio el 23 de enero de 2024.

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se realizaron revisiones parciales de precios unitarios, memorias de cálculo y memorias de cantidades.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Pendiente el inicio de la la realización de apiques a cielo abierto y perfil estratigráfico, levantamiento topográfico,cartera, informe y georreferenciación, estudio hidrológico e hidráulico y diseño geométrico y diseño de mezcla, lo anterior por insuficiencia de recursos.

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTO 1	**FOTO 2**	**FOTO 3**
Indicar localización y actividad	**Indicar localización y actividad**	**Indicar localización y actividad**

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Aprobación de precios unitarios y memorias de cálculo

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA .....

NOMBRE MARIANA ROZO MORENO

Matrícula Profesional No.: 091037-05259458 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 15/09/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: META | SEMANA No.: 38 del 8 al 14 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI ☑

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SANTA LUCIA DEL MUNICIPIO PUERTO RICO, DEPARTAMENTO DE META, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El proyecto a desarrollar en virtud del convenio aborda el mejoramiento de la vía terciaria situada en la zona de influencia dentro del municipio de Puerto Rico, en el departamento de Menta, específicamente en la vereda Santa Lucia, con "LOMA MATECOCO" como punto de referencia. El propósito principal de este proyecto es la construcción de 94 metros lineales de placa huella y la construcción de una alcantarilla de tipo III.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Se programará la primera visita técnica al punto de referencia con el objetivo de precisar las cantidades reales que se llevarán a cabo en el marco del proyecto. Durante esta visita, se realizará una evaluación del área, permitiendo una definición más precisa de las dimensiones y alcances contemplados en el objeto del proyecto, optimizando así la ejecución del proyecto y asegurando la congruencia entre las metas previstas y la realidad del sitio de intervención.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SANTA LUCIA

CONVENIO No.	4664 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 186.874.936,00
FECHA DE INICIO:	22 de diciembre de 2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 de diciembre de 2023	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	15 de septiembre de 2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: MISAEL VILLALBA GUAYARA

INTEGRANTES:

CONTRATO No.	5001 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 65.909.578,00
FECHA DE INICIO:	22 de diciembre de 2023	VALOR ADICIONES:	$ 32.852.568
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 de diciembre de 2023	VALOR ACUMULADO:	$ 98.762.146
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	15 de septiembre de 2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 185.874.936	$ 185.874.936		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ 171.172.112		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 185.874.936	$ 14.702.824		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 65.909.578	$ 98.079.562		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 682.584,00	$ 97.707.427		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 65.226.994	$ 372.135		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 138.950.825,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 148.362.090,40	80%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 148.362.090,40	80%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 22.810.022,08	12%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 171.172.112,48	92%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 171.172.112,48	92%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 154.629,00	0%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 154.629,00	0%

Observaciones: Durante la semana no se generaron pagos a proveedores, los gastos relacionados corresponden a los gastos bancarios.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 98.390.011,26	99,62%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 98.390.011,26	99,62%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 2.604.943,16	2,64%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 2.604.943,16	2,64%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %

Meta Física Ejecutada %

Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	Placa huella	m	72,2
*			
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES: El 20 de febrero el Instituto Nacional de Vias (INVIAS) mediante el oficio con numero de radicado 2024S-VMET-008893, solicito la implementacion de un modelo paga. Esto ultimo, informandose a la JAC para iniciar su respectiva implementacion.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 2

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: La interventoría aprueba los perfiles de ingeniero residente, maestro y contados, mediante un oficio emitio el 23 de enero de 2024.

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se realizaron revisiones parciales de precios unitarios, memorias de cálculo y memorias de cantidades.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Pendiente el inicio de la la realización de apiques a cielo abierto y perfil estratigráfico, levantamiento topográfico,cartera, informe y georreferenciación, estudio hidrológico e hidráulico y diseño geométrico y diseño de mezcla, lo anterior por insuficiencia de recursos.

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTO 1	**FOTO 2**	**FOTO 3**
Indicar localización y actividad	**Indicar localización y actividad**	**Indicar localización y actividad**

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Aprobación de precios unitarios y memorias de cálculo

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE MARIANA ROZO MORENO

Matrícula Profesional No.: 091037-053458 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 16/09/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: META — SEMANA No.: 39 del 15 al ____ (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☑

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SANTA LUCIA DEL MUNICIPIO PUERTO RICO, DEPARTAMENTO DE META, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El proyecto a desarrollar en virtud del convenio aborda el mejoramiento de la vía terciaria situada en la zona de influencia dentro del municipio de Puerto Rico, en el departamento de Menta, específicamente en la vereda Santa Lucia, con "LOMA MATECOCO" como punto de referencia. El propósito principal de este proyecto es la construcción de 94 metros lineales de placa huella y la construcción de una alcantarilla de tipo III.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Se programará la primera visita técnica al punto de referencia con el objetivo de precisar las cantidades reales que se llevarán a cabo en el marco del proyecto. Durante esta visita, se realizará una evaluación del área, permitiendo una definición más precisa de las dimensiones y alcances contemplados en el objeto del proyecto, optimizando así la ejecución del proyecto y asegurando la congruencia entre las metas previstas y la realidad del sitio de intervención.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SANTA LUCIA

CONVENIO No.	4664 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 186.874.936,00
FECHA DE INICIO:	22 de diciembre de 2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 de diciembre de 2023	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	15 de septiembre de 2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: MISAEL VILLALBA GUAYARA

INTEGRANTES:

CONTRATO No.	5001 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 65.909.578,00
FECHA DE INICIO:	22 de diciembre de 2023	VALOR ADICIONES:	$ 32.852.568
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 de diciembre de 2023	VALOR ACUMULADO:	$ 98.762.146
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	15 de septiembre de 2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 185.874.936	$ 185.874.936		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ 170.861.612		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 185.874.936	$ 15.013.324		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 65.909.578	$ 98.079.562		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 682.584,00	$ 98.079.562		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 65.226.994	$ -		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 138.950.825,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 148.362.090,40	80%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 148.362.090,40	80%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 22.499.522,08	12%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 170.861.612,48	92%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 170.861.612,48	92%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

Observaciones: En esta semana no se realizaron pagos, ni descuentos del banco por comisión.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 98.762.146,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 98.762.146,00	100,00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 372.134,74	0,38%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 372.134,74	0,38%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: ____ Avance o Atraso Físico %: ____

Meta Física Ejecutada %: ____

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	Placa huella	m	72,2
*			
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES: El 20 de febrero el Instituto Nacional de Vias (INVIAS) mediante el oficio con numero de radicado 2024S-VMET-008893, solicito la implementacion de un modelo paga. Esto ultimo, informandose a la JAC para iniciar su respectiva implementacion.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 2

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: La interventoría aprueba los perfiles de ingeniero residente, maestro y contados, mediante un oficio emitio el 23 de enero de 2024.

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se realizaron revisiones parciales de precios unitarios, memorias de cálculo y memorias de cantidades.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Pendiente el inicio de la la realización de apiques a cielo abierto y perfil estratigráfico, levantamiento topográfico,cartera, informe y georreferenciación, estudio hidrológico e hidráulico y diseño geométrico y diseño de mezcla, lo anterior por insuficiencia de recursos.

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTO 1	**FOTO 2**	**FOTO 3**
Indicar localización y actividad	**Indicar localización y actividad**	**Indicar localización y actividad**

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Aprobación de precios unitarios y memorias de cálculo

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE MARIANA ROZO MORENO

Matrícula Profesional No.: 091037-053458 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

4.2. MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA:

Durante septiembre de 2024, los procesos constructivos de la placa huella finalizaron, por lo que no se utilizó maquinaria en ninguno de los dos convenios.

4.3. PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL DE OBRA

Una vez concluidos los procesos constructivos de la placa huella, se informa que las actividades de obra llegaron a su término, y el personal asignado para dichas labores fue completamente liquidado durante el mes anterior. Actualmente, no se dispone de personal de obra en el marco de los convenios supervisados.

4.4. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO CONVENIOS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 01/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES, CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. 8 **MES:** SEPTIEMBRE **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO** ☐

CONVENIO No. 4614-2023 (Indicar número y año)

DESEMBOLSO OTORGADO: 100 %

VALOR DEL DESEMBOLSO OTORGADO: $ 186.175.193,00 (M/CTE)

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA PRIMAVERA DEL MUNICIPIO PUERTO RICO, DEPARTAMENTO DE META, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ORGANIZACIÓN DE ACCIÓN COMUNAL JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA PRIMAVERA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5001-2023 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: MISAEL VILLALBA GUAYARA

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

DOCUMENTO DE EGRESO No.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR FACTURA CON IVA	VALOR ANTICIPO	DESCUENTO RETENCIÓN EN LA FUENTE	DESCUENTO RETENCIÓN ICA	VALOR A PAGAR O VALOR GIRADO	RUBRO No.	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO
	2/05/2024	AV VILLAS	DEVOLUCION ND RTE	$ 750,00	$ -	$ -	$ -	$ (750,00)	3	DEVOLUCION ND RTE
	2/05/2024	AV VILLAS	DEVOLUCION I.V.A.	$ 750,00	$ -	$ -	$ -	$ (750,00)	3	DEVOLUCION I.V.A.
	15/07/2024	AV VILLAS	DEVOLUCION ND RTE	$ 13.550,00	$ -	$ -	$ -	$ (13.550,00)	3	DEVOLUCION ND RTE
	15/07/2024	AV VILLAS	DEVOLUCION ND RTE	$ 13.550,00	$ -	$ -	$ -	$ (13.550,00)	3	DEVOLUCION ND RTE
	15/07/2024	AV VILLAS	DEVOLUCION ND RTE	$ 13.550,00	$ -	$ -	$ -	$ (13.550,00)	3	DEVOLUCION ND RTE
	15/07/2024	AV VILLAS	REINTEGRO COMISION	$ 13.550,00	$ -	$ -	$ -	$ (13.550,00)	3	REINTEGRO COMISION
	15/07/2024	AV VILLAS	REINTEGRO COMISION	$ 13.550,00	$ -	$ -	$ -	$ (13.550,00)	3	REINTEGRO COMISION
	15/07/2024	AV VILLAS	REINTEGRO COMISION	$ 13.550,00	$ -	$ -	$ -	$ (13.550,00)	3	REINTEGRO COMISION
	22/07/2024	AV VILLAS	DEVOLUCION ND RTE	$ 13.550,00	$ -	$ -	$ -	$ (13.550,00)	3	DEVOLUCION ND RTE
	22/07/2024	AV VILLAS	DEVOLUCION ND RTE	$ 13.550,00	$ -	$ -	$ -	$ (13.550,00)	3	DEVOLUCION ND RTE
	22/07/2024	AV VILLAS	REINTEGRO COMISION	$ 13.550,00	$ -	$ -	$ -	$ (13.550,00)	3	REINTEGRO COMISION
	22/07/2024	AV VILLAS	REINTEGRO COMISION	$ 13.550,00	$ -	$ -	$ -	$ (13.550,00)	3	REINTEGRO COMISION
	1/08/2024	AV VILLAS	REINTEGRO COBRO MENSUAL	$ 3.950,00	$ -	$ -	$ -	$ (3.950,00)	3	COBRO MENSUAL DE NOTIFICACIONES
	1/08/2024	AV VILLAS	DEVOLUCION ND RTE	$ 3.950,00	$ -	$ -	$ -	$ (3.950,00)	3	DEVOLUCION ND RTE
	1/08/2024	AV VILLAS	DEVOLUCION ND RTE	$ 750,00	$ -	$ -	$ -	$ (750,00)	3	DEVOLUCION ND RTE
	1/08/2024	AV VILLAS	DEVOLUCION ND RTE	$ 13.550,00	$ -	$ -	$ -	$ (13.550,00)	3	DEVOLUCION ND RTE
	1/08/2024	AV VILLAS	DEVOLUCION ND RTE	$ 13.550,00	$ -	$ -	$ -	$ (13.550,00)	3	DEVOLUCION ND RTE
	1/08/2024	AV VILLAS	DEVOLUCION I.V.A.	$ 750,00	$ -	$ -	$ -	$ (750,00)	3	DEVOLUCION I.V.A.
	1/08/2024	AV VILLAS	REINTEGRO COMISION	$ 13.550,00	$ -	$ -	$ -	$ (13.550,00)	3	REINTEGRO COMISION
	1/08/2024	AV VILLAS	REINTEGRO COMISION	$ 13.550,00	$ -	$ -	$ -	$ (13.550,00)	3	REINTEGRO COMISION
	20/08/2024	AV VILLAS	DEVOLUCION ND RTE	$ 13.550,00	$ -	$ -	$ -	$ (13.550,00)	3	DEVOLUCION ND RTE
	20/08/2024	AV VILLAS	DEVOLUCION ND RTE	$ 13.550,00	$ -	$ -	$ -	$ (13.550,00)	3	DEVOLUCION ND RTE
	20/08/2024	AV VILLAS	DEVOLUCION ND RTE	$ 13.550,00	$ -	$ -	$ -	$ (13.550,00)	3	DEVOLUCION ND RTE
	20/08/2024	AV VILLAS	DEVOLUCION ND RTE	$ 13.550,00	$ -	$ -	$ -	$ (13.550,00)	3	DEVOLUCION ND RTE
	20/08/2024	AV VILLAS	DEVOLUCION ND RTE	$ 13.550,00	$ -	$ -	$ -	$ (13.550,00)	3	DEVOLUCION ND RTE
	20/08/2024	AV VILLAS	REINTEGRO COMISION	$ 13.550,00	$ -	$ -	$ -	$ (13.550,00)	3	REINTEGRO COMISION
	20/08/2024	AV VILLAS	REINTEGRO COMISION	$ 13.550,00	$ -	$ -	$ -	$ (13.550,00)	3	REINTEGRO COMISION
	20/08/2024	AV VILLAS	REINTEGRO COMISION	$ 13.550,00	$ -	$ -	$ -	$ (13.550,00)	3	REINTEGRO COMISION
	20/08/2024	AV VILLAS	REINTEGRO COMISION	$ 13.550,00	$ -	$ -	$ -	$ (13.550,00)	3	REINTEGRO COMISION
	20/08/2024	AV VILLAS	REINTEGRO COMISION	$ 13.550,00	$ -	$ -	$ -	$ (13.550,00)	3	REINTEGRO COMISION
ORDEN NO.44	31/08/2024	JAC LA PRIMAVERA	PAGO NOMINA Y LIQUIDACION AYUDANTES	$ 8.212.596,00	$ -	$ -	$ -	$ 8.212.596,00	1	OBRA
ORDEN NO.44	31/08/2024	JAC LA PRIMAVERA	PAGO NOMINA Y LIQUIDACION MAESTRO	$ 3.259.305,00	$ -	$ -	$ -	$ 3.259.305,00	3	ADMINISTRATIVO
ORDEN NO.42	31/08/2024	JAC LA PRIMAVERA	SEGURIDAD SOCIAL JULIO AYUDANTES	$ 2.855.440,00	$ -	$ -	$ -	$ 2.855.440,00	1	OBRA
ORDEN NO.42	31/08/2024	JAC LA PRIMAVERA	SEGURIDAD SOCIAL JULIO MAESTRO	$ 713.860,00	$ -	$ -	$ -	$ 713.860,00	3	ADMINISTRATIVO
ORDEN NO.43	31/08/2024	DUBER LOPEZ	TRANSPORTE TRITURADOS Y MATERIAL CEMENTO	$ 7.029.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 7.029.000,00	1	OBRA
	2/09/2024	AV VILLAS	COMISION TRANSF ACH OFICINA	$ 13.550,00	$ -	$ -	$ -	$ 13.550,00	3	COMISION TRANSF ACH OFICINA
	2/09/2024	AV VILLAS	COMISION TRANSF ACH OFICINA	$ 13.550,00	$ -	$ -	$ -	$ 13.550,00	3	COMISION TRANSF ACH OFICINA
	2/09/2024	AV VILLAS	COMISION TRANSF ACH OFICINA	$ 13.550,00	$ -	$ -	$ -	$ 13.550,00	3	COMISION TRANSF ACH OFICINA
	2/09/2024	AV VILLAS	NOTA DEBITO 4X1000	$ 88.443,40	$ -	$ -	$ -	$ 88.443,40	3	NOTA DEBITO 4X1000
	13/09/2024	AV VILLAS	DEBITO RTE	$ 750,00	$ -	$ -	$ -	$ 750,00	3	DEBITO RTE
	13/09/2024	AV VILLAS	DEBITO RTE	$ 13.550,00	$ -	$ -	$ -	$ 13.550,00	3	DEBITO RTE
	13/09/2024	AV VILLAS	DEBITO RTE	$ 750,00	$ -	$ -	$ -	$ 750,00	3	DEBITO RTE
	13/09/2024	AV VILLAS	DEBITO RTE	$ 13.550,00	$ -	$ -	$ -	$ 13.550,00	3	DEBITO RTE
	13/09/2024	AV VILLAS	DEBITO RTE	$ 13.550,00	$ -	$ -	$ -	$ 13.550,00	3	DEBITO RTE
	13/09/2024	AV VILLAS	DEBITO RTE	$ 13.550,00	$ -	$ -	$ -	$ 13.550,00	3	DEBITO RTE
	13/09/2024	AV VILLAS	DEBITO RTE	$ 13.550,00	$ -	$ -	$ -	$ 13.550,00	3	DEBITO RTE
	13/09/2024	AV VILLAS	DEBITO RTE	$ 13.550,00	$ -	$ -	$ -	$ 13.550,00	3	DEBITO RTE
	13/09/2024	AV VILLAS	DEBITO RTE	$ 13.550,00	$ -	$ -	$ -	$ 13.550,00	3	DEBITO RTE
	13/09/2024	AV VILLAS	DEBITO RTE	$ 13.550,00	$ -	$ -	$ -	$ 13.550,00	3	DEBITO RTE
	13/09/2024	AV VILLAS	DEBITO RTE	$ 13.550,00	$ -	$ -	$ -	$ 13.550,00	3	DEBITO RTE
	13/09/2024	AV VILLAS	DEBITO RTE	$ 13.550,00	$ -	$ -	$ -	$ 13.550,00	3	DEBITO RTE
	13/09/2024	AV VILLAS	DEBITO RTE	$ 3.950,00	$ -	$ -	$ -	$ 3.950,00	3	DEBITO RTE
	13/09/2024	AV VILLAS	DEBITO RTE	$ 13.550,00	$ -	$ -	$ -	$ 13.550,00	3	DEBITO RTE
	13/09/2024	AV VILLAS	DEVOLUCION NOTA DEBITO	$ 672,20	$ -	$ -	$ -	$ (672,20)	3	DEVOLUCION 4X1000
ORDEN NO.46	16/09/2024	YEIMY GONZALES	POLIZA PRORROGA 3	$ 148.202,00	$ -	$ -	$ -	$ 148.202,00	3	ADMINISTRATIVO
ORDEN NO.45	16/09/2024	JAC LA PRIMAVERA	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL - AGOSTO MAESTRO	$ 708.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 708.000,00	3	ADMINISTRATIVO
ORDEN NO.45	16/09/2024	JAC LA PRIMAVERA	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL - AGOSTO AYUDANTES	$ 2.832.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 2.832.000,00	1	OBRA
	16/09/2024	AV VILLAS	COMISION TRANSF ACH OFICINA	$ 13.550,00	$ -	$ -	$ -	$ 13.550,00	3	COMISION TRANSF ACH OFICINA
	16/09/2024	AV VILLAS	COMISION TRANSF ACH OFICINA	$ 13.550,00	$ -	$ -	$ -	$ 13.550,00	3	COMISION TRANSF ACH OFICINA
	16/09/2024	AV VILLAS	NOTA DEBITO 4X1000	$ 14.861,21	$ -	$ -	$ -	$ 14.861,21	3	NOTA DEBITO 4X1000
ORDEN NO.47	30/09/2024	LEONARDO TRUJILLO	PAGO DE MATERIALES	$ 9.406.151,08	$ -	$ -	$ -	$ 9.406.151,08	1	OBRA
	30/09/2024	AV VILLAS	COMISION TRANSF ACH OFICINA	$ 13.550,00	$ -	$ -	$ -	$ 13.550,00	3	COMISION TRANSF ACH OFICINA
	30/09/2024	AV VILLAS	NOTA DEBITO 4X1000	$ 37.678,80	$ -	$ -	$ -	$ 37.678,80	3	NOTA DEBITO 4X1000

	30/09/2024	DTN RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y ENTIDADES VARIAS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$ 216,96	$ -	$ -	$ -	$ (216,96)	3	RENDIMIENTOS FINANCIEROS

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).

** Indicar el número del rubro según la numeración establecida en el Plan de Inversión del desembolso Mensualizado del convenio.

NOTA:
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de desembolso y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del desembolso,

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL CONVENIO POR RUBRO

RUBRO No.	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO DESEMBOLSO ACTUAL (A-D)
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA	$ 138.950.825,00	$ 113.443.309,87	$ 30.335.187,08	$ 143.778.496,95	$ (4.827.671,95)
2	GASTOS GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL	$ 4.168.525,00	$ -	$ -	$ -	$ 4.168.525,00
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 43.055.843,00	$ 22.735.376,32	$ 4.882.711,25	$ 27.618.087,57	$ 15.437.755,43
	TOTALES	$ 186.175.193,00				$ 14.778.608,48

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DEL INFORME **(SEPTIEMBRE) :** (Indicar el mes) $ 216,96 (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ 6.557,67 (Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO
118023486	$ 761,87	$ -	FEBRERO	5/07/2024	$ 761,87
118023486	$ 1.425,92	$ -	MARZO	5/07/2024	$ 2.187,79
118023486	$ 1.125,54	$ -	ABRIL	5/07/2024	$ 3.313,33
118023486	$ 989,71	$ -	MAYO	5/07/2024	$ 4.303,04
118259980	$ 874,32	$ -	JUNIO	29/07/2024	$ 5.177,36
EN TRAMITE	$ 697,17	$ -	JULIO		$ 5.874,53
EN TRAMITE	$ 466,18	$ -	AGOSTO		$ 6.340,71
EN TRAMITE	$ 216,96	$ 1	SEPTIEMBRE		$ 6.557,67

OBSERVACIONES:

NOTA:

Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica de remitir mensualmente copia a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del desembolso otorgado, el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)**

Firma:
Nombre: WILMER DELGADO
Representante Legal OAC

Firma:
Nombre: YEIMI GONZALES
Contador de la OAC
Tarjeta Profesional No.: 196772-T

Firma:
Nombre: MISAEL VILLALBA GUAYARA
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202093652CND

Firma:
Nombre: YEINER EDUARDO PINILLA
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Etnica
Matrícula Profesional No.: 091037-0516940 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES, CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

DIRECCIÓN TERRITORIAL: META

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. 7 **MES:** SEPTIEMBRE **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO** ☐

CONVENIO No. 4664-2023 (Indicar número y año)

DESEMBOLSO OTORGADO: 100 %

VALOR DEL DESEMBOLSO OTORGADO: $ 185.874.936,00 **(M/CTE)**

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SANTA LUCÍA DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO EN EL DEPARTAMENTO DEL META PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ORGANIZACIÓN DE ACCIÓN COMUNAL JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SANTA LUCIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5001-2023 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: MISAEL VILLALBA GUAYARA

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

DOCUMENTO DE EGRESO No.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR FACTURA CON IVA	VALOR ANTICIPO	DESCUENTO RETENCIÓN EN LA FUENTE	DESCUENTO RETENCIÓN ICA	VALOR A PAGAR O VALOR GIRADO	RUBRO No.	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO
	2/05/2024	BANCO AVVILLAS	DEVOLUCION ND RTE	$ 750,00	$ -	$ -	$ -	$ (750)	3	DEVOLUCION ND
	2/05/2024	BANCO AVVILLAS	DEVOLUCION DE NOTA DEBITO	$ 750,00	$ -	$ -	$ -	$ (750)	3	DEVOLUCION NOTA BANCARIA
	4/06/2024	BANCO AVVILLAS	DEVOLUCION ND RTE	$ 750,00	$ -	$ -	$ -	$ (750)	3	DEVOLUCION ND
	4/06/2024	BANCO AVVILLAS	DEVOLUCION DE NOTA DEBITO	$ 750,00	$ -	$ -	$ -	$ (750)	3	DEVOLUCION NOTA BANCARIA
	5/07/2024	BANCO AVVILLAS	DEVOLUCION ND RTE	$ 13.550,00	$ -	$ -	$ -	$ (13.550)	3	DEVOLUCION ND
	5/07/2024	BANCO AVVILLAS	REINTEGRO COMISION	$ 13.550,00	$ -	$ -	$ -	$ (13.550)	3	REINTEGRO
	15/07/2024	BANCO AVVILLAS	DEVOLUCION ND RTE	$ 13.550,00	$ -	$ -	$ -	$ (13.550)	3	DEVOLUCION ND
	15/07/2024	BANCO AVVILLAS	DEVOLUCION ND RTE	$ 13.550,00	$ -	$ -	$ -	$ (13.550)	3	DEVOLUCION ND
	15/07/2024	BANCO AVVILLAS	DEVOLUCION ND RTE	$ 13.550,00	$ -	$ -	$ -	$ (13.550)	3	DEVOLUCION ND
	15/07/2024	BANCO AVVILLAS	DEVOLUCION ND RTE	$ 13.550,00	$ -	$ -	$ -	$ (13.550)	3	DEVOLUCION ND
	15/07/2024	BANCO AVVILLAS	REINTEGRO COMISION	$ 13.550,00	$ -	$ -	$ -	$ (13.550)	3	REINTEGRO
	15/07/2024	BANCO AVVILLAS	REINTEGRO COMISION	$ 13.550,00	$ -	$ -	$ -	$ (13.550)	3	REINTEGRO
	15/07/2024	BANCO AVVILLAS	REINTEGRO COMISION	$ 13.550,00	$ -	$ -	$ -	$ (13.550)	3	REINTEGRO
	15/07/2024	BANCO AVVILLAS	REINTEGRO COMISION	$ 13.550,00	$ -	$ -	$ -	$ (13.550)	3	REINTEGRO
	22/07/2024	BANCO AVVILLAS	DEVOLUCION ND RTE	$ 13.550,00	$ -	$ -	$ -	$ (13.550)	3	DEVOLUCION ND
	22/07/2024	BANCO AVVILLAS	REINTEGRO COMISION	$ 13.550,00	$ -	$ -	$ -	$ (13.550)	3	REINTEGRO
	30/07/2024	BANCO AVVILLAS	DEVOLUCION ND RTE	$ 13.550,00	$ -	$ -	$ -	$ (13.550)	3	DEVOLUCION ND
	30/07/2024	BANCO AVVILLAS	REINTEGRO COMISION	$ 13.550,00	$ -	$ -	$ -	$ (13.550)	3	REINTEGRO
	1/08/2024	BANCO AVVILLAS	REINTEGRO COMISION	$ 3.950,00	$ -	$ -	$ -	$ (3.950)	3	REINTEGRO
	1/08/2024	BANCO AVVILLAS	DEVOLUCION ND RTE	$ 3.950,00	$ -	$ -	$ -	$ (3.950)	3	DEVOLUCION ND
	1/08/2024	BANCO AVVILLAS	DEVOLUCION ND RTE	$ 750,00	$ -	$ -	$ -	$ (750)	3	DEVOLUCION ND
	1/08/2024	BANCO AVVILLAS	DEVOLUCION DE NOTA DEBITO	$ 750,00	$ -	$ -	$ -	$ (750)	3	DEVOLUCION NOTA BANCARIA
	20/08/2024	BANCO AVVILLAS	DEVOLUCION ND RTE	$ 13.550,00	$ -	$ -	$ -	$ (13.550)	3	DEVOLUCION ND
	20/08/2024	BANCO AVVILLAS	DEVOLUCION ND RTE	$ 13.550,00	$ -	$ -	$ -	$ (13.550)	3	DEVOLUCION ND
	20/08/2024	BANCO AVVILLAS	DEVOLUCION ND RTE	$ 13.550,00	$ -	$ -	$ -	$ (13.550)	3	DEVOLUCION ND
	20/08/2024	BANCO AVVILLAS	DEVOLUCION ND RTE	$ 13.550,00	$ -	$ -	$ -	$ (13.550)	3	DEVOLUCION ND
	20/08/2024	BANCO AVVILLAS	REINTEGRO COMISION	$ 13.550,00	$ -	$ -	$ -	$ (13.550)	3	REINTEGRO
	20/08/2024	BANCO AVVILLAS	REINTEGRO COMISION	$ 13.550,00	$ -	$ -	$ -	$ (13.550)	3	REINTEGRO
	20/08/2024	BANCO AVVILLAS	REINTEGRO COMISION	$ 13.550,00	$ -	$ -	$ -	$ (13.550)	3	REINTEGRO
	20/08/2024	BANCO AVVILLAS	REINTEGRO COMISION	$ 13.550,00	$ -	$ -	$ -	$ (13.550)	3	REINTEGRO
ORDEN NO.34	31/08/2024	JUNTA DE ACCION COMUNAL SANTA LUCIA	PAGO NOMINA Y LIQUIDACION AYUDANTES	$ 4.042.393,00	$ -	$ -	$ -	$ 4.042.393	1	OBRA
ORDEN NO.34	31/08/2024	JUNTA DE ACCION COMUNAL SANTA LUCIA	PAGO NOMINA Y LIQUIDACION MAESTRO	$ 1.662.887,00	$ -	$ -	$ -	$ 1.662.887	3	ADMINISTRATIVO
ORDEN NO.35	31/08/2024	DUBER LOPEZ	TRANSPORTE DE CEMENTO Y ALQUILER DE MAQUINARIA	$ 1.782.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 1.782.000	1	OBRA
ORDEN NO.33	31/08/2024	JUNTA DE ACCION COMUNAL SANTA LUCIA	SEGURIDAD SOCIAL JULIO AYUDANTES	$ 2.851.360,00	$ -	$ -	$ -	$ 2.851.360	1	OBRA
ORDEN NO.33	31/08/2024	JUNTA DE ACCION COMUNAL SANTA LUCIA	SEGURIDAD SOCIAL JULIO MAESTRO	$ 712.840,00	$ -	$ -	$ -	$ 712.840	3	ADMINISTRATIVO
	2/09/2024	BANCO AVVILLAS	COMISION BANCARIA	$ 13.550,00	$ -	$ -	$ -	$ 13.550	3	COMISION BANCO
	2/09/2024	BANCO AVVILLAS	COMISION BANCARIA	$ 13.550,00	$ -	$ -	$ -	$ 13.550	3	COMISION BANCO
	2/09/2024	BANCO AVVILLAS	COMISION BANCARIA	$ 13.550,00	$ -	$ -	$ -	$ 13.550	3	COMISION BANCO
	2/09/2024	BANCO AVVILLAS	NOTA DEBITO	$ 44.368,52	$ -	$ -	$ -	$ 44.369	3	NOTA BANCARIA
	13/09/2024	BANCO AVVILLAS	DEBITO RTE IVA	$ 750,00	$ -	$ -	$ -	$ 750	3	DEBITO RTE
	13/09/2024	BANCO AVVILLAS	DEBITO RTE IVA	$ 13.550,00	$ -	$ -	$ -	$ 13.550	3	DEBITO RTE
	13/09/2024	BANCO AVVILLAS	DEBITO RTE IVA	$ 13.550,00	$ -	$ -	$ -	$ 13.550	3	DEBITO RTE
	13/09/2024	BANCO AVVILLAS	DEBITO RTE IVA	$ 750,00	$ -	$ -	$ -	$ 750	3	DEBITO RTE
	13/09/2024	BANCO AVVILLAS	DEBITO RTE IVA	$ 13.550,00	$ -	$ -	$ -	$ 13.550	3	DEBITO RTE
	13/09/2024	BANCO AVVILLAS	DEBITO RTE IVA	$ 13.550,00	$ -	$ -	$ -	$ 13.550	3	DEBITO RTE
	13/09/2024	BANCO AVVILLAS	DEBITO RTE IVA	$ 13.550,00	$ -	$ -	$ -	$ 13.550	3	DEBITO RTE
	13/09/2024	BANCO AVVILLAS	DEBITO RTE IVA	$ 13.550,00	$ -	$ -	$ -	$ 13.550	3	DEBITO RTE
	13/09/2024	BANCO AVVILLAS	DEBITO RTE IVA	$ 13.550,00	$ -	$ -	$ -	$ 13.550	3	DEBITO RTE
	13/09/2024	BANCO AVVILLAS	DEBITO RTE IVA	$ 13.550,00	$ -	$ -	$ -	$ 13.550	3	DEBITO RTE
	13/09/2024	BANCO AVVILLAS	DEBITO RTE IVA	$ 13.550,00	$ -	$ -	$ -	$ 13.550	3	DEBITO RTE
	13/09/2024	BANCO AVVILLAS	DEBITO RTE IVA	$ 3.950,00	$ -	$ -	$ -	$ 3.950	3	DEBITO RTE
	13/09/2024	BANCO AVVILLAS	DEBITO RTE IVA	$ 750,00	$ -	$ -	$ -	$ 750	3	DEBITO RTE
	13/09/2024	BANCO AVVILLAS	DEBITO RTE IVA	$ 13.550,00	$ -	$ -	$ -	$ 13.550	3	DEBITO RTE
	13/09/2024	BANCO AVVILLAS	DEBITO RTE IVA	$ 13.550,00	$ -	$ -	$ -	$ 13.550	3	DEBITO RTE
	13/09/2024	BANCO AVVILLAS	DEBITO RTE IVA	$ 621,00	$ -	$ -	$ -	$ (621)	3	DEVOLUCION NOTA BANCARIA
ORDEN NO.36	17/09/2024	JUNTA DE ACCION COMUNAL SANTA LUCIA	RETENCION EN LA FUENTE - AGOSTO	$ 771.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 771.000	1	OBRA
ORDEN NO.37	17/09/2024	JUNTA DE ACCION COMUNAL SANTA LUCIA	SEGURIDAD SOCIAL AGOSTO MAESTRO	$ 377.900,00	$ -	$ -	$ -	$ 377.900	3	ADMINISTRATIVO
ORDEN NO.37	17/09/2024	JUNTA DE ACCION COMUNAL SANTA LUCIA	SEGURIDAD SOCIAL AGOSTO AYUDANTES	$ 1.511.600,00	$ -	$ -	$ -	$ 1.511.600	1	OBRA
ORDEN NO.38	17/09/2024	YEIMY GONZALES	POLIZAS PRORROGA 3	$ 143.321,65	$ -	$ -	$ -	$ 143.322	3	ADMINISTRATIVO
	17/09/2024	BANCO AVVILLAS	COMISION BANCARIA	$ 13.550,00	$ -	$ -	$ -	$ 13.550	3	COMISION BANCO
	17/09/2024	BANCO AVVILLAS	COMISION BANCARIA	$ 13.550,00	$ -	$ -	$ -	$ 13.550	3	COMISION BANCO
	17/09/2024	BANCO AVVILLAS	COMISION BANCARIA	$ 13.550,00	$ -	$ -	$ -	$ 13.550	3	COMISION BANCO
	17/09/2024	BANCO AVVILLAS	NOTA DEBITO	$ 11.377,89	$ -	$ -	$ -	$ 11.378	3	NOTA BANCARIA
	30/09/2024	DTN RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y ENTIDADES VARIAS	RENDIMIENTO FINANCIERO	$ 114,71	$ -	$ -	$ -	$ (115)	3	RENDIMIENTO

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).

** Indicar el número del rubro según la numeración establecida en el Plan de Inversión del desembolso Mensualizado del convenio.

NOTA:
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de desembolso y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del desembolso,

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL CONVENIO POR RUBRO

RUBRO No.	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO DESEMBOLSO ACTUAL (A-D)
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA	$ 138.660.441,00	$ 136.877.625	$ 10.958.353	$ 147.835.977,85	$ (9.175.536,85)
2	GASTOS GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL	$ 4.159.813,00	$ -	$ -	$ -	$ 4.159.813,00
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 43.054.682,00	$ 23.003.359	$ 2.878.009	$ 25.881.368,45	$ 17.173.313,55
	TOTALES	$ 185.874.936,00				$ 12.157.589,70

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DEL INFORME **(SEPTIEMBRE)** (Indicar el mes) $ 114,71 (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ 5.039,07 (Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

MOVIMIENTO RESUMEN

Saldo inicial:	$25,993,952.05
+ Movimiento crédito:	$311,235.71
- Movimiento débito:	$14,147,598.06
Saldo final periodo:	$12,157,589.70

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO
118067294	$ 852,88	$ -	MARZO	10/07/2024	$ 852,88
118067294	$ 1.201,27	$ -	ABRIL	10/07/2024	$ 2.054,15
118067294	$ 1.026,28	$ -	MAYO	10/07/2024	$ 3.080,43
118243221	$ 859,54	$ -	JUNIO	26/07/2024	$ 3.939,97
EN TRAMITE	$ 603,33	$ -	JULIO		$ 4.543,30
EN TRAMITE	$ 381,06	$ -	AGOSTO		$ 4.924,36
EN TRAMITE	$ 114,71	$ -	SEPTIEMBRE		$ 5.039,07

OBSERVACIONES:

NOTA:

Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica de remitir mensualmente copia a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del desembolso otorgado, el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)**

Firma: José Remolina Jerez
Nombre: JOSE ALEXANDER REMOLINA JEREZ
Representante Legal OAC

Firma:
Nombre: YEIMY GONZALES
Contador de la OAC
Tarjeta Profesional No.: 196772-T

Firma:
Nombre: MISAEL VALLALBA GUYARA
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202093652CND

Firma:
Nombre: DIEGO FERNANDO HERNANDEZ MUÑOZ
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.: 25202-425694 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

4.5. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Tras la finalización de los procesos constructivos de la placa huella, no se llevó registro del estado general del tiempo, dado que este dejó de ser un factor determinante para las actividades asociadas a la culminación del proyecto.

4.6. RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

Se informa que las muestras de laboratorio recolectadas durante la ejecución del proyecto ya fueron debidamente procesadas y falladas conforme a los procedimientos establecidos. Por lo anterior, durante el mes de cierre no se realizaron ensayos de laboratorio relacionados con la obra, ya que todos los análisis requeridos fueron concluidos en etapas previas.

4.7. SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

Se informa que el seguimiento a las garantías y seguros del contrato de obra fue realizado durante la ejecución del proyecto, cumpliendo con los lineamientos establecidos. Por ello, durante el mes de cierre no se efectuaron actividades adicionales relacionadas con este ítem, ya que dichas gestiones fueron concluidas previamente.

4.8. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA

teniendo en cuenta las características de las obras, no se exigió presentar un plan de calidad a la OAC, se aplicó de manera conjunta con la interventoría el control de calidad de la obra, para garantizar el cumplimiento de las especificaciones, a través de ensayos de laboratorio

4.9. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

4614-2023:

Tabla de Avance Placa Huella		
Mes	**PH Construida (ml)**	**PH Construida Acum. (ml)**
Abril	0,00	0,00
Mayo	0,00	0,00
Junio	19,60	19,60
Julio	45,00	64,60
Agosto	27,40	92,00

4664-2023:

Tabla de Avance Placa Huella		
Mes	**PH Construida (ml)**	**PH Construida Acum. (ml)**
Mayo	0,00	0,00
Junio	11,37	11,37
Julio	60,15	71,51
Agosto	0,69	72,2

5 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORIA

5.1. información general del contrato

No. DE PROCESO	IP-DT-MET-026-2023
ID	CO1.SLCNTR.11753104
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO RICO DEPARTAMENTO DEL META DEL PROGRAMA “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".
CONTRATISTA	MISAEL VILLALBA GUAYARA C.C 86.058.561
VALOR	$ 65.909.578,00
ADICIÓN	$ 32.852.568
VALOR ACTUALIZADO	$ 98.762.146
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	22/12/2023
FECHA DE INICIO	22/12/2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31/12/2023
FECHA PRORROGA No.1	31/03/2024
FECHA PRORROGA No.2	30/04/2024
FECHA PRORROGA No.3	15/05/2024
FECHA PRORROGA No.4	31/05/2024
FECHA PRORROGA No.5	20/06/2024
FECHA PRORROGA No.6	15/09/2024
SUSPENSIÓN 1	20/06/2024 AL 04/07/2024
REINICIO	05/07/2024
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA	15/09/2024

5.2 Descripción de actividades realizadas por el Interventor

ACTIVIDADES PACTADAS	ACTIVIDADES
Revisar todos los documentos contractuales de los convenios solidarios, de los cuales se derivan las obras a realizar interventoría, objeto del presente proceso de selección de Interventoría, incluida la cartilla de obras menores y estructuras viales.	Durante el presente mes se revisaron los documentos contractuales de los convenios 4614-2023 y 4664-2023. Así mismo, se revisó la cartilla de obras menores suministrada en la pagina https://caminoscomunitarios.invias.gov.co/caja-herramientas.php
Las mediciones de las cantidades de obra realmente ejecutadas y aprobadas por la Interventoría son de exclusiva responsabilidad la junta u organismos de acción comunal- OAC y del Interventor. Estas mediciones deben desarrollarse detalladamente y servirán como soporte a la respectiva Pre-acta y Acta Recibo Parcial de Obra, información que serán incluidas en los respectivos informes de Interventoría. La interventoría y el instituto determinará de manera conjunta entre el o los Organismo de Acción Comunal, con fundamento en los resultados que arroje la aplicación de lo establecido en la especificación particular del proyecto "REVISIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL CONTENIDO DE LA CARTILLA DE OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS VIALES DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS", para lo cual se deberá tener en cuenta la visita técnica realizada por los profesionales designados del INVIAS en conjunto con el Representante legal del Organismo de Acción Comunal - OAC, en donde se realizó una concertación de las obras a ejecutar, utilizando los diseños tipo establecidos en la Cartilla de Obras de Drenaje y Estructurales Viales, necesarias y suficientes para llevar a cabo el objeto del convenio y para garantizar la transitabilidad del sector a intervenir.	Durante el presente periodo, consultores de la OAC iniciaron de los estudios de apique a cielo abierto y perfil estratigráfico, así como el levantamiento topográfico, cartera, informe y georreferenciación. además del estudio hidrológico e hidráulico, junto con el diseño geométrico y el diseño de mezcla.
El interventor deberá aprobar una vez se verifiquen las actividades tales como condiciones del terreno donde se ejecutarán las obras, verificando entre	Inició el proceso de revisión y aprobación de los estudios y diseños por los especialistas de la interventoría, con el fin de dar inicio a la ejecución de la obra.

otras actividades; el estado de la subrasante (caracterización del suelo), pendiente, drenajes requeridos y condiciones particulares para la construcción de la estructura de pavimento (Pavimento convencional o placa huella), obras de drenajes, obras de contención de baja complejidad, etc	
El interventor deberá verificar que la OAC deberá obtener los datos sobre condiciones locales, características de los materiales, ensayos de laboratorio de suelos y concretos, tránsito, levantamiento topográfico, etc., así como los conceptos de profesionales especializados de acuerdo con las obras estimadas en el desarrollo del convenio para garantizar su estabilidad y calidad.	Durante el presente periodo, la interventoría realizó la revisión de las observaciones de los estudios y diseños realizados por los consultores de la OAC. Se atendió la invitación realizada por el concejo municipal de Puerto Rico, con el objetivo de darle a conocer a la administración y a la comunidad el avance del proyecto que propende mejorar la calidad de vida de la comunidad de la vereda Santa Lucia y La Primavera.
El interventor deberá garantizar que el Organismo de Acción Comunal - **OAC** efectué todas las gestiones sociales, prediales y ambientales que apliquen y que se reglamenten, de conformidad con lo dispuesto en las especificaciones generales de construcción de carreteras y de la legislación ambiental vigente.	Se ha sugerido a las OAC establecer comunicaciones con los actores implicados en la intervención principal, para su conocimiento y apoyo durante la ejecución de la obra.
El Interventor deberá verificar que durante el plazo del convenio, el Organismo de Acción Comunal - OAC tome las medidas necesarias a fin de garantizar la seguridad vial del usuario en el sector a intervenir	Los convenios no cuentan con un rubro establecido para el plan de manejo de tránsito, no obstante, se establecen medidas mínimas para la seguridad vial al momento de iniciar obra.
El contenido y características de los informes mensuales debe ser de acuerdo con lo establecido en el Manual de Interventoría aplicado al programa de CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL vigente, no obstante, lo anterior, la interventoría se obliga a presentar los informes que requiera el INVIAS. Para cumplir con el objeto y metas contractuales, las actividades que ejecutará el INTERVENTOR están	Se proyecta informe mensual, de acuerdo a lo indicado por el Instituto Nacional de vías.

establecidas en el Manual de Interventoría aplicado al programa de CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL vigente, o el que lo modifique o lo sustituya del Instituto Nacional de Vías.	
Sin limitarse a lo anterior, el interventor debe cumplir sus obligaciones derivadas de la Ley 80 de 1993 y 1474 de 2011.	Se ha llevado a cabo el acompañamiento contractual a los convenios objeto de seguimiento, en lo que respecta a la actualización de pólizas según modificaciones realizadas.

5.3. Informes especialistas y profesionales

Durante el presente periodo no se requirió.

5.4. Informe programa anual de caja- PAC

N/A

5.5. informe matriz de riesgos

No.	RIESGO	SEGUIMIENTO
1	Factor Multiplicador y Precios Por debajo del Presupuesto Oficial en la propuesta del PROPONENTE y/o INTERVENTOR	El salario del inspector y del inspector SST fue calculado con base en el salario mínimo legal de 2022; sin embargo, con el aumento, hay una diferencia de $130.000 en cada uno.
2	Riesgo presentado por la terminación anticipada de la Interventoría, por estar ligada contractualmente al desarrollo de las obras desagregadas de los convenios solidarios, de tal manera que, si éste llegare a terminarse por cualquiera de las causales previstas en los convenios o por la Ley, el contrato de interventoría producto del presente concurso de méritos, será liquidado por terminación de su objeto, sin lugar a indemnización. Riesgo que asume el INTERVENTOR.	Actualmente, la interventoría supervisa simultáneamente los convenios 4614-2023 y 4664-2023. Por lo tanto, no se espera una finalización anticipada, a pesar de que las obras estén divididas en partes.
3	Riesgo por la deficiente Interventoría al Ajuste y/o Actualización y/o Unificación y/o	El alcance del proyecto fue actualizado conforme a las condiciones específicas de la zona,

	Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios realizados por las Juntas u organismos de acción comunal, que resultaren deficientes y/o incompletos y/o adversos para el proyecto, y que fueron revisados y aprobados por el Interventor. Riesgo que asume el INTERVENTOR	considerando la disponibilidad y costos de materiales, mano de obra local y presupuesto ajustado al mercado regional. Se realizaron ajustes técnicos en los estudios y diseños para adaptarlos a las características del entorno, garantizando su viabilidad técnica y económica.
4	Riesgo presentado por la deficiente Interventoría, que conlleve a generar problemas a causa del no inicio de las obras y/o parálisis de la mismas por demoras ocasionadas por la revisión y aprobación por parte del INTERVENTOR, de los cálculos estructurales y/o estudios y/o diseños definitivos para la obra de los convenios solidarios, elaborados por las Juntas u organismos de acción comunal. Riesgo que asume el INTERVENTOR	Cada una de las revisiones han sido realizadas en el menor tiempo posible.
5	Riesgo presentado por la deficiente Interventoría, por autorizar y/o aprobar por parte de la INTERVENTORIA, la ejecución de obras que contravienen los cálculos y/o estudios y/o diseños aprobados; Por autorizar y/o aprobar la construcción de obras con cálculos y/o estudios y/o diseños deficientes realizados por las juntas u organismos de acción comunal. Riesgo que asume el INTERVENTOR	Cada una de las revisiones han sido realizadas en el menor tiempo posible.
6	Riesgo por la deficiente Interventoría, por autorizar y/o aprobar el personal de la Junta y organización comunal, sin que cumpla requisitos de acuerdo con las exigencias del convenio solidario y la normatividad vigente. Por permitir que las juntas u organismos de acción comunal	Cada una de las revisiones han sido realizadas en el menor tiempo posible y en cumplimiento de los requisitos establecidos por el Instituto Nacional de vias.

	ejecute los trabajos sin un Ingeniero Residente y/o Director, y/o Especialistas, y/o Personal Profesional, debidamente aprobado. Riesgo que asume el INTERVENTOR	
7	Riesgo por la deficiente Interventoría, por mediciones erróneas de las cantidades de obra ejecutadas por las Juntas u organismos de acción comunal y medidas por el INTERVENTOR. Riesgo que asume el INTERVENTOR	El alcance del proyecto fue ajustado y actualizado considerando las condiciones especificas de la zona, incluyendo la disponibilidad y costos de materiales, mano de obra local y el presupuesto vigente en el mercado regional. Este proceso incluyó una revisión detallada de las mediciones realizadas, con el fin de corregir posibles inconsistencias en las cantidades de obra ejecutas por la junta u organismo de acción comunal, asimismo, se implementaron mecanismos de control y verificación para garantizar que las mediciones efectuadas por el interventor sean precisas, coherentes con los diseños aprobados y acorde con las necesidades del proyecto, mitigando así los riesgos asociados a errores en interventoría.
8	Riesgo por la deficiente Interventoría en el control y seguimiento a la señalización preventiva en obra, falta o deficiencia en la señalización de aproximación e iluminación, equipos de radio para cierres parciales, temporales y demás señalización necesaria, y de seguridad industrial y de señalización y dotación de los operarios y trabajadores ,etc., a cargo de la Junta u organización comunal que pueda ocasionar accidentes y/o perjuicios, que debió ser observada y corregida por el	Se aclara que el presupuesto inicial no incluyó un monto específico para el plan de manejo de tránsito; sin embargo, se están considerando algunas señalizaciones básicas para realizar la obra. Además, se ha realizado la cotización de la dotación para el personal de obra.

	INTERVENTOR. Riesgo que asume el INTERVENTOR.	
9	Riesgo por la deficiente Interventoría en el control y seguimiento a la programación de actividades en obra que pudieran llevar a obras discontinuas, inconclusas ó con problemas para garantizar la estabilidad de obra ejecutada. Riesgo que asume el INTERVENTOR	Se está llevando a cabo el control y seguimiento suficiente a la programación.
10	Riesgo por la deficiente Interventoría en el control y seguimiento de la Interventoría a los frentes obligatorios de obra. Riesgo que asume el INTERVENTOR	A la fecha no hay frentes obligatorios de obra.
11	Riesgo por la deficiente Interventoría, que genere demora o ausencia en la toma de decisiones correspondientes al Interventor, que llegaren a generar efectos económicos al proyecto. Riesgo que asume el INTERVENTOR.	La interventoría está tomando las decisiones requeridas en el tiempo previsto; sin embargo, el Instituto Nacional de Vías creó un comité operativo para la aprobación, toma de decisiones y recomendaciones, lo que ha complicado el proceso decisional. Además, debido a la ubicación de cada convenio, es difícil mantener una comunicación fluida con los veedores.
12	Riesgo presentado por la deficiente Interventoría, en lo de su competencia, en los casos de procesos administrativos y/o judiciales con ocasión de la ejecución de las obras, tanto en la etapa contractual como en la poscontractual, ya sea por procesos de multas, sanciones, reparación directa, etc., o siniestros por estabilidad de obra ejecutada por la junta u organización comunal y/o siniestros por calidad del servicio de interventoría. Riesgo que asume el INTERVENTOR.	A la fecha la interventoría ha cumplido con cada uno de los procesos administrativos.
13	Riesgo presentado por la no oportuna celebración de los	A la fecha, los convenios llevan una ejecución sin novedad.

	convenios solidarios, correspondiente a este proceso de Interventoría. Riesgo que asume el PROPONENTE Y/O INTERVENTOR, hasta seis (6) meses después de suscrito el convenio solidario, teniendo en cuenta que es un proceso independiente, que podría presentar demoras por trámites administrativos. Riesgo que asume INVIAS después de seis (6) meses de adjudicado el contrato de Interventoría.	
14	Expedición y/o modificación de normas: Ocurre por cambios normativos o por la expedición de normas posteriores al cierre del proceso de concurso de méritos, que afecten las condiciones económicas y/o técnicas inicialmente pactadas.	N/A
15	Riesgo por la deficiente Interventoría, causado por inadecuadas prácticas en el proceso constructivo que puedan generar daños técnicos y/o ambientales, autorizadas y/o aprobadas por el Interventor. Riesgo que asume el INTERVENTOR.	Se espera acompañar, asesorar y vigilar los diferentes procesos constructivos de las obras a realizar.
16	Presencia de Riesgos Biológicos. Se refiere a la posibilidad que, durante la ejecución del contrato, los colaboradores del Interventor, presenten síntomas de enfermedades altamente contagiosas y que afecten y deterioren la Salud del Personal.	A la fecha, no existe vinculación de personal.
17	Disponibilidad de los Elementos de Protección Personal. Se refiere a la posibilidad de que el Interventor no disponga o suministre a sus colaboradores y demás, los Elementos de Protección Personal EPP y los de Riesgo Bilógico.	Se dará estricto cumplimiento.

18	Orden público: Posible ocurrencia de actos terroristas, paros, huelgas, manifestaciones, disturbios y demás que afecten el orden público y se ubiquen en las zonas de influencia de las obras.	A la fecha, la comunidad no ha reportado situaciones vandálicas
19	Gestión Indebida y dolosa de los Recursos Financieros, de Insumos y Obras. Se refiere a la posibilidad de que las juntas u organismos de acción comunal, de la Interventoría y de funcionarios de Invias, promuevan y participen de acciones fraudulentas en el manejo de los recursos destinados a las obras tanto en los aspectos financieros (anticipos), facturación, calidad y cantidad de materiales e insumos, diseños y obras sin justificar.	A la fecha, se han realizado desembolsos en las actividades de obra, gastos administrativos y PAGA

5.6. Información otros programas

Se realizó un seguimiento detallado de la programación del convenio 4614-2023 utilizando el software Project. A través de esta herramienta, se monitorearon los avances y el cumplimiento de las actividades planificadas, permitiendo un control efectivo de los tiempos, la asignación de recursos y la identificación oportuna de posibles retrasos o ajustes necesarios en la ejecución del convenio.

6 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

6.1. Equipo y vehículos del contrato de interventoría

Con la finalización de la obra, las actividades de supervisión en el sitio dejaron de ser necesarias de manera constante, lo que redujo significativamente los desplazamientos al lugar por parte de la interventoría. En consecuencia, ya no se cuenta con maquinaria asignada a estas labores, dado que su uso no es requerido en la etapa del cierre del proyecto.

6.2. Personal, Control aportes legales y seguridad social contrato de interventoría

6.3. Informe financiero y presupuestal del contrato de interventoría

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 03/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: META

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5001-2023

INTERVENTOR: MISAEL VILLALBA GUAYARA

MES INFORME MENSUAL: 01/08/2024 a 30/08/2024

PROYECTO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO RICO DEPARTAMENTO DEL META DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE OBRA No: 4664-2023; 4614-2023

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SANTA LUCIA- JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA PRIMAVERA

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	1395123	ADQUISION DE SERVICIOS- VIA TERCIARIA MEJORADA- MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL NACIONAL	10	NACION	PRINCIPAL	$ 65.909.578	$ 2.710.075
2024	611624	MEJORADA -5 CONVERGENCIA REGIONAL / A	16	NACION	ADICIONAL	$ 32.852.568	$ 32.852.568
			TOTAL			$ 98.762.146	$ 35.562.643

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 98.762.146**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
1	22/12/2023 al 21/01/2024	$ 4.595.800,00	$ 873.202,00	$ 5.469.002,00	N/A	N/A	N/A	1395123 - 2023	$ 65.909.578,00	$ 60.440.576,00	5/04/2024	En tramite
2	22/01/2024 al 31/01/2024	$ 1.723.800,00	$ 327.522,00	$ 2.051.322,00	N/A	N/A	N/A	1395123 - 2023	$ 60.440.576,00	$ 58.389.254,00	6/04/2024	En tramite
3	01/02/2024 al 29/02/2024	$ 5.793.400,00	$ 1.100.746,00	$ 6.894.146,00	N/A	N/A	N/A	1395123 - 2023	$ 58.389.254,00	$ 51.495.108,00	7/04/2024	En tramite
4	01/03/2024 al 31/03/2024	$ 8.463.200,00	$ 1.608.008,00	$ 10.071.208,00	N/A	N/A	N/A	1395123 - 2023	$ 51.495.108,00	$ 41.423.900,00	28/04/2024	En tramite
5	01/04/2024 al 30/04/2024	$ 5.483.400,00	$ 1.041.846,00	$ 6.525.246,00	N/A	N/A	N/A	1395123 - 2023	$ 41.423.900,00	$ 34.898.654,00	9/07/2024	En tramite
6	01/05/2024 al 31/05/2024	$ 5.296.000,00	$ 1.006.240,00	$ 6.302.240,00	N/A	N/A	N/A	1395123 - 2023	$ 34.898.654,00	$ 28.596.414,00	9/07/2024	En tramite
7	01/06/2024 al 19/06/2024	$ 9.347.684,00	$ 1.776.059,96	$ 11.123.743,96	N/A	N/A	N/A	1395123 - 2023	$ 28.596.414,00	$ 17.472.670,04	24/09/2024	En tramite
8	05/07/2024 al 31/07/2024	$ 12.405.542,00	$ 2.357.052,98	$ 14.762.594,98	N/A	N/A	N/A	1395123 - 2023	$ 17.472.670,04	$ 2.710.075,06	24/09/2024	En tramite
9	01/08/2024 al 03/08/2024	$ 2.277.374,00	$ 432.701,06	$ 2.710.075,06	N/A	N/A	N/A	1395123 - 2023	$ 2.710.075	$ -	24/09/2024	En tramite
10	04/08/2024 al 30/08/2024	$ 22.916.426,00	$ 4.354.120,94	$ 27.270.546,94	N/A	N/A	N/A	611624 - 2024	$ 32.852.568	$ 5.582.021	24/09/2024	Saldo del registro presupuestal de la adicional
TOTALES		**$ 78.302.626**	**$ 14.877.499**	**$ 93.180.124,94**					**$ -**			

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL	$ 61.019.200,00	$ 11.593.648,00	$ 72.612.848,00
OTROS COSTOS DIRECTOS	$ 17.283.426,00	$ 3.283.850,94	$ 20.567.276,94
VALOR TOTAL	**$ 78.302.626,00**	**$ 14.877.498,94**	**$ 93.180.124,94**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: MARIANA ROCIO MORENO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 091037 - 0539458 CND

Firma
Nombre: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-250038 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

$ -

6.4. Seguimiento garantías contrato de interventoría

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 3/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5001-2023 **INTERVENTOR:** MISAEL VILLALBA GUAYARA

OBJETO DEL CONTRATO:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO RICO DEPARTAMENTO DEL META DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO: 22/12/2023

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 15/09/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 65.909.578,00

VALOR ACUMULADO: $ 98.762.146,00 (Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 6.590.957	15	12	2023	1/07/2024		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 13.181.915,60	15	12	2023	31	12	2026
Calidad del servicio	30%	$ 19.772.873,40	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100299994

Certificado de modificación o anexo No.: 71820421

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 19/12/2023

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO DE ACUERDO A ORDEN DE INICIO

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 6.590.957	15	12	2023	1/07/2024		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
Pago de Salarios, prestaciones sociales	20%	$ 13.181.915,60	15	12	2023	21	12	2026
Calidad del servicio	30%	$ 19.772.873,40	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100299994

Certificado de modificación o anexo No.: 71831818

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 27/12/2023

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 3/10/2024 (Día / Mes / Año)

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO DE ACUERDO A PRORROGA No.1

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 6.590.957	15	12	2023	1/10/2024		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 13.181.915,60	15	12	2023	31	3	2027
Calidad del servicio	30%	$ 19.772.873,40	31	3	2024	31	3	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100299994

Certificado de modificación o anexo No.: 71833669
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 18/03/2024

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO DE ACUERDO A PRORROGA No.2

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 6.590.957	27	3	2023	1/10/2024		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
Pago de Salarios, prestaciones sociales	20%	$ 13.181.915,60	27	3	2024	30	4	2027
Calidad del servicio	30%	$ 19.772.873,40	30	4	2024	30	4	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100299994

Certificado de modificación o anexo No.: 71919156
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 16/04/2024

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO DE ACUERDO A PRORROGA No.3

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 6.590.957	27	3	2023	15/11/2024		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
Pago de Salarios, prestaciones sociales	20%	$ 13.181.915,60	27	3	2024	15	5	2027
Calidad del servicio	30%	$ 19.772.873,40	30	4	2024	30	4	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100299994

Certificado de modificación o anexo No.: 71946113
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 20/05/2024

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO DE ACUERDO A PRORROGA No.4

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 3/10/2024
(Día / Mes / Año)

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 6.590.957	27	3	2023	1/11/2024		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
Pago de Salarios, prestaciones sociales	20%	$ 13.181.915,60	27	3	2024	30	4	2027
Calidad del servicio	30%	$ 19.772.873,40	30	4	2024	30	4	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100299994

Certificado de modificación o anexo No.: 71991556
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 20/05/2024

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO DE ACUERDO A PRORROGA No.5

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 6.590.957,80	27	3	2024	20/12/2024		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
Pago de Salarios, prestaciones sociales	20%	$ 13.181.915,60	27	3	2024	20	6	2027
Calidad del servicio	30%	$ 19.772.873,40	20	6	2024	20	6	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100299994

Certificado de modificación o anexo No.: 71975346
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 06/06/2024

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO DE ACUERDO A PRORROGA No.6 Y ADICION

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 9.876.214,60	20	6	2024	15/03/2025		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
Pago de Salarios, prestaciones sociales	20%	$ 19.752.429,20	20	6	2024	15	9	2027
Calidad del servicio	30%	$ 29.628.643,80	15	9	2024	15	9	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100299994

Certificado de modificación o anexo No.: 72029816
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 17/09/2024

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO DE ACUERDO A SUSPENSION No.1

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 9.876.214,60	20	6	2024	15/03/2025		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
Pago de Salarios, prestaciones sociales	20%	$ 19.752.429,20	20	6	2024	15	9	2027
Calidad del servicio	30%	$ 29.628.643,80	15	9	2024	15	9	2029

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 3/10/2024
(Día / Mes / Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100299994

Certificado de modificación o anexo No.: 72072675
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 27/09/2024

OBSERVACIONES:
NINGUNA

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
Nombre: MARIANA ROZO MORENO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 091037-0539458

Firma
Nombre: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:25202-250038

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

6.5. Seguimiento al plan de calidad contrato de interventoría

El seguimiento al plan de calidad de la obra se realizó de manera continua y conforme a los lineamientos establecidos durante los meses en los que se llevaron a cabo los procesos constructivos.

6.6. Otros documentos seguimiento mensual

MES	COSTO PROGRAMADO	COSTO EJECUTADO	COSTO PROGRAMADO ACUMULADO	COSTO EJECUTADO ACUMULADO
Diciembre	$ 911.064	$ 682.584	$ 911.064	$ 682.584
Enero	$ 25.204.120	$ 6.837.740	$ 26.115.184	$ 7.520.324
Febrero	$ 22.411.588	$ 6.894.146	$ 48.526.772	$ 14.414.470
Marzo	$ 17.382.806	$ 10.071.208	$ 65.909.578	$ 24.485.678
Abril	$ 23.941.134	$ 6.525.246	$ 89.850.712	$ 31.010.924
Mayo	$ 6.302.240	$ 6.302.240	$ 96.152.952	$ 37.313.164
Junio	$ 11.123.744	$ 11.123.744	$ 107.276.696	$ 48.436.908
Julio	$ 14.762.595	$ 14.762.595	$ 122.039.291	$ 63.199.503
Agosto	$ 29.980.622	$ 29.980.622	$ 152.019.913	$ 93.180.125
Septiembre	$ 5.582.021	$ 5.582.021	$ 157.601.934	$ 98.762.146

7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Culminación de actividades ejecutadas
- Etapa final temas administrativos

8 ANEXOS

Ninguno

8.1. Relación de correspondencia

FECHA	No. DE OFICIO	REMITENTE	DESCRIPCIÓN
19/12/2023	PR-IP-28-01	INVIAS	Entrega hojas de vida
26/12/2023	PR-IP-28-02	INVIAS	Solicitud de prorroga No. 01
29/12/2023	PR-IP-28-03	INVIAS	Autorización registro de firma para manejo de cuenta convenio 4664 de 2023
29/12/2023	PR-IP-28-04	INVIAS	Autorización registro de firma para manejo de cuenta convenio 4614 de 2023
04/01/2024	PR-IP-28-06	INVIAS	Solicitud inclusión de otros costos

09/01/2023	PR-IP-28-08	INVIAS	Aprobación hojas de vida convenio 4664 de 2023
09/01/2023	PR-IP-28-09	INVIAS	Aprobación hojas de vida convenio 4614 de 2023
16/01/2023	PR-IP-28-10	INVIAS	Aprobación de informes semanales No. 1,2 y 3 convenio 4614 de 2023
16/01/2023	PR-IP-28-11	INVIAS	Aprobación del informe semanal No. 1 convenio 4664 de 2023
18/01/2023	PR-IP-28-12	INVIAS	Insuficiencia de fondos
22/01/2023	PR-IP-28-13	INVIAS	Aprobación de informes semanales No. 4 convenio 4614 de 2023
23/01/2024	PR-IP-28-14	JHON WILMER DELGADO ACOSTA	Aprobación hojas de vida convenio 4614-2023
22/01/2024	PR-IP-28-15	JOSE ALEXANDER REMOLINA JEREZ	Aprobación hojas de vida convenio 4664-2023
26/01/2024	PR-IP-28-16	INVIAS	Aprobación informes semanales
3/02/2024	PR-IP-28-17	JHON WILMER DELGADO ACOSTA	Aporte de la JAC correspondiente a la herramienta menor, convenio 4614 de 2023
3/02/2024	PR-IP-28-18	JOSE ALEXANDER REMOLINA JEREZ	Aporte de la JAC correspondiente a la herramienta menor, convenio 4664 de 2023
3/02/2024	PR-IP-28-19	INVIAS	Aprobación informes semanales
4/02/2024	PR-IP-28-20	JOSE ALEXANDER REMOLINA JEREZ	Aprobación hojas de vida convenio 4664-2023

5/02/2024	PR-IP-28-21	INVIAS	Solicitud de realización de reuniones virtuales
20/02/2024	PR-IP-28-22	INVIAS	Aprobación informes semanales
26/02/2024	PR-IP-28-23	INVIAS	Aprobación informes semanales
6/03/2024	PR-IP-28-24	INVIAS	Solicitud diseño de valla
14/03/2024	PR-IP-28-25	JHON WILMER DELGADO ACOSTA	Requerimiento de formatos
14/03/2024	PR-IP-28-26	JOSE ALEXANDER REMOLINA JEREZ	Requerimiento de formatos
20/03/2024	PR-IP-28-27	JOSE ALEXANDER REMOLINA JEREZ	Requerimiento información de transito
20/03/2024	PR-IP-28-28	JOSE ALEXANDER REMOLINA JEREZ	Requerimientos certificados de residencia
20/03/2024	PR-IP-28-30	INVIAS	Solicitud de ingreso ingeniero residente
31/03/2024	PR-IP-28-31	INVIAS	Aprobación informes semanales
1/04/2024	PR-IP-28-32	INVIAS	Aprobación informes semanales
2/04/2024	Sin radicado	SEGUROS MUNDIAL	Carta de no siniestro
4/04/2024	PR-IP-28-33	INVIAS	Solicitud de ajuste al plan de cargas
5/04/2024	PR-IP-28-34	INVIAS	Solicitud de aprobación hojas de vida
10/04/2024	PR-IP-28-35	INVIAS	Solicitud de prorroga No. 3 y adición No. 1
17/04/2024	PR-IP-28-36	JOYFER JAVIER BARRETO ORTIZ	Invitación socialización de inicio de Convenios Solidarios para el mejoramiento y

			mantenimiento vial- Juntas de Acción Comunal de las Veredas La Primavera y Santa Lucía en el Municipio de Puerto Rico – Meta.
17/04/2024	PR-IP-28-37	IVAN ANDRES PUENTES MOLINA ALCALDE MUNICIPAL	Invitación socialización de inicio de Convenios Solidarios para el mejoramiento y mantenimiento vial - Juntas de Acción Comunal de las Veredas La Primavera y Santa Lucía en el Municipio de Puerto Rico – Meta.
22/04/2024	PR-IP-28-38	JHON WILMER DELGADO ACOSTA	Requerimiento control estricto de obra
22/04/2024	PR-IP-28-39	JOSE ALEXANDER REMOLINA JEREZ	Requerimiento control estricto de obra
22/04/2024	PR-IP-28-40	INVIAS	Aprobación informes semanales
26/04/2024	PR-IP-28-43	INVIAS	Aprobación informes semanales
2/05/2024	PR-IP-28-44	JHON WILMER DELGADO ACOSTA Y JOSE ALEXANDER REMOLINA JEREZ	Informe de revisión de los estudios hidrológicos e hidráulicos
2/05/2024	PR-IP-28-45	JHON WILMER DELGADO ACOSTA Y JOSE ALEXANDER REMOLINA JEREZ	Informe de revisión del diseño geométrico
8/05/2024	PR-IP-28-46	JHON WILMER DELGADO ACOSTA Y JOSE ALEXANDER REMOLINA JEREZ	Suspensión de Pagos, Retiro de Personal y Convocatoria a Comité

23/05/2024	PR-IP-28-47	INVIAS	Aprobación informes semanales
30/05/2024	PR-IP-28-48	INVIAS	Solicitud de prorroga No. 5
7/06/2024	PR-IP-28-50	BANCO AVVILLAS	Solicitud de extractos bancarios, saldos y movimientos convenio 4614-2023
7/06/2024	PR-IP-28-49	BANCO AVVILLAS	Solicitud de extractos bancarios, saldos y movimientos convenio 4614-2023
17/06/2024	PR-IP-28-51	INVIAS	Aprobación informes semanales
25/06/2024	PR-IP-28-53	JHON WILMER DELGADO ACOSTA	Actividad de cierre
02/07/2024	PR-IP-28-54	JOSE ALEXANDER REMOLINA JEREZ	Rendimientos financieros
02/07/2024	PR-IP-28-55	JHON WILMER DELGADO ACOSTA	Rendimientos financieros
02/07/2024	PR-IP-28-56	BANCO AVVILLAS	Solicitud de extractos bancarios, saldos y movimientos convenio 4614-2023
02/07/2024	PR-IP-28-57	BANCO AVVILLAS	Solicitud de extractos bancarios, saldos y movimientos convenio 4664-2023
03/07/2024	PR-IP-28-58	JOSE ALEXANDER REMOLINA JEREZ	Solicitud de estudios y diseños
05/07/2024	PR-IP-28-59	BANCO AVVILLAS	Solicitud de transferencia sebra - rendimientos financieros
05/07/2024	PR-IP-28-60	BANCO AVVILLAS	Solicitud de transferencia sebra - rendimientos financieros

05/07/2024	PR-IP-28-61	INVIAS	Solicitud de prorroga No.6 y Adición No.1
06/07/2024	PR-IP-28-62	INVIAS	Entrega de estudios y diseños de convenios solidarios
09/07/2024	PR-IP-28-63	INVIAS	Entrega de pagos parciales del mes de Abril y Mayo
12/07/2024	PR-IP-28-64	JHON WILMER DELGADO ACOSTA	Presentación orden de compra - caja menor
12/07/2024	PR-IP-28-65	JOSE ALEXANDER REMOLINA JEREZ	Presentación orden de compra - caja menor
22/07/2024	PR-IP-28-66	JOSE ALEXANDER REMOLINA JEREZ	Documentación del personal
22/07/2024	PR-IP-28-67	JHON WILMER DELGADO ACOSTA	Documentación del personal
29/07/2024	PR-IP-28-68	BANCO AVVILLAS	Solicitud de transferencia sebra - rendimientos financieros
29/07/2024	PR-IP-28-69	BANCO AVVILLAS	Solicitud de transferencia sebra - rendimientos financieros
30/07/2024	PR-IP-28-70	INVIAS	Solicitud de prorroga No.3
30/07/2024	PR-IP-28-71	INVIAS	Solicitud de prorroga No.3
07/08/2024	PR-IP-28-72	BANCO AVVILLAS	Solicitud de extractos bancarios, saldos y movimientos convenio 4614-2023
07/08/2024	PR-IP-28-73	BANCO AVVILLAS	Solicitud de extractos bancarios, saldos y movimientos convenio 4664-2023
08/08/2024	PR-IP-28-74	INVIAS	Solicitud de cambio de residente de interventoría

21/08/2024	PR-IP-28-75	INVIAS	Oficio Aclaratorio
21/08/2024	PR-IP-28-76	INVIAS	Oficio Aclaratorio
21/08/2024	PR-IP-28-77	INVIAS	Entrega I – plan de gestión social
21/08/2024	PR-IP-28-78	INVIAS	Entrega I – plan de gestión social
21/08/2024	PR-IP-28-79	INVIAS	Aprobación de actividad de socialización de cierre del convenio No.4614-2023
21/08/2024	PR-IP-28-80	INVIAS	Aprobación de actividad de socialización de cierre del convenio No.4664-2023
11/09/2024	PR-IP-28-81	BANCO AVVILLAS	Solicitud de extractos bancarios, saldos y movimientos convenio 4614-2023
11/09/2024	PR-IP-28-82	BANCO AVVILLAS	Solicitud de extractos bancarios, saldos y movimientos convenio 4664-2023
26/09/2024	PR-IP-28-83	INVIAS	Reprogramación de socialización de cierre y entrega de obra del convenio solidario en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total, para el mejoramiento y mantenimiento vial – junta de acción comunal vereda santa lucía del municipio de puerto rico-meta.
27/09/2024	PR-IP-28-84	INVIAS	Reprogramación de socialización de cierre y entrega de obra del convenio solidario en el marco del programa caminos comunitarios de

			la paz total, para el mejoramiento y mantenimiento vial – junta de acción comunal vereda la primavera del municipio de puerto rico-meta.

8.2. Registro fotográfico y video del avance de las obras

4614-2023:





Actividades preliminares






Extendido de subbase





Señalización del proyecto



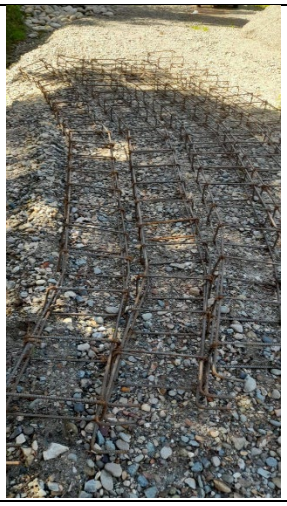

Figurado y armado de acero





Fundición de vigas riostras y huellas





Detallado final (Pintura)

4664-2023:






Creación del campamento





Actividades preliminares

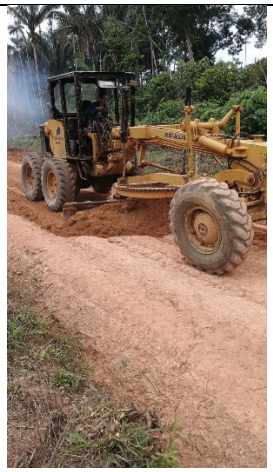




Nivelación de rasante y extendido de subbase





Figurado y armado de acero

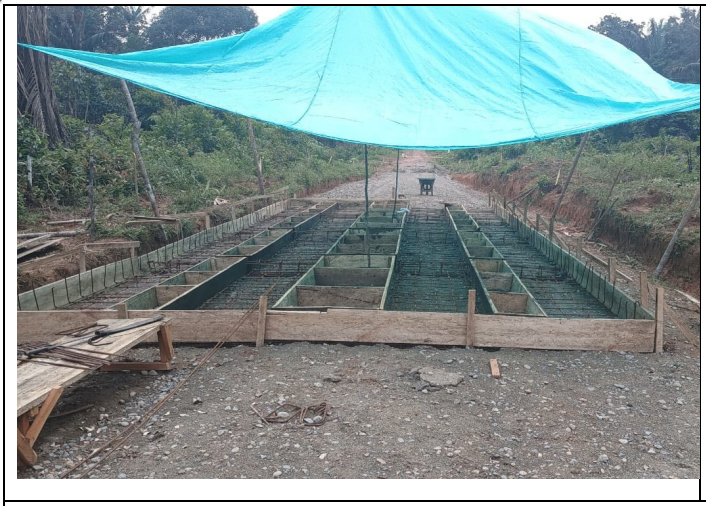



Fundición de vigas riostras y huellas





Procesos finales de construcción de placa huella

8.3. Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas.





Actividades sociales y ambientales

8.4 Copia de la bitácora
