INFORME MENSUAL N° 02
(25 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 24 DE ENERO DE 2026)

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PAIPA Y RED VITAL PAIPA S.A. E.S.P. CONVENIO MP039 DE 2025

OBJETO:

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y OPERATIVOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE DIFERENTES TRAMOS DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN LOS SECTORES LLANO GRANDE, TOIBITA, PABLO SOLANO, BONZA Y CANAL CARTAGENA, UBICADOS EN LAS ZONAS RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO DE PAIPA

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

RED VITAL PAIPA S.A. E.S.P.

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 3

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONVENIO 4

2. RELACIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS DEL CONTRATO DE OBRA 6

3. ASPECTOS JURIDICOS 6

3.1 PÓLIZAS DEL CONVENIO 6

4. RELACIÓN DEL PERSONAL VINCULADO AL PROYECTO. 7

5. RELACIÓN DE LOS APORTES A SEGURIDAD SOCIAL 8

6. LOCALIZACIÓN 10

6.1 LOCALIZACIÓN ESPECÍFICA VÍAS A INTERVENIR 10

7. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO 12

7.1 EVIDENCIA FOTOGRÁFICA 13

8. CANTIDADES EJECUTADAS 17

9. OBSERVACIONES 21

INTRODUCCIÓN

La ejecución del presente proyecto se desarrolla en el marco del Convenio Interadministrativo N° 039 de 2025, suscrito entre el Municipio de Paipa y la Empresa Red Vital Paipa S.A. E.S.P., cuyo objeto consiste en aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y operativos para la construcción y ampliación de diferentes tramos de redes de alcantarillado sanitario y pluvial en los sectores Llano Grande, Toibita, Pablo Solano, Bonza y Canal Cartagena, ubicados en las zonas urbana y rural del municipio de Paipa, departamento de Boyacá.

El convenio tiene como propósito fortalecer la infraestructura de saneamiento básico del municipio mediante la optimización de redes existentes que presentan condiciones de deterioro estructural, insuficiencia hidráulica y limitaciones operativas, así como ampliar la cobertura del servicio para responder al crecimiento urbano y a las necesidades actuales de la población. Estas intervenciones se desarrollan a través de la articulación institucional entre la administración municipal y el prestador del servicio público domiciliario, orientadas al mejoramiento de las condiciones de salubridad pública, sostenibilidad ambiental y calidad de vida de las comunidades beneficiarias.

El presente documento corresponde al Segundo Informe de Avance de Obra del Convenio Interadministrativo N° 039 de 2025, el cual consolida las actividades ejecutadas durante el periodo comprendido entre el 25 de diciembre de 2025 al 24 de enero de 2026, en cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas. El informe tiene como finalidad presentar las actividades desarrolladas durante el periodo reportado, así como el avance físico, técnico y administrativo alcanzado durante el periodo reportado de ejecución.

En el marco del convenio se contempla la intervención de doce (12) tramos de redes de alcantarillado sanitario y pluvial, mediante obras de reposición y construcción nueva que en conjunto suman aproximadamente seis (6) kilómetros de infraestructura, beneficiando de manera directa a cerca de cuatrocientas veinte (420) familias distribuidas en distintos sectores del municipio. Durante el periodo reportado se avanzó con la intervención parcial del tramo denominado Llano Grande (Calle 14).

El presente informe constituye un instrumento técnico de seguimiento y control que permite evidenciar el avance del proyecto frente a las metas establecidas, asegurando la trazabilidad de las actividades ejecutadas y el cumplimiento de los lineamientos técnicos, contractuales y normativos aplicables al sector de saneamiento básico. La ejecución progresiva de estas obras representa un avance significativo en el fortalecimiento de la infraestructura de alcantarillado del municipio de Paipa, contribuyendo a la protección de los recursos hídricos, la reducción de impactos ambientales y el mejoramiento integral del servicio para las comunidades urbanas y rurales beneficiadas.

Km 1 Vía Francisco Montaña / Código Postal 150444
Números de Contacto: +(57) 320 8587785 – 320 8585284
Correo electrónico: redvital@paipa-boyaca.gov.co / sig@redvitalpaipa.com
Página Web: www.redvitalpaipasaesp.com

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONVENIO

TIPO DE CONTRATO/CONVENIO:	OBRA	
CONTRATO No. Y FECHA:	CONV MP 039 2025	07 DE NOVIEMBRE DE 2025
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE PAIPA NIT 891.801.240-1 R/L GERMAN RICARDO CAMACHO BARRERA C.C. No. 80.470.658	
CONTRATISTA:	RED VITAL PAIPA S.A. E.S.P. NIT 900.259.348-5 R/L YEISON ROKNEY TORRES SUAREZ C.C. No. 1.053.611.160	
SUPERVISOR:	JORGE EDWIN LÓPEZ TORREZ SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPIO DE PAIPA	
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y OPERATIVOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE DIFERENTES TRAMOS DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN LOS SECTORES LLANO GRANDE, TOIBITA, PABLO SOLANO, BONZA Y CANAL CARTAGENA, UBICADOS EN LAS ZONAS RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO DE PAIPA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.	
APORTE RED VITAL PAIPA S.A. E.S.P.	$ 764.870.788,[79]	
APORTE MUNICIPIO	$ 1.329.278.260,[44]	
VALOR TOTAL:	$ 2.094.149.049,[23]	
FORMA DE DESEMBOLSO:	Los aportes a transferir por parte del MUNICIPIO a RED VITAL, por concepto del presente convenio interadministrativo serán transferidos una vez suscrita el acta de inicio; siendo en todo caso necesario el desarrollo de las siguientes actividades:	
	Primer desembolso: equivalente al cuarenta por ciento (40 %), que se efectuará una vez el Convenio se encuentre debidamente perfeccionado y legalizado, y se haya suscrito el Acta de Inicio, los recursos serán girados a la cuenta bancaria establecida previa firma del acta de inicio.	
	Segundo desembolso: equivalente al cuarenta por ciento (40 %) del	

	valor total del aporte, el cual se efectuará previa presentación y aprobación, por parte del Supervisor del Convenio, del informe de avance que acredite la ejecución del ochenta por ciento (80 %) de las actividades programadas, junto con los soportes técnicos, financieros y administrativos que demuestren la efectiva realización de las mismas y su verificación y conformidad por parte de la supervisión.
	Tercer y último desembolso: equivalente al veinte por ciento (20%) restante, que se efectuará una vez RED VITAL presente el informe final de ejecución y la correspondiente acta de liquidación, acompañado de los documentos soporte, la relación de gastos debidamente justificados, previa aprobación del Supervisor del Convenio.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO PERIODO:	1.48%
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO:	3.93%
PORCENTAJE DE DESEMBOLSO:	0%
PLAZO INICIAL:	6 MESES
FECHA ACTA DE INICIO:	25 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	24 DE MAYO DE 2026

CURVA S CONVENIO 039 DE 2025



Km 1 Vía Francisco Montaña / Código Postal 150444
Números de Contacto: +(57) 320 8587785 – 320 8585284
Correo electrónico: redvital@paipa-boyaca.gov.co / sig@redvitalpaipa.com
Página Web: www.redvitalpaipasaesp.com

2. RELACIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS DEL CONTRATO DE OBRA

ACTA	FECHA	DESCRIPCIÓN
INICIO	25/11/2025	Suscripción acta de inicio

3. ASPECTOS JURIDICOS

A continuación, se relacionan, las pólizas del CONV MP 039 2025 expedidas por seguros del estado S.A con sus respectivas actualizaciones, así mismo la relación del seguimiento jurídico y legal del contrato bajo las siguientes consideraciones

3.1 PÓLIZAS DEL CONVENIO

Pólizas Iniciales del convenio

Póliza de Seguro de cumplimiento entidad estatal No. 39-44-101177343 anexo 0			
Aprobada mediante acta de aprobación de pólizas de fecha 14/11/2025			
AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
		Desde (DD/MM/AA)	Hasta (DD/MM/AA)
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$ 209.414.904.92	07/11/2025	10/11/2026
PAGO SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	$ 104.707.452.46	07/11/2025	10/05/2026
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	$ 418.829.809.85	SI AMPARA 5 AÑOS 0 MESES Y 0 DÍAS	

Póliza de Seguro de responsabilidad civil extracontractual derivadas de cumplimiento RCE CONTRATOS No. 39-40-101046621 anexo 0			
Aprobada mediante acta de aprobación de pólizas de fecha 14/11/2025			
AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
		Desde (DD/MM/AA)	Hasta (DD/MM/AA)
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	$ 427.050.000	07/11/2025	10/11/2026
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	$ 427.050.000	07/11/2025	10/05/2026
VEHÍCULOS PROPIOS Y	$ 427.050.000	07/11/2025	10/05/2026

Km 1 Vía Francisco Montaña / Código Postal 150444
Números de Contacto: +(57) 320 8587785 – 320 8585284
Correo electrónico: redvital@paipa-boyaca.gov.co / sig@redvitalpaipa.com
Página Web: www.redvitalpaipasaesp.com

NO PROPIOS			
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	$ 427.050.000	07/11/2025	10/05/2026
RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	$ 427.050.000	07/11/2025	10/05/2026
GASTOS MÉDICOS	$ 427.050.000	07/11/2025	10/05/2026
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	$ 427.050.000	07/11/2025	10/05/2026
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	$ 427.050.000	07/11/2025	10/05/2026

3.2 DOCUMENTOS LEGALES DEL CONVENIO

Se realiza la relación correspondiente a las diferentes modificaciones y/o actualizaciones que se legales que se han realizado al convenio tales como actas de inicio.

Estado legal del CONV MP 039 2025

No	Objeto	Fecha de firma
1	Suscripción del convenio	07/11/2025
2	Acta de Inicio	25/11/2025

4. RELACIÓN DEL PERSONAL VINCULADO AL PROYECTO.

El personal vinculado en la ejecución del contrato se relaciona en el siguiente cuadro: El personal solicitado según el pliego de condiciones o términos de referencia son:

CARGO	% DE DEDICACIÓN	NOMBRE	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	FECHA DE INGRESO	FECHA DE TERMINACIÓN
Director de obra	100%	María Amalfi Valderrama López	23856977	25-11-2025	24-05-2026
Residente de obra	100%	Rubén Dario Galán Hernández	1007343312	25-11-2025	30-01-2026
Residente SG-SST	50%	Andrew Masami Asakura García	1053605825	25-11-2025	24-05-2026
Oficial de Obra	100%	Luis Alberto Camargo Avella	4192865	25-11-2025	24-05-2026
Oficial de Obra	100%	Hernando Monroy Rodríguez	4192776	25-11-2025	24-05-2026
Oficial de Obra	100%	Edilberto Monroy Rodríguez	4192455	25-11-2025	24-05-2026
Conductor	20%	Yovany Tibata Jiménez	1053610862	25-11-2025	24-05-2026

5. RELACIÓN DE LOS APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

En cumplimiento de las obligaciones contractuales y legales derivadas del Convenio Interadministrativo N° 039 de 2025, el contratista de obra garantiza la afiliación y el pago oportuno de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral del personal técnico y operativo vinculado al proyecto.

Para el periodo comprendido entre el 25 de diciembre de 2025 al 24 de enero de 2026, se reporta el pago efectivo de los aportes a salud, pensión, riesgos laborales (ARL) y aportes parafiscales, estas acciones se rigen estrictamente por la normativa vigente y las cláusulas específicas para la ejecución de obras públicas.

El personal detallado previamente en este informe se encuentra actualmente activo, asegurando así la cobertura prestacional y la mitigación de riesgos laborales. Como evidencia de este compromiso, se adjuntan en los anexos las planillas de autoliquidación correspondientes al personal de Red Vital Paipa S.A. E.S.P., las cuales certifican la transparencia en la gestión de seguridad social.

A continuación, se presenta el resumen detallado de los aportes realizados:

CARGO	IBC	NOMBRE	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	N° DE PLANILLA	FECHA DE PAGO
PERIODO: DICIEMBRE DEL 2025					
Director de obra	$ 3.332.627	María Amalfi Valderrama López	23856977	9497698938	08/01/2026
Residente de obra	$3.131.529	Rubén Dario Galán Hernández	1007343312	9497698938	08/01/2026
Residente SG-SST	$3.131529	Andrew Masami Asakura García	1053605825	9497698938	08/01/2026
Oficial de Obra	$ 1.953.371	Luis Alberto Camargo Avella	4192865	9497698938	08/01/2026
Oficial de Obra	$ 1.861.267	Hernando Monroy Rodríguez	4192776	9497698938	08/01/2026
Oficial de Obra	$ 1.495.744	Edilberto Monroy Rodríguez	4192455	9497698938	08/01/2026
Conductor	$2.114.554	Yovany Tibata Jiménez	1053610862	9497698938	08/01/2026


PERIODO: ENERO DEL 2026					
Director de obra	$4.099.131	María Amalfi Valderrama López	23856977	9499309637	06/02/2026
Residente de obra	$3,851,731	Rubén Dario Galán Hernández	1007343312	9499309637	06/02/2026
Residente SG-SST	$3.851.731	Andrew Masami Asakura García	1053605825	9499309637	06/02/2026
Oficial de Obra	$ 2.475.811	Luis Alberto Camargo Avella	4192865	9499309637	06/02/2026
Oficial de Obra	2.416.808	Hernando Monroy Rodríguez	4192776	9499309637	06/02/2026
Oficial de Obra	$1.825.907	Edilberto Monroy Rodríguez	4192455	9499309637	06/02/2026
Conductor	$2.650.464	Yovany Tibata Jiménez	1053610862	9499309637	06/02/2026

PAIPA S.A. E.S.P. Red Vital

6. LOCALIZACIÓN

El proyecto se localiza en el municipio de Paipa, ubicado en la región centro-oriental del país y en el sector noroccidental del departamento de Boyacá, dentro de la provincia de Tundama, sobre la Cordillera Oriental de Colombia, a una altitud aproximada de 2.525 m s. n. m. Las intervenciones se desarrollan tanto en zona urbana como rural, en áreas priorizadas por sus condiciones operativas y por la necesidad de optimizar y ampliar la infraestructura existente de saneamiento básico, contribuyendo al fortalecimiento del sistema de alcantarillado sanitario y pluvial del municipio.


Figura 1. Localización del municipio de Paipa

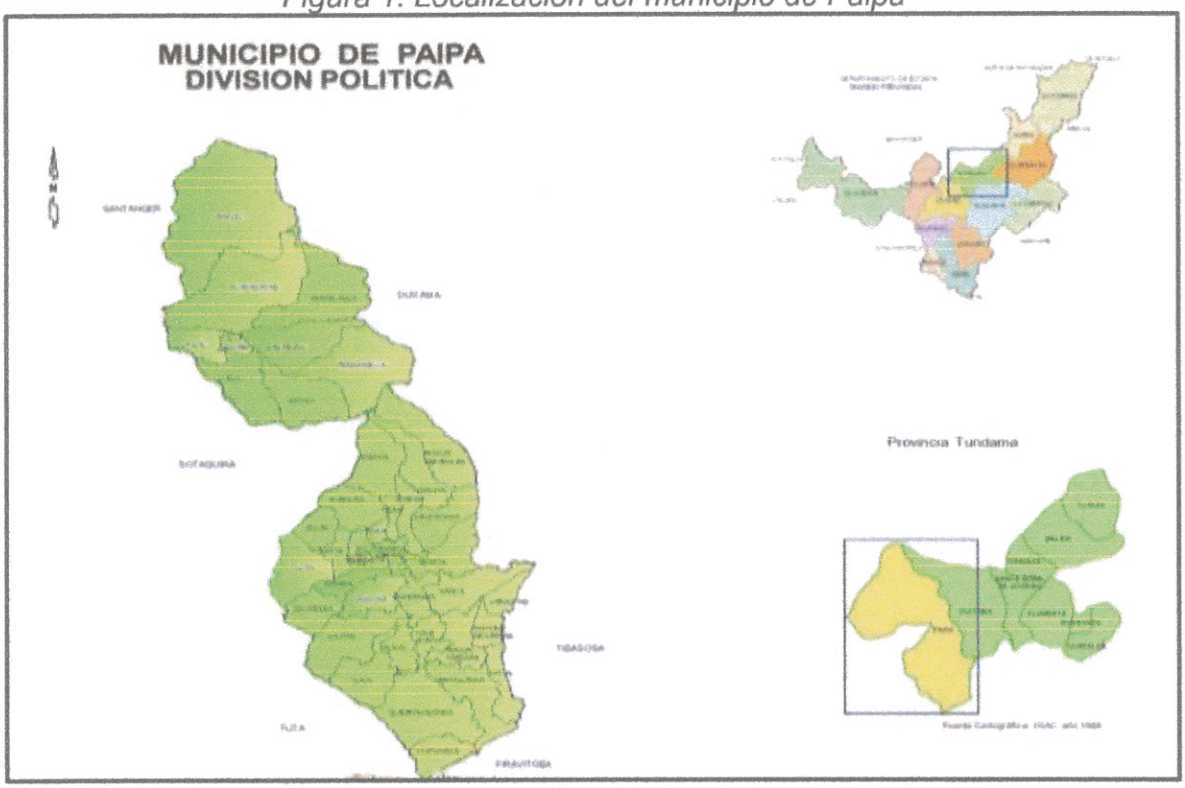

Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC

6.1 LOCALIZACIÓN ESPECÍFICA VÍAS A INTERVENIR

Aunque el convenio contempla la ejecución de diferentes frentes de obra distribuidos estratégicamente en el territorio municipal, durante el periodo comprendido entre el 25 de diciembre de 2025 al 24 de enero de 2026 las actividades constructivas se concentraron exclusivamente en el frente correspondiente al alcantarillado sanitario Llano Grande – Calle 14.

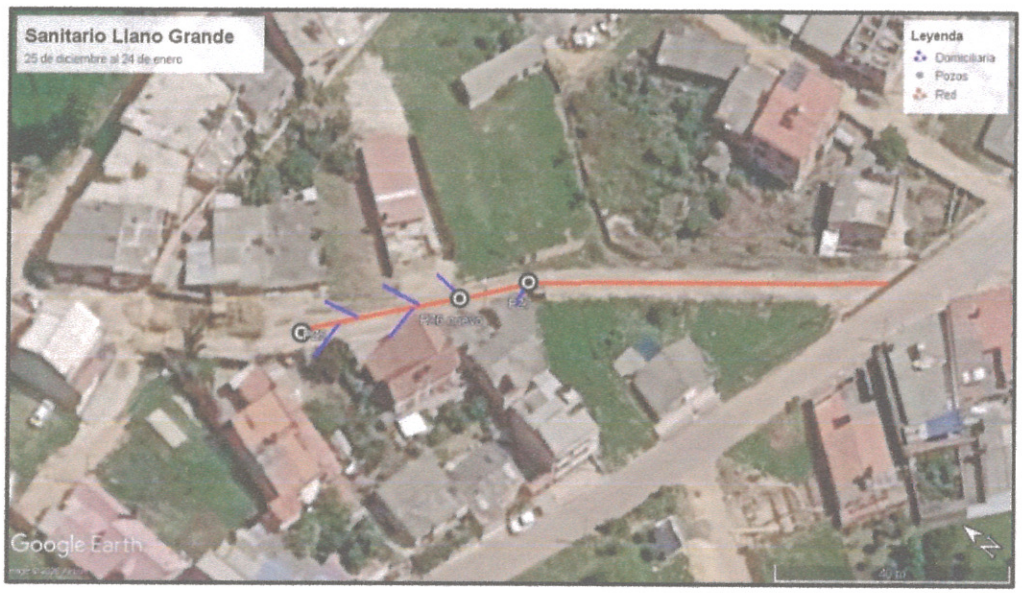

DESARROLLO DEL CONVENIO

El presente informe describe el desarrollo y ejecución de las actividades de obras enunciadas dentro del objeto contractual contenido en CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 039 DE 2025, suscrito entre el Municipio de Paipa y la Empresa de Servicios Públicos Red Vital Paipa S.A. E.S.P.


Durante este periodo se desarrolló un comité de obra el día 15 de enero de 2026, en el cual se trataron temas relacionados con el avance de las obras, seguimiento a las actividades ejecutadas y revisión general del estado de ejecución del convenio.

Se intervino el tramo sobre la diagonal 11A entre carrera 25 y carrera 26 hasta el punto descrito como PZ5, teniendo en cuenta que esta red cumplió con su vida útil y era necesario intervenirla de manera prioritaria; dadas las condiciones operativas identificadas en la red existente, relacionadas con su estado estructural y capacidad hidráulica, así como por la necesidad de mejorar la conducción adecuada de las aguas residuales y garantizar la correcta prestación del servicio de alcantarillado sanitario a la población beneficiaria.

Las actividades de ejecución para el tramo intervenido en el frente Llano Grande (Calle 14) se avanzaron con la fase de preliminares, donde se realizó el cerramiento y señalización del área de intervención, localización y replanteo topográfico de precisión, posteriormente, se procedió con el movimiento de tierras, ejecutando las excavaciones y la compactación de la subrasante para garantizar la estabilidad del terreno. Una vez adecuadas las bases, se instalaron las redes de alcantarillado. Finalmente, el proceso se finalizó con la limpieza general de escombros, asegurando que la entrega final coincida

estrictamente con las cantidades y especificaciones técnicas detalladas en el archivo de Excel (sábana de cantidades ejecutadas).

LOCALIZACION TRAMO INTERVENDO - ALCANTARILLADO SANITARIO LLANO GRANDE (CALLE 14) – PERIODO 25 DE DICIEMBRE DEL 2025 – 24 DE ENERO DEL 2026

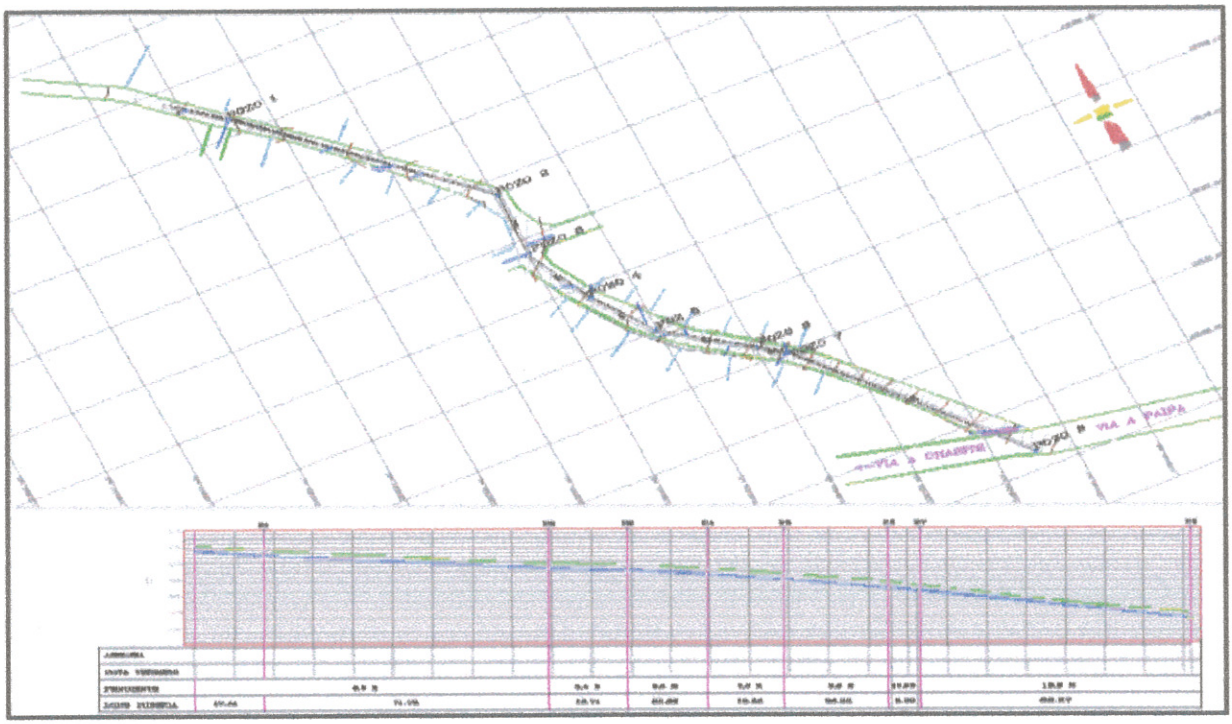

7. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO

Durante el periodo comprendido entre el 25 de diciembre de 2025 al 24 de enero de 2026, las actividades ejecutadas en el marco del Convenio Interadministrativo N° 039 de 2025 estuvieron orientadas a la continuidad de proceso constructivo del proyecto, concentrándose exclusivamente en el frente correspondiente al alcantarillado sanitario Llano Grande – Calle 14.

Siguiendo el cronograma general de obra por parte de la Empresa Red Vital Paipa S.A. E.S.P., se realizaron las siguientes actividades:

Las actividades ejecutadas comprendieron el replanteo del eje de la red sanitaria, excavación mecánica de zanjas mediante retroexcavadora, alineación y nivelación de tubería, instalación de tubería corrugada sanitaria de 10 pulgadas, atraque con material seleccionado, relleno y conformación de zanjas con material afirmado, retiro del material producto de excavación y adecuación progresiva del frente intervenido.

Como resultado de las labores ejecutadas durante el periodo reportado, se instalaron aproximadamente 91 metros lineales de tubería de alcantarillado corrugada de 10 pulgadas, avanzando en la conformación del sistema de alcantarillado sanitario proyectado. Adicionalmente, se ejecutaron obras complementarias consistentes en la construcción de un (01) pozo de inspección con altura de 1,80 m, la instalación de cuatro (04) conexiones domiciliarias mediante silla YEE de 10" x 6", así como dos (02) conexiones domiciliarias directas al pozo de inspección, garantizando la correcta integración de los usuarios al sistema.

Durante el desarrollo del periodo se contó con personal operativo permanente en obra y apoyo de maquinaria amarilla para las actividades de excavación, manejo y retiro de material. Las labores se ejecutaron bajo condiciones climáticas variables, predominando jornadas de lluvia que incidieron sustancialmente en la programación diaria afectando el avance general previsto.

En algunas fechas no se realizaron actividades constructivas debido a situaciones previamente justificadas, tales como condiciones climáticas adversas y se presentó un desabastecimiento de agregados finos (arena) y unidades de mampostería (ladrillo) que cumplen con la curva granulométrica y los estándares de resistencia estructural exigidos, esto imposibilitó la ejecución de actividades precursoras, forzando la reprogramación del cronograma.

Las actividades desarrolladas durante el periodo se realizaron de conformidad con la planeación técnica garantizando las condiciones necesarias para la continuidad de las obras en los periodos siguientes.

7.1 EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

Localización y replanteo.






Excavaciones.





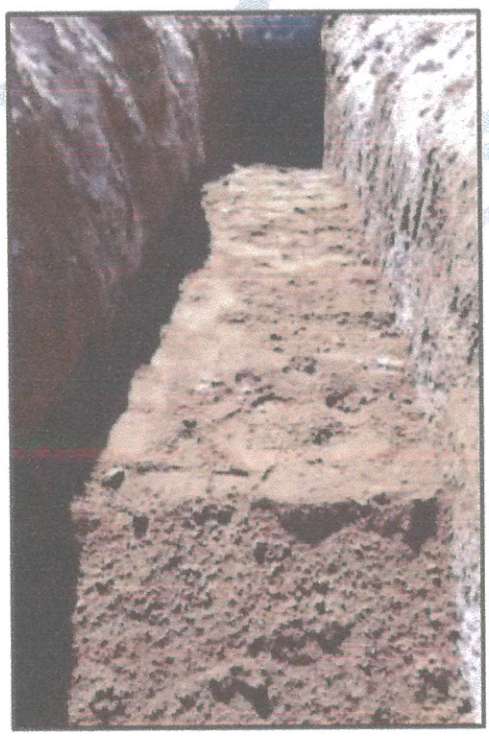

Instalación tubería principal.





Instalación de conexiones domiciliarias.





Construcción de estructuras pozos y cajas.



Señalización, cerramiento de la obra y suministro de materiales



8. CANTIDADES EJECUTADAS

	CANTIDADES CONTRACTUALES INICIALES			CANTIDADES EJECUTADAS INFORME 2			CANTIDAD EJECUTADA ANTERIORES INFORMES	CANTIDAD TOTAL ACUMULADO	PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	SUMINISTRO/ TRANSPORTE (MUNICIPIO DE PAIPA)	OBRA CIVIL (RED VITAL)	PORCENTAJE DE AVANCE			
				CANTIDAD SUMINISTRADA	CANTIDAD EJECUTADA				
1.1	**PRELIMINARES**								
1.1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	km	6.08	0.00	0.09	1.48%	0.15	0.24	3.93%
	SUB TOTAL PRELIMINARES								
1.2	**EXCAVACIONES**								
1.2.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	m^3	463.73	0.00	14.98	3.23%	23.28	38.25	5.02%
1.2.2	EXCAVACIONES MECÁNICAS Y CORTES EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	m^3	5,117.62	0.00	127.51	2.49%	234.67	362.17	4.59%
	SUB TOTAL EXCAVACIÓN								
1.3	TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC								
1.3.1	TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=6"	m	753.00	0.00	31.20	4.14%	45.50	76.70	6.04%
1.3.2	TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=8"	m	274.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%

1.3.3	TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=10"	m	1,915.13	25.70	25.70	1.34%	132.50	158.20	6.92%
1.3.4	TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=12"	m	1,899.68	64.42	64.42	3.39%	0.00	64.42	0.00%
1.3.5	TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=14"	m	983.39	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
1.3.6	TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=16"	m	62.99	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
1.3.7	TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=18"	m	63.64	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
	SUB TOTAL TUBERÍAS DE ALCANTARILLADO PVC								
1.4	RELLENOS								
1.4.1	RELLENO EN ARENA DE PEÑA COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA.	m^3	994.03	41.83	41.83	4.21%	65.28	107.11	6.57%
1.4.2	RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O VIBRO COMPACTADOR. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	m^3	2,083.31	87.77	87.77	4.21%	171.97	259.74	8.25%
1.4.3	ACARREO DE MATERIALES PÉTREOS, TIERRA Y VARIOS (DESPUÉS DE 5 KM.).	m^3-km	13,541.52	570.50	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
1.4.4	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	m^3	1,965.64	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
	SUB TOTAL RELLENOS								
1.5	POZOS DE INSPECCIÓN								
1.5.1	POZO DE INSPECCIÓN, DIÁMETRO INTERIOR 1.0 M. (H < = 1.0 M.). (NO INCLUYE ARO Y TAPA).	und	33.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%

1.5.2	POZO DE INSPECCIÓN, DIÁMETRO INTERIOR 1.2 M. (1.00 M. < H < 1.50 M.). (NO INCLUYE ARO Y TAPA).	und	15.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
1.5.3	POZO DE INSPECCIÓN, DIÁMETRO INTERIOR 1.2 M. (1.50 M. < H < 2.00 M.). (NO INCLUYE ARO Y TAPA).	und	9.00	1.00	1.00	11.11%	2.00	3.00	22.22%
1.5.4	POZO DE INSPECCIÓN, DIÁMETRO INTERIOR 1.2 M. (2.00 M. < H < 2.50 M.). (NO INCLUYE ARO Y TAPA).	und	4.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
1.5.5	POZO DE INSPECCIÓN, DIÁMETRO INTERIOR 1.5 M. (2.50 M. < H < 3.50 M.). (NO INCLUYE ARO Y TAPA).	und	2.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
1.5.6	ARO Y TAPA POZOS INSP EN HF	und	82.00	0.00	0.00	0.00%	1.00	1.00	1.22%
	SUB TOTAL POZOS								
1.6	CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADO								
1.6.1	CONEXIÓN DOMICILIARIA PARA ALCANTARILLADO DE 200 MM. X 160 MM. KIT SILLA YEE 8" x 6"	und	39.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
1.6.2	CONEXIÓN DOMICILIARIA PARA ALCANTARILLADO DE 250 MM. X 160 MM. KIT SILLA YEE 10" x 6"	und	57.00	0.00	4.00	7.02%	6.00	10.00	10.53%
1.6.3	CONEXIÓN DOMICILIARIA PARA ALCANTARILLADO DE 315 MM. X 160 MM. KIT SILLA YEE 12" x 6"	und	64.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
1.6.4	CONEXIÓN DOMICILIARIA PARA ALCANTARILLADO DE 350 MM. X 160 MM. KIT SILLA YEE 14" x 6"	und	56.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
1.6.5	CONEXIÓN DOMICILIARIA PARA ALCANTARILLADO DE 400 MM. X 160 MM.	und	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
1.6.6	CONEXIÓN DOMICILIARIA PARA ALCANTARILLADO DE 450 MM. X 160 MM.	und	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
	SUB TOTAL SUMINISTRO CONEXIÓN DOMICILIARIA PARA ALCANTARILLADO								

1.7	CAJAS DE INSPECCIÓN EN LADRILLO DE 0.40 X 0.40 x 0.40 M. (NO INCLUYE TAPA).								
1.7.1	CAJAS DE INSPECCIÓN DE 0.40 X 0.40 X 0.40 MTS LADRILLO	und	216.00	0.00	0.00	0.00%	1.00	1.00	0.46%
1.7.2	CONCRETO SIMPLE DE 21 Mpa - (3000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA TAPAS	m^3	5.18	0.00	0.00	0.00%	0.02	0.02	0.46%
	SUB TOTAL CAJAS DE INSPECCIÓN								
1.8	SUMIDEROS								
1.8.1	SUMIDERO LATERAL EN LADRILLO. DIMENSIONES INTERNAS 0.40 X 0.80 M. H = 1.10 M. (INCLUYE REJILLA PLÁSTICA TRÁFICO PESADO).	und	12.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
	SUB TOTAL CONSTRUCCIÓN DE SUMIDEROS								
					PROMEDIO	1.47%		PROMEDIO	2.63%

9. OBSERVACIONES

Durante el periodo comprendido entre el 25 de diciembre de 2025 al 24 de enero de 2026 se presentan las siguientes observaciones asociadas a la ejecución del proyecto:

- Durante el periodo reportado las actividades se ejecutaron únicamente en el frente correspondiente al alcantarillado sanitario Llano Grande – Calle 14.
- El rendimiento diario presentó afectaciones debido a condiciones climáticas desfavorables y al desabastecimiento de insumos (arena y ladrillo) bajo estándares técnicos; estos factores generaron intermitencias en el avance de obra y limitaron la continuidad de las actividades programadas.
- Las obras cumplen con las especificaciones técnicas; sin embargo, los factores externos forzaron una reprogramación de actividades para los periodos siguientes.
- El suministro de materiales se realizó de manera gradual conforme al avance del frente de trabajo.
- No se presentaron situaciones de orden público ni conflictos sociales que afectaran la ejecución del proyecto.
- El frente de obra permaneció señalizado y bajo condiciones adecuadas de seguridad industrial y manejo del tránsito local.

PAIPA S.A. E.S.P. Red Vital

Emite	**YEISON ROKNEY TORRES SUAREZ**
Empleo	Gerente General

Validación	*Nombre Completo / Empleo*	*Vo.Bo.*
Elaboró	*María Amalfi Valderrama López* *Profesional Planeación y Proyectos*	
Elaboró	*David Felipe Puentes Fuentes* *Apoyo Planeación y Proyectos*	
Revisó	*Helmer Herrera Rivera* *Subgerente General Operativo*	
Aprobó	*Yeison Rokney Torres Suarez* *Gerente General*	

No	*Archivado en*

No	*Anexos*	*Folios*
1	*Planilla PILA Red Vital Paipa S.A. E.S.P. (Diciembre)*	*5*
2	*Planilla PILA Red Vital Paipa S.A. E.S.P. (Enero)*	*5*
3	*Memoria de cantidades informe 2*	*2*
4	*Sabana mayores y menores informe 2*	*2*

No	*Tipo*	*Gestión Documental (¿A Quién? - Empleo)*

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900259348	5	RED VITAL PAIPA SA E.S.P	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PAIPA COMFABOY	KM 1 VIA FRANCISCO MONTAÑA	PAIPA-BOYACA	7853051	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2026-01	2068106583	9497698938	E	2026/01/14	2026/01/08	BANCO POPULAR	0	$52,647,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PAIPA COMFABOY (99 Afiliados)						$199,973,552	$32,074,900			$199,973,552	$8,003,700			$227,211,522	$9,017,900			$199,973,552	$3,551,200		$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (99 Afiliados)						$199,973,552	$32,074,900			$199,973,552	$8,003,700			$227,211,522	$9,017,900			$199,973,552	$3,551,200		$0	$0
Ciudad: DUITAMA Depto: BOYACA (1 Afiliados)						$779,541	$124,800			$779,541	$31,200			$829,381	$33,200			$779,541	$54,300		$0	$0
1	CC	1052396359	BECERRA VALDERRAMA WILSON ARIEL	25-14	16	$779,541	$124,800	EPS037	16	$779,541	$31,200	CCF10	16	$829,381	$33,200	14-23	16	$779,541	$54,300	16	$0	$0
Ciudad: PAIPA Depto: BOYACA (98 Afiliados)						$199,194,011	$31,950,100			$199,194,011	$7,972,500			$226,382,141	$8,984,700			$199,194,011	$3,496,900		$0	$0
2	CC	74323988	ALFONSO PUERTO JORGE ORLANDO	25-14	30	$2,056,988	$329,200	EPS037	30	$2,056,988	$82,300	CCF10	30	$2,150,438	$86,100	14-23	30	$2,056,988	$50,200	30	$0	$0
3	CC	74130745	ALVARADO PEDRAZA ELKIN DARIO	25-14	30	$1,842,079	$294,800	EPS005	30	$1,842,079	$73,700	CCF10	30	$1,935,529	$77,500	14-23	30	$1,842,079	$44,900	30	$0	$0
4	CC	1053613961	AMAYA REYES JULIAN ALFONSO	230201	30	$2,740,513	$438,500	EPS017	30	$2,740,513	$109,700	CCF10	30	$2,833,963	$113,400	14-23	30	$2,740,513	$14,400	30	$0	$0
5	CC	52158241	AREVALO ZAMBRANO MIRYAM MAGNOLIA	25-14	2	$97,443	$15,600	EPS017	2	$97,443	$3,900	CCF10	2	$0	$0	14-23	2	$97,443	$0	2	$0	$0
6	CC	52158241	AREVALO ZAMBRANO MIRYAM MAGNOLIA	25-14	3	$144,893	$23,200	EPS017	3	$144,893	$5,800	CCF10	3	$0	$0	14-23	3	$144,893	$0	3	$0	$0
7	CC	52158241	AREVALO ZAMBRANO MIRYAM MAGNOLIA	25-14	25	$1,218,033	$194,900	EPS017	25	$1,218,033	$48,800	CCF10	25	$1,295,907	$51,900	14-23	25	$1,218,033	$12,800	25	$0	$0
8	CC	1032436013	ARGUELLO FLOREZ JULIANA	230201	30	$3,332,627	$533,300	EPS005	30	$3,332,627	$133,400	CCF10	30	$3,332,627	$133,400	14-23	30	$3,332,627	$17,400	30	$0	$0
9	CC	1053605825	ASAKURA GARCIA ANDREW MASAMI	230201	30	$3,131,529	$501,100	EPS017	30	$3,131,529	$125,300	CCF10	30	$3,131,529	$125,300	14-23	30	$3,131,529	$32,700	30	$0	$0
10	CC	1053604212	AVENDAÑO PACHECO OSCAR IVAN	25-14	30	$2,121,168	$339,400	EPS017	30	$2,121,168	$84,900	CCF10	30	$2,214,618	$88,600	14-23	30	$2,121,168	$51,700	30	$0	$0
11	CC	23857282	AVILA FONSECA MIREYA	25-14	30	$1,510,360	$241,700	EPS037	30	$1,510,360	$60,500	CCF10	30	$1,603,810	$64,200	14-23	30	$1,510,360	$15,800	30	$0	$0
12	CC	1053608342	BARON ALBARRACIN MANUEL ANTONIO	25-14	30	$1,461,639	$233,900	EPS005	30	$1,461,639	$58,500	CCF10	30	$1,555,089	$62,300	14-23	30	$1,461,639	$35,700	30	$0	$0
13	CC	74360014	BRIÑEZ PARDO JAMIX JENID	231001	30	$1,999,803	$320,000	EPS037	30	$1,999,803	$80,000	CCF10	30	$2,093,253	$83,800	14-23	30	$1,999,803	$87,000	30	$0	$0
14	CC	4117063	CAMARGO AVELLA JAVIER	25-14	30	$1,644,344	$263,100	EPS017	30	$1,644,344	$65,800	CCF10	30	$1,737,794	$69,600	14-23	30	$1,644,344	$40,100	30	$0	$0
15	CC	74130567	CAMARGO CAMARGO JAVIER ANTONIO	25-14	30	$1,842,079	$294,800	EPS005	30	$1,842,079	$73,700	CCF10	30	$1,935,529	$77,500	14-23	30	$1,842,079	$19,300	30	$0	$0
16	CC	1053612397	CAMARGO PEDRAZA JULIETH PAOLA	25-14	1	$104,384	$16,800	EPS017	1	$104,384	$4,200	CCF10	1	$0	$0	14-23	1	$104,384	$0	1	$0	$0
17	CC	1053612397	CAMARGO PEDRAZA JULIETH PAOLA	25-14	5	$521,921	$83,600	EPS017	5	$521,921	$20,900	CCF10	5	$0	$0	14-23	5	$521,921	$0	5	$0	$0
18	CC	1053612397	CAMARGO PEDRAZA JULIETH PAOLA	25-14	22	$2,296,455	$367,500	EPS017	22	$2,296,455	$91,900	CCF10	22	$6,910,996	$276,500	14-23	22	$2,296,455	$24,000	22	$0	$0
19	CC	4192865	CAMARGO AVELLA LUIS ALBERTO	25-14	30	$1,842,079	$294,800	EPS017	30	$1,842,079	$73,700	CCF10	30	$1,935,529	$77,500	14-23	30	$1,842,079	$44,900	30	$0	$0
20	CC	74322901	CAMARGO SALAMANCA NORBERTO	25-14	30	$1,667,051	$266,800	EPS005	30	$1,667,051	$66,700	CCF10	30	$1,760,501	$70,500	14-23	30	$1,667,051	$40,700	30	$0	$0
21	CC	74130492	CAMARGO AVELLA SAUL	25-14	30	$1,461,639	$233,900	EPS037	30	$1,461,639	$58,500	CCF10	30	$1,555,089	$62,300	14-23	30	$1,461,639	$35,700	30	$0	$0
22	CC	74360447	CAÑADULCE URIEL	25-14	7	$429,818	$68,800	EPS037	7	$429,818	$17,200	CCF10	7	$0	$0	14-23	7	$429,818	$0	7	$0	$0
23	CC	74360447	CAÑADULCE URIEL	25-14	23	$1,412,261	$226,000	EPS037	23	$1,412,261	$56,500	CCF10	23	$1,926,261	$77,100	14-23	23	$1,412,261	$34,500	23	$0	$0
24	CC	1053609616	CARDENAS DE LA CRUZ CARLOS AUGUSTO	230301	30	$1,540,380	$246,500	EPS005	30	$1,540,380	$61,700	CCF10	30	$1,633,830	$65,400	14-23	30	$1,540,380	$37,600	30	$0	$0
25	CC	4192800	CEPEDA VERDUGO CARLOS YOVANNI	231001	1	$48,721	$7,800	EPS017	1	$48,721	$2,000	CCF10	1	$0	$0	14-23	1	$48,721	$0	1	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
26	CC	4192800	CEPEDA VERDUGO CARLOS YOVANNI	231001	29	$1,498,180	$239,800	EPS017	29	$1,498,180	$60,000	CCF10	29	$1,588,515	$63,600	14-23	29	$1,498,180	$36,500	29	$0	$0
27	CC	1053615208	CETINA VELANDIA ANGELA NATALIA	230301	30	$2,740,513	$438,500	EPS005	30	$2,740,513	$109,700	CCF10	30	$2,833,963	$113,400	14-23	30	$2,740,513	$14,400	30	$0	$0
28	CC	1053613469	CHAPARRO RUIZ JUAN CAMILO	25-14	30	$3,131,529	$501,100	EPS002	30	$3,131,529	$125,300	CCF10	30	$3,131,529	$125,300	14-23	30	$3,131,529	$76,300	30	$0	$0
29	CC	1053606736	CHAPARRO RODRIGUEZ LEIDY ALEXANDRA	230301	30	$1,559,082	$249,500	EPS041	30	$1,559,082	$62,400	CCF10	30	$1,652,532	$66,200	14-23	30	$1,559,082	$38,000	30	$0	$0
30	CC	74130511	CIPAGAUTA RINCON BERNARDO	230201	2	$97,443	$15,600	EPS017	2	$97,443	$3,900	CCF10	2	$0	$0	14-23	2	$97,443	$0	2	$0	$0
31	CC	74130511	CIPAGAUTA RINCON BERNARDO	230201	28	$1,364,197	$218,300	EPS017	28	$1,364,197	$54,600	CCF10	28	$1,451,416	$58,100	14-23	28	$1,364,197	$14,300	28	$0	$0
32	CC	1053607751	CORCHUELO LARA LEIDY ELIANA	230301	30	$3,131,529	$501,100	EPS017	30	$3,131,529	$125,300	CCF10	30	$3,131,529	$125,300	14-23	30	$3,131,529	$16,400	30	$0	$0
33	CC	1053604596	DIAZ MANCIPE SANDRA PATRICIA	25-14	1	$48,721	$7,800	EPS017	1	$48,721	$2,000	CCF10	1	$0	$0	14-23	1	$48,721	$0	1	$0	$0
34	CC	1053604596	DIAZ MANCIPE SANDRA PATRICIA	25-14	29	$1,510,361	$241,700	EPS017	29	$1,510,361	$60,500	CCF10	29	$1,600,696	$64,100	14-23	29	$1,510,361	$36,800	29	$0	$0
35	CC	46681148	DUEÑEZ PACHECO MAYERLINE	230301	30	$1,794,349	$287,100	EPS002	30	$1,794,349	$71,800	CCF10	30	$1,887,799	$75,600	14-23	30	$1,794,349	$43,800	30	$0	$0
36	CC	1053606149	ESPEJO RODRIGUEZ ELKIN FERNEY	230301	30	$3,131,529	$501,100	EPS017	30	$3,131,529	$125,300	CCF10	30	$3,131,529	$125,300	14-23	30	$3,131,529	$76,300	30	$0	$0
37	CC	74359604	ESPEJO VASQUEZ VICTOR HUGO	25-14	30	$1,644,344	$263,100	EPS017	30	$1,644,344	$65,800	CCF10	30	$1,737,794	$69,600	14-23	30	$1,644,344	$40,100	30	$0	$0
38	CC	1053611961	ESPEJO BOSIGA YEISON FABIAN	230301	30	$1,644,344	$263,100	EPS017	30	$1,644,344	$65,800	CCF10	30	$1,737,794	$69,600	14-23	30	$1,644,344	$40,100	30	$0	$0
39	CC	46680754	FIGUEREDO GUTIERREZ RUTH MIREYA	230201	30	$3,216,281	$514,700	EPS005	30	$3,216,281	$128,700	CCF10	30	$3,216,281	$128,700	14-23	30	$3,216,281	$16,800	30	$0	$0
40	CC	1053607571	FLOREZ GRANADOS DIEGO ARMANDO	230201	4	$217,705	$34,900	EPS017	4	$217,705	$8,800	CCF10	4	$0	$0	14-23	4	$217,705	$0	4	$0	$0
41	CC	1053607571	FLOREZ GRANADOS DIEGO ARMANDO	230201	26	$1,627,169	$260,400	EPS017	26	$1,627,169	$65,100	CCF10	26	$1,708,159	$68,400	14-23	26	$1,627,169	$39,700	26	$0	$0
42	CC	74324456	FONSECA CASTRO GILBERTO	230201	10	$657,738	$105,300	EPS037	10	$657,738	$26,400	CCF10	10	$3,129,948	$125,200	14-23	10	$657,738	$16,100	10	$0	$0
43	CC	1053604562	FONSECA BARON JHON EDISON	25-14	10	$1,205,544	$192,900	EPS017	10	$1,205,544	$48,300	CCF10	10	$1,205,544	$0	14-23	10	$1,205,544	$0	10	$0	$0
44	CC	1053604562	FONSECA BARON JHON EDISON	25-14	20	$2,833,030	$453,300	EPS017	20	$2,833,030	$113,400	CCF10	20	$5,292,310	$211,700	14-23	20	$2,833,030	$14,800	20	$0	$0
45	CC	74323433	FONSECA ROJAS JORGE	25-14	30	$2,461,442	$393,900	EPS017	30	$2,461,442	$98,500	CCF10	30	$2,554,892	$102,200	14-23	30	$2,461,442	$60,000	30	$0	$0
46	CC	39662885	GACHA PULIDO MARTHA INES	25-14	2	$97,443	$15,600	EPS017	2	$97,443	$3,900	CCF10	2	$97,443	$0	14-23	2	$97,443	$0	2	$0	$0
47	CC	39662885	GACHA PULIDO MARTHA INES	25-14	28	$1,364,197	$218,300	EPS017	28	$1,364,197	$54,600	CCF10	28	$1,451,416	$58,100	14-23	28	$1,364,197	$14,300	28	$0	$0
48	CC	1007343312	GALAN HERNANDEZ RUBEN DARIO	230301	30	$3,131,529	$501,100	EPS037	30	$3,131,529	$125,300	CCF10	30	$3,131,529	$125,300	14-23	30	$3,131,529	$76,300	30	$0	$0
49	CC	74359655	GAMBOA CAMARGO GUILLERMO ENRIQUE	230301	30	$1,718,949	$275,100	EPS017	30	$1,718,949	$68,800	CCF10	30	$1,812,399	$72,500	14-23	30	$1,718,949	$74,800	30	$0	$0
50	CC	30352577	GARCIA FANY	25-14	30	$1,461,639	$233,900	EPS017	30	$1,461,639	$58,500	CCF10	30	$1,555,089	$62,300	14-23	30	$1,461,639	$35,700	30	$0	$0
51	CC	1053604772	GARZON BUITRAGO CAMILO INDALECIO	230201	30	$1,842,079	$294,800	EPS017	30	$1,842,079	$73,700	CCF10	30	$1,935,529	$77,500	14-23	30	$1,842,079	$44,900	30	$0	$0
52	CC	46680595	GOMEZ MONTENEGRO YENNY	231001	30	$1,559,082	$249,500	EPS017	30	$1,559,082	$62,400	CCF10	30	$1,652,532	$66,200	14-23	30	$1,559,082	$38,000	30	$0	$0
53	CC	74130530	GONZALEZ FONSECA WILDER ALEJANDRO	25-14	30	$1,461,639	$233,900	EPS017	30	$1,461,639	$58,500	CCF10	30	$1,555,089	$62,300	14-23	30	$1,461,639	$35,700	30	$0	$0
54	CC	51684052	GRANADOS CASTRO FLOR DE MARIA	231001	30	$1,501,284	$240,300	EPS017	30	$1,501,284	$60,100	CCF10	30	$1,594,734	$63,800	14-23	30	$1,501,284	$36,600	30	$0	$0
55	CC	1053613608	GRANADOS MEDINA JIMMY ALEXANDER	25-14	30	$1,913,076	$306,100	EPS017	30	$1,913,076	$76,600	CCF10	30	$2,006,526	$80,300	14-23	30	$1,913,076	$46,700	30	$0	$0
56	CC	40019727	HERNANDEZ MARIA ROSALBA	231001	3	$144,893	$23,200	EPS017	3	$144,893	$5,800	CCF10	3	$0	$0	14-23	3	$144,893	$0	3	$0	$0
57	CC	40019727	HERNANDEZ MARIA ROSALBA	231001	27	$1,315,476	$210,500	EPS017	27	$1,315,476	$52,700	CCF10	27	$1,399,580	$56,000	14-23	27	$1,315,476	$32,100	27	$0	$0
58	CC	74359629	HERRERA RIVERA HELMER	230201	30	$5,581,772	$893,100	EPS005	30	$5,581,772	$223,300	CCF10	30	$5,581,772	$223,300	14-23	30	$5,581,772	$136,000	30	$0	$0
59	CC	23856706	HIGUERA ALVARADO NUBIA TERESA	230301	30	$1,461,639	$233,900	EPS017	30	$1,461,639	$58,500	CCF10	30	$1,555,089	$62,300	14-23	30	$1,461,639	$15,300	30	$0	$0
60	CC	1053606359	HURTADO FIGUEREDO DIANA KATHERINE	230201	30	$5,581,772	$893,100	EPS017	30	$5,581,772	$223,300	CCF10	30	$5,581,772	$223,300	14-23	30	$5,581,772	$29,200	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
61	CC	46683315	JIMENEZ NIÑO LUZ MARLEN	230301	30	$1,559,082	$249,500	EPS037	30	$1,559,082	$62,400	CCF10	30	$1,652,532	$66,200	14-23	30	$1,559,082	$38,000	30	$0	$0
62	CC	24069673	JIMENEZ DE TIBATA MARIA EULALIA	25-14	30	$1,461,639	$233,900	EPS017	30	$1,461,639	$58,500	CCF10	30	$1,555,089	$62,300	14-23	30	$1,461,639	$35,700	30	$0	$0
63	CC	74322520	LARA RODRIGUEZ LUIS FERNANDO	230301	30	$1,842,079	$294,800	EPS005	30	$1,842,079	$73,700	CCF10	30	$1,935,529	$77,500	14-23	30	$1,842,079	$44,900	30	$0	$0
64	CC	40395482	LOPEZ CETINA ROSALBA	230201	30	$1,510,360	$241,700	EPS037	30	$1,510,360	$60,500	CCF10	30	$1,603,810	$64,200	14-23	30	$1,510,360	$36,800	30	$0	$0
65	CC	1051588795	MACHUCA OJEDA JOHNN JAIRO	25-14	30	$1,738,959	$278,300	EPS017	30	$1,738,959	$69,600	CCF10	30	$1,832,409	$73,300	14-23	30	$1,738,959	$42,400	30	$0	$0
66	CC	74373225	MALAVER CERCADO HECTOR PABLO	25-14	30	$2,336,370	$373,900	EPS005	30	$2,336,370	$93,500	CCF10	30	$2,429,820	$97,200	14-23	30	$2,336,370	$24,400	30	$0	$0
67	CC	74359649	MALAVER BENAVIDES LUIS GABRIEL	231001	30	$1,794,349	$287,100	EPS005	30	$1,794,349	$71,800	CCF10	30	$1,887,799	$75,600	14-23	30	$1,794,349	$9,400	30	$0	$0
68	CC	73120570	MATEUS JIMENEZ CESAR AUGUSTO	25-14	10	$614,026	$98,300	EPS005	10	$614,026	$24,600	CCF10	10	$614,026	$0	14-23	10	$614,026	$0	10	$0	$0
69	CC	73120570	MATEUS JIMENEZ CESAR AUGUSTO	25-14	20	$1,228,053	$196,500	EPS005	20	$1,228,053	$49,200	CCF10	20	$3,811,463	$152,500	14-23	20	$1,228,053	$30,000	20	$0	$0
70	CC	4192455	MONROY RODRIGUEZ EDILBERTO	25-14	30	$1,461,639	$233,900	EPS041	30	$1,461,639	$58,500	CCF10	30	$1,555,089	$62,300	14-23	30	$1,461,639	$35,700	30	$0	$0
71	CC	4192776	MONROY RODRIGUEZ HERNANDO	25-14	30	$1,842,079	$294,800	EPS017	30	$1,842,079	$73,700	CCF10	30	$1,935,529	$77,500	14-23	30	$1,842,079	$19,300	30	$0	$0
72	CC	1053606329	MONROY RODRIGUEZ PAOLA ANDREA	230201	30	$1,794,349	$287,100	EPS005	30	$1,794,349	$71,800	CCF10	30	$1,887,799	$75,600	14-23	30	$1,794,349	$9,400	30	$0	$0
73	CC	1053615891	OCHOA DIAZ WILFREDY	230201	30	$1,861,267	$297,900	EPS037	30	$1,861,267	$74,500	CCF10	30	$1,954,717	$78,200	14-23	30	$1,861,267	$19,500	30	$0	$0
74	CC	93124198	ORJUELA CAMPOS JOSE ALBEIRO	25-14	30	$1,632,164	$261,200	EPS017	30	$1,632,164	$65,300	CCF10	30	$1,725,614	$69,100	14-23	30	$1,632,164	$39,800	30	$0	$0
75	CC	46680659	PACHECO MARTINEZ GLADYS JACKELINNE	25-14	3	$167,073	$26,800	EPS005	3	$167,073	$6,700	CCF10	3	$0	$0	14-23	3	$167,073	$0	3	$0	$0
76	CC	46680659	PACHECO MARTINEZ GLADYS JACKELINNE	25-14	3	$167,073	$26,800	EPS005	3	$167,073	$6,700	CCF10	3	$0	$0	14-23	3	$167,073	$0	3	$0	$0
77	CC	46680659	PACHECO MARTINEZ GLADYS JACKELINNE	25-14	22	$1,315,856	$210,600	EPS005	22	$1,315,856	$52,700	CCF10	22	$4,190,178	$167,700	14-23	22	$1,315,856	$6,900	22	$0	$0
78	CC	60423066	PARRA MARIÑO BRIGIDA	230301	30	$1,559,082	$249,500	EPS017	30	$1,559,082	$62,400	CCF10	30	$1,652,532	$66,200	14-23	30	$1,559,082	$38,000	30	$0	$0
79	CC	46683468	PATARROYO RAMIREZ ALICIA	25-14	30	$1,461,639	$233,900	EPS017	30	$1,461,639	$58,500	CCF10	30	$1,555,089	$62,300	14-23	30	$1,461,639	$15,300	30	$0	$0
80	CC	74130943	PATARROYO SANCHEZ JUAN FERNANDO	230201	30	$1,461,639	$233,900	CCFC55	30	$1,461,639	$58,500	CCF10	30	$1,555,089	$62,300	14-23	30	$1,461,639	$35,700	30	$0	$0
81	CC	74333939	PEREZ BECERRA MARCO AURELIO	25-14	30	$1,842,079	$294,800	EPS037	30	$1,842,079	$73,700	CCF10	30	$1,935,529	$77,500	14-23	30	$1,842,079	$44,900	30	$0	$0
82	CC	52442246	PIRABAN NIDIA ESPERANZA	25-14	30	$1,510,360	$241,700	EPS005	30	$1,510,360	$60,500	CCF10	30	$1,603,810	$64,200	14-23	30	$1,510,360	$36,800	30	$0	$0
83	CC	74360605	PUERTO CAMARGO IVAN HERNAN	230301	30	$1,794,349	$287,100	EPS005	30	$1,794,349	$71,800	CCF10	30	$1,887,799	$75,600	14-23	30	$1,794,349	$9,400	30	$0	$0
84	CC	4192111	RACHE MONGUA JORGE ANTONIO	231001	30	$1,501,284	$240,300	EPS017	30	$1,501,284	$60,100	CCF10	30	$1,594,734	$63,800	14-23	30	$1,501,284	$15,700	30	$0	$0
85	CC	1053609802	RICO VALDERRAMA LINA MARIA	25-14	10	$1,110,876	$177,800	EPS017	10	$1,110,876	$44,500	CCF10	10	$5,513,552	$220,600	14-23	10	$1,110,876	$5,800	10	$0	$0
86	CC	1053613345	RODRIGUEZ FONSECA DUVAN ALBENIO	230301	30	$1,882,374	$301,200	EPS017	30	$1,882,374	$75,300	CCF10	30	$1,975,824	$79,100	14-23	30	$1,882,374	$19,700	30	$0	$0
87	CC	1053615468	RODRIGUEZ IBAÑEZ DUVAN ANDRES	25-14	6	$368,416	$59,000	EPS017	6	$368,416	$14,800	CCF10	6	$0	$0	14-23	6	$368,416	$0	6	$0	$0
88	CC	1053615468	RODRIGUEZ IBAÑEZ DUVAN ANDRES	25-14	24	$1,523,552	$243,800	EPS017	24	$1,523,552	$61,000	CCF10	24	$1,966,728	$78,700	14-23	24	$1,523,552	$37,200	24	$0	$0
89	CC	74323446	RODRIGUEZ BARRERA ISRAEL	25-14	30	$1,461,639	$233,900	EPS017	30	$1,461,639	$58,500	CCF10	30	$1,555,089	$62,300	14-23	30	$1,461,639	$35,700	30	$0	$0
90	CC	1053606365	RODRIGUEZ DIAZ MARTHA LILIANA	25-14	30	$1,559,082	$249,500	ESSC24	30	$1,559,082	$62,400	CCF10	30	$1,652,532	$66,200	14-23	30	$1,559,082	$38,000	30	$0	$0
91	CC	1053613382	RODRIGUEZ ALFONSO MONICA JESENIA	25-14	30	$1,461,639	$233,900	ESSC24	30	$1,461,639	$58,500	CCF10	30	$1,555,089	$62,300	14-23	30	$1,461,639	$35,700	30	$0	$0
92	CC	74322563	RODRIGUEZ HURTADO PEDRO ANTONIO	230201	30	$1,548,199	$247,800	EPS037	30	$1,548,199	$62,000	CCF10	30	$1,641,649	$65,700	14-23	30	$1,548,199	$37,800	30	$0	$0
93	CC	1053605397	ROJAS ARAQUE MARIO ANDRES	231001	2	$115,931	$18,600	EPS017	2	$115,931	$4,700	CCF10	2	$0	$0	14-23	2	$115,931	$0	2	$0	$0
94	CC	1053605397	ROJAS ARAQUE MARIO ANDRES	231001	28	$1,883,872	$301,500	EPS017	28	$1,883,872	$75,400	CCF10	28	$1,971,092	$78,900	14-23	28	$1,883,872	$45,900	28	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
95	CC	74322163	ROMERO ESPITIA JAIME ANTONIO	25-14	2	$97,443	$15,600	EPS037	2	$97,443	$3,900	CCF10	2	$0	$0	14-23	2	$97,443	$0	2	$0	$0
96	CC	74322163	ROMERO ESPITIA JAIME ANTONIO	25-14	28	$1,364,197	$218,300	EPS037	28	$1,364,197	$54,600	CCF10	28	$1,451,416	$58,100	14-23	28	$1,364,197	$33,300	28	$0	$0
97	CC	8731958	ROSAS HIGUERA SANTOS MIGUEL	230301	30	$1,883,872	$301,500	EPS005	30	$1,883,872	$75,400	CCF10	30	$1,977,322	$79,100	14-23	30	$1,883,872	$45,900	30	$0	$0
98	CC	74323801	RUIZ RUIZ JOSE MIGUEL	25-14	30	$1,842,079	$294,800	EPS037	30	$1,842,079	$73,700	CCF10	30	$1,935,529	$77,500	14-23	30	$1,842,079	$19,300	30	$0	$0
99	CC	1053604273	RUIZ CAÑADULCE SANDRA PAOLA	230201	7	$429,818	$68,800	EPS037	7	$429,818	$17,200	CCF10	7	$0	$0	14-23	7	$429,818	$0	7	$0	$0
100	CC	1053604273	RUIZ CAÑADULCE SANDRA PAOLA	230201	23	$1,412,261	$226,000	EPS037	23	$1,412,261	$56,500	CCF10	23	$1,975,511	$79,100	14-23	23	$1,412,261	$34,500	23	$0	$0
101	CC	74324119	SALAMANCA GABRIEL	25-14	30	$1,842,079	$294,800	EPS017	30	$1,842,079	$73,700	CCF10	30	$1,935,529	$77,500	14-23	30	$1,842,079	$44,900	30	$0	$0
102	CC	74322662	SALAZAR ANDRADE HERNAN FRANCISCO	230301	20	$954,186	$152,700	EPS017	20	$954,186	$38,200	CCF10	20	$0	$0	14-23	20	$954,186	$0	20	$0	$0
103	CC	74322662	SALAZAR ANDRADE HERNAN FRANCISCO	230301	10	$500,428	$80,100	EPS017	10	$500,428	$20,100	CCF10	10	$531,578	$21,300	14-23	10	$500,428	$12,200	10	$0	$0
104	CC	46683220	SALCEDO RODRIGUEZ NINI GIOVANNA	230201	30	$1,510,360	$241,700	EPS041	30	$1,510,360	$60,500	CCF10	30	$1,603,810	$64,200	14-23	30	$1,510,360	$36,800	30	$0	$0
105	CC	74323507	SANA TORRES MIGUEL ANGEL	25-14	30	$1,451,405	$232,300	EPS002	30	$1,451,405	$58,100	CCF10	30	$0	$0	14-23	30	$1,451,405	$0	30	$0	$0
106	CC	74322535	SANCHEZ PULIDO HECTOR JULIO	25-14	30	$1,461,639	$233,900	EPS017	30	$1,461,639	$58,500	CCF10	30	$1,555,089	$62,300	14-23	30	$1,461,639	$35,700	30	$0	$0
107	CC	4042060	SIMBACICA GUTIERREZ JOSE RICARDO	25-14	30	$1,461,639	$233,900	EPS005	30	$1,461,639	$58,500	CCF10	30	$1,555,089	$62,300	14-23	30	$1,461,639	$35,700	30	$0	$0
108	CC	74130153	SUAREZ BOCIGA JOSE RICARDO	230301	30	$1,619,983	$259,200	EPS037	30	$1,619,983	$64,800	CCF10	30	$1,713,433	$68,600	14-23	30	$1,619,983	$39,500	30	$0	$0
109	CC	1049609304	SUAREZ MOLINA LEIDY LILIANA	230301	30	$3,131,529	$501,100	EPS005	30	$3,131,529	$125,300	CCF10	30	$3,131,529	$125,300	14-23	30	$3,131,529	$76,300	30	$0	$0
110	CC	1053610862	TIBATA JIMENEZ YOVANY	25-14	30	$2,010,936	$321,800	EPS017	30	$2,010,936	$80,500	CCF10	30	$2,104,386	$84,200	14-23	30	$2,010,936	$49,000	30	$0	$0
111	CC	1053611160	TORRES SUAREZ YEISON ROKNEY	25-14	30	$7,340,036	$1,248,100	EPS037	30	$7,340,036	$293,700	CCF10	30	$7,340,036	$293,700	14-23	30	$7,340,036	$38,400	30	$0	$0
112	CC	1053613769	URIBE CORREDOR EDWIN SEBASTIAN	230301	30	$1,842,079	$294,800	EPS017	30	$1,842,079	$73,700	CCF10	30	$1,935,529	$77,500	14-23	30	$1,842,079	$19,300	30	$0	$0
113	CC	74359861	VALDERRAMA CARLOS	25-14	30	$1,842,079	$294,800	EPS005	30	$1,842,079	$73,700	CCF10	30	$1,935,529	$77,500	14-23	30	$1,842,079	$44,900	30	$0	$0
114	CC	7226057	VALDERRAMA PEDRAZA JOSE TRINIDAD	230201	30	$1,461,639	$233,900	EPS002	30	$1,461,639	$58,500	CCF10	30	$1,555,089	$62,300	14-23	30	$1,461,639	$63,600	30	$0	$0
115	CC	23856977	VALDERRAMA LOPEZ MARIA AMALFI	25-14	30	$3,332,627	$533,300	EPS017	30	$3,332,627	$133,400	CCF10	30	$3,332,627	$133,400	14-23	30	$3,332,627	$34,800	30	$0	$0
116	CC	74322488	VARGAS SANDOVAL JOSE FERNANDO	25-14	30	$1,842,079	$294,800	EPS002	30	$1,842,079	$73,700	CCF10	30	$1,935,529	$77,500	14-23	30	$1,842,079	$44,900	30	$0	$0
117	CC	1053614462	VARGAS RODRIGUEZ MAICOL FERNANDO	230201	30	$1,632,164	$261,200	EPS037	30	$1,632,164	$65,300	CCF10	30	$1,725,614	$69,100	14-23	30	$1,632,164	$39,800	30	$0	$0
118	CC	74359989	VASQUEZ CAMARGO ANGEL ROSENDO	230301	30	$1,842,079	$294,800	EPS005	30	$1,842,079	$73,700	CCF10	30	$1,935,529	$77,500	14-23	30	$1,842,079	$44,900	30	$0	$0
119	CC	53083888	VILLAMIL TOVAR KAROL IVON	230301	30	$4,593,240	$735,000	EPS005	30	$4,593,240	$183,800	CCF10	30	$9,583,877	$383,400	14-23	30	$4,593,240	$24,000	30	$0	$0
Total			**Afiliados(99)**			$199,973,552	$32,074,900			$199,973,552	$8,003,700			$227,211,522	$9,017,900			$199,973,552	$3,551,200		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				99	$32,074,900	$0	$0	$32,074,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	8	$2,138,600	$0	$0	$2,138,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	50	$15,394,900	$0	$0	$15,394,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	22	$7,498,300	$0	$0	$7,498,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	19	$7,043,100	$0	$0	$7,043,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				99	$3,551,200	$0	$0	$3,551,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	99	$3,551,200	$0	$0	$3,551,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				99	$9,017,900	$0	$0	$9,017,900
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	99	$9,017,900	$0	$0	$9,017,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				99	$8,003,700	$0	$0	$8,003,700
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$58,500	$0	$0	$58,500
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	$120,900	$0	$0	$120,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	46	$3,652,000	$0	$0	$3,652,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	19	$1,500,700	$0	$0	$1,500,700
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	$181,400	$0	$0	$181,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	5	$387,400	$0	$0	$387,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	23	$2,102,800	$0	$0	$2,102,800
TOTAL				99	$52,647,700	$0	$0	$52,647,700

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900259348	5	RED VITAL PAIPA SA E.S.P	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PAIPA COMFABOY	KM 1 VIA FRANCISCO MONTAÑA	PAIPA-BOYACA	7853051	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-02	41649695	9499309637	E	2026/02/11	2026/02/06	BANCO POPULAR	0	$61,489,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ig	rt	te	tp	tp	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	svp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PAIPA COMFABOY (98 Afiliados)																					$235,335,690	$37,833,900			$235,335,690	$9,419,100			$247,087,632	$9,861,300			$235,335,690	$4,375,500		$0	$0		$61,489,800
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO D (98 Afiliados)																					$235,335,690	$37,833,900			$235,335,690	$9,419,100			$247,087,632	$9,861,300			$235,335,690	$4,375,500		$0	$0		$61,489,800
Ciudad: DUITAMA Depto: BOYACA (1 Afiliados)																					$1,891,452	$302,700			$1,891,452	$75,780			$1,984,902	$79,400			$1,891,452	$131,700		$0	$0		$589,500
1	CC	1052396359	BECERRA VALDERRAMA WILSON ARIEL								X								25-14	30	$1,891,452	$302,700	EPS037	30	$1,891,452	$75,780	CCF10	30	$1,984,902	$79,400	14-23	30	$1,891,452	6.960%	$131,700	30	$0	$0	SI	$589,500
Ciudad: PAIPA Depto: BOYACA (96 Afiliados)																					$230,430,376	$37,048,900			$230,430,376	$9,222,800			$242,088,869	$9,661,300			$230,430,376	$4,228,000		$0	$0		$60,161,000
2	CC	74323988	ALFONSO PUERTO JORGE ORLANDO								X								25-14	30	$2,416,807	$386,700	EPS037	30	$2,416,807	$96,700	CCF10	30	$2,510,257	$100,500	14-23	30	$2,416,807	2.436%	$58,900	30	$0	$0	SI	$642,800
3	CC	74130745	ALVARADO PEDRAZA ELKIN DARIO																25-14	30	$2,265,757	$362,600	EPS005	30	$2,265,757	$90,700	CCF10	30	$2,359,207	$94,400	14-23	30	$2,265,757	2.436%	$55,200	30	$0	$0	SI	$602,900
4	CC	1053613961	AMAYA REYES JULIAN ALFONSO	X															23030 1	7	$786,527	$125,900	EPS017	7	$786,527	$31,500	CCF10	7	$5,711,593	$228,500	14-23	7	$786,527	0.522%	$4,200	7	$0	$0	SI	$390,100
5	CC	52158241	AREVALO ZAMBRANO MIRYAM MAGNOLIA																25-14	30	$1,797,816	$287,700	EPS017	30	$1,797,816	$72,000	CCF10	30	$1,891,266	$75,700	14-23	30	$1,797,816	1.044%	$18,800	30	$0	$0	SI	$454,200
6	CC	1032436013	ARGUELLO FLOREZ JULIANA																23020 1	30	$4,099,131	$655,900	EPS065	30	$4,099,131	$164,000	CCF10	30	$4,099,131	$164,000	14-23	30	$4,099,131	0.522%	$21,400	30	$0	$0	SI	$1,005,300
7	CC	1053605825	ASAKURA GARCIA ANDREW MASAMI																23020 1	30	$3,851,731	$616,300	EPS017	30	$3,851,731	$154,100	CCF10	30	$3,851,731	$154,100	14-23	30	$3,851,731	1.044%	$40,300	30	$0	$0	SI	$964,800
8	CC	1053604212	AVENDAÑO PACHECO OSCAR IVAN								X								25-14	30	$2,675,878	$428,200	EPS017	30	$2,675,878	$107,100	CCF10	30	$2,769,328	$110,800	14-23	30	$2,675,878	2.436%	$65,200	30	$0	$0	SI	$711,300
9	CC	23857282	AVILA FONSECA MIREYA								X								25-14	30	$1,971,605	$315,500	EPS037	30	$1,971,605	$78,900	CCF10	30	$2,065,055	$82,700	14-23	30	$1,971,605	1.044%	$20,600	30	$0	$0	SI	$497,700
10	CC	1053608342	BARON ALBARRACIN MANUEL ANTONIO								X								25-14	30	$2,037,525	$326,100	EPS005	30	$2,037,525	$81,600	CCF10	30	$2,130,975	$85,300	14-23	30	$2,037,525	2.436%	$49,700	30	$0	$0	SI	$542,700
11	CC	74360014	BRIÑEZ PARDO JAMIX JEHID								X								23100 1	30	$2,334,988	$373,600	EPS037	30	$2,334,988	$93,400	CCF10	30	$2,428,438	$97,200	14-23	30	$2,334,988	4.350%	$101,600	30	$0	$0	SI	$665,800
12	CC	4157063	CAMARGO AVELLA JAVIER								X								25-14	30	$1,917,670	$306,900	EPS017	30	$1,917,670	$76,800	CCF10	30	$2,011,120	$80,500	14-23	30	$1,917,670	2.436%	$46,800	30	$0	$0	SI	$511,000
13	CC	74130567	CAMARGO CAMARGO JAVIER ANTONIO									X							25-14	1	$75,525	$12,100	EPS005	1	$75,525	$3,100	CCF10	1	$0	$0	14-23	1	$75,525	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$15,200
14	CC	74130567	CAMARGO CAMARGO JAVIER ANTONIO																25-14	29	$2,190,232	$350,500	EPS005	29	$2,190,232	$87,700	CCF10	29	$2,280,567	$91,300	14-23	29	$2,190,232	1.044%	$22,900	29	$0	$0	SI	$552,400
15	CC	4192865	CAMARGO AVELLA LUIS ALBERTO								X								25-14	30	$2,475,811	$396,200	EPS017	30	$2,475,811	$99,100	CCF10	30	$2,569,261	$102,800	14-23	30	$2,475,811	2.436%	$60,400	30	$0	$0	SI	$658,500
16	CC	23857845	CAMARGO MOLANO MARTHA INES	X															23030 1	9	$1,229,740	$196,800	EPS017	9	$1,229,740	$49,200	CCF10	9	$1,229,739	$49,200	14-23	9	$1,229,740	0.522%	$6,500	9	$0	$0	SI	$301,700
17	CC	74322901	CAMARGO SALAMANCA NORBERTO																25-14	30	$1,846,579	$295,500	EPS005	30	$1,846,579	$73,900	CCF10	30	$1,940,029	$77,700	14-23	30	$1,846,579	2.436%	$45,000	30	$0	$0	SI	$492,100
18	CC	74130492	CAMARGO AVELLA SAUL									X							25-14	4	$236,581	$37,900	EPS037	4	$236,581	$9,500	CCF10	4	$0	$0	14-23	4	$236,581	0.000%	$0	4	$0	$0	SI	$47,400
19	CC	74130492	CAMARGO AVELLA SAUL															X	25-14	5	$299,636	$48,000	EPS037	5	$299,636	$12,000	CCF10	5	$0	$0	14-23	5	$299,636	0.000%	$0	5	$0	$0	SI	$60,000
20	CC	74130492	CAMARGO AVELLA SAUL								X								25-14	21	$1,294,053	$207,100	EPS037	21	$1,294,053	$51,800	CCF10	21	$1,359,468	$54,400	14-23	21	$1,294,053	2.436%	$31,600	21	$0	$0	SI	$344,900
21	CC	74360447	CANADULCE URIEL																25-14	30	$2,265,757	$362,600	EPS037	30	$2,265,757	$90,700	CCF10	30	$2,359,207	$94,400	14-23	30	$2,265,757	2.436%	$55,200	30	$0	$0	SI	$602,900

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

| | | |

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				98	$37,833,900	$0	$0	$37,833,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	8	$2,305,500	$0	$0	$2,305,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	47	$18,057,000	$0	$0	$18,057,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	24	$9,155,600	$0	$0	$9,155,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	19	$8,315,800	$0	$0	$8,315,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				98	$4,375,500	$0	$0	$4,375,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	98	$4,375,500	$0	$0	$4,375,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				98	$9,861,300	$0	$0	$9,861,300
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	98	$9,861,300	$0	$0	$9,861,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				98	$9,419,100	$0	$0	$9,419,100
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$73,400	$0	$0	$73,400
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	$155,600	$0	$0	$155,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	45	$4,177,500	$0	$0	$4,177,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	19	$2,012,800	$0	$0	$2,012,800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	4	$309,200	$0	$0	$309,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	5	$478,000	$0	$0	$478,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	22	$2,212,600	$0	$0	$2,212,600
TOTAL				98	$61,489,800	$0	$0	$61,489,800

PAIPA S.A. E.S.P. Red Vital	RED VITAL PAIPA S.A. E.S.P. GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y DIRECCIÓN MEMORIA DE CANTIDADES EJECUTADAS	CÓDIGO: PE-GPD-FO-14 FECHA: 02/02/2026 VERSIÓN: 01 PAGINA: ENCABEZADO

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 039 DE 2025

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y OPERATIVOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE DIFERENTES TRAMOS DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN LOS SECTORES LLANO GRANDE, TOIBITA, PABLO SOLANO, BONZA Y CANAL CARTAGENA, UBICADOS EN LAS ZONAS RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO DE PAIPA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

INFORME MENSUAL N° 02
(25 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 24 DE ENERO DE 2026)

ÍTEM	1.1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	UNIDAD:	km




LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				CANTIDAD	TOTAL
	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	UNIDAD:		
PZ5 - PZ6	25.70			km	1.00	0.03
PZ6 - PZ7	7.40			km	1.00	0.01
PZ7 - FINAL	57.02			km	1.00	0.06

OBSERVACIONES:

TOTAL ÍTEM: 0.09

ÍTEM	1.2.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	UNIDAD:	m3



LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				CANTIDAD	TOTAL
	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	UNIDAD:		
DOMICILIARIA 9	6.00	0.40	1.20	m3	1.00	2.88
DOMICILIARIA 10	4.60	0.40	1.20	m3	1.00	2.21
DOMICILIARIA 11	6.00	0.40	1.20	m3	1.00	2.88
DOMICILIARIA 12	6.00	0.40	1.20	m3	1.00	2.88
DOMICILIARIA 13	4.20	0.40	1.20	m3	1.00	2.02
DOMICILIARIA 14	4.40	0.40	1.20	m3	1.00	2.11

OBSERVACIONES:

TOTAL ÍTEM: 14.98

ÍTEM	1.2.2	EXCAVACIONES MECÁNICAS Y CORTES EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	UNIDAD:	m3




LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				CANTIDAD	TOTAL
	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	UNIDAD:		
PZ5 - PZ6	25.70	0.80	2.02	m3	1.00	41.53
PZ6 - PZ7	7.40	0.80	1.98	m3	1.00	11.72
PZ7 - FINAL	57.02	0.80	1.47	m3	1.00	67.06
PZ7	2.00	2.00	1.80	m3	1.00	7.20

OBSERVACIONES:

TOTAL ÍTEM: 127.51

ÍTEM	1.3.1	TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=6"	UNIDAD:	m





LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				CANTIDAD	TOTAL
	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	UNIDAD:		
DOMICILIARIA 9	6.00			m	1	6.00
DOMICILIARIA 10	4.60			m	1	4.60
DOMICILIARIA 11	6.00			m	1	6.00
DOMICILIARIA 12	6.00			m	1	6.00
DOMICILIARIA 13	4.20			m	1	4.20
DOMICILIARIA 14	4.40			m	1	4.40

OBSERVACIONES:

TOTAL ÍTEM: 31.20

ÍTEM	1.3.3	TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=10"	UNIDAD:	m




LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				CANTIDAD	TOTAL
	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	UNIDAD:		
PZ5 - PZ6	25.70			m	1.00	25.70

OBSERVACIONES:

TOTAL ÍTEM: 25.70

PAIPA S.A. E.S.P. Red Vital	RED VITAL PAIPA S.A. E.S.P. GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y DIRECCIÓN MEMORIA DE CANTIDADES EJECUTADAS	CÓDIGO: PE-GPD-FO-14 FECHA: 02/02/2026 VERSIÓN: 01 PAGINA: ENCABEZADO

ÍTEM 1.3.4 — TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=12" — UNIDAD: m



LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				CANTIDAD	TOTAL
	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	UNIDAD:		
PZ6 - PZ7	7.40			m	1.00	7.40
PZ7 - FINAL	57.02			m	1.00	57.02

OBSERVACIONES:

TOTAL ÍTEM: 64.42

ÍTEM 1.4.1 — RELLENO EN ARENA DE PEÑA COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA. — UNIDAD: m3



LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				CANTIDAD	TOTAL
	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	UNIDAD:		
PZ5 - PZ6	25.70	0.80	0.55	m3	1.00	10.05
PZ6 - PZ7	7.40	0.80	0.62	m3	1.00	3.06
PZ7 - FINAL	57.02	0.80	0.62	m3	1.00	23.61
DOMICILIARIA 9	6.00	0.40	0.46	m3	1.00	0.98
DOMICILIARIA 10	4.60	0.40	0.46	m3	1.00	0.75
DOMICILIARIA 11	6.00	0.40	0.46	m3	1.00	0.98
DOMICILIARIA 12	6.00	0.40	0.46	m3	1.00	0.98
DOMICILIARIA 13	4.20	0.40	0.46	m3	1.00	0.69
DOMICILIARIA 14	4.40	0.40	0.46	m3	1.00	0.72

OBSERVACIONES:

TOTAL ÍTEM: 41.83

ÍTEM 1.4.2 — RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O VIBRO COMPACTADOR. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) — UNIDAD: m3



LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				CANTIDAD	TOTAL
	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	UNIDAD:		
PZ5 - PZ6	25.70	0.80	1.47	m3	1.00	30.22
PZ6 - PZ7	7.40	0.80	1.37	m3	1.00	8.08
PZ7 - FINAL	57.02	0.80	0.86	m3	1.00	39.00
PZ7	2.00	2.00	1.80	m3	1.00	1.23
DOMICILIARIA 9	6.00	0.40	0.74	m3	1.00	1.78
DOMICILIARIA 10	4.60	0.40	0.74	m3	1.00	1.36
DOMICILIARIA 11	6.00	0.40	0.74	m3	1.00	1.78
DOMICILIARIA 12	6.00	0.40	0.74	m3	1.00	1.78
DOMICILIARIA 13	4.20	0.40	0.74	m3	1.00	1.24
DOMICILIARIA 14	4.40	0.40	0.74	m3	1.00	1.30

OBSERVACIONES:

TOTAL ÍTEM: 87.77

ÍTEM 1.4.3 — ACARREO DE MATERIALES PÉTREOS, TIERRA Y VARIOS (DESPUÉS DE 5 KM.). — UNIDAD: m3-km



LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				CANTIDAD	TOTAL
	VOLUMEN (m^3)	DISTANCIA (km)	EXPANSIÓN (%)	UNIDAD:		
MATERIAL AFIRMADO TOTAL	87.77	5.00	1.30	m3-km	1.00	570.50

OBSERVACIONES:

TOTAL ÍTEM: 570.50

ÍTEM 1.5.3 — POZO DE INSPECCIÓN, DIÁMETRO INTERIOR 1.2 M. (1.50 M. < H < 2.00 M.). (NO INCLUYE ARO Y TAPA). — UNIDAD: und



LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				CANTIDAD	TOTAL
	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	UNIDAD:		
PZ6		1.20	1.80	und	1.00	1.00

OBSERVACIONES:

TOTAL ÍTEM: 1.00

PAIPA S.A. E.S.P. Red Vital	RED VITAL PAIPA S.A. E.S.P. GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y DIRECCIÓN MEMORIA DE CANTIDADES EJECUTADAS	CÓDIGO: PE-GPD-FO-14 FECHA: 02/02/2025 VERSIÓN: 01 PAGINA: ENCABEZADO

ÍTEM	1.6.2	CONEXIÓN DOMICILIARIA PARA ALCANTARILLADO DE 250 MM. X 160 MM. KIT SILLA YEE 10" x 6"	UNIDAD:	und





LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				CANTIDAD	TOTAL
	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	UNIDAD:		
DOMICILIARIA 9				und	1.00	1.00
DOMICILIARIA 10				und	1.00	1.00
DOMICILIARIA 11				und	1.00	1.00
DOMICILIARIA 12				und	1.00	1.00
					TOTAL ÍTEM:	4.00

OBSERVACIONES:

MARÍA AMALFI VALDERRAMA LÓPEZ
DIRECTORA DE OBRA

R/L YERSON ROKNEY TORRES SUAREZ
CONTRATISTA

Elaboro:	David Felipe Puentes Fuentes - Apoyo Planeación y Proyectos - Red Vital Paipa S.A. E.S.P.	Vo. Bo.	DFP

PAIPA S.A. E.S.P. Red Vital	RED VITAL PAIPA S.A. E.S.P.	CÓDIGO	PE-GPD-FO-14
	GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y DIRECCIÓN	FECHA	02/02/2026
	SABANA DE CANTIDADES DE OBRA CONTRATADAS Y EJECUTADAS	VERSIÓN	01
		PÁGINA	ENCABEZADO

CONTRATO	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 039 DE 2025
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y OPERATIVOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE DIFERENTES TRAMOS DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN LOS SECTORES LLANO GRANDE, TOIBITA, PABLO SOLANO, BONZA Y CANAL CARTAGENA, UBICADOS EN LAS ZONAS RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO DE PAIPA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.
CONTRATISTA:	RED VITAL PAIPA S.A. E.S.P.
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	JORGE EDWIN LÓPEZ TORRES

			CANTIDADES CONTRACTUALES INICIALES							CANTIDADES EJECUTADAS INFORME 2										
ITEM	APUS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	SUMINISTRO/TRANSPORTE (MUNICIPIO DE PAIPA)		OBRA CIVIL (RED VITAL)		VALOR TOTAL	SUMINISTRO/TRANSPORTE (MUNICIPIO DE PAIPA)		OBRA CIVIL (RED VITAL)			VALOR TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA ANTERIORES INFORMES	VALOR ANTERIORES INFORMES	CANTIDAD TOTAL ACUMULADO	VALOR ACUMULADO	PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO
					VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL		CANTIDAD SUMINISTRADA	VALOR EJECUTADO	CANTIDAD EJECUTADA	PORCENTAJE DE AVANCE	VALOR EJECUTADO						
1.1		PRELIMINARES																		
1.1.1	3.01.08	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	km	6.06	$ -	$ -	$ 4,049,009.34	$ 24,617,922.07	$ 24,617,922.07	0.09	$ -	0.09	1.48%	$ 364,895.91	$ 364,895.91	6.15	$ 893,341.54	0.24	$ 966,237.45	3.93%
		SUB TOTAL PRELIMINARES							$ 24,617,922.07		$ -			$ 364,895.91	$ 364,895.91		$ 893,341.54		$ 966,237.45	
1.2		EXCAVACIONES																	$ -	
1.2.1	2.03.10	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	m^3	463.73	$ -	$ -	$ 70,577.63	$ 32,726,964.36	$ 32,726,964.36	0.00	$ -	14.96	3.23%	$ 1,056,870.59	$ 1,056,870.59	23.28	$ 1,642,803.31	38.25	$ 2,699,773.90	8.25%
1.2.2	2.02.15	EXCAVACIONES MECÁNICAS Y CORTES EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	m^3	5,117.52	$ -	$ -	$ 26,955.15	$ 137,948,214.74	$ 137,948,214.74	0.00	$ -	127.51	2.49%	$ 3,437,005.89	$ 3,437,005.89	234.67	$ 6,326,461.54	362.17	$ 9,763,467.43	7.06%
		SUB TOTAL EXCAVACIÓN							$ 170,675,179.10		$ -			$ 4,493,876.48	$ 4,493,876.48		$ 7,968,264.85		$ 12,462,241.33	
1.3		TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC						$ -											$ -	
1.3.1	5.01.25	TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=8"	m	753.00	$ 51,050.46	$ 38,448,481.33	$ 22,083.87	$ 16,638,684.11	$ 55,089,165.31	0.00	$ -	31.20	4.14%	$ 689,328.74	$ 689,328.74	45.50	$ 1,311,633.49	76.70	$ 2,000,962.23	92.19%
1.3.2	5.01.26	TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=6"	m	274.00	$ 71,734.31	$ 19,655,200.94	$ 29,456.49	$ 8,071,626.26	$ 27,726,827.20	0.00	$ -	0.00	0.00%	$ -	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00%
1.3.3	5.01.27	TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=10"	m	1,915.13	$ 115,744.76	$ 221,665,796.24	$ 36,625.11	$ 70,120,695.38	$ 292,186,894.60	25.70	$ 2,974,640.33	25.70	1.34%	$ 946,353.93	$ 3,920,994.26	132.50	$ 20,215,942.78	158.20	$ 24,136,937.03	8.26%
1.3.4	5.01.28	TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=12"	m	1,899.88	$ 168,375.31	$ 319,869,883.43	$ 44,187.74	$ 83,942,742.67	$ 403,812,626.06	64.42	$ 10,846,737.47	64.42	3.39%	$ 2,846,574.21	$ 13,693,311.68	0.00	$ -	64.42	$ 13,693,311.68	3.39%
1.3.5	5.01.29	TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=14"	m	983.39	$ 240,390.43	$ 236,397,544.95	$ 51,552.35	$ 50,695,865.47	$ 287,093,410.42	0.00	$ -	0.00	0.00%	$ -	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00%
1.3.6	5.01.30	TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=16"	m	62.89	$ 292,985.76	$ 18,452,444.61	$ 55,234.66	$ 3,475,055.66	$ 21,931,369.87	0.00	$ -	0.00	0.00%	$ -	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00%
1.3.7	5.01.31	TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=18"	m	63.64	$ 388,997.63	$ 25,361,254.57	$ 58,916.98	$ 3,749,476.61	$ 29,140,731.18	0.00	$ -	0.00	0.00%	$ -	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00%
		SUB TOTAL TUBERÍAS DE ALCANTARILLADO PVC							$ 1,116,967,953.47		$ 13,821,377.80			$ 4,482,256.88	$ 18,303,634.68		$ 31,526,676.26		$ 39,830,510.94	
1.4		RELLENOS																	$ -	
1.4.1	4.01.04	RELLENO EN ARENA DE PEÑA COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	m^3	994.05	$ 92,556.50	$ 92,002,441.25	$ 31,411.56	$ 31,224,132.55	$ 123,626,573.81	41.83	$ 3,864,582.72	41.83	4.21%	$ 1,214,079.29	$ 5,198,662.01	65.28	$ 8,112,271.71	107.11	$ 13,310,933.72	19.78%
1.4.2	2.03.15	RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O VIBRO COMPACTADOR. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	m^3	2,083.31	$ 77,039.20	$ 160,477,841.42	$ 29,857.33	$ 62,222,928.77	$ 222,700,770.19	57.77	$ 6,780,040.29	57.77	4.21%	$ 2,621,455.41	$ 9,382,395.70	171.97	$ 18,353,139.95	259.74	$ 27,735,535.66	12.47%
1.4.3	2.01.92	ACARREO DE MATERIALES PÉTREOS, TIERRA Y VARIOS (DESPUÉS DE 5 KM.)	m^3-km	13,541.52	$ 2,127.00	$ 28,802,612.36	$ -	$ -	$ 28,802,612.36	570.50	$ 1,213,464.07	0.00	0.00%	$ -	$ 1,213,464.07	0.00	$ 2,377,967.59	0.00	$ 3,591,431.65	0.00%
1.4.4	3.03.16	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	m^3	1,965.84	$ -	$ -	$ 31,742.33	$ 62,393,993.54	$ 62,393,993.54	0.00	$ -	0.00	0.00%	$ -	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00%
		SUB TOTAL RELLENOS			#¡DIV/0!				$ 437,424,149.70		$ 11,858,087.08			$ 3,835,534.70	$ 15,754,521.78		$ 28,872,879.24		$ 44,667,501.02	
1.5		POZOS DE INSPECCIÓN																	$ -	
1.5.1	5.01.06	POZO DE INSPECCIÓN, DIÁMETRO INTERIOR 1.0 M, (H <= 1.0 M.), (NO INCLUYE ARO Y TAPA)	und	33.00	$ 630,499.23	$ 20,806,474.59	$ 490,974.82	$ 16,202,169.06	$ 37,008,643.65	0.00	$ -	0.00	0.00%	$ -	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00%
1.5.2	5.01.07	POZO DE INSPECCIÓN, DIÁMETRO INTERIOR 1.2 M, (1.00 M. < H < 1.50 M.), (NO INCLUYE ARO Y TAPA)	und	15.00	$ 1,136,353.61	$ 17,045,445.15	$ 583,032.61	$ 8,745,489.15	$ 25,790,934.30	0.00	$ -	0.00	0.00%	$ -	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00%
1.5.3	5.01.06	POZO DE INSPECCIÓN, DIÁMETRO INTERIOR 1.2 M, (1.50 M. < H < 2.00 M.), (NO INCLUYE ARO Y TAPA)	und	9.00	$ 1,477,124.94	$ 13,294,124.45	$ 675,090.38	$ 6,075,813.42	$ 19,369,937.88	1.00	$ 1,477,124.94	1.00	11.11%	$ 675,090.38	$ 2,152,215.32	2.00	$ 4,304,430.64	3.00	$ 6,456,645.96	33.33%
1.5.4	5.01.09	POZO DE INSPECCIÓN, DIÁMETRO INTERIOR 1.2 M, (2.00 M. < H < 2.50 M.), (NO INCLUYE ARO Y TAPA)	und	4.00	$ 1,810,865.18	$ 7,243,460.72	$ 797,834.08	$ 3,191,336.36	$ 10,434,797.08	0.00	$ -	0.00	0.00%	$ -	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00%
1.5.5	5.01.10	POZO DE INSPECCIÓN, DIÁMETRO INTERIOR 1.5 M, (2.50 M. < H < 3.00 M.), (NO INCLUYE ARO Y TAPA)	und	2.00	$ 3,946,045.48	$ 6,098,090.96	$ 926,577.80	$ 1,841,155.60	$ 7,939,246.56	0.00	$ -	0.00	0.00%	$ -	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00%
1.5.6	5.01.01	ARO Y TAPA POZOS INSP EN HF	und	82.00	$ 444,426.00	$ 36,443,096.00	$ 14,612.35	$ 1,198,212.70	$ 37,641,308.70	0.00	$ -	0.00	0.00%	$ -	$ -	1.00	$ 459,040.35	1.00	$ 459,040.35	1.22%
		SUB TOTAL POZOS							$ 138,184,868.17		$ 1,477,124.94			$ 675,090.38	$ 2,152,215.32		$ 4,763,470.99		$ 6,915,686.31	
1.6		CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADO																	$ -	
1.6.1	5.02.04	CONEXIÓN DOMICILIARIA PARA ALCANTARILLADO DE 200 MM. X 160 MM. KIT SILLA YEE 8" x 6"	und	39.00	$ 217,549.30	$ 8,484,422.70	$ 165,704.06	$ 6,462,458.06	$ 14,946,879.70	0.00	$ -	0.00	0.00%	$ -	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00%
1.6.2	5.02.05	CONEXIÓN DOMICILIARIA PARA ALCANTARILLADO DE 250 MM. X 160 MM. KIT SILLA YEE 10" x 6"	und	57.00	$ 245,774.30	$ 14,009,135.10	$ 165,704.06	$ 9,445,128.00	$ 23,454,263.10	0.00	$ -	4.00	7.02%	$ 662,816.00	$ 662,816.00	6.00	$ 994,224.00	10.00	$ 1,657,040.00	17.54%
1.6.3	5.02.06	CONEXIÓN DOMICILIARIA PARA ALCANTARILLADO DE 315 MM. X 160 MM. KIT SILLA YEE 12" x 6"	und	64.00	$ 365,421.30	$ 23,386,963.20	$ 165,704.06	$ 10,605,059.00	$ 33,992,819.20	0.00	$ -	0.00	0.00%	$ -	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00%
1.6.4	ITEM REFERENCIA	CONEXIÓN DOMICILIARIA PARA ALCANTARILLADO DE 350 MM. X 160 MM. KIT SILLA YEE 14" x 6"	und	56.00	$ 373,336.30	$ 21,013,544.80	$ 165,704.06	$ 9,279,424.00	$ 30,292,768.80	0.00	$ -	0.00	0.00%	$ -	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00%
1.6.5	ITEM REFERENCIA	CONEXIÓN DOMICILIARIA PARA ALCANTARILLADO DE 400 MM. X 160 MM.	und	0.00	$ 416,237.30	$ -	$ 165,704.06	$ -	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00%	$ -	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00%
1.6.6	ITEM REFERENCIA	CONEXIÓN DOMICILIARIA PARA ALCANTARILLADO DE 450 MM. X 160 MM.	und	0.00	$ 446,077.30	$ -	$ 165,704.06	$ -	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00%	$ -	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00%
		SUB TOTAL SUMINISTRO CONEXIÓN DOMICILIARIA PARA ALCANTARILLADO							$ 102,525,329.80		$ -			$ 662,816.00	$ 662,816.00		$ 994,224.00		$ 1,657,040.00	
1.7		CAJAS DE INSPECCIÓN EN LADRILLO DE 0.40 X 0.40 x 0.40 M. (NO INCLUYE TAPA)																	$ -	
1.7.1	ITEM REFERENCIA	CAJAS DE INSPECCIÓN DE 0.40 X 0.40 X 0.40 MTS LADRILLO	und	215.00	$ -	$ -	$ 359,048.46	$ 77,554,467.09	$ 77,554,467.09	0.00	$ -	0.00	0.00%	$ -	$ -	1.00	$ 359,048.46	1.00	$ 359,048.46	0.46%
1.7.2	5.03.03	CONCRETO SIMPLE DE 21 Mpa - (3000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA TAPAS	m^3	5.18	$ -	$ -	$ 1,013,578.64	$ 5,252,365.54	$ 5,252,365.54	0.00	$ -	0.00	0.00%	$ -	$ -	0.02	$ 24,082.63	0.02	$ 24,082.63	0.46%
		SUB TOTAL CAJAS DE INSPECCIÓN							$ 82,806,832.63		$ -			$ -	$ -		$ 383,131.09		$ 383,131.09	
1.8		SUMIDEROS																	$ -	
1.8.1	5.02.14	SUMIDERO LATERAL EN LADRILLO, DIMENSIONES INTERNAS 0.40 X 0.80 M. H = 1.10 M. (INCLUYE REJILLA PLÁSTICA TRÁFICO PESADO)	und	12.00	$ -	$ -	$ 1,732,259.52	$ 20,787,114.30	$ 20,787,114.30	0.00	$ -	0.00	0.00%	$ -	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00%
		SUB TOTAL CONSTRUCCIÓN DE SUMIDEROS							$ 20,787,114.30		$ -			$ -	$ -		$ -		$ -	
					APORTE PAIPA	$ 1,329,278,269.44	APORTE RED VITAL	$ 764,870,798.79	$ 2,094,149,049.23	APORTE PAIPA	$ 27,157,489.83	APORTE RED VITAL	1.47%	$ 14,614,579.35	$ 41,772,069.18		$ 85,112,287.87		$ 106,884,948.15	4.05%

VoBo DTP
