	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL	OBJETO:	RVLC0783 ADECUAR SALAS DE ENTRENAMIENTO OPERACIONAL PARA EL PERSONAL DE CONTROLADORES AEREOS REGIONAL VALLE.	VALOR INICIAL	CANTIDADES DE OBRA
				$ 105.673.174	ACTA DE COBRO PARCIAL
	DESARROLLO AEROPORTUARIO REGIONAL VALLE	CONTRATO No.20001103-H4		INCLUYE IVA SOBRE UTILIDAD	FECHA: 21 DE DICIEMBRE DE 2020
		AEROPUERTO		VALOR FINAL	CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2020
		AEROPUERTO MATECAÑA - SANTANA		$ 130.363.376	
		PLAZO INICIAL: CUARENTA Y CINCO (45) DIAS PLAZO FINAL: CUARENTA Y CINCO (45) DIAS		INCLUYE IVA SOBRE UTILIDAD	SUPERVISOR: MILTON CESAR SANCHEZ PEREZ APOYO A SUPERVISION: JUAN DAVID RODRIGUEZ.

ITEMS	DESCRIPCIÓN	ACTA No 01 DE MODIFICACION DE CANTIDADES (CONDICIONES ACTUALZADAS)				ACTA DE COBRO PARCIAL No.1		EJECUTADO ACOMULADO		
		UND.	CANT.	Vr.UNIT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	% ACUM
1	AEROPUERTO MATECAÑA DE PEREIRA									
	Preliminares.									
1,01	LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON.	M2	31,54	$ 3.400,00	$ 107.236,00	31,54	$ 107.236,00	31,54	$ 107.236,00	100%
1,02	CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-SINB	ML	48,70	$ 18.600,00	$ 905.820,00	48,70	$ 905.820,00	48,70	$ 905.820,00	100%
1,03	RETIRO DE ARBUSTO Y POSTERIOR TRANSPLANTE	UND	2,00	$ 11.700,00	$ 23.400,00	2,00	$ 23.400,00	2,00	$ 23.400,00	100%
1,04	EXCAVACION DE TIERRA A MANO (VIGAS CIMIENTO)	M3	53,22	$ 11.900,00	$ 633.318,00	53,22	$ 633.318,00	53,22	$ 633.318,00	100%
1,05	DESCAPOTE MAQUINA MAS RETIRO	M2	57,88	$ 1.400,00	$ 81.032,00	57,88	$ 81.032,00	57,88	$ 81.032,00	100%
1,06	EXCAVACION A MAQUINA SIN RETIRO	M3	0,00	$ 2.500,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	N/A
1,07	RETIRO SOBRANTES MAQUINA <=10KM.	M3	13,07	$ 15.800,00	$ 206.506,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
2	Rellenos.									
2,01	RELLENO ROCA MUERTA COMPAC-CILINDRO +ACA	M3	31,50	$ 31.600,00	$ 995.400,00	31,50	$ 995.400,00	31,50	$ 995.400,00	100%
2,02	RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO-RANA	M3	6,63	$ 12.900,00	$ 85.527,00	6,63	$ 85.527,00	6,63	$ 85.527,00	100%
2,03	CONFIGURACION-NIVELACION TERRENO	M2	0,00	$ 700,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	N/A
2,04	CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95	M2	0,00	$ 2.400,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	N/A
3	Cimentacion y Estructura									
3,01	SOLADO ESPESOR E=0.05M 3000 PSI 210 MPA	M2	27,84	$ 18.700,00	$ 520.608,00	27,84	$ 520.608,00	27,84	$ 520.608,00	100%
3,02	CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI RELAC.60C/40P	M3	3,52	$ 261.100,00	$ 919.072,00	3,52	$ 919.072,00	3,52	$ 919.072,00	100%
3,03	ZAPATA CONCRETO 3000 PSI INC. FORMALETA	M3	2,05	$ 327.600,00	$ 671.580,00	2,05	$ 671.580,00	2,05	$ 671.580,00	100%
3,04	PEDESTAL CONCRETO	M3	0,00	$ 366.300,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	N/A
3,05	VIGA CIMIENTO ENLACE H=20-40 CMS	M3	2,64	$ 497.100,00	$ 1.312.344,00	2,64	$ 1.312.344,00	2,64	$ 1.312.344,00	100%
3,06	COLUMNA CONCRETO 4000 PSI	M3	2,12	$ 803.700,00	$ 1.703.844,00	2,12	$ 1.703.844,00	2,12	$ 1.703.844,00	100%
3,07	VIGA CONCRETO AEREA 3000 PSI	M3	2,64	$ 698.100,00	$ 1.842.984,00	2,64	$ 1.842.984,00	2,64	$ 1.842.984,00	100%
3,08	DESCOLGADO CONCRETO 45 CMS	ML	0,00	$ 65.900,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	N/A
3,09	VIGA CONCR.AMARRE MURO 10-12x20CM	ML	29,40	$ 27.200,00	$ 799.680,00	29,40	$ 799.680,00	29,40	$ 799.680,00	100%
3,10	COLUMNA AMARRE MURO CULATA E=15CM-20CM	ML	0,00	$ 34.600,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	N/A
3,11	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KG	1042,00	$ 3.300,00	$ 3.438.600,00	1042,00	$ 3.438.600,00	1042,00	$ 3.438.600,00	100%
3,12	MALLA ELECTROSOLDADA M-0.84	KG	76,98	$ 4.700,00	$ 361.806,00	76,98	$ 361.806,00	76,98	$ 361.806,00	100%
3,13	VIGA CANAL AEREA CONCRETO 3000 PSI	M3	0,00	$ 748.500,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	N/A
3,14	ESTRUCTURA METALICA PERFIL IPE	KG	0,00	$ 6.000,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	N/A
3,15	PERFIL ABIERTO HR C160x 60mm -2.0MM C.14	ML	0,00	$ 34.500,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	N/A
3,16	PLASTIFICANTE IMPERMEABILIZANTE.	KG	20,00	$ 11.000,00	$ 220.000,00	20,00	$ 220.000,00	20,00	$ 220.000,00	100%
4	Cubierta.									
4,01	TEJA ALUMINIO-POLIURETANO-ALUM.E=1 1C	M2	28,00	$ 131.800,00	$ 3.690.400,00	28,00	$ 3.690.400,00	28,00	$ 3.690.400,00	100%
4,02	IMPERM.MANTO 800XT. 4mm.	M2	0,00	$ 28.000,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	N/A
4,03	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4	ML	5,40	$ 18.000,00	$ 97.200,00	5,40	$ 97.200,00	5,40	$ 97.200,00	100%
4,04	TUBERIA PVC 4 SANITARIA	ML	17,80	$ 27.600,00	$ 491.280,00	17,80	$ 491.280,00	17,80	$ 491.280,00	100%

Conclusión

ITEMS	DESCRIPCIÓN	ACTA No 01 DE MODIFICACION DE CANTIDADES (CONDICIONES ACTUALZADAS)				ACTA DE COBRO PARCIAL No.1		EJECUTADO ACOMULADO		
		UND.	CANT.	Vr.UNIT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	% ACUM
4,05	CODO SANITARIO PVC 45 CE-4"	UND	0,00	$ 14.300,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	N/A
4,06	CODO SANITARIO PVC 90 CE-4"	UND	2,00	$ 9.400,00	$ 18.800,00	2,00	$ 18.800,00	2,00	$ 18.800,00	100%
4,07	ABRAZADERA SANITARIA 4"	UND	8,00	$ 17.200,00	$ 137.600,00	8,00	$ 137.600,00	8,00	$ 137.600,00	100%
4,08	CAJA INSPECCION 60x60,HAST 1.0M CONC+EXC	UND	3,00	$ 188.400,00	$ 565.200,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
4,09	TAPA CAJA MARCO ANGULO 51X51 - 60X60	UND	3,00	$ 103.700,00	$ 311.100,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
4,1	C.F.PANEL YESO 12.7MM S.JUNTA+VINILO	M2	0,00	$ 34.200,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	N/A
4,11	AISLAMIENTO TERMICO FRESCASA	M2	0,00	$ 17.600,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	N/A
4,12	LAMINA POLICARBONATO ALVEOLAR 4MM	M2	0,00	$ 40.700,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	N/A
4,13	REMATE SUPERIOR CONTRA MURO TEJA AJOVER	ML	29,40	$ 53.000,00	$ 1.558.200,00	29,40	$ 1.558.200,00	29,40	$ 1.558.200,00	100%
4,14	SOLAPA LAMINA GALVANIZADA	ML	0,00	$ 19.200,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	N/A
4,15	CONECTOR H LAMINA POLICARBONATO A=4- 6MM	ML	0,00	$ 14.700,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	N/A
4,16	CONECTOR BASE+TAPA LAMINA POLICARBONATO	ML	0,00	$ 28.600,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	N/A
4,17	TUBO ESTRUCTURAL 76x 38x2.0MM	ML	33,20	$ 38.800,00	$ 1.288.160,00	33,20	$ 1.288.160,00	33,20	$ 1.288.160,00	100%
5	Carpinterias									
5,01	VENTANA ALUM.FIJA P.38-31	M2	10,20	$ 190.300,00	$ 1.941.060,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
5,02	NAVE ALUMINIO NAVE-ENTAMBORADA-LLENA	M2	0,00	$ 332.200,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	N/A
5,03	MARCOS EN ALUM 0,81-1,00M LISO C/ LUCETA	UND	8,00	$ 181.300,00	$ 1.450.400,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
5,04	CERRADURA YALE ENTRADA PPAL.REF.5316	UND	1,00	$ 135.100,00	$ 135.100,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
6	Pisos.									
6,01	CONTRAPISO CONCRETO E= 6CM 2.500Psi	M2	57,88	$ 24.600,00	$ 1.423.848,00	57,88	$ 1.423.848,00	57,88	$ 1.423.848,00	100%
6,02	ALISTADO PISO 4 CM	M2	31,54	$ 19.700,00	$ 621.338,00	31,54	$ 621.338,00	31,54	$ 621.338,00	100%
6,03	CERAMICA 30.01-32.50x30.01-32.50 TRAF.4	M2	31,54	$ 48.400,00	$ 1.526.536,00	31,54	$ 1.526.536,00	31,54	$ 1.526.536,00	100%
6,04	GUARDAESCOBA PORCELANATO 7X30CM	ML	24,20	$ 11.300,00	$ 273.460,00	24,20	$ 273.460,00	24,20	$ 273.460,00	100%
7	Instalaciones Electricas y Domotizado									
7,01	SAL TOMA 1F (C/T/A/TO:REGULADO P&S)	UND	4,00	$ 82.000,00	$ 328.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
7,02	TABLERO 2F 6 CTOS TQSP	UND	0,00	$ 210.400,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	N/A
7,03	BREAKER 2F DESDE 15 HASTA 60 AMP	UND	6,00	$ 79.600,00	$ 477.600,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
7,04	SAL LAMP EMT	UND	6,00	$ 94.100,00	$ 564.600,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
7,05	SALIDA S3 EMT	UND	1,00	$ 110.600,00	$ 110.600,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
7,06	LAMPARA HERMETICA LED 2X20W	UND	0,00	$ 144.600,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	N/A
7,07	INSTALACION LAMPARA 2X96	UND	0,00	$ 26.300,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	N/A
7,08	INSTALACION SALIDA LAMPARA	UND	6,00	$ 26.600,00	$ 159.600,00	6,00	$ 159.600,00	6,00	$ 159.600,00	100%
7,09	INSTALACION SALIDA TOMA A 120V	UND	5,00	$ 32.100,00	$ 160.500,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
7,1	INSTALACION SWITCHE	UND	0,00	$ 6.000,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	N/A
7,11	PUNTO SANITARIO PVC 1,1/2 [V]	PTO	0,00	$ 19.600,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	N/A
7,12	TUBERIA PVC 1,1/2"	ML	0,00	$ 10.100,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	N/A
7,13	CODO 90 PRESION PVC 1,1/2"	UND	0,00	$ 8.000,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	N/A
7,14	ACOM.E.3F(3#4/0+1#4/0)3"	ML	0,00	$ 366.200,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	N/A
8	Mamposteria, Repellos, Estucos y Pintura									
8,01	MURO BLOQUE CONCRETO 10x19x39CM	M2	59,23	$ 40.000,00	$ 2.369.200,00	59,23	$ 2.369.200,00	59,23	$ 2.369.200,00	100%
8,02	ALFAGIA CONCRETO A= 8-10CM	ML	0,00	$ 21.300,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	N/A
8,03	REPELLO MURO 1:3	M2	63,55	$ 17.400,00	$ 1.105.770,00	63,55	$ 1.105.770,00	63,55	$ 1.105.770,00	100%
8,04	FILOS - DILATACIONES	ML	110,80	$ 3.400,00	$ 376.720,00	110,80	$ 376.720,00	110,80	$ 376.720,00	100%
8,05	REPELLO VIGA CANAL [3C]	ML	0,00	$ 24.800,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	N/A
8,06	ESTUCO PLASTICO + RELLENO S/BLOQUE	M2	55,85	$ 15.500,00	$ 865.675,00	55,85	$ 865.675,00	55,85	$ 865.675,00	100%
8,07	KORAZA [3M]	M2	61,01	$ 8.300,00	$ 506.383,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
ITEMS NUEVOS										
NP 01	C.FALSO LAMINA PVC A=25CM E=10MM	M2	27,13	$ 61.200,00	$ 1.660.356,00	27,13	$ 1.660.356,00	27,13	$ 1.660.356,00	100%
NP 02	ALFAGIA CONCRETO A= 25 - 30CM	ML	25,20	$ 28.853,00	$ 727.096,00	25,20	$ 727.096,00	25,20	$ 727.096,00	100%
NP 03	PINTURA TIPO 1 INTERIOR, 3 MANOS	M2	55,85	$ 8.100,00	$ 452.385,00	55,85	$ 452.385,00	55,85	$ 452.385,00	100%
NP 04	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MURO 1:3	M2	61,01	$ 19.597,00	$ 1.195.613,00	61,01	$ 1.195.613,00	61,01	$ 1.195.613,00	100%
NP 05	TUBERIA PVC 2 SANITARIA	ML	7,80	$ 17.480,00	$ 136.344,00	7,80	$ 136.344,00	7,80	$ 136.344,00	100%
NP 06	SIFON SANITARIO PVC 2"	UND	2,00	$ 27.000,00	$ 54.000,00	2,00	$ 54.000,00	2,00	$ 54.000,00	100%
NP 07	REJILLA PARA SIFON 3x2"	UND	2,00	$ 21.000,00	$ 42.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0%

ITEMS	DESCRIPCIÓN	ACTA No 01 DE MODIFICACION DE CANTIDADES (CONDICIONES ACTUALZADAS)				ACTA DE COBRO PARCIAL No.1		EJECUTADO ACOMULADO		
		UND.	CANT.	Vr.UNIT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	% ACUM
NP 08	PUERTA PRINCIPAL EN VIDRIO, CON CUERPO FIJO DE 0,70 MTS Y DOS CUERPOS BATIENTES CADA UNO DE 1 X 2 MTS	UND	1,00	$ 4.414.333,00	$ 4.414.333,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
NP 09	PANEL LED 0,60 X 0,60 MTS	UND	6,00	$ 170.000,00	$ 1.020.000,00	6,00	$ 1.020.000,00	6,00	$ 1.020.000,00	100%
NP 10	CANAL GALVANIZADA CALIBRE 20 DESARROLLO 0,61 MTS	ML	8,10	$ 118.375,00	$ 958.838,00	8,10	$ 958.838,00	8,10	$ 958.838,00	100%
NP 11	ACOMETIDA CABLE STP CATEGORIA 6. VOZ Y DATOS	ML	55,00	$ 30.050,00	$ 1.652.750,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
NP 12	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO, 8 CIRCUITOS CON TOTALIZADOR	UND	1,00	$ 570.250,00	$ 570.250,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
NP 13	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICO, 8 CIRCUITOS	UND	1,00	$ 154.417,00	$ 154.417,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
NP 14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TRIPLE	UND	1,00	$ 17.750,00	$ 17.750,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
NP 15	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE BIFÁSICA 20A/220V(2Ø+PT)	UND	1,00	$ 133.180,00	$ 133.180,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
NP 16	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE RACK DE TELECOMUNICACIONES 60 CMS	UND	1,00	$ 412.900,00	$ 412.900,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
NP 17	SALIDA VOZ Y DATOS	UND	1,00	$ 73.533,00	$ 73.533,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
NP 18	TOMA JACK FACE PLATE. VOZ Y DATOS	UND	1,00	$ 49.900,00	$ 49.900,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
NP 19	ACOM.E.3F(3#2+1#6) NO REGULADA	ML	55,00	$ 104.730,00	$ 5.760.150,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
NP 20	ACOM.E.2F(2#2+1#6) REGULADA	ML	100,00	$ 78.480,00	$ 7.848.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
NP 21	TUBO CORRUGADO ELECTRICO DE 3"	ML	105,00	$ 48.178,00	$ 5.058.690,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
	AEROPUERTO SANTANA DE CARTAGO									
9	Sala de Capacitacion y Entrenamiento.									
9,01	RASQUETEADA-LIJADA-RESANE	M2	35,62	$ 1.700,00	$ 60.554,00	35,62	$ 60.554,00	35,62	$ 60.554,00	100%
9,02	VINILO CIELO TIPO 1 [3M]	M2	35,62	$ 8.900,00	$ 317.018,00	35,62	$ 317.018,00	35,62	$ 317.018,00	100%
9,03	REPELLO MURO 1:3	M2	35,62	$ 17.400,00	$ 619.788,00	35,62	$ 619.788,00	35,62	$ 619.788,00	100%
9,04	DESM CIELO FALSO PANEL + ESTRUCTURA	M2	11,73	$ 4.000,00	$ 46.920,00	11,73	$ 46.920,00	11,73	$ 46.920,00	100%
9,05	RETIRO LAMPARA	UND	1,00	$ 4.500,00	$ 4.500,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
9,06	RETIRO SWITCHE O TOMA	UND	0,00	$ 2.500,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	N/A
9,07	INSTALACION LAMPARA 2X96	UND	0,00	$ 26.300,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	N/A
9,08	INSTALACION SALIDA LAMPARA	UND	1,00	$ 26.600,00	$ 26.600,00	1,00	$ 26.600,00	1,00	$ 26.600,00	100%
9,09	INSTALACION SALIDA TOMA A 120V	UND	0,00	$ 32.100,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	N/A
9,1	INSTALACION SWITCHE	UND	0,00	$ 6.000,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	N/A
9,11	DEMOL.ENCHAPE CERAMICO	M2	11,73	$ 7.200,00	$ 84.456,00	11,73	$ 84.456,00	11,73	$ 84.456,00	100%
9,12	C.FALSO LAMINA PVC A=25CM E=10MM	M2	11,73	$ 61.200,00	$ 717.876,00	11,73	$ 717.876,00	11,73	$ 717.876,00	100%
9,13	CERAMICA 30.01-32.50x30.01-32.50 TRAF.4	M2	11,73	$ 48.400,00	$ 567.732,00	11,73	$ 567.732,00	11,73	$ 567.732,00	100%
9,14	DESMONTE CAJONERA	UND	0,00	$ 4.600,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	N/A
10	Baño.									
10,01	DESM.APARATO SANITARIO	UND	2,00	$ 22.400,00	$ 44.800,00	2,00	$ 44.800,00	2,00	$ 44.800,00	100%
10,02	DEMOL.ENCHAPE CERAMICO	M2	25,02	$ 7.200,00	$ 180.144,00	25,02	$ 180.144,00	25,02	$ 180.144,00	100%
10,03	DESM CIELO FALSO PANEL + ESTRUCTURA	M2	4,22	$ 4.000,00	$ 16.880,00	4,22	$ 16.880,00	4,22	$ 16.880,00	100%
10,04	RETIRO LAMPARA	UND	1,00	$ 4.500,00	$ 4.500,00	1,00	$ 4.500,00	1,00	$ 4.500,00	100%
10,05	RETIRO SWITCHE O TOMA	UND	2,00	$ 2.500,00	$ 5.000,00	2,00	$ 5.000,00	2,00	$ 5.000,00	100%
10,06	INSTALACION LAMPARA 2X96	UND	0,00	$ 26.300,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	N/A
10,07	INSTALACION SALIDA LAMPARA	UND	1,00	$ 26.600,00	$ 26.600,00	1,00	$ 26.600,00	1,00	$ 26.600,00	100%
10,08	INSTALACION SALIDA TOMA A 120V	UND	1,00	$ 32.100,00	$ 32.100,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
10,09	INSTALACION SWITCHE	UND	2,00	$ 6.000,00	$ 12.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
10,1	C.FALSO LAMINA PVC A=25CM E=10MM	M2	4,22	$ 61.200,00	$ 258.264,00	4,22	$ 258.264,00	4,22	$ 258.264,00	100%
10,11	ALISTADO PISO IMPERMEABLE 4 CM	M2	4,22	$ 25.600,00	$ 108.032,00	4,22	$ 108.032,00	4,22	$ 108.032,00	100%
10,12	ENCHAPE CERAMICA 20X20 -1 CALIDAD	M2	25,02	$ 44.600,00	$ 1.115.892,00	25,02	$ 1.115.892,00	25,02	$ 1.115.892,00	100%
10,13	INCRUST.CERAM. JGO 4 PZ ESTILO (A)	JGO	1,00	$ 85.700,00	$ 85.700,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
10,14	INSTALACION SANITARIO	UND	2,00	$ 21.000,00	$ 42.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
10,15	INSTALACION LAVAMANOS	UND	1,00	$ 20.800,00	$ 20.800,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
10,16	DISPENSADOR JABON 1.2 LTS A.INOX	UND	1,00	$ 145.800,00	$ 145.800,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
10,17	DISPENSADOR PAPEL HIGIENICO A.INOX	UND	1,00	$ 155.200,00	$ 155.200,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0%

ITEMS	DESCRIPCIÓN	ACTA No 01 DE MODIFICACION DE CANTIDADES (CONDICIONES ACTUALZADAS)				ACTA DE COBRO PARCIAL No.1		EJECUTADO ACOMULADO		
		UND.	CANT.	Vr.UNIT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	% ACUM
10,18	EXTRACTOR OLORES 100 CFM BAJO RUIDO	UND	1,00	$ 226.300,00	$ 226.300,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
10,19	SECADOR MANOS TORNADO 1500W AUT.	UND	1,00	$ 1.024.500,00	$ 1.024.500,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
10,2	ESPEJO CLARO DE 3MM	M2	0,50	$ 38.900,00	$ 19.450,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
10,21	LAVAMANOS COLGAR PEDESTAL LINEA MEDIA	JGO	1,00	$ 147.200,00	$ 147.200,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
10,22	ORINAL PEQUEÑO	UND	1,00	$ 158.200,00	$ 158.200,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
10,23	SANITARIO LINEA MEDIA COMPLETO	UND	1,00	$ 245.400,00	$ 245.400,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
10,24	DUCHA MEZCLADORA (M)	UND	1,00	$ 93.100,00	$ 93.100,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
10,25	DIV.BANO A.INOX ORINAL 96X46CM	UND	1,00	$ 385.700,00	$ 385.700,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
10,26	DIV.ALUM.ACRILICO 75% CORREDIZA R=4215	M2	4,00	$ 194.600,00	$ 778.400,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
10,27	SIFON SANITARIO PVC 2"	UND	2,00	$ 6.700,00	$ 13.400,00	2,00	$ 13.400,00	2,00	$ 13.400,00	100%
10,28	NAVE ALUMINIO NAVE-ENTAMBORADA-LLENA	M2	6,85	$ 332.200,00	$ 2.275.570,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
10,29	CERRADURA BANO ALUMINIO	UND	1,00	$ 53.400,00	$ 53.400,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
10,3	MARCOS EN ALUM 0,81-1,00M LISO C/ LUCETA	UND	0,00	$ 181.300,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	N/A
11	Torre de Control.									
11,01	REPELLO MURO 1:3	M2	11,70	$ 17.400,00	$ 203.580,00	11,70	$ 203.580,00	11,70	$ 203.580,00	100%
11,02	ESTUCO PLASTICO MURO [PASTA]	M2	47,32	$ 8.400,00	$ 397.488,00	47,32	$ 397.488,00	47,32	$ 397.488,00	100%
11,03	VINILO CIELO TIPO 1 [3M]	M2	47,32	$ 8.900,00	$ 421.148,00	47,32	$ 421.148,00	47,32	$ 421.148,00	100%
11,04	DESM.VENTANA EXISTENTE	M3	39,02	$ 17.400,00	$ 678.948,00	39,02	$ 678.948,00	39,02	$ 678.948,00	100%
11,05	DESM.MARCO + NAVE SENCILLA	UND	3,00	$ 15.900,00	$ 47.700,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
11,06	VENTANA ALUM.FIJA P.38-31 - SIN VIDRIO	M2	40,93	$ 163.500,00	$ 6.692.055,00	40,93	$ 6.692.055,00	40,93	$ 6.692.055,00	100%
11,07	VIDRIO LAMINADO INCOLORO 8 MM	M2	39,02	$ 194.400,00	$ 7.585.488,00	39,02	$ 7.585.488,00	39,02	$ 7.585.488,00	100%
11,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE OPALIZADO	M3	39,02	$ 53.100,00	$ 2.071.962,00	39,02	$ 2.071.962,00	39,02	$ 2.071.962,00	100%
11,09	LIJADA Y PINTURA DE ESTRUCTURA METALICA	ML	0,00	$ 11.200,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	N/A
ITEMS NUEVOS										
NPC 01	PANEL LED 0,60 X 0,60 MTS	UND	2,00	$ 170.000,00	$ 340.000,00	2,00	$ 340.000,00	2,00	$ 340.000,00	100%
NPC 02	GUARDAESCOBA PORCELANATO 7X30CM	ML	13,70	$ 11.300,00	$ 154.810,00	13,70	$ 154.810,00	13,70	$ 154.810,00	100%
NPC 03	CONTRAPISO CONCRETO E= 6CM 2.500Psi	M2	8,96	$ 24.600,00	$ 220.416,00	8,96	$ 220.416,00	8,96	$ 220.416,00	100%
NPC 04	ALISTADO PISO 4 CM	M2	11,73	$ 19.700,00	$ 231.081,00	11,73	$ 231.081,00	11,73	$ 231.081,00	100%

	COSTO DIRECTO TOTAL		31,00%		$ 98.940.024,00		$ 60.042.102,00		$ 60.042.102,00	60,69%
	ADMINISTRACIÓN		21,00%		$ 20.777.405,00		$ 12.608.841,00		$ 12.608.841,00	
	IMPREVISTOS		6,00%		$ 5.936.401,00		$ 3.602.526,00		$ 3.602.526,00	
	UTILIDAD		4,00%		$ 3.957.601,00		$ 2.401.684,00		$ 2.401.684,00	
	SUBTOTAL				$ 129.611.431,00		$ 78.655.153,00		$ 78.655.153,00	
	IVA SOBRE UTILIDAD		19,00%		$ 751.945,00		$ 456.319,96		$ 456.319,96	
	TOTAL				$ 130.363.376,00		$ 79.111.472,96		$ 79.111.472,96	60,69%

DIEGO ROLANDO GUTIERREZ CASTRO
Representante Legal
CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2020

U.A.E. DE AERONAUTICA CIVIL
JUAN DAVID RODRIGUEZ SUANCHA
Apoyo a la supervision

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
VoBo MILTON CÉSAR SÁNCHEZ PÉREZ
DIRECTOR AERONAUTICO REGIONAL VALLE

AERONAUTICA CIVIL	OBJETO:	VALOR INICIAL:	CONTRATISTA :
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO	RVLC0783 ADECUAR SALAS DE ENTRENAMIENTO OPERACIONAL PARA EL PERSONAL DE CONTROLADORES AEREOS REGIONAL VALLE. AEROPUERTO: AEROPUERTO MATECAÑA - SANTANA CONTRATO No.20001103-H4 PLAZO INICIAL: CUARENTA Y CINCO (45) DIAS PLAZO ADICIONAL: PLAZO FINAL: CUARENTA Y CINCO (45) DIAS	$ 105.673.174,00 INCLUIDO IVA SOBRE UTILIDAD VALOR ADICIONAL: $ 24.690.202,00 INCLUIDO IVA SOBRE U. VALOR FINAL : $ 130.363.376,00 INCLUIDO IVA SOBRE UTILIDAD	CONSORCIO OBRAS 2020 SUPERVISOR: MILTON CESAR SANCHEZ PEREZ APOYO A SUPERVISION: JUAN DAVID RODRIGUEZ

ACTA DE COBRO PARCIAL

El día 21 de diciembre de 2020 en el Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragon de Cali, se reunieron el Ingeniero DIEGO ROLANDO GUTIERREZ CASTRO representante legal del contratista de obra CONSORCIO OBRAS 2020, MILTON CESAR SANCHEZ , quién actúa como Supervisor, y JUAN DAVID RODRIGUEZ SUANCHA obrando en calidad de apoyo a la supervisión designado por la entidad para la vigilancia y control del contrato designado por la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL; con el objeto de recibir las cantidades de obra ejecutadas durante el periodo comprendido entre el 20 de noviembre de 2020 y el 21 de diciembre del 2020 determinando su valor de acuerdo a los precios unitarios estipulados en el Contrato y según se relaciona en el cuadro anexo de cantidades de obra ACTA DE COBRO PARCIAL , las cuales se recibieron a entera satisfacción por parte del supervisor del contrato.

BALANCE FINACIERO DEL CONTRATO		VALORES
1. Valor Inicial Contrato		$ 105.673.174
2.Valor Adicional		$ 24.690.202
3, Valor total del Contrato (1+2)		$ 130.363.376
4, Valor Pagado por Anticipo	0%	$ 0
5. Valor que resta por Pagar (3-4)		$ 130.363.376
6, Valor Presente Acta No. 01		$ 79.111.472,96
7. Amortización en esta acta	0%	$ -
8. Otras retenciones (Acumuladas)		$ -
9,Valor a Pagar de la Presente Acta (6-7)		$ 79.111.472,96
10. Pagos Actas Anteriores		$ -
11, Valor pagado a la Fecha		$ -
12, Saldo por pagar del presente Contrato		$ 130.363.376,00
13. Porcentaje de ejecución del contrato a la fecha		60,69%

OBSERVACIONES: El Contratista y la Interventoria mediante el presente documento, hacen constar que las cantidades de obra consignadas en el formato de cantidades, que hace parte integral de la presente acta, corresponden a las medidas tomadas IN-SITU por el Contratista y verificadas por la Interventoria contratada por la U.A.E.A.C.

De igual manera dejan constancia que la ejecución de los diferentes ITEMS se han realizado atendiendo las mejores practicas constructivas actuales, con materiales de las mejores calidades y cumpliendo con las especificaciones técnicas establecidas en los terminos de referencia del presente contrato. Lo anterior de conformidad con la Resolucion 00589 del 12 de febrero de 2007 por la cual se reglamentan las funciones de Interventoria y Supervisoria para los contratos que celebra la U.A.E.A.C.

Contratista: CONSORCIO OBRAS 2020
DIEGO ROLANDO GUTIERREZ CASTRO
Representante Legal

U.A.E. DE AERONAUTICA CIVIL
JUAN DAVID RODRIGUEZ SUANCHA
Apoyo a la supervision

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
VoBo MILTON CÉSAR SÁNCHEZ PÉREZ
DIRECTOR AERONAUTICO REGIONAL VALLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

LIQUIDACION IVA

ACTA DE COBRO PARCIAL

NUMERO:	**CONTRATO No.20001103-H4**
CONTRATISTA:	**CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2020**
SUPERVISOR DELEGADO UAEAC:	**SUPERVISOR:** MILTON CESAR SANCHEZ PEREZ.
COSTO TOTAL BRUTO (Costo Directo + A.I.U. + IVA SOBRE U)	$79.111.472,96
Porcentaje estimado para el A.I.U	31,0%
COSTO DIRECTO Costo Total Directo	$60.042.102,00
UTILIDAD (Costo Directo x 4% estimado de Utilidad)	$2.401.684,00
IVA Utilidad x 19% estimado para el IVA	$456.319,96

DIEGO ROLANDO GUTIERREZ CASTRO
Representante Legal
CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2020

U.A.E. DE AERONAUTICA CIVIL
JUAN DAVID RODRIGUEZ
Apoyo a la Suprervision

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
VoBo MILTON CÉSAR SÁNCHEZ PÉREZ
DIRECTOR AERONAUTICO REGIONAL VALLE

AERONÁUTICA CIVIL

RVLC0783 ADECUAR SALAS DE ENTRENAMIENTO OPERACIONAL PARA EL PERSONAL DE CONTROLADORES AEREOS REGIONAL VALLE

1	AEROPUERTO MATECAÑA DE PEREIRA

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DIMENSIONES					TOTAL			LOCALIZACIÓN
1,01	LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON.	M2	Ancho (M)	Altura (M)	Longitud (M)	Descuento:	Cant (Und)	Long Total (ML)	Area (M²)	Volumen (M³)	LUGAR
			3,80		8,30				31,54		
						TOTAL	0,00	0,00	31,54	0,00	

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DIMENSIONES					TOTAL			LOCALIZACIÓN
1,02	CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-SINB	ML	Ancho (M)	Altura (M)	Longitud (M)	Descuento:	Cant (Und)	Long Total (ML)	Area (M²)	Volumen (M³)	LUGAR
			11,80		12,70			24,50			0
			11,20		13,00			24,20			
						TOTAL	0,00	48,70	0,00	0,00	

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DIMENSIONES					TOTAL			LOCALIZACIÓN
1,03	RETIRO DE ARBUSTO Y POSTERIOR TRANSPLANTE	UND	Ancho (M)	Altura (M)	Longitud (M)	Descuento:	Cant (Und)	Long Total (ML)	Area (M²)	Volumen (M³)	LUGAR
							2,00			0,00	0
						TOTAL	2,00	0,00	0,00	0,00	

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DIMENSIONES					TOTAL			LOCALIZACIÓN
1,04	EXCAVACION DE TIERRA A MANO (VIGAS CIMIENTO)	M3	Ancho (M)	Altura (M)	Longitud (M)	Expansión	Cant (Und)	Long Total (ML)	Area (M²)	Volumen (M³)	LUGAR
			0,80	0,75	0,80		8,00			3,84	ZAPATAS
			0,40	0,70	5,60		2,00			3,14	CICLOPEO
			0,40	0,70	2,70		4,00			3,02	
			2,45	0,15	3,00		2,00			2,21	SOLADO
			1,90	0,15	3,00		1,00			0,86	
			0,70	0,15	26,20		1,00			2,75	ANDENES
			2,00	0,30	4,00		1,00			2,40	
			1,00	1,00	35,00		1,00			35,00	TUBERIA CORRUGADA
						TOTAL	14,00	0,00	0,00	53,22	

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DIMENSIONES					TOTAL			LOCALIZACIÓN
1,05	DESCAPOTE MAQUINA MAS RETIRO	M2	Ancho (M)	Altura (M)	Longitud (M)	Expansión	Cant (Und)	Long Total (ML)	Area (M²)	Volumen (M³)	LUGAR
			3,80		8,30				31,54	0,00	
			2,00		4,00				8,00	0,00	
			0,70		26,20				18,34	0,00	
										0,00	
						TOTAL	0,00	0,00	57,88	0,00	

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DIMENSIONES					TOTAL			LOCALIZACIÓN
2,01	RELLENO ROCA MUERTA COMPAC-CILINDRO +ACA	M3	Ancho (M)	Altura (M)	Longitud (M)	Descuento:	Cant (Und)	Long Total (ML)	Area (M²)	Volumen (M³)	LUGAR
			1,00	0,90	35,00		1,00			31,50	
						TOTAL	1,00	0,00	0,00	31,50	

AERONÁUTICA CIVIL

RVLC0783 ADECUAR SALAS DE ENTRENAMIENTO OPERACIONAL PARA EL PERSONAL DE CONTROLADORES AEREOS REGIONAL VALLE

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DIMENSIONES					TOTAL			LOCALIZACIÓN
2,02	RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO-RANA	M3	Ancho (M)	Altura (M)	Longitud (M)	Descuento:	Cant (Und)	Long Total (ML)	Area (M²)	Volumen (M³)	LUGAR
			8,30	0,20	3,20				5,31		
			0,70	0,05	26,20				0,92		
			2,00	0,05	4,00				0,40		
						TOTAL	0,00	0,00	6,63	0,00	

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DIMENSIONES					TOTAL			LOCALIZACIÓN
3,01	SOLADO ESPESOR E=0.05M 3000 PSI 210 MPA	M2	Ancho (M)	Altura (M)	Longitud (M)	Descuento:	Cant (Und)	Long Total (ML)	Area (M²)	Volumen (M³)	LUGAR
			0,80	0,05	0,80		8,00		5,12	0,03	#¡REF!
			2,55	0,05	3,20		2,00		16,32	0,41	
			2,00	0,05	3,20		1,00		6,40	0,32	
										0,00	
						TOTAL	10,00	0,00	27,84	1,00	

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DIMENSIONES					TOTAL			LOCALIZACIÓN
3,02	CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI RELAC.60C/40P	M3	Ancho (M)	Altura (M)	Longitud (M)	Descuento:	Cant (Und)	Long Total (ML)	Area (M²)	Volumen (M³)	LUGAR
			0,40	0,40	2,70		4,00			1,73	
			0,40	0,40	2,05		4,00			1,31	
			0,40	0,40	1,50		2,00			0,48	
						TOTAL		0,00	0,00	3,52	

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DIMENSIONES					TOTAL			LOCALIZACIÓN
3,03	ZAPATA CONCRETO 3000 PSI INC. FORMALETA	M3	Ancho (M)	Altura (M)	Longitud (M)	Expansión	Cant (Und)	Long Total (ML)	Area (M²)	Volumen (M³)	LUGAR
			0,80	0,40	0,80		8,00			2,05	
						TOTAL	8,00	0,00	0,00	2,05	

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DIMENSIONES					TOTAL			LOCALIZACIÓN
3,05	VIGA CIMIENTO ENLACE H=20-40 CMS	M3	Ancho (M)	Altura (M)	Longitud (M)	Expansión	Cant (Und)	Long Total (ML)	Area (M²)	Volumen (M³)	LUGAR
			0,30	0,30	8,30		2,00	16,60		1,49	
			0,30	0,30	3,20		4,00	12,80		1,15	
						TOTAL	6,00	29,00	0,00	2,64	

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DIMENSIONES					TOTAL			LOCALIZACIÓN
3,06	COLUMNA CONCRETO 4000 PSI	M3	Ancho (M)	Altura (M)	Longitud (M)	Expansión	Cant (Und)	Long Total (ML)	Area (M²)	Volumen (M³)	LUGAR
			0,30	2,70	0,30		4,00			0,97	
			0,30	3,20	0,30		4,00			1,15	
						TOTAL	8,00	0,00	0,00	2,12	

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DIMENSIONES					TOTAL			LOCALIZACIÓN
3,07	VIGA CONCRETO AEREA 3000 PSI	M3	Ancho (M)	Altura (M)	Longitud (M)	Expansión	Cant (Und)	Long Total (ML)	Area (M²)	Volumen (M³)	LUGAR
			0,30	0,30	8,30		2,00	16,60		1,49	
			0,30	0,30	3,20		4,00	12,80		1,15	
						TOTAL	6,00	29,00	0,00	2,64	

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DIMENSIONES	TOTAL	LOCALIZACIÓN

AERONÁUTICA CIVIL

RVLC0783 ADECUAR SALAS DE ENTRENAMIENTO OPERACIONAL PARA EL PERSONAL DE CONTROLADORES AEREOS REGIONAL VALLE

3,09	VIGA CONCR.AMARRE MURO 10-12x20CM	ML	Ancho (M)	Altura (M)	Longitud (M)	Expansión	Cant (Und)	Long Total (ML)	Area (M²)	Volumen (M³)	LUGAR
					3,20		4,00	12,80		0,00	
					8,30		2,00	16,60		0,00	
						TOTAL		**29,40**		**0,00**	

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DIMENSIONES					TOTAL			LOCALIZACIÓN
3,11	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KG	Longitud (M)	Peso (Kls)	Cant	Expansión	Cant (Und)	Long Total (ML)	Area (M²)	Peso(Kls)	LUGAR
			1,00	1,00	16,00		8,00			128,00	ZAPATAS
			3,92	1,00	4,00		4,00			62,72	COLUMNAS POSTERIORES
			1,04	0,56	21,00		4,00			48,92	FLEJES COLUMNAS POSTERIORES
			4,42	1,00	4,00		4,00			70,72	COLUMNAS FRONTALES
			1,04	0,56	25,00		4,00			58,24	FLEJES COLUMNAS FRONTALES
			6,00	1,00	2,00		4,00			48,00	VIGA AMARRE
			6,00	1,00	2,00		4,00			48,00	VIGA AMARRE
			2,30	1,00	2,00		2,00			9,20	VIGA AMARRE
			1,50	1,00	2,00		2,00			6,00	VIGA AMARRE
			3,80	1,00	4,00		2,00			30,40	VIGA AMARRE
			1,04	0,56	225,00		1,00			131,04	FLEJES VIGA AMARRE
			6,00	1,00	2,00		4,00			48,00	VIGA AEREA
			6,00	1,00	2,00		4,00			48,00	VIGA AEREA
			2,30	1,00	2,00		2,00			9,20	VIGA AEREA
			1,50	1,00	2,00		2,00			6,00	VIGA AEREA
			3,80	1,00	4,00		2,00			30,40	VIGA AEREA
			1,04	0,56	225,00		1,00			131,04	FLEJES VIGA AEREA
			5,30	1,00	4,00		2,00			42,40	VIGA CINTA
			4,90	1,00	2,00		4,00			39,20	VIGA CINTA
			0,37	0,56	225,00		1,00			46,62	FLEJES VIGA CINTA
						TOTAL				**1042,00**	

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DIMENSIONES					TOTAL			LOCALIZACIÓN
3,12	MALLA ELECTROSOLDADA M-0.84	KG	Longitud (M)	Peso (Kls)	Cant	Expansión	Cant (Und)	Long Total (ML)	Area (M²)	Peso(Kls)	LUGAR
				1,33					31,54	41,95	
				1,33					18,34	24,39	
				1,33					8,00	10,64	
						TOTAL				**76,98**	

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DIMENSIONES					TOTAL			LOCALIZACIÓN
3,16	PLASTIFICANTE IMPERMEABILIZANTE.	KG	Ancho (M)	Altura (M)	Longitud (M)	Expansión	Cant (Und)	Long Total (ML)	Area (M²)	Volumen (M³)	LUGAR
							20,00				
						TOTAL	**20,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DIMENSIONES					TOTAL			LOCALIZACIÓN
4,01	TEJA ALUMINIO-POLIURETANO-ALUM.E=1 1C	M2	Ancho (M)	Altura (M)	Longitud (M)	Expansión	Cant (Und)	Long Total (ML)	Area (M²)	Volumen (M³)	LUGAR
			3,50		8,00				28,00		
										0,00	
						TOTAL	**0,00**	**0,00**	**28,00**	**0,00**	

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DIMENSIONES	TOTAL	LOCALIZACIÓN

AERONAUTICA CIVIL

RVLC0783 ADECUAR SALAS DE ENTRENAMIENTO OPERACIONAL PARA EL PERSONAL DE CONTROLADORES AEREOS REGIONAL VALLE

4,03	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4	ML	Ancho (M)	Altura (M)	Longitud (M)	Expansión	Cant (Und)	Long Total (ML)	Area (M²)	Volumen (M³)	LUGAR
					2,70		2,00	5,40			
						TOTAL	2,00	5,40	0,00	0,00	

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DIMENSIONES					TOTAL			LOCALIZACIÓN
4,04	TUBERIA PVC 4 SANITARIA	ML	Ancho (M)	Altura (M)	Longitud (M)	Expansión	Cant (Und)	Long Total (ML)	Area (M²)	Volumen (M³)	LUGAR
					7,80			7,80		0,00	
					10,00			10,00		0,00	
						TOTAL	0,00	17,80	0,00	0,00	

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DIMENSIONES					TOTAL			LOCALIZACIÓN
4,06	CODO SANITARIO PVC 90 CE-4"	UND	Ancho (M)	Altura (M)	Longitud (M)	Expansión	Cant (Und)	Long Total (ML)	Area (M²)	Volumen (M³)	LUGAR
							2,00				BAJANTES
							2,00				SIFONES
						TOTAL	4,00	0,00	0,00	0,00	

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DIMENSIONES					TOTAL			LOCALIZACIÓN
4,07	ABRAZADERA SANITARIA 4"	UND	Ancho (M)	Altura (M)	Longitud (M)	Expansión	Cant (Und)	Long Total (ML)	Area (M²)	Volumen (M³)	LUGAR
							8,00			0,00	
										0,00	
						TOTAL	8,00	0,00	0,00	0,00	

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DIMENSIONES					TOTAL			LOCALIZACIÓN
4,13	REMATE SUPERIOR CONTRA MURO TEJA AJOVER	ML	Ancho (M)	Altura (M)	Longitud (M)	Descuento:	Cant (Und)	Long Total (ML)	Area (M²)	Volumen (M³)	LUGAR
					8,30		2,00	16,60			
					3,20		4,00	12,80			
								0,00			
								0,00			
						TOTAL		29,40	0,00	0,00	

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DIMENSIONES					TOTAL			LOCALIZACIÓN
4,17	TUBO ESTRUCTURAL 76x 38x2.0MM	ML	Ancho (M)	Altura (M)	Longitud (M)	Descuento:	Cant (Und)	Long Total (ML)	Area (M²)	Volumen (M³)	LUGAR
					8,30		4,00	33,20			
						TOTAL		33,20	0,00	0,00	

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DIMENSIONES					TOTAL			LOCALIZACIÓN
6,01	CONTRAPISO CONCRETO E= 8CM 2.500Psi	M2	Ancho (M)	Altura (M)	Longitud (M)	Descuento:	Cant (Und)	Long Total (ML)	Area (M²)	Volumen (M³)	LUGAR
			3,80		8,30			31,54			SALA DE CAPACITACIONES
			0,70		26,20			18,34			ANDENES PERIMETRALES
			2,00		4,00			8,00			
						TOTAL	0,00	57,88	0,00	0,00	

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DIMENSIONES					TOTAL			LOCALIZACIÓN
6,02	ALISTADO PISO 4 CM	M2	Ancho (M)	Altura (M)	Longitud (M)	Descuento:	Cant (Und)	Long Total (ML)	Area (M²)	Volumen (M³)	LUGAR
			3,80		8,30			31,54			

				TOTAL	0,00	31,54	0,00	0,00	

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DIMENSIONES					TOTAL			LOCALIZACIÓN
6,03	CERAMICA 30.01-32.50x30.01-32.50 TRAF.4	M2	Ancho (M)	Altura (M)	Longitud (M)	Descuento:	Cant (Und)	Long Total (ML)	Area (M²)	Volumen (M³)	LUGAR
			3,80		8,30			31,54			
						TOTAL	0,00	31,54	0,00	0,00	

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DIMENSIONES					TOTAL			LOCALIZACIÓN
6,04	GUARDAESCOBA PORCELANATO 7X30CM	ML	Ancho (M)	Altura (M)	Longitud (M)	Descuento:	Cant (Und)	Long Total (ML)	Area (M²)	Volumen (M³)	LUGAR
					3,80			3,80			
					3,80			3,80			
					8,30			8,30			
					8,30			8,30			
						TOTAL	0,00	24,20	0,00	0,00	

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DIMENSIONES					TOTAL			LOCALIZACIÓN
7,07	INSTALACION LAMPARA 2X96	UND	Ancho (M)	Altura (M)	Longitud (M)	Descuento:	Cant (Und)	Long Total (ML)	Area (M²)	Volumen (M³)	LUGAR
							0,00		0,00		
						TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DIMENSIONES					TOTAL			LOCALIZACIÓN
7,08	INSTALACION SALIDA LAMPARA	UND	Ancho (M)	Altura (M)	Longitud (M)	Descuento:	Cant (Und)	Long Total (ML)	Area (M²)	Volumen (M³)	LUGAR
							6,00		0,00		
						TOTAL	6,00	0,00	0,00	0,00	

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DIMENSIONES					TOTAL			LOCALIZACIÓN
8,01	MURO BLOQUE CONCRETO 10x19x39CM	M2	Ancho (M)	Altura (M)	Longitud (M)	Descuento:	Cant (Und)	Long Total (ML)	Area (M²)	Volumen (M³)	LUGAR
				2,70	2,55		6,00		41,31		
				0,40	0,80		-8,00		-2,56		
				2,00	2,55		-2,00		-10,20		
				2,70	3,20		3,00		25,92		
				0,40	0,80		-2,00		-0,64		
				2,70	2,00		1,00		5,40		
						TOTAL		0,00	59,23	0,00	

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DIMENSIONES					TOTAL			LOCALIZACIÓN
8,03	REPELLO MURO 1:3	M2	Ancho (M)	Altura (M)	Longitud (M)	Descuento:	Cant (Und)	Long Total (ML)	Area (M²)	Volumen (M³)	LUGAR
				3,20	7,90		1,00		25,28		MURO POSTERIOR INTERIOR
				0,40	0,80		-2,00		-0,64		

		2,00	2,55		-1,00		-5,10		
		3,50	7,90		1,00		27,65		MURO FRONTAL INTERIOR
		0,40	0,80		-2,00		-0,64		
		2,00	2,55		-1,00		-5,10		
		2,70	2,00		-1,00		-5,40		
		3,10	3,30		1,00		10,23		MURO LATERAL INTERIOR IZQUIERDO
		0,40	0,80		-2,00		-0,64		
		3,10	3,50		1,00		10,85		MURO LATERAL INTERIOR DERECHO
		0,40	0,80		-2,00		-0,64		
		0,55	3,50		4,00		7,70		CUCHILLAS
				TOTAL		0,00	63,55	0,00	

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DIMENSIONES					TOTAL			LOCALIZACIÓN
8,04	FILOS - DILATACIONES	ML	Ancho (M)	Altura (M)	Longitud (M)	Descuento:	Cant (Und)	Long Total (ML)	Area (M²)	Volumen (M³)	LUGAR
					110,80		1,00	110,80			
						TOTAL		110,80	0,00	0,00	

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DIMENSIONES					TOTAL			LOCALIZACIÓN
8,06	ESTUCO PLASTICO + RELLENO S/BLOQUE	M2	Ancho (M)	Altura (M)	Longitud (M)	Descuento:	Cant (Und)	Long Total (ML)	Area (M²)	Volumen (M³)	LUGAR
				3,20	7,90		1,00		25,28		MURO POSTERIOR INTERIOR
				0,40	0,80		-2,00		-0,64		
				2,00	2,55		-1,00		-5,10		
				3,50	7,90		1,00		27,65		MURO FRONTAL INTERIOR
				0,40	0,80		-2,00		-0,64		
				2,00	2,55		-1,00		-5,10		
				2,70	2,00		-1,00		-5,40		
				3,10	3,30		1,00		10,23		MURO LATERAL INTERIOR IZQUIERDO
				0,40	0,80		-2,00		-0,64		
				3,10	3,50		1,00		10,85		MURO LATERAL INTERIOR DERECHO
				0,40	0,80		-2,00		-0,64		
						TOTAL		0,00	55,85	0,00	

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DIMENSIONES					TOTAL			LOCALIZACIÓN
NP 01	C.FALSO LAMINA PVC A=25CM E=10MM	M2	Ancho (M)	Altura (M)	Longitud (M)	Descuento:	Cant (Und)	Long Total (ML)	Area (M²)	Volumen (M³)	LUGAR
			3,30		2,60		1,00		8,58		
			3,50		5,30		1,00		18,55		
						TOTAL	2,00	0,00	27,13	0,00	

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DIMENSIONES					TOTAL			LOCALIZACIÓN
NP 02	ALFAGIA CONCRETO A= 25 - 30CM	ML	Ancho (M)	Altura (M)	Longitud (M)	Descuento:	Cant (Und)	Long Total (ML)	Area (M²)	Volumen (M³)	LUGAR
					25,20		1,00	25,20			
						TOTAL	1,00	25,20	0,00	0,00	

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DIMENSIONES	TOTAL	LOCALIZACIÓN

AERONÁUTICA CIVIL

RVLC0783 ADECUAR SALAS DE ENTRENAMIENTO OPERACIONAL PARA EL PERSONAL DE CONTROLADORES AEREOS REGIONAL VALLE

NP 03	PINTURA TIPO 1 INTERIOR, 3 MANOS	M2	Ancho (M)	Altura (M)	Longitud (M)	Descuento:	Cant (Und)	Long Total (ML)	Area (M²)	Volumen (M³)	LUGAR
				3,20	7,90		1,00		25,28		MURO POSTERIOR INTERIOR
				0,40	0,80		-2,00		-0,64		
				2,00	2,55		-1,00		-5,10		
				3,50	7,90		1,00		27,65		MURO FRONTAL INTERIOR
				0,40	0,80		-2,00		-0,64		
				2,00	2,55		-1,00		-5,10		
				2,70	2,00		-1,00		-5,40		
				3,10	3,30		1,00		10,23		MURO LATERAL INTERIOR IZQUIERDO
				0,40	0,80		-2,00		-0,64		
				3,10	3,50		1,00		10,85		MURO LATERAL INTERIOR DERECHO
				0,40	0,80		-2,00		-0,64		
						TOTAL		0,00	55,85	0,00	

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DIMENSIONES					TOTAL			LOCALIZACIÓN
NP 04	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MURO 1:3	M2	Ancho (M)	Altura (M)	Longitud (M)	Descuento:	Cant (Und)	Long Total (ML)	Area (M²)	Volumen (M³)	LUGAR
				3,20	8,30		1,00		26,56		MURO POSTERIOR EXTERIOR
				0,40	0,80		-2,00		-0,64		
				2,00	2,55		-1,00		-5,10		
				3,50	8,30		1,00		29,05		MURO FRONTAL EXTERIOR
				0,40	0,80		-2,00		-0,64		
				2,00	2,55		-1,00		-5,10		
				2,70	2,00		-1,00		-5,40		
				3,10	3,80		2,00		23,56		MUROS LATERALES EXTERIOR
				0,40	0,80		-4,00		-1,28		
						TOTAL		0,00	61,01	0,00	

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DIMENSIONES					TOTAL			LOCALIZACIÓN
NP 05	TUBERIA PVC 2 SANITARIA	ML	Ancho (M)	Altura (M)	Longitud (M)	Descuento:	Cant (Und)	Long Total (ML)	Area (M²)	Volumen (M³)	LUGAR
					3,90		2,00	7,80			
						TOTAL	2,00	7,80	0,00	0,00	

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DIMENSIONES					TOTAL			LOCALIZACIÓN
NP 06	SIFON SANITARIO PVC 2"	UND	Ancho (M)	Altura (M)	Longitud (M)	Descuento:	Cant (Und)	Long Total (ML)	Area (M²)	Volumen (M³)	LUGAR
							2,00		0,00		
						TOTAL	2,00	0,00	0,00	0,00	

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DIMENSIONES					TOTAL			LOCALIZACIÓN
NP 09	PANEL LED 0,60 X 0,60 MTS	UND	Ancho (M)	Altura (M)	Longitud (M)	Descuento:	Cant (Und)	Long Total (ML)	Area (M²)	Volumen (M³)	LUGAR
							6,00				
						TOTAL	6,00	0,00	0,00	0,00	

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DIMENSIONES	TOTAL	LOCALIZACIÓN

AERONÁUTICA CIVIL

RVLC0783 ADECUAR SALAS DE ENTRENAMIENTO OPERACIONAL PARA EL PERSONAL DE CONTROLADORES AEREOS REGIONAL VALLE

NP 10	CANAL GALVANIZADA CALIBRE 20 DESARROLLO 0,61 MTS	ML	Ancho (M)	Altura (M)	Longitud (M)	Descuento:	Cant (Und)	Long Total (ML)	Area (M²)	Volumen (M³)	LUGAR
					8,10		1,00	8,10	0,00		
						TOTAL	1,00	8,10	0,00	0,00	

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DIMENSIONES					TOTAL			LOCALIZACIÓN
NP 11	ACOMETIDA CABLE STP CATEGORIA 6. VOZ Y DATOS	ML	Ancho (M)	Altura (M)	Longitud (M)	Descuento:	Cant (Und)	Long Total (ML)	Area (M²)	Volumen (M³)	LUGAR
					55,00		1,00	55,00	0,00		
						TOTAL	1,00	55,00	0,00	0,00	

AEROPUERTO SANTANA DE CARTAGO

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DIMENSIONES					TOTAL			LOCALIZACIÓN
9,01	RASQUETEADA-LIJADA-RESANE	M2	Ancho (M)	Altura (M)	Longitud (M)	Descuento:	Cant (Und)	Long Total (ML)	Area (M²)	Volumen (M³)	LUGAR
			3,45	2,60			2,00		17,94		
			3,40	2,60			2,00		17,68		
									0,00		
									0,00		
						TOTAL		0,00	35,62	0,00	

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DIMENSIONES					TOTAL			LOCALIZACIÓN
9,02	VINILO CIELO TIPO 1 [3M]	M2	Ancho (M)	Altura (M)	Longitud (M)	Descuento:	Cant (Und)	Long Total (ML)	Area (M²)	Volumen (M³)	LUGAR
			3,45	2,60			2,00		17,94		
			3,40	2,60			2,00		17,68		
									0,00		
									0,00		
						TOTAL		0,00	35,62	0,00	

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DIMENSIONES					TOTAL			LOCALIZACIÓN
9,03	REPELLO MURO 1:3	M2	Ancho (M)	Altura (M)	Longitud (M)	Descuento:	Cant (Und)	Long Total (ML)	Area (M²)	Volumen (M³)	LUGAR
			3,45	2,60			2,00		17,94		
			3,40	2,60			2,00		17,68		
									0,00		
									0,00		
						TOTAL		0,00	35,62	0,00	

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DIMENSIONES					TOTAL			LOCALIZACIÓN
9,04	DESM CIELO FALSO PANEL + ESTRUCTURA	M2	Ancho (M)	Altura (M)	Longitud (M)	Descuento:	Cant (Und)	Long Total (ML)	Area (M²)	Volumen (M³)	LUGAR
			3,45		3,40				11,73		
									0,00		
									0,00		
									0,00		
						TOTAL		0,00	11,73	0,00	

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DIMENSIONES	TOTAL	LOCALIZACIÓN

AERONAUTICA CIVIL

RVLC0783 ADECUAR SALAS DE ENTRENAMIENTO OPERACIONAL PARA EL PERSONAL DE CONTROLADORES AEREOS REGIONAL VALLE

9,08	INSTALACION SALIDA LAMPARA	UND	Ancho (M)	Altura (M)	Longitud (M)	Descuento:	Cant (Und)	Long Total (ML)	Area (M²)	Volumen (M³)	LUGAR
							1,00		0,00		
									0,00		
									0,00		
									0,00		
						TOTAL	1,00	0,00	0,00	0,00	

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DIMENSIONES					TOTAL			LOCALIZACIÓN
9,11	DEMOL.ENCHAPE CERAMICO	M2	Ancho (M)	Altura (M)	Longitud (M)	Descuento:	Cant (Und)	Long Total (ML)	Area (M²)	Volumen (M³)	LUGAR
			3,45		3,40				11,73		
									0,00		
									0,00		
									0,00		
						TOTAL		0,00	11,73	0,00	

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DIMENSIONES					TOTAL			LOCALIZACIÓN
9,12	C.FALSO LAMINA PVC A=25CM E=10MM	M2	Ancho (M)	Altura (M)	Longitud (M)	Descuento:	Cant (Und)	Long Total (ML)	Area (M²)	Volumen (M³)	LUGAR
			3,45		3,40				11,73		
									0,00		
									0,00		
									0,00		
						TOTAL		0,00	11,73	0,00	

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DIMENSIONES					TOTAL			LOCALIZACIÓN
9,13	CERAMICA 30.01-32.50x30.01-32.50 TRAF.4	M2	Ancho (M)	Altura (M)	Longitud (M)	Descuento:	Cant (Und)	Long Total (ML)	Area (M²)	Volumen (M³)	LUGAR
			3,45		3,40				11,73		
									0,00		
									0,00		
									0,00		
						TOTAL		0,00	11,73	0,00	

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DIMENSIONES					TOTAL			LOCALIZACIÓN
10,01	DESM.APARATO SANITARIO	UND	Ancho (M)	Altura (M)	Longitud (M)	Descuento:	Cant (Und)	Long Total (ML)	Area (M²)	Volumen (M³)	LUGAR
							2,00		0,00		
									0,00		
									0,00		
									0,00		
						TOTAL	2,00	0,00	0,00	0,00	

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DIMENSIONES					TOTAL			LOCALIZACIÓN
10,02	DEMOL.ENCHAPE CERAMICO	M2	Ancho (M)	Altura (M)	Longitud (M)	Descuento:	Cant (Und)	Long Total (ML)	Area (M²)	Volumen (M³)	LUGAR
			1,76		2,40		1,00		4,22		Piso
			1,76		2,50		2,00		8,80		Paredes
			2,40		2,50		2,00		12,00		
									0,00		
						TOTAL	1,00	0,00	25,02	0,00	

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DIMENSIONES					TOTAL			LOCALIZACIÓN
10,03	DESM CIELO FALSO PANEL + ESTRUCTURA	M2	Ancho (M)	Altura (M)	Longitud (M)	Descuento:	Cant (Und)	Long Total (ML)	Area (M²)	Volumen (M³)	LUGAR

		1,76		2,40		1,00		4,22		
								0,00		
					TOTAL	1,00	0,00	4,22	0,00	

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DIMENSIONES					TOTAL			LOCALIZACIÓN
10,04	RETIRO LAMPARA	UND	Ancho (M)	Altura (M)	Longitud (M)	Descuento:	Cant (Und)	Long Total (ML)	Area (M²)	Volumen (M³)	LUGAR
							1,00		0,00		
									0,00		
						TOTAL	1,00	0,00	0,00	0,00	

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DIMENSIONES					TOTAL			LOCALIZACIÓN
10,05	RETIRO SWITCHE O TOMA	UND	Ancho (M)	Altura (M)	Longitud (M)	Descuento:	Cant (Und)	Long Total (ML)	Area (M²)	Volumen (M³)	LUGAR
							2,00		0,00		
									0,00		
						TOTAL	2,00	0,00	0,00	0,00	

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DIMENSIONES					TOTAL			LOCALIZACIÓN
10,07	INSTALACION SALIDA LAMPARA	UND	Ancho (M)	Altura (M)	Longitud (M)	Descuento:	Cant (Und)	Long Total (ML)	Area (M²)	Volumen (M³)	LUGAR
							1,00		0,00		
									0,00		
						TOTAL	1,00	0,00	0,00	0,00	

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DIMENSIONES					TOTAL			LOCALIZACIÓN
10,1	C.FALSO LAMINA PVC A=25CM E=10MM	M2	Ancho (M)	Altura (M)	Longitud (M)	Descuento:	Cant (Und)	Long Total (ML)	Area (M²)	Volumen (M³)	LUGAR
			1,76		2,40		1,00		4,22		
									0,00		
						TOTAL	1,00	0,00	4,22	0,00	

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DIMENSIONES					TOTAL			LOCALIZACIÓN
10,11	ALISTADO PISO IMPERMEABLE 4 CM	M2	Ancho (M)	Altura (M)	Longitud (M)	Descuento:	Cant (Und)	Long Total (ML)	Area (M²)	Volumen (M³)	LUGAR
			1,76		2,40		1,00		4,22		
									0,00		
						TOTAL	1,00	0,00	4,22	0,00	

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DIMENSIONES					TOTAL			LOCALIZACIÓN
10,12	ENCHAPE CERAMICA 20X20 -1 CALIDAD	M2	Ancho (M)	Altura (M)	Longitud (M)	Descuento:	Cant (Und)	Long Total (ML)	Area (M²)	Volumen (M³)	LUGAR
			1,76		2,40		1,00		4,22		

	1,76		2,50		2,00		8,80		
	2,40		2,50		2,00		12,00		
							0,00		
				TOTAL	1,00	0,00	25,02	0,00	

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DIMENSIONES					TOTAL			LOCALIZACIÓN
10,27	SIFON SANITARIO PVC 2"	UND	Ancho (M)	Altura (M)	Longitud (M)	Descuento:	Cant (Und)	Long Total (ML)	Area (M²)	Volumen (M³)	LUGAR
							2,00		0,00		
						TOTAL	2,00	0,00	0,00	0,00	

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DIMENSIONES					TOTAL			LOCALIZACIÓN
11,01	REPELLO MURO 1:3	M2	Ancho (M)	Altura (M)	Longitud (M)	Descuento:	Cant (Und)	Long Total (ML)	Area (M²)	Volumen (M³)	LUGAR
			2,50	0,90			4,00		6,10		Paredes Tunel
			1,10	2,50			1,00		3,60		Plancha
			1,10	0,90			1,00		2,00		Lateral
						TOTAL		0,00	11,70	0,00	

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DIMENSIONES					TOTAL			LOCALIZACIÓN
11,02	ESTUCO PLASTICO MURO [PASTA]	M2	Ancho (M)	Altura (M)	Longitud (M)	Descuento:	Cant (Und)	Long Total (ML)	Area (M²)	Volumen (M³)	LUGAR
			2,50	0,90			4,00		6,10		Paredes Tunel
			1,10	2,50			1,00		3,60		Plancha
			1,10	0,90			1,00		2,00		Lateral
			3,45	2,60			2,00		17,94		Sala de Netranamiento 1 Piso
			3,40	2,60			2,00		17,68		
						TOTAL		0,00	47,32	0,00	

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DIMENSIONES					TOTAL			LOCALIZACIÓN
11,03	VINILO CIELO TIPO 1 [3M]	M2	Ancho (M)	Altura (M)	Longitud (M)	Descuento:	Cant (Und)	Long Total (ML)	Area (M²)	Volumen (M³)	LUGAR
			2,50	0,90			4,00		6,10		Paredes Tunel
			1,10	2,50			1,00		3,60		Plancha
			1,10	0,90			1,00		2,00		Lateral
			3,45	2,60			2,00		17,94		Sala de Netranamiento 1 Piso
			3,40	2,60			2,00		17,68		
						TOTAL		0,00	47,32	0,00	

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DIMENSIONES					TOTAL			LOCALIZACIÓN
11,04	DESM.VENTANA EXISTENTE	M3	Ancho (M)	Altura (M)	Longitud (M)	Descuento:	Cant (Und)	Long Total (ML)	Area (M²)	Volumen (M³)	LUGAR
			2,45	1,13			1,00		3,58		
			2,40	1,13			1,00		3,53		
			2,43	1,13			1,00		3,56		
			2,43	1,13			1,00		3,56		
			2,43	1,13			1,00		3,56		
			1,65	1,13			1,00		2,78		
			2,43	1,13			1,00		3,56		
			2,43	1,13			1,00		3,56		

		0,50	1,00			8,00		8,50		
		0,62	0,82			1,00		1,44		
		0,57	0,82			1,00		1,39		
					TOTAL		0,00	39,02	0,00	

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DIMENSIONES					TOTAL			LOCALIZACIÓN
11,06	VENTANA ALUM.FIJA P.38-31 - SIN VIDRIO	M2	Ancho (M)	Altura (M)	Longitud (M)	Descuento:	Cant (Und)	Long Total (ML)	Area (M²)	Volumen (M³)	LUGAR
			2,50	1,16			1,00		3,66		
			2,50	1,16			1,00		3,66		
			2,50	1,16			1,00		3,66		
			2,50	1,16			1,00		3,66		
			2,50	1,16			1,00		3,66		
			2,50	1,16			1,00		3,66		
			2,50	1,16			1,00		3,66		
			2,50	1,16			1,00		3,66		
			0,50	1,00			8,00		8,50		
			0,70	0,90			1,00		1,60		
			0,65	0,90			1,00		1,55		
						TOTAL		0,00	40,93	0,00	

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DIMENSIONES					TOTAL			LOCALIZACIÓN
11,07	VIDRIO LAMINADO INCOLORO 8 MM	M2	Ancho (M)	Altura (M)	Longitud (M)	Descuento:	Cant (Und)	Long Total (ML)	Area (M²)	Volumen (M³)	LUGAR
			2,45	1,13			1,00		3,58		
			2,40	1,13			1,00		3,53		
			2,43	1,13			1,00		3,56		
			2,43	1,13			1,00		3,56		
			2,43	1,13			1,00		3,56		
			1,65	1,13			1,00		2,78		
			2,43	1,13			1,00		3,56		
			2,43	1,13			1,00		3,56		
			0,50	1,00			8,00		8,50		
			0,62	0,82			1,00		1,44		
			0,57	0,82			1,00		1,39		
						TOTAL		0,00	39,02	0,00	

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DIMENSIONES					TOTAL			LOCALIZACIÓN
11,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE OPALIZADO	M2	Ancho (M)	Altura (M)	Longitud (M)	Descuento:	Cant (Und)	Long Total (ML)	Area (M²)	Volumen (M³)	LUGAR
			2,45	1,13			1,00		3,58		
			2,40	1,13			1,00		3,53		
			2,43	1,13			1,00		3,56		
			2,43	1,13			1,00		3,56		
			2,43	1,13			1,00		3,56		
			1,65	1,13			1,00		2,78		
			2,43	1,13			1,00		3,56		
			2,43	1,13			1,00		3,56		
			0,50	1,00			8,00		8,50		
			0,62	0,82			1,00		1,44		
			0,57	0,82			1,00		1,39		

				TOTAL		0,00	39,02	0,00	

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DIMENSIONES					TOTAL			LOCALIZACIÓN
11,09	LIJADA Y PINTURA DE ESTRUCTURA METALICA	ML	Ancho (M)	Altura (M)	Longitud (M)	Descuento:	Cant (Und)	Long Total (ML)	Area (M²)	Volumen (M³)	LUGAR
						TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DIMENSIONES					TOTAL			LOCALIZACIÓN
NPC 01	PANEL LED 0,60 X 0,60 MTS	UND	Ancho (M)	Altura (M)	Longitud (M)	Descuento:	Cant (Und)	Long Total (ML)	Area (M²)	Volumen (M³)	LUGAR
							2,00		0,00		
									0,00		
									0,00		
						TOTAL	2,00	0,00	0,00	0,00	

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DIMENSIONES					TOTAL			LOCALIZACIÓN
NPC 02	GUARDAESCOBA PORCELANATO 7X30CM	ML	Ancho (M)	Altura (M)	Longitud (M)	Descuento:	Cant (Und)	Long Total (ML)	Area (M²)	Volumen (M³)	LUGAR
			3,45	3,40			2,00	13,70			
						TOTAL		13,70	0,00	0,00	

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DIMENSIONES					TOTAL			LOCALIZACIÓN
NPC 03	CONTRAPISO CONCRETO E= 6CM 2.500Psi	M2	Ancho (M)	Altura (M)	Longitud (M)	Descuento:	Cant (Und)	Long Total (ML)	Area (M²)	Volumen (M³)	LUGAR
			3,45		3,40		1,00		11,73		
			2,05		1,35	-1,00			-2,77		
									0,00		
						TOTAL		0,00	8,96	0,00	

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DIMENSIONES					TOTAL			LOCALIZACIÓN
NPC 04	ALISTADO PISO 4 CM	M2	Ancho (M)	Altura (M)	Longitud (M)	Descuento:	Cant (Und)	Long Total (ML)	Area (M²)	Volumen (M³)	LUGAR
			3,45		3,40		1,00		11,73		
						TOTAL	1,00	0,00	11,73	0,00	

CONDICIONES GENERALES

NÚMERO DE CONTRATO	20001103-H4 de 2020
CLASE DE CONTRATO	OBRA.
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS 2020.
OBJETO	RVLC0783 ADECUAR SALAS DE ENTRENAMIENTO OPERACIONAL PARA EL PERSONAL DE CONTROLADORES AEREOS REGIONAL VALLE.
VALOR	CIENTO CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS IVA INCLUIDO $ 105.673.174,00 M/CTE.
ADICION	VEINTI CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS DOS M/CTE ($ 24.690.202) INCLUIDO IVA SOBRE LA UTILIDAD
PLAZO	Cuarenta y cinco (45) días calendario contados a partir de la suscripción del acta de inicio sin exceder la fecha de recibo final que no debe pasar del día 31 de diciembre de 2020.
VALOR FINAL	CIENTO TREINTA MILLONES SEISCIENTOS SETANTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS Y SEIS PESOS M/CTE ($130.636.376). INCLUIDO IVA SOBRE LA UTILIDAD
PRORROGA	N/A
PLAZO FINAL	Cuarenta y cinco (45) días calendario contados a partir de la suscripción del acta de inicio sin exceder la fecha de recibo final que no debe pasar del día 31 de diciembre de 2020.
CDP	25520 09-09-2020
RP	84320 15-11-2020
CDP ADICIONAL	35320 16-12-2020
RP ADICIONAL	98420 17-12-2020
FECHA LEGALIZACIÓN	15 DE NOVIEMBRE DE 2020
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	MILTON CESAR SANCHEZ PEREZ.

En la ciudad de Palmira (V), a los 21 días del mes de diciembre de 2020, se reunieron:

El Ing. **DIEGO ROLANDO GUTIERREZ** representante legal de **CONSORCIO OBRAS 2020** obrando como contratista, **MILTON CESAR SANCHEZ PEREZ** como Supervisor y **JUAN DAVID RODRIGUEZ SUANCHA** en apoyo a la supervisión designado por la Aeronáutica Civil, con el propósito de efectuar la Entrega y Recibo de **ACTA DE COBRO PARCIAL No.1,** de las obras el Contrato 20001103-H4 de 2020.

CONDICIONES LEGALES

FECHA ACTA DE INICIO:

15/11/2020

SUSPENSIONES:

N/A

LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIONES

N/A

PRÓRROGAS

N/A

ADICIONES EN VALOR

VEINTI CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS DOS M/CTE ($ 24.690.202) INCLUIDO IVA SOBRE LA UTILIDAD.

TERMINACIÓN CONTRACTUAL:

30/12/2020

ACTIVIDADES EJECUTADAS

ITEMS	DESCRIPCIÓN	ACTA No 01 DE MODIFICACION DE CANTIDADES (CONDICIONES ACTUALZADAS)				ACTA DE COBRO PARCIAL No.1	
		UND.	CANT.	Vr.UNIT.	VALOR	CANT.	VALOR
1	AEROPUERTO MATECAÑA DE PEREIRA						
	Preliminares.						
1,01	LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON.	M2	31,54	$ 3.400,00	$ 107.236,00	31,54	$ 107.236,00

1,02	CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-SINB	ML	48,70	$ 18.600,00	$ 905.820,00	48,70	$	905.820,00
1,03	RETIRO DE ARBUSTO Y POSTERIOR TRANSPLANTE	UND	2,00	$ 11.700,00	$ 23.400,00	2,00	$	23.400,00
1,04	EXCAVACION DE TIERRA A MANO (VIGAS CIMIENTO)	M3	53,22	$ 11.900,00	$ 633.318,00	53,22	$	633.318,00
1,05	DESCAPOTE MAQUINA MAS RETIRO	M2	57,88	$ 1.400,00	$ 81.032,00	57,88	$	81.032,00
1,06	EXCAVACION A MAQUINA SIN RETIRO	M3	0,00	$ 2.500,00	$ -	0,00	$	-
1,07	RETIRO SOBRANTES MAQUINA <=10KM.	M3	13,07	$ 15.800,00	$ 206.506,00	0,00	$	-
2	Rellenos.							
2,01	RELLENO ROCA MUERTA COMPAC-CILINDRO +ACA	M3	31,50	$ 31.600,00	$ 995.400,00	31,50	$	995.400,00
2,02	RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO-RANA	M3	6,63	$ 12.900,00	$ 85.527,00	6,63	$	85.527,00
2,03	CONFIGURACION-NIVELACION TERRENO	M2	0,00	$ 700,00	$ -	0,00	$	-
2,04	CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95	M2	0,00	$ 2.400,00	$ -	0,00	$	-
3	Cimentacion y Estructura							
3,01	SOLADO ESPESOR E=0.05M 3000 PSI 210 MPA	M2	27,84	$ 18.700,00	$ 520.608,00	27,84	$	520.608,00
3,02	CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI RELAC.60C/40P	M3	3,52	$ 261.100,00	$ 919.072,00	3,52	$	919.072,00
3,03	ZAPATA CONCRETO 3000 PSI INC. FORMALETA	M3	2,05	$ 327.600,00	$ 671.580,00	2,05	$	671.580,00
3,04	PEDESTAL CONCRETO	M3	0,00	$ 366.300,00	$ -	0,00	$	-
3,05	VIGA CIMIENTO ENLACE H=20-40 CMS	M3	2,64	$ 497.100,00	$ 1.312.344,00	2,64	$	1.312.344,00
3,06	COLUMNA CONCRETO 4000 PSI	M3	2,12	$ 803.700,00	$ 1.703.844,00	2,12	$	1.703.844,00
3,07	VIGA CONCRETO AEREA 3000 PSI	M3	2,64	$ 698.100,00	$ 1.842.984,00	2,64	$	1.842.984,00
3,08	DESCOLGADO CONCRETO 45 CMS	ML	0,00	$ 65.900,00	$ -	0,00	$	-
3,09	VIGA CONCR.AMARRE MURO 10-12x20CM	ML	29,40	$ 27.200,00	$ 799.680,00	29,40	$	799.680,00
3,10	COLUMNA AMARRE MURO CULATA E=15CM-20CM	ML	0,00	$ 34.600,00	$ -	0,00	$	-
3,11	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KG	1042,00	$ 3.300,00	$ 3.438.600,00	1042,00	$	3.438.600,00
3,12	MALLA ELECTROSOLDADA M-0.84	KG	76,98	$ 4.700,00	$ 361.806,00	76,98	$	361.806,00
3,13	VIGA CANAL AEREA CONCRETO 3000 PSI	M3	0,00	$ 748.500,00	$ -	0,00	$	-
3,14	ESTRUCTURA METALICA PERFIL IPE	KG	0,00	$ 6.000,00	$ -	0,00	$	-
3,15	PERFIL ABIERTO HR C160x 60mm - 2.0MM C.14	ML	0,00	$ 34.500,00	$ -	0,00	$	-
3,16	PLASTIFICANTE IMPERMEABILIZANTE.	KG	20,00	$ 11.000,00	$ 220.000,00	20,00	$	220.000,00
4	Cubierta.							
4,01	TEJA ALUMINIO-POLIURETANO-ALUM.E=1 1C	M2	28,00	$ 131.800,00	$ 3.690.400,00	28,00	$	3.690.400,00
4,02	IMPERM.MANTO 800XT. 4mm.	M2	0,00	$ 28.000,00	$ -	0,00	$	-
4,03	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4	ML	5,40	$ 18.000,00	$ 97.200,00	5,40	$	97.200,00
4,04	TUBERIA PVC 4 SANITARIA	ML	17,80	$ 27.600,00	$ 491.280,00	17,80	$	491.280,00
4,05	CODO SANITARIO PVC 45 CE-4"	UND	0,00	$ 14.300,00	$ -	0,00	$	-
4,06	CODO SANITARIO PVC 90 CE-4"	UND	2,00	$ 9.400,00	$ 18.800,00	2,00	$	18.800,00

4,07	ABRAZADERA SANITARIA 4"	UND	8,00	$	17.200,00	$ 137.600,00	8,00	$	137.600,00
4,08	CAJA INSPECCION 60x60,HAST 1.0M CONC+EXC	UND	3,00	$	188.400,00	$ 565.200,00	0,00	$	-
4,09	TAPA CAJA MARCO ANGULO 51X51 - 60X60	UND	3,00	$	103.700,00	$ 311.100,00	0,00	$	-
4,1	C.F.PANEL YESO 12.7MM S.JUNTA+VINILO	M2	0,00	$	34.200,00	$ -	0,00	$	-
4,11	AISLAMIENTO TERMICO FRESCASA	M2	0,00	$	17.600,00	$ -	0,00	$	-
4,12	LAMINA POLICARBONATO ALVEOLAR 4MM	M2	0,00	$	40.700,00	$ -	0,00	$	-
4,13	REMATE SUPERIOR CONTRA MURO TEJA AJOVER	ML	29,40	$	53.000,00	$ 1.558.200,00	29,40	$	1.558.200,00
4,14	SOLAPA LAMINA GALVANIZADA	ML	0,00	$	19.200,00	$ -	0,00	$	-
4,15	CONECTOR H LAMINA POLICARBONATO A=4- 6MM	ML	0,00	$	14.700,00	$ -	0,00	$	-
4,16	CONECTOR BASE+TAPA LAMINA POLICARBONATO	ML	0,00	$	28.600,00	$ -	0,00	$	-
4,17	TUBO ESTRUCTURAL 76x 38x2.0MM	ML	33,20	$	38.800,00	$ 1.288.160,00	33,20	$	1.288.160,00
5	Carpinterias								
5,01	VENTANA ALUM.FIJA P.38-31	M2	10,20	$	190.300,00	$ 1.941.060,00	0,00	$	-
5,02	NAVE ALUMINIO NAVE-ENTAMBORADA-LLENA	M2	0,00	$	332.200,00	$ -	0,00	$	-
5,03	MARCOS EN ALUM 0,81-1,00M LISO C/ LUCETA	UND	8,00	$	181.300,00	$ 1.450.400,00	0,00	$	-
5,04	CERRADURA YALE ENTRADA PPAL.REF.5316	UND	1,00	$	135.100,00	$ 135.100,00	0,00	$	-
6	Pisos.								
6,01	CONTRAPISO CONCRETO E= 6CM 2.500Psi	M2	57,88	$	24.600,00	$ 1.423.848,00	57,88	$	1.423.848,00
6,02	ALISTADO PISO 4 CM	M2	31,54	$	19.700,00	$ 621.338,00	31,54	$	621.338,00
6,03	CERAMICA 30.01-32.50x30.01-32.50 TRAF.4	M2	31,54	$	48.400,00	$ 1.526.536,00	31,54	$	1.526.536,00
6,04	GUARDAESCOBA PORCELANATO 7X30CM	ML	24,20	$	11.300,00	$ 273.460,00	24,20	$	273.460,00
7	Instalaciones Electricas y Domotizado								
7,01	SAL TOMA 1F (C/T/A/TO:REGULADO P&S)	UND	4,00	$	82.000,00	$ 328.000,00	0,00	$	-
7,02	TABLERO 2F 6 CTOS TQSP	UND	0,00	$	210.400,00	$ -	0,00	$	-
7,03	BREAKER 2F DESDE 15 HASTA 60 AMP	UND	6,00	$	79.600,00	$ 477.600,00	0,00	$	-
7,04	SAL LAMP EMT	UND	6,00	$	94.100,00	$ 564.600,00	0,00	$	-
7,05	SALIDA S3 EMT	UND	1,00	$	110.600,00	$ 110.600,00	0,00	$	-
7,06	LAMPARA HERMETICA LED 2X20W	UND	0,00	$	144.600,00	$ -	0,00	$	-
7,07	INSTALACION LAMPARA 2X96	UND	0,00	$	26.300,00	$ -	0,00	$	-
7,08	INSTALACION SALIDA LAMPARA	UND	6,00	$	26.600,00	$ 159.600,00	6,00	$	159.600,00
7,09	INSTALACION SALIDA TOMA A 120V	UND	5,00	$	32.100,00	$ 160.500,00	0,00	$	-
7,1	INSTALACION SWITCHE	UND	0,00	$	6.000,00	$ -	0,00	$	-
7,11	PUNTO SANITARIO PVC 1,1/2 [V]	PTO	0,00	$	19.600,00	$ -	0,00	$	-
7,12	TUBERIA PVC 1,1/2"	ML	0,00	$	10.100,00	$ -	0,00	$	-
7,13	CODO 90 PRESION PVC 1,1/2"	UND	0,00	$	8.000,00	$ -	0,00	$	-

7,14	ACOM.E.3F(3#4/0+1#4/0)3"	ML	0,00	$ 366.200,00	$ -	0,00	$	-
8	Mampostería, Repellos, Estucos y Pintura							
8,01	MURO BLOQUE CONCRETO 10x19x39CM	M2	59,23	$ 40.000,00	$ 2.369.200,00	59,23	$	2.369.200,00
8,02	ALFAGIA CONCRETO A= 8-10CM	ML	0,00	$ 21.300,00	$ -	0,00	$	-
8,03	REPELLO MURO 1:3	M2	63,55	$ 17.400,00	$ 1.105.770,00	63,55	$	1.105.770,00
8,04	FILOS - DILATACIONES	ML	110,80	$ 3.400,00	$ 376.720,00	110,80	$	376.720,00
8,05	REPELLO VIGA CANAL [3C]	ML	0,00	$ 24.800,00	$ -	0,00	$	-
8,06	ESTUCO PLASTICO + RELLENO S/BLOQUE	M2	55,85	$ 15.500,00	$ 865.675,00	55,85	$	865.675,00
8,07	KORAZA [3M]	M2	61,01	$ 8.300,00	$ 506.383,00	0,00	$	-
ITEMS NUEVOS								
NP 01	C.FALSO LAMINA PVC A=25CM E=10MM	M2	27,13	$ 61.200,00	$ 1.660.356,00	27,13	$	1.660.356,00
NP 02	ALFAGIA CONCRETO A= 25 - 30CM	ML	25,20	$ 28.853,00	$ 727.096,00	25,20	$	727.096,00
NP 03	PINTURA TIPO 1 INTERIOR, 3 MANOS	M2	55,85	$ 8.100,00	$ 452.385,00	55,85	$	452.385,00
NP 04	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MURO 1:3	M2	61,01	$ 19.597,00	$ 1.195.613,00	61,01	$	1.195.613,00
NP 05	TUBERIA PVC 2 SANITARIA	ML	7,80	$ 17.480,00	$ 136.344,00	7,80	$	136.344,00
NP 06	SIFON SANITARIO PVC 2"	UND	2,00	$ 27.000,00	$ 54.000,00	2,00	$	54.000,00
NP 07	REJILLA PARA SIFÓN 3x2"	UND	2,00	$ 21.000,00	$ 42.000,00	0,00	$	-
NP 08	PUERTA PRINCIPAL EN VIDRIO, CON CUERPO FIJO DE 0,70 MTS Y DOS CUERPOS BATIENTES CADA UNO DE 1 X 2 MTS	UND	1,00	$ 4.414.333,00	$ 4.414.333,00	0,00	$	-
NP 09	PANEL LED 0,60 X 0,60 MTS	UND	6,00	$ 170.000,00	$ 1.020.000,00	6,00	$	1.020.000,00
NP 10	CANAL GALVANIZADA CALIBRE 20 DESARROLLO 0,61 MTS	ML	8,10	$ 118.375,00	$ 958.838,00	8,10	$	958.838,00
NP 11	ACOMETIDA CABLE STP CATEGORIA 6. VOZ Y DATOS	ML	55,00	$ 30.050,00	$ 1.652.750,00	0,00	$	-
NP 12	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO, 8 CIRCUITOS CON TOTALIZADOR	UND	1,00	$ 570.250,00	$ 570.250,00	0,00	$	-
NP 13	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICO, 8 CIRCUITOS	UND	1,00	$ 154.417,00	$ 154.417,00	0,00	$	-
NP 14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TRIPLE	UND	1,00	$ 17.750,00	$ 17.750,00	0,00	$	-
NP 15	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE BIFÁSICA 20A/220V(2Ø+PT)	UND	1,00	$ 133.180,00	$ 133.180,00	0,00	$	-
NP 16	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE RACK DE TELECOMUNICACIONES 60 CMS	UND	1,00	$ 412.900,00	$ 412.900,00	0,00	$	-
NP 17	SALIDA VOZ Y DATOS	UND	1,00	$ 73.533,00	$ 73.533,00	0,00	$	-
NP 18	TOMA JACK FACE PLATE. VOZ Y DATOS	UND	1,00	$ 49.900,00	$ 49.900,00	0,00	$	-
NP 19	ACOM.E.3F(3#2+1#6) NO REGULADA	ML	55,00	$ 104.730,00	$ 5.760.150,00	0,00	$	-
NP 20	ACOM.E.2F(2#2+1#6) REGULADA	ML	100,00	$ 78.480,00	$ 7.848.000,00	0,00	$	-

NP 21	TUBO CORRUGADO ELECTRICO DE 3"	ML	105,00	$ 48.178,00	$ 5.058.690,00	0,00	$	-
	AEROPUERTO SANTANA DE CARTAGO							
9	Sala de Capacitacion y Entrenamiento.							
9,01	RASQUETEADA-LIJADA-RESANE	M2	35,62	$ 1.700,00	$ 60.554,00	35,62	$	60.554,00
9,02	VINILO CIELO TIPO 1 [3M]	M2	35,62	$ 8.900,00	$ 317.018,00	35,62	$	317.018,00
9,03	REPELLO MURO 1:3	M2	35,62	$ 17.400,00	$ 619.788,00	35,62	$	619.788,00
9,04	DESM CIELO FALSO PANEL + ESTRUCTURA	M2	11,73	$ 4.000,00	$ 46.920,00	11,73	$	46.920,00
9,05	RETIRO LAMPARA	UND	1,00	$ 4.500,00	$ 4.500,00	0,00	$	-
9,06	RETIRO SWITCHE O TOMA	UND	0,00	$ 2.500,00	$ -	0,00	$	-
9,07	INSTALACION LAMPARA 2X96	UND	0,00	$ 26.300,00	$ -	0,00	$	-
9,08	INSTALACION SALIDA LAMPARA	UND	1,00	$ 26.600,00	$ 26.600,00	1,00	$	26.600,00
9,09	INSTALACION SALIDA TOMA A 120V	UND	0,00	$ 32.100,00	$ -	0,00	$	-
9,1	INSTALACION SWITCHE	UND	0,00	$ 6.000,00	$ -	0,00	$	-
9,11	DEMOL.ENCHAPE CERAMICO	M2	11,73	$ 7.200,00	$ 84.456,00	11,73	$	84.456,00
9,12	C.FALSO LAMINA PVC A=25CM E=10MM	M2	11,73	$ 61.200,00	$ 717.876,00	11,73	$	717.876,00
9,13	CERAMICA 30.01-32.50x30.01-32.50 TRAF.4	M2	11,73	$ 48.400,00	$ 567.732,00	11,73	$	567.732,00
9,14	DESMONTE CAJONERA	UND	0,00	$ 4.600,00	$ -	0,00	$	-
10	Baño.							
10,01	DESM.APARATO SANITARIO	UND	2,00	$ 22.400,00	$ 44.800,00	2,00	$	44.800,00
10,02	DEMOL.ENCHAPE CERAMICO	M2	25,02	$ 7.200,00	$ 180.144,00	25,02	$	180.144,00
10,03	DESM CIELO FALSO PANEL + ESTRUCTURA	M2	4,22	$ 4.000,00	$ 16.880,00	4,22	$	16.880,00
10,04	RETIRO LAMPARA	UND	1,00	$ 4.500,00	$ 4.500,00	1,00	$	4.500,00
10,05	RETIRO SWITCHE O TOMA	UND	2,00	$ 2.500,00	$ 5.000,00	2,00	$	5.000,00
10,06	INSTALACION LAMPARA 2X96	UND	0,00	$ 26.300,00	$ -	0,00	$	-
10,07	INSTALACION SALIDA LAMPARA	UND	1,00	$ 26.600,00	$ 26.600,00	1,00	$	26.600,00
10,08	INSTALACION SALIDA TOMA A 120V	UND	1,00	$ 32.100,00	$ 32.100,00	0,00	$	-
10,09	INSTALACION SWITCHE	UND	2,00	$ 6.000,00	$ 12.000,00	0,00	$	-
10,1	C.FALSO LAMINA PVC A=25CM E=10MM	M2	4,22	$ 61.200,00	$ 258.264,00	4,22	$	258.264,00
10,11	ALISTADO PISO IMPERMEABLE 4 CM	M2	4,22	$ 25.600,00	$ 108.032,00	4,22	$	108.032,00
10,12	ENCHAPE CERAMICA 20X20 -1 CALIDAD	M2	25,02	$ 44.600,00	$ 1.115.892,00	25,02	$	1.115.892,00
10,13	INCRUST.CERAM. JGO 4 PZ ESTILO (A)	JGO	1,00	$ 85.700,00	$ 85.700,00	0,00	$	-
10,14	INSTALACION SANITARIO	UND	2,00	$ 21.000,00	$ 42.000,00	0,00	$	-
10,15	INSTALACION LAVAMANOS	UND	1,00	$ 20.800,00	$ 20.800,00	0,00	$	-
10,16	DISPENSADOR JABON 1.2 LTS A.INOX	UND	1,00	$ 145.800,00	$ 145.800,00	0,00	$	-
10,17	DISPENSADOR PAPEL HIGIENICO A.INOX	UND	1,00	$ 155.200,00	$ 155.200,00	0,00	$	-
10,18	EXTRACTOR OLORES 100 CFM BAJO RUIDO	UND	1,00	$ 226.300,00	$ 226.300,00	0,00	$	-

10,19	SECADOR MANOS TORNADO 1500W AUT.	UND	1,00	$ 1.024.500,00	$ 1.024.500,00	0,00	$	-
10,2	ESPEJO CLARO DE 3MM	M2	0,50	$ 38.900,00	$ 19.450,00	0,00	$	-
10,21	LAVAMANOS COLGAR PEDESTAL LINEA MEDIA	JGO	1,00	$ 147.200,00	$ 147.200,00	0,00	$	-
10,22	ORINAL PEQUEÑO	UND	1,00	$ 158.200,00	$ 158.200,00	0,00	$	-
10,23	SANITARIO LINEA MEDIA COMPLETO	UND	1,00	$ 245.400,00	$ 245.400,00	0,00	$	-
10,24	DUCHA MEZCLADORA (M)	UND	1,00	$ 93.100,00	$ 93.100,00	0,00	$	-
10,25	DIV.BANO A.INOX ORINAL 96X46CM	UND	1,00	$ 385.700,00	$ 385.700,00	0,00	$	-
10,26	DIV.ALUM.ACRILICO 75% CORREDIZA R=4215	M2	4,00	$ 194.600,00	$ 778.400,00	0,00	$	-
10,27	SIFON SANITARIO PVC 2"	UND	2,00	$ 6.700,00	$ 13.400,00	2,00	$	13.400,00
10,28	NAVE ALUMINIO NAVE-ENTAMBORADA-LLENA	M2	6,85	$ 332.200,00	$ 2.275.570,00	0,00	$	-
10,29	CERRADURA BANO ALUMINIO	UND	1,00	$ 53.400,00	$ 53.400,00	0,00	$	-
10,3	MARCOS EN ALUM 0,81-1,00M LISO C/ LUCETA	UND	0,00	$ 181.300,00	$ -	0,00	$	-
11	Torre de Control.							
11,01	REPELLO MURO 1:3	M2	11,70	$ 17.400,00	$ 203.580,00	11,70	$	203.580,00
11,02	ESTUCO PLASTICO MURO [PASTA]	M2	47,32	$ 8.400,00	$ 397.488,00	47,32	$	397.488,00
11,03	VINILO CIELO TIPO 1 [3M]	M2	47,32	$ 8.900,00	$ 421.148,00	47,32	$	421.148,00
11,04	DESM.VENTANA EXISTENTE	M3	39,02	$ 17.400,00	$ 678.948,00	39,02	$	678.948,00
11,05	DESM.MARCO + NAVE SENCILLA	UND	3,00	$ 15.900,00	$ 47.700,00	0,00	$	-
11,06	VENTANA ALUM.FIJA P.38-31 - SIN VIDRIO	M2	40,93	$ 163.500,00	$ 6.692.055,00	40,93	$	6.692.055,00
11,07	VIDRIO LAMINADO INCOLORO 8 MM	M2	39,02	$ 194.400,00	$ 7.585.488,00	39,02	$	7.585.488,00
11,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE OPALIZADO	M3	39,02	$ 53.100,00	$ 2.071.962,00	39,02	$	2.071.962,00
11,09	LIJADA Y PINTURA DE ESTRUCTURA METALICA	ML	0,00	$ 11.200,00	$ -	0,00	$	-
ITEMS NUEVOS								
NPC 01	PANEL LED 0,60 X 0,60 MTS	UND	2,00	$ 170.000,00	$ 340.000,00	2,00	$	340.000,00
NPC 02	GUARDAESCOBA PORCELANATO 7X30CM	ML	13,70	$ 11.300,00	$ 154.810,00	13,70	$	154.810,00
NPC 03	CONTRAPISO CONCRETO E= 6CM 2.500Psi	M2	8,96	$ 24.600,00	$ 220.416,00	8,96	$	220.416,00
NPC 04	ALISTADO PISO 4 CM	M2	11,73	$ 19.700,00	$ 231.081,00	11,73	$	231.081,00

	COSTO DIRECTO TOTAL		31,00%		**$ 98.940.024,00**		**$ 60.042.102,00**
	ADMINISTRACIÓN		21,00%		$ 20.777.405,00		$ 12.608.841,00
	IMPREVISTOS		6,00%		$ 5.936.401,00		$ 3.602.526,00
	UTILIDAD		4,00%		$ 3.957.601,00		$ 2.401.684,00
	SUBTOTAL				**$ 129.611.431,00**		**$ 78.655.153,00**
	IVA SOBRE UTILIDAD		19,00%		$ 751.945,00		$ 456.320,00
	TOTAL				**$ 130.363.376,00**		**$ 79.111.473,00**

CONDICIONES FINANCIERAS

VALOR DEL CONTRATO

$ 105.673.174,00 M/CTE IVA INCLUIDO SOBRE LA UTILIDAD.

VALOR FINAL DEL CONTRATO

$130.636.376 INCLUIDO IVA SOBRE LA UTILIDAD.

FORMA DE PAGO:

La Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, pagara el valor total adjudicado por medio de **UN (1) ACTA PARCIAL, que se levantara a la mitad del plazo de ejecución y/o con un avance en la ejecución del 50% y UN (1) ACTA FINAL,** previa certificación del recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato, donde se mencionen los servicios efectivamente prestados parcialmente, acompañado de una factura comercial o cuenta de cobro (lo que aplique). El último pago se realizará previa presentación del ACTA DE RECIBO FINAL y acompañamiento de pagos parafiscales del contratista y sus empleados.

Cuando la contratación se realice con personas jurídicas, se deberá acreditar el pago a los sistemas de salud, ARL, pensiones y aportes parafiscales a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, mediante certificación expedida por el Revisor Fiscal cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de Ley, o por el Representante Legal durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para que se hubiere constituido la sociedad, el cual en todo caso no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del contrato. En el evento en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, deberá acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución (Art. 50, inciso 3 Ley 789 de 2002) y la **Certificación del pago a la Contribución FIC**, conforme al Decreto 2375 de 1974 y sus decretos reglamentarios y normas concordantes.

NOTA: Los supervisores de los contratos deben informar a contratistas y proveedores que el tiempo máximo para el pago de sus facturas, será de 10 días hábiles para reconocimiento de obligaciones amparadas con recursos propios y de 31 días hábiles cuando se trate de obligaciones amparadas con Recursos de la Nación sujetos a cupo PAC. Este tiempo empezara a contar una vez la cuenta cumpla con la totalidad de los requisitos exigidos para el pago.

DESARROLLO FINANCIERO DEL CONTRATO

ANTICIPO:

N/A

ACTAS DE RECIBO PARCIAL

Durante la vigencia del contrato fueron presentadas y tramitadas las siguientes actas: (Indicar entre otros, el número de acta, valor bruto, valor neto, valor IVA, valor otros descuentos).

NOTA 1: En caso de contratos de obra u otro que tenga pactado anticipo debe registrarse los datos correspondientes a su valor y amortización.

NOTA 2: El valor de **otros descuentos** corresponde a aquellos valores que le serán descontados al contratista por concepto de sanciones (multas, cláusula penal, entre otros) o de impuestos (Iva, 5% contribución ciudadana, Ica, Retefuente).

NOTA3: En el evento que de acuerdo con cada contrato no aplique consignar algún dato o valor debe colocarse una raya o cero según el caso.

VALOR EJECUTADO Y PENDIENTE DE PAGO

(indicar si a la fecha de la presente acta de Recibo Final se adeuda al contratista valor alguno por concepto del contrato ejecutado).

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 105.673.174
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL	$ 24.690.202
VALOR CONTRATOS REAJUSTES	$ _____

VALOR TOTAL EJECUTADO	$79.111.473	
VALOR NO EJECUTADO	$51.251.903	
VALOR PAGADO		$ 0
VALOR DESCUENTOS		$ 0
VALOR PENDIENTE PAGO		$ 130.636.376
TOTALES	$ 130.636.376	$ 130.636.376 $ 130.636.376

NOTA 1: Los totales deben dar sumas iguales

NOTA 2: En el evento que de acuerdo con cada contrato no aplique consignar algún dato o valor debe colocarse una raya o cero según el caso.

CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El supervisor y/o interventor del presente contrato deja constancia que verificó el pago de los aportes parafiscales y al sistema de seguridad social integral, de conformidad a las certificaciones de paz y salvo, presentadas por el representante legal del contratista o revisor fiscal, según el caso.

CERTIFICACIÓN DE DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN

Si los bienes utilizados en la ejecución del contrato son importados, el supervisor debe:

1. Certificar que verificó el documento de declaración de importación con la autorización de levante, para constatar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y aduaneras del proceso de importación de estos.
2. Anexar al acta copia del certificado de declaración de importación.

GARANTÍAS

El contratista se compromete a prorrogar o adicionar las garantías contractuales de acuerdo con la cláusula 18 del contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta de Recibo parcial por los que en ella intervinieron.

(Para su validez, la presente acta de recibo final debe contar con la firma del representante legal del contratista y del supervisor o interventor, con el visto bueno del Ordenador del gasto de conformidad con las Resoluciones de delegación vigentes).

DIEGO ROLANDO GUTIERREZ
RL. Consorcio obras 2020
Contratista.

JUAN DAVID RODRIGUEZ SUANCHA.
Apoyo a la supervisión del Contrato
U.A.E.A.C.

VoBo. MILTON CESAR SANCHEZ PEREZ
Director Aeronáutico Regional Valle.
U.A.E. DE AERONAUTICA CIVIL

Proyectó: Juan David Rodriguez Suancha- Infraestructura
Revisó: Diego Mauricio López. - Jurídico

CONSORCIO OBRAS 2020

CONTRATANTE:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL- AEROCIVIL - NIT 899999059-3
CONTRATO:	20001103 H4 A DE 2020
OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO RUTINARIO A EDIFICACIONES AEROPORTUARIAS DE FORMA GENERAL Y PERMANENTE DE LOS AEROPUERTOS DE LA REGIONAL ANTIOQUIA


ACTIVIDADES REALIZADAS ACTA DE PAGO Nº 1.


A continuación, se realiza una breve descripción de las actividades ejecutadas en cuanto al área técnica, realizadas por el personal de obra y el Ingeniero residente.


ACTIVIDADES TECNICAS.

1. **AEROPUERTO PEREIRA**

PRELIMINARES Y RELLENOS

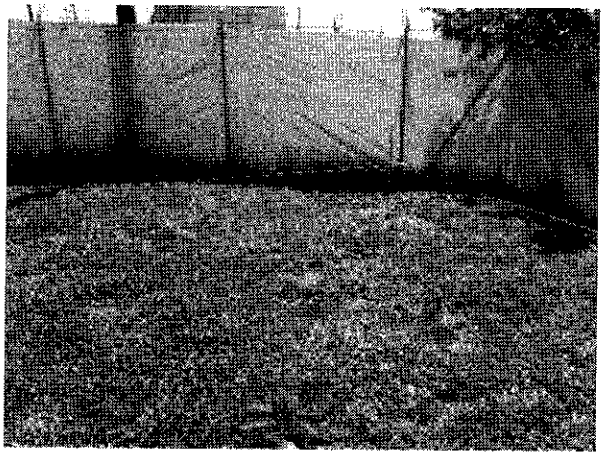

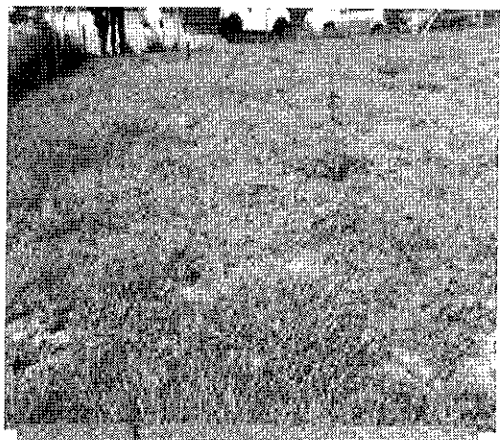


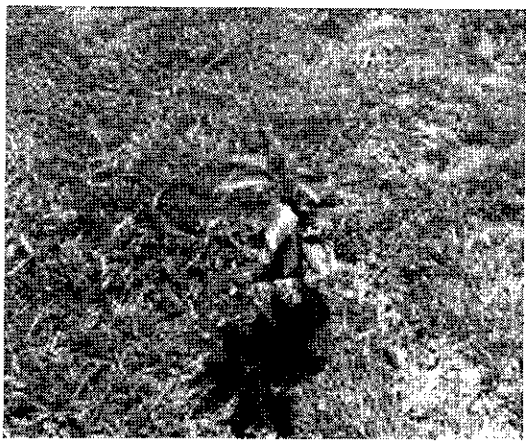





CONSORCIO OBRAS 2020



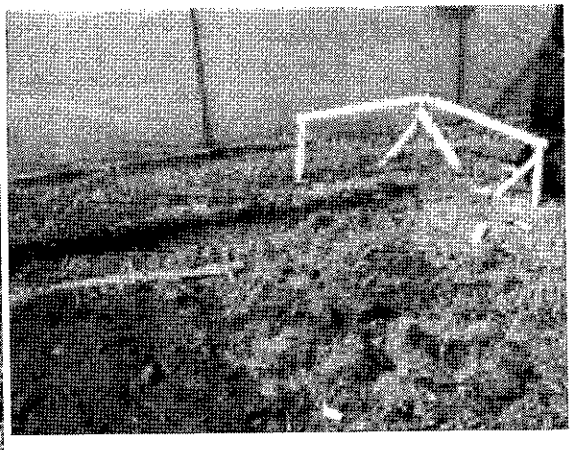

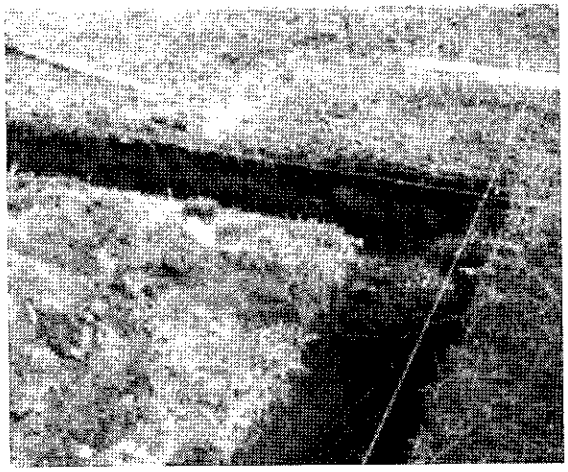

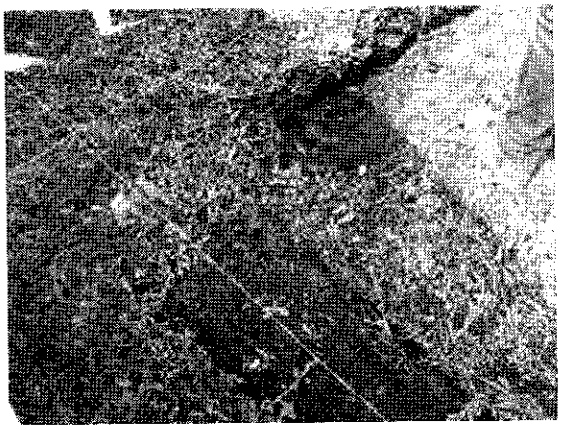









CONSORCIO OBRAS 2020




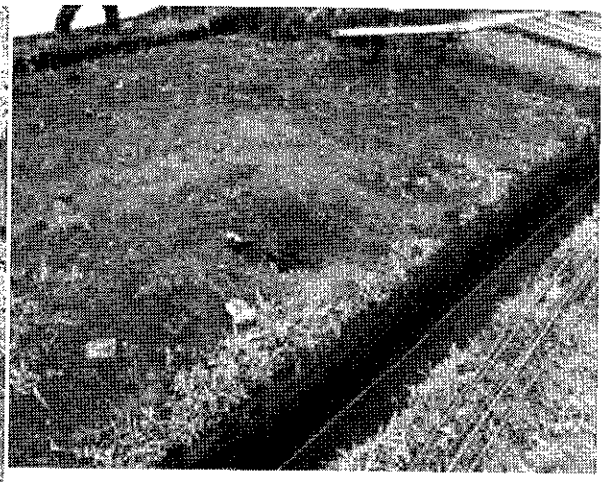

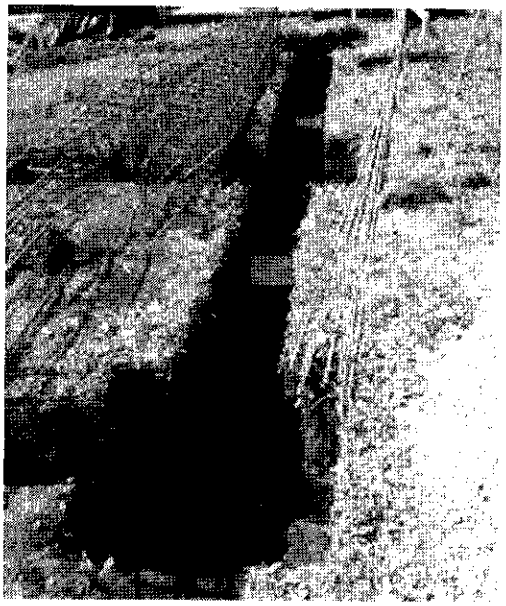

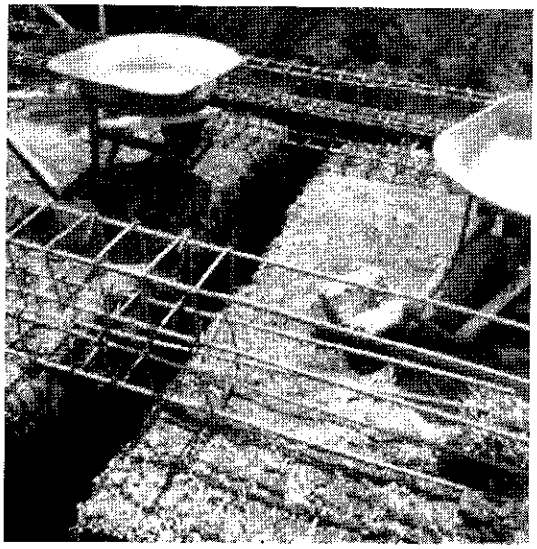


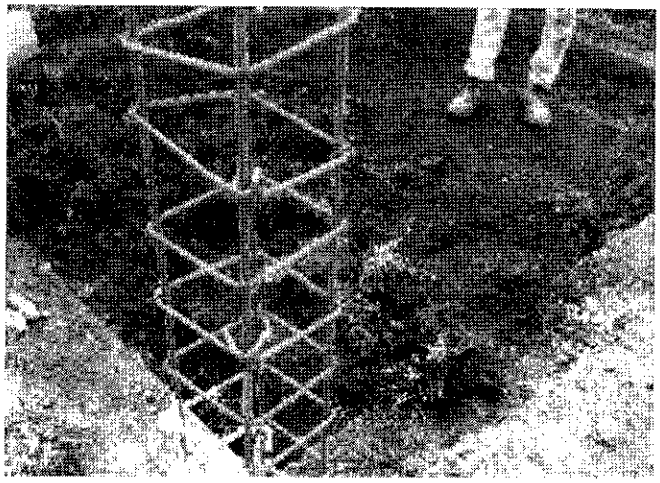

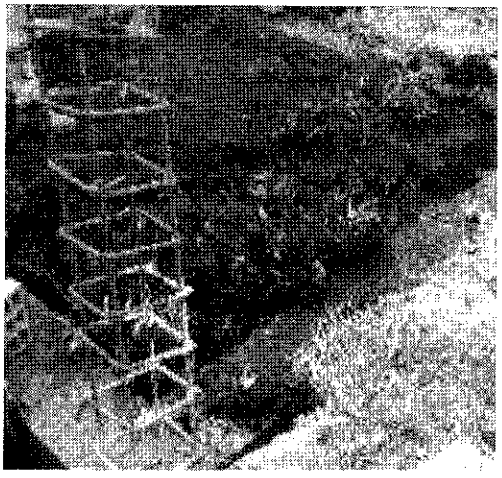


CONSORCIO OBRAS 2020




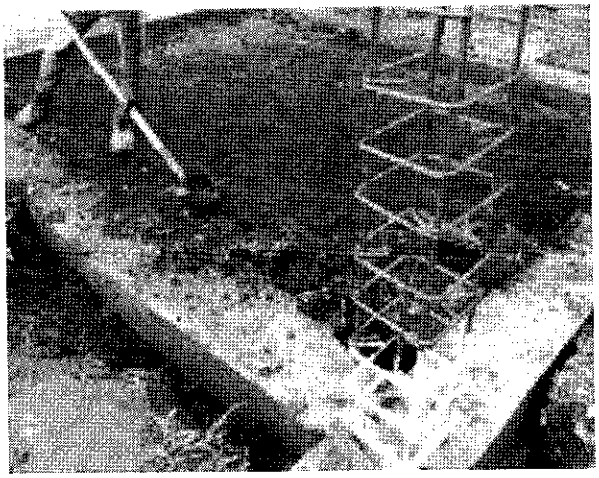


CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA

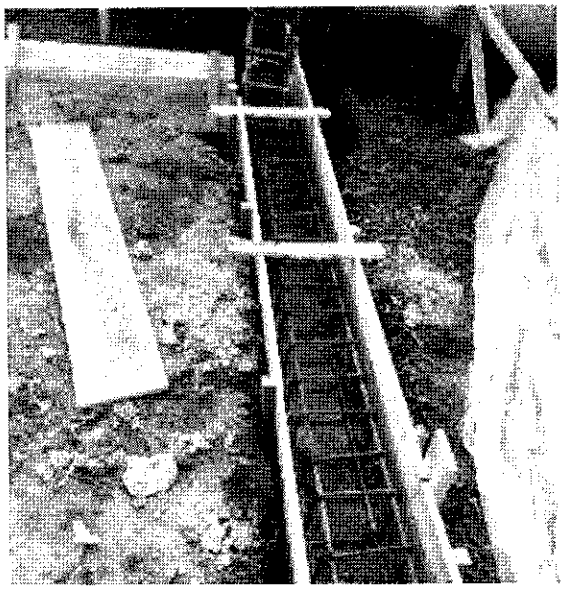





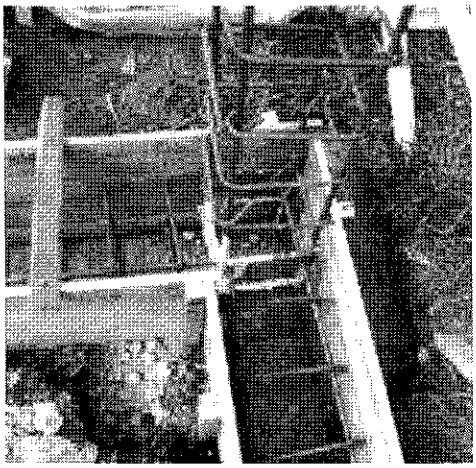


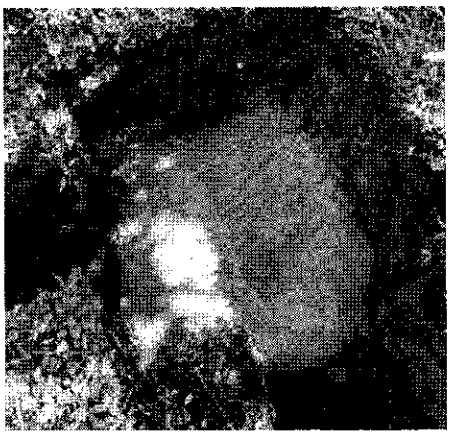



CONSORCIO OBRAS 2020

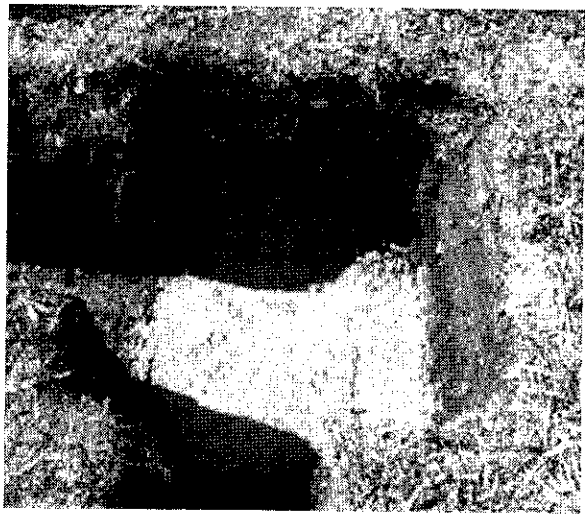


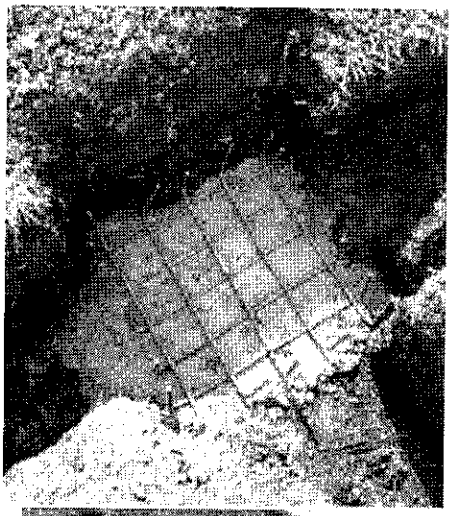

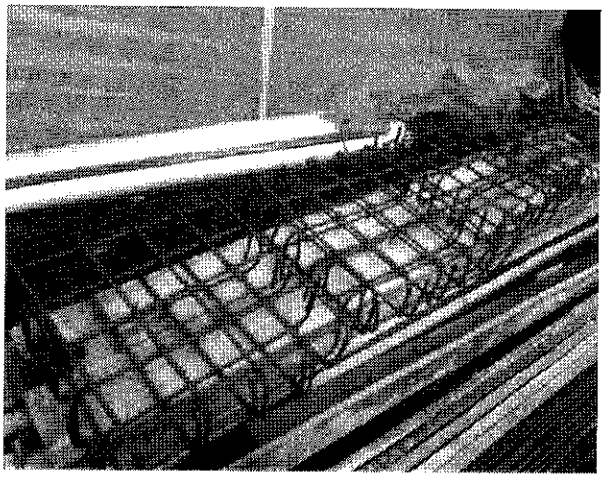


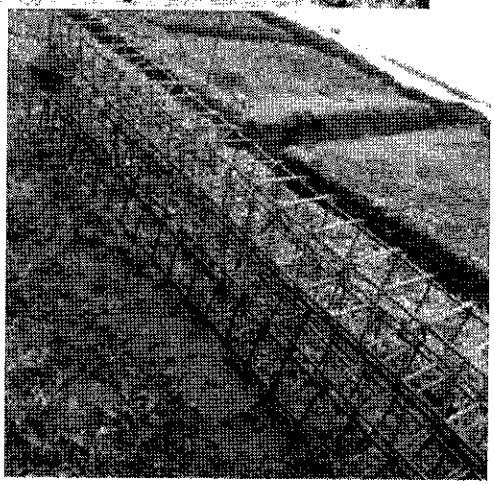


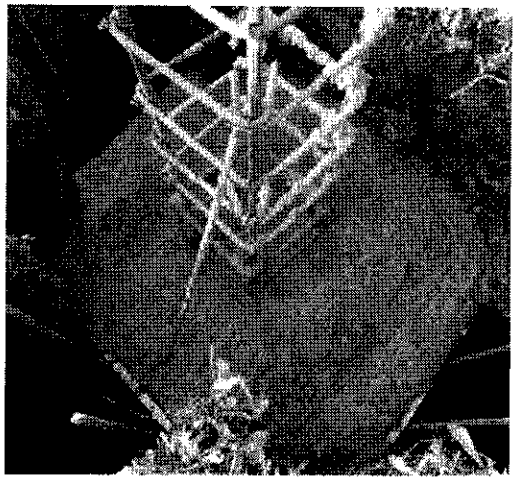


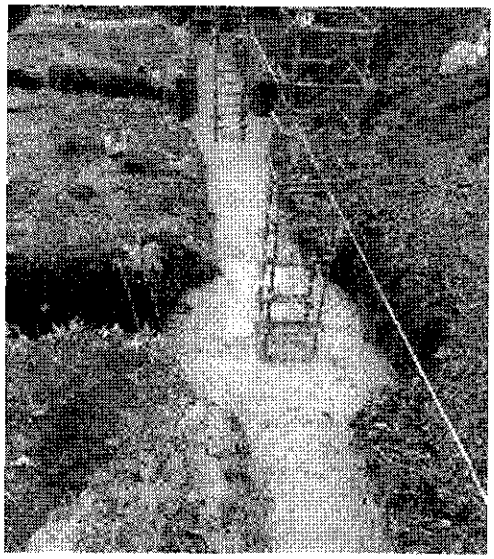



CONSORCIO OBRAS 2020

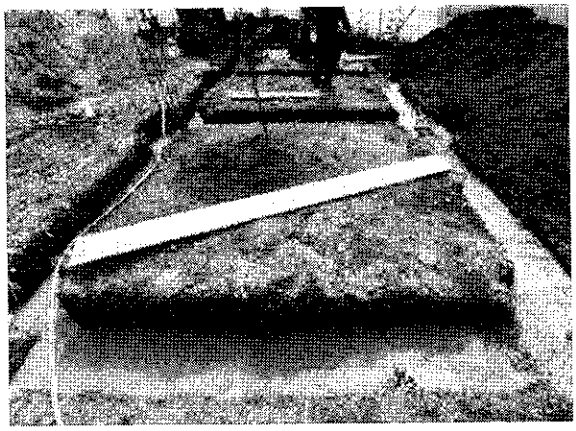


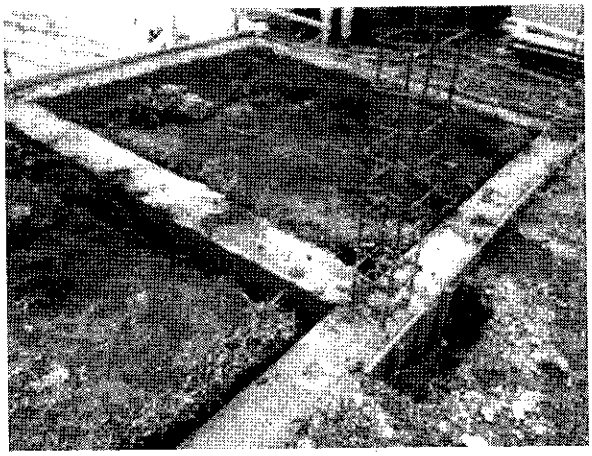

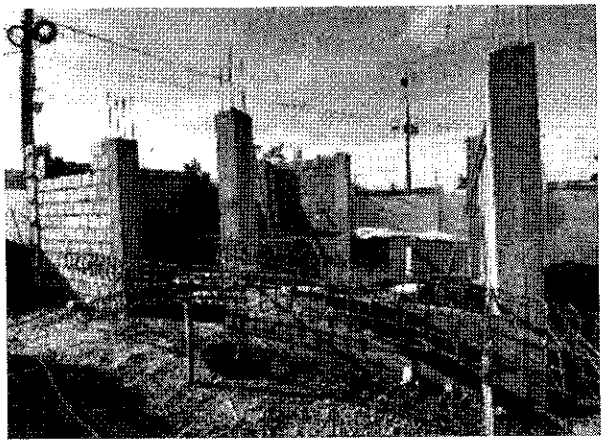


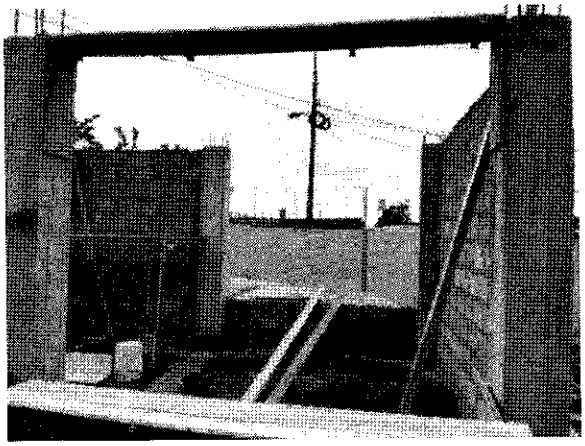

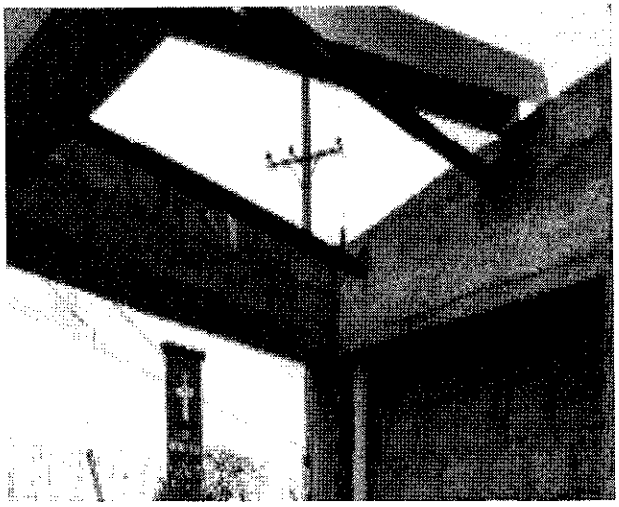

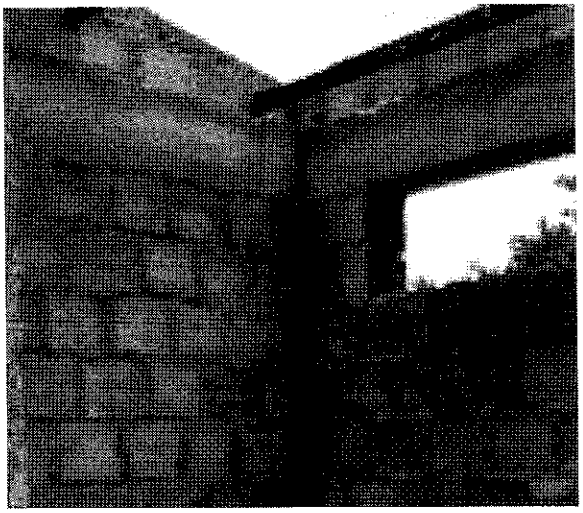



CONSORCIO OBRAS 2020

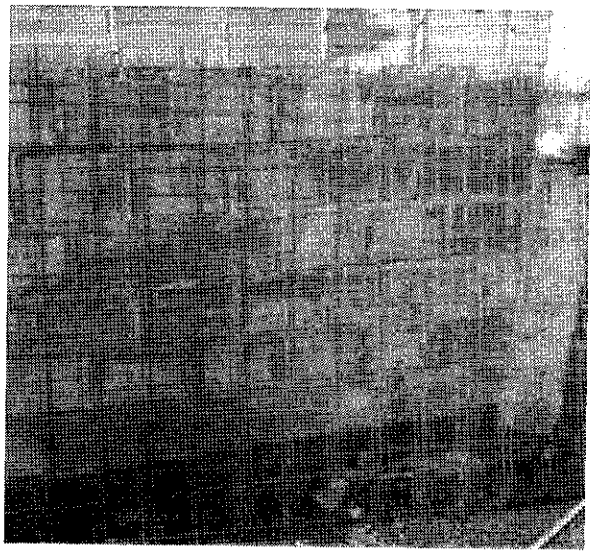





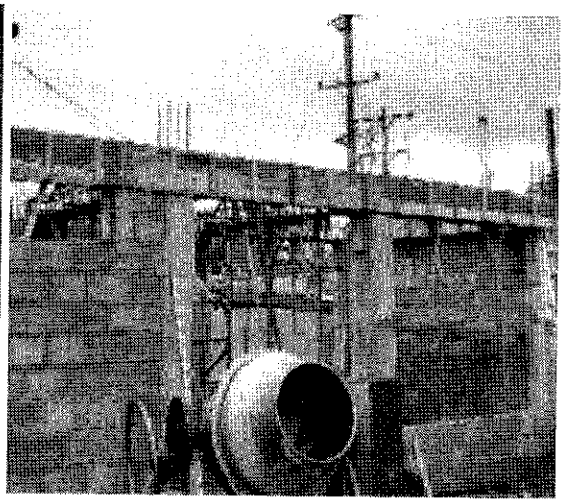


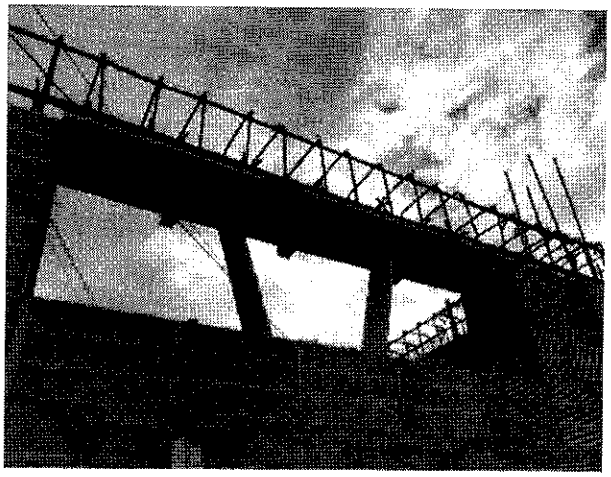





CONSORCIO OBRAS 2020


CUBIERTA

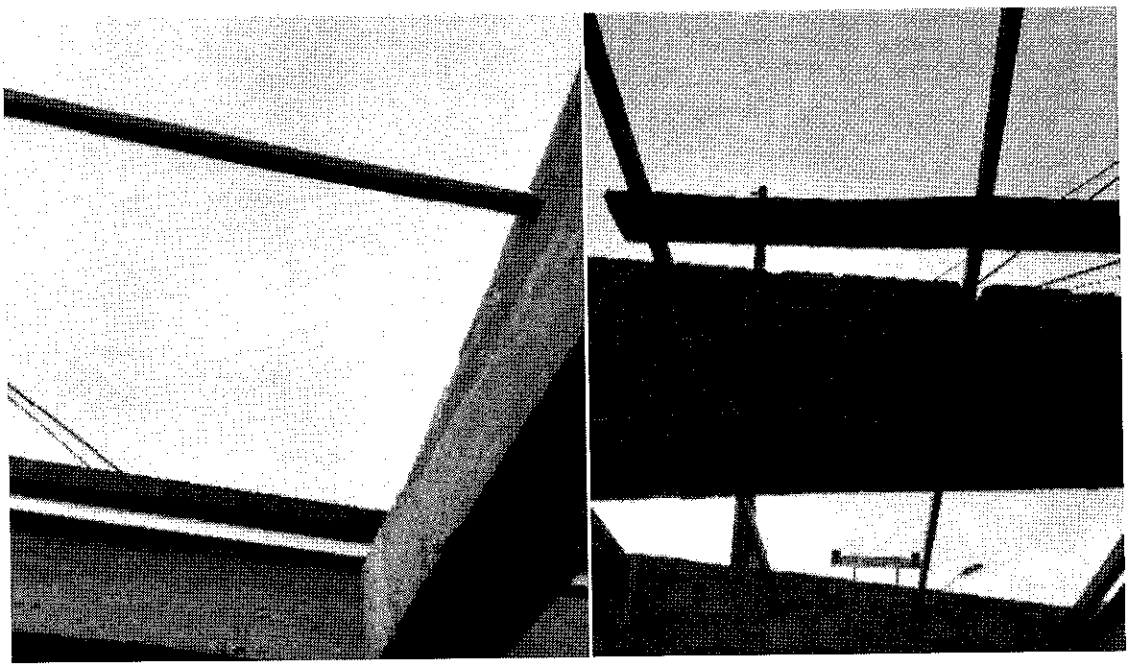


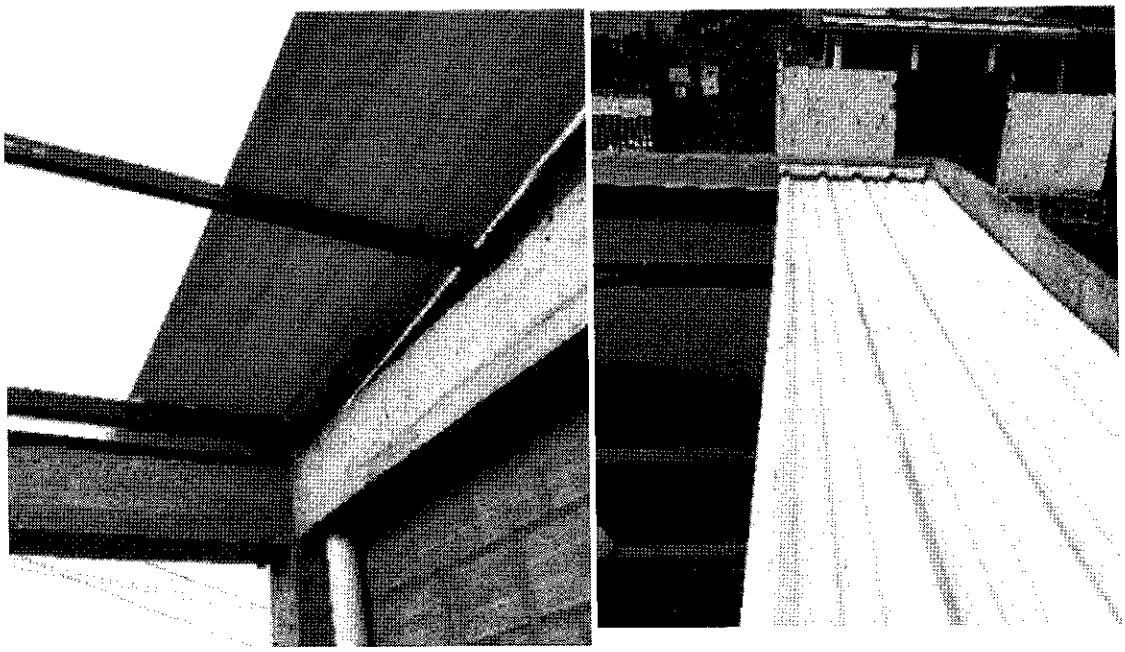


CONSORCIO OBRAS 2020

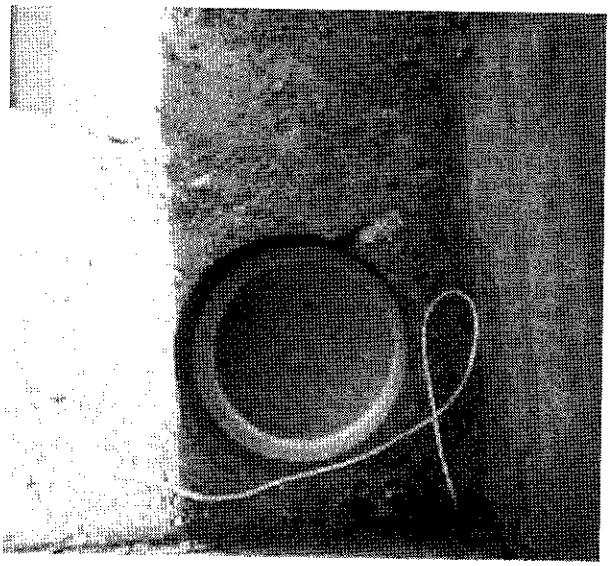

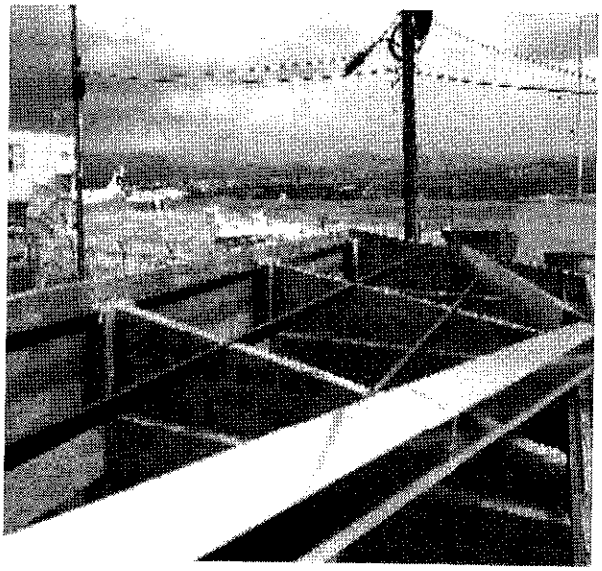

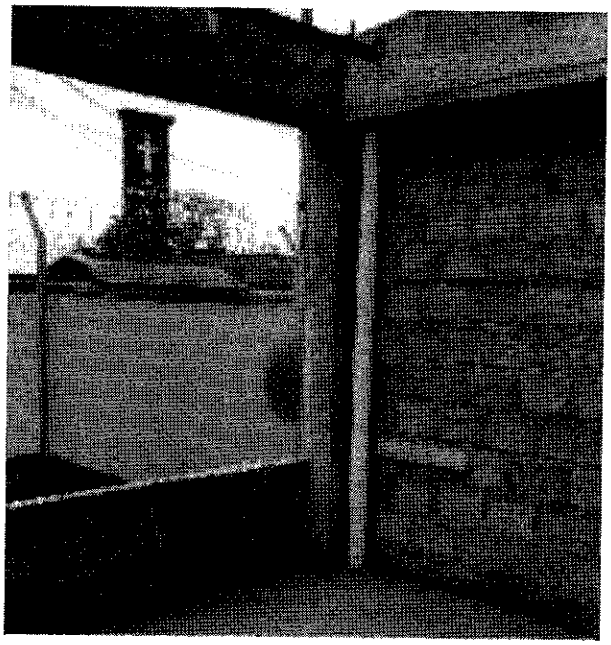


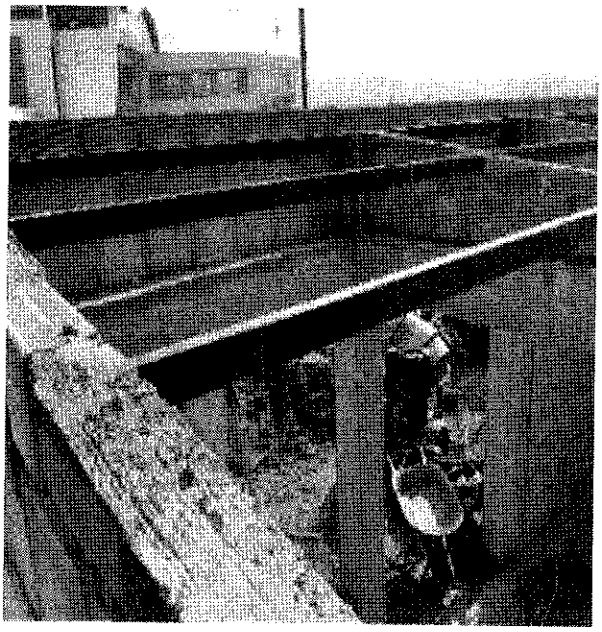



CONSORCIO OBRAS 2020

PISOS




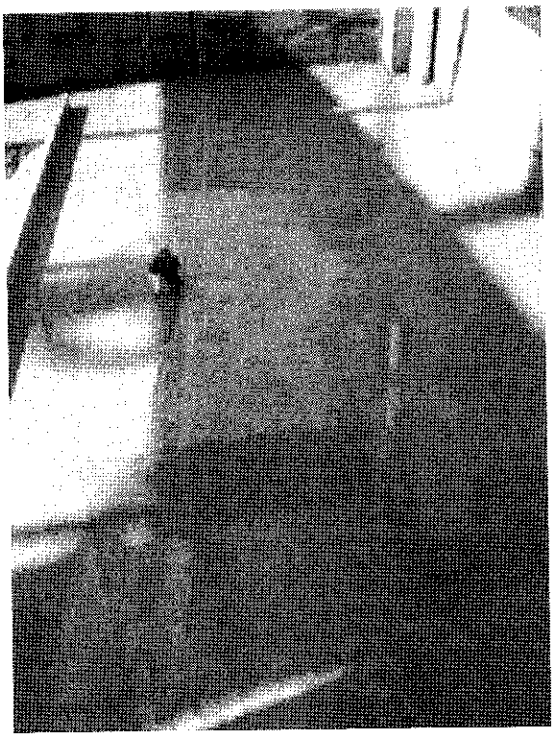


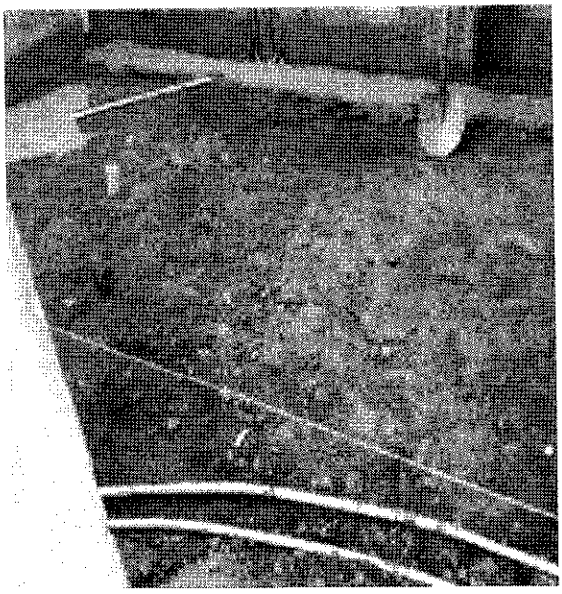

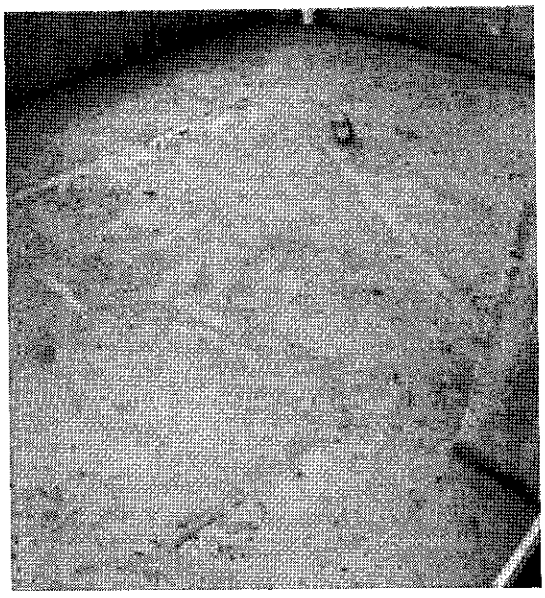



CONSORCIO OBRAS 2020

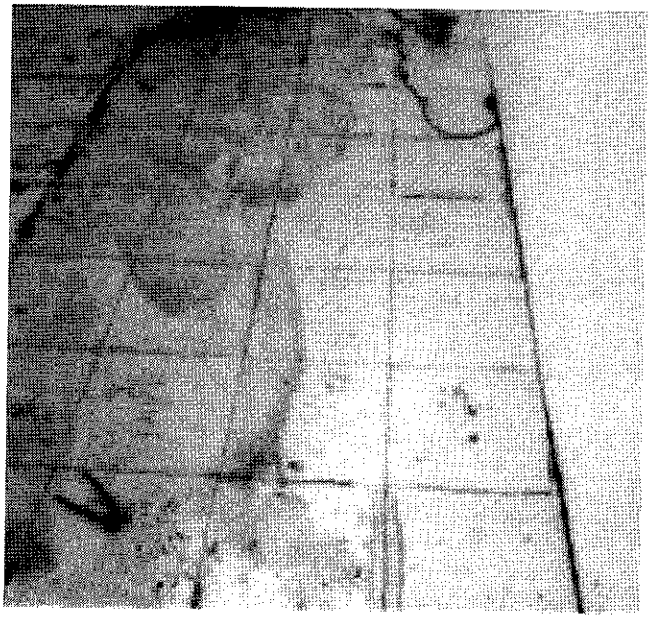

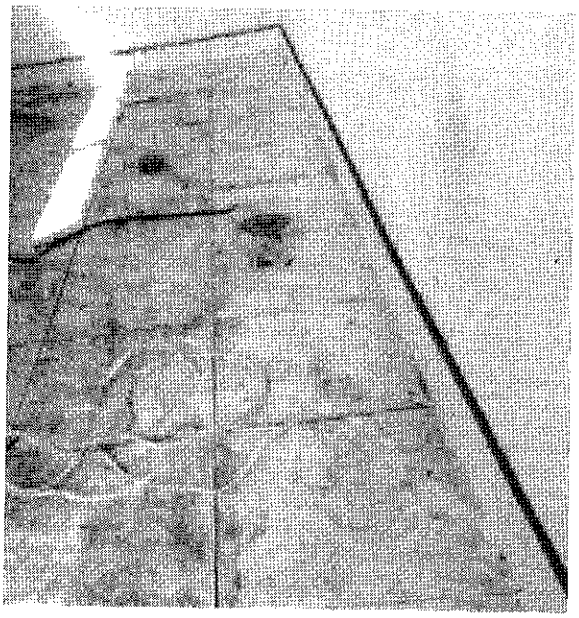


INSTALACIONES ELECTRICAS Y DOMOTIZADO

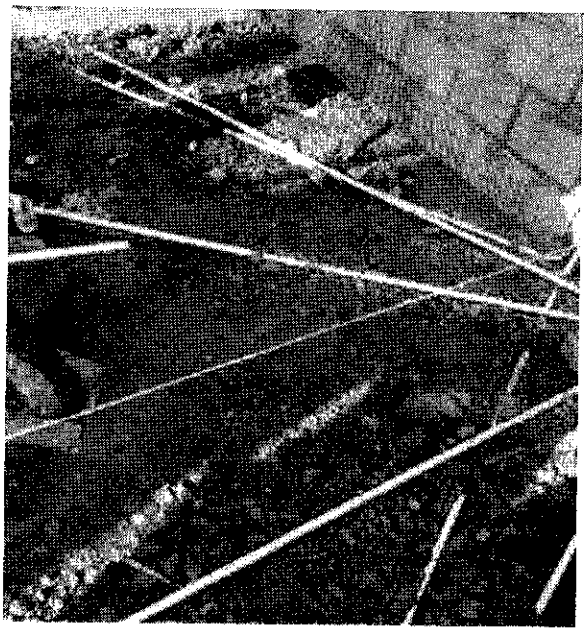


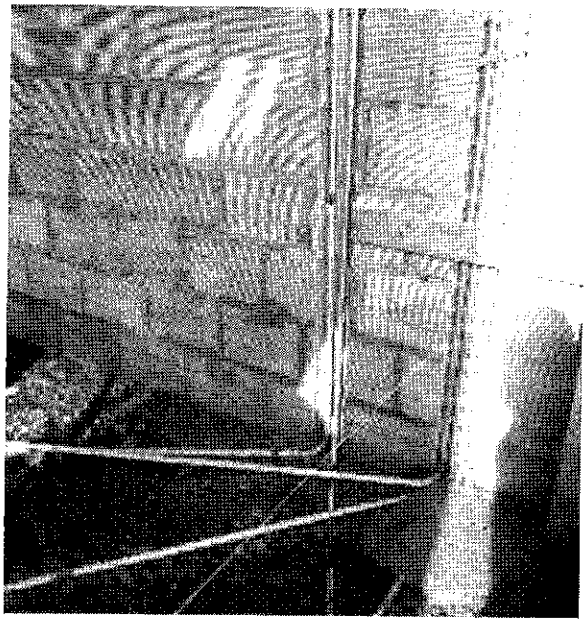


CONSORCIO OBRAS 2020


MAMPOSTERIA, REPELLOS, ESTUCOS Y PINTURA

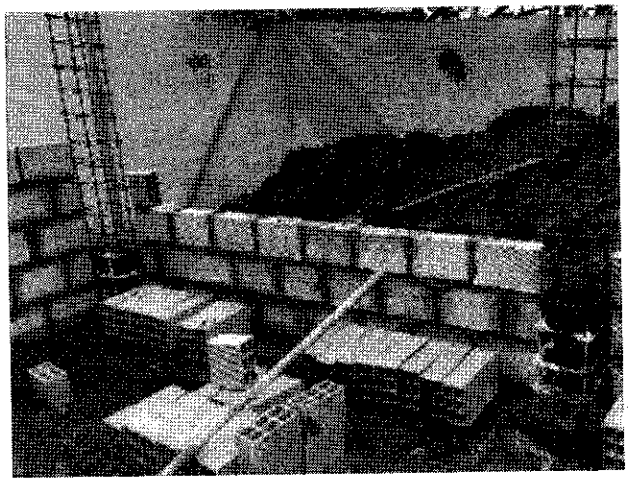


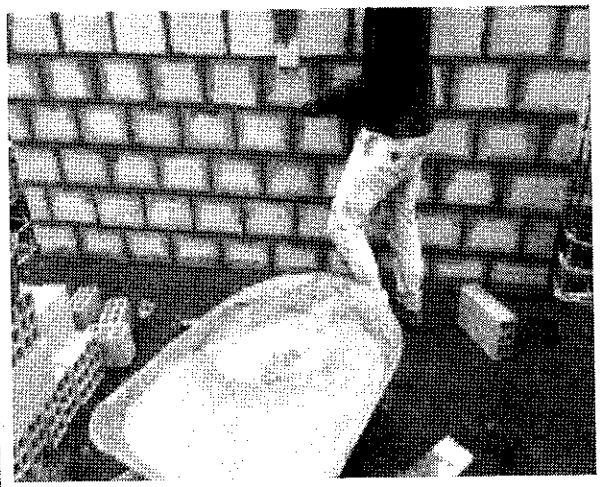

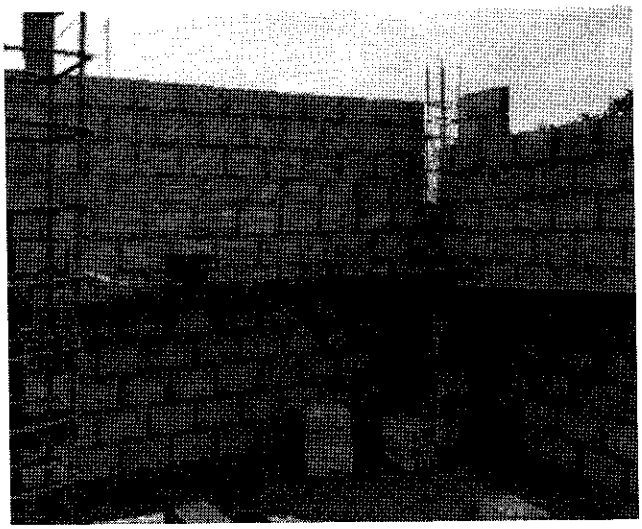





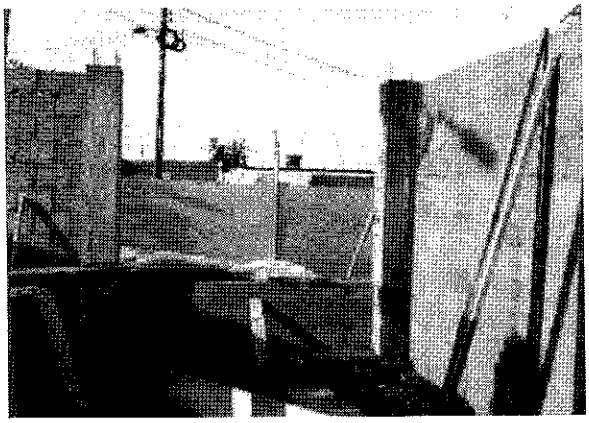


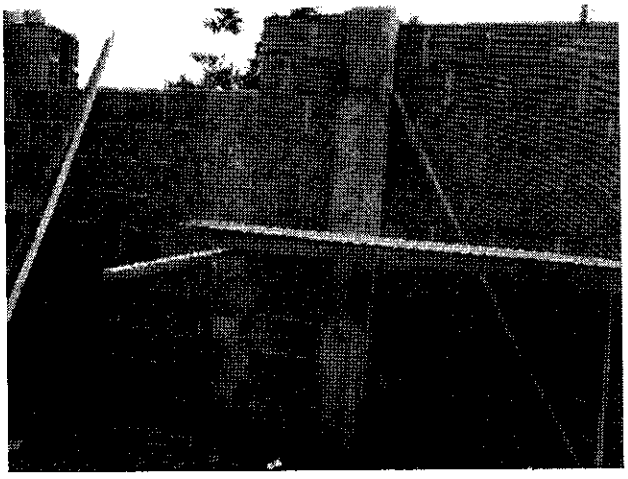


CONSORCIO OBRAS 2020

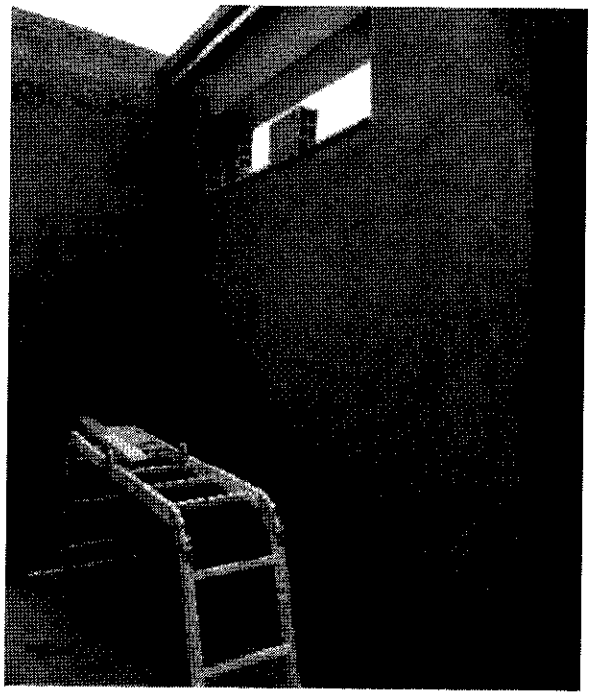


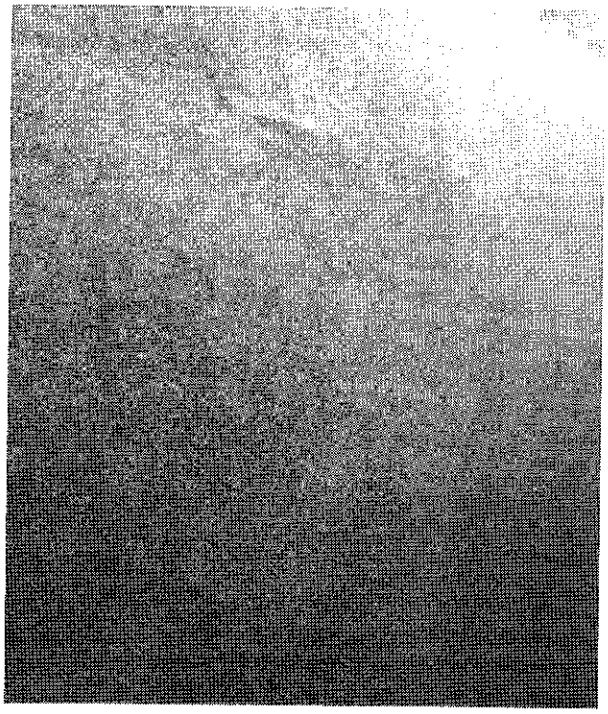


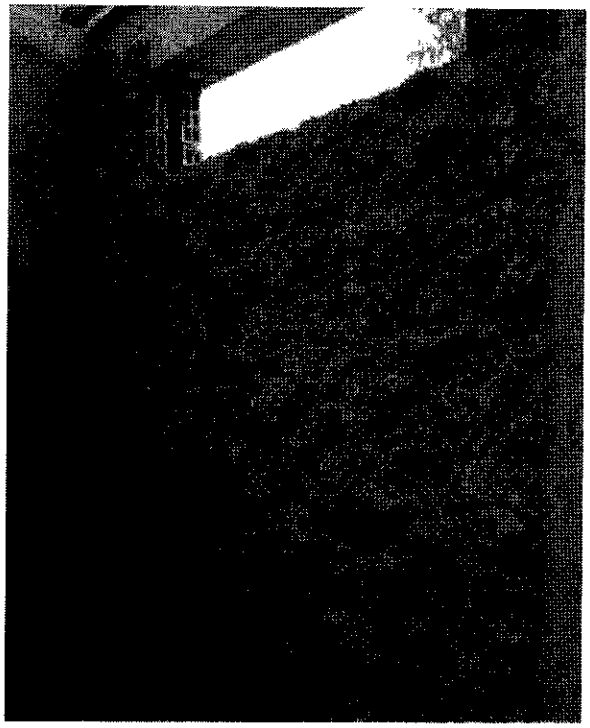


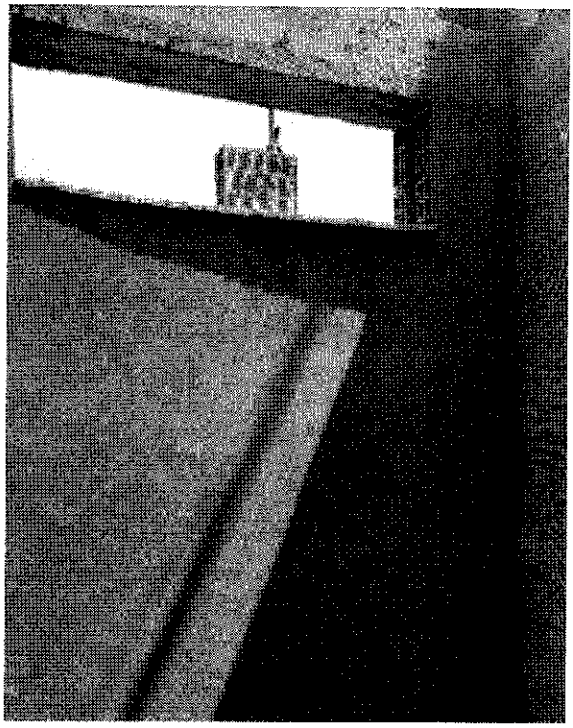


CONSORCIO OBRAS 2020

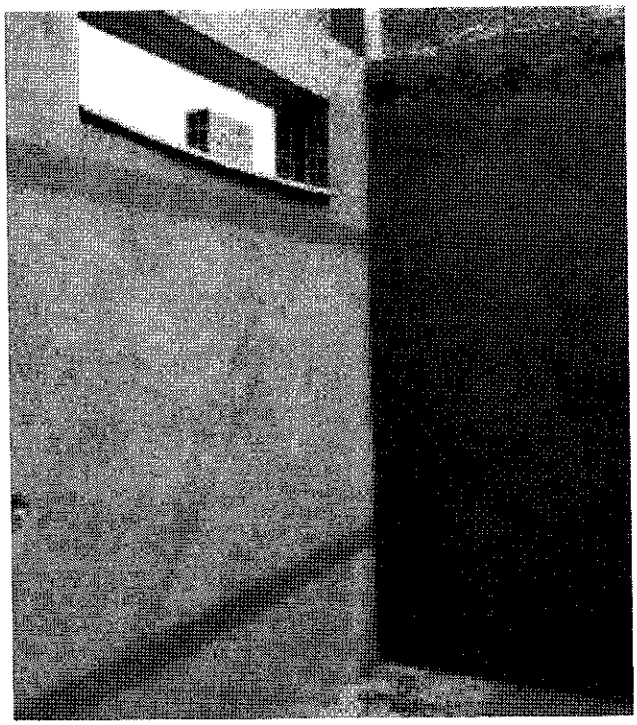

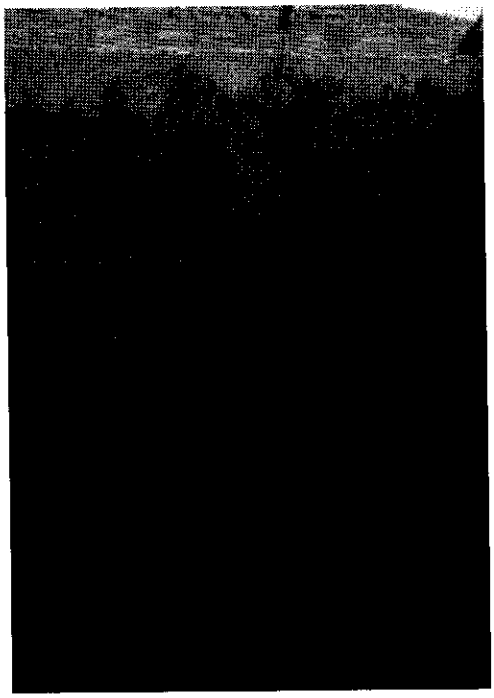


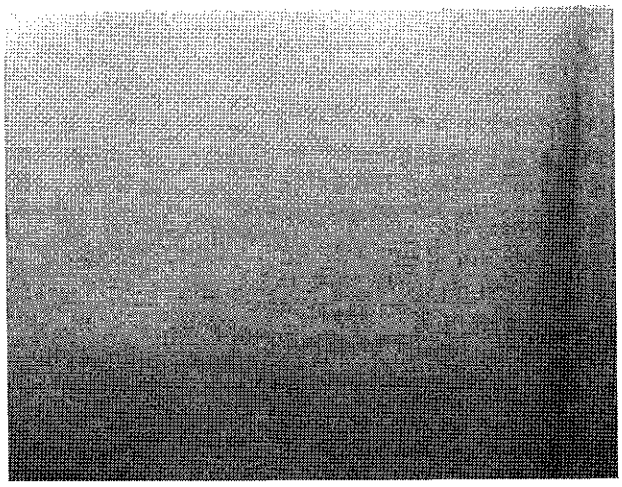


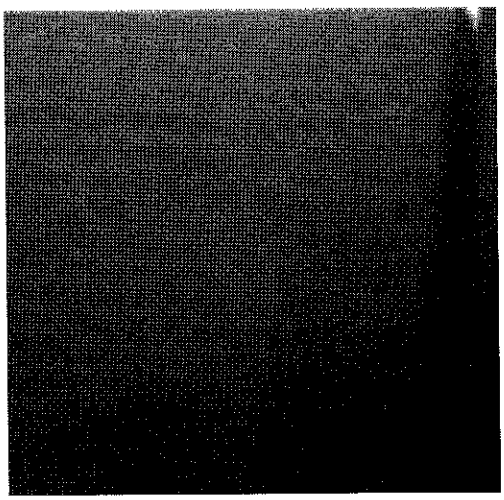



CONSORCIO OBRAS 2020


ITEMS NO PREVISTOS

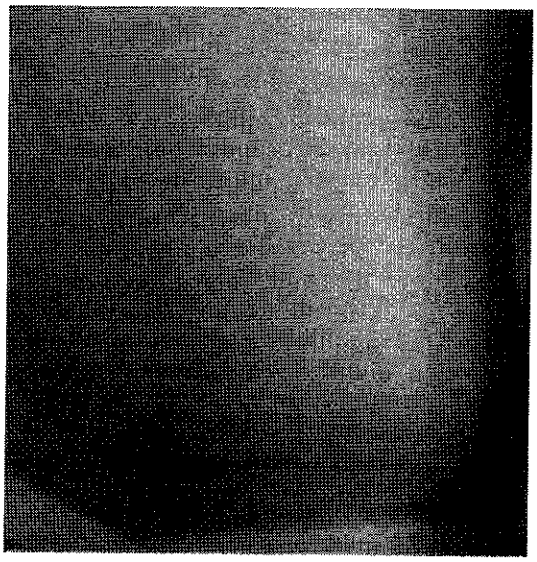


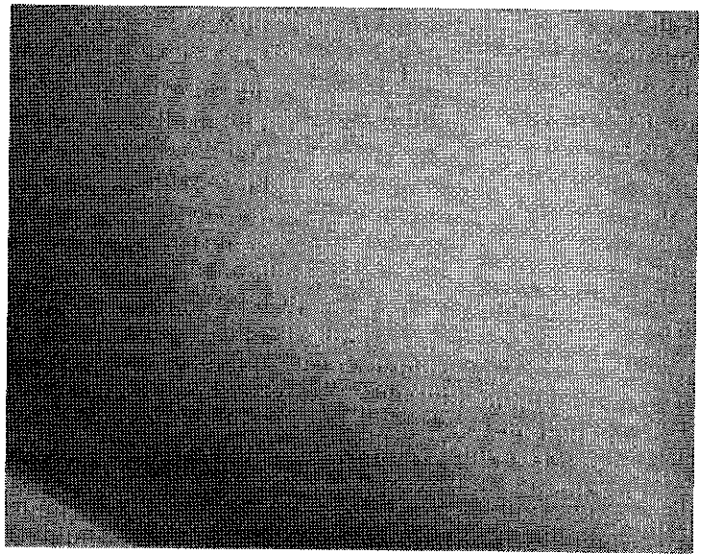

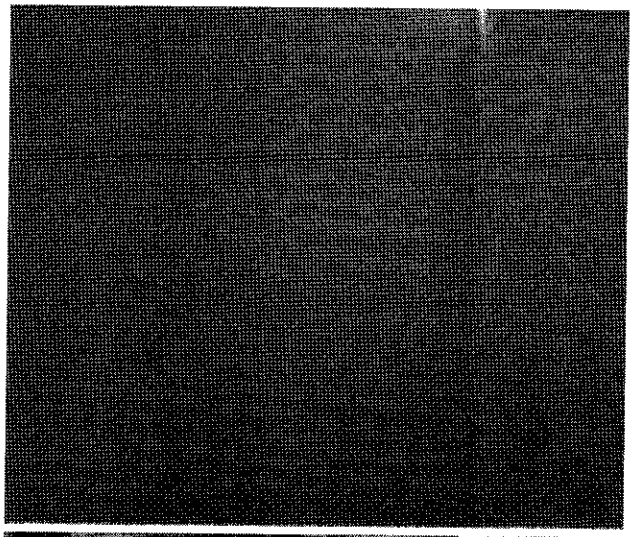


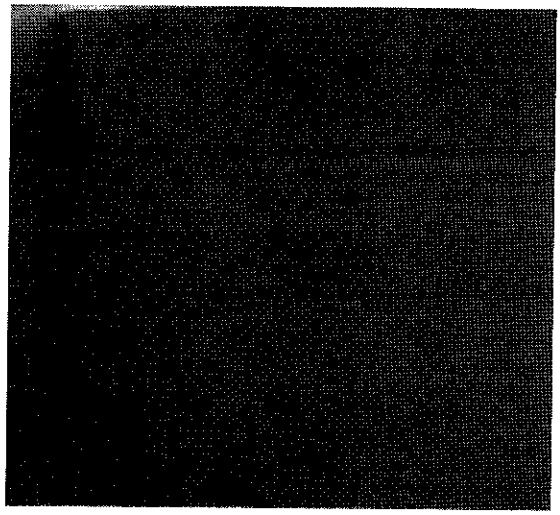

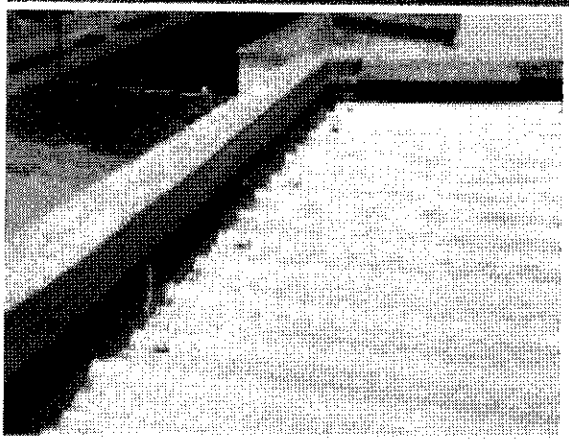

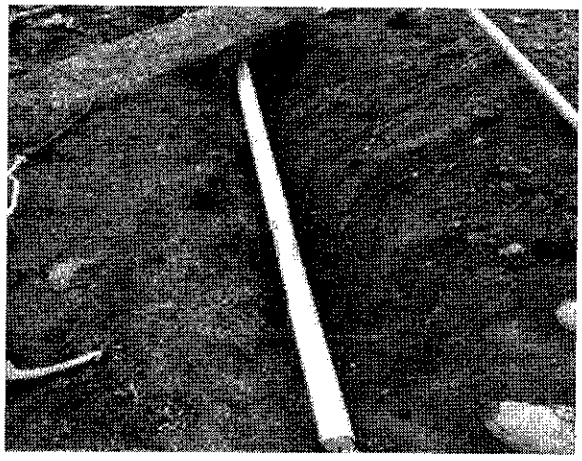


CONSORCIO OBRAS 2020

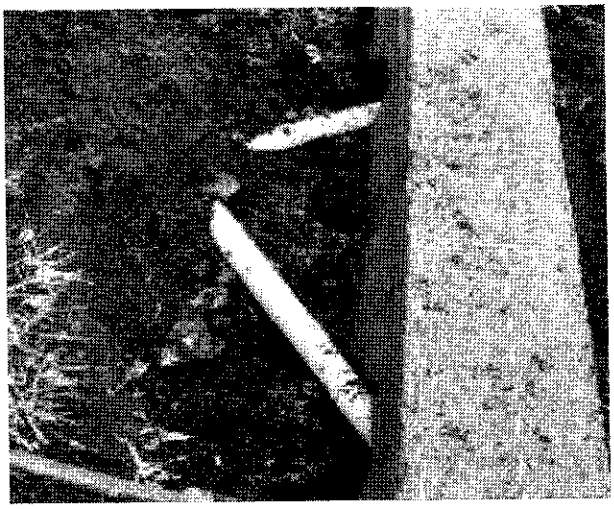





2. AEROPUERTO SANTANA DE CARTAGO

SALA DE CAPACITACIÓN DE ENTRENAMIENTO

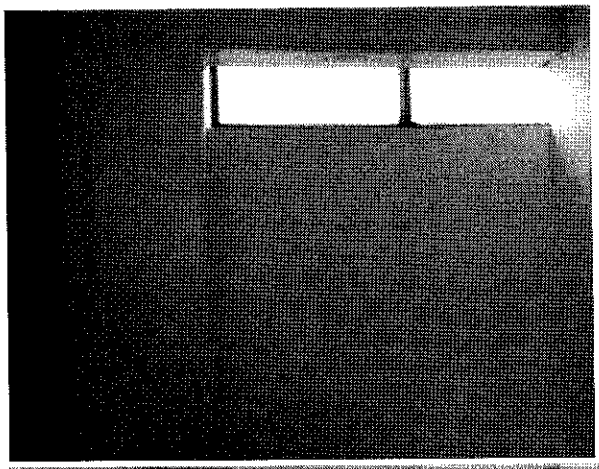

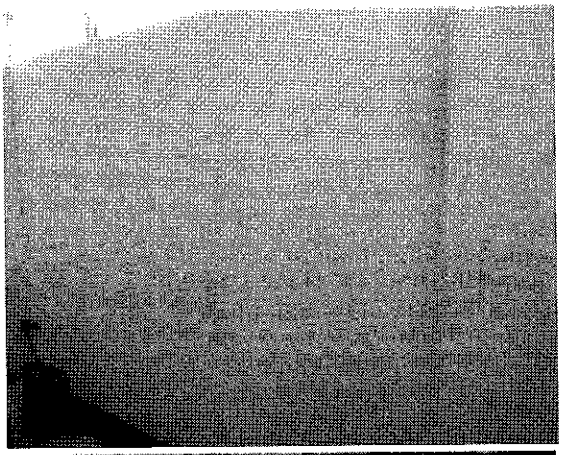


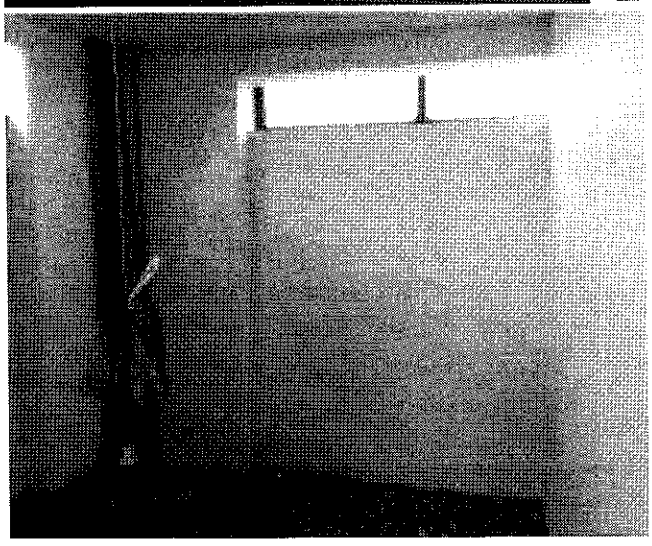




CONSORCIO OBRAS 2020




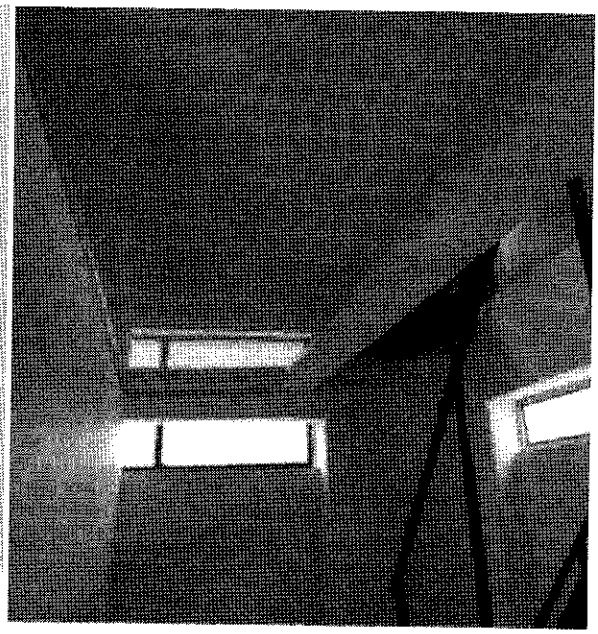


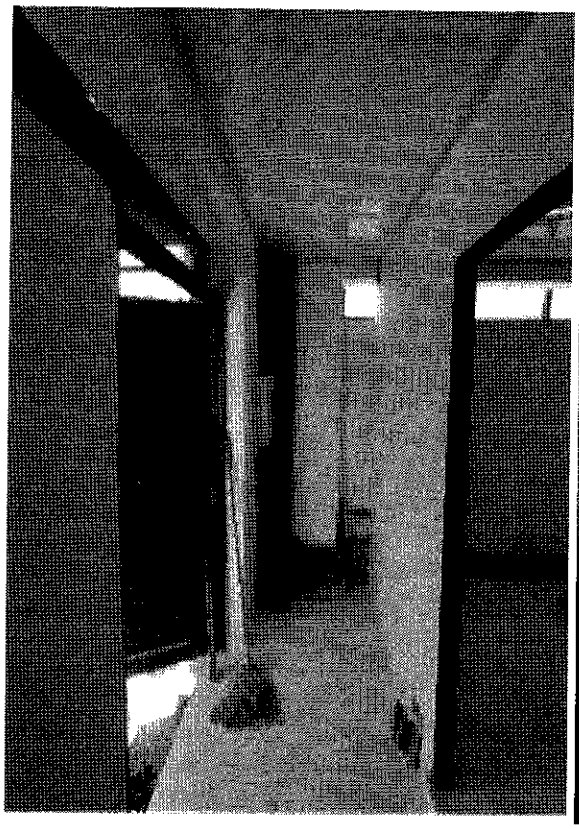





CONSORCIO OBRAS 2020

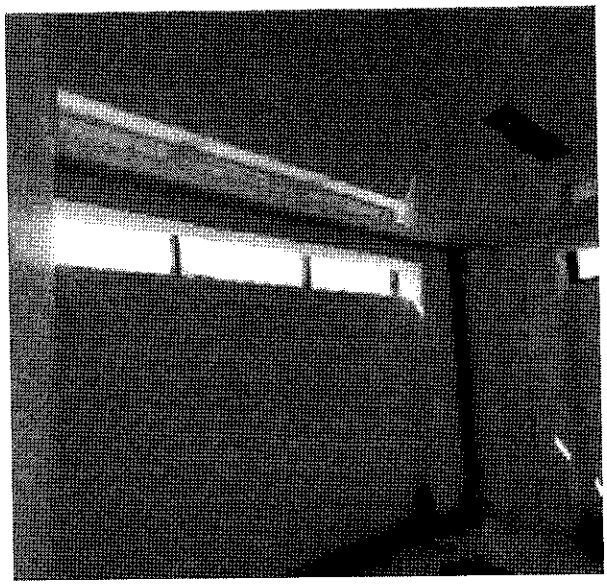

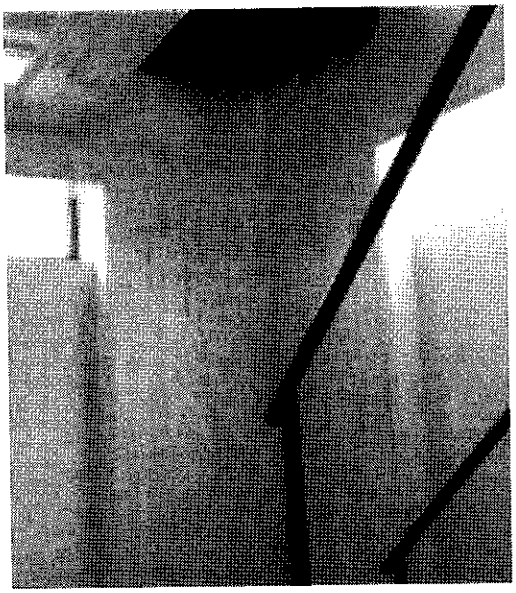

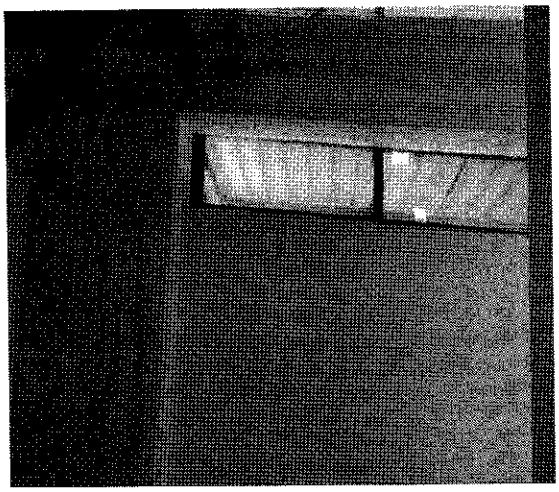

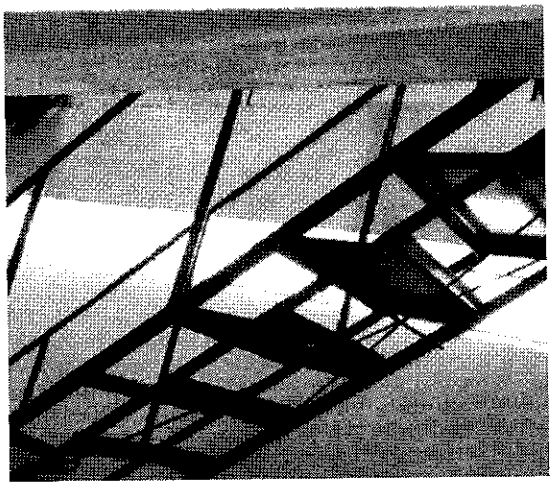







CONSORCIO OBRAS 2020



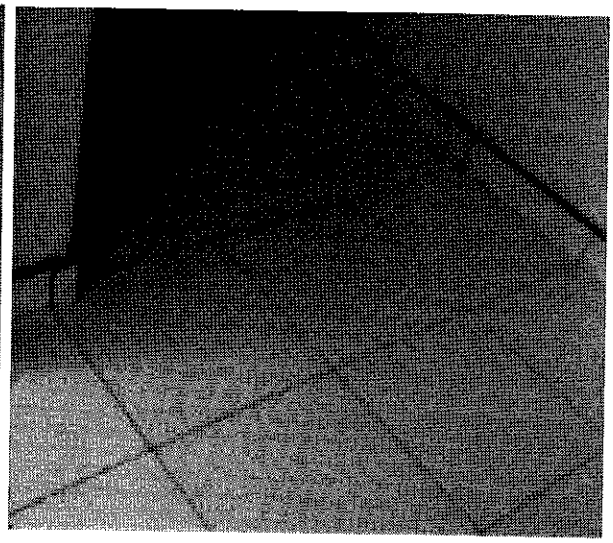


BAÑO



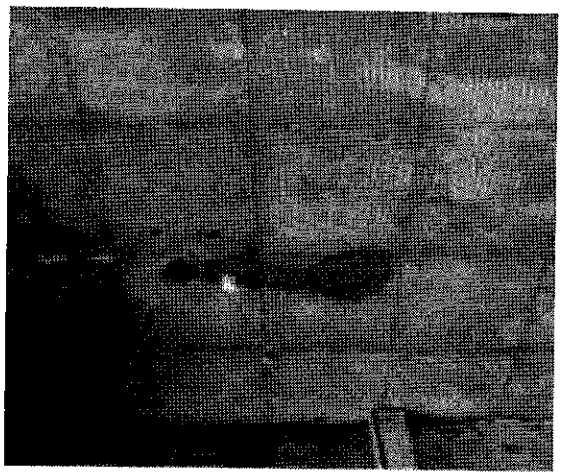





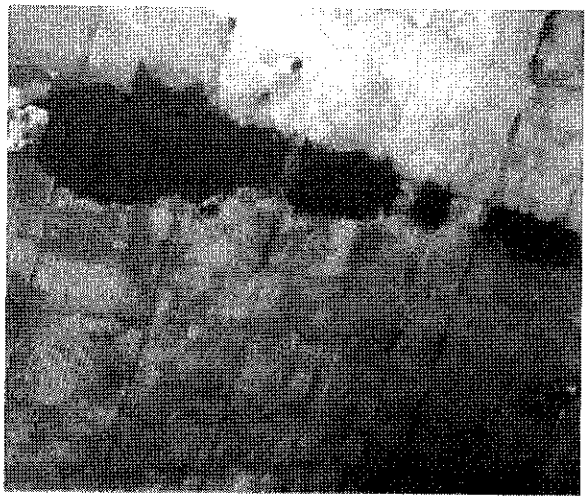



CONSORCIO OBRAS 2020




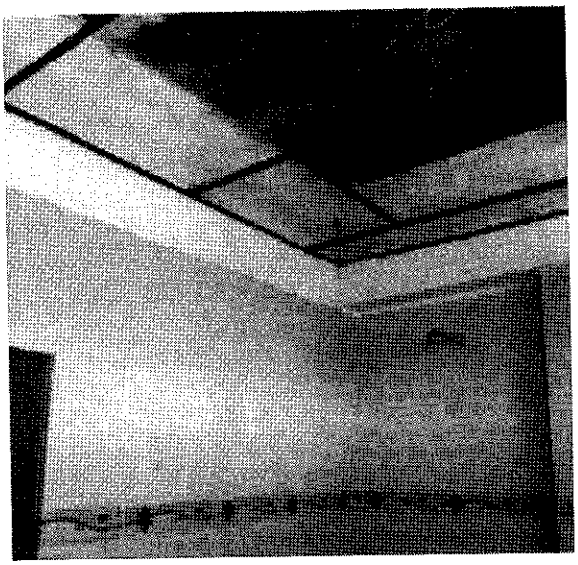

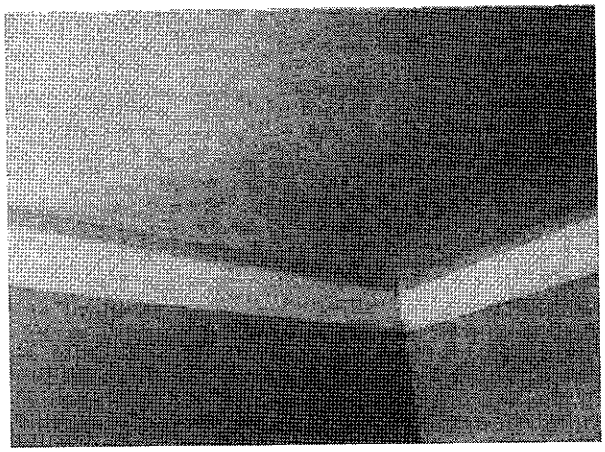

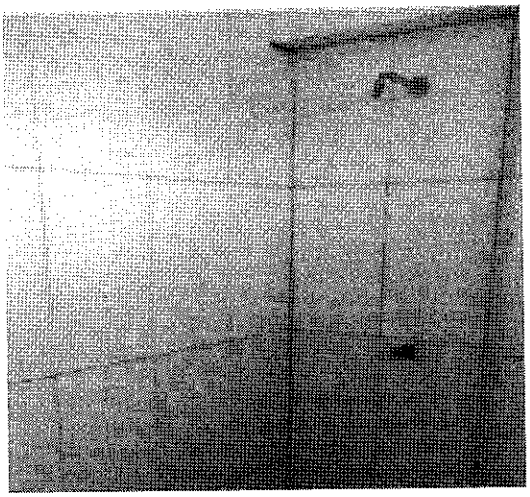


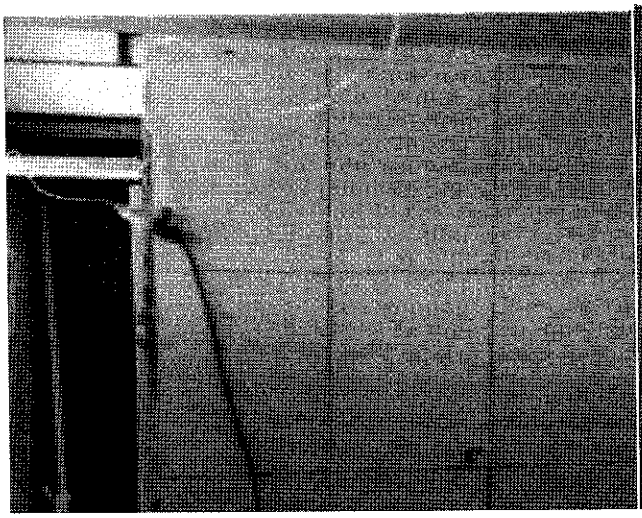


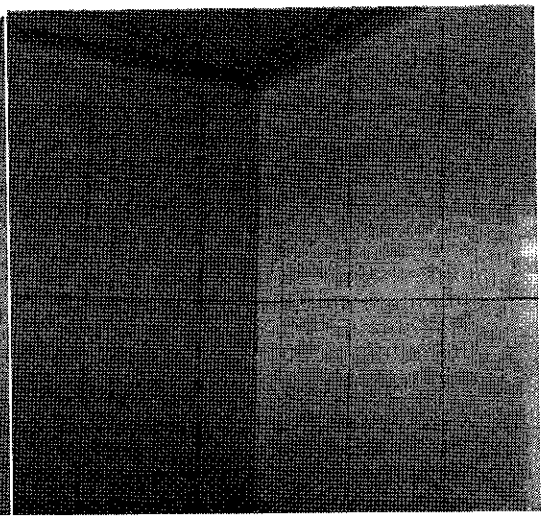


CONSORCIO OBRAS 2020

TORRE DE CONTROL

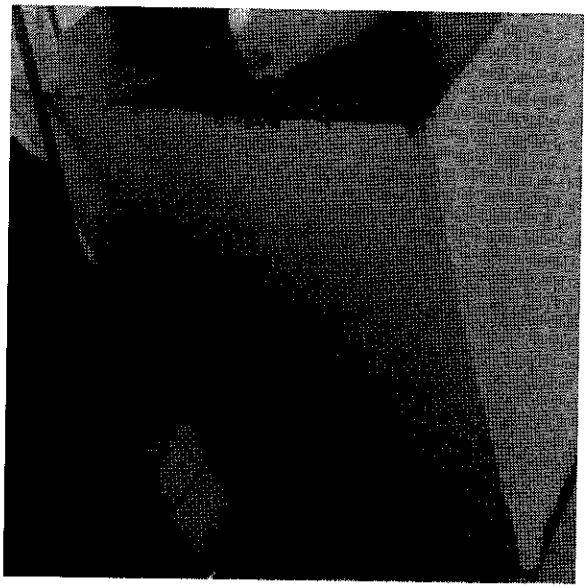


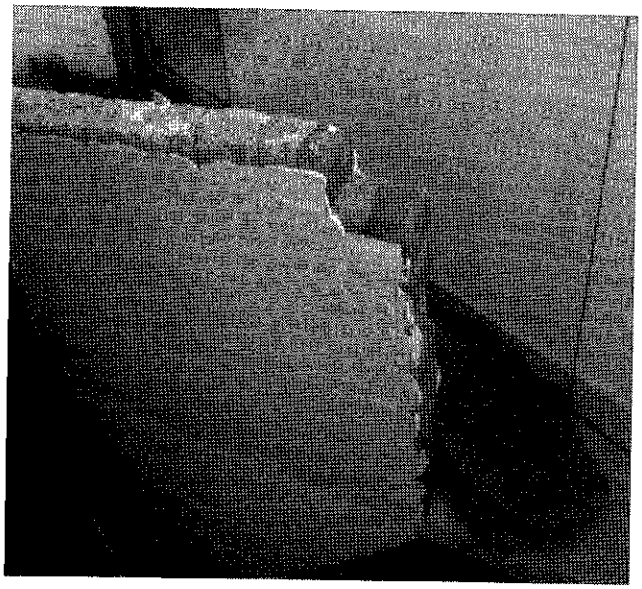

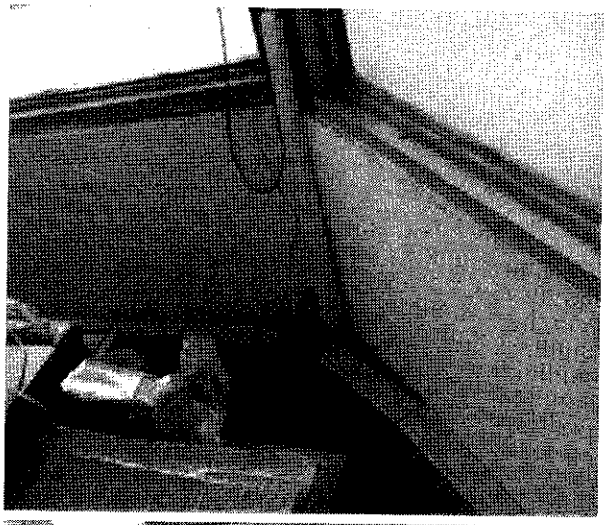






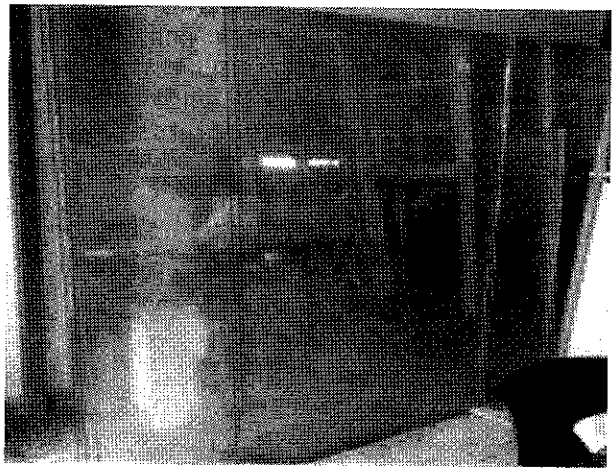

CONSORCIO OBRAS 2020





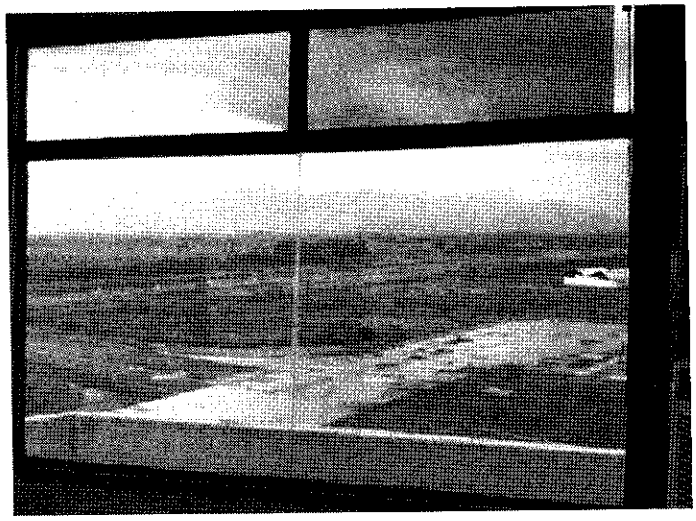



DIEGO ROLANDO GUTIÉRREZ CASTRO
Representante legal
CONSORCIO OBRAS 2020

CONSORCIO OBRAS 2020

CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL- AEROCIVIL - NIT 899999059-3

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2020 – NIT 901.427.345-8


CONTRATO: 20001103 H4 A DE 2020


OBJETO: REALIZAR MANTENIMIENTO RUTINARIO A EDIFICACIONES AEROPORTUARIAS DE FORMA GENERAL Y PERMANENTE DE LOS AEROPUERTOS DE LA REGIONAL ANTIOQUIA


INFORME MATRIZ DE RIESGO

A continuación, se adjunta un registro fotográfico donde se evidencia que el personal de obra realiza actividades de excavación, relleno, figurado de hierro, fundida de concreto, corte de hierro, soldadura, manipulación de equipos, entre otras, utilizando los Elementos de Protección Personal.



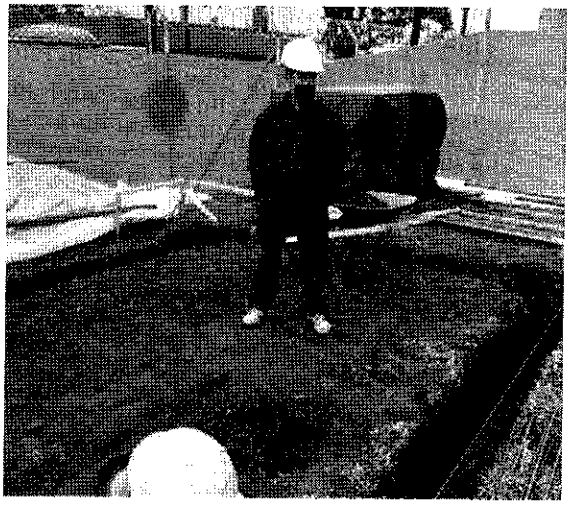

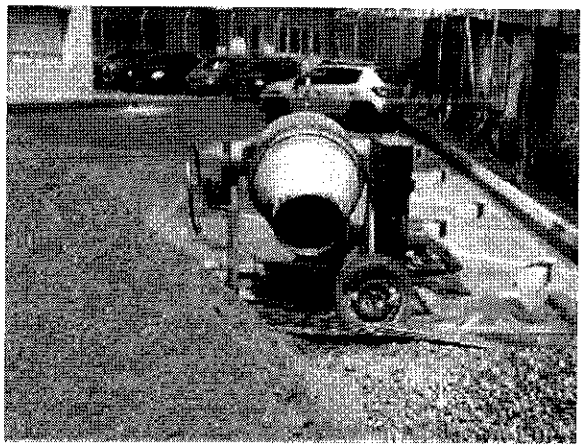

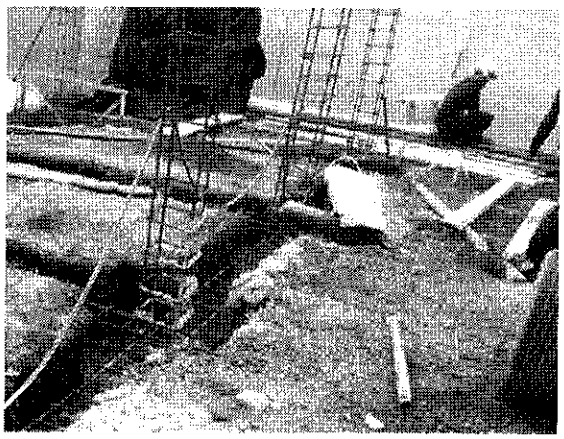


Calle 68 No. 7 – 56
Torre 4
Apartamento 04

317 409 8864 – 322 234 0241
serinsas17@gmail.com

Neiva - Huila

CONSORCIO OBRAS 2020

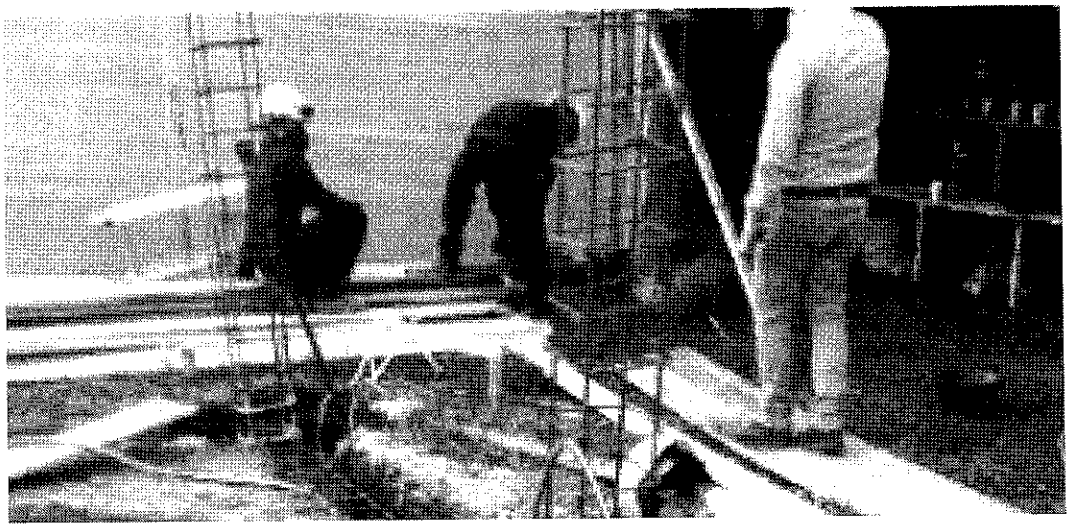







Calle 68 No. 7 – 56
Torre 4
Apartamento 04


317 409 8864 – 322 234 0241
serinsas17@gmail.com

Neiva - Huila

CONSORCIO OBRAS 2020





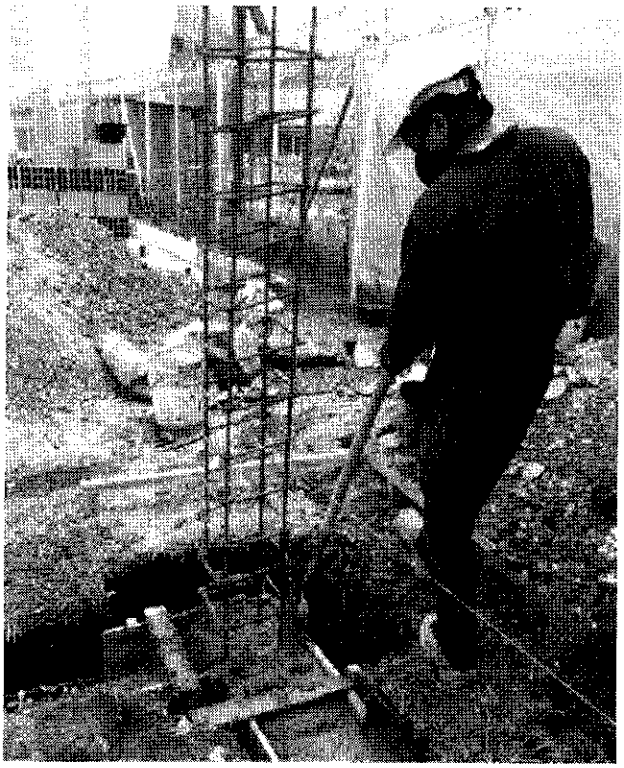




Calle 68 No. 7 – 56
Torre 4
Apartamento 04

317 409 8864 – 322 234 0241
serinsas17@gmail.com

Neiva - Huila

CONSORCIO OBRAS 2020

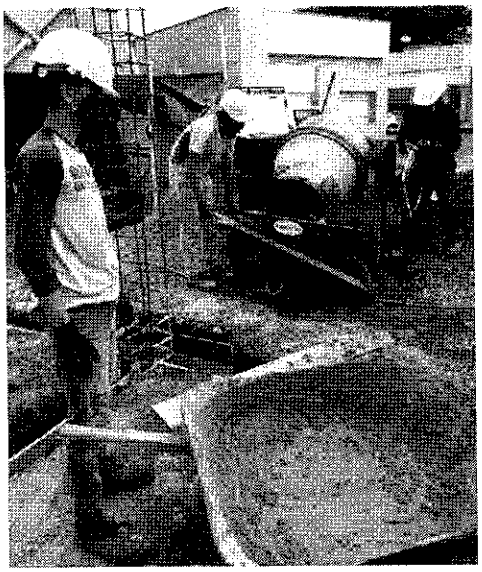







Calle 68 No. 7 – 56
Torre 4
Apartamento 04

317 409 8864 – 322 234 0241
serinsas17@gmail.com


Neiva - Huila

CONSORCIO OBRAS 2020







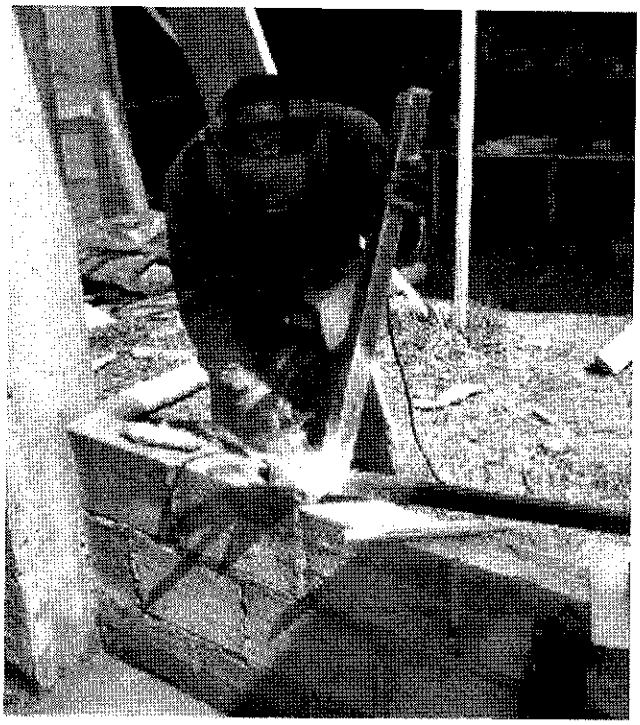


Calle 68 No. 7 – 56
Torre 4
Apartamento 04


317 409 8864 – 322 234 0241
serinsas17@gmail.com


Neiva - Huila

CONSORCIO OBRAS 2020



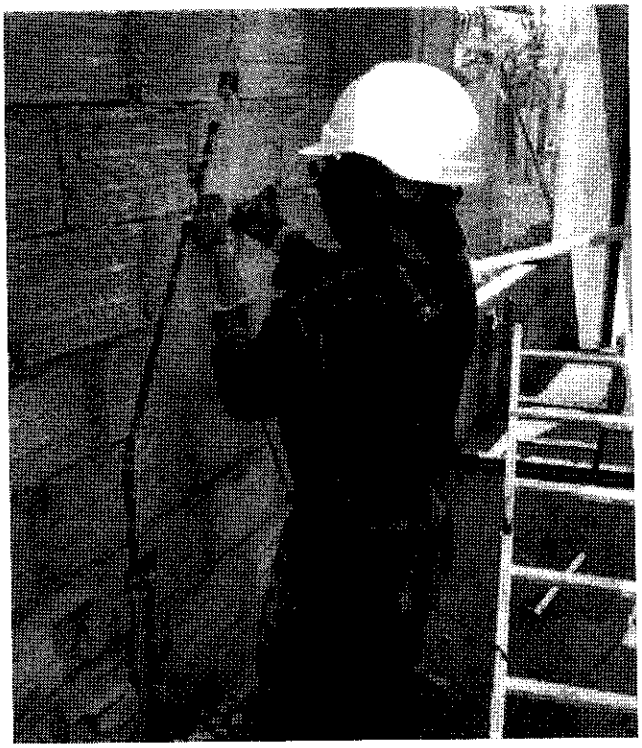

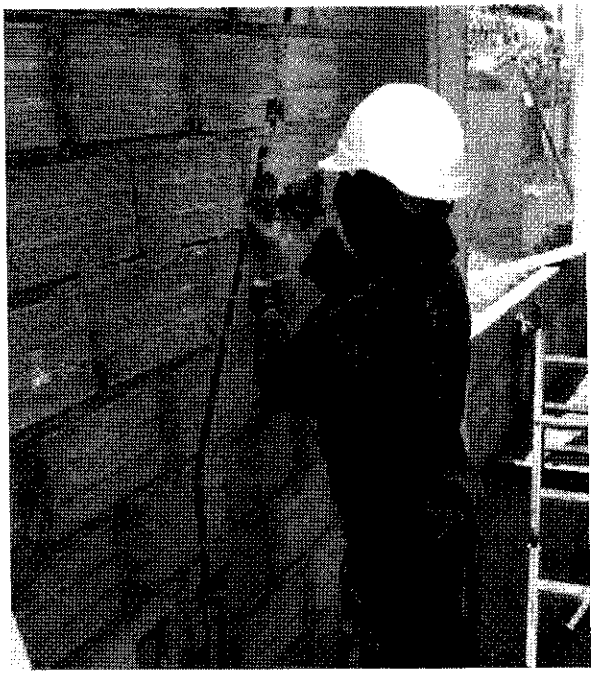

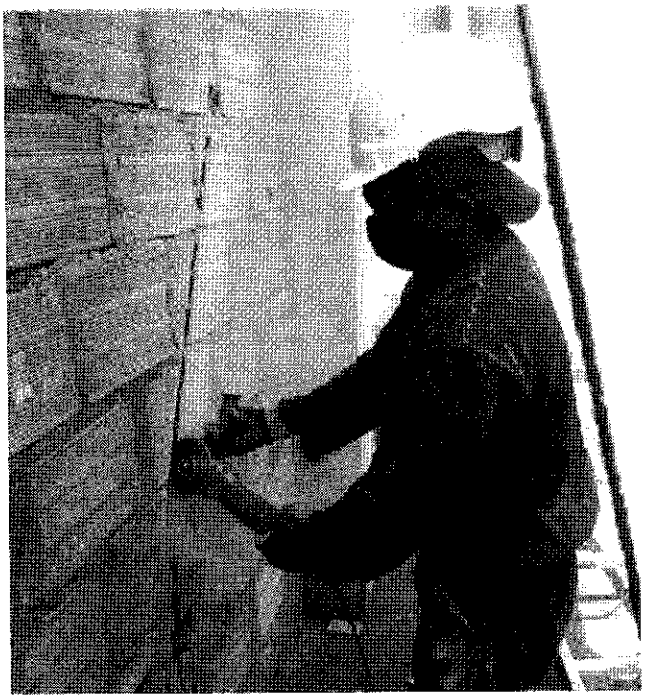


Calle 68 No. 7 – 56
Torre 4
Apartamento 04


317 409 8664 – 322 234 0241
serinsas17@gmail.com

Neiva - Huila

CONSORCIO OBRAS 2020

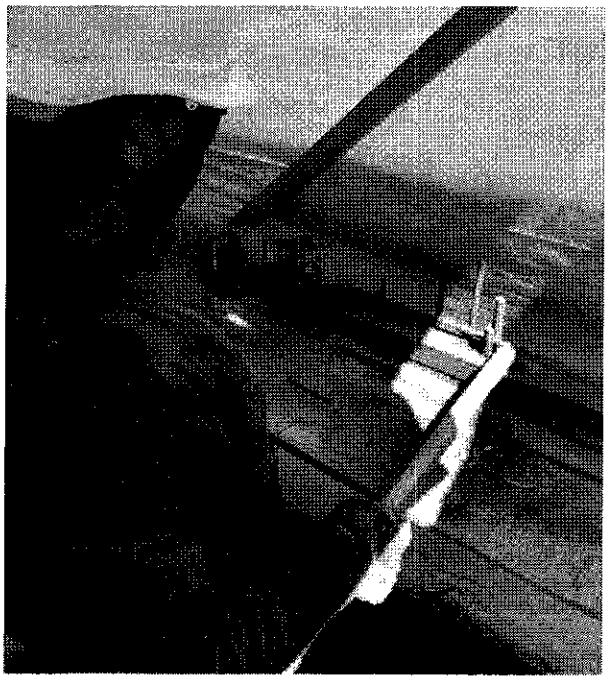



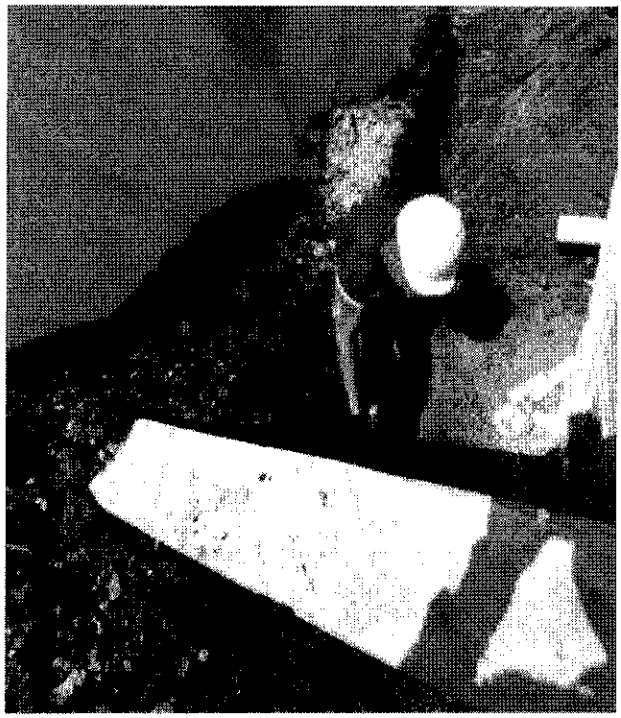



Calle 68 No. 7 – 56
Torre 4
Apartamento 04

317 409 8864 – 322 234 0241
serinsas17@gmail.com

Neiva - Huila

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL.

Además, se reitera que todo el personal que se encuentra laborando en obra está afiliado al sistema de seguridad social.

DIEGO ROLANDO GUTIÉRREZ CASTRO
Representante legal
CONSORCIO OBRAS 2020

CONSORCIO OBRAS 2020

CONTRATANTE:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL- AEROCIVIL - NIT 899999059-3
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS 2020 – NIT 901.427.345-8
CONTRATO:	20001103 H4 A DE 2020
OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO RUTINARIO A EDIFICACIONES AEROPORTUARIAS DE FORMA GENERAL Y PERMANENTE DE LOS AEROPUERTOS DE LA REGIONAL ANTIOQUIA

INFORME PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD

A continuación, se adjunta un registro fotográfico donde se evidencia que el personal de obra realiza actividades, utilizando los Elementos relacionados al Protocolo de Bioseguridad.









CONSORCIO OBRAS 2020



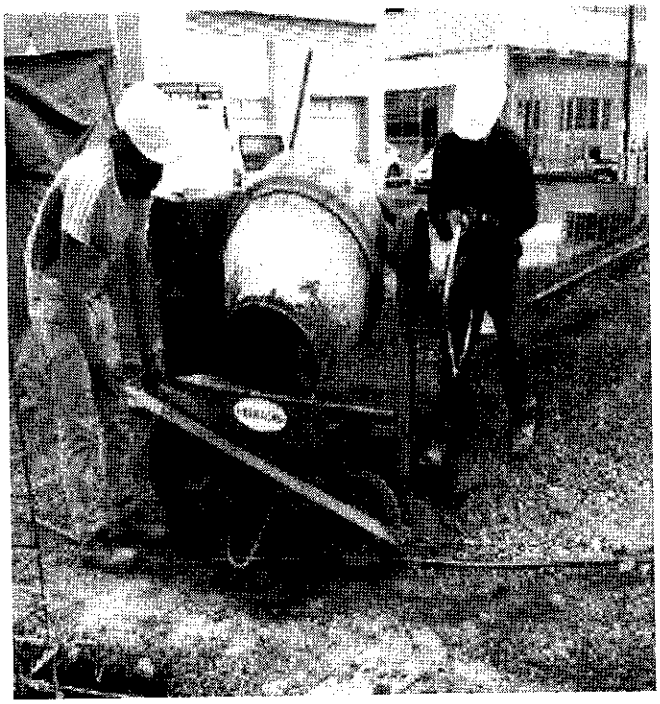



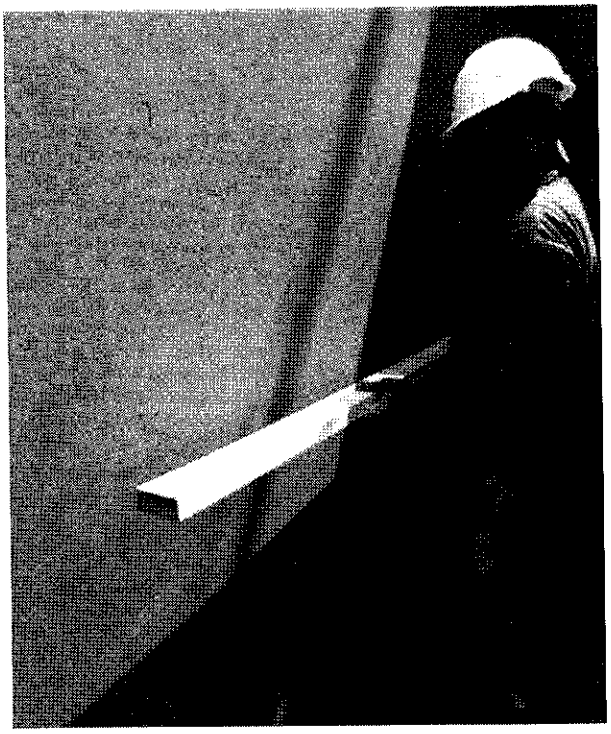


Calle 68 No. 7 – 56
Torre 4
Apartamento 04


317 409 8864 – 322 234 0241
serinsas17@gmail.com

Neiva - Huila

CONSORCIO OBRAS 2020

Se anexan imágenes donde se realizan charlas para la concientización del cuidado del COVID-19 y su respectiva prevención

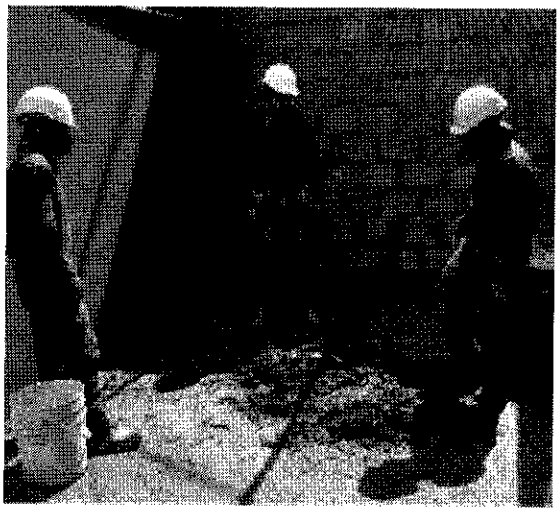

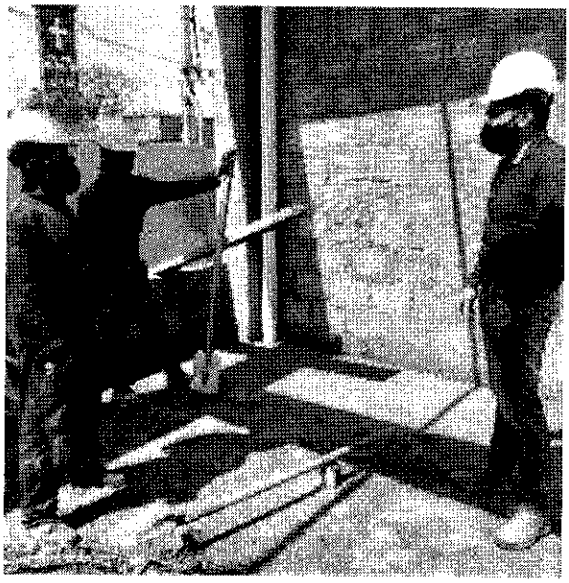

Se anexa tablas y seguimiento de síntomas del protocolo de BIOSEGURIDAD COVID – 19

DIEGO ROLANDO GUTIÉRREZ CASTRO
Representante legal
CONSORCIO OBRAS 2020

Calle 68 No. 7 – 56
Torre 4
Apartamento 04

317 409 8864 – 322 234 0241
serinsas17@gmail.com

Neiva - Huila

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD COVID - 19

CONSORCIO VIARIAS 2020

PROYECTO: RVLC0783 ADECUAR SALAS DE ENTRENAMIENTO OPERACIONAL PARA EL PERSONAL DE CONTROLADORES AÉREOS REGIONAL VALLE.

NOMBRE: Diego Bolando Gutierrez Castro Semana comprendida desde el dia: 23/11/2020 al día 29/11/2020

Día:	El núcleo familiar donde reside y el personal en mención no presenta ninguno de los siguientes síntomas:				Control de lavado de manos							Control de temperatura		FIRMA
	Fiebre:	Cansancio:	Tos seca:	Dlarrea, dolor, congestión, secreción nasal o dificultad para respirar.	1	2	3	4	5	6	7	Inicio	Fin	
Lunes					X	X	X	X	X	X		35.6	36.4	
Martes					X	X	X	X	X			35.8	36.1	
Miercoles					X	X	X	X	X	X		35.6	35.9	
Jueves					X	X	X	X	X	X		36.0	36.4	
Viernes					X	X	X	X	X	X	X	35.8	35.9	

Firma del Ing. Residente

Firma del Ing. Residente Interventoria

NOTA: El presente documento se ajusta a los protocolos establecidos en la Resolucion 00666 del 24 de abril del 2020 del ministerio de salud

Escaneado con CamScanner

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD COVID - 19

PROYECTO: RVLC0283 ADECUAR SALAS DE ENTRENAMIENTO OPERACIONAL PARA EL PERSONAL DE CONTROLADORES AÉREOS REGIONAL VALLE

NOMBRE: Diego Rolando Gutierrez Cano Semana comprendida desde el día: 30/11/2020 al día 6/12/2020

Día	El núcleo familiar donde reside y el personal en mención no presenta ninguno de los siguientes síntomas:				Control de lavado de manos							Control de temperatura		FIRMA
	Fiebre	Cansancio	Tos seca	Diarrea, dolor, congestión, secreción nasal o dificultad para respirar	1	2	3	4	5	6	7	Inicio	Fin	
Lunes	✓	✓	✓	✓	X	X	X	X	X			36.1	36.3	
Martes					X	X	X	X	X	X		35.4	35.9	
Miercoles					X	X	X	X	X	X	X	36.0	35.8	
Jueves					X	X	X	X	X			35.6	36.1	
Viernes					X	X	X	X	X			35.8	36.4	

Firma del ing. Residente

Firma del ing. Residente Interventoria

NOTA: El presente documento se ajusta a los protocolos establecidos en la Resolucion 00666 del 24 de abril del 2020 del ministerio de salud.

Escaneado con CamScanner

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD COVID - 19

CONSORCIO VIARIAS 2020

PROYECTO: RVLC0783 ADECUAR SALAS DE ENTRENAMIENTO OPERACIONAL PARA EL PERSONAL DE CONTROLADORES AÉREOS REGIONAL VALLE.

NOMBRE: Diego Rolando Guerrero Castro Semana comprendida desde el día: 7/12/2020 al día 13/12/2020

Día:	El núcleo familiar donde reside y el personal en mención no presenta ninguno de los siguientes síntomas:				Control de lavado de manos							Control de temperatura		FIRMA
	Fiebre:	Cansancio	Tos seca:	Diarrea, dolor, congestión, secreción nasal ó dificultad para respirar	1	2	3	4	5	6	7	Inicio	Fin	
Lunes					X	X	X	X	X	X		35.5	35.5	
Martes					X	X	X	X	X	X	X	35.2	35.2	
Miercoles					X	X	X	X	X	X	X	35.6	35.6	
Jueves					X	X	X	X	X			35.8	35.1	
Viernes					X	X	X	X	X	X		35.3	36.2	

Firma del Ing. Residente

Firma del Ing. Residente Interventoria

NOTA: El presente documento se ajusta a los protocolos establecidos en la Resolucion 00666 del 24 de abril del 2020 del ministerio de salud.

Escaneado con CamScanner

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD COVID - 19

CONSORCIO OBRAS 2020

PROYECTO: RVLC0783 ADECUAR SALAS DE ENTRENAMIENTO OPERACIONAL PARA EL PERSONAL DE CONTROLADORES AÉREOS REGIONAL VALLE.

NOMBRE: Diego Rolando Gutierrez Castro Semana comprendida desde el día: 14/12/2020 al día 18/12/2020

Día:	El núcleo familiar donde reside y el personal en mención no presenta ninguno de los siguientes síntomas:				Control de lavado de manos							Control de temperatura		FIRMA
	Fiebre:	Cansancio:	Tos seca.	Diarrea, dolor, congestión, secresión nasal o dificultad para respirar	1	2	3	4	5	6	7	Inicio	Fin	
Lunes					X	X	X	X	X	X		32.6	36.7	
Martes					X	X	X	X	X	X		35.8	35.7	
Miercoles					X	X	X	X	X	X	X	36.1	36.2	
Jueves					X	X	X	X	X	X		35.7	35.6	
Viernes					X	X	X	X	X	X		36.0	35.7	

Firma del ing. Residente

Firma del ing. Residente Interventoria

NOTA: El presente documento se ajusta a los protocolos establecidos en la Resolución 00666 del 24 de abril del 2020 del ministerio de salud.

Escaneado con CamScanner

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD COVID - 19

CRONOGRAMA 2020

PROYECTO: RVLC0783 ADECUAR SALAS DE ENTRENAMIENTO OPERACIONAL PARA EL PERSONAL DE CONTROLADORES AÉREOS REGIONAL VALLE.

NOMBRE: Fabian Guillermo Gutierrez Castro Semana comprendida desde el dia: 23/11/2020 al dia 29/11/2020

Dia:	El núcleo familiar donde reside y el personal en mención no presenta ninguno de los siguientes síntomas:				Control de lavado de manos							Control de temperatura		FIRMA
	Fiebre:	Cansancio:	Tos seca:	Diarrea, dolor, congestión, secresion nasal o dificultad para respirar:	1	2	3	4	5	6	7	Inicio	Fin	
Lunes					X	X	X	X	X	X	X	35.7	35.8	
Martes					X	X	X	X	X	X		36.9	36.1	
Miercoles					X	X	X	X	X	X	X	36.2	35.8	
Jueves					X	X	X	X	X			35.4	36.3	
Viernes					X	X	X	X	X	X		35.9	36.8	

Firma del ing. Residente

Firma del ing Residente Interventoria

NOTA: El presente documento se ajusta a los protocolos establecidos en la Resolucion 00666 del 24 de abril del 2020 del ministerio de salud.

Escaneado con CamScanner

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD COVID - 19

CONSORCIO OBRAS 2020

PROYECTO: RVLC0783 ADECUAR SALAS DE ENTRENAMIENTO OPERACIONAL PARA EL PERSONAL DE CONTROLADORES AÉREOS REGIONAL VALLE.

NOMBRE: Fabian Guillermo Gutierrez Castro Semana comprendida desde el dia: 30/11/2020 al dia 6/12/2020

Dia:	El núcleo familiar donde reside y el personal en mención no presenta ninguno de los siguientes síntomas:				Control de lavado de manos							Control de temperatura		FIRMA
	Fiebre:	Cansancio:	Tos seca:	Diarrea, dolor, congestión, secreción nasal o dificultad para respirar	1	2	3	4	5	6	7	Inicio	Fin	
Lunes					X	X	X	X	X	X		35.8	35.9	
Martes					X	X	X	X	X	X	X	36.1	35.8	
Miercoles					X	X	X	X	X			35.3	36.0	
Jueves					X	X	X	X	X	X		35.3	35.8	
Viernes					X	X	X	X	X	X		35.9	36.1	

Firma del Ing. Residente

Firma del ing. Residente Interventoria

NOTA: El presente documento se ajusta a los protocolos establecidos en la Resolucion 00666 del 24 de abril del 2020 del ministerio de salud.

Escaneado con CamScanner

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD COVID - 19

CONSORCIO OBRAS 2020

NIT 901.427.516-0

PROYECTO: RVLC0783 ADECUAR SALAS DE ENTRENAMIENTO OPERACIONAL PARA EL PERSONAL DE CONTROLADORES AÉREOS REGIONAL VALLE.

NOMBRE: Jose Nader Rocha Tapias Semana comprendida desde el día: 23/11/2020 al día 29/11/2020

Día:	El núcleo familiar donde reside y el personal en mención no presenta ninguno de los siguientes síntomas:				Control de lavado de manos							Control de temperatura		FIRMA
	Fiebre:	Cansancio:	Tos seca:	Diarrea, dolor, congestión, secresión nasal o dificultad para respirar	1	2	3	4	5	6	7	Inicio	Fin	
Lunes					X	X	X	X	X	X		35.8	35.6	Jose Nader
Martes					X	X	X	X	X	X	X	35.8	35.7	Jose Nader
Miercoles					X	X	X	X	X	X	X	35.5	36.0	Jose Nader
Jueves					X	X	X	X	X	X		35.9	35.8	Jose Nader
Viernes					X	X	X	X	X	X	X	36.3	35.9	Jose Nader

Firma del ing. Residente

Firma del ing. Residente Interventoria

NOTA: El presente documento se ajusta a los protocolos establecidos en la Resolucion 00666 del 24 de abril del 2020 del ministerio de salud.

Escaneado con CamScanner

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD COVID - 19

CONSORCIO OBRAS 2020

PROYECTO: RVLC0783 ADECUAR SALAS DE ENTRENAMIENTO OPERACIONAL PARA EL PERSONAL DE CONTROLADORES AÉREOS REGIONAL VALLE.

NOMBRE: Jose Heder Rocha Ramos Semana comprendida desde el dia: 30/11/2020 al dia 6/12/2020

Dia:	El núcleo familiar donde reside y el personal en mención no presenta ninguno de los siguientes síntomas:				Control de lavado de manos							Control de temperatura		FIRMA
	Fiebre:	Cansancio:	Tos seca:	Diarrea, dolor, congestión, secresión nasal o dificultad para respirar	1	2	3	4	5	6	7	Inicio	Fin	
Lunes	✓	✓	✓	✓	X	X	X	X	X			35.9	36.3	Jose Heder
Martes	✓	✓	✓	✓	X	X	X	X	X	X	X	35.4	35.7	Jose Heder
Miercoles	✓	✓	✓	✓	X	X	X	X	X	X		35.8	35.5	Jose Heder
Jueves	✓	✓	✓	✓	X	X	X	X	X	X	X	36.1	35.9	Jose Heder
Viernes	✓	✓	✓	✓	X	X	X	X	X	X		36.0	36.1	Jose Heder

Firma del Ing. Residente

Firma del Ing. Residente Interventoria

NOTA: El presente documento se ajusta a los protocolos establecidos en la Resolucion 00666 del 24 de abril del 2020 del ministerio de salud.

Escaneado con CamScanner

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD COVID - 19

PROYECTO: RVLC0783 ADECUAR SALAS DE ENTRENAMIENTO OPERACIONAL PARA EL PERSONAL DE CONTROLADORES AÉREOS REGIONAL VALLE

NOMBRE: Brayan Rocha Semana comprendida desde el dia: 23/11/2020 al dia 29/11/2020

Dia:	El núcleo familiar donde reside y el personal en mención no presenta ninguno de los siguientes sintomas:				Control de lavado de manos							Control de temperatura		FIRMA
	Fiebre:	Cansancio:	Tos seca:	Diarrea, dolor, congestión, secreción nasal o dificultad para respirar	1	2	3	4	5	6	7	nicio	Fin	
Lunes					X	X	X	X	X	X		32.8	36.2	
Martes					X	X	X	X	X	X	X	32.9	36.0	
Miercoles					X	X	X	X	X	X	X	35.6	36.1	
Jueves					X	X	X	X	X	X	X	35.9	35.8	
Viernes					X	X	X	X	X	X		36.1	35.9	

Firma del ing. Residente

Firma del ing. Residente Interventoria

NOTA: El presente documento se ajusta a los protocolos establecidos en la Resolucion 00666 del 24 de abril del 2020 del ministerio de salud.

Escaneado con CamScanner

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD COVID - 19

PROYECTO: RVLC0783 ADECUAR SALAS DE ENTRENAMIENTO OPERACIONAL PARA EL PERSONAL DE CONTROLADORES AÉREOS REGIONAL VALLE

NOMBRE: Brayan Rocha Semana comprendida desde el día: 30/11/2020 al día 6/12/20..

Día:	El nucleo familiar donde reside y el personal en mención no presenta ninguno de los siguientes síntomas:				Control de lavado de manos							Control de temperatura		FIRMA
	Fiebre:	Cansancio:	Tos seca:	Diarrea, dolor, congestión, secresion nasal o dificultad para respirar	1	2	3	4	5	6	7	Inicio	Fin	
Lunes					X	X	X	X	X	X	X	35.3	35.6	
Martes					X	X	X	X	X			35.8	35.9	
Miercoles					X	X	X	X	X	X		35.9	35.8	
Jueves					X	X	X	X	X	X	X	36	36.1	
Viernes					X	X	X	X	X	X		35.5	36.2	

Firma del ing. Residente

Firma del ing. Residente Interventoria

NOTA: El presente documento se ajusta a los protocolos establecidos en la Resolucion 00666 del 24 de abril del 2020 del ministerio de salud.

Escaneado con CamScanner

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD COVID - 19

PROYECTO: RVLC0783 ADECUAR SALAS DE ENTRENAMIENTO OPERACIONAL PARA EL PERSONAL DE CONTROLADORES AÉREOS REGIONAL VALLE

NOMBRE: Brayan Gomez Semana comprendida desde el dia. 26/11/2020 al dia 27/11/2020

Dia:	El núcleo familiar donde reside y el personal en mención no presenta ninguno de los siguientes síntomas:				Control de lavado de manos							Control de temperatura		FIRMA
	Fiebre:	Cansancio:	Tos seca:	Diarrea, dolor, congestión, secresión nasal o dificultad para respirar	1	2	3	4	5	6	7	Inicio	Fin	
Lunes														
Martes														
Miercoles														
Jueves	S	S	S	S	X	X	X	X	X	X		35.6	35.8	
Viernes	S	S	S	S	X	X	X	X	X	X	X	36.1	35.6	

Firma del ing. Residente

Firma del ing. Residente Interventoria

NOTA: El presente documento se ajusta a los protocolos establecidos en la Resolucion 00666 del 24 de abril del 2020 del ministerio de salud.

Escaneado con CamScanner

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD COVID - 19

CONSORCIO OBRAS 2020

PROYECTO: RVLC0783 ADECUAR SALAS DE ENTRENAMIENTO OPERACIONAL PARA EL PERSONAL DE CONTROLADORES AÉREOS REGIONAL VALLE.

NOMBRE: Brayan Gomez Semana comprendida desde el día: 30/11/2020 al día 6/12/20

Día:	El núcleo familiar donde reside y el personal en mención no presenta ninguno de los siguientes síntomas:				Control de lavado de manos							Control de temperatura		FIRMA
	Fiebre:	Cansancio:	Tos seca:	Diarrea, dolor, congestión, secreción nasal o dificultad para respirar	1	2	3	4	5	6	7	Inicio	Fin	
Lunes					X	X	X	X	X	X		35.6	35.9	
Martes					X	X	X	X	X	X	X	35.8	37.5	
Miercoles					X	X	X	X	X	X		35.9	37.8	
Jueves					X	X	X	X	X			35.5	37.6	
Viernes					X	X	X	X	X	X	X	36.1	36.1	

Firma del ing. Residente

Firma del ing. Residente Interventoria

NOTA: El presente documento se ajusta a los protocolos establecidos en la Resolucion 00666 del 24 de abril del 2020 del ministerio de salud.

Escaneado con CamScanner

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD COVID - 19

PROYECTO: RVLC0783 ADECUAR SALAS DE ENTRENAMIENTO OPERACIONAL PARA EL PERSONAL DE CONTROLADORES AÉREOS REGIONAL VALLE.

NOMBRE: Jeffrey Mesa Semana comprendida desde el día. 26/11/2020 al día 27/11/2020

Día:	El núcleo familiar donde reside y el personal en mención no presenta ninguno de los siguientes síntomas:				Control de lavado de manos							Control de temperatura		FIRMA
	Fiebre:	Cansancio:	Tos seca:	Diarrea, dolor, congestión, secreción nasal o dificultad para respirar	1	2	3	4	5	6	7	Inicio	Fin	
Lunes														
Martes														
Miercoles														
Jueves	S	S	S	S	X	X	X	X	X	X	X	36.1	36.0	
Viernes					X	X	X	X	X	X	X	36.7	36.7	

Firma del Ing. Residente

Firma del Ing. Residente Interventoria

NOTA: El presente documento se ajusta a los protocolos establecidos en la Resolucion 00666 del 24 de abril del 2020 del ministerio de salud.

Escaneado con CamScanner

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD COVID - 19

CONSORCIO FUERZAS 2020

PROYECTO: RVLC0783 ADECUAR SALAS DE ENTRENAMIENTO OPERACIONAL PARA EL PERSONAL DE CONTROLADORES AÉREOS REGIONAL VALLE.

NOMBRE: Jeffrey Mesa Semana comprendida desde el día: 30/11/2020 al día 6/12/2020

Día:	El núcleo familiar donde reside y el personal en mención no presenta ninguno de los siguientes síntomas:				Control de lavado de manos							Control de temperatura		FIRMA
	Fiebre:	Cansancio:	Tos seca:	Diarrea, dolor, congestion ,secrecion nasal o dificultad para respirar	1	2	3	4	5	6	7	Inicio	Fin	
Lunes					X	X	X	X	X	X		35.7	35.9	
Martes					X	X	X	X	X	X	X	36.1	35.9	
Miercoles					X	X	X	X	X	X	X	36.0	35.9	
Jueves					X	X	X	X	X	X	X	36.0	36.1	
Viernes					X	X	X	X	X			35.8	36.3	

Firma del ing. Residente

Firma del ing. Residente Interventoria

NOTA: El presente documento se ajusta a los protocolos establecidos en la Resolucion 00666 del 24 de abril del 2020 del ministerio de salud.

Escaneado con CamScanner

AERONÁUTICA CIVIL Unidad Administrativa Especial	FORMATO	Salud Ocupacional
Principio de Procedencia: 1401.528	Título: VERIFICACION SALUD OCUPACIONAL	

IMPLEMENTACIÓN DE LOS CONTROLES ESTABLECIDOS EN LA MATRIZ DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PARA CONTRATISTAS

Contrato No.20001103-H4 de 2020.

RVLC0783 ADECUAR SALAS DE ENTRENAMIENTO OPERACIONAL PARA EL PERSONAL DE CONTROLADORES AEREOS REGIONAL VALLE.

Nombre del Apoyo a la Supervisión. Juan David Rodriguez Suancha.

Verificación No.1 Fecha 21/12/2020

Realizada la verificación de la matriz de cumplimiento en seguridad y salud ocupacional, certifico que la empresa contratista cumple con todos los requerimientos de seguridad y salud ocupacional.

Vo.Bo. JUAN DAVID RODRIGUEZ SUANCHA.
Apoyo a la Supervisión.

Firma: _____
Apoyo a la Supervisión.

Carrera 10 N° 4 35
Tels.8644276 / 3134994082
Neiva-Huila

Asesorias Integrales
Contadores Publicos
Asesores contables

EL SUSCRITO CONTADOR PÚBLICO

CERTIFICA

Que el CONSORCIO OBRAS 2020, identificado con número de identificación tributaria NIT 901.397.537-5, de conformidad con la ley 100 de 1993 se encuentra a PAZ Y SALVO con los pagos de seguridad integral (Salud, Pensión, Riesgos Profesionales) y de conformidad con la ley 21 de 1982, Ley 789 del 2002 y en concordancia con la ley 1607 del 2012, se cancelan aportes parafiscales correspondientes al cuatro por ciento (4%), distribuidos para caja de compensación familiar, de todo el personal que labora hasta el mes de noviembre del año 2020.

Dado en Neiva a los dieciocho (18) días del mes de diciembre de 2020.

TERESA RUBIANO GARCIA
Contador Público
128027-T

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 19403600
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2020-12-18

pagado

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	CONSORCIO OBRAS 2020	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	901427345	D.V.	8	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 68 N 7 56 TORRE 4 APTO 04	DEPARTAMENTO	HUILA	MUNICIPIO	NEIVA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4290	CORREO ELECTRÓNICO	SERINSAS.ADTIVO@GMAIL.COM	TELÉFONO	3174098864
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	80833443	PRIMER APELLIDO	GUTIERREZ	SEGUNDO APELLIDO	CASTRO
PRIMER NOMBRE	DIEGO	SEGUNDO NOMBRE	ROLANDO		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2020	Mes: 11	Año: 2020	Mes: 12	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
6		$1,784,869		19403600

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO									Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1007705295	01	No	No	No	41	1	Fijo	GOMEZ OVIEDO BRAYAN STEVEN	$877,803
CC-80833443	01	No	No	No	41	1	Fijo	GUTIERREZ CASTRO DIEGO ROLANDO	$877,803
CC-1022394423	01	No	No	No	11	1	Fijo	GUTIERREZ CASTRO FABIAN GUILLERMO	$877,803
CC-1088337862	01	No	No	No	41	1	Fijo	MESA TANGARIFE JEFFREY RAMSES	$877,803
CC-1084924161	01	No	No	No	41	1	Fijo	ROCHA DELGADO BRAYAN ESNEIDER	$877,803
CC-83224158	01	No	No	No	41	1	Fijo	ROCHA IQUINAS JOSE HEDER	$877,803

NOVEDADES																																
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1007705295	X	2020-11-25																											0		
CC - 80833443	X	2020-11-18																											0		
CC - 1022394423	X	2020-11-18																											0		
CC - 1088337862	X	2020-11-25																											0		
CC - 1084924161	X	2020-11-21																											0		
CC - 83224158	X	2020-11-18																											0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1007705295	PROTECCION	6	$175,561	0.1600000	$28,100	$0	$0	$28,100	$0	$0	$0
CC - 80833443	COLFONDOS	13	$380,382	0.1600000	$60,900	$0	$0	$60,900	$0	$0	$0
CC - 1022394423	COLFONDOS	13	$380,382	0.1600000	$60,900	$0	$0	$60,900	$0	$0	$0
CC - 1088337862	PORVENIR	6	$175,561	0.1600000	$28,100	$0	$0	$28,100	$0	$0	$0
CC - 1084924161	COLFONDOS	10	$292,601	0.1600000	$46,900	$0	$0	$46,900	$0	$0	$0
CC - 83224158	PORVENIR	13	$380,382	0.1600000	$60,900	$0	$0	$60,900	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1007705295	NUEVA E.P.S. S.A.	6	$175,561	0.0400000	$7,100	$0	0	$0	0	$0	6	$175,561	1	0.0696000	$12,300
CC - 80833443	MEDIMAS EPS	13	$380,382	0.0400000	$15,300	$0	0	$0	0	$0	13	$380,382	1	0.0696000	$26,500
CC - 1022394423	FAMISANAR	13	$380,382	0.0400000	$15,300	$0	0	$0	0	$0	13	$380,382	1	0.0696000	$26,500
CC - 1088337862	SALUD TOTAL	6	$175,561	0.0400000	$7,100	$0	0	$0	0	$0	6	$175,561	1	0.0696000	$12,300
CC - 1084924161	EPS-S COMF HUILA	10	$292,601	0.0400000	$11,800	$0	0	$0	0	$0	10	$292,601	1	0.0696000	$20,400
CC - 83224158	COOMEVA EPS	13	$380,382	0.0400000	$15,300	$0	0	$0	0	$0	13	$380,382	1	0.0696000	$26,500

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1007705295	COMFAMILIAR DEL HUILA	6	$175,561	0.0400000	$7,100	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-80833443	COMFAMILIAR DEL HUILA	13	$380,382	0.0400000	$15,300	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1022394423	CAFAM	13	$380,382	0.0400000	$15,300	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1088337862	COMFAMILIAR DEL HUILA	6	$175,561	0.0400000	$7,100	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1084924161	COMFAMILIAR DEL HUILA	10	$292,601	0.0400000	$11,800	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-83224158	COMFAMILIAR DEL HUILA	13	$380,382	0.0400000	$15,300	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2020 - 11											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLFONDOS	3	$168,700	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$168,700
PORVENIR	2	$89,000	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$89,000
PROTECCION	1	$28,100	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$28,100

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
COOMEVA EPS	1	$15,300	$0	0	$0	0	$0	$15,300	0	$0	$0	$15,300	$0	0	$0	$0	$15,300	$0	$0	$15,300
MEDIMAS EPS	1	$15,300	$0	0	$0	0	$0	$15,300	0	$0	$0	$15,300	$0	0	$0	$0	$15,300	$0	$0	$15,300
NUEVA E.P.S. S.A.	1	$7,100	$0	0	$0	0	$0	$7,100	0	$0	$0	$7,100	$0	0	$0	$0	$7,100	$0	$0	$7,100
SALUD TOTAL	1	$7,100	$0	0	$0	0	$0	$7,100	0	$0	$0	$7,100	$0	0	$0	$0	$7,100	$0	$0	$7,100
EPS-S COMF HUILA	1	$11,800	$0	0	$0	0	$0	$11,800	0	$0	$0	$11,800	$0	0	$0	$0	$11,800	$0	$0	$11,800
FAMISANAR	1	$15,300	$0	0	$0	0	$0	$15,300	0	$0	$0	$15,300	$0	0	$0	$0	$15,300	$0	$0	$15,300

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	6	$124,500	0	$0	$0	$124,500	0	$0	$124,500	0	$0	$1,245	$124,500

TOTAL APORTES PARAFISCALES

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFAMILIAR DEL HUILA	5	$56,600	0	$0	$56,600
CAFAM	1	$15,300	0	$0	$15,300
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR

CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	6	$71,900

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
PENSIONES	3	$285,800
RIESGOS PROFESIONALES	1	$124,500
CAJAS DE COMPENSACIÓN	2	$71,900
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$554,100

NÚMERO DE CONTRATO	20001103-H4 de 2020
CLASE DE CONTRATO	OBRA.
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS 2020.
OBJETO	RVLC0783 ADECUAR SALAS DE ENTRENAMIENTO OPERACIONAL PARA EL PERSONAL DE CONTROLADORES AEREOS REGIONAL VALLE.
VALOR	CIENTO CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS IVA INCLUIDO $ 105.673.174,00 M/CTE.
PLAZO	Cuarenta y cinco (45) días calendario contados a partir de la suscripción del acta de inicio sin exceder la fecha de recibo final que no debe pasar del día 31 de diciembre de 2020.
CDP	25520 09-09-2020
RP	84320 15-11-2020
FECHA LEGALIZACIÓN	15 de Noviembre de 2020
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	Milton Cesar Sánchez Pérez.

En la ciudad de Palmira (V), el **15/11/2020** se reunieron con el fin de dar inicio a la ejecución del presente contrato: **MILTON CESAR SÁNCHEZ PÉREZ** con cedula No. 16.889.912 obrando en calidad de supervisor, **DIEGO ROLANDO GUTIERREZ CASTRO** con Cedula No 80.833.443 de Bogotá, obrando en calidad de representante legal del contratista **CONSORCIO OBRAS 2020, Juan David Rodriguez Suancha**, con cedula No. 74.451.949; obrando en calidad de apoyo a la supervisión designado por la entidad para la vigilancia y control del contrato.

DIEGO ROLANDO GUTIERREZ CASTRO
R/L. CONSORCIO OBRAS 2020

JUAN DAVID RODRIGUEZ SUANCHA
Apoyo a Supervisión U.A.E.A.C.

MILTON CESAR SANCHEZ PEREZ
Supervisor U.A.E.A.C.
Director Regional Valle

Proyecto: Juan David Rodríguez- Contratista Infraestructura - Regional (V).
Reviso: Diego Mauricio López Forero- Abogado Contratista- Regional (V).

ANEXO 5
MINUTA DEL CONTRATO

TABLA DE CONTENIDO

CLÁUSULA 1.	DEFINICIONES
CLÁUSULA 2.	OBJETO
CLÁUSULA 3.	ALCANCE DEL OBJETO
CLÁUSULA 4.	PLAZO DEL CONTRATO
CLÁUSULA 5.	VALOR DEL CONTRATO
CLÁUSULA 6.	ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO
CLÁUSULA 7.	APROPIACIÓN PRESUPUESTAL
CLÁUSULA 8.	FORMA DE PAGO
CLÁUSULA 9.	OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA
CLÁUSULA 10.	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA
CLÁUSULA 11.	DERECHOS DEL CONTRATISTA
CLÁUSULA 12.	OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
CLÁUSULA 13.	RESPONSABILIDAD
CLÁUSULA 14.	INDEMNIDAD
CLÁUSULA 15.	MULTAS
CLÁUSULA 16.	CLÁUSULA PENAL
CLÁUSULA 17.	CLÁUSULAS EXCEPCIONALES
CLÁUSULA 18.	GARANTÍAS
CLÁUSULA 19.	INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA
CLÁUSULA 20.	INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL CONTRATISTA
CLÁUSULA 21.	CESIÓN
CLÁUSULA 22.	LIQUIDACIÓN
CLÁUSULA 23.	SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN
CLÁUSULA 24.	LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL
CLÁUSULA 25.	DOCUMENTOS

Entre el **MILTON CESAR SANCHEZ PEREZ** mayor de edad, vecino de Florida (V); identificado con la cédula de ciudadanía 16.889.912 de Florida (V) obrando en su condición de **DIRECTOR AERONAUTICO REGIONAL VALLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL, según** Resolución número 02529 del 16 de agosto de 2019, entidad especializada de carácter técnico adscrita al Ministerio de Transporte, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, con NIT 899.999.059-3; debidamente facultado para la celebración del presente contrato, conforme a la delegación conferida bajo el marco jurídico establecido por los artículos 209 y 211 de la Constitución Política, el numeral 9 del Decreto 260 de 2004 (modificado por el Decreto 823 de 2017), el artículo 49 de la Ley 446 de 1998, artículo 12 de la Ley 80 de 1993, artículo 21 de la Ley 1150 de 2007 y la Resolución 00896 del 03 de abril de 2019, en adelante la ENTIDAD, por una parte; y, por la otra, **DIEGO ROLANDO GUTIERREZ CASTRO, C.C. 80.833.443 Bogotá, Representante Legal del CONSORCIO OBRAS 2020, identificado con Nit.** 9 0 1 4 2 7 3 4 5 -8, en adelante el CONTRATISTA, identificado como aparece en el Formato 1 – Carta de Presentación de la oferta, hemos convenido celebrar el presente contrato, previas las siguientes consideraciones:

I. Que mediante Resolución No. 087 del nueve (09) de octubre de 2020 la Entidad abrió el Proceso de Contratación de selección abreviada de menor cuantía **No. 20001103 H4 de 2020.**

II. Que mediante Resolución No. 099 del tres (03) de noviembre de 2020 la Entidad adjudicó el Contrato al Contratista.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la "Parte", conjuntamente las "Partes"), acuerdan que el presente Contrato se regirá por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, el Código Civil y el Código de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, además de las adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con el significado que se les asigna en el Anexo 3 – Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

CLÁUSULA 2. OBJETO

El objeto del Contrato es ***RVLC0783 ADECUAR SALAS DE ENTRENAMIENTO OPERACIONAL PARA EL PERSONAL DE CONTROLADORES AÉREOS REGIONAL VALLE.***

CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación No. **20001103 H4 de 2020.** los cuales hacen parte integral del presente contrato.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma independiente y con plena autonomía técnica y administrativa hasta su total terminación y aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta económica, conforme lo señaló en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial.

El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el Contratista con la presentación de su propuesta.

CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de Cuarenta y cinco (45) Días Calendario, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO

El valor del Contrato es por la suma **CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS $120.000.000,00 incluido IVA sobre la utilidad**, equivalentes **136.704932655 SMLMV** para el año de suscripción del contrato 2020, suma que se discrimina de la siguiente manera:

El contratista acepto con la presentación de su propuesta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades.

El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el presente Contrato.

CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

Para el presente contrato la Entidad no entregará al Contratista anticipo y/o pago anticipado

CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará a la apropiación presupuestal correspondiente y específicamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal:

certificado de disponibilidad presupuestal SIIF Nación **No. 25520 expedido el día del 09 de septiembre de 2020**. Correspondiente a la vigencia fiscal 2020.

CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO

La Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, pagara el valor total adjudicado por medio de **UN (1) ACTA PARCIAL, que se levantara a la mitad del plazo de ejecución y/o con un avance en la ejecución del 50% y UN (1) ACTA FINAL**, previa certificación del recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato, donde se mencionen los servicios efectivamente prestados parcialmente, acompañado de una factura comercial o cuenta de cobro (lo que aplique). El último pago se realizará previa presentación del ACTA DE RECIBO FINAL y acompañamiento de pagos parafiscales del contratista y sus empleados.

Cuando la contratación se realice con personas jurídicas, se deberá acreditar el pago a los sistemas de salud, ARL, pensiones y aportes parafiscales a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, mediante certificación expedida por el Revisor Fiscal cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de Ley, o por el Representante Legal durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para que se hubiere constituido la sociedad, el cual en todo caso

no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del contrato. En el evento en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, deberá acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución (Art. 50, Inciso 3 Ley 789 de 2002) y la **Certificación del pago a la Contribución FIC**, conforme al Decreto 2375 de 1974 y sus decretos reglamentarios y normas concordantes.

NOTA: Los supervisores de los contratos deben informar a contratistas y proveedores que el tiempo máximo para el pago de sus facturas, será de 10 días hábiles para reconocimiento de obligaciones amparadas con recursos propios y de 31 días hábiles cuando se trate de obligaciones amparadas con Recursos de la Nación sujetos a cupo PAC. Este tiempo empezara a contar una vez la cuenta cumpla con la totalidad de los requisitos exigidos para el pago.

Parágrafo 1. El [supervisor o interventor] solo aprobará el pago final de aquellas actividades que sean comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el Contratista. Para causar el pago final del contrato, el Contratista deberá acreditar que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la ejecución de las actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la Entidad no hará el respectivo recibo de factura final de pago al contrato.

Reglas comunes a todas las opciones:

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.

CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del presente Contrato, la ley, las obligaciones y condiciones señaladas en el pliego de condiciones y demás Documentos del Proceso, vigentes durante la ejecución del contrato, el Contratista se obliga a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.
2. Desarrollar el objeto del Contrato y alcance del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.
3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso.
4. Disponer del personal idóneo, así como de los recursos logísticos, materiales, y/o equipos, necesarios para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecidos.
5. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.
6. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).
7. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos acordados con la Entidad.
8. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato.
9. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.
10. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la oferta.

11. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.
12. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.
13. Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la producida a lo largo de la ejecución del contrato.
14. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP).
15. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o accionistas.
16. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.
17. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista.
18. Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que la Entidad le llegue a entregar para el debido desarrollo de las obligaciones a cargo y en consecuencia estará obligado a hacer el correspondiente reintegro en especie o en dinero cuando por su culpa se produzca daño o pérdida, sin que esto excluya la indemnización de perjuicios. Lo anterior sin perjuicio de las acciones que del hecho se puedan predicar.
19. Las demás inherentes a la ejecución del contrato.

CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA

a. Presentar previo a la iniciación del contrato la MATRIZ DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS EN SEGURIDAD OCUPACIONAL PARA CONTRATISTAS DE LA AERONAUTICA CIVIL, debidamente diligenciada en físico y medio magnético dando cumplimiento a la normatividad legal vigente en seguridad y salud ocupacional.
b. Dar cumplimiento a los protocolos de bioseguridad para el manejo y control del riesgo de coronavirus COVID-19 en el sector de infraestructura de transporte.
c. Presentar posterior a la suscripción del acta de inicio, el CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA de manera detallado, que deberá ser aprobado por el SUPERVISOR, así, como el personal que desarrollará las actividades contratadas.
d. Adquirir y presentar las GARANTÍAS exigidas por la entidad en el pliego de condiciones.
e. Cumplir con las especificaciones técnicas descritas en el Anexo 1- Anexo Técnico CCE-EICP-IDI-06 Menor Cuantía
f. Ejecutar las obras descritas en el Formulario 1– Formulario de Presupuesto Oficial CCE-EICP-FM-25 Menor Cuantía y las modificaciones que puedan resultar durante la ejecución.
g. Cumplir con los plazos establecidos en el CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA.
h. Establecer sitios de acopio de sobrantes, cumpliendo las especificaciones de autoridad ambiental y/o la persona encargada, de tal manera que no interfieran con las actividades que se desarrollan en el sitio de ejecución de la obra, haciéndose la remoción periódica para evitar acumulaciones de estos sobrantes. Al finalizar la obra deberá hacerse en cada una de las áreas intervenidas una limpieza general a total satisfacción del SUPERVISOR.
i. Todos los trabajadores a utilizar por parte del CONTRATISTA en el desarrollo de la obra son responsabilidad de este en su vinculación o remoción al igual que las obligaciones como contratante de los mismos. La AERONAUTICA CIVIL no adquiere compromisos ni

obligaciones con persona alguna, empleados u obreros del CONTRATISTA por cualquier concepto, debido a los trabajos contratados. Sin embargo, la AERONAUTICA CIVIL se reserva el derecho de solicitar el retiro de cualquier trabajador previa justificación de la decisión.

j. Cumplir con las condiciones de seguridad industrial y salud ocupacional y diligenciar previo al inicio de la ejecución del presente contrato el documento incluido en el mismo denominado "requisitos de seguridad y salud ocupacional a cumplir durante la ejecución del contrato" y atender las recomendaciones emitidas por el Supervisor en este sentido, que podrán implicar la suspensión de la actividad.
k. Cumplir con las normas de seguridad aeroportuaria.
l. Asumir los riesgos a su cargo, conforme a la distribución de los mismos.
m. En la eventualidad de que las actividades a ejecutar requieran trabajos en altura, el CONTRATISTA deberá garantizar que el personal encargado de tales trabajos, cuente con la certificación vigente, emitida por la autoridad competente al igual que los equipos adecuados para realizar dicha labor.
n. Reparar a su costa todos los daños causados a los trabajos, equipamiento o edificaciones adyacentes que le sean imputables.
o. Presentar para aprobación de la entidad, el cronograma para la ejecución del factor de calidad ofrecido en la etapa de selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del contrato.

CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA

El Contratista tiene derecho a:

1. Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 del presente Contrato.

CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

La Entidad está obligada a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.
2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad ofrecido en la etapa de selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del contrato.
3. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 del presente Contrato.
4. Suministrar oportunamente al CONTRATISTA, toda la información que requiera razonablemente para el cumplimiento del objeto de este contrato.

CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. Además, responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del contrato, causados por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas.

CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD

La AEROCIVIL no tendrá responsabilidad alguna en relación con las acciones u omisiones constitutivos de actos de afectación, daño o gravamen que EL CONTRATISTA genere con ocasión a la ejecución del contrato, y defenderá, indemnizará y mantendrá a LA AEROCIVIL indemne de pérdidas, costos, reclamaciones y responsabilidades asociados con el desarrollo de las actividades inherentes y concomitantes al inicio, ejecución, terminación del contrato. En desarrollo del contenido de la presente cláusula: 1. EL CONTRATISTA, mantendrá indemne y defenderá a su propio costo a LA AEROCIVIL de cualquier pleito, queja o demanda y responsabilidad de cualquier naturaleza: con

relación a la ejecución del proyecto objeto del presente contrato, incluyendo costos y gastos provenientes de actos y/u omisiones del CONTRATISTA, en el desarrollo del mismo. 2. El CONTRATISTA se obliga a evitar que sus empleados y/o los familiares de los mismos, sus acreedores, sus proveedores y/o terceros, presenten reclamaciones (judiciales o extrajudiciales) contra LA AEROCIVIL, con ocasión o por razón de acciones u omisiones suyas relacionadas con la ejecución del presente contrato. Si ello no fuere posible y se presentaren reclamaciones o demandas contra LA AEROCIVIL, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en que le sean notificadas o en que se radiquen aquellas, podrá comunicarle la situación por escrito al CONTRATISTA o llamarlo en garantía. En cualquiera de dichas situaciones, EL CONTRATISTA se obliga a acudir en defensa de los intereses de la AEROCIVIL, para lo cual contratará profesionales idóneos que asuman la representación y asumirá el costo de los honorarios de éstos, del proceso y de la condena si la hubiere. Si la AEROCIVIL estima que sus intereses no están siendo adecuadamente defendidos, lo manifestará por escrito al CONTRATISTA, caso en el cual acordarán la mejor estrategia de defensa, o si LA AEROCIVIL lo estima necesario, asumirá directamente la misma. En este último caso, LA AEROCIVIL, descontará de los saldos a favor del CONTRATISTA, todos los costos que implique esa defensa, más un diez por ciento (10%) del valor de los mismos por concepto de gastos de administración, o, si no hubiere saldos pendientes de pago a favor del CONTRATISTA, LA AEROCIVIL podrá proceder al cobro de los valores a que se refiere esta cláusula por la vía ejecutiva, para lo cual este contrato junto con los documentos en los que se consignen dichos valores, prestarán mérito ejecutivo. En caso en el que EL CONTRATISTA no asuma la defensa o LA AEROCIVIL no llame en garantía dentro del proceso al CONTRATISTA o no le comunique de la existencia del mismo dentro del plazo de cinco (5) días hábiles a partir del momento en que fue radicada la reclamación o notificada la demanda, LA AEROCIVIL asumirá su defensa, pero el costo de los honorarios de los abogados del proceso y de la condena, si la hubiere, serán descontados de los saldos pendientes de pago a favor del CONTRATISTA; si no hubiere saldos pendientes de pago a favor del CONTRATISTA o no fuere posible hacer efectiva la garantía, LA AEROCIVIL podrá proceder al cobro de los valores a que se refiere esta cláusula por la vía ejecutiva, para lo cual este contrato junto con los documentos en los que se consignen dichos valores, prestarán mérito ejecutivo.

PARÁGRAFO ÚNICO: En todo caso, EL CONTRATISTA hará uso del derecho al debido proceso y defensa, en las oportunidades que se le requiera para efectos del cumplimiento de lo aquí estipulado.

CLÁUSULA 15. MULTAS

Se causarán multas equivalentes a ½ SMMLV, por cada día calendario transcurrido a partir del tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podrá ser superior al cinco por ciento 5% del valor del contrato.

Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causarán las siguientes multas:

Causales:

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso.
2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar las garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la cláusula 18 **GARANTÍAS**, de acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones, se causará una multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones más gravosas.
3. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el supervisor, que se relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causará una multa equivalente al 0,2% del valor del contrato. Estas multas se causarán

sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfacción del supervisor.

4. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en la fecha pactada, se causará una multa diaria equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el Contratista no inicie efectivamente con la ejecución del contrato en la fecha acordada.
5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará acreedor a una multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso.
6. Por incumplir las órdenes dadas por la supervisión, el Contratista se hará acreedor a una multa equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada orden incumplida.
7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondrá una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación.
8. Por cambiar el personal presentado a la supervisión o interventoría, sin la aprobación previa de esta, al Contratista se le impondrá una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato.
9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o Contratistas, al Contratista se le impondrá una multa equivalente a dos (2) salarios mínimos diarios legales vigentes, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación.
10. Las demás inherentes a la ejecución del contrato.

Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del Código Civil.

Parágrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la garantía de cumplimiento del contrato.

Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Contratista de continuar con la ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen del contrato.

Parágrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias obligaciones se podrán imponer nuevas multas.

Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo Diario o Mensual Vigente, será aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato.

Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de forma independiente, podrá ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL

Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las obligaciones contractuales y podrá exigirse al Contratista la pena y la indemnización de perjuicios.

En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco (5) días hábiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, por

el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inejecución total o parcial de las obligaciones a su cargo contraídas en virtud del presente acuerdo, el Contratista pagará a la Entidad, una suma equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato. La presente cláusula penal no tiene el carácter de estimación anticipada de perjuicios.

Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolución del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones a cargo del Contratista.

Parágrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto.

Parágrafo 3. Esta misma sanción se aplicará en caso de declararse la caducidad del contrato.

CLÁUSULA 17. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES

Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.

CLÁUSULA 18. GARANTÍAS

18.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar la garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (3) días hábiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta garantía tendrá las siguientes características:

<table>
<tr><th>Característica</th><th>Condición</th></tr>
<tr><td>Clase</td><td>Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades Estatales, (ii) Patrimonio autónomo, (iii) Garantía Bancaria.</td></tr>
<tr><td>Asegurado/ beneficiario</td><td>Unidad Administrativa Especial De Aeronáutica Civil identificada con NIT 899.999.059-3</td></tr>
<tr><td>Amparos, vigencia y valores asegurados</td><td>
<table>
<tr><th>Amparo</th><th>Vigencia</th><th>Valor Asegurado</th></tr>
<tr><td>Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan</td><td>Su vigencia será igual al plazo de ejecución del contrato y cuatro [4] meses, plazo contractual previsto para la liquidación del contrato.</td><td>En una cuantía equivalente al veinte por ciento [20%] del valor del contrato.</td></tr>
<tr><td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td><td>Hasta la liquidación del contrato o hasta la amortización del anticipo</td><td>El valor de esta garantía debe ser el ciento por ciento (100%) del monto pagado como</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Característica	Condición		
			anticipo, ya sea este en dinero o en especie. **No Aplica**
	Devolución del pago anticipado	Hasta la liquidación del contrato o hasta que la Entidad Estatal verifique el cumplimiento de todas las actividades o la entrega de todos los bienes o servicios asociados al pago anticipado, de acuerdo con lo que determine la Entidad Estatal	El valor de esta garantía debe ser el ciento por ciento (100%) del monto pagado de forma anticipada, ya sea este en dinero o en especie. **No Aplica**
	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el Contratista haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato	Plazo del contrato y tres (3) años más.	En una cuantía equivalente al veinte por ciento [20%] del valor del contrato.
	Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción	Una vigencia de cinco (2) años contados a partir del Acta de recibo final. Por ser obras de mantenimiento.	[En una cuantía equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total del contrato o del ítem o ítems de obras civiles.
	[Incluir amparos adicionales en los términos descritos en el Decreto 1082 de 2015]		
Tomador	• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. • No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir la razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. • Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes,		

Característica	Condición
	su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.
Información necesaria dentro de la póliza	• Número y año del contrato • Objeto del contrato • Firma del representante legal del Contratista • En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. Cumplimiento, si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El Contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las garantías en los eventos de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del Contratista o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar.

18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA

El Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes utilizados en la construcción. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de garantía de dos (2) años (Teniendo en cuenta que son actividades de mantenimiento) contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El Contratista procederá a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le señale en la comunicación escrita que le enviará al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad podrá hacer efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el Contrato. Así mismo, el Contratista será responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas durante el período de garantía.

Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones.

18.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad con las siguientes características:

Característica	Condición
Clase	Contrato de seguro contenido en una póliza
Asegurados	Unidad Administrativa Especial De Aeronáutica Civil identificada con NIT 899.999.059-3 y el Contratista

Característica	Condición
Tomador	• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. • No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. • Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.
Valor	En una cuantía equivalente a 200 SMMLV
Vigencia	Igual al período de ejecución del contrato y cuatro (4) meses más.
Beneficiarios	Terceros afectados y la Unidad Administrativa Especial De Aeronáutica Civil identificada con NIT 899.999.059-3
Amparos	Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3° del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.
Información necesaria dentro de la póliza	• Número y año del contrato • Objeto del contrato • Firma del representante legal del Contratista • En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, dentro del mismo término establecido para la garantía única de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles.

El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil extracontractual.

CLÁUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

CLÁUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL CONTRATISTA

El Contratista ejecutará el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de Contratación. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá vínculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista responderá de manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya lugar. Así mismo, el Contratista deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.

El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la Entidad. El empleo de tales subcontratistas no relevará al Contratista de las responsabilidades que asume por las labores de la construcción y por las demás obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguirá a cargo del Contratista. La Entidad podrá exigir al Contratista la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLÁUSULA 21. CESIÓN

El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 893 del Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia.

CLÁUSULA 22. LIQUIDACIÓN

Se procederá a la liquidación del contrato en cualquiera de los eventos previstos en los artículos 60 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 217 del Decreto 019 de 2012 y artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. La liquidación del contrato por cualquier evento se hará mediante acta suscrita por EL CONTRATISTA, EL SUPERVISOR Y EL ORDENADOR DEL GASTO, previa presentación por parte del CONTRATISTA de los documentos exigidos por escrito por el supervisor. El presente contrato deberá liquidarse a más tardar antes del vencimiento de los cuatro (4) meses siguientes a la finalización del plazo del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga.

Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato.

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del contrato o las partes no llegan a ningún acuerdo, la Entidad procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada susceptible del recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a la liquidación acordada o que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidación.

CLÁUSULA 23. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN

Para la suscripción se requiere que el Contratista se encuentre al día en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento

se requiere la firma de las partes. Para su ejecución, la aprobación de las garantías, y el Registro Presupuestal correspondiente.

CLÁUSULA 24. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en Departamento de Risaralda –Municipio de Pereira –Aeropuerto Matecaña y en el Departamento del Valle del Cauca – Municipio de Cartago –Aeropuerto Santa Ana, el domicilio contractual es Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón – Palmira – Aero civil 3 Piso.

CLÁUSULA 25. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales:

1. Estudios y documentos previos.
2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.
3. Propuesta presentada por el Contratista.
4. Las garantías debidamente aprobadas.
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución del Contrato.

En constancia se firma el presente contrato en el Municipio de Palmira, el día nueve (09) de noviembre de 2020.

Por el contratante,

MILTON CÉSAR SANCHEZ PÉREZ
DIRECTOR AERONÁUTICO REGIONAL VALLE II

Por el contratista,

CONSORCIO OBRAS 2020
NIT 9 0 1 4 2 7 3 4 5 8
Rep./Legal DIEGO ROLANDO GUTIERREZ CASTRO
Cedula de ciudadanía No. 80.833.443 Bogotá

Proyectó: Olmedo Ortiz Acevedo – Abogado Contratista
Revisó. Olmedo Ortiz Acevedo — Abogado Contratista
Vto. Bno. Maryluz Martínez Largo— Coordinadora de Grupo Administrativo y Financiero.

Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHmlorza MARISOL LORZA ORJUELA

Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 24-12-00-500 RVA_VALLE

Fecha y Hora Sistema: 2020-09-09-6:36 p. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	25520	**Fecha Registro:**	2020-09-09	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	24-12-00-500 RVA_VALLE						
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado		**Tipo:**	Gasto		**Uso Caja Menor**	Ninguno		
Valor Inicial:	120.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00		**Valor Actual.:**	120.000.000,00	**Saldo x Comprometer:**	120.000.000,00	**Vr. Bloqueado**	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	27020	**Fecha Registro:**	2020-09-09	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
50000 UAEAC - RVA - REG. VALLE	C-2403-0600-51-0-2403119-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - DEPENDENCIAS AERONÁUTICAS MANTENIDAS - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE NAVEGACIÓN AÉREA NACIONAL	Propios	21	CSF						
					Total:	120.000.000,00	0,00	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00

Objeto:	RVLC0783 ADECUAR SALAS DE ENTRENAMIENTO OPERACIONAL PARA EL PERSONAL DE CONTROLADORES AEREOS REGIONAL VALLE

Firma Responsable

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmlorza	MARISOL LORZA ORJUELA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-12-00-500	RVA_VALLE
Fecha y Hora Sistema:	2020-11-22-10:54 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 25520 de fecha 2020-09-09. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	84320	Fecha Registro:	2020-11-15	Unidad / Subunidad ejecutora:	24-12-00-500 RVA_VALLE		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo de Moneda: COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	105.673.174,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual: 105.673.174,00	Saldo x Obligar:	105.673.174,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901427345	Razon Social:	CONSORCIO OBRAS 2020	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	24102710742	Banco:	BCSC S A	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	16889912	Nombre:	MILTON CESAR SANCHEZ PEREZ	Cargo:	DIRECTOR REGIONAL VALLE

CAJA MENOR				VIATICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificacion:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de comisión:		Numero:	20001103 H4	Tipo:	CONTRATO DE OBRA	Fecha:	2020-11-15

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSORE CURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
50000 UAEAC - RVA - REG. VALLE	C-2403-0600-51-0-2403119-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - DEPENDENCIAS AERONÁUTICAS MANTENIDAS - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE NAVEGACIÓN AÉREA NACIONAL	Propios	21	CSF		105.673.174,00	0,00		
					Total:	105.673.174,00	0,00	105.673.174,00	105.673.174,00

Objeto:	ADECUAR SALAS DE ENTRENAMIENTO OPERACIONAL PARA EL PERSONAL DE CONTROLADORES AEREOS REGIONAL VALLE

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
50000	UAEAC - RVA - REG. VALLE	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2020-12-31	105.673.174,00	105.673.174,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHmlorza MARISOL LORZA ORJUELA

Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 24-12-00-500 RVA_VALLE

Fecha y Hora Sistema: 2020-12-16-3:44 p. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	35320	**Fecha Registro:**	2020-12-16	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	24-12-00-500 RVA_VALLE						
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado		**Tipo:**	Gasto		**Uso Caja Menor**	Ninguno		
Valor Inicial:	24.690.202,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00		**Valor Actual.:**	24.690.202,00	**Saldo x Comprometer:**	24.690.202,00	**Vr. Bloqueado**	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				**AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**					
Número:	37620	**Fecha Registro:**	2020-12-16	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
50000 UAEAC - RVA - REG. VALLE	C-2403-0500-51-0-2403119-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - DEPENDENCIAS AERONÁUTICAS MANTENIDAS - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE NAVEGACIÓN AÉREA NACIONAL	Propios	21	CSF						
					Total:	19.690.202,00	0,00	19.690.202,00	19.690.202,00	0,00

					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
50000 UAEAC - RVA - REG. VALLE	C-2403-0600-51-0-2403119-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - DEPENDENCIAS AERONÁUTICAS MANTENIDAS - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE NAVEGACIÓN AÉREA NACIONAL	Propios	20	CSF						
					Total:	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00

Objeto:	ADICION EN VALOR AL CONTRATO Nro. 20001103 H4 : ADECUAR SALAS DE ENTRENAMIENTO OPERACIONAL PARA EL PERSONAL DE CONTROLADORES AEREOS REGIONAL VALLE

Firma Responsable

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmlorza	MARISOL LORZA ORJUELA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-12-00-500	RVA_VALLE
Fecha y Hora Sistema:	2020-12-21-10:21 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 35320 de fecha 2020-12-16. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	98420	Fecha Registro:	2020-12-17	Unidad / Subunidad ejecutora:		24-12-00-500 RVA_VALLE			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	24.690.202,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	24.690.202,00	Saldo x Obligar:	24.690.202,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901427345	Razon Social:	CONSORCIO OBRAS 2020	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	24102710742	Banco:	BCSC S A	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	16889912	Nombre:	MILTON CESAR SANCHEZ PEREZ	Cargo:	DIRECTOR REGIONAL VALLE

CAJA MENOR				VIATICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificacion:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de comisión:		Numero:	ADICION 001 CTO 20001103 H4	Tipo:	CONTRATO DE OBRA	Fecha:	2020-12-17

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSORE CURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
50000 UAEAC - RVA - REG. VALLE	C-2403-0600-51-0-2403119-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - DEPENDENCIAS AERONÁUTICAS MANTENIDAS - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE NAVEGACIÓN AÉREA NACIONAL	Propios	21	CSF		19.690.202,00	0,00		
					Total:	19.690.202,00	0,00	19.690.202,00	19.690.202,00

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSORE CURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
50000 UAEAC - RVA - REG. VALLE	C-2403-0600-51-0-2403119-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - DEPENDENCIAS AERONÁUTICAS MANTENIDAS - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE NAVEGACIÓN AÉREA NACIONAL	Propios	20	CSF		5.000.000,00	0,00		
					Total:	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00

Objeto:	ADICION 001 EN VALOR CONTRATO 20001103 H4 : ADECUAR SALAS DE ENTRENAMIENTO OPERACIONAL PARA EL PERSONAL DE CONTROLADORES AEREOS REGIONAL VALLE

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
50000	UAEAC - RVA - REG. VALLE	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2020-12-31	24.690.202,00	24.690.202,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
