SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
WILLIAM MOLANO RODRIGUEZ

OSCAR BURITICA
GRUPO 3
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO CONTRATO DE INTERVENTORÍA 1052-2022
Periodo:	Del 01 de enero al 31 de enero 2026
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	4106 DEL 03 DE OCTUBRE DE 2025

Respetados:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

1. CONTRATO DE OBRA 1544 DE 2022 -DERIVADO CONVENIO 1899-2021

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
TRAMO 1: PR0+000 - PR1+194 Calzada Izquierda
TRAMO 2: PR0+000 - PR1+194 Calzada Derecha

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 1194 Metros, Doble Calzada

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	1544 DE 2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERNACIONAL WOC	NIT:	901.615.824-0

INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	CONSTRUCCIONES CIVILES ACOSTA INGENIERÍA S.A.S (20%) NIT 90026835-2 XIE S.A (25%) NIT 83006168-4 CARLOS GUILLERMO SUAREZ ESCOBAR (5%) ID:7.167.398 CAM INGENIEROS SAS (50%)		
OBJETO:	"REHABILITACIÓN DE LA DOBLE CALZADA, ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS DE LA AVENIDA INTERNACIONAL ENTRE CALLE 3 Y CALLE 12 DEL MUNICIPIO DE LETICIA".		
FECHA DE INICIO:	28/12/2022	En ejecución	SVR
VALOR TOTAL INVIAS:	VEINTE MIL OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS ($20.800.000.000,00) MCTE.		
VALOR TOTAL SGR:	CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA PESOS Y TRECE CENTAVOS ($5.154.566.150,13) MCTE		
VALOR ACTUAL:	VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA PESOS Y TRECE CENTAVOS ($25.954.566.150,13) MCTE.		
ANTICIPO	50%		
ANTICIPO OTORGADO:	$10.400.000.000,00 MCTE		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 6.713.819.428,94 MCTE		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 3.686.180.571,06 MCTE		
PLAZO INICIAL:	MESES (7) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.		
FECHA FINAL INICIAL	27 DE JULIO DE 2023		
OTRO SÍ No 1	ACLARATORIO Y MODIFICATORIO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No 001544		
Fecha OTRO SÍ No 1	12 DE SEPTIEMBRE DE 2022		
OTRO SÍ No 2	MODIFICATORIO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No 001544		
Fecha OTRO SÍ No 1	17 DE FEBRERO DE 2023		
OTRO SÍ No 3	CESIÓN DE PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CONSORCIAL.		
Fecha OTRO SÍ No 1	12 DE JULIO DE 2023		
ACTA No 2	SUSPENSIÓN 1 (60 días)		
FECHA ACTA No 2	29 DE DICIEMBRE DE 2022		
ACTA No 3	REINICIO 1		
FECHA ACTA No 3	02 DE FEBRERO DE 2023		
ACTA No 4	SUSPENSIÓN 2 (73 días)		

FECHA ACTA No 4	03 DE FEBRERO DE 2023
ACTA No 5	REINICIO 2
FECHA ACTA No 5	12 DE ABRIL DE 2023
ACTA No 6	SUSPENSIÓN 3 (121 días)
FECHA ACTA No 6	31 DE MAYO DE 2023
ACTA No 7	REINICIO 3
FECHA ACTA No 7	29 DE SEPTIEMBRE DE 2023
OTRO SÍ No 4	MODIFICATORIO DE CANTIDADES E ÍTEMS NO PREVISTOS Y AMPLIACIÓN DE PLAZO EN 9 MESES Y 25 DÍAS
Fecha OTRO SÍ No 4	27 DE DICIEMBRE DE 2023
OTRO SÍ No 5	GENERACIÓN DE APROPIACIÓN FINANCIERA DE LOS RECURSOS OCASIONADOS
Fecha OTRO SÍ No 5	08 DE NOVIEMBRE DE 2024
OTRO SÍ No 6	PRORROGA (6 MESES)
Fecha OTRO SÍ No 6	30 DE DICIEMBRE DE 2024
OTRO SÍ No 7	PRORROGA (4 MESES)
Fecha OTRO SÍ No 7	25 DE JUNIO DE 2025
OTRO SÍ No 8	PRORROGA (2 MESES), ADICIÓN PRESUPUESTAL Y BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES E ÍTEMS NO PREVISTOS
Fecha OTRO SÍ No 8	11 DE AGOSTO DE 2025
OTRO SÍ No 9	PRORROGA (3 MESES Y 16 DÍAS)
Fecha OTRO SÍ No 9	30 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE FINALIZACIÓN:	16 DE ABRIL DE 2026

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
4103	2024	02 – 2.3.2.2.24.02.006 - 52	Nación	$20.800.000.000,00	$13.427.638,857,86	$7.372.361.142,14
						-
TOTAL						$7.372.361.142,14

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	SALDO ANTICIPO POR AMORTIZAR
ACTA PARCIAL 7	$ 1.212.456.310,00	$ 0	$ 606.228.155,21	$ 3.686.180.571,06

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 30 de fecha 5 de febrero de 2025, para el periodo de enero de 2025, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación: 75,61%

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ÍTEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 20.800.000.000,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 15.667.015.051,62	75.43%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 15.727.588.682,48	75.89%

Nota: El % programado disminuyo respecto a lo reportado en el mes de diciembre de 2025 teniendo en cuenta a reprogramación efectuada al contrato de obra aprobada por la interventoría y que extiende el plazo contractual hasta el 16 de abril de 2026.

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$10.400.000.000,00
Amortizado	$ 6.713.819.428,94
Saldo	$ 3.686.180.571,06

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	SALDO ANTICIPO POR AMORTIZAR
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 1	$ 2.630.942.215,70	$ 0	$ 1.315.471.107,85	$ 9.084.528.892,15
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 2	$ 2.441.097.765,23	$ 0	$ 1.220.548.882,61	$ 7.863.980.009,54
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 3	$ 3.830.790.609,82	$ 0	$ 1.915.395.304,91	$ 5.948.584.704,63
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 4	$ 977.489.987	$ 0	$ 488.744.993,34	$ 5.459.839.711,29
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 5	$ 1.044.411.530,95	$ 0	$ 522.205.765,47	$ 4.937.633.945,82
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 6	$ 1.290.450.439,00	$ 0	$ 645.225.219,53	$ 4.292.408.726,28
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 7	$ 1.212.456.310,00	$ 0	$ 606.228.155,21	$ 3.686.180.571,06
TOTAL	$ 13.427.638.857,86		$ 6.713.819.428,92	$ 3.686.180.571,06


Durante el mes de enero de 2026 se tramitó el Acta Parcial No. 7 por valor de $1.212.456.310,00. En consecuencia, con corte al 31 de enero de 2026 se registra un total pagado de $13.427.638.857,86, equivalente al 64.56 % de los recursos aportados por el INVIAS al contrato de obra. Así mismo, al contratista se le otorgó un anticipo por valor de $10.400.000.000,00, del cual se ha amortizado el 64.56 %, quedando un saldo pendiente por amortizar de $3.686.180.571,06.

Por otra parte, el avance físico acumulado del contrato alcanza el 75.89%, lo que evidencia un rezago en la facturación del 11.33 % frente a lo efectivamente ejecutado en obra.

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada : 75.43%
Meta física ejecutada : 75.89%

CURVA S PROGRAMADO VS EJECUTADO

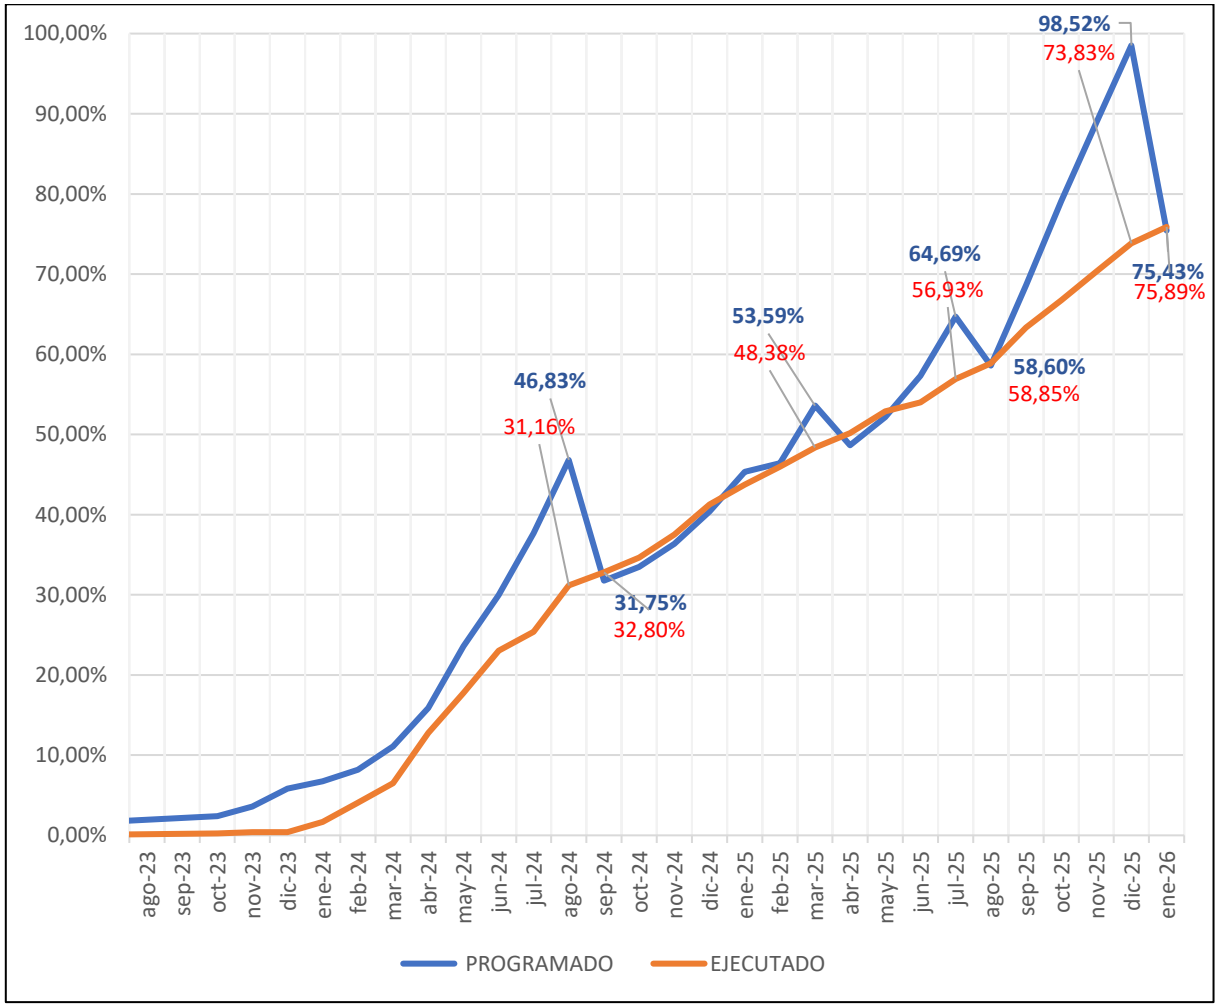

Del análisis de la curva S se infiere que el contrato de obra ha presentado múltiples reprogramaciones como consecuencia del incumplimiento reiterado del contratista frente a los ajustes efectuados al cronograma, lo cual ha generado impactos directos en el porcentaje programado de ejecución con cada reprogramación aprobada.

Durante el último año de ejecución, el contrato registra un avance promedio mensual del 2,7 %, evidenciando bajos rendimientos frente a las metas establecidas. Por parte de la interventoría, se han emitido los respectivos oficios de incumplimiento dirigidos al contratista, así como las notificaciones correspondientes a la Gobernación del Amazonas; no obstante, el Departamento no ha dado traslado a la apertura de un proceso formal de incumplimiento frente a su contratista.

Así mismo, en los comités presenciales de obra realizados durante los meses de octubre y y noviembre de 2025, el Supervisor del Contrato de Interventoría manifestó al Departamento la necesidad de iniciar el correspondiente proceso sancionatorio al contratista, con el fin de salvaguardar el adecuado cumplimiento del objeto contractual.

En relación con la reprogramación vigente derivada de la prórroga del contrato de obra efectuada al finalizar el mes de diciembre de 2025 debido al no cumplimiento del cronograma por parte del contratista , con nueva fecha de finalización prevista para el 16 de abril de 2026, se estableció una meta de programación al finalizar el mes de enero de 2026 del 75,43 %, la cual fue superada en el período evaluado, alcanzando una ejecución real en campo del 75,89 %. No obstante, de conformidad con lo expresado por la interventoría en su informe mensual, se indica lo siguiente:

> *"Durante el mes de enero de 2026, la Interventoría verifica que la inversión programada para el período fue alcanzada, conforme a los registros de ejecución física. No obstante, el comportamiento de la ejecución durante el mes permite identificar que dicho cumplimiento se logró bajo condiciones operativas ajustadas, las cuales no resultan suficientes para sostener el ritmo de ejecución requerido para los meses de febrero, marzo y abril de 2026, en los que se concentran inversiones significativamente mayores.*
> *Adicionalmente, se reitera que el avance del Componente Vial se encuentra supeditado a la liberación oportuna de frentes por parte del Componente de Redes, situación que condiciona directamente los rendimientos de las actividades viales".*

1.4.4. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD
N/A	N/A	N/A	N/A

1.4.5. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	OTRO SÍ No.
N/A	N/A

1.5. PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACIÓN	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.6. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACIÓN No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.6.1. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA OTRO SÍ	No. OTRO SÍ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

1.7. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: OTRO SÍ N°9, PRÓRROGA N°5
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 30/12/2025
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS: 08/01/2026
PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$2.595.456.616,00	11-44-101215265 Anexo N°7	12/07/23	16/10/26

Buen Manejo Anticipo	$12.977.283.076,00	11-44-101215265 Anexo N°7	12/07/24	16/10/26
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$5.190.913.231,00	11-44-101215265 Anexo N°7	12/07/25	16/04/29
Estabilidad y/o calidad de la Obra	$7.786.369.846,00	11-44-101215265 Anexo N°7	Se ampara 5 años a partir del acta de entrega y recibo a satisfacción de la obra.	

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	$1.297.728.308,00	11-40-101058979 Anexo N°8	12/07/23	16/04/26

1.7.1. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.7.2. CORRESPONDENCIA RADICADA A LA INTERVENTORIA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
OBRA-CIW-585	05/01/2026	CONSORCIO VIASCOL	Respuesta comunicado CE-VIASCOL-2344 Solicitud de documentación de SOAT de las volquetas.
OBRA-CIW-586	05/01/2026	CONSORCIO VIASCOL	Entrega de los Informes mensual técnico correspondiente a los meses de agosto, septiembre y octubre de 2025.
OBRA-CIW-588	08/01/2026	CONSORCIO VIASCOL	Entrega del informe ambiental del mes de octubre 2025 No 28 V1.

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
OBRA-CIW-589	09/01/2026	CONSORCIO VIASCOL	Respuesta comunicados INT- MULTI –170 y CE-VIASCOL-2348 Solicitud de actualización de información contractual pólizas.
CORREO ELECTRÓNICO	13/01/2026	CONSORCIO VIASCOL	Informe de SST del mes de noviembre.
OBRA-CIW-590	16/01/2026	CONSORCIO VIASCOL	Respuesta a su oficio CE-VIASCOL-2350.
OBRA-CIW-591	16/01/2026	CONSORCIO VIASCOL	Respuesta comunicado CE-VIASCOL-2348 y Alcance comunicado OBRACIW-589 Respuesta Comunicado INTMULTI– 170 y CE-VIASCOL-2348 Solicitud de actualización de información contractual.
OBRA-CIW-592	16/01/2026	CONSORCIO VIASCOL	Entrega del acta parcial de obra No 8 - Correspondiente al Componente vial.
OBRA-CIW-593	19/01/2026	CONSORCIO VIASCOL	Respuesta a su oficio CE-VIASCOL-2369 del 17/01/2026, observaciones acta parcial No 8.
CORREO ELECTRÓNICO	22/01/2026	CONSORCIO VIASCOL	Autorización de pagos de Ordenes de giro No 42 y No 43.
CORREO ELECTRÓNICO	22/01/2026	CONSORCIO VIASCOL	Documentación según compromisos.
OBRA-CIW-599	27/01/2026	CONSORCIO VIASCOL	Respuesta comunicado CE-VIASCOL-226, CE-VIASCOL-2302, CEVIASCOL- 2355, INT-MULTI-154, INT-MULTI-161 – Información sobre rendimientos financieros.
OBRA-CIW-601	30/01/2026	CONSORCIO VIASCOL	Respuesta comunicado CE-VIASCOL 2360 Y CE-VIASCOL 2377 – Solicitud de entrega ensayos de laboratorios pendiente.

1.8. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

Nota: La documentación se envía al archivo cuando se inicia el proceso de liquidación adicionalmente el contrato de obra está contratado por la Entidad Territorial.

Nota 2: Se anexa link de one drive con el expediente contractual:

CONV1899-2021_CTO_OBRA1544-2022

1.9. REGISTRO FOTOGRAFICO

1.9.1. Excavación mecánica en material común

Una vez retirada la placa en concreto existente, se procede a iniciar con las excavaciones de acuerdo con lo indicado en el diseño geométrico hasta llegar a la subrasante. Durante el periodo se avanzó del Pr0+132 al Pr0+100 calzada occidental de calle 5-4.



1.9.2. Geodren Vial

Consiste en un sistema integral de captación, conducción y evacuación de aguas de escorrentía, el cual está compuesto por un Geotextil No Tejido, una red drenante y tubería de PVC corrugada de drenaje, donde la red drenante y la tubería cumplen la función de drenaje, mientras el Geotextil actúa como elemento de filtración. Durante el periodo se avanzó del Pr0+167 al Pr0+140 calzada occidental de calle 5-4.



1.9.3. Geotextil T2400

Esta actividad consiste en el suministro e instalación de geotextil Tejido 2100 para prevenir la mezcla entre los suelos de subrasante y los materiales mixtos contenidos en la geoceldas HDPE perforada. Durante el periodo se avanzó del Pr0+200 al Pr0+167 calzada occidental de calle 6-5 y del Pr0+338 al Pr0+300 calzada oriental (Intersección con calle 6).



1.9.4. Geocelda HDPE perforada, altura 15 cm (Suministro e instalación)

Consiste en un sistema para el mejoramiento de suelos de subrasante, el cual se alcanza mediante la implementación de un sistema de confinamiento celular. Con el uso del sistema se busca que los esfuerzos generados en las capas superiores de la estructura de pavimento sean redistribuidos en la subrasante y la capa mejorada con geoceldas, mediante el confinamiento de material granular, mejorando así las características mecánicas del suelo de fundación de la estructura de pavimento. Durante el periodo se avanzó del Pr0+167 al Pr0+140 de calle 5-4 calzada occidental.



1.9.5. Mezcla de material gravilla y arena (50% gravilla y 50% arena) (Incluye mezclado extendida)

Consiste en la mezcla de arena y gravilla en proporción de (50/50) para distribuirla entre la geoceldas, con un respectivo sello de 5cm, para una altura total de 20 cm. Durante el periodo se avanzó del Pr0+167 al Pr0+140 de calle 5-4 calzada occidental.



1.9.6. Mezcla de material RCD, arena, cemento y Solid Soil:

Consiste en la mezcla de material proveniente de la demolición, arena, cemento y Solid Soil, la capa se instala con un espesor de 0.23m en 6.3 metros de ancho de calzada. Durante el periodo se avanzó del Pr0+167 al Pr0+145 de calle 5-4 calzada occidental.




1.9.7. Pavimento en concreto Mr40 MPa

Consiste en la elaboración e instalación de concreto Mr40 Mpa para pavimento, este ítem incluye la instalación de las barras de anclaje y los pasadores y/o dovelas. Durante el periodo se avanzó entre la calle 7 y 6, por la calzada occidental desde el Pr0+200 hasta el Pr0+150 de calle 5-4 calzada occidental.






ESQUEMA GRÁFICO METAS FISICAS EJECUTADAS:

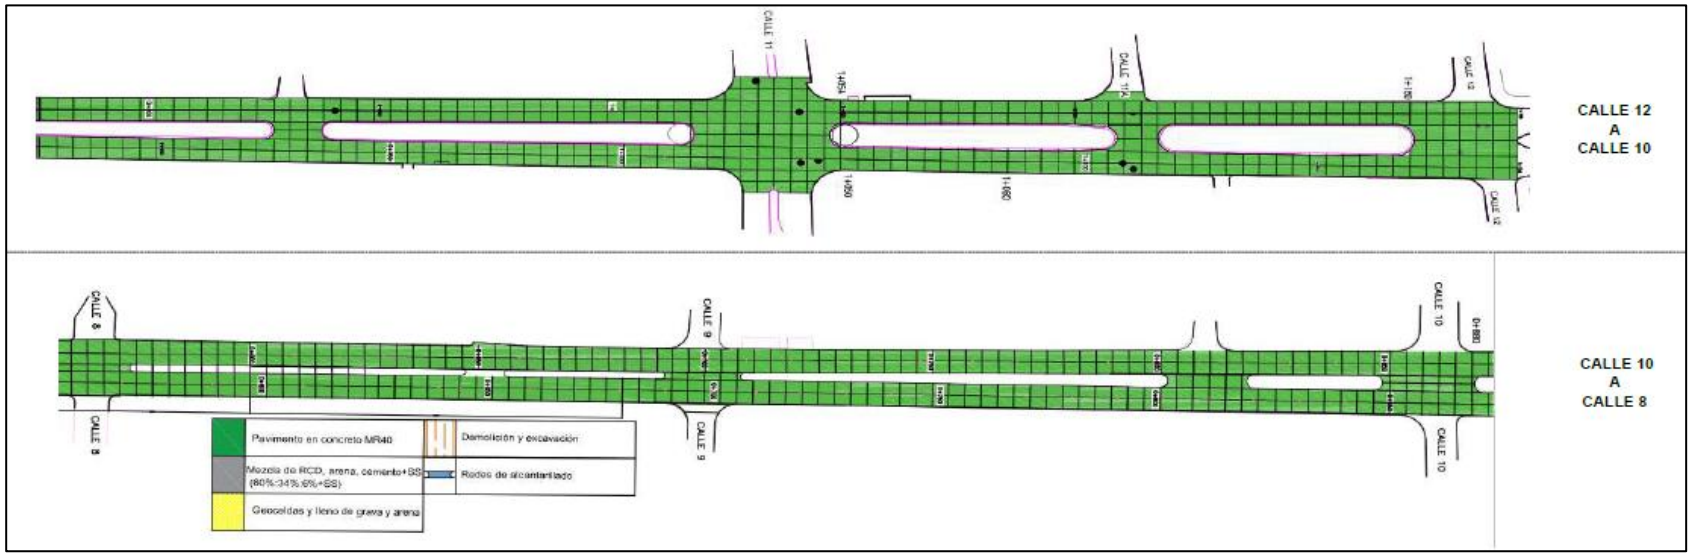

ESQUEMA GRÁFICO METAS FISICAS EJECUTADAS:

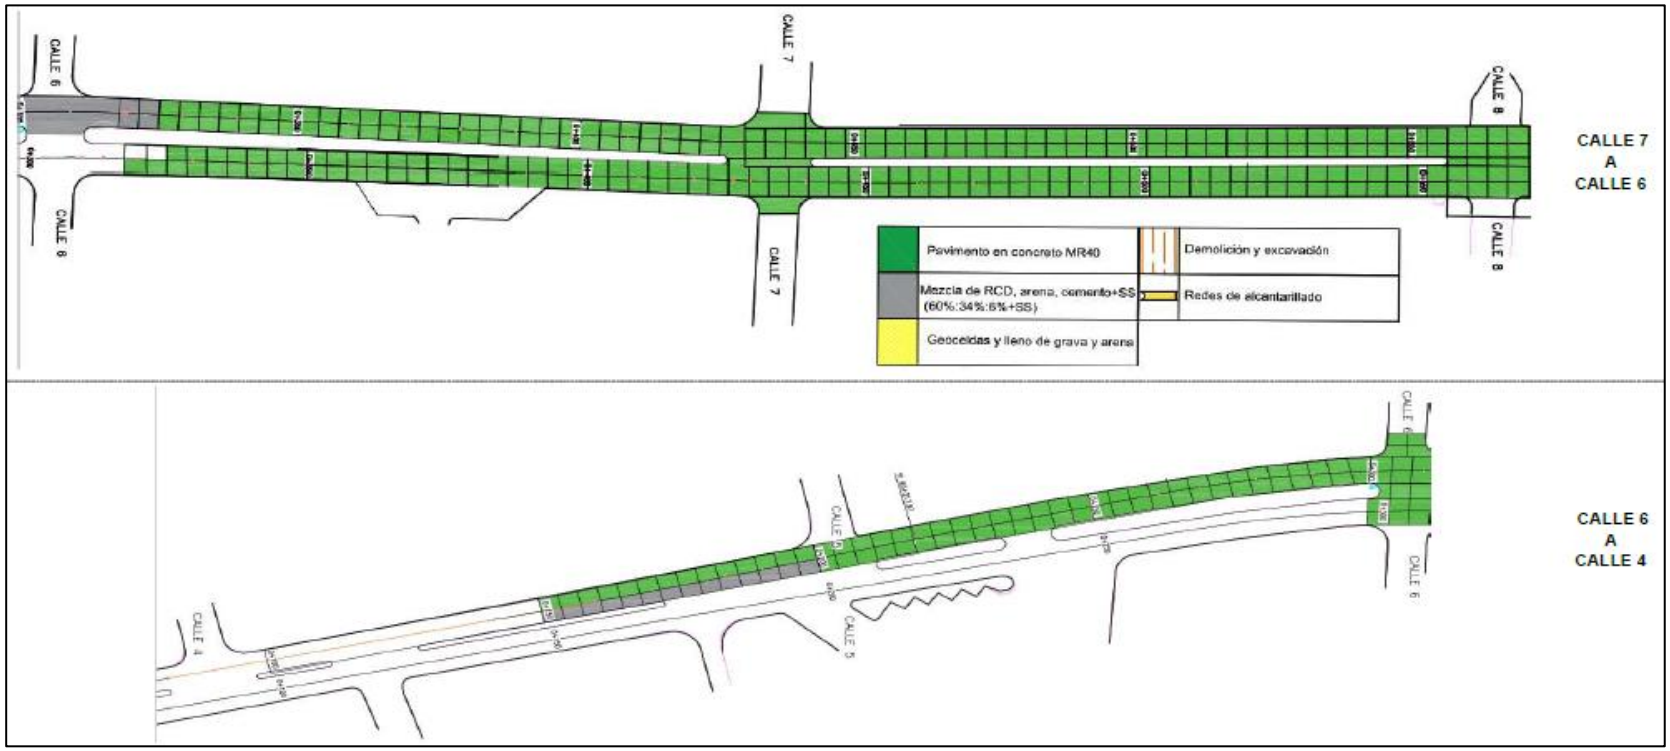

1.9.8. Gestión del Supervisor

Se efectuó seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de la interventoría en relación con el desarrollo del proyecto derivado teniendo en cuenta que durante el mes de enero de 2026 la obra no presento retrasos en su ejecución esto debido a la reprogramación efectuada a la obra, a continuación, se relacionan algunas de las gestiones y conclusiones presentadas por la interventoría en el marco del informe mensual del mes de enero de 2026.

Con corte al 31 de enero de 2026, la Interventoría identifica como situaciones que inciden en el desempeño del proyecto:

- Intermitencia en el suministro de cemento, situación advertida previamente mediante oficios y notas de bitácora, que continúa generando pérdidas de tiempo y afectación de rendimientos.
- Dependencia del avance del Componente de Redes, cuyo retraso impacta la ejecución de la estructura de pavimento.
- Riesgos asociados al suministro oportuno de insumos críticos, tales como agregados pétreos y materiales geosintéticos (geotextil, geoceldas y geodren vial).
- Limitaciones en la disponibilidad de personal y equipos, que afectan la capacidad de incrementar frentes de trabajo.

De mantenerse estas condiciones, existe un riesgo real de no alcanzar las inversiones programadas para los meses restantes del plazo contractual.

Acciones a seguir:

Con base en el estado de avance a 31 de enero de 2026, la Interventoría identifica como acciones a seguir las siguientes:

- Solicitar al contratista la presentación de un plan de contingencia, en el cual se definan de manera clara los frentes de trabajo, personal y materiales requeridos, con el fin de realizar un seguimiento y medición semanal de su cumplimiento frente a las inversiones programadas y a las metas establecidas en el cronograma vigente aprobado.
- Reforzar la coordinación entre el Componente Vial y el Componente de Redes, garantizando la liberación oportuna de frentes de trabajo.

- Asegurar la planificación anticipada del suministro de insumos críticos, en especial cemento, agregados pétreos y materiales geosintéticos.
- Mantener un seguimiento permanente a los rendimientos mensuales, comparándolos con las metas físicas y financieras previstas para los meses de febrero, marzo y abril de 2026.

Por parte de la Supervisión se efectuó seguimiento a las labores de seguimiento, requerimiento y control de la interventoría como se detalla a continuación en los comités de obra efectuados durante el mes de enero donde se establecieron, compromisos con su debida verificación de cumplimiento, seguimiento a las reparaciones de losas y llamados de atención y/o notificaciones de incumplimiento en los casos que corresponda.

COMPROMISOS ESTABLECIDOS COMITÉ DE OBRA 13 DE ENERO DE 2026:

- Entrega de programa de inversiones por parte del contratista
- Presentación plan de manejo de tránsito
- Entrega rendimientos financieros

COMPROMISOS ESTABLECIDOS COMITÉ DE OBRA DEL 20 DE ENERO DE 2026:

- Seguimiento a los compromisos establecidos comité de obra 13 de enero de 2026:
- Movimiento placa del igac y del desmonte de las banderas de la glorieta, por parte de la alcaldía.
- Aumentar a 25 trabajadores en obra.
- Aprobación programa de inversiones 23 de enero 2026
- Aprobación y firma PMT 21 de enero 2026.
- Entrega rendimientos financieros 27 de enero de 2026

COMITÉ DE OBRA DEL 30 DE ENERO DE 2026:

- Cumplido compromiso de traslado de poste y poda de árbol.
- Cumplido compromiso de vinculación adicional de personal a la obra.
- Reparación de losas por parte del contratista-Cumplido.
- Solicitud de levantamiento de la suspensión de giros cumplido y mesa de trabajo con DNP para el 05 de febrero de 2026.

- Plan de manejo de tránsito radicado a la alcaldía municipal el 21 de enero-CUMPLIDO.
- Se efectúa notificación de incumplimiento por la interventoría hacia el contratista mediante oficio CE-VIASCOL-2390 del 23 de enero de 2026 en relación a entrega de planillas de seguridad social.
- Solicitud al contratista de mantener un stock mínimo de materiales en obra.
- Se efectuará recorrido a la obra el 31 de enero de 2026 para verificar con el especialista en pavimientos de la interventoría las reparaciones efectuadas por el contratista.
- Por parte de la gobernación se informa que se adelantan los tramites pertinentes para el retiro de las placas Banderas, Igac y Letrero turístico.
- Entrega de cronograma detallado de actividades por parte del contratista para el 02 de febrero de 2026.

2. CONTRATO DE OBRA 558 DE 2022 -DERIVADO DEL CONVENIO 1901-2021.

2.1 INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	558 DE 2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO KAIROS SENDERO PEATONAL	NIT:	901.650.344-3
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	INGEGAB S.A.S. – 40% de Participación Fredy Mauricio Ceballos Delgadillo – 25% de Participación Edwin Alberto Mestre Hernández – 35% de Participación		
OBJETO:	“MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE SENDEROS PEATONALES DESDE LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO HASTA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO, DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS.”		
FECHA DE INICIO:	12/04/2023	En ejecución	SVR
VALOR ACTUAL:	SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($ 6.833.142.595,00)		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 2.049.942.778,50		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 1.788.062.926,20		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 261.879.852,30		

PLAZO INICIAL	UN (1) MES Y VEINTIDOS (22) DÍAS
OTRO SÍ No 1	PRORROGA 1 (6 MESES Y 18 DÍAS)
Fecha OTRO SÍ No 1	30/05/2023
ACTA No 2	SUSPENSIÓN No 1
Fecha Acta No 2	10/11/2023
Acta No 3	AMPLIACIÓN No 1 A SUSPENSIÓN No 1
Fecha Acta No 3	7/12/2023
OTRO SÍ No 2	PRORROGA No 2 (1 MES Y 6 DÍAS)
Fecha OTRO SÍ No 2	19/02/2024
ACTA No 4	SUSPENSIÓN No 2 (1 MES)
FECHA ACTA No 4	23/03/2024
ACTA No 5	AMPLIACIÓN No 1 A SUSPENSIÓN No 2 (30 DÍAS)
FECHA ACTA No 5	12/04/2024
ACTA No 6	AMPLIACIÓN No 2 A SUSPENSIÓN No 2 (30 DÍAS)
FECHA ACTA No 6	12/05/2024
ACTA No 7	AMPLIACIÓN No 3 A SUSPENSIÓN No 2 (25 DÍAS)
FECHA ACTA No 7	12/06/2024
ACTA No 8	REINICIO No 2
FECHA ACTA No 8	7/07/2024
OTRO SÍ No 3	PRORROGA No 3 (4 MESES)
FECHA OTRO SÍ No 3	11/07/2024
OTRO SÍ No 4	PRORROGA No 4 (1 MES Y 1 DÍA)
Fecha OTRO SÍ No 4	5/11/2024
OTRO SÍ No 5	PRORROGA No 5 (17 DÍAS)
Fecha OTRO SÍ No 5	12/12/2024
OTRO SÍ No 6	PRORROGA No 6 (1 MES Y 1 DÍA)
Fecha OTRO SÍ No 6	27/12/2024
OTRO SÍ No 7	PRORROGA No 7 (15 DÍAS)
Fecha OTRO SÍ No 7	13/02/2024
OTRO SÍ No 8	PRORROGA No 8 (30 DÍAS)
Fecha OTRO SÍ No 8	13/02/2024
OTRO SÍ No 9	PRORROGA No 9 (15 DÍAS)
Fecha OTRO SÍ No 9	14/03/2025
OTRO SÍ No 10	PRORROGA No 10 (60 DÍAS)
Fecha OTRO SÍ No 10	28/03/2025
OTRO SÍ No 11	PRORROGA No 11 (30 DÍAS)
Fecha OTRO SÍ No 11	30/05/2025

ACTA No 9	SUSPENSIÓN No 3 (15 DÍAS)
FECHA de Acta No 9	24/06/2025
ACTA No 10	AMPLIACIÓN No 1 A SUSPENSIÓN No 3 (15 DÍAS)
FECHA de Acta No 10	9/07/2025
ACTA No 11	AMPLIACIÓN No 2 A SUSPENSIÓN No 3 (13 DÍAS)
FECHA de Acta No 11	24/07/2025
ACTA No 12	AMPLIACIÓN No 3 A SUSPENSIÓN No 3 (15 DÍAS)
FECHA de Acta No 12	06/08/2025
ACTA No 13	AMPLIACIÓN No 4 A SUSPENSIÓN No 3 (15 DÍAS)
FECHA de Acta No 13	21/08/2025
ACTA No 14	AMPLIACIÓN No 5 A SUSPENSIÓN No 3 (8 DÍAS)
FECHA de Acta No 14	05/09/2025
ACTA No 15	AMPLIACIÓN No 6 A SUSPENSIÓN No 3 (16 DÍAS)
FECHA de Acta No 15	13/09/2025
ACTA No 16	AMPLIACIÓN No 7 A SUSPENSIÓN No 3 (16 DÍAS)
FECHA de Acta No 16	29/09/2025
ACTA No 17	REINICIO No 3
FECHA de Acta No 17	15/10/2025
OTRO SÍ No 12	PRORROGA No 12 (64 DÍAS)
FECHA de OTRO SÍ No 12	20/10/2025
OTRO SÍ No 13	ADICIÓN No 1
FECHA de OTRO SÍ No 13	27/10/2025
OTRO SÍ No 14	PRORROGA No 13 (43 DÍAS)
FECHA de OTRO SÍ No 14	19/12/2025
OTRO SÍ No 15	PRORROGA No 14 (30 DÍAS)
FECHA de OTRO SÍ No 15	31/01/2026
FECHA DE FINALIZACIÓN:	28 DE FEBRERO DE 2026

2.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1271	2023	2.3.2.02.02	Nación	$7.200.000.000,00	$ 5.960.209.754,00	$1.239,790.246,00
						-
TOTAL						$1.239,790.246,00

2.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	SALDO ANTICIPO POR AMORTIZAR
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A


2.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 27 de fecha 5 de febrero de 2025, para el periodo de enero de 2026, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación: 98.59%

2.5 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ÍTEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 7.128.924.922,00	100,00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 7.128.924.922,00	100,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 7.028.407.080,60	98.59%

2.6 CURVA S Y ANALISIS COMPARATIVO

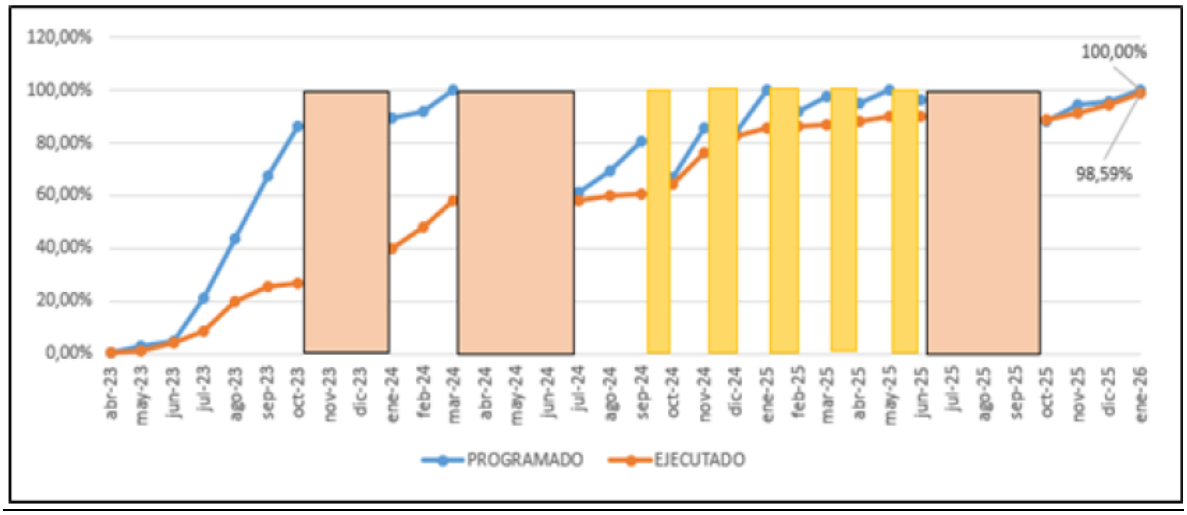

Para el mes de enero de 2026 se registra una ejecución acumulada del 98,59% frente a un avance programado del 100,00%, lo que representa un desfase del -1,41%. En

consecuencia, el contratista no alcanzó a ejecutar la totalidad de las actividades previstas dentro del plazo contractual.
Las múltiples reprogramaciones que ha tenido el contrato de obra no se han cumplido por parte del contratista , generando impactos en el cambio constante en la programación de obra y ocasionando el retraso en la entrega de las obras a la comunidad del Municipio de Puerto Nariño , no obstante que para el mes de enero de 2026 la obra está muy próxima a completar el 100% de ejecución por lo cual es pertinente el seguimiento a los informes semanales de interventoría para verificar el cumplimiento de la programación y por consiguiente la definitiva terminación de las obras .

En relación a lo anterior según el informe de interventoría del mes de enero de 2026 se indica lo siguiente frente al no cumplimiento del 100% de ejecución al corte del 31 de enero de 2026.

Mediante comunicado CE-VIASCOL-2386, se informó al contratista que, teniendo como fecha inicial de terminación el 31 de enero de 2026, y de acuerdo con el seguimiento realizado, a falta de nueve (9) días para la culminación del plazo se evidenciaba la existencia de actividades pendientes de ejecución. No obstante, es importante precisar que, para el corte del mes de enero de 2026, el proyecto presentaba un atraso moderado del -1,41%, el cual, aunque no era representativo en términos porcentuales, sí evidenciaba un riesgo de incumplimiento debido a la cantidad de las actividades faltantes. Entre las actividades pendientes se encontraban: construcción de cunetas, bordillos, concreto de senderos, reparación de losas fisuradas, instalación de señalización vertical, construcción de cajas de inspección, sumideros, sellos de juntas y demás actividades complementarias.
Por lo anterior, se solicitó al contratista la implementación inmediata de un plan de trabajo ajustado al tiempo restante, en el cual se definieran claramente las medidas, recursos y estrategias a adoptar para garantizar la terminación del 100% de las actividades dentro del plazo contractual, evitando así incurrir en un posible incumplimiento.

"El contratista manifiesta que durante el mes de enero de 2026 se presentaron lluvias fuertes y constantes en el municipio, situación que afectó el normal desarrollo de las actividades programadas e impidió la culminación total de las obligaciones contractuales.

En atención a lo anterior, el constructor solicitó ante la interventoría una prórroga por el término de un (1) mes, contado a partir de la fecha de terminación inicial del contrato (31/01/2026), considerando que no resulta procedente ejecutar actividades con el contrato vencido. Una vez revisada y analizada la solicitud, la interventoría otorgó el aval correspondiente, estableciendo como nueva fecha de terminación del contrato el 28/02/2026.

Adicionalmente, por parte de la interventoría se requirió al contratista la presentación de un plan de trabajo detallado, ajustado al tiempo de ejecución restante, en el cual se evidencien de manera clara las medidas y estrategias que adoptará para culminar las actividades pendientes dentro del nuevo plazo contractual".

2.7 ANTICIPO

Otorgado	$ 2.049.942.778,50
Amortizado	$ 1.788.062.926,20
Saldo	$ 261.879.852,30

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	SALDO ANTICIPO POR AMORTIZAR
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 1 – OCTUBRE 2023	$ 1.014.720.416,00	$ 0	$ 304.416.124,80	$ 1.745.526.653,70
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 2 – MARZO 2024	$ 1.134.996.593,00	$ 0	$ 340.498.977,90	$ 1.405.027.675,80
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 3 – SEPTIEMBRE 2024	$ 1.125.679.602,00	$ 0	$ 337.703.880,60	$ 1.067.323.795,20
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 4 – DICIEMBRE 2024	$ 1.086.975.744,00	$ 0	$ 326.092.723,20	$ 741.231.072,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 5 – FEBRERO 2025	$ 417.422.846,00	$ 0	$ 125.226.853,80	$ 616.004.218,20
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 6 – MARZO 2025	$ 390.454.334,00	$ 0	$ 117.136.300,20	$ 498.867.918
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 7 – JUNIO 2025	$ 448.934.812,00	$ 0	$ 134.680.443,60	$ 364.187.474,40
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 8 – DICIEMBRE 2025	$ 341.025.407,00	$ 0	$ 102.307.622,10	$ 261.879.852,30
TOTAL	$ 5.960.209.754,00		$ 1.788.062.926,20	$ 261.879.852,30

2.8 ANALISIS FINANCIERO

Con corte al 31 de enero se tiene un total pagado de $ 5.960.209.754,00 que corresponde al 78,8% de los recursos de INVIAS, se otorgó un anticipo al contratista de obra de $2.049.942.778,50 de los cuales se ha amortizado el 87,23%, teniendo un saldo por amortizar de $261.879.852.30 de otra parte, el total ejecutado logro un avance de 98.59% por lo cual se presenta un rezago en la facturación del 19.79% frente a lo ejecutado en obra.

Nota: Durante el mes de enero de 2026 no se tramitaron actas de costos asociadas al contrato de obra, la información reportada esta actualizada a corte 31 de enero de 2026.

2.9 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO CORTE 31 DE ENERO 2026

Meta física programada: 100,00% (CORTE 31 DICIEMBRE 2025: 96,49%)
Meta física ejecutada: 98,59% (CORTE 31 DICIEMBRE 2025: 95,09%)

2.10 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD
N/A	N/A	N/A

2.11 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	OTRO SÍ No.
N/A	N/A

2.12 PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACIÓN	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

2.13 DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACIÓN No.	FECHA DE REINICIO
N/A	N/A	N/A	N/A

2.14 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA OTRO SÍ	No. OTRO SÍ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
31/01/2026	15	PRORROGA No 14	APROBADO

2.15 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: OTRO SÍ N°15 PRORROGA 14
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 31/01/2026
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS: 09/01/2026
PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI

CONTROL DE GARANTÍAS
TIPO DE GARANTÍA: GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL
NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$683.314.259,15	30-44-101049806 Anexo 23	12/04/23	31/07/2026
Buen Manejo Anticipo	$2.049.942.778,50	30-44-101049806 Anexo 23	12/04/23	31/07/2026
Pago de Salarios,	$1.366.628.519,00	30-44-101049806	12/04/23	31/01/29

Prestaciones Sociales e indemnizaciones.		Anexo 23		
Estabilidad y/o calidad de la Obra	$2.049.942.778,50	30-44-101049806 Anexo 23	Se ampara 5 años a partir del acta de entrega y recibo a satisfacción de la obra.	

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	$875.452.500,00	30-40-101017803 Anexo 24	12/04/23	31/01/26

2.16 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.17 CORRESPONDENCIA RADICADA DURANTE EL PERIODO A LA INTERVENTORIA

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
CORREO ELECTRÓNICO	15/01/2026	CONSORCIO VIASCOL	Pólizas actualizadas OTRO SI N° 14.
CKSP-0558-2022	30/01/2026	CONSORCIO VIASCOL	Solicitud de Prorroga N° 14.

2.18 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

Nota: La documentación se envía al archivo cuando se inicia el proceso de liquidación adicionalmente el contrato de obra está contratado por la Entidad Territorial.

2.19 REGISTRO FOTOGRAFICO

2.19.1 Concreto para Cunetas.

Se realizo el vaciado de concreto de resistencia 3000 P.S.I, de 40 cm de ancho y 7 cm de espesor desde el Pr 0+630 al Pr 0+600; Pr 0+504 al Pr 0+567 ambos costados tramo N° 2; y del Pr 0+000 al Pr 0+119 ambos costados tramo 4.






2.19.2 Acero de Refuerzo 60.000 PSI

Cuneta: se realizó la instalación de malla electrosoldada de 4mm para cunetas del Pr 0+630 al Pr 0+600; Pr 0+504 al Pr 0+567 tramo N° 2; del Pr 0+000 al Pr +119 ambos costados tramo N° 4.



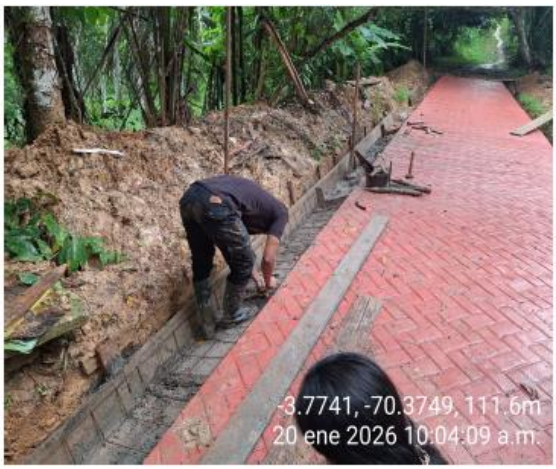

Sendero: Se realiza la instalación de malla electrosoldada para sendero 6mm desde el Pr 0+50 al Pr 0+119 tramo 4.





Bordillo: se realizó la instalación de acero de refuerzo para bordillo del Pr 0+080 al Pr 0+119 ambos costados tramo 4.





2.19.3 Base arena/cemento

Se realizo la instalación de la base estabilizadora del sendero con un espesor de 17 cm y un ancho de 2,16 m, en el tramo de empalme de sendero con el box culvert 0+590 tramo 2.



Bordillos: Instalación arena/cemento para bordillos de un ancho de 0.17 cm y un espesor de 5 cm, para este periodo se realizó la instalación del Pr 0+080 al Pr 0+119 ambos costados tramo N° 4.





2.19.4 Concreto para bordillos

Se realiza el correspondiente vaciado de concreto para bordillos 3000 P.S.I con h=0.43cm, b= 17cm, para este periodo se ejecutó dicha actividad del Pr 0+000 al Pr 0+080 ambos costados tramo 4.





2.19.5 Sendero peatonal en concreto

El sendero está conformado por concreto hidráulico de 3000 P.S.I con un espesor de 10cm, ancho 2.50 m. para este periodo se realizaron las actividades de sendero en el tramo 4 del Pr 0+050 al Pr 0+119.





2.19.6 Corte de juntas de construcción

Se realizo el corte de las juntas de construcción del sendero en el tramo 4 del Pr 0+000 al Pr 0+119.



2.19.7 Rellenos laterales de cunetas

Se ejecuto esta actividad a lo largo del sendero en los tramos N° 2 y 4 del proyecto.



2.1 Gestión del Supervisor

Se efectuó seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de la interventoría en relación al desarrollo del proyecto derivado, a continuación, se relacionan algunas de las gestiones y conclusiones presentadas por la interventoría en el marco del informe mensual del mes de enero de 2026. Adicionalmente se programa comisión al municipio de Puerto Nariño para el mes de febrero de 2026 con el fin de verificar el estado de las obras.


Para el presente periodo el contratista registra un porcentaje ejecutado 98.59% vs un porcentaje programado 100% lo cual indica un atraso del -1,41 %, el contratista expresa que dicho atraso se debe a factores externos a la obra que han afectado los rendimientos de las actividades programadas, por tales motivos el constructor solicito una prórroga No. 14 de un mes a partir de la fecha actual de terminación 31/01/2026, y así poder culminar con el 100% de las actividades contractuales.


Una vez revisada la solicitud de prorroga enviada por el contratista la interventoría concede el aval la nueva fecha terminación del contrato es 28/2/2026.


Dentro de las acciones requeridas por la interventoría con el contratista están las siguientes:

- *Se le solicita al contratista sostener el personal presente en obra (2) maestros (18)ayudantes, con el objetivo de poder culminar con las actividades faltantes.*
- *Seguimiento y control a las especificaciones técnicas de las diferentes actividades que se viene ejecutando.*
- *Se le recomienda al contratista implementar alguna estrategia que le permita ejecutar actividades sobre la lluvia, esto con el fin de que los rendimientos en obra se mantengan y se logre terminar el proyecto en los tiempos contractuales.*
- *Se le solicita al contratista dotar al personal de trabajo con los EPP mínimos requeridos para la ejecución de las actividades, esto es de vital importancia para garantizar la integridad física de cada trabajador y velar por su seguridad.*

ESQUEMA GRÁFICO METAS FISICAS EJECUTADAS:

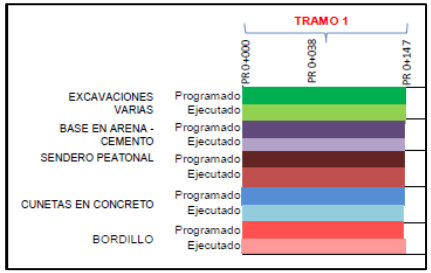

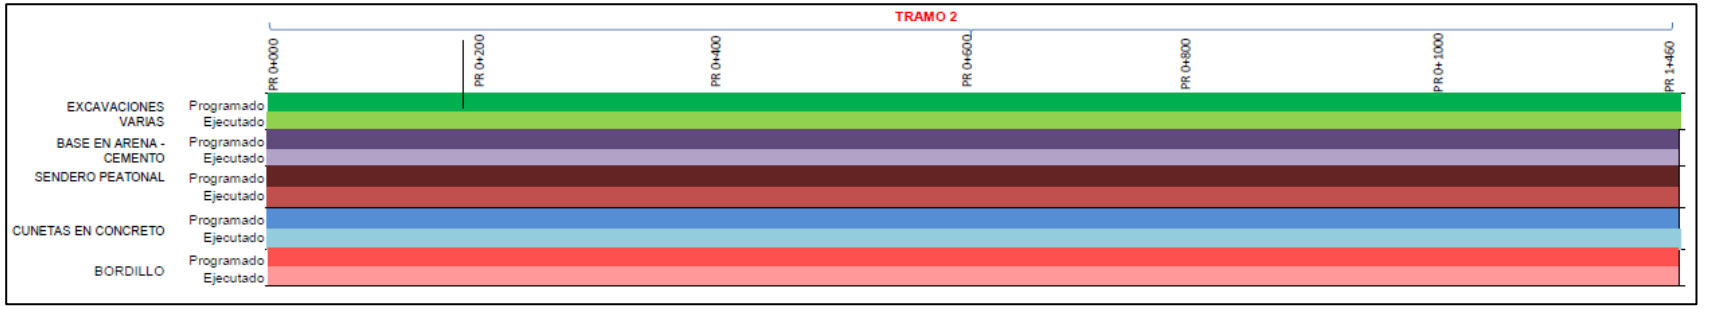

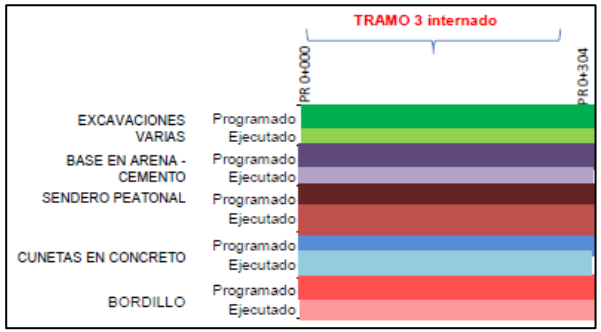

COMITÉ DE OBRA DEL 13 DE ENERO DE 2026

- *El proyecto se encuentra en un porcentaje programado del 97,39% vs un porcentaje ejecutado 95.88% para un atraso de -1,51%, la interventoría manifiesta que se viene trabajando en los tramos 2(concreto para cunetas) y tramo 4(concreto sendero y cunetas), en obra se tiene el siguiente personal laborando 2 maestro, 22 ayudantes. El contratista indica que de las actividades denominadas principales falta por ejecutar 20 ml de sendero peatonal y 470 ml de cunetas, expresa que más tardar el 24/01/2026 terminara dichas actividades.*

- *En vista que la fecha de terminación esta próxima 31/01/2026 esta interventoría le solicita al contratista un plan de trabajo donde indique la fecha de inicio y fin de cada actividad faltante, donde se evidencie que el constructor va cumplir con el 100% de actividades en los tiempos contractuales. El contratista indica que ese plan de trabajo lo entrega 14/01/2026.*

- *El contratista indica que ya organizo un grupo de trabajo (1 maestro y 2 ayudantes) destinado para la reparación de losas y el día de mañana 14/01/2026 inician dicha actividad.*

- *La interventoría expresa que en campo se han presentado algunos retrasos en las actividades programadas debido al trasiego de la gravilla, en ocasiones este material escasea en obra y mientras se hace el trasiego desde el muelle donde se acopia hasta el sitio de trabajo se han perdido horas de ejecución por este evento, el contratista indica que todo el material para terminar el proyecto se encuentra en Puerto Nariño y que no presentarse ningún percance terminara el proyecto en la fecha contractual.*

3. CONTRATO DE INTERVENTORÍA 1052-2022.

3.1 INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	1052 DE 2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIASCOL	NIT:	901.598.877-7
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	INGENOBRAS CONSTRUCCION Y CONSULTORIAS S.A.S (50%) NIT 824.004.441-2 CIAF LTDA INGENIERIA (45%) NIT 800.130.967-6 PROCIVING S.A.S (5%) NIT 900.905.675-0		
OBJETO:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DEL AMAZONAS, CAQUETÁ Y VAUPÉS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 1"		
FECHA DE INICIO:	16/11/2022	EN EJECUCIÓN	SVR
VALOR INICIAL:	SEIS MIL OCHOCIENTOS DIEZ MILLONES DOCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS ($ 6.810.230.532) M/cte.		
VALOR ADICIONES:	$1.328.679.453		
ADICIÓN 1:	$1.328.679.453		
VALOR ACTUAL:	$ 8.138.909.985		
ANTICIPO	$ 386.791.000,00		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 386.791.000,00		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 386.791.000,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0		
PLAZO INICIAL:	26 MESES		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2024		
TOTAL, PRÓRROGAS:	3		
OTRO SÍ No 1	PRORROGA 1 (HASTA 30/06/2025)		
FEHCA OTRO SÍ No 1	31/12/2024		
OTRO SÍ No 2	PRORROGA 2 (HASTA 31/12/2025)		

FECHA OTRO SÍ No 2	11/07/2025
OTRO SÍ No 3	PRORROGA 3 (HASTA 30/03/2026)
FECHA OTRO SÍ No 3	31/12/2025
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30 DE MARZO DE 2026

3.2 DETALLE ADICIONES EFECTUADAS

Adición #	Valor	Motivo	Fuente	Comité de Contratación
1	$ 1.328.679.453,00	Necesidad de contar con el adecuado seguimiento, vigilancia y control del cumplimiento de la meta física de los contratos de obra derivados de los Convenios Interadministrativos No.1856-2021, 1790-2021, 1901-2021 ,1899-2021.	$180.000.000 Gobernación de Amazonas (RP:2656) $1.148.679.453,00 INVIAS (RP:111525)	Acta 27- 07 de julio de 2025

3.3 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
918622	2022	11	Nación	$400.000.000,00	$400.000.000,00	$0.0
224023	2023	11	Nación	$3.400.000.000,00	$3.400.000.000	$0.0
219724	2024	11	Nación	$3.010.230.532,00	$3.010.230.532,00	$0.0
2656	2025	02-2.3.2.24.02.005-214	Gobernación Amazonas	$180.000.000,00	$180.000.000,00	$0.0
111525	2025	10	Nación	$1.148.679.453,00	$636.009.771,35	$512.669.681,65

3.4 ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3.5 AVANCE DEL CONTRATO

Con corte al 31 de enero de 2025, el contrato registra un avance acumulado del 93,70%. Durante el mes de enero la ejecución estuvo asociada a la facturación del Acta de Costos No. 39 que aún no ha sido presentada por la interventoría.

La ejecución presupuestal del contrato de interventoría en este periodo se encuentra vinculada a los servicios prestados en cumplimiento de su objeto contractual respecto a los contratos de obra 1544 de 2022 y 558 de 2022. A continuación, se detallan las actividades desarrolladas en cada uno de estos contratos, así como el avance mensual registrado en comparación con el mes anterior.

CONTRATO	ACTIVIDAD	DESARROLLO MES	% AVANCE MES
1544-2022	Excavación mecánica en material común	Durante el periodo se avanzó del Pr0+132 al Pr0+100 calzada occidental de calle 5-4.	2,06%
	Geodren vial	Durante el periodo se avanzó del Pr0+167 al Pr0+140 calzada occidental de calle 5-4.	
	Geotextil T2400	Durante el periodo se avanzó del Pr0+167 al Pr0+140 calzada occidental de calle 5-4.	
	Geocelda HDPE perforada, altura 15 cm (suministro e instalación).	Durante el periodo se avanzó del Pr0+167 al Pr0+140 de calle 5-4 calzada occidental.	
	Mezcla de material gravilla y arena (50 % gravilla y 50 % arena) (incluye mezclado extendida)	Durante el periodo se avanzó del Pr0+167 al Pr0+140 de calle 5-4 calzada occidental.	
	Mezcla de material RCD, arena, cemento y Solid Soil:	Durante el periodo se avanzó del Pr0+167 al Pr0+145 de calle 5-4 calzada occidental.	

CONTRATO	ACTIVIDAD	DESARROLLO MES	% AVANCE MES
	Pavimento en concreto Mr40 Mpa	Durante el periodo se avanzó entre la calle 7 y 6, por la calzada occidental desde el Pr0+200 hasta el Pr0+150 de calle 5-4 calzada occidental.	
558 - 2022	Concreto para cunetas	Se realizo el vaciado de concreto de resistencia 3000 P.S.I, de 40 cm de ancho y 7 cm de espesor desde el Pr 0+630 al Pr 0+600; Pr 0+504 al Pr 0+567 ambos costados tramo N° 2; y del Pr 0+000 al Pr 0+119 ambos costados tramo 4.	3,50%
	Trasiego interno de material	Se realizó el correspondiente transporte de material (arena, grava, acero de refuerzo, cemento) y acopio del mismo tanto en el tramo N° 2 y 4 del proyecto.	
	Acero de refuerzo 60.000 P.S.I	Cuneta: Se realizó la instalación de malla electrosoldada de 4mm para cunetas del Pr 0+630 al Pr 0+600; Pr 0+504 al Pr 0+567 tramo N° 2; del Pr 0+000 al Pr +119 ambos costados tramo N° 4. Sendero: Se realiza la instalación de malla electrosoldada para sendero 6mm desde el Pr 0+50 al Pr 0+119 tramo 4. Bordillo: Se realizó la instalación de acero de refuerzo para bordillo del Pr 0+080 al Pr 0+119 ambos costados tramo 4.	

CONTRATO	ACTIVIDAD	DESARROLLO MES	% AVANCE MES
	Base arena/cemento	Se realizo la instalación de la base estabilizadora del sendero con un espesor de 17 cm y un ancho de 2,16 m, en el tramo de empalme de sendero con el box culvert 0+590 tramo 2. Bordillos: Instalación arena/cemento para bordillos de un ancho de 0.17 cm y un espesor de 5 cm, para este periodo se realizó la instalación del Pr 0+080 al Pr 0+119 ambos costados tramo N° 4.	
	Concreto para bordillos	Se realiza el correspondiente vaciado de concreto para bordillos 3000 P.S.I con h=0.43cm, b= 17cm, para este periodo se ejecutó dicha actividad del Pr 0+080 al Pr 0+119 ambos costados tramo 4.	
	Sendero peatonal en concreto	El sendero está conformado por concreto hidráulico de 3000 P.S.I con un espesor de 10cm, ancho 2.50 m. para este periodo se realizaron las actividades de sendero en el tramo 4 del Pr 0+050 al Pr 0+119.	
	Corte de juntas de construcción	Se realizo el corte de las juntas de construcción del sendero en el tramo 4 del Pr 0+000 al Pr 0+119.	
	Rellenos laterales de cunetas	Se ejecuto esta actividad a lo largo del sendero en los tramos N° 2 y 4 del proyecto.	

3.6 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total, inversión programada: $ 8.058.082.719,70 95.44%
Total, inversión ejecutada: $ 7.626.240.303,35 93,70%

La inversión ejecutada corresponde al total facturado por interventoría con corte a 31 de enero y que equivale a $7.626.240.303,35 es decir el 93,70 % del valor actual del contrato de interventoría, el anticipo otorgado por valor de $386.791.000,00 ya fue totalmente amortizado.

3.7 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

No se tramitaron actas de modificación de costos en el presente periodo

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

3.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

No se tramitaron adiciones, prorrogas y/o modificaciones en el presente periodo.

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACIÓN No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

No se tramitaron adiciones, prorrogas y/o modificaciones en el presente periodo.

FECHA MEMORANDO	MEMORANDO	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

3.10 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA N°3
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 31/12/2025
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS: Mediante memorando 2026I-VBOG-006460 se solicitó a la subdirección de gestión contractual y procesos administrativos la revisión del Anexo 10 de la póliza de cumplimiento.
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS: 05/01/2026
PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI.

CONTROL DE GARANTIAS
TIPO DE GARANTÍA: GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES.
NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$813.890.998,50	15-44-101264567 Anexo N°10	24/06/2022	30/09/2026
Buen Manejo Anticipo	$1.627.781.997,00	15-44-101264567 Anexo N°10	24/06/2022	30/03/2029
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$1.362.046.107,00	15-44-101264567 Anexo N°10	24/06/2022	30/09/2026
Calidad del Servicio	$2.441.672.995,50	15-44-101264567 Anexo N°10	31/12/2024	31/12/2029

3.11 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3.12 CORRESPONDENCIA RADICADA AL CONTRATISTA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
CE-VIASCOL-2344	02/01/2026	CONSORCIO INTERNACIONAL WOC	Solicitud de documentación de SOAT de las volquetas.
CE-VIASCOL-2345	05/01/2026	CONSORCIO INTERNACIONAL WOC	Apremio de entrega de dotación y EPP.
CE-VIASCOL-2348	06/01/2026	CONSORCIO INTERNACIONAL WOC	Solicitud de reprogramación de obra, actualización del PMT y pólizas.
CE-VIASCOL-2349	07/01/2026	CONSORCIO INTERNACIONAL WOC	Apremio entrega de planilla de seguridad social CASE INGENIERIA S.A.
CE-VIASCOL-2350	08/01/2026	CONSORCIO INTERNACIONAL WOC	Solicitud de reposición del cerramiento de la obra.
CE-VIASCOL-2352	13/01/2026	CONSORCIO INTERNACIONAL WOC	Solicitud de pago de planilla de Seguridad Social.
CE-VIASCOL-2353	13/01/2026	CONSORCIO INTERNACIONAL WOC	Apremio entrega de documentación pendiente.
CE-VIASCOL-2355	14/01/2026	CONSORCIO INTERNACIONAL WOC	Apremio entrega de información sobre rendimientos financieros de anticipo.
CE-VIASCOL-2357	14/01/2026	CONSORCIO INTERNACIONAL WOC	Acompañamiento especialista del contratista de obra.
CE-VIASCOL-2360	16/01/2026	CONSORCIO INTERNACIONAL WOC	Respuesta a comunicado OBRA-CIW-565 – Ensayos de laboratorio pendientes.
CE-VIASCOL-2363	16/01/2026	CONSORCIO INTERNACIONAL WOC	Respuesta al comunicado OBRA-CIW-580 recibido el 18/12/2025, en relación con el alcance al informe mensual ambiental No. 20 Versión 3, del contrato de la referencia.
CE-VIASCOL-2364	16/01/2026	CONSORCIO INTERNACIONAL WOC	Respuesta al comunicado OBRA-CIW-580, recibido el 18/12/2025, en relación con el alcance al

			informe mensual ambiental No. 21 Versión 6, del contrato de la referencia.
CE-VIASCOL-2365	16/01/2026	CONSORCIO INTERNACIONAL WOC	Respuesta al comunicado OBRA-CIW-580 recibido el 18/12/2025, en relación con el alcance al informe mensual ambiental No. 22 Versión 5, del contrato de la referencia.
CE-VIASCOL-2366	16/01/2026	CONSORCIO INTERNACIONAL WOC	Respuesta al comunicado OBRA-CIW-580 recibido el 18/12/2025, en relación con el alcance al informe mensual ambiental No. 23 Versión 4, del contrato de la referencia.
CE-VIASCOL-2367	16/01/2026	CONSORCIO INTERNACIONAL WOC	Respuesta al comunicado OBRA-CIW-580 recibido el 18/12/2025, en relación con el alcance al informe mensual ambiental No. 24 Versión 2, del contrato de la referencia.
CE-VIASCOL-2368	16/01/2026	CONSORCIO INTERNACIONAL WOC	Respuesta al comunicado OBRA-CIW-580 recibido el 18/12/2025, en relación con el alcance al informe mensual ambiental No. 25 Versión 2, del contrato de la referencia.
CE-VIASCOL-2369	17/01/2026	CONSORCIO INTERNACIONAL WOC	Observaciones acta parcial No 8.
CE-VIASCOL-2376	20/01/2026	CONSORCIO INTERNACIONAL WOC	Apremio entrega de pago de planilla de seguridad social.
CE-VIASCOL-2377	20/01/2026	CONSORCIO INTERNACIONAL WOC	Reiteración, entrega de ensayos de laboratorio pendientes.
CE-VIASCOL-2381	21/01/2026	CONSORCIO INTERNACIONAL WOC	Respuesta al comunicado OBRA-CIW-580 recibido el 18/12/2025, en relación con el alcance al informe mensual ambiental No. 26 Versión 1, del contrato de la referencia.
CE-VIASCOL-2382	21/01/2026	CONSORCIO INTERNACIONAL WOC	Respuesta al comunicado OBRA-CIW-580 recibido el 18/12/2025, en relación con el alcance al informe mensual ambiental No. 27 Versión 1, del contrato de la referencia.
CE-VIASCOL-2383	21/01/2026	CONSORCIO INTERNACIONAL WOC	Respuesta al comunicado OBRA-CIW-588 recibido el 08/01/2026, en relación con el alcance al informe mensual ambiental No. 28 Versión 1, del contrato de la referencia.
CE-VIASCOL-2385	23/01/2026	CONSORCIO INTERNACIONAL WOC	Remisión de ordenes de giro de anticipo N° 42 y 43.
CE-VIASCOL-2399	29/01/2026	CONSORCIO INTERNACIONAL WOC	Entrega acta parcial de obra No. 8.
CE-VIASCOL-2400	30/01/2026	CONSORCIO INTERNACIONAL WOC	Apremio de pago de planilla de Seguridad Social.

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
CE-VIASCOL-2384	22/01/2026	CONSORCIO KAIROS SENDERO PEATONAL	Remisión acta de visita previa y entrega definitivo de obra.
CE-VIASCOL-2386	23/01/2026	CONSORCIO KAIROS SENDERO PEATONAL	Actividades pendientes por ejecutar dentro del plazo contractual y solicitud de plan de trabajo.

3.12.1 CORRESPONDENCIA RADICADA A CONSORCIO INTERNACIONAL WOC

Respecto a la correspondencia generada por la interventoría, se identifica que la misma responde a algunas de las obligaciones referidas en el Manual de Interventoría como las actividades de seguimiento técnico, administrativo, financiero, ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo, orientadas al control del cumplimiento de obligaciones contractuales, ejecución de actividades de obra, manejo del anticipo y atención de requerimientos ambientales, como se detalla a continuación:

- Solicitudes y apremios relacionados con el pago de planillas de seguridad social.
- Requerimientos de entrega de dotación y elementos de protección personal (EPP).
- Solicitud de documentación de vehículos vinculados a la obra (SOAT).
- Solicitud de reprogramación de obra, actualización del PMT y pólizas contractuales.
- Requerimientos y reiteraciones sobre rendimientos financieros del anticipo y remisión de órdenes de giro.
- Acompañamiento de especialista del contratista de obra.
- Respuestas a comunicados relacionados con ensayos de laboratorio pendientes.
- Respuestas y alcances a informes mensuales ambientales.
- Observaciones y entrega de actas parciales de obra.
- Requerimientos asociados a cerramiento, orden y documentación pendiente del contrato.

3.12.2 CORRESPONDENCIA RADICADA A CONSORCIO KAIROS SENDERO PEATONAL

Respecto a la correspondencia generada por la interventoría, se identifica que la misma responde a algunas de las obligaciones referidas en el Manual de Interventoría en relación al estado actual del contrato de obra y se orienta al seguimiento y cierre contractual del

proyecto, en lo relacionado con visita de obra, entrega definitiva y verificación de actividades pendientes dentro del plazo establecido, como se detalla a continuación:

- Remisión de acta de visita previa y entrega definitiva de obra.
- Requerimiento de actividades pendientes por ejecutar y solicitud de plan de trabajo.

3.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

Nota: *La documentación se envía al archivo cuando se inicia el proceso de liquidación del contrato de interventoría, adicionalmente durante el periodo no se recibió documentación en físico.*

DOCUMENTACION RECIBIDA PLATAFORMA A-Z			
MEMORANDO No.	**FECHA**	**DESTINATARIO**	**ASUNTO**
2026E-VUVRAZ-002361	20/01/2026	INVIAS	ENTREGA INFORME MENSUAL DICIEMBRE 2025.

4 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

4.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

Seguimiento al levantamiento de bloqueo de recursos al contrato 1544-2022 por parte del DNP por el componente de saneamiento, si bien este componente no contiene recursos de INVIAS el bloqueo en pagos a generado dificultades presupuestales en el contratista de obra.

4.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

El equipo de Supervisión mediante oficio 2026S-VBOG-018922 y previa revisión detallada de la plataforma Secop ii solicita a la interventoría el reporte y cargue de los informes mensuales pendientes por subir en la plataforma, en relación a cada contrato que tiene a cargo la interventoría en ejecución o terminados y de conformidad a sus obligaciones contractuales.

Por parte del equipo de Supervisión se envía correo electrónico el 26 de enero de 2026 en relación a la respuesta al requerimiento presentado por la Procuraduría Regional de Instrucción Amazonas mediante oficio PRIA – OSNM – 0062, en el marco del convenio 1899-2021 y su contrato derivad 1544-2022.

4.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

Se efectúa seguimiento al tramite de actas pendientes de pago al contrato de interventoría 1052-2022, estando pendiente por pago las actas 32 ,33,34,35,36,37 y 38 , que fueron radicadas en los meses de noviembre , diciembre de 2025 y enero de 2026 , al momento del presente informe de supervisión solo se encuentra obligada el acta de costos de la vigencia expirada por valor de $ 157.215.151,00 como se detalla a continuación.

TIPO DE ACTA	MES/AÑO	ACTA N° (números)	No. RADICADO	FECHA RADICACION	VALOR TOTAL	ESTADO	FECHA OBLIGACION
COSTOS	jun-25	32	INVIAS-CP-R25-00547	17/12/2025	$ 88.434.684,00	RADICADO	N/A
COSTOS	jul-25	33	13872	26/11/2025	$ 81.056.088,00	RADICADO	N/A
COSTOS	ago-25	34	13873	26/11/2025	$ 123.741.571,00	RADICADO	N/A
COSTOS	sep-25	35	14380	3/12/2025	$ 117.909.417,00	RADICADO	N/A
COSTOS	oct-25	36	INVIAS-CP-R26-00089 el 20-01-2026	20/01/2026	$ 130.092.242,00	RADICADO	N/A
COSTOS	nov-25	37	INVIAS-CP-R26-00053	15/01/2026	$ 136.906.847,82	RADICADO	N/A
COSTOS	dic-25	38	INVIAS-CP-R26-00013	2/01/2026	$ 137.868.921,24	RADICADO	N/A
VIGENCIA EXPIRADA			INVIAS-CP-R25-02451	30/12/2025	$ 157.215.151,00	OBLIGADO	27/01/2026

- Por parte del equipo de Supervisión se envía correo electrónico el 27 de enero de 2026 al profesional Juan Jose Obando con el fin de hacer seguimiento y conocer el estado de tramite de obligación de las cuentas pendientes por pago.

- Por parte del equipo de Supervisión se envía correo electrónico el 14 de enero de 2026 al coordinador del grupo 3 ingeniero Oscar Buriticá en relación al trámite de subsanación de la cuenta SVR- VIGENCIA ACTA COSTOS No.37 NOVIEMBRE 2025 por valor de .$136.906.847,82.

4.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

CONTRATO 1544: REPORTADO POR LA INTERVENTORIA

- Revisión de informes mensuales ambientales de obra.
- Acompañamiento a la revisión de PQRS: Se realizó acompañamiento a la revisión de PQRS en los puntos de atención físicos y digitales. Para el periodo correspondiente al mes de enero no se registraron PQRS escritas; sin embargo, se efectuó acompañamiento a las observaciones e inquietudes manifestadas por la comunidad relacionadas con los tramos a intervenir.
- Capacitación ambiental: Se realizó acompañamiento por parte de la interventoría a la ejecución de la capacitación en cuidados ambientales dirigida al personal del contratista.
- Seguimiento a los criterios de contratación: En el seguimiento a los criterios de contratación por parte del contratista, se evidenció que el equipo de trabajo actual no cumple con el porcentaje de participación del género femenino establecido contractualmente. No obstante, se programó el ingreso de dos controladoras viales, lo cual permitirá dar cumplimiento a dicha obligación contractual.

CONTRATO 558: REPORTADO POR LA INTERVENTORIA

- Revisión semanal de buzón de sugerencias, durante el mes de enero no se encontraron PQRS escritas.
- Se recibieron cometarios y sugerencias para la mejora continua de la dinámica de ejecución de la obra.
- Revisión de los criterios de contratación del personal de obra, evidenciando que se tiene en cuenta los criterios del personal de la zona de influencia e inclusión de género.

4.5 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

N/A

5 PROCESO Y ENLACE SECOP

PROCESO	# CONTRATO	OBJETO CONTRATO OBRA	LINK SECOP
002/2022	1544 - 2022	REHABILITACION DE LA DOBLE CALZADA, ESPACIOS PUBLICOS URBANOS DE LA AVENIDA INTERNACIONAL ENTRE CALLE 3 Y CALLE 12 DEL MUNICIPIO DE LETICIA	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=22-1-222420
LP-0002-2022	558-2022	MEJORAMIENTO Y MANTENIMINETO DE SENDEROS PEATONALES DESDE LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO HASTA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=22-21-33299

PROCESO	# CONTRATO	OBJETO CONTRATO INTERVENTORIA	LINK SECOP	DOCUMENTOS CARGADOS EN EL PERIODO
CMA-DTE-SEP-197-2021	1052 - 2022	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE AMAZONAS, CAQUETÁ Y VAUPÉS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 1	https://acortar.link/7v58Ol	N/A

6 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR

- Se da respuesta el 26 de enero de 2026 al requerimiento presentado por la Procuraduría Regional de Instrucción Amazonas mediante oficio PRIA – OSNM – 0062, en relación con el convenio 1899 de 2021.

- Se atendieron las GLOSAS No 091 y 122 en relación con las actas de costos de interventoría.

- Se efectúa la gestión pertinente con el área financiera de la Subdirección de vías regionales para agilizar los trámites de obligación y posterior pago de las facturas pendientes por cancelar al Consorcio Viascol.

- Seguimiento a los demás convenios en ejecución que tiene a cargo el contrato de interventoría, en los departamentos del Amazonas, Vaupés y Caquetá, con el fin de continuar con el buen ejercicio de las actividades previstas en cada uno de los convenios (1899-2021; 1900-2021; 1901-2021, 1856-2021, 1790-2021)

Seguimiento a las obligaciones contractuales de la interventoría 1052-2022:

PRINCIPALES OBLIGACIONES ESPECIFICAS DE CONFORMIDAD AL MANUAL DE INTERVENTORIA VIGENTE			
No.	**OBLIGACIÓN**	**ESTADO**	**OBSERVACIONES**
1	Sistema de Gestión en Salud y seguridad en el Trabajo	En Ejecución	Esta obligación se soporta en el informe mensual de interventoría. Contrato 1544-2022 páginas 19, 123. Contrato 558-2022 página 96.
2	Plan de Manejo del Tránsito (PMT)	En Ejecución	Necesario hacer claridad respecto al PMT vigente. Contrato 1544-2022: El 6 de enero se solicitó actualización de PMT. Contrato 558-2022: Decreto de febrero de 2025, y PMT de junio de 2025.
3	Documentos para la Revisión, Seguimiento y Control de la Obra	En Ejecución	Esta obligación se soporta en el informe mensual de interventoría. Contrato 1544-2022: El seguimiento y control se realiza por medio de Microsoft Project, páginas 99 a 102.

PRINCIPALES OBLIGACIONES ESPECIFICAS DE CONFORMIDAD AL MANUAL DE INTERVENTORIA VIGENTE			
			Contrato 558-2022: páginas 78 a 82.
4	Diario de Obra (Bitácora)	En Ejecución	Esta obligación se soporta en el informe mensual de interventoría. Contrato 1544-2022: páginas 267 a 279. Contrato 558-2022: páginas 210 a 226.
5	Estudios, Diseños y Planos	En Ejecución	Esta obligación se soporta en el informe mensual de interventoría. Contrato 1544-2022: páginas 11 y 12. Contrato 558-2022: página 10.
6	Inicio de los Trabajos	En Ejecución	No se presenta en este informe mensual de interventoría.
7	Inversión del Anticipo y/o Pago Anticipado	En Ejecución	Esta obligación se soporta en el informe mensual de interventoría. Contrato 1544-2022: Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-8, página 44. Formato MEPI-MN-IN-2-FR-1 página 92 a 97. Contrato 558-2022: Formato MEPI-MN1-IN-2-FR-2, página 76 y 77.
8	Recursos Necesarios	En Ejecución	Esta obligación se soporta en el informe mensual de interventoría. Contrato 1544-2022: Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7, páginas 220 a 229. Contrato 558-2022: Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7, páginas 161 a 170.
9	Estado, Calidad y Cantidad del Equipo Disponible	En Ejecución	Esta obligación se soporta en el informe mensual de interventoría. Contrato 1544-2022: Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4, páginas 34 a 40. Contrato 558-2022: Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4, página 37.
10	Personal y Equipo del Constructor	En Ejecución	Contrato 1544-2022: Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6, páginas 41 y 42. Contrato 558-2022: Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6, página 38 a 39. Desactualizado, se adjunta información del mes de noviembre de 2025.

PRINCIPALES OBLIGACIONES ESPECIFICAS DE CONFORMIDAD AL MANUAL DE INTERVENTORIA VIGENTE			
11	Ensayos y Control de Calidad	En Ejecución	Esta obligación se soporta en el informe mensual de interventoría. Contrato 1544-2022: Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-14, páginas 90 y 91. Contrato 558-2022: Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-14, página 73.
12	Acta de Recibo Parcial de Obra	En Ejecución	Esta obligación se soporta en el informe mensual de interventoría. Contrato 1544-2022: Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-8, página 44. Contrato 558-2022: Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-8, página 50.
13	Informe Semanal	En Ejecución	Ha dado cumplimiento con la entrega de la información necesaria y se evidencia en el informe mensual de interventoría. Contrato 1544-2022: Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-3, páginas 25 a 32. Contrato 558-2022: Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-3, páginas 25 a 35.
14	Informe Mensual	En Ejecución	La interventoría ha dado cumplimiento con la entrega de la información los días 5 de cada mes.
15	Programa de Utilización del Equipo	En Ejecución	Esta obligación se soporta en el informe mensual de interventoría. Contrato 1544-2022: Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4, páginas 34 a 40. Contrato 558-2022: Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4, página 37.
16	Concepto Sobre Modificaciones	En Ejecución	Contrato 1544-2022: No aplica para el presente periodo. Contrato 558-2022: No aplica para el presente periodo.
17	Manuales de Mantenimiento de Equipos	En Ejecución	Contrato 1544-2022: No aplica para el presente periodo. Contrato 558-2022: No aplica para el presente periodo.
18	Visita Previa Para el Recibo Definitivo de Obra	En Ejecución	Contrato 1544-2022: No aplica para el presente periodo.

PRINCIPALES OBLIGACIONES ESPECIFICAS DE CONFORMIDAD AL MANUAL DE INTERVENTORIA VIGENTE			
			Contrato 558-2022: No aplica para el presente periodo.
19	Recibo Definitivo de la Obra	En Ejecución	Contrato 1544-2022: No aplica para el presente periodo. Contrato 558-2022: No aplica para el presente periodo.
20	Informe Final	En Ejecución	Contrato 1544-2022: No aplica para el presente periodo. Contrato 558-2022: No aplica para el presente periodo.

7 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO


La ejecución del contrato 1544 de 2022 registro un avance del 2,06 % en el mes de enero de 2026 respecto al mes anterior , durante este periodo se cumplió con la programación establecida pero debido a un nuevo programa de inversión aprobado por la interventoría que extendió el plazo contractual hasta el 16 de abril de 2026 , es pertinente el seguimiento a las obligaciones de la interventoría frente a al cumplimiento del cronograma en el mes de febrero teniendo en cuenta las múltiples reprogramaciones que ha tenido el contrato de obra derivado , se recomienda apoyar en el mes de Febrero al Departamento en la gestión con el DNP frente al bloqueo de recursos del componente de saneamiento que ha impedido el pago de actas al contratista de obra por este componente y lo cual afecta la capacidad financiera del contratista para la ejecución del componente de saneamiento que finalmente libera pista para el componente vial a cargo de INVIAS , en ese sentido es pertinente programar una comisión de servicio para el mes de febrero con el fin de revisar el estado de la obra en campo y efectuar comité de seguimiento presencial.

De otra parte, el contrato 558 de 2022, registro un avance del 3,50% en el mes de enero de 2026 respecto al mes anterior sin cumplirse la meta de finalización al 100%, por lo cual la interventoría avalo prorroga al contrato de obra por un mes adicional motivado por condiciones climáticas por lo cual es necesario el seguimiento a la terminación al 100% de las obras para el mes de febrero de 2026 teniendo en cuenta que este contrato también a tenido múltiples prorrogas y reprogramaciones y para lo cual también es pertinente la programación de comisión de servicio por parte de la Supervisión al municipio de Puerto

Nariño para la verificación del cumplimiento de la finalización de las obras para el mes de febrero de 2026.

Seguimiento al Convenio 1856-2021 suscrito con el Departamento de Vaupés, donde su contrato de obra derivado suscribió acta de inicio el 19 de enero de 2026 , con corte al 31 de enero el contrato no reporta avance físico teniendo en cuenta que se inició con labores logísticas de traslado de material hasta la comunidad de Acaricuara.

Cordialmente,



WILLIAM MOLANO RODRIGUEZ
C.C. 7.946.3217 SUBDIRECTOR DE VIAS REGIONALES
FECHA: DESDE EL 01 HASTA EL 31 DE ENERO DE 2026
