ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
TRANSMILENIO S.A.

CONTRATO 1380 DE 2025 - REALIZAR LA ADECUACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS REQUERIDAS PARA FORTALECER EL SISTEMA, MEJORAR LA EXPERIENCIA DEL USUARIO Y RENOVAR SUS CONDICIONES FÍSICAS, LAS CUALES SE REALIZARÁN SOBRE LA INFRAESTRUCTURA DEL COMPONENTE BRT DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO -TRANSMILENIO S.A. LOTE 1

INFORME EJECUTIVO MENSUAL No 08

PERIODO 21 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO DE 2026

CONSORCIO MYE BOGOTÁ


MARZO 2026

Versión 1

CONTROL DE REVISIONES Y CAMBIOS

VERSIÓN N°.	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	FOLIOS
0	20/03/2026	VERSION INICIAL	25

EMPRESA CONTRATISTA

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
		
ING. VILMA ZARATE	ARQ. ANGELICA SIERRA	ARQ. ANGELICA SIERRA
RESIDENTE DE OBRA	**DIRECTORA DE OBRA**	**DIRECTORA DE OBRA**

EMPRESA INTERVENTORA

Revisado por:	Aprobado por:
	
ING. SEBASTIAN BETANCOURT	ARQ. EDUARDO ANDRÉS ACERO CAJIGAS
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	**DIRECTOR DE INTERVENTORIA**

CARRERA 13 # 94A - 25 OF 201 PBX: +57 601 716 7384
E-mail: direccion.consorciomye@gmail.com - Bogotá D.C. – Colombia.

TABLA DE CONTENIDO

1. INFORMACIÓN LEGAL DE LOS CONTRATOS DE CONTRATISTA E INTERVENTORÍA 5
1.1. Datos Generales, Fecha de Suscripción, Legalización, Iniciación y Terminación 5
1.2. Valor Inicial del Contrato y Adiciones 6
1.3. Garantías, Certificados de Modificación y Vigencias. 6
2. ASPECTOS TECNICOS 7
2.1. Actividades Realizadas Durante el Periodo 7
2.1.1. MET 07 - 1380-L1-037 8
2.1.2. OBC 02 - 1380-L1-038 8
2.1.3. OBC 02 - 1380-L1-039 9
2.1.4. OBS 02 – 1380-L1-040 9
2.1.5. OBC - 02- 1380-L1-041 10
2.1.6. MET -03 - 1380-L1-042 10
2.1.7. MET – 05 – MET 06 - 1380-L1-043 11
2.1.8. OBC-02 - 1380-L1-044 11
3. Componente de calidad 12
3.1.1. Inspección de Calidad de los Elementos Durante el Periodo 12
3.1.2. Evaluación de la calidad del concreto 17
3.1.3. Certificados de Calidad de Materiales 18
3.1.4. Fichas Técnicas de Materiales 19
4. RESUMEN EJECUTIVO AREA SST 20
4.1. Personal del proyecto 20
4.1.1. Personal SST 20
4.1.2. Personal de Plantilla Mínima y administración 21
4.2. Gestión SST Durante el Periodo 21
5. RESUMEN EJECUTIVO AREA AMBIENTAL 23
6. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL GENERAL 24
7. VALIDACION DE INFORME CONSORCIO MYE BOGOTA 25

CARRERA 13 # 94A - 25 OF 201 PBX: +57 601 716 7384
E-mail: direccion.consorciomye@gmail.com - Bogotá D.C. – Colombia.

INDICE DE TABLAS

Tabla 1. Datos Generales 5
Tabla 2. Valor del Contrato 6
Tabla 3. Garantías del contrato. 6
Tabla 4. Actividades Realizadas durante el Periodo 7
Tabla 5. Toma de registros espesores de pintura en elementos metálicos 15
Tabla 6. Toma de registros de ingreso, precinto y slump. 17
Tabla 7. Toma de registros de ingreso, precinto y slump. 18
Tabla 8. Registros y resultados falla de cilindros de concreto a la compresión 18
Tabla 9. Certificados de Calidad de los materiales 19
Tabla 10. Fichas Técnicas de los materiales 19
Tabla 11. Personal Calidad y SST 20
Tabla 12. Personal Profesionales y Plantilla Mínima 21
Tabla 13. Ejecución presupuestal general del contrato 24
Tabla 14. Ejecución Presupuestal por Troncal 24

INDICE DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Verificación de calidad de elementos metálicos 13
Ilustración 2. Verificación de calidad de elementos metálicos 14
Ilustración 3. Toma de registros espesores de pintura en elementos metálicos 16
Ilustración 4. Aprobación COI 6 ESTACION CALLE 106 20
Ilustración 5. Indicadores SGSST 22
Ilustración 6. Ejecución Presupuestal por troncal 24

CARRERA 13 # 94A - 25 OF 201 PBX: +57 601 716 7384
E-mail: direccion.consorciomye@gmail.com - Bogotá D.C. – Colombia.

1. INFORMACIÓN LEGAL DE LOS CONTRATOS DE CONTRATISTA E INTERVENTORÍA

1.1. Datos Generales, Fecha de Suscripción, Legalización, Iniciación y Terminación

Tabla 1. *Datos Generales*

INFORMACIÓN	CONSULTOR		INTERVENTOR	
No. DEL CONTRATO	***1380-2025***		***1369 - 2025***	
OBJETO	REALIZAR LA ADECUACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS REQUERIDAS PARA FORTALECER EL SISTEMA, MEJORAR LA EXPERIENCIA DEL USUARIO Y RENOVAR SUS CONDICIONES FÍSICAS, LAS CUALES SE REALIZARÁN SOBRE LA INFRAESTRUCTURA DEL COMPONENTE BRT DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO -TRANSMILENIO S.A. LOTE 1		REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA) DE LOS CONTRATOS RESULTANTES DE LA RESPECTIVA LICITACIÓN (LOTE 1 Y LOTE 2), CUYO OBJETO ES: REALIZAR LA ADECUACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS REQUERIDAS PARA FORTALECER EL SISTEMA, MEJORAR LA EXPERIENCIA DEL USUARIO Y RENOVAR SUS CONDICIONES FÍSICAS, LAS CUALES SE REALIZARÁN SOBRE LA INFRAESTRUCTURA DEL COMPONENTE BRT DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO - TRANSMILENIO S.A. .	
CONTRATISTA CONFORMACIÓN CONSORCIO Y PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	**CONSORCIO MYE BOGOTA**	**Participación**	**CONSORCIO ALIANZA XXI**	**Participación**
	CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS EFRS S.A.S	45.00%	DAIMCO S.A.S	99.90%
	MR GROUP COL S.A.S	45.00%	DIBENEM S.A.S	0.10%
	COLPETROLEUM SERVICES S.A.S	10.00%		
ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCIÓN		EN EJECUCIÓN	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	19 DE JUNIO DE 2025		16 DE JUNIO DE 2025	
FECHA DE INICIO:	21 DE JULIO DE 2025		21 DE JULIO DE 2025	
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	**21 DE OCTUBRE DE 2026**		**21 DE OCTUBRE DE 2026**	

CARRERA 13 # 94A - 25 OF 201 PBX: +57 601 716 7384
E-mail: direccion.consorciomye@gmail.com - Bogotá D.C. – Colombia.

1.2. Valor Inicial del Contrato y Adiciones

Tabla 2. *Valor del Contrato*

CONSULTORÍA	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$13,750,000,000.00 COP
VALOR ADICIONES	$6,672,853,444.00 COP
VALOR TOTAL CONTRACTUAL DEL CONTRATO	$20,422,853,444.00 COP

1.3. Garantías, Certificados de Modificación y Vigencias.

Tabla 3. *Garantías del contrato.*

Compañía de Seguros	Póliza No.	Causa de la Modificación (indicar documento soporte)	Amparo	Vigencia		Valor Asegurado
				Desde	Hasta	
SEGUROS MUNDIAL	**BCH-100044568** De Cumplimiento	Emisión de Pólizas de garantía al contrato 1380-2025	*Cumplimiento del Contrato*	21/07/2025	21/11/2026	$4,125,000,000.00
			Prestaciones Sociales e Indemnizaciones	21/07/2025	21/05/2029	$1,375,000,000.00
			Estabilidad de la obra	21/05/2026	21/05/2031	$4,125,000,000.00
	BCH-100009725 Responsabilidad Civil Extracontractual derivada de cumplimiento		*Amparo básico*	21/07/2025	21/05/2026	$685,500,000.00
			Contratistas y subcontratistas	21/07/2025	21/05/2026	$685,500,000.00
			Vehículos propios y no propios	21/07/2025	21/05/2026	$685,500,000.00
			Patronal	21/07/2025	21/05/2026	$685,500,000.00
			R.C. Cruzada	21/07/2025	21/05/2026	$685,500,000.00

CARRERA 13 # 94A - 25 OF 201 PBX: +57 601 716 7384
E-mail: direccion.consorciomye@gmail.com - Bogotá D.C. – Colombia.

2. ASPECTOS TECNICOS

2.1. Actividades Realizadas Durante el Periodo

Durante este periodo se realizó la intervención de las siguientes estaciones:

Tabla 4. *Actividades Realizadas durante el Periodo*

No DE ORDEN DE TRABAJO	TRONCAL	ESTACION	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR	ACTIVIDADES EJECUTADAS
1380-L1-037	CALLE 26	PORTAL EL DORADO	MET-07 - REEMPLAZO Y DESMONTE DE FACHADA EN VIDRIO POR ESTRUCTURA SOPORTE CON LÁMINA CORTE LÁSER PARA SUPERFICIES DE PORTAL O ESTACIÓN	EN EJECUCION
1380-L1-038	NORTE	TOBERIN	OBC-02 - DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN ESTACIONES	SE EJECUTA LA ACTIVIDAD TOTAL DURANTE EL PERIODO
1380-L1-039	NORTE	CALLE 161	OBC-02 - DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN ESTACIONES	SE EJECUTA LA ACTIVIDAD TOTAL DURANTE EL PERIODO
1380-L1-040	NORTE	CALLE 161	OBC-02 - DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN ESTACIONES	SE EJECUTA LA ACTIVIDAD TOTAL DURANTE EL PERIODO
1380-L1-041	NORTE	MAZUREN	OBC-02 - DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN ESTACIONES	SE EJECUTA LA ACTIVIDAD TOTAL DURANTE EL PERIODO
1380-L1-042	NORTE	CALLE 106	MET 03 CERRAMIENTO TIPO ONDA	SE EJECUTA LA ACTIVIDAD TOTAL DURANTE EL PERIODO
1380-L1-043	NQS SUR	PORTAL SUR	MET 05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA EN CERRAMIENTO DE PLATAFORMAS	EN EJECUCION
			MET 06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA MICROPERFORADA EN PORTALES	EN EJECUCION
1380-L1-044	NORTE	MAZUREN	OBC-02 - DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN ESTACIONES	SE EJECUTA LA ACTIVIDAD TOTAL DURANTE EL PERIODO

CARRERA 13 # 94A - 25 OF 201 PBX: +57 601 716 7384
E-mail: direccion.consorciomye@gmail.com - Bogotá D.C. – Colombia.

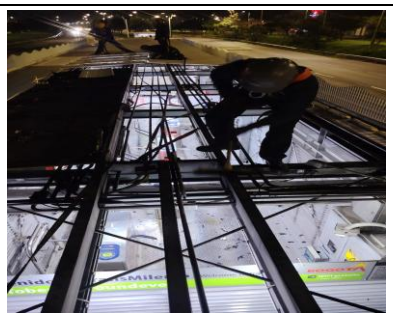
2.1.1. MET 07 - 1380-L1-037

REEMPLAZO Y DESMONTE DE FACHADA EN VIDRIO POR ESTRUCTURA SOPORTE CON LÁMINA CORTE LÁSER PARA SUPERFICIES DE PORTAL O ESTACIÓN, en el PORTAL EL DORADO se está realizando el reemplazo de los vidrios de la fachada por lamina corte laser.

TRONCAL	ESTACION	DESCRIPCION
CALLE 26	PORTAL EL DORADO	REEMPLAZO Y DESMONTE DE FACHADA EN VIDRIO POR ESTRUCTURA SOPORTE CON LÁMINA CORTE LÁSER PARA SUPERFICIES DE PORTAL O ESTACIÓN
ANTES	**DURANTE**	**DESPUES**
		EN EJECUCION

2.1.2. OBC 02 - 1380-L1-038

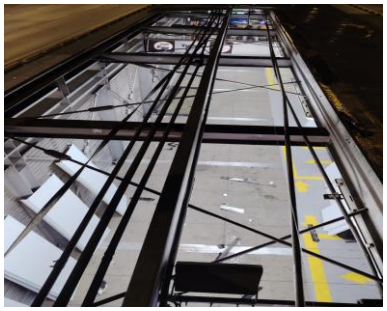
DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN ESTACIONES, en la ESTACION TOBERIN se realiza el desmonte de la cubierta existente en los vagones 4 y 5, para luego realizar el suministro e instalación de cubierta nueva tipo sándwich.

TRONCAL	ESTACION	DESCRIPCION
NORTE	TOBERIN	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN ESTACIONES
ANTES	**DURANTE**	**DESPUES**
		

CARRERA 13 # 94A - 25 OF 201 PBX: +57 601 716 7384
E-mail: direccion.consorciomye@gmail.com - Bogotá D.C. – Colombia.

2.1.3. OBC 02 - 1380-L1-039

DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN ESTACIONES, en la ESTACION CALLE 161, se realiza el desmonte de la cubierta existente en el vagón 3 para luego realizar el suministro e instalación de cubierta nueva tipo sándwich.

TRONCAL	ESTACION	DESCRIPCION
NORTE	CALLE 161	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN ESTACIONES
ANTES	DURANTE	DESPUES
		

2.1.4. OBS 02 – 1380-L1-040

DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN ESTACIONES, en la ESTACION CALLE 161, se realiza el desmonte de la cubierta existente en el vagón 2, para luego realizar el suministro e instalación de cubierta nueva tipo sándwich.

TRONCAL	ESTACION	DESCRIPCION
NORTE	CALLE 161	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN ESTACIONES
ANTES	DURANTE	DESPUES
		

CARRERA 13 # 94A - 25 OF 201 PBX: +57 601 716 7384
E-mail: direccion.consorciomye@gmail.com - Bogotá D.C. – Colombia.

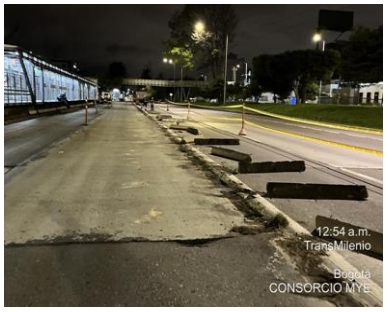
2.1.5. OBC - 02- 1380-L1-041

DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN ESTACIONES, en la ESTACION MAZUREN, se realiza el desmonte de la cubierta existente en los vagones 3 y 4, para luego realizar el suministro e instalación de cubierta nueva tipo sándwich.

TRONCAL	ESTACION	DESCRIPCION
NORTE	MAZUREN	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN ESTACIONES
ANTES	**DURANTE**	**DESPUES**
		

2.1.6. MET -03 - 1380-L1-042

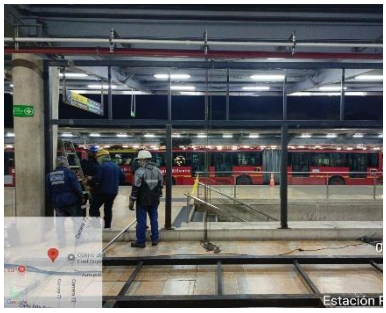
SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO TIPO ONDA, en la ESTACION CALLE 106, se realiza la instalación del cerramiento tipo onda en el costado occidental.

TRONCAL	ESTACION	DESCRIPCION
NORTE	CALLE 106	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO TIPO ONDA
ANTES	**DURANTE**	**DESPUES**
		

CARRERA 13 # 94A - 25 OF 201 PBX: +57 601 716 7384
E-mail: direccion.consorciomye@gmail.com - Bogotá D.C. – Colombia.

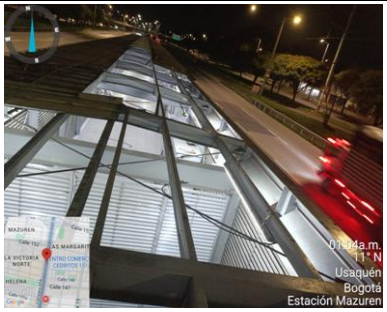
2.1.7. MET – 05 – MET 06 - 1380-L1-043

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA EN CERRAMIENTO DE PLATAFORMAS; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA MICROPERFORADA EN PORTALES EN PLATAFORMA 1 en el PORTAL SUR, se esta realizando desmonte de tubería aluminio y cerramiento en vidrio en plataforma 1.

TRONCAL	ESTACION	DESCRIPCION
NQS SUR	PORTAL SUR	REEMPLAZO Y DESMONTE DE FACHADA EN VIDRIO POR ESTRUCTURA SOPORTE CON LÁMINA CORTE LÁSER PARA SUPERFICIES DE PORTAL O ESTACIÓN
ANTES	**DURANTE**	**DESPUES**
		EN EJECUCION

2.1.8. OBC-02 - 1380-L1-044

DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN ESTACIONES, en la ESTACION MAZUREN, se realiza el desmonte de la cubierta existente en los vagones 1,2 y 5, para luego realizar el suministro e instalación de cubierta nueva tipo sándwich.

TRONCAL	ESTACION	DESCRIPCION
NORTE	MAZUREN	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN ESTACIONES
ANTES	**DURANTE**	**DESPUES**
		

CARRERA 13 # 94A - 25 OF 201 PBX: +57 601 716 7384
E-mail: direccion.consorciomye@gmail.com - Bogotá D.C. – Colombia.

3. Componente de calidad

3.1.1. Inspección de Calidad de los Elementos Durante el Periodo

En el marco del plan de inspección de calidad de los elementos fabricados e instalados, se siguen los parámetros para la validación de los estándares de aceptación de cada uno de los elementos.

Para todos los ítems del contrato, se siguen tres aspectos de control de calidad, uno de ellos es la verificación visual, en donde se debe validar cada uno de los cordones de soldadura en los elementos que los requieran, como las estructuras metálicas o en los tubos del cerramiento tipo onda. Que estos estén correctamente soldados, sobre todo, que no falte ninguna de las uniones en cada uno de los elementos instalados.

Las validaciones empleadas a los materiales fabricados se harán a una muestra representativa del total del lote, para este caso en particular, se realizarán las inspecciones al 10% de los elementos, como se indica en el plan de inspección de calidad del contrato.

Como segunda medida, se valida la dimensionalidad de los elementos fabricados, se verifica también la ortogonalidad en las láminas que componen tanto la teja superior como inferior de la cubierta tipo sándwich y sus respectivos cortes y remates laterales y frontales, además de su aislante térmico interno. También en los tubos instalados en el costado occidental en el marco de la ejecución del cerramiento tipo onda, en donde, se toman las medidas longitudinales y transversales, además de las distancias entre los elementos instalados.

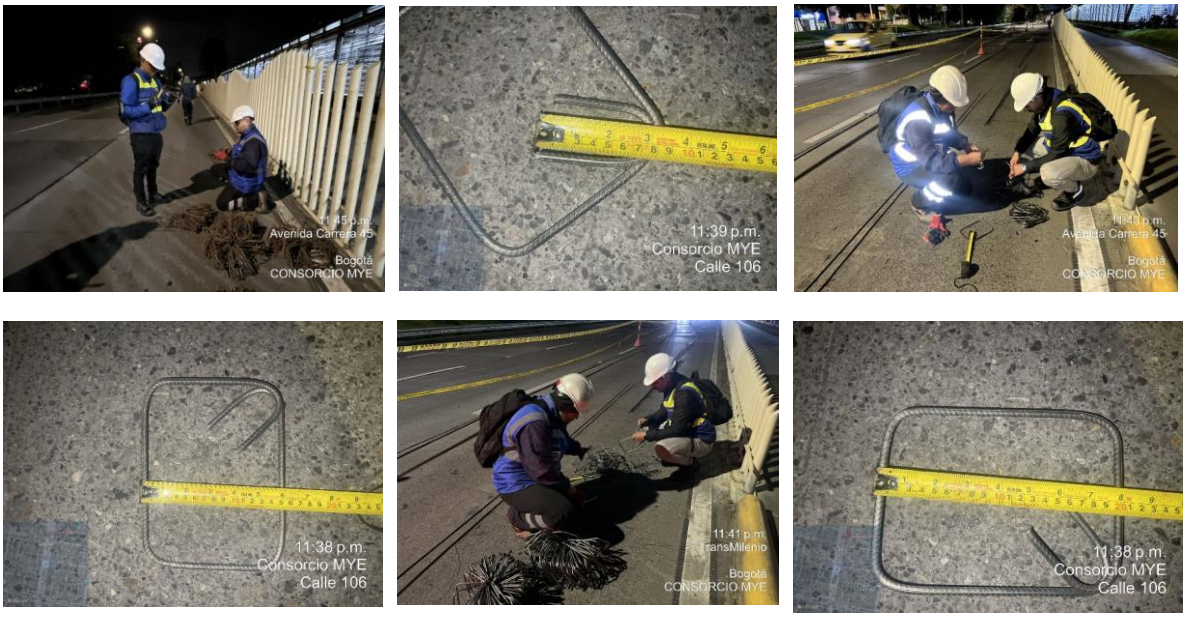
A continuación, se relaciona el registro fotográfico como evidencia de las inspecciones y verificaciones realizadas tanto en taller como en el sitio de la obra.

CARRERA 13 # 94A - 25 OF 201 PBX: +57 601 716 7384
E-mail: direccion.consorciomye@gmail.com - Bogotá D.C. – Colombia.

Ilustración 1. *Verificación de calidad de elementos metálicos*

MET-03 - SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO TIPO ONDA

Validacion Dimensiones y Longitudes en obra ESTACION CALLE 106



CARRERA 13 # 94A - 25 OF 201 PBX: +57 601 716 7384
E-mail: direccion.consorciomye@gmail.com - Bogotá D.C. – Colombia.

Ilustración 2. *Verificación de calidad de elementos metálicos*

MET-03 - SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO TIPO ONDA

Validacion Plomo y alineaciones en obra en estación CALLE 106



CARRERA 13 # 94A - 25 OF 201 PBX: +57 601 716 7384
E-mail: direccion.consorciomye@gmail.com - Bogotá D.C. – Colombia.

En el marco de las constantes acciones para garantizar la calidad de los elementos instalados, se realiza las inspecciones exigidas correspondientes, se toma la lectura de los espesores en la pintura aplicada sobre los elementos metálicos. Esta validación se realiza tanto a la capa aplicada de barrera anticorrosiva, como a la capa final de la pintura de acabado una vez haya secado correctamente, supervisando que los espesores aplicados estén dentro de los permitidos según lo definido en el plan de inspección de calidad y la normativa establecida vigente.

A continuación, se muestra en tablas anexas, las lecturas de los espesores de pintura (en unidad de medida *MILS)*, aplicado de acuerdo con las actividades en cada uno de los frentes activos en el periodo del presente informe y la evidencia fotográfica que corrobora los datos en cada una de las lecturas relacionadas de la siguiente manera:

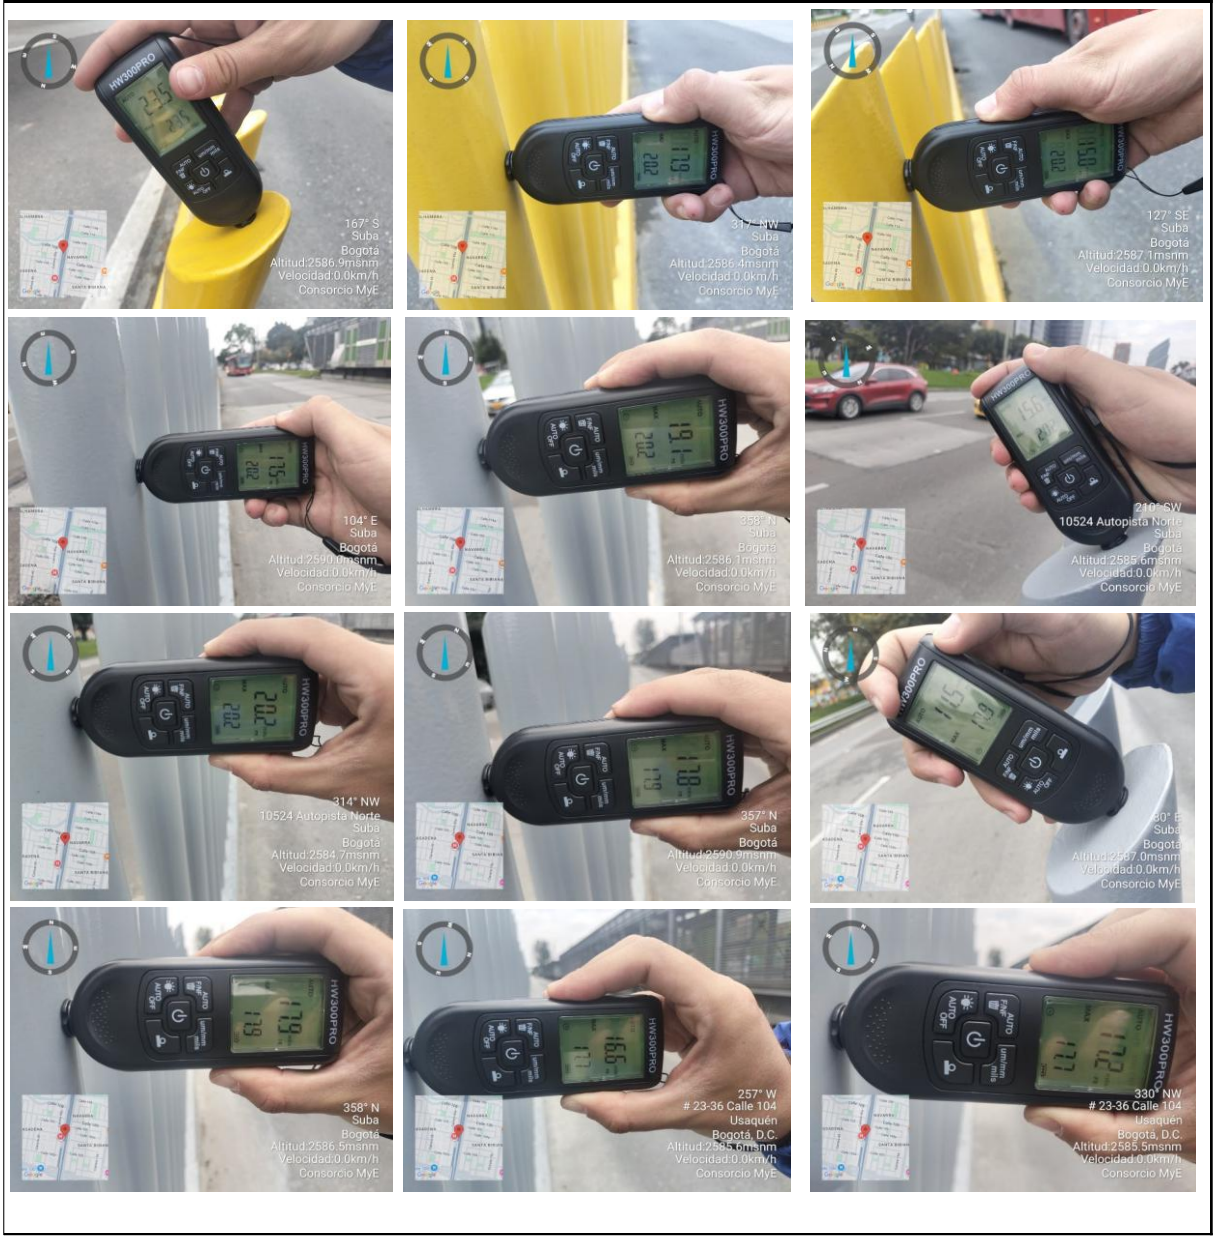
Tabla 5. *Toma de registros espesores de pintura en elementos metálicos*

TOMA DE REGISTROS ESPESORES DE PINTURA DE ELEMENTOS METALICOS MET 03				
ESTACIÓN	**ESPICIFICACIÓN**	**ELEMENTO**	**MEDICIÓN {mils}**	**CRITERIO {>9 mils}**
CALLE 106	**MET- 03**	Cerramiento - Capa final	23.5	Cumple
			17.9	Cumple
			15.0	Cumple
			17.5	Cumple
			19.1	Cumple
			15.6	Cumple
			20.2	Cumple
			17.8	Cumple
			11.5	Cumple
			17.9	Cumple
			16.6	Cumple
			17.2	Cumple

CARRERA 13 # 94A - 25 OF 201 PBX: +57 601 716 7384
E-mail: direccion.consorciomye@gmail.com - Bogotá D.C. – Colombia.

Ilustración 3. *Toma de registros espesores de pintura en elementos metálicos*

REGISTRO FOTOGRAFICO EN OBRA MET 03- CALLE 106

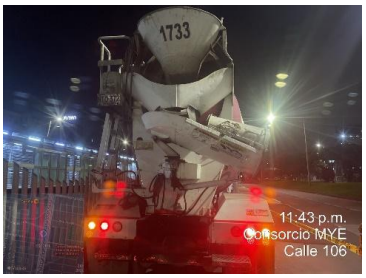
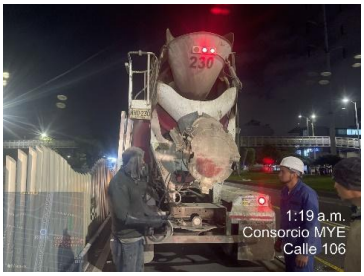


CARRERA 13 # 94A - 25 OF 201 PBX: +57 601 716 7384
E-mail: direccion.consorciomye@gmail.com - Bogotá D.C. – Colombia.

3.1.2. Evaluación de la calidad del concreto

Durante el periodo reportado, se realizan los procedimientos de control y calidad según los estándares establecidos por la normatividad vigente. Conforme a ello, se ejecutan las pruebas de asentamiento al concreto fresco como lo indica la NTC 396. Se relaciona de igual manera el registro de entrada de mixers al frente de obra, la verificación de los precintos, su estado y sus consecutivos. Para el presente informe, las pruebas realizadas al concreto, hacen referencia únicamente al frente de obra de la estación calle 106, arrojando los siguientes resultados:

Tabla 6. *Toma de registros de ingreso, precinto y slump.*

ESTACIÓN	FECHA	SELLO SEGURIDAD	PROVEEDOR	CANTIDAD		ASENTAMIENTO	LOCALIZACIÓN
				REMISIÓN	m³		
Calle 106	2/03/2026	7985	COVAL	8108	6.0	7´´	Viga occidental
  							
Calle 106	2/03/2026	7986	COVAL	8109	6.0	6.5´´	Viga occidental
  							

CARRERA 13 # 94A - 25 OF 201 PBX: +57 601 716 7384
E-mail: direccion.consorciomye@gmail.com - Bogotá D.C. – Colombia.

Tabla 7. Toma de registros de ingreso, precinto y slump.

ESTACIÓN	FECHA	SELLO SEGURIDAD	PROVEEDOR	CANTIDAD		ASENTAMIENTO	LOCALIZACIÓN
				REMISIÓN	m³		
Calle 106	6/03/2026	8024	COVAL	8147	6	7´´	Viga occidental
							
Calle 106	6/03/2026	8025	COVAL	8148	6	7´´	Viga occidental
							

Se relaciona a continuación, el fallo de los testigos de concreto tomadas *in situ* en cada una de las fundidas presentadas en el periodo reportado.

Tabla 8. Registros y resultados falla de cilindros de concreto a la compresión

CONSORCIO MYE BOGOTA / FUNDIDA DE CONCRETO / 1380-2025									
CONCRETO 3000 PSI ACELERADO A 3 DIAS								RESULTADOS	
ESTACION	FECHA	SELLO	PROVEEDOR	REMISION	CANT (M3)	SLUMP	UBICACIÓN	3 DIAS	No. Inf
CALLE 106	2/03/2026	7985	COVAL	8108	6	7"	VIGA OCCIDENTAL	104.05%	830
CALLE 106	6/03/2026	8024	COVAL	8147	6	7"	VIGA OCCIDENTAL	104.05%	830

3.1.3. Certificados de Calidad de Materiales

De acuerdo con el Plan de Inspección y Calidad, se anexan los certificados de calidad, de los materiales o insumos con los cuales se desarrollan las ordenes de trabajo asignadas al proyecto, de acuerdo a la siguiente tabla:

CARRERA 13 # 94A - 25 OF 201 PBX: +57 601 716 7384
E-mail: direccion.consorciomye@gmail.com - Bogotá D.C. – Colombia.

Tabla 9. Certificados de Calidad de los materiales

4.3.3 Certificados de calidad de los materiales Y fichas tecnicas:		
TUBERIAS	TUBO COLD ROLLED 50 (50X15X1,5 MM).	LA CAMPANA
	TUBO ESTRUCTURAL HR 50 (50X25X1,5MM).	LA CAMPANA
	PLATINAS DE 3/16".	250115Z01053
	PLATINAS DE 7/16"x2".	76960
	PEH1.4SUP 160.60	
	TUBO REDONDO 2	LA CAMPANA
	TUBO CR RECTANGULAR 2X1X6	AGOFER
	TUBO CR RECTANGULAR 3 X 1.12	AGOFER
PINTURA	SUPER EPOXI IMPRIMANTE FOSFATO DE ZINC	PRIME EXCELENCIA EN PINTURAS
	AUTOIMPRIMANTE FOSFATO DE ZINC	PRIME EXCELENCIA EN PINTURAS
	PINTURA	PRIME EXCELENCIA EN PINTURAS
	AJUSTADOR 21-06	SIGMAFAST 278
SOLDADURA	SOLDADURA 6010	WEST ARCO
	SOLDADURA 7018	

3.1.4. Fichas Técnicas de Materiales

Se anexan las fichas técnicas, de algunos materiales o insumos con los cuales se desarrollan las ordenes de trabajo asignadas al proyecto, de acuerdo con la siguiente tabla:

Tabla 10. Fichas Técnicas de los materiales

4.3.5 Fichas técnicas de cada material.		
PINTURA	AJUSTADOR 21-06	
	SIGMAFAST 278 BASE RAL 7035	
PINTURA ELECTROSTATICA	PINTURA ROJO RAL 3020 LISO POLIESTER SIN TGIC	ELECTROCOAT

3.2. Plan de Manejo de Tránsito Emitido Durante el Periodo

Durante el presente periodo, en la estación Calle 106 mediante la Orden de trabajo, se autoriza realizar las actividades para el MET-03 - Suministro e Instalación Cerramiento Tipo Onda COSTADO OCCIDENTAL, para lo cual se hizo necesario solicitar ante secretaria de Movilidad un PMT, para trabajar sobre las vías BRT y MIXTA, de la Autopista Norte con calle 106, el cual fue aprobado bajo el COI 06 el pasado 5 de febrero de 2026 y está habilitada hasta el 5 de abril de 2026.

CARRERA 13 # 94A - 25 OF 201 PBX: +57 601 716 7384
E-mail: direccion.consorciomye@gmail.com - Bogotá D.C. – Colombia.

Ilustración 4. *Aprobación COI 6 ESTACION CALLE 106*

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG
PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI) y otros
CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 3.0

COI No. 06
FEBRERO 05 DE 2026
SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No.	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV)		DIRECCIÓN DE LA OBRA		CONTRATISTA	FECHA		HORARIO DE TRABAJO	HORARIO DE CIERRE	No. CONTRATO	OBSERVACIONES	AUTORIZADO	LOCALIDAD	ING. RESPONSABLE	No RADICADO SDM
	INICIO	FIN	INICIO	FIN		INICIO	FIN								
3093	1005370	1007802	AUTO NORTE (AK 45) CL 104	AUTO NORTE (AK 45) CL 106B	CONSORCIO MYE BOGOTA	6-feb-26	9-abr-26	00:30-03:30	00:30-03:30	TM-1380-2025	NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE, EN ESPECIAL CON LOS DIFERENTES CONTRATOS IDU QUE TIENEN PMT VIGENTE PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO VIAL A LO LARGO DEL CORREDOR, A FIN DE VERIFICAR GARANTIAS Y BRINDAR CONDICIONES SEGURAS DE TAL FORMA QUE NO SE TENGAN OTROS CIERRES EN LA MISMA CALZADA A UNA DISTANCIA MENOR A 500m. 2. DAR ESTRICTO CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR TRANSMILENIO S.A. 3. NO SE AUTORIZA BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA AFECTACION DE LA ESTACION. LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DEL CARRIL ORIENTAL DE LA CALZADA ORIENTAL EXCLUSIVA DE TRANSMILENIO PARA ACTIVIDADES DE INSTALACION DE BARRERAS ANTICOLADOS EN TRAMOS MAXIMOS DE 50m. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN ANCHO DE CALZADA LIBRE MINIMO DE 3.5m PARA LA CIRCULACION VEHICULAR. SEÑALIZACION DE OBRA, BARRICADAS, AUXILIARES DE TRANSITO Y CIERRES DEBEN PERMANECER MIENTRAS DURE LA INTERVENCION. NO SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DE LA CALZADA. SE DEBEN ACOGER A LA NORMATIVIDAD EXISTENTE EN CUANTO A LA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (03:30 HORAS) LA CALZADA DEBE HABILITARSE EN CONDICIONES OPTIMAS DE SEGURIDAD VIAL.	SI	CORREDOR	MARISELA PEÑA C.	20256120029822
3094	1005370	1007802	AUTO NORTE (AK 45) CL 104	AUTO NORTE (AK 45) CL 106B	CONSORCIO MYE BOGOTA	6-feb-26	9-abr-26	00:30-03:30	00:30-03:30	TM-1380-2025	NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE, EN ESPECIAL CON LOS DIFERENTES CONTRATOS IDU QUE TIENEN PMT VIGENTE PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO VIAL A LO LARGO DEL CORREDOR, A FIN DE VERIFICAR GARANTIAS Y BRINDAR CONDICIONES SEGURAS DE TAL FORMA QUE NO SE TENGAN OTROS CIERRES EN LA MISMA CALZADA A UNA DISTANCIA MENOR A 500m. 2. DAR ESTRICTO CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR TRANSMILENIO S.A. 3. NO SE AUTORIZA BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA AFECTACION DE LA ESTACION. LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DEL CARRIL OCCIDENTAL DE LA CALZADA OCCIDENTAL EXCLUSIVA DE TRANSMILENIO PARA ACTIVIDADES DE INSTALACION DE BARRERAS ANTICOLADOS EN TRAMOS MAXIMOS DE 50m. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN ANCHO DE CALZADA LIBRE MINIMO DE 3.5m PARA LA CIRCULACION VEHICULAR. SEÑALIZACION DE OBRA, BARRICADAS, AUXILIARES DE TRANSITO Y CIERRES DEBEN PERMANECER MIENTRAS DURE LA INTERVENCION. NO SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DE LA CALZADA. SE DEBEN ACOGER A LA NORMATIVIDAD EXISTENTE EN CUANTO A LA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (03:30 HORAS) LA CALZADA DEBE HABILITARSE EN CONDICIONES OPTIMAS DE SEGURIDAD VIAL.	SI	CORREDOR	MARISELA PEÑA C.	20256120029822
3095	1005370	1007802	AUTO NORTE (AK 45) CL 104	AUTO NORTE (AK 45) CL 106B	CONSORCIO MYE BOGOTA	6-feb-26	9-abr-26	21:00-05:00	21:00-05:00	TM-1380-2025	NOTA: SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE, EN ESPECIAL CON LOS DIFERENTES CONTRATOS IDU QUE TIENEN PMT VIGENTE PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO VIAL A LO LARGO DEL CORREDOR, A FIN DE VERIFICAR GARANTIAS Y BRINDAR CONDICIONES SEGURAS DE TAL FORMA QUE NO SE TENGAN OTROS CIERRES EN LA MISMA CALZADA A UNA DISTANCIA MENOR A 500m. LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DEL CARRIL OCCIDENTAL DE LA CALZADA MIXTA RAPIDA ORIENTAL PARA ACTIVIDADES DE INSTALACION DE BARRERAS ANTICOLADOS EN TRAMOS MAXIMOS DE 50m. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LOS DOS CARRILES RESTANTES LIBRES PARA LA CIRCULACION. SEÑALIZACION DE OBRA, BARRICADAS, AUXILIARES DE TRANSITO Y CIERRES DEBEN PERMANECER MIENTRAS DURE LA INTERVENCION. NO SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DE LA CALZADA. GARANTIZAR EL ACCESO Y SALIDA A LOS VEHICULOS O MEDIOS DE TTE DE LOS RESIDENTES Y COMERCIANTES DEL SECTOR. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VEHICULOS SOBRE LAS VIAS. SE DEBEN ACOGER A LA NORMATIVIDAD EXISTENTE EN CUANTO A LA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. SE DEBE ACOMPAÑAR EL TRASIEGO DE MATERIALES CON PERSONAL ABANDERADO. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (05:00 HORAS) LA CALZADA DEBE HABILITARSE EN CONDICIONES OPTIMAS DE SEGURIDAD VIAL.	SI	CORREDOR	MARISELA PEÑA C.	20256120029822

4. RESUMEN EJECUTIVO AREA SST

El Consorcio MYE implementa el Sistema de Gestión de SST (SG-SST) conforme a la normatividad legal y contractual, priorizando la prevención de riesgos laborales, la protección de los trabajadores y la garantía de entornos seguros, dando cumplimiento al 100% el plan de trabajo del SGSST.

4.1. Personal del proyecto

El equipo cuenta con ingenieros de SST, ambientales, inspectores, residentes de obra y personal administrativo, con organigrama y estructura definida para la ejecución del contrato.

4.1.1. Personal SST

Por parte del componente se indica el siguiente personal de apoyo y de interventoría

Tabla 11. *Personal Calidad y SST*

PROFESIONAL	CARGO
Oscar Ciendua Torres	Ing. de Calidad Y SST – interventoría
Catherine Duque Botero	Ing. de Calidad Y SST
Miguel Ángel Briceño Velosa	Ing. de Calidad Y SST
Tatiana Rocío Ricardo Torres	Inspector Calidad Y SST

CARRERA 13 # 94A - 25 OF 201 PBX: +57 601 716 7384
E-mail: direccion.consorciomye@gmail.com - Bogotá D.C. – Colombia.

4.1.2. Personal de Plantilla Mínima y administración

Tabla 12. *Personal Profesionales y Plantilla Mínima*

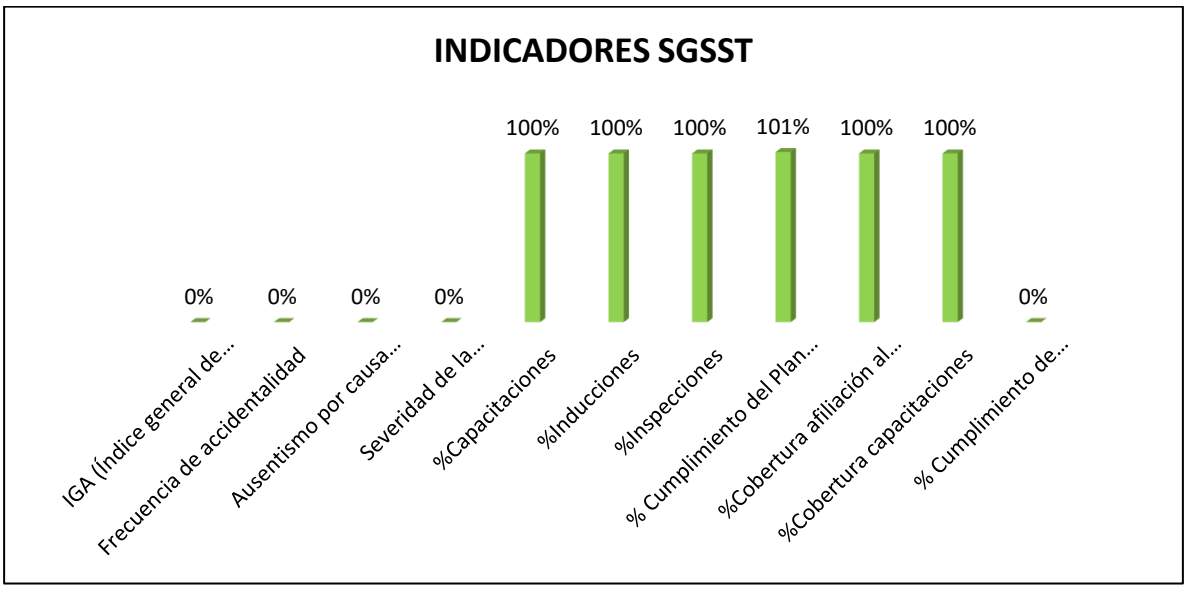
N°	NOMBRE	CEDULA	CARGO
1	Daniel Antonio Ávila Navarro	1.020.795.956	Coordinador De Proyecto - Apoyo
2	Jeny Angelica Sierra Mayorga	52.027.642	Director De Proyecto
3	Vilma Zulay Zarate Pérez	68.298.776	Residente De Obra
4	Edward Fabian Martínez Palomino	1.019.104.383	Residente De Obra
5	Miguel Ángel Briceño Velosa	80.029.706	Ing. Calidad SST
6	Katherine Duque Botero	52.849.283	Ing. Calidad SST
7	Jorge Eduardo Rodríguez Martínez	1.032.362.166	Ing. Ambiental
8	Jennifer Astrid Capera Sánchez	1.136.880.609	Ing. Ambiental
9	Paula Milena Gómez Cardenas	1024576217	Inspector De Calidad y SST
10	Liseth Katherine Márquez Ochoa	1.030.599.549	Inspector Ambiental
11	Robert Andrés Torres Rojas	1.024.501.619	Inspector De Obra
12	Sergio Hernán Mateus Useche	1.016.097.191	Inspector De Obra
13	Juan Felipe Cornejo Nieto	1.015.484.496	Auxiliar Administrativo
14	Rafael Antonio Niño Rodríguez	1.121.326.909	Almacenista
15	Anderson Esneyder García Quintero	1.015.476.931	Auxiliar Administrativo

4.2. Gestión SST Durante el Periodo

- Afiliación a seguridad social: soportada para todo el personal.
- Comités: COPASST y de Convivencia Laboral constituidos y con acta de reunión mensual.
- Entrega de EPP: realizada con soportes.
- Capacitaciones e inspecciones: ejecutadas según cronograma de capacitación, 3 temas, programados 3 temas, se ejecutó mayor temario a necesidad del proyecto cumpliendo al 100%. Esto con referencia al Cronograma de capacitación.
- Accidentalidad: no se reportaron accidentes, ni incidentes de trabajo.
- Indicadores SG-SST: cumplimiento satisfactorio, en accidentalidad a 0% y cumplimientos al 106% del plan de trabajo.
- Afectación a usuarios: no se presentaron eventos.

CARRERA 13 # 94A - 25 OF 201 PBX: +57 601 716 7384
E-mail: direccion.consorciomye@gmail.com - Bogotá D.C. – Colombia.

Ilustración 5. Indicadores SGSST



El Consorcio MYE cumple con la implementación del SG-SST, garantizando condiciones de seguridad y salud adecuadas para el personal.

Se evidencian controles efectivos en afiliaciones, inducciones, comités, entrega de EPP, capacitaciones y exámenes médicos.

No se presentaron accidentes, incidentes laborales ni afectaciones a usuarios.

Las actividades técnicas avanzan conforme al cronograma establecido

CARRERA 13 # 94A - 25 OF 201 PBX: +57 601 716 7384
E-mail: direccion.consorciomye@gmail.com - Bogotá D.C. – Colombia.

5. RESUMEN EJECUTIVO AREA AMBIENTAL

Durante el periodo comprendido entre el 21 de febrero al 20 de marzo de 2026, se desarrollaron actividades de gestión, control y seguimiento ambiental, orientadas al adecuado manejo de residuos y a la implementación de medidas de protección ambiental en las estaciones de TransMilenio asignadas. Dichas acciones se ejecutaron conforme a los lineamientos establecidos, con el propósito de garantizar el desarrollo de las obras bajo criterios de sostenibilidad, seguridad y responsabilidad ambiental.

En relación con los residuos peligrosos (RESPEL), estos fueron clasificados, rotulados y almacenados temporalmente en condiciones seguras, de acuerdo con la normatividad ambiental vigente. Asimismo, se adelantaron las gestiones correspondientes con gestores debidamente autorizados, encontrándose a la espera de su recolección, lo cual garantiza la trazabilidad de la disposición final y el cumplimiento de los requisitos legales aplicables.

Durante la ejecución de las actividades de campo, se implementaron diversas medidas preventivas y de control, entre las que se destacan: la instalación de cubiertas de protección en pisos y estructuras durante los trabajos de pintura, con el fin de evitar el deterioro o contaminación de superficies; la colocación de barreras en sumideros durante las actividades de fundida de concreto, para prevenir el ingreso de sedimentos a la red de alcantarillado; y la verificación del cumplimiento de los parámetros relacionados con emisiones atmosféricas y niveles de ruido, asegurando que estos no generaran molestias ni afectaciones a la comunidad ni al entorno circundante.

Adicionalmente, se realizaron capacitaciones al personal, conforme al cronograma establecido en el Plan de Manejo Ambiental, con el objetivo de fortalecer el conocimiento, la prevención y la adecuada respuesta frente a los factores ambientales que puedan presentarse durante la ejecución del proyecto.

De manera complementaria, se efectuaron inspecciones periódicas a los kits de control de derrames, verificando su disponibilidad, correcto estado y ubicación en todos los frentes de trabajo. Durante el periodo evaluado no se presentaron incidentes que requirieran su utilización, lo cual evidencia la efectividad de las medidas preventivas implementadas para el manejo de sustancias peligrosas.

Del 20 al 21 de febrero de 2026 se realizaron trabajos de demolición de separadores en la estación de la calle 106 retirando los separadores y disponiendo en los sitios de disposición final correspondiente, para este periodo se realizó actividades de fundida de concreto en la misma estación mencionada conforme a la elaboración del MET 03 cerramiento tipo onda

Finalmente, se consolidó un registro fotográfico que documenta y respalda las actividades ejecutadas durante el periodo, constituyéndose como evidencia verificable del cumplimiento de las obligaciones ambientales en obra y de la adecuada implementación de las medidas establecidas.

CARRERA 13 # 94A - 25 OF 201 PBX: +57 601 716 7384
E-mail: direccion.consorciomye@gmail.com - Bogotá D.C. – Colombia.

6. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL GENERAL

La ejecución presupuestal que se presenta a continuación corresponde a las órdenes de trabajo finalizadas y debidamente recibidas por la interventoría, las cuales constituyen la base para el cálculo de los valores aquí reportados. La información consignada puede ser verificada en el acta de costos, documento en el que se registran y validan los montos asociados a cada una de las actividades ejecutadas.

Es importante señalar que se suscribió la adición de recursos al contrato por un valor de **SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($ 6,672,853,444.00)**, con lo cual el valor total del contrato asciende a **VEINTE MIL CUATROCIENTOS VEINTIDÓS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($ 20,422,853,444.00)**.

Tabla 13. *Ejecución presupuestal general del contrato*

CONCEPTO		VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR ADICION (Si aplica)	VALOR ACTUAL	ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		PENDIENTE POR EJECUTAR	
					%	VALOR EJECUTADO	%	VALOR PENDIENTE
VALOR PARA LAS OBRAS DE ADECUACIÓN		$ 11,059,277,729.00	$ 5,367,050,144.00	$ 16,426,327,873.00	50.99%	$ 8,376,036,582.00	49.01%	$ 8,050,291,291.00
VALOR DEL AIU PARA LAS OBRAS DE ADECUACION	24.33%	$ 2,690,722,271.00	$ 1,305,803,300.00	$ 3,996,525,571.00	51.60%	$ 2,062,146,081.00	48.40%	$ 1,934,379,490.00
VALOR TOTAL OBRAS DE ADECUACIÓN - INCLUIDO EL AIU:		$ 13,750,000,000.00	$ 6,672,853,444.00	$ 20,422,853,444.00	51.11%	$ 10,438,182,663.00	48.89%	$ 9,984,670,781.00

Como se observa en la tabla anterior, a la fecha y teniendo en cuenta la adición de recursos, se ha ejecutado el 51.11% del valor total del contrato, correspondiente a **$10,438,182,663**, quedando un saldo pendiente por ejecutar de **$9,984,670,781.00**, equivalente al 48.89% del valor contractual.

Tabla 14. *Ejecución Presupuestal por Troncal*

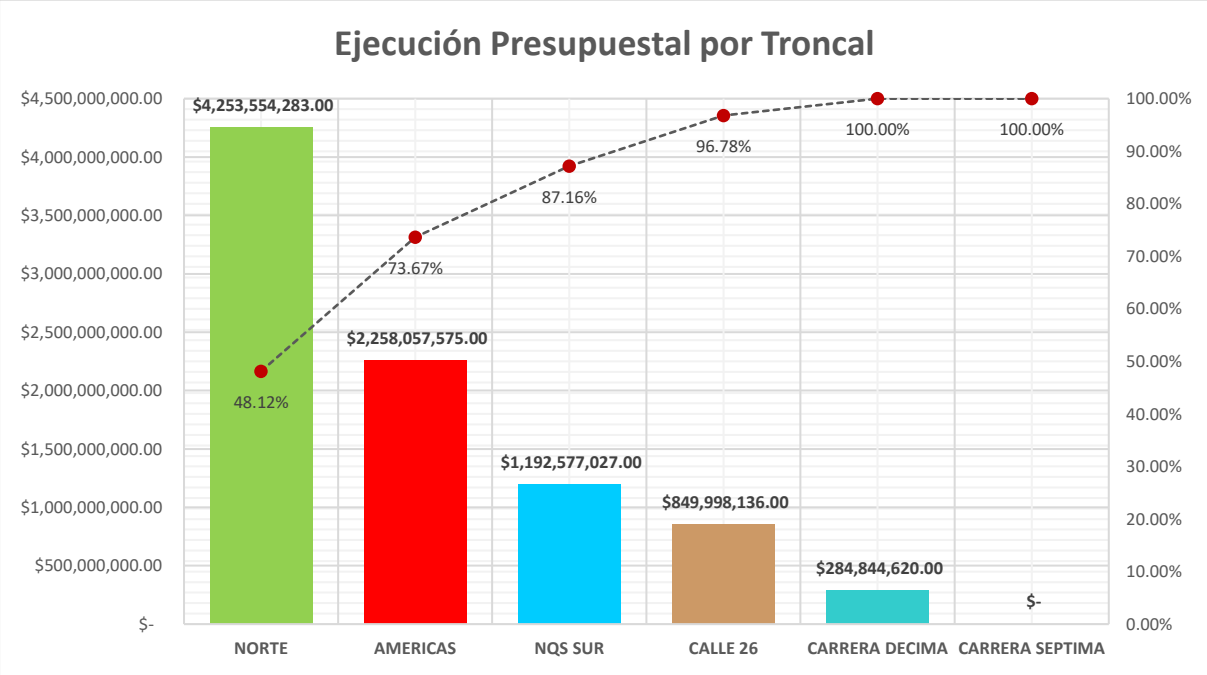
TRONCAL	VALOR EJECUTADO	%	% ACUMULADO
NORTE	$ 4,253,554,283.00	48.12%	48.12%
AMERICAS	$ 2,258,057,575.00	25.55%	73.67%
NQS SUR	$ 1,192,577,027.00	13.49%	87.16%
CALLE 26	$ 849,998,136.00	9.62%	96.78%
CARRERA DECIMA	$ 284,844,620.00	3.22%	100.00%
CARRERA SEPTIMA	$ -	0.00%	100.00%

De igual manera, se puede observar que, a la fecha de corte, la troncal con mayor inversión corresponde a la troncal NORTE, con una inversión de **$4,253,554,283.00**, equivalente al 48.12% del valor total ejecutado. En segundo lugar, se encuentra la troncal AMERICAS, con **$2,258,057,575.00** (25.55%), seguida de la troncal NQS SUR, con **$1,192,577,027.00** (13.49%). Posteriormente, la troncal CALLE 26 con **$849,998,136.00** (9.62%) y finalmente la troncal CARRERA DECIMA, con **$284,844,620.00** (3.22%). De esta manera, el valor total de la ejecución presupuestal asciende a **$8,839,031,641.00**.

CARRERA 13 # 94A - 25 OF 201 PBX: +57 601 716 7384
E-mail: direccion.consorciomye@gmail.com - Bogotá D.C. – Colombia.

Cabe destacar que, a la fecha, no se han adelantado actividades en las troncales CARRERA SÉPTIMA, toda vez que, no se han emitido órdenes de trabajo para dichos corredores.

Ilustración 6. *Ejecución Presupuestal por troncal*



7. VALIDACION DE INFORME CONSORCIO MYE BOGOTA

Este informe corresponde al Informe Ejecutivo correspondiente **al Periodo No. 08, entre el 21 de febrero al 20 de marzo de 2026,** como resumen del Informe Mensual presentado y que se encuentra en los documentos relacionados con el Contrato 1380 de 2025.

Adicionalmente todos los documentos relacionados con el informe Mensual del Contratista Consorcio MYE Bogotá, correspondiente al Periodo No. 08, entre el 21 de febrero al 20 de marzo de 2026, se encuentran alojados en la plataforma SECOP II, en los Documentos de Ejecución del contrato 1380 de 2025.

La Interventoría, con la suscripción del presente informe, certifica que el contratista cumplió con su obligación de acreditar los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

CARRERA 13 # 94A - 25 OF 201 PBX: +57 601 716 7384
E-mail: direccion.consorciomye@gmail.com - Bogotá D.C. – Colombia.
