ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL
CONTRATO DE OBRA No.192-2025
PROCESO MINIMA CUANTÍA No.MC-INV-050-2025

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE ARATOCA NIT: 890.205.334-5 R/L ALEXANDER GALVIS RAMIREZ C.C No.91.452.162 de Aratoca/Santander Alcalde Municipal
CONTRATISTA:	COOPRESSTA LTDA NIT: 804.013.432-7 R/L CARLOS CASTILLO RUEDA C.C No.91.069.841 de San Gil/Santander
SUPERVISOR:	ING. GERSON CABALLERO LIZARAZO SEC. DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
OBJETO	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE TANQUE EN CONCRETO REFORZADO PERTENECIENTE AL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA PTAP LA GUACAMAYA DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ARATOCA, SANTANDER
VALOR:	VEINTICINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS ($25.864.500,00) MCTE
FECHA DE INICIO:	19 DE DICIEMBRE DE 2025
PLAZO:	DIEZ (10) DIAS CALENDARIO
FECHA TERMINACIÓN INICIAL:	28 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN 001:	26 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE PRORROGA A LA SUSPENSION 001:	12 DE ENERO DE 2026
NUEVA FECHA DE REINICIO	20 DE ENERO DE 2026
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	21 DE ENERO DE 2026

En aratoca, a los 21 días del mes de enero de 2026, se reunieron **COOPRESSTA LTDA**, contratista de obra identificado con NIT 804.013.432-7 representada legalmente por **CARLOS CASTILLO RUEDA**, identificada con CC No.91.069.841 de San Gil/Santander y el supervisor del contrato designado y debidamente notificado ingeniero **GERSON CABALLERO LIZARAZO**, con el fin de suscribir la presente acta de entrega y recibo final.

A continuación, se presentan los siguientes,

CONSIDERANDO

1. Que el día 16 de diciembre de 2025, se suscribió el contrato de obra No.192-2025 entre **COOPRESSTA LTDA** identificado con NIT 804.013.432-7 y el Municipio de Aratoca.
2. Que el día 19 de diciembre de 2025, se suscribió acta de inicio entre las partes por un tiempo de diez (10) días calendario estableciendo como fecha de finalización el día 28 de diciembre de 2025.
3. Que el día 26 de diciembre de 2025, el Contrato de Obra No. 192-2025 fue suspendido de manera temporal, ordenándose la suspensión de la ejecución de las actividades contractuales, en atención a las circunstancias que impedían la normal continuidad del objeto contractual, con fecha de reinicio el día 12 de enero de 2026.
4. Que el día 12 de enero de 2026, se firma prorroga 001 a la suspensión 001 por el término de 8 días calendario debido a que los motivos que dieron lugar a la suspensión 001 no habían sido superados.
5. Que el día 20 de enero de 2026 se suscribió acta de reinicio de actividades y acta de modificación de cantidades 001 con el fin de realizar balance financiero al contrato.
6. Que el Contrato de Obra No.192-2025 cuyo objeto es **"CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE TANQUE EN CONCRETO REFORZADO PERTENECIENTE AL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA PTAP LA GUACAMAYA DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ARATOCA, SANTANDER"** fue ejecutado y recibido a satisfacción en un 100% de sus actividades.
7. Que el Contrato de Obra No.192-2025 finalizó la ejecución a los 21 días del mes de enero de 2026.
8. Las actividades ejecutadas fueron las siguientes:

No.	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
		1.RED DE CONDUCCIÓN		
1,01	1,01	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	M3	24,15
1,02	1,02	INSTALACION DE TUBERÍA PVC RDE 21 D=2"	M	396,50
1,03	1,03	RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN	M3	24,15
		SUBTOTAL		
		2. RED DE DISTRIBUCION		
2,01	2,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA PVC RDE 21 D=1"	M	155,10
2,02	2,02	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	M3	12,27
2,03	2,03	RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN	M3	12,27
		SUBTOTAL		
		3. TANQUE DE ALMACENANIMIENTO		
3,01	3,01	PINTURA PARA EXTERIORES (2 MANOS)	M2	180,08

9. Que el balance financiero del contrato es el siguiente:

VALOR CONTRATO	**$ 25.864.500,00**	
VALOR CONTRATO ADICIONAL	**$ 0,00**	
VALOR A COBRAR		**$ 23.892.910,00**
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO		**$ 1.971.590,00**
SUMAS IGUALES	**$ 25.864.500,00**	**$ 25.864.500,00**

10. Que el municipio recibe a satisfacción las actividades del objeto contractual, sin que ello exima al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato.

ACUERDAN

1. Suscribir la presente Acta de Entrega y Recibo Final del Contrato de Obra No. 192-2025, cuyo objeto es "**CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE TANQUE EN CONCRETO REFORZADO PERTENECIENTE AL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA PTAP LA GUACAMAYA DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ARATOCA, SANTANDER**", de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa del presente documento.
2. Que el Municipio de Aratoca, ha verificado el estado y las especificaciones técnicas solicitadas en el Contrato de Obra No. 192-2025. Observando que cumple con lo estipulado en el contrato.
3. Estando conforme a lo especificado en el Contrato de Obra No.192-2025, se recibe a satisfacción del ingeniero **GERSON CABALLERO LIZARAZO** como supervisor designado en representación del Municipio, al contratista **COOPRESSTA LTDA** identificado con NIT. 804.013.432-7, representado legalmente por **CARLOS CASTILLO RUEDA** identificado con cédula de ciudadanía No.91.069.841 de San Gil/Santander, se firma la presente Acta de Entrega y Recibo Final de dicho contrato.

En constancia se firma por los que en ella intervinieron,

ING.GERSON CABALLERO LIZARAZO
SEC. PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR

COOPRESSTA LTDA
R/L CARLOS CASTILLO RUEDA
CONTRATISTA DE OBRA

ACTA DE RECIBO FINAL

CONTRATO N°	192-2025
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN PARA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TANQUE EN CONCRETO REFORZADO PERTENECIENTE AL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA PTAP LA GUACAMAYA DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ARATOCA SANTANDER
CONTRATISTA:	COOPRESSTA LTDA
NIT:	804.013.342-7
SUPERVISOR DE	ING. GERSON CABALLERO LIZARAZO
VALOR INICIAL:	$ 25.864.500,00
VALOR OTRO SI	$ 0,00

Alcaldía de ARATOCA
NIT 890205334-5

FECHA DE INICIO:	viernes, 19 de diciembre de 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO:	viernes, 26 de diciembre de 2025
FECHA PORROGA A LA SUSPENSIÓN	lunes, 12 de enero de 2026
FECHA REINICIO	martes, 20 de enero de 2026
FECHA DE TERMINACIÓN REAL:	miércoles, 21 de enero de 2026
VALOR TOTAL	$ 23.892.910,00
FECHA:	miércoles, 21 de enero de 2026

N°	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND.	CONDICIONES INICIALES			MAYORES Y MENORES		CANTIDADES EJECUTADAS	
		GENERAL	PARTICULAR			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD (-+)	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1RED DE CONDUCCIÓN												
1,01	1,01	Ver Especificación	Ver Especificación	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	M3	45	$ 101.500,00	$ 4.567.500,00	-20,85	-$ 2.116.275,00	24,15	$ 2.451.225,00
1,02	1,02	Ver Especificación	Ver Especificación	INSTALACION DE TUBERÍA PVC RDE 21 D=2"	M	600	$ 5.000,00	$ 3.000.000,00	-203,50	-$ 1.017.500,00	396,50	$ 1.982.500,00
1,03	1,03	Ver Especificación	Ver Especificación	RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN	M3	45	$ 74.500,00	$ 3.352.500,00	-20,85	-$ 1.553.325,00	24,15	$ 1.799.175,00
							SUBTOTAL	$ 10.920.000,00		-$ 4.687.100,00		$ 6.232.900,00
2. RED DE DISTRIBUCION												
2,01	2,01	Ver Especificación	Ver Especificación	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA PVC RDE 21 D=1"	M	210	$ 35.500,00	$ 7.455.000,00	-54,9	-$ 1.948.950,00	155,10	$ 5.506.050,00
2,02	2,02	Ver Especificación	Ver Especificación	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	M3	15,75	$ 101.500,00	$ 1.598.625,00	-3,48	-$ 353.220,00	12,27	$ 1.245.405,00
2,03	2,03	Ver Especificación	Ver Especificación	RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN	M3	15,75	$ 74.500,00	$ 1.173.375,00	-3,48	-$ 259.260,00	12,27	$ 914.115,00
							SUBTOTAL	$ 10.227.000,00		-$ 2.561.430,00		$ 7.665.570,00
3. TANQUE DE ALMACENANIMIENTO												
3,01	3,01	Ver Especificación	Ver Especificación	PINTURA PARA EXTERIORES (2 MANOS)	M2	85	$ 55.500,00	$ 4.717.500,00	95,08	$ 5.276.940,00	180,08	$ 9.994.440,00
							SUBTOTAL	$ 4.717.500,00		$ 5.276.940,00		$ 9.994.440,00
							SUBTOTAL OBRAS	$ 25.864.500,00				$ 23.892.910,00
								MAYORES Y MENORES		-$ 1.971.590,00		
							SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE AIU)	$ 25.864.500,00				$ 23.892.910,00

ING. GERSON CABALLERO LIZARAZO
SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRASTRUCTURA
SUPERVISOR

CARLOS CASTILLO RUEDA
R/L COOPRESSTA LTDA
CONTRATISTA

Fecha de Aprobación: 01/01/2024	Versión: 02	Código MC-EJ-SY-01

MEMORIA DE CALCULO

República de Colombia
Departamento de Santander
Municipio de Aratoca
Nit 890205334-5
DANE 68051

OBJETO	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN PARA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TANQUE EN CONCRETO REFORZADO PERTENECIENTE AL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA PTAP LA GUACAMAYA DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ARATOCA SANTANDER				
ITEM	1,01	UNIDAD	m3	FECHA:	miércoles, 21 de enero de 2026
DESCRIPCION	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	MEDIDAS PROMEDIO			



LOCALIZACIÓN	l (m)	a(m)	h (m)	A (m2)	E (m)	V (m3)	Ø (")	Cant	Elemento	l (m)	area de puertas	TOTAL
RED DE CONDUCCION	40,50	0,30	0,30			3,65						3,65
RED DE CONDUCCION	50,80	0,30	0,30			4,57						4,572
RED DE CONDUCCION	127,00	0,30	0,30			11,43						11,43
RED DE CONDUCCION	27,00	0,30	0,30			2,43						2,43
RED DE CONDUCCION	23,00	0,30	0,30			2,07						2,07
											TOTAL	24,15

Nota:

VALOR UNITARIO	$ 101.500,00	CANTIDAD EJECUTADA	24,15
MAYOR CANTIDAD	-	CONDICIONES ORIGINALES	45,00
MENOR CANTIDAD	20,85	VALOR CANTIDAD EJECUTADA	$2.451.225,00

ING. GERSON CABALLERO LIZARAZO
SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRASTRUCTURA
SUPERVISOR

CARLOS CASTILLO RUEDA
R/L COOPRESSTA LTDA
CONTRATISTA

Fecha de Aprobación: 01/01/2024	Versión: 02	Código MC-EJ-SY-01

MEMORIA DE CALCULO

República de Colombia
Departamento de Santander
Municipio de Aratoca
Nit. 890205334-5
DANE 68051

OBJETO	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN PARA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TANQUE EN CONCRETO REFORZADO PERTENECIENTE AL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA PTAP LA GUACAMAYA DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ARATOCA SANTANDER				
ITEM	1,02	UNIDAD	M	FECHA:	miércoles, 21 de enero de 2026
DESCRIPCION	INSTALACION DE TUBERÍA PVC RDE 21 D=2"	MEDIDAS MEDIDAS PROMEDIO			



LOCALIZACIÓN	l (m)	a(m)	h (m)	A (m2)	E (m)	V (m3)	Ø (")	Cant	Elemento	l (m)	W unitario (kg/m)	TOTAL
RED DE CONDUCCION AREA	128,20											128,20
RED DE CONDUCCION ENTERRADA	268,30											268,3
											TOTAL	396,50

Nota:

VALOR UNITARIO	$ 5.000,00	CANTIDAD EJECUTADA	396,50
MAYOR CANTIDAD	-	CONDICIONES ORIGINALES	600,00
MENOR CANTIDAD	203,50	VALOR CANTIDAD EJECUTADA	$1.982.500,00

ING. GERSON CABALLERO LIZARAZO
SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRASTRUCTURA
SUPERVISOR


CARLOS CASTILLO RUEDA
R/L COOPRESSTA LTDA
CONTRATISTA

Fecha de Aprobación: 01/01/2024	Versión: 02	Código MC-EJ-SY-01

MEMORIA DE CALCULO

República de Colombia
Departamento de Santander
Municipio de Aratoca
Nit. 890205334-5
DANE 68051

OBJETO	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN PARA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TANQUE EN CONCRETO REFORZADO PERTENECIENTE AL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA PTAP LA GUACAMAYA DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ARATOCA SANTANDER				
ITEM	1,03	UNIDAD	M3	FECHA:	miércoles, 21 de enero de 2026
DESCRIPCION	RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN	MEDIDAS MEDIDAS PROMEDIO			

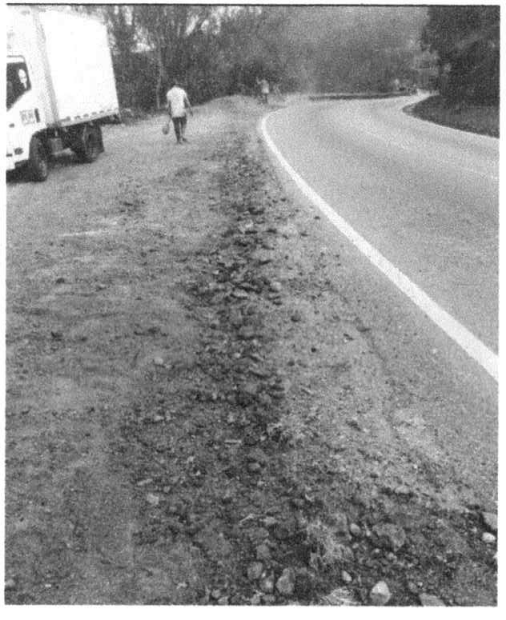

LOCALIZACIÓN	l (m)	a(m)	h (m)	A (m2)	E (m)	V (m3)	Ø (")	Cant	Elemento	l (m)	W unitario (kg/m)	TOTAL
RED DE CONDUCCION	40,50	0,30	0,30			3,65						3,65
RED DE CONDUCCION	50,80	0,30	0,3			4,57						4,57
RED DE CONDUCCION	127,00	0,30	0,3			11,43						11,43
RED DE CONDUCCION	27,00	0,30	0,3			2,43						2,43
RED DE CONDUCCION	23,00	0,30	0,3			2,07						2,07
											TOTAL	24,15

Nota:

VALOR UNITARIO	$ 74.500,00	CANTIDAD EJECUTADA	24,15
MAYOR CANTIDAD	-	CONDICIONES ORIGINALES	45,00
MENOR CANTIDAD	20,85	VALOR CANTIDAD EJECUTADA	$1.799.175,00

ING. GERSON CABALLERO LIZARAZO
SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRASTRUCTURA
SUPERVISOR

CARLOS CASTILLO RUEDA
R/L COOPRESSTA LTDA
CONTRATISTA

Fecha de Aprobación: 01/01/2024	Versión: 02	Código MC-EJ-SY-01

MEMORIA DE CALCULO

República de Colombia
Departamento de Santander
Municipio de Aratoca
Nit. 890205334-5
DANE 68051

OBJETO	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN PARA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TANQUE EN CONCRETO REFORZADO PERTENECIENTE AL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA PTAP LA GUACAMAYA DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ARATOCA SANTANDER
ITEM	2,01
UNIDAD	M
FECHA:	miércoles, 21 de enero de 2026
DESCRIPCION	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA PVC RDE 21 D=1"
	MEDIDAS MEDIDAS PROMEDIO



LOCALIZACIÓN	l (m)	a(m)	h (m)	A (m2)	E (m)	V (m3)	Ø (")	Cant	Elemento	l (m)	W unitario (kg/m)	TOTAL
RED DISTRIBUCION ENTERRADA	136,30											136,3
RED DISTRIBUCION AEREA	18,80											18,80
											TOTAL	155,10

Nota:

VALOR UNITARIO	$ 35.500,00	CANTIDAD EJECUTADA	155,10
MAYOR CANTIDAD	-	CONDICIONES ORIGINALES	210,00
MENOR CANTIDAD	54,90	VALOR CANTIDAD EJECUTADA	$5.506.050,00

ING. GERSON CABALLERO LIZARAZO
SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRASTRUCTURA
SUPERVISOR

CARLOS CASTILLO RUEDA
R/L COOPRESSTA LTDA
CONTRATISTA

Fecha de Aprobación: 01/01/2024	Versión: 02	Código MC-EJ-SY-01

MEMORIA DE CALCULO

República de Colombia
Departamento de Santander
Municipio de Aratoca
Nit. 890205334-5
DANE: 68051

OBJETO	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN PARA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TANQUE EN CONCRETO REFORZADO PERTENECIENTE AL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA PTAP LA GUACAMAYA DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ARATOCA SANTANDER				
ITEM	2,02	UNIDAD	M3	FECHA:	miércoles, 21 de enero de 2026
DESCRIPCION	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	MEDIDAS MEDIDAS PROMEDIO			



LOCALIZACIÓN	l (m)	a(m)	h (m)	A (m2)	E (m)	V (m3)	Ø (")	Cant	Elemento	l (m)	W unitario (kg/m)	TOTAL
RED DISTRIBUCION ENTERRADA	136,30	0,30	0,30			12,27						12,27
											TOTAL	12,27

Nota:

VALOR UNITARIO	$ 101.500,00	CANTIDAD EJECUTADA	12,27
MAYOR CANTIDAD	-	CONDICIONES ORIGINALES	15,75
MENOR CANTIDAD	3,48	VALOR CANTIDAD EJECUTADA	$1.245.405,00

ING. GERSON CABALLERO LIZARAZO
SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRASTRUCTURA
SUPERVISOR


CARLOS CASTILLO RUEDA
R/L COOPRESSTA LTDA
CONTRATISTA

Fecha de Aprobación: 01/01/2024	Versión: 02	Código MC-EJ-SY-01

MEMORIA DE CALCULO

República de Colombia
Departamento de Santander
Municipio de Aratoca
Nit. 890205334-5
DANE 68051

OBJETO	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN PARA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TANQUE EN CONCRETO REFORZADO PERTENECIENTE AL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA PTAP LA GUACAMAYA DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ARATOCA SANTANDER
ITEM	2,03
UNIDAD	M3
FECHA:	miércoles, 21 de enero de 2026
DESCRIPCION	RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN

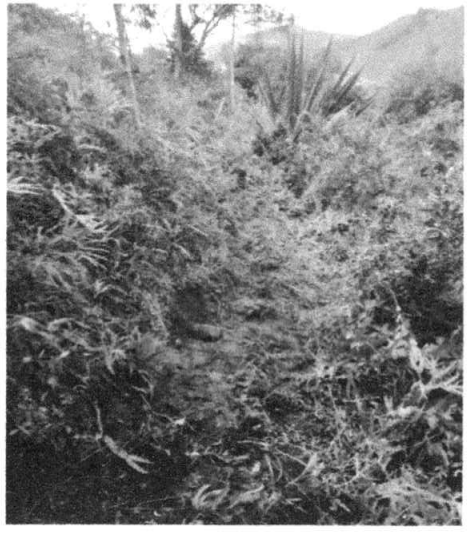

MEDIDAS MEDIDAS PROMEDIO

LOCALIZACIÓN	l (m)	a(m)	h (m)	A (m2)	E (m)	V (m3)	Ø (")	Cant	Elemento	l (m)	W unitario (kg/m)	TOTAL
RED DISTRIBUCION ENTERRADA	136,30	0,30	0,30			12,27						12,27
											TOTAL	12,27

Nota:

VALOR UNITARIO	$ 74.500,00	CANTIDAD EJECUTADA	12,27
MAYOR CANTIDAD	-	CONDICIONES ORIGINALES	15,75
MENOR CANTIDAD	3,48	VALOR CANTIDAD EJECUTADA	$914.115,00

ING. GERSON CABALLERO LIZARAZO
SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRASTRUCTURA
SUPERVISOR

CARLOS CASTILLO RUEDA
R/L COOPRESSTA LTDA
CONTRATISTA


Fecha de Aprobación: 01/01/2024	Versión: 02	Código MC-EJ-SY-01

MEMORIA DE CALCULO

República de Colombia
Departamento de Santander
Municipio de Aratoca
Nit. 890205334-5
DANE: 68051

OBJETO	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN PARA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TANQUE EN CONCRETO REFORZADO PERTENECIENTE AL SISTEMA DE
ITEM	3,01
DESCRIPCION	PINTURA PARA EXTERIORES (2 MANOS)

UNIDAD: M2 — FECHA: miércoles, 21 de enero de 2026

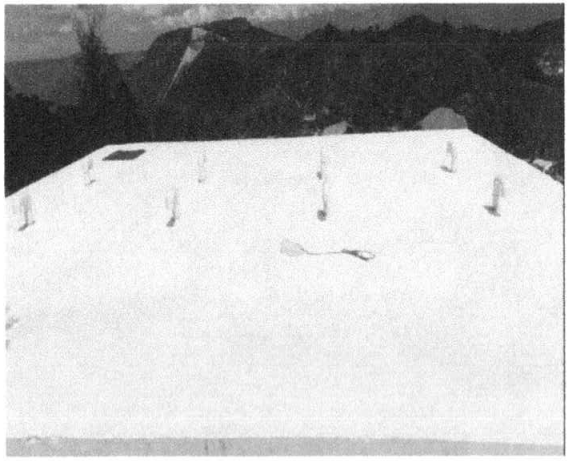

MEDIDAS MEDIDAS PROMEDIO

LOCALIZACIÓN	l (m)	a(m)	h (m)	A (m2)	E (m)	V (m3)	Ø (")	Cant	Elemento	l (m)	W unitario (kg/m)	TOTAL
TANQUE	9,50	8,60		81,70								81,70
TANQUE		8,60	4,00	34,40								34,40
TANQUE	9,50		4,00	38,00								38,00
TANQUE		8,60	4,00	34,40								34,40
											TOTAL	188,50

VALOR UNITARIO	$ 55.500,00	CANTIDAD EJECUTADA	188,50
MAYOR CANTIDAD	103,50	CONDICIONES ORIGINALES	85,00
MENOR CANTIDAD	-	VALOR CANTIDAD EJECUTADA	$10.461.750,00

ING. GERSON CABALLERO LIZARAZO
SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRASTRUCTURA
SUPERVISOR

CARLOS CASTILLO RUEDA
R/L COOPRESSTA LTDA
CONTRATISTA
