Municipio de Villamaría
Secretaría de INFRAESTRUCTURA Y VÍAS

ACTA DE SUPERVISIÓN No. 02

OCTUBRE DE 2024

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO		
Tipo de contrato: CTO DE OBRA 650-2024 MC-003-2024	Adición:	**Dinero:** / **Tiempo:**
Contratista: TRANSPOR SAS	**C.C./NIT:** 901.600.221-4	
OBJETO: "MEJORAMIENTO DE VÍAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACAS HUELLAS EN LA VEREDA NUEVA PRIMAVERA DEL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA"	**VIGENCIA:** **Desde: 01 de agosto de 2024** **Hasta: 30 de septiembre de 2024**	

VALOR: El valor del presente contrato es la suma de **NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS ($99.740.135) M/CTE** incluido el IVA y todos los tributos que se generen con ocasión a la celebración, ejecución y liquidación del Contrato, los cuales serán a cargo del contratista.

FORMA DE PAGO: El Municipio de Villamaría Caldas, pagará al contratista de la siguiente manera:

Cuotas parciales hasta completar el 100% del valor del contrato, los cuales se cancelarán a la previa presentación de la factura y/o cuenta de cobro, en las condiciones pactadas en el respectivo contrato. Adicionalmente, el contratista, debe de acreditar cada vez que solicite el pago, que se encuentra al día con los pagos al Sistema Integral de Seguridad Social y aportes parafiscales. Este último en caso de que aplique.

El contratista deberá acreditar encontrarse al día en los pagos a la seguridad social integral, conforme lo exige la Ley, por la naturaleza jurídica el contratista presenta el certificado de cumplimiento en consideración al artículo 50 ley 789 de 2002 y ley 828 de 2003.

RUBRO: 16-2.3.2.02.02.005	CDP: 339	RP: 1458
Valor a pagar según acta: $ 9.950.282	**Valor desembolsos efectuados:$ 89.766.766**	

INFORMACIÓN PARA REPORTAR

JORGE ELIÉCER BUITRAGO URIBE, Secretario de infraestructura y Vías del Municipio de Villamaría, actuando en calidad de supervisor he constatado el cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones contenidas en el contrato suscrito entre el precitado contratista y el Municipio de Villamaría, para lo cual el contratista realizó las siguientes actividades durante el periodo comprendido durante los meses de Julio y agosto de 2024, actividades que han sido verificadas y supervisadas, las cuales fueron:

Scanned with CamScanner

VALOR CONTRATO INICIAL

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	VALOR UNIT.	CANT.	VALOR PARCIAL
1 - PRELIMINARES					
1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO DE VIAS incluye eje de via y laterales con ande	ml	5.894,2	60	$ 353.652
1.2	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO	m3	196.709,0	0	
1.3	EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS - MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0 M	m3	51.666,4	5,29	$ 273.315
1.4	EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS - CONGLOMERADO - 0.0 A 2.0 M	m3	67.375,8	29,52	$ 1.988.934
1.5	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE MANUAL	m3	51.050,3	32,9	$ 1.679.555
1.6	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION	m3	44.103,3	7,93	$ 349.739
2 - AFIRMADOS Y GRANULARES					
2.1	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE AFIRMADO COMPACTADO	M3	345.278,2	17,63	$ 6.087.255
2.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUB BASE COMPACTADA CON R	M3	363.859,8	26,45	$ 9.624.092
3 - ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACERO DE REFUERZO					
3.1	CONCRETO CLASE D: CONCRETO DE 3000 PSI PARA PLACA HUELLA - INCLU	M3	1.477.229,0	11,61	$ 17.150.629
3.2	CONCRETO CLASE D: CONCRETO DE 3000 PSI PARA VIGA ENLACE -INCLUY	M3	1.556.023,6	3,33	$ 5.181.559
3.3	CONCRETO CLASE D: CONCRETO DE 3000 PSI PARA CUNETA - INCLUYE FO	M3	1.409.546,2	6,45	$ 9.091.573
3.4	CONCRETO CLASE D: CONCRETO DE 3000 PSI PARA SARDINEL - INCLUYE F	M3	1.495.012,6	8,94	$ 13.365.413
3.5	CONCRETO CLASE G: 60% CONCRETO CLASE D Y 40% PIEDRA - INCLUYE F	M3	1.225.947,5	5,81	$ 7.122.755
3.6	SUMINISTRO, FIGURADO Y AMARRE DE ACERO DE REFUERZO Fy=60.000 PS	KG	12.818,0	1579,25	$ 20.242.827
3.7	CORTE MECANIZADO DE PAVIMENTO 0.07 M	ML	13.752,3	215,4	$ 2.962.245
3.8	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SELLO DE JUNTA DE PAVIMENT	ML	19.993,4	213,4	$ 4.266.592
			VALOR TOTAL INCLUIDO AIU		$ 99.740.135

EJECUCION DE OBRA ACTA 2

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	VALOR UNIT.	CANT.	VALOR PARCIAL
1 - PRELIMINARES					
1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO DE VIAS incluye eje de via y laterales con ander	ml	5.894,2		$ -
1.2	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO	m3	196.709,0		
1.3	EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS - MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0 M	m3	51.666,4		$ -
1.4	EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS - CONGLOMERADO - 0.0 A 2.0 M	m3	67.375,8		$ -
1.5	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE MANUAL	m3	51.050,3		$ -
1.6	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACI	m3	44.103,3		$ -
2 - AFIRMADOS Y GRANULARES					
2.1	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE AFIRMADO COMPACTADO	M3	345.278,2		$ -
2.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUB BASE COMPACTADA CO	M3	363.859,8	2,36	$ 858.709,00
3 - ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACERO DE REFUERZO					
3.1	CONCRETO CLASE D: CONCRETO DE 3000 PSI PARA PLACA HUELLA - INCL	M3	1.477.229,0		$ -
3.2	CONCRETO CLASE D: CONCRETO DE 3000 PSI PARA VIGA ENLACE -INCLU	M3	1.556.023,6		$ -
3.3	CONCRETO CLASE D: CONCRETO DE 3000 PSI PARA CUNETA - INCLUYE FO	M3	1.409.546,2	6,45	$ 9.091.573,00
3.4	CONCRETO CLASE D: CONCRETO DE 3000 PSI PARA SARDINEL - INCLUYE	M3	1.495.012,6		$ -
3.5	CONCRETO CLASE G: 60% CONCRETO CLASE D Y 40% PIEDRA - INCLUYE F	M3	1.225.947,5		$ -
3.6	SUMINISTRO, FIGURADO Y AMARRE DE ACERO DE REFUERZO Fy=60.000 F	KG	12.818,0		$ -
3.7	CORTE MECANIZADO DE PAVIMENTO 0.07 M	ML	13.752,3		$ -
3.8	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SELLO DE JUNTA DE PAVIME	ML	19.993,4		$ -
			VALOR TOTAL INCLUIDO AIU		$ 9.950.282,00

Scanned with CamScanner

RESUMEN FINAL DEL CONTRATO

CONTROL FÍSICO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO				ACUMULADO CONTRACTUAL		% EJECUCION
ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND	VALOR UNIT.	CANT.	VALOR PARCIAL	
1 - PRELIMINARES						
1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE VIAS incluye eje de vía y laterales con andenes	ml	5.894,2	55,00	$ 324.181,00	91,67%
1.2	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO	m3	196.709,0	0,00	$ -	0,00%
1.3	EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS - MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0 M	m3	51.666,4	8,23	$ 425.214,00	155,58%
1.4	EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS - CONGLOMERADO - 0.0 A 2.0 M	m3	67.375,8	24,68	$ 1.662.835,00	83,60%
1.5	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE MANUAL	m3	51.050,3	25,00	$ 1.276.258,00	75,99%
1.6	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION	m3	44.103,3	8,00	$ 352.826,00	100,88%
2 - AFIRMADOS Y GRANULARES						
2.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE AFIRMADO COMPACTADO	M3	345.278,2	20,87	$ 7.205.956,00	118,38%
2.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUB BASE COMPACTADA CON RANA	M3	363.859,8	28,45	$ 10.351.811,00	107,56%
3 - ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACERO DE REFUERZO						
3.1	CONCRETO CLASE D. CONCRETO DE 3000 PSI PARA PLACA HUELLA - INCLUYE FORMALETA. NO INCLUYE REFUERZO	M3	1.477.229,0	11,61	$ 17.150.629,00	100,00%
3.2	CONCRETO CLASE D. CONCRETO DE 3000 PSI PARA VIGA ENLACE -INCLUYE FORMALETA. NO INCLUYE REFUERZO	M3	1.556.023,6	3,33	$ 5.181.559,00	100,00%
3.3	CONCRETO CLASE D. CONCRETO DE 3000 PSI PARA CUNETA - INCLUYE FORMALETA. NO INCLUYE REFUERZO	M3	1.409.546,2	6,45	$ 9.091.573,00	100,00%
3.4	CONCRETO CLASE D. CONCRETO DE 3000 PSI PARA SARDINEL - INCLUYE FORMALETA. NO INCLUYE REFUERZO	M3	1.495.612,6	8,99	$ 13.440.163,00	100,56%
3.5	CONCRETO CLASE G. 60% CONCRETO CLASE D Y 40% PIEDRA - INCLUYE FORMALETA	M3	1.225.947,5	5,81	$ 7.122.755,00	100,00%
3.6	SUMINISTRO, FIGURADO Y AMARRE DE ACERO DE REFUERZO Fy=60.000 PSI	KG	12.818,0	2038,64	$ 26.131.288,00	129,09%
3.7	CORTE MECANIZADO DE PAVIMENTO 0.07 M	ML	13.752,3	0,00	$ -	0,00%
3.8	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SELLO DE JUNTA DE PAVIMENTO RIGIDO 0.01 m	ML	19.991,4	0,00	$ -	0,00%
			VALOR TOTAL INCLUIDO AIU		$ 99.717.048,00	99,98%

Página 1

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

TABLA OBTENIDA SEGÚN BITÁCORA DE OBRA, INFORME EJECUTIVO Y VISITA DE OBRA.

Fecha	Descripción Actividades.
 Del 26 al 30 de Agosto de 2024	1. Vaciado de cuneta

Scanned with CamScanner



2. Demolición de roca para ampliar la vía y permitir una cuneta continua

Del 26 al 30 de Agosto de 2024



3. Vaciado de enrocado central.


Del 26 al 30 de Agosto de 2024

Scanned with CamScanner



Del 26 del 30 de Agosto de 2024


4. Formaleta para sadinel.

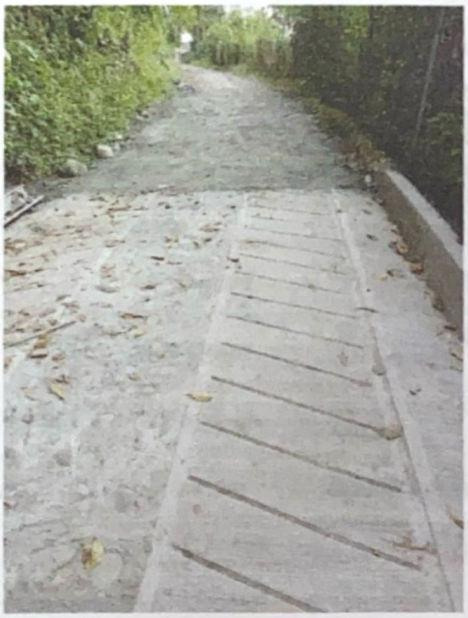

Del 2 al 6 de septiembre de 2024

5. Vía terminada y empalmada a la ruta existente

Scanned with CamScanner

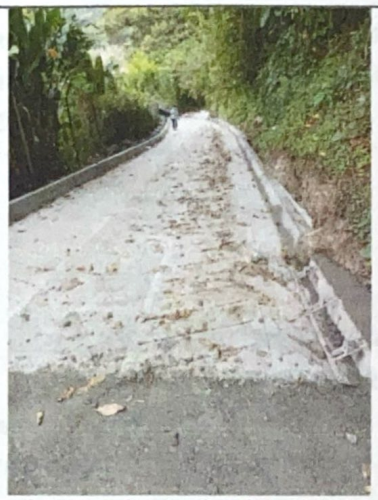

Del 2 al 6 de septiembre de 2024

Como se puede evidenciar en la actividades anteriormente descritas se ha realizado un control del personal y documental. Dicha informacion se ha revisado con los registros físicos de la entidad, lo que me da certeza en certificar que el contratista ha cumplido con las obligaciones contempladas en el objeto tipificado en el contrato en mención.

De igual manera el contratista ha efectuado los aportes y pagos correspondientes a Salud, Pensión y Riesgos laborales de JULIO- AGOSTO en el porcentaje establecido por el Gobierno Nacional.

RESUMEN DE PAGOS

CONTROL FINANCIERO				
RESUMEN DEL CONTRATO		**RESUMEN DEL ANTICIPO**		
VALOR DEL CONTRATO	$ 99.740.135,00	VALOR ANTICIPO	0%	$ 0,00
VALOR ACTAS ANTERIORES	$ 89.766.766,00	AMORTIZACIÓN ACTAS ANTERIORES	40%	$ 0,00
VALOR PRESENTE ACTA	$ 9.950.282.00	AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA	40%	$ 0,00
SALDO POR EJECUTAR	$ 23.087.00	SALDO POR AMORTIZAR	0,00%	$ 0,00
VALOR ADICIONES	$ 0,00			

VALOR PRESENTE ACTA	$ 9.950.282.oo
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	$ 0.00
VALOR A PAGAR	$ 9.950.282.00

Scanned with CamScanner

En virtud de lo anterior, emito el presente visto bueno para que se proceda a efectuar el pago del valor adeudado al contratista según la presente acta, que corresponde al pago Parcial No. **dos** (2) del **CONTRATO N.º 650-2024.**
FIRMA: **JORGE ELIECER BUITRAGO URIBE** **SUPERVISOR** **OBSERVACIONES:** Hace parte integral de la presente acta de supervisión los soportes allegados por el contratista estos son: Informe ejecución con sus respectivos anexos, certificado afiliación personal, registro fotográfico.

Scanned with CamScanner
