

DIAGRAMA DE GANTT
SAMC-019-2025
MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO JOSE DE CALDAS DEL MUNICIPIO DE CALDAS - BOYACA

Id	Item	Item Gobar.	Nombre de la actividad	UNID	CANTIDAD	Duración	Comienzo temprano	Fin temprano	Comienzo tardío	Final tardío	Holgura	Sucesoras	Predecesoras
0			**CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES**			**40 días**					**0 días**		
1			Emisión acta de inicio			0 días					0 días	3;19	
2			**COLEGIO**			**40 días**	**día 0**	**día 40**	**día 0**	**día 40**	**0 días**		
3	1	2,01,36	DEMOLICIÓN DE PLACA DE PISO EN CONCRETO DE E = 10 CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M2	12,80	1 día	día 0	día 1	día 0	día 1	0 días	6	1
4	2	3,08,23	CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 17,5 MPa - (2500 PSI)	M2	40,00	5 días	día 16	día 21	día 19	día 24	3 días	22	5
5	3	3,03,15	RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O VIBROCOMPACTADOR. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M3	10,00	1 día	día 15	día 16	día 18	día 19	3 días	4	14
6	4	2,01,32	DEMOLICIÓN DE PAÑETES. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M2	140,00	2 días	día 1	día 3	día 1	día 3	0 días	7	3
7	5	1,08,12	PAÑETE LISO MUROS 1:4	M2	250,00	8 días	día 3	día 11	día 3	día 11	0 días	10	6
8	6	2,07,14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE O ESTUCO A TRES MANOS.	M2	800,00	7 días	día 18	día 25	día 18	día 25	0 días	11	9
9	7	2,07,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO MUROS	M2	150,00	3 días	día 15	día 18	día 15	día 18	0 días	8	10
10	8	1,03,01	FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES	ML	150,00	4 días	día 11	día 15	día 11	día 15	0 días	9	7
11	9	2,07,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE LÁMINA LINEAL 3 MANOS	ML	150,00	3 días	día 25	día 28	día 25	día 28	0 días	12	8
12	10	2,07,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE LÁMINA LLENA 3 MANOS	M2	100,00	4 días	día 28	día 32	día 28	día 32	0 días	15	11
13	11	1.06.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 20 D=0.75 CON PINTURA Y ANTICORROSIVO	ML	20,00	3 días	día 10	día 13	día 13	día 16	3 días	14	18
14	12	2,08,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE PVC DE AGUAS LLUVIA. (REF. RAINGO O SIMILAR)	ML	16,00	2 días	día 13	día 15	día 16	día 18	3 días	5	13
15	13	2,10,138	SUMINISTROE INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA INTERRUPTOR SENCILLO EN CALIBRE 12 AWG Y DUCTO PVC 1/2" (INCLUYEAPARATO)	UND	2,00	1 día	día 32	día 33	día 32	día 33	0 días	20	12
16	14	2,10,180	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED REDONDO DE SOBREPONER DE 24 W	UND	12,00	1 día	día 39	día 40	día 39	día 40	0 días	25	20;17
17	15	2,18,18	DEMARCACION CON PINTURA PARA CANCHAS BASE ACRÍLICA. (INCLUYE LAVADO DE SUPERFICIE CON ÁCIDO).	ML	500,00	7 días	día 29	día 36	día 32	día 39	3 días	16	23
18	16	2,08,37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEJA TERMOACUSTICA TIPO TRAPEZOIDAL	M2	150,00	6 días	día 4	día 10	día 7	día 13	3 días	13	19
19	17	2,08,33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERIA METALICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA DE EDIFICACIONES .DIMENSIONES Y CALIBRES SEGÚN DISEÑO	KG	850,00	4 días	día 0	día 4	día 3	día 7	3 días	18	1
20	18	2.09.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC DE 7 MM	M2	120,00	6 días	día 33	día 39	día 33	día 39	0 días	16	15
21	19	2.02.35	SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 420 MPa (60000 PSI)	KG	200,00	2 días	día 23	día 25	día 26	día 28	3 días	24	22
22	20	3.08.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BORDILLO PREFABRICADO A-80 35*20*80	ML	20,00	2 días	día 21	día 23	día 24	día 26	3 días	21	4
23	21	3.08.10	CONSTRUCCION DE ANDENES EN CONCRETO DE 17.5 MPa - (2500 PSI)	M3	4,00	3 días	día 26	día 29	día 29	día 32	3 días	17	24
24	22	2.03.35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA	KG	200,00	1 día	día 25	día 26	día 28	día 29	3 días	23	31
25			Emisión de acta de finalización			0 días	día 40	día 40	día 40	día 40	0 días		16

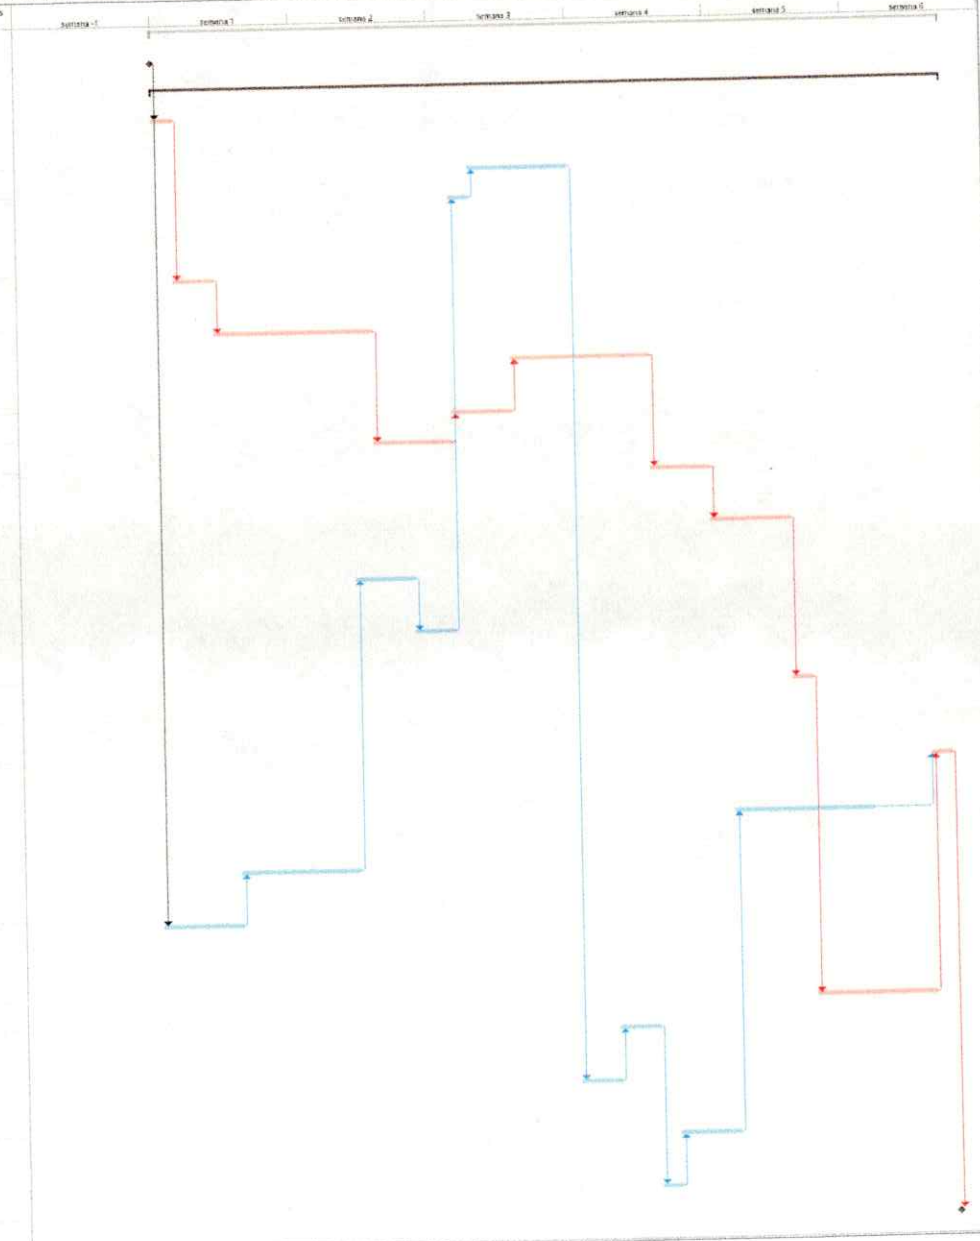

Tareas críticas — Progreso de tarea crítica — División — Tarea manual — Progreso diferenciado — Resumen del proyecto
División crítica — Tarea — Progreso de tarea — Hito — Resumen

JAVIER ALBERTO MARTINEZ ACERO
C.C. No. 7.313.313

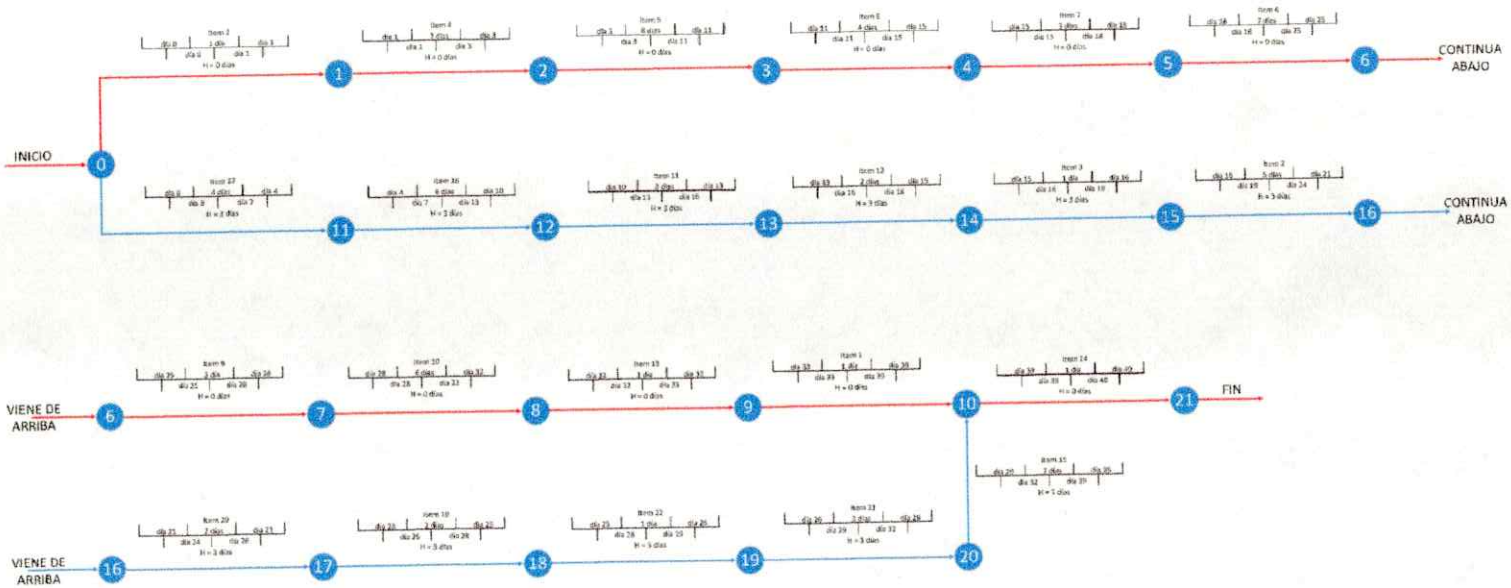

CONVENCIONES

- Actividad crítica
- Actividad no crítca
- Nodo o evento

ACTIVIDAD

TIC	DURACIÓN	TTC
TIL		TTL

HOLGURA

Proponente: JAVIER ALBERTO MARTÍNEZ ACERO
C.C. No. 7.313.313
