
IDU-1847-2021 - ZONASINDG4-CLB-20260421


Id	Modo de tarea	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
0		**0**	**IDU-1847-2021 - ZONASINDG4-CLB-20260421**	**1376 días**	**vie 14/01/22**	**jue 21/05/26**	**$63,246,117,200.00**
1		**1**	**CRONOGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN CONTRATO IDU-1847-2021: CONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LAS ZONAS INDUSTRIALES DE MONTEVIDEO Y PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ**	**1376 días**	**vie 14/01/22**	**jue 21/05/26**	**$63,246,117,200.00**
2		1.1	ACTA DE INICIO	0 días	vie 14/01/22	vie 14/01/22	$0.00
3		**1.2**	**FASE DE OBRAS INICIALES Y GESTIONES PRELIMINARES**	**756 días**	**vie 14/01/22**	**mar 21/05/24**	**$607,849,447.00**
4		1.2.1	ACTA No. 3 DE SUSPENSIÓN 1	0 días	vie 3/06/22	vie 3/06/22	$0.00
5		1.2.2	REINICIO 1	0 días	mar 5/07/22	mar 5/07/22	$0.00
6		1.2.3	ACTA No. 4 SUSPENSIÓN 2	0 días	vie 1/07/22	vie 1/07/22	$0.00
7		1.2.4	REINICIO 2	0 días	jue 4/08/22	jue 4/08/22	$0.00
8		1.2.5	ACTA No. 5 SUSPENSIÓN 3	0 días	vie 5/08/22	vie 5/08/22	$0.00
9		1.2.6	REINICIO 3	0 días	lun 22/08/22	lun 22/08/22	$0.00
10		1.2.7	ACTA No. 6 SUSPENSIÓN 4	0 días	mar 23/08/22	mar 23/08/22	$0.00
11		1.2.8	REINICIO 4	0 días	lun 26/09/22	lun 26/09/22	$0.00
12		1.2.9	ACTA No. 7 SUSPENSIÓN 5	0 días	lun 26/09/22	lun 26/09/22	$0.00
13		1.2.10	REINICIO 5	0 días	mié 26/10/22	mié 26/10/22	$0.00
14		1.2.11	ACTA No. 8 SUSPENSIÓN 6	0 días	mié 26/10/22	mié 26/10/22	$0.00
15		1.2.12	REINICIO 6	0 días	vie 25/11/22	vie 25/11/22	$0.00
16		1.2.13	ACTA No. 9 SUSPENSIÓN 7	0 días	vie 25/11/22	vie 25/11/22	$0.00
17		1.2.14	REINICIO 7	0 días	lun 12/12/22	lun 12/12/22	$0.00
18		1.2.15	ACTA No. 10 SUSPENSIÓN 8	0 días	lun 12/12/22	lun 12/12/22	$0.00
19		1.2.16	REINICIO 8	0 días	mié 11/01/23	mié 11/01/23	$0.00
20		1.2.17	ACTA No. 11 SUSPENSIÓN 9	0 días	mié 11/01/23	mié 11/01/23	$0.00
21		1.2.18	REINICIO 9	0 días	jue 26/01/23	jue 26/01/23	$0.00
22		1.2.19	ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	0 días	mar 5/03/24	mar 5/03/24	$0.00
23		1.2.20	ACTA 12 REINICIO DE CONTRATO DE OBRA	0 días	mié 6/03/24	mié 6/03/24	$0.00
24		1.2.21	ACTA No. 13 SUSPENSIÓN 10	0 días	vie 15/03/24	vie 15/03/24	$0.00
25		1.2.22	REINICIO 10	0 días	mié 20/03/24	mié 20/03/24	$0.00
26		1.2.23	ENTREGA POR PARTE DEL IDU (12 CIVS)	4 días	mié 6/03/24	lun 11/03/24	$0.00
27		1.2.24	COMPONENTE TECNICO	756 días	vie 14/01/22	mar 21/05/24	$442,310,447.00
28		**1.2.24.1**	**HOJAS DE VIDA FASE OBRAS INICIALES Y GESTIONES PRELIMII**	**740 días**	**vie 14/01/22**	**jue 2/05/24**	**$3,587,000.00**
29		1.2.24.1.1	HOJAS DE VIDA RECURSO HUMANO MINIMO	3 días	vie 14/01/22	mar 18/01/22	$622,000.00
30		1.2.24.1.2	HOJAS DE VIDA RECURSO HUMANO ETAPA GESTIONES PRELIMINARES FASE 1	15 días	vie 14/01/22	lun 31/01/22	$300,000.00
31		1.2.24.1.3	HOJAS DE VIDA RECURSO HUMANO ETAPA GESTIONES PRELIMINARES FASE 2	30 días	mié 6/03/24	vie 12/04/24	$1,664,998.00
32		1.2.24.1.4	REVISION HOJAS DE VIDA POR PARTE DE LA INTERVENTORIA Y GENERACION DE OBSERVACIONES Y	5 días	vie 12/04/24	jue 18/04/24	$1.00
33		1.2.24.1.5	ATENCION A OBSERVACIONES Y ENTREGA HOJAS DE VIDA A LA INTERVENTORIA	6 días	jue 18/04/24	jue 25/04/24	$1,000,000.00
34		1.2.24.1.6	REVISION POR PARTE DE LA INTERVENTORIA Y APROBACION DE HOJAS DE VIDA IDU	5 días	jue 25/04/24	jue 2/05/24	$1.00
35		1.2.24.2	DESGLOSE DEL AIU OFERTADO	3 días	vie 14/01/22	mar 18/01/22	$2,616,255.00
36		**1.2.24.3**	**ANTICIPO**	**754 días**	**vie 14/01/22**	**lun 20/05/24**	**$8,630,000.00**
37		1.2.24.3.1	PLAN DETALLADO DE INVERSION DEL ANTICIPO	3 días	vie 14/01/22	mar 18/01/22	$1,565,000.00
38		1.2.24.3.2	SUSCRIBIRÁ CONTRATO DE FIDUCIA PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS DEL ANTICIPO	30 días	mar 18/01/22	lun 21/02/22	$1,565,000.00
39		1.2.24.3.3	SUSCRIBIRÁ CONTRATO DE FIDUCIA PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS DEL ANTICIPO FASE 2	60 días	mié 6/03/24	lun 20/05/24	$5,500,000.00
40		**1.2.24.4**	**ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS APU**	**755 días**	**vie 14/01/22**	**lun 20/05/24**	**$19,130,000.00**
41		1.2.24.4.1	ELABORACION Y ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE PRECIOS UNITARIOS VERSION 0	30 días	vie 14/01/22	jue 17/02/22	$2,829,996.00
42		1.2.24.4.2	REVISION DEL PRECIOS UNITARIOS POR PARTE DE LA INTERVENTORIA Y GENERACION DE OBSERVACIONES Y COMENTARIOS	5 días	jue 17/02/22	mar 22/02/22	$1.00
43		1.2.24.4.3	ATENCION A OBSERVACIONES Y ENTREGA DE DOCUMENTO A LA INTERVENTORIA (VERSION CORREGIDA)	3 días	mié 23/02/22	vie 25/02/22	$200,000.00
44		1.2.24.4.4	REVISION POR PARTE DE LA INTERVENTORIA Y APROBACION DE PRECIOS UNITARIOS VERSION FINAL	5 días	vie 25/02/22	jue 3/03/22	$1.00
45		1.2.24.4.5	ELABORACION Y ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE PRECIOS UNITARIOS FASE 2 (12 CIVS)	42 días	lun 11/03/24	jue 2/05/24	$7,100,000.00
46		1.2.24.4.6	REVISION DEL PRECIOS UNITARIOS POR PARTE DE LA INTERVENTORIA Y GENERACION DE OBSERVACIONES Y COMENTARIOS FASE 2 (12 CIVS)	5 días	jue 2/05/24	mié 8/05/24	$1.00
47		1.2.24.4.7	ATENCION A OBSERVACIONES Y ENTREGA DE DOCUMENTO A LA INTERVENTORIA (VERSION CORREGIDA) FASE 2	5 días	mié 8/05/24	mié 15/05/24	$9,000,000.00
48		1.2.24.4.8	REVISION POR PARTE DE LA INTERVENTORIA Y APROBACION DE PRECIOS UNITARIOS FASE 2(12CIVS)	5 días	mié 15/05/24	lun 20/05/24	$1.00
49		**1.2.24.5**	**HOJAS DE VIDA PERSONAL ETAPA DE CONSTRUCCION**	**28 días**	**mar 16/04/24**	**lun 20/05/24**	**$5,600,000.00**
50		1.2.24.5.1	HOJAS DE VIDA RECURSO HUMANO ETAPA DE CONSTRUCCI	14 días	mar 16/04/24	vie 3/05/24	$3,099,998.00
51		1.2.24.5.2	REVISION HOJAS DE VIDA ETAPA CONSTRUCCIÓN POR PARTE DE LA INTERVENTORIA Y GENERACION DE OBSERVACIONES Y COMENTARIOS	5 días	vie 3/05/24	jue 9/05/24	$1.00
52		1.2.24.5.3	ATENCION A OBSERVACIONES Y ENTREGA HOJAS DE VIDA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN A LA INTERVENTORIA	3 días	jue 9/05/24	mar 14/05/24	$2,500,000.00
53		1.2.24.5.4	REVISION POR PARTE DE LA INTERVENTORIA Y APROBACION DE HOJAS DE VIDA IDU ETAPA DE	6 días	mar 14/05/24	lun 20/05/24	$1.00
54		1.2.24.6	ADQUIRIR INFORMACION DEL CONTRATO	5 días	vie 14/01/22	jue 20/01/22	$3,130,000.00
55		1.2.24.7	RELACIÓN DEL EQUIPO MÍNIMO OBLIGATORIO.	16 días	vie 14/01/22	mar 1/02/22	$939,000.00
56		**1.2.24.8**	**REVISION DOCUMENTOS CONTRATOS CONSULTORIAS ESTUDIOS Y DISEÑOS**	**756 días**	**vie 14/01/22**	**mar 21/05/24**	**$98,943,192.00**
57		1.2.24.8.1	CARTA GENERADA POR EL IDU DEL ESTADO DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS	0 días	vie 14/01/22	vie 14/01/22	$0.00
58		1.2.24.8.2	REVISAR Y ESTUDIAR LOS DOCUMENTOS E INFORMACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 12 CIVS, DE ACUERDO A LA CLAUSULA 6 PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO, E IDENTIFICACION DE POSIBLES ERRORES EN LOS	60 días	vie 14/01/22	mié 23/03/22	$62,000,000.00
59		1.2.24.8.3	REVISAR Y ESTUDIAR LOS DOCUMENTOS E INFORMACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 12 CIVS, DE ACUERDO A LA CLAUSULA 6 PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO, E IDENTIFICACION DE POSIBLES ERRORES EN LOS	49 días	vie 15/03/24	mié 15/05/24	$36,943,191.00
60		1.2.24.8.4	ENTREGA DEL PRODUCTO POR PARTE DEL CONTRATISTA (INFORMACIÓN ELEMENTOS 12 CIVs)	5 días	jue 16/05/24	mar 21/05/24	$1.00
61		1.2.24.8.5	CONCEPTO DE VIABILIDAD POR PARTE DE LA INTERVENTORIA PARA LOS PRODUCTOS ENTREGADOS POR PARTE DEL CONTRATISTA DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE	0 días	mar 21/05/24	mar 21/05/24	$0.00
62		1.2.24.9	VISITA A OBRA	5 días	vie 14/01/22	jue 20/01/22	$3,130,000.00
63		**1.2.24.10**	**TRAMITES ANTE EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS**	**756 días**	**vie 14/01/22**	**mar 21/05/24**	**$6,260,000.00**
64		1.2.24.10.1	SOLICITUD POR PARTE DE LA INTERVENTORIA AL IDU DEL LISTADO DE DELEGADOS DE LAS ESP RESPUESTA AL CONTRATISTA POR PARTE DE LA INTERVENTORIA	5 días	vie 14/01/22	jue 20/01/22	$1.00
65		1.2.24.10.2	INFORMAR A LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS EL INICIO DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA	5 días	jue 20/01/22	mar 25/01/22	$3,129,999.00

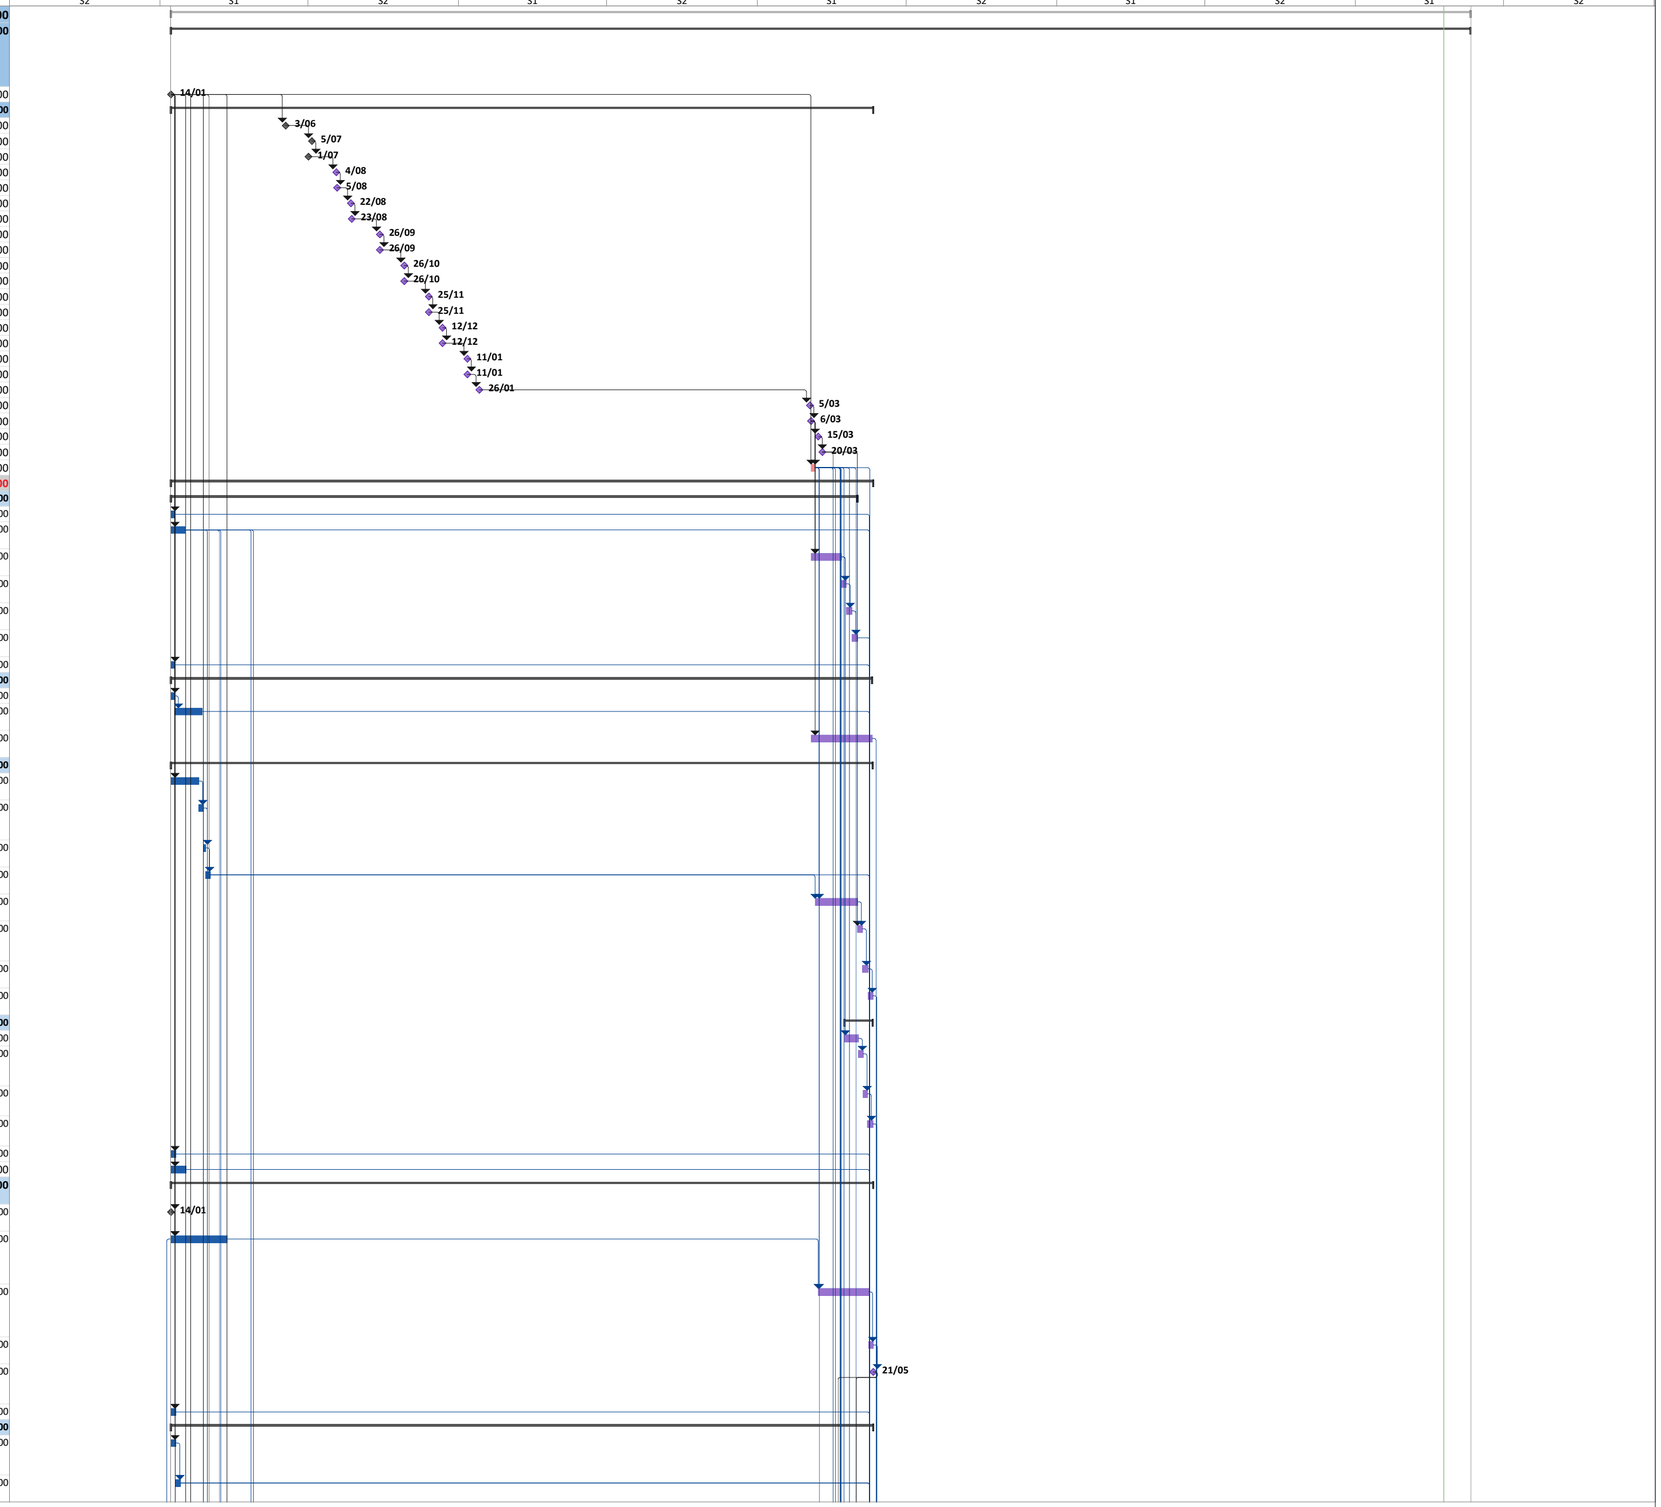

Proyecto:ID
Fecha: 14/1

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tareas externas
Hito externo
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
Sólo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
Sólo el comienzo
Sólo fin
Fecha límite
Tarea hito de sucesor controlado de ruta de acceso
Tarea de resumen de sucesor controlado de ruta de a
Tarea normal de sucesor controlado de ruta de acces
Tareas críticas
División crítica
Progreso


Id	Modo de tarea	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
66		1.2.24.10.3	SOLICITUD POR PARTE DE LA INTERVENTORIA AL IDU DEL LISTADO DE DELEGADOS DE LAS ESP 12 CIVS RESPUESTA AL CONTRATISTA POR PARTE DE LA INTERVENTORIA	0 días	mar 21/05/24	mar 21/05/24	$0.00
67		1.2.24.10.4	INFORMAR A LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS EL INICIO DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA 12 CIVS	6 días	mié 15/05/24	mar 21/05/24	$3,130,000.00
68		**1.2.24.11**	**ELABORACION Y APROBACION PLAN DE CALIDAD - PLAN DE INSPECCION Y ENSAYOS**	**740 días**	**mar 1/02/22**	**mar 21/05/24**	**$11,559,000.00**
69		1.2.24.11.1	ELABORACION Y ENTREGA A LA INTERVENTORIA PLAN DE CALIDAD - PLAN DE INSPECCION Y ENSAYOS VERSION 0	22 días	mar 1/02/22	vie 25/02/22	$5,958,998.00
70		1.2.24.11.2	REVISION DEL INFORME POR PARTE DE LA INTERVENTORIA Y GENERACION DE OBSERVACIONES Y COMENTARIOS	5 días	vie 25/02/22	jue 3/03/22	$1.00
71		1.2.24.11.3	ATENCION A OBSERVACIONES Y ENTREGA DE DOCUMENTO A LA INTERVENTORIA (VERSION CORREGIDA)	3 días	vie 10/05/24	mié 15/05/24	$5,600,000.00
72		1.2.24.11.4	REVISION POR PARTE DE LA INTERVENTORIA Y APROBACION DEL PRODUCTO FINAL	5 días	jue 16/05/24	mar 21/05/24	$1.00
73		**1.2.24.12**	**ELABORACION Y APROBACION DE PRESUPUESTO DE OBRA**	**27 días**	**jue 18/04/24**	**mar 21/05/24**	**$46,000,000.00**
74		1.2.24.12.1	ELABORACION Y ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE PRESUPUESTO DE OBRA VERSION 12 CIVS	22 días	jue 18/04/24	mié 15/05/24	$30,499,998.00
75		1.2.24.12.2	REVISION DEL PRESUPUESTO POR PARTE DE LA INTERVENTORIA Y GENERACION DE OBSERVACIONES Y	3 días	mié 15/05/24	vie 17/05/24	$1.00
76		1.2.24.12.3	ATENCION A OBSERVACIONES Y ENTREGA DE DOCUMENTO A LA INTERVENTORIA (VERSION CORREGIDA)	2 días	jue 16/05/24	lun 20/05/24	$15,500,000.00
77		1.2.24.12.4	REVISION POR PARTE DE LA INTERVENTORIA Y APROBACION DEL PRESUPUESTO FINAL	3 días	vie 17/05/24	mar 21/05/24	$1.00
78		**1.2.24.13**	**ELABORACION Y APROBACION PDT DETALLADO ACTIVIDADES DE OBRA**	**20 días**	**vie 26/04/24**	**mar 21/05/24**	**$31,000,000.00**
79		1.2.24.13.1	ELABORACION Y ENTREGA A LA INTERVENTORIA PDT DETALLADO ACTIVIDADES DE OBRA VERSION 12 CIVS	10 días	vie 26/04/24	jue 9/05/24	$21,000,000.00
80		1.2.24.13.2	REVISION DEL PDT POR PARTE DE LA INTERVENTORIA Y GENERACION DE OBSERVACIONES Y COMENTARIOS	4 días	jue 9/05/24	mié 15/05/24	$1.00
81		1.2.24.13.3	ATENCION A OBSERVACIONES Y ENTREGA DE DOCUMENTO A LA INTERVENTORIA (VERSION CORREGIDA)	2 días	mié 15/05/24	jue 16/05/24	$9,999,998.00
82		1.2.24.13.4	REVISION POR PARTE DE LA INTERVENTORIA Y APROBACION DEL PDT FINAL	4 días	jue 16/05/24	mar 21/05/24	$1.00
83		**1.2.24.14**	**ELABORACION Y APROBACION PAC**	**10 días**	**jue 9/05/24**	**mar 21/05/24**	**$21,000,000.00**
84		1.2.24.14.1	ELABORACION Y ENTREGA A LA INTERVENTORIA PAC VERSION 12 CIVS	3 días	jue 9/05/24	mar 14/05/24	$12,500,000.00
85		1.2.24.14.2	REVISION DEL PAC POR PARTE DE LA INTERVENTORIA Y GENERACION DE OBSERVACIONES Y COMENTARIOS	3 días	mar 14/05/24	jue 16/05/24	$1.00
86		1.2.24.14.3	ATENCION A OBSERVACIONES Y ENTREGA DE DOCUMENTO A LA INTERVENTORIA (VERSION CORREGIDA)	2 días	jue 16/05/24	lun 20/05/24	$8,499,998.00
87		1.2.24.14.4	REVISION POR PARTE DE LA INTERVENTORIA Y APROBACION DEL PAC FINAL	2 días	lun 20/05/24	mar 21/05/24	$1.00
88		**1.2.24.15**	**ELABORACION Y APROBACION INFORME FINAL ETAPA**	**17 días**	**mar 30/04/24**	**mar 21/05/24**	**$180,786,000.00**
89		1.2.24.15.1	ELABORACION Y ENTREGA A LA INTERVENTORIA INFORME GENERAL (VERSION INICIAL)	10 días	mar 30/04/24	mar 14/05/24	$110,285,998.00
90		1.2.24.15.2	REVISION DEL INFORME POR PARTE DE LA INTERVENTORIA Y GENERACION DE OBSERVACIONES Y COMENTARIOS	3 días	mar 14/05/24	jue 16/05/24	$1.00
91		1.2.24.15.3	ATENCION A OBSERVACIONES Y ENTREGA DE DOCUMENTO A LA INTERVENTORIA (VERSION CORREGIDA)	2 días	jue 16/05/24	lun 20/05/24	$70,500,000.00
92		1.2.24.15.4	REVISION POR PARTE DE LA INTERVENTORIA Y APROBACION DEL PRODUCTO FINAL	2 días	lun 20/05/24	mar 21/05/24	$1.00
93		1.2.24.16	FIN COMPONENTE TECNICO	0 días	mar 21/05/24	mar 21/05/24	$0.00
94		**1.2.25**	**COMPONENTE PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO - PMT.**	**756 días**	**vie 14/01/22**	**mar 21/05/24**	**$30,304,000.00**
95		1.2.25.1	ASIGNACION DEL DELEGADO POR PARTE DE LA SDM	84 días	vie 14/01/22	vie 22/04/22	$100,000.00
96		**1.2.25.2**	**PRESENTACION Y APROBACION DEL PMT**	**91 días**	**mié 26/01/22**	**mié 11/05/22**	**$15,204,000.00**
97		1.2.25.2.1	ELABORACION Y ENTREGA A LA INTERVENTORIA PMT GENERAL (VERSION INICIAL)	40 días	mié 26/01/22	vie 11/03/22	$12,362,000.00
98		1.2.25.2.2	REVISION DEL PMT ESPECIFICO TRAMOS INICIALES, POR PARTE DE LA INTERVENTORIA Y GENERACION DE OBSERVACIONES Y COMENTARIOS	27 días	vie 11/03/22	mar 12/04/22	$1.00
99		1.2.25.2.3	ATENCION A OBSERVACIONES Y ENTREGA DE DOCUMENTO A LA INTERVENTORIA (VERSION CORREGIDA)	5 días	mar 12/04/22	mié 20/04/22	$2,841,998.00
100		1.2.25.2.4	REVISION POR PARTE DE LA INTERVENTORIA Y APROB	24 días	mar 12/04/22	mié 11/05/22	$1.00
101		1.2.25.3	RADICACION , REVISION Y APROBACION POR POR PARTE	21 días	mié 4/05/22	vie 27/05/22	$500,000.00
102		1.2.25.4	ATENCION A OBSERVACIONES Y ENTREGA DE PMT 12 CIVS ENTREGADOS POR IDU	10 días	mar 2/04/24	vie 12/04/24	$6,000,000.00
103		1.2.25.5	REVISIÓN POR PARTE DE LA INTERVENTORIA PMT 12 CIV	8 días	vie 12/04/24	lun 22/04/24	$1.00
104		1.2.25.6	RADICACION , REVISION Y APROBACION POR POR PARTE DE LA SDM DE LOS PMTS APROBADO 12 CIVS	12 días	lun 22/04/24	mar 7/05/24	$3,499,999.00
105		1.2.25.7	ATENCION A OBSERVACIONES Y ENTREGA DE DOCUMENTO (VERSION CORREGIDA)	6 días	mar 7/05/24	mié 15/05/24	$2,500,000.00
106		1.2.25.8	APROBACION DE PMT ESPECIFICO TRAMOS 12 CIVS, PARA INICIO DE FASE DE CONSTRUCCION POR PARTE	6 días	mié 15/05/24	mar 21/05/24	$2,500,000.00
107		1.2.25.9	FIN COMPONENTE PMT	0 días	mar 21/05/24	mar 21/05/24	$0.00
108		**1.2.26**	**COMPONENTE AMBIENTAL-SST-BIOSEGURIDAD**	**740 días**	**mar 1/02/22**	**mar 21/05/24**	**$84,341,000.00**
109		**1.2.26.1**	**FASE 1**	**176 días**	**mar 1/02/22**	**mar 23/08/22**	**$11,458,430.00**
110		1.2.26.1.1	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CON EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 12 CIVS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	100 días	lun 7/02/22	vie 3/06/22	$2,972,999.00
111		1.2.26.1.2	AJUSTAR Y OBTENER LA APROBACION DEL INTERVENTOR E IMPLEMENTAR LOS ESTUDIOS AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	100 días	lun 7/02/22	vie 3/06/22	$1.00
112		1.2.26.1.3	AJUSTAR Y OBTENER LA APROBACION DEL INTERVENTOR E IMPLEMENTAR LOS CAPITULOS O ANEXOS REQUERIDOS PARA LA IMPLEMENTACION DE CADA UNO DE LOS PROGRAMAS ESTABLECIDOS EN LOS MANUALES, GUIAS PLANES Y PROCEDIMIENTOS DEL IDU	11 días	mar 1/02/22	lun 14/02/22	$3,130,000.00
113		1.2.26.1.4	VERIFICARÁ EL INVENTARIO INICIAL DEL ARBOLADO Y AVIFAUNA DE ACUERDO CON LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS AUTORIZADOS POR LA SDA, TENIENDO EN CUENTA TODOS LOS POSIBLES TRATAMIENTOS	152 días	lun 28/02/22	lun 22/08/22	$1,565,000.00
114		1.2.26.1.5	INVENTARIO Y BALANCES DE ZONAS VERDES	58 días	mié 16/03/22	mar 24/05/22	$1,565,000.00
115		1.2.26.1.6	REGISTRO DE PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL	108 días	vie 22/04/22	mar 23/08/22	$854,490.00
116		1.2.26.1.7	PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN - RCD	69 días	lun 14/03/22	vie 3/06/22	$657,300.00
117		1.2.26.1.8	VERIFICARÁ QUE LOS PERMISOS Y/O LICENCIAS Y/O AUTORIZACIONES Y/O TRÁMITES NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CORRESPONDAN CON LO REQUERIDO POR EL MISMO, EN CASO DE SER NECESARIO, TRAMITARÁ LOS PERMISOS Y/O LICENCIAS Y/O	35 días	lun 25/04/22	vie 3/06/22	$713,640.00
118		**1.2.26.2**	**FASE 2**	**729 días**	**lun 14/02/22**	**mar 21/05/24**	**$72,882,570.00**
119		1.2.26.2.1	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CON EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 12 CIVS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	39 días	vie 5/04/24	mar 21/05/24	$999,999.00
120		1.2.26.2.2	AJUSTAR Y OBTENER LA APROBACION DEL INTERVENTOR E IMPLEMENTAR LOS ESTUDIOS AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	39 días	vie 5/04/24	mar 21/05/24	$1.00

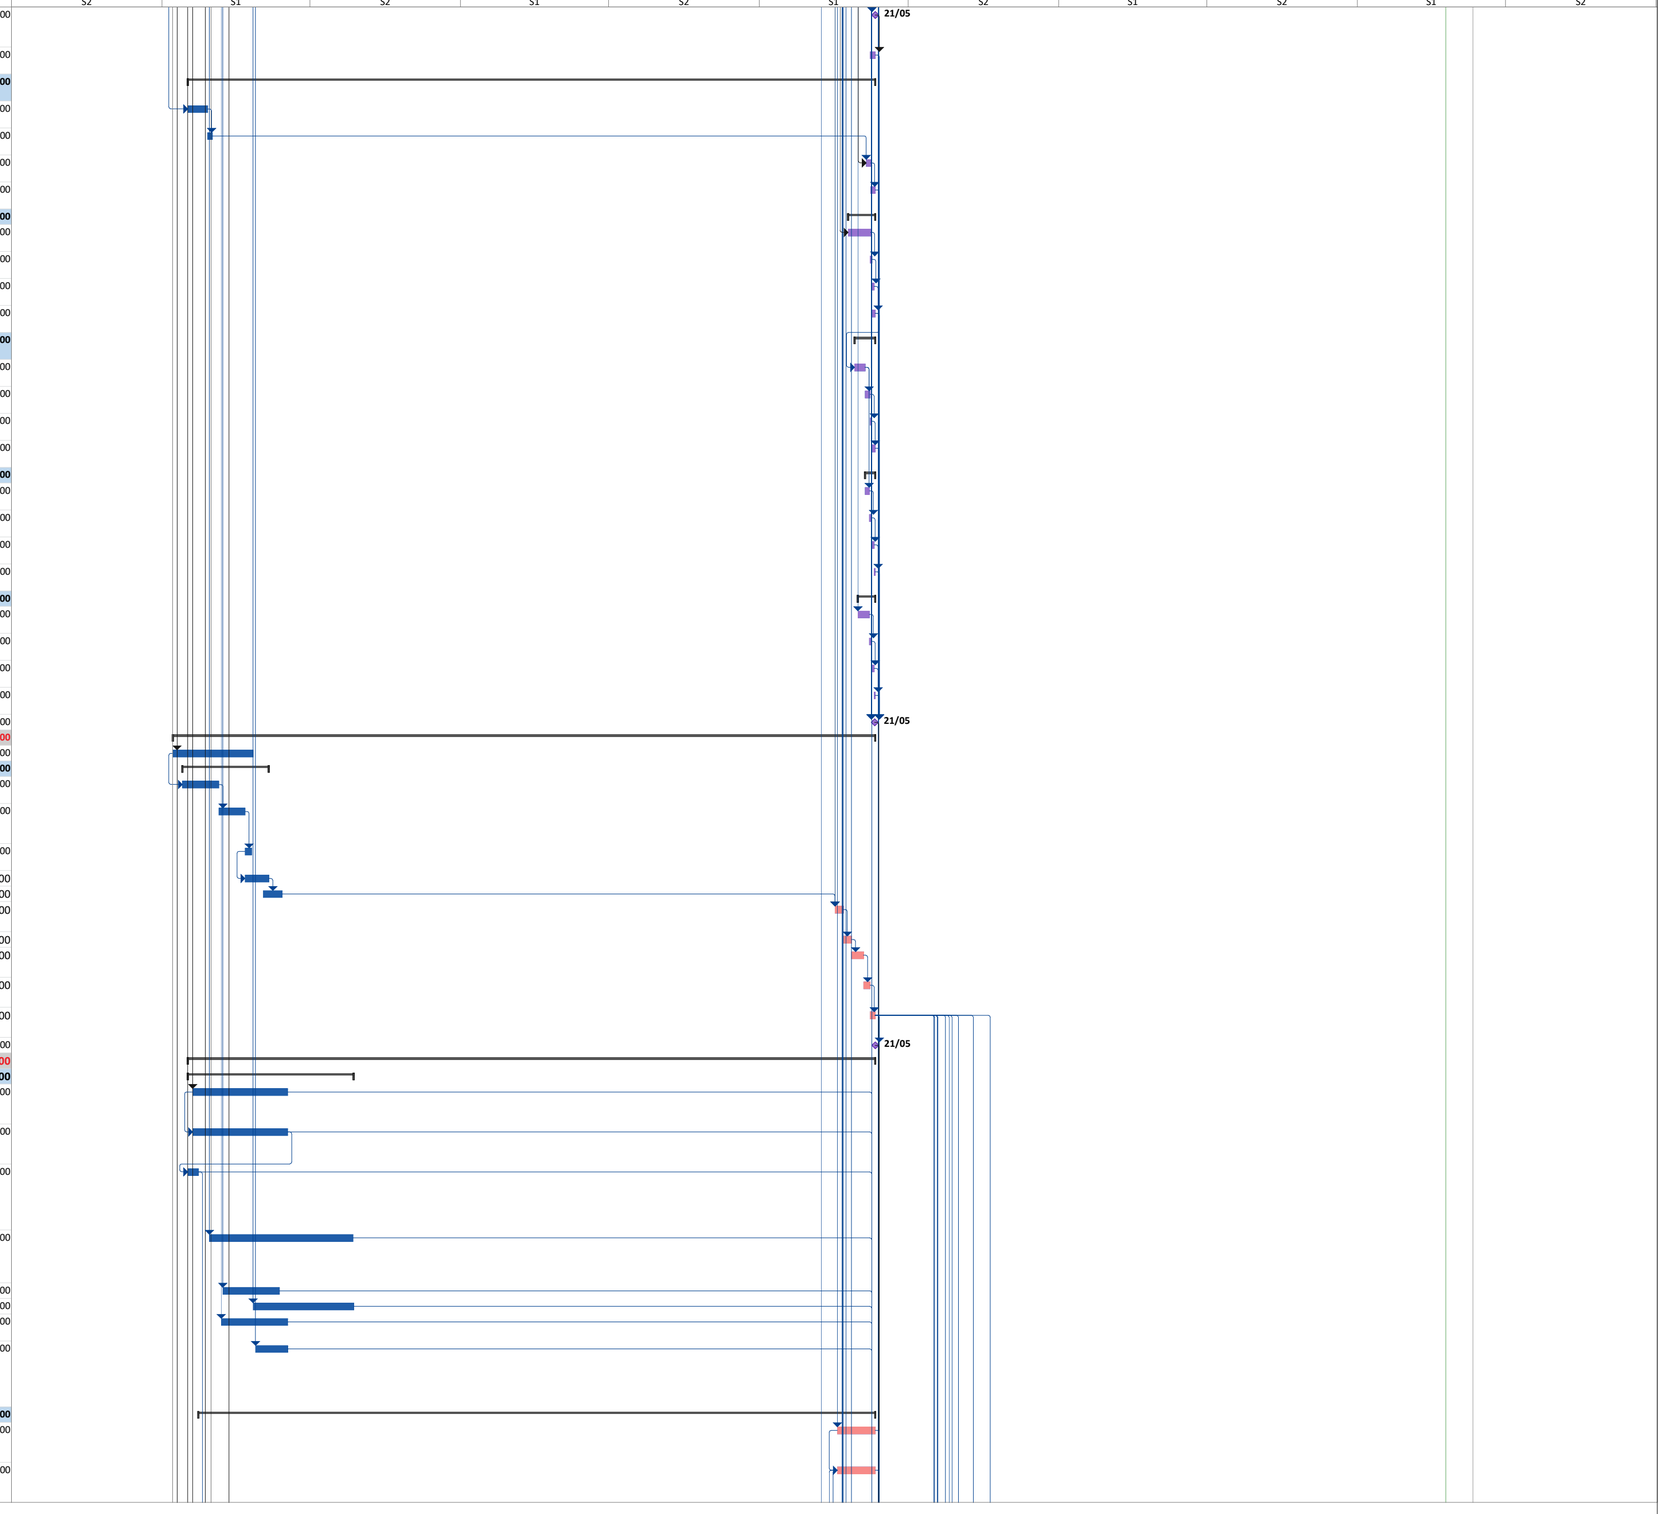

Proyecto:ID
Fecha: 14/1

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tareas externas
Hito externo
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
Sólo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
Sólo el comienzo
Sólo fin
Fecha límite
Tarea hito de sucesor controlado de ruta de acceso
Tarea de resumen de sucesor controlado de ruta de a
Tarea normal de sucesor controlado de ruta de acces
Tareas críticas
División crítica
Progreso


Id	Modo de tarea	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
121		1.2.26.2.3	VERIFICARÁ EL INVENTARIO INICIAL DEL ARBOLADO Y AVIFAUNA DE ACUERDO CON LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS AUTORIZADOS POR LA SDA, TENIENDO EN CUENTA TODOS LOS POSIBLES TRATAMIENTOS	39 días	vie 5/04/24	mar 21/05/24	$1,935,000.00
122		1.2.26.2.4	REGISTRO DE PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL	39 días	vie 5/04/24	mar 21/05/24	$1,645,510.00
123		1.2.26.2.5	PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN - RCD	39 días	vie 5/04/24	mar 21/05/24	$1,842,700.00
124		1.2.26.2.6	VERIFICARÁ QUE LOS PERMISOS Y/O LICENCIAS Y/O AUTORIZACIONES Y/O TRÁMITES NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CORRESPONDAN CON LO REQUERIDO POR EL MISMO, EN CASO DE SER NECESARIO, TRAMITARÁ LOS PERMISOS Y/O LICENCIAS Y/O	39 días	vie 5/04/24	mar 21/05/24	$786,360.00
125		**1.2.26.2.7**	**ELABORARÁ EL PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL MAO (MANEJO AMBIENTAL EN OBRA).**	**729 días**	**lun 14/02/22**	**mar 21/05/24**	**$47,673,000.00**
126		1.2.26.2.7.1	ELABORACION Y ENTREGA A LA INTERVENTORIA MAO GENERAL (VERSION INICIAL) FASE 1	30 días	lun 14/02/22	vie 18/03/22	$33,073,000.00
127		1.2.26.2.7.2	ELABORACION Y ENTREGA A LA INTERVENTORIA MAO GENERAL (VERSION INICIAL) FASE 2	17 días	jue 11/04/24	mar 30/04/24	$1,500,000.00
128		1.2.26.2.7.3	REVISION DEL MAO POR PARTE DE LA INTERVENTORIA Y GENERACION DE OBSERVACIONES Y COMENTARIOS	10 días	vie 18/03/22	jue 31/03/22	$100,000.00
129		1.2.26.2.7.4	REVISION DEL MAO POR PARTE DE LA INTERVENTORIA Y GENERACION DE OBSERVACIONES Y COMENTARIOS	4 días	mar 30/04/24	lun 6/05/24	$100,000.00
130		1.2.26.2.7.5	ATENCION A OBSERVACIONES Y ENTREGA DE DOCUMENTO A LA INTERVENTORIA (VERSION	10 días	sáb 23/04/22	mié 4/05/22	$2,500,000.00
131		1.2.26.2.7.6	ATENCION A OBSERVACIONES Y ENTREGA DE DOCUMENTO A LA INTERVENTORIA (VERSION	3 días	lun 6/05/24	jue 9/05/24	$1,000,000.00
132		1.2.26.2.7.7	REVISION POR PARTE DE LA INTERVENTORIA Y APROBACION DEL PRODUCTO FINAL FASE 1	10 días	jue 28/04/22	mar 10/05/22	$4,000,000.00
133		1.2.26.2.7.8	REVISION POR PARTE DE LA INTERVENTORIA Y APROBACION DEL PRODUCTO FINAL FASE 2	3 días	jue 9/05/24	mar 14/05/24	$700,000.00
134		1.2.26.2.7.9	REVISION Y APROBACION POR PARTE DEL IDU FASE 1	16 días	mar 10/05/22	vie 27/05/22	$4,000,000.00
135		1.2.26.2.7.10	REVISION Y APROBACION POR PARTE DEL IDU FASE 2	7 días	mar 14/05/24	mar 21/05/24	$700,000.00
136		1.2.26.2.8	ACTIVIDADES TRATAMIENTOS SILVICULTURALES FRENTES IN	11 días	lun 16/05/22	vie 27/05/22	$18,000,000.00
137		1.2.26.2.9	FIN COMPONENTE AMBIENTAL-SST-BIOSEGURIDAD	0 días	mar 21/05/24	mar 21/05/24	$0.00
138		**1.2.27**	**COMPONENTE DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRA**	**756 días**	**vie 14/01/22**	**mar 21/05/24**	**$45,577,000.00**
139		1.2.27.1	ELABORAR Y PRESENTAR LOS DOCUMENTOS METODOLOGICOS Y CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES Y PRODUCTOS DEL COMPONENTE SOCIAL	30 días	vie 14/01/22	jue 17/02/22	$1,565,000.00
140		1.2.27.2	ELABORAR Y PRESENTAR LA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO	84 días	vie 14/01/22	vie 22/04/22	$1,565,000.00
141		1.2.27.3	ELABORAR Y PRESENTAR LA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL DESARROLLO SOCIO ECONOMICO DEL	90 días	vie 14/01/22	jue 28/04/22	$1,565,000.00
142		1.2.27.4	REALIZAR LAS EVALUACIONES DE IMPACTO SOCIAL Y PLAN DE MANEJO DE LOS MISMOS	60 días	mar 1/03/22	mié 11/05/22	$1,565,000.00
143		1.2.27.5	INVENTARIO DE PREDIOS, METODOLOGÍA Y CRONOGRAMA PARA EL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO DE	90 días	vie 14/01/22	jue 28/04/22	$1,565,000.00
144		1.2.27.6	ELABORARÁ LAS ACTAS DE VECINDAD CORRESPONDIENTES A LOS FRENTES 12 CIVS INICIALES (FASE 1)	38 días	jue 21/04/22	vie 3/06/22	$3,000,000.00
145		1.2.27.7	ELABORARÁ LAS ACTAS DE VECINDAD CORRESPONDIENTES A LOS FRENTES 12 CIVS INICIALES (FASE 2)	33 días	jue 11/04/24	mar 21/05/24	$3,000,000.00
146		1.2.27.8	INSTALARÁ EL CAMPAMENTO Y PONDRÁ EN FUNCIONAMIENTO EL PUNTO IDU.	30 días	vie 14/01/22	jue 17/02/22	$939,000.00
147		1.2.27.9	REALIZARÁ LAS SOCIALIZACIONES CORRESPONDIENTES REQUERIDAS SEGÚN EL APÉNDICE H. (FASE 1)	105 días	mar 1/02/22	vie 3/06/22	$1,800,000.00
148		1.2.27.10	REALIZARÁ LAS SOCIALIZACIONES CORRESPONDIENTES REQUERIDAS SEGÚN EL APÉNDICE H. (FASE 2)	30 días	mar 16/04/24	mar 21/05/24	$700,000.00
149		1.2.27.11	DIRECTORIO DE ACTORES	21 días	jue 24/03/22	mar 19/04/22	$313,000.00
150		1.2.27.12	ACTUALIZACIÓN DE PRODUCTOS QUE APLIQUEN, PARA APROBACIÓN INFORME DIALOGO CIUDADANO	54 días	vie 15/03/24	mar 21/05/24	$5,000,000.00
151		**1.2.27.13**	**ELABORACION Y APROBACION INFORME DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA**	**735 días**	**lun 7/02/22**	**mar 21/05/24**	**$23,000,000.00**
152		1.2.27.13.1	ELABORACION Y ENTREGA A LA INTERVENTORIA INFORME GENERAL (VERSION INICIAL) (FASE 1)	100 días	lun 7/02/22	vie 3/06/22	$500,000.00
153		1.2.27.13.2	ELABORACION Y ENTREGA A LA INTERVENTORIA INFORME GENERAL (VERSION INICIAL) (FASE 2)	20 días	vie 12/04/24	mar 7/05/24	$16,000,000.00
154		1.2.27.13.3	REVISION DEL INFORME POR PARTE DE LA INTERVENTORIA Y GENERACION DE OBSERVACIONES Y COMENTARIOS	4 días	mar 7/05/24	vie 10/05/24	$1.00
155		1.2.27.13.4	ATENCION A OBSERVACIONES Y ENTREGA DE DOCUMENTO A LA INTERVENTORIA (VERSION CORREGIDA)	3 días	vie 10/05/24	mié 15/05/24	$6,499,998.00
156		1.2.27.13.5	REVISION POR PARTE DE LA INTERVENTORIA Y APROBACION DEL PRODUCTO FINAL	3 días	jue 16/05/24	lun 20/05/24	$1.00
157		1.2.27.13.6	REVISION Y APROBACION POR PARTE DEL IDU	0 días	mar 21/05/24	mar 21/05/24	$0.00
158		1.2.27.14	FIN COMPONENTE DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	0 días	mar 21/05/24	mar 21/05/24	$0.00
159		**1.2.28**	**ACTIVIDADES ARQUEOLOGIA Y PATRIMONIO**	**721 días**	**mié 23/02/22**	**mar 21/05/24**	**$5,317,000.00**
160		1.2.28.1	PLAN DE MANEJO ARQUEOLÓGICO APROBADO POR EL ICANH	86 días	mié 23/02/22	vie 3/06/22	$1,970,000.00
161		1.2.28.2	PLAN DE MANEJO ARQUEOLÓGICO APROBADO POR EL ICANH	24 días	lun 22/04/24	mar 21/05/24	$217,000.00
162		1.2.28.3	ACTIVIDADES DE IDENTIFICACION BIENES DE INTERES CULTURAL LOCALIZADOS EN EL AREA DEL PROYECTO (FASE 1)	86 días	mié 23/02/22	vie 3/06/22	$1,675,000.00
163		1.2.28.4	ACTIVIDADES DE IDENTIFICACION BIENES DE INTERES CULTURAL LOCALIZADOS EN EL AREA DEL PROYECTO (FASE 2)	24 días	lun 22/04/24	mar 21/05/24	$1,455,000.00
164		1.2.28.5	FIN ACTIVIDADES ARQUEOLOGIA Y PATRIMONIO	0 días	mar 21/05/24	mar 21/05/24	$0.00
165		1.2.29	FIN DE ETAPA OBRAS INICIALES Y PRELIMINARES	0 días	mar 21/05/24	mar 21/05/24	$0.00
166		**1.3**	**FASE DE CONSTRUCCIÓN**	**619 días**	**mié 22/05/24**	**jue 21/05/26**	**$51,013,023,336.31**
167		1.3.1	ACTA DE INICIO FASE DE EJECUCION	0 días	mié 22/05/24	mié 22/05/24	$0.00
168		**1.3.2**	**UPZ 111**	**281 días**	**mié 22/05/24**	**lun 21/04/25**	**$13,957,452,136.50**
169		**1.3.2.1**	**TRATAMIENTO SILVICULTURAL- ACTUALIZACIÓN RESOLUCIÓ**	**0 días**	**mié 22/05/24**	**mié 22/05/24**	**$0.00**
170		1.3.2.1.1	OBTENCIÓN RESOLUCIÓN TRATAMIENTO SILVICULTURAL	0 días	mié 22/05/24	mié 22/05/24	$0.00
171		**1.3.2.2**	**INICIO CONSTRUCCIÓN UPZ 111**	**0 días**	**mié 22/05/24**	**mié 22/05/24**	**$0.00**
172		**1.3.2.3**	**CONTRUCCION 12 CIVS**	**281 días**	**mié 22/05/24**	**lun 21/04/25**	**$13,957,452,136.50**
173		**1.3.2.3.1**	**CIV 50008276**	**233 días**	**mié 22/05/24**	**vie 21/02/25**	**$1,390,533,745.97**
174		1.3.2.3.1.1	INICIO CIV 50008276	0 días	mié 22/05/24	mié 22/05/24	$0.00
175		**1.3.2.3.1.2**	**TRAMITE DE PMT**	**10 días**	**mié 22/05/24**	**mar 4/06/24**	**$0.00**
176		1.3.2.3.1.2.1	IMPLEMENTACIÓN PMT ESPECIFICIO Y CERRAMIENTO DE OBRA	10 días	mié 22/05/24	mar 4/06/24	$0.00
177		**1.3.2.3.1.3**	**ACTIVIDADES DE ARQUEOLOGIA**	**8 días**	**vie 24/05/24**	**mar 4/06/24**	**$0.00**
178		1.3.2.3.1.3.1	EXPLORACIÓN E INVESTIGACIÓN ARQUEOLOGICA EN LA ZONA DE INTERVENCIÓN	8 días	vie 24/05/24	mar 4/06/24	$0.00
179		**1.3.2.3.1.4**	**REDES HIDROSANITARIAS ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL**	**65 días**	**mié 5/06/24**	**jue 22/08/24**	**$353,145,913.34**
180		1.3.2.3.1.4.1	EXCAVACIONES, DEMOLICIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS	41 días	mié 5/06/24	mié 24/07/24	$59,763,792.85
181		1.3.2.3.1.4.2	INSTALACION DE TUBERIAS	43 días	sáb 15/06/24	lun 5/08/24	$106,966,289.92
182		1.3.2.3.1.4.3	RELLENO DE TUBERIAS	43 días	mar 18/06/24	jue 8/08/24	$76,275,018.75
183		1.3.2.3.1.4.4	CONSTRUCCION DE POZOS Y SUMIDEROS	51 días	mar 18/06/24	vie 16/08/24	$104,160,977.82
184		1.3.2.3.1.4.5	CONSTRUCCIÓN CAJAS DE INSPECCIÓN	32 días	lun 15/07/24	jue 22/08/24	$5,979,834.00
185		**1.3.2.3.1.5**	**PRELIMINARES - MOVIMIENTO DE TIERRAS, DEMOLICIONES Y RELLENOS**	**83 días**	**mié 5/06/24**	**mié 11/09/24**	**$175,399,875.43**

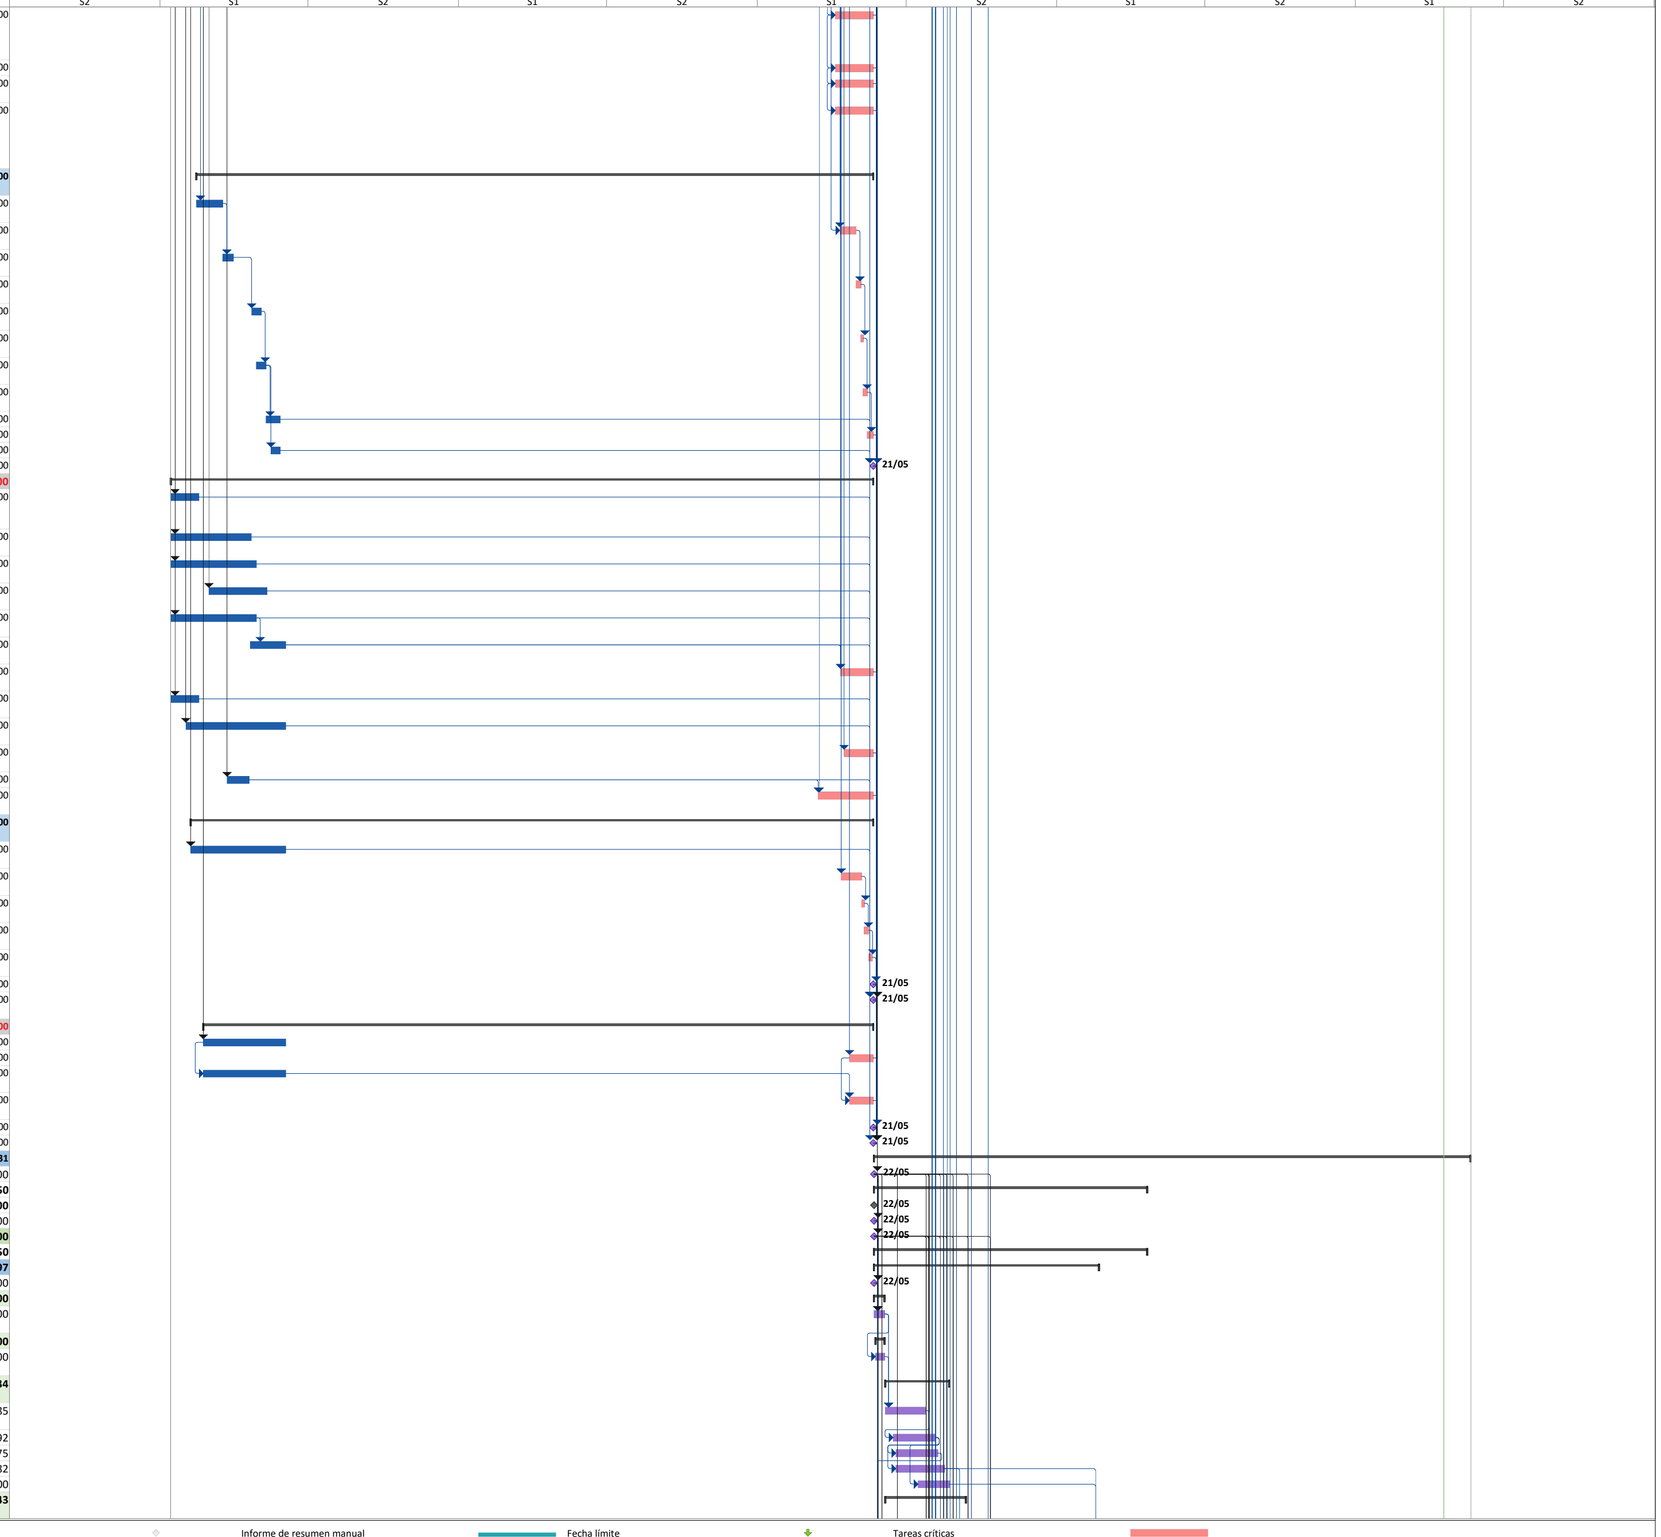

Proyecto:ID
Fecha: 14/1

Tarea	Resumen del proyecto	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Fecha límite	Tareas críticas
División	Tareas externas	Resumen inactivo	Resumen manual	Tarea hito de sucesor controlado de ruta de acceso	División crítica
Hito	Hito externo	Tarea manual	Sólo el comienzo	Tarea de resumen de sucesor controlado de ruta de a	Progreso
Resumen	Tarea inactiva	Sólo duración	Sólo fin	Tarea normal de sucesor controlado de ruta de acces	


Id	Modo de tarea	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
186		1.3.2.3.1.5.1	DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y TRANSPORTES DE ESCOMBROS	74 días	mié 5/06/24	lun 2/09/24	$90,422,854.62
187		1.3.2.3.1.5.2	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON RAJON Y SELLO DE RAJON	51 días	lun 8/07/24	vie 6/09/24	$57,253,884.04
188		1.3.2.3.1.5.3	INSTALACION DE GEOTEXTILES Y RELLENO DE MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA	27 días	lun 12/08/24	mié 11/09/24	$27,723,136.77
189		**1.3.2.3.1.6**	**PAVIMENTOS**	**50 días**	**lun 2/09/24**	**mar 29/10/24**	**$388,174,490.66**
190		1.3.2.3.1.6.1	BASES Y SUBBASES	13 días	lun 2/09/24	lun 16/09/24	$45,235,791.15
191		1.3.2.3.1.6.2	MEZCLA ASFALTICA	13 días	mié 4/09/24	mié 18/09/24	$69,948,547.47
192		1.3.2.3.1.6.3	CONCRETO LOSAS MR	40 días	jue 12/09/24	lun 28/10/24	$261,451,639.32
193		1.3.2.3.1.6.4	INSTALACION DE ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO Y CORTES (FALTA CORTE DE LOSAS)	31 días	lun 23/09/24	mar 29/10/24	$11,538,512.72
194		**1.3.2.3.1.7**	**REDES HIDROSANITARIAS ACUEDUCTO**	**37 días**	**jue 28/11/24**	**lun 13/01/25**	**$35,043,837.62**
195		1.3.2.3.1.7.1	EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS	20 días	jue 28/11/24	vie 20/12/24	$2,557,359.96
196		1.3.2.3.1.7.2	INSTALACION DE TUBERIAS	20 días	sáb 30/11/24	lun 23/12/24	$299,068.74
197		1.3.2.3.1.7.3	INSTALACION ACCESORIOS Y EMPATES	20 días	mié 4/12/24	vie 27/12/24	$28,058,586.00
198		1.3.2.3.1.7.4	RELLENOS TUBERIAS	20 días	lun 9/12/24	jue 2/01/25	$2,510,003.92
199		1.3.2.3.1.7.5	PRUEBA HIDROSTATICA DE TUBERIAS	3 días	jue 9/01/25	lun 13/01/25	$1,618,819.00
200		**1.3.2.3.1.8**	**REDES SECAS (Codensa)**	**151 días**	**jue 8/08/24**	**sáb 1/02/25**	**$175,239,282.10**
201		*1.3.2.3.1.8.1*	*MANIOBRAS A CARGO DE ENEL - CODENSA*	*0 días*	*jue 8/08/24*	*jue 8/08/24*	*$0.00*
202		1.3.2.3.1.8.2	EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS	37 días	jue 8/08/24	jue 19/09/24	$21,592,478.32
203		1.3.2.3.1.8.3	INSTALACION DE DUCTERIAS	37 días	jue 15/08/24	vie 27/09/24	$22,419,676.63
204		1.3.2.3.1.8.4	RELLENO DE DUCTERIAS	40 días	jue 22/08/24	lun 7/10/24	$11,638,257.58
205		*1.3.2.3.1.8.5*	*NOTIFICACIÓN INTERFERENCIA DE DUCTERIA ENEL SOBRE INFRAESTRUCTURA ETB*	*0 días*	*lun 7/10/24*	*lun 7/10/24*	*$0.00*
206		*1.3.2.3.1.8.6*	*CONCEPTO DE VIABILIDAD Y MANIOBRA A CARGO DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS*	*0 días*	*jue 7/11/24*	*jue 7/11/24*	*$0.00*
207		1.3.2.3.1.8.7	EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS	28 días	mar 12/11/24	jue 12/12/24	$4,174,665.10
208		1.3.2.3.1.8.8	INSTALACION DE DUCTERIAS	28 días	vie 15/11/24	mar 17/12/24	$35,420,641.61
209		1.3.2.3.1.8.9	RELLENO DE DUCTERIAS	28 días	mié 20/11/24	vie 20/12/24	$7,807,030.86
210		1.3.2.3.1.8.10	CONSTRUCCION DE CAJAS Y CAMARAS	40 días	lun 25/11/24	lun 13/01/25	$68,739,246.00
211		1.3.2.3.1.8.11	INSTALACIÓN POSTES DE ALUMBRADO PUBLICO	8 días	jue 23/01/25	sáb 1/02/25	$3,447,286.00
212		**1.3.2.3.1.9**	**REDES SECAS (ETB)**	**58 días**	**sáb 2/11/24**	**lun 13/01/25**	**$62,996,188.67**
213		1.3.2.3.1.9.1	EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS	25 días	sáb 2/11/24	mar 3/12/24	$6,892,597.04
214		1.3.2.3.1.9.2	RELLENO DE DUCTERIAS	20 días	vie 15/11/24	lun 9/12/24	$17,309,438.43
215		1.3.2.3.1.9.3	NIVELACION DE CAJAS Y CAMARAS	38 días	mié 27/11/24	lun 13/01/25	$38,794,153.20
216		**1.3.2.3.1.10**	**ESPACIO PUBLICO**	**128 días**	**jue 12/09/24**	**mar 11/02/25**	**$174,153,823.76**
217		1.3.2.3.1.10.1	DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y TRANSPORTES DE ESCOMBROS	82 días	mié 2/10/24	jue 9/01/25	$30,114,947.65
218		1.3.2.3.1.10.2	INSTALACION DE GEOTEXTILES	50 días	vie 15/11/24	mié 15/01/25	$6,484,722.30
219		1.3.2.3.1.10.3	RELLENOS EN MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA	52 días	mar 19/11/24	lun 20/01/25	$19,911,011.64
220		1.3.2.3.1.10.4	RELLENOS EN MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA RAMPAS	10 días	mar 14/01/25	vie 24/01/25	$2,310,537.23
221		1.3.2.3.1.10.5	INSTALACION DE ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO Y PREFABRICADOS	120 días	jue 12/09/24	sáb 1/02/25	$101,401,519.30
222		1.3.2.3.1.10.6	CONCRETO LOSAS MR	6 días	vie 24/01/25	vie 31/01/25	$3,003,972.64
223		1.3.2.3.1.10.7	ELEMENTOS MOBILIARIO URBANO (CANECAS, BANCAS	14 días	lun 27/01/25	mar 11/02/25	$10,927,113.00
224		**1.3.2.3.1.11**	**PAISAJISMO**	**16 días**	**mar 4/02/25**	**vie 21/02/25**	**$2,197,316.99**
225		1.3.2.3.1.11.1	PAISAJISMO	16 días	mar 4/02/25	vie 21/02/25	$2,197,316.99
226		**1.3.2.3.1.12**	**SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN (HORIZONTAL Y VERTI**	**16 días**	**mar 4/02/25**	**vie 21/02/25**	**$24,183,017.40**
227		1.3.2.3.1.12.1	SEÑALIZACIÓN	16 días	mar 4/02/25	vie 21/02/25	$24,183,017.40
228		1.3.2.3.1.13	FIN CIV 50008276	0 días	vie 21/02/25	vie 21/02/25	$0.00
229		**1.3.2.3.2**	**CIV 16000237**	**255 días**	**lun 24/06/24**	**lun 21/04/25**	**$1,347,956,614.23**
230		*1.3.2.3.2.1*	*SOLICITUD A INTERVENTORÍA DE AJUSTES A LOS DISEÑOS ENTREGADOS POR LA ENTIDAD*	*0 días*	*lun 24/06/24*	*lun 24/06/24*	*$0.00*
231		*1.3.2.3.2.2*	*REMISIÓN DE LA COMUNICACIÓN A LA ENTIDAD POR PARTE DE INTERVENTORÍA PARA AJUSTE A LOS DISEÑOS ENTREGADOS POR LA ENTIDAD*	*0 días*	*mar 16/07/24*	*mar 16/07/24*	*$0.00*
232		*1.3.2.3.2.3*	*APROBACIÓN Y AJUSTES POR PARTE DE LA ENTIDAD (CONCEPTO DE VIABILIDAD PARA ACTIVIDADES)*	*0 días*	*mié 14/08/24*	*mié 14/08/24*	*$0.00*
233		*1.3.2.3.2.4*	*AJUSTES A LA CAMARA CMP107620 POR INTERFERENCIA CON LA ETB DOCUMENTO RADICADO AL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO*	*0 días*	*jue 22/08/24*	*jue 22/08/24*	*$0.00*
234		*1.3.2.3.2.5*	*APROBACIÓN DE LOS AJUSTES POR PARTE DE LA ENTIDAD PARA INTERFERENCIA DE LA CAMARA*	*0 días*	*mié 11/09/24*	*mié 11/09/24*	*$0.00*
235		1.3.2.3.2.6	INICIO CIV 16000237	0 días	mar 20/08/24	mar 20/08/24	$0.00
236		**1.3.2.3.2.7**	**TRAMITE DE PMT**	**10 días**	**mar 20/08/24**	**vie 30/08/24**	**$0.00**
237		1.3.2.3.2.7.1	IMPLEMENTACIÓN PMT ESPECIFICIO Y CERRAMIENTO DE OBRA	10 días	mar 20/08/24	vie 30/08/24	$0.00
238		**1.3.2.3.2.8**	**ACTIVIDADES DE ARQUEOLOGIA**	**8 días**	**vie 23/08/24**	**lun 2/09/24**	**$0.00**
239		1.3.2.3.2.8.1	EXPLORACIÓN E INVESTIGACIÓN ARQUEOLOGICA EN LA ZONA DE INTERVENCIÓN	8 días	vie 23/08/24	lun 2/09/24	$0.00
240		**1.3.2.3.2.9**	**REDES HIDROSANITARIAS ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL**	**68 días**	**jue 24/10/24**	**mié 15/01/25**	**$517,438,171.99**
241		1.3.2.3.2.9.1	EXCAVACIONES, DEMOLICIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS	55 días	jue 24/10/24	sáb 28/12/24	$80,014,152.42
242		1.3.2.3.2.9.2	INSTALACION DE TUBERIAS	54 días	mar 29/10/24	jue 2/01/25	$245,014,320.73
243		1.3.2.3.2.9.3	RELLENOS DE TUBERIAS	55 días	mié 30/10/24	sáb 4/01/25	$103,957,052.06
244		1.3.2.3.2.9.4	CONSTRUCCION DE POZOS Y SUMIDEROS	45 días	lun 18/11/24	vie 10/01/25	$83,836,469.78
245		1.3.2.3.2.9.5	CONSTRUCCIÓN CAJAS DE INSPECCIÓN	53 días	mié 13/11/24	mié 15/01/25	$4,616,177.00
246		**1.3.2.3.2.10**	**PRELIMINARES - MOVIMIENTO DE TIERRAS, DEMOLICIONES Y RELLENOS**	**59 días**	**lun 18/11/24**	**lun 27/01/25**	**$133,678,036.67**
247		1.3.2.3.2.10.1	DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y TRANSPORTES DE ESCOMBROS	52 días	lun 18/11/24	vie 17/01/25	$67,820,884.94
248		1.3.2.3.2.10.2	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON RAJON Y SELLO DE RAJON	54 días	mar 19/11/24	mié 22/01/25	$38,510,929.62
249		1.3.2.3.2.10.3	INSTALACION DE GEOTEXTILES Y RELLENO DE MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA	57 días	mié 20/11/24	lun 27/01/25	$27,346,222.11
250		**1.3.2.3.2.11**	**PAVIMENTOS**	**77 días**	**lun 25/11/24**	**lun 24/02/25**	**$320,842,453.66**
251		1.3.2.3.2.11.1	BASES Y SUBBASES	65 días	lun 25/11/24	lun 10/02/25	$43,864,205.55
252		1.3.2.3.2.11.2	MEZCLA ASFALTICA	65 días	mié 27/11/24	mié 12/02/25	$66,797,897.49
253		1.3.2.3.2.11.3	CONCRETO LOSAS MR	65 días	lun 2/12/24	lun 17/02/25	$208,403,247.02
254		1.3.2.3.2.11.4	INSTALACION DE ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO (BORDILLOS, SARDINELES FRANJAS)	4 días	mié 19/02/25	lun 24/02/25	$1,777,103.60
255		**1.3.2.3.2.12**	**REDES HIDROSANITARIAS ACUEDUCTO**	**56 días**	**sáb 1/02/25**	**lun 7/04/25**	**$1,368,390.00**
256		1.3.2.3.2.12.1	INSTALACION DE TUBERIAS	56 días	sáb 1/02/25	lun 7/04/25	$1,368,390.00
257		**1.3.2.3.2.13**	**REDES SECAS (Codensa)**	**188 días**	**mar 10/09/24**	**sáb 19/04/25**	**$151,805,440.51**
258		*1.3.2.3.2.13.1*	*MANIOBRAS POR PARTE DE LA EMPRESA ENEL - CODE*	*0 días*	*mar 10/09/24*	*mar 10/09/24*	*$0.00*
259		1.3.2.3.2.13.2	EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS	11 días	mar 10/09/24	sáb 21/09/24	$8,209,091.40
260		1.3.2.3.2.13.3	INSTALACION DE DUCTERIAS	11 días	jue 12/09/24	mar 24/09/24	$12,581,474.40
261		1.3.2.3.2.13.4	RELLENO DE DUCTERIAS	12 días	vie 13/09/24	vie 27/09/24	$7,238,254.44

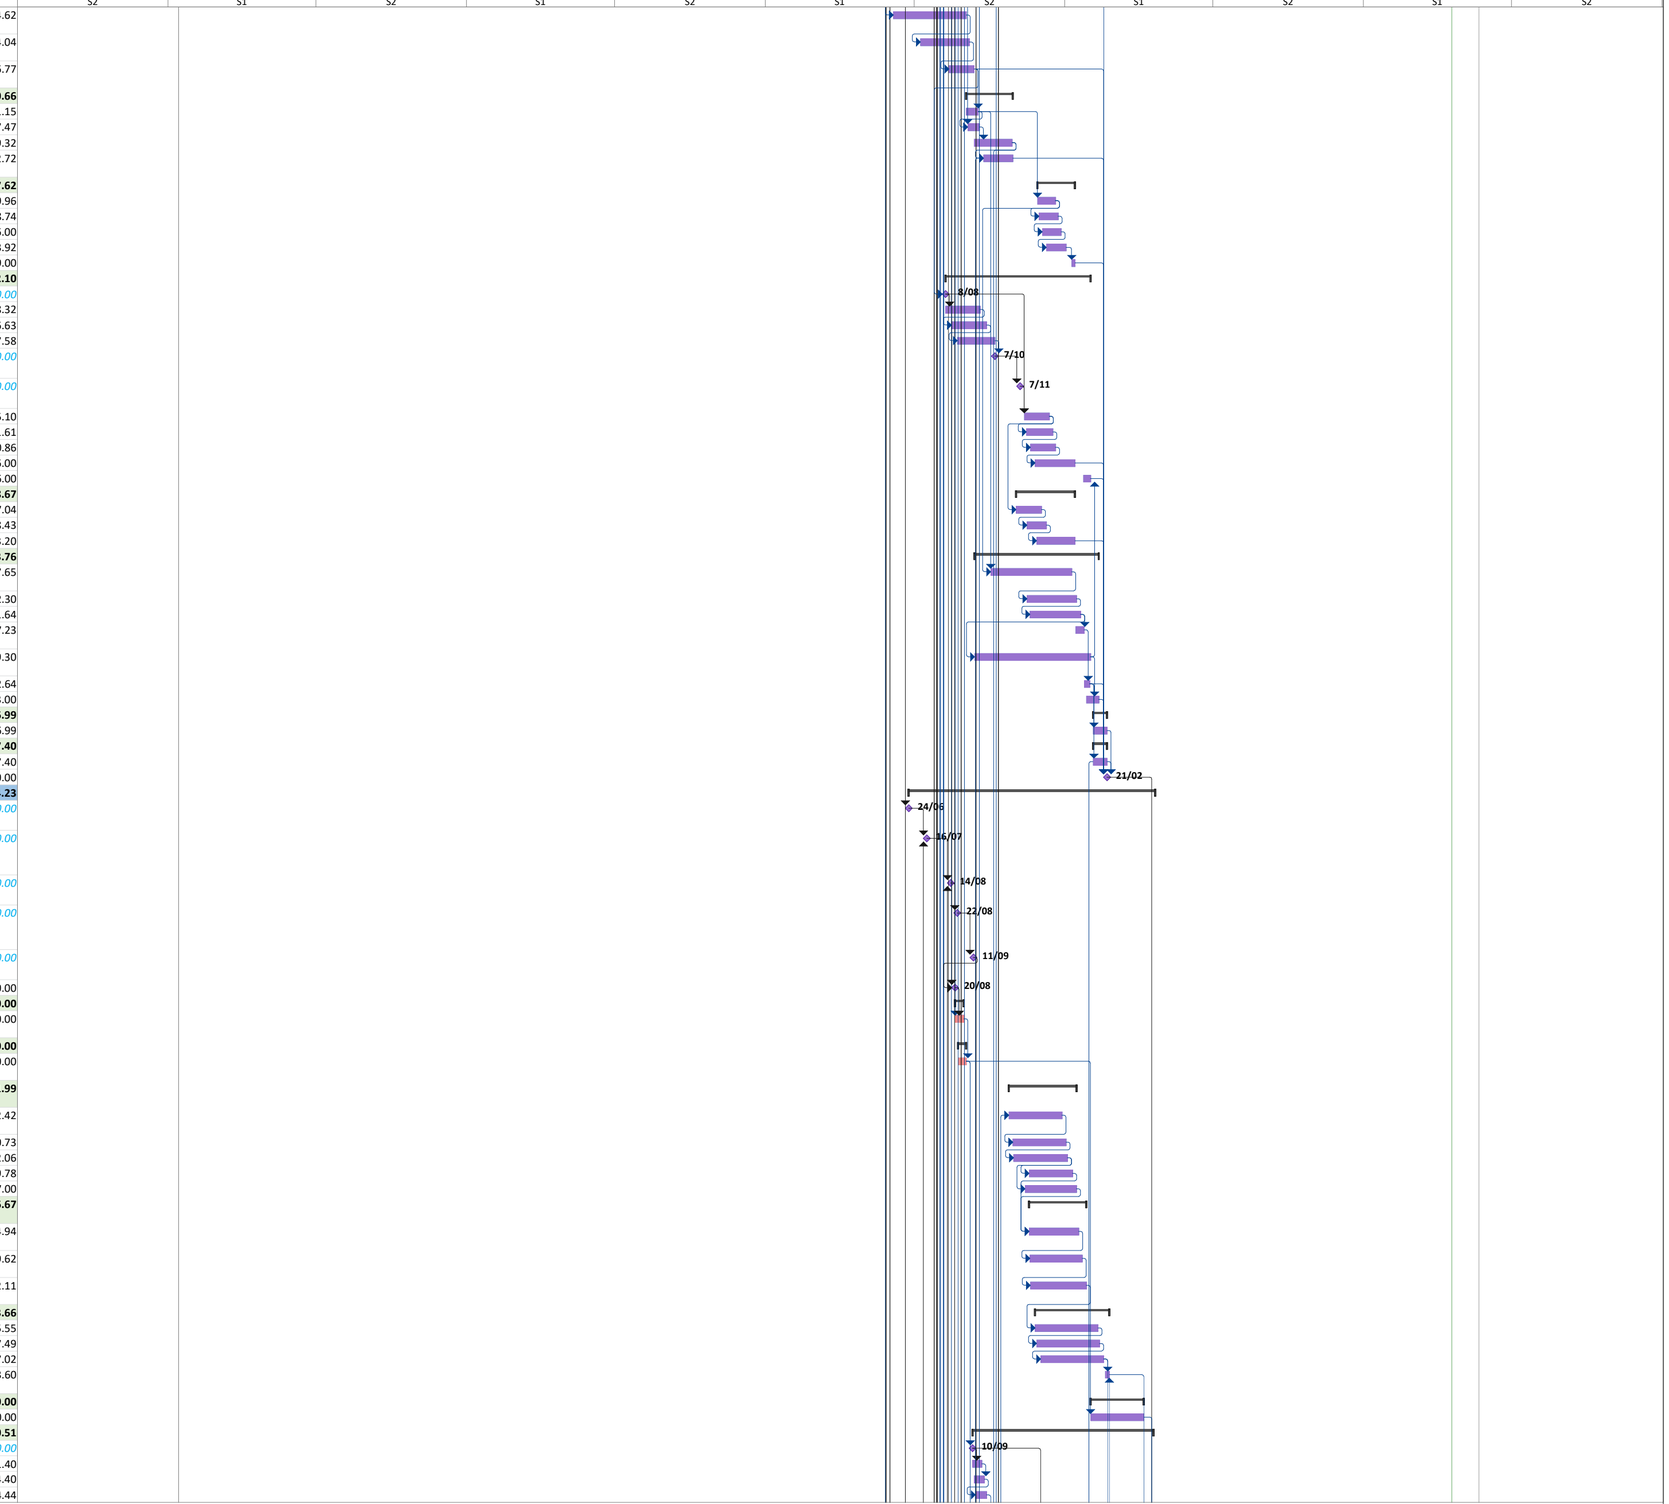

Proyecto:ID
Fecha: 14/1

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tareas externas
Hito externo
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
Sólo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
Sólo el comienzo
Sólo fin
Fecha límite
Tarea hito de sucesor controlado de ruta de acceso
Tarea de resumen de sucesor controlado de ruta de a
Tarea normal de sucesor controlado de ruta de acces
Tareas críticas
División crítica
Progreso

Id	Modo de tarea	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
262		*1.3.2.3.2.13.5*	*NOTIFICACIÓN INTERFERENCIA DE DUCTERIA ENEL SOBRE INFRAESTRUCTURA ETB*	*0 días*	*vie 27/09/24*	*vie 27/09/24*	*$0.00*
263		*1.3.2.3.2.13.6*	*TRASLADO DE COMUNICACIÓN POR PARTE DE INTERVENTORÍA A LA ENTIDAD PARA INTERFERENCIA ENEL-ETB*	*0 días*	*jue 3/10/24*	*jue 3/10/24*	*$0.00*
264		*1.3.2.3.2.13.7*	*CONCEPTO DE VIABILIDAD Y MANIOBRA A CARGO DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS*	*0 días*	*lun 2/12/24*	*lun 2/12/24*	*$0.00*
265		1.3.2.3.2.13.8	EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS	90 días	lun 2/12/24	lun 17/03/25	$8,443,983.40
266		1.3.2.3.2.13.9	INSTALACION DE DUCTERIAS	90 días	lun 9/12/24	mar 25/03/25	$44,511,358.90
267		1.3.2.3.2.13.10	RELLENO DE DUCTERIAS	100 días	mié 11/12/24	lun 7/04/25	$10,646,627.97
268		1.3.2.3.2.13.11	CONSTRUCCION DE CAJAS Y CAMARAS	84 días	sáb 11/01/25	sáb 19/04/25	$60,174,650.00
269		**1.3.2.3.2.14**	**REDES SECAS (ETB)**	**20 días**	**mié 26/02/25**	**jue 20/03/25**	**$8,813,376.00**
270		1.3.2.3.2.14.1	NIVELACION DE CAJAS Y CAMARAS	20 días	mié 26/02/25	jue 20/03/25	$8,813,376.00
271		**1.3.2.3.2.15**	**ESPACIO PUBLICO**	**194 días**	**mié 4/09/24**	**lun 21/04/25**	**$188,906,452.27**
272		1.3.2.3.2.15.1	DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y TRANSPORTES DE ESCOMBROS	150 días	mié 4/09/24	mié 26/02/25	$23,846,737.01
273		1.3.2.3.2.15.2	INSTALACION DE GEOTEXTILES	82 días	jue 26/12/24	mar 1/04/25	$5,584,245.66
274		1.3.2.3.2.15.3	RELLENOS EN MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA	82 días	sáb 4/01/25	mié 9/04/25	$14,191,151.43
275		1.3.2.3.2.15.4	RELLENOS EN MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA RAMPAS	78 días	lun 13/01/25	vie 11/04/25	$7,629,584.80
276		1.3.2.3.2.15.5	INSTALACION DE ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO Y PREFABRICADOS	78 días	vie 17/01/25	mié 16/04/25	$111,960,999.11
277		1.3.2.3.2.15.6	CONCRETO LOSAS MR	53 días	lun 17/02/25	lun 21/04/25	$17,713,584.26
278		1.3.2.3.2.15.7	ELEMENTOS MOBILIARIO URBANO (CANECAS, BANCA	12 días	vie 4/04/25	lun 21/04/25	$7,980,150.00
279		**1.3.2.3.2.16**	**PAISAJISMO**	**13 días**	**jue 3/04/25**	**lun 21/04/25**	**$2,766,871.92**
280		1.3.2.3.2.16.1	PAISAJISMO	13 días	jue 3/04/25	lun 21/04/25	$2,766,871.92
281		**1.3.2.3.2.17**	**SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN (HORIZONTAL Y VERTI**	**10 días**	**lun 7/04/25**	**lun 21/04/25**	**$22,337,421.21**
282		1.3.2.3.2.17.1	SEÑALIZACIÓN	10 días	lun 7/04/25	lun 21/04/25	$22,337,421.21
283		1.3.2.3.2.18	FIN CIV 16000237	0 días	lun 21/04/25	lun 21/04/25	$0.00
284		**1.3.2.3.3**	**CIV 16000337**	**233 días**	**mié 22/05/24**	**vie 21/02/25**	**$797,206,496.30**
285		1.3.2.3.3.1	INICIO CIV 16000337	0 días	mié 22/05/24	mié 22/05/24	$0.00
286		**1.3.2.3.3.2**	**TRAMITE DE PMT**	**10 días**	**mié 22/05/24**	**mar 4/06/24**	**$0.00**
287		1.3.2.3.3.2.1	IMPLEMENTACIÓN PMT ESPECIFICIO Y CERRAMIENTO DE OBRA	10 días	mié 22/05/24	mar 4/06/24	$0.00
288		**1.3.2.3.3.3**	**ACTIVIDADES DE ARQUEOLOGIA**	**10 días**	**mié 22/05/24**	**mar 4/06/24**	**$0.00**
289		1.3.2.3.3.3.1	EXPLORACIÓN E INVESTIGACIÓN ARQUEOLOGICA EN LA ZONA DE INTERVENCIÓN	10 días	mié 22/05/24	mar 4/06/24	$0.00
290		**1.3.2.3.3.4**	**REDES HIDROSANITARIAS ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL**	**42 días**	**mié 5/06/24**	**jue 25/07/24**	**$175,434,058.99**
291		1.3.2.3.3.4.1	EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS	29 días	mié 5/06/24	mié 10/07/24	$32,316,724.83
292		1.3.2.3.3.4.2	INSTALACION DE TUBERIAS	30 días	sáb 8/06/24	lun 15/07/24	$51,023,727.03
293		1.3.2.3.3.4.3	RELLENO DE TUBERIAS	31 días	sáb 15/06/24	lun 22/07/24	$36,870,013.73
294		1.3.2.3.3.4.4	CONSTRUCCION DE POZOS Y SUMIDEROS	28 días	vie 21/06/24	jue 25/07/24	$48,974,253.40
295		1.3.2.3.3.4.5	CONSTRUCCIÓN CAJAS DE INSPECCIÓN	16 días	sáb 6/07/24	jue 25/07/24	$6,249,340.00
296		**1.3.2.3.3.5**	**PRELIMINARES - MOVIMIENTO DE TIERRAS, DEMOLICIONES Y RELLENOS**	**46 días**	**lun 17/06/24**	**vie 9/08/24**	**$90,077,138.96**
297		1.3.2.3.3.5.1	DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y TRANSPORTES DE ESCOMBROS	22 días	lun 17/06/24	vie 12/07/24	$47,831,833.03
298		1.3.2.3.3.5.2	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON RAJON Y SELLO DE RAJON	12 días	vie 5/07/24	jue 18/07/24	$34,457,306.20
299		1.3.2.3.3.5.3	INSTALACION DE GEOTEXTILES Y RELLENO DE MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA	28 días	lun 8/07/24	vie 9/08/24	$7,787,999.73
300		**1.3.2.3.3.6**	**PAVIMENTOS**	**94 días**	**sáb 6/07/24**	**jue 24/10/24**	**$220,272,262.80**
301		1.3.2.3.3.6.1	BASES Y SUBBASES	12 días	sáb 6/07/24	vie 19/07/24	$31,654,644.45
302		1.3.2.3.3.6.2	MEZCLA ASFALTICA	35 días	lun 22/07/24	lun 2/09/24	$40,766,964.15
303		1.3.2.3.3.6.3	CONCRETO LOSAS MR	35 días	lun 29/07/24	lun 9/09/24	$143,679,350.64
304		1.3.2.3.3.6.4	INSTALACION DE ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO (BORDILLOS, SARDINELES FRANJAS)	45 días	mar 3/09/24	jue 24/10/24	$4,171,303.56
305		**1.3.2.3.3.7**	**REDES HIDROSANITARIAS ACUEDUCTO**	**44 días**	**vie 13/12/24**	**mié 5/02/25**	**$4,290,152.49**
306		1.3.2.3.3.7.1	EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS	20 días	vie 13/12/24	jue 9/01/25	$650,612.32
307		1.3.2.3.3.7.2	INSTALACION DE TUBERIAS	12 días	jue 9/01/25	mié 22/01/25	$1,259,222.15
308		1.3.2.3.3.7.3	INSTALACION ACCESORIOS Y EMPATES	6 días	jue 23/01/25	mié 29/01/25	$1,785,422.00
309		1.3.2.3.3.7.4	RELLENO DE TUBERIAS	6 días	mié 29/01/25	mié 5/02/25	$594,896.02
310		**1.3.2.3.3.8**	**REDES SECAS (Codensa)**	**174 días**	**vie 5/07/24**	**lun 27/01/25**	**$114,637,163.26**
311		*1.3.2.3.3.8.1*	*MANIOBRAS POR PARTE DE LA EMPRESA ENEL - CODE*	*0 días*	*vie 5/07/24*	*vie 5/07/24*	*$0.00*
312		1.3.2.3.3.8.2	EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS	60 días	sáb 6/07/24	lun 16/09/24	$9,709,541.68
313		1.3.2.3.3.8.3	INSTALACION DE DUCTERIAS	63 días	mar 9/07/24	vie 20/09/24	$20,254,267.50
314		1.3.2.3.3.8.4	RELLENO DE DUCTERIAS	54 días	mié 24/07/24	mié 25/09/24	$3,664,979.77
315		*1.3.2.3.3.8.5*	*NOTIFICACIÓN DE INTERFERENCIAS REDES DE ENEL-ET*	*0 días*	*mié 25/09/24*	*mié 25/09/24*	*$0.00*
316		*1.3.2.3.3.8.6*	*TRASLADO DE COMUNICACIÓN INTERFERENCIAS ENEL-ETB AL IDU*	*0 días*	*mié 2/10/24*	*mié 2/10/24*	*$0.00*
317		*1.3.2.3.3.8.7*	*CONCEPTO DE VIABILIDAD POR PARTE DEL IDU PARA LAS INTERFERENCIAS*	*0 días*	*mar 19/11/24*	*mar 19/11/24*	*$0.00*
318		1.3.2.3.3.8.8	EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS	45 días	mié 20/11/24	lun 13/01/25	$5,533,983.02
319		1.3.2.3.3.8.9	INSTALACION DE DUCTERIAS	45 días	lun 25/11/24	vie 17/01/25	$19,558,559.45
320		1.3.2.3.3.8.10	RELLENO DE DUCTERIAS	45 días	vie 29/11/24	mié 22/01/25	$4,502,517.84
321		1.3.2.3.3.8.11	CONSTRUCCION DE CAJAS Y CAMARAS	72 días	vie 1/11/24	lun 27/01/25	$51,413,314.00
322		**1.3.2.3.3.9**	**REDES SECAS (ETB)**	**38 días**	**jue 12/12/24**	**lun 27/01/25**	**$30,836,634.86**
323		1.3.2.3.3.9.1	EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS	23 días	jue 12/12/24	vie 10/01/25	$869,511.16
324		1.3.2.3.3.9.2	INSTALACIÓN DE DUCTERIAS	21 días	jue 19/12/24	jue 16/01/25	$7,082,264.00
325		1.3.2.3.3.9.3	RELLENO DE DUCTERIAS	21 días	mar 24/12/24	mar 21/01/25	$1,906,352.70
326		1.3.2.3.3.9.4	NIVELACION DE CAJAS Y CAMARAS	9 días	vie 17/01/25	lun 27/01/25	$20,978,507.00
327		**1.3.2.3.3.10**	**ESPACIO PUBLICO**	**135 días**	**vie 6/09/24**	**mié 12/02/25**	**$141,962,609.95**
328		1.3.2.3.3.10.1	DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y TRANSPORTES DE ESCOMBROS	39 días	vie 6/09/24	lun 21/10/24	$18,905,805.33
329		1.3.2.3.3.10.2	INSTALACION DE GEOTEXTILES	15 días	mié 6/11/24	sáb 23/11/24	$5,475,270.78
330		1.3.2.3.3.10.3	RELLENOS EN MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA	14 días	mié 13/11/24	jue 28/11/24	$16,335,382.47
331		1.3.2.3.3.10.4	RELLENOS EN MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA RAMPAS	16 días	sáb 4/01/25	jue 23/01/25	$4,704,384.40
332		1.3.2.3.3.10.5	INSTALACION DE ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO Y PREFABRICADOS	120 días	lun 16/09/24	mar 4/02/25	$73,903,844.97
333		1.3.2.3.3.10.6	CONCRETO LOSAS MR	11 días	jue 23/01/25	mié 5/02/25	$11,710,809.00
334		1.3.2.3.3.10.7	ELEMENTOS MOBILIARIO URBANO (CANECAS, BANCA	7 días	mar 4/02/25	mié 12/02/25	$10,927,113.00
335		**1.3.2.3.3.11**	**PAISAJISMO**	**10 días**	**mar 11/02/25**	**vie 21/02/25**	**$2,363,451.39**
336		1.3.2.3.3.11.1	PAISAJISMO	10 días	mar 11/02/25	vie 21/02/25	$2,363,451.39
337		**1.3.2.3.3.12**	**SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN (HORIZONTAL Y VERTI**	**10 días**	**mar 11/02/25**	**vie 21/02/25**	**$17,333,023.60**
338		1.3.2.3.3.12.1	SEÑALIZACIÓN	10 días	mar 11/02/25	vie 21/02/25	$17,333,023.60
339		1.3.2.3.3.13	FIN CIV 16000337	0 días	vie 21/02/25	vie 21/02/25	$0.00
340		**1.3.2.3.4**	**CIV 16000253**	**232 días**	**lun 24/06/24**	**vie 21/03/25**	**$1,457,467,047.87**
341		*1.3.2.3.4.1*	*SOLICITUD A INTERVENTORÍA DE AJUSTES A LOS DISEÑOS ENTREGADOS POR LA ENTIDAD*	*0 días*	*lun 24/06/24*	*lun 24/06/24*	*$0.00*

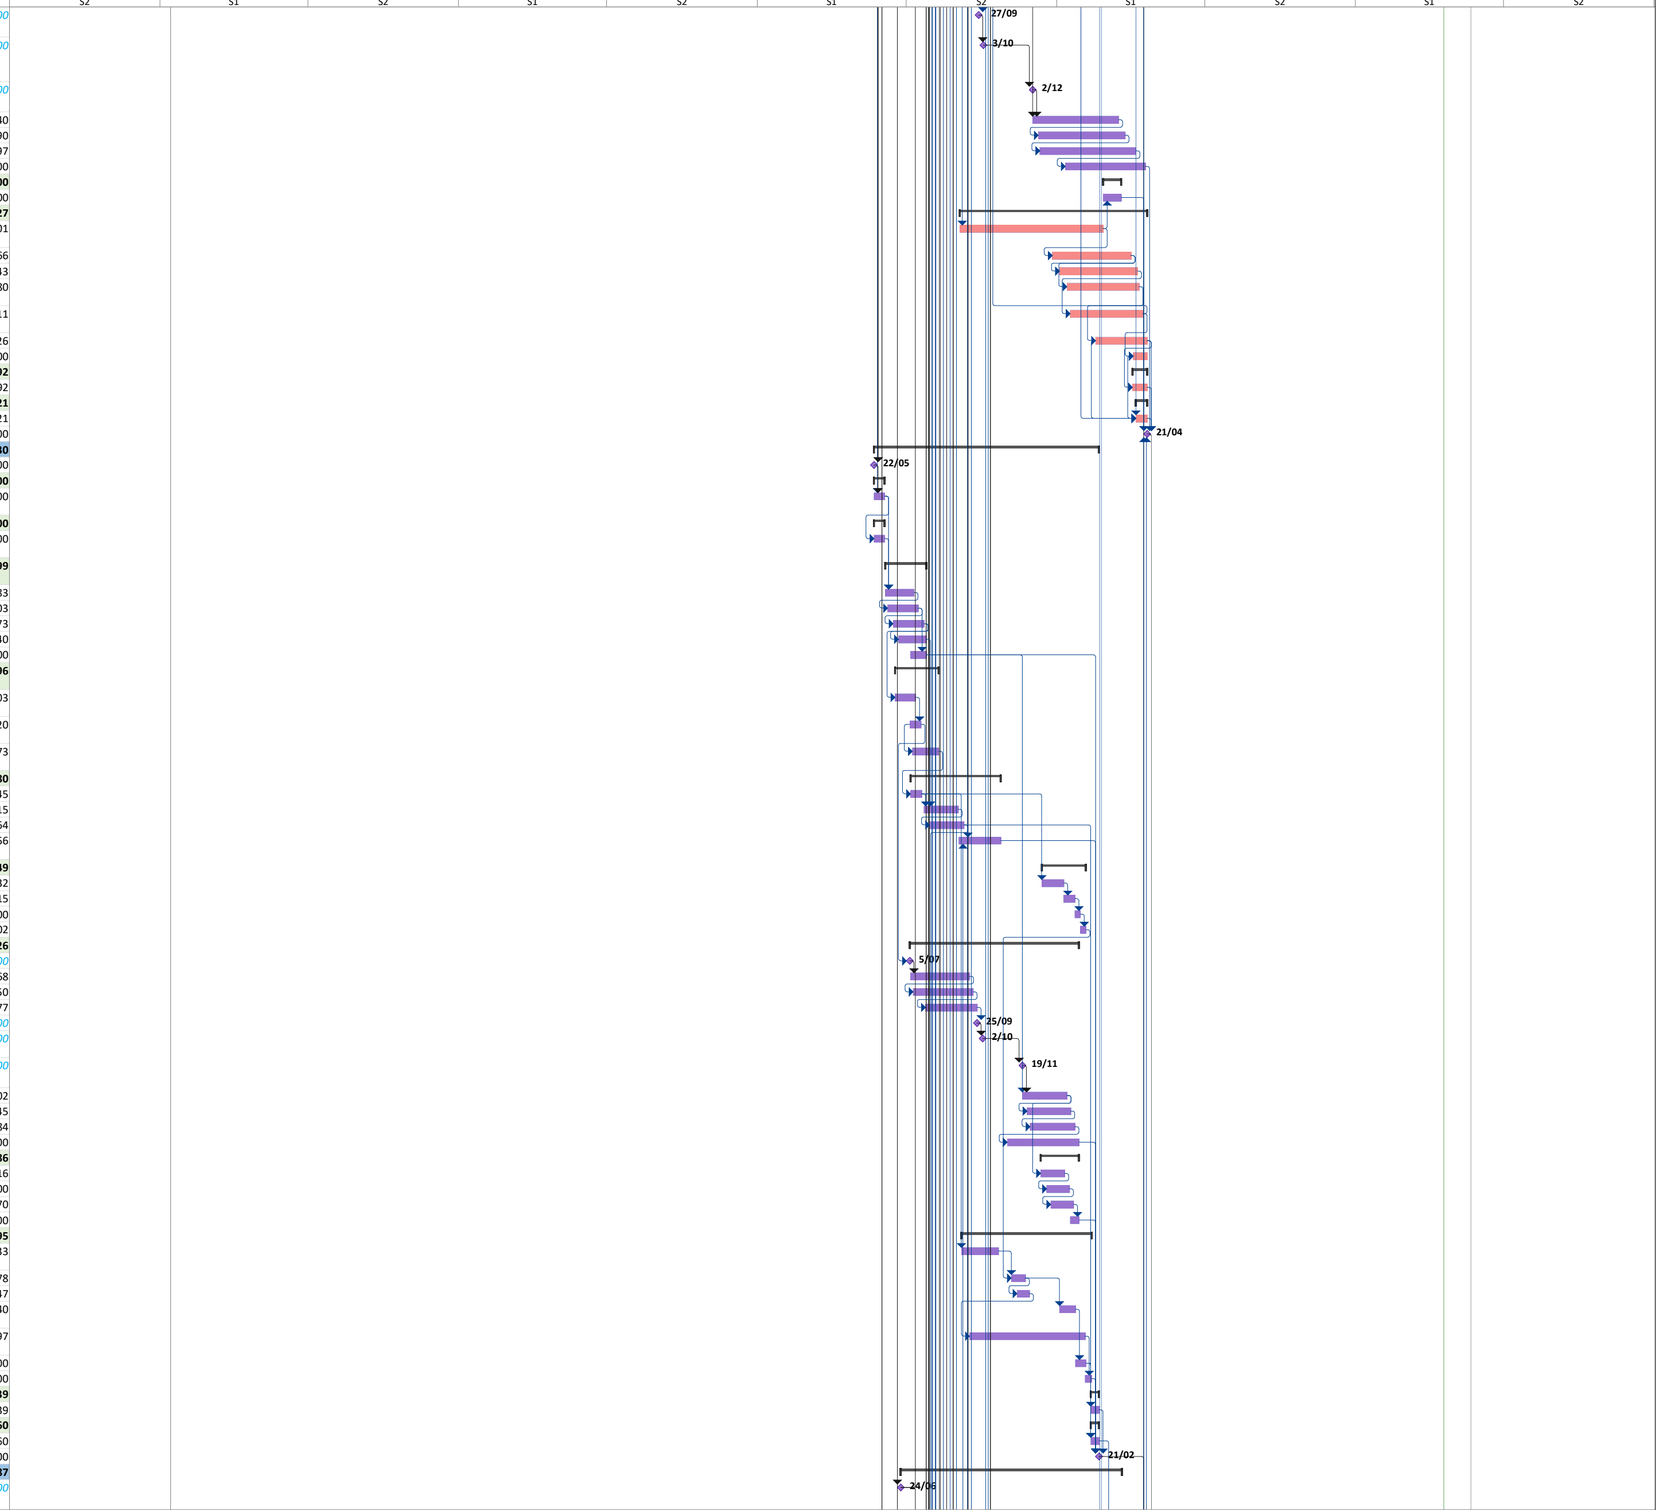

Proyecto:ID
Fecha: 14/1

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tareas externas
Hito externo
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
Sólo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
Sólo el comienzo
Sólo fin
Fecha límite
Tarea hito de sucesor controlado de ruta de acceso
Tarea de resumen de sucesor controlado de ruta de a
Tarea normal de sucesor controlado de ruta de acces
Tareas críticas
División crítica
Progreso


Id	Modo de tarea	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
342		*1.3.2.3.4.2*	*REMISIÓN DE LA COMUNICACIÓN A LA ENTIDAD POR PARTE DE INTERVENTORÍA PARA AJUSTE A LOS DISEÑOS ENTREGADOS POR LA ENTIDAD*	*0 días*	*mar 16/07/24*	*mar 16/07/24*	*$0.00*
343		*1.3.2.3.4.3*	*APROBACIÓN Y AJUSTES POR PARTE DE LA ENTIDAD (CONCEPTO DE VIABILIDAD PARA ACTIVIDADES)*	*0 días*	*mié 14/08/24*	*mié 14/08/24*	*$0.00*
344		1.3.2.3.4.4	INICIO CIV 16000253	0 días	jue 1/08/24	jue 1/08/24	$0.00
345		**1.3.2.3.4.5**	**TRAMITE DE PMT**	**10 días**	**lun 5/08/24**	**vie 16/08/24**	**$0.00**
346		1.3.2.3.4.5.1	IMPLEMENTACIÓN PMT ESPECIFICIO Y CERRAMIENTO DE OBRA	10 días	lun 5/08/24	vie 16/08/24	$0.00
347		**1.3.2.3.4.6**	**ACTIVIDADES DE ARQUEOLOGIA**	**7 días**	**vie 9/08/24**	**sáb 17/08/24**	**$0.00**
348		1.3.2.3.4.6.1	EXPLORACIÓN E INVESTIGACIÓN ARQUEOLOGICA EN LA ZONA DE INTERVENCIÓN	7 días	vie 9/08/24	sáb 17/08/24	$0.00
349		**1.3.2.3.4.7**	**REDES HIDROSANITARIAS ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL**	**59 días**	**mar 20/08/24**	**vie 25/10/24**	**$497,019,440.86**
350		1.3.2.3.4.7.1	EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS	19 días	mar 20/08/24	mar 10/09/24	$82,355,914.51
351		1.3.2.3.4.7.2	INSTALACION DE TUBERIAS	19 días	jue 22/08/24	jue 12/09/24	$232,395,432.63
352		1.3.2.3.4.7.3	RELLENO DE TUBERIAS	18 días	lun 26/08/24	lun 16/09/24	$125,750,844.56
353		1.3.2.3.4.7.4	CONSTRUCCION DE POZOS Y SUMIDEROS	21 días	mié 28/08/24	vie 20/09/24	$49,678,067.16
354		1.3.2.3.4.7.5	CONSTRUCCIÓN CAJAS DE INSPECCIÓN	40 días	mar 10/09/24	vie 25/10/24	$6,839,182.00
355		**1.3.2.3.4.8**	**PRELIMINARES - MOVIMIENTO DE TIERRAS, DEMOLICIONES Y RELLENOS**	**86 días**	**mar 20/08/24**	**jue 28/11/24**	**$167,318,854.79**
356		1.3.2.3.4.8.1	DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y TRANSPORTES DE ESCOMBROS	75 días	mar 20/08/24	vie 15/11/24	$94,022,013.73
357		1.3.2.3.4.8.2	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON RAJON Y SELLO DE RAJON	55 días	mié 18/09/24	vie 22/11/24	$39,606,229.75
358		1.3.2.3.4.8.3	INSTALACION DE GEOTEXTILES Y RELLENO DE MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA	55 días	mar 24/09/24	jue 28/11/24	$33,690,611.31
359		**1.3.2.3.4.9**	**PAVIMENTOS**	**94 días**	**jue 19/09/24**	**vie 10/01/25**	**$393,703,074.03**
360		1.3.2.3.4.9.1	BASES Y SUBBASES	80 días	jue 19/09/24	sáb 21/12/24	$54,406,228.80
361		1.3.2.3.4.9.2	MEZCLA ASFALTICA	80 días	mié 25/09/24	sáb 28/12/24	$78,475,268.12
362		1.3.2.3.4.9.3	CONCRETO LOSAS MR	83 días	vie 27/09/24	sáb 4/01/25	$255,661,637.51
363		1.3.2.3.4.9.4	INSTALACION DE ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO (BORDILLOS, SARDINELES FRANJAS)	18 días	mié 18/12/24	vie 10/01/25	$5,159,939.60
364		**1.3.2.3.4.10**	**REDES HIDROSANITARIAS ACUEDUCTO**	**10 días**	**mié 8/01/25**	**lun 20/01/25**	**$456,130.00**
365		1.3.2.3.4.10.1	INSTALACION DE TUBERIAS	10 días	mié 8/01/25	lun 20/01/25	$456,130.00
366		**1.3.2.3.4.11**	**REDES SECAS (Codensa)**	**89 días**	**mié 16/10/24**	**mié 29/01/25**	**$178,640,239.85**
367		*1.3.2.3.4.11.1*	*MANIOBRAS POR PARTE DE LA EMPRESA ENEL - CODE*	*0 días*	*mié 16/10/24*	*mié 16/10/24*	*$0.00*
368		1.3.2.3.4.11.2	EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS	56 días	mié 16/10/24	jue 19/12/24	$24,310,682.38
369		1.3.2.3.4.11.3	INSTALACION DE DUCTERIAS	55 días	lun 21/10/24	lun 23/12/24	$64,844,452.60
370		1.3.2.3.4.11.4	RELLENO DE DUCTERIAS	55 días	mar 22/10/24	jue 26/12/24	$14,232,891.87
371		1.3.2.3.4.11.5	CONSTRUCCION DE CAJAS Y CAMARAS	45 días	vie 6/12/24	mié 29/01/25	$75,252,213.00
372		**1.3.2.3.4.12**	**REDES SECAS (ETB)**	**41 días**	**lun 16/12/24**	**lun 3/02/25**	**$10,717,662.00**
373		*1.3.2.3.4.12.1*	*MANIOBRAS POR PARTE DE LA EMPRESA DE ETB*	*0 días*	*lun 16/12/24*	*lun 16/12/24*	*$0.00*
374		1.3.2.3.4.12.2	INSTALACION DE DUCTERIAS	22 días	sáb 28/12/24	vie 24/01/25	$2,825,941.00
375		1.3.2.3.4.12.3	NIVELACION DE CAJAS Y CAMARAS	8 días	vie 24/01/25	lun 3/02/25	$7,891,721.00
376		**1.3.2.3.4.13**	**ESPACIO PUBLICO**	**63 días**	**sáb 4/01/25**	**mar 18/03/25**	**$175,037,441.22**
377		1.3.2.3.4.13.1	DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y TRANSPORTES DE ESCOMBROS	31 días	sáb 4/01/25	lun 10/02/25	$27,767,552.23
378		1.3.2.3.4.13.2	INSTALACION DE GEOTEXTILES	10 días	sáb 1/02/25	jue 13/02/25	$3,977,822.10
379		1.3.2.3.4.13.3	RELLENOS EN MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA	12 días	jue 6/02/25	mié 19/02/25	$15,934,932.12
380		1.3.2.3.4.13.4	RELLENOS EN MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA RAMPAS	10 días	mar 11/02/25	vie 21/02/25	$9,241,252.00
381		1.3.2.3.4.13.5	INSTALACION DE ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO Y PREFABRICADOS	25 días	mar 11/02/25	mar 11/03/25	$95,914,864.65
382		1.3.2.3.4.13.6	CONCRETO LOSAS MR	8 días	mar 25/02/25	mié 5/03/25	$11,816,369.12
383		1.3.2.3.4.13.7	ELEMENTOS MOBILIARIO URBANO (CANECAS, BANCAS	10 días	jue 6/03/25	mar 18/03/25	$10,384,649.00
384		**1.3.2.3.4.14**	**PAISAJISMO**	**15 días**	**mié 5/03/25**	**vie 21/03/25**	**$6,057,522.37**
385		1.3.2.3.4.14.1	PAISAJISMO	15 días	mié 5/03/25	vie 21/03/25	$6,057,522.37
386		**1.3.2.3.4.15**	**SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN (HORIZONTAL Y VERTI**	**15 días**	**mié 5/03/25**	**vie 21/03/25**	**$28,516,682.75**
387		1.3.2.3.4.15.1	SEÑALIZACIÓN	15 días	mié 5/03/25	vie 21/03/25	$28,516,682.75
388		*1.3.2.3.4.16*	*FIN CIV 16000253*	*0 días*	*vie 21/03/25*	*vie 21/03/25*	*$0.00*
389		**1.3.2.3.5**	**CIV 16000265**	**232 días**	**lun 24/06/24**	**vie 21/03/25**	**$1,267,164,609.99**
390		*1.3.2.3.5.1*	*SOLICITUD A INTERVENTORÍA DE AJUSTES A LOS DISEÑOS ENTREGADOS POR LA ENTIDAD*	*0 días*	*lun 24/06/24*	*lun 24/06/24*	*$0.00*
391		*1.3.2.3.5.2*	*REMISIÓN DE LA COMUNICACIÓN A LA ENTIDAD POR PARTE DE INTERVENTORÍA PARA AJUSTE A LOS DISEÑOS ENTREGADOS POR LA ENTIDAD*	*0 días*	*mar 16/07/24*	*mar 16/07/24*	*$0.00*
392		*1.3.2.3.5.3*	*APROBACIÓN Y AJUSTES POR PARTE DE LA ENTIDAD (CONCEPTO DE VIABILIDAD PARA ACTIVIDADES)*	*0 días*	*mié 14/08/24*	*mié 14/08/24*	*$0.00*
393		1.3.2.3.5.4	INICIO CIV 16000265	0 días	jue 15/08/24	jue 15/08/24	$0.00
394		**1.3.2.3.5.5**	**TRAMITE DE PMT**	**6 días**	**jue 15/08/24**	**vie 23/08/24**	**$0.00**
395		1.3.2.3.5.5.1	IMPLEMENTACIÓN PMT ESPECIFICIO Y CERRAMIENTO DE OBRA	6 días	jue 15/08/24	vie 23/08/24	$0.00
396		**1.3.2.3.5.6**	**ACTIVIDADES DE ARQUEOLOGIA**	**6 días**	**jue 15/08/24**	**vie 23/08/24**	**$0.00**
397		1.3.2.3.5.6.1	EXPLORACIÓN E INVESTIGACIÓN ARQUEOLOGICA EN LA ZONA DE INTERVENCIÓN	6 días	jue 15/08/24	vie 23/08/24	$0.00
398		**1.3.2.3.5.7**	**REDES HIDROSANITARIAS ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL**	**79 días**	**mié 18/09/24**	**jue 19/12/24**	**$419,424,088.13**
399		1.3.2.3.5.7.1	EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS	60 días	mié 18/09/24	jue 28/11/24	$55,574,138.96
400		1.3.2.3.5.7.2	INSTALACION DE TUBERIAS	65 días	vie 20/09/24	vie 6/12/24	$199,685,005.60
401		1.3.2.3.5.7.3	RELLENO DE TUBERIAS	68 días	lun 23/09/24	jue 12/12/24	$72,146,942.74
402		1.3.2.3.5.7.4	CONSTRUCCION DE POZOS Y SUMIDEROS	70 días	mié 25/09/24	mar 17/12/24	$87,040,980.83
403		1.3.2.3.5.7.5	CONSTRUCCIÓN CAJAS DE INSPECCIÓN	33 días	mié 13/11/24	jue 19/12/24	$4,977,020.00
404		**1.3.2.3.5.8**	**PRELIMINARES - MOVIMIENTO DE TIERRAS, DEMOLICIONES Y RELLENOS**	**109 días**	**lun 26/08/24**	**mar 31/12/24**	**$138,857,856.39**
405		1.3.2.3.5.8.1	DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y TRANSPORTES DE ESCOMBROS	90 días	lun 26/08/24	lun 9/12/24	$70,731,654.84
406		1.3.2.3.5.8.2	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON RAJON Y SELLO DE RAJON	74 días	jue 19/09/24	lun 16/12/24	$40,077,059.09
407		1.3.2.3.5.8.3	INSTALACION DE GEOTEXTILES Y RELLENO DE MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA	40 días	vie 15/11/24	mar 31/12/24	$28,049,142.46
408		**1.3.2.3.5.9**	**PAVIMENTOS**	**43 días**	**lun 20/01/25**	**sáb 8/03/25**	**$314,122,081.40**
409		1.3.2.3.5.9.1	BASES Y SUBBASES	6 días	lun 20/01/25	lun 27/01/25	$39,382,059.75
410		1.3.2.3.5.9.2	MEZCLA ASFALTICA	4 días	vie 14/02/25	mié 19/02/25	$54,947,408.21
411		1.3.2.3.5.9.3	CONCRETO LOSAS MR	5 días	mié 19/02/25	lun 24/02/25	$217,923,390.64
412		1.3.2.3.5.9.4	INSTALACION DE ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO (BORDILLOS, SARDINELES FRANJAS)	6 días	sáb 1/03/25	sáb 8/03/25	$1,869,222.80
413		**1.3.2.3.5.10**	**REDES HIDROSANITARIAS ACUEDUCTO**	**30 días**	**lun 27/01/25**	**vie 28/02/25**	**$28,137,403.92**
414		1.3.2.3.5.10.1	EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS	14 días	lun 27/01/25	mar 11/02/25	$6,768,116.40
415		1.3.2.3.5.10.2	INSTALACION DE TUBERIAS	7 días	vie 7/02/25	vie 14/02/25	$10,452,005.28
416		1.3.2.3.5.10.3	INSTALACION ACCESORIOS Y EMPATES	10 días	jue 13/02/25	lun 24/02/25	$4,666,042.00
417		1.3.2.3.5.10.4	RELLENO DE TUBERIAS	8 días	jue 20/02/25	vie 28/02/25	$6,251,240.24



Proyecto:ID
Fecha: 14/1

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tareas externas
Hito externo
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
Sólo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
Sólo el comienzo
Sólo fin
Fecha límite
Tarea hito de sucesor controlado de ruta de acceso
Tarea de resumen de sucesor controlado de ruta de a
Tarea normal de sucesor controlado de ruta de acces
Tareas críticas
División crítica
Progreso

Id	Modo de tarea	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
418		**1.3.2.3.5.11**	**REDES SECAS (Codensa)**	**45 días**	**mié 22/01/25**	**jue 13/03/25**	**$103,704,499.26**
419		*1.3.2.3.5.11.1*	*MANIOBRAS POR PARTE DE LA EMPRESA ENEL - CODE*	*0 días*	*mié 22/01/25*	*mié 22/01/25*	*$0.00*
420		1.3.2.3.5.11.2	EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS	25 días	mié 22/01/25	mié 19/02/25	$14,422,270.16
421		1.3.2.3.5.11.3	INSTALACION DE DUCTERIAS	17 días	mié 5/02/25	lun 24/02/25	$38,823,115.35
422		1.3.2.3.5.11.4	RELLENO DE DUCTERIAS	14 días	mié 12/02/25	jue 27/02/25	$12,459,559.75
423		1.3.2.3.5.11.5	CONSTRUCCION DE CAJAS Y CAMARAS	20 días	mié 19/02/25	jue 13/03/25	$37,999,554.00
424		**1.3.2.3.5.12**	**REDES SECAS (ETB)**	**27 días**	**jue 30/01/25**	**sáb 1/03/25**	**$7,015,861.52**
425		*1.3.2.3.5.12.1*	*MANIOBRAS POR PARTE DE LA EMPRESA DE ETB*	*0 días*	*jue 30/01/25*	*jue 30/01/25*	*$0.00*
426		1.3.2.3.5.12.2	EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS	12 días	jue 30/01/25	jue 13/02/25	$1,224,141.52
427		1.3.2.3.5.12.3	NIVELACION DE CAJAS Y CAMARAS	7 días	vie 21/02/25	sáb 1/03/25	$5,791,720.00
428		**1.3.2.3.5.13**	**ESPACIO PUBLICO**	**160 días**	**jue 5/09/24**	**mar 11/03/25**	**$191,057,500.56**
429		1.3.2.3.5.13.1	DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y TRANSPORTES DE ESCOMBROS	100 días	jue 5/09/24	mar 31/12/24	$27,207,038.30
430		1.3.2.3.5.13.2	INSTALACION DE GEOTEXTILES	20 días	mar 24/12/24	lun 20/01/25	$3,487,913.10
431		1.3.2.3.5.13.3	RELLENOS EN MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA	18 días	vie 10/01/25	jue 30/01/25	$22,802,513.61
432		1.3.2.3.5.13.4	RELLENOS EN MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA RAMPAS	5 días	mar 28/01/25	lun 3/02/25	$6,416,770.80
433		1.3.2.3.5.13.5	INSTALACION DE ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO Y PREFABRICADOS	36 días	jue 23/01/25	mar 4/03/25	$112,501,081.71
434		1.3.2.3.5.13.6	CONCRETO LOSAS MR	7 días	jue 6/02/25	vie 14/02/25	$8,779,090.04
435		1.3.2.3.5.13.7	ELEMENTOS MOBILIARIO URBANO (CANECAS, BANCA	6 días	mar 4/03/25	mar 11/03/25	$9,863,093.00
436		**1.3.2.3.5.14**	**PAISAJISMO**	**10 días**	**mar 11/03/25**	**vie 21/03/25**	**$8,503,796.51**
437		1.3.2.3.5.14.1	PAISAJISMO	10 días	mar 11/03/25	vie 21/03/25	$8,503,796.51
438		**1.3.2.3.5.15**	**SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN (HORIZONTAL Y VERTI**	**12 días**	**sáb 8/03/25**	**vie 21/03/25**	**$56,341,522.30**
439		1.3.2.3.5.15.1	SEÑALIZACIÓN	12 días	sáb 8/03/25	vie 21/03/25	$56,341,522.30
440		1.3.2.3.5.16	FIN CIV 16000265	0 días	vie 21/03/25	vie 21/03/25	$0.00
441		**1.3.2.3.6**	**CIV 16000287**	**255 días**	**lun 24/06/24**	**lun 21/04/25**	**$1,298,936,510.45**
442		*1.3.2.3.6.1*	*SOLICITUD A INTERVENTORÍA DE AJUSTES A LOS DISEÑOS ENTREGADOS POR LA ENTIDAD*	*0 días*	*lun 24/06/24*	*lun 24/06/24*	*$0.00*
443		*1.3.2.3.6.2*	*REMISIÓN DE LA COMUNICACIÓN A LA ENTIDAD POR PARTE DE INTERVENTORÍA PARA AJUSTE A LOS DISEÑOS ENTREGADOS POR LA ENTIDAD*	*0 días*	*mar 16/07/24*	*mar 16/07/24*	*$0.00*
444		*1.3.2.3.6.3*	*APROBACIÓN Y AJUSTES POR PARTE DE LA ENTIDAD (CONCEPTO DE VIABILIDAD PARA ACTIVIDADES)*	*0 días*	*mié 14/08/24*	*mié 14/08/24*	*$0.00*
445		1.3.2.3.6.4	INICIO CIV 16000287	0 días	vie 2/08/24	vie 2/08/24	$0.00
446		**1.3.2.3.6.5**	**TRAMITE DE PMT**	**6 días**	**vie 2/08/24**	**vie 9/08/24**	**$0.00**
447		1.3.2.3.6.5.1	IMPLEMENTACIÓN PMT ESPECIFICIO Y CERRAMIENTO DE OBRA	6 días	vie 2/08/24	vie 9/08/24	$0.00
448		**1.3.2.3.6.6**	**ACTIVIDADES DE ARQUEOLOGIA**	**6 días**	**vie 2/08/24**	**vie 9/08/24**	**$0.00**
449		1.3.2.3.6.6.1	EXPLORACIÓN E INVESTIGACIÓN ARQUEOLOGICA EN LA ZONA DE INTERVENCIÓN	6 días	vie 2/08/24	vie 9/08/24	$0.00
450		**1.3.2.3.6.7**	**REDES HIDROSANITARIAS ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL**	**57 días**	**mié 21/08/24**	**vie 25/10/24**	**$398,378,258.09**
451		1.3.2.3.6.7.1	EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS	48 días	mié 21/08/24	mar 15/10/24	$52,663,190.21
452		1.3.2.3.6.7.2	INSTALACION DE TUBERIAS	46 días	lun 26/08/24	jue 17/10/24	$188,464,883.04
453		1.3.2.3.6.7.3	RELLENO DE TUBERIAS	46 días	mié 28/08/24	sáb 19/10/24	$85,489,245.12
454		1.3.2.3.6.7.4	CONSTRUCCION DE POZOS Y SUMIDEROS	35 días	jue 12/09/24	mar 22/10/24	$66,666,755.72
455		1.3.2.3.6.7.5	CONSTRUCCIÓN CAJAS DE INSPECCIÓN	12 días	jue 10/10/24	vie 25/10/24	$5,094,184.00
456		**1.3.2.3.6.8**	**PRELIMINARES - MOVIMIENTO DE TIERRAS, DEMOLICIONES Y RELLENOS**	**96 días**	**jue 22/08/24**	**jue 12/12/24**	**$163,745,659.57**
457		1.3.2.3.6.8.1	DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y TRANSPORTES DE ESCOMBROS	75 días	jue 22/08/24	mar 19/11/24	$86,116,679.66
458		1.3.2.3.6.8.2	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON RAJON Y SELLO DE RAJON	67 días	jue 5/09/24	vie 22/11/24	$42,916,634.93
459		1.3.2.3.6.8.3	INSTALACION DE GEOTEXTILES Y RELLENO DE MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA	25 días	jue 14/11/24	jue 12/12/24	$34,712,344.98
460		**1.3.2.3.6.9**	**PAVIMENTOS**	**75 días**	**vie 25/10/24**	**jue 23/01/25**	**$329,261,713.90**
461		1.3.2.3.6.9.1	BASES Y SUBBASES	65 días	vie 25/10/24	lun 13/01/25	$52,442,738.70
462		1.3.2.3.6.9.2	MEZCLA ASFALTICA	65 días	lun 28/10/24	mié 15/01/25	$62,028,631.80
463		1.3.2.3.6.9.3	CONCRETO LOSAS MR	65 días	mar 5/11/24	mié 22/01/25	$209,924,231.20
464		1.3.2.3.6.9.4	INSTALACION DE ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO (BORDILLOS, SARDINELES FRANJAS)	65 días	jue 7/11/24	jue 23/01/25	$4,866,112.20
465		**1.3.2.3.6.10**	**REDES HIDROSANITARIAS ACUEDUCTO**	**84 días**	**lun 13/01/25**	**lun 21/04/25**	**$19,692,519.48**
466		1.3.2.3.6.10.1	EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS	50 días	lun 13/01/25	lun 10/03/25	$3,098,895.36
467		1.3.2.3.6.10.2	INSTALACION DE TUBERIAS	60 días	vie 17/01/25	mié 26/03/25	$5,886,911.52
468		1.3.2.3.6.10.3	INSTALACION ACCESORIOS Y EMPATES	70 días	mar 21/01/25	jue 10/04/25	$8,376,230.00
469		1.3.2.3.6.10.4	RELLENO DE TUBERIAS	72 días	lun 27/01/25	lun 21/04/25	$2,330,482.60
470		**1.3.2.3.6.11**	**REDES SECAS (Codensa)**	**169 días**	**mié 2/10/24**	**lun 21/04/25**	**$162,738,186.70**
471		*1.3.2.3.6.11.1*	*MANIOBRAS POR PARTE DE LA EMPRESA ENEL - CODE*	*0 días*	*mié 2/10/24*	*mié 2/10/24*	*$0.00*
472		1.3.2.3.6.11.2	EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS	3 días	jue 3/10/24	lun 7/10/24	$1,352,570.92
473		1.3.2.3.6.11.3	INSTALACION DE DUCTERIAS	5 días	vie 4/10/24	mié 9/10/24	$10,446,436.32
474		1.3.2.3.6.11.4	RELLENO DE DUCTERIAS	6 días	mié 9/10/24	mié 16/10/24	$4,109,251.78
475		*1.3.2.3.6.11.5*	*NOTIFICACIÓN INTERFERENCIA DE DUCTERIA ENEL SOBRE INFRAESTRUCTURA ETB*	*0 días*	*mié 16/10/24*	*mié 16/10/24*	*$0.00*
476		*1.3.2.3.6.11.6*	*CONCEPTO DE VIABILIDAD Y MANIOBRA A CARGO DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS*	*0 días*	*mié 27/11/24*	*mié 27/11/24*	*$0.00*
477		1.3.2.3.6.11.7	EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS	100 días	mié 27/11/24	mar 25/03/25	$17,365,931.40
478		1.3.2.3.6.11.8	INSTALACION DE DUCTERIAS	100 días	sáb 30/11/24	jue 27/03/25	$57,764,948.18
479		1.3.2.3.6.11.9	RELLENO DE DUCTERIAS	110 días	mié 4/12/24	vie 11/04/25	$7,362,867.10
480		1.3.2.3.6.11.10	CONSTRUCCION DE CAJAS Y CAMARAS	108 días	vie 13/12/24	lun 21/04/25	$64,336,181.00
481		**1.3.2.3.6.12**	**REDES SECAS (ETB)**	**22 días**	**mié 22/01/25**	**vie 14/02/25**	**$31,806,744.43**
482		1.3.2.3.6.12.1	EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS	18 días	mié 22/01/25	mar 11/02/25	$5,431,553.72
483		1.3.2.3.6.12.2	INSTALACIÓN DE DUCTERIAS	15 días	lun 27/01/25	mié 12/02/25	$6,996,788.40
484		1.3.2.3.6.12.3	RELLENO DE DUCTERIAS	15 días	mar 28/01/25	jue 13/02/25	$2,498,086.31
485		1.3.2.3.6.12.4	NIVELACION DE CAJAS Y CAMARAS	14 días	jue 30/01/25	vie 14/02/25	$16,880,316.00
486		**1.3.2.3.6.13**	**ESPACIO PUBLICO**	**84 días**	**lun 13/01/25**	**lun 21/04/25**	**$160,445,628.01**
487		1.3.2.3.6.13.1	DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y TRANSPORTES DE ESCOMBROS	55 días	lun 13/01/25	vie 14/03/25	$28,209,429.11
488		1.3.2.3.6.13.2	INSTALACION DE GEOTEXTILES	50 días	mié 29/01/25	jue 27/03/25	$6,720,595.56
489		1.3.2.3.6.13.3	RELLENOS EN MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA	55 días	mar 4/02/25	mar 8/04/25	$18,999,772.47
490		1.3.2.3.6.13.4	RELLENOS EN MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA RAMPAS	50 días	mié 12/02/25	jue 10/04/25	$2,699,855.20
491		1.3.2.3.6.13.5	INSTALACION DE ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO Y PREFABRICADOS	57 días	lun 10/02/25	mié 16/04/25	$88,618,958.47
492		1.3.2.3.6.13.6	CONCRETO LOSAS MR	49 días	jue 20/02/25	lun 21/04/25	$6,142,393.20
493		1.3.2.3.6.13.7	ELEMENTOS MOBILIARIO URBANO (CANECAS, BANCA	13 días	jue 3/04/25	lun 21/04/25	$9,054,624.00
494		**1.3.2.3.6.14**	**PAISAJISMO**	**10 días**	**lun 7/04/25**	**lun 21/04/25**	**$6,834,780.44**
495		1.3.2.3.6.14.1	PAISAJISMO	10 días	lun 7/04/25	lun 21/04/25	$6,834,780.44
496		**1.3.2.3.6.15**	**SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN (HORIZONTAL Y VERTI**	**8 días**	**mié 9/04/25**	**lun 21/04/25**	**$26,033,019.83**
497		1.3.2.3.6.15.1	SEÑALIZACIÓN	8 días	mié 9/04/25	lun 21/04/25	$26,033,019.83
498		1.3.2.3.6.16	FIN CIV 16000287	0 días	lun 21/04/25	lun 21/04/25	$0.00

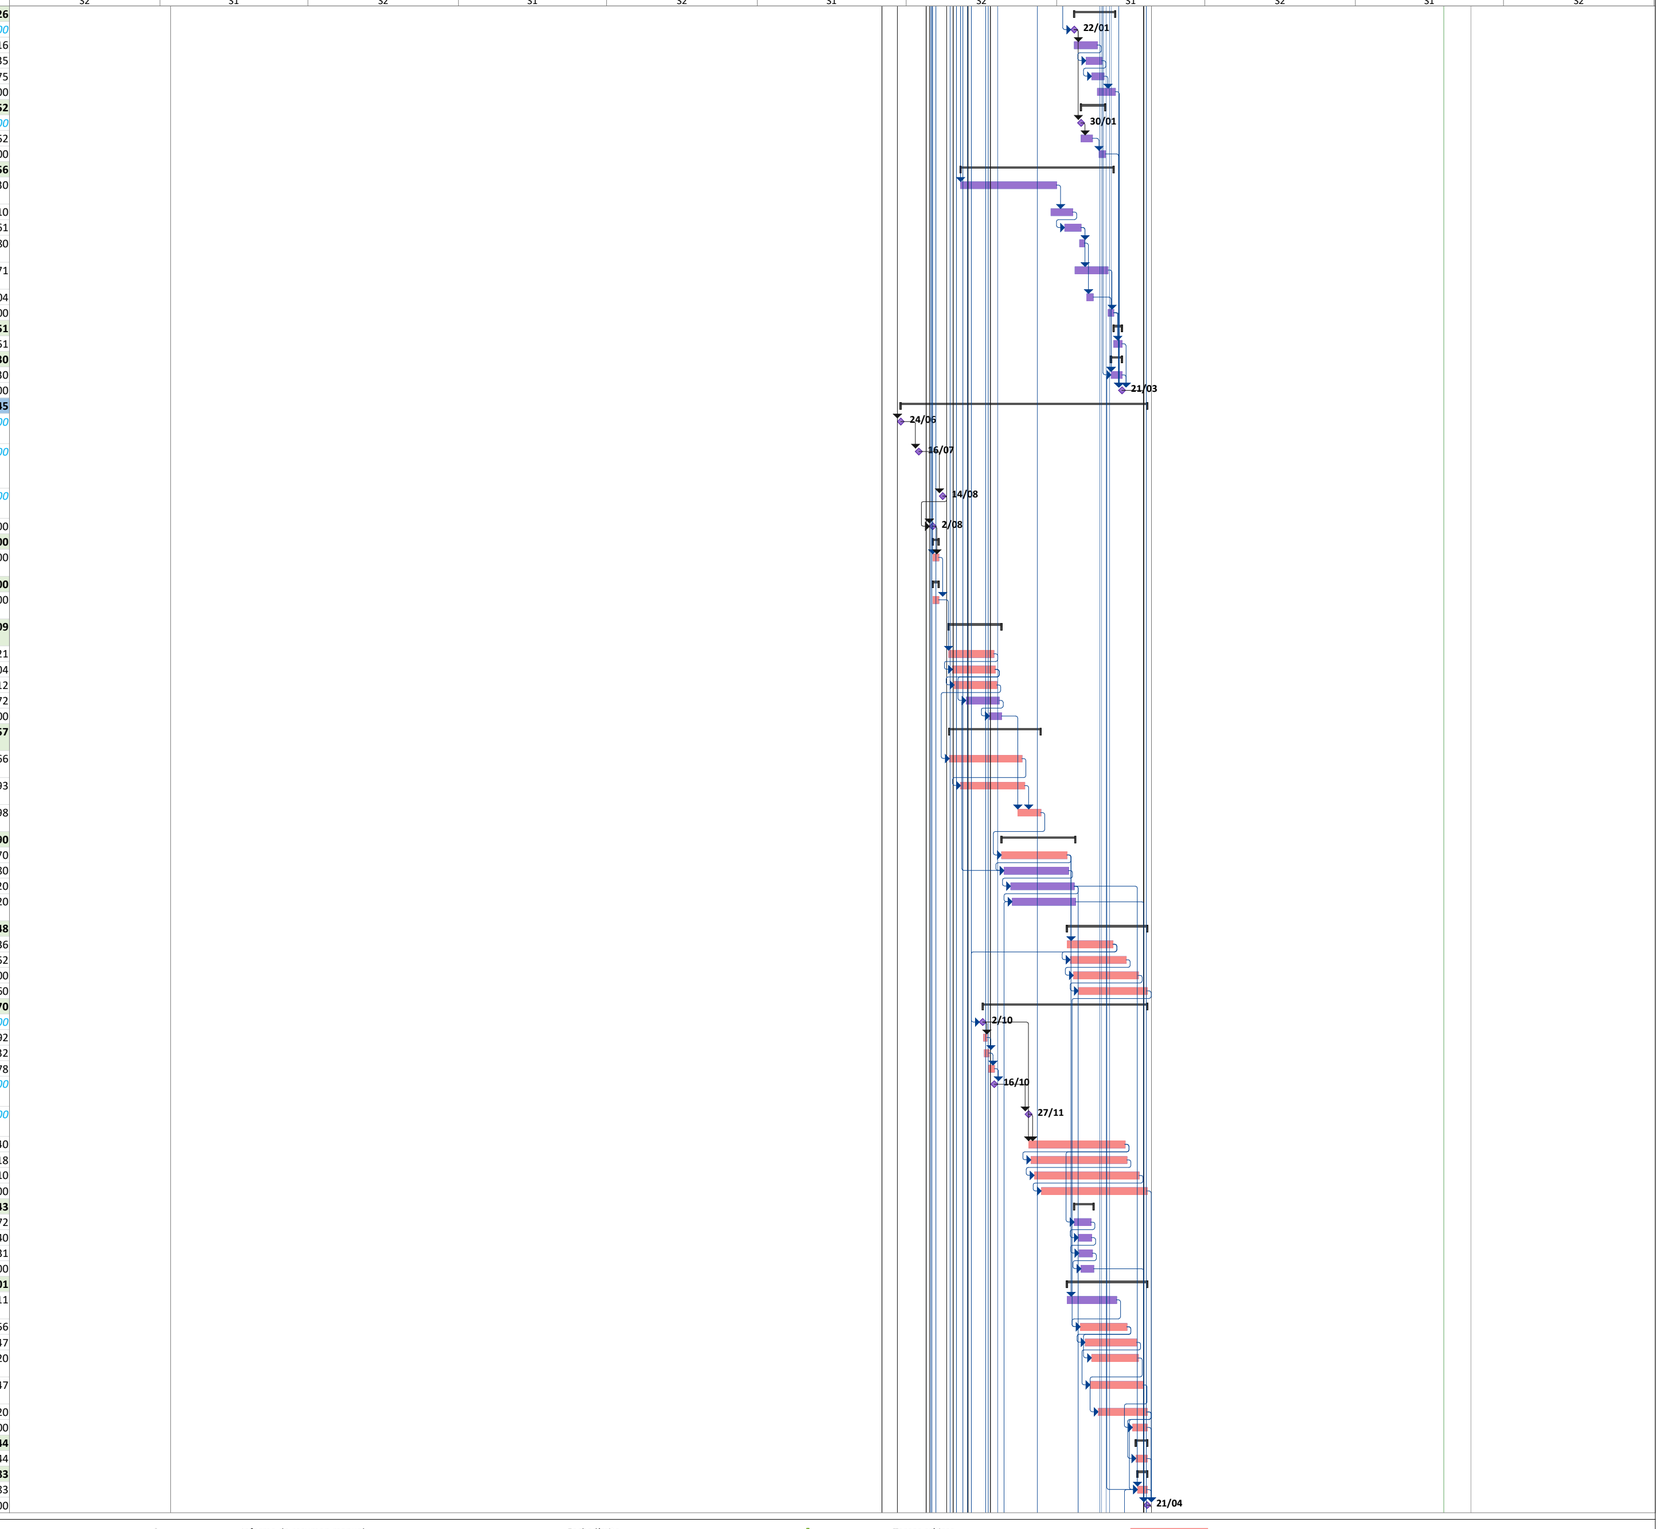


Proyecto:ID
Fecha: 14/1

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tareas externas
Hito externo
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
Sólo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
Sólo el comienzo
Sólo fin
Fecha límite
Tarea hito de sucesor controlado de ruta de acceso
Tarea de resumen de sucesor controlado de ruta de a
Tarea normal de sucesor controlado de ruta de acces
Tareas críticas
División crítica
Progreso

JESSICA PAOLA JAIMES GUARÍN
DIRECTORA DE OBRA
CONTRATO 1847 DE 2021

RICARDO ALBERTO PEÑA QUEVEDO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
CONTRATO 1842 DE 2021


Id	Modo de tarea	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
499		**1.3.2.3.7**	**CIV 16000307**	**255 días**	**lun 24/06/24**	**lun 21/04/25**	**$1,321,626,988.43**
500		*1.3.2.3.7.1*	*SOLICITUD A INTERVENTORÍA DE AJUSTES A LOS DISEÑOS ENTREGADOS POR LA ENTIDAD*	*0 días*	*lun 24/06/24*	*lun 24/06/24*	*$0.00*
501		*1.3.2.3.7.2*	*REMISIÓN DE LA COMUNICACIÓN A LA ENTIDAD POR PARTE DE INTERVENTORÍA PARA AJUSTE A LOS DISEÑOS ENTREGADOS POR LA ENTIDAD*	*0 días*	*mar 16/07/24*	*mar 16/07/24*	*$0.00*
502		*1.3.2.3.7.3*	*APROBACIÓN Y AJUSTES POR PARTE DE LA ENTIDAD (CONCEPTO DE VIABILIDAD PARA ACTIVIDADES)*	*0 días*	*mié 14/08/24*	*mié 14/08/24*	*$0.00*
503		1.3.2.3.7.4	INICIO CIV 16000307	0 días	vie 23/08/24	vie 23/08/24	$0.00
504		**1.3.2.3.7.5**	**TRAMITE DE PMT**	**10 días**	**vie 23/08/24**	**mié 4/09/24**	**$0.00**
505		1.3.2.3.7.5.1	IMPLEMENTACIÓN PMT ESPECIFICIO Y CERRAMIENTO DE OBRA	10 días	vie 23/08/24	mié 4/09/24	$0.00
506		**1.3.2.3.7.6**	**ACTIVIDADES DE ARQUEOLOGIA**	**8 días**	**mié 28/08/24**	**vie 6/09/24**	**$0.00**
507		1.3.2.3.7.6.1	EXPLORACIÓN E INVESTIGACIÓN ARQUEOLOGICA EN LA ZONA DE INTERVENCIÓN	8 días	mié 28/08/24	vie 6/09/24	$0.00
508		**1.3.2.3.7.7**	**REDES HIDROSANITARIAS ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL**	**85 días**	**vie 13/09/24**	**sáb 21/12/24**	**$375,420,755.50**
509		1.3.2.3.7.7.1	EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS	65 días	vie 13/09/24	vie 29/11/24	$62,079,303.64
510		1.3.2.3.7.7.2	INSTALACION DE TUBERIAS	65 días	mar 17/09/24	mar 3/12/24	$154,302,826.00
511		1.3.2.3.7.7.3	RELLENO DE TUBERIAS	65 días	vie 20/09/24	vie 6/12/24	$79,476,297.78
512		1.3.2.3.7.7.4	CONSTRUCCION DE POZOS Y SUMIDEROS	65 días	lun 23/09/24	lun 9/12/24	$76,004,138.08
513		1.3.2.3.7.7.5	CONSTRUCCIÓN CAJAS DE INSPECCIÓN	15 días	jue 5/12/24	sáb 21/12/24	$3,558,190.00
514		**1.3.2.3.7.8**	**PRELIMINARES - MOVIMIENTO DE TIERRAS, DEMOLICIONES Y RELLENOS**	**107 días**	**vie 23/08/24**	**jue 26/12/24**	**$181,308,944.80**
515		1.3.2.3.7.8.1	DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y TRANSPORTES DE ESCOMBROS	95 días	vie 23/08/24	jue 12/12/24	$78,018,925.07
516		1.3.2.3.7.8.2	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON RAJON Y SELLO DE RAJON	80 días	mar 17/09/24	jue 19/12/24	$59,623,520.26
517		1.3.2.3.7.8.3	INSTALACION DE GEOTEXTILES Y RELLENO DE MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA	82 días	vie 20/09/24	jue 26/12/24	$43,666,499.47
518		**1.3.2.3.7.9**	**PAVIMENTOS**	**70 días**	**mié 20/11/24**	**mar 11/02/25**	**$313,644,862.53**
519		1.3.2.3.7.9.1	BASES Y SUBBASES	35 días	mié 20/11/24	mar 31/12/24	$47,570,752.35
520		1.3.2.3.7.9.2	MEZCLA ASFALTICA	35 días	lun 25/11/24	mar 7/01/25	$51,757,254.28
521		1.3.2.3.7.9.3	CONCRETO LOSAS MR	10 días	jue 23/01/25	mar 4/02/25	$209,184,312.10
522		1.3.2.3.7.9.4	INSTALACION DE ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO (BORDILLOS, SARDINELES FRANJAS)	5 días	mié 5/02/25	mar 11/02/25	$5,132,543.80
523		**1.3.2.3.7.10**	**REDES HIDROSANITARIAS ACUEDUCTO**	**85 días**	**mié 8/01/25**	**mar 15/04/25**	**$5,860,747.06**
524		1.3.2.3.7.10.1	EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS	55 días	mié 8/01/25	mar 11/03/25	$864,031.24
525		1.3.2.3.7.10.2	INSTALACION DE TUBERIAS	58 días	sáb 11/01/25	mar 18/03/25	$1,367,608.32
526		1.3.2.3.7.10.3	INSTALACION ACCESORIOS Y EMPATES	75 días	mar 14/01/25	mié 9/04/25	$3,110,120.00
527		1.3.2.3.7.10.4	RELLENO DE TUBERIAS	75 días	lun 20/01/25	mar 15/04/25	$518,987.50
528		**1.3.2.3.7.11**	**REDES SECAS (Codensa)**	**83 días**	**sáb 11/01/25**	**mié 16/04/25**	**$194,907,503.36**
529		*1.3.2.3.7.11.1*	*MANIOBRAS POR PARTE DE LA EMPRESA ENEL - CODE*	*0 días*	*sáb 11/01/25*	*sáb 11/01/25*	*$0.00*
530		1.3.2.3.7.11.2	EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS	65 días	sáb 11/01/25	mié 26/03/25	$27,712,188.56
531		1.3.2.3.7.11.3	INSTALACION DE DUCTERIAS	65 días	lun 20/01/25	jue 3/04/25	$86,414,210.41
532		1.3.2.3.7.11.4	RELLENO DE DUCTERIAS	65 días	vie 24/01/25	mié 9/04/25	$18,079,383.39
533		1.3.2.3.7.11.5	CONSTRUCCION DE CAJAS Y CAMARAS	60 días	jue 6/02/25	mié 16/04/25	$62,701,721.00
534		**1.3.2.3.7.12**	**REDES SECAS (ETB)**	**10 días**	**jue 20/02/25**	**mar 4/03/25**	**$12,462,691.33**
535		1.3.2.3.7.12.1	NIVELACION DE CAJAS Y CAMARAS	10 días	jue 20/02/25	mar 4/03/25	$12,462,691.33
536		**1.3.2.3.7.13**	**ESPACIO PUBLICO**	**88 días**	**mié 8/01/25**	**lun 21/04/25**	**$186,599,049.15**
537		1.3.2.3.7.13.1	DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y TRANSPORTES DE ESCOMBROS	69 días	mié 8/01/25	jue 27/03/25	$30,661,191.42
538		1.3.2.3.7.13.2	INSTALACION DE GEOTEXTILES	58 días	mar 28/01/25	vie 4/04/25	$6,336,076.74
539		1.3.2.3.7.13.3	RELLENOS EN MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA	58 días	vie 31/01/25	mar 8/04/25	$24,192,807.99
540		1.3.2.3.7.13.4	RELLENOS EN MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA RAMPAS	55 días	vie 7/02/25	vie 11/04/25	$3,580,950.20
541		1.3.2.3.7.13.5	INSTALACION DE ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO Y PREFABRICADOS	64 días	mar 4/02/25	lun 21/04/25	$107,653,002.52
542		1.3.2.3.7.13.6	CONCRETO LOSAS MR	54 días	vie 14/02/25	sáb 19/04/25	$6,716,426.28
543		1.3.2.3.7.13.7	ELEMENTOS MOBILIARIO URBANO (CANECAS, BANCA	10 días	lun 7/04/25	lun 21/04/25	$7,458,594.00
544		**1.3.2.3.7.14**	**PAISAJISMO**	**8 días**	**mié 9/04/25**	**lun 21/04/25**	**$7,094,239.41**
545		1.3.2.3.7.14.1	PAISAJISMO	8 días	mié 9/04/25	lun 21/04/25	$7,094,239.41
546		**1.3.2.3.7.15**	**SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN (HORIZONTAL Y VERTI**	**13 días**	**jue 3/04/25**	**lun 21/04/25**	**$44,328,195.29**
547		1.3.2.3.7.15.1	SEÑALIZACIÓN	13 días	jue 3/04/25	lun 21/04/25	$44,328,195.29
548		1.3.2.3.7.16	FIN CIV 16000307	0 días	lun 21/04/25	lun 21/04/25	$0.00
549		**1.3.2.3.8**	**CIV 16000313**	**158 días**	**mié 18/09/24**	**vie 21/03/25**	**$960,057,578.28**
550		1.3.2.3.8.1	INICIO CIV 16000313	0 días	mié 18/09/24	mié 18/09/24	$0.00
551		**1.3.2.3.8.2**	**TRAMITE DE PMT**	**10 días**	**mié 18/09/24**	**lun 30/09/24**	**$0.00**
552		1.3.2.3.8.2.1	IMPLEMENTACIÓN PMT ESPECIFICIO Y CERRAMIENTO DE OBRA	10 días	mié 18/09/24	lun 30/09/24	$0.00
553		**1.3.2.3.8.3**	**ACTIVIDADES DE ARQUEOLOGIA**	**8 días**	**lun 23/09/24**	**mié 2/10/24**	**$0.00**
554		1.3.2.3.8.3.1	EXPLORACIÓN E INVESTIGACIÓN ARQUEOLOGICA EN LA ZONA DE INTERVENCIÓN	8 días	lun 23/09/24	mié 2/10/24	$0.00
555		**1.3.2.3.8.4**	**REDES HIDROSANITARIAS ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL**	**61 días**	**mar 15/10/24**	**mar 24/12/24**	**$176,185,755.67**
556		1.3.2.3.8.4.1	EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS	45 días	mar 15/10/24	vie 6/12/24	$37,247,337.68
557		1.3.2.3.8.4.2	INSTALACION DE TUBERIAS	45 días	jue 17/10/24	mar 10/12/24	$47,506,269.37
558		1.3.2.3.8.4.3	RELLENO DE TUBERIAS	45 días	mar 22/10/24	vie 13/12/24	$41,930,195.22
559		1.3.2.3.8.4.4	CONSTRUCCION DE POZOS Y SUMIDEROS	14 días	vie 6/12/24	sáb 21/12/24	$43,522,119.40
560		1.3.2.3.8.4.5	CONSTRUCCIÓN CAJAS DE INSPECCIÓN	10 días	vie 13/12/24	mar 24/12/24	$5,979,834.00
561		**1.3.2.3.8.5**	**PRELIMINARES - MOVIMIENTO DE TIERRAS, DEMOLICIONES Y RELLENOS**	**59 días**	**vie 4/10/24**	**jue 12/12/24**	**$115,395,264.43**
562		1.3.2.3.8.5.1	DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y TRANSPORTES DE ESCOMBROS	40 días	vie 4/10/24	jue 21/11/24	$65,264,539.66
563		1.3.2.3.8.5.2	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON RAJON Y SELLO DE RAJON	15 días	mar 19/11/24	jue 5/12/24	$27,058,097.69
564		1.3.2.3.8.5.3	INSTALACION DE GEOTEXTILES Y RELLENO DE MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA	15 días	mar 26/11/24	jue 12/12/24	$23,072,627.08
565		**1.3.2.3.8.6**	**PAVIMENTOS**	**50 días**	**jue 28/11/24**	**lun 27/01/25**	**$277,167,845.89**
566		1.3.2.3.8.6.1	BASES Y SUBBASES	30 días	jue 28/11/24	vie 3/01/25	$36,755,228.40
567		1.3.2.3.8.6.2	MEZCLA ASFALTICA	32 días	lun 2/12/24	vie 10/01/25	$61,352,331.43
568		1.3.2.3.8.6.3	CONCRETO LOSAS MR	35 días	vie 6/12/24	vie 17/01/25	$177,440,347.66
569		1.3.2.3.8.6.4	INSTALACION DE ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO (BORDILLOS, SARDINELES FRANJAS)	6 días	mar 21/01/25	lun 27/01/25	$1,619,938.40
570		**1.3.2.3.8.7**	**REDES HIDROSANITARIAS ACUEDUCTO**	**22 días**	**jue 9/01/25**	**lun 3/02/25**	**$2,753,372.53**
571		1.3.2.3.8.7.1	EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS	7 días	jue 9/01/25	vie 17/01/25	$594,703.88
572		1.3.2.3.8.7.2	INSTALACION DE TUBERIAS	8 días	mar 14/01/25	mié 22/01/25	$373,246.65
573		1.3.2.3.8.7.3	INSTALACION ACCESORIOS Y EMPATES	8 días	mar 21/01/25	mié 29/01/25	$853,248.00
574		1.3.2.3.8.7.4	RELLENO DE TUBERIAS	8 días	vie 24/01/25	lun 3/02/25	$932,174.00
575		**1.3.2.3.8.8**	**REDES SECAS (Codensa)**	**32 días**	**vie 17/01/25**	**vie 21/02/25**	**$173,677,417.83**
576		*1.3.2.3.8.8.1*	*MANIOBRAS POR PARTE DE LA EMPRESA ENEL - CODE*	*0 días*	*vie 17/01/25*	*vie 17/01/25*	*$0.00*
577		1.3.2.3.8.8.2	EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS	16 días	lun 20/01/25	jue 6/02/25	$26,858,427.22

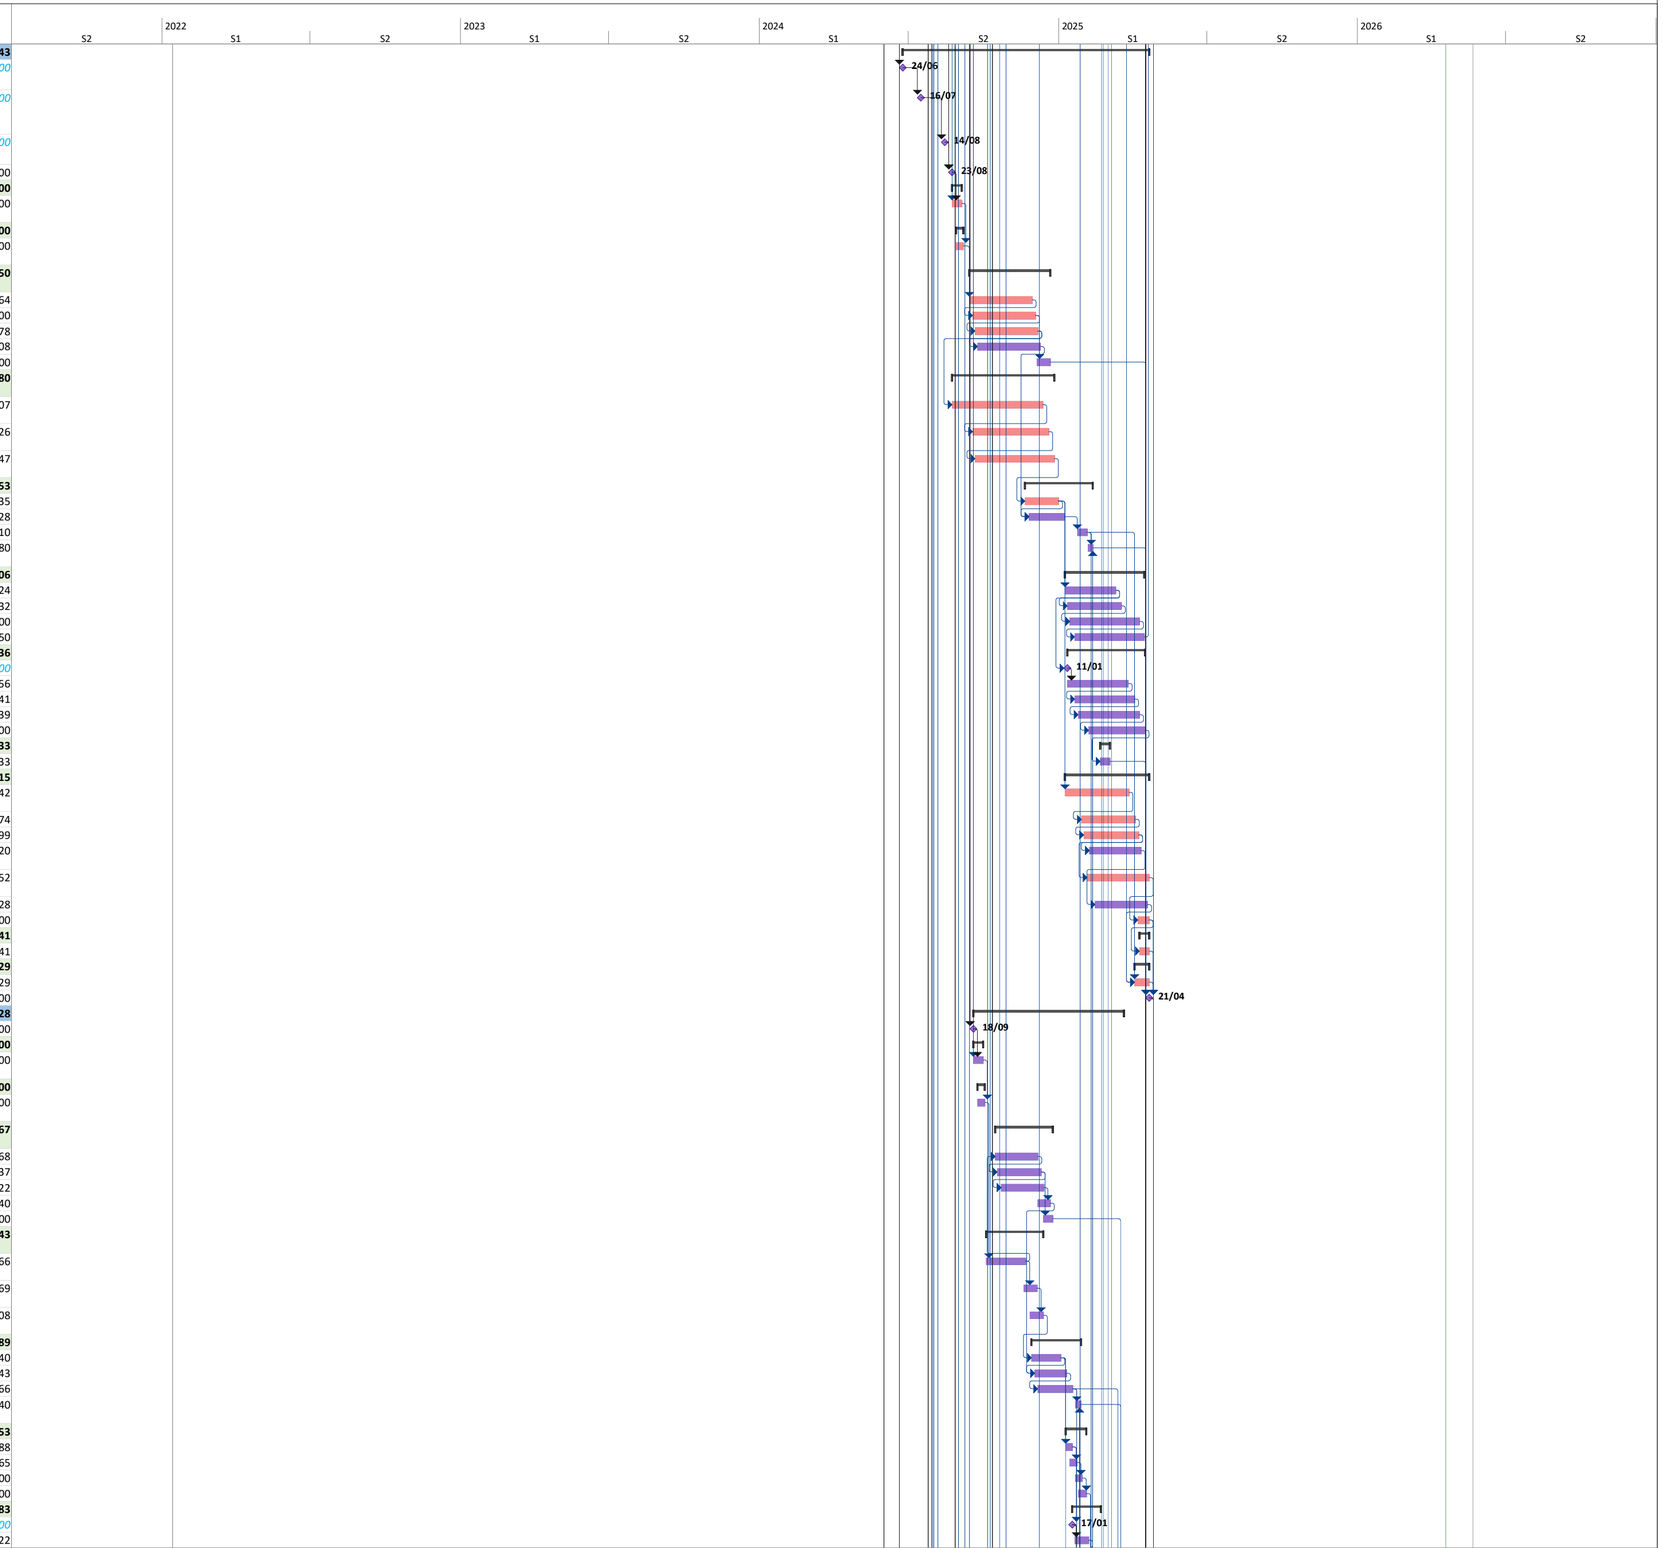

Proyecto:ID
Fecha: 14/1

Tarea · División · Hito · Resumen
Resumen del proyecto · Tareas externas · Hito externo · Tarea inactiva
Hito inactivo · Resumen inactivo · Tarea manual · Sólo duración
Informe de resumen manual · Resumen manual · Sólo el comienzo · Sólo fin
Fecha límite · Tarea hito de sucesor controlado de ruta de acceso · Tarea de resumen de sucesor controlado de ruta de a · Tarea normal de sucesor controlado de ruta de acces
Tareas críticas · División crítica · Progreso

Id	Modo de tarea	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
578		1.3.2.3.8.8.3	INSTALACION DE DUCTERIAS	16 días	jue 23/01/25	mar 11/02/25	$69,197,421.02
579		1.3.2.3.8.8.4	RELLENO DE DUCTERIAS	16 días	mar 28/01/25	vie 14/02/25	$14,984,658.59
580		1.3.2.3.8.8.5	CONSTRUCCION DE CAJAS Y CAMARAS	21 días	mié 29/01/25	vie 21/02/25	$62,636,911.00
581		**1.3.2.3.8.9**	**REDES SECAS (ETB)**	**30 días**	**vie 17/01/25**	**mié 19/02/25**	**$17,851,654.80**
582		*1.3.2.3.8.9.1*	*MANIOBRAS POR PARTE DE LA EMPRESA ETB*	*0 días*	*vie 17/01/25*	*vie 17/01/25*	*$0.00*
583		1.3.2.3.8.9.2	EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS	8 días	lun 20/01/25	mar 28/01/25	$2,630,776.00
584		1.3.2.3.8.9.3	INSTALACION DE DUCTERIAS	10 días	jue 23/01/25	lun 3/02/25	$8,242,290.00
585		1.3.2.3.8.9.4	RELLENO DE DUCTERIAS	10 días	mar 28/01/25	sáb 8/02/25	$1,959,567.80
586		1.3.2.3.8.9.5	CONSTRUCCION Y NIVELACIÓN DE CAJAS Y CAMARAS	10 días	sáb 8/02/25	mié 19/02/25	$5,019,021.00
587		**1.3.2.3.8.10**	**ESPACIO PUBLICO**	**61 días**	**jue 9/01/25**	**mié 19/03/25**	**$181,859,625.71**
588		1.3.2.3.8.10.1	DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y TRANSPORTES DE ESCOMBROS	30 días	jue 9/01/25	mié 12/02/25	$27,507,773.32
589		1.3.2.3.8.10.2	INSTALACION DE GEOTEXTILES	13 días	lun 3/02/25	mar 18/02/25	$6,773,290.65
590		1.3.2.3.8.10.3	RELLENOS EN MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA	8 días	jue 13/02/25	vie 21/02/25	$19,990,822.20
591		1.3.2.3.8.10.4	RELLENOS EN MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA RAMPAS	4 días	jue 20/02/25	lun 24/02/25	$6,860,056.90
592		1.3.2.3.8.10.5	INSTALACION DE ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO Y PREFABRICADOS	20 días	mar 18/02/25	mié 12/03/25	$98,396,253.46
593		1.3.2.3.8.10.6	CONCRETO LOSAS MR	8 días	mié 5/03/25	vie 14/03/25	$14,862,381.18
594		1.3.2.3.8.10.7	ELEMENTOS MOBILIARIO URBANO (CANECAS, BANCA	6 días	mié 12/03/25	mié 19/03/25	$7,469,048.00
595		**1.3.2.3.8.11**	**PAISAJISMO**	**7 días**	**vie 14/03/25**	**vie 21/03/25**	**$3,153,385.17**
596		1.3.2.3.8.11.1	PAISAJISMO	7 días	vie 14/03/25	vie 21/03/25	$3,153,385.17
597		**1.3.2.3.8.12**	**SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN (HORIZONTAL Y VERTI**	**7 días**	**vie 14/03/25**	**vie 21/03/25**	**$12,013,256.25**
598		1.3.2.3.8.12.1	SEÑALIZACIÓN	7 días	vie 14/03/25	vie 21/03/25	$12,013,256.25
599		1.3.2.3.8.13	FIN CIV 16000313	0 días	vie 21/03/25	vie 21/03/25	$0.00
600		**1.3.2.3.9**	**CIV 16000322**	**232 días**	**lun 24/06/24**	**vie 21/03/25**	**$1,578,072,999.36**
601		*1.3.2.3.9.1*	*SOLICITUD A INTERVENTORÍA DE AJUSTES A LOS DISEÑOS ENTREGADOS POR LA ENTIDAD*	*0 días*	*lun 24/06/24*	*lun 24/06/24*	*$0.00*
602		*1.3.2.3.9.2*	*REMISIÓN DE LA COMUNICACIÓN A LA ENTIDAD POR PARTE DE INTERVENTORÍA PARA AJUSTE A LOS DISEÑOS ENTREGADOS POR LA ENTIDAD*	*0 días*	*mar 16/07/24*	*mar 16/07/24*	*$0.00*
603		*1.3.2.3.9.3*	*APROBACIÓN Y AJUSTES POR PARTE DE LA ENTIDAD (CONCEPTO DE VIABILIDAD PARA ACTIVIDADES)*	*0 días*	*mié 14/08/24*	*mié 14/08/24*	*$0.00*
604		*1.3.2.3.9.4*	*APLAZAMIENTO POR CIERRE TOTAL DE CALZADA "JUSTIFICACIÓN A LA SDM" DESVIO*	*0 días*	*mié 11/09/24*	*mié 11/09/24*	*$0.00*
605		*1.3.2.3.9.5*	*CONCEPTO DE VIABILIDAD SDM PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA DESVIO*	*0 días*	*jue 10/10/24*	*jue 10/10/24*	*$0.00*
606		1.3.2.3.9.6	INICIO CIV 16000322	0 días	mar 15/10/24	mar 15/10/24	$0.00
607		**1.3.2.3.9.7**	**TRAMITE DE PMT**	**10 días**	**mié 9/10/24**	**lun 21/10/24**	**$0.00**
608		1.3.2.3.9.7.1	IMPLEMENTACIÓN PMT ESPECIFICO Y CERRAMIENTO DE OBRA	10 días	mié 9/10/24	lun 21/10/24	$0.00
609		**1.3.2.3.9.8**	**ACTIVIDADES DE ARQUEOLOGIA**	**8 días**	**mar 15/10/24**	**mié 23/10/24**	**$0.00**
610		1.3.2.3.9.8.1	EXPLORACIÓN E INVESTIGACIÓN ARQUEOLOGICA EN LA ZONA DE INTERVENCIÓN	8 días	mar 15/10/24	mié 23/10/24	$0.00
611		**1.3.2.3.9.9**	**REDES HIDROSANITARIAS ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL**	**58 días**	**mié 23/10/24**	**mar 31/12/24**	**$307,792,635.63**
612		1.3.2.3.9.9.1	EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS	35 días	mié 23/10/24	mié 4/12/24	$54,019,697.27
613		1.3.2.3.9.9.2	INSTALACION DE TUBERIAS	40 días	vie 25/10/24	jue 12/12/24	$97,628,290.64
614		1.3.2.3.9.9.3	RELLENO DE TUBERIAS	45 días	lun 28/10/24	jue 19/12/24	$73,909,866.78
615		1.3.2.3.9.9.4	CONSTRUCCION DE POZOS Y SUMIDEROS	45 días	jue 31/10/24	lun 23/12/24	$72,691,709.94
616		1.3.2.3.9.9.5	CONSTRUCCIÓN CAJAS DE INSPECCIÓN	28 días	jue 28/11/24	mar 31/12/24	$9,543,071.00
617		**1.3.2.3.9.10**	**PRELIMINARES - MOVIMIENTO DE TIERRAS, DEMOLICIONES Y RELLENOS**	**45 días**	**mar 26/11/24**	**lun 20/01/25**	**$186,574,773.84**
618		1.3.2.3.9.10.1	DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y TRANSPORTES DE ESCOMBROS	35 días	mar 26/11/24	mié 8/01/25	$90,976,266.85
619		1.3.2.3.9.10.2	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON RAJON Y SELLO DE RAJON	38 días	jue 28/11/24	mar 14/01/25	$55,457,795.15
620		1.3.2.3.9.10.3	INSTALACION DE GEOTEXTILES Y RELLENO DE MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA	40 días	lun 2/12/24	lun 20/01/25	$40,140,711.84
621		**1.3.2.3.9.11**	**PAVIMENTOS**	**82 días**	**jue 5/12/24**	**mar 11/03/25**	**$463,469,580.17**
622		1.3.2.3.9.11.1	BASES Y SUBBASES	58 días	jue 5/12/24	mié 12/02/25	$64,462,482.15
623		1.3.2.3.9.11.2	MEZCLA ASFALTICA	60 días	sáb 7/12/24	lun 17/02/25	$92,157,756.94
624		1.3.2.3.9.11.3	CONCRETO LOSAS MR	27 días	jue 30/01/25	sáb 1/03/25	$302,952,056.32
625		1.3.2.3.9.11.4	INSTALACION DE ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO (BORDILLOS, SARDINELES FRANJAS)	8 días	sáb 1/03/25	mar 11/03/25	$3,897,284.76
626		**1.3.2.3.9.12**	**REDES HIDROSANITARIAS ACUEDUCTO**	**20 días**	**lun 27/01/25**	**mar 18/02/25**	**$9,427,687.52**
627		1.3.2.3.9.12.1	EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS	7 días	lun 27/01/25	lun 3/02/25	$1,334,427.00
628		1.3.2.3.9.12.2	INSTALACION DE TUBERIAS	8 días	mié 29/01/25	vie 7/02/25	$584,356.68
629		1.3.2.3.9.12.3	INSTALACION ACCESORIOS Y EMPATES	10 días	lun 3/02/25	vie 14/02/25	$6,220,240.00
630		1.3.2.3.9.12.4	RELLENO DE TUBERIAS	8 días	sáb 8/02/25	mar 18/02/25	$1,288,663.84
631		**1.3.2.3.9.13**	**REDES SECAS (Codensa)**	**39 días**	**lun 3/02/25**	**mié 19/03/25**	**$201,375,115.96**
632		*1.3.2.3.9.13.1*	*MANIOBRAS POR PARTE DE LA EMPRESA ENEL - CODE*	*0 días*	*lun 3/02/25*	*lun 3/02/25*	*$0.00*
633		1.3.2.3.9.13.2	EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS	18 días	mié 5/02/25	mar 25/02/25	$31,460,304.76
634		1.3.2.3.9.13.3	INSTALACION DE DUCTERIAS	15 días	lun 10/02/25	mié 26/02/25	$99,851,659.22
635		1.3.2.3.9.13.4	RELLENO DE DUCTERIAS	15 días	vie 14/02/25	lun 3/03/25	$22,859,153.98
636		1.3.2.3.9.13.5	CONSTRUCCION DE CAJAS Y CAMARAS	25 días	mié 19/02/25	mié 19/03/25	$47,203,998.00
637		**1.3.2.3.9.14**	**REDES SECAS (ETB)**	**37 días**	**lun 3/02/25**	**lun 17/03/25**	**$34,408,489.91**
638		*1.3.2.3.9.14.1*	*MANIOBRAS POR PARTE DE LA EMPRESA ETB*	*0 días*	*lun 3/02/25*	*lun 3/02/25*	*$0.00*
639		1.3.2.3.9.14.2	EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS	11 días	mié 5/02/25	mar 18/02/25	$2,730,705.92
640		1.3.2.3.9.14.3	INSTALACION DE DUCTERIAS	10 días	jue 13/02/25	lun 24/02/25	$11,233,936.00
641		1.3.2.3.9.14.4	RELLENO DE DUCTERIAS	10 días	vie 21/02/25	mié 5/03/25	$3,431,657.99
642		1.3.2.3.9.14.5	CONSTRUCCION Y NIVELACION DE CAJAS Y CAMARAS	10 días	mié 5/03/25	lun 17/03/25	$17,012,190.00
643		**1.3.2.3.9.15**	**ESPACIO PUBLICO**	**49 días**	**lun 27/01/25**	**vie 21/03/25**	**$321,627,162.09**
644		1.3.2.3.9.15.1	DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y TRANSPORTES DE ESCOMBROS	20 días	lun 27/01/25	mar 18/02/25	$49,179,260.81
645		1.3.2.3.9.15.2	INSTALACION DE GEOTEXTILES	12 días	lun 10/02/25	lun 24/02/25	$8,446,031.16
646		1.3.2.3.9.15.3	RELLENOS EN MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA	12 días	jue 13/02/25	mié 26/02/25	$26,662,953.66
647		1.3.2.3.9.15.4	RELLENOS EN MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA RAMPAS	9 días	jue 20/02/25	lun 3/03/25	$12,472,737.70
648		1.3.2.3.9.15.5	INSTALACION DE ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO Y PREFABRICADOS	24 días	mar 18/02/25	lun 17/03/25	$188,232,542.46
649		1.3.2.3.9.15.6	CONCRETO LOSAS MR	8 días	lun 3/03/25	mié 12/03/25	$24,110,493.30
650		1.3.2.3.9.15.7	ELEMENTOS MOBILIARIO URBANO (CANECAS, BANCA	6 días	sáb 15/03/25	vie 21/03/25	$12,523,143.00
651		**1.3.2.3.9.16**	**PAISAJISMO**	**9 días**	**mié 12/03/25**	**vie 21/03/25**	**$13,700,103.60**
652		1.3.2.3.9.16.1	PAISAJISMO	9 días	mié 12/03/25	vie 21/03/25	$13,700,103.60
653		**1.3.2.3.9.17**	**SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN (HORIZONTAL Y VERTI**	**7 días**	**vie 14/03/25**	**vie 21/03/25**	**$39,697,450.64**
654		1.3.2.3.9.17.1	SEÑALIZACIÓN	7 días	vie 14/03/25	vie 21/03/25	$39,697,450.64
655		1.3.2.3.9.18	FIN CIV 16000322	0 días	vie 21/03/25	vie 21/03/25	$0.00
656		**1.3.2.3.10**	**CIV 16000323**	**226 días**	**sáb 27/07/24**	**lun 21/04/25**	**$955,119,121.97**
657		1.3.2.3.10.1	INICIO CIV 16000323	0 días	lun 29/07/24	lun 29/07/24	$0.00
658		**1.3.2.3.10.2**	**TRAMITE DE PMT**	**10 días**	**jue 1/08/24**	**mar 13/08/24**	**$0.00**

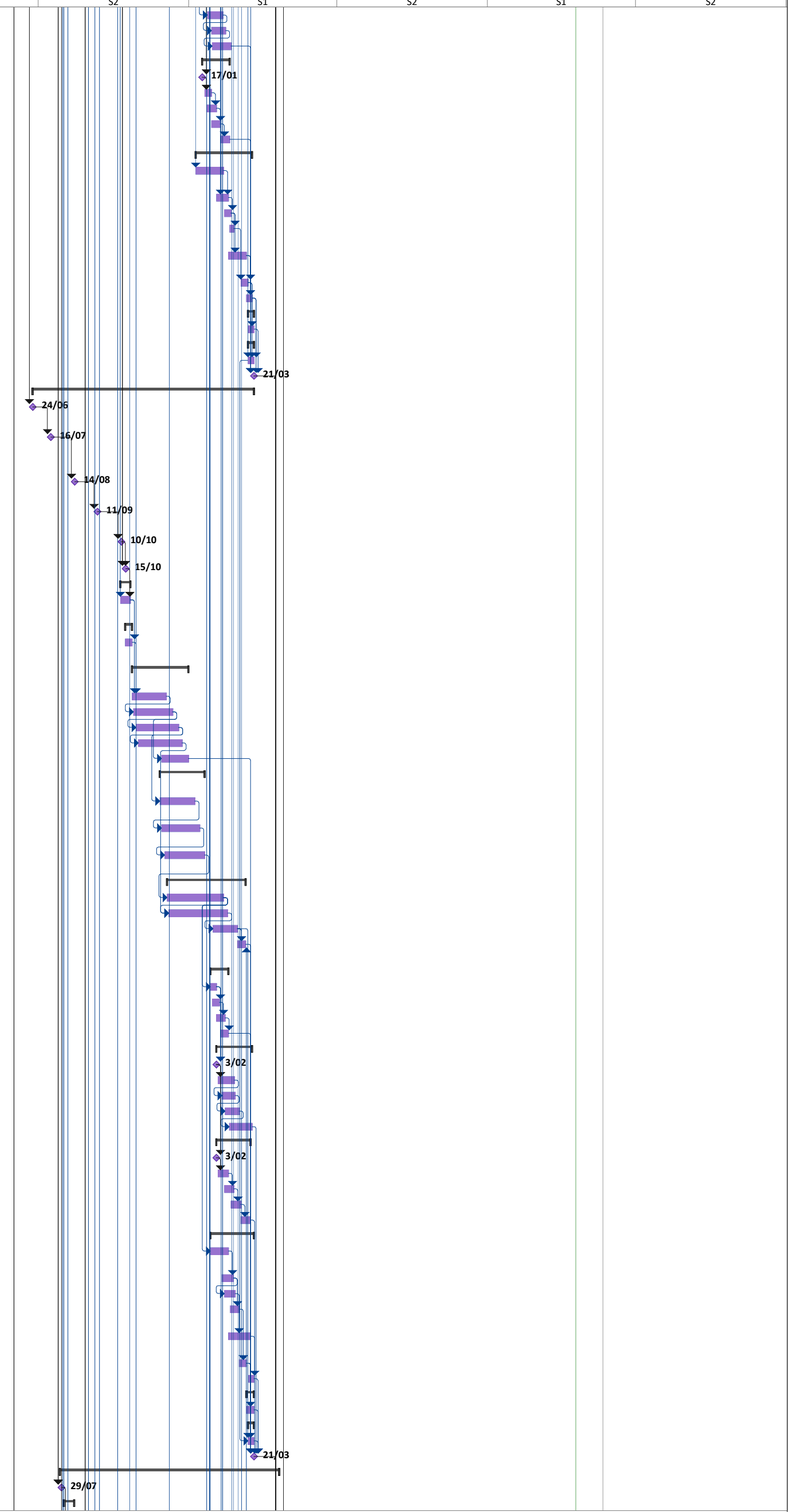

Proyecto:ID
Fecha: 14/1

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tareas externas
Hito externo
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
Sólo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
Sólo el comienzo
Sólo fin
Fecha límite
Tarea hito de sucesor controlado de ruta de acceso
Tarea de resumen de sucesor controlado de ruta de a
Tarea normal de sucesor controlado de ruta de acces
Tareas críticas
División crítica
Progreso


Id	Modo de tarea	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
659		1.3.2.3.10.2.1	IMPLEMENTACIÓN PMT ESPECIFICIO Y CERRAMIENTO DE OBRA	10 días	jue 1/08/24	mar 13/08/24	$0.00
660		**1.3.2.3.10.3**	**ACTIVIDADES DE ARQUEOLOGIA**	**8 días**	**sáb 27/07/24**	**mar 6/08/24**	**$0.00**
661		1.3.2.3.10.3.1	EXPLORACIÓN E INVESTIGACIÓN ARQUEOLOGICA EN LA ZONA DE INTERVENCIÓN	8 días	sáb 27/07/24	mar 6/08/24	$0.00
662		**1.3.2.3.10.4**	**REDES HIDROSANITARIAS ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL**	**62 días**	**jue 8/08/24**	**vie 18/10/24**	**$242,056,590.20**
663		1.3.2.3.10.4.1	EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS	21 días	jue 8/08/24	lun 2/09/24	$42,176,236.74
664		1.3.2.3.10.4.2	INSTALACION DE TUBERIAS	21 días	vie 9/08/24	mar 3/09/24	$98,184,554.80
665		1.3.2.3.10.4.3	RELLENO DE TUBERIAS	21 días	lun 12/08/24	jue 5/09/24	$59,529,047.26
666		1.3.2.3.10.4.4	CONSTRUCCION DE POZOS Y SUMIDEROS	40 días	lun 26/08/24	mié 9/10/24	$38,749,703.40
667		1.3.2.3.10.4.5	CONSTRUCCIÓN CAJAS DE INSPECCIÓN	15 días	mar 1/10/24	vie 18/10/24	$3,417,048.00
668		**1.3.2.3.10.5**	**PRELIMINARES - MOVIMIENTO DE TIERRAS, DEMOLICIONES Y RELLENOS**	**65 días**	**lun 26/08/24**	**vie 8/11/24**	**$113,208,194.48**
669		1.3.2.3.10.5.1	DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y TRANSPORTES DE ESCOMBROS	60 días	lun 26/08/24	sáb 2/11/24	$59,877,541.50
670		1.3.2.3.10.5.2	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON RAJON Y SELLO DE RAJON	60 días	jue 29/08/24	jue 7/11/24	$32,480,538.45
671		1.3.2.3.10.5.3	INSTALACION DE GEOTEXTILES Y RELLENO DE MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA	60 días	sáb 31/08/24	vie 8/11/24	$20,850,114.53
672		**1.3.2.3.10.6**	**PAVIMENTOS**	**95 días**	**vie 6/09/24**	**jue 26/12/24**	**$297,112,686.32**
673		1.3.2.3.10.6.1	BASES Y SUBBASES	25 días	vie 6/09/24	vie 4/10/24	$34,438,636.65
674		1.3.2.3.10.6.2	MEZCLA ASFALTICA	26 días	lun 9/09/24	mar 8/10/24	$52,929,908.15
675		1.3.2.3.10.6.3	CONCRETO LOSAS MR	70 días	sáb 21/09/24	jue 12/12/24	$208,191,710.32
676		1.3.2.3.10.6.4	INSTALACION DE ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO (BORDILLOS, SARDINELES FRANJAS)	9 días	lun 16/12/24	jue 26/12/24	$1,552,431.20
677		**1.3.2.3.10.7**	**REDES SECAS (Codensa)**	**174 días**	**jue 12/09/24**	**jue 3/04/25**	**$128,610,064.17**
678		*1.3.2.3.10.7.1*	*MANIOBRAS POR PARTE DE LA EMPRESA ENEL - CODE*	*0 días*	*jue 12/09/24*	*jue 12/09/24*	*$0.00*
679		1.3.2.3.10.7.2	EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS	82 días	lun 16/09/24	jue 19/12/24	$11,336,797.60
680		1.3.2.3.10.7.3	INSTALACION DE DUCTERIAS	82 días	mié 18/09/24	lun 23/12/24	$40,728,585.02
681		1.3.2.3.10.7.4	RELLENO DE DUCTERIAS	82 días	sáb 21/09/24	vie 27/12/24	$7,765,017.55
682		1.3.2.3.10.7.5	CONSTRUCCION DE CAJAS Y CAMARAS	120 días	vie 15/11/24	jue 3/04/25	$68,779,664.00
683		**1.3.2.3.10.8**	**REDES SECAS (ETB)**	**80 días**	**mar 17/09/24**	**jue 19/12/24**	**$8,512,823.04**
684		1.3.2.3.10.8.1	EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS	22 días	mar 17/09/24	vie 11/10/24	$882,002.40
685		1.3.2.3.10.8.2	RELLENO DE DUCTERIAS	35 días	jue 19/09/24	mié 30/10/24	$2,049,536.64
686		1.3.2.3.10.8.3	NIVELACION DE CAJAS Y CAMARAS	7 días	jue 12/12/24	jue 19/12/24	$5,581,284.00
687		**1.3.2.3.10.9**	**ESPACIO PUBLICO**	**138 días**	**vie 1/11/24**	**sáb 12/04/25**	**$134,624,029.14**
688		1.3.2.3.10.9.1	DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y TRANSPORTES DE ESCOMBROS	45 días	vie 1/11/24	mar 24/12/24	$21,464,772.33
689		1.3.2.3.10.9.2	INSTALACION DE GEOTEXTILES	60 días	mié 6/11/24	vie 17/01/25	$5,041,283.10
690		1.3.2.3.10.9.3	RELLENOS EN MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA	50 días	jue 7/11/24	mar 7/01/25	$14,846,312.34
691		1.3.2.3.10.9.4	RELLENOS EN MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA RAMPAS	65 días	vie 8/11/24	vie 24/01/25	$4,280,972.90
692		1.3.2.3.10.9.5	INSTALACION DE ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO Y PREFABRICADOS	131 días	vie 8/11/24	jue 10/04/25	$67,888,301.17
693		1.3.2.3.10.9.6	CONCRETO LOSAS MR	55 días	vie 22/11/24	lun 27/01/25	$10,973,289.30
694		1.3.2.3.10.9.7	ELEMENTOS MOBILIARIO URBANO (CANECAS, BANCAS	10 días	mar 1/04/25	sáb 12/04/25	$10,129,098.00
695		**1.3.2.3.10.10**	**PAISAJISMO**	**10 días**	**lun 7/04/25**	**lun 21/04/25**	**$5,517,936.57**
696		1.3.2.3.10.10.1	PAISAJISMO	10 días	lun 7/04/25	lun 21/04/25	$5,517,936.57
697		**1.3.2.3.10.11**	**SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN (HORIZONTAL Y VERTI**	**10 días**	**lun 7/04/25**	**lun 21/04/25**	**$25,476,798.05**
698		1.3.2.3.10.11.1	SEÑALIZACIÓN	10 días	lun 7/04/25	lun 21/04/25	$25,476,798.05
699		1.3.2.3.10.12	FIN CIV 16000323	0 días	lun 21/04/25	lun 21/04/25	$0.00
700		**1.3.2.3.11**	**CIV 16000336**	**174 días**	**sáb 31/08/24**	**vie 21/03/25**	**$821,397,298.83**
701		1.3.2.3.11.1	INICIO CIV 16000336	0 días	sáb 31/08/24	sáb 31/08/24	$0.00
702		**1.3.2.3.11.2**	**TRAMITE DE PMT**	**6 días**	**sáb 31/08/24**	**vie 6/09/24**	**$0.00**
703		1.3.2.3.11.2.1	IMPLEMENTACIÓN PMT ESPECIFICIO Y CERRAMIENTO DE OBRA	6 días	sáb 31/08/24	vie 6/09/24	$0.00
704		**1.3.2.3.11.3**	**ACTIVIDADES DE ARQUEOLOGIA**	**6 días**	**sáb 31/08/24**	**vie 6/09/24**	**$0.00**
705		1.3.2.3.11.3.1	EXPLORACIÓN E INVESTIGACIÓN ARQUEOLOGICA EN LA ZONA DE INTERVENCIÓN	6 días	sáb 31/08/24	vie 6/09/24	$0.00
706		**1.3.2.3.11.4**	**REDES HIDROSANITARIAS ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL**	**56 días**	**mar 17/09/24**	**jue 21/11/24**	**$107,512,351.00**
707		1.3.2.3.11.4.1	EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS	50 días	mar 17/09/24	jue 14/11/24	$23,112,852.68
708		1.3.2.3.11.4.2	INSTALACION DE TUBERIAS	50 días	mié 18/09/24	lun 18/11/24	$19,771,270.22
709		1.3.2.3.11.4.3	RELLENO DE TUBERIAS	50 días	lun 23/09/24	jue 21/11/24	$26,119,188.10
710		1.3.2.3.11.4.4	CONSTRUCCION DE POZOS Y SUMIDEROS	20 días	vie 27/09/24	lun 21/10/24	$30,820,682.00
711		1.3.2.3.11.4.5	CONSTRUCCIÓN DE CAJAS DE INSPECCIÓN	25 días	lun 30/09/24	mar 29/10/24	$7,688,358.00
712		**1.3.2.3.11.5**	**PRELIMINARES - MOVIMIENTO DE TIERRAS, DEMOLICIONES Y RELLENOS**	**76 días**	**jue 5/09/24**	**mar 3/12/24**	**$110,177,544.04**
713		1.3.2.3.11.5.1	DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y TRANSPORTES DE ESCOMBROS	65 días	jue 5/09/24	mié 20/11/24	$57,078,996.69
714		1.3.2.3.11.5.2	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON RAJON Y SELLO DE RAJON	68 días	lun 9/09/24	mié 27/11/24	$29,063,114.65
715		1.3.2.3.11.5.3	INSTALACION DE GEOTEXTILES Y RELLENO DE MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA	65 días	mar 17/09/24	mar 3/12/24	$24,035,432.70
716		**1.3.2.3.11.6**	**PAVIMENTOS**	**94 días**	**jue 19/09/24**	**vie 10/01/25**	**$255,542,548.66**
717		1.3.2.3.11.6.1	BASES Y SUBBASES	67 días	jue 19/09/24	sáb 7/12/24	$39,122,846.40
718		1.3.2.3.11.6.2	MEZCLA ASFALTICA	67 días	sáb 21/09/24	mar 10/12/24	$50,503,803.70
719		1.3.2.3.11.6.3	CONCRETO LOSAS MR	80 días	lun 30/09/24	vie 3/01/25	$164,661,858.56
720		1.3.2.3.11.6.4	INSTALACION DE ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO (BORDILLOS, SARDINELES FRANJAS)	10 días	vie 27/12/24	vie 10/01/25	$1,254,040.00
721		**1.3.2.3.11.7**	**REDES HIDROSANITARIAS ACUEDUCTO**	**11 días**	**mié 15/01/25**	**lun 27/01/25**	**$13,057,431.00**
722		1.3.2.3.11.7.1	INSTALACION ACCESORIOS Y EMPATES	11 días	mié 15/01/25	lun 27/01/25	$13,057,431.00
723		**1.3.2.3.11.8**	**REDES SECAS (Codensa)**	**78 días**	**mié 30/10/24**	**vie 31/01/25**	**$135,183,985.51**
724		*1.3.2.3.11.8.1*	*MANIOBRAS POR PARTE DE LA EMPRESA ENEL - CODE*	*0 días*	*mié 30/10/24*	*mié 30/10/24*	*$0.00*
725		1.3.2.3.11.8.2	EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS	59 días	mié 30/10/24	vie 10/01/25	$21,587,710.24
726		1.3.2.3.11.8.3	INSTALACION DE DUCTERIAS	61 días	vie 1/11/24	mié 15/01/25	$69,261,661.00
727		1.3.2.3.11.8.4	RELLENO DE DUCTERIAS	65 días	mar 5/11/24	mié 22/01/25	$14,929,503.27
728		1.3.2.3.11.8.5	CONSTRUCCION DE CAJAS Y CAMARAS	20 días	jue 9/01/25	vie 31/01/25	$29,405,111.00
729		**1.3.2.3.11.9**	**REDES SECAS (ETB)**	**8 días**	**jue 23/01/25**	**vie 31/01/25**	**$7,236,826.00**
730		1.3.2.3.11.9.1	NIVELACION DE CAJAS Y CAMARAS	8 días	jue 23/01/25	vie 31/01/25	$7,236,826.00
731		**1.3.2.3.11.10**	**ESPACIO PUBLICO**	**64 días**	**jue 9/01/25**	**vie 21/03/25**	**$169,793,903.55**
732		1.3.2.3.11.10.1	DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y TRANSPORTES DE ESCOMBROS	38 días	jue 9/01/25	jue 20/02/25	$25,058,677.65
733		1.3.2.3.11.10.2	INSTALACION DE GEOTEXTILES	12 días	mié 12/02/25	mar 25/02/25	$6,815,470.62
734		1.3.2.3.11.10.3	RELLENOS EN MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA	10 días	jue 20/02/25	lun 3/03/25	$18,519,614.58
735		1.3.2.3.11.10.4	RELLENOS EN MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA RAMPAS	6 días	mar 25/02/25	mar 4/03/25	$10,663,562.40
736		1.3.2.3.11.10.5	INSTALACION DE ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO Y PREFABRICADOS	26 días	lun 17/02/25	mar 18/03/25	$80,123,689.90
737		1.3.2.3.11.10.6	CONCRETO LOSAS MR	4 días	mar 4/03/25	sáb 8/03/25	$21,686,304.40
738		1.3.2.3.11.10.7	ELEMENTOS MOBILIARIO URBANO (CANECAS, BANCAS	7 días	vie 14/03/25	vie 21/03/25	$6,926,584.00
739		**1.3.2.3.11.11**	**PAISAJISMO**	**8 días**	**jue 13/03/25**	**vie 21/03/25**	**$3,190,214.88**



Proyecto:ID
Fecha: 14/1

Tarea	Resumen del proyecto	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Fecha límite	Tareas críticas
División	Tareas externas	Resumen inactivo	Resumen manual	Tarea hito de sucesor controlado de ruta de acceso	División crítica
Hito	Hito externo	Tarea manual	Sólo el comienzo	Tarea de resumen de sucesor controlado de ruta de a	Progreso
Resumen	Tarea inactiva	Sólo duración	Sólo fin	Tarea normal de sucesor controlado de ruta de acces	


Id	Modo de tarea	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
740		1.3.2.3.11.11.1	PAISAJISMO	8 días	jue 13/03/25	vie 21/03/25	$3,190,214.88
741		**1.3.2.3.11.12**	**SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN (HORIZONTAL Y VERTI**	**25 días**	**vie 21/02/25**	**vie 21/03/25**	**$19,702,494.19**
742		1.3.2.3.11.12.1	SEÑALIZACIÓN	25 días	vie 21/02/25	vie 21/03/25	$19,702,494.19
743		1.3.2.3.11.13	FIN CIV 16000336	0 días	vie 21/03/25	vie 21/03/25	$0.00
744		**1.3.2.3.12**	**CIV 16000342**	**173 días**	**vie 2/08/24**	**vie 21/02/25**	**$761,913,124.82**
745		1.3.2.3.12.1	INICIO CIV 16000342	0 días	vie 2/08/24	vie 2/08/24	$0.00
746		**1.3.2.3.12.2**	**TRAMITE DE PMT**	**6 días**	**mar 6/08/24**	**mar 13/08/24**	**$0.00**
747		1.3.2.3.12.2.1	IMPLEMENTACIÓN PMT ESPECIFICIO Y CERRAMIENTO DE OBRA	6 días	mar 6/08/24	mar 13/08/24	$0.00
748		**1.3.2.3.12.3**	**ACTIVIDADES DE ARQUEOLOGIA**	**6 días**	**mar 6/08/24**	**mar 13/08/24**	**$0.00**
749		1.3.2.3.12.3.1	EXPLORACIÓN E INVESTIGACIÓN ARQUEOLOGICA EN LA ZONA DE INTERVENCIÓN	6 días	mar 6/08/24	mar 13/08/24	$0.00
750		**1.3.2.3.12.4**	**REDES HIDROSANITARIAS ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL**	**26 días**	**jue 15/08/24**	**lun 16/09/24**	**$66,785,926.81**
751		1.3.2.3.12.4.1	EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS	18 días	jue 15/08/24	vie 6/09/24	$15,633,861.71
752		1.3.2.3.12.4.2	INSTALACION DE TUBERIAS	19 días	vie 16/08/24	lun 9/09/24	$10,030,682.85
753		1.3.2.3.12.4.3	RELLENO DE TUBERIAS	19 días	mar 20/08/24	mié 11/09/24	$12,433,534.45
754		1.3.2.3.12.4.4	CONSTRUCCION DE POZOS Y SUMIDEROS	19 días	jue 22/08/24	jue 12/09/24	$26,125,061.80
755		1.3.2.3.12.4.5	CONSTRUCCIÓN CAJAS DE INSPECCIÓN	17 días	mar 27/08/24	lun 16/09/24	$2,562,786.00
756		**1.3.2.3.12.5**	**PRELIMINARES - MOVIMIENTO DE TIERRAS, DEMOLICIONES Y RELLENOS**	**28 días**	**jue 8/08/24**	**mar 10/09/24**	**$103,532,381.12**
757		1.3.2.3.12.5.1	DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y TRANSPORTES DE ESCOMBROS	8 días	jue 8/08/24	vie 16/08/24	$54,617,936.21
758		1.3.2.3.12.5.2	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON RAJON Y SELLO DE RAJON	18 días	lun 12/08/24	lun 2/09/24	$26,638,978.46
759		1.3.2.3.12.5.3	INSTALACION DE GEOTEXTILES Y RELLENO DE MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA	20 días	vie 16/08/24	mar 10/09/24	$22,275,466.45
760		**1.3.2.3.12.6**	**PAVIMENTOS**	**59 días**	**mié 21/08/24**	**lun 28/10/24**	**$261,412,651.24**
761		1.3.2.3.12.6.1	BASES Y SUBBASES	18 días	mié 21/08/24	mié 11/09/24	$35,720,416.05
762		1.3.2.3.12.6.2	MEZCLA ASFALTICA	18 días	lun 26/08/24	lun 16/09/24	$46,464,540.11
763		1.3.2.3.12.6.3	CONCRETO LOSAS MR	25 días	mié 28/08/24	mié 25/09/24	$172,006,307.44
764		1.3.2.3.12.6.4	INSTALACION DE ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO (BORDILLOS, SARDINELES FRANJAS)	20 días	vie 4/10/24	lun 28/10/24	$7,221,387.64
765		**1.3.2.3.12.7**	**REDES SECAS (Codensa)**	**106 días**	**vie 4/10/24**	**vie 7/02/25**	**$166,913,389.24**
766		*1.3.2.3.12.7.1*	*MANIOBRAS POR PARTE DE LA EMPRESA ENEL - CODE*	*0 días*	*vie 4/10/24*	*vie 4/10/24*	*$0.00*
767		*1.3.2.3.12.7.2*	*NOTIFICACIÓN INTERFERENCIA DE DUCTERIA ENEL SOBRE INFRAESTRUCTURA ETB*	*0 días*	*vie 4/10/24*	*vie 4/10/24*	*$0.00*
768		*1.3.2.3.12.7.3*	*CONCEPTO DE VIABILIDAD Y MANIOBRA A CARGO DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS*	*0 días*	*lun 28/10/24*	*lun 28/10/24*	*$0.00*
769		1.3.2.3.12.7.4	EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS	63 días	mié 30/10/24	mié 15/01/25	$21,913,771.00
770		1.3.2.3.12.7.5	INSTALACION DE DUCTERIAS	65 días	vie 1/11/24	lun 20/01/25	$57,053,629.76
771		1.3.2.3.12.7.6	RELLENO DE DUCTERIAS	65 días	mar 5/11/24	mié 22/01/25	$11,625,683.48
772		1.3.2.3.12.7.7	CONSTRUCCION DE CAJAS Y CAMARAS	30 días	vie 3/01/25	vie 7/02/25	$76,320,305.00
773		**1.3.2.3.12.8**	**REDES SECAS (ETB)**	**8 días**	**mié 29/01/25**	**vie 7/02/25**	**$2,825,941.00**
774		1.3.2.3.12.8.1	NIVELACION DE CAJAS Y CAMARAS	8 días	mié 29/01/25	vie 7/02/25	$2,825,941.00
775		**1.3.2.3.12.9**	**ESPACIO PUBLICO**	**150 días**	**vie 30/08/24**	**vie 21/02/25**	**$143,399,851.62**
776		1.3.2.3.12.9.1	DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y TRANSPORTES DE ESCOMBROS	110 días	vie 30/08/24	mié 8/01/25	$23,368,162.83
777		1.3.2.3.12.9.2	INSTALACION DE GEOTEXTILES	80 días	mar 15/10/24	vie 17/01/25	$5,590,339.65
778		1.3.2.3.12.9.3	RELLENOS EN MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA	80 días	vie 18/10/24	mié 22/01/25	$16,820,533.98
779		1.3.2.3.12.9.4	RELLENOS EN MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA RAMPAS	10 días	sáb 18/01/25	mié 29/01/25	$2,818,500.80
780		1.3.2.3.12.9.5	INSTALACION DE ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO Y PREFABRICADOS	135 días	jue 5/09/24	mar 11/02/25	$74,077,875.50
781		1.3.2.3.12.9.6	CONCRETO LOSAS MR	16 días	mié 29/01/25	lun 17/02/25	$11,403,809.86
782		1.3.2.3.12.9.7	ELEMENTOS MOBILIARIO URBANO (CANECAS, BANCA	10 días	mar 11/02/25	vie 21/02/25	$9,320,629.00
783		**1.3.2.3.12.10**	**PAISAJISMO**	**5 días**	**lun 17/02/25**	**vie 21/02/25**	**$2,566,649.79**
784		1.3.2.3.12.10.1	PAISAJISMO	5 días	lun 17/02/25	vie 21/02/25	$2,566,649.79
785		**1.3.2.3.12.11**	**SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN (HORIZONTAL Y VERTI**	**5 días**	**lun 17/02/25**	**vie 21/02/25**	**$14,476,334.00**
786		1.3.2.3.12.11.1	SEÑALIZACIÓN	5 días	lun 17/02/25	vie 21/02/25	$14,476,334.00
787		1.3.2.3.12.12	FIN CIV 16000342	0 días	vie 21/02/25	vie 21/02/25	$0.00
788		**1.3.2.4**	**FIN CONSTRUCCIÓN UPZ 111**	**0 días**	**lun 21/04/25**	**lun 21/04/25**	**$0.00**
789		**1.3.3**	**UPZ 108**	**506 días**	**mar 17/09/24**	**mié 6/05/26**	**$33,495,445,768.81**
790		1.3.3.1	ENTREGA POR PARTE DEL IDU REVISIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS	0 días	jue 21/11/24	jue 21/11/24	$0.00
791		1.3.3.2	INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL IDU ENTREGA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS KR 38 (9 CIVS) CONFORME AL	0 días	vie 22/11/24	vie 22/11/24	$0.00
792		1.3.3.3	INCUMPLIMIENTO No. 2 ENTREGA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS FIRMADOS Y APROBADOS POR LAS ESP POSTERIOR AL INCUMPLIMIENTO INICIAL DEL MODIFICATORIO No. 2 PARA	0 días	sáb 21/12/24	sáb 21/12/24	$0.00
793		1.3.3.4	INCUMPLIMIENTO No. 3 ENTREGA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS FIRMADOS Y APROBADOS POR LAS ESP POSTERIOR AL INCUMPLIMIENTO INICIAL DEL MODIFICATORIO No. 2 PARA	0 días	mar 21/01/25	mar 21/01/25	$0.00
794		1.3.3.5	ENTREGA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS POR PARTE DE LA ENTIDAD CON LA NO OBJECIÓN POR PARTE DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS Y APROBACIONES	0 días	vie 28/02/25	vie 28/02/25	$0.00
795		**1.3.3.6**	**REVISIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS 8 CIVS ENTREGADOS POR IDU (CALLE 17)**	**50 días**	**jue 21/11/24**	**mar 21/01/25**	**$0.00**
796		1.3.3.6.1	INFORME TECNICO	50 días	jue 21/11/24	mar 21/01/25	$0.00
797		1.3.3.6.2	COMPONENTE PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO - PMT.	50 días	jue 21/11/24	mar 21/01/25	$0.00
798		1.3.3.6.3	COMPONENTE AMBIENTAL-SST-BIOSEGURIDAD	50 días	jue 21/11/24	mar 21/01/25	$0.00
799		1.3.3.6.4	COMPONENTE DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	50 días	jue 21/11/24	mar 21/01/25	$0.00
800		1.3.3.6.5	ACTIVIDADES ARQUEOLOGIA Y PATRIMONIO	50 días	jue 21/11/24	mar 21/01/25	$0.00
801		**1.3.3.7**	**REVISIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS 9 CIVS ENTREGADOS POR IDU (CARRERA 38)**	**48 días**	**vie 28/02/25**	**lun 28/04/25**	**$0.00**
802		1.3.3.7.1	INFORME TECNICO	48 días	vie 28/02/25	lun 28/04/25	$0.00
803		1.3.3.7.2	COMPONENTE PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO - PMT.	48 días	vie 28/02/25	lun 28/04/25	$0.00
804		1.3.3.7.3	COMPONENTE AMBIENTAL-SST-BIOSEGURIDAD	48 días	vie 28/02/25	lun 28/04/25	$0.00
805		1.3.3.7.4	COMPONENTE DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	48 días	vie 28/02/25	lun 28/04/25	$0.00
806		1.3.3.7.5	ACTIVIDADES ARQUEOLOGIA Y PATRIMONIO	48 días	vie 28/02/25	lun 28/04/25	$0.00
807		**1.3.3.8**	**INICIO CONSTRUCCIÓN UPZ 108**	**0 días**	**mar 21/01/25**	**mar 21/01/25**	**$0.00**
808		**1.3.3.9**	**CONSTRUCCIÓN DE CIVs CALLE 17**	**493 días**	**mar 17/09/24**	**mar 21/04/26**	**$10,547,540,798.36**
809		**1.3.3.9.1**	**CIV 16001302**	**493 días**	**mar 17/09/24**	**mar 21/04/26**	**$1,111,594,875.89**
810		**1.3.3.9.1.1**	**SOLICITUD PARA PLAN DE MANEJO DE TRANSITO CIV 16001302 COSTADO NORTE**	**73 días**	**mar 17/09/24**	**jue 12/12/24**	**$0.00**
811		*1.3.3.9.1.1.1*	*PRESENTACIÓN PMT A INTERVENTORÍA CALLE 17 ENTRE KR 32 Y KR 36*	*0 días*	*mar 17/09/24*	*mar 17/09/24*	*$0.00*
812		*1.3.3.9.1.1.2*	*RADICACIÓN A LA SDM PMT CALLE 17 ENTRE KR 32 Y K*	*0 días*	*mié 18/09/24*	*mié 18/09/24*	*$0.00*
813		*1.3.3.9.1.1.3*	*OBSERVACIONES POR PARTE DE LA SDM AL PMT CALLE 17 ENTRE KR 32 Y KR 36 V0 (SOLICITUD DE AFOROS Y ACTAS DE COORDINACIÓN)*	*0 días*	*mar 24/09/24*	*mar 24/09/24*	*$0.00*

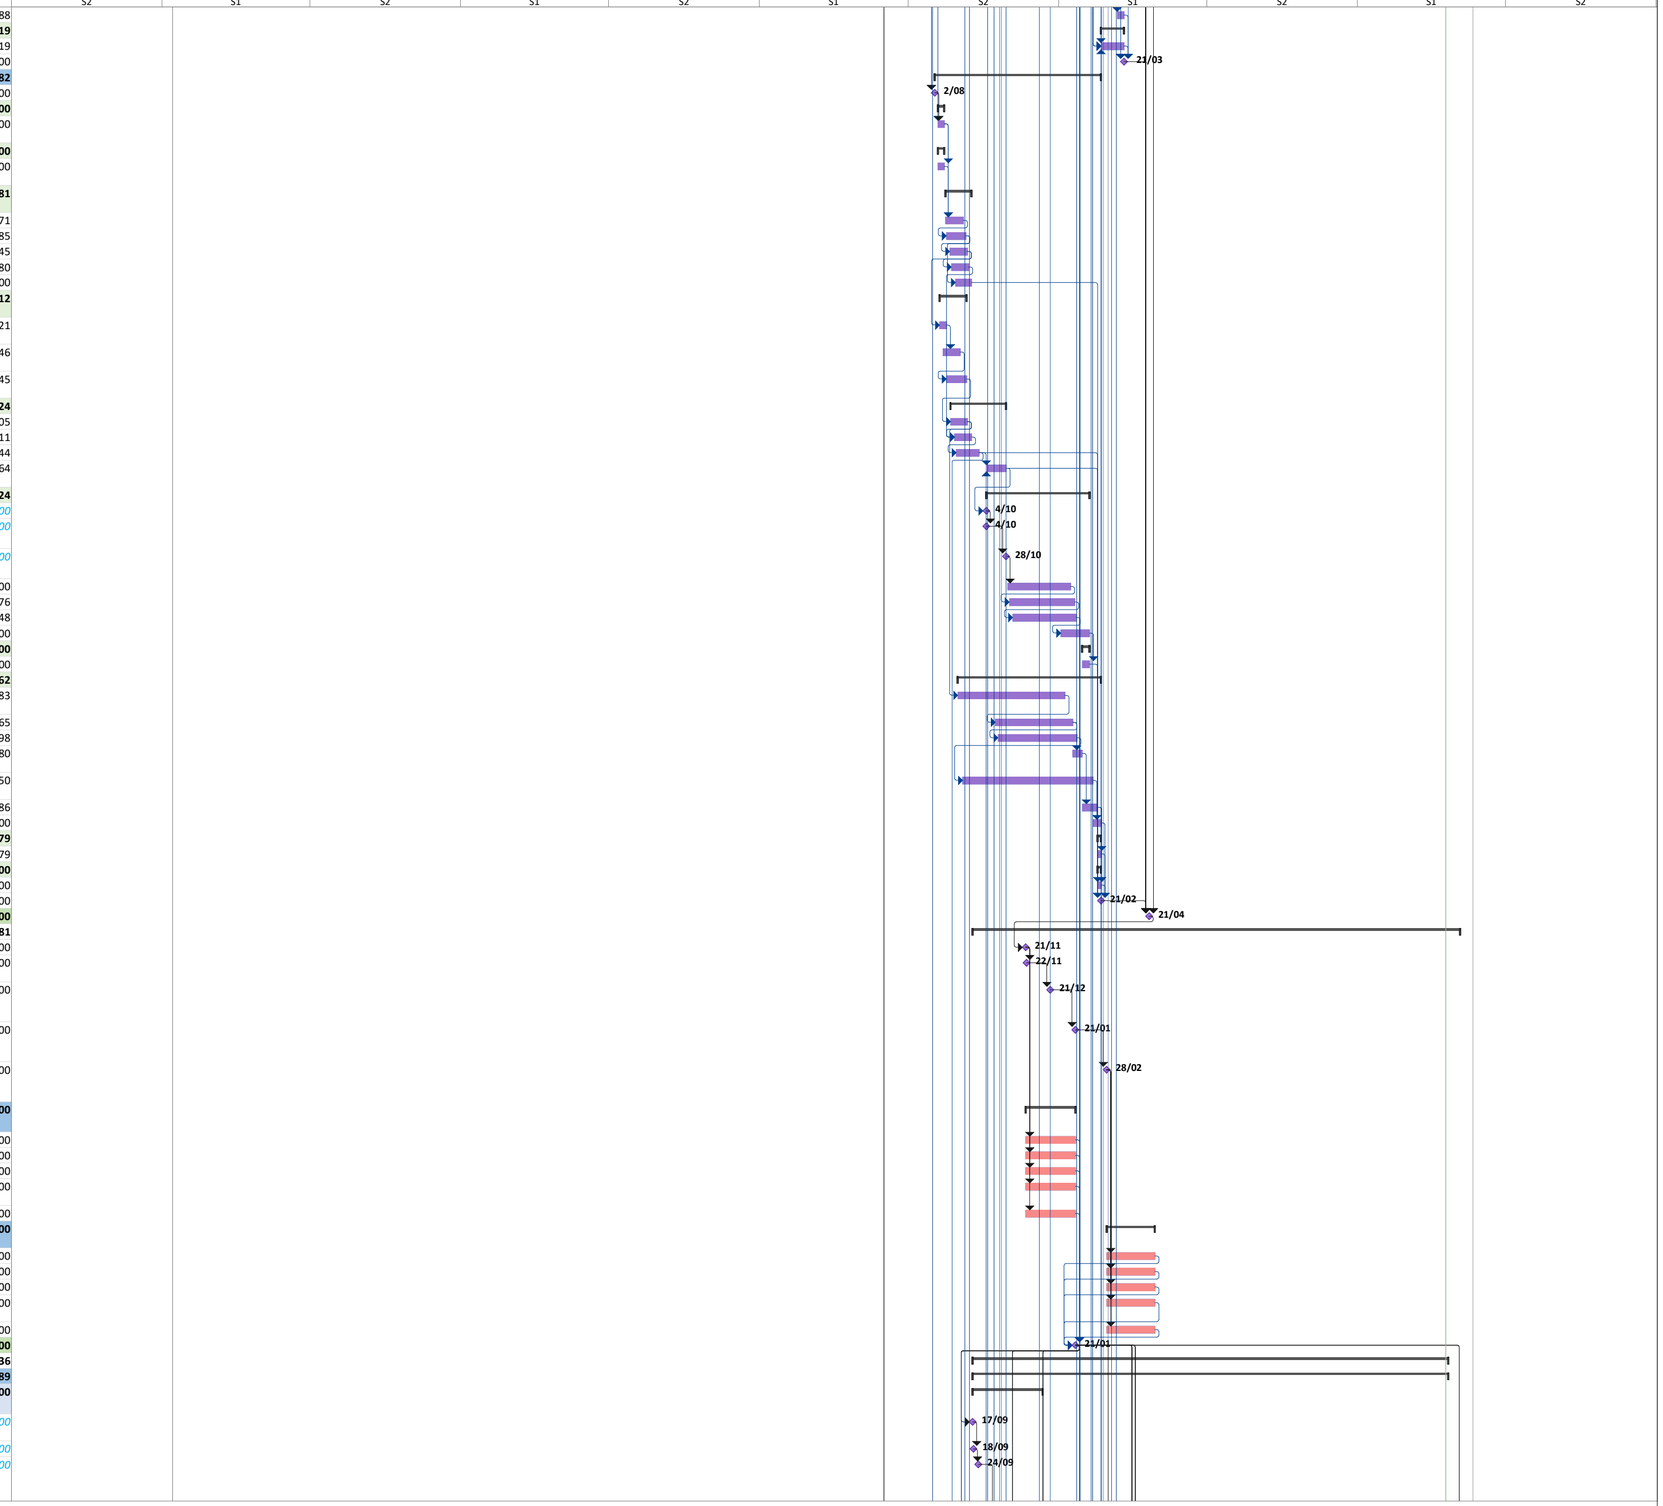

Proyecto:ID
Fecha: 14/1

Tarea | Resumen del proyecto | Hito inactivo | Informe de resumen manual | Fecha límite | Tareas críticas
División | Tareas externas | Resumen inactivo | Resumen manual | Tarea hito de sucesor controlado de ruta de acceso | División crítica
Hito | Hito externo | Tarea manual | Sólo el comienzo | Tarea de resumen de sucesor controlado de ruta de a | Progreso
Resumen | Tarea inactiva | Sólo duración | Sólo fin | Tarea normal de sucesor controlado de ruta de acces


Id	Modo de tarea	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
814		*1.3.3.9.1.1.4*	*ACTAS DE COORDINACIÓN FIRMADAS ENTRE CONTRATO IDU 1847 DE 2021 Y 1825 DE 2021*	*0 días*	*mar 15/10/24*	*mar 15/10/24*	*$0.00*
815		*1.3.3.9.1.1.5*	*ELABORACIÓN DE AFOROS DE TRANSITO PARA LAS INTERSECCIONES*	*0 días*	*sáb 19/10/24*	*sáb 19/10/24*	*$0.00*
816		*1.3.3.9.1.1.6*	*ATENCIÓN DE OBSERVACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA AL PMT CALLE 17 ENTRE KR 32 Y KR 36*	*0 días*	*vie 8/11/24*	*vie 8/11/24*	*$0.00*
817		*1.3.3.9.1.1.7*	*REUNIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA DEFINICIÓN DE LAS ZONAS DE PARQUEO*	*0 días*	*mar 19/11/24*	*mar 19/11/24*	*$0.00*
818		*1.3.3.9.1.1.8*	*OBSERVACIONES POR PARTE DE LA SDM AL PMT CALLE 17 ENTRE KR 32 Y KR 36*	*0 días*	*jue 28/11/24*	*jue 28/11/24*	*$0.00*
819		*1.3.3.9.1.1.9*	*ATENCIÓN DE OBSERVACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA AL PMT CALLE 17 ENTRE KR 32 Y KR 36*	*0 días*	*mié 4/12/24*	*mié 4/12/24*	*$0.00*
820		*1.3.3.9.1.1.10*	*MESA DE TRABAJO COORDINACIÓN DE PMTS CON PROYECTO IDU 1825 DE 2021 REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL PUENTE DE LA CALLE 13 CON CALLE*	*0 días*	*jue 5/12/24*	*jue 5/12/24*	*$0.00*
821		*1.3.3.9.1.1.11*	*ENTREGA A LA SDM LAS OBSERVACIONES AJUSTADAS CONFORME AL CORREO DEL 04 DE DICIEMBRE DE*	*0 días*	*mar 10/12/24*	*mar 10/12/24*	*$0.00*
822		*1.3.3.9.1.1.12*	*APROBACIÓN DE PMT COI 50 CIERRE ANDÉN NORTE Y UN CARRIL DE CALZADA NORTE.*	*0 días*	*jue 12/12/24*	*jue 12/12/24*	*$0.00*
823		**1.3.3.9.1.2**	**SOLICITUD PARA PLAN DE MANEJO DE TRANSITO CIV 16001302 COSTADO SUR**	**64 días**	**mar 8/04/25**	**mié 25/06/25**	**$0.00**
824		*1.3.3.9.1.2.1*	*PRESENTACIÓN PMT A INTERVENTORÍA CALLE 17 ENTRE KR 32 Y KR 36*	*0 días*	*mar 8/04/25*	*mar 8/04/25*	*$0.00*
825		*1.3.3.9.1.2.2*	*RADICACIÓN A LA SDM PMT CALLE 17 ENTRE KR 32 Y K*	*0 días*	*mié 9/04/25*	*mié 9/04/25*	*$0.00*
826		*1.3.3.9.1.2.3*	*OBSERVACIONES POR PARTE DE LA SDM AL PMT CALLE 17 ENTRE KR 32 Y KR 36 V0*	*0 días*	*mar 29/04/25*	*mar 29/04/25*	*$0.00*
827		*1.3.3.9.1.2.4*	*ATENCIÓN DE OBSERVACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA AL PMT CALLE 17 ENTRE KR 32 Y KR 36*	*0 días*	*vie 16/05/25*	*vie 16/05/25*	*$0.00*
828		*1.3.3.9.1.2.5*	*OBSERVACIONES POR PARTE DE LA SDM AL PMT CALLE 17 ENTRE KR 32 Y KR 36 V1*	*0 días*	*mar 3/06/25*	*mar 3/06/25*	*$0.00*
829		*1.3.3.9.1.2.6*	*ATENCIÓN DE OBSERVACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA AL PMT CALLE 17 ENTRE KR 32 Y KR 36*	*0 días*	*vie 20/06/25*	*vie 20/06/25*	*$0.00*
830		*1.3.3.9.1.2.7*	*TRAMITE DE PMT CIERRE ANDÉN IZQUIERDO Y UN CARRIL DE CALZADA SUR.*	*0 días*	*mié 25/06/25*	*mié 25/06/25*	*$0.00*
831		**1.3.3.9.1.3**	**FASE 1 CONSTRUCCIÓN COSTADO NORTE CL 17 ENTRE KR 32 Y KR 32A**	**159 días**	**jue 12/12/24**	**mié 18/06/25**	**$765,065,767.15**
832		1.3.3.9.1.3.1	INICIO CIV 16001302	0 días	vie 13/12/24	vie 13/12/24	$0.00
833		**1.3.3.9.1.3.2**	**TRAMITE DE PMT**	**4 días**	**vie 13/12/24**	**mié 18/12/24**	**$0.00**
834		1.3.3.9.1.3.2.1	IMPLEMENTACIÓN PMT ESPECIFICIO Y CERRAMIENTO DE OBRA	4 días	vie 13/12/24	mié 18/12/24	$0.00
835		**1.3.3.9.1.3.3**	**ACTIVIDADES DE ARQUEOLOGIA**	**4 días**	**jue 12/12/24**	**mar 17/12/24**	**$0.00**
836		1.3.3.9.1.3.3.1	EXPLORACIÓN E INVESTIGACIÓN ARQUEOLOGICA EN LA ZONA DE INTERVENCIÓN	4 días	jue 12/12/24	mar 17/12/24	$0.00
837		**1.3.3.9.1.3.4**	**REDES HIDROSANITARIAS ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL**	**30 días**	**mié 18/12/24**	**jue 23/01/25**	**$63,628,329.08**
838		1.3.3.9.1.3.4.1	EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS	10 días	mié 18/12/24	lun 30/12/24	$16,044,489.84
839		1.3.3.9.1.3.4.2	INSTALACION DE TUBERIAS	12 días	jue 19/12/24	sáb 4/01/25	$15,069,472.20
840		1.3.3.9.1.3.4.3	RELLENO DE TUBERIAS	14 días	vie 20/12/24	jue 9/01/25	$7,170,743.04
841		1.3.3.9.1.3.4.4	CONSTRUCCION DE POZOS Y SUMIDEROS	20 días	jue 26/12/24	mar 21/01/25	$18,702,014.00
842		1.3.3.9.1.3.4.5	CONSTRUCCIÓN CAJAS DE INSPECCIÓN	20 días	lun 30/12/24	jue 23/01/25	$6,641,610.00
843		**1.3.3.9.1.3.5**	**PRELIMINARES - MOVIMIENTO DE TIERRAS, DEMOLICIONES Y RELLENOS**	**38 días**	**mar 24/12/24**	**sáb 8/02/25**	**$104,279,629.80**
844		1.3.3.9.1.3.5.1	DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y TRANSPORTES DE ESCOMBROS	25 días	mar 24/12/24	vie 24/01/25	$62,968,463.01
845		1.3.3.9.1.3.5.2	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON RAJON Y SELLO DE RAJON	23 días	mar 7/01/25	sáb 1/02/25	$3,313,227.44
846		1.3.3.9.1.3.5.3	INSTALACION DE GEOTEXTILES Y RELLENO DE MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA	24 días	lun 13/01/25	sáb 8/02/25	$37,997,939.35
847		**1.3.3.9.1.3.6**	**PAVIMENTOS**	**25 días**	**lun 20/01/25**	**lun 17/02/25**	**$239,270,139.52**
848		1.3.3.9.1.3.6.1	BASES Y SUBBASES	11 días	lun 20/01/25	vie 31/01/25	$42,132,682.57
849		1.3.3.9.1.3.6.2	MEZCLA ASFALTICA	11 días	lun 27/01/25	vie 7/02/25	$49,411,521.65
850		1.3.3.9.1.3.6.3	CONCRETO LOSAS MR	12 días	vie 31/01/25	vie 14/02/25	$143,827,838.72
851		1.3.3.9.1.3.6.4	INSTALACION DE ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO (BORDILLOS, SARDINELES	7 días	sáb 8/02/25	lun 17/02/25	$3,898,096.58
852		**1.3.3.9.1.3.7**	**REDES HIDROSANITARIAS ACUEDUCTO**	**20 días**	**lun 31/03/25**	**jue 24/04/25**	**$14,961,679.71**
853		1.3.3.9.1.3.7.1	EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS	8 días	lun 31/03/25	mar 8/04/25	$2,111,764.56
854		1.3.3.9.1.3.7.2	INSTALACION DE TUBERIAS	7 días	vie 4/04/25	sáb 12/04/25	$3,143,180.10
855		1.3.3.9.1.3.7.3	INSTALACION ACCESORIOS Y EMPATES	8 días	mar 8/04/25	sáb 19/04/25	$8,003,131.00
856		1.3.3.9.1.3.7.4	RELLENO DE TUBERIAS	9 días	vie 11/04/25	jue 24/04/25	$1,703,604.05
857		**1.3.3.9.1.3.8**	**REDES SECAS (Codensa)**	**94 días**	**jue 16/01/25**	**mar 6/05/25**	**$73,444,495.22**
858		*1.3.3.9.1.3.8.1*	*MANIOBRAS POR PARTE DE LA EMPRESA ENEL - CC*	*0 días*	*jue 16/01/25*	*jue 16/01/25*	*$0.00*
859		1.3.3.9.1.3.8.2	EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS	75 días	vie 17/01/25	sáb 12/04/25	$11,339,317.32
860		1.3.3.9.1.3.8.3	INSTALACION DE DUCTERIAS	75 días	jue 23/01/25	lun 21/04/25	$28,228,392.72
861		1.3.3.9.1.3.8.4	RELLENO DE DUCTERIAS	75 días	mié 29/01/25	lun 28/04/25	$11,659,370.18
862		1.3.3.9.1.3.8.5	CONSTRUCCION DE CAJAS Y CAMARAS	75 días	jue 6/02/25	mar 6/05/25	$22,217,415.00
863		**1.3.3.9.1.3.9**	**ESPACIO PUBLICO**	**114 días**	**mar 4/02/25**	**mié 18/06/25**	**$269,481,493.82**
864		1.3.3.9.1.3.9.1	DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y TRANSPORTES DE ESCOMBROS	75 días	mar 4/02/25	lun 5/05/25	$53,360,651.68
865		1.3.3.9.1.3.9.2	INSTALACION DE GEOTEXTILES	25 días	mar 8/04/25	vie 9/05/25	$8,842,220.85
866		1.3.3.9.1.3.9.3	RELLENOS EN MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA ANDEN	30 días	lun 14/04/25	mié 21/05/25	$36,360,725.12
867		1.3.3.9.1.3.9.4	RELLENOS EN MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA RAMPAS	85 días	jue 20/02/25	mar 3/06/25	$6,534,478.45
868		1.3.3.9.1.3.9.5	INSTALACION DE ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO Y PREFABRICADOS	95 días	vie 14/02/25	vie 6/06/25	$137,103,489.86
869		1.3.3.9.1.3.9.6	CONCRETO LOSAS MR	10 días	mar 3/06/25	vie 13/06/25	$24,353,872.86
870		1.3.3.9.1.3.9.7	ELEMENTOS MOBILIARIO URBANO (CANECAS, BANCAS, ETC)	13 días	mié 4/06/25	mié 18/06/25	$2,926,055.00
871		**1.3.3.9.1.4**	**FASE 2 CONSTRUCCIÓN COSTADO SUR CL 17 ENTRE KR 32 Y KR 32A**	**261 días**	**mié 18/06/25**	**mar 21/04/26**	**$346,529,108.74**
872		**1.3.3.9.1.4.1**	**TRAMITE DE PMT**	**6 días**	**jue 26/06/25**	**jue 3/07/25**	**$0.00**
873		1.3.3.9.1.4.1.1	IMPLEMENTACIÓN PMT ESPECIFICIO Y CERRAMIENTO DE OBRA	6 días	jue 26/06/25	jue 3/07/25	$0.00
874		**1.3.3.9.1.4.2**	**REDES HIDROSANITARIAS ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL**	**50 días**	**mié 18/06/25**	**sáb 16/08/25**	**$36,318,044.72**
875		1.3.3.9.1.4.2.1	RELLENO DE TUBERIAS	25 días	mié 18/06/25	vie 18/07/25	$3,701,520.72
876		1.3.3.9.1.4.2.2	CONSTRUCCION DE POZOS Y SUMIDEROS	35 días	mar 8/07/25	sáb 16/08/25	$32,616,524.00
877		**1.3.3.9.1.4.3**	**REDES SECAS (Codensa)**	**45 días**	**jue 28/08/25**	**sáb 18/10/25**	**$76,215,459.97**
878		*1.3.3.9.1.4.3.1*	*MANIOBRAS POR PARTE DE LA EMPRESA ENEL - CC*	*0 días*	*jue 28/08/25*	*jue 28/08/25*	*$0.00*
879		1.3.3.9.1.4.3.2	EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS	20 días	lun 1/09/25	mar 23/09/25	$15,879,135.88
880		1.3.3.9.1.4.3.3	INSTALACION DE DUCTERIAS	15 días	mié 10/09/25	sáb 27/09/25	$43,531,085.10
881		1.3.3.9.1.4.3.4	RELLENO DE DUCTERIAS	15 días	lun 15/09/25	jue 2/10/25	$12,516,330.99
882		1.3.3.9.1.4.3.5	CONSTRUCCION DE CAJAS Y CAMARAS	25 días	vie 19/09/25	sáb 18/10/25	$4,288,908.00

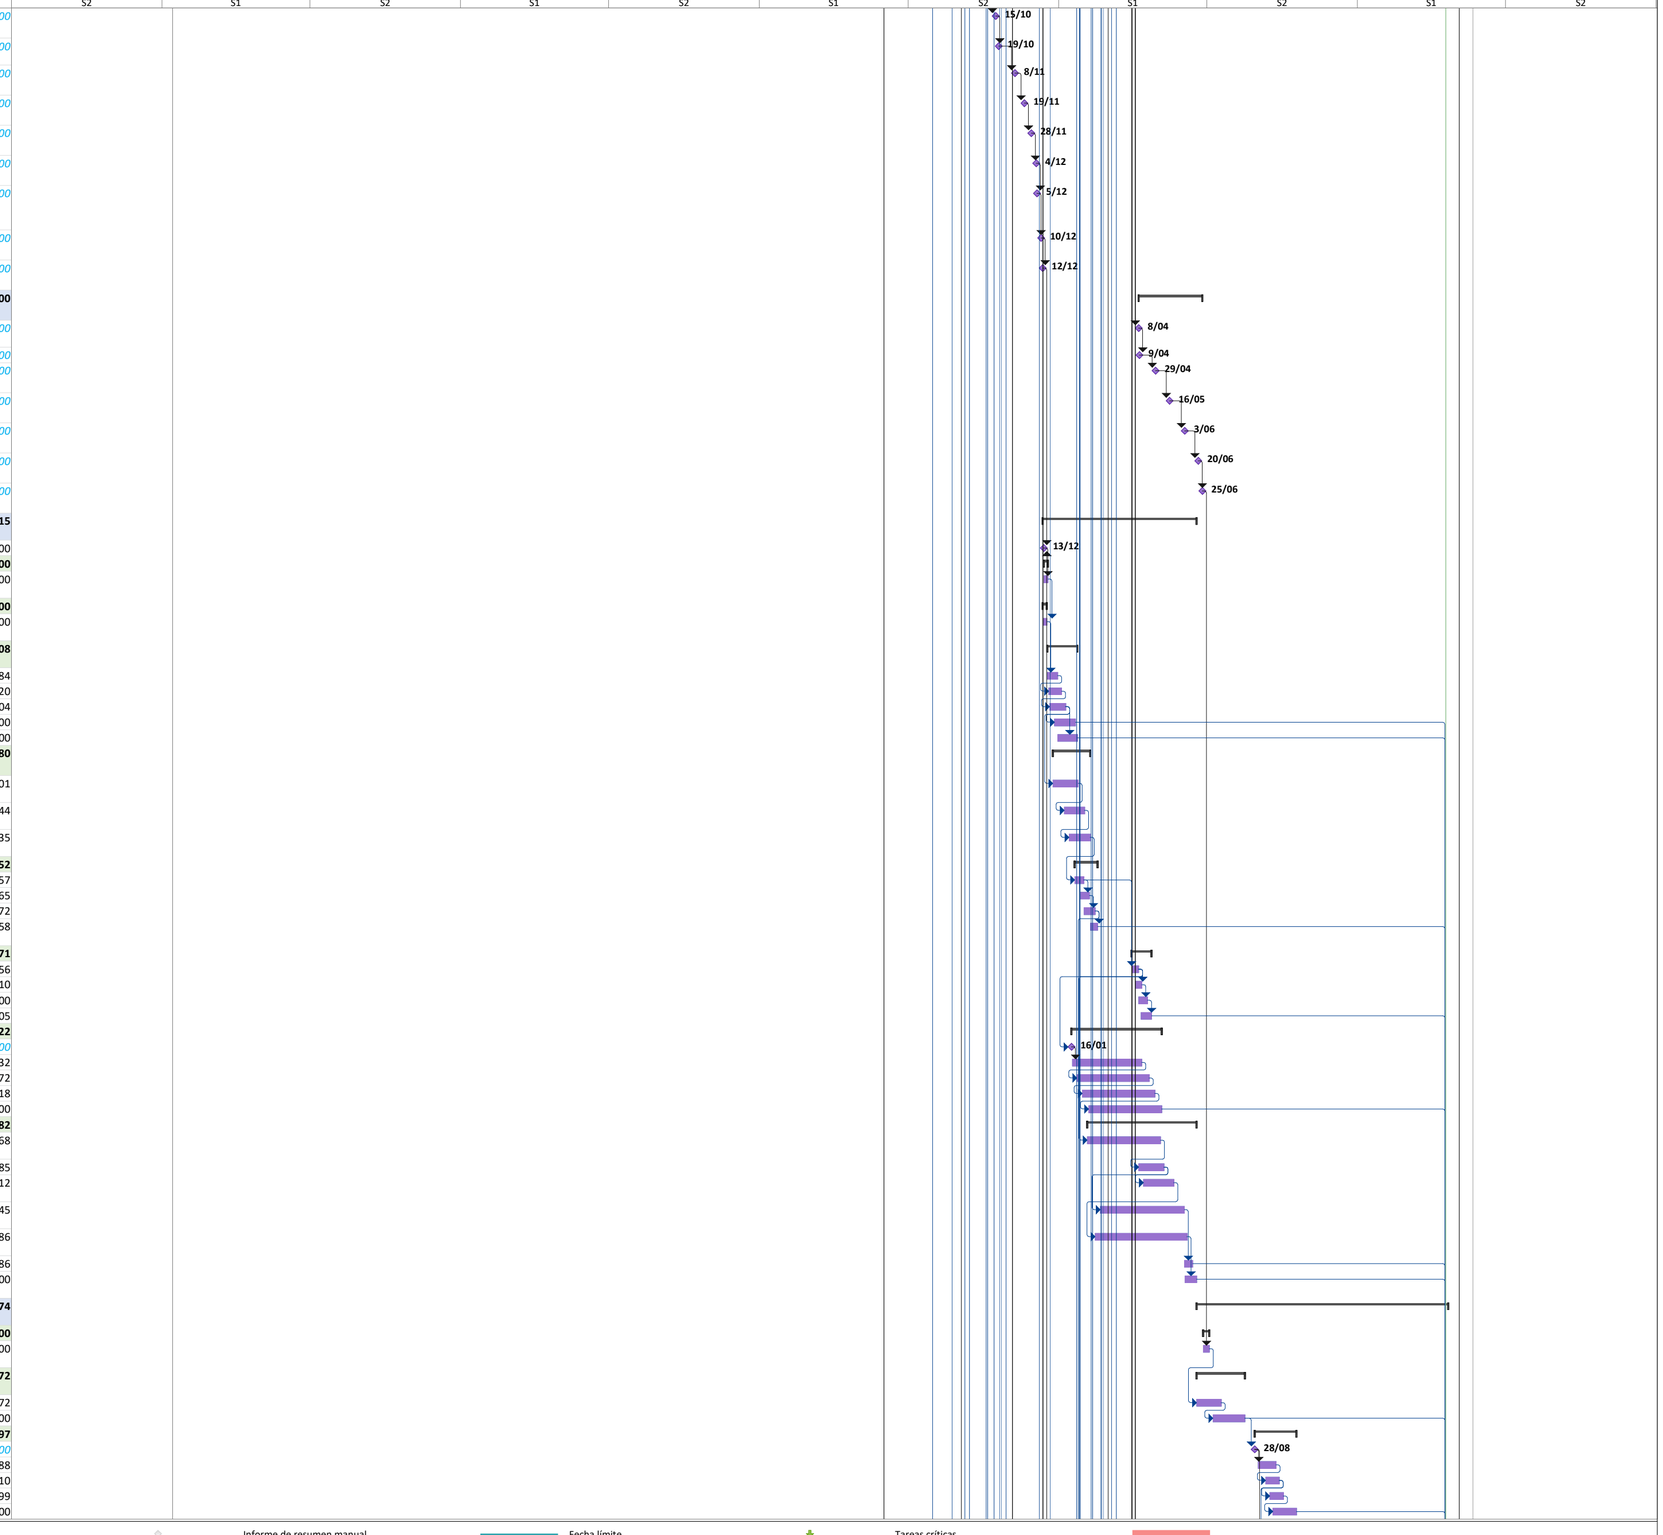

Proyecto:ID
Fecha: 14/1

Tarea | División | Hito | Resumen
Resumen del proyecto | Tareas externas | Hito externo | Tarea inactiva
Hito inactivo | Resumen inactivo | Tarea manual | Sólo duración
Informe de resumen manual | Resumen manual | Sólo el comienzo | Sólo fin
Fecha límite | Tarea hito de sucesor controlado de ruta de acceso | Tarea de resumen de sucesor controlado de ruta de a | Tarea normal de sucesor controlado de ruta de acces
Tareas críticas | División crítica | Progreso

Id	Modo de tarea	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
883		**1.3.3.9.1.4.4**	**REDES SECAS (ETB)**	**26 días**	**lun 15/09/25**	**mar 14/10/25**	**$16,785,128.00**
884		1.3.3.9.1.4.4.1	NIVELACION DE CAJAS	26 días	lun 15/09/25	mar 14/10/25	$16,785,128.00
885		**1.3.3.9.1.4.5**	**ESPACIO PUBLICO**	**68 días**	**mié 3/09/25**	**vie 21/11/25**	**$215,623,922.80**
886		1.3.3.9.1.4.5.1	DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y TRANSPORTES DE ESCOMBROS	30 días	mié 3/09/25	mar 7/10/25	$34,276,959.02
887		1.3.3.9.1.4.5.2	INSTALACION DE GEOTEXTILES	15 días	jue 25/09/25	sáb 11/10/25	$3,607,883.04
888		1.3.3.9.1.4.5.3	RELLENOS EN MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA ANDEN	16 días	mar 7/10/25	sáb 25/10/25	$11,424,927.48
889		1.3.3.9.1.4.5.4	RELLENOS EN MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA RAMPAS	16 días	jue 9/10/25	mié 29/10/25	$12,513,611.70
890		1.3.3.9.1.4.5.5	INSTALACION DE ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO Y PREFABRICADOS	25 días	jue 16/10/25	vie 14/11/25	$51,494,828.32
891		1.3.3.9.1.4.5.6	CONCRETO LOSAS MR	10 días	mié 22/10/25	mar 4/11/25	$46,038,951.24
892		1.3.3.9.1.4.5.7	ELEMENTOS MOBILIARIO URBANO (CANECAS, BANCAS, ETC)	15 días	mar 4/11/25	vie 21/11/25	$6,394,574.00
893		1.3.3.9.1.4.5.8	CANALES DE DRENAJE MONOLITICO	10 días	lun 10/11/25	vie 21/11/25	$49,872,188.00
894		**1.3.3.9.1.4.6**	**PAISAJISMO**	**9 días**	**sáb 11/04/26**	**mar 21/04/26**	**$1,586,553.25**
895		1.3.3.9.1.4.6.1	PAISAJISMO	9 días	sáb 11/04/26	mar 21/04/26	$1,586,553.25
896		1.3.3.9.1.4.7	FIN CIV 16001302	0 días	mar 21/04/26	mar 21/04/26	$0.00
897		**1.3.3.9.2**	**CIV 16001255**	**493 días**	**mar 17/09/24**	**mar 21/04/26**	**$1,161,029,320.08**
898		**1.3.3.9.2.1**	**SOLICITUD PARA PLAN DE MANEJO DE TRANSITO CIV 16001255 COSTADO NORTE**	**73 días**	**mar 17/09/24**	**jue 12/12/24**	**$0.00**
899		*1.3.3.9.2.1.1*	*PRESENTACIÓN PMT A INTERVENTORÍA CALLE 17 ENTRE KR 32 Y KR 36*	*0 días*	*mar 17/09/24*	*mar 17/09/24*	*$0.00*
900		*1.3.3.9.2.1.2*	*RADICACIÓN A LA SDM PMT CALLE 17 ENTRE KR 32 Y K*	*0 días*	*mié 18/09/24*	*mié 18/09/24*	*$0.00*
901		*1.3.3.9.2.1.3*	*OBSERVACIONES POR PARTE DE LA SDM AL PMT CALLE 17 ENTRE KR 32 Y KR 36 V0 (SOLICITUD DE AFOROS Y ACTAS DE COORDINACIÓN)*	*0 días*	*mar 24/09/24*	*mar 24/09/24*	*$0.00*
902		*1.3.3.9.2.1.4*	*ACTAS DE COORDINACIÓN FIRMADAS ENTRE CONTRATO IDU 1847 DE 2021 Y 1825 DE 2021*	*0 días*	*mar 15/10/24*	*mar 15/10/24*	*$0.00*
903		*1.3.3.9.2.1.5*	*ELABORACIÓN DE AFOROS DE TRANSITO PARA LAS INTERSECCIONES*	*0 días*	*sáb 19/10/24*	*sáb 19/10/24*	*$0.00*
904		*1.3.3.9.2.1.6*	*ATENCIÓN DE OBSERVACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA AL PMT CALLE 17 ENTRE KR 32 Y KR 36*	*0 días*	*vie 8/11/24*	*vie 8/11/24*	*$0.00*
905		*1.3.3.9.2.1.7*	*REUNIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA DEFINICIÓN DE LAS ZONAS DE PARQUEO*	*0 días*	*mar 19/11/24*	*mar 19/11/24*	*$0.00*
906		*1.3.3.9.2.1.8*	*OBSERVACIONES POR PARTE DE LA SDM AL PMT CALLE 17 ENTRE KR 32 Y KR 36*	*0 días*	*jue 28/11/24*	*jue 28/11/24*	*$0.00*
907		*1.3.3.9.2.1.9*	*ATENCIÓN DE OBSERVACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA AL PMT CALLE 17 ENTRE KR 32 Y KR 36*	*0 días*	*mié 4/12/24*	*mié 4/12/24*	*$0.00*
908		*1.3.3.9.2.1.10*	*MESA DE TRABAJO COORDINACIÓN DE PMTS CON PROYECTO IDU 1825 DE 2021 REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL PUENTE DE LA CALLE 13 CON CALLE*	*0 días*	*jue 5/12/24*	*jue 5/12/24*	*$0.00*
909		*1.3.3.9.2.1.11*	*ENTREGA A LA SDM LAS OBSERVACIONES AJUSTADAS CONFORME AL CORREO DEL 04 DE DICIEMBRE DE*	*0 días*	*mar 10/12/24*	*mar 10/12/24*	*$0.00*
910		*1.3.3.9.2.1.12*	*APROBACIÓN DE PMT COI 50 CIERRE ANDÉN NORTE Y UN CARRIL DE CALZADA NORTE.*	*0 días*	*jue 12/12/24*	*jue 12/12/24*	*$0.00*
911		**1.3.3.9.2.2**	**SOLICITUD PARA PLAN DE MANEJO DE TRANSITO CIV 16001255 COSTADO SUR**	**64 días**	**mar 8/04/25**	**mié 25/06/25**	**$0.00**
912		*1.3.3.9.2.2.1*	*PRESENTACIÓN PMT A INTERVENTORÍA CALLE 17 ENTRE KR 32 Y KR 36*	*0 días*	*mar 8/04/25*	*mar 8/04/25*	*$0.00*
913		*1.3.3.9.2.2.2*	*RADICACIÓN A LA SDM PMT CALLE 17 ENTRE KR 32 Y K*	*0 días*	*mié 9/04/25*	*mié 9/04/25*	*$0.00*
914		*1.3.3.9.2.2.3*	*OBSERVACIONES POR PARTE DE LA SDM AL PMT CALLE 17 ENTRE KR 32 Y KR 36 V0*	*0 días*	*mar 29/04/25*	*mar 29/04/25*	*$0.00*
915		*1.3.3.9.2.2.4*	*ATENCIÓN DE OBSERVACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA AL PMT CALLE 17 ENTRE KR 32 Y KR 36*	*0 días*	*vie 16/05/25*	*vie 16/05/25*	*$0.00*
916		*1.3.3.9.2.2.5*	*OBSERVACIONES POR PARTE DE LA SDM AL PMT CALLE 17 ENTRE KR 32 Y KR 36 V1*	*0 días*	*mar 3/06/25*	*mar 3/06/25*	*$0.00*
917		*1.3.3.9.2.2.6*	*ATENCIÓN DE OBSERVACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA AL PMT CALLE 17 ENTRE KR 32 Y KR 36*	*0 días*	*vie 20/06/25*	*vie 20/06/25*	*$0.00*
918		*1.3.3.9.2.2.7*	*TRAMITE DE PMT CIERRE ANDÉN IZQUIEROD Y UN CARRIL DE CALZADA SUR.*	*0 días*	*mié 25/06/25*	*mié 25/06/25*	*$0.00*
919		**1.3.3.9.2.3**	**FASE 1 CONSTRUCCIÓN COSTADO NORTE CL 17 ENTRE KR 32A Y KR 33**	**157 días**	**vie 13/12/24**	**mié 18/06/25**	**$676,840,103.36**
920		1.3.3.9.2.3.1	INICIO CIV 16001255	0 días	mar 17/12/24	mar 17/12/24	$0.00
921		**1.3.3.9.2.3.2**	**TRAMITE DE PMT**	**4 días**	**mié 18/12/24**	**sáb 21/12/24**	**$0.00**
922		1.3.3.9.2.3.2.1	IMPLEMENTACIÓN PMT ESPECIFICIO Y CERRAMIENTO DE OBRA	4 días	mié 18/12/24	sáb 21/12/24	$0.00
923		**1.3.3.9.2.3.3**	**ACTIVIDADES DE ARQUEOLOGIA**	**6 días**	**vie 13/12/24**	**vie 20/12/24**	**$0.00**
924		1.3.3.9.2.3.3.1	EXPLORACIÓN E INVESTIGACIÓN ARQUEOLOGICA EN LA ZONA DE INTERVENCIÓN	6 días	vie 13/12/24	vie 20/12/24	$0.00
925		**1.3.3.9.2.3.4**	**REDES HIDROSANITARIAS ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL**	**77 días**	**lun 23/12/24**	**vie 21/03/25**	**$84,300,140.28**
926		1.3.3.9.2.3.4.1	EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS	65 días	lun 23/12/24	sáb 8/03/25	$10,038,869.26
927		1.3.3.9.2.3.4.2	INSTALACION DE TUBERIAS	65 días	jue 26/12/24	mié 12/03/25	$27,013,423.08
928		1.3.3.9.2.3.4.3	RELLENO DE TUBERIAS	65 días	jue 2/01/25	mar 18/03/25	$19,345,078.16
929		1.3.3.9.2.3.4.4	CONSTRUCCION DE POZOS Y SUMIDEROS	64 días	jue 9/01/25	vie 21/03/25	$23,017,639.78
930		1.3.3.9.2.3.4.5	CONSTRUCCIÓN CAJAS DE INSPECCIÓN	64 días	jue 9/01/25	vie 21/03/25	$4,885,130.00
931		**1.3.3.9.2.3.5**	**PRELIMINARES - MOVIMIENTO DE TIERRAS, DEMOLICIONES Y RELLENOS**	**72 días**	**mié 15/01/25**	**lun 7/04/25**	**$124,099,955.66**
932		1.3.3.9.2.3.5.1	DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y TRANSPORTES DE ESCOMBROS	65 días	mié 15/01/25	sáb 29/03/25	$51,061,737.98
933		1.3.3.9.2.3.5.2	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON RAJON Y SELLO DE RAJON	60 días	jue 23/01/25	mar 1/04/25	$27,055,425.47
934		1.3.3.9.2.3.5.3	INSTALACION DE GEOTEXTILES Y RELLENO DE MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA	60 días	mar 28/01/25	lun 7/04/25	$45,982,792.21
935		**1.3.3.9.2.3.6**	**PAVIMENTOS**	**101 días**	**jue 23/01/25**	**mié 21/05/25**	**$235,404,084.28**
936		1.3.3.9.2.3.6.1	BASES Y SUBBASES	8 días	jue 23/01/25	vie 31/01/25	$44,669,797.48
937		1.3.3.9.2.3.6.2	MEZCLA ASFALTICA	86 días	vie 24/01/25	mar 6/05/25	$37,232,617.81
938		1.3.3.9.2.3.6.3	CONCRETO LOSAS MR	93 días	mar 28/01/25	sáb 17/05/25	$150,160,358.75
939		1.3.3.9.2.3.6.4	INSTALACION DE ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO (BORDILLOS, SARDINELES	83 días	mié 12/02/25	mié 21/05/25	$3,341,310.24
940		**1.3.3.9.2.3.7**	**REDES HIDROSANITARIAS ACUEDUCTO**	**75 días**	**lun 10/02/25**	**vie 9/05/25**	**$46,185,842.95**
941		1.3.3.9.2.3.7.1	EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS	55 días	lun 10/02/25	lun 14/04/25	$6,404,057.60
942		1.3.3.9.2.3.7.2	INSTALACION DE TUBERIAS	55 días	mié 12/02/25	mié 16/04/25	$10,964,195.37
943		1.3.3.9.2.3.7.3	INSTALACION ACCESORIOS Y EMPATES	14 días	mié 16/04/25	lun 5/05/25	$5,166,434.98
944		1.3.3.9.2.3.7.4	RELLENO DE TUBERIAS	64 días	vie 21/02/25	vie 9/05/25	$23,651,155.00
945		**1.3.3.9.2.3.8**	**REDES SECAS (Codensa)**	**93 días**	**sáb 15/02/25**	**jue 5/06/25**	**$42,783,360.40**
946		1.3.3.9.2.3.8.1	MANIOBRAS POR PARTE DE LA EMPRESA ENEL - CC	0 días	sáb 15/02/25	sáb 15/02/25	$0.00
947		1.3.3.9.2.3.8.2	EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS	84 días	sáb 15/02/25	lun 26/05/25	$6,936,417.20
948		1.3.3.9.2.3.8.3	INSTALACION DE DUCTERIAS	85 días	mar 18/02/25	mié 28/05/25	$17,726,490.80
949		1.3.3.9.2.3.8.4	RELLENO DE DUCTERIAS	86 días	mar 18/02/25	jue 29/05/25	$4,944,578.40

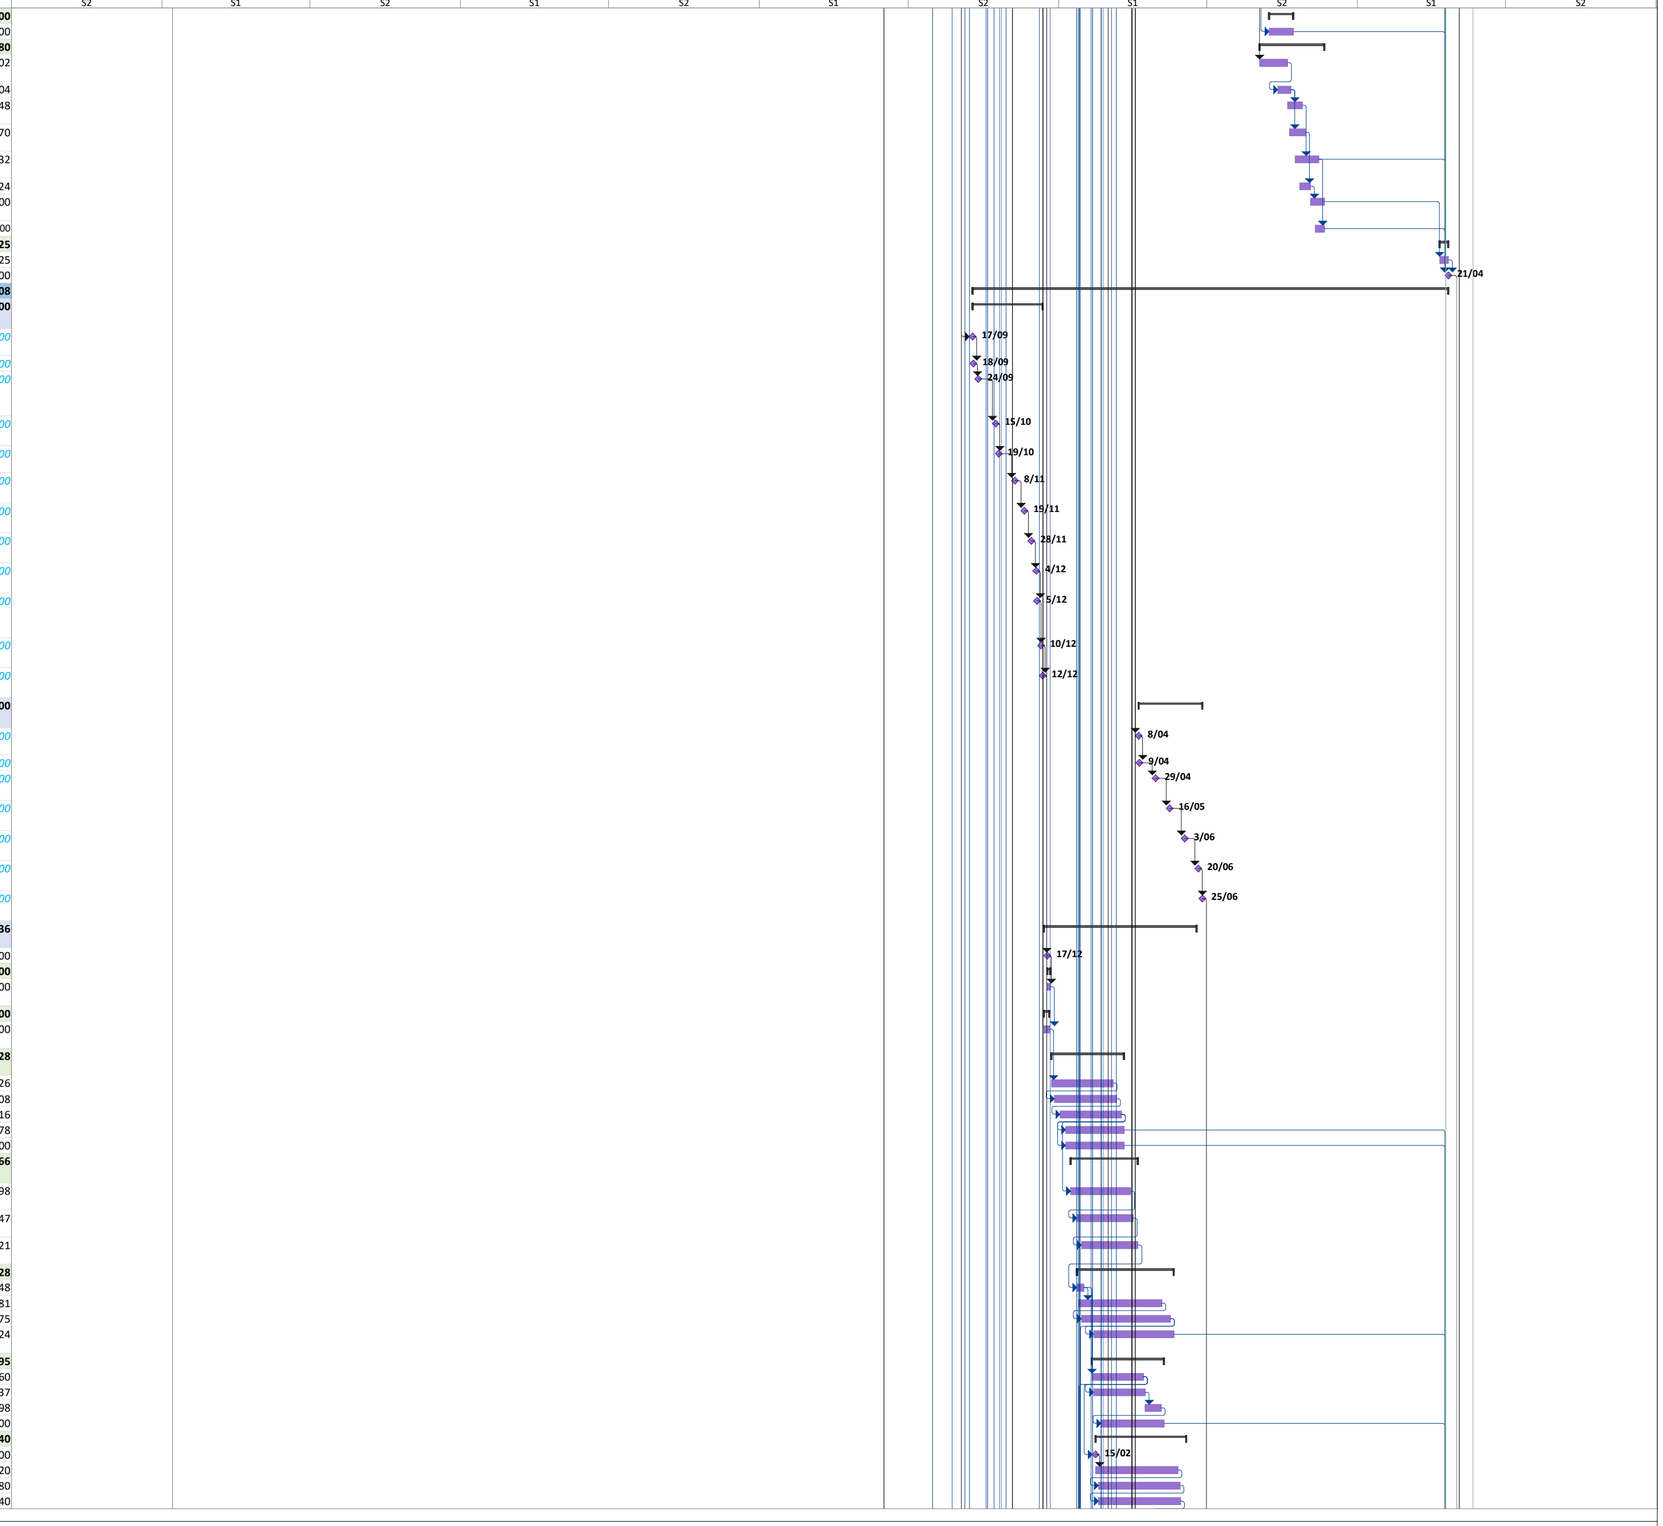

Proyecto:ID
Fecha: 14/1

Tarea · División · Hito · Resumen
Resumen del proyecto · Tareas externas · Hito externo · Tarea inactiva
Hito inactivo · Resumen inactivo · Tarea manual · Sólo duración
Informe de resumen manual · Resumen manual · Sólo el comienzo · Sólo fin
Fecha límite · Tarea hito de sucesor controlado de ruta de acceso · Tarea de resumen de sucesor controlado de ruta de a · Tarea normal de sucesor controlado de ruta de acces
Tareas críticas · División crítica · Progreso

Id	Modo de tarea	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
950		1.3.3.9.2.3.8.5	CONSTRUCCION DE CAJAS Y CAMARAS	25 días	mié 7/05/25	jue 5/06/25	$13,175,874.00
951		**1.3.3.9.2.3.9**	**ESPACIO PUBLICO**	**114 días**	**mar 4/02/25**	**mié 18/06/25**	**$144,066,719.79**
952		1.3.3.9.2.3.9.1	DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y TRANSPORTES DE ESCOMBROS	103 días	mar 4/02/25	jue 5/06/25	$26,131,987.50
953		1.3.3.9.2.3.9.2	INSTALACION DE GEOTEXTILES	70 días	jue 13/03/25	jue 5/06/25	$4,473,680.31
954		1.3.3.9.2.3.9.3	RELLENOS EN MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA ANDEN	10 días	jue 29/05/25	mar 10/06/25	$13,494,446.10
955		1.3.3.9.2.3.9.4	RELLENOS EN MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA RAMPAS	73 días	mar 18/03/25	vie 13/06/25	$19,519,465.00
956		1.3.3.9.2.3.9.5	INSTALACION DE ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO Y PREFABRICADOS	111 días	jue 6/02/25	mar 17/06/25	$61,111,256.26
957		1.3.3.9.2.3.9.6	CONCRETO LOSAS MR	9 días	lun 9/06/25	mié 18/06/25	$12,685,759.62
958		1.3.3.9.2.3.9.7	ELEMENTOS MOBILIARIO URBANO (CANECAS, BANCAS, ETC)	11 días	jue 5/06/25	mié 18/06/25	$6,650,125.00
959		**1.3.3.9.2.4**	**FASE 2 CONSTRUCCIÓN COSTADO SUR CL 17 ENTRE KR 32A Y KR 33**	**256 días**	**mié 25/06/25**	**mar 21/04/26**	**$484,189,216.72**
960		**1.3.3.9.2.4.1**	**TRAMITE DE PMT**	**6 días**	**mié 25/06/25**	**jue 3/07/25**	**$0.00**
961		1.3.3.9.2.4.1.1	IMPLEMENTACIÓN PMT ESPECIFICIO Y CERRAMIENTO DE OBRA	6 días	mié 25/06/25	jue 3/07/25	$0.00
962		**1.3.3.9.2.4.2**	**REDES HIDROSANITARIAS ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL**	**53 días**	**vie 4/07/25**	**jue 4/09/25**	**$39,685,433.28**
963		1.3.3.9.2.4.2.1	EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS	25 días	vie 4/07/25	jue 31/07/25	$5,089,246.16
964		1.3.3.9.2.4.2.2	INSTALACION DE TUBERIAS	23 días	vie 11/07/25	mié 6/08/25	$7,739,177.34
965		1.3.3.9.2.4.2.3	RELLENO DE TUBERIAS	23 días	lun 21/07/25	sáb 16/08/25	$7,053,968.00
966		1.3.3.9.2.4.2.4	CONSTRUCCION DE POZOS Y SUMIDEROS	30 días	mié 30/07/25	jue 4/09/25	$15,554,603.78
967		1.3.3.9.2.4.2.5	CONSTRUCCIÓN CAJAS DE INSPECCIÓN	30 días	mié 30/07/25	jue 4/09/25	$4,248,438.00
968		**1.3.3.9.2.4.3**	**PRELIMINARES - MOVIMIENTO DE TIERRAS, DEMOLICIONES Y RELLENOS**	**33 días**	**mar 5/08/25**	**vie 12/09/25**	**$14,083,902.84**
969		1.3.3.9.2.4.3.1	DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y TRANSPORTES DE ESCOMBROS	33 días	mar 5/08/25	vie 12/09/25	$14,083,902.84
970		**1.3.3.9.2.4.4**	**REDES SECAS (Codensa)**	**41 días**	**mié 24/09/25**	**mar 11/11/25**	**$57,178,966.78**
971		1.3.3.9.2.4.4.1	MANIOBRAS POR PARTE DE LA EMPRESA ENEL - CC	0 días	mié 24/09/25	mié 24/09/25	$0.00
972		1.3.3.9.2.4.4.2	EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS	25 días	sáb 27/09/25	lun 27/10/25	$9,638,691.24
973		1.3.3.9.2.4.4.3	INSTALACION DE DUCTERIAS	22 días	lun 29/09/25	vie 24/10/25	$29,036,021.85
974		1.3.3.9.2.4.4.4	RELLENO DE DUCTERIAS	22 días	jue 2/10/25	mar 28/10/25	$9,567,038.69
975		1.3.3.9.2.4.4.5	CONSTRUCCION DE CAJAS Y CAMARAS	30 días	mar 7/10/25	mar 11/11/25	$8,937,215.00
976		**1.3.3.9.2.4.5**	**REDES SECAS (ETB)**	**29 días**	**vie 3/10/25**	**vie 7/11/25**	**$4,755,310.00**
977		1.3.3.9.2.4.5.1	NIVELACIÓN DE CAMARAS	29 días	vie 3/10/25	vie 7/11/25	$4,755,310.00
978		**1.3.3.9.2.4.6**	**ESPACIO PUBLICO**	**48 días**	**jue 25/09/25**	**vie 21/11/25**	**$355,233,655.06**
979		1.3.3.9.2.4.6.1	DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y TRANSPORTES DE ESCOMBROS	20 días	jue 25/09/25	sáb 18/10/25	$68,531,745.37
980		1.3.3.9.2.4.6.2	INSTALACION DE GEOTEXTILES	18 días	vie 3/10/25	vie 24/10/25	$10,386,073.85
981		1.3.3.9.2.4.6.3	RELLENOS EN MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA ANDEN	10 días	mié 15/10/25	lun 27/10/25	$22,218,633.27
982		1.3.3.9.2.4.6.4	RELLENOS EN MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA RAMPAS	10 días	mar 21/10/25	vie 31/10/25	$15,350,160.05
983		1.3.3.9.2.4.6.5	INSTALACION DE ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO Y PREFABRICADOS	24 días	vie 17/10/25	vie 14/11/25	$140,098,263.86
984		1.3.3.9.2.4.6.6	CONCRETO LOSAS MR	10 días	lun 27/10/25	vie 7/11/25	$37,001,442.66
985		1.3.3.9.2.4.6.7	ELEMENTOS MOBILIARIO URBANO (CANECAS, BANCAS, ETC)	9 días	mar 11/11/25	vie 21/11/25	$8,522,614.00
986		1.3.3.9.2.4.6.8	CANALES DE DRENAJE MONOLITICO	10 días	mar 4/11/25	vie 14/11/25	$53,124,722.00
987		**1.3.3.9.2.4.7**	**PAISAJISMO**	**16 días**	**vie 3/04/26**	**mar 21/04/26**	**$3,941,885.81**
988		1.3.3.9.2.4.7.1	PAISAJISMO	16 días	vie 3/04/26	mar 21/04/26	$3,941,885.81
989		**1.3.3.9.2.4.8**	**SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN (HORIZONTAL Y VEF**	**16 días**	**vie 3/04/26**	**mar 21/04/26**	**$9,310,062.95**
990		1.3.3.9.2.4.8.1	SEÑALIZACIÓN	16 días	vie 3/04/26	mar 21/04/26	$9,310,062.95
991		1.3.3.9.2.4.9	FIN CIV 16001255	0 días	mar 21/04/26	mar 21/04/26	$0.00
992		**1.3.3.9.3**	**CIV 16001198**	**493 días**	**mar 17/09/24**	**mar 21/04/26**	**$1,926,067,235.66**
993		**1.3.3.9.3.1**	**SOLICITUD PARA PLAN DE MANEJO DE TRANSITO CIV 16001198 COSTADO NORTE**	**73 días**	**mar 17/09/24**	**jue 12/12/24**	**$0.00**
994		*1.3.3.9.3.1.1*	*PRESENTACIÓN PMT A INTERVENTORÍA CALLE 17 ENTRE KR 32 Y KR 36*	*0 días*	*mar 17/09/24*	*mar 17/09/24*	*$0.00*
995		*1.3.3.9.3.1.2*	*RADICACIÓN A LA SDM PMT CALLE 17 ENTRE KR 32 Y K*	*0 días*	*mié 18/09/24*	*mié 18/09/24*	*$0.00*
996		*1.3.3.9.3.1.3*	*OBSERVACIONES POR PARTE DE LA SDM AL PMT CALLE 17 ENTRE KR 32 Y KR 36 V0 (SOLICITUD DE AFOROS Y ACTAS DE COORDINACIÓN)*	*0 días*	*mar 24/09/24*	*mar 24/09/24*	*$0.00*
997		*1.3.3.9.3.1.4*	*ACTAS DE COORDINACIÓN FIRMADAS ENTRE CONTRATO IDU 1847 DE 2021 Y 1825 DE 2021*	*0 días*	*mar 15/10/24*	*mar 15/10/24*	*$0.00*
998		*1.3.3.9.3.1.5*	*ELABORACIÓN DE AFOROS DE TRANSITO PARA LAS INTERSECCIONES*	*0 días*	*sáb 19/10/24*	*sáb 19/10/24*	*$0.00*
999		*1.3.3.9.3.1.6*	*ATENCIÓN DE OBSERVACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA AL PMT CALLE 17 ENTRE KR 32 Y KR 36*	*0 días*	*vie 8/11/24*	*vie 8/11/24*	*$0.00*
1000		*1.3.3.9.3.1.7*	*REUNIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA DEFINICIÓN DE LAS ZONAS DE PARQUEO*	*0 días*	*mar 19/11/24*	*mar 19/11/24*	*$0.00*
1001		*1.3.3.9.3.1.8*	*OBSERVACIONES POR PARTE DE LA SDM AL PMT CALLE 17 ENTRE KR 32 Y KR 36*	*0 días*	*jue 28/11/24*	*jue 28/11/24*	*$0.00*
1002		*1.3.3.9.3.1.9*	*ATENCIÓN DE OBSERVACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA AL PMT CALLE 17 ENTRE KR 32 Y KR 36*	*0 días*	*mié 4/12/24*	*mié 4/12/24*	*$0.00*
1003		*1.3.3.9.3.1.10*	*MESA DE TRABAJO COORDINACIÓN DE PMTS CON PROYECTO IDU 1825 DE 2021 REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL PUENTE DE LA CALLE 13 CON CALLE*	*0 días*	*jue 5/12/24*	*jue 5/12/24*	*$0.00*
1004		*1.3.3.9.3.1.11*	*ENTREGA A LA SDM LAS OBSERVACIONES AJUSTADAS CONFORME AL CORREO DEL 04 DE DICIEMBRE DE*	*0 días*	*mar 10/12/24*	*mar 10/12/24*	*$0.00*
1005		*1.3.3.9.3.1.12*	*APROBACIÓN DE PMT COI 50 CIERRE ANDÉN NORTE Y UN CARRIL DE CALZADA NORTE.*	*0 días*	*jue 12/12/24*	*jue 12/12/24*	*$0.00*
1006		**1.3.3.9.3.2**	**SOLICITUD PARA PLAN DE MANEJO DE TRANSITO CIV 16001198 COSTADO NORTE**	**64 días**	**mar 8/04/25**	**mié 25/06/25**	**$0.00**
1007		*1.3.3.9.3.2.1*	*PRESENTACIÓN PMT A INTERVENTORÍA CALLE 17 ENTRE KR 32 Y KR 36*	*0 días*	*mar 8/04/25*	*mar 8/04/25*	*$0.00*
1008		*1.3.3.9.3.2.2*	*RADICACIÓN A LA SDM PMT CALLE 17 ENTRE KR 32 Y K*	*0 días*	*mié 9/04/25*	*mié 9/04/25*	*$0.00*
1009		*1.3.3.9.3.2.3*	*OBSERVACIONES POR PARTE DE LA SDM AL PMT CALLE 17 ENTRE KR 32 Y KR 36 V0*	*0 días*	*mar 29/04/25*	*mar 29/04/25*	*$0.00*
1010		*1.3.3.9.3.2.4*	*ATENCIÓN DE OBSERVACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA AL PMT CALLE 17 ENTRE KR 32 Y KR 36*	*0 días*	*vie 16/05/25*	*vie 16/05/25*	*$0.00*
1011		*1.3.3.9.3.2.5*	*OBSERVACIONES POR PARTE DE LA SDM AL PMT CALLE 17 ENTRE KR 32 Y KR 36 V1*	*0 días*	*mar 3/06/25*	*mar 3/06/25*	*$0.00*
1012		*1.3.3.9.3.2.6*	*ATENCIÓN DE OBSERVACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA AL PMT CALLE 17 ENTRE KR 32 Y KR 36*	*0 días*	*vie 20/06/25*	*vie 20/06/25*	*$0.00*
1013		*1.3.3.9.3.2.7*	*TRAMITE DE PMT CIERRE ANDÉN IZQUIEROD Y UN CARRIL DE CALZADA SUR.*	*0 días*	*mié 25/06/25*	*mié 25/06/25*	*$0.00*
1014		**1.3.3.9.3.3**	**FASE 1 CONSTRUCCIÓN COSTADO NORTE CL 17 ENTRE KR 33 Y KR 34**	**154 días**	**mar 17/12/24**	**mié 18/06/25**	**$1,031,613,787.49**
1015		1.3.3.9.3.3.1	INICIO CIV 16001198	0 días	mar 17/12/24	mar 17/12/24	$0.00



Proyecto:ID
Fecha: 14/1

Tarea	Resumen del proyecto	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Fecha límite	Tareas críticas
División	Tareas externas	Resumen inactivo	Resumen manual	Tarea hito de sucesor controlado de ruta de acceso	División crítica
Hito	Hito externo	Tarea manual	Sólo el comienzo	Tarea de resumen de sucesor controlado de ruta de a	Progreso
Resumen	Tarea inactiva	Sólo duración	Sólo fin	Tarea normal de sucesor controlado de ruta de acces	


Id	Modo de tarea	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
1016		**1.3.3.9.3.3.2**	**TRAMITE DE PMT**	**5 días**	**mié 18/12/24**	**mar 24/12/24**	**$0.00**
1017		1.3.3.9.3.3.2.1	IMPLEMENTACIÓN PMT ESPECIFICIO Y CERRAMIENTO DE OBRA	5 días	mié 18/12/24	mar 24/12/24	$0.00
1018		**1.3.3.9.3.3.3**	**ACTIVIDADES DE ARQUEOLOGIA**	**5 días**	**mié 18/12/24**	**mar 24/12/24**	**$0.00**
1019		1.3.3.9.3.3.3.1	EXPLORACIÓN E INVESTIGACIÓN ARQUEOLOGICA EN LA ZONA DE INTERVENCIÓN	5 días	mié 18/12/24	mar 24/12/24	$0.00
1020		**1.3.3.9.3.3.4**	**REDES HIDROSANITARIAS ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL**	**101 días**	**jue 26/12/24**	**jue 24/04/25**	**$76,672,500.81**
1021		1.3.3.9.3.3.4.1	EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS	65 días	jue 26/12/24	mié 12/03/25	$10,390,212.27
1022		1.3.3.9.3.3.4.2	INSTALACION DE TUBERIAS	67 días	lun 30/12/24	mar 18/03/25	$21,737,990.74
1023		1.3.3.9.3.3.4.3	RELLENO DE TUBERIAS	70 días	vie 3/01/25	mar 25/03/25	$29,171,363.26
1024		1.3.3.9.3.3.4.4	CONSTRUCCION DE POZOS Y SUMIDEROS	65 días	jue 16/01/25	lun 31/03/25	$11,124,496.54
1025		1.3.3.9.3.3.4.5	CONSTRUCCIÓN CAJAS DE INSPECCIÓN	30 días	mié 19/03/25	jue 24/04/25	$4,248,438.00
1026		**1.3.3.9.3.3.5**	**PRELIMINARES - MOVIMIENTO DE TIERRAS, DEMOLICIONES Y RELLENOS**	**78 días**	**mié 22/01/25**	**mié 23/04/25**	**$168,976,417.13**
1027		1.3.3.9.3.3.5.1	DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y TRANSPORTES DE ESCOMBROS	70 días	mié 22/01/25	vie 11/04/25	$83,498,036.28
1028		1.3.3.9.3.3.5.2	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON RAJON Y SELLO DE RAJON	70 días	lun 27/01/25	mié 16/04/25	$51,673,588.31
1029		1.3.3.9.3.3.5.3	INSTALACION DE GEOTEXTILES Y RELLENO DE MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA	69 días	vie 31/01/25	mié 23/04/25	$33,804,792.54
1030		**1.3.3.9.3.3.6**	**PAVIMENTOS**	**76 días**	**lun 3/02/25**	**lun 5/05/25**	**$371,562,756.24**
1031		1.3.3.9.3.3.6.1	BASES Y SUBBASES	70 días	lun 3/02/25	vie 25/04/25	$51,966,592.70
1032		1.3.3.9.3.3.6.2	MEZCLA ASFALTICA	65 días	mié 12/02/25	mar 29/04/25	$68,711,631.44
1033		1.3.3.9.3.3.6.3	CONCRETO LOSAS MR	61 días	mié 19/02/25	vie 2/05/25	$248,824,489.46
1034		1.3.3.9.3.3.6.4	INSTALACION DE ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO (BORDILLOS, SARDINELES	61 días	jue 20/02/25	lun 5/05/25	$2,060,042.64
1035		**1.3.3.9.3.3.7**	**REDES HIDROSANITARIAS ACUEDUCTO**	**25 días**	**vie 2/05/25**	**vie 30/05/25**	**$76,157,425.61**
1036		1.3.3.9.3.3.7.1	EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS	10 días	vie 2/05/25	mié 14/05/25	$6,673,202.84
1037		1.3.3.9.3.3.7.2	INSTALACION DE TUBERIAS	9 días	mié 7/05/25	sáb 17/05/25	$15,140,806.44
1038		1.3.3.9.3.3.7.3	INSTALACION ACCESORIOS Y EMPATES	15 días	vie 9/05/25	mar 27/05/25	$48,961,258.00
1039		1.3.3.9.3.3.7.4	RELLENO DE TUBERIAS	12 días	sáb 17/05/25	vie 30/05/25	$5,382,158.33
1040		**1.3.3.9.3.3.8**	**REDES SECAS (Codensa)**	**82 días**	**mar 25/02/25**	**mar 3/06/25**	**$116,653,186.43**
1041		1.3.3.9.3.3.8.1	MANIOBRAS POR PARTE DE LA EMPRESA ENEL - CC	0 días	mar 25/02/25	mar 25/02/25	$0.00
1042		1.3.3.9.3.3.8.2	EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS	65 días	mié 26/02/25	jue 15/05/25	$24,383,159.44
1043		1.3.3.9.3.3.8.3	INSTALACION DE DUCTERIAS	67 días	vie 28/02/25	mar 20/05/25	$52,640,134.06
1044		1.3.3.9.3.3.8.4	RELLENO DE DUCTERIAS	67 días	lun 3/03/25	jue 22/05/25	$16,544,998.93
1045		1.3.3.9.3.3.8.5	CONSTRUCCION DE CAJAS Y CAMARAS	70 días	mar 11/03/25	mar 3/06/25	$23,084,894.00
1046		**1.3.3.9.3.3.9**	**ESPACIO PUBLICO**	**102 días**	**mar 18/02/25**	**mié 18/06/25**	**$221,591,501.27**
1047		1.3.3.9.3.3.9.1	DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y TRANSPORTES DE ESCOMBROS	82 días	mar 18/02/25	lun 26/05/25	$41,347,692.60
1048		1.3.3.9.3.3.9.2	INSTALACION DE GEOTEXTILES	18 días	jue 8/05/25	mié 28/05/25	$7,591,023.78
1049		1.3.3.9.3.3.9.3	RELLENOS EN MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA ANDEN	10 días	jue 22/05/25	mar 3/06/25	$20,284,534.03
1050		1.3.3.9.3.3.9.4	RELLENOS EN MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA RAMPAS	10 días	lun 26/05/25	vie 6/06/25	$17,591,109.75
1051		1.3.3.9.3.3.9.5	INSTALACION DE ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO Y PREFABRICADOS	92 días	jue 20/02/25	mar 10/06/25	$99,619,414.97
1052		1.3.3.9.3.3.9.6	CONCRETO LOSAS MR	12 días	vie 30/05/25	sáb 14/06/25	$29,561,167.14
1053		1.3.3.9.3.3.9.7	ELEMENTOS MOBILIARIO URBANO (CANECAS, BANCAS, ETC)	7 días	mar 10/06/25	mié 18/06/25	$5,596,559.00
1054		**1.3.3.9.3.4**	**FASE 2 CONSTRUCCIÓN COSTADO SUR CL 17 ENTRE KR 33 Y KR 34**	**255 días**	**jue 26/06/25**	**mar 21/04/26**	**$894,453,448.17**
1055		**1.3.3.9.3.4.1**	**TRAMITE DE PMT**	**7 días**	**jue 26/06/25**	**vie 4/07/25**	**$0.00**
1056		1.3.3.9.3.4.1.1	IMPLEMENTACIÓN PMT ESPECIFICIO Y CERRAMIENTO DE OBRA	7 días	jue 26/06/25	vie 4/07/25	$0.00
1057		**1.3.3.9.3.4.2**	**REDES HIDROSANITARIAS ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL**	**51 días**	**lun 7/07/25**	**jue 4/09/25**	**$169,669,461.82**
1058		1.3.3.9.3.4.2.1	EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS	30 días	lun 7/07/25	lun 11/08/25	$7,715,358.40
1059		1.3.3.9.3.4.2.2	INSTALACION DE TUBERIAS	25 días	mié 16/07/25	jue 14/08/25	$66,410,600.25
1060		1.3.3.9.3.4.2.3	RELLENO DE TUBERIAS	25 días	mar 22/07/25	jue 21/08/25	$1,549,208.70
1061		1.3.3.9.3.4.2.4	CONSTRUCCION DE POZOS Y SUMIDEROS	30 días	mié 30/07/25	jue 4/09/25	$89,745,856.47
1062		1.3.3.9.3.4.2.5	CONSTRUCCIÓN CAJAS DE INSPECCIÓN	30 días	mié 30/07/25	jue 4/09/25	$4,248,438.00
1063		**1.3.3.9.3.4.3**	**PRELIMINARES - MOVIMIENTO DE TIERRAS, DEMOLICIONES Y RELLENOS**	**35 días**	**vie 8/08/25**	**jue 18/09/25**	**$3,119,564.65**
1064		1.3.3.9.3.4.3.1	DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y TRANSPORTES DE ESCOMBROS	35 días	vie 8/08/25	jue 18/09/25	$3,119,564.65
1065		**1.3.3.9.3.4.4**	**REDES SECAS (Codensa)**	**30 días**	**mar 14/10/25**	**mié 19/11/25**	**$60,934,218.00**
1066		1.3.3.9.3.4.4.1	MANIOBRAS POR PARTE DE LA EMPRESA ENEL - CC	0 días	mié 15/10/25	mié 15/10/25	$0.00
1067		1.3.3.9.3.4.4.2	EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS	18 días	jue 16/10/25	jue 6/11/25	$7,597,592.84
1068		1.3.3.9.3.4.4.3	INSTALACION DE DUCTERIAS	18 días	sáb 18/10/25	lun 10/11/25	$16,274,780.04
1069		1.3.3.9.3.4.4.4	RELLENO DE DUCTERIAS	19 días	mar 21/10/25	mié 12/11/25	$10,963,104.12
1070		1.3.3.9.3.4.4.5	CONSTRUCCION DE CAJAS Y CAMARAS	30 días	mar 14/10/25	mié 19/11/25	$26,098,741.00
1071		**1.3.3.9.3.4.5**	**REDES SECAS (ETB)**	**28 días**	**jue 16/10/25**	**mié 19/11/25**	**$4,448,836.60**
1072		1.3.3.9.3.4.5.1	CONSTRUCCION DE CAJAS Y CAMARAS	28 días	jue 16/10/25	mié 19/11/25	$4,448,836.60
1073		**1.3.3.9.3.4.6**	**ESPACIO PUBLICO**	**31 días**	**mié 15/10/25**	**vie 21/11/25**	**$641,068,116.97**
1074		1.3.3.9.3.4.6.1	DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y TRANSPORTES DE ESCOMBROS	20 días	mié 15/10/25	vie 7/11/25	$93,395,893.55
1075		1.3.3.9.3.4.6.2	INSTALACION DE GEOTEXTILES	15 días	mié 22/10/25	lun 10/11/25	$13,031,584.29
1076		1.3.3.9.3.4.6.3	RELLENOS EN MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA ANDEN	8 días	sáb 1/11/25	mar 11/11/25	$56,220,260.95
1077		1.3.3.9.3.4.6.4	RELLENOS EN MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA RAMPAS	7 días	jue 6/11/25	jue 13/11/25	$9,694,378.98
1078		1.3.3.9.3.4.6.5	INSTALACION DE ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO Y PREFABRICADOS	21 días	vie 24/10/25	mié 19/11/25	$280,268,170.86
1079		1.3.3.9.3.4.6.6	CONCRETO LOSAS MR	12 días	vie 7/11/25	vie 21/11/25	$12,645,323.34
1080		1.3.3.9.3.4.6.7	ELEMENTOS MOBILIARIO URBANO (CANECAS, BANCAS, ETC)	6 días	jue 6/11/25	mié 12/11/25	$5,596,559.00
1081		1.3.3.9.3.4.6.8	CANALES DE DRENAJE MONOLITICO	11 días	jue 6/11/25	mié 19/11/25	$170,215,946.00
1082		**1.3.3.9.3.4.7**	**PAISAJISMO**	**6 días**	**mié 15/04/26**	**mar 21/04/26**	**$7,049,987.13**
1083		1.3.3.9.3.4.7.1	PAISAJISMO	6 días	mié 15/04/26	mar 21/04/26	$7,049,987.13
1084		**1.3.3.9.3.4.8**	**SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN (HORIZONTAL Y VEF**	**6 días**	**mié 15/04/26**	**mar 21/04/26**	**$8,163,263.00**
1085		1.3.3.9.3.4.8.1	SEÑALIZACIÓN	6 días	mié 15/04/26	mar 21/04/26	$8,163,263.00
1086		1.3.3.9.3.4.9	FIN CIV 16001198	0 días	mar 21/04/26	mar 21/04/26	$0.00
1087		**1.3.3.9.4**	**CIV 16001110**	**493 días**	**mar 17/09/24**	**mar 21/04/26**	**$2,106,496,511.11**
1088		**1.3.3.9.4.1**	**SOLICITUD PARA PLAN DE MANEJO DE TRANSITO CIV 16001110 COSTADO NORTE**	**73 días**	**mar 17/09/24**	**jue 12/12/24**	**$0.00**
1089		*1.3.3.9.4.1.1*	*PRESENTACIÓN PMT A INTERVENTORÍA CALLE 17 ENTRE KR 32 Y KR 36*	*0 días*	*mar 17/09/24*	*mar 17/09/24*	*$0.00*
1090		*1.3.3.9.4.1.2*	*RADICACIÓN A LA SDM PMT CALLE 17 ENTRE KR 32 Y K*	*0 días*	*mié 18/09/24*	*mié 18/09/24*	*$0.00*
1091		*1.3.3.9.4.1.3*	*OBSERVACIONES POR PARTE DE LA SDM AL PMT CALLE 17 ENTRE KR 32 Y KR 36 V0 (SOLICITUD DE AFOROS Y ACTAS DE COORDINACIÓN)*	*0 días*	*mar 24/09/24*	*mar 24/09/24*	*$0.00*



Proyecto:ID
Fecha: 14/1

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tareas externas
Hito externo
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
Sólo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
Sólo el comienzo
Sólo fin
Fecha límite
Tarea hito de sucesor controlado de ruta de acceso
Tarea de resumen de sucesor controlado de ruta de a
Tarea normal de sucesor controlado de ruta de acces
Tareas críticas
División crítica
Progreso


Id	Modo de tarea	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
1092		*1.3.3.9.4.1.4*	*ACTAS DE COORDINACIÓN FIRMADAS ENTRE CONTRATO IDU 1847 DE 2021 Y 1825 DE 2021*	*0 días*	*mar 15/10/24*	*mar 15/10/24*	*$0.00*
1093		*1.3.3.9.4.1.5*	*ELABORACIÓN DE AFOROS DE TRANSITO PARA LAS INTERSECCIONES*	*0 días*	*sáb 19/10/24*	*sáb 19/10/24*	*$0.00*
1094		*1.3.3.9.4.1.6*	*ATENCIÓN DE OBSERVACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA AL PMT CALLE 17 ENTRE KR 32 Y KR 36*	*0 días*	*vie 8/11/24*	*vie 8/11/24*	*$0.00*
1095		*1.3.3.9.4.1.7*	*REUNIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA DEFINICIÓN DE LAS ZONAS DE PARQUEO*	*0 días*	*mar 19/11/24*	*mar 19/11/24*	*$0.00*
1096		*1.3.3.9.4.1.8*	*OBSERVACIONES POR PARTE DE LA SDM AL PMT CALLE 17 ENTRE KR 32 Y KR 36*	*0 días*	*jue 28/11/24*	*jue 28/11/24*	*$0.00*
1097		*1.3.3.9.4.1.9*	*ATENCIÓN DE OBSERVACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA AL PMT CALLE 17 ENTRE KR 32 Y KR 36*	*0 días*	*mié 4/12/24*	*mié 4/12/24*	*$0.00*
1098		*1.3.3.9.4.1.10*	*MESA DE TRABAJO COORDINACIÓN DE PMTS CON PROYECTO IDU 1825 DE 2021 REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL PUENTE DE LA CALLE 13 CON CALLE*	*0 días*	*jue 5/12/24*	*jue 5/12/24*	*$0.00*
1099		*1.3.3.9.4.1.11*	*ENTREGA A LA SDM LAS OBSERVACIONES AJUSTADAS CONFORME AL CORREO DEL 04 DE DICIEMBRE DE*	*0 días*	*mar 10/12/24*	*mar 10/12/24*	*$0.00*
1100		*1.3.3.9.4.1.12*	*APROBACIÓN DE PMT COI 50 CIERRE ANDÉN NORTE Y UN CARRIL DE CALZADA NORTE.*	*0 días*	*jue 12/12/24*	*jue 12/12/24*	*$0.00*
1101		**1.3.3.9.4.2**	**SOLICITUD PARA PLAN DE MANEJO DE TRANSITO CIV 16001110 COSTADO SUR**	**64 días**	**mar 8/04/25**	**mié 25/06/25**	**$0.00**
1102		*1.3.3.9.4.2.1*	*PRESENTACIÓN PMT A INTERVENTORÍA CALLE 17 ENTRE KR 32 Y KR 36*	*0 días*	*mar 8/04/25*	*mar 8/04/25*	*$0.00*
1103		*1.3.3.9.4.2.2*	*RADICACIÓN A LA SDM PMT CALLE 17 ENTRE KR 32 Y K*	*0 días*	*mié 9/04/25*	*mié 9/04/25*	*$0.00*
1104		*1.3.3.9.4.2.3*	*OBSERVACIONES POR PARTE DE LA SDM AL PMT CALLE 17 ENTRE KR 32 Y KR 36 V0*	*0 días*	*mar 29/04/25*	*mar 29/04/25*	*$0.00*
1105		*1.3.3.9.4.2.4*	*ATENCIÓN DE OBSERVACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA AL PMT CALLE 17 ENTRE KR 32 Y KR 36*	*0 días*	*vie 16/05/25*	*vie 16/05/25*	*$0.00*
1106		*1.3.3.9.4.2.5*	*OBSERVACIONES POR PARTE DE LA SDM AL PMT CALLE 17 ENTRE KR 32 Y KR 36 V1*	*0 días*	*mar 3/06/25*	*mar 3/06/25*	*$0.00*
1107		*1.3.3.9.4.2.6*	*ATENCIÓN DE OBSERVACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA AL PMT CALLE 17 ENTRE KR 32 Y KR 36*	*0 días*	*vie 20/06/25*	*vie 20/06/25*	*$0.00*
1108		*1.3.3.9.4.2.7*	*TRAMITE DE PMT CIERRE ANDÉN IZQUIEROD Y UN CARRIL DE CALZADA SUR.*	*0 días*	*mié 25/06/25*	*mié 25/06/25*	*$0.00*
1109		**1.3.3.9.4.3**	**FASE 1 CONSTRUCCIÓN COSTADO NORTE CL 17 ENTRE KR 34 Y KR 35**	**134 días**	**lun 13/01/25**	**mié 18/06/25**	**$947,922,066.29**
1110		1.3.3.9.4.3.1	INICIO CIV 16101110	0 días	lun 13/01/25	lun 13/01/25	$0.00
1111		**1.3.3.9.4.3.2**	**TRAMITE DE PMT**	**6 días**	**mar 14/01/25**	**mar 21/01/25**	**$0.00**
1112		1.3.3.9.4.3.2.1	IMPLEMENTACIÓN PMT ESPECIFICIO Y CERRAMIENTO DE OBRA	6 días	mar 14/01/25	mar 21/01/25	$0.00
1113		**1.3.3.9.4.3.3**	**ACTIVIDADES DE ARQUEOLOGIA**	**6 días**	**mar 14/01/25**	**mar 21/01/25**	**$0.00**
1114		1.3.3.9.4.3.3.1	EXPLORACIÓN E INVESTIGACIÓN ARQUEOLOGICA EN LA ZONA DE INTERVENCIÓN	6 días	mar 14/01/25	mar 21/01/25	$0.00
1115		**1.3.3.9.4.3.4**	**REDES HIDROSANITARIAS ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL**	**88 días**	**mié 22/01/25**	**lun 5/05/25**	**$94,029,545.18**
1116		1.3.3.9.4.3.4.1	EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS	80 días	mié 22/01/25	jue 24/04/25	$15,607,920.00
1117		1.3.3.9.4.3.4.2	INSTALACION DE TUBERIAS	80 días	vie 24/01/25	mar 29/04/25	$33,542,138.29
1118		1.3.3.9.4.3.4.3	RELLENO DE TUBERIAS	80 días	mar 28/01/25	vie 2/05/25	$34,723,420.00
1119		1.3.3.9.4.3.4.4	CONSTRUCCION DE POZOS Y SUMIDEROS	77 días	lun 3/02/25	lun 5/05/25	$6,615,701.89
1120		1.3.3.9.4.3.4.5	CONSTRUCCIÓN CAJAS DE INSPECCIÓN	56 días	mar 25/02/25	lun 5/05/25	$3,540,365.00
1121		**1.3.3.9.4.3.5**	**PRELIMINARES - MOVIMIENTO DE TIERRAS, DEMOLICIONES Y RELLENOS**	**99 días**	**lun 20/01/25**	**jue 15/05/25**	**$221,391,469.88**
1122		1.3.3.9.4.3.5.1	DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y TRANSPORTES DE ESCOMBROS	96 días	lun 20/01/25	lun 12/05/25	$114,405,610.96
1123		1.3.3.9.4.3.5.2	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON RAJON Y SELLO DE RAJON	10 días	mié 22/01/25	sáb 1/02/25	$39,242,642.87
1124		1.3.3.9.4.3.5.3	INSTALACION DE GEOTEXTILES Y RELLENO DE MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA	92 días	mar 28/01/25	jue 15/05/25	$67,743,216.05
1125		**1.3.3.9.4.3.6**	**PAVIMENTOS**	**98 días**	**vie 31/01/25**	**mar 27/05/25**	**$217,951,211.81**
1126		1.3.3.9.4.3.6.1	BASES Y SUBBASES	91 días	vie 31/01/25	lun 19/05/25	$78,667,513.98
1127		1.3.3.9.4.3.6.2	MEZCLA ASFALTICA	87 días	jue 6/02/25	mar 20/05/25	$29,691,058.47
1128		1.3.3.9.4.3.6.3	CONCRETO LOSAS MR	83 días	vie 14/02/25	vie 23/05/25	$109,035,939.36
1129		1.3.3.9.4.3.6.4	INSTALACION DE ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO (BORDILLOS, SARDINELES	83 días	mar 18/02/25	mar 27/05/25	$556,700.00
1130		**1.3.3.9.4.3.7**	**REDES HIDROSANITARIAS ACUEDUCTO**	**88 días**	**vie 21/02/25**	**vie 6/06/25**	**$21,063,910.41**
1131		1.3.3.9.4.3.7.1	EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS	76 días	vie 21/02/25	vie 23/05/25	$1,687,989.52
1132		1.3.3.9.4.3.7.2	INSTALACION DE TUBERIAS	78 días	mar 25/02/25	mié 28/05/25	$9,464,900.32
1133		1.3.3.9.4.3.7.3	INSTALACION ACCESORIOS Y EMPATES	78 días	vie 28/02/25	mar 3/06/25	$6,592,147.00
1134		1.3.3.9.4.3.7.4	RELLENO DE TUBERIAS	78 días	mié 5/03/25	vie 6/06/25	$3,318,873.57
1135		**1.3.3.9.4.3.8**	**REDES SECAS (Codensa)**	**98 días**	**vie 14/02/25**	**mar 10/06/25**	**$160,052,124.53**
1136		1.3.3.9.4.3.8.1	MANIOBRAS POR PARTE DE LA EMPRESA ENEL - CC	0 días	vie 14/02/25	vie 14/02/25	$0.00
1137		1.3.3.9.4.3.8.2	EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS	83 días	vie 14/02/25	vie 23/05/25	$22,649,358.08
1138		1.3.3.9.4.3.8.3	INSTALACION DE DUCTERIAS	84 días	mar 18/02/25	mié 28/05/25	$69,177,865.90
1139		1.3.3.9.4.3.8.4	RELLENO DE DUCTERIAS	86 días	vie 21/02/25	mié 4/06/25	$25,362,149.55
1140		1.3.3.9.4.3.8.5	CONSTRUCCION DE CAJAS Y CAMARAS	75 días	mié 12/03/25	mar 10/06/25	$42,862,751.00
1141		**1.3.3.9.4.3.9**	**ESPACIO PUBLICO**	**87 días**	**jue 6/03/25**	**mié 18/06/25**	**$233,433,804.48**
1142		1.3.3.9.4.3.9.1	DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y TRANSPORTES DE ESCOMBROS	71 días	jue 6/03/25	jue 29/05/25	$38,171,365.80
1143		1.3.3.9.4.3.9.2	INSTALACION DE GEOTEXTILES	67 días	vie 14/03/25	mar 3/06/25	$6,943,394.35
1144		1.3.3.9.4.3.9.3	RELLENOS EN MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA ANDEN	64 días	jue 20/03/25	vie 6/06/25	$44,034,436.84
1145		1.3.3.9.4.3.9.4	RELLENOS EN MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA RAMPAS	63 días	mié 26/03/25	mar 10/06/25	$3,879,258.10
1146		1.3.3.9.4.3.9.5	INSTALACION DE ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO Y PREFABRICADOS	85 días	vie 7/03/25	mar 17/06/25	$136,125,624.25
1147		1.3.3.9.4.3.9.6	CONCRETO LOSAS MR	7 días	mar 10/06/25	mié 18/06/25	$4,279,725.14
1148		**1.3.3.9.4.4**	**FASE 2 CONSTRUCCIÓN COSTADO SUR CL 17 ENTRE KR 34 Y KR 35**	**256 días**	**mié 25/06/25**	**mar 21/04/26**	**$1,158,574,444.82**
1149		**1.3.3.9.4.4.1**	**TRAMITE DE PMT**	**6 días**	**mié 25/06/25**	**jue 3/07/25**	**$0.00**
1150		1.3.3.9.4.4.1.1	IMPLEMENTACIÓN PMT ESPECIFICIO Y CERRAMIENTO DE OBRA	6 días	mié 25/06/25	jue 3/07/25	$0.00
1151		**1.3.3.9.4.4.2**	**REDES HIDROSANITARIAS ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL**	**51 días**	**vie 4/07/25**	**mar 2/09/25**	**$141,116,873.50**
1152		1.3.3.9.4.4.2.1	EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS	30 días	vie 4/07/25	mié 6/08/25	$8,858,125.21
1153		1.3.3.9.4.4.2.2	INSTALACION DE TUBERIAS	26 días	lun 14/07/25	mar 12/08/25	$40,889,537.07
1154		1.3.3.9.4.4.2.3	RELLENO DE TUBERIAS	25 días	sáb 19/07/25	mar 19/08/25	$7,108,457.16
1155		1.3.3.9.4.4.2.4	CONSTRUCCION DE POZOS Y SUMIDEROS	30 días	lun 28/07/25	mar 2/09/25	$80,720,389.06
1156		1.3.3.9.4.4.2.5	CONSTRUCCIÓN CAJAS DE INSPECCIÓN	30 días	lun 28/07/25	mar 2/09/25	$3,540,365.00
1157		**1.3.3.9.4.4.3**	**PRELIMINARES - MOVIMIENTO DE TIERRAS, DEMOLICIONES Y RELLENOS**	**30 días**	**mié 6/08/25**	**mié 10/09/25**	**$5,474,743.06**
1158		1.3.3.9.4.4.3.1	DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y TRANSPORTES DE ESCOMBROS	30 días	mié 6/08/25	mié 10/09/25	$5,474,743.06
1159		**1.3.3.9.4.4.4**	**PAVIMENTOS**	**35 días**	**vie 3/10/25**	**jue 13/11/25**	**$204,739,581.65**

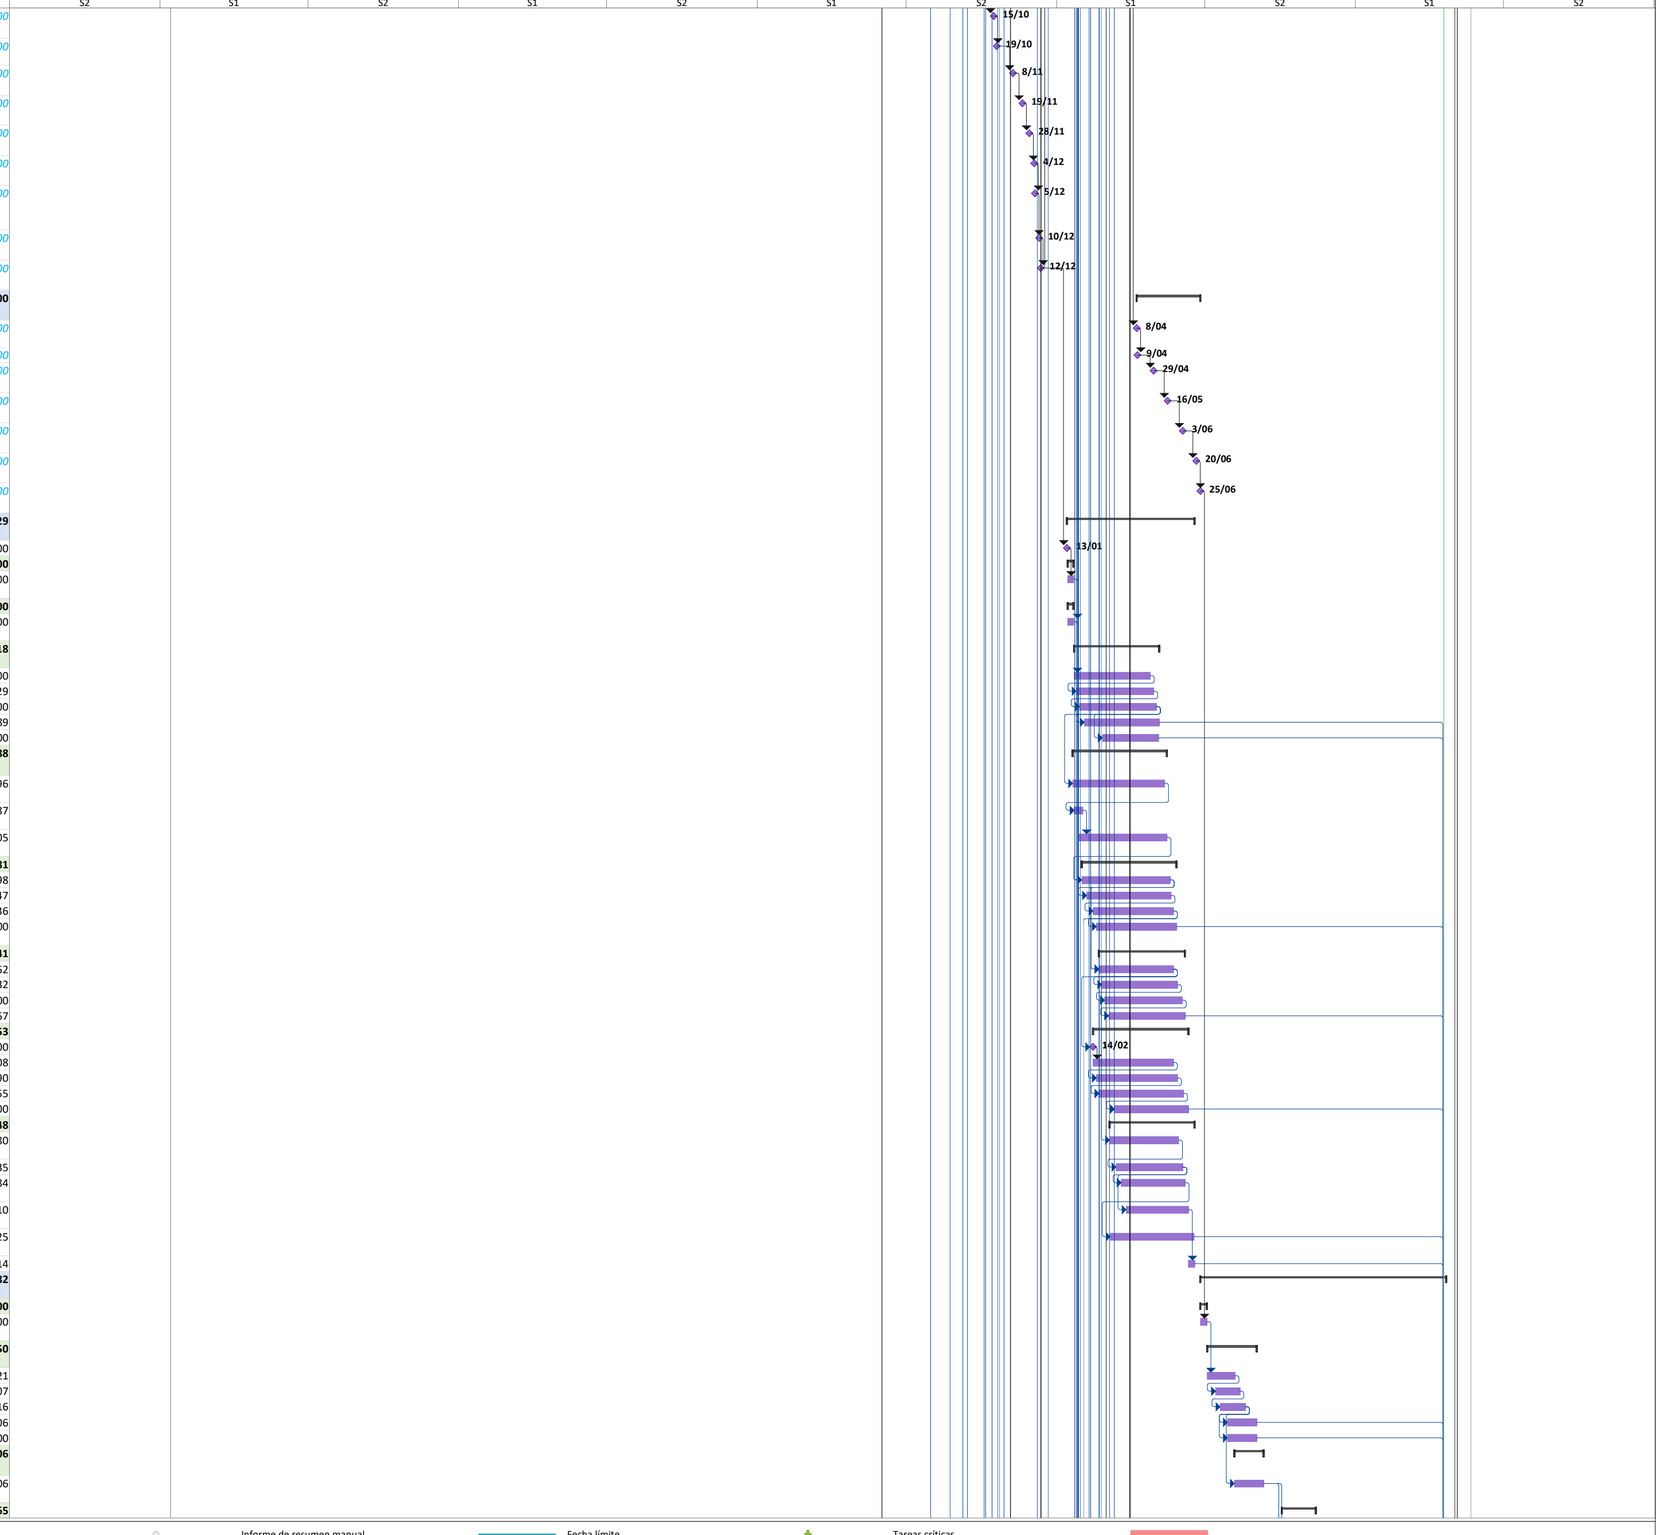

Proyecto:ID
Fecha: 14/1

Tarea	Resumen del proyecto	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Fecha límite	Tareas críticas
División	Tareas externas	Resumen inactivo	Resumen manual	Tarea hito de sucesor controlado de ruta de acceso	División crítica
Hito	Hito externo	Tarea manual	Sólo el comienzo	Tarea de resumen de sucesor controlado de ruta de a	Progreso
Resumen	Tarea inactiva	Sólo duración	Sólo fin	Tarea normal de sucesor controlado de ruta de acces	


Id	Modo de tarea	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
1160		1.3.3.9.4.4.4.1	MEZCLA ASFALTICA	9 días	vie 3/10/25	mar 14/10/25	$54,759,762.19
1161		1.3.3.9.4.4.4.2	CONCRETO LOSAS MR	10 días	mar 14/10/25	sáb 25/10/25	$146,719,299.08
1162		1.3.3.9.4.4.4.3	INSTALACION DE ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO (BORDILLOS, SARDINELES	10 días	sáb 1/11/25	jue 13/11/25	$3,260,520.38
1163		**1.3.3.9.4.4.5**	**REDES HIDROSANITARIAS ACUEDUCTO**	**22 días**	**lun 29/09/25**	**vie 24/10/25**	**$40,796,985.69**
1164		1.3.3.9.4.4.5.1	EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS	10 días	lun 29/09/25	jue 9/10/25	$6,113,696.28
1165		1.3.3.9.4.4.5.2	INSTALACION DE TUBERIAS	8 días	lun 6/10/25	mié 15/10/25	$11,181,067.16
1166		1.3.3.9.4.4.5.3	INSTALACION ACCESORIOS Y EMPATES	14 días	mié 8/10/25	vie 24/10/25	$20,527,589.00
1167		1.3.3.9.4.4.5.4	RELLENO DE TUBERIAS	10 días	mar 14/10/25	vie 24/10/25	$2,974,633.25
1168		**1.3.3.9.4.4.6**	**REDES SECAS (Codensa)**	**32 días**	**jue 9/10/25**	**mar 18/11/25**	**$125,222,435.53**
1169		1.3.3.9.4.4.6.1	MANIOBRAS POR PARTE DE LA EMPRESA ENEL - CC	0 días	jue 9/10/25	jue 9/10/25	$0.00
1170		1.3.3.9.4.4.6.2	EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS	18 días	vie 10/10/25	vie 31/10/25	$15,695,404.48
1171		1.3.3.9.4.4.6.3	INSTALACION DE DUCTERIAS	20 días	vie 10/10/25	mié 5/11/25	$51,478,569.82
1172		1.3.3.9.4.4.6.4	RELLENO DE DUCTERIAS	20 días	jue 16/10/25	lun 10/11/25	$18,006,865.23
1173		1.3.3.9.4.4.6.5	CONSTRUCCION DE CAJAS Y CAMARAS	21 días	jue 23/10/25	mar 18/11/25	$40,041,596.00
1174		**1.3.3.9.4.4.7**	**ESPACIO PUBLICO**	**35 días**	**jue 9/10/25**	**vie 21/11/25**	**$629,936,125.64**
1175		1.3.3.9.4.4.7.1	DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y TRANSPORTES DE ESCOMBROS	20 días	jue 9/10/25	mar 4/11/25	$66,662,280.56
1176		1.3.3.9.4.4.7.2	INSTALACION DE GEOTEXTILES	16 días	jue 16/10/25	mié 5/11/25	$14,390,625.69
1177		1.3.3.9.4.4.7.3	RELLENOS EN MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA ANDEN	14 días	jue 23/10/25	lun 10/11/25	$64,269,778.41
1178		1.3.3.9.4.4.7.4	RELLENOS EN MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA RAMPAS	18 días	mié 22/10/25	mié 12/11/25	$29,331,710.76
1179		1.3.3.9.4.4.7.5	INSTALACION DE ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO Y PREFABRICADOS	19 días	mar 28/10/25	jue 20/11/25	$249,447,940.64
1180		1.3.3.9.4.4.7.6	CONCRETO LOSAS MR	11 días	vie 7/11/25	vie 21/11/25	$109,341,947.58
1181		1.3.3.9.4.4.7.7	CANALES DE DRENAJE MONOLITICO	11 días	vie 7/11/25	jue 20/11/25	$96,491,842.00
1182		**1.3.3.9.4.4.8**	**PAISAJISMO**	**9 días**	**sáb 11/04/26**	**mar 21/04/26**	**$3,674,721.00**
1183		1.3.3.9.4.4.8.1	PAISAJISMO	9 días	sáb 11/04/26	mar 21/04/26	$3,674,721.00
1184		**1.3.3.9.4.4.9**	**SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN (HORIZONTAL Y VEF**	**9 días**	**sáb 11/04/26**	**mar 21/04/26**	**$7,612,978.75**
1185		1.3.3.9.4.4.9.1	SEÑALIZACIÓN	9 días	sáb 11/04/26	mar 21/04/26	$7,612,978.75
1186		1.3.3.9.4.4.10	FIN CIV 16101110	0 días	mar 21/04/26	mar 21/04/26	$0.00
1187		**1.3.3.9.5**	**CIV 16001015**	**380 días**	**mar 28/01/25**	**mar 21/04/26**	**$1,360,833,569.85**
1188		*1.3.3.9.5.1*	*PRESENTACIÓN PMT A INTERVENTORÍA*	*0 días*	*mar 28/01/25*	*mar 28/01/25*	*$0.00*
1189		*1.3.3.9.5.2*	*RADICACIÓN A LA SDM*	*0 días*	*mié 29/01/25*	*mié 29/01/25*	*$0.00*
1190		*1.3.3.9.5.3*	*OBSERVACIONES POR PARTE DE LA SDM AL PMT*	*0 días*	*vie 14/02/25*	*vie 14/02/25*	*$0.00*
1191		*1.3.3.9.5.4*	*ATENCIÓN DE OBSERVACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA AL PMT*	*0 días*	*mar 4/03/25*	*mar 4/03/25*	*$0.00*
1192		*1.3.3.9.5.5*	*OBSERVACIONES POR PARTE DE LA SDM AL PMT*	*0 días*	*jue 20/03/25*	*jue 20/03/25*	*$0.00*
1193		*1.3.3.9.5.6*	*ATENCIÓN DE OBSERVACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA AL PMT*	*0 días*	*mar 8/04/25*	*mar 8/04/25*	*$0.00*
1194		*1.3.3.9.5.7*	*APROBACIÓN DEL PMT*	*0 días*	*vie 11/04/25*	*vie 11/04/25*	*$0.00*
1195		**1.3.3.9.5.8**	**FASE 1 CONSTRUCCION CL 17 ENTRE KR 35 Y KR 36**	**315 días**	**sáb 12/04/25**	**mar 21/04/26**	**$1,300,379,806.02**
1196		**1.3.3.9.5.8.1**	**TRAMITE DE PMT**	**10 días**	**sáb 12/04/25**	**vie 25/04/25**	**$0.00**
1197		1.3.3.9.5.8.1.1	IMPLEMENTACIÓN PMT ESPECIFICIO Y CERRAMIENTO DE OBRA	10 días	sáb 12/04/25	vie 25/04/25	$0.00
1198		**1.3.3.9.5.8.2**	**ACTIVIDADES DE ARQUEOLOGIA**	**8 días**	**mar 15/04/25**	**vie 25/04/25**	**$0.00**
1199		1.3.3.9.5.8.2.1	EXPLORACIÓN E INVESTIGACIÓN ARQUEOLOGICA EN LA ZONA DE INTERVENCIÓN	8 días	mar 15/04/25	vie 25/04/25	$0.00
1200		**1.3.3.9.5.8.3**	**REDES HIDROSANITARIAS ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL**	**49 días**	**lun 28/04/25**	**mié 25/06/25**	**$226,457,586.39**
1201		1.3.3.9.5.8.3.1	EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS	30 días	lun 28/04/25	mar 3/06/25	$24,060,819.29
1202		1.3.3.9.5.8.3.2	INSTALACION DE TUBERIAS	26 días	jue 8/05/25	sáb 7/06/25	$65,917,755.12
1203		1.3.3.9.5.8.3.3	RELLENO DE TUBERIAS	24 días	vie 16/05/25	vie 13/06/25	$25,569,054.92
1204		1.3.3.9.5.8.3.4	CONSTRUCCION DE POZOS Y SUMIDEROS	30 días	mar 20/05/25	mié 25/06/25	$105,245,373.06
1205		1.3.3.9.5.8.3.5	CONSTRUCCIÓN CAJAS DE INSPECCIÓN	30 días	mar 20/05/25	mié 25/06/25	$5,664,584.00
1206		**1.3.3.9.5.8.4**	**PRELIMINARES - MOVIMIENTO DE TIERRAS, DEMOLICIONES Y RELLENOS**	**44 días**	**mar 3/06/25**	**jue 24/07/25**	**$129,049,104.77**
1207		1.3.3.9.5.8.4.1	DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y TRANSPORTES DE ESCOMBROS	30 días	mar 3/06/25	mar 8/07/25	$50,902,540.95
1208		1.3.3.9.5.8.4.2	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON RAJON Y SELLO DE RAJON	23 días	mié 18/06/25	mié 16/07/25	$32,485,145.91
1209		1.3.3.9.5.8.4.3	INSTALACION DE GEOTEXTILES Y RELLENO DE MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA	23 días	vie 27/06/25	jue 24/07/25	$45,661,417.91
1210		**1.3.3.9.5.8.5**	**PAVIMENTOS**	**52 días**	**lun 14/07/25**	**jue 11/09/25**	**$277,135,893.85**
1211		1.3.3.9.5.8.5.1	BASES Y SUBBASES	14 días	lun 14/07/25	mar 29/07/25	$30,899,309.65
1212		1.3.3.9.5.8.5.2	MEZCLA ASFALTICA	7 días	vie 22/08/25	sáb 30/08/25	$56,177,601.82
1213		1.3.3.9.5.8.5.3	CONCRETO LOSAS MR	9 días	sáb 30/08/25	mar 9/09/25	$187,202,214.14
1214		1.3.3.9.5.8.5.4	INSTALACION DE ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO (BORDILLOS, SARDINELES	8 días	mié 3/09/25	jue 11/09/25	$2,856,768.24
1215		**1.3.3.9.5.8.6**	**REDES HIDROSANITARIAS ACUEDUCTO**	**25 días**	**lun 4/08/25**	**mié 3/09/25**	**$135,103,879.72**
1216		1.3.3.9.5.8.6.1	EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS	11 días	lun 4/08/25	sáb 16/08/25	$12,121,519.16
1217		1.3.3.9.5.8.6.2	INSTALACION DE TUBERIAS	10 días	lun 11/08/25	vie 22/08/25	$34,656,490.49
1218		1.3.3.9.5.8.6.3	INSTALACION ACCESORIOS Y EMPATES	15 días	mié 13/08/25	lun 1/09/25	$78,542,525.00
1219		1.3.3.9.5.8.6.4	RELLENO DE TUBERIAS	12 días	mié 20/08/25	mié 3/09/25	$9,783,345.07
1220		**1.3.3.9.5.8.7**	**REDES SECAS (Codensa)**	**48 días**	**sáb 16/08/25**	**vie 10/10/25**	**$145,112,025.13**
1221		*1.3.3.9.5.8.7.1*	*MANIOBRAS POR PARTE DE LA EMPRESA ENEL - CC*	*0 días*	*sáb 16/08/25*	*sáb 16/08/25*	*$0.00*
1222		1.3.3.9.5.8.7.2	EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS	25 días	sáb 23/08/25	sáb 20/09/25	$22,310,601.44
1223		1.3.3.9.5.8.7.3	INSTALACION DE DUCTERIAS	26 días	vie 29/08/25	sáb 27/09/25	$60,902,657.80
1224		1.3.3.9.5.8.7.4	RELLENO DE DUCTERIAS	25 días	jue 4/09/25	jue 2/10/25	$19,634,695.89
1225		1.3.3.9.5.8.7.5	CONSTRUCCION DE CAJAS Y CAMARAS	28 días	mié 10/09/25	vie 10/10/25	$42,264,070.00
1226		**1.3.3.9.5.8.8**	**REDES SECAS (ETB)**	**35 días**	**mar 9/09/25**	**sáb 18/10/25**	**$9,750,073.00**
1227		1.3.3.9.5.8.8.1	NIVELACIÓN DE CAMARAS	35 días	mar 9/09/25	sáb 18/10/25	$9,750,073.00
1228		**1.3.3.9.5.8.9**	**ESPACIO PUBLICO**	**82 días**	**sáb 16/08/25**	**vie 21/11/25**	**$340,629,513.93**
1229		1.3.3.9.5.8.9.1	DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y TRANSPORTES DE ESCOMBROS	30 días	sáb 16/08/25	sáb 20/09/25	$78,674,985.81
1230		1.3.3.9.5.8.9.2	INSTALACION DE GEOTEXTILES	14 días	mié 10/09/25	jue 25/09/25	$10,638,048.69
1231		1.3.3.9.5.8.9.3	RELLENOS EN MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA ANDEN	14 días	lun 15/09/25	mar 30/09/25	$26,508,773.47
1232		1.3.3.9.5.8.9.4	RELLENOS EN MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA RAMPAS	14 días	mar 16/09/25	jue 2/10/25	$2,094,046.12
1233		1.3.3.9.5.8.9.5	INSTALACION DE ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO Y PREFABRICADOS	51 días	mar 16/09/25	vie 14/11/25	$181,482,858.26
1234		1.3.3.9.5.8.9.6	CONCRETO LOSAS MR	25 días	sáb 20/09/25	lun 20/10/25	$7,801,955.58
1235		1.3.3.9.5.8.9.7	ELEMENTOS MOBILIARIO URBANO (CANECAS, BANCAS, ETC)	11 días	vie 7/11/25	vie 21/11/25	$10,661,108.00
1236		1.3.3.9.5.8.9.8	CANALES DE DRENAJE MONOLITICO	10 días	mar 4/11/25	vie 14/11/25	$22,767,738.00
1237		**1.3.3.9.5.8.10**	**PAISAJISMO**	**13 días**	**lun 6/04/26**	**mar 21/04/26**	**$15,000,156.08**
1238		1.3.3.9.5.8.10.1	PAISAJISMO	13 días	lun 6/04/26	mar 21/04/26	$15,000,156.08
1239		**1.3.3.9.5.8.11**	**SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN (HORIZONTAL Y VEF**	**13 días**	**lun 6/04/26**	**mar 21/04/26**	**$22,141,573.15**
1240		1.3.3.9.5.8.11.1	SEÑALIZACIÓN	13 días	lun 6/04/26	mar 21/04/26	$22,141,573.15
1241		**1.3.3.9.5.9**	**FASE 2 CRUCE VEHICULAR KR 36**	**26 días**	**vie 20/03/26**	**mar 21/04/26**	**$60,453,763.83**

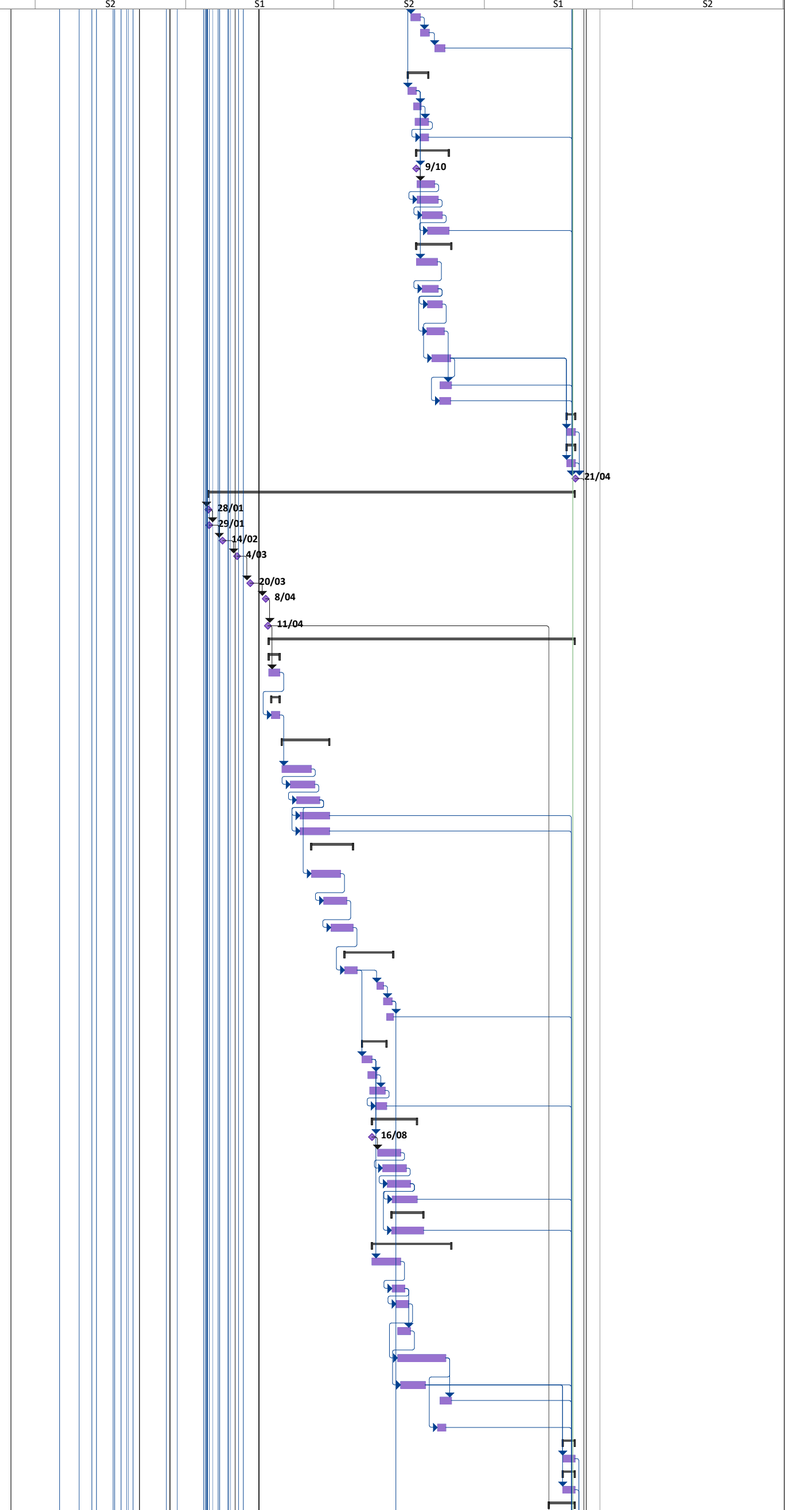

Proyecto:ID
Fecha: 14/1

Tarea	Resumen del proyecto	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Fecha límite	Tareas críticas
División	Tareas externas	Resumen inactivo	Resumen manual	Tarea hito de sucesor controlado de ruta de acceso	División crítica
Hito	Hito externo	Tarea manual	Sólo el comienzo	Tarea de resumen de sucesor controlado de ruta de a	Progreso
Resumen	Tarea inactiva	Sólo duración	Sólo fin	Tarea normal de sucesor controlado de ruta de acces	


Id	Modo de tarea	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
1242		**1.3.3.9.5.9.1**	**PRELIMINARES - MOVIMIENTO DE TIERRAS, DEMOLICIONES Y RELLENOS**	**10 días**	**vie 20/03/26**	**jue 2/04/26**	$5,010,305.62
1243		1.3.3.9.5.9.1.1	DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y TRANSPORTES DE ESCOMBROS	10 días	vie 20/03/26	jue 2/04/26	$5,010,305.62
1244		**1.3.3.9.5.9.2**	**PAVIMENTOS**	**9 días**	**vie 10/04/26**	**mar 21/04/26**	$55,443,458.21
1245		1.3.3.9.5.9.2.1	MEZCLA ASFALTICA	9 días	vie 10/04/26	mar 21/04/26	$55,443,458.21
1246		1.3.3.9.5.10	FIN CIV 16001015	0 días	mar 21/04/26	mar 21/04/26	$0.00
1247		**1.3.3.9.6**	**CIV 16000927**	**407 días**	**jue 26/12/24**	**mar 21/04/26**	**$1,209,761,228.32**
1248		*1.3.3.9.6.1*	*ENTREGA DOCUMENTACIÓN BIC POSTOBON*	*0 días*	*jue 26/12/24*	*jue 26/12/24*	*$0.00*
1249		*1.3.3.9.6.2*	*OBSERVACIONES A DOCUMENTACIÓN SUMINISTRADA PARA INTERVENCIÓN ANTE EL IDPC*	*0 días*	*mar 31/12/24*	*mar 31/12/24*	*$0.00*
1250		*1.3.3.9.6.3*	*ATENCIÓN A OBSERVACIONES PARA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN PARA TRAMITE ANTE EL IDPC*	*0 días*	*mié 22/01/25*	*mié 22/01/25*	*$0.00*
1251		*1.3.3.9.6.4*	*ALCANCE A ATENCIÓN DE OBSERVACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA ANTE EL IDPC CON No. De RADICADO IDU 20255110015312*	*0 días*	*jue 20/02/25*	*jue 20/02/25*	*$0.00*
1252		*1.3.3.9.6.5*	*MESA DE TRABAJO PARA REVISIÓN DE INFORMACIÓN CON EL IDPC SOLICITANDO ALCANCE AL RADICADO IDU 20255110015312*	*0 días*	*mar 25/02/25*	*mar 25/02/25*	*$0.00*
1253		*1.3.3.9.6.6*	*RADICACIÓN ALCANCE RADICADO IDU 20255110015312 PARA LA SOLICITUD DE LICENCIA DE INTERVENCIÓN EN ESPACIO PÚBLICO PATRIMONIAL CON NUEVO RADICADO IDU 20255110019282*	*0 días*	*mié 5/03/25*	*mié 5/03/25*	*$0.00*
1254		*1.3.3.9.6.7*	*APROBACIÓN POR PARTE DE IDPC PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES*	*0 días*	*jue 8/05/25*	*jue 8/05/25*	*$0.00*
1255		*1.3.3.9.6.8*	*PRESENTACIÓN PMT A INTERVENTORÍA*	*0 días*	*lun 12/05/25*	*lun 12/05/25*	*$0.00*
1256		*1.3.3.9.6.9*	*RADICACIÓN A LA SDM*	*0 días*	*mar 13/05/25*	*mar 13/05/25*	*$0.00*
1257		*1.3.3.9.6.10*	*OBSERVACIONES POR PARTE DE LA SDM AL PMT*	*0 días*	*vie 23/05/25*	*vie 23/05/25*	*$0.00*
1258		*1.3.3.9.6.11*	*ATENCIÓN DE OBSERVACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA AL PMT*	*0 días*	*jue 5/06/25*	*jue 5/06/25*	*$0.00*
1259		*1.3.3.9.6.12*	*OBSERVACIONES POR PARTE DE LA SDM AL PMT*	*0 días*	*sáb 14/06/25*	*sáb 14/06/25*	*$0.00*
1260		*1.3.3.9.6.13*	*ATENCIÓN DE OBSERVACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA AL PMT*	*0 días*	*vie 20/06/25*	*vie 20/06/25*	*$0.00*
1261		*1.3.3.9.6.14*	*APROBACIÓN DEL PMT*	*0 días*	*sáb 21/06/25*	*sáb 21/06/25*	*$0.00*
1262		1.3.3.9.6.15	INICIO CIV 16000927	0 días	sáb 21/06/25	sáb 21/06/25	$0.00
1263		**1.3.3.9.6.16**	**TRAMITE DE PMT**	**10 días**	**mar 24/06/25**	**lun 7/07/25**	**$0.00**
1264		1.3.3.9.6.16.1	IMPLEMENTACIÓN PMT ESPECIFICIO Y CERRAMIENTO DE OBRA	10 días	mar 24/06/25	lun 7/07/25	$0.00
1265		**1.3.3.9.6.17**	**ACTIVIDADES DE ARQUEOLOGIA**	**8 días**	**jue 26/06/25**	**lun 7/07/25**	**$0.00**
1266		1.3.3.9.6.17.1	EXPLORACIÓN E INVESTIGACIÓN ARQUEOLOGICA EN LA ZONA DE INTERVENCIÓN	8 días	jue 26/06/25	lun 7/07/25	$0.00
1267		**1.3.3.9.6.18**	**REDES HIDROSANITARIAS ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL**	**48 días**	**mar 8/07/25**	**mar 2/09/25**	**$157,325,323.98**
1268		1.3.3.9.6.18.1	EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS	28 días	mar 8/07/25	vie 8/08/25	$19,253,303.43
1269		1.3.3.9.6.18.2	INSTALACION DE TUBERIAS	25 días	mié 16/07/25	jue 14/08/25	$45,941,617.53
1270		1.3.3.9.6.18.3	RELLENO DE TUBERIAS	23 días	mar 22/07/25	mar 19/08/25	$17,181,863.22
1271		1.3.3.9.6.18.4	CONSTRUCCION DE POZOS Y SUMIDEROS	30 días	lun 28/07/25	mar 2/09/25	$69,283,955.80
1272		1.3.3.9.6.18.5	CONSTRUCCIÓN CAJAS DE INSPECCIÓN	30 días	lun 28/07/25	mar 2/09/25	$5,664,584.00
1273		**1.3.3.9.6.19**	**PRELIMINARES - MOVIMIENTO DE TIERRAS, DEMOLICIONES Y RELLENOS**	**37 días**	**vie 1/08/25**	**sáb 13/09/25**	**$153,169,187.27**
1274		1.3.3.9.6.19.1	DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y TRANSPORTES DE ESCOMBROS	30 días	vie 1/08/25	vie 5/09/25	$62,474,489.49
1275		1.3.3.9.6.19.2	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON RAJON Y SELLO DE RAJON	25 días	mar 12/08/25	mar 9/09/25	$37,141,780.42
1276		1.3.3.9.6.19.3	INSTALACION DE GEOTEXTILES Y RELLENO DE MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA	23 días	mar 19/08/25	sáb 13/09/25	$53,552,917.36
1277		**1.3.3.9.6.20**	**PAVIMENTOS**	**42 días**	**lun 8/09/25**	**sáb 25/10/25**	**$343,815,862.85**
1278		1.3.3.9.6.20.1	BASES Y SUBBASES	8 días	lun 8/09/25	mar 16/09/25	$54,509,358.20
1279		1.3.3.9.6.20.2	MEZCLA ASFALTICA	10 días	sáb 27/09/25	mié 8/10/25	$66,068,002.97
1280		1.3.3.9.6.20.3	CONCRETO LOSAS MR	8 días	mié 8/10/25	sáb 18/10/25	$220,379,155.04
1281		1.3.3.9.6.20.4	INSTALACION DE ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO (BORDILLOS, SARDINELES FRANJAS)	10 días	mar 14/10/25	sáb 25/10/25	$2,859,346.64
1282		**1.3.3.9.6.21**	**REDES HIDROSANITARIAS ACUEDUCTO**	**21 días**	**jue 18/09/25**	**sáb 11/10/25**	**$48,239,527.62**
1283		1.3.3.9.6.21.1	EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS	10 días	jue 18/09/25	mar 30/09/25	$6,502,274.00
1284		1.3.3.9.6.21.2	INSTALACION DE TUBERIAS	8 días	lun 22/09/25	mié 1/10/25	$15,644,998.34
1285		1.3.3.9.6.21.3	INSTALACION ACCESORIOS Y EMPATES	14 días	mié 24/09/25	jue 9/10/25	$20,843,676.00
1286		1.3.3.9.6.21.4	RELLENO DE TUBERIAS	10 días	mié 1/10/25	sáb 11/10/25	$5,248,579.28
1287		**1.3.3.9.6.22**	**REDES SECAS (Codensa)**	**38 días**	**mar 30/09/25**	**jue 13/11/25**	**$178,483,458.31**
1288		1.3.3.9.6.22.1	*MANIOBRAS POR PARTE DE LA EMPRESA ENEL - CODE*	0 días	mar 30/09/25	mar 30/09/25	$0.00
1289		1.3.3.9.6.22.2	EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS	18 días	mié 1/10/25	mié 22/10/25	$22,693,420.96
1290		1.3.3.9.6.22.3	INSTALACION DE DUCTERIAS	14 días	mié 8/10/25	vie 24/10/25	$86,126,916.57
1291		1.3.3.9.6.22.4	RELLENO DE DUCTERIAS	16 días	mar 14/10/25	vie 31/10/25	$27,424,907.78
1292		1.3.3.9.6.22.5	CONSTRUCCION DE CAJAS Y CAMARAS	25 días	mié 15/10/25	jue 13/11/25	$42,238,213.00
1293		**1.3.3.9.6.23**	**REDES SECAS (ETB)**	**30 días**	**mié 8/10/25**	**jue 13/11/25**	**$17,243,509.00**
1294		1.3.3.9.6.23.1	NIVELACIÓN DE CAMARAS	30 días	mié 8/10/25	jue 13/11/25	$17,243,509.00
1295		**1.3.3.9.6.24**	**REDES SECAS (VANTI)**	**33 días**	**mié 1/10/25**	**lun 10/11/25**	**$4,185,733.72**
1296		1.3.3.9.6.24.1	EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS	20 días	mié 1/10/25	vie 24/10/25	$3,335,622.92
1297		1.3.3.9.6.24.2	RELLENO DE DUCTERIAS	20 días	jue 16/10/25	lun 10/11/25	$850,110.80
1298		**1.3.3.9.6.25**	**ESPACIO PUBLICO**	**44 días**	**mar 30/09/25**	**vie 21/11/25**	**$276,747,832.50**
1299		1.3.3.9.6.25.1	DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y TRANSPORTES DE ESCOMBROS	18 días	mar 30/09/25	mar 21/10/25	$61,653,181.62
1300		1.3.3.9.6.25.2	INSTALACION DE GEOTEXTILES	10 días	mar 14/10/25	sáb 25/10/25	$11,576,531.01
1301		1.3.3.9.6.25.3	RELLENOS EN MATERIALES GRANULARES ESTRUCTUR	10 días	sáb 18/10/25	jue 30/10/25	$33,608,390.04
1302		1.3.3.9.6.25.4	INSTALACION DE ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO Y PREFABRICADOS	23 días	jue 23/10/25	jue 20/11/25	$161,919,125.83
1303		1.3.3.9.6.25.5	ELEMENTOS MOBILIARIO URBANO (CANECAS, BANCA	9 días	mar 11/11/25	vie 21/11/25	$7,990,604.00
1304		**1.3.3.9.6.26**	**PAISAJISMO**	**8 días**	**sáb 11/04/26**	**mar 21/04/26**	**$23,454,175.32**
1305		1.3.3.9.6.26.1	PAISAJISMO	8 días	sáb 11/04/26	mar 21/04/26	$23,454,175.32
1306		**1.3.3.9.6.27**	**SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN (HORIZONTAL Y VERTI**	**8 días**	**sáb 11/04/26**	**mar 21/04/26**	**$7,096,617.75**
1307		1.3.3.9.6.27.1	SEÑALIZACIÓN	8 días	sáb 11/04/26	mar 21/04/26	$7,096,617.75
1308		1.3.3.9.6.28	FIN CIV 16000927	0 días	mar 21/04/26	mar 21/04/26	$0.00
1309		**1.3.3.9.7**	**CIV 16000850**	**407 días**	**jue 26/12/24**	**mar 21/04/26**	**$1,130,121,666.00**
1310		*1.3.3.9.7.1*	*ENTREGA DOCUMENTACIÓN BIC POSTOBON*	*0 días*	*jue 26/12/24*	*jue 26/12/24*	*$0.00*
1311		*1.3.3.9.7.2*	*OBSERVACIONES A DOCUMENTACIÓN SUMINISTRADA PARA INTERVENCIÓN ANTE EL IDPC*	*0 días*	*mar 31/12/24*	*mar 31/12/24*	*$0.00*
1312		*1.3.3.9.7.3*	*ATENCIÓN A OBSERVACIONES PARA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN PARA TRAMITE ANTE EL IDPC*	*0 días*	*mié 22/01/25*	*mié 22/01/25*	*$0.00*
1313		*1.3.3.9.7.4*	*ALCANCE A ATENCIÓN DE OBSERVACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA ANTE EL IDPC CON No. De RADICADO IDU 20255110015312*	*0 días*	*jue 20/02/25*	*jue 20/02/25*	*$0.00*

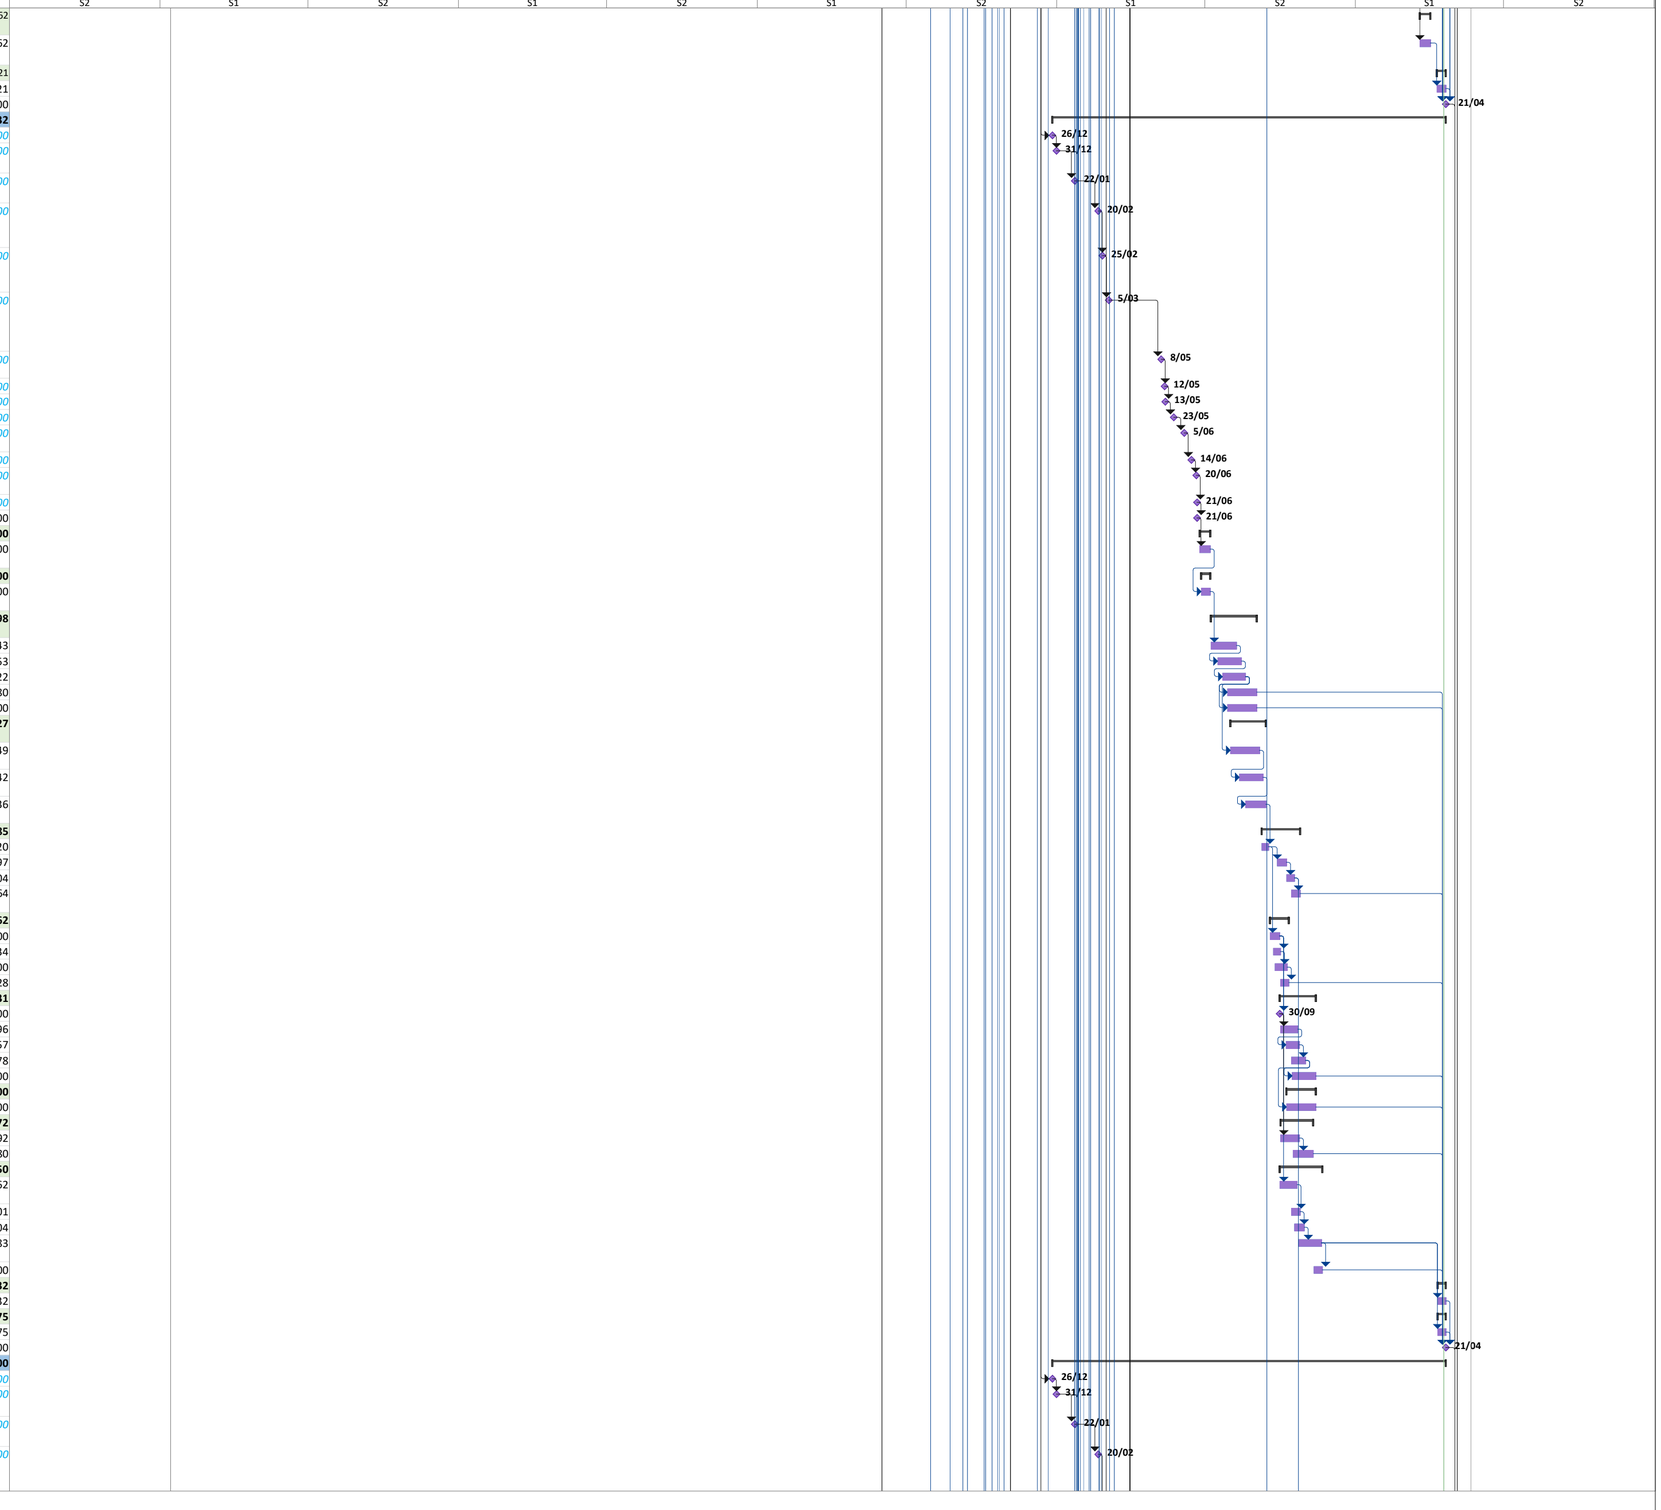

Proyecto:ID
Fecha: 14/1

Tarea	Resumen del proyecto	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Fecha límite	Tareas críticas		
División	Tareas externas	Resumen inactivo	Resumen manual	Tarea hito de sucesor controlado de ruta de acceso	División crítica		
Hito	Hito externo	Tarea manual	Sólo el comienzo	Tarea de resumen de sucesor controlado de ruta de a	Progreso		
Resumen	Tarea inactiva	Sólo duración	Sólo fin	Tarea normal de sucesor controlado de ruta de acces			

Id	Modo de tarea	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
1314		*1.3.3.9.7.5*	*MESA DE TRABAJO PARA REVISIÓN DE INFORMACIÓN CON EL IDPC SOLICITANDO ALCANCE AL RADICADO IDU 20255110015312*	*0 días*	*mar 25/02/25*	*mar 25/02/25*	*$0.00*
1315		*1.3.3.9.7.6*	*RADICACIÓN ALCANCE RADICADO IDU 20255110015312 PARA LA SOLICITUD DE LICENCIA DE INTERVENCIÓN EN ESPACIO PÚBLICO PATRIMONIAL CON NUEVO RADICADO IDU 20255110019282*	*0 días*	*mié 5/03/25*	*mié 5/03/25*	*$0.00*
1316		*1.3.3.9.7.7*	*APROBACIÓN POR PARTE DE IDPC PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES*	*0 días*	*jue 8/05/25*	*jue 8/05/25*	*$0.00*
1317		*1.3.3.9.7.8*	*PRESENTACIÓN PMT A INTERVENTORÍA*	*0 días*	*lun 12/05/25*	*lun 12/05/25*	*$0.00*
1318		*1.3.3.9.7.9*	*RADICACIÓN A LA SDM*	*0 días*	*mar 13/05/25*	*mar 13/05/25*	*$0.00*
1319		*1.3.3.9.7.10*	*OBSERVACIONES POR PARTE DE LA SDM AL PMT*	*0 días*	*vie 23/05/25*	*vie 23/05/25*	*$0.00*
1320		*1.3.3.9.7.11*	*ATENCIÓN DE OBSERVACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA AL PMT*	*0 días*	*jue 5/06/25*	*jue 5/06/25*	*$0.00*
1321		*1.3.3.9.7.12*	*OBSERVACIONES POR PARTE DE LA SDM AL PMT*	*0 días*	*sáb 14/06/25*	*sáb 14/06/25*	*$0.00*
1322		*1.3.3.9.7.13*	*ATENCIÓN DE OBSERVACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA AL PMT*	*0 días*	*vie 20/06/25*	*vie 20/06/25*	*$0.00*
1323		*1.3.3.9.7.14*	*APROBACIÓN DEL PMT*	*0 días*	*sáb 21/06/25*	*sáb 21/06/25*	*$0.00*
1324		*1.3.3.9.7.15*	*INICIO CIV 16000850*	*0 días*	*sáb 21/06/25*	*sáb 21/06/25*	*$0.00*
1325		**1.3.3.9.7.16**	**TRAMITE DE PMT**	**10 días**	**mar 24/06/25**	**lun 7/07/25**	**$0.00**
1326		1.3.3.9.7.16.1	IMPLEMENTACIÓN PMT ESPECIFICIO Y CERRAMIENTO DE OBRA	10 días	mar 24/06/25	lun 7/07/25	$0.00
1327		**1.3.3.9.7.17**	**ACTIVIDADES DE ARQUEOLOGIA**	**8 días**	**jue 26/06/25**	**lun 7/07/25**	**$0.00**
1328		1.3.3.9.7.17.1	EXPLORACIÓN E INVESTIGACIÓN ARQUEOLOGICA EN LA ZONA DE INTERVENCIÓN	8 días	jue 26/06/25	lun 7/07/25	$0.00
1329		**1.3.3.9.7.18**	**REDES HIDROSANITARIAS ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL**	**48 días**	**mar 8/07/25**	**mar 2/09/25**	**$107,749,714.47**
1330		1.3.3.9.7.18.1	EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS	28 días	mar 8/07/25	vie 8/08/25	$14,336,451.70
1331		1.3.3.9.7.18.2	INSTALACION DE TUBERIAS	25 días	mié 16/07/25	jue 14/08/25	$24,816,333.60
1332		1.3.3.9.7.18.3	RELLENO DE TUBERIAS	23 días	mar 22/07/25	mar 19/08/25	$15,173,606.64
1333		1.3.3.9.7.18.4	CONSTRUCCION DE POZOS Y SUMIDEROS	30 días	lun 28/07/25	mar 2/09/25	$49,882,957.53
1334		1.3.3.9.7.18.5	CONSTRUCCIÓN CAJAS DE INSPECCIÓN	30 días	lun 28/07/25	mar 2/09/25	$3,540,365.00
1335		**1.3.3.9.7.19**	**PRELIMINARES - MOVIMIENTO DE TIERRAS, DEMOLICIONES Y RELLENOS**	**37 días**	**mar 29/07/25**	**mié 10/09/25**	**$163,406,435.70**
1336		1.3.3.9.7.19.1	DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y TRANSPORTES DE ESCOMBROS	30 días	mar 29/07/25	mié 3/09/25	$55,069,107.50
1337		1.3.3.9.7.19.2	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON RAJON Y SELLO DE RAJON	26 días	mié 6/08/25	vie 5/09/25	$61,496,075.04
1338		1.3.3.9.7.19.3	INSTALACION DE GEOTEXTILES Y RELLENO DE MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA	23 días	jue 14/08/25	mié 10/09/25	$46,841,253.16
1339		**1.3.3.9.7.20**	**PAVIMENTOS**	**42 días**	**jue 4/09/25**	**mié 22/10/25**	**$289,199,742.36**
1340		1.3.3.9.7.20.1	BASES Y SUBBASES	8 días	jue 4/09/25	vie 12/09/25	$47,609,987.81
1341		1.3.3.9.7.20.2	MEZCLA ASFALTICA	10 días	mié 24/09/25	lun 6/10/25	$57,711,513.03
1342		1.3.3.9.7.20.3	CONCRETO LOSAS MR	8 días	lun 6/10/25	mié 15/10/25	$181,075,502.48
1343		1.3.3.9.7.20.4	INSTALACION DE ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO (BORDILLOS, SARDINELES FRANJAS)	10 días	jue 9/10/25	mié 22/10/25	$2,802,739.04
1344		**1.3.3.9.7.21**	**REDES HIDROSANITARIAS ACUEDUCTO**	**16 días**	**lun 15/09/25**	**jue 2/10/25**	**$19,465,017.66**
1345		1.3.3.9.7.21.1	EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS	10 días	lun 15/09/25	vie 26/09/25	$6,100,600.76
1346		1.3.3.9.7.21.2	INSTALACION DE TUBERIAS	8 días	jue 18/09/25	sáb 27/09/25	$8,445,451.08
1347		1.3.3.9.7.21.3	RELLENO DE TUBERIAS	10 días	lun 22/09/25	jue 2/10/25	$4,918,965.82
1348		**1.3.3.9.7.22**	**REDES SECAS (Codensa)**	**38 días**	**vie 26/09/25**	**mar 11/11/25**	**$179,907,129.16**
1349		1.3.3.9.7.22.1	*MANIOBRAS POR PARTE DE LA EMPRESA ENEL - CODE*	0 días	vie 26/09/25	vie 26/09/25	$0.00
1350		1.3.3.9.7.22.2	EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS	18 días	sáb 27/09/25	sáb 18/10/25	$25,668,289.64
1351		1.3.3.9.7.22.3	INSTALACION DE DUCTERIAS	14 días	vie 3/10/25	mar 21/10/25	$88,568,422.02
1352		1.3.3.9.7.22.4	RELLENO DE DUCTERIAS	16 días	mié 8/10/25	mar 28/10/25	$30,839,285.50
1353		1.3.3.9.7.22.5	CONSTRUCCION DE CAJAS Y CAMARAS	25 días	vie 10/10/25	mar 11/11/25	$34,831,132.00
1354		**1.3.3.9.7.23**	**REDES SECAS (ETB)**	**30 días**	**jue 16/10/25**	**vie 21/11/25**	**$5,667,732.00**
1355		1.3.3.9.7.23.1	NIVELACIÓN DE CAMARAS	30 días	jue 16/10/25	vie 21/11/25	$5,667,732.00
1356		**1.3.3.9.7.24**	**ESPACIO PUBLICO**	**47 días**	**vie 26/09/25**	**vie 21/11/25**	**$346,738,235.58**
1357		1.3.3.9.7.24.1	DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y TRANSPORTES DE ESCOMBROS	18 días	vie 26/09/25	vie 17/10/25	$57,746,118.85
1358		1.3.3.9.7.24.2	INSTALACION DE GEOTEXTILES	10 días	jue 9/10/25	mié 22/10/25	$9,820,370.05
1359		1.3.3.9.7.24.3	RELLENOS EN MATERIALES GRANULARES ESTRUCTUR	10 días	mié 15/10/25	lun 27/10/25	$24,562,036.55
1360		1.3.3.9.7.24.4	RELLENOS EN MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA RAMPAS	10 días	vie 17/10/25	mié 29/10/25	$4,903,683.54
1361		1.3.3.9.7.24.5	INSTALACION DE ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO Y PREFABRICADOS	23 días	lun 20/10/25	sáb 15/11/25	$188,391,354.67
1362		1.3.3.9.7.24.6	CONCRETO LOSAS MR	10 días	mié 22/10/25	mar 4/11/25	$54,643,638.92
1363		1.3.3.9.7.24.7	ELEMENTOS MOBILIARIO URBANO (CANECAS, BANCA	12 días	vie 7/11/25	vie 21/11/25	$6,671,033.00
1364		**1.3.3.9.7.25**	**PAISAJISMO**	**13 días**	**lun 6/04/26**	**mar 21/04/26**	**$12,726,434.82**
1365		1.3.3.9.7.25.1	PAISAJISMO	13 días	lun 6/04/26	mar 21/04/26	$12,726,434.82
1366		**1.3.3.9.7.26**	**SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN (HORIZONTAL Y VERTI**	**13 días**	**lun 6/04/26**	**mar 21/04/26**	**$5,261,224.25**
1367		1.3.3.9.7.26.1	SEÑALIZACIÓN	13 días	lun 6/04/26	mar 21/04/26	$5,261,224.25
1368		1.3.3.9.7.27	FIN CIV 16000850	0 días	mar 21/04/26	mar 21/04/26	$0.00
1369		**1.3.3.9.8**	**CIV 16000763**	**407 días**	**jue 26/12/24**	**mar 21/04/26**	**$541,636,391.45**
1370		*1.3.3.9.8.1*	*ENTREGA DOCUMENTACIÓN BIC POSTOBON*	*0 días*	*jue 26/12/24*	*jue 26/12/24*	*$0.00*
1371		*1.3.3.9.8.2*	*OBSERVACIONES A DOCUMENTACIÓN SUMINISTRADA PARA INTERVENCIÓN ANTE EL IDPC*	*0 días*	*mar 31/12/24*	*mar 31/12/24*	*$0.00*
1372		*1.3.3.9.8.3*	*ATENCIÓN A OBSERVACIONES PARA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN PARA TRAMITE ANTE EL IDPC*	*0 días*	*mié 22/01/25*	*mié 22/01/25*	*$0.00*
1373		*1.3.3.9.8.4*	*ALCANCE A ATENCIÓN DE OBSERVACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA ANTE EL IDPC CON No. De RADICADO IDU 20255110015312*	*0 días*	*jue 20/02/25*	*jue 20/02/25*	*$0.00*
1374		*1.3.3.9.8.5*	*MESA DE TRABAJO PARA REVISIÓN DE INFORMACIÓN CON EL IDPC SOLICITANDO ALCANCE AL RADICADO IDU 20255110015312*	*0 días*	*mar 25/02/25*	*mar 25/02/25*	*$0.00*
1375		*1.3.3.9.8.6*	*RADICACIÓN ALCANCE RADICADO IDU 20255110015312 PARA LA SOLICITUD DE LICENCIA DE INTERVENCIÓN EN ESPACIO PÚBLICO PATRIMONIAL CON NUEVO RADICADO IDU 20255110019282*	*0 días*	*mié 5/03/25*	*mié 5/03/25*	*$0.00*
1376		*1.3.3.9.8.7*	*APROBACIÓN POR PARTE DE IDPC PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES*	*0 días*	*jue 8/05/25*	*jue 8/05/25*	*$0.00*
1377		*1.3.3.9.8.8*	*PRESENTACIÓN PMT A INTERVENTORÍA*	*0 días*	*lun 12/05/25*	*lun 12/05/25*	*$0.00*
1378		*1.3.3.9.8.9*	*RADICACIÓN A LA SDM*	*0 días*	*mar 13/05/25*	*mar 13/05/25*	*$0.00*
1379		*1.3.3.9.8.10*	*OBSERVACIONES POR PARTE DE LA SDM AL PMT*	*0 días*	*vie 23/05/25*	*vie 23/05/25*	*$0.00*
1380		*1.3.3.9.8.11*	*ATENCIÓN DE OBSERVACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA AL PMT*	*0 días*	*jue 5/06/25*	*jue 5/06/25*	*$0.00*
1381		*1.3.3.9.8.12*	*OBSERVACIONES POR PARTE DE LA SDM AL PMT*	*0 días*	*sáb 14/06/25*	*sáb 14/06/25*	*$0.00*
1382		*1.3.3.9.8.13*	*ATENCIÓN DE OBSERVACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA AL PMT*	*0 días*	*vie 20/06/25*	*vie 20/06/25*	*$0.00*
1383		*1.3.3.9.8.14*	*APROBACIÓN DEL PMT*	*0 días*	*sáb 21/06/25*	*sáb 21/06/25*	*$0.00*
1384		1.3.3.9.8.15	INICIO CIV 16000763	0 días	sáb 21/06/25	sáb 21/06/25	$0.00

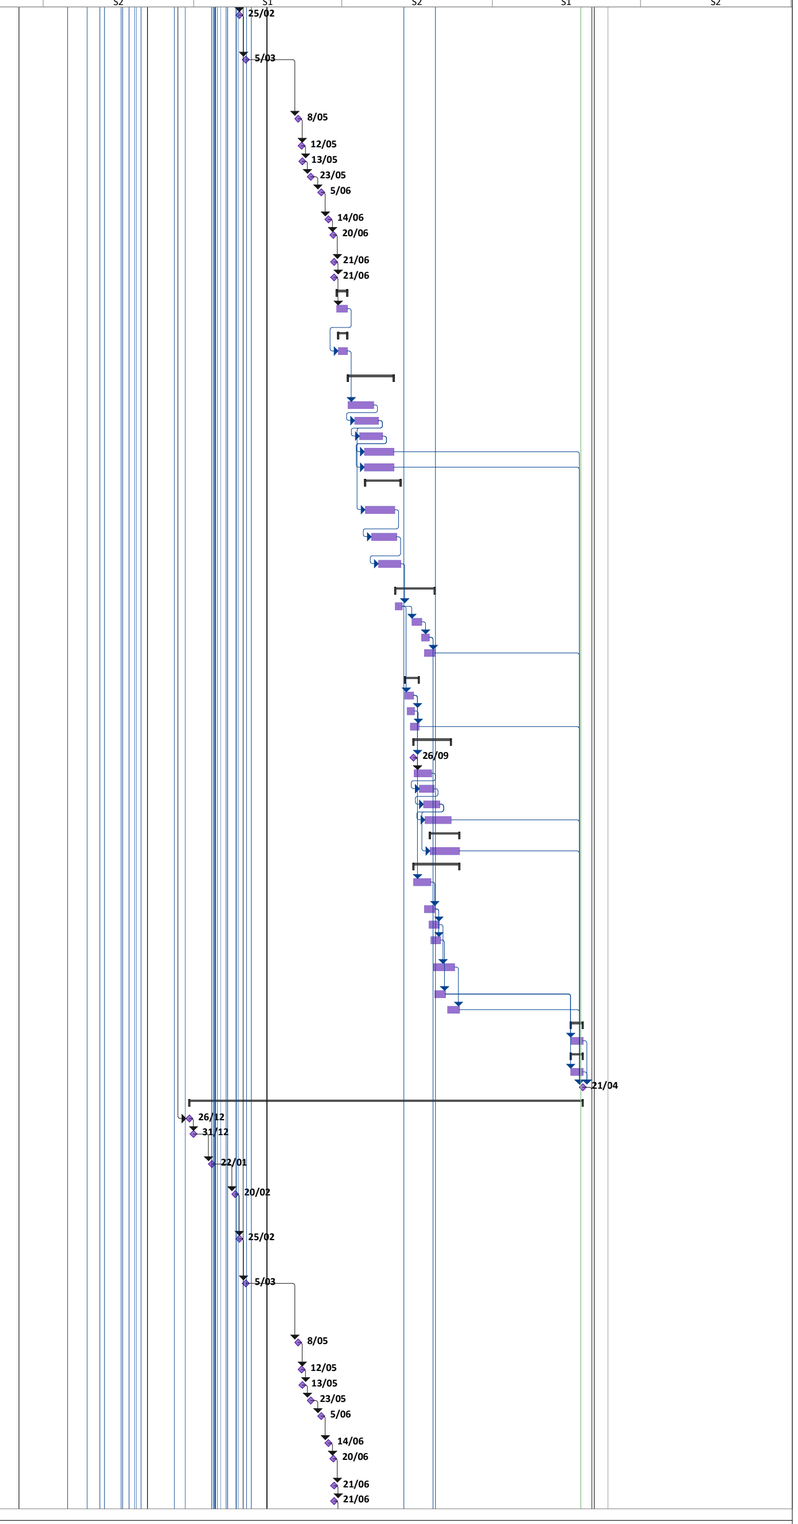

Proyecto:ID
Fecha: 14/1

Tarea	Resumen del proyecto	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Fecha límite	Tareas críticas		
División	Tareas externas	Resumen inactivo	Resumen manual	Tarea hito de sucesor controlado de ruta de acceso	División crítica		
Hito	Hito externo	Tarea manual	Sólo el comienzo	Tarea de resumen de sucesor controlado de ruta de a	Progreso		
Resumen	Tarea inactiva	Sólo duración	Sólo fin	Tarea normal de sucesor controlado de ruta de acces			


Id	Modo de tarea	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
1385		**1.3.3.9.8.16**	**TRAMITE DE PMT**	**10 días**	**mar 24/06/25**	**lun 7/07/25**	**$0.00**
1386		1.3.3.9.8.16.1	IMPLEMENTACIÓN PMT ESPECIFICIO Y CERRAMIENTO DE OBRA	10 días	mar 24/06/25	lun 7/07/25	$0.00
1387		**1.3.3.9.8.17**	**ACTIVIDADES DE ARQUEOLOGIA**	**8 días**	**jue 26/06/25**	**lun 7/07/25**	**$0.00**
1388		1.3.3.9.8.17.1	EXPLORACIÓN E INVESTIGACIÓN ARQUEOLOGICA EN LA ZONA DE INTERVENCIÓN	8 días	jue 26/06/25	lun 7/07/25	$0.00
1389		**1.3.3.9.8.18**	**REDES HIDROSANITARIAS ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL**	**48 días**	**mar 8/07/25**	**mar 2/09/25**	**$41,908,083.58**
1390		1.3.3.9.8.18.1	EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS	28 días	mar 8/07/25	vie 8/08/25	$5,621,758.33
1391		1.3.3.9.8.18.2	INSTALACION DE TUBERIAS	25 días	mié 16/07/25	jue 14/08/25	$10,694,021.85
1392		1.3.3.9.8.18.3	RELLENO DE TUBERIAS	23 días	mar 22/07/25	mar 19/08/25	$5,434,076.40
1393		1.3.3.9.8.18.4	CONSTRUCCION DE POZOS Y SUMIDEROS	30 días	lun 28/07/25	mar 2/09/25	$18,034,008.00
1394		1.3.3.9.8.18.5	CONSTRUCCIÓN CAJAS DE INSPECCIÓN	30 días	lun 28/07/25	mar 2/09/25	$2,124,219.00
1395		**1.3.3.9.8.19**	**PRELIMINARES - MOVIMIENTO DE TIERRAS, DEMOLICIONES Y RELLENOS**	**37 días**	**vie 1/08/25**	**sáb 13/09/25**	**$63,235,646.81**
1396		1.3.3.9.8.19.1	DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y TRANSPORTES DE ESCOMBROS	30 días	vie 1/08/25	vie 5/09/25	$25,299,966.32
1397		1.3.3.9.8.19.2	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON RAJON Y SELLO DE RAJON	25 días	mar 12/08/25	mar 9/09/25	$15,612,946.20
1398		1.3.3.9.8.19.3	INSTALACION DE GEOTEXTILES Y RELLENO DE MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA	23 días	mar 19/08/25	sáb 13/09/25	$22,322,734.29
1399		**1.3.3.9.8.20**	**PAVIMENTOS**	**42 días**	**lun 8/09/25**	**sáb 25/10/25**	**$144,401,441.64**
1400		1.3.3.9.8.20.1	BASES Y SUBBASES	8 días	lun 8/09/25	mar 16/09/25	$22,781,295.35
1401		1.3.3.9.8.20.2	MEZCLA ASFALTICA	10 días	sáb 27/09/25	mié 8/10/25	$27,615,939.17
1402		1.3.3.9.8.20.3	CONCRETO LOSAS MR	8 días	mié 8/10/25	sáb 18/10/25	$92,096,876.08
1403		1.3.3.9.8.20.4	INSTALACION DE ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO (BORDILLOS, SARDINELES FRANJAS)	10 días	mar 14/10/25	sáb 25/10/25	$1,907,331.04
1404		**1.3.3.9.8.21**	**REDES HIDROSANITARIAS ACUEDUCTO**	**21 días**	**mié 18/02/26**	**vie 13/03/26**	**$13,173,751.55**
1405		1.3.3.9.8.21.1	EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS	10 días	mié 18/02/26	sáb 28/02/26	$871,646.84
1406		1.3.3.9.8.21.2	INSTALACION DE TUBERIAS	8 días	vie 20/02/26	lun 2/03/26	$1,206,819.12
1407		1.3.3.9.8.21.3	INSTALACION ACCESORIOS Y EMPATES	14 días	mar 24/02/26	mié 11/03/26	$10,390,863.00
1408		1.3.3.9.8.21.4	RELLENO DE TUBERIAS	10 días	lun 2/03/26	vie 13/03/26	$704,422.59
1409		**1.3.3.9.8.22**	**REDES SECAS (Codensa)**	**38 días**	**sáb 28/02/26**	**mar 14/04/26**	**$117,054,861.93**
1410		1.3.3.9.8.22.1	*MANIOBRAS POR PARTE DE LA EMPRESA ENEL - CODE*	0 días	sáb 28/02/26	sáb 28/02/26	$0.00
1411		1.3.3.9.8.22.2	EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS	18 días	lun 2/03/26	mar 24/03/26	$11,729,737.92
1412		1.3.3.9.8.22.3	INSTALACION DE DUCTERIAS	14 días	lun 9/03/26	mié 25/03/26	$46,647,666.74
1413		1.3.3.9.8.22.4	RELLENO DE DUCTERIAS	16 días	sáb 14/03/26	jue 2/04/26	$14,600,561.27
1414		1.3.3.9.8.22.5	CONSTRUCCION DE CAJAS Y CAMARAS	25 días	lun 16/03/26	mar 14/04/26	$44,076,896.00
1415		**1.3.3.9.8.23**	**REDES SECAS (ETB)**	**27 días**	**jue 19/03/26**	**mar 21/04/26**	**$10,605,987.00**
1416		1.3.3.9.8.23.1	NIVELACIÓN DE CAMARAS	27 días	jue 19/03/26	mar 21/04/26	$10,605,987.00
1417		**1.3.3.9.8.24**	**REDES SECAS (VANTI)**	**33 días**	**lun 2/03/26**	**jue 9/04/26**	**$822,800.33**
1418		1.3.3.9.8.24.1	EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS	20 días	lun 2/03/26	mié 25/03/26	$650,883.12
1419		1.3.3.9.8.24.2	RELLENO DE DUCTERIAS	20 días	mar 17/03/26	jue 9/04/26	$171,917.21
1420		**1.3.3.9.8.25**	**ESPACIO PUBLICO**	**44 días**	**sáb 28/02/26**	**mar 21/04/26**	**$148,355,679.61**
1421		1.3.3.9.8.25.1	DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y TRANSPORTES DE ESCOMBROS	18 días	sáb 28/02/26	vie 20/03/26	$34,862,474.08
1422		1.3.3.9.8.25.2	INSTALACION DE GEOTEXTILES	10 días	sáb 14/03/26	jue 26/03/26	$9,669,365.45
1423		1.3.3.9.8.25.3	RELLENOS EN MATERIALES GRANULARES ESTRUCTUR	10 días	jue 19/03/26	mar 31/03/26	$19,303,166.52
1424		1.3.3.9.8.25.4	INSTALACION DE ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO Y PREFABRICADOS	23 días	mié 25/03/26	lun 20/04/26	$77,328,084.56
1425		1.3.3.9.8.25.5	ELEMENTOS MOBILIARIO URBANO (CANECAS, BANCA	9 días	vie 10/04/26	mar 21/04/26	$7,192,589.00
1426		**1.3.3.9.8.26**	**PAISAJISMO**	**9 días**	**vie 10/04/26**	**mar 21/04/26**	**$2,078,139.00**
1427		1.3.3.9.8.26.1	PAISAJISMO	9 días	vie 10/04/26	mar 21/04/26	$2,078,139.00
1428		1.3.3.9.8.27	FIN CIV 16000763	0 días	mar 21/04/26	mar 21/04/26	$0.00
1429		**1.3.3.10**	**CONSTRUCCION DE CIVs CARRERA 38**	**454 días**	**mar 19/11/24**	**mié 6/05/26**	**$21,566,313,587.69**
1430		**1.3.3.10.1**	**CIV 16001709**	**440 días**	**mar 19/11/24**	**mar 21/04/26**	**$1,764,273,571.30**
1431		*1.3.3.10.1.1*	*PERIODO ESTACIONAL HASTA EL 25-ENE-2025*	*0 días*	*mar 19/11/24*	*mar 19/11/24*	*$0.00*
1432		*1.3.3.10.1.2*	*REUNIÓN DE ACERCAMIENTO CON FESACOL Y SECRETARÍA DE GOBIERNO PARA SOCIALIZACIÓN OBRAS DE CIERRE DE LA CARRERA 38*	*0 días*	*lun 16/12/24*	*lun 16/12/24*	*$0.00*
1433		*1.3.3.10.1.3*	*SUBCONTRATISTA S&G ENTREGA A CSC BORRADOR DE PMT PARA PRIMER TRAMO DE CIERRE DE LA KR 38*	*0 días*	*vie 10/01/25*	*vie 10/01/25*	*$0.00*
1434		*1.3.3.10.1.4*	*CSC REALIZA AJUSTES A LA PROPUESTA DE PMT DE LA KR 38 ENTRE CL 6 Y CL 9 PARA ENTREGAR A*	*0 días*	*vie 10/01/25*	*vie 10/01/25*	*$0.00*
1435		*1.3.3.10.1.5*	*SUBCONTRATISTA S&G ENTREGA A INTERVENTORÍA PARA REVISIÓN Y APROBACIÓN PMT PARA CIERRE KR 38 ENTRE CL 6 Y CL 9*	*0 días*	*jue 16/01/25*	*jue 16/01/25*	*$0.00*
1436		*1.3.3.10.1.6*	*SE RADICA EN SDM CON VISTO BUENO DE INTERVENTORÍA PMT PARA CIERRE KR 38 ENTRE CL 6 Y CL 9 MEDIANTE NÚMERO SDM_20256120016350Z*	*0 días*	*vie 17/01/25*	*vie 17/01/25*	*$0.00*
1437		*1.3.3.10.1.7*	*SUBCONTRATISTA S&G ENTREGA BORRADOR DE PMT PARA CIERRE DE LA KR 38 ENTRE CL 9 Y AV. CL 13*	*0 días*	*lun 20/01/25*	*lun 20/01/25*	*$0.00*
1438		*1.3.3.10.1.8*	*REUNIÓN SOCIALIZACIÓN PMT DE LA KR 38 ENTRE CL 6 Y CL 9 CON LÍDERES DE VENDEDORES INFORMALES UP2*	*0 días*	*mié 22/01/25*	*mié 22/01/25*	*$0.00*
1439		*1.3.3.10.1.9*	*LA SDM ENVÍA OBSERVACIONES AL PMT DE LA KR 38 ENTRE CL 6 Y CL 9*	*0 días*	*mié 29/01/25*	*mié 29/01/25*	*$0.00*
1440		*1.3.3.10.1.10*	*SE REALIZAN AFOROS DE TRÁNSITO EN TERRENO KR 38 ENTRE CL 6 Y CL 9 CONFORME A OBSERVACIONES DE*	*0 días*	*mar 11/02/25*	*mar 11/02/25*	*$0.00*
1441		*1.3.3.10.1.11*	*ENTREGA RESULTADOS DE LOS AFOROS KR 38 ENTRE CL 6*	*0 días*	*mar 18/02/25*	*mar 18/02/25*	*$0.00*
1442		*1.3.3.10.1.12*	*SE SUBSANÓ A SDM LAS OBSERVACIONES ACERCA DEL PMT DE LA KR 38 ENTRE CL 6 Y CL 9*	*0 días*	*vie 21/02/25*	*vie 21/02/25*	*$0.00*
1443		*1.3.3.10.1.13*	*SE COTIZARON Y CONTRATARON ACTIVIDADES DE AFOROS DE TRÁNSITO PARA LA KR 38 ENTRE CL 9 Y AV.*	*0 días*	*lun 24/02/25*	*lun 24/02/25*	*$0.00*
1444		*1.3.3.10.1.14*	*CSC REALIZA AJUSTES A LA PROPUESTA DE PMT DE LA KR 38 ENTRE CL 6 Y AV CL 9*	*0 días*	*lun 24/02/25*	*lun 24/02/25*	*$0.00*
1445		*1.3.3.10.1.15*	*LA SDM NUEVAMENTE ENVÍA OBSERVACIONES ADICIONALES AL PMT DE LA KR 38 ENTRE CL 6 Y CL 9*	*0 días*	*vie 28/02/25*	*vie 28/02/25*	*$0.00*
1446		*1.3.3.10.1.16*	*EJECUCIÓN DE AFOROS DE TRÁNSITO DE LAS INTERSECCIONES DE LA KR 38 ENTRE CL 10 Y AV. CL 13*	*0 días*	*mar 4/03/25*	*mar 4/03/25*	*$0.00*
1447		*1.3.3.10.1.17*	*LA SDM NUEVAMENTE ENVÍA OBSERVACIONES ADICIONALES AL PMT DE LA KR 38 ENTRE CL 6 Y CL 9*	*0 días*	*mié 5/03/25*	*mié 5/03/25*	*$0.00*
1448		*1.3.3.10.1.18*	*LA SDM NUEVAMENTE ENVÍA OBSERVACIONES ADICIONALES AL PMT DE LA KR 38 ENTRE CL 6 Y CL 9*	*0 días*	*vie 14/03/25*	*vie 14/03/25*	*$0.00*
1449		*1.3.3.10.1.19*	*MESA DE TRABAJO ENTRE IDU, LA SDM, LA INTERVENTORÍA Y EL CSC PARA EL PMT DE LA KR 38*	*0 días*	*lun 17/03/25*	*lun 17/03/25*	*$0.00*
1450		*1.3.3.10.1.20*	*PENDIENTE S&G SUBSANE OBSERVACIONES MESA DE TRABAJO DEL 17/03/2025*	*0 días*	*mar 18/03/25*	*mar 18/03/25*	*$0.00*
1451		*1.3.3.10.1.21*	*APROBACIÓN PMT COSTADO ORIENTAL - CRUCE VEHICUL*	*0 días*	*jue 20/03/25*	*jue 20/03/25*	*$0.00*
1452		**1.3.3.10.1.22**	**FASE 1 CRUCE VEHICULAR**	**66 días**	**jue 27/03/25**	**sáb 14/06/25**	**$306,911,036.12**
1453		1.3.3.10.1.22.1	INICIO CIV 16001709	0 días	jue 27/03/25	jue 27/03/25	$0.00
1454		**1.3.3.10.1.22.2**	**TRAMITE DE PMT**	**3 días**	**jue 27/03/25**	**lun 31/03/25**	**$0.00**



Proyecto:ID
Fecha: 14/1

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tareas externas
Hito externo
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
Sólo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
Sólo el comienzo
Sólo fin
Fecha límite
Tarea hito de sucesor controlado de ruta de acceso
Tarea de resumen de sucesor controlado de ruta de a
Tarea normal de sucesor controlado de ruta de acces
Tareas críticas
División crítica
Progreso


Id	Modo de tarea	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
1455		1.3.3.10.1.22.2.1	IMPLEMENTACIÓN PMT ESPECIFICIO Y CERRAMIENTO DE OBRA	3 días	jue 27/03/25	lun 31/03/25	$0.00
1456		**1.3.3.10.1.22.3**	**ACTIVIDADES DE ARQUEOLOGIA**	**3 días**	**jue 27/03/25**	**lun 31/03/25**	**$0.00**
1457		1.3.3.10.1.22.3.1	EXPLORACIÓN E INVESTIGACIÓN ARQUEOLOGICA EN LA ZONA DE INTERVENCIÓN	3 días	jue 27/03/25	lun 31/03/25	$0.00
1458		**1.3.3.10.1.22.4**	**REDES HIDROSANITARIAS ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL**	**41 días**	**vie 28/03/25**	**sáb 17/05/25**	**$83,485,489.82**
1459		1.3.3.10.1.22.4.1	EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS	12 días	vie 28/03/25	vie 11/04/25	$7,725,860.64
1460		1.3.3.10.1.22.4.2	INSTALACION DE TUBERIAS	15 días	sáb 5/04/25	jue 24/04/25	$44,266,665.52
1461		1.3.3.10.1.22.4.3	RELLENO DE TUBERIAS	12 días	sáb 19/04/25	lun 5/05/25	$11,138,553.34
1462		1.3.3.10.1.22.4.4	CONSTRUCCION DE POZOS Y SUMIDEROS	17 días	lun 28/04/25	sáb 17/05/25	$20,354,410.32
1463		**1.3.3.10.1.22.5**	**PRELIMINARES - MOVIMIENTO DE TIERRAS, DEMOLICIONES Y RELLENOS**	**14 días**	**sáb 17/05/25**	**mar 3/06/25**	**$48,746,175.50**
1464		1.3.3.10.1.22.5.1	DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y TRANSPORTES DE ESCOMBROS	8 días	sáb 17/05/25	mar 27/05/25	$21,731,197.60
1465		1.3.3.10.1.22.5.2	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON RAJON Y SELLO DE RAJON	6 días	vie 23/05/25	jue 29/05/25	$10,238,816.80
1466		1.3.3.10.1.22.5.3	INSTALACION DE GEOTEXTILES Y RELLENO DE MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA	6 días	mar 27/05/25	mar 3/06/25	$16,776,161.10
1467		**1.3.3.10.1.22.6**	**PAVIMENTOS**	**12 días**	**vie 30/05/25**	**sáb 14/06/25**	**$174,679,370.80**
1468		1.3.3.10.1.22.6.1	BASES Y SUBBASES	4 días	vie 30/05/25	jue 5/06/25	$88,688,778.00
1469		1.3.3.10.1.22.6.2	MEZCLA ASFALTICA	4 días	mar 3/06/25	vie 6/06/25	$1,304,990.00
1470		1.3.3.10.1.22.6.3	CONCRETO LOSAS MR	6 días	vie 6/06/25	vie 13/06/25	$84,523,984.00
1471		1.3.3.10.1.22.6.4	INSTALACION DE ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO (BORDILLOS, SARDINELES	3 días	mié 11/06/25	sáb 14/06/25	$161,618.80
1472		**1.3.3.10.1.23**	**FASE 2 ANDEN COSTADO OCCIDENTAL**	**163 días**	**mar 13/05/25**	**vie 21/11/25**	**$718,645,300.61**
1473		**1.3.3.10.1.23.1**	**REDES HIDROSANITARIAS ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL**	**46 días**	**mar 13/05/25**	**mar 8/07/25**	**$72,930,918.44**
1474		1.3.3.10.1.23.1.1	EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS	25 días	mar 13/05/25	mié 11/06/25	$14,164,880.92
1475		1.3.3.10.1.23.1.2	INSTALACION DE TUBERIAS	23 días	mié 21/05/25	mar 17/06/25	$15,748,003.44
1476		1.3.3.10.1.23.1.3	RELLENO DE TUBERIAS	23 días	lun 26/05/25	sáb 21/06/25	$16,920,884.76
1477		1.3.3.10.1.23.1.4	CONSTRUCCION DE POZOS Y SUMIDEROS	30 días	vie 30/05/25	mar 8/07/25	$25,096,698.32
1478		1.3.3.10.1.23.1.5	CONSTRUCCIÓN CAJAS DE INSPECCIÓN	30 días	vie 30/05/25	mar 8/07/25	$1,000,451.00
1479		**1.3.3.10.1.23.2**	**PRELIMINARES - MOVIMIENTO DE TIERRAS, DEMOLICIONES Y RELLENOS**	**42 días**	**mié 25/06/25**	**mié 13/08/25**	**$110,426,165.39**
1480		1.3.3.10.1.23.2.1	DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y TRANSPORTES DE ESCOMBROS	20 días	mié 25/06/25	vie 18/07/25	$47,084,506.76
1481		1.3.3.10.1.23.2.2	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON RAJON Y SELLO DE RAJON	14 días	mar 15/07/25	jue 31/07/25	$20,457,862.29
1482		1.3.3.10.1.23.2.3	INSTALACION DE GEOTEXTILES Y RELLENO DE MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA	14 días	lun 28/07/25	mié 13/08/25	$42,883,796.34
1483		**1.3.3.10.1.23.3**	**PAVIMENTOS**	**61 días**	**mar 12/08/25**	**mar 21/10/25**	**$265,824,603.08**
1484		1.3.3.10.1.23.3.1	BASES Y SUBBASES	16 días	mar 12/08/25	sáb 30/08/25	$113,869,199.97
1485		1.3.3.10.1.23.3.2	MEZCLA ASFALTICA	16 días	mié 27/08/25	sáb 13/09/25	$4,128,529.85
1486		1.3.3.10.1.23.3.3	CONCRETO LOSAS MR	19 días	lun 15/09/25	lun 6/10/25	$146,967,216.32
1487		1.3.3.10.1.23.3.4	INSTALACION DE ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO (BORDILLOS, SARDINELES	15 días	vie 3/10/25	mar 21/10/25	$859,656.94
1488		**1.3.3.10.1.23.4**	**REDES HIDROSANITARIAS ACUEDUCTO**	**28 días**	**mar 2/09/25**	**jue 2/10/25**	**$43,097,037.40**
1489		1.3.3.10.1.23.4.1	EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS	12 días	mar 2/09/25	lun 15/09/25	$6,849,470.88
1490		1.3.3.10.1.23.4.2	INSTALACION DE TUBERIAS	10 días	vie 5/09/25	mié 17/09/25	$12,653,257.92
1491		1.3.3.10.1.23.4.3	INSTALACION ACCESORIOS Y EMPATES	16 días	mié 10/09/25	lun 29/09/25	$17,074,705.00
1492		1.3.3.10.1.23.4.4	RELLENO DE TUBERIAS	12 días	vie 19/09/25	jue 2/10/25	$6,519,603.60
1493		**1.3.3.10.1.23.5**	**REDES SECAS (Codensa)**	**42 días**	**lun 15/09/25**	**mar 4/11/25**	**$63,139,297.73**
1494		1.3.3.10.1.23.5.1	EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS	15 días	lun 15/09/25	jue 2/10/25	$8,036,883.68
1495		1.3.3.10.1.23.5.2	INSTALACION DE DUCTERIAS	17 días	vie 3/10/25	jue 23/10/25	$26,171,085.55
1496		1.3.3.10.1.23.5.3	RELLENO DE DUCTERIAS	17 días	mar 7/10/25	lun 27/10/25	$7,633,227.50
1497		1.3.3.10.1.23.5.4	CONSTRUCCION DE CAJAS Y CAMARAS	20 días	jue 9/10/25	mar 4/11/25	$21,298,101.00
1498		**1.3.3.10.1.23.6**	**ESPACIO PUBLICO**	**57 días**	**lun 15/09/25**	**vie 21/11/25**	**$163,227,278.57**
1499		1.3.3.10.1.23.6.1	DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y TRANSPORTES DE ESCOMBROS	20 días	lun 15/09/25	mar 7/10/25	$26,306,739.34
1500		1.3.3.10.1.23.6.2	INSTALACION DE GEOTEXTILES	14 días	vie 26/09/25	sáb 11/10/25	$4,442,577.87
1501		1.3.3.10.1.23.6.3	RELLENOS EN MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA ANDEN	14 días	mié 1/10/25	vie 17/10/25	$14,133,917.67
1502		1.3.3.10.1.23.6.4	RELLENOS EN MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA RAMPAS	14 días	vie 3/10/25	lun 20/10/25	$13,584,278.00
1503		1.3.3.10.1.23.6.5	INSTALACION DE ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO Y PREFABRICADOS	41 días	sáb 27/09/25	vie 14/11/25	$61,330,552.37
1504		1.3.3.10.1.23.6.6	CONCRETO LOSAS MR	20 días	mié 8/10/25	vie 31/10/25	$35,694,160.32
1505		1.3.3.10.1.23.6.7	ELEMENTOS MOBILIARIO URBANO (CANECAS, BANCAS, ETC)	11 días	vie 7/11/25	vie 21/11/25	$7,735,053.00
1506		**1.3.3.10.1.24**	**FASE 3 ANDEN COSTADO ORIENTAL**	**251 días**	**mar 1/07/25**	**mar 21/04/26**	**$738,717,234.57**
1507		**1.3.3.10.1.24.1**	**REDES HIDROSANITARIAS ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL**	**28 días**	**mar 1/07/25**	**jue 31/07/25**	**$70,192,642.97**
1508		1.3.3.10.1.24.1.1	EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS	20 días	mar 1/07/25	mié 23/07/25	$13,409,193.92
1509		1.3.3.10.1.24.1.2	INSTALACION DE TUBERIAS	18 días	vie 4/07/25	vie 25/07/25	$15,741,780.49
1510		1.3.3.10.1.24.1.3	RELLENO DE TUBERIAS	18 días	mar 8/07/25	lun 28/07/25	$16,917,451.06
1511		1.3.3.10.1.24.1.4	CONSTRUCCION DE POZOS Y SUMIDEROS	23 días	lun 7/07/25	jue 31/07/25	$23,123,766.50
1512		1.3.3.10.1.24.1.5	CONSTRUCCIÓN CAJAS DE INSPECCIÓN	23 días	lun 7/07/25	jue 31/07/25	$1,000,451.00
1513		**1.3.3.10.1.24.2**	**PRELIMINARES - MOVIMIENTO DE TIERRAS, DEMOLICIONES Y RELLENOS**	**15 días**	**sáb 26/07/25**	**mié 13/08/25**	**$110,425,540.41**
1514		1.3.3.10.1.24.2.1	DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y TRANSPORTES DE ESCOMBROS	10 días	sáb 26/07/25	mié 6/08/25	$47,083,902.48
1515		1.3.3.10.1.24.2.2	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON RAJON Y SELLO DE RAJON	8 días	jue 31/07/25	lun 11/08/25	$20,457,841.59
1516		1.3.3.10.1.24.2.3	INSTALACION DE GEOTEXTILES Y RELLENO DE MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA	8 días	lun 4/08/25	mié 13/08/25	$42,883,796.34
1517		**1.3.3.10.1.24.3**	**PAVIMENTOS**	**47 días**	**sáb 23/08/25**	**jue 16/10/25**	**$227,377,680.47**
1518		1.3.3.10.1.24.3.1	BASES Y SUBBASES	8 días	sáb 23/08/25	mar 2/09/25	$113,869,199.97
1519		1.3.3.10.1.24.3.2	MEZCLA ASFALTICA	8 días	mié 27/08/25	jue 4/09/25	$4,128,494.58
1520		1.3.3.10.1.24.3.3	CONCRETO LOSAS MR	8 días	vie 3/10/25	sáb 11/10/25	$108,521,942.16
1521		1.3.3.10.1.24.3.4	INSTALACION DE ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO (BORDILLOS, SARDINELES	5 días	jue 9/10/25	jue 16/10/25	$858,043.76
1522		**1.3.3.10.1.24.4**	**REDES HIDROSANITARIAS ACUEDUCTO**	**17 días**	**jue 4/09/25**	**mar 23/09/25**	**$48,221,632.66**
1523		1.3.3.10.1.24.4.1	EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS	8 días	jue 4/09/25	vie 12/09/25	$6,849,007.32
1524		1.3.3.10.1.24.4.2	INSTALACION DE TUBERIAS	8 días	vie 5/09/25	lun 15/09/25	$12,652,497.00
1525		1.3.3.10.1.24.4.3	INSTALACION ACCESORIOS Y EMPATES	10 días	mié 10/09/25	sáb 20/09/25	$22,201,561.00
1526		1.3.3.10.1.24.4.4	RELLENO DE TUBERIAS	8 días	lun 15/09/25	mar 23/09/25	$6,518,567.34
1527		**1.3.3.10.1.24.5**	**REDES SECAS (Codensa)**	**32 días**	**mié 24/09/25**	**vie 31/10/25**	**$78,216,184.87**
1528		1.3.3.10.1.24.5.1	EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS	23 días	mié 24/09/25	mar 21/10/25	$8,035,815.84
1529		1.3.3.10.1.24.5.2	INSTALACION DE DUCTERIAS	19 días	jue 2/10/25	vie 24/10/25	$26,171,085.55
1530		1.3.3.10.1.24.5.3	RELLENO DE DUCTERIAS	19 días	vie 3/10/25	lun 27/10/25	$7,631,645.48
1531		1.3.3.10.1.24.5.4	CONSTRUCCION DE CAJAS Y CAMARAS	26 días	mié 1/10/25	vie 31/10/25	$36,377,638.00
1532		**1.3.3.10.1.24.6**	**REDES SECAS (ETB)**	**20 días**	**mié 15/10/25**	**vie 7/11/25**	**$24,918,313.00**

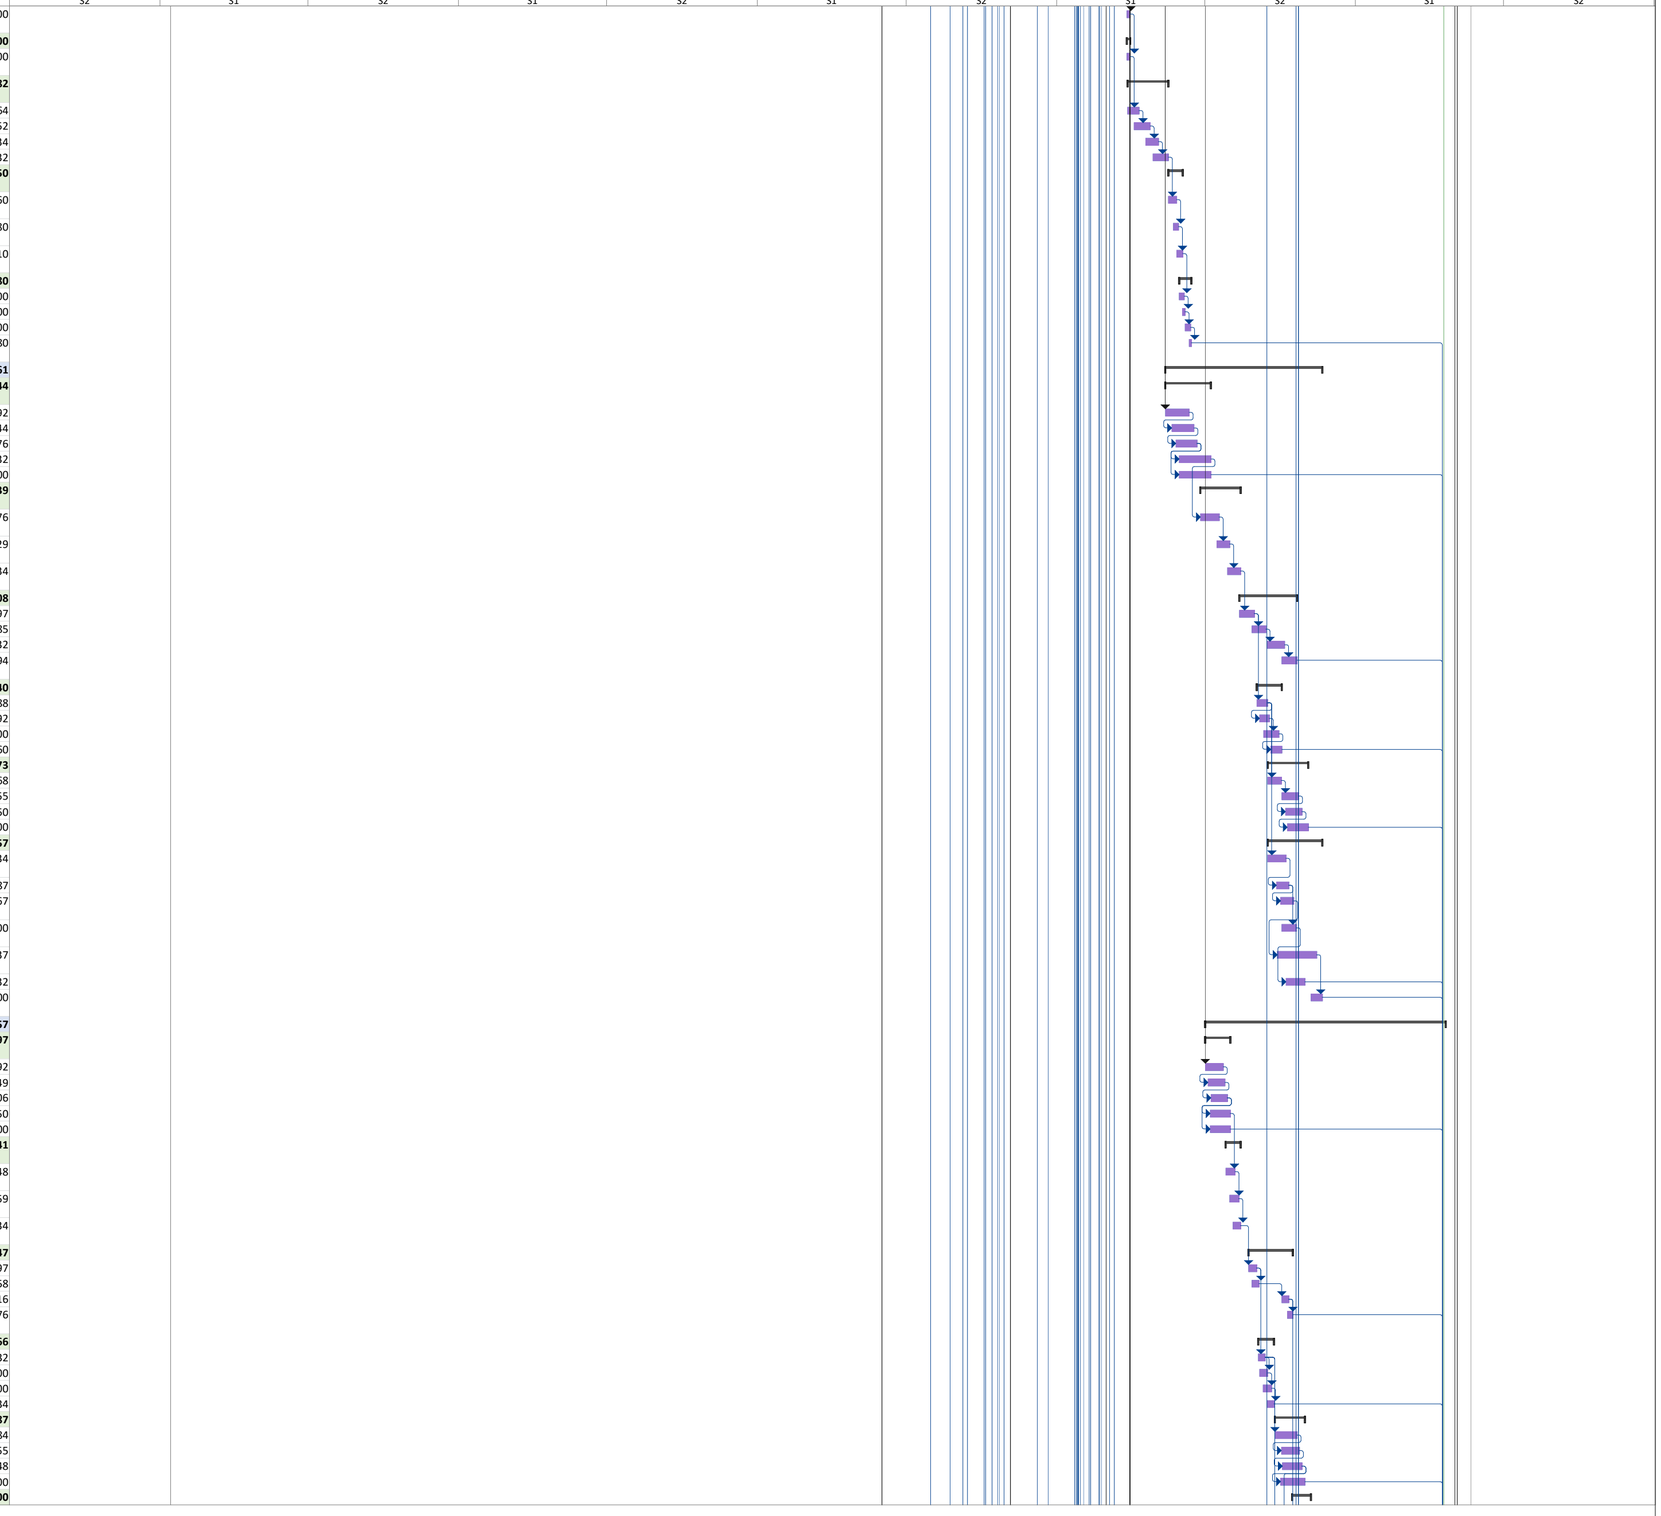

Proyecto:ID
Fecha: 14/1

Tarea	Resumen del proyecto	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Fecha límite	Tareas críticas
División	Tareas externas	Resumen inactivo	Resumen manual	Tarea hito de sucesor controlado de ruta de acceso	División crítica
Hito	Hito externo	Tarea manual	Sólo el comienzo	Tarea de resumen de sucesor controlado de ruta de a	Progreso
Resumen	Tarea inactiva	Sólo duración	Sólo fin	Tarea normal de sucesor controlado de ruta de acces	


Id	Modo de tarea	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
1533		1.3.3.10.1.24.6.1	NIVELACION DE CAJAS Y CAMARAS	20 días	mié 15/10/25	vie 7/11/25	$24,918,313.00
1534		**1.3.3.10.1.24.7**	**REDES SECAS (VANTI)**	**33 días**	**mié 24/09/25**	**vie 31/10/25**	**$822,800.33**
1535		1.3.3.10.1.24.7.1	EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS	20 días	mié 24/09/25	vie 17/10/25	$650,883.12
1536		1.3.3.10.1.24.7.2	RELLENO DE DUCTERIAS	20 días	mié 8/10/25	vie 31/10/25	$171,917.21
1537		**1.3.3.10.1.24.8**	**ESPACIO PUBLICO**	**39 días**	**mié 24/09/25**	**lun 10/11/25**	**$164,837,381.96**
1538		1.3.3.10.1.24.8.1	DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y TRANSPORTES DE ESCOMBROS	20 días	mié 24/09/25	vie 17/10/25	$26,306,045.36
1539		1.3.3.10.1.24.8.2	INSTALACION DE GEOTEXTILES	10 días	mié 8/10/25	lun 20/10/25	$4,442,577.87
1540		1.3.3.10.1.24.8.3	RELLENOS EN MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA ANDEN	10 días	mar 14/10/25	vie 24/10/25	$14,131,123.92
1541		1.3.3.10.1.24.8.4	RELLENOS EN MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA RAMPAS	8 días	vie 17/10/25	lun 27/10/25	$13,582,555.20
1542		1.3.3.10.1.24.8.5	INSTALACION DE ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO Y PREFABRICADOS	27 días	mar 7/10/25	vie 7/11/25	$57,329,742.27
1543		1.3.3.10.1.24.8.6	CONCRETO LOSAS MR	10 días	mar 21/10/25	vie 31/10/25	$41,310,284.34
1544		1.3.3.10.1.24.8.7	ELEMENTOS MOBILIARIO URBANO (CANECAS, BANCAS, ETC)	6 días	sáb 1/11/25	lun 10/11/25	$7,735,053.00
1545		**1.3.3.10.1.24.9**	**PAISAJISMO**	**11 días**	**mié 8/04/26**	**mar 21/04/26**	**$170,646.00**
1546		1.3.3.10.1.24.9.1	PAISAJISMO	11 días	mié 8/04/26	mar 21/04/26	$170,646.00
1547		**1.3.3.10.1.24.10**	**SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN (HORIZONTAL Y VEF**	**11 días**	**mié 8/04/26**	**mar 21/04/26**	**$13,534,411.90**
1548		1.3.3.10.1.24.10.1	SEÑALIZACIÓN	11 días	mié 8/04/26	mar 21/04/26	$13,534,411.90
1549		1.3.3.10.1.24.11	FIN CIV 16001709	0 días	mar 21/04/26	mar 21/04/26	$0.00
1550		**1.3.3.10.2**	**CIV 16001651**	**440 días**	**mar 19/11/24**	**mar 21/04/26**	**$1,871,614,195.98**
1551		*1.3.3.10.2.1*	*PERIODO ESTACIONAL HASTA EL 25-ENE-2025*	*0 días*	*mar 19/11/24*	*mar 19/11/24*	*$0.00*
1552		*1.3.3.10.2.2*	*REUNIÓN DE ACERCAMIENTO CON FESACOL Y SECRETARÍA DE GOBIERNO PARA SOCIALIZACIÓN OBRAS DE CIERRE DE LA CARRERA 38*	*0 días*	*lun 16/12/24*	*lun 16/12/24*	*$0.00*
1553		*1.3.3.10.2.3*	*SUBCONTRATISTA S&G ENTREGA A CSC BORRADOR DE PMT PARA PRIMER TRAMO DE CIERRE DE LA KR 38*	*0 días*	*vie 10/01/25*	*vie 10/01/25*	*$0.00*
1554		*1.3.3.10.2.4*	*CSC REALIZA AJUSTES A LA PROPUESTA DE PMT DE LA KR 38 ENTRE CL 6 Y CL 9 PARA ENTREGAR A*	*0 días*	*vie 10/01/25*	*vie 10/01/25*	*$0.00*
1555		*1.3.3.10.2.5*	*SUBCONTRATISTA S&G ENTREGA A INTERVENTORÍA PARA REVISIÓN Y APROBACIÓN PMT PARA CIERRE KR 38 ENTRE CL 6 Y CL 9*	*0 días*	*jue 16/01/25*	*jue 16/01/25*	*$0.00*
1556		*1.3.3.10.2.6*	*SE RADICA EN SDM CON VISTO BUENO DE INTERVENTORÍA PMT PARA CIERRE KR 38 ENTRE CL 6 Y CL 9 MEDIANTE NÚMERO SDM_20256120016350Z*	*0 días*	*vie 17/01/25*	*vie 17/01/25*	*$0.00*
1557		*1.3.3.10.2.7*	*SUBCONTRATISTA S&G ENTREGA BORRADOR DE PMT PARA CIERRE DE LA KR 38 ENTRE CL 9 Y AV. CL 13*	*0 días*	*lun 20/01/25*	*lun 20/01/25*	*$0.00*
1558		*1.3.3.10.2.8*	*REUNIÓN SOCIALIZACIÓN PMT DE LA KR 38 ENTRE CL 6 Y CL 9 CON LÍDERES DE VENDEDORES INFORMALES UPZ*	*0 días*	*mié 22/01/25*	*mié 22/01/25*	*$0.00*
1559		*1.3.3.10.2.9*	*LA SDM ENVÍA OBSERVACIONES AL PMT DE LA KR 38 ENTRE CL 6 Y CL 9*	*0 días*	*mié 29/01/25*	*mié 29/01/25*	*$0.00*
1560		*1.3.3.10.2.10*	*SE REALIZAN AFOROS DE TRÁNSITO EN TERRENO KR 38 ENTRE CL 6 Y CL 9 CONFORME A OBSERVACIONES DE*	*0 días*	*mar 11/02/25*	*mar 11/02/25*	*$0.00*
1561		*1.3.3.10.2.11*	*ENTREGA RESULTADOS DE LOS AFOROS KR 38 ENTRE CL 6*	*0 días*	*mar 18/02/25*	*mar 18/02/25*	*$0.00*
1562		*1.3.3.10.2.12*	*SE SUBSANÓ A SDM LAS OBSERVACIONES ACERCA DEL PMT DE LA KR 38 ENTRE CL 6 Y CL 9*	*0 días*	*vie 21/02/25*	*vie 21/02/25*	*$0.00*
1563		*1.3.3.10.2.13*	*SE COTIZARON Y CONTRATARON ACTIVIDADES DE AFOROS DE TRÁNSITO PARA LA KR 38 ENTRE CL 9 Y AV.*	*0 días*	*lun 24/02/25*	*lun 24/02/25*	*$0.00*
1564		*1.3.3.10.2.14*	*CSC REALIZA AJUSTES A LA PROPUESTA DE PMT DE LA KR 38 ENTRE CL 6 Y AV CL 9*	*0 días*	*lun 24/02/25*	*lun 24/02/25*	*$0.00*
1565		*1.3.3.10.2.15*	*LA SDM NUEVAMENTE ENVÍA OBSERVACIONES ADICIONALES AL PMT DE LA KR 38 ENTRE CL 6 Y CL 9*	*0 días*	*vie 28/02/25*	*vie 28/02/25*	*$0.00*
1566		*1.3.3.10.2.16*	*EJECUCIÓN DE AFOROS DE TRÁNSITO DE LAS INTERSECCIONES DE LA KR 38 ENTRE CL 10 Y AV. CL 13*	*0 días*	*mar 4/03/25*	*mar 4/03/25*	*$0.00*
1567		*1.3.3.10.2.17*	*LA SDM NUEVAMENTE ENVÍA OBSERVACIONES ADICIONALES AL PMT DE LA KR 38 ENTRE CL 6 Y CL 9*	*0 días*	*mié 5/03/25*	*mié 5/03/25*	*$0.00*
1568		*1.3.3.10.2.18*	*LA SDM NUEVAMENTE ENVÍA OBSERVACIONES ADICIONALES AL PMT DE LA KR 38 ENTRE CL 6 Y CL 9*	*0 días*	*vie 14/03/25*	*vie 14/03/25*	*$0.00*
1569		*1.3.3.10.2.19*	*MESA DE TRABAJO ENTRE IDU, LA SDM, LA INTERVENTORÍA Y EL CSC PARA EL PMT DE LA KR 38*	*0 días*	*lun 17/03/25*	*lun 17/03/25*	*$0.00*
1570		*1.3.3.10.2.20*	*PENDIENTE S&G SUBSANE OBSERVACIONES MESA DE TRABAJO DEL 17/03/2025*	*0 días*	*mar 18/03/25*	*mar 18/03/25*	*$0.00*
1571		*1.3.3.10.2.21*	*APROBACIÓN PMT COSTADO ORIENTAL - CRUCE VEHICUL*	*0 días*	*jue 20/03/25*	*jue 20/03/25*	*$0.00*
1572		**1.3.3.10.2.22**	**FASE 1 ANDEN COSTADO OCCIDENTAL**	**186 días**	**lun 14/04/25**	**vie 21/11/25**	**$850,438,146.04**
1573		1.3.3.10.2.22.1	INICIO CIV 16001651	0 días	lun 14/04/25	lun 14/04/25	$0.00
1574		**1.3.3.10.2.22.2**	**TRAMITE DE PMT**	**6 días**	**sáb 19/04/25**	**vie 25/04/25**	**$0.00**
1575		1.3.3.10.2.22.2.1	IMPLEMENTACIÓN PMT ESPECIFICIO Y CERRAMIENTO DE OBRA	6 días	sáb 19/04/25	vie 25/04/25	$0.00
1576		**1.3.3.10.2.22.3**	**ACTIVIDADES DE ARQUEOLOGIA**	**6 días**	**lun 21/04/25**	**lun 28/04/25**	**$0.00**
1577		1.3.3.10.2.22.3.1	EXPLORACIÓN E INVESTIGACIÓN ARQUEOLOGICA EN LA ZONA DE INTERVENCIÓN	6 días	lun 21/04/25	lun 28/04/25	$0.00
1578		**1.3.3.10.2.22.4**	**REDES HIDROSANITARIAS ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL**	**46 días**	**lun 28/04/25**	**vie 20/06/25**	**$106,851,773.67**
1579		1.3.3.10.2.22.4.1	EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS	25 días	lun 28/04/25	mar 27/05/25	$14,808,873.16
1580		1.3.3.10.2.22.4.2	INSTALACION DE TUBERIAS	23 días	mar 6/05/25	mar 3/06/25	$43,016,955.13
1581		1.3.3.10.2.22.4.3	RELLENO DE TUBERIAS	23 días	sáb 10/05/25	vie 6/06/25	$16,442,343.94
1582		1.3.3.10.2.22.4.4	CONSTRUCCION DE POZOS Y SUMIDEROS	30 días	vie 16/05/25	vie 20/06/25	$30,020,815.44
1583		1.3.3.10.2.22.4.5	CONSTRUCCIÓN CAJAS DE INSPECCIÓN	30 días	vie 16/05/25	vie 20/06/25	$2,562,786.00
1584		**1.3.3.10.2.22.5**	**PRELIMINARES - MOVIMIENTO DE TIERRAS, DEMOLICIONES Y RELLENOS**	**42 días**	**lun 9/06/25**	**mar 29/07/25**	**$106,700,844.21**
1585		1.3.3.10.2.22.5.1	DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y TRANSPORTES DE ESCOMBROS	20 días	lun 9/06/25	jue 3/07/25	$45,957,508.06
1586		1.3.3.10.2.22.5.2	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON RAJON Y SELLO DE RAJON	14 días	mar 1/07/25	mié 16/07/25	$27,813,014.81
1587		1.3.3.10.2.22.5.3	INSTALACION DE GEOTEXTILES Y RELLENO DE MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA	14 días	lun 14/07/25	mar 29/07/25	$32,930,321.34
1588		**1.3.3.10.2.22.6**	**PAVIMENTOS**	**81 días**	**sáb 26/07/25**	**mié 29/10/25**	**$337,979,013.59**
1589		1.3.3.10.2.22.6.1	BASES Y SUBBASES	16 días	sáb 26/07/25	jue 14/08/25	$166,327,413.66
1590		1.3.3.10.2.22.6.2	MEZCLA ASFALTICA	16 días	mar 12/08/25	sáb 30/08/25	$3,435,227.46
1591		1.3.3.10.2.22.6.3	CONCRETO LOSAS MR	19 días	lun 22/09/25	mar 14/10/25	$168,014,173.17
1592		1.3.3.10.2.22.6.4	INSTALACION DE ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO (BORDILLOS, SARDINELES	15 días	vie 10/10/25	mié 29/10/25	$202,199.30
1593		**1.3.3.10.2.22.7**	**REDES HIDROSANITARIAS ACUEDUCTO**	**28 días**	**sáb 16/08/25**	**jue 18/09/25**	**$37,594,405.23**
1594		1.3.3.10.2.22.7.1	EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS	12 días	sáb 16/08/25	lun 1/09/25	$8,331,516.36
1595		1.3.3.10.2.22.7.2	INSTALACION DE TUBERIAS	10 días	vie 22/08/25	mié 3/09/25	$15,646,888.36
1596		1.3.3.10.2.22.7.3	INSTALACION ACCESORIOS Y EMPATES	16 días	mié 27/08/25	sáb 13/09/25	$5,612,720.00
1597		1.3.3.10.2.22.7.4	RELLENO DE TUBERIAS	12 días	vie 5/09/25	jue 18/09/25	$8,003,280.51
1598		**1.3.3.10.2.22.8**	**REDES SECAS (Codensa)**	**42 días**	**lun 1/09/25**	**sáb 18/10/25**	**$83,840,627.26**
1599		1.3.3.10.2.22.8.1	EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS	15 días	lun 1/09/25	mié 17/09/25	$11,003,714.60
1600		1.3.3.10.2.22.8.2	INSTALACION DE DUCTERIAS	17 días	jue 18/09/25	mar 7/10/25	$33,712,509.54

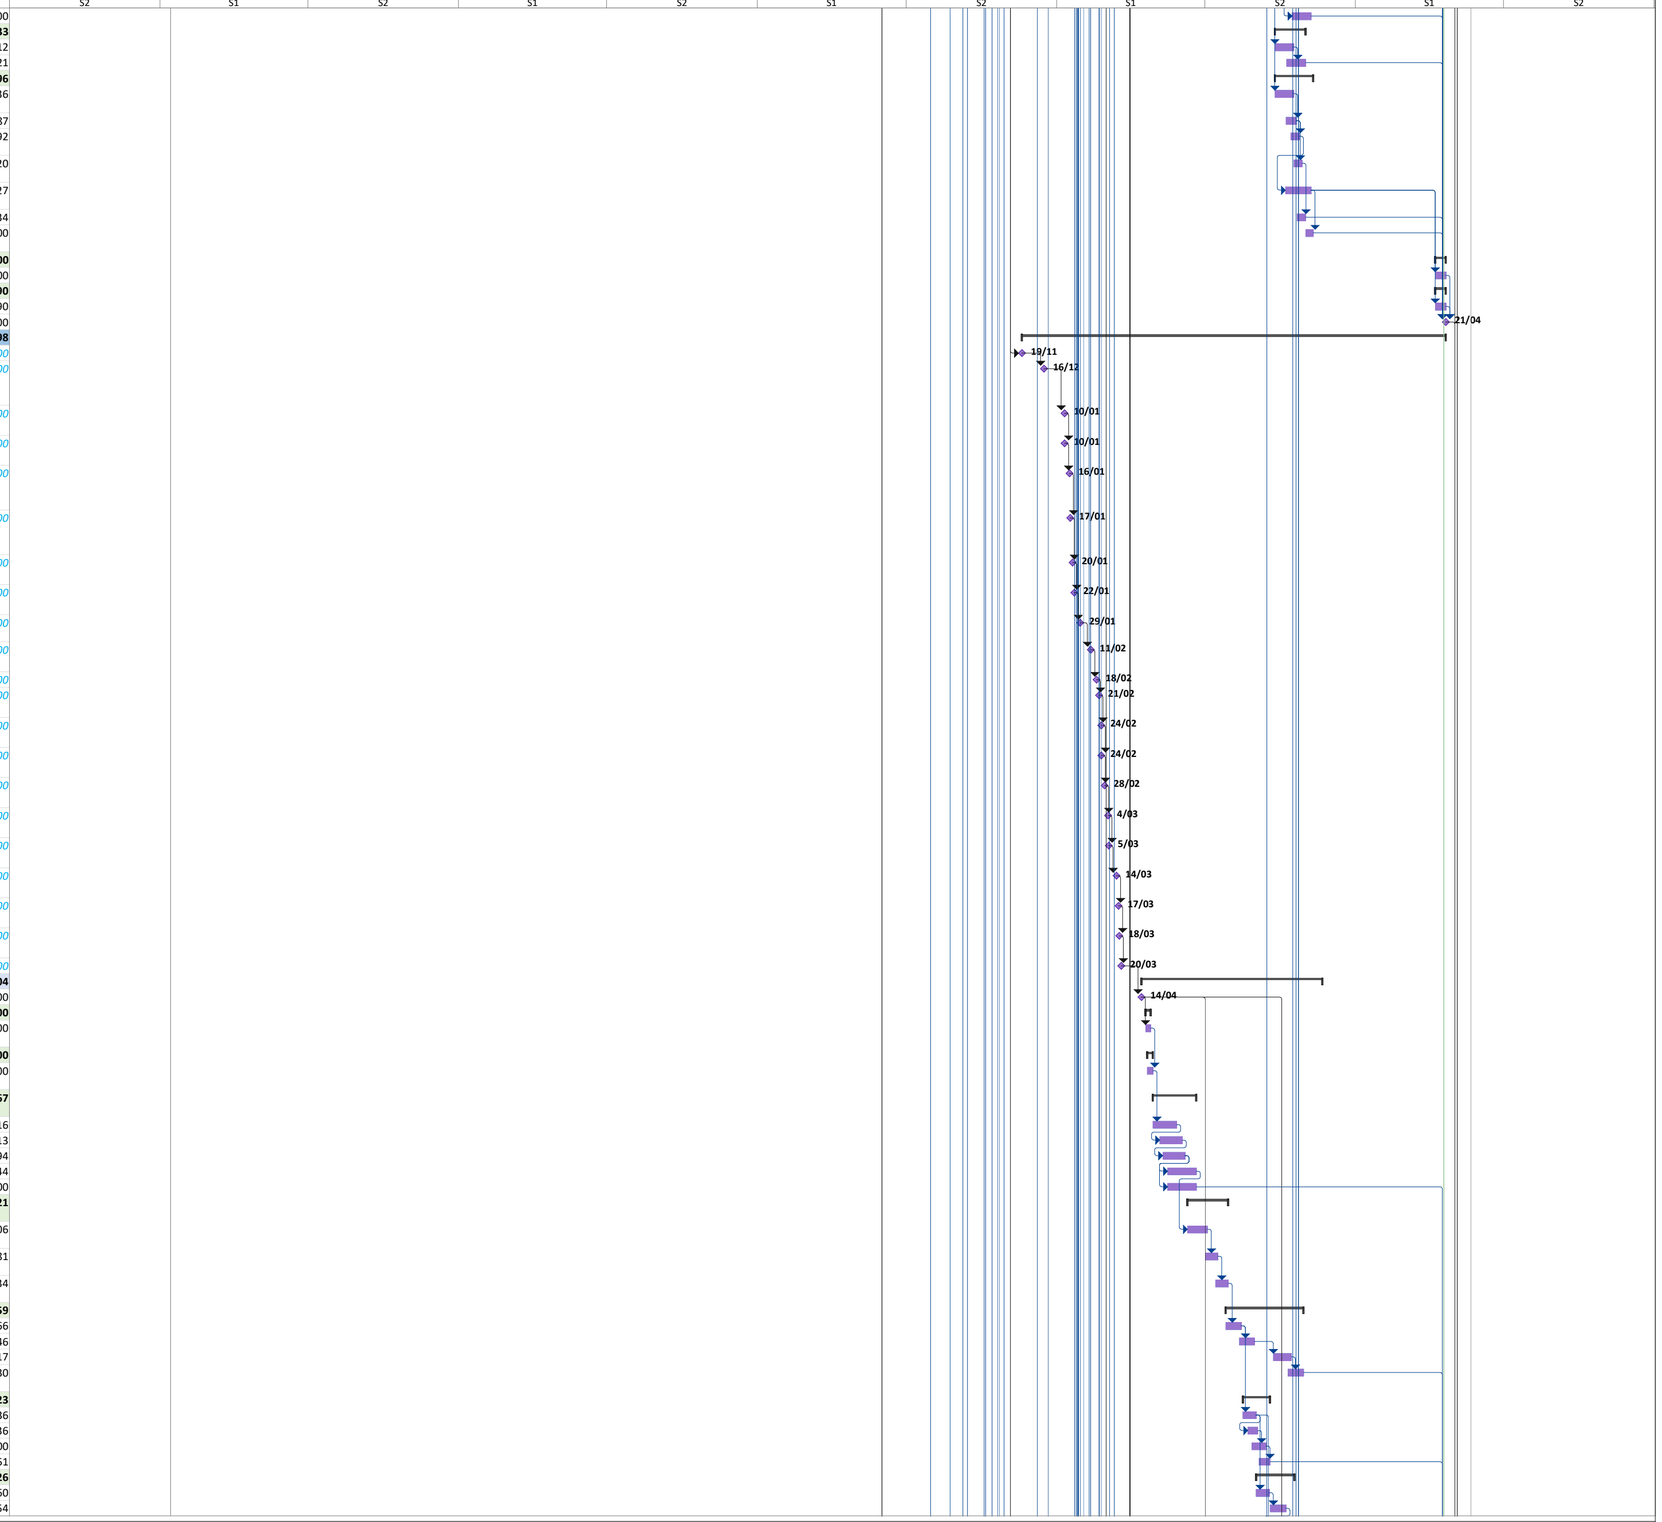

Proyecto:ID
Fecha: 14/1

Tarea	Resumen del proyecto	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Fecha límite	Tareas críticas		
División	Tareas externas	Resumen inactivo	Resumen manual	Tarea hito de sucesor controlado de ruta de acceso	División crítica		
Hito	Hito externo	Tarea manual	Sólo el comienzo	Tarea de resumen de sucesor controlado de ruta de a	Progreso		
Resumen	Tarea inactiva	Sólo duración	Sólo fin	Tarea normal de sucesor controlado de ruta de acces			


Id	Modo de tarea	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
1601		1.3.3.10.2.22.8.3	RELLENO DE DUCTERIAS	17 días	lun 22/09/25	vie 10/10/25	$11,006,555.12
1602		1.3.3.10.2.22.8.4	CONSTRUCCION DE CAJAS Y CAMARAS	20 días	jue 25/09/25	sáb 18/10/25	$28,117,848.00
1603		**1.3.3.10.2.22.9**	**ESPACIO PUBLICO**	**56 días**	**mar 16/09/25**	**vie 21/11/25**	**$177,471,482.08**
1604		1.3.3.10.2.22.9.1	DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y TRANSPORTES DE ESCOMBROS	20 días	mar 16/09/25	mié 8/10/25	$25,470,406.55
1605		1.3.3.10.2.22.9.2	INSTALACION DE GEOTEXTILES	14 días	sáb 27/09/25	mar 14/10/25	$4,360,539.55
1606		1.3.3.10.2.22.9.3	RELLENOS EN MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA ANDEN	14 días	jue 2/10/25	sáb 18/10/25	$13,871,439.18
1607		1.3.3.10.2.22.9.4	RELLENOS EN MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA RAMPAS	14 días	vie 3/10/25	mar 21/10/25	$13,332,749.20
1608		1.3.3.10.2.22.9.5	INSTALACION DE ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO Y PREFABRICADOS	41 días	lun 29/09/25	sáb 15/11/25	$92,147,185.26
1609		1.3.3.10.2.22.9.6	CONCRETO LOSAS MR	20 días	mié 8/10/25	vie 31/10/25	$22,150,139.34
1610		1.3.3.10.2.22.9.7	ELEMENTOS MOBILIARIO URBANO (CANECAS, BANCAS, ETC)	10 días	lun 10/11/25	vie 21/11/25	$6,139,023.00
1611		**1.3.3.10.2.23**	**FASE 2 CRUCE O BOCACALLE**	**41 días**	**vie 3/10/25**	**vie 21/11/25**	**$204,879,849.02**
1612		**1.3.3.10.2.23.1**	**REDES HIDROSANITARIAS ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL**	**17 días**	**vie 3/10/25**	**jue 23/10/25**	**$67,666,554.27**
1613		1.3.3.10.2.23.1.1	EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS	8 días	vie 3/10/25	sáb 11/10/25	$10,692,230.12
1614		1.3.3.10.2.23.1.2	INSTALACION DE TUBERIAS	8 días	mar 7/10/25	jue 16/10/25	$32,268,406.93
1615		1.3.3.10.2.23.1.3	RELLENO DE TUBERIAS	8 días	jue 9/10/25	lun 20/10/25	$13,952,862.06
1616		1.3.3.10.2.23.1.4	CONSTRUCCION DE POZOS Y SUMIDEROS	8 días	mar 14/10/25	jue 23/10/25	$10,753,055.16
1617		**1.3.3.10.2.23.2**	**PRELIMINARES - MOVIMIENTO DE TIERRAS, DEMOLICIONES Y RELLENOS**	**14 días**	**jue 23/10/25**	**lun 10/11/25**	**$26,202,441.65**
1618		1.3.3.10.2.23.2.1	DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y TRANSPORTES DE ESCOMBROS	8 días	jue 23/10/25	vie 31/10/25	$10,914,192.85
1619		1.3.3.10.2.23.2.2	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON RAJON Y SELLO DE RAJON	6 días	mié 29/10/25	jue 6/11/25	$570,355.00
1620		1.3.3.10.2.23.2.3	INSTALACION DE GEOTEXTILES Y RELLENO DE MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA	6 días	sáb 1/11/25	lun 10/11/25	$14,717,893.80
1621		**1.3.3.10.2.23.3**	**PAVIMENTOS**	**12 días**	**vie 7/11/25**	**vie 21/11/25**	**$111,010,853.10**
1622		1.3.3.10.2.23.3.1	BASES Y SUBBASES	4 días	vie 7/11/25	mar 11/11/25	$56,329,359.00
1623		1.3.3.10.2.23.3.2	MEZCLA ASFALTICA	4 días	vie 7/11/25	mié 12/11/25	$864,115.00
1624		1.3.3.10.2.23.3.3	CONCRETO LOSAS MR	6 días	mié 12/11/25	jue 20/11/25	$53,684,152.00
1625		1.3.3.10.2.23.3.4	INSTALACION DE ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO (BORDILLOS, SARDINELES	3 días	mar 18/11/25	vie 21/11/25	$133,227.10
1626		**1.3.3.10.2.24**	**FASE 3 ANDEN COSTADO ORIENTAL**	**251 días**	**mar 1/07/25**	**mar 21/04/26**	**$816,296,200.92**
1627		**1.3.3.10.2.24.1**	**REDES HIDROSANITARIAS ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL**	**28 días**	**mar 1/07/25**	**jue 31/07/25**	**$109,927,237.40**
1628		1.3.3.10.2.24.1.1	EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS	20 días	mar 1/07/25	mié 23/07/25	$14,808,201.70
1629		1.3.3.10.2.24.1.2	INSTALACION DE TUBERIAS	18 días	vie 4/07/25	vie 25/07/25	$43,001,414.02
1630		1.3.3.10.2.24.1.3	RELLENO DE TUBERIAS	18 días	mar 8/07/25	lun 28/07/25	$16,438,910.24
1631		1.3.3.10.2.24.1.4	CONSTRUCCION DE POZOS Y SUMIDEROS	23 días	lun 7/07/25	jue 31/07/25	$33,970,187.44
1632		1.3.3.10.2.24.1.5	CONSTRUCCIÓN CAJAS DE INSPECCIÓN	23 días	lun 7/07/25	jue 31/07/25	$1,708,524.00
1633		**1.3.3.10.2.24.2**	**PRELIMINARES - MOVIMIENTO DE TIERRAS, DEMOLICIONES Y RELLENOS**	**15 días**	**sáb 26/07/25**	**mié 13/08/25**	**$106,696,727.60**
1634		1.3.3.10.2.24.2.1	DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y TRANSPORTES DE ESCOMBROS	10 días	sáb 26/07/25	mié 6/08/25	$45,957,058.05
1635		1.3.3.10.2.24.2.2	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON RAJON Y SELLO DE RAJON	8 días	jue 31/07/25	lun 11/08/25	$27,811,271.31
1636		1.3.3.10.2.24.2.3	INSTALACION DE GEOTEXTILES Y RELLENO DE MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA	8 días	lun 4/08/25	mié 13/08/25	$32,928,398.24
1637		**1.3.3.10.2.24.3**	**PAVIMENTOS**	**47 días**	**sáb 23/08/25**	**jue 16/10/25**	**$239,508,484.87**
1638		1.3.3.10.2.24.3.1	BASES Y SUBBASES	8 días	sáb 23/08/25	mar 2/09/25	$127,771,765.17
1639		1.3.3.10.2.24.3.2	MEZCLA ASFALTICA	8 días	mié 27/08/25	jue 4/09/25	$3,435,227.46
1640		1.3.3.10.2.24.3.3	CONCRETO LOSAS MR	8 días	vie 3/10/25	sáb 11/10/25	$108,099,322.24
1641		1.3.3.10.2.24.3.4	INSTALACION DE ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO (BORDILLOS, SARDINELES	5 días	jue 9/10/25	jue 16/10/25	$202,170.00
1642		**1.3.3.10.2.24.4**	**REDES HIDROSANITARIAS ACUEDUCTO**	**17 días**	**jue 4/09/25**	**mar 23/09/25**	**$42,904,653.85**
1643		1.3.3.10.2.24.4.1	EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS	8 días	jue 4/09/25	vie 12/09/25	$8,331,052.80
1644		1.3.3.10.2.24.4.2	INSTALACION DE TUBERIAS	8 días	vie 5/09/25	lun 15/09/25	$15,189,234.54
1645		1.3.3.10.2.24.4.3	INSTALACION ACCESORIOS Y EMPATES	10 días	mié 10/09/25	sáb 20/09/25	$11,381,086.00
1646		1.3.3.10.2.24.4.4	RELLENO DE TUBERIAS	8 días	lun 15/09/25	mar 23/09/25	$8,003,280.51
1647		**1.3.3.10.2.24.5**	**REDES SECAS (Codensa)**	**32 días**	**mié 24/09/25**	**vie 31/10/25**	**$97,969,735.45**
1648		1.3.3.10.2.24.5.1	EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS	23 días	mié 24/09/25	mar 21/10/25	$11,003,714.60
1649		1.3.3.10.2.24.5.2	INSTALACION DE DUCTERIAS	19 días	jue 2/10/25	vie 24/10/25	$33,706,522.75
1650		1.3.3.10.2.24.5.3	RELLENO DE DUCTERIAS	19 días	vie 3/10/25	lun 27/10/25	$11,004,973.10
1651		1.3.3.10.2.24.5.4	CONSTRUCCION DE CAJAS Y CAMARAS	26 días	mié 1/10/25	vie 31/10/25	$42,254,525.00
1652		**1.3.3.10.2.24.6**	**REDES SECAS (ETB)**	**20 días**	**mié 15/10/25**	**vie 7/11/25**	**$28,617,271.00**
1653		1.3.3.10.2.24.6.1	NIVELACION DE CAJAS Y CAMARAS	20 días	mié 15/10/25	vie 7/11/25	$28,617,271.00
1654		**1.3.3.10.2.24.7**	**REDES SECAS (VANTI)**	**33 días**	**mié 24/09/25**	**vie 31/10/25**	**$5,793,902.03**
1655		1.3.3.10.2.24.7.1	EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS	20 días	mié 24/09/25	vie 17/10/25	$4,582,605.20
1656		1.3.3.10.2.24.7.2	RELLENO DE DUCTERIAS	20 días	mié 8/10/25	vie 31/10/25	$1,211,296.83
1657		**1.3.3.10.2.24.8**	**ESPACIO PUBLICO**	**39 días**	**mié 24/09/25**	**lun 10/11/25**	**$165,888,169.67**
1658		1.3.3.10.2.24.8.1	DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y TRANSPORTES DE ESCOMBROS	20 días	mié 24/09/25	vie 17/10/25	$25,469,852.96
1659		1.3.3.10.2.24.8.2	INSTALACION DE GEOTEXTILES	10 días	mié 8/10/25	lun 20/10/25	$4,360,426.86
1660		1.3.3.10.2.24.8.3	RELLENOS EN MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA ANDEN	10 días	mar 14/10/25	vie 24/10/25	$13,870,227.45
1661		1.3.3.10.2.24.8.4	RELLENOS EN MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA RAMPAS	8 días	vie 17/10/25	lun 27/10/25	$13,331,026.40
1662		1.3.3.10.2.24.8.5	INSTALACION DE ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO Y PREFABRICADOS	27 días	mar 7/10/25	vie 7/11/25	$75,057,427.56
1663		1.3.3.10.2.24.8.6	CONCRETO LOSAS MR	10 días	mar 21/10/25	vie 31/10/25	$9,199,297.44
1664		1.3.3.10.2.24.8.7	ELEMENTOS MOBILIARIO URBANO (CANECAS, BANCAS, ETC)	6 días	sáb 1/11/25	lun 10/11/25	$4,000,529.00
1665		1.3.3.10.2.24.8.8	CANALES DE DRENAJE MONOLITICO	11 días	sáb 25/10/25	vie 7/11/25	$20,599,382.00
1666		**1.3.3.10.2.24.9**	**PAISAJISMO**	**11 días**	**mié 8/04/26**	**mar 21/04/26**	**$1,364,004.00**
1667		1.3.3.10.2.24.9.1	PAISAJISMO	11 días	mié 8/04/26	mar 21/04/26	$1,364,004.00
1668		**1.3.3.10.2.24.10**	**SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN (HORIZONTAL Y VEF**	**11 días**	**mié 8/04/26**	**mar 21/04/26**	**$17,626,015.05**
1669		1.3.3.10.2.24.10.1	SEÑALIZACIÓN	11 días	mié 8/04/26	mar 21/04/26	$17,626,015.05
1670		1.3.3.10.2.24.11	INICIO CIV 16001651	0 días	mar 21/04/26	mar 21/04/26	$0.00
1671		**1.3.3.10.3**	**CIV 16001578**	**441 días**	**mar 19/11/24**	**mar 21/04/26**	**$2,371,863,854.24**
1672		*1.3.3.10.3.1*	*PERIODO ESTACIONAL HASTA EL 25-ENE-2025*	*0 días*	*mar 19/11/24*	*mar 19/11/24*	*$0.00*
1673		*1.3.3.10.3.2*	*REUNIÓN DE ACERCAMIENTO CON FESACOL Y SECRETARÍA DE GOBIERNO PARA SOCIALIZACIÓN OBRAS DE CIERRE DE LA CARRERA 38*	*0 días*	*lun 16/12/24*	*lun 16/12/24*	*$0.00*
1674		*1.3.3.10.3.3*	*SUBCONTRATISTA S&G ENTREGA A CSC BORRADOR DE PMT PARA PRIMER TRAMO DE CIERRE DE LA KR 38*	*0 días*	*vie 10/01/25*	*vie 10/01/25*	*$0.00*
1675		*1.3.3.10.3.4*	*CSC REALIZA AJUSTES A LA PROPUESTA DE PMT DE LA KR 38 ENTRE CL 6 Y CL 9 PARA ENTREGAR A*	*0 días*	*vie 10/01/25*	*vie 10/01/25*	*$0.00*

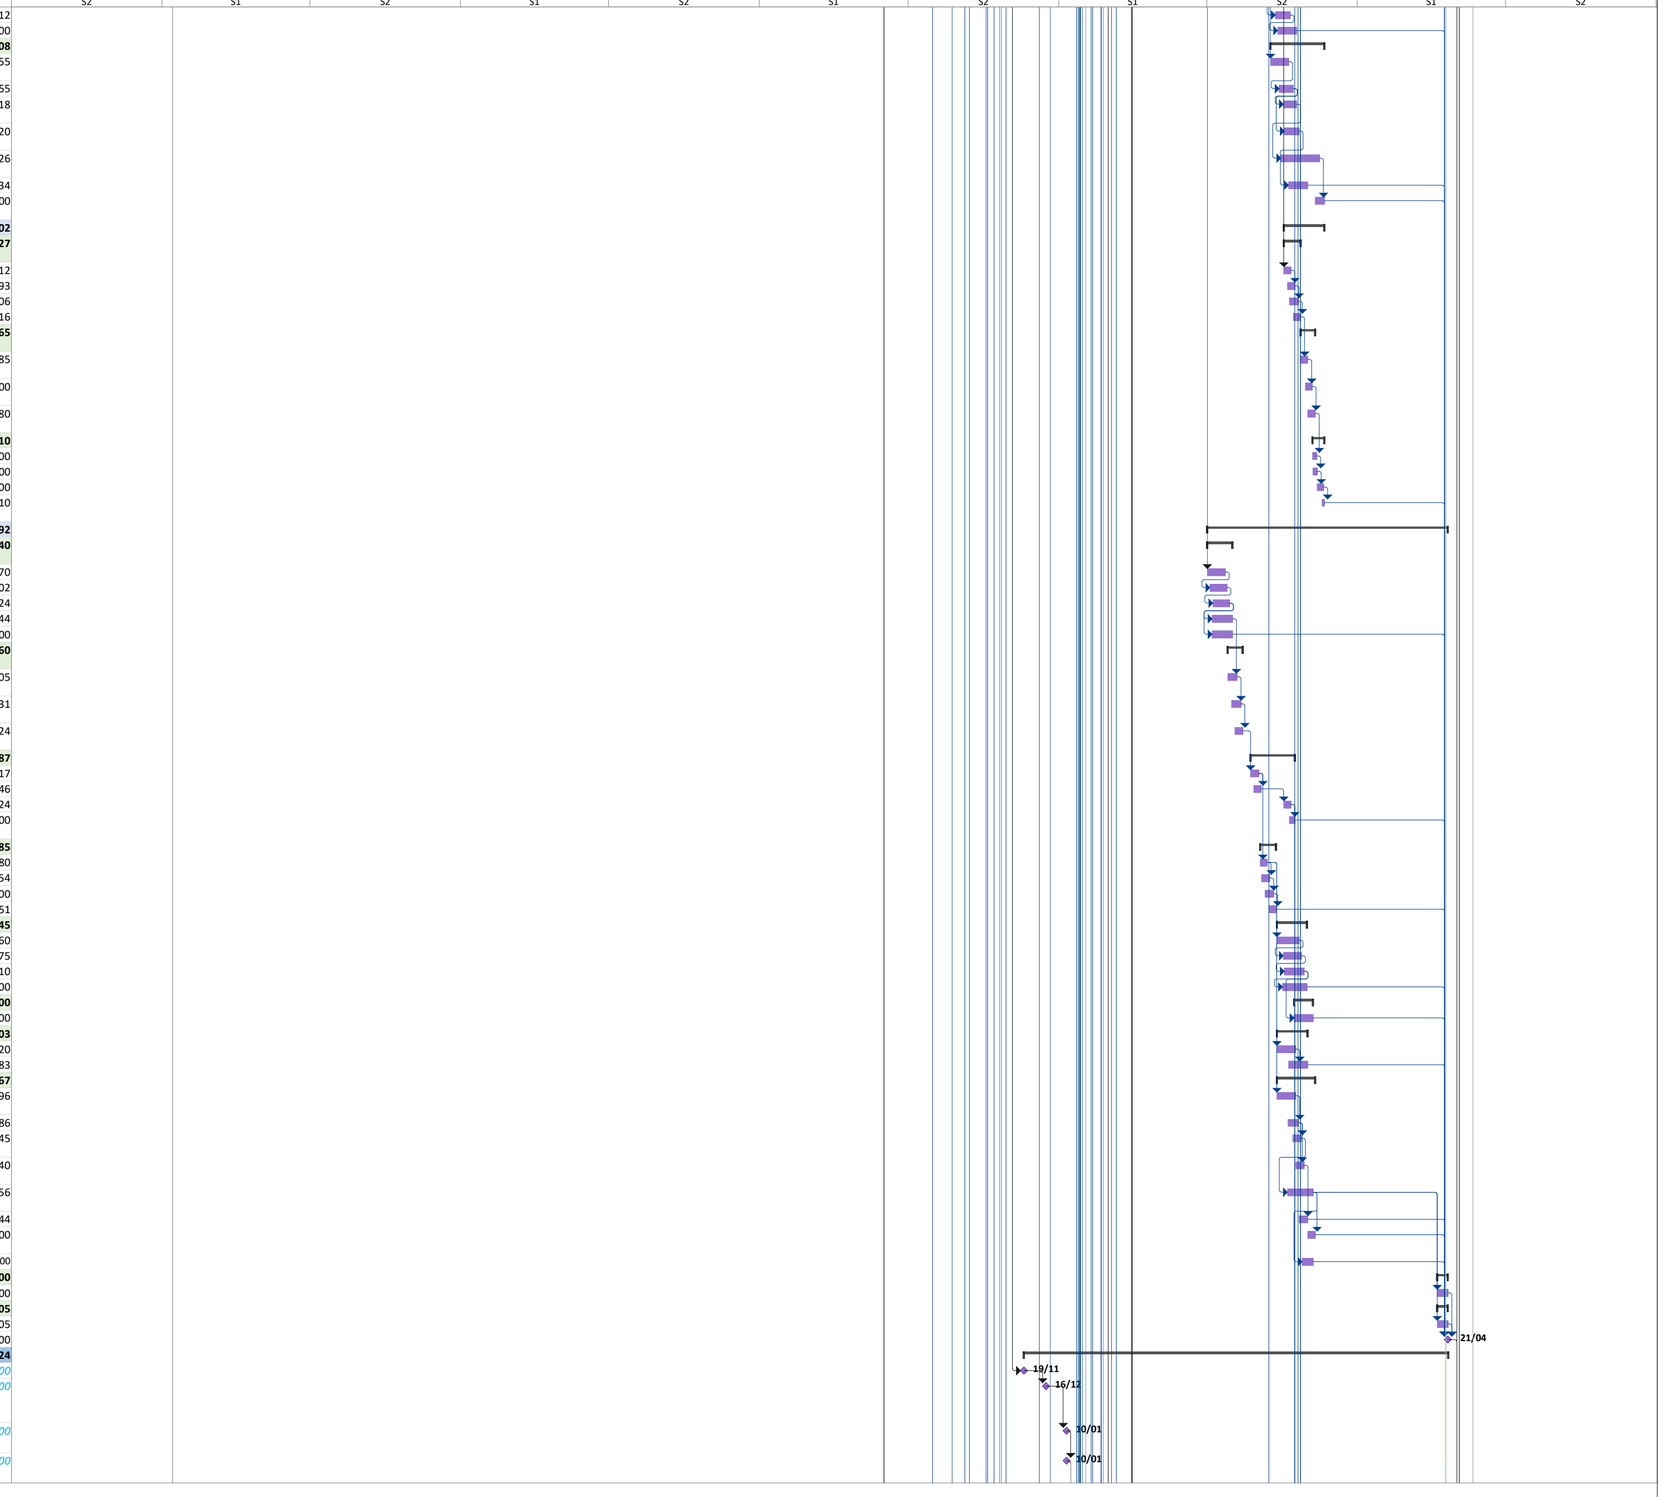

Proyecto:ID
Fecha: 14/1

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tareas externas
Hito externo
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
Sólo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
Sólo el comienzo
Sólo fin
Fecha límite
Tarea hito de sucesor controlado de ruta de acceso
Tarea de resumen de sucesor controlado de ruta de a
Tarea normal de sucesor controlado de ruta de acces
Tareas críticas
División crítica
Progreso


Id	Modo de tarea	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
1676		*1.3.3.10.3.5*	*SUBCONTRATISTA S&G ENTREGA A INTERVENTORÍA PARA REVISIÓN Y APROBACIÓN PMT PARA CIERRE KR 38 ENTRE CL 6 Y CL 9*	*0 días*	*jue 16/01/25*	*jue 16/01/25*	*$0.00*
1677		*1.3.3.10.3.6*	*SE RADICA EN SDM CON VISTO BUENO DE INTERVENTORÍA PMT PARA CIERRE KR 38 ENTRE CL 6 Y CL 9 MEDIANTE NÚMERO SDM_20256120016350*2*	*0 días*	*vie 17/01/25*	*vie 17/01/25*	*$0.00*
1678		*1.3.3.10.3.7*	*SUBCONTRATISTA S&G ENTREGA BORRADOR DE PMT PARA CIERRE DE LA KR 38 ENTRE CL 9 Y AV. CL 13*	*0 días*	*lun 20/01/25*	*lun 20/01/25*	*$0.00*
1679		*1.3.3.10.3.8*	*REUNIÓN SOCIALIZACIÓN PMT DE LA KR 38 ENTRE CL 6 Y CL 9 CON LÍDERES DE VENDEDORES INFORMALES UPZ*	*0 días*	*mié 22/01/25*	*mié 22/01/25*	*$0.00*
1680		*1.3.3.10.3.9*	*LA SDM ENVÍA OBSERVACIONES AL PMT DE LA KR 38 ENTRE CL 6 Y CL 9*	*0 días*	*mié 29/01/25*	*mié 29/01/25*	*$0.00*
1681		*1.3.3.10.3.10*	*SE REALIZAN AFOROS DE TRÁNSITO EN TERRENO KR 38 ENTRE CL 6 Y CL 9 CONFORME A OBSERVACIONES DE*	*0 días*	*mar 11/02/25*	*mar 11/02/25*	*$0.00*
1682		*1.3.3.10.3.11*	*ENTREGA RESULTADOS DE LOS AFOROS KR 38 ENTRE CL*	*0 días*	*mar 18/02/25*	*mar 18/02/25*	*$0.00*
1683		*1.3.3.10.3.12*	*SE SUBSANÓ A SDM LAS OBSERVACIONES ACERCA DEL PMT DE LA KR 38 ENTRE CL 6 Y CL 9*	*0 días*	*vie 21/02/25*	*vie 21/02/25*	*$0.00*
1684		*1.3.3.10.3.13*	*SE COTIZARON Y CONTRATARON ACTIVIDADES DE AFOROS DE TRÁNSITO PARA LA KR 38 ENTRE CL 9 Y AV.*	*0 días*	*lun 24/02/25*	*lun 24/02/25*	*$0.00*
1685		*1.3.3.10.3.14*	*CSC REALIZA AJUSTES A LA PROPUESTA DE PMT DE LA KR 38 ENTRE CL 6 Y AV CL 9*	*0 días*	*lun 24/02/25*	*lun 24/02/25*	*$0.00*
1686		*1.3.3.10.3.15*	*LA SDM NUEVAMENTE ENVÍA OBSERVACIONES ADICIONALES AL PMT DE LA KR 38 ENTRE CL 6 Y CL 9*	*0 días*	*vie 28/02/25*	*vie 28/02/25*	*$0.00*
1687		*1.3.3.10.3.16*	*EJECUCIÓN DE AFOROS DE TRÁNSITO DE LAS INTERSECCIONES DE LA KR 38 ENTRE CL 10 Y AV. CL 13*	*0 días*	*mar 4/03/25*	*mar 4/03/25*	*$0.00*
1688		*1.3.3.10.3.17*	*LA SDM NUEVAMENTE ENVÍA OBSERVACIONES ADICIONALES AL PMT DE LA KR 38 ENTRE CL 6 Y CL 9*	*0 días*	*mié 5/03/25*	*mié 5/03/25*	*$0.00*
1689		*1.3.3.10.3.18*	*LA SDM NUEVAMENTE ENVÍA OBSERVACIONES ADICIONALES AL PMT DE LA KR 38 ENTRE CL 6 Y CL 9*	*0 días*	*vie 14/03/25*	*vie 14/03/25*	*$0.00*
1690		*1.3.3.10.3.19*	*MESA DE TRABAJO ENTRE IDU, LA SDM, LA INTERVENTORÍA Y EL CSC PARA EL PMT DE LA KR 38*	*0 días*	*lun 17/03/25*	*lun 17/03/25*	*$0.00*
1691		*1.3.3.10.3.20*	*PENDIENTE S&G SUBSANE OBSERVACIONES MESA DE TRABAJO DEL 17/03/2025*	*0 días*	*mar 18/03/25*	*mar 18/03/25*	*$0.00*
1692		*1.3.3.10.3.21*	*APROBACIÓN PMT COSTADO ORIENTAL - CRUCE VEHICUL*	*0 días*	*jue 20/03/25*	*jue 20/03/25*	*$0.00*
1693		**1.3.3.10.3.22**	**FASE 1 CRUCE DE LA 9**	**304 días**	**lun 28/04/25**	**mar 21/04/26**	**$515,302,764.41**
1694		1.3.3.10.3.22.1	INICIO CIV 16001578	0 días	lun 28/04/25	lun 28/04/25	$0.00
1695		**1.3.3.10.3.22.2**	**TRAMITE DE PMT**	**6 días**	**mar 24/02/26**	**mar 3/03/26**	**$0.00**
1696		1.3.3.10.3.22.2.1	IMPLEMENTACIÓN PMT ESPECIFICIO Y CERRAMIENTO DE OBRA	6 días	mar 24/02/26	mar 3/03/26	$0.00
1697		**1.3.3.10.3.22.3**	**ACTIVIDADES DE ARQUEOLOGIA**	**6 días**	**mié 25/02/26**	**mié 4/03/26**	**$0.00**
1698		1.3.3.10.3.22.3.1	EXPLORACIÓN E INVESTIGACIÓN ARQUEOLOGICA EN LA ZONA DE INTERVENCIÓN	6 días	mié 25/02/26	mié 4/03/26	$0.00
1699		**1.3.3.10.3.22.4**	**REDES HIDROSANITARIAS ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL**	**17 días**	**mié 4/03/26**	**mar 24/03/26**	**$53,994,909.36**
1700		1.3.3.10.3.22.4.1	EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS	8 días	mié 4/03/26	vie 13/03/26	$5,600,744.16
1701		1.3.3.10.3.22.4.2	INSTALACION DE TUBERIAS	8 días	sáb 7/03/26	mar 17/03/26	$19,314,700.24
1702		1.3.3.10.3.22.4.3	RELLENO DE TUBERIAS	8 días	mié 11/03/26	jue 19/03/26	$6,866,521.88
1703		1.3.3.10.3.22.4.4	CONSTRUCCION DE POZOS Y SUMIDEROS	8 días	sáb 14/03/26	mar 24/03/26	$22,212,943.08
1704		**1.3.3.10.3.22.5**	**PRELIMINARES - MOVIMIENTO DE TIERRAS, DEMOLICIONES Y RELLENOS**	**14 días**	**mié 25/03/26**	**jue 9/04/26**	**$109,710,250.85**
1705		1.3.3.10.3.22.5.1	DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y TRANSPORTES DE ESCOMBROS	8 días	mié 25/03/26	jue 2/04/26	$43,215,790.25
1706		1.3.3.10.3.22.5.2	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON RAJON Y SELLO DE RAJON	6 días	lun 30/03/26	lun 6/04/26	$24,438,260.60
1707		1.3.3.10.3.22.5.3	INSTALACION DE GEOTEXTILES Y RELLENO DE MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA	6 días	jue 2/04/26	jue 9/04/26	$42,056,200.00
1708		**1.3.3.10.3.22.6**	**PAVIMENTOS**	**12 días**	**mar 7/04/26**	**mar 21/04/26**	**$351,597,604.20**
1709		1.3.3.10.3.22.6.1	BASES Y SUBBASES	4 días	mar 7/04/26	sáb 11/04/26	$178,576,053.00
1710		1.3.3.10.3.22.6.2	MEZCLA ASFALTICA	4 días	mié 8/04/26	lun 13/04/26	$2,627,615.00
1711		1.3.3.10.3.22.6.3	CONCRETO LOSAS MR	6 días	lun 13/04/26	lun 20/04/26	$170,190,184.00
1712		1.3.3.10.3.22.6.4	INSTALACION DE ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO (BORDILLOS, SARDINELES	3 días	vie 17/04/26	mar 21/04/26	$203,752.20
1713		**1.3.3.10.3.23**	**FASE 2 ANDEN COSTADO OCCIDENTAL**	**163 días**	**mar 13/05/25**	**vie 21/11/25**	**$831,838,520.79**
1714		**1.3.3.10.3.23.1**	**REDES HIDROSANITARIAS ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL**	**46 días**	**mar 13/05/25**	**mar 8/07/25**	**$178,397,602.90**
1715		1.3.3.10.3.23.1.1	EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS	25 días	mar 13/05/25	mié 11/06/25	$24,962,090.64
1716		1.3.3.10.3.23.1.2	INSTALACION DE TUBERIAS	23 días	mié 21/05/25	mar 17/06/25	$109,864,064.98
1717		1.3.3.10.3.23.1.3	RELLENO DE TUBERIAS	23 días	lun 26/05/25	sáb 21/06/25	$27,142,512.04
1718		1.3.3.10.3.23.1.4	CONSTRUCCION DE POZOS Y SUMIDEROS	30 días	vie 30/05/25	mar 8/07/25	$14,720,411.24
1719		1.3.3.10.3.23.1.5	CONSTRUCCIÓN CAJAS DE INSPECCIÓN	30 días	vie 30/05/25	mar 8/07/25	$1,708,524.00
1720		**1.3.3.10.3.23.2**	**PRELIMINARES - MOVIMIENTO DE TIERRAS, DEMOLICIONES Y RELLENOS**	**42 días**	**mié 25/06/25**	**mié 13/08/25**	**$120,693,149.66**
1721		1.3.3.10.3.23.2.1	DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y TRANSPORTES DE ESCOMBROS	20 días	mié 25/06/25	vie 18/07/25	$63,177,008.38
1722		1.3.3.10.3.23.2.2	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON RAJON Y SELLO DE RAJON	14 días	mar 15/07/25	jue 31/07/25	$32,528,589.58
1723		1.3.3.10.3.23.2.3	INSTALACION DE GEOTEXTILES Y RELLENO DE MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA	14 días	lun 28/07/25	mié 13/08/25	$24,987,551.70
1724		**1.3.3.10.3.23.3**	**PAVIMENTOS**	**61 días**	**mar 12/08/25**	**mar 21/10/25**	**$217,984,106.41**
1725		1.3.3.10.3.23.3.1	BASES Y SUBBASES	16 días	mar 12/08/25	sáb 30/08/25	$110,429,513.58
1726		1.3.3.10.3.23.3.2	MEZCLA ASFALTICA	16 días	mié 27/08/25	sáb 13/09/25	$1,632,401.41
1727		1.3.3.10.3.23.3.3	CONCRETO LOSAS MR	19 días	lun 15/09/25	lun 6/10/25	$105,734,935.12
1728		1.3.3.10.3.23.3.4	INSTALACION DE ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO (BORDILLOS, SARDINELES	15 días	vie 3/10/25	mar 21/10/25	$187,256.30
1729		**1.3.3.10.3.23.4**	**REDES HIDROSANITARIAS ACUEDUCTO**	**28 días**	**mar 2/09/25**	**jue 2/10/25**	**$47,449,813.92**
1730		1.3.3.10.3.23.4.1	EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS	12 días	mar 2/09/25	lun 15/09/25	$8,959,422.60
1731		1.3.3.10.3.23.4.2	INSTALACION DE TUBERIAS	10 días	vie 5/09/25	mié 17/09/25	$17,132,302.60
1732		1.3.3.10.3.23.4.3	INSTALACION ACCESORIOS Y EMPATES	16 días	mié 10/09/25	lun 29/09/25	$12,927,562.00
1733		1.3.3.10.3.23.4.4	RELLENO DE TUBERIAS	12 días	vie 19/09/25	jue 2/10/25	$8,430,526.72
1734		**1.3.3.10.3.23.5**	**REDES SECAS (Codensa)**	**42 días**	**lun 15/09/25**	**mar 4/11/25**	**$100,403,658.39**
1735		1.3.3.10.3.23.5.1	EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS	15 días	lun 15/09/25	jue 2/10/25	$12,537,074.32
1736		1.3.3.10.3.23.5.2	INSTALACION DE DUCTERIAS	17 días	vie 3/10/25	jue 23/10/25	$43,080,219.35
1737		1.3.3.10.3.23.5.3	RELLENO DE DUCTERIAS	17 días	mar 7/10/25	lun 27/10/25	$11,742,025.72
1738		1.3.3.10.3.23.5.4	CONSTRUCCION DE CAJAS Y CAMARAS	20 días	jue 9/10/25	mar 4/11/25	$33,044,339.00
1739		**1.3.3.10.3.23.6**	**ESPACIO PUBLICO**	**57 días**	**lun 15/09/25**	**vie 21/11/25**	**$166,910,189.51**
1740		1.3.3.10.3.23.6.1	DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y TRANSPORTES DE ESCOMBROS	20 días	lun 15/09/25	mar 7/10/25	$24,833,723.19
1741		1.3.3.10.3.23.6.2	INSTALACION DE GEOTEXTILES	14 días	vie 26/09/25	sáb 11/10/25	$4,254,498.26
1742		1.3.3.10.3.23.6.3	RELLENOS EN MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA ANDEN	14 días	mié 1/10/25	vie 17/10/25	$13,534,471.74
1743		1.3.3.10.3.23.6.4	RELLENOS EN MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA RAMPAS	14 días	vie 3/10/25	lun 20/10/25	$13,008,862.80

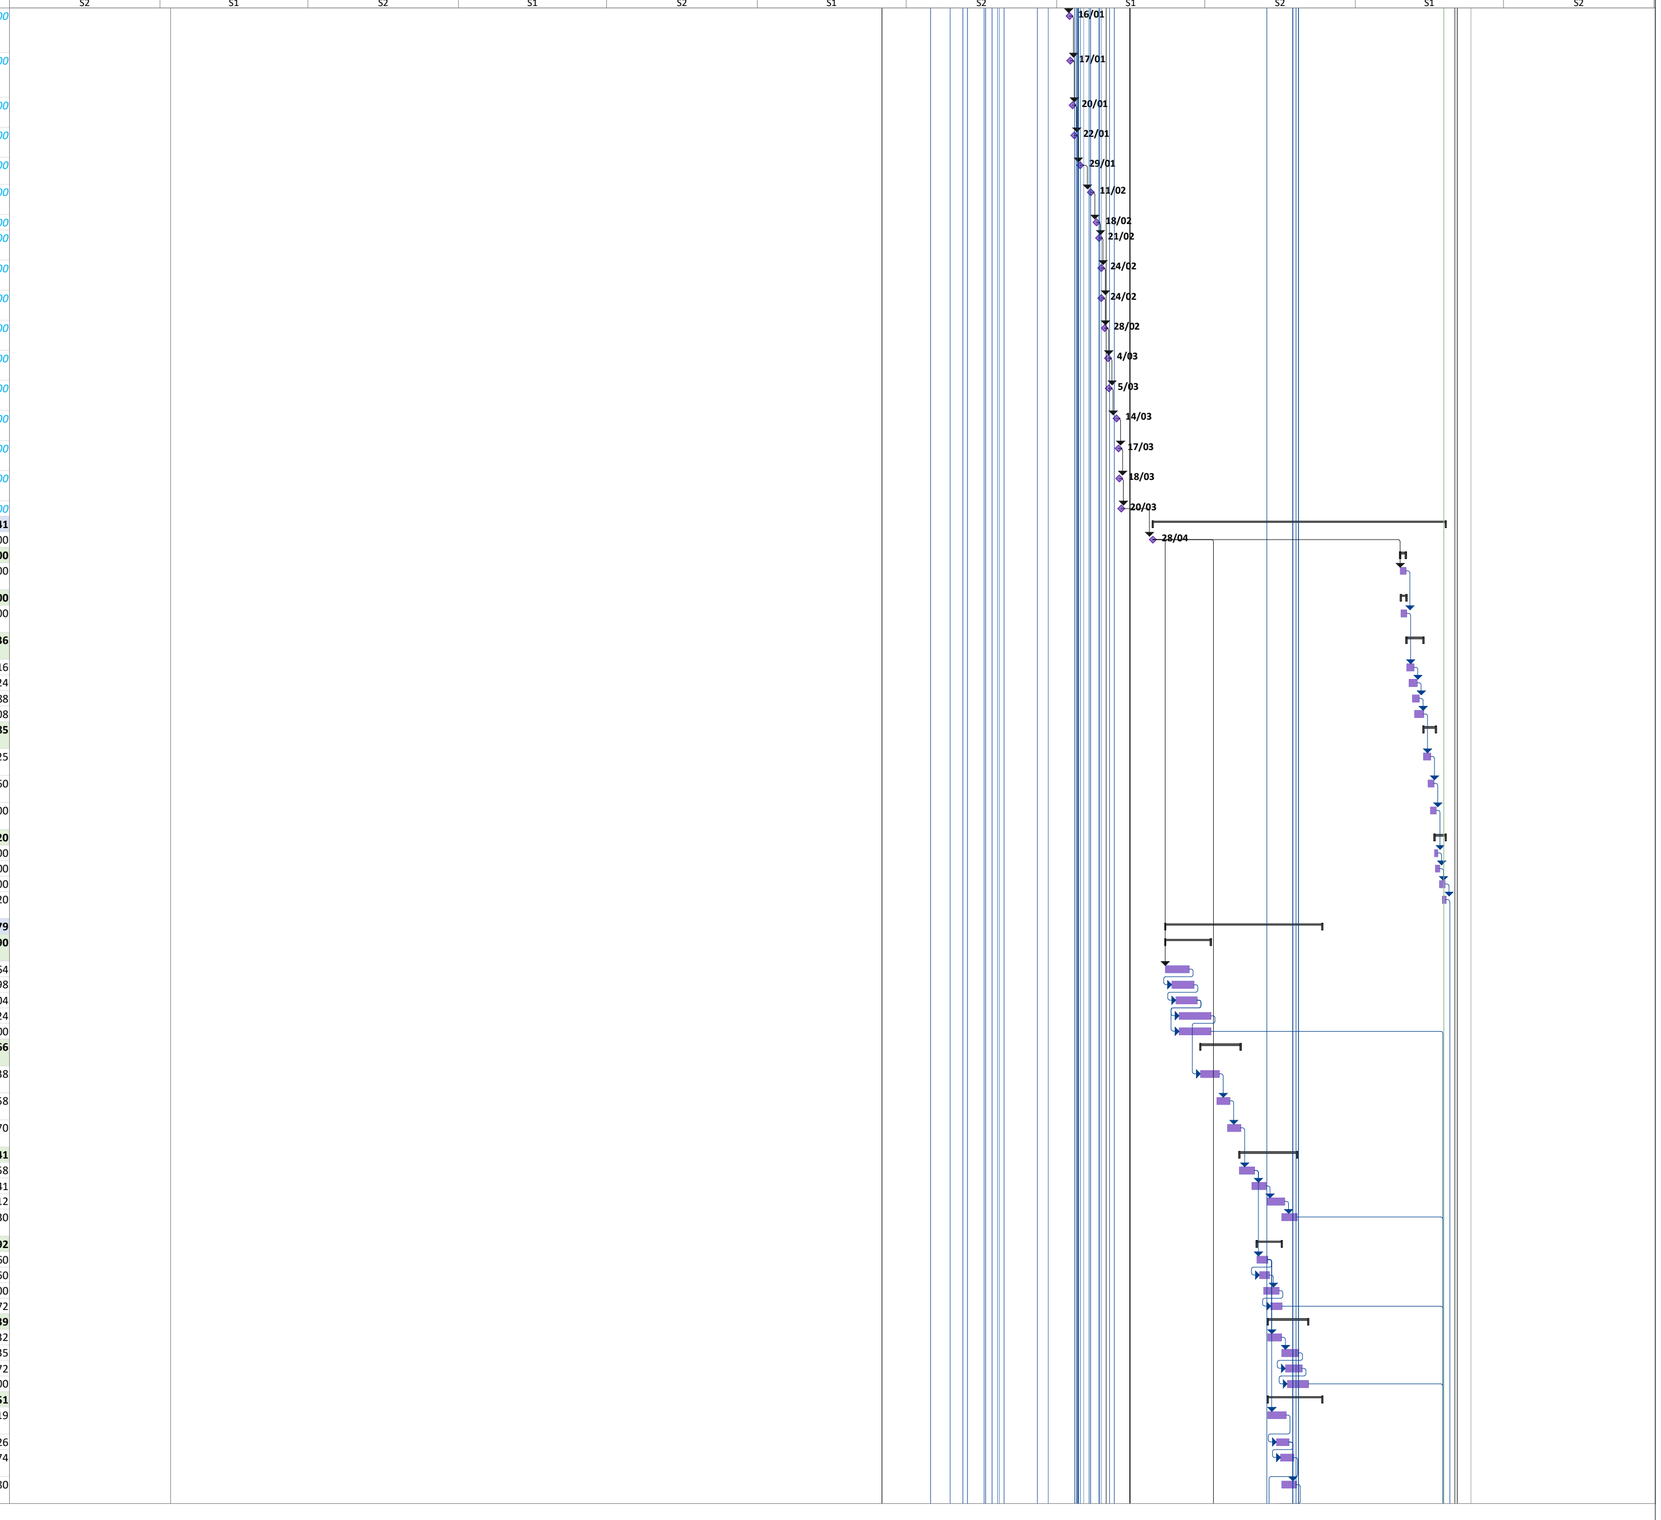

Proyecto:ID
Fecha: 14/1

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tareas externas
Hito externo
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
Sólo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
Sólo el comienzo
Sólo fin
Fecha límite
Tarea hito de sucesor controlado de ruta de acceso
Tarea de resumen de sucesor controlado de ruta de a
Tarea normal de sucesor controlado de ruta de acces
Tareas críticas
División crítica
Progreso

Id	Modo de tarea	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
1744		1.3.3.10.3.23.6.5	INSTALACION DE ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO Y PREFABRICADOS	41 días	sáb 27/09/25	vie 14/11/25	$83,678,245.32
1745		1.3.3.10.3.23.6.6	CONCRETO LOSAS MR	20 días	mié 8/10/25	vie 31/10/25	$21,461,365.20
1746		1.3.3.10.3.23.6.7	ELEMENTOS MOBILIARIO URBANO (CANECAS, BANCAS, ETC)	11 días	vie 7/11/25	vie 21/11/25	$6,139,023.00
1747		**1.3.3.10.3.24**	**FASE 3 ANDEN COSTADO ORIENTAL**	**242 días**	**vie 11/07/25**	**mar 21/04/26**	**$1,024,722,569.04**
1748		**1.3.3.10.3.24.1**	**REDES HIDROSANITARIAS ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL**	**28 días**	**vie 11/07/25**	**mié 13/08/25**	**$185,948,099.94**
1749		1.3.3.10.3.24.1.1	EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS	20 días	vie 11/07/25	lun 4/08/25	$24,961,486.36
1750		1.3.3.10.3.24.1.2	INSTALACION DE TUBERIAS	18 días	mié 16/07/25	mar 5/08/25	$109,860,150.74
1751		1.3.3.10.3.24.1.3	RELLENO DE TUBERIAS	18 días	vie 18/07/25	vie 8/08/25	$27,139,078.34
1752		1.3.3.10.3.24.1.4	CONSTRUCCION DE POZOS Y SUMIDEROS	23 días	jue 17/07/25	mié 13/08/25	$23,133,122.50
1753		1.3.3.10.3.24.1.5	CONSTRUCCIÓN CAJAS DE INSPECCIÓN	23 días	jue 17/07/25	mié 13/08/25	$854,262.00
1754		**1.3.3.10.3.24.2**	**PRELIMINARES - MOVIMIENTO DE TIERRAS, DEMOLICIONES Y RELLENOS**	**15 días**	**mié 6/08/25**	**mar 26/08/25**	**$120,690,527.08**
1755		1.3.3.10.3.24.2.1	DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y TRANSPORTES DE ESCOMBROS	10 días	mié 6/08/25	mié 20/08/25	$63,176,491.07
1756		1.3.3.10.3.24.2.2	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON RAJON Y SELLO DE RAJON	8 días	mar 12/08/25	vie 22/08/25	$32,528,568.88
1757		1.3.3.10.3.24.2.3	INSTALACION DE GEOTEXTILES Y RELLENO DE MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA	8 días	vie 15/08/25	mar 26/08/25	$24,985,467.13
1758		**1.3.3.10.3.24.3**	**PAVIMENTOS**	**67 días**	**jue 4/09/25**	**vie 21/11/25**	**$217,960,664.01**
1759		1.3.3.10.3.24.3.1	BASES Y SUBBASES	8 días	jue 4/09/25	vie 12/09/25	$110,417,528.61
1760		1.3.3.10.3.24.3.2	MEZCLA ASFALTICA	8 días	lun 8/09/25	mar 16/09/25	$1,632,366.14
1761		1.3.3.10.3.24.3.3	CONCRETO LOSAS MR	8 días	vie 7/11/25	mar 18/11/25	$105,723,512.96
1762		1.3.3.10.3.24.3.4	INSTALACION DE ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO (BORDILLOS, SARDINELES	5 días	vie 14/11/25	vie 21/11/25	$187,256.30
1763		**1.3.3.10.3.24.4**	**REDES HIDROSANITARIAS ACUEDUCTO**	**17 días**	**lun 15/09/25**	**vie 3/10/25**	**$50,969,897.34**
1764		1.3.3.10.3.24.4.1	EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS	8 días	lun 15/09/25	mié 24/09/25	$8,958,354.76
1765		1.3.3.10.3.24.4.2	INSTALACION DE TUBERIAS	8 días	mié 17/09/25	vie 26/09/25	$17,099,075.86
1766		1.3.3.10.3.24.4.3	INSTALACION ACCESORIOS Y EMPATES	10 días	sáb 20/09/25	jue 2/10/25	$16,481,940.00
1767		1.3.3.10.3.24.4.4	RELLENO DE TUBERIAS	8 días	jue 25/09/25	vie 3/10/25	$8,430,526.72
1768		**1.3.3.10.3.24.5**	**REDES SECAS (Codensa)**	**32 días**	**lun 6/10/25**	**mié 12/11/25**	**$107,485,523.74**
1769		1.3.3.10.3.24.5.1	EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS	23 días	lun 6/10/25	vie 31/10/25	$12,536,610.76
1770		1.3.3.10.3.24.5.2	INSTALACION DE DUCTERIAS	19 días	mar 14/10/25	jue 6/11/25	$43,079,782.41
1771		1.3.3.10.3.24.5.3	RELLENO DE DUCTERIAS	19 días	jue 16/10/25	vie 7/11/25	$11,740,460.57
1772		1.3.3.10.3.24.5.4	CONSTRUCCION DE CAJAS Y CAMARAS	26 días	mar 14/10/25	mié 12/11/25	$40,128,670.00
1773		**1.3.3.10.3.24.6**	**REDES SECAS (ETB)**	**20 días**	**lun 27/10/25**	**jue 20/11/25**	**$25,846,997.00**
1774		1.3.3.10.3.24.6.1	NIVELACION DE CAJAS Y CAMARAS	20 días	lun 27/10/25	jue 20/11/25	$25,846,997.00
1775		**1.3.3.10.3.24.7**	**REDES SECAS (VANTI)**	**33 días**	**lun 6/10/25**	**jue 13/11/25**	**$1,705,038.74**
1776		1.3.3.10.3.24.7.1	EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS	20 días	lun 6/10/25	mié 29/10/25	$1,364,368.36
1777		1.3.3.10.3.24.7.2	RELLENO DE DUCTERIAS	20 días	mar 21/10/25	jue 13/11/25	$340,670.38
1778		**1.3.3.10.3.24.8**	**ESPACIO PUBLICO**	**39 días**	**lun 6/10/25**	**vie 21/11/25**	**$300,145,712.99**
1779		1.3.3.10.3.24.8.1	DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y TRANSPORTES DE ESCOMBROS	20 días	lun 6/10/25	mié 29/10/25	$24,833,029.21
1780		1.3.3.10.3.24.8.2	INSTALACION DE GEOTEXTILES	10 días	lun 20/10/25	vie 31/10/25	$4,254,385.57
1781		1.3.3.10.3.24.8.3	RELLENOS EN MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA ANDEN	10 días	vie 24/10/25	jue 6/11/25	$13,533,260.01
1782		1.3.3.10.3.24.8.4	RELLENOS EN MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA RAMPAS	8 días	mié 29/10/25	vie 7/11/25	$13,007,140.00
1783		1.3.3.10.3.24.8.5	INSTALACION DE ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO Y PREFABRICADOS	27 días	sáb 18/10/25	jue 20/11/25	$99,499,126.62
1784		1.3.3.10.3.24.8.6	CONCRETO LOSAS MR	10 días	sáb 1/11/25	jue 13/11/25	$12,819,233.58
1785		1.3.3.10.3.24.8.7	ELEMENTOS MOBILIARIO URBANO (CANECAS, BANCAS, ETC)	6 días	jue 13/11/25	vie 21/11/25	$4,266,534.00
1786		1.3.3.10.3.24.8.8	CONSTRUCCION CANALES DE DRENAJE	11 días	vie 7/11/25	jue 20/11/25	$127,933,004.00
1787		**1.3.3.10.3.24.9**	**PAISAJISMO**	**11 días**	**jue 9/04/26**	**mar 21/04/26**	**$1,193,746.00**
1788		1.3.3.10.3.24.9.1	PAISAJISMO	11 días	jue 9/04/26	mar 21/04/26	$1,193,746.00
1789		**1.3.3.10.3.24.10**	**SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN (HORIZONTAL Y VEF**	**11 días**	**jue 9/04/26**	**mar 21/04/26**	**$12,776,362.20**
1790		1.3.3.10.3.24.10.1	SEÑALIZACIÓN	11 días	jue 9/04/26	mar 21/04/26	$12,776,362.20
1791		1.3.3.10.3.24.11	INICIO CIV 16001578	0 días	mar 21/04/26	mar 21/04/26	$0.00
1792		**1.3.3.10.4**	**CIV 16001474**	**348 días**	**jue 6/03/25**	**mar 21/04/26**	**$2,217,239,167.66**
1793		*1.3.3.10.4.1*	*PRESENTACIÓN PMT A INTERVENTORÍA*	*0 días*	*jue 6/03/25*	*jue 6/03/25*	*$0.00*
1794		*1.3.3.10.4.2*	*RADICACIÓN A LA SDM*	*0 días*	*vie 7/03/25*	*vie 7/03/25*	*$0.00*
1795		*1.3.3.10.4.3*	*OBSERVACIONES POR PARTE DE LA SDM AL PMT*	*0 días*	*mar 25/03/25*	*mar 25/03/25*	*$0.00*
1796		*1.3.3.10.4.4*	*ATENCIÓN DE OBSERVACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA AL PMT*	*0 días*	*vie 11/04/25*	*vie 11/04/25*	*$0.00*
1797		*1.3.3.10.4.5*	*OBSERVACIONES POR PARTE DE LA SDM AL PMT*	*0 días*	*mié 30/04/25*	*mié 30/04/25*	*$0.00*
1798		*1.3.3.10.4.6*	*ATENCIÓN DE OBSERVACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA AL PMT*	*0 días*	*lun 19/05/25*	*lun 19/05/25*	*$0.00*
1799		*1.3.3.10.4.7*	*APROBACIÓN DEL PMT*	*0 días*	*mar 20/05/25*	*mar 20/05/25*	*$0.00*
1800		**1.3.3.10.4.8**	**FASE 1 ANDEN COSTADO OCCIDENTAL**	**156 días**	**mié 21/05/25**	**vie 21/11/25**	**$779,059,924.34**
1801		1.3.3.10.4.8.1	INICIO CIV 16001474	0 días	mié 21/05/25	mié 21/05/25	$0.00
1802		**1.3.3.10.4.8.2**	**TRAMITE DE PMT**	**6 días**	**sáb 24/05/25**	**vie 30/05/25**	**$0.00**
1803		1.3.3.10.4.8.2.1	IMPLEMENTACIÓN PMT ESPECIFICIO Y CERRAMIENTO DE OBRA	6 días	sáb 24/05/25	vie 30/05/25	$0.00
1804		**1.3.3.10.4.8.3**	**ACTIVIDADES DE ARQUEOLOGIA**	**6 días**	**sáb 24/05/25**	**vie 30/05/25**	**$0.00**
1805		1.3.3.10.4.8.3.1	EXPLORACIÓN E INVESTIGACIÓN ARQUEOLOGICA EN LA ZONA DE INTERVENCIÓN	6 días	sáb 24/05/25	vie 30/05/25	$0.00
1806		**1.3.3.10.4.8.4**	**REDES HIDROSANITARIAS ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL**	**58 días**	**vie 30/05/25**	**vie 8/08/25**	**$86,529,636.22**
1807		1.3.3.10.4.8.4.1	EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS	25 días	vie 30/05/25	mié 2/07/25	$10,150,691.84
1808		1.3.3.10.4.8.4.2	INSTALACION DE TUBERIAS	23 días	lun 9/06/25	mar 8/07/25	$29,399,453.16
1809		1.3.3.10.4.8.4.3	RELLENO DE TUBERIAS	23 días	vie 13/06/25	vie 11/07/25	$24,090,254.04
1810		1.3.3.10.4.8.4.4	CONSTRUCCION DE POZOS Y SUMIDEROS	30 días	jue 19/06/25	vie 25/07/25	$22,034,975.18
1811		1.3.3.10.4.8.4.5	CONSTRUCCIÓN CAJAS DE INSPECCIÓN	30 días	vie 4/07/25	vie 8/08/25	$854,262.00
1812		**1.3.3.10.4.8.5**	**PRELIMINARES - MOVIMIENTO DE TIERRAS, DEMOLICIONES Y RELLENOS**	**42 días**	**lun 14/07/25**	**mar 2/09/25**	**$90,608,898.95**
1813		1.3.3.10.4.8.5.1	DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y TRANSPORTES DE ESCOMBROS	20 días	lun 14/07/25	mar 5/08/25	$35,268,538.50
1814		1.3.3.10.4.8.5.2	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON RAJON Y SELLO DE RAJON	14 días	vie 1/08/25	mié 20/08/25	$20,970,204.31
1815		1.3.3.10.4.8.5.3	INSTALACION DE GEOTEXTILES Y RELLENO DE MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA	14 días	vie 15/08/25	mar 2/09/25	$34,370,156.14
1816		**1.3.3.10.4.8.6**	**PAVIMENTOS**	**71 días**	**sáb 30/08/25**	**vie 21/11/25**	**$245,497,128.04**
1817		1.3.3.10.4.8.6.1	BASES Y SUBBASES	13 días	sáb 30/08/25	sáb 13/09/25	$125,159,041.71
1818		1.3.3.10.4.8.6.2	MEZCLA ASFALTICA	16 días	mié 10/09/25	lun 29/09/25	$1,826,950.73
1819		1.3.3.10.4.8.6.3	CONCRETO LOSAS MR	16 días	mié 22/10/25	mar 11/11/25	$118,333,577.60
1820		1.3.3.10.4.8.6.4	INSTALACION DE ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO (BORDILLOS, SARDINELES	11 días	vie 7/11/25	vie 21/11/25	$177,558.00
1821		**1.3.3.10.4.8.7**	**REDES HIDROSANITARIAS ACUEDUCTO**	**28 días**	**mar 16/09/25**	**sáb 18/10/25**	**$50,895,557.64**
1822		1.3.3.10.4.8.7.1	EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS	12 días	mar 16/09/25	mar 30/09/25	$10,404,135.08
1823		1.3.3.10.4.8.7.2	INSTALACION DE TUBERIAS	10 días	sáb 20/09/25	jue 2/10/25	$15,463,200.22

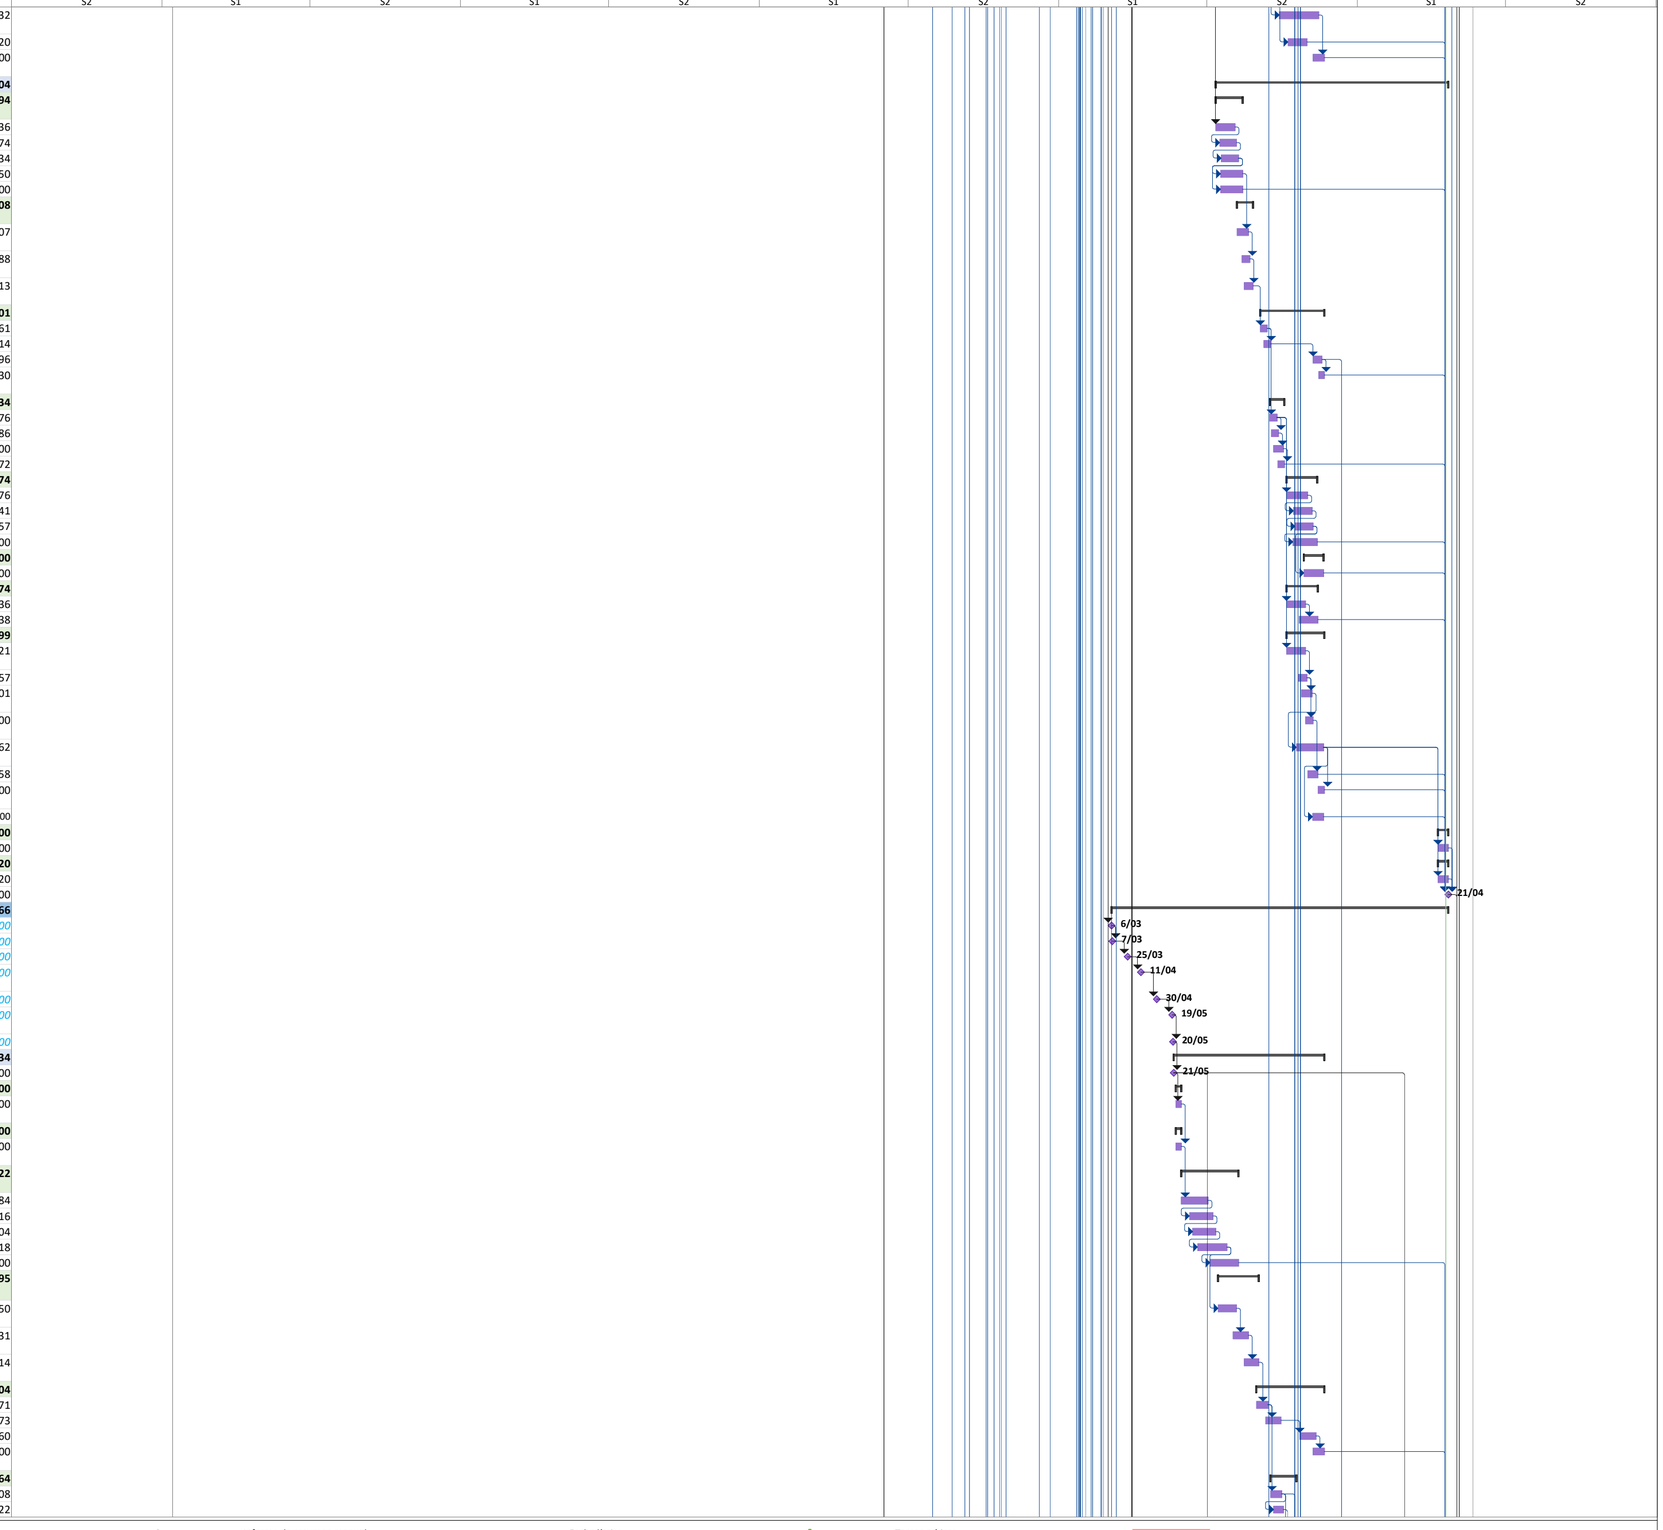

Proyecto:ID
Fecha: 14/1

Tarea	Resumen del proyecto	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Fecha límite	Tareas críticas
División	Tareas externas	Resumen inactivo	Resumen manual	Tarea hito de sucesor controlado de ruta de acceso	División crítica
Hito	Hito externo	Tarea manual	Sólo el comienzo	Tarea de resumen de sucesor controlado de ruta de a	Progreso
Resumen	Tarea inactiva	Sólo duración	Sólo fin	Tarea normal de sucesor controlado de ruta de acces	


Id	Modo de tarea	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
1824		1.3.3.10.4.8.7.3	INSTALACION ACCESORIOS Y EMPATES	16 días	jue 25/09/25	mar 14/10/25	$15,766,087.00
1825		1.3.3.10.4.8.7.4	RELLENO DE TUBERIAS	12 días	vie 3/10/25	sáb 18/10/25	$9,262,135.34
1826		**1.3.3.10.4.8.8**	**REDES SECAS (Codensa)**	**42 días**	**mar 30/09/25**	**mié 19/11/25**	**$112,977,845.51**
1827		1.3.3.10.4.8.8.1	EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS	15 días	mar 30/09/25	vie 17/10/25	$12,388,570.12
1828		1.3.3.10.4.8.8.2	INSTALACION DE DUCTERIAS	17 días	sáb 18/10/25	vie 7/11/25	$36,163,692.55
1829		1.3.3.10.4.8.8.3	RELLENO DE DUCTERIAS	17 días	mié 22/10/25	mar 11/11/25	$11,729,455.84
1830		1.3.3.10.4.8.8.4	CONSTRUCCION DE CAJAS Y CAMARAS	20 días	sáb 25/10/25	mié 19/11/25	$52,696,127.00
1831		**1.3.3.10.4.8.9**	**ESPACIO PUBLICO**	**30 días**	**jue 16/10/25**	**vie 21/11/25**	**$192,550,857.98**
1832		1.3.3.10.4.8.9.1	DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y TRANSPORTES DE ESCOMBROS	15 días	jue 16/10/25	mar 4/11/25	$35,648,288.00
1833		1.3.3.10.4.8.9.2	INSTALACION DE GEOTEXTILES	11 días	mié 22/10/25	mié 5/11/25	$6,161,776.51
1834		1.3.3.10.4.8.9.3	RELLENOS EN MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA ANDEN	11 días	jue 23/10/25	jue 6/11/25	$38,442,008.48
1835		1.3.3.10.4.8.9.4	INSTALACION DE ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO Y PREFABRICADOS	25 días	mié 22/10/25	vie 21/11/25	$105,893,756.99
1836		1.3.3.10.4.8.9.5	ELEMENTOS MOBILIARIO URBANO (CANECAS, BANCAS, ETC)	8 días	mié 12/11/25	vie 21/11/25	$6,405,028.00
1837		**1.3.3.10.4.9**	**FASE 2 ANDEN COSTADO ORIENTAL**	**252 días**	**mar 1/07/25**	**mar 21/04/26**	**$940,004,220.59**
1838		**1.3.3.10.4.9.1**	**REDES HIDROSANITARIAS ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL**	**28 días**	**mar 1/07/25**	**jue 31/07/25**	**$90,275,852.85**
1839		1.3.3.10.4.9.1.1	EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS	20 días	mar 1/07/25	mié 23/07/25	$10,150,087.56
1840		1.3.3.10.4.9.1.2	INSTALACION DE TUBERIAS	18 días	vie 4/07/25	vie 25/07/25	$29,389,723.37
1841		1.3.3.10.4.9.1.3	RELLENO DE TUBERIAS	18 días	mar 8/07/25	lun 28/07/25	$24,086,820.34
1842		1.3.3.10.4.9.1.4	CONSTRUCCION DE POZOS Y SUMIDEROS	23 días	lun 7/07/25	jue 31/07/25	$25,794,959.58
1843		1.3.3.10.4.9.1.5	CONSTRUCCIÓN CAJAS DE INSPECCIÓN	23 días	lun 7/07/25	jue 31/07/25	$854,262.00
1844		**1.3.3.10.4.9.2**	**PRELIMINARES - MOVIMIENTO DE TIERRAS, DEMOLICIONES Y RELLENOS**	**15 días**	**vie 21/11/25**	**mié 10/12/25**	**$90,892,474.58**
1845		1.3.3.10.4.9.2.1	DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y TRANSPORTES DE ESCOMBROS	10 días	vie 21/11/25	mié 3/12/25	$35,555,942.20
1846		1.3.3.10.4.9.2.2	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON RAJON Y SELLO DE RAJON	8 días	mié 26/11/25	vie 5/12/25	$20,968,460.81
1847		1.3.3.10.4.9.2.3	INSTALACION DE GEOTEXTILES Y RELLENO DE MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA	8 días	sáb 29/11/25	mié 10/12/25	$34,368,071.57
1848		**1.3.3.10.4.9.3**	**PAVIMENTOS**	**56 días**	**jue 18/12/25**	**lun 23/02/26**	**$245,485,670.61**
1849		1.3.3.10.4.9.3.1	BASES Y SUBBASES	8 días	jue 18/12/25	lun 29/12/25	$125,159,041.71
1850		1.3.3.10.4.9.3.2	MEZCLA ASFALTICA	8 días	lun 22/12/25	vie 2/01/26	$1,826,915.46
1851		1.3.3.10.4.9.3.3	CONCRETO LOSAS MR	8 días	mié 11/02/26	jue 19/02/26	$118,322,155.44
1852		1.3.3.10.4.9.3.4	INSTALACION DE ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO (BORDILLOS, SARDINELES	5 días	mié 18/02/26	lun 23/02/26	$177,558.00
1853		**1.3.3.10.4.9.4**	**REDES HIDROSANITARIAS ACUEDUCTO**	**17 días**	**lun 9/03/26**	**sáb 28/03/26**	**$46,839,124.91**
1854		1.3.3.10.4.9.4.1	EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS	8 días	lun 9/03/26	mié 18/03/26	$10,403,671.52
1855		1.3.3.10.4.9.4.2	INSTALACION DE TUBERIAS	8 días	mié 11/03/26	jue 19/03/26	$15,458,409.05
1856		1.3.3.10.4.9.4.3	INSTALACION ACCESORIOS Y EMPATES	10 días	sáb 14/03/26	jue 26/03/26	$11,714,909.00
1857		1.3.3.10.4.9.4.4	RELLENO DE TUBERIAS	8 días	jue 19/03/26	sáb 28/03/26	$9,262,135.34
1858		**1.3.3.10.4.9.5**	**REDES SECAS (Codensa)**	**29 días**	**mié 18/03/26**	**mar 21/04/26**	**$133,736,911.08**
1859		1.3.3.10.4.9.5.1	EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS	10 días	mié 18/03/26	lun 30/03/26	$12,388,106.56
1860		1.3.3.10.4.9.5.2	INSTALACION DE DUCTERIAS	15 días	jue 19/03/26	mar 7/04/26	$36,159,114.85
1861		1.3.3.10.4.9.5.3	RELLENO DE DUCTERIAS	13 días	vie 27/03/26	sáb 11/04/26	$11,726,308.67
1862		1.3.3.10.4.9.5.4	CONSTRUCCION DE CAJAS Y CAMARAS	21 días	vie 27/03/26	mar 21/04/26	$73,463,381.00
1863		**1.3.3.10.4.9.6**	**REDES SECAS (ETB)**	**18 días**	**mié 1/04/26**	**mar 21/04/26**	**$20,843,985.00**
1864		1.3.3.10.4.9.6.1	NIVELACION DE CAJAS Y CAMARAS	18 días	mié 1/04/26	mar 21/04/26	$20,843,985.00
1865		**1.3.3.10.4.9.7**	**ESPACIO PUBLICO**	**38 días**	**sáb 7/03/26**	**mar 21/04/26**	**$192,544,564.96**
1866		1.3.3.10.4.9.7.1	DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y TRANSPORTES DE ESCOMBROS	15 días	sáb 7/03/26	mié 25/03/26	$35,647,734.41
1867		1.3.3.10.4.9.7.2	INSTALACION DE GEOTEXTILES	11 días	mar 17/03/26	lun 30/03/26	$6,161,663.82
1868		1.3.3.10.4.9.7.3	RELLENOS EN MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA ANDEN	11 días	mié 25/03/26	lun 6/04/26	$38,440,285.68
1869		1.3.3.10.4.9.7.4	INSTALACION DE ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO Y PREFABRICADOS	24 días	jue 19/03/26	jue 16/04/26	$105,889,853.05
1870		1.3.3.10.4.9.7.5	ELEMENTOS MOBILIARIO URBANO (CANECAS, BANCAS, ETC)	8 días	sáb 11/04/26	mar 21/04/26	$6,405,028.00
1871		**1.3.3.10.4.9.8**	**PAISAJISMO**	**9 días**	**vie 10/04/26**	**mar 21/04/26**	**$1,875,554.00**
1872		1.3.3.10.4.9.8.1	PAISAJISMO	9 días	vie 10/04/26	mar 21/04/26	$1,875,554.00
1873		**1.3.3.10.4.9.9**	**SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN (HORIZONTAL Y VEF**	**9 días**	**vie 10/04/26**	**mar 21/04/26**	**$117,510,082.60**
1874		1.3.3.10.4.9.9.1	SEÑALIZACIÓN	9 días	vie 10/04/26	mar 21/04/26	$117,510,082.60
1875		**1.3.3.10.4.10**	**FASE 3 CRUCE VEHICULAR CALLE 10**	**46 días**	**vie 27/02/26**	**mar 21/04/26**	**$498,175,022.73**
1876		**1.3.3.10.4.10.1**	**REDES HIDROSANITARIAS ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL**	**33 días**	**vie 27/02/26**	**mar 7/04/26**	**$112,122,509.06**
1877		1.3.3.10.4.10.1.1	EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS	10 días	vie 27/02/26	mié 11/03/26	$9,832,825.28
1878		1.3.3.10.4.10.1.2	INSTALACION DE TUBERIAS	12 días	jue 5/03/26	mié 18/03/26	$50,433,477.74
1879		1.3.3.10.4.10.1.3	RELLENO DE TUBERIAS	13 días	jue 12/03/26	vie 27/03/26	$21,570,883.00
1880		1.3.3.10.4.10.1.4	CONSTRUCCION DE POZOS Y SUMIDEROS	20 días	sáb 14/03/26	mar 7/04/26	$30,285,323.04
1881		**1.3.3.10.4.10.2**	**PRELIMINARES - MOVIMIENTO DE TIERRAS, DEMOLICIONES Y RELLENOS**	**24 días**	**lun 16/03/26**	**lun 13/04/26**	**$90,712,760.46**
1882		1.3.3.10.4.10.2.1	DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y TRANSPORTES DE ESCOMBROS	10 días	lun 16/03/26	vie 27/03/26	$46,017,332.06
1883		1.3.3.10.4.10.2.2	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON RAJON Y SELLO DE RAJON	14 días	jue 19/03/26	lun 6/04/26	$21,707,280.00
1884		1.3.3.10.4.10.2.3	INSTALACION DE GEOTEXTILES Y RELLENO DE MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA	14 días	vie 27/03/26	lun 13/04/26	$22,988,148.40
1885		**1.3.3.10.4.10.3**	**PAVIMENTOS**	**13 días**	**mar 7/04/26**	**mar 21/04/26**	**$295,339,753.21**
1886		1.3.3.10.4.10.3.1	BASES Y SUBBASES	7 días	mar 7/04/26	mié 15/04/26	$149,009,132.01
1887		1.3.3.10.4.10.3.2	MEZCLA ASFALTICA	5 días	vie 10/04/26	jue 16/04/26	$2,222,010.00
1888		1.3.3.10.4.10.3.3	CONCRETO LOSAS MR	7 días	lun 13/04/26	mar 21/04/26	$143,919,216.00
1889		1.3.3.10.4.10.3.4	INSTALACION DE ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO (BORDILLOS, SARDINELES	4 días	vie 17/04/26	mar 21/04/26	$189,395.20
1890		1.3.3.10.4.10.4	FIN CIV 16001474	0 días	mar 21/04/26	mar 21/04/26	$0.00
1891		**1.3.3.10.5**	**CIV 16001398**	**347 días**	**jue 6/03/25**	**mar 21/04/26**	**$5,389,223,871.76**
1892		*1.3.3.10.5.1*	*PRESENTACIÓN PMT A INTERVENTORÍA*	*0 días*	*jue 6/03/25*	*jue 6/03/25*	*$0.00*
1893		*1.3.3.10.5.2*	*RADICACIÓN A LA SDM*	*0 días*	*vie 7/03/25*	*vie 7/03/25*	*$0.00*
1894		*1.3.3.10.5.3*	*OBSERVACIONES POR PARTE DE LA SDM AL PMT*	*0 días*	*mar 25/03/25*	*mar 25/03/25*	*$0.00*
1895		*1.3.3.10.5.4*	*ATENCIÓN DE OBSERVACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA AL PMT*	*0 días*	*vie 11/04/25*	*vie 11/04/25*	*$0.00*
1896		*1.3.3.10.5.5*	*OBSERVACIONES POR PARTE DE LA SDM AL PMT*	*0 días*	*mié 30/04/25*	*mié 30/04/25*	*$0.00*
1897		*1.3.3.10.5.6*	*ATENCIÓN DE OBSERVACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA AL PMT*	*0 días*	*lun 19/05/25*	*lun 19/05/25*	*$0.00*
1898		*1.3.3.10.5.7*	*APROBACIÓN DEL PMT*	*0 días*	*mar 20/05/25*	*mar 20/05/25*	*$0.00*
1899		**1.3.3.10.5.8**	**FASE 1 ANDEN COSTADO OCCIDENTAL**	**156 días**	**mié 21/05/25**	**vie 21/11/25**	**$1,754,674,394.22**
1900		1.3.3.10.5.8.1	INICIO CIV 16001398	0 días	mié 21/05/25	mié 21/05/25	$0.00
1901		**1.3.3.10.5.8.2**	**TRAMITE DE PMT**	**6 días**	**sáb 24/05/25**	**vie 30/05/25**	**$0.00**
1902		1.3.3.10.5.8.2.1	IMPLEMENTACIÓN PMT ESPECIFICIO Y CERRAMIENTO DE OBRA	6 días	sáb 24/05/25	vie 30/05/25	$0.00



Proyecto:ID
Fecha: 14/1

Tarea	Resumen del proyecto	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Fecha límite	Tareas críticas
División	Tareas externas	Resumen inactivo	Resumen manual	Tarea hito de sucesor controlado de ruta de acceso	División crítica
Hito	Hito externo	Tarea manual	Sólo el comienzo	Tarea de resumen de sucesor controlado de ruta de a	Progreso
Resumen	Tarea inactiva	Sólo duración	Sólo fin	Tarea normal de sucesor controlado de ruta de acces	

Id	Modo de tarea	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
1903		**1.3.3.10.5.8.3**	**ACTIVIDADES DE ARQUEOLOGIA**	**6 días**	**sáb 24/05/25**	**vie 30/05/25**	**$0.00**
1904		1.3.3.10.5.8.3.1	EXPLORACIÓN E INVESTIGACIÓN ARQUEOLOGICA EN LA ZONA DE INTERVENCIÓN	6 días	sáb 24/05/25	vie 30/05/25	$0.00
1905		**1.3.3.10.5.8.4**	**REDES HIDROSANITARIAS ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL**	**58 días**	**vie 30/05/25**	**vie 8/08/25**	**$218,148,526.84**
1906		1.3.3.10.5.8.4.1	EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS	25 días	vie 30/05/25	mié 2/07/25	$21,551,724.38
1907		1.3.3.10.5.8.4.2	INSTALACION DE TUBERIAS	23 días	lun 9/06/25	mar 8/07/25	$107,824,326.90
1908		1.3.3.10.5.8.4.3	RELLENO DE TUBERIAS	23 días	sáb 14/06/25	sáb 12/07/25	$33,101,536.00
1909		1.3.3.10.5.8.4.4	CONSTRUCCION DE POZOS Y SUMIDEROS	30 días	jue 19/06/25	vie 25/07/25	$51,399,629.56
1910		1.3.3.10.5.8.4.5	CONSTRUCCIÓN CAJAS DE INSPECCIÓN	30 días	vie 4/07/25	vie 8/08/25	$4,271,310.00
1911		**1.3.3.10.5.8.5**	**PRELIMINARES - MOVIMIENTO DE TIERRAS, DEMOLICIONES Y RELLENOS**	**42 días**	**lun 14/07/25**	**mar 2/09/25**	**$205,844,242.09**
1912		1.3.3.10.5.8.5.1	DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y TRANSPORTES DE ESCOMBROS	20 días	lun 14/07/25	mar 5/08/25	$67,130,787.31
1913		1.3.3.10.5.8.5.2	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON RAJON Y SELLO DE RAJON	14 días	vie 1/08/25	mié 20/08/25	$68,947,579.12
1914		1.3.3.10.5.8.5.3	INSTALACION DE GEOTEXTILES Y RELLENO DE MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA	14 días	vie 15/08/25	mar 2/09/25	$69,765,875.66
1915		**1.3.3.10.5.8.6**	**PAVIMENTOS**	**71 días**	**sáb 30/08/25**	**vie 21/11/25**	**$646,597,602.80**
1916		1.3.3.10.5.8.6.1	BASES Y SUBBASES	13 días	sáb 30/08/25	sáb 13/09/25	$353,388,825.42
1917		1.3.3.10.5.8.6.2	MEZCLA ASFALTICA	16 días	mié 10/09/25	lun 29/09/25	$4,451,285.62
1918		1.3.3.10.5.8.6.3	CONCRETO LOSAS MR	16 días	mié 22/10/25	mar 11/11/25	$288,306,740.56
1919		1.3.3.10.5.8.6.4	INSTALACION DE ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO (BORDILLOS, SARDINELES	11 días	vie 7/11/25	vie 21/11/25	$450,751.20
1920		**1.3.3.10.5.8.7**	**REDES HIDROSANITARIAS ACUEDUCTO**	**28 días**	**mar 16/09/25**	**sáb 18/10/25**	**$101,549,969.47**
1921		1.3.3.10.5.8.7.1	EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS	12 días	mar 16/09/25	mar 30/09/25	$21,670,629.28
1922		1.3.3.10.5.8.7.2	INSTALACION DE TUBERIAS	10 días	sáb 20/09/25	jue 2/10/25	$36,082,027.64
1923		1.3.3.10.5.8.7.3	INSTALACION ACCESORIOS Y EMPATES	16 días	jue 25/09/25	mar 14/10/25	$23,133,659.00
1924		1.3.3.10.5.8.7.4	RELLENO DE TUBERIAS	12 días	vie 3/10/25	sáb 18/10/25	$20,663,653.55
1925		**1.3.3.10.5.8.8**	**REDES SECAS (Codensa)**	**42 días**	**mar 30/09/25**	**mié 19/11/25**	**$206,360,627.69**
1926		1.3.3.10.5.8.8.1	EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS	15 días	mar 30/09/25	vie 17/10/25	$25,268,387.84
1927		1.3.3.10.5.8.8.2	INSTALACION DE DUCTERIAS	17 días	sáb 18/10/25	vie 7/11/25	$90,315,689.84
1928		1.3.3.10.5.8.8.3	RELLENO DE DUCTERIAS	17 días	mié 22/10/25	mar 11/11/25	$23,950,408.01
1929		1.3.3.10.5.8.8.4	CONSTRUCCION DE CAJAS Y CAMARAS	20 días	sáb 25/10/25	mié 19/11/25	$66,826,142.00
1930		**1.3.3.10.5.8.9**	**ESPACIO PUBLICO**	**33 días**	**mar 14/10/25**	**vie 21/11/25**	**$376,173,425.33**
1931		1.3.3.10.5.8.9.1	DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y TRANSPORTES DE ESCOMBROS	15 días	jue 16/10/25	mar 4/11/25	$76,004,119.02
1932		1.3.3.10.5.8.9.2	INSTALACION DE GEOTEXTILES	11 días	mié 22/10/25	mié 5/11/25	$11,501,930.23
1933		1.3.3.10.5.8.9.3	RELLENOS EN MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA ANDEN	11 días	jue 23/10/25	jue 6/11/25	$36,588,854.31
1934		1.3.3.10.5.8.9.4	RELLENOS EN MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA RAMPAS	9 días	sáb 25/10/25	jue 6/11/25	$7,649,232.00
1935		1.3.3.10.5.8.9.5	INSTALACION DE ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO Y PREFABRICADOS	25 días	mar 14/10/25	mar 11/11/25	$234,068,793.81
1936		1.3.3.10.5.8.9.6	CONCRETO LOSAS MR	18 días	lun 27/10/25	mar 18/11/25	$210,489.96
1937		1.3.3.10.5.8.9.7	ELEMENTOS MOBILIARIO URBANO (CANECAS, BANCAS, ETC)	8 días	mié 12/11/25	vie 21/11/25	$10,150,006.00
1938		**1.3.3.10.5.9**	**FASE 2 ANDEN COSTADO ORIENTAL**	**153 días**	**mié 22/10/25**	**mar 21/04/26**	**$2,114,812,522.91**
1939		**1.3.3.10.5.9.1**	**REDES HIDROSANITARIAS ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL**	**32 días**	**mié 22/10/25**	**sáb 29/11/25**	**$228,590,126.97**
1940		1.3.3.10.5.9.1.1	EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS	20 días	mié 22/10/25	vie 14/11/25	$21,551,052.92
1941		1.3.3.10.5.9.1.2	INSTALACION DE TUBERIAS	18 días	lun 27/10/25	mar 18/11/25	$110,400,537.31
1942		1.3.3.10.5.9.1.3	RELLENO DE TUBERIAS	18 días	mié 29/10/25	jue 20/11/25	$33,099,138.56
1943		1.3.3.10.5.9.1.4	CONSTRUCCION DE POZOS Y SUMIDEROS	23 días	mar 28/10/25	mar 25/11/25	$59,268,088.18
1944		1.3.3.10.5.9.1.5	CONSTRUCCIÓN CAJAS DE INSPECCIÓN	23 días	sáb 1/11/25	sáb 29/11/25	$4,271,310.00
1945		**1.3.3.10.5.9.2**	**PRELIMINARES - MOVIMIENTO DE TIERRAS, DEMOLICIONES Y RELLENOS**	**15 días**	**mié 19/11/25**	**vie 5/12/25**	**$205,841,971.15**
1946		1.3.3.10.5.9.2.1	DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y TRANSPORTES DE ESCOMBROS	10 días	mié 19/11/25	lun 1/12/25	$67,130,270.00
1947		1.3.3.10.5.9.2.2	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON RAJON Y SELLO DE RAJON	9 días	lun 24/11/25	jue 4/12/25	$68,945,825.49
1948		1.3.3.10.5.9.2.3	INSTALACION DE GEOTEXTILES Y RELLENO DE MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA	8 días	jue 27/11/25	vie 5/12/25	$69,765,875.66
1949		**1.3.3.10.5.9.3**	**PAVIMENTOS**	**44 días**	**vie 2/01/26**	**lun 23/02/26**	**$646,597,567.53**
1950		1.3.3.10.5.9.3.1	BASES Y SUBBASES	8 días	sáb 10/01/26	mié 21/01/26	$353,388,825.42
1951		1.3.3.10.5.9.3.2	MEZCLA ASFALTICA	8 días	vie 2/01/26	mar 13/01/26	$4,451,250.35
1952		1.3.3.10.5.9.3.3	CONCRETO LOSAS MR	8 días	mar 10/02/26	mié 18/02/26	$288,306,740.56
1953		1.3.3.10.5.9.3.4	INSTALACION DE ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO (BORDILLOS, SARDINELES	5 días	mar 17/02/26	lun 23/02/26	$450,751.20
1954		**1.3.3.10.5.9.4**	**REDES HIDROSANITARIAS ACUEDUCTO**	**17 días**	**lun 9/03/26**	**sáb 28/03/26**	**$135,173,849.01**
1955		1.3.3.10.5.9.4.1	EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS	8 días	lun 9/03/26	mié 18/03/26	$21,670,025.00
1956		1.3.3.10.5.9.4.2	INSTALACION DE TUBERIAS	8 días	mié 11/03/26	jue 19/03/26	$35,138,064.72
1957		1.3.3.10.5.9.4.3	INSTALACION ACCESORIOS Y EMPATES	10 días	sáb 14/03/26	jue 26/03/26	$57,703,142.00
1958		1.3.3.10.5.9.4.4	RELLENO DE TUBERIAS	8 días	jue 19/03/26	sáb 28/03/26	$20,662,617.29
1959		**1.3.3.10.5.9.5**	**REDES SECAS (Codensa)**	**28 días**	**mié 18/03/26**	**lun 20/04/26**	**$218,990,940.85**
1960		1.3.3.10.5.9.5.1	EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS	10 días	mié 18/03/26	lun 30/03/26	$25,267,320.00
1961		1.3.3.10.5.9.5.2	INSTALACION DE DUCTERIAS	13 días	jue 19/03/26	sáb 4/04/26	$90,315,689.84
1962		1.3.3.10.5.9.5.3	RELLENO DE DUCTERIAS	16 días	mié 25/03/26	lun 13/04/26	$23,950,408.01
1963		1.3.3.10.5.9.5.4	CONSTRUCCION DE CAJAS Y CAMARAS	20 días	vie 27/03/26	lun 20/04/26	$79,457,523.00
1964		**1.3.3.10.5.9.6**	**REDES SECAS (ETB)**	**20 días**	**vie 27/03/26**	**lun 20/04/26**	**$28,052,609.00**
1965		1.3.3.10.5.9.6.1	NIVELACION DE CAJAS Y CAMARAS	20 días	vie 27/03/26	lun 20/04/26	$28,052,609.00
1966		**1.3.3.10.5.9.7**	**REDES SECAS (VANTI)**	**33 días**	**jue 12/03/26**	**lun 20/04/26**	**$2,435,897.39**
1967		1.3.3.10.5.9.7.1	EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS	20 días	jue 12/03/26	sáb 4/04/26	$1,901,229.00
1968		1.3.3.10.5.9.7.2	RELLENO DE DUCTERIAS	20 días	vie 27/03/26	lun 20/04/26	$534,668.39
1969		**1.3.3.10.5.9.8**	**ESPACIO PUBLICO**	**29 días**	**mié 18/03/26**	**mar 21/04/26**	**$615,769,085.06**
1970		1.3.3.10.5.9.8.1	DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y TRANSPORTES DE ESCOMBROS	15 días	mié 18/03/26	sáb 4/04/26	$76,003,425.04
1971		1.3.3.10.5.9.8.2	INSTALACION DE GEOTEXTILES	11 días	vie 27/03/26	jue 9/04/26	$11,501,817.54
1972		1.3.3.10.5.9.8.3	RELLENOS EN MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA ANDEN	11 días	vie 3/04/26	jue 16/04/26	$36,587,642.58
1973		1.3.3.10.5.9.8.4	RELLENOS EN MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA RAMPAS	12 días	lun 6/04/26	lun 20/04/26	$7,647,509.20
1974		1.3.3.10.5.9.8.5	INSTALACION DE ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO Y PREFABRICADOS	15 días	lun 30/03/26	jue 16/04/26	$234,064,856.74
1975		1.3.3.10.5.9.8.6	CONCRETO LOSAS MR	9 días	mar 7/04/26	jue 16/04/26	$210,489.96
1976		1.3.3.10.5.9.8.7	ELEMENTOS MOBILIARIO URBANO (CANECAS, BANCAS, ETC)	8 días	sáb 11/04/26	mar 21/04/26	$10,150,006.00
1977		1.3.3.10.5.9.8.8	CANALES DE DRENAJE MONOLITICO	14 días	mar 31/03/26	jue 16/04/26	$239,603,338.00
1978		**1.3.3.10.5.9.9**	**PAISAJISMO**	**8 días**	**sáb 11/04/26**	**mar 21/04/26**	**$2,728,396.00**
1979		1.3.3.10.5.9.9.1	PAISAJISMO	8 días	sáb 11/04/26	mar 21/04/26	$2,728,396.00
1980		**1.3.3.10.5.9.10**	**SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN (HORIZONTAL Y VEF**	**8 días**	**sáb 11/04/26**	**mar 21/04/26**	**$30,632,079.95**
1981		1.3.3.10.5.9.10.1	SEÑALIZACIÓN	8 días	sáb 11/04/26	mar 21/04/26	$30,632,079.95
1982		**1.3.3.10.5.10**	**FASE 3 BAHIA OCCIDENTAL**	**34 días**	**mié 10/09/25**	**lun 20/10/25**	**$527,109,177.54**

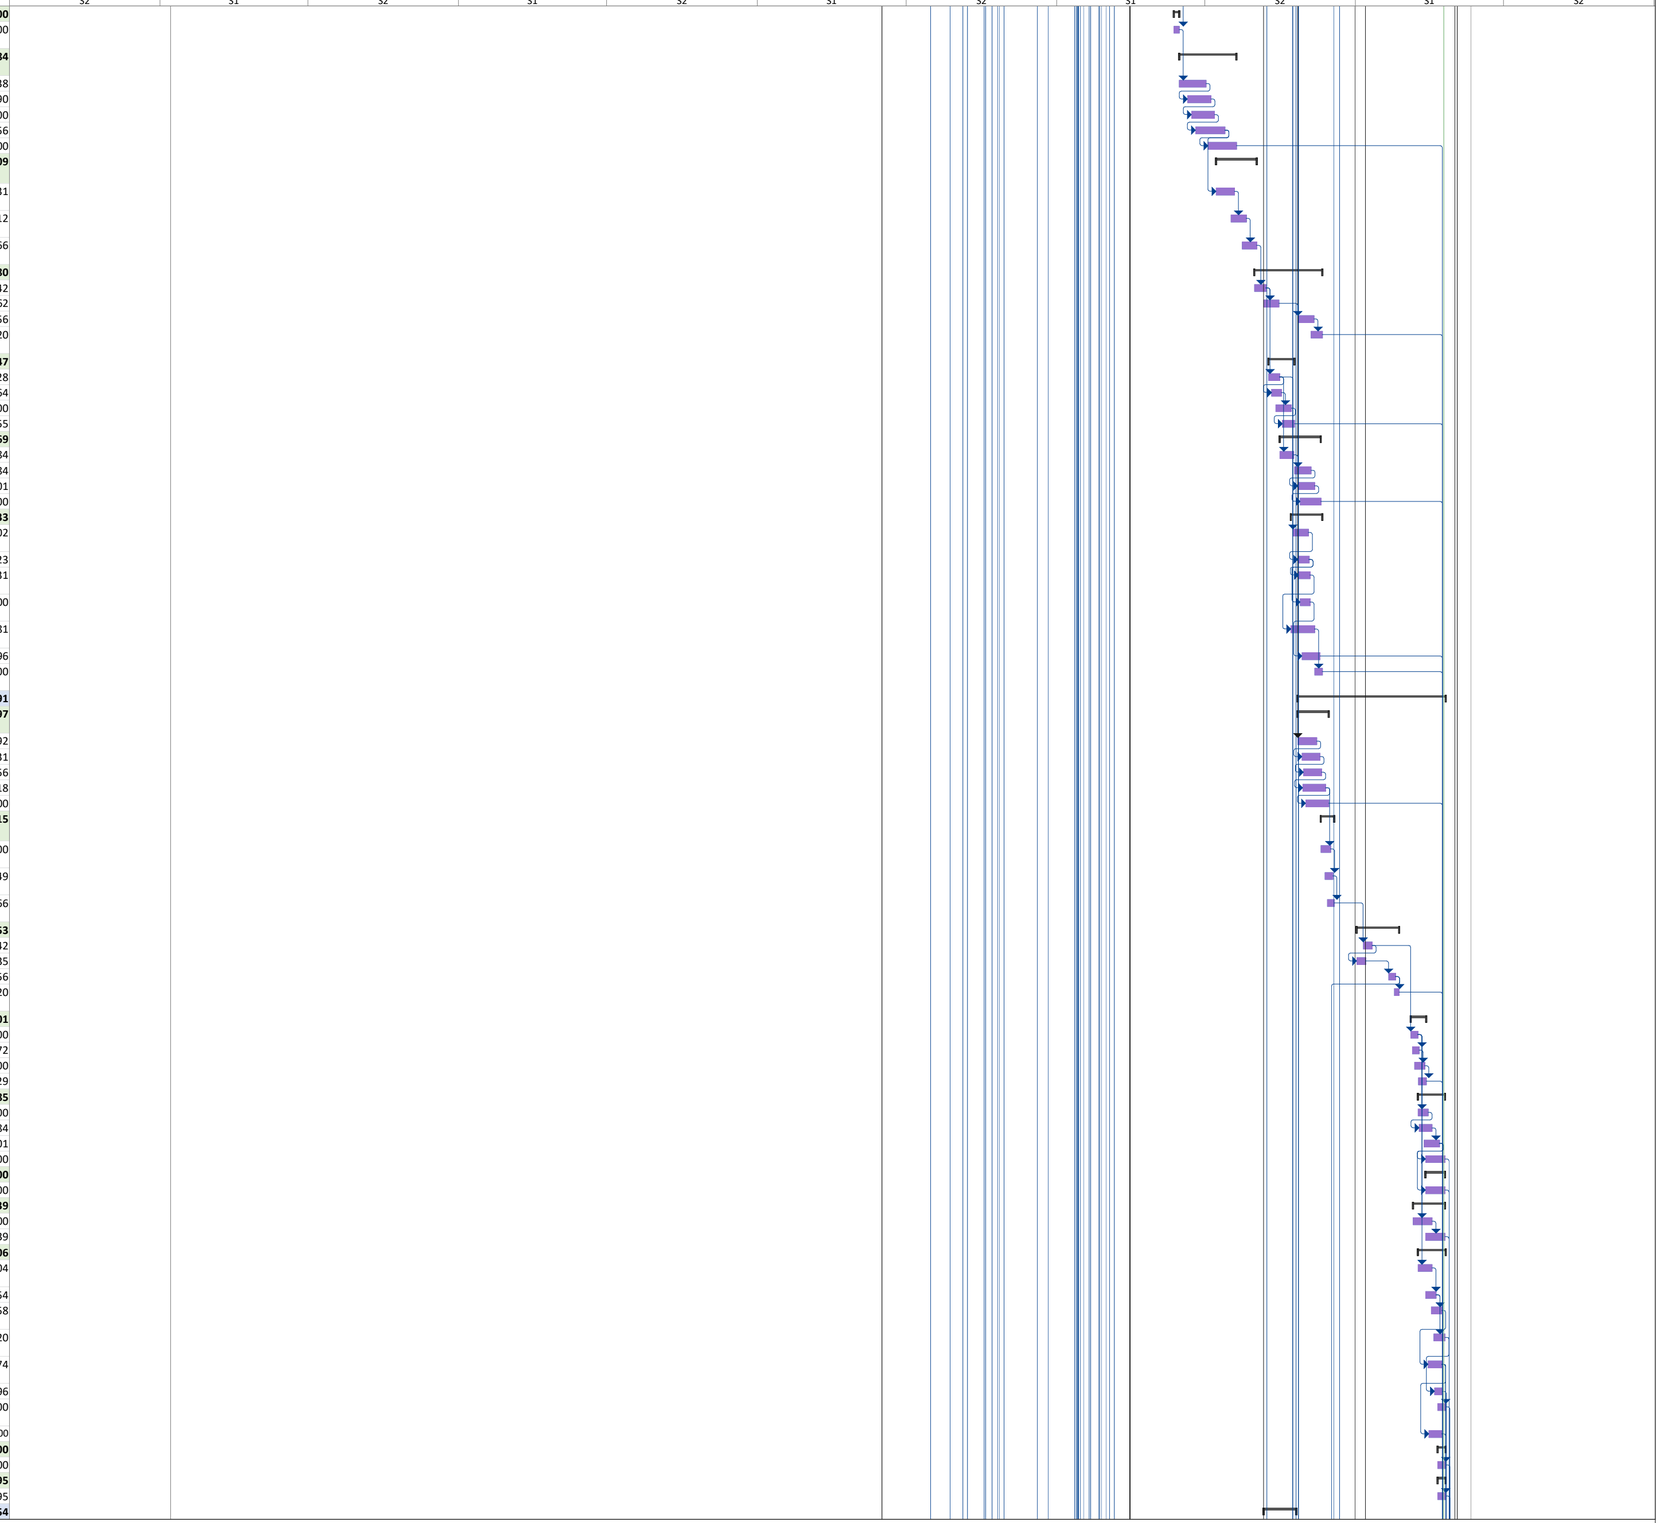

Proyecto:ID
Fecha: 14/1

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tareas externas
Hito externo
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Sólo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
Tarea manual
Sólo el comienzo
Sólo fin
Fecha límite
Tarea hito de sucesor controlado de ruta de acceso
Tarea de resumen de sucesor controlado de ruta de a
Tarea normal de sucesor controlado de ruta de acces
Tareas críticas
División crítica
Progreso


Id	Modo de tarea	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
1983		**1.3.3.10.5.10.1**	**PRELIMINARES - MOVIMIENTO DE TIERRAS, DEMOLICIONES Y RELLENOS**	**14 días**	**mié 10/09/25**	**vie 26/09/25**	**$109,590,973.79**
1984		1.3.3.10.5.10.1.1	DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y TRANSPORTES DE ESCOMBROS	10 días	mié 10/09/25	lun 22/09/25	$61,278,552.96
1985		1.3.3.10.5.10.1.2	INSTALACION DE GEOTEXTILES Y RELLENO DE MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA	10 días	lun 15/09/25	vie 26/09/25	$48,312,420.83
1986		**1.3.3.10.5.10.2**	**PAVIMENTOS**	**18 días**	**lun 29/09/25**	**lun 20/10/25**	**$417,518,203.75**
1987		1.3.3.10.5.10.2.1	BASES Y SUBBASES	8 días	lun 29/09/25	mar 7/10/25	$212,062,059.18
1988		1.3.3.10.5.10.2.2	MEZCLA ASFALTICA	9 días	mié 1/10/25	vie 10/10/25	$3,120,301.63
1989		1.3.3.10.5.10.2.3	CONCRETO LOSAS MR	8 días	mar 7/10/25	jue 16/10/25	$202,103,699.04
1990		1.3.3.10.5.10.2.4	INSTALACION DE ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO (BORDILLOS, SARDINELES	6 días	mar 14/10/25	lun 20/10/25	$232,143.90
1991		**1.3.3.10.5.11**	**FASE 4 BAHIA ORIENTAL**	**36 días**	**mar 13/01/26**	**lun 23/02/26**	**$527,095,606.24**
1992		**1.3.3.10.5.11.1**	**PRELIMINARES - MOVIMIENTO DE TIERRAS, DEMOLICIONES Y RELLENOS**	**14 días**	**mar 13/01/26**	**mié 28/01/26**	**$109,588,889.22**
1993		1.3.3.10.5.11.1.1	DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y TRANSPORTES DE ESCOMBROS	10 días	mar 13/01/26	vie 23/01/26	$61,278,552.96
1994		1.3.3.10.5.11.1.2	INSTALACION DE GEOTEXTILES Y RELLENO DE MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA	10 días	sáb 17/01/26	mié 28/01/26	$48,310,336.26
1995		**1.3.3.10.5.11.2**	**PAVIMENTOS**	**20 días**	**vie 30/01/26**	**lun 23/02/26**	**$417,506,717.02**
1996		1.3.3.10.5.11.2.1	BASES Y SUBBASES	8 días	vie 30/01/26	lun 9/02/26	$212,062,059.18
1997		1.3.3.10.5.11.2.2	MEZCLA ASFALTICA	9 días	lun 2/02/26	jue 12/02/26	$3,120,266.36
1998		1.3.3.10.5.11.2.3	CONCRETO LOSAS MR	8 días	sáb 7/02/26	mar 17/02/26	$202,092,276.88
1999		1.3.3.10.5.11.2.4	INSTALACION DE ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO (BORDILLOS, SARDINELES	8 días	vie 13/02/26	lun 23/02/26	$232,114.60
2000		**1.3.3.10.5.12**	**FASE 5 CRUCE VEHICULAR CALLE 11A**	**95 días**	**mié 31/12/25**	**mar 21/04/26**	**$465,532,170.85**
2001		**1.3.3.10.5.12.1**	**REDES HIDROSANITARIAS ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL**	**27 días**	**mié 31/12/25**	**lun 2/02/26**	**$144,391,109.72**
2002		1.3.3.10.5.12.1.1	EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS	10 días	mié 31/12/25	mié 14/01/26	$43,745,767.20
2003		1.3.3.10.5.12.1.2	INSTALACION DE TUBERIAS	8 días	sáb 3/01/26	mié 14/01/26	$32,508,616.20
2004		1.3.3.10.5.12.1.3	RELLENO DE TUBERIAS	12 días	mar 6/01/26	mié 21/01/26	$33,772,884.64
2005		1.3.3.10.5.12.1.4	CONSTRUCCION DE POZOS Y SUMIDEROS	20 días	vie 9/01/26	lun 2/02/26	$34,363,841.68
2006		**1.3.3.10.5.12.2**	**PRELIMINARES - MOVIMIENTO DE TIERRAS, DEMOLICIONES Y RELLENOS**	**20 días**	**jue 15/01/26**	**vie 6/02/26**	**$153,726,429.80**
2007		1.3.3.10.5.12.2.1	DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y TRANSPORTES DE ESCOMBROS	10 días	jue 15/01/26	lun 26/01/26	$83,319,459.80
2008		1.3.3.10.5.12.2.2	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON RAJON Y SELLO DE RAJON	14 días	mar 20/01/26	mié 4/02/26	$39,279,840.00
2009		1.3.3.10.5.12.2.3	INSTALACION DE GEOTEXTILES Y RELLENO DE MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA	10 días	mar 27/01/26	vie 6/02/26	$31,127,130.00
2010		**1.3.3.10.5.12.3**	**PAVIMENTOS**	**20 días**	**sáb 31/01/26**	**lun 23/02/26**	**$167,414,631.33**
2011		1.3.3.10.5.12.3.1	BASES Y SUBBASES	7 días	sáb 31/01/26	lun 9/02/26	$34,864,277.73
2012		1.3.3.10.5.12.3.2	MEZCLA ASFALTICA	5 días	vie 6/02/26	jue 12/02/26	$2,010,390.00
2013		1.3.3.10.5.12.3.3	CONCRETO LOSAS MR	9 días	lun 9/02/26	mié 18/02/26	$130,212,624.00
2014		1.3.3.10.5.12.3.4	INSTALACION DE ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO (BORDILLOS, SARDINELES	4 días	jue 19/02/26	lun 23/02/26	$327,339.60
2015		1.3.3.10.5.12.4	FIN CIV 16001398	0 días	mar 21/04/26	mar 21/04/26	$0.00
2016		**1.3.3.10.6**	**CIV 16001251**	**336 días**	**vie 4/04/25**	**mié 6/05/26**	**$2,265,411,993.92**
2017		*1.3.3.10.6.1*	*PRESENTACIÓN PMT A INTERVENTORÍA*	*0 días*	*vie 4/04/25*	*vie 4/04/25*	*$0.00*
2018		*1.3.3.10.6.2*	*RADICACIÓN A LA SDM*	*0 días*	*sáb 5/04/25*	*sáb 5/04/25*	*$0.00*
2019		*1.3.3.10.6.3*	*OBSERVACIONES POR PARTE DE LA SDM AL PMT*	*0 días*	*jue 24/04/25*	*jue 24/04/25*	*$0.00*
2020		*1.3.3.10.6.4*	*ATENCIÓN DE OBSERVACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA AL PMT*	*0 días*	*mar 13/05/25*	*mar 13/05/25*	*$0.00*
2021		*1.3.3.10.6.5*	*OBSERVACIONES POR PARTE DE LA SDM AL PMT*	*0 días*	*jue 29/05/25*	*jue 29/05/25*	*$0.00*
2022		*1.3.3.10.6.6*	*ATENCIÓN DE OBSERVACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA AL PMT*	*0 días*	*mar 17/06/25*	*mar 17/06/25*	*$0.00*
2023		*1.3.3.10.6.7*	*APROBACIÓN DEL PMT*	*0 días*	*mié 18/06/25*	*mié 18/06/25*	*$0.00*
2024		**1.3.3.10.6.8**	**FASE 1 ANDEN COSTADO OCCIDENTAL**	**130 días**	**vie 20/06/25**	**vie 21/11/25**	**$881,080,959.44**
2025		1.3.3.10.6.8.1	INICIO CIV 16001251	0 días	vie 20/06/25	vie 20/06/25	$0.00
2026		**1.3.3.10.6.8.2**	**TRAMITE DE PMT**	**6 días**	**mié 25/06/25**	**jue 3/07/25**	**$0.00**
2027		1.3.3.10.6.8.2.1	IMPLEMENTACIÓN PMT ESPECIFICIO Y CERRAMIENTO DE OBRA	6 días	mié 25/06/25	jue 3/07/25	$0.00
2028		**1.3.3.10.6.8.3**	**ACTIVIDADES DE ARQUEOLOGIA**	**6 días**	**mié 25/06/25**	**jue 3/07/25**	**$0.00**
2029		1.3.3.10.6.8.3.1	EXPLORACIÓN E INVESTIGACIÓN ARQUEOLOGICA EN LA ZONA DE INTERVENCIÓN	6 días	mié 25/06/25	jue 3/07/25	$0.00
2030		**1.3.3.10.6.8.4**	**REDES HIDROSANITARIAS ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL**	**50 días**	**jue 3/07/25**	**sáb 30/08/25**	**$154,239,135.73**
2031		1.3.3.10.6.8.4.1	EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS	25 días	jue 3/07/25	jue 31/07/25	$16,901,175.54
2032		1.3.3.10.6.8.4.2	INSTALACION DE TUBERIAS	23 días	mié 9/07/25	lun 4/08/25	$75,786,275.47
2033		1.3.3.10.6.8.4.3	RELLENO DE TUBERIAS	23 días	jue 10/07/25	mar 5/08/25	$43,413,551.36
2034		1.3.3.10.6.8.4.4	CONSTRUCCION DE POZOS Y SUMIDEROS	30 días	lun 14/07/25	mar 19/08/25	$16,429,609.36
2035		1.3.3.10.6.8.4.5	CONSTRUCCIÓN CAJAS DE INSPECCIÓN	30 días	vie 25/07/25	sáb 30/08/25	$1,708,524.00
2036		**1.3.3.10.6.8.5**	**PRELIMINARES - MOVIMIENTO DE TIERRAS, DEMOLICIONES Y RELLENOS**	**38 días**	**lun 4/08/25**	**mié 17/09/25**	**$76,806,476.83**
2037		1.3.3.10.6.8.5.1	DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y TRANSPORTES DE ESCOMBROS	20 días	lun 4/08/25	jue 28/08/25	$31,777,669.99
2038		1.3.3.10.6.8.5.2	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON RAJON Y SELLO DE RAJON	14 días	vie 22/08/25	lun 8/09/25	$19,065,270.01
2039		1.3.3.10.6.8.5.3	INSTALACION DE GEOTEXTILES Y RELLENO DE MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA	14 días	mar 2/09/25	mié 17/09/25	$25,963,536.83
2040		**1.3.3.10.6.8.6**	**PAVIMENTOS**	**60 días**	**jue 11/09/25**	**vie 21/11/25**	**$241,085,303.41**
2041		1.3.3.10.6.8.6.1	BASES Y SUBBASES	13 días	jue 11/09/25	vie 26/09/25	$132,170,249.16
2042		1.3.3.10.6.8.6.2	MEZCLA ASFALTICA	16 días	vie 19/09/25	mar 7/10/25	$1,653,281.25
2043		1.3.3.10.6.8.6.3	CONCRETO LOSAS MR	16 días	mié 29/10/25	mar 18/11/25	$107,082,750.00
2044		1.3.3.10.6.8.6.4	INSTALACION DE ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO (BORDILLOS, SARDINELES	11 días	vie 7/11/25	vie 21/11/25	$179,023.00
2045		**1.3.3.10.6.8.7**	**REDES HIDROSANITARIAS ACUEDUCTO**	**25 días**	**sáb 27/09/25**	**lun 27/10/25**	**$52,600,915.43**
2046		1.3.3.10.6.8.7.1	EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS	12 días	sáb 27/09/25	vie 10/10/25	$9,163,090.24
2047		1.3.3.10.6.8.7.2	INSTALACION DE TUBERIAS	10 días	jue 2/10/25	mar 14/10/25	$14,297,473.35
2048		1.3.3.10.6.8.7.3	INSTALACION ACCESORIOS Y EMPATES	16 días	vie 3/10/25	jue 23/10/25	$20,959,582.00
2049		1.3.3.10.6.8.7.4	RELLENO DE TUBERIAS	12 días	mar 14/10/25	lun 27/10/25	$8,180,769.84
2050		**1.3.3.10.6.8.8**	**REDES SECAS (Codensa)**	**34 días**	**vie 10/10/25**	**vie 21/11/25**	**$123,680,321.05**
2051		1.3.3.10.6.8.8.1	EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS	15 días	vie 10/10/25	mié 29/10/25	$12,576,543.00
2052		1.3.3.10.6.8.8.2	INSTALACION DE DUCTERIAS	17 días	lun 20/10/25	lun 10/11/25	$45,040,073.12
2053		1.3.3.10.6.8.8.3	RELLENO DE DUCTERIAS	17 días	sáb 25/10/25	vie 14/11/25	$12,042,378.93
2054		1.3.3.10.6.8.8.4	CONSTRUCCION DE CAJAS Y CAMARAS	20 días	mar 28/10/25	vie 21/11/25	$54,021,326.00
2055		**1.3.3.10.6.8.9**	**ESPACIO PUBLICO**	**30 días**	**jue 16/10/25**	**vie 21/11/25**	**$232,668,806.99**
2056		1.3.3.10.6.8.9.1	DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y TRANSPORTES DE ESCOMBROS	15 días	jue 16/10/25	mar 4/11/25	$35,756,860.02
2057		1.3.3.10.6.8.9.2	INSTALACION DE GEOTEXTILES	11 días	vie 24/10/25	jue 6/11/25	$13,345,313.25
2058		1.3.3.10.6.8.9.3	RELLENOS EN MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA ANDEN	11 días	mar 28/10/25	mar 11/11/25	$16,023,877.20



Proyecto:ID
Fecha: 14/1

Tarea	Resumen del proyecto	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Fecha límite	Tareas críticas
División	Tareas externas	Resumen inactivo	Resumen manual	Tarea hito de sucesor controlado de ruta de acceso	División crítica
Hito	Hito externo	Tarea manual	Sólo el comienzo	Tarea de resumen de sucesor controlado de ruta de a	Progreso
Resumen	Tarea inactiva	Sólo duración	Sólo fin	Tarea normal de sucesor controlado de ruta de acces	


Id	Modo de tarea	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
2059		1.3.3.10.6.8.9.4	RELLENOS EN MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA RAMPAS	9 días	jue 30/10/25	mar 11/11/25	$15,401,832.00
2060		1.3.3.10.6.8.9.5	INSTALACION DE ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO Y PREFABRICADOS	16 días	sáb 1/11/25	vie 21/11/25	$143,289,412.74
2061		1.3.3.10.6.8.9.6	CONCRETO LOSAS MR	18 días	jue 30/10/25	vie 21/11/25	$2,712,488.78
2062		1.3.3.10.6.8.9.7	ELEMENTOS MOBILIARIO URBANO (CANECAS, BANCAS, ETC)	8 días	mié 12/11/25	vie 21/11/25	$6,139,023.00
2063		**1.3.3.10.6.9**	**FASE 2 ANDEN COSTADO ORIENTAL**	**224 días**	**vie 1/08/25**	**mar 21/04/26**	**$902,890,155.64**
2064		**1.3.3.10.6.9.1**	**REDES HIDROSANITARIAS ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL**	**25 días**	**vie 1/08/25**	**lun 1/09/25**	**$160,788,266.31**
2065		1.3.3.10.6.9.1.1	EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS	15 días	vie 1/08/25	mié 20/08/25	$16,687,826.26
2066		1.3.3.10.6.9.1.2	INSTALACION DE TUBERIAS	10 días	mar 12/08/25	sáb 23/08/25	$82,560,622.15
2067		1.3.3.10.6.9.1.3	RELLENO DE TUBERIAS	10 días	jue 14/08/25	mié 27/08/25	$43,411,153.92
2068		1.3.3.10.6.9.1.4	CONSTRUCCION DE POZOS Y SUMIDEROS	18 días	lun 11/08/25	lun 1/09/25	$16,420,139.98
2069		1.3.3.10.6.9.1.5	CONSTRUCCIÓN CAJAS DE INSPECCIÓN	18 días	lun 11/08/25	lun 1/09/25	$1,708,524.00
2070		**1.3.3.10.6.9.2**	**PRELIMINARES - MOVIMIENTO DE TIERRAS, DEMOLICIONES Y RELLENOS**	**17 días**	**mié 26/11/25**	**mar 16/12/25**	**$76,805,671.65**
2071		1.3.3.10.6.9.2.1	DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y TRANSPORTES DE ESCOMBROS	10 días	mié 26/11/25	mar 9/12/25	$31,777,036.41
2072		1.3.3.10.6.9.2.2	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON RAJON Y SELLO DE RAJON	8 días	mar 2/12/25	jue 11/12/25	$19,065,259.88
2073		1.3.3.10.6.9.2.3	INSTALACION DE GEOTEXTILES Y RELLENO DE MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA	8 días	sáb 6/12/25	mar 16/12/25	$25,963,375.36
2074		**1.3.3.10.6.9.3**	**PAVIMENTOS**	**50 días**	**mié 24/12/25**	**lun 23/02/26**	**$241,085,274.11**
2075		1.3.3.10.6.9.3.1	BASES Y SUBBASES	8 días	mié 24/12/25	lun 5/01/26	$132,170,249.16
2076		1.3.3.10.6.9.3.2	MEZCLA ASFALTICA	8 días	mar 30/12/25	vie 9/01/26	$1,653,281.25
2077		1.3.3.10.6.9.3.3	CONCRETO LOSAS MR	8 días	sáb 7/02/26	mar 17/02/26	$107,082,750.00
2078		1.3.3.10.6.9.3.4	INSTALACION DE ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO (BORDILLOS, SARDINELES	5 días	mar 17/02/26	lun 23/02/26	$178,993.70
2079		**1.3.3.10.6.9.4**	**REDES HIDROSANITARIAS ACUEDUCTO**	**20 días**	**lun 9/03/26**	**mié 1/04/26**	**$54,872,300.44**
2080		1.3.3.10.6.9.4.1	EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS	8 días	lun 9/03/26	mié 18/03/26	$9,163,090.24
2081		1.3.3.10.6.9.4.2	INSTALACION DE TUBERIAS	8 días	vie 13/03/26	mar 24/03/26	$14,291,158.36
2082		1.3.3.10.6.9.4.3	INSTALACION ACCESORIOS Y EMPATES	10 días	lun 16/03/26	vie 27/03/26	$23,237,282.00
2083		1.3.3.10.6.9.4.4	RELLENO DE TUBERIAS	8 días	mar 24/03/26	mié 1/04/26	$8,180,769.84
2084		**1.3.3.10.6.9.5**	**REDES SECAS (Codensa)**	**30 días**	**mié 18/03/26**	**mar 21/04/26**	**$96,525,563.55**
2085		1.3.3.10.6.9.5.1	EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS	15 días	mié 18/03/26	sáb 4/04/26	$12,576,079.44
2086		1.3.3.10.6.9.5.2	INSTALACION DE DUCTERIAS	17 días	mié 18/03/26	mar 7/04/26	$45,039,636.18
2087		1.3.3.10.6.9.5.3	RELLENO DE DUCTERIAS	17 días	jue 19/03/26	jue 9/04/26	$12,042,378.93
2088		1.3.3.10.6.9.5.4	CONSTRUCCION DE CAJAS Y CAMARAS	20 días	lun 30/03/26	mar 21/04/26	$26,867,469.00
2089		**1.3.3.10.6.9.6**	**REDES SECAS (ETB)**	**20 días**	**lun 30/03/26**	**mar 21/04/26**	**$15,425,818.00**
2090		1.3.3.10.6.9.6.1	NIVELACION DE CAJAS Y CAMARAS	20 días	lun 30/03/26	mar 21/04/26	$15,425,818.00
2091		**1.3.3.10.6.9.7**	**REDES SECAS (VANTI)**	**30 días**	**mié 18/03/26**	**mar 21/04/26**	**$585,603.01**
2092		1.3.3.10.6.9.7.1	EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS	20 días	mié 18/03/26	vie 10/04/26	$468,887.80
2093		1.3.3.10.6.9.7.2	RELLENO DE DUCTERIAS	20 días	lun 30/03/26	mar 21/04/26	$116,715.21
2094		**1.3.3.10.6.9.8**	**ESPACIO PUBLICO**	**29 días**	**mié 18/03/26**	**mar 21/04/26**	**$232,663,724.27**
2095		1.3.3.10.6.9.8.1	DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y TRANSPORTES DE ESCOMBROS	15 días	mié 18/03/26	sáb 4/04/26	$35,755,791.85
2096		1.3.3.10.6.9.8.2	INSTALACION DE GEOTEXTILES	11 días	vie 27/03/26	jue 9/04/26	$13,345,313.25
2097		1.3.3.10.6.9.8.3	RELLENOS EN MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA ANDEN	11 días	mar 31/03/26	lun 13/04/26	$16,023,877.20
2098		1.3.3.10.6.9.8.4	RELLENOS EN MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA RAMPAS	9 días	sáb 4/04/26	mié 15/04/26	$15,401,832.00
2099		1.3.3.10.6.9.8.5	INSTALACION DE ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO Y PREFABRICADOS	11 días	mié 8/04/26	mar 21/04/26	$143,285,398.19
2100		1.3.3.10.6.9.8.6	CONCRETO LOSAS MR	13 días	lun 6/04/26	mar 21/04/26	$2,712,488.78
2101		1.3.3.10.6.9.8.7	ELEMENTOS MOBILIARIO URBANO (CANECAS, BANCAS, ETC)	8 días	sáb 11/04/26	mar 21/04/26	$6,139,023.00
2102		**1.3.3.10.6.9.9**	**PAISAJISMO**	**8 días**	**sáb 11/04/26**	**mar 21/04/26**	**$1,364,004.00**
2103		1.3.3.10.6.9.9.1	PAISAJISMO	8 días	sáb 11/04/26	mar 21/04/26	$1,364,004.00
2104		**1.3.3.10.6.9.10**	**SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN (HORIZONTAL Y VEF**	**8 días**	**sáb 11/04/26**	**mar 21/04/26**	**$22,773,930.30**
2105		1.3.3.10.6.9.10.1	SEÑALIZACIÓN	8 días	sáb 11/04/26	mar 21/04/26	$22,773,930.30
2106		**1.3.3.10.6.10**	**FASE 3 CRUCE VEHICULAR CALLE 12**	**46 días**	**sáb 14/03/26**	**mié 6/05/26**	**$481,440,878.84**
2107		**1.3.3.10.6.10.1**	**REDES HIDROSANITARIAS ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL**	**30 días**	**sáb 14/03/26**	**vie 17/04/26**	**$67,374,015.76**
2108		1.3.3.10.6.10.1.1	EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS	10 días	sáb 14/03/26	jue 26/03/26	$14,267,011.40
2109		1.3.3.10.6.10.1.2	INSTALACION DE TUBERIAS	8 días	jue 19/03/26	sáb 28/03/26	$6,786,954.28
2110		1.3.3.10.6.10.1.3	RELLENO DE TUBERIAS	12 días	mié 25/03/26	mar 7/04/26	$19,185,115.28
2111		1.3.3.10.6.10.1.4	CONSTRUCCION DE POZOS Y SUMIDEROS	20 días	jue 26/03/26	vie 17/04/26	$27,134,934.80
2112		**1.3.3.10.6.10.2**	**PRELIMINARES - MOVIMIENTO DE TIERRAS, DEMOLICIONES Y RELLENOS**	**18 días**	**mar 7/04/26**	**lun 27/04/26**	**$116,178,779.90**
2113		1.3.3.10.6.10.2.1	DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y TRANSPORTES DE ESCOMBROS	10 días	mar 7/04/26	vie 17/04/26	$52,325,024.90
2114		1.3.3.10.6.10.2.2	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON RAJON Y SELLO DE RAJON	14 días	mié 8/04/26	jue 23/04/26	$24,808,320.00
2115		1.3.3.10.6.10.2.3	INSTALACION DE GEOTEXTILES Y RELLENO DE MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA	10 días	jue 16/04/26	lun 27/04/26	$39,045,435.00
2116		**1.3.3.10.6.10.3**	**PAVIMENTOS**	**13 días**	**mié 22/04/26**	**mié 6/05/26**	**$297,888,083.18**
2117		1.3.3.10.6.10.3.1	BASES Y SUBBASES	6 días	mié 22/04/26	mar 28/04/26	$131,762,760.18
2118		1.3.3.10.6.10.3.2	MEZCLA ASFALTICA	5 días	vie 24/04/26	jue 30/04/26	$2,521,805.00
2119		1.3.3.10.6.10.3.3	CONCRETO LOSAS MR	9 días	jue 23/04/26	lun 4/05/26	$163,336,888.00
2120		1.3.3.10.6.10.3.4	INSTALACION DE ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO (BORDILLOS, SARDINELES	4 días	vie 1/05/26	mié 6/05/26	$266,630.00
2121		1.3.3.10.6.10.4	FIN CIV 16001251	0 días	mié 6/05/26	mié 6/05/26	$0.00
2122		**1.3.3.10.7**	**CIV 16001174**	**322 días**	**vie 4/04/25**	**mar 21/04/26**	**$2,002,744,577.26**
2123		*1.3.3.10.7.1*	*PRESENTACIÓN PMT A INTERVENTORÍA*	*0 días*	*vie 4/04/25*	*vie 4/04/25*	*$0.00*
2124		*1.3.3.10.7.2*	*RADICACIÓN A LA SDM*	*0 días*	*sáb 5/04/25*	*sáb 5/04/25*	*$0.00*
2125		*1.3.3.10.7.3*	*OBSERVACIONES POR PARTE DE LA SDM AL PMT*	*0 días*	*jue 24/04/25*	*jue 24/04/25*	*$0.00*
2126		*1.3.3.10.7.4*	*ATENCIÓN DE OBSERVACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA AL PMT*	*0 días*	*mar 13/05/25*	*mar 13/05/25*	*$0.00*
2127		*1.3.3.10.7.5*	*OBSERVACIONES POR PARTE DE LA SDM AL PMT*	*0 días*	*jue 29/05/25*	*jue 29/05/25*	*$0.00*
2128		*1.3.3.10.7.6*	*ATENCIÓN DE OBSERVACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA AL PMT*	*0 días*	*mar 17/06/25*	*mar 17/06/25*	*$0.00*
2129		*1.3.3.10.7.7*	*APROBACIÓN DEL PMT*	*0 días*	*mié 18/06/25*	*mié 18/06/25*	*$0.00*
2130		**1.3.3.10.7.8**	**FASE 1 ANDEN COSTADO OCCIDENTAL**	**130 días**	**vie 20/06/25**	**vie 21/11/25**	**$1,011,017,061.77**
2131		1.3.3.10.7.8.1	INICIO CIV 16001174	0 días	vie 20/06/25	vie 20/06/25	$0.00
2132		**1.3.3.10.7.8.2**	**TRAMITE DE PMT**	**6 días**	**mié 25/06/25**	**jue 3/07/25**	**$0.00**
2133		1.3.3.10.7.8.2.1	IMPLEMENTACIÓN PMT ESPECIFICIO Y CERRAMIENTO DE OBRA	6 días	mié 25/06/25	jue 3/07/25	$0.00
2134		**1.3.3.10.7.8.3**	**ACTIVIDADES DE ARQUEOLOGIA**	**6 días**	**mié 25/06/25**	**jue 3/07/25**	**$0.00**
2135		1.3.3.10.7.8.3.1	EXPLORACIÓN E INVESTIGACIÓN ARQUEOLOGICA EN LA ZONA DE INTERVENCIÓN	6 días	mié 25/06/25	jue 3/07/25	$0.00

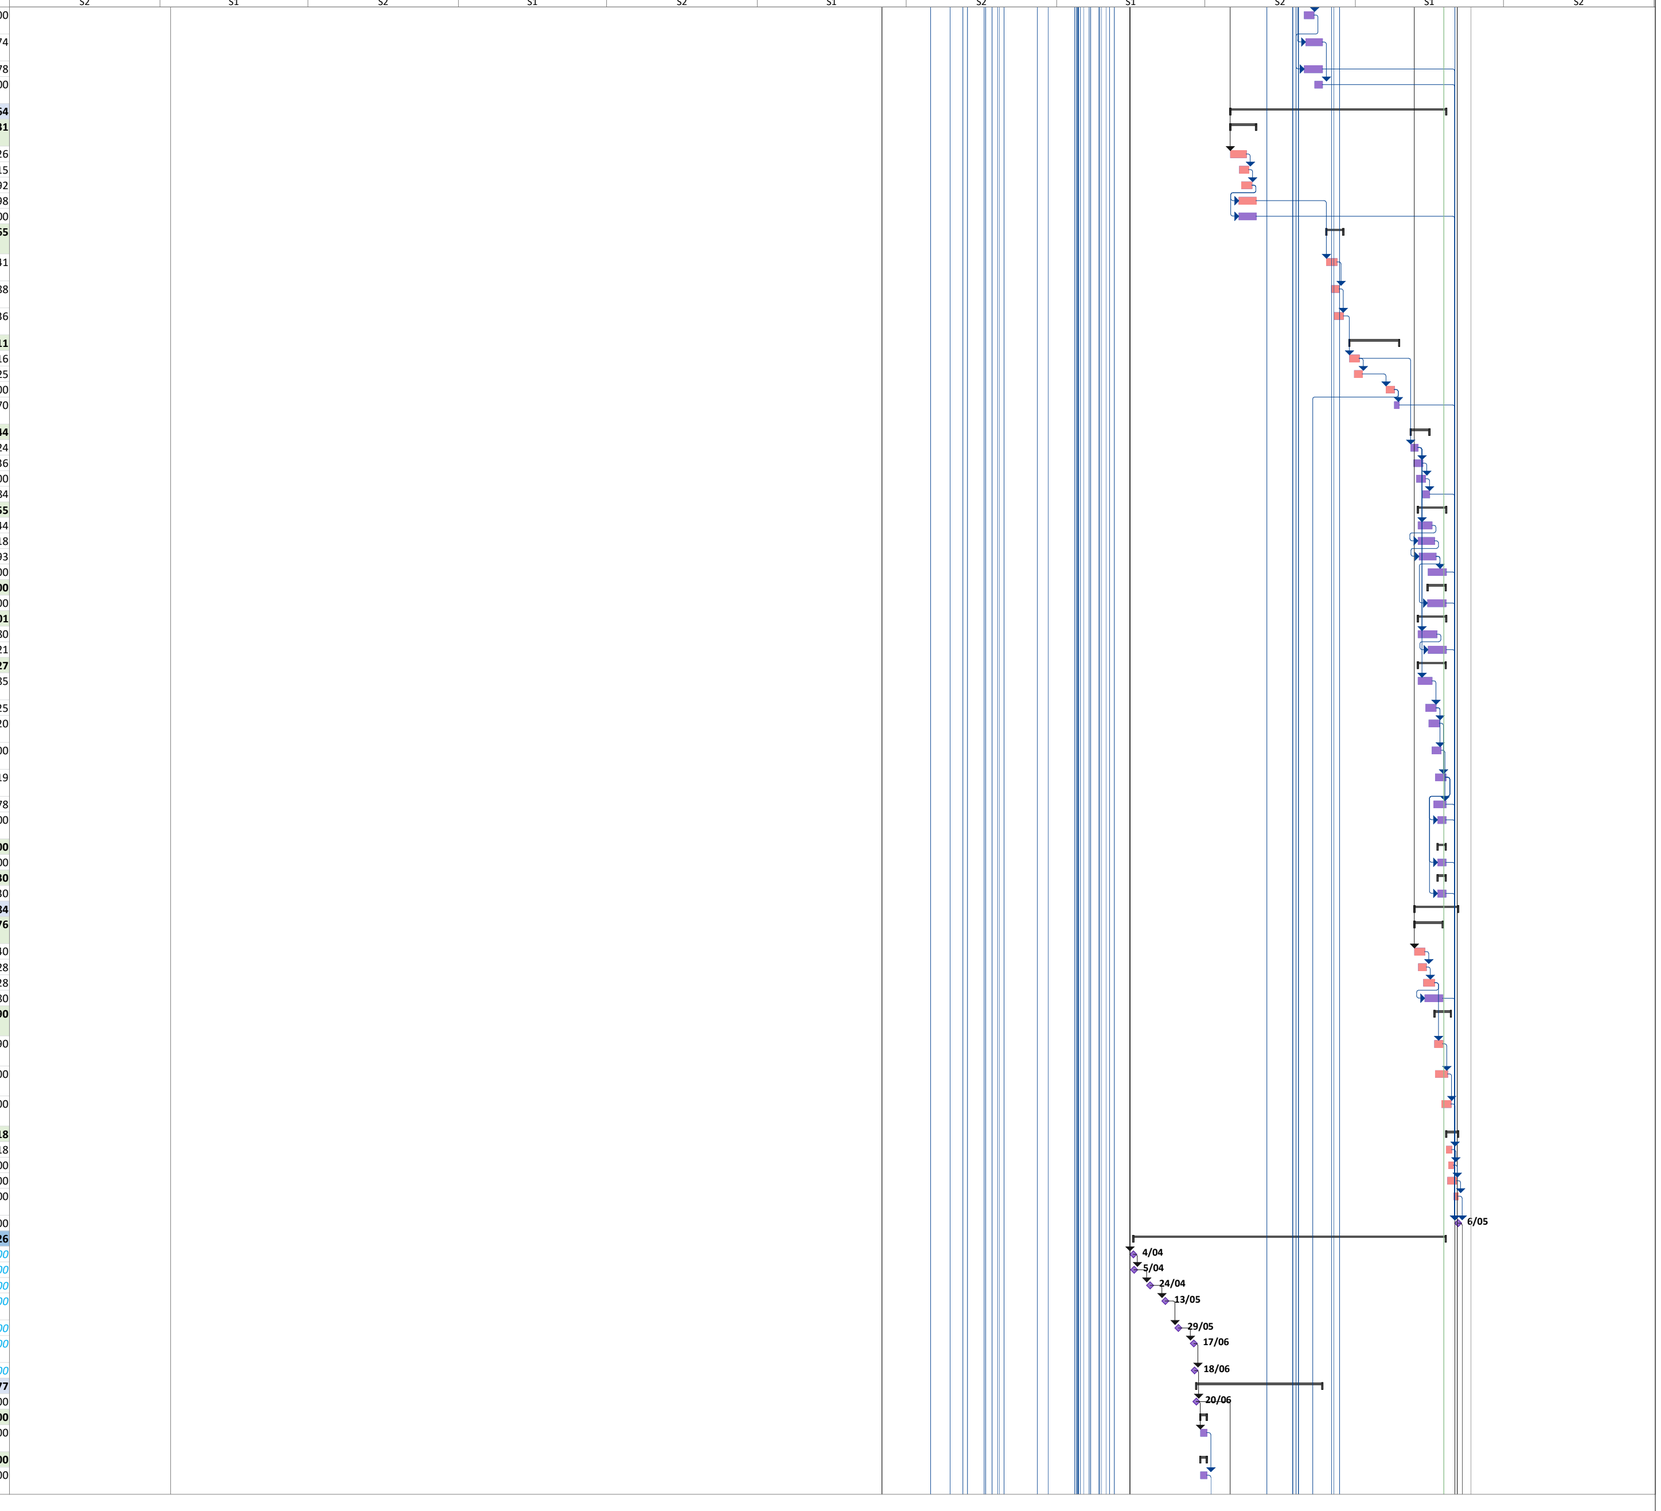

Proyecto:ID
Fecha: 14/1

Tarea	Resumen del proyecto	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Fecha límite	Tareas críticas		
División	Tareas externas	Resumen inactivo	Resumen manual	Tarea hito de sucesor controlado de ruta de acceso	División crítica		
Hito	Hito externo	Tarea manual	Sólo el comienzo	Tarea de resumen de sucesor controlado de ruta de a	Progreso		
Resumen	Tarea inactiva	Sólo duración	Sólo fin	Tarea normal de sucesor controlado de ruta de acces			


Id	Modo de tarea	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
2136		**1.3.3.10.7.8.4**	**REDES HIDROSANITARIAS ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL**	**50 días**	**jue 3/07/25**	**sáb 30/08/25**	**$219,933,744.02**
2137		1.3.3.10.7.8.4.1	EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS	25 días	jue 3/07/25	jue 31/07/25	$27,680,396.80
2138		1.3.3.10.7.8.4.2	INSTALACION DE TUBERIAS	23 días	mié 9/07/25	lun 4/08/25	$127,735,830.52
2139		1.3.3.10.7.8.4.3	RELLENO DE TUBERIAS	23 días	jue 10/07/25	mar 5/08/25	$29,651,725.88
2140		1.3.3.10.7.8.4.4	CONSTRUCCION DE POZOS Y SUMIDEROS	30 días	lun 14/07/25	mar 19/08/25	$34,011,528.82
2141		1.3.3.10.7.8.4.5	CONSTRUCCIÓN CAJAS DE INSPECCIÓN	30 días	vie 25/07/25	sáb 30/08/25	$854,262.00
2142		**1.3.3.10.7.8.5**	**PRELIMINARES - MOVIMIENTO DE TIERRAS, DEMOLICIONES Y RELLENOS**	**38 días**	**lun 4/08/25**	**mié 17/09/25**	**$127,100,639.35**
2143		1.3.3.10.7.8.5.1	DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y TRANSPORTES DE ESCOMBROS	20 días	lun 4/08/25	jue 28/08/25	$54,607,389.14
2144		1.3.3.10.7.8.5.2	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON RAJON Y SELLO DE RAJON	14 días	vie 22/08/25	lun 8/09/25	$29,622,295.58
2145		1.3.3.10.7.8.5.3	INSTALACION DE GEOTEXTILES Y RELLENO DE MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA	14 días	mar 2/09/25	mié 17/09/25	$42,870,954.63
2146		**1.3.3.10.7.8.6**	**PAVIMENTOS**	**60 días**	**jue 11/09/25**	**vie 21/11/25**	**$386,368,820.57**
2147		1.3.3.10.7.8.6.1	BASES Y SUBBASES	13 días	jue 11/09/25	vie 26/09/25	$205,386,430.89
2148		1.3.3.10.7.8.6.2	MEZCLA ASFALTICA	16 días	vie 19/09/25	mar 7/10/25	$2,747,250.84
2149		1.3.3.10.7.8.6.3	CONCRETO LOSAS MR	16 días	mié 29/10/25	mar 18/11/25	$177,945,830.64
2150		1.3.3.10.7.8.6.4	INSTALACION DE ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO (BORDILLOS, SARDINELES	11 días	vie 7/11/25	vie 21/11/25	$289,308.20
2151		**1.3.3.10.7.8.7**	**REDES HIDROSANITARIAS ACUEDUCTO**	**25 días**	**sáb 27/09/25**	**lun 27/10/25**	**$42,866,375.08**
2152		1.3.3.10.7.8.7.1	EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS	12 días	sáb 27/09/25	vie 10/10/25	$9,564,482.04
2153		1.3.3.10.7.8.7.2	INSTALACION DE TUBERIAS	10 días	jue 2/10/25	mar 14/10/25	$12,663,166.75
2154		1.3.3.10.7.8.7.3	INSTALACION ACCESORIOS Y EMPATES	16 días	vie 3/10/25	jue 23/10/25	$11,427,054.00
2155		1.3.3.10.7.8.7.4	RELLENO DE TUBERIAS	12 días	mar 14/10/25	lun 27/10/25	$9,211,672.29
2156		**1.3.3.10.7.8.8**	**REDES SECAS (Codensa)**	**34 días**	**vie 10/10/25**	**vie 21/11/25**	**$42,852,384.59**
2157		1.3.3.10.7.8.8.1	EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS	15 días	vie 10/10/25	mié 29/10/25	$4,645,069.16
2158		1.3.3.10.7.8.8.2	INSTALACION DE DUCTERIAS	17 días	lun 20/10/25	lun 10/11/25	$23,773,189.83
2159		1.3.3.10.7.8.8.3	RELLENO DE DUCTERIAS	17 días	sáb 25/10/25	vie 14/11/25	$4,523,358.60
2160		1.3.3.10.7.8.8.4	CONSTRUCCION DE CAJAS Y CAMARAS	20 días	mar 28/10/25	vie 21/11/25	$9,910,767.00
2161		**1.3.3.10.7.8.9**	**ESPACIO PUBLICO**	**30 días**	**jue 16/10/25**	**vie 21/11/25**	**$191,895,098.16**
2162		1.3.3.10.7.8.9.1	DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y TRANSPORTES DE ESCOMBROS	15 días	jue 16/10/25	mar 4/11/25	$30,518,583.88
2163		1.3.3.10.7.8.9.2	INSTALACION DE GEOTEXTILES	11 días	vie 24/10/25	jue 6/11/25	$4,290,559.06
2164		1.3.3.10.7.8.9.3	RELLENOS EN MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA ANDEN	11 días	mar 28/10/25	mar 11/11/25	$13,649,184.06
2165		1.3.3.10.7.8.9.4	RELLENOS EN MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA RAMPAS	9 días	jue 30/10/25	mar 11/11/25	$13,119,122.00
2166		1.3.3.10.7.8.9.5	INSTALACION DE ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO Y PREFABRICADOS	16 días	sáb 1/11/25	vie 21/11/25	$118,994,255.72
2167		1.3.3.10.7.8.9.6	CONCRETO LOSAS MR	18 días	jue 30/10/25	vie 21/11/25	$4,120,350.44
2168		1.3.3.10.7.8.9.7	ELEMENTOS MOBILIARIO URBANO (CANECAS, BANCAS, ETC)	8 días	mié 12/11/25	vie 21/11/25	$7,203,043.00
2169		**1.3.3.10.7.9**	**FASE 2 ANDEN COSTADO ORIENTAL**	**223 días**	**vie 1/08/25**	**mar 21/04/26**	**$991,727,515.49**
2170		**1.3.3.10.7.9.1**	**REDES HIDROSANITARIAS ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL**	**103 días**	**vie 1/08/25**	**lun 1/12/25**	**$219,913,065.16**
2171		1.3.3.10.7.9.1.1	EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS	15 días	vie 1/08/25	mié 20/08/25	$27,679,725.34
2172		1.3.3.10.7.9.1.2	INSTALACION DE TUBERIAS	10 días	mar 12/08/25	sáb 23/08/25	$127,726,874.38
2173		1.3.3.10.7.9.1.3	RELLENO DE TUBERIAS	10 días	jue 14/08/25	mié 27/08/25	$29,649,328.44
2174		1.3.3.10.7.9.1.4	CONSTRUCCION DE POZOS Y SUMIDEROS	18 días	lun 10/11/25	lun 1/12/25	$34,002,875.00
2175		1.3.3.10.7.9.1.5	CONSTRUCCIÓN CAJAS DE INSPECCIÓN	18 días	lun 10/11/25	lun 1/12/25	$854,262.00
2176		**1.3.3.10.7.9.2**	**PRELIMINARES - MOVIMIENTO DE TIERRAS, DEMOLICIONES Y RELLENOS**	**17 días**	**mié 26/11/25**	**mar 16/12/25**	**$127,098,697.56**
2177		1.3.3.10.7.9.2.1	DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y TRANSPORTES DE ESCOMBROS	10 días	mié 26/11/25	mar 9/12/25	$54,609,264.85
2178		1.3.3.10.7.9.2.2	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON RAJON Y SELLO DE RAJON	8 días	mar 2/12/25	jue 11/12/25	$29,620,562.65
2179		1.3.3.10.7.9.2.3	INSTALACION DE GEOTEXTILES Y RELLENO DE MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA	8 días	sáb 6/12/25	mar 16/12/25	$42,868,870.06
2180		**1.3.3.10.7.9.3**	**PAVIMENTOS**	**50 días**	**mié 24/12/25**	**lun 23/02/26**	**$349,000,182.35**
2181		1.3.3.10.7.9.3.1	BASES Y SUBBASES	8 días	mié 24/12/25	lun 5/01/26	$168,029,279.40
2182		1.3.3.10.7.9.3.2	MEZCLA ASFALTICA	8 días	mar 30/12/25	vie 9/01/26	$2,747,215.57
2183		1.3.3.10.7.9.3.3	CONCRETO LOSAS MR	8 días	sáb 7/02/26	mar 17/02/26	$177,934,408.48
2184		1.3.3.10.7.9.3.4	INSTALACION DE ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO (BORDILLOS, SARDINELES	5 días	mar 17/02/26	lun 23/02/26	$289,278.90
2185		**1.3.3.10.7.9.4**	**REDES HIDROSANITARIAS ACUEDUCTO**	**20 días**	**lun 16/02/26**	**mar 10/03/26**	**$45,105,990.83**
2186		1.3.3.10.7.9.4.1	EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS	8 días	lun 16/02/26	mar 24/02/26	$9,563,877.76
2187		1.3.3.10.7.9.4.2	INSTALACION DE TUBERIAS	8 días	jue 19/02/26	sáb 28/02/26	$12,661,642.93
2188		1.3.3.10.7.9.4.3	INSTALACION ACCESORIOS Y EMPATES	10 días	lun 23/02/26	jue 5/03/26	$13,670,363.00
2189		1.3.3.10.7.9.4.4	RELLENO DE TUBERIAS	8 días	sáb 28/02/26	mar 10/03/26	$9,210,107.14
2190		**1.3.3.10.7.9.5**	**REDES SECAS (Codensa)**	**39 días**	**vie 27/02/26**	**mar 14/04/26**	**$39,503,317.88**
2191		1.3.3.10.7.9.5.1	EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS	15 días	vie 27/02/26	mar 17/03/26	$4,645,069.16
2192		1.3.3.10.7.9.5.2	INSTALACION DE DUCTERIAS	17 días	mié 4/03/26	mar 24/03/26	$23,768,424.12
2193		1.3.3.10.7.9.5.3	RELLENO DE DUCTERIAS	17 días	mié 11/03/26	mar 31/03/26	$4,523,358.60
2194		1.3.3.10.7.9.5.4	CONSTRUCCION DE CAJAS Y CAMARAS	20 días	vie 20/03/26	mar 14/04/26	$6,566,466.00
2195		**1.3.3.10.7.9.6**	**REDES SECAS (ETB)**	**20 días**	**jue 19/03/26**	**sáb 11/04/26**	**$7,253,290.00**
2196		1.3.3.10.7.9.6.1	NIVELACION DE CAJAS Y CAMARAS	20 días	jue 19/03/26	sáb 11/04/26	$7,253,290.00
2197		**1.3.3.10.7.9.7**	**ESPACIO PUBLICO**	**29 días**	**mié 18/03/26**	**mar 21/04/26**	**$191,616,242.71**
2198		1.3.3.10.7.9.7.1	DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y TRANSPORTES DE ESCOMBROS	15 días	mié 18/03/26	sáb 4/04/26	$30,517,515.71
2199		1.3.3.10.7.9.7.2	INSTALACION DE GEOTEXTILES	11 días	vie 27/03/26	jue 9/04/26	$4,290,559.06
2200		1.3.3.10.7.9.7.3	RELLENOS EN MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA ANDEN	11 días	mar 31/03/26	lun 13/04/26	$13,647,972.33
2201		1.3.3.10.7.9.7.4	RELLENOS EN MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA RAMPAS	9 días	sáb 4/04/26	mié 15/04/26	$13,119,122.00
2202		1.3.3.10.7.9.7.5	INSTALACION DE ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO Y PREFABRICADOS	11 días	mié 8/04/26	mar 21/04/26	$118,992,305.15
2203		1.3.3.10.7.9.7.6	CONCRETO LOSAS MR	13 días	lun 6/04/26	mar 21/04/26	$4,111,730.46
2204		1.3.3.10.7.9.7.7	ELEMENTOS MOBILIARIO URBANO (CANECAS, BANCAS, ETC)	8 días	sáb 11/04/26	mar 21/04/26	$6,937,038.00
2205		**1.3.3.10.7.9.8**	**PAISAJISMO**	**8 días**	**sáb 11/04/26**	**mar 21/04/26**	**$682,196.00**
2206		1.3.3.10.7.9.8.1	PAISAJISMO	8 días	sáb 11/04/26	mar 21/04/26	$682,196.00
2207		**1.3.3.10.7.9.9**	**SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN (HORIZONTAL Y VEF**	**8 días**	**sáb 11/04/26**	**mar 21/04/26**	**$11,554,533.00**
2208		1.3.3.10.7.9.9.1	SEÑALIZACIÓN	8 días	sáb 11/04/26	mar 21/04/26	$11,554,533.00
2209		1.3.3.10.7.9.10	FIN CIV 16001174	0 días	mar 21/04/26	mar 21/04/26	$0.00
2210		**1.3.3.10.8**	**CIV 16001113**	**323 días**	**vie 4/04/25**	**mar 21/04/26**	**$1,851,147,269.65**
2211		*1.3.3.10.8.1*	*PRESENTACIÓN PMT A INTERVENTORÍA*	*0 días*	*vie 4/04/25*	*vie 4/04/25*	*$0.00*
2212		*1.3.3.10.8.2*	*RADICACIÓN A LA SDM*	*0 días*	*sáb 5/04/25*	*sáb 5/04/25*	*$0.00*
2213		*1.3.3.10.8.3*	*OBSERVACIONES POR PARTE DE LA SDM AL PMT*	*0 días*	*jue 24/04/25*	*jue 24/04/25*	*$0.00*
2214		*1.3.3.10.8.4*	*ATENCIÓN DE OBSERVACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA AL PMT*	*0 días*	*mar 13/05/25*	*mar 13/05/25*	*$0.00*
2215		*1.3.3.10.8.5*	*OBSERVACIONES POR PARTE DE LA SDM AL PMT*	*0 días*	*jue 29/05/25*	*jue 29/05/25*	*$0.00*

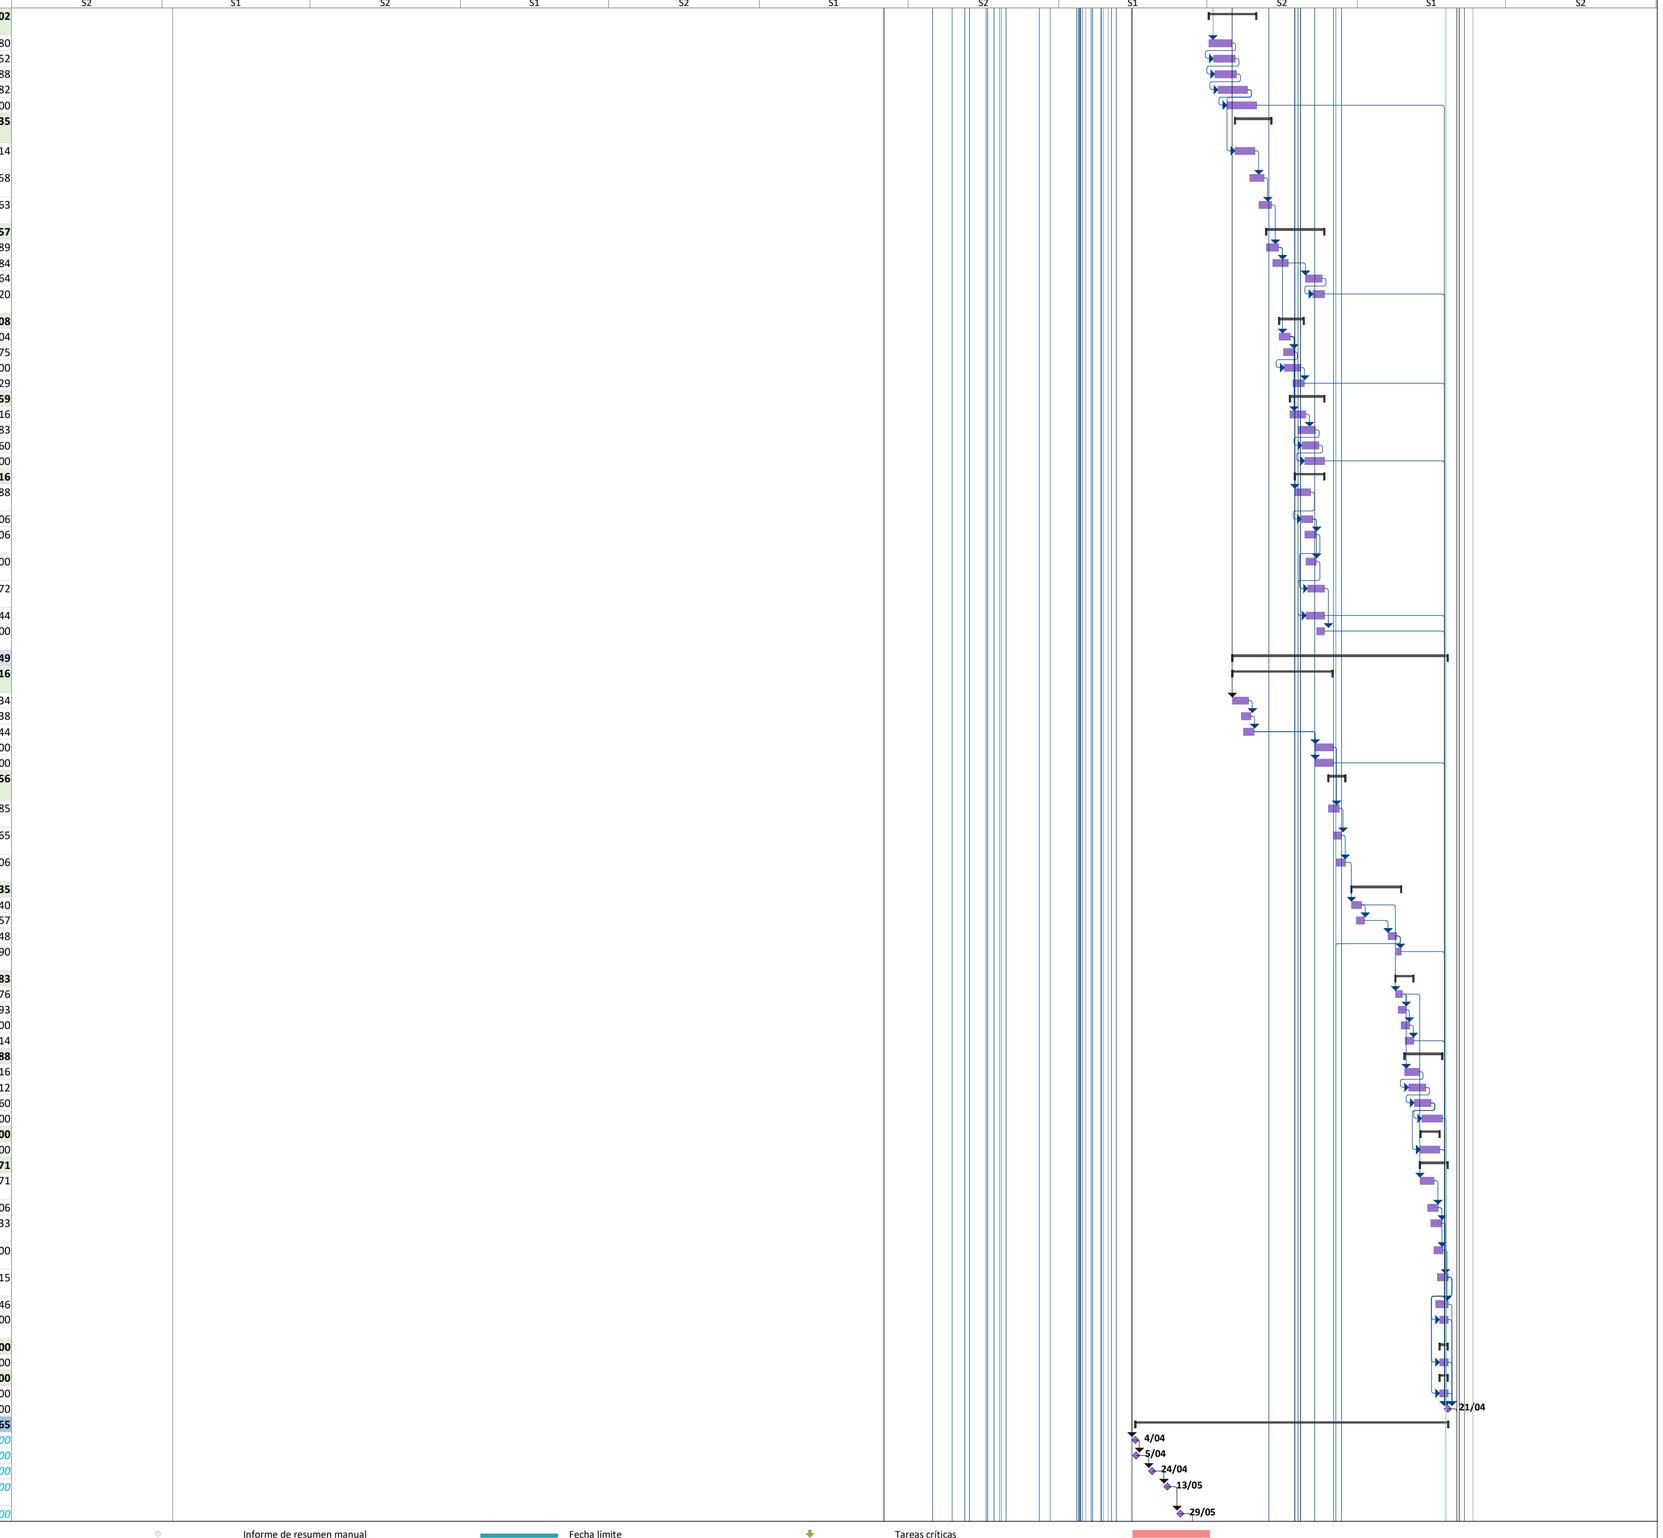

Proyecto:ID
Fecha: 14/1

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tareas externas
Hito externo
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
Sólo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
Sólo el comienzo
Sólo fin
Fecha límite
Tarea hito de sucesor controlado de ruta de acceso
Tarea de resumen de sucesor controlado de ruta de a
Tarea normal de sucesor controlado de ruta de acces
Tareas críticas
División crítica
Progreso


Id	Modo de tarea	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
2216		*1.3.3.10.8.6*	*ATENCIÓN DE OBSERVACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA AL PMT*	*0 días*	*mar 17/06/25*	*mar 17/06/25*	*$0.00*
2217		*1.3.3.10.8.7*	*APROBACIÓN DEL PMT*	*0 días*	*mié 18/06/25*	*mié 18/06/25*	*$0.00*
2218		**1.3.3.10.8.8**	**FASE 1 ANDEN COSTADO OCCIDENTAL**	**259 días**	**vie 20/06/25**	**mar 21/04/26**	**$793,489,561.53**
2219		1.3.3.10.8.8.1	INICIO CIV 16001113	0 días	vie 20/06/25	vie 20/06/25	$0.00
2220		**1.3.3.10.8.8.2**	**TRAMITE DE PMT**	**6 días**	**mié 25/06/25**	**jue 3/07/25**	**$0.00**
2221		1.3.3.10.8.8.2.1	IMPLEMENTACIÓN PMT ESPECIFICIO Y CERRAMIENTO DE OBRA	6 días	mié 25/06/25	jue 3/07/25	$0.00
2222		**1.3.3.10.8.8.3**	**ACTIVIDADES DE ARQUEOLOGIA**	**6 días**	**mié 25/06/25**	**jue 3/07/25**	**$0.00**
2223		1.3.3.10.8.8.3.1	EXPLORACIÓN E INVESTIGACIÓN ARQUEOLOGICA EN LA ZONA DE INTERVENCIÓN	6 días	mié 25/06/25	jue 3/07/25	$0.00
2224		**1.3.3.10.8.8.4**	**REDES HIDROSANITARIAS ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL**	**50 días**	**jue 3/07/25**	**sáb 30/08/25**	**$123,656,284.84**
2225		1.3.3.10.8.8.4.1	EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS	25 días	jue 3/07/25	jue 31/07/25	$10,796,025.38
2226		1.3.3.10.8.8.4.2	INSTALACION DE TUBERIAS	23 días	mié 9/07/25	lun 4/08/25	$75,474,324.58
2227		1.3.3.10.8.8.4.3	RELLENO DE TUBERIAS	23 días	jue 10/07/25	mar 5/08/25	$22,630,746.28
2228		1.3.3.10.8.8.4.4	CONSTRUCCION DE POZOS Y SUMIDEROS	30 días	lun 14/07/25	mar 19/08/25	$13,046,664.60
2229		1.3.3.10.8.8.4.5	CONSTRUCCIÓN CAJAS DE INSPECCIÓN	30 días	vie 25/07/25	sáb 30/08/25	$1,708,524.00
2230		**1.3.3.10.8.8.5**	**PRELIMINARES - MOVIMIENTO DE TIERRAS, DEMOLICIONES Y RELLENOS**	**38 días**	**lun 4/08/25**	**mié 17/09/25**	**$55,197,797.61**
2231		1.3.3.10.8.8.5.1	DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y TRANSPORTES DE ESCOMBROS	20 días	lun 4/08/25	jue 28/08/25	$19,823,461.63
2232		1.3.3.10.8.8.5.2	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON RAJON Y SELLO DE RAJON	14 días	vie 22/08/25	lun 8/09/25	$12,571,828.46
2233		1.3.3.10.8.8.5.3	INSTALACION DE GEOTEXTILES Y RELLENO DE MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA	14 días	mar 2/09/25	mié 17/09/25	$22,802,507.52
2234		**1.3.3.10.8.8.6**	**PAVIMENTOS**	**60 días**	**jue 11/09/25**	**vie 21/11/25**	**$268,556,630.48**
2235		1.3.3.10.8.8.6.1	BASES Y SUBBASES	13 días	jue 11/09/25	vie 26/09/25	$122,905,867.35
2236		1.3.3.10.8.8.6.2	MEZCLA ASFALTICA	16 días	vie 19/09/25	mar 7/10/25	$1,745,265.41
2237		1.3.3.10.8.8.6.3	CONCRETO LOSAS MR	16 días	mié 29/10/25	mar 18/11/25	$143,656,506.32
2238		1.3.3.10.8.8.6.4	INSTALACION DE ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO (BORDILLOS, SARDINELES	11 días	vie 7/11/25	vie 21/11/25	$248,991.40
2239		**1.3.3.10.8.8.7**	**REDES HIDROSANITARIAS ACUEDUCTO**	**20 días**	**mar 10/03/26**	**jue 2/04/26**	**$33,683,822.59**
2240		1.3.3.10.8.8.7.1	EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS	8 días	mar 10/03/26	mié 18/03/26	$7,373,639.40
2241		1.3.3.10.8.8.7.2	INSTALACION DE TUBERIAS	8 días	sáb 14/03/26	mar 24/03/26	$11,300,867.24
2242		1.3.3.10.8.8.7.3	INSTALACION ACCESORIOS Y EMPATES	10 días	mar 17/03/26	sáb 28/03/26	$7,961,497.00
2243		1.3.3.10.8.8.7.4	RELLENO DE TUBERIAS	8 días	mié 25/03/26	jue 2/04/26	$7,047,818.95
2244		**1.3.3.10.8.8.8**	**REDES SECAS (Codensa)**	**34 días**	**vie 13/03/26**	**mar 21/04/26**	**$82,333,155.87**
2245		1.3.3.10.8.8.8.1	EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS	15 días	vie 13/03/26	mar 31/03/26	$7,940,761.56
2246		1.3.3.10.8.8.8.2	INSTALACION DE DUCTERIAS	17 días	mié 18/03/26	mar 7/04/26	$23,003,793.77
2247		1.3.3.10.8.8.8.3	RELLENO DE DUCTERIAS	17 días	mié 25/03/26	mar 14/04/26	$7,659,484.54
2248		1.3.3.10.8.8.8.4	CONSTRUCCION DE CAJAS Y CAMARAS	20 días	lun 30/03/26	mar 21/04/26	$43,729,116.00
2249		**1.3.3.10.8.8.9**	**ESPACIO PUBLICO**	**25 días**	**mié 25/03/26**	**mar 21/04/26**	**$230,061,870.14**
2250		1.3.3.10.8.8.9.1	DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y TRANSPORTES DE ESCOMBROS	15 días	mié 25/03/26	vie 10/04/26	$31,122,417.16
2251		1.3.3.10.8.8.9.2	INSTALACION DE GEOTEXTILES	11 días	mié 1/04/26	mar 14/04/26	$5,379,482.53
2252		1.3.3.10.8.8.9.3	RELLENOS EN MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA ANDEN	11 días	sáb 4/04/26	jue 16/04/26	$17,113,644.24
2253		1.3.3.10.8.8.9.4	RELLENOS EN MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA RAMPAS	9 días	mar 7/04/26	jue 16/04/26	$16,449,294.40
2254		1.3.3.10.8.8.9.5	INSTALACION DE ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO Y PREFABRICADOS	11 días	jue 9/04/26	mar 21/04/26	$151,379,097.71
2255		1.3.3.10.8.8.9.6	CONCRETO LOSAS MR	13 días	mar 7/04/26	mar 21/04/26	$1,680,896.10
2256		1.3.3.10.8.8.9.7	ELEMENTOS MOBILIARIO URBANO (CANECAS, BANCAS, ETC)	8 días	lun 13/04/26	mar 21/04/26	$6,937,038.00
2257		**1.3.3.10.8.9**	**FASE 2 ANDEN COSTADO ORIENTAL**	**173 días**	**vie 1/08/25**	**lun 23/02/26**	**$772,040,326.03**
2258		**1.3.3.10.8.9.1**	**REDES HIDROSANITARIAS ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL**	**39 días**	**vie 1/08/25**	**mar 16/09/25**	**$139,773,953.57**
2259		1.3.3.10.8.9.1.1	EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS	15 días	vie 1/08/25	mié 20/08/25	$10,795,561.49
2260		1.3.3.10.8.9.1.2	INSTALACION DE TUBERIAS	10 días	mar 12/08/25	sáb 23/08/25	$75,461,824.10
2261		1.3.3.10.8.9.1.3	RELLENO DE TUBERIAS	10 días	jue 14/08/25	mié 27/08/25	$22,628,348.84
2262		1.3.3.10.8.9.1.4	CONSTRUCCION DE POZOS Y SUMIDEROS	18 días	mié 27/08/25	mar 16/09/25	$29,179,695.14
2263		1.3.3.10.8.9.1.5	CONSTRUCCIÓN CAJAS DE INSPECCIÓN	18 días	mié 27/08/25	mar 16/09/25	$1,708,524.00
2264		**1.3.3.10.8.9.2**	**PRELIMINARES - MOVIMIENTO DE TIERRAS, DEMOLICIONES Y RELLENOS**	**17 días**	**jue 11/09/25**	**mié 1/10/25**	**$55,192,868.65**
2265		1.3.3.10.8.9.2.1	DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y TRANSPORTES DE ESCOMBROS	10 días	jue 11/09/25	mar 23/09/25	$19,822,340.04
2266		1.3.3.10.8.9.2.2	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON RAJON Y SELLO DE RAJON	8 días	mié 17/09/25	vie 26/09/25	$12,570,105.66
2267		1.3.3.10.8.9.2.3	INSTALACION DE GEOTEXTILES Y RELLENO DE MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA	8 días	lun 22/09/25	mié 1/10/25	$22,800,422.95
2268		**1.3.3.10.8.9.3**	**PAVIMENTOS**	**36 días**	**mié 8/10/25**	**vie 21/11/25**	**$220,130,916.95**
2269		1.3.3.10.8.9.3.1	BASES Y SUBBASES	8 días	mié 8/10/25	sáb 18/10/25	$122,905,867.35
2270		1.3.3.10.8.9.3.2	MEZCLA ASFALTICA	8 días	mar 14/10/25	jue 23/10/25	$2,217,848.14
2271		1.3.3.10.8.9.3.3	CONCRETO LOSAS MR	8 días	jue 6/11/25	vie 14/11/25	$94,758,239.36
2272		1.3.3.10.8.9.3.4	INSTALACION DE ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO (BORDILLOS, SARDINELES	5 días	vie 14/11/25	vie 21/11/25	$248,962.10
2273		**1.3.3.10.8.9.4**	**REDES HIDROSANITARIAS ACUEDUCTO**	**20 días**	**mié 8/10/25**	**vie 31/10/25**	**$44,074,186.80**
2274		1.3.3.10.8.9.4.1	EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS	8 días	mié 8/10/25	vie 17/10/25	$7,373,175.84
2275		1.3.3.10.8.9.4.2	INSTALACION DE TUBERIAS	8 días	mar 14/10/25	mié 22/10/25	$10,812,271.42
2276		1.3.3.10.8.9.4.3	INSTALACION ACCESORIOS Y EMPATES	10 días	mié 15/10/25	lun 27/10/25	$18,843,522.00
2277		1.3.3.10.8.9.4.4	RELLENO DE TUBERIAS	8 días	mié 22/10/25	vie 31/10/25	$7,045,217.54
2278		**1.3.3.10.8.9.5**	**REDES SECAS (Codensa)**	**39 días**	**lun 6/10/25**	**vie 21/11/25**	**$51,646,911.79**
2279		1.3.3.10.8.9.5.1	EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS	15 días	lun 6/10/25	jue 23/10/25	$7,940,157.28
2280		1.3.3.10.8.9.5.2	INSTALACION DE DUCTERIAS	17 días	jue 9/10/25	jue 30/10/25	$22,998,591.12
2281		1.3.3.10.8.9.5.3	RELLENO DE DUCTERIAS	17 días	vie 17/10/25	jue 6/11/25	$7,657,919.39
2282		1.3.3.10.8.9.5.4	CONSTRUCCION DE CAJAS Y CAMARAS	20 días	mar 28/10/25	vie 21/11/25	$13,050,244.00
2283		**1.3.3.10.8.9.6**	**REDES SECAS (ETB)**	**20 días**	**mar 28/10/25**	**vie 21/11/25**	**$9,750,073.00**
2284		1.3.3.10.8.9.6.1	NIVELACION DE CAJAS Y CAMARAS	20 días	mar 28/10/25	vie 21/11/25	$9,750,073.00
2285		**1.3.3.10.8.9.7**	**ESPACIO PUBLICO**	**29 días**	**vie 17/10/25**	**vie 21/11/25**	**$229,778,250.17**
2286		1.3.3.10.8.9.7.1	DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y TRANSPORTES DE ESCOMBROS	15 días	vie 17/10/25	mié 5/11/25	$31,121,953.27
2287		1.3.3.10.8.9.7.2	INSTALACION DE GEOTEXTILES	11 días	lun 27/10/25	lun 10/11/25	$5,379,482.53
2288		1.3.3.10.8.9.7.3	RELLENOS EN MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA ANDEN	11 días	jue 30/10/25	mié 12/11/25	$17,110,850.49
2289		1.3.3.10.8.9.7.4	RELLENOS EN MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA RAMPAS	9 días	mié 5/11/25	vie 14/11/25	$16,447,571.60
2290		1.3.3.10.8.9.7.5	INSTALACION DE ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO Y PREFABRICADOS	11 días	vie 7/11/25	vie 21/11/25	$151,375,083.16
2291		1.3.3.10.8.9.7.6	CONCRETO LOSAS MR	13 días	jue 6/11/25	vie 21/11/25	$1,672,276.12
2292		1.3.3.10.8.9.7.7	ELEMENTOS MOBILIARIO URBANO (CANECAS, BANCAS, ETC)	8 días	mié 12/11/25	vie 21/11/25	$6,671,033.00
2293		**1.3.3.10.8.9.8**	**PAISAJISMO**	**8 días**	**vie 13/02/26**	**lun 23/02/26**	**$170,646.00**

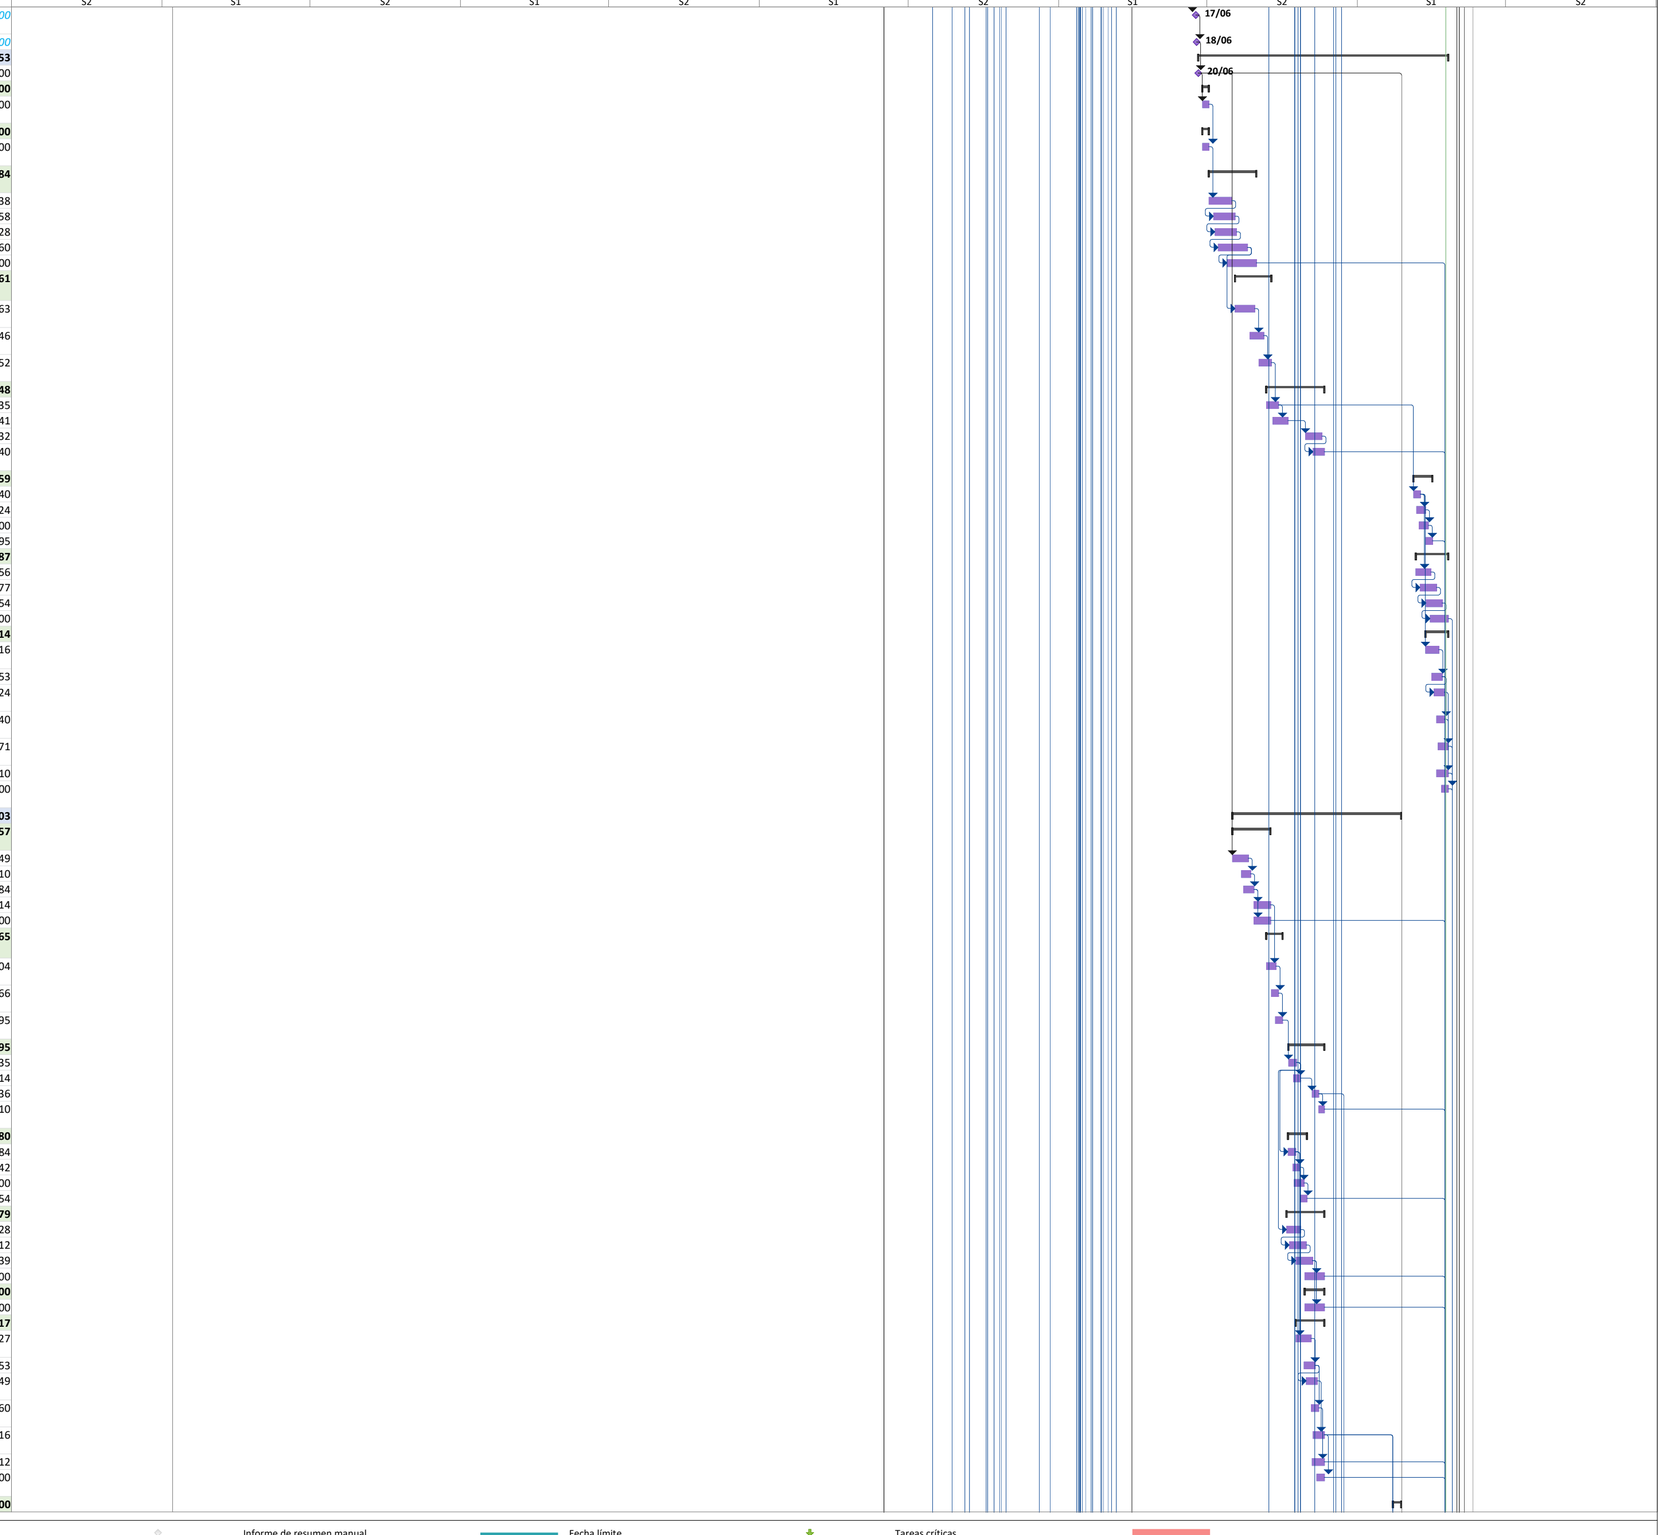

Proyecto:ID
Fecha: 14/1

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tareas externas
Hito externo
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
Sólo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
Sólo el comienzo
Sólo fin
Fecha límite
Tarea hito de sucesor controlado de ruta de acceso
Tarea de resumen de sucesor controlado de ruta de a
Tarea normal de sucesor controlado de ruta de acces
Tareas críticas
División crítica
Progreso


Id	Modo de tarea	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
2294		1.3.3.10.8.9.8.1	PAISAJISMO	8 días	vie 13/02/26	lun 23/02/26	$170,646.00
2295		**1.3.3.10.8.9.9**	**SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN (HORIZONTAL Y VEF**	**8 días**	**vie 13/02/26**	**lun 23/02/26**	**$21,522,519.10**
2296		1.3.3.10.8.9.9.1	SEÑALIZACIÓN	8 días	vie 13/02/26	lun 23/02/26	$21,522,519.10
2297		**1.3.3.10.8.10**	**FASE 3 CRUCE VEHICULAR CALLE 12B**	**50 días**	**mar 24/02/26**	**mar 21/04/26**	**$285,617,382.09**
2298		**1.3.3.10.8.10.1**	**REDES HIDROSANITARIAS ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL**	**30 días**	**mar 24/02/26**	**lun 30/03/26**	**$85,268,953.02**
2299		1.3.3.10.8.10.1.1	EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS	10 días	mar 24/02/26	vie 6/03/26	$16,829,272.16
2300		1.3.3.10.8.10.1.2	INSTALACION DE TUBERIAS	8 días	vie 27/02/26	lun 9/03/26	$26,695,424.00
2301		1.3.3.10.8.10.1.3	RELLENO DE TUBERIAS	12 días	mié 4/03/26	mié 18/03/26	$18,291,025.12
2302		1.3.3.10.8.10.1.4	CONSTRUCCION DE POZOS Y SUMIDEROS	20 días	vie 6/03/26	lun 30/03/26	$23,453,231.74
2303		**1.3.3.10.8.10.2**	**PRELIMINARES - MOVIMIENTO DE TIERRAS, DEMOLICIONES Y RELLENOS**	**22 días**	**vie 6/03/26**	**mié 1/04/26**	**$95,342,750.56**
2304		1.3.3.10.8.10.2.1	DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y TRANSPORTES DE ESCOMBROS	10 días	vie 6/03/26	mié 18/03/26	$48,693,638.56
2305		1.3.3.10.8.10.2.2	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON RAJON Y SELLO DE RAJON	14 días	vie 13/03/26	lun 30/03/26	$23,016,608.00
2306		1.3.3.10.8.10.2.3	INSTALACION DE GEOTEXTILES Y RELLENO DE MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA	10 días	jue 19/03/26	mié 1/04/26	$23,632,504.00
2307		**1.3.3.10.8.10.3**	**PAVIMENTOS**	**18 días**	**mié 1/04/26**	**mar 21/04/26**	**$105,005,678.51**
2308		1.3.3.10.8.10.3.1	BASES Y SUBBASES	5 días	mié 1/04/26	mar 7/04/26	$55,646,215.71
2309		1.3.3.10.8.10.3.2	MEZCLA ASFALTICA	6 días	vie 3/04/26	vie 10/04/26	$472,618.00
2310		1.3.3.10.8.10.3.3	CONCRETO LOSAS MR	10 días	vie 10/04/26	mar 21/04/26	$48,886,844.80
2311		1.3.3.10.8.10.4	FIN CIV 16001113	0 días	mar 21/04/26	mar 21/04/26	$0.00
2312		**1.3.3.10.9**	**CIV 16001060**	**323 días**	**vie 4/04/25**	**mar 21/04/26**	**$1,832,795,085.92**
2313		*1.3.3.10.9.1*	*PRESENTACIÓN PMT A INTERVENTORÍA*	*0 días*	*vie 4/04/25*	*vie 4/04/25*	*$0.00*
2314		*1.3.3.10.9.2*	*RADICACIÓN A LA SDM*	*0 días*	*sáb 5/04/25*	*sáb 5/04/25*	*$0.00*
2315		*1.3.3.10.9.3*	*OBSERVACIONES POR PARTE DE LA SDM AL PMT*	*0 días*	*jue 24/04/25*	*jue 24/04/25*	*$0.00*
2316		*1.3.3.10.9.4*	*ATENCIÓN DE OBSERVACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA AL PMT*	*0 días*	*mar 13/05/25*	*mar 13/05/25*	*$0.00*
2317		*1.3.3.10.9.5*	*OBSERVACIONES POR PARTE DE LA SDM AL PMT*	*0 días*	*jue 29/05/25*	*jue 29/05/25*	*$0.00*
2318		*1.3.3.10.9.6*	*ATENCIÓN DE OBSERVACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA AL PMT*	*0 días*	*mar 17/06/25*	*mar 17/06/25*	*$0.00*
2319		*1.3.3.10.9.7*	*APROBACIÓN DEL PMT*	*0 días*	*mié 18/06/25*	*mié 18/06/25*	*$0.00*
2320		**1.3.3.10.9.8**	**FASE 1 ANDEN COSTADO OCCIDENTAL**	**259 días**	**vie 20/06/25**	**mar 21/04/26**	**$900,673,372.32**
2321		1.3.3.10.9.8.1	INICIO CIV 16001060	0 días	vie 20/06/25	vie 20/06/25	$0.00
2322		**1.3.3.10.9.8.2**	**TRAMITE DE PMT**	**6 días**	**mié 25/06/25**	**jue 3/07/25**	**$0.00**
2323		1.3.3.10.9.8.2.1	IMPLEMENTACIÓN PMT ESPECIFICIO Y CERRAMIENTO DE OBRA	6 días	mié 25/06/25	jue 3/07/25	$0.00
2324		**1.3.3.10.9.8.3**	**ACTIVIDADES DE ARQUEOLOGIA**	**6 días**	**mié 25/06/25**	**jue 3/07/25**	**$0.00**
2325		1.3.3.10.9.8.3.1	EXPLORACIÓN E INVESTIGACIÓN ARQUEOLOGICA EN LA ZONA DE INTERVENCIÓN	6 días	mié 25/06/25	jue 3/07/25	$0.00
2326		**1.3.3.10.9.8.4**	**REDES HIDROSANITARIAS ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL**	**50 días**	**jue 3/07/25**	**sáb 30/08/25**	**$96,202,655.37**
2327		1.3.3.10.9.8.4.1	EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS	25 días	jue 3/07/25	jue 31/07/25	$12,741,732.02
2328		1.3.3.10.9.8.4.2	INSTALACION DE TUBERIAS	23 días	mié 9/07/25	lun 4/08/25	$22,436,301.95
2329		1.3.3.10.9.8.4.3	RELLENO DE TUBERIAS	23 días	jue 10/07/25	mar 5/08/25	$23,497,855.96
2330		1.3.3.10.9.8.4.4	CONSTRUCCION DE POZOS Y SUMIDEROS	30 días	lun 14/07/25	mar 19/08/25	$34,963,979.44
2331		1.3.3.10.9.8.4.5	CONSTRUCCIÓN CAJAS DE INSPECCIÓN	30 días	vie 25/07/25	sáb 30/08/25	$2,562,786.00
2332		**1.3.3.10.9.8.5**	**PRELIMINARES - MOVIMIENTO DE TIERRAS, DEMOLICIONES Y RELLENOS**	**38 días**	**lun 4/08/25**	**mié 17/09/25**	**$106,710,322.80**
2333		1.3.3.10.9.8.5.1	DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y TRANSPORTES DE ESCOMBROS	20 días	lun 4/08/25	jue 28/08/25	$45,723,188.95
2334		1.3.3.10.9.8.5.2	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON RAJON Y SELLO DE RAJON	14 días	vie 22/08/25	lun 8/09/25	$24,807,186.73
2335		1.3.3.10.9.8.5.3	INSTALACION DE GEOTEXTILES Y RELLENO DE MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA	14 días	mar 2/09/25	mié 17/09/25	$36,179,947.12
2336		**1.3.3.10.9.8.6**	**PAVIMENTOS**	**60 días**	**jue 11/09/25**	**vie 21/11/25**	**$305,705,851.73**
2337		1.3.3.10.9.8.6.1	BASES Y SUBBASES	13 días	jue 11/09/25	vie 26/09/25	$155,181,391.56
2338		1.3.3.10.9.8.6.2	MEZCLA ASFALTICA	16 días	vie 19/09/25	mar 7/10/25	$2,283,273.99
2339		1.3.3.10.9.8.6.3	CONCRETO LOSAS MR	16 días	mié 29/10/25	mar 18/11/25	$147,894,127.68
2340		1.3.3.10.9.8.6.4	INSTALACION DE ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO (BORDILLOS, SARDINELES	11 días	vie 7/11/25	vie 21/11/25	$347,058.50
2341		**1.3.3.10.9.8.7**	**REDES HIDROSANITARIAS ACUEDUCTO**	**20 días**	**mar 10/03/26**	**jue 2/04/26**	**$65,901,673.42**
2342		1.3.3.10.9.8.7.1	EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS	8 días	mar 10/03/26	mié 18/03/26	$13,727,872.76
2343		1.3.3.10.9.8.7.2	INSTALACION DE TUBERIAS	8 días	sáb 14/03/26	mar 24/03/26	$13,771,961.88
2344		1.3.3.10.9.8.7.3	INSTALACION ACCESORIOS Y EMPATES	10 días	mar 17/03/26	sáb 28/03/26	$25,490,565.00
2345		1.3.3.10.9.8.7.4	RELLENO DE TUBERIAS	8 días	mié 25/03/26	jue 2/04/26	$12,911,273.78
2346		**1.3.3.10.9.8.8**	**REDES SECAS (Codensa)**	**34 días**	**vie 13/03/26**	**mar 21/04/26**	**$69,517,178.02**
2347		1.3.3.10.9.8.8.1	EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS	15 días	vie 13/03/26	mar 31/03/26	$10,136,620.56
2348		1.3.3.10.9.8.8.2	INSTALACION DE DUCTERIAS	17 días	mié 18/03/26	mar 7/04/26	$34,840,896.48
2349		1.3.3.10.9.8.8.3	RELLENO DE DUCTERIAS	17 días	mié 25/03/26	mar 14/04/26	$10,134,310.98
2350		1.3.3.10.9.8.8.4	CONSTRUCCION DE CAJAS Y CAMARAS	20 días	lun 30/03/26	mar 21/04/26	$14,405,350.00
2351		**1.3.3.10.9.8.9**	**ESPACIO PUBLICO**	**29 días**	**jue 19/03/26**	**mar 21/04/26**	**$256,635,690.98**
2352		1.3.3.10.9.8.9.1	DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y TRANSPORTES DE ESCOMBROS	15 días	jue 19/03/26	lun 6/04/26	$33,872,786.34
2353		1.3.3.10.9.8.9.2	INSTALACION DE GEOTEXTILES	11 días	vie 27/03/26	jue 9/04/26	$5,742,006.26
2354		1.3.3.10.9.8.9.3	RELLENOS EN MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA ANDEN	11 días	mar 31/03/26	lun 13/04/26	$18,266,354.94
2355		1.3.3.10.9.8.9.4	RELLENOS EN MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA RAMPAS	9 días	jue 2/04/26	lun 13/04/26	$17,557,054.80
2356		1.3.3.10.9.8.9.5	INSTALACION DE ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO Y PREFABRICADOS	15 días	sáb 4/04/26	mar 21/04/26	$164,283,799.82
2357		1.3.3.10.9.8.9.6	CONCRETO LOSAS MR	17 días	jue 2/04/26	mar 21/04/26	$8,907,403.82
2358		1.3.3.10.9.8.9.7	ELEMENTOS MOBILIARIO URBANO (CANECAS, BANCAS, ETC)	8 días	lun 13/04/26	mar 21/04/26	$8,006,285.00
2359		**1.3.3.10.9.9**	**FASE 2 ANDEN COSTADO ORIENTAL**	**224 días**	**vie 1/08/25**	**mar 21/04/26**	**$932,121,713.60**
2360		**1.3.3.10.9.9.1**	**REDES HIDROSANITARIAS ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL**	**39 días**	**vie 1/08/25**	**mar 16/09/25**	**$95,119,464.88**
2361		1.3.3.10.9.9.1.1	EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS	15 días	vie 1/08/25	mié 20/08/25	$12,528,315.56
2362		1.3.3.10.9.9.1.2	INSTALACION DE TUBERIAS	10 días	mar 12/08/25	sáb 23/08/25	$22,433,693.00
2363		1.3.3.10.9.9.1.3	RELLENO DE TUBERIAS	10 días	jue 14/08/25	mié 27/08/25	$23,494,422.26
2364		1.3.3.10.9.9.1.4	CONSTRUCCION DE POZOS Y SUMIDEROS	18 días	mié 27/08/25	mar 16/09/25	$34,954,510.06
2365		1.3.3.10.9.9.1.5	CONSTRUCCIÓN CAJAS DE INSPECCIÓN	18 días	mié 27/08/25	mar 16/09/25	$1,708,524.00
2366		**1.3.3.10.9.9.2**	**PRELIMINARES - MOVIMIENTO DE TIERRAS, DEMOLICIONES Y RELLENOS**	**17 días**	**jue 11/09/25**	**mié 1/10/25**	**$106,706,246.06**
2367		1.3.3.10.9.9.2.1	DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y TRANSPORTES DE ESCOMBROS	10 días	jue 11/09/25	mar 23/09/25	$45,722,768.24
2368		1.3.3.10.9.9.2.2	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON RAJON Y SELLO DE RAJON	8 días	mié 17/09/25	vie 26/09/25	$24,805,453.80
2369		1.3.3.10.9.9.2.3	INSTALACION DE GEOTEXTILES Y RELLENO DE MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA	8 días	lun 22/09/25	mié 1/10/25	$36,178,024.02
2370		**1.3.3.10.9.9.3**	**PAVIMENTOS**	**36 días**	**mié 8/10/25**	**vie 21/11/25**	**$305,682,380.03**
2371		1.3.3.10.9.9.3.1	BASES Y SUBBASES	8 días	mié 8/10/25	sáb 18/10/25	$155,169,406.59

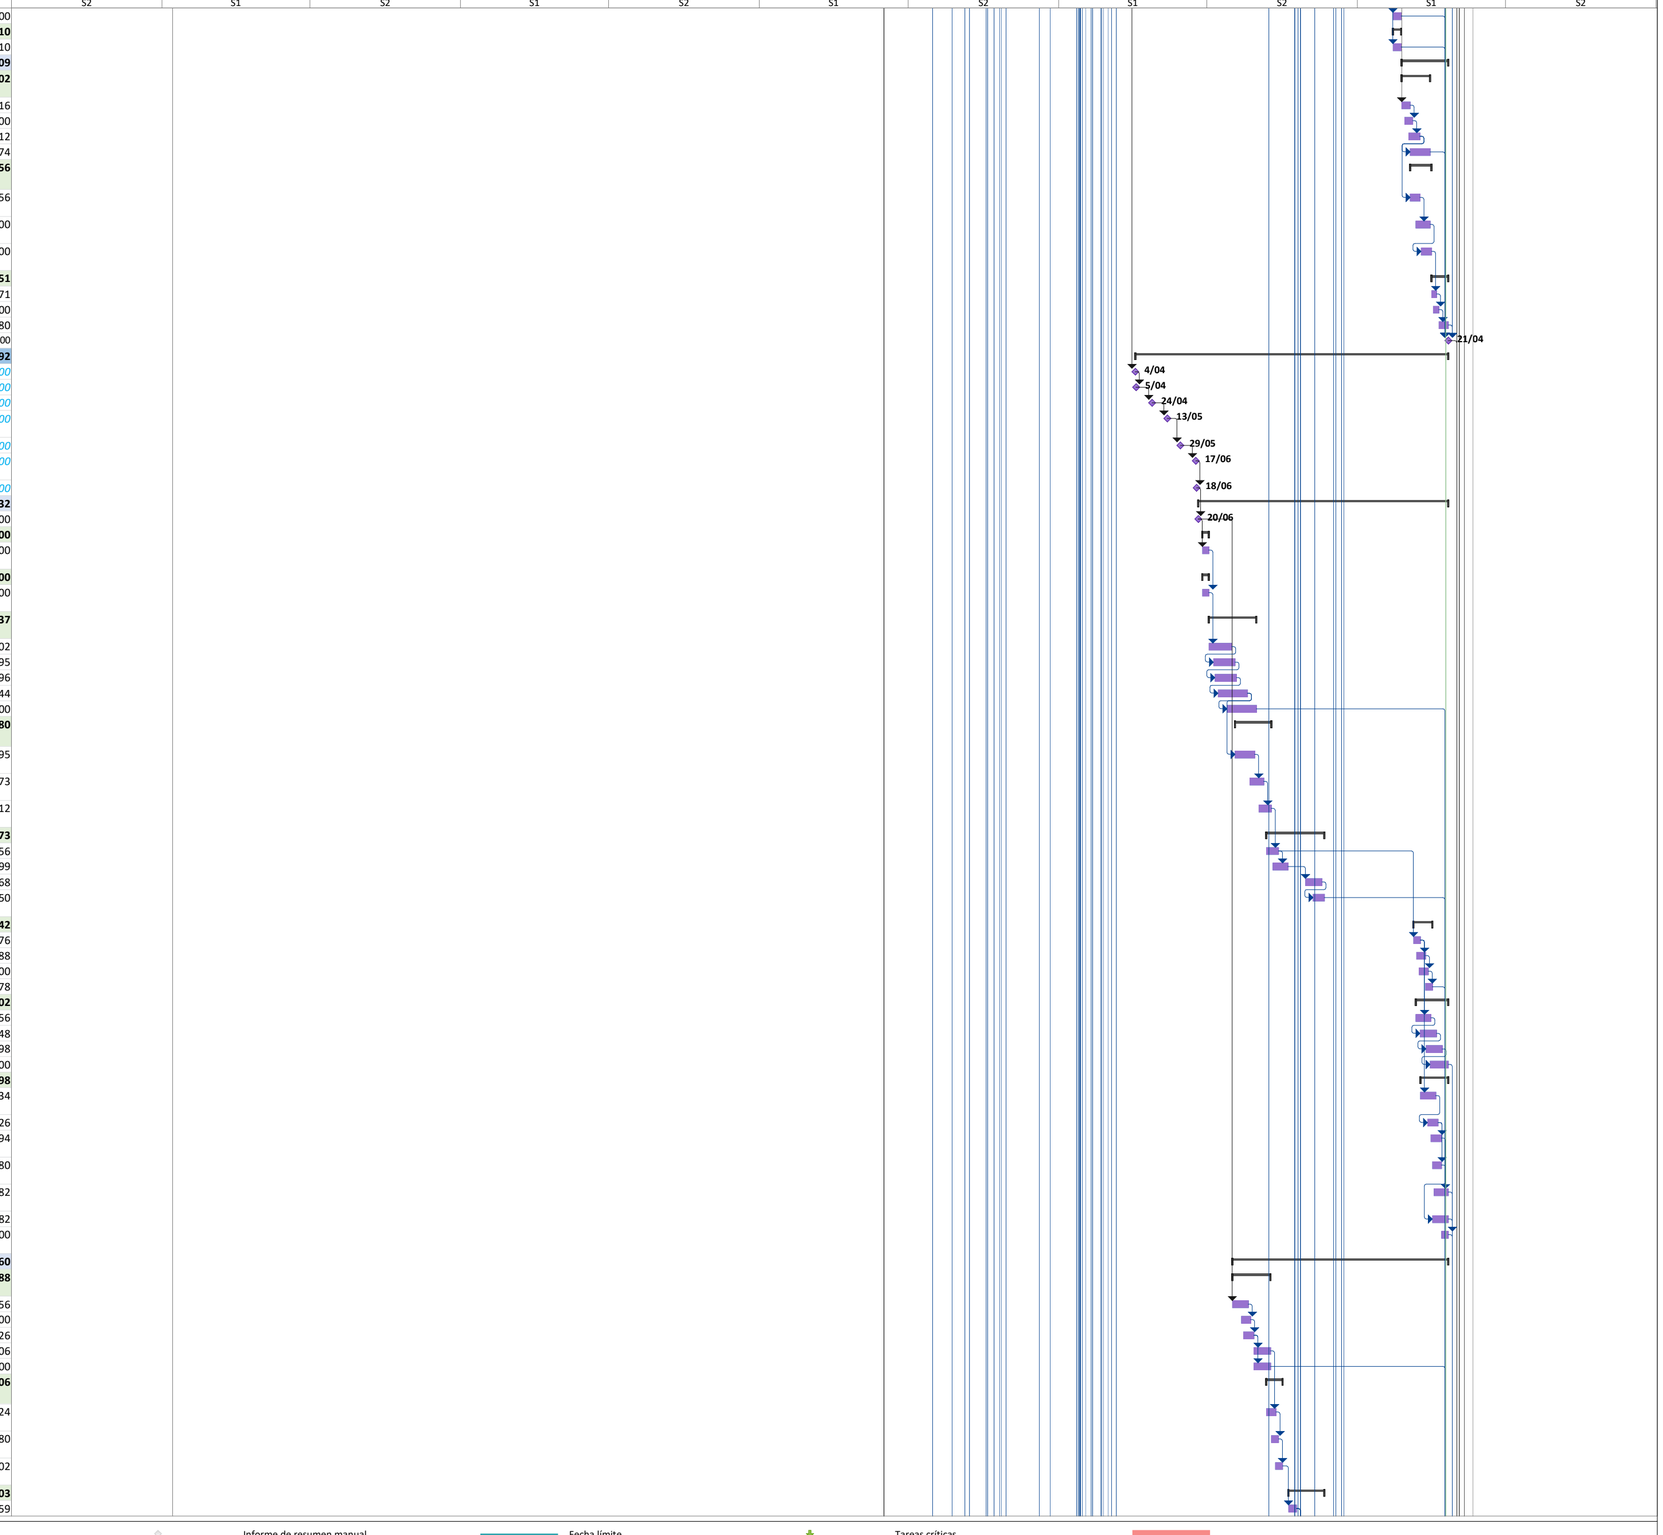

Proyecto:ID
Fecha: 14/1

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tareas externas
Hito externo
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
Sólo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
Sólo el comienzo
Sólo fin
Fecha límite
Tarea hito de sucesor controlado de ruta de acceso
Tarea de resumen de sucesor controlado de ruta de a
Tarea normal de sucesor controlado de ruta de acces
Tareas críticas
División crítica
Progreso


Id	Modo de tarea	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
2372		1.3.3.10.9.9.3.2	MEZCLA ASFALTICA	8 días	mar 14/10/25	jue 23/10/25	$2,283,238.72
2373		1.3.3.10.9.9.3.3	CONCRETO LOSAS MR	8 días	jue 6/11/25	vie 14/11/25	$147,882,705.52
2374		1.3.3.10.9.9.3.4	INSTALACION DE ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO (BORDILLOS, SARDINELES	5 días	vie 14/11/25	vie 21/11/25	$347,029.20
2375		**1.3.3.10.9.9.4**	**REDES HIDROSANITARIAS ACUEDUCTO**	**20 días**	**sáb 18/10/25**	**mar 11/11/25**	**$58,342,655.42**
2376		1.3.3.10.9.9.4.1	EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS	8 días	sáb 18/10/25	mar 28/10/25	$13,727,872.76
2377		1.3.3.10.9.9.4.2	INSTALACION DE TUBERIAS	8 días	jue 23/10/25	vie 31/10/25	$14,228,091.88
2378		1.3.3.10.9.9.4.3	INSTALACION ACCESORIOS Y EMPATES	10 días	sáb 25/10/25	jue 6/11/25	$17,475,417.00
2379		1.3.3.10.9.9.4.4	RELLENO DE TUBERIAS	8 días	sáb 1/11/25	mar 11/11/25	$12,911,273.78
2380		**1.3.3.10.9.9.5**	**REDES SECAS (Codensa)**	**28 días**	**sáb 18/10/25**	**vie 21/11/25**	**$70,402,638.58**
2381		1.3.3.10.9.9.5.1	EXCAVACIONES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS	15 días	sáb 18/10/25	jue 6/11/25	$10,136,016.28
2382		1.3.3.10.9.9.5.2	INSTALACION DE DUCTERIAS	15 días	jue 23/10/25	mar 11/11/25	$34,835,019.47
2383		1.3.3.10.9.9.5.3	RELLENO DE DUCTERIAS	15 días	mar 28/10/25	vie 14/11/25	$10,132,745.83
2384		1.3.3.10.9.9.5.4	CONSTRUCCION DE CAJAS Y CAMARAS	20 días	mar 28/10/25	vie 21/11/25	$15,298,857.00
2385		**1.3.3.10.9.9.6**	**REDES SECAS (ETB)**	**20 días**	**mar 28/10/25**	**vie 21/11/25**	**$15,762,375.00**
2386		1.3.3.10.9.9.6.1	NIVELACION DE CAJAS Y CAMARAS	20 días	mar 28/10/25	vie 21/11/25	$15,762,375.00
2387		**1.3.3.10.9.9.7**	**ESPACIO PUBLICO**	**29 días**	**vie 17/10/25**	**vie 21/11/25**	**$256,626,894.03**
2388		1.3.3.10.9.9.7.1	DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y TRANSPORTES DE ESCOMBROS	15 días	vie 17/10/25	mié 5/11/25	$33,872,322.45
2389		1.3.3.10.9.9.7.2	INSTALACION DE GEOTEXTILES	11 días	lun 27/10/25	lun 10/11/25	$5,742,006.26
2390		1.3.3.10.9.9.7.3	RELLENOS EN MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA ANDEN	11 días	jue 30/10/25	mié 12/11/25	$18,265,143.21
2391		1.3.3.10.9.9.7.4	RELLENOS EN MATERIALES GRANULARES ESTRUCTURA RAMPAS	9 días	mié 5/11/25	vie 14/11/25	$17,555,332.00
2392		1.3.3.10.9.9.7.5	INSTALACION DE ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO Y PREFABRICADOS	11 días	vie 7/11/25	vie 21/11/25	$164,278,401.29
2393		1.3.3.10.9.9.7.6	CONCRETO LOSAS MR	13 días	jue 6/11/25	vie 21/11/25	$8,907,403.82
2394		1.3.3.10.9.9.7.7	ELEMENTOS MOBILIARIO URBANO (CANECAS, BANCAS, ETC)	8 días	mié 12/11/25	vie 21/11/25	$8,006,285.00
2395		**1.3.3.10.9.9.8**	**PAISAJISMO**	**8 días**	**sáb 11/04/26**	**mar 21/04/26**	**$1,364,004.00**
2396		1.3.3.10.9.9.8.1	PAISAJISMO	8 días	sáb 11/04/26	mar 21/04/26	$1,364,004.00
2397		**1.3.3.10.9.9.9**	**SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN (HORIZONTAL Y VEF**	**8 días**	**sáb 11/04/26**	**mar 21/04/26**	**$22,115,055.60**
2398		1.3.3.10.9.9.9.1	SEÑALIZACIÓN	8 días	sáb 11/04/26	mar 21/04/26	$22,115,055.60
2399		1.3.3.10.9.9.10	FIN CIV 16001060	0 días	mar 21/04/26	mar 21/04/26	$0.00
2400		**1.3.3.11**	**FIN CONSTRUCCIÓN UPZ 108**	**0 días**	**mié 6/05/26**	**mié 6/05/26**	$0.00
2401		**1.3.3.12**	**VALOR PARA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ADICIONALES**	**1 día**	**mar 5/05/26**	**mié 6/05/26**	**$1,381,591,382.76**
2402		1.3.3.12.1	BOLSA DE CANTIDADES PARA ACTIVIDADES ADICIONALES	1 día	mar 5/05/26	mié 6/05/26	$1,381,591,382.76
2403		**1.3.4**	**ACTIVIDADES ACERO (INCLUYE A.I.U Y CAMBIO DE VIGENCIA)**	**539 días**	**vie 9/08/24**	**mié 6/05/26**	**$2,919,228,354.00**
2404		**1.3.4.1**	**COSTO ACERO UPZ 111**	**179 días**	**vie 9/08/24**	**vie 7/03/25**	**$868,171,978.42**
2405		1.3.4.1.1	ACTIVIDADES DE ACERO CIV 50008276	14 días	mié 16/10/24	jue 31/10/24	$59,576,004.28
2406		1.3.4.1.2	ACTIVIDADES DE ACERO CIV 16000237	9 días	sáb 8/02/25	mié 19/02/25	$67,999,971.78
2407		1.3.4.1.3	ACTIVIDADES DE ACERO CIV 16000337	20 días	vie 9/08/24	mar 3/09/24	$43,513,409.44
2408		1.3.4.1.4	ACTIVIDADES DE ACERO CIV 16000253	50 días	mié 30/10/24	sáb 28/12/24	$85,182,568.78
2409		1.3.4.1.5	ACTIVIDADES DE ACERO CIV 16000265	7 días	vie 21/02/25	sáb 1/03/25	$48,286,805.10
2410		1.3.4.1.6	ACTIVIDADES DE ACERO CIV 16000287	4 días	lun 20/01/25	jue 23/01/25	$45,239,281.06
2411		1.3.4.1.7	ACTIVIDADES DE ACERO CIV 16000307	4 días	sáb 1/02/25	jue 6/02/25	$50,754,642.06
2412		1.3.4.1.8	ACTIVIDADES DE ACERO CIV 16000313	4 días	jue 16/01/25	mar 21/01/25	$47,964,939.00
2413		1.3.4.1.9	ACTIVIDADES DE ACERO CIV 16000322	7 días	jue 27/02/25	vie 7/03/25	$94,393,845.04
2414		1.3.4.1.10	ACTIVIDADES DE ACERO CIV 16000323	37 días	vie 1/11/24	lun 16/12/24	$23,965,736.40
2415		1.3.4.1.11	ACTIVIDADES DE ACERO CIV 16000336	62 días	mié 23/10/24	mar 7/01/25	$45,287,511.76
2416		1.3.4.1.12	ACTIVIDADES DE ACERO CIV 16000342	23 días	lun 2/09/24	vie 27/09/24	$39,982,659.72
2417		1.3.4.1.13	AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA ACERO DE REFUERZO	179 días	vie 9/08/24	vie 7/03/25	$216,024,604.00
2418		**1.3.4.2**	**COSTO ACERO UPZ 108 CALLE 17**	**236 días**	**lun 3/02/25**	**vie 7/11/25**	**$833,758,983.70**
2419		1.3.4.2.1	ACTIVIDADES DE ACERO CIV 16001302	160 días	lun 3/02/25	lun 11/08/25	$65,716,789.50
2420		1.3.4.2.2	ACTIVIDADES DE ACERO CIV 16001255	160 días	jue 6/02/25	jue 14/08/25	$74,233,412.44
2421		1.3.4.2.3	ACTIVIDADES DE ACERO CIV 16001198	160 días	sáb 8/02/25	sáb 16/08/25	$124,900,583.04
2422		1.3.4.2.4	ACTIVIDADES DE ACERO CIV 16001110	160 días	mié 12/02/25	jue 21/08/25	$147,192,615.72
2423		1.3.4.2.5	ACTIVIDADES DE ACERO CIV 16001015	48 días	vie 12/09/25	vie 7/11/25	$52,730,919.60
2424		1.3.4.2.6	ACTIVIDADES DE ACERO CIV 16000927	14 días	mié 22/10/25	vie 7/11/25	$65,900,656.74
2425		1.3.4.2.7	ACTIVIDADES DE ACERO CIV 16000850	17 días	sáb 18/10/25	vie 7/11/25	$51,685,396.14
2426		1.3.4.2.8	ACTIVIDADES DE ACERO CIV 16000763	14 días	mié 22/10/25	vie 7/11/25	$54,096,865.52
2427		1.3.4.2.9	AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA ACERO DE REFUERZO	236 días	lun 3/02/25	vie 7/11/25	$197,301,745.00
2428		**1.3.4.3**	**COSTO DE ACERO UPZ 108 CARRERA 38**	**180 días**	**mar 7/10/25**	**mié 6/05/26**	**$996,055,616.70**
2429		1.3.4.3.1	ACTIVIDADES DE ACERO CIV 16001709	10 días	mar 7/10/25	sáb 18/10/25	$75,063,374.20
2430		1.3.4.3.2	ACTIVIDADES DE ACERO CIV 16001651	10 días	mar 7/10/25	sáb 18/10/25	$71,003,989.76
2431		1.3.4.3.3	ACTIVIDADES DE ACERO CIV 16001578	110 días	vie 12/12/25	mar 21/04/26	$88,476,692.78
2432		1.3.4.3.4	ACTIVIDADES DE ACERO CIV 16001474	110 días	lun 15/12/25	mar 21/04/26	$101,172,784.76
2433		1.3.4.3.5	ACTIVIDADES DE ACERO CIV 16001398	110 días	vie 12/12/25	mar 21/04/26	$130,232,864.24
2434		1.3.4.3.6	ACTIVIDADES DE ACERO CIV 16001251	144 días	mié 19/11/25	mié 6/05/26	$82,211,295.18
2435		1.3.4.3.7	ACTIVIDADES DE ACERO CIV 16001174	110 días	lun 15/12/25	mar 21/04/26	$74,692,096.24
2436		1.3.4.3.8	ACTIVIDADES DE ACERO CIV 16001113	110 días	lun 15/12/25	mar 21/04/26	$68,491,334.34
2437		1.3.4.3.9	ACTIVIDADES DE ACERO CIV 16001060	110 días	lun 15/12/25	mar 21/04/26	$69,003,367.20
2438		1.3.4.3.10	AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA ACERO DE REFUERZO	166 días	mar 7/10/25	mar 21/04/26	$235,707,818.00
2439		**1.3.4.4**	**VALOR PARA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ADICIONALES BOLSA DE ACERO**	**1 día**	**mar 5/05/26**	**mié 6/05/26**	**$221,241,775.18**
2440		1.3.4.4.1	BOLSA DE CANTIDADES PARA ACTIVIDADES ADICIONALES	1 día	mar 5/05/26	mié 6/05/26	$221,241,775.18
2441		**1.3.5**	**ENSAYOS DE LABORATORIO**	**1 día**	**mar 5/05/26**	**mié 6/05/26**	**$488,404,239.00**
2442		1.3.5.1	ENSAYOS DE LABORATORIO	1 día	mar 5/05/26	mié 6/05/26	$488,404,239.00
2443		**1.3.6**	**COMPENSACIONES, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO SDA**	**1 día**	**mar 5/05/26**	**mié 6/05/26**	**$152,492,838.00**
2444		1.3.6.1	COMPENSACION, EVALUACION Y SEGUIMIENTO SDA	1 día	mar 5/05/26	mié 6/05/26	$152,492,838.00
2445		1.3.7	FIN FASE DE CONSTRUCCIÓN	0 días	mié 6/05/26	mié 6/05/26	$0.00
2446		1.3.8	FASE DE RECIBO OBRAS	106 días	jue 22/01/26	jue 21/05/26	$0.00
2447		**1.4**	**FASE DE COMPONENTES Y AJUSTES**	**596 días**	**sáb 1/06/24**	**mié 6/05/26**	**$11,625,244,416.69**
2448		**1.4.1**	**MANEJO AMBIENTAL - SST - DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATEGICA - MANEJO DE TRAFICO**	**596 días**	**sáb 1/06/24**	**mié 6/05/26**	**$8,111,817,502.00**
2449		**1.4.1.1**	**UPZ 111**	**272 días**	**sáb 1/06/24**	**lun 21/04/25**	**$2,269,810,524.00**
2450		1.4.1.1.1	MANEJO AMBIENTAL - SST - DIALOGO CIUDADADO Y COMUNICACIÓN ESTRATEGICA - MANEJO DE TRAFICO 1	23 días	sáb 1/06/24	sáb 29/06/24	$57,531,165.44
2451		1.4.1.1.2	MANEJO AMBIENTAL - SST - DIALOGO CIUDADADO Y COMUNICACIÓN ESTRATEGICA - MANEJO DE TRAFICO 2	25 días	mar 2/07/24	mié 31/07/24	$142,827,913.60
2452		1.4.1.1.3	MANEJO AMBIENTAL - SST - DIALOGO CIUDADADO Y COMUNICACIÓN ESTRATEGICA - MANEJO DE TRAFICO 3	25 días	jue 1/08/24	sáb 31/08/24	$178,890,244.48
2453		1.4.1.1.4	MANEJO AMBIENTAL - SST - DIALOGO CIUDADADO Y COMUNICACIÓN ESTRATEGICA - MANEJO DE TRAFICO 4	25 días	lun 2/09/24	lun 30/09/24	$203,952,575.36
2454		1.4.1.1.5	MANEJO AMBIENTAL - SST - DIALOGO CIUDADADO Y COMUNICACIÓN ESTRATEGICA - MANEJO DE TRAFICO 5	26 días	mar 1/10/24	jue 31/10/24	$233,952,575.36
2455		1.4.1.1.6	MANEJO AMBIENTAL - SST - DIALOGO CIUDADADO Y COMUNICACIÓN ESTRATEGICA - MANEJO DE TRAFICO 6	24 días	vie 1/11/24	sáb 30/11/24	$275,014,906.24
2456		1.4.1.1.7	MANEJO AMBIENTAL - SST - DIALOGO CIUDADADO Y COMUNICACIÓN ESTRATEGICA - MANEJO DE TRAFICO 7	25 días	lun 2/12/24	mar 31/12/24	$360,546,071.68

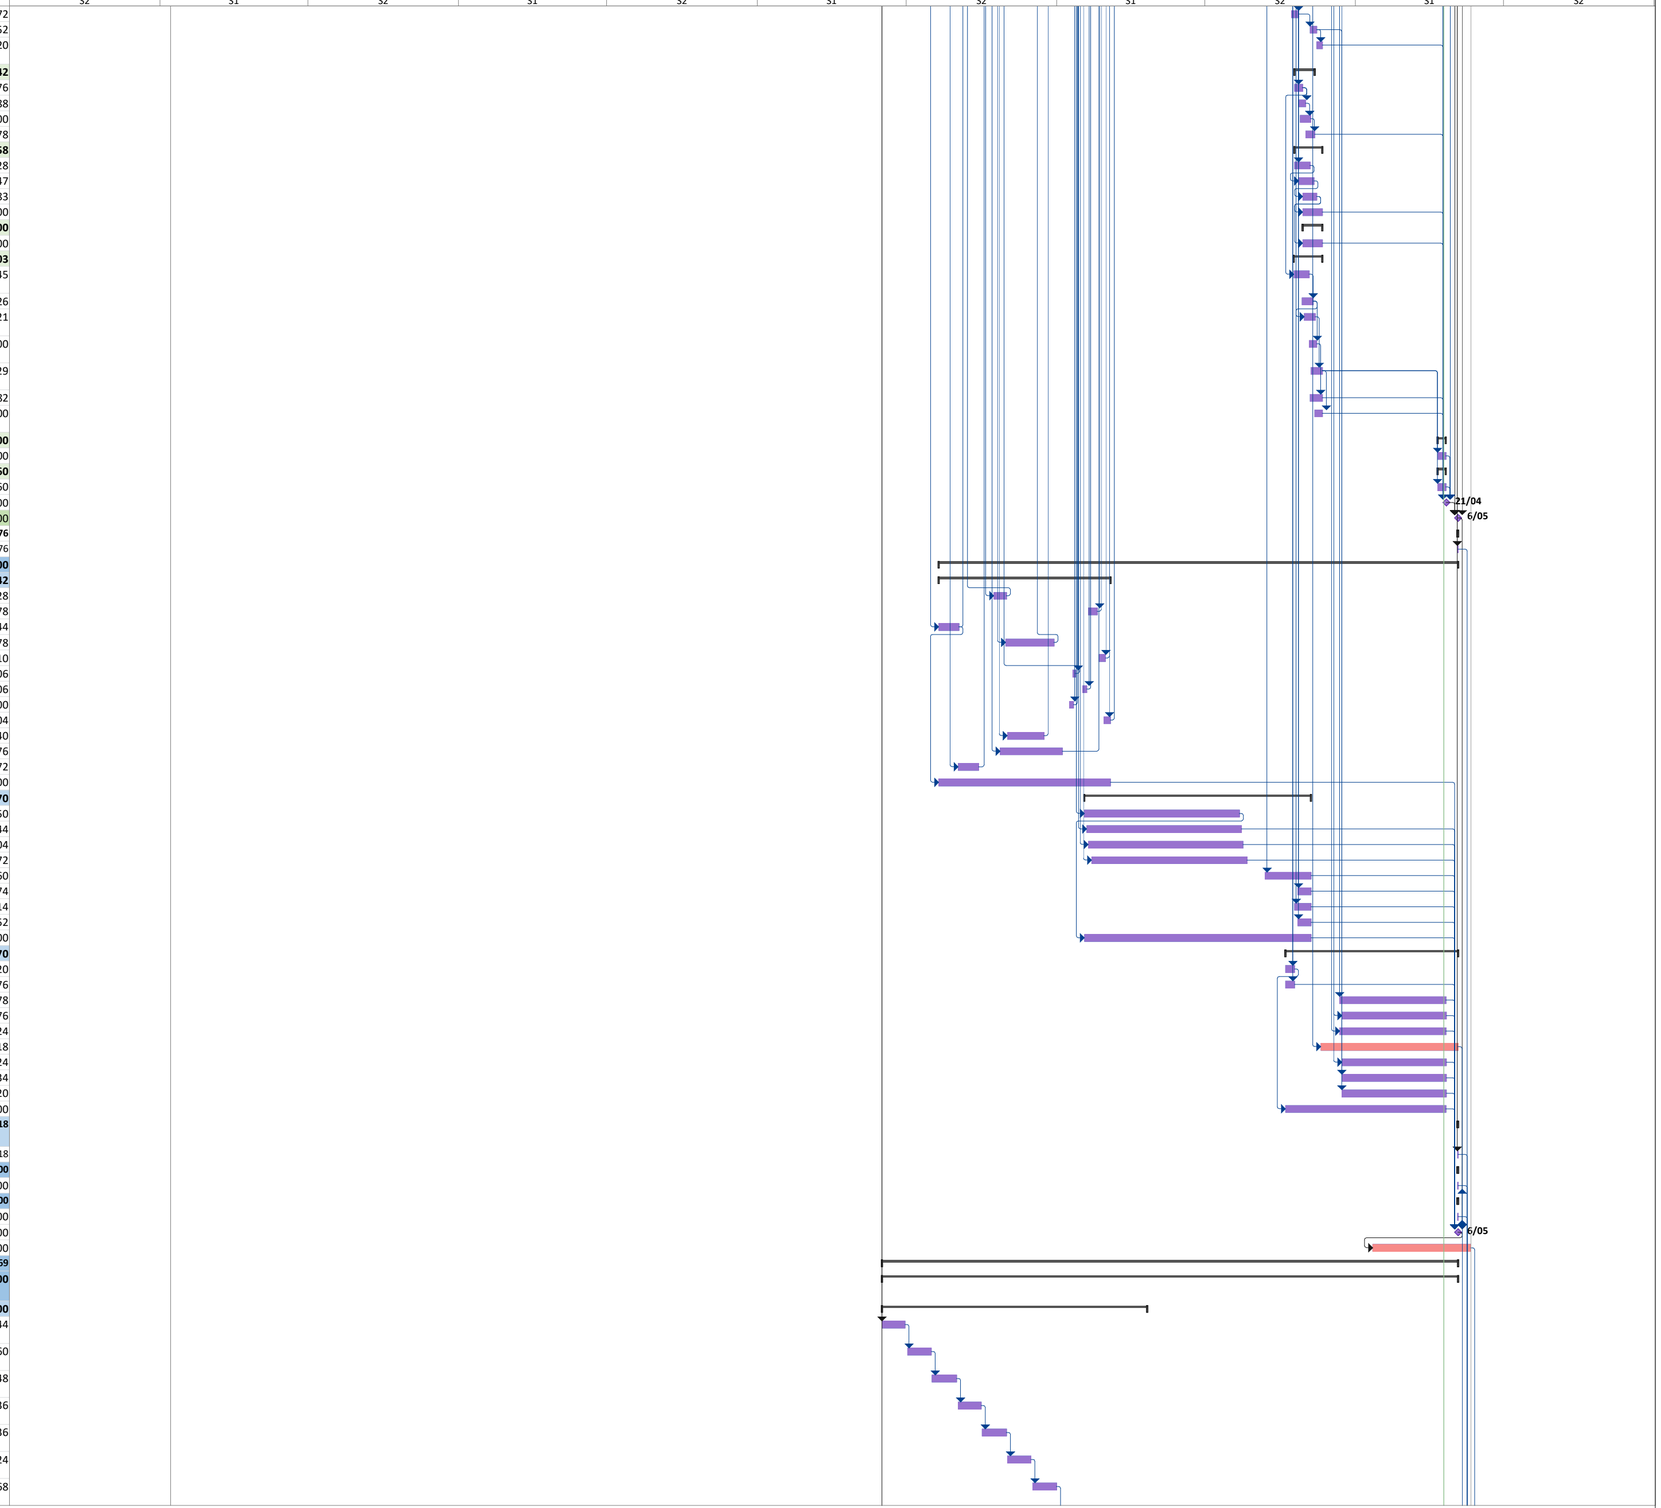

Proyecto:ID
Fecha: 14/1

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tareas externas
Hito externo
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
Sólo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
Sólo el comienzo
Sólo fin
Fecha límite
Tarea hito de sucesor controlado de ruta de acceso
Tarea de resumen de sucesor controlado de ruta de a
Tarea normal de sucesor controlado de ruta de acces
Tareas críticas
División crítica
Progreso

Id	Modo de tarea	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
2457		1.4.1.1.8	MANEJO AMBIENTAL - SST - DIALOGO CIUDADADO Y COMUNICACIÓN ESTRATEGICA - MANEJO DE TRAFICO 8	25 días	jue 2/01/25	vie 31/01/25	$299,077,237.12
2458		1.4.1.1.9	MANEJO AMBIENTAL - SST - DIALOGO CIUDADADO Y COMUNICACIÓN ESTRATEGICA - MANEJO DE TRAFICO 9	24 días	sáb 1/02/25	vie 28/02/25	$225,718,158.08
2459		1.4.1.1.10	MANEJO AMBIENTAL - SST - DIALOGO CIUDADADO Y COMUNICACIÓN ESTRATEGICA - MANEJO DE TRAFICO 10	41 días	sáb 1/03/25	lun 21/04/25	$292,299,676.64
2460		**1.4.1.2**	**UPZ 108**	**346 días**	**mar 25/03/25**	**mié 6/05/26**	**$5,842,006,978.00**
2461		1.4.1.2.1	MANEJO AMBIENTAL - SST - DIALOGO CIUDADADO Y COMUNICACIÓN ESTRATEGICA - MANEJO DE TRAFICO 11	31 días	mar 25/03/25	mié 30/04/25	$222,946,561.00
2462		1.4.1.2.2	MANEJO AMBIENTAL - SST - DIALOGO CIUDADADO Y COMUNICACIÓN ESTRATEGICA - MANEJO DE TRAFICO 12	25 días	vie 2/05/25	vie 30/05/25	$518,027,673.00
2463		1.4.1.2.3	MANEJO AMBIENTAL - SST - DIALOGO CIUDADADO Y COMUNICACIÓN ESTRATEGICA - MANEJO DE TRAFICO 13	22 días	mar 3/06/25	vie 27/06/25	$578,067,901.00
2464		1.4.1.2.4	MANEJO AMBIENTAL - SST - DIALOGO CIUDADADO Y COMUNICACIÓN ESTRATEGICA - MANEJO DE TRAFICO 14	27 días	mar 1/07/25	jue 31/07/25	$389,041,807.00
2465		1.4.1.2.5	MANEJO AMBIENTAL - SST - DIALOGO CIUDADADO Y COMUNICACIÓN ESTRATEGICA - MANEJO DE TRAFICO 15	24 días	vie 1/08/25	sáb 30/08/25	$310,547,201.00
2466		1.4.1.2.6	MANEJO AMBIENTAL - SST - DIALOGO CIUDADADO Y COMUNICACIÓN ESTRATEGICA - MANEJO DE TRAFICO 16	26 días	lun 1/09/25	mar 30/09/25	$319,064,901.00
2467		1.4.1.2.7	MANEJO AMBIENTAL - SST - DIALOGO CIUDADADO Y COMUNICACIÓN ESTRATEGICA - MANEJO DE TRAFICO 17	26 días	mié 1/10/25	vie 31/10/25	$337,425,749.00
2468		1.4.1.2.8	MANEJO AMBIENTAL - SST - DIALOGO CIUDADADO Y COMUNICACIÓN ESTRATEGICA - MANEJO DE TRAFICO 18	23 días	sáb 1/11/25	sáb 29/11/25	$421,985,209.00
2469		1.4.1.2.9	MANEJO AMBIENTAL - SST - DIALOGO CIUDADADO Y COMUNICACIÓN ESTRATEGICA - MANEJO DE TRAFICO 19	25 días	lun 1/12/25	mié 31/12/25	$667,220,720.00
2470		1.4.1.2.10	MANEJO AMBIENTAL - SST - DIALOGO CIUDADADO Y COMUNICACIÓN ESTRATEGICA - MANEJO DE TRAFICO 20	25 días	vie 2/01/26	sáb 31/01/26	$413,918,032.00
2471		1.4.1.2.11	MANEJO AMBIENTAL - SST - DIALOGO CIUDADADO Y COMUNICACIÓN ESTRATEGICA - MANEJO DE TRAFICO 21	24 días	lun 2/02/26	sáb 28/02/26	$427,768,977.00
2472		1.4.1.2.12	MANEJO AMBIENTAL - SST - DIALOGO CIUDADADO Y COMUNICACIÓN ESTRATEGICA - MANEJO DE TRAFICO 22	25 días	lun 2/03/26	mar 31/03/26	$466,041,471.00
2473		1.4.1.2.13	MANEJO AMBIENTAL - SST - DIALOGO CIUDADADO Y COMUNICACIÓN ESTRATEGICA - MANEJO DE TRAFICO 23	31 días	mié 1/04/26	mié 6/05/26	$769,950,776.00
2474		**1.4.2**	**AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA**	**596 días**	**sáb 1/06/24**	**mié 6/05/26**	**$3,513,426,914.69**
2475		**1.4.2.1**	**UPZ 111**	**272 días**	**sáb 1/06/24**	**lun 21/04/25**	**$970,662,866.00**
2476		1.4.2.1.1	AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA 1	23 días	sáb 1/06/24	sáb 29/06/24	$29,471,923.08
2477		1.4.2.1.2	AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA 2	25 días	mar 2/07/24	mié 31/07/24	$43,679,807.70
2478		1.4.2.1.3	AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA 3	25 días	jue 1/08/24	sáb 31/08/24	$52,835,971.52
2479		1.4.2.1.4	AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA 4	25 días	lun 2/09/24	lun 30/09/24	$81,567,500.02
2480		1.4.2.1.5	AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA 5	26 días	mar 1/10/24	jue 31/10/24	$91,569,478.00
2481		1.4.2.1.6	AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA 6	24 días	vie 1/11/24	sáb 30/11/24	$105,698,414.00
2482		1.4.2.1.7	AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA 7	25 días	lun 2/12/24	mar 31/12/24	$112,698,475.00
2483		1.4.2.1.8	AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA 8	25 días	jue 2/01/25	vie 31/01/25	$131,564,795.00
2484		1.4.2.1.9	AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA 9	24 días	sáb 1/02/25	vie 28/02/25	$143,587,002.00
2485		1.4.2.1.10	AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA 10	41 días	sáb 1/03/25	lun 21/04/25	$177,989,499.68
2486		**1.4.2.2**	**UPZ 108**	**346 días**	**mar 25/03/25**	**mié 6/05/26**	**$2,542,764,048.69**
2487		1.4.2.2.1	AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA 11	31 días	mar 25/03/25	mié 30/04/25	$56,433,733.00
2488		1.4.2.2.2	AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA 12	25 días	vie 2/05/25	vie 30/05/25	$97,812,891.00
2489		1.4.2.2.3	AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA 13	22 días	mar 3/06/25	vie 27/06/25	$122,158,737.00
2490		1.4.2.2.4	AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA 14	27 días	mar 1/07/25	jue 31/07/25	$156,683,654.00
2491		1.4.2.2.5	AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA 15	24 días	vie 1/08/25	sáb 30/08/25	$272,832,941.00
2492		1.4.2.2.6	AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA 16	26 días	lun 1/09/25	mar 30/09/25	$133,146,921.00
2493		1.4.2.2.7	AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA 17	26 días	mié 1/10/25	vie 31/10/25	$168,742,078.00
2494		1.4.2.2.8	AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA 18	23 días	sáb 1/11/25	sáb 29/11/25	$243,566,423.00
2495		1.4.2.2.9	AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA 19	25 días	lun 1/12/25	mié 31/12/25	$360,687,630.00
2496		1.4.2.2.10	AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA 20	25 días	vie 2/01/26	sáb 31/01/26	$392,478,025.00
2497		1.4.2.2.11	AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA 21	24 días	lun 2/02/26	sáb 28/02/26	$252,963,787.00
2498		1.4.2.2.12	AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA 22	25 días	lun 2/03/26	mar 31/03/26	$142,628,518.00
2499		1.4.2.2.13	AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA 23	31 días	mié 1/04/26	mié 6/05/26	$142,628,710.69
2500		1.5	FIN DEL PROYECTO	0 días	jue 21/05/26	jue 21/05/26	$0.00

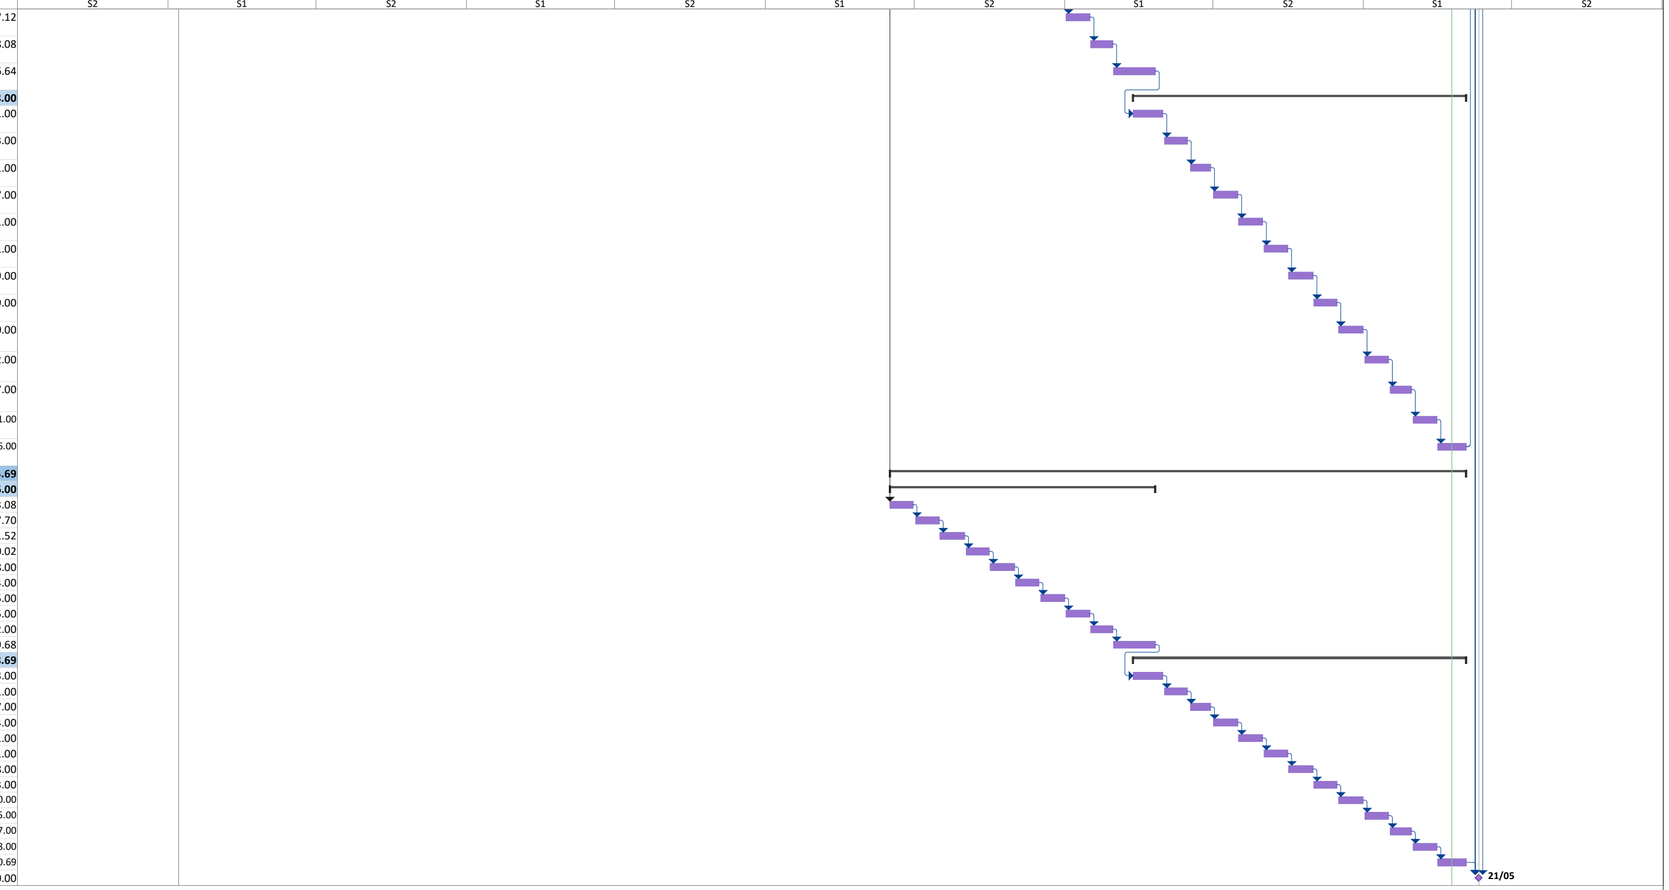

Proyecto:ID
Fecha: 14/1

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tareas externas
Hito externo
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
Sólo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
Sólo el comienzo
Sólo fin
Fecha límite
Tarea hito de sucesor controlado de ruta de acceso
Tarea de resumen de sucesor controlado de ruta de a
Tarea normal de sucesor controlado de ruta de acces
Tareas críticas
División crítica
Progreso
