

Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	% Avance Conciliado	% Avance Programado (% PV)	% Avance Ejecutado conciliado (% EV))	Comienzo	Fin	Predecesoras
0	**0**	**IDU-0350-2020-AV68TRAMO6-CLB-20230603**	**3595,5 días**	**0**	**47,977%**	**49,324%**	**vie 12/06/20**	**mar 11/11/31**	
1	**1**	**PROYECTO AVENIDA 68 TRAMO 2 - SECTOR 6 - DESDE CALLE 46 HASTA CALLE 66**	**3595,5 días**	**0**	**47,977%**	**49,324%**	**vie 12/06/20**	**mar 11/11/31**	
2	1.1	ACTA DE INICIO	0 días	100	0,000%	0,000%	vie 12/06/20	vie 12/06/20	
3	**1.2**	**ETAPA DE PRECONSTRUCCIÓN**	**204,13 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**vie 12/06/20**	**jue 11/02/21**	
4	1.2.1	INICIO DE LA ETAPA DE PRECONSTRUCCIÓN	0 días	100	0,000%	0,000%	vie 12/06/20	vie 12/06/20	2
5	1.2.2	ACTIVIDADES DE LA ETAPA DE PRECONSTRUCCIÓN	204 días	100	100,000%	100,000%	vie 12/06/20	jue 11/02/21	4CC
6	1.2.3	FIN DE LA ETAPA DE PRECONSTRUCCIÓN	0 días	100	0,000%	0,000%	jue 11/02/21	jue 11/02/21	5
7	**1**	**ETAPA DE CONSTRUCCIÓN**	**1766,25 días**	**0**	**60,908%**	**62,624%**	**vie 12/02/21**	**mié 11/11/26**	
8	1.3.1	INICIO ETAPA DE CONSTRUCCIÓN GRUPO 6	1 día	100	0,000%	0,000%	vie 12/02/21	vie 12/02/21	6CC
9	**1.3.2**	**ACTIVIDADES REDES DE ALTA TENSIÓN**	**498,5 días**	**0**	**0,000%**	**0,000%**	**sáb 30/04/22**	**mar 12/12/23**	
10	1.3.2.1	Cierre de Calzada para Inicio de actividades ENEL CODENSA	36,25 días	100	0,000%	0,000%	sáb 30/04/22	vie 10/06/22	8FC+355 días
11	1.3.2.2	Traslado Red De Alta Tensión Por Parte De Codensa	305,75 días	92	0,000%	0,000%	jue 15/12/22	mar 12/12/23	10CC+186 días;8F
12	**1.3.3**	**ENTREGA DE PREDIOS POR PARTE DEL IDU**	**834,75 días**	**0**	**0,000%**	**0,000%**	**sáb 13/02/21**	**mar 31/10/23**	
13	**1.3.3.1**	**Entrega De Predios Tramo 1**	**531,13 días**	**0**	**0,000%**	**0,000%**	**sáb 13/02/21**	**vie 4/11/22**	
14	1.3.3.1.1	PREDIO No RT 49841 AC 63 60 80 PARQUE EL SALITRE	0,5 días	100	0,000%	0,000%	sáb 13/02/21	sáb 13/02/21	8
15	1.3.3.1.2	Acceso a predio el salitre e Inicio de intervención	0 días	100	0,000%	0,000%	sáb 13/02/21	sáb 13/02/21	14
16	1.3.3.1.2	PREDIO No RT 49842 AK 68 64 32 RESTAURANTE MARAMAOS	0 días	100	0,000%	0,000%	vie 4/11/22	vie 4/11/22	8FC+510 días
17	1.3.3.1.4	Inicio Intervención Predio Restaurante MARAMAOS	0 días	100	0,000%	0,000%	vie 4/11/22	vie 4/11/22	16
18	**1.3.3.2**	**Entrega De Predios Tramo 2**	**0,5 días**	**0**	**0,000%**	**0,000%**	**sáb 13/02/21**	**sáb 13/02/21**	
19	1.3.3.2.1	PREDIO No RT 49840 AK 68 53 86 PARQUE SIMÓN BOLÍVAR	0,5 días	100	0,000%	0,000%	sáb 13/02/21	sáb 13/02/21	8
20	**1.3.3.3**	**Entrega De Predios Tramo 3**	**37,5 días**	**0**	**0,000%**	**0,000%**	**lun 18/09/23**	**mar 31/10/23**	
21	1.3.3.3.1	PREDIO No RT 51692 AK 68 64 45 COLEGIO CAFAM	0 días	100	0,000%	0,000%	mar 31/10/23	mar 31/10/23	8FC+803 días
22	1.3.3.3.2	PREDIO No RT 51693 AK 68 64C 35 BIENESTAR FAMILIAR	0 días	100	0,000%	0,000%	lun 18/09/23	lun 18/09/23	8FC+767 días
23	1.3.3.3.3	PREDIO No RT 51694 AK 68 64C 75 BIENESTAR FAMILIAR	0 días	100	0,000%	0,000%	lun 18/09/23	lun 18/09/23	8FC+767 días
24	**1.3.3.4**	**Entrega De Predios Tramo 4**	**834,75 días**	**0**	**0,000%**	**0,000%**	**sáb 13/02/21**	**mar 31/10/23**	
25	1.3.3.4.1	PREDIO No RT 51959 AC 63 68 45 UNIDAD DEPORTIVA SALITRE	1,63 días	100	0,000%	0,000%	sáb 13/02/21	lun 15/02/21	8
26	1.3.3.4.2	PREDIO No RT 52593 AK 68 49A 47 JARDÍN BOTÁNICO	0 días	100	0,000%	0,000%	mar 31/10/23	mar 31/10/23	8FC+803 días
27	1.3.3.4.3	PREDIO No RT 51958 AK 68 49A 35 COMPENSAR	1 día	100	0,000%	0,000%	lun 15/02/21	lun 15/02/21	8FC+1 día
28	**1.3.4**	**ACTIVIDADES TRASLADADAS DE PRECONSTRUCCIÓN A ETAPA DE CONSTRUCCIÓN**	**101 días**	**0**	**0,000%**	**0,000%**	**vie 12/02/21**	**sáb 12/06/21**	
29	1.3.4.1	Inicio de Actividades Trasladadas	1 día	100	0,000%	0,000%	lun 15/02/21	lun 15/02/21	8CF+3 días
30	1.3.4.2	5.1.2. Movilización de Equipo	1 día	100	0,000%	0,000%	lun 15/02/21	lun 15/02/21	8CF+3 días
31	**1.3.4.3**	**5.1.4. Obligaciones contenidas en los Apéndices**	**47 días**	**0**	**0,000%**	**0,000%**	**mié 17/02/21**	**mié 14/04/21**	
32	**1.3.4.3.1**	**Línea estratégica de dialogo ciudadano**	**47 días**	**0**	**0,000%**	**0,000%**	**mié 17/02/21**	**mié 14/04/21**	
33	1.3.4.3.1.1	programa de servicio a la ciudadanía	47 días	100	0,000%	0,000%	mié 17/02/21	mié 14/04/21	6;29;3144CC+3 dí
34	1.3.4.3.1.2	programa de dialogo y participación ciudadana	47 días	100	0,000%	0,000%	mié 17/02/21	mié 14/04/21	6;29;3144CC+3 dí
35	1.3.4.3.1.3	programa de acompañamiento a actividades técnicas	47 días	100	0,000%	0,000%	mié 17/02/21	mié 14/04/21	6;29;3144CC+3 días
36	1.3.4.3.1.4	programa de cultura ciudadana	47 días	100	0,000%	0,000%	mié 17/02/21	mié 14/04/21	6;29;3144CC+3 dí
37	1.3.4.3.1.5	programa de gobernanza para la movilidad	47 días	100	0,000%	0,000%	mié 17/02/21	mié 14/04/21	6;29;3144CC+3 dí
38	1.3.4.3.1.6	programa de manejo del paisaje urbano	47 días	100	0,000%	0,000%	mié 17/02/21	mié 14/04/21	6;29;3144CC+3 dí
39	1.3.4.4	5.1.6. Acta de armonización entre tramos adyacentes	2,13 días	100	0,000%	0,000%	jue 18/02/21	vie 19/02/21	6FC+5 días;29
40	**1.3.4.5**	**5.1.7. Elaboración, entrega a la Interventoría y aprobación del Plan de Manejo de Tránsito, Señalización y Desvíos.**	**88,63 días**	**0**	**0,000%**	**0,000%**	**jue 25/02/21**	**sáb 12/06/21**	
41	1.3.4.5.1	Aprobación de la línea base PMT	0 días	100	0,000%	0,000%	jue 25/02/21	jue 25/02/21	6FC+12 días;29;8
42	1.3.4.5.2	Radicación ante SDM PMT Etapa I	0 días	100	0,000%	0,000%	sáb 20/03/21	sáb 20/03/21	29;41FC+20 días
43	1.3.4.5.3	Observaciones SDM al PMT de la Etapa I	0 días	100	0,000%	0,000%	mar 30/03/21	mar 30/03/21	42FC+7 días
44	1.3.4.5.4	Atención de Observaciones	54,88 días	100	0,000%	0,000%	mié 31/03/21	vie 4/06/21	43
45	1.3.4.5.5	Radicación Respuesta observaciones PMT Etapa I	0 días	100	0,000%	0,000%	vie 4/06/21	vie 4/06/21	44
46	1.3.4.5.6	Aprobación SDM PMT de Preliminares	0 días	100	0,000%	0,000%	vie 11/06/21	vie 11/06/21	45FC+5 días
47	1.3.4.5.7	Implementación PMT inicio Hito contractual	0 días	100	0,000%	0,000%	sáb 12/06/21	sáb 12/06/21	45FC+5 días
48	1.3.4.6	5.1.8. Elaboración, presentación y aprobación por parte de la Interventoría del Diagnóstico de las Obras de Adecuación de Desvíos	79,38 días	100	0,000%	0,000%	vie 12/02/21	mar 18/05/21	8CC
49	1.3.4.7	Fin actividades trasladadas	0 días	100	0,000%	0,000%	sáb 12/06/21	sáb 12/06/21	30;33;34;35;36;3
50	**1.3.5**		**1468 días**	**0**	**0,000%**	**0,000%**	**jue 4/11/21**	**vie 14/08/26**	
51	**1.3.5.1**	**PMT Actividades Transicional**	**14,13 días**	**0**	**0,000%**	**0,000%**	**jue 4/11/21**	**sáb 20/11/21**	
52	1.3.5.1.1	radicación a interventoria	2,13 días	100	0,000%	0,000%	jue 4/11/21	vie 5/11/21	49FC+116 días
53	1.3.5.1.2	radicación a la SDM por parte de la interventoría	1,63 días	100	0,000%	0,000%	sáb 6/11/21	lun 8/11/21	52
54	1.3.5.1.3	mesa de trabajo con SDM	3,25 días	100	0,000%	0,000%	mar 9/11/21	jue 11/11/21	53
55	1.3.5.1.4	aprobación SDM	6,75 días	100	0,000%	0,000%	vie 12/11/21	sáb 20/11/21	54
56	**1.3.5.2**	**PMT Actividades Calle 63 - Calle 66 Calzada oriental lenta tramo 1 (2 carriles)**	**15,25 días**	**0**	**0,000%**	**0,000%**	**jue 13/01/22**	**sáb 29/01/22**	
57	1.3.5.2.1	radicación a interventoria	2,13 días	100	0,000%	0,000%	jue 13/01/22	vie 14/01/22	55FC+40 días
58	1.3.5.2.2	radicación a la SDM por parte de la interventoría	1,63 días	100	0,000%	0,000%	sáb 15/01/22	lun 17/01/22	57
59	1.3.5.2.3	mesa de trabajo con SDM	4,38 días	100	0,000%	0,000%	mar 18/01/22	vie 21/01/22	58
60	1.3.5.2.4	aprobación SDM	6,75 días	100	0,000%	0,000%	sáb 22/01/22	sáb 29/01/22	59

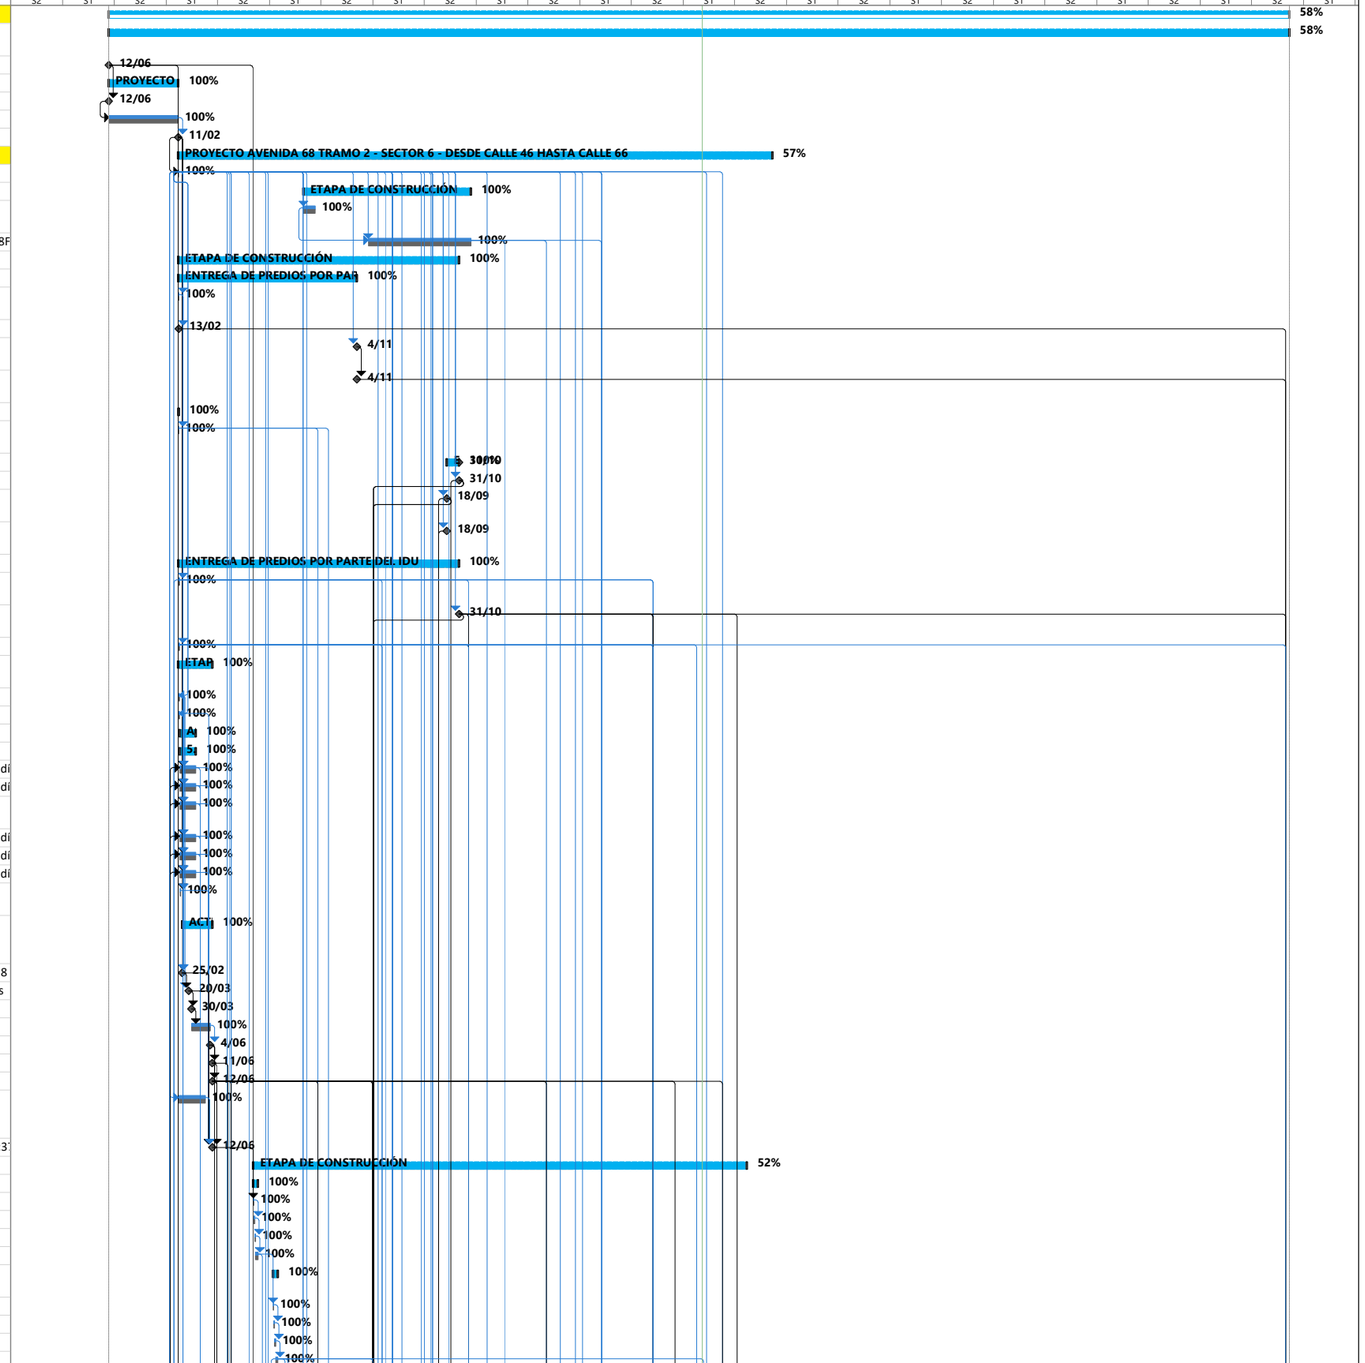


Tareas críticas | Tarea | Tarea manual | solo duración | Hito de línea base | Resumen | Tareas externas | Hito inactivo
División crítica | División | solo el comienzo | Línea base | Hito | Resumen manual | Hito externo | Resumen inactivo
Progreso de tarea crítica | Progreso de tarea | solo fin | División de la línea base | Progreso del resumen | Resumen del proyecto | Tarea inactiva | Fecha límite

Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	% Avance Conciliado	% Avance Programado (% PV)	% Avance Ejecutado conciliado (% EV))	Comienzo	Fin	Predecesoras
61	**1.3.5.3**	**PMT Actividades Armonizado Calle 46 - Calle 63 Calzada oriental lenta tramo 2**	**70,88 días**	**0**	**0,000%**	**0,000%**	**lun 7/03/22**	**vie 27/05/22**	
62	1.3.5.3.1	radicación a interventoria	2,13 días	100	0,000%	0,000%	lun 7/03/22	mar 8/03/22	60FC+30 días
63	1.3.5.3.2	radicación a la SDM por parte de la interventoría	2,13 días	100	0,000%	0,000%	mié 9/03/22	jue 10/03/22	62
64	1.3.5.3.3	mesa de trabajo con SDM	3,88 días	100	0,000%	0,000%	vie 11/03/22	mar 15/03/22	63
65	1.3.5.3.4	aprobación SDM	14,63 días	100	0,000%	0,000%	jue 12/05/22	vie 27/05/22	64FC+46 días
66	**1.3.5.3.5**	**PMT Armonizado Complementario Calle 46 - Calle 63 Calzada Oriental**	**43,63 días**	**0**	**0,000%**	**0,000%**	**mar 9/08/22**	**mar 27/09/22**	
67	1.3.5.3.5.1	radicación a interventoria	2,13 días	100	0,000%	0,000%	mar 9/08/22	mié 10/08/22	65FC+57 días
68	1.3.5.3.5.2	radicación a la SDM por parte de la interventoría	2,13 días	100	0,000%	0,000%	mié 10/08/22	jue 11/08/22	67FC-1 día
69	1.3.5.3.5.3	mesa de trabajo con SDM	5 días	100	0,000%	0,000%	jue 18/08/22	mar 23/08/22	68FC+4 días
70	1.3.5.3.5.4	aprobación SDM	32,25 días	100	0,000%	0,000%	mar 23/08/22	mar 27/09/22	69FC-1 día
71	**1.3.5.5**	**PMT Actividades Calle 46 - Calle 66 Calzada Occidental lenta**	**13 días**	**0**	**0,000%**	**0,000%**	**mar 10/12/24**	**mar 24/12/24**	
72	1.3.5.5.1	radicación a interventoria	1 día	0	0,000%	0,000%	mar 10/12/24	mié 11/12/24	70FC+677 días
73	1.3.5.5.2	radicación a la SDM por parte de la interventoría	2 días	0	0,000%	0,000%	mié 11/12/24	vie 13/12/24	72
74	1.3.5.5.3	mesa de trabajo con SDM	3 días	0	0,000%	0,000%	vie 13/12/24	mar 17/12/24	73
75	1.3.5.5.4	aprobación SDM	7 días	0	0,000%	0,000%	mar 17/12/24	mar 24/12/24	74
76	**1.3.5.5**	**PMT Actividades Calle 46 - Calle 66 Calzada BRT Oriental y Mixta**	**14 días**	**0**	**0,000%**	**0,000%**	**mar 16/09/25**	**jue 2/10/25**	
77	1.3.5.5.1	radicación a interventoria	1 día	80	0,000%	0,000%	mar 16/09/25	mié 17/09/25	75FC+224 días
78	1.3.5.5.2	radicación a la SDM por parte de la interventoría	2 días	80	0,000%	0,000%	mar 16/09/25	jue 18/09/25	77FC-1 día
79	1.3.5.5.3	mesa de trabajo con SDM	3 días	80	0,000%	0,000%	vie 19/09/25	mar 23/09/25	78FC+1 día
80	1.3.5.5.4	aprobación SDM	7 días	80	0,000%	0,000%	mié 24/09/25	jue 2/10/25	79FC+1 día
81	**1.3.5.7**	**PMT Bocacalle calle 64**	**12 días**	**0**	**0,000%**	**0,000%**	**jue 2/10/25**	**jue 16/10/25**	
82	1.3.5.7.1	radicación a interventoria	1 día	0	0,000%	0,000%	jue 2/10/25	vie 3/10/25	72FC+80 días;80
83	1.3.5.7.2	radicación a la SDM por parte de la interventoría	2 días	0	0,000%	0,000%	vie 3/10/25	lun 6/10/25	82
84	1.3.5.7.3	mesa de trabajo con SDM	3 días	0	0,000%	0,000%	lun 6/10/25	mié 8/10/25	83
85	1.3.5.7.4	aprobación SDM	6 días	0	0,000%	0,000%	jue 9/10/25	jue 16/10/25	84
86	**1.3.5.8**	**PMT DEPRIMIDO (K9+090-K9+470)**	**6 días**	**0**	**0,000%**	**0,000%**	**mié 19/03/25**	**jue 27/03/25**	
87	1.3.5.8.1	radicación a interventoria	1 día	100	0,000%	0,000%	mié 19/03/25	jue 20/03/25	8FC+1260 días
88	1.3.5.8.2	radicación a la SDM por parte de la interventoría	2 días	100	0,000%	0,000%	mié 19/03/25	vie 21/03/25	87CC
89	1.3.5.8.3	mesa de trabajo con SDM	3 días	100	0,000%	0,000%	mié 19/03/25	sáb 22/03/25	88CC
90	1.3.5.8.4	aprobación SDM	6 días	100	0,000%	0,000%	mié 19/03/25	jue 27/03/25	89CC
91	**1.3.5.9**	**PMT COSTADO OCCIDENTAL TRAMO 3A (K9+715 - K9+995)**	**60 días**	**0**	**0,000%**	**0,000%**	**lun 1/09/25**	**sáb 8/11/25**	
92	1.3.5.9.1	radicación a interventoria	1 día	25	0,000%	0,000%	lun 1/09/25	mar 2/09/25	22CC+400 días;23
93	1.3.5.9.2	radicación a la SDM por parte de la interventoría	5 días	25	0,000%	0,000%	jue 18/09/25	mié 24/09/25	92FC+15 días
94	1.3.5.9.3	mesa de trabajo con SDM	5 días	25	0,000%	0,000%	vie 10/10/25	vie 17/10/25	93FC+15 días
95	1.3.5.9.4	aprobación SDM	19 días	25	0,000%	0,000%	vie 17/10/25	sáb 8/11/25	94
96	**1.3.5.10**	**PMT COSTADO OCCIDENTAL TRAMO 3B (K9+280 - K9+715)**	**57,88 días**	**0**	**0,000%**	**0,000%**	**mié 21/02/24**	**lun 29/04/24**	
97	1.3.5.10.1	radicación a interventoria	1 día	25	0,000%	0,000%	mié 21/02/24	mié 21/02/24	21CC+90 días
98	1.3.5.10.2	radicación a la SDM por parte de la interventoría	5,5 días	25	0,000%	0,000%	lun 11/03/24	vie 15/03/24	97FC+15 días
99	1.3.5.10.3	mesa de trabajo con SDM	5 días	25	0,000%	0,000%	sáb 6/04/24	jue 11/04/24	98FC+15 días
100	1.3.5.10.4	aprobación SDM	15,25 días	25	0,000%	0,000%	vie 12/04/24	lun 29/04/24	99
101	**1.3.5.11**	**PMT COSTADO OCCIDENTAL TRAMO 3C (K8+980 - K9+190)**	**30 días**	**0**	**0,000%**	**0,000%**	**mar 14/02/23**	**sáb 18/03/23**	
102	1.3.5.11.1	radicación a interventoria	1 día	100	0,000%	0,000%	mar 14/02/23	mar 14/02/23	8FC+592 días
103	1.3.5.11.2	radicación a la SDM por parte de la interventoría	5 días	100	0,000%	0,000%	mar 14/02/23	sáb 18/02/23	102CC
104	1.3.5.11.3	mesa de trabajo con SDM	5,5 días	100	0,000%	0,000%	lun 20/02/23	vie 24/02/23	102CC;103
105	1.3.5.11.4	aprobación SDM	19,25 días	100	0,000%	0,000%	sáb 25/02/23	sáb 18/03/23	102CC;104
106	**1.3.5.12**	**PMT COSTADO OCCIDENTAL TRAMO 4A (K8+550 - K8+980)**	**60,5 días**	**0**	**0,000%**	**0,000%**	**sáb 2/11/24**	**mié 15/01/25**	
107	1.3.5.12.1	radicación a interventoria	0,5 días	30	0,000%	0,000%	sáb 2/11/24	sáb 2/11/24	25CC+1100 días
108	1.3.5.12.2	radicación a la SDM por parte de la interventoría	5 días	30	0,000%	0,000%	sáb 23/11/24	jue 28/11/24	107FC+15 días
109	1.3.5.12.3	mesa de trabajo con SDM	5 días	30	0,000%	0,000%	lun 16/12/24	sáb 21/12/24	108FC+15 días
110	1.3.5.12.4	aprobación SDM	19 días	30	0,000%	0,000%	sáb 21/12/24	mié 15/01/25	109
111	**1.3.5.13**	**PMT COSTADO OCCIDENTAL TRAMO 4B (K8+150 - K8+550)**	**31 días**	**0**	**0,000%**	**0,000%**	**mar 16/09/25**	**mié 22/10/25**	
112	1.3.5.13.1	radicación a interventoria	1 día	100	0,000%	0,000%	mar 16/09/25	mié 17/09/25	25FC+1 día;26FC+
113	1.3.5.13.2	radicación a la SDM por parte de la interventoría	5 días	100	0,000%	0,000%	mar 23/09/25	sáb 27/09/25	112FC+5 días
114	1.3.5.13.3	mesa de trabajo con SDM	5 días	100	0,000%	0,000%	vie 3/10/25	jue 9/10/25	113FC+5 días
115	1.3.5.13.4	aprobación SDM	10 días	100	0,000%	0,000%	jue 9/10/25	mié 22/10/25	114
116	**1.3.5.14**	**PMT COSTADO OCCIDENTAL TRAMO 4C (K7+970 - K8+150)**	**31 días**	**0**	**0,000%**	**0,000%**	**mar 16/09/25**	**mié 22/10/25**	
117	1.3.5.14.1	radicación a interventoria	1 día	100	0,000%	0,000%	mar 16/09/25	mié 17/09/25	25FC+1 día;26FC+
118	1.3.5.14.2	radicación a la SDM por parte de la interventoría	5 días	100	0,000%	0,000%	mar 23/09/25	sáb 27/09/25	117FC+5 días
119	1.3.5.14.3	mesa de trabajo con SDM	5 días	100	0,000%	0,000%	vie 3/10/25	jue 9/10/25	118FC+5 días
120	1.3.5.14.4	aprobación SDM	10 días	100	0,000%	0,000%	jue 9/10/25	mié 22/10/25	119
121	**1.3.5.15**	**PMT COSTADO OCCIDENTAL TRAMO 6 (K7+915 - K7+970)**	**40,13 días**	**0**	**0,000%**	**0,000%**	**mar 5/11/24**	**vie 20/12/24**	
122	1.3.5.15.1	radicación a interventoria	1 día	0	0,000%	0,000%	mar 5/11/24	mar 5/11/24	120FC-68 días
123	1.3.5.15.2	radicación a la SDM por parte de la interventoría	5 días	0	0,000%	0,000%	mié 13/11/24	lun 18/11/24	122FC+5 días
124	1.3.5.15.3	mesa de trabajo con SDM	5,5 días	0	0,000%	0,000%	lun 25/11/24	vie 29/11/24	123FC+5 días
125	1.3.5.15.4	aprobación SDM	18 días	0	0,000%	0,000%	sáb 30/11/24	vie 20/12/24	124
126	**1.3.5.16**	**PMT COSTADO ORIENTAL BRT TRAMO 1 (K9+415-9+990)**	**60 días**	**0**	**0,000%**	**0,000%**	**lun 16/12/24**	**mar 25/02/25**	
127	1.3.5.16.1	radicación a interventoria	1 día	0	0,000%	0,000%	lun 16/12/24	mar 17/12/24	8FC+1180 días

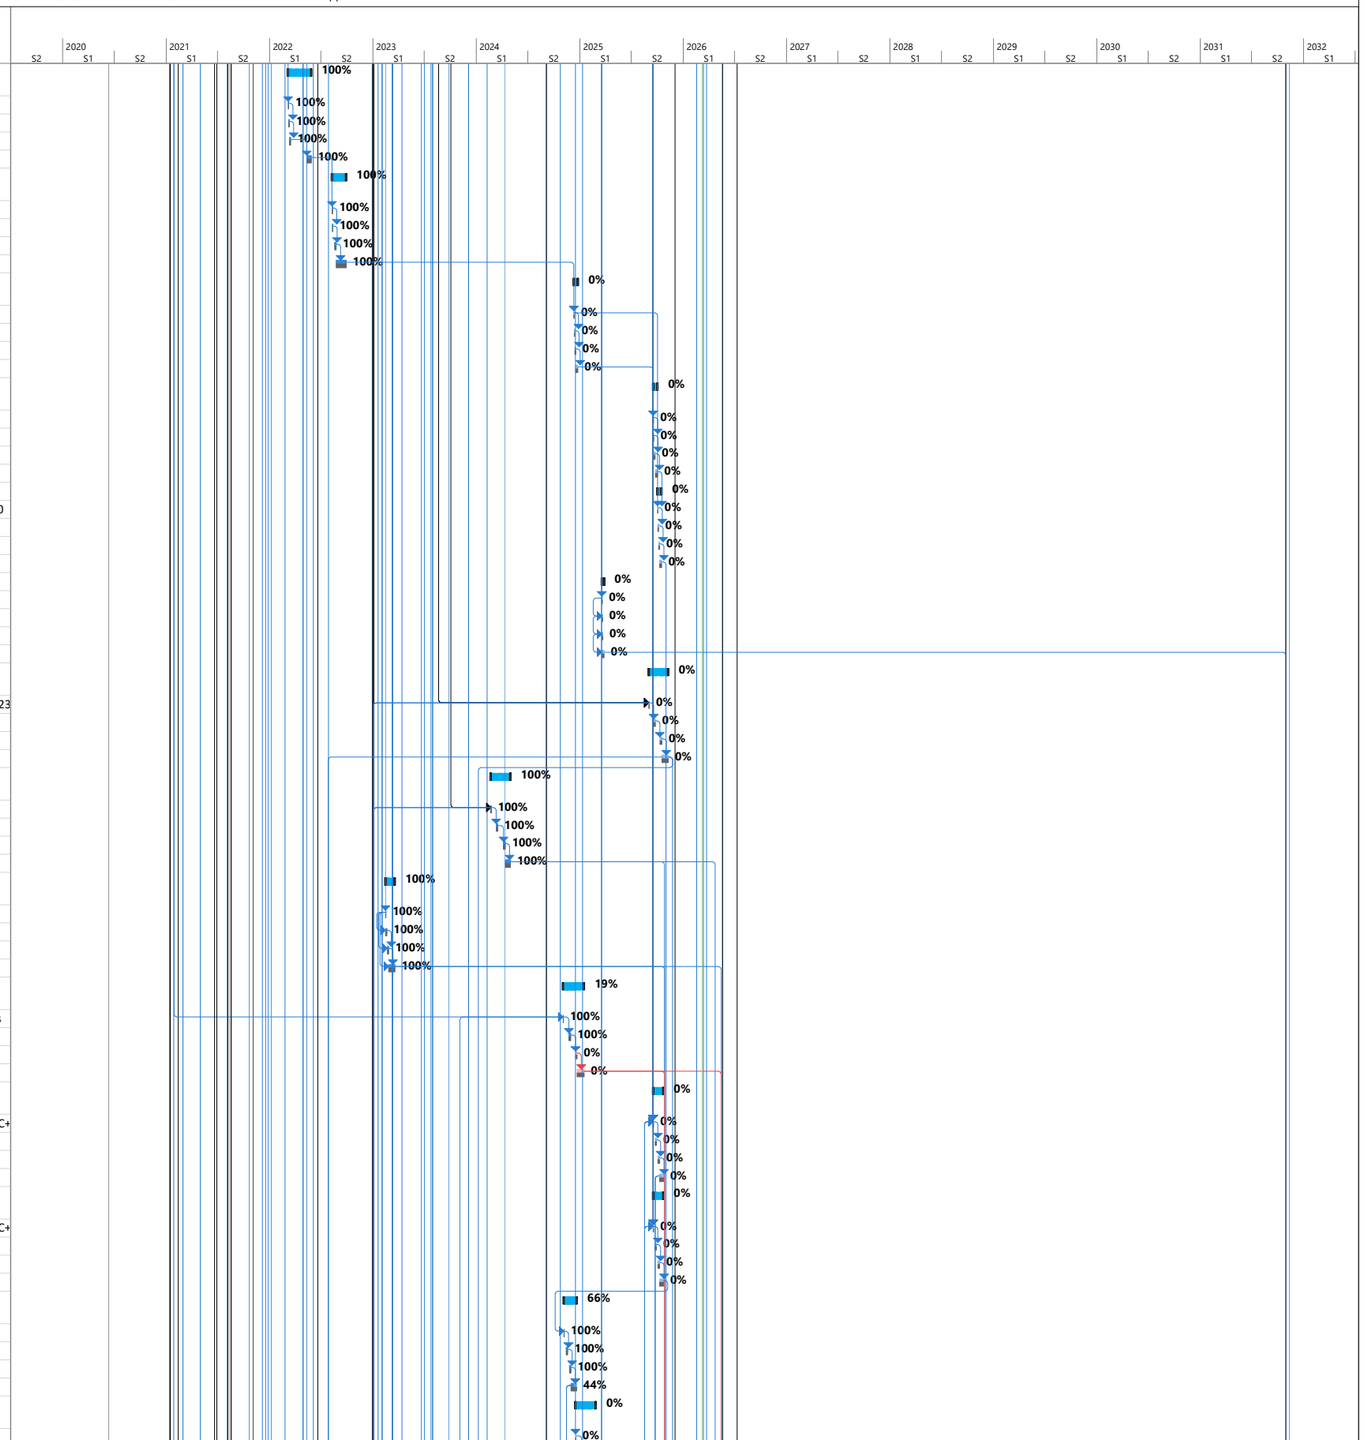


Tareas críticas · Tarea · Tarea manual · solo duración · Hito de línea base · Resumen · Tareas externas · Hito inactivo
División crítica · División · solo el comienzo · Línea base · Hito · Resumen manual · Hito externo · Resumen inactivo
Progreso de tarea crítica · Progreso de tarea · solo fin · División de la línea base · Progreso del resumen · Resumen del proyecto · Tarea inactiva · Fecha límite

Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	% Avance Conciliado	% Avance Programado (% PV)	% Avance Ejecutado conciliado (% EV))	Comienzo	Fin	Predecesoras
128	1.3.5.16.2	radicación a la SDM por parte de la interventoría	5 días	0	0,000%	0,000%	mar 7/01/25	sáb 11/01/25	127FC+15 días
129	1.3.5.16.3	mesa de trabajo con SDM	5 días	0	0,000%	0,000%	mié 29/01/25	mar 4/02/25	128FC+15 días
130	1.3.5.16.4	aprobación SDM	19 días	0	0,000%	0,000%	mar 4/02/25	mar 25/02/25	129
131	**1.3.5.17**	**PMT COSTADO ORIENTAL BRT TRAMO 2 (K7+970-K8+560) ETAPA 1**	**42,5 días**	**0**	**0,000%**	**0,000%**	**mar 20/06/23**	**mié 9/08/23**	
132	1.3.5.17.1	radicación a interventoria	1 día	100	0,000%	0,000%	mar 20/06/23	mar 20/06/23	8FC+693 días
133	1.3.5.17.2	radicación a la SDM por parte de la interventoría	5,5 días	100	0,000%	0,000%	lun 10/07/23	vie 14/07/23	132FC+15 días
134	1.3.5.17.3	mesa de trabajo con SDM	5 días	100	0,000%	0,000%	lun 17/07/23	sáb 22/07/23	133FC+1 día
135	1.3.5.17.4	aprobación SDM	19,75 días	100	0,000%	0,000%	lun 17/07/23	mié 9/08/23	134CC
136	**1.3.5.18**	**PMT COSTADO ORIENTAL BRT TRAMO 2 (K8+560-K8+980) ETAPA 2**	**61,88 días**	**0**	**0,000%**	**0,000%**	**mié 3/04/24**	**sáb 15/06/24**	
137	1.3.5.18.1	radicación a interventoria	1 día	100	0,000%	0,000%	mié 3/04/24	mié 3/04/24	900FC-334 días
138	1.3.5.18.2	radicación a la SDM por parte de la interventoría	5,5 días	100	0,000%	0,000%	lun 22/04/24	vie 26/04/24	137FC+15 días
139	1.3.5.18.3	mesa de trabajo con SDM	5 días	100	0,000%	0,000%	vie 17/05/24	mié 22/05/24	138FC+15 días
140	1.3.5.18.4	aprobación SDM	19,25 días	100	0,000%	0,000%	jue 23/05/24	sáb 15/06/24	139
141	**1.3.5.19**	**PMT COSTADO ORIENTAL BRT TRAMO 3 (K9+735-K9+990)**	**61,88 días**	**0**	**0,000%**	**0,000%**	**jue 8/02/24**	**sáb 20/04/24**	
142	1.3.5.19.1	radicación a interventoria	1 día	50	0,000%	0,000%	jue 8/02/24	jue 8/02/24	8FC+882 días
143	1.3.5.19.2	radicación a la SDM por parte de la interventoría	5 días	50	0,000%	0,000%	mar 27/02/24	sáb 2/03/24	142FC+15 días
144	1.3.5.19.3	mesa de trabajo con SDM	5 días	50	0,000%	0,000%	jue 21/03/24	mié 27/03/24	143FC+15 días
145	1.3.5.19.4	aprobación SDM	19,25 días	50	0,000%	0,000%	sáb 30/03/24	sáb 20/04/24	144
146	**1.3.5.20**	**PMT COSTADO ORIENTAL BRT TRAMO 3 (K9+420-K9+990)**	**36 días**	**0**	**0,000%**	**0,000%**	**mié 17/12/25**	**jue 29/01/26**	
147	1.3.5.20.1	radicación a interventoria	1 día	0	0,000%	0,000%	mié 17/12/25	jue 18/12/25	874FC-224 días
148	1.3.5.20.2	radicación a la SDM por parte de la interventoría	5 días	0	0,000%	0,000%	mié 24/12/25	mar 30/12/25	147FC+5 días
149	1.3.5.20.3	mesa de trabajo con SDM	5 días	0	0,000%	0,000%	mar 6/01/26	mar 13/01/26	148FC+5 días
150	1.3.5.20.4	aprobación SDM	15 días	0	0,000%	0,000%	mar 13/01/26	jue 29/01/26	149
151	**1.3.5.21**	**PMT COSTADO ORIENTAL MIXTO TRAMO 3 (K8+980 - K10+024)**	**51 días**	**0**	**0,000%**	**0,000%**	**vie 16/01/26**	**sáb 14/03/26**	
152	1.3.5.21.1	radicación a interventoria	1 día	0	0,000%	0,000%	vie 16/01/26	sáb 17/01/26	874FC-200 días
153	1.3.5.21.2	radicación a la SDM por parte de la interventoría	5 días	0	0,000%	0,000%	jue 29/01/26	mar 3/02/26	152FC+10 días
154	1.3.5.21.3	mesa de trabajo con SDM	5 días	0	0,000%	0,000%	vie 20/02/26	mié 25/02/26	153FC+15 días
155	1.3.5.21.4	aprobación SDM	15 días	0	0,000%	0,000%	jue 26/02/26	sáb 14/03/26	154
156	**1.3.5.22**	**PMT COSTADO ORIENTAL BRT TRAMO 4 (K7+970-K8+560) ETAPA 1**	**62,38 días**	**0**	**0,000%**	**0,000%**	**lun 25/09/23**	**mié 6/12/23**	
157	1.3.5.22.1	radicación a interventoria	1 día	50	0,000%	0,000%	lun 25/09/23	lun 25/09/23	8FC+772 días
158	1.3.5.22.2	radicación a la SDM por parte de la interventoría	5 días	50	0,000%	0,000%	vie 13/10/23	jue 19/10/23	157FC+15 días
159	1.3.5.22.3	mesa de trabajo con SDM	5 días	50	0,000%	0,000%	mié 8/11/23	mar 14/11/23	158FC+15 días
160	1.3.5.22.4	aprobación SDM	19,75 días	50	0,000%	0,000%	mié 15/11/23	mié 6/12/23	159
161	**1.3.5.23**	**PMT COSTADO ORIENTAL BRT TRAMO 4 (K8+560-K8+980) ETAPA 2**	**55 días**	**0**	**0,000%**	**0,000%**	**mar 9/06/26**	**vie 14/08/26**	
162	1.3.5.23.1	radicación a interventoria	1 día	0	0,000%	0,000%	mar 9/06/26	mié 10/06/26	884;891;898;899
163	1.3.5.23.2	radicación a la SDM por parte de la interventoría	5 días	0	0,000%	0,000%	mar 23/06/26	sáb 27/06/26	162FC+10 días
164	1.3.5.23.3	mesa de trabajo con SDM	5 días	0	0,000%	0,000%	jue 16/07/26	jue 23/07/26	163FC+15 días
165	1.3.5.23.4	aprobación SDM	19 días	0	0,000%	0,000%	jue 23/07/26	vie 14/08/26	164;140;155
166	**1.3.5.24**	**PMT COSTADO ORIENTAL MIXTO TRAMO 4 (K7+970 - K8+980)**	**60 días**	**0**	**0,000%**	**0,000%**	**mar 26/08/25**	**mar 4/11/25**	
167	1.3.5.24.1	radicación a interventoria	1 día	80	0,000%	0,000%	mar 26/08/25	mié 27/08/25	1050FC-320 días;
168	1.3.5.24.2	radicación a la SDM por parte de la interventoría	5 días	80	0,000%	0,000%	vie 12/09/25	jue 18/09/25	167FC+15 días
169	1.3.5.24.3	mesa de trabajo con SDM	5 días	80	0,000%	0,000%	lun 6/10/25	vie 10/10/25	168FC+15 días
170	1.3.5.24.4	aprobación SDM	19 días	80	0,000%	0,000%	vie 10/10/25	mar 4/11/25	169
171	**1.3.5.25**	**PMT COSTADO ORIENTAL TRAMO 5, 6 - TRASLADO POSTE - TRAMO 6 - 4- K7+950)**	**61,88 días**	**0**	**0,000%**	**0,000%**	**vie 6/09/24**	**lun 18/11/24**	
172	1.3.5.25.1	radicación a interventoria	1 día	100	0,000%	0,000%	vie 6/09/24	vie 6/09/24	145FC+110 días
173	1.3.5.25.2	radicación a la SDM por parte de la interventoría	5 días	100	0,000%	0,000%	mié 25/09/24	lun 30/09/24	172FC+15 días
174	1.3.5.25.3	mesa de trabajo con SDM	5 días	100	0,000%	0,000%	sáb 19/10/24	jue 24/10/24	173FC+15 días
175	1.3.5.25.4	aprobación SDM	19,25 días	100	0,000%	0,000%	vie 25/10/24	lun 18/11/24	174
176	**1.3.6**	**MEDIDA CAUTELAR**	**38,63 días**	**0**	**0,000%**	**0,000%**	**lun 23/08/21**	**mar 5/10/21**	
177	1.3.6.1	Inicio de la medida cautelar	0 días	100	0,000%	0,000%	lun 23/08/21	lun 23/08/21	8FC+152 días
178	1.3.6.2	Levantamiento de la Medida cautelar	1 día	100	0,000%	0,000%	mar 5/10/21	mar 5/10/21	177FC+36 días
179	1.3.7	LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y SEGUIMIENTO TOPOGRÁFICO	1179,13 días	100	0,000%	0,000%	sáb 13/02/21	sáb 14/12/24	6FC+1 día
180	1.3.8	OBTENCIÓN DE RESOLUCIÓN DE ARBOLES NO INCLUIDOS EN LA RESOLUCIÓN 3106	1 día	100	0,000%	0,000%	mié 3/11/21	mié 3/11/21	2FC+409 días
181	**1**	**OBRAS DE CONSTRUCCIÓN**	**1570,13 días**	**0**	**65,605%**	**68,025%**	**mié 4/08/21**	**vie 11/09/26**	
182	**1.3.9.1**	**Corredor Calle 46-Calle 66 C (Mixto)**	**1343,5 días**	**0**	**70,491%**	**71,336%**	**vie 29/04/22**	**vie 11/09/26**	
183	**1.3.9.1.1**	**Tramo 1 costado oriental Calle 63-calle 66 (K8+980 - K10+024)**	**1340,5 días**	**0**	**92,091%**	**95,688%**	**vie 29/04/22**	**mar 8/09/26**	
184	**1.3.9.1.1.1**	**Tramo 1 costado oriental Calle 63-calle 66 (K8+980 - K10+024) Fase I (1 carril) CARRIL IZQUIERDO**	**1336,38 días**	**0**	**82,745%**	**93,522%**	**vie 29/04/22**	**jue 3/09/26**	
185	1.3.9.1.1.1.1	AUTORIZACION PMT DEPRIMIDO (K9+090-K9+470)	0 días	0	0,000%	0,000%	vie 14/07/23	vie 14/07/23	8FC+714 días
186	1.3.9.1.1.1.2	PMT K9+760-10+024	0 días	100	0,000%	0,000%	sáb 10/06/23	sáb 10/06/23	185CC-27 días
187	**1.3.9.1.1.1.3**	**Tramo 1A costado oriental Calle 63-calle 66 (K9+770 - K10+000) Fase I (1 carril) CARRIL IZQUIERDO**	**279 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**vie 29/04/22**	**mié 22/03/23**	
188	**1.3.9.1.1.2**	**Intervención Calzada**	**279 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**vie 29/04/22**	**mié 22/03/23**	
189	1.3.9.1.1.2.1	Fresado	53,88 días	100	100,000%	100,000%	vie 29/04/22	vie 1/07/22	8FC+354 días

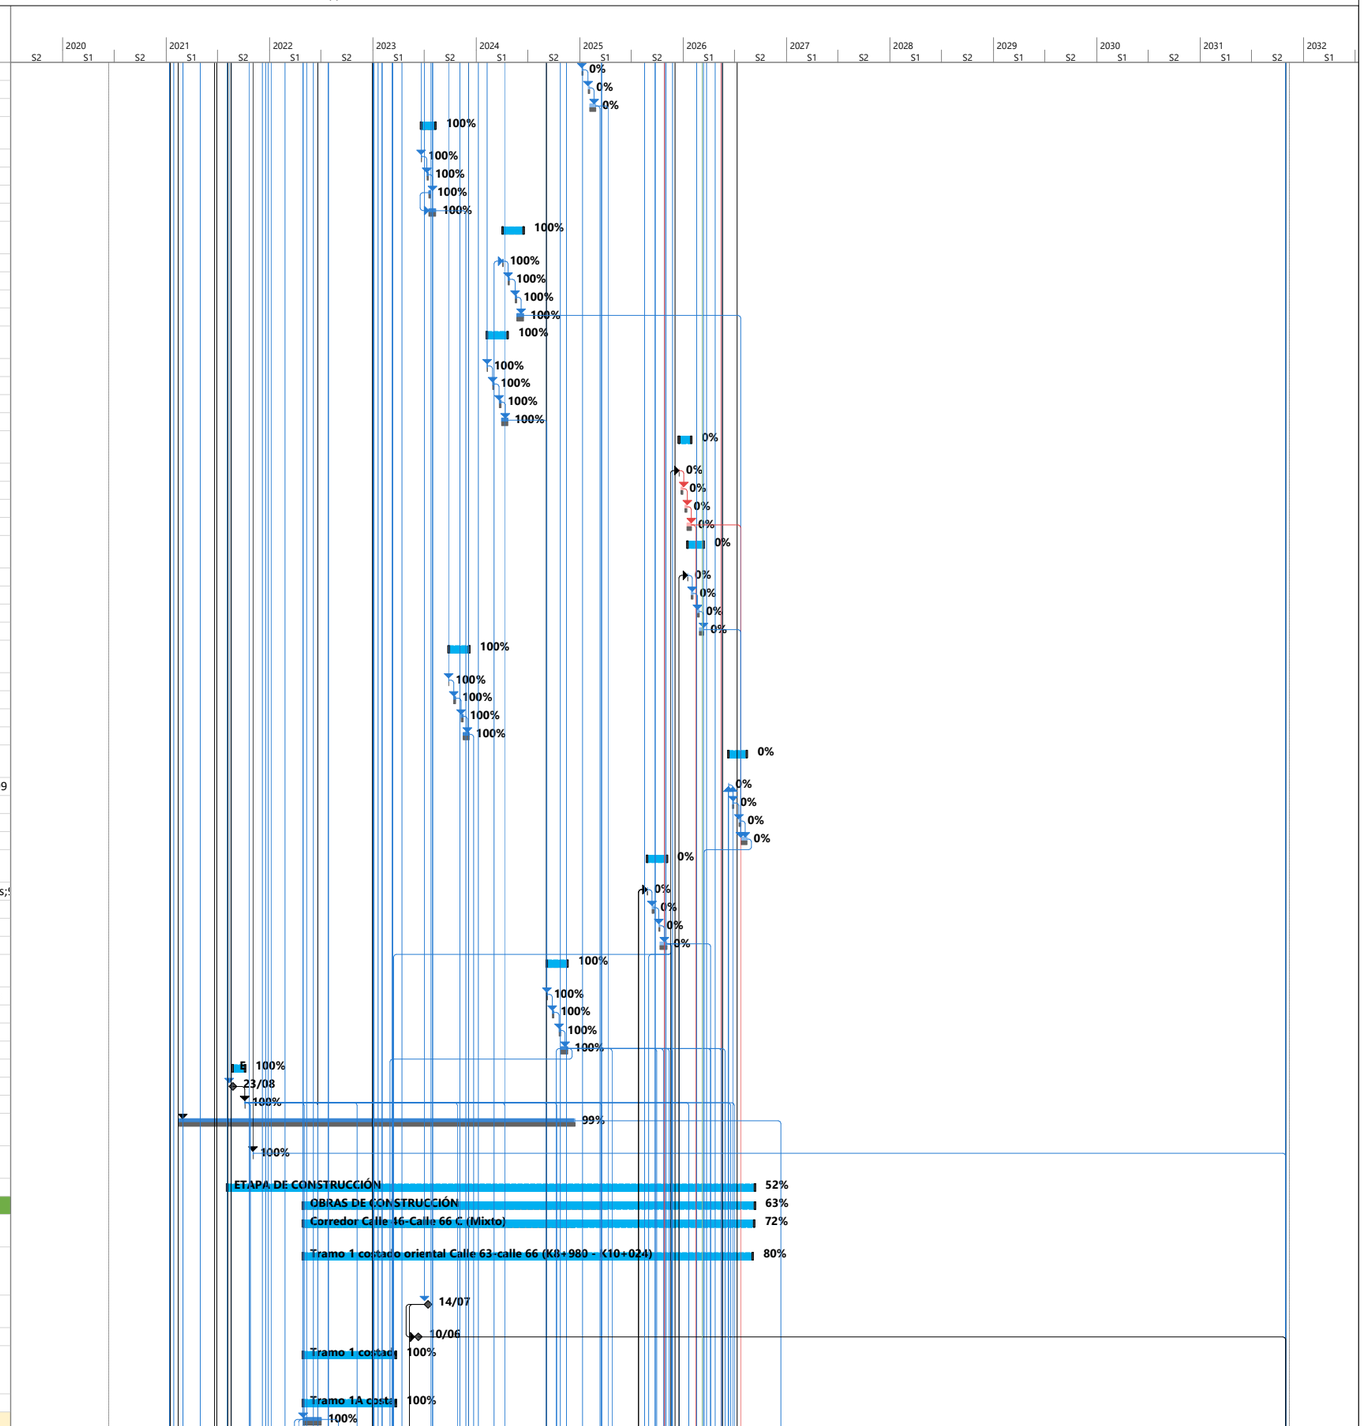


Tareas críticas · Tarea · Tarea manual · solo duración · Hito de línea base · Resumen · Tareas externas · Hito inactivo
División crítica · División · solo el comienzo · Línea base · Hito · Resumen manual · Hito externo · Resumen inactivo
Progreso de tarea crítica · Progreso de tarea · solo fin · División de la línea base · Progreso del resumen · Resumen del proyecto · Tarea inactiva · Fecha límite

Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	% Avance Conciliado	% Avance Programado (% PV)	% Avance Ejecutado conciliado (% EV))	Comienzo	Fin	Predecesoras
190	1.3.9.1.1.1.2.2	Excavaciones	62,38 días	100	100,000%	100,000%	mar 31/05/22	vie 12/08/22	189CC+26 días
191	1.3.9.1.1.1.2.3	Mejoramiento subrasante	62,38 días	100	100,000%	100,000%	jue 18/08/22	jue 27/10/22	190CC+63 días
192	1.3.9.1.1.1.2.4	Subbase granular reciclada	62,38 días	100	100,000%	100,000%	lun 10/10/22	jue 22/12/22	191CC+45 días
193	1.3.9.1.1.1.2.5	Material granular estabilizada con asfalto	61,88 días	100	100,000%	100,000%	sáb 15/10/22	mié 28/12/22	192CC+5 días
194	**1.3.9.1.1.1.2.6**	**Carpeta asfáltica**	**62,38 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**mié 11/01/23**	**mié 22/03/23**	
195	1.3.9.1.1.1.2.6.1	Base asfáltica	28,88 días	100	100,000%	100,000%	mié 11/01/23	sáb 11/02/23	193FC+10 días
196	1.3.9.1.1.1.2.6.2	Rodadura	33,38 días	100	100,000%	100,000%	lun 13/02/23	mié 22/03/23	195
197	**1.3.9.1.1.1.4**	**Tramo 1B costado oriental Calle 63-calle 66 (K10+000 - K10+024) Fase I (1 carril) CARRIL IZQUIERDO**	**927 días**	**0**	**54,211%**	**100,000%**	**sáb 1/04/23**	**jue 9/04/26**	
198	**1.3.9.1.1.1.2**	**Intervención Calzada**	**17 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**sáb 1/04/23**	**sáb 22/04/23**	
199	1.3.9.1.1.1.2.1	Fresado	4,5 días	100	100,000%	100,000%	sáb 1/04/23	sáb 8/04/23	195CC+768 días
200	1.3.9.1.1.1.4.1.2	Excavaciones	0,5 días	100	100,000%	100,000%	sáb 1/04/23	sáb 1/04/23	199CC+2 días
201	1.3.9.1.1.1.4.1.3	Mejoramiento subrasante	0,5 días	100	100,000%	100,000%	sáb 1/04/23	sáb 1/04/23	200CC+2 días
202	1.3.9.1.1.1.4.1.4	Subbase granular reciclada	0,5 días	100	100,000%	100,000%	sáb 1/04/23	sáb 1/04/23	201CC+2 días
203	1.3.9.1.1.1.4.1.5	Material granular estabilizada con asfalto	1 día	100	100,000%	100,000%	lun 17/04/23	lun 17/04/23	202CC+11 días
204	**1.3.9.1.1.1.2.6**	**Carpeta asfáltica**	**3,88 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**mié 19/04/23**	**sáb 22/04/23**	
205	1.3.9.1.1.1.2.6.1	Base asfáltica	2,13 días	100	100,000%	100,000%	mié 19/04/23	jue 20/04/23	203FC+1 día;202F
206	1.3.9.1.1.1.2.6.2	Rodadura	1,63 días	100	100,000%	100,000%	vie 21/04/23	sáb 22/04/23	205
207	**1.3.9.1.1.1.2**	**Intervención Calzada**	**13 días**	**0**	**0,000%**	**100,000%**	**mar 24/03/26**	**jue 9/04/26**	
208	1.3.9.1.1.1.2.2	Excavaciones	3 días	100	0,000%	100,000%	mar 24/03/26	vie 27/03/26	8FC+1571 días
209	1.3.9.1.1.1.2.3	Mejoramiento subrasante	3 días	100	0,000%	100,000%	jue 26/03/26	lun 30/03/26	208CC+2 días
210	1.3.9.1.1.1.2.4	Subbase granular reciclada	3 días	100	0,000%	100,000%	sáb 28/03/26	mié 1/04/26	209CC+2 días
211	1.3.9.1.1.1.2.5	Material granular estabilizada con asfalto	3 días	100	0,000%	100,000%	mar 31/03/26	lun 6/04/26	210CC+2 días
212	**1.3.9.1.1.1.2.6**	**Carpeta asfáltica**	**4 días**	**0**	**0,000%**	**100,000%**	**lun 6/04/26**	**jue 9/04/26**	
213	1.3.9.1.1.1.2.6.1	Base asfáltica	2 días	100	0,000%	100,000%	lun 6/04/26	mié 8/04/26	210;211
214	1.3.9.1.1.1.2.6.2	Rodadura	2 días	100	0,000%	100,000%	mié 8/04/26	jue 9/04/26	213
215	**1.3.9.1.1.1**	**Tramo 1C costado oriental Calle 63-calle 66 CARRIL DESACELERACION FASE I (1 CARRIL) (K9+880-K10+000)**	**339,25 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**vie 29/04/22**	**vie 2/06/23**	
216	**1.3.9.1.1.1.2**	**Intervención Calzada**	**339,25 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**vie 29/04/22**	**vie 2/06/23**	
217	1.3.9.1.1.1.2.1	Fresado	53,88 días	100	100,000%	100,000%	vie 29/04/22	vie 1/07/22	189CC
218	1.3.9.1.1.1.2.2	Excavaciones	98,75 días	100	100,000%	100,000%	mar 31/05/22	vie 23/09/22	217CC+26 días
219	1.3.9.1.1.1.2.3	Mejoramiento subrasante	73,75 días	100	100,000%	100,000%	jue 18/08/22	jue 10/11/22	218CC+63 días
220	1.3.9.1.1.1.2.4	Subbase granular reciclada	62,38 días	100	100,000%	100,000%	lun 10/10/22	jue 22/12/22	219CC+45 días
221	1.3.9.1.1.1.2.5	Material granular estabilizada con asfalto	51 días	100	100,000%	100,000%	mié 23/11/22	vie 20/01/23	220CC+35 días
222	**1.3.9.1.1.1.2.6**	**Carpeta asfáltica**	**113 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**sáb 21/01/23**	**vie 2/06/23**	
223	1.3.9.1.1.1.2.6.1	Base asfáltica	28,88 días	100	100,000%	100,000%	sáb 21/01/23	mié 22/02/23	221
224	1.3.9.1.1.1.2.6.2	Rodadura	1 día	100	100,000%	100,000%	vie 2/06/23	vie 2/06/23	223FF+81 días
225	**1.3.9.1.1.1**	**Tramo 1D costado oriental Calle 63-calle 66 CARRIL DESACELERACION FASE I (1 CARRIL) (K10+000-K10+024)**	**1048,75 días**	**0**	**54,211%**	**54,211%**	**sáb 1/04/23**	**jue 3/09/26**	
226	**1.3.9.1.1.1.2**	**Intervención Calzada**	**20,38 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**sáb 1/04/23**	**mié 26/04/23**	
227	1.3.9.1.1.1.2.1	Fresado	6,75 días	100	100,000%	100,000%	sáb 1/04/23	mar 11/04/23	199CC
228	1.3.9.1.1.1.2.2	Excavaciones	7,25 días	100	100,000%	100,000%	lun 3/04/23	mié 12/04/23	227FC-6 días
229	1.3.9.1.1.1.2.3	Mejoramiento subrasante	7,25 días	100	100,000%	100,000%	mar 4/04/23	jue 13/04/23	228FC-6 días
230	1.3.9.1.1.1.2.4	Subbase granular reciclada	7,25 días	100	100,000%	100,000%	mié 5/04/23	vie 14/04/23	229FC-6 días
231	1.3.9.1.1.1.2.5	Material granular estabilizada con asfalto	6,75 días	100	100,000%	100,000%	sáb 8/04/23	sáb 15/04/23	230FC-6 días
232	**1.3.9.1.1.1.2.6**	**Carpeta asfáltica**	**15,75 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**lun 10/04/23**	**mié 26/04/23**	
233	1.3.9.1.1.1.2.6.1	Base asfáltica	3,25 días	100	100,000%	100,000%	lun 10/04/23	mié 12/04/23	231FC-6 días
234	1.3.9.1.1.1.2.6.2	Rodadura	3,25 días	100	100,000%	100,000%	lun 24/04/23	mié 26/04/23	233;206
235	**1.3.9.1.1.1.2**	**Intervención Calzada**	**26 días**	**0**	**0,000%**	**0,000%**	**mar 14/07/26**	**jue 13/08/26**	
236	1.3.9.1.1.1.6.2.1	Excavaciones	10 días	0	0,000%	0,000%	mar 14/07/26	sáb 25/07/26	227FC+999 días
237	1.3.9.1.1.1.6.2.2	Mejoramiento subrasante	10 días	0	0,000%	0,000%	mié 15/07/26	lun 27/07/26	236CC+1 día
238	1.3.9.1.1.1.6.2.3	Subbase granular reciclada	10 días	0	0,000%	0,000%	vie 24/07/26	mié 5/08/26	237CC+8 días
239	1.3.9.1.1.1.6.2.4	Material granular estabilizada con asfalto	10 días	0	0,000%	0,000%	sáb 1/08/26	jue 13/08/26	238CC+7 días
240	**1.3.9.1.1.1.2.6**	**Carpeta asfáltica**	**21 días**	**0**	**0,000%**	**0,000%**	**lun 10/08/26**	**jue 3/09/26**	
241	1.3.9.1.1.1.2.6.1	Base asfáltica	10 días	0	0,000%	0,000%	lun 10/08/26	vie 21/08/26	239CC+6 días
242	1.3.9.1.1.1.2.6.2	Rodadura	10 días	0	0,000%	0,000%	lun 24/08/26	jue 3/09/26	241FC+1 día
243	**1.3.9.1.1.1**	**Tramo 1E costado oriental Calle 63-calle 66 FASE I (1 CARRIL) (K9+090-K9+470) DEPRIMIDO**	**695,88 días**	**0**	**100,000%**	**99,406%**	**sáb 15/04/23**	**mar 22/07/25**	
244	**1.3.9.1.1.1.7.1**	**Intervención Calzada**	**81,25 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**sáb 15/04/23**	**sáb 22/07/23**	
245	1.3.9.1.1.1.2.1	Fresado	6,13 días	100	100,000%	100,000%	sáb 15/04/23	vie 21/04/23	229FC+1 día
246	1.3.9.1.1.1.2.2	Excavaciones	12,38 días	100	100,000%	100,000%	jue 18/05/23	jue 1/06/23	245CC+27 días
247	1.3.9.1.1.1.2.3	Mejoramiento subrasante	12,38 días	100	100,000%	100,000%	vie 2/06/23	vie 16/06/23	246CC+12 días
248	1.3.9.1.1.1.2.4	Subbase granular reciclada	11,88 días	100	100,000%	100,000%	sáb 17/06/23	sáb 1/07/23	247
249	1.3.9.1.1.1.2.5	Material granular estabilizada con asfalto	3,88 días	100	100,000%	100,000%	sáb 17/06/23	jue 22/06/23	248CC
250	**1.3.9.1.1.1.2.6**	**Carpeta asfáltica**	**14,13 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**jue 6/07/23**	**sáb 22/07/23**	
251	1.3.9.1.1.1.2.6.1	Base asfáltica	3,88 días	100	100,000%	100,000%	jue 6/07/23	lun 10/07/23	249FC+10 días
252	1.3.9.1.1.1.2.6.2	Rodadura	3,88 días	100	100,000%	100,000%	mar 18/07/23	sáb 22/07/23	251FC+6 días
253	**1.3.9.1.1.1.7.2**	**Intervención Calzada**	**4 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**vie 13/12/24**	**mié 18/12/24**	

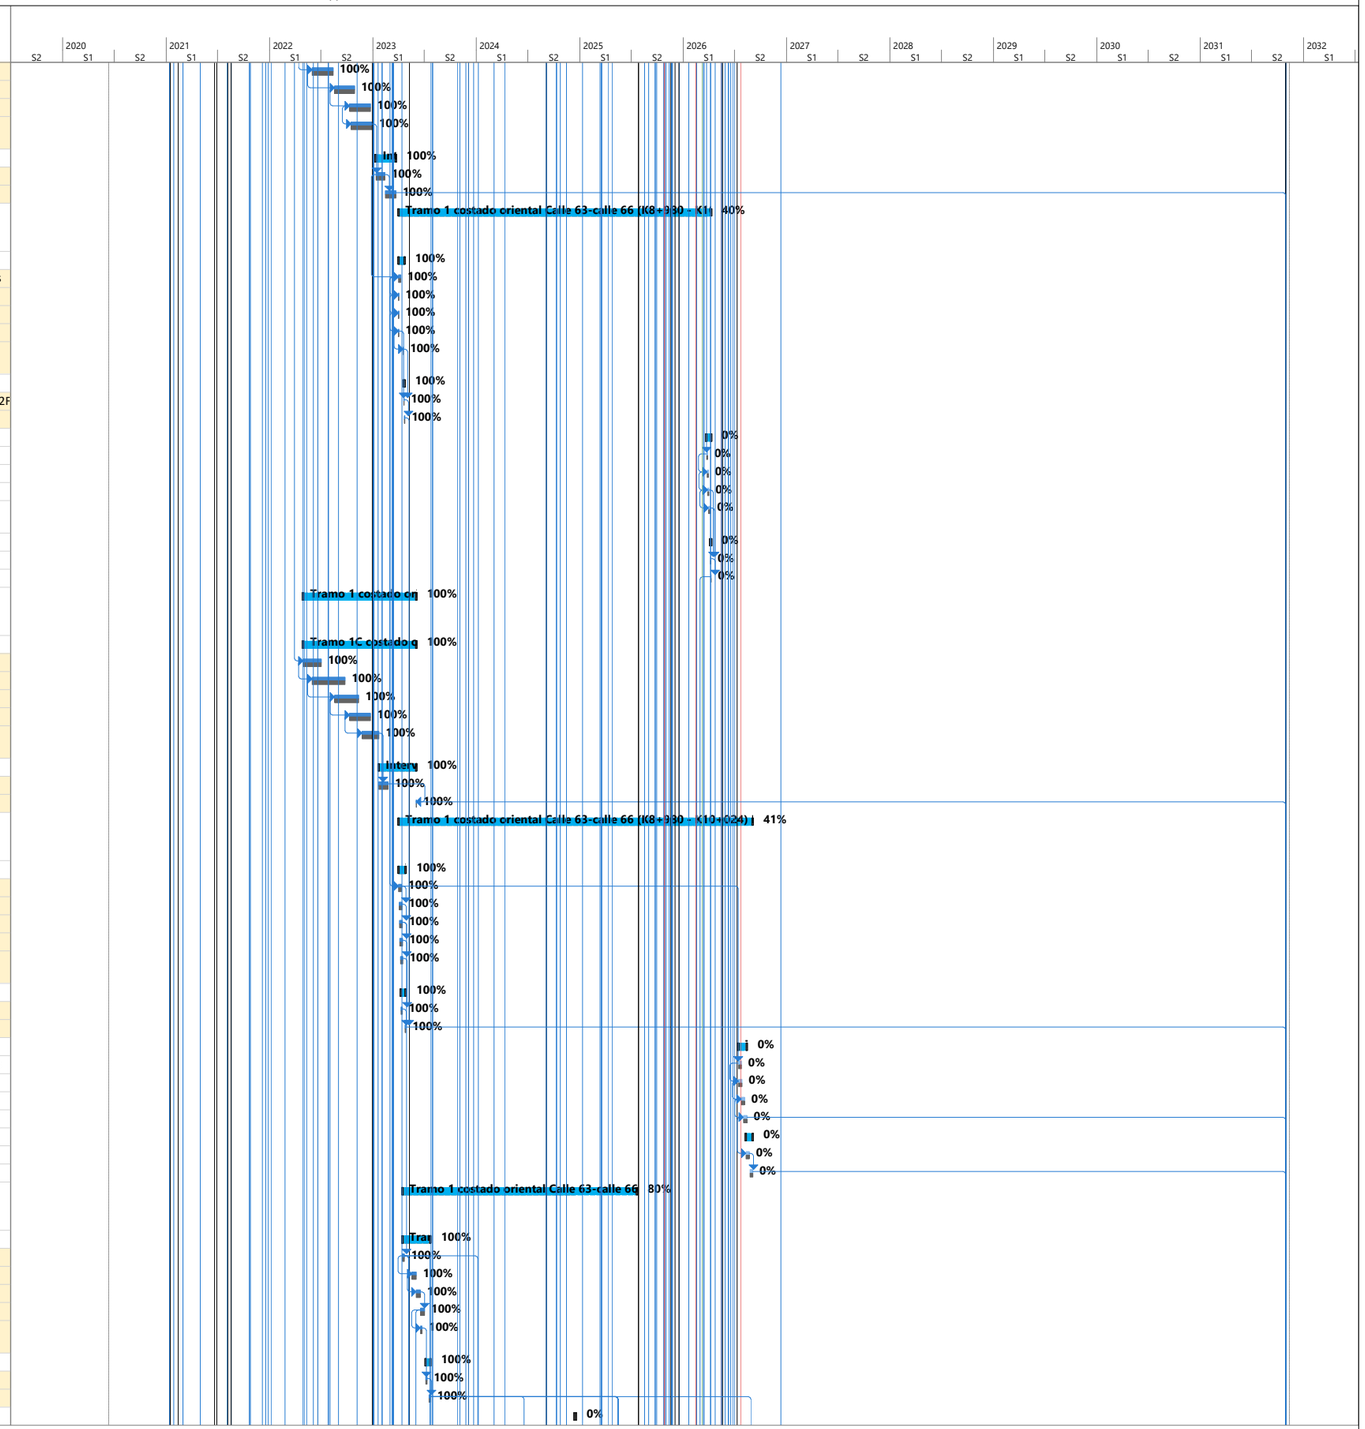


Tareas críticas · Tarea · Tarea manual · solo duración · Hito de línea base · Resumen · Tareas externas · Hito inactivo
División crítica · División · solo el comienzo · Línea base · Hito · Resumen manual · Hito externo · Resumen inactivo
Progreso de tarea crítica · Progreso de tarea · solo fin · División de la línea base · Progreso del resumen · Resumen del proyecto · Tarea inactiva · Fecha límite

Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	% Avance Conciliado	% Avance Programado (% PV)	% Avance Ejecutado conciliado (% EV))	Comienzo	Fin	Predecesoras
254	1.3.9.1.1.1.2.5	Material granular estabilizada con asfalto	4 días	100	100,000%	100,000%	vie 13/12/24	mié 18/12/24	248CC+458 días
255	**1.3.9.1.1.1.2.6**	**Carpeta asfáltica**	**117 días**	**0**	**100,000%**	**78,576%**	**mar 4/03/25**	**mar 22/07/25**	
256	1.3.9.1.1.1.2.6.1	Base asfáltica	4 días	100	100,000%	100,000%	mar 4/03/25	vie 7/03/25	254FC+64 días
257	1.3.9.1.1.1.2.6.2	Rodadura	3 días	100	100,000%	100,000%	mié 19/03/25	sáb 22/03/25	256FC+10 días
258	1.3.9.1.1.1.2.6.2	Rodadura	3 días	0	100,000%	0,000%	vie 18/07/25	mar 22/07/25	257CC+100 días
259	**1.3.9.1.1.1**	**Tramo 1F costado oriental Calle 63-calle 66 FASE I (1 CARRIL) (K8+980-K9+090) (VENTANA) ENTRADA SUR**	**837 días**	**0**	**19,640%**	**100,000%**	**vie 21/07/23**	**jue 9/04/26**	
260	**1.3.9.1.1.1.2**	**Intervención Calzada**	**180,13 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**vie 21/07/23**	**lun 19/02/24**	
261	1.3.9.1.1.1.2.1	Fresado	1 día	100	100,000%	100,000%	vie 21/07/23	vie 21/07/23	245FC+71 días
262	1.3.9.1.1.1.2.2	Excavaciones	6,13 días	100	100,000%	100,000%	sáb 22/07/23	vie 28/07/23	261
263	1.3.9.1.1.1.2.3	Mejoramiento subrasante	6,13 días	100	100,000%	100,000%	mar 15/08/23	mar 22/08/23	262FC+13 días
264	1.3.9.1.1.1.2.4	Subbase granular reciclada	6,13 días	100	100,000%	100,000%	mié 16/08/23	mié 23/08/23	263CC+1 día
265	1.3.9.1.1.1.2.5	Material granular estabilizada con asfalto	6,13 días	100	100,000%	100,000%	mar 13/02/24	lun 19/02/24	264FC+141 días
266	**1.3.9.1.1.1.2**	**Intervención Calzada**	**23 días**	**0**	**0,000%**	**100,000%**	**mié 11/03/26**	**jue 9/04/26**	
267	1.3.9.1.1.1.2.1	Fresado	0 días	100	0,000%	100,000%	mié 11/03/26	mié 11/03/26	261CC+814 días
268	1.3.9.1.1.1.2.2	Excavaciones	3 días	100	0,000%	100,000%	vie 13/03/26	mar 17/03/26	267CC+2 días
269	1.3.9.1.1.1.2.3	Mejoramiento subrasante	3 días	100	0,000%	100,000%	mié 18/03/26	vie 20/03/26	268FC+1 día
270	1.3.9.1.1.1.2.4	Subbase granular reciclada	4 días	100	0,000%	100,000%	jue 19/03/26	mié 25/03/26	269CC+1 día
271	1.3.9.1.1.1.2.5	Material granular estabilizada con asfalto	2 días	100	0,000%	100,000%	sáb 21/03/26	mié 25/03/26	270CC+2 días
272	**1.3.9.1.1.1.2.6**	**Carpeta asfáltica**	**6 días**	**0**	**0,000%**	**100,000%**	**mié 1/04/26**	**jue 9/04/26**	
273	1.3.9.1.1.1.2.6.1	Base asfáltica	4 días	100	0,000%	100,000%	mié 1/04/26	mar 7/04/26	271CC+8 días;214
274	1.3.9.1.1.1.2.6.2	Rodadura	2 días	100	0,000%	100,000%	mié 8/04/26	jue 9/04/26	273
275	**1.3.9.1.1.1**	**Tramo 1G costado oriental Calle 63-calle 66 FASE I (1 CARRIL) (K9+470-K9+580) (VENTANA) SALIDA NORTE**	**855,25 días**	**0**	**16,649%**	**44,737%**	**sáb 12/08/23**	**sáb 23/05/26**	
276	**1.3.9.1.1.1.2**	**Intervención Calzada**	**162,5 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**sáb 12/08/23**	**mar 20/02/24**	
277	1.3.9.1.1.1.2.1	Fresado	10,13 días	100	100,000%	100,000%	sáb 12/08/23	jue 24/08/23	261CC-788 días;2
278	1.3.9.1.1.1.2.2	Excavaciones	10,13 días	100	100,000%	100,000%	vie 27/10/23	mié 8/11/23	277FC+53 días
279	1.3.9.1.1.1.2.3	Mejoramiento subrasante	10,13 días	100	100,000%	100,000%	vie 27/10/23	mié 8/11/23	278CC
280	1.3.9.1.1.1.2.4	Subbase granular reciclada	10,63 días	100	100,000%	100,000%	lun 18/09/23	jue 28/09/23	277CC-33 días;27
281	1.3.9.1.1.1.2.5	Material granular estabilizada con asfalto	7,25 días	100	100,000%	100,000%	mar 13/02/24	mar 20/02/24	265CC
282	**1.3.9.1.1.1.2.6**	**Carpeta asfáltica**	**2,75 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**jue 15/02/24**	**sáb 17/02/24**	
283	1.3.9.1.1.1.2.6.1	Base asfáltica	2,75 días	100	100,000%	100,000%	jue 15/02/24	sáb 17/02/24	281CC+2 días
284	**1.3.9.1.1.1.2**	**Intervención Calzada**	**20 días**	**0**	**0,000%**	**100,000%**	**mié 11/03/26**	**mar 7/04/26**	
285	1.3.9.1.1.1.2.1	Fresado	6 días	100	0,000%	100,000%	mié 11/03/26	mié 18/03/26	267CC
286	1.3.9.1.1.1.2.2	Excavaciones	6 días	100	0,000%	100,000%	vie 13/03/26	vie 20/03/26	285CC+2 días
287	1.3.9.1.1.1.2.3	Mejoramiento subrasante	6 días	100	0,000%	100,000%	lun 16/03/26	mar 24/03/26	286CC+2 días
288	1.3.9.1.1.1.2.4	Subbase granular reciclada	6 días	100	0,000%	100,000%	mar 24/03/26	mar 31/03/26	285CC+6 días;287
289	1.3.9.1.1.1.2.5	Material granular estabilizada con asfalto	6 días	100	0,000%	100,000%	jue 26/03/26	mié 1/04/26	288CC+2 días
290	**1.3.9.1.1.1.2.6**	**Carpeta asfáltica**	**6 días**	**0**	**0,000%**	**100,000%**	**vie 27/03/26**	**mar 7/04/26**	
291	1.3.9.1.1.1.2.6.1	Base asfáltica	5 días	100	0,000%	100,000%	vie 27/03/26	lun 6/04/26	289CC+2 días
292	1.3.9.1.1.1.2.6.2	Rodadura	4 días	100	0,000%	100,000%	mar 31/03/26	mar 7/04/26	291CC+2 días
293	**1.3.9.1.1.1.2**	**Intervención Calzada**	**20 días**	**0**	**0,000%**	**0,000%**	**mié 29/04/26**	**sáb 23/05/26**	
294	1.3.9.1.1.1.2.1	Fresado	6 días	0	0,000%	0,000%	mié 29/04/26	mié 6/05/26	267CC+40 días
295	1.3.9.1.1.1.2.2	Excavaciones	6 días	0	0,000%	0,000%	sáb 2/05/26	vie 8/05/26	294CC+2 días
296	1.3.9.1.1.1.2.3	Mejoramiento subrasante	6 días	0	0,000%	0,000%	mar 5/05/26	lun 11/05/26	295CC+2 días
297	1.3.9.1.1.1.2.4	Subbase granular reciclada	6 días	0	0,000%	0,000%	mar 12/05/26	mar 19/05/26	294CC+6 días;296
298	1.3.9.1.1.1.2.5	Material granular estabilizada con asfalto	6 días	0	0,000%	0,000%	mié 13/05/26	jue 21/05/26	297CC+2 días
299	**1.3.9.1.1.1.2.6**	**Carpeta asfáltica**	**6 días**	**0**	**0,000%**	**0,000%**	**vie 15/05/26**	**sáb 23/05/26**	
300	1.3.9.1.1.1.2.6.1	Base asfáltica	5 días	0	0,000%	0,000%	vie 15/05/26	vie 22/05/26	298CC+2 días
301	1.3.9.1.1.1.2.6.2	Rodadura	4 días	0	0,000%	0,000%	mar 19/05/26	sáb 23/05/26	300CC+2 días
302	**1.3.9.1.1.1**	**Tramo 1H costado oriental Calle 63-calle 66 FASE I (1 CARRIL) (K9+580-K9+770) (VENTANA)**	**950,5 días**	**0**	**98,460%**	**98,460%**	**sáb 22/04/23**	**mié 27/05/26**	
303	**1.3.9.1.1.1.2**	**Intervención Calzada**	**439,88 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**sáb 22/04/23**	**vie 27/09/24**	
304	1.3.9.1.1.1.2.1	Fresado	10,13 días	100	100,000%	100,000%	sáb 22/04/23	jue 4/05/23	245;283
305	1.3.9.1.1.1.2.2	Excavaciones	10,13 días	100	100,000%	100,000%	sáb 22/04/23	jue 4/05/23	245
306	1.3.9.1.1.1.2.3	Mejoramiento subrasante	10,13 días	100	100,000%	100,000%	sáb 22/04/23	jue 4/05/23	245
307	1.3.9.1.1.1.2.4	Subbase granular reciclada	10,13 días	100	100,000%	100,000%	sáb 22/04/23	jue 4/05/23	245
308	1.3.9.1.1.1.2.5	Material granular estabilizada con asfalto	10,63 días	100	100,000%	100,000%	mar 17/09/24	vie 27/09/24	307CC+414 días;280;304;306
309	**1.3.9.1.1.1.2.6**	**Carpeta asfáltica**	**2,75 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**sáb 6/01/24**	**mié 10/01/24**	
310	1.3.9.1.1.1.2.6.1	Base asfáltica	2,75 días	100	100,000%	100,000%	sáb 6/01/24	mié 10/01/24	245FC+208 días;3
311	**1.3.9.1.1.1.2**	**Intervención Calzada**	**309 días**	**0**	**98,049%**	**98,049%**	**sáb 24/05/25**	**mié 27/05/26**	
312	1.3.9.1.1.1.2.1	Fresado	6 días	100	100,000%	100,000%	sáb 24/05/25	sáb 31/05/25	310CC+426 días
313	1.3.9.1.1.1.2.2	Excavaciones	6 días	100	100,000%	100,000%	sáb 31/05/25	lun 9/06/25	312CC+6 días
314	1.3.9.1.1.1.2.3	Mejoramiento subrasante	6 días	100	100,000%	100,000%	mié 4/06/25	mié 11/06/25	313CC+2 días
315	1.3.9.1.1.1.2.4	Subbase granular reciclada	6 días	100	100,000%	100,000%	vie 6/06/25	jue 12/06/25	314CC+2 días
316	1.3.9.1.1.1.2.5	Material granular estabilizada con asfalto	5 días	100	100,000%	100,000%	jue 4/12/25	jue 11/12/25	315CC+154 días
317	**1.3.9.1.1.1.2.6**	**Carpeta asfáltica**	**139 días**	**0**	**91,426%**	**91,426%**	**vie 12/12/25**	**mié 27/05/26**	
318	1.3.9.1.1.1.2.6.1	Base asfáltica	2 días	100	100,000%	100,000%	vie 12/12/25	lun 15/12/25	316CC+6 días
319	1.3.9.1.1.1.2.6.2	Rodadura	2 días	100	100,000%	100,000%	mar 16/12/25	jue 18/12/25	318FC+1 día

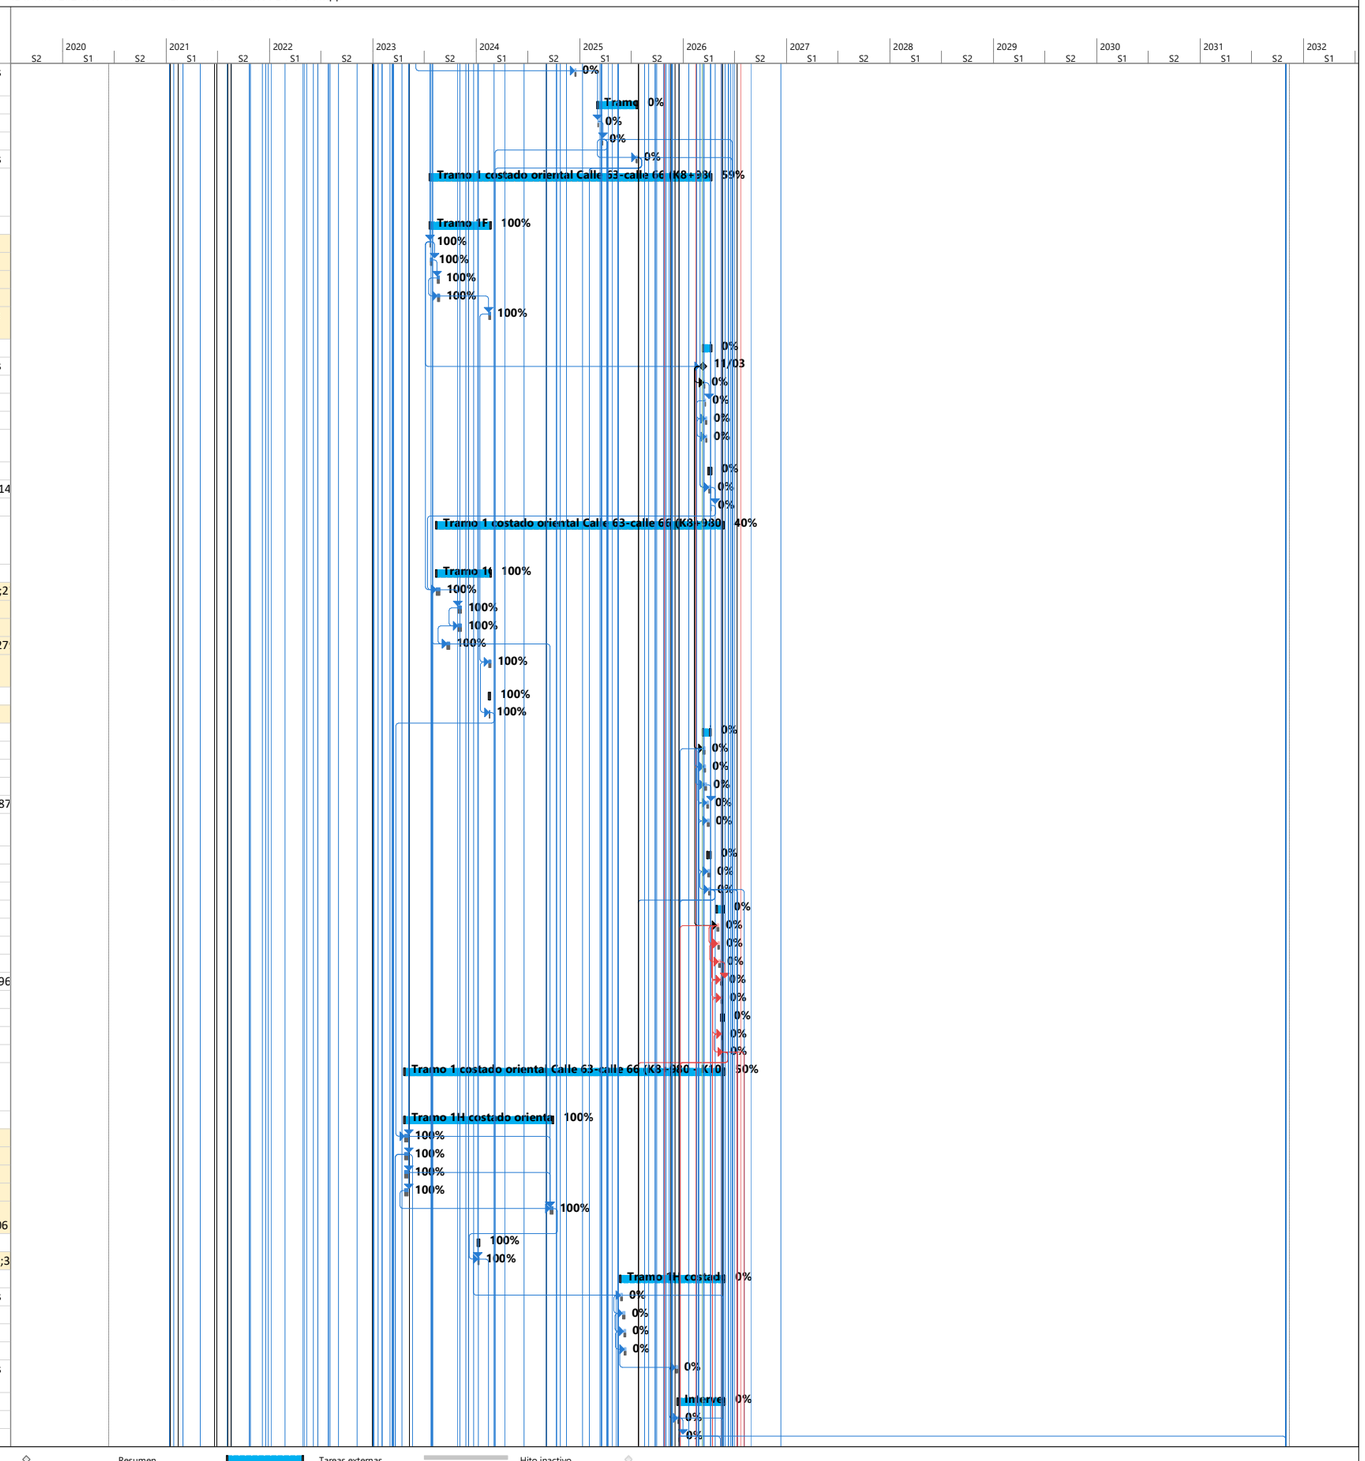


Tareas críticas · Tarea · Tarea manual · solo duración · Hito de línea base · Resumen · Tareas externas · Hito inactivo
División crítica · División · solo el comienzo · Línea base · Hito · Resumen manual · Hito externo · Resumen inactivo
Progreso de tarea crítica · Progreso de tarea · solo fin · División de la línea base · Progreso del resumen · Resumen del proyecto · Tarea inactiva · Fecha límite

Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	% Avance Conciliado	% Avance Programado (% PV)	% Avance Ejecutado conciliado (% EV))	Comienzo	Fin	Predecesoras
320	1.3.9.1.1.1.2.5	Material granular estabilizada con asfalto	14 días	0	0,000%	0,000%	lun 11/05/26	mié 27/05/26	319FC+120 días
321	1.3.9.1.1.1.2.6.1	Base asfáltica	3 días	0	0,000%	0,000%	vie 15/05/26	mié 20/05/26	316CC+5 días;320
322	1.3.9.1.1.1.2.6.2	Rodadura	3 días	0	0,000%	0,000%	jue 21/05/26	lun 25/05/26	318FC+1 día;312F
323	**1.3.9.1.1.2**	**Tramo 1 costado oriental Calle 63-calle 66 (K9+760 - K10+024) Fase 2 (2 carriles)**	**727,13 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**jue 20/04/23**	**mar 2/09/25**	
324	**1.3.9.1.1.2.1**	**Tramo 1 I costado oriental Calle 63-calle 66 (K9+760 - K9+805) Fase 2 (2 carriles)**	**650 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**jue 20/04/23**	**sáb 31/05/25**	
325	**1.3.9.1.1.2.1.1**	**Intervención Calzada**	**88 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**jue 20/04/23**	**jue 3/08/23**	
326	1.3.9.1.1.2.1.1.1	Fresado	10,13 días	100	100,000%	100,000%	jue 20/04/23	mar 2/05/23	305CC-2 días
327	1.3.9.1.1.2.1.1.2	Excavaciones	13,5 días	100	100,000%	100,000%	mar 25/04/23	mié 10/05/23	326CC+4 días
328	1.3.9.1.1.2.1.1.3	Mejoramiento subrasante	20,38 días	100	100,000%	100,000%	sáb 29/04/23	mié 24/05/23	326CC+4 días;327
329	1.3.9.1.1.2.1.1.4	Subbase granular reciclada	20,88 días	100	100,000%	100,000%	mar 11/07/23	jue 3/08/23	328FC+37 días
330	**1.3.9.1.1.2.1.2**	**Intervención Calzada**	**53 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**sáb 29/03/25**	**sáb 31/05/25**	
331	1.3.9.1.1.2.1.2.1	Excavaciones	10 días	100	100,000%	100,000%	sáb 29/03/25	mié 9/04/25	326FC+509 días;3
332	1.3.9.1.1.2.1.2.2	Mejoramiento subrasante	10 días	100	100,000%	100,000%	jue 10/04/25	jue 24/04/25	331CC+11 días
333	1.3.9.1.1.2.1.2.3	Subbase granular reciclada	10 días	100	100,000%	100,000%	jue 24/04/25	mié 7/05/25	332CC+10 días
334	1.3.9.1.1.2.1.2.4	Material granular estabilizada con asfalto	10 días	100	100,000%	100,000%	mié 7/05/25	lun 19/05/25	333CC+10 días
335	**1.3.9.1.1.2.1.2.5**	**Carpeta asfáltica**	**12 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**lun 19/05/25**	**sáb 31/05/25**	
336	1.3.9.1.1.2.1.2.5.1	Base asfáltica	5 días	100	100,000%	100,000%	lun 19/05/25	vie 23/05/25	334
337	1.3.9.1.1.2.1.2.5.2	Rodadura	6 días	100	100,000%	100,000%	lun 26/05/25	sáb 31/05/25	336FC+1 día
338	**1.3.9.1.1.2.2**	**Tramo 1 J costado oriental Calle 63-calle 66 (K9+805 - K9+835) Fase 2 (2 carriles)**	**703,13 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**jue 20/04/23**	**sáb 2/08/25**	
339	**1.3.9.1.1.2.2.1**	**Intervención Calzada**	**703,13 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**jue 20/04/23**	**sáb 2/08/25**	
340	1.3.9.1.1.2.2.1.1	Fresado	6,13 días	100	100,000%	100,000%	jue 20/04/23	mié 26/04/23	305CC-2 días
341	1.3.9.1.1.2.2.1.2	Excavaciones	10 días	100	100,000%	100,000%	mar 3/06/25	sáb 14/06/25	340FC+645 días
342	1.3.9.1.1.2.2.1.3	Mejoramiento subrasante	10 días	100	100,000%	100,000%	sáb 14/06/25	jue 26/06/25	341
343	1.3.9.1.1.2.2.1.4	Subbase granular reciclada	10 días	100	100,000%	100,000%	vie 27/06/25	jue 10/07/25	342FC+1 día
344	1.3.9.1.1.2.2.1.5	Material granular estabilizada con asfalto	10 días	100	100,000%	100,000%	jue 10/07/25	mar 22/07/25	343
345	**1.3.9.1.1.2.2.1.6**	**Carpeta asfáltica**	**11 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**mar 22/07/25**	**sáb 2/08/25**	
346	1.3.9.1.1.2.2.1.6.1	Base asfáltica	5 días	100	100,000%	100,000%	mar 22/07/25	lun 28/07/25	344
347	1.3.9.1.1.2.2.1.6.2	Rodadura	5 días	100	100,000%	100,000%	mar 29/07/25	sáb 2/08/25	346FC+1 día
348	**1.3.9.1.1.2.3**	**Tramo 1 K costado oriental Calle 63-calle 66 (K9+835 - K9+865) Fase 2 (2 carriles)**	**686,25 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**jue 18/05/23**	**mar 12/08/25**	
349	**1.3.9.1.1.2.3.1**	**Intervención Calzada**	**686,25 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**jue 18/05/23**	**mar 12/08/25**	
350	1.3.9.1.1.2.3.1.1	Fresado	10,13 días	100	100,000%	100,000%	jue 18/05/23	mar 30/05/23	305FC+11 días
351	1.3.9.1.1.2.3.1.2	Excavaciones	10 días	100	100,000%	100,000%	sáb 14/06/25	jue 26/06/25	341;350
352	1.3.9.1.1.2.3.1.3	Mejoramiento subrasante	10 días	100	100,000%	100,000%	vie 27/06/25	jue 10/07/25	351FC+1 día
353	1.3.9.1.1.2.3.1.4	Subbase granular reciclada	10 días	100	100,000%	100,000%	jue 10/07/25	mar 22/07/25	352
354	1.3.9.1.1.2.3.1.5	Material granular estabilizada con asfalto	10 días	100	100,000%	100,000%	mar 22/07/25	vie 1/08/25	353
355	**1.3.9.1.1.2.3.1.6**	**Carpeta asfáltica**	**8 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**vie 1/08/25**	**mar 12/08/25**	
356	1.3.9.1.1.2.3.1.6.1	Base asfáltica	3 días	100	100,000%	100,000%	vie 1/08/25	mar 5/08/25	354
357	1.3.9.1.1.2.3.1.6.2	Rodadura	3 días	100	100,000%	100,000%	vie 8/08/25	mar 12/08/25	356FC+2 días;347
358	**1.3.9.1.1.2.4**	**Tramo 1 L costado oriental Calle 63-calle 66 (K9+865 - K10+024) Fase 2 (2 carriles)**	**727,13 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**jue 20/04/23**	**mar 2/09/25**	
359	1.3.9.1.1.2.4.1	Inicio de tramo 1	0 días	0	0,000%	0,000%	mar 12/08/25	mar 12/08/25	357
360	**1.3.9.1.1.2.4.2**	**Intervención Calzada**	**16,38 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**jue 20/04/23**	**mar 9/05/23**	
361	1.3.9.1.1.2.4.2.1	Fresado	10,13 días	100	100,000%	100,000%	jue 20/04/23	mar 2/05/23	340CC
362	1.3.9.1.1.2.4.2.2	Excavaciones	10,13 días	100	100,000%	100,000%	vie 21/04/23	mié 3/05/23	361CC+1 día
363	1.3.9.1.1.2.4.2.3	Mejoramiento subrasante	10,63 días	100	100,000%	100,000%	lun 24/04/23	vie 5/05/23	362CC+2 días
364	1.3.9.1.1.2.4.2.4	Subbase granular reciclada	10,13 días	100	100,000%	100,000%	mié 26/04/23	lun 8/05/23	363CC+2 días
365	1.3.9.1.1.2.4.2.5	Material granular estabilizada con asfalto	7,88 días	100	100,000%	100,000%	sáb 29/04/23	mar 9/05/23	364CC+3 días
366	**1.3.9.1.1.2.4.2.6**	**Carpeta asfáltica**	**4,38 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**mar 2/05/23**	**vie 5/05/23**	
367	1.3.9.1.1.2.4.2.6.1	Base asfáltica	4,38 días	100	100,000%	100,000%	mar 2/05/23	vie 5/05/23	365CC+1 día
368	**1.3.9.1.1.2.4.3**	**Intervención Calzada**	**17 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**mar 12/08/25**	**mar 2/09/25**	
369	1.3.9.1.1.2.4.3.1	Material granular estabilizada con asfalto	8 días	100	100,000%	100,000%	mar 12/08/25	vie 22/08/25	359;367
370	**1.3.9.1.1.2.4.3.2**	**Carpeta asfáltica**	**9 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**vie 22/08/25**	**mar 2/09/25**	
371	1.3.9.1.1.2.4.3.2.1	Base asfáltica	4 días	100	100,000%	100,000%	vie 22/08/25	mié 27/08/25	365;369
372	1.3.9.1.1.2.4.3.2.2	Rodadura	4 días	100	100,000%	100,000%	jue 28/08/25	mar 2/09/25	371FC+1 día
373	**1.3.9.1.1.3**	**Tramo 1 costado oriental Calle 63-calle 66 (K8+980 - K9+760) Fase 2 (2 carriles)**	**1235,88 días**	**0**	**95,679%**	**95,679%**	**jue 1/09/22**	**mar 8/09/26**	
374	**1.3.9.1.1.3.1**	**Tramo 1M costado oriental Calle 63-calle 66 (K9+580 - K9+760) Fase 2 (2 carriles)**	**919,38 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**jue 1/09/22**	**mié 27/08/25**	
375	**1.3.9.1.1.2**	**Intervención Calzada**	**259,13 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**jue 1/09/22**	**mar 4/07/23**	
376	1.3.9.1.1.2.1	Fresado	53,88 días	100	100,000%	100,000%	jue 1/09/22	mar 1/11/22	189FC+49 días
377	1.3.9.1.1.2.2	Excavaciones	98,25 días	100	100,000%	100,000%	sáb 1/10/22	mié 25/01/23	376CC+26 días
378	1.3.9.1.1.2.3	Mejoramiento subrasante	73,75 días	100	100,000%	100,000%	jue 19/01/23	vie 14/04/23	377CC+89 días
379	1.3.9.1.1.2.4	Subbase granular reciclada	73,25 días	100	100,000%	100,000%	vie 10/02/23	lun 8/05/23	378CC+19 días
380	1.3.9.1.1.2.5	Material granular estabilizada con asfalto	73,25 días	100	100,000%	100,000%	mié 5/04/23	mar 4/07/23	379CC+45 días
381	**1.3.9.1.1.2.6**	**Carpeta asfáltica**	**53,88 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**lun 10/04/23**	**sáb 10/06/23**	
382	1.3.9.1.1.2.6.1	Base asfáltica	53,88 días	100	100,000%	100,000%	lun 10/04/23	sáb 10/06/23	380CC+2 días
383	**1.3.9.1.1.1.2**	**Intervención Calzada**	**50 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**vie 27/06/25**	**mié 27/08/25**	
384	1.3.9.1.1.1.2.5	Material granular estabilizada con asfalto	40 días	100	100,000%	100,000%	vie 27/06/25	jue 14/08/25	351FC+1 día

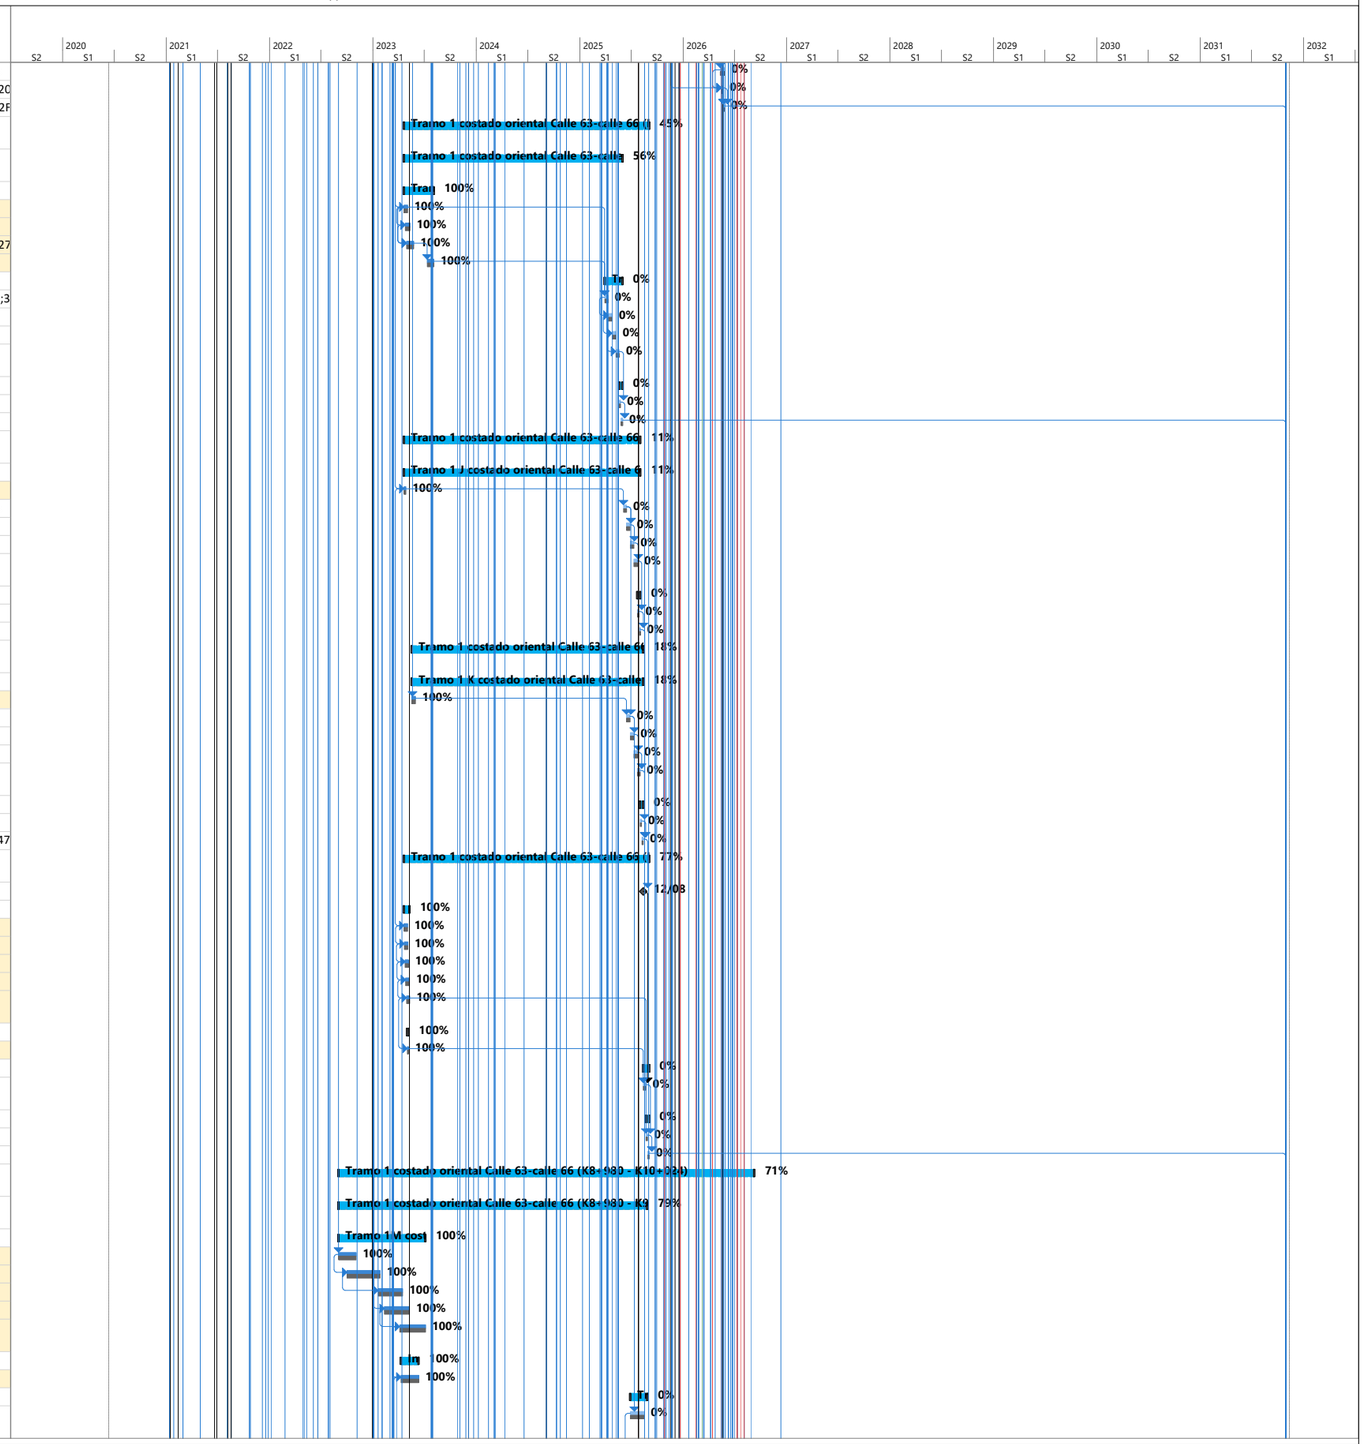


Tareas críticas · Tarea · Tarea manual · solo duración · Hito de línea base · Resumen · Tareas externas · Hito inactivo
División crítica · División · solo el comienzo · Línea base · Hito · Resumen manual · Hito externo · Resumen inactivo
Progreso de tarea crítica · Progreso de tarea · solo fin · División de la línea base · Progreso del resumen · Resumen del proyecto · Tarea inactiva · Fecha límite

Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	% Avance Conciliado	% Avance Programado (% PV)	% Avance Ejecutado conciliado (% EV))	Comienzo	Fin	Predecesoras
385	**1.3.9.1.1.1.2.6**	**Carpeta asfáltica**	**40 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**jue 10/07/25**	**mié 27/08/25**	
386	1.3.9.1.1.1.2.6.1	Base asfáltica	35 días	100	100,000%	100,000%	jue 10/07/25	jue 21/08/25	384CC+10 días
387	1.3.9.1.1.1.2.6.2	Rodadura	40 días	100	100,000%	100,000%	jue 10/07/25	mié 27/08/25	386CC
388	**1.3.9.1.1.1**	**Tramo 1N costado oriental Calle 63-calle 66 FASE 2 (2 CARRILES) (K9+090-K9+470) DEPRIMIDO**	**732,75 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**sáb 15/04/23**	**mié 3/09/25**	
389	**1.3.9.1.1.1.2**	**Intervención Calzada**	**53,38 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**sáb 15/04/23**	**sáb 17/06/23**	
390	1.3.9.1.1.1.2.1	Fresado	6,13 días	100	100,000%	100,000%	sáb 15/04/23	vie 21/04/23	382CC+5 días
391	1.3.9.1.1.1.2.2	Excavaciones	11,88 días	100	100,000%	100,000%	sáb 22/04/23	sáb 6/05/23	390
392	1.3.9.1.1.1.2.3	Mejoramiento subrasante	12,38 días	100	100,000%	100,000%	lun 8/05/23	sáb 20/05/23	391
393	1.3.9.1.1.1.2.4	Subbase granular reciclada	7,25 días	100	100,000%	100,000%	mar 23/05/23	mar 30/05/23	392
394	1.3.9.1.1.1.2.5	Material granular estabilizada con asfalto	7,25 días	100	100,000%	100,000%	mar 6/06/23	mié 14/06/23	393FC+5 días
395	**1.3.9.1.1.1.2.6**	**Carpeta asfáltica**	**6,75 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**vie 9/06/23**	**sáb 17/06/23**	
396	1.3.9.1.1.1.2.6.1	Base asfáltica	3,88 días	100	100,000%	100,000%	vie 9/06/23	mié 14/06/23	394CC+3 días
397	1.3.9.1.1.1.2.6.2	Rodadura	3,88 días	100	100,000%	100,000%	mié 14/06/23	sáb 17/06/23	396FC-1 día
398	**1.3.9.1.1.1.2**	**Intervención Calzada**	**23 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**mié 6/08/25**	**mié 3/09/25**	
399	1.3.9.1.1.1.2.4	Subbase granular reciclada	7 días	100	100,000%	100,000%	mié 6/08/25	jue 14/08/25	382CC+62 días;31
400	1.3.9.1.1.1.2.5	Material granular estabilizada con asfalto	7 días	100	100,000%	100,000%	jue 14/08/25	sáb 23/08/25	399FC-0,2 días
401	**1.3.9.1.1.1.2.6**	**Carpeta asfáltica**	**9 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**lun 25/08/25**	**mié 3/09/25**	
402	1.3.9.1.1.1.2.6.1	Base asfáltica	4 días	100	100,000%	100,000%	lun 25/08/25	jue 28/08/25	400FC+0,2 días
403	1.3.9.1.1.1.2.6.2	Rodadura	4 días	100	100,000%	100,000%	vie 29/08/25	mié 3/09/25	402FC+1 día
404	**1.3.9.1.1.1**	**Tramo 1O costado oriental Calle 63-calle 66 FASE 2 (2 CARRILES) (K8+980-K9+090) (VENTANA) ENTRADA SUR**	**762,68 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**sáb 17/06/23**	**mié 10/12/25**	
405	**1.3.9.1.1.1.2**	**Intervención Calzada**	**60,75 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**sáb 17/06/23**	**mié 30/08/23**	
406	1.3.9.1.1.1.2.1	Fresado	6,75 días	100	100,000%	100,000%	sáb 17/06/23	lun 26/06/23	396FC+2 días
407	1.3.9.1.1.1.2.2	Excavaciones	7,25 días	100	100,000%	100,000%	vie 23/06/23	vie 30/06/23	406FC-3 días
408	1.3.9.1.1.1.2.3	Mejoramiento subrasante	7,25 días	100	100,000%	100,000%	mar 15/08/23	mié 23/08/23	407FC+35 días
409	1.3.9.1.1.1.2.4	Subbase granular reciclada	7,25 días	100	100,000%	100,000%	mié 23/08/23	mié 30/08/23	408FC-1 día
410	**1.3.9.1.1.1.2**	**Intervención Calzada**	**83,8 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**mar 2/09/25**	**mié 10/12/25**	
411	1.3.9.1.1.1.2.1	Fresado	6 días	100	100,000%	100,000%	mar 2/09/25	mar 9/09/25	396FC+4 días;402
412	1.3.9.1.1.1.2.2	Excavaciones	7 días	100	100,000%	100,000%	jue 11/09/25	jue 18/09/25	411CC+8 días
413	1.3.9.1.1.1.2.3	Mejoramiento subrasante	6 días	100	100,000%	100,000%	mar 4/11/25	mar 11/11/25	412FC+39 días
414	1.3.9.1.1.1.2.4	Subbase granular reciclada	7 días	100	100,000%	100,000%	jue 13/11/25	vie 21/11/25	413FC+2 días
415	1.3.9.1.1.1.2.5	Material granular estabilizada con asfalto	7 días	100	100,000%	100,000%	vie 21/11/25	sáb 29/11/25	409;414
416	**1.3.9.1.1.1.2.6**	**Carpeta asfáltica**	**8 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**sáb 29/11/25**	**mié 10/12/25**	
417	1.3.9.1.1.1.2.6.1	Base asfáltica	3 días	100	100,000%	100,000%	sáb 29/11/25	mié 3/12/25	397FC-0,2 días;40
418	1.3.9.1.1.1.2.6.2	Rodadura	3 días	100	100,000%	100,000%	vie 5/12/25	mié 10/12/25	417CC+5 días
419	**1.3.9.1.1.1**	**Tramo 1P costado oriental Calle 63-calle 66 FASE 2 (2 CARRILES) (K9+470-K9+580) (VENTANA) SALIDA NORTE**	**903,75 días**	**0**	**71,462%**	**71,462%**	**sáb 17/06/23**	**mié 27/05/26**	
420	**1.3.9.1.1.1.2**	**Intervención Calzada**	**278,5 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**sáb 17/06/23**	**mié 15/05/24**	
421	1.3.9.1.1.1.2.1	Fresado	5 días	100	100,000%	100,000%	sáb 17/06/23	vie 23/06/23	406FC-7 días
422	1.3.9.1.1.1.2.2	Excavaciones	5 días	100	100,000%	100,000%	sáb 17/06/23	vie 23/06/23	421CC
423	1.3.9.1.1.1.2.3	Mejoramiento subrasante	6 días	100	100,000%	100,000%	mar 8/08/23	lun 14/08/23	422FC+34 días
424	1.3.9.1.1.1.2.4	Subbase granular reciclada	5 días	100	100,000%	100,000%	mar 8/08/23	sáb 12/08/23	423CC
425	1.3.9.1.1.1.2.5	Material granular estabilizada con asfalto	5 días	100	100,000%	100,000%	mar 13/02/24	sáb 17/02/24	310FC+28 días;424
426	**1.3.9.1.1.1.2.6**	**Carpeta asfáltica**	**2,75 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**sáb 11/05/24**	**mié 15/05/24**	
427	1.3.9.1.1.1.2.6.1	Base asfáltica	2,75 días	100	100,000%	100,000%	sáb 11/05/24	mié 15/05/24	425FC+67 días
428	**1.3.9.1.1.1.2**	**Intervención Calzada**	**109,2 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**mié 6/08/25**	**sáb 13/12/25**	
429	1.3.9.1.1.1.2.1	Fresado	3 días	100	100,000%	100,000%	mié 6/08/25	lun 11/08/25	427FC+378 días
430	1.3.9.1.1.1.2.2	Excavaciones	4,2 días	100	100,000%	100,000%	mié 6/08/25	mar 12/08/25	429CC
431	1.3.9.1.1.1.2.3	Mejoramiento subrasante	4 días	100	100,000%	100,000%	mié 13/08/25	mar 19/08/25	430FC+1 día
432	1.3.9.1.1.1.2.4	Subbase granular reciclada	5 días	100	100,000%	100,000%	mié 13/08/25	mar 19/08/25	431CC
433	1.3.9.1.1.1.2.5	Material granular estabilizada con asfalto	4 días	100	100,000%	100,000%	vie 17/10/25	mié 22/10/25	432CC+57 días
434	**1.3.9.1.1.1.2.6**	**Carpeta asfáltica**	**42 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**jue 23/10/25**	**sáb 13/12/25**	
435	1.3.9.1.1.1.2.6.1	Base asfáltica	2 días	100	100,000%	100,000%	jue 23/10/25	sáb 25/10/25	433CC+5 días
436	1.3.9.1.1.1.2.6.2	Rodadura	2 días	100	100,000%	100,000%	jue 11/12/25	sáb 13/12/25	435CC+40 días
437	**1.3.9.1.1.1.2**	**Intervención Calzada**	**23 días**	**0**	**0,000%**	**0,000%**	**mié 29/04/26**	**mié 27/05/26**	
438	1.3.9.1.1.1.2.1	Fresado	3 días	0	0,000%	0,000%	sáb 23/05/26	mié 27/05/26	277CC;285CC;292
439	1.3.9.1.1.1.2.2	Excavaciones	4 días	0	0,000%	0,000%	mié 29/04/26	mar 5/05/26	438CC-20 días
440	1.3.9.1.1.1.2.3	Mejoramiento subrasante	4 días	0	0,000%	0,000%	mié 6/05/26	lun 11/05/26	439FC+1 día
441	1.3.9.1.1.1.2.4	Subbase granular reciclada	5 días	0	0,000%	0,000%	mié 6/05/26	lun 11/05/26	440CC
442	1.3.9.1.1.1.2.5	Material granular estabilizada con asfalto	4 días	0	0,000%	0,000%	mar 12/05/26	vie 15/05/26	441CC+5 días
443	**1.3.9.1.1.1.2.6**	**Carpeta asfáltica**	**7 días**	**0**	**0,000%**	**0,000%**	**sáb 16/05/26**	**mar 26/05/26**	
444	1.3.9.1.1.1.2.6.1	Base asfáltica	2 días	0	0,000%	0,000%	sáb 16/05/26	mié 20/05/26	442CC+5 días
445	1.3.9.1.1.1.2.6.2	Rodadura	2 días	0	0,000%	0,000%	sáb 23/05/26	mar 26/05/26	444CC+5 días
446	1.3.9.1.1.3	Fin de tramo 1	0 días	0	0,000%	0,000%	mar 8/09/26	mar 8/09/26	843
447	**1.3.9.1.2**	**Tramo 2 costado oriental calle 53-calle 63 (K7+970 - K8+980)**	**1267,38 días**	**0**	**96,567%**	**96,567%**	**lun 25/07/22**	**sáb 5/09/26**	
448	1.3.9.1.2.1	MANIOBRA ENEL CODENSA	4,38 días	0	0,000%	0,000%	lun 31/07/23	jue 3/08/23	8FC+726 días
449	**1.3.9.1.2.2**	**Tramo 2 costado oriental calle 53-calle 63 (K7+970 - K8+980) CARRIL DERECHO**	**951,63 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**lun 25/07/22**	**mar 26/08/25**	

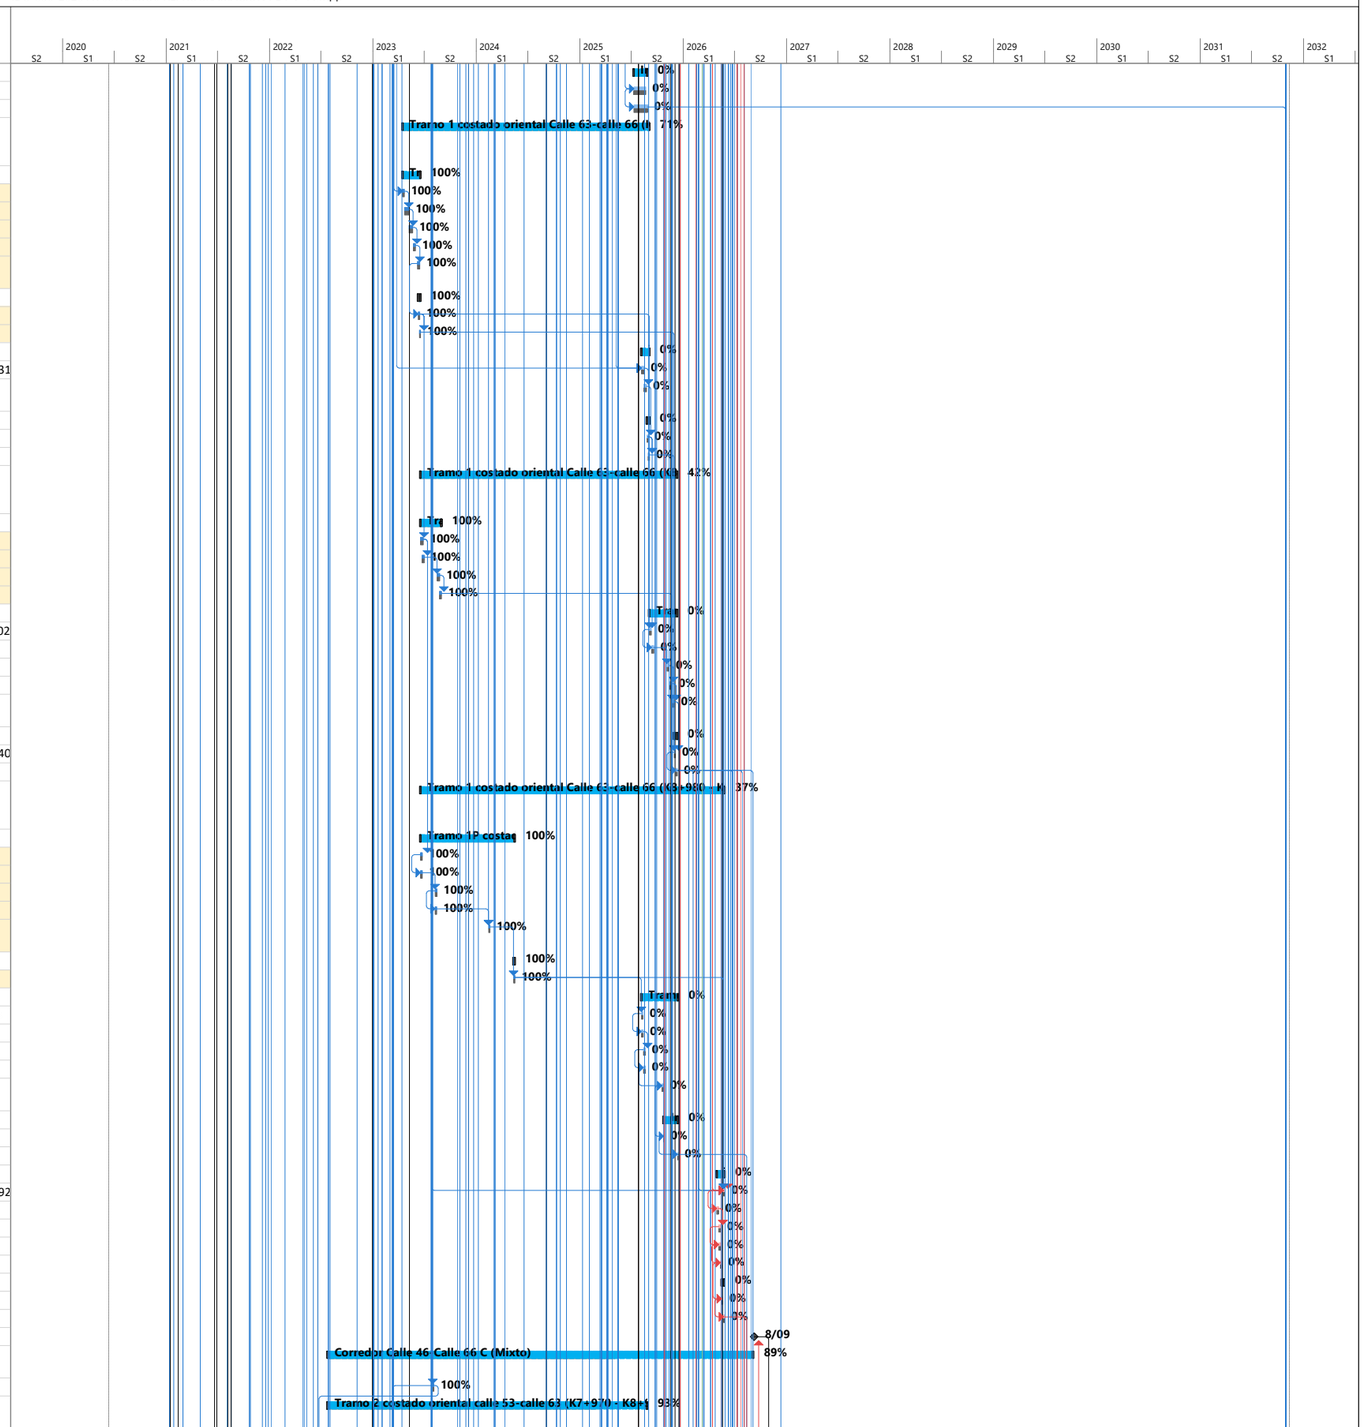


Tareas críticas | Tarea | Tarea manual | solo duración | Hito de línea base | Resumen | Tareas externas | Hito inactivo
División crítica | División | solo el comienzo | Línea base | Hito | Resumen manual | Hito externo | Resumen inactivo
Progreso de tarea crítica | Progreso de tarea | solo fin | División de la línea base | Progreso del resumen | Resumen del proyecto | Tarea inactiva | Fecha límite

Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	% Avance Conciliado	% Avance Programado (% PV)	% Avance Ejecutado conciliado (% EV))	Comienzo	Fin	Predecesoras
450	**1.3.9.1.2.1**	**Tramo 2A costado oriental calle 53-calle 63 (K7+970 - K8+360) Fase I (1 carril) MANIOBRA ENEL CODENSA**	**594,5 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**lun 25/07/22**	**jue 27/06/24**	
451	**1.3.9.1.2.1.2**	**Intervención Calzada**	**259,63 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**lun 25/07/22**	**mié 24/05/23**	
452	1.3.9.1.2.1.2.1	Fresado	259,63 días	100	100,000%	100,000%	lun 25/07/22	mié 24/05/23	448FC-307 días
453	1.3.9.1.2.1.2.2	Excavaciones	20,88 días	100	100,000%	100,000%	lun 24/04/23	mié 17/05/23	452FC-25 días
454	1.3.9.1.2.1.2.3	Mejoramiento subrasante	20,88 días	100	100,000%	100,000%	lun 24/04/23	mié 17/05/23	453CC
455	1.3.9.1.2.1.2.4	Subbase granular reciclada	20,88 días	100	100,000%	100,000%	lun 24/04/23	mié 17/05/23	454CC
456	1.3.9.1.2.1.2.5	Material granular estabilizada con asfalto	20,88 días	100	100,000%	100,000%	lun 24/04/23	mié 17/05/23	455CC
457	**1.3.9.1.2.1.2.6**	**Carpeta asfáltica**	**22 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**lun 24/04/23**	**jue 18/05/23**	
458	1.3.9.1.2.1.2.6.1	Base asfáltica	20,88 días	100	100,000%	100,000%	lun 24/04/23	mié 17/05/23	456CC
459	1.3.9.1.2.1.2.6.2	Rodadura	5 días	100	100,000%	100,000%	sáb 13/05/23	jue 18/05/23	458FC-4 días
460	**1.3.9.1.2.1.2**	**Intervención Calzada**	**37,38 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**mié 15/05/24**	**jue 27/06/24**	
461	1.3.9.1.2.1.2.2	Excavaciones	20,88 días	100	100,000%	100,000%	mié 15/05/24	vie 7/06/24	2262;459
462	1.3.9.1.2.1.2.3	Mejoramiento subrasante	20,38 días	100	100,000%	100,000%	vie 17/05/24	mar 11/06/24	461CC+2 días
463	1.3.9.1.2.1.2.4	Subbase granular reciclada	20,88 días	100	100,000%	100,000%	lun 20/05/24	jue 13/06/24	462CC+2 días
464	1.3.9.1.2.1.2.5	Material granular estabilizada con asfalto	20,88 días	100	100,000%	100,000%	mar 21/05/24	vie 14/06/24	463CC+1 día
465	**1.3.9.1.2.1.2.6**	**Carpeta asfáltica**	**11,25 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**sáb 15/06/24**	**jue 27/06/24**	
466	1.3.9.1.2.1.2.6.1	Base asfáltica	5 días	100	100,000%	100,000%	sáb 15/06/24	jue 20/06/24	464
467	1.3.9.1.2.1.2.6.2	Rodadura	5 días	100	100,000%	100,000%	sáb 22/06/24	jue 27/06/24	466FC+1 día
468	**1.3.9.1.2.1**	**Tramo 2B costado oriental calle 53-calle 63 (K8+360 - K8+525) Fase I (1 carril)**	**274,38 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**lun 25/07/22**	**vie 9/06/23**	
469	**1.3.9.1.2.1.2**	**Intervención Calzada**	**274,38 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**lun 25/07/22**	**vie 9/06/23**	
470	1.3.9.1.2.1.2.1	Fresado	52,13 días	100	100,000%	100,000%	lun 25/07/22	mié 21/09/22	452CC
471	1.3.9.1.2.1.2.2	Excavaciones	88,5 días	100	100,000%	100,000%	mar 23/08/22	vie 2/12/22	470CC+24 días
472	1.3.9.1.2.1.2.3	Mejoramiento subrasante	1,63 días	100	100,000%	100,000%	sáb 22/04/23	lun 24/04/23	471FC+115 días
473	1.3.9.1.2.1.2.4	Subbase granular reciclada	1,63 días	100	100,000%	100,000%	sáb 22/04/23	lun 24/04/23	472CC
474	1.3.9.1.2.1.2.5	Material granular estabilizada con asfalto	0,5 días	100	100,000%	100,000%	sáb 22/04/23	sáb 22/04/23	473CC
475	**1.3.9.1.2.1.2.6**	**Carpeta asfáltica**	**41,38 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**sáb 22/04/23**	**vie 9/06/23**	
476	1.3.9.1.2.1.2.6.1	Base asfáltica	1,63 días	100	100,000%	100,000%	sáb 22/04/23	lun 24/04/23	474CC
477	1.3.9.1.2.1.2.6.2	Rodadura	20,88 días	100	100,000%	100,000%	mié 17/05/23	vie 9/06/23	474CC+18 días;47
478	**1.3.9.1.2.1**	**Tramo 2C costado oriental calle 53-calle 63 (K8+525 - K8+600) Fase I (1 carril)**	**804,5 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**lun 25/07/22**	**lun 3/03/25**	
479	**1.3.9.1.2.1.2**	**Intervención Calzada**	**804,5 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**lun 25/07/22**	**lun 3/03/25**	
480	1.3.9.1.2.1.2.1	Fresado	20,88 días	100	100,000%	100,000%	lun 25/07/22	mié 17/08/22	452CC
481	1.3.9.1.2.1.2.2	Excavaciones	36,25 días	100	100,000%	100,000%	mar 23/08/22	sáb 1/10/22	480CC+24 días
482	1.3.9.1.2.1.2.3	Mejoramiento subrasante	20,38 días	100	100,000%	100,000%	sáb 22/04/23	mar 16/05/23	472CC;481
483	1.3.9.1.2.1.2.4	Subbase granular reciclada	15,25 días	100	100,000%	100,000%	sáb 22/04/23	mié 10/05/23	482CC
484	1.3.9.1.2.1.2.5	Material granular estabilizada con asfalto	16,38 días	100	100,000%	100,000%	sáb 22/04/23	jue 11/05/23	483CC
485	**1.3.9.1.2.1.2.6**	**Carpeta asfáltica**	**21,5 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**sáb 22/04/23**	**mié 17/05/23**	
486	1.3.9.1.2.1.2.6.1	Base asfáltica	5 días	100	100,000%	100,000%	sáb 22/04/23	jue 27/04/23	484CC
487	1.3.9.1.2.1.2.6.2	Rodadura	20,88 días	100	100,000%	100,000%	lun 24/04/23	mié 17/05/23	486CC+1 día
488	**1.3.9.1.2.1.2.6**	**Carpeta asfáltica**	**2 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**vie 28/02/25**	**lun 3/03/25**	
489	1.3.9.1.2.2.3.1.7.1	Rodadura	2 días	100	100,000%	100,000%	vie 28/02/25	lun 3/03/25	1215FC+208 días;
490	**1.3.9.1.2.1**	**Tramo 2D costado oriental calle 53-calle 63 (K8+600 - K8+980) Fase I (1 carril)**	**951,63 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**lun 25/07/22**	**mar 26/08/25**	
491	**1.3.9.1.2.1.2**	**Intervención Calzada**	**376,75 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**lun 25/07/22**	**mar 10/10/23**	
492	1.3.9.1.2.1.2.1	Fresado	20,88 días	100	100,000%	100,000%	lun 25/07/22	mié 17/08/22	452CC
493	1.3.9.1.2.1.2.2	Excavaciones	20,38 días	100	100,000%	100,000%	vie 2/12/22	lun 26/12/22	492CC+108 días
494	1.3.9.1.2.1.2.3	Mejoramiento subrasante	15,25 días	100	100,000%	100,000%	sáb 22/04/23	mié 10/05/23	493FC+96 días
495	1.3.9.1.2.1.2.4	Subbase granular reciclada	10,63 días	100	100,000%	100,000%	mar 29/08/23	vie 8/09/23	494FC+87 días
496	1.3.9.1.2.1.2.5	Material granular estabilizada con asfalto	7,88 días	100	100,000%	100,000%	sáb 22/04/23	mar 2/05/23	494CC
497	**1.3.9.1.2.1.2.6**	**Carpeta asfáltica**	**132,38 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**sáb 6/05/23**	**mar 10/10/23**	
498	1.3.9.1.2.1.2.6.1	Base asfáltica	3,88 días	100	100,000%	100,000%	sáb 6/05/23	mié 10/05/23	496CC+11 días
499	1.3.9.1.2.1.2.6.2	Rodadura	5 días	100	100,000%	100,000%	jue 5/10/23	mar 10/10/23	498FC+119 días;4
500	**1.3.9.1.2.1.2**	**Intervención Calzada**	**65 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**lun 9/06/25**	**mar 26/08/25**	
501	1.3.9.1.2.1.2.2	Excavaciones	20 días	100	100,000%	100,000%	lun 9/06/25	jue 3/07/25	2285CC-178 días;
502	1.3.9.1.2.1.2.3	Mejoramiento subrasante	15 días	100	100,000%	100,000%	vie 4/07/25	mar 22/07/25	501FC+1 día
503	1.3.9.1.2.1.2.4	Subbase granular reciclada	10 días	100	100,000%	100,000%	mar 22/07/25	vie 1/08/25	502
504	1.3.9.1.2.1.2.5	Material granular estabilizada con asfalto	8 días	100	100,000%	100,000%	sáb 2/08/25	mié 13/08/25	503FC+1 día
505	**1.3.9.1.2.1.2.6**	**Carpeta asfáltica**	**10 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**mié 13/08/25**	**mar 26/08/25**	
506	1.3.9.1.2.1.2.6.1	Base asfáltica	4 días	100	100,000%	100,000%	mié 13/08/25	mar 19/08/25	504
507	1.3.9.1.2.1.2.6.2	Rodadura	5 días	100	100,000%	100,000%	mié 20/08/25	mar 26/08/25	506FC+1 día
508	**1.3.9.1.2.3**	**Tramo 2 costado oriental Calle 63-calle 66 (K7+970 - K8+980) CARRIL CENTRAL**	**1001,88 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**lun 25/07/22**	**mié 22/10/25**	
509	**1.3.9.1.2.2**	**Tramo 2E costado oriental calle 53-calle 63 (K7+970 - K8+360) Fase 1 (1 carril) MANIOBRA ENEL CODENSA**	**795,13 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**lun 25/07/22**	**mié 19/02/25**	
510	**1.3.9.1.2.2.2**	**Intervención Calzada**	**259,63 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**lun 25/07/22**	**mié 24/05/23**	
511	1.3.9.1.2.2.2.1	Fresado	259,63 días	100	100,000%	100,000%	lun 25/07/22	mié 24/05/23	452CC
512	1.3.9.1.2.2.2.2	Excavaciones	20,88 días	100	100,000%	100,000%	lun 24/04/23	mié 17/05/23	511FC-25 días
513	1.3.9.1.2.2.2.3	Mejoramiento subrasante	20,88 días	100	100,000%	100,000%	mié 26/04/23	vie 19/05/23	512CC+2 días
514	1.3.9.1.2.2.2.4	Subbase granular reciclada	15,25 días	100	100,000%	100,000%	vie 28/04/23	mar 16/05/23	513CC+2 días

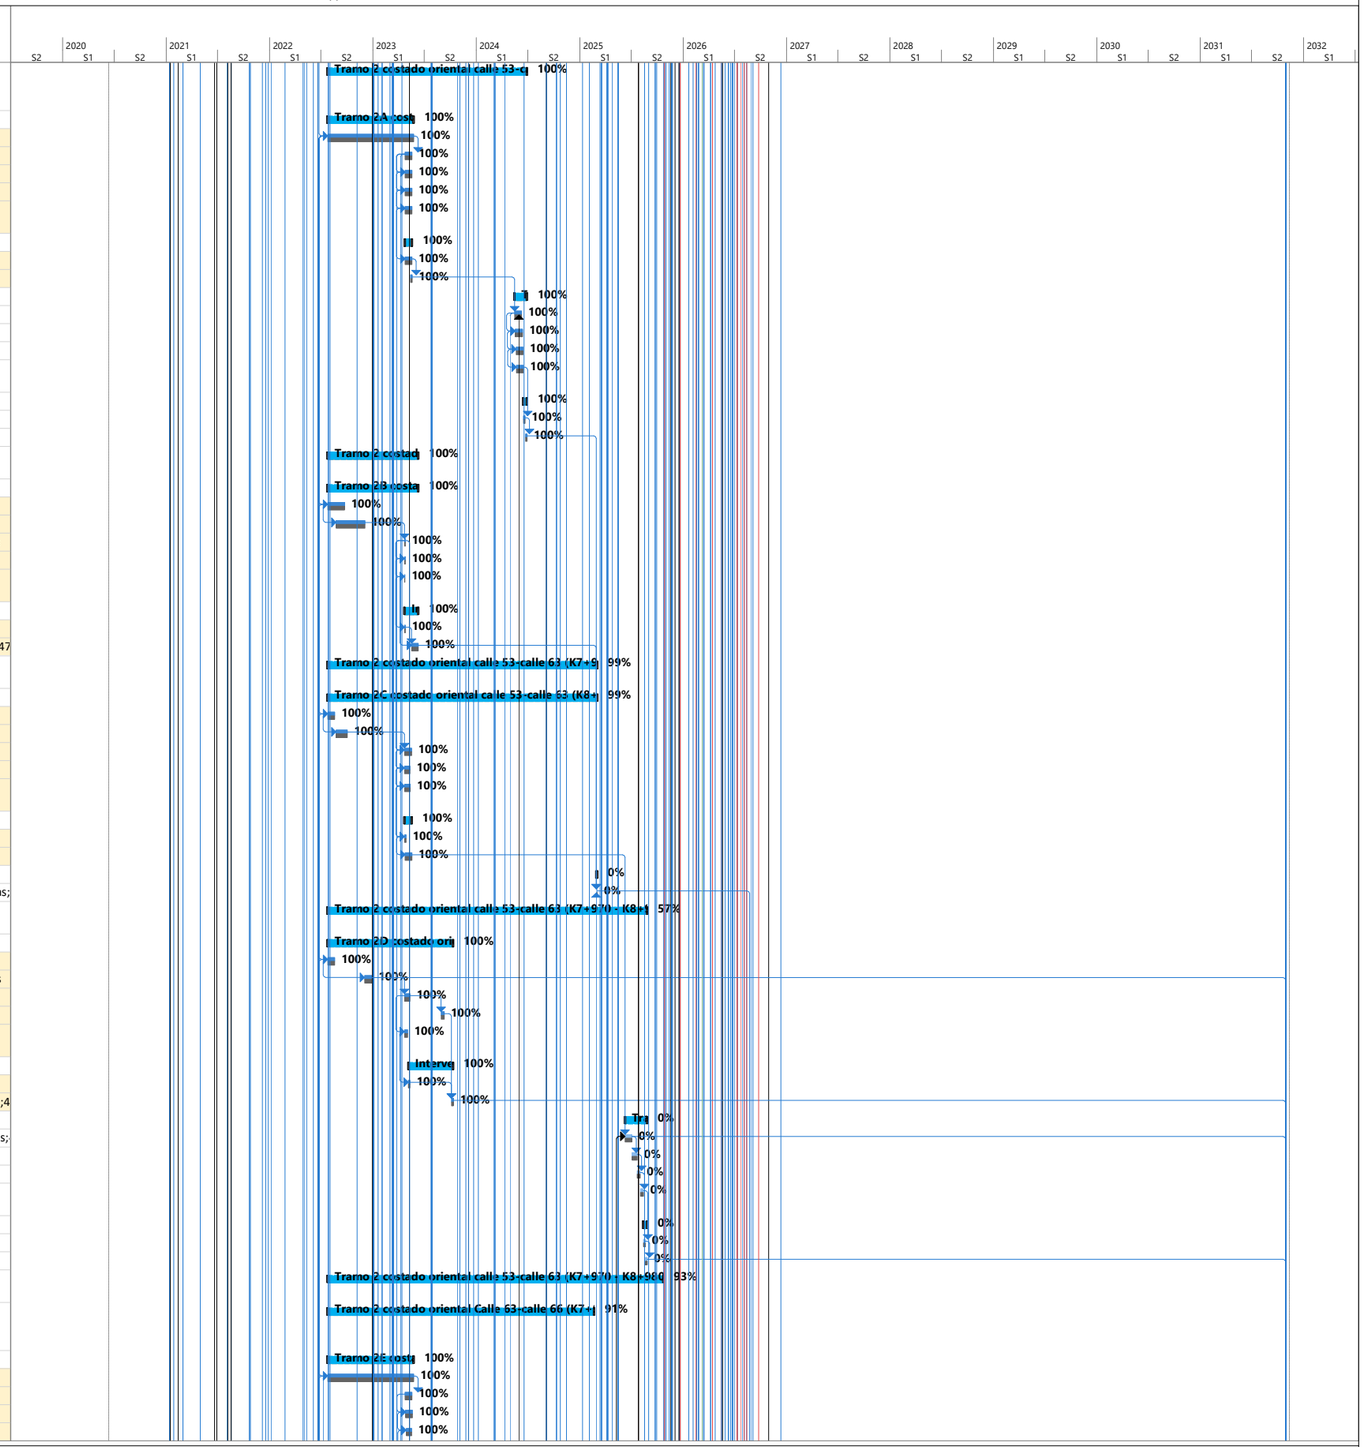


Tareas críticas · Tarea · Tarea manual · solo duración · Hito de línea base · Resumen · Tareas externas · Hito inactivo
División crítica · División · solo el comienzo · Línea base · Hito · Resumen manual · Hito externo · Resumen inactivo
Progreso de tarea crítica · Progreso de tarea · solo fin · División de la línea base · Progreso del resumen · Resumen del proyecto · Tarea inactiva · Fecha límite

Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	% Avance Conciliado	% Avance Programado (% PV)	% Avance Ejecutado conciliado (% EV))	Comienzo	Fin	Predecesoras
515	1.3.9.1.2.2.2.5	Material granular estabilizada con asfalto	15,25 días	100	100,000%	100,000%	sáb 29/04/23	mié 17/05/23	514CC+1 día
516	**1.3.9.1.2.2.2.6**	**Carpeta asfáltica**	**14,63 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**jue 4/05/23**	**vie 19/05/23**	
517	1.3.9.1.2.2.2.6.1	Base asfáltica	5 días	100	100,000%	100,000%	jue 4/05/23	mar 9/05/23	515FC-12 días
518	1.3.9.1.2.2.2.6.2	Rodadura	10,63 días	100	100,000%	100,000%	mar 9/05/23	vie 19/05/23	517FC-1 día
519	**1.3.9.1.2.2.2**	**Intervención Calzada**	**30 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**vie 17/01/25**	**mié 19/02/25**	
520	1.3.9.1.2.3.1.2.1	Excavaciones	7 días	100	100,000%	100,000%	vie 17/01/25	vie 24/01/25	453CC+208 días;4
521	1.3.9.1.2.3.1.2.2	Mejoramiento subrasante	7 días	100	100,000%	100,000%	lun 20/01/25	lun 27/01/25	520CC+2 días
522	1.3.9.1.2.3.1.2.3	Subbase granular reciclada	7 días	100	100,000%	100,000%	vie 24/01/25	sáb 1/02/25	521CC+5 días
523	1.3.9.1.2.3.1.2.4	Material granular estabilizada con asfalto	6 días	100	100,000%	100,000%	lun 3/02/25	lun 10/02/25	522FC+1 día
524	**1.3.9.1.2.2.2.6**	**Carpeta asfáltica**	**8 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**mar 11/02/25**	**mié 19/02/25**	
525	1.3.9.1.2.3.1.2.5.1	Base asfáltica	4 días	100	100,000%	100,000%	mar 11/02/25	vie 14/02/25	523FC+1 día
526	1.3.9.1.2.3.1.2.5.2	Rodadura	4 días	100	100,000%	100,000%	sáb 15/02/25	mié 19/02/25	525
527	**1.3.9.1.2.1**	**Tramo 2F costado oriental calle 53-calle 63 (K8+360 - K8+525) Fase 1 (1 carril)**	**260,75 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**lun 25/07/22**	**jue 25/05/23**	
528	**1.3.9.1.2.1.2**	**Intervención Calzada**	**260,75 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**lun 25/07/22**	**jue 25/05/23**	
529	1.3.9.1.2.1.2.1	Fresado	218,13 días	100	100,000%	100,000%	lun 25/07/22	lun 3/04/23	470CC
530	1.3.9.1.2.1.2.2	Excavaciones	228,38 días	100	100,000%	100,000%	mar 23/08/22	mar 16/05/23	529CC+24 días
531	1.3.9.1.2.1.2.3	Mejoramiento subrasante	21,5 días	100	100,000%	100,000%	sáb 22/04/23	mié 17/05/23	472FC-2 días
532	1.3.9.1.2.1.2.4	Subbase granular reciclada	22,63 días	100	100,000%	100,000%	sáb 22/04/23	jue 18/05/23	531CC
533	1.3.9.1.2.1.2.5	Material granular estabilizada con asfalto	24,38 días	100	100,000%	100,000%	sáb 22/04/23	sáb 20/05/23	532CC
534	**1.3.9.1.2.1.2.6**	**Carpeta asfáltica**	**27,75 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**sáb 22/04/23**	**jue 25/05/23**	
535	1.3.9.1.2.1.2.6.1	Base asfáltica	26,63 días	100	100,000%	100,000%	sáb 22/04/23	mié 24/05/23	533CC
536	1.3.9.1.2.1.2.6.2	Rodadura	27,13 días	100	100,000%	100,000%	lun 24/04/23	jue 25/05/23	535CC+1 día
537	**1.3.9.1.2.1**	**Tramo 2G costado oriental calle 53-calle 63 (K8+525 - K8+600) Fase 1 (1 carril)**	**1001,88 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**lun 25/07/22**	**mié 22/10/25**	
538	**1.3.9.1.2.1.2**	**Intervención Calzada**	**1001,88 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**lun 25/07/22**	**mié 22/10/25**	
539	1.3.9.1.2.1.2.1	Fresado	103,88 días	100	100,000%	100,000%	lun 25/07/22	mar 22/11/22	480CC
540	1.3.9.1.2.1.2.2	Excavaciones	103,88 días	100	100,000%	100,000%	mar 23/08/22	mié 21/12/22	539CC+24 días
541	1.3.9.1.2.1.2.3	Mejoramiento subrasante	20,38 días	100	100,000%	100,000%	sáb 22/04/23	mar 16/05/23	531CC
542	1.3.9.1.2.1.2.4	Subbase granular reciclada	20,38 días	100	100,000%	100,000%	sáb 22/04/23	mar 16/05/23	541CC
543	1.3.9.1.2.1.2.5	Material granular estabilizada con asfalto	20,38 días	100	100,000%	100,000%	sáb 22/04/23	mar 16/05/23	542CC
544	**1.3.9.1.2.1.2.6**	**Carpeta asfáltica**	**22 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**lun 24/04/23**	**jue 18/05/23**	
545	1.3.9.1.2.1.2.6.1	Base asfáltica	20,88 días	100	100,000%	100,000%	lun 24/04/23	mié 17/05/23	543CC+1 día
546	1.3.9.1.2.1.2.6.2	Rodadura	10,63 días	100	100,000%	100,000%	lun 8/05/23	jue 18/05/23	543CC+12 días
547	**1.3.9.1.2.1.2.6**	**Carpeta asfáltica**	**289,75 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**vie 15/11/24**	**mié 22/10/25**	
548	1.3.9.1.2.1.2.6.2	Rodadura	289,75 días	100	100,000%	100,000%	vie 15/11/24	mié 22/10/25	545FC+441 días
549	**1.3.9.1.2.1**	**Tramo 2H costado oriental calle 53-calle 63 (K8+600 - K8+980) Fase 1 (1 carril)**	**999,63 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**lun 25/07/22**	**lun 20/10/25**	
550	**1.3.9.1.2.1.2**	**Intervención Calzada**	**376,75 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**lun 25/07/22**	**mar 10/10/23**	
551	1.3.9.1.2.1.2.1	Fresado	83,38 días	100	100,000%	100,000%	lun 25/07/22	jue 27/10/22	492CC
552	1.3.9.1.2.1.2.2	Excavaciones	62,38 días	100	100,000%	100,000%	mar 23/08/22	mar 1/11/22	551CC+24 días
553	1.3.9.1.2.1.2.3	Mejoramiento subrasante	15,25 días	100	100,000%	100,000%	sáb 22/04/23	mié 10/05/23	552FC+140 días
554	1.3.9.1.2.1.2.4	Subbase granular reciclada	15,25 días	100	100,000%	100,000%	sáb 22/04/23	mié 10/05/23	553CC
555	1.3.9.1.2.1.2.5	Material granular estabilizada con asfalto	15,25 días	100	100,000%	100,000%	sáb 22/04/23	mié 10/05/23	553CC;554CC
556	**1.3.9.1.2.1.2.6**	**Carpeta asfáltica**	**132,38 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**sáb 6/05/23**	**mar 10/10/23**	
557	1.3.9.1.2.1.2.6.1	Base asfáltica	5 días	100	100,000%	100,000%	sáb 6/05/23	jue 11/05/23	555CC+11 días
558	1.3.9.1.2.1.2.6.2	Rodadura	5 días	100	100,000%	100,000%	jue 5/10/23	mar 10/10/23	557FC+118 días
559	**1.3.9.1.2.1.2**	**Intervención Calzada**	**113 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**lun 9/06/25**	**lun 20/10/25**	
560	1.3.9.1.2.1.2.2	Excavaciones	60 días	100	100,000%	100,000%	lun 9/06/25	mié 20/08/25	2285FC-178 días
561	1.3.9.1.2.1.2.3	Mejoramiento subrasante	10 días	100	100,000%	100,000%	mié 3/09/25	lun 15/09/25	560CC+73 días
562	1.3.9.1.2.1.2.4	Subbase granular reciclada	10 días	100	100,000%	100,000%	lun 15/09/25	jue 25/09/25	561
563	1.3.9.1.2.1.2.5	Material granular estabilizada con asfalto	10 días	100	100,000%	100,000%	jue 25/09/25	mar 7/10/25	562
564	**1.3.9.1.2.1.2.6**	**Carpeta asfáltica**	**9 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**mié 8/10/25**	**lun 20/10/25**	
565	1.3.9.1.2.1.2.6.1	Base asfáltica	3 días	100	100,000%	100,000%	mié 8/10/25	sáb 11/10/25	563FC+1 día
566	1.3.9.1.2.1.2.6.2	Rodadura	4 días	100	100,000%	100,000%	mié 15/10/25	lun 20/10/25	565FC+2 días
567	**1.3.9.1.2.4**	**Tramo 2 costado oriental Calle 63-calle 66 (K7+970 - K8+980) CARRIL IZQUIERDO**	**958,63 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**lun 25/07/22**	**mar 2/09/25**	
568	**1.3.9.1.2.2**	**Tramo 2I costado oriental calle 53-calle 63 (K7+970 - K8+360) Fase 1 (1 carril) MANIOBRA ENEL CODENSA**	**846,75 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**lun 25/07/22**	**mar 22/04/25**	
569	**1.3.9.1.2.2.2**	**Intervención Calzada**	**263,63 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**lun 25/07/22**	**lun 29/05/23**	
570	1.3.9.1.2.2.2.1	Fresado	52,13 días	100	100,000%	100,000%	lun 25/07/22	mié 21/09/22	511CC
571	1.3.9.1.2.2.2.2	Excavaciones	15,75 días	100	100,000%	100,000%	lun 24/04/23	jue 11/05/23	570FC+175 días
572	1.3.9.1.2.2.2.3	Mejoramiento subrasante	15,75 días	100	100,000%	100,000%	lun 24/04/23	jue 11/05/23	571CC
573	1.3.9.1.2.2.2.4	Subbase granular reciclada	15,75 días	100	100,000%	100,000%	lun 24/04/23	jue 11/05/23	572CC
574	1.3.9.1.2.2.2.5	Material granular estabilizada con asfalto	15,75 días	100	100,000%	100,000%	lun 24/04/23	jue 11/05/23	573CC
575	**1.3.9.1.2.2.2.6**	**Carpeta asfáltica**	**30 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**lun 24/04/23**	**lun 29/05/23**	
576	1.3.9.1.2.2.2.6.1	Base asfáltica	20,88 días	100	100,000%	100,000%	lun 24/04/23	mié 17/05/23	574CC
577	1.3.9.1.2.2.2.6.2	Rodadura	10,13 días	100	100,000%	100,000%	mié 17/05/23	lun 29/05/23	576FC-1 día
578	**1.3.9.1.2.2.2**	**Intervención Calzada**	**114 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**lun 9/12/24**	**mar 22/04/25**	
579	1.3.9.1.2.2.2.1	Fresado	50 días	100	100,000%	100,000%	lun 9/12/24	jue 6/02/25	511CC+706 días
580	1.3.9.1.2.4.1.2.2	Excavaciones	10 días	100	100,000%	100,000%	vie 7/02/25	mié 19/02/25	579FC+2 días

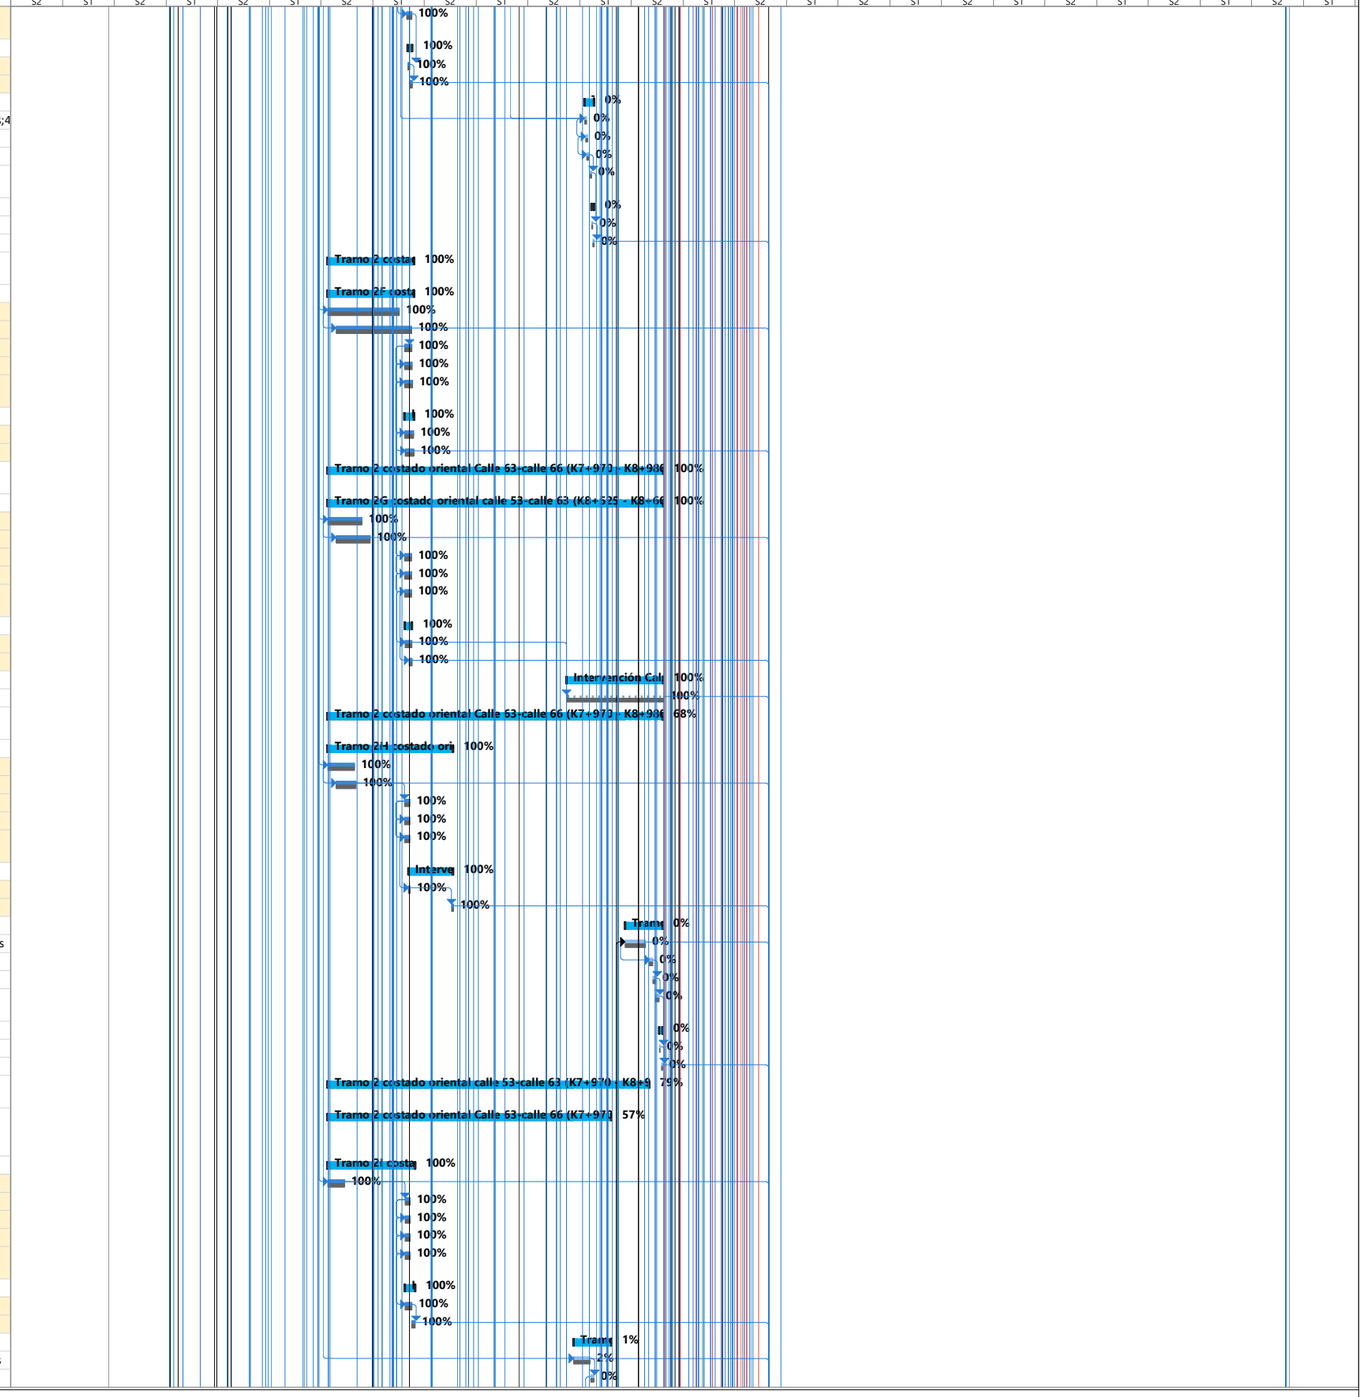


Tareas críticas · Tarea · Tarea manual · solo duración · Hito de línea base · Resumen · Tareas externas · Hito inactivo
División crítica · División · solo el comienzo · Línea base · Hito · Resumen manual · Hito externo · Resumen inactivo
Progreso de tarea crítica · Progreso de tarea · solo fin · División de la línea base · Progreso del resumen · Resumen del proyecto · Tarea inactiva · Fecha límite

Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	% Avance Conciliado	% Avance Programado (% PV)	% Avance Ejecutado conciliado (% EV))	Comienzo	Fin	Predecesoras
581	1.3.9.1.2.4.1.2.3	Mejoramiento subrasante	10 días	100	100,000%	100,000%	jue 20/02/25	mar 4/03/25	580CC+11 días
582	1.3.9.1.2.4.1.2.4	Subbase granular reciclada	10 días	100	100,000%	100,000%	mar 4/03/25	vie 14/03/25	581CC+10 días
583	1.3.9.1.2.4.1.2.5	Material granular estabilizada con asfalto	10 días	100	100,000%	100,000%	vie 14/03/25	jue 27/03/25	582
584	**1.3.9.1.2.2.2.6**	**Carpeta asfáltica**	**20 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**vie 28/03/25**	**mar 22/04/25**	
585	1.3.9.1.2.4.1.2.6.1	Base asfáltica	10 días	100	100,000%	100,000%	vie 28/03/25	mié 9/04/25	583FC+1 día
586	1.3.9.1.2.4.1.2.6.2	Rodadura	10 días	100	100,000%	100,000%	mié 9/04/25	mar 22/04/25	585
587	**1.3.9.1.2.1**	**Tramo 2J costado oriental calle 53-calle 63 (K8+360 - K8+980) Fase 1 (1 carril)**	**958,63 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**lun 25/07/22**	**mar 2/09/25**	
588	**1.3.9.1.2.1.2**	**Intervención Calzada**	**384,13 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**lun 25/07/22**	**jue 19/10/23**	
589	1.3.9.1.2.1.2.1	Fresado	296 días	100	100,000%	100,000%	lun 25/07/22	vie 7/07/23	452CC
590	1.3.9.1.2.1.2.2	Excavaciones	51,63 días	100	100,000%	100,000%	lun 24/04/23	sáb 24/06/23	571CC;589CC
591	1.3.9.1.2.1.2.3	Mejoramiento subrasante	51,63 días	100	100,000%	100,000%	lun 24/04/23	sáb 24/06/23	590CC
592	1.3.9.1.2.1.2.4	Subbase granular reciclada	51,63 días	100	100,000%	100,000%	lun 24/04/23	sáb 24/06/23	591CC
593	1.3.9.1.2.1.2.5	Material granular estabilizada con asfalto	31,13 días	100	100,000%	100,000%	lun 24/04/23	mar 30/05/23	592CC
594	**1.3.9.1.2.1.2.6**	**Carpeta asfáltica**	**139,75 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**sáb 6/05/23**	**jue 19/10/23**	
595	1.3.9.1.2.1.2.6.1	Base asfáltica	12,38 días	100	100,000%	100,000%	sáb 6/05/23	vie 19/05/23	593CC+10 días
596	1.3.9.1.2.1.2.6.2	Rodadura	12,38 días	100	100,000%	100,000%	jue 5/10/23	jue 19/10/23	595CC+123 días
597	**1.3.9.1.2.1.2**	**Intervención Calzada**	**41 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**mié 16/07/25**	**mar 2/09/25**	
598	1.3.9.1.2.1.2.2	Excavaciones	10 días	100	100,000%	100,000%	mié 16/07/25	sáb 26/07/25	2285FC-147 días;5
599	1.3.9.1.2.1.2.3	Mejoramiento subrasante	10 días	100	100,000%	100,000%	vie 18/07/25	mar 29/07/25	598CC+2 días
600	1.3.9.1.2.1.2.4	Subbase granular reciclada	10 días	100	100,000%	100,000%	lun 21/07/25	jue 31/07/25	599CC+2 días
601	1.3.9.1.2.1.2.5	Material granular estabilizada con asfalto	9 días	100	100,000%	100,000%	mié 23/07/25	sáb 2/08/25	600CC+3 días
602	**1.3.9.1.2.1.2.6**	**Carpeta asfáltica**	**24 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**lun 4/08/25**	**mar 2/09/25**	
603	1.3.9.1.2.1.2.6.1	Base asfáltica	12 días	100	100,000%	100,000%	lun 4/08/25	mié 20/08/25	601CC+10 días
604	1.3.9.1.2.1.2.6.2	Rodadura	12 días	100	100,000%	100,000%	mié 20/08/25	mar 2/09/25	603
605	1.3.9.1.2.2.3	Señalización, demarcación y semaforización	30 días	0	0,000%	0,000%	vie 31/07/26	sáb 5/09/26	843CC-10 días;60
606	1.3.9.1.2.3	Fin de tramo 2	0 días	0	0,000%	0,000%	sáb 5/09/26	sáb 5/09/26	605;489
607	**1.3.9.1.3**	**Tramo 3 costado occidental calle 63-calle 66 (K8+980 - K10+024)**	**394,43 días**	**0**	**60,257%**	**60,257%**	**lun 26/05/25**	**mar 8/09/26**	
608	**1.3.9.1.3.1**	**Tramo 3 costado occidental calle 63-calle 66 (K8+980 - K9+500) Fase III (3 carriles)**	**348,8 días**	**0**	**80,207%**	**80,207%**	**lun 26/05/25**	**mié 15/07/26**	
609	1.3.9.1.3.1.1	Inicio de tramo 3	0 días	0	0,000%	0,000%	mié 15/07/26	mié 15/07/26	2462FC+20 días
610	**1.3.9.1.3.1.2**	**Intervención Calzada**	**87,2 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**lun 26/05/25**	**lun 8/09/25**	
611	1.3.9.1.3.1.2.1	Fresado	25 días	100	100,000%	100,000%	lun 26/05/25	mié 25/06/25	609CC-348 días
612	1.3.9.1.3.1.2.2	Excavaciones	25 días	100	100,000%	100,000%	sáb 31/05/25	mié 2/07/25	611CC+5 días
613	1.3.9.1.3.1.2.3	Mejoramiento subrasante	25,5 días	100	100,000%	100,000%	mar 29/07/25	vie 29/08/25	612CC+49 días
614	1.3.9.1.3.1.2.4	Subbase granular reciclada	25 días	100	100,000%	100,000%	lun 4/08/25	mié 3/09/25	613CC+5,2 días
615	1.3.9.1.3.1.2.5	Material granular estabilizada con asfalto	22,4 días	100	100,000%	100,000%	lun 11/08/25	sáb 6/09/25	614CC+5 días
616	**1.3.9.1.3.1.2.6**	**Carpeta asfáltica**	**18 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**sáb 16/08/25**	**lun 8/09/25**	
617	1.3.9.1.3.1.2.6.1	Base asfáltica (Granocaucho)	18 días	100	100,000%	100,000%	sáb 16/08/25	lun 8/09/25	615CC+5 días
618	**1.3.9.1.3.1.2**	**Intervención Calzada**	**316 días**	**0**	**67,374%**	**67,374%**	**lun 26/05/25**	**jue 4/06/26**	
619	1.3.9.1.3.1.2.1	Fresado	24 días	100	100,000%	100,000%	lun 26/05/25	mar 24/06/25	617CC-70 días
620	1.3.9.1.3.1.2.2	Excavaciones	25 días	100	100,000%	100,000%	sáb 31/05/25	mié 2/07/25	619CC+6 días
621	1.3.9.1.3.1.2.3	Mejoramiento subrasante	25 días	100	100,000%	100,000%	mar 29/07/25	jue 28/08/25	620CC+48 días
622	1.3.9.1.3.1.2.4	Subbase granular reciclada	25 días	100	100,000%	100,000%	lun 4/08/25	mié 3/09/25	621CC+5 días
623	1.3.9.1.3.1.2.5	Material granular estabilizada con asfalto	22,4 días	100	100,000%	100,000%	lun 11/08/25	sáb 6/09/25	622CC+6 días
624	1.3.9.1.3.1.2.1	Fresado	20 días	0	0,000%	0,000%	sáb 11/04/26	mar 5/05/26	617CC+200 días
625	1.3.9.1.3.1.2.2	Excavaciones	20 días	0	0,000%	0,000%	vie 17/04/26	mar 12/05/26	624CC+6 días
626	1.3.9.1.3.1.2.3	Mejoramiento subrasante	20 días	0	0,000%	0,000%	jue 23/04/26	mar 19/05/26	625CC+5 días
627	1.3.9.1.3.1.2.4	Subbase granular reciclada	20 días	0	0,000%	0,000%	mié 29/04/26	lun 25/05/26	626CC+5 días
628	1.3.9.1.3.1.2.5	Material granular estabilizada con asfalto	20 días	0	0,000%	0,000%	mié 6/05/26	vie 29/05/26	627CC+5 días
629	**1.3.9.1.3.1.2.6**	**Carpeta asfáltica**	**246 días**	**0**	**70,568%**	**70,568%**	**sáb 16/08/25**	**jue 4/06/26**	
630	1.3.9.1.3.1.2.6.1	Base asfáltica (Granocaucho)	18 días	100	100,000%	100,000%	sáb 16/08/25	lun 8/09/25	623CC+5 días
631	1.3.9.1.3.1.2.6.2	Rodadura	18 días	100	100,000%	100,000%	sáb 15/11/25	mar 9/12/25	630CC+78 días
632	1.3.9.1.3.1.2.6.1	Base asfáltica (Granocaucho)	15 días	0	0,000%	0,000%	mar 12/05/26	vie 29/05/26	623CC+5 días;628
633	1.3.9.1.3.1.2.6.2	Rodadura	15 días	0	0,000%	0,000%	mar 19/05/26	jue 4/06/26	632CC+5 días
634	1.3.9.1.3.1.3	Señalización, demarcación y semaforización	15 días	0	0,000%	0,000%	mar 19/05/26	jue 4/06/26	631CC-10 días;63
635	**1.3.9.1.3.1**	**Tramo 3 costado occidental calle 63-calle 66 (K9+500 - K9+995) Fase III (2 carriles)**	**394,43 días**	**0**	**21,045%**	**21,045%**	**lun 26/05/25**	**mar 8/09/26**	
636	1.3.9.1.3.1.1	Inicio de tramo 3	0 días	0	0,000%	0,000%	lun 22/06/26	lun 22/06/26	2462
637	**1.3.9.1.3.1.2**	**Intervención Calzada**	**391,8 días**	**0**	**23,067%**	**23,067%**	**lun 26/05/25**	**vie 4/09/26**	
638	1.3.9.1.3.1.2.1	Fresado	25 días	100	100,000%	100,000%	lun 26/05/25	mié 25/06/25	619FC-24 días
639	1.3.9.1.3.1.2.2	Excavaciones	25 días	100	100,000%	100,000%	sáb 31/05/25	mié 2/07/25	638CC+6 días
640	1.3.9.1.3.1.2.1	Fresado	25 días	100	100,000%	100,000%	lun 26/05/25	mié 25/06/25	638CC
641	1.3.9.1.3.1.2.2	Excavaciones	25 días	100	100,000%	100,000%	sáb 31/05/25	mié 2/07/25	640CC+6 días
642	1.3.9.1.3.1.2.3	Mejoramiento subrasante	20 días	100	100,000%	100,000%	sáb 20/12/25	jue 15/01/26	640CC+177 días
643	1.3.9.1.3.1.2.4	Subbase granular reciclada	19 días	100	100,000%	100,000%	mié 24/12/25	lun 19/01/26	642CC+3 días
644	1.3.9.1.3.1.2.5	Material granular estabilizada con asfalto	20 días	100	100,000%	100,000%	lun 29/12/25	jue 22/01/26	643CC-183 días;6
645	1.3.9.1.3.1.2.1	Fresado	25 días	0	0,000%	0,000%	mié 24/06/26	vie 24/07/26	636FC+2 días
646	1.3.9.1.3.1.2.2	Excavaciones	25 días	0	0,000%	0,000%	mié 1/07/26	mié 29/07/26	645CC+5 días
647	1.3.9.1.3.1.2.3	Mejoramiento subrasante	20 días	0	0,000%	0,000%	vie 31/07/26	mié 26/08/26	646FC+2 días;246
648	1.3.9.1.3.1.2.4	Subbase granular reciclada	20 días	0	0,000%	0,000%	mar 4/08/26	vie 28/08/26	647CC+3 días
649	1.3.9.1.3.1.2.5	Material granular estabilizada con asfalto	20 días	0	0,000%	0,000%	jue 6/08/26	mar 1/09/26	643CC+2 días;648
650	**1.3.9.1.3.1.2.6**	**Carpeta asfáltica**	**22 días**	**0**	**0,000%**	**0,000%**	**lun 10/08/26**	**vie 4/09/26**	
651	1.3.9.1.3.1.2.6.1	Base asfáltica (Granocaucho)	20 días	0	0,000%	0,000%	lun 10/08/26	mié 2/09/26	649CC+2 días;644

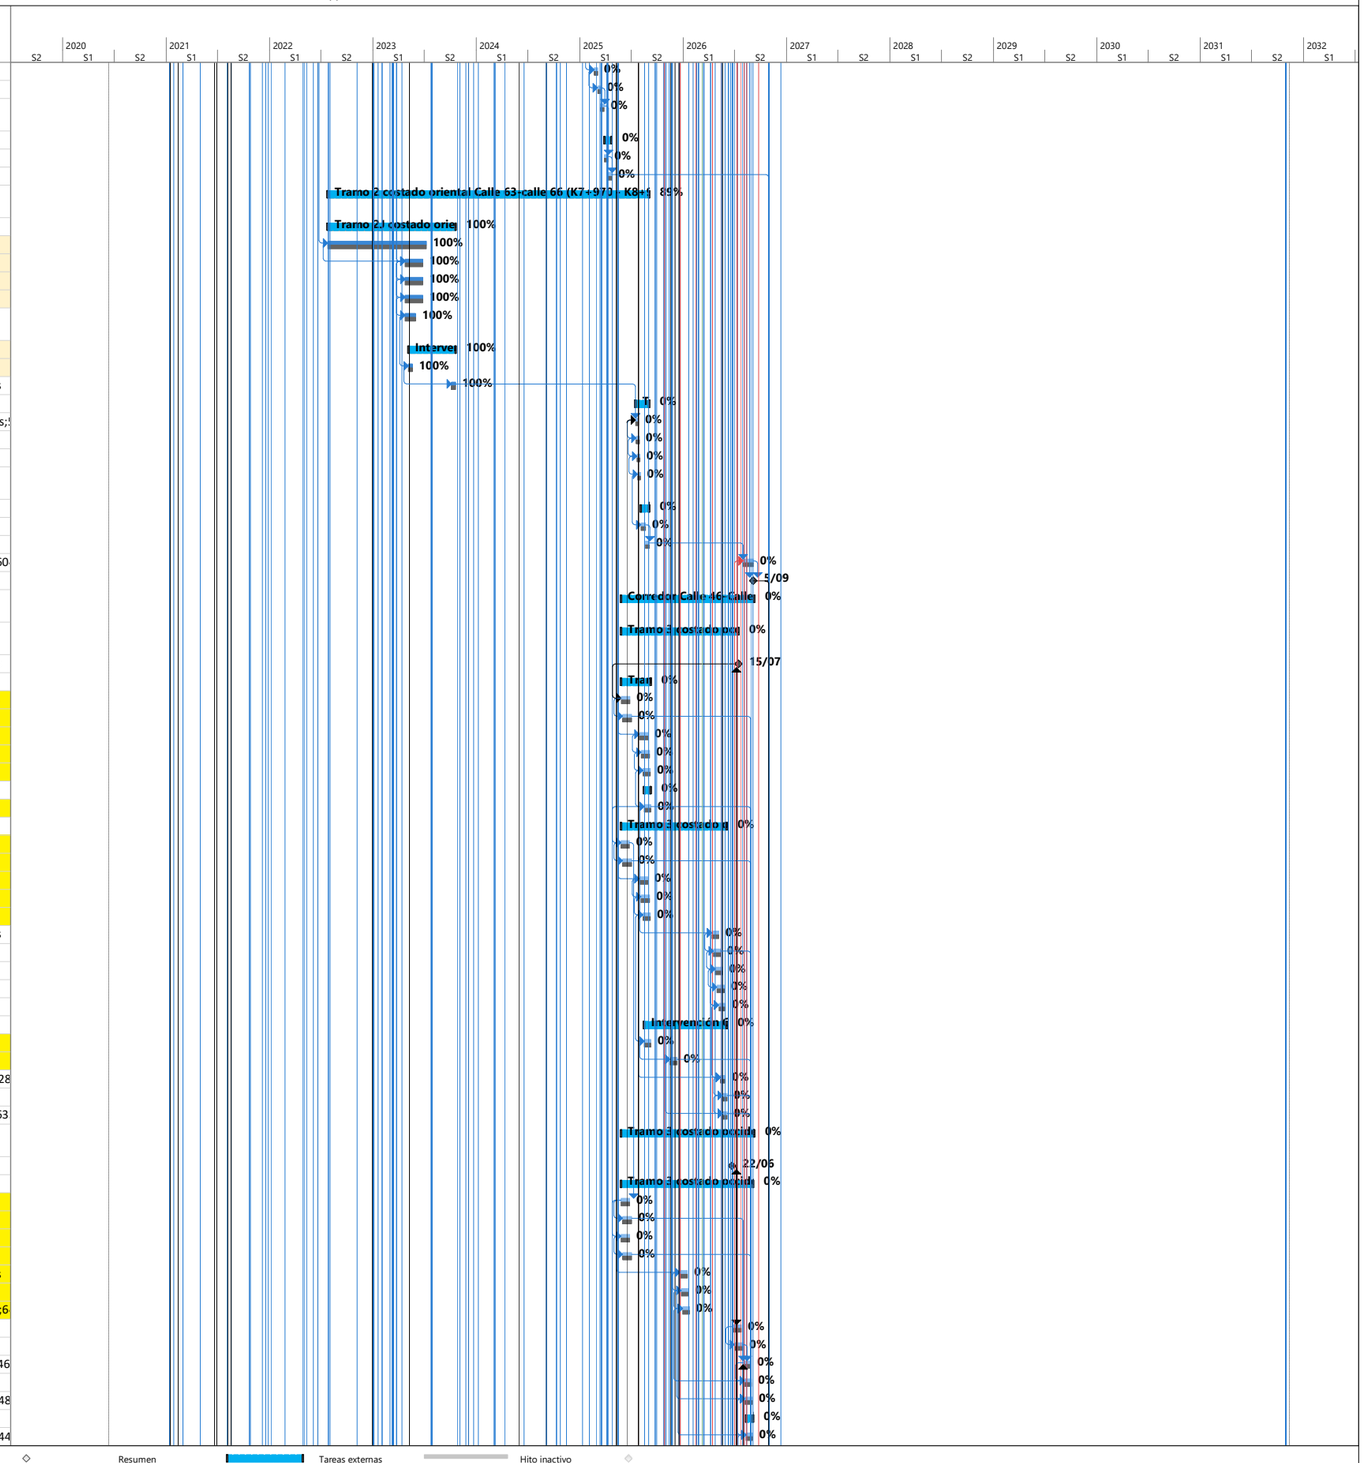


Tareas críticas · Tarea · Tarea manual · solo duración · Hito de línea base · Resumen · Tareas externas · Hito inactivo
División crítica · División · solo el comienzo · Línea base · Hito · Resumen manual · Hito externo · Resumen inactivo
Progreso de tarea crítica · Progreso de tarea · solo fin · División de la línea base · Progreso del resumen · Resumen del proyecto · Tarea inactiva · Fecha límite

Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	% Avance Conciliado	% Avance Programado (% PV)	% Avance Ejecutado conciliado (% EV))	Comienzo	Fin	Predecesoras
652	1.3.9.1.3.1.2.6.2	Rodadura	20 días	0	0,000%	0,000%	mié 12/08/26	vie 4/09/26	651CC+2 días
653	1.3.9.1.3.1.3	Señalización, demarcación y semaforización	15 días	0	0,000%	0,000%	vie 21/08/26	mar 8/09/26	843FC-15 días
654	**1.3.9.1.3.1**	**Tramo 3 costado occidental calle 63-calle 66 (K9+500 - K9+995) Fase III (1 carriles)**	**251,63 días**	**0**	**69,739%**	**69,739%**	**lun 10/11/25**	**mar 8/09/26**	
655	1.3.9.1.3.1.1	Inicio de tramo 3	0 días	0	0,000%	0,000%	jue 12/02/26	jue 12/02/26	2462FC-107 días
656	**1.3.9.1.3.1.2**	**Intervención Calzada**	**245 días**	**0**	**75,300%**	**75,300%**	**lun 10/11/25**	**mar 1/09/26**	
657	1.3.9.1.3.1.2.1	Fresado	18 días	100	100,000%	100,000%	lun 15/12/25	mié 7/01/26	655CC-50 días
658	1.3.9.1.3.1.2.2	Excavaciones	18 días	100	100,000%	100,000%	mié 17/12/25	jue 8/01/26	657CC+2 días
659	1.3.9.1.3.1.2.3	Mejoramiento subrasante	20 días	100	100,000%	100,000%	lun 2/02/26	mar 24/02/26	658FC+20 días
660	1.3.9.1.3.1.2.4	Subbase granular reciclada	15 días	100	100,000%	100,000%	vie 6/02/26	mar 24/02/26	659CC+5 días
661	1.3.9.1.3.1.2.5	Material granular estabilizada con asfalto	10 días	100	100,000%	100,000%	jue 12/02/26	mar 24/02/26	660CC+5 días
662	1.3.9.1.3.1.2.1	Fresado	18 días	100	100,000%	100,000%	lun 15/12/25	mié 7/01/26	657CC
663	1.3.9.1.3.1.2.2	Excavaciones	18 días	100	100,000%	100,000%	mié 17/12/25	jue 8/01/26	662CC+2 días
664	1.3.9.1.3.1.2.3	Mejoramiento subrasante	20 días	100	100,000%	100,000%	lun 10/11/25	mié 3/12/25	663CC-31 días
665	1.3.9.1.3.1.2.4	Subbase granular reciclada	20 días	100	100,000%	100,000%	jue 18/12/25	mar 13/01/26	664CC+32 días
666	1.3.9.1.3.1.2.5	Material granular estabilizada con asfalto	20,4 días	100	100,000%	100,000%	vie 19/12/25	jue 15/01/26	665CC+1 día
667	1.3.9.1.3.1.2.1	Fresado	18 días	0	0,000%	0,000%	mar 7/07/26	mié 29/07/26	655CC+120 días
668	1.3.9.1.3.1.2.2	Excavaciones	18 días	0	0,000%	0,000%	jue 9/07/26	jue 30/07/26	667CC+2 días
669	1.3.9.1.3.1.2.3	Mejoramiento subrasante	20 días	0	0,000%	0,000%	mié 8/07/26	vie 31/07/26	668FC-19 días
670	1.3.9.1.3.1.2.4	Subbase granular reciclada	20 días	0	0,000%	0,000%	jue 9/07/26	lun 3/08/26	669CC+1 día
671	1.3.9.1.3.1.2.5	Material granular estabilizada con asfalto	20 días	0	0,000%	0,000%	sáb 11/07/26	mar 4/08/26	670CC+2 días
672	**1.3.9.1.3.1.2.6**	**Carpeta asfáltica**	**204 días**	**0**	**25,026%**	**25,026%**	**mar 30/12/25**	**mar 1/09/26**	
673	1.3.9.1.3.1.2.6.1	Base asfáltica (Granocaucho)	20 días	100	100,000%	100,000%	mar 30/12/25	vie 23/01/26	666CC+8 días
674	1.3.9.1.3.1.2.6.2	Rodadura	20 días	100	100,000%	100,000%	mié 31/12/25	sáb 24/01/26	673CC+1 día
675	1.3.9.1.3.1.2.6.1	Base asfáltica (Granocaucho)	20 días	0	0,000%	0,000%	mar 4/08/26	vie 28/08/26	661CC+20 días;67
676	1.3.9.1.3.1.2.6.2	Rodadura	20 días	0	0,000%	0,000%	jue 6/08/26	mar 1/09/26	673CC+2 días;675
677	1.3.9.1.3.1.3	Señalización, demarcación y semaforización	15 días	0	0,000%	0,000%	vie 21/08/26	mar 8/09/26	843FC-15 días
678	1.3.9.1.3.2	Fin de tramo 3	0 días	0	0,000%	0,000%	mar 8/09/26	mar 8/09/26	634;652;653;676;
679	**1.3.9.1.4**	**Tramo 4 costado occidental calle 53-calle 63 (K7+970 - K8+980)**	**248 días**	**0**	**28,915%**	**28,915%**	**mar 18/11/25**	**jue 10/09/26**	
680	**1.3.9.1.4.1**	**Tramo 4 costado occidental calle 53-calle 63 (K7+970 - K8+980) Fase III (2 carriles)**	**238 días**	**0**	**26,723%**	**26,723%**	**vie 28/11/25**	**jue 10/09/26**	
681	1.3.9.1.4.1.1	Inicio de tramo 4	0 días	0	0,000%	0,000%	mié 25/03/26	mié 25/03/26	2728FC-117,2 día
682	**1.3.9.1.4.1.2**	**Intervención Calzada**	**238 días**	**0**	**26,723%**	**26,723%**	**vie 28/11/25**	**jue 10/09/26**	
683	1.3.9.1.4.1.2.1	Fresado	19 días	100	100,000%	100,000%	vie 28/11/25	lun 22/12/25	681CC-98 días
684	1.3.9.1.4.1.2.2	Excavaciones	19 días	100	100,000%	100,000%	vie 28/11/25	lun 22/12/25	681CC-98 días
685	0,00%	Mejoramiento subrasante	25 días	100	100,000%	100,000%	mar 2/12/25	vie 2/01/26	684CC+3 días
686	1.3.9.1.4.1.2.4	Subbase granularreciclada	23 días	100	100,000%	100,000%	jue 4/12/25	vie 2/01/26	685CC+2 días
687	1.3.9.1.4.1.2.5	Material granular estabilizada con asfalto	20 días	100	100,000%	100,000%	mar 9/12/25	vie 2/01/26	686CC+3 días
688	1.3.9.1.4.1.2.1	Fresado	19 días	0	0,000%	0,000%	lun 13/07/26	mar 4/08/26	681CC+90 días
689	1.3.9.1.4.1.2.2	Excavaciones	19 días	0	0,000%	0,000%	lun 13/07/26	mar 4/08/26	681CC+90 días
690	0,00%	Mejoramiento subrasante	25 días	0	0,000%	0,000%	jue 16/07/26	sáb 15/08/26	684CC+3 días;689
691	1.3.9.1.4.1.2.4	Subbase granularreciclada	23 días	0	0,000%	0,000%	vie 17/07/26	sáb 15/08/26	690CC+2 días
692	1.3.9.1.4.1.2.5	Material granular estabilizada con asfalto	20 días	0	0,000%	0,000%	mié 22/07/26	sáb 15/08/26	691CC+3 días
693	**1.3.9.1.4.1.2.6**	**Carpeta asfáltica**	**12 días**	**0**	**0,000%**	**0,000%**	**jue 27/08/26**	**jue 10/09/26**	
694	1.3.9.1.4.1.2.6.1	Base asfáltica (Granocaucho)	12 días	0	0,000%	0,000%	jue 27/08/26	jue 10/09/26	692FC+10 días;68
695	1.3.9.1.4.1.2.6.2	Rodadura	8 días	0	0,000%	0,000%	sáb 29/08/26	mar 8/09/26	694CC+1,5 días
696	**1.3.9.1.4.1**	**Tramo 4 costado occidental calle 53-calle 63 (K7+970 - K8+980) Fase III (1 carriles)**	**229,5 días**	**0**	**32,217%**	**32,217%**	**mar 18/11/25**	**jue 20/08/26**	
697	**1.3.9.1.4.1.2**	**Intervención Calzada**	**229,5 días**	**0**	**39,925%**	**39,925%**	**mar 18/11/25**	**jue 20/08/26**	
698	1.3.9.1.4.1.2.1	Fresado	20 días	100	100,000%	100,000%	mar 18/11/25	jue 11/12/25	683CC-10 días
699	1.3.9.1.4.1.2.2	Excavaciones	20 días	100	100,000%	100,000%	mar 18/11/25	jue 11/12/25	698CC
700	1.3.9.1.4.1.2.3	Mejoramiento subrasante	24 días	100	100,000%	100,000%	mar 18/11/25	mar 16/12/25	699CC
701	1.3.9.1.4.1.2.4	Subbase granularreciclada	22 días	100	100,000%	100,000%	jue 20/11/25	mar 16/12/25	700CC+2 días
702	1.3.9.1.4.1.2.5	Material granular estabilizada con asfalto	20 días	100	100,000%	100,000%	lun 24/11/25	mié 17/12/25	701CC+3 días
703	1.3.9.1.4.1.2.1	Fresado	20 días	0	0,000%	0,000%	mié 22/07/26	vie 14/08/26	695FC-40 días
704	1.3.9.1.4.1.2.2	Excavaciones	20 días	0	0,000%	0,000%	mié 22/07/26	vie 14/08/26	703CC
705	1.3.9.1.4.1.2.3	Mejoramiento subrasante	24 días	0	0,000%	0,000%	mié 22/07/26	jue 20/08/26	704CC
706	1.3.9.1.4.1.2.4	Subbase granularreciclada	22 días	0	0,000%	0,000%	jue 23/07/26	mié 19/08/26	700CC+1 día;705
707	1.3.9.1.4.1.2.5	Material granular estabilizada con asfalto	20 días	0	0,000%	0,000%	sáb 25/07/26	mié 19/08/26	706CC+2 días
708	**1.3.9.1.4.1.2.6**	**Carpeta asfáltica**	**13 días**	**0**	**0,000%**	**0,000%**	**vie 31/07/26**	**mar 18/08/26**	
709	1.3.9.1.4.1.2.6.1	Base asfáltica (Granocaucho)	13 días	0	0,000%	0,000%	vie 31/07/26	mar 18/08/26	707CC+5,5 días;7
710	1.3.9.1.4.1.2.6.2	Rodadura	8 días	0	0,000%	0,000%	lun 3/08/26	jue 13/08/26	709CC+2 días
711	1.3.9.1.4.1.3	Señalización, demarcación y semaforización	12 días	0	0,000%	0,000%	jue 30/07/26	vie 14/08/26	710FC-11 días
712	1.3.9.1.4.2	Fin de tramo 4	0 días	0	0,000%	0,000%	vie 14/08/26	vie 14/08/26	711;683;688
713	**1.3.9.1.5**	**Tramo 5 costado oriental calle 46-calle 53 (K7+915 - K7+970)**	**1036,75 días**	**0**	**90,549%**	**90,549%**	**lun 24/04/23**	**mié 9/09/26**	
714	**1.3.9.1.5.1**	**Tramo 5 costado oriental calle 46-calle 53 (K7+915 - K7+970) Fase I (2 carriles)**	**640,38 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**lun 24/04/23**	**vie 23/05/25**	
715	**1.3.9.1.5.1**	**Tramo 5A costado oriental calle 46-calle 53 (K7+915 - K7+945) Fase I (2 carriles)**	**597,5 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**lun 24/04/23**	**mié 2/04/25**	
716	**1.3.9.1.5.1.2**	**Intervención Calzada**	**239,25 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**lun 24/04/23**	**sáb 3/02/24**	
717	1.3.9.1.5.1.2.1	Fresado	32,25 días	100	100,000%	100,000%	lun 24/04/23	mié 31/05/23	590CC
718	1.3.9.1.5.1.2.2	Excavaciones	5 días	100	100,000%	100,000%	sáb 27/01/24	jue 1/02/24	717FC+193 días
719	1.3.9.1.5.1.2.3	Mejoramiento subrasante	5 días	100	100,000%	100,000%	mar 30/01/24	sáb 3/02/24	718FC-3 días
720	**1.3.9.1.5.1.2**	**Intervención Calzada**	**27 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**sáb 1/03/25**	**mié 2/04/25**	
721	1.3.9.1.5.1.2.2	Excavaciones	6 días	100	100,000%	100,000%	sáb 1/03/25	sáb 8/03/25	718FC+333 días
722	1.3.9.1.5.1.2.3	Mejoramiento subrasante	4 días	100	100,000%	100,000%	vie 7/03/25	mié 12/03/25	718FC-1 día;721F

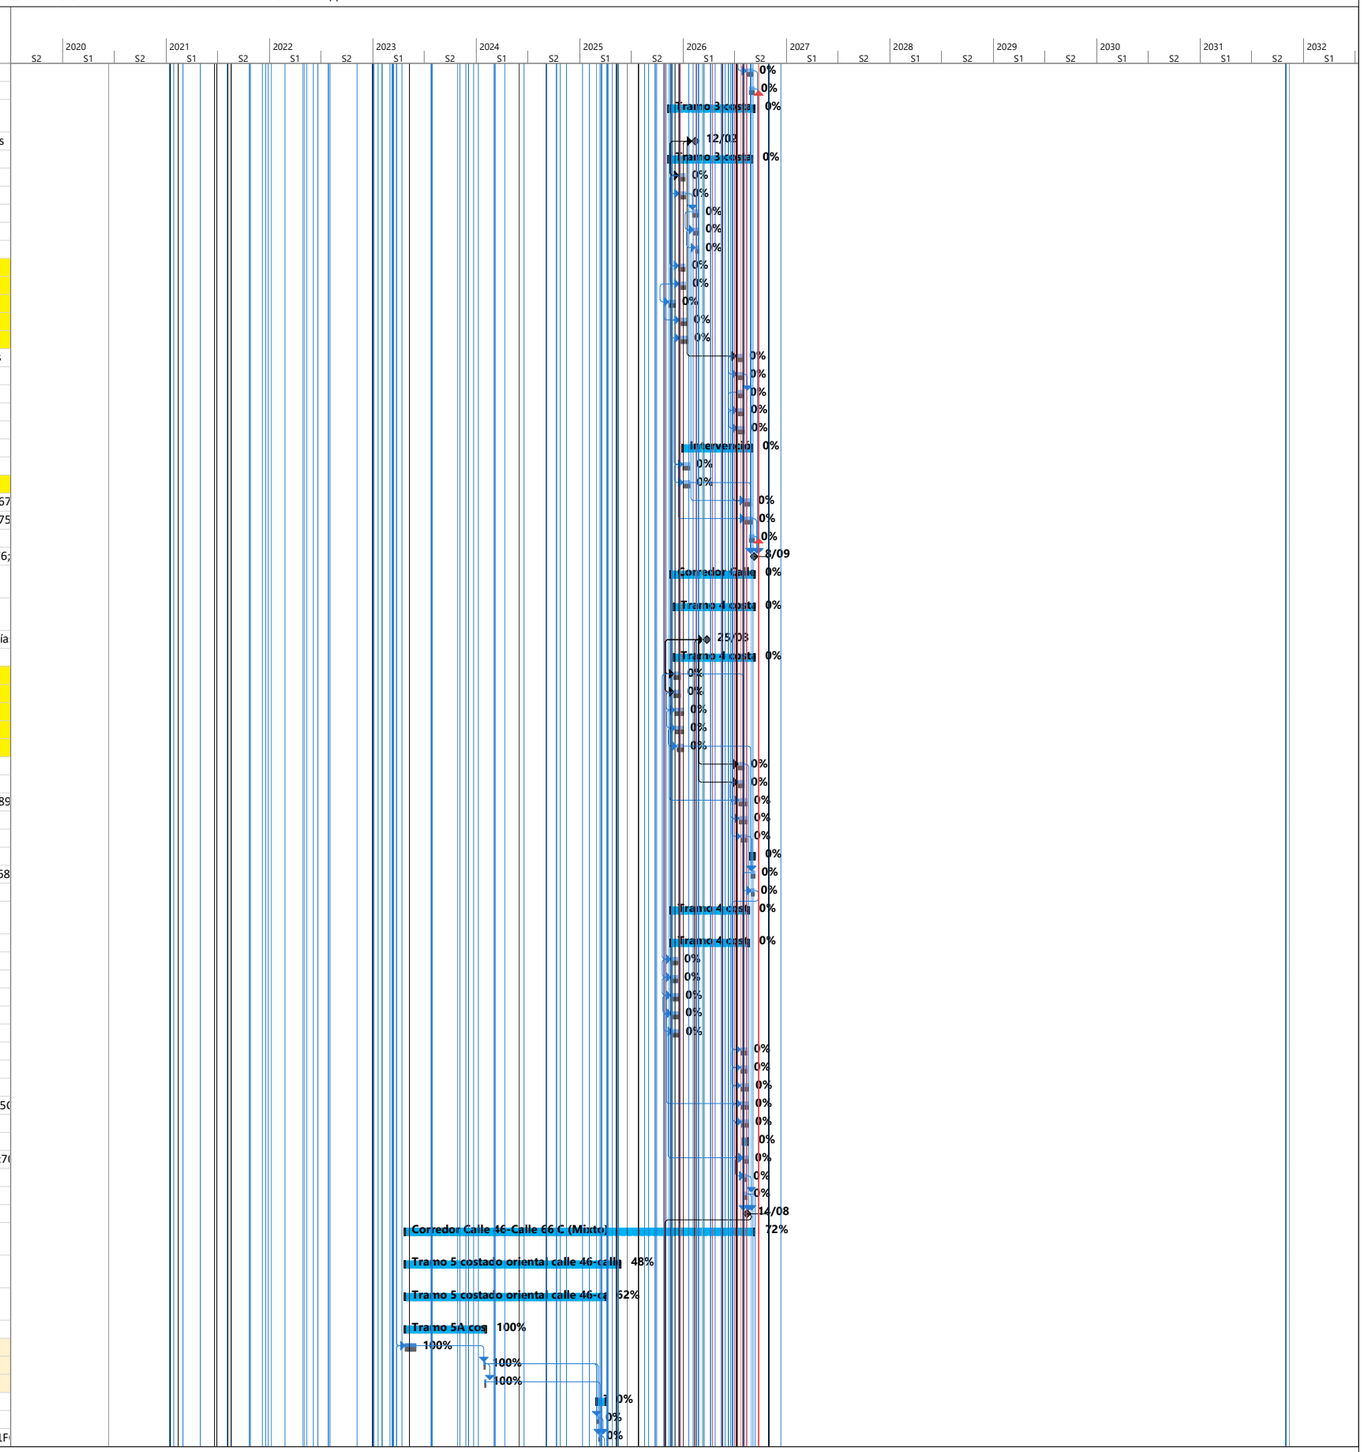


Tareas críticas · Tarea · Tarea manual · solo duración · Hito de línea base · Resumen · Tareas externas · Hito inactivo
División crítica · División · solo el comienzo · Línea base · Hito · Resumen manual · Hito externo · Resumen inactivo
Progreso de tarea crítica · Progreso de tarea · solo fin · División de la línea base · Progreso del resumen · Resumen del proyecto · Tarea inactiva · Fecha límite

Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	% Avance Conciliado	% Avance Programado (% PV)	% Avance Ejecutado conciliado (% EV))	Comienzo	Fin	Predecesoras
723	1.3.9.1.5.1.2.4	Subbase granular reciclada	5 días	100	100,000%	100,000%	jue 13/03/25	mié 19/03/25	722FC+1 día;719F
724	1.3.9.1.5.1.2.5	Material granular estabilizada con asfalto	5 días	100	100,000%	100,000%	mié 19/03/25	mar 25/03/25	723
725	**1.3.9.1.5.1.2.6**	**Carpeta asfáltica**	**7 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**mié 26/03/25**	**mié 2/04/25**	
726	1.3.9.1.5.1.2.6.1	Base asfáltica	3 días	100	100,000%	100,000%	mié 26/03/25	vie 28/03/25	724
727	1.3.9.1.5.1.2.6.2	Rodadura	3 días	100	100,000%	100,000%	lun 31/03/25	mié 2/04/25	726FC+1 día
728	**1.3.9.1.5.1**	**Tramo 5B costado oriental calle 46-calle 53 (K7+945 - K7+955) Fase I (2 carriles) (INTERSECCION CALLE 53)**	**615,5 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**lun 24/04/23**	**jue 24/04/25**	
729	**1.3.9.1.5.1.2**	**Intervención Calzada**	**237,5 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**lun 24/04/23**	**jue 1/02/24**	
730	1.3.9.1.5.1.2.1	Fresado	3,25 días	100	100,000%	100,000%	lun 24/04/23	mié 26/04/23	717CC
731	1.3.9.1.5.1.2.2	Excavaciones	2,75 días	100	100,000%	100,000%	sáb 27/01/24	mar 30/01/24	730FC+221 días
732	1.3.9.1.5.1.2.3	Mejoramiento subrasante	3,25 días	100	100,000%	100,000%	mar 30/01/24	jue 1/02/24	731CC+2 días
733	**1.3.9.1.5.1.2**	**Intervención Calzada**	**18 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**mié 2/04/25**	**jue 24/04/25**	
734	1.3.9.1.5.1.2.2	Excavaciones	3 días	100	100,000%	100,000%	mié 2/04/25	sáb 5/04/25	2807CC-81 días;7
735	1.3.9.1.5.1.2.3	Mejoramiento subrasante	2 días	100	100,000%	100,000%	lun 7/04/25	mié 9/04/25	734FC+1 día
736	1.3.9.1.5.1.2.4	Subbase granular reciclada	3 días	100	100,000%	100,000%	jue 10/04/25	lun 14/04/25	735FC+1 día
737	1.3.9.1.5.1.2.5	Material granular estabilizada con asfalto	3 días	100	100,000%	100,000%	lun 14/04/25	sáb 19/04/25	736
738	**1.3.9.1.5.1.2.6**	**Carpeta asfáltica**	**5 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**sáb 19/04/25**	**jue 24/04/25**	
739	1.3.9.1.5.1.2.6.1	Base asfáltica	2 días	100	100,000%	100,000%	sáb 19/04/25	mar 22/04/25	737
740	1.3.9.1.5.1.2.6.2	Rodadura	2 días	100	100,000%	100,000%	mié 23/04/25	jue 24/04/25	739FC+1 día
741	**1.3.9.1.5.1**	**Tramo 5C costado oriental calle 46-calle 53 (K7+955 - K7+970) Fase I (2 carriles) (INTERSECCION CALLE 53)**	**640,38 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**lun 24/04/23**	**vie 23/05/25**	
742	**1.3.9.1.5.1.2**	**Intervención Calzada**	**1 día**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**lun 24/04/23**	**lun 24/04/23**	
743	1.3.9.1.5.1.2.1	Fresado	1 día	100	100,000%	100,000%	lun 24/04/23	lun 24/04/23	730CC
744	**1.3.9.1.5.1.2**	**Intervención Calzada**	**14 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**jue 8/05/25**	**vie 23/05/25**	
745	1.3.9.1.5.1.2.2	Excavaciones	3 días	100	100,000%	100,000%	jue 8/05/25	lun 12/05/25	1135CC+416 días;
746	1.3.9.1.5.1.2.3	Mejoramiento subrasante	3 días	100	100,000%	100,000%	lun 12/05/25	jue 15/05/25	745
747	1.3.9.1.5.1.2.4	Subbase granular reciclada	3 días	100	100,000%	100,000%	jue 15/05/25	lun 19/05/25	746
748	1.3.9.1.5.1.2.5	Material granular estabilizada con asfalto	3 días	100	100,000%	100,000%	lun 19/05/25	jue 22/05/25	747
749	**1.3.9.1.5.1.2.6**	**Carpeta asfáltica**	**5 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**lun 19/05/25**	**vie 23/05/25**	
750	1.3.9.1.5.1.2.6.1	Base asfáltica	2 días	100	100,000%	100,000%	lun 19/05/25	mié 21/05/25	748CC
751	1.3.9.1.5.1.2.6.2	Rodadura	2 días	100	100,000%	100,000%	jue 22/05/25	vie 23/05/25	750FC+1 día
752	**1.3.9.1.5.2**	**Tramo 5 costado oriental calle 46-calle 53 (K7+915 - K7+970) Fase II (1 carril)**	**1036,75 días**	**0**	**74,662%**	**74,662%**	**lun 24/04/23**	**mié 9/09/26**	
753	**1.3.9.1.5.2.1**	**Tramo 5D costado oriental calle 46-calle 53 (K7+915 - K7+945) Fase II (1 carril)**	**644 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**lun 24/04/23**	**mié 28/05/25**	
754	**1.3.9.1.5.2.2**	**Intervención Calzada**	**254 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**lun 24/04/23**	**mar 20/02/24**	
755	1.3.9.1.5.2.2.1	Fresado	254 días	100	100,000%	100,000%	lun 24/04/23	mar 20/02/24	743CC
756	**1.3.9.1.5.2.2**	**Intervención Calzada**	**18 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**jue 8/05/25**	**mié 28/05/25**	
757	1.3.9.1.5.2.2.2	Excavaciones	3 días	100	100,000%	100,000%	jue 8/05/25	lun 12/05/25	755FC+372 días
758	1.3.9.1.5.2.2.3	Mejoramiento subrasante	3 días	100	100,000%	100,000%	lun 12/05/25	mié 14/05/25	757
759	1.3.9.1.5.2.2.4	Subbase granular reciclada	2 días	100	100,000%	100,000%	jue 15/05/25	vie 16/05/25	758
760	1.3.9.1.5.2.2.5	Material granular estabilizada con asfalto	3 días	100	100,000%	100,000%	lun 19/05/25	mié 21/05/25	759FC+1 día
761	**1.3.9.1.5.2.2.6**	**Carpeta asfáltica**	**5 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**jue 22/05/25**	**mié 28/05/25**	
762	1.3.9.1.5.2.2.6.1	Base asfáltica	1 día	100	100,000%	100,000%	jue 22/05/25	vie 23/05/25	760FC+1 día
763	1.3.9.1.5.2.2.6.2	Rodadura	2 días	100	100,000%	100,000%	lun 26/05/25	mié 28/05/25	762FC+2 días
764	**1.3.9.1.5.2.2**	**Tramo 5E costado oriental calle 46-calle 53 (K7+945 - K7+955) Fase II (1 carril) (INTERSECCION CALLE 53)**	**687,38 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**lun 24/04/23**	**sáb 19/07/25**	
765	**1.3.9.1.5.2.2**	**Intervención Calzada**	**1 día**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**lun 24/04/23**	**lun 24/04/23**	
766	1.3.9.1.5.2.2.1	Fresado	1 día	100	100,000%	100,000%	lun 24/04/23	lun 24/04/23	755CC
767	**1.3.9.1.5.2.2**	**Intervención Calzada**	**16 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**mié 2/07/25**	**sáb 19/07/25**	
768	1.3.9.1.5.2.2.2	Excavaciones	3 días	100	100,000%	100,000%	mié 2/07/25	vie 4/07/25	751FC+31 días;76
769	1.3.9.1.5.2.2.3	Mejoramiento subrasante	3 días	100	100,000%	100,000%	vie 4/07/25	mar 8/07/25	768
770	1.3.9.1.5.2.2.4	Subbase granular reciclada	3 días	100	100,000%	100,000%	mié 9/07/25	sáb 12/07/25	769CC+4 días
771	1.3.9.1.5.2.2.5	Material granular estabilizada con asfalto	1 día	100	100,000%	100,000%	sáb 12/07/25	lun 14/07/25	770;763
772	**1.3.9.1.5.2.2.6**	**Carpeta asfáltica**	**5 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**lun 14/07/25**	**sáb 19/07/25**	
773	1.3.9.1.5.2.2.6.1	Base asfáltica	2 días	100	100,000%	100,000%	lun 14/07/25	mié 16/07/25	771
774	1.3.9.1.5.2.2.6.2	Rodadura	2 días	100	100,000%	100,000%	jue 17/07/25	sáb 19/07/25	773FC+1 día
775	**1.3.9.1.5.1**	**Tramo 5F costado oriental calle 46-calle 53 (K7+955 - K7+970) Fase II (1 carril)) (INTERSECCION CALLE 53)**	**1023,38 días**	**0**	**49,474%**	**49,474%**	**lun 24/04/23**	**mar 25/08/26**	
776	**1.3.9.1.5.1.2**	**Intervención Calzada**	**1 día**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**lun 24/04/23**	**lun 24/04/23**	
777	1.3.9.1.5.1.2.1	Fresado	1 día	100	100,000%	100,000%	lun 24/04/23	lun 24/04/23	766CC
778	**1.3.9.1.5.1.2**	**Intervención Calzada**	**336 días**	**0**	**36,000%**	**36,000%**	**sáb 19/07/25**	**mar 25/08/26**	
779	1.3.9.1.5.1.2.2	Excavaciones	3 días	100	100,000%	100,000%	sáb 19/07/25	mié 23/07/25	751FC+10 días;77
780	1.3.9.1.5.1.2.3	Mejoramiento subrasante	3 días	100	100,000%	100,000%	mié 23/07/25	vie 25/07/25	779
781	1.3.9.1.5.1.2.4	Subbase granular reciclada	3 días	0	0,000%	0,000%	mié 12/08/26	sáb 15/08/26	780FC+320 días
782	1.3.9.1.5.1.2.5	Material granular estabilizada con asfalto	3 días	0	0,000%	0,000%	mar 18/08/26	jue 20/08/26	781
783	**1.3.9.1.5.1.2.6**	**Carpeta asfáltica**	**4 días**	**0**	**0,000%**	**0,000%**	**jue 20/08/26**	**mar 25/08/26**	
784	1.3.9.1.5.1.2.6.1	Base asfáltica	2 días	0	0,000%	0,000%	jue 20/08/26	sáb 22/08/26	782
785	1.3.9.1.5.1.2.6.2	Rodadura	2 días	0	0,000%	0,000%	sáb 22/08/26	mar 25/08/26	784

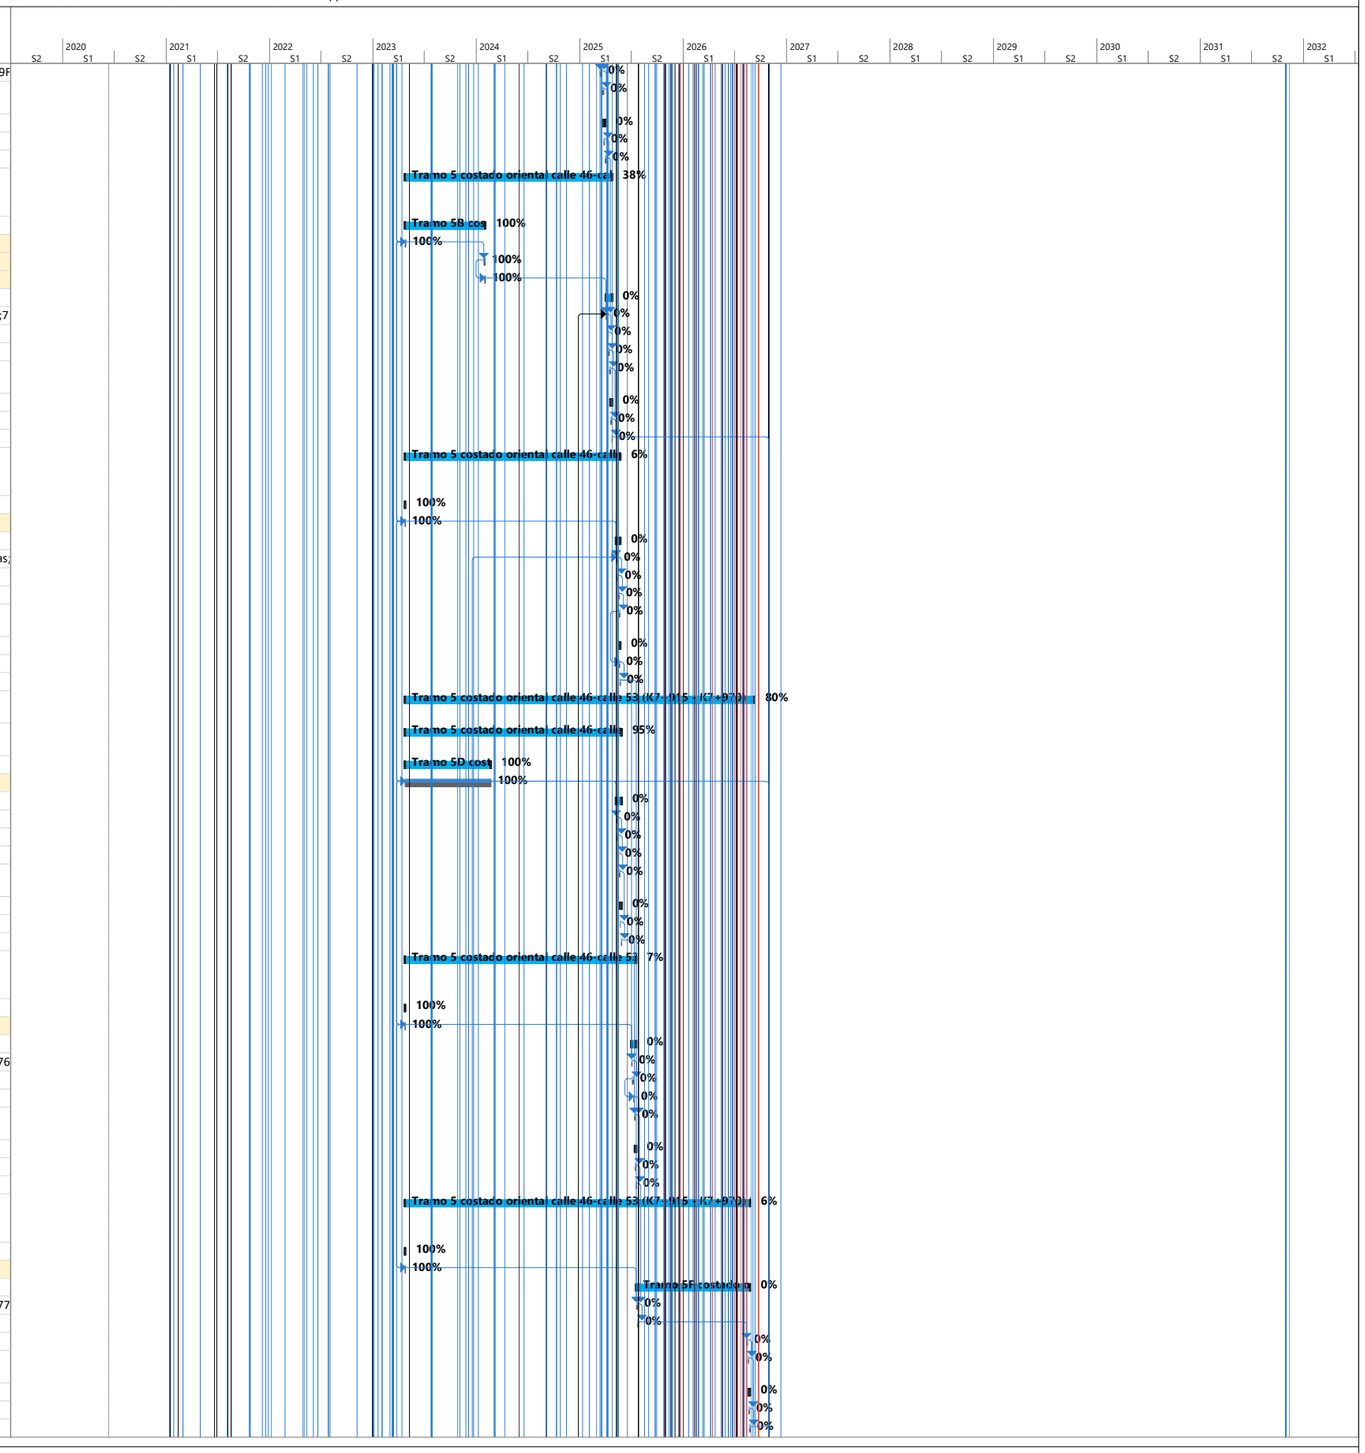


Tareas críticas · Tarea · Tarea manual · solo duración · Hito de línea base · Resumen · Tareas externas · Hito inactivo
División crítica · División · solo el comienzo · Línea base · Hito · Resumen manual · Hito externo · Resumen inactivo
Progreso de tarea crítica · Progreso de tarea · solo fin · División de la línea base · Progreso del resumen · Resumen del proyecto · Tarea inactiva · Fecha límite

Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	% Avance Conciliado	% Avance Programado (% PV)	% Avance Ejecutado conciliado (% EV))	Comienzo	Fin	Predecesoras
786	1.3.9.1.5.3	Señalización, demarcación y semaforización	21 días	0	0,000%	0,000%	sáb 15/08/26	mié 9/09/26	843CC+2 días
787	1.3.9.1.5.4	Fin de tramo 5	0 días	0	0,000%	0,000%	mié 9/09/26	mié 9/09/26	786
788	**1.3.9.1.6**	**Tramo 6 costado occidental calle 46-calle 53 (K7+915 - K7+970)**	**228,95 días**	**0**	**0,000%**	**0,000%**	**jue 11/12/25**	**vie 11/09/26**	
789	**1.3.9.1.6.1**	**Tramo 6 costado occidental calle 46-calle 53 (K7+915 - K7+970) Fase III (3 carriles)**	**228,95 días**	**0**	**0,000%**	**0,000%**	**jue 11/12/25**	**vie 11/09/26**	
790	1.3.9.1.6.1.1	Inicio de tramo 6	0 días	0	0,000%	0,000%	jue 11/12/25	jue 11/12/25	712FC-205 días
791	**1.3.9.1.6.1.2**	**Intervención Calzada**	**66 días**	**0**	**0,000%**	**0,000%**	**jue 14/05/26**	**lun 3/08/26**	
792	1.3.9.1.6.1.2.1	Fresado	59 días	0	0,000%	0,000%	jue 14/05/26	lun 27/07/26	790FC+130 días
793	1.3.9.1.6.1.2.2	Excavaciones	30 días	0	0,000%	0,000%	mié 20/05/26	jue 25/06/26	792CC+4 días
794	1.3.9.1.6.1.2.3	Mejoramiento subrasante	20 días	0	0,000%	0,000%	vie 26/06/26	mié 22/07/26	793FC+1 día
795	1.3.9.1.6.1.2.4	Subbase granular reciclada	20 días	0	0,000%	0,000%	mar 30/06/26	jue 23/07/26	794CC+2 días
796	1.3.9.1.6.1.2.5	Material granular estabilizada con asfalto	20 días	0	0,000%	0,000%	jue 2/07/26	lun 27/07/26	795CC+2 días
797	**1.3.9.1.6.1.2.6**	**Carpeta asfáltica**	**12 días**	**0**	**0,000%**	**0,000%**	**mar 21/07/26**	**lun 3/08/26**	
798	1.3.9.1.6.1.2.6.1	Base asfáltica	10 días	0	0,000%	0,000%	mar 21/07/26	vie 31/07/26	792FC-5 días;793
799	1.3.9.1.6.1.2.6.2	Rodadura	10 días	0	0,000%	0,000%	mié 22/07/26	lun 3/08/26	798CC+2 días
800	1.3.9.1.6.1.3	Señalización, demarcación y semaforización	20 días	0	0,000%	0,000%	jue 20/08/26	vie 11/09/26	843CC+5 días
801	1.3.9.1.6.2	Fin de tramo 6	0 días	0	0,000%	0,000%	vie 11/09/26	vie 11/09/26	792;793;794;795;
802	**1.3.9.1.6.1**	**Conectantes Calle 63**	**194 días**	**0**	**18,674%**	**18,674%**	**mar 20/01/26**	**mar 8/09/26**	
803	**1.3.9.1.1.1**	**Conectante Sur-Oriente Calle 63 (K9+025-K9+125)**	**17 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**mar 20/01/26**	**sáb 7/02/26**	
804	**1.3.9.1.1.1.2**	**Intervención Calzada**	**11 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**mar 20/01/26**	**lun 2/02/26**	
805	1.3.9.1.1.1.2.1	Fresado	4 días	100	100,000%	100,000%	mar 20/01/26	vie 23/01/26	277CC-105 días;2
806	1.3.9.1.1.1.2.2	Excavaciones	5 días	100	100,000%	100,000%	mar 20/01/26	lun 26/01/26	805CC
807	1.3.9.1.1.1.2.3	Mejoramiento subrasante	5 días	100	100,000%	100,000%	lun 26/01/26	vie 30/01/26	806
808	1.3.9.1.1.1.2.4	Subbase granular reciclada	6 días	100	100,000%	100,000%	lun 26/01/26	lun 2/02/26	807CC
809	1.3.9.1.1.1.2.5	Material granular estabilizada con asfalto	4 días	100	100,000%	100,000%	mié 28/01/26	lun 2/02/26	808CC+2 días
810	**1.3.9.1.1.1.2.6**	**Carpeta asfáltica**	**6 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**lun 2/02/26**	**sáb 7/02/26**	
811	1.3.9.1.1.1.2.6.1	Base asfáltica	3 días	100	100,000%	100,000%	lun 2/02/26	mié 4/02/26	809
812	1.3.9.1.1.1.2.6.2	Rodadura	3 días	100	100,000%	100,000%	mié 4/02/26	sáb 7/02/26	811;418FC-30 día
813	**1.3.9.1.1.1**	**Conectante Occidente-Sur (Uds) Calle 63 (K8+980 -K9+105)**	**30 días**	**0**	**0,000%**	**0,000%**	**mié 24/06/26**	**jue 30/07/26**	
814	**1.3.9.1.1.1.2**	**Intervención Calzada**	**13 días**	**0**	**0,000%**	**0,000%**	**sáb 11/07/26**	**lun 27/07/26**	
815	1.3.9.1.1.1.2.1	Fresado	4 días	0	0,000%	0,000%	sáb 11/07/26	mié 15/07/26	277CC+40 días;28
816	1.3.9.1.1.1.2.2	Excavaciones	5 días	0	0,000%	0,000%	sáb 11/07/26	jue 16/07/26	815CC
817	1.3.9.1.1.1.2.3	Mejoramiento subrasante	5 días	0	0,000%	0,000%	jue 16/07/26	jue 23/07/26	816
818	1.3.9.1.1.1.2.4	Subbase granular reciclada	6 días	0	0,000%	0,000%	mar 21/07/26	lun 27/07/26	817CC+2 días
819	1.3.9.1.1.1.2.5	Material granular estabilizada con asfalto	4 días	0	0,000%	0,000%	mié 22/07/26	lun 27/07/26	818CC+2 días
820	**1.3.9.1.1.1.2.6**	**Carpeta asfáltica**	**30 días**	**0**	**0,000%**	**0,000%**	**mié 24/06/26**	**jue 30/07/26**	
821	1.3.9.1.1.1.2.6.1	Base asfáltica	3 días	0	0,000%	0,000%	lun 27/07/26	jue 30/07/26	819
822	1.3.9.1.1.1.2.6.2	Rodadura	3 días	0	0,000%	0,000%	mié 24/06/26	sáb 27/06/26	821FC-30 días;41
823	**1.3.9.1.1.1**	**Conectante Occidente-Norte (Instituto Técnico Francisco Jose De Caldas) Calle 63 (K8+980 -K9+105) CALLE 63**	**17 días**	**0**	**0,000%**	**0,000%**	**sáb 11/07/26**	**vie 31/07/26**	
824	**1.3.9.1.1.1.2**	**Intervención Calzada**	**11 días**	**0**	**0,000%**	**0,000%**	**sáb 11/07/26**	**vie 24/07/26**	
825	1.3.9.1.1.1.2.1	Fresado	4 días	0	0,000%	0,000%	sáb 11/07/26	mié 15/07/26	277CC+40 días;28
826	1.3.9.1.1.1.2.2	Excavaciones	5 días	0	0,000%	0,000%	sáb 11/07/26	jue 16/07/26	825CC
827	1.3.9.1.1.1.2.3	Mejoramiento subrasante	5 días	0	0,000%	0,000%	jue 16/07/26	jue 23/07/26	826
828	1.3.9.1.1.1.2.4	Subbase granular reciclada	6 días	0	0,000%	0,000%	jue 16/07/26	vie 24/07/26	827CC
829	1.3.9.1.1.1.2.5	Material granular estabilizada con asfalto	4 días	0	0,000%	0,000%	mar 21/07/26	vie 24/07/26	828CC+2 días
830	**1.3.9.1.1.1.2.6**	**Carpeta asfáltica**	**6 días**	**0**	**0,000%**	**0,000%**	**vie 24/07/26**	**vie 31/07/26**	
831	1.3.9.1.1.1.2.6.1	Base asfáltica	3 días	0	0,000%	0,000%	vie 24/07/26	mar 28/07/26	829
832	1.3.9.1.1.1.2.6.2	Rodadura	3 días	0	0,000%	0,000%	mar 28/07/26	vie 31/07/26	831;418
833	**1.3.9.1.1.1**	**Conectante Oriente-Norte (Avión Salitre) Calle 63 (K9+435-K9+540)5) CALLE 63**	**29 días**	**0**	**0,000%**	**0,000%**	**mar 4/08/26**	**mar 8/09/26**	
834	**1.3.9.1.1.1.2**	**Intervención Calzada**	**11 días**	**0**	**0,000%**	**0,000%**	**mar 4/08/26**	**mié 19/08/26**	
835	1.3.9.1.1.1.2.1	Fresado	4 días	0	0,000%	0,000%	mar 4/08/26	lun 10/08/26	277CC+60 días;28
836	1.3.9.1.1.1.2.2	Excavaciones	5 días	0	0,000%	0,000%	mar 4/08/26	mar 11/08/26	835CC
837	1.3.9.1.1.1.2.3	Mejoramiento subrasante	5 días	0	0,000%	0,000%	mar 11/08/26	mar 18/08/26	836
838	1.3.9.1.1.1.2.4	Subbase granular reciclada	6 días	0	0,000%	0,000%	mar 11/08/26	mié 19/08/26	837CC
839	1.3.9.1.1.1.2.5	Material granular estabilizada con asfalto	4 días	0	0,000%	0,000%	jue 13/08/26	mié 19/08/26	838CC+2 días
840	**1.3.9.1.1.1.2.6**	**Carpeta asfáltica**	**8 días**	**0**	**0,000%**	**0,000%**	**lun 31/08/26**	**mar 8/09/26**	
841	1.3.9.1.1.1.2.6.1	Base asfáltica	4 días	0	0,000%	0,000%	lun 31/08/26	jue 3/09/26	839FC+10 días
842	1.3.9.1.1.1.2.6.2	Rodadura	3 días	0	0,000%	0,000%	vie 4/09/26	mar 8/09/26	841FC+1 día;418F
843	1.3.9.1.1.2.3	Señalización, demarcación y semaforización	22 días	0	0,000%	0,000%	jue 13/08/26	mar 8/09/26	436FC+65 días;81
844	1.3.9.1.1.2.3	Fin Conectantes	0 días	0	0,000%	0,000%	mar 8/09/26	mar 8/09/26	843;822;832;842
845	**1**	**Corredor calle 46-calle 66 (BRT)**	**1397,5 días**	**0**	**68,725%**	**70,551%**	**jue 24/02/22**	**vie 11/09/26**	
846	**1.3.9.2.1**	**Tramo 1 costado oriental Calle 63-calle 66 (K8+980 - K10+024)**	**1397,5 días**	**0**	**20,781%**	**20,781%**	**jue 24/02/22**	**vie 11/09/26**	
847	**1.3.9.2.1.1**	**TRAMO 1 K8+980-K9+415**	**356,88 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**jue 24/02/22**	**jue 20/04/23**	
848	**1.3.9.2.1.1**	**Tramo 1 K8+980 a K9+060**	**206,25 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**jue 24/02/22**	**mar 25/10/22**	
849	**1.3.9.2.1.1.2**	**Estructura Nueva**	**206,25 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**jue 24/02/22**	**mar 25/10/22**	
850	1.3.9.2.1.1.2.1	Fresado	51,63 días	100	100,000%	100,000%	jue 24/02/22	mar 26/04/22	60FC+21 días
851	1.3.9.2.1.1.2.2	Excavaciones	52,13 días	100	100,000%	100,000%	lun 28/02/22	vie 29/04/22	850CC+3 días
852	1.3.9.2.1.1.2.3	Mejoramiento subrasante	51,63 días	100	100,000%	100,000%	sáb 5/03/22	jue 5/05/22	851CC+5 días
853	1.3.9.2.1.1.2.4	Subbase granular reciclada	51,63 días	100	100,000%	100,000%	vie 11/03/22	mié 11/05/22	852CC+5 días
854	1.3.9.2.1.1.2.5	Capa antierosiva en mezcla asfaltica	51,63 días	100	100,000%	100,000%	jue 17/03/22	mar 17/05/22	853CC+5 días
855	1.3.9.2.1.1.2.6	MR45 (incluye: acero, curado, juntas)	182,38 días	100	100,000%	100,000%	jue 24/03/22	mar 25/10/22	854CC+5 días

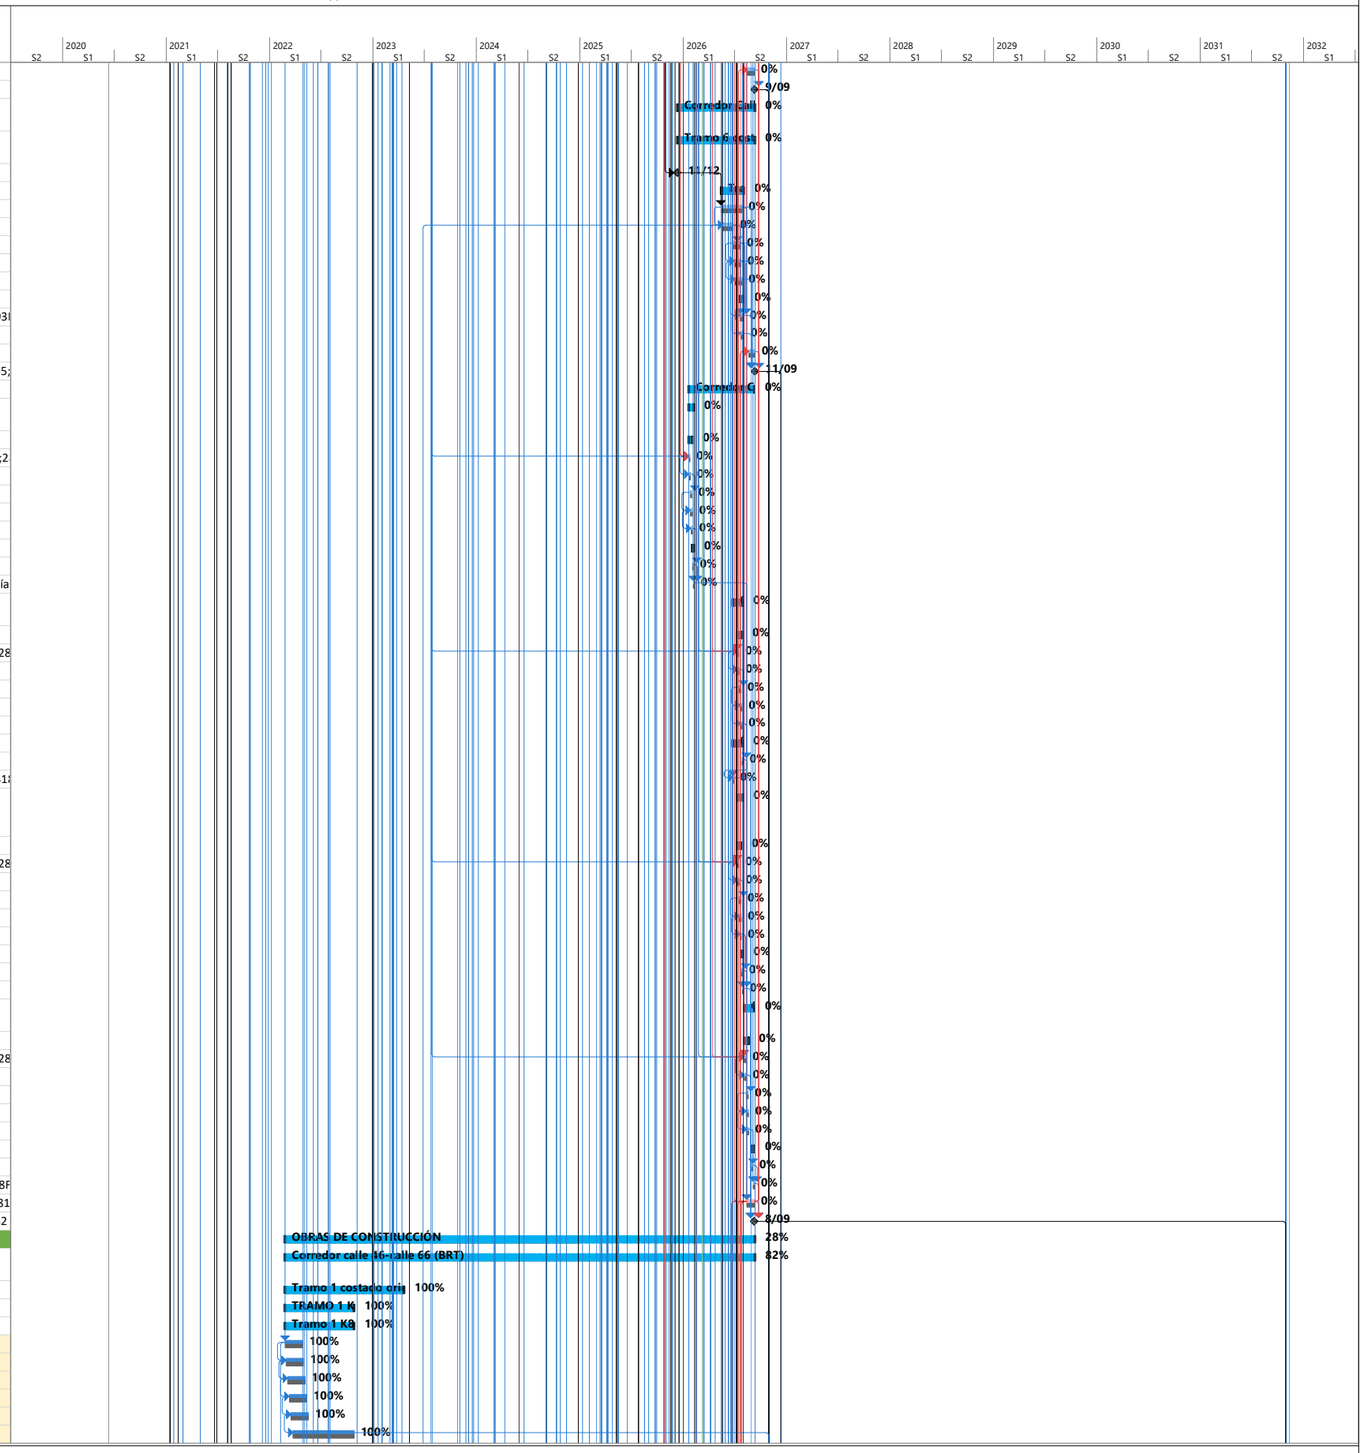


Tareas críticas · Tarea · Tarea manual · solo duración · Hito de línea base · Resumen · Tareas externas · Hito inactivo
División crítica · División · solo el comienzo · Línea base · Hito · Resumen manual · Hito externo · Resumen inactivo
Progreso de tarea crítica · Progreso de tarea · solo fin · División de la línea base · Progreso del resumen · Resumen del proyecto · Tarea inactiva · Fecha límite

Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	% Avance Conciliado	% Avance Programado (% PV)	% Avance Ejecutado conciliado (% EV))	Comienzo	Fin	Predecesoras
856	**1.3.9.2.1.1**	**Tramo 1 K9+060 a K9+415**	**206,75 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**mar 23/08/22**	**jue 20/04/23**	
857	**1.3.9.2.1.1.2**	**Estructura Nueva**	**206,75 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**mar 23/08/22**	**jue 20/04/23**	
858	1.3.9.2.1.1.2.1	Fresado	52,13 días	100	100,000%	100,000%	mar 23/08/22	jue 20/10/22	850CC+145 días
859	1.3.9.2.1.1.2.2	Excavaciones	51,63 días	100	100,000%	100,000%	vie 26/08/22	lun 24/10/22	858CC+3 días
860	1.3.9.2.1.1.2.3	Mejoramiento subrasante	51,63 días	100	100,000%	100,000%	jue 1/09/22	sáb 29/10/22	859CC+5 días
861	1.3.9.2.1.1.2.4	Subbase granular reciclada	52,13 días	100	100,000%	100,000%	mié 7/09/22	vie 4/11/22	860CC+5 días
862	1.3.9.2.1.1.2.5	Capa antierosiva en mezcla asfaltica	52,13 días	100	100,000%	100,000%	mar 13/09/22	vie 11/11/22	861CC+5 días
863	1.3.9.2.1.1.2.6	MR45 (incluye: acero, curado, juntas)	182,88 días	100	100,000%	100,000%	lun 19/09/22	jue 20/04/23	862CC+5 días
864	**1.3.9.2.1.2**	**Tramo 1 Cierre general (K9+415-K9+990)**	**139,75 días**	**0**	**0,000%**	**0,000%**	**jue 26/03/26**	**vie 11/09/26**	
865	1.3.9.2.1.2.1	Inicio de tramo 1 Cierre general	0 días	0	0,000%	0,000%	jue 26/03/26	jue 26/03/26	60FC+1280 días
866	**1.3.9.2.1.2.2**	**Estructura nueva**	**60 días**	**0**	**0,000%**	**0,000%**	**lun 20/04/26**	**jue 2/07/26**	
867	1.3.9.2.1.2.2.1	Fresado	15 días	0	0,000%	0,000%	lun 20/04/26	vie 8/05/26	865CC+20 días
868	1.3.9.2.1.2.2.2	Excavaciones	30 días	0	0,000%	0,000%	sáb 25/04/26	lun 1/06/26	867CC+5 días
869	1.3.9.2.1.2.2.3	Mejoramiento subrasante	29 días	0	0,000%	0,000%	sáb 2/05/26	vie 5/06/26	868CC+5 días
870	1.3.9.2.1.2.2.4	Subbase granular reciclada	35 días	0	0,000%	0,000%	vie 8/05/26	vie 19/06/26	869CC+5 días
871	1.3.9.2.1.2.2.5	Capa antierosiva en mezcla asfaltica	35 días	0	0,000%	0,000%	jue 14/05/26	jue 25/06/26	870CC+5 días
872	1.3.9.2.1.2.2.6	MR45 (incluye: acero, curado, juntas)	35 días	0	0,000%	0,000%	mié 20/05/26	jue 2/07/26	871CC+5 días
873	1.3.9.2.1.2.3	Señalización, demarcación y semaforización	20 días	0	0,000%	0,000%	jue 20/08/26	vie 11/09/26	843CC+5 días;872
874	1.3.9.2.1.2.4	Fin de tramo 1	0 días	0	0,000%	0,000%	vie 11/09/26	vie 11/09/26	873
875	**1.3.9.2.2**	**Tramo 2 costado oriental calle 53-calle 63 (K7+970 - K8+980)**	**1124,63 días**	**0**	**93,102%**	**93,102%**	**vie 13/01/23**	**vie 11/09/26**	
876	**1.3.9.2.2**	**Tramo 2 costado oriental calle 53-calle 63 (K7+970-K8+560) ETAPA 1**	**1123,63 días**	**0**	**91,663%**	**91,663%**	**vie 13/01/23**	**jue 10/09/26**	
877	1.3.9.2.2.1	Inicio de tramo 2	0 días	100	0,000%	0,000%	vie 13/01/23	vie 13/01/23	60FC+285 días
878	**1.3.9.2.2.2**	**Estructura Nueva**	**231,25 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**vie 13/01/23**	**jue 12/10/23**	
879	1.3.9.2.2.2.1	Fresado	26 días	100	100,000%	100,000%	vie 13/01/23	vie 10/02/23	877CC-1 día
880	1.3.9.2.2.2.2	Excavaciones	26 días	100	100,000%	100,000%	vie 13/01/23	vie 10/02/23	879CC
881	1.3.9.2.2.2.3	Mejoramiento subrasante	20,88 días	100	100,000%	100,000%	jue 26/01/23	vie 17/02/23	880CC+11 días
882	1.3.9.2.2.2.4	Subbase granular reciclada	20,88 días	100	100,000%	100,000%	lun 13/02/23	mar 7/03/23	881CC+15 días
883	1.3.9.2.2.2.5	Capa antierosiva en mezcla asfaltica	20,88 días	100	100,000%	100,000%	mié 20/09/23	jue 12/10/23	882CC+177 días
884	1.3.9.2.2.2.6	MR45 (incluye: acero, curado, juntas)	20,38 días	100	100,000%	100,000%	sáb 25/02/23	mar 21/03/23	881FC+6 días
885	**1.3.9.2.2.2**	**Estructura Nueva**	**46 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**lun 24/11/25**	**lun 19/01/26**	
886	1.3.9.2.2.2.1	Fresado	31 días	100	100,000%	100,000%	lun 24/11/25	mié 31/12/25	867CC-124 días;8
887	1.3.9.2.2.2.2	Excavaciones	15 días	100	100,000%	100,000%	vie 28/11/25	mié 17/12/25	886CC+5 días
888	1.3.9.2.2.2.3	Mejoramiento subrasante	15 días	100	100,000%	100,000%	jue 4/12/25	mar 23/12/25	887CC+5 días
889	1.3.9.2.2.2.4	Subbase granular reciclada	14 días	100	100,000%	100,000%	jue 11/12/25	lun 29/12/25	888CC+5 días
890	1.3.9.2.2.2.5	Capa antierosiva en mezcla asfaltica	14 días	100	100,000%	100,000%	mié 17/12/25	lun 5/01/26	889CC+5 días
891	1.3.9.2.2.2.6	MR45 (incluye: acero, curado, juntas)	21 días	100	100,000%	100,000%	mar 23/12/25	lun 19/01/26	890CC+5 días
892	**1.3.9.2.2.2**	**Estructura Nueva**	**217,75 días**	**0**	**8,450%**	**8,450%**	**mar 23/12/25**	**jue 10/09/26**	
893	1.3.9.2.2.2.1	Fresado	31 días	0	0,000%	0,000%	lun 20/04/26	mié 27/05/26	867CC;883CC
894	1.3.9.2.2.2.2	Excavaciones	15 días	0	0,000%	0,000%	sáb 25/04/26	mié 13/05/26	893CC+5 días
895	1.3.9.2.2.2.3	Mejoramiento subrasante	15 días	0	0,000%	0,000%	sáb 2/05/26	mié 20/05/26	894CC+5 días
896	1.3.9.2.2.2.4	Subbase granular reciclada	7 días	0	0,000%	0,000%	vie 8/05/26	vie 15/05/26	895CC+5 días
897	1.3.9.2.2.2.5	Capa antierosiva en mezcla asfaltica	15 días	0	0,000%	0,000%	jue 14/05/26	lun 1/06/26	896CC+5 días
898	1.3.9.2.2.2.6	MR45 (incluye: acero, curado, juntas)	16 días	100	100,000%	100,000%	mar 23/12/25	mar 13/01/26	897CC-119 días
899	1.3.9.2.2.2.6	MR45 (incluye: acero, curado, juntas)	16 días	0	0,000%	0,000%	mié 20/05/26	mar 9/06/26	897CC+5 días
900	1.3.9.2.2.2.7	Señalización, demarcación y semaforización	14 días	0	0,000%	0,000%	mié 26/08/26	jue 10/09/26	843CC+10 días
901	**1.3.9.2.2**	**Tramo 2 costado oriental calle 53-calle 63 (K8+560-K8+980) ETAPA 2**	**1124,63 días**	**0**	**95,000%**	**95,000%**	**vie 13/01/23**	**vie 11/09/26**	
902	1.3.9.2.2.1	Inicio de tramo 2	0 días	0	0,000%	0,000%	vie 13/01/23	vie 13/01/23	880CC
903	**1.3.9.2.2.2**	**Estructura Nueva**	**144,88 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**vie 3/11/23**	**mié 24/04/24**	
904	1.3.9.2.2.2.1	Fresado	20,38 días	100	100,000%	100,000%	vie 3/11/23	mar 28/11/23	902CC+240 días
905	1.3.9.2.2.2.2	Excavaciones	25,5 días	100	100,000%	100,000%	vie 3/11/23	lun 4/12/23	904CC
906	1.3.9.2.2.2.3	Mejoramiento subrasante	26 días	100	100,000%	100,000%	jue 16/11/23	vie 15/12/23	905CC+9 días
907	1.3.9.2.2.2.4	Subbase granular reciclada	26 días	100	100,000%	100,000%	mar 28/11/23	jue 28/12/23	906CC+10 días
908	1.3.9.2.2.2.5	Capa antierosiva en mezcla asfaltica	26 días	100	100,000%	100,000%	mar 16/01/24	mar 13/02/24	907CC+38 días
909	1.3.9.2.2.2.6	MR45 (incluye: acero, curado, juntas)	20,88 días	100	100,000%	100,000%	mar 2/04/24	mié 24/04/24	908CC+63 días
910	**1.3.9.2.2.2**	**Estructura Nueva**	**213,75 días**	**0**	**93,617%**	**93,617%**	**mar 30/12/25**	**vie 11/09/26**	
911	1.3.9.2.2.2.3.1	Fresado	15 días	100	100,000%	100,000%	mar 30/12/25	sáb 17/01/26	886CC-94 días;90
912	1.3.9.2.2.2.2	Excavaciones	15 días	100	100,000%	100,000%	vie 2/01/26	mar 20/01/26	911CC+2 días
913	1.3.9.2.2.2.3	Mejoramiento subrasante	15 días	100	100,000%	100,000%	mar 6/01/26	vie 23/01/26	912CC+3 días
914	1.3.9.2.2.2.4	Subbase granular reciclada	14 días	100	100,000%	100,000%	vie 9/01/26	mar 27/01/26	913CC+4 días
915	1.3.9.2.2.2.5	Capa antierosiva en mezcla asfaltica	15 días	100	100,000%	100,000%	mié 14/01/26	vie 30/01/26	914CC+3 días
916	1.3.9.2.2.2.6	MR45 (incluye: acero, curado, juntas)	14 días	100	100,000%	100,000%	sáb 17/01/26	mar 3/02/26	915CC+3 días
917	1.3.9.2.2.2.7	Señalización, demarcación y semaforización	20 días	0	0,000%	0,000%	jue 20/08/26	vie 11/09/26	843CC+5 días
918	1.3.9.2.2.2.8	Fin de tramo 2	0 días	0	0,000%	0,000%	vie 11/09/26	vie 11/09/26	917;916;887;888;
919	**1**	**Tramo 3 costado occidental calle 63-calle 66 (K8+980 - K9+990)**	**1307,25 días**	**0**	**76,760%**	**76,658%**	**sáb 4/06/22**	**sáb 5/09/26**	
920	1.3.9.2.3.1	Inicio de tramo 3	0 días	0	0,000%	0,000%	mié 26/04/23	mié 26/04/23	60CC+390 días
921	**1.3.9.2.3.2**	**Tramo 3 K8+980 a K9+420 (Carril unico Izquierdo)**	**1071,13 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**sáb 4/06/22**	**mié 26/11/25**	
922	1.3.9.2.3.2.1	Inicio de tramo 3 K8+980 a K9+420	0 días	100	0,000%	0,000%	vie 12/05/23	vie 12/05/23	920CC
923	**1.3.9.2.3.2.2**	**Estructura Nueva**	**151,13 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**sáb 4/06/22**	**mié 30/11/22**	
924	1.3.9.2.3.2.2.1	Fresado	52,25 días	100	100,000%	100,000%	sáb 4/06/22	sáb 6/08/22	60FC+103 días;92
925	1.3.9.2.3.2.2.2	Excavaciones	15,25 días	100	100,000%	100,000%	sáb 11/06/22	jue 30/06/22	924CC+6 días
926	1.3.9.2.3.2.2.3	Mejoramiento subrasante	15,25 días	100	100,000%	100,000%	sáb 11/06/22	jue 30/06/22	925CC

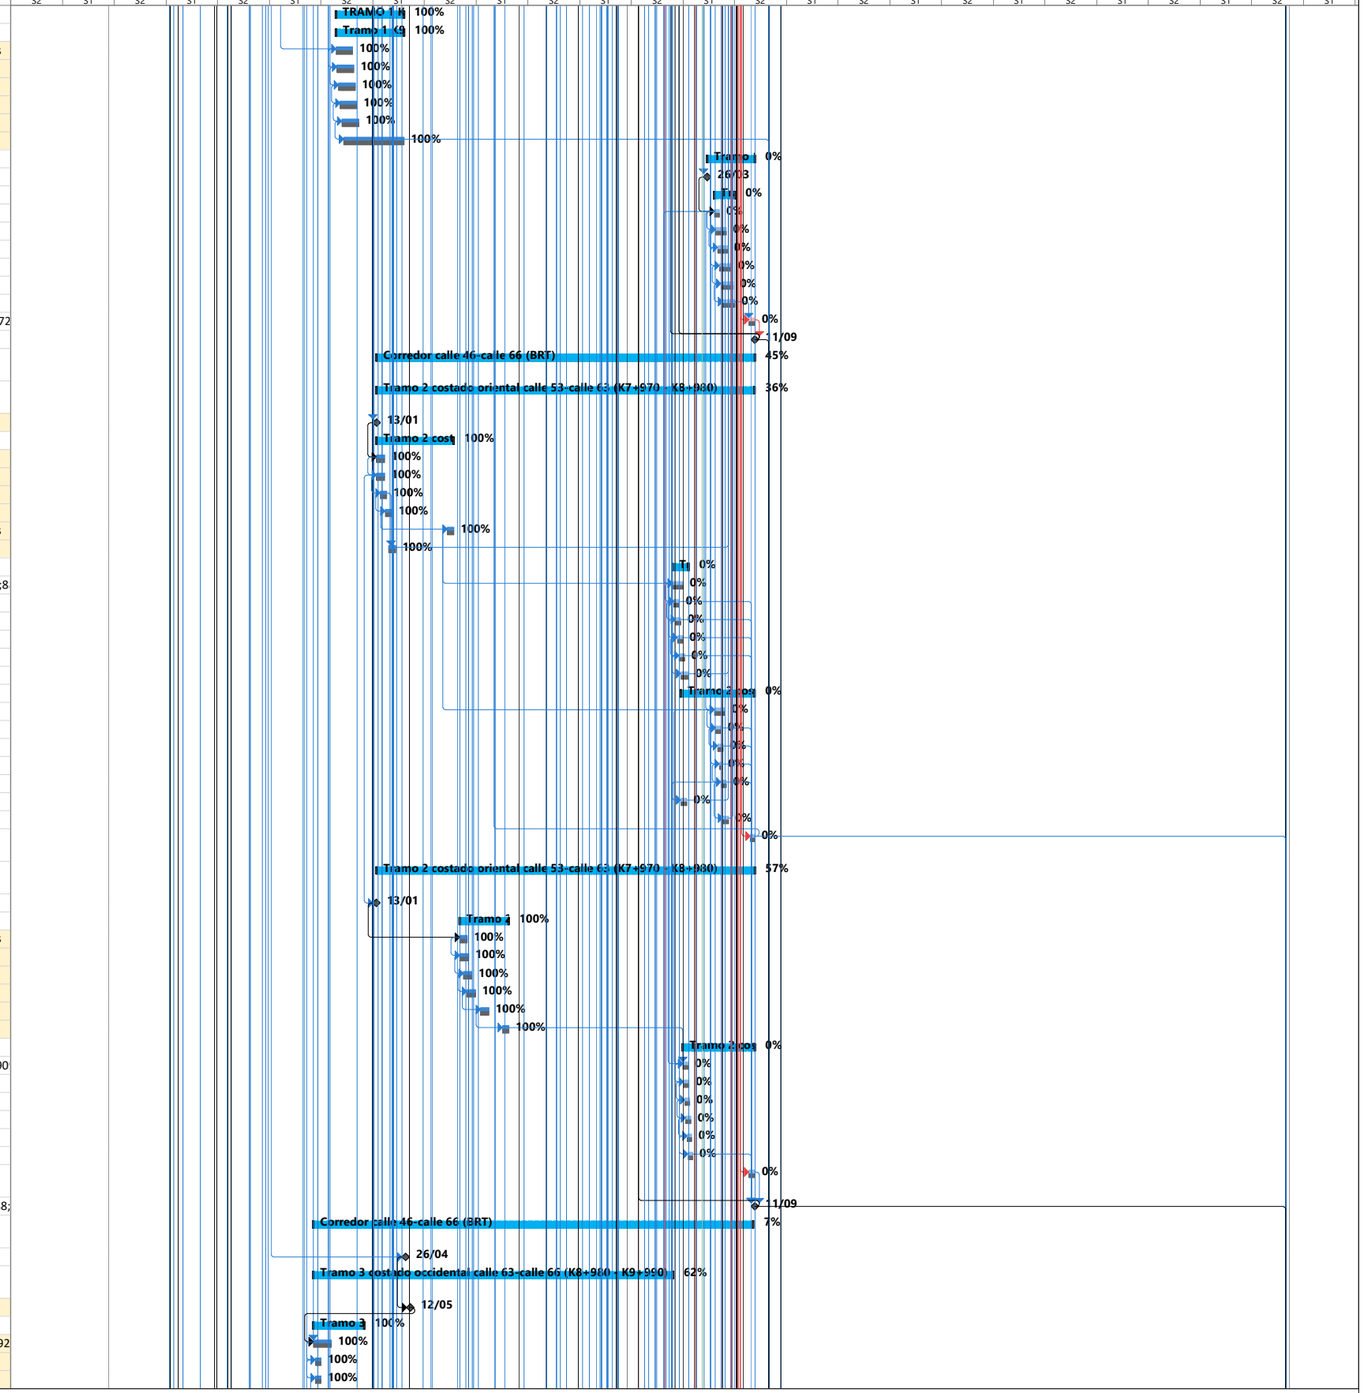


Tareas críticas · Tarea · Tarea manual · solo duración · Hito de línea base · Resumen · Tareas externas · Hito inactivo
División crítica · División · solo el comienzo · Línea base · Hito · Resumen manual · Hito externo · Resumen inactivo
Progreso de tarea crítica · Progreso de tarea · solo fin · División de la línea base · Progreso del resumen · Resumen del proyecto · Tarea inactiva · Fecha límite

Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	% Avance Conciliado	% Avance Programado (% PV)	% Avance Ejecutado conciliado (% EV))	Comienzo	Fin	Predecesoras
927	1.3.9.2.3.2.2.4	Subbase granular reciclada	15,25 días	100	100,000%	100,000%	vie 1/07/22	mar 19/07/22	926CC+15 días
928	1.3.9.2.3.2.2.5	Capa antierosiva en mezcla asfaltica	15,75 días	100	100,000%	100,000%	mar 4/10/22	vie 21/10/22	927CC+78 días
929	1.3.9.2.3.2.2.6	MR45 (incluye: acero, curado, juntas)	20,38 días	100	100,000%	100,000%	sáb 5/11/22	mié 30/11/22	928CC+27 días
930	**1.3.9.2.3.2.2**	**Estructura Nueva**	**85 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**lun 30/12/24**	**mar 8/04/25**	
931	1.3.9.2.3.2.2.2	Excavaciones	14,5 días	100	100,000%	100,000%	lun 30/12/24	vie 17/01/25	929FC+640 días
932	1.3.9.2.3.2.2.3	Mejoramiento subrasante	15 días	100	100,000%	100,000%	mar 7/01/25	jue 23/01/25	931CC+5 días
933	1.3.9.2.3.2.2.4	Subbase granular reciclada	15 días	100	100,000%	100,000%	lun 13/01/25	mié 29/01/25	932CC+5 días
934	1.3.9.2.3.2.2.5	Capa antierosiva en mezcla asfaltica	15 días	100	100,000%	100,000%	sáb 18/01/25	mar 4/02/25	933CC+5 días
935	1.3.9.2.3.2.2.6	MR45 (incluye: acero, curado, juntas)	20 días	100	100,000%	100,000%	sáb 15/03/25	mar 8/04/25	934CC+50 días
936	**1.3.9.2.3.2.2**	**Estructura Nueva**	**4 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**vie 21/11/25**	**mié 26/11/25**	
937	1.3.9.2.3.2.2.6	MR45 (incluye: acero, curado, juntas)	4 días	100	100,000%	100,000%	vie 21/11/25	mié 26/11/25	935CC+211 días
938	**1**	**Tramo 3 costado occidental calle 63-calle 66 (K8+980 - K9+990)**	**1160,13 días**	**0**	**70,968%**	**70,841%**	**sáb 26/11/22**	**sáb 5/09/26**	
939	1.3.9.2.3.3.1	Inicio de tramo 3 Cierre general	0 días	0	0,000%	0,000%	jue 29/01/26	jue 29/01/26	150
940	**1**	**Tramo 3 BRT 1 CARRIL IZQUIERDO (K9+420-K9+880) ETAPA 1**	**376,5 días**	**0**	**59,881%**	**59,881%**	**jue 12/06/25**	**vie 4/09/26**	
941	**1**	**Estructura nueva**	**84,4 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**jue 12/06/25**	**sáb 20/09/25**	
942	1.3.9.2.3.3.2.1	Fresado	61 días	100	100,000%	100,000%	jue 12/06/25	lun 25/08/25	939CC-194 días
943	1.3.9.2.3.3.2.2	Excavaciones	61 días	100	100,000%	100,000%	mié 18/06/25	sáb 30/08/25	942CC+5 días
944	1.3.9.2.3.3.2.3	Mejoramiento subrasante	61 días	100	100,000%	100,000%	mié 25/06/25	vie 5/09/25	943CC+5 días
945	1.3.9.2.3.3.2.4	Subbase granular reciclada	60 días	100	100,000%	100,000%	mié 2/07/25	mié 10/09/25	944CC+5 días
946	1.3.9.2.3.3.2.5	Capa antierosiva en mezcla asfaltica	60 días	100	100,000%	100,000%	mar 8/07/25	mar 16/09/25	945CC+5 días
947	1	MR45 (incluye: acero, curado, juntas)	59,4 días	100	100,000%	100,000%	lun 14/07/25	sáb 20/09/25	946CC+5 días
948	**1.3.9.2.3.3.2.2**	**Estructura Nueva**	**228,5 días**	**0**	**40,256%**	**40,256%**	**jue 4/12/25**	**vie 4/09/26**	
949	1.3.9.2.3.3.2.1	Fresado	29 días	100	100,000%	100,000%	jue 4/12/25	vie 9/01/26	942CC+148 días
950	1.3.9.2.3.3.2.2	Excavaciones	29 días	100	100,000%	100,000%	vie 5/12/25	sáb 10/01/26	942CC+149 días
951	1.3.9.2.3.3.2.3	Mejoramiento subrasante	30 días	100	100,000%	100,000%	lun 15/12/25	mié 21/01/26	950CC+7 días
952	1.3.9.2.3.3.2.4	Subbase granular reciclada	29,3 días	100	100,000%	100,000%	mié 17/12/25	jue 22/01/26	951CC+2 días
953	1.3.9.2.3.3.2.5	Capa antierosiva en mezcla asfaltica	20 días	100	100,000%	100,000%	vie 19/12/25	mié 14/01/26	952CC+2 días
954	1.3.9.2.3.3.2.6	MR45 (incluye: acero, curado, juntas)	20 días	100	100,000%	100,000%	mié 24/12/25	lun 19/01/26	953CC+4 días
955	1.3.9.2.3.3.2.1	Fresado	29 días	0	0,000%	0,000%	jue 4/06/26	vie 10/07/26	942CC+300 días
956	1.3.9.2.3.3.2.2	Excavaciones	29 días	0	0,000%	0,000%	jue 4/06/26	vie 10/07/26	942CC+300 días
957	1.3.9.2.3.3.2.3	Mejoramiento subrasante	30 días	0	0,000%	0,000%	vie 5/06/26	lun 13/07/26	956CC+1 día
958	1.3.9.2.3.3.2.4	Subbase granular reciclada	31 días	0	0,000%	0,000%	jue 18/06/26	sáb 25/07/26	957CC+10 días
959	1.3.9.2.3.3.2.5	Capa antierosiva en mezcla asfaltica	19,2 días	0	0,000%	0,000%	mié 24/06/26	vie 17/07/26	958CC+5 días
960	1.3.9.2.3.3.2.6	MR45 (incluye: acero, curado, juntas)	19,5 días	0	0,000%	0,000%	mié 1/07/26	vie 24/07/26	959CC+5 días
961	1.3.9.2.3.3.2.7	Señalización, demarcación y semaforización	19,5 días	0	0,000%	0,000%	jue 13/08/26	vie 4/09/26	843CC;947;960CC
962	**1.3.9.2.3.3.3**	**Tramo 3 BRT 1 CARRIL IZQUIERDO (K9+880-K9+990) ETAPA 2**	**1160,13 días**	**0**	**93,754%**	**93,754%**	**sáb 26/11/22**	**sáb 5/09/26**	
963	**1.3.9.2.3.3.2**	**Estructura nueva**	**30,75 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**sáb 26/11/22**	**sáb 31/12/22**	
964	1.3.9.2.3.3.2.1	Fresado	30,75 días	100	100,000%	100,000%	sáb 26/11/22	sáb 31/12/22	929FC-4 días
965	**1.3.9.2.3.3.2**	**Estructura nueva**	**90,2 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**lun 6/10/25**	**jue 22/01/26**	
966	1.3.9.2.3.3.2.1	Fresado	30 días	100	100,000%	100,000%	lun 6/10/25	lun 10/11/25	964FC+850 días
967	$ 20.029.022,83	Excavaciones	50 días	100	100,000%	100,000%	lun 6/10/25	jue 4/12/25	966CC
968	1.3.9.2.3.3.2.3	Mejoramiento subrasante	70 días	100	100,000%	100,000%	vie 10/10/25	lun 5/01/26	967CC+4,7 días
969	1.3.9.2.3.3.2.4	Subbase granular reciclada	70 días	100	100,000%	100,000%	vie 17/10/25	vie 9/01/26	968CC+5 días
970	1.3.9.2.3.3.2.5	Capa antierosiva en mezcla asfaltica	70 días	100	100,000%	100,000%	jue 23/10/25	vie 16/01/26	969CC+5 días
971	1.3.9.2.3.3.2.6	MR45 (incluye: acero, curado, juntas)	70 días	100	100,000%	100,000%	mié 29/10/25	jue 22/01/26	970CC+5,5 días
972	**1.3.9.2.3.3.2**	**Estructura nueva**	**205,18 días**	**0**	**66,723%**	**66,723%**	**sáb 3/01/26**	**sáb 5/09/26**	
973	1.3.9.2.3.3.2.3	Mejoramiento subrasante	20 días	100	0,000%	0,000%	mar 2/06/26	vie 26/06/26	967CC+200 días
974	1.3.9.2.3.3.2.4	Subbase granular reciclada	19,5 días	100	0,000%	0,000%	sáb 27/06/26	mié 22/07/26	973FC+1 día
975	1.3.9.2.3.3.2.5	Capa antierosiva en mezcla asfaltica	20 días	100	100,000%	100,000%	sáb 3/01/26	mar 27/01/26	971FC-16 días
976	1.3.9.2.3.3.2.6	MR45 (incluye: acero, curado, juntas)	20 días	100	100,000%	100,000%	mar 27/01/26	jue 19/02/26	975
977	1.3.9.2.3.3.2.7	Señalización, demarcación y semaforización	20 días	0	0,000%	0,000%	jue 13/08/26	sáb 5/09/26	843CC;947;960
978	**1**	**Tramo 3 BRT 1 CARRIL DERECHO (K9+420-K9+735)) ETAPA 2**	**292,38 días**	**0**	**66,690%**	**65,494%**	**vie 15/08/25**	**jue 30/07/26**	
979	**1.3.9.2.3.3.2**	**Estructura nueva**	**71 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**jue 4/12/25**	**jue 26/02/26**	
980	1.3.9.2.3.3.2.1	Fresado	45,5 días	100	100,000%	100,000%	jue 4/12/25	jue 29/01/26	964FC+900 días
981	1.3.9.2.3.3.2.2	Excavaciones	45,5 días	100	100,000%	100,000%	jue 11/12/25	mar 3/02/26	980CC+5 días
982	1.3.9.2.3.3.2.3	Mejoramiento subrasante	44,5 días	100	100,000%	100,000%	mar 16/12/25	sáb 7/02/26	981CC+5 días
983	1.3.9.2.3.3.2.4	Subbase granular reciclada	45 días	100	100,000%	100,000%	lun 22/12/25	vie 13/02/26	982CC+5 días
984	1.3.9.2.3.3.2.5	Capa antierosiva en mezcla asfaltica	44,5 días	100	100,000%	100,000%	mié 24/12/25	lun 16/02/26	983CC+2 días
985	1.3.9.2.3.3.2.6	MR45 (incluye: acero, curado, juntas)	49 días	100	100,000%	100,000%	mié 31/12/25	jue 26/02/26	984CC+5 días
986	**1**	**Estructura nueva**	**292,38 días**	**0**	**64,059%**	**62,768%**	**vie 15/08/25**	**jue 30/07/26**	
987	1.3.9.2.3.3.2.1	Fresado	35 días	100	100,000%	100,000%	vie 15/08/25	jue 25/09/25	980CC-94 días
988	1.3.9.2.3.3.2.2	Excavaciones	35 días	100	100,000%	100,000%	vie 15/08/25	jue 25/09/25	980CC-94 días
989	1.3.9.2.3.3.2.3	Mejoramiento subrasante	35 días	100	100,000%	100,000%	sáb 16/08/25	vie 26/09/25	988CC+1 día
990	1.3.9.2.3.3.2.4	Subbase granular reciclada	34 días	100	100,000%	100,000%	jue 4/09/25	sáb 11/10/25	989CC+15 días
991	1	Capa antierosiva en mezcla asfaltica	34 días	100	100,000%	100,000%	jue 4/09/25	sáb 11/10/25	989CC+15 días
992	1.3.9.2.3.3.2.6	MR45 (incluye: acero, curado, juntas)	41 días	100	100,000%	100,000%	mar 9/09/25	lun 27/10/25	991CC+5 días
993	1.3.9.2.3.3.2.1	Fresado	34 días	0	100,000%	0,000%	jue 4/12/25	jue 15/01/26	980CC
994	1.3.9.2.3.3.2.2	Excavaciones	34 días	0	0,000%	0,000%	lun 9/03/26	lun 20/04/26	980CC+80 días
995	1.3.9.2.3.3.2.3	Mejoramiento subrasante	35 días	0	0,000%	0,000%	mar 10/03/26	mié 22/04/26	994CC+1 día
996	1.3.9.2.3.3.2.4	Subbase granular reciclada	35 días	0	0,000%	0,000%	vie 13/03/26	lun 27/04/26	995CC+4 días
997	1.3.9.2.3.3.2.5	Capa antierosiva en mezcla asfaltica	36 días	0	0,000%	0,000%	jue 19/03/26	lun 4/05/26	996CC+5 días
998	1.3.9.2.3.3.2.6	MR45 (incluye: acero, curado, juntas)	41 días	0	0,000%	0,000%	jue 26/03/26	vie 15/05/26	997CC+5 días

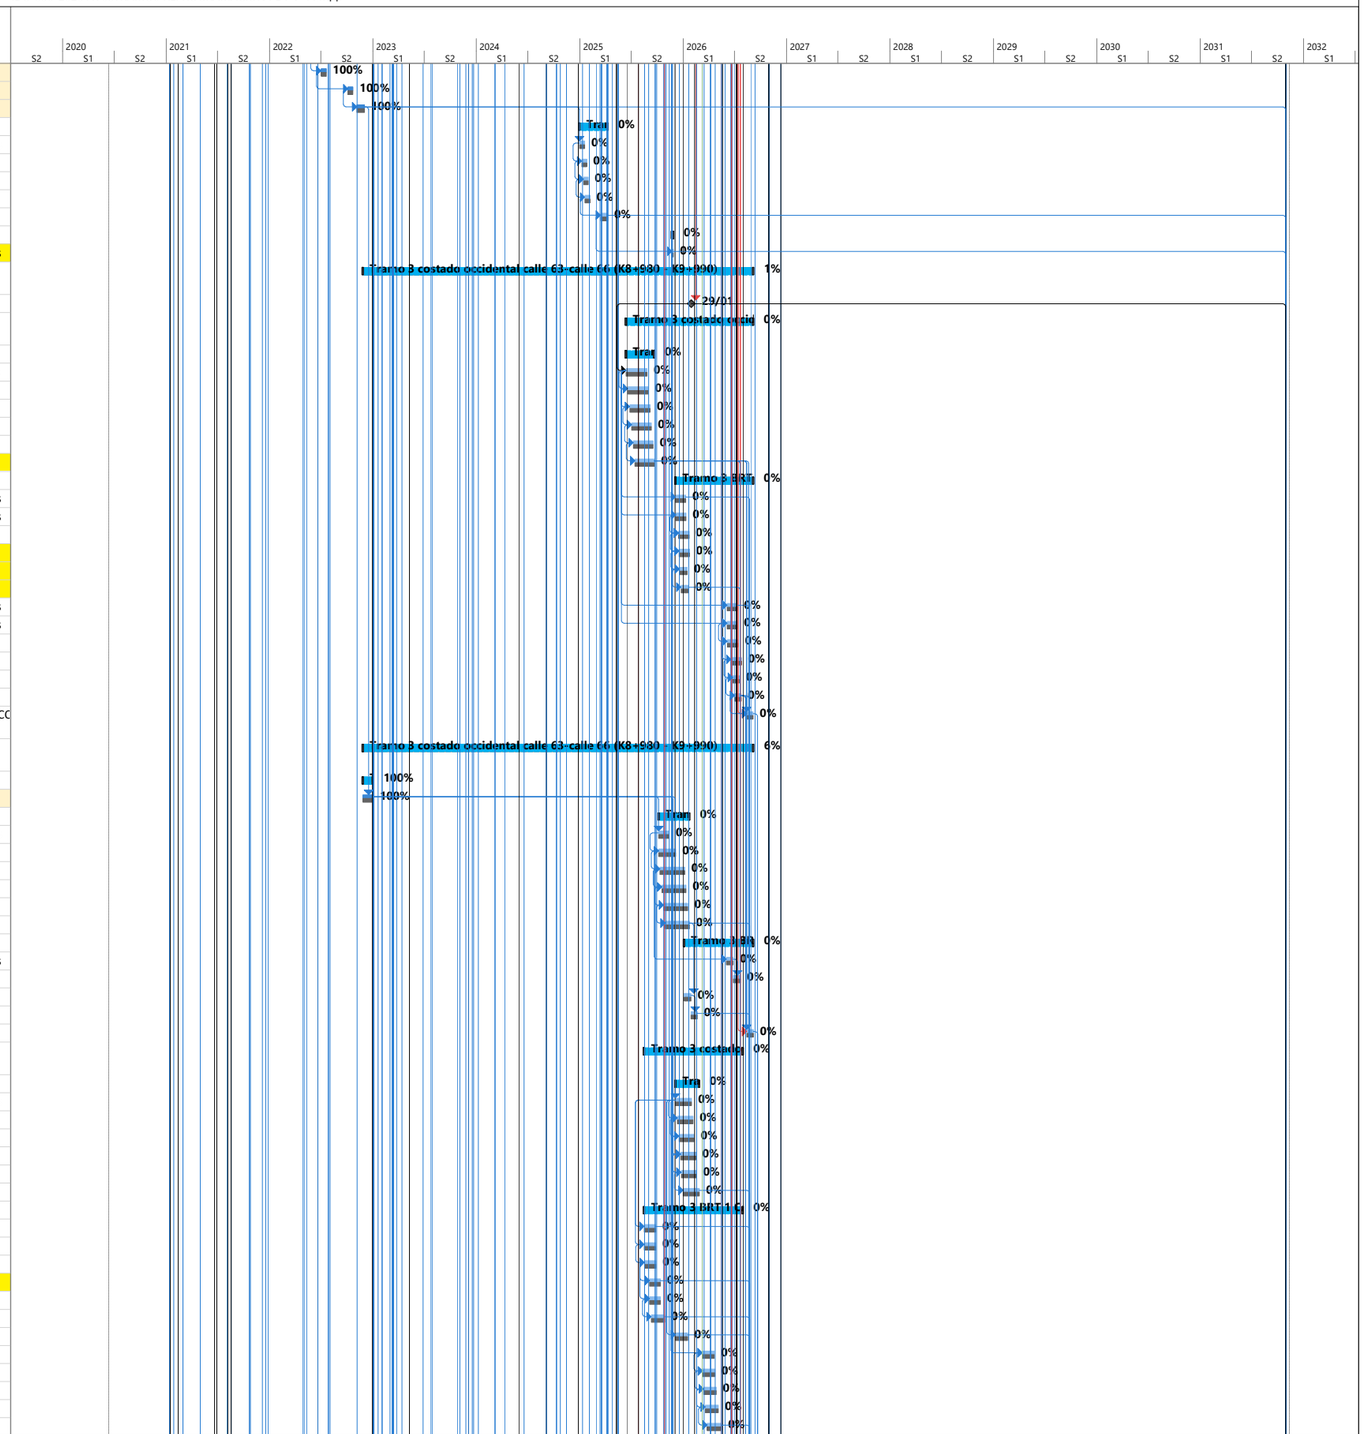


Tareas críticas · Tarea · Tarea manual · solo duración · Hito de línea base · Resumen · Tareas externas · Hito inactivo
División crítica · División · solo el comienzo · Línea base · Hito · Resumen manual · Hito externo · Resumen inactivo
Progreso de tarea crítica · Progreso de tarea · solo fin · División de la línea base · Progreso del resumen · Resumen del proyecto · Tarea inactiva · Fecha límite

Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	% Avance Conciliado	% Avance Programado (% PV)	% Avance Ejecutado conciliado (% EV))	Comienzo	Fin	Predecesoras
999	1.3.9.2.3.3.2.7	Señalización, demarcación y semaforización	9 días	0	0,000%	0,000%	mar 21/07/26	jue 30/07/26	843CC-20 días;94
1000	**1.3.9.2.3.3.5**	**Tramo 3 BRT 1 CARRIL DERECHO (K9+735-K9+990) ETAPA 1**	**205,5 días**	**0**	**89,993%**	**93,754%**	**mar 25/11/25**	**mié 29/07/26**	
1001	**1.3.9.2.3.3.2**	**Estructura nueva**	**87 días**	**0**	**95,989%**	**100,000%**	**mar 25/11/25**	**sáb 7/03/26**	
1002	1.3.9.2.3.3.2.1	Fresado	61 días	100	100,000%	100,000%	mar 25/11/25	vie 6/02/26	964FC+892 días
1003	1.3.9.2.3.3.2.2	Excavaciones	61,5 días	100	100,000%	100,000%	lun 1/12/25	jue 12/02/26	1002CC+5 días
1004	1.3.9.2.3.3.2.3	Mejoramiento subrasante	61 días	100	100,000%	100,000%	sáb 6/12/25	mié 18/02/26	1003CC+5,5 días
1005	1.3.9.2.3.3.2.4	Subbase granular reciclada	61 días	100	100,000%	100,000%	sáb 13/12/25	mar 24/02/26	1004CC+5 días
1006	1.3.9.2.3.3.2.5	Capa antierosiva en mezcla asfaltica	61 días	100	99,590%	100,000%	vie 19/12/25	lun 2/03/26	1005CC+5 días
1007	1.3.9.2.3.3.2.6	MR45 (incluye: acero, curado, juntas)	61,5 días	100	90,650%	100,000%	vie 26/12/25	sáb 7/03/26	1006CC+5 días
1008	**1.3.9.2.3.3.2**	**Estructura nueva**	**20 días**	**0**	**0,000%**	**0,000%**	**lun 6/07/26**	**mié 29/07/26**	
1009	1.3.9.2.3.3.2.7	Señalización, demarcación y semaforización	20 días	0	0,000%	0,000%	lun 6/07/26	mié 29/07/26	1007CC+160 días
1010	1.3.9.2.3.4	Fin de tramo 3	0 días	0	0,000%	0,000%	sáb 5/09/26	sáb 5/09/26	961;977;976;971;
1011	**1.3.9.2.4**	**Tramo 4 costado occidental calle 53-calle 63 (K7+970 - K8+980)**	**780,75 días**	**0**	**85,768%**	**95,000%**	**mar 20/02/24**	**sáb 5/09/26**	
1012	**1.3.9.2.4**	**Tramo 4 costado occidental calle 53-calle 63 (K7+970-K8+560) ETAPA 1**	**780,75 días**	**0**	**79,196%**	**95,000%**	**mar 20/02/24**	**sáb 5/09/26**	
1013	1.3.9.2.4.1	Inicio de tramo 4	0 días	0	0,000%	0,000%	mar 20/02/24	mar 20/02/24	2972CC+71 días
1014	**1.3.9.2.4.2**	**Estructura nueva**	**232,88 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**mar 20/02/24**	**vie 22/11/24**	
1015	1.3.9.2.4.2.1	Fresado	26 días	100	100,000%	100,000%	mar 20/02/24	mar 19/03/24	1013CC-1 día
1016	1.3.9.2.4.2.2	Excavaciones	36,25 días	100	100,000%	100,000%	mar 20/02/24	mié 3/04/24	1015CC
1017	1.3.9.2.4.2.3	Mejoramiento subrasante	36,25 días	100	100,000%	100,000%	mié 6/03/24	jue 18/04/24	1016CC+13 días
1018	1.3.9.2.4.2.4	Subbase granular reciclada	36,25 días	100	100,000%	100,000%	jue 11/04/24	jue 23/05/24	1017CC+28 días
1019	1.3.9.2.4.2.5	Capa antierosiva en mezcla asfaltica	35,75 días	100	100,000%	100,000%	vie 26/04/24	sáb 8/06/24	1018CC+13 días
1020	1.3.9.2.4.2.6	MR45 (incluye: acero, curado, juntas)	62,38 días	100	100,000%	100,000%	mié 11/09/24	vie 22/11/24	1019CC+110 días
1021	**1.3.9.2.4.2**	**Estructura nueva**	**84 días**	**0**	**84,097%**	**100,000%**	**mié 17/12/25**	**jue 26/03/26**	
1022	1.3.9.2.4.1.3.1	Fresado	9 días	100	100,000%	100,000%	mié 17/12/25	lun 29/12/25	1020FC+329 días
1023	1.3.9.2.4.2.2	Excavaciones	35 días	100	100,000%	100,000%	vie 19/12/25	vie 30/01/26	1020;1022CC+2 d
1024	1.3.9.2.4.2.3	Mejoramiento subrasante	36 días	100	100,000%	100,000%	vie 26/12/25	vie 6/02/26	1023CC+5 días
1025	1.3.9.2.4.2.4	Subbase granular reciclada	36 días	100	100,000%	100,000%	vie 2/01/26	vie 13/02/26	1024CC+6 días
1026	1.3.9.2.4.2.5	Capa antierosiva en mezcla asfaltica	30 días	100	100,000%	100,000%	jue 8/01/26	jue 12/02/26	1025CC+5 días
1027	1.3.9.2.4.2.6	MR45 (incluye: acero, curado, juntas)	61 días	100	65,164%	100,000%	jue 15/01/26	jue 26/03/26	1026CC+5 días
1028	**1.3.9.2.4.2**	**Estructura nueva**	**244,88 días**	**0**	**54,752%**	**82,675%**	**sáb 15/11/25**	**sáb 5/09/26**	
1029	1.3.9.2.4.1.4.1	Fresado	20 días	100	100,000%	100,000%	mié 4/02/26	jue 26/02/26	1022CC+40 días
1030	1.3.9.2.4.2.2	Excavaciones	30 días	100	69,167%	100,000%	jue 5/02/26	mié 11/03/26	1029CC+2 días;10
1031	1.3.9.2.4.2.3	Mejoramiento subrasante	30 días	100	52,500%	100,000%	mié 11/02/26	mar 17/03/26	1030CC+5 días
1032	1.3.9.2.4.2.4	Subbase granular reciclada	30 días	100	35,833%	100,000%	mar 17/02/26	mar 24/03/26	1031CC+5 días
1033	1.3.9.2.4.2.5	Capa antierosiva en mezcla asfaltica	30 días	100	19,167%	100,000%	lun 23/02/26	lun 30/03/26	1032CC+5 días
1034	1.3.9.2.4.2.6	MR45 (incluye: acero, curado, juntas)	0 días	100	100,000%	100,000%	sáb 15/11/25	sáb 15/11/25	1033CC-83 días
1035	1.3.9.2.4.2.7	Señalización, demarcación y semaforización	15 días	0	0,000%	0,000%	jue 20/08/26	sáb 5/09/26	843CC+5 días;947
1036	1.3.9.2.4.3	Fin de tramo 4	0 días	0	0,000%	0,000%	sáb 5/09/26	sáb 5/09/26	1035
1037	**1.3.9.2.4**	**Tramo 4 costado occidental calle 53-calle 63 (K8+560-K8+980) ETAPA 2**	**256,88 días**	**0**	**95,000%**	**95,000%**	**jue 2/10/25**	**jue 6/08/26**	
1038	1.3.9.2.4.1	Inicio de tramo 4	0 días	0	0,000%	0,000%	lun 27/04/26	lun 27/04/26	165FC-90 días
1039	**1.3.9.2.4.2**	**Estructura nueva**	**56 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**jue 2/10/25**	**mar 9/12/25**	
1040	1.3.9.2.4.2.1	Fresado	30 días	100	100,000%	100,000%	jue 2/10/25	vie 7/11/25	1020FC+266 días
1041	1.3.9.2.4.2.2	Excavaciones	30 días	100	100,000%	100,000%	mié 8/10/25	jue 13/11/25	1040CC+5 días
1042	1.3.9.2.4.2.3	Mejoramiento subrasante	30 días	100	100,000%	100,000%	mié 15/10/25	jue 20/11/25	1041CC+5 días
1043	1.3.9.2.4.2.4	Subbase granular reciclada	30,5 días	100	100,000%	100,000%	mar 21/10/25	mié 26/11/25	1042CC+5 días
1044	1.3.9.2.4.2.5	Capa antierosiva en mezcla asfaltica	31 días	100	100,000%	100,000%	lun 27/10/25	mar 2/12/25	1043CC+5 días
1045	1.3.9.2.4.2.6	MR45 (incluye: acero, curado, juntas)	30 días	100	100,000%	100,000%	sáb 1/11/25	mar 9/12/25	1044CC+6 días
1046	**1.3.9.2.4.2**	**Estructura nueva**	**218,88 días**	**0**	**55,312%**	**55,312%**	**mar 18/11/25**	**jue 6/08/26**	
1047	1.3.9.2.4.2.5	Capa antierosiva en mezcla asfaltica	0 días	100	100,000%	100,000%	mar 18/11/25	mar 18/11/25	1044CC+18 días
1048	1.3.9.2.4.2.6	MR45 (incluye: acero, curado, juntas)	2,5 días	100	100,000%	100,000%	jue 20/11/25	sáb 22/11/25	1047CC+2 días
1049	1.3.9.2.4.2.7	Señalización, demarcación y semaforización	15 días	0	0,000%	0,000%	mar 21/07/26	jue 6/08/26	843CC-20 días;94
1050	1.3.9.2.4.3	Fin de tramo 4	0 días	0	0,000%	0,000%	jue 6/08/26	jue 6/08/26	1049;1038
1051	**1.3.9.2.5**	**Tramo 5 costado oriental calle 46-calle 53 (K7+915 - K7+970)**	**325 días**	**0**	**72,013%**	**72,013%**	**mié 4/06/25**	**jue 25/06/26**	
1052	1.3.9.2.5.1	Inicio de tramo 5	0 días	0	0,000%	0,000%	jue 8/01/26	jue 8/01/26	1027CC-5 días;10
1053	1.3.9.2.5.2	Fresado	20 días	100	100,000%	100,000%	mié 4/06/25	vie 27/06/25	1052FC-184 días
1054	1.3.9.2.5.3	Excavaciones	31 días	100	100,000%	100,000%	sáb 21/06/25	mar 29/07/25	1053CC+16 días
1055	1.3.9.2.5.4	Mejoramiento subrasante	21 días	100	100,000%	100,000%	vie 11/07/25	lun 4/08/25	1054CC+15 días
1056	1.3.9.2.5.5	Subbase granular reciclada	30 días	100	100,000%	100,000%	mar 29/07/25	mié 3/09/25	1055CC+16 días
1057	1.3.9.2.5.6	Capa antierosiva en mezcla asfaltica	29 días	100	100,000%	100,000%	sáb 16/08/25	vie 19/09/25	1056CC+15,6 días
1058	1.3.9.2.5.7	MR45(incluye: acero, curado, juntas)	25 días	100	100,000%	100,000%	jue 4/09/25	jue 2/10/25	1057CC+15 días
1059	**1.3.9.2.5.8**	**Estructura Nueva**	**24 días**	**0**	**0,000%**	**0,000%**	**jue 7/05/26**	**jue 4/06/26**	
1060	1.3.9.2.5.2	Fresado	21 días	0	0,000%	0,000%	jue 7/05/26	lun 1/06/26	1052CC+100 días
1061	1.3.9.2.5.3	Excavaciones	10 días	0	0,000%	0,000%	jue 7/05/26	mar 19/05/26	1052CC+100 días
1062	1.3.9.2.5.4	Mejoramiento subrasante	10 días	0	0,000%	0,000%	lun 11/05/26	vie 22/05/26	1061CC+3 días
1063	1.3.9.2.5.5	Subbase granular reciclada	10 días	0	0,000%	0,000%	mié 13/05/26	mar 26/05/26	1062CC+3 días
1064	1.3.9.2.5.6	Capa antierosiva en mezcla asfaltica	10 días	0	0,000%	0,000%	mié 20/05/26	lun 1/06/26	1063CC+5 días;28
1065	1.3.9.2.5.7	MR45(incluye: acero, curado, juntas)	10 días	0	0,000%	0,000%	sáb 23/05/26	jue 4/06/26	1064CC+3 días
1066	1.3.9.2.5.8	Señalización, demarcación y semaforización	15 días	0	0,000%	0,000%	sáb 6/06/26	jue 25/06/26	1065CC+12 días
1067	1.3.9.2.5.9	Fin de tramo 5	0 días	0	0,000%	0,000%	jue 25/06/26	jue 25/06/26	1066;1060
1068	**1.3.9.2.6**	**Tramo 6 costado occidental calle 46-calle 53 (K7+915 - K7+970)**	**265 días**	**0**	**46,272%**	**46,272%**	**mar 19/08/25**	**mar 30/06/26**	
1069	1.3.9.2.6.1	Inicio de tramo 6	0 días	0	0,000%	0,000%	mié 25/02/26	mié 25/02/26	1058FC-83 días;1

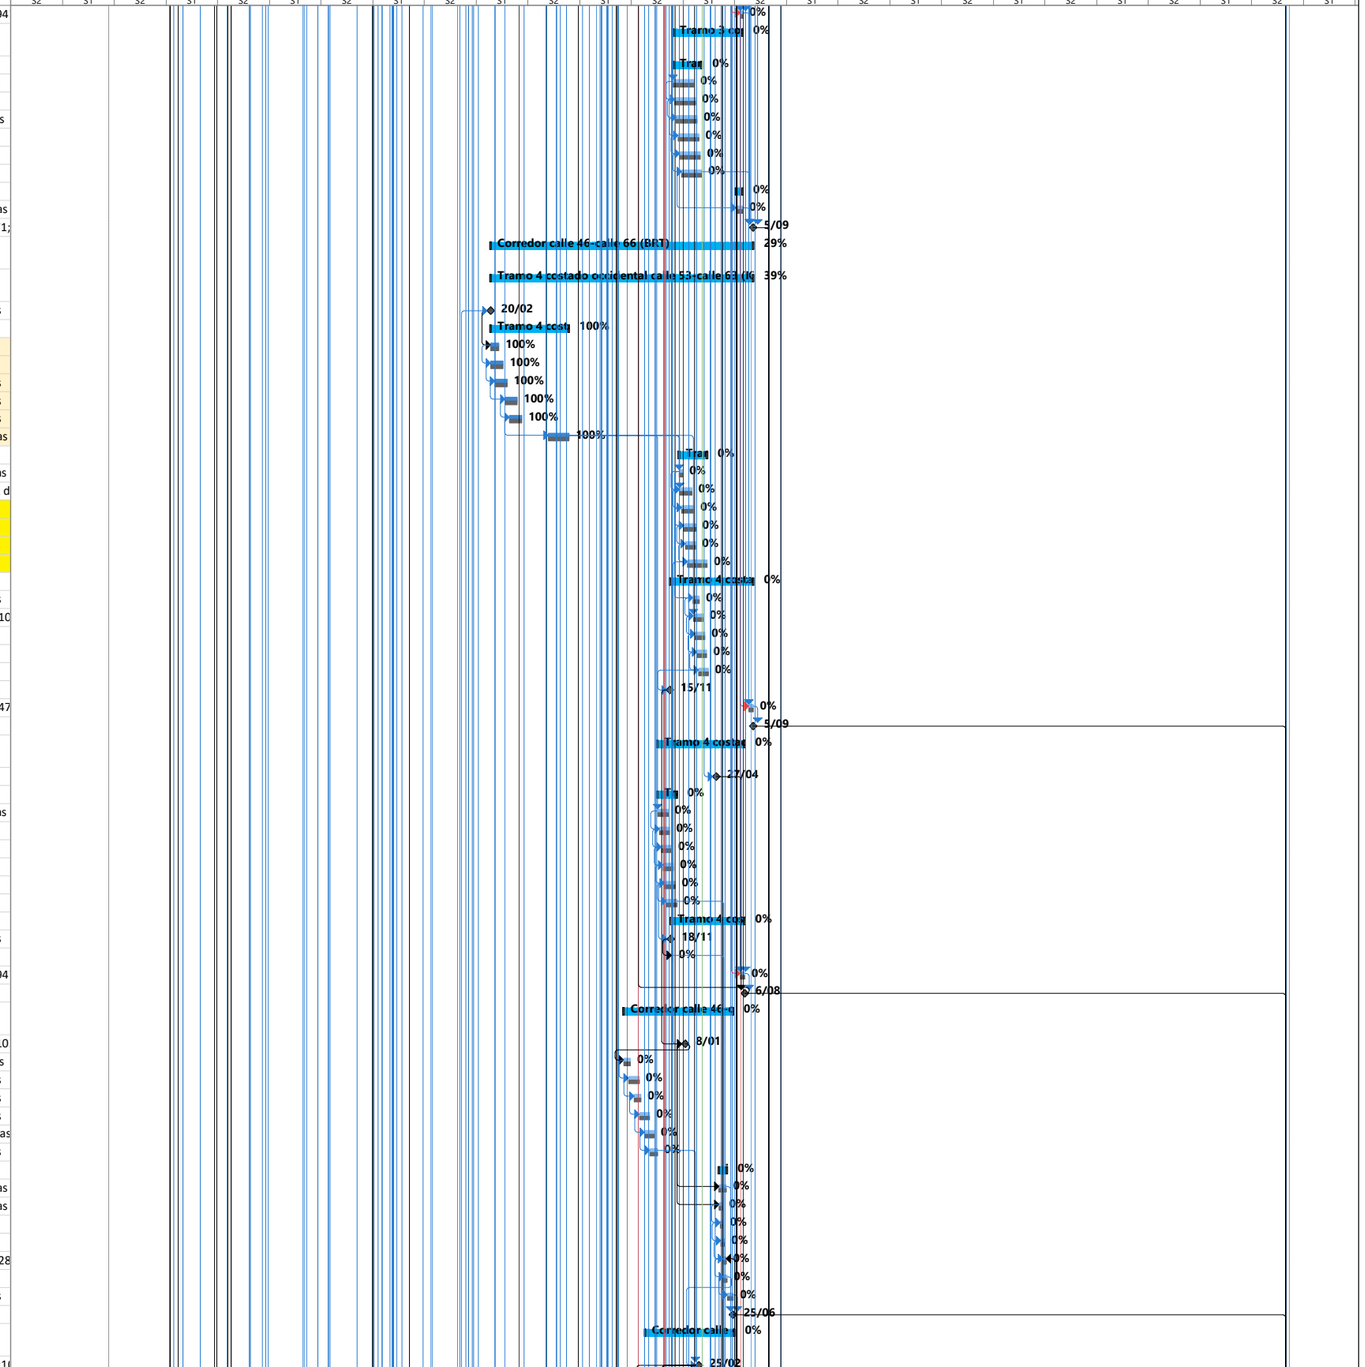


Tareas críticas · Tarea · Tarea manual · solo duración · Hito de línea base · Resumen · Tareas externas · Hito inactivo
División crítica · División · solo el comienzo · Línea base · Hito · Resumen manual · Hito externo · Resumen inactivo
Progreso de tarea crítica · Progreso de tarea · solo fin · División de la línea base · Progreso del resumen · Resumen del proyecto · Tarea inactiva · Fecha límite

Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	% Avance Conciliado	% Avance Programado (% PV)	% Avance Ejecutado conciliado (% EV))	Comienzo	Fin	Predecesoras
1070	1.3.9.2.6.2	Fresado	20 días	100	100,000%	100,000%	mar 19/08/25	mié 10/09/25	1069CC-162 días
1071	1.3.9.2.6.3	Excavaciones	35 días	100	100,000%	100,000%	lun 25/08/25	jue 2/10/25	1070CC+5 días
1072	1.3.9.2.6.4	Mejoramiento subrasante	36 días	100	100,000%	100,000%	sáb 30/08/25	jue 9/10/25	1071CC+5,5 días
1073	**1.3.9.2.6.5**	**Estructura Nueva**	**187 días**	**0**	**41,338%**	**41,338%**	**mar 18/11/25**	**mar 30/06/26**	
1074	1.3.9.2.6.2	Fresado	10 días	100	100,000%	100,000%	mar 18/11/25	vie 28/11/25	1069CC-84 días
1075	1.3.9.2.6.3	Excavaciones	15 días	100	100,000%	100,000%	mar 18/11/25	jue 4/12/25	1069CC-84 días
1076	1.3.9.2.6.4	Mejoramiento subrasante	15 días	100	100,000%	100,000%	mar 18/11/25	jue 4/12/25	1069CC-84 días
1077	1.3.9.2.6.5	Subbase granular reciclada	15 días	100	100,000%	100,000%	sáb 22/11/25	mié 10/12/25	1076CC+4,5 días
1078	1.3.9.2.6.6	Capa antierosiva en mezcla asfaltica	15 días	100	100,000%	100,000%	sáb 22/11/25	mié 10/12/25	1076CC+4,5 días
1079	1.3.9.2.6.7	MR45 (incluye: acero, curado, juntas)	14 días	100	100,000%	100,000%	jue 27/11/25	lun 15/12/25	1078CC+4,5 días
1080	1.3.9.2.6.2	Fresado	10 días	0	0,000%	0,000%	lun 9/03/26	jue 19/03/26	1069CC+10 días
1081	1.3.9.2.6.3	Excavaciones	15 días	0	0,000%	0,000%	mié 1/04/26	lun 20/04/26	1069CC+30 días
1082	1.3.9.2.6.4	Mejoramiento subrasante	15 días	0	0,000%	0,000%	mié 1/04/26	lun 20/04/26	1069CC+30 días
1083	1.3.9.2.6.5	Subbase granular reciclada	15 días	0	0,000%	0,000%	mié 8/04/26	vie 24/04/26	1082CC+4 días
1084	1.3.9.2.6.6	Capa antierosiva en mezcla asfaltica	15 días	0	0,000%	0,000%	jue 9/04/26	lun 27/04/26	1082CC+6 días
1085	1.3.9.2.6.7	MR45 (incluye: acero, curado, juntas)	15 días	0	0,000%	0,000%	mié 15/04/26	lun 4/05/26	1084CC+5 días
1086	1.3.9.2.6.8	Señalización, demarcación y semaforización	10 días	0	0,000%	0,000%	jue 18/06/26	mar 30/06/26	1065CC+20 días
1087	1.3.9.2.6.9	Fin de tramo 6	0 días	0	0,000%	0,000%	mar 30/06/26	mar 30/06/26	1086;1079;1072;1
1088	**1.3.9.3**	**Bocacalles**	**1060,38 días**	**0**	**28,521%**	**25,321%**	**vie 24/03/23**	**mié 9/09/26**	
1089	**1.3.9.3.1**	**Tramo 3 costado occidental calle 63-calle 66**	**185 días**	**0**	**5,333%**	**0,000%**	**mar 28/10/25**	**vie 5/06/26**	
1090	1.3.9.3.1.1	Inicio de tramo 3	0 días	0	0,000%	0,000%	mar 28/10/25	mar 28/10/25	85FC+10 días
1091	**1.3.9.3.1.2**	**Bocacalle calle 64 C**	**85 días**	**0**	**5,333%**	**0,000%**	**mié 25/02/26**	**vie 5/06/26**	
1092	1.3.9.3.1.2.1	Fresado	15 días	0	26,667%	0,000%	mié 25/02/26	vie 13/03/26	1090CC+100 días
1093	1.3.9.3.1.2.2	Excavaciones	20 días	0	0,000%	0,000%	lun 2/03/26	mié 25/03/26	1092CC+5 días
1094	1.3.9.3.1.2.3	Mejoramiento subrasante	25 días	0	0,000%	0,000%	sáb 7/03/26	mié 8/04/26	1093CC+5 días
1095	1.3.9.3.1.2.4	Subbase granular reciclada	25 días	0	0,000%	0,000%	vie 13/03/26	mar 14/04/26	1094CC+5 días
1096	1.3.9.3.1.2.5	Material granular estabilizada con asfalto	25 días	0	0,000%	0,000%	jue 19/03/26	lun 20/04/26	1095CC+5 días
1097	**1.3.9.3.1.2.6**	**Carpeta asfáltica**	**20 días**	**0**	**0,000%**	**0,000%**	**lun 20/04/26**	**mié 13/05/26**	
1098	1.3.9.3.1.2.6.1	Base asfáltica	15 días	0	0,000%	0,000%	lun 20/04/26	jue 7/05/26	1092;1093;1094;1
1099	1.3.9.3.1.2.6.2	Rodadura	15 días	0	0,000%	0,000%	sáb 25/04/26	mié 13/05/26	1098CC+5 días
1100	1.3.9.3.1.2.7	Señalización, demarcación y semaforización	10 días	0	0,000%	0,000%	mar 26/05/26	vie 5/06/26	1099FC+10 días
1101	1.3.9.3.1.3	Fin de tramo 3	0 días	0	0,000%	0,000%	vie 5/06/26	vie 5/06/26	1100;1045;1048
1102	**1.3.9.3.2**	**Tramo 5 costado occidental y oriental calle 46-calle 53**	**1060,38 días**	**0**	**63,303%**	**63,303%**	**vie 24/03/23**	**mié 9/09/26**	
1103	1.3.9.3.2.1	PMT Bocacalle Occidenta Norte Etapa 1	0 días	0	0,000%	0,000%	vie 24/03/23	vie 24/03/23	8FC+625 días
1104	1.3.9.3.2.2	PMT Bocacalle Occidental Sur Etapa 2	0 días	0	0,000%	0,000%	vie 24/03/23	vie 24/03/23	1103CC
1105	1.3.9.3.2.3	PMT Bocacalle Oriental calle 53 Norte Etapa 1	0 días	0	0,000%	0,000%	vie 14/04/23	vie 14/04/23	175FC-472 días;1
1106	1.3.9.3.2.4	PMT Bocacalle Oriental calle 53 Sur Etapa 2	0 días	0	0,000%	0,000%	vie 4/08/23	vie 4/08/23	8FC+731 días
1107	**1.3.9.3.2**	**Tramo 5 costado occidental calle 47 Norte**	**1036,38 días**	**0**	**16,421%**	**16,421%**	**sáb 22/04/23**	**mar 8/09/26**	
1108	**1.3.9.3.2.2**	**Bocacalle calle 47**	**1036,38 días**	**0**	**16,421%**	**16,421%**	**sáb 22/04/23**	**mar 8/09/26**	
1109	1.3.9.3.2.2.1	Fresado	20,38 días	100	100,000%	100,000%	sáb 22/04/23	mar 16/05/23	1103CC+22 días
1110	1.3.9.3.2.5.1.2	Fresado	20 días	0	0,000%	0,000%	mié 22/07/26	vie 14/08/26	150FC+145 días
1111	1.3.9.3.2.2.2	Excavaciones	3 días	0	0,000%	0,000%	sáb 15/08/26	jue 20/08/26	2860CC;1109;111
1112	1.3.9.3.2.2.3	Mejoramiento subrasante	3 días	0	0,000%	0,000%	vie 21/08/26	mar 25/08/26	1111FC+1 día
1113	1.3.9.3.2.2.4	Subbase granular reciclada	3 días	0	0,000%	0,000%	mié 26/08/26	vie 28/08/26	1112FC+1 día
1114	1.3.9.3.2.2.5	Material granular estabilizada con asfalto	4 días	0	0,000%	0,000%	lun 31/08/26	jue 3/09/26	1113FC+1 día
1115	**1.3.9.3.2.2.6**	**Carpeta asfáltica**	**3 días**	**0**	**0,000%**	**0,000%**	**vie 4/09/26**	**mar 8/09/26**	
1116	1.3.9.3.2.2.6.1	Base asfáltica	1 día	0	0,000%	0,000%	vie 4/09/26	sáb 5/09/26	1114FC+1 día
1117	1.3.9.3.2.2.6.2	Rodadura	1 día	0	0,000%	0,000%	lun 7/09/26	mar 8/09/26	1116FC+1 día
1118	**1.3.9.3.2**	**Tramo 5 costado occidental calle 47 Sur**	**1037,5 días**	**0**	**55,487%**	**55,487%**	**sáb 22/04/23**	**mié 9/09/26**	
1119	**1.3.9.3.2.2**	**Bocacalle calle 47**	**1037,5 días**	**0**	**55,487%**	**55,487%**	**sáb 22/04/23**	**mié 9/09/26**	
1120	1.3.9.3.2.2.1	Fresado	92,63 días	100	100,000%	100,000%	sáb 22/04/23	sáb 12/08/23	1103CC+22 días
1121	1.3.9.3.2.6.1.2	Fresado	92 días	100	100,000%	100,000%	lun 29/09/25	lun 19/01/26	175FC+267 días;1
1122	1.3.9.3.2.2.2	Excavaciones	93 días	100	100,000%	100,000%	mié 11/06/25	sáb 27/09/25	1120FC+563 días
1123	1.3.9.3.2.2.3	Mejoramiento subrasante	92 días	100	100,000%	100,000%	lun 29/09/25	lun 19/01/26	1122CC+94 días
1124	1.3.9.3.2.2.4	Subbase granular reciclada	1 día	100	100,000%	100,000%	mar 20/01/26	mié 21/01/26	1123CC+93 días
1125	1.3.9.3.2.2.5	Material granular estabilizada con asfalto	1 día	100	100,000%	100,000%	jue 22/01/26	vie 23/01/26	1124FC+1 día
1126	1.3.9.3.2.2.2	Excavaciones	80 días	0	0,000%	0,000%	mar 26/05/26	lun 31/08/26	1121CC+200 días
1127	1.3.9.3.2.2.3	Mejoramiento subrasante	80 días	0	0,000%	0,000%	jue 28/05/26	mié 2/09/26	1126CC+2 días
1128	1.3.9.3.2.2.4	Subbase granular reciclada	75 días	0	0,000%	0,000%	mar 2/06/26	mié 2/09/26	1127CC+5 días
1129	1.3.9.3.2.2.5	Material granular estabilizada con asfalto	1 día	0	0,000%	0,000%	vie 4/09/26	vie 4/09/26	1128FC+2 días
1130	**1.3.9.3.2.2.6**	**Carpeta asfáltica**	**3 días**	**0**	**0,000%**	**0,000%**	**sáb 5/09/26**	**mié 9/09/26**	
1131	1.3.9.3.2.2.6.1	Base asfáltica	1 día	0	0,000%	0,000%	sáb 5/09/26	lun 7/09/26	1125FC+0,5 días;1
1132	1.3.9.3.2.2.6.2	Rodadura	1 día	0	0,000%	0,000%	mar 8/09/26	mié 9/09/26	1131FC+1 día
1133	**1.3.9.3.2**	**Tramo 5 costado oriental calle 46-calle 53 Norte**	**825,75 días**	**0**	**98,105%**	**98,105%**	**mar 2/01/24**	**mar 8/09/26**	
1134	**1.3.9.3.2.2**	**Bocacalle calle 53**	**825,75 días**	**0**	**98,105%**	**98,105%**	**mar 2/01/24**	**mar 8/09/26**	
1135	1.3.9.3.2.2.1	Fresado	1 día	100	100,000%	100,000%	mar 2/01/24	mar 2/01/24	1103FC+226 días
1136	1.3.9.3.2.2.2	Excavaciones	1,63 días	100	100,000%	100,000%	vie 5/01/24	sáb 6/01/24	1135FC+2 días
1137	1.3.9.3.2.2.3	Mejoramiento subrasante	0,5 días	100	100,000%	100,000%	sáb 6/01/24	sáb 6/01/24	1136CC+1 día
1138	1.3.9.3.2.2.4	Subbase granular reciclada	0,5 días	100	100,000%	100,000%	sáb 13/01/24	sáb 13/01/24	1137CC+5 días
1139	1.3.9.3.2.2.5	Material granular estabilizada con asfalto	1 día	100	100,000%	100,000%	vie 26/04/24	vie 26/04/24	1138CC+86 días
1140	1.3.9.3.2.2.5	Material granular estabilizada con asfalto	1 día	100	100,000%	100,000%	mar 7/01/25	mié 8/01/25	175CC+60 días;11
1141	**1.3.9.3.2.2.6**	**Carpeta asfáltica**	**3 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**jue 11/12/25**	**lun 15/12/25**	
1142	1.3.9.3.2.2.6.1	Base asfáltica	1 día	100	100,000%	100,000%	jue 11/12/25	vie 12/12/25	1140FC+287 días
1143	1.3.9.3.2.2.6.2	Rodadura	1 día	100	100,000%	100,000%	sáb 13/12/25	lun 15/12/25	1142FC+1 día
1144	**1.3.9.3.2.2.6**	**Carpeta asfáltica**	**3 días**	**0**	**0,000%**	**0,000%**	**vie 4/09/26**	**mar 8/09/26**	

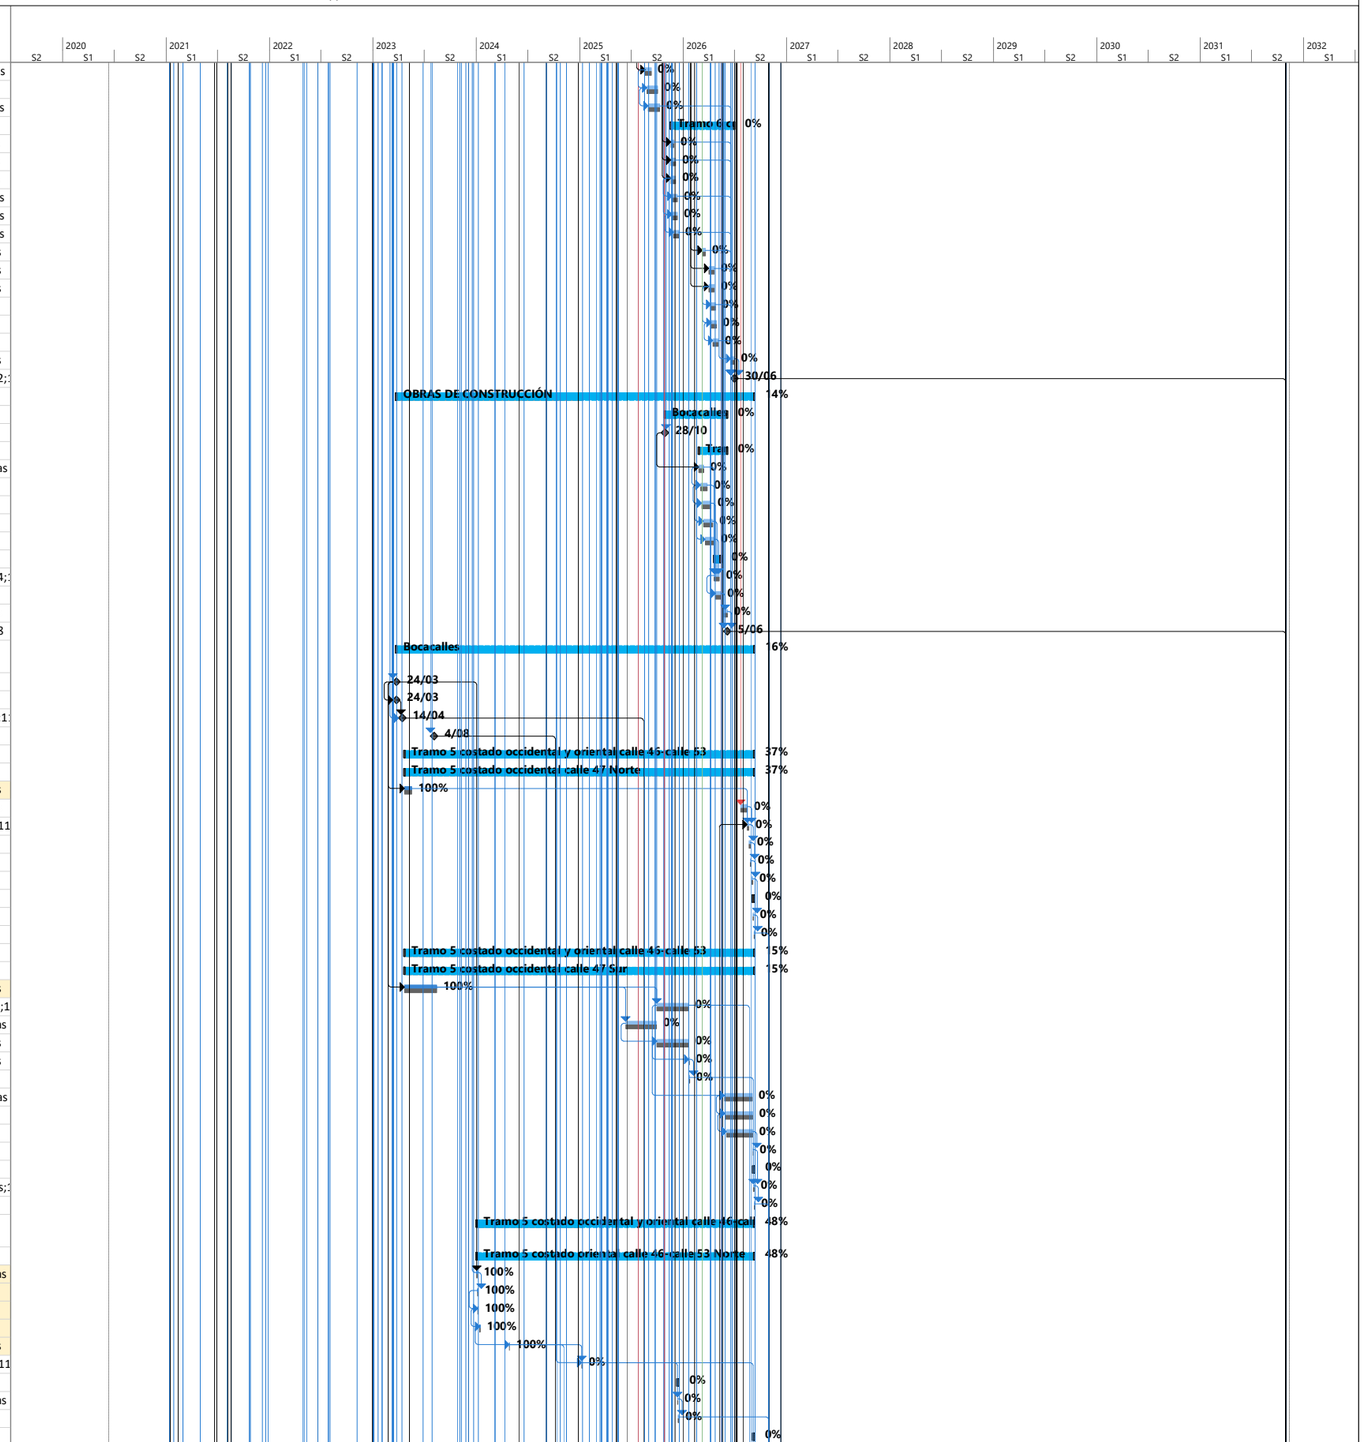


Tareas críticas · Tarea · Tarea manual · solo duración · Hito de línea base · Resumen · Tareas externas · Hito inactivo
División crítica · División · solo el comienzo · Línea base · Hito · Resumen manual · Hito externo · Resumen inactivo
Progreso de tarea crítica · Progreso de tarea · solo fin · División de la línea base · Progreso del resumen · Resumen del proyecto · Tarea inactiva · Fecha límite

Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	% Avance Conciliado	% Avance Programado (% PV)	% Avance Ejecutado conciliado (% EV))	Comienzo	Fin	Predecesoras
1145	1.3.9.3.2.2.6.1	Base asfáltica	1 día	0	0,000%	0,000%	vie 4/09/26	lun 7/09/26	1140FC+510 días
1146	1.3.9.3.2.2.6.2	Rodadura	1 día	0	0,000%	0,000%	mar 8/09/26	mar 8/09/26	1145FC+1 día
1147	**1.3.9.3.2**	**Tramo 5 costado oriental calle 46-calle 53 Sur**	**551,5 días**	**0**	**96,526%**	**96,526%**	**mar 5/11/24**	**lun 24/08/26**	
1148	**1.3.9.3.2.2**	**Bocacalle calle 53**	**292 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**mar 5/11/24**	**mié 15/10/25**	
1149	1.3.9.3.2.2.1	Fresado	1 día	100	100,000%	100,000%	mar 5/11/24	mar 5/11/24	1139FC+154 días
1150	1.3.9.3.2.2.2	Excavaciones	4 días	100	100,000%	100,000%	mié 30/04/25	mar 6/05/25	1149FC+149 días
1151	1.3.9.3.2.2.3	Mejoramiento subrasante	4 días	100	100,000%	100,000%	mié 7/05/25	lun 12/05/25	1150FC+1 día
1152	1.3.9.3.2.2.4	Subbase granular reciclada	4,5 días	100	100,000%	100,000%	mar 13/05/25	sáb 17/05/25	1151FC+1 día
1153	1.3.9.3.2.2.5	Material granular estabilizada con asfalto	4,5 días	100	100,000%	100,000%	jue 9/10/25	mié 15/10/25	1152FC+123 días
1154	**1.3.9.3.2.2.6**	**Carpeta asfáltica**	**11 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**sáb 24/05/25**	**vie 6/06/25**	
1155	1.3.9.3.2.2.6.1	Base asfáltica	4 días	100	100,000%	100,000%	sáb 24/05/25	jue 29/05/25	1153FC-121,4 día
1156	1.3.9.3.2.2.6.2	Rodadura	6 días	100	100,000%	100,000%	vie 30/05/25	vie 6/06/25	1155FC+1 día
1157	**1.3.9.3.2.8.2**	**Estructura Nueva**	**17 días**	**0**	**0,000%**	**0,000%**	**sáb 1/08/26**	**lun 24/08/26**	
1158	1.3.9.3.2.2.5	Material granular estabilizada con asfalto	5 días	0	0,000%	0,000%	sáb 1/08/26	sáb 8/08/26	1152FC+370 días
1159	**1.3.9.3.2.2.6**	**Carpeta asfáltica**	**9,5 días**	**0**	**0,000%**	**0,000%**	**mar 11/08/26**	**lun 24/08/26**	
1160	1.3.9.3.2.2.6.1	Base asfáltica	4 días	0	0,000%	0,000%	mar 11/08/26	sáb 15/08/26	1153FC+250 días
1161	1.3.9.3.2.2.6.2	Rodadura	4,5 días	0	0,000%	0,000%	mar 18/08/26	lun 24/08/26	1160FC+1 día
1162	1.3.9.3.2.2.7	Señalización, demarcación y semaforización	11 días	0	0,000%	0,000%	lun 24/08/26	vie 4/09/26	1156;1161
1163	1.3.9.3.2.3	Fin de tramo 5	0 días	0	0,000%	0,000%	vie 4/09/26	vie 4/09/26	1162;1121;1158;
1164	**1.3.9.4**	**Espacio público zonas duras**	**1341,75 días**	**0**	**62,244%**	**63,317%**	**vie 29/04/22**	**mié 9/09/26**	
1165	**1.3.9.4.1**	**Tramo 1 costado oriental Calle 63-calle 66 (K8+980 - K9+760)**	**1331,63 días**	**0**	**66,949%**	**78,224%**	**vie 29/04/22**	**vie 28/08/26**	
1166	**1.3.9.4.1**	**Tramo 1A costado oriental Calle 63-calle 66 (K8+980 - K9+250) TRIANGULO**	**1331,63 días**	**0**	**95,517%**	**99,426%**	**vie 29/04/22**	**vie 28/08/26**	
1167	1.3.9.4.1.1	Inicio de tramo 1	1 día	100	0,000%	0,000%	vie 29/04/22	vie 29/04/22	8FC+354 días
1168	1.3.9.4.1.2	Demolición de andenes existentes	476,88 días	100	100,000%	100,000%	mié 18/05/22	lun 4/12/23	1167FC+15 días
1169	1.3.9.4.1.3	Excavaciones	482,5 días	100	100,000%	100,000%	lun 6/06/22	vie 29/12/23	1168CC+15 días
1170	1.3.9.4.1.4	Mejoramiento subrasante	482 días	100	100,000%	100,000%	vie 24/06/22	jue 18/01/24	1169CC+15 días
1171	1.3.9.4.1.5	Subbase granular reciclada	777 días	100	100,000%	100,000%	jue 14/07/22	mar 21/01/25	1170CC+15 días
1172	1.3.9.4.1.6	Bordillos y sardineles	777 días	100	100,000%	100,000%	sáb 23/07/22	mié 29/01/25	1171CC+7 días
1173	1.3.9.4.1.7	Acabados de pisos	777 días	100	100,000%	100,000%	lun 1/08/22	jue 6/02/25	1172CC+7 días
1174	1.3.9.4.1.2	Demolición de andenes existentes	30 días	100	95,833%	100,000%	mié 28/01/26	mar 3/03/26	1866FC-137 días
1175	1.3.9.4.1.4	Mejoramiento subrasante	30 días	100	79,167%	100,000%	mar 3/02/26	sáb 7/03/26	1174CC+5 días
1176	1.3.9.4.1.6	Bordillos y sardineles	40 días	100	29,375%	100,000%	lun 16/02/26	lun 6/04/26	1175CC+12 días
1177	1.3.9.4.1.7	Acabados de pisos	40 días	100	11,875%	100,000%	mar 24/02/26	lun 13/04/26	1176CC+7 días
1178	1.3.9.4.1.2	Demolición de andenes existentes	25 días	0	0,000%	0,000%	jue 16/07/26	sáb 15/08/26	1866FC+5 días
1179	1.3.9.4.1.4	Mejoramiento subrasante	25 días	0	0,000%	0,000%	vie 17/07/26	mié 19/08/26	1178CC+2 días
1180	1.3.9.4.1.6	Bordillos y sardineles	30 días	0	0,000%	0,000%	mié 22/07/26	mié 26/08/26	1179CC+2 días
1181	1.3.9.4.1.7	Acabados de pisos	30 días	0	0,000%	0,000%	jue 23/07/26	vie 28/08/26	1180CC+2 días
1182	**1.3.9.4.1**	**Tramo 1B costado oriental Calle 63-calle 66 (K9+350 - K9+430)**	**951 días**	**0**	**66,925%**	**99,980%**	**jue 22/06/23**	**lun 27/07/26**	
1183	1.3.9.4.1.1	Inicio de tramo 1	0 días	100	0,000%	0,000%	jue 22/06/23	jue 22/06/23	1855CC-118 días
1184	1.3.9.4.1.2	Demolición de andenes existentes	7,25 días	100	100,000%	100,000%	jue 22/06/23	jue 29/06/23	1183CC
1185	1.3.9.4.1.3	Excavaciones	7,25 días	100	100,000%	100,000%	jue 22/06/23	jue 29/06/23	1184CC
1186	1.3.9.4.1.4	Mejoramiento subrasante	6,75 días	100	100,000%	100,000%	vie 30/06/23	sáb 8/07/23	1185
1187	1.3.9.4.1.5	Subbase granular reciclada	7,25 días	100	100,000%	100,000%	mar 5/09/23	mar 12/09/23	1186FC+46 días
1188	1.3.9.4.1.6	Bordillos y sardineles	10,13 días	100	100,000%	100,000%	mar 18/07/23	sáb 29/07/23	1186CC+14 días
1189	1.3.9.4.1.7	Acabados de pisos	20,88 días	100	100,000%	100,000%	mar 6/08/24	vie 30/08/24	1188FC+301 días;
1190	1.3.9.4.1.2	Demolición de andenes existentes	7 días	100	0,000%	100,000%	mié 4/03/26	jue 12/03/26	1174CC+32 días
1191	1.3.9.4.1.3	Excavaciones	6 días	100	0,000%	100,000%	vie 13/03/26	vie 20/03/26	1190CC+8 días
1192	1.3.9.4.1.4	Mejoramiento subrasante	6 días	100	0,000%	100,000%	sáb 21/03/26	lun 30/03/26	1191CC+7 días
1193	1.3.9.4.1.5	Subbase granular reciclada	6 días	100	0,000%	100,000%	mar 31/03/26	mié 8/04/26	1192FC+1 día
1194	1.3.9.4.1.6	Bordillos y sardineles	10 días	100	0,000%	100,000%	jue 9/04/26	mar 21/04/26	1193FC+1 día
1195	1.3.9.4.1.7	Acabados de pisos	20 días	100	0,000%	100,000%	mar 21/04/26	jue 14/05/26	1194
1196	1.3.9.4.1.7	Acabados de pisos	1,13 días	100	0,000%	100,000%	lun 20/04/26	mar 21/04/26	1194FC-1 día
1197	1.3.9.4.1.7	Acabados de pisos	20 días	0	0,000%	0,000%	vie 3/07/26	lun 27/07/26	1194FC+60 días
1198	1.3.9.4.1.2.16	Fin de tramo 1	0 días	0	0,000%	0,000%	lun 27/07/26	lun 27/07/26	1189;1195;1196;
1199		**Tramo 1C costado oriental Calle 63-calle 66 (K9+430 - K9+560)**	**952,88 días**	**0**	**2,900%**	**35,435%**	**mié 28/06/23**	**mar 4/08/26**	
1200	1.3.9.4.1.1	Inicio de tramo 1	0 días	100	0,000%	0,000%	mié 28/06/23	mié 28/06/23	1183CC+6 días
1201	1.3.9.4.1.2	Demolición de andenes existentes	5 días	100	0,000%	100,000%	vie 13/03/26	jue 19/03/26	1190FC+1 día
1202	1.3.9.4.1.3	Excavaciones	7,25 días	100	100,000%	100,000%	mié 28/06/23	jue 6/07/23	1200CC-1 día
1203	1.3.9.4.1.3	Excavaciones	7 días	100	0,000%	100,000%	mar 17/03/26	jue 26/03/26	1201CC+3 días;12
1204	1.3.9.4.1.4	Mejoramiento subrasante	7 días	100	0,000%	100,000%	vie 27/03/26	mar 7/04/26	1203FC+1 día
1205	1.3.9.4.1.5	Subbase granular reciclada	7 días	100	0,000%	100,000%	lun 6/04/26	lun 13/04/26	1204FC-1 día
1206	1.3.9.4.1.6	Bordillos y sardineles	9 días	100	0,000%	100,000%	lun 13/04/26	mié 22/04/26	1205FC-1 día
1207	1.3.9.4.1.7	Acabados de pisos	20 días	100	0,000%	100,000%	mar 21/04/26	jue 14/05/26	1206FC-1 día
1208	1.3.9.4.1.3	Excavaciones	7 días	0	0,000%	0,000%	sáb 6/06/26	mié 17/06/26	1201CC+70 días;1
1209	1.3.9.4.1.4	Mejoramiento subrasante	7 días	0	0,000%	0,000%	jue 18/06/26	jue 25/06/26	1208FC+1 día
1210	1.3.9.4.1.5	Subbase granular reciclada	7 días	0	0,000%	0,000%	mié 24/06/26	vie 3/07/26	1209FC-1 día
1211	1.3.9.4.1.6	Bordillos y sardineles	9 días	0	0,000%	0,000%	jue 2/07/26	lun 13/07/26	1210FC-1 día
1212	1.3.9.4.1.7	Acabados de pisos	20 días	0	0,000%	0,000%	sáb 11/07/26	mar 4/08/26	1211FC-1 día
1213	1.3.9.4.1.3.14	Fin de tramo 1	0 días	0	0,000%	0,000%	mar 4/08/26	mar 4/08/26	1207;1212
1214	**1.3.9.4.1**	**Tramo 1D costado oriental Calle 63-calle 66 (K9+560 - K9+760)**	**885,75 días**	**0**	**96,802%**	**100,000%**	**mar 25/04/23**	**mié 11/03/26**	
1215	1.3.9.4.1.1	Inicio de tramo 1	1 día	100	0,000%	0,000%	mar 25/04/23	mar 25/04/23	1183CC-46 días
1216	1.3.9.4.1.2	Demolición de andenes existentes	5 días	100	100,000%	100,000%	mar 25/04/23	sáb 29/04/23	1215CC

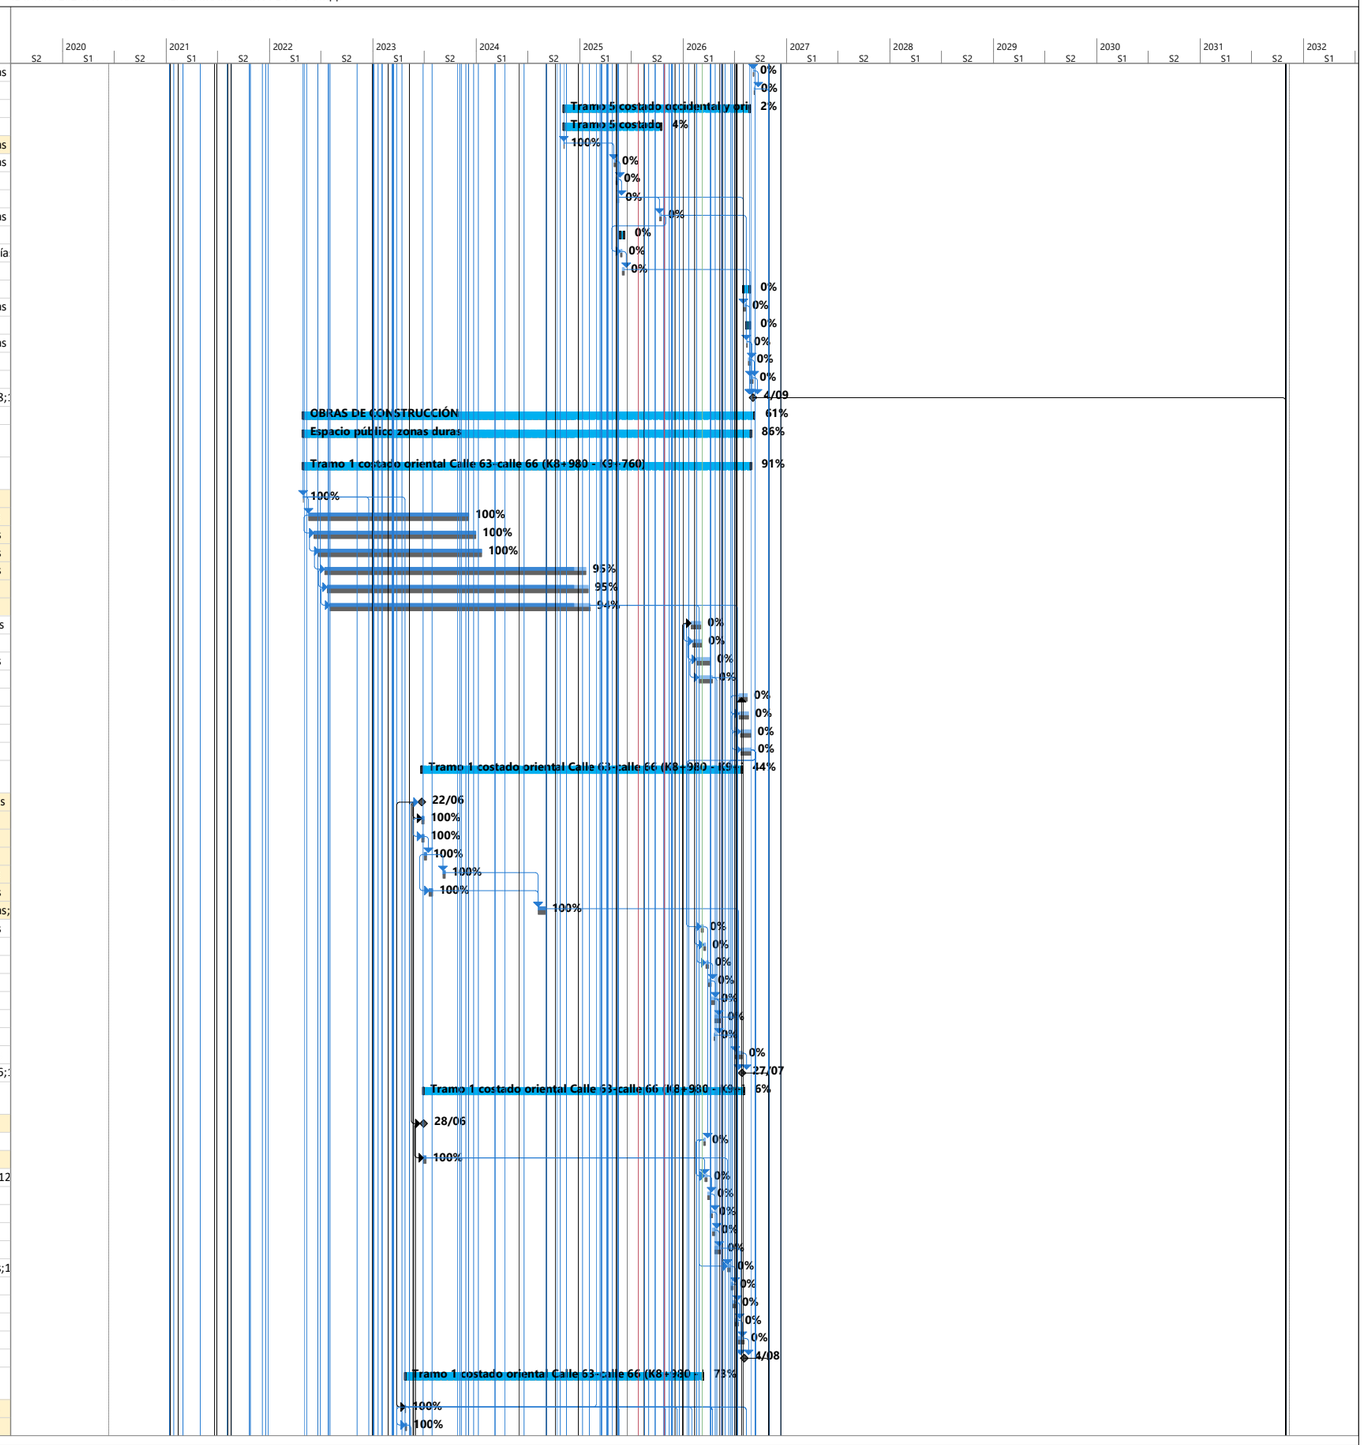


Tareas críticas | Tarea | Tarea manual | solo duración | Hito de línea base | Resumen | Tareas externas | Hito inactivo
División crítica | División | solo el comienzo | Línea base | Hito | Resumen manual | Hito externo | Resumen inactivo
Progreso de tarea crítica | Progreso de tarea | solo fin | División de la línea base | Progreso del resumen | Resumen del proyecto | Tarea inactiva | Fecha límite

Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	% Avance Conciliado	% Avance Programado (% PV)	% Avance Ejecutado conciliado (% EV))	Comienzo	Fin	Predecesoras
1217	1.3.9.4.1.3	Excavaciones	7,25 días	100	100,000%	100,000%	mar 2/05/23	mar 9/05/23	1216
1218	1.3.9.4.1.4	Mejoramiento subrasante	7,25 días	100	100,000%	100,000%	mar 27/06/23	mié 5/07/23	1217CC+45 días
1219	1.3.9.4.1.5	Subbase granular reciclada	7,25 días	100	100,000%	100,000%	mar 22/08/23	mar 29/08/23	1218FC+37 días
1220	1.3.9.4.1.6	Bordillos y sardineles	10,13 días	100	100,000%	100,000%	jue 29/06/23	mar 11/07/23	1218CC+2 días
1221	1.3.9.4.1.7	Acabados de pisos	24,25 días	100	100,000%	100,000%	lun 4/09/23	vie 29/09/23	1219FC+4 días;12
1222	1.3.9.4.1.7	Acabados de pisos	23 días	100	59,783%	100,000%	vie 13/02/26	mié 11/03/26	1181FC-163 días
1223	1.3.9.4.1.8	Mobiliario	40 días	0	0,000%	0,000%	sáb 11/07/26	vie 28/08/26	1173FC-40 días;1
1224	1.3.9.4.1.6	Fin de tramo 1	0 días	0	0,000%	0,000%	vie 28/08/26	vie 28/08/26	1223;1222
1225	**1.3.9.4.2**	**Tramo 1 costado oriental Calle 63-calle 66 (K9+760 - K10+024)**	**1149,13 días**	**0**	**89,474%**	**89,474%**	**jue 1/12/22**	**vie 28/08/26**	
1226	**1.3.9.4.2.1**	**Tramo 1E costado oriental Calle 63-calle 66 (K9+760 - K9+805)**	**683,5 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**lun 24/04/23**	**mar 15/07/25**	
1227	1.3.9.4.2.1.1	Inicio de tramo 1	0 días	0	0,000%	0,000%	lun 24/04/23	lun 24/04/23	1215FC-2 días
1228	1.3.9.4.2.1.2	Demolición de andenes existentes	3,25 días	100	100,000%	100,000%	lun 24/04/23	mié 26/04/23	1227CC
1229	1.3.9.4.2.1.3	Excavaciones	1 día	100	100,000%	100,000%	lun 24/04/23	lun 24/04/23	1228CC
1230	1.3.9.4.2.1.4	Mejoramiento subrasante	4,38 días	100	100,000%	100,000%	lun 24/04/23	jue 27/04/23	1229CC
1231	1.3.9.4.2.1.5	Subbase granular reciclada	4,38 días	100	100,000%	100,000%	lun 24/04/23	jue 27/04/23	1230CC
1232	1.3.9.4.2.1.6	Bordillos y sardineles	7,25 días	100	100,000%	100,000%	mar 5/09/23	mar 12/09/23	1231FC+103 días
1233	1.3.9.4.2.1.7	Acabados de pisos	9 días	100	100,000%	100,000%	vie 15/09/23	lun 25/09/23	1232CC+9 días
1234	1.3.9.4.2.1.8	Subbase granular reciclada	4 días	100	100,000%	100,000%	vie 6/06/25	mié 11/06/25	2128FC-273 días
1235	1.3.9.4.2.1.9	Bordillos y sardineles	7 días	100	100,000%	100,000%	mar 24/06/25	jue 3/07/25	1234FC+10 días
1236	1.3.9.4.2.1.10	Acabados de pisos	9 días	100	100,000%	100,000%	vie 4/07/25	mar 15/07/25	1235CC+9 días
1237	1.3.9.4.1.9	Fin de tramo 1	0 días	0	0,000%	0,000%	mar 15/07/25	mar 15/07/25	1227;1228;1229;
1238	**1.3.9.4.2.2**	**Tramo 1F costado oriental Calle 63-calle 66 (K9+805 - K9+835)**	**567 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**vie 3/11/23**	**mar 9/09/25**	
1239	1.3.9.4.2.2.1	Inicio de tramo 1	0 días	100	0,000%	0,000%	vie 3/11/23	vie 3/11/23	1183CC+111 días
1240	1.3.9.4.2.2.2	Demolición de andenes existentes	7,25 días	100	100,000%	100,000%	mar 7/11/23	mié 15/11/23	1239FC+1 día
1241	1.3.9.4.2.2.3	Excavaciones	10,13 días	100	100,000%	100,000%	mar 28/05/24	sáb 8/06/24	1240CC+164 días
1242	1.3.9.4.2.2.4	Mejoramiento subrasante	10,13 días	100	100,000%	100,000%	jue 8/08/24	mar 20/08/24	1240CC+221 días
1243	1.3.9.4.2.2.5	Subbase granular reciclada	10,13 días	100	100,000%	100,000%	mar 7/11/23	sáb 18/11/23	1239FC+1 día
1244	1.3.9.4.2.2.6	Bordillos y sardineles	8,38 días	100	100,000%	100,000%	mié 20/12/23	vie 29/12/23	1243FC+25 días
1245	1.3.9.4.2.2.7	Acabados de pisos	13,5 días	100	100,000%	100,000%	jue 8/08/24	vie 23/08/24	1244CC+186 días
1246	1.3.9.4.2.2.8	Demolición de andenes existentes	7 días	100	100,000%	100,000%	jue 19/06/25	sáb 28/06/25	1239CC+499 días
1247	1.3.9.4.2.2.9	Excavaciones	15 días	100	100,000%	100,000%	mié 25/06/25	lun 14/07/25	1246FC-3 días
1248	1.3.9.4.2.2.10	Mejoramiento subrasante	10 días	100	100,000%	100,000%	mar 22/07/25	vie 1/08/25	1247FC+7 días
1249	1.3.9.4.2.2.11	Subbase granular reciclada	10 días	100	100,000%	100,000%	sáb 2/08/25	vie 15/08/25	1248FC+1 día
1250	1.3.9.4.2.2.12	Bordillos y sardineles	8 días	100	100,000%	100,000%	vie 15/08/25	mar 26/08/25	1249
1251	1.3.9.4.2.2.13	Acabados de pisos	13 días	100	100,000%	100,000%	mar 26/08/25	mar 9/09/25	1250;1237
1252	1.3.9.4.1.9	Fin de tramo 1	0 días	0	0,000%	0,000%	mar 9/09/25	mar 9/09/25	1239;1240;1241;
1253	**1.3.9.4.2.3**	**Tramo 1G costado oriental Calle 63-calle 66 (K9+835 - K9+865)**	**419 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**mié 6/03/24**	**jue 17/07/25**	
1254	1.3.9.4.2.3.1	Inicio de tramo 1	0 días	100	0,000%	0,000%	mié 6/03/24	mié 6/03/24	1241CC-66 días
1255	1.3.9.4.2.3.2	Demolición de andenes existentes	5 días	100	100,000%	100,000%	mié 6/03/24	lun 11/03/24	1254CC
1256	1.3.9.4.2.3.3	Excavaciones	135,13 días	100	100,000%	100,000%	mié 6/03/24	jue 15/08/24	1254CC
1257	1.3.9.4.2.3.4	Mejoramiento subrasante	10,13 días	100	100,000%	100,000%	mar 6/08/24	sáb 17/08/24	1255CC+122 días
1258	1.3.9.4.2.3.5	Subbase granular reciclada	72,63 días	100	100,000%	100,000%	vie 31/05/24	mar 27/08/24	1256CC+69 días;1
1259	1.3.9.4.2.3.6	Bordillos y sardineles	73,13 días	100	100,000%	100,000%	mié 5/06/24	vie 30/08/24	1258CC+3 días
1260	1.3.9.4.2.3.7	Acabados de pisos	77,75 días	100	100,000%	100,000%	jue 8/08/24	mié 6/11/24	1259CC+51 días
1261	1.3.9.4.2.3.8	Demolición de andenes existentes	5 días	100	100,000%	100,000%	mié 16/04/25	jue 24/04/25	1254CC+343 días;
1262	1.3.9.4.2.3.9	Excavaciones	6 días	100	100,000%	100,000%	jue 24/04/25	mié 30/04/25	1261
1263	1.3.9.4.2.3.10	Mejoramiento subrasante	5 días	100	100,000%	100,000%	vie 2/05/25	mié 7/05/25	2177FC+300 días;
1264	1.3.9.4.2.3.11	Subbase granular reciclada	4 días	100	100,000%	100,000%	jue 8/05/25	mar 13/05/25	1263FC+1 día
1265	1.3.9.4.2.3.12	Bordillos y sardineles	4 días	100	100,000%	100,000%	lun 12/05/25	vie 16/05/25	1264CC+3 días
1266	1.3.9.4.2.3.13	Acabados de pisos	4 días	100	100,000%	100,000%	lun 14/07/25	jue 17/07/25	1265CC+52 días
1267	1.3.9.4.1.9	Fin de tramo 1	0 días	0	0,000%	0,000%	jue 17/07/25	jue 17/07/25	1260;1266
1268	**1.3.9.4.2.4**	**Tramo 1H costado oriental Calle 63-calle 66 (K9+865- K10+024)**	**158,5 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**jue 1/12/22**	**lun 5/06/23**	
1269	1.3.9.4.2.4.1	Inicio de tramo 1	0 días	100	0,000%	0,000%	jue 1/12/22	jue 1/12/22	2146FC-1 día
1270	1.3.9.4.2.4.2	Demolición de andenes existentes	155,63 días	100	100,000%	100,000%	jue 1/12/22	jue 1/06/23	1269CC
1271	1.3.9.4.2.4.3	Excavaciones	155,63 días	100	100,000%	100,000%	lun 5/12/22	lun 5/06/23	1270CC+3 días
1272	1.3.9.4.2.4.4	Mejoramiento subrasante	41,38 días	100	100,000%	100,000%	lun 5/12/22	sáb 21/01/23	1271CC
1273	1.3.9.4.2.4.5	Subbase granular reciclada	41,38 días	100	100,000%	100,000%	lun 5/12/22	sáb 21/01/23	1272CC
1274	1.3.9.4.2.4.6	Bordillos y sardineles	62,38 días	100	100,000%	100,000%	lun 5/12/22	mar 14/02/23	1273CC
1275	1.3.9.4.2.4.7	Acabados de pisos	62,38 días	100	100,000%	100,000%	lun 5/12/22	mar 14/02/23	1274CC
1276	1.3.9.4.2.5	Mobiliario	20 días	0	0,000%	0,000%	mar 4/08/26	vie 28/08/26	1267;1223CC+20
1277	1.3.9.4.1.9	Fin de tramo 1	0 días	0	0,000%	0,000%	vie 28/08/26	vie 28/08/26	1276
1278	**1.3.9.4.3**	**Tramo 2 costado oriental calle 53-calle 63 Fase I (K7+970 - K8+980)**	**1289,38 días**	**0**	**89,474%**	**89,356%**	**mié 29/06/22**	**mar 8/09/26**	
1279	**1.3.9.4.2**	**Tramo 2A costado oriental calle 53-calle 63 (K7+970 - K8+240)**	**706 días**	**0**	**100,000%**	**99,506%**	**lun 24/04/23**	**lun 11/08/25**	
1280	1.3.9.4.2.1	Inicio de tramo 2	1 día	100	0,000%	0,000%	lun 24/04/23	lun 24/04/23	1167FC+293 días
1281	1.3.9.4.2.2	Demolición de andenes existentes	26 días	100	100,000%	100,000%	lun 24/04/23	mié 24/05/23	1280CC
1282	1.3.9.4.2.3	Excavaciones	26 días	100	100,000%	100,000%	lun 24/04/23	mié 24/05/23	1280CC;1281CC
1283	1.3.9.4.2.4	Mejoramiento subrasante	26 días	100	100,000%	100,000%	lun 24/04/23	mié 24/05/23	1280CC;1282CC
1284	1.3.9.4.2.5	Subbase granular reciclada	31,13 días	100	100,000%	100,000%	lun 24/04/23	mar 30/05/23	1280CC
1285	1.3.9.4.2.6	Bordillos y sardineles	51,63 días	100	100,000%	100,000%	lun 24/04/23	sáb 24/06/23	1280CC;1284CC
1286	1.3.9.4.2.7	Acabados de pisos	61,88 días	100	100,000%	100,000%	sáb 15/07/23	mar 26/09/23	1285CC+66 días
1287	1.3.9.4.2.6	Bordillos y sardineles	41 días	100	100,000%	100,000%	mar 24/06/25	lun 11/08/25	1280FC+664 días

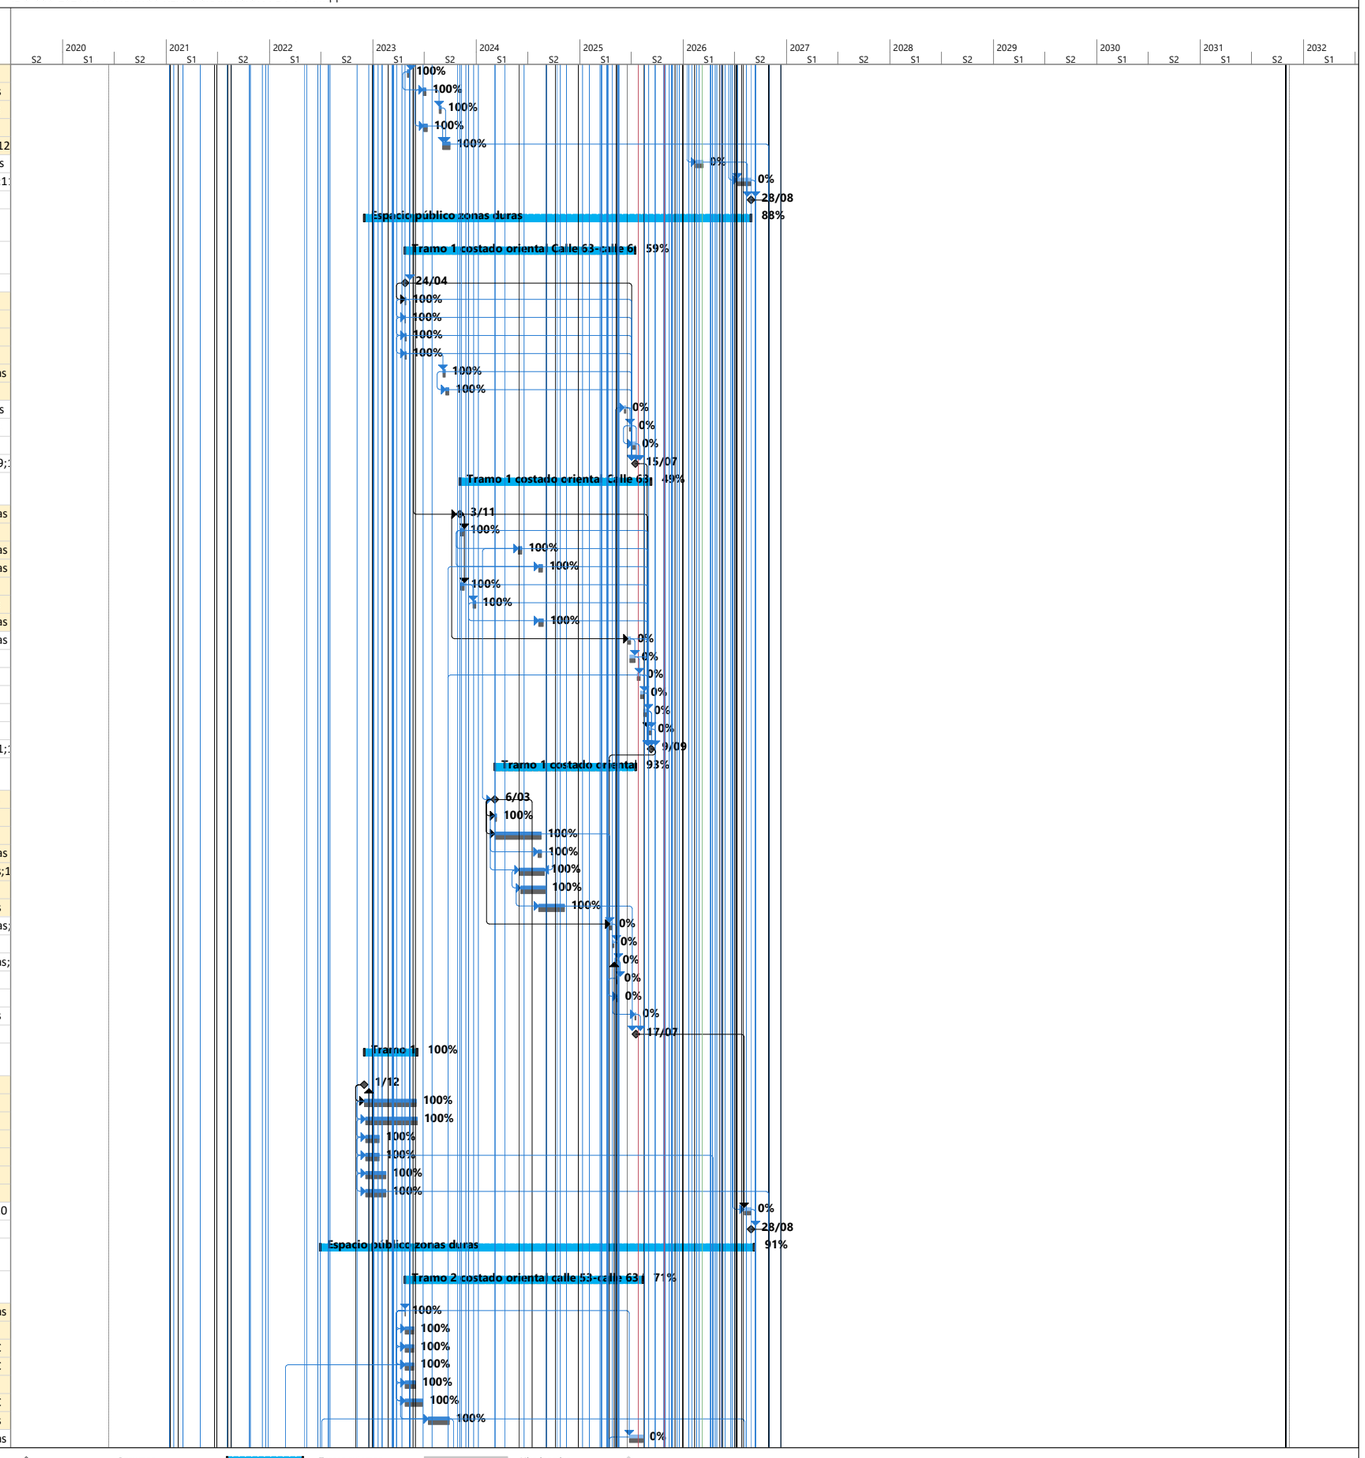


Tareas críticas · Tarea · Tarea manual · solo duración · Hito de línea base · Resumen · Tareas externas · Hito inactivo
División crítica · División · solo el comienzo · Línea base · Hito · Resumen manual · Hito externo · Resumen inactivo
Progreso de tarea crítica · Progreso de tarea · solo fin · División de la línea base · Progreso del resumen · Resumen del proyecto · Tarea inactiva · Fecha límite

Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	% Avance Conciliado	% Avance Programado (% PV)	% Avance Ejecutado conciliado (% EV))	Comienzo	Fin	Predecesoras
1288	1.3.9.4.2.7	Acabados de pisos	50 días	90,4	100,000%	90,400%	jue 15/05/25	lun 14/07/25	1287CC-99 días;1
1289	**1.3.9.4.2**	**Tramo 2B costado oriental calle 53-calle 63 (K8+240 - K8+980)**	**367,13 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**mié 29/06/22**	**mié 6/09/23**	
1290	1.3.9.4.2.1	Inicio de tramo 2	1 día	100	0,000%	0,000%	mié 29/06/22	mié 29/06/22	1167FC+48 días
1291	1.3.9.4.2.2	Demolición de andenes existentes	186,88 días	100	100,000%	100,000%	jue 30/06/22	vie 3/02/23	1290CC+1 día
1292	1.3.9.4.2.3	Excavaciones	186,88 días	100	100,000%	100,000%	mié 27/07/22	mar 28/02/23	1291CC+21 días
1293	1.3.9.4.2.4	Mejoramiento subrasante	221 días	100	100,000%	100,000%	jue 1/09/22	mié 17/05/23	1292CC+30 días
1294	1.3.9.4.2.5	Subbase granular reciclada	259,13 días	100	100,000%	100,000%	lun 19/09/22	sáb 22/07/23	1293CC+15 días
1295	1.3.9.4.2.6	Bordillos y sardineles	259,13 días	100	100,000%	100,000%	mié 5/10/22	mié 9/08/23	1294CC+14 días
1296	1.3.9.4.2.7	Acabados de pisos	275,63 días	100	100,000%	100,000%	jue 13/10/22	mié 6/09/23	1295CC+7 días
1297	1.3.9.4.2.8	Mobiliario	70 días	0	0,000%	0,000%	mar 16/06/26	mar 8/09/26	2351FC-3 días
1298	1.3.9.4.3.4	Fin de tramo 2	0 días	0	0,000%	0,000%	mar 8/09/26	mar 8/09/26	1297
1299	**1.3.9.4.3**	**Tramo 3 costado occidental calle 63-calle 66 (K8+980 - K10+024)**	**1231,25 días**	**0**	**9,990%**	**12,553%**	**mar 6/09/22**	**lun 7/09/26**	
1300	1.3.9.4.3.1	Inicio de tramo 3	0 días	100	0,000%	0,000%	mar 20/02/24	mar 20/02/24	95FC-335 días
1301	1.3.9.4.3.2	Aprobación trámite exclusión BIC	0 días	0	0,000%	0,000%	lun 2/02/26	lun 2/02/26	1300FC+600 días
1302	**1.3.9.4.3**	**Tramo 3A costado occidental calle 63-calle 66 (K9+715 - K9+995)**	**60,88 días**	**0**	**0,000%**	**14,708%**	**jue 25/06/26**	**lun 7/09/26**	
1303	1.3.9.4.3.3	Demolición de andenes existentes	30 días	90	0,000%	90,000%	jue 25/06/26	vie 31/07/26	2454CC+40 días;2
1304	1.3.9.4.3.4	Excavaciones	31 días	90	0,000%	90,000%	jue 2/07/26	sáb 8/08/26	1303CC+5 días
1305	1.3.9.4.3.5	Mejoramiento subrasante	30 días	0	0,000%	0,000%	jue 23/07/26	jue 27/08/26	1304CC+2 días;22
1306	1.3.9.4.3.6	Subbase granular reciclada	30 días	0	0,000%	0,000%	vie 24/07/26	lun 31/08/26	1305CC+2 días
1307	1.3.9.4.3.7	Bordillos y sardineles	30 días	0	0,000%	0,000%	mar 28/07/26	mar 1/09/26	1306CC+2 días
1308	1.3.9.4.3.8	Acabados de pisos	30 días	0	0,000%	0,000%	lun 3/08/26	lun 7/09/26	1307CC+5 días
1309	**1.3.9.4.3**	**Tramo 3B costado occidental calle 63-calle 66 (K9+280 - K9+715)**	**71 días**	**0**	**0,000%**	**0,000%**	**sáb 13/06/26**	**lun 7/09/26**	
1310	1.3.9.4.3.3	Demolición de andenes existentes	30 días	0	0,000%	0,000%	sáb 13/06/26	mar 21/07/26	2454CC+30 días;2
1311	1.3.9.4.3.4	Excavaciones	30 días	0	0,000%	0,000%	mar 16/06/26	mié 22/07/26	1310CC+1 día
1312	1.3.9.4.3.5	Mejoramiento subrasante	30 días	0	0,000%	0,000%	jue 18/06/26	vie 24/07/26	1311CC+2 días
1313	1.3.9.4.3.6	Subbase granular reciclada	30 días	0	0,000%	0,000%	lun 27/07/26	mar 1/09/26	1312FC+2 días
1314	1.3.9.4.3.7	Bordillos y sardineles	33 días	0	0,000%	0,000%	jue 30/07/26	lun 7/09/26	1313CC+3 días
1315	1.3.9.4.3.8	Acabados de pisos	20 días	0	0,000%	0,000%	lun 3/08/26	jue 27/08/26	1314CC+3 días
1316	**1.3.9.4.3**	**Tramo 3C costado occidental calle 63-calle 66 (K8+980 - K9+190)**	**1207,5 días**	**0**	**90,120%**	**90,120%**	**mar 6/09/22**	**mar 11/08/26**	
1317	1.3.9.4.3.3	Demolición de andenes existentes	41,38 días	100	100,000%	100,000%	mar 6/09/22	sáb 22/10/22	1300FC-433 días
1318	1.3.9.4.3.4	Excavaciones	40,88 días	100	100,000%	100,000%	sáb 4/03/23	sáb 22/04/23	1317FC+109 días
1319	1.3.9.4.3.5	Mejoramiento subrasante	40,88 días	100	100,000%	100,000%	sáb 4/03/23	sáb 22/04/23	1318CC
1320	1.3.9.4.3.6	Subbase granular reciclada	41,38 días	100	100,000%	100,000%	mié 17/05/23	jue 6/07/23	1319CC+59 días
1321	1.3.9.4.3.7	Bordillos y sardineles	51,63 días	100	100,000%	100,000%	mié 10/05/23	mar 11/07/23	1320CC-6 días
1322	1.3.9.4.3.8	Acabados de pisos	92,63 días	100	100,000%	100,000%	sáb 20/05/23	sáb 9/09/23	1321CC+9 días
1323	1.3.9.4.4.5.7	Demolición de andenes existentes	40 días	100	100,000%	100,000%	sáb 22/11/25	vie 9/01/26	175FC+313 días
1324	1.3.9.4.4.5.8	Excavaciones	41 días	100	100,000%	100,000%	mar 13/01/26	vie 27/02/26	1323FC+1 día
1325	1.3.9.4.4.5.9	Mejoramiento subrasante	30 días	100	100,000%	100,000%	sáb 4/10/25	lun 10/11/25	2462FC-216 días
1326	1.3.9.4.4.5.10	Subbase granular reciclada	30 días	100	100,000%	100,000%	mar 28/10/25	mar 2/12/25	1325CC+19 días
1327	1.3.9.4.4.5.11	Bordillos y sardineles	40 días	100	100,000%	100,000%	mar 21/10/25	sáb 6/12/25	1326CC-6 días
1328	1.3.9.4.4.5.12	Acabados de pisos	60 días	100	100,000%	100,000%	vie 31/10/25	mié 14/01/26	1327CC+10 días
1329	1.3.9.4.4.5.13	Demolición de andenes existentes	40 días	100	100,000%	100,000%	mié 12/11/25	mié 31/12/25	175FC+305 días
1330	1.3.9.4.4.5.14	Excavaciones	41 días	100	100,000%	100,000%	mié 12/11/25	vie 2/01/26	1329CC
1331	1.3.9.4.4.5.15	Demolición de andenes existentes	30 días	0	0,000%	0,000%	jue 28/05/26	lun 6/07/26	175FC+470 días
1332	1.3.9.4.4.5.16	Excavaciones	30 días	0	0,000%	0,000%	jue 28/05/26	lun 6/07/26	1331CC
1333	1.3.9.4.4.5.17	Mejoramiento subrasante	25 días	0	0,000%	0,000%	vie 10/07/26	mar 11/08/26	1330FC+5 días;24
1334	1.3.9.4.4.5.18	Subbase granular reciclada	20 días	0	0,000%	0,000%	lun 13/07/26	mié 5/08/26	1333CC+2 días
1335	1.3.9.4.4.5.19	Bordillos y sardineles	16 días	0	0,000%	0,000%	sáb 18/07/26	jue 6/08/26	1334CC+5 días
1336	1.3.9.4.4.5.20	Acabados de pisos	12 días	0	0,000%	0,000%	sáb 25/07/26	lun 10/08/26	1335CC+5 días
1337	1.3.9.4.3.9	Mobiliario	20 días	0	0,000%	0,000%	lun 13/07/26	mié 5/08/26	1328CC-10 días;1
1338	**1.3.9.4.3**	**Tramo 3D costado occidental calle 63-calle 66 (K8+980 - K10+020) Separador Central**	**92 días**	**0**	**0,000%**	**0,000%**	**jue 14/05/26**	**jue 3/09/26**	
1339	1.3.9.4.3.3	Demolición de andenes existentes	40 días	0	0,000%	0,000%	jue 14/05/26	vie 3/07/26	105FC+410 días;1
1340	1.3.9.4.3.4	Excavaciones	35 días	0	0,000%	0,000%	mar 19/05/26	mar 30/06/26	1339CC+2 días
1341	1.3.9.4.3.5	Mejoramiento subrasante	40 días	0	0,000%	0,000%	mié 20/05/26	mié 8/07/26	1340CC+2 días
1342	1.3.9.4.3.6	Subbase granular reciclada	40 días	0	0,000%	0,000%	vie 22/05/26	vie 10/07/26	1341CC+2 días
1343	1.3.9.4.3.7	Bordillos y sardineles	51 días	0	0,000%	0,000%	lun 25/05/26	lun 27/07/26	1342CC+2 días
1344	1.3.9.4.3.8	Acabados de pisos	60 días	0	0,000%	0,000%	mié 27/05/26	sáb 8/08/26	1343CC+2 días
1345	1.3.9.4.3.9	Mobiliario	20 días	0	0,000%	0,000%	mar 11/08/26	jue 3/09/26	1344FC+2 días
1346	1.3.9.4.3.10	Fin de tramo 3	0 días	0	0,000%	0,000%	jue 3/09/26	jue 3/09/26	1337;1345;1324
1347	**1.3.9.4.4**	**Tramo 4 costado occidental calle 53-calle 63 (K7+970 - K8+980)**	**284 días**	**0**	**53,843%**	**46,292%**	**vie 3/10/25**	**mié 9/09/26**	
1348	1.3.9.4.4.1	Inicio de tramo 4	0 días	0	0,000%	0,000%	vie 17/07/26	vie 17/07/26	2727
1349	1.3.9.4.4.2	Aprobación trámite exclusión BIC	0 días	0	0,000%	0,000%	vie 6/03/26	vie 6/03/26	1301FC+30 días
1350	**1.3.9.4.4**	**Tramo 4A costado occidental calle 53-calle 63 (K8+550 - K8+980)**	**284 días**	**0**	**4,893%**	**4,893%**	**vie 3/10/25**	**mié 9/09/26**	
1351	1.3.9.4.4.3	Demolición de andenes existentes	50 días	100	100,000%	100,000%	vie 3/10/25	mar 2/12/25	1349FC-130 días
1352	1.3.9.4.4.3	Demolición de andenes existentes	50 días	0	0,000%	0,000%	mié 20/05/26	vie 17/07/26	1349FC+60 días
1353	1.3.9.4.4.4	Excavaciones	40 días	0	0,000%	0,000%	lun 25/05/26	lun 13/07/26	1351CC+5 días;13
1354	1.3.9.4.4.5	Mejoramiento subrasante	40 días	0	0,000%	0,000%	lun 13/07/26	lun 31/08/26	2727FC-30 días;1
1355	1.3.9.4.4.6	Subbase granular reciclada	40 días	0	0,000%	0,000%	mié 15/07/26	mar 1/09/26	1354CC+2 días
1356	1.3.9.4.4.7	Bordillos y sardineles	40 días	0	0,000%	0,000%	vie 17/07/26	jue 3/09/26	1355CC+2 días
1357	1.3.9.4.4.8	Acabados de pisos	40 días	0	0,000%	0,000%	vie 24/07/26	mié 9/09/26	1356CC+5 días

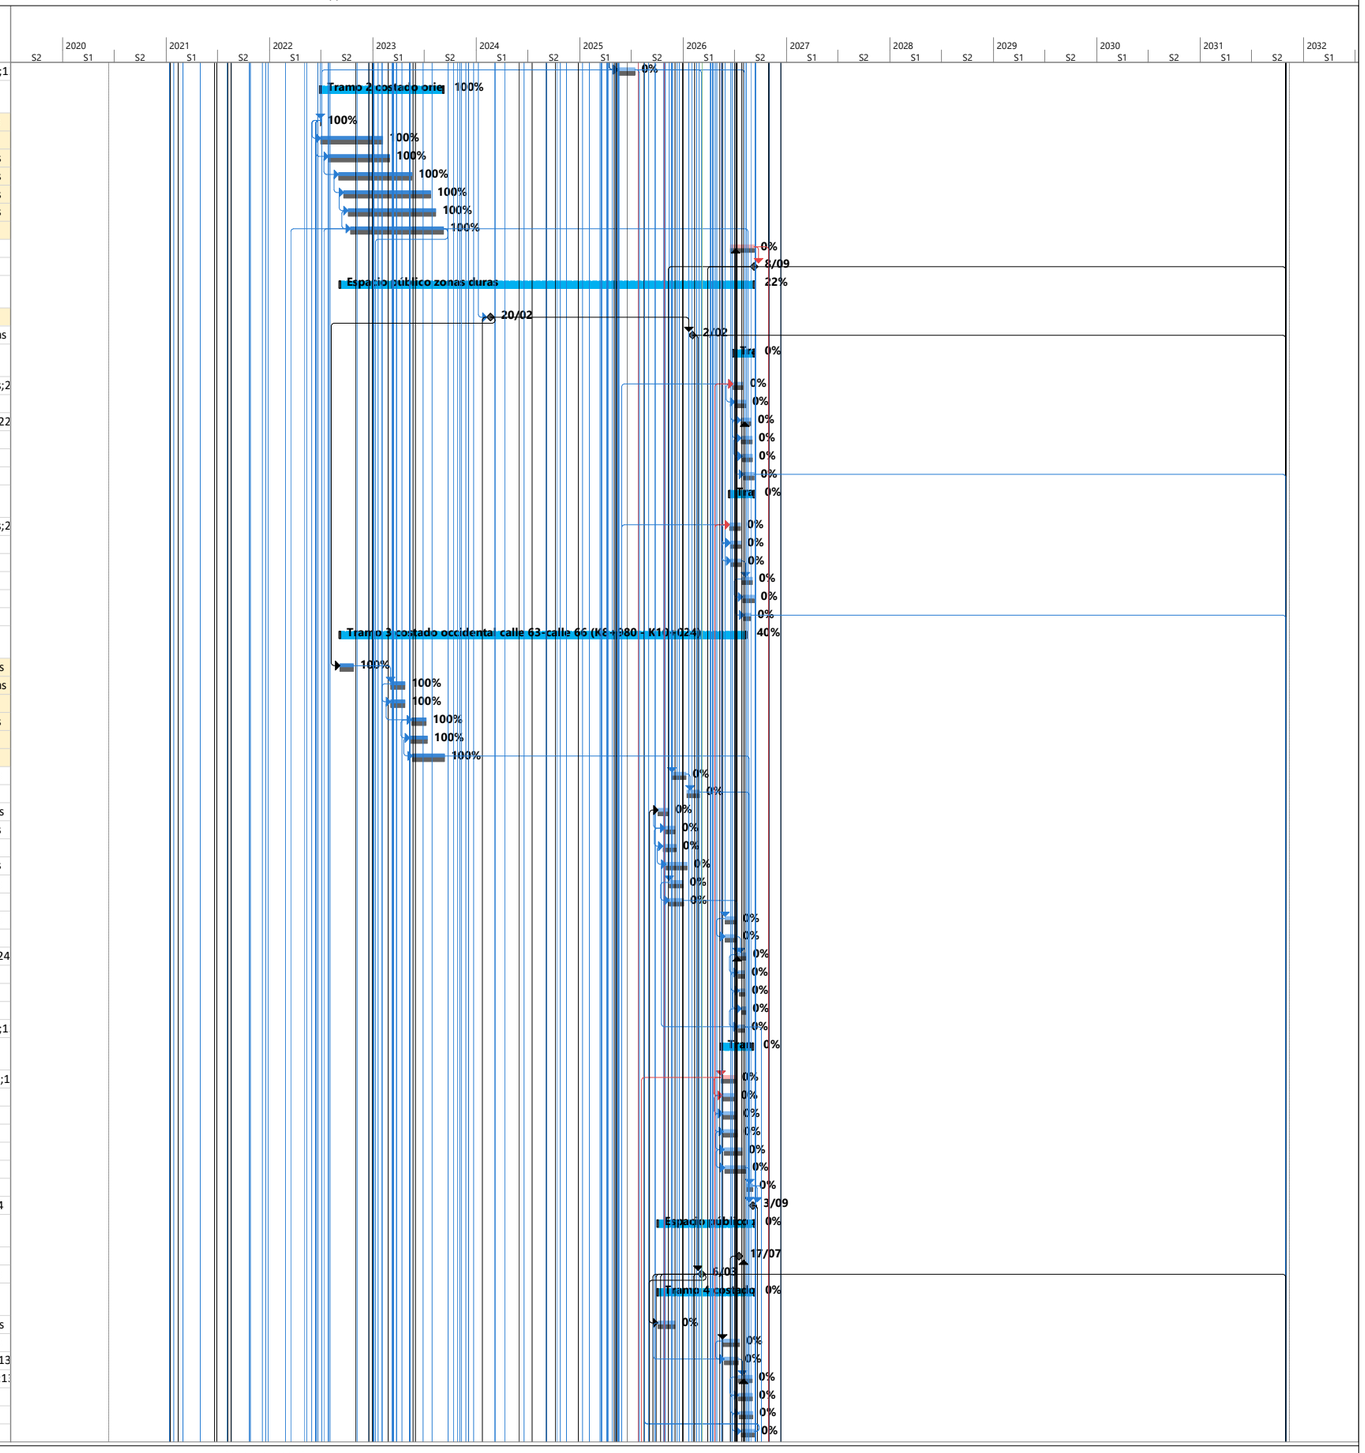


Tareas críticas · Tarea · Tarea manual · solo duración · Hito de línea base · Resumen · Tareas externas · Hito inactivo
División crítica · División · solo el comienzo · Línea base · Hito · Resumen manual · Hito externo · Resumen inactivo
Progreso de tarea crítica · Progreso de tarea · solo fin · División de la línea base · Progreso del resumen · Resumen del proyecto · Tarea inactiva · Fecha límite

Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	% Avance Conciliado	% Avance Programado (% PV)	% Avance Ejecutado conciliado (% EV))	Comienzo	Fin	Predecesoras
1358	**1.3.9.4.4**	**Tramo 4B costado occidental calle 53-calle 63 (K8+150 - K8+550)**	**261 días**	**0**	**55,038%**	**55,038%**	**mar 28/10/25**	**sáb 5/09/26**	
1359	1.3.9.4.4.3	Demolición de andenes existentes	30 días	100	100,000%	100,000%	mar 28/10/25	mar 2/12/25	1349CC-110 días
1360	1.3.9.4.4.4	Excavaciones	30 días	100	100,000%	100,000%	sáb 1/11/25	mar 9/12/25	1359CC+5 días
1361	1.3.9.4.4.5	Mejoramiento subrasante	30 días	100	100,000%	100,000%	sáb 8/11/25	lun 15/12/25	1360CC+5 días
1362	1.3.9.4.4.6	Subbase granular reciclada	30 días	100	100,000%	100,000%	vie 14/11/25	sáb 20/12/25	1361CC+5 días
1363	1.3.9.4.4.7	Bordillos y sardineles	30 días	100	100,000%	100,000%	vie 21/11/25	vie 26/12/25	1362CC+5 días
1364	1.3.9.4.4.8	Acabados de pisos	24 días	100	100,000%	100,000%	jue 11/12/25	vie 9/01/26	1363CC+17 días
1365	1.3.9.4.4.3	Demolición de andenes existentes	30 días	0	0,000%	0,000%	mié 24/06/26	jue 30/07/26	1349CC+90 días
1366	1.3.9.4.4.4	Excavaciones	30 días	0	0,000%	0,000%	mié 1/07/26	mié 5/08/26	1365CC+5 días
1367	1.3.9.4.4.5	Mejoramiento subrasante	30 días	0	0,000%	0,000%	mar 7/07/26	mié 12/08/26	1366CC+5 días
1368	1.3.9.4.4.6	Subbase granular reciclada	30 días	0	0,000%	0,000%	lun 13/07/26	mié 19/08/26	1367CC+5 días
1369	1.3.9.4.4.7	Bordillos y sardineles	30 días	0	0,000%	0,000%	sáb 18/07/26	mar 25/08/26	1368CC+5 días
1370	1.3.9.4.4.8	Acabados de pisos	24 días	0	0,000%	0,000%	sáb 8/08/26	sáb 5/09/26	1369CC+17 días
1371	**1.3.9.4.4**	**Tramo 4C costado occidental calle 53-calle 63 (K7+970 - K8+150)**	**123,5 días**	**0**	**76,536%**	**34,050%**	**mié 12/11/25**	**jue 9/04/26**	
1372	1.3.9.4.4.3	Demolición de andenes existentes	3 días	100	100,000%	100,000%	mié 12/11/25	sáb 15/11/25	1349CC-97 días
1373	1.3.9.4.4.4	Excavaciones	30 días	24,22	100,000%	24,220%	mar 18/11/25	mar 23/12/25	1372CC+4 días
1374	1.3.9.4.4.5	Mejoramiento subrasante	30 días	24,22	100,000%	24,220%	lun 24/11/25	mar 30/12/25	1373CC+5,5 días
1375	1.3.9.4.4.6	Subbase granular reciclada	26 días	24,22	100,000%	24,220%	sáb 29/11/25	mié 31/12/25	1374CC+5 días
1376	1.3.9.4.4.7	Bordillos y sardineles	28 días	24,22	100,000%	24,220%	vie 5/12/25	vie 9/01/26	1375CC+5 días
1377	1.3.9.4.4.8	Acabados de pisos	24 días	24,22	0,000%	24,220%	mar 10/03/26	jue 9/04/26	1376CC+80 días
1378	**1.3.9.4.4**	**Tramo 4d costado occidental calle 53-calle 63 (K7+980 - K8+980) Separador Central**	**274 días**	**0**	**97,008%**	**98,076%**	**jue 16/10/25**	**mié 9/09/26**	
1379	1.3.9.4.4.3	Demolición de andenes existentes	31 días	100	100,000%	100,000%	jue 16/10/25	vie 21/11/25	1349CC-120 días
1380	1.3.9.4.4.4	Excavaciones	80 días	100	100,000%	100,000%	mar 28/10/25	lun 2/02/26	1379CC+10 días
1381	1.3.9.4.4.5	Mejoramiento subrasante	80 días	100	100,000%	100,000%	sáb 8/11/25	jue 12/02/26	1380CC+10 días
1382	1.3.9.4.4.6	Subbase granular reciclada	80 días	100	100,000%	100,000%	vie 21/11/25	mar 24/02/26	1381CC+10 días
1383	1.3.9.4.4.7	Bordillos y sardineles	75 días	100	99,500%	100,000%	mar 2/12/25	lun 2/03/26	1382CC+10 días
1384	1.3.9.4.4.8	Acabados de pisos	60 días	100	96,042%	100,000%	mar 23/12/25	mié 4/03/26	1383CC+17 días
1385	1.3.9.4.4.4	Excavaciones	70 días	0	0,000%	0,000%	vie 12/06/26	vie 4/09/26	1379CC+200 días
1386	1.3.9.4.4.5	Mejoramiento subrasante	70 días	0	0,000%	0,000%	mar 16/06/26	lun 7/09/26	1385CC+2 días
1387	1.3.9.4.4.6	Subbase granular reciclada	70 días	0	0,000%	0,000%	jue 18/06/26	mié 9/09/26	1386CC+2 días
1388	1.3.9.4.4.7	Bordillos y sardineles	55 días	0	0,000%	0,000%	vie 19/06/26	mié 26/08/26	1387CC+2 días
1389	1.3.9.4.4.8	Acabados de pisos	50 días	0	0,000%	0,000%	mar 23/06/26	sáb 22/08/26	1388CC+2 días
1390	1.3.9.4.4.9	Mobiliario	95 días	0	0,000%	0,000%	mar 12/05/26	jue 3/09/26	1337FF;1345FF
1391	1.3.9.4.4.10	Fin de tramo 4	0 días	0	0,000%	0,000%	jue 3/09/26	jue 3/09/26	1390;1322
1392	**1.3.9.4.5**	**Tramo 5 costado oriental calle 46-calle 53 (K7+915 - K7+970)**	**406,63 días**	**0**	**89,474%**	**89,474%**	**mié 7/05/25**	**jue 3/09/26**	
1393	1.3.9.4.5.1	Inicio de tramo 5	0 días	0	0,000%	0,000%	mié 7/05/25	mié 7/05/25	175FC+144 días
1394	1.3.9.4.5.2	Demolición de andenes existentes	92 días	100	100,000%	100,000%	mié 7/05/25	lun 25/08/25	1393
1395	1.3.9.4.5.3	Excavaciones	92,5 días	100	100,000%	100,000%	mar 13/05/25	sáb 30/08/25	1394CC+5 días
1396	1.3.9.4.5.4	Mejoramiento subrasante	92 días	100	100,000%	100,000%	vie 6/06/25	mar 23/09/25	1395CC+21 días
1397	1.3.9.4.5.5	Subbase granular reciclada	92 días	100	100,000%	100,000%	vie 4/07/25	lun 20/10/25	1396CC+23 días
1398	1.3.9.4.5.6	Bordillos y sardineles	93 días	100	100,000%	100,000%	mar 22/07/25	vie 7/11/25	1397CC+15 días
1399	1.3.9.4.5.7	Acabados de pisos	91 días	100	100,000%	100,000%	mar 5/08/25	vie 21/11/25	1398CC+13 días
1400	1.3.9.4.5.8	Mobiliario	15 días	0	0,000%	0,000%	mar 18/08/26	jue 3/09/26	1390FF
1401	1.3.9.4.5.9	Fin de tramo 5	0 días	0	0,000%	0,000%	mié 29/07/26	mié 29/07/26	1394FC-30 días;1
1402	**1.3.9.4.6**	**Tramo 6 costado occidental calle 46-calle 53 (K7+915 - K7+970)**	**947,25 días**	**0**	**89,474%**	**89,474%**	**jue 10/08/23**	**mié 9/09/26**	
1403	1.3.9.4.6.1	Inicio de tramo 6	0 días	100	0,000%	0,000%	jue 10/08/23	jue 10/08/23	8FC+735 días
1404	1.3.9.4.6.2	Demolición de andenes existentes	20,38 días	100	100,000%	100,000%	jue 10/08/23	sáb 2/09/23	1403FC-1 día
1405	1.3.9.4.6.3	Excavaciones	20,38 días	100	100,000%	100,000%	jue 10/08/23	sáb 2/09/23	1404CC
1406	1.3.9.4.6.4	Mejoramiento subrasante	20,88 días	100	100,000%	100,000%	lun 14/08/23	mié 6/09/23	1405CC+3 días
1407	1.3.9.4.6.6	Bordillos y sardineles	20,88 días	100	100,000%	100,000%	lun 11/09/23	mar 3/10/23	1406CC+23 días
1408	1.3.9.4.6.6	Subbase granular reciclada	30 días	100	100,000%	100,000%	lun 10/11/25	mar 16/12/25	1393FC+40 días;1
1409	1.3.9.4.6.6	Bordillos y sardineles	21 días	100	100,000%	100,000%	mié 17/12/25	mar 13/01/26	1408CC+31 días
1410	1.3.9.4.6.7	Acabados de pisos	19,5 días	100	100,000%	100,000%	mié 14/01/26	mié 4/02/26	1409CC+22 días
1411	1.3.9.4.6.8	Mobiliario	20 días	0	0,000%	0,000%	mar 18/08/26	mié 9/09/26	1410CC+180 días
1412	1.3.9.4.6.9	Fin de tramo 6	0 días	0	0,000%	0,000%	mié 9/09/26	mié 9/09/26	1410;1411
1413	1.3.9.4.7	Fin espacio Publico Zonas duras	0 días	0	0,000%	0,000%	mié 9/09/26	mié 9/09/26	1401;1412;1346;
1414	**1.3.9.5**	**Espacio público zonas verdes**	**1476,75 días**	**0**	**17,886%**	**23,432%**	**mié 17/11/21**	**sáb 5/09/26**	
1415	**1.3.9.5.1**	**Tramo 1 costado oriental Calle 63-calle 66 (K8+980 - K10+024)**	**1415,63 días**	**0**	**26,222%**	**29,477%**	**mié 17/11/21**	**mié 24/06/26**	
1416	1.3.9.5.1.1	Inicio de tramo 1	1 día	100	0,000%	0,000%	mié 17/11/21	mié 17/11/21	8CC+223 días
1417	1.3.9.5.1.2	Limpieza de terreno	260,13 días	100	100,000%	100,000%	mié 17/11/21	mar 20/09/22	1416CC
1418	1.3.9.5.1.3	lleno en tierra	186,88 días	100	100,000%	100,000%	mié 7/09/22	jue 13/04/23	1417FC-12 días
1419	1.3.9.5.1.3	lleno en tierra	20 días	100	100,000%	100,000%	sáb 8/11/25	mar 2/12/25	1418FC+791 días
1420	1.3.9.5.1.3	lleno en tierra	20 días	0	0,000%	0,000%	jue 7/05/26	sáb 30/05/26	1419CC+150 días
1421	1.3.9.5.1.4	Empradización/ cobertura vegetal	40 días	0	0,000%	0,000%	jue 7/05/26	mié 24/06/26	1420CC
1422	1.3.9.5.1.5	Arborización	30 días	100	0,000%	100,000%	jue 7/05/26	jue 11/06/26	1421CC
1423	1.3.9.5.1.5	Arborización	30 días	0	0,000%	0,000%	jue 7/05/26	jue 11/06/26	1421CC
1424	1.3.9.5.1.6	Fin de tramo 1	0 días	0	0,000%	0,000%	mié 24/06/26	mié 24/06/26	1417;1418;1421;
1425	**1.3.9.5.2**	**Tramo 2 costado oriental calle 53-calle 63 (K7+970 - K8+980)**	**1407,5 días**	**0**	**35,254%**	**47,726%**	**lun 27/12/21**	**sáb 25/07/26**	
1426	1.3.9.5.2.1	Inicio de tramo 2	1 día	100	0,000%	0,000%	lun 27/12/21	lun 27/12/21	8FC+254 días
1427	1.3.9.5.2.2	Limpieza de terreno	260,13 días	100	100,000%	100,000%	lun 27/12/21	vie 28/10/22	1426CC-1 día
1428	1.3.9.5.2.3	lleno en tierra	23 días	100	59,783%	100,000%	vie 13/02/26	mié 11/03/26	1427FC+1013 días

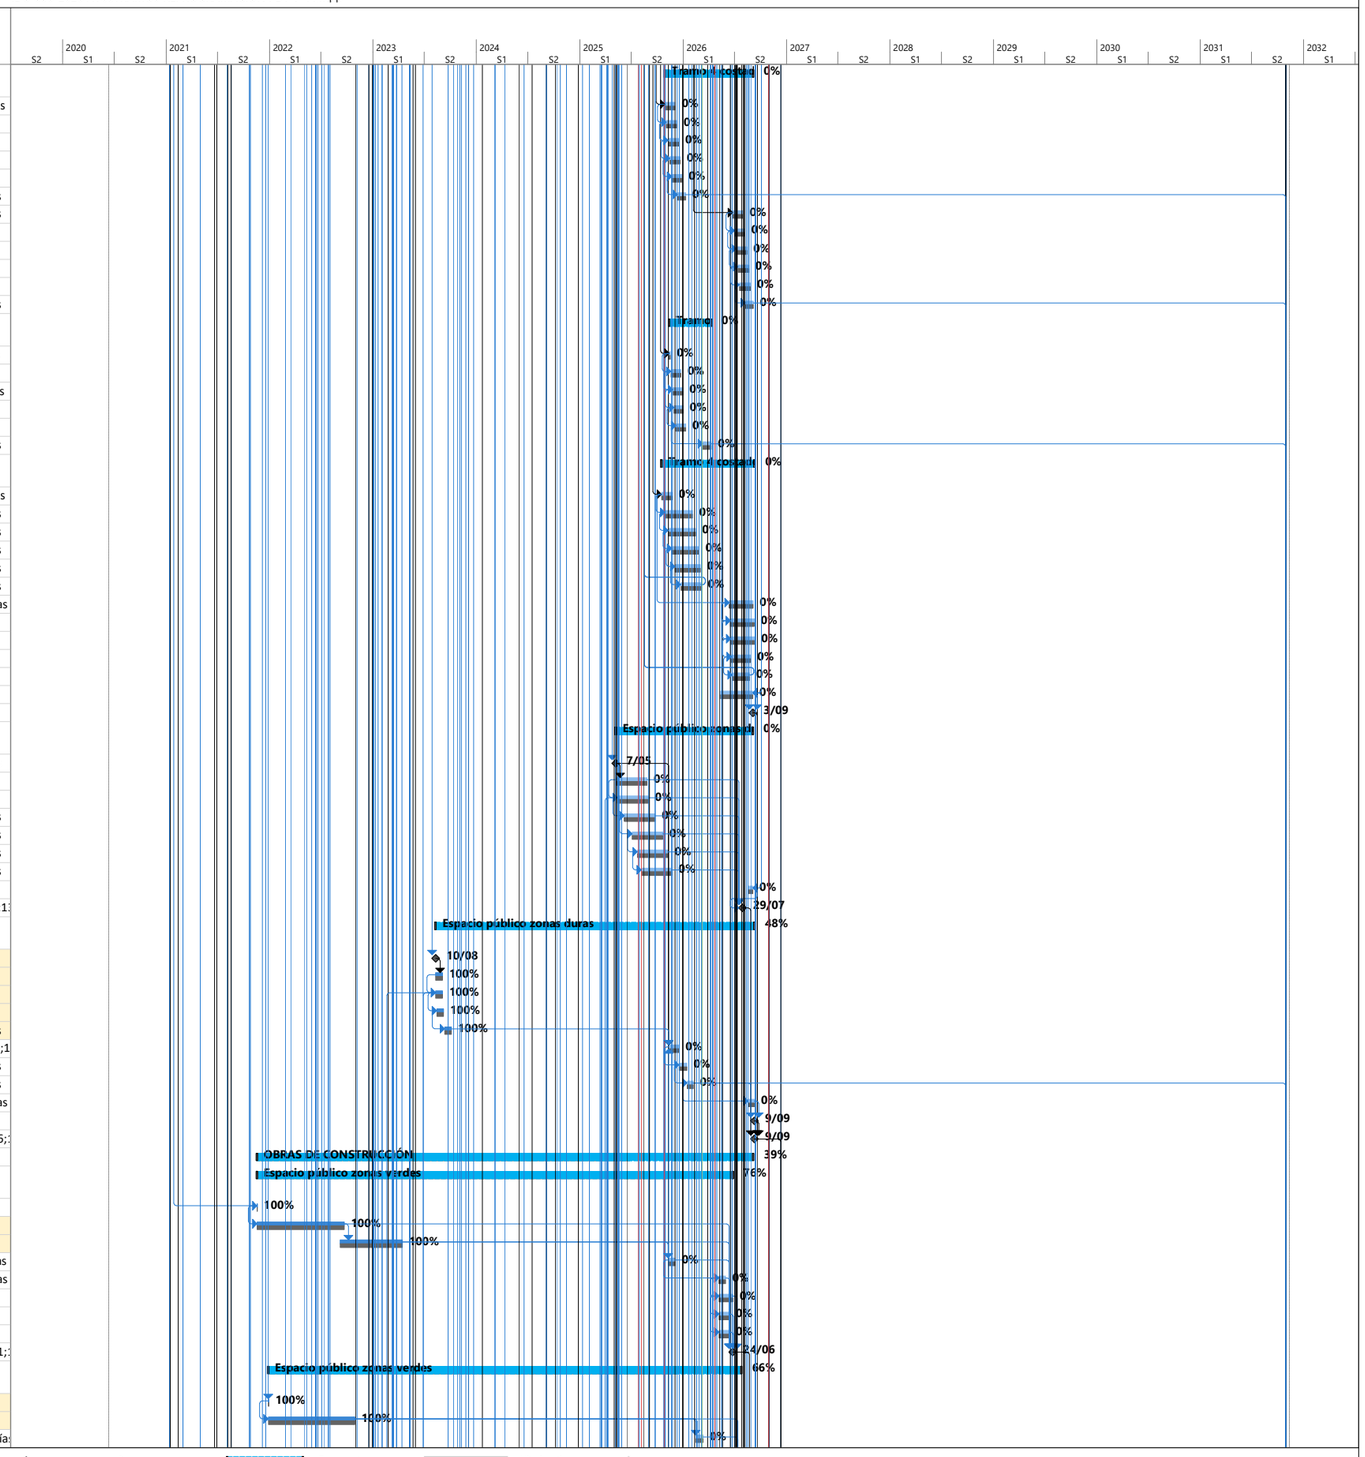


Tareas críticas · Tarea · Tarea manual · solo duración · Hito de línea base · Resumen · Tareas externas · Hito inactivo
División crítica · División · solo el comienzo · Línea base · Hito · Resumen manual · Hito externo · Resumen inactivo
Progreso de tarea crítica · Progreso de tarea · solo fin · División de la línea base · Progreso del resumen · Resumen del proyecto · Tarea inactiva · Fecha límite

Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	% Avance Conciliado	% Avance Programado (% PV)	% Avance Ejecutado conciliado (% EV))	Comienzo	Fin	Predecesoras
1429	1.3.9.5.2.4	Empradización/ cobertura vegetal	22 días	100	39,773%	100,000%	jue 19/02/26	lun 16/03/26	1427FC+1018 días
1430	1.3.9.5.2.5	Arborización	23 días	100	100,000%	100,000%	mié 10/12/25	mié 7/01/26	1298CC-227 días
1431	1.3.9.5.2.3	lleno en tierra	22 días	0	0,000%	0,000%	lun 27/04/26	lun 25/05/26	1298CC-110 días
1432	1.3.9.5.2.4	Empradización/ cobertura vegetal	22 días	0	0,000%	0,000%	vie 22/05/26	jue 18/06/26	1431CC+20 días
1433	1.3.9.5.2.5	Arborización	23 días	0	0,000%	0,000%	vie 26/06/26	sáb 25/07/26	1432CC+30 días
1434	1.3.9.5.2.6	Fin de tramo 2	0 días	0	0,000%	0,000%	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	1427;1428;1429;1
1435	**1.3.9.5.3**	**Tramo 3 costado occidental calle 63-calle 66 (K8+980 - K9+K10+024)**	**290 días**	**0**	**0,000%**	**4,580%**	**vie 19/09/25**	**mar 1/09/26**	
1436	1.3.9.5.3.1	Inicio de tramo 3	0 días	0	0,000%	0,000%	vie 19/09/25	vie 19/09/25	1339CC-200 días
1437	1.3.9.5.3.2	Limpieza de terreno	41 días	0	0,000%	0,000%	lun 4/05/26	mar 23/06/26	1436CC+190 días
1438	1.3.9.5.3.3	lleno en tierra	40 días	100	0,000%	100,000%	mié 24/06/26	mar 11/08/26	1437CC+42 días
1439	1.3.9.5.3.4	Empradización/ cobertura vegetal	40 días	100	0,000%	100,000%	mié 24/06/26	mar 11/08/26	1438CC
1440	1.3.9.5.3.5	Arborización	28 días	100	0,000%	100,000%	lun 13/04/26	jue 14/05/26	1439CC-60 días
1441	1.3.9.5.3.3	lleno en tierra	40 días	0	0,000%	0,000%	mié 24/06/26	mar 11/08/26	1437CC+42 días
1442	1.3.9.5.3.4	Empradización/ cobertura vegetal	40 días	0	0,000%	0,000%	mié 24/06/26	mar 11/08/26	1441CC
1443	1.3.9.5.3.5	Arborización	28 días	0	0,000%	0,000%	mié 29/07/26	mar 1/09/26	1442CC+30 días
1444	1.3.9.5.3.6	Fin de tramo 3	0 días	0	0,000%	0,000%	mar 1/09/26	mar 1/09/26	1440;1443
1445	**1.3.9.5.4**	**Tramo 4 costado occidental calle 53-calle 63 (K7+970 - K8+980)**	**1226,88 días**	**0**	**2,448%**	**2,815%**	**jue 8/09/22**	**vie 4/09/26**	
1446	1.3.9.5.4.1	Inicio de tramo 4	0 días	100	0,000%	0,000%	jue 8/09/22	jue 8/09/22	95CC-747 días
1447	1.3.9.5.4.2	Limpieza de terreno	31,13 días	100	100,000%	100,000%	jue 8/09/22	mié 12/10/22	1446
1448	1.3.9.5.4.2	Limpieza de terreno	30 días	0	0,000%	0,000%	lun 4/05/26	mar 9/06/26	1436CC+190 días
1449	1.3.9.5.4.3	lleno en tierra	30 días	0	0,000%	0,000%	sáb 9/05/26	mar 16/06/26	1448CC+5 días
1450	1.3.9.5.4.4	Empradización/ cobertura vegetal	40 días	0	0,000%	0,000%	mié 13/05/26	mié 1/07/26	1449CC+3 días
1451	1.3.9.5.4.5	Arborización	44 días	100	0,000%	100,000%	vie 19/06/26	mar 11/08/26	1450CC+30 días
1452	1.3.9.5.4.5	Arborización	45 días	0	0,000%	0,000%	lun 13/07/26	vie 4/09/26	1450CC+50 días
1453	1.3.9.5.4.6	Fin de tramo 4	0 días	0	0,000%	0,000%	vie 4/09/26	vie 4/09/26	1447;1449;1450;1
1454	**1.3.9.5.5**	**Tramo 5 costado oriental calle 46-calle 53 (K7+915 - K7+970)**	**45 días**	**0**	**0,000%**	**0,000%**	**mar 14/07/26**	**sáb 5/09/26**	
1455	1.3.9.5.5.1	Inicio de tramo 5	0 días	0	0,000%	0,000%	mié 15/07/26	mié 15/07/26	1436FC+250 días
1456	1.3.9.5.5.2	Limpieza de terreno	41 días	0	0,000%	0,000%	mar 14/07/26	mar 1/09/26	1455FC-1 día
1457	1.3.9.5.5.3	lleno en tierra	41 días	0	0,000%	0,000%	jue 16/07/26	jue 3/09/26	1456CC+2 días
1458	1.3.9.5.5.4	Empradización/ cobertura vegetal	39 días	0	0,000%	0,000%	sáb 18/07/26	jue 3/09/26	1457CC+2 días
1459	1.3.9.5.5.5	Arborización	41 días	0	0,000%	0,000%	sáb 18/07/26	sáb 5/09/26	1458CC
1460	1.3.9.5.5.6	Fin de tramo 5	0 días	0	0,000%	0,000%	sáb 5/09/26	sáb 5/09/26	1456;1457;1458;1
1461	**1.3.9.5.6**	**Tramo 6 costado occidental calle 46-calle 53 (K7+915 - K7+970)**	**342 días**	**0**	**13,270%**	**13,270%**	**mié 25/06/25**	**mié 5/08/26**	
1462	1.3.9.5.6.1	Inicio de tramo 6	0 días	0	0,000%	0,000%	jue 28/05/26	jue 28/05/26	175FC+470 días
1463	1.3.9.5.6.2	Limpieza de terreno	51 días	0	0,000%	0,000%	lun 1/06/26	vie 31/07/26	1462CC+2 días
1464	1.3.9.5.6.3	lleno en tierra	51 días	0	0,000%	0,000%	mar 2/06/26	lun 3/08/26	1463CC+1 día
1465	1.3.9.5.6.4	Empradización/ cobertura vegetal	49 días	100	100,000%	100,000%	mié 25/06/25	vie 22/08/25	1464CC-288 días
1466	1.3.9.5.6.4	Empradización/ cobertura vegetal	51 días	0	0,000%	0,000%	mié 3/06/26	mié 5/08/26	1464CC+2 días
1467	1.3.9.5.6.5	Arborización	50 días	0	0,000%	0,000%	vie 5/06/26	mié 5/08/26	1466CC+2 días;14
1468	1.3.9.5.6.6	Fin de tramo 6	0 días	0	0,000%	0,000%	mié 5/08/26	mié 5/08/26	1467
1469	1.3.9.5.7	Final espacio Publico Zonas Verdes	0 días	0	0,000%	0,000%	sáb 5/09/26	sáb 5/09/26	1424;1434;1444;1
1470	**1.3.9.6**	**Cicloruta**	**1292,5 días**	**0**	**62,270%**	**62,270%**	**mié 29/06/22**	**jue 10/09/26**	
1471	**1.3.9.6.1**	**Tramo 1 costado oriental Calle 63-calle 66 (K8+980 - K10+024)**	**1129,25 días**	**0**	**81,901%**	**81,901%**	**jue 1/12/22**	**mar 4/08/26**	
1472	**1.3.9.6.1**	**Tramo 1A costado oriental Calle 63-calle 66 (K8+980 - K9+250) TRIANGULO**	**867,63 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**jue 29/12/22**	**vie 24/10/25**	
1473	1.3.9.6.1.1	Inicio de tramo 1	0 días	100	0,000%	0,000%	jue 29/12/22	jue 29/12/22	1167FC+199 días
1474	1.3.9.6.1.2	Demoliciones	352,38 días	100	100,000%	100,000%	vie 30/12/22	mié 21/02/24	1473CC
1475	1.3.9.6.1.3	Excavaciones	357,5 días	100	100,000%	100,000%	jue 12/01/23	sáb 9/03/24	1474CC+10 días
1476	1.3.9.6.1.4	Mejoramiento	362,63 días	100	100,000%	100,000%	mar 24/01/23	sáb 30/03/24	1475CC+10 días
1477	1.3.9.6.1.5	Subbase granular reciclada	362,63 días	100	100,000%	100,000%	sáb 4/02/23	jue 11/04/24	1476CC+10 días
1478	1.3.9.6.1.6	Mezcla densa en caliente MD-12	345 días	100	100,000%	100,000%	sáb 11/03/23	vie 26/04/24	1477CC+30 días
1479	1.3.9.6.1.2	Demoliciones	50 días	100	100,000%	100,000%	jue 15/05/25	lun 14/07/25	1478FC+322 días
1480	1.3.9.6.1.3	Excavaciones	80 días	100	100,000%	100,000%	mar 27/05/25	vie 29/08/25	1479CC+10 días
1481	1.3.9.6.1.4	Mejoramiento	80 días	100	100,000%	100,000%	lun 9/06/25	jue 11/09/25	1480CC+11 días
1482	1.3.9.6.1.5	Subbase granular reciclada	80 días	100	100,000%	100,000%	vie 20/06/25	mar 23/09/25	1481CC+10 días
1483	1.3.9.6.1.6	Mezcla densa en caliente MD-12	60 días	100	100,000%	100,000%	mié 16/07/25	mié 24/09/25	1482CC+21 días
1484	1.3.9.6.1.4	Mejoramiento	80 días	100	100,000%	100,000%	vie 20/06/25	mar 23/09/25	1480CC+21 días
1485	1.3.9.6.1.6	Mezcla densa en caliente MD-12	80 días	100	100,000%	100,000%	mié 23/07/25	vie 24/10/25	1486CC+6 días
1486	1.3.9.6.1.5	Subbase granular reciclada	80 días	100	100,000%	100,000%	mié 16/07/25	vie 17/10/25	1484CC+21 días
1487	**1.3.9.6.1**	**Tramo 1B costado oriental Calle 63-calle 66 (K9+350 - K9+430)**	**900,38 días**	**0**	**99,794%**	**99,794%**	**jue 22/06/23**	**mar 26/05/26**	
1488	1.3.9.6.1.2	Demoliciones	5 días	100	100,000%	100,000%	jue 22/06/23	mar 27/06/23	1183CC
1489	1.3.9.6.1.3	Excavaciones	4 días	100	100,000%	100,000%	mié 16/07/25	lun 21/07/25	1479FC+2 días;14
1490	1.3.9.6.1.4	Mejoramiento	5 días	100	100,000%	100,000%	lun 28/07/25	vie 1/08/25	1489CC+10 días
1491	1.3.9.6.1.5	Subbase granular reciclada	4 días	100	100,000%	100,000%	sáb 9/08/25	jue 14/08/25	1490CC+11 días
1492	1.3.9.6.1.6	Mezcla densa en caliente MD-12	3 días	100	100,000%	100,000%	jue 21/08/25	lun 25/08/25	1491CC+9 días;14
1493	1.3.9.6.1.4	Mejoramiento	5 días	100	100,000%	100,000%	lun 28/07/25	vie 1/08/25	1489CC+10 días
1494	1.3.9.6.1.5	Subbase granular reciclada	5 días	100	100,000%	100,000%	vie 8/08/25	jue 14/08/25	1493CC+10 días
1495	1.3.9.6.1.6	Mezcla densa en caliente MD-12	5 días	100	100,000%	100,000%	jue 21/08/25	mié 27/08/25	1494CC+10 días;1
1496	1.3.9.6.1.4	Mejoramiento	5 días	0	0,000%	0,000%	lun 27/04/26	sáb 2/05/26	1489CC+240 días
1497	1.3.9.6.1.5	Subbase granular reciclada	5 días	0	0,000%	0,000%	vie 8/05/26	jue 14/05/26	1496CC+10 días
1498	1.3.9.6.1.6	Mezcla densa en caliente MD-12	5 días	0	0,000%	0,000%	jue 21/05/26	mar 26/05/26	1497CC+10 días;1

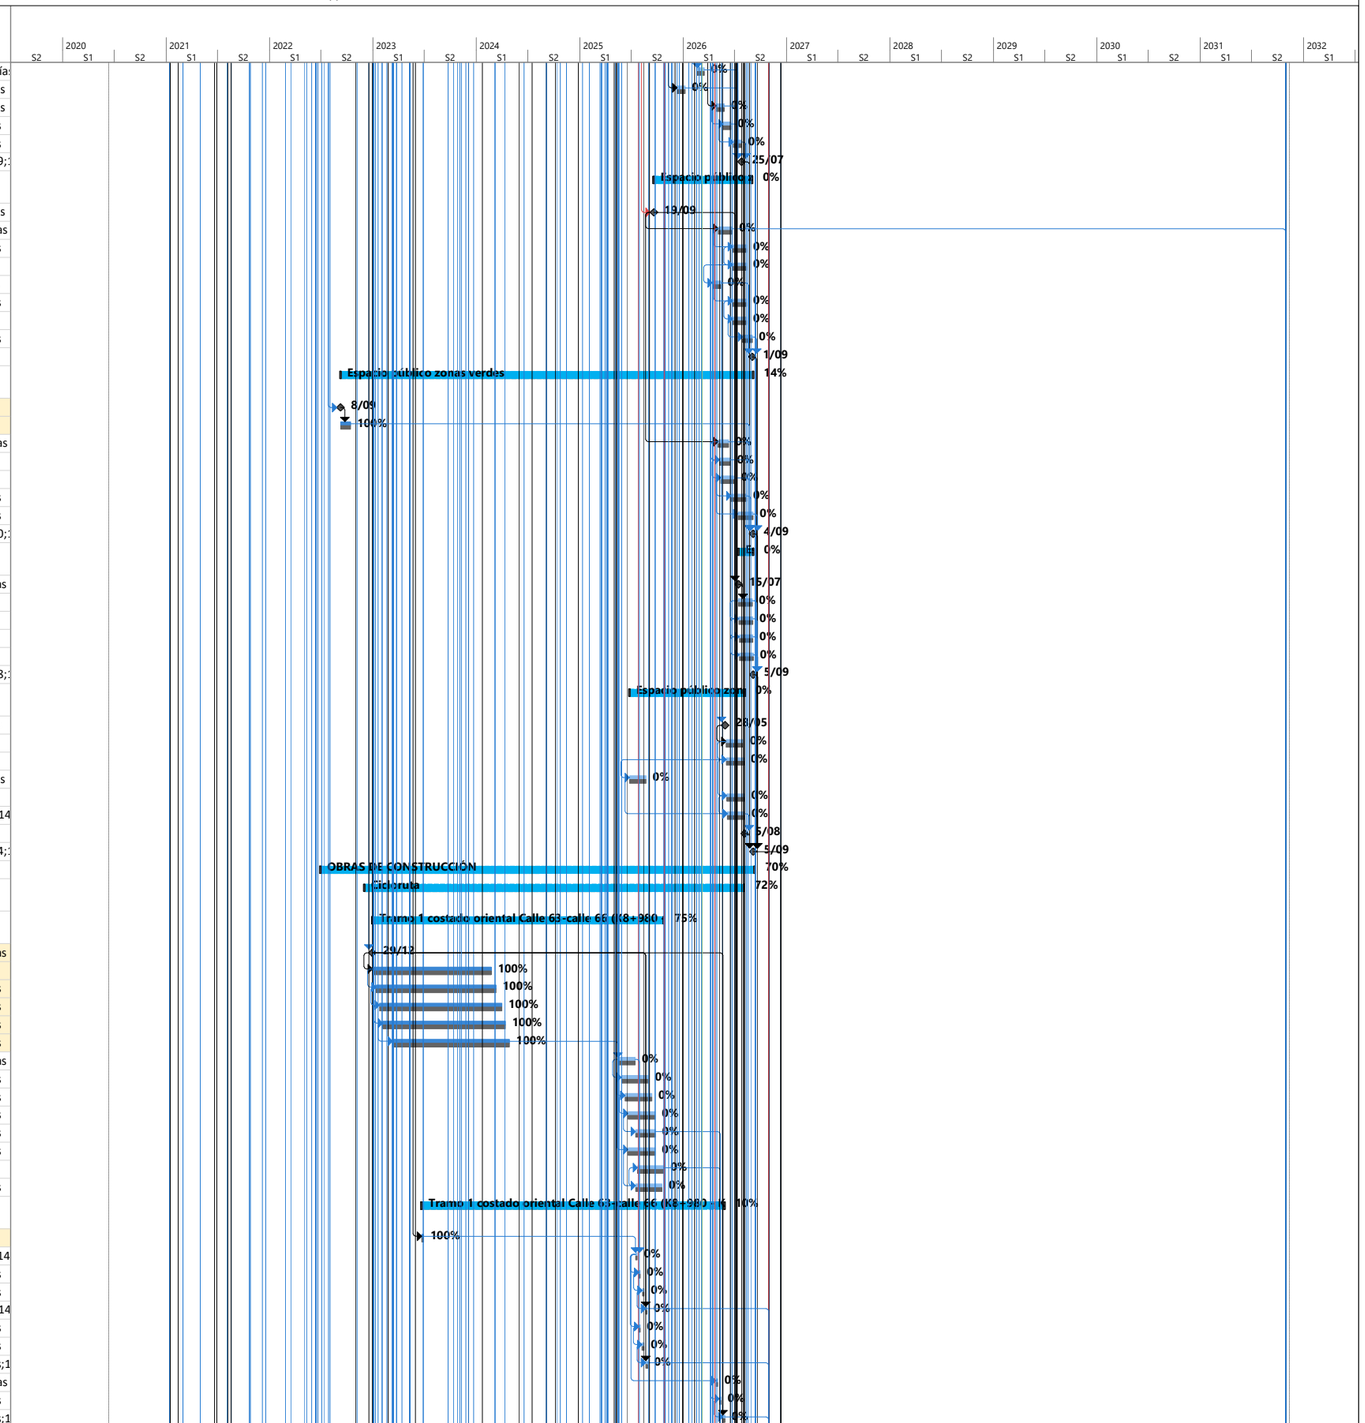


Tareas críticas · Tarea · Tarea manual · solo duración · Hito de línea base · Resumen · Tareas externas · Hito inactivo
División crítica · División · solo el comienzo · Línea base · Hito · Resumen manual · Hito externo · Resumen inactivo
Progreso de tarea crítica · Progreso de tarea · solo fin · División de la línea base · Progreso del resumen · Resumen del proyecto · Tarea inactiva · Fecha límite

Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	% Avance Conciliado	% Avance Programado (% PV)	% Avance Ejecutado conciliado (% EV))	Comienzo	Fin	Predecesoras
1499	**1.3.9.6.1**	**Tramo 1C costado oriental Calle 63-calle 66 (K9+430 - K9+560)**	**102 días**	**0**	**0,000%**	**0,000%**	**sáb 4/04/26**	**mar 4/08/26**	
1500	1.3.9.6.1.2	Demoliciones	7 días	0	0,000%	0,000%	sáb 4/04/26	lun 13/04/26	1200CC+850 días
1501	1.3.9.6.1.3	Excavaciones	7 días	0	0,000%	0,000%	vie 10/04/26	vie 17/04/26	1500CC+5 días
1502	1.3.9.6.1.4	Mejoramiento	7 días	0	0,000%	0,000%	mié 15/04/26	jue 23/04/26	1501CC+5 días
1503	1.3.9.6.1.5	Subbase granular reciclada	6 días	0	0,000%	0,000%	mié 22/04/26	mié 29/04/26	1502CC+6 días
1504	1.3.9.6.1.6	Mezcla densa en caliente MD-12	6 días	0	0,000%	0,000%	mié 29/07/26	mar 4/08/26	1503CC+80 días
1505	**1.3.9.6.1**	**Tramo 1D costado oriental Calle 63-calle 66 (K9+560 - K9+760)**	**601,88 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**mar 25/04/23**	**mar 8/04/25**	
1506	1.3.9.6.1.2	Demoliciones	6,13 días	100	100,000%	100,000%	mar 25/04/23	mar 2/05/23	453CC+1 día
1507	1.3.9.6.1.3	Excavaciones	6,13 días	100	100,000%	100,000%	mar 2/05/23	lun 8/05/23	1506CC+5 días
1508	1.3.9.6.1.4	Mejoramiento	6,13 días	100	100,000%	100,000%	vie 16/06/23	vie 23/06/23	1507CC+37 días
1509	1.3.9.6.1.5	Subbase granular reciclada	7,25 días	100	100,000%	100,000%	jue 15/06/23	vie 23/06/23	1508CC-1 día
1510	1.3.9.6.1.6	Mezcla densa en caliente MD-12	6,13 días	100	100,000%	100,000%	mar 15/08/23	mar 22/08/23	1509CC+48 días
1511	1.3.9.6.1.3	Excavaciones	6 días	100	100,000%	100,000%	jue 13/03/25	jue 20/03/25	1500FC-331 días
1512	1.3.9.6.1.4	Mejoramiento	6 días	100	100,000%	100,000%	mié 19/03/25	jue 27/03/25	1511CC+5 días
1513	1.3.9.6.1.5	Subbase granular reciclada	6 días	100	100,000%	100,000%	mié 26/03/25	mié 2/04/25	1512CC+5 días
1514	1.3.9.6.1.6	Mezcla densa en caliente MD-12	6 días	100	100,000%	100,000%	mié 2/04/25	mar 8/04/25	1513CC+6 días
1515	**1.3.9.6.1**	**Tramo 1E costado oriental Calle 63-calle 66 (K9+760 - K9+805)**	**429,63 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**mar 21/03/23**	**jue 15/08/24**	
1516	1.3.9.6.1.2	Demoliciones	5 días	100	100,000%	100,000%	mar 21/03/23	sáb 25/03/23	1405CC-113 días
1517	1.3.9.6.1.3	Excavaciones	5 días	100	100,000%	100,000%	mar 2/05/23	sáb 6/05/23	1516CC+33 días
1518	1.3.9.6.1.4	Mejoramiento	8,38 días	100	100,000%	100,000%	lun 8/05/23	mar 16/05/23	1517
1519	1.3.9.6.1.5	Subbase granular reciclada	8,38 días	100	100,000%	100,000%	mar 6/08/24	jue 15/08/24	1518FC+360 días
1520	1.3.9.6.1.6	Mezcla densa en caliente MD-12	7,25 días	100	100,000%	100,000%	mar 6/08/24	mié 14/08/24	1519CC
1521	**1.3.9.6.1**	**Tramo 1F costado oriental Calle 63-calle 66 (K9+805 - K9+835)**	**295,88 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**jue 30/05/24**	**jue 15/05/25**	
1522	1.3.9.6.1.2	Demoliciones	11 días	100	100,000%	100,000%	jue 20/03/25	jue 3/04/25	1511
1523	1.3.9.6.1.3	Excavaciones	11 días	100	100,000%	100,000%	jue 3/04/25	mar 15/04/25	1522
1524	1.3.9.6.1.4	Mejoramiento	10 días	100	100,000%	100,000%	mié 16/04/25	mié 30/04/25	1523FC+1 día
1525	1.3.9.6.1.5	Subbase granular reciclada	13 días	100	100,000%	100,000%	jue 30/05/24	sáb 15/06/24	1517FC+314 días
1526	1.3.9.6.1.6	Mezcla densa en caliente MD-12	12 días	100	100,000%	100,000%	vie 2/05/25	jue 15/05/25	1524FC+1 día;152
1527	**1.3.9.6.1**	**Tramo 1G costado oriental Calle 63-calle 66 (K9+835 - K9+865)**	**13 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**lun 14/04/25**	**vie 2/05/25**	
1528	1.3.9.6.1.2	Demoliciones	2 días	100	100,000%	100,000%	lun 14/04/25	mié 16/04/25	1511FC+21 días
1529	1.3.9.6.1.3	Excavaciones	2 días	100	100,000%	100,000%	lun 21/04/25	mar 22/04/25	1528FC+1 día
1530	1.3.9.6.1.4	Mejoramiento	2 días	100	100,000%	100,000%	mar 22/04/25	jue 24/04/25	1529
1531	1.3.9.6.1.5	Subbase granular reciclada	3 días	100	100,000%	100,000%	vie 25/04/25	mar 29/04/25	1530FC+1 día
1532	1.3.9.6.1.6	Mezcla densa en caliente MD-12	2 días	100	100,000%	100,000%	mar 29/04/25	vie 2/05/25	1531
1533	**1.3.9.6.1**	**Tramo 1H costado oriental Calle 63-calle 66 (K9+865 - K10+024)**	**769,25 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**jue 1/12/22**	**sáb 31/05/25**	
1534	1.3.9.6.1.2	Demoliciones	103,88 días	100	100,000%	100,000%	jue 1/12/22	jue 30/03/23	1269CC
1535	1.3.9.6.1.3	Excavaciones	160,75 días	100	100,000%	100,000%	mié 14/12/22	mié 21/06/23	1534CC+10 días
1536	1.3.9.6.1.4	Mejoramiento	49,88 días	100	100,000%	100,000%	lun 24/04/23	jue 22/06/23	1535FC-47 días
1537	1.3.9.6.1.5	Subbase granular reciclada	51 días	100	100,000%	100,000%	lun 24/04/23	vie 23/06/23	1536CC
1538	1.3.9.6.1.6	Mezcla densa en caliente MD-12	62,38 días	100	100,000%	100,000%	lun 24/04/23	vie 7/07/23	1537CC
1539	1.3.9.6.1.5	Subbase granular reciclada	49 días	100	100,000%	100,000%	jue 20/03/25	lun 19/05/25	1511
1540	1.3.9.6.1.6	Mezcla densa en caliente MD-12	60 días	100	100,000%	100,000%	jue 20/03/25	sáb 31/05/25	1539CC
1541	1.3.9.6.1.7	señalización y demarcación	20 días	0	0,000%	0,000%	mar 12/05/26	jue 4/06/26	1540CC+350 días
1542	1.3.9.6.1.8	Tramo recibido por la interventoría	0 días	0	0,000%	0,000%	jue 4/06/26	jue 4/06/26	1541
1543	1.3.9.6.1.9	Fin de tramo 1	0 días	0	0,000%	0,000%	lun 25/05/26	lun 25/05/26	1542FC-10 días;14
1544	**1.3.9.6.2**	**Tramo 2 costado oriental calle 53-calle 63 (K7+970 - K8+980)**	**1271,13 días**	**0**	**95,000%**	**95,000%**	**mié 29/06/22**	**mar 18/08/26**	
1545	**1.3.9.6.2**	**Tramo 2A costado oriental calle 53-calle 63 (K7+970 - K8+240)**	**647 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**lun 24/04/23**	**sáb 31/05/25**	
1546	1.3.9.6.2.2	Demoliciones	20,88 días	100	100,000%	100,000%	lun 24/04/23	mié 17/05/23	1280CC
1547	1.3.9.6.2.3	Excavaciones	26 días	100	100,000%	100,000%	lun 24/04/23	mié 24/05/23	1546CC
1548	1.3.9.6.2.4	Mejoramiento	26 días	100	100,000%	100,000%	lun 24/04/23	mié 24/05/23	1546CC;1547CC
1549	1.3.9.6.2.5	Subbase granular reciclada	31,13 días	100	100,000%	100,000%	lun 24/04/23	mar 30/05/23	1546CC;1548CC
1550	1.3.9.6.2.6	Mezcla densa en caliente MD-12	20,88 días	100	100,000%	100,000%	mar 13/06/23	vie 7/07/23	1549FC+10 días
1551	1.3.9.6.2.5	Subbase granular reciclada	30 días	100	100,000%	100,000%	jue 20/03/25	sáb 26/04/25	1511
1552	1.3.9.6.2.6	Mezcla densa en caliente MD-12	18 días	100	100,000%	100,000%	lun 12/05/25	sáb 31/05/25	1551FC+12 días
1553	**1.3.9.6.2**	**Tramo 2B costado oriental calle 53-calle 63 (K8+240 - K8+980)**	**363,13 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**mié 29/06/22**	**vie 1/09/23**	
1554	1.3.9.6.2.2	Demoliciones	316,5 días	100	100,000%	100,000%	mié 29/06/22	vie 7/07/23	1290CC
1555	1.3.9.6.2.3	Excavaciones	316,5 días	100	100,000%	100,000%	mar 12/07/22	mié 19/07/23	1554CC+10 días
1556	1.3.9.6.2.4	Mejoramiento	321,63 días	100	100,000%	100,000%	lun 25/07/22	mar 8/08/23	1555CC+10 días
1557	1.3.9.6.2.5	Subbase granular reciclada	321,13 días	100	100,000%	100,000%	vie 5/08/22	sáb 19/08/23	1556CC+10 días
1558	1.3.9.6.2.6	Mezcla densa en caliente MD-12	321,63 días	100	100,000%	100,000%	jue 18/08/22	vie 1/09/23	1557CC+10 días
1559	1.3.9.6.2.7	señalización y demarcación	20 días	0	0,000%	0,000%	vie 24/07/26	mar 18/08/26	1550FC+350 días;
1560	1.3.9.6.2.8	Tramo recibido por la interventoría	0 días	0	0,000%	0,000%	mar 18/08/26	mar 18/08/26	1559
1561	1.3.9.6.2.9	Fin de tramo 2	0 días	0	0,000%	0,000%	mar 18/08/26	mar 18/08/26	1560
1562	**1.3.9.6.3**	**Tramo 3 costado occidental calle 63-calle 66 (K8+980 - K10+024)**	**759,38 días**	**0**	**46,000%**	**46,000%**	**mar 19/03/24**	**jue 10/09/26**	
1563	1.3.9.6.3.1	Inicio de tramo 3	0 días	0	0,000%	0,000%	mar 19/03/24	mar 19/03/24	1300CC+25 días
1564	**1.3.9.6.3**	**Tramo 3C costado occidental calle 63-calle 66 (K8+980 - K9+180)**	**651 días**	**0**	**46,000%**	**46,000%**	**mar 30/07/24**	**jue 10/09/26**	
1565	1.3.9.6.3.2	Demoliciones	25 días	100	100,000%	100,000%	mar 30/07/24	jue 29/08/24	1558CC+600 días

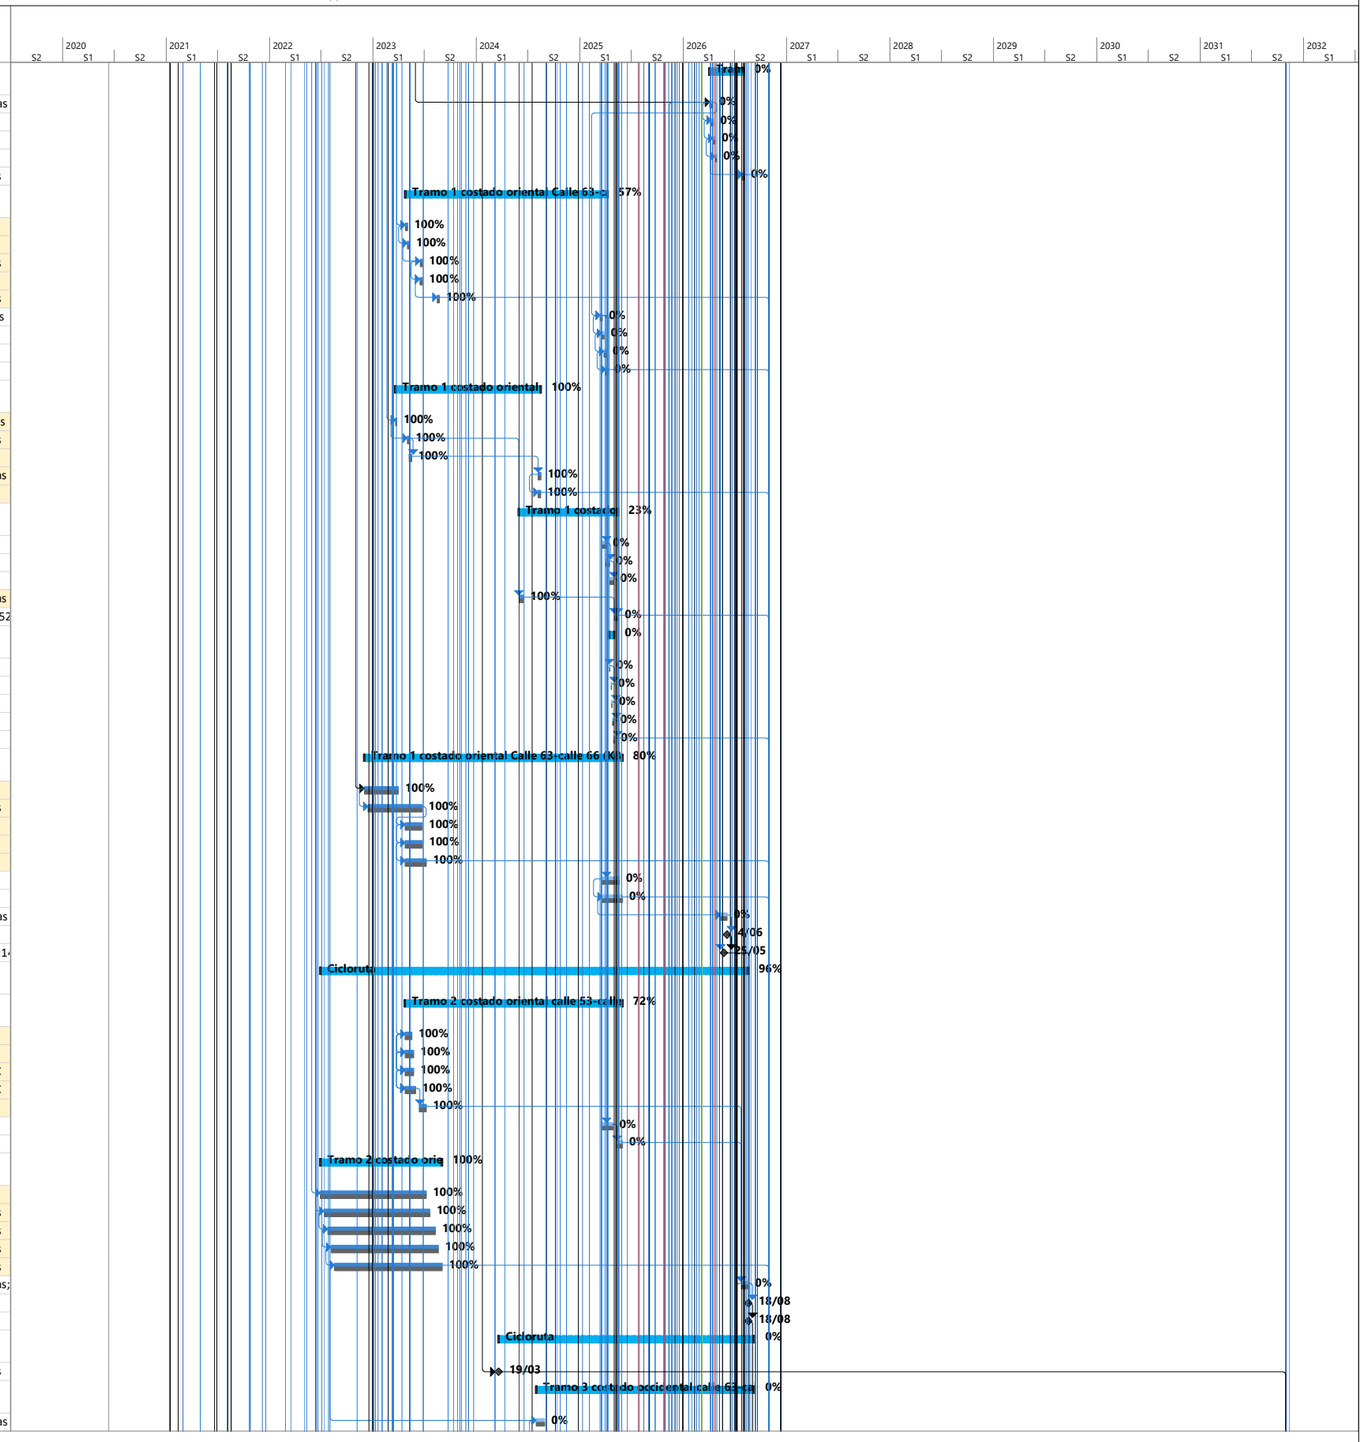


Tareas críticas · Tarea · Tarea manual · solo duración · Hito de línea base · Resumen · Tareas externas · Hito inactivo
División crítica · División · solo el comienzo · Línea base · Hito · Resumen manual · Hito externo · Resumen inactivo
Progreso de tarea crítica · Progreso de tarea · solo fin · División de la línea base · Progreso del resumen · Resumen del proyecto · Tarea inactiva · Fecha límite

Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	% Avance Conciliado	% Avance Programado (% PV)	% Avance Ejecutado conciliado (% EV))	Comienzo	Fin	Predecesoras
1566	1.3.9.6.3.3	Excavaciones	25 días	100	100,000%	100,000%	lun 5/08/24	mié 4/09/24	1565CC+5 días
1567	1.3.9.6.3.4	Mejoramiento	25 días	0	0,000%	0,000%	jue 6/08/26	vie 4/09/26	1566CC+616 días
1568	1.3.9.6.3.5	Subbase granular reciclada	25 días	0	0,000%	0,000%	mié 12/08/26	jue 10/09/26	1567CC+5 días
1569	1.3.9.6.3.6	Mezcla densa en caliente MD-12	20 días	0	0,000%	0,000%	mié 19/08/26	jue 10/09/26	1568CC+5 días
1570	1.3.9.6.3.7	señalización y demarcación	12 días	0	0,000%	0,000%	mar 25/08/26	mar 8/09/26	1569CC+5 días
1571	1.3.9.6.3.8	Tramo recibido por la interventoría	0 días	0	0,000%	0,000%	lun 31/08/26	lun 31/08/26	1570CC+5 días
1572	1.3.9.6.3.9	Fin de tramo 3	0 días	0	0,000%	0,000%	lun 31/08/26	lun 31/08/26	1571
1573	**1.3.9.6.4**	**Tramo 4 costado occidental calle 53-calle 63 (K7+970 - K8+980)**	**56 días**	**0**	**0,000%**	**0,000%**	**lun 6/07/26**	**jue 10/09/26**	
1574	1.3.9.6.4.1	Inicio de tramo 4	0 días	0	0,000%	0,000%	mié 29/07/26	mié 29/07/26	1348CC+10 días
1575	**1.3.9.6.4**	**Tramo 4A costado occidental calle 53-calle 63 (K8+550 - K8+980)**	**50 días**	**0**	**0,000%**	**0,000%**	**lun 6/07/26**	**jue 3/09/26**	
1576	1.3.9.6.4.2	Demoliciones	20 días	0	0,000%	0,000%	lun 6/07/26	mié 29/07/26	1574CC-20 días
1577	1.3.9.6.4.3	Excavaciones	30 días	0	0,000%	0,000%	sáb 11/07/26	mar 18/08/26	1576CC+5 días
1578	1.3.9.6.4.4	Mejoramiento	30 días	0	0,000%	0,000%	vie 17/07/26	lun 24/08/26	1577CC+5 días
1579	1.3.9.6.4.5	Subbase granular reciclada	35 días	0	0,000%	0,000%	vie 24/07/26	jue 3/09/26	1578CC+5 días
1580	1.3.9.6.4.6	Mezcla densa en caliente MD-12	30 días	0	0,000%	0,000%	mié 29/07/26	jue 3/09/26	1579CC+5 días
1581	**1.3.9.6.4**	**Tramo 4B costado occidental calle 53-calle 63 (K8+150 - K8+550)**	**30 días**	**0**	**0,000%**	**0,000%**	**mié 5/08/26**	**jue 10/09/26**	
1582	1.3.9.6.4.2	Demoliciones	9 días	0	0,000%	0,000%	mié 5/08/26	mar 18/08/26	115CC+250 días;1
1583	1.3.9.6.4.3	Excavaciones	9 días	0	0,000%	0,000%	mié 12/08/26	lun 24/08/26	1582CC+5 días
1584	1.3.9.6.4.4	Mejoramiento	10 días	0	0,000%	0,000%	mié 19/08/26	lun 31/08/26	1583CC+5 días
1585	1.3.9.6.4.5	Subbase granular reciclada	10 días	0	0,000%	0,000%	mar 25/08/26	vie 4/09/26	1584CC+5 días
1586	1.3.9.6.4.6	Mezcla densa en caliente MD-12	9 días	0	0,000%	0,000%	mar 1/09/26	jue 10/09/26	1585CC+6 días
1587	**1.3.9.6.4**	**Tramo 4C costado occidental calle 53-calle 63 (K7+970 - K8+150)**	**38 días**	**0**	**0,000%**	**0,000%**	**vie 10/07/26**	**mié 26/08/26**	
1588	1.3.9.6.4.2	Demoliciones	4 días	0	0,000%	0,000%	vie 10/07/26	mié 15/07/26	26FC+200 días;13
1589	1.3.9.6.4.3	Excavaciones	8 días	0	0,000%	0,000%	mié 15/07/26	vie 24/07/26	1588
1590	1.3.9.6.4.4	Mejoramiento	8 días	0	0,000%	0,000%	vie 24/07/26	lun 3/08/26	1589
1591	1.3.9.6.4.5	Subbase granular reciclada	8 días	0	0,000%	0,000%	lun 3/08/26	jue 13/08/26	1590
1592	1.3.9.6.4.6	Mezcla densa en caliente MD-12	10 días	0	0,000%	0,000%	jue 13/08/26	mié 26/08/26	1591
1593	1.3.9.6.4.7	señalización y demarcación	15 días	0	0,000%	0,000%	jue 13/08/26	mar 1/09/26	1592CC
1594	1.3.9.6.4.8	Tramo recibido por la interventoría	0 días	0	0,000%	0,000%	mar 1/09/26	mar 1/09/26	1593
1595	1.3.9.6.4.9	Fin de tramo 4	0 días	0	0,000%	0,000%	mar 1/09/26	mar 1/09/26	1594
1596	**1.3.9.6.5**	**Tramo 5 costado occidental y oriental calle 46-calle 53 (K7+915 - K7+970)**	**479,63 días**	**0**	**95,000%**	**95,000%**	**lun 10/02/25**	**jue 3/09/26**	
1597	1.3.9.6.5.1	Inicio de tramo 5	0 días	0	0,000%	0,000%	mar 13/05/25	mar 13/05/25	1395CC
1598	1.3.9.6.5.2	Demoliciones	50 días	100	100,000%	100,000%	lun 10/02/25	mar 8/04/25	1597FC-78 días
1599	1.3.9.6.5.3	Excavaciones	50 días	100	100,000%	100,000%	vie 14/02/25	lun 14/04/25	1598CC+5 días
1600	1.3.9.6.5.4	Mejoramiento	50 días	100	100,000%	100,000%	jue 20/02/25	mar 22/04/25	1599CC+5 días
1601	1.3.9.6.5.5	Subbase granular reciclada	50 días	100	100,000%	100,000%	mié 26/02/25	lun 28/04/25	1600CC+5 días
1602	1.3.9.6.5.6	Mezcla densa en caliente MD-12	51 días	100	100,000%	100,000%	mar 4/03/25	lun 5/05/25	1601CC+5 días
1603	1.3.9.6.5.7	señalización y demarcación	15 días	0	0,000%	0,000%	mar 18/08/26	jue 3/09/26	1602FC+20 días;1
1604	1.3.9.6.5.8	Tramo recibido por la interventoría	0 días	0	0,000%	0,000%	jue 3/09/26	jue 3/09/26	1602;1603
1605	1.3.9.6.5.9	Fin de tramo 5	0 días	0	0,000%	0,000%	jue 3/09/26	jue 3/09/26	1598;1599;1600;
1606	**1.3.9.6.6**	**Tramo 6 costado occidental calle 46-calle 53 (K7+915 - K7+970)**	**940,75 días**	**0**	**62,261%**	**62,261%**	**jue 10/08/23**	**mar 1/09/26**	
1607	1.3.9.6.6.1	Inicio de tramo 6	0 días	100	0,000%	0,000%	jue 10/08/23	jue 10/08/23	1405CC
1608	1.3.9.6.6.2	Demoliciones	20,38 días	100	100,000%	100,000%	jue 10/08/23	sáb 2/09/23	1607
1609	1.3.9.6.6.3	Excavaciones	20,88 días	100	100,000%	100,000%	mié 16/08/23	vie 8/09/23	1608CC+5 días
1610	1.3.9.6.6.4	Mejoramiento	20,88 días	100	100,000%	100,000%	jue 24/08/23	vie 15/09/23	1609CC+6 días
1611	1.3.9.6.6.4	Mejoramiento	19,5 días	100	100,000%	100,000%	vie 21/02/25	sáb 15/03/25	1597FC-67 días
1612	1.3.9.6.6.5	Subbase granular reciclada	25 días	100	100,000%	100,000%	sáb 1/03/25	lun 31/03/25	1610CC+5 días;16
1613	1.3.9.6.6.6	Mezcla densa en caliente MD-12	20 días	100	100,000%	100,000%	vie 23/05/25	mar 17/06/25	1597CC+10 días
1614	1.3.9.6.6.4	Mejoramiento	19 días	0	0,000%	0,000%	lun 4/05/26	mié 27/05/26	1597FC+300 días
1615	1.3.9.6.6.5	Subbase granular reciclada	25 días	0	0,000%	0,000%	vie 22/05/26	lun 22/06/26	1614CC+15 días;1
1616	1.3.9.6.6.6	Mezcla densa en caliente MD-12	20 días	0	0,000%	0,000%	lun 22/06/26	mié 15/07/26	1597CC+340 días
1617	1.3.9.6.6.7	señalización y demarcación	16 días	0	0,000%	0,000%	jue 13/08/26	mar 1/09/26	1613;1593CC;161
1618	1.3.9.6.6.8	Tramo recibido por la interventoría	0 días	0	0,000%	0,000%	mar 1/09/26	mar 1/09/26	1613;1617FC-1 dí
1619	1.3.9.6.6.9	Fin de tramo 6	0 días	0	0,000%	0,000%	mar 1/09/26	mar 1/09/26	1618CC
1620	1.3.9.6.7	Fin Cicloruta	0 días	0	0,000%	0,000%	jue 3/09/26	jue 3/09/26	1605;1619;1543;
1621	**1.3.9.7**	**Estación BRT # 11 -Tipo 3 calle 53**	**731 días**	**0**	**37,953%**	**47,769%**	**lun 22/04/24**	**mié 9/09/26**	
1622	1.3.9.7.1	Inicio estación BRT #11- tipo 3 calle 53	0 días	0	0,000%	0,000%	lun 22/04/24	lun 22/04/24	11FC+160 días;17
1623	1.3.9.7.2	Cimentación (Avance Oct-2024)	72,63 días	100	100,000%	100,000%	jue 29/08/24	jue 21/11/24	1622CC+160 días
1624	1.3.9.7.2	Cimentación	20 días	100	100,000%	100,000%	lun 16/12/24	vie 10/01/25	1623FC+21 días
1625	**1.3.9.7.3**	**Estructura metálica**	**100,25 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**lun 7/10/24**	**mar 4/02/25**	
1626	1.3.9.7.4.1	Suministro de estructura metálica	10 días	100	100,000%	100,000%	lun 7/10/24	vie 18/10/24	1622CC+141 días
1627	1.3.9.7.3.1	Suministro de estructura metálica	30 días	100	100,000%	100,000%	jue 19/12/24	vie 24/01/25	1626FC+52 días
1628	1.3.9.7.3.2	Instalación de estructura metálica	61 días	100	100,000%	100,000%	sáb 23/11/24	mar 4/02/25	1623FC+58 días;1
1629	**1.3.9.7.4**	**Acabados**	**154 días**	**0**	**0,000%**	**16,827%**	**vie 6/03/26**	**mié 9/09/26**	
1630	1.3.9.7.4.1	Puertas y cerramientos	50 días	0	0,000%	0,000%	vie 26/06/26	mié 26/08/26	1651CC
1631	1.3.9.7.4.2	Pisos y mobiliario	38 días	100	0,000%	100,000%	vie 6/03/26	mié 22/04/26	1651CC-92 días
1632	1.3.9.7.4.3	Cubierta	50 días	100	0,000%	100,000%	mié 1/04/26	mar 2/06/26	1651CC-70 días
1633	1.3.9.7.4.2	Pisos y mobiliario	38 días	0	0,000%	0,000%	mié 22/07/26	vie 4/09/26	1651CC+20 días
1634	1.3.9.7.4.3	Cubierta	50 días	0	0,000%	0,000%	sáb 11/07/26	mié 9/09/26	1651CC+12 días
1635	1.3.9.7.4.4	Señalética	30 días	0	0,000%	0,000%	mié 22/07/26	mié 26/08/26	1651CC+20 días
1636	1.3.9.7.5	Sistema electromecánico de puertas (Incluye redes in	30 días	0	0,000%	0,000%	sáb 1/08/26	lun 7/09/26	1635FC-20 días

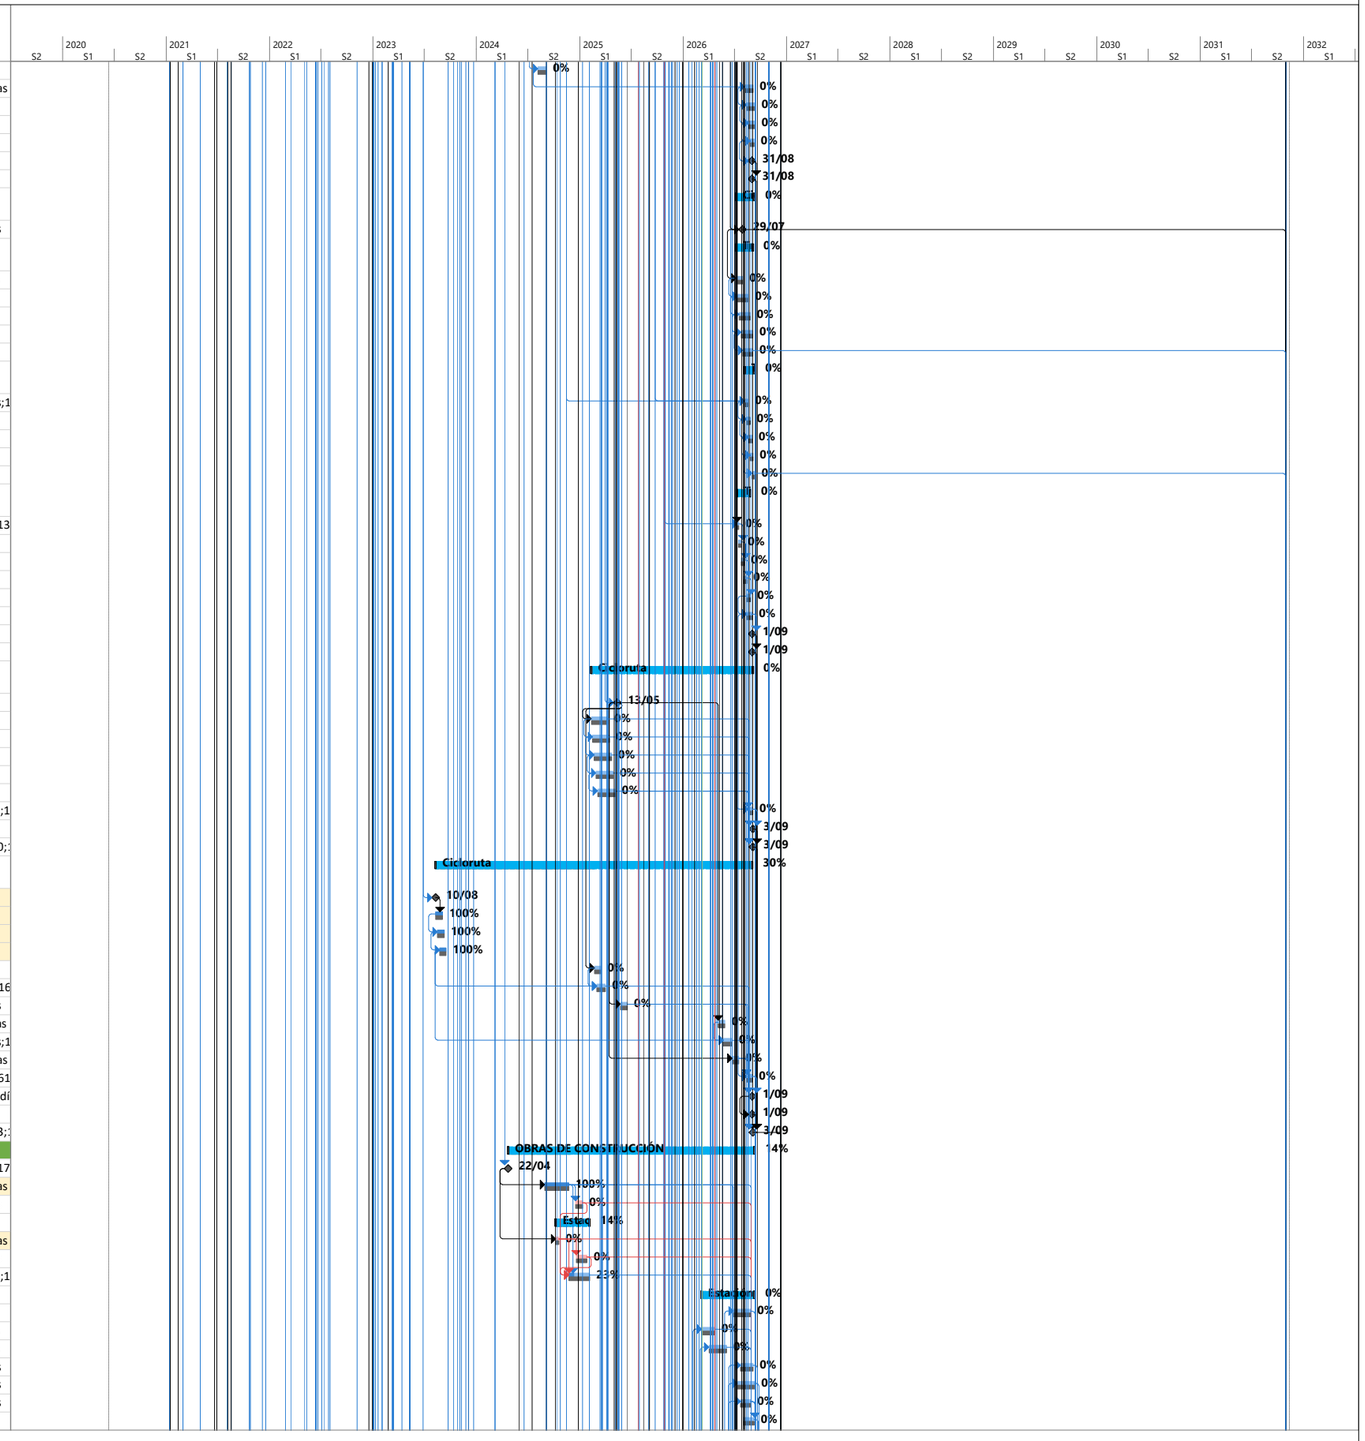


Tareas críticas | Tarea | Tarea manual | solo duración | Hito de línea base | Resumen | Tareas externas | Hito inactivo
División crítica | División | solo el comienzo | Línea base | Hito | Resumen manual | Hito externo | Resumen inactivo
Progreso de tarea crítica | Progreso de tarea | solo fin | División de la línea base | Progreso del resumen | Resumen del proyecto | Tarea inactiva | Fecha límite

Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	% Avance Conciliado	% Avance Programado (% PV)	% Avance Ejecutado conciliado (% EV))	Comienzo	Fin	Predecesoras
1637	**1.3.9.7.5**	**Delta de Acabados de estación**	**30 días**	**0**	**0,000%**	**13,845%**	**mar 4/08/26**	**mié 9/09/26**	
1638	1.3.9.7.5	Valor Delta Acabados (Suministro E Instalación Pasam	30 días	100	0,000%	100,000%	mar 4/08/26	mié 9/09/26	1635CC+12 días
1639	1.3.9.7.5	Valor Delta Acabados (Suministro E Instalación Pasam	30 días	0	0,000%	0,000%	mar 4/08/26	mié 9/09/26	1635CC+12 días
1640	1.3.9.7.5	Valor Delta Sistema Electromecánico Puertas Sencilla	30 días	0	0,000%	0,000%	mar 4/08/26	mié 9/09/26	1635CC+12 días
1641	1.3.9.7.5	Valor Delta Sistema Electromecánico Puertas Sencilla	30 días	0	0,000%	0,000%	mar 4/08/26	mié 9/09/26	1635CC+12 días
1642	1.3.9.7.6	Fin estación BRT #11- tipo 3 calle 53	0 días	0	0,000%	0,000%	mié 9/09/26	mié 9/09/26	1623;1627;1628;
1643	**1.3.9.8**	**Estación BRT #12- Tipo 3 Simón Bolívar**	**1180,88 días**	**0**	**42,104%**	**42,104%**	**mié 2/11/22**	**lun 7/09/26**	
1644	1.3.9.8.1	Inicio estación BRT #12-tipo 3 Simón Bolívar	0 días	0	0,000%	0,000%	mar 31/01/23	mar 31/01/23	8FC+581 días
1645	1.3.9.8.2	Cimentación	23,13 días	100	100,000%	100,000%	mar 31/01/23	vie 24/02/23	1644FC-1 día
1646	**1.3.9.8.3**	**Estructura metálica**	**956,88 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**mié 2/11/22**	**vie 12/12/25**	
1647	1.3.9.8.3.1	Suministro de estructura metálica	98,75 días	100	100,000%	100,000%	mié 2/11/22	vie 24/02/23	1645CC-73 días
1648	1.3.9.8.3.2	Instalación de estructura metálica	31,13 días	100	100,000%	100,000%	vie 9/08/24	vie 13/09/24	1645FC+427 días
1649	1.3.9.8.3.2	Instalación de estructura metálica	222 días	100	100,000%	100,000%	sáb 22/03/25	vie 12/12/25	1623FC+104 días;
1650	**1.3.9.8.4**	**Acabados**	**223 días**	**0**	**10,096%**	**10,096%**	**sáb 13/12/25**	**lun 7/09/26**	
1651	1.3.9.8.4.1	Puertas y cerramientos	60 días	0	0,000%	0,000%	vie 26/06/26	lun 7/09/26	1623FC+490 días
1652	1.3.9.8.4.2	Pisos y mobiliario	60 días	0	0,000%	0,000%	vie 26/06/26	lun 7/09/26	1651CC
1653	1.3.9.8.4.3	Cubierta	0 días	100	100,000%	100,000%	sáb 13/12/25	sáb 13/12/25	1649FC+1 día
1654	1.3.9.8.4.4	Señalética	60 días	0	0,000%	0,000%	mar 23/06/26	jue 3/09/26	1653CC+160 días
1655	1.3.9.8.5	Sistema electromecánico de puertas (Incluye redes internas)	60 días	0	0,000%	0,000%	mar 23/06/26	jue 3/09/26	1654CC
1656	**1.3.9.8.5**	**Delta de Acabados de estación**	**30 días**	**0**	**0,000%**	**0,000%**	**mié 29/07/26**	**jue 3/09/26**	
1657	1.3.9.8.5	Valor Delta Acabados (Suministro E Instalación Pasam	30 días	0	0,000%	0,000%	mié 29/07/26	jue 3/09/26	1654CC+30 días
1658	1.3.9.8.5	Valor Delta Sistema Electromecánico Puertas Sencilla	30 días	0	0,000%	0,000%	mié 29/07/26	jue 3/09/26	1654CC+30 días
1659	1.3.9.8.5	Valor Delta Sistema Electromecánico Puertas Sencilla	30 días	0	0,000%	0,000%	mié 29/07/26	jue 3/09/26	1654CC+30 días
1660	1.3.9.8.6	Fin estación BRT #12-tipo 3 Simón Bolívar	0 días	0	0,000%	0,000%	lun 7/09/26	lun 7/09/26	1654;1655;1657;
1661	**1.3.9.9**	**Estación BRT #13- Tipo 3 Calle 66**	**583,13 días**	**0**	**37,953%**	**42,104%**	**mié 16/10/24**	**mié 9/09/26**	
1662	1.3.9.9.1	Inicio estación BRT #13-tipo 3 Calle 66	0 días	0	0,000%	0,000%	lun 31/03/25	lun 31/03/25	11FC+400 días;17
1663	1.3.9.9.2	Cimentación	72 días	100	100,000%	100,000%	mar 15/07/25	lun 6/10/25	1662FC+88 días
1664	1.3.9.9.3	Cimentación	70 días	100	100,000%	100,000%	jue 15/05/25	mié 6/08/25	1662FC+38 días
1665	**1.3.9.9.3**	**Estructura metálica**	**363,25 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**mié 16/10/24**	**vie 19/12/25**	
1666	1.3.9.9.3.1	Suministro de estructura metálica	81,5 días	100	100,000%	100,000%	mié 16/10/24	mar 21/01/25	1664CC-25 días;1
1667	1.3.9.9.3.2	Instalación de estructura metálica	31 días	100	100,000%	100,000%	mié 12/11/25	vie 19/12/25	1666FC+31 días;1
1668	**1.3.9.9.4**	**Acabados**	**144 días**	**0**	**0,000%**	**10,096%**	**vie 6/03/26**	**vie 28/08/26**	
1669	1.3.9.9.4.1	Puertas y cerramientos	50 días	0	0,000%	0,000%	mar 30/06/26	vie 28/08/26	1651CC+2 días;16
1670	1.3.9.9.4.2	Pisos y mobiliario	50 días	0	0,000%	0,000%	mar 30/06/26	vie 28/08/26	1669CC
1671	1.3.9.9.4.3	Cubierta	49 días	100	0,000%	100,000%	vie 6/03/26	mié 6/05/26	1669CC-94 días
1672	1.3.9.9.4.4	Señalética	50 días	0	0,000%	0,000%	mar 30/06/26	vie 28/08/26	1669CC
1673	1.3.9.9.5	Sistema electromecánico de puertas (Incluye redes in	50 días	0	0,000%	0,000%	mar 30/06/26	vie 28/08/26	1672CC
1674	**1.3.9.9.5**	**Delta de Acabados de estación**	**30 días**	**0**	**0,000%**	**0,000%**	**mar 4/08/26**	**mié 9/09/26**	**1672CC**
1675	1.3.9.9.5	Valor Delta Acabados (Suministro E Instalación Pasam	30 días	0	0,000%	0,000%	mar 4/08/26	mié 9/09/26	1672CC+30 días
1676	1.3.9.9.5	Valor Delta Sistema Electromecánico Puertas Sencilla	30 días	0	0,000%	0,000%	mar 4/08/26	mié 9/09/26	1672CC+30 días
1677	1.3.9.9.5	Valor Delta Sistema Electromecánico Puertas Sencillas, Dintel, Receptor Inteligente, Master	30 días	0	0,000%	0,000%	mar 4/08/26	mié 9/09/26	1672CC+30 días
1678	1.3.9.9.6	Fin estación BRT #13 -tipo 3 Simón Bolívar	0 días	0	0,000%	0,000%	mié 9/09/26	mié 9/09/26	1672;1677;1669;
1679	**1.3.9.10**	**Taquillas externas**	**873,88 días**	**0**	**6,650%**	**42,687%**	**mar 7/11/23**	**vie 11/09/26**	
1680	**1.3.9.10.1**	**Taquilla estación # 13**	**873,88 días**	**0**	**23,009%**	**26,680%**	**mar 7/11/23**	**vie 11/09/26**	
1681	1.3.9.10.1.1	Inicio taquilla estación #13	0 días	100	0,000%	0,000%	mar 7/11/23	mar 7/11/23	178FC+619 días
1682	**1.3.9.10.1.2**	**Taquilla # 7 costado oriental -k9+760**	**871,88 días**	**100**	**28,262%**	**35,383%**	**mar 7/11/23**	**mié 9/09/26**	
1683	1.3.9.10.1.2	Taquilla # 7 costado oriental -k9+760	61,88 días	100	100,000%	100,000%	mar 7/11/23	sáb 20/01/24	1681CC-1 día
1684	1.3.9.10.1.2	Taquilla # 7 costado oriental -k9+760	60 días	100	59,375%	100,000%	mar 20/01/26	lun 30/03/26	178FC+1319 días;
1685	1.3.9.10.1.2	Taquilla # 7 costado oriental -k9+760	60 días	0	0,000%	0,000%	mar 30/06/26	mié 9/09/26	178FC+750 días;1
1686	1.3.9.10.1.2	Delta Taquilla # 7 costado oriental -k9+760 (Acabac	70 días	0	0,000%	0,000%	mié 17/06/26	mié 9/09/26	178FC+740 días;1
1687	**1.3.9.10.1.3**	**Taquilla # 6 costado occidental-k9+730**	**762 días**	**0**	**17,417%**	**17,417%**	**lun 18/03/24**	**vie 11/09/26**	
1688	1.3.9.10.1.3	Taquilla # 6 costado occidental-k9+730	60 días	100	100,000%	100,000%	lun 18/03/24	mié 29/05/24	1686CC-700 días;
1689	1.3.9.10.1.3	Taquilla # 6 costado occidental-k9+730	60 días	0	0,000%	0,000%	mar 30/06/26	mié 9/09/26	1686CC;1685CC;1
1690	1.3.9.10.1.3	Delta Taquilla # 6 costado occidental-k9+730 (Acab	60 días	0	0,000%	0,000%	jue 2/07/26	vie 11/09/26	1686CC+2 días;16
1691	1.3.9.10.1.4	Fin taquilla estación #13	0 días	0	0,000%	0,000%	vie 11/09/26	vie 11/09/26	1686CC;1685CC;1
1692	**1.3.9.10.2**	**Taquilla estación # 11**	**115 días**	**0**	**0,000%**	**55,807%**	**jue 16/04/26**	**mié 2/09/26**	
1693	1.3.9.10.2.1	Inicio taquilla estación #11	0 días	0	0,000%	0,000%	jue 16/04/26	jue 16/04/26	1686CC-61 días;1
1694	**1.3.9.10.2.2**	**Taquilla # 2 costado oriental-k8+025**	**115 días**	**0**	**0,000%**	**55,982%**	**jue 16/04/26**	**mié 2/09/26**	
1695	1.3.9.10.2.2	Taquilla # 2 costado oriental-k8+025	50 días	100	0,000%	100,000%	jue 16/04/26	mar 16/06/26	1693
1696	1.3.9.10.2.2	Taquilla # 2 costado oriental-k8+025	50 días	0	0,000%	0,000%	sáb 27/06/26	jue 27/08/26	1693FC+60 días
1697	1.3.9.10.2.2	Delta Taquilla # 2 costado oriental-k8+025 (acabad	45 días	0	0,000%	0,000%	vie 10/07/26	mié 2/09/26	1693CC+70 días
1698	**1.3.9.10.2.3**	**Taquilla # 1 costado occidental-k7+955**	**115 días**	**0**	**0,000%**	**55,620%**	**jue 16/04/26**	**mié 2/09/26**	
1699	1.3.9.10.2.3	Taquilla # 1 costado occidental-k7+955	51 días	100	0,000%	100,000%	jue 16/04/26	mié 17/06/26	1693
1700	1.3.9.10.2.3	Taquilla # 1 costado occidental-k7+955	51 días	0	0,000%	0,000%	sáb 27/06/26	vie 28/08/26	1693FC+60 días
1701	1.3.9.10.2.3	Delta de Taquilla # 1 costado occidental-k7+955 (Ac	45 días	0	0,000%	0,000%	vie 10/07/26	mié 2/09/26	1693CC+70 días
1702	1.3.9.10.2.4	Fin taquilla estación # 11	0 días	0	0,000%	0,000%	mié 2/09/26	mié 2/09/26	1697;1701;1700;
1703	**1.3.9.10.3**	**Taquilla estación # 12**	**143 días**	**0**	**0,000%**	**44,663%**	**mié 18/03/26**	**mar 8/09/26**	
1704	1.3.9.10.3.1	Inicio taquilla estación # 12	0 días	0	0,000%	0,000%	jue 16/04/26	jue 16/04/26	1686CC-61 días;1
1705	**1.3.9.10.3.2**	**Taquilla # 5 costado oriental-k9+130**	**110 días**	**0**	**0,000%**	**23,207%**	**mar 28/04/26**	**mar 8/09/26**	
1706	1.3.9.10.3.2	Taquilla # 5 costado oriental-k9+130	50 días	100	0,000%	100,000%	mar 28/04/26	sáb 27/06/26	1704FC+10 días
1707	1.3.9.10.3.2	Taquilla # 5 costado oriental-k9+130	40 días	0	0,000%	0,000%	sáb 27/06/26	vie 14/08/26	1704FC+60 días
1708	1.3.9.10.3.2	Delta Taquilla # 5 costado oriental-k9+130 (Acabad	40 días	0	0,000%	0,000%	mié 22/07/26	mar 8/09/26	1704CC+80 días
1709	**1.3.9.10.3.3**	**Taquilla # 4 costado occidental-k9+050 (Acabados y I**	**111 días**	**0**	**0,000%**	**55,621%**	**vie 24/04/26**	**sáb 5/09/26**	
1710	1.3.9.10.3.3	Taquilla # 4 costado occidental-k9+050	49 días	100	0,000%	100,000%	vie 24/04/26	mar 23/06/26	1690CC-56 días;1
1711	1.3.9.10.3.3	Taquilla # 4 costado occidental-k9+050	80 días	100	0,000%	100,000%	mié 13/05/26	jue 20/08/26	1690CC-40 días

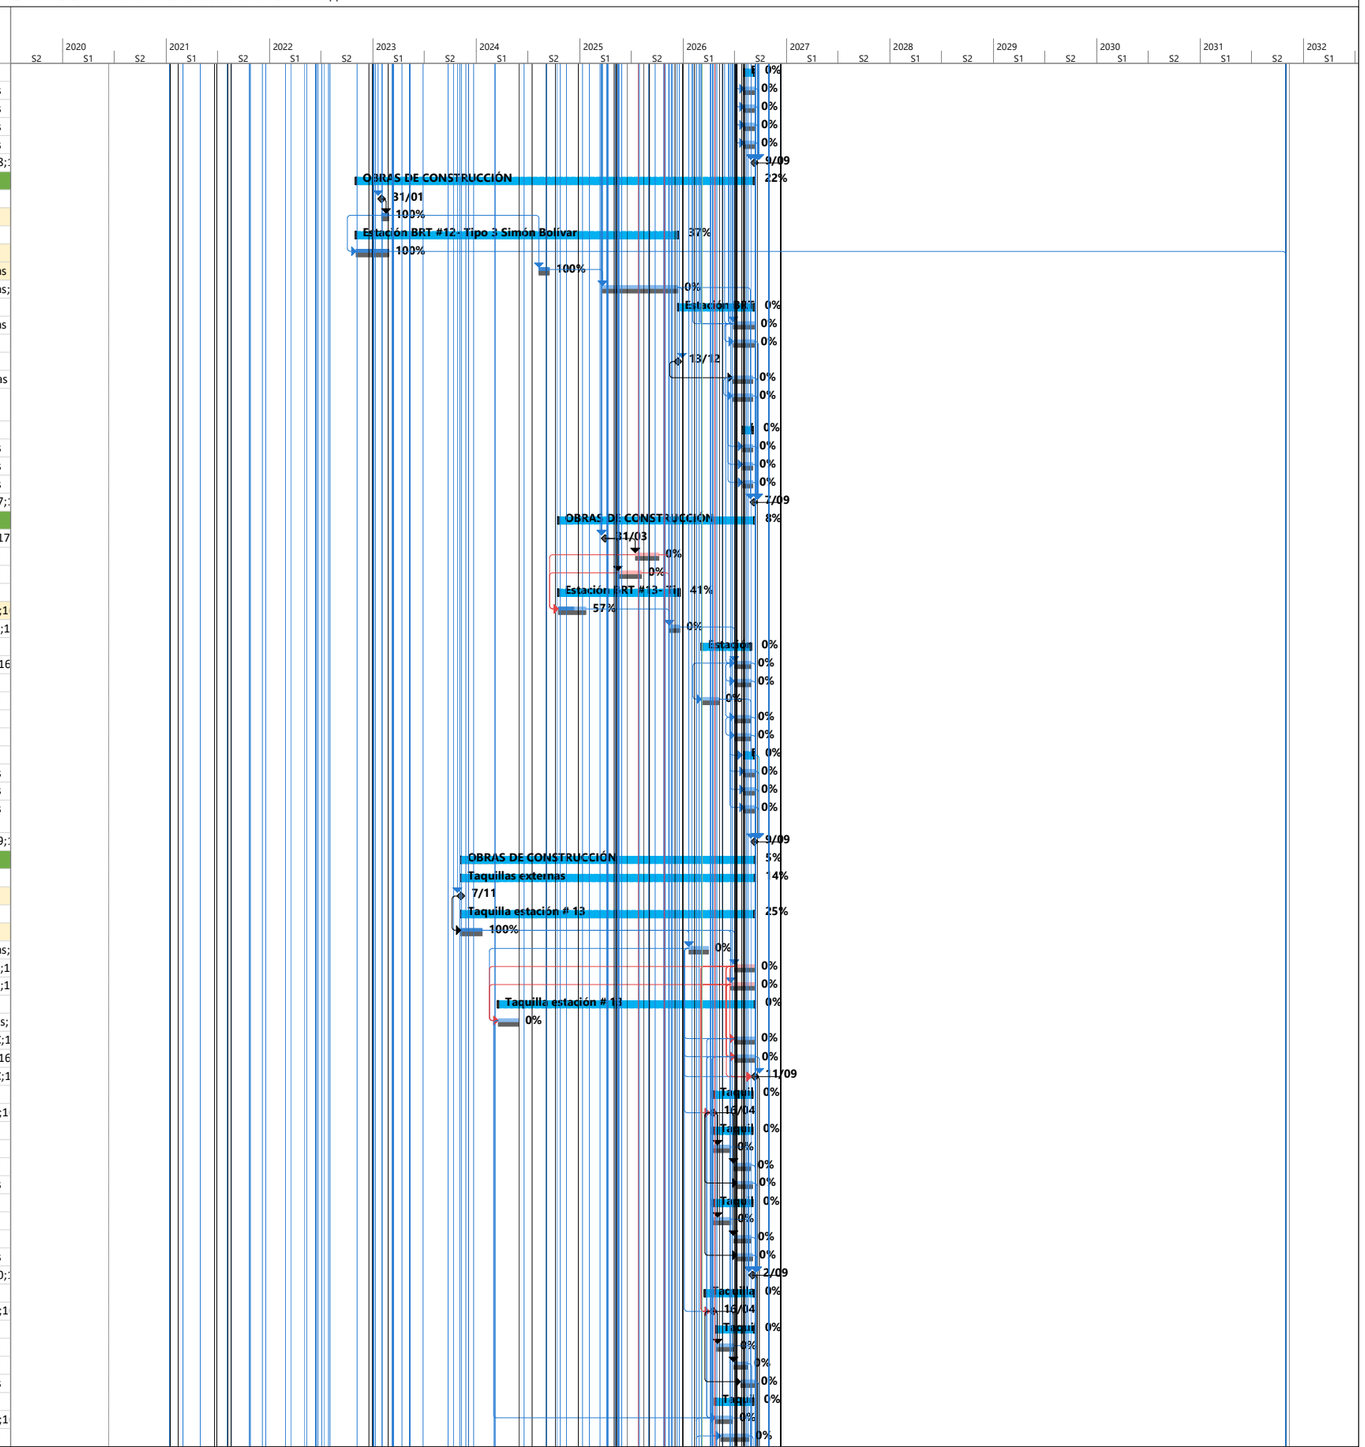


Tareas críticas | Tarea | Tarea manual | solo duración | Hito de línea base | Resumen | Tareas externas | Hito inactivo
División crítica | División | solo el comienzo | Línea base | Hito | Resumen manual | Hito externo | Resumen inactivo
Progreso de tarea crítica | Progreso de tarea | solo fin | División de la línea base | Progreso del resumen | Resumen del proyecto | Tarea inactiva | Fecha límite

Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	% Avance Conciliado	% Avance Programado (% PV)	% Avance Ejecutado conciliado (% EV))	Comienzo	Fin	Predecesoras
1712	1.3.9.10.3.3	Taquilla # 4 costado occidental-k9+050	80 días	0	0,000%	0,000%	mié 13/05/26	jue 20/08/26	1690CC-40 días
1713	1.3.9.10.3.3	Delta Taquilla # 4 costado occidental-k9+050(Acab	30 días	0	0,000%	0,000%	vie 31/07/26	sáb 5/09/26	1690CC+25 días;1
1714	**1.3.9.10.3.4**	**Taquilla # 3 costado occidental-k8+595**	**141 días**	**68,98**	**0,000%**	**55,238%**	**mié 18/03/26**	**sáb 5/09/26**	
1715	1.3.9.10.3.4	Taquilla # 3 costado occidental-k8+595	40 días	100	0,000%	100,000%	mié 18/03/26	mié 6/05/26	1713CC-111 días;
1716	1.3.9.10.3.4	Taquilla # 3 costado occidental-k8+595	40 días	0	0,000%	0,000%	mar 21/07/26	sáb 5/09/26	1713CC-10 días;1
1717	1.3.9.10.3.4	Delta Taquilla # 3 costado occidental-k8+595 (Acab	40 días	0	0,000%	0,000%	mar 21/07/26	sáb 5/09/26	1713CC-10 días;1
1718	1.3.9.10.3.5	Fin taquilla estación # 12	0 días	0	0,000%	0,000%	mar 8/09/26	mar 8/09/26	1708;1713;1717;
1719	1.3.9.10.4	Fin taquillas externas	0 días	0	0,000%	0,000%	vie 11/09/26	vie 11/09/26	1691;1702;1718
1720	**1.3.9.11**	**Ciclopuente P9 Coldeportes-Simón Bolívar**	**794 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**sáb 2/07/22**	**jue 30/01/25**	
1721	1.3.9.11.1	Inicio ciclopuente P9 Coldeportes simón Bolívar	0 días	100	0,000%	0,000%	sáb 2/07/22	sáb 2/07/22	19FC+218 días;47
1722	1.3.9.11.2	Aprobación trámite exclusión BIC	0 días	100	0,000%	0,000%	mar 9/08/22	mar 9/08/22	19;1721FC+30 día
1723	**1.3.9.11.3**	**Cimentación**	**130,63 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**vie 11/11/22**	**jue 13/04/23**	
1724	1.3.9.11.3.1	Apoyo costado oriental	119,25 días	100	100,000%	100,000%	vie 11/11/22	mié 29/03/23	1721CC+107 días
1725	1.3.9.11.3.2	Apoyo central	42,5 días	100	100,000%	100,000%	mié 22/02/23	jue 13/04/23	1724CC+85 días
1726	1.3.9.11.3.3	Apoyo costado occidental	43 días	100	100,000%	100,000%	lun 30/01/23	vie 17/03/23	1722FC-50 días;1
1727	**1.3.9.11.4**	**Estructura metálica**	**659,88 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**vie 11/11/22**	**vie 3/01/25**	
1728	1.3.9.11.4.1	Suministro de estructura metálica	103,88 días	100	100,000%	100,000%	vie 11/11/22	vie 10/03/23	1722FC+77 días
1729	1.3.9.11.4.2	Instalación de estructura metálica	155,13 días	100	100,000%	100,000%	mié 22/02/23	lun 28/08/23	1725FC-41 días;1
1730	1.3.9.11.4.2	Instalación de estructura metálica	70,38 días	100	100,000%	100,000%	vie 11/10/24	vie 3/01/25	178FC+893 días
1731	**1.3.9.11.5**	**Obras complementarias**	**540,38 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**jue 27/04/23**	**jue 30/01/25**	
1732	1.3.9.11.5.1	Pisos	103,38 días	100	100,000%	100,000%	jue 27/04/23	mié 30/08/23	1730CC-431 días;
1733	1.3.9.11.5.1	Pisos	20 días	100	100,000%	100,000%	vie 13/12/24	mié 8/01/25	1730CC+53 días;1
1734	1.3.9.11.5.2	Prueba de carga	5 días	100	100,000%	100,000%	sáb 25/01/25	jue 30/01/25	1732FC+15 días;1
1735	1.3.9.11.6	Fin ciclopuente P9 Coldeportes simón Bolívar	0 días	0	0,000%	0,000%	jue 30/01/25	jue 30/01/25	1734
1736	**1.3.9.12**	**Rampa Peatonal R1 calle 53-Simón Bolívar (costado sur)**	**586 días**	**0**	**96,920%**	**96,920%**	**mar 17/09/24**	**vie 14/08/26**	
1737	1.3.9.12.1	Inicio rampa peatonal R1 calle 53-Simón Bolívar (costado sur)	0 días	0	0,000%	0,000%	mar 17/09/24	mar 17/09/24	11FC+234 días;47FC+234
1738	1.3.9.12.2	Cimentación	62,38 días	100	100,000%	100,000%	mié 25/09/24	vie 6/12/24	1726FC+142 días
1739	1.3.9.12.3	Cimentación	60 días	100	100,000%	100,000%	mar 10/12/24	mié 19/02/25	1737FC+72 días
1740	**1.3.9.12.3**	**Estructura metálica**	**237,63 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**lun 7/10/24**	**mié 16/07/25**	
1741	1.3.9.12.3.1	Suministro de estructura metálica	61,88 días	100	100,000%	100,000%	lun 7/10/24	mié 18/12/24	1728FC+152 días;
1742	1.3.9.12.3.1	Suministro de estructura metálica	60 días	100	100,000%	100,000%	vie 7/03/25	lun 19/05/25	1728;1738CC+75
1743	1.3.9.12.3.2	Instalación de estructura metálica	45 días	100	100,000%	100,000%	jue 22/05/25	mié 16/07/25	1730FC+3 días;17
1744	**1.3.9.12.4**	**Obras complementarias**	**331 días**	**0**	**72,000%**	**72,000%**	**mié 16/07/25**	**vie 14/08/26**	
1745	1.3.9.12.4.1	Pisos (Acabados)	30 días	100	100,000%	100,000%	mié 16/07/25	mié 20/08/25	1742;1743
1746	1.3.9.12.4.1	Pisos (Acabados)	30 días	0	0,000%	0,000%	mié 1/04/26	jue 7/05/26	1742FC+220 días;
1747	1.3.9.12.4.2	Prueba de carga	11 días	0	0,000%	0,000%	vie 31/07/26	vie 14/08/26	1746FC+70 días;1
1748	1.3.9.12.5	Fin rampa peatonal R1 calle 53-Simón Bolívar (costado sur)	0 días	0	0,000%	0,000%	vie 14/08/26	vie 14/08/26	1747
1749	**1.3.9.13**	**Rampa Peatonal R2 calle 53-Simón Bolívar (costado norte)**	**462,63 días**	**0**	**97,206%**	**97,800%**	**lun 7/10/24**	**mié 8/04/26**	
1750	1.3.9.13.1	Inicio rampa peatonal R2 calle 53-Simón Bolívar (costado norte)	0 días	0	0,000%	0,000%	mié 19/02/25	mié 19/02/25	1739
1751	1.3.9.13.2	Cimentación	31,13 días	100	100,000%	100,000%	lun 28/10/24	mar 3/12/24	1750
1752	1.3.9.13.3	Cimentación	60 días	100	100,000%	100,000%	jue 27/02/25	vie 9/05/25	1750FC+7 días
1753	**1.3.9.13.3**	**Estructura metálica**	**291,63 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**lun 7/10/24**	**mié 17/09/25**	
1754	1.3.9.13.3.1	Suministro de estructura metálica	61,88 días	100	100,000%	100,000%	lun 7/10/24	mié 18/12/24	1751CC-17 días;1
1755	1.3.9.13.3.1	Suministro de estructura metálica	60 días	100	100,000%	100,000%	mar 13/05/25	mar 22/07/25	1752CC+62 días
1756	1.3.9.13.3.2	Instalación de estructura metálica	45 días	100	100,000%	100,000%	vie 25/07/25	mié 17/09/25	1755FC+3 días;17
1757	**1.3.9.13.4**	**Obras complementarias**	**71 días**	**0**	**74,600%**	**80,000%**	**jue 15/01/26**	**mié 8/04/26**	
1758	1.3.9.13.4.1	Pisos (Acabados)	30 días	100	100,000%	100,000%	jue 15/01/26	mié 18/02/26	1756FC+100 días
1759	1.3.9.13.4.1	Pisos (Acabados)	30 días	100	32,500%	100,000%	mié 18/02/26	mié 25/03/26	1758
1760	1.3.9.13.4.2	Prueba de carga	11 días	0	0,000%	0,000%	mié 25/03/26	mié 8/04/26	1759;1758
1761	1.3.9.13.5	Fin rampa peatonal R2 calle 53-Simón Bolívar (costado norte)	0 días	0	0,000%	0,000%	mié 8/04/26	mié 8/04/26	1760
1762	**1.3.9.14**	**Cicloestación (1)**	**1165,75 días**	**0**	**55,466%**	**55,466%**	**vie 18/11/22**	**jue 3/09/26**	
1763	1.3.9.14.1	Inicio cicloestación (1)	0 días	0	0,000%	0,000%	vie 18/11/22	vie 18/11/22	178FC+331 días
1764	**1.3.9.14.2**	**Cicloparqueadero parque simón Bolívar**	**1165,75 días**	**0**	**55,466%**	**55,466%**	**vie 18/11/22**	**jue 3/09/26**	
1765	1.3.9.14.2.1	Cimentación	36,25 días	100	100,000%	100,000%	vie 18/11/22	jue 29/12/22	1763CC-1 día
1766	1.3.9.14.2.2	Estructura	25,5 días	100	100,000%	100,000%	vie 18/11/22	sáb 17/12/22	1765CC
1767	1.3.9.14.2.3	Acabados	20 días	100	100,000%	100,000%	sáb 31/01/26	lun 23/02/26	1215FC+850 días;
1768	1.3.9.14.2.3	Acabados	20 días	0	0,000%	0,000%	mar 11/08/26	jue 3/09/26	1215FC+1010 día
1769	1.3.9.14.2.3	Delta cicloestación	20 días	0	0,000%	0,000%	mar 11/08/26	jue 3/09/26	1215FC+1010 día
1770	1.3.9.14.3	Fin cicloestación (1)	0 días	0	0,000%	0,000%	jue 3/09/26	jue 3/09/26	1769;1767;1768
1771	**1.3.9.15**	**Demolición de puente peatonal calle 64- Colegio Cafam**	**47 días**	**0**	**0,000%**	**90,000%**	**lun 1/06/26**	**mar 28/07/26**	
1772	1.3.9.15.1	Inicio demolición de puente peatonal calle 64- Colegio Cafam	0 días	0	0,000%	0,000%	lun 1/06/26	lun 1/06/26	47;8FC+1628 días
1773	1.3.9.15.2	Desmonte de viga	15 días	100	0,000%	100,000%	sáb 6/06/26	jue 25/06/26	1772FC+5 días
1774	1.3.9.15.3	Demolición de escaleras y columnas	30 días	100	0,000%	100,000%	mar 23/06/26	mar 28/07/26	1773FC-3 días
1775	1.3.9.15.3	Demolición de escaleras y columnas	30 días	0	0,000%	0,000%	mar 23/06/26	mar 28/07/26	1773FC-3 días
1776	1.3.9.15.4	Fin demolición de puente peatonal calle 64- Colegio Cafam	0 días	0	0,000%	0,000%	mar 28/07/26	mar 28/07/26	1775;1774
1777	**1.3.9.16**	**Restitución de canal y cerramiento parque simón Bolívar**	**1562,75 días**	**0**	**69,648%**	**74,322%**	**mié 4/08/21**	**jue 3/09/26**	
1778	1.3.9.16.1	Inicio restitución de canal y cerramiento parque simón Bolívar	1 día	0	0,000%	0,000%	mié 18/08/21	mié 18/08/21	47FC+51 días;8

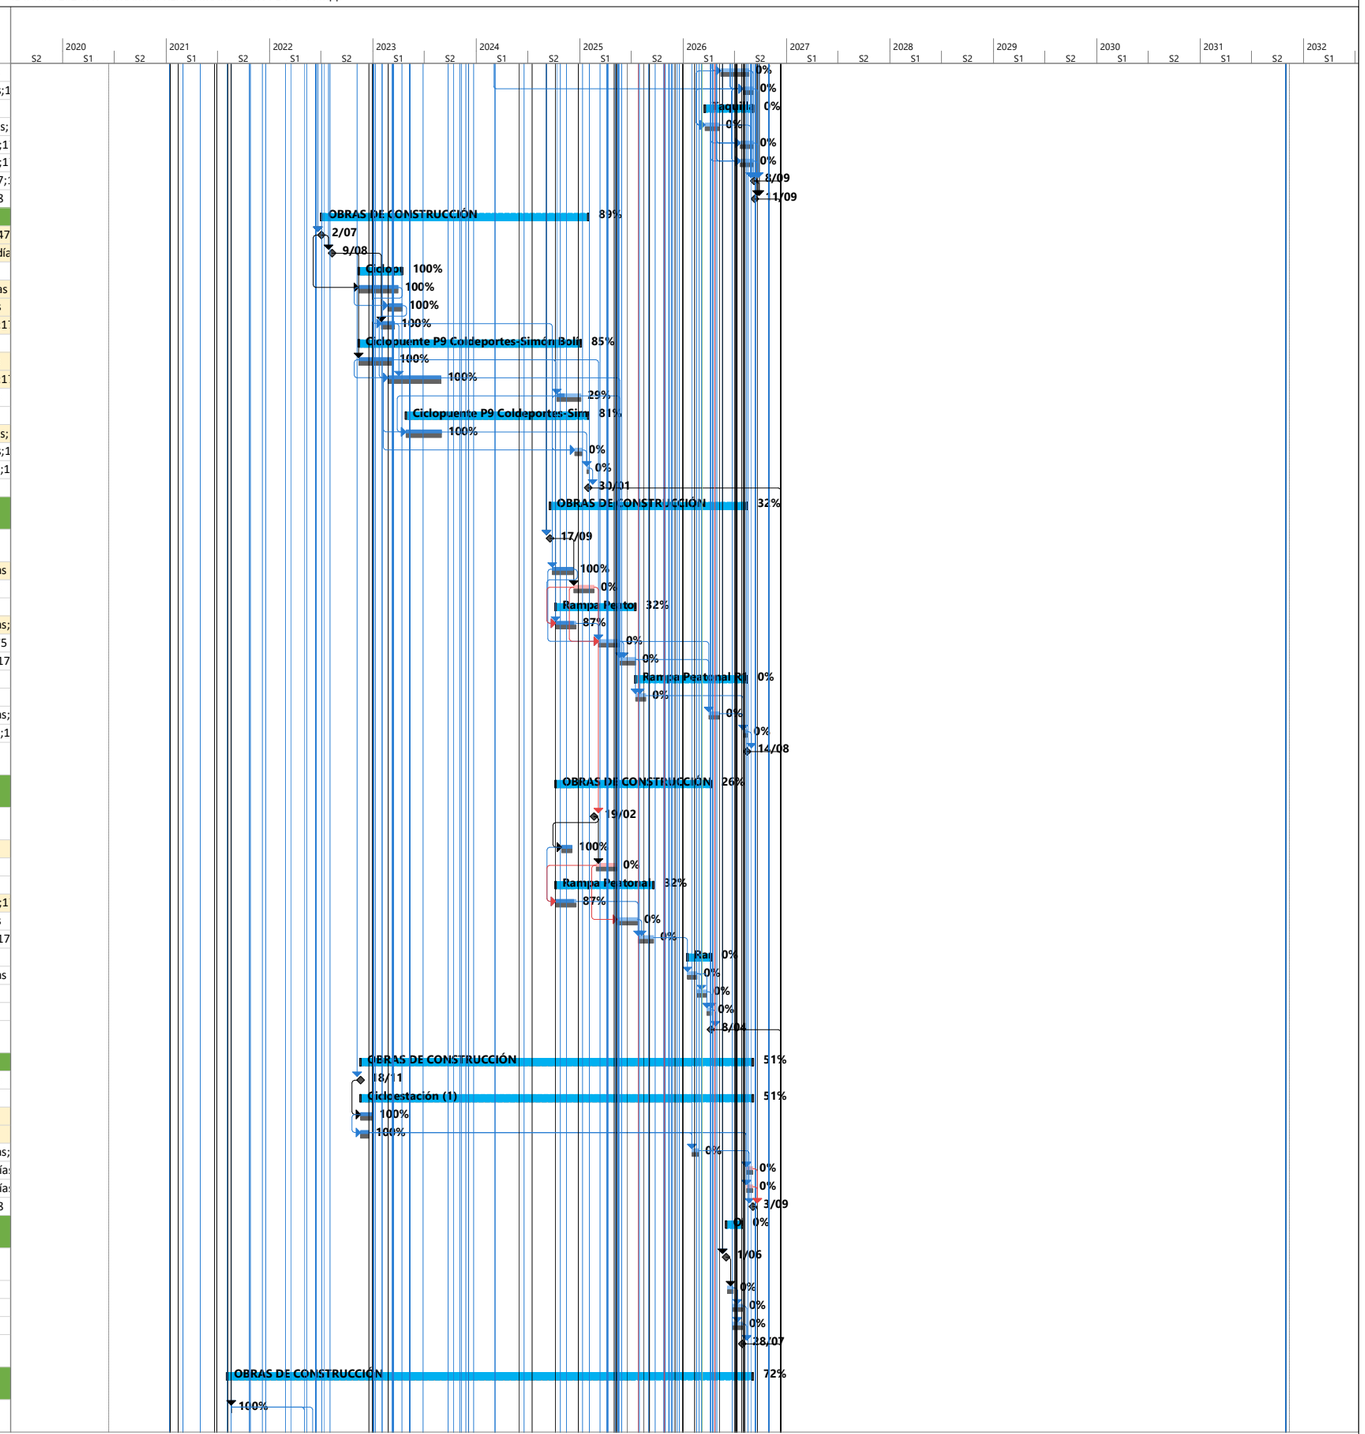


Tareas críticas | Tarea | Tarea manual | solo duración | Hito de línea base | Resumen | Tareas externas | Hito inactivo
División crítica | División | solo el comienzo | Línea base | Hito | Resumen manual | Hito externo | Resumen inactivo
Progreso de tarea crítica | Progreso de tarea | solo fin | División de la línea base | Progreso del resumen | Resumen del proyecto | Tarea inactiva | Fecha límite

Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	% Avance Conciliado	% Avance Programado (% PV)	% Avance Ejecutado conciliado (% EV))	Comienzo	Fin	Predecesoras
1779	**1.3.9.16.2**	**Canal**	**272,63 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**jue 9/12/21**	**mié 26/10/22**	
1780	1.3.9.16.2.1	Autorización de tratamientos silviculturales en espacio publico SDA	0,5 días	100	0,000%	0,000%	sáb 18/12/21	sáb 18/12/21	178FC+59 días;8FC+59 días
1781	1.3.9.16.2.2	Autorización de tratamientos silviculturales Talas IDU	1 día	100	0,000%	0,000%	jue 9/12/21	jue 9/12/21	1780FC-9 días
1782	1.3.9.16.2.3	Autorizacción tratamiento silvicultural individuos arboreos sin resolución	47 días	100	0,000%	0,000%	sáb 18/12/21	sáb 12/02/22	1780FC-1 día
1783	1.3.9.16.2.4	Construcción de canal	103,88 días	100	100,000%	100,000%	mar 3/05/22	vie 2/09/22	178FC+64 días;17
1784	1.3.9.16.2.5	Demolición de canal	124,38 días	100	100,000%	100,000%	jue 2/06/22	mié 26/10/22	1778;1783CC+25
1785	**1.3.9.16.3**	**Cerramiento parque Simón Bolívar**	**1513,5 días**	**0**	**80,827%**	**99,617%**	**mié 4/08/21**	**lun 6/07/26**	
1786	1.3.9.16.3.1	Autorización de tratamientos silviculturales en espacio publico SDA	1 día	100	0,000%	0,000%	mié 4/08/21	mié 4/08/21	8FC+137 días
1787	1.3.9.16.3.2	Autorización de tratamientos silviculturales Talas IDU	1 día	100	0,000%	0,000%	mié 18/08/21	mié 18/08/21	8FC+147 días
1788	**1.3.9.16.3.3**	**Construcción cerramiento Parque Simon Bolivar**	**1314,13 días**	**0**	**80,827%**	**99,617%**	**lun 28/03/22**	**lun 6/07/26**	
1789	**1.3.9.16.3.3.1**	**Construcción cerramiento (K8+020 - K8+232)**	**1314,13 días**	**0**	**30,000%**	**98,600%**	**lun 28/03/22**	**lun 6/07/26**	
1790	1.3.9.16.3.3.1.1	Construcción cerramiento	30 días	98	0,000%	98,000%	vie 29/05/26	lun 6/07/26	1288FF+300 días;
1791	1.3.9.16.3.4	Desmonte cerramiento	103,88 días	100	100,000%	100,000%	lun 28/03/22	vie 29/07/22	1283CC-320 días
1792	**1.3.9.16.3.3.2**	**Construcción cerramiento (K8+232 - K8+470)**	**144,88 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**sáb 22/10/22**	**mar 11/04/23**	
1793	1.3.9.16.3.3	Construcción cerramiento	124,38 días	100	100,000%	100,000%	sáb 22/10/22	mié 15/03/23	1296FF-139 días
1794	1.3.9.16.3.4	Desmonte cerramiento	51,63 días	100	100,000%	100,000%	jue 9/02/23	mar 11/04/23	1296FC-169 días
1795	**1.3.9.16.3.3.3**	**Construcción cerramiento (K8+680 - K9+004)**	**285,25 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**sáb 16/04/22**	**mié 15/03/23**	
1796	1.3.9.16.3.3	Construcción cerramiento	124,38 días	100	100,000%	100,000%	sáb 22/10/22	mié 15/03/23	1296FF-139 días
1797	1.3.9.16.3.4	Desmonte cerramiento	222,75 días	100	100,000%	100,000%	sáb 16/04/22	mar 3/01/23	1296CC-148 días
1798	**1.3.9.16.4**	**Cerramiento parque Salitre Magico**	**1031 días**	**0**	**97,764%**	**97,673%**	**lun 24/04/23**	**mié 2/09/26**	
1799	1.3.9.16.4.1	CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO PROVISIONAL EN MALLA ESLABONADA	15 días	0	0,000%	0,000%	lun 14/07/25	mié 30/07/25	1833
1800	**1.3.9.16.4.2**	**Cerramiento parque Salitre Magico (K9+455-K9+530)**	**219 días**	**0**	**15,000%**	**15,000%**	**sáb 13/12/25**	**mié 2/09/26**	
1801	1.3.9.16.4.2	Desmonte cerramiento	55 días	100	100,000%	100,000%	sáb 13/12/25	mar 17/02/26	1500CC-93 días
1802	1.3.9.16.4.2	Desmonte cerramiento	56,6 días	0	0,000%	0,000%	jue 11/06/26	mié 19/08/26	1801CC+150 días
1803	1.3.9.16.4.1	Construcción cerramiento	89 días	0	0,000%	0,000%	mar 19/05/26	mié 2/09/26	1802CC-20 días
1804	**1.3.9.16.4.3**	**Cerramiento parque Salitre Magico (K9+760 - K9+805)**	**20,88 días**	**0**	**100,000%**	**98,600%**	**mié 10/05/23**	**vie 2/06/23**	
1805	1.3.9.16.4.2	Desmonte cerramiento	20 días	100	100,000%	100,000%	mié 10/05/23	vie 2/06/23	1228FC+10 días
1806	1.3.9.16.4.1	Construcción cerramiento	20,88 días	100	100,000%	100,000%	mié 10/05/23	vie 2/06/23	1805CC
1807	1.3.9.16.4.1	Construcción cerramiento	20,88 días	0	100,000%	0,000%	mié 10/05/23	vie 2/06/23	1805CC
1808	**1.3.9.16.4.4**	**Cerramiento parque Salitre Magico (K9+805 - K9+835)**	**639 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**lun 23/10/23**	**mié 19/11/25**	
1809	1.3.9.16.4.2	Desmonte cerramiento	10,63 días	100	100,000%	100,000%	lun 23/10/23	jue 2/11/23	1242CC-517 días;
1810	1.3.9.16.4.4.2	Construcción cerramiento	16 días	100	100,000%	100,000%	jue 30/10/25	mié 19/11/25	1809CC+623 días
1811	**1.3.9.16.4.5**	**Cerramiento parque Salitre Magico (K9+835 - K9+865)**	**12,88 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**mar 16/07/24**	**mar 30/07/24**	
1812	1.3.9.16.4.2	Desmonte cerramiento	8,88 días	100	100,000%	100,000%	mar 16/07/24	jue 25/07/24	1254FC+105 días
1813	1.3.9.16.4.1	Construcción cerramiento	12,88 días	100	100,000%	100,000%	mar 16/07/24	mar 30/07/24	1812CC
1814	**1.3.9.16.4.6**	**Cerramiento parque Salitre Magico (K9+990 - K10+005)**	**940,75 días**	**0**	**30,000%**	**98,600%**	**lun 24/04/23**	**vie 15/05/26**	
1815	1.3.9.16.4.2	Desmonte cerramiento	15,75 días	100	100,000%	100,000%	lun 24/04/23	jue 11/05/23	1805CC-13 días
1816	1.3.9.16.4.6.2	Construcción cerramiento	25 días	98	0,000%	98,000%	jue 16/04/26	vie 15/05/26	1273FC+900 días;
1817	**1.3.9.16.5**	**Cerramiento UDS**	**110 días**	**0**	**0,000%**	**0,000%**	**jue 23/04/26**	**jue 3/09/26**	
1818	1.3.9.16.5.2	Desmonte cerramiento	50 días	0	0,000%	0,000%	jue 23/04/26	mar 23/06/26	1810FC+130 días
1819	1.3.9.16.5.1	Construcción cerramiento	60 días	0	0,000%	0,000%	mar 23/06/26	jue 3/09/26	1818
1820	1.3.9.16.6	Fin restitución de canal y cerramiento parque simón Bolívar, Cerramiento Salitre Magico	0 días	0	0,000%	0,000%	jue 3/09/26	jue 3/09/26	1783;1784;1818;
1821	**1.3.10**	**REDES**	**1712,38 días**	**0**	**49,672%**	**50,029%**	**vie 12/02/21**	**jue 10/09/26**	
1822	**1.3.10.1**	**Corredor Calle 46-Calle 66**	**1691,63 días**	**0**	**67,756%**	**68,243%**	**vie 12/02/21**	**mar 18/08/26**	
1823	**1.3.10.1.1**	**TRAMITES PMT Y AUTORIZACIONES SALITRE MAGICO**	**753,63 días**	**0**	**0,000%**	**0,000%**	**mar 21/03/23**	**jue 4/09/25**	
1824	1.3.10.1.1.1	PMT (K9+450-K9+760)	0 días	0	0,000%	0,000%	mar 21/03/23	mar 21/03/23	8FC+622 días
1825	**1.3.10.1.1.2**	**PMT (K9+560-K9+760)**	**5 días**	**0**	**0,000%**	**0,000%**	**jue 15/06/23**	**mié 21/06/23**	
1826	1.3.10.1.1.2.1	FIRMA PARQUE SALITRE MAGICO	0 días	0	0,000%	0,000%	jue 15/06/23	jue 15/06/23	1824CC+69 días
1827	1.3.10.1.1.2.2	AUTORIZACION SMD PMT (K9+570-K9+760)	5 días	0	0,000%	0,000%	jue 15/06/23	mié 21/06/23	1826CC-1 día
1828	**1.3.10.1.1.3**	**PMT (K9+430-K9+560)**	**44,25 días**	**0**	**0,000%**	**0,000%**	**sáb 22/04/23**	**mié 14/06/23**	
1829	1.3.10.1.1.3.1	FIRMA PARQUE SALITRE MAGICO	6,13 días	0	0,000%	0,000%	sáb 22/04/23	vie 28/04/23	1826FC-44 días
1830	1.3.10.1.1.3.2	AUTORIZACION PMT 9+430-9+560	10,13 días	0	0,000%	0,000%	vie 2/06/23	mié 14/06/23	1829FC+27 días
1831	1.3.10.1.1.4	PMT K8+870+K8+970	10 días	0	0,000%	0,000%	lun 25/08/25	jue 4/09/25	292FC-230 días;3
1832	1.3.10.1.1.5	AUTORIZACION PARQUE SALITRE MAGICO	0 días	0	0,000%	0,000%	jue 4/09/25	jue 4/09/25	1826FC-9 días;18
1833	1.3.10.1.1.6	DEFINICION IDRD ACCESO VEHICULAR CICI AQUAPARK	0 días	0	0,000%	0,000%	lun 14/07/25	lun 14/07/25	1832CC-45 días
1834	**1.3.10.1.1**	**Tramo 1A costado oriental Calle 63-calle 66 (K8+980 - K10+024)**	**1464,25 días**	**0**	**82,388%**	**81,296%**	**vie 22/10/21**	**mar 28/07/26**	
1835	**1.3.10.1.1.1**	**Actividades Silviculturales resolución 2354**	**210,13 días**	**0**	**0,000%**	**0,000%**	**vie 22/10/21**	**mié 29/06/22**	
1836	**1.3.10.1.1.1.1**	**Traslados**	**208,38 días**	**0**	**0,000%**	**0,000%**	**lun 25/10/21**	**mié 29/06/22**	
1837	1.3.10.1.1.1.1.1	actividades posteriores a la medida cautelar	208,38 días	100	0,000%	0,000%	lun 25/10/21	mié 29/06/22	178FC+15 días
1838	**1.3.10.1.1.1.2**	**Talas**	**207,88 días**	**0**	**0,000%**	**0,000%**	**vie 22/10/21**	**sáb 25/06/22**	
1839	1.3.10.1.1.1.2.1	actividades posteriores a la medida cautelar	207,88 días	100	0,000%	0,000%	vie 22/10/21	sáb 25/06/22	178FC+13 días
1840	**1.3.10.1.1.2**	**Redes Húmedas**	**1000 días**	**0**	**93,853%**	**92,571%**	**lun 24/04/23**	**mar 28/07/26**	

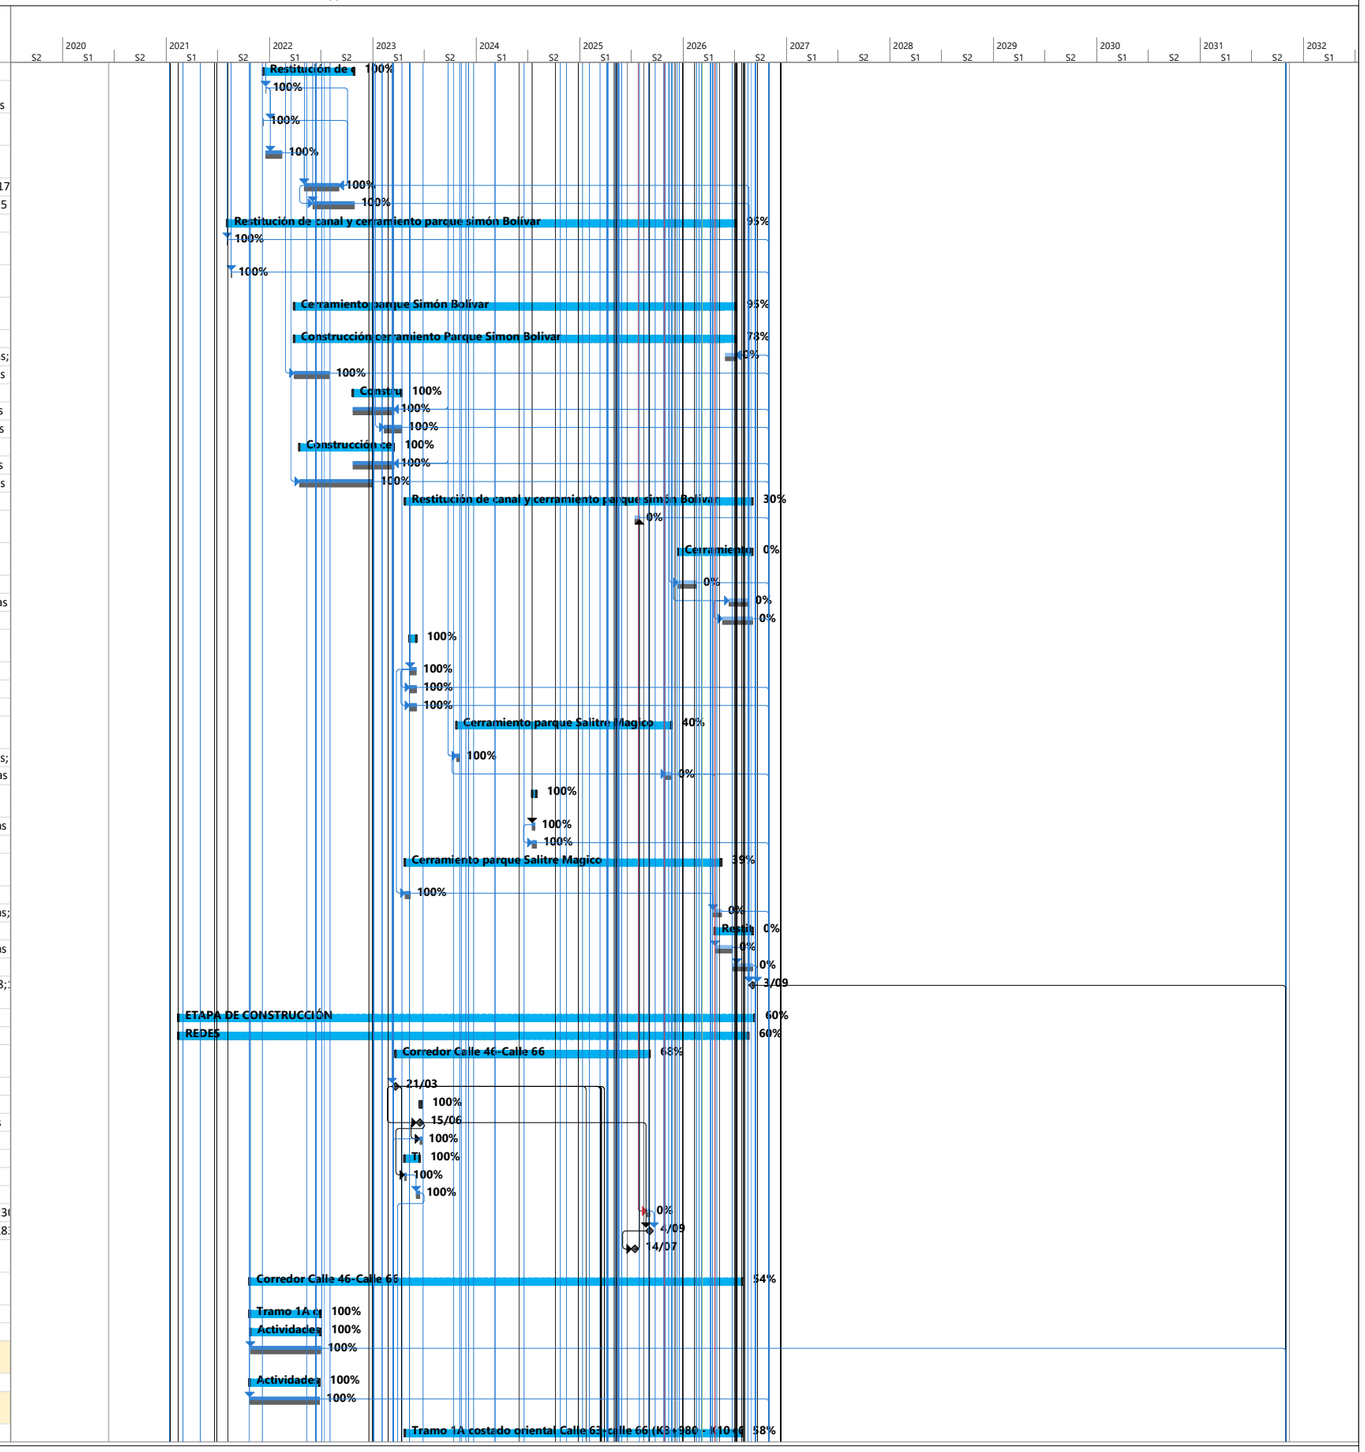


Tareas críticas · Tarea · Tarea manual · solo duración · Hito de línea base · Resumen · Tareas externas · Hito inactivo
División crítica · División · solo el comienzo · Línea base · Hito · Resumen manual · Hito externo · Resumen inactivo
Progreso de tarea crítica · Progreso de tarea · solo fin · División de la línea base · Progreso del resumen · Resumen del proyecto · Tarea inactiva · Fecha límite

Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	% Avance Conciliado	% Avance Programado (% PV)	% Avance Ejecutado conciliado (% EV))	Comienzo	Fin	Predecesoras
1841	**1.3.10.1.1.2.2**	**Redes de Acueducto**	**842,63 días**	**0**	**93,390%**	**90,909%**	**mié 11/10/23**	**vie 10/07/26**	
1842	**1.3.10.1.1.2.2.1**	**Tramo de redes de acueducto (K8+980 - K9+250) TRIANGULO**	**155,13 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**mié 11/10/23**	**sáb 13/04/24**	
1843	1.3.10.1.1.2.2.1.1	Inicio tramo redes de acueducto	0 días	100	0,000%	0,000%	mié 11/10/23	mié 11/10/23	1979FC+411 días
1844	1.3.10.1.1.2.2.1.2	Excavaciones	155,13 días	100	100,000%	100,000%	mié 11/10/23	sáb 13/04/24	1843CC-1 día
1845	1.3.10.1.1.2.2.1.3	Tuberías	155,13 días	100	100,000%	100,000%	mié 11/10/23	sáb 13/04/24	1844CC
1846	1.3.10.1.1.2.2.1.4	Accesorios	155,13 días	100	100,000%	100,000%	mié 11/10/23	sáb 13/04/24	1845CC
1847	1.3.10.1.1.2.2.1.5	Empates	155,13 días	100	100,000%	100,000%	mié 11/10/23	sáb 13/04/24	1846CC
1848	1.3.10.1.1.2.2.1.6	Rellenos	155,13 días	100	100,000%	100,000%	mié 11/10/23	sáb 13/04/24	1847CC
1849	1.3.10.1.1.2.2.1.7	Hidrantes	155,13 días	100	100,000%	100,000%	mié 11/10/23	sáb 13/04/24	1848CC
1850	**1.3.10.1.1.2.2.1**	**Tramo de redes de acueducto (K9+350 - K9+430)**	**59 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**mar 24/10/23**	**mié 3/01/24**	
1851	1.3.10.1.1.2.2.1.2	Excavaciones	41,38 días	100	100,000%	100,000%	mar 24/10/23	mar 12/12/23	1979FC+420 días
1852	1.3.10.1.1.2.2.1.3	Tuberías	41,38 días	100	100,000%	100,000%	jue 26/10/23	jue 14/12/23	1851CC+2 días
1853	1.3.10.1.1.2.2.1.4	Accesorios	41,38 días	100	100,000%	100,000%	mié 1/11/23	mié 20/12/23	1852CC+5 días
1854	1.3.10.1.1.2.2.1.5	Empates	41,38 días	100	100,000%	100,000%	mié 8/11/23	mié 27/12/23	1853CC+5 días
1855	1.3.10.1.1.2.2.1.6	Rellenos	41,38 días	100	100,000%	100,000%	mié 15/11/23	mié 3/01/24	1854CC+5 días
1856	**1.3.10.1.1.2.2.1**	**Tramo de redes de acueducto (K9+430 - K9+560)**	**797,13 días**	**0**	**81,497%**	**69,181%**	**mar 5/12/23**	**vie 10/07/26**	
1857	1.3.10.1.1.2.2.1.2	Excavaciones	15,75 días	100	100,000%	100,000%	mar 5/12/23	vie 22/12/23	1855CC+17 días
1858	1.3.10.1.1.2.2.1.3	Tuberías	15,75 días	100	100,000%	100,000%	mar 5/12/23	vie 22/12/23	1857CC
1859	1.3.10.1.1.2.2.1.6	Rellenos	15,25 días	100	100,000%	100,000%	sáb 23/12/23	vie 12/01/24	1858CC+15 días
1860	1.3.10.1.1.2.2.1.2	Excavaciones	15 días	100	100,000%	100,000%	jue 25/09/25	mar 14/10/25	2057CC+1 día;185
1861	1.3.10.1.1.2.2.1.3	Tuberías	15 días	100	100,000%	100,000%	jue 25/09/25	mar 14/10/25	1860CC
1862	1.3.10.1.1.2.2.1.4	Accesorios	15 días	0	0,000%	0,000%	mié 17/06/26	sáb 4/07/26	1861CC+220 días
1863	1.3.10.1.1.2.2.1.5	Empates	15 días	0	0,000%	0,000%	mar 23/06/26	vie 10/07/26	1862CC+5 días
1864	1.3.10.1.1.2.2.1.6	Rellenos	15 días	100	100,000%	100,000%	mié 15/10/25	vie 31/10/25	1860CC+16 días
1865	1.3.10.1.1.2.2.1.7	Hidrantes	17 días	0	100,000%	0,000%	mar 14/10/25	sáb 1/11/25	1864CC-1 día
1866	1.3.10.1.1.2.2.1.8	Fin tramo redes de acueducto	0 días	0	0,000%	0,000%	vie 10/07/26	vie 10/07/26	1860;1861;1862;
1867	**1.3.10.1.1.2.2.1**	**Tramo de redes de acueducto (K9+560 - K9+760)**	**737,88 días**	**0**	**89,383%**	**89,383%**	**jue 9/11/23**	**sáb 4/04/26**	
1868	1.3.10.1.1.2.2.1.2	Excavaciones	15,75 días	100	100,000%	100,000%	mar 14/11/23	jue 30/11/23	1855CC-1 día
1869	1.3.10.1.1.2.2.1.3	Tuberías	10,13 días	100	100,000%	100,000%	vie 24/11/23	mar 5/12/23	1868FC-6 días
1870	1.3.10.1.1.2.2.1.4	Accesorios	10,63 días	100	100,000%	100,000%	lun 5/02/24	jue 15/02/24	1869CC+58 días
1871	1.3.10.1.1.2.2.1.6	Rellenos	15,25 días	100	100,000%	100,000%	jue 9/11/23	lun 27/11/23	1868CC-3 días
1872	1.3.10.1.1.2.2.1.4	Accesorios	4 días	0	0,000%	0,000%	sáb 28/03/26	sáb 4/04/26	2073FC-100 días;
1873	1.3.10.1.1.2.2.1.5	Empates	4 días	0	0,000%	0,000%	sáb 28/03/26	sáb 4/04/26	1872CC
1874	1.3.10.1.1.2.2.1.8	Fin tramo redes de acueducto	0 días	0	0,000%	0,000%	sáb 28/03/26	sáb 28/03/26	1873CC
1875	**1.3.10.1.1.2.3**	**Redes de alcantarillado sanitario**	**1000 días**	**0**	**97,582%**	**99,554%**	**lun 24/04/23**	**mar 28/07/26**	
1876	**1.3.10.1.1.2.3.1**	**Tramo de redes de alcantarillado sanitario (K8+980 - K9+115)**	**820,13 días**	**0**	**87,388%**	**100,000%**	**vie 24/11/23**	**mar 28/07/26**	
1877	1.3.10.1.2.2.2.1.1	Inicio tramo redes de alcantarillado sanitario	0 días	0	0,000%	0,000%	mar 5/11/24	mar 5/11/24	8FC+1145 días
1878	1.3.10.1.2.2.2.1.2	Excavaciones	35 días	100	100,000%	100,000%	jue 6/03/25	mar 15/04/25	252FF-115 días;25
1879	1.3.10.1.2.2.2.1.3	Entibados	35 días	100	100,000%	100,000%	jue 6/03/25	mar 15/04/25	252FF-115 días;25
1880	1.3.10.1.2.2.2.1.4	Tuberías	35 días	100	100,000%	100,000%	jue 6/03/25	mar 15/04/25	252FF-115 días;25
1881	1.3.10.1.2.2.2.1.5	Rellenos	35 días	100	100,000%	100,000%	jue 6/03/25	mar 15/04/25	252FF-115 días;25
1882	1.3.10.1.2.2.2.1.6	Pozos de inspección y/o cámaras	35 días	100	100,000%	100,000%	sáb 6/04/24	sáb 18/05/24	252FF-397 días;25
1883	1.3.10.1.2.2.2.1.7	Pozos de inspección y/o cámaras	30 días	100	0,000%	100,000%	lun 22/06/26	mar 28/07/26	252FF+281 días;2
1884	1.3.10.1.2.2.2.1.8	Excavaciones	35 días	100	100,000%	100,000%	vie 24/11/23	sáb 6/01/24	1877CC-291 días
1885	1.3.10.1.2.2.2.1.9	Entibados	35 días	100	100,000%	100,000%	mié 20/03/24	jue 2/05/24	1878CC-295 días;
1886	1.3.10.1.2.2.2.1.1	Tuberías	35 días	100	100,000%	100,000%	mié 20/03/24	jue 2/05/24	1879CC-295 días;
1887	1.3.10.1.2.2.2.1.1	Rellenos	35 días	100	100,000%	100,000%	mar 2/04/24	sáb 11/05/24	1886CC+8 días
1888	1.3.10.1.2.2.2.1.1	Fin tramo de redes de alcantarillado sanitario	0 días	0	0,000%	0,000%	mar 28/07/26	mar 28/07/26	1882;1883;1881;
1889	**1.3.10.1.1.2.3.1**	**Tramo de redes de alcantarillado sanitario (K9+455 - K9+550)**	**608 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**lun 24/04/23**	**lun 14/04/25**	
1890	1.3.10.1.1.2.3.1.1	Inicio tramo redes de alcantarillado sanitario	0 días	100	0,000%	0,000%	lun 24/04/23	lun 24/04/23	1824FC+27 días;1870
1891	1.3.10.1.1.2.3.1.2	Excavaciones	41,38 días	100	100,000%	100,000%	lun 24/04/23	sáb 10/06/23	1890CC-1 día
1892	1.3.10.1.1.2.3.1.3	Entibados	41,38 días	100	100,000%	100,000%	lun 24/04/23	sáb 10/06/23	1891CC
1893	1.3.10.1.1.2.3.1.4	Tuberías	41,38 días	100	100,000%	100,000%	lun 24/04/23	sáb 10/06/23	1892CC
1894	1.3.10.1.1.2.3.1.5	Rellenos	41,38 días	100	100,000%	100,000%	lun 24/04/23	sáb 10/06/23	1893CC
1895	1.3.10.1.1.2.3.1.6	Pozos de inspección y/o cámaras	41,38 días	100	100,000%	100,000%	lun 24/04/23	sáb 10/06/23	1894CC
1896	1.3.10.1.1.2.3.1.2	Excavaciones	20 días	100	100,000%	100,000%	mar 4/03/25	jue 27/03/25	1890CC+571 días;
1897	1.3.10.1.1.2.3.1.3	Entibados	21 días	100	100,000%	100,000%	jue 6/03/25	lun 31/03/25	1896CC+2 días
1898	1.3.10.1.1.2.3.1.4	Tuberías	20 días	100	100,000%	100,000%	vie 7/03/25	mar 1/04/25	1897CC+2 días
1899	1.3.10.1.1.2.3.1.5	Rellenos	23 días	100	100,000%	100,000%	mar 11/03/25	lun 7/04/25	1898CC+2 días
1900	1.3.10.1.1.2.3.1.6	Pozos de inspección y/o cámaras	24 días	100	100,000%	100,000%	lun 17/03/25	lun 14/04/25	1899CC+6 días
1901	1.3.10.1.1.2.3.1.7	Fin tramo de redes de alcantarillado sanitario	0 días	0	0,000%	0,000%	lun 14/04/25	lun 14/04/25	1896;1897;1898;
1902	**1.3.10.1.1.2.3.1**	**Tramo de redes de alcantarillado sanitario (K9+550 - K10+000)**	**197,75 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**jue 5/10/23**	**mar 28/05/24**	
1903	1.3.10.1.1.2.3.1.1	Inicio tramo redes de alcantarillado sanitario	0 días	100	0,000%	0,000%	jue 5/10/23	jue 5/10/23	1843CC-6 días
1904	1.3.10.1.1.2.3.1.2	Excavaciones	188,63 días	100	100,000%	100,000%	jue 5/10/23	vie 17/05/24	1903
1905	1.3.10.1.1.2.3.1.3	Entibados	188,63 días	100	100,000%	100,000%	jue 5/10/23	vie 17/05/24	1904CC
1906	1.3.10.1.1.2.3.1.4	Tuberías	188,63 días	100	100,000%	100,000%	mié 11/10/23	jue 23/05/24	1905CC+5 días
1907	1.3.10.1.1.2.3.1.5	Rellenos	192,63 días	100	100,000%	100,000%	mié 11/10/23	mar 28/05/24	1906CC

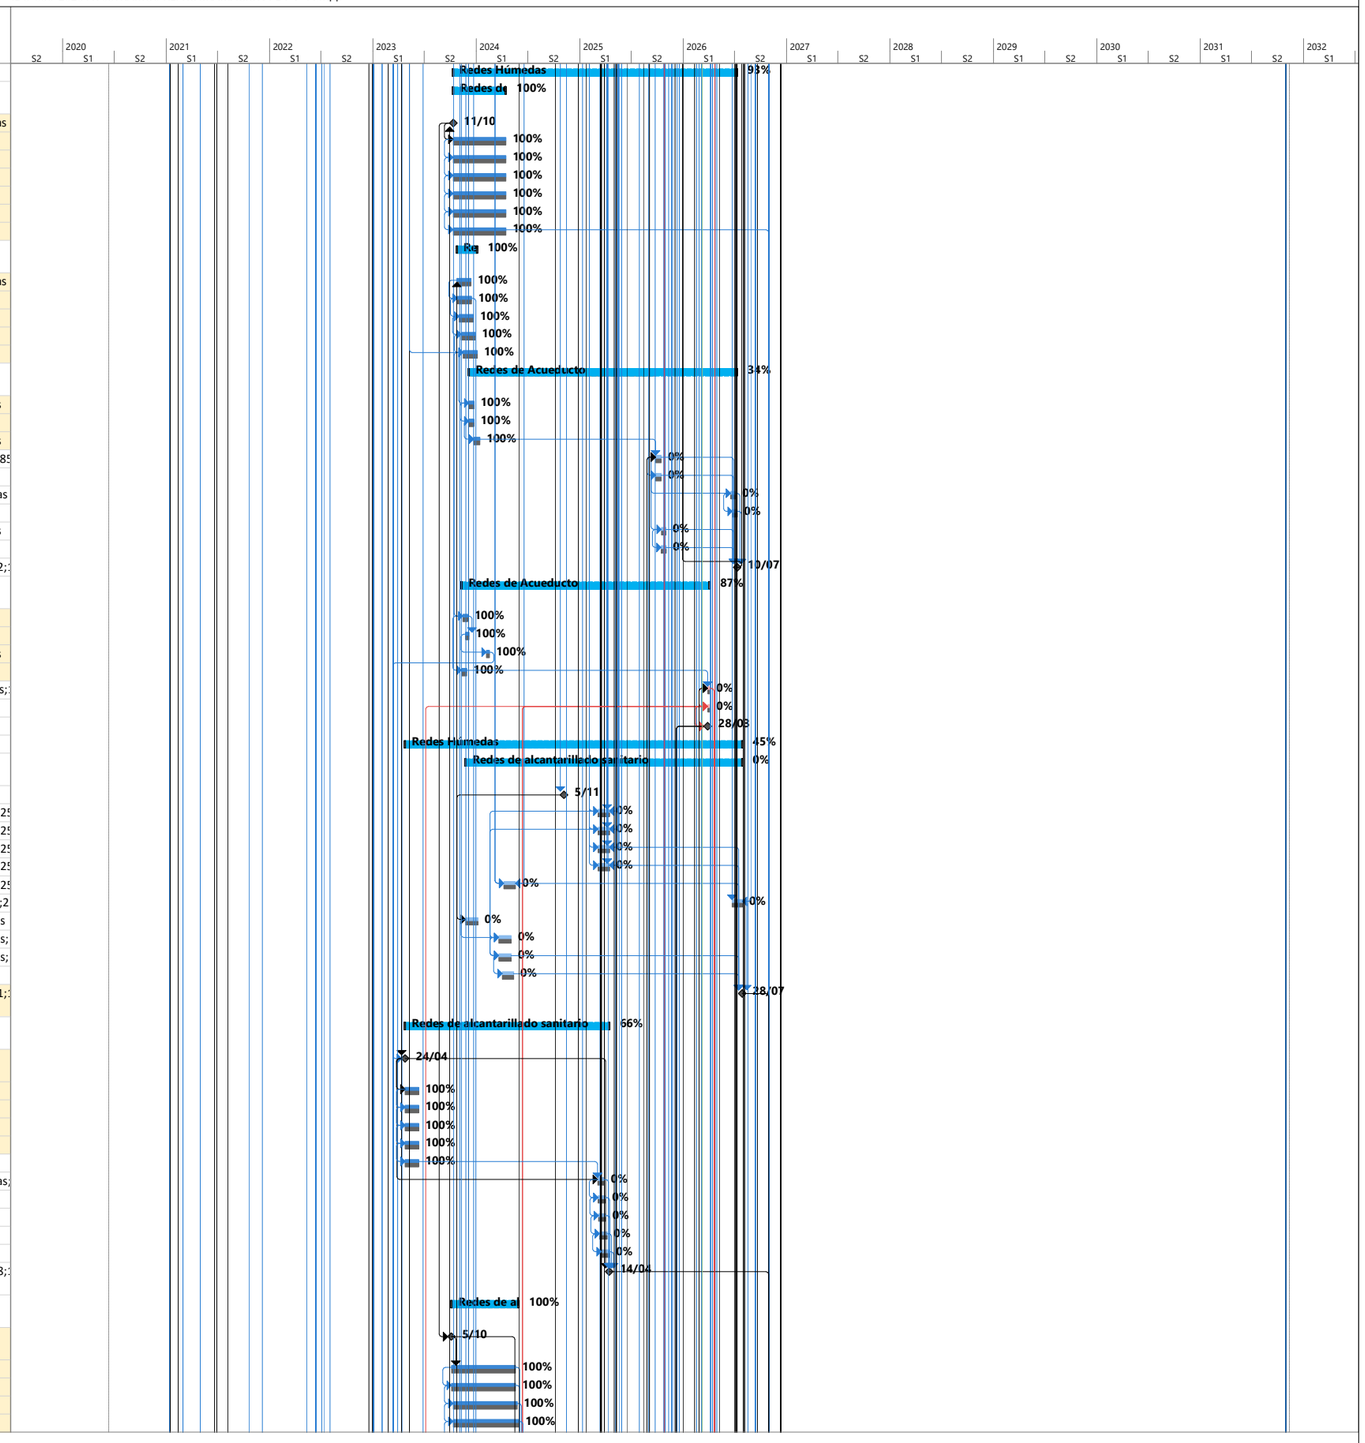


Tareas críticas · Tarea · Tarea manual · solo duración · Hito de línea base · Resumen · Tareas externas · Hito inactivo
División crítica · División · solo el comienzo · Línea base · Hito · Resumen manual · Hito externo · Resumen inactivo
Progreso de tarea crítica · Progreso de tarea · solo fin · División de la línea base · Progreso del resumen · Resumen del proyecto · Tarea inactiva · Fecha límite

Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	% Avance Conciliado	% Avance Programado (% PV)	% Avance Ejecutado conciliado (% EV))	Comienzo	Fin	Predecesoras
1908	1.3.10.1.1.2.3.1.6	Pozos de inspección y/o cámaras	192,63 días	100	100,000%	100,000%	mié 11/10/23	mar 28/05/24	1907CC
1909	1.3.10.1.1.2.3.1.7	Fin tramo de redes de alcantarillado sanitario	0 días	100	0,000%	0,000%	mar 28/05/24	mar 28/05/24	1903;1904;1905;1
1910	**1.3.10.1.1.2.3.1**	**Tramo de redes de alcantarillado sanitario (K10+000 - K10+024)**	**737 días**	**0**	**100,000%**	**86,931%**	**vie 18/08/23**	**vie 9/01/26**	
1911	1.3.10.1.1.2.3.1.1	Inicio tramo redes de alcantarillado sanitario	0 días	0	0,000%	0,000%	vie 18/08/23	vie 18/08/23	1873CC-804 días
1912	1.3.10.1.1.2.3.1.2	Excavaciones	187 días	100	100,000%	100,000%	vie 12/07/24	mar 18/02/25	1873CC-528 días
1913	1.3.10.1.1.2.3.1.3	Entibados	187 días	100	100,000%	100,000%	vie 12/07/24	mar 18/02/25	1873CC-528 días
1914	1.3.10.1.1.2.3.1.4	Tuberías	187 días	100	100,000%	100,000%	jue 18/07/24	lun 24/02/25	1913CC+5 días
1915	1.3.10.1.1.2.3.1.5	Rellenos	192 días	100	100,000%	100,000%	jue 18/07/24	vie 28/02/25	1913CC+5 días
1916	1.3.10.1.1.2.3.1.6	Pozos de inspección y/o cámaras	192 días	100	100,000%	100,000%	jue 18/07/24	vie 28/02/25	1913CC+5 días
1917	1.3.10.1.1.2.3.1.2	Excavaciones	10 días	0	100,000%	0,000%	vie 19/12/25	mié 31/12/25	1911CC+720 días
1918	1.3.10.1.1.2.3.1.3	Entibados	10 días	0	100,000%	0,000%	lun 22/12/25	lun 5/01/26	1917CC+2 días
1919	1.3.10.1.1.2.3.1.4	Tuberías	9,5 días	0	100,000%	0,000%	vie 26/12/25	mié 7/01/26	1918CC+3 días
1920	1.3.10.1.1.2.3.1.5	Rellenos	10 días	0	100,000%	0,000%	lun 29/12/25	vie 9/01/26	1919CC+2 días
1921	1.3.10.1.1.2.3.1.7	Fin tramo de redes de alcantarillado sanitario	0 días	0	0,000%	0,000%	vie 9/01/26	vie 9/01/26	1916;1920;1912;1
1922	**1.3.10.1.1.2.4**	**Redes de alcantarillado Pluvial**	**963,13 días**	**0**	**90,582%**	**86,637%**	**lun 24/04/23**	**vie 12/06/26**	
1923	**1.3.10.1.1.2.4.1**	**Tramo de redes de alcantarillado pluvial (K8+980-K9+090)**	**668,88 días**	**0**	**100,000%**	**93,231%**	**sáb 9/12/23**	**mar 10/02/26**	
1924	1.3.10.1.1.2.4.1.1	Inicio tramo de redes de alcantarillado pluvial	0 días	100	0,000%	0,000%	sáb 9/12/23	sáb 9/12/23	1852FC-5 días
1925	1.3.10.1.1.2.4.1.2	Excavaciones	20,38 días	100	100,000%	100,000%	sáb 9/12/23	mié 3/01/24	1924CC
1926	1.3.10.1.1.2.4.1.3	Entibados	20,38 días	100	100,000%	100,000%	sáb 9/12/23	mié 3/01/24	1925CC
1927	1.3.10.1.1.2.4.1.4	Tuberías	20,38 días	100	100,000%	100,000%	sáb 9/12/23	mié 3/01/24	1925CC
1928	1.3.10.1.1.2.4.1.5	Rellenos	20,38 días	100	100,000%	100,000%	sáb 9/12/23	mié 3/01/24	1927CC
1929	1.3.10.1.1.2.4.1.6	Pozos de inspección y/o cámaras	20,75 días	100	100,000%	100,000%	lun 18/11/24	mar 10/12/24	1925CC+278 días
1930	1.3.10.1.1.2.4.1.7	Sumideros	20 días	100	100,000%	100,000%	sáb 1/02/25	lun 24/02/25	1925CC+64 días;1
1931	1.3.10.1.1.2.4.1.2	Excavaciones	21 días	100	100,000%	100,000%	mié 7/01/26	vie 30/01/26	1874CC-70 días
1932	1.3.10.1.1.2.4.1.3	Entibados	21 días	100	100,000%	100,000%	mié 7/01/26	vie 30/01/26	1874CC-70 días
1933	1.3.10.1.1.2.4.1.4	Tuberías	20 días	100	100,000%	100,000%	vie 9/01/26	mar 3/02/26	1932CC+3 días
1934	1.3.10.1.1.2.4.1.5	Rellenos	20 días	100	100,000%	100,000%	mar 13/01/26	mié 4/02/26	1933CC+2 días
1935	1.3.10.1.1.2.4.1.6	Pozos de inspección y/o cámaras	20 días	100	100,000%	100,000%	vie 9/01/26	mar 3/02/26	1932CC+3 días
1936	1.3.10.1.1.2.4.1.7	Sumideros	19,3 días	100	100,000%	100,000%	sáb 10/01/26	lun 2/02/26	1932CC+3,4 días
1937	1.3.10.1.1.2.4.1.7	Sumideros	30 días	50	100,000%	50,000%	mié 7/01/26	mar 10/02/26	1932CC
1938	1.3.10.1.1.2.4.1.8	Fin tramo de redes de alcantarillado pluvial	0 días	0	0,000%	0,000%	mar 10/02/26	mar 10/02/26	1925;1926;1927;1
1939	**1.3.10.1.1.2.4.1**	**Tramo de redes de alcantarillado pluvial (K9+090-K9+470) DEPRIMIDO**	**914,25 días**	**0**	**87,087%**	**87,087%**	**jue 22/06/23**	**vie 12/06/26**	
1940	1.3.10.1.1.2.4.1.1	Inicio tramo de redes de alcantarillado pluvial	0 días	100	0,000%	0,000%	jue 22/06/23	jue 22/06/23	185CC-19 días
1941	1.3.10.1.1.2.4.1.2	Excavaciones	41,38 días	100	100,000%	100,000%	jue 22/06/23	jue 10/08/23	1940CC
1942	1.3.10.1.1.2.4.1.3	Entibados	41,38 días	100	100,000%	100,000%	jue 22/06/23	jue 10/08/23	1941CC
1943	1.3.10.1.1.2.4.1.4	Tuberías	41,38 días	100	100,000%	100,000%	jue 22/06/23	jue 10/08/23	1941CC
1944	1.3.10.1.1.2.4.1.5	Rellenos	41,38 días	100	100,000%	100,000%	jue 22/06/23	jue 10/08/23	1943CC
1945	1.3.10.1.1.2.4.1.6	Pozos de inspección y/o cámaras	36,25 días	100	100,000%	100,000%	jue 22/06/23	jue 3/08/23	1941CC
1946	1.3.10.1.1.2.4.1.7	Sumideros	28,88 días	100	100,000%	100,000%	vie 4/08/23	jue 7/09/23	1945
1947	1.3.10.1.1.2.4.1.7	Sumideros	28 días	100	100,000%	100,000%	sáb 14/12/24	sáb 18/01/25	1945FC+420 días
1948	1.3.10.1.1.2.4.1.7	Sumideros	28 días	0	0,000%	0,000%	sáb 9/05/26	vie 12/06/26	1945FC+850 días
1949	1.3.10.1.1.2.4.1.8	Fin tramo de redes de alcantarillado pluvial	0 días	0	0,000%	0,000%	vie 12/06/26	vie 12/06/26	1941;1942;1943;1
1950	**1.3.10.1.1.2.4.1**	**Tramo de redes de alcantarillado pluvial (K9+470-K9+550)**	**66 días**	**0**	**100,000%**	**70,841%**	**mar 4/02/25**	**mar 22/04/25**	
1951	1.3.10.1.1.2.4.1.1	Inicio tramo de redes de alcantarillado pluvial	0 días	100	0,000%	0,000%	mar 4/02/25	mar 4/02/25	1824FC+574 días
1952	1.3.10.1.1.2.4.1.2	Excavaciones	19 días	100	100,000%	100,000%	vie 14/03/25	lun 7/04/25	1824FC+609 días;
1953	1.3.10.1.1.2.4.1.3	Entibados	19 días	100	100,000%	100,000%	vie 14/03/25	lun 7/04/25	1824FC+609 días;
1954	1.3.10.1.1.2.4.1.4	Tuberías	20 días	100	100,000%	100,000%	lun 17/03/25	mié 9/04/25	1824FC+611 días;
1955	1.3.10.1.1.2.4.1.5	Rellenos	20 días	100	100,000%	100,000%	mar 18/03/25	jue 10/04/25	1824FC+612 días;
1956	1.3.10.1.1.2.4.1.6	Pozos de inspección y/o cámaras	31 días	100	100,000%	100,000%	vie 14/03/25	mar 22/04/25	1824FC+609 días;
1957	1.3.10.1.1.2.4.1.7	Sumideros	20 días	100	100,000%	100,000%	vie 28/03/25	mar 22/04/25	1824FC+620 días;
1958	1.3.10.1.1.2.4.1.7	Sumideros	20 días	0	100,000%	0,000%	vie 28/03/25	mar 22/04/25	1824FC+620 días;
1959	1.3.10.1.1.2.4.1.8	Fin tramo de redes de alcantarillado pluvial	0 días	0	0,000%	0,000%	mar 22/04/25	mar 22/04/25	1952;1953;1954;1
1960	**1.3.10.1.1.2.4.1**	**Tramo de redes de alcantarillado pluvial (K9+550-K9+760)**	**963,13 días**	**0**	**88,387%**	**88,387%**	**lun 24/04/23**	**vie 12/06/26**	
1961	1.3.10.1.1.2.4.1.1	Inicio tramo de redes de alcantarillado pluvial	0 días	100	0,000%	0,000%	lun 24/04/23	lun 24/04/23	1824FC+27 días
1962	1.3.10.1.1.2.4.1.2	Excavaciones	20,88 días	100	100,000%	100,000%	lun 24/04/23	mié 17/05/23	1961CC-1 día
1963	1.3.10.1.1.2.4.1.3	Entibados	20,88 días	100	100,000%	100,000%	lun 24/04/23	mié 17/05/23	1962CC
1964	1.3.10.1.1.2.4.1.4	Tuberías	20,88 días	100	100,000%	100,000%	lun 24/04/23	mié 17/05/23	1962CC
1965	1.3.10.1.1.2.4.1.5	Rellenos	20,88 días	100	100,000%	100,000%	lun 24/04/23	mié 17/05/23	1964CC
1966	1.3.10.1.1.2.4.1.6	Pozos de inspección y/o cámaras	20,88 días	100	100,000%	100,000%	lun 24/04/23	mié 17/05/23	1962CC
1967	1.3.10.1.1.2.4.1.7	Sumideros	20,88 días	100	100,000%	100,000%	lun 24/04/23	mié 17/05/23	1962CC;1966FF
1968	1.3.10.1.1.2.4.1.2	Excavaciones	20 días	100	100,000%	100,000%	lun 3/02/25	mar 25/02/25	1961CC+545 días
1969	1.3.10.1.1.2.4.1.3	Entibados	20 días	100	100,000%	100,000%	lun 3/02/25	mar 25/02/25	1968CC
1970	1.3.10.1.1.2.4.1.4	Tuberías	20 días	100	100,000%	100,000%	lun 3/02/25	mar 25/02/25	1968CC
1971	1.3.10.1.1.2.4.1.5	Rellenos	20 días	100	100,000%	100,000%	lun 3/02/25	mar 25/02/25	1970CC

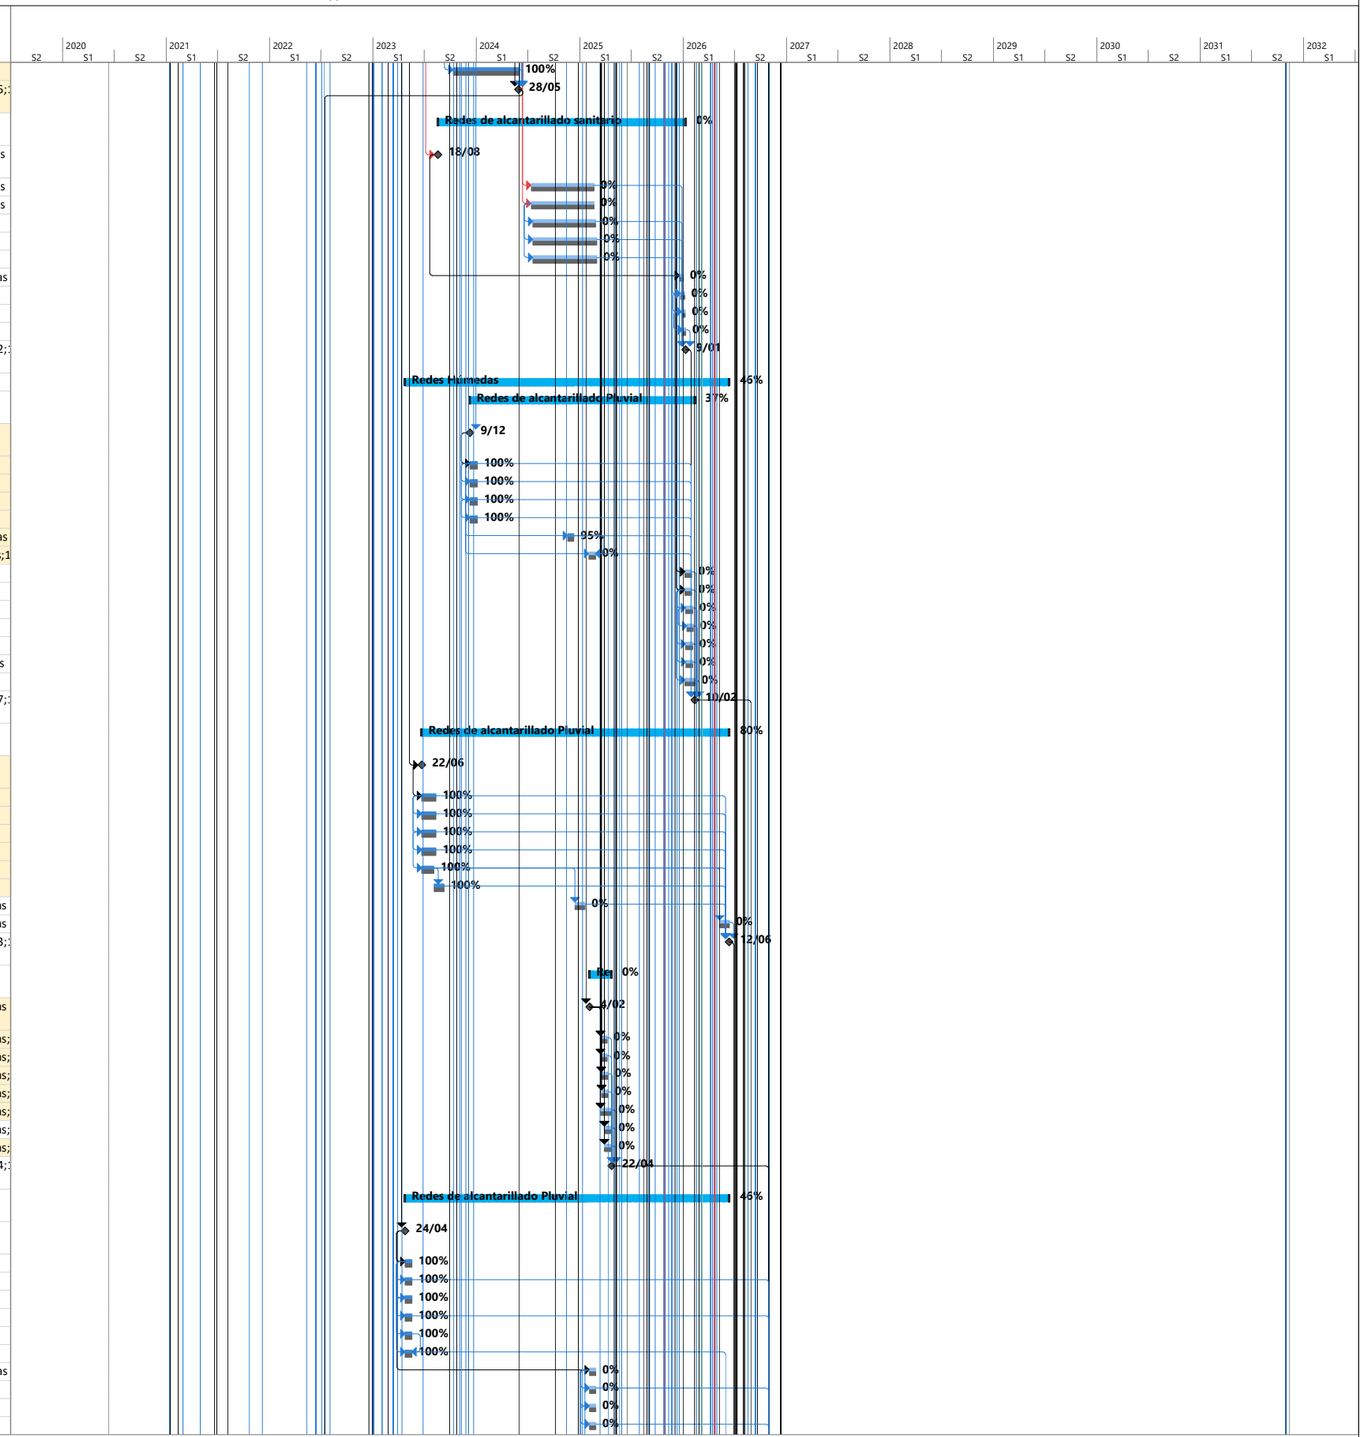


Tareas críticas · Tarea · Tarea manual · solo duración · Hito de línea base · Resumen · Tareas externas · Hito inactivo
División crítica · División · solo el comienzo · Línea base · Hito · Resumen manual · Hito externo · Resumen inactivo
Progreso de tarea crítica · Progreso de tarea · solo fin · División de la línea base · Progreso del resumen · Resumen del proyecto · Tarea inactiva · Fecha límite

Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	% Avance Conciliado	% Avance Programado (% PV)	% Avance Ejecutado conciliado (% EV))	Comienzo	Fin	Predecesoras
1972	1.3.10.1.1.2.4.1.6	Pozos de inspección y/o cámaras	20 días	100	100,000%	100,000%	lun 3/02/25	mar 25/02/25	1968CC
1973	1.3.10.1.1.2.4.1.7	Sumideros	25 días	100	100,000%	100,000%	jue 30/01/25	jue 27/02/25	1968CC-3 días;19
1974	1.3.10.1.1.2.4.1.7	Sumideros	25 días	0	0,000%	0,000%	jue 16/04/26	vie 15/05/26	1968CC+370 días;
1975	1.3.10.1.1.2.4.1.8	Fin tramo de redes de alcantarillado pluvial	0 días	0	0,000%	0,000%	vie 12/06/26	vie 12/06/26	1967FC+3 días;1974FC+3
1976	**1.3.10.1.1.3**	**Redes Secas**	**1283,13 días**	**0**	**74,056%**	**73,102%**	**mar 24/05/22**	**mar 28/07/26**	
1977	**1.3.10.1.2.3.1**	**Redes de codensa**	**1283,13 días**	**0**	**78,526%**	**77,692%**	**mar 24/05/22**	**mar 28/07/26**	
1978	**1.3.10.1.1.3.1**	**Redes de Codensa (K8+980 - K9+250) TRIANGULO**	**1224 días**	**0**	**93,541%**	**87,230%**	**mar 24/05/22**	**sáb 16/05/26**	
1979	1.3.10.1.1.3.1.1	Inicio tramo de redes de Codensa	0 días	100	0,000%	0,000%	mar 24/05/22	mar 24/05/22	8FC+376 días
1980	1.3.10.1.1.3.1.2	Excavaciones	20,88 días	100	100,000%	100,000%	mié 25/05/22	vie 17/06/22	1979CC
1981	1.3.10.1.1.3.1.3	Canalización	20,38 días	100	100,000%	100,000%	vie 27/05/22	mar 21/06/22	1980CC+2 días
1982	1.3.10.1.1.3.1.4	Rellenos	20,88 días	100	100,000%	100,000%	mar 31/05/22	jue 23/06/22	1981CC+2 días
1983	1.3.10.1.1.3.1.5	Cajas	14,13 días	100	100,000%	100,000%	vie 27/01/23	sáb 11/02/23	1982FC+177 días
1984	1.3.10.1.1.3.1.2	Excavaciones	20 días	100	100,000%	100,000%	vie 3/10/25	lun 27/10/25	1979FC+1035 días
1985	1.3.10.1.1.3.1.3	Canalización	20 días	100	100,000%	100,000%	lun 6/10/25	mié 29/10/25	1984CC+2 días
1986	1.3.10.1.1.3.1.4	Rellenos	20 días	100	100,000%	100,000%	mié 8/10/25	vie 31/10/25	1985CC+2 días
1987	1.3.10.1.1.3.1.2	Excavaciones	20 días	100	0,000%	100,000%	sáb 18/04/26	mar 12/05/26	1979FC+1200 días
1988	1.3.10.1.1.3.1.3	Canalización	20 días	100	0,000%	100,000%	lun 20/04/26	mié 13/05/26	1987CC+1 día
1989	1.3.10.1.1.3.1.4	Rellenos	20 días	100	0,000%	100,000%	jue 23/04/26	sáb 16/05/26	1988CC+3 días
1990	1.3.10.1.1.3.1.5	Cajas	20 días	100	100,000%	100,000%	sáb 6/12/25	mié 31/12/25	1181FF-200 días
1991	1.3.10.1.1.3.1.2	Excavaciones	20 días	0	0,000%	0,000%	sáb 18/04/26	mar 12/05/26	1979FC+1200 días
1992	1.3.10.1.1.3.1.3	Canalización	20 días	0	0,000%	0,000%	lun 20/04/26	mié 13/05/26	1991CC+1 día
1993	1.3.10.1.1.3.1.4	Rellenos	20 días	0	0,000%	0,000%	jue 23/04/26	sáb 16/05/26	1992CC+3 días
1994	1.3.10.1.1.3.1.5	Cajas	20 días	0	100,000%	0,000%	sáb 6/12/25	mié 31/12/25	1181FF-200 días
1995	1.3.10.1.1.3.1.6	Fin tramo de redes de Codensa	0 días	0	0,000%	0,000%	mar 17/02/26	mar 17/02/26	1980FC-75 días;19
1996	**1.3.10.1.1.3.1**	**Redes de Codensa (K9+350 - K9+430)**	**951,13 días**	**0**	**81,754%**	**95,967%**	**vie 10/02/23**	**lun 16/03/26**	
1997	1.3.10.1.1.3.1.1	Inicio tramo de redes de Codensa	0 días	100	0,000%	0,000%	lun 17/04/23	lun 17/04/23	2011CC-20 días
1998	1.3.10.1.1.3.1.2	Excavaciones	20,88 días	100	100,000%	100,000%	lun 17/04/23	mié 10/05/23	1997CC
1999	1.3.10.1.1.3.1.3	Canalización	20,88 días	100	100,000%	100,000%	lun 24/04/23	mié 17/05/23	1998CC+6 días
2000	1.3.10.1.1.3.1.4	Rellenos	20,88 días	100	100,000%	100,000%	lun 24/04/23	mié 17/05/23	1999CC
2001	1.3.10.1.1.3.1.5	Cajas	20,88 días	100	100,000%	100,000%	lun 24/04/23	mié 17/05/23	2000CC
2002	1.3.10.1.1.3.1.2	Excavaciones	20 días	100	53,750%	100,000%	mar 17/02/26	mié 11/03/26	1997CC;1995CC
2003	1.3.10.1.1.3.1.3	Canalización	19,5 días	100	44,872%	100,000%	jue 19/02/26	jue 12/03/26	2002CC+2 días
2004	1.3.10.1.1.3.1.4	Rellenos	20 días	100	33,750%	100,000%	sáb 21/02/26	lun 16/03/26	2003CC+2 días
2005	1.3.10.1.1.3.1.5	Cajas	20 días	100	100,000%	100,000%	vie 10/02/23	lun 6/03/23	1997CC-54 días
2006	1.3.10.1.1.3.1.2	Excavaciones	20 días	0	53,750%	0,000%	mar 17/02/26	mié 11/03/26	1997CC;1995
2007	1.3.10.1.1.3.1.3	Canalización	20 días	0	53,750%	0,000%	mar 17/02/26	mié 11/03/26	2006CC
2008	1.3.10.1.1.3.1.4	Rellenos	20 días	0	43,750%	0,000%	jue 19/02/26	vie 13/03/26	2007CC+2 días
2009	1.3.10.1.1.3.1.6	Fin tramo de redes de Codensa	0 días	0	0,000%	0,000%	lun 16/03/26	lun 16/03/26	2001;2005;2008;
2010	**1.3.10.1.1.3.1**	**Redes de Codensa (K9+430 - K9+560)**	**931,13 días**	**0**	**27,290%**	**27,290%**	**jue 11/05/23**	**vie 22/05/26**	
2011	1.3.10.1.1.3.1.1	Inicio tramo de redes de Codensa	0 días	100	0,000%	0,000%	jue 11/05/23	jue 11/05/23	1830FC-28 días
2012	1.3.10.1.1.3.1.2	Excavaciones	20,38 días	100	100,000%	100,000%	vie 10/11/23	lun 4/12/23	2011CC+148 días
2013	1.3.10.1.1.3.1.3	Canalización	20,38 días	100	100,000%	100,000%	vie 10/11/23	lun 4/12/23	2012CC
2014	1.3.10.1.1.3.1.4	Rellenos	20,38 días	100	100,000%	100,000%	vie 10/11/23	lun 4/12/23	2013CC
2015	1.3.10.1.1.3.1.5	Cajas	20,38 días	100	100,000%	100,000%	vie 10/11/23	lun 4/12/23	2014CC
2016	1.3.10.1.1.3.1.2	Excavaciones	20 días	100	100,000%	100,000%	mié 20/08/25	jue 11/09/25	1984CC-205 días;
2017	1.3.10.1.1.3.1.3	Canalización	20 días	100	100,000%	100,000%	mié 20/08/25	jue 11/09/25	2016CC
2018	1.3.10.1.1.3.1.4	Rellenos	20 días	100	100,000%	100,000%	mié 20/08/25	jue 11/09/25	2017CC
2019	1.3.10.1.1.3.1.5	Cajas	20 días	100	100,000%	100,000%	mié 20/08/25	jue 11/09/25	2018CC
2020	1.3.10.1.1.3.1.2	Excavaciones	20 días	0	0,000%	0,000%	vie 24/04/26	mar 19/05/26	1984CC+5 días;19
2021	1.3.10.1.1.3.1.3	Canalización	20 días	0	0,000%	0,000%	sáb 25/04/26	mié 20/05/26	2020CC+1 día
2022	1.3.10.1.1.3.1.4	Rellenos	20 días	0	0,000%	0,000%	lun 27/04/26	jue 21/05/26	2020CC+2 días
2023	1.3.10.1.1.3.1.5	Cajas	20 días	0	0,000%	0,000%	mar 28/04/26	vie 22/05/26	2020CC+3 días
2024	1.3.10.1.1.3.1.6	Fin tramo de redes de Codensa	0 días	0	0,000%	0,000%	vie 22/05/26	vie 22/05/26	2015;2019;2023;
2025	**1.3.10.1.1.3.1**	**Redes de Codensa (K9+560 - K9+760)**	**1001 días**	**0**	**90,267%**	**90,267%**	**lun 24/04/23**	**mar 28/07/26**	
2026	1.3.10.1.1.3.1.1	Inicio tramo de redes de Codensa	0 días	100	0,000%	0,000%	lun 24/04/23	lun 24/04/23	1827CC-42 días
2027	1.3.10.1.1.3.1.2	Excavaciones	20 días	100	100,000%	100,000%	lun 24/04/23	mié 17/05/23	2026CC
2028	1.3.10.1.1.3.1.3	Canalización	20 días	100	100,000%	100,000%	lun 24/04/23	mié 17/05/23	2027CC
2029	1.3.10.1.1.3.1.4	Rellenos	20 días	100	100,000%	100,000%	lun 24/04/23	mié 17/05/23	2028CC
2030	1.3.10.1.1.3.1.5	Cajas	20 días	100	100,000%	100,000%	vie 5/05/23	lun 29/05/23	2029FC-11 días
2031	1.3.10.1.1.3.1.2	Excavaciones	20 días	100	100,000%	100,000%	vie 20/12/24	mié 15/01/25	2026FC+510 días
2032	1.3.10.1.1.3.1.3	Canalización	20 días	100	100,000%	100,000%	vie 20/12/24	mié 15/01/25	2031CC
2033	1.3.10.1.1.3.1.4	Rellenos	20 días	100	100,000%	100,000%	vie 20/12/24	mié 15/01/25	2032CC
2034	1.3.10.1.1.3.1.2	Excavaciones	20 días	0	0,000%	0,000%	mar 9/06/26	vie 3/07/26	2026FC+960 días
2035	1.3.10.1.1.3.1.3	Canalización	20 días	0	0,000%	0,000%	mar 9/06/26	vie 3/07/26	2034CC
2036	1.3.10.1.1.3.1.4	Rellenos	20 días	0	0,000%	0,000%	mar 9/06/26	vie 3/07/26	2035CC
2037	1.3.10.1.1.3.1.5	Cajas	20 días	0	0,000%	0,000%	sáb 4/07/26	mar 28/07/26	2036FC+1 día
2038	1.3.10.1.1.3.1.6	Fin tramo de redes de Codensa	0 días	0	0,000%	0,000%	mar 28/07/26	mar 28/07/26	2030;2037;2009;
2039	**1.3.10.1.2.3.2**	**Redes ETB**	**1283,13 días**	**0**	**62,310%**	**61,042%**	**mar 24/05/22**	**mar 28/07/26**	
2040	**1.3.10.1.1.3.2**	**Redes de ETB (K8+980 - K9+250) TRIANGULO**	**1255,5 días**	**0**	**90,672%**	**88,370%**	**mar 24/05/22**	**jue 25/06/26**	
2041	1.3.10.1.1.3.2.1	Inicio tramo redes de ETB	0 días	100	0,000%	0,000%	mar 24/05/22	mar 24/05/22	1979CC
2042	1.3.10.1.1.3.2.2	Excavaciones	20,88 días	100	100,000%	100,000%	mié 25/05/22	vie 17/06/22	2041
2043	1.3.10.1.1.3.2.3	canalizaciones	20,38 días	100	100,000%	100,000%	vie 27/05/22	mar 21/06/22	2042CC+2 días
2044	1.3.10.1.1.3.2.4	Rellenos	20,88 días	100	100,000%	100,000%	mié 25/05/22	vie 17/06/22	2042CC
2045	1.3.10.1.1.3.2.5	Camaras	30,63 días	100	100,000%	100,000%	jue 1/06/23	sáb 8/07/23	2030FC+2 días;20

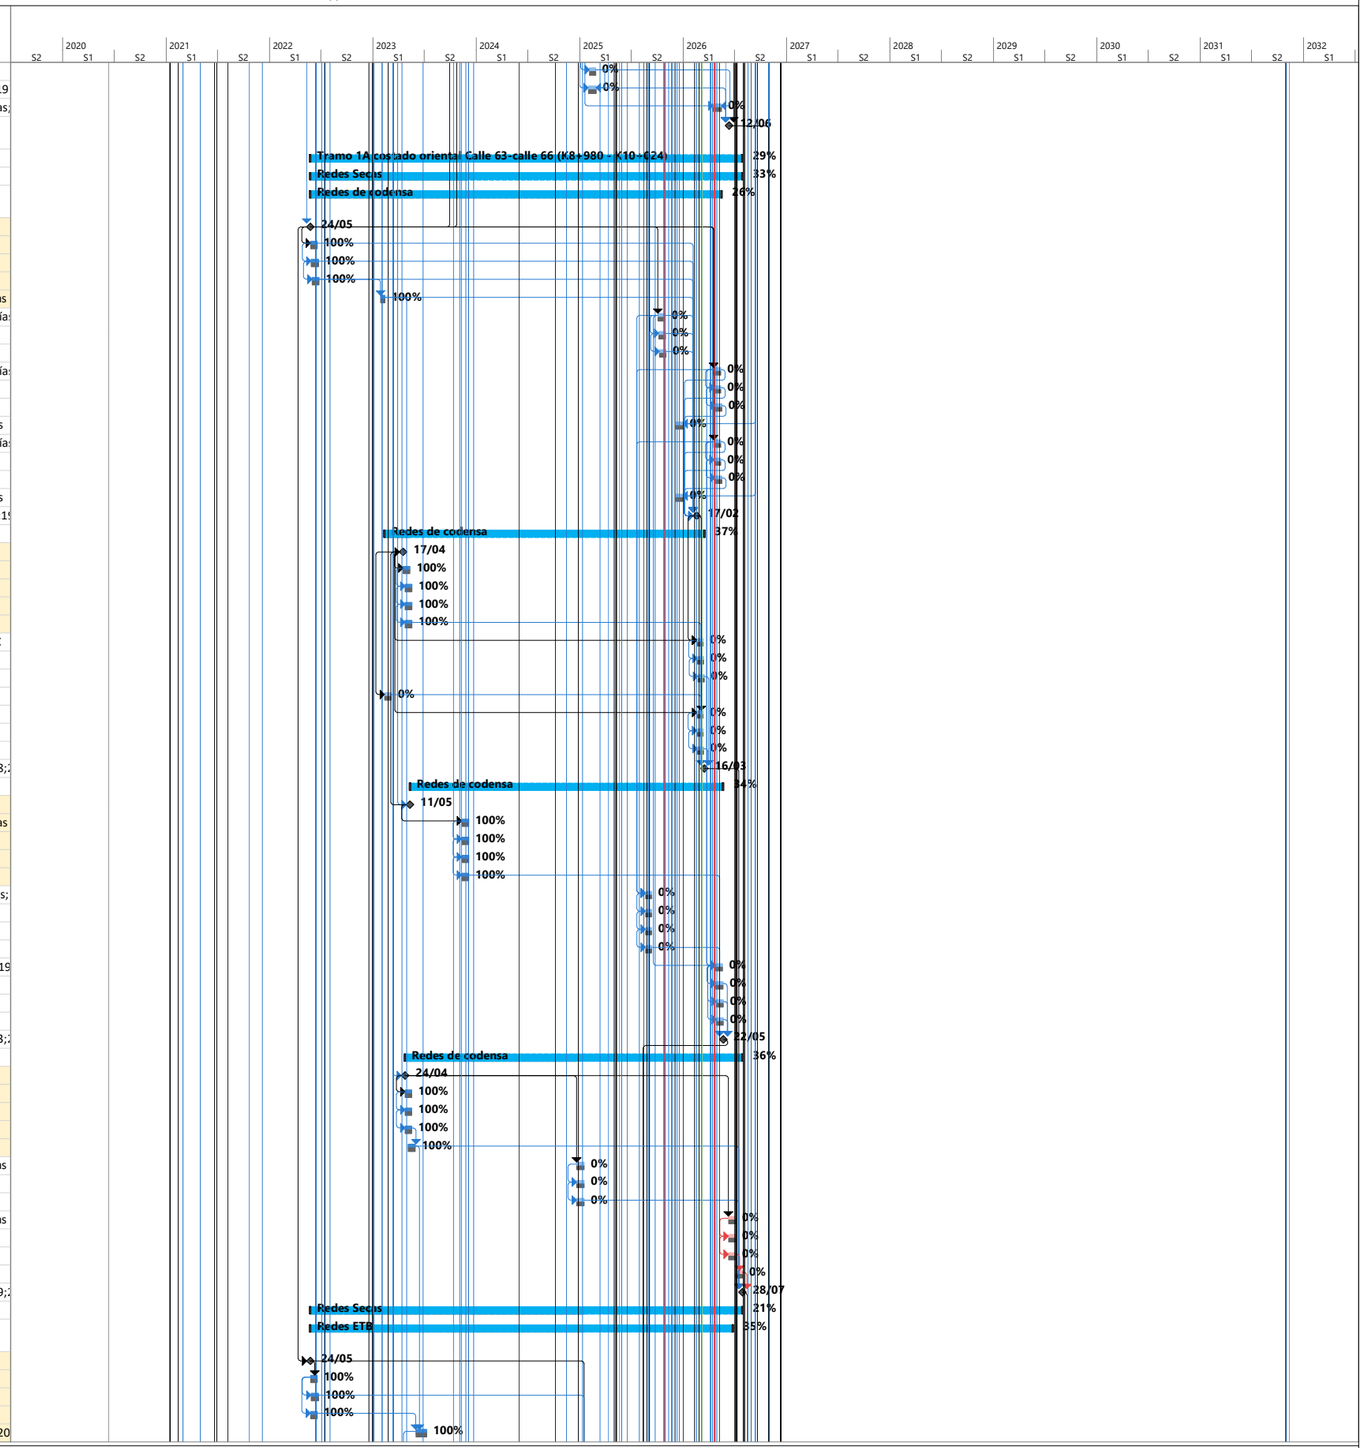


Tareas críticas · Tarea · Tarea manual · solo duración · Hito de línea base · Resumen · Tareas externas · Hito inactivo
División crítica · División · solo el comienzo · Línea base · Hito · Resumen manual · Hito externo · Resumen inactivo
Progreso de tarea crítica · Progreso de tarea · solo fin · División de la línea base · Progreso del resumen · Resumen del proyecto · Tarea inactiva · Fecha límite

Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	% Avance Conciliado	% Avance Programado (% PV)	% Avance Ejecutado conciliado (% EV))	Comienzo	Fin	Predecesoras
2046	1.3.10.1.1.3.2.6	Reconstruccion de cámaras	0 días	100	100,000%	100,000%	jue 1/06/23	jue 1/06/23	2045CC
2047	1.3.10.1.2.3.2.1.7	Excavaciones	20 días	100	100,000%	100,000%	mié 15/01/25	jue 6/02/25	2041FC+812 días;
2048	1.3.10.1.2.3.2.1.8	canalizaciones	20 días	100	100,000%	100,000%	vie 17/01/25	sáb 8/02/25	2047CC+2 días
2049	1.3.10.1.2.3.2.1.9	Rellenos	20 días	100	100,000%	100,000%	mié 23/04/25	vie 16/05/25	2047FC+62 días;2
2050	1.3.10.1.2.3.2.1.1	Excavaciones	20 días	0	0,000%	0,000%	mié 6/05/26	vie 29/05/26	2046CC+900 días
2051	1.3.10.1.2.3.2.1.1	canalizaciones	20 días	0	0,000%	0,000%	jue 7/05/26	lun 1/06/26	2050CC+1 día
2052	1.3.10.1.2.3.2.1.1	Rellenos	19 días	0	0,000%	0,000%	mar 2/06/26	jue 25/06/26	2050FC+1 día;205
2053	1.3.10.1.1.3.2.5	Camaras	30 días	0	100,000%	0,000%	vie 19/12/25	lun 26/01/26	1173FF-180 días;
2054	1.3.10.1.1.3.2.7	Nivelacion de cámaras	20 días	0	100,000%	0,000%	mié 31/12/25	lun 26/01/26	2053CC+10 días
2055	1.3.10.1.1.3.2.8	Fin tramo de redes de ETB	0 días	0	0,000%	0,000%	lun 26/01/26	lun 26/01/26	2054
2056	**1.3.10.1.1.3.2**	**Redes de ETB (K9+430 - K9+560)**	**363 días**	**0**	**44,952%**	**44,952%**	**jue 27/03/25**	**mar 2/06/26**	
2057	1.3.10.1.1.3.2.1	Inicio tramo redes de ETB	0 días	100	0,000%	0,000%	mié 24/09/25	mié 24/09/25	2024FC-201 días
2058	1.3.10.1.1.3.2.2	Excavaciones	30 días	100	100,000%	100,000%	mar 23/09/25	mar 28/10/25	2057CC-1 día
2059	1.3.10.1.1.3.2.3	canalizaciones	30 días	100	100,000%	100,000%	mar 28/10/25	mié 3/12/25	2058
2060	1.3.10.1.1.3.2.4	Rellenos	30 días	100	100,000%	100,000%	mié 3/12/25	vie 9/01/26	2059
2061	1.3.10.1.1.3.2.5	Camaras	30 días	100	100,000%	100,000%	jue 27/03/25	sáb 3/05/25	2060FC-242 días
2062	1.3.10.1.1.3.2.2	Excavaciones	20 días	0	0,000%	0,000%	mié 15/04/26	vie 8/05/26	2057CC+170 días;
2063	1.3.10.1.1.3.2.3	canalizaciones	20 días	0	0,000%	0,000%	mar 21/04/26	jue 14/05/26	2062CC+5 días
2064	1.3.10.1.1.3.2.4	Rellenos	20 días	0	0,000%	0,000%	lun 27/04/26	jue 21/05/26	2063CC+5 días
2065	1.3.10.1.1.3.2.5	Camaras	20 días	0	0,000%	0,000%	lun 4/05/26	mié 27/05/26	2064CC+5 días
2066	1.3.10.1.1.3.2.6	Reconstruccion de cámaras	15 días	0	0,000%	0,000%	vie 8/05/26	mié 27/05/26	2065CC+5 días
2067	1.3.10.1.1.3.2.7	Nivelacion de cámaras	15 días	0	0,000%	0,000%	jue 14/05/26	mar 2/06/26	2066CC+5 días
2068	1.3.10.1.1.3.2.8	Fin tramo de redes de ETB	0 días	0	0,000%	0,000%	mar 2/06/26	mar 2/06/26	2067
2069	**1.3.10.1.1.3.2**	**Redes de ETB (K9+560 - K9+760)**	**984,13 días**	**0**	**2,324%**	**2,324%**	**vie 12/05/23**	**mar 28/07/26**	
2070	1.3.10.1.1.3.2.1	Inicio tramo redes de ETB	0 días	100	0,000%	0,000%	vie 12/05/23	vie 12/05/23	1983FC+73 días
2071	1.3.10.1.1.3.2.7	Nivelacion de cámaras	20,38 días	100	100,000%	100,000%	sáb 13/05/23	mar 6/06/23	2070
2072	1.3.10.1.1.3.2.7	Nivelacion de cámaras	20 días	0	0,000%	0,000%	lun 4/05/26	mié 27/05/26	2067CC-10 días
2073	1.3.10.1.1.3.2.8	Fin tramo de redes de ETB	0 días	0	0,000%	0,000%	mar 28/07/26	mar 28/07/26	2071;2072;2038
2074	**1.3.10.1.3**	**Tramo 1B costado oriental Calle 63-calle 66 (K9+760 - K10+024)**	**1156,25 días**	**0**	**92,665%**	**92,772%**	**sáb 27/08/22**	**vie 29/05/26**	
2075	**1.3.10.1.3.1**	**Redes Húmedas**	**1156,25 días**	**0**	**82,452%**	**82,814%**	**sáb 27/08/22**	**vie 29/05/26**	
2076	**1.3.10.1.3.1.1**	**Redes de Acueducto**	**972,75 días**	**0**	**95,935%**	**97,785%**	**lun 20/02/23**	**mar 21/04/26**	
2077	**1.3.10.1.3.1.1.1**	**Tramo de redes de acueducto (K9+760 - K9+805)**	**11,88 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**sáb 22/04/23**	**sáb 6/05/23**	
2078	1.3.10.1.3.1.1.1.1	Inicio tramo redes de acueducto	0 días	100	0,000%	0,000%	sáb 22/04/23	sáb 22/04/23	2070CC-17 días
2079	1.3.10.1.3.1.1.1.2	Excavaciones	3,25 días	100	100,000%	100,000%	lun 24/04/23	mié 26/04/23	2078FC+1 día
2080	1.3.10.1.3.1.1.1.3	Tuberías	3,25 días	100	100,000%	100,000%	mié 26/04/23	vie 28/04/23	2079FC-1 día
2081	1.3.10.1.3.1.1.1.4	Accesorios	2,75 días	100	100,000%	100,000%	sáb 29/04/23	mié 3/05/23	2079FC+2 días
2082	1.3.10.1.3.1.1.1.5	Empates	2,75 días	100	100,000%	100,000%	sáb 29/04/23	mié 3/05/23	2081CC
2083	1.3.10.1.3.1.1.1.6	Rellenos	3,88 días	100	100,000%	100,000%	mié 3/05/23	sáb 6/05/23	2080FC-1 día;208
2084	**1.3.10.1.3.1.1.2**	**Tramo de redes de acueducto (K9+805 - K9+835)**	**875 días**	**0**	**61,274%**	**78,898%**	**vie 16/06/23**	**mar 21/04/26**	
2085	1.3.10.1.3.1.1.2.1	Excavaciones	3,88 días	100	100,000%	100,000%	vie 16/06/23	mié 21/06/23	2083FC+32 días
2086	1.3.10.1.3.1.1.2.2	Tuberías	3,88 días	100	100,000%	100,000%	jue 22/06/23	lun 26/06/23	2085CC+4 días
2087	1.3.10.1.3.1.1.2.3	Rellenos	3 días	100	0,000%	100,000%	mié 25/03/26	vie 27/03/26	2085CC-20 días;2
2088	1.3.10.1.3.1.1.2.4	Accesorios	3 días	0	0,000%	0,000%	mié 15/04/26	sáb 18/04/26	1872FC-40 días;2
2089	1.3.10.1.3.1.1.2.5	Empates	2 días	0	0,000%	0,000%	sáb 18/04/26	mar 21/04/26	2088
2090	**1.3.10.1.3.1.1.3**	**Tramo de redes de acueducto (K9+835 - K9+865)**	**17,63 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**sáb 21/10/23**	**sáb 11/11/23**	
2091	1.3.10.1.3.1.1.3.1	Inicio tramo redes de acueducto	0 días	100	0,000%	0,000%	sáb 21/10/23	sáb 21/10/23	2086FC+96 días
2092	1.3.10.1.3.1.1.3.2	Excavaciones	4,38 días	100	100,000%	100,000%	lun 23/10/23	jue 26/10/23	2091
2093	1.3.10.1.3.1.1.3.3	Tuberías	2,75 días	100	100,000%	100,000%	jue 26/10/23	sáb 28/10/23	2092CC+3 días
2094	1.3.10.1.3.1.1.3.4	Accesorios	3,25 días	100	100,000%	100,000%	lun 30/10/23	mié 1/11/23	2093CC+3 días
2095	1.3.10.1.3.1.1.3.5	Empates	3,88 días	100	100,000%	100,000%	mié 1/11/23	sáb 4/11/23	2094CC+2 días
2096	1.3.10.1.3.1.1.3.6	Rellenos	3,88 días	100	100,000%	100,000%	jue 2/11/23	mar 7/11/23	2095CC+1 día
2097	1.3.10.1.3.1.1.3.7	Hidrantes	3,88 días	100	100,000%	100,000%	mié 8/11/23	sáb 11/11/23	2096CC+4 días
2098	1.3.10.1.3.1.1.3.8	Fin tramo redes de acueducto	0 días	100	0,000%	0,000%	jue 9/11/23	jue 9/11/23	2097CC+2 días
2099	**1.3.10.1.3.1.1.4**	**Tramo de redes de acueducto (K9+865 - K10+024)**	**202,25 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**lun 20/02/23**	**mié 18/10/23**	
2100	1.3.10.1.3.1.1.4.1	Inicio tramo redes de acueducto	0 días	100	0,000%	0,000%	lun 20/02/23	lun 20/02/23	2083CC-58 días
2101	1.3.10.1.3.1.1.4.2	Excavaciones	103,88 días	100	100,000%	100,000%	lun 20/02/23	vie 23/06/23	2100CC
2102	1.3.10.1.3.1.1.4.3	Tuberías	103,38 días	100	100,000%	100,000%	mié 22/02/23	lun 26/06/23	2101CC+2 días
2103	1.3.10.1.3.1.1.4.4	Accesorios	103,38 días	100	100,000%	100,000%	sáb 25/02/23	jue 29/06/23	2101CC+5 días
2104	1.3.10.1.3.1.1.4.5	Empates	103,38 días	100	100,000%	100,000%	sáb 25/02/23	jue 29/06/23	2101CC+5 días
2105	1.3.10.1.3.1.1.4.6	Rellenos	82,88 días	100	100,000%	100,000%	vie 30/06/23	jue 5/10/23	2103
2106	1.3.10.1.3.1.1.4.7	Hidrantes	82,88 días	100	100,000%	100,000%	jue 13/07/23	mié 18/10/23	2105CC+10 días
2107	1.3.10.1.3.1.1.4.8	Fin tramo redes de acueducto	0 días	100	0,000%	0,000%	mar 18/07/23	mar 18/07/23	2106FC-76 días;2
2108	**1.3.10.1.3.1.2**	**Redes de alcantarillado Pluvial**	**1156,25 días**	**0**	**79,173%**	**79,173%**	**sáb 27/08/22**	**vie 29/05/26**	
2109	**1.3.10.1.3.1.2.1**	**Tramo de redes de alcantarillado pluvial (K9+760-K10+024)**	**1156,25 días**	**0**	**79,173%**	**79,173%**	**sáb 27/08/22**	**vie 29/05/26**	
2110	1.3.10.1.3.1.2.1.1	Inicio tramo de redes de alcantarillado pluvial	0 días	100	0,000%	0,000%	sáb 27/08/22	sáb 27/08/22	1909FC-521 días
2111	1.3.10.1.3.1.2.1.2	Excavaciones	466,63 días	100	100,000%	100,000%	sáb 27/08/22	jue 29/02/24	2110
2112	1.3.10.1.3.1.2.1.3	Entibados	466,63 días	100	100,000%	100,000%	mar 30/08/22	sáb 2/03/24	2111CC+2 días
2113	1.3.10.1.3.1.2.1.4	Tuberías	467,13 días	100	100,000%	100,000%	lun 5/09/22	vie 8/03/24	2112CC+5 días
2114	1.3.10.1.3.1.2.1.5	Rellenos	466,63 días	100	100,000%	100,000%	sáb 10/09/22	jue 14/03/24	2113CC+5 días
2115	1.3.10.1.3.1.2.1.6	Pozos de inspección y/o cámaras	482 días	100	100,000%	100,000%	sáb 27/08/22	lun 18/03/24	2110CC
2116	1.3.10.1.3.1.2.1.7	Sumideros	466,63 días	100	100,000%	100,000%	mié 14/09/22	lun 18/03/24	2113CC+8 días

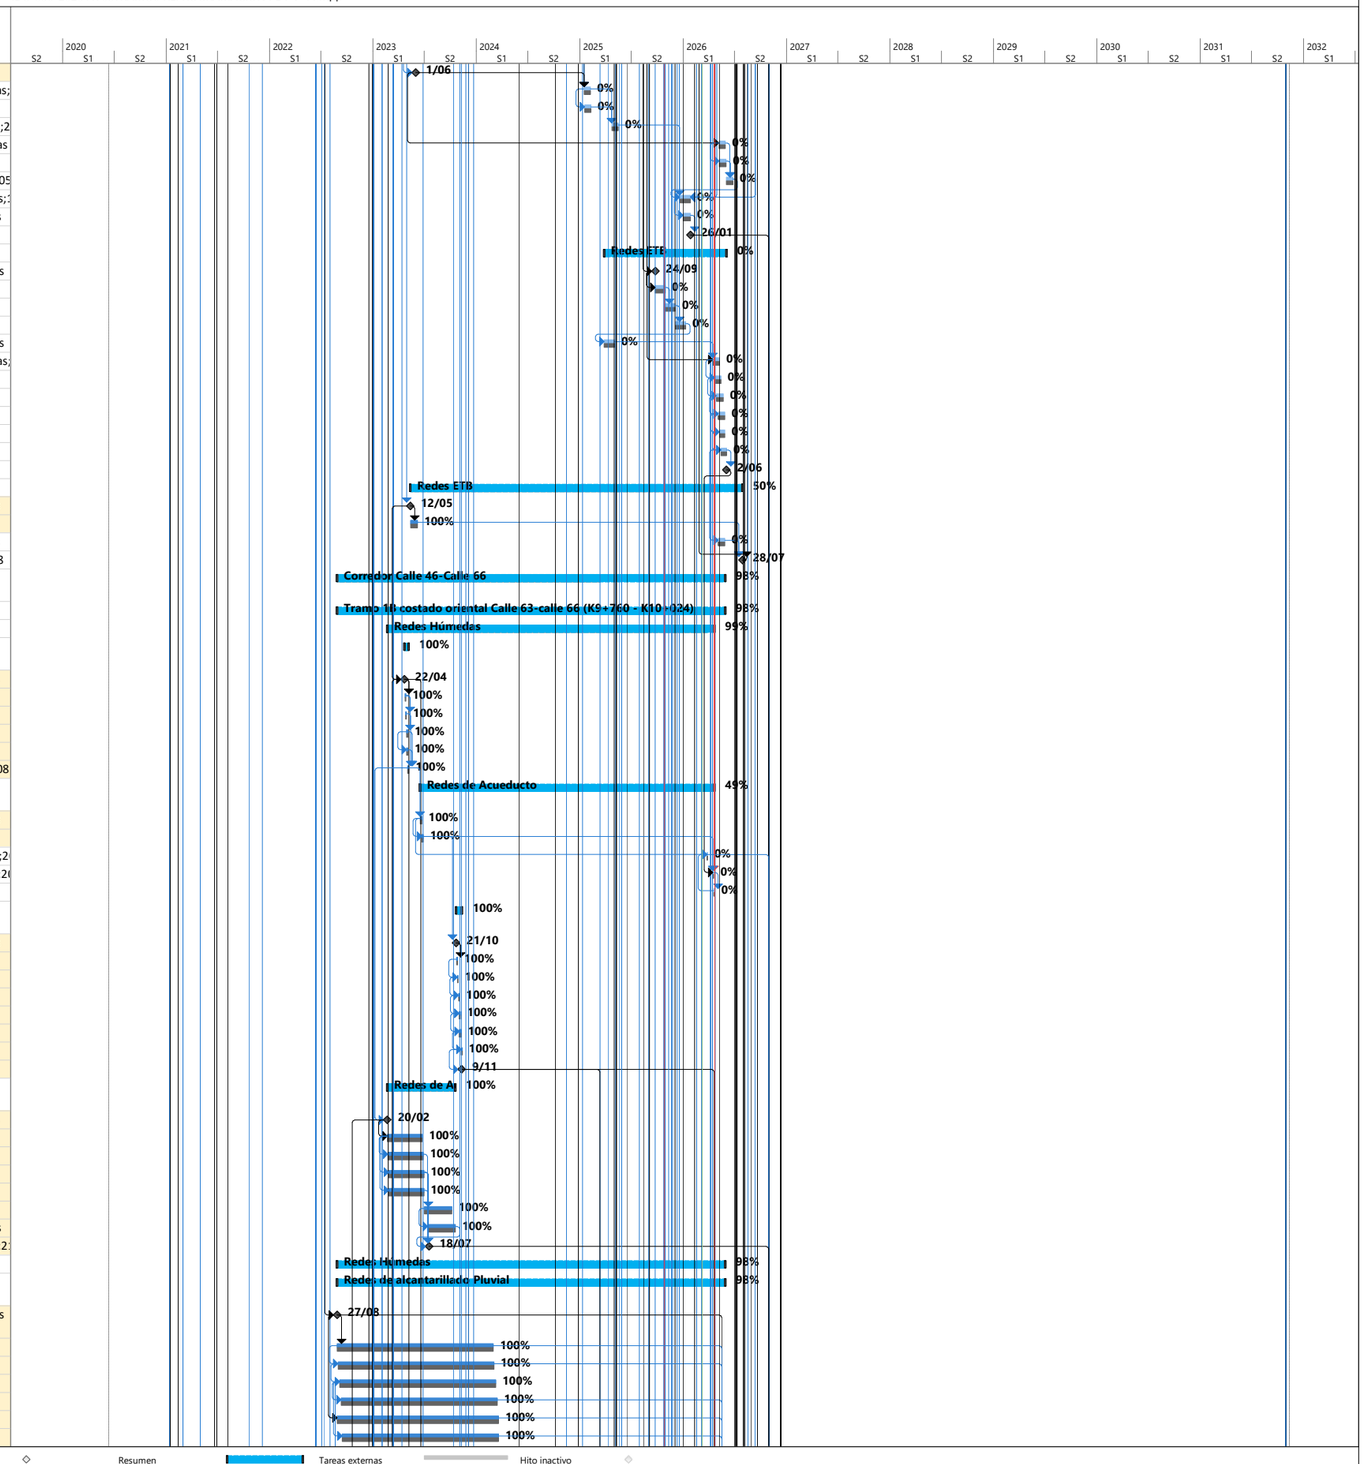


Tareas críticas · Tarea · Tarea manual · solo duración · Hito de línea base · Resumen · Tareas externas · Hito inactivo
División crítica · División · solo el comienzo · Línea base · Hito · Resumen manual · Hito externo · Resumen inactivo
Progreso de tarea crítica · Progreso de tarea · solo fin · División de la línea base · Progreso del resumen · Resumen del proyecto · Tarea inactiva · Fecha límite

Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	% Avance Conciliado	% Avance Programado (% PV)	% Avance Ejecutado conciliado (% EV))	Comienzo	Fin	Predecesoras
2117	1.3.10.1.3.1.2.1.8	Sumideros	14 días	100	100,000%	100,000%	mié 12/03/25	vie 28/03/25	2113CC+777 días,
2118	1.3.10.1.3.1.2.1.9	Sumideros	34 días	0	0,000%	0,000%	lun 20/04/26	vie 29/05/26	2113CC+750 días,
2119	1.3.10.1.3.1.2.1.1	Fin tramo de redes de alcantarillado pluvial	0 días	0	0,000%	0,000%	vie 29/05/26	vie 29/05/26	2110;2111;2112;
2120	**1.3.10.1.3.2**	**Redes Secas**	**1059,63 días**	**0**	**96,956%**	**96,956%**	**vie 2/12/22**	**mié 13/05/26**	
2121	**1.3.10.1.3.2.1**	**Redes de codensa**	**1059,63 días**	**0**	**95,797%**	**95,797%**	**vie 2/12/22**	**mié 13/05/26**	
2122	**1.3.10.1.3.2.1.1**	**Redes de Codensa (K9+760 - K9+805)**	**925,13 días**	**0**	**93,835%**	**93,835%**	**sáb 22/04/23**	**lun 27/04/26**	
2123	1.3.10.1.3.2.1.1.1	Inicio tramo de redes de Codensa	0 días	100	0,000%	0,000%	sáb 22/04/23	sáb 22/04/23	2078
2124	1.3.10.1.3.2.1.1.2	Excavaciones	2,13 días	100	100,000%	100,000%	lun 24/04/23	mar 25/04/23	2123CC+1 día
2125	1.3.10.1.3.2.1.1.3	Canalización	2,13 días	100	100,000%	100,000%	mié 26/04/23	jue 27/04/23	2124CC+2 días
2126	1.3.10.1.3.2.1.1.4	Rellenos	1,63 días	100	100,000%	100,000%	vie 28/04/23	sáb 29/04/23	2125CC+2 días
2127	1.3.10.1.3.2.1.1.5	Cajas	10,63 días	100	100,000%	100,000%	mar 2/05/23	vie 12/05/23	2126CC+2 días
2128	1.3.10.1.3.2.1.1.6	Cajas	10 días	0	0,000%	0,000%	mié 15/04/26	lun 27/04/26	2126CC+910 días
2129	**1.3.10.1.3.2.1.2**	**Redes de Codensa (K9+805 - K9+835)**	**892,63 días**	**0**	**90,755%**	**90,755%**	**vie 16/06/23**	**mié 13/05/26**	
2130	1.3.10.1.3.2.1.2.1	Inicio tramo de redes de Codensa	0 días	100	0,000%	0,000%	vie 16/06/23	vie 16/06/23	2127FC+28 días
2131	1.3.10.1.3.2.1.2.2	Excavaciones	2,75 días	100	100,000%	100,000%	sáb 17/06/23	mié 21/06/23	2130CC
2132	1.3.10.1.3.2.1.2.3	Canalización	3,25 días	100	100,000%	100,000%	mié 21/06/23	vie 23/06/23	2131CC+2 días
2133	1.3.10.1.3.2.1.2.4	Rellenos	2,75 días	100	100,000%	100,000%	vie 23/06/23	lun 26/06/23	2132CC+2 días
2134	1.3.10.1.3.2.1.2.5	Cajas	20,88 días	100	100,000%	100,000%	mar 27/06/23	vie 21/07/23	2133CC+3 días
2135	1.3.10.1.3.2.1.2.6	Cajas	9 días	0	0,000%	0,000%	lun 4/05/26	mié 13/05/26	2128CC+15 días
2136	1.3.10.1.3.2.1.2.7	Fin tramo de redes de Codensa	0 días	0	0,000%	0,000%	mié 13/05/26	mié 13/05/26	2134;2135
2137	**1.3.10.1.3.2.1.3**	**Redes de Codensa (K9+835 - K9+865)**	**810,25 días**	**0**	**81,509%**	**81,509%**	**mar 19/09/23**	**vie 8/05/26**	
2138	1.3.10.1.3.2.1.3.1	Inicio tramo de redes de Codensa	0 días	100	0,000%	0,000%	mar 19/09/23	mar 19/09/23	2133CC+72 días
2139	1.3.10.1.3.2.1.3.2	Excavaciones	3,88 días	100	100,000%	100,000%	mié 20/09/23	sáb 23/09/23	2138CC
2140	1.3.10.1.3.2.1.3.3	Canalización	3,25 días	100	100,000%	100,000%	lun 25/09/23	mié 27/09/23	2139CC+4 días
2141	1.3.10.1.3.2.1.3.4	Rellenos	2,75 días	100	100,000%	100,000%	jue 28/09/23	sáb 30/09/23	2140CC+3 días
2142	1.3.10.1.3.2.1.3.5	Cajas	20,88 días	100	100,000%	100,000%	lun 2/10/23	mié 25/10/23	2141
2143	1.3.10.1.3.2.1.3.6	Cajas	20 días	0	0,000%	0,000%	mié 15/04/26	vie 8/05/26	2141FC+780 días
2144	1.3.10.1.3.2.1.3.7	Fin tramo de redes de Codensa	0 días	0	0,000%	0,000%	vie 8/05/26	vie 8/05/26	2143;2142
2145	**1.3.10.1.3.2.1.4**	**Redes de Codensa (K9+865 - K10+024)**	**242,63 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**vie 2/12/22**	**vie 15/09/23**	
2146	1.3.10.1.3.2.1.4.1	Inicio tramo de redes de Codensa	0 días	100	0,000%	0,000%	vie 2/12/22	vie 2/12/22	2100CC-66 días
2147	1.3.10.1.3.2.1.4.2	Excavaciones	155,63 días	100	100,000%	100,000%	vie 2/12/22	vie 2/06/23	2146
2148	1.3.10.1.3.2.1.4.3	Canalización	155,63 días	100	100,000%	100,000%	lun 5/12/22	lun 5/06/23	2147CC+2 días
2149	1.3.10.1.3.2.1.4.4	Rellenos	155,63 días	100	100,000%	100,000%	mié 7/12/22	mié 7/06/23	2148CC+2 días
2150	1.3.10.1.3.2.1.4.5	Cajas	93,13 días	100	100,000%	100,000%	sáb 27/05/23	vie 15/09/23	2149FC-10 días
2151	1.3.10.1.3.2.1.4.6	Fin tramo de redes de Codensa	0 días	100	0,000%	0,000%	vie 9/06/23	vie 9/06/23	2150CC+12 días
2152	**1.3.10.1.3.2.2**	**Redes ETB**	**259,25 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**lun 19/12/22**	**sáb 21/10/23**	
2153	**1.3.10.1.3.2.2.1**	**Redes de ETB (K9+760 - K9+805)**	**5 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**sáb 22/04/23**	**jue 27/04/23**	
2154	1.3.10.1.3.2.2.1.1	Inicio tramo redes de ETB	0 días	100	0,000%	0,000%	sáb 22/04/23	sáb 22/04/23	2078CC
2155	1.3.10.1.3.2.2.1.2	Excavaciones	1 día	100	100,000%	100,000%	lun 24/04/23	lun 24/04/23	2154CC+1 día
2156	1.3.10.1.3.2.2.1.3	canalizaciones	1 día	100	100,000%	100,000%	mié 26/04/23	mié 26/04/23	2155CC+2 días
2157	1.3.10.1.3.2.2.1.4	Rellenos	1 día	100	100,000%	100,000%	jue 27/04/23	jue 27/04/23	2156CC+1 día
2158	**1.3.10.1.3.2.2.2**	**Redes de ETB (K9+805 - K9+835)**	**15,38 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**vie 16/06/23**	**jue 6/07/23**	
2159	1.3.10.1.3.2.2.2.1	Inicio tramo redes de ETB	0 días	100	0,000%	0,000%	vie 16/06/23	vie 16/06/23	2130CC
2160	1.3.10.1.3.2.2.2.2	Excavaciones	3,88 días	100	100,000%	100,000%	sáb 17/06/23	jue 22/06/23	2159CC
2161	1.3.10.1.3.2.2.2.3	canalizaciones	3,88 días	100	100,000%	100,000%	mié 21/06/23	sáb 24/06/23	2160CC+2 días
2162	1.3.10.1.3.2.2.2.4	Rellenos	3,88 días	100	100,000%	100,000%	sáb 24/06/23	mié 28/06/23	2161FC-1 día
2163	1.3.10.1.3.2.2.2.5	Camaras	5 días	100	100,000%	100,000%	sáb 24/06/23	jue 29/06/23	2162CC
2164	1.3.10.1.3.2.2.2.6	Fin tramo de redes de ETB	0 días	100	0,000%	0,000%	jue 6/07/23	jue 6/07/23	2163FC+5 días
2165	**1.3.10.1.3.2.2.3**	**Redes de ETB (K9+835 - K9+865)**	**8 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**mié 11/10/23**	**sáb 21/10/23**	
2166	1.3.10.1.3.2.2.3.1	Inicio tramo redes de ETB	0 días	100	0,000%	0,000%	mié 11/10/23	mié 11/10/23	2159CC+80 días;2
2167	1.3.10.1.3.2.2.3.2	Excavaciones	2,75 días	100	100,000%	100,000%	jue 12/10/23	sáb 14/10/23	2166CC
2168	1.3.10.1.3.2.2.3.3	canalizaciones	2,75 días	100	100,000%	100,000%	sáb 14/10/23	mié 18/10/23	2167CC+2 días
2169	1.3.10.1.3.2.2.3.4	Rellenos	2,75 días	100	100,000%	100,000%	jue 19/10/23	sáb 21/10/23	2168CC+3 días
2170	1.3.10.1.3.2.2.3.5	Fin tramo de redes de ETB	0 días	100	0,000%	0,000%	sáb 21/10/23	sáb 21/10/23	2167FC-1 día;216
2171	**1.3.10.1.3.2.2.4**	**Redes de ETB (K9+865 - K10+024)**	**168,25 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**lun 19/12/22**	**jue 6/07/23**	
2172	1.3.10.1.3.2.2.4.1	Inicio tramo redes de ETB	0 días	100	0,000%	0,000%	lun 19/12/22	lun 19/12/22	2146CC+14 días
2173	1.3.10.1.3.2.2.4.2	Excavaciones	10,63 días	100	100,000%	100,000%	mar 20/12/22	vie 30/12/22	2172
2174	1.3.10.1.3.2.2.4.3	canalizaciones	3,25 días	100	100,000%	100,000%	mié 28/06/23	vie 30/06/23	2173CC+155 días
2175	1.3.10.1.3.2.2.4.4	Rellenos	1,63 días	100	100,000%	100,000%	sáb 1/07/23	mar 4/07/23	2174CC+3 días
2176	1.3.10.1.3.2.2.4.5	Camaras	5 días	100	100,000%	100,000%	vie 30/06/23	jue 6/07/23	2175CC-1 día
2177	1.3.10.1.3.2.2.4.6	Fin tramo de redes de ETB	0 días	100	100,000%	100,000%	jue 6/07/23	jue 6/07/23	2173FC-88 días;2
2178	**1.3.10.1.2**	**Tramo 2 costado oriental calle 53-calle 63 (K7+970 - K8+980)**	**1668,13 días**	**0**	**98,484%**	**98,487%**	**vie 12/02/21**	**mar 21/07/26**	
2179	**1.3.10.1.2.1**	**Actividades Silviculturales resolución 2354**	**209,13 días**	**0**	**0,000%**	**0,000%**	**jue 10/11/22**	**sáb 15/07/23**	
2180	**1.3.10.1.2.1.1**	**Traslados**	**207,38 días**	**0**	**0,000%**	**0,000%**	**jue 10/11/22**	**jue 13/07/23**	
2181	1.3.10.1.2.1.1.1	actividades posteriores a la medida cautelar	207,38 días	100	0,000%	0,000%	jue 10/11/22	jue 13/07/23	2964CC-678 días;2144FC-678
2182	**1.3.10.1.2.1.2**	**Talas**	**206,88 días**	**0**	**0,000%**	**0,000%**	**sáb 12/11/22**	**sáb 15/07/23**	
2183	1.3.10.1.2.1.2.1	actividades posteriores a la medida cautelar	206,88 días	100	0,000%	0,000%	sáb 12/11/22	sáb 15/07/23	2181CC+2 días
2184	1.3.10.1.2.2	Inicio de redes Tramo 2	0 días	0	0,000%	0,000%	vie 12/02/21	vie 12/02/21	8
2185	**1.3.10.1.2.3**	**Redes Húmedas**	**1129,25 días**	**0**	**99,422%**	**99,422%**	**mié 16/11/22**	**sáb 18/07/26**	
2186	**1.3.10.1.2.3.1**	**Redes de Acueducto**	**1075,25 días**	**0**	**90,513%**	**90,513%**	**mié 18/01/23**	**sáb 18/07/26**	
2187	**1.3.10.1.2.3.1.1**	**Tramo de redes de acueducto (K7+970 - K8+240)**	**932 días**	**0**	**80,695%**	**80,695%**	**lun 8/05/23**	**mié 20/05/26**	
2188	1.3.10.1.2.3.1.1.1	Inicio tramo de redes de acueducto	0 días	100	0,000%	0,000%	lun 8/05/23	lun 8/05/23	2177FC-47 días

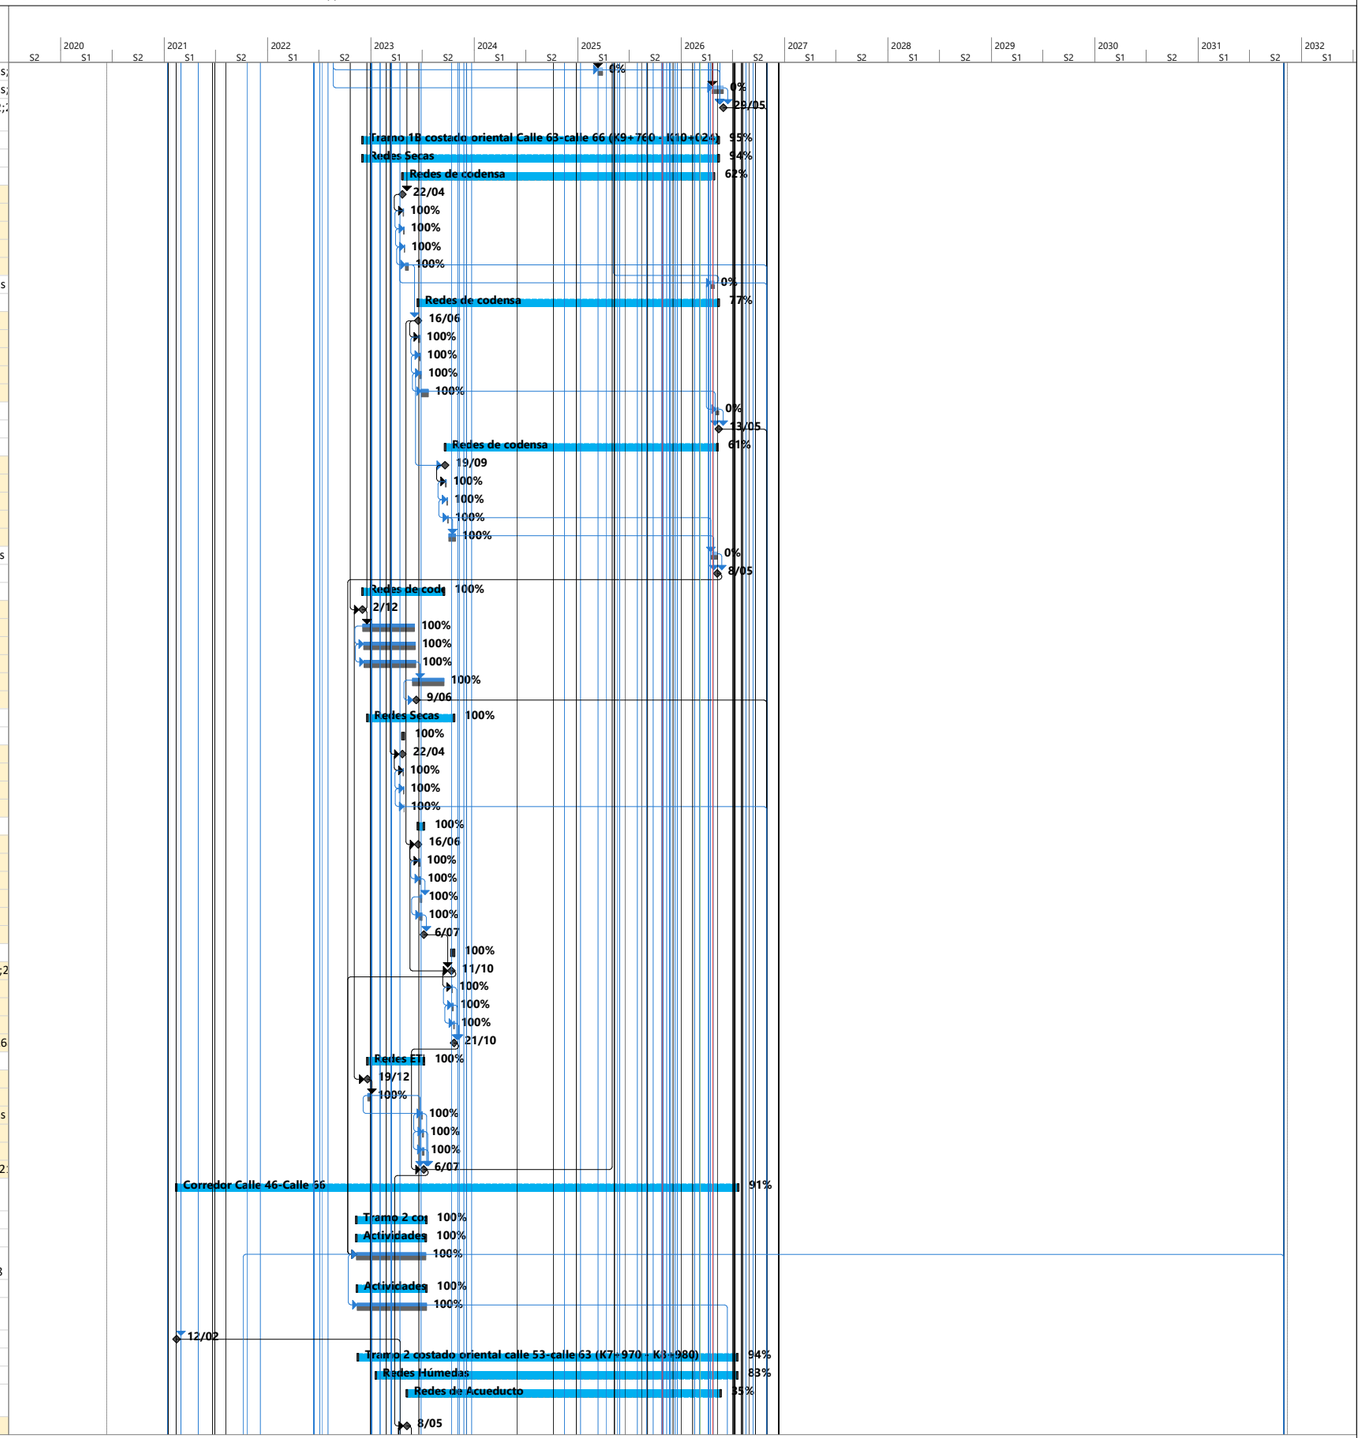


Tareas críticas · Tarea · Tarea manual · solo duración · Hito de línea base · Resumen · Tareas externas · Hito inactivo
División crítica · División · solo el comienzo · Línea base · Hito · Resumen manual · Hito externo · Resumen inactivo
Progreso de tarea crítica · Progreso de tarea · solo fin · División de la línea base · Progreso del resumen · Resumen del proyecto · Tarea inactiva · Fecha límite

Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	% Avance Conciliado	% Avance Programado (% PV)	% Avance Ejecutado conciliado (% EV))	Comienzo	Fin	Predecesoras
2189	1.3.10.1.2.3.1.1.2	Excavaciones	18,63 días	100	100,000%	100,000%	lun 8/05/23	lun 29/05/23	2188CC
2190	1.3.10.1.2.3.1.1.3	Tuberías	18,63 días	100	100,000%	100,000%	lun 8/05/23	lun 29/05/23	2189CC
2191	1.3.10.1.2.3.1.1.6	Rellenos	18,63 días	100	100,000%	100,000%	lun 8/05/23	lun 29/05/23	2188FC-18 días;2
2192	1.3.10.1.2.3.1.1.7	Hidrantes	20,38 días	100	100,000%	100,000%	vie 29/09/23	lun 23/10/23	2191CC+117 días
2193	1.3.10.1.4.3.1.1.6	Excavaciones	17 días	100	100,000%	100,000%	jue 27/11/25	mié 17/12/25	2188CC+787 días
2194	1.3.10.1.4.3.1.1.7	Tuberías	17 días	100	100,000%	100,000%	jue 27/11/25	mié 17/12/25	2193CC
2195	1.3.10.1.4.3.1.1.8	Rellenos	33 días	100	100,000%	100,000%	jue 27/11/25	mié 7/01/26	2193CC
2196	1.3.10.1.4.3.1.1.9	Accesorios	18 días	100	100,000%	100,000%	jue 27/11/25	jue 18/12/25	2193CC
2197	1.3.10.1.4.3.1.1.1	Accesorios	18 días	0	0,000%	0,000%	vie 24/04/26	sáb 16/05/26	2193CC+125 días
2198	1.3.10.1.4.3.1.1.1	Empates	18 días	0	0,000%	0,000%	vie 24/04/26	sáb 16/05/26	2193CC+125 días
2199	1.3.10.1.4.3.1.1.1	Hidrantes	20 días	0	0,000%	0,000%	vie 24/04/26	mié 20/05/26	2193CC+125 días
2200	1.3.10.1.2.3.1.1.8	Fin de tramo de redes de acueducto	0 días	0	0,000%	0,000%	sáb 16/05/26	sáb 16/05/26	2193CC;2192;219
2201	**1.3.10.1.2.3.1.1**	**Tramo de redes de acueducto (K8+240 - K8+980)**	**1075,25 días**	**0**	**94,095%**	**94,095%**	**mié 18/01/23**	**sáb 18/07/26**	
2202	1.3.10.1.2.3.1.1.1	Inicio tramo de redes de acueducto	1 día	100	0,000%	0,000%	mié 18/01/23	mié 18/01/23	2297FC+106 días
2203	1.3.10.1.2.3.1.1.2	Excavaciones	124,38 días	100	100,000%	100,000%	jue 19/01/23	mié 14/06/23	2202
2204	1.3.10.1.2.3.1.1.3	Tuberías	124,38 días	100	100,000%	100,000%	sáb 21/01/23	vie 16/06/23	2203CC+2 días
2205	1.3.10.1.2.3.1.1.4	Accesorios	124,38 días	100	100,000%	100,000%	vie 27/01/23	vie 23/06/23	2204CC+5 días
2206	1.3.10.1.2.3.1.1.5	Empates	124,38 días	100	100,000%	100,000%	jue 2/02/23	jue 29/06/23	2205CC+5 días
2207	1.3.10.1.2.3.1.1.6	Rellenos	124,38 días	100	100,000%	100,000%	mié 8/02/23	jue 6/07/23	2206CC+5 días
2208	1.3.10.1.2.3.1.1.7	Hidrantes	119,25 días	100	100,000%	100,000%	mar 14/02/23	jue 6/07/23	2207CC+5 días
2209	1.3.10.1.2.3.1.1.7	Hidrantes	30 días	0	0,000%	0,000%	vie 12/06/26	sáb 18/07/26	2200FC-20 días;2
2210	1.3.10.1.2.3.1.1.8	Fin de tramo de redes de acueducto	0 días	0	0,000%	0,000%	sáb 18/07/26	sáb 18/07/26	2209;2208
2211	**1.3.10.1.2.3.2**	**Redes de alcantarillado sanitario**	**1100,88 días**	**0**	**99,715%**	**99,715%**	**mié 16/11/22**	**mar 16/06/26**	
2212	**1.3.10.1.2.3.2.1**	**Tramo de redes de alcantarillado sanitario (K7+970-K8+310)**	**150,63 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**sáb 22/04/23**	**jue 19/10/23**	
2213	1.3.10.1.2.3.2.1.1	Inicio de tramo de redes de alcantarillado sanitario	0 días	100	0,000%	0,000%	sáb 22/04/23	sáb 22/04/23	1103CC+23 días
2214	1.3.10.1.2.3.2.1.2	Excavaciones	2,13 días	100	100,000%	100,000%	lun 24/04/23	mar 25/04/23	2213CC
2215	1.3.10.1.2.3.2.1.3	Entibados	2,13 días	100	100,000%	100,000%	lun 24/04/23	mar 25/04/23	2214CC
2216	1.3.10.1.2.3.2.1.4	Tuberías	2,13 días	100	100,000%	100,000%	lun 24/04/23	mar 25/04/23	2215CC
2217	1.3.10.1.2.3.2.1.5	Rellenos	2,13 días	100	100,000%	100,000%	lun 24/04/23	mar 25/04/23	2216CC
2218	1.3.10.1.2.3.2.1.6	Pozos de inspección y/o cámaras	2,13 días	100	100,000%	100,000%	lun 24/04/23	mar 25/04/23	2217CC
2219	1.3.10.1.2.3.2.1.7	Fin de tramo de redes de alcantarillado sanitario	0 días	100	0,000%	0,000%	jue 19/10/23	jue 19/10/23	2218FC+143 días
2220	**1.3.10.1.2.3.2.1**	**Tramo de redes de alcantarillado sanitario (K8+310-K8+750)**	**281,25 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**mié 16/11/22**	**jue 12/10/23**	
2221	1.3.10.1.2.3.2.1.1	Inicio de tramo de redes de alcantarillado sanitario	0 días	100	0,000%	0,000%	jue 17/11/22	jue 17/11/22	2202FC-52 días
2222	1.3.10.1.2.3.2.1.2	Excavaciones	186,88 días	100	100,000%	100,000%	mié 16/11/22	vie 23/06/23	2221FC-1 día
2223	1.3.10.1.2.3.2.1.3	Entibados	186,88 días	100	100,000%	100,000%	mié 16/11/22	vie 23/06/23	2222CC
2224	1.3.10.1.2.3.2.1.4	Tuberías	186,38 días	100	100,000%	100,000%	jue 24/11/22	sáb 1/07/23	2223CC+7 días
2225	1.3.10.1.2.3.2.1.5	Rellenos	186,38 días	100	100,000%	100,000%	vie 2/12/22	mar 11/07/23	2224CC+7 días
2226	1.3.10.1.2.3.2.1.6	Pozos de inspección y/o cámaras	259,63 días	100	100,000%	100,000%	lun 12/12/22	jue 12/10/23	2225CC+7 días
2227	1.3.10.1.2.3.2.1.7	Fin de tramo de redes de alcantarillado sanitario	0 días	100	0,000%	0,000%	jue 12/10/23	jue 12/10/23	2226
2228	**1.3.10.1.2.3.2.1**	**Tramo de redes de alcantarillado sanitario (K8+750-K8+980)**	**965 días**	**0**	**98,748%**	**98,748%**	**lun 24/04/23**	**mar 16/06/26**	
2229	1.3.10.1.2.3.2.1.1	Inicio de tramo de redes de alcantarillado sanitario	0 días	100	0,000%	0,000%	lun 24/04/23	lun 24/04/23	2214CC;2227
2230	1.3.10.1.2.3.2.1.2	Excavaciones	15,75 días	100	100,000%	100,000%	lun 24/04/23	jue 11/05/23	2229
2231	1.3.10.1.2.3.2.1.3	Entibados	15,75 días	100	100,000%	100,000%	lun 24/04/23	jue 11/05/23	2230CC
2232	1.3.10.1.2.3.2.1.4	Tuberías	15,75 días	100	100,000%	100,000%	lun 24/04/23	jue 11/05/23	2231CC
2233	1.3.10.1.2.3.2.1.5	Rellenos	15,75 días	100	100,000%	100,000%	lun 24/04/23	jue 11/05/23	2232CC
2234	1.3.10.1.2.3.2.1.6	Pozos de inspección y/o cámaras	20,88 días	100	100,000%	100,000%	lun 24/04/23	mié 17/05/23	2233CC
2235	1.3.10.1.2.3.2.1.2	Excavaciones	15 días	100	100,000%	100,000%	jue 26/12/24	mar 14/01/25	2229FC+514 días;
2236	1.3.10.1.2.3.2.1.3	Entibados	15 días	100	100,000%	100,000%	mié 12/02/25	vie 28/02/25	2235CC+41 días
2237	1.3.10.1.2.3.2.1.2	Excavaciones	14 días	0	0,000%	0,000%	jue 21/05/26	sáb 6/06/26	2236CC+390 días
2238	1.3.10.1.2.3.2.1.4	Tuberías	15 días	0	0,000%	0,000%	jue 21/05/26	mar 9/06/26	2236CC+390 días
2239	1.3.10.1.2.3.2.1.5	Rellenos	15 días	0	0,000%	0,000%	jue 21/05/26	mar 9/06/26	2238CC
2240	1.3.10.1.2.3.2.1.6	Pozos de inspección y/o cámaras	20 días	100	100,000%	100,000%	sáb 28/12/24	mié 22/01/25	2229FC+516 días;
2241	1.3.10.1.2.3.2.1.6	Pozos de inspección y/o cámaras	20 días	0	0,000%	0,000%	jue 21/05/26	mar 16/06/26	2239CC
2242	1.3.10.1.2.3.2.1.7	Fin de tramo de redes de alcantarillado sanitario	0 días	0	0,000%	0,000%	mar 16/06/26	mar 16/06/26	2240;2241;2237
2243	**1.3.10.1.2.3.3**	**Redes de alcantarillado Pluvial**	**1107,75 días**	**0**	**99,935%**	**99,935%**	**mié 16/11/22**	**mar 23/06/26**	
2244	**1.3.10.1.2.3.3.1**	**Tramo de redes de alcantarillado pluvial (Salidas Pluvial Parque Simón Bolivar)**	**319,38 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**mié 16/11/22**	**mar 28/11/23**	
2245	1.3.10.1.2.3.3.1.1	Inicio de tramo de redes de alcantarillado pluvial	0 días	100	0,000%	0,000%	jue 17/11/22	jue 17/11/22	2221CC
2246	1.3.10.1.2.3.3.1.2	Excavaciones	290,38 días	100	100,000%	100,000%	mié 16/11/22	mar 24/10/23	2245FC-1 día
2247	1.3.10.1.2.3.3.1.3	Entibados	290,38 días	100	100,000%	100,000%	mié 16/11/22	mar 24/10/23	2246CC
2248	1.3.10.1.2.3.3.1.4	Tuberías	290,38 días	100	100,000%	100,000%	jue 24/11/22	mié 1/11/23	2247CC+7 días
2249	1.3.10.1.2.3.3.1.5	Rellenos	290,38 días	100	100,000%	100,000%	vie 2/12/22	vie 10/11/23	2248CC+7 días
2250	1.3.10.1.2.3.3.1.6	Pozos de inspección y/o cámaras	290,38 días	100	100,000%	100,000%	lun 12/12/22	lun 20/11/23	2249CC+7 días
2251	1.3.10.1.2.3.3.1.7	Sumideros	290,38 días	100	100,000%	100,000%	mar 20/12/22	mar 28/11/23	2250CC+7 días
2252	**1.3.10.1.4.3.3.2**	**Tramo de redes de alcantarillado pluvial (K7+970-K8+310)**	**971,88 días**	**0**	**99,775%**	**99,775%**	**lun 24/04/23**	**mar 23/06/26**	
2253	1.3.10.1.4.3.3.2.1	Inicio de tramo de redes de alcantarillado pluvial	0 días	100	0,000%	0,000%	lun 24/04/23	lun 24/04/23	448CC-78 días

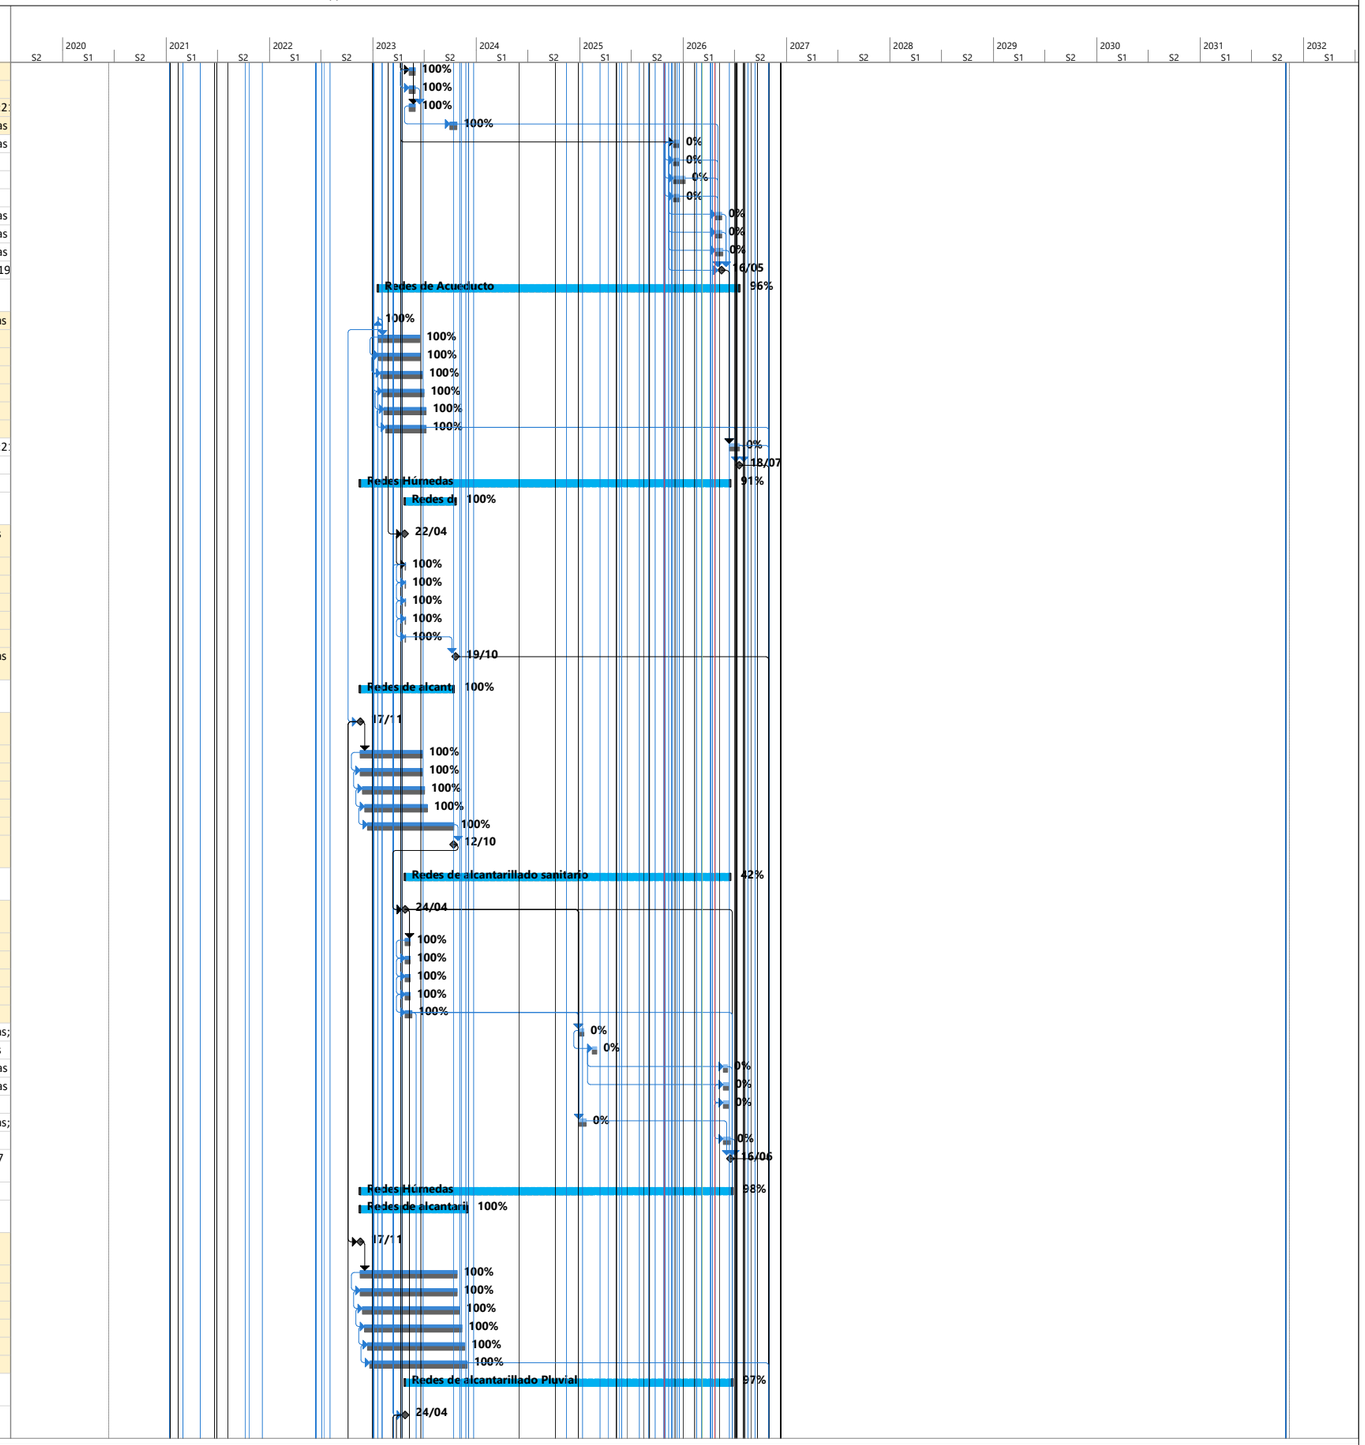


Tareas críticas · Tarea · Tarea manual · solo duración · Hito de línea base · Resumen · Tareas externas · Hito inactivo
División crítica · División · solo el comienzo · Línea base · Hito · Resumen manual · Hito externo · Resumen inactivo
Progreso de tarea crítica · Progreso de tarea · solo fin · División de la línea base · Progreso del resumen · Resumen del proyecto · Tarea inactiva · Fecha límite

Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	% Avance Conciliado	% Avance Programado (% PV)	% Avance Ejecutado conciliado (% EV))	Comienzo	Fin	Predecesoras
2254	1.3.10.1.4.3.3.2.2	Excavaciones	5,5 días	100	100,000%	100,000%	lun 24/04/23	vie 28/04/23	2253CC
2255	1.3.10.1.4.3.3.2.3	Entibados	5,5 días	100	100,000%	100,000%	lun 24/04/23	vie 28/04/23	2254CC
2256	1.3.10.1.4.3.3.2.4	Tuberías	5,5 días	100	100,000%	100,000%	lun 24/04/23	vie 28/04/23	2255CC
2257	1.3.10.1.4.3.3.2.5	Rellenos	5,5 días	100	100,000%	100,000%	lun 24/04/23	vie 28/04/23	2256CC
2258	1.3.10.1.4.3.3.2.6	Pozos de inspección y/o cámaras	5 días	100	100,000%	100,000%	vie 23/06/23	mié 28/06/23	2257FC+43 días
2259	1.3.10.1.4.3.3.2.7	Sumideros	2,13 días	100	100,000%	100,000%	jue 29/06/23	vie 30/06/23	2258
2260	1.3.10.1.4.3.3.2.8	Sumideros	2,13 días	100	100,000%	100,000%	lun 24/04/23	mar 25/04/23	2229FC+800 días;
2261	1.3.10.1.4.3.3.2.9	Sumideros	1 día	0	0,000%	0,000%	mar 23/06/26	mar 23/06/26	2229FC+950 días;
2262	1.3.10.1.2.3.3.1.8	Fin de tramo de redes alcantarillado pluvial	0 días	0	0,000%	0,000%	mar 14/05/24	mar 14/05/24	2259FC+257 días;2260FC+257
2263	**1.3.10.1.4.3.3.3**	**Tramo de redes de alcantarillado pluvial (K8+310-K8+870)**	**732 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**jue 17/11/22**	**mié 2/04/25**	
2264	1.3.10.1.4.3.3.3.1	Inicio de tramo de redes de alcantarillado pluvial	0 días	100	0,000%	0,000%	jue 17/11/22	jue 17/11/22	2221CC
2265	1.3.10.1.4.3.3.3.2	Excavaciones	259,13 días	100	100,000%	100,000%	jue 17/11/22	mar 19/09/23	2264CC
2266	1.3.10.1.4.3.3.3.3	Entibados	259,13 días	100	100,000%	100,000%	vie 25/11/22	mié 27/09/23	2265CC+7 días
2267	1.3.10.1.4.3.3.3.4	Tuberías	259,13 días	100	100,000%	100,000%	sáb 3/12/22	jue 5/10/23	2266CC+7 días
2268	1.3.10.1.4.3.3.3.5	Rellenos	259,63 días	100	100,000%	100,000%	mar 13/12/22	vie 13/10/23	2267CC+7 días
2269	1.3.10.1.4.3.3.3.6	Pozos de inspección y/o cámaras	259,13 días	100	100,000%	100,000%	mié 21/12/22	lun 23/10/23	2268CC+7 días
2270	1.3.10.1.4.3.3.3.7	Sumideros	259,13 días	100	100,000%	100,000%	lun 24/04/23	lun 26/02/24	2260CC;2261CC
2271	1.3.10.1.4.3.3.3.8	Sumideros	40 días	100	100,000%	100,000%	vie 14/02/25	mié 2/04/25	2269CC+663 días
2272	1.3.10.1.2.3.3.1.8	Fin de tramo de redes alcantarillado pluvial	0 días	0	0,000%	0,000%	mié 2/04/25	mié 2/04/25	2270;2271
2273	**1.3.10.1.4.3.3.4**	**Tramo de redes de alcantarillado pluvial (K8+870-K8+980)**	**831 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**lun 24/04/23**	**mar 6/01/26**	
2274	1.3.10.1.4.3.3.4.1	Inicio de tramo de redes de alcantarillado pluvial	0 días	0	0,000%	0,000%	lun 24/04/23	lun 24/04/23	2253CC
2275	1.3.10.1.4.3.3.4.2	Excavaciones	3,25 días	100	100,000%	100,000%	lun 24/04/23	mié 26/04/23	2274CC
2276	1.3.10.1.4.3.3.4.3	Entibados	3,25 días	100	100,000%	100,000%	lun 24/04/23	mié 26/04/23	2275CC
2277	1.3.10.1.4.3.3.4.4	Tuberías	3,25 días	100	100,000%	100,000%	lun 24/04/23	mié 26/04/23	2276CC
2278	1.3.10.1.4.3.3.4.5	Rellenos	3,25 días	100	100,000%	100,000%	lun 24/04/23	mié 26/04/23	2277CC
2279	1.3.10.1.4.3.3.4.6	Excavaciones	3 días	100	100,000%	100,000%	vie 28/11/25	mar 2/12/25	2274FC+800 días
2280	1.3.10.1.4.3.3.4.7	Entibados	3 días	100	100,000%	100,000%	vie 28/11/25	mar 2/12/25	2279CC
2281	1.3.10.1.4.3.3.4.8	Tuberías	3 días	100	100,000%	100,000%	vie 28/11/25	mar 2/12/25	2280CC
2282	1.3.10.1.4.3.3.4.9	Rellenos	3 días	100	100,000%	100,000%	mar 2/12/25	vie 5/12/25	2280CC;2281
2283	1.3.10.1.4.3.3.4.1	Pozos de inspección y/o cámaras	3 días	100	100,000%	100,000%	lun 10/11/25	jue 13/11/25	2278CC-19 días;2
2284	1.3.10.1.4.3.3.4.1	Sumideros	2 días	100	100,000%	100,000%	sáb 15/11/25	mié 19/11/25	2283FC+2 días
2285	1.3.10.1.2.3.3.1.8	Fin de tramo de redes alcantarillado pluvial	0 días	0	0,000%	0,000%	mar 6/01/26	mar 6/01/26	2284FC+40 días
2286	**1.3.10.1.2.4**	**Redes Secas**	**1219,13 días**	**0**	**96,016%**	**96,029%**	**mié 3/08/22**	**mar 21/07/26**	
2287	**1.3.10.1.4.4.1**	**Redes de Codensa**	**1211,75 días**	**0**	**99,818%**	**99,818%**	**jue 11/08/22**	**mar 21/07/26**	
2288	**1.3.10.1.2.4.1**	**Redes de Codensa (K8+260-K8+300)**	**1186,75 días**	**0**	**96,772%**	**96,772%**	**vie 9/09/22**	**mar 21/07/26**	
2289	1.3.10.1.2.4.1.1	Inicio redes de Codensa segunda fase	1 día	100	0,000%	0,000%	vie 9/09/22	vie 9/09/22	1290CC+59 días
2290	1.3.10.1.2.4.1.3	Excavaciones	119 días	100	100,000%	100,000%	sáb 10/09/22	vie 27/01/23	2289
2291	1.3.10.1.2.4.1.4	Canalización	119 días	100	100,000%	100,000%	mar 13/09/22	lun 30/01/23	2290CC+2 días
2292	1.3.10.1.2.4.1.5	Rellenos	119 días	100	100,000%	100,000%	jue 15/09/22	mié 1/02/23	2291CC+2 días
2293	1.3.10.1.2.4.1.6	Cajas	142 días	100	100,000%	100,000%	vie 30/09/22	mar 14/03/23	2292CC+13 días
2294	1.3.10.1.4.4.1.1.6	Cajas	80 días	0	0,000%	0,000%	mar 14/04/26	vie 17/07/26	1296FF+880 días
2295	1.3.10.1.2.4.1.7	Fin de redes de Codensa	0 días	0	0,000%	0,000%	mar 21/07/26	mar 21/07/26	2293FC+1 día;229
2296	**1.3.10.1.2.4.1**	**Redes de Codensa**	**299,13 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**jue 11/08/22**	**lun 31/07/23**	
2297	1.3.10.1.2.4.1.1	Inicio redes de Codensa segunda fase	1 día	100	0,000%	0,000%	vie 9/09/22	vie 9/09/22	1290CC+59 días
2298	1.3.10.1.2.4.1.3	Excavaciones	269 días	100	100,000%	100,000%	sáb 10/09/22	mié 26/07/23	2297
2299	1.3.10.1.2.4.1.4	Canalización	269 días	100	100,000%	100,000%	mar 13/09/22	vie 28/07/23	2298CC+2 días
2300	1.3.10.1.2.4.1.5	Rellenos	269 días	100	100,000%	100,000%	jue 15/09/22	lun 31/07/23	2299CC+2 días
2301	1.3.10.1.2.4.1.6	Cajas	286 días	100	100,000%	100,000%	jue 11/08/22	vie 14/07/23	1296CC-289 días;
2302	1.3.10.1.2.4.1.7	Fin de redes de Codensa	0 días	100	0,000%	0,000%	jue 11/08/22	jue 11/08/22	2301CC
2303	**1.3.10.1.4.4.2**	**Redes de ETB**	**1194,5 días**	**0**	**99,395%**	**99,697%**	**mié 3/08/22**	**sáb 20/06/26**	
2304	**1.3.10.1.2.4.2**	**Redes de ETB (K7+950- K8+260)**	**851,63 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**mié 3/08/22**	**jue 8/05/25**	
2305	1.3.10.1.2.4.2.1	Inicio redes de ETB segunda fase	1 día	100	0,000%	0,000%	vie 14/10/22	vie 14/10/22	1290CC+89 días
2306	18.909.385,00	Excavaciones	144 días	100	100,000%	100,000%	sáb 15/10/22	lun 3/04/23	2305
2307	1.3.10.1.2.4.2.3	Canalizaciones	144 días	100	100,000%	100,000%	mié 19/10/22	mar 4/04/23	2306CC+2 días
2308	1.3.10.1.2.4.2.4	Rellenos	147 días	100	100,000%	100,000%	mié 19/10/22	lun 10/04/23	2306CC+2 días
2309	1.3.10.1.2.4.2.5	Camaras	77 días	100	100,000%	100,000%	sáb 15/10/22	lun 16/01/23	2305
2310	1.3.10.1.4.4.2.1.6	Camaras	75 días	100	100,000%	100,000%	sáb 8/02/25	jue 8/05/25	2305FC+712 días
2311	1.3.10.1.2.4.2.6	Reconstruccion de camras	143 días	100	100,000%	100,000%	mar 18/10/22	sáb 1/04/23	2309CC-814 días;
2312	1.3.10.1.2.4.2.7	Nivelacion de cajas	138 días	100	100,000%	100,000%	mié 3/08/22	mié 11/01/23	1288CC-858 días;
2313	1.3.10.1.2.4.2.8	Fin redes de ETB	0 días	100	0,000%	0,000%	lun 10/04/23	lun 10/04/23	2307;2308;2312
2314	**1.3.10.1.2.4.2**	**Redes de ETB**	**1139,38 días**	**0**	**98,727%**	**99,363%**	**mié 5/10/22**	**sáb 20/06/26**	
2315	1.3.10.1.2.4.2.1	Inicio redes de ETB segunda fase	1 día	100	0,000%	0,000%	mar 22/11/22	mar 22/11/22	1290CC+119 días
2316	18.909.385,00	Excavaciones	145,38 días	100	100,000%	100,000%	mié 23/11/22	jue 11/05/23	2315
2317	1.3.10.1.2.4.2.3	Canalizaciones	144,25 días	100	100,000%	100,000%	vie 25/11/22	vie 12/05/23	2316CC+2 días
2318	1.3.10.1.2.4.2.4	Rellenos	147,13 días	100	100,000%	100,000%	vie 25/11/22	mar 16/05/23	2316CC+2 días
2319	1.3.10.1.2.4.2.5	Camaras	149,38 días	100	100,000%	100,000%	mié 23/11/22	mar 16/05/23	2315
2320	1.3.10.1.2.4.2.6	Reconstruccion de camaras	148,25 días	100	100,000%	100,000%	jue 24/11/22	mar 16/05/23	2319CC+1 día
2321	1.3.10.1.4.4.2.2.7	Reconstruccion de camaras	143 días	100	100,000%	100,000%	sáb 8/02/25	lun 28/07/25	2319CC+681 días
2322	1.3.10.1.4.4.2.2.8	Reconstruccion de camaras	49 días	50	0,000%	50,000%	mié 22/04/26	sáb 20/06/26	2319CC+1050 día
2323	1.3.10.1.2.4.2.7	Nivelacion de cajas	138 días	100	100,000%	100,000%	mié 5/10/22	mar 14/03/23	2320CC-40 días
2324	1.3.10.1.2.4.2.8	Fin redes de ETB	0 días	0	0,000%	0,000%	sáb 20/06/26	sáb 20/06/26	2317;2318;2323;

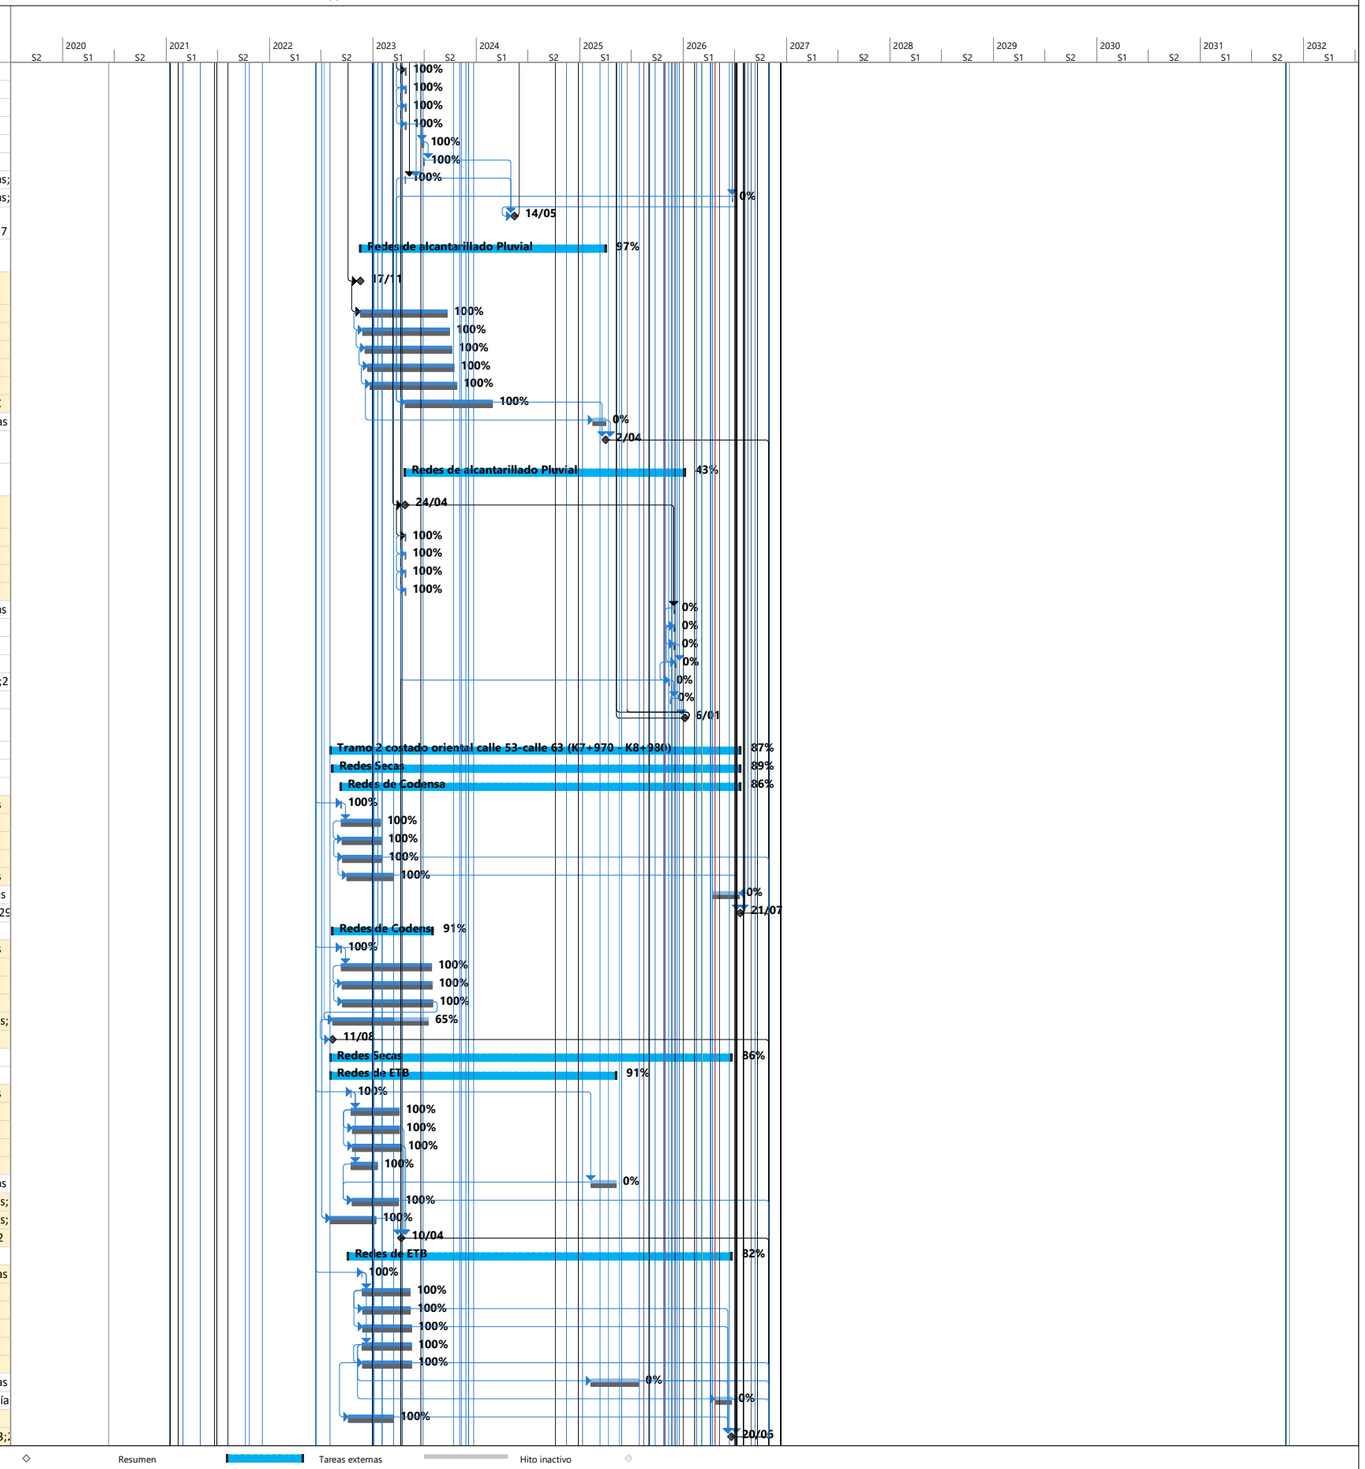


Tareas críticas · Tarea · Tarea manual · solo duración · Hito de línea base · Resumen · Tareas externas · Hito inactivo
División crítica · División · solo el comienzo · Línea base · Hito · Resumen manual · Hito externo · Resumen inactivo
Progreso de tarea crítica · Progreso de tarea · solo fin · División de la línea base · Progreso del resumen · Resumen del proyecto · Tarea inactiva · Fecha límite

Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	% Avance Conciliado	% Avance Programado (% PV)	% Avance Ejecutado conciliado (% EV))	Comienzo	Fin	Predecesoras
2325	**1.3.10.1.4.4.3**	**Redes de Codensa PMT Transicional**	**1161 días**	**0**	**91,539%**	**91,539%**	**vie 9/09/22**	**vie 19/06/26**	
2326	**1.3.10.1.2.4.3**	**Redes de Codensa PMT Transicional (K7+950-K8+260)**	**1089,88 días**	**0**	**97,955%**	**97,955%**	**vie 9/09/22**	**mar 24/03/26**	
2327	1.3.10.1.2.4.3.1	Inicio tramo de redes de Codensa	1 día	100	0,000%	0,000%	vie 9/09/22	vie 9/09/22	1290CC+59 días
2328	1.3.10.1.2.4.3.3	Excavaciones	20,38 días	100	100,000%	100,000%	sáb 10/09/22	lun 3/10/22	2327
2329	1.3.10.1.2.4.3.4	Canalización	20,38 días	100	100,000%	100,000%	vie 16/09/22	sáb 8/10/22	2328CC+5 días
2330	1.3.10.1.2.4.3.5	Rellenos	20,88 días	100	100,000%	100,000%	jue 22/09/22	vie 14/10/22	2329CC+5 días
2331	1.3.10.1.2.4.3.6	Cajas	30,63 días	100	100,000%	100,000%	sáb 11/03/23	mar 18/04/23	2330CC+141 días
2332	1.3.10.1.2.4.3.3	Excavaciones	15 días	100	100,000%	100,000%	sáb 8/03/25	mié 26/03/25	2327FC+768 días
2333	1.3.10.1.2.4.3.4	Canalización	15 días	100	100,000%	100,000%	jue 13/03/25	lun 31/03/25	2327FC+772 días
2334	1.3.10.1.2.4.3.5	Rellenos	15 días	100	100,000%	100,000%	lun 31/03/25	mié 16/04/25	2327;2333
2335	1.3.10.1.4.4.3.1.9	Excavaciones	15 días	100	100,000%	100,000%	sáb 8/03/25	mié 26/03/25	2327FC+768 días
2336	1.3.10.1.2.4.3.4	Canalización	15 días	100	100,000%	100,000%	mar 11/03/25	vie 28/03/25	2335CC+2 días
2337	1.3.10.1.2.4.3.5	Rellenos	15 días	100	100,000%	100,000%	jue 13/03/25	lun 31/03/25	2336CC+2 días
2338	1.3.10.1.2.4.3.6	Cajas	20 días	100	100,000%	100,000%	mié 1/10/25	vie 24/10/25	2337CC+170 días
2339	1.3.10.1.2.4.3.6	Cajas	15 días	0	0,000%	0,000%	vie 6/03/26	mar 24/03/26	1288FC+200 días
2340	1.3.10.1.2.4.3.7	Fin tramo de redes de Codensa	0 días	0	0,000%	0,000%	mar 24/03/26	mar 24/03/26	2330;2331;2337;2
2341	**1.3.10.1.2.4.3**	**Redes de Codensa PMT Transicional**	**1161 días**	**0**	**84,461%**	**84,461%**	**vie 9/09/22**	**vie 19/06/26**	
2342	1.3.10.1.2.4.3.1	Inicio tramo de redes de Codensa	1 día	100	0,000%	0,000%	vie 9/09/22	vie 9/09/22	1290CC+59 días
2343	1.3.10.1.2.4.3.3	Excavaciones	31,13 días	100	100,000%	100,000%	sáb 10/09/22	vie 14/10/22	2342CC+1 día
2344	1.3.10.1.2.4.3.4	Canalización	31,13 días	100	100,000%	100,000%	vie 16/09/22	vie 21/10/22	2343CC+5 días
2345	1.3.10.1.2.4.3.5	Rellenos	31,13 días	100	100,000%	100,000%	jue 22/09/22	jue 27/10/22	2344CC+5 días
2346	1.3.10.1.2.4.3.6	Cajas	51,63 días	100	100,000%	100,000%	vie 14/10/22	jue 15/12/22	2345CC+19 días
2347	1.3.10.1.4.4.3.2.6	Excavaciones	30 días	0	0,000%	0,000%	mié 8/04/26	mié 13/05/26	2342FC+1100 días
2348	1.3.10.1.2.4.3.4	Canalización	30 días	0	0,000%	0,000%	mar 14/04/26	mié 20/05/26	2347CC+5 días
2349	1.3.10.1.2.4.3.5	Rellenos	35 días	0	0,000%	0,000%	lun 20/04/26	sáb 30/05/26	2348CC+5 días
2350	1.3.10.1.4.4.3.2.9	Cajas	50 días	0	0,000%	0,000%	lun 20/04/26	vie 19/06/26	2349CC
2351	1.3.10.1.2.4.3.7	Fin tramo de redes de Codensa	0 días	0	0,000%	0,000%	vie 19/06/26	vie 19/06/26	2345;2346;2349;2
2352	**1.3.10.1.4.4.4**	**Redes de ETB PMT Transicional**	**206,88 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**sáb 15/10/22**	**sáb 17/06/23**	
2353	**1.3.10.1.2.4.4**	**Redes de ETB PMT Transicional (K8+260-K8+300)**	**124,38 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**sáb 15/10/22**	**jue 9/03/23**	
2354	1.3.10.1.2.4.4.1	Inicio tramo redes de ETB	0,5 días	100	0,000%	0,000%	sáb 15/10/22	sáb 15/10/22	1290CC+90 días
2355	1.3.10.1.2.4.4.3	Excavaciones	103,38 días	100	100,000%	100,000%	sáb 15/10/22	mar 14/02/23	2354CC
2356	1.3.10.1.2.4.4.4	canalizaciones incluye ductos y rellenos	103,38 días	100	100,000%	100,000%	sáb 22/10/22	lun 20/02/23	2355CC+5 días
2357	1.3.10.1.2.4.4.5	Cámaras	103,38 días	100	100,000%	100,000%	sáb 22/10/22	lun 20/02/23	2355CC+5 días
2358	1.3.10.1.2.4.4.6	Demolición de canalizaciones de redes	103,38 días	100	100,000%	100,000%	sáb 22/10/22	lun 20/02/23	2356CC
2359	1.3.10.1.2.4.4.7	Demolición de pozos, cajas y cámaras	103,38 días	100	100,000%	100,000%	sáb 22/10/22	lun 20/02/23	2357CC
2360	1.3.10.1.2.4.4.8	Reconstrucción de cámaras	103,38 días	100	100,000%	100,000%	sáb 15/10/22	mar 14/02/23	2354CC
2361	1.3.10.1.2.4.4.9	Cárcamos	103,88 días	100	100,000%	100,000%	jue 10/11/22	jue 9/03/23	1288FF-726 días;1
2362	1.3.10.1.2.4.4.10	Fin tramo de redes de ETB	0 días	0	0,000%	0,000%	jue 9/03/23	jue 9/03/23	2356;2357;2358;2
2363	**1.3.10.1.2.4.4**	**Redes de ETB PMT Transicional**	**177,25 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**mar 22/11/22**	**sáb 17/06/23**	
2364	1.3.10.1.2.4.4.1	Inicio tramo redes de ETB	1 día	100	0,000%	0,000%	mar 22/11/22	mar 22/11/22	1290CC+119 días
2365	1.3.10.1.2.4.4.3	Excavaciones	103,88 días	100	100,000%	100,000%	mié 23/11/22	mié 22/03/23	2364CC+1 día
2366	1.3.10.1.2.4.4.4	canalizaciones incluye ductos y rellenos	103,88 días	100	100,000%	100,000%	mar 29/11/22	mar 28/03/23	2365CC+5 días
2367	1.3.10.1.2.4.4.5	Cámaras	103,88 días	100	100,000%	100,000%	mar 29/11/22	mar 28/03/23	2365CC+5 días
2368	1.3.10.1.2.4.4.6	Demolición de canalizaciones de redes	103,88 días	100	100,000%	100,000%	mar 29/11/22	mar 28/03/23	2367CC
2369	1.3.10.1.2.4.4.7	Demolición de pozos, cajas y cámaras	103,88 días	100	100,000%	100,000%	mar 29/11/22	mar 28/03/23	2367CC
2370	1.3.10.1.2.4.4.8	Reconstrucción de cámaras	124,38 días	100	100,000%	100,000%	mié 23/11/22	lun 17/04/23	2364
2371	1.3.10.1.2.4.4.9	Cárcamos	51,63 días	100	100,000%	100,000%	mar 18/04/23	sáb 17/06/23	2370
2372	1.3.10.1.2.4.4.10	Fin tramo de redes de ETB	0 días	100	0,000%	0,000%	sáb 17/06/23	sáb 17/06/23	2366;2367;2368;2
2373	1.3.10.1.2.5	Fin redes Tramo 2	0 días	0	0,000%	0,000%	jue 7/03/24	jue 7/03/24	2372FC+214 días
2374	**1.3.10.1.3**	**Tramo 3 costado occidental calle 63-calle 66 (K8+980 - K10+024)**	**1198,88 días**	**0**	**44,976%**	**45,842%**	**jue 22/09/22**	**mar 18/08/26**	
2375	**1.3.10.1.3.1**	**Actividades Silviculturales resolución 2354**	**31,13 días**	**0**	**0,000%**	**0,000%**	**jue 2/02/23**	**mié 8/03/23**	
2376	**1.3.10.1.5.1.1**	**Traslados**	**31,13 días**	**0**	**0,000%**	**0,000%**	**jue 2/02/23**	**mié 8/03/23**	
2377	1.3.10.1.5.1.1.1	actividades posteriores a la medida cautelar	31,13 días	100	0,000%	0,000%	jue 2/02/23	mié 8/03/23	21FC-585 días;22FC-585
2378	**1.3.10.1.3.1.2**	**Talas**	**31,13 días**	**0**	**0,000%**	**0,000%**	**jue 2/02/23**	**mié 8/03/23**	
2379	1.3.10.1.3.1.2.1	actividades posteriores a la medida cautelar	31,13 días	100	0,000%	0,000%	jue 2/02/23	mié 8/03/23	21FC-585 días;22FC-585
2380	1.3.10.1.3.2	Inicio Redes tramo 3	0 días	0	0,000%	0,000%	sáb 8/11/25	sáb 8/11/25	95;100;105;2377;
2381	**1.3.10.1.3.3**	**Redes Húmedas**	**1197,5 días**	**0**	**57,850%**	**58,881%**	**vie 23/09/22**	**mar 18/08/26**	
2382	1.3.10.1.3.3.1	Inicio redes húmedas - Tramo 3	0 días	100	0,000%	0,000%	mar 31/03/26	mar 31/03/26	2380FC+120 días
2383	**1.3.10.1.3.3.2**	**Redes de Acueducto**	**1197,5 días**	**0**	**7,485%**	**10,684%**	**vie 23/09/22**	**mar 18/08/26**	
2384	**1.3.10.1.3.3.2.1**	**Tramo 3A de redes de acueducto (K9+715 - K9+995)**	**89 días**	**0**	**0,000%**	**0,000%**	**mar 31/03/26**	**vie 17/07/26**	
2385	1.3.10.1.3.3.2.1.1	Inicio tramo de redes de acueducto	0 días	0	0,000%	0,000%	mar 31/03/26	mar 31/03/26	2382
2386	1.3.10.1.3.3.2.1.2	Excavaciones	15 días	0	0,000%	0,000%	jue 7/05/26	mar 26/05/26	2385FC+30 días
2387	1.3.10.1.3.3.2.1.3	Tuberías	15 días	0	0,000%	0,000%	sáb 9/05/26	mié 27/05/26	2386CC+2 días
2388	1.3.10.1.3.3.2.1.4	Accesorios	15 días	0	0,000%	0,000%	mié 27/05/26	mar 16/06/26	2387
2389	1.3.10.1.3.3.2.1.5	Empates	15 días	0	0,000%	0,000%	mié 27/05/26	mar 16/06/26	2388CC
2390	1.3.10.1.3.3.2.1.6	Rellenos	15 días	0	0,000%	0,000%	vie 29/05/26	jue 18/06/26	2389CC+2 días
2391	1.3.10.1.3.3.2.1.7	Hidrantes	15 días	0	0,000%	0,000%	mié 1/07/26	vie 17/07/26	2390FC+10 días
2392	**1.3.10.1.3.3.2.1**	**Tramo 3B de redes de acueducto (K9+280 - K9+715)**	**62 días**	**0**	**0,000%**	**0,000%**	**mié 6/05/26**	**mar 21/07/26**	
2393	1.3.10.1.3.3.2.1.1	Inicio tramo de redes de acueducto	0 días	0	0,000%	0,000%	mié 6/05/26	mié 6/05/26	100FC+620 días

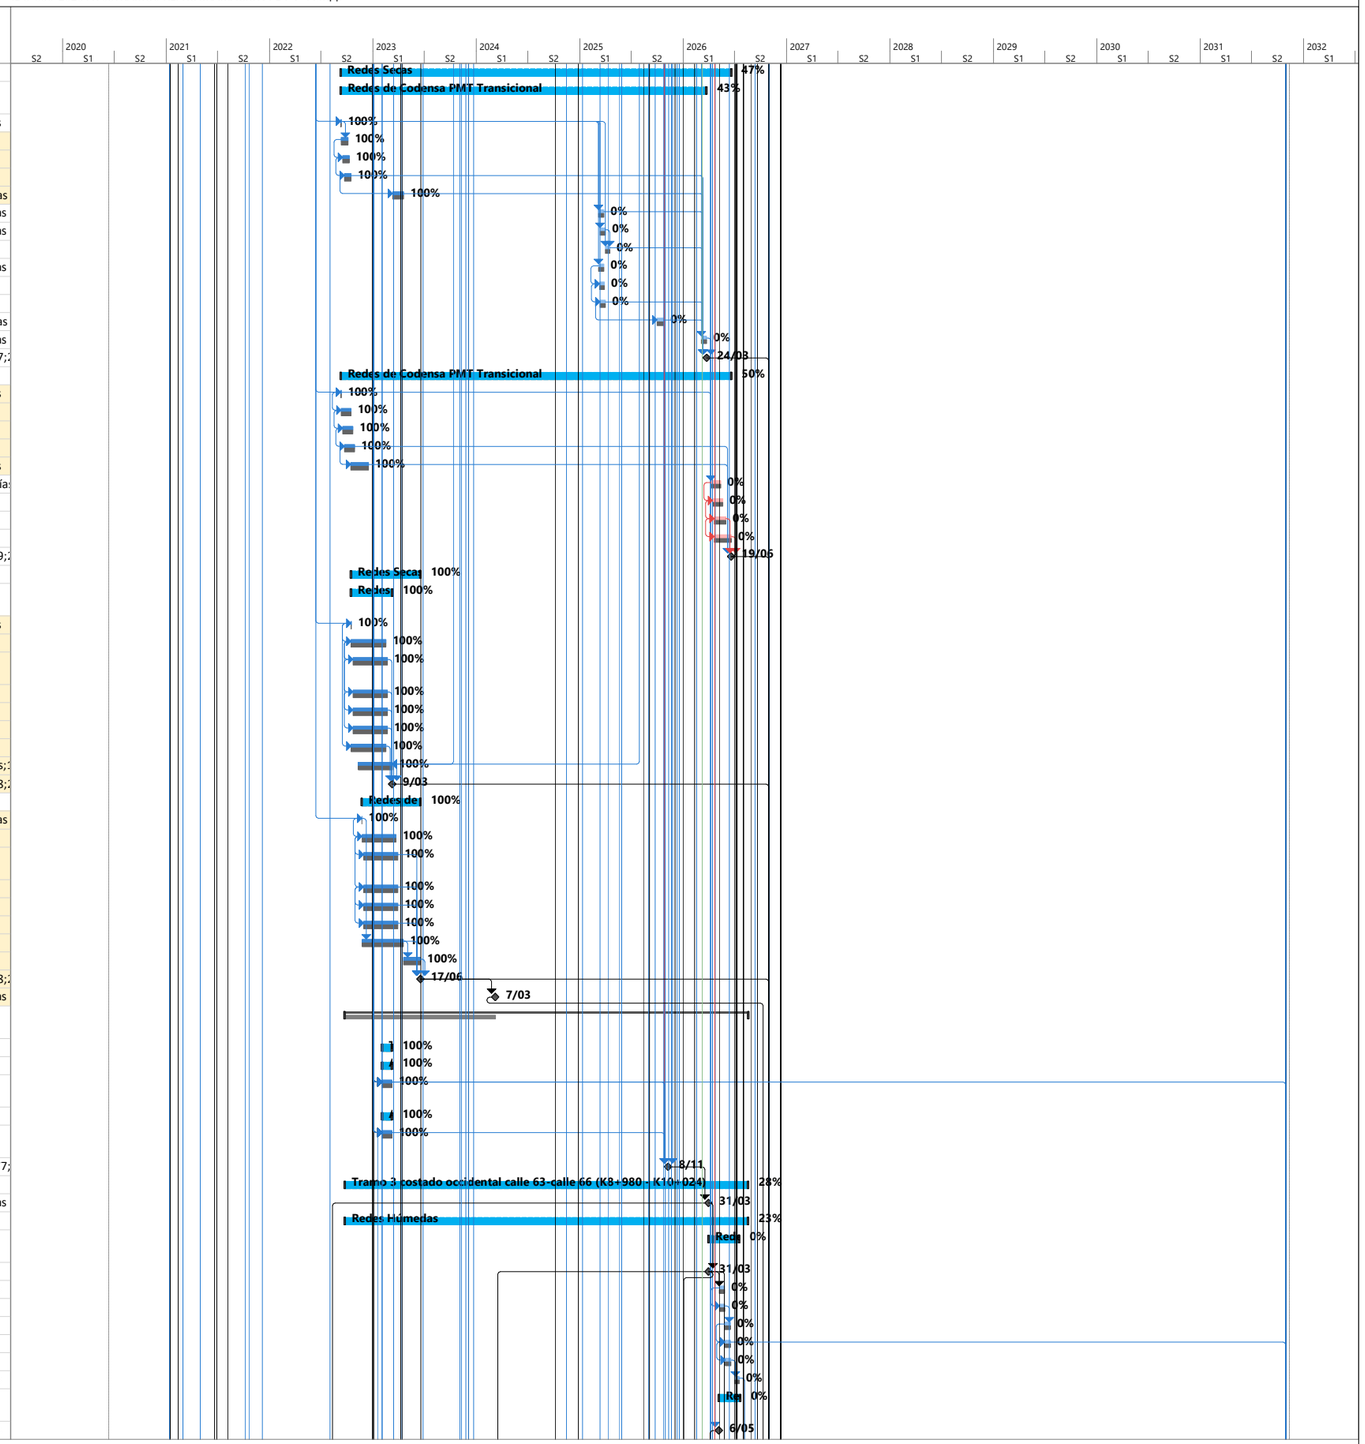


Tareas críticas | Tarea | Tarea manual | solo duración | Hito de línea base | Resumen | Tareas externas | Hito inactivo
División crítica | División | solo el comienzo | Línea base | Hito | Resumen manual | Hito externo | Resumen inactivo
Progreso de tarea crítica | Progreso de tarea | solo fin | División de la línea base | Progreso del resumen | Resumen del proyecto | Tarea inactiva | Fecha límite

Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	% Avance Conciliado	% Avance Programado (% PV)	% Avance Ejecutado conciliado (% EV))	Comienzo	Fin	Predecesoras
2394	1.3.10.1.3.3.2.1.2	Excavaciones	10 días	0	0,000%	0,000%	mié 6/05/26	mar 19/05/26	2393CC
2395	1.3.10.1.3.3.2.1.3	Tuberías	15 días	0	0,000%	0,000%	vie 8/05/26	mar 26/05/26	2394CC+2 días
2396	1.3.10.1.3.3.2.1.4	Accesorios	15 días	0	0,000%	0,000%	mar 12/05/26	vie 29/05/26	2395CC+3 días
2397	1.3.10.1.3.3.2.1.5	Empates	15 días	0	0,000%	0,000%	vie 15/05/26	mié 3/06/26	2396CC+4 días
2398	1.3.10.1.3.3.2.1.6	Rellenos	18 días	0	0,000%	0,000%	vie 22/05/26	vie 12/06/26	2397CC+5 días
2399	1.3.10.1.3.3.2.1.7	Hidrantes	20 días	0	0,000%	0,000%	jue 25/06/26	mar 21/07/26	2398FC+10 días
2400	**1.3.10.1.3.3.2.1**	**Tramo 3C de redes de acueducto (K8+980 - K9+220)**	**1197,5 días**	**0**	**32,559%**	**46,475%**	**vie 23/09/22**	**mar 18/08/26**	
2401	1.3.10.1.3.3.2.1.1	Inicio tramo de redes de acueducto	0 días	100	0,000%	0,000%	vie 23/09/22	vie 23/09/22	2382CC-753 días
2402	1.3.10.1.3.3.2.1.2	Excavaciones	41,38 días	100	100,000%	100,000%	vie 23/09/22	jue 10/11/22	2401CC
2403	1.3.10.1.3.3.2.1.3	Tuberías	41,38 días	100	100,000%	100,000%	jue 29/09/22	jue 17/11/22	2402CC+5 días
2404	1.3.10.1.3.3.2.1.6	Rellenos	41,38 días	100	100,000%	100,000%	mar 18/10/22	lun 5/12/22	219CC-25 días;24
2405	1.3.10.1.3.3.2.1.2	Excavaciones	20 días	100	100,000%	100,000%	lun 2/02/26	mar 24/02/26	2385FC-50 días;2
2406	1.3.10.1.3.3.2.1.3	Tuberías	20 días	100	0,000%	100,000%	jue 5/03/26	sáb 28/03/26	2405CC+28 días
2407	1.3.10.1.3.3.2.1.4	Accesorios	20 días	100	0,000%	100,000%	jue 5/03/26	sáb 28/03/26	2405CC+28 días
2408	1.3.10.1.3.3.2.1.6	Rellenos	20 días	100	0,000%	100,000%	mar 24/03/26	vie 17/04/26	2407CC+16 días
2409	1.3.10.1.3.3.2.1.2	Excavaciones	20 días	0	0,000%	0,000%	mar 26/05/26	vie 19/06/26	2385FC+45 días;2
2410	1.3.10.1.3.3.2.1.3	Tuberías	20 días	0	0,000%	0,000%	lun 1/06/26	jue 25/06/26	2409CC+5 días
2411	1.3.10.1.3.3.2.1.4	Accesorios	20 días	0	0,000%	0,000%	lun 1/06/26	jue 25/06/26	2409CC+5 días
2412	1.3.10.1.3.3.2.1.5	Empates	20 días	0	0,000%	0,000%	mar 2/06/26	vie 26/06/26	2411CC+2 días
2413	1.3.10.1.3.3.2.1.6	Rellenos	20 días	0	0,000%	0,000%	jue 4/06/26	mié 1/07/26	2412CC+2 días
2414	1.3.10.1.3.3.2.1.7	Hidrantes	50 días	0	0,000%	0,000%	jue 18/06/26	mar 18/08/26	2408CC+10 días;2
2415	1.3.10.1.3.3.2.1.8	Fin redes tramo de acueducto	0 días	0	0,000%	0,000%	mar 18/08/26	mar 18/08/26	2391;2399;2414;2
2416	**1.3.10.1.3.3.3**	**Redes de alcantarillado sanitario**	**960,75 días**	**0**	**2,937%**	**7,497%**	**jue 27/04/23**	**sáb 13/06/26**	
2417	**1.3.10.1.3.3.3.1**	**Tramo de redes de alcantarillado sanitario**	**960,75 días**	**0**	**2,937%**	**7,497%**	**jue 27/04/23**	**sáb 13/06/26**	
2418	1.3.10.1.3.3.3.1.1	Inicio tramo redes alcantarillado sanitario	0 días	100	0,000%	0,000%	jue 27/04/23	jue 27/04/23	170
2419	1.3.10.1.3.3.3.1.2	Excavaciones	46,5 días	100	100,000%	100,000%	jue 27/04/23	jue 22/06/23	2418CC
2420	1.3.10.1.3.3.3.1.3	Entibados	44,25 días	100	100,000%	100,000%	jue 27/04/23	mar 20/06/23	2419CC
2421	1.3.10.1.3.3.3.1.4	Tuberías	44,25 días	100	100,000%	100,000%	jue 27/04/23	mar 20/06/23	2420CC
2422	1.3.10.1.3.3.3.1.5	Rellenos	44,25 días	100	100,000%	100,000%	jue 27/04/23	mar 20/06/23	2421CC
2423	1.3.10.1.3.3.3.1.6	Pozos de inspección y/o cámaras	46,5 días	100	100,000%	100,000%	jue 27/04/23	jue 22/06/23	2422CC
2424	1.3.10.1.5.3.3.1.7	Excavaciones	45 días	100	0,000%	100,000%	lun 13/04/26	jue 4/06/26	1215FC+910 días
2425	1.3.10.1.5.3.3.1.8	Entibados	50 días	100	0,000%	100,000%	lun 13/04/26	jue 11/06/26	2424CC
2426	1.3.10.1.5.3.3.1.9	Tuberías	43 días	100	0,000%	100,000%	mié 15/04/26	jue 4/06/26	2425CC+2 días
2427	1.3.10.1.5.3.3.1.1	Rellenos	43 días	100	0,000%	100,000%	jue 16/04/26	sáb 6/06/26	2426CC+2 días
2428	1.3.10.1.5.3.3.1.1	Pozos de inspección y/o cámaras	46 días	100	0,000%	100,000%	lun 20/04/26	sáb 13/06/26	2432CC+2 días;24
2429	1.3.10.1.5.3.3.1.1	Excavaciones	45 días	0	0,000%	0,000%	lun 13/04/26	jue 4/06/26	1215FC+910 días
2430	1.3.10.1.5.3.3.1.1	Entibados	50 días	0	0,000%	0,000%	lun 13/04/26	jue 11/06/26	2429CC
2431	1.3.10.1.5.3.3.1.1	Tuberías	43 días	0	0,000%	0,000%	mié 15/04/26	jue 4/06/26	2430CC+2 días
2432	1.3.10.1.5.3.3.1.1	Rellenos	43 días	0	0,000%	0,000%	jue 16/04/26	sáb 6/06/26	2431CC+2 días
2433	1.3.10.1.5.3.3.1.1	Pozos de inspección y/o cámaras	46 días	0	0,000%	0,000%	lun 20/04/26	sáb 13/06/26	2432CC+2 días;24
2434	1.3.10.1.5.3.3.1.1	Fin tramo de redes alcantarillado sanitario	0 días	0	0,000%	0,000%	sáb 13/06/26	sáb 13/06/26	2419;2420;2421;2
2435	**1.3.10.1.3.3.4**	**Redes de alcantarillado Pluvial**	**1078,75 días**	**0**	**74,723%**	**74,723%**	**sáb 17/12/22**	**lun 22/06/26**	
2436	**1.3.10.1.3.3.4.1**	**Tramo de redes de alcantarillado pluvial**	**1078,75 días**	**0**	**74,723%**	**74,723%**	**sáb 17/12/22**	**lun 22/06/26**	
2437	1.3.10.1.3.3.4.1.1	Inicio tramo redes de alcantarillado pluvial	0 días	100	0,000%	0,000%	sáb 17/12/22	sáb 17/12/22	2401FC+70 días
2438	1.3.10.1.3.3.4.1.2	Excavaciones	46,5 días	100	100,000%	100,000%	sáb 17/12/22	mié 8/02/23	2437CC-1 día
2439	1.3.10.1.3.3.4.1.3	Entibados	43,13 días	100	100,000%	100,000%	sáb 17/12/22	sáb 4/02/23	2438CC
2440	1.3.10.1.3.3.4.1.4	Tuberías	43,13 días	100	100,000%	100,000%	sáb 17/12/22	sáb 4/02/23	2439CC
2441	1.3.10.1.3.3.4.1.5	Rellenos	43,13 días	100	100,000%	100,000%	sáb 17/12/22	sáb 4/02/23	2440CC
2442	1.3.10.1.3.3.4.1.7	Sumideros	46,5 días	100	100,000%	100,000%	jue 16/03/23	jue 11/05/23	2441FC+33 días
2443	1.3.10.1.3.3.4.1.2	Excavaciones	15 días	100	100,000%	100,000%	mié 29/10/25	mar 18/11/25	1215FC+773 días
2444	1.3.10.1.3.3.4.1.3	Entibados	15 días	100	100,000%	100,000%	mié 29/10/25	mar 18/11/25	2443CC
2445	1.3.10.1.3.3.4.1.4	Tuberías	15 días	100	100,000%	100,000%	jue 6/11/25	mar 25/11/25	2444CC+6 días
2446	1.3.10.1.3.3.4.1.5	Rellenos	15 días	100	100,000%	100,000%	jue 13/11/25	mar 2/12/25	2445CC+6 días
2447	1.3.10.1.3.3.4.1.6	Pozos de inspección y/o cámaras	15 días	100	100,000%	100,000%	vie 21/11/25	mar 9/12/25	2446CC+6 días
2448	1.3.10.1.3.3.4.1.7	Sumideros	15 días	100	100,000%	100,000%	jue 27/11/25	lun 15/12/25	2447CC+5 días
2449	1.3.10.1.3.3.4.1.2	Excavaciones	45 días	100	100,000%	100,000%	lun 19/05/25	vie 11/07/25	1215FC+633 días
2450	1.3.10.1.3.3.4.1.3	Entibados	47 días	100	100,000%	100,000%	lun 19/05/25	lun 14/07/25	2449CC
2451	1.3.10.1.3.3.4.1.4	Tuberías	47 días	100	100,000%	100,000%	mar 27/05/25	mié 23/07/25	2450CC+8 días
2452	1.3.10.1.3.3.4.1.5	Rellenos	43 días	100	100,000%	100,000%	jue 5/06/25	vie 25/07/25	2451CC+7 días
2453	1.3.10.1.3.3.4.1.6	Pozos de inspección y/o cámaras	46 días	100	100,000%	100,000%	vie 13/06/25	mié 6/08/25	2452CC+7 días
2454	1.3.10.1.3.3.4.1.7	Sumideros	46 días	100	100,000%	100,000%	vie 13/06/25	mié 6/08/25	2453CC
2455	1.3.10.1.3.3.4.1.2	Excavaciones	35 días	0	0,000%	0,000%	lun 13/04/26	lun 25/05/26	1215FC+910 días
2456	1.3.10.1.3.3.4.1.3	Entibados	37 días	0	0,000%	0,000%	lun 13/04/26	mar 26/05/26	2455CC
2457	1.3.10.1.3.3.4.1.4	Tuberías	37 días	0	0,000%	0,000%	mar 21/04/26	jue 4/06/26	2456CC+8 días
2458	1.3.10.1.3.3.4.1.5	Rellenos	33 días	0	0,000%	0,000%	mié 29/04/26	mar 9/06/26	2457CC+7 días
2459	1.3.10.1.3.3.4.1.6	Pozos de inspección y/o cámaras	36 días	0	0,000%	0,000%	vie 8/05/26	lun 22/06/26	2458CC+7 días
2460	1.3.10.1.3.3.4.1.7	Sumideros	36 días	0	0,000%	0,000%	vie 8/05/26	lun 22/06/26	2459CC
2461	1.3.10.1.3.3.4.1.8	Fin tramo de redes de alcantarillado pluvial	0 días	0	0,000%	0,000%	lun 22/06/26	lun 22/06/26	2442;2454;2448;2
2462	1.3.10.1.3.3.5	Fin Redes Alcantarillado Sanitario y Pluvial	0 días	0	0,000%	0,000%	lun 22/06/26	lun 22/06/26	2461;2434
2463	**1.3.10.1.3.4**	**Redes Secas**	**1165,5 días**	**0**	**26,692%**	**27,323%**	**jue 22/09/22**	**mié 8/07/26**	
2464	**1.3.10.1.5.4.1**	**Redes de codensa**	**1141,5 días**	**0**	**26,426%**	**27,333%**	**jue 22/09/22**	**mar 9/06/26**	

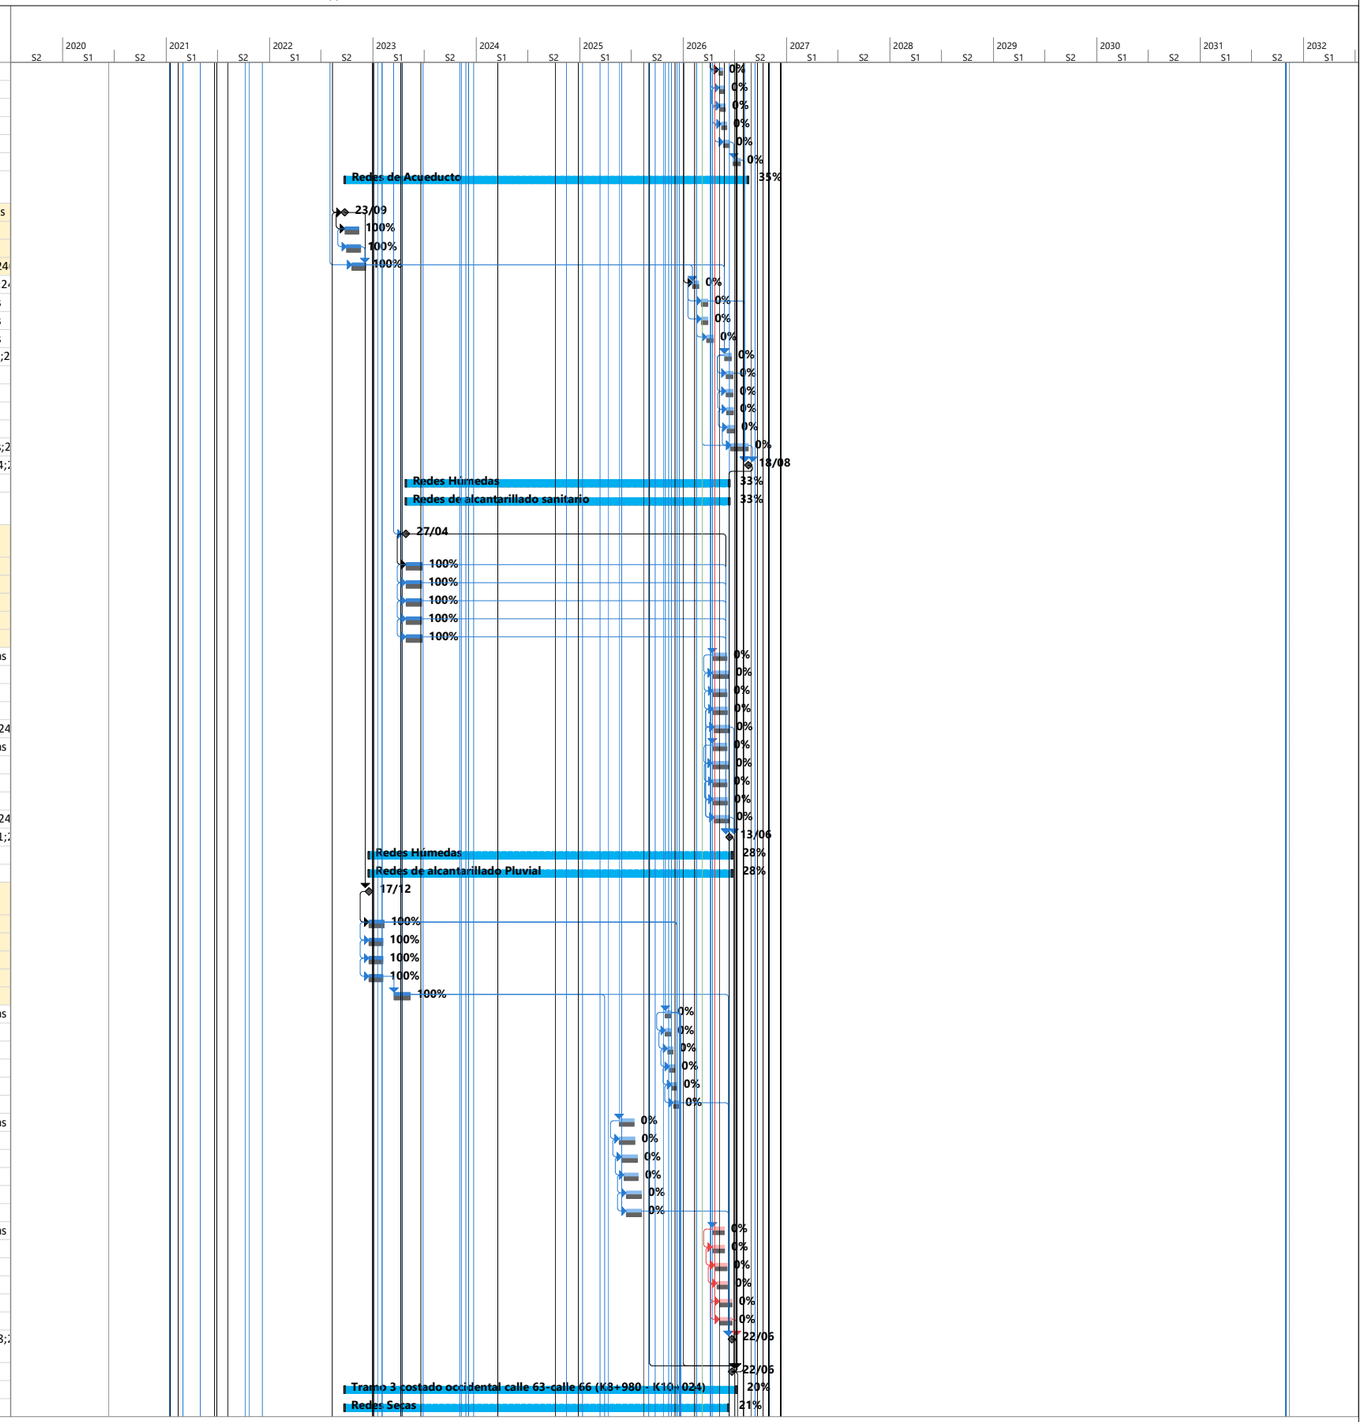


Tareas críticas | Tarea | Tarea manual | solo duración | Hito de línea base | Resumen | Tareas externas | Hito inactivo
División crítica | División | solo el comienzo | Línea base | Hito | Resumen manual | Hito externo | Resumen inactivo
Progreso de tarea crítica | Progreso de tarea | solo fin | División de la línea base | Progreso del resumen | Resumen del proyecto | Tarea inactiva | Fecha límite

Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	% Avance Conciliado	% Avance Programado (% PV)	% Avance Ejecutado conciliado (% EV))	Comienzo	Fin	Predecesoras
2465	**1.3.10.1.3.4.1**	**Tramo 3A Redes de Codensa (K9+715 - K9+995)**	**645 días**	**0**	**21,092%**	**23,086%**	**lun 29/04/24**	**mié 3/06/26**	
2466	1.3.10.1.3.4.1.1	Inicio tramo redes de Codensa	0 días	0	0,000%	0,000%	lun 29/04/24	lun 29/04/24	2385CC
2467	1.3.10.1.3.4.1.2	Maniobras	10 días	0	0,000%	0,000%	mié 10/12/25	lun 22/12/25	2466FC+498 días
2468	1.3.10.1.3.4.1.3	Excavaciones	18 días	100	100,000%	100,000%	mar 9/12/25	mar 30/12/25	2438FC+870 días
2469	1.3.10.1.3.4.1.4	Canalización	18 días	100	100,000%	100,000%	mar 9/12/25	mar 30/12/25	2438FC+870 días
2470	1.3.10.1.3.4.1.5	Rellenos	15 días	100	100,000%	100,000%	mar 9/12/25	vie 26/12/25	2438FC+870 días
2471	1.3.10.1.3.4.1.6	Cajas	20 días	100	0,000%	100,000%	vie 8/05/26	lun 1/06/26	2474CC+5 días
2472	1.3.10.1.3.4.1.3	Excavaciones	18 días	0	0,000%	0,000%	lun 20/04/26	mar 12/05/26	2467CC+110 días
2473	1.3.10.1.3.4.1.4	Canalización	18 días	0	0,000%	0,000%	sáb 25/04/26	mar 19/05/26	2472CC+5 días
2474	1.3.10.1.3.4.1.5	Rellenos	15 días	0	0,000%	0,000%	sáb 2/05/26	mié 20/05/26	2473CC+5 días
2475	1.3.10.1.3.4.1.6	Cajas	20 días	0	0,000%	0,000%	vie 8/05/26	lun 1/06/26	2474CC+5 días
2476	1.3.10.1.3.4.1.7	Fin tramo redes de Codensa	0 días	0	0,000%	0,000%	mié 3/06/26	mié 3/06/26	2468;2472;2475F
2477	**1.3.10.1.3.4.1**	**Tramo 3B Redes de Codensa (K9+280 - K9+715)**	**421 días**	**0**	**16,869%**	**16,869%**	**sáb 28/12/24**	**mar 12/05/26**	
2478	1.3.10.1.3.4.1.1	Inicio tramo redes de Codensa	0 días	0	0,000%	0,000%	vie 12/12/25	vie 12/12/25	2466FC+500 días
2479	1.3.10.1.3.4.1.2	Maniobras	25 días	0	0,000%	0,000%	sáb 13/12/25	mié 14/01/26	2478FC+1 día
2480	1.3.10.1.3.4.1.3	Excavaciones	40 días	100	100,000%	100,000%	sáb 28/12/24	jue 13/02/25	2479CC-296 días
2481	1.3.10.1.3.4.1.4	Canalización	40 días	100	100,000%	100,000%	jue 13/02/25	mar 1/04/25	2479CC-256 días;
2482	1.3.10.1.3.4.1.5	Rellenos	40 días	100	100,000%	100,000%	mar 1/04/25	lun 19/05/25	2479CC-216 días;
2483	1.3.10.1.3.4.1.6	Cajas	45 días	100	100,000%	100,000%	mar 20/05/25	sáb 12/07/25	2479CC-296 días;
2484	1.3.10.1.3.4.1.3	Excavaciones	20 días	100	100,000%	100,000%	mié 10/12/25	lun 5/01/26	2479CC-3 días
2485	1.3.10.1.3.4.1.4	Canalización	25 días	100	100,000%	100,000%	mié 10/12/25	vie 9/01/26	2479CC-3 días
2486	1.3.10.1.3.4.1.5	Rellenos	25 días	100	100,000%	100,000%	mié 10/12/25	vie 9/01/26	2479CC-3 días
2487	1.3.10.1.3.4.1.3	Excavaciones	20 días	0	0,000%	0,000%	lun 13/04/26	mié 6/05/26	2479CC+100 días
2488	1.3.10.1.3.4.1.4	Canalización	25 días	0	0,000%	0,000%	lun 13/04/26	mar 12/05/26	2487CC
2489	1.3.10.1.3.4.1.5	Rellenos	25 días	0	0,000%	0,000%	lun 13/04/26	mar 12/05/26	2488CC
2490	1.3.10.1.3.4.1.6	Cajas	20 días	0	0,000%	0,000%	jue 16/04/26	lun 11/05/26	2489CC+4 días
2491	1.3.10.1.3.4.1.7	Fin tramo redes de Codensa	0 días	0	0,000%	0,000%	lun 11/05/26	lun 11/05/26	2490;2483;2486;
2492	**1.3.10.1.3.4.1**	**Tramo 3C Redes de Codensa (K8+980 - K9+220)**	**1141,5 días**	**0**	**52,918%**	**54,254%**	**jue 22/09/22**	**mar 9/06/26**	
2493	1.3.10.1.3.4.1.1	Inicio tramo redes de Codensa	0 días	100	0,000%	0,000%	jue 22/09/22	jue 22/09/22	2401CC-1 día
2494	1.3.10.1.3.4.1.2	Maniobras	26 días	100	0,000%	0,000%	lun 24/10/22	mié 23/11/22	2493FC+26 días
2495	1.3.10.1.3.4.1.3	Excavaciones	41,38 días	100	100,000%	100,000%	jue 24/11/22	mié 11/01/23	2494
2496	1.3.10.1.3.4.1.4	Canalización	41,38 días	100	100,000%	100,000%	jue 24/11/22	mié 11/01/23	2495CC
2497	1.3.10.1.3.4.1.5	Rellenos	41,38 días	100	100,000%	100,000%	mié 30/11/22	mar 17/01/23	2495CC+5 días;24
2498	1.3.10.1.3.4.1.6	Cajas	51,63 días	100	100,000%	100,000%	mié 30/11/22	sáb 28/01/23	2497CC
2499	1.3.10.1.3.4.1.2	Maniobras	25 días	0	0,000%	0,000%	mié 10/12/25	vie 9/01/26	1215FC+807 días
2500	1.3.10.1.3.4.1.3	Excavaciones	30 días	100	100,000%	100,000%	mié 14/01/26	mar 17/02/26	2499CC+28 días
2501	1.3.10.1.3.4.1.4	Canalización	30 días	100	100,000%	100,000%	mié 14/01/26	mar 17/02/26	2499CC+28 días
2502	1.3.10.1.3.4.1.5	Rellenos	30 días	100	100,000%	100,000%	lun 26/01/26	sáb 28/02/26	2499CC+38 días
2503	1.3.10.1.3.4.1.6	Cajas	32 días	100	82,813%	100,000%	vie 30/01/26	vie 6/03/26	2499CC+42 días
2504	1.3.10.1.3.4.1.3	Excavaciones	25 días	0	0,000%	0,000%	mié 15/04/26	jue 14/05/26	2499FC+80 días
2505	1.3.10.1.3.4.1.4	Canalización	30 días	0	0,000%	0,000%	mié 15/04/26	mié 20/05/26	2504CC
2506	1.3.10.1.3.4.1.5	Rellenos	30 días	0	0,000%	0,000%	sáb 25/04/26	lun 1/06/26	2505CC+10 días
2507	1.3.10.1.3.4.1.6	Cajas	31 días	0	0,000%	0,000%	sáb 2/05/26	mar 9/06/26	2505CC+15 días
2508	1.3.10.1.3.4.1.7	Fin tramo redes de Codensa	0 días	0	0,000%	0,000%	mar 9/06/26	mar 9/06/26	2498;2507;2503;2
2509	**1.3.10.1.3.4.2**	**Redes de ETB**	**1165,5 días**	**0**	**27,300%**	**27,300%**	**jue 22/09/22**	**mié 8/07/26**	
2510	**1.3.10.1.3.4.2**	**Tramo 3A Redes de ETB (K9+715 - K9+995)**	**507 días**	**0**	**8,522%**	**8,522%**	**mié 25/09/24**	**mar 19/05/26**	
2511	1.3.10.1.3.4.2.1	Inicio tramo redes de ETB	0 días	0	0,000%	0,000%	mar 14/10/25	mar 14/10/25	2466CC+450 días
2512	1.3.10.1.3.4.2.2	Maniobras	20 días	0	0,000%	0,000%	vie 4/04/25	mar 29/04/25	2511FC-162 días
2513	1.3.10.1.3.4.2.3	Excavaciones	20 días	100	100,000%	100,000%	vie 4/04/25	mar 29/04/25	2511FC-162 días
2514	1.3.10.1.3.4.2.4	Ductos	20 días	100	100,000%	100,000%	mié 9/07/25	jue 31/07/25	2513CC+79 días
2515	1.3.10.1.3.4.2.3	Excavaciones	15 días	100	100,000%	100,000%	mié 25/09/24	vie 11/10/24	2512FC-183 días
2516	1.3.10.1.3.4.2.4	Ductos	20 días	100	100,000%	100,000%	vie 27/12/24	mar 21/01/25	2515FC+64 días
2517	1.3.10.1.3.4.2.3	Excavaciones	15 días	0	0,000%	0,000%	jue 26/03/26	mar 14/04/26	2512FC+280 días
2518	1.3.10.1.3.4.2.4	Ductos	20 días	0	0,000%	0,000%	lun 20/04/26	mié 13/05/26	2517FC+5 días
2519	1.3.10.1.3.4.2.5	cámaras	20 días	0	0,000%	0,000%	jue 23/04/26	mar 19/05/26	2514CC+3 días;25
2520	1.3.10.1.3.4.2.6	Demolición de canalizaciones de redes	30 días	0	0,000%	0,000%	jue 9/04/26	mié 13/05/26	2515CC+10 días;2
2521	1.3.10.1.3.4.2.7	Demolición de pozos, cajas y cámaras	30 días	0	0,000%	0,000%	jue 9/04/26	mié 13/05/26	2520CC
2522	1.3.10.1.3.4.2.8	Reconstrucción de cámaras	30 días	0	0,000%	0,000%	vie 10/04/26	vie 15/05/26	2520CC+2 días;25
2523	1.3.10.1.3.4.2.9	Cárcamos	20 días	0	0,000%	0,000%	mié 15/04/26	vie 8/05/26	2519CC-7 días
2524	1.3.10.1.3.4.2.10	Fin tramo de redes de ETB	0 días	0	0,000%	0,000%	mar 19/05/26	mar 19/05/26	2512FC+1 día;251
2525	**1.3.10.1.3.4.2**	**Tramo 3B Redes de ETB (K9+280 - K9+715)**	**165 días**	**0**	**11,712%**	**11,712%**	**mié 10/12/25**	**jue 25/06/26**	
2526	1.3.10.1.3.4.2.1	Inicio tramo redes de ETB	0 días	0	0,000%	0,000%	sáb 13/12/25	sáb 13/12/25	2478CC+1 día
2527	1.3.10.1.3.4.2.2	Maniobras	20 días	0	0,000%	0,000%	vie 19/12/25	mié 14/01/26	2526CC+5 días
2528	1.3.10.1.3.4.2.3	Excavaciones	30 días	100	100,000%	100,000%	mié 14/01/26	mar 17/02/26	2527
2529	1.3.10.1.3.4.2.4	Ductos	30 días	100	100,000%	100,000%	mar 20/01/26	lun 23/02/26	2528CC+5 días
2530	1.3.10.1.3.4.2.3	Excavaciones	30 días	100	100,000%	100,000%	mié 10/12/25	vie 16/01/26	2527FC-28 días
2531	1.3.10.1.3.4.2.4	Ductos	30 días	100	100,000%	100,000%	mié 10/12/25	vie 16/01/26	2530CC
2532	1.3.10.1.3.4.2.3	Excavaciones	30 días	0	0,000%	0,000%	vie 17/04/26	sáb 23/05/26	2527FC+80 días
2533	1.3.10.1.3.4.2.4	Ductos	30 días	0	0,000%	0,000%	vie 17/04/26	sáb 23/05/26	2532CC
2534	1.3.10.1.3.4.2.5	cámaras	30 días	0	0,000%	0,000%	jue 23/04/26	vie 29/05/26	2529CC+20 días;2
2535	1.3.10.1.3.4.2.6	Demolición de canalizaciones de redes	30 días	0	0,000%	0,000%	mar 12/05/26	jue 18/06/26	2528CC+20 días;2
2536	1.3.10.1.3.4.2.7	Demolición de pozos, cajas y cámaras	30 días	0	0,000%	0,000%	mar 12/05/26	jue 18/06/26	2528CC+20 días;2
2537	1.3.10.1.3.4.2.8	Reconstrucción de cámaras	30 días	0	0,000%	0,000%	jue 14/05/26	vie 19/06/26	2535CC+2 días;25
2538	1.3.10.1.3.4.2.9	Cárcamos	30 días	0	0,000%	0,000%	mié 20/05/26	jue 25/06/26	2537CC+5 días

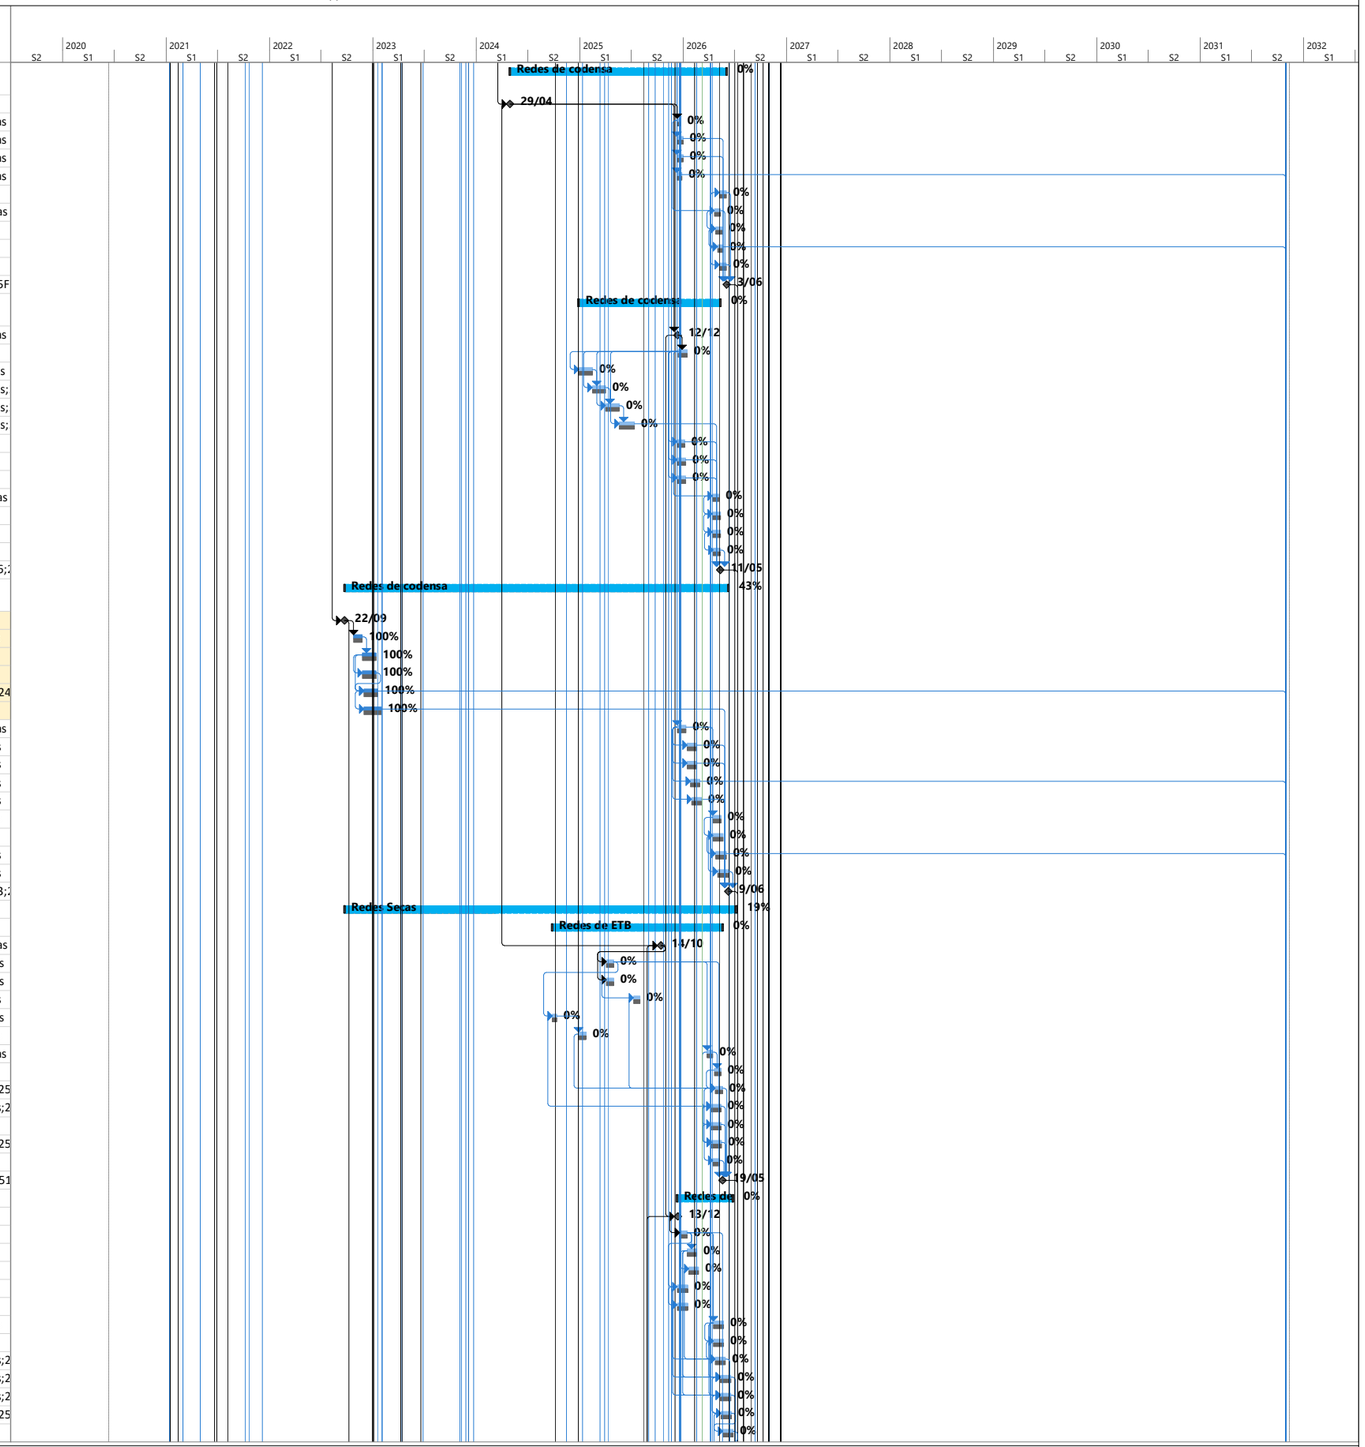


Tareas críticas | Tarea | Tarea manual | solo duración | Hito de línea base | Resumen | Tareas externas | Hito inactivo
División crítica | División | solo el comienzo | Línea base | Hito | Resumen manual | Hito externo | Resumen inactivo
Progreso de tarea crítica | Progreso de tarea | solo fin | División de la línea base | Progreso del resumen | Resumen del proyecto | Tarea inactiva | Fecha límite

Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	% Avance Conciliado	% Avance Programado (% PV)	% Avance Ejecutado conciliado (% EV))	Comienzo	Fin	Predecesoras
2539	1.3.10.1.3.4.2.10	Fin tramo de redes de ETB	0 días	0	0,000%	0,000%	lun 1/06/26	lun 1/06/26	2527FC-20 días;2
2540	**1.3.10.1.3.4.2**	**Tramo 3C Redes de ETB (K8+980 - K9+220)**	**1165,5 días**	**0**	**83,694%**	**83,694%**	**jue 22/09/22**	**mié 8/07/26**	
2541	1.3.10.1.3.4.2.1	Inicio tramo redes de ETB	0 días	100	0,000%	0,000%	jue 22/09/22	jue 22/09/22	2493
2542	1.3.10.1.3.4.2.2	Maniobras	36,25 días	100	0,000%	0,000%	vie 23/09/22	jue 3/11/22	2541CC+1 día
2543	1.3.10.1.3.4.2.3	Excavaciones	35,75 días	100	100,000%	100,000%	vie 4/11/22	sáb 17/12/22	2541CC+36 días
2544	1.3.10.1.3.4.2.4	Ductos	36,25 días	100	100,000%	100,000%	vie 18/11/22	jue 29/12/22	2543CC+10 días
2545	1.3.10.1.3.4.2.7	Demolición de pozos, cajas y cámaras	103,38 días	100	100,000%	100,000%	vie 4/11/22	sáb 4/03/23	2543CC
2546	1.3.10.1.3.4.2.5	cámaras	70 días	0	0,000%	0,000%	lun 13/04/26	lun 6/07/26	1215FC+910 días
2547	1.3.10.1.3.4.2.6	Demolición de canalizaciones de redes	70 días	0	0,000%	0,000%	mié 15/04/26	mié 8/07/26	2546CC+2 días
2548	1.3.10.1.3.4.2.9	Cárcamos	14 días	100	100,000%	100,000%	vie 8/03/24	mar 26/03/24	2545FC+310 días
2549	1.3.10.1.3.4.2.9	Cárcamos	64 días	100	100,000%	100,000%	sáb 26/04/25	sáb 12/07/25	2550FC-339 días
2550	1.3.10.1.3.4.2.8	Reconstrucción de cámaras	40 días	0	0,000%	0,000%	jue 16/04/26	mié 3/06/26	2547CC+2 días
2551	1.3.10.1.3.4.2.9	Cárcamos	50 días	0	0,000%	0,000%	lun 6/04/26	mié 3/06/26	2550FC-50 días
2552	1.3.10.1.3.4.2.10	Fin tramo de redes de ETB	0 días	0	0,000%	0,000%	sáb 13/06/26	sáb 13/06/26	2542FC-20 días;2
2553	1.3.10.1.3.5	Fin redes Tramo 3	0 días	0	0,000%	0,000%	vie 24/07/26	vie 24/07/26	2462FC-20 días;2
2554	**1.3.10.1.4**	**Tramo 4 costado occidental calle 53-calle 63 (K7+970 - K8+980)**	**1083,25 días**	**0**	**38,727%**	**40,432%**	**jue 2/02/23**	**vie 14/08/26**	
2555	**1.3.10.1.4.1**	**Actividades Silviculturales resolución 2354**	**31,13 días**	**0**	**0,000%**	**0,000%**	**jue 2/02/23**	**mié 8/03/23**	
2556	**1.3.10.1.4.1.1**	**Traslados**	**31,13 días**	**0**	**0,000%**	**0,000%**	**jue 2/02/23**	**mié 8/03/23**	
2557	1.3.10.1.4.1.1.1	actividades posteriores a la medida cautelar	31,13 días	100	0,000%	0,000%	jue 2/02/23	mié 8/03/23	26FC-221 días;25FC-221
2558	**1.3.10.1.4.1.2**	**Talas**	**31,13 días**	**0**	**0,000%**	**0,000%**	**jue 2/02/23**	**mié 8/03/23**	
2559	1.3.10.1.4.1.2.1	actividades posteriores a la medida cautelar	31,13 días	100	0,000%	0,000%	jue 2/02/23	mié 8/03/23	2557CC
2560	**1.3.10.1.4.2**	**Actividades Silviculturales individuos sin resolución**	**20,88 días**	**0**	**0,000%**	**0,000%**	**lun 4/12/23**	**jue 28/12/23**	
2561	**1.3.10.1.4.2.1**	**Traslados**	**20,88 días**	**0**	**0,000%**	**0,000%**	**lun 4/12/23**	**jue 28/12/23**	
2562	1.3.10.1.4.2.1.1	actividades posteriores a la medida cautelar	20,88 días	50	0,000%	0,000%	lun 4/12/23	jue 28/12/23	2557CC-271 días;25FC-271
2563	**1.3.10.1.4.2.2**	**Talas**	**10,63 días**	**0**	**0,000%**	**0,000%**	**lun 4/12/23**	**vie 15/12/23**	
2564	1.3.10.1.4.2.2.1	actividades posteriores a la medida cautelar	10,63 días	50	0,000%	0,000%	lun 4/12/23	vie 15/12/23	2562CC
2565	1.3.10.1.4.3	Inicio Redes tramo 4	0 días	0	0,000%	0,000%	jue 30/11/23	jue 30/11/23	2188CC+168 días
2566	**1.3.10.1.4.4**	**Redes Húmedas**	**471,25 días**	**0**	**45,075%**	**45,273%**	**mar 31/12/24**	**mié 15/07/26**	
2567	**1.3.10.1.4.4.1**	**Redes de Acueducto**	**471,25 días**	**0**	**16,841%**	**16,841%**	**mar 31/12/24**	**mié 15/07/26**	
2568	**1.3.10.1.4.4.1.1**	**Tramo 4A redes de acueducto (K8+550 - K8+980)**	**84 días**	**0**	**0,000%**	**0,000%**	**lun 6/04/26**	**mié 15/07/26**	
2569	1.3.10.1.4.4.1.1.1	Inicio tramo redes de acueducto	0 días	0	0,000%	0,000%	lun 6/04/26	lun 6/04/26	2565FC+720 días
2570	1.3.10.1.4.4.1.1.2	Excavaciones	30 días	0	0,000%	0,000%	mié 8/04/26	mar 12/05/26	2569CC+2 días
2571	1.3.10.1.4.4.1.1.3	Tuberías	30 días	0	0,000%	0,000%	jue 9/04/26	jue 14/05/26	2570CC+2 días
2572	1.3.10.1.4.4.1.1.4	Accesorios	50 días	0	0,000%	0,000%	lun 13/04/26	mié 10/06/26	2571CC+2 días
2573	1.3.10.1.4.4.1.1.5	Empates	50 días	0	0,000%	0,000%	lun 13/04/26	mié 10/06/26	2572CC
2574	1.3.10.1.4.4.1.1.6	Rellenos	40 días	0	0,000%	0,000%	mar 14/04/26	lun 1/06/26	2573CC+2 días
2575	1.3.10.1.4.4.1.1.7	Hidrantes	70 días	0	0,000%	0,000%	mar 21/04/26	mié 15/07/26	2574CC+6 días
2576	**1.3.10.1.4.4.1.1**	**Tramo 4B redes de acueducto (K8+150 - K8+550)**	**67 días**	**0**	**0,000%**	**0,000%**	**sáb 18/04/26**	**jue 9/07/26**	
2577	1.3.10.1.4.4.1.1.1	Inicio tramo redes de acueducto	0 días	0	0,000%	0,000%	sáb 18/04/26	sáb 18/04/26	115CC+160 días;1
2578	1.3.10.1.4.4.1.1.2	Excavaciones	20 días	0	0,000%	0,000%	lun 20/04/26	mié 13/05/26	2577
2579	1.3.10.1.4.4.1.1.3	Tuberías	20 días	0	0,000%	0,000%	mié 22/04/26	vie 15/05/26	2578CC+3 días
2580	1.3.10.1.4.4.1.1.4	Accesorios	60 días	0	0,000%	0,000%	lun 27/04/26	jue 9/07/26	2579CC+4 días
2581	1.3.10.1.4.4.1.1.5	Empates	40 días	0	0,000%	0,000%	mar 28/04/26	mié 17/06/26	2580CC+1 día
2582	1.3.10.1.4.4.1.1.6	Rellenos	40 días	0	0,000%	0,000%	mar 5/05/26	mar 23/06/26	2581CC+5 días
2583	1.3.10.1.4.4.1.1.7	Hidrantes	40 días	0	0,000%	0,000%	mar 5/05/26	mar 23/06/26	2581CC+5 días
2584	**1.3.10.1.4.4.1.1**	**Tramo 4C redes de acueducto (K7+970 - K8+150)**	**438 días**	**0**	**73,956%**	**73,956%**	**mar 31/12/24**	**mié 3/06/26**	
2585	1.3.10.1.4.4.1.1.1	Inicio tramo redes de acueducto	0 días	0	0,000%	0,000%	mar 31/12/24	mar 31/12/24	2557FC+310 días;
2586	1.3.10.1.4.4.1.1.2	Excavaciones	12 días	100	100,000%	100,000%	jue 16/01/25	mié 29/01/25	2585FC+12 días
2587	1.3.10.1.4.4.1.1.3	Tuberías	12 días	100	100,000%	100,000%	mar 28/01/25	lun 10/02/25	2585FC+22 días
2588	1.3.10.1.4.4.1.1.4	Accesorios	12 días	100	100,000%	100,000%	mar 28/01/25	lun 10/02/25	2585FC+22 días
2589	1.3.10.1.4.4.1.1.6	Rellenos	12 días	100	100,000%	100,000%	mar 11/02/25	lun 24/02/25	2585FC+35 días
2590	1.3.10.1.4.4.1.1.2	Excavaciones	12 días	0	0,000%	0,000%	lun 20/04/26	lun 4/05/26	2585FC+400 días
2591	1.3.10.1.4.4.1.1.3	Tuberías	12 días	0	0,000%	0,000%	vie 24/04/26	sáb 9/05/26	2590CC+5 días
2592	1.3.10.1.4.4.1.1.4	Accesorios	12 días	0	0,000%	0,000%	jue 30/04/26	vie 15/05/26	2591CC+5 días
2593	1.3.10.1.4.4.1.1.5	Empates	12 días	0	0,000%	0,000%	jue 7/05/26	vie 22/05/26	2592CC+5 días;25
2594	1.3.10.1.4.4.1.1.6	Rellenos	12 días	0	0,000%	0,000%	mié 13/05/26	jue 28/05/26	2593CC+5 días
2595	1.3.10.1.4.4.1.1.7	Hidrantes	18 días	0	0,000%	0,000%	mié 13/05/26	mié 3/06/26	2593CC+5 días
2596	1.3.10.1.4.4.1.1.8	Fin tramo de redes de acueducto	0 días	0	0,000%	0,000%	mié 3/06/26	mié 3/06/26	2590;2591;2592;2
2597	**1.3.10.1.4.4.2**	**Redes de alcantarillado sanitario**	**150,63 días**	**0**	**21,117%**	**21,719%**	**lun 22/12/25**	**sáb 20/06/26**	
2598	**1.3.10.1.4.4.2.1**	**Tramo de redes de alcantarillado sanitario**	**150,63 días**	**0**	**21,117%**	**21,719%**	**lun 22/12/25**	**sáb 20/06/26**	
2599	1.3.10.1.4.4.2.1.1	Inicio tramo de redes de alcantarillado sanitario	0 días	0	0,000%	0,000%	lun 20/04/26	lun 20/04/26	170FC+140 días;175FC+140
2600	1.3.10.1.4.4.2.1.2	Excavaciones	20,4 días	100	100,000%	100,000%	lun 22/12/25	sáb 17/01/26	2443FC+29 días
2601	1.3.10.1.4.4.2.1.3	Entibados	20,4 días	100	100,000%	100,000%	lun 22/12/25	sáb 17/01/26	2443FC+29 días
2602	1.3.10.1.4.4.2.1.4	Tuberías	20 días	100	100,000%	100,000%	lun 22/12/25	vie 16/01/26	2443FC+29 días
2603	1.3.10.1.4.4.2.1.5	Rellenos	20 días	100	100,000%	100,000%	lun 22/12/25	vie 16/01/26	2443FC+29 días
2604	1.3.10.1.4.4.2.1.6	Pozos de inspección y/o cámaras	20 días	100	0,000%	100,000%	mié 27/05/26	sáb 20/06/26	2603CC+7 días;26
2605	1.3.10.1.4.4.2.1.2	Excavaciones	20 días	0	0,000%	0,000%	sáb 2/05/26	mar 26/05/26	2599FC+10 días

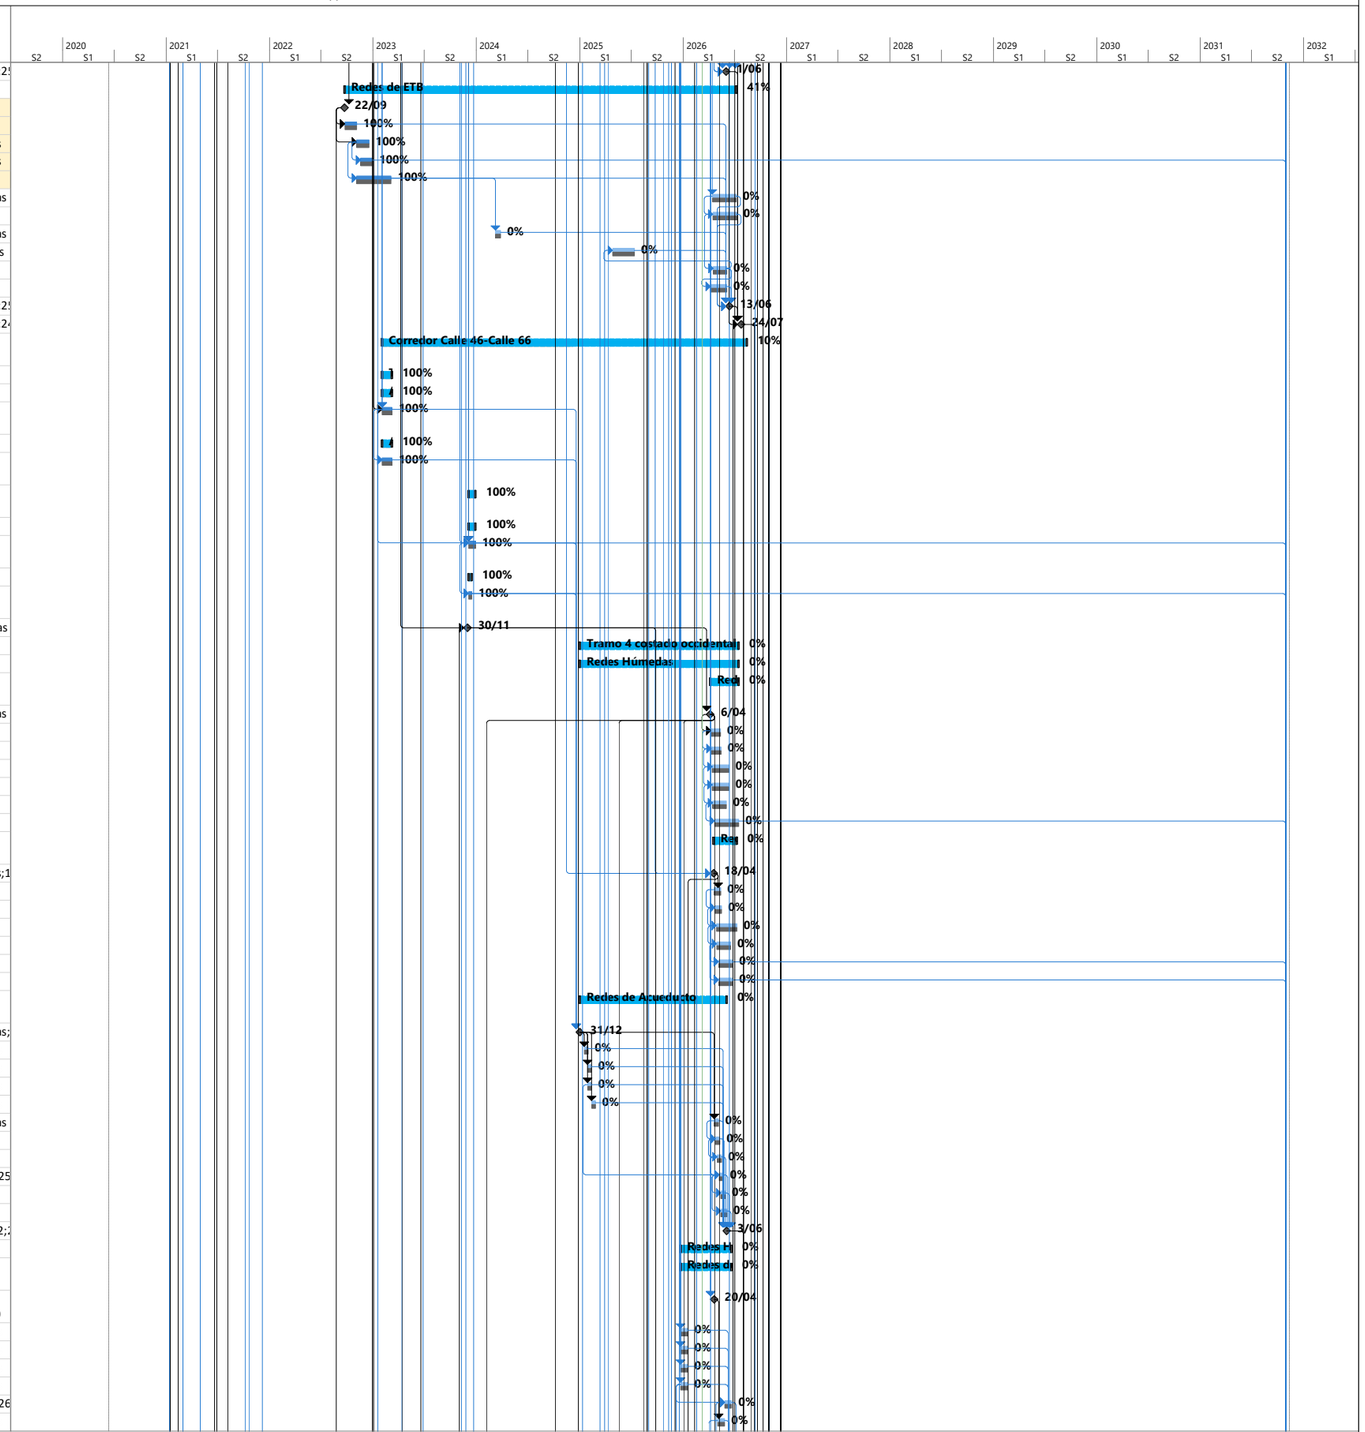


Tareas críticas · Tarea · Tarea manual · solo duración · Hito de línea base · Resumen · Tareas externas · Hito inactivo
División crítica · División · solo el comienzo · Línea base · Hito · Resumen manual · Hito externo · Resumen inactivo
Progreso de tarea crítica · Progreso de tarea · solo fin · División de la línea base · Progreso del resumen · Resumen del proyecto · Tarea inactiva · Fecha límite

Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	% Avance Conciliado	% Avance Programado (% PV)	% Avance Ejecutado conciliado (% EV))	Comienzo	Fin	Predecesoras
2606	1.3.10.1.4.4.2.1.3	Entibados	20 días	0	0,000%	0,000%	sáb 2/05/26	mar 26/05/26	2605CC
2607	1.3.10.1.4.4.2.1.4	Tuberías	20 días	0	0,000%	0,000%	lun 11/05/26	mié 3/06/26	2606CC+7 días
2608	1.3.10.1.4.4.2.1.5	Rellenos	20 días	0	0,000%	0,000%	mar 19/05/26	jue 11/06/26	2607CC+7 días
2609	1.3.10.1.4.4.2.1.6	Pozos de inspección y/o cámaras	20 días	0	0,000%	0,000%	mié 27/05/26	sáb 20/06/26	2603CC+7 días;26
2610	1.3.10.1.4.4.2.1.7	fin tramo de redes alcantarillado sanitario	0 días	0	0,000%	0,000%	sáb 20/06/26	sáb 20/06/26	2600;2601;2602;2
2611	**1.3.10.1.4.4.3**	**Redes de alcantarillado Pluvial**	**373,3 días**	**0**	**62,137%**	**62,137%**	**sáb 29/03/25**	**jue 18/06/26**	
2612	**1.3.10.1.4.4.3.1**	**Tramo de redes de alcantarillado pluvial**	**373,3 días**	**0**	**62,137%**	**62,137%**	**sáb 29/03/25**	**jue 18/06/26**	
2613	1.3.10.1.4.4.3.1.1	Inicio tramo redes alcantarillado pluvial	0 días	0	0,000%	0,000%	mar 4/11/25	mar 4/11/25	170;175
2614	1.3.10.1.4.4.3.1.2	Excavaciones	30 días	100	100,000%	100,000%	sáb 29/03/25	mar 6/05/25	2442FC+578,2 día
2615	1.3.10.1.4.4.3.1.3	Entibados	30 días	100	100,000%	100,000%	sáb 29/03/25	mar 6/05/25	2614CC
2616	1.3.10.1.4.4.3.1.4	Tuberías	30 días	100	100,000%	100,000%	lun 7/04/25	mié 14/05/25	2615CC+7 días
2617	1.3.10.1.4.4.3.1.5	Rellenos	30 días	100	100,000%	100,000%	lun 14/04/25	mié 21/05/25	2616CC+7 días
2618	1.3.10.1.4.4.3.1.6	Pozos de inspección y/o cámaras	30 días	100	100,000%	100,000%	jue 24/04/25	jue 29/05/25	2617CC+7 días
2619	1.3.10.1.4.4.3.1.7	Sumideros	30 días	100	100,000%	100,000%	sáb 3/05/25	sáb 7/06/25	2618CC+7 días
2620	1.3.10.1.4.4.3.1.2	Excavaciones	31 días	100	100,000%	100,000%	jue 21/08/25	jue 25/09/25	2613FC-64 días
2621	1.3.10.1.4.4.3.1.3	Entibados	31 días	100	100,000%	100,000%	jue 21/08/25	jue 25/09/25	2620CC
2622	1.3.10.1.4.4.3.1.4	Tuberías	30 días	100	100,000%	100,000%	jue 28/08/25	mié 1/10/25	2621CC+6 días
2623	1.3.10.1.4.4.3.1.5	Rellenos	29 días	100	100,000%	100,000%	vie 5/09/25	mié 8/10/25	2622CC+7 días
2624	1.3.10.1.4.4.3.1.6	Pozos de inspección y/o cámaras	30 días	100	100,000%	100,000%	sáb 13/09/25	vie 17/10/25	2623CC+7,2 días
2625	1.3.10.1.4.4.3.1.7	Sumideros	30 días	100	100,000%	100,000%	lun 22/09/25	lun 27/10/25	2624CC+7 días
2626	1.3.10.1.4.4.3.1.2	Excavaciones	30 días	0	0,000%	0,000%	sáb 2/05/26	vie 5/06/26	2613FC+150 días
2627	1.3.10.1.4.4.3.1.3	Entibados	30 días	0	0,000%	0,000%	sáb 2/05/26	vie 5/06/26	2626CC
2628	1.3.10.1.4.4.3.1.4	Tuberías	30 días	0	0,000%	0,000%	mar 5/05/26	mié 10/06/26	2627CC+2 días
2629	1.3.10.1.4.4.3.1.5	Rellenos	30 días	0	0,000%	0,000%	jue 7/05/26	jue 11/06/26	2628CC+2 días
2630	1.3.10.1.4.4.3.1.6	Pozos de inspección y/o cámaras	29 días	0	0,000%	0,000%	vie 8/05/26	vie 12/06/26	2629CC+2 días
2631	1.3.10.1.4.4.3.1.7	Sumideros	30,5 días	0	0,000%	0,000%	mar 12/05/26	jue 18/06/26	2630CC+2 días
2632	1.3.10.1.4.4.3.1.8	Fin tramo redes alcantarillado pluvial	0 días	0	0,000%	0,000%	jue 18/06/26	jue 18/06/26	2625;2619;2631
2633	1.3.10.1.4.4.4	Fin redes húmedas - Tramo 4	0 días	0	0,000%	0,000%	sáb 20/06/26	sáb 20/06/26	2610;2632
2634	**1.3.10.1.4.5**	**Redes Secas**	**783,75 días**	**0**	**29,255%**	**33,209%**	**jue 25/01/24**	**vie 14/08/26**	
2635	**1.3.10.1.4.5.1**	**Redes de Codensa**	**768,75 días**	**0**	**24,085%**	**27,445%**	**jue 25/01/24**	**mar 28/07/26**	
2636	**1.3.10.1.4.5.1**	**Tramo 4A Redes de Codensa (K8+550 - K8+980)**	**744,5 días**	**0**	**9,474%**	**17,368%**	**jue 25/01/24**	**sáb 27/06/26**	
2637	1.3.10.1.4.5.1.1	Inicio de tramo de redes Codensa	0 días	100	0,000%	0,000%	jue 25/01/24	jue 25/01/24	2565CC+44 días
2638	1.3.10.1.4.5.1.2	Maniobras	31 días	100	0,000%	0,000%	mié 31/01/24	mar 5/03/24	2637FC+4 días
2639	1.3.10.1.4.5.1.3	Excavaciones	3 días	100	100,000%	100,000%	mié 31/01/24	vie 2/02/24	2638CC
2640	1.3.10.1.4.5.1.4	Canalización	3 días	100	100,000%	100,000%	mié 31/01/24	vie 2/02/24	2639CC
2641	1.3.10.1.4.5.1.5	Rellenos	3 días	100	100,000%	100,000%	mié 31/01/24	vie 2/02/24	2640CC
2642	1.3.10.1.4.5.1.3	Excavaciones	30 días	100	82,917%	100,000%	lun 2/02/26	vie 6/03/26	2569FC-53 días
2643	1.3.10.1.4.5.1.4	Canalización	40 días	100	57,188%	100,000%	mar 3/02/26	vie 20/03/26	2642CC+2 días
2644	1.3.10.1.4.5.1.5	Rellenos	40 días	100	52,188%	100,000%	jue 5/02/26	mar 24/03/26	2643CC+2 días
2645	1.3.10.1.4.5.1.6	Cajas	30 días	100	0,000%	100,000%	vie 6/03/26	lun 13/04/26	2642
2646	1.3.10.1.4.5.1.3	Excavaciones	30 días	0	0,000%	0,000%	jue 16/04/26	vie 22/05/26	2569FC+10 días
2647	1.3.10.1.4.5.1.4	Canalización	40 días	0	0,000%	0,000%	sáb 18/04/26	jue 4/06/26	2646CC+2 días
2648	1.3.10.1.4.5.1.5	Rellenos	40 días	0	0,000%	0,000%	mar 21/04/26	mar 9/06/26	2647CC+2 días
2649	1.3.10.1.4.5.1.6	Cajas	30 días	0	0,000%	0,000%	vie 22/05/26	sáb 27/06/26	2646
2650	1.3.10.1.4.5.1.7	Fin tramo de redes de Codensa	0 días	0	0,000%	0,000%	sáb 27/06/26	sáb 27/06/26	2638;2639;2640;2
2651	**1.3.10.1.4.5.1**	**Tramo 4B Redes de Codensa (K8+150 - K8+550)**	**188,63 días**	**0**	**35,375%**	**35,375%**	**vie 12/12/25**	**mar 28/07/26**	
2652	1.3.10.1.4.5.1.1	Inicio de tramo de redes Codensa	0 días	0	0,000%	0,000%	lun 2/03/26	lun 2/03/26	2577FC-40 días;2
2653	1.3.10.1.4.5.1.2	Maniobras	20 días	0	0,000%	0,000%	mié 4/03/26	vie 27/03/26	2652FC+2 días
2654	1.3.10.1.4.5.1.3	Excavaciones	29 días	100	100,000%	100,000%	vie 12/12/25	lun 19/01/26	2638FC+545 días
2655	1.3.10.1.4.5.1.4	Canalización	30 días	100	100,000%	100,000%	lun 15/12/25	mar 20/01/26	2654CC+1 día
2656	1.3.10.1.4.5.1.5	Rellenos	30 días	100	100,000%	100,000%	mié 17/12/25	vie 23/01/26	2655CC+3 días
2657	1.3.10.1.4.5.1.6	Cajas	30 días	100	100,000%	100,000%	mié 21/01/26	mar 24/02/26	2656CC+28 días
2658	1.3.10.1.4.5.1.3	Excavaciones	30 días	0	0,000%	0,000%	lun 22/06/26	mar 28/07/26	2653CC+90 días
2659	1.3.10.1.4.5.1.4	Canalización	20 días	0	0,000%	0,000%	mié 24/06/26	vie 17/07/26	2658CC+2 días
2660	1.3.10.1.4.5.1.5	Rellenos	20 días	0	0,000%	0,000%	jue 25/06/26	mar 21/07/26	2659CC+2 días
2661	1.3.10.1.4.5.1.6	Cajas	20 días	0	0,000%	0,000%	mar 30/06/26	jue 23/07/26	2660CC+2 días
2662	1.3.10.1.4.5.1.7	Fin tramo de redes de Codensa	0 días	0	0,000%	0,000%	mar 28/07/26	mar 28/07/26	2653;2654;2655;2
2663	**1.3.10.1.4.5.1**	**Tramo 4C Redes de Codensa (K7+970 - K8+150)**	**488 días**	**0**	**34,219%**	**34,219%**	**vie 6/12/24**	**vie 10/07/26**	
2664	1.3.10.1.4.5.1.1	Inicio de tramo de redes Codensa	0 días	100	0,000%	0,000%	mar 1/07/25	mar 1/07/25	2569FC-235 días
2665	1.3.10.1.4.5.1.2	Maniobras	26 días	100	0,000%	0,000%	mar 1/07/25	mié 30/07/25	2664
2666	1.3.10.1.4.5.1.3	Excavaciones	37 días	100	100,000%	100,000%	mar 1/07/25	mié 13/08/25	2664
2667	1.3.10.1.4.5.1.4	Canalización	36 días	100	100,000%	100,000%	vie 4/07/25	jue 14/08/25	2666CC+3 días
2668	1.3.10.1.4.5.1.5	Rellenos	31 días	100	100,000%	100,000%	lun 7/07/25	mar 12/08/25	2667CC+2 días
2669	1.3.10.1.4.5.1.6	Cajas	43 días	100	100,000%	100,000%	mié 2/07/25	jue 21/08/25	2668CC-4 días
2670	1.3.10.1.4.5.1.3	Excavaciones	35 días	100	100,000%	100,000%	vie 6/12/24	sáb 18/01/25	2664CC-173 días
2671	1.3.10.1.4.5.1.4	Canalización	36 días	100	100,000%	100,000%	lun 9/12/24	mié 22/01/25	2670CC+2 días
2672	1.3.10.1.4.5.1.5	Rellenos	30 días	100	100,000%	100,000%	mié 11/12/24	vie 17/01/25	2671CC+2 días
2673	1.3.10.1.4.5.1.6	Cajas	43 días	100	100,000%	100,000%	lun 9/12/24	mié 29/01/25	2671CC
2674	1.3.10.1.4.5.1.3	Excavaciones	35 días	0	0,000%	0,000%	vie 15/05/26	sáb 27/06/26	2664CC+270 días
2675	1.3.10.1.4.5.1.4	Canalización	36 días	0	0,000%	0,000%	mar 19/05/26	jue 2/07/26	2674CC+2 días
2676	1.3.10.1.4.5.1.5	Rellenos	30 días	0	0,000%	0,000%	jue 21/05/26	vie 26/06/26	2675CC+2 días
2677	1.3.10.1.4.5.1.6	Cajas	43 días	0	0,000%	0,000%	mar 19/05/26	vie 10/07/26	2675CC

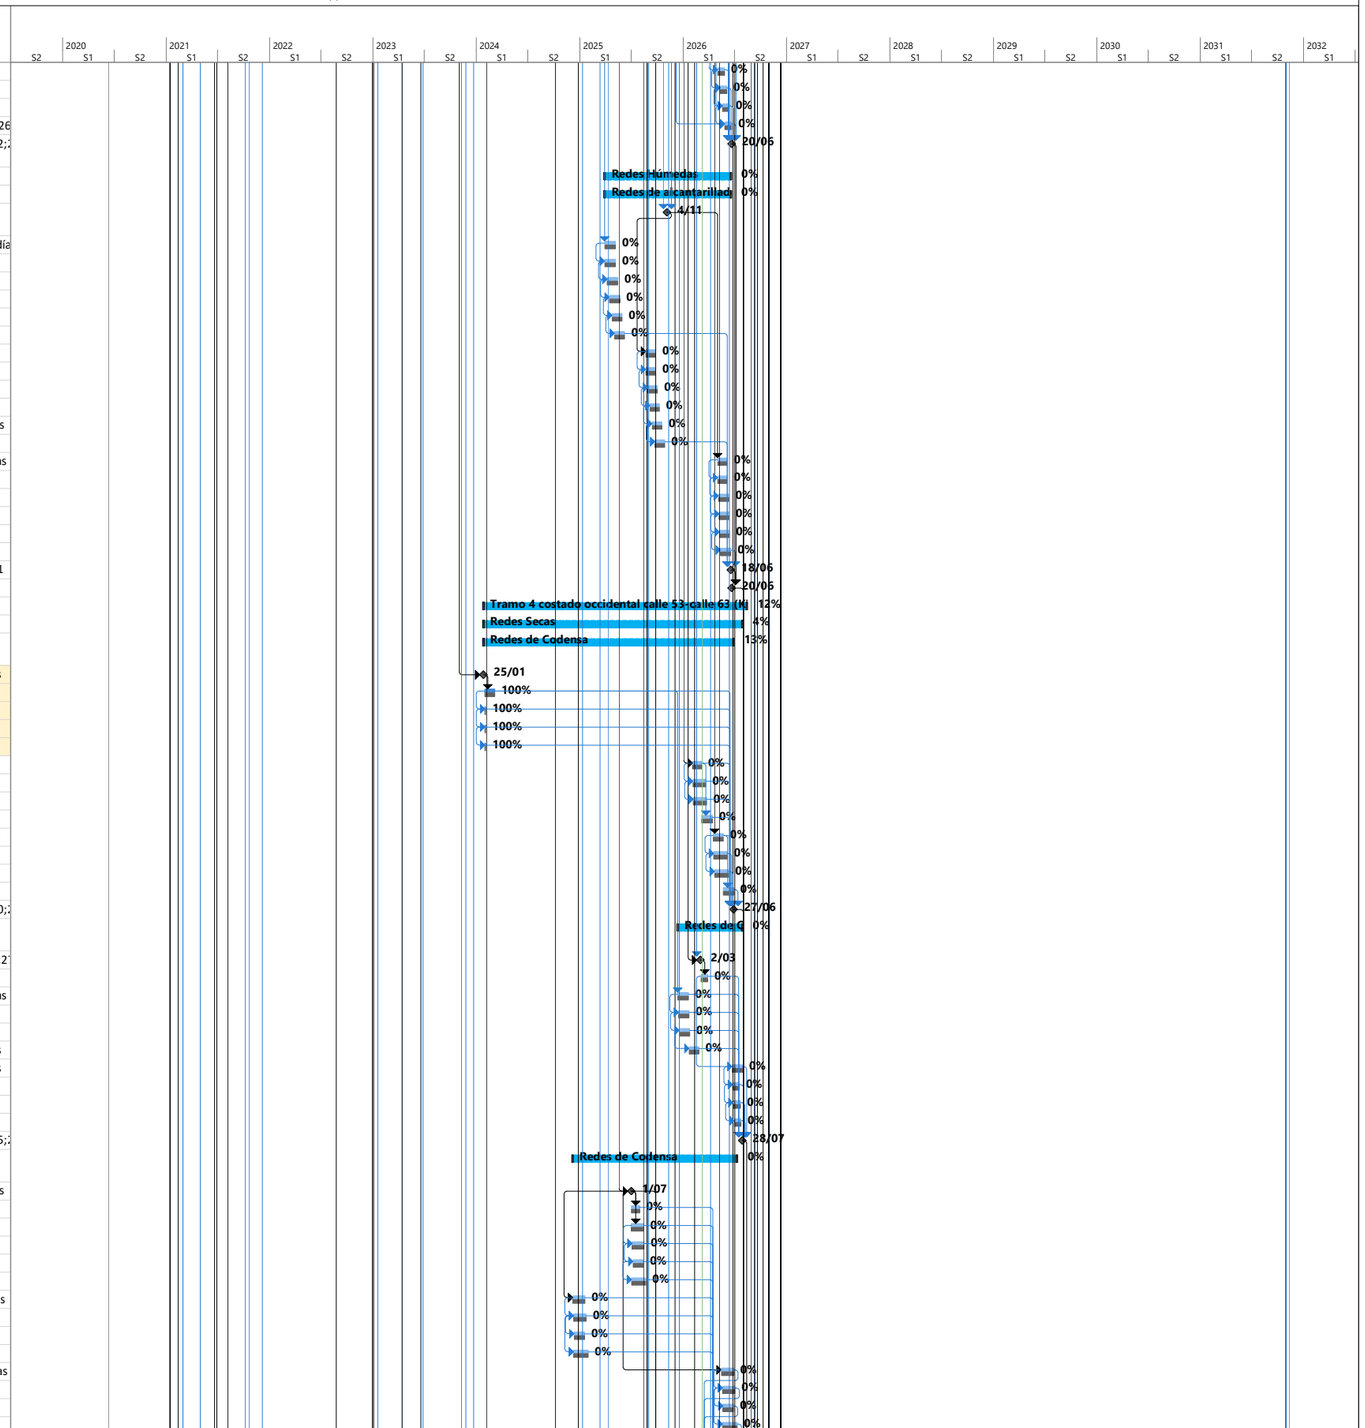


Tareas críticas · Tarea · Tarea manual · solo duración · Hito de línea base · Resumen · Tareas externas · Hito inactivo
División crítica · División · solo el comienzo · Línea base · Hito · Resumen manual · Hito externo · Resumen inactivo
Progreso de tarea crítica · Progreso de tarea · solo fin · División de la línea base · Progreso del resumen · Resumen del proyecto · Tarea inactiva · Fecha límite

Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	% Avance Conciliado	% Avance Programado (% PV)	% Avance Ejecutado conciliado (% EV))	Comienzo	Fin	Predecesoras
2678	1.3.10.1.4.5.1.7	Fin tramo de redes de Codensa	0 días	0	0,000%	0,000%	mar 28/04/26	mar 28/04/26	2665FC-60 días;2
2679	**1.3.10.1.4.5.2**	**Redes de ETB**	**735,88 días**	**0**	**40,936%**	**46,230%**	**mié 20/03/24**	**vie 14/08/26**	
2680	**1.3.10.1.4.5.2**	**Tramo 4A Redes de ETB (K8+550 - K8+980)**	**735,88 días**	**0**	**24,896%**	**38,459%**	**mié 20/03/24**	**vie 14/08/26**	
2681	1.3.10.1.4.5.2.1	Inicio tramo de redes de ETB	0 días	0	0,000%	0,000%	mié 20/03/24	mié 20/03/24	2569FC-240 días
2682	1.3.10.1.4.5.2.2	Maniobras	61,88 días	0	0,000%	0,000%	mié 20/03/24	mar 4/06/24	2681
2683	1.3.10.1.4.5.2.3	Excavaciones	10,13 días	100	100,000%	100,000%	mié 20/03/24	mié 3/04/24	2681CC
2684	1.3.10.1.4.5.2.4	Ductos	10,13 días	100	100,000%	100,000%	sáb 27/04/24	jue 9/05/24	2683CC+30 días
2685	1.3.10.1.4.5.2.9	Cárcamo	51,63 días	100	100,000%	100,000%	jue 25/07/24	lun 23/09/24	2684CC+70 días
2686	1.3.10.1.4.5.2.3	Excavaciones	60 días	100	100,000%	100,000%	mar 11/03/25	mié 21/05/25	2682FC+237 días
2687	1.3.10.1.4.5.2.4	Ductos	60 días	100	100,000%	100,000%	mar 11/03/25	mié 21/05/25	2682FC+237 días
2688	1.3.10.1.4.5.2.3	Excavaciones	30 días	100	0,000%	100,000%	vie 10/04/26	vie 15/05/26	2682FC+570 días
2689	1.3.10.1.4.5.2.4	Ductos	30 días	100	0,000%	100,000%	mar 14/04/26	mar 19/05/26	2688CC+2 días
2690	1.3.10.1.4.5.2.3	Excavaciones	30 días	0	0,000%	0,000%	mar 5/05/26	mié 10/06/26	2682FC+590 días
2691	1.3.10.1.4.5.2.4	Ductos	30 días	0	0,000%	0,000%	jue 7/05/26	vie 12/06/26	2690CC+2 días
2692	1.3.10.1.4.5.2.5	cámaras	30 días	0	0,000%	0,000%	jue 7/05/26	vie 12/06/26	2691CC;2687CC;2
2693	1.3.10.1.4.5.2.6	Demolición de canalizaciones de redes	30 días	0	0,000%	0,000%	mar 7/07/26	mié 12/08/26	2692FC+20 días
2694	1.3.10.1.4.5.2.7	Demolición de pozos, cajas y cámaras	30 días	0	0,000%	0,000%	mar 7/07/26	mié 12/08/26	2693CC
2695	1.3.10.1.4.5.2.8	Reconstrucción de cámaras	30 días	0	0,000%	0,000%	jue 9/07/26	vie 14/08/26	2694CC+2 días
2696	1.3.10.1.4.5.2.9	Cárcamo	30 días	100	0,000%	100,000%	mar 31/03/26	jue 7/05/26	2692FC-60 días
2697	1.3.10.1.4.5.2.9	Cárcamo	30 días	0	0,000%	0,000%	mar 31/03/26	jue 7/05/26	2692FC-60 días
2698	1.3.10.1.4.5.2.10	Fin tramo de redes de ETB	0 días	0	0,000%	0,000%	vie 14/08/26	vie 14/08/26	2682;2693;2694;2
2699	**1.3.10.1.4.5.2**	**Tramo 4B Redes de ETB (K8+150 - K8+550)**	**565,63 días**	**0**	**35,588%**	**35,655%**	**sáb 28/09/24**	**sáb 1/08/26**	
2700	1.3.10.1.4.5.2.1	Inicio tramo de redes de ETB	0 días	0	0,000%	0,000%	lun 30/09/24	lun 30/09/24	2698FC-190 días
2701	1.3.10.1.4.5.2.2	Maniobras	21,5 días	0	0,000%	0,000%	sáb 28/09/24	mié 23/10/24	2700CC-1 día
2702	1.3.10.1.4.5.2.3	Excavaciones	10,13 días	100	100,000%	100,000%	vie 25/10/24	mié 6/11/24	2685CC+76 días
2703	1.3.10.1.4.5.2.4	Ductos	10,63 días	100	100,000%	100,000%	lun 28/10/24	vie 8/11/24	2702CC+2 días
2704	1.3.10.1.4.5.2.9	Cárcamo	52,13 días	100	100,000%	100,000%	lun 30/09/24	vie 29/11/24	2700CC
2705	1.3.10.1.4.5.2.3	Excavaciones	30 días	100	100,000%	100,000%	lun 22/12/25	mié 28/01/26	2704FC+327 días
2706	1.3.10.1.4.5.2.4	Ductos	30 días	100	100,000%	100,000%	mié 24/12/25	vie 30/01/26	2705CC+2 días
2707	1.3.10.1.4.5.2.5	cámaras	70 días	100	39,464%	100,000%	jue 29/01/26	mar 21/04/26	2705CC-91 días;2
2708	1.3.10.1.4.5.2.8	Reconstrucción de cámaras	30 días	100	0,000%	100,000%	lun 22/06/26	mar 28/07/26	2713CC+2 días
2709	1.3.10.1.4.5.2.3	Excavaciones	30 días	0	0,000%	0,000%	vie 15/05/26	mar 23/06/26	2698FC-74 días
2710	1.3.10.1.4.5.2.4	Ductos	30 días	0	0,000%	0,000%	mié 20/05/26	mié 24/06/26	2709CC+2 días
2711	1.3.10.1.4.5.2.5	cámaras	70 días	0	39,464%	0,000%	jue 29/01/26	mar 21/04/26	2705CC-91 días;2
2712	1.3.10.1.4.5.2.6	Demolición de canalizaciones de redes	30 días	0	0,000%	0,000%	vie 19/06/26	vie 24/07/26	2703CC+25 días;2
2713	1.3.10.1.4.5.2.7	Demolición de pozos, cajas y cámaras	30 días	0	0,000%	0,000%	vie 19/06/26	vie 24/07/26	2703CC+25 días;2
2714	1.3.10.1.4.5.2.8	Reconstrucción de cámaras	30 días	0	0,000%	0,000%	lun 22/06/26	mar 28/07/26	2713CC+2 días
2715	1.3.10.1.4.5.2.9	Cárcamo	30 días	0	0,000%	0,000%	vie 26/06/26	sáb 1/08/26	2714CC+5 días
2716	1.3.10.1.4.5.2.10	Fin tramo de redes de ETB	0 días	0	0,000%	0,000%	sáb 1/08/26	sáb 1/08/26	2701;2712;2713;2
2717	**1.3.10.1.4.5.2**	**Tramo 4C Redes de ETB (K7+970 - K8+150)**	**235 días**	**0**	**79,063%**	**76,850%**	**mié 8/10/25**	**vie 17/07/26**	
2718	1.3.10.1.4.5.2.1	Inicio tramo de redes de ETB	0 días	0	0,000%	0,000%	mié 8/10/25	mié 8/10/25	2565FC-55 días;25
2719	1.3.10.1.4.5.2.2	Maniobras	15 días	0	0,000%	0,000%	mié 8/10/25	lun 27/10/25	2718CC
2720	1.3.10.1.4.5.2.3	Excavaciones	18 días	100	100,000%	100,000%	jue 9/10/25	jue 30/10/25	2719FC-14 días
2721	1.3.10.1.4.5.2.4	Ductos	18 días	100	100,000%	100,000%	sáb 11/10/25	sáb 1/11/25	2720CC+2 días
2722	1.3.10.1.4.5.2.5	cámaras	25 días	75	100,000%	75,000%	mié 15/10/25	jue 13/11/25	2721CC+2 días
2723	1.3.10.1.4.5.2.6	Demolición de canalizaciones de redes	30 días	0	0,000%	0,000%	jue 4/06/26	sáb 11/07/26	2718FC+200 días
2724	1.3.10.1.4.5.2.7	Demolición de pozos, cajas y cámaras	5 días	0	0,000%	0,000%	sáb 11/07/26	vie 17/07/26	2722FC+200 días
2725	1.3.10.1.4.5.2.8	Reconstrucción de cámaras	5 días	0	0,000%	0,000%	sáb 11/07/26	vie 17/07/26	2722FC+200 días
2726	1.3.10.1.4.5.2.9	Cárcamo	15 días	0	0,000%	0,000%	mié 24/06/26	sáb 11/07/26	2719FC+200 días
2727	1.3.10.1.4.5.2.10	Fin tramo de redes de ETB	0 días	0	0,000%	0,000%	vie 17/07/26	vie 17/07/26	2719;2723;2724;2
2728	1.3.10.1.4.6	Fin redes Tramo 4	0 días	0	0,000%	0,000%	vie 14/08/26	vie 14/08/26	2633;2596;2650;2
2729	**1.3.10.1.5**	**Tramo 5 costado oriental calle 46-calle 53 (K7+915 - K7+970)**	**955,75 días**	**0**	**86,190%**	**88,776%**	**mié 26/04/23**	**sáb 6/06/26**	
2730	**1.3.10.1.5.1**	**Actividades Silviculturales resolución 2354**	**113 días**	**0**	**0,000%**	**0,000%**	**vie 10/01/25**	**jue 22/05/25**	
2731	**1.3.10.1.5.1.2**	**Talas**	**113 días**	**0**	**0,000%**	**0,000%**	**vie 10/01/25**	**jue 22/05/25**	
2732	1.3.10.1.5.1.2.1	actividades posteriores a la medida cautelar	113 días	0	0,000%	0,000%	vie 10/01/25	jue 22/05/25	8FC+1200 días
2733	1.3.10.1.5.2	Inicio de Redes Tramo 5	0 días	0	0,000%	0,000%	mié 26/04/23	mié 26/04/23	2184FC+651 días
2734	1.3.10.1.7.3	INSTALACION DE RED SANITARIA GRUPO 5	0 días	0	0,000%	0,000%	mié 9/04/25	mié 9/04/25	2733FC+600 días
2735	**1.3.10.1.5.3**	**Redes Húmedas**	**936,25 días**	**0**	**99,823%**	**99,780%**	**mar 16/05/23**	**mar 2/06/26**	
2736	**1.3.10.1.5.3.1**	**Redes de Acueducto**	**906,38 días**	**0**	**90,739%**	**88,521%**	**mar 16/05/23**	**lun 27/04/26**	
2737	**1.3.10.1.5.3.1.1**	**Tramo de redes de acueducto (K7+915-K7+940)**	**0 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**sáb 1/07/23**	**sáb 1/07/23**	
2738	1.3.10.1.5.3.1.1.1	Inicio tramo de redes de acueducto	0 días	100	0,000%	0,000%	sáb 1/07/23	sáb 1/07/23	2734CC-548 días
2739	1.3.10.1.5.3.1.1.2	Excavaciones	0 días	100	100,000%	100,000%	sáb 1/07/23	sáb 1/07/23	2738CC
2740	1.3.10.1.5.3.1.1.3	Tuberías	0 días	100	100,000%	100,000%	sáb 1/07/23	sáb 1/07/23	2738CC
2741	1.3.10.1.5.3.1.1.4	Accesorios	0 días	100	100,000%	100,000%	sáb 1/07/23	sáb 1/07/23	2738CC+400 días
2742	1.3.10.1.5.3.1.1.5	Empates	0 días	100	100,000%	100,000%	sáb 1/07/23	sáb 1/07/23	2738CC
2743	1.3.10.1.5.3.1.1.6	rellenos	0 días	100	100,000%	100,000%	sáb 1/07/23	sáb 1/07/23	2738CC
2744	1.3.10.1.5.3.1.1.7	Hidrantes	0 días	100	100,000%	100,000%	sáb 1/07/23	sáb 1/07/23	2738CC
2745	1.3.10.1.5.3.1.1.8	Fin tramo de redes de acueducto	0 días	100	0,000%	0,000%	sáb 1/07/23	sáb 1/07/23	2739;2740;2741;2
2746	**1.3.10.1.5.3.1.1**	**Tramo de redes de acueducto (K7+940-K7+970)**	**906,38 días**	**0**	**83,021%**	**78,954%**	**mar 16/05/23**	**lun 27/04/26**	
2747	1.3.10.1.5.3.1.1.1	Inicio tramo de redes de acueducto	0 días	100	0,000%	0,000%	mar 16/05/23	mar 16/05/23	2738CC-37 días
2748	1.3.10.1.5.3.1.1.2	Excavaciones	4,38 días	100	100,000%	100,000%	mar 16/05/23	vie 19/05/23	2747CC
2749	1.3.10.1.5.3.1.1.3	Tuberías	3,88 días	100	100,000%	100,000%	sáb 20/05/23	jue 25/05/23	2748CC+4 días

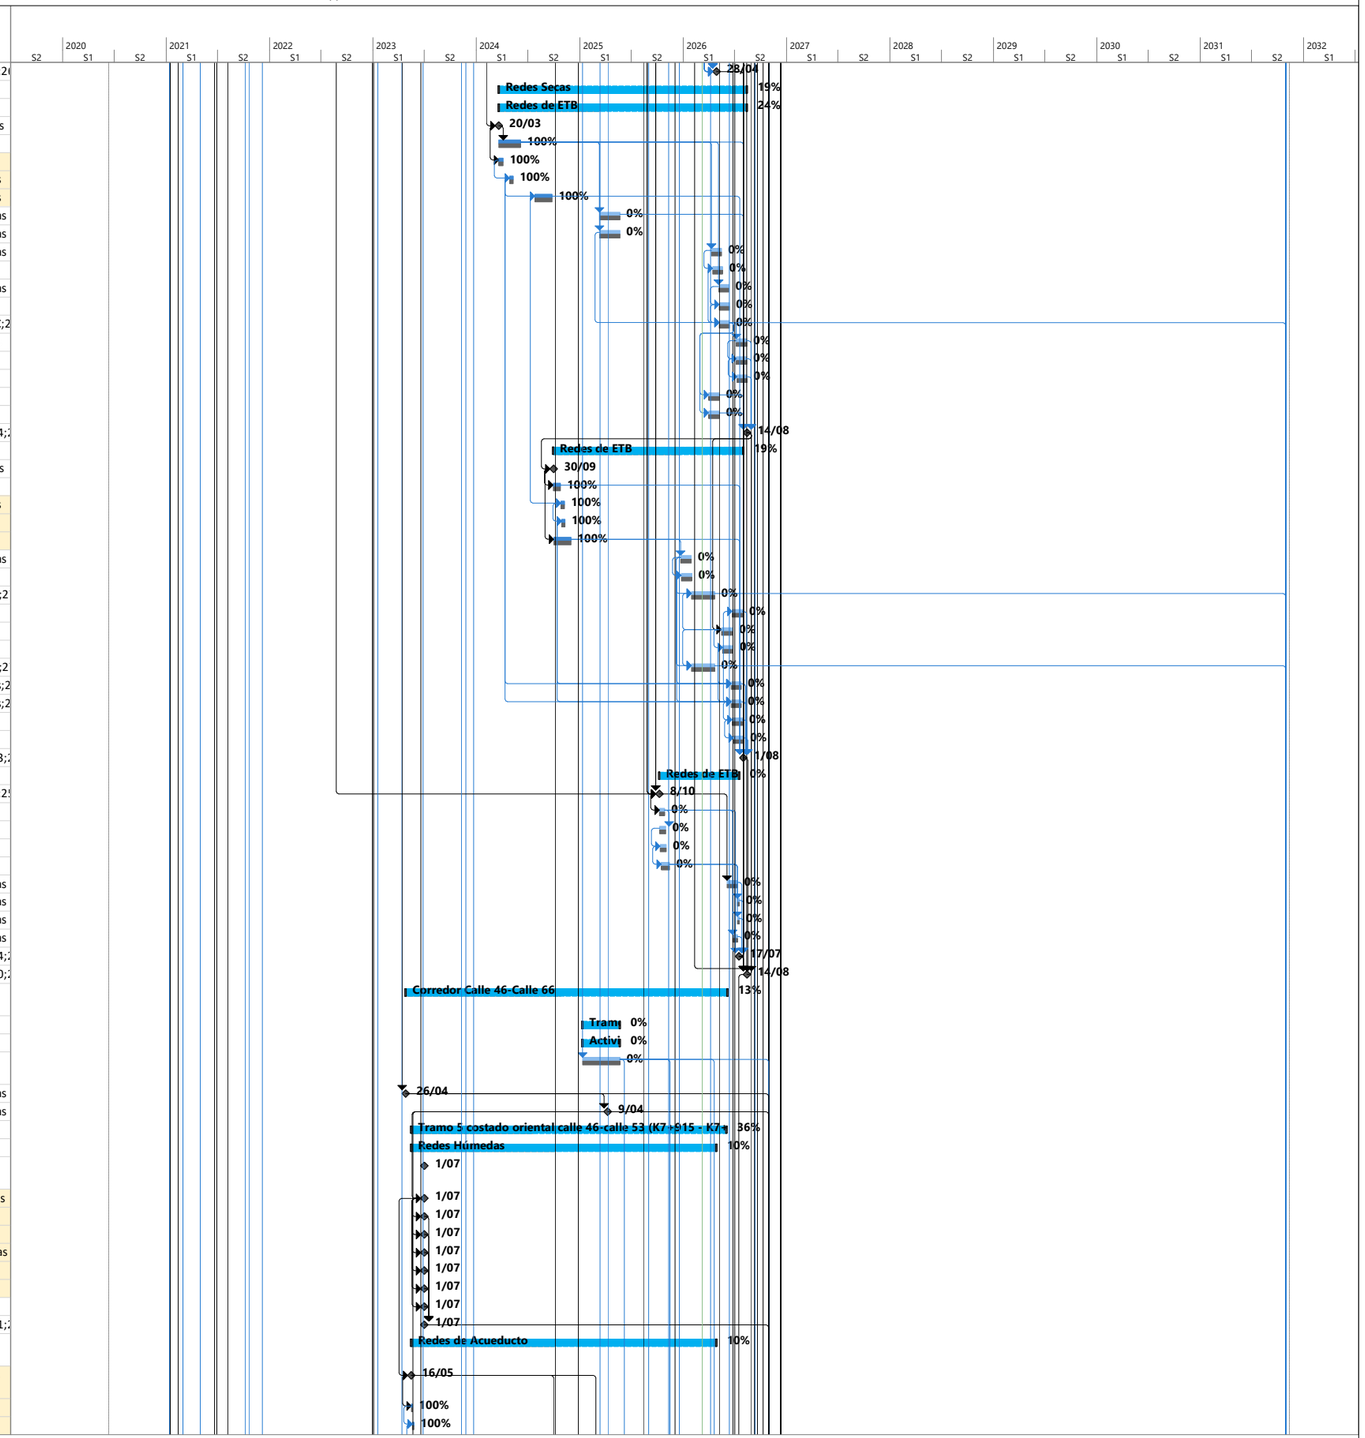


Tareas críticas — Tarea — Tarea manual — solo duración — Hito de línea base — Resumen — Tareas externas — Hito inactivo
División crítica — División — solo el comienzo — Línea base — Hito — Resumen manual — Hito externo — Resumen inactivo
Progreso de tarea crítica — Progreso de tarea — solo fin — División de la línea base — Progreso del resumen — Resumen del proyecto — Tarea inactiva — Fecha límite

Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	% Avance Conciliado	% Avance Programado (% PV)	% Avance Ejecutado conciliado (% EV)	Comienzo	Fin	Predecesoras
2750	1.3.10.1.5.3.1.1.6	rellenos	3,88 días	100	100,000%	100,000%	mié 31/05/23	sáb 3/06/23	2749CC+8 días
2751	1.3.10.1.7.4.1.2.5	Excavaciones	101 días	100	100,000%	100,000%	lun 30/09/24	mar 28/01/25	2747FC+405 días;
2752	1.3.10.1.5.3.1.1.3	Tuberías	3 días	100	100,000%	100,000%	vie 24/01/25	mar 28/01/25	2751FC-3 días
2753	1.3.10.1.5.3.1.1.4	Accesorios	2 días	80	100,000%	80,000%	mié 7/01/26	jue 8/01/26	2752CC+293 días
2754	1.3.10.1.5.3.1.1.5	Empates	1 día	0	0,000%	0,000%	mié 22/04/26	jue 23/04/26	2753CC+90 días
2755	1.3.10.1.5.3.1.1.6	rellenos	3 días	100	100,000%	100,000%	mié 26/02/25	sáb 1/03/25	2747FC+532 días;
2756	1.3.10.1.5.3.1.1.7	Hidrantes	3 días	0	0,000%	0,000%	jue 23/04/26	lun 27/04/26	2755FC+253 días;
2757	1.3.10.1.5.3.1.1.8	Fin tramo de redes de acueducto	0 días	0	0,000%	0,000%	lun 27/04/26	lun 27/04/26	2756
2758	**1.3.10.1.5.3.2**	**Redes de alcantarillado sanitario**	**897 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**mar 4/07/23**	**mar 2/06/26**	
2759	**1.3.10.1.5.3.2.1**	**Tramo de redes de alcantarillado sanitario (K7+915-K7+950)**	**461,25 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**mar 4/07/23**	**jue 2/01/25**	
2760	1.3.10.1.5.3.2.1.1	Inicio tramo redes de alcantarillado sanitario	0 días	100	0,000%	0,000%	mar 4/07/23	mar 4/07/23	2734CC-547 días
2761	1.3.10.1.5.3.2.1.2	Excavaciones	2,75 días	100	100,000%	100,000%	jue 6/07/23	sáb 8/07/23	2760FC+2 días
2762	1.3.10.1.5.3.2.1.3	Entibados	2,75 días	100	100,000%	100,000%	sáb 8/07/23	mar 11/07/23	2761CC+2 días
2763	1.3.10.1.5.3.2.1.4	Tuberías	3,25 días	100	100,000%	100,000%	mar 11/07/23	jue 13/07/23	2762CC+2 días
2764	1.3.10.1.5.3.2.1.5	Rellenos	2,75 días	100	100,000%	100,000%	jue 13/07/23	sáb 15/07/23	2763FC-1 día
2765	1.3.10.1.5.3.2.1.6	Pozos de inspección y/o cámaras	9 días	100	100,000%	100,000%	vie 20/12/24	jue 2/01/25	2764FC+441 días
2766	1.3.10.1.5.3.2.1.2	Excavaciones	3 días	100	100,000%	100,000%	mar 2/04/24	vie 5/04/24	2760FC+230 días
2767	1.3.10.1.5.3.2.1.3	Entibados	2 días	100	100,000%	100,000%	vie 5/04/24	lun 8/04/24	2766CC+3 días
2768	1.3.10.1.5.3.2.1.4	Tuberías	2 días	100	100,000%	100,000%	mar 9/04/24	jue 11/04/24	2767FC+1 día
2769	1.3.10.1.5.3.2.1.5	Rellenos	2 días	100	100,000%	100,000%	vie 12/04/24	lun 15/04/24	2768FC+1 día
2770	1.3.10.1.5.3.2.1.6	Pozos de inspección y/o cámaras	10 días	100	100,000%	100,000%	mar 16/04/24	vie 26/04/24	2769FC+1 día
2771	1.3.10.1.5.3.2.1.7	Fin tramo de redes alcantarillado sanitario	0 días	0	0,000%	0,000%	jue 2/01/25	jue 2/01/25	2770;2765
2772	**1.3.10.1.5.3.2.1**	**Tramo de redes de alcantarillado sanitario (K7+950-K7+970)**	**315 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**vie 23/05/25**	**mar 2/06/26**	
2773	1.3.10.1.5.3.2.1.1	Inicio tramo redes de alcantarillado sanitario	0 días	0	0,000%	0,000%	mar 2/06/26	mar 2/06/26	2859FC-4 días;2771FC-4
2774	1.3.10.1.5.3.2.1.2	Excavaciones	0,1 días	100	100,000%	100,000%	vie 23/05/25	vie 23/05/25	2773FC-315 días
2775	1.3.10.1.5.3.2.1.3	Entibados	1,5 días	100	100,000%	100,000%	sáb 24/05/25	mar 27/05/25	2774FC+1 día
2776	1.3.10.1.5.3.2.1.4	Tuberías	1,5 días	100	100,000%	100,000%	mié 28/05/25	jue 29/05/25	2775FC+1 día
2777	1.3.10.1.5.3.2.1.5	Rellenos	0,5 días	100	100,000%	100,000%	vie 30/05/25	vie 30/05/25	2776FC+1 día
2778	1.3.10.1.5.3.2.1.6	Pozos de inspección y/o cámaras	1 día	100	100,000%	100,000%	jue 29/05/25	vie 30/05/25	2777FC-1 día
2779	**1.3.10.1.5.3.3**	**Redes de alcantarillado Pluvial**	**420 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**mar 10/10/23**	**jue 20/02/25**	
2780	**1.3.10.1.5.3.3.1**	**Tramo de redes de alcantarillado pluvial (K7+915-K7+950)**	**420 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**mar 10/10/23**	**jue 20/02/25**	
2781	1.3.10.1.5.3.3.1.1	Inicio tramo de redes de alcantarillado pluvial	0 días	100	0,000%	0,000%	mar 10/10/23	mar 10/10/23	2760FC+71 días;2764FC+71
2782	1.3.10.1.5.3.3.1.2	Excavaciones	4,38 días	100	100,000%	100,000%	mar 10/10/23	vie 13/10/23	2781CC-1 día
2783	1.3.10.1.5.3.3.1.3	Entibados	4,38 días	100	100,000%	100,000%	mar 10/10/23	vie 13/10/23	2781CC-1 día;278
2784	1.3.10.1.5.3.3.1.4	Tuberías	4,38 días	100	100,000%	100,000%	mar 10/10/23	vie 13/10/23	2781CC-1 día
2785	1.3.10.1.5.3.3.1.5	Rellenos	3,25 días	100	100,000%	100,000%	mar 10/10/23	jue 12/10/23	2781CC-1 día;278
2786	1.3.10.1.5.3.3.1.6	Pozos de inspección y/o cámaras	20,38 días	100	100,000%	100,000%	mié 1/11/23	sáb 25/11/23	2781CC+17 días;2
2787	1.3.10.1.5.3.3.1.6	Sumideros	21,38 días	100	100,000%	100,000%	mar 16/07/24	vie 9/08/24	2785CC+207 días;
2788	1.3.10.1.5.3.3.1.2	Excavaciones	4 días	100	100,000%	100,000%	lun 13/01/25	jue 16/01/25	2787FC-14 días;2
2789	1.3.10.1.5.3.3.1.3	Entibados	4 días	100	100,000%	100,000%	lun 13/01/25	jue 16/01/25	2788CC
2790	1.3.10.1.5.3.3.1.4	Tuberías	4 días	100	100,000%	100,000%	lun 13/01/25	jue 16/01/25	2789CC
2791	1.3.10.1.5.3.3.1.5	Rellenos	2 días	100	100,000%	100,000%	jue 16/01/25	sáb 18/01/25	2790CC+4 días
2792	1.3.10.1.5.3.3.1.6	Pozos de inspección y/o cámaras	14 días	100	100,000%	100,000%	vie 17/01/25	lun 3/02/25	2791CC+1 día
2793	1.3.10.1.5.3.3.1.6	Sumideros	15 días	100	100,000%	100,000%	mar 4/02/25	jue 20/02/25	2791CC+1 día;279
2794	1.3.10.1.5.3.3.1.8	Fin tramo de redes de alcantarillado pluvial	0 días	0	0,000%	0,000%	jue 20/02/25	jue 20/02/25	2793
2795	**1.3.10.1.5.3.3.1**	**Tramo de redes de alcantarillado pluvial (K7+950-K7+970)**	**383,5 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**mié 25/10/23**	**vie 24/01/25**	
2796	1.3.10.1.5.3.3.1.1	Inicio tramo de redes de alcantarillado pluvial	0 días	100	0,000%	0,000%	mié 25/10/23	mié 25/10/23	2773CC-428 días;2794FC-428
2797	1.3.10.1.5.3.3.1.2	Excavaciones	2,13 días	100	100,000%	100,000%	mié 25/10/23	jue 26/10/23	2796CC
2798	1.3.10.1.5.3.3.1.3	Entibados	2,13 días	100	100,000%	100,000%	mié 25/10/23	jue 26/10/23	2797CC
2799	1.3.10.1.5.3.3.1.4	Tuberías	2,13 días	100	100,000%	100,000%	mié 25/10/23	jue 26/10/23	2798CC
2800	1.3.10.1.5.3.3.1.5	Rellenos	1 día	100	100,000%	100,000%	mié 25/10/23	mié 25/10/23	2799CC
2801	1.3.10.1.5.3.3.1.6	Pozos de inspección y/o cámaras	10,13 días	100	100,000%	100,000%	jue 26/10/23	mar 7/11/23	2800CC+1 día
2802	1.3.10.1.5.3.3.1.7	Sumideros	7,25 días	100	100,000%	100,000%	mar 7/11/23	mié 15/11/23	2801CC+9 días
2803	1.3.10.1.5.3.3.1.2	Excavaciones	1 día	100	100,000%	100,000%	vie 17/01/25	sáb 18/01/25	2787FC-9 días;27
2804	1.3.10.1.5.3.3.1.3	Entibados	1 día	100	100,000%	100,000%	lun 20/01/25	mar 21/01/25	2788CC+7 días
2805	1.3.10.1.5.3.3.1.4	Tuberías	1 día	100	100,000%	100,000%	jue 23/01/25	vie 24/01/25	2789CC+10 días
2806	1.3.10.1.5.3.3.1.5	Rellenos	0,5 días	100	100,000%	100,000%	jue 23/01/25	jue 23/01/25	2805CC
2807	1.3.10.1.5.3.3.1.8	Fin tramo de redes de alcantarillado pluvial	0 días	0	0,000%	0,000%	vie 24/01/25	vie 24/01/25	2802;2806;2803;
2808	**1.3.10.1.5.4**	**Redes Secas**	**503,13 días**	**0**	**47,317%**	**57,396%**	**vie 18/10/24**	**sáb 6/06/26**	
2809	**1.3.10.1.7.5.1**	**Redes Codensa**	**490,13 días**	**0**	**57,102%**	**76,649%**	**vie 18/10/24**	**vie 22/05/26**	
2810	**1.3.10.1.5.4.1**	**Redes de Codensa (K7+915-K7+940)**	**339 días**	**0**	**98,560%**	**98,560%**	**lun 14/04/25**	**vie 22/05/26**	
2811	1.3.10.1.5.4.1.1	Inicio tramo redes de Codensa	0 días	0	0,000%	0,000%	mar 26/08/25	mar 26/08/25	1105FC+726 días
2812	1.3.10.1.5.4.1.2	Maniobras	8 días	0	0,000%	0,000%	mié 27/08/25	jue 4/09/25	2811FC+1 día
2813	1.3.10.1.5.4.1.3	Excavaciones	13 días	100	100,000%	100,000%	lun 14/04/25	mié 30/04/25	2812FC-120 días
2814	1.3.10.1.5.4.1.4	Canalización	12 días	100	100,000%	100,000%	lun 14/04/25	mié 30/04/25	2813CC+1 día
2815	1.3.10.1.5.4.1.5	Rellenos	18 días	100	100,000%	100,000%	mar 15/04/25	vie 9/05/25	2814CC+1 día
2816	1.3.10.1.5.4.1.6	Cajas	28 días	100	100,000%	100,000%	mié 7/01/26	lun 9/02/26	2811CC+114 días

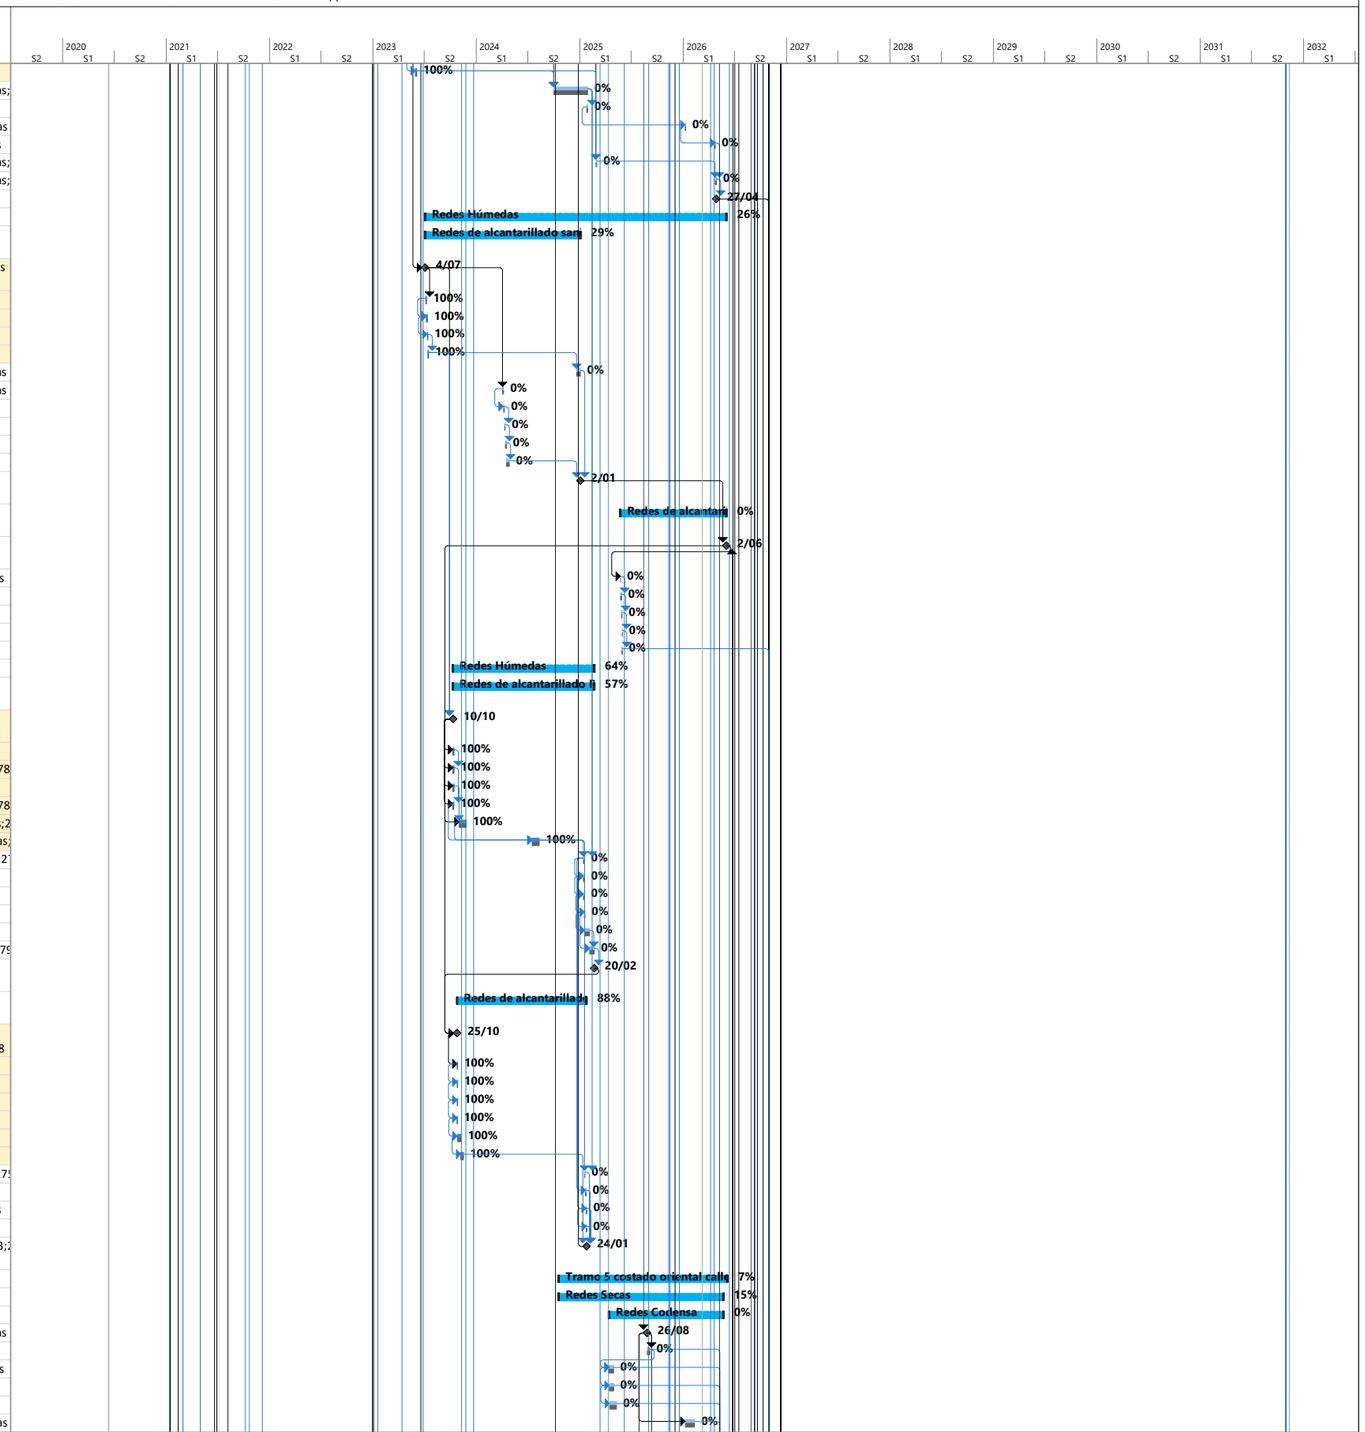


Tareas críticas · Tarea · Tarea manual · solo duración · Hito de línea base · Resumen · Tareas externas · Hito inactivo
División crítica · División · solo el comienzo · Línea base · Hito · Resumen manual · Hito externo · Resumen inactivo
Progreso de tarea crítica · Progreso de tarea · solo fin · División de la línea base · Progreso del resumen · Resumen del proyecto · Tarea inactiva · Fecha límite

Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	% Avance Conciliado	% Avance Programado (% PV)	% Avance Ejecutado conciliado (% EV))	Comienzo	Fin	Predecesoras
2817	1.3.10.1.5.4.1.6	Cajas	28 días	0	0,000%	0,000%	lun 20/04/26	vie 22/05/26	2811CC+200 días
2818	1.3.10.1.5.4.1.7	Fin tramo de redes de Codensa	0 días	0	0,000%	0,000%	vie 22/05/26	vie 22/05/26	2812;2813;2814;2
2819	**1.3.10.1.5.4.1**	**Redes de Codensa (K7+940-K7+970)**	**474,13 días**	**0**	**22,555%**	**58,390%**	**vie 18/10/24**	**lun 4/05/26**	
2820	1.3.10.1.5.4.1.1	Inicio tramo redes de Codensa	0 días	100	0,000%	0,000%	vie 18/10/24	vie 18/10/24	1106FC+357 días
2821	1.3.10.1.5.4.1.2	Maniobras	17,5 días	100	0,000%	0,000%	vie 18/10/24	jue 7/11/24	2820CC-1 día
2822	1.3.10.1.5.4.1.3	Excavaciones	18,63 días	100	100,000%	100,000%	vie 18/10/24	vie 8/11/24	2820CC-1 día
2823	1.3.10.1.5.4.1.4	Canalización	20,38 días	100	100,000%	100,000%	vie 18/10/24	mar 12/11/24	2822CC
2824	1.3.10.1.5.4.1.3	Excavaciones	60 días	100	44,375%	100,000%	vie 30/01/26	vie 10/04/26	2818FC-95 días
2825	1.3.10.1.5.4.1.4	Canalización	19 días	100	100,000%	100,000%	mar 3/02/26	mar 24/02/26	2824CC+3 días
2826	1.3.10.1.5.4.1.5	Rellenos	24 días	100	90,104%	100,000%	jue 5/02/26	mié 4/03/26	2825CC+2 días
2827	1.3.10.1.5.4.1.6	Cajas	28 días	100	0,000%	100,000%	mar 3/03/26	mar 7/04/26	2826FC-1 día
2828	1.3.10.1.5.4.1.3	Excavaciones	9 días	0	0,000%	0,000%	sáb 28/03/26	jue 9/04/26	2824FC-10 días
2829	1.3.10.1.5.4.1.4	Canalización	10 días	0	0,000%	0,000%	mié 1/04/26	mar 14/04/26	2828CC+3 días
2830	1.3.10.1.5.4.1.5	Rellenos	24 días	0	0,000%	0,000%	lun 6/04/26	lun 4/05/26	2829CC+2 días
2831	1.3.10.1.5.4.1.6	Cajas	45 días	100	61,389%	100,000%	jue 29/01/26	vie 20/03/26	2830FC-80 días
2832	1.3.10.1.5.4.1.7	Fin tramo de redes de Codensa	0 días	0	0,000%	0,000%	lun 4/05/26	lun 4/05/26	2824;2825;2826;2
2833	**1.3.10.1.7.5.2**	**Redes ETB**	**371 días**	**0**	**38,650%**	**40,345%**	**vie 21/03/25**	**sáb 6/06/26**	
2834	**1.3.10.1.5.4.2**	**Redes de ETB (K7+915-K7+940)**	**358 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**vie 21/03/25**	**vie 22/05/26**	
2835	1.3.10.1.5.4.2.1	Inicio tramo redes de ETB	0 días	0	0,000%	0,000%	vie 22/05/26	vie 22/05/26	2818
2836	1.3.10.1.5.4.2.8	Reconstrucción de cámaras	10 días	100	100,000%	100,000%	vie 21/03/25	jue 3/04/25	2835FC-358 días
2837	1.3.10.1.5.4.2.10	Fin tramo redes de ETB	0 días	0	0,000%	0,000%	mié 2/04/25	mié 2/04/25	2836FC-1 día
2838	**1.3.10.1.5.4.2**	**Redes de ETB (K7+940-K7+970)**	**250 días**	**0**	**38,014%**	**39,726%**	**jue 14/08/25**	**sáb 6/06/26**	
2839	1.3.10.1.5.4.2.1	Inicio tramo redes de ETB	0 días	0	0,000%	0,000%	mar 26/08/25	mar 26/08/25	2811
2840	1.3.10.1.5.4.2.2	Maniobras	18 días	0	0,000%	0,000%	mié 18/02/26	mar 10/03/26	2839FC+150 días
2841	1.3.10.1.5.4.2.3	Excavaciones	18 días	100	100,000%	100,000%	jue 14/08/25	jue 4/09/25	2839FC-9 días
2842	1.3.10.1.5.4.2.4	Ductos	18 días	100	100,000%	100,000%	jue 14/08/25	jue 4/09/25	2839FC-9 días
2843	1.3.10.1.5.4.2.5	Cámaras	18 días	100	100,000%	100,000%	jue 21/08/25	mié 10/09/25	2842CC+5 días
2844	1.3.10.1.5.4.2.6	Demolición de canalizaciones de redes	25 días	100	100,000%	100,000%	jue 14/08/25	vie 12/09/25	2839FC-9 días
2845	1.3.10.1.5.4.2.9	Cárcamos	14 días	100	97,321%	100,000%	vie 13/02/26	lun 2/03/26	2844FC+130 días
2846	1.3.10.1.5.4.2.3	Excavaciones	31 días	100	82,661%	100,000%	sáb 31/01/26	vie 6/03/26	2839FC+134 días
2847	1.3.10.1.5.4.2.4	Teledirigidos	30 días	100	78,750%	100,000%	mar 3/02/26	lun 9/03/26	2846CC+2 días;28
2848	1.3.10.1.5.4.2.4	Ductos	18 días	100	100,000%	100,000%	mar 3/02/26	lun 23/02/26	2846CC+2 días;28
2849	1.3.10.1.5.4.2.5	Cámaras	18 días	100	100,000%	100,000%	jue 5/02/26	mié 25/02/26	2848CC+2 días;28
2850	1.3.10.1.5.4.2.6	Demolición de canalizaciones de redes	25 días	100	100,000%	100,000%	mié 7/01/26	jue 5/02/26	2849CC-24 días
2851	1.3.10.1.5.4.2.9	Cárcamos	13 días	100	97,115%	100,000%	sáb 14/02/26	lun 2/03/26	2849FC-9 días;284
2852	1.3.10.1.5.4.2.3	Excavaciones	31 días	0	0,000%	0,000%	mar 31/03/26	vie 8/05/26	2839FC+185 días
2853	1.3.10.1.5.4.2.4	Teledirigidos	30 días	0	0,000%	0,000%	sáb 4/04/26	vie 8/05/26	2852CC+2 días;28
2854	1.3.10.1.5.4.2.4	Ductos	18 días	0	0,000%	0,000%	sáb 4/04/26	vie 24/04/26	2852CC+2 días;28
2855	1.3.10.1.5.4.2.6	Demolición de canalizaciones de redes	25 días	0	0,000%	0,000%	vie 24/04/26	lun 25/05/26	2854
2856	1.3.10.1.5.4.2.7	Demolición de pozos, cajas y cámaras	25 días	0	0,000%	0,000%	jue 7/05/26	vie 5/06/26	2850CC+10 días;2
2857	1.3.10.1.5.4.2.8	Reconstrucción de cámaras	26 días	0	0,000%	0,000%	jue 7/05/26	sáb 6/06/26	2856CC
2858	1.3.10.1.5.4.2.9	Cárcamos	13 días	0	0,000%	0,000%	vie 13/03/26	lun 30/03/26	2849FC+15 días;2
2859	1.3.10.1.5.4.2.10	Fin tramo redes de ETB	0 días	0	0,000%	0,000%	sáb 6/06/26	sáb 6/06/26	2840;2846;2848;2
2860	1.3.10.1.5.5	Fin redes - Tramo 5	0 días	0	0,000%	0,000%	sáb 6/06/26	sáb 6/06/26	2859;2837;2832;2
2861	**1.3.10.1.6**	**Tramo 6 costado occidental calle 46-calle 53 (K7+915 - K7+970)**	**955,05 días**	**0**	**55,762%**	**52,337%**	**jue 15/06/23**	**lun 27/07/26**	
2862	1.3.10.1.6.1	inicio de Redes Tramo 6	0 días	0	0,000%	0,000%	mar 25/02/25	mar 25/02/25	130
2863	**1.3.10.1.6.2**	**Redes Húmedas**	**940,93 días**	**0**	**15,798%**	**15,798%**	**sáb 1/07/23**	**lun 27/07/26**	
2864	**1.3.10.1.6.2.1**	**Redes de Acueducto**	**551 días**	**0**	**89,426%**	**89,426%**	**vie 6/09/24**	**lun 22/06/26**	
2865	**1.3.10.1.6.2.1.1**	**Tramo de redes de acueducto**	**551 días**	**0**	**89,426%**	**89,426%**	**vie 6/09/24**	**lun 22/06/26**	
2866	1.3.10.1.6.2.1.1.1	Inicio tramo de redes de acueducto	0 días	0	0,000%	0,000%	sáb 19/04/25	sáb 19/04/25	2862CC+45 días
2867	1.3.10.1.6.2.1.1.2	Excavaciones	30 días	100	100,000%	100,000%	jue 19/06/25	vie 25/07/25	2866FC+52 días
2868	1.3.10.1.6.2.1.1.3	Tuberías	30 días	100	100,000%	100,000%	sáb 21/06/25	lun 28/07/25	2867CC+2 días
2869	1.3.10.1.6.2.1.1.4	Accesorios	30 días	100	100,000%	100,000%	vie 6/09/24	jue 10/10/24	2866FC-191 días
2870	1.3.10.1.6.2.1.1.4	Accesorios	30 días	0	0,000%	0,000%	vie 10/04/26	vie 15/05/26	2866FC+300 días
2871	1.3.10.1.6.2.1.1.5	Empates	30 días	0	0,000%	0,000%	vie 15/05/26	lun 22/06/26	2869CC+220 días;
2872	1.3.10.1.6.2.1.1.6	Rellenos	30 días	100	100,000%	100,000%	mié 30/04/25	jue 5/06/25	2869FC+170 días
2873	1.3.10.1.6.2.1.1.7	Hidrantes	30 días	100	100,000%	100,000%	mié 28/05/25	vie 4/07/25	2872FC-6 días
2874	1.3.10.1.6.2.1.1.8	Fin tramo de redes de acueducto	0 días	0	0,000%	0,000%	lun 22/06/26	lun 22/06/26	2866;2867;2869;2
2875	**1.3.10.1.6.2.2**	**Redes de alcantarillado sanitario**	**863,75 días**	**0**	**20,861%**	**20,861%**	**mié 9/08/23**	**vie 29/05/26**	
2876	**1.3.10.1.6.2.2.1**	**Tramo de redes de alcantarillado sanitario**	**863,75 días**	**0**	**20,861%**	**20,861%**	**mié 9/08/23**	**vie 29/05/26**	
2877	1.3.10.1.6.2.2.1.1	Inicio tramo redes de alcantarillado sanitario	0 días	100	0,000%	0,000%	mié 9/08/23	mié 9/08/23	793CC-564 días
2878	1.3.10.1.6.2.2.1.2	Excavaciones	41,38 días	100	100,000%	100,000%	mié 9/08/23	lun 25/09/23	2877CC
2879	1.3.10.1.6.2.2.1.3	Entibados	41,38 días	100	100,000%	100,000%	mié 9/08/23	lun 25/09/23	2878CC
2880	1.3.10.1.6.2.2.1.4	Tuberías	41,38 días	100	100,000%	100,000%	mié 9/08/23	lun 25/09/23	2878CC;2879
2881	1.3.10.1.6.2.2.1.5	Rellenos	41,38 días	100	100,000%	100,000%	mié 9/08/23	lun 25/09/23	2878CC;2880
2882	1.3.10.1.6.2.2.1.2	Excavaciones	35 días	100	100,000%	100,000%	jue 18/12/25	jue 29/01/26	170FC+37 días
2883	1.3.10.1.6.2.2.1.3	Entibados	38 días	100	100,000%	100,000%	jue 18/12/25	lun 2/02/26	2882CC
2884	1.3.10.1.6.2.2.1.4	Tuberías	40 días	100	100,000%	100,000%	vie 26/12/25	jue 12/02/26	2883CC+7 días
2885	1.3.10.1.6.2.2.1.5	Rellenos	40 días	100	100,000%	100,000%	mar 6/01/26	vie 20/02/26	2884CC+8 días
2886	1.3.10.1.6.2.2.1.2	Excavaciones	25 días	0	0,000%	0,000%	vie 10/04/26	lun 11/05/26	2877FC-60 días;2
2887	1.3.10.1.6.2.2.1.3	Entibados	30 días	0	0,000%	0,000%	vie 10/04/26	vie 15/05/26	2886CC
2888	1.3.10.1.6.2.2.1.4	Tuberías	30 días	0	0,000%	0,000%	mar 14/04/26	mar 19/05/26	2887CC+2 días
2889	1.3.10.1.6.2.2.1.5	Rellenos	30 días	0	0,000%	0,000%	mié 15/04/26	jue 21/05/26	2888CC+2 días
2890	1.3.10.1.6.2.2.1.6	Pozos de inspección y/o cámaras	35 días	0	0,000%	0,000%	vie 17/04/26	vie 29/05/26	2885CC+2 días;28

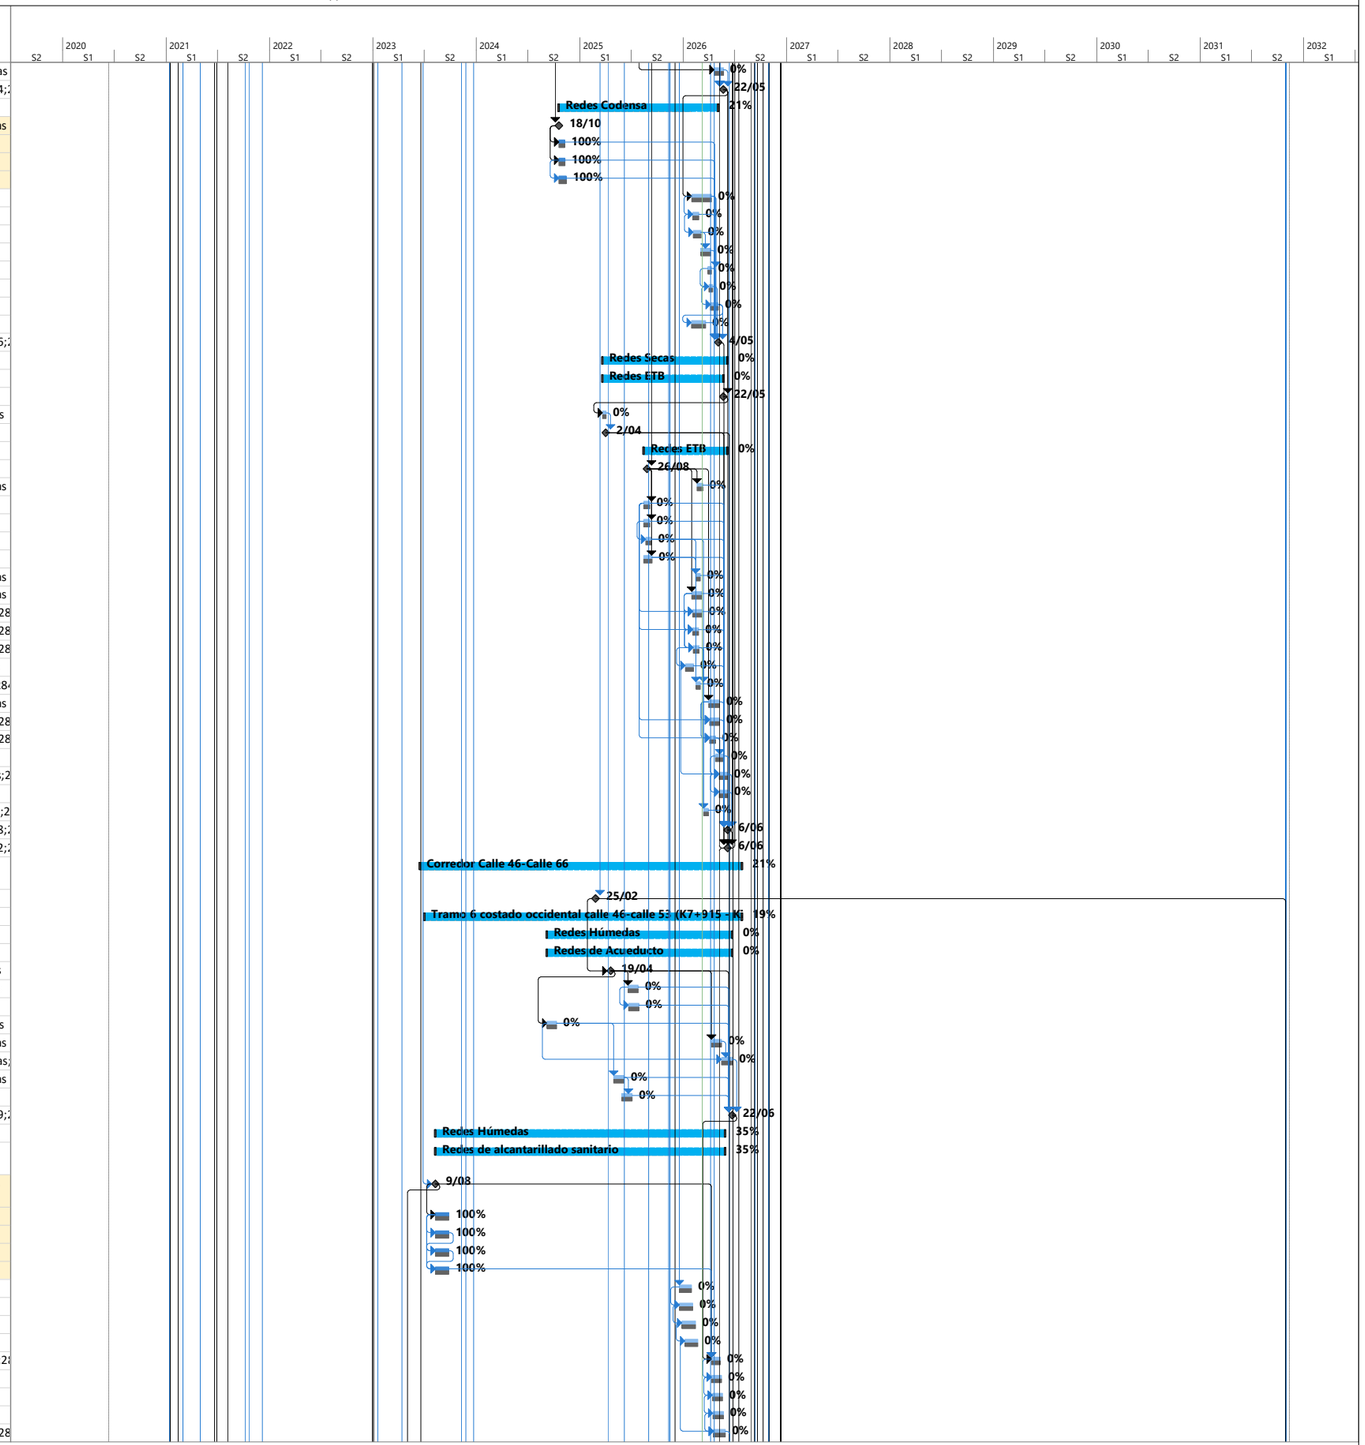


Tareas críticas | Tarea | Tarea manual | solo duración | Hito de línea base | Resumen | Tareas externas | Hito inactivo
División crítica | División | solo el comienzo | Línea base | Hito | Resumen manual | Hito externo | Resumen inactivo
Progreso de tarea crítica | Progreso de tarea | solo fin | División de la línea base | Progreso del resumen | Resumen del proyecto | Tarea inactiva | Fecha límite

Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	% Avance Conciliado	% Avance Programado (% PV)	% Avance Ejecutado conciliado (% EV))	Comienzo	Fin	Predecesoras
2891	1.3.10.1.6.2.2.1.7	Fin tramo de redes alcantarillado sanitario	0 días	0	0,000%	0,000%	vie 29/05/26	vie 29/05/26	2890
2892	**1.3.10.1.6.2.3**	**Redes de alcantarillado Pluvial**	**55 días**	**0**	**0,000%**	**0,000%**	**mié 20/05/26**	**lun 27/07/26**	
2893	**1.3.10.1.6.2.3.1**	**Tramo de redes de alcantarillado pluvial**	**55 días**	**0**	**0,000%**	**0,000%**	**mié 20/05/26**	**lun 27/07/26**	
2894	1.3.10.1.6.2.3.1.1	Inicio tramo de redes de alcantarillado pluvial	0 días	0	0,000%	0,000%	mié 20/05/26	mié 20/05/26	793CC
2895	1.3.10.1.6.2.3.1.2	Excavaciones	30 días	0	0,000%	0,000%	lun 1/06/26	mié 8/07/26	2894CC+10 días
2896	1.3.10.1.6.2.3.1.3	Entibados	30 días	0	0,000%	0,000%	lun 1/06/26	mié 8/07/26	2895CC
2897	1.3.10.1.6.2.3.1.4	Tuberías	30 días	0	0,000%	0,000%	jue 4/06/26	sáb 11/07/26	2896CC+3 días
2898	1.3.10.1.6.2.3.1.5	Rellenos	30 días	0	0,000%	0,000%	mar 9/06/26	mié 15/07/26	2897CC+3 días
2899	1.3.10.1.6.2.3.1.6	Pozos de inspección y/o cámaras	30 días	0	0,000%	0,000%	jue 11/06/26	vie 17/07/26	2898CC+3 días
2900	1.3.10.1.6.2.3.1.7	Sumideros	30 días	0	0,000%	0,000%	vie 19/06/26	lun 27/07/26	2899CC+6 días
2901	1.3.10.1.6.2.3.1.8	Fin tramo de redes de alcantarillado pluvial	0 días	0	0,000%	0,000%	lun 27/07/26	lun 27/07/26	2900
2902	1.3.10.1.6.2.4	Fin redes húmedas - Tramo 6	0 días	0	0,000%	0,000%	sáb 1/07/23	sáb 1/07/23	2078FC+57 días
2903	**1.3.10.1.6.3**	**Redes Secas**	**930,13 días**	**0**	**93,187%**	**86,553%**	**jue 15/06/23**	**jue 25/06/26**	
2904	**1.3.10.1.6.3.1**	**Redes de Codensa**	**925,05 días**	**0**	**97,420%**	**88,645%**	**jue 15/06/23**	**vie 19/06/26**	
2905	1.3.10.1.6.3.1.1	Inicio tramo redes de Codensa	0 días	100	0,000%	0,000%	jue 15/06/23	jue 15/06/23	2877FC-43 días
2906	1.3.10.1.6.3.1.3	Excavaciones	51,63 días	100	100,000%	100,000%	jue 15/06/23	mié 16/08/23	2905CC
2907	1.3.10.1.6.3.1.4	Canalización	51,63 días	100	100,000%	100,000%	jue 15/06/23	mié 16/08/23	2906CC
2908	1.3.10.1.6.3.1.5	Rellenos	51,63 días	100	100,000%	100,000%	jue 15/06/23	mié 16/08/23	2907CC
2909	1.3.10.1.6.3.1.6	Cajas	62,38 días	100	100,000%	100,000%	jue 3/08/23	vie 13/10/23	2908CC+39 días
2910	1.3.10.1.6.3.1.2	Maniobras	50 días	0	0,000%	0,000%	vie 2/05/25	mié 2/07/25	2909FC+475 días
2911	1.3.10.1.6.3.1.3	Excavaciones	50 días	100	100,000%	100,000%	mié 2/07/25	vie 29/08/25	2909FC+525 días
2912	1.3.10.1.6.3.1.4	Canalización	50 días	100	100,000%	100,000%	vie 4/07/25	lun 1/09/25	2911CC+2 días
2913	1.3.10.1.6.3.1.5	Rellenos	50 días	100	100,000%	100,000%	lun 7/07/25	mié 3/09/25	2912CC+2 días
2914	1.3.10.1.6.3.1.6	Cajas	60 días	100	100,000%	100,000%	mar 15/07/25	mar 23/09/25	2912CC+10 días
2915	1.3.10.1.6.3.1.3	Excavaciones	40 días	0	0,000%	0,000%	lun 30/03/26	sáb 16/05/26	2910FC+230 días
2916	1.3.10.1.6.3.1.4	Canalización	40 días	0	0,000%	0,000%	mié 1/04/26	jue 21/05/26	2915CC+3 días
2917	1.3.10.1.6.3.1.5	Rellenos	40 días	0	0,000%	0,000%	lun 6/04/26	vie 22/05/26	2916CC+1 día
2918	1.3.10.1.6.3.1.6	Cajas	40 días	0	100,000%	0,000%	mar 15/07/25	lun 1/09/25	2906FC+588 días
2919	1.3.10.1.6.3.1.7	Fin tramo de redes de Codensa	0 días	0	0,000%	0,000%	vie 19/06/26	vie 19/06/26	2905FC-30 días;2
2920	**1.3.10.1.6.3.2**	**Redes de ETB**	**922,75 días**	**0**	**80,077%**	**80,077%**	**sáb 24/06/23**	**jue 25/06/26**	
2921	1.3.10.1.6.3.2.1	Inicio tramo redes de ETB	0 días	0	0,000%	0,000%	lun 12/05/25	lun 12/05/25	2910CC+8 días
2922	1.3.10.1.6.3.2.2	Maniobras	25 días	0	0,000%	0,000%	vie 9/05/25	sáb 7/06/25	2921CC-2 días
2923	1.3.10.1.6.3.2.3	Excavaciones	25,5 días	100	100,000%	100,000%	sáb 24/06/23	mar 25/07/23	2908CC+7 días
2924	1.3.10.1.6.3.2.4	Ductos	30,63 días	100	100,000%	100,000%	sáb 24/06/23	lun 31/07/23	2923CC
2925	1.3.10.1.8.3.2.5	Excavaciones	20 días	100	100,000%	100,000%	jue 22/05/25	lun 16/06/25	2732;2924
2926	1.3.10.1.8.3.2.6	Ductos	40 días	100	100,000%	100,000%	mié 28/05/25	mié 16/07/25	2925CC+5 días
2927	1.3.10.1.8.3.2.7	Cámaras	40 días	100	100,000%	100,000%	mié 4/06/25	lun 21/07/25	2926CC+5 días
2928	1.3.10.1.6.3.2.8	Reconstrucción de cámaras	41 días	100	100,000%	100,000%	vie 15/08/25	mié 1/10/25	2927FC+21 días
2929	1.3.10.1.6.3.2.9	Cárcamos	30 días	100	100,000%	100,000%	mié 1/10/25	jue 6/11/25	2928
2930	1.3.10.1.8.3.2.10	Excavaciones	21 días	100	100,000%	100,000%	sáb 15/11/25	jue 11/12/25	2732FC+150 días;
2931	1.3.10.1.8.3.2.11	Ductos	40 días	100	100,000%	100,000%	sáb 15/11/25	lun 5/01/26	2732FC+150 días;
2932		Cárcamos	40,5 días	100	100,000%	100,000%	lun 11/08/25	vie 26/09/25	2931CC-83 días
2933	1.3.10.1.8.3.2.13	Excavaciones	20 días	0	0,000%	0,000%	lun 20/04/26	mié 13/05/26	2732FC+280 días
2934	1.3.10.1.8.3.2.14	Ductos	39 días	0	0,000%	0,000%	mar 21/04/26	vie 5/06/26	2933CC+1 día
2935	1.3.10.1.8.3.2.15	Cámaras	40 días	0	0,000%	0,000%	sáb 25/04/26	vie 12/06/26	2931CC+4 días;29
2936	1.3.10.1.6.3.2.6	Demolición de canalizaciones de redes	40 días	0	0,000%	0,000%	sáb 2/05/26	vie 19/06/26	2927CC+5 días;29
2937	1.3.10.1.6.3.2.7	Demolición de pozos, cajas y cámaras	42 días	100	100,000%	100,000%	lun 11/08/25	sáb 27/09/25	2928CC-4 días
2938	1.3.10.1.6.3.2.8	Reconstrucción de cámaras	40 días	0	0,000%	0,000%	vie 8/05/26	jue 25/06/26	2936CC+5 días
2939	1.3.10.1.6.3.2.9	Cárcamos	30 días	0	0,000%	0,000%	vie 8/05/26	vie 12/06/26	2938CC
2940	1.3.10.1.6.3.2.10	Fin tramo redes de ETB	0 días	0	0,000%	0,000%	jue 25/06/26	jue 25/06/26	2922;2936;2937;2
2941	1.3.10.1.6.4	Fin redes - Tramo 6	0 días	0	0,000%	0,000%	jue 25/06/26	jue 25/06/26	2902;2919;2938;2
2942	**1.3.10.1.7**	**Actividades Varias de Redes Corredor Calle 46-Calle 66**	**1 día**	**0**	**0,000%**	**0,000%**	**mié 9/09/26**	**jue 10/09/26**	
2943	1.3.10.1.7.1	Redes Húmedas	1 día	0	0,000%	0,000%	mié 9/09/26	jue 10/09/26	2553FC+40 días
2944	1.3.10.1.7.2	Redes Secas	1 día	0	0,000%	0,000%	mié 9/09/26	jue 10/09/26	2943FF
2945	1.3.10.2	Fin de redes	0 días	0	0,000%	0,000%	mié 9/09/26	mié 9/09/26	2373CF;2379CC;2
2946	**1.3.11**	**ADECUACIÓN DE DESVÍOS**	**1712,13 días**	**0**	**88,090%**	**83,696%**	**sáb 13/02/21**	**jue 10/09/26**	
2947	1.3.11.1	Inicio Actividades de adecuación de desvíos	0,5 días	0	0,000%	0,000%	sáb 13/02/21	sáb 13/02/21	8
2948	**1.3.11.2**	**Actividades de adecuación Vías Intermedias**	**1518,58 días**	**0**	**100,000%**	**46,093%**	**sáb 20/03/21**	**jue 26/02/26**	
2949	1.3.11.2.1	Entrega de informe Adecuación de Desvíos	1,63 días	0	0,000%	0,000%	sáb 20/03/21	mar 23/03/21	2947FC+29 días
2950	1.3.11.2.2	Aprobación por parte de Interventoria Informe de Desvios	17,5 días	0	0,000%	0,000%	jue 20/05/21	mié 9/06/21	2949FC+44 días
2951	1.3.11.2.3	Aprobación por parte de interventoría y no objeción por parte de IDU actividades adecuación vías Intermedias	0 días	0	0,000%	0,000%	mié 9/06/21	mié 9/06/21	2950
2952	1.3.11.2.4	Presentación PMT Especifico a interventoría	1 día	0	0,000%	0,000%	mar 15/06/21	mar 15/06/21	2951CC+3 días
2953	1.3.11.2.5	Aprobación PMT Especifico interventoría	1 día	0	0,000%	0,000%	vie 18/06/21	vie 18/06/21	2952FC+2 días
2954	1.3.11.2.6	Aprobación PMT Especifico SDM	1 día	0	0,000%	0,000%	mar 6/07/21	mar 6/07/21	46FF;2953FC+13
2955	1.3.11.2.7	Fresado o excavación para reparaciones en pavimento a	0,2 días	0	100,000%	0,000%	mié 4/02/26	mié 4/02/26	2954FC+1411 días
2956	1.3.11.2.8	Extendido de carpeta asfáltica o parcheo	20,38 días	100	100,000%	100,000%	sáb 22/07/23	mar 15/08/23	2955
2957	1.3.11.2.9	Extendido de carpeta asfáltica o parcheo (PMT alto impa	20 días	0	100,000%	0,000%	mié 4/02/26	jue 26/02/26	2955
2958	1.3.11.2.10	Demarcación definitiva (PMT alto impacto)	20 días	0	100,000%	0,000%	mié 4/02/26	jue 26/02/26	2955CC
2959	**1.3.11.3**	**Actividades de Adecuación Separadores y solicitudes SDM**	**1401,88 días**	**0**	**100,000%**	**90,000%**	**sáb 5/06/21**	**vie 26/12/25**	

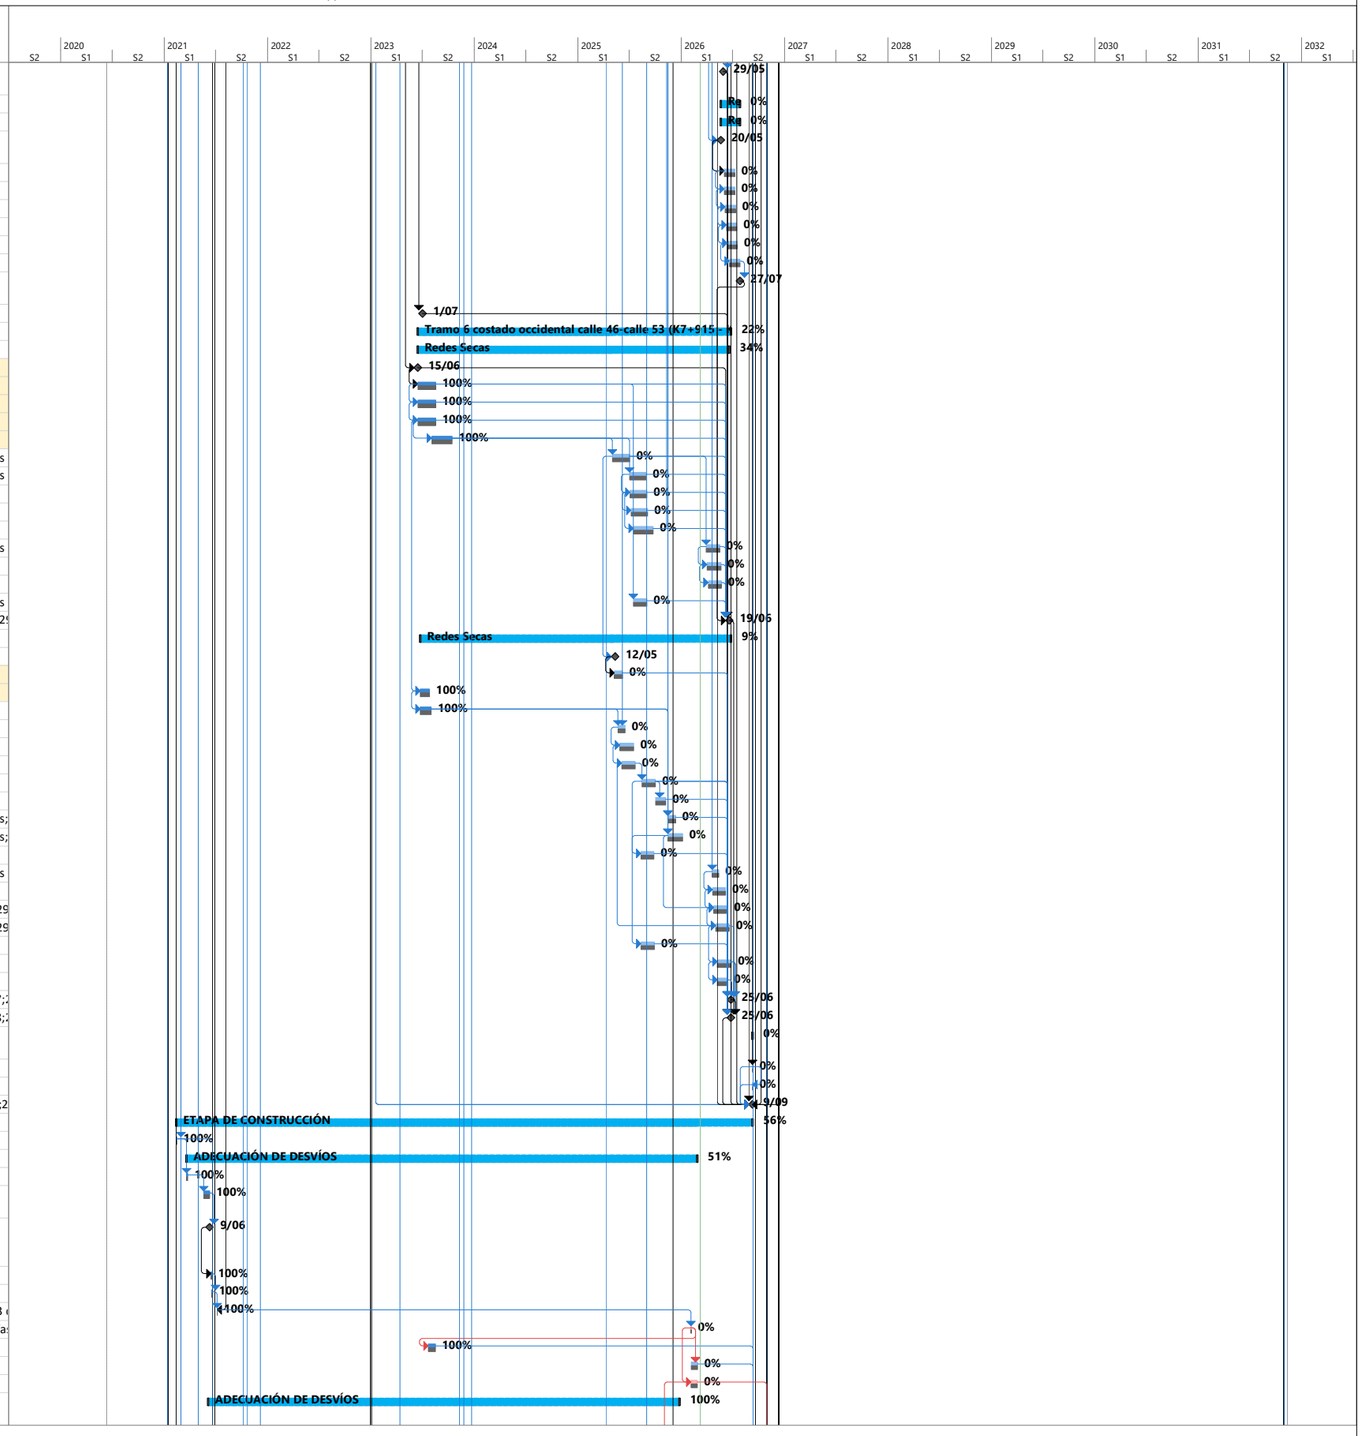


Tareas críticas · Tarea · Tarea manual · solo duración · Hito de línea base · Resumen · Tareas externas · Hito inactivo
División crítica · División · solo el comienzo · Línea base · Hito · Resumen manual · Hito externo · Resumen inactivo
Progreso de tarea crítica · Progreso de tarea · solo fin · División de la línea base · Progreso del resumen · Resumen del proyecto · Tarea inactiva · Fecha límite

Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	% Avance Conciliado	% Avance Programado (% PV)	% Avance Ejecutado conciliado (% EV))	Comienzo	Fin	Predecesoras
2960	1.3.11.3.1	Aprobación por parte de interventoría y no objeción por parte de IDU actividades adecuación de separadores	1 día	0	0,000%	0,000%	sáb 19/06/21	lun 21/06/21	46FC+5 días;2947
2961	1.3.11.3.2	solicitud de Cortes a Enel Codensa por parte de Interventoria e IDU grupo I	0,5 días	0	0,000%	0,000%	sáb 5/06/21	sáb 5/06/21	45
2962	1.3.11.3.3	solicitud de Cortes a Enel Codensa por parte de Interventoria e IDU grupo II	1 día	0	0,000%	0,000%	vie 3/09/21	vie 3/09/21	2960;2961FC+70 días
2963	1.3.11.3.4	Cortes de Energia Enel-Codensa Grupo I	8,38 días	0	0,000%	0,000%	mié 28/07/21	jue 5/08/21	2961FC+40 días
2964	1.3.11.3.5	Cortes de Energia Enel-Codensa Grupo II	17 días	0	0,000%	0,000%	vie 22/10/21	jue 11/11/21	2962FC+40 días
2965	1.3.11.3.6	tratamientos Silviculturales separador Central para adecuaciones PMT	93 días	0	0,000%	0,000%	mié 28/07/21	vie 12/11/21	2963CC;2964FF
2966	1.3.11.3.7	adecuaciones separadores carrera 68	19 días	90	100,000%	90,000%	mié 3/12/25	vie 26/12/25	2963CC+1250 día
2967	1.3.11.4	Actividades de mantenimiento y señalización vías (PMT alt	92 días	100	80,978%	100,000%	mié 3/12/25	vie 20/03/26	47FC+1200 días;2
2968	1.3.11.4	Actividades de mantenimiento y señalización vías (PMT alt	235 días	100	31,702%	100,000%	mié 3/12/25	jue 10/09/26	2967CC
2969	1.3.11.4	Actividades de mantenimiento y señalización vías (PMT alto impacto)	235 días	0	31,702%	0,000%	mié 3/12/25	jue 10/09/26	2967CC
2970	1.3.11.7	Adecuacion de desvios TRAMO 1-3 (K9+620 - K9+655)	9 días	100	100,000%	100,000%	jue 10/04/25	mié 23/04/25	130FC+39 días
2971	1.3.11.8	Adecuacion de desvios TRAMO 3 (K9+382 - K9+525)	15 días	100	100,000%	100,000%	mié 1/10/25	lun 20/10/25	170FC-28 días
2972	1.3.11.9	Adecuacion de desvios TRAMO 2 (K8+565 - K8+600)	10 días	100	100,000%	100,000%	sáb 25/11/23	mié 6/12/23	135FC-10 días;16
2973	1.3.12	ENTREGA FINAL DE OBRA	52 días	0	0,000%	0,000%	vie 11/09/26	mié 11/11/26	179FF+7 días;801
2974	1.3.13	FIN ETAPA DE CONSTRUCCIÓN GRUPO 6	0 días	0	0,000%	0,000%	mié 11/11/26	mié 11/11/26	678;712;801;101
2975	**1.4**	**ETAPA DE MANTENIMIENTO**	**1624 días**	**0**	**0,000%**	**0,000%**	**jue 12/11/26**	**mar 11/11/31**	
2976	1.4.1	INICIO DE LA ETAPA DE MANTENIMIENTO	0 días	0	0,000%	0,000%	jue 12/11/26	jue 12/11/26	2974FC+1 día
2977	1.4.2	PROGRAMA PARA CONTROL DE ACTIVIDADES DE LA ETAPA DE MANTENIMIENTO	77 días	0	0,000%	0,000%	jue 12/11/26	jue 11/02/27	2976
2978	1.4.3	REVISIÓN Y APROBACIÓN POR PARTE DE INTERVENTORÍA	13 días	0	0,000%	0,000%	jue 11/02/27	vie 26/02/27	2977
2979	1.4.4	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	1535 días	0	0,000%	0,000%	jue 25/02/27	mar 11/11/31	2978FC-1 día
2980	1.4.5	FIN ETAPA DE MANTENIMIENTO GRUPO 6	0 días	0	0,000%	0,000%	mar 11/11/31	mar 11/11/31	2979
2981	**1.5**	**COMPONENTE AMBIENTAL Y SST**	**3390,25 días**	**0**	**89,032%**	**89,004%**	**vie 12/02/21**	**lun 10/11/31**	
2982	**1.5.1**	**COMPONENTE AMBIENTAL Y SST DE LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN**	**1741,25 días**	**0**	**98,182%**	**98,150%**	**vie 12/02/21**	**mar 13/10/26**	
2983	**1.5.1.1**	**COMPONENTE AMBIENTAL**	**1741,25 días**	**0**	**98,802%**	**98,585%**	**vie 12/02/21**	**mar 13/10/26**	
2984	**1.5.1.1.1**	**2021**	**270,25 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**vie 12/02/21**	**jue 30/12/21**	
2985	1.5.1.1.1.1	Inicio componente Ambiental 2021	1 día	0	0,000%	0,000%	vie 12/02/21	vie 12/02/21	8CC
2986	1.5.1.1.1.2	Informe Mensual Ambiental	270,25 días	100	100,000%	100,000%	vie 12/02/21	jue 30/12/21	2985CC
2987	1.5.1.1.1.3	Informe Semanal Ambiental	270,25 días	100	100,000%	100,000%	vie 12/02/21	jue 30/12/21	2985CC
2988	1.5.1.1.1.4	Comité de Seguimiento de área A&SST	270,25 días	0	0,000%	0,000%	vie 12/02/21	jue 30/12/21	2985CC
2989	1.5.1.1.1.5	Visitas conjuntas y programadas de campo. Residentes Ambientales	270,25 días	100	100,000%	100,000%	vie 12/02/21	jue 30/12/21	2985CC
2990	1.5.1.1.1.6	Inducción del Personal nuevo de ingreso a la obra (cuando aplique)	270,25 días	100	100,000%	100,000%	vie 12/02/21	jue 30/12/21	2985CC
2991	1.5.1.1.1.7	Programa de capacitaciones componente Ambiental	270,25 días	100	100,000%	100,000%	vie 12/02/21	jue 30/12/21	2985CC
2992	1.5.1.1.1.8	Implementación del Plan de Gestión de residuos de construcción y demolición RCD	270,25 días	100	100,000%	100,000%	vie 12/02/21	jue 30/12/21	2985CC
2993	1.5.1.1.1.9	Protección y mantenimiento de especies arbóreas del área de intervención	270,25 días	100	100,000%	100,000%	vie 12/02/21	jue 30/12/21	2985CC
2994	1.5.1.1.1.10	Revisar el estado de los sumideros existentes en la zona de actividades de las obras acorde al procedimiento contemplado en el MAO	270,25 días	100	100,000%	100,000%	vie 12/02/21	jue 30/12/21	2985CC
2995	1.5.1.1.1.11	Limpieza y protección de sumideros del tramo intervenido Según Aplique .	270,25 días	100	100,000%	100,000%	vie 12/02/21	jue 30/12/21	2985CC
2996	1.5.1.1.1.12	Implementación actividades avifauna (cuando aplique).	270,25 días	100	100,000%	100,000%	vie 12/02/21	jue 30/12/21	2985CC
2997	1.5.1.1.1.13	Implementación tratamientos silviculturales.	269,13 días	100	100,000%	100,000%	sáb 13/02/21	jue 30/12/21	2985CC+1 día
2998	**1.5.1.1.2**	**2022**	**308 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**lun 3/01/22**	**sáb 31/12/22**	
2999	1.5.1.1.2.1	Inicio componente Ambiental 2022	1 día	0	0,000%	0,000%	lun 3/01/22	lun 3/01/22	2985FC+259 días
3000	1.5.1.1.2.2	Informe Mensual Ambiental	307,38 días	100	100,000%	100,000%	lun 3/01/22	vie 30/12/22	2999CC
3001	1.5.1.1.2.3	Informe Semanal Ambiental	306,88 días	100	100,000%	100,000%	mar 4/01/22	sáb 31/12/22	2999
3002	1.5.1.1.2.4	Comité de Seguimiento de área A&SST	307,38 días	0	0,000%	0,000%	lun 3/01/22	vie 30/12/22	2999CC
3003	1.5.1.1.2.5	Visitas conjuntas y programadas de campo. Residentes Ambientales	307,38 días	100	100,000%	100,000%	lun 3/01/22	vie 30/12/22	2999CC
3004	1.5.1.1.2.6	Inducción del Personal nuevo de ingreso a la obra (cuando aplique)	307,38 días	100	100,000%	100,000%	lun 3/01/22	vie 30/12/22	2999CC
3005	1.5.1.1.2.7	Programa de capacitaciones componente Ambiental	307,38 días	100	100,000%	100,000%	lun 3/01/22	vie 30/12/22	2999CC
3006	1.5.1.1.2.8	Implementación del Plan de Gestión de residuos de construcción y demolición RCD	307,38 días	100	100,000%	100,000%	lun 3/01/22	vie 30/12/22	2999CC
3007	1.5.1.1.2.9	Protección y mantenimiento de especies arbóreas del área de intervención	307,38 días	100	100,000%	100,000%	lun 3/01/22	vie 30/12/22	2999CC
3008	1.5.1.1.2.10	Revisar el estado de los sumideros existentes en la zona de actividades de las obras acorde al procedimiento contemplado en el MAO	307,38 días	100	100,000%	100,000%	lun 3/01/22	vie 30/12/22	2999CC
3009	1.5.1.1.2.11	Limpieza y protección de sumideros del tramo intervenido Según Aplique .	307,38 días	100	100,000%	100,000%	lun 3/01/22	vie 30/12/22	2999CC
3010	1.5.1.1.2.12	Implementación actividades avifauna (cuando aplique).	306,88 días	100	100,000%	100,000%	mar 4/01/22	sáb 31/12/22	2999
3011	1.5.1.1.2.13	Implementación tratamientos silviculturales.	307,38 días	100	100,000%	100,000%	lun 3/01/22	vie 30/12/22	2999CC
3012	**1.5.1.1.3**	**2023**	**305,13 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**lun 2/01/23**	**vie 29/12/23**	
3013	1.5.1.1.3.1	Inicio componente Ambiental 2023	1 día	0	0,000%	0,000%	lun 2/01/23	lun 2/01/23	2999FC+296 días

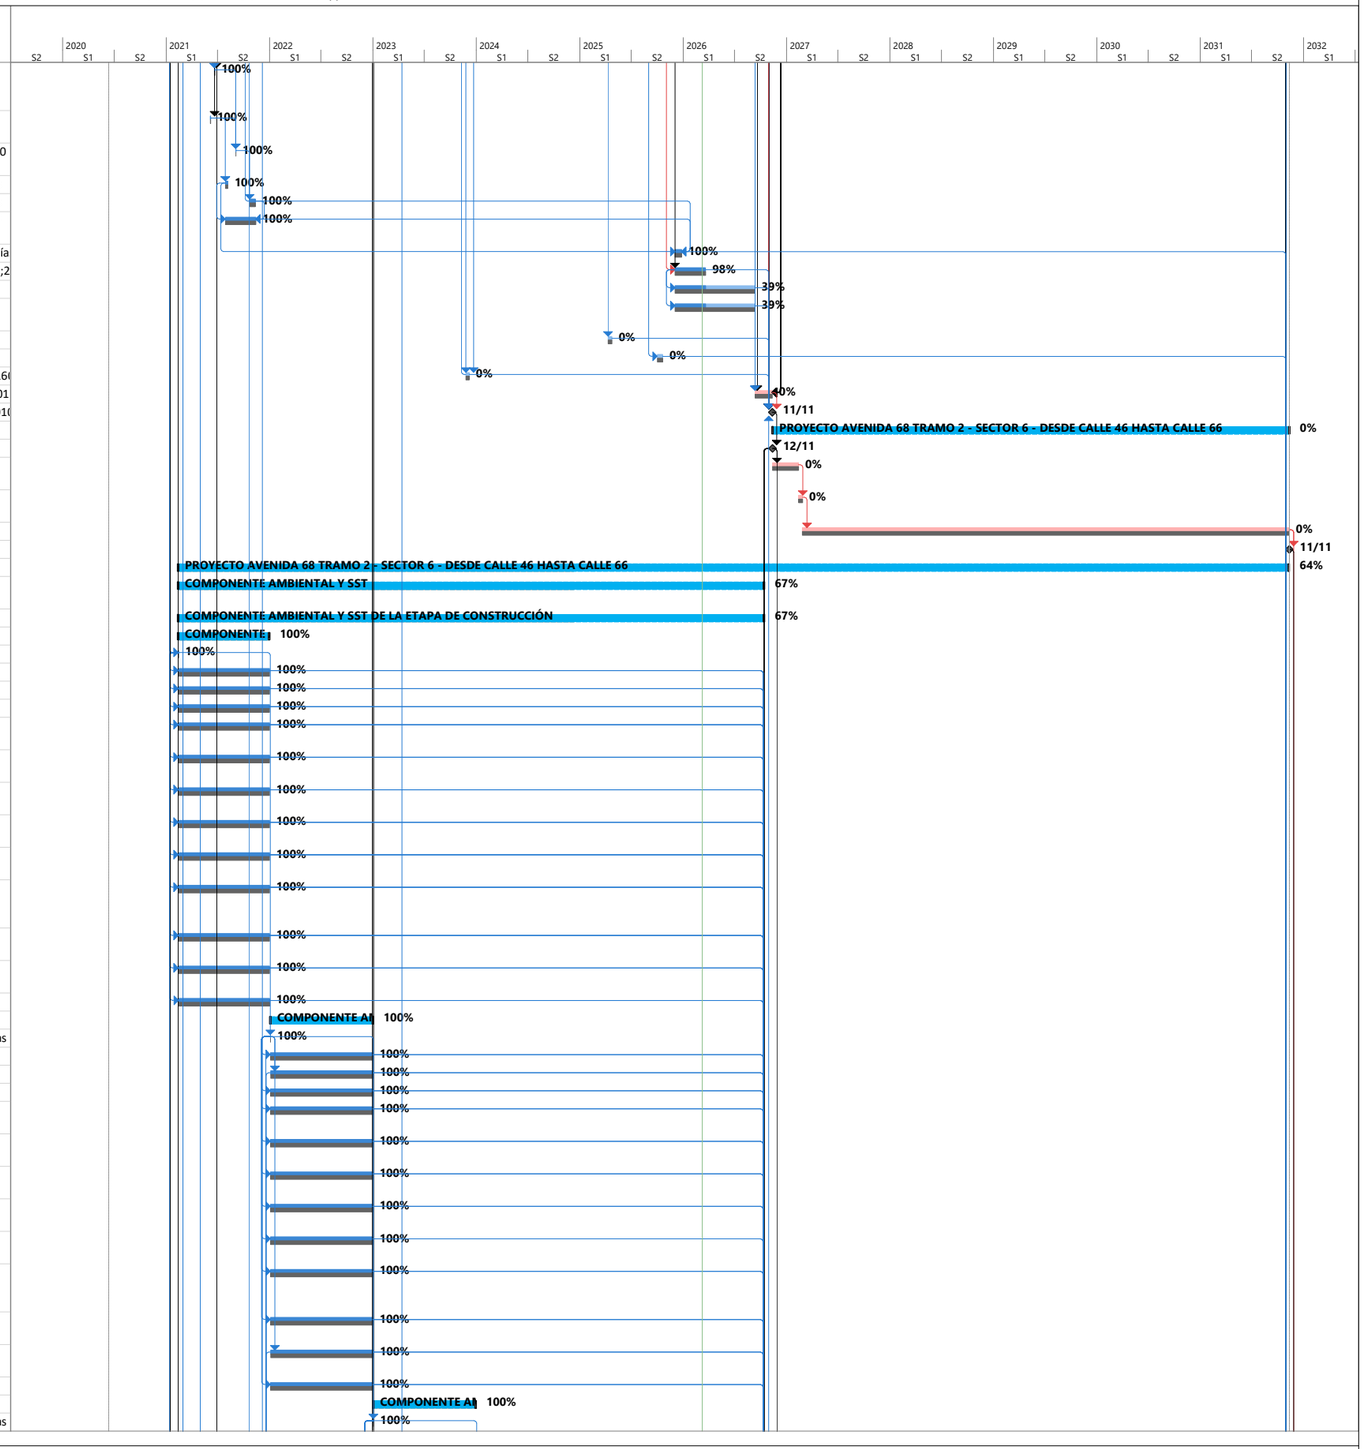


Tareas críticas · Tarea · Tarea manual · solo duración · Hito de línea base · Resumen · Tareas externas · Hito inactivo
División crítica · División · solo el comienzo · Línea base · Hito · Resumen manual · Hito externo · Resumen inactivo
Progreso de tarea crítica · Progreso de tarea · solo fin · División de la línea base · Progreso del resumen · Resumen del proyecto · Tarea inactiva · Fecha límite

Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	% Avance Conciliado	% Avance Programado (% PV)	% Avance Ejecutado conciliado (% EV))	Comienzo	Fin	Predecesoras
3014	1.5.1.1.3.2	Informe Mensual Ambiental	305,13 días	100	100,000%	100,000%	lun 2/01/23	vie 29/12/23	3013CC
3015	1.5.1.1.3.3	Informe Semanal Ambiental	305,13 días	100	100,000%	100,000%	lun 2/01/23	vie 29/12/23	3013CC
3016	1.5.1.1.3.4	Comité de Seguimiento de área A&SST	305,13 días	100	0,000%	0,000%	lun 2/01/23	vie 29/12/23	3013CC
3017	1.5.1.1.3.5	Visitas conjuntas y programadas de campo. Residentes Ambientales	305,13 días	100	100,000%	100,000%	lun 2/01/23	vie 29/12/23	3013CC
3018	1.5.1.1.3.6	Inducción del Personal nuevo de ingreso a la obra (cuando aplique)	305,13 días	100	100,000%	100,000%	lun 2/01/23	vie 29/12/23	3013CC
3019	1.5.1.1.3.7	Programa de capacitaciones componente Ambiental	305,13 días	100	100,000%	100,000%	lun 2/01/23	vie 29/12/23	3013CC
3020	1.5.1.1.3.8	Implementación del Plan de Gestión de residuos de construcción y demolición RCD	305,13 días	100	100,000%	100,000%	lun 2/01/23	vie 29/12/23	3013CC
3021	1.5.1.1.3.9	Protección y mantenimiento de especies arbóreas del área de intervención	305,13 días	100	100,000%	100,000%	lun 2/01/23	vie 29/12/23	3013CC
3022	1.5.1.1.3.10	Revisar el estado de los sumideros existentes en la zona de actividades de las obras acorde al procedimiento contemplado en el MAO	305,13 días	100	100,000%	100,000%	lun 2/01/23	vie 29/12/23	3013CC
3023	1.5.1.1.3.11	Limpieza y protección de sumideros del tramo intervenido Según Aplique .	305,13 días	100	100,000%	100,000%	lun 2/01/23	vie 29/12/23	3013CC
3024	1.5.1.1.3.12	Implementación actividades avifauna (cuando aplique).	305,13 días	100	100,000%	100,000%	lun 2/01/23	vie 29/12/23	3013CC
3025	1.5.1.1.3.13	Implementación tratamientos silviculturales.	305,13 días	100	100,000%	100,000%	lun 2/01/23	vie 29/12/23	3013CC
3026	1.5.1.1.3.14	Monitoreo 1. calidad de aire y ruido (elaboración y entrega de informe)	47 días	100	100,000%	100,000%	lun 2/01/23	jue 23/02/23	3013CC
3027	**1.5.1.1.4**	**2024**	**307,75 días**	**0**	**100,000%**	**99,601%**	**mar 2/01/24**	**mar 31/12/24**	
3028	1.5.1.1.4.1	Inicio componente Ambiental 2024	1 día	0	0,000%	0,000%	mar 2/01/24	mar 2/01/24	3013FC+294 días
3029	1.5.1.1.4.2	Informe Mensual Ambiental	306,63 días	100	100,000%	100,000%	mié 3/01/24	mar 31/12/24	3028;3014;3015;3
3030	1.5.1.1.4.3	Informe Semanal Ambiental	306,63 días	100	100,000%	100,000%	mié 3/01/24	mar 31/12/24	3028
3031	1.5.1.1.4.4	Comité de Seguimiento de área A&SST	306,63 días	0	0,000%	0,000%	mié 3/01/24	mar 31/12/24	3028;3014;3015;3
3032	1.5.1.1.4.5	Visitas conjuntas y programadas de campo. Residentes Ambientales	306,63 días	100	100,000%	100,000%	mié 3/01/24	mar 31/12/24	3028
3033	1.5.1.1.4.6	Inducción del Personal nuevo de ingreso a la obra (cuando aplique)	306,63 días	100	100,000%	100,000%	mié 3/01/24	mar 31/12/24	3028
3034	1.5.1.1.4.7	Programa de capacitaciones componente Ambiental	306,63 días	100	100,000%	100,000%	mié 3/01/24	mar 31/12/24	3028
3035	1.5.1.1.4.8	Implementación del Plan de Gestión de residuos de construcción y demolición RCD	306,63 días	100	100,000%	100,000%	mié 3/01/24	mar 31/12/24	3028
3036	1.5.1.1.4.9	Protección y mantenimiento de especies arbóreas del área de intervención	306,63 días	100	100,000%	100,000%	mié 3/01/24	mar 31/12/24	3028
3037	1.5.1.1.4.10	Revisar el estado de los sumideros existentes en la zona de actividades de las obras acorde al procedimiento contemplado en el MAO	306,63 días	100	100,000%	100,000%	mié 3/01/24	mar 31/12/24	3028
3038	1.5.1.1.4.11	Limpieza y protección de sumideros del tramo intervenido Según Aplique .	306,63 días	100	100,000%	100,000%	mié 3/01/24	mar 31/12/24	3028
3039	1.5.1.1.4.12	Implementación actividades avifauna (cuando aplique).	306,63 días	100	100,000%	100,000%	mié 3/01/24	mar 31/12/24	3028
3040	1.5.1.1.4.13	Implementación tratamientos silviculturales.	306,63 días	95,61	100,000%	95,610%	mié 3/01/24	mar 31/12/24	3028
3041	1.5.1.1.4.14	Monitoreo 2. calidad de aire y ruido (elaboración y entrega de informe)	306,63 días	100	0,000%	0,000%	mié 3/01/24	mar 31/12/24	3028
3042	**1.5.1.1.5**	**2025**	**307 días**	**0**	**100,000%**	**90,909%**	**jue 2/01/25**	**mié 31/12/25**	
3043	1.5.1.1.5.1	Inicio componente Ambiental 2025	1 día	0	0,000%	0,000%	jue 2/01/25	vie 3/01/25	3028FC+296 días;
3044	1.5.1.1.5.2	Informe Mensual Ambiental	307 días	100	100,000%	100,000%	jue 2/01/25	mié 31/12/25	3043FC-1 día
3045	1.5.1.1.5.3	Informe Semanal Ambiental	307 días	100	100,000%	100,000%	jue 2/01/25	mié 31/12/25	3043FC-1 día
3046	1.5.1.1.5.4	Comité de Seguimiento de área A&SST	307 días	0	0,000%	0,000%	jue 2/01/25	mié 31/12/25	3043FC-1 día
3047	1.5.1.1.5.5	Visitas conjuntas y programadas de campo. Residentes Ambientales	307 días	100	100,000%	100,000%	jue 2/01/25	mié 31/12/25	3043FC-1 día
3048	1.5.1.1.5.6	Inducción del Personal nuevo de ingreso a la obra (cuando aplique)	307 días	100	100,000%	100,000%	jue 2/01/25	mié 31/12/25	3043FC-1 día
3049	1.5.1.1.5.7	Programa de capacitaciones componente Ambiental	307 días	100	100,000%	100,000%	jue 2/01/25	mié 31/12/25	3043FC-1 día
3050	1.5.1.1.5.8	Implementación del Plan de Gestión de residuos de construcción y demolición RCD	307 días	100	100,000%	100,000%	jue 2/01/25	mié 31/12/25	3043FC-1 día
3051	1.5.1.1.5.9	Protección y mantenimiento de especies arbóreas del área de intervención	307 días	100	100,000%	100,000%	jue 2/01/25	mié 31/12/25	3043FC-1 día
3052	1.5.1.1.5.10	Revisar el estado de los sumideros existentes en la zona de actividades de las obras acorde al procedimiento contemplado en el MAO	307 días	100	100,000%	100,000%	jue 2/01/25	mié 31/12/25	3043FC-1 día
3053	1.5.1.1.5.11	Limpieza y protección de sumideros del tramo intervenido Según Aplique .	307 días	100	100,000%	100,000%	jue 2/01/25	mié 31/12/25	3043FC-1 día
3054	1.5.1.1.5.12	Implementación actividades avifauna (cuando aplique).	307 días	100	100,000%	100,000%	jue 2/01/25	mié 31/12/25	3043FC-1 día
3055	1.5.1.1.5.13	Implementación tratamientos silviculturales.	307 días	0	100,000%	0,000%	jue 2/01/25	mié 31/12/25	3043FC-1 día
3056	**1.5.1.1.6**	**2026**	**239 días**	**0**	**18,389%**	**47,346%**	**vie 2/01/26**	**mar 13/10/26**	
3057	1.5.1.1.6.1	Inicio componente Ambiental 2026	1 día	0	0,000%	0,000%	vie 2/01/26	vie 2/01/26	3043FC+307 días
3058	1.5.1.1.6.2	Informe Mensual Ambiental	238 días	54,63	21,218%	54,630%	vie 2/01/26	sáb 10/10/26	3057CC
3059	1.5.1.1.6.3	Informe Semanal Ambiental	238 días	54,63	21,218%	54,630%	vie 2/01/26	sáb 10/10/26	3057CC
3060	1.5.1.1.6.4	Comité de Seguimiento de área A&SST	238 días	54,63	21,218%	54,630%	vie 2/01/26	sáb 10/10/26	3057CC
3061	1.5.1.1.6.5	Visitas conjuntas y programadas de campo. Residentes Ambientales	238 días	54,63	21,218%	54,630%	vie 2/01/26	sáb 10/10/26	3057CC
3062	1.5.1.1.6.6	Inducción del Personal nuevo de ingreso a la obra (cuando aplique)	238 días	54,63	21,218%	54,630%	vie 2/01/26	sáb 10/10/26	3057CC
3063	1.5.1.1.6.7	Programa de capacitaciones componente Ambiental	238 días	54,63	21,218%	54,630%	vie 2/01/26	sáb 10/10/26	3057CC

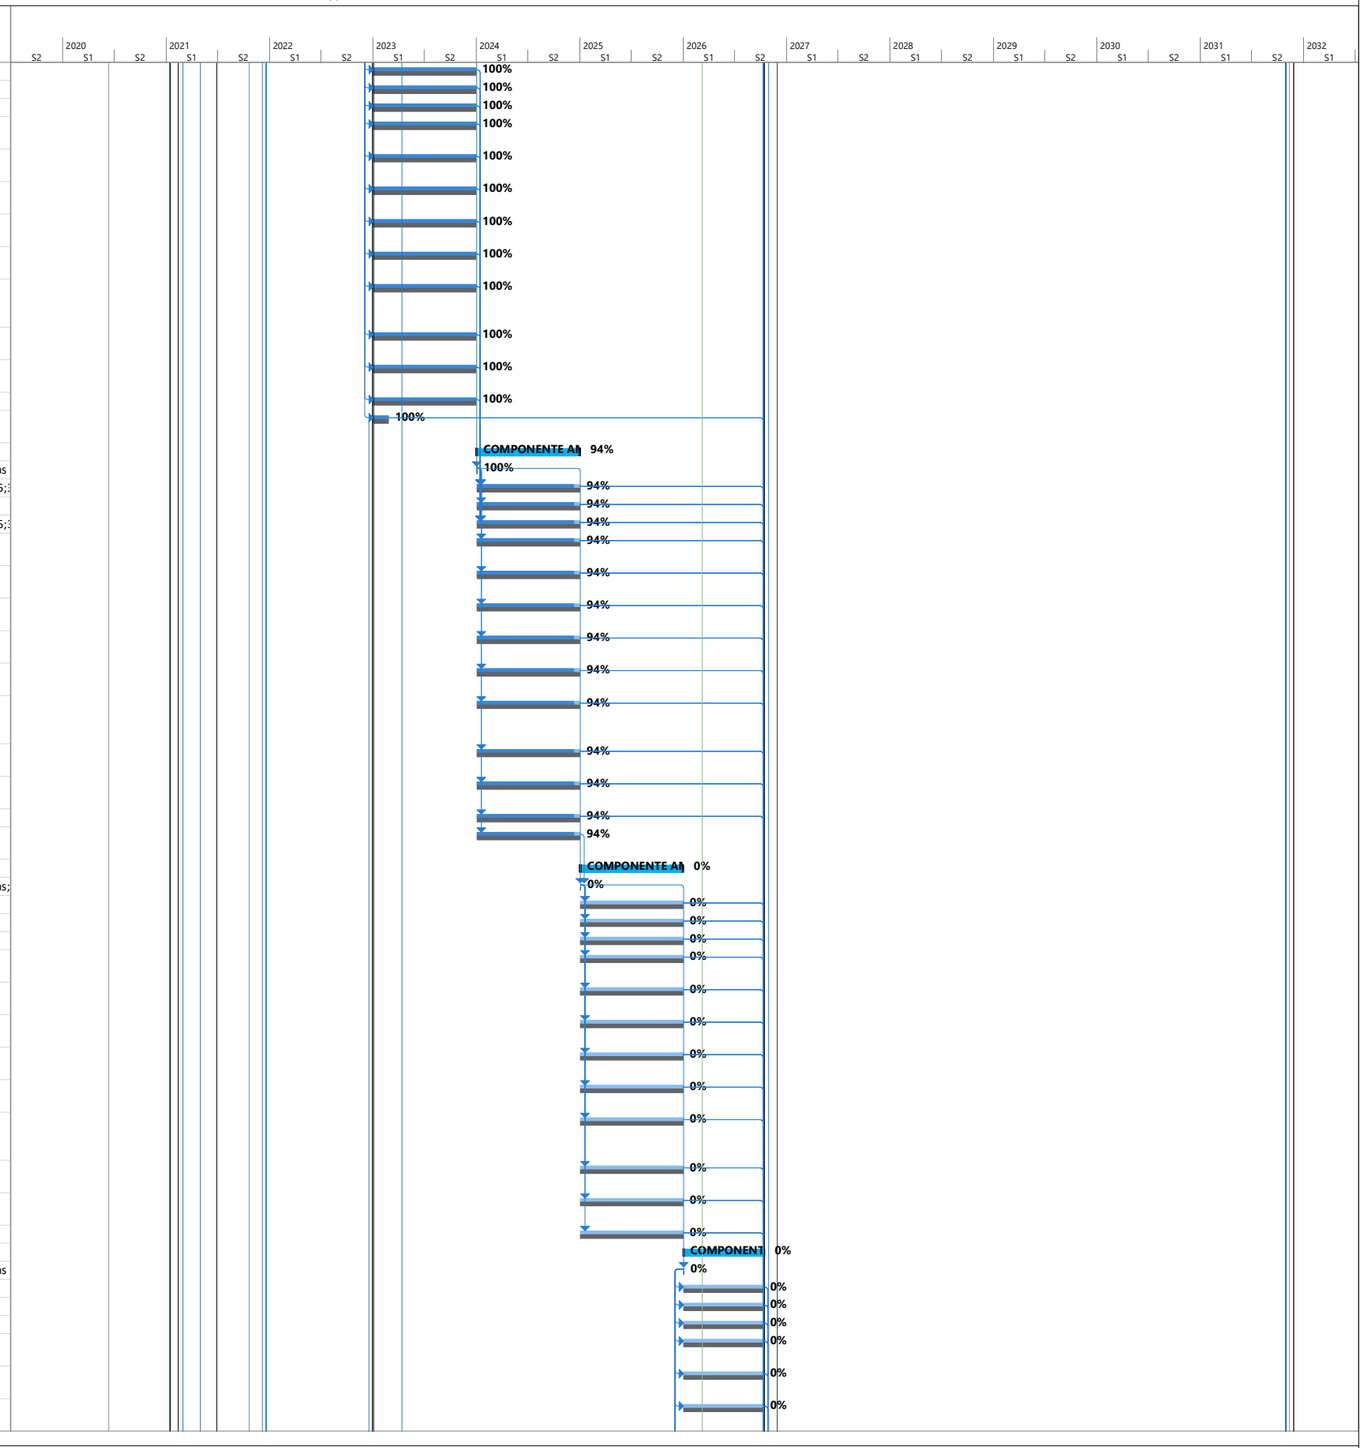


Tareas críticas · Tarea · Tarea manual · solo duración · Hito de línea base · Resumen · Tareas externas · Hito inactivo
División crítica · División · solo el comienzo · Línea base · Hito · Resumen manual · Hito externo · Resumen inactivo
Progreso de tarea crítica · Progreso de tarea · solo fin · División de la línea base · Progreso del resumen · Resumen del proyecto · Tarea inactiva · Fecha límite

Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	% Avance Conciliado	% Avance Programado (% PV)	% Avance Ejecutado conciliado (% EV))	Comienzo	Fin	Predecesoras
3064	1.5.1.1.6.8	Implementación del Plan de Gestión de residuos de construcción y demolición RCD	238 días	54,63	21,218%	54,630%	vie 2/01/26	sáb 10/10/26	3057CC
3065	1.5.1.1.6.9	Protección y mantenimiento de especies arbóreas del área de intervención	238 días	54,63	21,218%	54,630%	vie 2/01/26	sáb 10/10/26	3057CC
3066	1.5.1.1.6.10	Revisar el estado de los sumideros existentes en la zona de actividades de las obras acorde al procedimiento contemplado en el MAO	238 días	54,63	21,218%	54,630%	vie 2/01/26	sáb 10/10/26	3057CC
3067	1.5.1.1.6.11	Limpieza y protección de sumideros del tramo intervenido Según Aplique .	238 días	54,63	21,218%	54,630%	vie 2/01/26	sáb 10/10/26	3057CC
3068	1.5.1.1.6.12	Implementación actividades avifauna (cuando aplique).	238 días	54,63	21,218%	54,630%	vie 2/01/26	sáb 10/10/26	3057CC
3069	1.5.1.1.6.13	Implementación tratamientos silviculturales.	238 días	54,63	21,218%	54,630%	vie 2/01/26	sáb 10/10/26	3057CC
3070	1.5.1.1.6.14	Monitoreo 3. calidad de aire y ruido (elaboración y entrega de informe)	238 días	54,63	21,218%	54,630%	vie 2/01/26	sáb 10/10/26	3057CC
3071	1.5.1.1.6.15	Visita de Cierre A&SST de Obra	1 día	0	0,000%	0,000%	sáb 10/10/26	mar 13/10/26	3029FC-1 día;303
3072	1.5.1.1.6.16	Informe Final	1 día	0	0,000%	0,000%	vie 9/10/26	sáb 10/10/26	3029FC-1 día;303
3073	1.5.1.1.6.17	fin Componente Ambiental	1 día	0	0,000%	0,000%	sáb 10/10/26	mar 13/10/26	3029FC-1 día;303
3074	**1.5.1.2**	**COMPONENTE SST**	**1740 días**	**0**	**97,302%**	**97,535%**	**vie 12/02/21**	**sáb 10/10/26**	
3075	**1.5.1.2.1**	**2021**	**271,38 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**vie 12/02/21**	**vie 31/12/21**	
3076	1.5.1.2.1.1	Inicio Componentes SST 2021	1,63 días	0	0,000%	0,000%	vie 12/02/21	sáb 13/02/21	8CC
3077	1.5.1.2.1.2	Informe Mensual SST	269,63 días	100	100,000%	100,000%	lun 15/02/21	vie 31/12/21	3076
3078	1.5.1.2.1.3	Informe Semanal SST	269,63 días	100	100,000%	100,000%	lun 15/02/21	vie 31/12/21	3076
3079	1.5.1.2.1.4	Visitas conjuntas y programadas de campo. Residentes SST	269,63 días	100	100,000%	100,000%	lun 15/02/21	vie 31/12/21	3076
3080	1.5.1.2.1.5	Verificación personal mínimo	269,63 días	100	100,000%	100,000%	lun 15/02/21	vie 31/12/21	3076
3081	1.5.1.2.1.6	Participación a Comités Semanales componente A&SST	269,63 días	100	100,000%	100,000%	lun 15/02/21	vie 31/12/21	3076
3082	1.5.1.2.1.7	Participación Comité Técnico integral mensual	269,63 días	100	100,000%	100,000%	lun 15/02/21	vie 31/12/21	3076
3083	1.5.1.2.1.8	Conciliación Calificaciones Semanales	269,63 días	100	100,000%	100,000%	lun 15/02/21	vie 31/12/21	3076
3084	1.5.1.2.1.9	Conciliación Calificación consolidado Mensual	269,63 días	100	100,000%	100,000%	lun 15/02/21	vie 31/12/21	3076
3085	1.5.1.2.1.10	Fin Componente SST 2021	0 días	0	0,000%	0,000%	vie 31/12/21	vie 31/12/21	3077;3078;3079;3
3086	**1.5.1.2.2**	**2022**	**308 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**lun 3/01/22**	**sáb 31/12/22**	
3087	1.5.1.2.2.1	Inicio Componentes SST 2022	1 día	0	0,000%	0,000%	lun 3/01/22	lun 3/01/22	3085
3088	1.5.1.2.2.2	Informe Mensual SST	306,88 días	100	100,000%	100,000%	mar 4/01/22	sáb 31/12/22	3087
3089	1.5.1.2.2.3	Informe Semanal SST	306,88 días	100	100,000%	100,000%	mar 4/01/22	sáb 31/12/22	3087
3090	1.5.1.2.2.4	Visitas conjuntas y programadas de campo. Residentes SST	306,88 días	100	100,000%	100,000%	mar 4/01/22	sáb 31/12/22	3087
3091	1.5.1.2.2.5	Verificación personal mínimo	306,88 días	100	100,000%	100,000%	mar 4/01/22	sáb 31/12/22	3087
3092	1.5.1.2.2.6	Participación a Comités Semanales componente A&SST	306,88 días	100	100,000%	100,000%	mar 4/01/22	sáb 31/12/22	3087
3093	1.5.1.2.2.7	Participación Comité Técnico integral mensual	306,88 días	100	100,000%	100,000%	mar 4/01/22	sáb 31/12/22	3087
3094	1.5.1.2.2.8	Conciliación Calificaciones Semanales	306,88 días	100	100,000%	100,000%	mar 4/01/22	sáb 31/12/22	3087
3095	1.5.1.2.2.9	Conciliación Calificación consolidado Mensual	306,88 días	100	100,000%	100,000%	mar 4/01/22	sáb 31/12/22	3087
3096	1.5.1.2.2.10	Fin Componente SST 2022	0 días	0	0,000%	0,000%	sáb 31/12/22	sáb 31/12/22	3087;3088;3089;3
3097	**1.5.1.2.3**	**2023**	**305,75 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**lun 2/01/23**	**sáb 30/12/23**	
3098	1.5.1.2.3.1	Inicio Componentes SST 2023	1 día	0	0,000%	0,000%	lun 2/01/23	lun 2/01/23	3096
3099	1.5.1.2.3.2	Informe Mensual SST	304,63 días	100	100,000%	100,000%	mar 3/01/23	sáb 30/12/23	3098
3100	1.5.1.2.3.3	Informe Semanal SST	304,63 días	100	100,000%	100,000%	mar 3/01/23	sáb 30/12/23	3098
3101	1.5.1.2.3.4	Visitas conjuntas y programadas de campo. Residentes SST	304,63 días	100	100,000%	100,000%	mar 3/01/23	sáb 30/12/23	3098
3102	1.5.1.2.3.5	Verificación personal mínimo	304,63 días	100	100,000%	100,000%	mar 3/01/23	sáb 30/12/23	3098
3103	1.5.1.2.3.6	Participación a Comités Semanales componente A&SST	304,63 días	100	100,000%	100,000%	mar 3/01/23	sáb 30/12/23	3098
3104	1.5.1.2.3.7	Participación Comité Técnico integral mensual	304,63 días	100	100,000%	100,000%	mar 3/01/23	sáb 30/12/23	3098
3105	1.5.1.2.3.8	Conciliación Calificaciones Semanales	304,63 días	100	100,000%	100,000%	mar 3/01/23	sáb 30/12/23	3098
3106	1.5.1.2.3.9	Conciliación Calificación consolidado Mensual	304,63 días	100	100,000%	100,000%	mar 3/01/23	sáb 30/12/23	3098
3107	1.5.1.2.3.10	Fin Componente SST 2023	0 días	0	0,000%	0,000%	sáb 30/12/23	sáb 30/12/23	3098;3099;3100;3
3108	**1.5.1.2.4**	**2024**	**307,75 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**mar 2/01/24**	**mar 31/12/24**	
3109	1.5.1.2.4.1	Inicio Componentes SST 2024	1 día	0	0,000%	0,000%	mar 2/01/24	mar 2/01/24	3107
3110	1.5.1.2.4.2	Informe Mensual SST	306,63 días	100	100,000%	100,000%	mié 3/01/24	mar 31/12/24	3109
3111	1.5.1.2.4.3	Informe Semanal SST	306,63 días	100	100,000%	100,000%	mié 3/01/24	mar 31/12/24	3109
3112	1.5.1.2.4.4	Visitas conjuntas y programadas de campo. Residentes SST	306,63 días	100	100,000%	100,000%	mié 3/01/24	mar 31/12/24	3109
3113	1.5.1.2.4.5	Verificación personal mínimo	306,63 días	100	100,000%	100,000%	mié 3/01/24	mar 31/12/24	3109
3114	1.5.1.2.4.6	Participación a Comités Semanales componente A&SST	306,63 días	100	100,000%	100,000%	mié 3/01/24	mar 31/12/24	3109
3115	1.5.1.2.4.7	Participación Comité Técnico integral mensual	306,63 días	100	100,000%	100,000%	mié 3/01/24	mar 31/12/24	3109
3116	1.5.1.2.4.8	Conciliación Calificaciones Semanales	306,63 días	100	100,000%	100,000%	mié 3/01/24	mar 31/12/24	3109
3117	1.5.1.2.4.9	Conciliación Calificación consolidado Mensual	306,63 días	100	100,000%	100,000%	mié 3/01/24	mar 31/12/24	3109
3118	1.5.1.2.4.10	Fin Componente SST 2024	0 días	0	0,000%	0,000%	sáb 28/12/24	sáb 28/12/24	3109FC-2 días;31
3119	**1.5.1.2.5**	**2025**	**307 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**lun 30/12/24**	**lun 29/12/25**	
3120	1.5.1.2.5.1	Inicio Componentes SST 2025	0 días	0	0,000%	0,000%	lun 30/12/24	lun 30/12/24	3118FC+1 día
3121	1.5.1.2.5.2	Informe Mensual SST	307 días	100	100,000%	100,000%	lun 30/12/24	lun 29/12/25	3120
3122	1.5.1.2.5.3	Informe Semanal SST	307 días	100	100,000%	100,000%	lun 30/12/24	lun 29/12/25	3120
3123	1.5.1.2.5.4	Visitas conjuntas y programadas de campo. Residentes SST	307 días	100	100,000%	100,000%	lun 30/12/24	lun 29/12/25	3120
3124	1.5.1.2.5.5	Verificación personal mínimo	307 días	100	100,000%	100,000%	lun 30/12/24	lun 29/12/25	3120
3125	1.5.1.2.5.6	Participación a Comités Semanales componente A&SST	307 días	100	100,000%	100,000%	lun 30/12/24	lun 29/12/25	3120

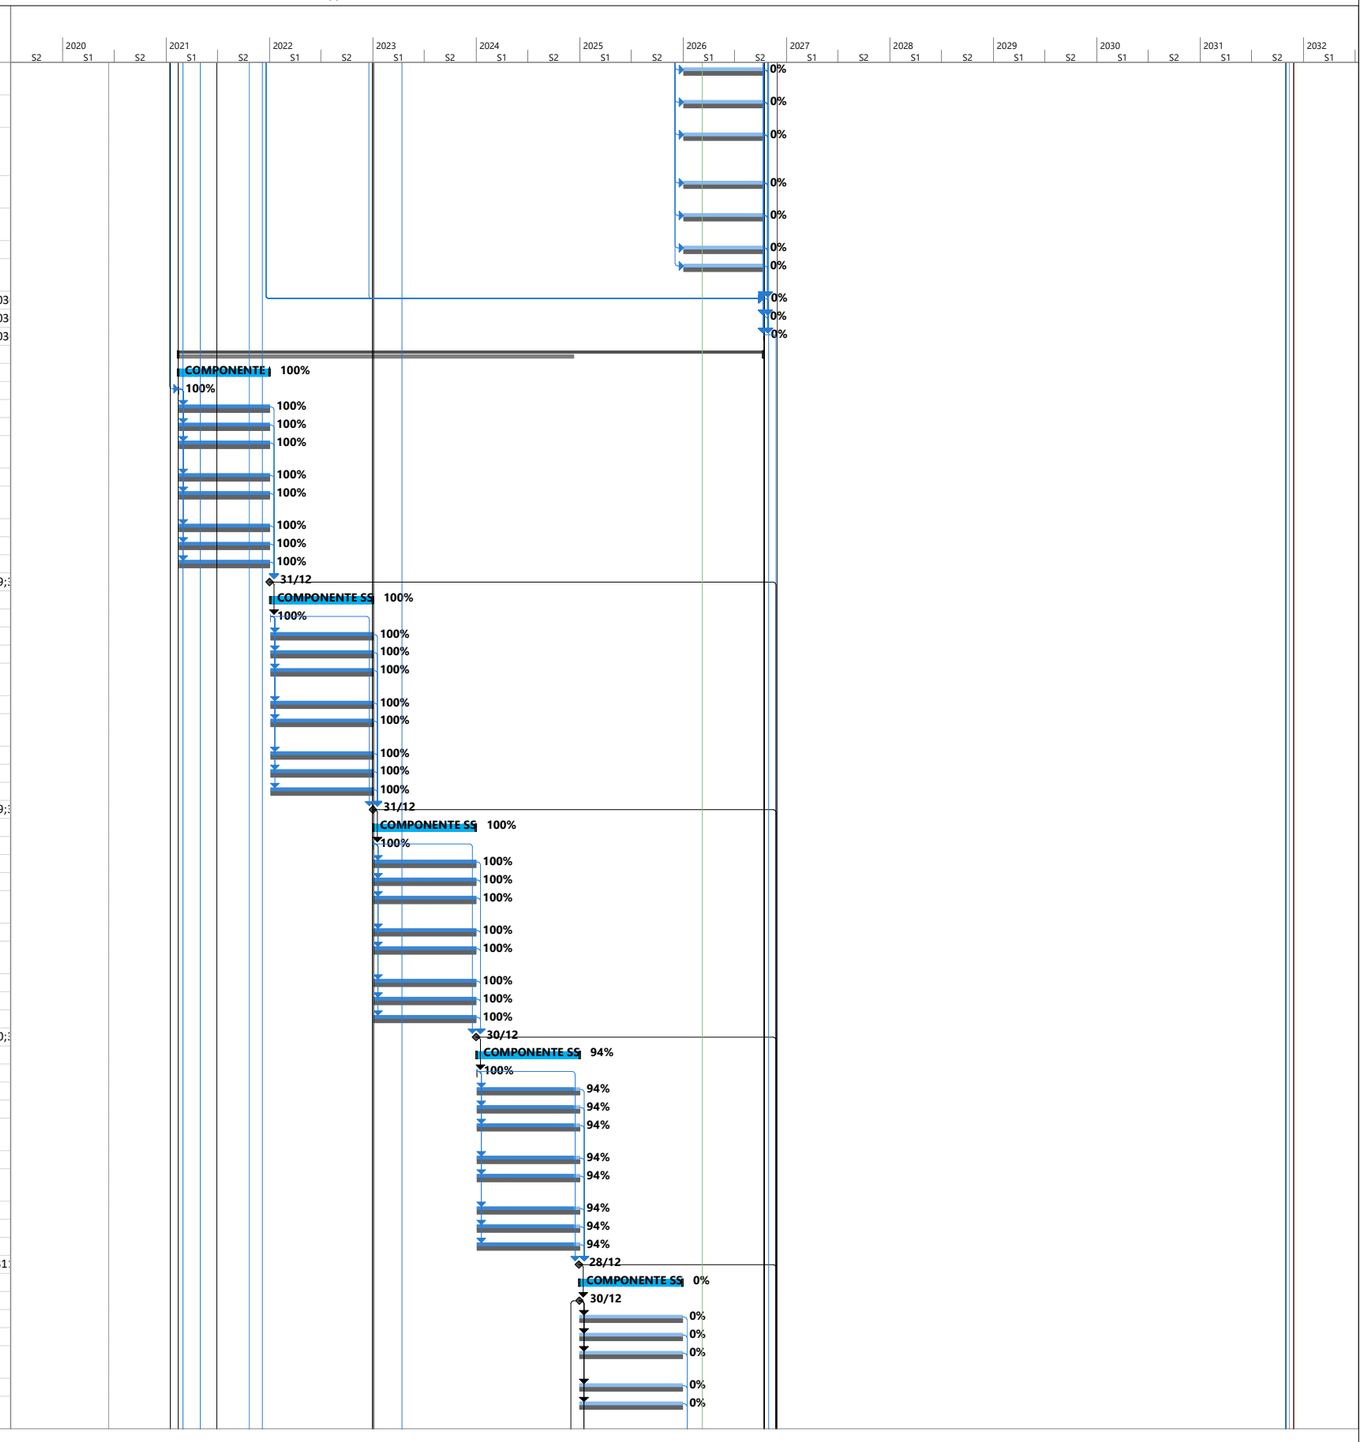


Tareas críticas · División crítica · Progreso de tarea crítica · Tarea · División · Progreso de tarea · Tarea manual · solo el comienzo · solo fin · solo duración · Línea base · División de la línea base · Hito de línea base · Hito · Progreso del resumen · Resumen · Resumen manual · Resumen del proyecto · Tareas externas · Hito externo · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Fecha límite

Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	% Avance Conciliado	% Avance Programado (% PV)	% Avance Ejecutado conciliado (% EV))	Comienzo	Fin	Predecesoras
3126	1.5.1.2.5.7	Participación Comité Técnico integral mensual	307 días	100	100,000%	100,000%	lun 30/12/24	lun 29/12/25	3120
3127	1.5.1.2.5.8	Conciliación Calificaciones Semanales	307 días	100	100,000%	100,000%	lun 30/12/24	lun 29/12/25	3120
3128	1.5.1.2.5.9	Conciliación Calificación consolidado Mensual	307 días	100	100,000%	100,000%	lun 30/12/24	lun 29/12/25	3120CC
3129	**1.5.1.2.6**	**2026**	**239 días**	**0**	**18,861%**	**25,877%**	**mié 31/12/25**	**sáb 10/10/26**	
3130	1.5.1.2.6.1	Inicio Componentes SST 2025	0 días	0	0,000%	0,000%	mié 31/12/25	mié 31/12/25	3127FC+2 días;31
3131	1.5.1.2.6.2	Informe Mensual SST	238 días	0	21,218%	0,000%	vie 2/01/26	sáb 10/10/26	3130FC+1 día
3132	1.5.1.2.6.3	Informe Semanal SST	238 días	33,27	21,218%	33,270%	vie 2/01/26	sáb 10/10/26	3131CC
3133	1.5.1.2.6.4	Visitas conjuntas y programadas de campo. Residentes SST	238 días	33,27	21,218%	33,270%	vie 2/01/26	sáb 10/10/26	3131CC
3134	1.5.1.2.6.5	Verificación personal mínimo	238 días	33,27	21,218%	33,270%	vie 2/01/26	sáb 10/10/26	3131CC
3135	1.5.1.2.6.6	Participación a Comités Semanales componente A&SST	238 días	33,27	21,218%	33,270%	vie 2/01/26	sáb 10/10/26	3131CC
3136	1.5.1.2.6.7	Participación Comité Técnico integral mensual	238 días	33,27	21,218%	33,270%	vie 2/01/26	sáb 10/10/26	3131CC
3137	1.5.1.2.6.8	Conciliación Calificaciones Semanales	238 días	33,27	21,218%	33,270%	vie 2/01/26	sáb 10/10/26	3131CC
3138	1.5.1.2.6.9	Conciliación Calificación consolidado Mensual	238 días	33,27	21,218%	33,270%	vie 2/01/26	sáb 10/10/26	3131CC
3139	1.5.1.2.5.10	Fin Componente SST 2026	0 días	0	0,000%	0,000%	sáb 10/10/26	sáb 10/10/26	3131CC+2 días;31
3140	1.5.2	COMPONENTE AMBIENTAL Y SST DE LA ETAPA DE MANTENIMIENTO	1614 días	0	0,000%	0,000%	mar 24/11/26	lun 10/11/31	2976CC+9 días;3085FC+9
3141	**1.6**	**COMPONENTE SOCIAL**	**3379,25 días**	**0**	**64,590%**	**64,778%**	**vie 12/02/21**	**mié 29/10/31**	
3142	**1.6.1**	**COMPONENTE SOCIAL ETAPA DE CONSTRUCCIÓN**	**1765,25 días**	**0**	**98,386%**	**98,674%**	**vie 12/02/21**	**mié 11/11/26**	
3143	**1.6.1.1**	**2021**	**273,75 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**vie 12/02/21**	**mié 5/01/22**	
3144	1.6.1.1.1	Inicio Componente social 2021	0 días	0	0,000%	0,000%	vie 12/02/21	vie 12/02/21	8
3145	**1.6.1.1.2**	**LÍNEA ESTRATÉGICA DE DIALOGO CIUDADANO**	**223,63 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**jue 15/04/21**	**mié 5/01/22**	
3146	1.6.1.1.2.1	PROGRAMA DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA	223,63 días	100	100,000%	100,000%	jue 15/04/21	mié 5/01/22	33
3147	1.6.1.1.2.2	PROGRAMA DE DIALOGO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	223,63 días	100	100,000%	100,000%	jue 15/04/21	mié 5/01/22	34
3148	1.6.1.1.2.3	PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO A ACTIVIDADES TÉCNICAS	223,63 días	100	100,000%	100,000%	jue 15/04/21	mié 5/01/22	35
3149	1.6.1.1.2.4	PROGRAMA DE CULTURA CIUDADANA	223,63 días	100	100,000%	100,000%	jue 15/04/21	mié 5/01/22	36
3150	1.6.1.1.2.5	PROGRAMA DE GOBERNANZA PARA LA MOVILIDAD	223,63 días	100	100,000%	100,000%	jue 15/04/21	mié 5/01/22	37
3151	**1.6.1.1.3**	**LÍNEA ESTRATÉGICA: COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA**	**270,25 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**sáb 13/02/21**	**vie 31/12/21**	
3152	1.6.1.1.3.1	PROGRAMA DE INFORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO	270,25 días	100	100,000%	100,000%	sáb 13/02/21	vie 31/12/21	3144
3153	**1.6.1.1.4**	**LÍNEA ESTRATÉGICA: MEDICIÓN DE PERCEPCIÓN CIUDADANA Y MONITOREO DE IMPACTO**	**46,5 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**mié 20/10/21**	**mar 14/12/21**	
3154	1.6.1.1.4.1	Evaluación inicial percepción ciudadana hasta antes del 10% de avance de la obra	46,5 días	100	100,000%	100,000%	mié 20/10/21	mar 14/12/21	8FC+200 días
3155	1.6.1.1.5	Fin componente Social 2021	0 días	0	0,000%	0,000%	mié 5/01/22	mié 5/01/22	3146;3147;3148;3
3156	**1.6.1.2**	**2022**	**308 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**vie 7/01/22**	**mié 4/01/23**	
3157	1.6.1.2.1	Inicio Componente social 2022	1 día	0	0,000%	0,000%	vie 7/01/22	vie 7/01/22	3155
3158	**1.6.1.2.2**	**LÍNEA ESTRATÉGICA DE DIALOGO CIUDADANO**	**306,88 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**sáb 8/01/22**	**mié 4/01/23**	
3159	1.6.1.2.2.1	PROGRAMA DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA	306,88 días	100	100,000%	100,000%	sáb 8/01/22	mié 4/01/23	3157
3160	1.6.1.2.2.2	PROGRAMA DE DIALOGO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	306,88 días	100	100,000%	100,000%	sáb 8/01/22	mié 4/01/23	3157
3161	1.6.1.2.2.3	PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO A ACTIVIDADES TÉCNICAS	306,88 días	100	100,000%	100,000%	sáb 8/01/22	mié 4/01/23	3157
3162	1.6.1.2.2.4	PROGRAMA DE CULTURA CIUDADANA	306,88 días	100	100,000%	100,000%	sáb 8/01/22	mié 4/01/23	3157
3163	1.6.1.2.2.5	PROGRAMA DE GOBERNANZA PARA LA MOVILIDAD	306,88 días	100	100,000%	100,000%	sáb 8/01/22	mié 4/01/23	3157
3164	**1.6.1.2.3**	**LÍNEA ESTRATÉGICA: COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA**	**306,88 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**sáb 8/01/22**	**mié 4/01/23**	
3165	1.6.1.2.3.1	PROGRAMA DE INFORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO	306,88 días	100	100,000%	100,000%	sáb 8/01/22	mié 4/01/23	3157
3166	1.6.1.2.4	Fin componente social 2022	0 días	0	0,000%	0,000%	mié 4/01/23	mié 4/01/23	3157;3159;3160;3
3167	**1.6.1.3**	**2023**	**305,75 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**jue 5/01/23**	**jue 4/01/24**	
3168	1.6.1.3.1	Inicio Componente social 2023	1 día	0	0,000%	0,000%	jue 5/01/23	jue 5/01/23	3166
3169	**1.6.1.3.2**	**LÍNEA ESTRATÉGICA DE DIALOGO CIUDADANO**	**304,63 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**vie 6/01/23**	**jue 4/01/24**	
3170	1.6.1.3.2.1	PROGRAMA DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA	304,63 días	100	100,000%	100,000%	vie 6/01/23	jue 4/01/24	3168
3171	1.6.1.3.2.2	PROGRAMA DE DIALOGO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	304,63 días	100	100,000%	100,000%	vie 6/01/23	jue 4/01/24	3168
3172	1.6.1.3.2.3	PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO A ACTIVIDADES TÉCNICAS	304,63 días	100	100,000%	100,000%	vie 6/01/23	jue 4/01/24	3168
3173	1.6.1.3.2.4	PROGRAMA DE CULTURA CIUDADANA	304,63 días	100	100,000%	100,000%	vie 6/01/23	jue 4/01/24	3168
3174	1.6.1.3.2.5	PROGRAMA DE GOBERNANZA PARA LA MOVILIDAD	304,63 días	100	100,000%	100,000%	vie 6/01/23	jue 4/01/24	3168
3175	**1.6.1.3.3**	**LÍNEA ESTRATÉGICA: COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA**	**304,63 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**vie 6/01/23**	**jue 4/01/24**	
3176	1.6.1.3.3.1	PROGRAMA DE INFORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO	304,63 días	100	100,000%	100,000%	vie 6/01/23	jue 4/01/24	3168
3177	**1.6.1.3.4**	**LÍNEA ESTRATÉGICA: MEDICIÓN DE PERCEPCIÓN CIUDADANA Y MONITOREO DE IMPACTO**	**46,5 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**jue 13/04/23**	**mar 6/06/23**	
3178	1.6.1.3.4.1	Evaluación intermedia percepción ciudadana entre el 50% y 60% de avance de obra.	46,5 días	100	100,000%	100,000%	jue 13/04/23	mar 6/06/23	8FC+639 días
3179	1.6.1.3.5	Fin componente Social 2023	0 días	0	0,000%	0,000%	jue 4/01/24	jue 4/01/24	3168;3170;3171;3
3180	**1.6.1.4**	**2024**	**303,38 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**vie 5/01/24**	**lun 30/12/24**	
3181	1.6.1.4.1	Inicio Componente social 2024	1 día	0	0,000%	0,000%	vie 5/01/24	vie 5/01/24	3179
3182	**1.6.1.4.2**	**LÍNEA ESTRATÉGICA DE DIALOGO CIUDADANO**	**302,25 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**sáb 6/01/24**	**lun 30/12/24**	
3183	1.6.1.4.2.1	PROGRAMA DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA	302,25 días	100	100,000%	100,000%	sáb 6/01/24	lun 30/12/24	3181

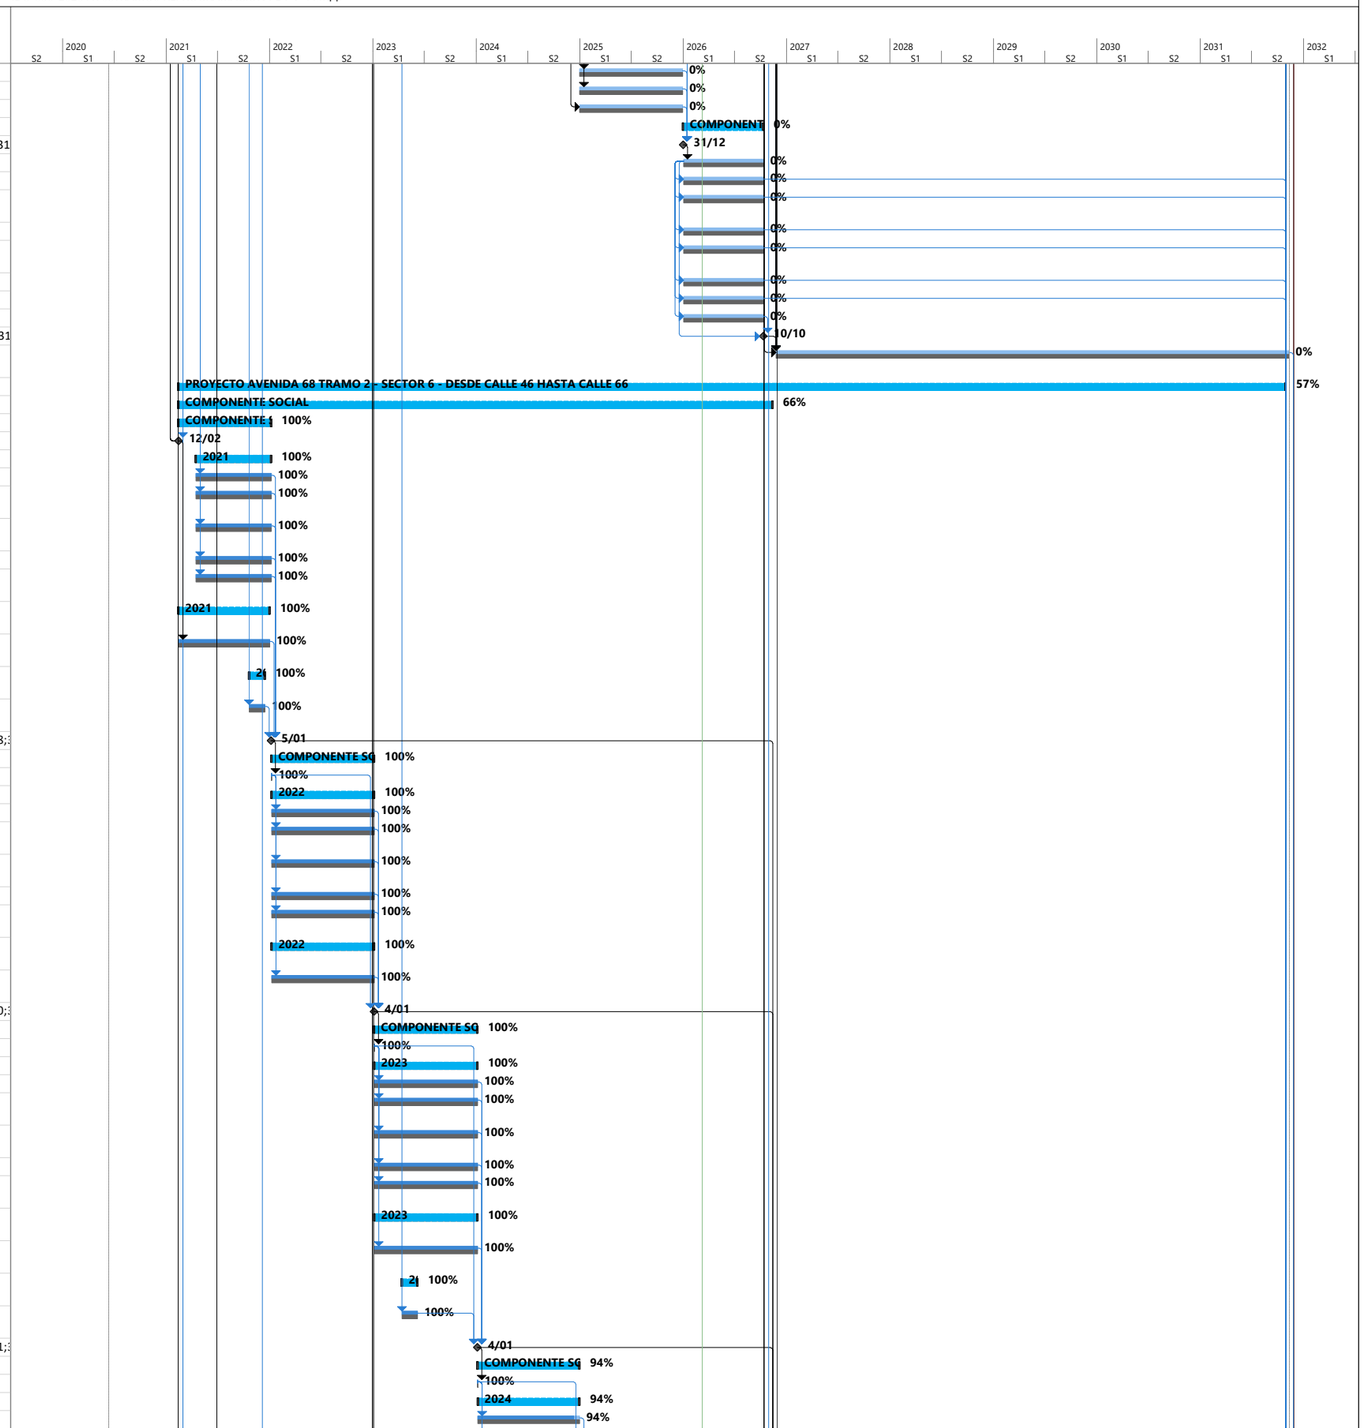


Tareas críticas · Tarea · Tarea manual · solo duración · Hito de línea base · Resumen · Tareas externas · Hito inactivo
División crítica · División · solo el comienzo · Línea base · Hito · Resumen manual · Hito externo · Resumen inactivo
Progreso de tarea crítica · Progreso de tarea · solo fin · División de la línea base · Progreso del resumen · Resumen del proyecto · Tarea inactiva · Fecha límite

Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	% Avance Conciliado	% Avance Programado (% PV)	% Avance Ejecutado conciliado (% EV))	Comienzo	Fin	Predecesoras
3184	1.6.1.4.2.2	PROGRAMA DE DIALOGO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	302,25 días	100	100,000%	100,000%	sáb 6/01/24	lun 30/12/24	3181
3185	1.6.1.4.2.3	PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO A ACTIVIDADES TÉCNICAS	302,25 días	100	100,000%	100,000%	sáb 6/01/24	lun 30/12/24	3181
3186	1.6.1.4.2.4	PROGRAMA DE CULTURA CIUDADANA	302,25 días	100	100,000%	100,000%	sáb 6/01/24	lun 30/12/24	3181
3187	1.6.1.4.2.5	PROGRAMA DE GOBERNANZA PARA LA MOVILIDAD	302,25 días	100	100,000%	100,000%	sáb 6/01/24	lun 30/12/24	3181
3188	**1.6.1.4.3**	**LÍNEA ESTRATÉGICA: COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA**	**302,25 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**sáb 6/01/24**	**lun 30/12/24**	
3189	1.6.1.4.3.1	PROGRAMA DE INFORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO	302,25 días	100	100,000%	100,000%	sáb 6/01/24	lun 30/12/24	3181
3190	1.6.1.4.4	Fin componente Social 2024	0 días	0	0,000%	0,000%	lun 30/12/24	lun 30/12/24	3181;3183;3184;3
3191	**1.6.1.5**	**2025**	**306 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**mar 31/12/24**	**lun 29/12/25**	
3192	1.6.1.5.1	Inicio Componente social 2025	1 día	0	0,000%	0,000%	mar 31/12/24	jue 2/01/25	3190FC+1 día
3193	**1.6.1.5.2**	**LÍNEA ESTRATÉGICA DE DIALOGO CIUDADANO**	**306 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**mar 31/12/24**	**lun 29/12/25**	
3194	1.6.1.5.2.1	PROGRAMA DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA	306 días	100	100,000%	100,000%	mar 31/12/24	lun 29/12/25	3192CC
3195	1.6.1.5.2.2	PROGRAMA DE DIALOGO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	306 días	100	100,000%	100,000%	mar 31/12/24	lun 29/12/25	3192CC
3196	1.6.1.5.2.3	PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO A ACTIVIDADES TÉCNICAS	306 días	100	100,000%	100,000%	mar 31/12/24	lun 29/12/25	3192CC
3197	1.6.1.5.2.4	PROGRAMA DE CULTURA CIUDADANA	306 días	100	100,000%	100,000%	mar 31/12/24	lun 29/12/25	3192CC
3198	1.6.1.5.2.5	PROGRAMA DE GOBERNANZA PARA LA MOVILIDAD	306 días	100	100,000%	100,000%	mar 31/12/24	lun 29/12/25	3192CC
3199	**1.6.1.5.3**	**LÍNEA ESTRATÉGICA: COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA**	**306 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**mar 31/12/24**	**lun 29/12/25**	
3200	1.6.1.5.3.1	PROGRAMA DE INFORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO	306 días	100	100,000%	100,000%	mar 31/12/24	lun 29/12/25	3192CC
3201	1.6.1.5.4	Fin componente Social 2025	0 días	0	0,000%	0,000%	lun 29/12/25	lun 29/12/25	3192;3194;3195;3
3202	**1.6.1.5**	**2026**	**188 días**	**0**	**19,434%**	**33,770%**	**lun 29/12/25**	**mar 11/08/26**	
3203	1.6.1.5.1	Inicio Componente social 2026	1 día	0	0,000%	0,000%	lun 29/12/25	mar 30/12/25	3201
3204	**1.6.1.5.2**	**LÍNEA ESTRATÉGICA DE DIALOGO CIUDADANO**	**265 días**	**0**	**19,434%**	**33,770%**	**mié 31/12/25**	**mié 11/11/26**	
3205	1.6.1.5.2.1	PROGRAMA DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA	265 días	33,77	19,434%	33,770%	mié 31/12/25	mié 11/11/26	3203FC+1 día
3206	1.6.1.5.2.2	PROGRAMA DE DIALOGO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	265 días	33,77	19,434%	33,770%	mié 31/12/25	mié 11/11/26	3203FC+1 día
3207	1.6.1.5.2.3	PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO A ACTIVIDADES TÉCNICAS	265 días	33,77	19,434%	33,770%	mié 31/12/25	mié 11/11/26	3203FC+1 día
3208	1.6.1.5.2.4	PROGRAMA DE CULTURA CIUDADANA	265 días	33,77	19,434%	33,770%	mié 31/12/25	mié 11/11/26	3203FC+1 día
3209	1.6.1.5.2.5	PROGRAMA DE GOBERNANZA PARA LA MOVILIDAD	265 días	33,77	19,434%	33,770%	mié 31/12/25	mié 11/11/26	3203FC+1 día
3210	**1.6.1.5.3**	**LÍNEA ESTRATÉGICA: COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA**	**265 días**	**0**	**19,434%**	**33,770%**	**mié 31/12/25**	**mié 11/11/26**	
3211	1.6.1.5.3.1	PROGRAMA DE INFORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO	265 días	33,77	19,434%	33,770%	mié 31/12/25	mié 11/11/26	3203FC+1 día
3212	1.6.1.5.4	Fin componente Social 2026	0 días	0	0,000%	0,000%	mié 11/11/26	mié 11/11/26	3203;3205;3206;3
3213	1.6.2	COMPONENTE SOCIAL ETAPA DE MANTENIMIENTO	1612 días	0	0,000%	0,000%	vie 13/11/26	mié 29/10/31	2976FC+1 día;315
3214	**1.7**	**COMPONENTE TRANSITO**	**3391,25 días**	**0**	**81,417%**	**81,756%**	**vie 12/02/21**	**mar 11/11/31**	
3215	**1.7.1**	**COMPONENTE DE TRANSITO ETAPA DE CONSTRUCCIÓN**	**1766,25 días**	**0**	**98,482%**	**98,892%**	**vie 12/02/21**	**mié 11/11/26**	
3216	**1.7.1.1**	**2021**	**272,5 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**vie 12/02/21**	**lun 3/01/22**	
3217	1.7.1.1.1	Inicio componente Tránsito 2021	0 días	0	0,000%	0,000%	vie 12/02/21	vie 12/02/21	8
3218	1.7.1.1.2	Actividades de PMT Transicional	270,25 días	0	0,000%	0,000%	sáb 13/02/21	vie 31/12/21	3217
3219	1.7.1.1.3	Montaje PMT Transicional	10,63 días	100	100,000%	100,000%	lun 22/11/21	jue 2/12/21	55
3220	1.7.1.1.4	Mantenimiento Rutinario - Ajuste Y/O Reposición De Señales Y Demás Elementos Que Componen Los PMT Específicos del proyecto.	270,25 días	100	100,000%	100,000%	sáb 13/02/21	vie 31/12/21	3217
3221	1.7.1.1.5	Personal Dedicado Al Diseño, Implementación Y Seguimiento Del PMT de bajo impacto	271,38 días	100	100,000%	100,000%	vie 12/02/21	vie 31/12/21	6
3222	1.7.1.1.6	Personal Dedicado Al Diseño, Implementación Y Seguimiento Del PMT	271,38 días	100	100,000%	100,000%	vie 12/02/21	vie 31/12/21	6
3223	1.7.1.1.7	Personal De Apoyo	271,38 días	100	100,000%	100,000%	vie 12/02/21	vie 31/12/21	6
3224	1.7.1.1.8	Acciones De Contingencia	270,25 días	100	100,000%	100,000%	sáb 13/02/21	vie 31/12/21	3217
3225	1.7.1.1.9	Estudios De Monitoreo Al Plan De Manejo De Tránsito de alto impacto, Señalización Y Desvíos, Para Su Evaluación Y Retroalimentación.	171,38 días	100	100,000%	100,000%	mar 15/06/21	lun 3/01/22	47
3226	1.7.1.1.10	Entrega De Informes Mensuales De Tránsito	247,5 días	100	100,000%	100,000%	jue 11/03/21	vie 31/12/21	3217FC+22 días
3227	1.7.1.1.11	Evaluación Semanal	271,38 días	100	100,000%	100,000%	vie 12/02/21	vie 31/12/21	6
3228	1.7.1.1.12	Comité Semanal	271,38 días	100	100,000%	100,000%	vie 12/02/21	vie 31/12/21	6
3229	1.7.1.1.13	Fin Componente Tránsito 2021	0 días	0	0,000%	0,000%	lun 3/01/22	lun 3/01/22	3218;3220;3221;3
3230	**1.7.1.2**	**2022**	**308 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**lun 3/01/22**	**sáb 31/12/22**	
3231	1.7.1.2.1	Inicio componente Tránsito 2022	1 día	0	0,000%	0,000%	lun 3/01/22	lun 3/01/22	3229FC-1 día
3232	1.7.1.2.2	Montaje PMT Calle 63 - Calle 66 Calzada oriental lenta	306,88 días	100	100,000%	100,000%	mar 4/01/22	sáb 31/12/22	3231
3233	1.7.1.2.3	Montaje PMT Armonizado Calle 46 - Calle 66 Calzada oriental lenta	306,88 días	100	100,000%	100,000%	mar 4/01/22	sáb 31/12/22	3231
3234	1.7.1.2.4	Montaje PMT Armonizado Complementario Calle 46 - Calle 66 Calzada oriental lenta (1 carril)	306,88 días	100	0,000%	0,000%	mar 4/01/22	sáb 31/12/22	3231
3235	1.7.1.2.5	Mantenimiento Rutinario - Ajuste Y/O Reposición De Señales Y Demás Elementos Que Componen Los PMT Específicos del proyecto.	306,88 días	100	100,000%	100,000%	mar 4/01/22	sáb 31/12/22	3231
3236	1.7.1.2.6	Personal Dedicado Al Diseño, Implementación Y Seguimiento Del PMT de bajo impacto	306,88 días	100	100,000%	100,000%	mar 4/01/22	sáb 31/12/22	3231

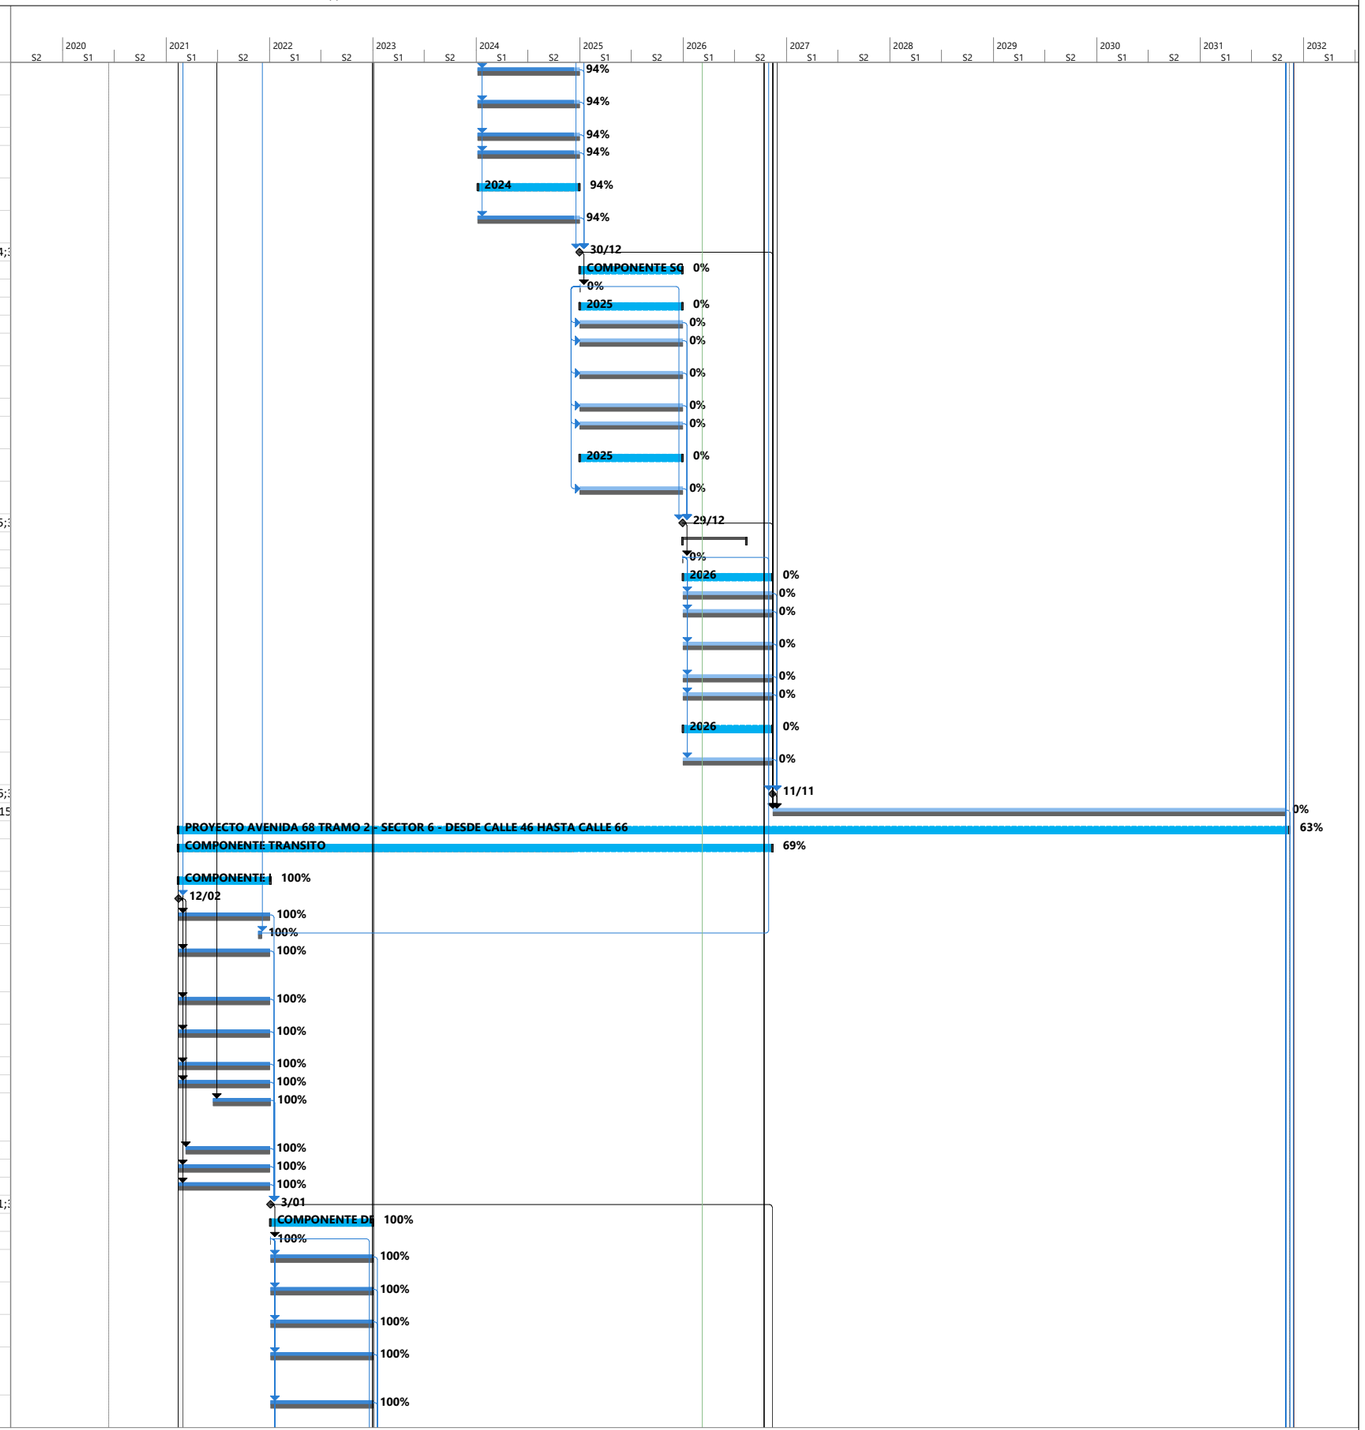


Tareas críticas · Tarea · Tarea manual · solo duración · Hito de línea base · Resumen · Tareas externas · Hito inactivo
División crítica · División · solo el comienzo · Línea base · Hito · Resumen manual · Hito externo · Resumen inactivo
Progreso de tarea crítica · Progreso de tarea · solo fin · División de la línea base · Progreso del resumen · Resumen del proyecto · Tarea inactiva · Fecha límite

Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	% Avance Conciliado	% Avance Programado (% PV)	% Avance Ejecutado conciliado (% EV))	Comienzo	Fin	Predecesoras
3237	1.7.1.2.7	Personal Dedicado Al Diseño, Implementación Y Seguimiento Del PMT	306,88 días	100	100,000%	100,000%	mar 4/01/22	sáb 31/12/22	3231
3238	1.7.1.2.8	Personal De Apoyo	306,88 días	100	100,000%	100,000%	mar 4/01/22	sáb 31/12/22	3231
3239	1.7.1.2.9	Acciones De Contingencia	306,88 días	100	100,000%	100,000%	mar 4/01/22	sáb 31/12/22	3231
3240	1.7.1.2.10	Estudios De Monitoreo Al Plan De Manejo De Tránsito de alto impacto, Señalización Y Desvíos, Para Su Evaluación Y Retroalimentación.	306,88 días	100	100,000%	100,000%	mar 4/01/22	sáb 31/12/22	3231
3241	1.7.1.2.11	Entrega De Informes Mensuales De Tránsito	306,88 días	100	100,000%	100,000%	mar 4/01/22	sáb 31/12/22	3231
3242	1.7.1.2.12	Evaluación Semanal	306,88 días	100	100,000%	100,000%	mar 4/01/22	sáb 31/12/22	3231
3243	1.7.1.2.13	Comité Semanal	306,88 días	100	100,000%	100,000%	mar 4/01/22	sáb 31/12/22	3231
3244	1.7.1.2.14	Fin Componente Tránsito 2022	0 días	0	0,000%	0,000%	sáb 31/12/22	sáb 31/12/22	3231;3232;3233;3
3245	**1.7.1.3**	**2023**	**305,75 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**lun 2/01/23**	**sáb 30/12/23**	
3246	1.7.1.3.1	Inicio componente Tránsito 2023	1 día	0	0,000%	0,000%	lun 2/01/23	lun 2/01/23	3244
3247	1.7.1.3.2	Mantenimiento Rutinario - Ajuste Y/O Reposición De Señales Y Demás Elementos Que Componen Los PMT Específicos del proyecto.	304,63 días	100	100,000%	100,000%	mar 3/01/23	sáb 30/12/23	3246
3248	1.7.1.3.3	Personal Dedicado Al Diseño, Implementación Y Seguimiento Del PMT de bajo impacto	304,63 días	100	100,000%	100,000%	mar 3/01/23	sáb 30/12/23	3246
3249	1.7.1.3.4	Personal Dedicado Al Diseño, Implementación Y Seguimiento Del PMT	304,63 días	100	100,000%	100,000%	mar 3/01/23	sáb 30/12/23	3246
3250	1.7.1.3.5	Personal De Apoyo	304,63 días	100	100,000%	100,000%	mar 3/01/23	sáb 30/12/23	3246
3251	1.7.1.3.6	Acciones De Contingencia	304,63 días	100	100,000%	100,000%	mar 3/01/23	sáb 30/12/23	3246
3252	1.7.1.3.7	Estudios De Monitoreo Al Plan De Manejo De Tránsito de alto impacto, Señalización Y Desvíos, Para Su Evaluación Y Retroalimentación.	304,63 días	100	100,000%	100,000%	mar 3/01/23	sáb 30/12/23	3246
3253	1.7.1.3.8	Entrega De Informes Mensuales De Tránsito	304,63 días	100	100,000%	100,000%	mar 3/01/23	sáb 30/12/23	3246
3254	1.7.1.3.9	Evaluación Semanal	304,63 días	100	100,000%	100,000%	mar 3/01/23	sáb 30/12/23	3246
3255	1.7.1.3.10	Comité Semanal	304,63 días	100	100,000%	100,000%	mar 3/01/23	sáb 30/12/23	3246
3256	1.7.1.3.11	Fin Componente Tránsito 2023	0 días	0	0,000%	0,000%	sáb 30/12/23	sáb 30/12/23	3246;3247;3248;3
3257	**1.7.1.4**	**2024**	**307,75 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**mar 2/01/24**	**mar 31/12/24**	
3258	1.7.1.4.1	Inicio componente Tránsito 2024	1 día	0	0,000%	0,000%	mar 2/01/24	mar 2/01/24	3256
3259	1.7.1.4.2	Mantenimiento Rutinario - Ajuste Y/O Reposición De Señales Y Demás Elementos Que Componen Los PMT Específicos del proyecto.	306,63 días	100	100,000%	100,000%	mié 3/01/24	mar 31/12/24	3258
3260	1.7.1.4.3	Personal Dedicado Al Diseño, Implementación Y Seguimiento Del PMT de bajo impacto	306,63 días	100	100,000%	100,000%	mié 3/01/24	mar 31/12/24	3258
3261	1.7.1.4.4	Personal Dedicado Al Diseño, Implementación Y Seguimiento Del PMT	306,63 días	100	100,000%	100,000%	mié 3/01/24	mar 31/12/24	3258
3262	1.7.1.4.5	Personal De Apoyo	306,63 días	100	100,000%	100,000%	mié 3/01/24	mar 31/12/24	3258
3263	1.7.1.4.6	Acciones De Contingencia	306,63 días	100	100,000%	100,000%	mié 3/01/24	mar 31/12/24	3258
3264	1.7.1.4.7	Estudios De Monitoreo Al Plan De Manejo De Tránsito de alto impacto, Señalización Y Desvíos, Para Su Evaluación Y Retroalimentación.	306,63 días	100	100,000%	100,000%	mié 3/01/24	mar 31/12/24	3258
3265	1.7.1.4.8	Entrega De Informes Mensuales De Tránsito	306,63 días	100	100,000%	100,000%	mié 3/01/24	mar 31/12/24	3258
3266	1.7.1.4.9	Evaluación Semanal	306,63 días	100	100,000%	100,000%	mié 3/01/24	mar 31/12/24	3258
3267	1.7.1.4.10	Comité Semanal	306,63 días	100	100,000%	100,000%	mié 3/01/24	mar 31/12/24	3258
3268	1.7.1.4.11	Fin Componente Tránsito 2024	0 días	0	0,000%	0,000%	mar 31/12/24	mar 31/12/24	3258;3259;3260;3
3269	**1.7.1.5**	**2025**	**307 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**lun 30/12/24**	**lun 29/12/25**	
3270	1.7.1.5.1	Inicio componente Tránsito 2025	0 días	0	0,000%	0,000%	lun 30/12/24	lun 30/12/24	3268CC-1 día
3271	1.7.1.5.2	Mantenimiento Rutinario - Ajuste Y/O Reposición De Señales Y Demás Elementos Que Componen Los PMT Específicos del proyecto.	307 días	100	100,000%	100,000%	lun 30/12/24	lun 29/12/25	3270
3272	1.7.1.5.3	Personal Dedicado Al Diseño, Implementación Y Seguimiento Del PMT de bajo impacto	307 días	100	100,000%	100,000%	lun 30/12/24	lun 29/12/25	3270
3273	1.7.1.5.4	Personal Dedicado Al Diseño, Implementación Y Seguimiento Del PMT	307 días	100	100,000%	100,000%	lun 30/12/24	lun 29/12/25	3270
3274	1.7.1.5.5	Personal De Apoyo	307 días	100	100,000%	100,000%	lun 30/12/24	lun 29/12/25	3270
3275	1.7.1.5.6	Acciones De Contingencia	307 días	100	100,000%	100,000%	lun 30/12/24	lun 29/12/25	3270
3276	1.7.1.5.7	Estudios De Monitoreo Al Plan De Manejo De Tránsito de alto impacto, Señalización Y Desvíos, Para Su Evaluación Y Retroalimentación.	307 días	100	100,000%	100,000%	lun 30/12/24	lun 29/12/25	3270
3277	1.7.1.5.8	Entrega De Informes Mensuales De Tránsito	307 días	100	100,000%	100,000%	lun 30/12/24	lun 29/12/25	3270
3278	1.7.1.5.9	Evaluación Semanal	307 días	100	100,000%	100,000%	lun 30/12/24	lun 29/12/25	3270
3279	1.7.1.5.10	Comité Semanal	307 días	100	100,000%	100,000%	lun 30/12/24	lun 29/12/25	3270
3280	1.7.1.5.11	Fin Componente Tránsito 2025	0 días	0	0,000%	0,000%	lun 29/12/25	lun 29/12/25	3270;3271;3272;3
3281	**1.7.1.5**	**2026**	**265 días**	**0**	**19,129%**	**40,970%**	**mié 31/12/25**	**mié 11/11/26**	
3282	1.7.1.5.1	Inicio componente Tránsito 2026	0 días	0	0,000%	0,000%	mié 31/12/25	mié 31/12/25	3280CC+2 días
3283	1.7.1.5.2	Mantenimiento Rutinario - Ajuste Y/O Reposición De Señales Y Demás Elementos Que Componen Los PMT Específicos del proyecto.	264 días	40,97	19,129%	40,970%	vie 2/01/26	mié 11/11/26	3282FC+1 día
3284	1.7.1.5.3	Personal Dedicado Al Diseño, Implementación Y Seguimiento Del PMT de bajo impacto	264 días	40,97	19,129%	40,970%	vie 2/01/26	mié 11/11/26	3282FC+1 día
3285	1.7.1.5.4	Personal Dedicado Al Diseño, Implementación Y Seguimiento Del PMT	264 días	40,97	19,129%	40,970%	vie 2/01/26	mié 11/11/26	3282FC+1 día
3286	1.7.1.5.5	Personal De Apoyo	264 días	40,97	19,129%	40,970%	vie 2/01/26	mié 11/11/26	3282FC+1 día
3287	1.7.1.5.6	Acciones De Contingencia	264 días	40,97	19,129%	40,970%	vie 2/01/26	mié 11/11/26	3282FC+1 día
3288	1.7.1.5.7	Estudios De Monitoreo Al Plan De Manejo De Tránsito de alto impacto, Señalización Y Desvíos, Para Su Evaluación Y Retroalimentación.	264 días	40,97	19,129%	40,970%	vie 2/01/26	mié 11/11/26	3282FC+1 día
3289	1.7.1.5.8	Entrega De Informes Mensuales De Tránsito	264 días	40,97	19,129%	40,970%	vie 2/01/26	mié 11/11/26	3282FC+1 día
3290	1.7.1.5.9	Evaluación Semanal	264 días	40,97	19,129%	40,970%	vie 2/01/26	mié 11/11/26	3282FC+1 día

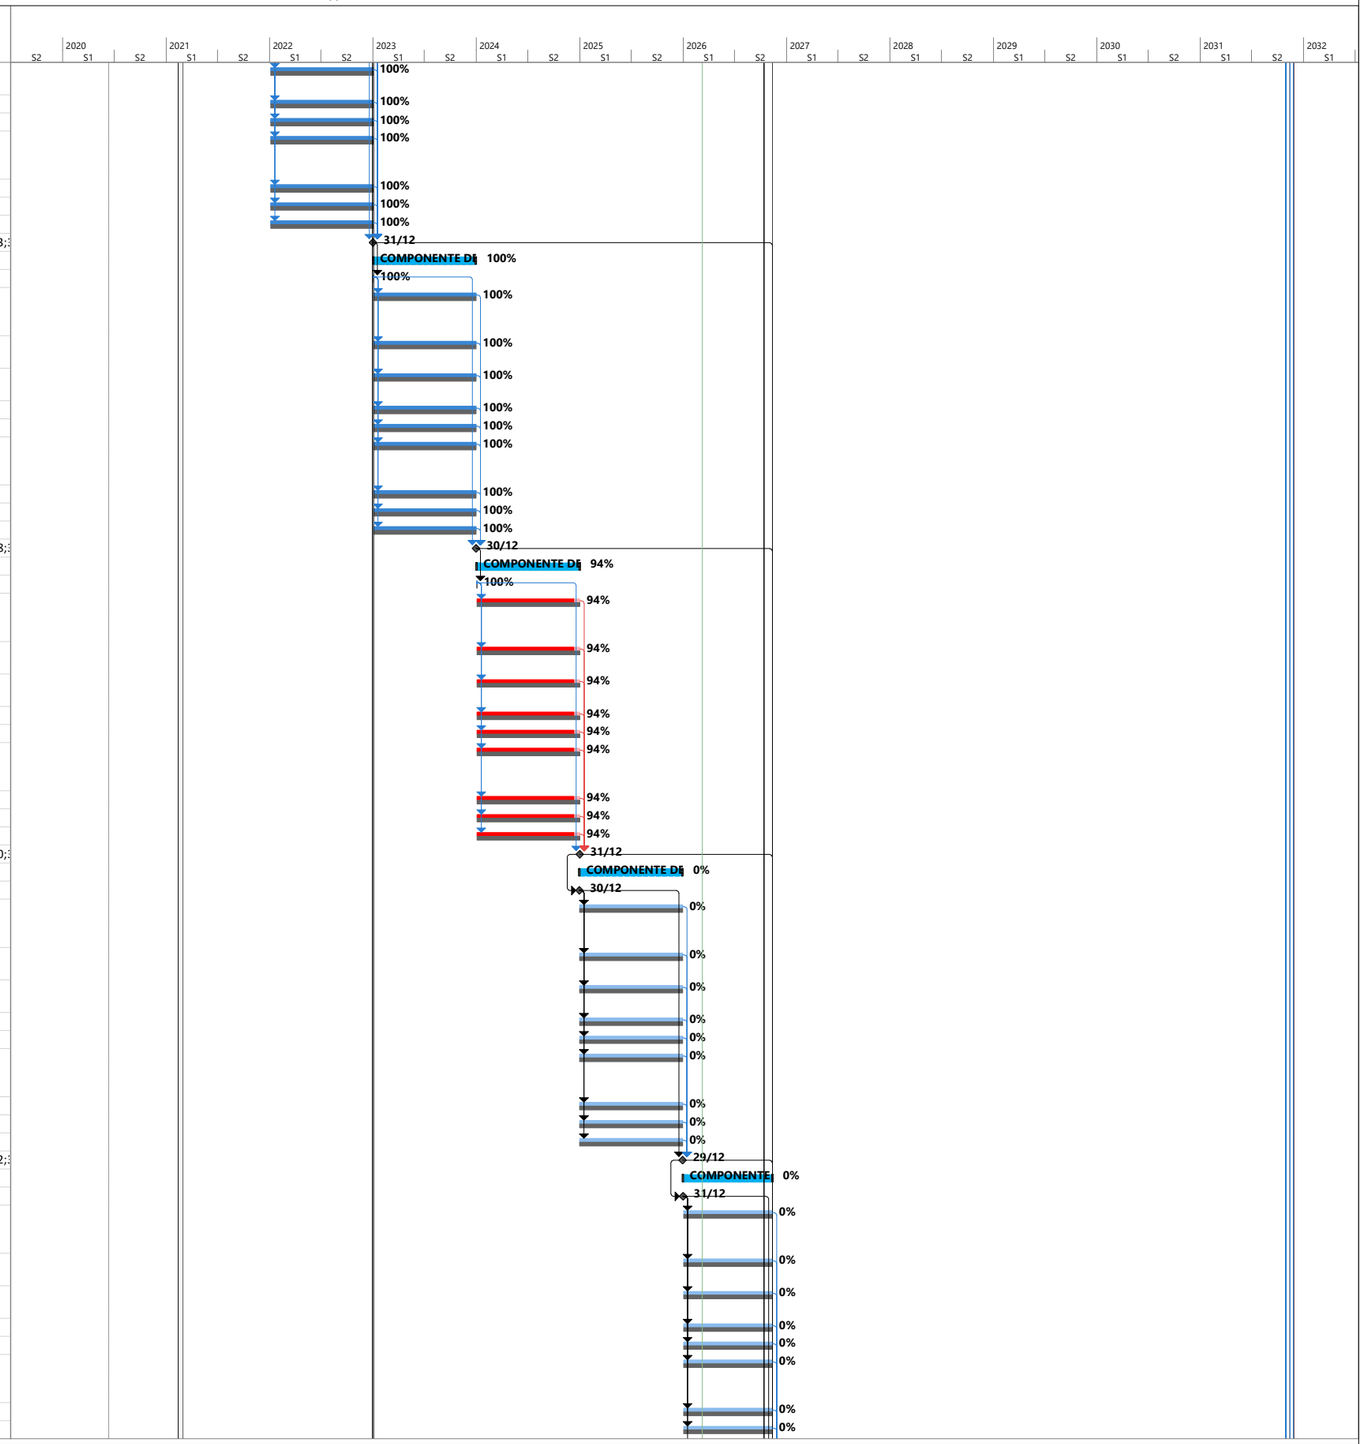

Tareas críticas · Tarea · Tarea manual · solo duración · Hito de línea base · Resumen · Tareas externas · Hito inactivo
División crítica · División · solo el comienzo · Línea base · Hito · Resumen manual · Hito externo · Resumen inactivo
Progreso de tarea crítica · Progreso de tarea · solo fin · División de la línea base · Progreso del resumen · Resumen del proyecto · Tarea inactiva · Fecha límite

Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	% Avance Conciliado	% Avance Programado (% PV)	% Avance Ejecutado conciliado (% EV))	Comienzo	Fin	Predecesoras
3291	1.7.1.5.10	Comité Semanal	264 días	40,97	19,129%	40,970%	vie 2/01/26	mié 11/11/26	3282FC+1 día
3292	1.7.1.5.11	Fin Componente Tránsito 2026	0 días	0	0,000%	0,000%	mié 11/11/26	mié 11/11/26	3282;3283;3284;3
3293	1.7.2	COMPONENTE DE TRANSITO ETAPA DE MANTENIMIENTO	1625 días	0	0,000%	0,000%	mié 11/11/26	mar 11/11/31	2976CC-1 día;3229FC-1
3294	**1.8**	**REMUNERACIONES DEL FONDO DE COMPENSACIONES**	**1712,75 días**	**0**	**18,137%**	**19,695%**	**vie 12/02/21**	**jue 10/09/26**	
3295	1.8.1	FONDO DE COMPENSACIONES ETAPA DE PRECONSTRUCCIÓN	206 días	100	100,000%	100,000%	vie 12/02/21	jue 14/10/21	2FC+197 días
3296	**1.8.2**	**FONDO DE COMPENSACIONES ETAPA DE CONSTRUCCIÓN**	**1712,75 días**	**0**	**18,108%**	**19,667%**	**vie 12/02/21**	**jue 10/09/26**	
3297	**1.8.2.1**	**2021**	**270,5 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**vie 12/02/21**	**vie 31/12/21**	
3298	1.8.2.1.1	febrero a julio	141 días	100	100,000%	100,000%	vie 12/02/21	sáb 31/07/21	6
3299	1.8.2.1.2	agosto a diciembre	129 días	100	100,000%	100,000%	lun 2/08/21	vie 31/12/21	3298
3300	**1.8.2.2**	**2022**	**27 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**lun 12/09/22**	**mar 11/10/22**	
3301	1.8.2.2.9	Septiembre	27 días	100	100,000%	100,000%	lun 12/09/22	mar 11/10/22	3299FC+205 días
3302	**1.8.2.3**	**2023**	**195 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**vie 12/05/23**	**mar 2/01/24**	
3303	1.8.2.3.1	Mayo	25 días	100	100,000%	100,000%	vie 12/05/23	sáb 10/06/23	3301FC+173 días
3304	1.8.2.4.6	Junio	23 días	100	100,000%	100,000%	mar 13/06/23	mar 11/07/23	3303
3305	1.8.2.4.7	Julio	26 días	100	100,000%	100,000%	mié 12/07/23	vie 11/08/23	3304
3306	1.8.2.4.8	Agosto	25 días	100	100,000%	100,000%	sáb 12/08/23	lun 11/09/23	3305
3307	1.8.2.4.9	Septiembre	27 días	100	100,000%	100,000%	mar 12/09/23	mié 11/10/23	3306
3308	1.8.2.4.10	Octubre	25 días	100	100,000%	100,000%	jue 12/10/23	sáb 11/11/23	3307
3309	1.8.2.4.11	Noviembre	23 días	100	100,000%	100,000%	mar 14/11/23	lun 11/12/23	3308
3310	1.8.2.4.12	Diciembre	17 días	100	100,000%	100,000%	mar 12/12/23	mar 2/01/24	3309
3311	**1.8.2.4**	**2024**	**398,5 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**sáb 2/09/23**	**mié 18/12/24**	
3312	1.8.2.4.1	Enero	26 días	100	100,000%	100,000%	sáb 2/09/23	lun 2/10/23	3310FC-99 días
3313	1.8.2.4.2	Febrero	26 días	100	100,000%	100,000%	mar 3/10/23	mié 1/11/23	3312
3314	1.8.2.4.3	Marzo	24 días	100	100,000%	100,000%	jue 2/11/23	vie 1/12/23	3313
3315	1.8.2.4.4	Abril	25 días	100	100,000%	100,000%	jue 2/11/23	sáb 2/12/23	3314FC-24 días
3316	1.8.2.4.5	Mayo	23 días	100	100,000%	100,000%	mar 5/12/23	mié 3/01/24	3315FC+1 día
3317	1.8.2.4.6	Junio	26 días	100	100,000%	100,000%	mié 20/03/24	lun 22/04/24	3316FC+64 días
3318	1.8.2.4.7	Julio	24 días	100	100,000%	100,000%	mar 23/04/24	mié 22/05/24	3317
3319	1.8.2.4.8	Agosto	26 días	100	100,000%	100,000%	jue 23/05/24	lun 24/06/24	3318
3320	1.8.2.4.9	Septiembre	27 días	100	100,000%	100,000%	mar 25/06/24	vie 26/07/24	3319
3321	1.8.2.4.10	Octubre	23 días	100	100,000%	100,000%	sáb 27/07/24	sáb 24/08/24	3320
3322	1.8.2.4.11	Noviembre	27 días	100	100,000%	100,000%	lun 26/08/24	mar 24/09/24	3321
3323	1.8.2.4.12	Diciembre	25 días	100	100,000%	100,000%	mié 20/11/24	mié 18/12/24	3322FC+45 días
3324	**1.8.2.5**	**2025**	**319 días**	**0**	**100,000%**	**100,000%**	**jue 19/12/24**	**vie 2/01/26**	
3325	1.8.2.5.1	Enero	24 días	100	100,000%	100,000%	mié 29/01/25	mar 25/02/25	3323FC+34 días
3326	1.8.2.4.2	Febrero	57 días	100	100,000%	100,000%	jue 19/12/24	mar 25/02/25	3323FC+1 día
3327	1.8.2.4.3	Marzo	24 días	100	100,000%	100,000%	mié 26/02/25	mié 26/03/25	3326FC+2 días
3328	1.8.2.4.4	Abril	25 días	100	100,000%	100,000%	mié 26/02/25	jue 27/03/25	3327FC-24 días
3329	1.8.2.4.5	Mayo	24 días	100	100,000%	100,000%	vie 28/03/25	lun 28/04/25	3328FC+1 día
3330	1.8.2.4.6	Junio	26 días	100	100,000%	100,000%	mié 16/07/25	vie 15/08/25	3329FC+67 días
3331	1.8.2.4.7	Julio	24 días	100	100,000%	100,000%	vie 15/08/25	vie 12/09/25	3330
3332	1.8.2.4.8	Agosto	26 días	100	100,000%	100,000%	lun 15/09/25	mar 14/10/25	3331FC+1 día
3333	1.8.2.4.9	Septiembre	26 días	100	100,000%	100,000%	jue 16/10/25	mar 18/11/25	3332FC+2 días
3334	1.8.2.4.10	Octubre	15 días	100	100,000%	100,000%	mar 18/11/25	jue 4/12/25	3333
3335	1.8.2.4.11	Noviembre	15 días	100	100,000%	100,000%	vie 5/12/25	mar 23/12/25	3334FC+1 día
3336	1.8.2.4.12	Diciembre	6 días	100	100,000%	100,000%	mié 24/12/25	vie 2/01/26	3335FC+1 día
3337	**1.8.2.4**	**2026**	**129 días**	**0**	**47,000%**	**100,000%**	**sáb 3/01/26**	**jue 4/06/26**	
3338	1.8.2.4.1	Enero	26 días	100	100,000%	100,000%	sáb 3/01/26	mar 3/02/26	3336FC+1 día
3339	1.8.2.4.2	Febrero	25 días	100	88,000%	100,000%	mié 4/02/26	mié 4/03/26	3338FC+1 día
3340	1.8.2.4.3	Marzo	24 días	100	0,000%	100,000%	jue 5/03/26	lun 6/04/26	3339FC+1 día
3341	1.8.2.4.4	Abril	25 días	100	0,000%	100,000%	lun 6/04/26	mar 5/05/26	3340
3342	1.8.2.4.4	Mayo	26 días	100	0,000%	100,000%	mié 6/05/26	jue 4/06/26	3341FC+1 día
3343	1.8.2.6	PROVISIÓN DE LA ETAPA MAYORES CANTIDADES DE OBRA (SI APLICA)	0 días	1,2	0,000%	1,200%	jue 10/09/26	jue 10/09/26	3312FC+80 días;3338FC+80
3344	1.9	FONDO DE COMPENSACIONES ETAPA DE MANTENIMIENTO	1604 días	0	0,000%	0,000%	vie 13/11/26	lun 20/10/31	2976CC+1 día;3325CC+1 día
3345	**1.1**	**REMUNERACIÓN DE ENSAYOS DE LABORATORIO**	**1184,88 días**	**0**	**18,767%**	**0,000%**	**mar 3/01/23**	**mié 11/11/26**	
3346	1.10.3	2023	305 días	0	100,000%	0,000%	mar 3/01/23	mar 2/01/24	47FC+461 días
3347	1.10.4	2024	308 días	0	100,000%	0,000%	mié 3/01/24	jue 2/01/25	3346
3348	1.10.5	2025	307 días	0	100,000%	0,000%	vie 3/01/25	vie 2/01/26	3347FC+1 día
3349	1.10.5	2026	262 días	0	18,750%	0,000%	sáb 3/01/26	mié 11/11/26	3348FC+1 día
3350	**1.11**	**REMUNERACIÓN COMPENSACIONES SDA**	**1187,88 días**	**0**	**19,374%**	**0,000%**	**vie 30/12/22**	**mié 11/11/26**	
3351	1.11.3	2023	305 días	0	100,000%	0,000%	vie 30/12/22	jue 28/12/23	47FC+458 días
3352	1.11.4	2024	308 días	0	100,000%	0,000%	vie 29/12/23	sáb 28/12/24	3351
3353	1.11.5	2025	311 días	0	100,000%	0,000%	lun 30/12/24	vie 2/01/26	3352
3354	1.11.5	2026	262 días	0	18,702%	0,000%	sáb 3/01/26	mié 11/11/26	3353FC+1 día
3355	**1.12**	**REMUNERACIÓN OBRAS ESPECIALES**	**1186,88 días**	**0**	**19,084%**	**0,000%**	**vie 30/12/22**	**mar 10/11/26**	
3356	1.12.3	2023	305 días	0	0,000%	0,000%	vie 30/12/22	jue 28/12/23	47FC+458 días
3357	1.12.4	2024	308 días	0	0,000%	0,000%	vie 29/12/23	sáb 28/12/24	3356
3358	1.12.5	2025	308 días	0	0,000%	0,000%	jue 2/01/25	vie 2/01/26	3357FC+3 días
3359	1.12.5	2026	262 días	0	19,084%	0,000%	vie 2/01/26	mar 10/11/26	3358
3360	1.13	FIN DEL PROYECTO	0 días	0	0,000%	0,000%	mar 11/11/31	mar 11/11/31	1067;1087;1820;1

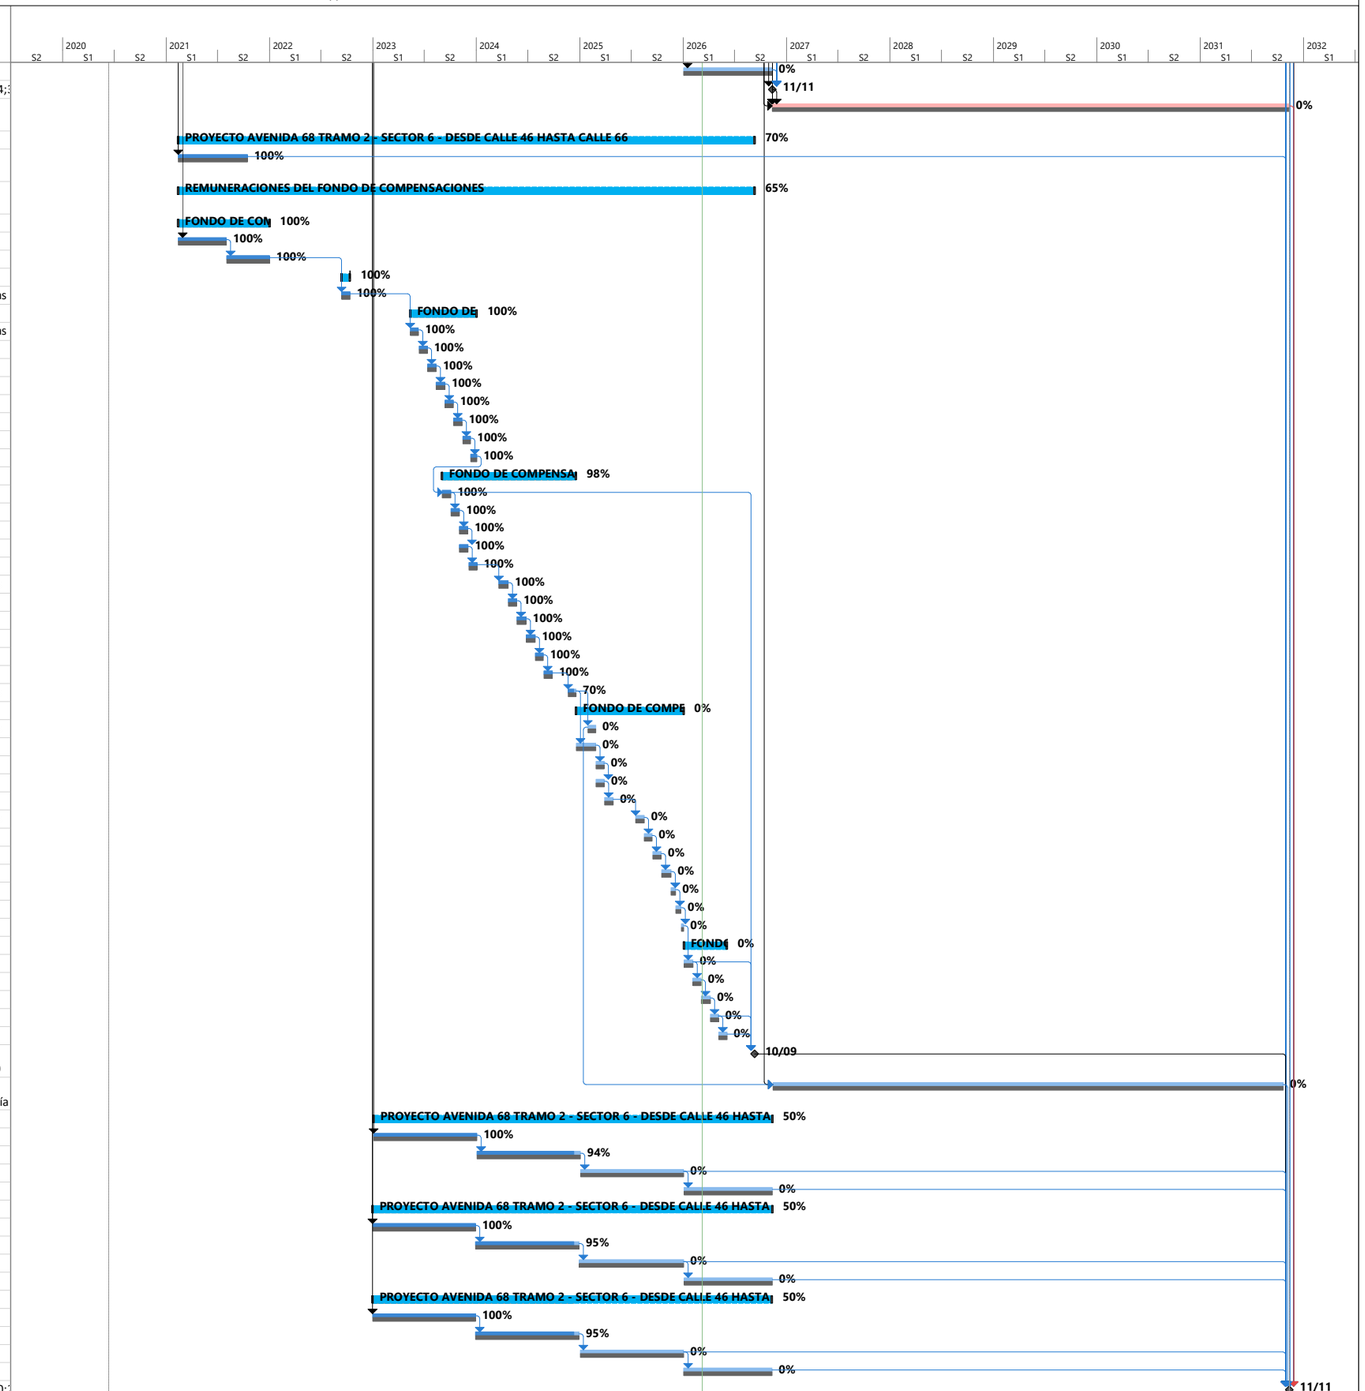

Tareas críticas · Tarea · Tarea manual · solo duración · Hito de línea base · Resumen · Tareas externas · Hito inactivo
División crítica · División · solo el comienzo · Línea base · Hito · Resumen manual · Hito externo · Resumen inactivo
Progreso de tarea crítica · Progreso de tarea · solo fin · División de la línea base · Progreso del resumen · Resumen del proyecto · Tarea inactiva · Fecha límite
