526

GOBERNACION DEL MAGDALENA

NIT: 800103920-6

ORDEN DE PAGO

Estado: Aprobado

Vigencia Fiscal: 2026

Tipo de orden: Proveedor

Orden de Pago No. 2845

Lugar y Fecha:	SANTA MARTA 10-04-2026 Obligación SPGR:
Tipo de Orden:	Proveedor
Pagado a:	CONSORCIO CENTRO CAMBIA NIU/C.C.: 901936019-5
Documento:	Contrato CO-0782-2025
Concepto:	ACTA PARCIAL #6 DELCONTRATO: CO-0782-2025 CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA."

Documentos

Fuente: FN Nro. Fue. CCB 6 Per. Fue. 202604

Nro. CxP: 4144 Tipo CxP: 78 CONTRATO CONSTRUCCION OBRA - PROY INVERSION

Valor Bruto: 2,518,277,080.92

Imputación Presupuestal

Registros	Rubro Presupuestal	Descripción	Valor
202601-50101	R-0300-3-22020708-2.3.2.1.1.1.2.7-983	EDIFICIOS EDUCATIVOS	2,518,277,080.92
		Total Presupuesto:	2,518,277,080.92

Descuentos y otros		Valores	%
Valor Bruto		2,518,277,080.92	
Valor IVA:		0.00	
Base Gravable		2,518,277,080.92	
Deducciones	Base		
Retencion - Contratos Obra	2,518,277,080.92	50,365,542.00	2.0
Pro Deporte Y Recreacion 1%	2,518,277,080.92	25,182,771.00	1.0
Procultura 2%	2,518,277,080.92	50,365,542.00	2.0
Prohospital Universitario	2,518,277,080.92	50,365,542.00	2.0
Prodesarrollo 1%	2,518,277,080.92	25,182,771.00	1.0
Problenestar Adulto Mayor 3%	2,518,277,080.92	75,548,312.00	3.0
Fondo Seguridad Ciudadana 5%	2,518,277,080.92	125,913,854.00	5.0
Refundacion Unimagdalena 2%	2,518,277,080.92	50,365,542.00	2.0
Reteica 6 X Mil	2,518,277,080.92	15,109,662.00	0.6
Total Deducciones		*468,399,538.00*	
Anticipos / Amortizaciones		*0.00*	
Valor Neto Ctas Por Pagar		*2,049,877,542.92*	

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24400401	0.00	15,109,662.00	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
24403502	0.00	25,182,771.00	ESTAMPILLA PRO DESARROLLO
24403504	0.00	25,182,771.00	ESTAMPILLA PRO DEPORTES
24072201	0.00	50,365,542.00	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL
24072202	0.00	50,365,542.00	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD
24362601	0.00	50,365,542.00	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN
24403501	0.00	50,365,542.00	ESTAMPILLA PRO CULTURA
24403503	0.00	75,548,312.00	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR
24070301	0.00	125,913,854.00	FONDO DE SEGURIDAD CIUDADANA
24010201	0.00	2,049,877,542.92	PROYECTOS DE INVERSIÓN
54230201	2,518,277,080.92	0.00	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN
TOTALES	2,518,277,080.92	2,518,277,080.92	

Revisado Por:
Ana Leidis Ayala Alvarino - Contratista

Wilson Carbonó Mendoza - Contratista

8:00 Am
14 ABR 2026


María Margarita Guerra Z.

MARÍA MARGARITA GUERRA ZÚÑIGA
GOBERNADORA
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

ALFONSO MIGUEL RUIZ GOMEZ
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 22205
CONTADOR PUBLICO - T.P. 93699-T

Original - Tesorería, 1 Copia - Proveedor o Contratista

Imprime: ALFONSO.RUIZ Elaboró: ALFONSO.RUIZ



CONSORCIO CENTRO CAMBIA
NIT. 901936019-5

CONTRATO N° 0782 DE 2025 - "CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA"

ACTA PARCIAL 6

CONTENIDO

ACTA PARCIAL
MEMORIAS DE CANTIDADES

SOPORTES

1. CDP y RP
2. CONTRATO SECOP
3. CLAUSULAS ADICIONALES
4. ACTA DE INICIO
5. POLIZAS
6. APROBACIONES DE POLIZAS
7. INFORME DEL CONTRATISTA
8. INFORME DEL SUPERVISOR
9. CEDULA REPRESENTANTE LEGAL y RUT
10. FACTURA
11. CERTIFICACION BANCARIA
12. CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES
13. FORMATO DEL SIA OBSERVA

CDP

REPÚBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACION DEL MAGDALENA
800103920-6

Fecha
31-01-2025
CDP
359

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
VIGENCIA FISCAL 2025

SE EXPIDE ESTE CERTIFICADO A SOLICITUD DE:

NOMBRE VARGAS CORVACHO EFRAIN DE JESUS
CARGO: SECRETARIO DE DESPACHO 02006
CÓDIGO BPIN: 20240002470037

QUE RESPALDA EL COMPROMISO:

CONSTRUCCION DE LA SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA

POR VALOR 35,000,000,000.00

Rubro	Nombre	Disponibilidad
0300-3-22020708-2.3.2.1.1.1.2.7-983	Edificios Educativos	32,142,179,439.00
0300-3-22020708-2.3.2.2.2.8.30-983	Otros Servicios Profesionales Científicos Y Técnicos	1,054,589,170.00
0300-3-22020708-2.3.2.2.2.8.33-983	Servicios De Ingeniería	1,803,231,391.00

983 RECURSOS DE CREDITO ORDENANZA 169 DE 2024 35,000,000,000.00

Dado en SANTA MARTA a los 31 días del mes de enero del 2025

VILLA ORTIZ ARLENIS
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 22205

Revisado 09/04/26.

Gobernación del Magdalena
09/04/2026 10:00 Folios: 215 Anexos: 0
Remite: Señores CONSORCIO CENTRO CAMBIA
Destinatario: AREA FUNCIONAL DE CONTABILIDAD
Asunto: CTA 06 CTO 0782-25 CONCSORCIO CENTRO CAMBIA
R-2026-12118

[PREREP15GM]

Elaboró: MARIA MOSQUERA

Imprimo: MARIA MOSQUERA

SPGR

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprometido

Usuario Solicitante:	MHdrangel	DENIS RANGEL LOZANO
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	02-47000	DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
Fecha y Hora Sistema:	2026-02-19 2:52 p. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Número:	18125	Fecha Registro:	2026-02-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	02-47000 DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo:	Gasto		
Valor Inicial:	15.000.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual:	15.000.000.000,00	Saldo x Comprometer:	15.000.000.000,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número:	18125	Fecha Registro:	2026-02-19	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	

VIGENCIA ANTERIOR

Previene Vigencia Anterior:	NO	CDP:		Compromiso:		Obligación:	

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO / RECURSO	SITUACION
02-47000 DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	00AR-2201-0700-2025-00247-0002 DESARROLLO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CONSTRUCCION DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL CENTRO CAMBIA EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA	Nación	AN47000	CSP

DETALLE MOVIMIENTOS

FECHA / OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
2026-02-19				
Total:	15.000.000.000,00	0,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00

Objeto:	DESARROLLO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CONSTRUCCION DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL CENTRO CAMBIA EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA

Firma Responsable

Gobernación del MAGDALENA

AÑO	MES	DIA
2025	01	31

SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DE INVERSION

EDP359

Gobernación del Magdalena
[illegible]
Fecha: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Dependencia: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
Asunto: SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DE INVERSION

OBJETO	VALOR
CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA RADICACIÓN BANCO DE PROYECTOS: SI X (Anexar Constancia) NO ____ CÓDIGO BPIN No. 2024000247003	$ 35.000.000.000 RUBRO PRESUPUESTAL • 0300-3-22020708-2.3.2. 1.1.1. 2.7-983 • 0300-3-22020708-2.3.2. 2.2.8. 30-983 • 0300-3-22020708-2.3.2. 2.2.8. 33-983 • EDIFICIOS EDUCATIVOS - $32.142.179.439 • OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS - $1.054.589.170 • SERVICIOS DE INGENIERIA - $1.803.231.391

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA SOLICITUD

NOMBRE: EFRAIN DE JESUS VARGAS CORVACHO CARGO: SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

Vo.Bo. JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
NOMBRE: LANCASTER TEJEDA ESCORCIA

Secretaría de Hacienda
Fecha:
Hora: 10:55 AM
Recibido por: [illegible]

JENNY CAMACHO NEUTO
Jefe Oficina de Contratación

YESSIKA HERNANDEZ CANATE
Secretaria de Hacienda Dptal (E).

Gobernación del MAGDALENA

EL ÁREA DEL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DEPARTAMENTAL ADSCRITA A LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

CERTIFICA QUE:

El siguiente proyecto "CONSTRUCCION DE LA SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA", se encuentra en el sistema Unificado de Inversiones y Finanzas – SUIFP- TERRITORIO establecido por el Departamento Nacional de Planeación – DNP a través de la resolución 4788 de 2016 y está en concordancia con el Plan de Desarrollo Departamental Ruta del Cambio para Superar la Pobreza 2024-2027.

Que, el valor del proyecto de inversión cuenta con la siguiente fuente de financiación:

ENTIDAD	*Gobernación del Magdalena*	
Código Bpin	2024002470037	Valor del proyecto de inversión
VALOR TOTAL DEL PROYECTO		$ 35.000.000.000

Y está en concordancia con el *Plan de Desarrollo Departamental Ruta del Cambio para Superar la Pobreza 2024-2027*, así:

REVOLUCION	Revolución de Equidad
MOVILIZACION	Educación para Superar la Pobreza
PROGRAMA	Cambio por la Educación Superior, Técnica y Formación para el Trabajo y el Desarrollo Humano
ACCION(ES)	Construir (4) sedes universitarias en Buritaca (Santa Marta), Santa Ana, Aracataca, y Ciénaga.

Para constancia de lo anterior, se firma en el Santa Marta D.T.C e H a los 5 días del mes julio del año 2024.

ALONSO AMADOR GOSSOLLO
Jefe de la Oficina Asesora de Planeación
Gobernación del Magdalena

Proyectó: Yarlenis Castillo - Contratista BPID

Gobernación del
MAGDALENA

Santa Marta, D.T.C.H, 03 de mayo de 2024

I-20244033
07 MAYO 2024
3:34 pm

Señor
EFRAIN DE JESUS VARGAS CORVACHO
Secretario de Infraestructura
Gobernación del Magdalena
E. S. D

REF: Proyecto Registrado en el Banco de Proyectos de Inversión Departamental

Cordial Saludo:

Me permito informar que el proyecto "CONSTRUCCION DE LA SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA", ha sido registrando al Banco de Proyectos de Inversión departamental, con el código 2024002470037

Atentamente,

ALONSO ANDRÉS AMADOR COGOLLO
Jefe de la Oficina de Planeación

Revisó: Oscar Escobar – Contratista BPID
Proyectó: Yarlenis Criollo- Contratista BPID

Gobernación del
MAGDALENA

EL ÁREA DEL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DEPARTAMENTAL ADSCRITA A LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

CERTIFICA QUE:

El siguiente proyecto "CONSTRUCCION DE LA SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA", se encuentra en el sistema Unificado de Inversiones y Finanzas – SUIFP- TERRITORIO establecido por el Departamento Nacional de Planeación – DNP a través de la resolución 4788 de 2016 y está en concordancia con el Plan de Desarrollo Departamental Ruta del Cambio para Superar la Pobreza 2024-2027.

Que, el valor del proyecto de Inversión cuenta con la siguiente fuente de financiación:

ENTIDAD	*Gobernación del Magdalena*	
Código Bpin	2024002470037	Valor del proyecto de inversión
VALOR TOTAL DEL PROYECTO		$ 50.000.000.000

Y está en concordancia con el *Plan de Desarrollo Departamental Ruta del Cambio para Superar la Pobreza 2024-2027*, así:

REVOLUCION	Revolución de Equidad
MOVILIZACION	Educación para Superar la Pobreza
PROGRAMA	Cambio por la Educación Superior, Técnica y Formación para el Trabajo y el Desarrollo Humano

El proyecto está contemplado en el Plan Plurianual de Inversiones 2024-2027 del Plan de Desarrollo.

Para constancia de lo anterior, se firma en Santa Marta D.T.C e H a los 5 días del mes julio del año 2024.

ALONSO AMADOR COGOLLO
Jefe de la Oficina Asesora de Planeación
Gobernación del Magdalena

Proyectó: Yarlenis Castillo - Contratista SPID

Fecha
19-02-2025
CDP
25181

REPÚBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACION DEL MAGDALENA
800103928-6

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
VIGENCIA FISCAL 2025

SE EXPIDE ESTE CERTIFICADO A SOLICITUD DE:

NOMBRE VARGAS CORVACHO EFRAIN DE JESUS
CARGO: SECRETARIO DE DESPACHO 02006
CÓDIGO BPIN: 20250024700002

QUE RESPALDA EL COMPROMISO:

DESARROLLO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CONSTRUCCION DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL CENTRO CAMBIA EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA

POR VALOR 15,000,000,000.00

Rubro	Nombre	Disponibilidad
00AR.2201.0700.2025.00247.0002.01-732	Desarrollo De Obras Complementarias De La Construccion De Sede Universitaria Subregional Centro Cambia En El Municipio De Cienaga Magdalena	15,000,000,000.00

732 ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - DEPARTAMENTOS 15,000,000,000.00

Dado en SANTA MARTA a los 19 días del mes de febrero del 2025.

RUIZ GOMEZ ALFONSO MIGUEL
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 22205

[PREREPISGM]

Elaboró: MARIANELA PONNEFZ

Imprimer: MARIANELA PONNEFZ

AÑO	MES	DIA
2025	02	12

SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DE INVERSIÓN

Gobernación del Magdalena
12/02/2025 15:40 Folios: 1 Anexos: 1
Remite: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Destinatario: OFICINA ASESORA DE PLANEACION
Asunto: SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DE INVERSION
I-2025-01140

1812.25

OBJETO	VALOR
	$15.000.000.000
DESARROLLO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL CENTRO CAMBIA EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA RADICACIÓN BANCO DE PROYECTOS: SI X (Anexar Constancia) NO _____ CÓDIGO BPIN No. 2025002470002	RUBRO PRESUPUESTAL 00AR.2201.0700.2025.00247.0002.01-732
	DESARROLLO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL CENTRO CAMBIA EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA– ($15.000.000.000)

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA SOLICITUD

NOMBRE: EFRAIN DE JESUS VARGAS CORVACHO CARGO: SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

Vo.Bo. JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
NOMBRE: LANCASTER TEJEDA ESCORCIA

JENNY CAMACHO NEUTO
Jefe Oficina de Contratación

YESSIKA HERNANDEZ CAÑATE
Secretaria de Hacienda Dptal (E).

DECRETO No. 41 DE 07 FEB 2025

100.7

"POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA UNA INCORPORACIÓN DE RECURSOS EN EL CAPITULO INDEPENDIENTE DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS PARA EL BIENIO 2025 – 2026 DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA".

Que el Artículo 2.1.1.8.4. del Decreto 1821 de 2020, indicó que en aplicación del artículo 160 de la Ley 2056 de 2020, las entidades territoriales beneficiarias de asignaciones directas y las designadas como ejecutoras de un proyecto, incorporarán al capítulo presupuestal independiente bienal que se encuentre en ejecución, mediante Decreto expedido por el Gobernador, el monto de los recursos de los proyectos de inversión aprobados en la bienalidad del Sistema General de Regalías por la entidad o instancia competente, según corresponda, como también las adiciones, modificaciones, reducciones, aplazamientos y en general las operaciones presupuestales correspondientes a partidas del SGR del capítulo de regalías dentro de los presupuestos de las entidades territoriales, se harán por Decreto del Gobernador y se soportarán, en lo pertinente, en decisiones previamente adoptadas por la entidad o instancia competente, según corresponda.

Que el Artículo 35 de la Ley 2056 de 2020 "Por la cual se regula la organización y el funcionamiento del Sistema General de Regalías" estableció que *"la priorización y aprobación de los proyectos de inversión de la Asignación para la Inversión Regional, en cabeza de los departamentos, estará a cargo de los respectivos departamentos."*

Que el Literal a del Artículo 1.2.1.2.1.1. del Decreto 1281 de 2020 señala que *"las entidades territoriales beneficiarias serán las encargadas de priorizar y aprobar los proyectos de inversión que se financiarán con cargos a los recursos de Asignaciones Directas y de la Asignación para la Inversión Local, y que se encuentren contenidos en el capítulo "Inversiones con cargo al SGR" del respectivo Plan de Desarrollo Territorial"*, priorización que *"se realizará conforme con lo establecido en el Artículo 36 de la Ley 2056 de 2020."*

Que en concordancia con las disposiciones citadas, el Gobernador del Departamento del Magdalena expidió Decreto 025 del 24 de enero de 2025 *"POR EL CUAL SE PRIORIZA Y APRUEBA PROYECTO DE INVERSIÓN A FINANCIARSE CON RECURSOS DEL 60% DE LA ASIGNACIÓN PARA LA INVERSION REGIONAL DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS – SGR- DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, SE DESIGNA SU EJECUTOR Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"*

Que mediante el Decreto 025 del 24 de enero de 2025, el Departamento del Magdalena priorizó y aprobó el proyecto denominado ***DESARROLLO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA*** con código **BPIN 2025002470002** por un valor de **QUINCE MIL MILLONES DE PESOS M/CTE. ($15.000.000.000,00)**, con recursos del SGR Asignación para la Inversión Regional – Departamentos 60%, como se detalla a continuación:

DECRETO No. 044 DE 07 FEB 2025

100-20

"POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA UNA INCORPORACIÓN DE RECURSOS EN EL CAPITULO INDEPENDIENTE DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS PARA EL BIENIO 2025 – 2026 DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA"

Código BPIN	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
2025002470002	DESARROLLO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA	EDUCACIÓN	FACTIBILIDAD – FASE 3	$15.000.000.000,00
Fuentes	Tipo de recurso		Cronograma MGA	Valor
Departamento del Magdalena	SGR – Asignación para la Inversión Regional 60%		Bienalidad 2025-2026	$15.000.000.000,00
Entidad Pública Ejecutora del Proyecto	Departamento del Magdalena		Instancia encargada de contratar la interventoría del proyecto	Departamento del Magdalena
Valor Ejecución	$15.000.000.000,00		Valor Interventoría	$ 1.803.231.391,00
Plazo de ejecución física y financiera	Catorce (14) meses		Bienio en el que se reciben los bienes y servicios	2025 – 2026
Cumplió requisitos generales y sectoriales, atendiendo las disposiciones establecidas por el acuerdo único de la comisión rectora del Sistema General de Regalías				

Que teniendo en cuenta lo anterior, se hace necesario incorporar al presupuesto correspondiente a la bienalidad 2025 – 2026 del Capítulo Independiente del Sistema General de Regalías, los recursos aprobados en el Decreto 025 del 24 de enero de 2025 de los cuales el Departamento del Magdalena fue designado como entidad ejecutora con cargo al SGR Asignación para la Inversión Regional – Departamentos 60%.

Que en virtud de lo anterior,

DECRETA:

ARTÍCULO 1°. Incorpórese al Presupuesto de Ingresos del Sistema General de Regalías – SGR – del Bienio (2025 – 2026) la suma de **QUINCE MIL MILLONES DE PESOS M/CTE. ($15.000.000.000,00)**, correspondiente al proyecto con código BPIN **2025002470002** denominado ***DESARROLLO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA*** detallados de la siguiente manera:

RUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	INGRESOS	$15.000.000.000,00
1.1	INGRESOS CORRIENTES	$15.000.000.000,00

Carrera 1c N° 16-15 Palacio Tayrona
PBX (+5) 4381143
Código Postal 470004
www.magdalena.gov.co
contactenos@magdalena.gov.co
@MagdalenaGobco @MagdalenaGobco @gobernacionmagdalena

100-20

DECRETO No. Nº 044 DE 07 FEB 2025

"POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA UNA INCORPORACIÓN DE RECURSOS EN EL CAPITULO INDEPENDIENTE DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS PARA EL BIENIO 2025 – 2026 DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA"

RUBRO	DESCRIPCION	VALOR
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	$15.000.000.000,00
1.1.02.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	$15.000.000.000,00
1.1.02.06.002	ASIGNACIONES Y DISTRIBUCIONES DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	$15.000.000.000,00
1.1.02.06.002.01	ADMINISTRACION, SSEC, INVERSION Y AHORRO PARA LA ESTABILIZACION DE LA INVERSION DEL SGR	$15.000.000.000,00
1.1.02.06.002.01.03	ASIGNACIONES DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	$15.000.000.000,00
1.1.02.06.002.01.03.03	ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL	$15.000.000.000,00
1.1.02.06.002.01.03.03.01	ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL – DEPARTAMENTOS	$15.000.000.000,00
1.1.02.06.002.01.03.03.01.31-732	DESARROLLO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL CENTRO CAMBIA EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA	$15.000.000.000,00
TOTAL ADICIONES EN EL PRESUPUESTO DE INGRESOS		$15.000.000.000,00

ARTÍCULO 2°. Incorpórese al presupuesto de gastos del Sistema General de Regalías –SGR- del Bienio (2025-2026) la suma de **QUINCE MIL MILLONES DE PESOS M/CTE. ($15.000.000.000,00),** correspondiente al proyecto con código BPIN 2025002470002 denominado ***DESARROLLO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA*** detallados de la siguiente manera:

RUBRO	DESCRIPCION	VALOR
00AR	ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL – DEPARTAMENTOS	$15.000.000.000,00
00AR.2201	CALIDAD EN LA EDUCACION INICIAL PARA LA PRIMERA INFANCIA	$15.000.000.000,00
00AR.4502.0700	INTERSUBSECTORIAL EDUCACIÓN	$15.000.000.000,00
00AR.4502.1000.2025	AÑO 2025	$15.000.000.000,00
00AR.4502.1000.2025.00247	OCAD DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	$15.000.000.000,00

Gobernación del
MAGDALENA

DECRETO No. 044 DE 07 FEB 2025

"POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA UNA INCORPORACIÓN DE RECURSOS EN EL CAPITULO INDEPENDIENTE DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS PARA EL BIENIO 2025 – 2026 DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA"

RUBRO	DESCRIPCION	VALOR
00AR.2201.0700.2025.00247.0002-732	DESARROLLO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL CENTRO CAMBIA EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA	$15.000.000.000,00
	TOTAL ADICIONES EN EL PRESUPUESTO DE GASTOS	$15.000.000.000,00

ARTÍCULO 3°. De ser necesario, ajústese la codificación presupuestal según el Catálogo de Clasificación Presupuestal, en la parametrización a realizar en los sistemas presupuestales y financieros que soporten los tramites del SGR.

ARTICULO 4°. Comuníquese a la Secretaría de Hacienda, Oficina Asesora de Planeación y Secretaría de Equidad y Poder Popular, para los fines pertinentes.

ARTICULO 5°. El presente decreto rige a partir de la fecha su publicación.

PUBLIQUESE, CUMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en la ciudad de Santa Marta D.T.C.H, a los

RAFAEL ALEJANDRO MARTÍNEZ
Gobernador del Departamento del Magdalena

YESSIKA HERNÁNDEZ CANATE
Secretaria de Hacienda Departamental (E)

Descripción	Nombre	Cargo	Firma
Proyectó	Marianela Fonseca Diaz	Profesional Universitario- Área Funcional de Presupuesto	
Revisó	Carol Paola Guerra Rizo	Profesional Universitario- Área Funcional de Presupuesto	
Revisó	Alfonso Ruiz Gómez	Prof. Esp. – Área Funcional de Presupuesto (E)	
Revisó	Efraín Vargas Carvacho	Secretario de Infraestructura	
Revisó	Lancaster Tejeda Escorcia	Jefe Oficina Asesora de Planeación	
Revisó	Jaime Bernal Tolosa	Jefe Oficina Asesora Jurídica	

Los firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento, encontrándolo ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes, en consecuencia, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma del señor Gobernador.

Gobernación del
MAGDALENA

DECRETO No. Nº044 DE 07 FEB 2025

"POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA UNA INCORPORACIÓN DE RECURSOS EN EL CAPITULO INDEPENDIENTE DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS PARA EL BIENIO 2025 – 2026 DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA"

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por la Ley 2056 de 2020, el Decreto 1821 de 2020, y

CONSIDERANDO:

Que el Acto Legislativo 05 de 2011 creo el Sistema General de Regalías – SGR, modificando los Artículos 360 y 361 de la Constitución Política, dictando disposiciones sobre el régimen de regalías y compensaciones.

Que mediante el Acto Legislativo 05 de 2019 se modificó el Artículo 361 de la Constitución Política y se previló que la vigencia de este nuevo régimen estaría sujeta a la expedición de una Ley que ajustara el Sistema General de Regalías a las disposiciones allí previstas.

Que, en desarrollo de lo anterior, se expidió la Ley 2056 de 2020 *"Por la cual se regula la organización y el funcionamiento del Sistema General de Regalías"*, cuyo objeto consiste en determinar la distribución, objetivos, fines, administración, ejecución, control, el uso eficiente y la destinación de los ingresos provenientes de la explotación de los recursos naturales no renovables, la cual en el Título IV versa sobre la inversión de los recursos del Sistema General de Regalías.

Que el Gobierno Nacional expidió el Decreto 1821 de 2020, por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sistema General de Regalías, y el Libro 2 – Parte 1 – Título 1 – Capítulo 8. versa sobre el manejo presupuestal de las regalías en las entidades territoriales.

Que el Artículo 2.1.1.8.3. del Decreto 1821 de 2020, regulo lo correspondiente al Capítulo Presupuestal independiente del SGR para Entidades Territoriales, indicando que el presupuesto de las entidades territoriales a las cuales les aplica este capítulo presupuestal contendrá un capítulo independiente de regalías el cual debe incorporar los rubros a los que hace referencia el catálogo de clasificación presupuestal del Sistema General de Regalías expedido por la Dirección General de Presupuesto Público Nacional, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público;
Que el Artículo 160 de la Ley 2056 de 2020 establece que los beneficiarios de asignaciones directas, y los ejecutores de proyectos de inversión deben incorporar los recursos del Sistema General de Regalías en un capítulo presupuestal independiente, mediante Decreto del Gobernador o Alcalde o quien haga sus veces.

R P

REPÚBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACION DEL MAGDALENA
800103920-6

REGISTRO PRESUPUESTAL
VIGENCIA FISCAL 2025

CRP Numero
2740
CDP
359

CON DESTINO AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO NUMERO CO-0782-2025 DE FECHA 20/05/2025

A NOMBRE DE: 901936019 CONSORCIO CENTRO CAMBIA

OBJETO:

CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBÍA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA."

SOLICITANTE: VARGAS CORVACHO EFRAIN DE JESUS

Rubro	Nombre	Valor
Gastos de Inversión		
0300-3-22020708-2.3.2.1.1.1.2.7-983	Edificios Educativos	29,855,783,740.31
Total:		29,855,783,740.31

983 RECURSOS DE CREDITO ORDENANZA 169 DE 2024 29,855,783,740.31

Elaboró: MARIA.MOSQUERA Imprime: MARIA.MOSQUERA

Dado en SANTA MARTA a los 21 días del mes de mayo del 2025

GUERRA RIZO CAROL PAOLA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACION DEL MAGDALENA
800103920-6

CRP Número
250203
CDP
250181

REGISTRO PRESUPUESTAL
VIGENCIA FISCAL 2025

CON DESTINO AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO NUMERO CO-0782-2025 DE FECHA 20/05/2025

A NOMBRE DE: 901936019 CONSORCIO CENTRO CAMBIA

OBJETO:

CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA."

SOLICITANTE: VARGAS CORVACHO EFRAIN DE JESUS

Rubro	Nombre	Valor
00AR.2201.0700.2025.00247.0002.01-732	Desarrollo De Obras Complementarias De La Construccion De Sede Universitaria Subregional C	15,000,000,000.00
Total:		15,000,000,000.00

732 ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - DEPARTAMENTOS 15,000,000,000.00

Elaboró: MARIANELA.PONNEFZ Imprime: MARIANELA.PONNEFZ

Dado en SANTA MARTA a los 21 días del mes de mayo del 2025

GUERRA RIZO CAROL PAOLA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO

SPGR

Reporte compromiso para el giro "Comprobante"

Usuario Solicitante:	MHdrangel	DENIS RANGEL LOZANO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	02-47000	DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
Fecha y Hora Sistema:	2026-05-21-3:38 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 16126 de fecha 2025-12-19. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	20325	Fecha Registro:	2026-05-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	02-47000 DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Inicial:	16.000.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual:	16.000.000.000,00	Saldo x Obligar:		16.000.000.000,00

TERCERO

Identificacion:	901936019	Razon Social:	CONSORCIO CENTRO CAMBIA	Modo de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	091387480	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	85470323	Nombre:	RAFAEL ALEJANDRO MARTINEZ	Cargo:	REPRESENTANTE LEGAL

CAJA MENOR				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificacion:		Fecha de Registro:		Numero:	CO-0781-2025	Tipo:	CONTRATO	Fecha:	2026-04-11

VIGENCIA ANTERIOR

Poseen Vigencia Anterior:	NO	CDP:		Compromiso:		Obligación:	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC	DETALLE MOVIMIENTOS				
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
02-47000 DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	00AR-2201-0700-2025-00247-0002 DESARROLLO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL CENTRO CAMBIA EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA	Nación	AR47000	CSF	2026-05-21	16.000.000.000,00	0,00		
					Total:	16.000.000.000,00	0,00	16.000.000.000,00	16.000.000.000,00

Objeto:	CONSTRUCCION DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAG		POSICION DEL CATALOGO DE PAG		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
02-47000	DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	SGR-AIRD	ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - DEPARTAMENTOS	2026-06-27	16.000.000.000,00	16.000.000.000,00	NINGUNO

CONTRATO DEL SECOP

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7754353
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	7/04/2025 2:57:28 PM *(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO-0782-2025
Objeto del contrato	CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA."
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐SI ☑No
Duración del contrato	14 Meses
Fecha de inicio de contrato	6 horas de tiempo transcurrido *(9/07/2025 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	10/07/2026 6:00:00 AM *(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐SI ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐SI ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐SI ☑No *
Reversión	☐SI ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

GOBERNACION DEL MAGDALENA

COLOMBIA, Santa Marta

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONSORCIO CENTRO CAMBIA

COLOMBIA, Valledupar
Número de documento 9019380195

Cuenta bancaria del proveedor

☐Cuentas bancarias débitos por proveedor ☑Cuenta bancaria de la unidad (empresa)

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSORCIO CENTRO CAMBIA			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: JESUS ARMANDO CERVANTES CEBALLOS — Fecha de aprobación: 11/04/2025 2:36:32 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: JENNY MARCELA CAMACHO NEUTO — Fecha de aprobación: 11/04/2025 2:53:26 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7754353_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐SI ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐SI ☐No.

Configuración financiera – Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐SI ☑No

Configuración financiera – Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑SI ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐SI ☑No

Seriedad de la oferta ☑SI ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta 10,00

Cumplimiento ☑SI ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato 10,00 Fecha de vigencia (desde) 31/03/2025 6:00:00 PM (UTC-0500) Bogotá, Lima, Quito

☐Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 31/07/2026 6:00:00 AM (UTC-0500) Bogotá, Lima, Quito

☑ Pago de salarios

☑% del valor del contrato 5,00 Fecha de vigencia (desde) 31/03/2025 6:00:00 PM (UTC-0500) Bogotá, Lima, Quito

☐Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 31/03/2029 6:00:00 AM (UTC-0500) Bogotá, Lima, Quito

☑ Estabilidad y calidad de la obra

☑% del valor del contrato 10,00 Fecha de vigencia (desde) 31/03/2025 6:00:00 PM (UTC-0500) Bogotá, Lima, Quito

☐Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 31/03/2031 6:00:00 AM (UTC-0500) Bogotá, Lima, Quito

Responsabilidad civil extra contractual ☑SI ☐No

☑% del valor de la oferta 5,00

Fecha límite para entrega de garantías: 4/04/2025 6:00:00 PM (UTC-0500) Bogotá, Lima, Quito Fecha de entrega de garantías: 5 días de tiempo transcurrido (14/05/2025 4:41:12 PM (UTC-0500) Bogotá, Lima, Quito)

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Identificador	Tipo de garantía	Valor, Entidad emisora	Fecha de vencimiento	Estado
CO1.WRT.17097558	Responsabilidad Civil extra contractual	Contrato de seguro	2.242.789.187,00 COP NACIONAL DE SEGUROS	5/07/2026 (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	Pendiente Detalle
CO1.WRT.17097549	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	11.213.945.935,08 COP NACIONAL DE SEGUROS	5/07/2031 (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	Pendiente Detalle
CO1.WRT.16852311	Seriedad de la oferta		4.714.217.543,00 COP	7/07/2025 (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐SI ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCONTR.7754353

Proveedor CONSORCIO CENTRO CAMBIA

Creado por

Agregado en

Comentario

Ítems del contrato

Descripción

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados.

Nombre

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 1C No 16-15 Palacio Tayrona

Ubicación CO-MAG-47001 - Santa Marta

País COLOMBIA

Departamento Magdalena

Municipio Santa Marta

Dirección Carrera 1C No 16-15 Palacio Tayrona

Código postal

Grados (°) Minutos (') Segundos (")

Latitud:

Longitud:

Municipio de ejecución del contrato

ID Dirección

1 MUNICIPIO DE CIENAGA -UBICADO EN ZONA URBANA Ubicación COLOMBIA > Magdalena > Ciénaga

CO1.PCONTR.7754353

							Precio total estimado	0,00	Indique el precio como lo indica la ficha técnica
No.	Código Unspsc	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Indique el precio como lo indica la ficha técnica	
1	7207930	PROPUESTA ECONOMICA	1,00	UN		44.855.783.740,31	0,00	44.855.783.740,31	

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CLAUSULAS ADICIONALES N°0782-2025.pdf	CLAUSULAS ADICIONALES N°0782-2025.pdf	(detalle)
RUT CONSORCIO CENTRO CAMBIA.pdf	RUT CONSORCIO CENTRO CAMBIA.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	JENNY MARCELA CAM	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	57452212	Guardar y notificar
Supervisor	EFRAN DE JESUS VAR	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	7629011	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento		Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Agregar usuario

Rol	Nombre	Fecha de asignación	Creado por
Supervisor	EFRAN DE JESUS VARGAS CORVACHO	11/04/2025 2:53:29 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	JENNY MARCELA CAMACHO NEUTO
Ordenador del Gasto	JENNY MARCELA CAMACHO NEUTO	11/04/2025 2:53:29 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	JENNY MARCELA CAMACHO NEUTO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ SI ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:			Valor
	Presupuesto General de la Nación - PGN	☐ SI ☑ No *	
	Sistema General de Participaciones - SGP	☐ SI ☑ No *	
	Sistema General de Regalías - SGR	☒ SI ☐ No *	15.000.000.000
	Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐ SI ☑ No *	
	Recursos de Crédito	☒ SI ☐ No *	29.855.783.740,31
	Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ SI ☑ No *	

Total 44.855.783.740,31

Validación Código BPIN

Código BPIN	Año	Estado
2024002470037	2024	Validado
2025002470002	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado	
18125	2025002470002	CDP	Generado	15.000.000.000 COP	15.000.000.000 COP	15.000.000.000 COP	Consulta Exitosa	Validado	Editar

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐ SI ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad ejecutora	Estado	
359	CDP	No se ha iniciado	29.855.783.740,31 COP	29.855.783.740,31 COP			Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de Vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso presupuestal (CDP)	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
0		No se ha iniciado		0 COP	0 COP	0 COP			Editar

Saldo de compromisos CDP 0 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 0 COP
Última consulta a SIIF

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7754353
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	3 días de tiempo transcurrido (7/24/2025 2:57:26 PM UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Número del contrato	CO-0782-2025
Objeto del contrato	CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA."
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	[ ]SI [X]No
Duración del contrato	14 Meses
Fecha de inicio de contrato	[redacted] *
Fecha de terminación del contrato	10/09/2025 6:00 PM *
Tiempo adicional en días	0 días
Liquidación	[ ]SI [X]No *
Obligaciones Ambientales	[ ]SI [X]No *
Obligaciones pos consumo	[ ]SI [X]No *
Reversión	[ ]SI [X]No *

Información de la Entidad Estatal contratante

GOBERNACION DEL MAGDALENA

COLOMBIA, Santa Marta

0 Recomendación (es)

[X]

Información del Proveedor contratista

CONSORCIO CENTRO CAMBIA

COLOMBIA, Valledupar
Número de documento 9013360195

Cuenta bancaria del proveedor

[ ]Cuentas bancarias distintas por proponente [X]Cuenta bancaria de la unión temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSORCIO CENTRO CAMBIA	[redacted]	[redacted]	[redacted]

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor
Aprobado por: JESUS ARMANDO CERVANTES CEBALLOS
Fecha de aprobación: 11/04/2025 2:03:02 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal
Aprobado por: JENNY MAROLA CAMACHO NIETO
Fecha de aprobación: 11/04/2025 2:53:25 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado
Contrato en ejecución

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	[ ]SI [X]No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado [X]SI [ ]No

Configuración financiera – Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? [ ]SI [X]No

Configuración financiera – Garantías

¿Solicitud de garantías? [X]SI [ ]No

Garantías por ítems, grupos o etapas [ ]SI [X]No

Seriedad de la oferta [X]SI [ ]No

[X]% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00	

Cumplimiento [X]SI [ ]No

[X] Cumplimiento del contrato [X]% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	10 días de tiempo transcurrido (7/24/2025 2:57:26 PM UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
[ ]Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/07/2025 6:00:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☑ Pago de salarios
☑ % del valor del contrato 5,00 Fecha de vigencia (desde) 10 días de tiempo transcurrido (31/03/2025 6:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
☐ Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 31/03/2029 6:00:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
☑ Estabilidad y calidad de la obra
☑ % del valor del contrato 10,00 Fecha de vigencia (desde) 10 días de tiempo transcurrido (31/03/2029 6:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
☐ Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 31/03/2031 6:00:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Responsabilidad civil extra contractual ☑ Sí ☐ No
☑ % del valor de la oferta 6,00

Fecha límite para entrega de garantías: 6 días de tiempo transcurrido (4/04/2025 6:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Fecha de entrega de garantías:

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Utilización	Tipo de garantía	Valor Prima	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.16852311	Seriedad de la oferta		4.714.217.943,00 COP	7/07/2025 (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7754353
Proveedor CONSORCIO CENTRO CAMBIA
Creado por
Agregado en
Comentario

Anexos del contrato

Descripción Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados.

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 1C No 16-15 Palacio Tayrona
Ubicación CO-MAG-47001 - Santa Marta
País COLOMBIA
Departamento Magdalena
Municipio Santa Marta
Dirección Carrera 1C No 16-15 Palacio Tayrona
Código postal

Grados (°) Minutos (') Segundos (")
Latitud:
Longitud:

Municipio de ejecución del contrato

ID Dirección Ubicación
1 MUNICIPIO DE CIENAGA - UBICADO EN ZONA URBANA COLOMBIA > Magdalena > Ciénaga

CO1.PCCNTR.7754353

Nº	Código producto	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado	Fecha y hora límite para la entrega de la oferta	Fecha y hora límite para la entrega de la oferta
1	72101500	PROPUESTA ECONOMICA	1,00	UN	44.000.000,00	0,00	44.000.000,00	44.000.000,00

Documentos del contrato

Descripción Nombre del documento Fecha
☐ CLAUSULAS ADICIONALES N°002-2025.pdf CLAUSULAS ADICIONALES N°002-2025.pdf (detalle)
☐ RUT CONSORCIO CENTRO CAMBIA.pdf RUT CONSORCIO CENTRO CAMBIA.pdf (detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto JENNY MARCELA CAM Tipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 57462212 Guardar y notificar
Supervisor EFRAIN DE JESUS VAR Tipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 7629011 Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago Tipo de documento Número de documento Guardar y notificar

Acciones del contrato

Histórico de asignaciones

Acción	Nombre	Fecha de registro	Cargo	Observación
Supervisor	EFRAIN DE JESUS VARGAS OSPINACHO	11/04/2025 2:53:29 PM (GMT-05:00) Bogotá, Lima, Quito		
Ordenador del Gasto	JENNY MARCELA CAMACHO NEUTO	11/04/2025 2:53:29 PM (GMT-05:00) Bogotá, Lima, Quito	JENNY MARCELA CAMACHO NEUTO	JENNY MARCELA CAMACHO NEUTO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐SI ☒No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐SI ☒No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐SI ☒No *	
Sistema General de Regalías - SGR	☒SI ☐No *	15.000.000.000
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐SI ☒No *	
Recursos de Crédito	☒SI ☐No *	29.856.783.740,31
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐SI ☒No *	
	Total	44.856.783.740,31

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2024002470037	2024	Validado
☐	2025002470002	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor inicial	Saldo	Valor a liberar	Estado de la consulta	Estado
18125	2025002470002	CDP	Generado	15.000.000.000 COP	15.000.000.000 COP	15.000.000.000 COP	Consulta Exitosa	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐SI ☐No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a liberar	Código de la solicitud en el sistema	Estado
359	CDP	No se ha iniciado	29.856.783.740,31 COP			

Saldo de CDP: 0 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 0 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF:

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Items por consumir	Items presupuestal a liberar	Grupo Posición de Gasto	Cuenta Contable

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Saldo de compromisos CDP: 0 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido:
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF:

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Modificaciones del Contrato

Modificación del contrato

Referencia de la modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de aprobación	Esti
CO1.CTRMOD.21667157	Modificar el contrato	20/01/2026 2:58 PM *(UTC -5 horas)*	20/01/2026 9:20 PM *(UTC -5 horas)*	Publ
CO1.CTRMOD.20082225	Modificar el contrato	2/09/2025 9:50 AM *(UTC -5 horas)*	2/09/2025 5:37 PM *(UTC -5 horas)*	Publ
CO1.CTRMOD.19092092	Modificar el contrato	19/05/2025 6:41 PM *(UTC -5 horas)*	20/05/2025 5:30 PM *(UTC -5 horas)*	Publ

Incumplimientos

Incumplimientos del contrato

Tipo	Fecha de emisión	Fecha de vencimiento

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Buscar resultados (Buscar resultados por*Filtrando en*

Todos los avisos de contrato - La búsqueda simple solamente se hace sobre los campos "Referencia" y "Descripción", la visualización de los procesos c

)

Borrar búsqueda

Pría	Entidad Estatal	Referencia	Descripción	Fase actual	Fecha de publicación	Fecha de presentación de ofertas
☐	GOBERNACION DEL MAGDALENA	LP-017-2024 (Fase de Selección (Presentación de ofertas))	LP-017-2024 (Fase de Selección (Presentación de ofertas))	Fase de Selección (Presentación de ofertas)	20/02/2025 4:59 PM *(UTC -5 horas)*	7/03/2025 10:00 AM *(UTC -5 horas)*

CLAUSULAS ADICIONALES

CONTRATO DE OBRA N°0782 DE 2025

CLAUSULAS ADICIONALES

En Santa Marta, entre los suscritos, **JENNY MARCELA CAMACHO NEUTO,** mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 57.462.212 expedida en Santa Marta, obrando en nombre y representación del Departamento del Magdalena entidad territorial con Nit. N°.800.103.920-6, en calidad de JEFE DE OFICINA DE CONTRATACIÓN nombrado mediante Decreto 257 del 13 de junio de 2023, expedido por el Gobernador del Departamento del Magdalena y delegado para asuntos pre-contractuales y contractuales mediante Decreto 0061 del 30 enero de 2020 expedido por el Gobernador del Departamento del Magdalena; quien en adelante y para efectos del presente contrato se denominará **EL DEPARTAMENTO,** por una parte, y por la otra, **JESUS ARMANDO CERVANTES CEBALLOS,** identificado con Cedula de ciudadanía N° 19.691.435, representante legal del **CONSORCIO CENTRO CAMBIA,** identificado con el NIT N° 901.936.019-5, integrado por: 1. EBM CONSTRUCCIONES EINTERVENTORIA S.A.S. identificado con NIT: 901333170-1 y con participación de 90%; 2. JESUS ARMANDO CERVANTES CEBALLOS, identificado con C.C. 19.691.435 y con participación de 10% y para efectos del presente acuerdo de voluntades se denominará **EL CONTRATISTA,** hemos convenido celebrar el presente documento de cláusulas adicionales, las cuales se entienden incorporadas al presente contrato, ***SUSCRITO POR FIRMA ELECTRÓNICA EN SECOP II, A TRAVÉS DE MENSAJES DE DATOS,*** previas las siguientes **CONSIDERACIONES: i)** Que mediante Resolución No. 060 del 19 de febrero de 2025, la Entidad abrió el Proceso de Contratación número LP-017-2024. **ii)** Que mediante Resolución No. 0139 del 03 de abril de 2025 la Entidad adjudicó el Contrato al Contratista. Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista, acuerdan que el presente Contrato se regirá por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, el Código Civil y el Código de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, además de las adicionales que resulten aplicables a la materia. Que, en virtud de todo lo anterior, y en concordancia con la Ley 527 de 1999, las partes se regirán por el ***CONTRATO ELECTRÓNICO DISPUESTO EN LA PLATAFORMA SECOP II,*** más las siguientes **CLÁUSULAS ADICIONALES: CLÁUSULA 1. DEFINICIONES.** - Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con el significado que se les asigna en el Anexo 3 – Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio. **CLÁUSULA 2. OBJETO.** - El objeto del Contrato es "***CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA.***" **CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO:** El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación No. LP-017-2024, los cuales hacen parte integral del presente contrato. El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta económica, conforme lo señaló en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial. El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el Contratista con la presentación de su propuesta. **CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO.** - El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de CATORCE (14) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones. **CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO.** - El

CONTRATO DE OBRA N°0782 DE 2025

CLAUSULAS ADICIONALES

valor del Contrato es por la suma de **CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS CON TREINTA Y UN CENTAVOS M/CTE ($44.855.783.740,31)** equivalentes 31.510,9123 SMLMV para el año de suscripción del contrato 2025 suma que se discrimina de la siguiente manera: El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el presente Contrato. **CLAUSULA 6. FORMA DE PAGO:** La Gobernación del Magdalena cancelará al contratista el valor del futuro contrato de la siguiente manera: Pagos parciales mensuales de cada acto de servicio en ejecución de acuerdo con las actas parciales mensuales de avance de obra ejecutada; para cobrar el acta, esta deberá contar con la aprobación de la interventoría de acuerdo con los siguientes porcentajes (o los que consigne el contratista en la programación aprobada por la interventoría) así: De cada uno de estos pagos se efectuará una retención de garantía del 5%, la cual se devolverá al contratista contra la suscripción del acta de servicio final. El último pago correspondiente al saldo por retención en garantía del cinco (5%) del valor de cada acta de servicio, de acuerdo con los productos realmente ejecutados y recibidos a satisfacción por parte de la interventoría y la Gobernación del Magdalena, se pagará una vez se suscriba el acta de cierre y previa suscripción del acta de recibo final de los productos a satisfacción por parte de la interventoría y de la Gobernación del Magdalena, así como la aprobación de las garantías correspondientes señaladas. El interventor contará con cinco (5) días hábiles a partir del recibo de los documentos presentados por el contratista para el cobro de actas parciales, para emitir su concepto sobre los mismos. El contratista podrá cobrar mediantes actas parciales mensuales hasta el (90%) del valor del contrato, el saldo restante, (10%) se cancelará previa suscripción de las actas de recibo y liquidación. **SISTEMA DE PAGO:** El sistema de pago del contrato es por precios unitarios sin fórmula de ajuste. **PARAGRAFO 1: CONDICIONES PARA CADA UNO DE LOS PAGOS:** Para el pago será necesario la certificación por parte del supervisor del contrato del cumplimiento a satisfacción de los servicios prestados y de la entrega a satisfacción de los bienes incluidos en el anexo técnico. Además, para cada pago el contratista deberá allegar: a) La factura correspondiente con el cumplimiento de los requisitos fiscales y legales, b) Certificación suscrita por el Supervisor Contractual en la que consta que se ha cumplido a satisfacción con el objeto del Contrato, c) Certificación del Pago de Aportes Parafiscales y de Seguridad Social, esto en cumplimiento de la Ley 789 de 2002 y el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. El Departamento efectuará las retenciones que en materia tributaria tenga establecida la Ley y respecto de las cuales sea su obligación efectuar la retención. En los demás casos, el contratista deberá cumplir con el pago de los impuestos, tasas o contribuciones que se deriven de la presente contratación. Deberán ser tramitadas por el PROPONENTE, las devoluciones o exenciones a que crea tener derecho ante la respectiva Administración de Impuestos, sin responsabilidad alguna por parte del Departamento o costo para ella. Todos los impuestos, retenciones y gastos que se causen por razón de la legalización y ejecución del contrato, incluidas la constitución de la garantía de cumplimiento en caso de que se le requiera, son de cargo exclusivo del Contratista. Por lo tanto, los precios que se propongan deberán considerar tales conceptos. Al formular la propuesta el Proponente deberá determinar, evaluar y asumir los impuestos, tasas y contribuciones, así como los demás gravámenes que conlleven la celebración, ejecución y liquidación del Contrato, observando que aquellos son de cargo exclusivo del Contratista, con excepción de los que por expresa disposición legal correspondan al ente territorial. Por lo tanto, los precios que se propongan deberán considerar tal concepto. El Departamento del Magdalena solo pagará los valores del Contrato; no reconocerá suma adicional alguna por impuestos, así estos fueren establecidos con posterioridad al Cierre del proceso. Así y para efectos de estructurar el valor de la oferta, el proponente deberá tener en cuenta, además de los

CONTRATO DE OBRA N°0782 DE 2025

CLAUSULAS ADICIONALES

Impuestos de carácter nacional y los demás conceptos señalados en este numeral, los siguientes descuentos departamentales que deberá realizar para efectos de legalización del contrato, así:

DESCRIPCION TARIFA	PORCENTAJE Y/O VALOR
PRO-DESARROLLO DEPARTAMENTAL	1/100 (1%)
PRO-HOSPITALES UNIVERSITARIOS PÚBLICOS	2/100 (2%)
REFUNDACIÓN UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA	2/100 (2%)
PROCULTURA	2/100 (2%)
PRO-BIENESTAR DEL ANCIANO	3/100 (3%)
PRO-DEPORTES	1/100 (1%)
CONTRIBUCIÓN DE OBRA PÚBLICA	5/100 (5%)
ICA	0,7/100 (0,7%)

PARAGRAFO 2: Para efectos del pago de estos impuestos del orden departamental, el contratista se someterá a los que resulten de la liquidación que practique el Departamento del Magdalena. **PARAGRAFO 3:** Las estampillas antes relacionadas serán descontadas de cada pago realizado al contratista. **PARAGRAFO 4:** Para la aprobación de los pagos correspondientes a cada entrega parcial de obra, el Contratista deberá allegar un acta con un informe detallado sobre la ejecución de las obras en los formatos suministrados por la Interventoría, la correspondiente cuenta de cobro o factura y acreditar encontrarse al día en el pago de salarios, prestaciones sociales y aportes al sistema de seguridad social integral. **PARAGRAFO 5:** La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato. **PARAGRAFO 6:** El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del Contrato que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y cajas de compensación familiar, cuando corresponda. **CLAUSULA 7. CDP:** La suma que se encuentra amparada en los CDPs N° 359 del 31 de enero de 2025 ($29.855.783.740,31) y N°16125 del 19 de febrero de 2025 ($15.000.000.000) para la celebración del presente contrato, expedido por la oficina de presupuesto Departamental. **CLAUSULA 8. SUPERVISOR:** La supervisión, control y vigilancia del contrato será ejercida por la **SECRETARÍA DE INFRAESTRCUTURA**, quedando obligado EL CONTRATISTA a suministrarle toda la información que le sea solicitada para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones que contrae, de acuerdo con la Ley 80 de 1993, artículos 4° y 5°. El Supervisor tendrá las siguientes funciones: a) Cumplir con las obligaciones establecidas para el efecto en materia legal. b) Podrá exigir al CONTRATISTA la información que considere necesaria en desarrollo del objeto del contrato. c) Velar por los intereses del DEPARTAMENTO y tendrá las funciones que por la índole y naturaleza del contrato le sean propias. d) Elaborar y suscribir conjuntamente con el CONTRATISTA las Acta a que haya lugar durante la ejecución del contrato, incluida el Acta de Inicio. e) Vigilar y requerir al CONTRATISTA para que cumpla con las obligaciones que se deriven del objeto del contrato. f) Expedir la Certificación Mensual del Recibido a Satisfacción del cumplimiento del objeto contractual, para efectos de cada pago correspondiente. PARÁGRAFO: Según el Decreto 019 de 2012, artículo 217, en los contratos de prestación de servicios, no será obligatorio su liquidación. **CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA:** Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato,

CONTRATO DE OBRA N°0782 DE 2025

CLAUSULAS ADICIONALES

la ley, las obligaciones y condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y de las establecidas en el Anexo Técnico, vigente durante la ejecución del contrato, el Contratista se obliga a: 1. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un porcentaje no inferior al diez por ciento (10%), sin perjuicio de que el contratista incorpore un porcentaje superior al definido por la Entidad, de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecución del contrato. En todo caso, el cinco por ciento (5 %), sin perjuicio de establecer un porcentaje superior, de acuerdo con el estudio del sector y características propias de la región, que no podrá superar el treinta por ciento (30 %)] de la mano de obra no calificada de la región serán mujeres. Para efectos de esta obligación, se entiende por personal de la región a aquellos domiciliados por al menos el último año, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los municipios donde se ejecutará el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el contrato imposibiliten vincular el porcentaje anteriormente previsto, será posible contratar personal del departamento en donde se desarrolla el contrato. Esta obligación no se entenderá incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su debida diligencia, mediante la realización de actuaciones dirigidas a lograr la destinación mínima del personal requerido para la ejecución del contrato. 2. Destinar a la ejecución del contrato, en un porcentaje del cinco por ciento (5 %) al diez por ciento (10%) sin perjuicio de que el contratista incorpore un porcentaje superior al definido por la Entidad, la provisión de bienes o servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos de especial protección constitucional: población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación, víctimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar, adultos mayores, personas en condición de discapacidad, así como la población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros sujetos identificados por la Ley o la jurisprudencia de esta manera. El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecución del contrato deberá mantenerse durante toda su vigencia en el porcentaje mínimo establecido en este numeral, so pena del incumplimiento contractual. El Interventor hará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas al inicio y durante la ejecución del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. Para estos efectos, el contratista presentará la documentación respectiva que acredite la condición de los sujetos mencionados y la forma en la que participarán durante la ejecución del contrato. El cumplimiento de esta obligación deberá probarse ante al Interventor dentro de los 5 días días siguientes contados a partir de acta de inicio. Para la acreditación de la condición de mujer cabeza de familia, personas en condición de discapacidad, adultos mayores, población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, personas en proceso de reintegración o reincorporación, se aplicará en lo pertinente lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte, la condición de población en pobreza extrema se constatará en las bases de datos del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV) y la condición de víctima de conflicto armado y de desplazados por la violencia deberá demostrarse con el certificado de inclusión en el Registro Único de Víctimas – RUV, en los términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. La condición de los sujetos de especial protección constitucional que no se encuentre definida en esta cláusula deberá ser acreditada por el contratista de conformidad con lo determinado por la ley y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable. 1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación. 2. Asistir a las audiencias de seguimiento a la ejecución de las obras, las cuales serán convocadas por el Gobernador del Departamento del Magdalena, cuando las considere necesarias. 3. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de

CONTRATO DE OBRA N°0782 DE 2025

CLAUSULAS ADICIONALES

Contratación. 4. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso. 5. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 6. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por la entidad competente (cuando aplique Intervenciones). 7. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos acordados con la Entidad. 8. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato. 9. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra. 10. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la oferta. 11. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato. 12. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato. 13. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP). 14 Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o accionistas. 15 Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 16. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista. 17. El contratista presentará el plan de calidad especifica para el proyecto, elaborado conforme a las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los 5 días hábiles siguientes a la suscripción del contrato. 18. El Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1 del documento base. En consecuencia, el Contratista debe adquirir los bienes que se encuentren en el Registro de Productores de Bienes Nacionales durante la ejecución del contrato. 19.Informar al interventor o al supervisor del contrato, según corresponda, la fecha de adquisición de los bienes nacionales relevantes para que este verifique que fueron obtenidos durante la vigencia del Registro de Productores de Bienes Nacionales correspondiente. **Parágrafo:** En caso de que el Contratista incorpore bienes nacionales relevantes durante la ejecución del contrato, quedará exento de cumplir con las obligaciones relacionadas con su utilización cuando ocurra alguno de los siguientes supuestos: i) El bien nacional relevante no esté registrado en el Registro de Productores Bienes Nacionales al momento de su adquisición. ii) Los proveedores existentes no tienen la capacidad de suministrar el bien nacional relevante. iii) El proveedor incrementa significativamente los precios del bien nacional relevante, por ausencia de otros proveedores que estén registrados en el Registro de Productores de Bienes Nacionales o sin que exista una justificación por condiciones de mercado, dificultando de manera grave la ejecución del contrato. Para estos efectos, las partes deberán agotar las siguientes actuaciones para que se configure el evento eximente de responsabilidad: a) El Contratista comunicará al supervisor o interventor del contrato la ocurrencia de uno de los supuestos eximentes de responsabilidad dentro de los 3 días contados a partir de su ocurrencia, incluyendo la información con soportes o documentos, y demás detalles que fueran pertinentes sobre su acontecimiento. b) La Entidad Estatal por medio del supervisor o interventor del contrato informará dentro de los 3 días hábiles siguientes contados a partir

CONTRATO DE OBRA N°0782 DE 2025

CLAUSULAS ADICIONALES

de la fecha de recibida la comunicación del Contratista, si efectivamente se configura o no uno de los supuestos definidos en este numeral. **c)** En el evento que se compruebe la ocurrencia de uno de estos supuestos, la Entidad Estatal verificará si es posible que el Proponente adquiera un bien de características técnicas iguales o superiores que se encuentre en el Registro de Productores de Bienes Nacionales. En caso de que sea viable le informará al Contratista el bien nacional relevante que deberá adquirir durante la ejecución del proyecto. **d)** En caso de que no sea posible adquirir un bien de características técnicas iguales o superiores para el cumplimiento del contrato, se configurará el evento eximente de responsabilidad. **CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA:** 1. Cumplir con el objeto del contrato de conformidad a los documentos del proceso contractual (estudios previos, pliegos entre otros) y la propuesta los cuales hacen parte integral del contrato. 2. Garantizar la calidad y correcto desarrollo del contrato. 3. Suscribir las garantías exigidas en los términos y plazos dispuestos en el contrato para la aprobación de la Administración Municipal. 4. Asumir los gastos y riesgos que implica el desarrollo del contrato bajo su propia responsabilidad. 5. Encontrarse al día en el pago de los aportes parafiscales durante la ejecución del contrato. Acreditar el aporte al Sistema de Seguridad Social (Pensión y Salud), durante la ejecución del contrato. 6. Disponer lo necesario para que el objeto del contrato se cumpla a cabalidad conforme las obligaciones derivadas del contrato. 7. Cumplir con las normas, instrucciones y solicitudes que imparta EL DEPARTAMENTO para la efectiva ejecución de las actividades contratadas. 8. EL CONTRATISTA debe utilizar personal idóneo, calificado, debidamente capacitado, y directamente empleado por EL CONTRATISTA, para ejecutar el objeto contractual y supervisarlo de manera directa y oportuna. 9. Cumplir con el objeto del contrato de forma eficaz y oportuna, así como atender los requerimientos e instrucciones que le sean efectuados por el Supervisor del Contrato y/o el Gobernador. 10. Hacer entrega al Supervisor del Contrato de los informes y/o actas de avance, con los soportes correspondientes, si a ello hubiere lugar. 11. Cumplir con las obligaciones fiscales de ley, el contratista autoriza al DEPARTAMENTO a efectuar las retenciones que surjan del presente contrato las cuales estén a cargo del CONTRATISTA. 12. Las demás obligaciones que se deriven y tengan relación con el objeto contractual. **CLAUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA: a)** Tendrá derecho a recibir oportunamente la remuneración pactada en la cláusula del presente contrato y a que el valor intrínseco de la misma no se altere o modifique durante la vigencia del contrato. En consecuencia, tendrán derecho, previa solicitud, a que la administración les restablezca el equilibrio de la ecuación económica del contrato a un punto de no pérdida por la ocurrencia de situaciones imprevistas que no sean imputables a los contratistas. Si dicho equilibrio se rompe por incumplimiento de la entidad estatal contratante, tendrá que restablecerse la ecuación surgida al momento del nacimiento del contrato. **b)** Podrán acudir a las autoridades con el fin de obtener la protección de los derechos derivados del contrato y la sanción para quienes los desconozcan o vulneren. **CLAUSULA 12 DERECHOS DEL CONTRATANTE:** Para la ejecución de los fines, y en consonancia con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993, el DEPARTAMENTO: 1. Exigirá del CONTRATISTA la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. Igual exigencia podrá hacer al garante. 2. Adelantará las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar. 3. Solicitará la actualización o la revisión de los precios cuando se produzcan fenómenos que alteren en su contra el equilibrio económico o financiero del contrato. 4. Adelantará las acciones conducentes a obtener la indemnización de los daños que sufran en desarrollo o con ocasión del contrato celebrado. 5. Adoptará las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecución del contrato las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al momento de proponer en los casos en que se hubiere realizado licitación o concurso, o de contratar en los casos de contratación directa. Para ello utilizarán los mecanismos de ajuste y revisión de precios, acudirán a los procedimientos de revisión y corrección de tales mecanismos si fracasan los supuestos o hipótesis para la ejecución y pactarán intereses moratorios. Sin perjuicio de la actualización

CONTRATO DE OBRA N°0782 DE 2025

CLAUSULAS ADICIONALES

o revisión de precios, en caso de no haberse pactado intereses moratorios, se aplicará la tasa equivalente al doble del interés legal civil sobre el valor histórico actualizado. 6. Sin perjuicio del llamamiento en garantía, repetirá contra los servidores públicos, contra el contratista o los terceros responsables, según el caso, por las indemnizaciones que deban pagar como consecuencias de la actividad contractual. 7. Actuará de tal modo que por causas a ellas imputables, no sobrevenga una mayor onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista. Con este fin, en el menor tiempo posible, corregirán los desajustes que pudieren presentarse y acordarán los mecanismos y procedimientos pertinentes para precaver o solucionar rápida y eficazmente las diferencias o situaciones litigiosas que llegaren a presentarse. **CLAUSULA 11. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATANTE:** 1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación. 2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad ofrecido en la etapa de selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del contrato. 3. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en el Contrato. 4. Brindar la colaboración y proporcionar la información y/o documentación que sea necesaria para el adecuado cumplimiento del contrato; así como atender y tramitar los requerimientos y consultas que formule el contratista, durante la ejecución del contrato. 5. Aprobar las garantías o las modificaciones a las mismas que el contratista constituya siempre que estas cumplan las condiciones de suma asegurada, vigencias y amparos, exigidas en el contrato. 6. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de él forman parte. 7. Otorgar las autorizaciones respectivas para la ejecución de las obras, siempre que el contratista cumpla con los requisitos previos para ello. 8. Expedir el certificado de ejecución del contrato a solicitud del contratista, una vez este haya cumplido con todas las obligaciones derivadas del mismo. 9. Suscribir en conjunto con el contratista y el interventor, el acta de inicio, suspensión, reinicio, de comité de avance de obra, de modificación de cantidades de obra, de supresión de las mismas o de obras complementarias, de recibo parcial de obra, de recibo final de la obra, de terminación, de liquidación del contrato, y cualquier otra que se genere durante la ejecución de los trabajos. 10. Hacer revisiones periódicas de las obras ejecutadas (visitas de campo) para verificar el cumplimiento de las condiciones de calidad ofrecidas por el contratista, en atención al principio de responsabilidad. 11. Gestionar la participación activa de instancias locales de seguimiento y control del contrato, tales como comités y veedurías ciudadanas, antes, durante y después de la ejecución del proyecto. 12. Verificar el cumplimiento de la ejecución del contrato de obra, conminar al contratista en caso de retardos, defectos de ejecución y/o incumplimientos, adelantar los procedimientos establecidos en la Ley para la imposición de las multas y/o sanciones y hacer efectivas las garantías, previo cumplimiento de las actividades propias establecidas en el Estatuto Anticorrupción, así como iniciar las acciones contractuales y legalmente establecidas de manera oportuna para obtener las indemnizaciones del caso. 13. Recibir a satisfacción las obras terminadas. 14. Adelantar los trámites tendientes a la liquidación del contrato dentro de los términos legales. 15. Tramitar y obtener ante las autoridades competentes todas las licencias, permisos y autorizaciones para adelantar la obra y para el uso y aprovechamiento de recursos naturales y para el depósito de materiales. 16. Resolver las peticiones y consultas que le haga el contratista dentro de los términos legales. **CLAUSULA 12. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA:** EL Contratista será responsable ante las autoridades de los actos u omisiones que desarrolle en el ejercicio de las actividades del presente contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la administración o a terceros. Igualmente será responsable en los términos de la Ley 80 de 1993, artículo 52. **CLAUSULA 13. TERMINACION, MODIFICACION E INTERPRETACION UNILATERAL DEL CONTRATO** El **DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA** puede terminar, modificar y/o interpretar unilateralmente el contrato, de acuerdo con los artículos 15 a 17 de la Ley 80 de 1993, cuando lo considere necesario para que el Contratista cumpla con el objeto del presente Contrato. **CLAUSULA 14. CADUCIDAD:** En virtud de esta cláusula, si se presentase alguno de los hechos

CONTRATO DE OBRA N°0782 DE 2025

CLAUSULAS ADICIONALES

constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo del Contratista previstas en el presente contrato, que afecte de manera grave y directa la ejecución del mismo y evidencie que puede conducir a su paralización, el Contratante aplicará el procedimiento dispuesto en el artículo 86 de la ley 1474 de 2011. **CLAUSULA 15. MULTAS:** Incumplir la obligación de incluir mínimamente el diez por ciento (10%) o el porcentaje previsto por la entidad que no supere el treinta por ciento (30%) de mano de obra no calificada de la región durante la ejecución del contrato, de conformidad con la obligación 1 de las "obligaciones generales del contratista", causará multas equivalentes a medio SMMLV por cada día de incumplimiento. Por su parte, no cumplir con el porcentaje mínimo de vinculación de mujeres durante la ejecución del contrato, de conformidad con la misma obligación indicada, causará multas equivalentes al 1% del valor total del contrato. Se causarán multas equivalentes a medio SMMLV, por cada día calendario transcurrido a partir del tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podrá ser superior al cinco por ciento 5% del valor del contrato. 1. Se impondrá una multa equivalente a medio SMMLV cuando el Contratista no adquiera los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1. del documento base. 2. Así mismo, cuando el interventor o supervisor, según corresponda, solicite al Contratista que informe la fecha en que se adquirieron los bienes nacionales relevantes y este omita presentarla, se causarán multas equivalentes a medio SMMLV por cada día transcurrido a partir del tercer día hábil siguiente al momento en que se hizo el requerimiento. Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causarán las siguientes multas: Causales: 1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar las garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la cláusula 18, de acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones, se causará una multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones más gravosas. 3. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el supervisor, que se relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causará una multa equivalente al 0,2% del valor del contrato. Estas multas se causarán sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfacción del supervisor. 4. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en la fecha pactada, se causará una multa diaria equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el Contratista no inicie efectivamente con la ejecución del contrato en la fecha acordada. 5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará acreedor a una multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 6. Por incumplir las órdenes dadas por la supervisión, el Contratista se hará acreedor a una multa equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada orden incumplida. 7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondrá una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación. 8. Por cambiar el personal presentado a la supervisión, sin la aprobación previa de esta, al Contratista se le impondrá una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato. 9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o Contratistas, al Contratista se le impondrá una multa equivalente a 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación. Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de

CONTRATO DE OBRA N°0782 DE 2025

CLAUSULAS ADICIONALES

estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del Código Civil. Parágrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la garantía de cumplimiento del contrato. Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Contratista de continuar con la ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen del contrato. Parágrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias obligaciones se podrán imponer nuevas multas. Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo Diario o Mensual Vigente, será aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato. Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de forma independiente, podrá ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. **CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL:** Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las obligaciones contractuales y podrá exigirse al Contratista la pena y la indemnización de perjuicios. En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco (5) días hábiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, por el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inejecución total o parcial de las obligaciones a su cargo contraídas en virtud del presente acuerdo, el Contratista pagará a la Entidad, una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato. La presente cláusula penal no tiene el carácter de estimación anticipada de perjuicios. **Parágrafo 1.** El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolución del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones a cargo del Contratista. **Parágrafo 2.** El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto. **Parágrafo 3.** Esta misma sanción se aplicará en caso de declararse la caducidad del contrato. **CLAUSULA 17. GARANTÍAS Y MECANISMOS DE COBERTURA DEL RIESGO:** Para garantizar a la Entidad el cumplimiento de todos y cada una de las obligaciones contractuales y considerando los posibles riesgos que puedan presentarse con ocasión del contrato, EL CONTRATISTA deberá constituir a su costa y a favor del Departamento del Magdalena NIT. 800.103.920-6, ante una compañía de seguros legalmente establecida en el país, póliza única que ampare los siguientes riesgos: **a) Cumplimiento general del Contrato** y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan: equivalente al 10% del valor del contrato, con una vigencia hasta la liquidación del contrato; **b) Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales** del personal que el contratista haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato: equivalente al 5% del valor del contrato, con una vigencia igual a la del contrato y tres (3) años más. **c) Estabilidad y calidad de las obras** ejecutadas entregadas a satisfacción: equivalente al 10 % del valor del contrato, equivalente a cinco (5) años contados a partir de la fecha de firma del acta de recibo final **d)** Garantía de responsabilidad civil extracontractual, equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del contrato, con una vigencia igual al período de ejecución del contrato. **CLAUSULA 18. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA:** El Contratista es una entidad

CONTRATO DE OBRA N°0782 DE 2025

CLAUSULAS ADICIONALES

Independiente del DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, y en consecuencia, el Contratista no es su representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre del DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. **CLAUSULA 19. CESIONES:** El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 893 del Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia.. **CLAUSULA 20. INDEMNIDAD:** EL Contratista, se responsabiliza y asume por su cuenta y riesgo, y así mismo librará totalmente al DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, de cualquier hecho que genere reclamaciones ya sean de carácter civil, penal, policivo, o de cualquier situación, hecho a causa originado por agentes humanos que puedan originar, suscitar o producir responsabilidad contractual o extra contractual derivada de la operación por ellos organizados; deberán mantener al DEPARTAMENTO, indemne y libre de toda perdida, daño y pago de todo reclamo, demandas, litigio, acción legal y reivindicación de cualquier especie y naturaleza que se entable o pueda entablarse contra EL DEPARTAMENTO, por causa de acciones u omisiones en que incurra EL CONTRATISTA o empleados en la ejecución de sus obligaciones en el presente contrato. **CLAUSULA 21. CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR:** Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por la demora en la satisfacción de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del presente contrato, cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana. **CLAUSULA 22. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS:** Las partes acuerdan someter a la decisión de la Procuraduría General de la Nación, las diferencias que puedan surgir por razón de la celebración del contrato y de su ejecución, desarrollo, terminación o liquidación. **CLAUSULA 23. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN:** El presente contrato requiere para su perfeccionamiento de la firma de las partes, y para su ejecución, la expedición del registro presupuestal correspondiente, la suscripción del acta de inicio, la acreditación de encontrarse el Contratista a paz y salvo por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral y la aprobación de la garantía de que trata la cláusula 17 del presente Contrato, siempre y cuando la Entidad Estatal Contratante la requiera. **CLAUSULA 24. REGISTRO Y APROPIACIONES PRESUPUESTALES:** El valor del presente contrato, se pagará con cargo al presupuesto de la actual vigencia, según el CDP respectivo. **CLAUSULA 25. CONFIDENCIALIDAD:** En caso de que exista información sujeta a alguna reserva legal, las partes deben mantener la confidencialidad de esta información. Para ello, debe comunicar a la otra parte que la información suministrada tiene el carácter de confidencial.. **CLAUSULA 26. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL CONTRATISTA .-** El Contratista ejecutará el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de Contratación. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá vínculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista responderá de manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya lugar. Así mismo, el Contratista deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley. El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la Entidad. El empleo de tales subcontratistas no relevará al Contratista de las responsabilidades que asume por las labores de la construcción y por las demás obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la

CONTRATO DE OBRA N°0782 DE 2025

CLAUSULAS ADICIONALES

responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguirá a cargo del Contratista. La Entidad podrá exigir al Contratista la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). **CLAUSULA 27. SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL:** Con el fin de dar cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 282 de la Ley 100 de 1993, EL CONTRATISTA deberá acreditar que cumple con los aportes a los Sistemas Generales de Seguridad Social y aportes Parafiscales, en los términos de la Ley 789 de 2002, Ley 828 de 2003, Ley 1150 de 2007, el Decreto 1703 de 2002 y demás normas concordantes, requisito que deberá tener en cuenta durante la ejecución y liquidación del contrato. **CLAUSULA 28. SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO:** De común acuerdo, las partes contratantes podrán suspender la ejecución de este contrato, mediante la suscripción de un acta en la cual conste el evento sin que para efectos del término de duración del contrato se compute el tiempo de la suspensión. **CLAUSULA 29. CAUSALES DE TERMINACIÓN:** El presente contrato se puede dar por terminado cuando: a) se declare la caducidad o la terminación unilateral, de conformidad con la Ley 80 de 1993, Artículos 17 y 18, b) por mutuo acuerdo de las partes. c) cuando se dé cumplimiento del objeto del contrato, y d) por vencimiento del plazo. **CLAUSULA 30. LIQUIDACIÓN:** El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la materia. El término para la liquidación del contrato será de CUATRO (4) MESES. Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato. Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del contrato o las partes no llegan a ningún acuerdo, la Entidad procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada susceptible del recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a la liquidación acordada o que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidación. **CLAUSULA 32. SOMETIMIENTO A LAS LEYES NACIONALES:** El presente contrato se encuentra sujeto a las leyes nacionales de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 13 de la Ley 80 de 1993. **CLAUSULA 32. IMPUESTOS:** Los impuestos y las contribuciones parafiscales que se causen por razón o con ocasión del contrato serán por cuenta del CONTRATISTA, y las retenciones que ordene la ley en relación con sus honorarios serán efectuadas por EL DEPARTAMENTO. **CLAUSULA 33. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL:** Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en: la vía que comunica Fundación con el municipio de Pivijay, intervención que se encuentra en los municipios de Pivijay y Fundación; en el DEPARTAMENTO MAGDALENA. **CLAUSULA 33. NOTIFICACIONES:** Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes deban hacer en desarrollo del presente contrato, deben constar por escrito y se entenderán debidamente efectuadas sólo si son entregadas personalmente o por correo electrónico a la persona dispuesta en el SECOP II, y las constancias emitidas por mensaje de datos en el SECOP II.

EL PRESENTE CLAUSULADO SE ENTENDERÁ SUSCRITO MEDIANTE FIRMA DE MENSAJES DE DATOS EN LA PLATAFORMA SECOP II.

ACLARATORIO No. 001 A AL CONTRATO DE OBRA No. 0782 DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA Y CONSORCIO CENTRO CAMBIA

Entre los suscritos, Entre los suscritos, **JENNY CAMACHO NEUTO**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 57.462.212 expedida en Santa Marta, obrando en nombre y representación del Departamento del Magdalena entidad territorial con Nit. N°.800.103.920-6, en calidad de JEFE DE OFICINA DE CONTRATACIÓN, nombrada mediante Decreto 0257 del 13 junio de 2023 expedido por el Gobernador del Departamento del Magdalena y delegado para asuntos pre-contractuales y contractuales mediante Decreto 0061 del 30 enero de 2020 expedido por el Gobernador del Departamento del Magdalena; quien en adelante y para efectos del presente contrato se denominará, EL DEPARTAMENTO, y por la otra, **JESUS ARMANDO CERVANTES CEBALLOS**, Identificado con Cedula de ciudadanía N° 19.691.435, representante legal del **CONSORCIO CENTRO CAMBIA**, Identificado con el NIT N° 901.936.019-5, integrado por: 1. EBM CONSTRUCCIONES EINTERVENTORIA S.A.S. identificado con NIT: 901333170-1 y con participación de 90%; 2. JESUS ARMANDO CERVANTES CEBALLOS, identificado con C.C. 19.691.435 y con participación de 10%. y para efectos del presente acuerdo de voluntades se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar el presente aclaratorio, previa las siguientes consideraciones

CONSIDERACIONES:

1) Que el día 11 de abril de 2025, EL DEPARTAMENTO y el CONTRATISTA, celebraron a través de la Plataforma del SECOP II, el Contrato CO-0782-2025, cuyo objeto es: ***"CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA."***

2) Que el valor del contrato se pactó la suma de **CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS CON TREINTA Y UN CENTAVOS M/CTE ($44.855.783.740,31)** Incluidos todos los impuestos, tasas y contribuciones a que haya lugar, amparado en los Certificados de Disponibilidad Presupuestales N° 359 del 31 de enero de 2025 ($29.855.783.740,31) y N°18125 del 19 de febrero de 2025 ($15.000.000.000), expedido por la oficina de presupuesto Departamental.

3) Que el plazo de ejecución inicial se estipuló en CATORCE (14) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

4) Que se recibió oficio de fecha 19 de mayo de 2025 del Secretario de Infraestructura y supervisor del contrato en el que solicita aclarar el contrato No. CO-0782-2025, toda vez que: *"En base al oficio enviado por la Oficina de Presupuesto, se solicita un aclaratorio con respecto a la Cláusula No. 4 "Plazo del Contrato" del contrato CO-0782-2025, correspondiente al proyecto "CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE UNIVERSITARIA*

SUBREGIONAL – CENTRO CAMBIA – EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA, MAGDALENA" con BPIN 2024002470037, el cual es cofinanciado con recursos del Presupuesto Ordinario y del Sistema General de Regalías – SGR. La Secretaría de Hacienda y su Área Funcional de Presupuesto ha manifestado que, conforme a lo establecido en el artículo 14 del Decreto 111 de 1996 y el artículo 10 de la Ordenanza 013 de 1997 del Departamento del Magdalena, los recursos del Presupuesto Ordinario tienen una vigencia limitada al año fiscal en curso, por lo cual no es procedente efectuar un registro que sobrepase el 31 de diciembre de 2025. Por tanto, se requiere que en la Cláusula No. 4 del contrato se aclare expresamente lo siguiente:

• Los recursos financiados con el Presupuesto Ordinario, respaldados en el CDP No. 359 del 31 de enero de 2025 por un valor de $29.855.783.740,31, tendrán un plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2025.

• Los recursos provenientes del SGR, respaldados en el CDP No. 18125 del 19 de febrero de 2025 por un valor de $15.000.000.000, tendrán un plazo de ejecución de CATORCE (14) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio. (...)"

La mencionada solicitud hace parte integral del presente aclaratorio. Es importante advertir que la aclaración tiene como finalidad señalar que el contrato cuenta con amparos que cubren las vigencias durante las cuales se ejecutará. No obstante, es necesaria una distinción clara entre dichos amparos.

5) Que el artículo 45 de la Ley 1437 de 2011, establece: *Corrección de errores formales. En cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte, se podrán corregir los errores simplemente formales contenidos en los actos administrativos, ya sean aritméticos, de digitación, de transcripción o de omisión de palabras. En ningún caso la corrección dará lugar a cambios en el sentido material de la decisión, ni revivirá los términos legales para demandar el acto. Realizada la corrección, esta deberá ser notificada o comunicada a todos los interesados, según corresponda*

6) Que, en consecuencia, se aclara la cláusula N°7, referente a los CDPS del CONTRATO DE OBRA No. 0782 DE 2025.

7) En virtud de lo antes expuesto, las partes,

ACUERDAN:

CLÁUSULA PRIMERA: ACLARAR las cláusulas 7, referente a los CDPs del CONTRATO DE OBRA No. 0782 DE 2025, de conformidad con las consideraciones expuestas, las cuales quedaran así:

"CLAUSULA 7. CDP: La suma que se encuentra amparada así:

• Los recursos financiados con el Presupuesto Ordinario, respaldados en el CDP No. 359 del 31 de enero de 2025 por un valor de $29.855.783.740,31, tendrán un plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2025.

• Los recursos provenientes del SGR, respaldados en el CDP No. 18125 del 19 de febrero de 2025 por un valor de $15.000.000.000, tendrán un plazo de ejecución de CATORCE (14) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.

Expedidos por la oficina de presupuesto Departamental."

CLÁUSULA SEGUNDA: VIGENCIA DE LAS CLAUSULAS NO MODIFICADAS: Quedan vigentes todas las estipulaciones o Cláusulas del CONTRATO DE OBRA No. 0782 DE 2025 y su Anexo que no fueron objeto de Aclaración a través del presente documento.

CLÁUSULA TERCERA: PERFECCIONAMIENTO: El presente Aclaratorio queda perfeccionado con la firma electrónica de las partes en la plataforma SECOP II.

Santa Marta, 19 de mayo de 2025

Gobernación del Magdalena
19/05/2025 17:05 Folios: 2 Anexos: 0
Remitente: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Destinatario: ORDINADE CONTRATACION
Asunto: Solicitud de acto aclaratorio sobre Cláusula 4 del Contrato CO-0782-2025 - Vigencia presupuestal por fuente de financiación
I-2025-04035

Dra. JENNY CAMACHO NEUTO
Jefe de oficina de contratación
GOBERNACION DEL MAGDALENA

Asunto: Solicitud de acto aclaratorio sobre Cláusula 4 del Contrato CO-0782-2025 – Vigencia presupuestal por fuente de financiación.

En base al oficio enviado por la Oficina de Presupuesto, se solicita un aclaratorio con respecto a la **Cláusula No. 4 "Plazo del Contrato"** del contrato **CO-0782-2025,** correspondiente al proyecto ***"CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL – CENTRO CAMBIA – EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA, MAGDALENA"*** con **BPIN 2024002470037**, el cual es cofinanciado con recursos del Presupuesto Ordinario y del Sistema General de Regalías – SGR.

La Secretaría de Hacienda y su Área Funcional de Presupuesto ha manifestado que, conforme a lo establecido en el artículo 14 del Decreto 111 de 1996 y el artículo 10 de la Ordenanza 013 de 1997 del Departamento del Magdalena, los recursos del Presupuesto Ordinario tienen una vigencia limitada al año fiscal en curso, por lo cual no es procedente efectuar un registro que sobrepase el 31 de diciembre de 2025.

Por tanto, se requiere que en la Cláusula No. 4 del contrato se aclare expresamente lo siguiente:

- Los recursos financiados con el Presupuesto Ordinario, respaldados en el CDP No. 359 del 31 de enero de 2025 por un valor de $29.855.783.740,31, tendrán un plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2025.
- Los recursos provenientes del SGR, respaldados en el CDP No. 18125 del 19 de febrero de 2025 por un valor de $15.000.000.000, tendrán un plazo de ejecución de CATORCE (14) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.

Esta precisión se solicita con el fin de garantizar el cumplimiento normativo y presupuestal, conforme a la plurianualidad propia de los recursos del Sistema General de Regalías y la restricción derivada del principio de anualidad que rige para los recursos del presupuesto ordinario o propios.

Agradecemos su oportuna colaboración.

Cordial saludo,

EFRAIN DE JESÚS VARGAS CORVACHO
Secretario de Infraestructura Departamental

ACLARATORIO No. 002 AL CONTRATO DE OBRA No. 0782 DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA Y CONSORCIO CENTRO CAMBIA

Entre los suscritos, **JENNY CAMACHO NEUTO**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 57.462.212 expedida en Santa Marta, obrando en nombre y representación del Departamento del Magdalena entidad territorial con Nit. N°.800.103.920-6, en calidad de JEFE DE OFICINA DE CONTRATACIÓN, nombrada mediante Decreto 0257 del ,3 de junio de 2023 expedido por el Gobernador del Departamento del Magdalena y delegado para asuntos pre-contractuales y contractuales mediante Decreto 0061 del 30 enero de 2020 expedido por el Gobernador del Departamento del Magdalena; quien en adelante y para efectos del presente contrato se denominará, EL DEPARTAMENTO, y por la otra, **JESUS ARMANDO CERVANTES CEBALLOS**, identificado con Cedula de ciudadanía N° 19.691.435, representante legal del **CONSORCIO CENTRO CAMBIA**, identificado con el NIT N° 901.936.019-5, integrado por: 1. EBM CONSTRUCCIONES EINTERVENTORIA S.A.S. identificado con NIT: 901333170-1 y con participación de 90%; 2. JESUS ARMANDO CERVANTES CEBALLOS, identificado con C.C. 19.691.435 y con participación de 10%. y para efectos del presente acuerdo de voluntades se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar el presente aclaratorio, previas las siguientes consideraciones

CONSIDERACIONES:

1) Que el día 11 de abril de 2025, **EL DEPARTAMENTO** y **EL CONTRATISTA** celebraron, a través de la plataforma SECOP II, el Contrato de Obra No. CO-0782-2025, cuyo objeto es: ***"CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA."***

2) Que el valor del contrato fue pactado en la suma de **CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS CON TREINTA Y UN CENTAVOS M/CTE ($44.855.783.740,31)**, incluidos todos los impuestos, tasas y contribuciones a que haya lugar. Este valor se encuentra amparado en los siguientes Certificados de Disponibilidad Presupuestal: CDP No. 359 del 31 de enero de 2025, por valor de $29.855.783.740,31, con plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2025 y CDP No. 18125 del 19 de febrero de 2025, por valor de $15.000.000.000, con un plazo de ejecución de **CATORCE (14) MESES**, ambos expedidos por la Oficina de Presupuesto Departamental.

3) Que el plazo de ejecución inicial se estipuló en CATORCE (14) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

4) Que la ejecución del contrato dio inicio el día 19 de mayo de 2025.

5) Que se recibió oficio de fecha 01 de septiembre de 2025, suscrito por el Secretario de Infraestructura y supervisor del contrato, en el cual solicita aclarar la forma de pago del Contrato No. CO-0782-2025, manifestando lo siguiente:

> *"En el marco de la supervisión adelantada por la Gobernación del Magdalena, a través de la Secretaría de Infraestructura, sobre la ejecución del Contrato de Obra N°0782 de 2025, (...), nos permitimos aclarar que en la Cláusula Sexta – Forma de Pago se presentó un error de redacción que dio lugar a la inclusión de dos métodos de pago. Para efectos contractuales y legales, la forma de pago correcta será la siguiente: "El contratista podrá cobrar mediante actas parciales mensuales hasta el noventa por ciento (90%) del valor del contrato. El saldo restante, equivalente al diez por ciento (10%), se cancelará previa suscripción de las actas de recibo y liquidación." En atención a lo anterior, solicitamos respetuosamente adelantar las actuaciones administrativas correspondientes, con el fin de dar cumplimiento a lo estipulado en la normativa contractual vigente y permitir la aclaración de la cláusula sexta del contrato en mención. (...)"*

La solicitud mencionada forma parte integral del presente documento aclaratorio. Es importante precisar que esta aclaración tiene como único propósito corregir la redacción de la Cláusula Sexta del contrato, a fin de establecer de manera clara y unívoca la forma de pago aplicable. En ningún caso se modifican los términos, condiciones ni garantías contractuales previamente acordadas.

6) Que el artículo 45 de la Ley 1437 de 2011, establece: *Corrección de errores formales. En cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte, se podrán corregir los errores simplemente formales contenidos en los actos administrativos, ya sean aritméticos, de digitación, de transcripción o de omisión de palabras. En ningún caso la corrección dará lugar a cambios en el sentido material de la decisión, ni revivirá los términos legales para demandar el acto. Realizada la corrección, esta deberá ser notificada o comunicada a todos los interesados, según corresponda*

7) Que, en consecuencia, se aclara la cláusula N°6, referente a la FORMA DE PAGO del CONTRATO DE OBRA No. 0782 DE 2025.

8) En virtud de lo antes expuesto, las partes,

ACUERDAN:

CLÁUSULA PRIMERA: ACLARAR las cláusulas 6, referente a la FORMA DE PAGO del CONTRATO DE OBRA No. 0782 DE 2025, de conformidad con las consideraciones expuestas, las cuales quedarán así:

> *"**CLAUSULA 6. FORMA DE PAGO:** El contratista podrá cobrar mediante actas parciales mensuales hasta el (90%) del valor del contrato, el saldo restante, (10%)*

se cancelará previa suscripción de las actas de recibo y liquidación. **SISTEMA DE PAGO:** El sistema de pago del contrato es por precios unitarios sin fórmula de ajuste. **PARAGRAFO 1: CONDICIONES PARA CADA UNO DE LOS PAGOS:** Para el pago será necesario la certificación por parte del supervisor del contrato del cumplimiento a satisfacción de los servicios prestados y de la entrega a satisfacción de los bienes incluidos en el anexo técnico. Además, para cada pago el contratista deberá allegar: a) La factura correspondiente con el cumplimiento de los requisitos fiscales y legales; b) Certificación suscrita por el Supervisor Contractual en la que consta que se ha cumplido a satisfacción con el objeto del Contrato; c) Certificación del Pago de Aportes Parafiscales y de Seguridad Social, esto en cumplimiento de la Ley 789 de 2002 y el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. El Departamento efectuará las retenciones que en materia tributaria tenga establecida la Ley y respecto de las cuales sea su obligación efectuar la retención. En los demás casos, el contratista deberá cumplir con el pago de los impuestos, tasas o contribuciones que se deriven de la presente contratación. Deberán ser tramitadas por el PROPONENTE, las devoluciones o exenciones a que crea tener derecho ante la respectiva Administración de Impuestos, sin responsabilidad alguna por parte del Departamento o costo para ella. Todos los impuestos, retenciones y gastos que se causen por razón de la legalización y ejecución del contrato, incluidas la constitución de la garantía de cumplimiento en caso de que se le requiera, son de cargo exclusivo del Contratista. Por lo tanto, los precios que se propongan deberán considerar tales conceptos. Al formular la propuesta el Proponente deberá determinar, evaluar y asumir los impuestos, tasas y contribuciones, así como los demás gravámenes que conlleven la celebración, ejecución y liquidación del Contrato, observando que aquellos son de cargo exclusivo del Contratista, con excepción de los que por expresa disposición legal correspondan al ente territorial. Por lo tanto, los precios que se propongan deberán considerar tal concepto. El Departamento del Magdalena solo pagará los valores del Contrato; no reconocerá suma adicional alguna por impuestos, así estos fueren establecidos con posterioridad al Cierre del proceso. Así y para efectos de estructurar el valor de la oferta, el proponente deberá tener en cuenta, además de los impuestos de carácter nacional y los demás conceptos señalados en este numeral, los siguientes descuentos departamentales que deberá realizar para efectos de legalización del contrato, así:

DESCRIPCIÓN TARIFA	PORCENTAJE Y/O VALOR
PRO-DESARROLLO DEPARTAMENTAL	1/100 (1%)
PRO-HOSPITALES UNIVERSITARIOS PÚBLICOS	2/100 (2%)
REFUNDACIÓN UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA	2/100 (2%)
PROCULTURA	2/100 (2%)
PRO-BIENESTAR DEL ANCIANO	3/100 (3%)
PRO-DEPORTES	1/100 (1%)
CONTRIBUCIÓN DE OBRA PÚBLICA	5/100 (5%)

ICA	0,7/100 (0,7%)

PARAGRAFO 2: Para efectos del pago de estos impuestos del orden departamental, el contratista se someterá a los que resulten de la liquidación que practique el Departamento del Magdalena. PARAGRAFO 3: Las estampillas antes relacionadas serán descontadas de cada pago realizado al contratista. PARAGRAFO 4: Para la aprobación de los pagos correspondientes a cada entrega parcial de obra, el Contratista deberá allegar un acta con un informe detallado sobre la ejecución de las obras en los formatos suministrados por la Interventoría, la correspondiente cuenta de cobro o factura y acreditar encontrarse al día en el pago de salarios, prestaciones sociales y aportes al sistema de seguridad social integral. PARAGRAFO 5: La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato. PARAGRAFO 6: El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del Contrato que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y cajas de compensación familiar, cuando corresponda."

CLÁUSULA SEGUNDA: VIGENCIA DE LAS CLAUSULAS NO MODIFICADAS: Quedan vigentes todas las estipulaciones o Cláusulas del CONTRATO DE OBRA No. 0782 DE 2025 y su Anexo que no fueron objeto de Aclaración a través del presente documento.

CLÁUSULA TERCERA: PERFECCIONAMIENTO: El presente Aclaratorio queda perfeccionado con la firma electrónica de las partes en la plataforma SECOP II.

Gobernación del MAGDALENA

Magdalena

Santa marta, 01 de septiembre de 2025

Dra. JENNY CAMACHO NEUTO
Jefe de oficina de contratación
GOBERNACION DEL MAGDALENA

Gobernación del Magdalena
01/09/2025 14:17 Folios: 1 Anexos: 0
Remite: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Destinatario: OFICINA DE CONTRATACION
Asunto: Aclaración clausula sexta – Forma de pago del contrato de obra N°0782 de 2025

I-2025-06914

Asunto: Aclaración clausula sexta – Forma de pago del contrato de obra N°0782 de 2025

Cordial saludo,

En el marco de la supervisión adelantada por la Gobernación del Magdalena, a través de la Secretaría de Infraestructura, sobre la ejecución del Contrato de Obra **N°0782 de 2025**, denominado *"Construcción de sede universitaria subregional Centro Cambia en el municipio de Ciénaga – Magdalena"*, nos permitimos aclarar que en la Cláusula Sexta – Forma de Pago se presentó un error de redacción que dio lugar a la inclusión de dos métodos de pago.

Para efectos contractuales y legales, la forma de pago correcta será la siguiente:

"El contratista podrá cobrar mediante actas parciales mensuales hasta el noventa por ciento (90%) del valor del contrato. El saldo restante, equivalente al diez por ciento (10%), se cancelará previa suscripción de las actas de recibo y liquidación."

En atención a lo anterior, solicitamos respetuosamente adelantar las actuaciones administrativas correspondientes, con el fin de dar cumplimiento a lo estipulado en la normativa contractual vigente y permitir la aclaración de la cláusula sexta del contrato en mención.

Atentamente.

EFRAÍN DE JESÚS VARGAS CORVACHO
Secretario de Infraestructura
Gobernación del Departamento del Magdalena

Revisó: Francisco Betancourt
Elaboró: Valeria Manjarés
Contratista Apoyo – Secretaría Infraestructura Departamental

ACTA DE INICIO

Gobernación del
MAGDALENA

ACTA DE INICIO

CONTRATO No:	CO-0782-2025
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA
TIPO DE CONTRATO	OBRA
CONTRATANTE:	GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA
CONTRATISTA:	CONSORCIO CENTRO CAMBIA
VALOR:	CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS CON TREINTA Y UN CENTAVOS M/CTE ($44.855.783.740,31)
SUPERVISOR DESIGNADO:	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
PLAZO:	El plazo estimado para la ejecución del contrato será de CATORCE (14) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Departamento del Magdalena

En la ciudad de Santa Marta, Magdalena, a los diecisiete (17) días del mes de julio del año dos mil veinticinco (2025) entre las personas, **EFRAIN DE JESUS VARGAS CORVACHO**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 7.629.011 expedida en Santa Marta, obrando en nombre y representación del Departamento del Magdalena entidad territorial con Nit. N°.800.103.920-6, en calidad de SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA mediante Decreto 021 del 12 enero de 2024 expedido por el Gobernador del Departamento del Magdalena, por una parte, **JESUS ARMANDO CERVANTES CEBALLOS**, identificado con C.C. No. 19.691.435, quien obra en nombre y representación de **CONSORCIO CENTRO CAMBIA** identificado con NIT 901.936.019-5, en calidad de **CONTRATISTA**, y **LAURA MARCELA CAICEDO MUÑOZ**, identificada con C.C. 1.143.142.359, quien obra en nombre y representación de **CONSORCIO AVANZA MAGDALENA 025**, en calidad de **INTERVENTOR**, hemos convenido suscribir el acta de inicio del contrato de obra CO-0782-2025 teniendo en cuenta el cumplimiento de los requisitos ejecución:

Número y fecha del CDP N°359 de 31 de enero de 2025 y N°18125 del 19 de febrero de 2025

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron a los diecisiete (17) días del mes de julio del 2025.

EFRAIN DE JESÚS VARGAS CORVACHO
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

JESUS ARMANDO CERVANTES CEBALLOS
Rep. Legal CONSORCIO CENTRO CAMBIA

LAURA MARCELA CAICEDO MUÑOZ
Rep. Legal CONSORCIO AVANZA MAGDALENA 025

Gobernación del MAGDALENA

ACTA DE SUSPENSIÓN

Magdalena

Fecha: 28-12-2025	Versión:

ACTA No. 1

CONTRATO No:	CO- 0782-2025	TIPO DE CONTRATO:	OBRA
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA		
CONTRATISTA:	CONSORCIO CENTRO CAMBIA		
INTERVENTOR: [X] NA [ ] CONSORCIO AVANZA MAGDALENA 025		SUPERVISOR: [X] NA [ ] EFRAIN VARGAS CORVACHO	

FECHA DE INICIO:	17 DE JULIO DE 2025	SUSPENSIÓN No 1 :	29 DE DICIEMBRE DE 2025
PLAZO:	14 MESES	REINICIO No :	NA
FECHA TERMINACION INICIAL:	17 DE SEPTIEMBRE DE 2026	VALOR:	$ 44.855.783.740
ADICIÓN EN PLAZO No :	NA	ADICIÓN EN VALOR No :	NA
FECHA DE REINICIO PROG:	19 DE ENERO DE 2026	TIEMPO DE SUSPENSION EN DIAS:	21 DIAS
FECHA DE TERMINACION PROG:	8 DE OCTUBRE DE 2026	TIEMPO RESTANTE EN DIAS:	260 DIAS

MOTIVO:

Teniendo en cuenta:

(i) Que un número significativo de proveedores, fabricantes y distribuidores de materiales de construcción suspenden sus operaciones con ocasión de la temporada de fin de año. Esta situación genera afectaciones directas en los tiempos de suministro de materiales esenciales para la ejecución de las actividades programadas. Dichas circunstancias constituyen hechos ajenos a la voluntad y control del contratista, imposibilitando la ejecución normal y continua de las actividades constructivas.

(ii) Que la jurisprudencia del Consejo de Estado que dispone que, los contratos estatales pueden ser suspendidos para reconocer situaciones de interés público que impiden la ejecución del objeto contractual: *"En efecto, la finalidad de la suspensión del contrato estatal, como medida excepcional, está encaminada a reconocer la ocurrencia de situaciones de fuerza mayor, caso fortuito o de interés público que impiden la ejecución temporal del negocio jurídico, y es precisamente por ese motivo que la misma no puede ser indefinida, sino que debe estar sujeta al vencimiento de un plazo o al cumplimiento de una condición. Por lo tanto, la suspensión no adiciona el contrato en su vigencia o plazo, sino que se delimita como una medida de tipo provisional y excepcional que debe ajustarse a los criterios de necesidad y proporcionalidad, sujeta a un término o condición, periodo este durante el que las obligaciones contenidas en el contrato no se ejecutan, pero sin que se impute ese tiempo al plazo pactado inicialmente por las partes."* (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 26 de Abril de 2010, Rad. 16431, M.P. Enrique Gil Botero).

Por último y teniendo en cuenta lo anterior, se determina necesario realizar el Acta de Suspensión No. 1, la cual se firma de común acuerdo entre el Contratante, el Contratista y la Supervisión e Interventoría, al considerarla viable y conveniente para el proyecto y que por los hechos aquí nombrados no se generan reclamaciones por ninguna de las partes. La mencionada Suspensión consta de los siguientes puntos:

PRIMERO. Suspéndase el plazo de ejecución del Contrato N° 0782, por un término de 21 días de suspensión días a partir del día 29 de diciembre del 2025.
SEGUNDO. Durante el término de suspensión al que se refiere el punto PRIMERO, EL CONTRATANTE, EL CONTRATISTA y EL INTERVENTOR detendrán todas la actividades relacionadas con el Contrato N° 0782.
TERCERO. El CONTRATISTA se obliga a adecuar todas las pólizas suscritas a favor del contratante con el fin de que las mismas se ajusten a la vigencia del contrato, esto es, que se suspendan durante el término a que se refiere la presente acta y se renueven en la fecha de reinicio igualmente prevista en esta acta. El CONTRATISTA enviará las constancias respectivas al CONTRATANTE, una vez cumpla con la obligación a la que se refiere este punto.
CUARTO. Las partes manifiestan que dada la información suministrada en la presente acta, el contrato se reiniciará el día 19 del mes enero del 2026.
QUINTO. Las partes manifiestan libremente que han procedido a la lectura total y cuidadosa del presente documento, por lo que en consecuencia, se obligan a todo lo dispuesto y descrito en la presente Acta.

Las partes acuerdan que la suspensión del contrato no generará gastos de administración adicionales por permanencia en obra o lucro cesante a cargo de la GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA

Para constancia se firma a los 29 días del mes de diciembre de 2025 y se suscribe el ACTA DE SUSPENSION No 01.

EFRAIN VARGAS CORVACHO
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
Gobernación del Magdalena

JESUS CERVANTES
CONSORCIO CENTRO CAMBIA
Representante legal

LAURA CAICEDO MUÑOZ
CONSORCIO AVANZA MAGDALENA 025
Representante legal
Interventoría

Contrato N°: 782
Original: Gobernación del Magdalena
Copia: Archivo (Dependencia / Contratista / Interventor, si aplica)

Gobernación del MAGDALENA

ACTA DE REINICIO

Magdalena

Fecha: 19-01-2026 | Versión:

ACTA No. 1

CONTRATO No:	CO- 0782-2025	TIPO DE CONTRATO:	OBRA
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA		
CONTRATISTA:	CONSORCIO CENTRO CAMBIA		
INTERVENTOR: [X] NA [ ]	CONSORCIO AVANZA MAGDALENA 025	SUPERVISOR: [X] NA [ ]	EFRAIN VARGAS CORVACHO

FECHA DE INICIO:	17 DE JULIO DE 2025	SUSPENSIÓN No 1 :	29 DE DICIEMBRE DE 2025
PLAZO:	14 MESES	REINICIO No :	NA
FECHA TERMINACION INICIAL:	17 DE SEPTIEMBRE DE 2026	VALOR:	$ 41.855.783 Y40
ADICIÓN EN PLAZO No :	NA	ADICIÓN EN VALOR No :	NA
FECHA DE REINICIO PROG:	19 DE ENERO DE 2026	TIEMPO DE SUSPENSION EN DIAS:	21 DIAS
FECHA DE TERMINACION PROG:	8 DE OCTUBRE DE 2026	TIEMPO RESTANTE EN DIAS:	260 DIAS

MOTIVO:

Teniendo en cuenta:
(i) Ya ha trasnscurrio el tiempo solicitado para la suspension y no hay motivos para prorrogarlo, se decide dar REINICIO al contrato de obra No 0782.

Para constancia se firma a los 19 días del mes de enero de 2026 y se suscribe el ACTA DE REINICIO No 01.

EFRAIN VARGAS CORVACHO
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
Gobernación del Magdalena

JESUS CERVANTES
CONSORCIO CENTRO CAMBIA
Representante legal

Laura Caicedo M.

LAURA CAICEDO MUÑOZ
CONSORCIO AVANZA MAGDALENA 025
Representante legal
Interventoria

Contrato Nº: 782
Original: Gobernación del Magdalena
Copia: Archivo (Dependencia / Contratista / Interventor, si aplica)

POLIZAS

VERIFICA TU POLIZA AQUÍ

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

nacional de seguros

CIUDAD DE EXPEDICIÓN: BOGOTÁ, D.C. | DIRECCIÓN GENERAL: CALLE 94 N° 11-30 PISO 4 | TELÉFONO: (601) 7463219

NIT.: 860.002.527-9
www.nacionaldeseguros.com.co

REFERENCIA	SUCURSAL	CÓD. SUCURSAL	CÓD.PUNTO DE VENTA	RAMO	No. PÓLIZA	ANEXO
188188	BOGOTA	11		15	400064071	0

FECHA EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE	A LAS	VIGENCIA HASTA	A LAS	TIPO DE MOVIMIENTO	HOJA
Día - Mes - Año	Día - Mes - Año		Día - Mes - Año	Horas		
12/5/2025	5/5/2025	00:00	5/7/2028	00:00	EXPEDICIÓN	1

DATOS DEL TOMADOR / AFIANZADO

NOMBRE	CONSORCIO CENTRO CAMBIA	NIT	901.936.019 - 5
DIRECCIÓN	CARRERA 19D 3 B1 -33 RINCON DEL AMPARO, VALLEDUPAR, CESAR	TELÉFONO	3014835376

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	CONSORCIO CENTRO CAMBIA	NIT 901.936.019 - 5	TELÉFONO 3014835376
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	NIT 000.000.000 - 0	TELÉFONO 1000000

AMPAROS	SUBLÍMITE POR EVENTO	SUBLÍMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA	VALOR PRIMA
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES -PLO	2.242.789.187,00	2.242.789.187,00	2.242.789.187,00	5.235.223,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	2.242.789.187,00	2.242.789.187,00	2.242.789.187,00	0,00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	2.242.789.187,00	2.242.789.187,00	2.242.789.187,00	0,00
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	2.242.789.187,00	2.242.789.187,00	2.242.789.187,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	2.242.789.187,00	2.242.789.187,00	2.242.789.187,00	0,00

DEDUCIBLES

PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES -PLO	10,00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5,00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10,00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5,00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10,00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5,00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10,00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5,00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10,00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5,00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA

VALOR PRIMA	GASTOS	IVA	TOTAL A PAGAR	FECHA LIMITE DE PAGO	No DOCUMENTO PARA PAGO
$ 5.235.223,00	$ 17.700,00	$ 998.055,37	$ 6.250.978,37	Día - Mes - Año 11/06/2025	901336019

VALOR ASEGURADO TOTAL	VALOR ASEGURADO EN LETRAS
$ 2.242.789.187,00	DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	%
BAEZ COTE ASESORES DE SEGUROS LTDA	40163	100,00

COASEGURO

NOMBRE	% PARTICIPACIÓN	VALOR ASEGURADO

FIRMA AUTORIZADA
NACIONAL DE SEGUROS S.A.
IVA REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6511
TARIFA ICA 11,04/1000

FIRMA TOMADOR

CANALES DE ATENCIÓN:
Calle 94 # 11-30 Piso 4 / Bogotá D.C.
(601) 743 3275
[illegible]

Pague en línea en:
www.nacionaldeseguros.com.co

PASA APF
Asociación Panamericana de Afianzadores, Seguros y Afines

DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO:
Cra. 13 #34 Ed. Colseg. Of 202 / Bogotá D.C.
(601) 562 5017
3142900300
defensoriadelconsumidor@nacionaldeseguros.com

Nacional de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

NRODRIGUEZO 06/05/2025 14:13:7[INT-PI08[INT-RC-CUMP1[0001 — 13/06/2014 13:7[PI06[CLCRC-PARTICULAR-01[0001

DIRECCIÓN GENERAL CALLE 94 N° 11-30 PISO 4
TELÉFONO 7483219

nacional de seguros

www.nacionaldeseguros.com.co

No. PÓLIZA	ANEXO	SUCURSAL	FECHA SOLICITUD Día - Mes - Año	CIUDAD DE EXPEDICIÓN
400064071	0	BOGOTA	12 5 2025	BOGOTÁ, D.C.

VIGENCIA DESDE Día - Mes - Año	A LAS Horas	VIGENCIA HASTA Día - Mes - Año	A LAS Horas	TIPO DE MOVIMIENTO
5 5 2025	00:00	5 7 2026	00:00	EXPEDICIÓN

DATOS DEL TOMADOR / AFIANZADO

NOMBRE	CONSORCIO CENTRO CAMBIA	NIT	901.938.019 - 5
DIRECCIÓN	CARRERA 19D # 8A-33 RINCON DEL AMPARO, VALLEDUPAR, CESAR	TELÉFONO	3014835376

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	CONSORCIO CENTRO CAMBIA	NIT	901.938.019 - 5	TELÉFONO	3014835376
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	NIT	000.000.000 - 0	TELÉFONO	1000000

OBJETO DE LA POLIZA:

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A BIENES DE TERCEROS Y O LESIONES A PERSONAS QUE SE PUEDAN CAUSAR EN LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA No. 0782 DE 2025, CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA

TOMADOR AFIANZADO CONSORCIO CENTRO CAMBIA:
- ERM CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIA SAS NIT 901333170-1 PART. 90%
- SUS ARMANDO CERVANTES CEBALLOS CC 19691435 PART. 10%

SE ACLARA QUE LA COBERTURA DE DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE, SE ENCUENTRAN INCLUIDAS DENTRO DEL P.L.O.

ASEGURADO: CONSORCIO CENTRO CAMBIA.; SE TENDRA A DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LO DAÑOS CAUSADOS UNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA CONSORCIO CENTRO CAMBIA. EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS. ADICIONALMENTE, SE TENDRA A DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL.

********** FIN PÓLIZA **********

VERIFICA TU POLIZA AQUÍ

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

nacional de seguros

NIT.: 860.002.527-9
www.nacionaldeseguros.com.co

CIUDAD DE EXPEDICIÓN: BOGOTÁ, D.C.
DIRECCIÓN GENERAL: CALLE 94 N° 11-30 PISO 4
TELÉFONO: (601) 7463219

REFERENCIA	SUCURSAL	COD. SUCURSAL	CÓD. PUNTO DE VENTA	RAMO	No. POLIZA	ANEXO
193510	BOGOTA	11		15	400064071	1

FECHA EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE	A LAS	VIGENCIA HASTA	A LAS	TIPO DE MOVIMIENTO	HOJA
Día - Mes - Año	Día - Mes - Año		Día - Mes - Año	Horas		
25/7/2025	17/7/2025	00:00	17/9/2026	00:00	MODIFICACIÓN	1

DATOS DEL TOMADOR / AFIANZADO

NOMBRE	CONSORCIO CENTRO CAMBIA	NIT	901.936.019 - 5
DIRECCIÓN	CARRERA 19D # 8ª -33 RINCON DEL AMPARO, VALLEDUPAR, CESAR	TELÉFONO	3014835376

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	CONSORCIO CENTRO CAMBIA	NIT	901.936.019 - 5	TELÉFONO	3014835376
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	NIT	000.000.000 - 0	TELÉFONO	1000000

AMPAROS	SUBLIMITE POR EVENTO	SUBLIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA	VALOR PRIMA
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES -PLO	2.242.782.187,00	2.242.782.187,00	2.242.782.187,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	2.242.782.187,00	2.242.782.187,00	2.242.782.187,00	0,00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	2.242.782.187,00	2.242.782.187,00	2.242.782.187,00	0,00
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	2.242.782.187,00	2.242.782.187,00	2.242.782.187,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	2.242.782.187,00	2.242.782.187,00	2.242.782.187,00	0,00

DEDUCIBLES

PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES -PLO	10,00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5,00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10,00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5,00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10,00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5,00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10,00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5,00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10,00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5,00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA

VALOR PRIMA	GASTOS	IVA	TOTAL A PAGAR	FECHA LIMITE DE PAGO	No DOCUMENTO PARA PAGO
$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	Día - Mes - Año 23/08/2025	901936019

VALOR ASEGURADO TOTAL	VALOR ASEGURADO EN LETRAS
$ 2.242.782.187,00	DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	%
BAEZ COTE ASESORES DE SEGUROS LTDA	40168	100,00

COASEGURO

NOMBRE	% PARTICIPACIÓN	VALOR ASEGURADO

FIRMA AUTORIZADA
NACIONAL DE SEGUROS S.A.
IVA REGIMEN COMUN- ACTIVIDAD ECONOMICA 6511
TARIFA ICA 11.04/1000

FIRMA TOMADOR

CANALES DE ATENCIÓN:
Calle 94 # 11-30 Piso 4 / Bogotá D.C.
(601) 7463219

Pague en línea en:
www.nacionaldeseguros.com.co

DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO:

Nacional de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

06/08/2014|1:3-7|NT-P|06|NT-RC-CUMP|1|0|0|0|T|dos|2014|1|3-7|P|00|CLARC-PARTICULAR-01|0061

NRODRIGUEZG

DIRECCIÓN GENERAL CALLE 94 N° 11-30 PISO 4
TELÉFONO 7463219

nacional de seguros

www.nacionaldeseguros.com.co

No. PÓLIZA	ANEXO	SUCURSAL	FECHA SOLICITUD	CIUDAD DE EXPEDICIÓN
400064071	1	BOGOTA	Día-Mes-Año 25 7 2025	BOGOTÁ, D.C.

VIGENCIA DESDE	A LAS	VIGENCIA HASTA	A LAS	TIPO DE MOVIMIENTO
Día-Mes-Año 17 7 2025	Horas 00:00	Día-Mes-Año 17 9 2026	Horas 00:00	MODIFICACIÓN

DATOS DEL TOMADOR / AFIANZADO

NOMBRE	CONSORCIO CENTRO CAMBIA	NIT	901,938,019-5
DIRECCIÓN	CARRERA 19D # 6ª -33 RINCON DEL AMPARO, VALLEDUPAR, CESAR	TELÉFONO	3014833376

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	CONSORCIO CENTRO CAMBIA	NIT	901,938,019-5	TELÉFONO	3014833376
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	NIT	000,000,000-0	TELÉFONO	1000000

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN ACTA DE INICIO DEL 17 DE JULIO DE 2025, SE REALIZA AJUSTE DE VIGENCIAS, LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

OBJETO DE LA POLIZA:

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A BIENES DE TERCEROS Y O LESIONES A PERSONAS QUE SE PUEDAN CAUSAR EN LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA No. 0782 DE 2025, CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA

TOMADOR AFIANZADO CONSORCIO CENTRO CAMBIA:
- EBM CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIA SAS NIT 901333170-1 PART. 90%
- JESUS ARMANDO CERVANTES CEBALLOS CC 19691435 PART. 10%

SE ACLARA QUE LA COBERTURA DE DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE, SE ENCUENTRAN INCLUIDAS DENTRO DEL P.L.O.

ASEGURADO: CONSORCIO CENTRO CAMBIA; SE TENDRA A DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LO DAÑOS CAUSADOS UNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA CONSORCIO CENTRO CAMBIA. EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS, ADICIONALMENTE, SE TENDRA A DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL.

********** FIN PÓLIZA **********

VERIFICA TU POLIZA AQUÍ

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL

nacional de seguros

CIUDAD DE EXPEDICIÓN: BOGOTÁ, D.C.
DIRECCIÓN GENERAL: CALLE 94 N° 11-30 PISO 4
TELÉFONO: (601) 7463219

NIT.: 860.002.527-9
www.nacionaldeseguros.com.co

REFERENCIA	SUCURSAL	COD. SUCURSAL	COD. PUNTO DE VENTA	RAMO	No. PÓLIZA	ANEXO
188187	BOGOTA	11		30	400064070	0

FECHA EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE	A LAS	VIGENCIA HASTA	A LAS	TIPO DE MOVIMIENTO	HOJA
Día - Mes - Año	Día - Mes - Año	Horas	Día - Mes - Año	Horas		
12/5/2025	5/5/2025	00:00	5/7/2031	00:00	EXPEDICIÓN	1

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE	CONSORCIO CENTRO CAMBIA	NIT	901.936.019 - 5
DIRECCIÓN	CARRERA 19D # 8A-33 RINCON DEL AMPARO, VALLEDUPAR, CESAR	TELÉFONO	3014333376

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE	CONSORCIO CENTRO CAMBIA	NIT	901.936.019 - 5
DIRECCIÓN	CARRERA 19D # 8A-33 RINCON DEL AMPARO, VALLEDUPAR, CESAR	TELÉFONO	3014333376

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	NIT	800.103.920 - 9	TELÉFONO
BENEFICIARIO	DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	NIT	800.103.920 - 6	TELÉFONO

OBJETO DEL SEGURO

OBJETO DE LA POLIZA:

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS EN DESARROLLO DEL CONTRATO DE OBRA No. 0782 DE 2025, CUYO OBJETO ES :ISTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA.

- ADOR AFIANZADO CONSORCIO CENTRO CAMBIA:
- EBM CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIA SAS NIT 901333170-1 PART. 90%

TIPO DE OBLIGACIÓN: CUMP-CONSTRUCCION DE EDIFICIOS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA	VALOR PRIMA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	05/05/2025	05/11/2029	4,485,578,374.03	13,433,602.89
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	05/05/2025	05/07/2029	2,242,789,187.02	18,704,247.36
ESTABILIDAD DE LA OBRA	05/07/2028	05/07/2031	4,485,578,374.03	44,880,362.25

ACLARACIONES

VALOR PRIMA	GASTOS	IVA	TOTAL A PAGAR	FECHA LIMITE DE PAGO	NO DOCUMENTO PARA PAGO
77.078.212,50	$ 17.700,00	$ 14.648.223,38	$ 91.744.135,88	Día - Mes - Año 11/06/2025	901936019

VALOR ASEGURADO TOTAL	VALOR ASEGURADO EN LETRAS
$ 11.213.945.935,08	ONCE MIL DOSCIENTOS TRECE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON OCHO C

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	%	COASEGURO NOMBRE COMPAÑIA	%	VALOR ASEGURADO
BAEZ COTE ASESORES DE SEGUROS LTDA	40168	100,00			

FIRMA AUTORIZADA
NACIONAL DE SEGUROS S.A.
IVA REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6511
TARIFA ICA 11.04/1000

FIRMA TOMADOR

CANALES DE ATENCIÓN:
Cra 94 # 11-30 Piso 4 / Bogotá D.C.
(601) 7463219
[illegible]

Pague en línea en:
www.nacionaldeseguros.com.co

PASA APF
Asociación Panamericana de Puentes, Túneles, Viaductos y Autopistas

DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO:
Cra. 13 #71-31 Of. Colonia, Oficina 702 / Bogotá D.C.
(601) [illegible]
[illegible]

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

04/07/2026 11:30 (NTE)(SINT-CUMPLESTATAL)[DOC_07032026 11:30 TE](SCL-CUMP-ESTATAL)[DOC]

No. PÓLIZA	ANEXO	SUCURSAL	FECHA SOLICITUD	CIUDAD DE EXPEDICIÓN
400064070	0	BOGOTA	12 /5 /2025	BOGOTÁ, D.C.

VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	TIPO DE MOVIMIENTO	DIRECCIÓN GENERAL	CALLE 94 N° 11-30 PISO 4
00:00 Horas del 5 /5 /2025	00:00 Horas del 5 /7 /2031	EXPEDICIÓN	TELÉFONO	7463219

TOMADOR	CONSORCIO CENTRO CAMBIA	NIT	901.936.019 - 5
DIRECCIÓN	CARRERA 19D # 8A -33 RINCON DELAMPARO, VALLEDUPAR, CESAR	TELÉFONO	3014835376
ASEGURADO	DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	NIT	800.103.920 - 6
DIRECCIÓN	SIN DIRECCION CONDOR, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	
BENEFICIARIO	DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	NIT	800.103.920 - 6
DIRECCIÓN	SIN DIRECCION CONDOR, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	

- JESUS ARMANDO CERVANTES CEBALLOS CC 19691439 PART. 10%

NOTA: EL AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA INICIA VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCION.

********** FIN PÓLIZA **********

VERIFICA TU POLIZA AQUI

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL

nacional de seguros

NIT.: 860.002.527-9
www.nacionaldeseguros.com.co

CIUDAD DE EXPEDICIÓN: BOGOTÁ, D.C.
DIRECCIÓN GENERAL: CALLE 94 N° 11-30 PISO 4
TELÉFONO: (601) 7463219

REFERENCIA	SUCURSAL	COD. SUCURSAL	COD. PUNTO DE VENTA	RAMO	No. PÓLIZA	ANEXO
193509	BOGOTA	11		30	400064070	1

FECHA EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE	A LAS	VIGENCIA HASTA	A LAS	TIPO DE MOVIMIENTO	HOJA
Día - Mes - Año	Día - Mes - Año	Horas	Día - Mes - Año	Horas		
25/7/2025	17/7/2025	00:00	17/9/2031	00:00	MODIFICACIÓN	1

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE	CONSORCIO CENTRO CAMBIA	NIT	901.936.019 - 5
DIRECCIÓN	CARRERA 19D # 6F -33 RINCON DEL AMPARO, VALLEDUPAR, CESAR	TELÉFONO	3014855376

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE	CONSORCIO CENTRO CAMBIA	NIT	901.936.019 - 5
DIRECCIÓN	CARRERA 19D # 6F -33 RINCON DEL AMPARO, VALLEDUPAR, CESAR	TELÉFONO	3014855376

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	NIT	800.103.920 - 6	TELÉFONO	3192930
BENEFICIARIO	DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	NIT	800.103.920 - 6	TELÉFONO	3192930

OBJETO DEL SEGURO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN ACTA DE INICIO DEL 17 DE JULIO DE 2025, SE REALIZA AJUSTE DE VIGENCIAS, LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

TO DE LA POLIZA:

ASEGURAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS EN DESARROLLO DEL CONTRATO DE OBRA No. 0782 DE 2025, CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA.

TIPO DE OBLIGACIÓN: CUMP-CONSTRUCCION DE EDIFICIOS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA	VALOR PRIMA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	17/07/2025	17/01/2027	4.485.578.374,03	0,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	17/07/2025	17/09/2029	2.242.789.187,02	0,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	17/09/2026	17/09/2031	4.485.578.374,03	0,00

ACLARACIONES

VALOR PRIMA	GASTOS	IVA	TOTAL A PAGAR	FECHA LIMITE DE PAGO	No DOCUMENTO PARA PAGO
				Día - Mes - Año	
$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	24/08/2025	901936019

VALOR ASEGURADO TOTAL	VALOR ASEGURADO EN LETRAS
$ 11.213.945.935,08	ONCE MIL DOSCIENTOS TRECE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON OCHO (

INTERMEDIARIO			COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	%	NOMBRE COMPAÑIA	%	VALOR ASEGURADO
BAEZ COTE ASESORES DE SEGUROS LTDA	40168	100,00			

FIRMA AUTORIZADA
NACIONAL DE SEGUROS S.A.
IVA REGIMEN COMUN- ACTIVIDAD ECONOMICA 6511
TARIFA ICA 11.04/1000

FIRMA TOMADOR

CANALES DE ATENCIÓN:
Calle 94 # 11-30 Piso 4 / Bogotá D.C.
(601) 7463219
www.nacionaldeseguros.com.co

Pague en línea en:
www.nacionaldeseguros.com.co

PASA APF

DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO:
Cra. 13 #73-24 Ed. Colseguros Of. 202 / Bogotá D.C.
(601) 000 0117
3125760000

VIGILADO SUPERFINANCIERA
VIGILADO SUPERSOLIDARIA
de Seguros S.A.
04/07/2025|1307|INT-PI|PI5|INT-CUMP-ESTATAL|1|001|L|07/07/2025|1307|RI|PI5|CI-CUMP-ESTATAL|1|001
NRO.RIQUEZO

No. PÓLIZA	ANEXO	SUCURSAL	FECHA SOLICITUD	CIUDAD DE EXPEDICIÓN
400064070	1	BOGOTA	25 /7 /2025	BOGOTÁ, D.C.

VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	TIPO DE MOVIMIENTO	DIRECCIÓN GENERAL	CALLE 94 N° 11-30 PISO 4
00:00 Horas del 17 /7 /2025	00:00 Horas del 17 /9 /2031	MODIFICACIÓN	TELÉFONO	7463219

TOMADOR	CONSORCIO CENTRO CAMBIA	NIT	901.936.019 - 5
DIRECCIÓN	CARRERA 19D # 8A -33 RINCON DELAMPARO, VALLEDUPAR, CESAR	TELÉFONO	3014835376
ASEGURADO	DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	NIT	800.103.920 - 6
DIRECCIÓN	SIN DIRECCION CONDOR, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	3192930
BENEFICIARIO	DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	NIT	800.103.920 - 6
DIRECCIÓN	SIN DIRECCION CONDOR, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	3192930

TOMADOR AFIANZADO CONSORCIO CENTRO CAMBIA:
- EBSU CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIA SAS NIT 901333176-1 PART. 60%
- JESUS ARMANDO CERVANTES CEBALLOS CC 19691435 PART. 10%

NOTA: EL AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA INICIA VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCION.

********** FIN PÓLIZA **********

VERIFICA TU POLIZA AQUÍ

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL

nacional de seguros

NIT.: 860.002.527-9
www.nacionaldeseguros.com.co

CIUDAD DE EXPEDICIÓN: BOGOTÁ, D.C.
DIRECCIÓN GENERAL: CALLE 94 N° 11-30 PISO 4
TELÉFONO: (601) 7463219

REFERENCIA	SUCURSAL		CÓD. SUCURSAL	CÓD.PUNTO DE VENTA		RAMO	No. PÓLIZA	ANEXO
205671	BOGOTA		11			30	400064070	2
FECHA EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE	A LAS	VIGENCIA HASTA	A LAS	TIPO DE MOVIMIENTO			HOJA
Día - Mes - Año	Día - Mes - Año	Horas	Día - Mes - Año	Horas				
23 / 1 / 2026	19 / 1 / 2026	00:00	8 / 10 / 2031	00:00	MODIFICACIÓN			1

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE	CONSORCIO CENTRO CAMBIA	NIT	901.936.019 - 5
DIRECCIÓN	CARRERA 19D # 8ª -33 RINCON DEL AMPARO, VALLEDUPAR, CESAR	TELÉFONO	3014835376

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE	CONSORCIO CENTRO CAMBIA	NIT	901.936.019 - 5
DIRECCIÓN	CARRERA 19D # 8ª -33 RINCON DEL AMPARO, VALLEDUPAR, CESAR	TELÉFONO	3014835376

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	NIT	800.103.920 - 6	TELÉFONO	3192930
BENEFICIARIO	DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	NIT	800.103.920 - 6	TELÉFONO	3192930

OBJETO DEL SEGURO

ANEXO 2:

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO QUE HACE PARTE INTEGRAL DE LA PÓLIZA ARRIBA MENCIONAD Y DE ACUERDO AL ACTA DE SUSPENSIÓN No.1 DEL 29-12-2025 Y ACTA DE REINICIO No.1 DEL 19-01-2026 AL CONTRATO NO.CO- 0782-2025, SE AJUSTA LA VIGENCIA QUEDANDO COMO NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN 08-10-2026.

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINÚAN VIGENTES.

TIPO DE OBLIGACIÓN: CUMP-CONSTRUCCION DE EDIFICIOS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA	VALOR PRIMA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	19/01/2026	08/02/2027	4.485.578.374,03	540.727,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	19/01/2026	08/10/2029	2.242.789.187,02	258.074,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	08/10/2026	08/10/2031	4.485.578.374,03	0,00

ACLARACIONES

VALOR PRIMA	GASTOS	IVA	TOTAL A PAGAR	FECHA LÍMITE DE PAGO	No DOCUMENTO PARA PAGO
$ 798.801,00	$ 0,00	$ 151.772,19	$ 950.573,19	Día - Mes - Año 20/02/2026	901936019

VALOR ASEGURADO TOTAL	VALOR ASEGURADO EN LETRAS
$ 11.213.945.935,08	ONCE MIL DOSCIENTOS TRECE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON OCHO

INTERMEDIARIO			COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	%	NOMBRE COMPAÑÍA	%	VALOR ASEGURADO
BAEZ COTE ASESORES DE SEGUROS LTDA	40168	100,00			

Firmado por:
Nacional De Seguros S A
Compañía De Seguros Generales
2026/01/23 03:11:23:660

FIRMA AUTORIZADA
NACIONAL DE SEGUROS S.A.
IVA REGIMEN COMUN- ACTIVIDAD ECONOMICA 6511
TARIFA ICA 11.04/1000

FIRMA TOMADOR

CANALES DE ATENCIÓN:
Calle 94 # 11-30 Piso 4 / Bogotá D.C.
(601) 746 3219
información@nacionaldeseguros.com.co
www.nacionaldeseguros.com.co

Pague en línea en:
www.nacionaldeseguros.com.co

PASA APF
Asociación Panamericana de Fianzas
Panamerican Surety Association

DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO:
Cra. 13 73-34 Ed. Catania. Of. 202 / Bogotá D.C.
(601) 808 6017
3137993800
defensornacionaldeseguros@umoabogados.com

VIGILADO SUPERINTENDENCIA DE COLOMBIA
CIERA
Seguros S.A.
ACASTRO
04/02/2025|1307|NT-P|05|NT-CUMP-ESTATAL6|D001 07/03/2025|1307|P|05|CL-CUMP-ESTATAL5|D00

No. PÓLIZA	ANEXO	SUCURSAL	FECHA SOLICITUD	CIUDAD DE EXPEDICIÓN
400064070	2	BOGOTA	23 /1 /2026	BOGOTÁ, D.C.

VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	TIPO DE MOVIMIENTO
00:00 Horas del 19 /1 /2026	00:00 Horas del 8 /10 /2031	MODIFICACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL	CALLE 94 N° 11-30 PISO 4
TELÉFONO	7463219

TOMADOR	CONSORCIO CENTRO CAMBIA	NIT	901.936.019 - 5
DIRECCIÓN	CARRERA 19D # 8ª -33 RINCON DEL AMPARO, VALLEDUPAR, CESAR	TELÉFONO	3014835376
ASEGURADO	DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	NIT	800.103.920 - 6
DIRECCIÓN	SIN DIRECCION CONDOR, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	3192930
BENEFICIARIO	DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	NIT	800.103.920 - 6
DIRECCIÓN	SIN DIRECCION CONDOR, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	3192930

ANEXO 1:

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN ACTA DE INICIO DEL 17 DE JULIO DE 2025, SE REALIZA AJUSTE DE VIGENCIAS, LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

OBJETO DE LA POLIZA:

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS EN DESARROLLO DEL CONTRATO DE OBRA No. 0782 DE 2025, CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA.

TOMADOR AFIANZADO CONSORCIO CENTRO CAMBIA:
- BM CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIA SAS NIT 901333170-1 PART. 90%
- JESUS ARMANDO CERVANTES CEBALLOS CC 19691435 PART. 10%

NOTA: EL AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA INICIA VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCION.

********** FIN PÓLIZA **********

VERIFICA TU POLIZA AQUI

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

nacional de seguros

NIT.: 860.002.527-9
www.nacionaldeseguros.com.co

CIUDAD DE EXPEDICIÓN: BOGOTÁ, D.C.
DIRECCIÓN GENERAL: CALLE 94 N° 11-30 PISO 4
TELÉFONO: (601) 7463219

REFERENCIA	SUCURSAL	CÓD. SUCURSAL	CÓD.PUNTO DE VENTA	RAMO	No. PÓLIZA	ANEXO
205672	BOGOTA	11		15	400064071	2

FECHA EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE	A LAS Horas	VIGENCIA HASTA	A LAS	TIPO DE MOVIMIENTO	HOJA
Día - Mes - Año	Día - Mes - Año		Día - Mes - Año	Horas		
23 / 1 / 2026	19 / 1 / 2026	00:00	8 / 10 / 2026	00:00	MODIFICACIÓN	1

DATOS DEL TOMADOR / AFIANZADO

NOMBRE	CONSORCIO CENTRO CAMBIA	NIT	901.936.019 - 5
DIRECCIÓN	CARRERA 19D # 8ª -33 RINCON DEL AMPARO, VALLEDUPAR, CESAR	TELÉFONO	3014835376

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	CONSORCIO CENTRO CAMBIA	NIT	901.936.019 - 5	TELÉFONO	3014835376
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	NIT	000.000.000 - 0	TELÉFONO	1000000

AMPAROS	SUBLIMITE POR EVENTO	SUBLIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA	VALOR PRIMA
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES -PLO	2.242.789.187,00	2,242,789,187.00	2.242.789.187,00	258.074,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	2.242.789.187,00	2,242,789,187.00	2.242.789.187,00	0,00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	2.242.789.187,00	2,242,789,187.00	2.242.789.187,00	0,00
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	2.242.789.187,00	2,242,789,187.00	2.242.789.187,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	2.242.789.187,00	2,242,789,187.00	2.242.789.187,00	0,00

DEDUCIBLES

PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES -PLO	10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA

VALOR PRIMA	GASTOS	IVA	TOTAL A PAGAR	FECHA LÍMITE DE PAGO	No DOCUMENTO PARA PAGO
$ 258.074,00	$ 0,00	$ 49.034,06	$ 307.108,06	Día - Mes - Año 20/02/2026	901936019

VALOR ASEGURADO TOTAL	VALOR ASEGURADO EN LETRAS
$ 2.242.789.187,00	DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS

INTERMEDIARIO			COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	%	NOMBRE	% PARTICIPACIÓN	VALOR ASEGURADO
BAEZ COTE ASESORES DE SEGUROS LTDA	40168	100,00			

Firmado por:
Nacional De Seguros S A
Compañia De Seguros Generales
2026/01/23 03:12:24:532

FIRMA AUTORIZADA
NACIONAL DE SEGUROS S.A.
IVA REGIMEN COMUN- ACTIVIDAD ECONOMICA 6511
TARIFA ICA 11.04/1000

FIRMA TOMADOR

Nacional de Seguros S.A.
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO
06/06/2014|13-7|NT-P|06|NT-RC-CUMP1|D001 13/05/2014|13-7|P|06|CL-RC-PARTICULAR-01|D001
ACASTRO

nacional de seguros

DIRECCIÓN GENERAL CALLE 94 N° 11-30 PISO 4
TELÉFONO 7463219

www.nacionaldeseguros.com.co

No. PÓLIZA	ANEXO	SUCURSAL	FECHA SOLICITUD	CIUDAD DE EXPEDICIÓN
400064071	2	BOGOTA	Día - Mes - Año 23 1 2026	BOGOTÁ, D.C.

VIGENCIA DESDE	A LAS	VIGENCIA HASTA	A LAS	TIPO DE MOVIMIENTO
Día - Mes - Año	Horas	Día - Mes - Año	Horas	
19 1 2026	00:00	8 10 2026	00:00	MODIFICACIÓN

DATOS DEL TOMADOR / AFIANZADO			
NOMBRE	CONSORCIO CENTRO CAMBIA	NIT	901.936.019 - 5
DIRECCIÓN	CARRERA 19D # 8ª -33 RINCON DEL AMPARO, VALLEDUPAR, CESAR	TELÉFONO	3014835376

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO					
ASEGURADO	CONSORCIO CENTRO CAMBIA	NIT	901.936.019 - 5	TELÉFONO	3014835376
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	NIT	000.000.000 - 0	TELÉFONO	1000000

ANEXO 2:

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO QUE HACE PARTE INTEGRAL DE LA PÓLIZA ARRIBA MENCIONADO Y DE ACUERDO AL ACTA DE SUSPENSIÓN No.1 DEL 29-12-2025 Y ACTA DE REINICIO No.1 DEL 19-01-2026 AL CONTRATO NO.CO- 0782-2025, SE AJUSTA LA VIGENCIA QUEDANDO COMO NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN 08-10-2026.

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINÚAN VIGENTES.

ANEXO 1:

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN ACTA DE INICIO DEL 17 DE JULIO DE 2025, SE REALIZA AJUSTE DE VIGENCIAS, LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

OBJETO DE LA POLIZA:

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A BIENES DE TERCEROS Y O LESIONES A PERSONAS QUE SE PUEDAN CAUSAR EN LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA No. 0782 DE 2025, CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA

TOMADOR AFIANZADO CONSORCIO CENTRO CAMBIA:
- EBM CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIA SAS NIT 901333170-1 PART. 90%
- JESUS ARMANDO CERVANTES CEBALLOS CC 19691435 PART. 10%

SE ACLARA QUE LA COBERTURA DE DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE, SE ENCUENTRAN INCLUIDAS DENTRO DEL P.L.O.

ASEGURADO: CONSORCIO CENTRO CAMBIA.; SE TENDRA A DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LO DAÑOS CAUSADOS UNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA CONSORCIO CENTRO CAMBIA. EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS. ADICIONALMENTE, SE TENDRA A DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL.

********** FIN PÓLIZA **********

APROBACIONES DE POLIZAS

Constancia de Verificación de Garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual - RCE

En Santa Marta D.T.C.H., a los 16 días del mes de mayo del año 2025, la Jefe de la Oficina de Contratación, en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, así como el Decreto Departamental 0060 del 30 de enero de 2020, una vez efectuada la verificación en la página oficial de la aseguradora, procede a la correspondiente aprobación de la garantía única presentada por el contratista: CONSORCIO CENTRO CAMBIA para amparar el contrato N° CO-0782-2025

En consecuencia, de lo anterior, su estado es:

APROBADO

JENNY CAMACHO NEUTO
Jefe Oficina Contratación.

Proyectó: VAVILLA

Resultados

DATOS DE C

CAMPO	
Nombre	Valeria Avila Cardoso
Número de Documento	1082981938
Fecha y Hora de la Consulta	20250526 19:23:09

DATOS GENERALES DE LA POLIZA

CAMPO	DATO
Referencia	188188
Número de Póliza	400064071
Anexo	0
Ramo	RESPONSABILIDAD CIVIL
Tomador	CONSORCIO CENTRO CAMBIA
Asegurado	TERCEROS AFECTADOS
Vigencia Desde	2025-05-05
Vigencia Hasta	2026-07-05
Suma Asegurada	2.242.789.187,00

OBJETO DEL SEGURO

OBJETO

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A BIENES DE TERCEROS Y O LESIONES A PERSONAS QUE SE PUEDAN CAUSAR EN LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA No. 0782 DE 2025, CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL CENTRO CAMBIA EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA TOMADOR AFIANZADO CONSORCIO CENTRO CAMBIA: - EBM CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIA SAS NIT 901333170-1 PART. 90% - JESUS ARMANDO CERVANTES CEBALLOS CC 19691435 PART. 10% SE ACLARA QUE LA COBERTURA DE DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE, SE ENCUENTRAN INCLUIDAS DENTRO DEL P.L.O. ASEGURADO: CONSORCIO CENTRO CAMBIA.; SE TENDRA A DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LO DAÑOS CAUSADOS UNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA CONSORCIO CENTRO CAMBIA. EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA. BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS. ADICIONALMENTE, SE TENDRA A DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL.

AMPAROS Y VIGENCIAS

Amparos	Vigencia Desde	Vigencia Hasta
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	2025-05-05	2026-07-05
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	2025-05-05	2026-07-05
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	2025-05-05	2026-07-05
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES -PLO	2025-05-05	2026-07-05
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	2025-05-05	2026-07-05

LA INFORMACION AQUI CONSULTADA SE PUBLICA CON FINES INFORMATIVOS Y NO REEMPLAZA LA POLIZA EXPEDIDA POR NACIONAL DE SEGUROS S.A.

ESTA INFORMACION DEBE COINCIDIR CON LA POLIZA ORIGINAL, EN CASO DE ENCONTRAR ALGUNA INCONSISTENCIA LO INVITAMOS A NOTIFICARLO AL TELEFONO 601 7463219

Constancia de Verificación de Garantía Única de Cumplimiento

En Santa Marta D.T.C.H., a los 16 días del mes de mayo del año, 2025, la Jefe de la Oficina de Contratación, en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, así como el Decreto Departamental 0060 del 30 de enero de 2020, una vez efectuada la verificación en la página oficial de la aseguradora, procede a la correspondiente aprobación de la garantía única, presentada por el contratista: CONSORCIO CENTRO CAMBIA para amparar el contrato N° CO-0782-2025.

En consecuencia, de lo anterior, su estado es:

APROBADO

JENNY CAMACHO NEUTO
Jefe Oficina Contratación

Proyectó: VAVILA

Resultados

DATOS DE

CAMPO	
Nombre	Valeria Avila Cardoso
Número de Documento	1082981938
Fecha y Hora de la Consulta	20250526 19:24:49

DATOS GENERALES DE LA POLIZA

CAMPO	DATO
Referencia	188187
Número de Póliza	400064070
Anexo	0
Ramo	CUMPLIMIENTO
Tomador	CONSORCIO CENTRO CAMBIA
Asegurado	DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
Vigencia Desde	2025-05-05
Vigencia Hasta	2031-07-05
Suma Asegurada	11.213.945.935,08

OBJETO DEL SEGURO

OBJETO

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS EN DESARROLLO DEL CONTRATO DE OBRA No. 0782 DE 2025, CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA. TOMADOR AFIANZADO CONSORCIO CENTRO CAMBIA: - EBM CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIA SAS NIT 901333170-1 PART. 90% - JESUS ARMANDO CERVANTES CEBALLOS CC 19691435 PART. 10% NOTA: EL AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA INICIA VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCION.


AMPAROS Y VIGENCIAS

Amparos	Vigencia Desde	Vigencia Hasta
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	2025-05-05	2029-07-05
ESTABILIDAD DE LA OBRA	2026-07-05	2031-07-05
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	2025-05-05	2026-11-05

LA INFORMACION AQUI CONSULTADA SE PUBLICA CON FINES INFORMATIVOS Y NO REEMPLAZA LA POLIZA EXPEDIDA POR NACIONAL DE SEGUROS S.A.

ESTA INFORMACION DEBE COINCIDIR CON LA POLIZA ORIGINAL, EN CASO DE ENCONTRAR ALGUNA INCONSISTENCIA LO INVITAMOS A NOTIFICARLO AL TELEFONO 601 7463219

Regresar Imprimir



Resultados

DATOS DE C

CAMPO	
Nombre	
Número de Documento	
Fecha y Hora de la Consulta	

Constancia de Verificación de Garantía Única de Cumplimiento

En Santa Marta D.T.C.H., a los 19 días del mes de agosto del año 2025, la Jefe de la Oficina de Contratación, en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, así como el Decreto Departamental 0060 del 30 de enero de 2020, una vez efectuada la verificación en la página oficial de la aseguradora, procede a la correspondiente aprobación de la garantía única de cumplimiento presentada por el contratista: CONSORCIO CENTRO CAMBIA para amparar el contrato N° CO-0782-2025.

En consecuencia, VERIFICADOS los amparos y vigencias conforme a lo solicitado en el contrato antes mencionado, su estado es:

APROBADO

JENNY CAMACHO NEUTO
Jefe Oficina Contratación

Proyectó: VAVILA

DATOS GENERALES DE LA POLIZA

CAMPO	DATO
Referencia	193610
Número de Póliza	400064071
Anexo	1
Ramo	RESPONSABILIDAD CIVIL
Tomador	CONSORCIO CENTRO CAMBIA
Asegurado	TERCEROS AFECTADOS
Vigencia Desde	2025-07-17
Vigencia Hasta	2026-09-17
Suma Asegurada	2.242.789.187,00

OBJETO DEL SEGURO

OBJETO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN ACTA DE INICIO DEL 17 DE JULIO DE 2025, SE REALIZA AJUSTE DE VIGENCIAS, LOS DEMÁS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES, SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A BIENES DE TERCEROS Y O LESIONES A PERSONAS QUE SE PUEDAN CAUSAR EN LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA No. 0782 DE 2025, CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL □CENTRO CAMBIA□ EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA TOMADOR AFIANZADO CONSORCIO CENTRO CAMBIA: - EBM CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIA SAS NIT 901333170-1 PART. 90% - JESUS ARMANDO CERVANTES CEBALLOS CC 19691435 PART. 10% SE ACLARA QUE LA COBERTURA DE DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE, SE ENCUENTRAN INCLUIDAS DENTRO DEL P.L.O. ASEGURADO: CONSORCIO CENTRO CAMBIA.; SE TENDRA A DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LO DAÑOS CAUSADOS UNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA CONSORCIO CENTRO CAMBIA. EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA. BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS. ADICIONALMENTE, SE TENDRA A DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL.


AMPAROS Y VIGENCIAS

Amparos	Vigencia Desde	Vigencia Hasta
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	2025-07-17	2026-09-17
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	2025-07-17	2026-09-17
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	2025-07-17	2026-09-17
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES -PLO	2025-07-17	2026-09-17
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	2025-07-17	2026-09-17

LA INFORMACION AQUI CONSULTADA SE PUBLICA CON FINES INFORMATIVOS Y NO REEMPLAZA LA POLIZA EXPEDIDA POR NACIONAL DE SEGUROS S.A.

ESTA INFORMACION DEBE COINCIDIR CON LA POLIZA ORIGINAL, EN CASO DE ENCONTRAR ALGUNA INCONSISTENCIA LO INVITAMOS A NOTIFICARLO AL TELEFONO 601 7463219.

Regresar Imprimir



Resultados C

DATOS DE QU

CAMPO	
Nombre	
Número de Documento	
Fecha y Hora de la Consulta	

Constancia de Verificación de
Garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual - RCE

En Santa Marta D.T.C.H., a los 19 días del mes de agosto del año 2025, la Jefe de la Oficina de Contratación, en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, así como el Decreto Departamental 0060 del 30 de enero de 2020, una vez efectuada la verificación en la página oficial de la aseguradora, procede a la correspondiente aprobación de la garantía de RCE presentada por el contratista: CONSORCIO CENTRO CAMBIA para amparar el contrato N° CO-0782-2025

En consecuencia, VERIFICADOS los amparos y vigencias conforme a lo solicitado en el contrato antes mencionado, su estado es:

APROBADO

JENNY CAMACHO NEUTO
Jefe Oficina Contratación

Proyectó: VAVILA

DATOS GENERALES DE LA POLIZA

CAMPO	DATO
Referencia	193609
Número de Póliza	400064070
Anexo	1
Ramo	CUMPLIMIENTO
Tomador	CONSORCIO CENTRO CAMBIA
Asegurado	DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
Vigencia Desde	2025-07-17
Vigencia Hasta	2031-09-17
Suma Asegurada	11.213.945.935,08

OBJETO DEL SEGURO

OBJETO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN ACTA DE INICIO DEL 17 DE JULIO DE 2025, SE REALIZA AJUSTE DE VIGENCIAS, LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES. AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS EN DESARROLLO DEL CONTRATO DE OBRA No. 0782 DE 2025, CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA. TOMADOR AFIANZADO CONSORCIO CENTRO CAMBIA: - EBM CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIA SAS NIT 901333170-1 PART. 90% - JESUS ARMANDO CERVANTES CEBALLOS CC 19691435 PART. 10% NOTA: EL AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA INICIA VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCION.

AMPAROS Y VIGENCIAS

Amparos	Vigencia Desde	Vigencia Hasta
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	2025-07-17	2029-09-17
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	2025-07-17	2027-01-17
ESTABILIDAD DE LA OBRA	2026-09-17	2031-09-17

LA INFORMACION AQUI CONSULTADA SE PUBLICA CON FINES INFORMATIVOS Y NO REEMPLAZA LA POLIZA EXPEDIDA POR NACIONAL DE SEGUROS S.A.

ESTA INFORMACION DEBE COINCIDIR CON LA POLIZA ORIGINAL, EN CASO DE ENCONTRAR ALGUNA INCONSISTENCIA LO INVITAMOS A NOTIFICARLO AL TELEFONO 601 7463219

Regresar Imprimir

Constancia de Verificación de Garantía Única de Cumplimiento

En Santa Marta D.T.C.H., a los 04 días del mes de febrero del año 2026, la Jefe de la Oficina de Contratación, en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, así como el Decreto Departamental 0060 del 30 de enero de 2020, una vez efectuada la verificación en la página oficial de la aseguradora, procede a la correspondiente aprobación de la garantía única presentada por el contratista: CONSORCIO CENTRO CAMBIA, para amparar el contrato N° CO-0782-2025

En consecuencia, de lo anterior, su estado es:

APROBADO

JENNY CAMACHO NEUTO
Jefe Oficina Contratación

Proyectó: VAVILA

Resu

DAT

CAMPO	
Nombre	
Número de Documento	
Fecha y Hora de la Consulta	

DATOS

CAMPO	DATO
Referencia	205671
Número de Póliza	400064070
Anexo	2
Ramo	CUMPLIMIENTO
Tomador	CONSORCIO CENTRO CAMBIA
Asegurado	DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
Vigencia Desde	2026-01-19
Vigencia Hasta	2031-10-08
Suma Asegurada	11.213.945.935,08

OBJETO DEL SEGURO

OBJETO
POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO QUE HACE PARTE INTEGRAL DE LA PÓLIZA ARRIBA MENCIONAD Y DE ACUERDO AL ACTA DE SUSPENSIÓN No.1 DEL 29-12-2025 Y ACTA DE REINICIO No.1 DEL 19-01-2026 AL CONTRATO NO.CO- 0782-2025, SE AJUSTA LA VIGENCIA QUEDANDO COMO NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN 08-10-2026. LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINÚAN VIGENTES.

AMPAROS Y VIGENCIAS

Amparos	Vigencia Desde	Vigencia Hasta
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	2026-01-19	2027-02-08
ESTABILIDAD DE LA OBRA	2026-10-08	2031-10-08
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	2026-01-19	2029-10-08

LA INFORMACION AQUI CONSULTADA SE PUBLICA CON FINES INFORMATIVOS Y NO REEMPLAZA LA POLIZA EXPEDIDA POR NACIONAL DE SEGUROS S.A.

ESTA INFORMACION DEBE COINCIDIR CON LA POLIZA ORIGINAL, EN CASO DE ENCONTRAR ALGUNA INCONSISTENCIA LO INVITAMOS A NOTIFICARLO AL TELEFONO 601 7463219

Regresar Imprimir

Constancia de Verificación de Garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual - RCE

En Santa Marta D.T.C.H., a los 04 días del mes de febrero del año 2026, la Jefe de la Oficina de Contratación, en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, así como el Decreto Departamental 0060 del 30 de enero de 2020, una vez efectuada la verificación en la página oficial de la aseguradora, procede a la correspondiente aprobación de la garantía única presentada por el contratista: CONSORCIO CENTRO CAMBIA, para amparar el contrato N° CO-0782-2025.

En consecuencia, de lo anterior, su estado es:

APROBADO

JENNY CAMACHO NEUTO
Jefe Oficina Contratación

Proyectó: VAVILA

Resulta

DATOS

CAMPO
Nombre
Número de Documento
Fecha y Hora de la Consulta

DATOS GENERALES DE LA POLIZA

CAMPO	DATO
Referencia	205672
Número de Póliza	400064071
Anexo	2
Ramo	RESPONSABILIDAD CIVIL
Tomador	CONSORCIO CENTRO CAMBIA
Asegurado	TERCEROS AFECTADOS
Vigencia Desde	2026-01-19
Vigencia Hasta	2026-10-08
Suma Asegurada	2.242.789.187,00

OBJETO DEL SEGURO

OBJETO
POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO QUE HACE PARTE INTEGRAL DE LA PÓLIZA ARRIBA MENCIONAD Y DE ACUERDO AL ACTA DE SUSPENSIÓN No.1 DEL 29-12-2025 Y ACTA DE REINICIO No.1 DEL 19-01-2026 AL CONTRATO NO.CO- 0782-2025, SE AJUSTA LA VIGENCIA QUEDANDO COMO NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN 08-10-2026. LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINÚAN VIGENTES.

AMPAROS Y VIGENCIAS

Amparos	Vigencia Desde	Vigencia Hasta
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	2026-01-19	2026-10-08
PERJUCICIOS EXTRAPATRIMONIALES	2026-01-19	2026-10-08
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES -PLO	2026-01-19	2026-10-08
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	2026-01-19	2026-10-08
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	2026-01-19	2026-10-08

LA INFORMACION AQUI CONSULTADA SE PUBLICA CON FINES INFORMATIVOS Y NO REEMPLAZA LA POLIZA EXPEDIDA POR NACIONAL DE SEGUROS S.A.

ESTA INFORMACION DEBE COINCIDIR CON LA POLIZA ORIGINAL, EN CASO DE ENCONTRAR ALGUNA INCONSISTENCIA LO INVITAMOS A NOTIFICARLO AL TELEFONO 601 7463219

Regresar Imprimir

INFORME DEL CONTRATISTA

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA			
Nombre Completo	CONSORCIO CENTRO CAMBIA	**Número de identificación**	901936019 - 5
Contrato No	0782 DE 2025	**Fecha de suscripción contrato**	11 /04/ 2025
Certificado de Disponibilidad Presupuestal – CDP No	No 359 31/01/2025 No 18125 19/02/2025	**Registro Presupuestal – RP No**	No 2740 21/05/2025 N° 20325 21/05/2025
Requiere Póliza	SI	**Fecha Aprobación Póliza**	16-05-2025 19/08/2025 04/02/26
Fecha de inicio contrato	17/07/2025	**Fecha de finalización contrato**	08/10/2026
Número de Planilla de seguridad social	VER CERTIFICADO	**Fecha de pago**	VER CERTIFICADO
Periodo del Informe	19/02/2026 –30/03/2026	**Informe No**	6
Objeto del contrato:	"CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA"		

RESUMEN DE ACTIVIDADES				
ACTIVIDADES U OBLIGACIONES ESPECÍFICAS		**ACTIVIDADES DESARROLLADAS**	**PRODUCTO**	**SOPORTE**
1.	"CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA"	Cumplir las demás obligaciones derivadas de los estudios previos, la oferta y el contrato.	ÍTEM 2.02 CIMENTACIÓN - Concreto 3,000 psi	Acta Parcial No 06 + Memoria de cantidades 2.02
2.	"CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA"	Cumplir las demás obligaciones derivadas de los estudios previos, la oferta y el contrato.	ÍTEM 03.01 LOSAS EN CONCRETO - 3,000 psi	Acta Parcial No 06 + Memoria de cantidades 03.01
3.	"CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA"	Cumplir las demás obligaciones derivadas de los estudios previos, la oferta y el contrato.	ÍTEM 03.02 COLUMNAS EN CONCRETO - 5,000 psi	Acta Parcial No 06 + Memoria de cantidades 03.02
4.	"CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA"	Cumplir las demás obligaciones derivadas de los estudios previos, la oferta y el contrato.	ÍTEM 03.05 REFUERZO	Acta Parcial No 06 + Memoria de cantidades 03.05
5.	"CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA"	Cumplir las demás obligaciones derivadas de los estudios previos, la oferta y el contrato.	ÍTEM 04.02 Dovelas en concreto	Acta Parcial No 06 + Memoria de cantidades 04.02
6.	"CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA"	Cumplir las demás obligaciones derivadas de los estudios previos, la oferta y el contrato.	ÍTEM 04.03 ACERO DE REFUERZO	Acta Parcial No 06 + Memoria de cantidades 04.03
7.	"CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA"	Cumplir las demás obligaciones derivadas de los estudios previos, la oferta y el contrato.	ÍTEM 12.01 VENTANERIA	Acta Parcial No 06 + Memoria de cantidades 12.01

RESUMEN DE ACTIVIDADES				
ACTIVIDADES U OBLIGACIONES ESPECÍFICAS		ACTIVIDADES DESARROLLADAS	PRODUCTO	SOPORTE
8.	"CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA"	Cumplir las demás obligaciones derivadas de los estudios previos, la oferta y el contrato.	ÍTEM 20.01.01 RED DE SUMINISTRO DE AGUA FRÍA POTABLE BLOQUE A	Acta Parcial No 06 + Memoria de cantidades 20.01.01
9.	"CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA"	Cumplir las demás obligaciones derivadas de los estudios previos, la oferta y el contrato.	ÍTEM 20.01.02 PUNTOS HIDRÁULICOS AGUA FRÍA	Acta Parcial No 06 + Memoria de cantidades 20.01.02
10.	"CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA"	Cumplir las demás obligaciones derivadas de los estudios previos, la oferta y el contrato.	ÍTEM 20.01.04 RED DE DISTRIBUCIÓN CONTRAINCENDIOS GABINETES PISO 1-2	Acta Parcial No 06 + Memoria de cantidades 20.01.04
11.	"CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA"	Cumplir las demás obligaciones derivadas de los estudios previos, la oferta y el contrato.	ÍTEM 20.01.05 RED DE DISTRIBUCION CONTRA INCENDIO (ROCIADORES)	Acta Parcial No 06 + Memoria de cantidades 20.01.05
12.	"CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA"	Cumplir las demás obligaciones derivadas de los estudios previos, la oferta y el contrato.	ÍTEM 20.01.06 SALIDAS SANITARIAS	Acta Parcial No 06 + Memoria de cantidades 20.01.06
13.	"CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA"	Cumplir las demás obligaciones derivadas de los estudios previos, la oferta y el contrato.	ÍTEM 20.02.01 RED DE SUMINISTRO DE AGUA FRÍA POTABLE BLOQUE B	Acta Parcial No 06 + Memoria de cantidades 20.02.01
14.	"CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA"	Cumplir las demás obligaciones derivadas de los estudios previos, la oferta y el contrato.	ÍTEM 20.02.02 PUNTOS HIDRÁULICOS AGUA FRÍA	Acta Parcial No 06 + Memoria de cantidades 20.02.02
15.	"CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA"	Cumplir las demás obligaciones derivadas de los estudios previos, la oferta y el contrato.	ÍTEM 20.02.06 RED DE DISTRIBUCIÓN CONTRAINCENDIOS GABINETES PISO 1-2	Acta Parcial No 06 + Memoria de cantidades 20.02.06
16.	"CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA"	Cumplir las demás obligaciones derivadas de los estudios previos, la oferta y el contrato.	ÍTEM 20.02.07 RED DE DISTRIBUCION CONTRA INCENDIO (ROCIADORES)	Acta Parcial No 06 + Memoria de cantidades 20.02.07
17.	"Construcción de pavimento en concreto rígido de vías urbanas por medio de la autogestión comunitaria en el distrito de Santa Marta, departamento del Magdalena. Fase 2".	Cumplir las demás obligaciones derivadas de los estudios previos, la oferta y el contrato.	ÍTEM 20.02.10 RAMALES DE AGUAS NEGRAS, VENTILACIONES Y REVENTILACIONES	Acta Parcial No 06 + Memoria de cantidades 20.02.10
18.	"Construcción de pavimento en concreto rígido de vías urbanas por medio de la autogestión comunitaria en el distrito de Santa Marta, departamento del Magdalena. Fase 2".	Cumplir las demás obligaciones derivadas de los estudios previos, la oferta y el contrato.	ÍTEM 20.02.15 PRUEBAS	Acta Parcial No 06 + Memoria de cantidades 20.02.15

RESUMEN DE ACTIVIDADES				
ACTIVIDADES U OBLIGACIONES ESPECÍFICAS		ACTIVIDADES DESARROLLADAS	PRODUCTO	SOPORTE
19.	"Construcción de pavimento en concreto rígido de vías urbanas por medio de la autogestión comunitaria en el distrito de Santa Marta, departamento del Magdalena. Fase 2".	Cumplir las demás obligaciones derivadas de los estudios previos, la oferta y el contrato.	ÍTEM 20.03.01 RED DE SUMINISTRO DE AGUA FRÍA POTABLE BLOQUE D	Acta Parcial No 06 + Memoria de cantidades 20.03.01
20.	"Construcción de pavimento en concreto rígido de vías urbanas por medio de la autogestión comunitaria en el distrito de Santa Marta, departamento del Magdalena. Fase 2".	Cumplir las demás obligaciones derivadas de los estudios previos, la oferta y el contrato.	ÍTEM 20.03.02 PUNTOS HIDRÁULICOS AGUA FRÍA	Acta Parcial No 06 + Memoria de cantidades 20.03.02
21.	"Construcción de pavimento en concreto rígido de vías urbanas por medio de la autogestión comunitaria en el distrito de Santa Marta, departamento del Magdalena. Fase 2".	Cumplir las demás obligaciones derivadas de los estudios previos, la oferta y el contrato.	ÍTEM 20.03.04 RED DE DISTRIBUCIÓN CONTRAINCENDIOS GABINETES PISO 1-2	Acta Parcial No 06 + Memoria de cantidades 20.03.04
22.	"Construcción de pavimento en concreto rígido de vías urbanas por medio de la autogestión comunitaria en el distrito de Santa Marta, departamento del Magdalena. Fase 2".	Cumplir las demás obligaciones derivadas de los estudios previos, la oferta y el contrato.	ÍTEM 20.03.05 RED DE DISTRIBUCION CONTRA INCENDIO (ROCIADORES)	Acta Parcial No 06 + Memoria de cantidades 20.03.05
23.	"Construcción de pavimento en concreto rígido de vías urbanas por medio de la autogestión comunitaria en el distrito de Santa Marta, departamento del Magdalena. Fase 2".	Cumplir las demás obligaciones derivadas de los estudios previos, la oferta y el contrato.	ÍTEM 20.03.06 SALIDAS SANITARIAS	Acta Parcial No 06 + Memoria de cantidades 20.03.06
24.	"Construcción de pavimento en concreto rígido de vías urbanas por medio de la autogestión comunitaria en el distrito de Santa Marta, departamento del Magdalena. Fase 2".	Cumplir las demás obligaciones derivadas de los estudios previos, la oferta y el contrato.	ÍTEM 20.03.07 BAJANTES DE AGUAS NEGRAS, VENTILACIONES Y REVENTILACIONES	Acta Parcial No 06 + Memoria de cantidades 20.03.07
25.	"Construcción de pavimento en concreto rígido de vías urbanas por medio de la autogestión comunitaria en el distrito de Santa Marta, departamento del Magdalena. Fase 2".	Cumplir las demás obligaciones derivadas de los estudios previos, la oferta y el contrato.	ÍTEM 20.03.08 RAMALES DE AGUAS NEGRAS, VENTILACIONES Y REVENTILACIONES	Acta Parcial No 06 + Memoria de cantidades NP 06
26.	"Construcción de pavimento en concreto rígido de vías urbanas por medio de la autogestión comunitaria en el distrito de Santa Marta, departamento del Magdalena. Fase 2".	Cumplir las demás obligaciones derivadas de los estudios previos, la oferta y el contrato.	ÍTEM 20.03.09 BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS	Acta Parcial No 06 + Memoria de cantidades 20.03.08
27.	"Construcción de pavimento en concreto rígido de vías urbanas por medio de la autogestión comunitaria en el distrito de Santa Marta, departamento del Magdalena. Fase 2".	Cumplir las demás obligaciones derivadas de los estudios previos, la oferta y el contrato.	ÍTEM 20.03.16 RED DE SUMINISTRO DE AGUA FRÍA POTABLE BLOQUE C	Acta Parcial No 06 + Memoria de cantidades 20.03.16

RESUMEN DE ACTIVIDADES				
ACTIVIDADES U OBLIGACIONES ESPECÍFICAS		ACTIVIDADES DESARROLLADAS	PRODUCTO	SOPORTE
28.	"Construcción de pavimento en concreto rígido de vías urbanas por medio de la autogestión comunitaria en el distrito de Santa Marta, departamento del Magdalena. Fase 2".	Cumplir las demás obligaciones derivadas de los estudios previos, la oferta y el contrato.	ÍTEM 20.03.19 RED DE DISTRIBUCIÓN CONTRAINCENDIOS GABINETES PISO 1-2	Acta Parcial No 06 + Memoria de cantidades 20.03.19
29.	"Construcción de pavimento en concreto rígido de vías urbanas por medio de la autogestión comunitaria en el distrito de Santa Marta, departamento del Magdalena. Fase 2".	Cumplir las demás obligaciones derivadas de los estudios previos, la oferta y el contrato.	ÍTEM 20.05.12 CONSTRUCCIONES EN CONCRETO	Acta Parcial No 06 + Memoria de cantidades 20.05.12
30.	"Construcción de pavimento en concreto rígido de vías urbanas por medio de la autogestión comunitaria en el distrito de Santa Marta, departamento del Magdalena. Fase 2".	Cumplir las demás obligaciones derivadas de los estudios previos, la oferta y el contrato.	ÍTEM 13 COMUNICACIONES	Acta Parcial No 06 + Memoria de cantidades 13
31.	"Construcción de pavimento en concreto rígido de vías urbanas por medio de la autogestión comunitaria en el distrito de Santa Marta, departamento del Magdalena. Fase 2".	Cumplir las demás obligaciones derivadas de los estudios previos, la oferta y el contrato.	ÍTEM NP 23.4 ALIMENTADORES PRINCIPALES Y TABLEROS 440V	Acta Parcial No 06 + Memoria de cantidades NP 23.4
32.	"Construcción de pavimento en concreto rígido de vías urbanas por medio de la autogestión comunitaria en el distrito de Santa Marta, departamento del Magdalena. Fase 2".	Cumplir las demás obligaciones derivadas de los estudios previos, la oferta y el contrato.	ÍTEM NP 23.5 ALIMENTADORES PRINCIPALES Y TABLEROS 220V	Acta Parcial No 06 + Memoria de cantidades NP 23.5
33.	"Construcción de pavimento en concreto rígido de vías urbanas por medio de la autogestión comunitaria en el distrito de Santa Marta, departamento del Magdalena. Fase 2".	Cumplir las demás obligaciones derivadas de los estudios previos, la oferta y el contrato.	ÍTEM NP 23.6 SUBALIMENTADORES Y SUBTABLEROS 220V, 440V	Acta Parcial No 06 + Memoria de cantidades NP 23.6
34.	"Construcción de pavimento en concreto rígido de vías urbanas por medio de la autogestión comunitaria en el distrito de Santa Marta, departamento del Magdalena. Fase 2".	Cumplir las demás obligaciones derivadas de los estudios previos, la oferta y el contrato.	ÍTEM NP 26 CERRAMIENTO EN TUBULAR	Acta Parcial No 06 + Memoria de cantidades NP 26
35.	"Construcción de pavimento en concreto rígido de vías urbanas por medio de la autogestión comunitaria en el distrito de Santa Marta, departamento del Magdalena. Fase 2".	Cumplir las demás obligaciones derivadas de los estudios previos, la oferta y el contrato.	ÍTEM NP 27 DEMOLICIÓN DE MURO EXISTENTE	Acta Parcial No 06 + Memoria de cantidades NP 27
36.	"Construcción de pavimento en concreto rígido de vías urbanas por medio de la autogestión comunitaria en el distrito de Santa Marta, departamento del Magdalena. Fase 2".	Cumplir las demás obligaciones derivadas de los estudios previos, la oferta y el contrato.	ÍTEM NP 32 DINTELES	Acta Parcial No 06 + Memoria de cantidades NP 32

RESUMEN DE ACTIVIDADES				
ACTIVIDADES U OBLIGACIONES ESPECÍFICAS		ACTIVIDADES DESARROLLADAS	PRODUCTO	SOPORTE
37.	"Construcción de pavimento en concreto rígido de vías urbanas por medio de la autogestión comunitaria en el distrito de Santa Marta, departamento del Magdalena. Fase 2".	Cumplir las demás obligaciones derivadas de los estudios previos, la oferta y el contrato.	ÍTEM NP 35 BUITRON	Acta Parcial No 06 + Memoria de cantidades NP 35

1/37

Nota: los Soportes del producto deben adjuntarse digitalmente o es especificar la forma en que estos se entregan o adjuntan.

Elaboró	Recibió
JESUS CERVANTES CEBALLOS R.L. CONSORCIO CENTRO CAMBIA	EFRAIN VARGAS CORVACHO
CC 19.691.435	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

INFORME DEL SUPERVISOR

A. INFORMACIÓN GENERAL	
Contrato/Convenio N°	0782 DE 2025
Nombre del Contratista	CONSORCIO CENTRO CAMBIA
N° de identificación	901936019 - 5
Objeto	"CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA"
Valor inicial	*$44.855.783.740,31*
Valor total	*$44.855.783.740,31*
Valor de honorarios periodo	*$2.518.277.080,92*
N° Pago / N° de informe	06
Periodo del informe	19/02/2026 al 30/03/2026
N° CDP	No 359 31/01/2025 - No 18125 19/02/2025
N° CRP	No 2740 21/05/2025 - N° 20325 21/05/2025
Plazo inicial	14 meses
Plazo final	14 meses
Fecha del Acta de Inicio	17 – 07 - 2025

B. MODIFICACIONES CONTRACTUALES (si aplica)				
N° de modificación	NA			
Tipo de modificación (Marque con una X)	Adición	*N/A*	Prórroga	*N/A*
	Suspensión	*1*	Reinicio	*1*
	Cesión			
Valor adicionado	*N/A*			
CDP de la adición	*N/A*			
CRP de la adición	*N/A*			
Tiempo prorrogado	*N/A*			
Tiempo suspendido	*21 dias*			

C. PÓLIZAS (si aplica)	
PÓLIZAS INICIALES	
N° de póliza	400064070 - 400064071
Nombre de la aseguradora	Nacional de seguros
Fecha de la póliza	12– 05 – 2025 / 25-07-2025 / 23- 1- 2026

Acto Administrativo de Aprobación	16– 05 – 2025 / 19-08-2025 / 04-02-2026 /

D. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES RECIBIDAS

OBLIGACIÓN N° 1: " CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA".".

Detalle de las actividades realizadas	Evidencias o Soportes verificados
Cumplir las demás obligaciones derivadas de los estudios previos, la oferta y el contrato.	ÍTEM 2.02 CIMENTACIÓN - Concreto 3,000 psi
	ÍTEM 03.01 LOSAS EN CONCRETO - 3,000 psi
	ÍTEM 03.02 COLUMNAS EN CONCRETO - 5,000 psi
	ÍTEM 03.05 REFUERZO
	ÍTEM 04.02 Dovelas en concreto
	ÍTEM 04.03 ACERO DE REFUERZO
Cumplir las demás obligaciones derivadas de los estudios previos, la oferta y el contrato.	ÍTEM 20.01.01 RED DE SUMINISTRO DE AGUA FRÍA POTABLE BLOQUE A
	ÍTEM 20.01.02 PUNTOS HIDRÁULICOS AGUA FRÍA
	ÍTEM 20.01.04 RED DE DISTRIBUCIÓN CONTRAINCENDIOS GABINETES PISO 1-2
	ÍTEM 20.01.05 RED DE DISTRIBUCION CONTRA INCENDIO (ROCIADORES)
	ÍTEM 20.01.06 SALIDAS SANITARIAS
	ÍTEM 20.02.01 RED DE SUMINISTRO DE AGUA FRÍA POTABLE BLOQUE B
	ÍTEM 20.02.02 PUNTOS HIDRÁULICOS AGUA FRÍA
	ÍTEM 20.02.06 RED DE DISTRIBUCIÓN CONTRAINCENDIOS GABINETES PISO 1-2
	ÍTEM 20.02.07 RED DE DISTRIBUCION CONTRA INCENDIO (ROCIADORES)
	ÍTEM 20.02.10 RAMALES DE AGUAS NEGRAS, VENTILACIONES Y REVENTILACIONES
	ÍTEM 20.02.15 PRUEBAS

	ÍTEM 20.03.01 RED DE SUMINISTRO DE AGUA FRÍA POTABLE BLOQUE D
	ÍTEM 20.03.02 PUNTOS HIDRÁULICOS AGUA FRÍA
	ÍTEM 20.03.04 RED DE DISTRIBUCIÓN CONTRAINCENDIOS GABINETES PISO 1-2
Cumplir las demás obligaciones derivadas de los estudios previos, la oferta y el contrato.	ÍTEM 20.03.05 RED DE DISTRIBUCION CONTRA INCENDIO (ROCIADORES)
	ÍTEM 20.03.06 SALIDAS SANITARIAS
	ÍTEM 20.03.07 BAJANTES DE AGUAS NEGRAS, VENTILACIONES Y REVENTILACIONES
	ÍTEM 20.03.08 RAMALES DE AGUAS NEGRAS, VENTILACIONES Y REVENTILACIONES
	ÍTEM 20.03.09 BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS
	ÍTEM 20.03.16 RED DE SUMINISTRO DE AGUA FRÍA POTABLE BLOQUE C
	ÍTEM 20.03.19 RED DE DISTRIBUCIÓN CONTRAINCENDIOS GABINETES PISO 1-2
	ÍTEM 20.05.12 CONSTRUCCIONES EN CONCRETO
	ÍTEM 13 COMUNICACIONES
	ÍTEM NP 23.4 ALIMENTADORES PRINCIPALES Y TABLEROS 440V
	ÍTEM NP 23.5 ALIMENTADORES PRINCIPALES Y TABLEROS 220V
	ÍTEM NP 23.6 SUBALIMENTADORES Y SUBTABLEROS 220V, 440V
	ÍTEM NP 26 CERRAMIENTO EN TUBULAR
	ÍTEM NP 27 DEMOLICIÓN DE MURO EXISTENTE
	ÍTEM NP 32 DINTELES
	ÍTEM NP 35 BUITRON

#39.

RECOMENDACIONES Y/U OBSERVACIONES:

Se da fe que se ha cumplido con lo estipulado en el informe de actividades, además de todos los sucesos acontecidos en el desarrollo del contrato

ITEM	VERIFICACION DE REQUISITOS	SI	NO
1.	El contrato se encuentra debidamente legalizado	X	
2.	El contratista autoriza que los impuestos que debe cancelar para la legalización del mencionado contrato, le sean descontados del valor a cancelar en el presente pago.	X	

3.	El Contratista cumplió con las actividades que se le asignaron para ejecutar en el periodo a cobrar	X	
4.	En la dependencia supervisora reposa el respectivo informe de actividades con previa certificación del cumplimiento	X	
5.	Que el contratista da cumplimiento a sus obligaciones frente a los aportes al sistema de seguridad social y de parafiscales, tal como exige el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, como consta a continuación:	X	

INFORMACIÓN DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

PLANILLA N°:	CERTIFICADO PARAFISCALES		
CONCEPTO DE PAGO	ENTIDAD	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO
SALUD	CERTIFICADO PARAFISCALES	CERTIFICADO PARAFISCALES	CERTIFICADO PARAFISCALES
PENSION	CERTIFICADO PARAFISCALES	CERTIFICADO PARAFISCALES	CERTIFICADO PARAFISCALES
ARL	CERTIFICADO PARAFISCALES	CERTIFICADO PARAFISCALES	CERTIFICADO PARAFISCALES

Teniendo en cuenta lo anterior, en mi calidad de supervisor doy visto bueno para el respectivo pago correspondiente al informe No 06.

La presente certificación se expide en el D.T.C. e H. de Santa Marta a los 7 días del mes de abril del año 2026.


FIRMA DE QUIEN CONVALIDA Y DA VISTO BUENO PARA PAGO


EFRAÍN VARGAS CORVACHO
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

Laura Caicedo M

LAURA CAICEDO MUÑOZ
CONSORCIO AVANZA MAGDALENA 025
VO.BO.

CEDULA

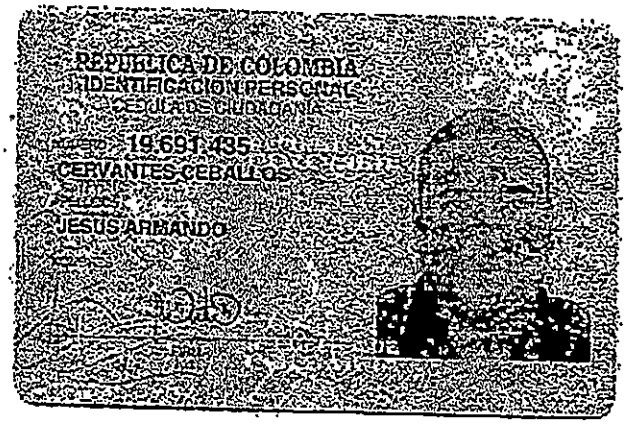
REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
19.691.435
CERVANTES CEBALLOS
JESUS ARMANDO

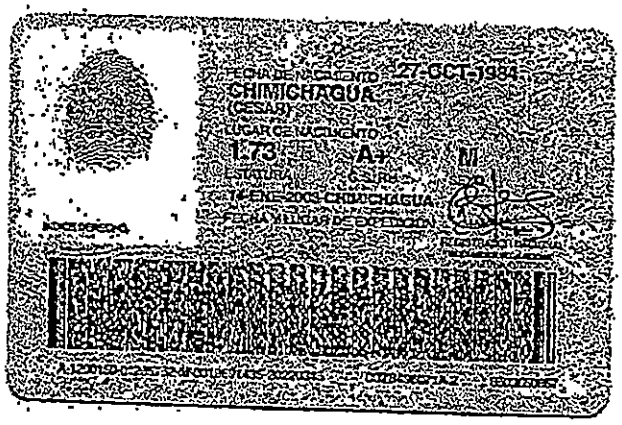
27-OCT-1984
CHIMICHAGUA
(CESAR)
1.73
A+
M
14-ENE-2003 CHIMICHAGUA

FORMATO 2 – CONFORMACIÓN DE PROPONENTE PLURAL
FORMATO 2A — DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO

Señores
GOBERNACION DEL MAGDALENA
Carrera 1C No 16-15 Palacio Tayrona
Santa Marta Magdalena

REFERENCIA: Proceso de contratación **No. LP-017-2024**, en adelante el "proceso de contratación"

Objeto: "CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA"

Estimados señores:

Los suscritos, JESUS ARMANDO CERVANTES CEBALLOS, identificado con cedula de ciudadanía No. 19.691.435 y EVER DE JESUS CASTILLO JIMENO, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.047.451.172; debidamente autorizados para actuar en nombre propio y representación de EBM CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S con NIT 901.333.170 - 1 respectivamente, manifestamos por medio de este documento, que hemos convenido asociarnos en consorcio, para participar en el proceso de contratación y, por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. El consorcio está integrado por los siguientes miembros:

Nombre del integrante	Compromiso (%) (1)
EBM CONSTRUCCIONES EINTERVENTORIAS S.A.S NIT 901.333.170 - 1	90%
JESUS ARMANDO CERVANTES CEBALLOS C.C. 19.691.435	10%

(1) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los integrantes, debe ser igual al 100%.

2. El Consorcio se denomina **CONSORCIO CENTRO CAMBIA**

3. El objeto del consorcio es **"CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA"**

4. La duración del consorcio no será inferior a la del plazo del contrato y un año más. El plazo del contrato es de catorce (14) meses; es decir que la duración total del consorcio será de un (1) año y catorce (14) meses. Con fecha de inicio el 03 del mes de abril de 2025 hasta el 30 de junio de 2027.

5. La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria en el cumplimiento de las obligaciones y de las sanciones que se deriven de la ejecución del contrato.

6. El representante del consorcio es **JESUS ARMANDO CERVANTES CEBALLOS**, identificado con **C. C. No. 19.691.435** de **Chimichagua- Cesar**, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del Contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.

7. El representante suplente del consorcio es **EVER DE JESUS CASTILLO JIMENO**, identificado con **C. C. No. 1.047.451.172 de Cartagena –Bolívar**, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.

8. El Señor **JESUS ARMANDO CERVANTES CEBALLOS** identificado con cedula de ciudadanía No. 19.691.435, acepta su nombramiento como representante legal del **CONSORCIO CENTRO CAMBIA**

9. En caso de resultar adjudicatario, la facturación del Proponente la realizará CONSORCIO CENTRO CAMBIA

10. El Domicilio del consorcio es:

Dirección de correo	**CARRERA 19D # 8ª - 33 RINCON DEL AMPARO**
Dirección electrónica	**consorciocentrocambia@gmail.com**
Teléfono	**3014835376**
Telefax	**N/A**
Ciudad	**VALLEDUPAR - CESAR**

En constancia, se firma en VALLEDUPAR, a los 03 días del mes de abril de 2025.

JESUS ARMANDO CERVANTES CEBALLOS
C.C 19.691.435 de Chimichagua, Cesar

EVER DE JESUS CASTILLO JIMENO
C.C. 1.047.451.172 de Cartagena, Bolívar
R. Legal EBM CONTRUCCIONES E INTERVERTORIAS S.A.S

JESUS ARMANDO CERVANTES CEBALLOS
C.C 19.691.435 de Chimichagua, Cesar
R. Legal CONSORCIO CENTRO CAMBIA

EVER DE JESUS CASTILLO JIMENO
C.C. 1.047.451.172 de Cartagena, Bolívar
R. Suplente CONSORCIO CENTRO CAMBIA

RUT

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 141206968331

(415)7707212489984(8020) 000014120696833 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 9 3 6 0 1 9	5	Impuestos y Aduanas de Valledupar	2 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO CENTRO CAMBIA

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cesar 2 0	Valledupar 0 0 1

41. Dirección principal
CR 19 D 8 A 33 RINCON DEL AMPARO

42. Correo electrónico consorciocentrocambia@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 0 1 4 8 3 5 3 7 6	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
4 2 9 0	2 0 2 5 0 4 0 3	7 1 1 2	2 0 2 5 0 4 0 3			

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 7 9 1 4 4 8 5 2 5 5

07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141206968331

(415)7707212489984(8020) 000014120696833 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 9 3 6 0 1 9	5	Impuestos y Aduanas de Valledupar	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 5 0 4 0 3	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	9 8	
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	2 0	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0	%
83. Nacional público	0 . 0	%
84. Nacional privado	1 0 0 . 0	%
85. Extranjero	0	%
86. Extranjero público	0 . 0	%
87. Extranjero privado	0 . 0	%

Vigencia

80. Desde	2 0 2 5 0 4 0 3
81. Hasta	2 0 2 7 0 6 3 0

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				
2				
3				
4				
5				

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 4 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141206968331

(415)7707212489984(8020) 000014120696833 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 9 3 6 0 1 9	5	Impuestos y Aduanas de Valledupar	2 4

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 5 0 4 0 3

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 9 6 9 1 4 3 5		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
CERVANTES	CEBALLOS	JESUS	ARMANDO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 5 0 4 0 3

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 4 7 4 5 1 1 7 2		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
CASTILLO	JIMENO	EVER	DE JESUS

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Página 4 de 4 **Hoja 4**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141206968331

(415)7707212489984(8020) 000014120696833 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 9 3 6 0 1 9	5	Impuestos y Aduanas de Valledupar	2 4

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 1 3 3 3 1 7 0	1	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: EBM CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		9 0 2 0 2 5 0 4 0 3	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	1 9 6 9 1 4 3 5	3	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
CERVANTES	CEBALLOS	JESUS	ARMANDO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	1 0	2 0 2 5 0 4 0 3	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

CERTIFICACION BANCARIA

Banco de Bogotá

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa CONSORCIO CENTRO CAMBIA identificado(a) con NITPJ 9019360195 está vinculado(a) al BANCO DE BOGOTA a través de la CTA CORRIENTE No. 091387480 desde el 10 de abril de 2025, este producto se encuentra Vigente.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 10 de abril de 2025, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,

Olga Yanira Otálora Guerrero

Gerencia de Soluciones para el Cliente

Banco de Bogota

FACTURA

CONSORCIO CENTRO CAMBIA
NIT. 901936019-5

CONSORCIO CENTRO CAMBIA
NIT 901.936.019-5
CRA 19D # 8A-33
Tel: 3014835376
Valledupar - Colombia
consorciocentrocambia@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. CCB 6

Señores	GOBERNACION DEL MAGDALENA MAGDALENA		
NIT	800.103.920-6	**Teléfono**	(605) 0000000
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Valledupar - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	06/04/2026, 11:11
Expedición	06/04/2026, 11:14
Vencimiento	13/04/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ACTA PARCIAL Nro 6	1.00	2,518,277,080.92

Total Ítems: 1

Total Bruto	2,518,277,080.92
Total a Pagar	2,518,277,080.92

Valor en Letras:
Dos mil quinientos dieciocho millones doscientos setenta y siete mil ochenta pesos m/cte con noventa y dos cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-04-13 por $ 2,518,277,080.92

Observaciones:
ACTA PARCIAL Nro 6
CONTRATO DE OBRA No 0782 DE 2025 " CONSTRUCCION DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA."

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764097668383 aprobado en 20250827 prefijo CCB desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica **7112** Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica Tarifa
CUFE: 2900184a0ff0c465b008de903ec3e42b688a0809720a1ccc5062a68c56242d479f0cb60bff1163f9c496da8e2e5bf018

ACTA PARCIAL

Gobernación del MAGDALENA | Magdalena

ACTA PARCIAL No. 6

CONSORCIO CENTRO CAMBIA
NIT. 901936019-5

CONTRATO No.:	0162 DE 2025	OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA		
CONTRATANTE:	GOBERNACION DEL MAGDALENA	CONTRATISTA:	CONSORCIO CENTRO CAMBIA	REPRESENTANTE LEGAL:	JESUS CERVANTES
INTERVENTOR:	CONSORCIO AVANZA MAGDALENA 025	VALOR DEL CONTRATO:	$ 44.650.753.740,31	VALOR PRESENTE ACTA	$ 2.518.277.080,92
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	CI-1276-2025	FECHA DEL CONTRATO:	11 DE ABRIL DE 2025	PLAZO DE EJECUCION:	14 MESES
OBJETO:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA"	FECHA DE INICIO:	17 DE JULIO DE 2025	FECHA DE TERMINACION:	6 DE OCTUBRE DE 2026
REPRESENTANTE LEGAL:	LAURA CAICEDO MUÑOZ	PERIODO DEL ACTA:	16 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2026	FECHA PRESENTE ACTA:	30 DE MARZO DE 2026

CONDICIONES GENERALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA						SALDO	
						MODIFICATORIA NO 1		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO			
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
01.	PRELIMINARES				$ 389.983.316,86		$ 809.862.514,00		$ 891.443.357,00		$ -		$ 891.443.357,00		$ 5.518.157,00
01.01	INSTALACIONES PROVISIONALES					-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
01.01.01	Instalación provisional de energía	GLB	1,00	$ 17.962.276,78	$ 17.962.277,00	1,00	$ 17.962.277,00	1,00	$ 17.962.277,00		$ -	1,00	$ 17.962.277,00	-	$ -
01.01.02	Instalación provisional de acueducto	GLB	1,00	$ 8.722.806,13	$ 8.722.806,00	1,00	$ 8.722.806,00	1,00	$ 8.722.806,00		$ -	1,00	$ 8.722.806,00	-	$ -
01.01.03	Instalación provisional comunicaciones	GLB	1,00	$ 1.869.764,01	$ 1.869.764,00	1,00	$ 1.869.764,00	1,00	$ 1.869.764,00		$ -	1,00	$ 1.869.764,00	-	$ -
01.02	TRABAJOS PRELIMINARES					-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
01.02.01	Vallas e avisos	UN	1,00	$ 8.293.243,45	$ 8.293.243,00	1,00	$ 8.293.243,00	1,00	$ 8.293.243,00		$ -	1,00	$ 8.293.243,00	-	$ -
01.02.02	Localización y replanteo, control de nivelaciones	M2	7.884,00	$ 5.293,51	$ 41.741.278,00	7.884,00	$ 41.311.278,00	7.884,00	$ 41.311.278,00		$ -	7.884,00	$ 41.311.278,00	-	$ -
01.02.03	Levado de volumenes	UN	1,00	$ 6.468.297,00	$ 6.468.297,00	1,00	$ 6.468.297,00		$ -		$ -	1,00	$ 6.468.297,00	-	$ -
01.02.04	Adquisición servicio de volquetes	GLB	1,00	$ 11.883.750,00	$ 11.883.750,00	1,00	$ 11.883.750,00		$ -		$ -	1,00	$ 11.883.750,00	-	$ -
01.02.05	Adquisición zona de trabajo-area larg	M2	20.190,00	$ 7.056,32	$ 142.467.162,00	20.190,00	$ 142.467.162,00		$ -		$ -	20.190,00	$ 142.467.162,00	-	$ -
	Retiro de subestruc, replanteo final y adecuación del terreno para ejecución de la obra, retiro de sobrantes				$ -	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
01.02.06	Mantenimiento diario por cualquier tipo medio	GL	1,00	$ 23.143.995,00	$ 23.143.995,00	1,00	$ 23.143.995,00		$ -		$ -	1,00	$ 23.143.995,00	-	$ -
	Demolición de la cuadrilla para retiro transformador en el barrio retiro en ejecuto de volumen				$ -	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
01.02.07	Demolición estructura concreto	M3	982,00	$ 142.766,29	$ 140.219.362,00	982,00	$ 138.338.982,00		$ -		$ -	982,00	$ 138.338.982,00	-	$ 0
01.03	CERRAMIENTO				$ -	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
01.03.01	Cerramiento provisional	ML	820,00	$ 37.847,64	$ 33.867.455,00	820,00	$ 35.862.435,00		$ -		$ -	820,00	$ 35.862.435,00	-	$ -
01.03.02	Cerramiento lote de obra Etapa 2 - MODIFICA	ML	-	$ 38.513,35	$ -	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
01.04	CAMPAMENTOS		-	-	-	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
01.04.01	Campamento de obra	UN	1,00	$ 99.913.314,00	$ 99.913.314,00	1,00	$ 97.211.514,00		$ -		$ -	1,00	$ 97.211.514,00	-	$ -
01.04.02	Aseo de campamento	MS	5,00	$ 5.536.957,25	$ 5.536.157,00	1,00	$ 5.536.157,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 5.536.157,25
02.	CIMENTACIÓN				$ 5.536.157,00	-	$ 4.091.732.973,00	-	$ 3.745.906,00		$ -	-	$ 3.745.906,00	-	$ 15.784.802,00
	Cerramiento en estructura al lote del edificio				$ -	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
02.01	EXCAVACIONES - RELLENOS				$ -	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
02.01.01	Excavación manual en suelos arcillosos	M3	1.210,00	$ 80.453,27	$ 97.351.139,00	1.210,00	$ 99.865.630,00		$ -		$ -	1.210,00	$ 99.865.630,00	-	$ -
02.01.02	Excavación manual suelos arcillosos, rellenos	M3	2.287,00	$ 109.171,72	$ 251.781.963,00	2.287,00	$ 251.944.210,00		$ -		$ -	2.286,66	$ 251.944.210,00	0,34	$ 37.443,00
02.01.03	Relleno en recebo para vigas y pedes - manual	M3	1.214,00	$ 111.512,79	$ 135.413.374,00	1.230,83	$ 138.240.208,00		$ -		$ -	1.230,83	$ 138.240.208,00	137,87	$ 15.302.387,00
02.01.04	Relleno en recebo para contrapiso - e=0,20cm	M3	11.079,60	$ 88.377,01	$ 979.833.448,00	11.063,00	$ 979.833.448,00		$ -		$ -	11.063,00	$ 979.833.448,00	-	$ -
2.02	CIMENTACIÓN - Concreto 3,000 psi				$ -	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
02.02.01	Concreto pedestal 3 mts, 3,000 psi	M3	3.369,00	$ 39.331,49	$ 91.961.706,00	3.580,00	$ 88.050.123,00		$ -		$ -	3.579,80	$ 88.050.123,00	0,20	$ 92.583,00
02.02.02	Concreto ciclópeo	M3	232,00	$ 377.704,73	$ 376.095.318,00	1.868,07	$ 1.130.685.800,00		$ -		$ -	1.868,07	$ 1.130.685.800,00	-	$ -
02.02.03	Concreto de bordes	M3	337,00	$ 3.099.029,64	$ 350.352.850,00	337,00	$ 350.352.850,00	33,77	$ 344.718.798,00	3,80	$ 3.940.008,00	335,17	$ 348.658.802,00	1,83	$ 1.693.818,00
02.02.04	Concreto viga de amarre	M3	241,00	$ 1.197.479,38	$ 288.607.350,00	241,00	$ 288.607.350,00		$ -		$ -	241,00	$ 288.607.350,00	-	$ -
02.02.05	Losa de contrapiso 0,10 - area laborat	M2	4.000,00	$ 107.153,11	$ 428.577.310,00	4.000,00	$ 428.577.382,00		$ -		$ -	4.000,00	$ 428.577.382,00	-	$ -
02.03	ACEROS													-	$ -
02.03.01	Suministro de varilla corrugada, acero de refu	KG	39.640,00	$ 7.469,26	$ 296.074.176,00	39.640,00	$ 296.574.122,00	39.381,00	$ 293.607.154,00		$ -	39.381,00	$ 293.607.154,00	49,00	$ 366.974,00
02.03.02	Malla losa de contrapiso	M2	9.950,00	$ 7.478,13	$ 74.410.734,00	9.917,00	$ 74.076.734,00	9.917,00	$ 74.082.238,00		$ -	9.917,00	$ 74.082.238,00	33,00	$ 348.617,00
03.	ESTRUCTURA				$ 8.516.469.224,00		$ 6.978.302.947,00		$ 4.561.454.434,00		$ 798.367.648,00		$ 5.359.821.899,00	-	$ 1.156.579.882,00
	La el presente se incluye la colocación del refuerzo				$ -	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
03.01	VIGAS EN CONCRETO - 3,000 psi					-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
03.01.01	Placas de 0.50 - (0.25 m3/M2)	M2	184,00	$ 398.317,39	$ 84.077.729,00	184,00	$ 86.077.708,00	-	$ -	184,00	$ 418.077.708,15	184,00	$ 86.077.708,00	-	$ -
03.01.02	Placas de 0.30 y Alcance 0.60 - (0.53 M3/M2)	M2	2.422,00	$ 402.317,15	$ 1.216.991.364,00	2.422,00	$ 1.135.685.864,00	2.303,37	$ 927.878.367,80	365,79	$ 139.185.408,00	2.668,86	$ 1.067.793.795,80	133,35	$ 53.702.173,00
03.01.03	Placas de 0.20 - (0.31 M3/M2)	M2	2.242,00	$ 402.317,15	$ 902.543.117,00	2.262,00	$ 906.545.137,00	1.745,16	$ 733.358.820,00	500,49	$ 210.318.407,12	2.243,65	$ 943.677.227,00	18,35	$ 8.469.811,00
03.01.04	Vigas cerradas	M3	97,00	$ 1.207.482,85	$ 117.125.734,00	97,00	$ 117.125.734,00	97,00	$ 117.125.734,00		$ -	97,00	$ 117.125.734,00	-	$ -
03.02	COLUMNAS EN CONCRETO - 3,000 psi					-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -

CONDICIONES GENERALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA						SALDO	
						MODIFICATORIA NO 1		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
05.02.01	Columnas de concreto	M3	566,00	$ 1 544 966,28	$ 427 536 368,00	266,00	$ 427 536 368,00	346,86	$ 342 601 783,00	4,14	$ 5 732 796,00	351,00	$ 348 534 579,00	56,91	$ 79 005 969,00
05.03	ESCALERA Y ESCALERA - 4,000 psi						-						-		-
06.01.01	Viga en concreto s alfeiz de ventana de 0.15	M3	43,00	$ 2 251 115,39	$ 96 040 164,00	43,00	$ 96 040 164,00	-	$ -		$ -	-	$ -	43,00	$ 96 040 164,00
06.01.02	Concreto de cimientos	M3	34,00	$ 2 672 379,79	$ 90 857 331,00	34,00	$ 90 857 331,00	-	$ -		$ -	-	$ -	34,00	$ 90 857 331,00
05.06	ESTRUCTURA METÁLICA						-		$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
06.04.01	Columnas metálicas en subsuelo	KG	119 772,53	$ 21 975,00	$ 2 257 972 963,00	78 276,00	$ 1 644 213 342,00		$ -	76 276,00	$ 1 644 213 342,00	43,487,53	$ 823 674 039,00		
07.04.01	Elementos metálicos para puentes	KG	12 570,00	$ 29 417,34	$ 261 600 211,00	12 570,00	$ 261 600 211,00	-	$ -		$ -	-	$ -	12 570,00	$ 261 600 211,00
07.04.03	Placa de concreto sobre metálicos - gironal	M2	145,00	$ 241 877,47	$ 35 121 734,00	145,00	$ 35 121 734,00	-	$ -		$ -	-	$ -	145,00	$ 35 121 734,00
07.04.04	Columna metálicas tipo tubular (e = 0.20 y Ø=0.20	UN	42,00			42,00	-	-				-		42,00	-
	Incluye: en colocación y pernos y pedestal de acero					-	-	-				-		-	-
05.04.04.1	Elementos metálicos en subsuelo	KG	6 960,00	$ 19 95	$ 138 779 534,00	6 960,00	$ 138 779 534,00	-				-		6 960,00	$ 138 779 534,00
05.04.04.2	Estructura metal montaje y otros, diversos	KG	56,70	$ 309 174,12	$ 8 190 642,00	56,70	$ 8 190 642,00	-	$ -		$ -	-	$ -	56,70	$ 8 190 645,00
05.04.04.3	Concreto de 3a serie	M3	23,70	$ 1 019 015,44	$ 24 624 966,00	23,70	$ 24 624 966,00	-	$ -		$ -	-	$ -	23,70	$ 24 624 966,00
05.04.04.4	Columnas en concreto	M3	3,10	$ 2 247 334,76	$ 7 071 367,00	3,10	$ 7 071 367,00	-	$ -		$ -	-	$ -	3,10	$ 7 071 367,00
05.04.04.5	Relleno en mezcla para vigas y aberturas	M3	23,40	$ 133 233,89	$ 3 273 193,00	23,40	$ 3 273 193,00	-	$ -		$ -	-	$ -	23,40	$ 3 273 193,00
05.04.04.6	Relleno de cimentación - acabado y viga	M3	7 299,00	$ 7 419,26	$ 54 157 215,00	7 299,00	$ 54 157 215,00	-	$ -		$ -	-	$ -	7 299,00	$ 54 157 215,00
	Incluye todos los gastos necesarios					-	-	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
06.05	SECUELO					-	-	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
06.05.01	Acero de refuerzo	KG	906 550,00	$ 1 249 662 017,00		134 153,39	$ 1 004 934 850,00	67708,50	$ 244 847 368,00	186 890,00	$ 1 249 662 017,00	-	$ -		
07.01.06	Malla electrosoldada	KG	17 240,00	$ 7 470,23	$ 128 738 705,00	17 217,60	$ 128 618 372,00		$ -	17 217,60	$ 128 618 372,00	22,40	$ 167 333,00		
06	MAMPOSTERIA				$ 742 315 644,00	-	$ 772 319 434,00		$ 555 809 261,00		$ 52 991 298,00	-	$ 608 800 559,00	-	$ 346 418 870,00
06.01	MUROS DE BLOQUE					-	-	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
	Incluye: fijación					-	-	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
06.01.01	Muros de bloque de concreto - Portantes y cubiertos	M2	2 280,00	$ 86 364,17	$ 216 640 716,00	2 280,00	$ 216 640 716,00	1,325,35	$ 127 656 992,00		$ -	1 325,35	$ 127 656 992,00	1 954,65	$ 168 164 726,00
06.01.02	Muros de bloque de concreto - Interior	M2	2 690,00	$ 80 172,14	$ 215 679 778,00	2 690,00	$ 215 679 778,00	1 587,10	$ 152 906 325,00		$ -	1 587,10	$ 152 906 325,00	782,90	$ 63 573 604,00
06.02	ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES					-	-	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
06.02.01	Dinteles y remates en concreto	M3	11,50	$ 1 057 174,54	$ 12 157 307,00	11,50	$ 12 157 307,00	-	$ -		$ -	-	$ -	11,50	$ 12 157 307,23
06.02.02	Dinteles en concreto	M3	3 790,00	$ 20 164,97	$ 76 457 272,00	3 790,00	$ 76 457 272,00	1 840,00	$ 37 142 373,00	1172,00	$ 24 063 413,00	3 032,00	$ 61 205 787,00	777,93	$ 14 451 885,00
06.02.03	Perforaciones y salidas para 1/2"	UN	2 930,00	$ 22 544,58	$ 77 008 499,00	2 808,00	$ 67 008 499,00	1 228,00	$ 15 404 736,00		$ -	1 228,00	$ 15 404 736,00	1 722,00	$ 21 621 760,00
06.03	ACERO DE REFUERZO					-	-	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
06.03.01	Acero de refuerzo	KG	5 278,00	$ 7 443,76	$ 67 310 614,00	5 278,00	$ 67 310 614,00	1 840,00	$ 13 780 232,00	1172,00	$ 8 827 783,00	3 032,00	$ 22 608 075,00	5 287,82	$ 39 802 589,00
06.03.02	Gradilla de acero	KG	9 300,00	$ 9 951,16	$ 92 533 308,00	9 300,00	$ 92 533 308,00	6,115,18	$ 76 818 708,00	-	$ -	6 115,18	$ 76 818 708,00	684,82	$ 4 602 899,00
05.	PAÑETE				$ 773 331 699,00	8,00	$ 732 731 000,00	-	$ 252 293 696,00	-	$ -	-	$ 252 293 696,00	-	$ 480 397 304,00
	Incluye: humedo					0,00	-	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
05.01	Pañete impermeabilizado en bajos	M2	1 406,00	$ 56 275,14	$ 79 143 805,00	1 406,00	$ 79 143 805,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1 406,00	$ 79 143 803,00
5.02	Pañete en fachadas - a la vista, impermeabilizado	M2	6 680,00	$ 27 804,19	$ 177 018 797,00	4 680,00	171 018 797,00	1 325,55	$ 78 780 334,00		$ -	1 325,55	$ 78 780 334,00	3 354,45	$ 184 250 463,00
5.03	Pañete de muros interiores - a la vista	M2	8 750,00	$ 44 736,56	$ 391 557 600,00	8 750,00	$ 391 557 600,00	3 928,40	$ 175 489 382,00		$ -	3 928,40	$ 175 489 382,00	4 829,38	$ 216 148 208,00
06.	ENCHAPES				$ 101 386 157,00	-	$ 101 386 157,00	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ 101 386 167,00
06.01	Enchapes en bajos - cerámica piedra, blanca	M2	850,00	$ 119 296,36	$ 101 386 107,00	850,00	$ 101 386 107,00	-	$ -		$ -	-	$ -	850,00	$ 101 386 107,00
07.	CUBIERTA				$ 2 339 202 259,00	-	$ 2 339 402 298,00	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ 1 316 902 298,00
07.01	TEJAS DE CERÁMICA					-	-	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
07.01.01	Placa metálica de 0, bordes MS blanco	M2	3 710,00	$ 248 511,78	$ 1 299 64 1 345,00	3 710,00	$ 1 099 865 849,00	-	$ -		$ -	-	$ -	3 710,00	$ 1 299 865 849,00
	Placa de 24 mm y estructura en fibra de vidrio - Ver detalle					-	-	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
07.01.02	Cumbrera de tejas en el mismo material	ML	830,00	$ 88 317,04	$ 73 210 501,00	830,00	$ 73 730 893,00	-	$ -		$ -	-	$ -	830,00	$ 73 730 893,00
07.01.03	Canaleta de 0.30 x 0.25 - desfogue	UN	1,00	$ 1 305 439,31	$ 1 301 462,00	1,00	$ 1 303 460,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 1 303 460,00
07.01.04	Canaleta de 0.30 x 0.15 - desfogue	UN	1,00	$ 1 498 979,68	$ 1 516 979,00	1,00	$ 1 498 979,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 1 498 979,00
	Nota: las canaletas incluyen tiantes galvanizado cal 26, gambotas de abordaje y flechas de acuerdo - Ver detalle					-	-	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
07.02	BAÑOS DE CUBIERTA					-	-	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
07.02.01	Vigas de concreto reforzado en placa - Ver reforzado	ML	1 046,00			1 046,00	-	-	$ -		$ -	-	$ -	1 046,00	$ -
	INCLUYE: Los actividades siguientes					-	-	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
07.02.03.3	Obturios y cemento en concreto	M3	24,13	$ 1 017 174,54	$ 24 555 711,00	24,13	$ 25 530 765,00	-	$ -		$ -	-	$ -	24,13	$ 25 530 765,00
07.02.07.2	Acero de refuerzo	KG	1 207,30	$ 7 431,19	$ 9 307 277,00	1 207,30	$ 8 043 277,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1 207,30	$ 8 043 277,00
07.02.07.3	Perforaciones y pedidos para 1/2"	UN	2 415,00	$ 12 344,16	$ 30 295 171,00	2 415,00	$ 30 296 151,00	-	$ -		$ -	-	$ -	2 415,00	$ 30 296 151,00
	Incluye: Todos los gastos necesarios					-	-	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
07.03.02	Aislante de cubierta	M2	3 380,00	$ (1 179,62	$ 84 447 471,00	1 380,00	$ 84 447 471,00	-	$ -		$ -	-	$ -	3 380,00	$ 84 447 471,00
07.03.05	Medias Aguas en cubierta	ML	800,00	$ 37 721,64	$ 12 298 724,00	800,00	$ 12 298 724,00	-	$ -		$ -	-	$ -	800,00	$ 12 298 724,00
08.	CIELORASOS				$ 534 834 819,11	-	$ 190 191 867,31	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ 190 191 867,09
	Incluye en primera final					-	-	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
08.01	COCINA Y BAÑOS					-	-	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -

CONDICIONES GENERALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA						SALDO	
						MODIFICATORIA NO 1		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO			
ITEM	DESCRIPCION		UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
06.01.03	Cielorraso Machimbrado, pintura esmalte - color a Ver detalle		M2	85,00	$ 148.878,65	$ 12.646.487,13	85,00	$ 12.646.487,13	-	$ -		$ -	-	$ -	85,00	$ 12.646.487,00
06.02.02	Cielorraso Machimbrado, pintura tipo quimbo - Incluye		M2	325,00	$ 126.363,44	$ 41.067.242,13	325,00	$ 41.067.242,13	-	$ -		$ -	-	$ -	325,00	$ 41.067.242,00
06.00	AISLANTORIO								-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
09.07.01	Cielorraso en durlock - Incluye primera fase		M2	310,00	$ 94.735,16	$ 29.678.698,00	310,00	$ 29.678.698,00	-	$ -		$ -	-	$ -	310,00	$ 29.678.698,00
01.05.02	Panel aislante metálico tipo, sandwich en madera - Ver detalle		UN	168,00	$ 472.198,05	$ 79.329.272,00	168,00	$ 79.329.272,00	-	$ -		$ -	-	$ -	168,00	$ 79.329.272,00
05.01	CERRAJERIA							$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
05.01.01	Panel aislante metálico 3.20x1.00, sandwich en madera - Ver detalle		UN	118,00	$ 977.058,82	$ 134.683.235,00		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
05.	IMPERMEABILIZACION					$ 237.184.811,00		$ 237.184.811,00	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ 237.184.811,00
09.02.01	Tratamiento latex cielorraso, sandia 1/45 3 mm, trafico pesado		M2	5.650,00	$ 98.388,19	$ 147.287.043,00	5.650,00	$ 147.287.043,00	-	$ -		$ -	-	$ -	5.650,00	$ 147.287.043,00
09.07.02	Antisolido de hormigón contra humedad		M2	4.660,00	$ 19.298,58	$ 89.897.568,00	4.660,00	$ 89.897.568,00	-	$ -		$ -	-	$ -	4.660,00	$ 89.897.568,00
10.	PISOS					$ 902.914.909,00		$ 902.914.909,00	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ 902.914.909,00
10.01	BANOS								-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
10.01.01	Piso San Gregorio 33x33		M2	310,00	$ 114.661,97	$ 35.545.192,00	310,00	$ 35.563.192,00	-	$ -		$ -	-	$ -	310,00	$ 35.563.192,00
10.01.02	Mediacaña de obra, mortero y alisado		ML	415,00	$ 50.887,23	$ 21.109.884,00	415,00	$ 21.109.884,00	-	$ -		$ -	-	$ -	415,00	$ 21.109.884,00
10.01.03	Conformado pocetas de duche		UN	2,00	$ 264.612,11	$ 529.224,00	2,00	$ 529.224,00	-	$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 529.224,00
10.01.04	Conformado bajo zocalos de madera		UN	8,00	$ 264.851,11	$ 2.118.937,00	8,00	$ 2.118.937,00	-	$ -		$ -	-	$ -	8,00	$ 2.118.937,00
10.01.05	Conformado sector de escalo		UN	2,00	$ 336.155,66	$ 672.311,00	2,00	$ 672.311,00	-	$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 672.311,00
10.01.06	Alisado de piso para cerámicos		M2	310,00	$ 32.496,61	$ 10.336.637,00	310,00	$ 10.336.637,00	-	$ -		$ -	-	$ -	310,00	$ 10.336.637,00
10.02	PISOS INTERIORES								-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
10.02.01	Piso Interiores en todo tipo de gres		M2	6.780,00	$ 106.499,51	$ 721.723.407,00	6.780,00	$ 721.795.887,00	-	$ -		$ -	-	$ -	6.780,00	$ 721.795.887,00
10.02.02	Solados peldaños de gres		ML	2.140,00	$ 37.475,45	$ 76.212.864,00	2.140,00	$ 76.852.864,00	-	$ -		$ -	-	$ -	2.140,00	$ 76.852.864,00
10.01	ZOCALOS								-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
10.09.01	Pisos en baldosa de gres y ruedi		M2	280,00	$ 78.174,29	$ 21.888.801,00	280,00	$ 21.888.801,00	-	$ -		$ -	-	$ -	280,00	$ 21.888.801,00
10.09.02	Descanso en baldosa de gres		M2	20,00	$ 106.139,75	$ 2.122.795,00	20,00	$ 2.122.795,00	-	$ -		$ -	-	$ -	20,00	$ 2.122.795,00
11.	APARATOS SANITARIOS					$ 277.580.793,00		$ 277.580.793,00	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ 277.580.793,00
11.01	APARATOS								-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
11.01.01	Sanitario bretel colonial Ferrum		UN	52,00	$ 747.374,79	$ 38.863.849,00	52,00	$ 38.863.889,00	-	$ -		$ -	-	$ -	52,00	$ 38.863.889,00
11.01.02	Sanitario Pamer one - Ferrum		UN	10,00	$ 648.629,70	$ 6.486.297,00	10,00	$ 6.486.297,00	-	$ -		$ -	-	$ -	10,00	$ 6.486.297,00
11.01.03	Sanitario para niños		UN	1,00	$ 911.441,81	$ 911.442,00	1,00	$ 911.442,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 911.442,00
11.01.04	Orinal line Arrecife, con flushometro		UN	24,00	$ 876.311,89	$ 24.379.245,00	24,00	$ 18.229.545,00	-	$ -		$ -	-	$ -	24,00	$ 18.229.545,00
11.01.05	Lavamanos line Chamberry y pedal metal		ML	48,30	$ 518.481,21	$ 24.805.961,00	48,30	$ 24.003.948,00	-	$ -		$ -	-	$ -	48,30	$ 24.003.948,00
11.01.06	Lavamanos Free multiplomb - bajo PMR		UN	23,00	$ 517.813,83	$ 11.911.718,00	18,00	$ 11.913.710,00	-	$ -		$ -	-	$ -	18,00	$ 11.913.710,00
11.01.07	Duchas		UN	8,00	$ 960.446,10	$ 7.683.578,00	8,00	$ 7.683.553,00	-	$ -		$ -	-	$ -	8,00	$ 7.683.553,00
11.02	ACCESORIOS								-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
11.02.01	Dispenser de papel para rollazo, cromo		UN	10,50	$ 812.639,13	$ 8.532.711,00	10,50	$ 8.952.711,00	-	$ -		$ -	-	$ -	10,50	$ 8.952.711,00
11.02.02	Dispenser de cromo bandeja - de pie de 1.20		M°1	131,00	$ 753.059,71	$ 98.644.421,00	131,00	$ 98.283.431,00	-	$ -		$ -	-	$ -	131,00	$ 98.283.431,00
11.02.03	Dispenser cromo duchas - visible transparente - Ver detalle		M2	4,00	$ 601.807,83	$ 2.407.205,00	4,00	$ 2.907.205,00	-	$ -		$ -	-	$ -	4,00	$ 2.907.205,00
	Dispenser de duchas visible transparente 0.45 mm, pulido y cromo, accesorios de cromo brillante, dispenser de jabon						-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
11.02.04	Dispenser de papel para rollazo, cromo		UN	24,00	$ 313.749,79	$ 7.572.877,00	24,00	$ 7.572.877,00	-	$ -		$ -	-	$ -	24,00	$ 7.572.877,00
11.02.05	Barra de cromo 0.45 visible		UN	8,00	$ 477.964,18	$ 3.818.818,00	8,00	$ 4.318.836,00	-	$ -		$ -	-	$ -	8,00	$ 4.318.836,00
11.02.06	Espejo Fijo de 0.80, 3 mm, de cuerpo, pulido		M°2	11,00	$ 211.614,00	$ 2.348.752,00	65,00	$ 17.348.782,00	-	$ -		$ -	-	$ -	65,00	$ 17.348.782,00
11.02.07	Mesada de piso		UN	62,00	$ 60.277,75	$ 3.372.490,00	62,00	$ 3.372.830,00	-	$ -		$ -	-	$ -	62,00	$ 3.372.830,00
11.02.08	Cubierta bronce con, antivandálico		UN	96,00	$ 313.213,30	$ 29.656.318,00	88,00	$ 28.658.518,00	-	$ -		$ -	-	$ -	88,00	$ 28.658.518,00
11.02.09	Mueble de atención en enfermería - Información		M°1	2,70			2,70	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	2,70	$ -
11.02.10	Cocheta en enfermería - Información		ML	1,50			1,50	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	1,50	$ -
11.03	ANEXO								-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
11.03.01	Pantalla sana, quirofano		UN	2,00	$ 1.077.044,50	$ 2.154.089,00	2,00	$ 2.158.089,00	-	$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 2.158.089,00
12.	CARPINTERIAS					$ 1.371.446.733,00		$ 1.783.514.884,00	-	$ -		$ 88.614.878,00	-	$ 88.614.878,00	-	$ 1.783.499.418,00
	Todas las aberturas incluyen su instalación, pintura final, herrajes y cerraduras.							$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
12.01	VENTANAS								-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
	Ventanería aluminio con vidrio laminado color natural visible laminado - Aluminio, Gris						-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
12.01.01	V-1 2.35 x 1.80 - Exterior		UN	1,00	$ 13.721.081,84	$ 13.722.081,00	1,00	$ 13.722.081,00			1,00	$ 13.722.081,00	1,00	$ 13.722.081,00	-	$ -
12.01.02	V-2 6.95 x 2.25 - Exterior		UN	1,00	$ 14.027.469,72	$ 14.027.470,00	1,00	$ 14.027.470,00			1,00	$ 14.027.470,00	1,00	$ 14.027.470,00	-	$ -
12.01.03	V-3 6.65 x 1.80 - Exterior		UN	1,00	$ 8.567.819,84	$ 8.567.870,00	1,00	$ 8.567.820,00			1,00	$ 8.567.820,00	1,00	$ 8.567.820,00	-	$ -
12.01.04	V-4 6.33 x 2.25 - Exterior		UN	1,00	$ 10.731.054,11	$ 10.731.054,00	1,00	$ 10.733.034,00			1,00	$ 10.733.034,00	1,00	$ 10.733.034,00	-	$ -

CONDICIONES GENERALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA						SALDO	
						MODIFICATORIA NO 1		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO			
ITEM	DESCRIPCION		UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
12.01.05	V-5 2.70 x 3.60 - Exterior		UNI	1.00	$ 10.907.158,80	$ 10.907.158,80	1,00	$ 10.907.158,00			1,00	$ 10.907.158,00	1,00	$ 10.907.158,00	-	$ -
12.01.06	V-6 2.70 x 3.71 - Exterior		UNI	1.00	$ 13.637.431,00	$ 13.637.431,00	1,00	$ 13.637.431,00			1,00	$ 13.637.431,00	1,00	$ 13.637.431,00	-	$ -
12.01.07	V-7 1.55 x 1.40 - Exterior		UNI	1.00	$ 1.708.429,00	$ 1.708.429,00	1,00	$ 1.708.429,00				$ -	-	$ -	1,00	$ 1.708.429,00
12.01.08	V-8 1.25 x 2.25 - Exterior		UNI	1.00	$ 2.131.284,00	$ 2.131.284,00	1,00	$ 2.131.284,00				$ -	-	$ -	1,00	$ 2.131.284,00
12.01.09	V-9 5.65 x 1.19 - Exterior		UNI	3.00	$ 5.391.228,00	$ 16.173.684,00	3,00	$ 16.173.684,00				$ -	-	$ -	3,00	$ 16.173.684,00
12.01.10	V-10 3.60 x 2.80 - Exterior		UNI	4.00	$ 7.020.699,75	$ 28.082.799,00	4,00	$ 28.082.799,00		$ -		$ -	-	$ -	4,00	$ 28.082.799,00
12.01.11	V-11 5.10 x 2.80 - Exterior		UNI	2.00	$ 11.408.637,21	$ 22.817.274,00	2,00	$ 22.817.274,00	-	$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 22.817.274,00
12.01.12	V-12 3.50 x 2.15 - Exterior		UNI	2.00	$ 8.775.879,00	$ 17.551.758,00	2,00	$ 17.551.758,00	-	$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 17.551.758,00
12.01.13	V-13 6.60 x 1.56 - Exterior		UNI	1.00	$ 6.931.050,00	$ 6.931.050,00	1,00	$ 6.931.050,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 6.931.050,00
12.01.14	V-14 6.01 x 1.56 - Exterior		UNI	1.00	$ 6.374.941,33	$ 6.374.941,00	1,00	$ 6.374.941,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 6.374.941,00
12.01.15	V-15 6.48 x 1.31 - Exterior		UNI	1.00	$ 4.845.136,00	$ 4.845.136,00	1,00	$ 4.845.136,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 4.845.136,00
12.01.16	V-16 6.05 x 1.31 - Exterior		UNI	1.00	$ 4.680.467,00	$ 4.680.467,00	1,00	$ 4.680.467,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 4.680.467,00
12.01.17	V-17 6.20 x 1.23 - Exterior		UNI	1.00	$ 4.713.291,00	$ 4.713.291,00	1,00	$ 4.713.291,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 4.713.291,00
12.01.18	V-18 3.70 x 3.71 - Exterior		UNI	3.00	$ 4.018.796,00	$ 12.056.388,00	3,00	$ 12.056.388,00	-	$ -		$ -	-	$ -	3,00	$ 12.056.388,00
12.01.19	V-19 3.67 x 1.30 - Exterior		UNI	2.00	$ 3.322.295,50	$ 6.644.591,00	2,00	$ 6.644.591,00	-	$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 6.644.591,00
12.01.20	V-20 6.30 x 1.11 - Exterior		UNI	1.00	$ 6.414.746,50	$ 6.414.747,00	1,00	$ 6.414.747,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 6.414.747,00
12.01.21	V-21 5.20 x 1.36 - Exterior		UNI	1.00	$ 5.645.599,75	$ 5.645.599,00	1,00	$ 5.645.599,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 5.645.599,00
12.01.22	V-22 2.82 x 1.16 - Exterior		UNI	1.00	$ 3.064.591,20	$ 3.064.591,00	1,00	$ 3.064.591,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 3.064.591,00
12.01.23	V-23 4.07 x 1.56 - Exterior		UNI	1.00	$ 4.401.867,50	$ 4.401.867,00	1,00	$ 4.401.867,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 4.401.867,00
12.01.24	V-24 5.60 x 1.80 - Exterior		UNI	20.00	$ 7.020.699,65	$ 140.413.997,00	20,00	$ 140.413.997,00	-	$ -		$ -	-	$ -	20,00	$ 140.413.997,00
12.01.25	V-25 5.60 x 1.80 - Exterior		UNI	20.00	$ 7.020.699,65	$ 140.413.997,00	20,00	$ 140.413.997,00	-	$ -		$ -	-	$ -	20,00	$ 140.413.997,00
12.01.26	V-26 6.01 x 0.80 - Exterior		UNI	16.00	$ 5.733.914,10	$ 90.734.626,00	16,00	$ 90.734.626,00	-	$ -		$ -	-	$ -	16,00	$ 90.734.626,00
12.01.27	V-27 6.30 x 1.31 - Interior		UNI	21.00	$ 5.597.151,86	$ 24.426.195,00	21,00	$ 24.426.195,00	-	$ -		$ -	-	$ -	21,00	$ 24.426.195,00
12.01.28	V-Varios - 4.75 x 0.30 - Exterior		UNI	12.00	$ 3.657.865,74	$ 19.891.863,00	12,00	$ 19.891.863,00	-	$ -		$ -	-	$ -	12,00	$ 19.891.863,00
12.02	PUERTAS INTER						-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
	Partidas de cantidad modificada color natural						-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
12.02.01	PI-1 0.85 x 2.10 - Exterior		UNI	1.00	$ 11.483.654,00	$ 11.483.654,00	1,00	$ 11.483.654,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 11.483.654,00
12.02.02	PI-2 0.85 x 0.35 - Exterior		UNI	4.00	$ 8.411.069,75	$ 33.644.279,00	4,00	$ 33.644.279,00	-	$ -		$ -	-	$ -	4,00	$ 33.644.279,00
12.02.03	PI-3 0.70 x 2.10 - Exterior		UNI	1.00	$ 10.682.109,50	$ 10.682.110,00	1,00	$ 10.682.110,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 10.682.110,00
12.02.04	PI-4 0.60 x 2.10 - Exterior		UNI	1.00	$ 6.874.777,50	$ 6.874.778,00	1,00	$ 6.874.778,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 6.874.778,00
12.02.05	PI-5 0.60 x 0.35 - Exterior		UNI	4.00	$ 6.874.777,80	$ 27.499.111,00	4,00	$ 27.499.111,00	-	$ -		$ -	-	$ -	4,00	$ 27.499.111,00
12.02.06	PI-6 0.10 x 2.10 - Exterior		UNI	2.00	$ 11.275.367,50	$ 22.550.735,00	2,00	$ 22.550.735,00	-	$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 22.550.735,00
12.02.07	PI-7 0.60 x 1.85 - Exterior		UNI	12.00	$ 3.884.495,60	$ 46.613.943,00	12,00	$ 46.613.943,00	-	$ -		$ -	-	$ -	12,00	$ 46.613.943,00
12.03	PUERTAS VENTANAS						-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
	Partidas de cantidad modificada color natural, chifre tornillo - bronce/s. 6+4						-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
	Las PV incluyen todos sus herrajes, se incluye la mueble de la PV para su costo incluye la colocación completa de vidrios y detalle.						-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
12.03.01	PVM 2.90 x 2.33 + Ventanería		UNI	1.00	$ 21.472.275,00	$ 21.065.396,00	3,00	$ 23.065.388,00	-	$ -		$ -	-	$ -	3,00	$ 33.065.388,00
12.03.02	PV-2 2.60 x 2.25 + Ventanería		UNI	1.00	$ 18.263.374,00	$ 18.263.374,00	1,00	$ 18.263.375,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 18.263.375,00
12.03.03	PV-3 0.90 x 2.25 + Ventanería		UNI	3.00	$ 4.257.201,50	$ 12.771.604,00	3,00	$ 12.771.604,00	-	$ -		$ -	-	$ -	3,00	$ 12.771.604,00
12.03.04	PV-4 1.61 x 2.25 + Ventanería		UNI	1.00	$ 7.167.481,98	$ 7.867.482,00	1,00	$ 7.867.482,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 7.867.482,00
12.03.05	PV-5 0.90 x 2.25 + Ventanería		UNI	1.00	$ 7.281.252,90	$ 7.281.753,00	1,00	$ 7.281.753,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 7.281.753,00
12.03.06	PV-6 0.90 x 2.25 + Ventanería		UNI	1.00	$ 6.310.177,70	$ 6.310.158,00	1,00	$ 6.310.158,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 6.310.158,00
12.03.07	PV-7 1.45 x 2.25 + Ventanería		UNI	23.00	$ 9.114.711,50	$ 203.149.031,00	25,00	$ 203.149.038,00	-	$ -		$ -	-	$ -	25,00	$ 203.149.038,00
12.03.08	PV-8 1.61 x 2.25 + Ventanería		UNI	20.00	$ 10.494.954,70	$ 209.897.094,00	20,00	$ 209.897.094,00	-	$ -		$ -	-	$ -	20,00	$ 209.897.094,00
12.03.09	PV-9 3.20 x 2.25 + Ventanería		UNI	1.00	$ 14.660.712,00	$ 14.660.712,00	1,00	$ 14.660.712,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 14.660.712,00

CONDICIONES GENERALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA						SALDO	
						MODIFICATORIO 1		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO			
ITEM	DESCRIPCION		UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
12.00	PUERTAS DE MADERA						-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
							-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
12.04.01	P-1 0.70 x 2.00		UN	20.00	$ 1.119.971,53	$ 42.378.630,60	20,00	$ 42.358.864,00	-	$ -		$ -	-	$ -	20,00	$ 42.358.864,00
12.04.02	P-3 0.90 x 2.00		UN	4.00	$ 2.279.784,00	$ 9.119.136,00	4,00	$ 9.119.136,00	-	$ -		$ -	-	$ -	4,00	$ 9.119.136,00
12.04.03	P-3 0.90 x 2.20		UN	20.00	$ 2.079.117,54	$ 41.579.170,80	19,00	$ 41.579.170,80	-	$ -		$ -	-	$ -	19,00	$ 41.579.170,80
12.04.04	P-4 0.80 x 2.20		UN	4.00	$ 4.113.466,91	$ 16.370.133,64	4,00	$ 16.370.364,00	-	$ -		$ -	-	$ -	4,00	$ 16.370.364,00
12.05	PUERTAS DE ACCESORIO						-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
							-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
12.05.01	P-2 1.20 x 2.00		UN	8,00	$ 3.473.143,72	$ 27.844.348,00	8,00	$ 27.844.348,00	-	$ -		$ -	-	$ -	8,00	$ 27.844.348,00
12.06	PUERTA TIPO PLEGABLE						-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
							-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
12.06.01	P-5 1.75 x 2.25		UN	8,00	$ 4.117.316,50	$ 33.293.531,00	8,00	$ 33.293.531,00	-	$ -		$ -	-	$ -	8,00	$ 33.293.531,00
12.07	VENTANAS DE VIDRIO						-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
							-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
12.07.01	V-1 2.00 x 2.00		UN	5,00	$ 3.278.857,20	$ 16.173.042,00	5,00	$ 16.113.082,00	-	$ -		$ -	-	$ -	5,00	$ 16.113.082,00
12.07.02	V-2 3.50 x 2.00		UN	6,00	$ 3.278.541,26	$ 27.000.000,00	6,00	$ 27.000.084,00	-	$ -		$ -	-	$ -	6,00	$ 27.000.084,00
12.07.03	V-3 2.00 x 2.00		UN	2,00	$ 3.278.760,00	$ 16.113.082,00	2,00	$ 16.113.082,00	-	$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 16.113.082,00
12.07.04	V-4 6.30 x 2.00		UN	1,00	$ 12.084.811,00	$ 12.084.811,00	1,00	$ 12.084.811,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 12.084.811,00
13.00	VITRINAS					0,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
13.01	FACHADAS						-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
13.01.01	Cortina ventilada HD, e:lamina hs 0.40		M2	270,00	$ 685.251,00	$ 297.317.700,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
13.01.02	Cristal de Relleno en estructura metálica e=3.00		M2	540,00	$ 790.393,26	$ 427.311.645,00	-	$ 0,00	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
13.10	BARANDAS						-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
	Suministro con tubo cuadrado 4" y perfiles metálicos varios detalle						-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
13.10.01	Baranda de escalera		ML	154,00	$ 315.364,47	$ 48.551.232,00	154,00	$ 48.551.232,00	-	$ -		$ -	-	$ -	154,00	$ 48.551.232,00
13.10.02	Baranda de rampa		ML	180,00	$ 342.674,64	$ 36.479.664,00	180,00	$ 58.018.664,00	-	$ -		$ -	-	$ -	180,00	$ 58.018.664,00
13.10.03	Baranda de mezzanine		ML	396,00	$ 315.614,00	$ 124.978.793,00	396,00	$ 124.918.531,00	-	$ -		$ -	-	$ -	396,00	$ 124.918.531,00
13.10.04	Baranda de rampa exterior - discapacitados		ML	45,00	$ 308.213,99	$ 13.871.523,00	45,00	$ 13.871.523,00	-	$ -		$ -	-	$ -	45,00	$ 13.871.523,00
13.11	OTROS ELEMENTOS						-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
13.11.01	Obrador movil y oficina, retirable		M2	714,00	$ 3.345.433,14	$ 212.919.191,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
	Incluye todas las medidas de seguridad y sus barreras						-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
14.	PINTURAS					$ 847.116.592,00	-	$ 347.143.082,00	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ 347.143.082,00
	Verificar Planillas						-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
14.02	Pintura volatica en Muro		M2	495,00	$ 47.399,38	$ 20.429.579,00	495,00	$ 20.429.579,00	-	$ -		$ -	-	$ -	495,00	$ 20.429.579,00
14.02	Pintura mezcla latex/caucho sobre muro/cielo, tipo 2		M2	8.730,00	$ 22.386,92	$ 192.149.736,00	8.730,00	$ 192.149.936,00	-	$ -		$ -	-	$ -	8.730,00	$ 192.149.936,00
14.03	Pintura mezcla en Bulbado, Tarrajeo, columnas, dinteles		M2	4.680,00	$ 30.800,00	$ 144.144.257,00	4.680,00	$ 144.144.257,00	-	$ -		$ -	-	$ -	4.680,00	$ 144.144.257,00
15.	OBRAS EXTERIORES					$ 6.867.998.106,00	-	$ 3.256.091.882,00	6,00	$ 255.983.433,00		$ 255.983.433,00	-	$ 255.983.433,00	-	$ 3.000.223.433,00
15.01	AREAS EXTERIORES						-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
15.01.01	Piso antideslizante - granitofino		M2	5.180,00		$ -	5.180,00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	5.180,00	$ -
	Incluye nivelación, relleno necesario y las obras complementarias					$ -	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
	INCLUYE Las actividades planificadas					$ -	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
15.01.01.1	Piso en alrededor perimetro		M2	5.180,00	$ 117.170,56	$ 670.790.811,00	5.180,00	$ 670.790.811,00	-	$ -		$ -	-	$ -	5.180,00	$ 670.790.811,00
15.01.01.2	Tratamiento antideslizante para de antideslizante		M2	620,00	$ 47.412,27	$ 30.485.209,00	620,00	$ 30.865.209,00	-	$ -		$ -	620,00	$ 30.865.209,00	-	$ -
15.01.01.3	Escaneritto manual		M3	930,00	$ 109.170,97	$ 101.748.992,00	930,00	$ 101.538.992,00	-	$ -		$ -	930,00	$ 101.538.992,00	-	$ -
15.01.01.4	Relleno en capa 0e - manual		M3	424,00	$ 11.511,29	$ 71.457.041,00	620,00	$ 71.457.041,00	-	$ -		$ -	620,00	$ 71.457.041,00	-	$ -

CONDICIONES GENERALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA						SALDO	
							MODIFICATORIA NO 1		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO			
ITEM	DESCRIPCION		UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
13.01.01.3	Refuerzo en cerrito - o mayores		M3	970.00	$ 84.577,23	$ 87.190.617,00	930,00	$ 82.190.617,00	930,00	$ 82.190.617,00		$ -	930,00	$ 82.190.617,00	-	$ -
13.01.02	Area de bombeo		M2	3.864,00	$ 52.515,35	$ 202.762.952,00	3.343,42	$ 175.729.982,00	-	$ -		$ -	-	$ -	3.343,42	$ 175.729.982,00
	Se considera grupo y subcontrolle de 5 bobinas cada 10 M2 de bombeo					$ -	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
13.01.03	Andes exteriores		M2	1.061,00		$ -	1.061,00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	1.061,00	$ -
	Incluye la plena de encuentro para su conformación, y refuerzo					$ -	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
	INCLUYE Los costos de equipos					$ -	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
13.01.01.1	Concreto para conformar muros		M3	200,00	$ 2.212.715,10	$ 192.436.879,00	980,00	$ 192.436.879,00	-	$ -		$ -	-	$ -	980,00	$ 192.436.879,00
13.02.04.1	Refuerzo para muros		KG	7.300,00	$ 7.411,19	$ 54.159.424,00	7.300,00	$ 54.159.424,00	-	$ -		$ -	-	$ -	7.300,00	$ 54.159.424,00
13.01.03.1	Fila de tablestacas instaurales - NO APLICA		M2	-	$ 134.897,00	$ -	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
13.01.01.4	Bandilla de concreto, rumido, bombeado y por M2 de muro		M2	2.953,00	$ 27.478,56	$ 80.978.307,00	1.061,00	$ 80.978.307,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1.061,00	$ 80.978.307,00
13.00	EQUIPAMIENTO EXTERIOR						-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
13.02.01	Bancas clase de bordillos		ML	230,00		$ -	230,00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	230,00	$ -
	Incluye la estructura de soporte de la banca y el clase del bordillo.					$ -	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
	INCLUYE Los actividades siguientes					$ -	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
13.01.01.5	Concreto para conformar zapata		M3	34,00	$ 2.661.013,41	$ 90.427.001,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
13.01.01.2	Concreto para muro de zampa		M3	34,00	$ 2.111.895,24	$ 71.804.840,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
13.02.01.3	Refuerzo del elemento		KG	2.970,00	$ 7.407,24	$ 21.912.131,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
13.01.01.4	Bomb mezclable mortero		ML	230,00	$ 264.572,15	$ 60.866.795,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
13.01.02	Bancs de concreto - Brasil		UN	-		$ -	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
13.02.02	Bancs de concreto 3 m		ML			$ -	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
13.02.03	Cimelle de bancs		M2	345,00		$ -	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
	Incluye su anclaje como y pint una baluestrina					$ -	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
	INCLUYE Los actividades siguientes					$ -	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
13.01.04.1	Concreto reforzado para de protección		M3	260,00	$ 29.452,27	$ 7.657.794,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
13.02.04.2	Refuerzo en varilla para construcción - o mayores		KG	180,00	$ 22.277,21	$ 24.149.316,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
13.02.04.3	Losa de concreto 10 cm		M2	345,00	$ 207.321,77	$ 58.721.360,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
13.02.04.4	Malla tipo de concreto		KG	2.160,00	$ 7.478,13	$ 16.149.094,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
13.02.04.5	Cimentacion tipo zapata de, bordel, concreto		M3	345,00	$ 41.361,89	$ 22.432.250,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
13.02.05	Rampas de concreto reforzado, lisas o rasilleo y pasamo		M2	979,00	$ 211.249,36	$ 62.077.007,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
13.03	MOBILIARIO DE MOBILIARIO						-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
13.03.01	Cimiento de bloc 11 y de tanto de concreto		ML	280,00		$ -	280,00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	280,00	$ -
	INCLUYE Los actividades siguientes					$ -	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
13.03.03.3	Excavación manual		M3	77,00	$ 101.173,71	$ 8.156.419,00	75,00	$ 8.156.419,00	-	$ -		$ -	-	$ -	75,00	$ 8.156.419,00
13.03.01.2	Concreto pobre, 3 cm, f'c=80 psi		M2	330,00	$ 36.162,85	$ 22.150.166,00	330,00	$ 7.330.988,00	-	$ -		$ -	-	$ -	330,00	$ 7.330.988,00
13.03.01.3	Concreto para base y muro del canal		M3	42,00	$ 1.210.210,68	$ 48.034.863,00	42,00	$ 48.034.863,00	-	$ -		$ -	-	$ -	42,00	$ 48.034.863,00
13.01.01.4	Refuerzo de base y muro del canal		KG	3.300,00	$ 7.469,24	$ 23.965.623,00	3.300,00	$ 23.965.623,00	-	$ -		$ -	-	$ -	3.300,00	$ 23.965.623,00
13.01.03.3	Relleno y tendido pedraplenados de concreto		M3	260,00	$ 126.993,34	$ 33.024.268,00	260,00	$ 33.024.268,00	-	$ -		$ -	-	$ -	260,00	$ 33.024.268,00
13.03.02	Pasos bomba dark WC para cuno de concreto en 0.00 m		ML		$ 3.113.127,00	$ -	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
	Se colloca sobre estructura existiles					$ -	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
13.01.02	Muro de contención de concreto ciclopeo - NO APLICA		M3			$ -	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
	Incluye su elaboración y su refuerzo					$ -	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
	INCLUYE Los actividades siguientes					$ -	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
13.03.03.1	Excavación manual		M3		$ 119.892,00	$ -	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
13.03.01.2	Concreto pobre, 3 cm, f'c=80 psi		M2		$ 30.260,00	$ -	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
13.03.03.3	Concreto para base y muro de contención		M3		$ 1.166.511,00	$ -	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -

CONDICIONES GENERALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA						SALDO	
						MODIFICATORIA NO 1		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO			
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
13.05.01.A	Relleno de base y sub	KG		$ 7.873,00	$ -	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
13.05.01.B	Relleno de mezcla + material	M3			$ -	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
13.05.04	Sello de asfalto entre placas Tipo II	ML	52,50	$ 212.463,23	$ 5.811.631,00	52,50	$ 5.811.631,00	-	$ -		$ -	-	$ -	52,50	$ 5.811.631,00
13.05.03	Sello de asfalto entre placas de pavimento	ML	42,00	$ 187.068,30	$ 5.782.868,00	42,00	$ 5.782.868,00	-	$ -		$ -	-	$ -	42,00	$ 5.782.868,00
13.06	TRAFICO VEHICULAR					-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
13.06.01	Pisa para peatones subterráneo	M2	640,00		$ -	640,00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	640,00	$ -
	Señales para tránsito, incluso en mezcla y en su todo				$ -	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
13.06.01.2	Demarcación vial de zona de estacionamiento	M2	70,00	$ 49.491,27	$ 3.464.298,00	70,00	$ 3.464.298,00	-	$ -		$ -	-	$ -	70,00	$ 3.464.298,00
13.06.01.3	Demarcación vial	M2	993,00	$ 209.178,92	$ 11.529.294,00	108,00	$ 11.529.294,00	-	$ -		$ -	-	$ -	108,00	$ 11.529.294,00
13.06.02.2	Relleno en mezcla - manual	M3	70,40	$ 117.479,27	$ 8.113.632,00	70,40	$ 8.113.632,00	-	$ -		$ -	-	$ -	70,40	$ 8.113.632,00
13.06.01.4	Señales en mezcla para construcción - s/ relleno	M2	1218,00	$ 66.377,21	$ 9.332.835,00	105,80	$ 9.332.835,00	-	$ -		$ -	-	$ -	105,80	$ 9.332.835,00
13.06.05.1	Piso de rubberoid textura y diseño bombeo	M2	640,00	$ 215.290,21	$ 99.000.737,00	640,00	$ 99.000.737,00	-	$ -		$ -	-	$ -	640,00	$ 99.000.737,00
13.06.02	Transferencia	UN	70,00	$ 90.178,56	$ 1.301.249,00	30,00	$ 1.301.249,00	-	$ -		$ -	-	$ -	30,00	$ 1.301.249,00
13.06.03	Desmontaje de pavimento	M2	13,00	$ 53.944,16	$ 788.113,00	13,00	$ 704.162,00	-	$ -		$ -	-	$ -	13,00	$ 704.162,00
13.05	TANQUE DE AGUA				$ -	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
13.05.01	Excavación manual en	M3	364,00	$ 49.697,27	$ 25.900.497,00	864,00	$ 28.903.497,00	-	$ -		$ -	-	$ -	864,00	$ 28.903.497,00
13.05.02	de base en mezcla - manual	M3	187,00	$ 115.539,29	$ 29.797.300,00	187,00	$ 19.247.300,00	-	$ -		$ -	-	$ -	187,00	$ 19.247.300,00
13.05.03	Concreto pobre de base de piso	M2	153,00	$ 58.365,65	$ 8.927.841,00	153,00	$ 8.927.841,00	-	$ -		$ -	-	$ -	153,00	$ 8.927.841,00
13.05.04	Concreto armado - 5,000 psi, impermeabilizante de muro	M3	84,00	$ 1.243.876,79	$ 104.492.615,00	84,00	$ 104.492.615,00	-	$ -		$ -	-	$ -	84,00	$ 104.492.615,00
13.05.05	Placa de rubberoid textura y diseño bombeo	M2	183,00	$ 215.291,06	$ 43.244.068,00	183,00	$ 43.244.068,00	-	$ -		$ -	-	$ -	183,00	$ 43.244.068,00
13.05.06	Columnas en concreto	M3	2,40	$ 1.273.940,49	$ 3.055.857,00	2,40	$ 3.055.857,00	-	$ -		$ -	-	$ -	2,40	$ 3.055.857,00
13.05.07	Muros en bloque de concreto	M2	44,00	$ 96.596,13	$ 4.217.317,00	44,00	$ 4.237.303,00	-	$ -		$ -	-	$ -	44,00	$ 4.237.303,00
13.05.08	Derribo en concreto	ML	29,00	$ 20.336,07	$ 589.746,00	29,00	$ 589.386,00	-	$ -		$ -	-	$ -	29,00	$ 589.386,00
13.05.09	Perforación y pedido para 1/2"	UN	12,00	$ 12.544,58	$ 150.773,00	12,00	$ 150.533,00	-	$ -		$ -	-	$ -	12,00	$ 150.533,00
13.05.10	Afinado y resanes en un cubierta bombeo y buenos	M2	187,00	$ 70.475,59	$ 13.179.490,00	187,00	$ 13.179.490,00	-	$ -		$ -	-	$ -	187,00	$ 13.179.490,00
13.05.11	Impermeabilizar cubierta bombeo y buenos	M2	187,00	$ 88.560,15	$ 16.557.548,00	187,00	$ 16.557.548,00	-	$ -		$ -	-	$ -	187,00	$ 16.557.548,00
13.07.17	Acero de refuerzo	KG	18.760,00	$ 7.449,16	$ 140.436.452,00	18.760,00	$ 140.436.452,00	-	$ -		$ -	-	$ -	18.760,00	$ 140.436.452,00
13.05.12	Malla electrosoldada	KG	140,00	$ 7.475,21	$ 1.045.932,00	140,00	$ 1.045.932,00	-	$ -		$ -	-	$ -	140,00	$ 1.045.932,00
13.05.14	Grafil de acero	KG	12,00	$ 7.051,36	$ 84.151,00	12,00	$ 84.151,00	-	$ -		$ -	-	$ -	12,00	$ 84.151,00
13.06	ACTIVIDADES FUERA DE DISEÑO - ESTIMADAS				$ -	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
	Cuadro de Actual	M2	6.500,00	$ 210.115,00	$ 1.913.724.200,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
	El precio de pico y lindero, excavaciones, rellenos de zanja, retiro sobre el para mezcla, plus especial de asfalto para mezcla, drenaje, humectación, demolición de la mezcla				$ -	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
	Cuadro de actual - sin APICA	M2		$ 410.000,00	$ -	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
	El precio de pico y relleno, excavaciones, rellenos de zanja, retiro sobre el para mezcla, plus especial de asfalto para mezcla, drenaje, humectación, demolición de la mezcla				$ -	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
13.00	CERRAMIENTO METÁLICO	ML	380,00			380,00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	380,00	$ -
	INCLUYE las actividades descritas				$ -	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
13.07.01	Pilotín de concreto Ø 0.30	ML	190,00	$ 119.662,84	$ 22.814.499,00	190,00	$ 22.814.499,00	-	$ -		$ -	-	$ -	190,00	$ 22.814.499,00
13.07.02	Excavaciones, rellenos, concreto pobre	ML	360,00	$ 39.938,72	$ 14.348.280,00	360,00	$ 14.348.280,00	-	$ -		$ -	-	$ -	360,00	$ 14.348.280,00
13.07.03	Dados de concreto acero tipo plataforma	M3	8,30	$ 1.227.199,16	$ 8.977.248,00	8,30	$ 8.977.248,00	-	$ -		$ -	-	$ -	8,30	$ 8.977.248,00
13.07.04	Cortinal de 0.25 h= 0.30, prefabricado a fundido	ML	320,00	$ 134.195,21	$ 49.342.508,00	320,00	$ 49.342.508,00	-	$ -		$ -	-	$ -	320,00	$ 49.342.508,00
13.07.05	Malla metálica de alambre, plástico	ML	380,00	$ 371.325,54	$ 140.953.155,00	380,00	$ 140.953.155,00	-	$ -		$ -	-	$ -	380,00	$ 140.953.155,00
15.	COSTO FINAL				$ 59.676.373,00	-	$ 59.676.373,00	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ 59.676.373,00
15.01	Acero Final - por área encontrada en	M2	7.730,00	$ 7.913,00	$ 39.676.373,00	7.730,00	$ 59.676.373,00	-	$ -		$ -	-	$ -	7.730,00	$ 59.676.373,00
						-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
17,00	TOTAL				$ 8.496.722.539,00	-	$ 1.498.732.130,00	-	$ 302.568.988,00		$ -	-	$ 302.568.988,00	-	$ 1.196.062.574,00

CONDICIONES GENERALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA						SALDO	
							MODIFICATORIA NO 1		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO			
ITEM	DESCRIPCION		UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
17.01	Bullnose		m1	1.00	$ 3.496.722.138,51	$ 3.496.722.138,00	1,00	$ 3.496.722.138,00	0,20	$ 302.849.568,00		$ -	0,20	$ 302.849.568,00	0,80	$ 3.193.872.570,00
							-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	
20.	BLOQUE A1 Y A2						-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
	BLOQUE A						-	$ -	-	$ -			-	$ -	-	$ -
20.01.01	RED DE SUMINISTRO DE AGUA FRIA POTABLE BLOQUE A					$ 24.157.511,00		$ 23.667.500,00	-	$ 10.833.781,00		$ 821.775,00	-	$ 11.491.617,00	-	$ 14.666.943,00
	Se toma en esta duplicidad la nueva de obra, lamentablemente y reconocimos que la mal de ese año, comprometiendo entre el diseño de diferentes que se encuentra en frente el eje A-A del bloque A (incluyendo el estacionamiento), y el cambio de dirección hacia el lado izquierdo del bloque A (Ver cuadro de comercial y la Red Interna del bloque A Tabla 2.2						-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
20.01.01.01	TUBERIA PVC-P	6"	ML	21.75	$ 71.213,78	$ 1.711.213,00	24,33	$ 1.515.817,00	-	$ -		$ -	-	$ -	21,33	$ 1.515.817,00
20.01.01.02	TUBERIA PVC-P	3"	ML	15,43	$ 46.334,71	$ 715.162,00	15,43	$ 715.162,00	-	$ -	15,43	$ 715.162,00	15,43	$ 715.162,00	-	$ -
20.01.01.03	TUBERIA PVC-P	2"	ML	17,75	$ 27.841,94	$ 494.212,00	17,75	$ 494.212,00	88,00	$ 278.429,00	3,75	$ 216.783,00	17,75	$ 494.212,00	-	$ -
20.01.01.04	TUBERIA PVC-P	2 1/2"	ML	3,25	$ 22.217,97	$ 72.208,00	3,25	$ 72.208,00	3,25	$ 72.208,00		$ -	3,25	$ 72.208,00	-	$ -
20.01.01.05	TUBERIA PVC-P	3 1/2"	ML	253,98	$ 19.156,64	$ 5.063.252,00	253,98	$ 5.063.252,00	373,88	$ 7.426.613,00	120,00	$ 2.343.081,00	253,98	$ 5.063.252,00	-	$ -
20.01.01.06	TUBERIA PVC-P	4"	ML	60,98	$ 33.336,62	$ 813.401,00	60,98	$ 813.401,00	80,98	$ 1.068.133,00	20,39	$ 268.732,00	60,98	$ 813.401,00	-	$ -
20.01.01.07	TUBERIA PVC-P	6"	ML	46,44	$ 7.937,14	$ 348.529,00	46,44	$ 348.529,00	66,44	$ 828.672,00	20,00	$ 158.143,00	46,44	$ 348.529,00	-	$ -
20.01.01.08	ACCESORIOS PVC-P	4"	UN	32,00	$ 67.653,94	$ 804.062,00	12,00	$ 804.062,00	-	$ -		$ -	-	$ -	12,00	$ 804.062,00
20.01.01.07	ACCESORIOS PVC-P	3"	UN	9,00	$ 37.119,98	$ 319.079,00	9,00	$ 319.079,00	-	$ -		$ -	-	$ -	9,00	$ 319.079,00
20.01.01.10	ACCESORIOS PVC-P	2"	UN	23,00	$ 11.376,21	$ 259.376,00	25,00	$ 259.376,00	-	$ -		$ -	-	$ -	25,00	$ 259.376,00
20.01.01.11	ACCESORIOS PVC-P	2 1/2"	UN	3,00	$ 7.153,13	$ 39.291,00	5,00	$ 39.291,00	-	$ -		$ -	-	$ -	5,00	$ 39.291,00
20.01.01.12	ACCESORIOS PVC-P	3 1/2"	UN	367,00	$ 9.901,84	$ 6.377.371,00	367,00	$ 6.377.371,00	18,00	$ 69.077,00		$ -	10,00	$ 69.077,00	357,00	$ 3.518.274,00
20.01.01.13	ACCESORIOS PVC-P	5/8"	UN	26,00	$ 3.990,70	$ 170.011,00	64,00	$ 170.011,00	15,00	$ 45.753,00		$ -	15,00	$ 45.753,00	41,00	$ 125.058,00
20.01.01.14	ACCESORIOS PVC-P	1/2"	UN	10,00	$ 2.790,04	$ 27.900,00	10,00	$ 27.900,00	10,00	$ 27.900,00		$ -	10,00	$ 27.900,00	-	$ -
20.01.01.15	ABRAZADERAS	2"	CN	5,00	$ 8.954,71	$ 43.174,00	5,00	$ 43.174,00	5,00	$ 43.174,00		$ -	5,00	$ 43.174,00	-	$ -
20.01.01.16	ABRAZADERAS	1 1/2"	CN	3,00	$ 9.160,00	$ 25.680,00	3,00	$ 25.680,00	3,00	$ 25.680,00		$ -	3,00	$ 25.680,00	-	$ -
20.01.01.17	ABRAZADERAS	1 1/4"	CN	92,00	$ 8.213,75	$ 756.445,00	92,00	$ 756.445,00	92,00	$ 756.445,00		$ -	92,00	$ 756.445,00	-	$ -
20.01.01.18	ABRAZADERAS	5/8"	UN	32,00	$ 7.146,45	$ 142.754,00	32,00	$ 142.754,00	32,00	$ 142.754,00		$ -	32,00	$ 142.754,00	-	$ -
20.01.01.19	ABRAZADERAS	3/4"	UN	37,00	$ 7.243,21	$ 268.405,00	37,00	$ 268.405,00	37,00	$ 268.405,00		$ -	37,00	$ 268.405,00	-	$ -
20.01.01.20	REGISTRO CORTINA	1 1/4"	UN	36,00	$ 252.509,79	$ 9.090.743,00	16,00	$ 4.025.745,00	-	$ -	8,00	$ 2.012.873,00	8,00	$ 2.012.873,00	8,00	$ 2.012.873,00
20.01.01.21	REGISTRO CORTINA	3/4"	UN	5,00	$ 137.277,31	$ 686.887,00	5,00	$ 686.887,00	-	$ -	2,00	$ 275.555,00	2,00	$ 275.555,00	3,00	$ 413.332,00
20.01.01.22	REGISTRO CORTINA	1/2"	UN	5,00	$ 110.665,42	$ 442.678,00	4,00	$ 442.678,00	-	$ -	2,00	$ 221.339,00	2,00	$ 221.339,00	2,00	$ 221.339,00
20.01.01.23	VALVULA ESFERICA DE BOLA	3/4"	UN	1,00	$ 195.889,00	$ 195.889,00	1,00	$ 195.889,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 195.889,00
20.01.01.24	EXCAVACIÓN		M3	28,16	$ 58.379,10	$ 1.629.088,00	28,16	$ 1.629.088,00	-	$ -		$ -	-	$ -	28,16	$ 1.629.088,00
20.01.01.25	RELLENO EN MATERIAL GRANULAR (BASE)		M3	8,27	$ 190.213,15	$ 521.897,00	8,27	$ 521.897,00	-	$ -		$ -	-	$ -	8,27	$ 521.897,00
20.01.01.26	RELLENO EN MATERIAL COMPACTADO		M3	22,89	$ 169.917,39	$ 4.166.176,00	22,89	$ 4.166.176,00	-	$ -		$ -	-	$ -	22,89	$ 4.166.176,00
20.01.02	PUESTOS HIDRANTES AGUA FRÍA					$ 6.921.421,00	-	$ 6.921.421,00	-	$ 4.729.278,00		$ 78.308,00	-	$ 4.808.584,00	-	$ 2.112.836,00
	Incluye el mobiliario, instalación, prueba de hidrante y por supuesto disponibilidad para realizar la conexión de agua a los aparatos sanitarios a puntos de abastecimiento. Comprende el tramo que abarca desde el punto de conexión al nivel de piso terminado						-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
20.01.02.01	PUESTO HIDRANTE PLAN	1 1/4"	UN	23,00	$ 135.854,72	$ 2.915.914,00	28,00	$ 2.863.914,00	14,00	$ 1.491.856,00		$ -	14,00	$ 1.491.856,00	14,00	$ 1.491.856,00
20.01.02.02	PUNTO LAVAMANOS	1/2"	UN	33,00	$ 70.305,33	$ 2.275.976,00	35,00	$ 2.373.880,00	17,00	$ 1.346.184,00	1,00	$ 78.308,00	18,00	$ 1.424.492,00	17,00	$ 1.345.194,00
20.01.02.03	PUNTO OBRAL	3/4"	UN	8,00	$ 91.171,85	$ 713.373,00	8,00	$ 743.374,00	4,00	$ 372.686,00		$ -	4,00	$ 372.686,00	4,00	$ 372.686,00
20.01.02.04	PUNTO RIEGO PÚBLICA	3/4"	UN	8,00	$ 86.219,44	$ 690.733,00	8,00	$ 690.533,00	-	$ -		$ -	8,00	$ 690.533,00	-	$ -
20.01.02.05	PUNTO TINA	1/2"	UN	1,00	$ 83.347,36	$ 83.341,00	1,00	$ 83.341,00	-	$ -		$ -	1,00	$ 83.341,00	-	$ -
20.01.02.06	PUNTO DUCHA DE EMERGENCIA	1 1/4"	UN	2,00	$ 86.116,64	$ 172.833,00	2,00	$ 172.833,00	-	$ -		$ -	2,00	$ 172.833,00	-	$ -
20.01.02.07	PUNTO LAVAJAPATOS	1/2"	UN	2,00	$ 78.905,33	$ 157.917,00	3,00	$ 237.917,00	2,00	$ 237.917,00		$ -	2,00	$ 237.917,00	-	$ -
20.01.02.08	PUNTO LAVACABEZAS	1/2"	UN	2,00	$ 78.305,33	$ 156.611,00	2,00	$ 156.611,00	2,00	$ 156.611,00		$ -	2,00	$ 156.611,00	-	$ -
20.01.02.09	PUNTO LAVACABINOVERA	1/2"	UN	2,00	$ 85.703,15	$ 171.406,00	2,00	$ 171.406,00	2,00	$ 171.406,00		$ -	2,00	$ 171.406,00	-	$ -
20.01.03	AMORTIGUADORES DE GOLPE DE ARIETE					$ 19.776.163,00	-	$ 20.179.585,00	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ 20.179.585,00
20.01.03.01	AMORTIGUADOR DE GOLPE DE ARIETE	1 1/4"	UN	16,00	$ 544.900,25	$ 8.718.406,00	16,00	$ 8.718.406,00	-	$ -		$ -	-	$ -	16,00	$ 8.718.406,00

CONDICIONES GENERALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA						SALDO	
							MODIFICATORIA NO 1		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO			
ITEM	DESCRIPCION		UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
20 01 09 02	AMORTIGUADOR DE GOLPE DE ARIETE	1/2"	UN	3.00	$ 307.843,24	$ 1.535.531,00	5,00	$ 1.539.241,00	-	$ -		$ -	-	$ -	5,00	$ 1.539.241,00
20 01 09 03	AMORTIGUADOR DE GOLPE DE ARIETE	1/2"	UN	2.00	$ 760.668,81	$ 521.338,00	2,00	$ 521.338,00	-	$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 521.338,00
20 01 04	RED DE DISTRIBUCIÓN CONTRAINCENDIOS HABILITADO Pliego 5.3					$ 115.454.899,00	-	$ 119.884.908,00	-	$ 72.930.134,00		$ 4.794.102,00	-	$ 76.724.234,00	-	$ 38.929.674,00
	Se tiene en este capítulo la mano de obra, herramientas y medios necesarios para la red de incendio desde la bomba ubicada a fondo los edificios en todo plan El detalle del item 4.3, forma de ejecución y los pruebas a realizar se ver. Se incluye:						-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
20 01 04 01	TUBERIA F°G°	5"	ML	81.00	$ 264.363,57	$ 21.411.049,00	41,00	$ 11.011.085,00	41,00	$ 11.011.085,00		$ -	41,00	$ 11.011.085,00	-	$ -
20 01 04 02	TUBERIA F°G°	4"	ML	60.00	$ 218.153,07	$ 13.089.184,00	60,00	$ 9.169.845,00	60,00	$ 9.169.845,00		$ -	60,00	$ 9.169.845,00	-	$ -
20 01 04 03	TUBERIA ACERO NEGRO RANURADA SCH 10	6"	ML	20.00	$ 201.333,97	$ 4.026.719,00	30,00	$ 4.023.719,00	-	$ -		$ -	-	$ -	30,00	$ 4.023.719,00
20 01 04 04	TUBERIA ACERO NEGRO RANURADA SCH 10	3"	ML	70.00	$ 149.776,50	$ 10.484.355,00	10,00	$ 1.497.765,00	-	$ -		$ -	-	$ -	10,00	$ 1.497.765,00
20 01 04 05	TUBERIA ACERO NEGRO ROSCADA SCH 40	2½"	ML	40.00	$ 86.454,94	$ 3.458.198,00	40,00	$ 3.442.198,00	-	$ -		$ -	-	$ -	40,00	$ 3.442.198,00
20 01 04 06	TUBERIA PVC	2½"	ML	33.00	$ 23.317,93	$ 777.627,00	33,00	$ 777.627,00		$ -		$ -	33,00	$ 777.627,00	-	$ -
20 01 04 07	ACCESORIOS F°G°	5"	UN	12.00	$ 210.953,46	$ 14.534.472,00	12,00	$ 14.534.472,00	11,00	$ 13.320.516,00		$ -	11,00	$ 13.320.516,00	1,00	$ 1.210.908,00
20 01 04 08	ACCESORIOS F°G°	4"	UN	13.00	$ 906.475,73	$ 9.143.178,00	13,00	$ 9.142.136,00	13,00	$ 9.142.136,00		$ -	13,00	$ 9.142.136,00	-	$ -
20 01 04 09	UNION DE TRANSICION ACERO A ROSC	6"	UN	4.00	$ 598.515,00	$ 4.794.100,00	4,00	$ 4.794.100,00	-	$ -	4,00	$ 4.794.100,00	4,00	$ 4.794.100,00	-	$ -
20 01 04 10	TUPI ESP. PARA TUBERIA DE 6"	6"	UN	10.00	$ 373.733,27	$ 3.737.433,00	10,00	$ 3.737.433,00	6,00	$ 3.472.460,00		$ -	6,00	$ 3.472.460,00	4,00	$ 2.314.973,00
20 01 04 11	TUPI ESP. PARA TUBERIA DE 4"	4"	UN	10.00	$ 418.136,09	$ 4.215.361,00	10,00	$ 4.381.534,00	10,00	$ 4.381.534,00		$ -	10,00	$ 4.381.534,00	-	$ -
20 01 04 12	ACCESORIOS ACERO RANURADOS	6"	UN	20.00	$ 127.467,34	$ 2.549.907,00	20,00	$ 2.548.903,00	-	$ -		$ -	-	$ -	20,00	$ 2.548.903,00
20 01 04 13	ACCESORIOS ACERO RANURADOS	5"	UN	10.00	$ 87.642,13	$ 876.426,00	10,00	$ 876.426,00	-	$ -		$ -	-	$ -	10,00	$ 876.426,00
20 01 04 14	ACCESORIOS ACERO ROSCADOS	2 1/2"	UN	60.00	$ 34.985,32	$ 3.367.615,00	40,00	$ 1.367.636,00	-	$ -		$ -	-	$ -	40,00	$ 1.367.636,00
20 01 04 15	ACCESORIOS PVC/P	2 1/2"	UN	20.00	$ 7.352,25	$ 157.045,00	20,00	$ 157.045,00		$ -		$ -	-	$ -	20,00	$ 157.045,00
20 01 04 16	COUPLING	6"	UN	60.00	$ 60.606,57	$ 3.624.382,00	60,00	$ 3.624.382,00		$ -		$ -	-	$ -	60,00	$ 3.624.382,00
20 01 04 17	COUPLING	5"	UN	17.00	$ 37.731,61	$ 629.654,00	12,00	$ 629.654,00		$ -		$ -	-	$ -	12,00	$ 629.654,00
20 01 04 18	SOPORTES INAMOVIBLES DE 3 VIAS		UN	4.00	$ 179.448,98	$ 717.794,00	4,00	$ 717.794,00		$ -		$ -	-	$ -	4,00	$ 717.794,00
20 01 04 19	SOPORTES INAMOVIBLE PUNTE DE 6 VIAS		UN	4.00	$ 206.982,81	$ 827.913,00	4,00	$ 825.912,00		$ -		$ -	-	$ -	4,00	$ 825.912,00
20 01 04 20	ABRAZADERAS U/PIE	6"	UN	36.00	$ 17.305,62	$ 376.998,00	16,00	$ 276.880,00		$ -		$ -	-	$ -	16,00	$ 276.880,00
20 01 04 21	ABRAZADERAS U/PIE	4"	UN	21.00	$ 13.063,63	$ 264.317,00	12,00	$ 158.317,00		$ -		$ -	-	$ -	12,00	$ 158.317,00
20 01 04 22	ABRAZADERAS U/PIE	5"	UN	3.00	$ 9.772,33	$ 29.317,00	3,00	$ 29.317,00		$ -		$ -	-	$ -	3,00	$ 29.317,00
20 01 04 23	ABRAZADERAS U/PIE	2½"	UN	12.00	$ 6.472,23	$ 77.667,00	12,00	$ 77.667,00		$ -		$ -	-	$ -	12,00	$ 77.667,00
20 01 04 24	VALVULA MARIPOSA	6"	UN	7.00	$ 516.624,57	$ 3.615.219,00	2,00	$ 1.312.248,00		$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 1.312.248,00
20 01 04 25	MANOMETRO 0-100 PSI		UN	3.00	$ 58.548,00	$ 175.776,00	3,00	$ 175.776,00		$ -		$ -	-	$ -	3,00	$ 175.776,00
20 01 04 26	VALVULA ESFERA BOYA DE AIRE	2"	UN	2.00	$ 730.536,25	$ 1.305.072,00	2,00	$ 1.305.072,00		$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 1.305.072,00
20 01 04 27	VALVULA DE BOLA U/PIE	5"	UN	7.00	$ 187.797,71	$ 313.564,00	2,00	$ 373.564,00		$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 373.564,00
20 01 04 28	GABINETE CLASE II CON ELEMENTOS DE EXTINCION	2 1/2"	UN	3.00	$ 2.525.315,33	$ 7.575.946,00	3,00	$ 7.575.946,00		$ -		$ -	-	$ -	3,00	$ 7.575.946,00
20 01 04 29	VIDRIO TEMPLADO PARA GABINETE CLASE II		UN	3.00	$ 249.964,33	$ 749.893,00	3,00	$ 749.841,00		$ -		$ -	-	$ -	0,00	$ 749.841,00
20 01 04 30	NEUTRALO DE FRAGMENTACION		UN	5.00	$ 23.187,81	$ 115.939,00	5,00	$ 115.874,00		$ -		$ -	-	$ -	5,00	$ 115.874,00
20 01 04 31	CIRCUITO PLANCHITAS DE IDENTIFICACION		UN	1.00	$ 9.268,84	$ 18.608,00	2,00	$ 18.608,00		$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 18.608,00
20 01 04 32	PINTURA PARA TUBERIAS		ML	70.00	$ 10.143,77	$ 709.924,00	70,00	$ 709.924,00		$ -		$ -	-	$ -	70,00	$ 709.924,00
20 01 04 33	EXCAVACION MATERIAL COMUN		M3	121.20	$ 68.379,43	$ 8.911.261,00	121,20	$ 8.433.033,00	121,20	$ 8.433.033,00		$ -	121,20	$ 8.433.033,00	-	$ -
20 01 04 34	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE EXCAVACION		M3	60.80	$ 43.396,16	$ 2.640.332,00	60,80	$ 2.640.332,00	60,80	$ 2.640.332,00		$ -	60,80	$ 2.640.332,00	-	$ -
20 01 04 35	RELLENO DE RETIRO		M3	20.20	$ 163.217,38	$ 3.678.713,00	20,20	$ 3.678.713,00	20,20	$ 3.678.713,00		$ -	20,20	$ 3.678.713,00	-	$ -
20 01 04 36	RELLENO DE ARENA		M3	60.40	$ 130.223,16	$ 7.863.018,00	60,40	$ 7.863.018,00	60,40	$ 7.863.018,00		$ -	60,40	$ 7.863.018,00	-	$ -
20 01 05	RED DE DISTRIBUCION CONTRA INCENDIO (EMBOCADURA)					$ 113.535.729,00	-	$ 313.536.729,00	-	$ 236.903,00		$ 62.631.134,00	-	$ 62.871.099,00	-	$ 150.864.626,00
	Se tiene en este capítulo la mano de obra, herramientas y materiales para la red de incendio desde la entrada de consumo cuadrante en dicho plan hasta los montadores de los pisos 1 a 7						-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
20 01 05 01	TUBERIA ACERO NEGRO RANURADA SCH 10	5"	ML	210.00	$ 149.776,50	$ 31.453.065,00	210,00	$ 31.453.065,00	-	$ -	65,00	$ 9.737.797,00	65,00	$ 9.737.797,00	150,00	$ 23.215.357,00
20 01 05 02	TUBERIA ACERO NEGRO RANURADA SCH 10	2 1/2"	ML	136.00	$ 113.478,73	$ 14.974.367,00	158,00	$ 15.014.267,00	80,00	$ 10.382.804,00	20,00	$ 2.809.804,00	66,00	$ 7.821.483,00	90,00	$ 7.368.103,00
20 01 05 03	TUBERIA ACERO NEGRO ROSCADA SCH 40	2"	ML	130.00	$ 105.230,06	$ 13.679.909,00	130,00	$ 13.679.909,00	60,00	$ 8.313.802,00	60,00	$ 8.313.802,00	30,00	$ 5.366.107,00		

CONDICIONES GENERALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA						SALDO	
							MODIFICATORIA NO 1		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO			
ITEM	DESCRIPCION		UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
20 01 03 04	TUBERIA ACERO NYLUB BOSCARA SCH 80	6 1/2"	ML	174.00	$ 86 014.94	$ 14 972 960.00	174,00	$ 14.972.960,00	-	$ -	80,00	$ 7.744.945,00	80,00	$ 7.744.945,00	94,00	$ 7.228 015,00
20 01 03 05	TUBERIA ACERO NYLUB BOSCARA SCH 80	5 1/2"	ML	81.00	$ 67 944,71	$ 5 481 146,00	81,00	$ 5.481.146,00	-	$ -	20,00	$ 1.353.374,00	20,00	$ 1.353.374,00	61,00	$ 4.127.791,00
20 01 03 06	TUBERIA ACERO NYLUB BOSCARA SCH 80	5"	ML	130.00	$ 52 263,19	$ 6 673 753,00	150,00	$ 6.879.765,00	-	$ -	30,00	$ 1.733 953,00	30,00	$ 1.733.953,00	120,00	$ 5.945 812,00
20 01 03 07	TUBERIA PVC	3/4	ML	10 00	$ 23 217,73	$ 232 179,00	90,00	$ 222.179,00	10,00	$ 222.179,00		$ -	10,00	$ 222.179,00	-	$ -
20 01 05 09	ACCESORIOS ACERO SAMUNDOS	5"	UN	13,00	$ 27 467,33	$ 2 804 362,00	32,00	$ 2.804.362,00	-	$ -	13,00	$ 1.314.836,00	13,00	$ 1.314.836,00	17,00	$ 1.489 523,00
20 01 05 09	ACCESORIOS ACERO SAMUNDOS	6 1/2"	UN	146 00	$ 72 900,16	$ 10 208 343,00	140,00	$ 10.208.343,00	-	$ -	34,00	$ 2.478.884,00	34,00	$ 2.478.884,00	106,00	$ 7.727.864,00
20 01 05 10	ACCESORIOS ACERO ROSCADOS	6"	UN	54 00	$ 43 416,96	$ 2 431 360,00	64,00	$ 2.431.360,00	-	$ -	25,00	$ 1.135.921,00	25,00	$ 1.135.921,00	29,00	$ 1.317 888,00
20 01 05 11	ACCESORIOS ACERO ROSCADOS	5 1/2"	UN	61 00	$ 34 615,23	$ 2 130 865,00	62,00	$ 2.150.865,00	-	$ -	30,00	$ 1.040.741,00	30,00	$ 1.040.741,00	32,00	$ 1.110.124,00
20 01 05 12	ACCESORIOS ACERO ROSCADOS	5 1/2"	UN	24 00	$ 27 968,84	$ 671 252,00	24,00	$ 671.252,00	-	$ -	8,00	$ 223.752,00	8,00	$ 223.752,00	16,00	$ 447 500,00
20 01 05 13	ACCESORIOS ACERO ROSCADOS	5"	UN	37,00	$ 20 272,67	$ 5 255 497,00	57,00	$ 1.155.497,00	-	$ -	10,00	$ 282.719,00	10,00	$ 282.719,00	47,00	$ 852.778,00
20 01 05 14	ACCESORIOS PVCP	3 1/2"	UN	15,00	$ 7 813,73	$ 117 764,00	15,00	$ 117.764,00	15,00	$ 117.764,00		$ -	15,00	$ 117.764,00	-	$ -
20 01 01 13	ABRAZADERAS UL/FM	5"	UN	50 00	$ 7 771,20	$ 386 356,00	60,00	$ 586.356,00	-	$ -	25,00	$ 273.824,00	25,00	$ 273.824,00	32,00	$ 312.713,00
20 01 01 15	ABRAZADERAS UL/FM	2"	UN	25 00	$ 9 121,71	$ 237 196,00	26,00	$ 237.196,00	-	$ -	26,00	$ 237.196,00	26,00	$ 237.196,00	-	$ -
20 01 01 17	ABRAZADERAS UL/FM	1"	UN	34 00	$ 6 838,09	$ 244 809,00	36,00	$ 284.404,00	-	$ -	36,00	$ 284.404,00	36,00	$ 284.404,00	-	$ -
20 01 01 23	ABRAZADERAS UL/FM	3 1/2"	UN	20 00	$ 9 497,23	$ 324 961,00	20,00	$ 324.961,00	-	$ -	20,00	$ 194.917,00	20,00	$ 194.917,00	20,00	$ 129 944,00
20 01 01 19	ABRAZADERAS UL/FM	3 1/2"	UN	24 00	$ 8 127,11	$ 144 952,00	24,00	$ 148.952,00	-	$ -	20,00	$ 122.465,00	20,00	$ 122.465,00	4,00	$ 26.487,00
20 01 01 20	ABRAZADERAS UL/FM	1"	UN	54,00	$ 5 776,11	$ 309 091,00	64,00	$ 369.091,00	-	$ -	20,00	$ 115.563,00	20,00	$ 115.563,00	44,00	$ 254.528,00
20 01 03 21	COUPLING	6"	UN	30,00	$ 37 737,57	$ 4 339 223,00	80,00	$ 4.339.223,00	-	$ -	28,00	$ 1.448.639,00	28,00	$ 1.448.639,00	52,00	$ 2.890.368,00
20 09 05 22	COUPLING	3 1/2"	UN	130,00	$ 40 581,89	$ 16 955 823,00	330,00	$ 18.933.675,00	-	$ -	45,00	$ 2.177.157,00	45,00	$ 2.177.157,00	305,00	$ 16.756.488,00
20 01 03 23	COUPLING	2"	UN	219,00	$ 19 214,85	$ 2 307 713,00	135,00	$ 5.307.513,00	-	$ -	30,00	$ 1.179.447,00	30,00	$ 1.179.447,00	105,00	$ 4.128 066,00
20 01 01 24	STRAP 6"x1"		UN	34 00	$ 11 013,97	$ 388 866,00	18,00	$ 1.508.868,00	-	$ -	14,00	$ 1.508.868,00	18,00	$ 1.508.868,00	-	$ -
20 01 01 25	STRAP 2"x"x1"		UN	84 00	$ 46 878,62	$ 2 945 037,00	84,00	$ 2.946.457,00	-	$ -	21,00	$ 987.472,00	21,00	$ 987.472,00	43,00	$ 1 958 985,00
20 01 01 26	STRAP 3"x1"		UN	32,00	$ 46 181,45	$ 2 247 276,00	52,00	$ 2.397.276,00	-	$ -	20,00	$ 922.029,00	20,00	$ 922.029,00	32,00	$ 1.475 247,00
20 01 01 27	STRAP 3 1/2"x1"		UN	80 00	$ 37 239,93	$ 2 983 276,00	80,00	$ 2.983.276,00	-	$ -	28,00	$ 1.044.147,00	28,00	$ 1.044.147,00	52,00	$ 1.939 129,00
20 01 01 28	STRAP 3 1/2"x1"		UN	4,00	$ 15 215,11	$ 140 901,00	4,00	$ 140.901,00	-	$ -		$ -	-	$ -	4,00	$ 140.901,00
20 01 03 29	SOPORTE DESMORRETIENTE DE 4 VIAS	5"	UN	2 00	$ 204 192,04	$ 408 384,00	2,00	$ 408.384,00	-	$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 408 384,00
20 01 03 28	SOPORTE DESMORRETIENTE DE 2 VIAS	5"	UN	8 00	$ 248 213,77	$ 1 117 461,00	8,00	$ 1.117.461,00	-	$ -		$ -	-	$ -	8,00	$ 1.117.461,00
20 01 03 31	SOPORTE DESMORRETIENTE DE 2 VIAS	20"	UN	4 00	$ 181 990,50	$ 727 961,00	4,00	$ 727.961,00	-	$ -		$ -	-	$ -	4,00	$ 727.961,00
20 01 05 32	JUNTA ANTIDINAMICA PRE LOOP	6"	UN	4 00	$ 4 717 529,69	$ 18 870 120,00	4,00	$ 18.870.120,00	-	$ -		$ -	-	$ -	4,00	$ 18 870 120,00
20 01 06 33	MANOMETRO DE GLICERINA 0-100 PSI		UN	2 00	$ 89 144,66	$ 178 773,00	2,00	$ 178.773,00	-	$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 178 773,00
20 01 05 34	REDUCIDOR EXCENTRICO RANGA STANDAR R 5.5 DR-RIGHT		UN	200 00	$ 72 417,05	$ 14 445 581,00	200,00	$ 14.445.581,00	-	$ -		$ -	-	$ -	200,00	$ 14 445 581,00
20 01 05 35	REDUCIDOR EXCENTRICO RANGA STANDAR R 5.5 DR-RIGHT		UN	61 00	$ 39 898,03	$ 2 431 810,00	61,00	$ 2.431.810,00	-	$ -		$ -	-	$ -	61,00	$ 2 431 810,00
20 01 05 31	MONTAJE ROCIADOR		UN	251,00	$ 33 736,99	$ 8 461 963,00	251,00	$ 8.291.963,00	-	$ -		$ -	-	$ -	251,00	$ 8 291 963,00
20 01 02 37	REGISTRO DE PRUEBA FORDINAR (PLATE CONTRAINCIA Y ROCIADOR PARA ROCIADOR R 5.5)	1 1/2"	UN	2,00	$ 588 217,21	$ 1 176 434,00	2,00	$ 1.176.434,00	-	$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 1.176.434,00
20 01 05 38	ESTACION DE CONTROL (Incluye valvula compuerta, alarma, manometro de flujo y accesorios)	6"	UN	2,00	$ 6 313 716,11	$ 12 291 476,00	2,00	$ 12.291.476,00	-	$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 12 291 476,00
20 01 05 39	SIGNITUE ESTACION DE CONTROL - incluido en numeral		GBL	2,00		$ -	2,00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ -
20 01 05 40	PINTURA PARA TUBERIAS		GBL	901,00	$ 19 145,77	$ 9 127 737,00	901,00	$ 9.127.737,00	-	$ -		$ -	-	$ -	901,00	$ 9 127 737,00
20 01 00	SALIDAS SANITARIAS					$ 13 313 309,00	-	$ 12.312.606,00	-	$ 6.314.969,00		$ 1.818.817,00	-	$ 7.836.877,00	-	$ 4.477 829,00
	Incluye el suministro, instalación, prueba de hidrante y accesorios requeridos para realizar la conexión de agua potable a los domicilios de los apartos existentes o puntos de diseños. Comprende el desmantelamiento desde la base de conexión del aparato hasta						-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
20 01 06 01	SANITARIO DE PUCH	6"	UN	24,00	$ 113 544,93	$ 2 170 198,00	29,00	$ 3.170.836,00	14,00	$ 1.363.429,00		$ -	14,00	$ 1.363.429,00	14,00	$ 1 363 429,00
20 01 06 02	LAVAMANOS	3"	UN	17,00	$ 97 170,23	$ 2 913 171,00	35,00	$ 3.863.372,00	17,00	$ 1.463.067,00	1,00	$ 87.233,00	18,00	$ 1.670.304,00	17,00	$ 1.463 067,00
20 01 06 06	DUCHA	2"	UN	8,00	$ 84 999,61	$ 679 977,00	8,00	$ 679.977,00	8,00	$ 679.987,00		$ -	8,00	$ 679.987,00	-	$ -
20 01 06 04	DUCHA DE EMERGENCIA	3"	UN	2,00	$ 84 999,81	$ 169 999,00	2,00	$ 169.999,00	2,00	$ 169.999,00		$ -	2,00	$ 169.999,00	-	$ -
20 01 06 07	DRAIN	3"	UN	5,00	$ 51 372,24	$ 715 386,00	6,00	$ 722.586,00	4,00	$ 368.293,00	4,00	$ 368.293,00	8,00	$ 722.586,00	-	$ -
20 01 06 05	LAVAPLATOS SENCILLO	2"	UN	5,00	$ 87 219,37	$ 436 196,00	5,00	$ 436.196,00	3,00	$ 261.718,00	2,00	$ 174.478,00	5,00	$ 436.196,00	-	$ -

CONDICIONES CONTRACTUALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA						SALDO	
							MODIFICATORIO N° 1		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO			
ITEM	DESCRIPCION		UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
29 01 06 09	LAVA CABEZAS	2"	UD	2,00	$ 93.355,50	$ 186.710,00	2,00	$ 186.710,00	2,00	$ 186.710,00		$ -	2,00	$ 186.710,00	-	$ -
29 01 06 09	TINA	2"	UD	1,00	$ 88.215,00	$ 88.215,00	1,00	$ 88.215,00	1,00	$ 88.215,00		$ -	1,00	$ 88.215,00	-	$ -
29 01 06 09	MESA DE PICO	4"	UD	9,00	$ 103.767,89	$ 933.907,00	9,00	$ 867.907,00	-	$ -	9,00	$ 867.907,00	9,00	$ 867.907,00	-	$ -
29 01 06 10	MESA DE PICO	3"	UD	30,00	$ 91.187,57	$ 2.671.260,00	13,00	$ 1.325.640,00		$ -		$ -	13,00	$ 1.325.640,00	13,00	$ 1.330.680,00
29 01 06 11	MESA DE PICO	2"	UD	2,00	$ 77.852,00	$ 155.704,00	1,00	$ 77.852,00		$ -		$ -	1,00	$ 77.852,00	1,00	$ 77.852,00
29 01 07	BANQUETE DE ARENA REGADA, VENTILACIONES Y REVENTILACIONES					$ 7.610.370,00	-	$ 7.610.370,00	-	$ 6.143.897,00		$ 89.734,00	-	$ 6.233.631,00	-	$ 2.473.937,00
	Se tiene en esta capítulo la mano de obra, herramientas y materiales para la construcción de los bancos ventanitos de ingreso de aguas negras, ventilaciones y empalme hasta hasta el cemento con el colector principal en _ pies).						-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
29 01 07 07	TUBERIA PVC 8	8"	MT	91,00	$ 73.305,41	$ 6.669.221,00	15,00	$ 1.100.331,00	15,00	$ 1.100.331,00		$ -	15,00	$ 1.100.331,00	-	$ -
29 01 07 08	TUBERIA PVC 6	6"	MT	67,00	$ 33.199,00	$ 2.225.266,00	67,00	$ 2.225.266,00	67,00	$ 2.225.266,00		$ -	67,00	$ 2.225.266,00	-	$ -
29 01 07 09	TUBERIA PVC 4	4"	MT	46,00	$ 20.104,95	$ 925.013,00	46,00	$ 925.013,00	46,00	$ 925.013,00		$ -	46,00	$ 925.013,00	-	$ -
29 01 07 04	ACCESORIOS PVC 6	6"	UD	14,00	$ 84.295,61	$ 1.179.935,00	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -	14,00	$ 1.179.935,00
29 01 07 05	ACCESORIOS PVC 8	8"	UD	76,00	$ 37.999,30	$ 1.959.757,00	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -	76,00	$ 1.883.287,00
29 01 07 06	ACCESORIOS PVC 3	3"	UD	30,00	$ 7.558,53	$ 226.755,00	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -	30,00	$ 226.755,00
29 01 07 07	JUNTA DE EXPANSION	4"	UD	1,00	$ 80.731,52	$ 80.734,00	-	$ -	1,00	$ 80.734,00		$ -	1,00	$ 80.734,00	-	$ -
29 01 07 08	ABRAZADERAS	6"	UD	9,00	$ 16.777,47	$ 150.972,00	9,00	$ 150.972,00		$ -		$ -	9,00	$ 150.972,00	-	$ -
29 01 07 09	ABRAZADERAS	5"	UD	13,00	$ 10.963,94	$ 141.224,00	13,00	$ 141.224,00		$ -		$ -	13,00	$ 141.224,00	-	$ -
29 01 07 10	ABRAZADERAS	3"	UD	47,00	$ 8.954,71	$ 424.831,00	47,00	$ 424.831,00		$ -		$ -	47,00	$ 424.831,00	-	$ -
29 01 07 11	PASE EN PLACA	8"	UD	9,00	$ 21.340,95	$ 192.069,00	9,00	$ 192.069,00		$ -		$ -	9,00	$ 192.069,00	-	$ -
29 01 08	REMATES DE CASAS DE 6MM, STATTLACIONES Y REVENTILACIONES					$ 54.408.367,00	-	$ 54.408.367,00	-	$ 16.209.943,00		$ -	-	$ 16.209.943,00	-	$ 38.197.832,00
	Se tiene en este capítulo la mano de obra, herramientas y materiales para la instalación de los bancos ventanitos, cuentas y derecho de los bajantes de aguas negras, ventilaciones y reventilaciones que en el plano hacen el empalme con los tubos a ventilar hasta						-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
29 01 09 01	TUBERIA PVC 6	6"	MT	87,00	$ 73.311,51	$ 3.721.479,00	87,00	$ 2.721.479,00	15,00	$ 1.103.301,00		$ -	15,00	$ 1.103.301,00	22,00	$ 618.178,00
29 01 09 02	TUBERIA PVC 4	4"	MT	66,00	$ 47.218,78	$ 3.479.216,00	66,00	$ 3.479.216,00	66,00	$ 3.479.216,00		$ -	66,00	$ 3.479.216,00	-	$ -
29 01 09 03	TUBERIA PVC 6	6"	MT	79,00	$ 51.327,79	$ 3.199.660,00	79,00	$ 3.199.660,00	79,00	$ 3.199.660,00		$ -	79,00	$ 3.199.660,00	-	$ -
29 01 09 04	TUBERIA PVC 8	8"	MT	77,00	$ 23.799,24	$ 1.836.716,00	79,00	$ 1.836.057,00		$ -		$ -	79,00	$ 1.836.057,00	-	$ -
29 01 09 05	TUBERIA PVC 4	3"	MT	83,00	$ 25.319,49	$ 2.135.549,00	83,00	$ 2.135.549,00		$ -		$ -	83,00	$ 2.135.549,00	-	$ -
29 01 09 06	TUBERIA PVC 3	2"	MT	126,00	$ 20.139,55	$ 2.533.732,00	126,00	$ 2.533.732,00		$ -		$ -	126,00	$ 2.533.732,00	-	$ -
29 01 09 07	ACCESORIOS PVC 6	6"	UD	64,00	$ 84.291,09	$ 5.393.967,00	64,00	$ 5.393.967,00	7,00	$ 588.967,00		$ -	7,00	$ 588.967,00	57,00	$ 4.804.000,00
29 01 09 08	ACCESORIOS PVC 4	4"	UD	177,00	$ 21.176,43	$ 3.749.397,00	122,00	$ 2.739.537,00	80,00	$ 1.606.843,00		$ -	80,00	$ 1.606.843,00	42,00	$ 1.732.694,00
29 01 09 09	ACCESORIOS PVC 6	3"	UD	221,00	$ 13.666,14	$ 3.020.200,00	223,00	$ 3.020.200,00	99,00	$ 353.347,00		$ -	99,00	$ 353.347,00	204,00	$ 2.677.513,00
29 01 09 10	ACCESORIOS PVC 4	2"	UD	232,00	$ 7.816,42	$ 2.845.151,00	232,00	$ 1.845.863,00	86,00	$ 676.150,00		$ -	86,00	$ 676.150,00	106,00	$ 1.320.823,00
29 01 04 13	ABRAZADERAS	6"	MT	21,00	$ 15.737,47	$ 331.362,00	21,00	$ 331.362,00		$ -		$ -	21,00	$ 331.362,00	-	$ -
29 01 04 12	ABRAZADERAS	4"	UD	46,00	$ 14.270,61	$ 660.361,00	46,00	$ 660.361,00		$ -		$ -	46,00	$ 660.361,00	-	$ -
29 01 04 11	ABRAZADERAS	3"	UD	44,00	$ 10.815,30	$ 477.866,00	44,00	$ 477.866,00		$ -		$ -	44,00	$ 477.866,00	-	$ -
29 01 04 10	ABRAZADERAS	2"	UD	143,00	$ 8.914,73	$ 1.291.964,00	143,00	$ 1.291.964,00		$ -		$ -	143,00	$ 1.291.964,00	-	$ -
29 01 08 13	PASE EN PLACA	6"	UD	37,00	$ 37.312,21	$ 1.382.221,00	37,00	$ 1.382.221,00	-	$ -		$ -	-	$ -	37,00	$ 1.382.221,00
29 01 08 14	PASE EN PLACA	5"	UD	30,00	$ 21.340,92	$ 640.224,00	30,00	$ 640.224,00	10,00	$ 213.408,00		$ -	10,00	$ 213.408,00	20,00	$ 426.816,00
29 01 08 17	PASE EN PLACA	2"	UD	60,00	$ 11.804,21	$ 666.297,00	60,00	$ 666.297,00	-	$ -		$ -	-	$ -	60,00	$ 666.297,00
29 01 04 15	REJILLAS EN ALUMINIO	8"	UD	12,00		$ -	12,00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	12,00	$ -
29 01 04 19	TRAMPA DE GRASAS 15 GPM PLASTICA		UD	6,00	$ 3.169.291,25	$ 19.129.812,00	6,00	$ 19.129.812,00	-	$ -		$ -	-	$ -	6,00	$ 18.123.812,00
29 01 08 20	PASE EN VIGA 1.10 CM	6"	UD	12,00	$ 37.257,93	$ 446.294,00	12,00	$ 446.294,00	-	$ -		$ -	-	$ -	12,00	$ 446.294,00
29 01 08 21	PASE EN VIGA 1.40 CM	6"	UD	2,00	$ 37.257,93	$ 74.715,00	2,00	$ 74.715,00	-	$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 74.715,00
29 01 08 22	PASE EN VIGA 1.10 CM	6"	UD	4,00	$ 28.226,48	$ 112.906,00	4,00	$ 112.906,00	-	$ -		$ -	-	$ -	4,00	$ 112.906,00
29 01 08 23	PASE EN VIGA 0.70 CM	3"	UD	6,00	$ 15.401,91	$ 92.342,00	4,00	$ 53.942,00	-	$ -		$ -	-	$ -	4,00	$ 53.942,00
29 01 08 24	PASE EN VIGA 0.70 CM	2"	UD	25,00	$ 13.451,81	$ 336.526,00	25,00	$ 350.526,00	-	$ -		$ -	-	$ -	25,00	$ 350.526,00
29 01 08 25	PASE EN VIGA 0.40 CM	2"	UD	7,00	$ 13.453,81	$ 94.173,00	2,00	$ 26.871,00	-	$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 26.871,00

CONDICIONES GENERALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA						SALDO	
							MODIFICATORIA NO 1		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO			
ITEM	DESCRIPCION		UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
20 01 00	RAMALES DE AGUAS SERVIDAS					$ 9.160.510,00		$ 9.160.510,00		$ 5.336.425,00		$		$ 5.336.425,00		$ 3.824.085,00
	Los ramales se usan en el caso de obras, mantenimiento y reparación para la instalación de las tuberías verticales de las bajadas de aguas lluvias desde la cubierta hasta el empate al colector principal en primer piso.							$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
20 01 00 01	TUBERIA PVC-S	6"	MT	64,00	$ 73.339,41	$ 4.707.418,00	64,00	$ 4.707.418,00	64,00	$ 4.707.418,00		$ -	64,00	$ 4.707.418,00	-	$ -
20 01 00 02	ACCESORIOS PVC-S	6"	UNI	43,00	$ 84.211,63	$ 3.624.085,00	43,00	$ 3.624.085,00	-	$ -		$ -	-	$ -	43,00	$ 3.624.085,00
20 01 00 01	JUNTA DE EXPANSION	6"	UNI	8,00	$ 50.730,11	$ 405.784,00	8,00	$ 405.784,00	8,00	$ 405.784,00		$ -	8,00	$ 405.784,00	-	$ -
20 01 00 00	ABRAZADERAS	6"	UNI	30,00	$ 14.174,41	$ 425.232,00	30,00	$ 425.232,00	30,00	$ 425.232,00		$ -	30,00	$ 425.232,00	-	$ -
20 01 10	RAMALES DE AGUAS SERVIDAS					$ 10.439.331,00		$ 10.439.331,00	-	$ 6.593.346,00		$ -	-	$ 6.593.346,00	-	$ 3.745.788,00
	Los ramales se usan en el caso de obras, mantenimiento y reparación para la instalación de las tuberías horizontales, sanitarios y duchas de las bajadas de aguas lluvias en cada piso. Estos al empate con las tuberías verticales.							$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
20 01 10 01	TUBERIA PVC-S	6"	MT	10,00	$ 73.312,01	$ 733.534,00	10,00	$ 733.534,00		$ -		$ -	10,00	$ 733.534,00	-	$ -
20 01 10 02	TUBERIA PVC-S	4"	MT	63,00	$ 43.798,99	$ 2.695.679,00	63,00	$ 2.695.679,00		$ -		$ -	63,00	$ 2.695.679,00	-	$ -
20 01 10 03	TUBERIA PVC-S	3"	MT	48,00	$ 33.257,38	$ 1.544.652,00	48,00	$ 1.544.652,00		$ -		$ -	48,00	$ 1.544.652,00	-	$ -
20 01 10 04	ACCESORIOS PVC-S	6"	UNI	10,00	$ 84.211,63	$ 842.811,00	10,00	$ 842.811,00		$ -		$ -	10,00	$ 842.811,00	-	$ -
20 01 10 05	ACCESORIOS PVC-S	4"	UNI	77,00	$ 21.132,15	$ 1.627.230,00	77,00	$ 1.627.230,00	-	$ -		$ -	-	$ -	77,00	$ 1.627.230,00
20 01 10 06	ACCESORIOS PVC-S	3"	UNI	69,00	$ 13.999,36	$ 831.621,00	69,00	$ 831.621,00	-	$ -		$ -	-	$ -	69,00	$ 831.621,00
20 01 10 07	ABRAZADERA	6"	UNI	10,00	$ 16.737,47	$ 167.375,00	10,00	$ 167.375,00	-	$ -		$ -	-	$ -	10,00	$ 167.375,00
20 01 10 08	ABRAZADERA	4"	UNI	41,00	$ 16.174,61	$ 663.159,00	41,00	$ 663.159,00		$ -		$ -	41,00	$ 663.159,00	-	$ -
20 01 10 09	ABRAZADERA	3"	UNI	27,00	$ 10.863,16	$ 293.311,00	27,00	$ 293.311,00		$ -		$ -	27,00	$ 293.311,00	-	$ -
20 01 10 10	REJILLA DE ALUMINIO	3"	UNI	20,00		$ -	20,00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	20,00	$ -
20 01 10 11	TRAGANTE CUPULA DE ALUMINIO	6"	UNI	9,00		$ -	9,00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	9,00	$ -
20 01 10 12	PASE EN VIGA 6"/10 CM	6"	UNI	14,00	$ 37.217,32	$ 521.002,00	14,00	$ 521.002,00	-	$ -		$ -	-	$ -	14,00	$ 521.002,00
20 01 10 13	PASE EN VIGA 4"/10 CM	4"	UNI	6,00	$ 16.298,64	$ 168.792,00	6,00	$ 168.792,00	-	$ -		$ -	-	$ -	6,00	$ 168.792,00
20 01 10 14	PASE EN VIGA 3"/10CM	3"	UNI	13,00	$ 11.340,71	$ 570.114,00	13,00	$ 570.114,00	-	$ -		$ -	-	$ -	13,00	$ 570.114,00
20 01 10 15	PASE EN VIGA 1"/10 CM	1"	UNI	5,00	$ 13.146,00	$ 106.795,00	5,00	$ 106.795,00		$ -		$ -	-	$ -	5,00	$ 106.795,00
20 01 11	CONEXIÓN APARATOS SANITARIOS Y MONTANTES					$ 8.870.961,00		$ 8.870.961,00		$ 8.823.987,00		$ -		$ 8.823.987,00	-	$ 46.974,00
	Se tienen en esta capítulo la unión de obra, herramientas y accesorios necesarios para la instalación, montaje y conexión de los aparatos, incluye el suministro de los mismos.							$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
20 01 11 01	MONTAJE SANITARIOS DE PUSH		UNI	21,00	$ 96.772,09	$ 2.032.213,00	21,00	$ 2.434.211,00		$ -		$ -	21,00	$ 2.434.211,00	-	$ -
20 01 11 02	MONTAJE DUCHA		UNI	6,00	$ 42.977,37	$ 343.795,00	8,00	$ 343.795,00		$ -		$ -	8,00	$ 343.795,00	-	$ -
20 01 11 03	MONTAJE DUCHA DE EMERGENCIA		UNI	2,00	$ 42.972,37	$ 85.945,00	2,00	$ 85.945,00		$ -		$ -	2,00	$ 85.945,00	-	$ -
20 01 21 00	CONEXIÓN LAVAMANOS		UNI	19,00	$ 76.376,42	$ 1.440.172,00	25,00	$ 2.080.175,00		$ -		$ -	25,00	$ 2.080.175,00	-	$ -
20 01 21 01	CONEXIÓN DUCHAS		UNI	8,00	$ 81.439,41	$ 675.217,00	8,00	$ 638.928,00		$ -		$ -	8,00	$ 638.928,00	-	$ -
20 01 21 04	CONEXIÓN LAVAPLATOS		UNI	5,00	$ 76.376,42	$ 342.882,00	6,00	$ 382.882,00		$ -		$ -	6,00	$ 382.882,00	-	$ -
20 01 21 07	CONEXIÓN LAVA CABEZAS		UNI	2,00	$ 76.376,42	$ 152.753,00	2,00	$ 153.153,00		$ -		$ -	2,00	$ 153.153,00	-	$ -
20 01 21 08	CONEXIÓN TINA		UNI	1,00	$ 84.186,84	$ 84.181,00	1,00	$ 84.181,00		$ -		$ -	1,00	$ 84.181,00	-	$ -
20 01 11 09	TAPONES PARA INSTALACIONES HIDRAULICAS, SANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS		UNI	0,00		$ -	8,00	$ -		$ -		$ -		$ -	8,00	$ -
						$ 736.305,00		$ 736.305,00		$ -		$ -		$ -	-	$ 736.305,00
						$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
20 01 13 01	CAIDA PVC S	6"	UNI	2,00	$ 14.207,33	$ 28.415,00	2,00	$ 28.415,00		$ -		$ -		$ -	2,00	$ 28.415,00
20 01 13 07	CAIDA PVC S	4"	UNI	42,00	$ 4.948,75	$ 207.890,00	42,00	$ 207.890,00		$ -		$ -		$ -	42,00	$ 207.890,00
20 01 19	PRUEBAS					$ -		$ 3.980.000,00							-	
							-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
20 01 19 01	PRUEBAS DE HERMETICIDAD		GLB	1,00		$ -	1,00	$ 3.980.000,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ -
20 01 24 01	ELABORACIÓN DE PLANOS RECORD					$ 8.251.328,00		$ 8.251.328,00	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ 8.251.328,00
							-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
20 01 24 01	PLANOS HIDROSANITARIOS E INSTALACIÓN ESPECIFICACIÓN		UNI	1,00	$ 8.251.328,00	$ 8.251.328,00	1,00	$ 8.251.328,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 8.251.328,00
20 01 25	ELABORACIÓN DE MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO					$ 201.295,00		$ 201.295,00	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ 201.295,00

CONDICIONES GENERALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA						SALDO	
							MODIFICATORIA NO 1		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO			
ITEM	DESCRIPCION		UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
							-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
20.07.11.01	MODULAR LEÓN EXPECTACION		UN	1.00	$ 209,244.12	$ 209,244.00	1.00	$ 209,245.00	-	$ -		$ -	-	$ -	1.00	$ 209,245.00
							-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
	VALOR TOTAL COSTO DIRECTO					$ 481,175,359.00	-	$ 484,365,532.00	-	$ 132,790,340.00		$ 59,622,886.00	-	$ 192,648,226.00	-	$ 293,434,368.00
							-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
	IVA				21%	$ 86,631,679.00	-	$ 87,126,076.00	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ 61,952,744.00
							-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
	IVA VINCENTE SOBRE LA UTILIDAD					$ 6,573,319.00	-	$ 6,800,429.00	-	$ 1,280,805.00		$ 568,413.00	-	$ 1,839,218.00	-	$ 2,741,950.00
							-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
	VALOR TOTAL					$ 572,956,647.00	-	$ 578,022,197.00	-	$ 133,877,118.00		$ 60,401,402.00	-	$ 194,278,512.00	-	$ 343,321,062.00
							-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
20.02	BLOQUE 2						-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
20.02.01	RED DE SUMINISTRO DE AGUA MÁS PORALE BLOQUE 2					$ 20,224,041.00	-	$ 10,224,041.00	-	$ 3,543,585.00		$ 3,234,160.00	-	$ 6,777,745.00	-	$ 4,447,296.00
	La toma se hará desde la red de cobo, incluyendo y suministro para la red de agua fría desde la válvula del cuarto de bombas, comprendiendo pozo, el cuarto de 4 mts de cuo se encuentra junto al de 3-4 del blanco a 3 de bebé el encuentro, hasta el cuarto						-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
20.02.01.01	TUBERIA PVC Ø	2"	ML	21.29	$ 40,244.76	$ 913,668.00	21.29	$ 865,468.00	-	$ -	21.29	$ 865,468.00	21.29	$ 865,468.00	-	$ -
20.02.01.02	TUBERIA PVC Ø	1 1/4"	ML	97.23	$ 37,758.91	$ 3,671,668.00	97.23	$ 3,671,668.00	41.87	$ 877,818.00	84.81	$ 3,104,350.00	97.23	$ 3,671,668.00	-	$ -
20.02.01.03	TUBERIA PVC Ø	1"	ML	3.00	$ 21,111.12	$ 63,444.00	3.00	$ 63,444.00	3.00	$ 63,444.00		$ -	3.00	$ 63,444.00	-	$ -
20.02.01.04	TUBERIA PVC Ø	3/4"	ML	3.00	$ 13,336.62	$ 40,010.00	3.00	$ 40,010.00	3.00	$ 40,010.00		$ -	3.00	$ 40,010.00	-	$ -
20.02.01.05	TUBERIA PVC Ø	1/2"	ML	65.00	$ 7,957.14	$ 517,214.00	65.00	$ 517,214.00	46.86	$ 372,671.00	18.14	$ 144,542.00	65.00	$ 517,214.00	-	$ -
20.02.01.06	ACCESORIOS PVC Ø	2"	UN	14.00	$ 35,452.98	$ 496,341.00	14.00	$ 496,339.00	-	$ -		$ -	-	$ -	14.00	$ 496,339.00
20.02.01.07	ACCESORIOS PVC Ø	1 1/4"	UN	81.00	$ 5,907.64	$ 478,522.00	81.00	$ 478,522.00	37.00	$ 299,307.00		$ -	37.00	$ 299,307.00	54.00	$ 319,015.00
20.02.01.08	ACCESORIOS PVC Ø	1"	UN	6.00	$ 3,915.00	$ 23,490.00	2.00	$ 7,830.00	-	$ -		$ -	2.00	$ 7,830.00	4.00	$ 15,660.00
20.02.01.09	ACCESORIOS PVC Ø	3/4"	UN	7.00	$ 3,030.70	$ 21,215.00	7.00	$ 21,351.00	-	$ -		$ -	-	$ -	7.00	$ 21,351.00
20.02.01.10	ACCESORIOS PVC Ø	1/2"	UN	94.00	$ 2,750.06	$ 345,942.00	84.00	$ 149,041.00	50.00	$ 44,161.00		$ -	50.00	$ 44,161.00	34.00	$ 104,882.00
20.02.01.11	ABRAZADERAS	1 1/4"	UN	33.00	$ 6,211.91	$ 455,417.00	65.00	$ 455,417.00	-	$ -		$ -	-	$ -	65.00	$ 455,417.00
20.02.01.12	ABRAZADERAS	1/2"	UN	47.00	$ 7,253.21	$ 342,217.00	47.00	$ 342,217.00	-	$ -		$ -	-	$ -	47.00	$ 342,217.00
20.02.09.13	REGISTRO CONTRA	1 1/4"	UN	6.00	$ 237,909.99	$ 1,509,659.00	6.00	$ 1,509,660.00	-	$ -		$ -	-	$ -	6.00	$ 1,509,660.00
20.02.09.14	REGISTRO CONTRA	3/4"	UN	1.00	$ 137,777.00	$ 137,777.00	1.00	$ 137,777.00	-	$ -		$ -	-	$ -	1.00	$ 137,777.00
20.02.01.15	REGISTRO CONTRA	1/2"	UN	6.00	$ 110,968.61	$ 664,917.00	6.00	$ 664,917.00	-	$ -		$ -	-	$ -	6.00	$ 664,917.00
20.02.01.16	REGISTRO BOLA	1"	UN	1.00	$ 91,748.00	$ 91,749.00	1.00	$ 91,748.00	-	$ -		$ -	-	$ -	1.00	$ 91,748.00
20.02.09.17	CHEQUE ROMO	3/4"	UN	1.00	$ 93,908.02	$ 91,909.00	1.00	$ 95,908.00	-	$ -		$ -	-	$ -	1.00	$ 95,908.00
20.02.09.18	VALVULA CHEQUEORA DE PIE	1/2"	UN	1.00	$ 101,660.96	$ 101,660.00	1.00	$ 105,660.00	-	$ -		$ -	-	$ -	1.00	$ 105,660.00
20.01.01.19	EXCAVACION		M3	6.18	$ 69,979.16	$ 367,427.00	6.10	$ 363,427.00	6.10	$ 363,894.00		$ -	6.10	$ 363,894.00	(0.01)	-$ 467.00
20.01.01.20	RELLENO DE MATERIAL BANQUILLO (SAUC)		M3	1.01	$ 190,213.33	$ 192,346.00	1.01	$ 192,344.00	1.01	$ 192,125.00		$ -	1.01	$ 192,125.00	0.00	$ 418.00
20.02.01.21	RELLENO (E MATERIAL COMPACTADO		M3	7.08	$ 182,713.00	$ 1,290,467.00	7.08	$ 1,290,467.00	7.08	$ 1,290,804.00		$ -	7.08	$ 1,290,804.00	(0.00)	-$ 337.00
									-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
20.02.02	PUNTOS HIDRÁULICOS RED PEÑA Incluye el suministro, instalación, prueba de la tubería y accesorios requeridos para realizar la conexión de agua a los aparatos sanitarios o puntos de abastecimiento. Comprende el tramo vertical a partir del codo mediante el cual se inicia el cambio de					$ 2,251,662.00	-	$ 2,056,662.00	-	$ 1,256,471.00		$ 608,192.00	-	$ 1,864,663.00	-	$ -
									-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
20.02.02.01	PUNTO SANITARIO PATIO	1 1/2"	UN	4.00	$ 105,764.43	$ 423,411.00	6.00	$ 638,411.00	1.00	$ 428,274.00	2.00	$ 210,137.00	6.00	$ 638,411.00	-	$ -
20.02.02.02	PUNTO LAVAMANOS	1/2"	UN	6.00	$ 79,369.33	$ 476,633.00	6.00	$ 476,633.00	4.00	$ 317,222.00	2.00	$ 158,611.00	6.00	$ 476,633.00	-	$ -
20.02.02.03	PUNTO DUCHA PÚBLICA	1/2"	UN	2.00	$ 86,216.64	$ 172,433.00	2.00	$ 172,833.00	2.00	$ 172,833.00		$ -	2.00	$ 172,833.00	-	$ -
20.02.02.04	PUNTO LAVAPLATOS	1/2"	UN	4.00	$ 79,303.53	$ 317,277.00	4.00	$ 317,222.00	3.00	$ 253,917.00	1.00	$ 79,305.00	4.00	$ 317,222.00	-	$ -
20.02.02.05	PUNTO CALENTADOR TIPO TERMOCO	1/2"	UN	1.00	$ 102,424.73	$ 102,424.00	1.00	$ 102,425.00	-	$ -		$ -	1.00	$ 102,425.00	-	$ -
20.02.02.06	PUNTO POZETA	1/2"	UN	2.00	$ 63,707.23	$ 127,388.00	2.00	$ 257,109.00	-	$ -	2.00	$ 257,109.00	2.00	$ 257,109.00	-	$ -
20.02.02.07	PUNTO MANGUERA	3/4"	UN	1.00	$ 92,829.77	$ 92,829.00	1.00	$ 92,829.00	-	$ -	1.00	$ 92,829.00	1.00	$ 92,829.00	-	$ -

CONDICIONES GENERALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA						SALDO	
							MODIFICATORIA NO 1		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO			
ITEM	DESCRIPCION		UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
07.07.01	ABASTECIMIENTOS DE GOLPE DE ARIETE					$ 6.834.815,00		$ 6.834.815,00		$ -		$ -		$ -	-	$ 6.834.815,00
07.07.01.01	ABASTECIMIENTOS DE GOLPE DE ARIETE	3 1/2"	UN	6,00	$ 384.900,25	$ 2.309.401,50	6,00	$ 2.259.402,00		$ -		$ -		$ -	6,00	$ 2.309.402,00
07.07.01.02	ABASTECIMIENTOS DE GOLPE DE ARIETE	2"	UN	6,00	$ 360.868,83	$ 2.165.213,00	6,00	$ 1.065.213,00		$ -		$ -		$ -	6,00	$ 1.065.213,00
										$ -		$ -		$ -	-	$ -
07.08.00	RED DE SUMINISTRO DE AGUA CALIENTE (EXCEPTUADOS BLOCKS 6					$ 713.997,00		$ 713.997,00		$ -		$ -		$ -	-	$ 713.997,00
	La toma de agua se realizará la cual de obra, haciendose a costa de las que la red de agua caliente desde la salida del calentador hasta los puntos de suministro de cada vivienda.							$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
07.08.04.01	TUBERIA C-PVC	1/2"	MTS	18,81	$ 17.561,23	$ 331.864,00	18,81	$ 333.888,00		$ -		$ -		$ -	18,81	$ 333.888,00
07.08.04.02	TUBERIA C-PVC	3/4"	MTS	7,33	$ 24.304,61	$ 108.348,00	7,33	$ 108.348,00		$ -		$ -		$ -	7,33	$ 108.348,00
07.08.04.03	ABASTEDEROS	3/4"	UNI	20,00	$ 7.586,03	$ 151.721,00	20,00	$ 151.721,00		$ -		$ -		$ -	20,00	$ 151.721,00
07.08.04.04	ABASTEDEROS	1/2"	UNI	7,00	$ 7.215,21	$ 50.366,00	7,00	$ 50.366,00		$ -		$ -		$ -	7,00	$ 50.366,00
07.08.04.05	ACCESORIOS C-PVC	3/4"	UNI	14,00	$ 7.319,53	$ 102.483,00	14,00	$ 102.483,00		$ -		$ -		$ -	14,00	$ 102.483,00
07.08.04.06	ACCESORIOS C-PVC	3/2"	UNI	3,00	$ 3.487,86	$ 10.269,00	3,00	$ 10.308,00		$ -		$ -		$ -	3,00	$ 10.308,00
								$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
07.08.05	PUNTOS TERMINALES AGUA CALIENTE					$ 828.945,00		$ 828.945,00		$ -		$ -		$ -	-	$ 828.945,00
	Incluye el suministro, toda tubo, grupo de la fuente y cumplir requisitos para agregar la conexión de agua y los aparatos sanitarios o puntos de abastecimiento. Comprende el tramo vertical y parte del codo conforme al nivel de piso del cuarto de							$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
07.08.05.01	PUNTO POETTA AC	1/2"	UNI	4,00	$ 100.734,75	$ 402.939,00	4,00	$ 402.939,00		$ -		$ -		$ -	4,00	$ 402.939,00
07.08.05.02	PUNTO CALENTADOR INFOTERM 6000	1/2"	UNI	1,00	$ 123.306,50	$ 123.306,50	1,00	$ 123.306,00		$ -		$ -		$ -	1,00	$ 123.306,00
								$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
07.08.06	RED DE DISTRIBUCIÓN CONTRAINCENDIOS BANNERS PISO 5 2					$ 258.507.267,00		$ 170.082.912,00		$ 83.358.313,00		$ 2.243.737,00		$ 91.680.951,00	-	$ 78.091.962,00
	Se toma en cuenta explicado la mano de obra, herramientas y accesorios para la red de hidrante desde la llegada al tanque 3 hasta los pisos y los gabinetes en cada piso (2 cabezal de bloque 4, tramo de hidrante y los valvulas angulares de c/u). Se incluye							$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
07.08.06.01	TUBERIA C-900	8"	MTS	30,00	$ 263.961,27	$ 8.956.877,00	30,00	$ 8.058.877,00	30,00	$ 8.058.877,00		$ -	30,00	$ 8.058.877,00	-	$ -
07.08.06.02	TUBERIA C-900	4"	MTS	98,00	$ 313.351,07	$ 34.791.483,00	98,00	$ 14.703.483,00		$ -		$ -	98,00	$ 14.703.483,00	-	$ -
07.07.06.03	TUBERIA ACERO NEGRO RANURADA SCH 30	6"	MTS	30,00	$ 291.155,95	$ 8.954.877,00	30,00	$ 8.034.877,00		$ -		$ -		$ -	30,00	$ 8.034.877,00
07.07.06.04	TUBERIA ACERO NEGRO RANURADA SCH 10	3"	MTS	10,00	$ 249.776,50	$ 2.497.765,00	10,00	$ 1.497.765,00		$ -		$ -		$ -	10,00	$ 1.497.765,00
07.07.06.05	TUBERIA ACERO NEGRO RANURADO SCH 10	2½"	MTS	10,00	$ 115.476,71	$ 2.236.767,00	10,00	$ 1.154.767,00		$ -		$ -		$ -	10,00	$ 1.154.767,00
07.07.06.06	TUBERIA ACERO NEGRO ROSCADA SCH 40	1½"	MTS	40,00	$ 84.654,94	$ 3.442.198,00	40,00	$ 3.442.198,00		$ -		$ -		$ -	40,00	$ 3.442.198,00
07.08.06.07	TUBERIA PVC	1½	MTS	40,00	$ 22.217,81	$ 888.712,00	40,00	$ 888.712,00	35,00	$ 777.527,00		$ -	35,00	$ 777.527,00	5,00	$ 111.080,00
07.07.06.08	ACCESORIOS C-900	6"	UNI	10,00	$ 1.219.953,00	$ 12.308.568,00	10,00	$ 12.109.560,00	8,00	$ 8.054.760,00		$ -	8,00	$ 8.054.760,00	5,00	$ 6.054.760,00
07.07.06.09	ACCESORIOS C-900	4"	UNI	33,00	$ 699.447,73	$ 23.389.068,00	18,00	$ 11.880.068,00	16,00	$ 10.979.592,00		$ -	16,00	$ 10.979.592,00	1,00	$ 908.476,00
07.07.06.10	INT DE TRANSICION ACERO A CPVC	4"	UN	3,00	$ 1.194.213,00	$ 3.582.639,00	5,00	$ 5.982.825,00	0,00	$ 5.982.825,00		$ -	5,00	$ 5.982.825,00	-	$ -
07.07.06.11	TUFI ESP PARA TUBERIA DE 6"	6"	UNI	26,00	$ 270.243,27	$ 11.374.665,00	40,00	$ 23.149.730,00	13,00	$ 7.523.993,00		$ -	13,00	$ 7.523.993,00	27,00	$ 13.925.954,00
07.07.06.12	TUFI ESP PARA TUBERIA DE 6"	4"	UNI	20,00	$ 410.353,05	$ 8.703.062,00	20,00	$ 8.703.062,00	16,00	$ 7.910.448,00	4,00	$ 1.722.612,00	20,00	$ 8.703.062,00	-	$ -
07.07.06.13	ACCESORIOS ACERO RANURADO	6"	UNI	20,00	$ 117.495,45	$ 2.349.909,00	20,00	$ 2.349.909,00		$ -		$ -		$ -	20,00	$ 2.349.909,00
07.07.06.14	ACCESORIOS ACERO RANURADOS	3"	UNI	10,00	$ 87.642,55	$ 876.425,00	10,00	$ 876.436,00		$ -		$ -		$ -	10,00	$ 876.436,00
07.07.06.15	ACCESORIOS ACERO RANURADOS	2½"	UNI	8,00	$ 72.902,46	$ 583.220,00	8,00	$ 583.220,00		$ -		$ -		$ -	8,00	$ 583.220,00
07.07.06.16	ACCESORIOS ACERO ROSCADOS	1.1/2"	UNI	40,00	$ 34.991,27	$ 1.367.650,00	40,00	$ 1.367.656,00						$ -	40,00	$ 1.367.656,00
07.07.06.17	ACCESORIOS PVCP	1.1/2"	UNI	30,00	$ 7.512,23	$ 225.366,00	30,00	$ 225.366,00		$ -		$ -		$ -	30,00	$ 225.366,00
07.07.06.18	VALVULA DE SECCIONALIZACION CON POSTE INDICADOR	6"	UNI	2,00	$ 4.720.763,00	$ 10.441.526,00	2,00	$ 10.841.526,00		$ -		$ -		$ -	2,00	$ 10.841.526,00
07.07.06.19	COUPLING	6"	UNI	80,00	$ 88.905,27	$ 3.824.152,00	80,00	$ 3.674.362,00		$ -		$ -		$ -	80,00	$ 3.674.362,00
07.07.06.20	COUPLING	3"	UNI	12,00	$ 29.737,61	$ 370.854,00	12,00	$ 370.854,00		$ -		$ -		$ -	12,00	$ 370.854,00
07.07.06.21	COUPLING	2½"	UNI	20,00	$ 65.141,71	$ 967.619,00	20,00	$ 967.639,00		$ -		$ -		$ -	20,00	$ 967.639,00
07.07.06.22	SOPORTES MENSURALES TIPO I (1 VIA)		UNI	4,00	$ 179.446,08	$ 717.784,00	4,00	$ 717.784,00		$ -		$ -		$ -	4,00	$ 717.784,00
07.07.06.23	SOPORTES MENSURALES TIPO I (1 VIA)		UNI	4,00	$ 206.487,29	$ 825.412,00	4,00	$ 825.812,00		$ -		$ -		$ -	4,00	$ 825.812,00
07.07.06.24	ABRAZADERAS UL/FM	6"	UNI	26,00	$ 10.016,43	$ 260.423,00	18,00	$ 208.428,00		$ -		$ -		$ -	18,00	$ 208.428,00
07.07.06.25	ABRAZADERAS UL/FM	3/4"	UNI	12,00	$ 6.197,21	$ 77.967,00	12,00	$ 77.967,00		$ -		$ -		$ -	12,00	$ 77.967,00

CONDICIONES GENERALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA						SALDO	
							MODIFICATORIO # 1		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO			
ITEM	DESCRIPCION		UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
20.07.06.20	VALVULA MARIPOSA	6"	UN	2,00	$ 856.624,50	$ 1.713.249,00	2,00	$ 1.713.249,00	-	$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 1.713.249,00
20.07.06.27	VALVULA EXPULSORA DE AIRE	6"	UN	2,00	$ 752.536,25	$ 1.505.072,50	2,00	$ 1.505.072,50	-	$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 1.505.072,50
20.07.06.28	VALVULA DE BOLA UNIVE	6"	UN	2,00	$ 137.792,25	$ 275.584,50	2,00	$ 275.584,50	-	$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 275.584,50
20.07.06.29	VALVULA DE PURGA	3 1/2"	UN	2,00	$ 588.267,25	$ 1.176.534,50	2,00	$ 1.176.534,50	-	$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 1.176.534,50
20.07.08.30	GABINETE CLASE II CON RESTRICTORA DE PRESION	3 1/2"	UN	3,00	$ 1.575.119,33	$ 4.725.418,00	3,00	$ 4.725.418,00	-	$ -		$ -	-	$ -	3,00	$ 4.725.418,00
20.07.08.31	GABINETE CLASE III SALIDA DE 2 1/2"	3 1/2"	UN	2,00	$ 1.808.415,50	$ 3.616.831,00	2,00	$ 3.616.831,00	-	$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 3.616.831,00
20.07.06.32	MORO TEMPLADO PARA GABINETE CLASE II		UN	6,00	$ 67.984,12	$ 407.904,00	6,00	$ 407.904,00	-	$ -		$ -	-	$ -	6,00	$ 407.904,00
20.07.06.33	MORO TEMPLADO PARA GABINETE CLASE III		UN	2,00	$ 172.113,63	$ 344.226,00	2,00	$ 344.226,00	-	$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 344.226,00
20.07.06.34	MANTILLO DE PROTECCION		UN	5,00	$ 23.162,63	$ 115.814,00	5,00	$ 115.814,00	-	$ -		$ -	-	$ -	5,00	$ 115.814,00
20.07.06.35	STIKER Y PLAQUETAS DE IDENTIFICACION		UN	2,00	$ 9.253,00	$ 18.506,00	2,00	$ 18.506,00	-	$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 18.506,00
20.02.06.36	PINTURA PARA TUBERIAS		MT	80,80	$ 10.193,77	$ 811.543,00	80,00	$ 811.543,00	-	$ -		$ -	-	$ -	80,00	$ 811.543,00
20.03.06.37	EXCAVACION MATERIAL COMUN		M3	951,20	$ 89.329,48	$ 10.520.418,00	151,20	$ 10.520.418,00	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
20.07.06.38	RELLENO DE MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACION		M3	75,60	$ 48.870,15	$ 3.543.384,00	75,60	$ 3.543.384,00	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
20.02.06.39	RELLENO DE RECIBO		M3	25,20	$ 182.017,39	$ 4.586.841,00	25,20	$ 4.586.841,00	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
20.07.06.40	RELLENO EN ARENA		M3	80,40	$ 116.215,11	$ 9.567.246,00	80,40	$ 9.567.246,00	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
							-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
20.07.07	SUB DE DISTRIBUCION CONTRA INCENDIOS (INCLUIDOS)					$ 181.679.343,00		$ 181.679.343,00	-	$ -		$ 48.083.178,00	-	$ 48.083.178,00	-	$ 133.596.009,00
	La tarea en esta capitulo la prueba de obra, funcionamiento y materiales para la red de incendios desde la acometida general incluyendo en esta pila todos los mecanismos de los ítem 1.1.2								-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
20.07.07.01	TUBERIA ACERO NEGRO RANURADA SCH 10	6"	MT	90,00	$ 149.736,50	$ 13.476.885,00	90,00	$ 13.476.885,00	-	$ -	50,00	$ 7.488.825,00	50,00	$ 7.488.825,00	40,00	$ 5.988.060,00
20.02.07.01	TUBERIA ACERO NEGRO RANURADA SCH 10	2 1/2"	MT	168,00	$ 115.476,72	$ 19.400.088,00	168,00	$ 19.400.088,00	-	$ -	81,00	$ 10.508.381,00	81,00	$ 10.508.381,00	77,00	$ 8.891.707,00
20.02.07.09	TUBERIA ACERO NEGRO ROSCADA SCH 40	2"	MT	32,00	$ 103.350,94	$ 3.307.393,00	32,00	$ 3.307.393,00	-	$ -	23,00	$ 2.420.291,00	23,00	$ 2.420.291,00	9,00	$ 887.070,00
20.02.07.08	TUBERIA ACERO NEGRO ROSCADA SCH 40	2 1/2"	MT	122,00	$ 15.662.000,00	$ 15.662.000,00	122,00	$ 15.662.000,00	-	$ -	80,00	$ 8.163.297,00	80,00	$ 8.163.297,00	122,00	$ 10.498.703,00
20.02.07.05	TUBERIA ACERO NEGRO ROSCADA SCH 40	1 1/2"	MT	171,00	$ 57.864,71	$ 9.892.945,00	121,00	$ 9.891.585,00	-	$ -	64,00	$ 3.854.110,00	64,00	$ 3.854.110,00	74,00	$ 6.037.435,00
20.02.07.06	TUBERIA ACERO NEGRO ROSCADA SCH 40	1"	MT	68,00	$ 57.864,70	$ 3.967.119,00	68,00	$ 3.967.119,00	-	$ -	48,00	$ 2.314.804,00	48,00	$ 2.314.804,00	68,00	$ 3.777.525,00
20.02.07.07	TUBERIA PVCP	3/4	MT	10,00	$ 22.317,91	$ 223.179,00	10,00	$ 222.978,00	-	$ -		$ -	-	$ -	10,00	$ 223.179,00
20.07.07.04	ACCESORIOS ACERO RANURADOS	6"	UN	26,00	$ 87.642,53	$ 2.276.706,00	26,00	$ 2.276.706,00	-	$ -	10,00	$ 876.426,00	10,00	$ 876.426,00	16,00	$ 1.402.280,00
20.07.07.09	ACCESORIOS ACERO RANURADOS	2 1/2"	UN	64,00	$ 72.360,49	$ 4.631.344,00	64,00	$ 4.657.364,00	-	$ -	38,00	$ 2.624.469,00	38,00	$ 2.624.469,00	26,00	$ 2.032.875,00
20.02.07.10	ACCESORIOS ACERO RANURADOS	2"	UN	22,00	$ 52.909,14	$ 1.164.825,00	22,00	$ 1.164.825,00	-	$ -	15,00	$ 797.317,00	15,00	$ 797.317,00	7,00	$ 367.508,00
20.07.07.13	ACCESORIOS ACERO ROSCADOS	2 1/2"	UN	72,00	$ 34.671,37	$ 2.497.378,00	72,00	$ 2.497.378,00	-	$ -	15,00	$ 620.370,00	15,00	$ 620.370,00	57,00	$ 1.877.408,00
20.07.07.12	ACCESORIOS ACERO ROSCADOS	2 1/2"	UN	42,00	$ 27.964,96	$ 1.174.688,00	42,00	$ 1.174.688,00	-	$ -	18,00	$ 447.503,00	18,00	$ 447.503,00	24,00	$ 727.185,00
20.07.07.11	ACCESORIOS ACERO ROSCADOS	2"	UN	64,00	$ 20.171,47	$ 1.378.487,00	64,00	$ 1.378.487,00	-	$ -	32,00	$ 848.700,00	32,00	$ 848.700,00	32,00	$ 729.787,00
20.07.07.10	ACCESORIOS PVCP	3/4	UN	13,00	$ 7.912,23	$ 113.744,00	13,00	$ 117.784,00	-	$ -		$ -	-	$ -	13,00	$ 117.784,00
20.02.07.23	ABRAZADERAS MUFAS	3"	UN	23,00	$ 8.772,30	$ 214.783,00	23,00	$ 224.783,00	-	$ -	23,00	$ 224.783,00	23,00	$ 224.783,00	-	$ -
20.02.07.26	ABRAZADERAS MUFAS	2 1/2"	UN	48,00	$ 9.321,71	$ 447.698,00	48,00	$ 447.698,00	-	$ -	48,00	$ 419.854,00	46,00	$ 419.854,00	2,00	$ 18.248,00
20.02.07.27	ABRAZADERAS MUFAS	2"	UN	10,00	$ 6.954,00	$ 69.540,00	10,00	$ 69.540,00	-	$ -	10,00	$ 69.540,00	10,00	$ 69.540,00	-	$ -
20.02.07.18	ABRAZADERAS MUFAS	3 1/2"	UN	52,00	$ 5.417,71	$ 317.656,00	52,00	$ 337.656,00	-	$ -	30,00	$ 194.817,00	30,00	$ 194.817,00	22,00	$ 142.839,00
20.02.07.19	ABRAZADERAS MUFAS	3 1/4"	UN	34,00	$ 6.214,24	$ 212.712,00	34,00	$ 232.732,00	-	$ -	27,00	$ 165.356,00	27,00	$ 165.356,00	11,00	$ 67.367,00
20.02.07.20	ABRAZADERAS MUFAS	3"	UN	26,00	$ 5.773,11	$ 150.732,00	26,00	$ 150.732,00	-	$ -	20,00	$ 115.953,00	20,00	$ 115.953,00	6,00	$ 34.779,00
20.02.07.21	CODPLING	6"	UN	65,00	$ 95.757,61	$ 6.242.754,00	65,00	$ 6.382.958,00	-	$ -	23,00	$ 1.189.870,00	23,00	$ 1.189.870,00	42,00	$ 2.172.988,00
20.02.07.22	COUPLING	3 1/2"	UN	170,00	$ 48.541,95	$ 8.251.974,00	170,00	$ 8.251.974,00	-	$ -	58,00	$ 2.854.334,00	58,00	$ 2.854.334,00	112,00	$ 5.370.394,00
20.02.07.23	COUPLING	3"	UN	93,00	$ 39.216,91	$ 3.648.373,00	93,00	$ 3.982.233,00	-	$ -	28,00	$ 1.540.133,00	29,00	$ 1.540.133,00	28,00	$ 1.822.188,00
20.02.07.24	REGISTRO DE PURGA Y DRENAJE (1"CON MANILLA Y RESTRICCION PARA ROCIADOR 1/2")	1/4"	UN	2,00	$ 627.279,35	$ 254.346,00	2,00	$ 1.254.346,00	-	$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 1.254.348,00
20.02.07.25	STAP 6"x3"		UN	30,00	$ 81.841,91	$ 4.175.295,00	80,00	$ 4.181.298,00	-	$ -	18,00	$ 1.908.868,00	18,00	$ 1.908.868,00	22,00	$ 2.682.429,00
20.02.07.26	STAP 2X"x6"		UN	30,00	$ 66.970,11	$ 2.309.106,00	30,00	$ 2.303.508,00	-	$ -	23,00	$ 1.008.613,00	23,00	$ 1.008.613,00	27,00	$ 1.243.893,00
20.02.07.27	STAP 2 "x3"		UN	12,00	$ 44.185,46	$ 573.213,00	12,00	$ 553.218,00	-	$ -	8,00	$ 368.812,00	8,00	$ 368.812,00	4,00	$ 184.406,00

CONDICIONES GENERALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA						SALDO	
							MODIFICATORIA NO 1		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO			
ITEM	DESCRIPCION		UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
20.07.07.29	STRAP 3.1/2"x12"		UNI	32.00	$ 372.465,22	$ 8.919.310,00	32.00	$ 8.919.310,00	-	$ -	19.00	$ 708.528,00	19.00	$ 708.528,00	13.00	$ 484.782,00
20.07.07.29	STRAP 3.1/2"x14"		UNI	32.00	$ 35.225,31	$ 1.127.204,00	32.00	$ 1.127.204,00	-	$ -	15.00	$ 528.377,00	15.00	$ 528.377,00	17.00	$ 598.827,00
20.07.07.30	SOPORTE SISMORESISTENTE DE 6 VIAS	3"	UNI	2.00	$ 204.292,00	$ 408.584,00	2.00	$ 408.584,00	-	$ -		$ -	-	$ -	2.00	$ 408.584,00
20.07.07.31	SOPORTE SISMORESISTENTE DE 3 VIAS	3"	UNI	6.00	$ 196.745,72	$ 1.117.483,00	6.00	$ 1.117.483,00	-	$ -		$ -	-	$ -	6.00	$ 1.117.483,00
20.07.07.32	SOPORTE SISMORESISTENTE DE 2 VIAS	2½"	UNI	4.00	$ 181.970,19	$ 727.881,00	4.00	$ 727.881,00	-	$ -		$ -	-	$ -	4.00	$ 727.881,00
20.07.07.33	MANOMETRO DE GLICERINA 0-300 PSI		UNI	2.00	$ 84.888,00	$ 176.776,00	2.00	$ 176.776,00	-	$ -		$ -	-	$ -	2.00	$ 176.776,00
20.07.07.34	JUNTA ANTISISMICA PRE LOOP	8"	UNI	4.00	$ 4.717.530,03	$ 18.870.120,00	4.00	$ 18.870.120,00	-	$ -		$ -	-	$ -	4.00	$ 18.870.120,00
20.01.07.11	ROCIADOR RESPUESTA RAPIDA STANDAR K 5.6 UP-RIGHT		UNI	207.00	$ 32.247,00	$ 10.675.629,00	203.00	$ 10.525.625,00	-	$ -		$ -	-	$ -	203.00	$ 10.525.625,00
20.01.07.36	ROCIADOR RESPUESTA RAPIDA STANDAR K 5.6 PENDENT		UNI	13.00	$ 30.949,69	$ 648.430,00	15.00	$ 668.460,00	-	$ -		$ -	-	$ -	15.00	$ 668.460,00
20.07.07.37	MONTAJE ROCIADOR		UNI	218.00	$ 19.910,99	$ 4.344.956,00	218.00	$ 4.344.956,00	-	$ -		$ -	-	$ -	218.00	$ 4.344.956,00
20.01.07.38	ESTACION DE CONTROL (incluye válvula mariposa, alarma, sensor de flujo y accesorios)	5"	UNI	2.00	$ 6.145.724,11	$ 12.291.478,00	2.00	$ 12.291.478,00	-	$ -		$ -	-	$ -	2.00	$ 12.291.478,00
20.20.00.39	MONTAJE ESTACION DE CONTROL - Incluido en ítem anterior		UNI	2.00		$ -	2.00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	2.00	$ -
20.07.07.40	PINTURA PARA TUVERIAS		GLB	844.00	$ 39.141,27	$ 6.977.539,00	688.00	$ 6.977.539,00	-	$ -		$ -	-	$ -	688.00	$ 6.977.539,00
									-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
19.23.00	SALIDAS SANITARIAS Incluye el suministro, instalación, prueba de la tubería y accesorios requeridos para realizar la conexión de aguas residuales domésticas de los aparatos sanitarios a puntos de descarga. Considerando el tramo vertical desde la boca de conexión del aparato hasta					$ 5.129.307,00		$ 5.129.307,00	-	$ 2.215.193,00		$ -	-	$ 2.215.193,00	-	$ 2.914.114,00
									-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
20.01.00.01	SANITARIOS DE PUSH	4"	UNI	6.00	$ 113.244,83	$ 679.470,00	6.00	$ 679.470,00	4.00	$ 452.980,00		$ -	4.00	$ 452.980,00	2.00	$ 226.490,00
20.01.00.02	LAVAMANOS	2"	UNI	6.00	$ 57.319,28	$ 323.435,00	6.00	$ 323.435,00	4.00	$ 148.957,00		$ -	4.00	$ 148.957,00	2.00	$ 174.478,00
20.07.00.03	DUCHA	2"	UNI	2.00	$ 84.999,65	$ 169.999,00	2.00	$ 169.999,00	2.00	$ 169.999,00		$ -	2.00	$ 169.999,00	-	$ -
20.01.00.05	LAVAPLATOS	2"	UNI	7.00	$ 87.239,23	$ 610.675,00	7.00	$ 610.675,00	3.00	$ 261.718,00		$ -	3.00	$ 261.718,00	4.00	$ 348.957,00
20.07.00.06	POCETA	2"	UNI	2.00	$ 87.050,57	$ 174.101,00	2.00	$ 174.101,00	-	$ -		$ -	-	$ -	2.00	$ 174.101,00
20.01.00.09	SIFON DE PISO	4"	UNI	10.00	$ 109.767,49	$ 1.097.675,00	10.00	$ 1.097.675,00	-	$ -		$ -	-	$ -	10.00	$ 1.097.675,00
20.07.00.09	SIFON DE PISO	3"	UNI	21.00	$ 87.045,92	$ 1.809.952,00	21.00	$ 1.809.952,00	11.00	$ 979.499,00		$ -	11.00	$ 979.499,00	10.00	$ 830.453,00
									-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
20.22.00	SALIDAS DE AGUAS NEGRAS, VENTILACIONES Y EXTENTILACIONES Se inicia en este capítulo la unión de tubos, herramientas y materiales para la instalación de las bocas horizontales, cambio y diseño de las bajantes de aguas negras, ventilaciones y reventilaciones en todo este hasta el encuentro con las tuberías verticales					$ 2.053.556,00		$ 2.053.556,00	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ 2.053.556,00
									-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
20.02.00.01	TUBERIA PVC-S	4"	UNI	5.00	$ 42.388,56	$ 213.943,00	5.00	$ 213.943,00	-	$ -		$ -	-	$ -	5.00	$ 213.943,00
20.02.00.02	TUBERIA PVC-S	6"	MTS	6.00	$ 37.079,25	$ 222.478,00	6.00	$ 222.478,00	-	$ -		$ -	-	$ -	6.00	$ 222.478,00
20.02.00.03	TUBERIA PVC-S	8"	MTS	32.00	$ 31.515,69	$ 811.501,00	32.00	$ 811.501,00	-	$ -		$ -	-	$ -	32.00	$ 811.501,00
20.02.00.04	TUBERIA PVC-S	3"	MTS	8.00	$ 23.196,98	$ 188.572,00	8.00	$ 188.572,00	-	$ -		$ -	-	$ -	8.00	$ 188.572,00
20.02.00.05	ACCESORIOS PVC-S	6"	UNI	8.00	$ 23.132,63	$ 369.063,00	8.00	$ 369.063,00	-	$ -		$ -	-	$ -	8.00	$ 369.063,00
20.02.00.06	ACCESORIOS PVC-S	8"	UNI	13.00	$ 23.600,54	$ 307.805,00	13.00	$ 307.805,00	-	$ -		$ -	-	$ -	13.00	$ 307.805,00
20.02.00.07	ACCESORIOS PVC-S	3"	UNI	3.00	$ 7.918,63	$ 19.756,00	8.00	$ 29.754,00	-	$ -		$ -	-	$ -	8.00	$ 29.754,00
20.02.00.08	BOTELLA DE EXPANSION	4"	UNI	2.00	$ 46.338,00	$ 46.338,00	1.00	$ 46.338,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1.00	$ 46.338,00
20.02.00.09	ABRAZADERAS	6"	UNI	4.00	$ 24.134,03	$ 96.536,00	4.00	$ 96.536,00	-	$ -		$ -	-	$ -	4.00	$ 96.536,00
20.07.00.10	ABRAZADERAS	8"	UNI	8.00	$ 20.862,75	$ 86.907,00	8.00	$ 86.907,00	-	$ -		$ -	-	$ -	8.00	$ 86.907,00
20.02.00.11	ABRAZADERAS	3"	UNI	2.00	$ 8.944,71	$ 18.889,00	2.00	$ 18.889,00	-	$ -		$ -	-	$ -	2.00	$ 18.889,00
									-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
20.23.10	BAJANTES DE AGUAS NEGRAS, VENTILACIONES Y EXVENTILACIONES Se inicia en este capítulo la unión de tubos, herramientas y materiales para la instalación de las bocas horizontales, cambio y diseño de las bajantes de aguas negras, ventilaciones y reventilaciones en todo este hasta el encuentro con las tuberías verticales					$ 23.949.750,00		$ 23.949.750,00	-	$ 3.776.978,00		$ 2.970.894,00	-	$ 6.747.372,00	-	$ 16.903.378,00
									-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
20.02.10.01	TUBERIA PVC-S	6"	MTS	8.00	$ 27.333,41	$ 220.960,00	8.00	$ 220.960,00	-	$ -		$ -	-	$ -	8.00	$ 220.960,00
20.02.10.02	TUBERIA PVC-S	8"	MTS	41.00	$ 42.788,36	$ 1.754.331,00	41.00	$ 1.754.331,00	6.00	$ -		$ -	41.00	$ 1.754.331,00	-	$ -
20.02.10.03	TUBERIA PVC-S	3"	MTS	54.00	$ 31.517,59	$ 1.701.490,00	54.00	$ 1.702.490,00	20.83	$ 656.720,00	33.17	$ 1.045.770,00	54.00	$ 1.702.490,00	-	$ -
20.02.10.04	TUBERIA PVC-S	2"	MTS	32.00	$ 23.494,34	$ 751.819,00	33.00	$ 775.315,00	9.26	$ 217.558,00	23.74	$ 557.757,00	33.00	$ 775.315,00	-	$ -
20.02.10.05	TUBERIA PVC-S	3"	MTS	45.00	$ 23.339,49	$ 1.050.273,00	45.00	$ 1.141.173,00	-	$ -	45.00	$ 1.141.173,00	45.00	$ 1.141.173,00	-	$ -

CONDICIONES GENERALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA						SALDO	
							MODIFICATORIA NO 1		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO			
ITEM	DESCRIPCION		UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
20.02.20.06	TUBERIA PVC 3	3"	ML	22.00	$ 20.108,84	$ 442.398,00	22,00	$ 442.398,00	13,94	$ 280.378,00	8,06	$ 162.078,00	22,00	$ 442.398,00	-	$ -
20.02.10.07	ACCESORIOS PVC 6	6"	UN	6,00	$ 84.281,01	$ 505.686,00	6,00	$ 505.686,00	-	$ -		$ -	-	$ -	6,00	$ 505.686,00
20.02.10.04	ACCESORIOS PVC 4	4"	UN	30,00	$ 21.312,61	$ 1.656.543,00	50,00	$ 1.056.543,00	22,00	$ 464.923,00		$ -	22,00	$ 464.923,00	28,00	$ 591.720,00
20.02.10.03	ACCESORIOS PVC 3	3"	UN	17,00	$ 12.980,24	$ 1.205.631,00	97,00	$ 1.205.631,00	17,00	$ 235.629,00		$ -	17,00	$ 235.629,00	70,00	$ 970.223,00
20.02.10.10	ACCESORIOS PVC 6	3"	UN	79,00	$ 7.276,51	$ 575.345,00	79,00	$ 575.345,00	51,00	$ 167.083,00		$ -	51,00	$ 167.083,00	56,00	$ 491.488,00
20.01.20.11	ABRAZADERAS	6"	UN	3,00	$ 26.736,47	$ 80.483,00	3,00	$ 80.483,00	-	$ -		$ -	-	$ -	3,00	$ 80.483,00
20.02.10.12	ABRAZADERAS	4"	UN	77,00	$ 14.175,83	$ 916.016,00	23,00	$ 326.016,00	-	$ -		$ -	-	$ -	23,00	$ 326.016,00
20.02.10.11	ABRAZADERAS	3"	UN	30,00	$ 10.869,36	$ 543.168,00	50,00	$ 543.168,00	-	$ -		$ -	-	$ -	50,00	$ 543.168,00
20.02.10.10	ABRAZADERAS	2"	UN	52,00	$ 8.934,71	$ 469.805,00	52,00	$ 469.805,00	-	$ -		$ -	-	$ -	52,00	$ 469.805,00
20.02.30.15	PASE EN PLACA	4"	UN	14,00	$ 37.071,53	$ 523.002,00	14,00	$ 523.002,00	-	$ -		$ -	-	$ -	14,00	$ 523.002,00
20.02.30.16	PASE EN PLACA	3"	UN	20,00	$ 18.134,72	$ 363.098,00	20,00	$ 363.098,00	-	$ -		$ -	-	$ -	20,00	$ 363.098,00
20.02.30.17	PASE EN PLACA	2"	UN	17,00	$ 13.485,81	$ 229.255,00	17,00	$ 229.255,00	-	$ -		$ -	-	$ -	17,00	$ 229.255,00
20.02.10.18	REJILLAS EN ALUMINIO	8"	UN	4,00		$ -	4,00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	4,00	$ -
20.01.20.19	TRAMPA DE BANOS 110 DM PLASTICA		UN	4,00	$ 3.238.111,93	$ 12.752.541,00	4,00	$ 12.752.541,00	-	$ -		$ -	-	$ -	4,00	$ 12.752.541,00
20.02.10.20	PASE TIPO VIGA L-70 CM	3"	UN	7,00	$ 13.348,91	$ 149.388,00	7,00	$ 149.388,00	-	$ -		$ -	-	$ -	7,00	$ 149.388,00
20.02.10.21	PASE EN VIGA L-40 CM	2"	UN	3,00	$ 13.340,99	$ 64.071,00	3,00	$ 64.071,00	-	$ -	3,00	$ 64.071,00	3,00	$ 64.071,00	-	$ -
20.02.10.22	PASE EN VIGA L-70 CM	3"	UN	8,00	$ 14.804,99	$ 118.440,00	8,00	$ 118.440,00	-	$ -		$ -	-	$ -	8,00	$ 118.440,00
20.02.10.23	PASE EN VIGA L-40 CM	2"	UN	3,00	$ 14.804,99	$ 44.415,00	3,00	$ 44.415,00	-	$ -		$ -	-	$ -	3,00	$ 44.415,00
									-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
20.02.2.5	SUMINISTRO DE AGUAS LLUVIAS Se tiene en esta capítulo la mano de obra, herramientas y materiales para la instalación de las cunetas verticales de las bajantes de aguas lluvias desde la cubierta hasta el empate al colector principal en primer piso.					$ 4.999.458,00		$ 4.999.458,00	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ 4.999.458,00
									-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
20.02.11.07	TUBERIA PVC 6	6"	ML	34,00	$ 73.570,41	$ 2.500.614,00	34,00	$ 2.500.614,00	-	$ -		$ -	-	$ -	34,00	$ 2.500.614,00
20.02.10.07	ACCESORIOS PVC 6	6"	UN	23,00	$ 84.281,07	$ 1.938.464,00	23,00	$ 1.938.464,00	-	$ -		$ -	-	$ -	23,00	$ 1.938.464,00
20.02.17.05	JUNTA DE EXPANSION	6"	UN	3,00	$ 80.333,33	$ 242.291,00	3,00	$ 242.291,00	-	$ -		$ -	-	$ -	3,00	$ 242.291,00
20.02.11.04	ABRAZADERAS	6"	UN	33,00	$ 19.737,47	$ 317.817,00	12,00	$ 317.817,00	-	$ -		$ -	-	$ -	12,00	$ 317.817,00
									-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
20.02.12	BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS Se tiene en esta capítulo la mano de obra, herramientas y materiales para la instalación de las cunetas horizontales, cunetas y bajantes de las bajantes de aguas lluvias en este piso, hasta el empate con las bajantes verticales.					$ 7.026.999,00		$ 7.026.999,00	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ 7.026.999,00
									-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
20.02.11.05	TUBERIA PVC 4	4"	ML	51,00	$ 47.736,16	$ 2.353.371,00	55,00	$ 2.353.371,00	-	$ -		$ -	-	$ -	55,00	$ 2.353.371,00
20.02.11.03	TUBERIA PVC 3	3"	ML	40,00	$ 31.277,37	$ 1.251.104,00	40,00	$ 1.251.104,00	-	$ -		$ -	-	$ -	40,00	$ 1.251.104,00
20.02.17.05	ACCESORIOS PVC 4	4"	UN	30,00	$ 21.312,61	$ 1.056.543,00	50,00	$ 1.056.543,00	-	$ -		$ -	-	$ -	50,00	$ 1.056.543,00
20.02.17.04	ACCESORIOS PVC 3	3"	UN	24,00	$ 19.686,96	$ 436.977,00	36,00	$ 436.977,00	-	$ -		$ -	-	$ -	36,00	$ 436.977,00
20.02.11.01	ABRAZADERAS	4"	UN	31,00	$ 14.174,61	$ 439.613,00	31,00	$ 439.613,00	-	$ -		$ -	-	$ -	31,00	$ 439.613,00
20.02.11.06	ABRAZADERAS	3"	UN	22,00	$ 10.863,18	$ 238.994,00	22,00	$ 238.994,00	-	$ -		$ -	-	$ -	22,00	$ 238.994,00
20.02.11.07	REJILLAS EN ALUMINIO	6"	UN	40,00		$ -	40,00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	40,00	$ -
20.02.17.08	TRANSANTE CUPULA EN ALUMINIO	6"	UN	16,00		$ -	16,00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	16,00	$ -
20.02.17.09	PASE EN VIGA L-10 CM	6"	UN	17,00	$ 37.357,53	$ 635.074,00	17,00	$ 635.074,00	-	$ -		$ -	-	$ -	17,00	$ 635.074,00
20.02.12.20	PASE EN VIGA L-40 CM	4"	UN	4,00	$ 37.357,53	$ 149.429,00	4,00	$ 149.429,00	-	$ -		$ -	-	$ -	4,00	$ 149.429,00
20.02.12.21	PASE EN VIGA L-10 CM	6"	UN	17,00	$ 19.136,97	$ 325.319,00	17,00	$ 325.319,00	-	$ -		$ -	-	$ -	17,00	$ 325.319,00
20.02.12.22	PASE EN VIGA L-40 CM	6"	UN	4,00	$ 21.648,99	$ 83.264,00	4,00	$ 83.264,00	-	$ -		$ -	-	$ -	4,00	$ 83.264,00
									-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
20.02.13	CONEXIÓN APARATOS SANITARIOS Y MONTAJES Se tiene en este capítulo la mano de obra, herramientas y accesorios para la instalación, montaje y conexión de los aparatos. No incluye el suministro de los mismos.					$ 5.913.499,00		$ 5.913.499,00	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ 5.913.499,00
									-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
20.02.15.03	MONTAJE SANITARIOS DE PUSH		UN	6,00	$ 88.954,00	$ 521.817,00	6,00	$ 521.817,00	-	$ -		$ -	-	$ -	6,00	$ 521.817,00
20.02.13.02	MONTAJE DUCHA		UN	2,00	$ 42.973,77	$ 85.948,00	2,00	$ 85.948,00	-	$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 85.948,00

CONDICIONES GENERALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA						SALDO	
							MODIFICATORIA NO 5		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO			
ITEM	DESCRIPCION		UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
20.02.13.09	CONEXIÓN LAVAMANOS		UD	8,00	$ 76.376,42	$ 499.459,00	6,00	$ 458.454,00	-	$ -		$ -	-	$ -	8,00	$ 458.454,00
20.02.13.04	CONEXIÓN LAVAPLATOS		UD	7,00	$ 76.576,43	$ 536.053,00	7,00	$ 536.035,00	-	$ -		$ -	-	$ -	7,00	$ 536.035,00
20.02.13.05	CONEXIÓN CALENTADOR TIPO TIRO 6000		UD	1,00	$ 178.697,00	$ 178.697,00	1,00	$ 178.697,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 178.697,00
20.02.13.06	CONEXIÓN POCETA		UD	8,00	$ 65.327,25	$ 522.618,00	2,00	$ 131.656,00	-	$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 131.656,00
20.02.13.07	TRAMPA DE GRASAS 15 G/M PLASTICA		UD	4,00		$ -	4,00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	4,00	$ -
									-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
20.02.14	TAPONES PARA INSTALACIONES HIDRAULICAS, SANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS					$ 112.581,00		$ 112.581,00	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ 113.581,00
20.02.14.01	TAPON PVC S	6"	UD	2,00	$ 14.207,50	$ 28.415,00	2,00	$ 28.415,00	-	$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 28.415,00
20.02.14.02	TAPON PVC S	4"	UD	17,00	$ 4.949,79	$ 84.146,00	17,00	$ 84.146,00	-	$ -		$ -	-	$ -	17,00	$ 84.146,00
									-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
20.00.15	PRUEBAS					$ -		$ 3.080.000,00								
20.02.15.01	PRUEBAS DE SANITTE		GLB	1,00			1,00	$ 3.080.000,00	-	$ -	1,00	$ -	1,00	$ -	-	$ -
							-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
20.02.16	ELABORACIÓN DE PLANOS RECORD					$ 6.291.129,00		$ 6.291.129,00	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ 6.291.129,00
20.02.16.01	PLANOS HIDROSANITARIOS (INCLUYE LOS EN ESPECIFICACIÓN		UN	8,00	$ 3.536.710,62	$ 6.291.129,00	8,00	$ 6.291.129,00	-	$ -		$ -	-	$ -	8,00	$ 6.291.129,00
									-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
20.02.17	ELABORACIÓN DE MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO					$ 203.295,00		$ 203.295,00	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ 201.295,00
20.02.17.01	MANUAL SEGÚN ESPECIFICACION		UD	1,00	$ 201.294,59	$ 201.295,00	1,00	$ 203.295,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 203.295,00
									-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
	VALOR TOTAL COSTO DIRECTO					$ 394.511.963,00		$ 400.968.618,00	-	$ 94.125.076,00		$ 61.733.569,00	-	$ 155.978.885,80	-	$ 247.008.148,90
								$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
	AIU				24%	$ 79.836.356,00		$ 73.974.026,00	-	$ 18.842.616,00		$ 15.115.648,00	-	$ 33.958.180,00	-	$ 44.983.467,00
								$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
	IVA VIGENTE SOBRE LA UTILIDAD					$ 5.717.463,00		$ 3.536.684,00	-	$ 994.188,00		$ 496.659,00	-	$ 1.490.847,00	-	$ 2.345.877,00
								$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
	VALOR TOTAL					$ 695.465.354,00		$ 482.897.520,00	-	$ 117.961.777,00		$ 73.453.893,00	-	$ 191.417.672,00	-	$ 293.818.192,00
									-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
20.00	ALCOSE B								-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
20.01.01	ACO DE SUMINISTRO DE AGUA PEÑA POTABLE BLOQUE B Nota: Desde el cuadro de ejecución para Bloque C y D, hasta el suministro del proyecto en Bloque A, y la red interna del bloque B (pisos 1 a Cubierta)					$ 13.872.851,00		$ 14.672.851,00	-	$ 53.813,00		$ 8.282.978,00	-	$ 8.336.650,00	-	$ 8.336.150,00
									-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
20.01.01.01	TUBERIA PVC-P	2"	ML	66,00	$ 27.947,39	$ 1.113.717,00	40,00	$ 1.113.717,00	-	$ -	46,00	$ 1.113.717,00	46,00	$ 1.113.717,00	-	$ -
20.01.01.02	TUBERIA PVC-P	1 1/2"	ML	2,00	$ 22.217,49	$ 44.434,00	2,00	$ 44.436,00	-	$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 44.436,00
20.01.01.03	TUBERIA PVC-P	1 1/4"	ML	124,00	$ 19.358,84	$ 2.401.498,00	124,00	$ 2.401.498,00	1,72	$ 34.157,00	122,28	$ 2.428.339,00	124,00	$ 2.462.496,00	-	$ -
20.01.01.04	TUBERIA PVC-P	1"	ML	17,00	$ 12.116,42	$ 178.976,00	13,00	$ 173.376,00	-	$ -	13,00	$ 173.376,00	13,00	$ 173.376,00	-	$ -
20.01.01.05	TUBERIA PVC-P	1/2"	ML	13,00	$ 7.957,34	$ 103.443,00	13,00	$ 103.443,00	0,16	$ 1.272,00	12,84	$ 102.170,00	13,00	$ 103.443,00	-	$ -
20.09.01.06	ACCESORIOS PVC-P	2"	UN	31,00	$ 25.574,73	$ 356.809,00	31,00	$ 356.809,00	-	$ -		$ -	-	$ -	31,00	$ 358.809,00
20.09.01.07	ACCESORIOS PVC-P	2 1/2"	UN	4,00	$ 7.852,25	$ 31.409,00	4,00	$ 31.409,00	-	$ -		$ -	-	$ -	4,00	$ 31.408,00
20.09.01.08	ACCESORIOS PVC-P	2 1/4"	UN	148,00	$ 5.907,68	$ 880.241,00	148,00	$ 880.245,00	3,00	$ 17.733,00		$ -	3,00	$ 17.733,00	148,00	$ 862.522,00
20.09.01.09	ACCESORIOS PVC-P	1/4"	UN	24,00	$ 3.045,29	$ 73.205,00	24,00	$ 73.205,00	-	$ -		$ -	-	$ -	24,00	$ 73.206,00
20.09.01.10	ACCESORIOS PVC-P	1/2"	UN	8,00	$ 2.760,04	$ 22.080,00	8,00	$ 22.080,00	1,00	$ 2.760,00		$ -	1,00	$ 2.760,00	7,00	$ 19.320,00
20.05.01.11	ABRAZADERAS	2"	UN	8,00	$ 5.484,71	$ 43.174,00	8,00	$ 43.174,00	-	$ -		$ -	-	$ -	8,00	$ 43.174,00
20.01.01.12	ABRAZADERAS	1 1/2"	UN	2,00	$ 6.560,00	$ 13.120,00	2,00	$ 17.120,00	-	$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 17.120,00
20.09.01.13	ABRAZADERAS	1 1/4"	UN	67,00	$ 8.243,95	$ 552.243,00	67,00	$ 552.243,00	-	$ -		$ -	-	$ -	67,00	$ 552.243,00
20.09.01.14	ABRAZADERAS	1"	UN	15,00	$ 7.526,03	$ 112.791,00	15,00	$ 112.791,00	-	$ -		$ -	-	$ -	15,00	$ 112.791,00
20.09.01.15	ABRAZADERAS	1/2"	UN	17,00	$ 7.257,23	$ 123.781,00	17,00	$ 123.781,00	-	$ -		$ -	-	$ -	17,00	$ 123.781,00

CONDICIONES GENERALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA						SALDO	
						MODIFICATORIA NO 1		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO			
ITEM	DESCRIPCION		UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
29 07 01 25	REGISTRO CONTRA	8 1/4"	UNI	10,00	$ 251.609,09	$ 2.516.091,00	10,00	$ 2.516.091,00	-	$ -		$ -	-	$ -	10,00	$ 2.516.091,00
29 01 01 27	EXCAVACION		M3	8,27	$ 69.579,48	$ 645.000,00	9,27	$ 645.000,00	-	$ -	8,27	$ 645.002,00	8,27	$ 645.002,00	0,00	$ 25,00
29 01 01 28	VALVULA EXPULSORA DE AIRE	3/4"	UNI	1,00	$ 195.680,00	$ 195.680,00	1,00	$ 195.680,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 195.680,00
29 01 01 29	MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACION		M3	2,00	$ 190.223,16	$ 380.446,00	2,00	$ 380.446,00	-	$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 380.446,00
29 01 01 30	RELLENO COMPACTADO		M3	10,00	$ 182.497,70	$ 1.824.977,00	10,00	$ 1.824.175,00	-	$ -	10,00	$ 1.824.175,00	10,00	$ 1.824.175,00	-	$ -
									-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
29 02 02	PUNTOS INSTALACION AGUA POTA					$ 4.009.313,00		$ 4.009.313,00	-	$ 3.997.566,00		$ 3.878.847,00	-	$ 3.878.446,00	-	$ 130.874,00
	Hallar el nivel de la, instalación, ganado de la palanta y accesorios requeridos para realizar la conexión de agua a las siguientes construcciones a partir de cotas referidas. Colocando el tramo vertical a partir del cada medidor el cual se ubica el cuadro de								-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
29 05 02 01	PUNTO SANITARIO PVSB	3 1/2"	UNI	15,00	$ 126.164,43	$ 1.892.526,00	15,00	$ 1.886.526,00	8,00	$ 853.547,00	6,00	$ 638.411,00	14,00	$ 1.491.958,00	1,00	$ 106.568,00
29 05 02 02	PUNTO LAVAMANOS	3/4"	UNI	21,00	$ 79.205,53	$ 1.663.416,00	21,00	$ 1.665.416,00	11,00	$ 372.361,00	9,00	$ 713.750,00	20,00	$ 1.586.111,00	1,00	$ 79.305,00
29 01 02 03	PUNTO ORINAL	3/4"	UNI	8,00	$ 93.171,63	$ 745.373,00	8,00	$ 745.373,00	4,00	$ 372.686,00	4,00	$ 372.685,00	8,00	$ 745.371,00	-	$ -
									-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
29 01 05	AMORTIGUADOR DE GOLPE DE ARIETE					$ 5.445.891,00		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ 5.445.893,00
29 09 05 01	AMORTIGUADOR DE GOLPE DE ARIETE	8 1/4"	UNI	10,00	$ 544.809,33	$ 5.449.000,00	10,00	$ 5.449.003,00	-	$ -		$ -	-	$ -	10,00	$ 5.449.003,00
									-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
29 09 04	RED DE DISTRIBUCIÓN CONTRAINCENDIOS GABINETES PNO 1-2					$ 89.962.899,00		$ 89.962.872,00	-	$ 37.137.644,00		$ 8.379.804,00	-	$ 83.417.961,00	-	$ 88.665.534,00
	Se tiene un solo capitulo la prueba de vitro, hermeticidad y accesorios para la red de Incendio desde la Bodega al Bloque D hasta los vitros y los gabinetes en cada piso (1 abastecimiento del Bloque D, tramo de hidrantes y los vitros) cumpliendo de la Art. De Incluye								-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
29 07 04 01	TUBERIA C-900	6"	M3	40,00	$ 159.181,97	$ 6.326.643,00	53,00	$ 12.406.047,00	40,00	$ 6.126.643,00	41,00	$ 6.279.804,00	81,00	$ 12.406.047,00	-	$ -
29 03 04 02	TUBERIA ACERO NTCSO RANURADA SCH 10	4"	M3	20,00	$ 201.113,91	$ 4.023.118,00	20,00	$ 4.023.118,00	-	$ -		$ -	-	$ -	20,00	$ 4.023.118,00
29 03 04 03	TUBERIA ACERO NTCSO RANURADA SCH 10	3"	M3	10,00	$ 149.776,50	$ 1.497.765,00	10,00	$ 1.497.765,00	-	$ -		$ -	-	$ -	10,00	$ 1.497.765,00
29 03 04 04	TUBERIA ACERO NTCSO RANURADA SCH 40	2"	M3	10,00	$ 115.205,69	$ 1.152.056,00	10,00	$ 1.152.056,00	-	$ -		$ -	-	$ -	10,00	$ 1.152.056,00
29 03 04 05	TUBERIA ACERO NTCSO RANURADA SCH 40	6"	M3	40,00	$ 85.954,84	$ 3.442.194,00	40,00	$ 3.442.196,00	-	$ -		$ -	-	$ -	40,00	$ 3.442.196,00
29 01 01 06	TUBERIA PVC	12"	M3	30,00	$ 22.717,97	$ 666.733,00	30,00	$ 666.536,00	20,00	$ 666.536,00		$ -	30,00	$ 666.536,00	-	$ -
29 05 04 07	ACCESORIOS E-900	6"	UNI	11,00	$ 899.417,91	$ 9.142.116,00	15,00	$ 9.142.116,00	11,00	$ 6.704.233,00		$ -	11,00	$ 6.704.233,00	4,00	$ 2.437.803,00
29 05 05 08	BY DE TRANSICION ACERO A C900	6"	UNI	4,00	$ 1.213.321,00	$ 4.794.100,00	4,00	$ 4.794.100,00	4,00	$ 4.794.100,00		$ -	4,00	$ 4.794.100,00	-	$ -
29 09 04 09	RUTA GARF PARA TUBERIA DE 6"	6"	UNI	10,00	$ 433.158,09	$ 4.383.331,00	64,00	$ 23.041.728,00	10,00	$ 4.381.831,00		$ -	10,00	$ 4.381.831,00	54,00	$ 23.660.267,00
29 03 04 10	ACCESORIOS ACERO RANURADOS		UNI	20,00	$ 127.475,14	$ 2.549.903,00	20,00	$ 2.549.903,00	-	$ -		$ -	-	$ -	20,00	$ 2.549.903,00
29 03 04 11	ACCESORIOS ACERO RANURADOS	3"	UNI	10,00	$ 67.847,13	$ 678.474,00	10,00	$ 678.439,00	-	$ -		$ -	-	$ -	10,00	$ 678.439,00
29 03 04 12	ACCESORIOS ACERO RANURADOS	2"	UNI	10,00	$ 72.902,46	$ 729.025,00	10,00	$ 729.025,00	-	$ -		$ -	-	$ -	10,00	$ 729.025,00
29 03 04 13	ACCESORIOS ACERO ROSCADOS	1/2"	UNI	40,00	$ 33.391,27	$ 1.337.653,00	40,00	$ 1.367.650,00	-	$ -		$ -	-	$ -	40,00	$ 1.367.650,00
29 05 04 14	ACCESORIOS PVC	8 1/2"	UNI	20,00	$ 7.452,15	$ 127.865,00	20,00	$ 127.843,00	-	$ -		$ -	-	$ -	20,00	$ 127.843,00
29 09 04 15	COUPLINS	6"	UNI	40,00	$ 60.405,31	$ 2.415.211,00	40,00	$ 2.416.256,00	-	$ -		$ -	-	$ -	40,00	$ 2.416.256,00
29 01 04 16	COUPLINS	3/4"	UNI	20,00	$ 37.371,91	$ 1.451.438,00	20,00	$ 1.451.438,00	-	$ -		$ -	-	$ -	20,00	$ 1.451.438,00
29 09 04 17	SOPORTES SISMORRESISTENTES DE 2 VIAS		UNI	24,00	$ 179.644,96	$ 4.308.795,00	24,00	$ 4.308.709,00	-	$ -		$ -	-	$ -	24,00	$ 4.308.709,00
29 09 04 18	SOPORTES SISMORRESISTENTES DE 4 VIAS		UNI	4,00	$ 206.402,85	$ 825.612,00	4,00	$ 825.612,00	-	$ -		$ -	-	$ -	4,00	$ 825.612,00
29 09 04 19	ABRAZADERAS ULTRA	6"	UNI	6,00	$ 13.026,50	$ 78.159,00	8,00	$ 78.159,00	-	$ -		$ -	-	$ -	8,00	$ 78.159,00
29 09 04 20	ABRAZADERAS ULTRA	3"	UNI	3,00	$ 9.772,39	$ 29.317,00	3,00	$ 29.317,00	-	$ -		$ -	-	$ -	3,00	$ 29.317,00
29 09 04 21	ABRAZADERAS ULTRA	2"	UNI	3,00	$ 9.171,45	$ 27.969,00	3,00	$ 27.969,00	-	$ -		$ -	-	$ -	3,00	$ 27.969,00
29 09 04 22	ABRAZADERAS ULTRA	1/2"	UNI	12,00	$ 6.477,21	$ 77.667,00	12,00	$ 77.667,00	-	$ -		$ -	-	$ -	12,00	$ 77.667,00
29 09 04 23	VALVULA MARIPOSA	6"	UNI	2,00	$ 891.624,27	$ 1.783.249,00	2,00	$ 1.713.249,00	-	$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 1.713.249,00
29 09 04 24	MANOMETRO 0-200 PSI		UNI	2,00	$ 88.388,50	$ 176.778,00	2,00	$ 176.778,00	-	$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 176.778,00
29 05 04 25	VALVULA EXPULSORA DE AIRE	2"	UNI	2,00	$ 732.519,73	$ 1.465.072,00	2,00	$ 1.303.072,00	-	$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 1.606.072,00
29 09 04 26	VALVULA DE BOLA ULTRA	2"	UNI	2,00	$ 317.792,21	$ 275.584,00	2,00	$ 275.584,00	-	$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 275.584,00
29 09 04 27	VALVULA DE CHEQUE	8 1/2"	UNI	2,00	$ 589.267,27	$ 1.178.534,00	2,00	$ 1.178.534,00	-	$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 1.178.534,00
29 09 04 28	TONO DE BOMBEROS	2 1/2"	UNI	2,00	$ 642.993,54	$ 2.253.987,00	3,00	$ 1.265.985,00	-	$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 1.265.985,00

CONDICIONES GENERALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA						SALDO	
							MODIFICATORIO 1		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO			
ITEM	DESCRIPCION		UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
20.01.01.01	GABINETE CLASE II DE PROTECCION DE PRESION	3 1/2"	UNI	2.00	$ 1.575.210,18	$ 3.150.420,00	2,00	$ 3.150.378,00	-	$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 3.150.378,00
20.01.01.02	VIDRIO TEMPLADO PARA TOMA DE MONITOR		UNI	2.00			2,00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ -
20.01.01.01	VIDRIO TEMPLADO PARA GABINETE CLASE II		UNI	2.00	$ 149.844,00	$ 299.688,00	2,00	$ 299.656,00	-	$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 299.656,00
20.01.01.03	MANTILLO DE PROTECCION		UNI	2.00	$ 24.192,47	$ 48.384,00	2,00	$ 48.366,00	-	$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 48.366,00
20.01.01.04	LITOS E / PLAQUITAS DE IDENTIFICACION		UNI	2.00	$ 9.305,04	$ 18.609,00	2,00	$ 18.606,00	-	$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 18.606,00
20.01.01.14	PINTURA PARA TUBERIAS		MTS	80.00	$ 79.145,37	$ 611.342,00	80,00	$ 611.342,00	-	$ -		$ -	-	$ -	80,00	$ 611.342,00
20.01.01.15	EXCAVACION MATERIAL COMUN		M3	46,00	$ 69.379,16	$ 3.319.813,00	46,00	$ 3.339.813,00	46,00	$ 3.339.813,00		$ -	46,00	$ 3.339.813,00	-	$ -
20.01.01.16	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACION		M3	24,00	$ 46.979,16	$ 1.124.994,00	24,00	$ 1.124.994,00	24,00	$ 1.124.994,00		$ -	24,00	$ 1.124.994,00	-	$ -
20.01.01.17	HORMIGON H8		M3	8,00	$ 181.917,50	$ 1.455.140,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	8,00	$ 1.455.140,00
20.01.01.18	RELLENO EN ARENA		M3	16,00	$ 59.211,16	$ 947.377,00	16,00	$ 947.371,00	-	$ -		$ -	-	$ -	16,00	$ 947.371,00
								$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
20.01.01.	RED DE DISTRIBUCION CONTRA INCENDIO (RECONOCIDO)					$ 646.445.736,00		$ 68.402.530,00	-	$ -		$ 64.496.573,00	-	$ 64.496.573,00	-	$ 91.906.959,00
	Se tiene en cuenta copiado la mano de obra, herramienta y materiales para la red de hidrantes desde la ejecución de obra el anterior en cada piso hasta los valores de los ítem 3.3							$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
20.01.01.01	TUBERIA ACERO NEGRO SIN COSTURA SCH 10	6"	ML	240.00	$ 149.726,99	$ 34.445.395,00	230,00	$ 34.445.395,00	-	$ -	122,00	$ 18.280.722,00	122,00	$ 18.280.722,00	107,00	$ 16.164.673,00
20.01.01.02	TUBERIA ACERO NEGRO SOLDADA SCH 40	3 1/2"	ML	80,00	$ 85.636,36	$ 6.847.115,00	80,00	$ 6.842.186,00	-	$ -	40,00	$ 3.443.196,00	40,00	$ 3.443.196,00	-	$ -
20.01.01.01	TUBERIA ACERO NEGRO ROSCADA SCH 40	6 3/4"	ML	440,00	$ 67.664,71	$ 29.774.233,00	440,00	$ 29.774.233,00	-	$ -	170,00	$ 11.503.681,00	170,00	$ 11.503.681,00	270,00	$ 18.270.552,00
20.01.01.04	TUBERIA ACERO NEGRO SOLDADA SCH 40	1"	ML	40,00	$ 57.665,10	$ 2.314.604,00	40,00	$ 2.314.604,00	-	$ -		$ -	-	$ -	40,00	$ 2.314.604,00
20.01.01.05	TUBERIA PVC P	2"	ML	35,00	$ 22.217,71	$ 777.627,00	35,00	$ 777.627,00	-	$ -		$ -	-	$ -	35,00	$ 777.627,00
20.01.01.06	ACCESORIOS ACERO NEGRO	6"	UNI	84,00	$ 37.642,75	$ 3.160.191,00	84,00	$ 3.158.177,00	50,00	$ 2.029.277,00	30,00	$ 1.129.777,00	80,00	$ 3.159.277,00	34,00	$ 1.879.847,00
20.01.01.07	ACCESORIOS ACERO SOLDADOS	3 1/2"	UNI	17,00	$ 34.441,37	$ 585.732,00	17,00	$ 585.753,00	-	$ -	10,00	$ 346.814,00	10,00	$ 346.814,00	7,00	$ 242.940,00
20.01.01.08	ACCESORIOS ACERO SOLDADOS	6 3/4"	UNI	100,00	$ 27.961,94	$ 2.796.194,00	100,00	$ 2.796.894,00	-	$ -	50,00	$ 1.398.447,00	50,00	$ 1.398.447,00	50,00	$ 1.398.447,00
20.01.01.09	ACCESORIOS ACERO ROSCADOS	1"	UNI	10,00	$ 20.271,47	$ 202.719,00	10,00	$ 202.719,00	-	$ -		$ -	-	$ -	10,00	$ 202.719,00
20.01.01.10	ACCESORIOS PVC P	2 1/2"	UNI	20,00	$ 7.892,23	$ 157.845,00	20,00	$ 157.845,00	-	$ -		$ -	-	$ -	20,00	$ 157.845,00
20.01.01.11	ABRAZADERAS U/URE	6"	UNI	68,00	$ 8.773,89	$ 596.824,00	68,00	$ 596.836,00	-	$ -	36,00	$ 317.478,00	36,00	$ 317.478,00	34,00	$ 296.813,00
20.01.01.12	ABRAZADERAS U/URE	3 1/2"	UNI	12,00	$ 6.457,21	$ 77.487,00	12,00	$ 77.487,00	-	$ -		$ -	-	$ -	12,00	$ 77.487,00
20.01.01.13	ABRAZADERAS U/URE	6 3/4"	UNI	126,00	$ 5.711,26	$ 771.637,00	126,00	$ 771.657,00	-	$ -	23,33	$ 142.890,00	23,33	$ 142.890,00	102,67	$ 628.746,00
20.01.01.14	ABRAZADERAS U/URE	1"	UNI	12,00	$ 5.774,16	$ 69.310,00	12,00	$ 69.336,00	-	$ -		$ -	-	$ -	12,00	$ 69.336,00
20.01.01.15	ESCUPLAMB	6"	MTS	300,00	$ 21.727,91	$ 6.518.700,00	300,00	$ 6.278.352,00	-	$ -	100,00	$ 6.173.261,00	100,00	$ 6.173.261,00	80,00	$ 3.104.269,00
20.01.01.16	STRAP 6"x6"		UNI	80,00	$ 21.511,75	$ 1.647.240,00	80,00	$ 1.647.240,00	-	$ -	40,00	$ 2.353.037,00	40,00	$ 2.353.037,00	40,00	$ 4.694.251,00
20.01.01.17	STRAP 3 1/2"x6"		UNI	12,00	$ 37.890,95	$ 647.491,00	12,00	$ 647.491,00	-	$ -		$ -	-	$ -	12,00	$ 647.491,00
20.01.01.18	STRAP 3 1/2"x3"		UNI	80,00	$ 53.213,11	$ 1.919.201,00	80,00	$ 1.929.361,00	-	$ -	40,00	$ 1.409.005,00	40,00	$ 1.409.005,00	40,00	$ 1.820.906,00
20.01.01.19	SOPORTE SEMIREGISTRADO DE 6" VIAS	6"	UNI	2,00	$ 208.272,00	$ 408.544,00	2,00	$ 408.564,00	-	$ -	2,00	$ 408.564,00	2,00	$ 408.564,00	-	$ -
20.01.01.20	SOPORTE SEMIREGISTRADO DE 2" VIAS	2"	UNI	20,00	$ 138.243,77	$ 2.275.040,00	16,00	$ 2.275.040,00	-	$ -	16,00	$ 2.979.800,00	16,00	$ 2.979.800,00	-	$ -
20.01.01.21	JUNTA ANTIVIBRANTE RHE LOOP		UNI	4,00	$ 6.717.527,50	$ 26.870.120,00	4,00	$ 26.870.120,00	-	$ -		$ -	-	$ -	4,00	$ 26.870.120,00
20.01.01.22	VALVULA TIPO DE GUILLOTINA 8-300 PSI		UNI	2,00	$ 88.388,50	$ 176.777,00	2,00	$ 178.776,00	-	$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 178.776,00
20.01.01.23	ROCIADOR RESPUESTA RAPIDA STANDAR K-5.6 UP-RIGHT		UNI	144,00	$ 62.347,00	$ 8.941.488,00	144,00	$ 8.945.376,00	-	$ -	40,00	$ 2.093.918,00	40,00	$ 2.093.918,00	104,00	$ 7.747.490,00
20.01.01.24	ROCIADOR RESPUESTA RAPIDA STANDAR K-5.6 PENDIENTE		UNI	14,00	$ 99.898,60	$ 845.578,00	14,00	$ 845.578,00	-	$ -		$ -	-	$ -	14,00	$ 845.578,00
20.01.01.25	MONTAJE ROCIADOR		UNI	284,00	$ 17.258,39	$ 4.861.909,00	284,00	$ 4.065.803,00	-	$ -	40,00	$ 797.236,00	40,00	$ 797.236,00	284,00	$ 3.268.667,00
20.01.01.26	PINTURA PARA TUBERIA		UNI	730,00	$ 10.141,77	$ 7.403.379,00	730,00	$ 7.408.329,00	-	$ -		$ -	-	$ -	730,00	$ 7.408.329,00
								$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
20.01.02	SALIDAS SANITARIAS					$ 8.888.944,00		$ 8.943.943,00	-	$ 8.796.157,38		$ 157.857,00	-	$ 4.953.253,00	-	$ 4.087.690,00
	Incluye el suministro, instalación, prueba de 3 bloque y accesorios requeridos para realizar la conexión de agua sanitaria de artefactos de los sanitarios existentes a partir de cámaras. Comprende el trazo vertical desde la boca de conexión del sanitario hasta							$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
20.01.02.01	LAVATORIOS DE PUSH	6"	UNI	3,00	$ 133.214,63	$ 2.666.574,00	15,00	$ 1.838.574,00	8,00	$ 826.900,00	6,00	$ 679.476,00	14,00	$ 1.583.429,00	1,00	$ 913.345,00
20.01.02.02	LAVAMANOS	2"	UNI	21,00	$ 97.295,23	$ 2.013.974,00	21,00	$ 1.832.424,00	11,00	$ 976.422,00	8,00	$ 788.153,00	20,00	$ 1.744.745,00	1,00	$ 87.228,00
20.01.02.03	CISTERN	2"	UNI	8,00	$ 91.973,34	$ 735.946,00	8,00	$ 732.568,00	4,00	$ 366.283,00	4,00	$ 366.283,00	8,00	$ 732.566,00	-	$ -

CONDICIONES CONTRACTUALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA						SALDO	
							MODIFICATORIO No 1		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO			
ITEM	DESCRIPCION		UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
70.01.04.04	[illegible]	4"	MT	70.00	$ 109.757,19	$ 7.683.390,00	20.50	$ 2.195.350,00	-	$ -		$ -	-	$ -	20,00	$ 2.195.350,00
70.01.05.01	[illegible]	6"	MT	27.00	$ 82.041,33	$ 2.302.211,00	29.00	$ 2.562.314,00	6.00	$ 534.272,00	4.00	$ 356.181,00	10,00	$ 890.453,00	19,00	$ 1.691.861,00
									-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
70.01.07	SUMINISTRO DE AGUA MINIMA, VENTILACIONES Y EXCAVACIONES					$ 3.179.113,00		$ 3.178.933,00	-	$ -		$ 1.365.498,00	-	$ 1.365.498,00	-	$ 1.813.434,00
	Se tiene en esta explicado la mano de obra, herramientas y materiales para la instalación de las tuberías sanitarias de las viviendas de aguas negras, ventilaciones y reconstrucciones hasta el momento con el exterior principal en [illegible]								-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
70.01.07.01	TUBERIA PVC 6	6"	MT	20.00	$ 73.525,71	$ 73.2756,00	10.00	$ 735.534,00	-	$ -	5.00	$ 367.767,00	5.00	$ 367.767,00	5,00	$ 367.767,00
70.01.07.02	TUBERIA PVC 4	4"	MT	21.00	$ 19.196,10	$ 236.980,00	33.00	$ 634.980,00	-	$ -	33.00	$ 636.980,00	33,00	$ 636.980,00	-	$ -
70.01.07.03	TUBERIA PVC 3	3"	MT	5.00	$ 20.106,50	$ 100.672,00	8.00	$ 160.672,00	-	$ -	8.00	$ 160.672,00	8,00	$ 160.672,00	-	$ -
70.01.07.04	ACCESORIOS PVC 6	6"	UN	4.00	$ 84.311,01	$ 674.248,00	8.00	$ 674.248,00	-	$ -		$ -	-	$ -	8,00	$ 674.248,00
70.01.07.05	ACCESORIOS PVC 4	4"	UN	20.00	$ 13.885,35	$ 277.207,00	20.00	$ 277.207,00	-	$ -		$ -	-	$ -	20,00	$ 277.207,00
70.01.07.06	ACCESORIOS PVC 3	3"	UN	5.00	$ 7.950,81	$ 39.754,00	5.00	$ 39.754,00	-	$ -		$ -	-	$ -	5,00	$ 39.754,00
70.01.07.07	JUNTA DE EXPANSION	6"	UN	3.00	$ 26.729,33	$ 80.754,00	3.00	$ 80.754,00	-	$ -		$ -	-	$ -	3,00	$ 80.754,00
70.01.07.08	ABRAZADERAS	6"	UN	3.00	$ 16.732,67	$ 50.982,00	6.00	$ 83.892,00	-	$ -		$ -	-	$ -	6,00	$ 83.892,00
70.01.07.09	ABRAZADERAS	3"	UN	20.00	$ 20.493,36	$ 204.934,00	10.00	$ 108.634,00	-	$ -		$ -	-	$ -	10,00	$ 108.634,00
70.01.07.10	ABRAZADERAS	2"	UN	4.00	$ 8.054,71	$ 36.139,00	4.00	$ 36.139,00	-	$ -		$ -	-	$ -	4,00	$ 36.139,00
70.01.07.11	PASE EN PLACA	3"	UN	2.00	$ 18.134,50	$ 143.217,00	8.00	$ 145.238,00	-	$ -		$ -	-	$ -	8,00	$ 145.238,00
									-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
70.01.08	SUMINISTRO DE AGUA MINIMA, VENTILACIONES Y EXCAVACIONES					$ 13.679.379,00		$ 13.328.179,00	-	$ 229.868,00		$ 8.413.196,00	-	$ 8.633.577,00	-	$ 7.830.070,00
	Se tiene en esta explicado la mano de obra, herramientas y materiales para la instalación de las tuberías sanitarias de las viviendas de aguas negras, ventilaciones y reconstrucciones hasta el momento con el exterior principal en [illegible]								-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
70.01.08.01	TUBERIA PVC 6	6"	MT	10.00	$ 73.516,71	$ 73.516,00	10.00	$ 735.534,00	-	$ -	10.00	$ 735.534,00	10.00	$ 735.534,00	-	$ -
70.01.08.02	TUBERIA PVC 4	4"	MT	41.00	$ 42.746,16	$ 1.727.256,00	43.00	$ 1.839.308,00	0.92	$ 39.380,00	42.08	$ 1.800.542,00	43.00	$ 1.839.308,00	-	$ -
70.01.08.03	TUBERIA PVC 3	3"	MT	19.00	$ 21.307,90	$ 399.024,00	19.00	$ 399.024,00	1.19	$ 37.518,00	17.81	$ 561.606,00	19.00	$ 599.124,00	-	$ -
70.01.08.04	TUBERIA PVC 2	2"	MT	34.00	$ 23.494,26	$ 798.909,00	34.00	$ 798.909,00	0.34	$ 7.866,00	33.66	$ 790.821,00	34.00	$ 798.909,00	-	$ -
70.01.08.05	TUBERIA PVC 4	6"	MT	15.00	$ 23.359,40	$ 350.391,00	15.00	$ 360.391,00	-	$ -	15.00	$ 360.391,00	15.00	$ 360.391,00	-	$ -
70.01.08.06	TUBERIA PVC 4	3"	MT	61.00	$ 25.196,36	$ 1.279.648,00	61.00	$ 1.238.648,00	4.09	$ 82.948,00	56.91	$ 1.144.482,00	61.00	$ 1.238.648,00	-	$ -
70.01.08.07	ACCESORIOS PVC 6	6"	UN	10.00	$ 84.245,07	$ 842.911,00	10.00	$ 842.911,00	-	$ -		$ -	-	$ -	10,00	$ 842.911,00
70.01.08.08	ACCESORIOS PVC 4	4"	UN	72.00	$ 21.121,17	$ 1.521.363,00	72.00	$ 1.521.085,00	1.00	$ 21.533,00		$ -	1.00	$ 21.533,00	71,00	$ 1.500.433,00
70.01.08.09	ACCESORIOS PVC 3	3"	UN	79.00	$ 13.668,36	$ 1.094.356,00	79.00	$ 1.094.868,00	1.00	$ 13.868,00		$ -	1.00	$ 13.860,00	78,00	$ 1.081.908,00
70.01.08.10	ACCESORIOS PVC 2	2"	UN	134.00	$ 7.938,52	$ 1.241.261,00	156.00	$ 1.341.264,00	2.00	$ 23.678,00		$ -	2.00	$ 23.678,00	153,00	$ 1.317.384,00
70.01.08.11	ABRAZADERAS	6"	UN	6.00	$ 16.732,67	$ 100.391,00	6.00	$ 100.396,00	-	$ -		$ -	-	$ -	6,00	$ 100.396,00
70.01.08.12	ABRAZADERAS	4"	UN	21.00	$ 16.127,81	$ 340.191,00	34.00	$ 340.191,00	-	$ -		$ -	-	$ -	21,00	$ 340.191,00
70.01.08.13	ABRAZADERAS	3"	UN	19.00	$ 16.941,26	$ 317.267,00	20.00	$ 317.267,00	-	$ -		$ -	-	$ -	20,00	$ 317.267,00
70.01.08.14	ABRAZADERAS	2"	UN	20.00	$ 9.976,71	$ 152.954,00	20.00	$ 152.954,00	-	$ -		$ -	-	$ -	20,00	$ 152.954,00
70.01.08.15	PASE EN PLACA	6"	UN	73.00	$ 19.236,84	$ 1.073.341,00	36.00	$ 1.078.348,00	-	$ -		$ -	-	$ -	36,00	$ 1.075.348,00
70.01.08.16	PASE EN PLACA	3"	UN	30.00	$ 18.136,72	$ 544.848,00	30.00	$ 544.848,00	-	$ -		$ -	-	$ -	30,00	$ 544.848,00
70.01.08.17	PASE EN PLACA	2"	UN	21.00	$ 19.525,91	$ 410.054,00	21.00	$ 410.054,00	-	$ -		$ -	-	$ -	21,00	$ 410.054,00
70.01.08.18	REFUAS EN ALUMINIO	6"	UN	20.00		$ -	10.00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	10,00	$ -
									-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
70.01.09	SUMINISTRO DE AGUA MINIMA					$ 7.407.914,00		$ 7.407.914,00	-	$ 2.651.537,00		$ 1.193.301,00	-	$ 3.864.838,00	-	$ 3.443.356,00
	Se tiene en esta explicado la mano de obra, herramientas y materiales para la instalación de las tuberías sanitarias de las viviendas de aguas frías desde la matriz hasta el empate de [illegible]								-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
70.01.09.01	TUBERIA PVC 6	6"	MT	54.00	$ 73.170,11	$ 3.971.344,00	54.00	$ 3.971.664,00	30.00	$ 2.208.802,00	15.00	$ 1.103.301,00	45.00	$ 3.309.804,00	9,00	$ 661.861,00
70.01.09.02	ACCESORIOS PVC 6	6"	UN	33.00	$ 84.317,05	$ 2.781.273,00	33.00	$ 2.781.273,00	-	$ -		$ -	-	$ -	33,00	$ 2.781.273,00
70.01.09.03	JUNTA DE EXPANSION	6"	UN	5.00	$ 80.730,53	$ 403.788,00	5.00	$ 403.788,00	-	$ -		$ -	5.00	$ 403.788,00	-	$ -
70.01.09.04	ABRAZADERAS	6"	UN	15.00	$ 16.727,67	$ 250.987,00	15.00	$ 250.987,00	-	$ -		$ -	15.00	$ 250.987,00	-	$ -
									-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -

CONDICIONES GENERALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA						SALDO	
							MODIFICATORIO 1		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO			
ITEM	DESCRIPCION		UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
20.09.10	MANILLES DE AGUAS LLUVIAS					$ 17.907.914,00	-	$ 17.907.914,00	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ 17.907.914,00
	Se toma en este capítulo la mano de obra, herramienta y materiales para la instalación de los manillas, tanto de aguas lluvias como de aguas servidas en cada piso. Incluye el suministro y colocación de la tubería vertical.					$ -	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
20.09.10.05	TUBERIA PVC-S	6"	ML	25,00	$ 73.533,41	$ 1.838.335,00	25,00	$ 1.838.335,00	-	$ -		$ -	-	$ -	25,00	$ 1.838.335,00
20.09.10.03	TUBERIA PVC-S	6"	ML	103,00	$ 42.788,56	$ 4.407.221,00	103,00	$ 4.407.221,00	-	$ -		$ -	-	$ -	103,00	$ 4.407.221,00
20.09.10.04	TUBERIA PVC-S	8"	ML	88,00	$ 31.327,30	$ 2.756.842,00	88,00	$ 2.756.842,00	-	$ -		$ -	-	$ -	88,00	$ 2.828.649,00
20.09.20.01	ACCESORIOS PVC-S	6"	UNI	21,00	$ 84.233,01	$ 1.769.307,00	21,00	$ 1.769.307,00	-	$ -		$ -	-	$ -	21,00	$ 1.769.307,00
20.09.20.02	ACCESORIOS PVC-S	6"	UNI	104,00	$ 21.132,01	$ 2.197.617,00	104,00	$ 2.197.617,00	-	$ -		$ -	-	$ -	104,00	$ 2.197.617,00
20.09.20.03	ACCESORIOS PVC-S	8"	UNI	64,00	$ 19.960,94	$ 1.764.270,00	64,00	$ 1.764.270,00	-	$ -		$ -	-	$ -	64,00	$ 1.764.270,00
20.09.30.02	ABRAZADERAS	6"	UN	14,00	$ 16.797,43	$ 234.255,00	14,00	$ 234.255,00	-	$ -		$ -	-	$ -	14,00	$ 234.255,00
20.09.30.03	ABRAZADERAS	8"	UN	57,00	$ 14.171,91	$ 807.953,00	57,00	$ 807.953,00	-	$ -		$ -	-	$ -	57,00	$ 807.953,00
20.09.30.04	ABRAZADERAS	8"	UN	54,00	$ 10.963,26	$ 592.017,00	84,00	$ 592.017,00	-	$ -		$ -	-	$ -	54,00	$ 592.017,00
20.09.30.30	BRIDAS DE ACERO	8"	UN	54,00		$ -	54,00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	54,00	$ -
20.09.30.11	TRASLANTE TUBULA (Y ACCESORIOS)	6"	UN	40,00		$ -	40,00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	40,00	$ -
20.09.30.17	PASE EN VIGA 1.10 CM	6"	UN	72,00	$ 23.191,64	$ 870.660,00	72,00	$ 870.660,00	-	$ -		$ -	-	$ -	72,00	$ 870.660,00
20.09.30.18	PASE EN VIGA 1.40 CM	6"	UN	3,00	$ 37.937,33	$ 298.530,00	8,00	$ 298.530,00	-	$ -		$ -	-	$ -	8,00	$ 298.530,00
20.09.30.19	PASE EN VIGA 1.30 CM	8"	UN	31,00	$ 13.154,03	$ 362.805,00	31,00	$ 362.805,00	-	$ -		$ -	-	$ -	31,00	$ 362.805,00
20.09.30.21	PASE EN VIGA 1.40 CM	8"	UN	8,00	$ 21.258,52	$ 192.068,00	8,00	$ 192.068,00	-	$ -		$ -	-	$ -	8,00	$ 192.068,00
									-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
20.09.35	CONEXIÓN APARATOS SANITARIOS Y MONTAJES					$ 2.571.775,00		$ 2.571.775,00	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ 2.571.775,00
	Se toma en este capítulo la mano de obra, herramienta y accesorios necesarios para la instalación, montaje y conexión de los aparatos. No incluye el suministro de los mismos.					$ -		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
20.09.35.01	MONTAJE SANITARIOS DE BANQUE		UN	51,00	$ 66.676,08	$ 1.304.061,00	15,00	$ 1.304.061,00	-	$ -		$ -	-	$ -	15,00	$ 1.304.061,00
20.09.11.01	CONEXIÓN LAVAMANOS		UN	31,00	$ 36.576,49	$ 1.606.161,00	31,00	$ 1.606.108,00	-	$ -		$ -	-	$ -	31,00	$ 1.606.108,00
20.09.11.03	CONEXIÓN DUCHAS		UN	5,00	$ 82.432,51	$ 599.529,00	8,00	$ 599.529,00	-	$ -		$ -	-	$ -	8,00	$ 599.529,00
									-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
20.09.12	TAPONES PARA INSTALACIONES HIDRAULICAS, SANITARIAS Y BAJANTES LLUVIAS					$ 272.634,00		$ 272.634,00	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ 272.634,00
20.09.12.01	TAPON PVC S	6"	UN	7,00	$ 12.107,01	$ 84.453,00	7,00	$ 84.453,00	-	$ -		$ -	-	$ -	7,00	$ 84.453,00
20.09.12.02	TAPON PVC S	8"	UN	25,00	$ 6.949,73	$ 173.241,00	25,00	$ 173.241,00	-	$ -		$ -	-	$ -	25,00	$ 173.241,00
									-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
20.09.13	PRUEBAS					$ -		$ 3.000.000,00								
20.09.13.01	POLIZAS DE GARANTÍA		GLB	1,00		$ -	1,00	$ 3.000.000,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ -
									-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
20.09.16	ELABORACIÓN DE PLANOS RECORD					$ 6.291.129,00	-	$ 6.291.129,00	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ 6.291.129,00
20.09.16.01	PLANOS HIDROSANITARIOS E INCENDIO LEÓN CONSTRUCCIÓN		GBL	1,00	$ 6.291.129,00	$ 6.291.129,00	1,00	$ 6.291.129,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 6.291.129,00
									-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
20.09.15	ELABORACIÓN DE MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO					$ 201.285,00	-	$ 201.285,00	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ 201.285,00
20.09.15.01	MANUAL SECCIÓN ESPECIFICACIÓN		UN	1,00	$ 201.284,52	$ 201.285,00	1,00	$ 201.285,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 201.285,00
									-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
	VALOR TOTAL COSTO DIRECTO					$ 298.646.542,00	-	$ 331.884.459,00	-	$ 39.164.541,00		$ 72.852.590,00	-	$ 112.996.441,00	-	$ 214.618.003,00
									-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
	AIU			19%		$ 53.760.343,00	-	$ 66.739.819,03	-	$ 6.139.018,00		$ 14.173.791,00	-	$ 20.312.809,00	-	$ 38.579.897,00
									-				-		-	
	VALOR DEL COSTO DE LA OBRA					$ 352.507.885,00	-	$ 398.543.388,19	-	$ 45.304.439,00		$ 87.026.709,00	-	$ 133.087.145,00	-	$ 253.456.599,80
									-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -

CONDICIONES GENERALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA						SALDO	
							MODIFICATORIA NO 1		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO			
ITEM	DESCRIPCION		UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
	BLOQUE C								-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
29.05.00	RED DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE BLOQUE C					$ 33.029.317,00		$ 21.028.110,00	-	$ -		$ 1.667.047,00	-	$ 1.667.047,00	-	$ 19.442.972,00
	Se tiene en esta capítulo la mano de obra, herramienta y materiales para la red de agua potable desde la Bagada al Bloque C hasta las válvulas de alivio en cada piso (1 válvula del bloque C, tomar de bandejones y las válvulas pasaderas de alivio. Se incluye								-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
29.05.10.01	TUBERIA PVC Ø	8"	ML	66,00	$ 49.345,71	$ 3.147.637,00	64,00	$ 3.147.637,00	-	$ -		$ -	-	$ -	66,00	$ 3.147.637,00
29.05.10.02	TUBERIA PVC Ø	3"	ML	37,00	$ 27.047,94	$ 1.007.047,00	47,00	$ 1.007.047,00	-	$ -	37,00	$ 1.007.047,00	37,00	$ 1.007.047,00	-	$ -
29.05.10.03	TUBERIA PVC Ø	2 1/2"	ML	3,00	$ 27.217,67	$ 81.654,00	3,00	$ 81.654,00	-	$ -		$ -	-	$ -	3,00	$ 81.654,00
29.05.10.04	TUBERIA PVC Ø	2 1/2"	ML	96,00	$ 20.535,54	$ 1.946.187,00	96,00	$ 1.946.187,00	-	$ -		$ -	-	$ -	96,00	$ 1.946.187,00
29.05.10.05	TUBERIA PVC Ø	1/2"	ML	12,34	$ 23.836,62	$ 167.241,00	12,34	$ 167.241,00	-	$ -		$ -	-	$ -	12,34	$ 167.241,00
29.05.10.06	TUBERIA PVC Ø	1/2"	ML	11,40	$ 7.937,34	$ 90.711,00	11,40	$ 90.711,00	-	$ -		$ -	-	$ -	11,40	$ 90.711,00
29.05.10.07	ACCESORIOS PVC Ø	3"	UN	27,00	$ 33.652,00	$ 957.226,00	27,00	$ 957.226,00	-	$ -		$ -	-	$ -	27,00	$ 957.226,00
29.05.10.08	ACCESORIOS PVC Ø	2"	UN	57,00	$ 33.574,23	$ 370.373,00	33,00	$ 370.373,00	-	$ -		$ -	-	$ -	33,00	$ 370.373,00
29.05.10.09	ACCESORIOS PVC Ø	3 1/2"	UN	4,00	$ 7.852,25	$ 31.409,00	4,00	$ 31.409,00	-	$ -		$ -	-	$ -	4,00	$ 31.409,00
29.05.10.10	ACCESORIOS PVC Ø	2 1/2"	UN	124,00	$ 5.907,54	$ 732.553,00	124,00	$ 732.553,00	-	$ -		$ -	-	$ -	124,00	$ 732.553,00
29.05.10.21	ACCESORIOS PVC Ø	1/2"	UN	24,00	$ 3.058,20	$ 73.396,80	24,00	$ 73.396,80	-	$ -		$ -	-	$ -	24,00	$ 73.396,80
29.05.10.22	ACCESORIOS PVC Ø	1/2"	UN	8,00	$ 4.760,00	$ 38.080,00	8,00	$ 38.080,00	-	$ -		$ -	-	$ -	8,00	$ 38.080,00
29.05.10.15	ABRAZADERAS	3"	UN	3,00	$ 7.624,71	$ 43.374,00	6,00	$ 43.374,00	-	$ -		$ -	-	$ -	6,00	$ 43.374,00
29.05.10.16	ABRAZADERAS	2 1/2"	UN	2,00	$ 8.560,00	$ 17.120,00	2,00	$ 17.120,00	-	$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 17.120,00
29.05.10.23	ABRAZADERAS	2 1/2"	UN	64,00	$ 4.243,95	$ 327.813,00	64,00	$ 327.813,00	-	$ -		$ -	-	$ -	64,00	$ 327.813,00
29.05.10.14	ABRAZADERAS	2"	UN	15,70	$ 7.328,05	$ 113.791,00	15,00	$ 113.791,00	-	$ -		$ -	-	$ -	15,00	$ 113.791,00
29.05.10.17	ABRAZADERAS	1/2"	UN	14,00	$ 7.243,21	$ 101.405,00	16,00	$ 116.499,00	-	$ -		$ -	-	$ -	16,00	$ 116.499,00
29.05.10.31	REGISTRO COLTRIA	1 1/2"	UN	10,00	$ 251.900,00	$ 2.519.001,00	10,00	$ 2.519.001,00	-	$ -		$ -	-	$ -	10,00	$ 2.519.001,00
29.05.10.32	VALVULA COMPUERTA DE JUNE	1/4"	UN	1,00	$ 191.665,00	$ 191.665,00	1,00	$ 195.830,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 195.830,00
29.05.10.70	EXCAVACIÓN		M3	32,50	$ 48.179,45	$ 2.263.391,00	32,50	$ 2.261.333,00	-	$ -		$ -	-	$ -	32,50	$ 2.261.333,00
29.07.10.21	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO (SASC)		M3	4,50	$ 199.123,11	$ 896.590,00	4,00	$ 839.004,00	-	$ -		$ -	-	$ -	4,00	$ 839.004,00
29.09.10.23	RELLENO EN ALCERO COMPACTADO		M3	28,50	$ 202.017,20	$ 5.757.490,00	28,50	$ 5.157.490,00	-	$ -		$ -	-	$ -	28,50	$ 5.157.490,00
									-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
29.05.13	PUNTOS HIDRÁULICOS AGUA FRÍA					$ 9.423.000,00		$ 3.823.440,00	-	$ 1.911.720,00		$ -	-	$ 1.911.720,00	-	$ 1.911.720,00
	Incluye el suministro, instalación, prueba de la tubería y accesorios requeridos para realizar la conexión de agua a los aparatos sanitarios y puntos de almacenamiento. Comprende el tramo vertical a partir del codo conforme al nivel se realice el montaje de								-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
29.05.27.01	PUNTO SANITARIO PVC	1 1/4"	UN	21,00	$ 106.353,43	$ 2.231.354,00	14,00	$ 1.431.958,00	7,00	$ 743.979,00		$ -	7,00	$ 743.979,00	7,00	$ 743.979,00
29.05.27.02	PUNTO LAVAMANOS	1/2"	UN	29,00	$ 79.305,72	$ 2.298.766,00	20,00	$ 1.585.115,00	10,00	$ 793.055,00		$ -	10,00	$ 793.055,00	10,00	$ 793.055,00
29.05.27.03	PUNTO CORAL	3/4"	UN	8,00	$ 93.171,44	$ 745.371,00	8,00	$ 745.371,00	4,00	$ 372.686,00		$ -	4,00	$ 372.686,00	4,00	$ 372.686,00
									-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
29.05.28	ANDAMIOS/BANDEJAS DE ROLAR DE ALBAÑIL					$ 5.449.003,00		$ 5.449.003,00	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ 5.449.003,00
29.05.11.01	ANDAMIOS/BANDEJAS DE ROLAR DE ALBAÑIL	3 1/4"	UN	10,00	$ 544.900,30	$ 5.449.003,00	10,00	$ 5.449.003,00	-	$ -		$ -	-	$ -	10,00	$ 5.449.003,00
									-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
29.06.15	RED DE INSTALACIÓN CONTRAINCENDIOS GABINETES PISO 1-2					$ 73.296.482,00		$ 71.296.442,00	-	$ 37.388.253,00		$ 4.764.160,00	-	$ 32.193.353,00	-	$ 38.906.129,00
	Se tiene en esta capítulo la mano de obra, herramienta y materiales para la red de hidrante desde la Bagada al Bloque C hasta las válvulas en cada piso (1 válvula del bloque C, tomar de bandejones y las válvulas pasaderas de alivio. Se incluye								-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
29.05.19.01	TUBERIA C-900	6"	ML	45,00	$ 173.761,07	$ 6.892.248,00	45,00	$ 6.892.248,00	45,00	$ 6.892.248,00	0,00	$ -	45,00	$ 6.892.248,00	-	$ -
29.05.19.02	TUBERIA ACERO INOXIDABLE SCH 10	6"	ML	20,00	$ 201.255,91	$ 4.023.118,00	20,00	$ 4.023.118,00	-	$ -		$ -	-	$ -	20,00	$ 4.023.118,00
29.05.19.03	TUBERIA ACERO INOXIDABLE SCH 10	5"	ML	10,00	$ 149.779,50	$ 1.497.795,00	10,00	$ 1.497.795,00	-	$ -		$ -	-	$ -	10,00	$ 1.497.795,00
29.05.19.04	TUBERIA ACERO INOXIDABLE SCH 10	2½"	ML	30,00	$ 115.425,71	$ 3.154.767,00	40,00	$ 5.154.767,00	-	$ -		$ -	-	$ -	40,00	$ 5.154.767,00
29.05.19.05	TUBERIA ACERO INOXIDABLE ROSCADA SCH 40	2½"	ML	40,00	$ 80.656,34	$ 3.441.275,00	40,00	$ 3.442.988,00	-	$ -		$ -	-	$ -	40,00	$ 3.442.988,00
29.05.19.06	TUBERIA PVCP	2½"	ML	40,00	$ 22.217,93	$ 888.717,00	37,00	$ 822.083,00	-	$ -		$ -	37,00	$ 822.083,00	3,00	$ 66.634,00
29.05.19.07	ACCESORIOS C-900	6"	UN	13,00	$ 909.673,71	$ 9.142.336,00	10,00	$ 9.094.757,00	-	$ -		$ -	-	$ -	5,00	$ 3.047.579,00
29.05.11.05	KIT DE TRANSICION ACERO A C900	6"	UN	4,00	$ 176.523,00	$ 4.794.100,00	4,00	$ 4.794.100,00	-	$ -	4,00	$ 4.794.100,00	4,00	$ 4.794.100,00	-	$ -

CONDICIONES GENERALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA						SALDO	
							MODIFICATORIA NO 1		ACUMULADO ANTEROS		PRESENTE ACTA		ACUMULADO			
ITEM	DESCRIPCION		UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
70.01.17.09	TEE CAP PARA TUBERIA DE 6"	6"	UD	70.00	$ 618.130,79	$ 43.269.155,00	10.00	$ 4.381.539,00	8.00	$ 3.505.235,00		$ -	8.00	$ 3.505.235,00	2.00	$ 876.308,00
70.01.19.08	ACCESORIOS ACERO GALVANIZADO	4"	UD	20.00	$ 127.475,14	$ 2.549.999,00	20.00	$ 2.547.903,00	-	$ -		$ -	-	$ -	20.00	$ 2.549.903,00
70.01.19.11	ACCESORIOS ACERO GALVANIZADO	6"	UD	10.00	$ 87.642,33	$ 876.376,00	10.00	$ 876.426,00	-	$ -		$ -	-	$ -	10.00	$ 876.426,00
70.01.19.12	ACCESORIOS ACERO GALVANIZADO	8in"	UD	10.00	$ 72.997,50	$ 729.975,00	10.00	$ 729.025,00	-	$ -		$ -	-	$ -	10.00	$ 729.025,00
70.01.19.13	ACCESORIOS ACERO GALVANIZADO	10in"	UD	40.00	$ 34.895,82	$ 1.397.833,00	40.00	$ 1.397.855,00	-	$ -		$ -	-	$ -	40.00	$ 1.397.855,00
70.01.19.14	COUPLING	4"	UD	40.00	$ 60.406,37	$ 2.416.255,00	40.00	$ 2.416.255,00	-	$ -		$ -	-	$ -	40.00	$ 2.416.255,00
70.01.19.15	COUPLING	10in"	UD	30.00	$ 48.315,85	$ 1.451.456,00	30.00	$ 1.451.456,00	-	$ -		$ -	-	$ -	30.00	$ 1.451.456,00
70.01.23.06	SOPORTES ANTIMOVIMIENTOS TIPO E 3 VIAS		UD	24.00	$ 172.446,06	$ 4.306.705,00	24.00	$ 4.308.705,00	-	$ -		$ -	-	$ -	24.00	$ 4.308.705,00
70.01.23.07	SOPORTES LIGADORES TIPO E DE 3 VIAS		UD	8.00	$ 206.489,85	$ 825.912,00	4.00	$ 825.912,00	-	$ -		$ -	-	$ -	4.00	$ 825.912,00
70.01.19.16	ABRAZADERAS M/PM	4"	UD	6.00	$ 13.026,45	$ 78.159,00	6.00	$ 78.159,00	-	$ -		$ -	-	$ -	6.00	$ 78.159,00
70.01.19.19	ABRAZADERAS M/PM	8"	UD	3.00	$ 9.772,50	$ 29.317,50	3.00	$ 29.317,00	-	$ -		$ -	-	$ -	3.00	$ 29.317,00
70.01.19.20	ABRAZADERAS M/PM	10in"	UD	3.00	$ 9.129,83	$ 27.389,49	3.00	$ 27.389,00	-	$ -		$ -	-	$ -	3.00	$ 27.389,00
70.01.27.23	ABRAZADERAS M/PM	6in"	UD	12.00	$ 6.497,21	$ 77.967,58	12.00	$ 77.967,00	-	$ -		$ -	-	$ -	12.00	$ 77.967,00
70.01.22.22	VALVULA MARIPOSA	8"	UD	1.00	$ 816.421,37	$ 816.419,00	2.00	$ 1.713.369,00	-	$ -		$ -	-	$ -	2.00	$ 1.713.369,00
70.01.19.23	MANOMETRO 0-100 PSI		UD	2.00	$ 89.368,88	$ 178.776,00	2.00	$ 178.776,00	-	$ -		$ -	-	$ -	2.00	$ 178.776,00
70.01.19.24	VALVULA DISPERSORA DE AIRE	8"	UD	2.00	$ 752.536,75	$ 1.505.073,00	2.00	$ 1.505.072,00	-	$ -		$ -	-	$ -	2.00	$ 1.505.072,00
70.01.23.17	VALVULA DE BOLA U/PM	1"	UD	2.00	$ 137.792,21	$ 275.584,00	2.00	$ 275.584,00	-	$ -		$ -	-	$ -	2.00	$ 275.584,00
70.01.19.28	VALVULA DE GRIDAM	2 1/2"	UD	2.00	$ 588.767,22	$ 1.175.534,00	2.00	$ 1.178.534,00	-	$ -		$ -	-	$ -	2.00	$ 1.178.534,00
70.01.19.27	TOMA DE BOMBEROS	2.1/2"	UD	2.00	$ 632.932,54	$ 1.265.865,00	2.00	$ 1.265.865,00	-	$ -		$ -	-	$ -	2.00	$ 1.265.865,00
70.01.19.29	GABINETE CLASE II CON RESTRICTORA DE PRESION	2.1/2"	UD	2.00	$ 1.073.139,21	$ 2.150.278,00	2.00	$ 2.150.278,00	-	$ -		$ -	-	$ -	2.00	$ 2.150.278,00
70.01.19.29	VIDRIO TEMPLADO PARA TOMA DE BOMBEROS		UD	2.00				$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
70.01.19.28	VIDRIO TEMPLADO PARA GABINETE CLASE II		UD	2.00	$ 137.612,35				-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
70.01.17.21	MUFTRAS DE DESMEMBRACION		UD	2.00	$ 23.153,81	$ 46.306,00	2.00	$ 46.306,00	-	$ -		$ -	-	$ -	2.00	$ 46.306,00
70.01.23.22	VINCHA / PLACHITAS DE IDENTIFICACION		UD	2.00	$ 9.228,06	$ 18.456,00	2.00	$ 18.606,00	-	$ -		$ -	-	$ -	2.00	$ 18.606,00
70.01.23.23	PINTURA PARA TUBERIAS		M2	60.00	$ 20.142,73	$ 913.739,00	60.00	$ 912.758,00	-	$ -		$ -	-	$ -	60.00	$ 912.758,00
70.01.23.24	EXCAVACION MATERIAL COMUN		M3	54.00	$ 69.579,48	$ 3.757.297,00	54.00	$ 3.757.293,00	-	$ -		$ -	54.00	$ 3.757.293,00	-	$ -
70.01.19.13	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO DE EX EXCAVACION		M3	27.00	$ 48.170,76	$ 1.300.594,00	27.00	$ 1.300.494,00	-	$ -		$ -	27.00	$ 1.300.494,00	-	$ -
70.01.23.25	RELLENO DE MEDIO		M3	9.00	$ 192.617,39	$ 1.733.557,00	9.00	$ 1.838.157,00	-	$ -		$ -	9.00	$ 1.838.157,00	-	$ -
70.01.19.27	RELLENO EN ARENA		M3	18.00	$ 190.273,16	$ 3.424.917,00	18.00	$ 3.424.917,00	-	$ -		$ -	18.00	$ 3.424.917,00	-	$ -
									-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
70.00.00	SITE DE ESTACIONAMIENTO CENTRAL MICRODIS (ESCALERITA)					$ 110.194.347,00		$ 149.258.364,00	-	$ 73.660.844,00		$ -	-	$ 73.660.844,00	-	$ 77.665.419,00
	Al tomar la obra capitulo 5 incrust de obra, Supervisor mp y encuentro para la red de incendios donde la estructura de cemento con losa1 en cada piso hasta las montantes de los pisos 3-5							$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
70.01.20.01	TUBERIA ACERO INTERO GALVANIZADA SCH 10	8"	ML	700.00	$ 117.276,19	$ 33.016.366,00	340.00	$ 39.946.380,00	120.00	$ 17.973.180,00		$ -	120.00	$ 17.973.180,00	620.00	$ 17.973.180,00
70.01.20.02	TUBERIA ACERO NEGRO SOLDADA SCH 40	6.1/2"	ML	40.00	$ 86.854,84	$ 3.442.198,00	40.00	$ 3.442.198,00	-	$ -		$ -	40.00	$ 3.442.198,00	-	$ -
70.01.20.01	TUBERIA ACERO INTERO SOLDADA SCH 40	6.3/4"	ML	440.00	$ 67.644,71	$ 29.771.211,00	440.00	$ 29.774.233,00	220.00	$ 14.887.116,00		$ -	220.00	$ 14.887.116,00	220.00	$ 14.887.116,00
70.01.20.04	TUBERIA ACERO NEGRO SOLDADA SCH 40	5"	ML	40.00	$ 57.865,19	$ 2.314.608,00	40.00	$ 2.314.604,00	20.00	$ 1.157.302,00		$ -	20.00	$ 1.157.302,00	20.00	$ 1.157.302,00
70.01.20.05	TUBERIA PVC P	3/4	ML	25.00	$ 27.777,92	$ 777.627,00	25.00	$ 777.627,00	-	$ -		$ -	-	$ -	25.00	$ 777.627,00
70.01.20.06	ACCESORIOS ACERO GALVANIZADO	8"	UD	64.00	$ 87.642,71	$ 5.609.131,00	64.00	$ 6.909.123,00	25.00	$ 2.191.064,00		$ -	25.00	$ 2.191.064,00	39.00	$ 3.418.068,00
70.01.20.07	ACCESORIOS ACERO ROSCADOS	6.1/2"	UD	17.00	$ 54.693,37	$ 929.784,00	17.00	$ 929.783,00	15.00	$ 620.370,00		$ -	15.00	$ 620.370,00	2.00	$ 88.363,00
70.01.20.08	ACCESORIOS ACERO ROSCADOS	6.3/4"	UD	108.00	$ 27.864,94	$ 2.798.194,00	108.00	$ 2.798.884,00	60.00	$ 1.678.137,00		$ -	60.00	$ 1.678.137,00	48.00	$ 1.118.756,00
70.01.20.09	ACCESORIOS ACERO ROSCADOS	5"	UD	10.00	$ 29.273,21	$ 292.719,00	10.00	$ 302.719,00	10.00	$ 302.719,00		$ -	10.00	$ 302.719,00	-	$ -
70.01.20.10	ACCESORIOS PVC P	2.1/2"	UD	20.00	$ 7.810,21	$ 157.045,00	20.00	$ 157.045,00	20.00	$ 157.045,00		$ -	20.00	$ 157.045,00	-	$ -
70.01.20.11	ABRAZADERAS U/PM	8"	UD	68.00	$ 9.777,30	$ 674.218,00	68.00	$ 674.238,00	30.00	$ 293.169,00		$ -	30.00	$ 293.169,00	38.00	$ 381.120,00
70.01.20.13	ABRAZADERAS M/U/PM	2.1/2"	UD	12.00	$ 6.477,27	$ 77.967,00	12.00	$ 77.967,00	10.00	$ 64.972,00		$ -	10.00	$ 64.972,00	2.00	$ 12.994,00
70.01.20.15	ABRAZADERAS U/PM	3.1/4"	UD	126.00	$ 5.778,16	$ 728.467,00	126.00	$ 771.057,00	70.00	$ 428.658,00		$ -	70.00	$ 428.658,00	56.00	$ 342.958,00

ITEM	DESCRIPCION		UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO #		OBRA EJECUTADA ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		SALDO	
							CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
20 05 20 18	ABRAZADERAS U/UP M	6"	UNI	12,00	$ 3.713,16	$ 89.338,00	12,00	$ 89.338,00	8,00	$ 29.691,00		$ -	8,00	$ 29.691,00	7,80	$ 40.647,00
20 05 20 13	CODOFUSIL	6"	UNI	360,00	$ 23.757,81	$ 8.372.040,00	180,00	$ 8.376.050,00	80,00	$ 4.139.025,00		$ -	80,00	$ 4.139.025,00	80,00	$ 4.139.025,00
20 05 20 15	REGISTRO DE PRUEBA Y DESCARGA DE MANILLA Y RESPECTOR PARA ROCIADOR C/U/O	2 1/2"	UNI	3,00	$ 617.375,13	$ 1.234.948,00	2,00	$ 1.234.948,00	-	$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 1.234.948,00
20 05 20 17	TEMP 6 "HT"		UNI	95,00	$ 97.471,97	$ 9.047.233,00	95,00	$ 9.047.233,00	40,00	$ 3.353.037,80		$ -	40,00	$ 3.353.037,80	55,00	$ 5.694.251,00
20 05 20 19	TEMP 8 "HT"		UNI	12,00	$ 37.340,09	$ 447.481,00	12,00	$ 447.481,00	8,00	$ 298.320,00		$ -	8,00	$ 298.320,00	4,00	$ 149.164,00
20 05 20 20	TEMP 8 1/2"HT"		UNI	46,00	$ 31.211,13	$ 3.673.961,00	46,00	$ 3.678.961,00	46,00	$ 1.870.356,00		$ -	46,00	$ 1.870.356,00	40,00	$ 1.808.605,00
20 05 20 22	ROCIADOR RESPUESTA RAPIDA ESTANDAR 15 MM	3"	UNI	2,00	$ 204.292,00	$ 408.584,00	6,00	$ 1.226.753,00	6,00	$ 1.226.753,00		$ -	6,00	$ 1.226.753,00	(4,00)	$ 817.966,00
20 05 20 23	ROCIADOR ESTANDAR/ESTANTE DE 15 MM	3"	UNI	16,00	$ 166.243,77	$ 2.679.900,00	16,00	$ 2.679.900,00	-	$ -		$ -	-	$ -	16,00	$ 2.679.900,00
20 05 20 24	SANTA ANTIBOMBA PRE COP	3"	UNI	4,00	$ 4.717.529,83	$ 18.870.120,00	2,00	$ 9.435.060,00	2,00	$ 9.435.060,00		$ -	2,00	$ 9.435.060,00	2,00	$ 9.435.060,00
20 05 20 25	MANOMETRO DE GOLPEOS 0-300 PSI		UNI	1,00	$ 84.946,66	$ 176.776,00	2,00	$ 176.776,00	-	$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 176.776,00
20 05 20 26	ROCIADOR RESPUESTA RAPIDA ESTANDAR 15 MM PENDIENTE		UNI	144,00	$ 57.347,39	$ 8.241.406,00	180,00	$ 8.841.406,00	80,00	$ 4.587.832,00		$ -	80,00	$ 4.587.832,00	100,00	$ 5.853.574,00
20 05 20 27	ROCIADOR RESPUESTA RAPIDA ESTANDAR 15 MM PENDIENTE		UNI	18,00	$ 50.099,66	$ 945.579,00	18,00	$ 945.579,00	-	$ -		$ -	-	$ -	18,00	$ 945.579,00
20 05 20 28	MONSALE ROCIADOR		UNI	294,00	$ 27.956,00	$ 4.095.864,00	294,00	$ 4.095.800,00	90,00	$ 1.884.472,00		$ -	90,00	$ 1.884.472,00	124,00	$ 2.471.432,00
20 05 20 27	PINTURA PARA TUBERIAS		UNI	700,00	$ 10.143,71	$ 7.107.247,00	700,00	$ 7.107.247,00	250,00	$ 2.536.443,00		$ -	250,00	$ 2.833.443,00	510,00	$ 5.172.304,00
							-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
20 05 21	SALIDAS SANITARIAS					$ 9.642.874,00	-	$ 9.662.874,00	-	$ 2.478.827,00		$ -	-	$ 2.478.827,00	-	$ 9.168.747,00
	Incluye el suministro, instalación, pruebas de la tubería y accesorios requeridos para realizar la conexión de aguas servidas/no domiciliarias de las sanitarias sanitarios a partir de diámetro. Comprende el tramo vertical desde la boca de descarga del aparato hasta						-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
20 05 21 01	SANITARIOS DE PUSH	4"	UNI	25,00	$ 119.244,99	$ 2.981.125,00	14,00	$ 1.580.426,00	7,00	$ 792.715,00		$ -	7,00	$ 792.715,00	7,00	$ 792.715,00
20 05 21 02	LAVAMANOS	2"	UNI	70,00	$ 87.318,29	$ 3.748.733,00	20,00	$ 1.744.733,00	10,00	$ 872.392,00		$ -	10,00	$ 872.392,00	10,00	$ 872.392,00
20 05 21 03	ORINAL	2"	UNI	8,00	$ 91.572,24	$ 757.588,00	8,00	$ 732.586,00	4,00	$ 366.293,00		$ -	4,00	$ 366.293,00	4,00	$ 366.293,00
20 05 21 04	BIDON DE PISO	4"	UNI	20,00	$ 109.767,49	$ 2.195.350,00	20,00	$ 2.195.350,00	-	$ -		$ -	-	$ -	20,00	$ 2.195.350,00
20 05 21 05	SIFON DE PISO	2"	UNI	27,00	$ 29.841,53	$ 2.404.224,00	27,00	$ 2.404.224,00	8,00	$ 443.227,00		$ -	8,00	$ 443.227,00	22,00	$ 1.858.997,00
							-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
20 05 22	SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y VENTILACIONES Y REVENTILACIONES					$ 2.992.857,00	-	$ 2.992.857,00	-	$ 148.328,00		$ -	-	$ 148.328,00	-	$ 2.847.619,00
	Incluye el suministro, instalación, pruebas de la tubería y accesorios requeridos para realizar la conexión de las bocas verticales de bajadas de aguas negras, ventilaciones y reventilaciones hasta el encuentro con el colector principal en piso 0.						-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
20 05 22 01	TUBERIA PVC S	6"	MTS	39,00	$ 19.313,51	$ 753.334,00	90,00	$ 735.834,00	-	$ -		$ -	-	$ -	90,00	$ 735.834,00
20 05 22 02	TUBERIA PVC-A	3"	MTS	25,00	$ 27.223,00	$ 687.579,00	25,00	$ 687.579,00	-	$ -		$ -	-	$ -	25,00	$ 687.579,00
20 05 22 03	ACCESORIOS PVC-S	6"	UNI	8,00	$ 84.781,05	$ 674.248,00	8,00	$ 674.248,00	-	$ -		$ -	-	$ -	8,00	$ 674.248,00
20 05 22 04	ACCESORIOS PVC-S	3"	UNI	20,00	$ 15.866,34	$ 277.267,00	20,00	$ 277.267,00	-	$ -		$ -	-	$ -	20,00	$ 277.267,00
20 05 22 05	JUNTA DE EXPANSION	6"	UNI	1,00	$ 60.733,78	$ 60.734,00	1,00	$ 60.734,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 60.734,00
20 05 22 06	ABRAZADERAS	6"	UNI	3,00	$ 15.717,67	$ 63.862,00	8,00	$ 63.862,00	-	$ -		$ -	-	$ -	8,00	$ 63.862,00
20 05 22 07	ABRAZADERAS	3"	UNI	27,00	$ 10.863,26	$ 293.614,00	18,00	$ 106.834,00	-	$ -		$ -	-	$ -	18,00	$ 106.834,00
20 05 22 08	PASE DE PLACA	6"	UNI	3,00	$ 13.134,33	$ 143.238,00	8,00	$ 143.238,00	8,00	$ 143.238,00		$ -	8,00	$ 143.238,00	-	$ -
							-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
20 05 23	SANEAMIENTO DE AGUAS NEGRAS, VENTILACIONES Y REVENTILACIONES					$ 12.372.649,00	-	$ 12.372.649,00	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ 12.172.649,00
	Incluye el suministro, instalación, pruebas de la tubería y accesorios requeridos para realizar la conexión de las bocas verticales de bajadas de aguas negras, ventilaciones y reventilaciones hasta el encuentro con las bajadas verticales.						-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
20 05 23 01	TUBERIA PVC-S	6"	MTS	39,00	$ 19.313,51	$ 753.334,00	40,00	$ 738.534,00	-	$ -		$ -	-	$ -	40,00	$ 753.334,00
20 05 23 02	TUBERIA PVC-S	4"	MTS	37,00	$ 42.764,78	$ 1.582.377,00	37,00	$ 1.582.177,00	-	$ -		$ -	-	$ -	37,00	$ 1.582.177,00
20 05 23 03	TUBERIA PVC-S	3"	MTS	28,00	$ 21.527,18	$ 634.162,00	28,00	$ 630.362,00	-	$ -		$ -	-	$ -	28,00	$ 630.362,00
20 05 23 04	TUBERIA PVC-S	2"	MTS	31,00	$ 23.494,16	$ 776.114,00	31,00	$ 728.326,00	-	$ -		$ -	-	$ -	31,00	$ 728.326,00
20 05 23 05	TUBERIA PVC-S	8"	MTS	13,00	$ 29.134,98	$ 380.395,00	15,00	$ 380.381,00	-	$ -		$ -	-	$ -	15,00	$ 380.381,00
20 05 23 06	TUBERIA PVC-S	3"	MTS	36,00	$ 20.126,96	$ 723.971,00	36,00	$ 723.923,00	-	$ -		$ -	-	$ -	36,00	$ 723.923,00
20 05 23 07	ACCESORIOS PVC S	6"	UNI	39,00	$ 84.261,95	$ 842.211,00	10,00	$ 842.611,00	-	$ -		$ -	-	$ -	10,00	$ 842.611,00
20 05 23 08	ACCESORIOS PVC-S	4"	UNI	73,00	$ 21.152,27	$ 1.500.433,00	71,00	$ 1.500.433,00	-	$ -		$ -	-	$ -	71,00	$ 1.500.433,00
20 05 23 09	ACCESORIOS PVC S	3"	UNI	77,00	$ 13.699,35	$ 1.054.968,00	78,00	$ 1.054.968,00	-	$ -		$ -	-	$ -	78,00	$ 1.054.968,00

CONDICIONES GENERALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA						SALDO	
							MODIFICATORIA NO 1		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO			
ITEM	DESCRIPCION		UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
20 05 21 10	ACCESORIOS PVC-S	2"	UN	157,00	$ 7.956,62	$ 1.217.204,00	153,00	$ 1.217.204,00	-	$ -		$ -	-	$ -	153,00	$ 1.217.204,00
20 05 21 11	ABRAZADERAS	6"	UN	8,00	$ 16.712,47	$ 100.395,00	8,00	$ 100.395,00	-	$ -		$ -	-	$ -	8,00	$ 100.395,00
20 05 21 21	ABRAZADERAS	4"	UN	21,00	$ 14.174,41	$ 297.667,00	21,00	$ 297.667,00	-	$ -		$ -	-	$ -	21,00	$ 297.667,00
20 05 21 31	ABRAZADERAS	3"	UN	20,00	$ 12.863,36	$ 257.267,00	20,00	$ 257.267,00	-	$ -		$ -	-	$ -	20,00	$ 257.267,00
20 05 21 15	ABRAZADERAS	2"	UN	33,00	$ 9.916,78	$ 323.354,00	33,00	$ 323.354,00	-	$ -		$ -	-	$ -	33,00	$ 323.354,00
20 05 22 13	PASE EN PLACA	6"	UN	23,00	$ 28.759,64	$ 990.452,00	23,00	$ 990.452,00	-	$ -		$ -	-	$ -	23,00	$ 990.452,00
20 05 22 15	PASE EN PLACA	5"	UN	22,00	$ 25.145,93	$ 599.406,00	22,00	$ 599.406,00	-	$ -		$ -	-	$ -	22,00	$ 599.406,00
20 05 22 17	PASE EN PLACA	4"	UN	23,00	$ 13.629,61	$ 377.267,00	23,00	$ 377.267,00	-	$ -		$ -	-	$ -	23,00	$ 377.267,00
20 05 23 10	REJILLAS EN ALUMINIO	6"	UN	10,00		$ -	10,00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	10,00	$ -
									-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
20.05.22	RAMALES DE REDES LLENAS					$ 7.302.178,00		$ 7.302.178,00	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ 7.302.178,00
	Se toma en este capítulo la mano de obra, herramientas y materiales para la instalación de las tuberías horizontales, verticales de las bajantes de aguas lluvias desde la entrada hasta el empate al colector principal en primer piso.								-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
20 05 22 01	TUBERIA PVC-S	6"	UN	26,00	$ 77.234,11	$ 4.119.991,00	54,00	$ 4.119.991,00	-	$ -		$ -	-	$ -	54,00	$ 4.119.991,00
20 05 22 02	ACCESORIOS PVC-S	6"	UN	30,00	$ 82.747,89	$ 2.529.432,00	30,00	$ 2.529.432,00	-	$ -		$ -	-	$ -	30,00	$ 2.529.432,00
20 05 22 03	JUNTA DE EXPANSION	6"	UN	5,00	$ 80.754,52	$ 403.768,00	5,00	$ 403.768,00	-	$ -		$ -	-	$ -	5,00	$ 403.768,00
20 05 22 04	ABRAZADERAS	6"	UN	13,00	$ 16.715,47	$ 230.867,00	15,00	$ 230.867,00	-	$ -		$ -	-	$ -	13,00	$ 230.867,00
									-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
20 05 23	RAMALES DE REDES LLENAS					$ 20.701.341,00		$ 20.701.341,00	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ 20.701.341,00
	Se toma en este capítulo la mano de obra, herramientas y materiales para la instalación de las tuberías horizontales, verticales y bajantes de aguas lluvias en cada piso, hasta el empate con los colectores principales.								-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
20 05 23 01	TUBERIA PVC-S	6"	UN	32,00	$ 73.171,41	$ 2.353.709,00	32,00	$ 2.353.709,00	-	$ -		$ -	-	$ -	32,00	$ 2.353.709,00
20 05 23 02	TUBERIA PVC-S	4"	UN	107,00	$ 43.766,16	$ 4.678.375,00	107,00	$ 4.678.375,00	-	$ -		$ -	-	$ -	107,00	$ 4.678.375,00
20 05 23 03	TUBERIA PVC-S	3"	UN	108,00	$ 31.377,00	$ 3.404.880,00	108,00	$ 3.404.880,00	-	$ -		$ -	-	$ -	108,00	$ 3.404.880,00
20 05 23 04	ACCESORIOS PVC-S	6"	UN	25,00	$ 84.245,01	$ 2.107.626,00	25,00	$ 2.107.626,00	-	$ -		$ -	-	$ -	25,00	$ 2.107.626,00
20 05 23 05	ACCESORIOS PVC-S	4"	UN	103,00	$ 71.117,85	$ 3.178.684,00	103,00	$ 3.178.684,00	-	$ -		$ -	-	$ -	103,00	$ 3.178.684,00
20 05 23 06	ACCESORIOS PVC-S	3"	UN	97,00	$ 14.660,95	$ 1.344.455,00	97,00	$ 1.344.455,00	-	$ -		$ -	-	$ -	97,00	$ 1.344.455,00
20 05 23 07	ABRAZADERAS	6"	UN	18,00	$ 16.732,47	$ 301.184,00	18,00	$ 301.184,00	-	$ -		$ -	-	$ -	18,00	$ 301.184,00
20 05 23 08	ABRAZADERAS	4"	UN	38,00	$ 14.174,63	$ 538.302,00	38,00	$ 538.302,00	-	$ -		$ -	-	$ -	38,00	$ 538.302,00
20 05 23 09	ABRAZADERAS	3"	UN	60,00	$ 10.865,58	$ 651.802,00	60,00	$ 651.802,00	-	$ -		$ -	-	$ -	60,00	$ 651.802,00
20 05 23 10	REJILLAS DE ALUMINIO	6"	UN	54,00		$ -		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
20 05 23 11	TERMINAL CUPULA EN ALUMINIO	4"	UN	40,00		$ -		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
20 05 23 12	PASE EN VIGA L 10 CM	6"	UN	48,00	$ 28.758,64	$ 1.356.331,00	48,00	$ 1.356.331,00	-	$ -		$ -	-	$ -	48,00	$ 1.356.331,00
20 05 23 13	PASE EN VIGA L 40 CM	4"	UN	20,00	$ 17.277,33	$ 373.573,00	18,00	$ 373.573,00	-	$ -		$ -	-	$ -	18,00	$ 373.573,00
20 05 23 14	PASE EN VIGA L 15 CM	3"	UN	34,00	$ 16.134,92	$ 940.344,00	84,00	$ 980.388,00	-	$ -		$ -	-	$ -	84,00	$ 980.388,00
20 05 23 15	PASE EN VIGA L 10 CM	2"	UN	11,00	$ 21.340,95	$ 234.750,00	11,00	$ 234.750,00	-	$ -		$ -	-	$ -	11,00	$ 234.750,00
									-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
20.05.24	CONEXIÓN APARATOS SANITARIOS Y MUEBLES					$ 3.408.362,00		$ 3.408.362,00	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ 3.408.362,00
	Se toma en este capítulo la mano de obra, herramientas y accesorios necesarios para la instalación, conexión y operación de los aparatos. Ello incluye el suministro de los aparatos.								-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
20 05 24 01	MONTAJE SANITARIOS DE PISO		UN	14,00	$ 86.964,09	$ 1.217.105,00	14,00	$ 1.217.105,00	-	$ -		$ -	-	$ -	14,00	$ 1.217.105,00
20 05 24 02	CONEXIÓN LAVAMANOS		UN	20,00	$ 76.576,62	$ 1.531.526,00	20,00	$ 1.531.526,00	-	$ -		$ -	-	$ -	20,00	$ 1.531.526,00
20 05 24 03	CONEXIÓN SIFONES		UN	8,00	$ 62.453,45	$ 499.629,00	8,00	$ 499.629,00	-	$ -		$ -	-	$ -	8,00	$ 499.629,00
									-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
20 05 25	TAPONES PARA INSTALACIONES HIDRAULICAS, SANITARIAS Y AGUAS LLENAS					$ 257.743,00		$ 257.743,00	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ 257.743,00
20 05 25 01	TAPON PVC S	6"	UN	7,00	$ 14.207,19	$ 99.453,00	7,00	$ 99.453,00	-	$ -		$ -	-	$ -	7,00	$ 99.453,00
20 05 25 02	TAPON PVC S	4"	UN	34,00	$ 4.949,71	$ 168.292,00	34,00	$ 168.292,00	-	$ -		$ -	-	$ -	34,00	$ 168.292,00
									-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -

	CONDICIONES GENERALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA						SALDO	
							MODIFICATORIA NO 1		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO			
ITEM	DESCRIPCION		UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
28.01.25	PRUEBAS					$ -		$ 3.000.000,00	-	$ -			-	$ -	-	$ -
28.01.26.01	PRUEBAS DE RADIOTES		GLB	1,00		$ -	1,00	$ 3.000.000,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ -
									-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
28.01.27	TRANSMISIÓN DE PLANOS RECIBIDO					$ 6.251.128,00		$ 6.251.128,00	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ 6.251.128,00
28.01.27.01	PLANOS REPRESENTATIVOS (RECIBIDO SEGÚN CLASIFICACIÓN		UN	1,00	$ 6.251.128,00	$ 6.251.128,00	1,00	$ 6.251.128,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 6.251.128,00
									-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
28.01.28	ELABORACIÓN DE MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO					$ 201.265,00		$ 201.265,00	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ 201.265,00
28.01.28.01	MANUAL SEGÚN CLASIFICACION		UD	1,00	$ 201.265,00	$ 201.265,00	1,00	$ 201.265,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 201.265,00
									-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
	VALOR TOTAL COSTO DIRECTO					$ 313.945.874,00		$ 315.826.424,00	-	$ 102.529.793,00		$ 6.299.147,00	-	$ 109.804.930,00	-	$ 207.841.494,00
									-				-		-	
	AIU				15%	$ 56.512.358,00		$ 56.868.756,00	-	$ 18.434.291,00		$ 1.133.808,00	-	$ 19.772.887,00	-	$ 37.370.268,00
									-				-		-	
	IVA VIGENTE SOBRE LA UTILIDAD					$ 8.972.041,00		$ 9.031.301,00	-	$ 985.471,00		$ 80.871,00	-	$ 1.066.087,00	-	$ 7.977.864,00
									-				-		-	
	VALOR TOTAL					$ 378.430.273,00		$ 379.794.481,00	-	$ 123.141.940,00		$ 7.513.826,00	-	$ 130.731.914,00	-	$ 249.062.567,00
									-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
									-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
28.02	GAS								-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
28.02.01	RED DE GAS BAJA PRESION					$ 7.550.488,00		$ 7.550.488,00	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ 7.550.488,00
	Se tomo en esta capitulo la mano de obra, herramienta y material para la instalación de las redes de gas de baja presión desde la acometida de potrero origen y centro de medición hasta las viviendas previstas a las obras, las cuales se encuentran								-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
28.02.01.01	TUBERÍA HG	1"	ML	28,42	$ 63.343,27	$ 661.897,00	10,42	$ 662.882,00	-	$ -		$ -	-	$ -	10,42	$ 662.882,00
28.02.01.02	TUBERÍA HG	1/2"	ML	71,64	$ 46.547,43	$ 3.317.671,00	71,64	$ 3.337.883,00	-	$ -		$ -	-	$ -	71,64	$ 3.337.883,00
28.02.01.03	ACCESORIOS HG	1"	UD	8,00	$ 21.133,63	$ 169.069,00	8,00	$ 169.088,00	-	$ -		$ -	-	$ -	8,00	$ 169.088,00
28.02.01.04	ACCESORIOS HG	1/2"	UD	25,00	$ 14.630,71	$ 372.268,00	25,00	$ 372.268,00	-	$ -		$ -	-	$ -	25,00	$ 372.268,00
28.02.01.05	CORAZA EN CONDUFLEX PARA PROTECCIÓN DE TUBERÍA	1"	UN	52,06	$ 17.697,47	$ 917.961,00	82,06	$ 1.427.865,00	-	$ -		$ -	-	$ -	82,06	$ 1.427.865,00
28.02.01.06	ABRAZADERAS	1"	UD	2,00	$ 7.897,45	$ 15.795,00	2,00	$ 15.795,00	-	$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 15.795,00
28.02.01.07	ABRAZADERAS	1/2"	UN	14,00	$ 7.146,05	$ 100.305,00	14,00	$ 100.305,00	-	$ -		$ -	-	$ -	14,00	$ 100.305,00
28.02.01.08	ELEVADOR	1"	UN	1,00	$ 109.453,33	$ 109.453,00	1,00	$ 109.453,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 109.453,00
28.02.01.09	REGISTRO BOLA GAS	1"	UN	1,00	$ 61.999,99	$ 61.999,00	1,00	$ 61.310,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 61.310,00
28.02.01.10	REGISTRO BOLA GAS	1/2"	UD	7,00	$ 36.130,76	$ 252.960,00	7,00	$ 252.960,00	-	$ -		$ -	-	$ -	7,00	$ 252.960,00
28.02.01.11	REGULADOR PRIMERA ETAPA		UN	1,00		$ -		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
28.02.01.12	MEDIDOR G-10		UN	1,00		$ -		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
28.02.01.13	REGULADOR MR VENTED ASOCIADO A APARATOS		UN	1,00		$ -		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
28.02.01.14	NICHO PARA REGULACION PRIMERA ETAPA Y MEDIDOR		UN	1,00		$ -		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
28.02.01.15	PLACAS TIPO STICKERS DE IDENTIFICACION		UN	7,00	$ 9.303,04	$ 65.121,00	7,00	$ 65.121,00	-	$ -		$ -	-	$ -	7,00	$ 65.121,00
28.02.01.16	PINTURA PARA TUBERÍAS		UN	82,06	$ 9.529,95	$ 782.196,00	82,06	$ 782.406,00	-	$ -		$ -	-	$ -	82,06	$ 782.406,00
									-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
28.04.02	RED DE BAJA GAS PRESIÓN					$ 4.991.315,00		$ 4.868.235,00	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ 4.868.235,00
	Se tomo en esta capitulo la mano de obra, herramienta y material tal para la baja tension de las redes de gas de baja presión desde la salida de las regulaciones previstas hasta el punto de conexión de los artefactos o gas.								-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
28.04.02.01	TUBERÍA HG	3/4"	ML	31,64	$ 46.857,43	$ 1.484.867,00	31,64	$ 1.484.867,00	-	$ -		$ -	-	$ -	31,64	$ 1.484.867,00
28.04.02.02	ACCESORIOS HG	3/4"	UN	24,00	$ 14.630,71	$ 357.377,00	24,00	$ 357.377,00	-	$ -		$ -	-	$ -	24,00	$ 357.377,00
28.04.02.03	CORAZA EN CONDUFLEX PARA PROTECCIÓN DE TUBERÍA	1"	ML	31,64	$ 17.697,47	$ 547.102,00	31,64	$ 547.102,00	-	$ -		$ -	-	$ -	31,64	$ 547.102,00
28.04.02.04	ABRAZADERAS	3/4"	UN	8,00	$ 7.304,01	$ 60.668,00	8,00	$ 60.668,00	-	$ -		$ -	-	$ -	8,00	$ 60.668,00
28.04.02.05	PINTURA PARA TUBERIAS		ML	31,64	$ 9.529,95	$ 302.483,00	31,64	$ 302.483,00	-	$ -		$ -	-	$ -	31,64	$ 302.483,00

CONDICIONES GENERALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA						SALDO	
						MODIFICATORIO No 1		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO			
ITEM	DESCRIPCION		UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
20 04 02 06	REJILLAS DE VENTILACION		UNI	0.00		$ -	4,00	$ -		$ -		$ -	-	$ -	4,00	$ -
20 04 02 07	PUNTO ESTUFA 6 QUEMADORES		UNI	1.00	$ 127.729,00	$ 127.729,00	1,00	$ 127.729,00		$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 127.729,00
20 04 02 08	PUNTO ESTUFA 8 QUEMADORES		UNI	3.00	$ 127.729,00	$ 383.187,00	3,00	$ 383.187,00		$ -		$ -	-	$ -	3,00	$ 383.187,00
20 04 02 09	PUNTO MUSHITA		UNI	1.00	$ 127.729,00	$ 127.729,00	1,00	$ 127.729,00		$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 127.729,00
20 04 02 10	PUNTO FREIDORA		UNI	1.00	$ 127.729,00	$ 127.729,00	1,00	$ 127.729,00		$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 127.729,00
20 04 02 11	PUNTO CALEFACTOR		UNI	1.00	$ 127.729,00	$ 127.729,00	1,00	$ 127.729,00		$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 127.729,00
20 04 02 12	CONEXIÓN CALEFACTOR		UNI	1.00	$ 108.940,00	$ 108.940,00	1,00	$ 108.940,00		$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 108.940,00
20 04 02 13	CONEXIÓN FREIDORA		UNI	3.00	$ 111.057,00	$ 333.157,00	3,00	$ 333.157,00		$ -		$ -	-	$ -	3,00	$ 333.157,00
20 04 02 14	CONEXIÓN MUSHITA		UNI	1.00	$ 111.057,00	$ 111.057,00	1,00	$ 111.057,00		$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 111.057,00
20 04 02 15	CONEXIÓN ESTUFA 6 QUEMADORES		UNI	1.00	$ 147.825,00	$ 147.825,00	1,00	$ 147.825,00		$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 147.825,00
20 04 02 16	CONEXIÓN ESTUFA 8 QUEMADORES		UNI	3.00	$ 147.825,00	$ 443.474,00	3,00	$ 443.474,00		$ -		$ -	-	$ -	3,00	$ 443.474,00
								$ -		$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
	VALOR TOTAL COSTO DIRECTO					$ 12.319.733,00		$ 12.539.733,00		$ -		$ -	-	$ -	-	$ 12.539.733,00
								-					-		-	
	GAO				19%	$ 2.277.350,00		$ 2.257.150,00		$ -		$ -	-	$ -	-	$ 2.257.150,00
								-					-		-	
	IVA VIGENTE SOBRE LA UTILIDAD					$ 119.127,00		$ 119.127,00		$ -		$ -	-	$ -	-	$ 119.127,00
								-					-		-	
	VALOR TOTAL					$ 14.916.000,00		$ 14.916.000,00		$ -		$ -	-	$ -	-	$ 64.916.000,00
								-	$ -		$ -		-	$ -	-	$ -
								-	$ -		$ -		-	$ -	-	$ -
20 05	REGIMEN GENERALES							-	$ -		$ -		-	$ -	-	$ -
20 05 01	ACOMETIDA					$ 7.788.809,00		$ 7.788.809,00	$ -		$ -		-	$ -	-	$ 2.788.809,00
	La toma se hace cargo de la mano de obra, herramienta y material en para la red de agua hdp desde la distribución de la red de agua hdp 90mm en 63", pasando por el medidor hasta llegar hasta los distribuidores en el puerto de hombres de agua potable y bomberos.							-	$ -		$ -		-	$ -	-	$ -
20 05 01 01	CAMPAÑA RED ACUEDUCTO (Incluye: Pruebas de componente, Muestras, permisos de consulta y Red Pública y en TP)	UNIDAD	GLB	1.00		$ -	1,00	$ -		$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ -
20 05 01 02	TUBERIA PVC-P	3 1/2"	MTS	41.00	23.215,02	$ 999.857,80	43,00	$ 999.857,80		$ -		$ -	-	$ -	43,00	$ 999.857,80
20 05 01 03	ACCESORIOS PVC-P	3 1/2"	UNI	30.00	7.512,23	$ 235.368,00	30,00	$ 235.368,00		$ -		$ -	-	$ -	30,00	$ 235.368,00
20 05 01 04	ADAPTADORES	3 1/2"	UNI	6.00	8.560,88	$ 51.365,28	6,00	$ 51.365,00		$ -		$ -	-	$ -	6,00	$ 51.365,00
20 05 01 05	UNIVERSAL	3 1/2"	UNI	1.00	36.574,02	$ 36.574,02	1,00	$ 36.574,00		$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 36.574,00
20 05 01 06	REGISTRO 90°	3 1/2"	UNI	8.00	221.817,61	$ 1.660.077,68	8,00	$ 1.660.088,00		$ -		$ -	-	$ -	8,00	$ 1.660.088,00
20 05 01 07	CHEQUE HIERRO	3 1/2"	UNI	2.00	243.681,33	$ 243.681,33	1,00	$ 243.424,00		$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 243.424,00
20 05 01 08	FILTROS MECANICO	3 1/2"	UNI	3.00	781.494,35	$ 1.548.483,00	3,00	$ 1.543.483,00		$ -		$ -	-	$ -	3,00	$ 1.543.483,00
20 05 01 09	VITEUS (PLANTILLA) REGISTROS DE CONTROL		UNI	7.00	8.589,00	$ 59.121,00	7,00	$ 59.121,00		$ -		$ -	-	$ -	7,00	$ 59.121,00
20 05 01 10	MEDIDOR TOMAMEDIDOR DE VELOCIDAD CHORRO MULTIPLE MINIMO 0,5 M3, CON CERTIFICADO DE CALIBRACION EXPEDIDO POR UN LABORATORIO AUTORIZADO POR LA CRRA.	1 1/2"	UNI	1.00		$ -	1,00	$ -		$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ -
20 05 01 11	VALVULA DE COMPUERTA	3 1/2"	UNI	1.00	332.017,83	$ 332.017,83	1,00	$ 332.018,00		$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 332.018,00
20 05 01 12	PETRO 1 m WE	3 1/2"	UNI	1.00	279.244,36	$ 279.244,36	1,00	$ 279.244,00		$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 279.244,00
20 05 01 13	CAMILLA EN CONCRETO PARA MEDIDOR	3 1/2"	UNI	1.00	1.695.564,00	$ 1.695.564,00	1,00	$ 1.695.564,00		$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 1.695.564,00
20 05 01 14	CONEXIÓN MEDIDOR	3 1/2"	MTS	7.00	340.485,33	$ 340.485,00	1,00	$ 340.485,00		$ -		$ -	-	$ -	7,00	$ 340.485,00
20 05 01 15	MAMPOSTERO CUCHARA 0.20CMS		UNI	1.00	84.369,00	$ 84.369,00	1,00	$ 84.369,00		$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 84.369,00
20 05 01 16	COLA DE MARRANO		UNI	1.00	53.105,00	$ 53.105,00	1,00	$ 53.105,00		$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 53.105,00
20 05 01 17	TAPA EN PLACA	3 1/2"	UNI	3.00	40.725,00	$ 40.725,00	3,00	$ 40.725,00		$ -		$ -	-	$ -	3,00	$ 40.725,00
20 05 01 18	PINTURA PARA FUENTERIA		MTS	14.00	-	$ -	14,00	$ -		$ -		$ -	-	$ -	14,00	$ -
								-		$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
20 05 01 19	CUARTO DE BOMBAS AGUA POTABLE PISCINA					$ 62.210.432,00		-	$	$ -		$ -	-	$ -	-	$ 62.210.432,00
	La toma se hace cargo de la mano de obra, herramienta y material en para la construcción de la red de agua hdp pasando dentro del cuarto de bombas, para los equipos de presión hasta la salida del cuarto de bombas (Pared).							-	$ -		$ -		-	$ -	-	$ -

CONDICIONES GENERALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA						SALDO	
							MODIFICATORIO No 1		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO			
ITEM	DESCRIPCION		UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
20.01.02.01	TUBERIA PVC SCH 80	6"	ML	70.00	132.991,26	$ 2.630.838,00	20,00	$ 2.658.838,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	20,00	$ 2.658.838,00
20.01.02.02	TUBERIA PVC SCH 80	2,1/2"	ML	20.00	42.448,23	$ 849.365,00	20,00	$ 849.365,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	20,00	$ 849.365,00
20.01.02.05	TUBERIA PVC SCH 80	1½"	ML	10.00	42.118,13	$ 800.264,00	19,00	$ 800.264,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	19,00	$ 800.264,00
20.01.02.04	TUBERÍA ACERO INOXIDABLE	6"	ML	11.00	875.343,93	$ 9.373.779,00	10,00	$ 8.573.779,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	10,00	$ 8.573.779,00
20.01.02.05	ACCESORIOS CODOS	6"	UN	10.00	945.884,71	$ 9.458.217,00	10,00	$ 3.480.337,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	10,00	$ 3.480.337,00
20.01.02.06	ACCESORIOS CODOS	2,1/2"	UN	20.00	213.345,93	$ 2.173.379,00	10,00	$ 2.133.370,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	10,00	$ 2.133.370,00
20.01.02.07	ACCESORIOS CODOS	1½"	UN	9.00	140.982,70	$ 923.371,00	9,00	$ 923.361,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	9,00	$ 923.361,00
20.01.02.08	ACCESORIOS ACERO INOXIDABLE	6"	UN	11.00	266.317,45	$ 2.907.213,00	12,00	$ 2.907.213,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	12,00	$ 2.907.213,00
20.01.02.09	KNEQUT AMORTIGUADOR LABRADO	6"	UN	3.00	648.371,66	$ 646.371,00	1,00	$ 648.372,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 648.372,00
20.01.02.10	CHIQUE AMORTIGUADOR LABRADO	2,1/2"	UN	4.00	977.733,50	$ 3.910.931,00	4,00	$ 1.510.932,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	4,00	$ 1.510.932,00
20.01.02.11	REGISTRO COMPUERTA EMBRIDADO	6"	UN	2.00	2.936.908,36	$ 5.871.817,00	2,00	$ 5.873.813,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	2,00	$ 5.873.813,00
20.01.02.12	REGISTRO COMPUERTA ROSCADO	2,1/2"	UN	4.00	824.441,79	$ 3.297.847,00	4,00	$ 3.697.847,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	4,00	$ 3.697.847,00
20.01.02.13	REGISTRO COMPUERTA ROSCADO	1½"	UN	3.00	832.897,85	$ 322.691,00	1,00	$ 322.918,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 322.918,00
20.01.02.14	REGISTRO	1½"	UN	1.00	832.897,63	$ 332.916,00	1,00	$ 332.918,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 332.918,00
20.01.02.15	CHEQUE	2½"	UN	2.00	345.891,31	$ 345.951,00	1,00	$ 345.921,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 345.921,00
20.01.02.16	UNIVERSAL	1½"	UN	2.00	86.374,00	$ 86.374,00	1,00	$ 86.674,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 86.374,00
20.01.02.17	VALVULA DE PIE ROSCADA	6"	UN	4.00	723.233,00	$ 2.940.956,00	4,00	$ 2.940.956,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	4,00	$ 2.940.956,00
20.01.02.18	UNION FLEXIBLE BORNACHA	6"	UN	4.00	3.128.833,01	$ 4.513.340,00	4,00	$ 4.513.340,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	4,00	$ 4.513.340,00
20.01.02.19	UNION FLEXIBLE BORNACHA	4"	UN	1.00	1.649.784,06	$ 1.649.787,00	1,00	$ 1.638.784,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 1.638.784,00
20.01.02.20	COPA EXCENTRICA BORNACHA	2" X 1"	UN	4.00	540.872,43	$ 2.164.450,00	4,00	$ 2.163.490,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	4,00	$ 2.163.490,00
20.01.02.21	MANOMETRO 0-160 PSI		UN	4.00	88.252,55	$ 353.706,00	4,00	$ 353.508,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	4,00	$ 353.508,00
20.01.02.22	BRIDA PVC	6"	UN	8.00	191.864,13	$ 1.534.911,00	8,00	$ 1.150.044,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	8,00	$ 1.150.044,00
20.01.02.23	BRIDA ACERO INOX	8"	UN	11.00	187.334,68	$ 2.017.406,00	10,00	$ 2.387.408,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	10,00	$ 2.387.408,00
20.01.02.24	CODA MARIANO		UN	4.00	53.094,00	$ 212.476,00	4,00	$ 212.420,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	4,00	$ 212.420,00
20.01.02.25	TABLERO DE CONTROL		UN	1.00		$ -	1,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ -
20.01.02.26	SOPORTE ESPECIAL	6"	UN	2.00	224.988,63	$ 457.966,00	2,00	$ 457.966,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	2,00	$ 457.966,00
20.01.02.27	SOPORTE ESPECIAL	8"	UN	4.00	199.232,35	$ 724.929,00	4,00	$ 724.929,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	4,00	$ 724.929,00
20.01.02.28	SOPORTE ESPECIAL	2,1/2"	UN	2.00	181.217,50	$ 362.435,00	2,00	$ 362.435,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	2,00	$ 362.435,00
20.11.02.29	ABRAZADERAS	4"	UN	4.00	11.512,63	$ 85.042,00	8,00	$ 85.048,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	8,00	$ 85.048,00
20.05.02.30	ABRAZADERAS	2½"	UN	4.00	8.560,00	$ 34.240,00	4,00	$ 34.240,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	4,00	$ 34.240,00
20.01.02.31	EXTRACTOR DE VENTILACION		UN	4.00	2.252.223,54	$ 9.008.894,00	4,00	$ 8.008.894,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	4,00	$ 8.008.894,00
20.01.02.32	ESCALERA ANTIDESLIZANTE (Material no suministrado)		UN	2.00		$ -	2,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	2,00	$ -
20.01.02.33	CANDADO DE BARRAS	0,15 x 0,20	ML	5.20		$ -	5,20	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	5,20	$ -
20.05.02.34	TUBERIA PVC-S	6"	ML	4.00	42.794,96	$ 171.154,00	4,00	$ 171.154,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	4,00	$ 171.154,00
20.05.02.35	ACCESORIOS PVC-S	6"	UN	4.00	21.232,25	$ 84.921,00	4,00	$ 84.921,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	4,00	$ 84.921,00
20.27.02.36	SIFON PVC-S	6"	UN	2.00	308.767,49	$ 279.535,00	2,00	$ 219.535,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	2,00	$ 219.535,00
20.11.02.37	PINTURA PARA TUBERÍAS		ML	30.00		$ -	80,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	80,00	$ -
20.05.02.38	ETIQUETA / PLAQUETAS DE IDENTIFICACIÓN		UN	8.00	9.303,04	$ 74.424,00	8,00	$ 74.424,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	8,00	$ 74.424,00
									-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
20.00.00	CUERPO DE BOMBAS RED CONTRA INCENDIO Se toma en esta ampliación de la red contra incendio, interconectada y anexada las para la construcción de la red contra incendio dentro del cuarto de bombas, para el equipo Jockey y la bomba principal hasta la salida del cuarto de bombas (exterior) y las tareas					$ 54.988.984,00		$ 54.988.984,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ 54.988.984,00
									-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
20.05.01.01	TUBERIA ACERO INOXIDABLE SCH 80	6"	ML	2.00	662.264,67	$ 3.318.311,00	6,00	$ 3.336.373,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	6,00	$ 3.336.373,00
20.05.01.02	TUBERIA ACERO INOXIDABLE SCH 80	4"	ML	6.00	346.858,41	$ 2.600.401,00	8,00	$ 2.600.401,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	8,00	$ 2.600.401,00
20.05.01.03	TUBERIA ACERO INOXIDABLE SCH 40	2"	ML	5.00	109.230,04	$ 526.150,00	5,00	$ 526.150,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	5,00	$ 526.150,00
20.03.01.04	TUBERIA C-900	6"	ML	1.00	240.563,17	$ 805.448,00	2,00	$ 805.448,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	2,00	$ 805.448,00

CONDICIONES GENERALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA						SALDO	
							MODIFICATORIO No 1		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO			
ITEM	DESCRIPCION		UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
20 05 01 05	ACCESORIOS RANURADOS	4"	UN	13.00	217.676,40	$ 2.787.647,00	13,00	$ 2.787.647,00	-	$ -		$ -	-	$ -	13.00	$ 2.787.647,00
20 05 01 06	ACCESORIOS RANURADOS	6"	UN	30.00	127.487,14	$ 3.824.614,00	30,00	$ 3.824.614,00	-	$ -		$ -	-	$ -	30.00	$ 3.824.614,00
20 05 01 07	ACCESORIOS ROSCADOS	2"	UN	10.00	45.436,90	$ 454.369,00	10,00	$ 454.369,00	-	$ -		$ -	-	$ -	10.00	$ 454.369,00
20 05 01 08	VÁLVULAS C/ VIGI	6"	UN	6.00	1.210.951,26	$ 7.265.716,00	6,00	$ 7.265.716,00	-	$ -		$ -	-	$ -	6.00	$ 7.265.716,00
20 05 03 09	TAPÓN MIP PARA TUBERÍA DE 6"	6"	UN	8.00	578.743,27	$ 4.472.480,00	8,00	$ 4.472.480,00	-	$ -		$ -	-	$ -	8.00	$ 4.472.480,00
20 05 05 10	VÁLVULA DE TRAFILACIÓN ACERO AL CARBÓN	6"	UN	1.00	1.665.737,00	$ 1.665.737,00	1,00	$ 1.665.737,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1.00	$ 1.665.737,00
20 05 05 11	CUPLINE RANURADO	6"	UN	20.00	89.784,50	$ 1.795.690,00	20,00	$ 1.795.690,00	-	$ -		$ -	-	$ -	20.00	$ 1.795.690,00
20 05 05 12	CUPLINE RANURADO	4"	UN	73.00	89.486,37	$ 6.530.478,00	73,00	$ 6.530.478,00	-	$ -		$ -	-	$ -	73.00	$ 6.530.478,00
20 05 07 13	COPA CONCÉNTRICA	6"x4"	UN	1.00	268.161,53	$ 268.161,00	1,00	$ 268.161,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1.00	$ 268.161,00
20 05 08 14	ACOPLE FLEXIBLE	6"	UN	1.00	1.649.784,00	$ 1.649.784,00	1,00	$ 1.649.784,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1.00	$ 1.649.784,00
20 05 08 15	VÁLVULA VASTAGO ASCENDENTE BRIDADA 250 LB	3"	UN	1.00	960.565,00	$ 960.565,00	1,00	$ 960.565,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1.00	$ 960.565,00
20 05 05 16	REGISTRO RW	3"	UN	2.00	533.380,54	$ 1.067.115,00	2,00	$ 1.067.115,00	-	$ -		$ -	-	$ -	2.00	$ 1.067.115,00
20 05 08 17	CAMARA DE PRUEBA CON 3 SALIDAS DE 3 1/1"	6"	UN	1.00	8.124.304,00	$ 8.124.304,00	1,00	$ 8.124.304,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1.00	$ 8.124.304,00
20 01 01 18	GUANTA 6"	6"	UN	1.00	2.373.091,00	$ 2.373.091,00	1,00	$ 2.373.091,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1.00	$ 2.373.091,00
20 05 04 19	BRIDA CIEGA ACERO INOXIDABLE	2"	UN	2.00	112.740,50	$ 225.481,00	2,00	$ 225.481,00	-	$ -		$ -	-	$ -	2.00	$ 225.481,00
20 05 08 20	ABRAZADERAS	6"	UN	4.00	17.305,63	$ 69.222,00	4,00	$ 69.222,00	-	$ -		$ -	-	$ -	4.00	$ 69.222,00
20 01 08 21	ABRAZADERAS	2"	UN	6.00	6.938,83	$ 27.832,00	4,00	$ 27.832,00	-	$ -		$ -	-	$ -	4.00	$ 27.832,00
20 03 03 22	ENTREGA POZO INMOBILIARIO VL/TM	6"	UN	1.00	997.212,00	$ 997.212,00	1,00	$ 997.212,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1.00	$ 997.212,00
20 03 03 23	MANOMETRO 0-100 PSI		UN	2.00	84.236,50	$ 63.369,00	1,00	$ 63.369,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1.00	$ 63.369,00
20 05 05 24	VÁLVULA MARIPOSA		UN	2.00	53.164,50	$ 53.165,00	1,00	$ 53.165,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1.00	$ 53.165,00
20 07 09 25	ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN		UN	3.00	9.368,00	$ 48.513,00	5,00	$ 48.513,00	-	$ -		$ -	-	$ -	5.00	$ 48.513,00
20 05 05 26	VÁLVULA MARIPOSA SUPERVISADA	4"	UN	2.00	782.780,00	$ 2.578.561,00	3,00	$ 2.578.561,00	-	$ -		$ -	-	$ -	3.00	$ 2.578.561,00
20 01 05 27	VÁLVULA MARIPOSA SUPERVISADA	6"	UN	3.00	1.067.236,00	$ 3.134.709,00	2,00	$ 2.134.709,00	-	$ -		$ -	-	$ -	2.00	$ 2.134.709,00
20 05 05 28	VÁLVULA DE ALIVIO DE PRESIÓN	3/4"	UN	1.00	365.674,13	$ 365.674,00	1,00	$ 365.674,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1.00	$ 365.674,00
20 05 05 29	ACCESORIOS PVC-P	1.1/2"	UN	4.00	7.857,25	$ 31.429,00	4,00	$ 31.429,00	-	$ -		$ -	-	$ -	4.00	$ 31.429,00
20 01 01 30	CAMBIAMIENTO	6"	UN	1.00		$ -	1,00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	1.00	$ -
20 05 05 31	SOPORTE ESPECIAL	6"	UN	4.00	228.993,65	$ 915.975,00	4,00	$ 915.975,00	-	$ -		$ -	-	$ -	4.00	$ 915.975,00
20 05 05 32	SOPORTE ESPECIAL	3"	UN	4.00	160.643,05	$ 642.572,00	4,00	$ 642.572,00	-	$ -		$ -	-	$ -	4.00	$ 642.572,00
20 03 08 33	ABRAZADERAS	6"	UN	4.00	14.574,63	$ 58.298,00	4,00	$ 58.298,00	-	$ -		$ -	-	$ -	4.00	$ 58.298,00
20 01 01 34	ABRAZADERAS	3"	UN	3.00	6.938,00	$ 13.916,00	2,00	$ 13.916,00	-	$ -		$ -	-	$ -	2.00	$ 13.916,00
20 01 01 35	PASE EN PLACA	6"	UN	2.00	38.286,84	$ 38.287,00	2,00	$ 38.287,00	-	$ -		$ -	-	$ -	2.00	$ 38.287,00
20 01 01 36	PASE EN PLACA	3"	UN	3.00	13.496,93	$ 13.488,00	1,00	$ 13.488,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1.00	$ 13.488,00
									-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
20 01 01	RED DE AGUA PARA RIEGOS Se hace en esta capítulo la suma de obra, herramienta y materiales desde el empate a la red principal en cada Riego hasta la terminal con los llaves correspond.					$ 1.406.854,00		$ 1.406.854,00	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ 1.406.854,00
									-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
20 0300 01	TUBERIA PVC-P	1/2"	ML	50.00	7.957,14	$ 397.857,00	50,00	$ 397.857,00	-	$ -		$ -	-	$ -	50.00	$ 397.857,00
20 0300 02	ACCESORIOS PVC-P	1/2"	UN	44.00	2.760,06	$ 121.442,00	44,00	$ 121.442,00	-	$ -		$ -	-	$ -	44.00	$ 121.442,00
20 0300 03	REGISTRO CORTINA	1/2"	UN	8.00	110.669,41	$ 885.355,00	8,00	$ 885.355,00	-	$ -		$ -	-	$ -	8.00	$ 885.355,00
									-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
20 05 05	PUNTOS HIDRÁULICOS AGUA FRÍA Incluye el suministro, instalación, prueba de la tubería y accesorios requeridos para realizar la conexión de agua a los aparatos sanitarios o puntos de abastecimiento. Comprende el primer vertical o punto del cual nacen los ramales ubicados en nivel de cielo de					$ 695.825,00		$ 695.825,00	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ 695.825,00
									-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
20 03 03	LLAVE MANGUERAS		UN	8.00	83.728,13	$ 695.825,00	8,00	$ 695.825,00	-	$ -		$ -	-	$ -	8.00	$ 695.825,00
									-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
20 05 06	CONEXIÓN APARATOS SANITARIOS Y MUEBLES Se hace en esta capítulo la suma de obra, herramienta y materiales para la instalación, conexión y conexión de los aparatos, los trabajos al suministro de las mismas.					$ 166.104,00		$ 166.104,00	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ 166.104,00
									-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -

CONDICIONES GENERALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA						SALDO	
							MODIFICATORIA NO 1		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO			
ITEM	DESCRIPCION		UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
20 01 06 01	MONTAJE GRAVETI MANGUERAS	1/2"	UN	8,00	$ 21.243,00	$ 168.104,00	8,00	$ 168.104,00	-	$ -		$ -	-	$ -	8,00	$ 168.104,00
									-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
20 01 07	SUMINISTRO Y/O CONEXIÓN DE SONDEOS					$ 11.901.600,00	-	$ 12.903.600,00	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ 12.903.600,00
	La forma en que medirá la mano de obra y herramienta necesaria para la ejecución de los sondeos								-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
20 01 07 01	CONEXIÓN EQUIPO DE PRESIÓN AGUA POTABLE (2 bombas)		UN	2,00	$ 4.217.309,75	$ 8.217.234,00	1,00	$ 8.257.384,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 8.257.384,00
20 01 07 02	CONEXIÓN BOMBA LUCHA INCENDIO 75HP		UN	1,00	$ 2.967.767,00	$ 2.967.767,00	1,00	$ 2.967.767,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 2.967.767,00
20 01 07 03	CONEXIÓN BOMBA JOCKEY INCENDIO		UN	1,00	$ 1.212.082,00	$ 1.212.082,00	1,00	$ 1.212.082,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 1.212.082,00
20 01 07 04	CONEXIÓN EQUIPO EYECTOR AGUAS RESIDUALES (2 bombas)		UN	1,00	$ 198.214,56	$ 396.217,00	1,00	$ 396.217,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 396.217,00
20 01 07 05	TRAMPA DE GRASAS 50 GPM PLASTICA		UN	2,00		$ -	3,00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	3,00	$ -
									-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
20.01.08	SUMINISTRO EQUIPOS (VER ESPECIFICACIÓN DE EQUIPOS)					$ 84.900.513,00		$ 184.800.300,00	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ 84.900.513,00
20 01 08 01	EQUIPO PRESION AGUA POTABLE (2 BOMBAS)		UN	2,00		$ -	1,00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ -
20 01 08 02	EQUIPO BCB CONTRA INCENDIO BOMBA LUCHA (2 BOMBAS)		UN	2,00		$ -	1,00	$ 116.765.292,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ -
20 01 08 03	EQUIPO BCB CONTRA INCENDIO BOMBA JOCKEY (2 BOMBAS)		UN	2,00		$ -	1,00	$ 60.572.408,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ -
20 01 08 04	EQUIPO EYECTOR AGUAS RESIDUALES (2 BOMBAS)		UN	2,00		$ -	1,00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ -
20 01 08 05	TRAMPA DE GRASAS 50 GPM PLASTICA		UN	3,00	$ 8.210.170,70	$ 24.630.512,00	3,00	$ 24.630.512,00	-	$ -		$ -	-	$ -	3,00	$ 24.630.512,00
									-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
20.09.00	SUMINISTRO DE CASETAS					$ -		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
20 01 09 01	LLAVE BUSCHI		UN	4,00		$ -	4,00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	4,00	$ -
									-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
20.09.10	SUMINISTRO DE CASETAS Comprende la caseta, donde la salida de las bombas y plomería, hasta la entrega al nivel propuesto por cubierta o fundación. Las tapas hacia de las mismas cuelga y pendiente del proyecto. Pueden ser suministrado, ensamblado en sitio o el diseño prefabricado por completo					$ 111.457.944,00		$ 113.457.944,00	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ 113.457.944,00
									-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
20 05 10 01	TUBERIA PVC RECANTARILLADO (NOVAFORT)	12"	MT	3.150,00	$ 343.412,00	$ 32.304.987,00	330,00	$ 82.304.987,00	-	$ -		$ -	-	$ -	330,00	$ 82.304.987,00
20 05 10 02	TUBERIA PVC RECANTARILLADO (NOVAFORT)	10"	MT	134,00	$ 227.941,00	$ 30.540.914,00	134,00	$ 18.360.914,00	-	$ -		$ -	-	$ -	134,00	$ 18.360.914,00
20 05 10 03	TUBERIA PVC RECANTARILLADO (NOVAFORT)	8"	MT	60,00	$ 159.697,13	$ 9.581.827,80	60,00	$ 9.581.827,80	-	$ -		$ -	-	$ -	60,00	$ 9.581.827,80
20 05 10 04	TUBERIA PVC RECANTARILLADO (NOVAFORT)	6"	MT	365,00	$ 84.675,37	$ 23.805.707,00	365,00	$ 23.805.707,00	-	$ -		$ -	-	$ -	365,00	$ 23.805.707,00
20 05 10 05	CAJA DE REGISTRO 1		UN	2,00	$ 1.215.333,50	$ 2.430.667,00	2,00	$ 2.430.667,00	-	$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 2.430.667,00
20 05 10 06	CAJA DE REGISTRO 2		UN	1,00	$ 434.222,00	$ 434.222,00	1,00	$ 434.222,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 434.222,00
20 05 10 07	TUBERIA PVC S	6"	MT	103,00	$ 73.539,71	$ 7.574.892,00	103,00	$ 7.574.892,00	-	$ -		$ -	-	$ -	103,00	$ 7.574.892,00
20 05 10 08	ACCESORIOS PVC S	6"	UN	24,00	$ 84.363,85	$ 2.023.743,00	24,00	$ 2.022.743,00	-	$ -		$ -	-	$ -	24,00	$ 2.022.743,00
20 05 10 09	CODOS PVC S	6"	UN	12,00	$ 86.477,58	$ 1.041.727,00	12,00	$ 1.041.727,00	-	$ -		$ -	-	$ -	12,00	$ 1.041.727,00
									-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
20 05 10 10	CAMICANO CON REJILLA 0,40mx0,40m		UN	46,00		$ -			-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
20 05 10 11	CAMICANO CON REJILLA 0,30mx0,30m		UN	273,00		$ -			-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
20 05 10 12	CAÑUELA EN CONCRETO		UN	573,00		$ -			-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
20 05 10 13	TRANSITO TUBERIA DE SUMINISTRO	6"	ML	77,00		$ -			-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
20 05 10 14	PASES DE MATERIAL		UN	11,00	$ 38.904,00	$ 441.971,00	15,00	$ 882.974,00	-	$ -		$ -	-	$ -	15,00	$ 882.974,00
20 05 10 15	MANEJO DE AGUAS (Incluye cilindros en concreto y todo lo que se requiera para su manejo)		GL	1,00		$ -	1,00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ -
									-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
20 05 11	REDES EXTERIORES DE AGUAS RESIDUALES					$ 53.271.617,00		$ 57.408.358,00	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
	Comprende las redes, desde la salida de las bombas A, B y C, hasta la llegada a la PTAR. La PTAR y portadores de suministrados no se parte del alcance de esta actividad.								-	$ 23.736.743,00		$ -	-	$ 23.736.743,00	-	$ 33.668.614,00
20 05 11 01	TUBERIA PVC ALCANTARILLADO (NOVAFORT)	8"	ML	138,00	$ 38.214,64	$ 14.619.299,00	170,00	$ 14.809.208,00	-	$ -		$ -	133,80	$ 11.537.858,00	36,20	$ 3.121.843,00
20 05 11 02	TUBERIA PVC ALCANTARILLADO (NOVAFORT)	6"	ML	365,00	$ 84.674,57	$ 31.212.308,00	625,00	$ 43.421.328,00	170,15	$ 11.004.302,00		$ -	170,15	$ 11.004.302,00	454,85	$ 29.417.026,00
20 05 11 03	TUBERIA PVC S	6"	ML	99,00	$ 73.539,41	$ 735.534,00	40,00	$ 735.534,00	-	$ -		$ -	-	$ -	40,00	$ 735.534,00
20 05 11 04	TUBERIA PVC S	4"	ML	77,00	$ 42.744,35	$ 841.671,00	15,00	$ 841.671,00	12,70	$ 543.415,00		$ -	12,70	$ 543.415,00	2,30	$ 98.414,00
20 05 11 05	TUBERIA PVC S	3"	ML	4,00	$ 31.727,00	$ 126.908,00	4,00	$ 126.908,00	-	$ -		$ -	-	$ -	4,00	$ 126.908,00

CONDICIONES GENERALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA						SALDO	
							MODIFICATORIO NO 1		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO			
ITEM	DESCRIPCION		UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
10.05.11.06	TUBERIA PVC S	3"	ML	2.00	23.494,50	$ 46.989,00	2,00	$ 46.989,00	-	$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 46.989,00
10.05.11.07	ACCESORIOS PVC-S	4"	UNI	7.00	84.133,85	$ 589.937,00	7,00	$ 589.937,00	7,00	$ 589.937,00		$ -	7,00	$ 589.937,00	-	$ -
10.05.11.08	ACCESORIOS PVC-S	6"	UNI	3.00	41.133,00	$ 126.797,00	3,00	$ 126.797,00	3,00	$ 63.398,00		$ -	3,00	$ 63.398,00	3,00	$ 63.398,00
10.05.11.09	ACCESORIOS PVC-S	8"	UNI	3.00	13.880,00	$ 41.641,00	3,00	$ 41.641,00	-	$ -		$ -	-	$ -	3,00	$ 41.641,00
10.05.11.10	ACCESORIOS PVC-S	8"	UNI	2.00	7.956,50	$ 15.914,00	2,00	$ 15.914,00	-	$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 15.914,00
10.05.11.11	MANEJO DE AGUAS (Incluye entubar en diversas la cual verificar medio pluvial)		GL	1.00	-	$ -	1,00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ -
									-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
10.05.12	CONSTRUCCIONES EN CONCRETO					$ 98.275.299,00	-	$ 68.279.308,00	-	$ 5.131.918,00		$ 5.995.754,00	-	$ 5.327.672,00	-	$ 98.947.534,00
									-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
10.05.12.01	CAJAS DE INSPECCION TIPO B (1.20X1.20X1.20)		UNI	15.00	3.647.365,94	$ 54.708.589,00	15,00	$ 54.708.589,00	-	$ -		$ -	-	$ -	15,00	$ 54.708.589,00
10.05.12.02	CAJAS DE INSPECCION TIPO C (1.50X1.50)		UNI	2.00	3.915.918,00	$ 7.831.836,00	2,00	$ 7.831.836,00	1,00	$ 5.131.918,00	1,00	$ 2.699.754,00	2,00	$ 5.327.672,00	2,00	$ 2.503.836,00
10.05.12.03	CAJAS DE INSPECCION TIPO B (1.20X1.20)		UNI	4.00	3.957.198,50	$ 15.828.797,00	4,00	$ 15.828.797,00	-	$ -		$ -	-	$ -	4,00	$ 15.828.797,00
10.05.12.04	CAJAS DE INSPECCION TIPO A (1.00X1.00)		UNI	11.00	805.094,00	$ 8.861.094,00	11,00	$ 8.861.094,00	-	$ -		$ -	-	$ -	11,00	$ 8.861.094,00
10.05.12.05	POZO DE INSPECCION H=5.10 MTS		UNI	4.00	8.971.537,00	$ 35.886.276,00	4,00	$ 35.886.276,00	-	$ -		$ -	-	$ -	4,00	$ 35.886.276,00
10.05.12.06	CAMILLAS DE PROTECCIÓN PARA TUBERÍA DE DESAGUES		ML	211.00		$ -	233,00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	233,00	$ -
10.05.12.07	DESARENADOR ML		UNI	4.00		$ -	4,00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	4,00	$ -
10.05.12.08	TANQUE DE RESERVA AGUA POTABLE		UNI	1.00		$ -		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
10.05.12.09	TANQUE DE RESERVA AGUA INCENDIO		UNI	1.00		$ -	1,00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ -
									-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
10.05.13	EXCAVACIONES, RELLENOS, ENTIBADOS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS					$ 193.258.975,00		$ 193.258.975,00	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ 193.258.975,00
									-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
10.05.13.01	EXCAVACION MATERIAL COMUN		M3	677.69	69.979,44	$ 47.433.321,00	677,69	$ 47.433.321,00	-	$ -		$ -	-	$ -	677,69	$ 47.433.321,00
10.05.13.02	RELLENO EN SITIO		M3	806.94	142.911,00	$ 92.271.900,00	806,94	$ 92.271.900,00	-	$ -		$ -	-	$ -	806,94	$ 92.271.900,00
10.05.13.03	RELLENO EN MATERIAL BANQUEAR		M3	100.67	182.233,00	$ 18.167.812,00	100,67	$ 18.167.812,00	-	$ -		$ -	-	$ -	100,67	$ 18.167.812,00
10.05.13.04	RETIRO DE SOBRANTES A BOTADERO CERTIFICADO		M3	790.16	29.965,00	$ 23.683.036,00	790,16	$ 23.683.036,00	-	$ -		$ -	-	$ -	790,16	$ 23.683.036,00
10.05.13.05	TRANSPORTE MATERIAL		M3	753.09	14.848,25	$ 11.180.756,00	753,09	$ 11.180.756,00	-	$ -		$ -	-	$ -	753,09	$ 11.180.756,00
10.05.13.06	NIVELACION		ML	1.065.00	3.08.500	$ -	1.065,00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	1.065,00	$ -
									-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
10.05.14	DRENAJES CANCHA DE FUTBOL					$ 78.932.992,00		$ 78.932.992,00	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ 78.932.992,00
	La tubería se debe suministrar la mano de obra, herramienta y materiales para la instalación de las tuberías de la red de filtros para las canchas de futbol. Para incluye la excavación en la zanja (ancho efectivo, zanja), suministro, arena, colchón, tendido								-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
10.05.14.01	TUBERIA PVC ALCANTARILLADO (NOVAFORT)	10"	ML	25.00	123.211,50	$ 3.211.796,00	26,00	$ 3.211.796,00	-	$ -		$ -	-	$ -	26,00	$ 3.211.796,00
10.05.14.02	TUBERIA PVC CORRUGADA DE 12"DRAIN		ML	953.00	28.426.834,00	$ 26.426.834,00	953,00	$ 26.426.834,00	-	$ -		$ -	-	$ -	953,00	$ 26.426.834,00
10.05.14.03	GEOTEXTIL NT 1600		M2	1.175,40	14.639.488,00	$ 14.639.488,00	1.175,40	$ 14.639.488,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1.175,40	$ 14.639.488,00
10.05.14.04	CANALILLA RECOVA	1.00" x 1"	M3	104.46	215.773,31	$ 22.540.051,00	104,46	$ 22.540.051,00	-	$ -		$ -	-	$ -	104,46	$ 22.540.035,00
10.05.14.05	CANALAND DE CONCRETO SECCION UTIL 0.40X0.60m (Cubo incluye excavación y retiro de sobrantes)		ML	266.40		$ -	266,40	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	266,40	$ -
10.05.14.06	CAMARA DE SALIDA	30"	UN	1.00		$ -	1,00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ -
10.05.14.07	CAJAS DE INSPECCION TIPO D (1.50X1.50)		UNI	1.00	3.647.365,94	$ 3.647.365,00	1,00	$ 3.647.108,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 3.647.108,00
10.05.14.08	EXCAVACION PARA FILTRO		M3	104.46	69.979,40	$ 7.310.663,00	104,46	$ 7.289.685,00	-	$ -		$ -	-	$ -	104,46	$ 7.289.685,00
10.05.14.09	RETIRO DE SOBRANTES A BOTADERO CERTIFICADO		M3	111.82	11.979,35	$ 4.013.908,00	133,82	$ 4.033.908,00	-	$ -		$ -	-	$ -	133,82	$ 4.033.908,00
									-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
10.05.15	PRUEBAS					$ -		$ 7.000.000,00	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
10.05.15.05	PRUEBAS DE PRESIÓN		GLB	1.00		$ -	1,00	$ 3.820.000,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ -
10.05.15.02	PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD		GLB	1.00		$ -	1,00	$ 3.180.000,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ -
									-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
10.05.16	ELABORACIÓN DE PLANOS RECORD					$ 12.042.254,00	-	$ 12.042.254,00	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ 12.042.254,00

CONDICIONES GENERALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA						SALDO	
							MODIFICATORIA NO 1		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO			
ITEM	DESCRIPCION		UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
20.03.11.01	PLANOS HIDROSANITARIOS E INCENDIO SEGÚN ESPECIFICACIÓN		UN	29.00	3.756.223,52	$ 12.362.296,00	10,00	$ 12.362.296,00	-	$ -		$ -	-	$ -	10,00	$ 12.362.296,00
								$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
20.05.12	ELABORACIÓN DE MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO					$ 402.589,00		$ 402.589,00	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ 402.589,00
20.03.12.01	MANUAL SEGÚN ESPECIFICACIONES		UN	1.00	201.744,72	$ 402.589,00	2,00	$ 402.589,00	-	$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 402.589,00
								$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
20.05.10	CLASIFICACIÓN DE MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO					$ 9.362.819,00		$ 8.362.819,00	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ 8.362.819,00
								$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
10.03.11.01	DESINFECCION DE SISTEMAS															
10.03.11.02	DESINFECCION SEGÚN ESPECIFICACION (no incluye certificado de laboratorio)		UN	2.00	1.052.407,70	$ 2.104.807,00	2,00	$ 2.104.807,00	-	$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 2.104.807,00
10.03.11.03	LAVADO Y DESINFECCION DEL TANQUE (no incluye certificado de laboratorio)		UN	3.00	1.052.407,70	$ 3.157.211,00	3,00	$ 3.157.211,00	-	$ -		$ -	-	$ -	3,00	$ 3.157.211,00
								$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
20.05.10	TRAMITES ANTE EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS					$ 11.659.875,00		$ 11.659.875,00	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ 11.554.875,00
20.03.10.01	TRAMITES ANTE LA ESP CONDICIONES DOMICILIARIAS		GL	1.00	8.067.730,00	$ 8.067.730,00	1,00	$ 8.067.730,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 8.067.730,00
20.03.10.02	TRAMITES ESP CONDICIÓN DEFINITIVA ACUEDUCTO		GL	1.00	3.568.123,00	$ 3.568.123,00	1,00	$ 3.568.123,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 3.568.123,00
								$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
20.05.20	CONEXIONES DOMICILIARIAS					$ -		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
20.05.20.01	CONEXIÓN DOMICILIARIAS ACUEDUCTOS	8"	UN	3.00		$ -	1,00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ -
								$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
	VALOR TOTAL COSTO DIRECTO					$ 720.875.232,00		$ 800.853.798,00	-	$ 25.070.640,00		$ 3.995.754,00	-	$ 29.066.414,00	-	$ 695.212.697,00
								$ -	-	$ -			-		-	
	AIU			15%		$ 120.531.553,00		$ 152.153.665,00	-	$ 4.512.719,00		$ 719.236,00	-	$ 5.231.955,00	-	$ 125.158.265,00
								$ -	-	$ -		$ -	-		-	
	IVA VIGENTE SOBRE LA UTILIDAD				$ 0,33	$ 6.868.715,00		$ 8.868.715,00	-	$ 23.817.127,00		$ 3.795.908,00	-	$ 27.613.023,00	-	$ 6.804.975,00
								$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	
	VALOR TOTAL					$ 858.529.300,00		$ 971.540.584,00	-	$ 53.400.306,00		$ 5.512.894,00	-	$ 61.811.482,00	-	$ 828.956.580,00
								$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
								$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
20.00	RESUMEN - -							$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
ITEM	DESCRIPCION							$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
	BLOQUE A				UN	$ 481.875.550,00		$ 484.255.859,00	-	$ 132.715.390,00		$ 59.612.869,00	-	$ 192.548.259,00	-	$ 288.828.318,00
	BLOQUE B				UN	$ 551.311.265,00		$ 405.868.810,00	-	$ 56.125.070,00		$ 61.723.588,00	-	$ 117.878.658,00	-	$ 347.008.144,00
	BLOQUE D				UN	$ 290.000.344,00		$ 331.668.438,00	-	$ 33.164.843,00		$ 78.632.596,00	-	$ 113.888.443,00	-	$ 214.810.995,00
	BLOQUE E				UN	$ 812.844.434,00		$ 913.028.424,00	-	$ 103.523.793,00		$ 8.381.947,00	-	$ 108.904.836,00	-	$ 282.941.496,00
	SAS				UN	$ 12.538.723,00		$ 12.538.723,00	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ 12.538.723,00
	REDES SUBTERRANEAS				UN	$ 720.875.232,00		$ 800.853.798,00	-	$ 25.070.640,00		$ 3.995.754,00	-	$ 29.066.414,00	-	$ 695.212.697,00
									-				-		-	
	COSTO DIRECTO					$ 2.716.417.631,00		$ 2.451.230.853,00	-	$ 390.580.373,00		$ 210.617.374,00	-	$ 601.207.748,00	-	$ 1.850.938.425,00
	AIU				15%	$ 598.995.170,00		$ 441.221.554,00	-	$ 70.304.457,00		$ 37.947.327,00	-	$ 108.251.985,00	-	$ 298.969.917,00
	UTILIDAD					$ 21.057.997,00		$ 23.286.683,00	-	$ 3.710.513,00		$ 2.002.765,00	-	$ 5.713.278,00	-	$ 15.778.913,00
	TOTAL					$ 3.334.566.548,00		$ 2.915.738.100,00	-	$ 464.595.343,00		$ 250.767.466,00	-	$ 715.362.921,00	-	$ 1.875.686.257,00
									-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
									-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
	ANEXO CAP. 11 ELÉCTRICA								-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
	INSTALACIONES ELECTRICAS								-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
1	REDES DE MEDIA TENSIÓN (Este ítem depende de la aprobación del proyecto de subestación por parte del OR)								-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
1.1	CONEXIÓN DE MLD A SISTEMA 33kV ÍTEM DEPENDE DE LA APROBACIÓN DEL PROYECTO DE SUBESTACIÓN POR PARTE DEL OR)					$ 53.529.671,00		$ 34.720.823,00	-	$ 27.824.973,00		$ -	-	$ 27.824.973,00	-	$ 6.895.848,00

CONDICIONES GENERALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA						SALDO	
							MODIFICATORIA NO 0		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO			
ITEM	DESCRIPCION		UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
2.1.5	CAJA DE PASO NORMA CT-275 CANALIZACION EMPOTRADA EN TUBERIA PVC TIPO 2140, CON BANCO DE DUCTOS 4 Ø DIAMETRO 6" LISA (4 NORMAS CODENSA CEDO), INCLUYE ALAMBRE DE GUIA EN SU INTERIOR, ACCESORIOS DE FABRICACION CENTRIFUGACION DE PRODUCTO Y EXCAVACION CELDA PUNTO DE CONEXION LUGAR FACTIBILIDAD UN CABLE 3+1x2.5 mm² AL XLPE 1 kV 100% AISLAMIENTO, CON NEUTRO CONCENTRICO PANTALLA CINTA NORMA CODENSA TRIFASICAS PRECARGADAS PARA UNO EXISTENTE 13 kV PARA CABLE 3 FASICO 3+1 x mm² AL XLPE 1 kV 100% AISLAMIENTO, 15 kV DE BIL O EQUIVALENTE (EL ARCO CONTIENE TRES UNIDADES POR CITY VCE)		UNI	3.00	$ 6.914.615,77	$ 6.914.615,00	4,00	$ 27.824.673,00	4,00	$ 27.824.673,00		$ -	4.00	$ 27.824.673,00	-	$ -
2.1.3			UN	10.00	$ 409.761,84	$ 12.113.077,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
2.1.4			UN	300,00	$ 371.892,13	$ 11.156.713,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
2.1.5			UN	1,00	$ 1.000.000,00	$ 1.000.000,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 1.000.000,00
2.1.6			UN	11,00	$ 371.892,13	$ 4.073.101,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
2.1.7			UN	1,00	$ 1.000.000,00	$ 1.000.000,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 1.000.000,00
2.1.8			UN	1,00	$ 1.000.000,00	$ 1.000.000,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
2.1.9			UN	1,00	$ 2.641.798,00	$ 2.641.798,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 2.641.798,00
2.1.10			UN	1,00	$ 844.173,00	$ 844.173,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
									-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
3	CELDAS MT. (Este ítem depende de la aprobación del proyecto de subestación por parte del OR)					$ 140.844.264,00		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
2.2									-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
2.2.2	CELDA PARA ENTRADA PRINCIPAL DE LA RED 34.5 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA CELDA DE ENTRADA DE BAJO DE SALIDA TRASERA CONFIGURADA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: DIMENSIONES APROX. / AL 100 / 0.94 ANCHO 0.37mm PROF. / 1.05 M		UN	1,00	$ 26.439.863,74	$ 26.439.864,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
2.2.3	CELDA PARA SALIDA LINEA RED 34.5 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA CELDA DE ENTRADA DE BAJO DE SALIDA TRASERA CONFIGURADA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: DIMENSIONES APROX. / AL 100 / 0.94 ANCHO 0.37mm PROF. / 1.05 M		UN	1,00	$ 26.439.863,74	$ 26.439.864,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
2.2.4	CELDA PROTECCIÓN DE TRANSFORMADOR SUMINISTRO Y INSTALACIÓN DE UNA CELDA DE PROTECCIÓN DE LA RED DE MEDIA TENSIÓN TIPO SIEMENS 8DJH 36 O SIMILAR, COMPUESTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: DIMENSIONES APROX. / AL 100 / 0.94 ANCHO 0.37mm PROF. / 1.05 M		UN	1,00	$ 80.748.344,00	$ 80.748.344,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
	CELDA DE MEDIDA EN MEDIA TENSIÓN SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA CELDA DE MEDIDA EN MT (AGUJA ESPECIFICACIONES DE OPERADOR DE RED) METODOS DE ENTREGA ACTIVA SIMILIDAD ACLACIÓN 1		UN	1,00	$ 36.621.823,73	$ 36.621.824,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
									-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
3	TRANSFORMADORES (INCLUYE PUERTAS Y BARRERAS DE PROTECCIÓN CONTRA FUEGO) (DIAMETROS O SIMILAR)					$ 825.636.994,00		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
3.1	TRANSFORMADORES DE INTERIOR LOCALES REFRIGERANTE: AGUA POTENCIA 500 [KVA] VOLTAJE PRIMARIO [1.000 [V]		UN	5,00	$ 123.454.998,99	$ 825.636.000,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
4	PLANTAS ELÉCTRICAS					$ 449.433.674,00		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
4.1	Planta ELÉCTRICA PLANTA ELÉCTRICA 500 KVA NORMALES (STAND BY) EFECTIVOS EN MAR SALINA, FACTOR DE POTENCIA 0.8, INCLUYE FILTROS, PRECALENTADOR DE CAMISAS, SISTEMA DE PROTECCION Y CONTROL, SOFTWARE PARA AJUSTE DE PARAMETROS EN TABLERO		UN	1,00	$ 175.316.837,00	$ 353.316.837,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
4.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BATERÍAS		UN	1,00	$ 25.161.737,17	$ 25.161.737,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
4.2	SISTEMA DE ESCAPE DE GASES					$ -			-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
4.2.1	DUCTO DE ESCAPE DE GASES 7" - LÁMINA DE ACERO CR CALIBRE 10		MT	11,00	$ 301.256,63	$ 7.321.576,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
4.2.2	CODOS CH LÁMINA DE ACERO CR CAL 12 DE 7"		UN	4,00	$ 838.511,84	$ 3.353.648,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
4.2.3	RECUBRIMIENTO TÉRMICO PARA TUBERÍA DE GASES DE ESCAPE CON FLEXIWRAP DE 1" Y ACABADO FINAL EN PVC DE ALUMINIO		UN	11,00	$ 344.991,07	$ 3.171.861,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
4.3	SISTEMA DE ALIMENTACIÓN DE ACPM					$ -			-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
4.3.1	TUBERIA EN ACERO AL CARBONO 160 40 DE 3/4" PARA TRANSITO DE COMBUSTIBLE DE FORMA ANTIBALÍNICA, ENTRE TANQUE DE 500 GAL Y TANQUES SUB-BASE, INCLUYE ELECTROVALVULAS CON PRUEBAS, CODOS, UNIONES, VALVULAS Y ACCESORIOS PARA		MT	7,00	$ 53.277.819,00	$ 247.444.717,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
4.3.2	ADECUACIÓN DE TANQUE SUB-BASE PARA INSTALACIÓN DE SENSORES DE NIVEL REMOTE-MONITOR-INTERNET		GL	1,00	$ 8.233.832,00	$ 8.233.832,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
4.3.3	TUBERÍA EMT Y CABLEADO PARA CONEXIÓN DE ELECTROVALVULAS, SENSORES DE NIVEL		GL	1,00	$ 269.706,00	$ 269.706,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
4.4	SISTEMA ELÉCTRICO					$ -			-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
4.4.1	SUMINISTRO Y CONEXIÓN DE PRECALENTADOR DE BATERÍAS A 220V (INCLUYE TUBERÍA Y CABLEADO)		UN	1,00	$ 177.211,00	$ 227.241,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
4.4.2	SUMINISTRO Y CONEXIÓN DE CARGADOR DE BATERÍAS A 120V (INCLUYE TUBERÍA Y CABLEADO)		UN	1,00	$ 240.719,72	$ 209.284,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
4.4.3	SALIDA ELÉCTRICA PARA PRECALENTADOR A 220V		UN	1,00	$ 177.211,00	$ 227.241,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
4.4.4	SALIDA ELÉCTRICA PARA CARGADOR DE BATERIAS A 120V		UN	1,00	$ 207.719,72	$ 207.719,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
4.5	MOVIMIENTO E INSTALACION PLANTA					$ -			-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
4.5.1	AJUSTE EN SITIO DE GRUPO ELECTRÓGENO EXISTENTE PARA REALIZAR ANALISIS DE HUMEDAD		GL	1,00	$ 694.198,11	$ 694.198,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
									-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
5	ILUMINACIÓN SALIDAS DE ALUMBRADO 1.- NO INCLUYE EL SUMINISTRO DE LUMINARIAS. 2.- PARA EL AVALUO DE CADA SALIDA ES ESTE CONSIDERA LA TUBERÍA REGIDA Y					$ 2.257.426.153,00		$ 203.177.161,00	-	$ 43.818.672,00		$ -	-	$ 43.818.672,00	-	$ 161.341.543,00
5.1									-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -

CONDICIONES GENERALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA						SALDO	
							MODIFICATORIA NO 1		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO			
ITEM	DESCRIPCION		UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
3.0.1	SALIDA ELÉCTRICA PARA LUMINARIA		Und	3.434,00	$ 694.206,00	$ 238.196.243,00		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
3.1	SALIDAS PARA CONTROL DE ILUMINACIÓN 1 - INCLUYE EL ACCESORIO. 2 - PARA EL ANÁLISIS DE CADA SALIDA SE DEBE CONSIDERAR LA TUBERÍA RÍGIDA Y								-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
3.1.1	INTERRUPTOR SENCILLO		Und	396,00	$ 379.191,74	$ 13.894.771,00	59,00	$ 10.572.283,00	-	$ -		$ -	-	$ -	59,00	$ 10.572.283,00
3.1.2	INTERRUPTOR DOBLE		Und	2,00	$ 191.577,16	$ 395.621,00	53,00	$ 12.198.297,00	-	$ -		$ -	-	$ -	53,00	$ 12.198.296,00
3.1.3	INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE		Und	8,00	$ 703.268,18	$ 5.613.766,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
3.1.4	INTERR. CONMUTABLE + SENCILLO NORMAL		Und	1,00	$ 210.831,84	$ 433.841,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
3.1.5	INTERRUPTOR DE LUMINOTECNIA		Und	21,00	$ 408.839,73	$ 8.720.979,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
3.1.6	INTERRUPTOR TRIPLE		Und	2,00	$ 212.282,64	$ 212.298,00	10,00	$ 2.122.967,00	-	$ -		$ -	-	$ -	10,00	$ 2.122.967,00
3.1.7	SENSOR TIPO DUAL		Und	20,00	$ 210.817,58	$ 14.208.352,00	18,00	$ 12.765.717,00	-	$ -		$ -	-	$ -	18,00	$ 12.765.712,00
3.1.8	SENSOR DE MOVIMIENTO 360° INTERNO		Und	44,00	$ 196.433,96	$ 14.808.315,00	8,00	$ 2.691.512,00	-	$ -		$ -	-	$ -	8,00	$ 2.691.512,00
3.1.9	CONTROL VENTILADOR		Und	44,00	$ 132.309,42	$ 23.227.576,00	265,00	$ 43.835.572,00	265,00	$ 43.835.572,00		$ -	265,00	$ 43.835.572,00	-	$ -
3.1.10	TABLERO DE CONTROL DE ALUMBRADO - 3 SELECTORES PARA CONTROLAR ILUMINACIÓN EXTERIOR		Und	1,00	$ 5.805.273,51	$ 5.805.336,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
3.1.11	TABLERO DE CONTROL DE ALUMBRADO - 3 SELECTORES PARA CONTROLAR ILUMINACIÓN BIBLIOTECA		Und	1,00	$ 2.219.219,71	$ 2.219.240,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
3.1.12	TABLERO NO DE CONTROL DE ALUMBRADO - 3 SELECTORES PARA CONTROLAR ILUMINACIÓN EN PASILLOS: NOMBRE DEL TABLERO: (CONTROL ILUMINACIÓN 4)		Und	1,00	$ 1.871.998,86	$ 1.871.998,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
3.1.13	TABLERO DE CONTROL DE ALUMBRADO - 3 SELECTORES PARA CONTROLAR ILUMINACIÓN EN PASILLOS: NOMBRE DEL TABLERO: (CONTROL ILUMINACIÓN 2, CONTROL ILUMINACIÓN 3)		Und	2,00	$ 2.216.379,73	$ 4.432.479,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
3.1.14	TABLERO DE CONTROL DE ALUMBRADO - 3 SELECTORES PARA CONTROLAR ILUMINACIÓN EN PASILLOS: NOMBRE DEL TABLERO: (CONTROL ILUMINACIÓN 6, CONTROL ILUMINACIÓN 5)		Und	2,00	$ 2.841.569,99	$ 5.683.140,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
3.1.15	TABLERO DE CONTROL DE ALUMBRADO - 2 SELECTORES PARA CONTROLAR ILUMINACIÓN EN PASILLOS: NOMBRE DEL TABLERO: (CONTROL ILUMINACIÓN 1)		Und	1,00	$ 2.655.185,41	$ 2.655.185,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
									-	$ -					-	$ -
3.2	INSTALACIÓN DE LUMINARIAS 1 - NO INCLUYE EL SUMINISTRO DE LUMINARIAS. 2 - DEBE INCLUIR LOS RELEVANTES DE FUNCIÓN PARA QUE CUMPLA LA NORMA RETIE								-	$ -					-	$ -
3.2.1	INSTALACIÓN DE LUMINARIAS ATENEA 2,5 RELIGIONAL LENS E16 E1OKI 1890 - XTD COLEAR BLANCA 6 1/2 PT 2700Lm 19.3W 61E		Und	77,00	$ 64.346,84	$ 4.737.397,00	27,00	$ 1.737.397,00	-	$ -		$ -	-	$ -	27,00	$ 1.737.397,00
3.2.2	INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TEMPLIA LENS E16 E1150K36CTD SOBREPONER - 2 1/2 PT 3700Lm 21W 61E		Und	612,00	$ 64.346,84	$ 39.511.397,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
3.2.3	INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TEMPLIA LENS E16 E1150K36CTD SOBREPONER - 2 1/2 PT 2700Lm 13.3W 61E		Und	274,00	$ 64.346,84	$ 17.681.364,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
3.2.4	INSTALACIÓN DE LUMINARIAS R 100 AQ LENS E10 1240K2D STAR SOBREPONE - 2 1/2 TB 2700Lm 19W 61E		Und	93,00	$ 64.346,84	$ 5.984.364,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
3.2.5	INSTALACIÓN DE LUMINARIAS CLIMORD SATURNO ES 1660 45 SOBREPONER BAJA 19W		Und	190,00	$ 64.346,84	$ 12.225.516,00	95,00	$ 6.113.084,00	-	$ -		$ -	-	$ -	95,00	$ 6.113.084,00
3.2.6	INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EMERGENCIA ALDEA 600L 90 E LED3000 DB SOBREPONER 2-26 2W (Circuito Independiente)		Und	237,00	$ 64.346,84	$ 14.295.315,00	300,00	$ 19.304.412,00	-	$ -		$ -	-	$ -	300,00	$ 19.304.413,00
3.2.7	INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EMERGENCIA SALIDA 90 E 8000K3 SERIES SOBREPONER 1W (Circuito Independiente)		Und	20,00	$ 64.346,84	$ 1.268.961,00	29,00	$ 1.866.093,00	-	$ -		$ -	-	$ -	29,00	$ 1.866.093,00
3.2.8	INSTALACIÓN DE LUMINARIAS FARON MERCURY LED 51 50 UM		Und	6,00	$ 473.672,10	$ 2.703.864,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
3.2.9	INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LUMINARIA VIAL MILLENIUM LED 21 500 UM		Und	18,00	$ 366.458,30	$ 6.622.105,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
3.2.10	INSTALACIÓN DE LUMINARIAS REFLECTOR APOLLO II UM-PL50 LED 31 30 UM		Und	16,00	$ 64.346,84	$ 1.029.549,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
3.2.11	INSTALACIÓN DE LUMINARIAS REFLECTOR APOLLO II UM-PL90 LED 21750 UM		Und	8,00	$ 64.346,84	$ 514.774,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
									-	$ -					-	$ -
3.3	SUMINISTRO DE LUMINARIAS 1 - PARA EL SUMINISTRO DE LUMINARIA SE DEBE CONSIDERAR LA MARCA CON LA CUAL SE CONCIBIÓ EL PROYECTO ASTRAL, EN CASO CONTRARIO, DEBE GARANTIZAR								-	$ -					-	$ -
3.3.1	SUMINISTRO DE LUMINARIAS ATENEA 2,5 RELIGIONAL LENS E16 E1OKI 1890 - XTD COLEAR BLANCA 6 1/2 PT 2700Lm 19.3W 61E		Und	77,00	$ 3.153.433,38	$ 30.521.701,00	27,00	$ 30.521.701,00	-	$ -		$ -	-	$ -	27,00	$ 30.521.701,00
3.3.2	SUMINISTRO DE LUMINARIAS TEMPLIA LENS E16 E1150K36CTD SOBREPONER - 2 1/2 PT 3700Lm 21W 61E		Und	612,00	$ 847.365,26	$ 518.847.740,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
3.3.3	SUMINISTRO DE LUMINARIAS TEMPLIA LENS E16 E1150K36CTD SOBREPONER - 2 1/2 PT 2700Lm 13.3W 61E		Und	274,00	$ 627.365,26	$ 172.042.421,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
3.3.4	SUMINISTRO DE LUMINARIAS R 100 AQ LENS E10 1240K2D STAR SOBREPONE - 2 1/2 TB 2700Lm 19W 61E		Und	93,00	$ 290.345,96	$ 27.002.674,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
3.3.5	SUMINISTRO DE LUMINARIAS CLIMORD SATURNO ES 1660 45 SOBREPONER BAJA 19W		Und	190,00	$ 213.439,30	$ 38.153.487,00	95,00	$ 29.061.734,00	-	$ -		$ -	-	$ -	95,00	$ 29.861.733,00
3.3.6	SUMINISTRO DE LUMINARIAS EMERGENCIA ALDEA 600L 90 E LED3000 DB SOBREPONER 2-26 2W (Circuito Independiente)		Und	273,00	$ 94.743,61	$ 21.463.324,00	300,00	$ 28.423.684,00	-	$ -		$ -	-	$ -	300,00	$ 28.423.684,00
3.3.7	SUMINISTRO DE LUMINARIAS EMERGENCIA SALIDA 90 E 8000K3 SERIES SOBREPONER 1W (Circuito Independiente)		Und	28,00	$ 114.575,32	$ 3.221.118,00	29,00	$ 3.322.888,00	-	$ -		$ -	-	$ -	29,00	$ 3.322.890,00
3.3.8	SUMINISTRO DE LUMINARIAS FARON MERCURY LED 51 50 UM		Und	6,00	$ 1.407.677,24	$ 5.631.064,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
3.3.9	SUMINISTRO DE LUMINARIAS LUMINARIA VIAL MILLENIUM LED 21 500 UM		Und	18,00	$ 779.423,17	$ 14.029.614,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
3.3.10	SUMINISTRO DE LUMINARIAS REFLECTOR APOLLO II UM-PL50 LED 31 30 UM		Und	16,00	$ 2.202.287,66	$ 35.236.603,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
3.3.11	SUMINISTRO DE LUMINARIAS REFLECTOR APOLLO II UM-PL90 LED 11750 UM		Und	8,00	$ 817.518,49	$ 6.540.133,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
									-	$ -					-	$ -
4	DESMONTES					$ 390.795.710,00		$ 344.608.335,00	-	$ 348.517.393,96		$ -	-	$ 348.517.393,00	-	$ 4.082.083,00

CONDICIONES GENERALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA						SALDO	
							MODIFICATORIA NO 1		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO			
ITEM	DESCRIPCION		UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
6.0	SALIDAS DE BOMBAS 1 - INCLUYE EL APARATO. 2 - PARA EL INSTALADOR EN CADA SALIDA SE DEBE CONSIDERAR LA TUBERÍA REQUERIDA Y							-		-				-		-
6.1.1	SALIDA ELECTRICA PARA BOMBA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA MONOFÁSICO SISTEMA NORMAL 1 SA, 120V Y 60CICLOS NEMA 5-15R, INCLUYE TOMA MARCA LEVITON O SIMILAR COLOR BLANCO CON PLACA DE NYLON ENCAPSADA, DUCTO EMT, CAJAS		UNI	331.00	$ 233.96,66	$ 84.905.434,00	333,00	$ 80.338.471,00	333,00	$ 80.338.471,00	-	$ -	333,00	$ 80.338.471,00	-	$ -
6.1.2	SALIDA ELECTRICA PARA BOMBA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA MONOFÁSICO SISTEMA NORMAL EN POZO 1 SA, 120V Y 60CICLOS NEMA 5-15R		UNI	33.00	$ 233.96,66	$ 8.445.053,00	33,00	$ 8.445.053,00	-	$ -	-	$ -	33,00	$ 8.445.053,00	-	$ -
6.1.3	SALIDA ELECTRICA PARA BOMBA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA MONOFÁSICO SISTEMA NORMAL EN TECHO 1 SA, 120V Y 60CICLOS NEMA 5-15R		UNI	56.00	$ 233.913,84	$ 14.330.998,00	56,00	$ 14.330.998,00	-	$ -	-	$ -	56,00	$ 14.330.998,00	-	$ -
6.1.4	SALIDA PARA BOMBA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA MONOFÁSICO SISTEMA NORMAL EN CAMARA 1 SA, 120V Y 60CICLOS NEMA 5-15R		UNI	202.00	$ 233.916,66	$ 51.693.856,00	202,00	$ 51.693.856,00	-	$ -	-	$ -	202,00	$ 51.693.856,00	-	$ -
6.1.5	SALIDA ELECTRICA PARA BOMBA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA MONOFÁSICO SISTEMA NORMAL EN CAMARA 1 SA, 120V Y 60CICLOS NEMA 5-15R		UNI	12.00	$ 233.916,66	$ 4.220.661,00	12,00	$ 4.220.661,00	-	$ -	-	$ -	12,00	$ 4.220.661,00	-	$ -
6.1.6	SALIDA ELECTRICA PARA BOMBA CORRIENTE DOBLE CON TOMA REGULADO COLOR NARANJA CON POLO A TIERRA AISLADO, MONOFÁSICO 15A, 120V, 60CICLOS NEMA 5-15R, INCLUYE TOMA MARCA LEVITON REF 5261-IG CON PLACA DE NYLON,		UNI	63.00	$ 272.995,92	$ 17.198.748,00	63,00	$ 17.198.748,00	-	$ -	-	$ -	63,00	$ 17.198.748,00	-	$ -
6.1.7	SALIDA ELECTRICA PARA BOMBA CORRIENTE DOBLE CON TOMA REGULADO COLOR NARANJA EN POZO CON POLO A TIERRA AISLADO, MONOFÁSICO 15A, 120V, 60CICLOS NEMA 5-15R, INCLUYE TOMA MARCA LEVITON REF 5261-IG CON PLACA DE NYLON,		UNI	30.00	$ 272.995,10	$ 8.194.953,00	30,00	$ 8.194.953,00	-	$ -	-	$ -	30,00	$ 8.194.953,00	-	$ -
6.1.8	SALIDA ELECTRICA PARA BOMBA CORRIENTE DOBLE CON TOMA REGULADO COLOR NARANJA EN TECHO CON POLO A TIERRA AISLADO, MONOFÁSICO 15A, 120V, 60CICLOS NEMA 5-15R, INCLUYE TOMA MARCA LEVITON REF 5261-IG CON PLACA DE NYLON,		UNI	53.00	$ 272.995,53	$ 14.468.682,00	53,00	$ 14.468.682,00	-	$ -	-	$ -	53,00	$ 14.468.682,00	-	$ -
6.1.9	SALIDA ELECTRICA PARA BOMBA CORRIENTE DOBLE CON TOMA REGULADO COLOR NARANJA EN CAMARA CON POLO A TIERRA AISLADO, MONOFÁSICO 15A, 120V, 60CICLOS NEMA 5-15R, INCLUYE TOMA MARCA LEVITON REF 5261-IG CON PLACA DE		UNI	293.00	$ 272.995,12	$ 80.196.714,00	217,00	$ 59.108.714,00	-	$ -	202,00	$ 55.108.714,00	15,00	$ 4.092.063,00		
6.1.10	SALIDA ELECTRICA PARA BOMBA CORRIENTE BIFÁSICO		UNI	6.00	$ 284.135,45	$ 3.414.807,00	11,00	$ 3.345.470,00	-	$ -	-	$ -	11,00	$ 3.345.470,00	-	$ -
6.1.11	SALIDA ELECTRICA PARA BOMBA CORRIENTE BIFÁSICO		UNI	11.00	$ 317.414,95	$ 3.602.004,00	11,00	$ 3.602.004,00	-	$ -	-	$ -	11,00	$ 3.602.004,00	-	$ -
6.1.12	SALIDA PARA ALUMBRADO (NO INCLUYE APARATO)		UNI	331.00	$ 254.268,87	$ 57.859.304,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
6.1.13	SALIDA PARA SECAMANOS (NO INCLUYE APARATO)		UNI	11.00	$ 254.963,87	$ 2.812.248,00	12,00	$ 2.512.248,00	-	$ -	-	$ -	12,00	$ 2.512.248,00	-	$ -
6.1.14	SALIDA PARA VENTILADOR (NO INCLUYE APARATO)		UNI	277.00	$ 254.963,87	$ 67.163.393,00	253,00	$ 66.793.730,00	-	$ -	-	$ -	253,00	$ 66.793.730,00	-	$ -
							-	$ -							-	$ -
7	TABLEROS, CAJAS Y PROTECCIONES					$ 647.738.123,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
7.1	TABLEROS Y CELDAS DE FABRICACIÓN ESPECIAL 1 - DEBE INCLUIR TODOS LOS ELEMENTOS INTERNOS DEL TABLERO SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR						-	$ -							-	$ -
7.1.1	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MONTAJE DE UNA CELDA AUTO SOPORTADA, EN LÁMINA GALVANIZADA COLD ROLLED CALIBRE 14 CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEABLE DE TIPO BARRAR DE 1170 DEL DE LAS SIGUIENTES		UNI	1,00	$ 63.999.014,14	$ 63.999.014,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
7.1.2	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MONTAJE DE UNA CELDA AUTO SOPORTADA, EN LÁMINA GALVANIZADA COLD ROLLED CALIBRE 14 CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEABLE DE TIPO BARRAR DE 1170 DEL DE LAS SIGUIENTES		UNI	1,00	$ 14.393.375,40	$ 14.393.375,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
7.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO TGA "TABLERO GENERAL DE ACOMETIDAS" TIPO AUTO SOPORTADO, EN LÁMINA DE CAL 14 Y 16, TRATAMIENTO ESPECIFICADO, BARRAJE DOBLE DE COBRE DE 1200 A, 208/120 V, LOS INTERRUPTORES SE		UNI	1,00	$ 63.999.056,00	$ 63.999.056,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
7.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO TGA-1 "TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN UNO" TIPO AUTO SOPORTADO, EN LÁMINA CR CAL. 14 Y 16, TRATAMIENTO ESPECIFICADO, BARRAJE DOBLE DE COBRE DE 1 Y 2 A, 208/120 V, LOS		UNI	1,00	$ 6.422.832,99	$ 6.422.832,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
7.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO TGA-2 "TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN DOS" TIPO AUTO SOPORTADO, EN LÁMINA CR CAL. 14 Y 16, TRATAMIENTO ESPECIFICADO, BARRAJE DOBLE DE COBRE DE 1 Y 2 A, 208/120 V, LOS		UNI	1,00	$ 6.342.341,38	$ 6.342.341,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
7.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO TGA-3 "TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN TRES" TIPO AUTO SOPORTADO, EN LÁMINA CR CAL. 14 Y 16, TRATAMIENTO ESPECIFICADO, BARRAJE DOBLE DE COBRE DE 1 Y 2 A, 208/120 V, LOS		UNI	1,00	$ 6.421.317,45	$ 6.421.317,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
7.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO TGA-4 "TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN CUATRO" TIPO AUTO SOPORTADO, EN LÁMINA CR CAL. 14 Y 16, TRATAMIENTO ESPECIFICADO, BARRAJE DOBLE DE COBRE DE 1 Y 2 A, 208/120 V, LOS		UNI	1,00	$ 6.733.622,00	$ 6.733.622,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
7.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO TGA-AUX "TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN AUXILIARES" TIPO AUTO SOPORTADO, EN LÁMINA CR CAL. 14 Y 16, TRATAMIENTO ESPECIFICADO, BARRAJE DOBLE DE COBRE DE 2 Y 5 A, 208/120 V, LOS		UNI	1,00	$ 4.208.263,00	$ 4.208.263,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
7.1.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO TGA-5 TIPO AUTO SOPORTADO, EN LÁMINA CR CAL. 14 Y 16, TRATAMIENTO ESPECIFICADO, BARRAJE DOBLE DE COBRE DE 2 Y 5 A, 208/120 V, LOS INTERRUPTORES SE CONECTARÁN DIRECTAMENTE A BARRAS CON		UNI	1,00	$ 5.565.342,00	$ 5.565.342,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
7.1.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BYPASS A TIPO SOBREPUESTO, EN LÁMINA CR CAL. 14 Y 16, TRANSFERENCIA ENPOSICIONES, CON BARRAJE DE COBRE PARA 225 A, 208/120 V, LOS INTERRUPTORES SE CONECTARÁN DIRECTAMENTE A BARRAS, CON MARCACIÓN Y		UNI	1,00	$ 8.845.870,00	$ 8.845.870,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
7.1.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BYPASS A TIPO SOBREPUESTO, EN LÁMINA CR CAL. 14 Y 16, TRANSFERENCIA ENPOSICIONES, CON BARRAJE DE COBRE PARA 225 A, 208/120 V, LOS INTERRUPTORES SE CONECTARÁN DIRECTAMENTE A BARRAS, CON MARCACIÓN Y		UNI	1,00	$ 8.845.870,00	$ 8.845.870,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
7.1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BYPASS A TIPO SOBREPUESTO, EN LÁMINA CR CAL. 14 Y 16, TRANSFERENCIA ENPOSICIONES, CON BARRAJE DE COBRE PARA 225 A, 208/120 V, LOS INTERRUPTORES SE CONECTARÁN DIRECTAMENTE A BARRAS, CON MARCACIÓN Y		UNI	1,00	$ 8.367.371,00	$ 8.367.371,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
7.1.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BYPASS A TIPO SOBREPUESTO, EN LÁMINA CR CAL. 14 Y 16, TRANSFERENCIA ENPOSICIONES, CON BARRAJE DE COBRE PARA 225 A, 208/120 V, LOS INTERRUPTORES SE CONECTARÁN DIRECTAMENTE A BARRAS, CON MARCACIÓN Y		UNI	1,00	$ 8.845.870,00	$ 8.845.870,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
7.1.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BYPASS A TIPO NORMAL/NORMAL, EN LÁMINA CR CAL. 14 Y 16, TRANSFERENCIA ENPOSICIONES, CON BARRAJE DE COBRE PARA 225 A, 208/120 V, LOS INTERRUPTORES SE CONECTARÁN DIRECTAMENTE A BARRAS, CON MARCACIÓN Y		UNI	1,00	$ 8.367.371,00	$ 8.367.371,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
7.1.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BYPASS A TIPO NORMAL/NORMAL, EN LÁMINA CR CAL. 14 Y 16, ENCLOSURE ESPECIFICADO, CON BARRAJE DE COBRE PARA 225 A, 208/120 V, LOS INTERRUPTORES SE CONECTARÁN DIRECTAMENTE A BARRAS, CON MARCACIÓN		UNI	1,00	$ 8.845.870,00	$ 8.845.870,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
7.1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BYPASS A TIPO NORMAL/NORMAL, EN LÁMINA CR CAL. 14 Y 16, TRANSFERENCIA ENPOSICIONES, CON BARRAJE DE COBRE PARA 225 A, 208/120 V, LOS INTERRUPTORES SE CONECTARÁN DIRECTAMENTE A BARRAS, CON MARCACIÓN Y		UNI	1,00	$ 16.717.372,14	$ 16.717.372,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
7.1.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE ILUMINACIÓN TIPO SOBREPONER, EN LÁMINA CR CAL. 14 Y 16, TRATAMIENTO ESPECIFICADO, CON BARRAJE DE COBRE PARA 1Y2 A, 208/120 V, LOS INTERRUPTORES SE CONECTARÁN		UNI	1,00	$ 6.775.570,96	$ 6.775.570,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
7.1.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE ILUMINACIÓN EXTERIOR TIPO SOBREPONER, FRENTE MUERTO, EN LÁMINA CR CAL. 14 Y 16, TRATAMIENTO ESPECIFICADO, CON BARRAJE DE COBRE PARA 1Y2 A, 208/120 V, LOS INTERRUPTORES		UNI	1,00	$ 6.775.570,96	$ 6.775.570,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
7.1.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE ILUMINACIÓN EXTERIOR TIPO SOBREPONER, IP65, CON CONTACTORES PARA CONTROL DE ILUMINACIÓN, FRENTE MUERTO, EN LÁMINA CR CAL. 14 Y 16, TRATAMIENTO ESPECIFICADO, CON BARRAJE DE		UNI	1,00	$ 7.515.719,51	$ 7.515.719,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
7.2	TABLEROS DE NOVA						-	$ -							-	$ -
7.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE NOVA DE 42 CIRCUITOS CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: 120/208 V, LOS INTERRUPTORES SE CONECTARÁN DIRECTAMENTE A BARRAS, CON MARCACIÓN Y SU RESPECTIVA CLASIFICACIÓN CUMPLIENDO CÓDIGO		UNI	7,00	$ 889.319,19	$ 6.225.277,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
7.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE NOVA DE 84 CIRCUITOS CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: 120/208 V, LOS INTERRUPTORES SE CONECTARÁN DIRECTAMENTE A BARRAS, CON MARCACIÓN Y SU RESPECTIVA CLASIFICACIÓN CUMPLIENDO CÓDIGO		UNI	2,00	$ 889.274,50	$ 1.885.349,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
7.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE NOVA DE 30 CIRCUITOS CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: 120/208 V, LOS INTERRUPTORES SE CONECTARÁN DIRECTAMENTE A BARRAS, CON MARCACIÓN Y SU RESPECTIVA CLASIFICACIÓN CUMPLIENDO CÓDIGO		UNI	1,00	$ 954.414,88	$ 954.417,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
7.2.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE NOVA DE 54 CIRCUITOS CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: 120/208 V, LOS INTERRUPTORES SE CONECTARÁN DIRECTAMENTE A BARRAS, CON MARCACIÓN Y SU RESPECTIVA CLASIFICACIÓN CUMPLIENDO CÓDIGO		UNI	2,00	$ 1.016.178,11	$ 2.032.356,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
7.2.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE NOVA DE 42 CIRCUITOS CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: 120/208 V, LOS INTERRUPTORES SE CONECTARÁN DIRECTAMENTE A BARRAS, CON MARCACIÓN Y SU RESPECTIVA CLASIFICACIÓN CUMPLIENDO CÓDIGO		UNI	2,00	$ 1.186.173,11	$ 2.372.330,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
7.2.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE NOVA DE 84 CIRCUITOS CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: 120/208 V, LOS INTERRUPTORES SE CONECTARÁN DIRECTAMENTE A BARRAS, CON MARCACIÓN Y SU RESPECTIVA CLASIFICACIÓN CUMPLIENDO CÓDIGO		UNI	2,00	$ 801.315,29	$ 2.202.371,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
7.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE NOVA DE 30 CIRCUITOS CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: 120/208 V, LOS INTERRUPTORES SE CONECTARÁN DIRECTAMENTE A BARRAS, CON MARCACIÓN Y SU RESPECTIVA CLASIFICACIÓN CUMPLIENDO CÓDIGO		UNI	1,00	$ 745.247,38	$ 745.252,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -

CONDICIONES GENERALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA						SALDO	
						MODIFICATORIA NO 1		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO			
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
7.2.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE 1.100(DE 2 FRENTES) EN ESPACIO PARA ROTAFLADOR, 3.8 KVAR V. LOS INTERRUPTORES SE CONECTARAN DIRECTAMENTE A BARRAS, CON MARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN CUMPLIENDO CÓDIGO	UNI	1,00	$ 808.274,00	$ 808.274,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
7.3	INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS							-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
7.3.1	INTERRUPTOR AUTOMÁTICO TIPO ENCHUFABLE 1 X 10 KA	UNI	251,00	$ 29.363,24	$ 6.353.814,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
7.3.2	INTERRUPTOR AUTOMÁTICO TIPO ENCHUFABLE 2 X 10A	UNI	34,00	$ 86.117,09	$ 2.985.160,06	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
7.3.3	INTERRUPTOR AUTOMÁTICO TIPO ENCHUFABLE 3 X 20A	UNI	3,00	$ 99.700,00	$ 199.000,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
7.3.4	INTERRUPTOR AUTOMÁTICO TIPO ENCHUFABLE 3 X 25A	UNI	21,00	$ 277.073,43	$ 5.847.531,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
7.4	OTROS EQUIPOS							-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
7.4.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UPS 5 KVA TRIFÁSICA 220/127 V CON AUTONOMÍA DE 5 MINUTOS (TS2, TS3, TS-4)	UNI	5,00	$ 10.069.868,01	$ 114.343.804,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
7.4.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UPS 8 KVA TRIFÁSICA 220/127 V CON AUTONOMÍA DE 5 MINUTOS (TS-1, TS-AUX)	UNI	2,00	$ 10.069.868,01	$ 76.099.112,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
7.4.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UPS X2 KVA TRIFÁSICA 220/127 V CON AUTONOMÍA DE 5 MINUTOS (TS-3)	UNI	1,00	$ 77.366.951,00	$ 77.366.951,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
7.4.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UPS 20 KVA TRIFÁSICA 220/127 V CON AUTONOMÍA DE 5 MINUTOS (TS-4)	UNI	2,00	$ 88.977.339,70	$ 84.977.140,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
						-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
8	RED MT BT				$ 862.689.325,00		$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
8.1	ACOMETIDAS Y ALIMENTADORES 1.- Todos los conductores serán Tipo Thw, 600 V.							-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
8.1.1	ACOMETIDA DESDE TRAFO HASTA TRANSFER-01 EN CONDUCTOR 3FL+3(2x 300+67) Al	M/L	33,20	$ 1.211.815,10	$ 10.142.331,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
8.1.2	ACOMETIDA DESDE PLANTA HASTA TRANSFER-01 EN CONDUCTOR 3(3x300+100+67) Al	M/L	32,70	$ 1.211.815,10	$ 10.142.331,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
8.1.3	ACOMETIDA DESDE TABLERO TRANSFERENCIA HASTA 80A EN CONDUCTOR 5(3x300+100+67) Al	M/L	2,80	$ 1.211.815,10	$ 11.000.760,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
8.1.4	ACOMETIDA DESDE TRAFO HASTA TRANSFER-BCI-01 EN CONDUCTOR 3(3x500+300+67 Al	M/L	33,20	$ 2.667.554,00	$ 8.229.308,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
8.1.5	ACOMETIDA DESDE PLANTA HASTA TRANSFER-BCI-01 EN CONDUCTOR 3x(3x500+300+67 Al	M/L	32,20	$ 2.667.554,00	$ 8.229.308,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
8.1.6	ACOMETIDA DESDE TABLERO TRANSFERENCIA HASTA BCI EN CONDUCTOR 1x(3x500+300+67 Al	M/L	23,60	$ 2.667.554,00	$ 8.673.271,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
8.1.7	ACOMETIDA DESDE TABLERO TGA HASTA HVAC EN CONDUCTOR 3-(3/0+3/0+67 Al	M/L	38,70	$ 79.073,15	$ 990.964,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
8.1.8	ACOMETIDA DESDE TABLERO TGA HASTA TABLERO TGA-1 EN CONDUCTOR 3-(4/0+4/0+67 Cu	M/L	27,00	$ 154.170,79	$ 5.087.634,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
8.1.9	ACOMETIDA DESDE TABLERO TGA HASTA CC #2 EN CONDUCTOR 3x(4+4+67 Cu	M/L	23,20	$ 194.868,78	$ 3.573.868,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
8.1.10	ACOMETIDA DESDE TABLERO TGA HASTA TNS EN CONDUCTOR 3x(3/0+3/0+67 Al	M/L	17,20	$ 73.973,31	$ 990.964,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
8.1.11	ACOMETIDA DESDE TABLERO TGA HASTA TNS EN CONDUCTOR 3-(2/0+2/0+67 Al	M/L	13,20	$ 72.868,77	$ 3.219.764,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
8.1.12	ACOMETIDA DESDE TABLERO TGA HASTA TRS EN CONDUCTOR 3x6-6+10T Cu	M/L	13,20	$ 71.705,15	$ 885.161,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
8.1.13	ACOMETIDA DESDE TABLERO TGA HASTA BYPASS-1 EN CONDUCTOR 2-6+6+10T Cu	M/L	13,20	$ 17.665,68	$ 458.573,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
8.1.14	ACOMETIDA DESDE TABLERO TGA HASTA TSD-1 EN CONDUCTOR 3x2+2+6T Cu	M/L	45,30	$ 153.811,88	$ 7.613.100,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
8.1.15	ACOMETIDA DESDE TABLERO TGA HASTA TSD-2 EN CONDUCTOR 3x(3/0+3/0+67 Cu	M/L	115,20	$ 719.475,99	$ 84.734.371,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
8.1.16	ACOMETIDA DESDE TABLERO TGA HASTA TSD-3 EN CONDUCTOR 3x(4/0+2/0+67 Cu	M/L	61,60	$ 296.243,84	$ 18.257.632,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
8.1.17	ACOMETIDA DESDE TABLERO TGA HASTA TSD-4 EN CONDUCTOR 3(3x500+300+67 Al	M/L	116,40	$ 372.780,35	$ 44.228.137,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
8.1.18	ACOMETIDA DESDE TABLERO TGA HASTA TSD-5 EN CONDUCTOR 3x300+300+67 Al	M/L	63,20	$ 217.245,78	$ 14.384.384,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
8.1.19	ACOMETIDA DESDE TABLERO TGA HASTA TSD-6/8/9 EN CONDUCTOR 3xA/B+6/8+67 Cu	M/L	98,80	$ 444.093,73	$ 43.873.326,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
8.1.20	ACOMETIDA DESDE TABLERO BYPASS-1 HASTA UPS-1 EN CONDUCTOR 2-6+6T+6TA Cu	M/L	11,00	$ 51.799,97	$ 568.567,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
8.1.21	ACOMETIDA DESDE TABLERO BYPASS-1 HASTA TRS EN CONDUCTOR 2-6+6T+6TA Cu	M/L	11,00	$ 43.478,99	$ 478.670,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
8.1.22	ACOMETIDA DESDE TABLERO TSD-1 HASTA TRS EN CONDUCTOR 1-6+6+10T Cu	M/L	11,00	$ 72.041,52	$ 792.417,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
8.1.23	ACOMETIDA DESDE TABLERO TSD-1 HASTA TRS EN CONDUCTOR 1-6+6+10T Cu	M/L	11,00	$ 72.069,01	$ 792.479,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
8.1.24	ACOMETIDA DESDE TABLERO TSD-1 HASTA BYPASS-1 EN CONDUCTOR 2-6+6+10T Cu	M/L	11,00	$ 27.479,75	$ 636.677,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
8.1.25	ACOMETIDA DESDE TABLERO BYPASS-2 HASTA UPS-2 EN CONDUCTOR 2+6+6T+6TA Cu	M/L	11,00	$ 27.479,42	$ 3.673.241,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
8.1.26	ACOMETIDA DESDE TABLERO BYPASS-2 HASTA TRS EN CONDUCTOR 2+6+6T+6TA Cu	M/L	11,00	$ 27.479,42	$ 3.672.241,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
8.1.27	ACOMETIDA DESDE TABLERO TSD-2 HASTA TRS EN CONDUCTOR 1-6+6+10T Cu	M/L	11,00	$ 284.413,21	$ 3.128.672,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
8.1.28	ACOMETIDA DESDE TABLERO TSD-3 HASTA TRS EN CONDUCTOR 1-6+6+10T Cu	M/L	11,00	$ 61.272,55	$ 221.988,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
8.1.29	ACOMETIDA DESDE TABLERO TSD-3 HASTA BYPASS-3 EN CONDUCTOR 1x6+6+10T Cu	M/L	11,00	$ 44.672,56	$ 132.988,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
8.1.30	ACOMETIDA DESDE TABLERO BYPASS-3 HASTA UPS-3 EN CONDUCTOR 3x6+6+6TA Cu	M/L	11,00	$ 31.976,72	$ 371.043,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
8.1.31	ACOMETIDA DESDE TABLERO BYPASS-3 HASTA TRS EN CONDUCTOR 3-3+6+6TA Cu	M/L	11,00	$ 31.956,72	$ 371.064,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -

CONDICIONES GENERALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA						SALDO	
						MODIFICATORIA NO 1		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO			
ITEM	DESCRIPCION		UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
8.1.37	ACOMETIDA DESDE TABLERO TEG-3 HASTA TM3 EN CONDUCTOR 3x6+6+1ST Cu		ML	11.00	$ 72.979,95	$ 792.429,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
8.1.38	ACOMETIDA DESDE TABLERO TEG-4 HASTA TM4 EN CONDUCTOR 3x6+6+1ST Cu		ML	11.00	$ 72.089,05	$ 792.429,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
8.1.39	ACOMETIDA DESDE TABLERO TEG-5 HASTA BYPASS-4 EN CONDUCTOR 3x6+6+1 PT Cu		ML	11.00	$ 39.017,13	$ 429.188,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
8.1.40	ACOMETIDA DESDE TABLERO BYPASS-4 HASTA UPS-4 EN CONDUCTOR 3x6+6+1 STA Cu		ML	11.00	$ 41.474,90	$ 456.478,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
8.1.41	ACOMETIDA DESDE TABLERO BYPASS-5 HASTA TM4 EN CONDUCTOR 3x6+6+1 STA Cu		ML	11.00	$ 41.474,90	$ 456.478,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
8.1.42	ACOMETIDA DESDE TABLERO TEG-6 HASTA TM5 EN CONDUCTOR 4x2+2+1ST Cu		ML	11.00	$ 332.937,41	$ 3.662.312,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
8.1.43	ACOMETIDA DESDE TABLERO TEG-8 HASTA BLS EN CONDUCTOR 3x6+6+1ST Cu		ML	11.00	$ 64.317,36	$ 707.491,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
8.1.44	ACOMETIDA DESDE TABLERO TEG-4 HASTA BYPASS-5 EN CONDUCTOR 3x6+6+1 ST Cu		ML	11.00	$ 72.979,95	$ 792.429,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
8.1.45	ACOMETIDA DESDE TABLERO BYPASS-5 HASTA UPS-5 EN CONDUCTOR 3x6+6+6STA Cu		ML	11.00	$ 317.866,21	$ 3.496.527,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
8.1.46	ACOMETIDA DESDE TABLERO BYPASS-5 HASTA TM3 EN CONDUCTOR 3x6+6+6STA Cu		ML	11.00	$ 317.866,21	$ 3.496.527,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
8.1.47	ACOMETIDA DESDE TABLERO TEG-2 HASTA TM2 EN CONDUCTOR 3x2+2+1ST Cu		ML	11.00	$ 336.044,73	$ 3.710.092,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
8.1.48	ACOMETIDA DESDE TABLERO TEG-2 HASTA TM3 EN CONDUCTOR 3x6+6+1ST Cu		ML	11.00	$ 48.872,00	$ 537.592,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
8.1.49	ACOMETIDA DESDE TABLERO TEG-3 HASTA TM3 EN CONDUCTOR 3x6+6+1 ST Cu		ML	11.00	$ 72.979,95	$ 792.429,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
8.1.50	ACOMETIDA DESDE TABLERO TEG-5 HASTA BYPASS-4 EN CONDUCTOR 3x2+2+1ST Cu		ML	11.00	$ 332.937,41	$ 3.662.312,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
8.1.51	ACOMETIDA DESDE TABLERO BYPASS-4 HASTA UPS-4 EN CONDUCTOR 3x2+2+1STA Cu		ML	11.00	$ 198.843,00	$ 2.187.273,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
8.1.52	ACOMETIDA DESDE TABLERO BYPASS-4 HASTA TM1 EN CONDUCTOR 3x2+2+1STA Cu		ML	11.00	$ 198.843,00	$ 2.187.273,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
8.1.53	ACOMETIDA DESDE TABLERO TEG-AUX HASTA TM-AUX EN CONDUCTOR 3x10+10+1ST Cu		ML	11.00	$ 87.619,95	$ 963.798,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
8.1.54	ACOMETIDA DESDE TABLERO TEG-AUX HASTA TR. AMP-AUX EN CONDUCTOR 3x2+2+1ST Cu		ML	11.00	$ 23.196,36	$ 255.157,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
8.1.55	ACOMETIDA DESDE TABLERO TEG-AUX HASTA TR. TRAMOS EN CONDUCTOR 3x2+2+1 ST Cu		ML	11.00	$ 23.196,36	$ 255.157,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
8.1.56	ACOMETIDA DESDE TABLERO TEG-AUX HASTA BYPASS-AUX EN CONDUCTOR 2x4+4+1ST Cu		ML	11.00	$ 80.956,36	$ 890.520,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
8.1.57	ACOMETIDA DESDE TABLERO BYPASS-AUX HASTA UPS-AUX EN CONDUCTOR 3x70+8+6STA Cu		ML	11.00	$ 42.154,78	$ 463.304,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
8.1.58	ACOMETIDA DESDE TABLERO BYPASS-AUX HASTA TR-AUX EN CONDUCTOR 2x70+8+6THHN Cu		ML	11.00	$ 21.91 / 79	$ 321.000,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
8.1.59	ACOMETIDA DESDE TABLERO TEG-8 HASTA PLANTA EN CONDUCTOR 4TH-300+300+1TAT		ML	11.00	$ 990.614,24	$ 10.896.977,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
8.2	TUBERÍAS								-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
8.2.1	TUBERIA DESDE TABLERO TRAFO HASTA TRANSFORMADOR EN DIÁMETRO 300" PVC		ML	17.00	$ 730.956,23	$ 8.508.431,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
8.2.2	TUBERÍA DESDE TABLERO PLANTA HASTA TRANSFORMADOR EN DIÁMETRO 300" PVC		ML	17.00	$ 730.956,23	$ 8.508.431,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
8.2.3	TUBERÍA DESDE TABLERO TRANSFORMADOR HASTA TGA EN DIÁMETRO 300" PVC		ML	5.40	$ 237.388,35	$ 2.884.862,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
8.2.4	TUBERÍA DESDE TABLERO TRAFO HASTA TRANSFORMADOR EN DIÁMETRO 300" EMC RECUBIERTO		ML	12.00	$ 762.246,73	$ 9.206.960,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
8.2.5	TUBERÍA DESDE TABLERO PLANTA HASTA TRANSFORMADOR EN DIÁMETRO 300" EMC RECUBIERTO		ML	17.00	$ 762.246,73	$ 9.206.960,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
8.2.6	TUBERÍA DESDE TABLERO TRANSFORMADOR HASTA TGA EN DIÁMETRO 300" EMC RECUBIERTO		ML	23.10	$ 762.246,73	$ 9.206.960,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
8.2.7	TUBERÍA DESDE TABLERO TGA HASTA BYPASS-1 EN DIÁMETRO 4" EMT		ML	27.40	$ 64.999,51	$ 785.000,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
8.2.8	TUBERÍA DESDE TABLERO TGA HASTA T-BOMBAS EN DIÁMETRO 1 (P)-1/2" EMT		ML	23.30	$ 91.296,19	$ 1.413.524,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
8.2.9	TUBERÍA DESDE TABLERO TGA HASTA TR. ATS EN DIÁMETRO 1 (P)-3/4" EMT		ML	13.90	$ 49.336,79	$ 672.999,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
8.2.10	TUBERÍA DESDE TABLERO TGA HASTA TM1 EN DIÁMETRO 1 (P)-1/2" EMT		ML	17.00	$ 64.999,51	$ 836.900,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
8.2.11	TUBERÍA DESDE TABLERO TGA HASTA TM2 EN DIÁMETRO 1(P)-1/2" EMT		ML	12.80	$ 64.999,51	$ 832.000,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
8.2.12	TUBERÍA DESDE TABLERO TGA HASTA TGA EN DIÁMETRO 1 (P)-1/4" EMT		ML	12.80	$ 49.336,79	$ 631.592,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
8.2.13	TUBERÍA DESDE TABLERO TGA HASTA BYPASS-1 EN DIÁMETRO 1(P)-1/4" EMT		ML	12.80	$ 23.980,00	$ 307.000,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
8.2.14	TUBERÍA DESDE TABLERO TGA HASTA TEG-1 EN DIÁMETRO 1 (P)-1/2" EMT		ML	47.60	$ 93.796,17	$ 2.421.967,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
8.2.15	TUBERÍA DESDE TABLERO TGA HASTA TEG-2 EN DIÁMETRO 1 (P)-1" EMT		ML	21.00	$ 134.819,45	$ 14.586.719,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
8.2.16	TUBERÍA DESDE TABLERO TGA HASTA TEG-3 EN DIÁMETRO 1(P)-1" EMT		ML	99.00	$ 64.999,51	$ 1.016.000,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
8.2.17	TUBERÍA DESDE TABLERO TGA HASTA TEG-4 EN DIÁMETRO 1-(P)" EMT		ML	111.40	$ 764.912,71	$ 86.451.143,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
8.2.18	TUBERÍA DESDE TABLERO TGA HASTA TEG-5 EN DIÁMETRO 1-(P)" EMT		ML	99.83	$ 240.715,12	$ 12.813.000,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
8.2.19	TUBERÍA DESDE TABLERO TGA HASTA TEG-AUX EN DIÁMETRO 1(P)" EMT		ML	97.46	$ 211.213,45	$ 22.411.517,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
8.2.20	TUBERÍA DESDE TABLERO BYPASS-1 HASTA UPS-1 EN DIÁMETRO 1(P)" EMT		ML	29.70	$ 96.778,27	$ 2.873.134,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
8.2.21	TUBERÍA DESDE TABLERO BYPASS-1 HASTA TM EN DIÁMETRO 1(P)" EMT		ML	29.70	$ 96.778,27	$ 2.873.134,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -

CONDICIONES GENERALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA						SALDO	
						MODIFICATORIO N° 1		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO			
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
8.2.22	TUBERÍA DESDE TABLERO TDD-1 HASTA TS1 EN DIÁMETRO 1 Ø1-1/2" EMT	ML	16.00	$ 41.616,19	$ 665.858,08	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
8.2.23	TUBERÍA DESDE TABLERO TDD-1 HASTA TS2 EN DIÁMETRO 1Ø1-1/4" EMT	ML	19.00	$ 43.356,19	$ 823.568,08	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
8.2.24	TUBERÍA DESDE TABLERO TDD-1 HASTA BYPASS-2 EN DIÁMETRO 1 Ø1" EMT	ML	10.00	$ 30.775,27	$ 307.752,70	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
8.2.25	TUBERÍA DESDE TABLERO BYPASS-2 HASTA UPS-2 EN DIÁMETRO 1Ø1-1/4" EMT	ML	26.00	$ 43.356,19	$ 823.568,08	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
8.2.26	TUBERÍA DESDE TABLERO BYPASS-2 HASTA TS3 EN DIÁMETRO 1 Ø1-1/4" EMT	ML	26.00	$ 43.356,19	$ 823.568,08	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
8.2.27	TUBERÍA DESDE TABLERO TDD-2 HASTA TS4 EN DIÁMETRO 1Ø1-1/4" EMT	ML	26.00	$ 43.356,19	$ 823.568,08	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
8.2.28	TUBERÍA DESDE TABLERO TDD-2 HASTA TS5 EN DIÁMETRO 1 Ø1" EMT	ML	26.00	$ 30.775,27	$ 584.729,13	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
8.2.29	TUBERÍA DESDE TABLERO TDD-2 HASTA BYPASS-1 EN DIÁMETRO 1Ø1" EMT	ML	26.00	$ 30.775,27	$ 584.729,13	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
8.2.30	TUBERÍA DESDE TABLERO BYPASS-1 HASTA UPS-1 EN DIÁMETRO 1Ø1" EMT	ML	26.00	$ 30.775,27	$ 584.729,13	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
8.2.31	TUBERÍA DESDE TABLERO BYPASS-1 HASTA TS6 EN DIÁMETRO 1 Ø1" EMT	ML	26.00	$ 30.775,27	$ 584.729,13	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
8.2.32	TUBERÍA DESDE TABLERO TDD-3 HASTA TS7 EN DIÁMETRO 1 Ø1-1/4" EMT	ML	26.00	$ 43.356,19	$ 823.568,08	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
8.2.33	TUBERÍA DESDE TABLERO TDD-3 HASTA TS8 EN DIÁMETRO 1 Ø1-1/4" EMT	ML	26.00	$ 43.356,19	$ 823.568,08	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
8.2.34	TUBERÍA DESDE TABLERO TDD-3 HASTA BYPASS-4 EN DIÁMETRO 1Ø1-1/4" EMT	ML	13.00	$ 43.356,19	$ 246.402,80	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
8.2.35	TUBERÍA DESDE TABLERO BYPASS-4 HASTA UPS-4 EN DIÁMETRO 1Ø1" EMT	ML	26.00	$ 30.775,27	$ 584.729,13	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
8.2.36	TUBERÍA DESDE TABLERO BYPASS-4 HASTA TS9 EN DIÁMETRO 1Ø1" EMT	ML	26.00	$ 30.775,27	$ 584.729,13	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
8.2.37	TUBERÍA DESDE TABLERO TDD-4 HASTA TS10 EN DIÁMETRO 1Ø1-1/2" EMT	ML	26.00	$ 43.356,19	$ 823.568,08	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
8.2.38	TUBERÍA DESDE TABLERO TDD-4 HASTA TS11 EN DIÁMETRO 1Ø1" EMT	ML	26.00	$ 30.775,27	$ 584.729,13	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
8.2.39	TUBERÍA DESDE TABLERO TDD-4 HASTA BYPASS-5 EN DIÁMETRO 1Ø1-1/2" EMT	ML	26.00	$ 43.356,19	$ 823.568,08	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
8.2.40	TUBERÍA DESDE TABLERO BYPASS-5 HASTA UPS-5 EN DIÁMETRO 1Ø1-1/2" EMT	ML	26.00	$ 43.356,19	$ 823.568,08	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
8.2.41	TUBERÍA DESDE TABLERO BYPASS-5 HASTA TS12 EN DIÁMETRO 1Ø1-1/4" EMT	ML	26.00	$ 43.356,19	$ 823.568,08	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
8.2.42	TUBERÍA DESDE TABLERO TDD-5 HASTA TS13 EN DIÁMETRO 1 Ø1-1/2" EMT	ML	26.00	$ 51.295,14	$ 974.407,66	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
8.2.43	TUBERÍA DESDE TABLERO TDD-5 HASTA TS14 EN DIÁMETRO 1 Ø1" EMT	ML	26.00	$ 30.775,27	$ 584.729,13	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
8.2.44	TUBERÍA DESDE TABLERO TDD-5 HASTA TS15 EN DIÁMETRO 1Ø1-1/4" EMT	ML	26.00	$ 43.356,19	$ 823.568,08	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
8.2.45	TUBERÍA DESDE TABLERO TDD-5 HASTA BYPASS-6 EN DIÁMETRO 1 Ø1-1/2" EMT	ML	26.00	$ 51.295,14	$ 974.407,66	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
8.2.46	TUBERÍA DESDE TABLERO BYPASS-6 HASTA UPS-6 EN DIÁMETRO 1Ø2" EMT	ML	26.00	$ 64.869,62	$ 1.232.522,80	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
8.2.47	TUBERÍA DESDE TABLERO BYPASS-6 HASTA TS16 EN DIÁMETRO 1 Ø2" EMT	ML	26.00	$ 64.869,62	$ 1.232.522,80	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
8.2.48	TUBERÍA DESDE TABLERO TDD-AUDI HASTA TS-AUDI-3 EN DIÁMETRO 1 Ø2-1/2" EMT	ML	26.00	$ 73.456,84	$ 1.396.180,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
8.2.49	TUBERÍA DESDE TABLERO TDD-AUDI HASTA TS-AUDI-AUDI EN DIÁMETRO 1 Ø1/2" EMT	ML	10.00	$ 16.276,79	$ 309.258,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
8.2.50	TUBERÍA DESDE TABLERO TDD-AUDI HASTA TS-ILUMOS EN DIÁMETRO 1 Ø1/2" EMT	ML	10.00	$ 16.276,79	$ 309.258,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
8.2.51	TUBERÍA DESDE TABLERO TDD-AUDI HASTA BYPASS-AUDI EN DIÁMETRO 1Ø1-1/4" EMT	ML	26.00	$ 43.356,19	$ 823.568,08	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
8.2.52	TUBERÍA DESDE TABLERO BYPASS-AUDI HASTA UPS-AUDI EN DIÁMETRO 1Ø1" EMT	ML	26.00	$ 30.775,27	$ 584.729,13	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
8.2.53	TUBERÍA DESDE TABLERO BYPASS-AUDI HASTA TS-AUDI EN DIÁMETRO 1Ø1" EMT	ML	26.00	$ 30.775,27	$ 584.729,13	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
8.2.54	TUBERÍA DESDE TABLERO B HASTA PLANTA EN DIÁMETRO 2Ø5" EMT	ML	26.00	$ 729.961,54	$ 13.868.309,26	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
8.3	CAJAS					-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
8.3.1	CAJA DE PASO NORMA C3-270	UN	5.00	$ 3.140.791,12	$ 15.703.955,60	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
8.3.2	CAJA DE PASO NORMA AP-240	UN	3.00	$ 751.611,34	$ 2.254.834,02	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
						-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
9	SISTEMA DE PROTECCIÓN EXTERNO				$ 81.301.383,00	-	$ 81.301.383,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ 81.301.383,00
9.1	SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS					-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
9.1.1	SISTEMA DE APANTALLAMIENTO CON PUNTAS FRANKLIN DE 100 CM2	UN	64.00	$ 171.731,56	$ 11.002.324,00	64.00	$ 11.002.324,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	64.00	$ 11.002.324,00
9.1.2	SOPORTE PARA VARILLA	UN	64.00	$ 148.164,15	$ 9.557.000,00	64.00	$ 9.557.000,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	64.00	$ 9.557.000,00
9.1.3	INTERCONEXIÓN CON CONDUCTOR ALUMINIO DE ALUMINIO DE 69 MM2(2/0AWG) DE ÁREA DE CUBIERTA	ML	865.00	$ 10.244,84	$ 8.847.868,00	865.00	$ 8.847.868,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	865.00	$ 8.847.868,00
9.1.4	SOPORTE SENCILLO DE APOYO	UN	844.00	$ 9.648,66	$ 8.407.081,80	844.00	$ 8.407.081,80	-	$ -	-	$ -	-	$ -	844.00	$ 8.407.081,80
9.1.5	INTERCONEXIÓN CON CONDUCTOR ALUMINIO DE COBRE 1/0 AWG DESDE ÁREA DE CUBIERTA HASTA PISO 0	ML	140.00	$ 57.217,61	$ 8.021.840,00	140.00	$ 8.021.840,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	140.00	$ 8.021.840,00
9.1.6	CONECTOR EMPERNADO DE ALUMINIO A COBRE	UN	10.00	$ 62.356,46	$ 623.565,00	10.00	$ 623.565,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	10.00	$ 623.565,00

CONDICIONES GENERALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA						SALDO	
						MODIFICATORIA NO 1		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO			
ITEM	DESCRIPCION		UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
9.1.7	CAMARA DE REGISTRO EN PARA EMPALME SUBTERRÁNEO ENTRE CABLE DE COBRE Y BARRAJE DE APANTALLAMIENTO		UNI	10.00	$ 69.433,86	$ 694.338,60	10,00	$ 694.310,00	-	$ -		$ -	-	$ -	10,00	$ 694.310,00
9.1.8	CABLE DE INYECCIÓN DE BARRA EN PARA INTERCONEXIÓN DE POZOS		UNI	20.00	$ 335.343,34	$ 6.333.433,40	10,00	$ 3.511.815,00	-	$ -		$ -	-	$ -	10,00	$ 3.511.815,00
9.1.9	SOLDADURA EXOTÉRMICA		UNI	20.00	$ 39.217,30	$ 391.640,00	10,00	$ 392.680,00	-	$ -		$ -	-	$ -	10,00	$ 392.680,00
9.1.10	VARILLAS COPPERWELD DE 5/8" X 8FT, 0.446, INCLUYE POZO INSPECCIONABLE		UNI	20.00	$ 844.956,56	$ 8.448.344,00	10,00	$ 8.448.540,00	-	$ -		$ -	-	$ -	10,00	$ 8.448.540,00
9.1.11	INTERCONEXIÓN DE POZOS A BARRAJE EQUIPOTENCIAL CON CABLE DESNUDO CU # 2/0 AWG		ML	891.00	$ 37.217,43	$ 33.408.394,00	891,00	$ 22.403.394,00	-	$ -		$ -	-	$ -	891,00	$ 22.403.394,00
9.1.12	MEDICIÓN CON MEGGER, CERTIFICACIÓN DE MENOS DE 10 OHMS		GL	1.00	$ 1.891.884,58	$ 1.891.887,00	1,00	$ 1.891.887,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 1.891.887,00
									-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
10	SISTEMA DE PROTECCIÓN INTERNO					$ 12.488.780,00		$ 12.488.780,00	-	$ 13.438.780,00		$ -	-	$ 12.488.780,00	-	$ -
10.3	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA								-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
10.3.1	VARILLAS COPPERWELD DE 5/8" X 8FT, 0.446		UNI	8.00	$ 537.695,06	$ 2.015.158,00	8,00	$ 2.028.158,00	8,00	$ 2.028.158,00		$ -	8,00	$ 2.028.158,00	-	$ -
10.3.2	SOLDADURA EXOTÉRMICA CR "1" CABLE 2/0 A BARRA COPPERWELD		UNI	8.00	$ 59.267,00	$ 474.144,00	8,00	$ 474.144,00	8,00	$ 474.144,00		$ -	8,00	$ 474.144,00	-	$ -
10.3.3	SOLDADURA EXOTÉRMICA CR "1" CABLE 2/0 A CABLE 2/0		UNI	6.00	$ 59.267,00	$ 355.608,00	6,00	$ 355.608,00	6,00	$ 355.608,00		$ -	6,00	$ 355.608,00	-	$ -
10.3.4	SOLDADURA EXOTÉRMICA CR "1" CABLE 2/0 A CABLE 2/0		UNI	3.00	$ 59.267,00	$ 177.804,00	3,00	$ 177.804,00	3,00	$ 177.804,00		$ -	3,00	$ 177.804,00	-	$ -
10.3.5	CABLE DE INYECCIÓN DE 2/0 CU		UNI	4.00	$ 101.361,34	$ 1.404.848,00	4,00	$ 1.404.848,00	4,00	$ 1.404.848,00		$ -	4,00	$ 1.404.848,00	-	$ -
10.3.6	CABLE N° 2/0 AWG DESNUDO EN COBRE MALLA		ML	55.00	$ 57.297,43	$ 3.151.358,00	55,00	$ 3.151.358,00	55,00	$ 3.151.358,00		$ -	55,00	$ 3.151.358,00	-	$ -
10.3.7	PLANTILLA TIPO E PARA INSTALACIÓN DE CAMALEACIÓN CHIT 1" Y CABLE N° 2/0 AWG DESNUDO DE COBRE CONEXIÓN MALLA - SUBESTACIÓN		ML	10.00	$ 93.796,36	$ 937.864,00	10,00	$ 937.864,00	10,00	$ 937.864,00		$ -	10,00	$ 937.864,00	-	$ -
10.3.8	BARRAJE DE EQUIPOTENCIALIZACIÓN PLATINA DE COBRE (5X0.5 MM) SOCHI DE LARGO CON 5 AISLADORES DE PORTA TIPO BARRA PARA SUBESTACIÓN		UNI	1.00	$ 1.322.972,78	$ 1.322.972,00	1,00	$ 1.322.972,00	1,00	$ 1.322.972,00		$ -	1,00	$ 1.322.972,00	-	$ -
10.3.9	HORNO DE COMPRESIÓN TIPO CXO PARA CONEXIÓN DE BARRAJES A MALLA DE PUESTA A TIERRA		UNI	1.00	$ 10.341,35	$ 10.342,00	1,00	$ 10.342,00	1,00	$ 10.342,00		$ -	1,00	$ 10.342,00	-	$ -
10.3.10	EXCAVACIÓN Y PREPARACIÓN DEL TERRENO CON EQUIPO		GL	1.00	$ 430.153,17	$ 430.153,00	1,00	$ 430.153,00	1,00	$ 430.153,00		$ -	1,00	$ 430.153,00	-	$ -
10.3.11	MEDICIÓN DE MALLA DE PUESTA A TIERRA POST CONSTRUCCIÓN		GL	1.00	$ 1.091.895,58	$ 1.091.895,00	1,00	$ 1.091.037,00	1,00	$ 1.091.037,00		$ -	1,00	$ 1.091.037,00	-	$ -
10.3.12	PLANTILLA TIPO E PARA INSTALACIÓN DE BARRAS DE ALIVIO PARA CÁRCAMOS DE SUBESTACIÓN (DE SER ESTAR ATERRADAS)		GL	1.00	$ 5.511.543,00	$ 5.511.543,00	1,00	$ 5.511.543,00	1,00	$ 5.511.543,00		$ -	1,00	$ 5.511.543,00	-	$ -
									-	$ -					-	$ -
11	INFRAESTRUCTURA DE BANDEJAS					$ 168.864.879,00		$ 13.839.307,00	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ 13.839.303,00
11.1	BANDEJA POR TIA CABLE TIPO MALLA								-	$ -					-	$ -
11.1.1	BANDEJA TIPO ESCALERA CON TAPA 30 CMS X 10 CMS (LA) VIVIENDA EN LIVIANO (EN TECHO)		ML	76.00	$ 117.214,58	$ 8.907.500,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
11.1.2	BANDEJA TIPO ESCALERA CON TAPA 30 CMS X 10 CMS GALVANIZADA EN LIVIANO (EN TECHO)		ML	27.00	$ 115.493,97	$ 3.215.873,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
11.1.3	BANDEJA TIPO ESCALERA CON TAPA 60 CMS X 10 CMS GALVANIZADA EN LIVIANO (EN TECHO)		ML	747.00	$ 154.446,32	$ 115.371.357,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
11.1.4	BANDEJA PORTA CABLE TIPO DUCTO PARA RED BT								-	$ -					-	$ -
11.1.5	BANDEJA TIPO DUCTO CON TAPA 10 CMS X 10 CMS GALVANIZADA EN LIVIANO (EN TECHO)		ML	15.00	$ 225.644,19	$ 3.438.826,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
11.1.6	BANDEJA TIPO DUCTO CON TAPA 20 CMS X 10 CMS GALVANIZADA EN LIVIANO (EN TECHO)		ML	24.00	$ 264.977,86	$ 6.317.884,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
11.1.7	BANDEJA TIPO DUCTO CON TAPA 40 CMS X 10 CMS GALVANIZADA EN LIVIANO (EN TECHO)		ML	747.00	$ 197.644,71	$ 148.636.407,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
11.2	ACCESORIOS								-	$ -					-	$ -
11.2.1	CURVA HORIZONTAL A 90° 60X0.6 CM		UNI	37.00	$ 141.379,07	$ 5.214.315,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
11.2.2	CURVA HORIZONTAL A 45° 60X0.6 CM		UNI	13.00	$ 141.379,07	$ 2.555.319,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
11.2.3	CURVA VERTICAL EXTERNA DE 90° - BAJO ABRIS CM		UNI	4.00	$ 104.406,46	$ 721.626,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
11.2.4	CURVA VERTICAL INTERNA DE 90° - SUBO ABRIS CM		UNI	4.00	$ 104.406,46	$ 515.626,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
11.2.5	TEE HORIZONTAL 60X0.6CM		UNI	22.00	$ 102.534,29	$ 3.161.731,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
11.4	OTROS COMPLEMENTOS INFRAESTRUCTURA DE BANDEJAS								-	$ -					-	$ -
11.4.1	COMPOSICIÓN Y COLOCACIÓN DE BANDEJAS CON SUS TAPAS DE PUESTA A TIERRA EN CONDUCTOR DE COBRE CALIBRE N° 2 AWG DESNUDO, INCLUYE GRAPAS DE FIJACIÓN EN SU'S ANAMBAS PUESTAS DE JE CONSIDERAR UNA GRAPA POR CADA TRAMO DE		ML	2.856.00	$ 10.447,68	$ 11.230.372,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
11.5	CANALETA								-	$ -					-	$ -
11.5.3	CANALETA 7.5*5 cm		ML	115.00	$ 71.349,90	$ 9.951.196,00	244,00	$ 13.839.307,00	-	$ -		$ -	-	$ -	244,00	$ 12.839.303,00
11.6	CANALETA								-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
11.6.1	BANDALES DE 2*13 + 17*5 CU		ML	7.992.00	$ 23.872,75	$ 183.791.233,70	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
11.6.2	BANDALES 2*13 +5*5+17*5 CU		ML	156.00	$ 37.367,75	$ 3.465.158,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
11.6.3	BANDALES 5*13+17*5+13*5 CU		ML	2.279.00	$ 17.396,17	$ 39.764.548,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -

CONDICIONES GENERALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA						SALDO	
							MODIFICATORIA NO 1		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO			
ITEM	DESCRIPCION		UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
									-	$ -					-	$ -
13	TRAMITES					$ 37.995.336,00		$ 37.995.336,00	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ 37.995.336,00
13.1	TRAMITES Y CERTIFICACIÓN ANTE LAS ENTIDADES COMPETENTES								-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
13.1.1	TRAMITES ANTE ORGANOS DE BID PARA OBTENCIÓN DEL PROYECTO DE SATELITACION		GL	1,00	$ 3.372.294,00	$ 3.372.294,00	1,00	$ 3.372.294,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 3.372.294,00
13.1.2	CERTIFICADO RITEL		GL	1,00	$ 31.623.179,00	$ 34.995.473,00	1,00	$ 95.995.473,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 95.995.473,00
13.1.3	CERTIFICADO RITELAP		GL	1,00	$ 16.991.179,00	$ 34.995.473,00	1,00	$ 95.995.473,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 95.995.473,00
									-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
19	COMUNICACIONES					$ 319.298.329,00		$ 179.674.424,00	-	$ 150.446.981,00		$ 5.313.247,00	-	$ 155.660.228,00	-	$ 23.638.196,00
19.1	FIBRA OPTICA								-	$ -					-	$ -
19.1.1	BANDEJAS DE FIBRA OPTICA DE 6 UNIDADES (FUSI)		UNI	4,00	$ 442.297,54	$ 1.693.703,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
19.1.2	TAPA CIEGA PARA BANDEJA		UNI	11,00	$ 96.595,00	$ 1.162.573,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
19.1.3	PANEL/ACOPLADOR LC, DUAL, 12 HILOS.		UNI	8,00	$ 479.359,00	$ 3.833.772,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
19.1.4	PANEL/ACOPLADOR DUAL SC/UTILE		UNI	6,00	$ 26.732,29	$ 161.394,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
19.1.5	CONECTOR (PIGTAIL) LC, DUAL		UNI	35,00	$ 47.177,14	$ 1.650.171,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
19.1.6	PATCH CORD DE FIBRA LC-SC, 1M, DUAL (DMX), DUPLEX.		UNI	11,00	$ 212.973,27	$ 2.617.696,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
19.1.7	BREAKOUT 6ST, 12 HILOS.		UNI	6,00	$ 214.513,06	$ 1.443.780,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
19.1.8	FIBRA ÓPTICA OM3, 8 HILOS, MM/OUT.		MT	500,00	$ 26.111,46	$ 14.067.373,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
19.1.9	TUBERÍA DE 2 0,5"		MT	80,00	$ 63.343,51	$ 5.645.441,00	80,00	$ 5.646.881,00	-	$ -	80,00	$ 5.646.881,00	80,00	$ 5.646.881,00	-	$ -
19.1.10	CAJA C3275		UNI	1,00	$ 1.466.363,05	$ 1.466.366,00	1,00	$ 1.466.366,00	-	$ -	1,00	$ 1.466.366,00	1,00	$ 1.466.366,00	-	$ -
									-	$ -					-	$ -
19.2	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA EQUIPOS SENSIBLES								-	$ -					-	$ -
19.2.1	BARRA DE EQUIPOTENCIALIZACIÓN PLATINA DE COBRE (500 x 4mm) 50CM DE LARGO CON 8 AISLADORES DE PARED TIPO BARRIL PARA 12 HILOS		UNI	1,00	$ 1.322.423,00	$ 1.322.423,00	1,00	$ 1.322.423,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 1.322.423,00
19.2.2	CAJA DE INSPECCIÓN DE 30*30 CM		UNI	2,00	$ 351.151,54	$ 1.053.455,00	2,00	$ 1.053.455,00	-	$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 1.053.455,00
19.2.3	VARILLAS COPPERWELD DE 5/8" X 8 FT (2,44M)		UNI	3,00	$ 337.693,00	$ 1.013.079,00	3,00	$ 1.013.079,00	-	$ -		$ -	-	$ -	3,00	$ 1.013.079,00
19.2.4	SOLDADURA EXOTÉRMICA EN "T" CABLE 2/0 A BARRA COPPERWELD		UNI	2,00	$ 88.227,00	$ 177.804,00	2,00	$ 177.804,00	-	$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 177.804,00
19.2.5	CABLE Nº 2/0 AWG DESNUDO DE COBRE PARA CONEXIÓN DE MALLA DE COMUNICACIONES		MT	53,00	$ 30.979,71	$ 891.886,00	53,00	$ 891.886,00	-	$ -		$ -	-	$ -	53,00	$ 891.886,00
19.2.6	CABLE Nº 3/0 AWG DESNUDO DE COBRE PARA CONEXIÓN DE MALLA DE COMUNICACIONES A PT LLEVE 5 PERIFERICAL EN MEZANINO PISO		MT	23,00	$ 30.995,13	$ 784.763,00	15,00	$ 784.763,00	-	$ -		$ -	-	$ -	15,00	$ 784.763,00
19.2.7	CABLE Nº 2 AWG AISLADO EN COBRE PARA CONEXIÓN DE EMGO A PAT		MT	461,00	$ 39.775,41	$ 17.198.380,00	461,00	$ 17.198.380,00	-	$ -		$ -	-	$ -	461,00	$ 17.198.380,00
19.2.8	BOMBA DE ELECTROCHOQUE		UNI	1,00	$ 845.064,87	$ 845.064,00	1,00	$ 843.065,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 845.066,00
									-	$ -					-	$ -
19.3	PUNTOS FALSOS DE COMUNICACIONES								-	$ -					-	$ -
19.3.1	RACK DE COMUNICACIONES TIPO GABINETE PARA DATACENTRO DE 4 SUR		UNI	0,00	$ 4.091.180,21	$ 14.695.824,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
19.3.2	BANDEJA HORIZONTAL		UNI	0,00	$ 134.312,06	$ 948.113,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
19.3.3	MULTIFONIA HORIZONTAL DE 12 PUNTOS		UNI	0,00	$ 64.412,76	$ 2.744.527,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
19.3.4	ORGANIZADORES TIPO DUCTO SUR		UNI	11,00	$ 394.777,63	$ 4.968.365,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
19.3.5	UNIDAD DE VENTILACIÓN SUR		UNI	6,00	$ 158.340,16	$ 951.843,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
19.3.6	MODULE PARA PATCH PANEL BLINDADO DE 24 PUERTOS RJ45 SUR (INCLUYE DE SOPORTE)		UNI	5,00	$ 271.215,63	$ 119.810,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
19.3.7	MODULE PARA PATCH PANEL BLINDADO DE 48 PUERTOS RJ45 SUR (INCLUYE DE SOPORTE)		UNI	10,00	$ 472.217,64	$ 4.766.178,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
19.3.8	CABLE PUTP CATEGORIA 6A		M	23.961,00	$ 7.210,14	$ 155.279.368,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
19.3.9	FACEPLATE PARA INCE RJ-45 CAT. 6A BLANCO 2 MODULE GANG (INCLUYE MARCACIÓN DE PUNTO CON EL SIMBOLO DEL CABLE)		UNI	217,00	$ 18.693,97	$ 1.866.026,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
19.3.10	FACEPLATE PARA INCE RJ-45 CAT. 6A BLANCO 2 DOUBLE GANG (INCLUYE MARCACIÓN DE PUNTO CON EL SIMBOLO DEL CABLE)		UNI	44,00	$ 16.466,66	$ 732.121,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
19.3.11	INCE RJ-45 CAT. 6A DATOS (PUNTOS DE TRABAJO)		UNI	431,00	$ 36.206,93	$ 23.387.481,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
19.3.12	INCE RJ-45 CAT. 6A DATOS (RACK)		UNI	432,00	$ 30.306,93	$ 23.387.083,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
19.3.13	PATCORD PUTP CAT 6A 2 MODATOS (PUNTO DE TRABAJO)		UNI	432,00	$ 37.833,93	$ 26.191.878,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
19.3.14	PATCORD PUTP CAT 6A 2 MODATOS (RACK)		UNI	432,00	$ 37.833,93	$ 26.191.878,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -

CONDICIONES GENERALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA						SALDO	
						MODIFICATORIA NO 9		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO			
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
13.3.13	CLAVIFICACIONES CABLEADO FUTP	UN	456.00	$ 45,079.61	$ 18,495,114.00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
13.3.14	MARCACIÓN SALIDAS VOZ Y DATOS EN AMBOS EXTREMOS	UN	451.00	$ 7,573.84	$ 3,430,993.00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
13.3.15	CAJA PARA DATOS SENCILLA	UN	42.00	$ 8,297.04	$ 348,477.00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
13.3.16	CAJA PARA DATOS SENCILLA EN PISO	UN	30.00	$ 8,297.04	$ 248,911.00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
13.3.17	CAJA PARA DATOS SENCILLA EN TECHO	UN	84.00	$ 8,297.04	$ 696,843.00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
13.3.18	CAJA PARA DATOS S/ NIQUEL EN CAMILLETA	UN	134.00	$ 8,297.04	$ 1,112,039.00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
13.3.19	CAJA PARA WAP	UN	65.00	$ 8,297.04	$ 539,312.00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
13.3.20	CAJA PARA CONTROL TECHO	UN	41.00	$ 8,297.04	$ 340,180.00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
13.3.21	CAJA PARA DATOS DOBLE	UN	2.00	$ 11,781.47	$ 23,564.00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
13.3.22	CAJA PARA DATOS DOBLE EN PISO	UN	1.00	$ 12,781.47	$ 12,781.00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
13.3.23	CAJA PARA DATOS DOBLE EN CAMILLETA	UN	44.00	$ 12,781.47	$ 562,545.00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
13.3.24	TUBERÍA DE 1" EMT	ML	6,812.00	$ 22,036.40	$ 150,085,982.00	6,812.00	$ 150,085,982.00	6,812.00	$ 150,085,982.00		$ -	6,812.00	$ 150,085,982.00	-	$ -
								-	$ -					-	$ -
13.4	SALIDAS PARA CÁMARAS (TUBERÍA, CABLE, CAJAS DOBLE FONDO)							-	$ -					-	$ -
13.4.1	ORGANIZADORES TIPO DUCTO 1 UR	UN	8.00	$ 279,636.66	$ 2,221,493.00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
13.4.2	CABLE FUTP CATEGORÍA 6A	M	9,218.00	$ 2,134.36	$ 8,844,772.00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
13.4.5	RÉGLETA PARA PATCH PANEL BLINDADO DE 24 PUERTOS CAT6A 568B (INCLUYE DE SOPORTE)	UN	5.00	$ 279,259.83	$ 1,346,319.00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
13.4.6	REGLETA PARA PATCH PANEL BLINDADO DE 48 PUERTOS CAT6A 568B (INCLUYE DE SOPORTE)	UN	3.00	$ 478,817.69	$ 676,817.00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
13.4.8	FACEPLATE PARA FACE 86-43 CAT. 6A BLANCO 8 SINGLE GANG (INCLUYE MARCACIÓN DE PUNTO CON EL MISMO TAG DEL CABLE)	UN	101.00	$ 15,440.01	$ 2,660,442.00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
13.4.9	JACK 86-43 CAT. 6A DATOS (PUESTO DE TRABAJO)	UN	107.00	$ 58,308.97	$ 6,686,953.00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
13.4.9	JACK 86-43 CAT. 6A DATOS (RACK)	UN	101.00	$ 58,308.97	$ 6,686,953.00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
13.4.9	PATCH CORD FUTP CAT6A 2M DATOS (PUESTO DE TRABAJO)	UN	101.00	$ 37,816.93	$ 4,816,794.00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
13.4.9	PATCH CORD FUTP CAT6A 2M DATOS (RACK)	UN	101.00	$ 37,816.93	$ 3,839,304.00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
13.4.10	CERTIFICACIONES CABLEADO FUTP	UN	101.00	$ 43,015.65	$ 4,345,171.00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
13.4.11	MARCACIÓN SALIDAS VOZ Y DATOS EN AMBOS EXTREMOS	UN	101.00	$ 7,573.84	$ 764,564.00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
13.4.12	CAJA PARA CAMARA	UN	101.00	$ 8,297.04	$ 838,003.00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
13.4.13	TUBERÍA DE 1" EMT	M	922.00	$ 20,676.40	$ 19,065,619.00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
								-	$ -					-	$ -
14	DETECCIÓN DE INCENDIOS				$ 116,171,873.00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
14.1	SALIDAS PARA DETECCIÓN DE INCENDIOS (INCLUYE TUBERÍA Y CAJAS 2 HOR GALVANIZADA, NO INCLUYE CABLE NI ACCESORIOS)							-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
14.1.1	CAJA PARA CENTRAL DE INCENDIOS ALGORITMICA MOD. AE/SA-CE	UN	1.00	$ 27,491.69	$ 27,491.00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
14.1.2	CAJA PARA DETECTOR OPTICO ALGORITMICO MOD. AE/SA-OPT	UN	277.00	$ 27,491.69	$ 7,613,806.00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
14.1.3	CAJA PARA ESTACION DE CONTROL WEB DE EXTINCION DE INCENDIO	UN	1.00	$ 27,491.69	$ 27,492.00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
14.1.4	CAJA PARA FUENTE DE ALIMENTACION AUXILIAR 24V 2A MOD. AE/SA-FA2	UN	1.00	$ 27,491.69	$ 27,492.00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
14.1.5	CAJA PARA PERSIADOR DE ALARMA	UN	11.00	$ 27,491.69	$ 302,409.00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
14.1.6	CAJA PARA SIRENA DE ALARMA CON POCO	UN	11.00	$ 27,491.69	$ 302,409.00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
14.1.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROL CABLE CAM 4/18 AWG 19/23 AWG	UN	3,491.00	$ 6,545.34	$ 8,213,839.00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
14.1.8	TUBERÍA DE 3/4" EMT	UN	1,370.00	$ 23,666.84	$ 40,342,973.00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
								-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
14.2	EQUIPOS PARA DETECCIÓN DE INCENDIOS							-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
14.2.1	CENTRAL DE INCENDIOS ALGORITMICA MOD. AE/SA-CE	UN	1.00	$ 13,451,327.99	$ 13,451,334.00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
14.2.2	DETECTOR CONVENCIONAL OPTICO-TERMICO MOD. AE/ES-OPT	UN	332.00	$ 332,004.73	$ 93,243,191.00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
14.2.3	ESTACION DE CONTROL WEB DE EXTINCION DE INCENDIO	UN	1.00	$ 421,615.25	$ 422,614.00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
14.2.4	FUENTE DE ALIMENTACION AUXILIAR 24V 2A MOD. AE/SA-FA2	UN	3.00	$ 1,126,614.19	$ 3,378,414.00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
14.2.5	PERSIADOR DE ALARMA	UN	11.00	$ 421,614.97	$ 4,636,771.00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -

CONDICIONES GENERALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA						SALDO	
							MODIFICATORIA NO 1		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO			
ITEM	DESCRIPCIÓN		UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
24.2.9	RIENDA DE ALARMA CONTRA INCENDIO		Un	11.00	$ 263 945,57	$ 2.906.357,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
									-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
25.7	IMPLEMENTACIÓN DE ENERGÍA SOLAR ALTERNATIVA					$ 953.500.000,00	-	$ 953.500.000,00	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ 953.500.000,00
25.7.1	IMPLEMENTACIÓN DE ENERGÍA SOLAR ALTERNATIVA		Glb	1.00	$ 953.500.000,00	$ 953.500.000,00	1,00	$ 953.500.000,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 953.500.000,00
								$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
	COSTOS DIRECTOS					$ 5.771.629.879,00		$ 1.536.098.144,00		878.191.94 5,00		$ 6.913.247,00		880.704.970,00		$ 1.277.924.317,00
	ADMINISTRACIÓN	10,0%				867.102.864,00		$ 185.908.814,40		57.515.156,00		911.525,00		58.026.483,00		127.763.132,00
	IMPREVISTOS	3,0%				178.130.900,00		$ 80.742.884,32		17.264.648,00		153.387,00		17.497.845,00		38.234.940,00
	UTILIDAD	5,0%				280.551.334,00		$ 62.904.807,20		25.757.879,00		255.687,00		29.013.241,00		62.991.588,00
	COSTOS INDIRECTOS					$ 1.056.784.802,00		$ 334.457.305,92		102.937.753,00		920.384,00		104.647.653,00		230.086.836,00
	COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS					$ 6.877.814.681,00		$ 2.192.053.449,92		878.878.894,00		6.033.631,00		884.712.677,00		1.507.840.996,00
	IVA SOBRE UTILIDAD	10,0%				56.774.753,00		$ 17.861.813,37		6.483.940,00		42.579,00		6.512.816,00		13.139.368,00
	COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS + IVA SOBRE UTILIDAD					$ 6.963.588.734,00		$ 2.210.908.263,29		884.143.834,00		6.092.967,00		890.225.813,00		1.515.980.353,00
									-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
									-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
									-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
23.	ANEXO CAP 23 - SISTEMA HVAC								-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
									-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
									-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
3.01	EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN															
3.01	Suministro e instalación de unidad condensadora de expansión directa de 130 MBTU/h @ 22ºH-50-60Hz Refrigerante 410A -descarga vertical. Incluye protección hasta de 40 kVatios		Und	2,00	$ 29.902.744,00	$ 62.805.334,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
3.02	Suministro e instalación de unidad condensadora de expansión directa de 112 MBTU/h @ 22ºH-50-60Hz Refrigerante 410A -descarga vertical. Incluye protección hasta de 40 kVatios		Und	2,00	$ 31.478.331,50	$ 66.045.063,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
3.03	Suministro e instalación de unidad condensadora de expansión directa de 110 MBTU/h @ 22ºH-50-60Hz Refrigerante 410A -descarga vertical. Incluye protección hasta de 40 kVatios		Und	2,00	$ 25.469.116,50	$ 53.488.233,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
3.04	Suministro e instalación de unidad manejadora de aire de expansión directa de 3000 CFM, 1.50 MBTU/h @ 22ºH-50-60Hz Refrigerante 410A - Descarga vertical		Und	2,00	$ 21.013.616,50	$ 42.013.616,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
3.05	Suministro e instalación de unidad manejadora de aire de expansión directa de 3000 CFM, 1.50 MBTU/h @ 22ºH-50-60Hz Refrigerante 410A - Descarga horizontal		Und	2,00	$ 22.013.616,50	$ 44.013.616,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
3.06	Suministro e instalación de unidad manejadora de aire de expansión directa de 4000 CFM, 1.90 MBTU/h @ 22ºH-50-60Hz Refrigerante 410A - Descarga vertical		Und	2,00	$ 17.742.232,50	$ 35.484.430,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
3.07	Suministro e instalación de unidad manejadora de aire de expansión directa de 2400 CFM, 72 MBTU/h @ 22ºH-50-60Hz Refrigerante 410A - Descarga vertical		Und	2,00	$ 13.412.616,75	$ 26.951.233,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
3.08	Suministro e instalación de unidad condensadora de sistema de refrigeración modelo de 260 MBTU/h @ 22ºH-50-60Hz Refrigerante 410A -Descarga vertical. Incluye protección hasta de 40 kVatios		Und	1,00	$ 64.168.756,00	$ 64.168.756,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
3.09	Suministro e instalación de unidad condensadora de sistema de refrigeración modelo de 212 MBTU/h @ 22ºH-50-60Hz Refrigerante 410A -Descarga vertical. Incluye protección hasta de 40 kVatios		Und	1,00	$ 74.127.216,50	$ 74.653.227,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
3.10	Suministro y instalación de una paradora de sistema de refrigeración modelo tipo cassette marca mca de 9 MBTU/h @ 22ºH-50-60Hz Refrigerante 410A, incluye control remoto		Und	2,00	$ 2.452.744,25	$ 6.875.544,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
3.11	Suministro e instalación de evaporador de sistema de refrigeración modelo tipo cassette marca mca de 12 MBTU/h @ 22ºH-50-60Hz Refrigerante 410A, incluye control remoto		Und	1,00	$ 2.812.616,75	$ 8.453.637,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
3.12	Suministro y instalación de evaporador de sistema de refrigeración modelo tipo cassette marca mca de 24 MBTU/h @ 22ºH-50-60Hz Refrigerante 410A, incluye control remoto		Und	3,00	$ 2.812.616,50	$ 17.675.711,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
3.13	Suministro y instalación de evaporador de sistema de refrigeración modelo tipo ductos marca mca de 24 MBTU/h @ 22ºH-50-60Hz Refrigerante 410A - incluye bandeja de condensado anti olor		Und	2,00	$ 4.973.259,00	$ 9.166.575,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
3.14	Suministro e instalación de evaporador de sistema de refrigeración modelo tipo ductos marca mca de 53 MBTU/h @ 22ºH-50-60Hz Refrigerante 410A - incluye bandeja de condensado anti olor		Und	1,00	$ 6.387.210,00	$ 21.772.260,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
3.15	Suministro e instalación de ventilador de extracción tipo tornado 2500 CFM @0.25 host 220V/3F-60Hz, diseño horizontal		Und	1,00	$ 3.213.391,75	$ 3.213.391,75	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
3.16	Suministro e instalación de ventilador de extracción tipo tornado 3600 CFM @0.25 host 220V/3F-60Hz, diseño horizontal		Und	3,00	$ 10.667.714,25	$ 30.667.714,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
3.17	Suministro e instalación de ventilador de inyección tipo centrífugo en línea 1200 CFM @0.25 host 220V/3F-60Hz, diseño horizontal		Und	1,00	$ 6.017.043,00	$ 6.017.043,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
3.18	Suministro y instalación de campana tipo lab. Extractor en acero inoxidable C/M, extractor ref.304 para una aplicación y de 6 diametros. Incluye filtros de grasa e iluminación, Medidas: 0.90x0.90x0.60 cm		Und	1,00	$ 11.464.795,00	$ 18.564.795,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
3.19	Suministro y instalación de campana tipo isla extractor en acero inoxidable C/M, extractor ref.304 para una aplicación y de 6 diametros. Incluye filtros de grasa e iluminación, Medidas: 2.70x1.30x0.60 cm		Und	1,00	$ 21.013.178,75	$ 16.882.173,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
3.20	SISTEMA DE DIFUSIÓN DE AIRE						-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
3.21	Construcción y instalación de ductos en bancos Galvanizado Calibre 22 - incluye pintura de color solicitado por obra		m2	217,00	$ 251.151,00	$ 51.894.527,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
3.22	Construcción y instalación de ductos en bancos Galvanizado Calibre 24 - incluye pintura de color solicitado por obra		m2	695,00	$ 157.576,13	$ 108.249.271,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
3.23	Suministro e instalación de difusores lineales en ranuras de 1" para ductos en bancos gipsum		m2	710,00	$ 83.387,05	$ 59.208.845,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
3.24	Suministro e instalación de difusor de cuatro vías con dimensiones de 12"x12" incluye pintura de color solicitado por obra		Und	36,00	$ 178.660,69	$ 6.172.571,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
3.25	Suministro e instalación de difusor de cuatro vías con dimensiones de 18"x18" incluye pintura de color solicitado por obra		Und	17,00	$ 111.999,70	$ 2.813.378,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
3.26	Suministro e instalación de difusor de cuatro vías dimensiones de 24"x24" incluye pintura de color solicitado por obra		Und	17,00	$ 99.570,11	$ 2.677.598,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -

CONDICIONES GENERALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA						SALDO	
						MODIFICATORIA NO 1		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO			
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
2.02	Suministro e instalación de difusor de tres vías con damper 8"x8" incluye pintura de color solicitado por obra	Und	2.00	$ 87.232,32	$ 174.464,64	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
2.03	Suministro e instalación de rejilla de retornoSuministro e instalación de rejilla de retorno con damper 10"x6" incluye pintura de color solicitado por obra	Und	24.00	$ 107.211,93	$ 2.514.462,32	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
2.04	Suministro e instalación de rejilla de retornoSuministro e instalación de rejilla de retorno con damper 12"x6" incluye pintura de color solicitado por obra	Und	6.00	$ 170.515,36	$ 1.023.091,80	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
2.10	Suministro e instalación de rejilla de retorno tipo fija 30"x8" incluye pintura de color solicitado por obra	Und	11.00	$ 78.579,53	$ 867.671,80	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
2.11	Suministro e instalación de rejilla de retorno tipo fija 16"x12" incluye pintura de color solicitado por obra	Und	2.00	$ 375.911,49	$ 173.411,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
2.12	Suministro e instalación de rejilla de retorno tipo fija 14"x12" incluye pintura de color solicitado por obra	Und	3.00	$ 376.291,83	$ 452.774,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
2.21	Suministro e instalación de rejilla de retorno tipo fija 8"x24" incluye pintura de color solicitado por obra	Und	1.00	$ 121.726,43	$ 113.732,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
2.14	Suministro e instalación de rejilla de retorno tipo fija 24"x24" incluye pintura de color solicitado por obra	Und	1.00	$ 215.513,79	$ 113.827,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
2.13	Suministro e instalación de rejilla de retorno tipo fija 30"x30" incluye pintura de color solicitado por obra	Und	4.00	$ 662.524,00	$ 2.650.496,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
2.14	Suministro e instalación de rejilla de retorno tipo fija 36"x30" incluye pintura de color solicitado por obra	Und	3.00	$ 776.707,60	$ 2.327.413,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
2.17	Suministro e instalación de rejilla de toma de aire ext para 36"x1 0"	Und	2.00	$ 648.385,18	$ 1.296.772,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
2.16	Suministro e instalación de rejilla de toma de aire ext para 24"x1 0"	Und	1.00	$ 618.139,73	$ 618.114,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
2.00	REDES DE AGUAS NEGRAS					-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
2.01	Suministro e instalación de Tubería de Cobre de 3/4", incluye accesorios y soportería, Tipo L Rígido, estándar bajo estándares constructivos con la utilización de soldaduras, incluye aislamiento tipo ISOLASTIC para obra ISOLASTIC en polímero y soporte con Pendín Semiflexible e instalación de Tubería de Cobre de 3/4", incluye accesorios y soportería,	Mt	17.00	$ 34.169,15	$ 580.661,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
2.02	Tipo L Rígido, estándar bajo estándares constructivos con la utilización de soldaduras, incluye aislamiento tipo ISOLASTIC para obra ISOLASTIC en polímero y soporte con Pendín Semiflexible e instalación de Tubería de Cobre de 3/4", incluye accesorios y soportería,	Mt	113.00	$ 64.416,33	$ 7.145.467,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
2.03	Tipo L Rígido, estándar bajo estándares constructivos con la utilización de soldaduras. La Suministro debe ser fabricado en aislamiento de caucho elastomerico con ref técnica, Semiflexible e instalación de Tubería de Cobre de 3/4", incluye accesorios y soportería,	Mt	49.00	$ 62.111,61	$ 2.772.272,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
2.04	Tipo L Rígido, estándar bajo estándares constructivos con la utilización de soldaduras, incluye aislamiento tipo ISOLASTIC para obra ISOLASTIC en polímero y soporte con Pendín Semiflexible e instalación de Tubería de Cobre de 3/4", incluye accesorios y soportería,	Pt	21.00	$ 73.017,19	$ 2.295.111,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
2.07	Tipo L Rígido, estándar bajo estándares constructivos con la utilización de soldaduras. La Suministro debe ser fabricado en aislamiento de caucho elastomerico con ref técnica, Semiflexible e instalación de Tubería de Cobre de 3/4", incluye accesorios y soportería,	Mt	134.00	$ 98.316,10	$ 14.001.000,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
2.05	Tipo L Rígido, estándar bajo estándares constructivos con la utilización de soldaduras, incluye aislamiento tipo ISOLASTIC para obra ISOLASTIC en polímero y soporte con Pendín Semiflexible e instalación de Tubería de Cobre de 3/4", incluye accesorios y soportería,	Mt	72.00	$ 81.438,78	$ 5.877.594,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
2.07	Tipo L Rígido, estándar bajo estándares constructivos con la utilización de soldaduras, incluye aislamiento tipo ISOLASTIC para obra ISOLASTIC en polímero y soporte con Pendín Semiflexible e instalación de Tubería de Cobre de 3/4", incluye accesorios y soportería,	Mt	84.00	$ 100.474,48	$ 8.440.166,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
2.08	Tipo L Rígido, estándar bajo estándares constructivos con la utilización de soldaduras, incluye aislamiento tipo ISOLASTIC para obra ISOLASTIC en polímero y soporte con Pendín Semiflexible e instalación de Tubería de Cobre de 3/4", incluye accesorios y soportería,	Mt	24.00	$ 305.537,06	$ 7.365.531,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
2.09	Tipo L Rígido, estándar bajo estándares constructivos con la utilización de soldaduras, incluye aislamiento tipo ISOLASTIC para obra ISOLASTIC en polímero y soporte con Pendín Semiflexible e instalación de Tubería de Cobre de 1-1/4", incluye accesorios y soportería,	Mt	105.00	$ 247.434,11	$ 25.989.330,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
2.10	Tipo L Rígido, estándar bajo estándares constructivos con la utilización de soldaduras, incluye aislamiento tipo ISOLASTIC para obra ISOLASTIC en polímero y soporte con Pendín Semiflexible e instalación de Tubería de Cobre de 1-1/2", incluye accesorios y soportería,	Mt	12.00	$ 317.617,00	$ 3.231.456,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
2.11	Tipo L Rígido, estándar bajo estándares constructivos con la utilización de soldaduras, incluye aislamiento tipo ISOLASTIC para obra ISOLASTIC en polímero y soporte con Pendín Semiflexible e instalación de Tubería de Cobre de 1-1/2", incluye accesorios y soportería,	Mt	21.00	$ 371.406,00	$ 8.330.571,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
2.12	Suministro y instalac. de distribuidor de refrigerante tipo BRANCH	Und	21.00	$ 426.117,95	$ 8.356.621,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
2.13	Suministro e instalación de filtro secador pulgada 3/8"	Und	4.00	$ 63.867,00	$ 240.710,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
2.14	Suministro e instalación de filtro secador pulgada 5/8"	Und	5.00	$ 70.801,20	$ 333.687,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
2.15	Suministro e instalación de válvula de bola roscada 3/8"	Und	2.00	$ 72.834,00	$ 290.774,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
2.16	Suministro e instalación de válvula de bola roscada 5/8"	Und	3.00	$ 83.043,93	$ 413.196,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
2.17	Suministro e instalación de válvula solenoide con bobina 220V para 60.000 Btu/h conexión 1/2"-1/2"	Und	1.00	$ 810.107,10	$ 3.240.414,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
2.18	Suministro e instalación de válvula solenoide con bobina 220V para 75.000 Btu/h conexión 3/4"-3/4"	Und	4.00	$ 771.714,00	$ 3.086.963,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
2.19	Suministro e instalación de válvula solenoide con bobina 220V para 72.000 Btu/h conexión 3/4"	Und	1.00	$ 672.714,00	$ 671.746,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
2.20	Suministro e instalación de válvula de bola con puente 3/8"	Und	17.00	$ 172.213,59	$ 2.915.613,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
2.21	Suministro e instalación de válvula de bola con puente 1/2"	Und	8.00	$ 163.362,87	$ 1.306.886,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
2.22	Suministro e instalación de válvula de bola con puente 7/8"	Und	3.00	$ 197.777,00	$ 863.370,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
2.23	Suministro e instalación de válvula de bola con puente 1-1/8"	Und	7.00	$ 218.777,00	$ 1.673.446,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
2.24	Suministro e instalación de válvula de bola con puente 1/4"	Und	2.00	$ 126.012,72	$ 252.424,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
2.25	Suministro e instalación de válvula de bola con puente 3/4"	Und	24.00	$ 136.615,00	$ 3.277.837,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
4.00	SISTEMA DE CONTROL					-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
4.01	Suministro e instalación de termostato doble etapa	Und	6.00	$ 240.766,13	$ 1.388.744,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
4.02	Suministro e instalación de termostato una etapa	Und	1.00	$ 217.767,00	$ 211.736,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
4.03	Suministro e instalación de termostato para fan coil - incluye acondicionamiento	Und	10.00	$ 147.186,73	$ 1.511.666,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
4.00	Suministro e instalación de tubería EMT de 3/4" SCHEDULE 40 incluye accesorios, incluye soportería, cajas de paso en tubo, y soportería. La Suministro debe ser fabricado en aislamiento de caucho elastomerico con ref técnica, varilla roscada,	Mt	174.00	$ 23.405,47	$ 4.428.479,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
4.07	Suministro e instalación de tubería EMT de 1/2" SCHEDULE 40 incluye accesorios, incluye soportería y soportería. La Suministro debe ser fabricado en aislamiento de caucho elastomerico con ref técnica, varilla roscada, abrazaderas, con diseño de	Mt	10.00	$ 17.975,13	$ 173.042,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
4.08	Suministro de cable de control apantallado certificado por Fabricante, incluye instalación y accesorios	Mt	300.00	$ 20.227,13	$ 7.014.533,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -

CONDICIONES GENERALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA						SALDO	
							MODIFICATORIA Nº 5		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO			
ITEM	DESCRIPCION		UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
5,00	MANTENIMIENTO							$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
5,01	Mantenimiento Anual Un		mes	210,00	$ 12.996,55	$ 5.629.647,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
6,00	OTROS COSTOS							$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
6,01	Izaje y Puesta en obra		GLB	1,00	$ 9.845.714,29	$ 9.845.714,29		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
6,02	Transporte de equipos y materiales		GLB	1,00	$ 10.750.909,09	$ 10.750.909,09		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
6,03	Supervisión y Inspección		MES	2,00	$ 6.702.057,50	$ 13.404.115,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
6,04	Personal UNS		MES	1,00	$ 3.436.319,13	$ 3.313.155,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
6,05	Alquiler de Andamios Certificados		MES	1,00	$ 2.187.500,00	$ 4.374.616,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
					SUBTOTAL COSTOS	$ 936.832.000,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
				IVA	19%	$ 178.378.087,00		$ -								$ -
				TOTAL COSTOS		$ 1.117.210.187,00		$ -								$ -
[redacted]																
[redacted]								$ 5.432.862.970,00	$ -	$ 3.911.441.396,19		$ 906.225.912,00		$ 5.217.667.348,09		$ 1.167.869.999,00
[redacted]								$ 431.036.965,00	$ -	$ 271.823.301,53		$ -		$ 271.823.302,00		$ 159.113.563,00
23.1.1																
23.1.1.1			u			$ 3.656.573,00	1,00	$ 3.656.573,00	-			$ -	-	$ -	1,00	$ 3.656.573,00
23.1.1.2			u			$ 6.362.440,00	1,00	$ 6.362.440,00	-			$ -	-	$ -	1,00	$ 6.362.440,00
23.1.1.3			u			$ 8.032.244,00	1,00	$ 8.032.244,00	-			$ -	-	$ -	1,00	$ 8.032.244,00
23.1.1.4			u			$ 2.086.175,00	1,00	$ 2.086.175,00	-			$ -	-	$ -	1,00	$ 2.086.175,00
23.1.1.5			u			$ 1.804.979,00	1,00	$ 1.804.979,00	-			$ -	-	$ -	1,00	$ 1.804.979,00
23.1.1.6			u			$ 829.882,00	1,00	$ 829.882,00	-			$ -	-	$ -	1,00	$ 829.882,00
23.1.1.7			u			$ 3.352.793,00	1,00	$ 3.352.793,00	-			$ -	-	$ -	1,00	$ 3.352.793,00
23.1.2									-			$ -	-	$ -	-	$ -
23.1.2.1			u			$ 4.183.568,00	1,00	$ 4.183.568,00	-			$ -	-	$ -	1,00	$ 4.183.568,00
23.1.2.2			u			$ 5.130.381,00	1,00	$ 5.130.381,00	-			$ -	-	$ -	1,00	$ 5.130.381,00
23.1.2.3			u			$ 2.086.175,00	1,00	$ 2.086.175,00	-			$ -	-	$ -	1,00	$ 2.086.175,00
23.1.2.4			u			$ 829.882,00	1,00	$ 829.882,00	-			$ -	-	$ -	1,00	$ 829.882,00
23.1.3									-			$ -	-	$ -	-	$ -
23.1.3.1			u			$ 2.799.063,00	1,00	$ 2.799.063,00	-			$ -	-	$ -	1,00	$ 2.799.063,00
23.1.3.2			u			$ 9.130.381,00	1,00	$ 9.130.381,00	-			$ -	-	$ -	1,00	$ 9.130.381,00
23.1.3.3			u			$ 2.086.175,00	1,00	$ 2.086.175,00	-			$ -	-	$ -	1,00	$ 2.086.175,00
23.1.3.4			u			$ 829.882,00	1,00	$ 829.882,00	-			$ -	-	$ -	1,00	$ 829.882,00
23.1.4									-			$ -	-	$ -	-	$ -
23.1.4.1			u			$ 3.345.074,00	1,00	$ 3.345.074,00	-			$ -	-	$ -	1,00	$ 3.345.074,00
23.1.4.2			u			$ 6.362.440,00	1,00	$ 6.362.440,00	-			$ -	-	$ -	1,00	$ 6.362.440,00
23.1.4.3			u			$ 2.086.175,00	1,00	$ 2.086.175,00	-			$ -	-	$ -	1,00	$ 2.086.175,00
23.1.4.4			u			$ 829.882,00	1,00	$ 829.882,00	-			$ -	-	$ -	1,00	$ 829.882,00
23.1.4.5			u			$ 3.813.263,00	1,00	$ 3.813.263,00	-			$ -	-	$ -	1,00	$ 3.813.263,00
23.1.5									-			$ -	-	$ -	-	$ -
23.1.5.1			m			$ 178.844,25	120,00	$ 21.461.307,00	-			$ -	-	$ -	120,00	$ 21.461.307,00
23.1.6									-			$ -	-	$ -	-	$ -
23.1.6.1			u			$ 70.307.000,00	1,00	$ 70.307.000,00	-			$ -	-	$ -	1,00	$ 70.307.000,00

CONDICIONES GENERALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA						SALDO	
							MODIFICATORIA NO 1		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO			
ITEM	DESCRIPCION		UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
23.3.2	Red de media tensión trifásica subterránea 13200 Voltios								-			$ -	-	$ -	-	$ -
23.3.2.1	Terminales, empalmes e instalación de ducto de 2-n° - RMC de 6m en poste nuevo con cinta bandit de 3/4 con hebilla, bolivar norte RMC		u			$ 3.982.858,11	1,00	$ 3.982.858,00	-			$ -	-	$ -	1,00	$ 3.982.858,00
23.3.2.3	Canalización, excavación e instalación de canalización de 2-n° - un bañado PVC, incluye tubería, manguera para pilotaje, accesorios, cables encamisados, tubería con piloto de malla y con instalación de la acometida, dado plantas subterráneas		m			$ 129.340,78	115,00	$ 14.901.802,00	115,00	$ 14.901.802,00		$ -	115,00	$ 14.901.802,00	-	$ -
23.3.2.5	Caja de inspección de 1.2*1.2*1 m, M-1115 - malla bandit cinta verde AIS-1 3-M-4616 y instalación de manejo de red de media tensión subterránea en ducto de 6n° - cobre 1 XLPE (AS 0 LM AWG ó 35 kV + 1 Dm (CA) ó 2 AWG, desde poste de entrada hasta torre del transformador - incluye prueba VLF al cable de aislamiento		u			$ 977.529,16	140,00	$ 43.052.673,00	140,00	$ 43.052.673,00		$ -	140,00	$ 43.052.673,00	-	$ -
23.3.3	Transformador trifásico (subestación) tipo poste de 300 KVA, tensión 13200/440-254 voltios						-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
23.3.3.1	Suministro, instalación y energización de transformador trifásico tipo poste de 300 KVA, tensión 13200/440-254 voltios, incluye elementos de conexión, protección y accesorios		u			$ 213.988.825,67	1,00	$ 213.988.825,00	1,00	$ 213.988.825,00		$ -	1,00	$ 213.988.825,00	-	$ -
							-	$ -							-	$ -
23.4	[redacted]							$ 121.870.803,00	-	$ 121.870.803,00		$ -		$ 121.870.803,00	-	$ -
							-	$ -							-	$ -
23.4.1	Alimentador principal 440V de barras del transformador hasta la transferencia automática															
23.4.1.1	Alimentador trifásico 440V de barras del transformador hasta tablero transferencia, en salida de cobre subida 3x500 MCM Centelfilm (fases), 3x 500 MCM Centelfilm (neutro), 3/0 AWG Centelfilm (tierra) en ductos conduit PVC 3x6", Long: 17m		m			$ 6.197.940,89	12,00	$ 78.648.081,00	12,00	$ 78.648.081,00		$ -	12,00	$ 78.648.081,00	-	$ -
23.4.2	Alimentador principal 440V de barras del transformador hasta la transferencia automática de la bomba contraincendios						-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
23.4.2.1	Alimentador trifásico 440V de barras del transformador hasta transferencia de la bomba contraincendios, en salida de cobre subida cables 2 THW (fases), 8 THW (neutro) en ducto conduit soterrado de 1 1/2" aislamiento, Long: 25m.		m			$ 167.343,07	70,00	$ 21.028.150,00	70,00	$ 21.028.150,00		$ -	70,00	$ 21.028.150,00	-	$ -
23.4.2.2	Alimentador trifásico 440V de barras de planta de emergencia hasta tablero transferencia de la bomba contraincendios, en salida de cobre subida cables 2 THW (fases), 8 THW (neutro) en ducto conduit soterrado de 1 1/2" aislamiento, Long: 25m.		m			$ 199.119,21	80,00	$ 23.884.657,00	80,00	$ 23.884.657,00		$ -	80,00	$ 23.884.657,00	-	$ -
							-	$ -							-	$ -
23.5	[redacted]							$ 844.637.868,00	-	$ 844.637.868,00		$ -		$ 844.637.868,00	-	$ -
23.5.1	Suministro e instalación de tablero de 2,5x1,6x 0,6m, con capacidad de 2,5m, 6 ventilos de rejilla de 3/8"x2,5cm y 60 m de conductor de cobre desnudo # 2/0 AWG (Enfasar Transversal (Ancho = 0,6 m, profundidad = 0,2 m), autosoportado anticorrosivo, ventilación		u			$ 11.820.043,67	1,00	$ 11.820.044,00	1,00	$ 11.820.044,00		$ -	1,00	$ 11.820.044,00	-	$ -
23.5.2	Planta eléctrica de 500 KVA, trifásica, 440-254 voltios, 60 Hz. Con cabina insonorizada, encerramiento		u			$ 536.605.476,67	1,00	$ 536.603.917,00	1,00	$ 536.603.917,00		$ -	1,00	$ 536.603.917,00	-	$ -
23.5.3	Alimentador trifásico 440V desde la planta de emergencia hasta la transferencia automática en salida de cobre subida 3x500 MCM Centelfilm (fases), 3x 500 MCM Centelfilm (neutro), 3/0 AWG Centelfilm (tierra) en ductos conduit PVC 3x6", Long:		m			$ 6.364.563,79	17,00	$ 102.758.240,00	17,00	$ 102.758.240,00		$ -	17,00	$ 102.758.240,00	-	$ -
23.5.4	Tablero trifásico (compl) NEMA, Transformador automático a 440V, 3 fases con interruptor termomagnético o amperímetro de red, salida de transformador a conectarse de 3 pasamanos 3x4/0 AWG + 3x4/0 cobre + barras + interruptor tipo de 3x2700A, Dimensión red automática, en		u			$ 95.471.209,00	6,00	$ 85.871.208,00	6,00	$ 85.871.208,00		$ -	1,00	$ 95.471.209,00	-	$ -
23.5.5	Alimentador trifásico 440V desde la transferencia automática hasta el tablero general principal de bajo formato 440V en salida de cobre subida 3-500 MCM Centelfilm (fases), 1 x 500 MCM Centelfilm (neutro), 3/0 AWG Centelfilm (tierra) en canaleta de 40x40cm, Long:		m			$ 8.343.239,61	6,00	$ 37.458.558,00	6,00	$ 37.458.558,00		$ -	6,00	$ 37.458.558,00	-	$ -
23.5.6	Tablero trifásico general para una compañía NEMA, Interruptor automático 440V, 7200A, 65kA, termos trifásicos de 800A, 220V, tres TC de 7200/5A, un interruptor 3x3 800 80kA, una 1x1 600 80 kA, una 3x1200 80 kA, una 1 x600 80 kA, una de 3x400, 65 kA		u			$ 98.938.023,00	1,00	$ 98.938.023,00	1,00	$ 98.938.023,00		$ -	1,00	$ 98.938.023,00	-	$ -
23.5.7	Alimentador trifásico 440V desde tablero principal hasta el transformador de 1 fases, incluyendo 440/220V en salida de cobre subida 3x500 MCM Centelfilm (fases), 2x 500 MCM Centelfilm (neutro), 3/0 AWG Centelfilm (tierra) en canaleta de 40x40cm, Long:		m			$ 5.343.239,61	6,00	$ 36.079.361,00	6,00	$ 36.079.361,00		$ -	6,00	$ 36.079.361,00	-	$ -
23.5.8	Transformador tipo reductor de 150 KVA, 440/220 -127 Voltios, 60 Hz, En caja Cerrada NEMA		u			$ 79.010.292,67	1,00	$ 79.010.292,00	1,00	$ 79.010.292,00		$ -	1,00	$ 79.010.292,00	-	$ -
							-	$ -							-	$ -
23.6	[redacted]							$ 114.529.298,00	-	$ 98.823.780,00		$ 2.946.418,00		$ 101.870.206,00	-	$ 13.659.092,00
23.6.1	Alimentador a tablero zona 1 desde tablero 1 [TAN-1] trifásico 440V de bus bronce en salida de cobre subida 3x#8 AWG Thhn (fases), 1x 2 #8 AWG Thhn (neutro), 2 AWG Thhn (tierra) en ducto conduit PVC enterrado, RMC en barras de 1x1", Long: 110m.		m			$ 3.140.790,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
23.6.2	Tablero trifásico general para suministro tomada 1 [TAN-1] compl NEMA, Interruptor termomagnético 440V, 3750A 50kA, termos trifásicos de 3000A, 220V, dual y serie interruptores 3x1 50 50 kA, un interruptor 3x800 (Un suministro de [redacted] 3x 3750 A		u			$ 29.615.772,00	1,00	$ 29.615.772,00	1,00	$ 29.615.772,00		$ -	1,00	$ 29.615.772,00	-	$ -
23.6.3	Alimentador a tablero zona 2 desde tablero 1 [TAN-1] trifásico 440V de bus bronce en salida de cobre subida 3x#3/0 AWG Thhn (fases), 1x 2 #4/0 AWG Thhn (neutro), 6 AWG Thhn (tierra) en ducto conduit PVC enterrado, RMC en barras de 1 1/2", Long: 3 m.		m			$ 760.297,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
23.6.4	Tablero trifásico general para suministro tomada 2 [TAN-2] compl NEMA, Interruptor termomagnético 440V, 1 600 50kA, termos trifásicos de 300A, 440V, (ultimos interruptores 3x1 50 50 kA, un interruptor 1x600 (Un suministro de [redacted] 3 x 300 A		u			$ 28.548.882,00	1,00	$ 28.548.882,00	1,00	$ 28.548.882,00		$ -	1,00	$ 28.548.882,00	-	$ -
23.6.5	Alimentadores para equipo acondicionador de 5 hp, # 1Ph, 440 V, En salida de cobre subida encamisetado 6x12 (3F + T), en ducto de 1" EMT, Longitud promedio 15m		u			$ 2.541.277,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
23.6.6	Transformador tipo tipo tc60/220V, 300 VA en seco.		u			$ 5.736.100,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
23.6.7	Alimentador para transformador en salida de cobre subida encamisetado 3-1/4 (3F + T), Longitud promedio 20m		u			$ 538.486,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
23.6.8	Alimentador a tablero de emergencia desde tablero [TAE] trifásico 440V de bus bronce en salida de cobre subida 6 AWG Thhn (fases), 6 AWG Thhn (neutro), 8 AWG Thhn (tierra) en ducto conduit PVC de 3 1/2 1/4", Long: 5m.		m			$ 193.301,23	6,00	$ 2.046.410,00	-	$ -	6,00	$ 2.046.410,00	6,00	$ 2.046.410,00	-	$ -
23.6.9	Tablero trifásico general para suministro tomada [TAE] compl NEMA, Interruptor termomagnético 440V, 3x70A 50kA, 1 interruptor de 3x30A, dos interruptores de 2x20A, un breaker de 3x30A, De breaker de totalizador tipo B		u			$ 11.893.842,00	1,00	$ 11.893.842,00	1,00	$ 11.893.842,00		$ -	1,00	$ 11.893.842,00	-	$ -
23.6.10	Alimentador a tablero de bombas (TB) trifásico 440V de bus bronce en salida 4/0 cobre subida 6 AWG Thhn (fases), 6 AWG Thhn (neutro), 8 AWG Thhn (tierra) en ducto conduit PVC de 1 1/2 1/4", Long: 25m.		m			$ 162.113,07	75,00	$ 13.659.080,00	-	$ -		$ -	-	$ -	75,00	$ 13.659.080,00
23.6.11	Tablero trifásico (compl) bombas (TB) trifásico 440V de bus bronce NEMA, Interruptor termomagnético 220V, 60A 50kA, termos trifásicos de 60A, 220V, cuatro interruptor 3x15A 50kA, una de 2x15A 50 kA, cuatro pasamuros ductos, conexiones para bobina alumbrado, Un suministro de		u			$ 28.965.292,00	1,00	$ 28.965.292,00	1,00	$ 28.965.292,00		$ -	1,00	$ 28.965.292,00	-	$ -
							-	$ -							-	$ -
23.7	[redacted]							$ 741.140.208,00	-	$ 232.806.721,88		$ 984.179.443,00		$ 636.986.163,00	-	$ 104.474.134,00
23.7.1	Alimentador a tablero desde 2.2 kV desde transformador trifásico reductor hasta el tablero principal de 2,2kV en salida de cobre subida 3x 500 MCM Centelfilm (fases), 3x 500 MCM Centelfilm (neutro), 3/0 AWG Centelfilm (tierra) en ducto conduit PVC de 3x6", Centro y/o red general administrativo, TICM (compl) NEMA, Interruptor termomagnético 2,2kV, 7600 A 5kA, termos trifásicos de 800A, 2,2kV, tres TC de 7600/5A, protección de red, un interruptor 3x3 800 50kA, una de 3x1 2 5A 50 kA, una de 3x1 1 5A 50 kA, tres de		m			$ 2.900.317,31	28,00	$ 158.816.186,00	-	$ -	28,00	$ 158.816.186,00	28,00	$ 158.816.186,00	-	$ -
23.7.2	Alimentador a tablero de bombas (TB) trifásico 440V de bus bronce en salida 4/0 cobre subida 6 AWG Thhn (fases), 6 AWG Thhn (neutro), 8 AWG Thhn (tierra) en ducto conduit PVC de 1 1/2 1/4", Long: 25m.		u			$ 77.646.124,00	1,00	$ 77.646.124,00	1,00	$ 77.646.124,00		$ -	1,00	$ 77.646.124,00	-	$ -
23.7.3	Tablero de control iluminación automático de plastico 60A, 220V		m			$ 183.813,48	8,00	$ 1.470.492,00	-	$ -	8,00	$ 1.470.492,00	8,00	$ 1.470.492,00	-	$ -
23.7.4	Tablero de control iluminación automático de plastico 60A, 220V		u			$ 13.676.784,00	1,00	$ 13.676.784,00	1,00	$ 13.676.784,00		$ -	1,00	$ 13.676.784,00	-	$ -
23.7.5	Alimentador a tablero zona 1 desde tablero 1 [TAN-1] trifásico 220V de bus bronce en salida de cobre subida 2 #4/0 (fases), 6 AWG (neutro), 6 AWG (tierra) en ducto conduit PVC de 1x1 1/2", Long: 5m.		m			$ 197.701,63	8,00	$ 2.717.613,00	-	$ -	8,00	$ 2.717.613,00	8,00	$ 2.717.613,00	-	$ -
23.7.6	Tablero de distribución zona 1 tomas 1 (TLT1) de 30 tomacos trifasicos con puerta y chapa, con espacio para totalizador, 1 interruptor 3x100A, 20 breakers de 2x20A, 6 de 2x40A enchufados		u			$ 4.190.796,00	1,00	$ 4.190.796,00	-	$ -	1,00	$ 4.190.796,00	1,00	$ 4.190.796,00	-	$ -

CONDICIONES GENERALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA						SALDO	
							MODIFICATORIA NO 1		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO			
ITEM	DESCRIPCION		UNO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
21.5.7	Alimentador a tablero regulado 3 (TR4) bifásico 220V de bajo tomado en cable de cobre aislado 4 AWG THW (fase), 6 AWG (neutro), 10 AWG (tierra) en ducto conduit PVC de 1x1 1/2", Long: 12 m. Uso: hasta computador conectado por UPS trifásico de 20 KVA fp		m		$ 4.640.107,00		12,00	$ 55.681.224,00	-	$ -	12,00	$ 55.681.224,00	12,00	$ 55.681.224,00	-	$ -
21.5.8	Alimentador a tablero regulado 4 (TR5) bifásico 220V de bajo tomado en cable de cobre aislado 6 AWG THW (fase), 6 AWG (neutro), 10 AWG (tierra) en ducto conduit PVC de 1x1 1/2", Long: 12 m.		m		$ 161.941,79		12,00	$ 1.895.298,00	-	$ -	12,00	$ 1.895.298,00	12,00	$ 1.895.298,00	-	$ -
21.5.9	Tablero de distribución regulado 1 (TR6) de 1.1 circuitos bifásico con puerta y chapa, con espacio para totalizador, 1 interruptor 2x50A, 2 breaker 2x20A, 4 breaker 1x20A enchufables.		u		$ 1.741.345,00		1,00	$ 1.741.345,00	-	$ -	1,00	$ 1.741.345,00	1,00	$ 1.741.345,00	-	$ -
21.5.10	Alimentador a tablero tomas regulado 2 (TR12) bifásico 220V de bajo tomado en cable de cobre aislado 3/0 AWG THW (fase), 2 #4AG (neutro), 6 AWG (tierra) en ducto conduit PVC de 1x3", Long: 54m.		m		$ 389.913,99		54,00	$ 21.052.230,00	-	$ -	54,00	$ 21.052.230,00	54,00	$ 21.052.230,00	-	$ -
21.5.11	Tablero de distribución tomas regulado 2 (TR13) de 42 circuitos trifásico con puerta y chapa, con espacio para totalizador, 1 interruptor 3x110A, 11 breakers de 3x30A enchufables.		u		$ 8.295.646,00		1,00	$ 8.295.646,00	-	$ -	1,00	$ 8.295.646,00	1,00	$ 8.295.646,00	-	$ -
21.5.12	Alimentador a tablero tomas regulado 3 (TR14) bifásico 220V de bajo tomado en cable de cobre aislado 2 AWG THW (fase), 4 AWG THW (neutro), 6 AWG THW (tierra) en ducto conduit PVC de 1x1 1/2", Long: 36m.		m		$ 349.412,96		56,00	$ 13.799.888,00	-	$ -	56,00	$ 13.799.888,00	56,00	$ 13.799.888,00	-	$ -
21.5.13	Tablero de distribución tomas regulado 3 (TR15) de 24 circuitos trifásico con puerta y chapa, con espacio para totalizador, 1 interruptor 3x80A, 20 breakers de 1x20A y/o 1x15A enchufables.		u		$ 7.717.981,00		1,00	$ 7.717.981,00	-	$ -	1,00	$ 7.717.981,00	1,00	$ 7.717.981,00	-	$ -
21.5.14	Alimentador a tablero tomas 5 (TL15) bifásico 220V de bajo tomado en cable de cobre aislado 2 AWG LH (fase), 4 AWG LH (neutro), 6 AWG LH (tierra) en ducto conduit EMT de 1x1 1/2", Long: 1.5m.		m		$ 293.314,97		35,00	$ 10.336.094,00	-	$ -		$ -	-	$ -	35,00	$ 10.336.094,00
21.5.15	Tablero de distribución tomas 5 (TL7) de 42 circuitos trifásico con puerta y chapa, con espacio para totalizador, 1 interruptor 3x160A, 21 breakers de 1x20A y/o 1x15A enchufables.		u		$ 9.543.324,00		1,00	$ 9.543.324,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 9.543.324,00
21.5.16	Alimentador a tablero tomas 6 (TL 9) bifásico 220V de bajo tomado en cable de cobre aislado 4 AWG LH (fase), 6 AWG LH (neutro), 8 AWG LH (tierra) en ducto conduit EMT de 1x1 1/4", Long: 33m.		m		$ 398.997,35		33,00	$ 7.956.335,00	-	$ -		$ -	-	$ -	33,00	$ 7.956.335,00
21.5.17	Tablero de distribución tomas 5 (TL3) de 14 circuitos trifásico con puerta y chapa, con espacio para totalizador, 1 interruptor 3x70A, 14 breakers de 1x20A y/o 1x15A enchufables.		u		$ 9.864.475,00		1,00	$ 9.864.475,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 9.864.475,00
21.5.18	Alimentador a tablero regulado 4 (TR6) bifásico 220V de bajo tomado en cable de cobre aislado 2 AWG LH (fase), 1/0 AWG LH (neutro), 6 AWG LH (tierra) en ducto conduit EMT de 1x1 1/2", Long: 60m.		m		$ 344.907,06		40,00	$ 13.952.283,00	-	$ -		$ -	-	$ -	40,00	$ 13.952.283,00
21.5.19	Tablero de distribución regulado 4 (TR4) de 20 circuitos trifásico con puerta y chapa, con espacio para totalizador, 1 interruptor 3x400A, 27 breakers de 1x63A enchufables.		u		$ 4.107.052,00		1,00	$ 4.107.052,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 4.107.052,00
21.5.20	Alimentador a tablero general distribución 2 (TL2-1) bifásico 220V de bajo tomado en cable de cobre aislado 4/0 AWG THW (fase), 2 AWG THW (neutro), 6 AWG THW (tierra) en ducto conduit PVC de 3x3", Long: 27m.		m		$ 312.134,61		32,00	$ 10.980.309,00	31,00	$ 10.327.176,00	1,00	$ 333.135,00	32,00	$ 10.980.309,00	-	$ -
21.5.21	Tablero bifásico general distribución 2 (TL2-1) compuesto de/del: interruptor termomagnético 220V, 315A, tornillo trifásico de 150A, 210V, un interruptor 3 x60A 50 kA, dos interruptores 3 x50A 50kA. Un numerador de tres canales tipo B		u		$ 17.415.900,00		1,00	$ 17.415.900,00	-	$ -	1,00	$ 17.415.900,00	1,00	$ 17.415.900,00	-	$ -
21.5.22	Alimentador a tablero general distribución 3 (TL2-2) bifásico 220V de bajo tomado en cable de cobre aislado 4/0 AWG LH (fase), 2/0 AWG LH (neutro), 2 AWG LH (tierra) en ducto conduit PVC de 3x6", Long: 30m.		m		$ 806.376,19		90,00	$ 72.753.317,00	90,00	$ 72.753.317,00		$ -	90,00	$ 72.753.317,00	-	$ -
21.5.23	Tablero bifásico general distribución 3 (TL2-2) compuesto de/del: interruptor termomagnético 220V, 315A, tornillo trifásico de 150A, 210V, un interruptor 3x140A, dos interruptores 3x100A. Un numerador de tres canales tipo B		u		$ 17.832.624,00		1,00	$ 17.832.624,00	-	$ -	1,00	$ 17.832.624,00	1,00	$ 17.832.624,00	-	$ -
21.5.24	Alimentador a tablero general distribución 4 (TL2-3) bifásico 220V de bajo tomado en cable de cobre aislado 3/0 AWG THW (fase), 2 AWG THW (neutro), 6 AWG THW (tierra) en ducto conduit PVC de 3x3", Long: 30m.		m		$ 486.981,46		90,00	$ 21.644.073,00	90,00	$ 21.644.073,00		$ -	90,00	$ 21.644.073,00	-	$ -
21.5.25	Tablero bifásico general distribución 4 (TL2-3) compuesto de/del: interruptor termomagnético 220V, 315A, tornillo trifásico de 150A, 210V, un interruptor 3x120A, dos interruptores 3x80A. Un numerador de tres canales tipo B		u		$ 17.832.624,00		1,00	$ 17.832.624,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 17.832.624,00
21.5.26	Alimentador a tablero general distribución 5 (TL2-4) bifásico 220V de bajo tomado en cable de cobre aislado 2x2/0 AWG THW (fase), 2x1/0 AWG THW (neutro), 2 AWG THW (tierra) en ducto conduit PVC de 3x5", Long: 30m.		m		$ 3.321.906,65		90,00	$ 100.617.396,00	-	$ -		$ -	-	$ -	90,00	$ 100.617.396,00
21.5.27	Tablero bifásico general distribución 5 (TL2-4) compuesto de/del: interruptor termomagnético 220V, 150A, tornillo trifásico de 100A, 210V, un interruptor 3x110A, un interruptor de 3x100A, dos interruptores 3x60A. Un numerador de tres canales tipo B		u		$ 17.832.624,00		1,00	$ 17.832.624,00	1,00	$ 17.832.624,00		$ -	1,00	$ 17.832.624,00	-	$ -
21.5.28	Alimentador a tablero general auditorio (TL2-5) compuesto de/del: interruptor termomagnético 220V, 150A, tornillo trifásico de 100A, 210V, un interruptor 3x110A, un interruptor de 3x100A, dos interruptores 3x60A. Un numerador de tres canales tipo B		u		$ 17.832.624,00		70,00	$ 40.956.521,00	-	$ -		$ -	-	$ -	70,00	$ 40.956.521,00
21.5.29	Tablero bifásico general auditorio (TL2-5) compuesto de/del: interruptor termomagnético 220V, 150A, tornillo trifásico de 100A, 210V, un interruptor 3x60A, un interruptor 1x40A, dos interruptores 3x30A. Un numerador de tres canales tipo B		u		$ 17.832.624,00		1,00	$ 17.832.624,00	1,00	$ 17.832.624,00		$ -	1,00	$ 17.832.624,00	-	$ -
															-	$ -
21.6	[redacted]							$ 624.804.981,00				$ 84.491.692,00			-	$ 539.313.289,00
															-	$ -
21.6.1	Bloque 1														-	$ -
21.6.1.1	Subalimentador a tablero regulado 1.1 (TR1.1) bifásico 220V de bajo tomado en cable de cobre aislado 6 AWG THW (fase), 4 AWG THW (neutro), 6 AWG LH (tierra) en ducto conduit PVC de 1 1/4" , Long: 30m.		m		$ 173.271,23		58,00	$ 10.017.830,00	-		58,00	$ 10.017.830,00	58,00	$ 10.017.830,00	-	$ -
21.6.1.2	Tablero de distribución regulado 1.1 (TR1.1) de 12 circuitos trifásico con puerta y chapa, con espacio para totalizador, 1 interruptor 3x50A, 9 breaker 1 x20A enchufables		u		$ 864.813,00		1,00	$ 864.812,00	-		1,00	$ 864.812,00	1,00	$ 864.812,00	-	$ -
									-		$ -	$ -	-	$ -	-	$ -
21.6.2	Bloque 2 Primer piso															
21.6.2.1	Subalimentador de TG-D-1 a tablero tomas y tomas 1 (TL15) bifásico 220V de bajo tomado en cable de cobre aislado 2 AWG THW (fase), 4 AWG THW (neutro), 6 AWG THW (tierra) en ducto conduit PVC de 1x1 1/2", Long: 6m.		m		$ 208.372,19		6,00	$ 1.838.233,00	-		-	$ -	-	$ -	6,00	$ 1.838.233,00
21.6.2.3	Tablero de distribución tomas y tomas 5 (TL12) de 36 circuitos trifásico con puerta y chapa, con espacio para totalizador, 1 interruptor 3x160A, 16 breakers de 1x20A y/o 1x15A enchufables		u		$ 4.128.553,00		1,00	$ 4.128.553,00	-		-	$ -	-	$ -	1,00	$ 4.128.553,00
21.6.2.3	Subalimentador a tablero regulado 5 (TL1) bifásico 220V de bajo tomado en cable de cobre aislado 2/0 AWG THW (fase), 2 AWG THW (neutro), 10 AWG THW (tierra) en ducto conduit PVC de 1x2", Long: 1.5m. Uso: hasta computador conectado por UPS		m		$ 389.523,00		14,00	$ 90.127.322,00	-		-	$ -	-	$ -	14,00	$ 90.127.322,00
21.6.2.4	Subalimentador a acondicionador tomas regulado 2 (TR2) bifásico 220V de bajo tomado en cable de cobre aislado 3/0 AWG THW (fase), 6 AWG THW (neutro), 10 AWG THW (tierra) en ducto conduit PVC de 1x1", Long: 14m.		m		$ 146.209,29		14,00	$ 2.156.916,00	-		-	$ -	-	$ -	14,00	$ 2.156.916,00
21.6.2.5	Tablero de distribución regulado 3 (TR2) de 12 circuitos trifásico con puerta y chapa, con espacio para totalizador, 1 interruptor 3x80A, 4 breaker 1x20A enchufables.		u		$ 884.812,00		1,00	$ 884.812,00	-		-	$ -	-	$ -	1,00	$ 884.812,00
									-		$ -	$ -	-	$ -	-	$ -
21.6.3	Bloque 2 Primer piso															
21.6.3.1	Subalimentador de TG-D-2 a tablero tomas y tomas 4 (TL14) bifásico 220V de bajo tomado en cable de cobre aislado 3 AWG THW (fase), 4 AWG THW (neutro), 6 AWG THW (tierra) en ducto conduit PVC de 1x1 1/2", Long: 6m.		m		$ 208.372,19		6,00	$ 1.838.233,00	-		6,00	$ 1.838.233,00	6,00	$ 1.838.233,00	-	$ -
21.6.3.2	Tablero de distribución tomas y tomas 6 (TL12) de 36 circuitos trifásico con puerta y chapa, con espacio para totalizador, 1 interruptor 3x100A, 3 breakers de 2x70A, 33 breakers de 1x20A y/o 1x15A enchufables.		u		$ 4.663.452,00		1,00	$ 4.663.452,00	-		1,00	$ 4.663.452,00	1,00	$ 4.663.452,00	-	$ -
21.6.3.3	Subalimentador a tablero regulado 5 (TR3) bifásico 220V de bajo tomado en cable de cobre aislado 4 AWG THW (fase), 6 AWG THW (neutro), 10 AWG THW (tierra) en ducto conduit PVC de 1x1 1/4", Long: 1.5m. Uso: hasta computador conectado por UPS		m		$ 277.230,00		14,00	$ 90.681.220,00	-		14,00	$ 90.681.220,00	14,00	$ 90.681.220,00	-	$ -
21.6.3.4	Subalimentador a acondicionador tomas regulado 3 (TR3) bifásico 220V de bajo tomado en cable de cobre aislado 6 AWG THW (fase), 6 AWG THW (neutro), 10 AWG THW (tierra) en ducto conduit PVC de 1x1 1/4", Long: 14m.		m		$ 170.634,98		14,00	$ 2.388.170,00	-		14,00	$ 2.388.170,00	14,00	$ 2.388.170,00	-	$ -
21.6.3.5	Tablero de distribución regulado 3 (TR2) de 12 circuitos trifásico con puerta y chapa, con espacio para totalizador, 1 interruptor 3x80A, 9 breaker 1x20A enchufables.		u		$ 1.782.424,00		1,00	$ 1.782.424,00	-		1,00	$ 1.782.424,00	1,00	$ 1.782.424,00	-	$ -
									-		$ -	$ -	-	$ -	-	$ -
21.6.4	Bloque 2 Segundo piso															
21.6.4.1	Subalimentador de TG-D-2 a tablero tomas y tomas 4 (TL14) bifásico 220V de bajo tomado en cable de cobre aislado 3 AWG THW (fase), 4 AWG THW (neutro), 6 AWG THW (tierra) en ducto conduit PVC de 1x1 1/2", Long: 6m.		m		$ 208.372,19		6,00	$ 1.838.233,00	-		-	$ -	-	$ -	6,00	$ 1.838.233,00
21.6.4.2	Tablero de distribución tomas y tomas 6 (TL12) de 30 circuitos trifásico con puerta y chapa, con espacio para totalizador, 1 interruptor 3x100A, 2 breakers de 1x20A, 23 breakers de 1 x20A enchufables.		u		$ 4.040.194,00		1,00	$ 4.040.194,00	-		-	$ -	-	$ -	1,00	$ 4.040.194,00
21.6.4.3	Subalimentador a tablero regulado 5 (TR3) bifásico 220V de bajo tomado en cable de cobre aislado 4 AWG THW (fase), 6 AWG THW (neutro), 8 AWG THW (tierra) en ducto conduit PVC de 1x1 1/4", Long: 1.5m. Uso: hasta computador conectado por UPS		m		$ 277.230,00		14,00	$ 90.783.382,00	-		-	$ -	-	$ -	14,00	$ 90.783.382,00
21.6.4.4	Subalimentador a acondicionador tomas regulado 3 (TR3) bifásico 220V de bajo tomado en cable de cobre aislado 6 AWG THW (fase), 6 AWG THW (neutro), 10 AWG LH (tierra) en ducto conduit PVC de 1x1 1/4", Long: 14m.		m		$ 158.974,53		14,00	$ 2.225.641,00	-		-	$ -	-	$ -	14,00	$ 2.225.641,00

CONDICIONES GENERALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA						SALDO	
							MODIFICATORIA NO 1		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO			
ITEM	DESCRIPCION		UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
21.6.4.5	Tablero de distribución empotrado 5 (TPE) de 12 circuitos trifásicos con puerta y chapa, con espacio para interbloqueo, 1 interruptor 3x50A, 1 breaker 3x20A enchufables		u		$ 1.782.424,00		1,00	$ 1.782.424,00	-			$ -	-	$ -	1,00	$ 1.782.424,00
21.6.5	Sistema 5 Tomacorriente para								-			$ -	-	$ -	-	$ -
21.6.5.1	Subalimentador de 1x95 mm2 + 1x70mm 1 tomas 7 (TL7) trifásicos 220V de bajo tomado en cable de cobre aislado 2 AWG THW (Rojo), 2 AWG THW (amarillo), 2 AWG THW (Azul) en ducto conduit PVC de 1 1/2 1/2". Long 6m.		m		$ 206.372,19		6,00	$ 1.838.233,00	-			$ -	-	$ -	6,00	$ 1.838.233,00
21.6.5.2	Tablero de distribución tomas y tomas 7 (TL7) de 42 circuitos trifásicos con puerta y chapa, con espacio para interbloqueo, 1 interruptor 3x1.000A, 2 breakers de 3x200A, 12 breakers de 1x15A enchufables		u		$ 5.243.616,00		1,00	$ 5.243.616,00	-			$ -	-	$ -	1,00	$ 5.243.616,00
21.6.5.3	Subalimentador a tablero regulado 6 (TR6) trifásicos 220V de bajo tomado en cable de cobre aislado 4 AWG THW (Rojo), 2 AWG THW (amarillo), 6 AWG THW (Verde) en ducto conduit PVC de 1x1 1/2". Long 14m. Incluye todos conectadores requeridos por UPS		m		$ 7.371.494,00		14,00	$ 103.880.972,00	-			$ -	-	$ -	14,00	$ 103.880.972,00
21.6.5.4	Subalimentadores a conmutador tablero regulado 6 (TR6) trifásicos 220V de bajo tomado en cable de cobre aislado 4 AWG THW (Rojo), 2 AWG LH (amarillo), 6 AWG LH (Verde) en ducto conduit PVC de 1x1 1/2". Long 14m.		m		$ 153.295,75		14,00	$ 2.146.113,00	-			$ -	-	$ -	14,00	$ 2.146.113,00
21.6.5.5	Tablero de distribución regulado 6 (TR6) de 18 circuitos trifásicos con puerta y chapa, con espacio para interbloqueo, 1 interruptor 3x60A, 12 breaker 3x20A enchufables		u		$ 3.060.819,00		1,00	$ 3.060.819,00	-			$ -	-	$ -	1,00	$ 3.060.819,00
21.6.6	Sistema 6 Tomacorriente para								-			$ -	-	$ -	-	$ -
21.6.6.1	Subalimentador a tablero regulado 4 (TR4) trifásico 220V de bajo tomado en cable de cobre aislado 2 AWG LH (Rojo), 1/0 AWG LH (amarillo), 6 AWG LH (Verde) en ducto conduit PVC de 1x1 1/2". Long 14m. Incluye todos conectadores requeridos por UPS		m		$ 8.294.965,00		14,00	$ 115.964.120,00	-			$ -	-	$ -	14,00	$ 115.964.120,00
21.6.6.2	Subalimentador a conmutador tablero regulado 6 (TR6) trifásico 220V de bajo tomado en cable de cobre aislado 2 AWG LH (Rojo), 1/0 AWG LH (amarillo), 6 AWG LH (Verde) en ducto conduit PVC de 1x2". Long 6m.		m		$ 223.623,94		14,00	$ 3.130.721,00	-			$ -	-	$ -	14,00	$ 3.130.721,00
21.6.7	Sistema 6 Tomacorriente para AUDITORIO								-			$ -	-	$ -	-	$ -
21.6.7.1	Subalimentador de TC(AUD) a tablero tomas y tomas auditorio (TLT AUD) trifásico 220V de bajo tomado en cable de cobre aislado 4 AWG LH (Rojo), 2 AWG LH (Amarillo), 10 AWG LH (Verde) en ducto conduit PVC de 1x1 1/4". Long 6m.		m		$ 177.880,01		6,00	$ 1.067.880,00	-			$ -	-	$ -	6,00	$ 1.067.880,00
21.6.7.2	Tablero de distribución tomas y tomas auditorio (TLT AUD) de 24 circuitos trifásicos con puerta y chapa, con espacio para interbloqueo, 1 interruptor 3x60A, 2 breakers de 3x20A 2 breakers de 1x20A enchufables		u		$ 3.167.081,00		1,00	$ 3.167.081,00	-			$ -	-	$ -	1,00	$ 3.167.081,00
21.6.7.3	Subalimentador a tablero automatico de transferencia automatico (TC) AUD trifasico 220V de bajo tomado en cable de cobre aislado 10 AWG LH (Rojo), 10 AWG LH (Amarillo), 10 AWG LH (Verde) en ducto conduit PVC de 1x1". Long 6m.		m		$ 126.713,41		6,00	$ 760.280,00	-			$ -	-	$ -	6,00	$ 760.280,00
21.6.7.4	Tablero de control automatico transferencia automatico (TC AUD) , Tres circuitos y protección principal		u		$ 10.378.909,00		1,00	$ 10.378.909,00	-			$ -	-	$ -	1,00	$ 10.378.909,00
21.6.7.5	Subalimentador a tablero regulado auxiliares (TA AUD) trifasico 220V de bajo tomado en cable de cobre aislado 2 AWG LH (Rojo), 6 AWG LH (amarillo), 6 AWG LH (Verde) en ducto conduit PVC de 1x1". Long 14m Incluye todos conectadores requeridos por UPS		m		$ 5.627.318,00		14,00	$ 80.785.382,00	-			$ -	-	$ -	14,00	$ 80.785.382,00
21.6.7.6	Subalimentador a conmutador tablero regulado auxiliares (TA AUD) trifasico 220V de bajo tomado en cable de cobre aislado 6 AWG LH (Rojo), 6 AWG LH (amarillo), 6 AWG LH (Verde) en ducto conduit PVC de 1x1 1/4". Long 14m.		m		$ 199.939,99		14,00	$ 2.758.577,00	-			$ -	-	$ -	14,00	$ 2.758.577,00
21.6.7.7	Tablero de distribución regulado auxiliares (TA AUD) de 12 circuitos trifasicos con puerta y chapa, con espacio para interbloqueo, 1 interruptor 3x60A, 4 breaker 1x20A enchufables		u		$ 1.781.424,00		1,00	$ 1.781.424,00	-			$ -	-	$ -	1,00	$ 1.781.424,00
21.6.8	Subalimentadores a tableros alumbrado exterior 440V								-			$ -	-	$ -	-	$ -
21.6.8.1	Subalimentador a tablero iluminación exterior 1 (TALU EXT 1) trifasico 440V de bajo tomado en cable de cobre aislado 6 AWG THW (Rojo), 6 AWG THW (Amarillo), 10 AWG THW (Verde) en ducto conduit PVC de 1x1 1/4". Long: 65m.		m		$ 99.142,81		65,00	$ 6.444.271,00	-			$ -	-	$ -	65,00	$ 6.444.271,00
21.6.8.2	Tablero iluminación exterior 1. Cofre empotrado manual y puertaventana para iluminación exterior marca conforme Shopper o. S.C.		u		$ 18.454.951,00		1,00	$ 18.454.951,00	1,00	$ 18.454.951,00	1,00	$ 18.454.951,00	-	$ -	-	$ -
21.6.8.3	Subalimentador a tablero iluminación exterior 2 (TALU EXT 2) trifasico 440V de bajo tomado en cable de cobre aislado 6 AWG THW (Rojo), 6 AWG THW (Amarillo), 10 AWG THW (Verde) en ducto conduit PVC de 1x1 1/4". Long: 110m.		m		$ 99.135,15		110,00	$ 10.976.368,00	-			$ -	-	$ -	110,00	$ 10.976.368,00
21.6.8.4	Tablero iluminación exterior 2. Cofre empotrado manual y puertaventana para iluminación exterior marca conforme Shopper o. S.		u		$ 18.454.951,00		1,00	$ 18.454.951,00	-			$ -	-	$ -	1,00	$ 18.454.951,00
21.6.8.5	Subalimentador a tablero iluminación exterior 3 (TALU EXT 3) trifasico 440V de bajo tomado en cable de cobre aislado 6 AWG THW (Rojo), 6 AWG THW (Amarillo), 8 AWG THW (Verde) en ducto conduit PVC de 1x1 1/4". Long: 100m		m		$ 199.899,09		100,00	$ 19.838.900,00	-			$ -	-	$ -	100,00	$ 19.838.900,00
21.6.8.6	Tablero iluminación exterior 3. Cofre empotrado manual con pulsador de cuatro teclas de la marca de fabricación para iluminación exterior. Cuarto terreno		u		$ 20.838.899,00		1,00	$ 20.838.899,00	-			$ -	-	$ -	1,00	$ 20.838.899,00
21.6.9	Sistema 9 Tomacorriente para bajo tomado de 3 ESA, 440/220-110 Voltios. En cable de cobre aislado 12 AWG THW (Rojo), 12 AWG THW (Amarillo), 12 AWG THW (Verde) en ducto conduit PVC de 1x1/2". Long: 6m.								-			$ -	-	$ -	-	$ -
21.6.9.1	Alimentador a tablero de distribución 220-110 Voltios. En cable de cobre aislado 12 AWG THW (Rojo), 12 AWG THW (Amarillo), 12 AWG THW (Verde) en ducto conduit PVC de 1x1/2". Long: 6m.		m		$ 108.759,96		4,00	$ 434.156,00	-			$ -	-	$ -	4,00	$ 434.156,00
21.6.9.2	Transformador seco reductor de 25KVA, 440/220-110 Voltios, 60 Hz. En cable Conexión RETIE		u		$ 6.007.229,37		1,00	$ 6.007.229,00	-			$ -	-	$ -	1,00	$ 6.007.229,00
21.6.9.3	Alimentador a tablero de distribución 220-110 Voltios. En cable de cobre aislado 12 AWG THW (Rojo), 12 AWG THW (Amarillo), 12 AWG THW (Verde) en ducto conduit PVC de 1x1/2". Long: 6m.		m		$ 68.907,33		4,00	$ 275.230,00	-			$ -	-	$ -	4,00	$ 275.230,00
21.6.9.4	Tablero de distribución de bajo y tomas puerta de madera (TD LTB) de 8 circuitos trifasicos con puerta y chapa, 1 breaker 3x63A, 8 breakers de 1x20A enchufables		u		$ 699.147,00		1,00	$ 699.147,00	-			$ -	-	$ -	1,00	$ 699.147,00
21.6.9.5	Luminaria de pared y techo para exteriores, Construida con cuerpo de aluminio de 2,5mm a 3/16", 6 entradas de cable de aplica diametro de 2, accesorios entre el con bombillos ahorrador de 13 W		u		$ 1.152.744,99		15,00	$ 18.791.160,00	-			$ -	-	$ -	15,00	$ 18.791.160,00
									-			$ -	-	$ -	-	$ -
21.7	ELABORACION EXTERIOR							$ 472.880.788,00	-			$ -	-	$ -	-	$ 422.640.788,00
21.7.1	Circuito de alumbrado a 440V en cable de cobre aislado THW No. 10 para dos focos + toma en ducto PVC de 3/4" Long 3.700m		m		$ 31.005,36		800,00	$ 44.030.477,00	-			$ -	-	$ -	800,00	$ 44.030.477,00
21.7.2	Luminaria en concreto de alumbrado de alta/baja/luz, con tubo bore metálico, bornes de		u		$ 616.715,53		60,00	$ 40.936.267,00	-			$ -	-	$ -	60,00	$ 40.936.267,00
21.7.3	Poste metálico para luminaria alumbrado público de 6m con brazo sencillo, montado en pedestal de concreto		u		$ 4.091.467,53		5,00	$ 20.417.337,00	-			$ -	-	$ -	5,00	$ 20.417.337,00
21.7.4	Poste metálico con armadillo de 14m para mejor echo preensamble en grandes de forma, empotrado en base de concreto.		u		$ 68.881.993,11		-	$ -	-			$ -	-	$ -	-	$ -
21.7.5	Poste metálico para luminaria decorativo de 6m, empotrado en pedestal de concreto		u		$ 3.966.267,91		36,00	$ 143.577.624,00	-			$ -	-	$ -	36,00	$ 143.577.624,00
21.7.6	Alimentador monofasico 440V en poste metálico de 14m en cable encauchetado 3x12 con fase y neutro. Long: 25m		u		$ 1.219.712,79		-	$ -	-			$ -	-	$ -	-	$ -
21.7.7	Alimentador monofasico 440V en poste metálico de 6m en cable encauchetado 3x12 con fase y neutro. Long: 5m		u		$ 969.579,79		36,00	$ 34.906.150,00	-			$ -	-	$ -	36,00	$ 34.906.150,00
21.7.8	Luminaria industrial tipo HIGH BAY LED 60W 210W 30000K 8600LM IP65 H38 RCH-TIPO o similar altura de montaje 6m.		u		$ 2.311.292,67		-	$ -	-			$ -	-	$ -	-	$ -
21.7.9	Luminaria alumbrado publico 60W 440V 60HZ 6400LM IP66 H38 RCH-TIPO o similar altura de montaje 6m techos fabricados		u		$ 7.319.874,51		8,00	$ 11.699.622,00	-			$ -	-	$ -	8,00	$ 11.699.622,00
21.7.10	Luminaria Tecnopr decorativa led 60W 440V 60HZ 5400Lm - IP65 o similar altura de montaje 6m techos 440V		u		$ 3.333.081,31		38,00	$ 127.663.288,00	-			$ -	-	$ -	38,00	$ 127.663.288,00
21.7.11	Proyector exterior tipo led - 440W 440V - SE800LM 3000K IP65 H38 CRI 70 1.000KGH o similar		u		$ 7.414.717,00		-	$ -	-			$ -	-	$ -	-	$ -
21.7.12	Tablones semidistribuidos Postes metálicos de 14m, 30m.		u		$ 5.529.977,35		-	$ -	-			$ -	-	$ -	-	$ -

CONDICIONES GENERALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA						SALDO	
							MODIFICATORIA NO 1		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO			
ITEM	DESCRIPCION		UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
									-						-	$ -
23 0	SALIDAS ELECTRICAS							$ 1.052.136.257,00	-	$ 861.888.808,00		$ -		$ 861.888.808,00	-	$ 798.498.348,00
23 0 2	Salida para alumbrado 220 VCA, en caida de cobre aislado libre de halogeno 8x14 para fase, neutro, y tierra, en ducto de 1/2" EMT y accesorios.		u		$ 312.116,03		1.672,00	$ 509.369.522,00	1.672,00	$ 509.369.522,00		$ -	1.672,00	$ 509.369.522,00	-	$ -
23 0 3	Salida de tomas para alumbrado 220 VAC en caida de cobre aislado libre de halogeno 8x14 para fase, neutro, y tierra, en ducto de 1/2" PVC. Long: 3 lm		u		$ 642.915,00		100,00	$ 64.285.500,00	100,00	$ 64.285.500,00		$ -	100,00	$ 64.285.500,00	-	$ -
23 0 5	Salida de tomas para alumbrado 220 VAC por techo,en caida de cobre aislado libre de halogeno 8x14 para fase, neutro, y tierra, en ducto de 1/2" EMT. Long: 3 lm		u		$ 817.628,30		150,00	$ 122.640.945,00	150,00	$ 122.640.945,00		$ -	150,00	$ 122.640.945,00	-	$ -
23 0 6	Luminaria led tipo SOBREPONER - 6400Lm 21.6f 4K a emitir con cable encauchetado 3x14 y clavija trifasica		u		$ 659.974,00		719,00	$ 474.521.306,00	-	$ -		$ -	-	$ -	719,00	$ 474.521.306,00
23 0 7	Luminaria led tipo SOBREPONER - 6400Lm 21.6f 4K a emitir con cable encauchetado 3x14 y clavija trifasica		u		$ 659.974,00		300,00	$ 197.992.200,00	-	$ -		$ -	-	$ -	300,00	$ 197.992.200,00
23 0 8	Cerco tipo deportivo tubular y luminarias en el exterior tipo		m		$ 96.536,73		800,00	$ 83.247.000,00	-	$ -		$ -	-	$ -	800,00	$ 83.247.000,00
23 0 9	Luminaria led tipo BALA 3 led a emitir con cable encauchetado 3x2.5 y clavija trifasica		u		$ 427.099,36		111,00	$ 54.088.098,00	-	$ -		$ -	-	$ -	111,00	$ 54.088.098,00
23 0 10	Reflejor exterior de pared 100W a emitir con cable encauchetado 3x14 y clavija trifasica		u		$ 707.442,36		15,00	$ 10.611.845,00	-	$ -		$ -	-	$ -	15,00	$ 10.611.845,00
23 0 11	Salidas de tomas para fuerza 220V por piso,en caida de cobre aislado libre de halogeno 8x12 para fase, neutro, y tierra, en ducto de 1/2" PVC. Long: 3 lm		u		$ 676.482,90		100,00	$ 67.948.230,00	100,00	$ 67.948.230,00		$ -	100,00	$ 67.948.230,00	-	$ -
23 0 12	Salidas de tomas para fuerza 220 VAC por techo,en caida de cobre aislado libre de halogeno 8x12 para fase, neutro, y tierra, en ducto de 1/2" EMT. Long: 3 lm		u		$ 969.347,13		100,00	$ 96.934.713,00	100,00	$ 96.934.713,00		$ -	100,00	$ 96.934.713,00	-	$ -
23 0 13	Salida para fuente de poder especial en Auditorio, en caida de cobre aislado libre de halogeno 8x12 para fase, neutro, y tierra, en ducto 1/2" PVC.Incluye accesorios necesarios de pase.		u		$ 790.951,63		3,00	$ 2.100.098,00	3,00	$ 2.100.098,00		$ -	3,00	$ 2.100.098,00	-	$ -
									-						-	$ -
23 1	CIVILES							$ 380 000 000,00	-	$ 380 000 000,00				$ 380 000 000,00	-	$ -
23 1 1	Civiles para planta electrica		gl		$ 380.000.000,00		1,00	$ 380 000 000,00	1,00	$ 380 000 000,00		$ -	1,00	$ 380 000 000,00	-	$ -
									-						-	$ -
24	DEMOLICIÓN DE PISOS							$ 244 588 851,00	-						-	$ 244 588 851,00
24 1	PISTEADO DE PISOS CON MORTERO 1:4 DE 3 Cm		M2		$ 69.650,00		3.511,37	$ 244 588 851,00	-	$ -		$ -	-	$ -	3.511,37	$ 244 588 851,00
									-						-	$ -
25	CANALES							$ 738 736 800,00	-						-	$ 738 736 800,00
25 3	Canales en concreto		ml		$ 3.082.243,00		240,00	$ 738 736 800,00	-	$ -		$ -	-	$ -	240,00	$ 738 736 800,00
									-						-	$ -
26	CERRAMIENTO DE TABLAZON							$ 811 276 520,00	-			$ 390 547 080,00		$ 390 547 080,00	-	$ 520 729 440,00
26 1	Suministro y construcción de cerramiento permanente opaco liviano		ml		$ 3.134.330,00		260,00	$ 811 276 520,00	-	$ -	120,00	$ 390 547 080,00	120,00	$ 390 547 080,00	140,00	$ 520 729 440,00
									-						-	$ -
27	DEMOLICIÓN DE MURO DIVISORIO							$ 248 130 490,00	-			$ 108 110 250,00		$ 108 110 250,00	-	$ 140 020 190,00
27 1	Demolición de muro permanente existente. (Incluye retiro)		M2		$ 340.715,00		662,00	$ 225 713 240,00	-	$ -	450,00	$ 108 110 250,00	450,00	$ 108 110 250,00	512,00	$ 120 602 990,00
27 2	Demolición de cerramiento muro permanente existente. (Incluye retiro)		M3		$ 277.388,00		70,00	$ 19 417 250,00	-	$ -		$ -	-	$ -	70,00	$ 19 417 250,00
									-						-	$ -
28	SISTEMA HVAC							$ 343 251 300,00	-						-	$ 343 251 300,00
									-						-	$ -
	BLOQUE A															
11 0 1	Ductería tipo interior en forma PRALU DE ALUMINIO GOFRADO, incluye soportaje, anclajes para ducto sepia delgado		m2		$ 374.960,00		500,00	$ 187 480 000,00	-	$ -		$ -	-	$ -	500,00	$ 187 480 000,00
11 0 2	Ductería tipo exterior en forma de ACERO INOXIDABLE 304 calibre 22, incluye soportaje metálico para ducto sepia delgado		m2		$ 413.864,00		60,00	$ 25 432 080,00	-	$ -		$ -	-	$ -	60,00	$ 25 432 080,00
11 0 10	Tuberia EMT con accesorios para conexión de termostatos y distribución de cableado de control		ml		$ 32.905,00		380,00	$ 12.389 900,00	-	$ -		$ -	-	$ -	380,00	$ 12.389 900,00
									-			$ -	-	$ -	-	$ -
	BLOQUE B PISO 2															
11 0 1	Ductería tipo interior en forma PRALU DE ALUMINIO GOFRADO, incluye soportaje metálico para ducto sepia delgado		m2		$ 374.960,00		185,00	$ 69 367 600,00	-	$ -		$ -	-	$ -	185,00	$ 69 367 600,00
11 0 2	Ductería tipo interior en forma de ACERO INOXIDABLE 304 calibre 22, incluye soportaje metálico para ducto sepia delgado		m2		$ 413.864,00		95,00	$ 39 314 120,00	-	$ -		$ -	-	$ -	95,00	$ 39 314 120,00
11 0 11	Tuberia EMT con accesorios para conexión de termostatos		ml		$ 32.905,00		320,00	$ 10 433 600,00	-	$ -		$ -	-	$ -	320,00	$ 10 433 600,00
31	SANITARIOS							$ 32 377 800,00	-			$ 16 194 900,00		$ 16 194 900,00	-	$ 16 194 900,00
31 1	Duchas duplicadas pared con cemento		ML		$ 161.889,00		200,00	$ 32 377 800,00	-		100,00	$ 16 194 900,00	100,00	$ 16 194 900,00	100,00	$ 16 194 900,00
									-						-	$ -
33	MUROS							$ 33 154 100,00	-			$ 12 381 345,00		$ 12 381 345,00	-	$ 20 792 755,00
33 1	Muros en bloque de concreto		ML		$ 165.770,90		200,00	$ 33 154 100,00	-		74,75	$ 12 381 345,00	74,75	$ 12 381 345,00	125,25	$ 20 792 755,00
									-							

CONDICIONES GENERALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA						SALDO	
						MODIFICATORIA NO 1		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO			
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
				SUBTOTAL COSTOS			$ 7.995.358.341,00	-	-						
	TOTAL COSTO DIRECTO				$ 34.315.483.367,31		$ 34.315.483.367,31		$ 14.213.901.810,15		$ 1.926.527.938,00		$ 16.140.429.856,00		$ 18.175.053.511,31
	COSTO DIRECTO AJUSTADO				$ 34.315.483.367,31		$ 34.315.483.367,31		$ 14.213.901.810,15		$ 1.926.527.938,00		$ 16.140.429.856,00		$ 18.175.053.511,31
	AIU de CONTRATISTA	%	30,72%												
	Administración	%	24,22%		8.309.783.304,00		$ 8.309.783.304,00		$ 9.442.015.056,98		$ 466.524.629,08		$ 9.908.539.686,27		$ 4.401.243.418,13
	Imprevistos	%	1,50%		514.732.401,00		$ 514.732.401,00		$ 213.206.528,79		$ 28.687.919,04		$ 242.106.447,84		$ 272.625.952,67
	Utilidad	%	5,00%		1.715.774.668,00		$ 1.715.774.668,00		$ 710.685.285,98		$ 96.336.366,80		$ 807.021.492,80		$ 908.753.175,57
	TOTAL AIU				10.540.290.373,00		$ 10.540.290.373,00		$ 4.365.918.681,73		$ 591.749.144,52		$ 4.957.667.826,91		$ 5.582.622.546,39
	VALOR TOTAL OBRA				44.855.773.740,31		$ 44.855.773.740,31		$ 18.579.820.492,88		$ 2.518.277.082,52		$ 21.098.097.682,91		$ 23.757.675.057,47

De forma la presente Acta por quienes en ella han intervenido:

JESUS ALEXANDER CEBALLOS
CONSORCIO CENTRO CAMBA
Representante legal
Contratista

LAURA CAICEDO MUÑOZ
CONSORCIO MAGDALENA AVANZA 025
Representante legal
Interventoria

Ing. EFRAIN VARGAS CORVACHO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Supervisor de Contrato

Gobernación del MAGDALENA


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO:	
VERSIÓN:	
FECHA DE APROBACIÓN	
PÁGINA	1 DE 1

ACTA PARCIAL DE OBRA No.	6		PERIODO DE EJECUCIÓN	19 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2026	
CONTRATO DE OBRA No.			CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CI-1324-2025		
CONTRATISTA	Consorcio Centro Cambia	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA	CONTRATISTA	CONSORCIO AVANZA MAGDALENA 025	OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA
DIRECTOR DE OBRA	JESUS CERVANTES		DIRECTOR INTERVENTORIA	DAVINSON GRAVINI POLO	
RESIDENTE DE OBRA	BRAYAN CUAVAS SALCEDO		RESIDENTE DE INTERVENTORIA	ALEJANDRA SANCHEZ CERÓN	
CAPITULO	2.00		SUBCAPITULO	02.02 -	FECHA:
ITEM	02.02.03	DESCRIPCIÓN: Concreto de zapatas			UNIDAD: M3

No.	DESCRIPCION	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL
	Concreto de zapatas	1.5	1.5	0.4		0.9	4	3.60
	BAÑO BLOQUE D							
							TOTAL ACTIVIDAD	3.60
							ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR	
							TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS	3.60

LOCALIZACION / ESQUEMA

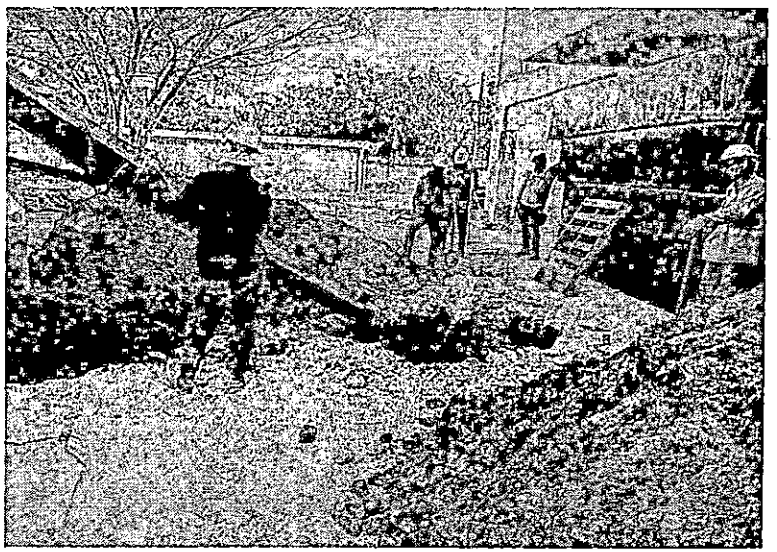

OBSERVACIONES

ELABORO	APROBÓ	REVISÓ
BRAYAN CUAVAS SALCEDO	RAFAEL CABRALES	ALEJANDRA SANCHEZ

Gobernación del MAGDALENA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO:	
VERSIÓN:	
FECHA DE APROBACIÓN	
PÁGINA	1 DE 1

ACTA PARCIAL DE OBRA No.	6	PERIODO DE EJECUCIÓN	19 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2026		
CONTRATO DE OBRA No.			CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CI-1324-2025		
CONTRATISTA	Consorcio Centro Cambia	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA	CONTRATISTA	CONSORCIO AVANZA MAGDALENA 025	OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA
DIRECTOR DE OBRA	JESUS CERVANTES		DIRECTOR INTERVENTORIA	DAVINSON GRAVINI POLO	
RESIDENTE DE OBRA	BRAYAN CUAVAS SALCEDO		RESIDENTE DE INTERVENTORIA	ALEJANDRA SANCHEZ CERÓN	
CAPITULO	3.01		SUBCAPITULO	03.01	FECHA
ITEM	03.01.01	DESCRIPCIÓN	Placas de 0.60 - (0.26 M3/M2)		UNIDAD M2


NO.	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL
	Placas de 0.60 - (0.26 M3/M2)							
	BAÑO BLOQUE D							
	Losa de entrepiso				45.7744			45.77
	Cubierta				45.7744			45.77


TOTAL ACTIVIDAD 91.55


ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR

TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS 91.55

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA

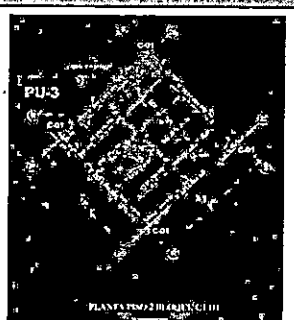

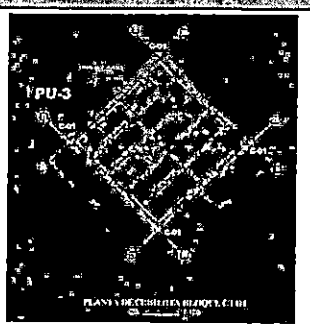

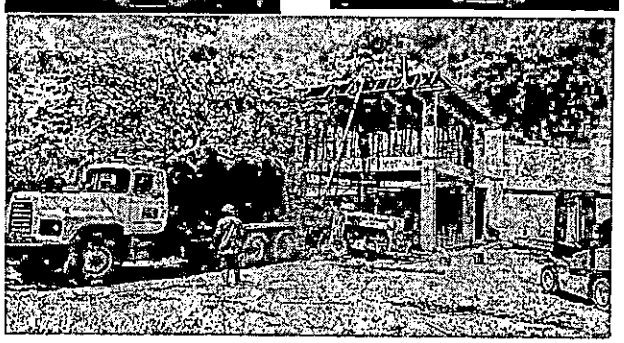

OBSERVACIONES

ELABORÓ	APROBÓ	REVISÓ
BRAYAN CUAVAS SALCEDO	RAFAEL CABRALES	ALEJANDRA SANCHEZ

Gobernación del MAGDALENA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO:	
VERSIÓN:	
FECHA DE APROBACIÓN	
PÁGINA	1 DE 1

ACTA PARCIAL DE OBRA No.	6	PERIODO DE EJECUCIÓN	19 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2026
CONTRATO DE OBRA No.		CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. GI-1324-2025	
CONTRATISTA	Consorcio Centro Cambia	CONTRATISTA	CONSORCIO AVANZA MAGDALENA 025
DIRECTOR DE OBRA	JESUS CERVANTES	DIRECTOR INTERVENTORÍA	DAVINSON GRAVINI POLO
RESIDENTE DE OBRA	BRAYAN CUAVAS SALCEDO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	ALEJANDRA SANCHEZ CERÓN
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA		OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA	
CAPITULO	3.01	SUBCAPITULO	03.01
ITEM	03.01.02	DESCRIPCIÓN	Placas de 0.70 y viguetas 0.60 - (0.31 M3/M2)
		UNIDAD	M2

No.	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL
	Placas de 0.70 y viguetas 0.60 - (0.31 M3/M2)							
	CUBIERTA BLOQUE C						385.2867	385.29
	Placas de 0.70 y viguetas 0.60 - (0.31 M3/M2)							
	BLOQUE C	875.06						
	BLOQUE D	875.06						
	CUBIERTA BLOQUE C	450.7267						
	CUBIERTA BLOQUE D	487.8						
	TOTAL	2688.65						
	BLOQUE B	940.5						
	BLOQUE D	875.06						
	CUBIERT BLOQUE D	487.8						
	Cantidad cobrada en el acta No. 3	2303.4						


TOTAL ACTIVIDAD	385.29
ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR	
TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS	385.29

OBSERVACIONES

ELABORO	APROBÓ	REVISÓ
BRAYAN CUAVAS SALCEDO	RAFAEL CABRALES	ALEJANDRA SANCHEZ

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA

CUBIERTA BLOQUE C

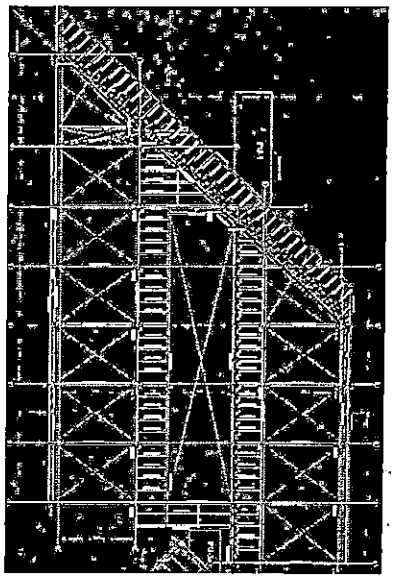

Gobernación del MAGDALENA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO:	
VERSIÓN:	
FECHA DE APROBACIÓN	
PÁGINA	1 DE 1

ACTA PARCIAL DE OBRA No.	6	PERIODO DE EJECUCIÓN	19 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2026
CONTRATO DE OBRA No.		CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CI-1324-2025	
CONTRATISTA	Consorcio Centro Cambia	CONTRATISTA	CONSORCIO AVANZA MAGDALENA 025
DIRECTOR DE OBRA	JESUS CERVANTES	DIRECTOR INTERVENTORIA	DAVINSON GRAVINI POLO
RESIDENTE DE OBRA	BRAYAN CUAVAS SALCEDO	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	ALEJANDRA SANCHEZ CERÓN
CAPITULO:	3.01	SUBCAPITULO	03.01
ITEM	03.01.03	DESCRIPCION	Placas de 0.70 - (0.33 M3/M2)
UNIDAD	M2		

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA

OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA

FECHA:


NO.	DESCRIPCION	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL	LOCALIZACIÓN / ESQUEMA
	Placas de 0.70 - (0.33 M3/M2)								
	CUBIERTA BLOQUE A						500.492	500.49	
	CUBIERTA BLOQUE B								
	Placas de 0.70 - (0.33 M3/M2)								
	BLOQUE A	870.1							
	BLOQUE B	940.5							
	CUBIERTA BLOQUE A	220.3798							
	CUBIERTA BLOQUE B	214.67							
	TOTAL	2245.65							
	BLOQUE A	870.1							
	BLOQUE C	875.06							
	Cantidad cobrada en el acta No. 2	1745.2							

TOTAL ACTIVIDAD	500.49
ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR	
TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS	500.49


OBSERVACIONES

ELABORÓ	APROBÓ	REVISÓ
BRAYAN CUAVAS SALCEDO	RAFAEL CABRALES	ALEJANDRA SANCHEZ

CUBIERTA BLOQUE A



CUBIERTA BLOQUE B

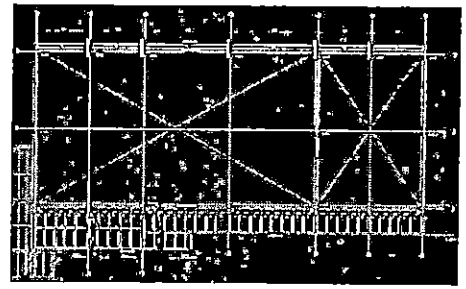

Gobernación del MAGDALENA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO:	
VERSIÓN:	
FECHA DE APROBACIÓN	
PÁGINA	1 DE 1

ACTA PARCIAL DE OBRA No.	6	PERIODO DE EJECUCIÓN	19 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2026

CONTRATO DE OBRA No.			CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CI-1324-2025		
CONTRATISTA	Consorcio Centro Cambia	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA	CONTRATISTA	CONSORCIO AVANZA MAGDALENA 025	OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA
DIRECTOR DE OBRA	JESUS CERVANTES		DIRECTOR INTERVENTORIA	DAVINSON GRAVINI POLO	
RESIDENTE DE OBRA	BRAYAN CUAVAS SALCEDO		RESIDENTE DE INTERVENTORIA	ALEJANDRA SANCHEZ CERÓN	

CAPITULO	3.01	SUBCAPITULO	03.01	FECHA	
ITEM	03.01.04	DESCRIPCIÓN	Vigas aisladas	UNIDAD	M3

No.	DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL
	Vigas aisladas							
	BLOQUE A				48.47			48.47
	BLOQUE B				14.99			14.99
	BLOQUE C				20.69			20.69
	BLOQUE D				17.9			17.88
							TOTAL ACTIVIDAD	102.03
							PARA COBRAR PRESENTE ACTA	97.00

OBSERVACIONES: PENDIENTE POR COBRAR 5.03 M3

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA

VIGAS AISLADAS BLOQUE A

VIGA	ANCHO	ALTO	LARGO	VOLUMEN
V-302	0.4	0.7	9.35	2.62
V-303	0.3	0.7	21.3	4.47
V-304	0.3	0.7	21.35	4.48
V-305	0.4	0.7	17.85	4.998
V-306	0.4	0.7	19.17	5.37
V-308	0.4	0.7	19.27	5.40
V-309	0.6	0.7	8.85	3.72
V-309	0.4	0.7	9.2	2.58
V-310	0.4	0.7	18.05	5.05
V-310	0.4	0.7	18.05	5.05
V-311	0.4	0.7	1.54	0.43
VT-10	0.2	0.7	8.55	1.20
VT-27	0.2	0.7	22.15	3.10
TOTAL				48.47

VIGAS AISLADAS BLOQUE B

VIGA	ANCHO	ALTO	LARGO	VOLUMEN
V-301	0.4	0.7	17.85	5.00
V-302	0.4	0.7	17.85	5.00
V-305	0.4	0.7	17.85	5.00
TOTAL				14.99

VIGAS AISLADAS BLOQUE D

VIGA	ANCHO	ALTO	LARGO	VOLUMEN
V-301	0.3	0.7	7.45	1.56
V-303	0.3	0.7	44.7	9.39
V-304	0.3	0.7	29.8	6.26
VT-19	0.15	0.7	6.38	0.67
TOTAL				17.88

VIGAS AISLADAS BLOQUE C

VIGA	ANCHO	ALTO	LARGO	VOLUMEN
V-301	0.3	0.7	7.45	1.56
V-303	0.3	0.7	44.7	9.39
V-304	0.3	0.7	29.8	6.26
V-306	0.3	0.7	6.82	1.43
VT-11	0.15	0.7	6.38	0.67
VT-15	0.15	0.7	6.75	0.71
VT-62	0.12	0.7	8.03	0.67
TOTAL				20.69

ELABORÓ	APROBÓ	REVISÓ
BRAYAN CUAVAS SALCEDO	RAFAEL CABRALES	ALEJANDRA SANCHEZ

Gobernación del MAGDALENA


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO:	
VERSIÓN:	
FECHA DE APROBACIÓN	
PÁGINA	1 DE 1

ACTA PARCIAL DE OBRA No.	6	PERIODO DE EJECUCIÓN	19 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2026		
CONTRATO DE OBRA No.			CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CI-1324-2025		
CONTRATISTA	Consorcio Centro Cambia	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA	CONTRATISTA	CONSORCIO AVANZA MAGDALENA 025	OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA
DIRECTOR DE OBRA	JESUS CERVANTES		DIRECTOR INTERVENTORÍA	DAVINSON GRAVINI POLO	
RESIDENTE DE OBRA	BRAYAN CUAVAS SALCEDO		RESIDENTE DE INTERVENTORIA	ALEJANDRA SANCHEZ CERÓN	
CAPITULO	3.01		SUBCAPITULO	03.02	FECHA
ITEM	03.02.01	DESCRIPCIÓN	Columnas en concreto		UNIDAD M3

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL
Columnas en concreto	0.5	0.35	2.95		0.51625	8	4.13
BAÑO BLOQUE D							
TOTAL ACTIVIDAD							4.13
ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR							
TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS							4.13

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA

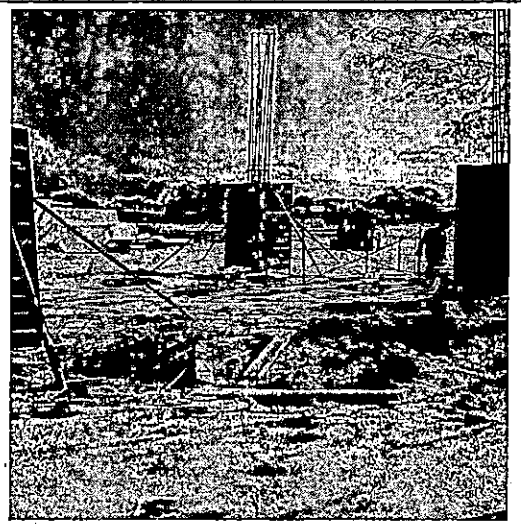

OBSERVACIONES:

ELABORO	APROBÓ	REVISÓ
BRAYAN CUAVAS SALCEDO	RAFAEL CABRALES	ALEJANDRA SANCHEZ

Gobernación del MAGDALENA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA


CÓDIGO:	
VERSIÓN:	
FECHA DE APROBACIÓN	
PÁGINA	1 DE 1


ACTA PARCIAL DE OBRA No.	6		PERIODO DE EJECUCIÓN	19 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2026	
CONTRATO DE OBRA No.			CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	CI-1324-2025	
CONTRATISTA	CONSORCIO CENTRO CAMBIA	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA	CONTRATISTA	CONSORCIO AVANZA MAGDALENA 025	OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA
DIRECTOR DE OBRA	JESUS CERVANTES		DIRECTOR INTERVENTORIA	DAVINSON GRAVINI POLO	
RESIDENTE DE OBRA	BRAYAN CUAVAS SALCEDO		RESIDENTE DE INTERVENTORIA	ALEJANDRA SANCHEZ CERÓN	
CAPITULO:	3,00		SUBCAPITULO	03,05	FECHA:
ITEM	03.05.01	DESCRIPCIÓN: Acero de refuerzo			UNIDAD: KG

No	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES KG	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL
	ACERO DE REFUERZO CUBIERTA							
	CUBIERTA BLOQUE A	8375.40						
	CUBIERTA BLOQUE B	5648.40						
	CUBIERTA BLOQUE C	9400.60						
	CUBIERTA BLOQUE D	12492.60						
	TOTAL	35917.00						
							PARCIAL ACTIVIDAD	35917.00
							PARA COBRAR PRESENTE ACTA	32706.60

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA


BLOQUE A






BLOQUE B





BLOQUE C





OBSERVACIONES: PENDIENTE POR COBRAR 3210.5 KG

ELABORO	APROBO	REVISO
BRAYAN CUAVAS SALCEDO	RAFAEL CABRALES	ALEJANDRA SANCHEZ

Gobernación del MAGDALENA


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO:	
VERSIÓN:	
FECHA DE APROBACIÓN	
PÁGINA	1 DE 1

ACTA PARCIAL DE OBRA No.	6		PERIODO DE EJECUCION	19 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2026	
CONTRATO DE OBRA No.			CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CI-1324-2026		
CONTRATISTA	CONSORCIO CENTRO CAMBIA	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA	CONTRATISTA	CONSORCIO AVANZA MAGDALENA 025	OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA
DIRECTOR DE OBRA	JESUS CERVANTES		DIRECTOR INTERVENTORIA	DAVINSON GRAVINI POLO	
RESIDENTE DE OBRA	BRAYAN CUAVAS SALCEDO		RESIDENTE DE INTERVENTORIA	ALEJANDRA SANCHEZ CERÓN	
CAPITULO:	4.00		SUBCAPITULO	04.03	FECHA:
ITEM	04.03.01	DESCRIPCIÓN: Acero de refuerzo			UNIDAD: KG

No.	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES KG	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL
	BLOQUE A							
		1		1118				1118.00
		1		9				9.00
		1		29				29.00
		1		19.38				19.38
		1		3.6				3.60
		1		40.8				40.80
		1		43.7				43.70
	BLOQUE B							
		1		767.00				767.00
		1		34.20				34.20
		1		37.40				37.40
		1		10.00				10.00
								2112.08
	CANTIDAD COBRADA EN EL ACTA No. 4							
	BLOQUE A							
	muros externos	160					160	160.00
	muros internos	300					300	300.00
	BLOQUE B							
	muros externos	160					160	160.00
	muros internos	300					300	300.00
								920.00
						PARCIAL ACTIVIDAD		1192.08
						ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR		
						TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS		1192.08

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA

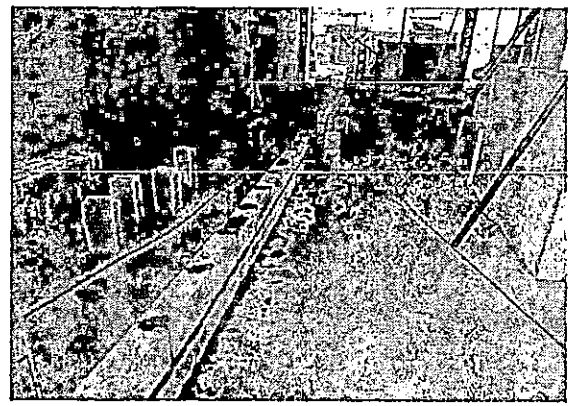

OBSERVACIONES

ELABORO	APROBO	REVISO
BRAYAN CUAVAS SALCEDO	RAFAEL CABRALES	ALEJANDRA SANCHEZ

Gobernación del MAGDALENA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO:	
VERSIÓN:	
FECHA DE APROBACIÓN	
PÁGINA	1 DE 1

ACTA PARCIAL DE OBRA No.	6	PERIODO DE EJECUCIÓN	19 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2026		
CONTRATO DE OBRA No.		CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CI-1324-2025			
CONTRATISTA	Consorcio Centro Cambia	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA	CONTRATISTA	CONSORCIO AVANZA MAGDALENA 025	OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA
DIRECTOR DE OBRA	JESUS CERVANTES		DIRECTOR INTERVENTORIA	DAVINSON GRAVINI POLO	
RESIDENTE DE OBRA	BRAYAN CUAVAS SALCEDO		RESIDENTE DE INTERVENTORIA	ALEJANDRA SANCHEZ CERÓN	
CAPITULO	4.00		SUBCAPITULO	04.02	FECHA:
ITEM	04.02.02	DESCRIPCIÓN	Dovelas en concreto		UNIDAD: ML

NO.	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL
	BLOQUE A:							
		3.25					344	1118.00
		0.9					10	9.00
		1					29	29.00
		0.51					38	19.38
		0.3					12	3.60
		1.7					24	40.80
		1.9					23	43.70
	BLOQUE B:							
		3.25					236.00	767.00
		1.90					18	34.20
		1.7					22.00	37.40
		1					10.00	10.00
								2112.08
	CANTIDAD COBRADA EN EL ACTA No. 4							
	BLOQUE A							
	muros externos	160					160	160.00
	muros internos	300					300	300.00
	BLOQUE B							
	muros externos	160					160	160.00
	muros internos	300					300	300.00
								920.00
							TOTAL ACTIVIDAD	1192.08
							ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR	
							TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS	1192.08

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA



OBSERVACIONES

ELABORÓ	APROBÓ	REVISÓ
BRAYAN CUAVAS SALCEDO	RAFAEL CABRALES	ALEJANDRA SANCHEZ

Gobernación del MAGDALENA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO:	
VERSIÓN:	
FECHA DE APROBACIÓN	
PÁGINA	1 DE 1


ACTA PARCIAL DE OBRA No.	6	PERÍODO DE EJECUCIÓN	19 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2026
CONTRATO DE OBRA No.		CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CI-1324-2025
CONTRATISTA	Consorcio Centro Cambia	CONTRATISTA	CONSORCIO AVANZA MAGDALENA 025
DIRECTOR DE OBRA	JESUS CERVANTES	DIRECTOR INTERVENTORÍA	DAVINSON GRAVINI POLO
RESIDENTE DE OBRA	BRAYAN CUAVAS SALCEDO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	ALEJANDRA SANCHEZ CERÓN
CAPÍTULO	13.00	SUBCAPÍTULO	13.1
ITEM	13.1.9	DESCRIPCIÓN	TUBERÍA DE 2Ø2"
FECHA		UNIDAD	ML

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA

OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA

No.	DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL
	TUBERÍA DE 2Ø2"	80						80.00
							TOTAL ACTIVIDAD	80.00
							ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR	
							TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS	80.00

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA

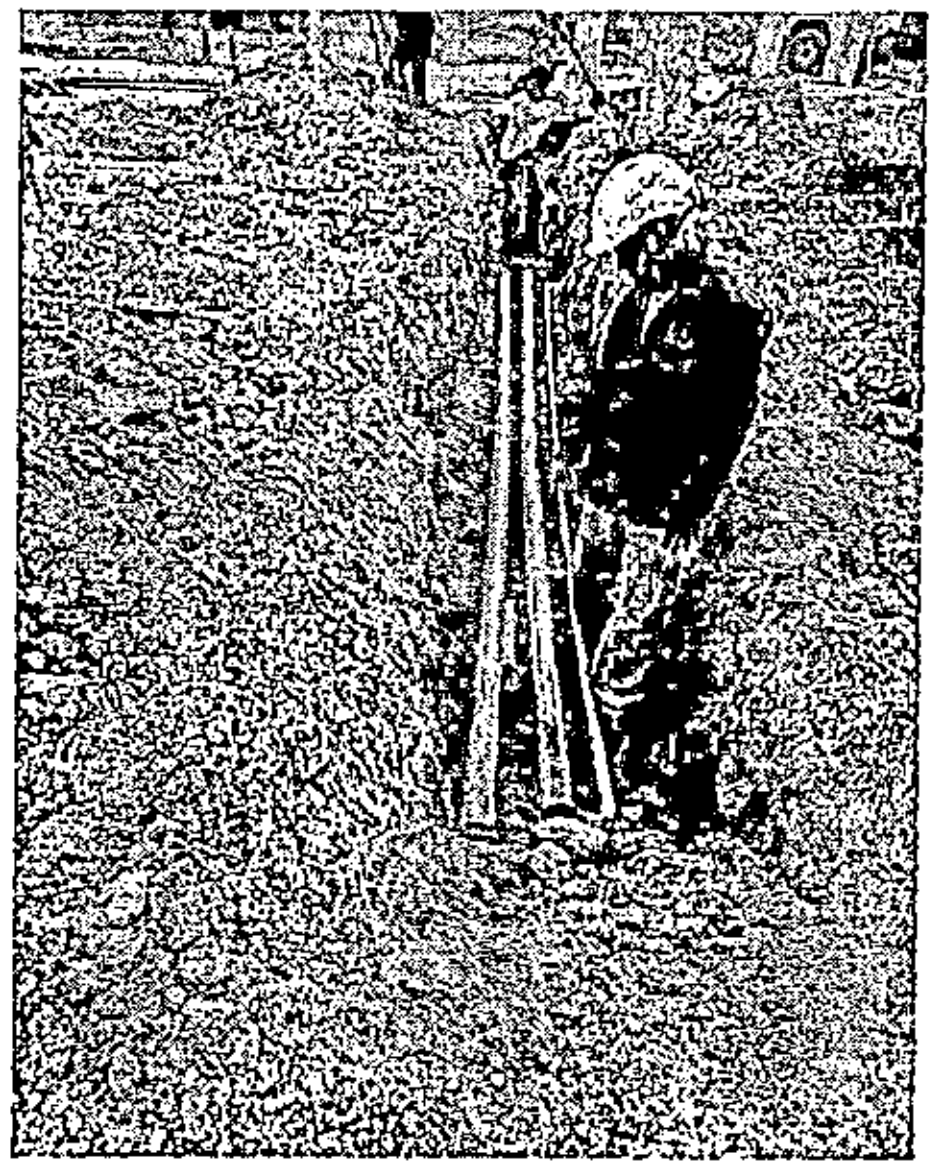

OBSERVACIONES

ELABORÓ	APROBÓ	REVISÓ
BRAYAN CUAVAS SALCEDO	RAFAEL CABRALES	ALEJANDRA SANCHEZ

Gobernación del
MAGDALENA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO:	
VERSIÓN:	
FECHA DE APROBACIÓN	
PÁGINA	1 DE 1


ACTA PARCIAL DE OBRA No.	6	PERIODO DE EJECUCIÓN	19 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2026

CONTRATO DE OBRA No.			CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CI-1324-2025		
CONTRATISTA	Consorcio Centro Cambia	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA	CONTRATISTA	CONSORCIO AVANZA MAGDALENA 025	OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA
DIRECTOR DE OBRA	JESUS CERVANTES		DIRECTOR INTERVENTORIA	DAVINSON GRAVINI POLO	
RESIDENTE DE OBRA	BRAYAN CUAVAS SALCEDO		RESIDENTE DE INTERVENTORIA	ALEJANDRA SANCHEZ CERÓN	
CAPITULO	13.00		SUBCAPITULO	13.1	FECHA

ITEM	13.1.10	DESCRIPCIÓN	CAJA CS275	UNIDAD	UN

No	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES					CANTIDAD	TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN		
	CAJA CS275						1	1.00
							TOTAL ACTIVIDAD	1.00
							ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR	
							TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS	1.00

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA

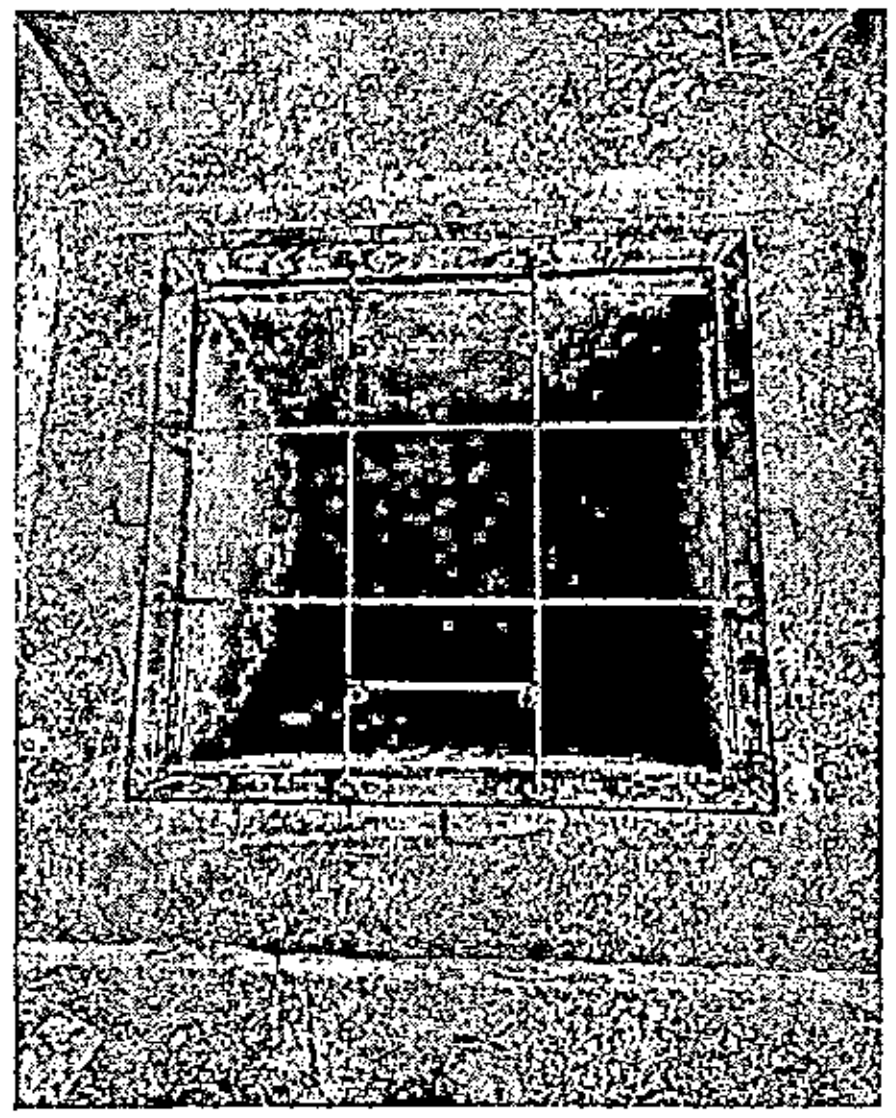

OBSERVACIONES

ELABORO	APROBÓ	REVISÓ
BRAYAN CUAVAS SALCEDO	RAFAEL CABRALES	ALEJANDRA SANCHEZ

Gobernación del MAGDALENA


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO:	
VERSIÓN:	
FECHA DE APROBACIÓN	
PÁGINA	1 DE 1

ACTA PARCIAL DE OBRA No.	6	PERIODO DE EJECUCION	19 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2026		
CONTRATO DE OBRA No.			CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CI-1324-2025		
CONTRATISTA	Consorcio Centro Cambia	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA	CONTRATISTA	CONSORCIO AVANZA MAGDALENA 025	OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA
DIRECTOR DE OBRA	JESUS CERVANTES		DIRECTOR INTERVENTORIA	DAVINSON GRAVINI POLO	
RESIDENTE DE OBRA	BRAYAN CUAVAS SALCEDO		RESIDENTE DE INTERVENTORIA	ALEJANDRA SANCHEZ CERÓN	
CAPITULO:	20.00		SUBCAPITULO	20.01.01	FECHA
ITEM	20.01.01.02	DESCRIPCIÓN: TUBERIA PVC-P			UNIDAD: ML

NO	DESCRIPCION	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL
	TUBERIA PVC-P 3"	15.45						15.45
							TOTAL ACTIVIDAD	15.45
							ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR	
							TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS	15.45

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA

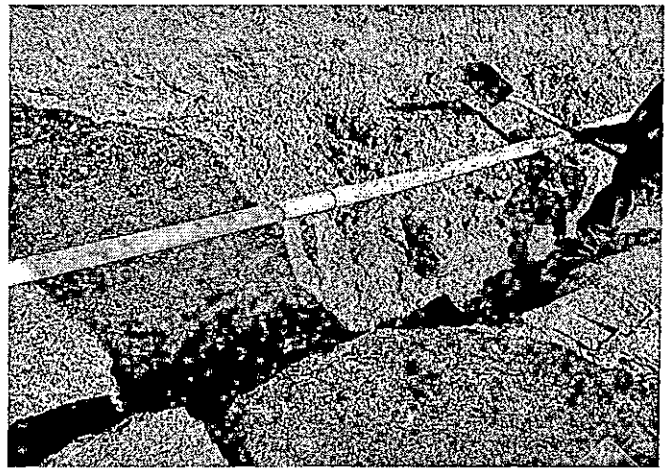

OBSERVACIONES

ELABORO	APROBÓ	REVISÓ
BRAYAN CUAVAS SALCEDO	RAFAEL CABRALES	ALEJANDRA SANCHEZ

Gobernación del MAGDALENA


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO:	
VERSIÓN:	
FECHA DE APROBACIÓN	
PÁGINA	1 DE 1

ACTA PARCIAL DE OBRA No.	6		PERIODO DE EJECUCIÓN	19 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2026	
CONTRATO DE OBRA No.			CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CI-1324-2025		
CONTRATISTA	Consorcio Centro Cambia	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA	CONTRATISTA	CONSORCIO AVANZA MAGDALENA 025	OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA
DIRECTOR DE OBRA	JESUS CERVANTES		DIRECTOR INTERVENTORIA	DAVINSON GRAVINI POLO	
RESIDENTE DE OBRA	BRAYAN CUAVAS SALCEDO		RESIDENTE DE INTERVENTORIA	ALEJANDRA SANCHEZ CERÓN	
CAPITULO	20.00		SUBCAPITULO	20.01.01	FECHA
ITEM	20.01.01.03	DESCRIPCIÓN	TUBERIA PVC-P		UNIDAD: ML

ITEM	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES: LARGO	ANCHO	ALTO	M² AREA	VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL
	TUBERIA PVC-P 2"	7.75						7.75
							TOTAL ACTIVIDAD	7.75
							ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR	
							TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS	7.75

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA

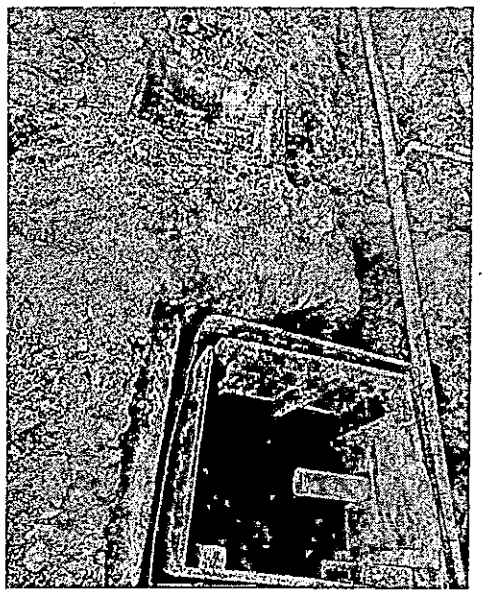

OBSERVACIONES

ELABORÓ	APROBÓ	REVISÓ
BRAYAN CUAVAS SALCEDO	RAFAEL CABRALES	ALEJANDRA SANCHEZ

Gobernación del **MAGDALENA**

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO:	
VERSIÓN:	
FECHA DE APROBACIÓN	
PÁGINA	1 DE 1


ACTA PARCIAL DE OBRA No.	6	PERIODO DE EJECUCIÓN	19 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2026

CONTRATO DE OBRA No.			CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CI-1324-2025		
CONTRATISTA	Consorcio Centro Cambia	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA	CONTRATISTA	CONSORCIO AVANZA MAGDALENA 025	OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA
DIRECTOR DE OBRA	JESUS CERVANTES		DIRECTOR INTERVENTORIA	DAVINSON GRAVINI POLO	
RESIDENTE DE OBRA	BRAYAN CUAVAS SALCEDO		RESIDENTE DE INTERVENTORIA	ALEJANDRA SANCHEZ CERÓN	
CAPITULO:	20.00		SUBCAPITULO	20.01.01	FECHA

ITEM	20.01.01.20	DESCRIPCIÓN	REGISTRO CORTINA	UNIDAD	UN

No.	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL
	REGISTRO CORTINA 1 1/4"						8	8.00
							TOTAL ACTIVIDAD	8.00
							ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR	
							TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS	8.00

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA

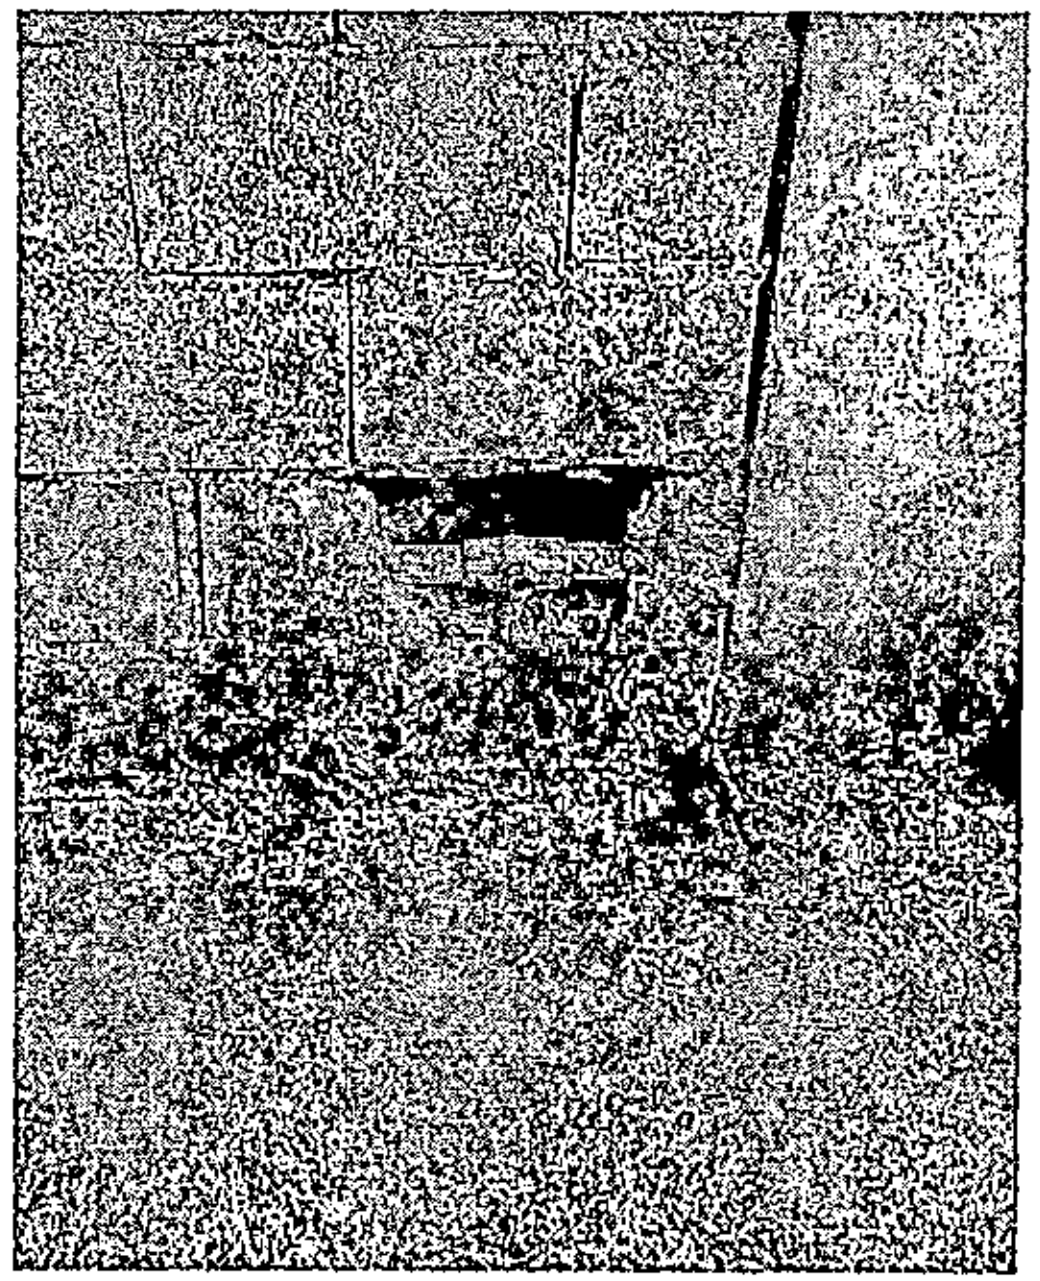

OBSERVACIONES

ELABORO	APROBO	REVISO
BRAYAN CUAVAS SALCEDO	RAFAEL CABRALES	ALEJANDRA SANCHEZ

Gobernación del MAGDALENA


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO:	
VERSIÓN:	
FECHA DE APROBACIÓN	
PÁGINA	1 DE 1

ACTA PARCIAL DE OBRA No.	6	PERIODO DE EJECUCIÓN	19 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2026		
CONTRATO DE OBRA No.			CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CI-1324-2025		
CONTRATISTA	Consorcio Centro Cambia	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA	CONTRATISTA	CONSORCIO AVANZA MAGDALENA 025	OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA
DIRECTOR DE OBRA	JESUS CERVANTES		DIRECTOR INTERVENTORIA	DAVINSON GRAVINI POLO	
RESIDENTE DE OBRA	BRAYAN CUAVAS SALCEDO		RESIDENTE DE INTERVENTORIA	ALEJANDRA SANCHEZ CERÓN	
CAPITULO	20.00		SUBCAPITULO	20.01.01	FECHA
ITEM	20.01.01.21	DESCRIPCIÓN	REGISTRO CORTINA		UNIDAD: UN

NO.	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL
	REGISTRO CORTINA 3/4"						2	2.00
	TOTAL ACTIVIDAD							2.00
	ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR							
	TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS							2.00

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA

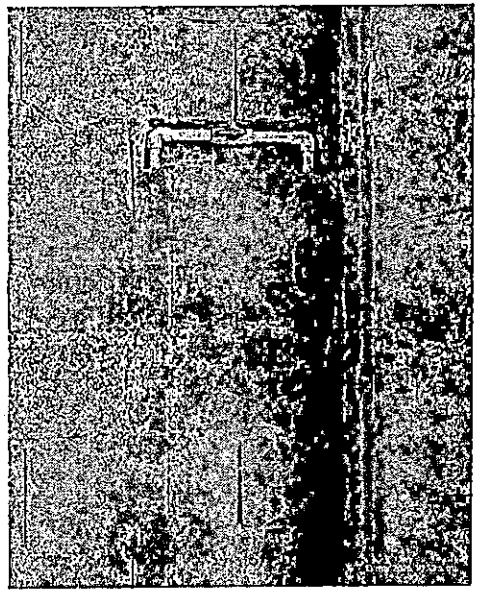

OBSERVACIONES

ELABORÓ	APROBÓ	REVISÓ
BRAYAN CUAVAS SALCEDO	RAFAEL CABRALES	ALEJANDRA SANCHEZ

Gobernación del MAGDALENA


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO:	
VERSIÓN:	
FECHA DE APROBACIÓN	
PÁGINA	1 DE 1

ACTA PARCIAL DE OBRA No.	6	PERIODO DE EJECUCIÓN	19 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2026
CONTRATO DE OBRA No.		CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CI-1324-2025	
CONTRATISTA	Consorcio Centro Cambia	CONTRATISTA	CONSORCIO AVANZA MAGDALENA 025
DIRECTOR DE OBRA	JESUS CERVANTES	DIRECTOR INTERVENTORIA	DAVINSON GRAVINI POLO
RESIDENTE DE OBRA	BRAYAN CUAVAS SALCEDO	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	ALEJANDRA SANCHEZ CERÓN
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA		OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA	
CAPITULO	20.00	SUBCAPITULO	20.01.01
ITEM	20.01.01.22	DESCRIPCIÓN	REGISTRO CORTINA
		FECHA	
		UNIDAD	UN

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL
REGISTRO CORTINA 1/2"						2	2.00
TOTAL ACTIVIDAD							2.00
ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR							
TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS							2.00

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA

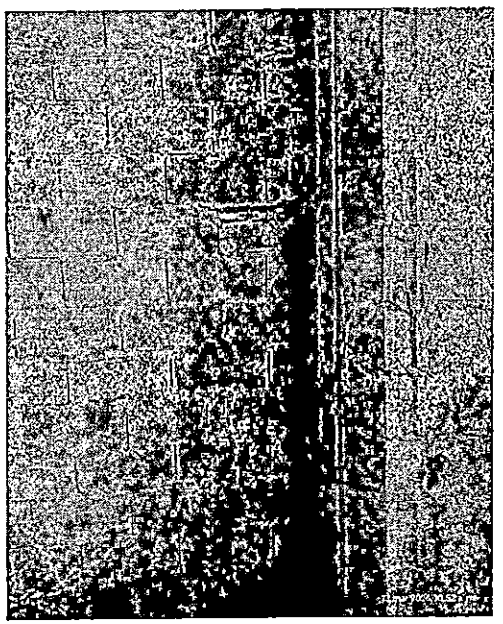

OBSERVACIONES

ELABORÓ	APROBÓ	REVISÓ
BRAYAN CUAVAS SALCEDO	RAFAEL CABRALES	ALEJANDRA SANCHEZ

Gobernación del MAGDALENA


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO:	
VERSIÓN:	
FECHA DE APROBACIÓN	
PÁGINA	1 DE 1

ACTA PARCIAL DE OBRA No.	6	PERIODO DE EJECUCIÓN	19 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2026		
CONTRATO DE OBRA No.			CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CI-1324-2025		
CONTRATISTA	Consorcio Centro Cambia	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA	CONTRATISTA	CONSORCIO AVANZA MAGDALENA 025	OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA
DIRECTOR DE OBRA	JESUS CERVANTES		DIRECTOR INTERVENTORIA	DAVINSON GRAVINI POLO	
RESIDENTE DE OBRA	BRAYAN CUAVAS SALCEDO		RESIDENTE DE INTERVENTORIA	ALEJANDRA SANCHEZ CERÓN	
CAPITULO	20.00		SUBCAPITULO	20.01.02	FECHA
ITEM	20.01.02.02	DESCRIPCIÓN	PUNTO LAVAMANOS		UNIDAD: UN

No.	DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL
	PUNTO LAVAMANOS 1/2"						1	1.00
							TOTAL ACTIVIDAD	1.00
							ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR	
							TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS	1.00

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA

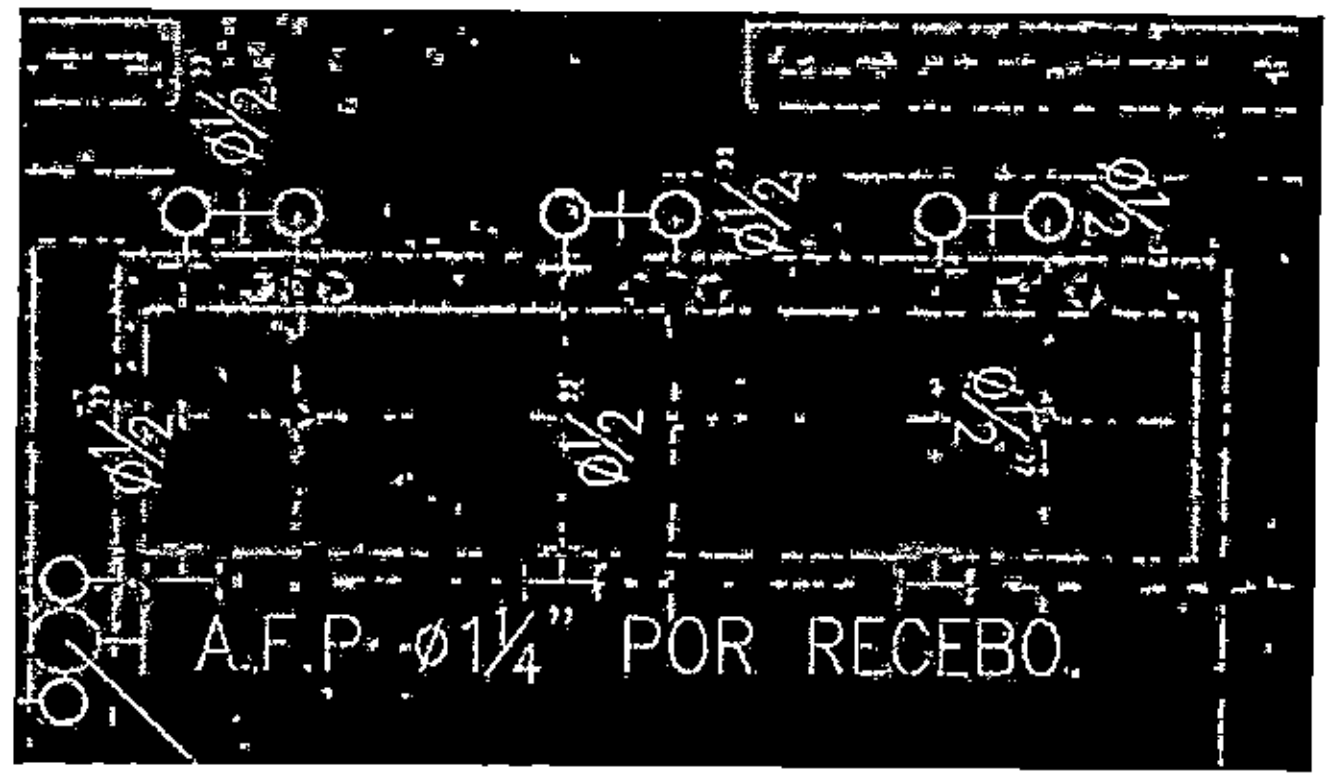

OBSERVACIONES

ELABORO	APROBÓ	REVISO
BRAYAN CUAVAS SALCEDO	RAFAEL CABRALES	ALEJANDRA SANCHEZ

Gobernación del **MAGDALENA**

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA


CÓDIGO:	
VERSIÓN:	
FECHA DE APROBACIÓN	
PÁGINA	1 DE 1


ACTA PARCIAL DE OBRA No	6	PERIODO DE EJECUCIÓN	19 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2026
CONTRATO DE OBRA No		CONTRATO DE INTERVENTORIA No	CI-1324-2025


CONTRATISTA	Consorcio Centro Cambia	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA	CONTRATISTA	CONSORCIO AVANZA MAGDALENA 025	OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA
DIRECTOR DE OBRA	JESUS CERVANTES		DIRECTOR INTERVENTORIA	DAVINSON GRAVINI POLO	
RESIDENTE DE OBRA	BRAYAN CUAVAS SALCEDO		RESIDENTE DE INTERVENTORIA	ALEJANDRA SANCHEZ CERÓN	
CAPITULO	20.00		SUBCAPITULO	20.01.04	FECHA
ITEM	20.01.04.09	DESCRIPCIÓN	KIT DE TRANSICION ACERO A C900	UNIDAD	UN

No	DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL
	KIT DE TRANSICION ACERO A C900						4	4.00
							TOTAL ACTIVIDAD	4.00
							ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR	
							TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS	4.00

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA

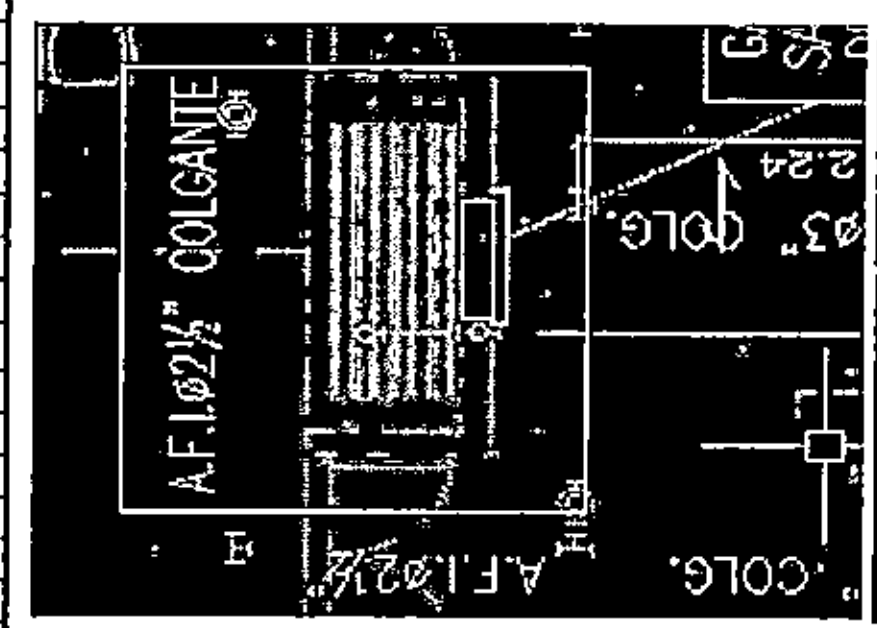

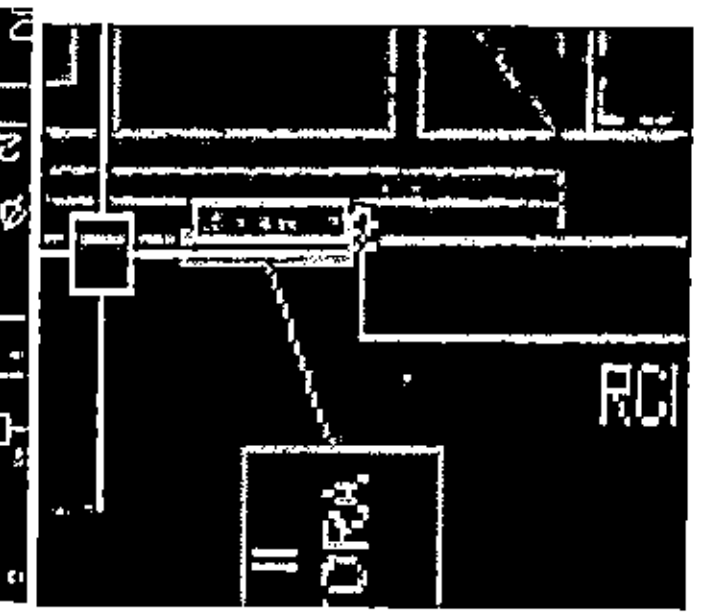

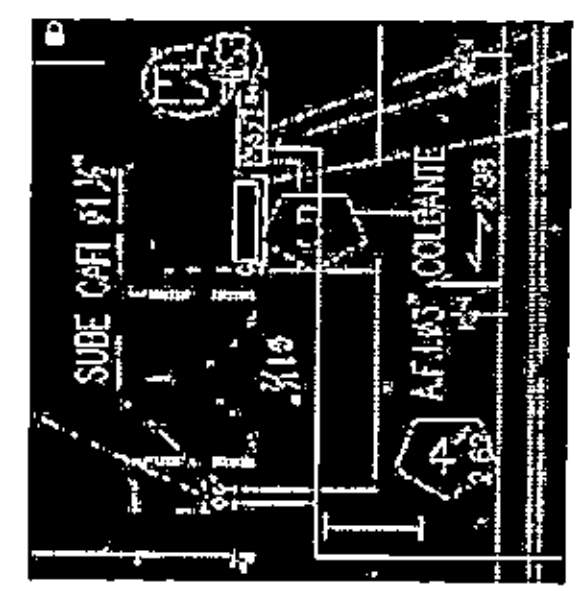

OBSERVACIONES

ELABORO	APROBO	REVISO
BRAYAN CUAVAS SALCEDO	RAFAEL CABRALES	ALEJANDRA SANCHEZ

Gobernación del
MAGDALENA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO:	
VERSIÓN:	
FECHA DE APROBACIÓN	
PÁGINA	1 DE 1


ACTA PARCIAL DE OBRA No.	6	PERIODO DE EJECUCIÓN	19 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2026

CONTRATO DE OBRA No.			CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CI-1324-2026		
CONTRATISTA	Consorcio Centro Cambia	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA	CONTRATISTA	CONSORCIO AVANZA MAGDALENA 025	OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA
DIRECTOR DE OBRA	JESUS CERVANTES		DIRECTOR INTERVENTORIA	DAVINSON GRAVINI POLO	
RESIDENTE DE OBRA	BRAYAN CUAVAS SALCEDO		RESIDENTE DE INTERVENTORIA	ALEJANDRA SANCHEZ CERÓN	
CAPITULO	20.00		SUBCAPITULO	20.01.05	FECHA

ITEM	20.01.05.01	DESCRIPCIÓN	TUBERIA ACERO NEGRO RANURADA SCH 10	UNIDAD	ML

No	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES					CANTIDAD	TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN		
	TUBERIA ACERO NEGRO RANURADA SCH 10 3"	55						55.00
							TOTAL ACTIVIDAD	55.00
							ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR	
							TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS	55.00

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA

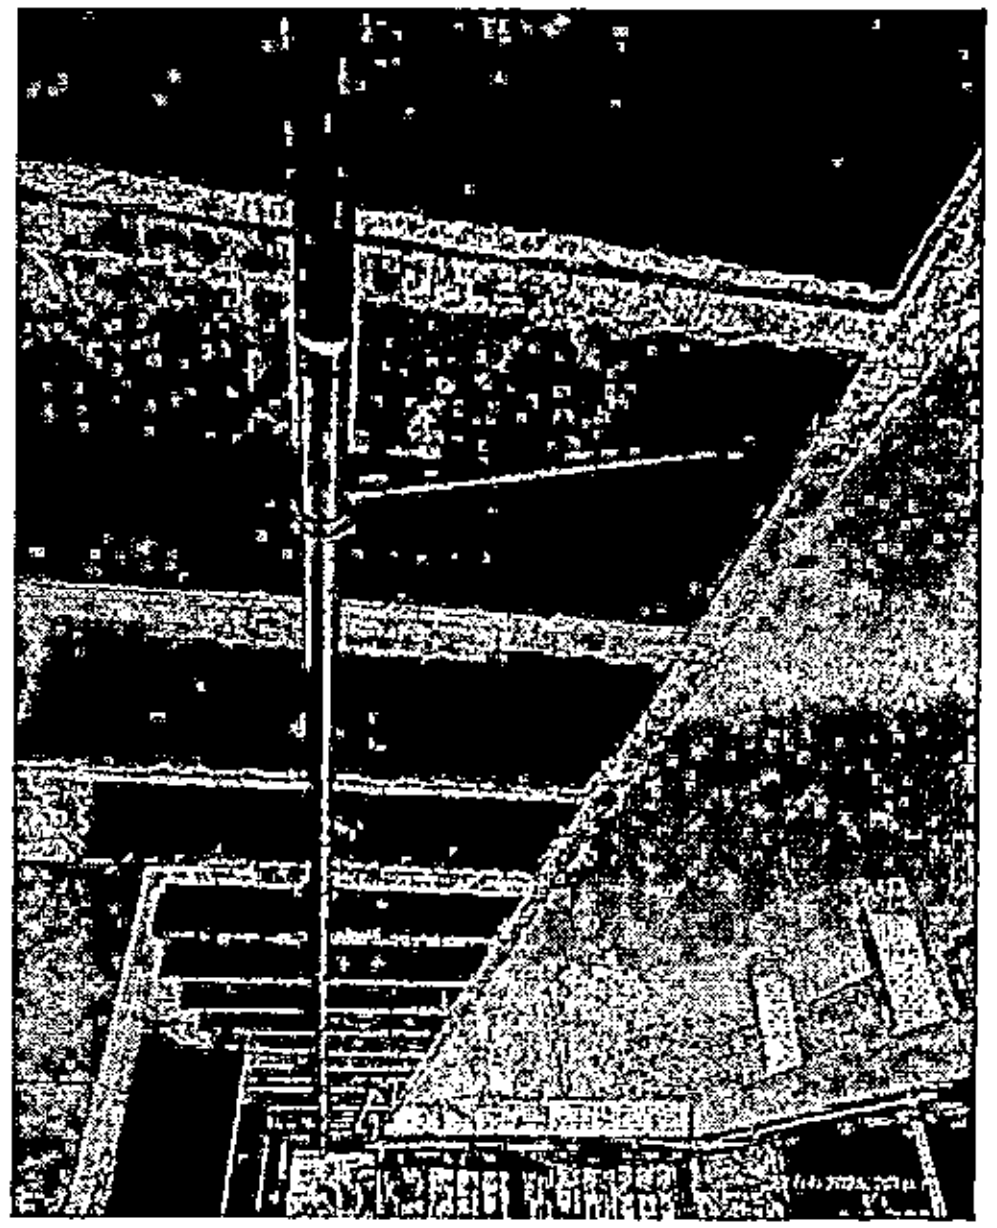

OBSERVACIONES

ELABORO	APROBÓ	REVISO
BRAYAN CUAVAS SALCEDO	RAFAEL CABRALES	ALEJANDRA SANCHEZ

Gobernación del MAGDALENA


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO:	
VERSIÓN:	
FECHA DE APROBACIÓN	
PÁGINA	1 DE 1

ACTA PARCIAL DE OBRA No.	6	PERIODO DE EJECUCIÓN	19 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2026		
CONTRATO DE OBRA No.			CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CI-1324-2025		
CONTRATISTA	Consorcio Centro Cambia	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA	CONTRATISTA	CONSORCIO AVANZA MAGDALENA 025	OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA
DIRECTOR DE OBRA	JESUS CERVANTES		DIRECTOR INTERVENTORIA	DAVINSON GRAVINI POLO	
RESIDENTE DE OBRA	BRAYAN CUAVAS SALCEDO		RESIDENTE DE INTERVENTORIA	ALEJANDRA SANCHEZ CERÓN	
CAPITULO:	20.00		SUBCAPITULO	20.01.05	FECHA:
ITEM	20.01.05.02	DESCRIPCIÓN	TUBERIA ACERO NEGRO RANURADA SCH 10		UNIDAD: MC

NO.	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL
	TUBERIA ACERO NEGRO RANURADA SCH 10 2 1/2"	90						90.00
							TOTAL ACTIVIDAD	90.00
							ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR	
							TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS	90.00

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA

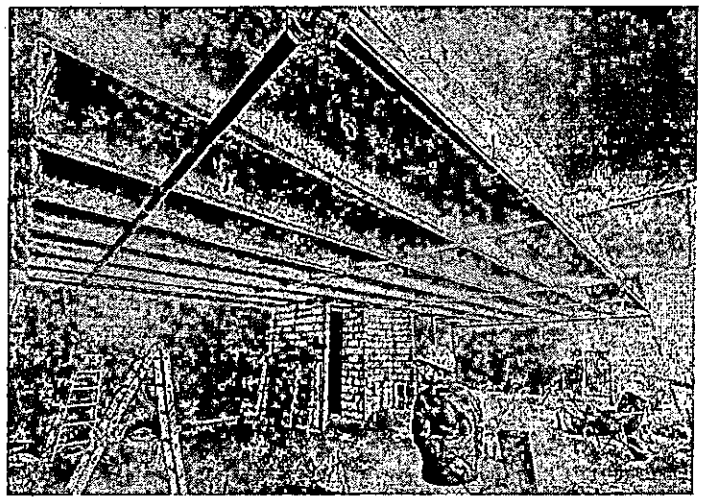

OBSERVACIONES

ELABORO	APROBÓ	REVISO
BRAYAN CUAVAS SALCEDO	RAFAEL CABRALES	ALEJANDRA SANCHEZ

Gobernación del MAGDALENA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO:	
VERSIÓN:	
FECHA DE APROBACIÓN	
PÁGINA	1 DE 1


ACTA PARCIAL DE OBRA No.	6	PERIODO DE EJECUCIÓN	19 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2026
CONTRATO DE OBRA No.		CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CI-1324-2025	

CONTRATISTA	Consorcio Centro Cambia	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA	CONTRATISTA	CONSORCIO AVANZA MAGDALENA 025	OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA
DIRECTOR DE OBRA	JESUS CERVANTES		DIRECTOR INTERVENTORIA	DAVINSON GRAVINI POLO	
RESIDENTE DE OBRA	BRAYAN CUAVAS SALCEDO		RESIDENTE DE INTERVENTORIA	ALEJANDRA SANCHEZ CERÓN	
CAPITULO	20.00		SUBCAPITULO	20.01.05	FECHA

ITEM	20.01.05.03	DESCRIPCIÓN	TUBERIA ACERO NEGRO ROSCADA SCH 40	UNIDAD	ML

No.	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL
	TUBERIA ACERO NEGRO ROSCADA SCH 40 2"	90						90.00
							TOTAL ACTIVIDAD	90.00
							ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR	
							TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS	90.00

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA

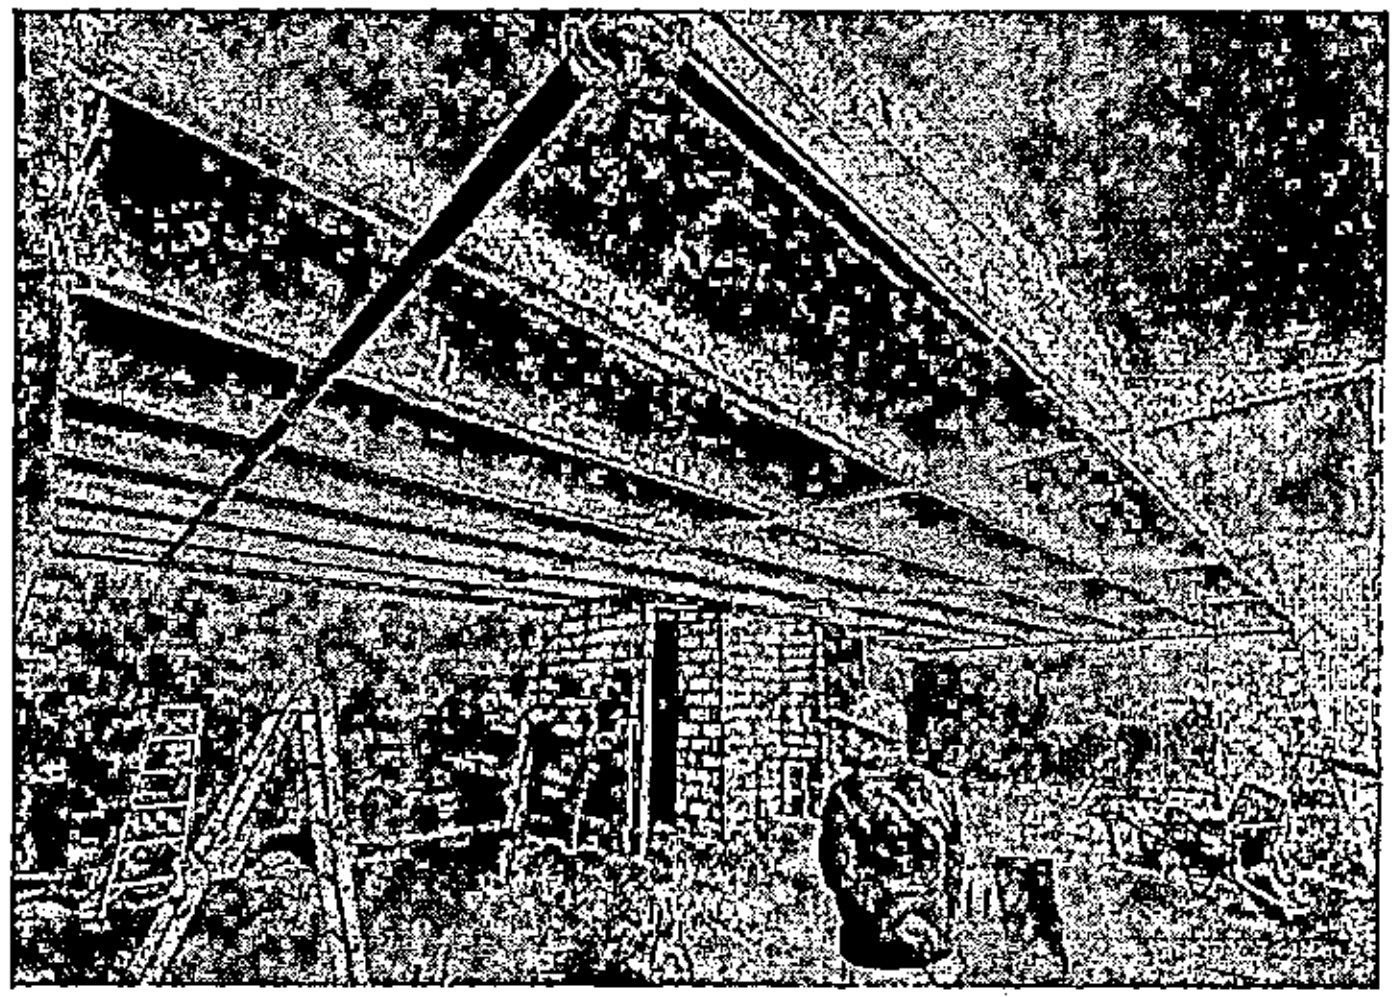

OBSERVACIONES

ELABORÓ	APROBÓ	REVISÓ
BRAYAN CUAVAS SALCEDO	RAFAEL CABRALES	ALEJANDRA SANCHEZ

Gobernación del
MAGDALENA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA


CÓDIGO:	
VERSIÓN:	
FECHA DE APROBACIÓN	
PÁGINA	1 DE 1

ACTA PARCIAL DE OBRA No.	6	PERIODO DE EJECUCIÓN	19 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2026

CONTRATO DE OBRA No.			CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CI-1324-2025		
CONTRATISTA	Consorcio Centro Cambia	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA	CONTRATISTA	CONSORCIO AVANZA MAGDALENA 025	OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA
DIRECTOR DE OBRA	JESUS CERVANTES		DIRECTOR INTERVENTORIA	DAVINSON GRAVINI POLO	
RESIDENTE DE OBRA	BRAYAN CUAVAS SALCEDO		RESIDENTE DE INTERVENTORIA	ALEJANDRA SANCHEZ CERÓN	
CAPITULO	20.00		SUBCAPITULO	20.01.05	FECHA
ITEM	20.01.05.04	DESCRIPCIÓN	TUBERIA ACERO NEGRO ROSCADA SCH 40	UNIDAD	ML

No.	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL
	TUBERIA ACERO NEGRO ROSCADA SCH 40 1.1/2"	90						90.00
							TOTAL ACTIVIDAD	90.00
							ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR	
							TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS	90.00

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA

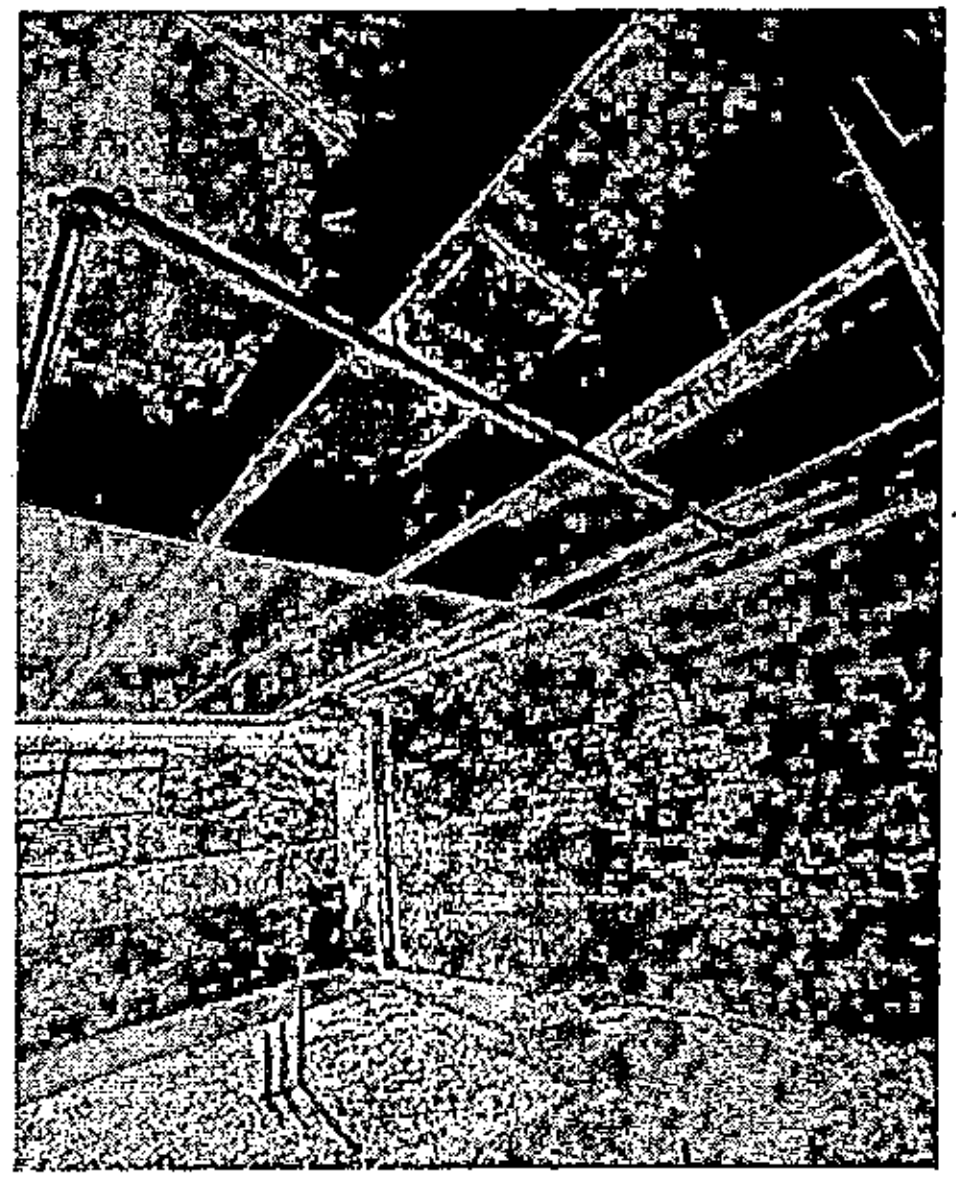

OBSERVACIONES

ELABORÓ	APROBÓ	REVISÓ
BRAYAN CUAVAS SALCEDO	RAFAEL CABRALES	ALEJANDRA SANCHEZ

Gobernación del MAGDALENA


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO:	
VERSIÓN:	
FECHA DE APROBACIÓN	
PÁGINA	1 DE 1

ACTA PARCIAL DE OBRA No.	6	PERIODO DE EJECUCIÓN	19 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2026
CONTRATO DE OBRA No.		CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CI-1324-2025	
CONTRATISTA	Consorcio Centro Cambia	CONTRATISTA	CONSORCIO AVANZA MAGDALENA 025
DIRECTOR DE OBRA	JESUS CERVANTES	DIRECTOR INTERVENTORIA	DAVINSON GRAVINI POLO
RESIDENTE DE OBRA	BRAYAN CUAVAS SALCEDO	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	ALEJANDRA SANCHEZ CERÓN
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA		OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA	
CAPITULO	20.00	SUBCAPITULO	20.01.05
ITEM	20.01.05.05	DESCRIPCIÓN	TUBERIA ACERO NEGRO ROSCADA SCH 40
FECHA:		UNIDAD	ML

No.	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL
	TUBERIA ACERO NEGRO ROSCADA SCH 40 1 1/4"	20						20.00
							TOTAL ACTIVIDAD	20.00
							ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR	
							TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS	20.00

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA

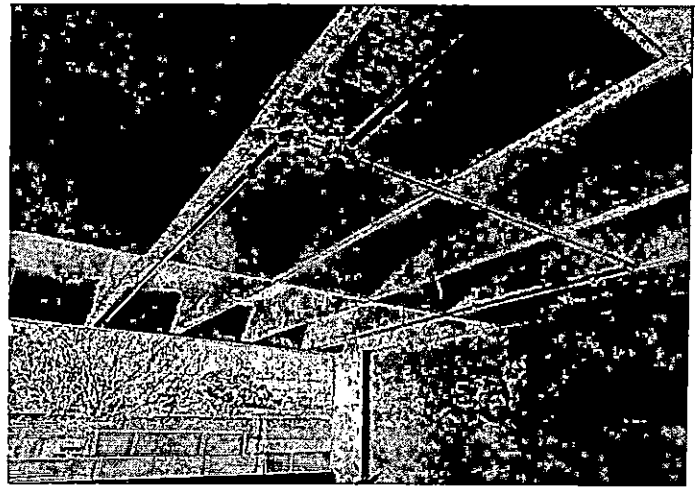

OBSERVACIONES

ELABORÓ	APROBÓ	REVISÓ
BRAYAN CUAVAS SALCEDO	RAFAEL CABRALES	ALEJANDRA SANCHEZ

Gobernación del MAGDALENA


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO:	
VERSIÓN:	
FECHA DE APROBACIÓN	
PÁGINA	1 DE 1

ACTA PARCIAL DE OBRA No.	6	PERIODO DE EJECUCIÓN	19 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2026		
CONTRATO DE OBRA No.		CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CI-1324-2025			
CONTRATISTA	Consorcio Centro Cambia	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA	CONTRATISTA	CONSORCIO AVANZA MAGDALENA 025	OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA
DIRECTOR DE OBRA	JESUS CERVANTES		DIRECTOR INTERVENTORIA	DAVINSON GRAVINI POLO	
RESIDENTE DE OBRA	BRAYAN CUAVAS SALCEDO		RESIDENTE DE INTERVENTORIA	ALEJANDRA SANCHEZ CERÓN	
CAPÍTULO	20.00		SUBCAPÍTULO	20.01.05	FECHA:
ITEM	20.01.05.06	DESCRIPCIÓN	TUBERIA ACERO NEGRO ROSCADA SCH 40	UNIDAD	ML

NO.	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	CANTIDAD	PARCIAL TOTAL
	TUBERIA ACERO NEGRO ROSCADA SCH 40 1"	30						30.00
	TOTAL ACTIVIDAD							30.00
	ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR							
	TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS							30.00

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA

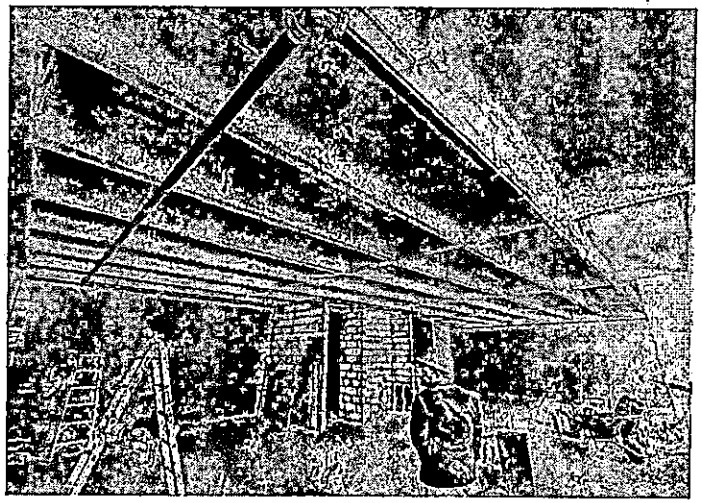

OBSERVACIONES

ELABORO	APROBO	REVISÓ
BRAYAN CUAVAS SALCEDO	RAFAEL CABRALES	ALEJANDRA SANCHEZ

Gobernación del MAGDALENA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA


CÓDIGO:	
VERSIÓN:	
FECHA DE APROBACIÓN	
PÁGINA	1 DE 1

ACTA PARCIAL DE OBRA No.	6	PERIODO DE EJECUCIÓN	19 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2026
CONTRATO DE OBRA No.		CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CI-1324-2025	

CONTRATISTA	Consorcio Centro Cambia	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA	CONTRATISTA	CONSORCIO AVANZA MAGDALENA 025	OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA
DIRECTOR DE OBRA	JESUS CERVANTES		DIRECTOR INTERVENTORIA	DAVINSON GRAVINI POLO	
RESIDENTE DE OBRA	BRAYAN CUAVAS SALCEDO		RESIDENTE DE INTERVENTORIA	ALEJANDRA SANCHEZ CERÓN	
CAPITULO	20.00		SUBCAPITULO	20.01.05	FECHA
ITEM	20.01.05.08	DESCRIPCIÓN	ACCESORIOS ACERO RANURADOS		UNIDAD: UN

No.	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL
	ACCESORIOS ACERO RANURADOS 3"						15	15.00
							TOTAL ACTIVIDAD	15.00
							ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR	
							TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS	15.00

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA

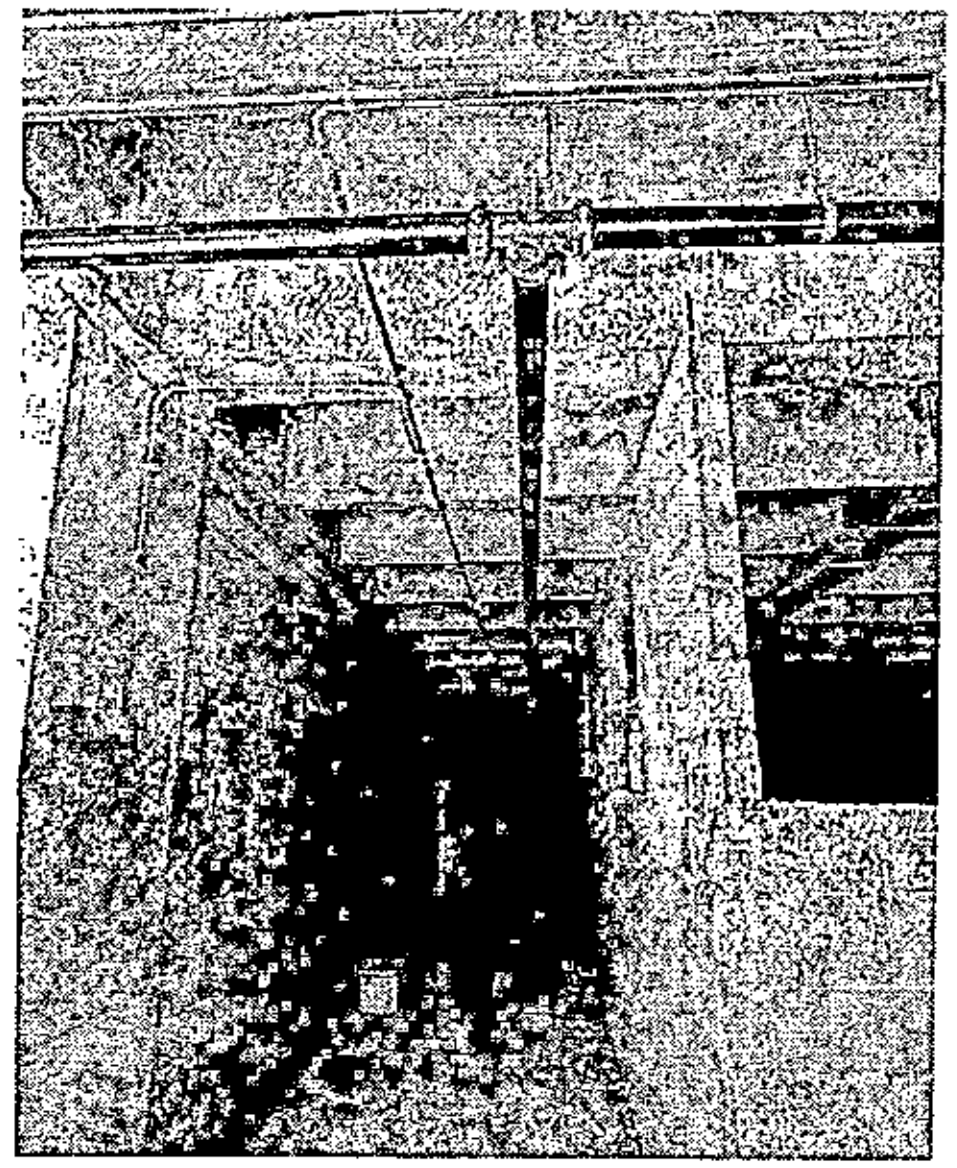

OBSERVACIONES

ELABORO	APROBÓ	REVISÓ
BRAYAN CUAVAS SALCEDO	RAFAEL CABRALES	ALEJANDRA SANCHEZ

Gobernación del MAGDALENA


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO:	
VERSIÓN:	
FECHA DE APROBACIÓN	
PÁGINA	1 DE 1

ACTA PARCIAL DE OBRA No.	6		PERIODO DE EJECUCIÓN	19 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2026	
CONTRATO DE OBRA No.			CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CI-1324-2025	
CONTRATISTA	Consorcio Centro Cambia	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA	CONTRATISTA	CONSORCIO AVANZA MAGDALENA 025	OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA
DIRECTOR DE OBRA	JESUS CERVANTES		DIRECTOR INTERVENTORÍA	DAVINSON GRAVINI POLO	
RESIDENTE DE OBRA	BRAYAN CUAVAS SALCEDO		RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	ALEJANDRA SANCHEZ CERÓN	
CAPÍTULO	20.00		SUBCAPÍTULO	20.01.05	FECHA:
ÍTEM	20.01.05.08	DESCRIPCIÓN: ACCESORIOS ACERO RANURADOS			UNIDAD: UN

NO.	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL
	ACCESORIOS ACERO RANURADOS 2 1/2"						34	34.00
	TOTAL ACTIVIDAD							34.00
	ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR							
	TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS							34.00

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA

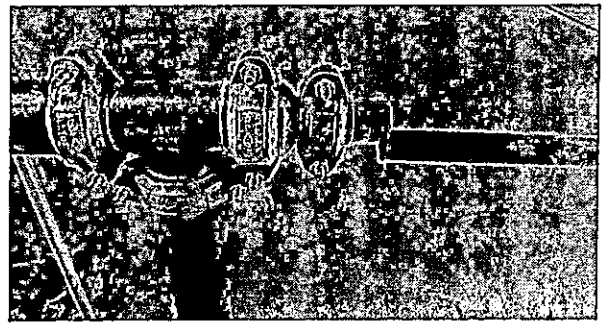

OBSERVACIONES

ELABORÓ	APROBÓ	REVISÓ
BRAYAN CUAVAS SALCEDO	RAFAEL CABRALES	ALEJANDRA SANCHEZ

Gobernación del MAGDALENA


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO:	
VERSIÓN:	
FECHA DE APROBACIÓN	
PÁGINA	1 DE 1

ACTA PARCIAL DE OBRA No.	6	PERIODO DE EJECUCIÓN	19 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2026		
CONTRATO DE OBRA No.			CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CI-1324-2025		
CONTRATISTA	Consorcio Centro Cambia	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA	CONTRATISTA	CONSORCIO AVANZA MAGDALENA 025	OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA
DIRECTOR DE OBRA	JESUS CERVANTES		DIRECTOR INTERVENTORIA	DAVINSON GRAVINI POLO	
RESIDENTE DE OBRA	BRAYAN CUAVAS SALCEDO		RESIDENTE DE INTERVENTORIA	ALEJANDRA SANCHEZ CERÓN	
CAPITULO	20.00		SUBCAPITULO	20.01.05	FECHA
ITEM	20.01.05.10	DESCRIPCIÓN	ACCESORIOS ACERO ROSCADOS		UNIDAD: UN

NO.	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL
	ACCESORIOS ACERO ROSCADOS 2"						25	25.00
	TOTAL ACTIVIDAD							25.00
	ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR							
	TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS							25.00

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA

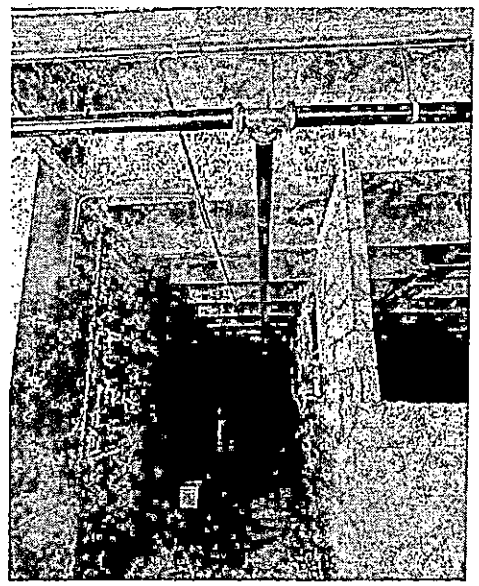

OBSERVACIONES

ELABORÓ	APROBÓ	REVISÓ
BRAYAN CUAVAS SALCEDO	RAFAEL CABRALES	ALEJANDRA SANCHEZ


Gobernación del MAGDALENA	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	CÓDIGO:	
		VERSIÓN:	
		FECHA DE APROBACIÓN	
		PÁGINA	1 DE 1

ACTA PARCIAL DE OBRA No.	6	PERIODO DE EJECUCIÓN	19 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2026

CONTRATO DE OBRA No.			CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CI-1324-2025		
CONTRATISTA	Consorcio Centro Cambia	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA	CONTRATISTA	, CONSORCIO AVANZA MAGDALENA 025	OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA
DIRECTOR DE OBRA	JESUS CERVANTES		DIRECTOR INTERVENTORIA	DAVINSON GRAVINI POLO	
RESIDENTE DE OBRA	BRAYAN CUAVAS SALCEDO		RESIDENTE DE INTERVENTORIA	ALEJANDRA SANCHEZ CERÓN	
CAPITULO	20.00		SUBCAPITULO	20.01.05	FECHA
ITEM	20.01.05.11	DESCRIPCION	ACCESORIOS ACERO ROSCADOS		UNIDAD: UN

No.	DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL
	ACCESORIOS ACERO ROSCADOS 1.1/2"						30	30.00
							TOTAL ACTIVIDAD	30.00
							ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR	
							TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS	30.00

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA

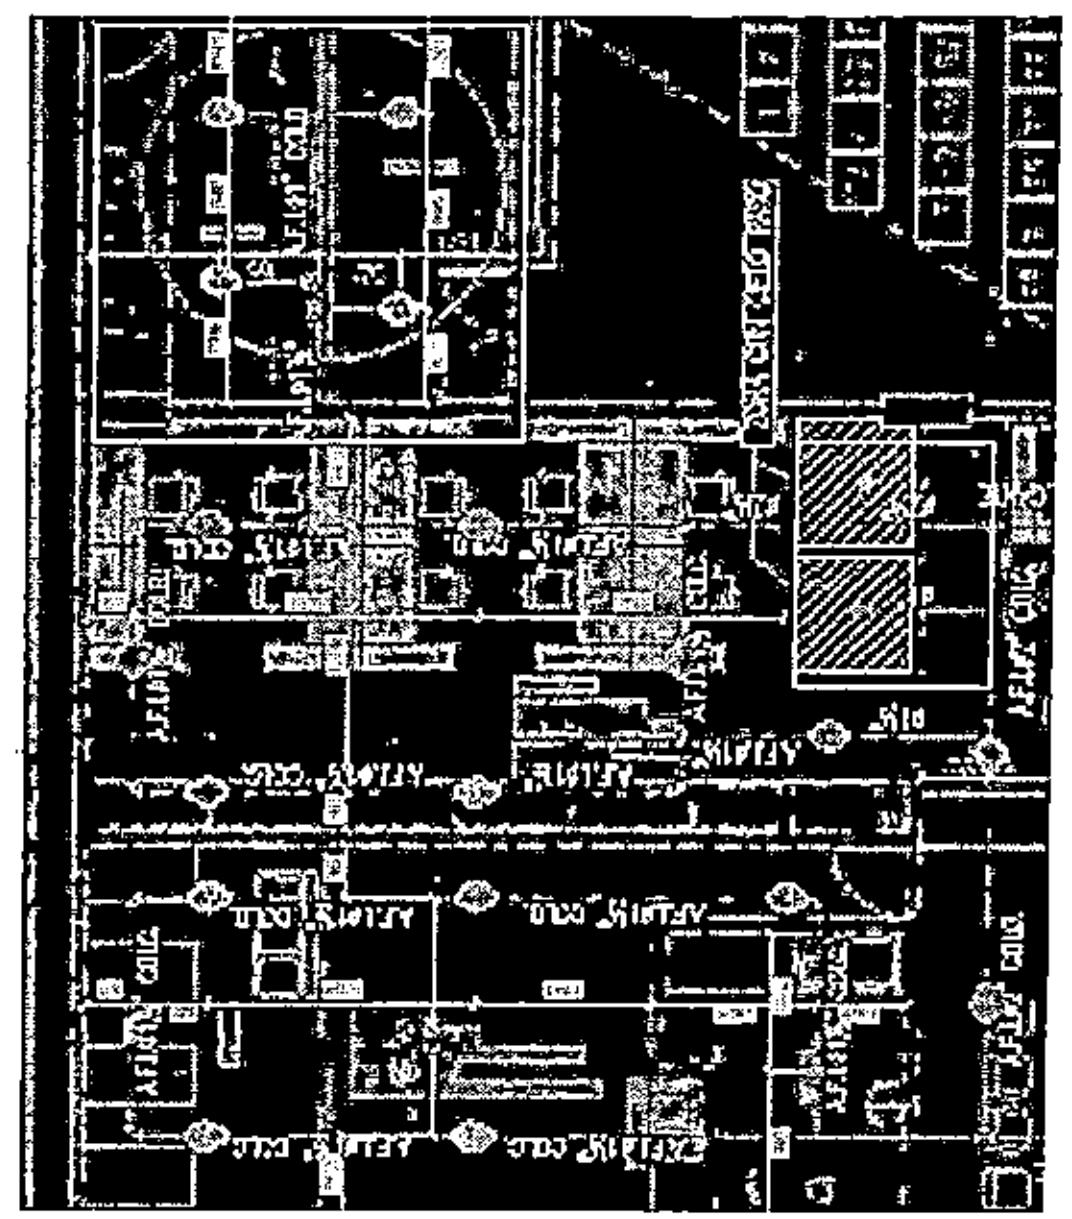

OBSERVACIONES

ELABORÓ	APROBÓ	REVISÓ
BRAYAN CUAVAS SALCEDO	RAFAEL CABRALES	ALEJANDRA SANCHEZ

Gobernación del MAGDALENA


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO:	
VERSIÓN:	
FECHA DE APROBACIÓN	
PÁGINA	1 DE 1

ACTA PARCIAL DE OBRA No.	6		PERIODO DE EJECUCIÓN:	19 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2026	
CONTRATO DE OBRA No.			CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CI-1324-2025		
CONTRATISTA	Consorcio Centro Cambia	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA	CONTRATISTA	CONSORCIO AVANZA MAGDALENA 025	OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA
DIRECTOR DE OBRA	JESUS CERVANTES		DIRECTOR INTERVENTORIA	DAVINSON GRAVINI POLO	
RESIDENTE DE OBRA	BRAYAN CUAVAS SALCEDO		RESIDENTE DE INTERVENTORIA	ALEJANDRA SANCHEZ CERÓN	
CAPITULO	20.00		SUBCAPITULO	20.01.05	FECHA
ITEM	20.01.05.12	DESCRIPCIÓN: ACCESORIOS ACERO ROSCADOS			UNIDAD: UN

NO.	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES: LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL
	ACCESORIOS ACERO ROSCADOS 1.1/4"						30	30.00
	TOTAL ACTIVIDAD							30.00
	ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR							
	TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS							30.00

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA

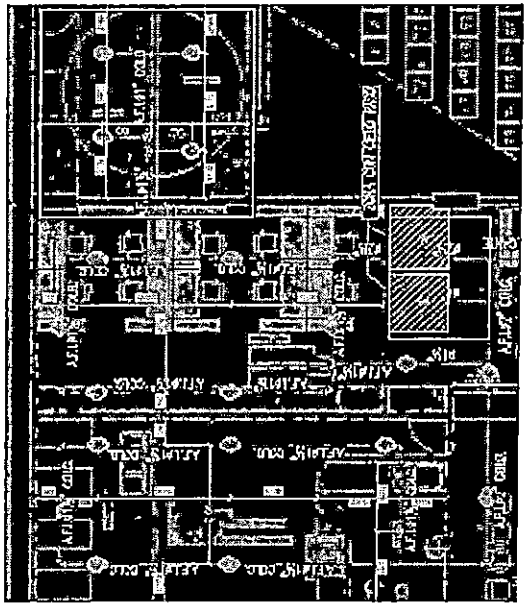

OBSERVACIONES

ELABORÓ	APROBÓ	REVISÓ
BRAYAN CUAVAS SALCEDO	RAFAEL CABRALES	ALEJANDRA SANCHEZ

Gobernación del
MAGDALENA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO:	
VERSIÓN:	
FECHA DE APROBACIÓN	
PÁGINA	1 DE 1

ACTA PARCIAL DE OBRA No.	6	PERIODO DE EJECUCIÓN	19 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2026

CONTRATO DE OBRA No.

CONTRATISTA	Consorcio Centro Cambia	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA
DIRECTOR DE OBRA	JESUS CERVANTES	
RESIDENTE DE OBRA	BRAYAN CUAVAS SALCEDO	
CAPITULO	20.00	


CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CI-1324-2025

CONTRATISTA	CONSORCIO AVANZA MAGDALENA 025	OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA
DIRECTOR INTERVENTORIA	DAVINSON GRAVINI POLO	
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	ALEJANDRA SANCHEZ CERÓN	
SUBCAPITULO	20.01.05	

ITEM	20.01.05.13	DESCRIPCIÓN	ACCESORIOS ACERO ROSCADOS	UNIDAD	UN
				FECHA	

No	DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL
		DIMENSIONES						
	ACCESORIOS ACERO ROSCADOS 1"						10	10.00
							TOTAL ACTIVIDAD	10.00
							ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR	
							TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS	10.00

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA

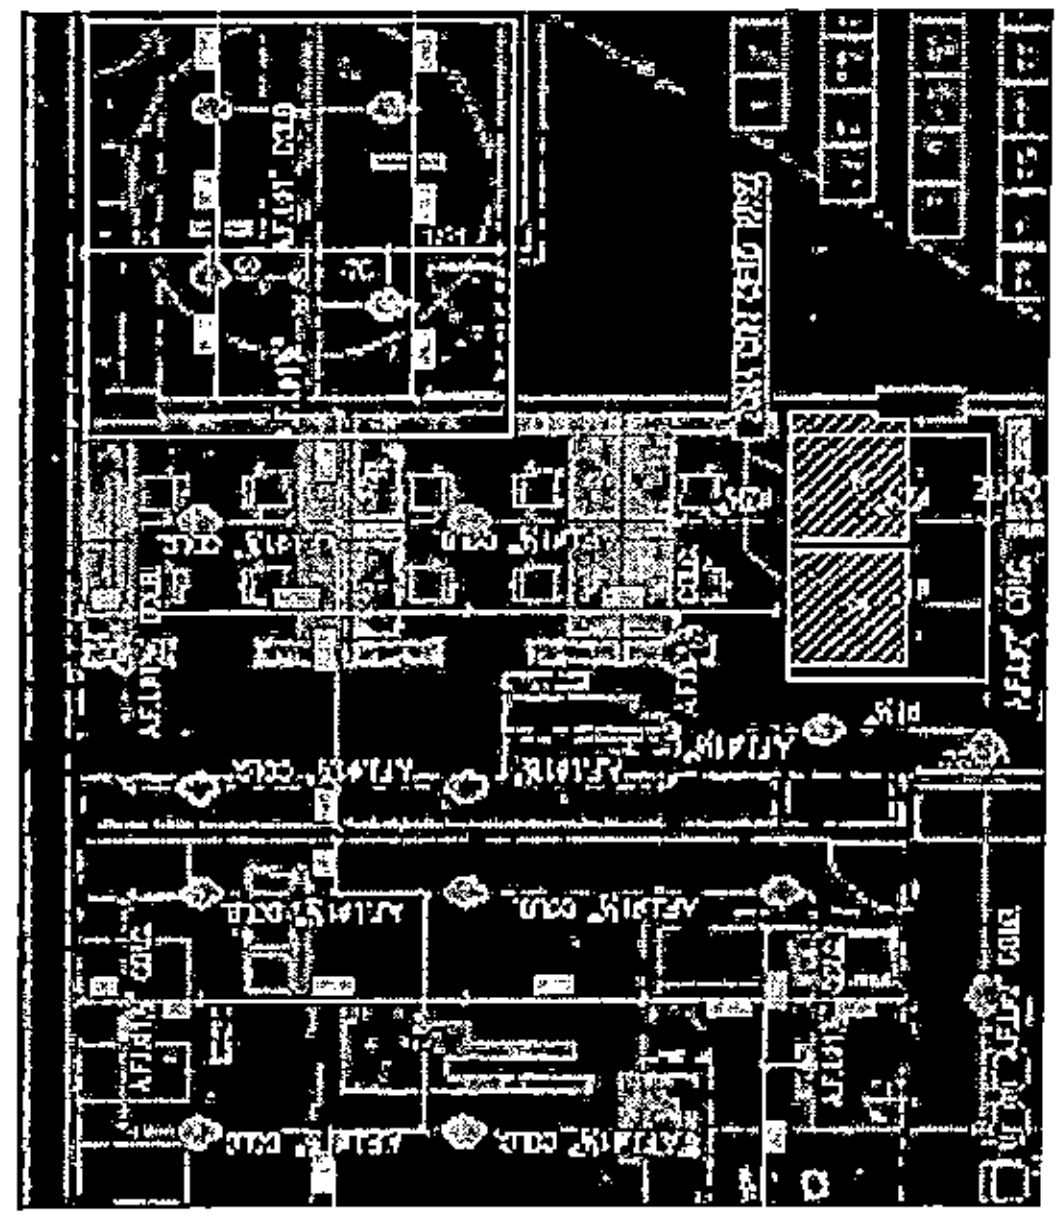

OBSERVACIONES

ELABORO	APROBÓ	REVISÓ
BRAYAN CUAVAS SALCEDO	RAFAEL CABRALES	ALEJANDRA SANCHEZ
[signature]	[signature]	[signature]

Gobernación del MAGDALENA


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO:	
VERSIÓN:	
FECHA DE APROBACIÓN	
PÁGINA	1 DE 1

ACTA PARCIAL DE OBRA No	6	PERIODO DE EJECUCIÓN	19 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2026		
CONTRATO DE OBRA No		CONTRATO DE INTERVENTORIA No: CI-1324-2025			
CONTRATISTA	Consorcio Centro Cambia	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA	CONTRATISTA	CONSORCIO AVANZA MAGDALENA 025	OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA
DIRECTOR DE OBRA	JESUS CERVANTES		DIRECTOR INTERVENTORIA	DAVINSON GRAVINI POLO	
RESIDENTE DE OBRA	BRAYAN CUAVAS SALCEDO		RESIDENTE DE INTERVENTORIA	ALEJANDRA SANCHEZ CERÓN	
CAPITULO	20.00		SUBCAPITULO	20.01.05	FECHA
ITEM	20.01.05.15	DESCRIPCIÓN	ABRAZADERAS UL/FM	UNIDAD	UN

No	DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL
	ABRAZADERAS UL/FM 3"						28	28.00
							TOTAL ACTIVIDAD	28.00
							ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR	
							TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS	28.00

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA

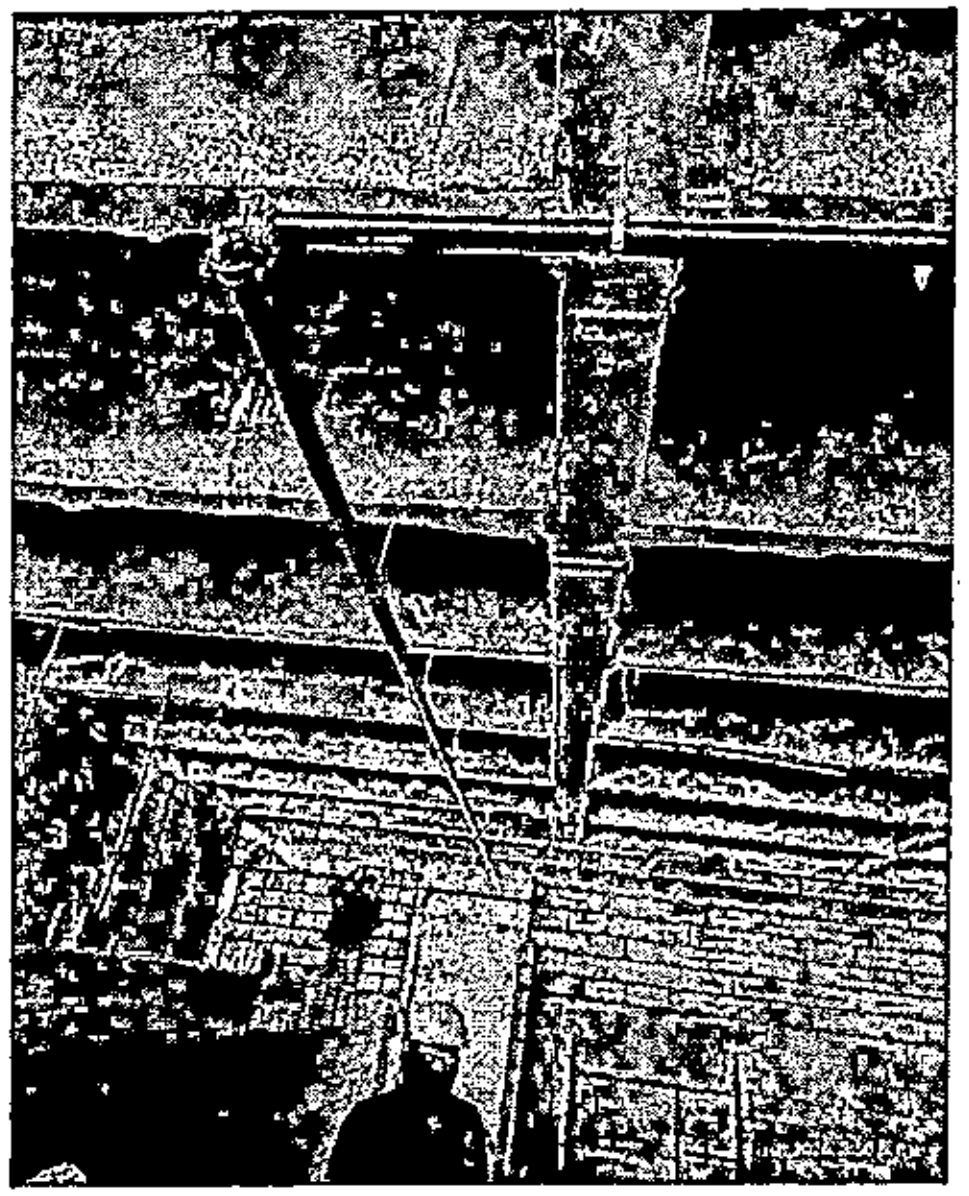

OBSERVACIONES

ELABORÓ	APROBÓ	REVISÓ
BRAYAN CUAVAS SALCEDO	RAFAEL CABRALES	ALEJANDRA SANCHEZ

Gobernación del MAGDALENA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA


CÓDIGO:	
VERSIÓN:	
FECHA DE APROBACIÓN	
PÁGINA	1 DE 1

ACTA PARCIAL DE OBRA No.	6	PERIODO DE EJECUCIÓN	19 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2026
CONTRATO DE OBRA No.		CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	CI-1324-2025

CONTRATISTA	Consorcio Centro Cambia	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA	CONTRATISTA	CONSORCIO AVANZA MAGDALENA 025	OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA
DIRECTOR DE OBRA	JESUS CERVANTES		DIRECTOR INTERVENTORIA	DAVINSON GRAVINI POLO	
RESIDENTE DE OBRA	BRAYAN CUAVAS SALCEDO		RESIDENTE DE INTERVENTORIA	ALEJANDRA SANCHEZ CERÓN	
CAPITULO	20.00		SUBCAPITULO	20.01.05	FECHA
ITEM	20.01.05.16	DESCRIPCIÓN	ABRAZADERAS UL/FM	UNIDAD	UN

No.	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL
	ABRAZADERAS UL/FM 2½"						26	26.00
							TOTAL ACTIVIDAD	26.00
							ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR	
							TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS	26.00

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA

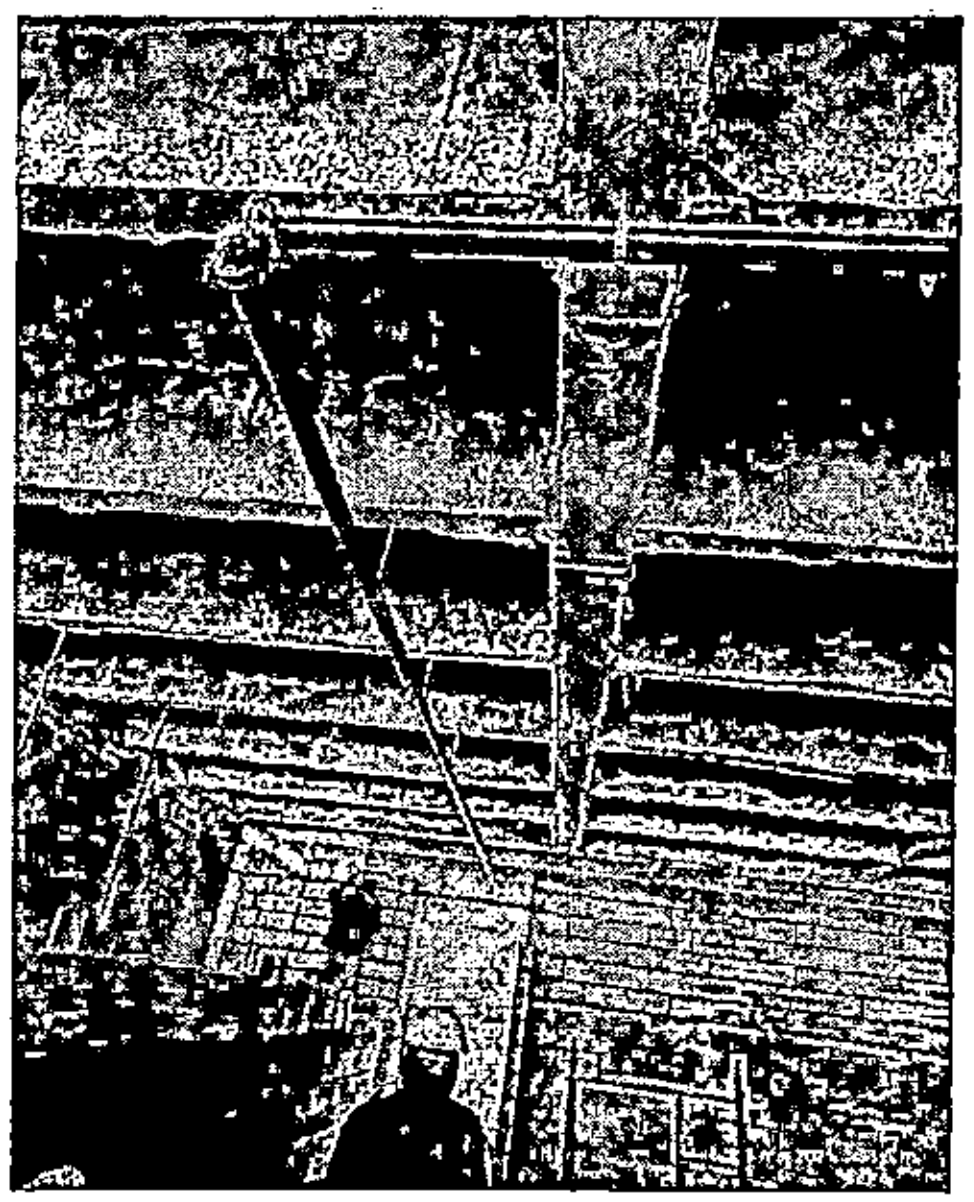

OBSERVACIONES

ELABORÓ	APROBÓ	REVISÓ
BRAYAN CUAVAS SALCEDO	RAFAEL CABRALES	ALEJANDRA SANCHEZ

Gobernación del MAGDALENA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO:	
VERSIÓN:	
FECHA DE APROBACIÓN	
PÁGINA	1 DE 1

ACTA PARCIAL DE OBRA No.	6	PERIODO DE EJECUCIÓN	19 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2026		
CONTRATO DE OBRA No.		CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	CI-1324-2025		
CONTRATISTA	Consorcio Centro Cambia	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA	CONTRATISTA	CONSORCIO AVANZA MAGDALENA 025	OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA
DIRECTOR DE OBRA	JESUS CERVANTES		DIRECTOR INTERVENTORIA	DAVINSON GRAVINI POLO	
RESIDENTE DE OBRA	BRAYAN CUAVAS SALCEDO		RESIDENTE DE INTERVENTORIA	ALEJANDRA SANCHEZ CERÓN	
CAPITULO	20.00		SUBCAPITULO	20.01.05	FECHA
ITEM	20.01.05.17	DESCRIPCIÓN	ABRAZADERAS UL/FM	UNIDAD	UN

ITEM No.	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL
	ABRAZADERAS UL/FM 2"						38	38.00
	TOTAL ACTIVIDAD							38.00
	ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR							
	TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS							38.00

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA



OBSERVACIONES

ELABORÓ	APROBÓ	REVISÓ
BRAYAN CUAVAS SALCEDO	RAFAEL CABRALES	ALEJANDRA SANCHEZ

Gobernación del MAGDALENA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO:	
VERSIÓN:	
FECHA DE APROBACIÓN	
PÁGINA	1 DE 1

ACTA PARCIAL DE OBRA No.:	6	PERÍODO DE EJECUCIÓN:	19 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2026
CONTRATO DE OBRA No.:		CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: CI-1324-2025	
CONTRATISTA:	Consorcio Centro Cambia	CONTRATISTA:	CONSORCIO AVANZA MAGDALENA 025
DIRECTOR DE OBRA:	JESUS CERVANTES	DIRECTOR INTERVENTORIA:	DAVINSON GRAVINI POLO
RESIDENTE DE OBRA:	BRAYAN CUAVAS SALCEDO	RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	ALEJANDRA SANCHEZ CERÓN
CAPITULO:	20.00	SUBCAPITULO:	20.01.05
ITEM:	20.01.05.18	DESCRIPCIÓN:	ABRAZADERAS UL/FM

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA


OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA

FECHA: [illegible]

UNIDAD: UN

No.	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL
	ABRAZADERAS UL/FM 1.1/2"						30	30.00
	TOTAL ACTIVIDAD							30.00
	ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR							
	TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS							30.00

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA

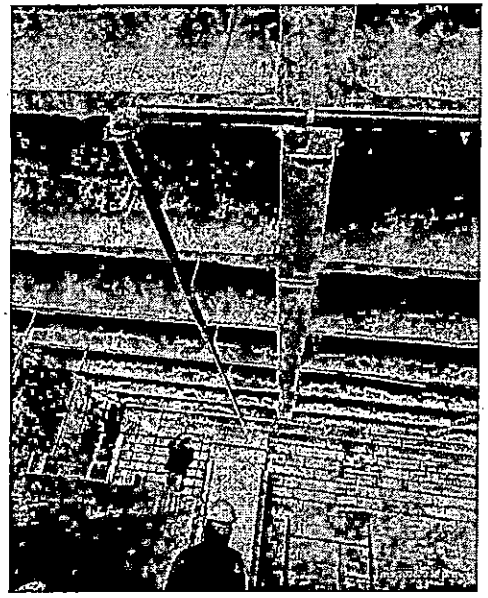

OBSERVACIONES

ELABORO	APROBO	REVISÓ
BRAYAN CUAVAS SALCEDO	RAFAEL CABRALES	ALEJANDRA SANCHEZ

Gobernación del MAGDALENA


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO:	
VERSIÓN:	
FECHA DE APROBACIÓN	
PÁGINA	1 DE 1

ACTA PARCIAL DE OBRA No.	6	PERIODO DE EJECUCIÓN	19 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2026		
CONTRATO DE OBRA No.		CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	CI-1324-2025		
CONTRATISTA	Consorcio Centro Cambia	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA	CONTRATISTA	CONSORCIO AVANZA MAGDALENA 025	OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA
DIRECTOR DE OBRA	JESUS CERVANTES		DIRECTOR INTERVENTORIA	DAVINSON GRAVINI POLO	
RESIDENTE DE OBRA	BRAYAN CUAVAS SALCEDO		RESIDENTE DE INTERVENTORIA	ALEJANDRA SANCHEZ CERÓN	
CAPITULO	20.00		SUBCAPITULO	20.01.05	FECHA
ITEM	20.01.05.19	DESCRIPCIÓN: ABRAZADERAS UL/FM			UNIDAD: UN

ITEM No.	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	CANTIDAD	CANTIDAD TOTAL
	ABRAZADERAS UL/FM 1.1/4"						20	20.00
	TOTAL ACTIVIDAD							20.00
	ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR							
	TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS							20.00

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA

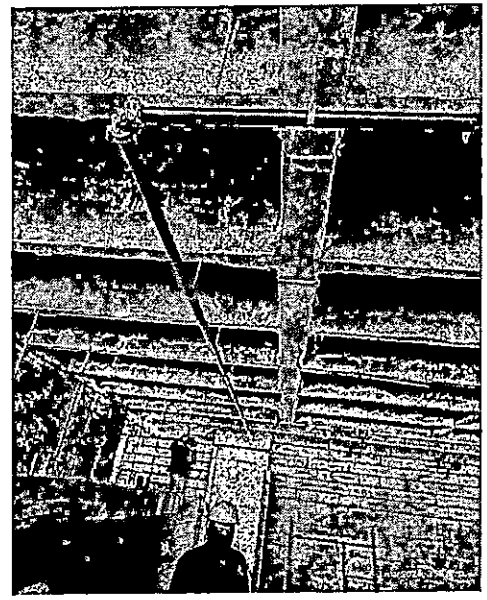

OBSERVACIONES

ELABORÓ	APROBÓ	REVISÓ
BRAYAN CUAVAS SALCEDO	RAFAEL CABRALES	ALEJANDRA SANCHEZ

Gobernación del MAGDALENA


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO:	
VERSIÓN:	
FECHA DE APROBACIÓN	
PÁGINA	1 DE 1

ACTA PARCIAL DE OBRA No.	6	PERIODO DE EJECUCIÓN	19 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2026		
CONTRATO DE OBRA No.			CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CI-1324-2025		
CONTRATISTA	Consorcio Centro Cambia	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA	CONTRATISTA	CONSORCIO AVANZA MAGDALENA 025	OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA
DIRECTOR DE OBRA	JESUS CERVANTES		DIRECTOR INTERVENTORÍA	DAVINSON GRAVINI POLO	
RESIDENTE DE OBRA	BRAYAN CUAVAS SALCEDO		RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	ALEJANDRA SANCHEZ CERÓN	
CAPÍTULO	20.00		SUBCAPÍTULO	20.01.05	FECHA
ITEM	20.01.05.20	DESCRIPCIÓN	ABRAZADERAS UL/FM		UNIDAD: UN

ITEM No.	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL
	ABRAZADERAS UL/FM 1"						20	20.00
	TOTAL ACTIVIDAD							20.00
	ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR							
	TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS							20.00

LOCALIZACIÓN Y ESQUEMA

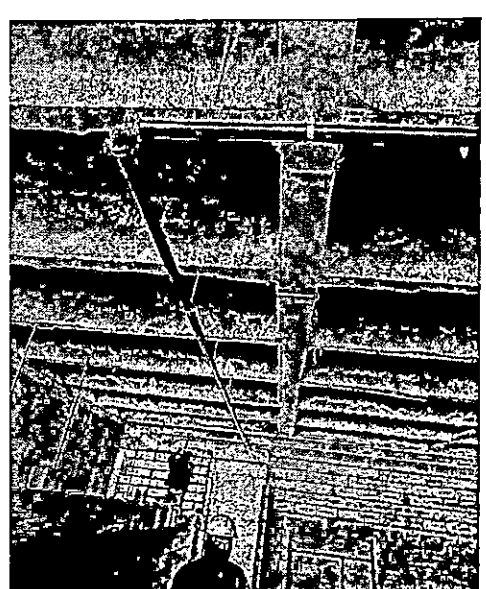

OBSERVACIONES

ELABORÓ	APROBÓ	REVISÓ
BRAYAN CUAVAS SALCEDO	RAFAEL CABRALES	ALEJANDRA SANCHEZ

Gobernación del MAGDALENA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO:	
VERSIÓN:	
FECHA DE APROBACIÓN	
PÁGINA	1 DE 1

ACTA PARCIAL DE OBRA No.	6	PERIODO DE EJECUCIÓN	19 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2026
CONTRATO DE OBRA No.		CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	CI-1324-2025
CONTRATISTA	Consorcio Centro Cambia	CONTRATISTA	CONSORCIO AVANZA MAGDALENA 025
DIRECTOR DE OBRA	JESUS CERVANTES	DIRECTOR INTERVENTORIA	DAVINSON GRAVINI POLO
RESIDENTE DE OBRA	BRAYAN CUAVAS SALCEDO	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	ALEJANDRA SANCHEZ CERÓN
CAPITULO	20.00	SUBCAPITULO	20.01.05
ITEM	20.01.05.21	DESCRIPCIÓN	COUPLING
FECHA		UNIDAD	UN

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA

OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA

No.	DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL
	COUPLING 3"						28	28.00
							TOTAL ACTIVIDAD	28.00
							ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR	
							TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS	28.00

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA



OBSERVACIONES

ELABORO	APROBÓ	REVISÓ
BRAYAN CUAVAS SALCEDO	RAFAEL CABRALES	ALEJANDRA SANCHEZ

Gobernación del MAGDALENA


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO: .	
VERSIÓN:	
FECHA DE APROBACIÓN	
PÁGINA	1 DE 1

ACTA PARCIAL DE OBRA No.	6	PERÍODO DE EJECUCIÓN	19 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2026		
CONTRATO DE OBRA No.		CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CI-1324-2025			
CONTRATISTA	Consorcio Centro Cambia	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA	CONTRATISTA	CONSORCIO AVANZA MAGDALENA 025	OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA
DIRECTOR DE OBRA	JESUS CERVANTES		DIRECTOR INTERVENTORIA	DAVINSON GRAVINI POLO	
RESIDENTE DE OBRA	BRAYAN CUAVAS SALCEDO		RESIDENTE DE INTERVENTORIA	ALEJANDRA SANCHEZ CERÓN	
CAPITULO	20.00		SUBCAPITULO	20.01.05	FECHA
ITEM	20.01.05.21	DESCRIPCIÓN: COUPLING			UNIDAD: UN

NO.	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL
	COUPLING 2 1/2"						45	45.00
	TOTAL ACTIVIDAD							45.00
	ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR							
	TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS							45.00

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA

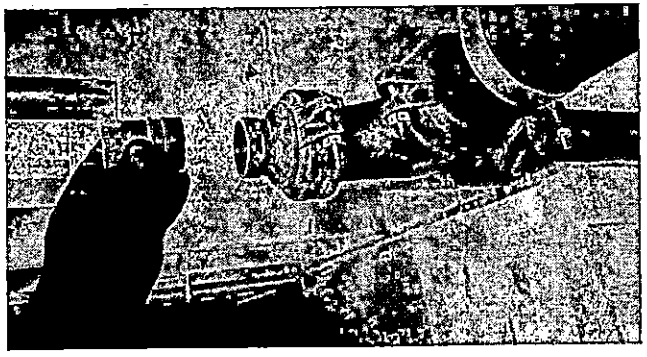

OBSERVACIONES

ELABORO	APROBO	REVISO
BRAYAN CUAVAS SALCEDO	RAFAEL CABRALES	ALEJANDRA SANCHEZ

Gobernación del MAGDALENA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO:	
VERSIÓN:	
FECHA DE APROBACIÓN	
PÁGINA	1 DE 1

ACTA PARCIAL DE OBRA No	6	PERIODO DE EJECUCIÓN	19 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2026
CONTRATO DE OBRA No.		CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CI-1324-2025	
CONTRATISTA	Consorcio Centro Cambia	CONTRATISTA	CONSORCIO AVANZA MAGDALENA 025
DIRECTOR DE OBRA	JESUS CERVANTES	DIRECTOR INTERVENTORIA	DAVINSON GRAVINI POLO
RESIDENTE DE OBRA	BRAYAN CUAVAS SALCEDO	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	ALEJANDRA SANCHEZ CERÓN
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA		OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA	
CAPITULO	20.00	SUBCAPITULO	20.01.05
FECHA			
ITEM	20.01.05.23	DESCRIPCIÓN	COUPLING
UNIDAD	UN		

No.	DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL
	COUPLING 2"						30	30.00
							TOTAL ACTIVIDAD	30.00
							ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR	
							TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS	30.00

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA



OBSERVACIONES

ELABORO	APROBO	REVISO
BRAYAN CUAVAS SALCEDO	RAFAEL CABRALES	ALEJANDRA SANCHEZ

Gobernación del MAGDALENA


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO:	
VERSIÓN:	
FECHA DE APROBACIÓN	
PÁGINA	1 DE 1

ACTA PARCIAL DE OBRA No.	6	PERIODO DE EJECUCIÓN	19 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2026		
CONTRATO DE OBRA No.			CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CI-1324-2025		
CONTRATISTA	Consorcio Centro Cambia	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA	CONTRATISTA	CONSORCIO AVANZA MAGDALENA 025	OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA
DIRECTOR DE OBRA	JESUS CERVANTES		DIRECTOR INTERVENTORIA	DAVINSON GRAVINI POLO	
RESIDENTE DE OBRA	BRAYAN CUAVAS SALCEDO		RESIDENTE DE INTERVENTORIA	ALEJANDRA SANCHEZ CERÓN	
CAPITULO	20.00		SUBCAPITULO	20.01.05	FECHA
ITEM	20.01.05.24	DESCRIPCIÓN: STRAP 3"x1"			UNIDAD: UN

NO.	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL
	STRAP 3"x1"						18	18.00
	TOTAL ACTIVIDAD							18.00
	ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR							
	TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS							18.00

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA

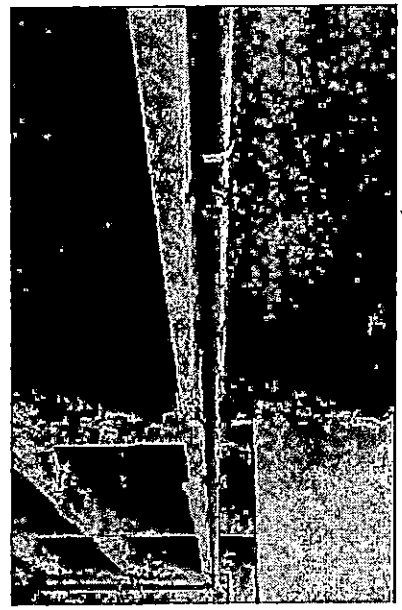

OBSERVACIONES

ELABORÓ	APROBÓ	REVISÓ
BRAYAN CUAVAS SALCEDO	RAFAEL CABRALES	ALEJANDRA SANCHEZ

Gobernación del MAGDALENA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO:	
VERSIÓN:	
FECHA DE APROBACIÓN	
PÁGINA	1 DE 1

ACTA PARCIAL DE OBRA No.	6	PERIODO DE EJECUCIÓN	19 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2026	
CONTRATO DE OBRA No.		CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CI-1324-2025		
CONTRATISTA	Consorcio Centro Cambia	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA	CONTRATISTA	CONSORCIO AVANZA MAGDALENA 025
DIRECTOR DE OBRA	JESUS CERVANTES		DIRECTOR INTERVENTORIA	DAVINSON GRAVINI POLO
RESIDENTE DE OBRA	BRAYAN CUAVAS SALCEDO		RESIDENTE DE INTERVENTORIA	ALEJANDRA SANCHEZ CERÓN
CAPITULO	20.00		SUBCAPITULO	20.01.05
ITEM	20.01.05.25	DESCRIPCIÓN	STRAP 2½"x1"	


OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA

FECHA:

UNIDAD: UN

No.	DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL
	STRAP 2½"x1"						21	21.00
							TOTAL ACTIVIDAD	21.00
							ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR	
							TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS	21.00

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA

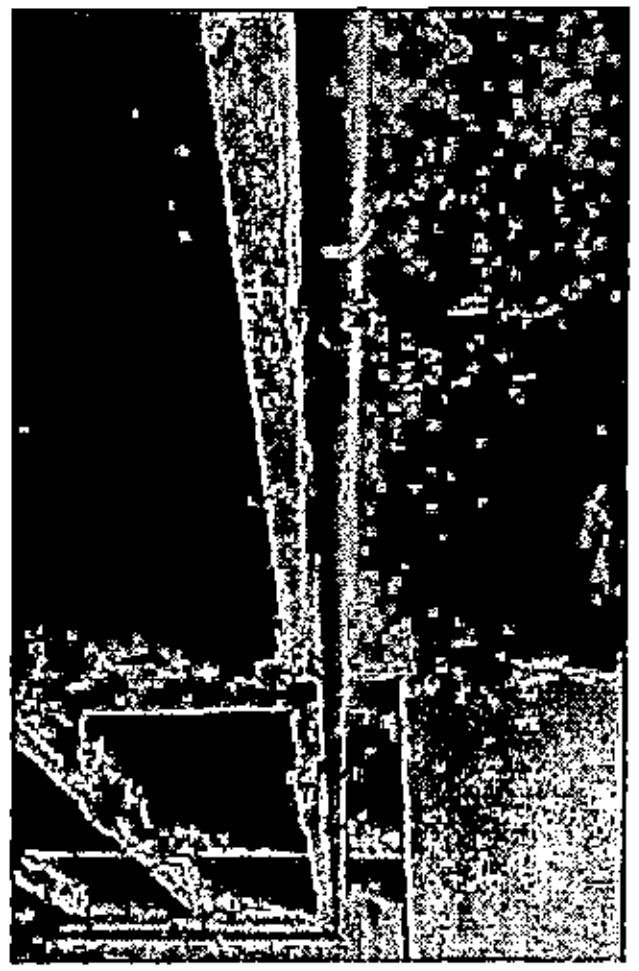

OBSERVACIONES

ELABORO	APROBÓ	REVISÓ
BRAYAN CUAVAS SALCEDO	RAFAEL CABRALES	ALEJANDRA SANCHEZ

Gobernación del MAGDALENA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO:	
VERSIÓN:	
FECHA DE APROBACIÓN	
PÁGINA	1 DE 1

ACTA PARCIAL DE OBRA No.	6	PERIODO DE EJECUCIÓN	19 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2026
CONTRATO DE OBRA No.		CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	CI-1324-2025
CONTRATISTA	Consorcio Centro Cambia	CONTRATISTA	CONSORCIO AVANZA MAGDALENA 025
DIRECTOR DE OBRA	JESUS CERVANTES	DIRECTOR INTERVENTORIA	DAVINSON GRAVINI POLO
RESIDENTE DE OBRA	BRAYAN CUAVAS SALCEDO	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	ALEJANDRA SANCHEZ CERÓN
CAPITULO	20.00	SUBCAPITULO	20.01.05
ITEM	20.01.05.28	DESCRIPCIÓN	STRAP 2"x1"

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA

OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA

FECHA

UNIDAD: UN

No.	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL
	STRAP 2"x1"						20	20.00
						TOTAL ACTIVIDAD		20.00
						ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR		
						TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS		20.00

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA



OBSERVACIONES

ELABORO	APROBÓ	REVISÓ
BRAYAN CUAVAS SALCEDO	RAFAEL CABRALES	ALEJANDRA SANCHEZ

Gobernación del MAGDALENA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO:	
VERSIÓN:	
FECHA DE APROBACIÓN	
PÁGINA	1 DE 1

ACTA PARCIAL DE OBRA No.	6	PERIODO DE EJECUCIÓN	19 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2026		
CONTRATO DE OBRA No.		CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	CI-1324-2025		
CONTRATISTA	Consorcio Centro Cambia	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA	CONTRATISTA	CONSORCIO AVANZA MAGDALENA 025	OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA
DIRECTOR DE OBRA	JESUS CERVANTES		DIRECTOR INTERVENTORIA	DAVINSON GRAVINI POLO	
RESIDENTE DE OBRA	BRAYAN CUAVAS SALCEDO		RESIDENTE DE INTERVENTORIA	ALEJANDRA SANCHEZ CERÓN	
CAPÍTULO	20.00		SUBCAPÍTULO	20.01.05	FECHA:
ITEM	20.01.05.27	DESCRIPCIÓN	STRAP 1,1/2"x1"		UNIDAD: UN

NO.	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL
	STRAP 1,1/2"x1"						28	28.00
	TOTAL ACTIVIDAD							28.00
	ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR							
	TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS							28.00

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA



OBSERVACIONES

ELABORÓ	APROBÓ	REVISÓ
BRAYAN CUAVAS SALCEDO	RAFAEL CABRALES	ALEJANDRA SANCHEZ

Gobernación del MAGDALENA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO:	
VERSIÓN:	
FECHA DE APROBACIÓN	
PÁGINA	1 DE 1


ACTA PARCIAL DE OBRA No	6	PERIODO DE EJECUCIÓN	19 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2026
CONTRATO DE OBRA No		CONTRATO DE INTERVENTORIA No	CI-1324-2025
CONTRATISTA	Consorcio Centro Cambia	CONTRATISTA	CONSORCIO AVANZA MAGDALENA 025
DIRECTOR DE OBRA	JESUS CERVANTES	DIRECTOR INTERVENTORIA	DAVINSON GRAVINI POLO
RESIDENTE DE OBRA	BRAYAN CUAVAS SALCEDO	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	ALEJANDRA SANCHEZ CERÓN
CAPITULO	20.00	SUBCAPITULO	20.01.06
ITEM	20.01.06.02	DESCRIPCIÓN	LAVAMANOS
UNIDAD	UN	FECHA	

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA

OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA

No.	DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL
	LAVAMANOS 2"						1	1.00
							TOTAL ACTIVIDAD	1.00
							ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR	
							TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS	1.00

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA

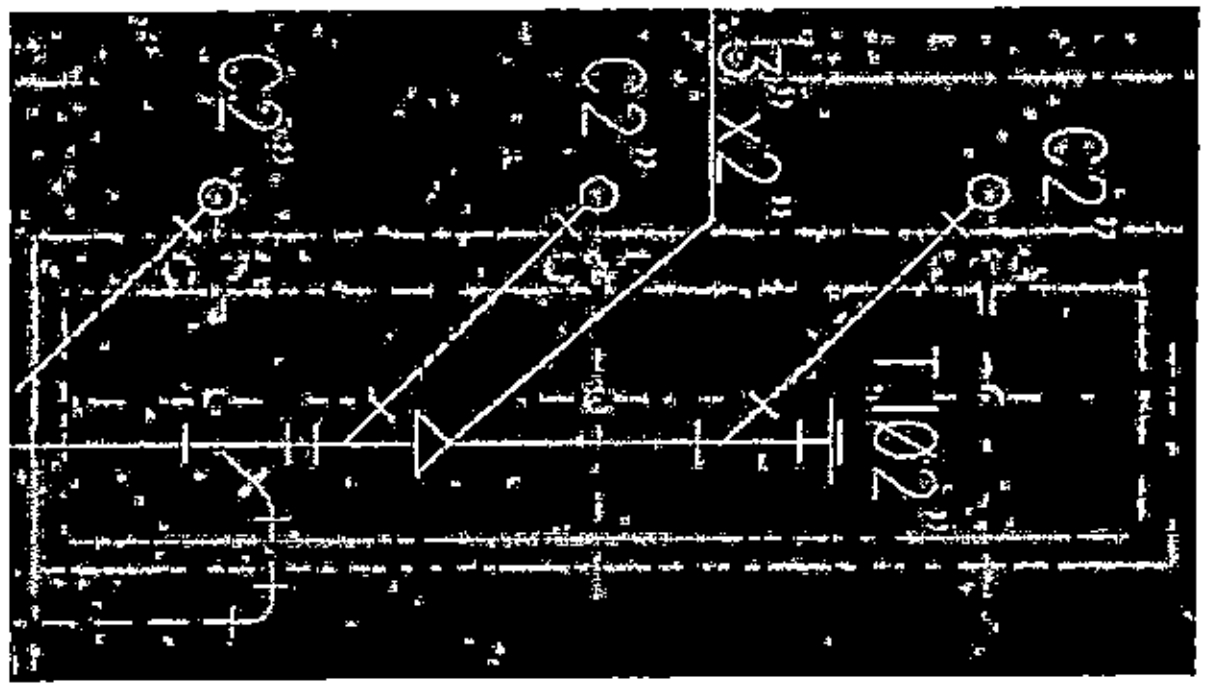

OBSERVACIONES

ELABORÓ	APROBÓ	REVISÓ
BRAYAN CUAVAS SALCEDO	RAFAEL CABRALES	ALEJANDRA SANCHEZ

Gobernación del
MAGDALENA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA


CÓDIGO:	
VERSIÓN:	
FECHA DE APROBACIÓN	
PÁGINA	1 DE 1

ACTA PARCIAL DE OBRA No.	6	PERIODO DE EJECUCIÓN	19 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2026

CONTRATO DE OBRA No.			CONTRATO DE INTERVENTORIA No. OI-1324-2025		
CONTRATISTA	Consorcio Centro Cambia	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA	CONTRATISTA	CONSORCIO AVANZA MAGDALENA 025	OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA
DIRECTOR DE OBRA	JESUS CERVANTES		DIRECTOR INTERVENTORIA	DAVINSON GRAVINI POLO	
RESIDENTE DE OBRA	BRAYAN CUAVAS SALCEDO		RESIDENTE DE INTERVENTORIA	ALEJANDRA SANCHEZ CERÓN	
CAPITULO	20.00		SUBCAPITULO	20.01.06	FECHA
ITEM	20.01.06.05	DESCRIPCIÓN	ORINAL		UNIDAD: UN

No.	DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL
	ORINAL 2"						4	4.00
							TOTAL ACTIVIDAD	4.00
							ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR	
							TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS	4.00

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA

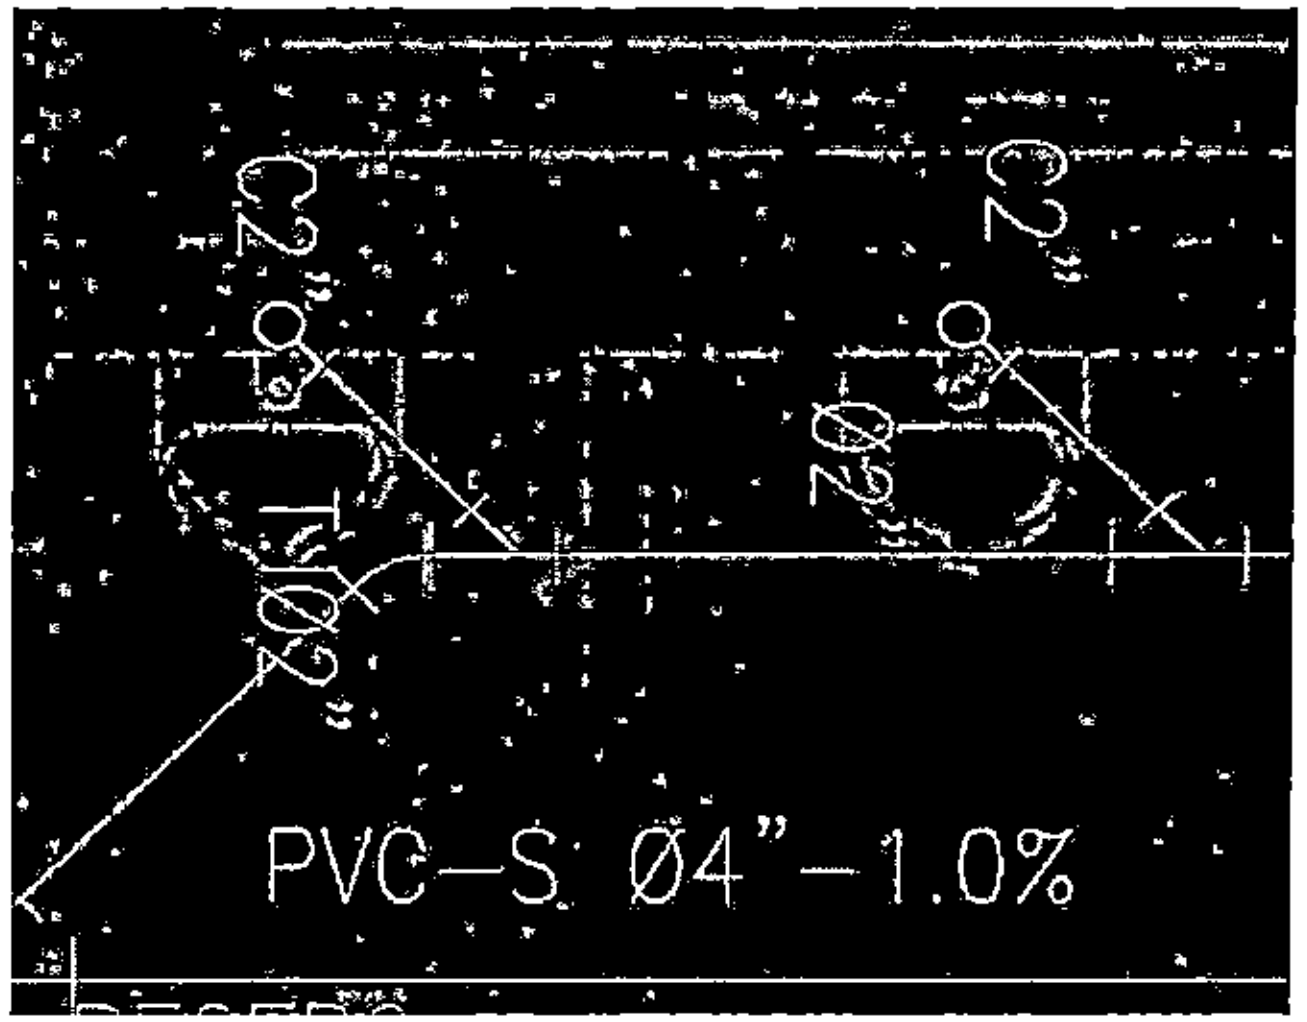

OBSERVACIONES

ELABORÓ	APROBÓ	REVISÓ
BRAYAN CUAVAS SALCEDO	RAFAEL CABRALES	ALEJANDRA SANCHEZ

Gobernación del MAGDALENA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO:	
VERSIÓN:	
FECHA DE APROBACIÓN	
PÁGINA	1 DE 1


ACTA PARCIAL DE OBRA No.	6	PERIODO DE EJECUCIÓN	19 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2026
CONTRATO DE OBRA No.		CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CJ-1324-2025	

CONTRATISTA	Consorcio Centro Cambia	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA	CONTRATISTA	CONSORCIO AVANZA MAGDALENA 025	OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA
DIRECTOR DE OBRA	JESUS CERVANTES		DIRECTOR INTERVENTORIA	DAVINSON GRAVINI POLO	
RESIDENTE DE OBRA	BRAYAN CUAVAS SALCEDO		RESIDENTE DE INTERVENTORIA	ALEJANDRA SANCHEZ CERÓN	
CAPITULO	20.00		SUBCAPITULO	20.01.06	FECHA

ITEM	20.01.06.06	DESCRIPCIÓN	LAVAPLATOS SENCILLO	UNIDAD	UN

No.	DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL
	LAVAPLATOS SENCILLO 2"						2	2.00
							TOTAL ACTIVIDAD	2.00
							ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR	
							TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS	2.00

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA

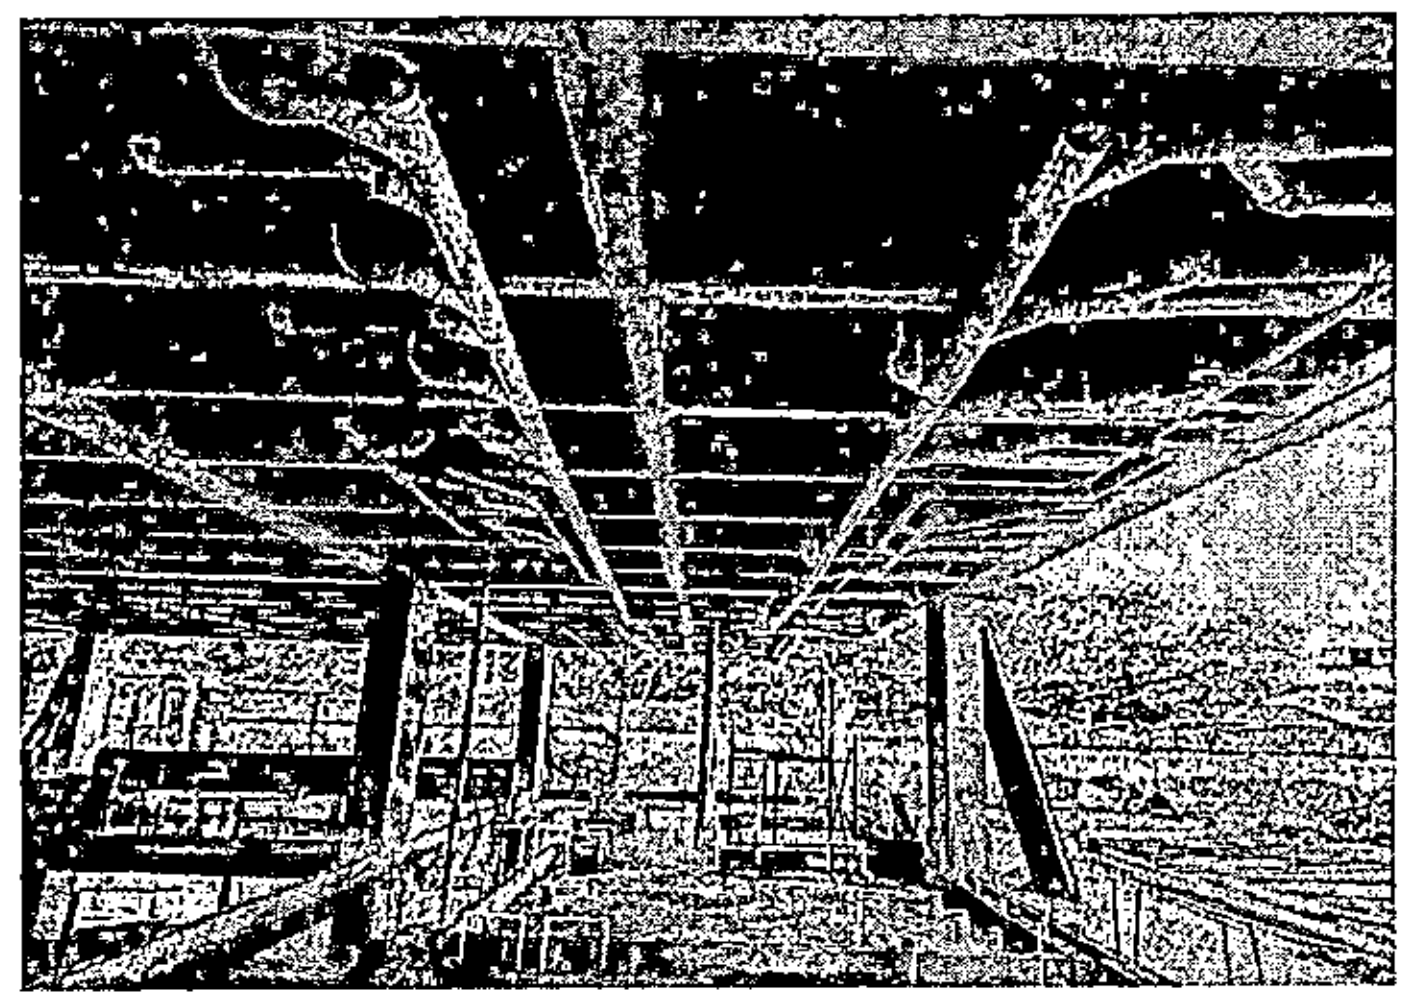

OBSERVACIONES

ELABORO	APROBÓ	REVISÓ
BRAYAN CUAVAS SALCEDO	RAFAEL CABRALES	ALEJANDRA SANCHEZ

Gobernación del MAGDALENA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO:	
VERSIÓN:	
FECHA DE APROBACIÓN	
PÁGINA	1 DE 1

ACTA PARCIAL DE OBRA No.	6	PERIODO DE EJECUCIÓN	19 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2026		
CONTRATO DE OBRA No.			CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CI-1324-2025		
CONTRATISTA	Consorcio Centro Cambia	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA	CONTRATISTA	CONSORCIO AVANZA MAGDALENA 025	OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA
DIRECTOR DE OBRA	JESUS CERVANTES		DIRECTOR INTERVENTORIA	DAVINSON GRAVINI POLO	
RESIDENTE DE OBRA	BRAYAN CUAVAS SALCEDO		RESIDENTE DE INTERVENTORIA	ALEJANDRA SANCHEZ CERÓN	
CAPITULO	20.00		SUBCAPITULO	20.01.06	FECHA:
ITEM	20.01.06.09	DESCRIPCIÓN	SIFON DE PISO		UNIDAD: UN

NO.	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL
	SIFON DE PISO 4"						9	9.00
						TOTAL ACTIVIDAD		9.00
						ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR		
						TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS		9.00

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA



OBSERVACIONES

ELABORO	APROBÓ	REVISÓ
BRAYAN CUAVAS SALCEDO	RAFAEL CABRALES	ALEJANDRA SANCHEZ

Gobernación del MAGDALENA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO:	
VERSIÓN:	
FECHA DE APROBACIÓN	
PÁGINA	1 DE 1

ACTA PARCIAL DE OBRA No.	6	PERIODO DE EJECUCIÓN	19 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2026		
CONTRATO DE OBRA No.			CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CI-1324-2025		
CONTRATISTA	Consorcio Centro Cambia	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA	CONTRATISTA	CONSORCIO AVANZA MAGDALENA 025	OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA
DIRECTOR DE OBRA	JESUS CERVANTES		DIRECTOR INTERVENTORIA	DAVINSON GRAVINI POLO	
RESIDENTE DE OBRA	BRAYAN CUAVAS SALCEDO		RESIDENTE DE INTERVENTORIA	ALEJANDRA SANCHEZ CERÓN	
CAPITULO	20.00		SUBCAPITULO	20.01.07	FECHA
ITEM	20.01.07.07	DESCRIPCIÓN: JUNTA DE EXPANSION			UNIDAD: UN

No.	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL
	JUNTA DE EXPANSION 6"						1	1.00
	TOTAL ACTIVIDAD							1.00
	ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR							
	TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS							1.00

LOCALIZACION / ESQUEMA



OBSERVACIONES

ELABORO	APROBÓ	REVISÓ
BRAYAN CUAVAS SALCEDO	RAFAEL CABRALES	ALEJANDRA SANCHEZ

Gobernación del MAGDALENA


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO:	
VERSIÓN:	
FECHA DE APROBACIÓN	
PÁGINA	1 DE 1

ACTA PARCIAL DE OBRA No.:	6	PERIODO DE EJECUCIÓN	19 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2026		
CONTRATO DE OBRA No.:			CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CI-1324-2025		
CONTRATISTA	Consorcio Centro Cambia	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA	CONTRATISTA	CONSORCIO AVANZA MAGDALENA 025	OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA
DIRECTOR DE OBRA	JESUS CERVANTES		DIRECTOR INTERVENTORIA	DAVINSON GRAVINI POLO	
RESIDENTE DE OBRA	BRAYAN CUAVAS SALCEDO		RESIDENTE DE INTERVENTORIA	ALEJANDRA SANCHEZ CERÓN	
CAPITULO	20.00		SUBCAPITULO	20.02.01	FECHA:
ITEM	20.02.01.01	DESCRIPCIÓN	TUBERIA PVC-P		UNIDAD: ML

NO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL
	TUBERIA PVC-P 3"	21.29						21.29
	TOTAL ACTIVIDAD							21.29
	ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR							
	TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS							21.29

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA

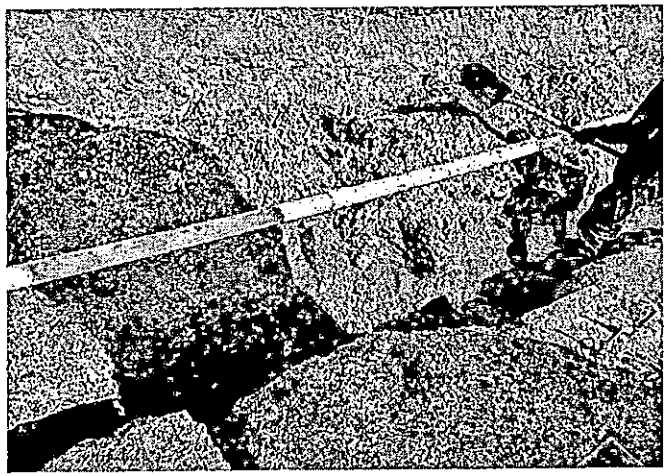

OBSERVACIONES

ELABORÓ	APROBÓ	REVISÓ
BRAYAN CUAVAS SALCEDO	RAFAEL CABRALES	ALEJANDRA SANCHEZ

Gobernación del
MAGDALENA


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO:	
VERSIÓN:	
FECHA DE APROBACIÓN	
PÁGINA	1 DE 1

ACTA PARCIAL DE OBRA No.	6	PERÍODO DE EJECUCIÓN	19 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2026		
CONTRATO DE OBRA No.		CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	C-1324-2025		
CONTRATISTA	Consorcio Centro Cambia	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA	CONTRATISTA	CONSORCIO AVANZA MAGDALENA 025	OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA
DIRECTOR DE OBRA	JESUS CERVANTES		DIRECTOR INTERVENTORIA	DAVINSON GRAVINI POLO	
RESIDENTE DE OBRA	BRAYAN CUAVAS SALCEDO		RESIDENTE DE INTERVENTORIA	ALEJANDRA SANCHEZ CERÓN	
CAPITULO	20.00		SUBCAPITULO	20.02.01	FECHA
ITEM	20.02.01.02	DESCRIPCIÓN	TUBERIA PVC-P		UNIDAD: ML

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL
TUBERIA PVC-P 1 1/4"	55.61						55.61
TOTAL ACTIVIDAD							55.61
ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR							
TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS							55.61

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA

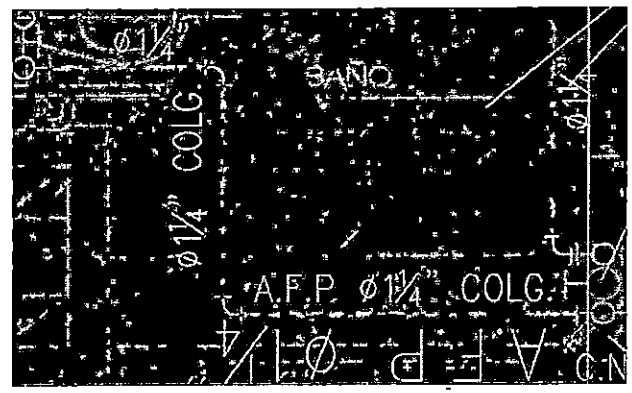

OBSERVACIONES

ELABORÓ	APROBÓ	REVISÓ
BRAYAN CUAVAS SALCEDO	RAFAEL CABRALES	ALEJANDRA SANCHEZ

Gobernación del MAGDALENA


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO:	
VERSIÓN:	
FECHA DE APROBACIÓN	
PÁGINA	1 DE 1

ACTA PARCIAL DE OBRA No.	6	PERÍODO DE EJECUCIÓN	19 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2026		
CONTRATO DE OBRA No.			CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CI-1324-2025		
CONTRATISTA	Consorcio Centro Cambia	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA	CONTRATISTA	CONSORCIO AVANZA MAGDALENA 025	OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA
DIRECTOR DE OBRA	JESUS CERVANTES		DIRECTOR INTERVENTORIA	DAVINSON GRAVINI POLO	
RESIDENTE DE OBRA	BRAYAN CUAVAS SALCEDO		RESIDENTE DE INTERVENTORIA	ALEJANDRA SANCHEZ CERÓN	
CAPITULO	20.00		SUBCAPITULO	20.02.01	FECHA
ITEM	20.02.01.05	DESCRIPCIÓN: TUBERIA PVC-P			UNIDAD: ML

No.	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	No. DE CANTIDAD	TOTAL
.	TUBERIA PVC-P 1/2"	18.14						18.14
	TOTAL ACTIVIDAD							18.14
	ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR							
	TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS							18.14

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA

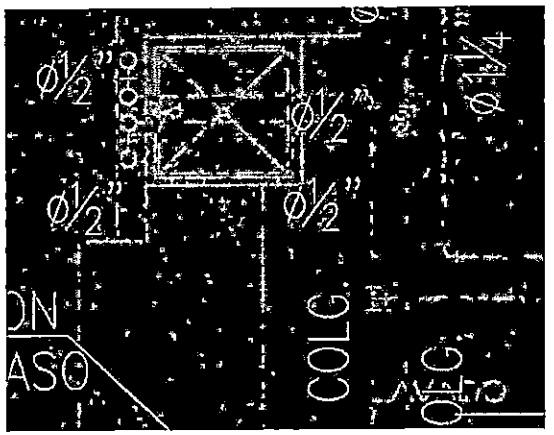

OBSERVACIONES

ELABORÓ	APROBÓ	REVISÓ
BRAYAN CUAVAS SALCEDO	RAFAEL CABRALES	ALEJANDRA SANCHEZ

Gobernación del MAGDALENA


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO:	
VERSIÓN:	
FECHA DE APROBACIÓN	
PÁGINA	1 DE 1

ACTA PARCIAL DE OBRA No.	6		PERIODO DE EJECUCIÓN:	19 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2026	
CONTRATO DE OBRA No.			CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	GI-1324-2025	
CONTRATISTA	Consorcio Centro Cambia	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA	CONTRATISTA	CONSORCIO AVANZA MAGDALENA 025	OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA
DIRECTOR DE OBRA	JESUS CERVANTES		DIRECTOR INTERVENTORÍA	DAVINSON GRAVINI POLO	
RESIDENTE DE OBRA	BRAYAN CUAVAS SALCEDO		RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	ALEJANDRA SANCHEZ CERÓN	
CAPÍTULO	20.00		SUBCAPÍTULO	20.02.02	FECHA
ITEM	20.02.02.01	DESCRIPCIÓN: PUNTO SANITARIO PUSH			UNIDAD: UN

NO.	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL
	PUNTO SANITARIO PUSH 1 1/4"						2	2.00
	Punto sanitario push 1 1/4" instalados según diseño.							
							TOTAL ACTIVIDAD	2.00
							ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR	
							TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS	2.00

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA

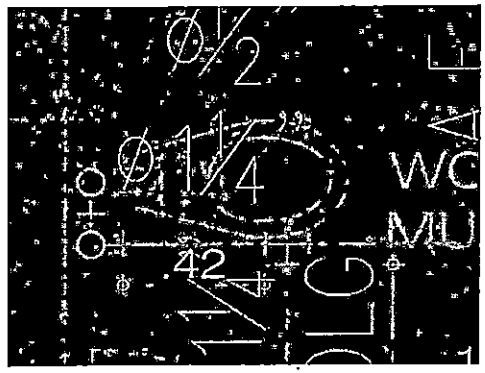

OBSERVACIONES

ELABORÓ	APROBÓ	REVISÓ
BRAYAN CUAVAS SALCEDO	RAFAEL CABRALES	ALEJANDRA SANCHEZ

Gobernación del MAGDALENA


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO:	
VERSIÓN:	
FECHA DE APROBACIÓN	
PÁGINA	1 DE 1

ACTA PARCIAL DE OBRA No.	6		PERIODO DE EJECUCIÓN	19 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2026	
CONTRATO DE OBRA No.			CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CI-1324-2025	
CONTRATISTA	Consorcio Centro Cambia	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA	CONTRATISTA	CONSORCIO AVANZA MAGDALENA 025	OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA
DIRECTOR DE OBRA	JESUS CERVANTES		DIRECTOR INTERVENTORÍA	DAVINSON GRAVINI POLO	
RESIDENTE DE OBRA	BRAYAN CUAVAS SALCEDO		RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	ALEJANDRA SANCHEZ CERÓN	
CAPITULO	20.00		SUBCAPITULO	20.02.02	FECHA:
ITEM	20.02.02.02	DESCRIPCIÓN: PUNTO LAVAMANOS			UNIDAD: UN

No.	DESCRIPCION	DIMENSIONES PLANO	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL
	PUNTO LAVAMANOS 1/2"							2	2.00
	Punto lavamanos 1/2" instalados según diseño.								
							TOTAL ACTIVIDAD		2.00
							ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR		
							TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS		2.00

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA

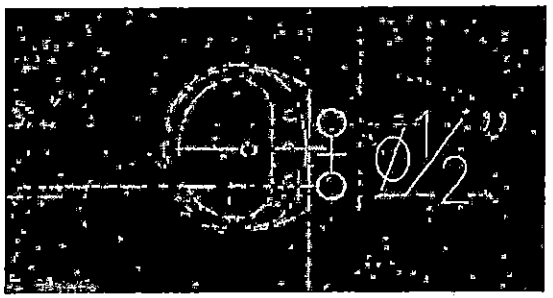

OBSERVACIONES

ELABORÓ	APROBÓ	REVISÓ
BRAYAN CUAVAS SALCEDO	RAFAEL CABRALES	ALEJANDRA SANCHEZ

Gobernación del MAGDALENA


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO:	
VERSIÓN:	
FECHA DE APROBACIÓN	
PÁGINA	1 DE 1

ACTA PARCIAL DE OBRA No.	6	PERIODO DE EJECUCIÓN	19 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2026		
CONTRATO DE OBRA No.		CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CI-1324-2025		
CONTRATISTA	Consorcio Centro Cambia	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA	CONTRATISTA	CONSORCIO AVANZA MAGDALENA 025	OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA
DIRECTOR DE OBRA	JESUS CERVANTES		DIRECTOR INTERVENTORIA	DAVINSON GRAVINI POLO	
RESIDENTE DE OBRA	BRAYAN CUAVAS SALCEDO		RESIDENTE DE INTERVENTORIA	ALEJANDRA SANCHEZ CERÓN	
CAPITULO	20.00		SUBCAPITULO	20.02.02	FECHA
ITEM	20.02.02.04	DESCRIPCIÓN	PUNTO LAVAPLATOS		UNIDAD: UN

No.	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL
	PUNTO LAVAPLATOS 1/2"						1	1.00
	Punto lavaplatos 1/2" instalados según diseño.							
							TOTAL ACTIVIDAD	1.00
							ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR	
							TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS	1.00

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA:

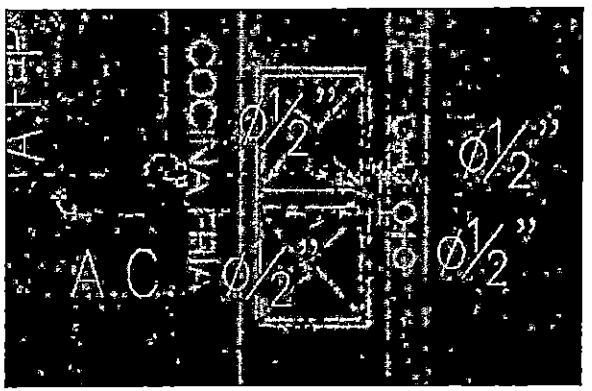

OBSERVACIONES

ELABORÓ	APROBÓ	REVISÓ
BRAYAN CUAVAS SALCEDO	RAFAEL CABRALES	ALEJANDRA SANCHEZ

Gobernación del MAGDALENA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO:	
VERSIÓN:	
FECHA DE APROBACIÓN	
PÁGINA	1 DE 1

ACTA PARCIAL DE OBRA No.	6		PERIODO DE EJECUCIÓN	19 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2026	
CONTRATO DE OBRA No.			CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	GI-1324-2025	
CONTRATISTA	Consorcio Centro Cambia	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA	CONTRATISTA	CONSORCIO AVANZA MAGDALENA 025	OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA
DIRECTOR DE OBRA	JESUS CERVANTES		DIRECTOR INTERVENTORIA	DAVINSON GRAVINI POLO	
RESIDENTE DE OBRA	BRAYAN CUAVAS SALCEDO		RESIDENTE DE INTERVENTORIA	ALEJANDRA SANCHEZ CERÓN	
CAPITULO	20.00		SUBCAPITULO	20.02.02	FECHA:
ITEM	20.02.02.06	DESCRIPCIÓN	PUNTO POCETA		UNIDAD: UN

NO.	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL	LOCALIZACIÓN / ESQUEMA
	PUNTO POCETA 1/2"						3	3.00	
	TOTAL ACTIVIDAD							3.00	
	ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR								
	TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS							3.00	

OBSERVACIONES

ELABORÓ	APROBÓ	REVISÓ
BRAYAN CUAVAS SALCEDO	RAFAEL CABRALES	ALEJANDRA SANCHEZ

Gobernación del MAGDALENA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO:	
VERSIÓN:	
FECHA DE APROBACIÓN	
PÁGINA	1 DE 1

ACTA PARCIAL DE OBRA No.	6	PERIODO DE EJECUCIÓN	19 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2026

CONTRATO DE OBRA No.			CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CI-1324-2025		
CONTRATISTA	Consorcio Centro Cambia	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA	CONTRATISTA	CONSORCIO AVANZA MAGDALENA 025	OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA
DIRECTOR DE OBRA	JESUS CERVANTES		DIRECTOR INTERVENTORÍA	DAVINSON GRAVINI POLO	
RESIDENTE DE OBRA	BRAYAN CUAVAS SALCEDO		RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	ALEJANDRA SANCHEZ CERÓN	
CAPITULO	20.00		SUBCAPITULO	20.02.02	FECHA
ITEM	20.02.02.07	DESCRIPCIÓN	PUNTO MARMITA		UNIDAD: UN

No.	DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL
	PUNTO MARMITA 1"						1	1.00
							TOTAL ACTIVIDAD	1.00
							ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR	
							TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS	1.00

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA

OBSERVACIONES

ELABORÓ	APROBÓ	REVISÓ
BRAYAN CUAVAS SALCEDO	RAFAEL CABRALES	ALEJANDRA SANCHEZ


Gobernación del MAGDALENA	# MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	CÓDIGO:	
		VERSIÓN:	
		FECHA DE APROBACIÓN	
		PÁGINA	1 DE 1


ACTA PARCIAL DE OBRA No.	6	PERIODO DE EJECUCIÓN	19 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2026


CONTRATO DE OBRA No.			CONTRATO DE INTERVENTORIA No: CI-1324-2025		
CONTRATISTA	Consorcio Centro Cambia	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA	CONTRATISTA	CONSORCIO AVANZA MAGDALENA 025	OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA
DIRECTOR DE OBRA	JESUS CERVANTES		DIRECTOR INTERVENTORIA	DAVINSON GRAVINI POLO	
RESIDENTE DE OBRA	BRAYAN CUAVAS SALCEDO		RESIDENTE DE INTERVENTORIA	ALEJANDRA SANCHEZ CERÓN	
CAPITULO	20.00		SUBCAPITULO	20.02.06	FECHA
ITEM	20.02.06.10	DESCRIPCION	KIT DE TRANSICION ACERO A C900		UNIDAD: UN

No	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES					CANTIDAD	TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN		
	KIT DE TRANSICION ACERO A C900 4"						5	5.00
							TOTAL ACTIVIDAD	5.00
							ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR	
							TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS	5.00

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA

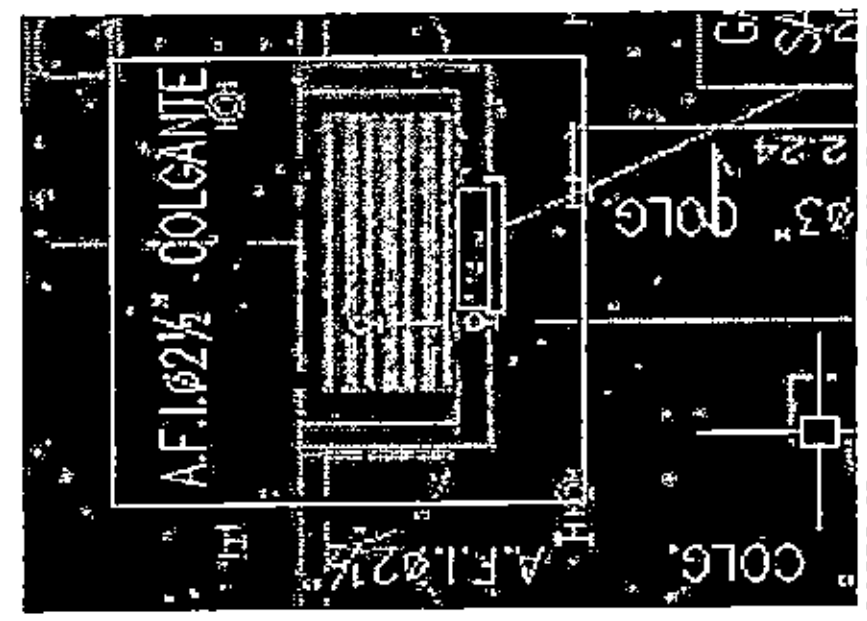

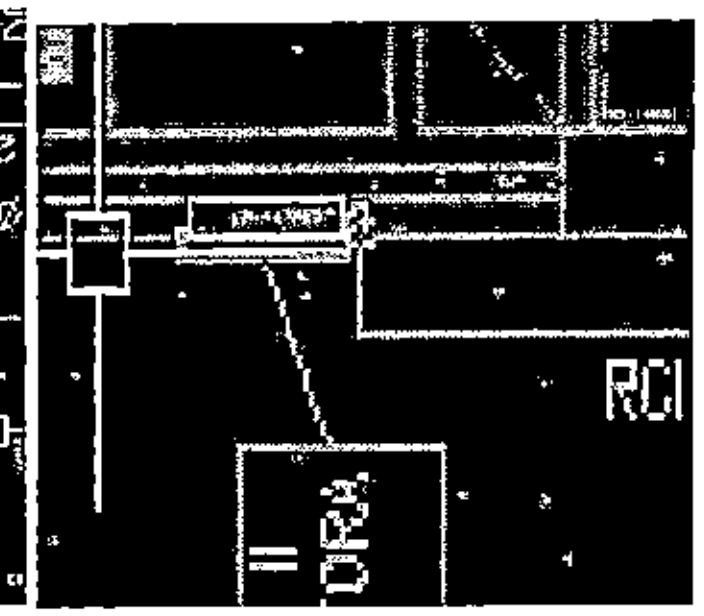

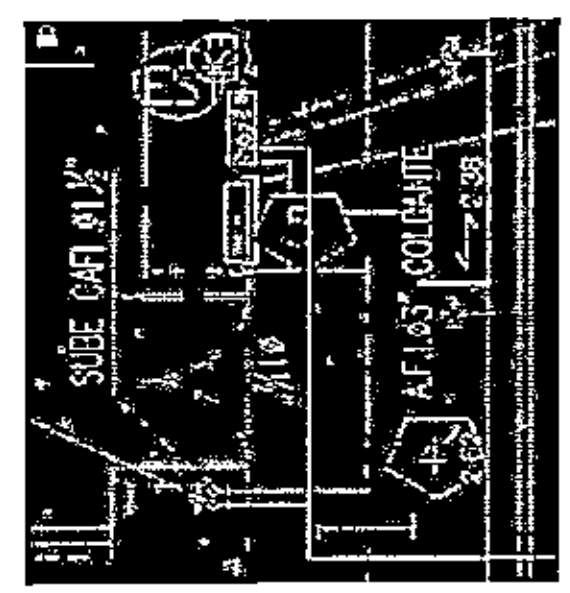

OBSERVACIONES

ELABORO	APROBO	REVISO
BRAYAN CUAVAS SALCEDO	RAFAEL CABRALES	ALEJANDRA SANCHEZ

Gobernación del
MAGDALENA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA


CÓDIGO:	
VERSIÓN:	
FECHA DE APROBACIÓN	
PÁGINA	1 DE 1

ACTA PARCIAL DE OBRA No.	6	PERIODO DE EJECUCIÓN	19 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2026

CONTRATO DE OBRA No.			CONTRATO DE INTERVENTORIA No. OI-1324-2025		
CONTRATISTA	Consorcio Centro Cambia	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA	CONTRATISTA	CONSORCIO AVANZA MAGDALENA 025	OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA
DIRECTOR DE OBRA	JESUS CERVANTES		DIRECTOR INTERVENTORIA	DAVINSON GRAVINI POLO	
RESIDENTE DE OBRA	BRAYAN CUAVAS SALCEDO		RESIDENTE DE INTERVENTORIA	ALEJANDRA SANCHEZ CERÓN	
CAPITULO	20.00		SUBCAPITULO	20.02.06	FECHA:
ITEM	20.02.06.12	DESCRIPCIÓN	TUFF GRIP PARA TUBERIA DE 4"		UNIDAD: UN

No	DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL
	TUFF GRIP PARA TUBERIA DE 4"						4	4.00
							TOTAL ACTIVIDAD	4.00
							ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR	
							TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS	4.00

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA

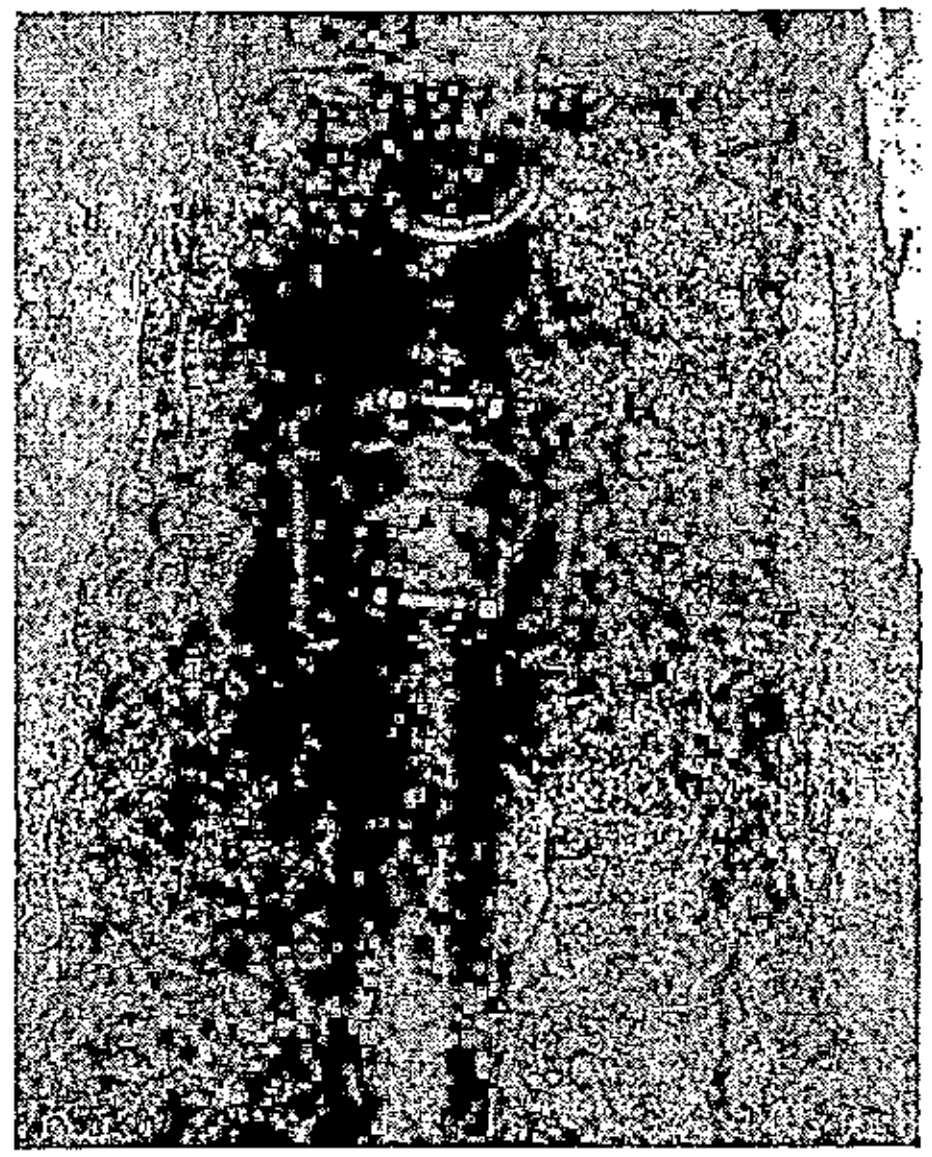

OBSERVACIONES

ELABORO	APROBO	REVISÓ
BRAYAN CUAVAS SALCEDO	RAFAEL CABRALES	ALEJANDRA SANCHEZ

Gobernación del MAGDALENA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA


CÓDIGO:	
VERSIÓN:	
FECHA DE APROBACIÓN	
PÁGINA	1 DE 1

ACTA PARCIAL DE OBRA No.	6	PERIODO DE EJECUCIÓN	19 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2026

CONTRATO DE OBRA No.			CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CI-1324-2025		
CONTRATISTA	Consorcio Centro Cambia	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA	CONTRATISTA	CONSORCIO AVANZA MAGDALENA 025	OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA
DIRECTOR DE OBRA	JESUS CERVANTES		DIRECTOR INTERVENTORIA	DAVINSON GRAVINI POLO	
RESIDENTE DE OBRA	BRAYAN CUAVAS SALCEDO		RESIDENTE DE INTERVENTORIA	ALEJANDRA SANCHEZ CERÓN	
CAPITULO	20.00		SUBCAPITULO	20.02.07	FECHA
ITEM	20.02.07.01	DESCRIPCIÓN	TUBERIA ACERO NEGRO RANURADA SCH 10		UNIDAD: ML

No.	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL
	TUBERIA ACERO NEGRO RANURADA SCH 10 3"	50						50.00
							TOTAL ACTIVIDAD	50.00
							ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR	
							TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS	50.00

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA

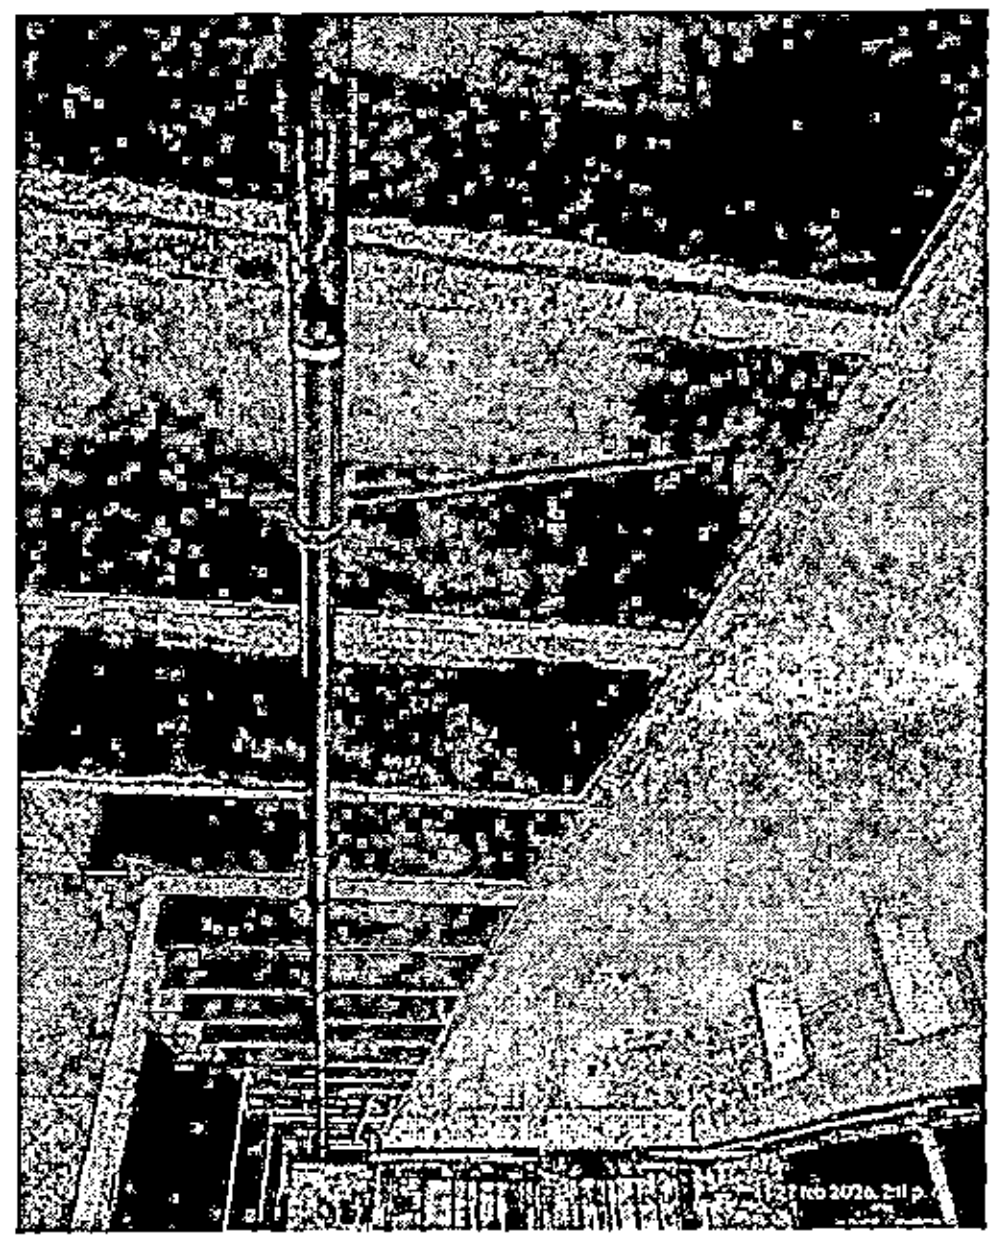

OBSERVACIONES

ELABORO	APROBO	REVISO
BRAYAN CUAVAS SALCEDO	RAFAEL CABRALES	ALEJANDRA SANCHEZ

Gobernación del MAGDALENA


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO:	
VERSIÓN:	
FECHA DE APROBACIÓN	
PÁGINA	1 DE 1

ACTA PARCIAL DE OBRA No.	6		PERIODO DE EJECUCIÓN	19 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2026	
CONTRATO DE OBRA No.			CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CI-1324-2025		
CONTRATISTA	Consorcio Centro Cambia	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA	CONTRATISTA	CONSORCIO AVANZA MAGDALENA 025	OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA
DIRECTOR DE OBRA	JESUS CERVANTES		DIRECTOR INTERVENTORIA	DAVINSON GRAVINI POLO	
RESIDENTE DE OBRA	BRAYAN CUAVAS SALCEDO		RESIDENTE DE INTERVENTORIA	ALEJANDRA SANCHEZ CERÓN	
CAPITULO	20.00		SUBCAPITULO	20.02.07	FECHA
ITEM	20.02.07.02	DESCRIPCIÓN: TUBERIA ACERO NEGRO RANURADA SCH 10			UNIDAD: ML

No.	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL
	TUBERIA ACERO NEGRO RANURADA SCH 10 2 1/2"	91						91.00
							TOTAL ACTIVIDAD	91.00
							ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR	
							TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS	91.00

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA

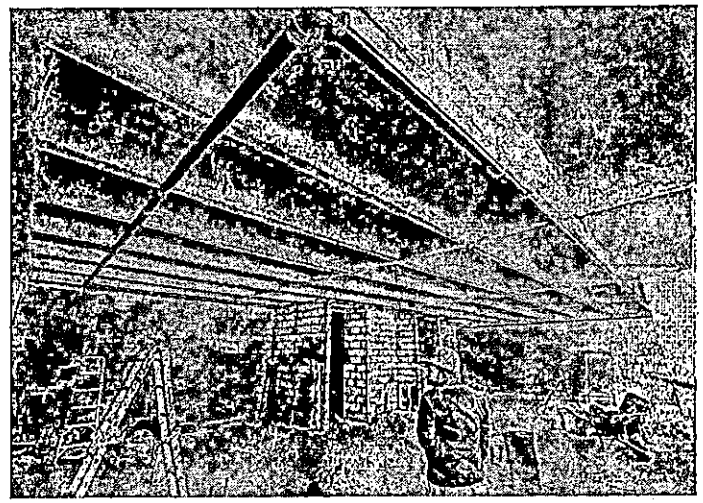

OBSERVACIONES

ELABORO	APROBÓ	REVISO
BRAYAN CUAVAS SALCEDO	RAFAEL CABRALES	ALEJANDRA SANCHEZ

Gobernación del MAGDALENA


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO:	
VERSIÓN:	
FECHA DE APROBACIÓN	
PÁGINA	1 DE 1

ACTA PARCIAL DE OBRA No.	6	PERIODO DE EJECUCIÓN	19 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2026		
CONTRATO DE OBRA No.			CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CI-1324-2025		
CONTRATISTA	Consorcio Centro Cambia	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA	CONTRATISTA	CONSORCIO AVANZA MAGDALENA 025	OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA
DIRECTOR DE OBRA	JESUS CERVANTES		DIRECTOR INTERVENTORIA	DAVINSON GRAVINI POLO	
RESIDENTE DE OBRA	BRAYAN CUAVAS SALCEDO		RESIDENTE DE INTERVENTORIA	ALEJANDRA SANCHEZ CERÓN	
CAPITULO	20.00		SUBCAPITULO	20.02.07	FECHA
ITEM	20.02.07.03	DESCRIPCIÓN	TUBERIA ACERO NEGRO ROSCADA SCH 40		UNIDAD ML

NO.	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL
	TUBERIA ACERO NEGRO ROSCADA SCH 40 2"	23						23.00
	TOTAL ACTIVIDAD							23.00
	ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR							
	TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS							23.00

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA

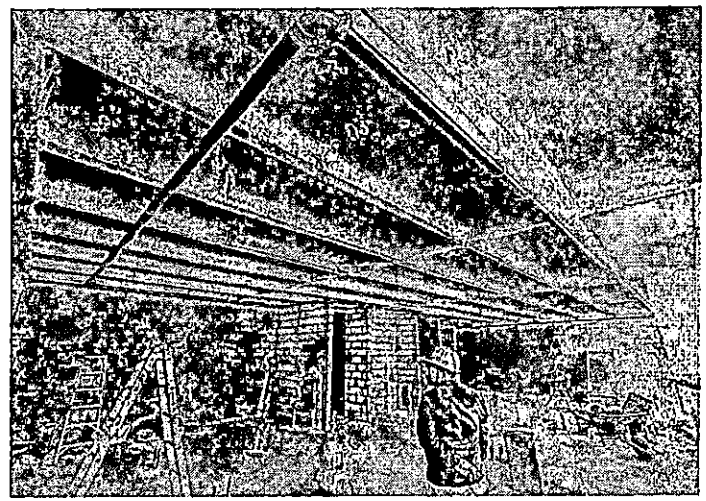

OBSERVACIONES

ELABORO	APROBÓ	REVISÓ
BRAYAN CUAVAS SALCEDO	RAFAEL CABRALES	ALEJANDRA SANCHEZ

Gobernación del MAGDALENA


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO:	
VERSIÓN:	
FECHA DE APROBACIÓN	
PÁGINA	1 DE 1

ACTA PARCIAL DE OBRA No.	6	PERIODO DE EJECUCIÓN	19 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2026		
CONTRATO DE OBRA No.		CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	CI-1324-2025		
CONTRATISTA	Consorcio Centro Cambia	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA	CONTRATISTA	CONSORCIO AVANZA MAGDALENA 025	OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA
DIRECTOR DE OBRA	JESUS CERVANTES		DIRECTOR INTERVENTORIA	DAVINSON GRAVINI POLO	
RESIDENTE DE OBRA	BRAYAN CUAVAS SALCEDO		RESIDENTE DE INTERVENTORIA	ALEJANDRA SANCHEZ CERÓN	
CAPITULO	20.00		SUBCAPITULO	20.02.07	FECHA:
ITEM	20.02.07.04	DESCRIPCIÓN	TUBERIA ACERO NEGRO ROSCADA SCH 40		UNIDAD: ML

NO.	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL
	TUBERIA ACERO NEGRO ROSCADA SCH 40 1.1/2"	60						60.00
							TOTAL ACTIVIDAD	60.00
							ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR	
							TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS	60.00

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA

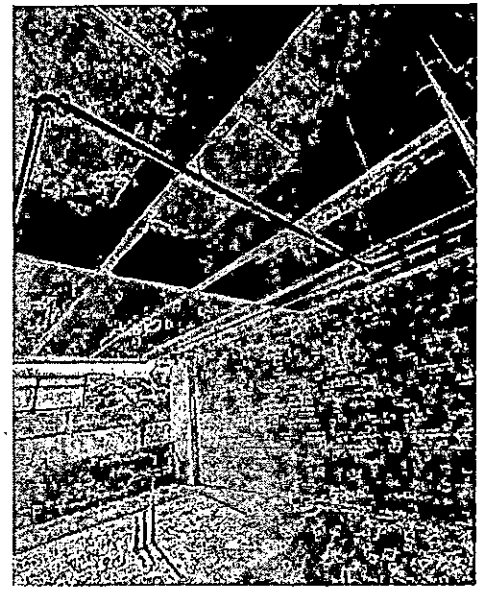

OBSERVACIONES

ELABORÓ	APROBÓ	REVISÓ
BRAYAN CUAVAS SALCEDO	RAFAEL CABRALES	ALEJANDRA SANCHEZ

Gobernación del MAGDALENA


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO:	
VERSIÓN:	
FECHA DE APROBACIÓN	
PÁGINA	1 DE 1

ACTA PARCIAL DE OBRA No.	6		PERIODO DE EJECUCIÓN	19 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2026	
CONTRATO DE OBRA No.			CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CI-1324-2025		
CONTRATISTA	Consorcio Centro Cambia	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA	CONTRATISTA	CONSORCIO AVANZA MAGDALENA 025	OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA
DIRECTOR DE OBRA	JESUS CERVANTES		DIRECTOR INTERVENTORIA	DAVINSON GRAVINI POLO	
RESIDENTE DE OBRA	BRAYAN CUAVAS SALCEDO		RESIDENTE DE INTERVENTORIA	ALEJANDRA SANCHEZ CERÓN	
CAPITULO	20.00		SUBCAPITULO	20.02.07	FECHA:
ITEM	20.02.07.05	DESCRIPCIÓN	TUBERIA ACERO NEGRO ROSCADA SCH 40		UNIDAD: ML

NO.	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL
	TUBERIA ACERO NEGRO ROSCADA SCH 40 1.1/4"	54						54.00
							TOTAL ACTIVIDAD	54.00
							ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR	
							TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS	54.00

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA

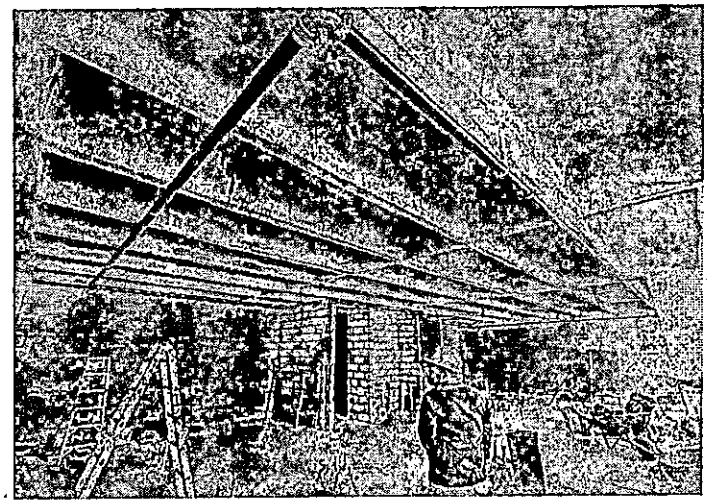

OBSERVACIONES

ELABORÓ	APROBÓ	REVISÓ
BRAYAN CUAVAS SALCEDO	RAFAEL CABRALES	ALEJANDRA SANCHEZ

Gobernación del MAGDALENA


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO:	
VERSIÓN:	
FECHA DE APROBACIÓN	
PÁGINA	1 DE 1

ACTA PARCIAL DE OBRA No.	6		PERIODO DE EJECUCIÓN	19 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2026	
CONTRATO DE OBRA No.				CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CI-1324-2025	
CONTRATISTA	Consorcio Centro Cambia	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA	CONTRATISTA	CONSORCIO AVANZA MAGDALENA 025	OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA
DIRECTOR DE OBRA	JESUS CERVANTES		DIRECTOR INTERVENTORIA	DAVINSON GRAVINI POLO	
RESIDENTE DE OBRA	BRAYAN CUAVAS SALCEDO		RESIDENTE DE INTERVENTORIA	ALEJANDRA SANCHEZ CERÓN	
CAPITULO	20.00		SUBCAPITULO	20.02.07	FECHA
ITEM	20.02.07.06	DESCRIPCIÓN: TUBERIA ACERO NEGRO ROSCADA SCH 40			UNIDAD: ML

No.	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL
	TUBERIA ACERO NEGRO ROSCADA SCH 40 1.1/4"	54						54.00
							TOTAL ACTIVIDAD	54.00
							ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR	
							TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS	54.00

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA

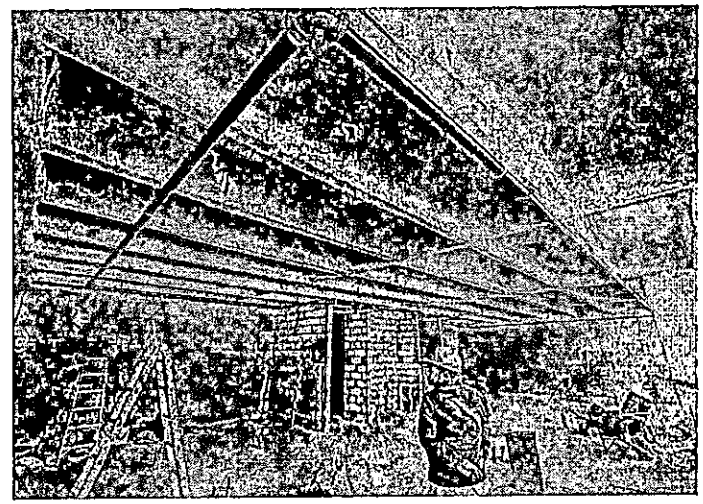

OBSERVACIONES

ELABORO	APROBÓ	REVISO
BRAYAN CUAVAS SALCEDO	RAFAEL GABRALES	ALEJANDRA SANCHEZ

Gobernación del MAGDALENA


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO:	
VERSIÓN:	
FECHA DE APROBACIÓN	
PÁGINA	1 DE 1

ACTA PARCIAL DE OBRA No.	6	PERIODO DE EJECUCIÓN	19 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2026		
CONTRATO DE OBRA No.			CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CI-1324-2025		
CONTRATISTA	Consorcio Centro Cambia	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA	CONTRATISTA	CONSORCIO AVANZA MAGDALENA 025	OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA
DIRECTOR DE OBRA	JESUS CERVANTES		DIRECTOR INTERVENTORIA	DAVINSON GRAVINI POLO	
RESIDENTE DE OBRA	BRAYAN CUAVAS SALCEDO		RESIDENTE DE INTERVENTORIA	ALEJANDRA SANCHEZ CERÓN	
CAPITULO	20.00		SUBCAPITULO	20.02.07	FECHA
ITEM	20.02.07.08	DESCRIPCIÓN	ACCESORIOS ACERO RANURADOS		UNIDAD: UN

NO.	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL
	ACCESORIOS ACERO RANURADOS 3"						10	10.00
	TOTAL ACTIVIDAD							10.00
	ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR							
	TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS							10.00

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA

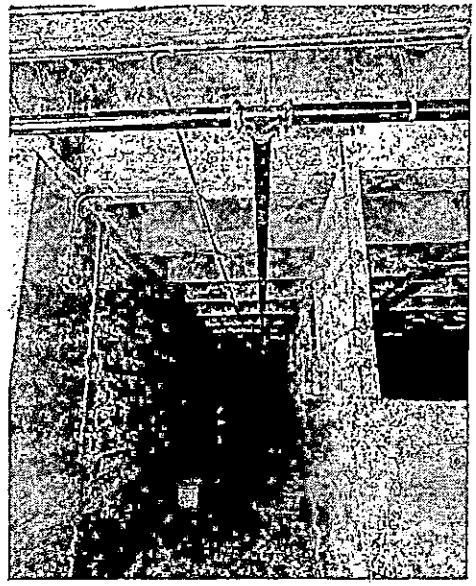

OBSERVACIONES

ELABORO	APROBÓ	REVISÓ
BRAYAN CUAVAS SALCEDO	RAFAEL CABRALES	ALEJANDRA SANCHEZ

Gobernación del MAGDALENA


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO:	
VERSIÓN:	
FECHA DE APROBACIÓN	
PÁGINA	1 DE 1

ACTA PARCIAL DE OBRA No.	6	PERIODO DE EJECUCIÓN	19 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2026		
CONTRATO DE OBRA No.			CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CI-1324-2025		
CONTRATISTA	Consorcio Centro Cambia	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA	CONTRATISTA	CONSORCIO AVANZA MAGDALENA 025	OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA
DIRECTOR DE OBRA	JESUS CERVANTES		DIRECTOR INTERVENTORIA	DAVINSON GRAVINI POLO	
RESIDENTE DE OBRA	BRAYAN CUAVAS SALCEDO		RESIDENTE DE INTERVENTORIA	ALEJANDRA SANCHEZ CERÓN	
CAPITULO:	20.00		SUBCAPITULO	20.02.07	FECHA:
ITEM	20.02.07.09	DESCRIPCIÓN	ACCESORIOS ACERO RANURADOS		UNIDAD: UN

NO.	DESCRIPCION	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL
	ACCESORIOS ACERO RANURADOS 2 1/2"						36	36.00
	TOTAL ACTIVIDAD							36.00
	ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR							
	TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS							36.00

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA

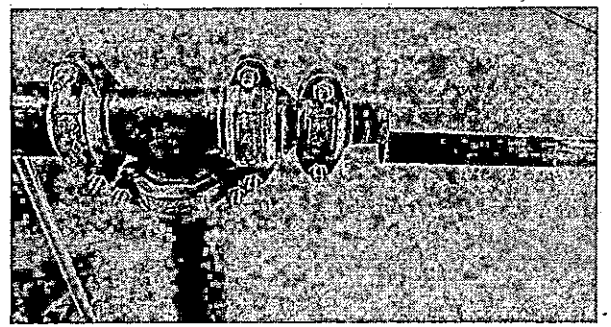

OBSERVACIONES

ELABORO	APROBÓ	REVISÓ
BRAYAN CUAVAS SALCEDO	RAFAEL CABRALES	ALEJANDRA SANCHEZ

Gobernación del MAGDALENA


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO:	
VERSIÓN:	
FECHA DE APROBACIÓN	
PÁGINA	1 DE 1

ACTA PARCIAL DE OBRA No	6	PERIODO DE EJECUCIÓN	19 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2026
CONTRATO DE OBRA No		CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CI-1324-2025	
CONTRATISTA	Consorcio Centro Cambia	CONTRATISTA	CONSORCIO AVANZA MAGDALENA 025
DIRECTOR DE OBRA	JESUS CERVANTES	DIRECTOR INTERVENTORIA	DAVINSON GRAVINI POLO
RESIDENTE DE OBRA	BRAYAN CUAVAS SALCEDO	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	ALEJANDRA SANCHEZ CERÓN
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA	OBJETO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA
CAPITULO	20.00	SUBCAPITULO	20.02.07
ITEM	20.02.07.10	FECHA	
DESCRIPCIÓN	ACCESORIOS ACERO RANURADOS	UNIDAD	UN

No.	DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL
	ACCESORIOS ACERO RANURADOS 2"						15	15.00
							TOTAL ACTIVIDAD	15.00
							ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR	
							TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS	15.00

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA

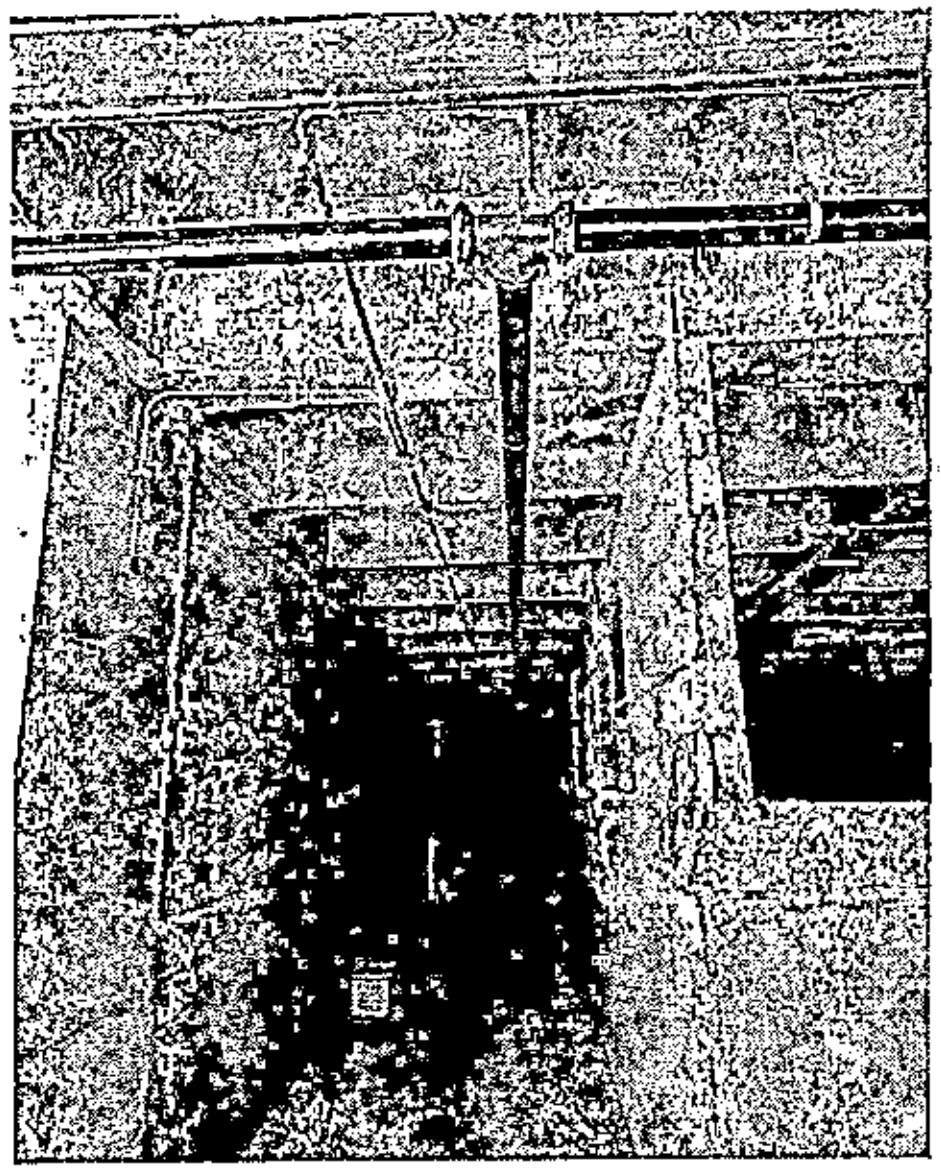

OBSERVACIONES

ELABORO	APROBÓ	REVISÓ
BRAYAN CUAVAS SALCEDO	RAFAEL CABRALES	ALEJANDRA SANCHEZ

Gobernación del MAGDALENA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO:	
VERSIÓN:	
FECHA DE APROBACIÓN	
PÁGINA	1 DE 1


ACTA PARCIAL DE OBRA No.	6	PERIODO DE EJECUCIÓN	19 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2026

CONTRATO DE OBRA No.			CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CI-1324-2025		
CONTRATISTA	Consorcio Centro Cambia	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA	CONTRATISTA	CONSORCIO AVANZA MAGDALENA 025	OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA
DIRECTOR DE OBRA	JESUS CERVANTES		DIRECTOR INTERVENTORIA	DAVINSON GRAVINI POLO	
RESIDENTE DE OBRA	BRAYAN CUAVAS SALCEDO		RESIDENTE DE INTERVENTORIA	ALEJANDRA SANCHEZ CERÓN	
CAPITULO:	20.00		SUBCAPITULO	20.02.07	FECHA:

ITEM	20.02.07.11	DESCRIPCIÓN	ACCESORIOS ACERO ROSCADOS	UNIDAD	UN

No.	DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL
	ACCESORIOS ACERO ROSCADOS 1.1/2"						15	15.00
							TOTAL ACTIVIDAD	15.00
							ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR	
							TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS	15.00

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA

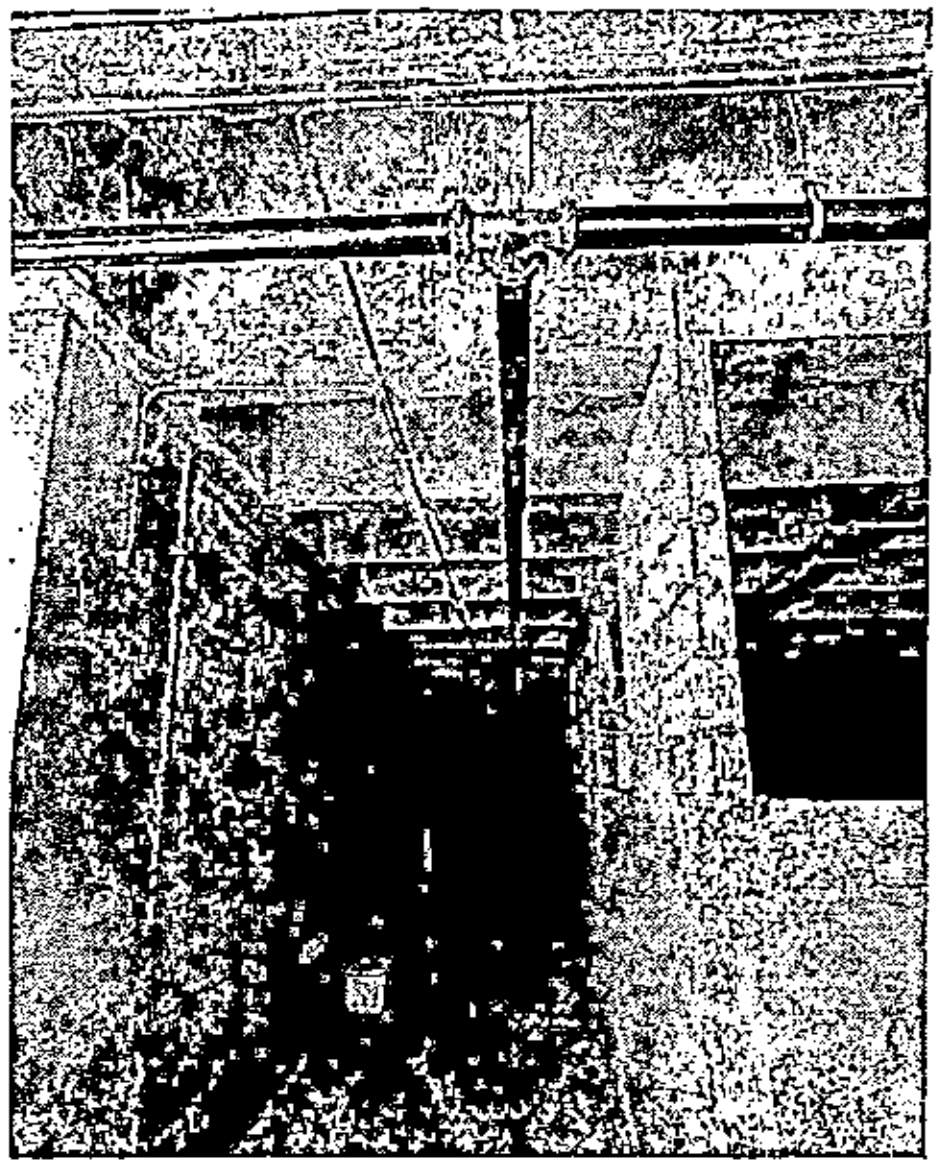

OBSERVACIONES

ELABORÓ	APROBÓ	REVISÓ
BRAYAN CUAVAS SALCEDO	RAFAEL CABRALES	ALEJANDRA SANCHEZ

Gobernación del MAGDALENA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO:	
VERSIÓN:	
FECHA DE APROBACIÓN	
PÁGINA	1 DE 1

ACTA PARCIAL DE OBRA No.	6	PERIODO DE EJECUCIÓN	19 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2026	
CONTRATO DE OBRA No.		CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CI-1324-2025		
CONTRATISTA	Consorcio Centro Cambia	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA	CONTRATISTA	CONSORCIO AVANZA MAGDALENA 025
DIRECTOR DE OBRA	JESUS CERVANTES		DIRECTOR INTERVENTORIA	DAVINSON GRAVINI POLO
RESIDENTE DE OBRA	BRAYAN CUAVAS SALCEDO		RESIDENTE DE INTERVENTORIA	ALEJANDRA SANCHEZ CERÓN
CAPITULO	20.00		SUBCAPITULO	20.02.07
ITEM	20.02.07.12	DESCRIPCIÓN	ACCESORIOS ACERO ROSCADOS	


OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA

FECHA:

UNIDAD: UN

No.	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES					CANTIDAD	TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN		
	ACCESORIOS ACERO ROSCADOS 1.1/4"						16	16.00
						TOTAL ACTIVIDAD		16.00
						ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR		
						TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS		16.00

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA

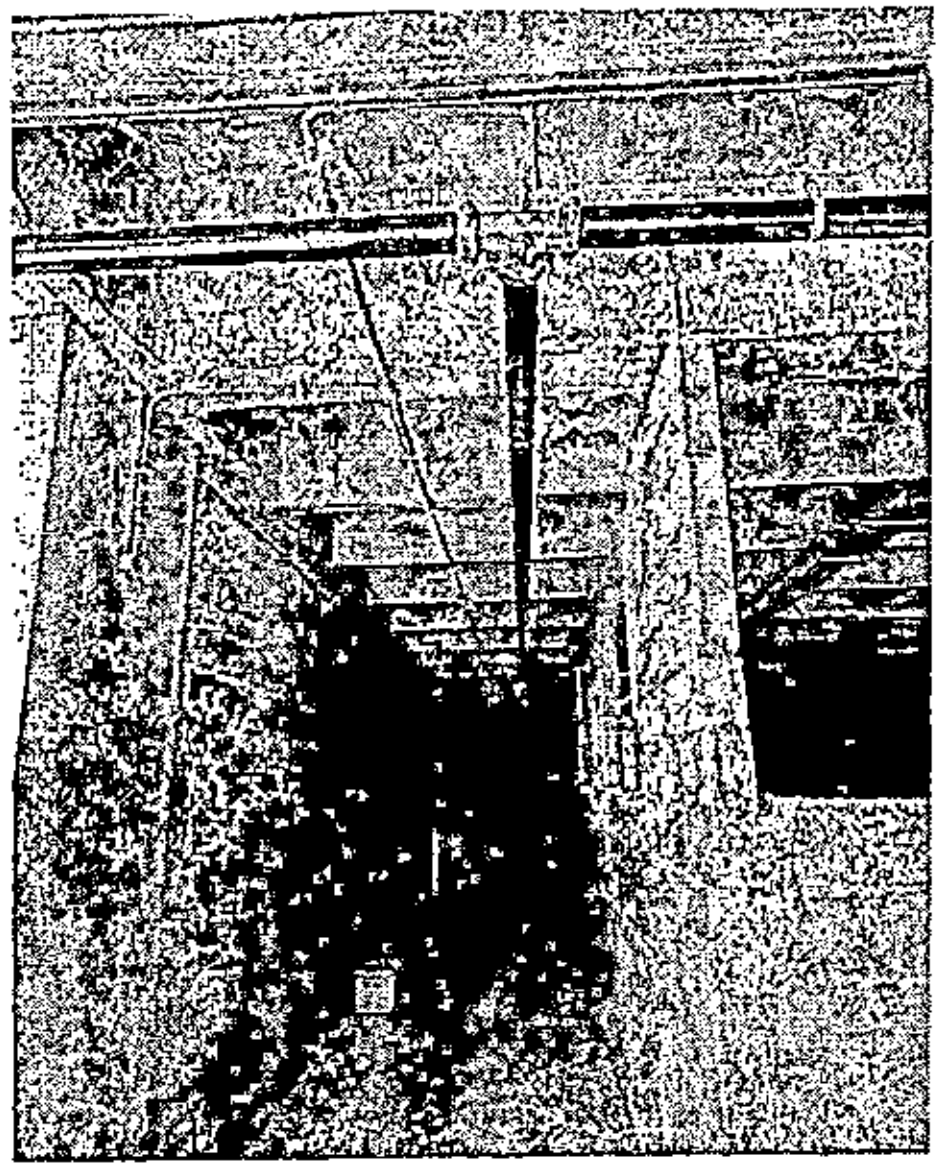

OBSERVACIONES

ELABORÓ	APROBÓ	REVISÓ
BRAYAN CUAVAS SALCEDO	RAFAEL CABRALES	ALEJANDRA SANCHEZ

Gobernación del MAGDALENA


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO:	
VERSIÓN:	
FECHA DE APROBACIÓN	
PÁGINA	1 DE 1

ACTA PARCIAL DE OBRA No.	6	PERIODO DE EJECUCIÓN	19 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2026
CONTRATO DE OBRA No.		CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	CI-1324-2025
CONTRATISTA	Consorcio Centro Cambia	CONTRATISTA	CONSORCIO AVANZA MAGDALENA 025
DIRECTOR DE OBRA	JESUS CERVANTES	DIRECTOR INTERVENTORIA	DAVINSON GRAVINI POLO
RESIDENTE DE OBRA	BRAYAN CUAVAS SALCEDO	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	ALEJANDRA SANCHEZ CERÓN
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA	OBJETO	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA
CAPITULO	20.00	SUBCAPITULO	20.02.07
		FECHA	
ITEM	20.02.07.13	DESCRIPCIÓN	ACCESORIOS ACERO ROSCADOS
		UNIDAD	UN

No.	DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL
	ACCESORIOS ACERO ROSCADOS 1"						32	32.00
							TOTAL ACTIVIDAD	32.00
							ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR	
							TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS	32.00

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA

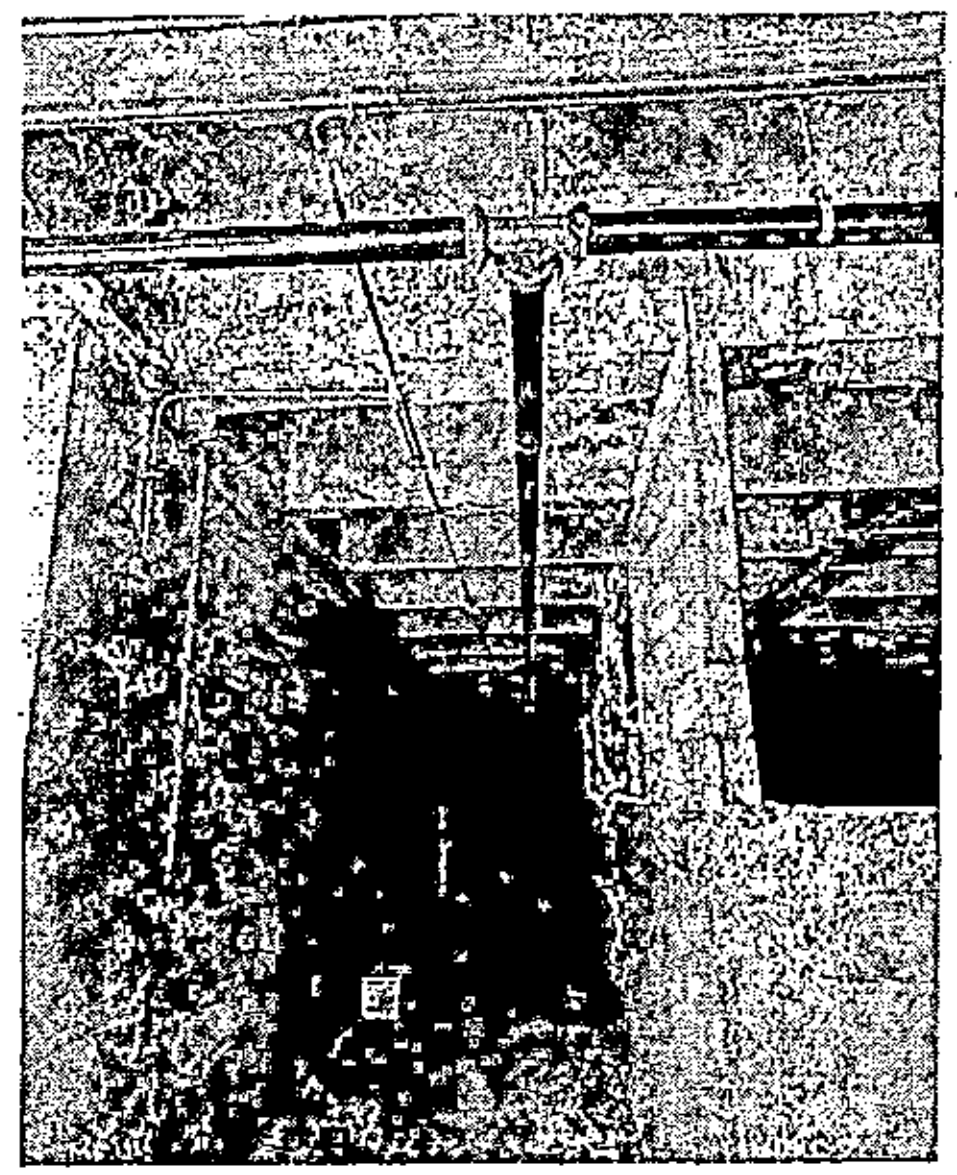

OBSERVACIONES

ELABORO	APROBO	REVISO
BRAYAN CUAVAS SALCEDO	RAFAEL CABRALES	ALEJANDRA SANCHEZ

Gobernación del
MAGDALENA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO:	
VERSIÓN:	
FECHA DE APROBACIÓN	
PÁGINA	1 DE 1

ACTA PARCIAL DE OBRA No.	6	PERIODO DE EJECUCIÓN	19 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2026
CONTRATO DE OBRA No.		CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CI-1324-2025	
CONTRATISTA	Consorcio Centro Cambia	CONTRATISTA	CONSORCIO AVANZA MAGDALENA 025
DIRECTOR DE OBRA	JESUS CERVANTES	DIRECTOR INTERVENTORIA	DAVINSON GRAVINI POLO
RESIDENTE DE OBRA	BRAYAN CUAVAS SALCEDO	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	ALEJANDRA SANCHEZ CERÓN
CAPITULO	20.00	SUBCAPITULO	20.02.07
ITEM	20.02.07.15	DESCRIPCIÓN	ABRAZADERAS UL/FM

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA


OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA

FECHA:

UNIDAD: UN

No	DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL
	ABRAZADERAS UL/FM 3"						23	23.00
							TOTAL ACTIVIDAD	23.00
							ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR	
							TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS	23.00

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA

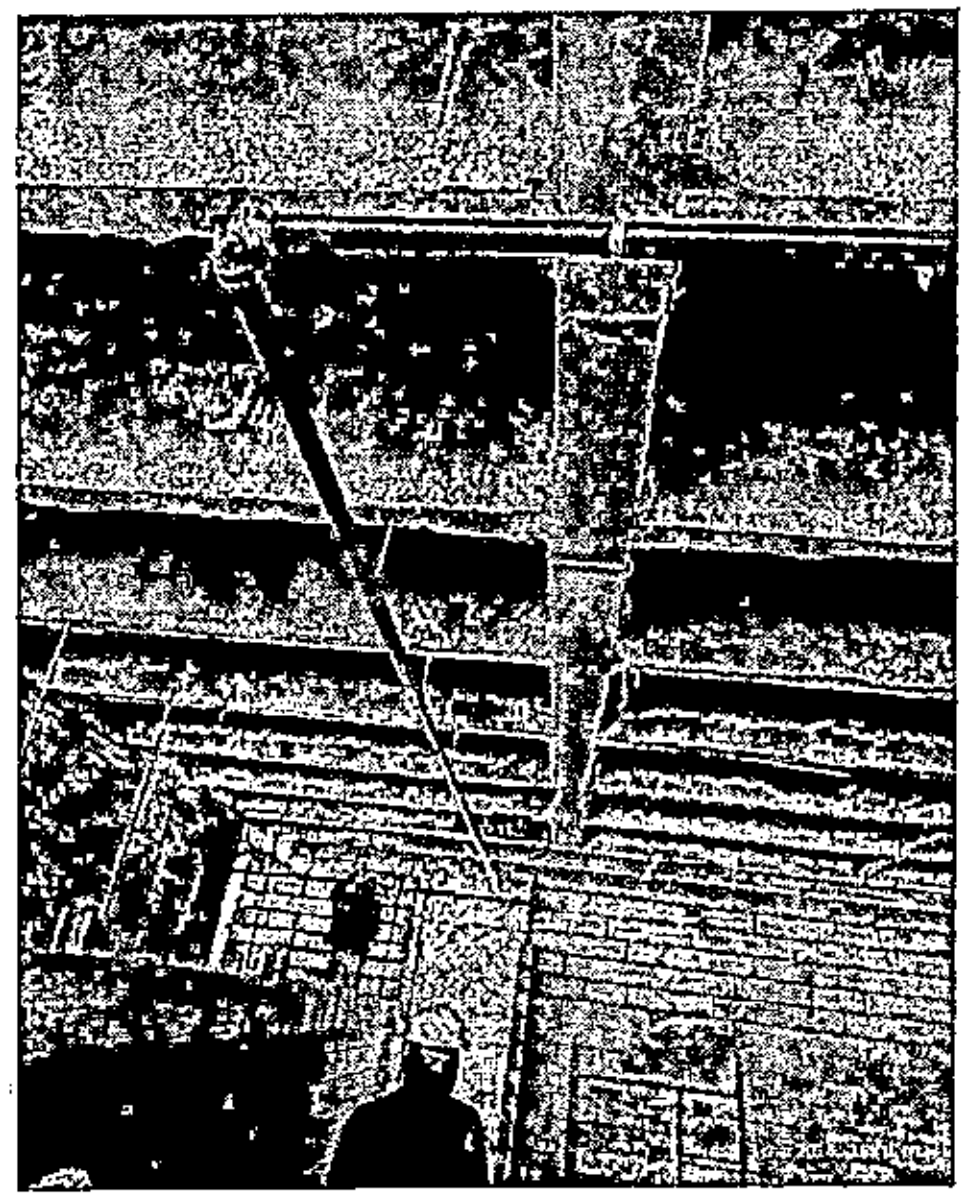

OBSERVACIONES

ELABORÓ	APROBÓ	REVISÓ
BRAYAN CUAVAS SALCEDO	RAFAEL CABRALES	ALEJANDRA SANCHEZ

Gobernación del MAGDALENA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO:	
VERSIÓN:	
FECHA DE APROBACIÓN	
PÁGINA	1 DE 1

ACTA PARCIAL DE OBRA No.	6	PERIODO DE EJECUCIÓN	19 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2026
CONTRATO DE OBRA No.		CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	CI-1324-2025
CONTRATISTA	Consorcio Centro Cambia	CONTRATISTA	CONSORCIO AVANZA MAGDALENA 025
DIRECTOR DE OBRA	JESUS CERVANTES	DIRECTOR INTERVENTORIA	DAVINSON GRAVINI POLO
RESIDENTE DE OBRA	BRAYAN CUAVAS SALCEDO	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	ALEJANDRA SANCHEZ CERÓN
CAPITULO	20.00	SUBCAPITULO	20.02.07
ITEM	20.02.07.16	DESCRIPCIÓN	ABRAZADERAS UL/FM

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA


OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA

FECHA:

UNIDAD: UN

No.	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL
	ABRAZADERAS UL/FM 3"						46	46.00
	TOTAL ACTIVIDAD							46.00
	ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR							
	TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS							46.00

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA

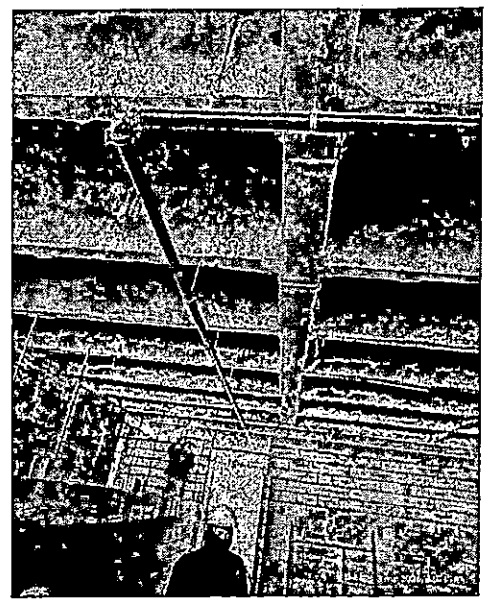

OBSERVACIONES

ELABORÓ	APROBÓ	REVISÓ
BRAYAN CUAVAS SALCEDO	RAFAEL CABRALES	ALEJANDRA SANCHEZ

Gobernación del MAGDALENA


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO:	
VERSIÓN:	
FECHA DE APROBACIÓN	
PÁGINA	1 DE 1

ACTA PARCIAL DE OBRA No.	6	PERIODO DE EJECUCIÓN	19 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2026		
CONTRATO DE OBRA No.				CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	CI-1324-2025
CONTRATISTA	Consorcio Centro Cambia	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA	CONTRATISTA	CONSORCIO AVANZA MAGDALENA 025	OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA
DIRECTOR DE OBRA	JESUS CERVANTES		DIRECTOR INTERVENTORIA	DAVINSON GRAVINI POLO	
RESIDENTE DE OBRA	BRAYAN CUAVAS SALCEDO		RESIDENTE DE INTERVENTORIA	ALEJANDRA SANCHEZ CERÓN	
CAPITULO	20,00		SUBCAPITULO	20.02.07	FECHA
ITEM	20.02.07.17	DESCRIPCIÓN: ABRAZADERAS UL/FM			UNIDAD: UN

NO.	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL
	ABRAZADERAS UL/FM 2"						10	10.00
	TOTAL ACTIVIDAD							10.00
	ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR							
	TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS							10.00

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA

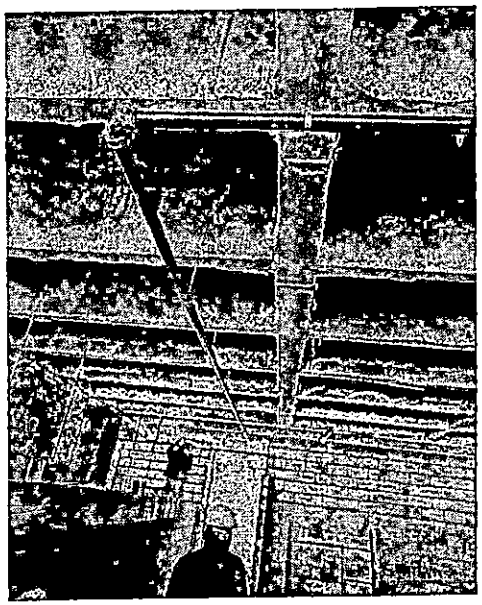

OBSERVACIONES

ELABORO	APROBO	REVISO
BRAYAN CUAVAS SALCEDO	RAFAEL CABRALES	ALEJANDRA SANCHEZ

Gobernación del MAGDALENA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA


CÓDIGO:	
VERSIÓN:	
FECHA DE APROBACIÓN	
PÁGINA	1 DE 1

ACTA PARCIAL DE OBRA No	6	PERÍODO DE EJECUCIÓN	19 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2026

CONTRATO DE OBRA No.			CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CI-1324-2025		
CONTRATISTA	Consorcio Centro Cambia	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA	CONTRATISTA	CONSORCIO AVANZA MAGDALENA 025	OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA
DIRECTOR DE OBRA	JESUS CERVANTES		DIRECTOR INTERVENTORIA	DAVINSON GRAVINI POLO	
RESIDENTE DE OBRA	BRAYAN CUAVAS SALCEDO		RESIDENTE DE INTERVENTORIA	ALEJANDRA SANCHEZ CERÓN	
CAPITULO	20.00		SUBCAPITULO	20.02.07	FECHA
ITEM	20.02.07.18	DESCRIPCIÓN	ABRAZADERAS UL/FM		UNIDAD: UN

No.	DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL
	ABRAZADERAS UL/FM 1.1/2"						30	30.00
							TOTAL ACTIVIDAD	30.00
							ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR	
							TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS	30.00

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA

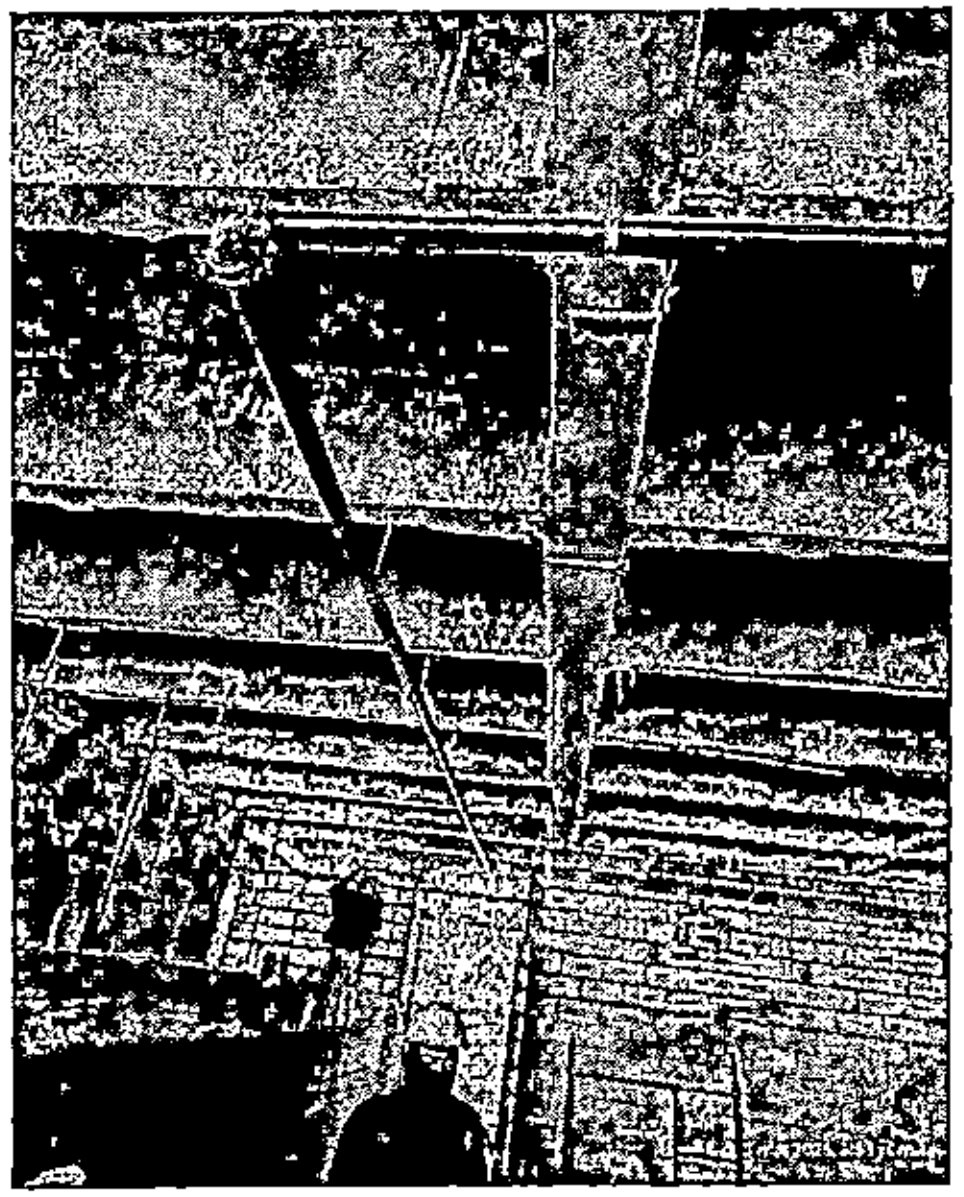

OBSERVACIONES

ELABORO	APROBÓ	REVISÓ
BRAYAN CUAVAS SALCEDO	RAFAEL CABRALES	ALEJANDRA SANCHEZ

Gobernación del MAGDALENA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO:	
VERSIÓN:	
FECHA DE APROBACIÓN	
PÁGINA	1 DE 1

ACTA PARCIAL DE OBRA No.	8	PERIODO DE EJECUCIÓN	19 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2026		
CONTRATO DE OBRA No.			CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CI-1324-2025		
CONTRATISTA	Consorcio Centro Cambia	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA	CONTRATISTA	CONSORCIO AVANZA MAGDALENA 025	OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA
DIRECTOR DE OBRA	JESUS CERVANTES		DIRECTOR INTERVENTORIA	DAVINSON GRAVINI POLO	
RESIDENTE DE OBRA	BRAYAN CUAVAS SALCEDO		RESIDENTE DE INTERVENTORIA	ALEJANDRA SANCHEZ CERÓN	
CAPITULO	20.00		SUBCAPITULO	20.02.07	FECHA
ITEM	20.02.07.19	DESCRIPCION	ABRAZADERAS UL/FM		UNIDAD: UN

NO.	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL
	ABRAZADERAS UL/FM 1.1/4"						27	27.00
	TOTAL ACTIVIDAD							27.00
	ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR							
	TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS							27.00

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA



OBSERVACIONES

ELABORÓ	APROBÓ	REVISÓ
BRAYAN CUAVAS SALCEDO	RAFAEL CABRALES	ALEJANDRA SANCHEZ

Gobernación del MAGDALENA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO:	
VERSIÓN:	
FECHA DE APROBACIÓN	
PÁGINA	1 DE 1

ACTA PARCIAL DE OBRA No.	6		PERIODO DE EJECUCIÓN	19 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2026	
CONTRATO DE OBRA No.			CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	CI-1324-2025	
CONTRATISTA	Consorcio Centro Cambia	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA	CONTRATISTA	CONSORCIO AVANZA MAGDALENA 025	OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA
DIRECTOR DE OBRA	JESUS CERVANTES		DIRECTOR INTERVENTORIA	DAVINSON GRAVINI POLO	
RESIDENTE DE OBRA	BRAYAN CUAVAS SALCEDO		RESIDENTE DE INTERVENTORIA	ALEJANDRA SANCHEZ CERÓN	
CAPITULO	20.00		SUBCAPITULO	20.02.07	FECHA
ITEM 20.02.07.20	DESCRIPCIÓN	ABRAZADERAS UL/FM			UNIDAD UN

NO.	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL
	ABRAZADERAS UL/FM 1"						20	20.00
	TOTAL ACTIVIDAD							20.00
	ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR							
	TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS							20.00

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA



OBSERVACIONES

ELABORO	APROBO	REVISO
BRAYAN CUAVAS SALCEDO	RAFAEL CABRALES	ALEJANDRA SANCHEZ

Gobernación del MAGDALENA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO:	
VERSIÓN:	
FECHA DE APROBACIÓN	
PÁGINA	1 DE 1

ACTA PARCIAL DE OBRA No.	6		PERIODO DE EJECUCIÓN	19 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2026	
CONTRATO DE OBRA No.			CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	GI-1324-2025	
CONTRATISTA	Consorcio Centro Cambia	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA	CONTRATISTA	CONSORCIO AVANZA MAGDALENA 025	OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA
DIRECTOR DE OBRA	JESUS CERVANTES		DIRECTOR INTERVENTORIA	DAVINSON GRAVINI POLO	
RESIDENTE DE OBRA	BRAYAN CUAVAS SALCEDO		RESIDENTE DE INTERVENTORIA	ALEJANDRA SANCHEZ CERÓN	
CAPITULO	20.00		SUBCAPITULO	20.02.07	FECHA
ITEM	20.02.07.21	DESCRIPCIÓN: COUPLING			UNIDAD: UN

ITEM	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
	COUPLING 3"				23	23.00

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA



TOTAL ACTIVIDAD	23.00
ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR	
TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS	23.00

OBSERVACIONES


ELABORÓ	APROBÓ	REVISÓ
BRAYAN CUAVAS SALCEDO	RAFAEL CABRALES	ALEJANDRA SANCHEZ

Gobernación del MAGDALENA	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	CÓDIGO:	
		VERSIÓN:	
		FECHA DE APROBACIÓN	
		PÁGINA	1 DE 1

ACTA PARCIAL DE OBRA No.	6	PERIODO DE EJECUCIÓN	19 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2026		
CONTRATO DE OBRA No.			CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CI-1324-2025		
CONTRATISTA	Consorcio Centro Cambia	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA	CONTRATISTA	CONSORCIO AVANZA MAGDALENA 025	OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA
DIRECTOR DE OBRA	JESUS CERVANTES		DIRECTOR INTERVENTORIA	DAVINSON GRAVINI POLO	
RESIDENTE DE OBRA	BRAYAN CUAVAS SALCEDO		RESIDENTE DE INTERVENTORIA	ALEJANDRA SANCHEZ CERÓN	
CAPITULO	20.00		SUBCAPITULO	20.02.07	FECHA
ITEM	20.02.07.22	DESCRIPCIÓN: COUPLING		UNIDAD	UN

No	DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL
	COUPLING 2 1/2"						59	59.00
							TOTAL ACTIVIDAD	59.00
							ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR	
							TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS	59.00

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA

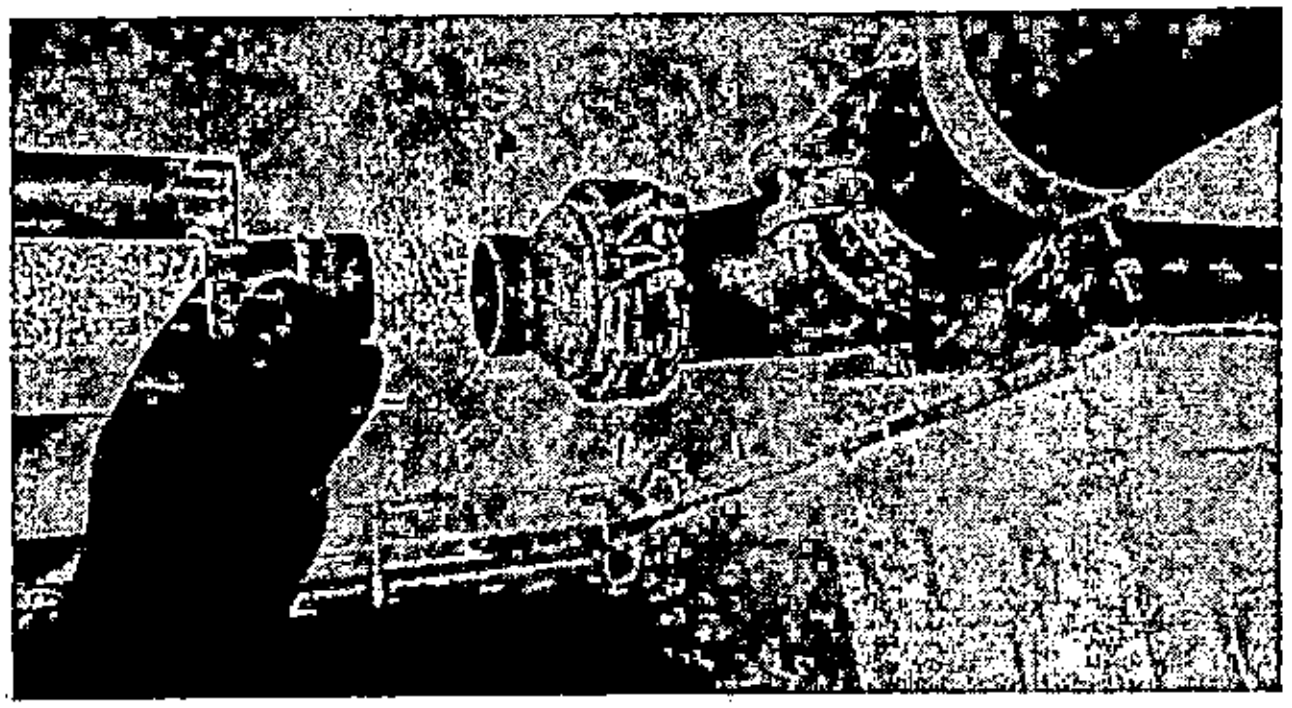

OBSERVACIONES

ELABORO	APROBÓ	REVISÓ
BRAYAN CUAVAS SALCEDO	RAFAEL CABRALES	ALEJANDRA SANCHEZ
Brayan Cuavas		

Gobernación del **MAGDALENA**


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO:	
VERSIÓN:	
FECHA DE APROBACIÓN	
PÁGINA	1 DE 1

ACTA PARCIAL DE OBRA No.	6	PERIODO DE EJECUCIÓN	19 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2026		
CONTRATO DE OBRA No.			CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CI-1324-2025		
CONTRATISTA	Consorcio Centro Cambia	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA	CONTRATISTA	CONSORCIO AVANZA MAGDALENA 025	OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA
DIRECTOR DE OBRA	JESUS CERVANTES		DIRECTOR INTERVENTORIA	DAVINSON GRAVINI POLO	
RESIDENTE DE OBRA	BRAYAN CUAVAS SALCEDO		RESIDENTE DE INTERVENTORIA	ALEJANDRA SANCHEZ CERÓN	
CAPITULO	20.00		SUBCAPITULO	20.02.07	FECHA
ITEM	20.02.07.23	DESCRIPCIÓN	COUPLING		UNIDAD: UN

No.	DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL
	COUPLING 2"						29	29.00

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA

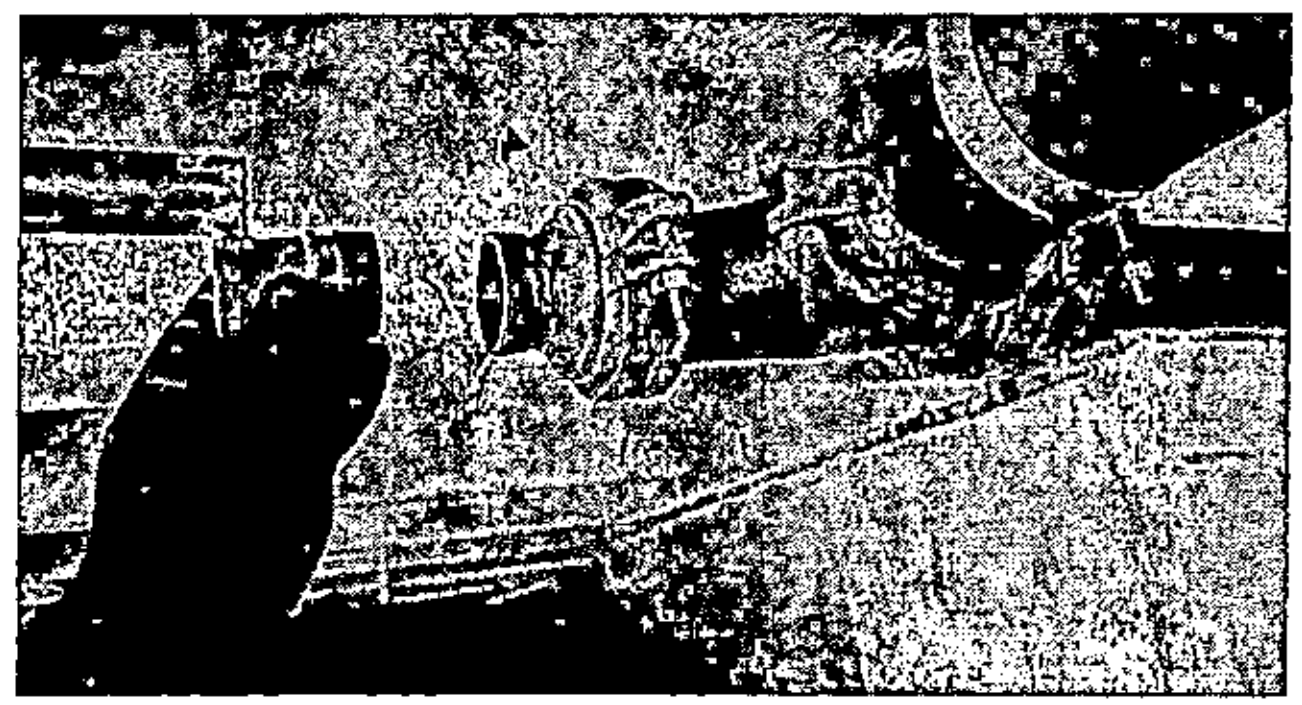

TOTAL ACTIVIDAD	29.00
ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR	
TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS	29.00

OBSERVACIONES

ELABORÓ	APROBÓ	REVISÓ
BRAYAN CUAVAS SALCEDO	RAFAEL CABRALES	ALEJANDRA SANCHEZ


Gobernación del MAGDALENA	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	CÓDIGO:	
		VERSIÓN:	
		FECHA DE APROBACIÓN	
		PÁGINA	1 DE 1

ACTA PARCIAL DE OBRA No.	6	PERIODO DE EJECUCIÓN	19 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2026
CONTRATO DE OBRA No.		CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	CI-1324-2025

CONTRATISTA	Consorcio Centro Cambia	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA	CONTRATISTA	CONSORCIO AVANZA MAGDALENA 025	OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA
DIRECTOR DE OBRA	JESUS CERVANTES		DIRECTOR INTERVENTORIA	DAVINSON GRAVINI POLO	
RESIDENTE DE OBRA	BRAYAN CUAVAS SALCEDO		RESIDENTE DE INTERVENTORIA	ALEJANDRA SANCHEZ CERÓN	
CAPITULO	20.00		SUBCAPITULO	20.02.07	FECHA
ITEM	20.02.07.25	DESCRIPCIÓN	STRAP 3"x1"	UNIDAD	UN

No.	DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL
	STRAP 3"x1"						18	18.00
							TOTAL ACTIVIDAD	18.00
							ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR	
							TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS	18.00

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA

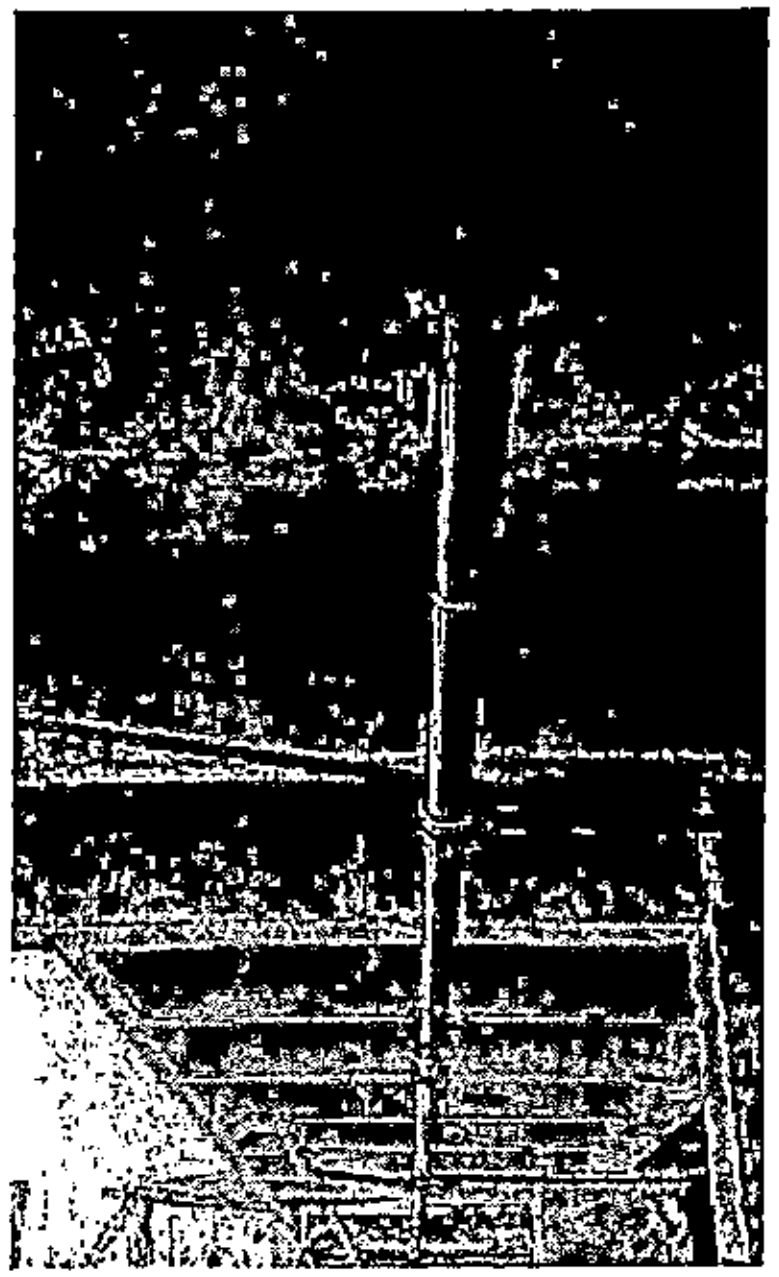

OBSERVACIONES

ELABORO	APROBÓ	REVISÓ
BRAYAN CUAVAS SALCEDO	RAFAEL CABRALES	ALEJANDRA SANCHEZ
Brayan Cuavas (firma)	(firma)	(firma)

Gobernación del MAGDALENA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO:	
VERSIÓN:	
FECHA DE APROBACIÓN	
PÁGINA	1 DE 1

ACTA PARCIAL DE OBRA No	6	PERIODO DE EJECUCIÓN	19 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2026

CONTRATO DE OBRA No.

CONTRATISTA	Consorcio Centro Cambia	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA
DIRECTOR DE OBRA	JESUS CERVANTES	
RESIDENTE DE OBRA	BRAYAN CUAVAS SALCEDO	
CAPITULO	20.00	


CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CI-1324-2025

CONTRATISTA	CONSORCIO AVANZA MAGDALENA 025	OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA
DIRECTOR INTERVENTORIA	DAVINSON GRAVINI POLO	
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	ALEJANDRA SANCHEZ CERÓN	
SUBCAPITULO	20.02.07	FECHA

ITEM	20.02.07.26	DESCRIPCIÓN	STRAP 2½"x1"	UNIDAD	UN

No	DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL
	STRAP 2½"x1"						23	23.00
							TOTAL ACTIVIDAD	23.00
							ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR	
							TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS	23.00

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA

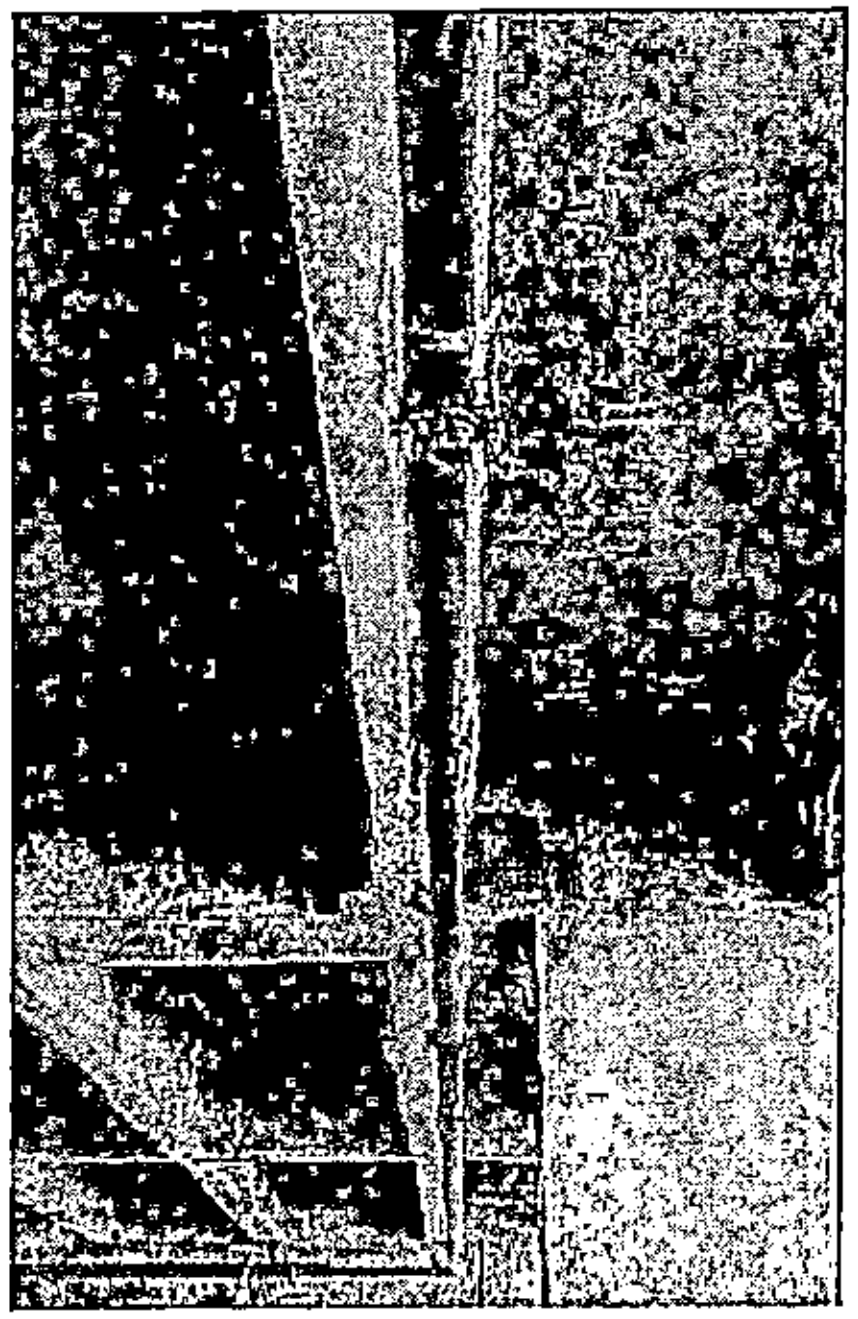

OBSERVACIONES

ELABORÓ	APROBÓ	REVISÓ
BRAYAN CUAVAS SALCEDO	RAFAEL CABRALES	ALEJANDRA SANCHEZ
[signature]	[signature]	[signature]

Gobernación del MAGDALENA


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO:	
VERSIÓN:	
FECHA DE APROBACIÓN	
PÁGINA	1 DE 1

ACTA PARCIAL DE OBRA No.	6		PERIODO DE EJECUCIÓN	19 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2026	
CONTRATO DE OBRA No.			CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	CI-1324-2025	
CONTRATISTA	Consorcio Centro Cambia	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA	CONTRATISTA	CONSORCIO AVANZA MAGDALENA 025	OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA
DIRECTOR DE OBRA	JESUS CERVANTES		DIRECTOR INTERVENTORIA	DAVINSON GRAVINI POLO	
RESIDENTE DE OBRA	BRAYAN CUAVAS SALCEDO		RESIDENTE DE INTERVENTORIA	ALEJANDRA SANCHEZ CERÓN	
CAPITULO	20.00		SUBCAPITULO	20.02.07	FECHA
ITEM	20.02.07.27	DESCRIPCIÓN: STRAP 2"x1"			UNIDAD: UN

NO.	DESCRIPCIÓN	U.	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL
	STRAP 2"x1"							8	8.00
								TOTAL ACTIVIDAD	8.00
								ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR	
								TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS	8.00

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA

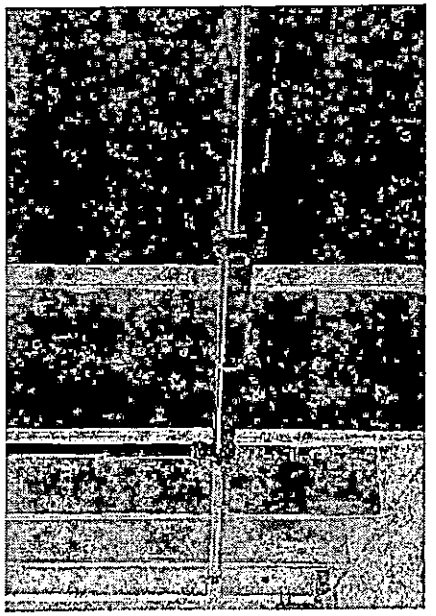

OBSERVACIONES

ELABORO	APROBÓ	REVISÓ
BRAYAN CUAVAS SALCEDO	RAFAEL CABRALES	ALEJANDRA SANCHEZ

Gobernación del MAGDALENA


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO:	
VERSIÓN:	
FECHA DE APROBACIÓN	
PÁGINA	1 DE 1

ACTA PARCIAL DE OBRA No.	6	PERIODO DE EJECUCIÓN	19 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2026		
CONTRATO DE OBRA No.			CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CI-1324-2025		
CONTRATISTA	Consorcio Centro Cambia	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA	CONTRATISTA	CONSORCIO AVANZA MAGDALENA 025	OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA
DIRECTOR DE OBRA	JESUS CERVANTES		DIRECTOR INTERVENTORIA	DAVINSON GRAVINI POLO	
RESIDENTE DE OBRA	BRAYAN CUAVAS SALCEDO		RESIDENTE DE INTERVENTORIA	ALEJANDRA SANCHEZ CERÓN	
CAPITULO	20.00		SUBCAPITULO	20.02.07	FECHA
ITEM No.	20.02.07.28	DESCRIPCIÓN: STRAP 1,1/2"x1"			UNIDAD: UN

NO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL
	STRAP 1,1/2"x1"						19	19.00
	TOTAL ACTIVIDAD							19.00
	ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR							
	TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS							19.00

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA

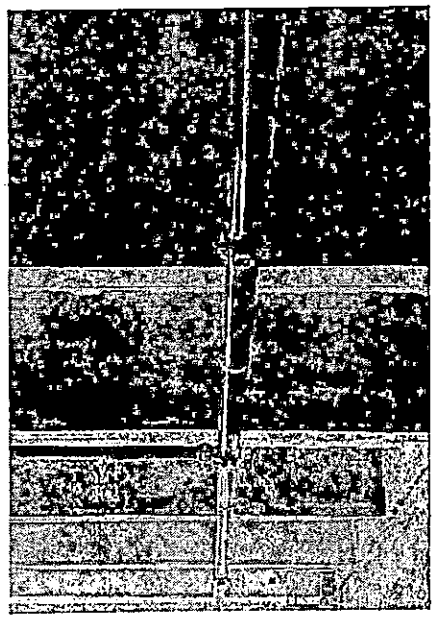

OBSERVACIONES

ELABORÓ	APROBÓ	REVISÓ
BRAYAN CUAVAS SALCEDO	RAFAEL CABRALES	ALEJANDRA SANCHEZ

Gobernación del **MAGDALENA**

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO:	
VERSIÓN:	
FECHA DE APROBACIÓN	
PÁGINA	1 DE 1


ACTA PARCIAL DE OBRA No.	6	PERIODO DE EJECUCIÓN	19 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2026
CONTRATO DE OBRA No.		CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	CI-1324-2025
CONTRATISTA	Consorcio Centro Cambia	CONTRATISTA	CONSORCIO AVANZA MAGDALENA 025
DIRECTOR DE OBRA	JESUS CERVANTES	DIRECTOR INTERVENTORIA	DAVINSON GRAVINI POLO
RESIDENTE DE OBRA	BRAYAN CUAVAS SALCEDO	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	ALEJANDRA SANCHEZ CERÓN
CAPITULO	20.00	SUBCAPITULO	20.02.07
ITEM	20.02.07.29	DESCRIPCIÓN	STRAP 1,1/4"x1"
FECHA		UNIDAD	UN

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA

OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA

No.	DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL
	STRAP 1,1/4"x1"						15	15.00
							TOTAL ACTIVIDAD	15.00
							ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR	
							TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS	15.00

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA

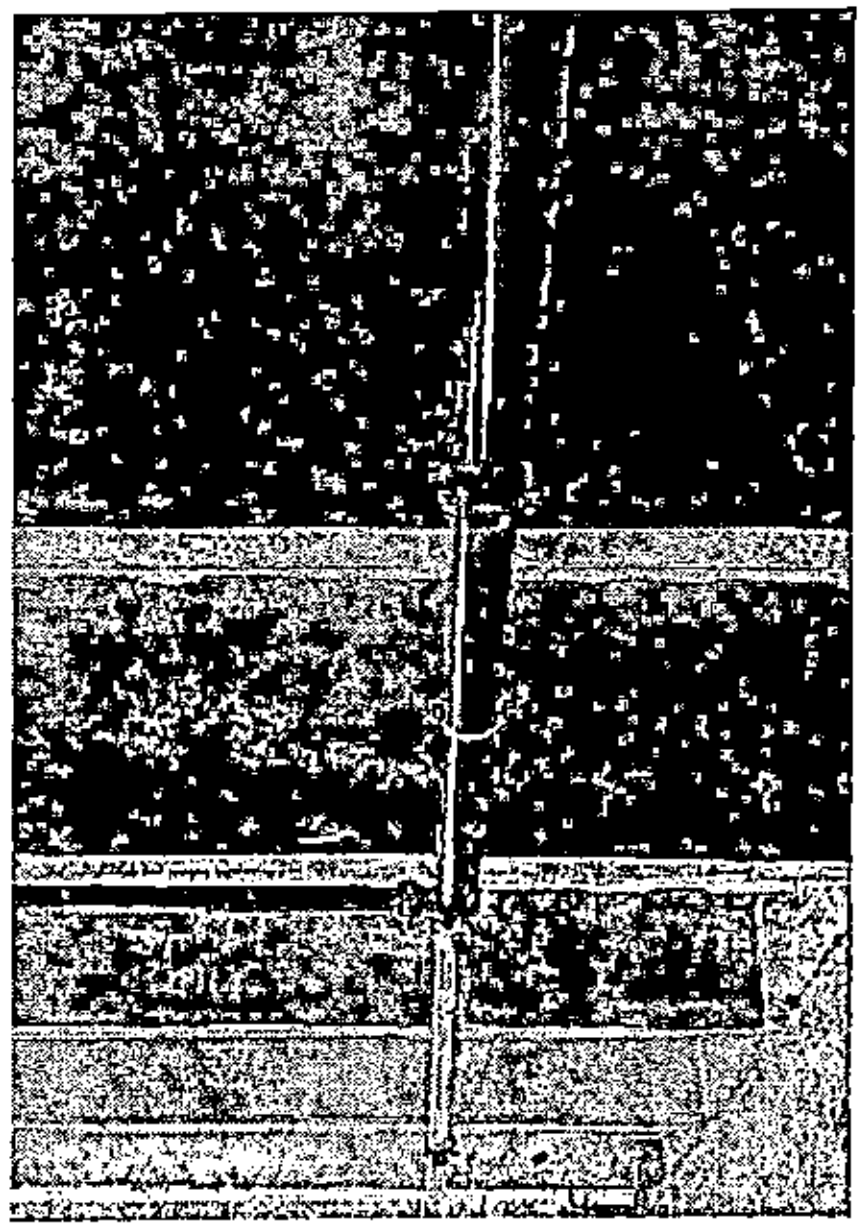

OBSERVACIONES

ELABORO	APROBÓ	REVISÓ
BRAYAN CUAVAS SALCEDO	RAFAEL CABRALES	ALEJANDRA SANCHEZ
[firma]	[firma]	[firma]

Gobernación del MAGDALENA


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO:	
VERSIÓN:	
FECHA DE APROBACIÓN	
PÁGINA	1 DE 1

ACTA PARCIAL DE OBRA No.	6	PERIODO DE EJECUCIÓN	19 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2026
CONTRATO DE OBRA No.		CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CI-1324-2025	
CONTRATISTA	Consorcio Centro Cambia	CONTRATISTA	CONSORCIO AVANZA MAGDALENA 025
DIRECTOR DE OBRA	JESUS CERVANTES	DIRECTOR INTERVENTORIA	DAVINSON GRAVINI POLO
RESIDENTE DE OBRA	BRAYAN CUAVAS SALCEDO	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	ALEJANDRA SANCHEZ CERÓN
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA		OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA	
CAPITULO	20.00	SUBCAPITULO	20.02.10
ITEM	20.02.10.03	DESCRIPCIÓN	TUBERIA PVC-S
		UNIDAD	ML

ITEM No.	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL
	TUBERIA PVC-S 3"	33.17						33.17
	Tubería interna.							
							TOTAL ACTIVIDAD	33.17
							ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR	
							TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS	33.17

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA



OBSERVACIONES

ELABORÓ	APROBÓ	REVISÓ
BRAYAN CUAVAS SALCEDO	RAFAEL CABRALES	ALEJANDRA SANCHEZ

Gobernación del MAGDALENA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO:	
VERSIÓN:	
FECHA DE APROBACIÓN	
PÁGINA	1 DE 1

ACTA PARCIAL DE OBRA No.	6	PERIODO DE EJECUCIÓN	19 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2026		
CONTRATO DE OBRA No.			CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CI-1324-2025		
CONTRATISTA	Consorcio Centro Cambia	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA	CONTRATISTA	CONSORCIO AVANZA MAGDALENA 025	OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA
DIRECTOR DE OBRA	JESUS CERVANTES		DIRECTOR INTERVENTORIA	DAVINSON GRAVINI POLO	
RESIDENTE DE OBRA	BRAYAN CUAVAS SALCEDO		RESIDENTE DE INTERVENTORIA	ALEJANDRA SANCHEZ CERÓN	
CAPITULO	20.00		SUBCAPITULO	20.02.10	FECHA
ITEM	20.02.10.04	DESCRIPCIÓN	TUBERIA PVC-S		UNIDAD: ML


No.	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL
	TUBERIA PVC-S 2"	23.74						23.74
	Tubería interna.							

TOTAL ACTIVIDAD 23.74

ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR

TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS 23.74

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA

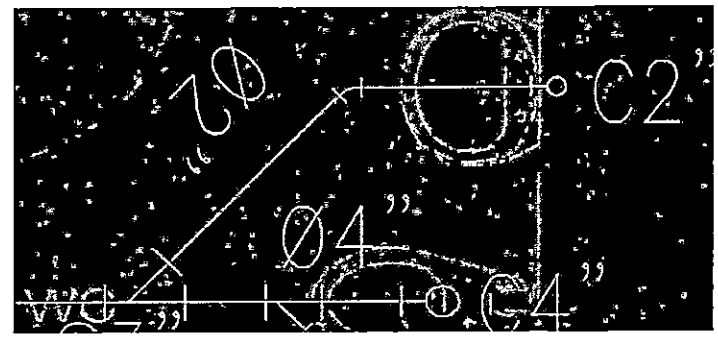

OBSERVACIONES

ELABORÓ	APROBÓ	REVISÓ
BRAYAN CUAVAS SALCEDO	RAFAEL CABRALES	ALEJANDRA SANCHEZ

Gobernación del MAGDALENA


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO:	
VERSIÓN:	
FECHA DE APROBACIÓN	
PÁGINA	1 DE 1

ACTA PARCIAL DE OBRA No.	6	PERIODO DE EJECUCIÓN	19 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2026		
CONTRATO DE OBRA No.			CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CI 1324-2025		
CONTRATISTA	Consorcio Centro Cambia	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA	CONTRATISTA	CONSORCIO AVANZA MAGDALENA 025	OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA
DIRECTOR DE OBRA	JESUS CERVANTES		DIRECTOR INTERVENTORIA	DAVINSON GRAVINI POLO	
RESIDENTE DE OBRA	BRAYAN CUAVAS SALCEDO		RESIDENTE DE INTERVENTORIA	ALEJANDRA SANCHEZ CERÓN	
CAPITULO	20.00		SUBCAPITULO	20.02.10	FECHA
ITEM	20.02.10.05	DESCRIPCIÓN	TUBERIA PVC-L		UNIDAD: ML

No.	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL
	TUBERIA PVC-L 3"	45						45.00
							TOTAL ACTIVIDAD	45.00
							ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR	
							TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS	45.00

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA

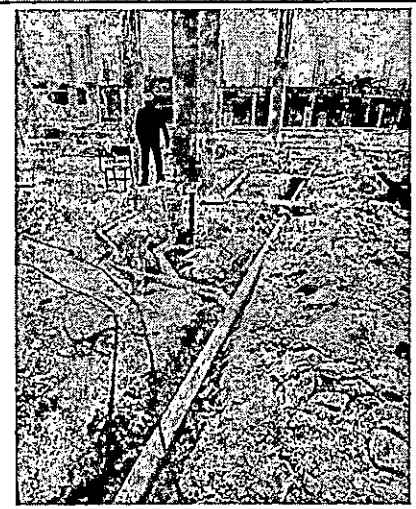

OBSERVACIONES

ELABORO	APROBÓ	REVISÓ
BRAYAN CUAVAS SALCEDO	RAFAEL CABRALES	ALEJANDRA SANCHEZ

Gobernación del MAGDALENA


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO:	
VERSIÓN:	
FECHA DE APROBACIÓN	
PÁGINA	1 DE 1

ACTA PARCIAL DE OBRA No.	6	PERIODO DE EJECUCIÓN	19 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2026		
CONTRATO DE OBRA No.			CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CI-1324-2025		
CONTRATISTA	Consorcio Centro Cambia	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA	CONTRATISTA	CONSORCIO AVANZA MAGDALENA 025	OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA
DIRECTOR DE OBRA	JESUS CERVANTES		DIRECTOR INTERVENTORIA	DAVINSON GRAVINI POLO	
RESIDENTE DE OBRA	BRAYAN CUAVAS SALCEDO		RESIDENTE DE INTERVENTORIA	ALEJANDRA SANCHEZ CERÓN	
CAPITULO	20.00		SUBCAPITULO	20.02.10	FECHA
ITEM	20.02.10.06	DESCRIPCIÓN: TUBERIA PVC-L			UNIDAD: ML

No.	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL
	TUBERIA PVC-L 2"	8.06						8.06
	Tubería interna.							
							TOTAL ACTIVIDAD	8.06
							ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR	
							TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS	8.06

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA

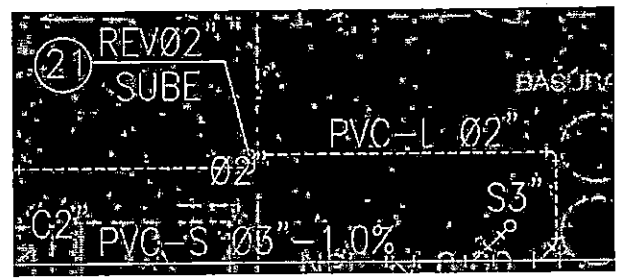

OBSERVACIONES

ELABORÓ	APROBÓ	REVISÓ
BRAYAN CUAVAS SALCEDO	RAFAEL CABRALES	ALEJANDRA SANCHEZ

Gobernación del
MAGDALENA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO:	
VERSIÓN:	
FECHA DE APROBACIÓN	
PÁGINA	1 DE 1

ACTA PARCIAL DE OBRA No.	6	PERIODO DE EJECUCIÓN	19 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2026

CONTRATO DE OBRA No.

CONTRATISTA	Consorcio Centro Cambia	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA
DIRECTOR DE OBRA	JESUS CERVANTES	
RESIDENTE DE OBRA	BRAYAN CUAVAS SALCEDO	
CAPITULO	20.00	

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CI-1324-2025

CONTRATISTA	CONSORCIO AVANZA MAGDALENA 025	OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA
DIRECTOR INTERVENTORIA	DAVINSON GRAVINI POLO	
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	ALEJANDRA SANCHEZ CERÓN	
SUBCAPITULO	20.02.10	
FECHA		

ITEM	20.02.10.21	DESCRIPCIÓN	PASE EN VIGA L:40 CM	UNIDAD	UN

No.	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL
	PASE EN VIGA L:40 CM 3"						3	3,00
							TOTAL ACTIVIDAD	3,00
							ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR	
							TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS	3,00

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA

OBSERVACIONES

ELABORÓ	APROBÓ	REVISÓ
BRAYAN CUAVAS SALCEDO	RAFAEL CABRALES	ALEJANDRA SÁNCHEZ

Gobernación del MAGDALENA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO:	
VERSIÓN:	
FECHA DE APROBACIÓN	
PÁGINA	1 DE 1

ACTA PARCIAL DE OBRA No.	6	PERIODO DE EJECUCIÓN	19 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2026
CONTRATO DE OBRA No.		CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CI-1324-2025	
CONTRATISTA	Consorcio Centro Cambia	CONTRATISTA	CONSORCIO AVANZA MAGDALENA 025
DIRECTOR DE OBRA	JESUS CERVANTES	DIRECTOR INTERVENTORIA	DAVINSON GRAVINI POLO
RESIDENTE DE OBRA	BRAYAN CUAVAS SALCEDO	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	ALEJANDRA SANCHEZ CERÓN
CAPITULO	20.00	SUBCAPITULO	20.02.15
ITEM	20.02.15.01	DESCRIPCIÓN	PRUEBAS DE BAJANTES
FECHA		UNIDAD	GLB

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA

OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA

No.	DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL
	PRUEBAS DE BAJANTES						1	1.00
							TOTAL ACTIVIDAD	1.00
							ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR	
							TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS	1.00

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA



OBSERVACIONES

ELABORO	APROBÓ	REVISÓ
BRAYAN CUAVAS SALCEDO	RAFAEL CABRALES	ALEJANDRA SANCHEZ

Gobernación del MAGDALENA


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO:	
VERSIÓN:	
FECHA DE APROBACIÓN	
PÁGINA	1 DE 1

ACTA PARCIAL DE OBRA No.	6		PERIODO DE EJECUCIÓN	19 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2026	
CONTRATO DE OBRA No.			CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CI-1324-2025		
CONTRATISTA	Consorcio Centro Cambia	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA	CONTRATISTA	CONSORCIO AVANZA MAGDALENA 025	OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA
DIRECTOR DE OBRA	JESUS CERVANTES		DIRECTOR INTERVENTORIA	DAVINSON GRAVINI POLO	
RESIDENTE DE OBRA	BRAYAN CUAVAS SALCEDO		RESIDENTE DE INTERVENTORIA	ALEJANDRA SANCHEZ CERÓN	
CAPITULO	20.00		SUBCAPITULO	20.03.01	FECHA
ITEM	20.03.01.01	DESCRIPCIÓN: TUBERIA PVC-P			UNIDAD: ML

NO.	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	No. CANTIDAD	TOTAL
	TUBERIA PVC-P 2"	40						40.00
	TOTAL ACTIVIDAD							40.00
	ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR							
	TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS							40.00

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA

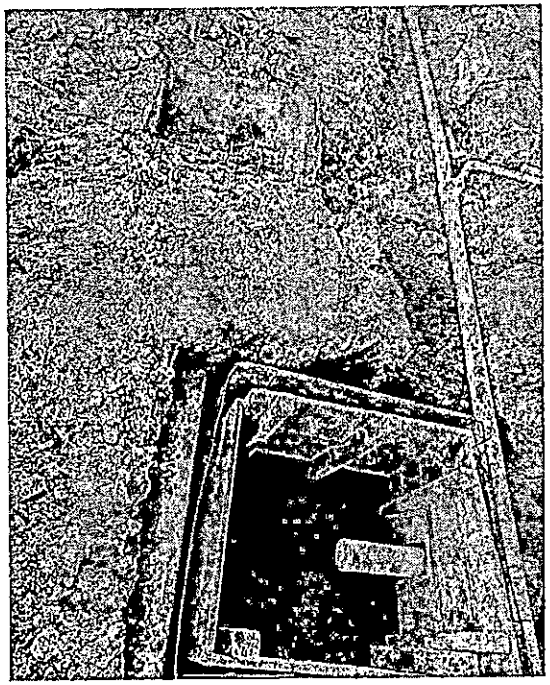

OBSERVACIONES

ELABORO	APROBÓ	REVISÓ
BRAYAN CUAVAS SALCEDO	RAFAEL CABRALES	ALEJANDRA SANCHEZ

Gobernación del MAGDALENA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO:	
VERSIÓN:	
FECHA DE APROBACIÓN	
PÁGINA	1 DE 1

ACTA PARCIAL DE OBRA No.	6	PERIODO DE EJECUCIÓN	19 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2026		
CONTRATO DE OBRA No.			CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CI-1324-2025		
CONTRATISTA	Consorcio Centro Cambia	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA	CONTRATISTA	CONSORCIO AVANZA MAGDALENA 025	OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA
DIRECTOR DE OBRA	JESUS CERVANTES		DIRECTOR INTERVENTORIA	DAVINSON GRAVINI POLO	
RESIDENTE DE OBRA	BRAYAN CUAVAS SALCEDO		RESIDENTE DE INTERVENTORIA	ALEJANDRA SANCHEZ CERÓN	
CAPITULO	20.00		SUBCAPITULO	20.03.01	FECHA:
ITEM	20.03.01.03	DESCRIPCIÓN	TUBERIA PVC-P		UNIDAD: ML


No.	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL
	TUBERIA PVC-P 1 1/4"	122.28						122.28
	Tubería interior.							

TOTAL ACTIVIDAD 122.28

ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR

TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS 122.28

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA

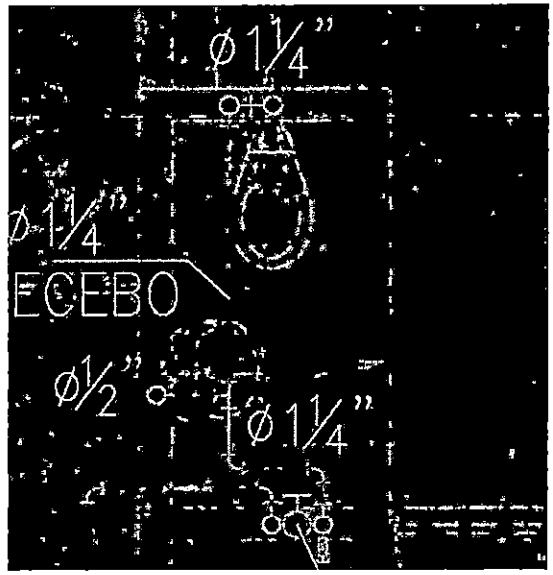

OBSERVACIONES

ELABORÓ	APROBÓ	REVISÓ
BRAYAN CUAVAS SALCEDO	RAFAEL CABRALES	ALEJANDRA SANCHEZ

Gobernación del MAGDALENA


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO:	
VERSIÓN:	
FECHA DE APROBACIÓN	
PÁGINA	1 DE 1

ACTA PARCIAL DE OBRA No.	6	PERIODO DE EJECUCIÓN	19 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2026		
CONTRATO DE OBRA No.			CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	CI-1324-2025	
CONTRATISTA	Consorcio Centro Cambia	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA	CONTRATISTA	CONSORCIO AVANZA MAGDALENA 025	OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA
DIRECTOR DE OBRA	JESUS CERVANTES		DIRECTOR INTERVENTORIA	DAVINSON GRAVINI POLO	
RESIDENTE DE OBRA	BRAYAN CUAVAS SALCEDO		RESIDENTE DE INTERVENTORIA	ALEJANDRA SANCHEZ CERÓN	
CAPITULO	20.00		SUBCAPITULO	20.03.01	FECHA
ITEM	20.03.01.04	DESCRIPCIÓN	TUBERIA PVC-P		UNIDAD ML

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL
		TUBERIA PVC-P 3/4"	13						13.00
		TOTAL ACTIVIDAD							13.00
		ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR							
		TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS							13.00

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA

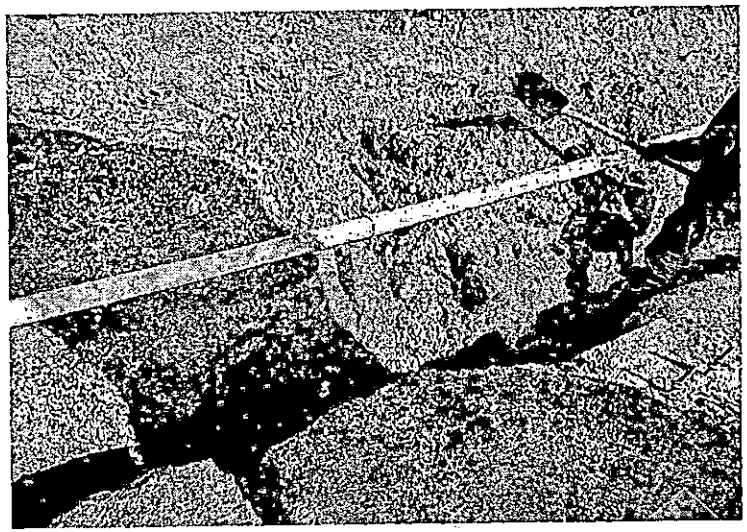

OBSERVACIONES

ELABORO	APROBÓ	REVISÓ
BRAYAN CUAVAS SALCEDO	RAFAEL CABRALES	ALEJANDRA SANCHEZ

Gobernación del MAGDALENA


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO:	
VERSIÓN:	
FECHA DE APROBACIÓN	
PÁGINA	1 DE 1

ACTA PARCIAL DE OBRA No.	6	PERIODO DE EJECUCIÓN	19 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2026		
CONTRATO DE OBRA No.		CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	CI-1324-2025		
CONTRATISTA	Consorcio Centro Cambia	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA	CONTRATISTA	CONSORCIO AVANZA MAGDALENA 025	OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA
DIRECTOR DE OBRA	JESUS CERVANTES		DIRECTOR INTERVENTORIA	DAVINSON GRAVINI POLO	
RESIDENTE DE OBRA	BRAYAN CUAVAS SALCEDO		RESIDENTE DE INTERVENTORIA	ALEJANDRA SANCHEZ CERÓN	
CAPÍTULO	20.00		SUBCAPITULO	20.03.01	FECHA
ITEM	20.03.01.05	DESCRIPCIÓN	TUBERIA PVC-P		UNIDAD: ML

No.	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL
	TUBERIA PVC-P 1/2"	12.84						12.84
	Tubería interior.							
							TOTAL ACTIVIDAD	12.84
							ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR	
							TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS	12.84

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA

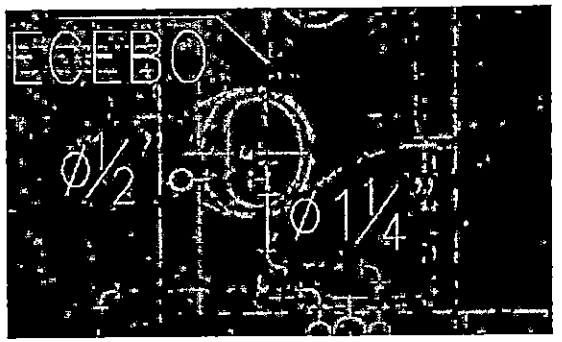

OBSERVACIONES

ELABORÓ	APROBÓ	REVISÓ
BRAYAN CUAVAS SALCEDO	RAFAEL CABRALES	ALEJANDRA SANCHEZ

Gobernación del MAGDALENA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO:	
VERSIÓN:	
FECHA DE APROBACIÓN	
PÁGINA	1 DE 1

ACTA PARCIAL DE OBRA No.	6	PERIODO DE EJECUCIÓN	19 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2026

CONTRATO DE OBRA No.

CONTRATISTA	Consorcio Centro Cambia	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA
DIRECTOR DE OBRA	JESUS CERVANTES	
RESIDENTE DE OBRA	BRAYAN CUAVAS SALCEDO	
CAPITULO	20.00	

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CI-1324-2025

CONTRATISTA	CONSORCIO AVANZA MAGDALENA 025	OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA
DIRECTOR INTERVENTORIA	DAVINSON GRAVINI POLO	
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	ALEJANDRA SANCHEZ CERÓN	
SUBCAPITULO	20.03.01	FECHA

ITEM	20.03.01.17	DESCRIPCIÓN	EXCAVACION	UNIDAD	M3

No.	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES: LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL	LOCALIZACIÓN / ESQUEMA
	EXCAVACION					9.27		9.27	
	TOTAL ACTIVIDAD							9.27	
	ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR								
	TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS							9.27	

OBSERVACIONES

ELABORÓ	APROBÓ	REVISÓ
BRAYAN CUAVAS SALCEDO	RAFAEL CABRALES	ALEJANDRA SANCHEZ
Brayan Cuavas	[signature]	[signature]

Gobernación del
MAGDALENA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO:	
VERSIÓN:	
FECHA DE APROBACIÓN	
PÁGINA	1 DE 1

ACTA PARCIAL DE OBRA No.	6	PERIODO DE EJECUCIÓN	19 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2026

CONTRATO DE OBRA No.

CONTRATISTA	Consorcio Centro Cambia	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA
DIRECTOR DE OBRA	JESUS CERVANTES	
RESIDENTE DE OBRA	BRAYAN CUAVAS SALCEDO	
CAPITULO	20.00	

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CI-1324-2025

CONTRATISTA	CONSORCIO AVANZA MAGDALENA 025	OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA
DIRECTOR INTERVENTORIA	DAVINSON GRAVINI POLO	
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	ALEJANDRA SANCHEZ CERÓN	
SUBCAPITULO	20.03.01	

ITEM	20.03.01.20	DESCRIPCIÓN	RELLENO COMPACTADO	FECHA	
				UNIDAD	M3

No.	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES					CANTIDAD	TOTAL	LOCALIZACIÓN / ESQUEMA
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN			
	RELLENO COMPACTADO					10.00		10.00	

TOTAL ACTIVIDAD	10.00
ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR	
TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS	10.00

OBSERVACIONES

ELABORO	APROBÓ	REVISÓ
BRAYAN CUAVAS SALCEDO	RAFAEL CABRALES	ALEJANDRA SANCHEZ
Brayan Cuavas	[signature]	[signature]

Gobernación del MAGDALENA


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO:	
VERSIÓN:	
FECHA DE APROBACIÓN	
PÁGINA	1 DE 1

ACTA PARCIAL DE OBRA No.	6	PERIODO DE EJECUCIÓN	19 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2026		
CONTRATO DE OBRA No.			CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CI-1324-2025		
CONTRATISTA	Consorcio Centro Cambia	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA	CONTRATISTA	CONSORCIO AVANZA MAGDALENA 025	OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA
DIRECTOR DE OBRA	JESUS CERVANTES		DIRECTOR INTERVENTORIA	DAVINSON GRAVINI POLO	
RESIDENTE DE OBRA	BRAYAN CUAVAS SALCEDO		RESIDENTE DE INTERVENTORIA	ALEJANDRA SANCHEZ CERÓN	
CAPÍTULO	20.00		SUBCAPÍTULO	20.03.02	FECHA:
ITEM	20.03.02.01	DESCRIPCIÓN	PUNTO SANITARIO PUSH		UNIDAD: UN

No.	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL
	PUNTO SANITARIO PUSH 1 1/4"						6	6.00
	Punto sanitario push 1/4" instalados según diseño.							
							TOTAL ACTIVIDAD	6.00
							ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR	
							TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS	6.00

LOCALIZACIÓN Y ESQUEMA

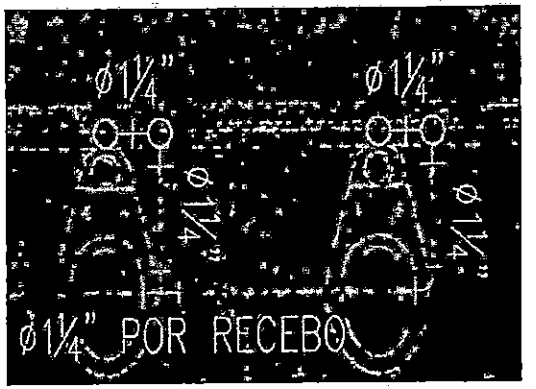

OBSERVACIONES

ELABORO	APROBÓ	REVISÓ
BRAYAN CUAVAS SALCEDO	RAFAEL CABRALES	ALEJANDRA SANCHEZ

Gobernación del MAGDALENA


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO:	
VERSIÓN:	
FECHA DE APROBACIÓN	
PÁGINA	1 DE 1

ACTA PARCIAL DE OBRA No.	6	PERIODO DE EJECUCIÓN	19 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2026		
CONTRATO DE OBRA No.			CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CI-1324-2025		
CONTRATISTA	Consorcio Centro Cambia	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA	CONTRATISTA	CONSORCIO AVANZA MAGDALENA 025	OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA
DIRECTOR DE OBRA	JESUS CERVANTES		DIRECTOR INTERVENTORIA	DAVINSON GRAVINI POLO	
RESIDENTE DE OBRA	BRAYAN CUAVAS SALCEDO		RESIDENTE DE INTERVENTORIA	ALEJANDRA SANCHEZ CERÓN	
CAPITULO	20.00		SUBCAPITULO	20.03.02	FECHA:
ITEM No.	20.03.02.02	DESCRIPCIÓN	PUNTO LAVAMANOS		UNIDAD: UN

No.	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL
	PUNTO LAVAMANOS 1/2"						9	9.00
	Punto lavamanos 1/2" instalados según diseño.							
						TOTAL ACTIVIDAD		9.00
						ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR		
						TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS		9.00

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA

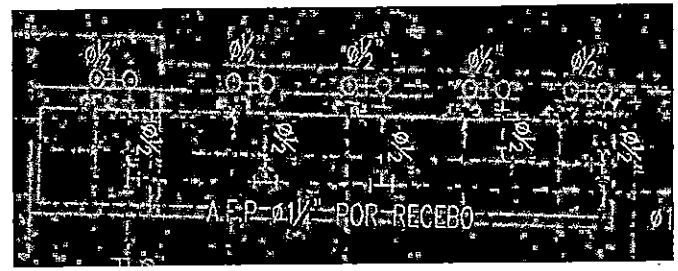

OBSERVACIONES

ELABORÓ	APROBÓ	REVISÓ
BRAYAN CUAVAS SALCEDO	RAFAEL CABRALES	ALEJANDRA SANCHEZ

Gobernación del MAGDALENA


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO:	
VERSIÓN:	
FECHA DE APROBACIÓN	
PÁGINA	1 DE 1

ACTA PARCIAL DE OBRA No.	6	PERÍODO DE EJECUCIÓN	19 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2026		
CONTRATO DE OBRA No.			CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CI-1324-2025		
CONTRATISTA	Consorcio Centro Cambia	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA	CONTRATISTA	CONSORCIO AVANZA MAGDALENA 025	OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA
DIRECTOR DE OBRA	JESUS CERVANTES		DIRECTOR INTERVENTORIA	DAVINSON GRAVINI POLO	
RESIDENTE DE OBRA	BRAYAN CUAVAS SALCEDO		RESIDENTE DE INTERVENTORIA	ALEJANDRA SANCHEZ CERÓN	
CAPITULO	20.00		SUBCAPITULO	20.03.02	FECHA
ITEM	20.03.02.03	DESCRIPCIÓN	PUNTO ORINAL		UNIDAD: UN

NO.	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL
	PUNTO ORINAL 3/4"						4	4.00
	Punto orinal 3/4" instalados según diseño.							
							TOTAL ACTIVIDAD	4.00
							ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR	
							TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS	4.00

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA

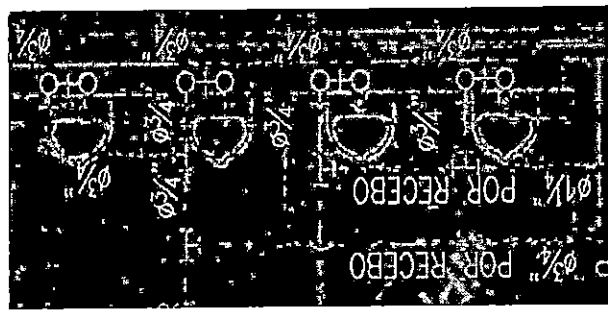

OBSERVACIONES

ELABORÓ	APROBÓ	REVISÓ
BRAYAN CUAVAS SALCEDO	RAFAEL CABRALES	ALEJANDRA SANCHEZ

Gobernación del MAGDALENA


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO:	
VERSIÓN:	
FECHA DE APROBACIÓN	
PÁGINA	1 DE 1

ACTA PARCIAL DE OBRA No.	6	PERÍODO DE EJECUCIÓN	19 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2026		
CONTRATO DE OBRA No.			CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CI-1324-2025		
CONTRATISTA	Consorcio Centro Cambia	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA	CONTRATISTA	CONSORCIO AVANZA MAGDALENA 025	OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA
DIRECTOR DE OBRA	JESUS CERVANTES		DIRECTOR INTERVENTORIA	DAVINSON GRAVINI POLO	
RESIDENTE DE OBRA	BRAYAN CUAVAS SALCEDO		RESIDENTE DE INTERVENTORIA	ALEJANDRA SANCHEZ CERÓN	
CAPITULO	20.00		SUBCAPITULO	20.03.04	FECHA
ITEM	20.03.04.01	DESCRIPCIÓN	TUBERIA C-900		UNIDAD: ML

NO.	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL
	TUBERIA C-900 4"	41						41.00
							TOTAL ACTIVIDAD	41.00
							ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR	
							TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS	41.00

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA

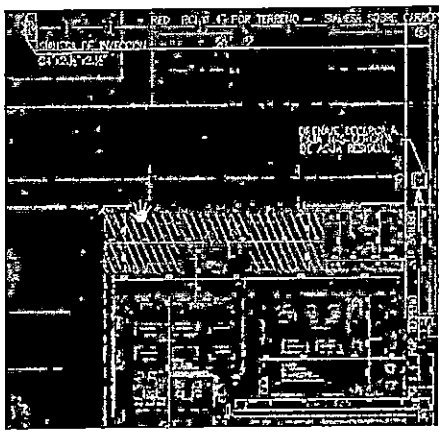

OBSERVACIONES

ELABORÓ	APROBÓ	REVISÓ
BRAYAN CUAVAS SALCEDO	RAFAEL CABRALES	ALEJANDRA SANCHEZ

Gobernación del MAGDALENA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA


CÓDIGO:	
VERSIÓN:	
FECHA DE APROBACIÓN	
PÁGINA	1 DE 1

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 6 — PERIODO DE EJECUCIÓN: 19 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2026

CONTRATO DE OBRA No.			CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CI-1324-2025		
CONTRATISTA	Consorcio Centro Cambia	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA	CONTRATISTA	CONSORCIO AVANZA MAGDALENA 025	OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA
DIRECTOR DE OBRA	JESUS CERVANTES		DIRECTOR INTERVENTORIA	DAVINSON GRAVINI POLO	
RESIDENTE DE OBRA	BRAYAN CUAVAS SALCEDO		RESIDENTE DE INTERVENTORIA	ALEJANDRA SANCHEZ CERÓN	
CAPITULO	20.00		SUBCAPITULO	20.03.05	FECHA
ITEM	20.03.05.01	DESCRIPCIÓN	TUBERIA ACERO NEGRO RANURADA SCH 10	UNIDAD	ML

No.	DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL
	TUBERIA ACERO NEGRO RANURADA SCH 10 3"	122.05						122.05
							TOTAL ACTIVIDAD	122.05
							ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR	
							TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS	122.05

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA

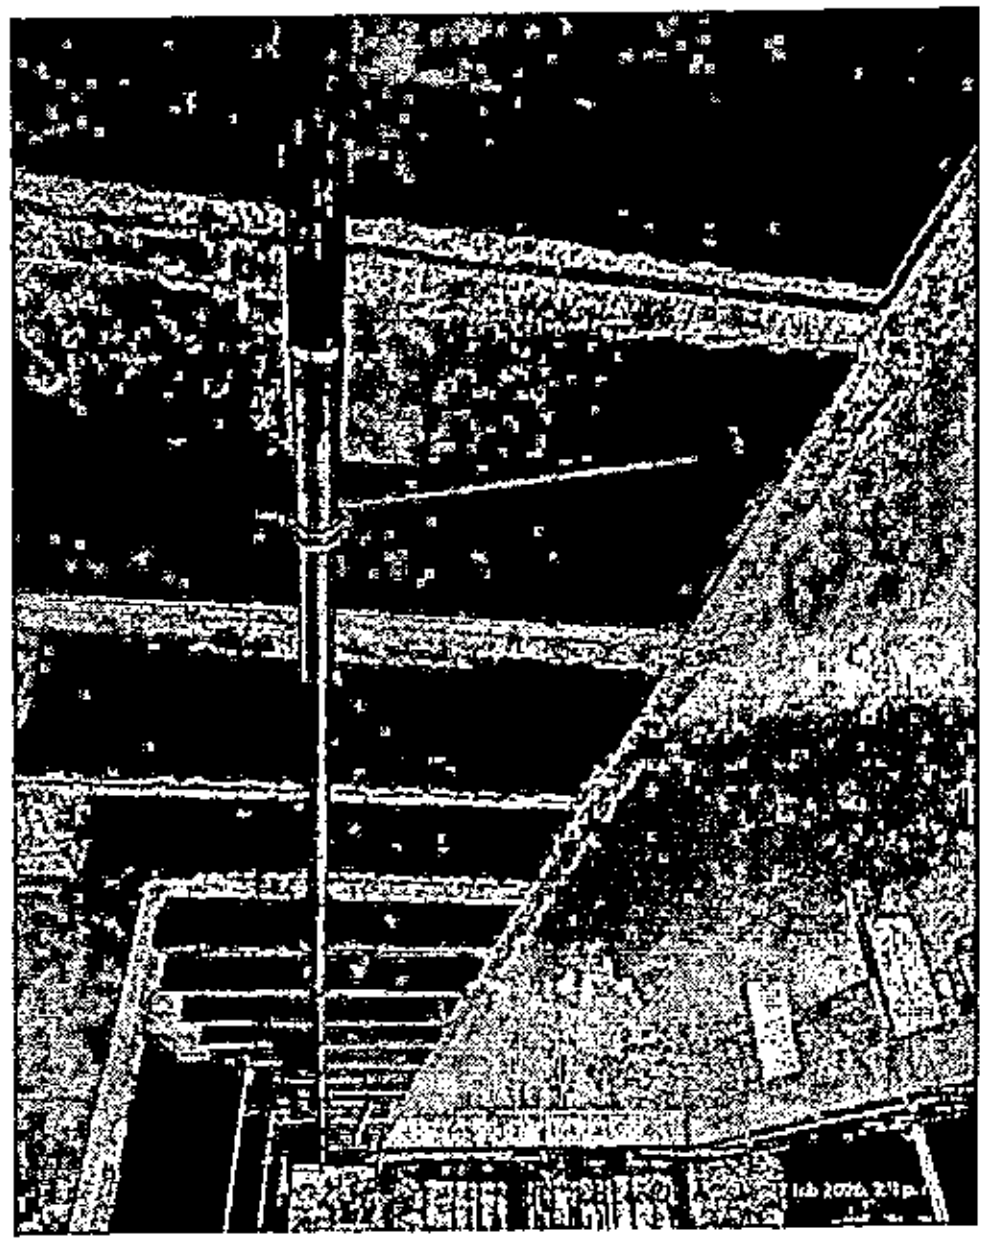

OBSERVACIONES

ELABORO	APROBO	REVISÓ
BRAYAN CUAVAS SALCEDO	RAFAEL CABRALES	ALEJANDRA SANCHEZ

Gobernación del
MAGDALENA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO:	
VERSIÓN:	
FECHA DE APROBACIÓN	
PÁGINA	1 DE 1

ACTA PARCIAL DE OBRA No.	6	PERÍODO DE EJECUCIÓN	19 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2026

CONTRATO DE OBRA No.

CONTRATISTA	Consorcio Centro Cambia	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA
DIRECTOR DE OBRA	JESUS CERVANTES	
RESIDENTE DE OBRA	BRAYAN CUAVAS SALCEDO	

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CI-1324-2025


CONTRATISTA	CONSORCIO AVANZA MAGDALENA 025	OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA
DIRECTOR INTERVENTORIA	DAVINSON GRAVINI POLO	
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	ALEJANDRA SANCHEZ CERÓN	

CAPITULO:	20.00	SUBCAPITULO	20.03.05	FECHA	
ITEM	20.03.05.02	DESCRIPCIÓN	TUBERIA ACERO NEGRO ROSCADA SCH 40	UNIDAD	ML

No.	DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL
	TUBERIA ACERO NEGRO ROSCADA SCH 40 1.1/2"	40						40.00

TOTAL ACTIVIDAD	40.00
ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR	
TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS	40.00

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA

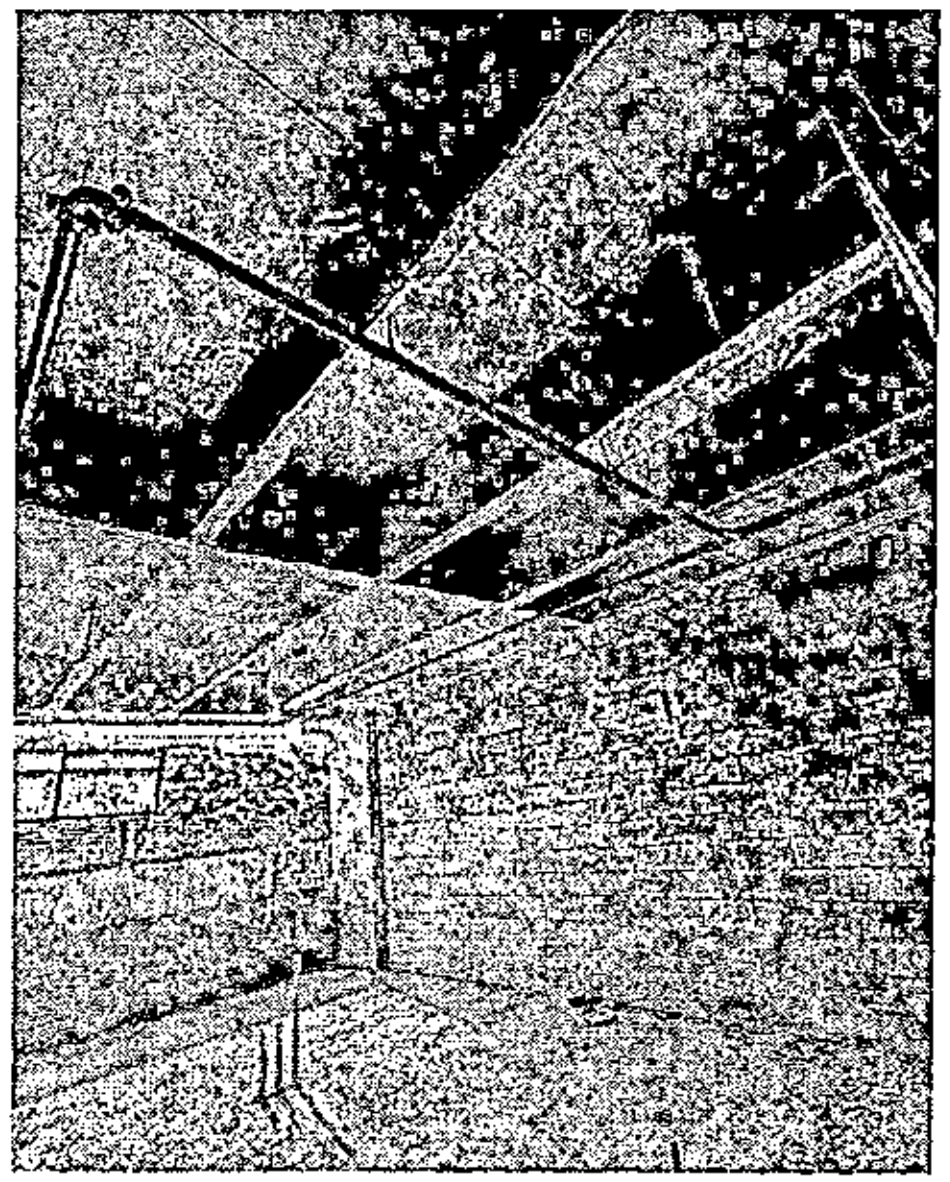

OBSERVACIONES

ELABORÓ	APROBÓ	REVISÓ
BRAYAN CUAVAS SALCEDO	RAFAEL CABRALES	ALEJANDRA SANCHEZ

Gobernación del MAGDALENA


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO:	
VERSIÓN:	
FECHA DE APROBACIÓN	
PÁGINA	1 DE 1

ACTA PARCIAL DE OBRA No.	6	PERIODO DE EJECUCIÓN	19 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2026		
CONTRATO DE OBRA No.			CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	01-1324-2025	
CONTRATISTA	Consorcio Centro Cambia	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA	CONTRATISTA	CONSORCIO AVANZA MAGDALENA 025	OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA
DIRECTOR DE OBRA	JESUS CERVANTES		DIRECTOR INTERVENTORIA	DAVINSON GRAVINI POLO	
RESIDENTE DE OBRA	BRAYAN CUAVAS SALCEDO		RESIDENTE DE INTERVENTORIA	ALEJANDRA SANCHEZ CERÓN	
CAPITULO:	20.00		SUBCAPITULO	20.03.05	FECHA:
ITEM	20.03.05.03	DESCRIPCIÓN	TUBERIA ACERO NEGRO ROSCADA SCH 40		UNIDAD: ML

ITEM No.	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL
	TUBERIA ACERO NEGRO ROSCADA SCH 40 1.1/4"	170						170.00
							TOTAL ACTIVIDAD	170.00
							ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR	
							TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS	170.00

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA

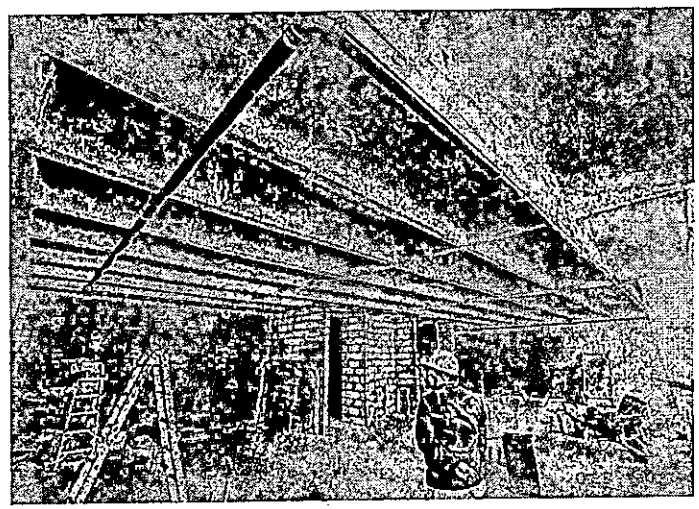

OBSERVACIONES

ELABORO	APROBÓ	REVISÓ
BRAYAN CUAVAS SALCEDO	RAFAEL CABRALES	ALEJANDRA SANCHEZ

Gobernación del MAGDALENA


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO:	
VERSIÓN:	
FECHA DE APROBACIÓN	
PÁGINA	1 DE 1

ACTA PARCIAL DE OBRA No.	6	PERIODO DE EJECUCIÓN	19 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2026		
CONTRATO DE OBRA No.			CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CI-1324-2025		
CONTRATISTA	Consorcio Centro Cambia	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA	CONTRATISTA	CONSORCIO AVANZA MAGDALENA 025	OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA
DIRECTOR DE OBRA	JESUS CERVANTES		DIRECTOR INTERVENTORIA	DAVINSON GRAVINI POLO	
RESIDENTE DE OBRA	BRAYAN CUAVAS SALCEDO		RESIDENTE DE INTERVENTORIA	ALEJANDRA SANCHEZ CERÓN	
CAPITULO	20.00		SUBCAPITULO	20.03.05	FECHA:
ITEM	20.03.05.06	DESCRIPCION	ACCESORIOS ACERO RANURADOS		UNIDAD: UN

NO.	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL
	ACCESORIOS ACERO RANURADOS 3"						30	30.00
	TOTAL ACTIVIDAD							30.00
	ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR							
	TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS							30.00

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA

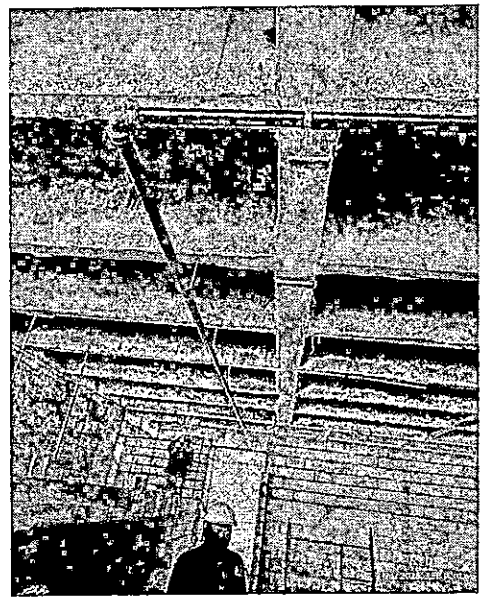

OBSERVACIONES

ELABORO	APROBO	REVISO
BRAYAN CUAVAS SALCEDO	RAFAEL CABRALES	ALEJANDRA SANCHEZ


Gobernación del MAGDALENA	# MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	CÓDIGO:	
		VERSIÓN:	
		FECHA DE APROBACIÓN	
		PÁGINA	1 DE 1

ACTA PARCIAL DE OBRA No.	6	PERIODO DE EJECUCIÓN	19 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2026

CONTRATO DE OBRA No.			CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CI-1324-2025		
CONTRATISTA	Consorcio Centro Cambia	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA	CONTRATISTA	CONSORCIO AVANZA MAGDALENA 025	OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA
DIRECTOR DE OBRA	JESUS CERVANTES		DIRECTOR INTERVENTORIA	DAVINSON GRAVINI POLO	
RESIDENTE DE OBRA	BRAYAN CUAVAS SALCEDO		RESIDENTE DE INTERVENTORIA	ALEJANDRA SANCHEZ CERÓN	
CAPITULO	20.00		SUBCAPITULO	20.03.05	FECHA [illegible]
ITEM	20.03.05.07	DESCRIPCIÓN	ACCESORIOS ACERO ROSCADOS		UNIDAD UN

No.	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL
	ACCESORIOS ACERO ROSCADOS 1.1/2"						10	10.00
							TOTAL ACTIVIDAD	10.00
							ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR	
							TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS	10.00

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA

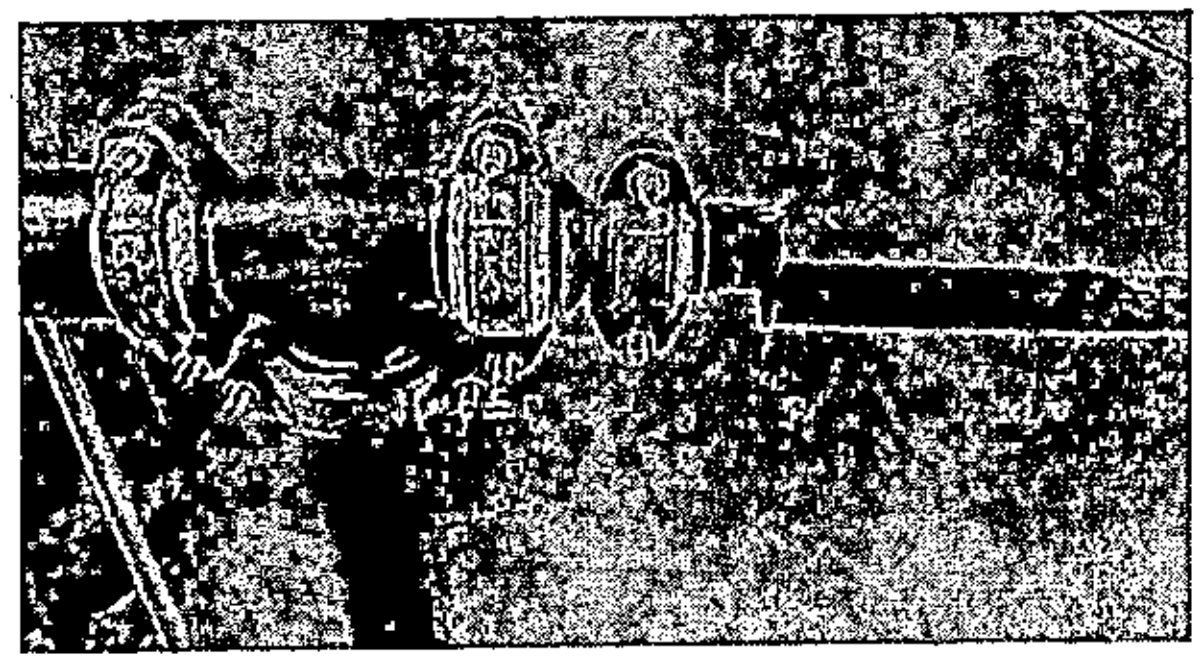

OBSERVACIONES


ELABORO	APROBO	REVISO
BRAYAN CUAVAS SALCEDO	RAFAEL CABRALES	ALEJANDRA SANCHEZ

Gobernación del MAGDALENA	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	CÓDIGO:	
		VERSIÓN:	
		FECHA DE APROBACIÓN	
		PÁGINA	1 DE 1

ACTA PARCIAL DE OBRA No.	6	PERIODO DE EJECUCIÓN	19 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2026
CONTRATO DE OBRA No.		CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CI-1324-2025	
CONTRATISTA	Consorcio Centro Cambia	CONTRATISTA	CONSORCIO AVANZA MAGDALENA 025
DIRECTOR DE OBRA	JESUS CERVANTES	DIRECTOR INTERVENTORIA	DAVINSON GRAVINI POLO
RESIDENTE DE OBRA	BRAYAN CUAVAS SALCEDO	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	ALEJANDRA SANCHEZ CERÓN
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA		OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA	
CAPITULO	20.00	SUBCAPITULO	20.03.05
ITEM	20.03.05.08	FECHA	
DESCRIPCIÓN	ACCESORIOS ACERO ROSCADOS	UNIDAD	UN

No.	DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL
	ACCESORIOS ACERO ROSCADOS 1.1/4"						50	50.00
							TOTAL ACTIVIDAD	50.00
							ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR	
							TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS	50.00

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA

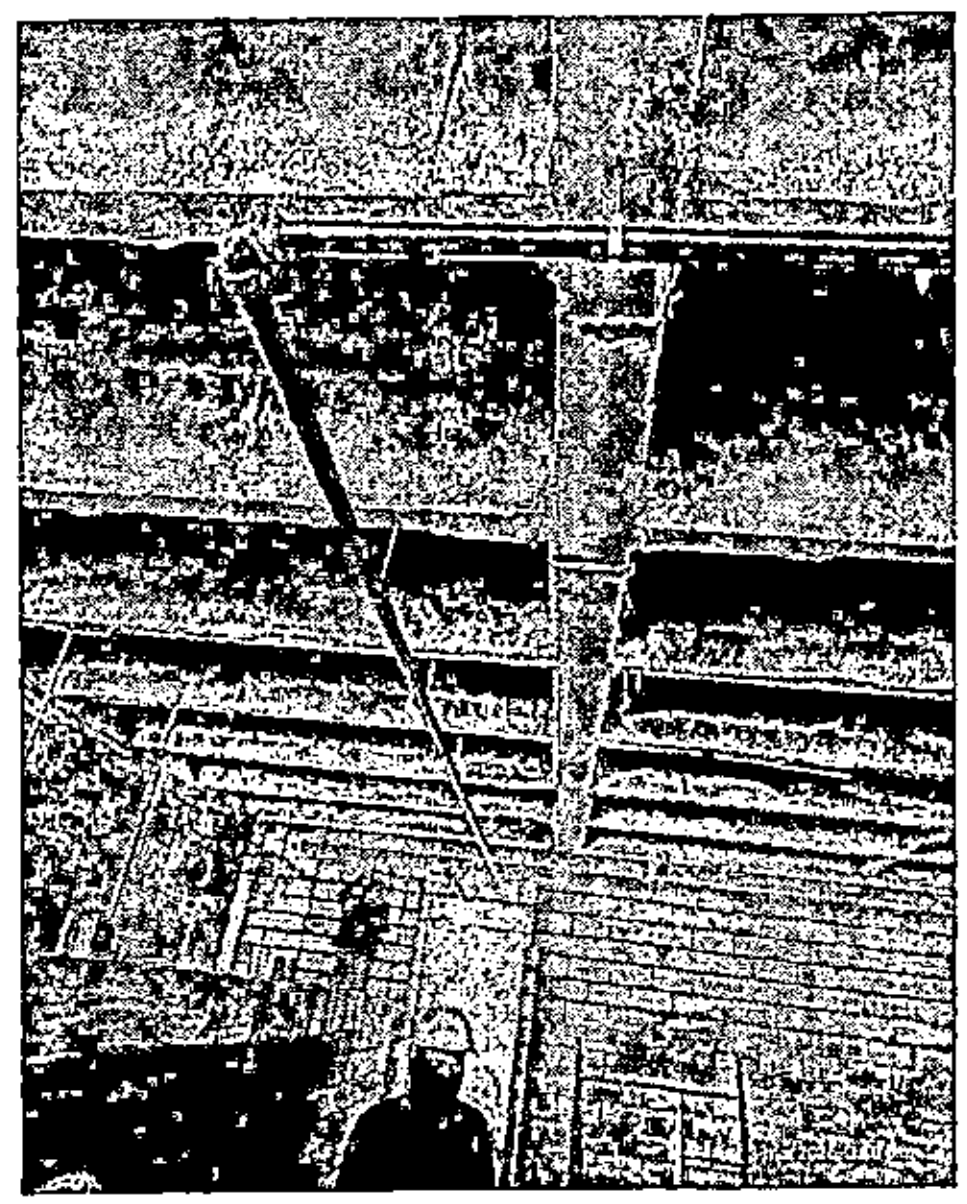

OBSERVACIONES

ELABORO	APROBÓ	REVISÓ
BRAYAN CUAVAS SALCEDO	RAFAEL CABRALES	ALEJANDRA SANCHEZ
Brayan Cuavas		

Gobernación del MAGDALENA


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO:	
VERSIÓN:	
FECHA DE APROBACIÓN	
PÁGINA	1 DE 1

ACTA PARCIAL DE OBRA No.	6	PERIODO DE EJECUCIÓN	19 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2026		
CONTRATO DE OBRA No.			CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CI-1324-2025		
CONTRATISTA	Consorcio Centro Cambia	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA	CONTRATISTA	CONSORCIO AVANZA MAGDALENA 025	OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA
DIRECTOR DE OBRA	JESUS CERVANTES		DIRECTOR INTERVENTORIA	DAVINSON GRAVINI POLO	
RESIDENTE DE OBRA	BRAYAN CUAVAS SALCEDO		RESIDENTE DE INTERVENTORIA	ALEJANDRA SANCHEZ CERÓN	
CAPITULO	20.00		SUBCAPITULO	20.03.05	FECHA
ITEM	20.03.05.11	DESCRIPCIÓN	ABRAZADERAS UL/FM		UNIDAD UN

NO.	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL
	ABRAZADERAS UL/FM 3"						55	55.00
	TOTAL ACTIVIDAD							55.00
	ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR							
	TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS							55.00

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA

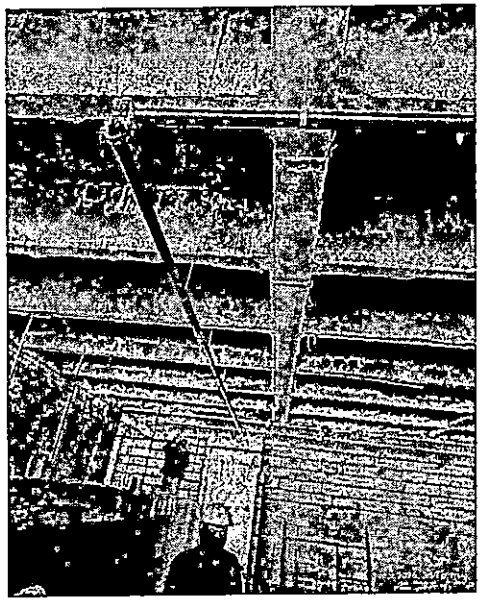

OBSERVACIONES

ELABORO	APROBÓ	REVISÓ
BRAYAN CUAVAS SALCEDO	RAFAEL CABRALES	ALEJANDRA SANCHEZ

Gobernación del MAGDALENA


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO:	
VERSIÓN:	
FECHA DE APROBACIÓN	
PÁGINA	1 DE 1

ACTA PARCIAL DE OBRA No.	6	PERIODO DE EJECUCIÓN	19 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2026		
CONTRATO DE OBRA No.			CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CI-1324-2025		
CONTRATISTA	Consorcio Centro Cambia	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA	CONTRATISTA	CONSORCIO AVANZA MAGDALENA 025	OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA
DIRECTOR DE OBRA	JESUS CERVANTES		DIRECTOR INTERVENTORIA	DAVINSON GRAVINI POLO	
RESIDENTE DE OBRA	BRAYAN CUAVAS SALCEDO		RESIDENTE DE INTERVENTORIA	ALEJANDRA SANCHEZ CERÓN	
CAPITULO	20.00		SUBCAPITULO	20.03.05	FECHA
ITEM	20.03.05.13	DESCRIPCIÓN	ABRAZADERAS UL/FM	UNIDAD	UN

No.	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL
	ABRAZADERAS UL/FM 1 1/4"						23.33	23.33
	TOTAL ACTIVIDAD							23.33
	ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR							
	TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS							23.33

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA

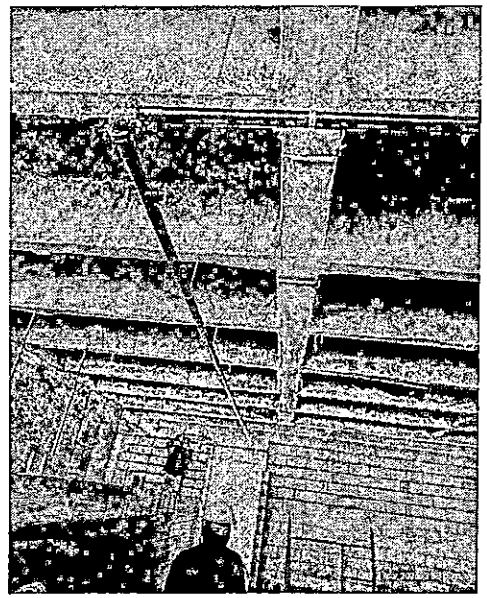

OBSERVACIONES

ELABORO	APROBÓ	REVISÓ
BRAYAN CUAVAS SALCEDO	RAFAEL CABRALES	ALEJANDRA SANCHEZ

Gobernación del MAGDALENA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO:	
VERSIÓN:	
FECHA DE APROBACIÓN	
PÁGINA	1 DE 1


ACTA PARCIAL DE OBRA No.	6	PERIODO DE EJECUCIÓN	19 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2026
CONTRATO DE OBRA No.		CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	CI-1324-2025

CONTRATISTA	Consorcio Centro Cambia	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA	CONTRATISTA	CONSORCIO AVANZA MAGDALENA 025	OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA
DIRECTOR DE OBRA	JESUS CERVANTES		DIRECTOR INTERVENTORIA	DAVINSON GRAVINI POLO	
RESIDENTE DE OBRA	BRAYAN CUAVAS SALCEDO		RESIDENTE DE INTERVENTORIA	ALEJANDRA SANCHEZ CERÓN	

CAPITULO	20.00	SUBCAPITULO	20.03.05	FECHA	
ITEM	20.03.05.15	DESCRIPCIÓN	COUPLING	UNIDAD	UN

No.	DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL
	COUPLING 3"						100	100.00
						TOTAL ACTIVIDAD		100.00
						ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR		
						TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS		100.00

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA

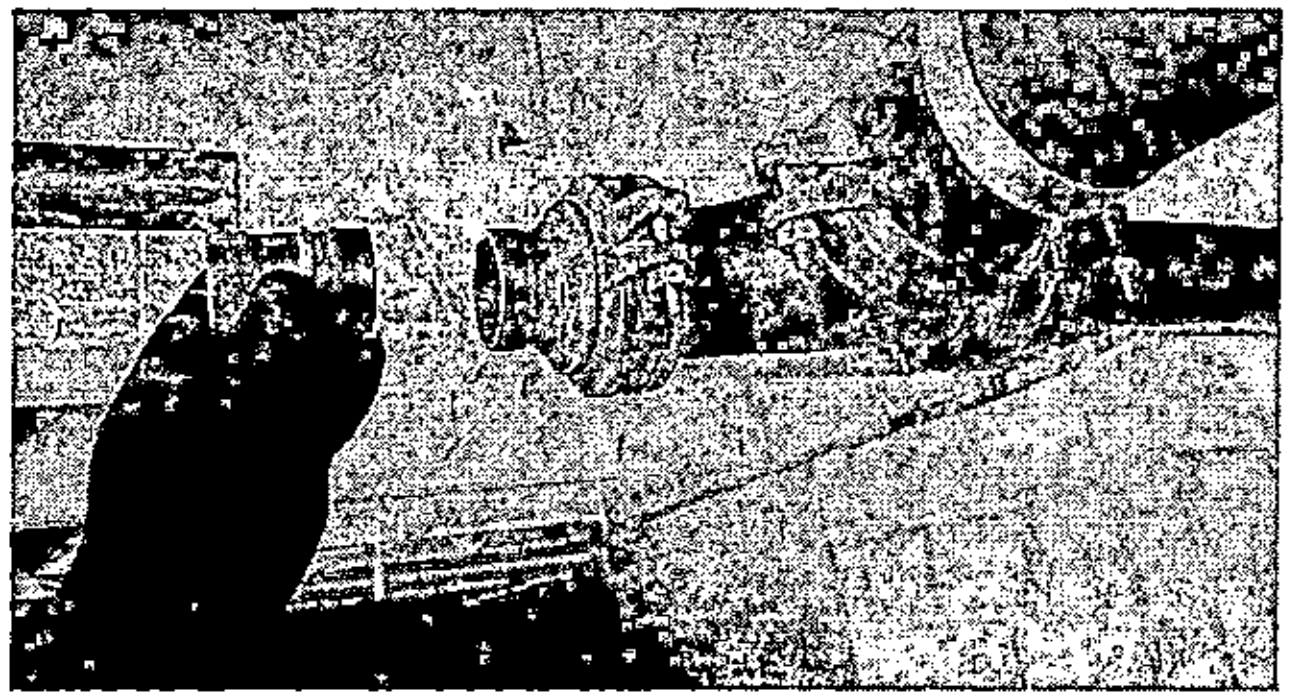

OBSERVACIONES

ELABORO	APROBÓ	REVISÓ
BRAYAN CUAVAS SALCEDO	RAFAEL CABRALES	ALEJANDRA SANCHEZ

Gobernación del MAGDALENA


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO:	
VERSIÓN:	
FECHA DE APROBACIÓN	
PÁGINA	1 DE 1

ACTA PARCIAL DE OBRA No.	6		PERIODO DE EJECUCIÓN	19 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2026	
CONTRATO DE OBRA No.			CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CI-1324-2025		
CONTRATISTA	Consorcio Centro Cambia	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA	CONTRATISTA	CONSORCIO AVANZA MAGDALENA 025	OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA
DIRECTOR DE OBRA	JESUS CERVANTES		DIRECTOR INTERVENTORIA	DAVINSON GRAVINI POLO	
RESIDENTE DE OBRA	BRAYAN CUAVAS SALCEDO		RESIDENTE DE INTERVENTORIA	ALEJANDRA SANCHEZ CERÓN	
CAPITULO	20.00		SUBCAPITULO	20.03.05	FECHA:
ITEM	20.03.05.16	DESCRIPCIÓN: STRAP 3"x1"			UNIDAD: UN

NO.	DESCRIPCION	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL
	STRAP 3"x1"						40	40.00
						TOTAL ACTIVIDAD		40.00
						ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR		
						TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS		40.00

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA



OBSERVACIONES

ELABORÓ	APROBÓ	REVISÓ
BRAYAN CUAVAS SALCEDO	RAFAEL CABRALES	ALEJANDRA SANCHEZ

Gobernación del MAGDALENA


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO:	
VERSIÓN:	
FECHA DE APROBACIÓN	
PÁGINA	1 DE 1

ACTA PARCIAL DE OBRA No.	6
PERIODO DE EJECUCIÓN	19 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2026
CONTRATO DE OBRA No.	
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	CI-1324-2025
CONTRATISTA	Consorcio Centro Cambia
DIRECTOR DE OBRA	JESUS CERVANTES
RESIDENTE DE OBRA	BRAYAN CUAVAS SALCEDO
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA
CONTRATISTA (interventoría)	CONSORCIO AVANZA MAGDALENA 025
DIRECTOR INTERVENTORIA	DAVINSON GRAVINI POLO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	ALEJANDRA SANCHEZ CERÓN
OBJETO (interventoría)	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA
CAPITULO	20.00
SUBCAPITULO	20.03.05
FECHA	
ITEM	20.03.05.18
DESCRIPCIÓN	STRAP 1,1/4"x1"
UNIDAD	UN

FNo	DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL
	STRAP 1,1/4"x1"						40	40.00
							TOTAL ACTIVIDAD	40.00
							ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR	
							TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS	40.00

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA

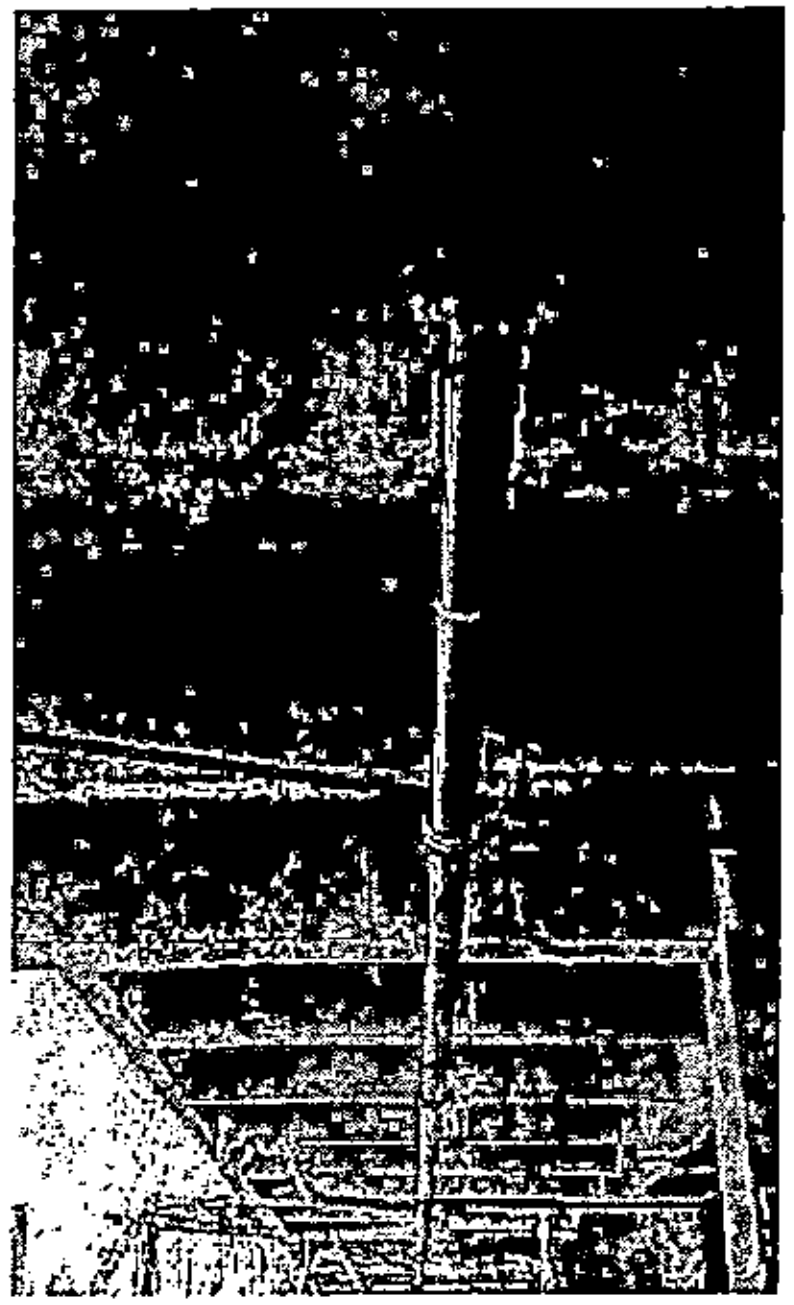

OBSERVACIONES

ELABORO	APROBÓ	REVISO
BRAYAN CUAVAS SALCEDO	RAFAEL CABRALES	ALEJANDRA SANCHEZ
[firma]	[firma]	[firma]

Gobernación del MAGDALENA


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO:	
VERSIÓN:	
FECHA DE APROBACIÓN	
PÁGINA	1 DE 1

ACTA PARCIAL DE OBRA No.	6	PERIODO DE EJECUCIÓN	19 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2026
CONTRATO DE OBRA No.		CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CI-1324-2025	
CONTRATISTA	Consorcio Centro Cambia.	CONTRATISTA	CONSORCIO AVANZA MAGDALENA 025
DIRECTOR DE OBRA	JESUS CERVANTES	DIRECTOR INTERVENTORIA	DAVINSON GRAVINI POLO
RESIDENTE DE OBRA	BRAYAN CUAVAS SALCEDO	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	ALEJANDRA SANCHEZ CERÓN
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA		OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA	
CAPITULO:	20.00	SUBCAPITULO:	20.03.05
FECHA:			
ITEM	20.03.05.19	DESCRIPCIÓN	SOPORTE SISMORRESISTENTE DE 4 VIAS
UNIDAD	UN		

No.	DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL
	SOPORTE SISMORRESISTENTE DE 4 VIAS 3"						2	2.00
							TOTAL ACTIVIDAD	2.00
							ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR	
							TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS	2.00

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA

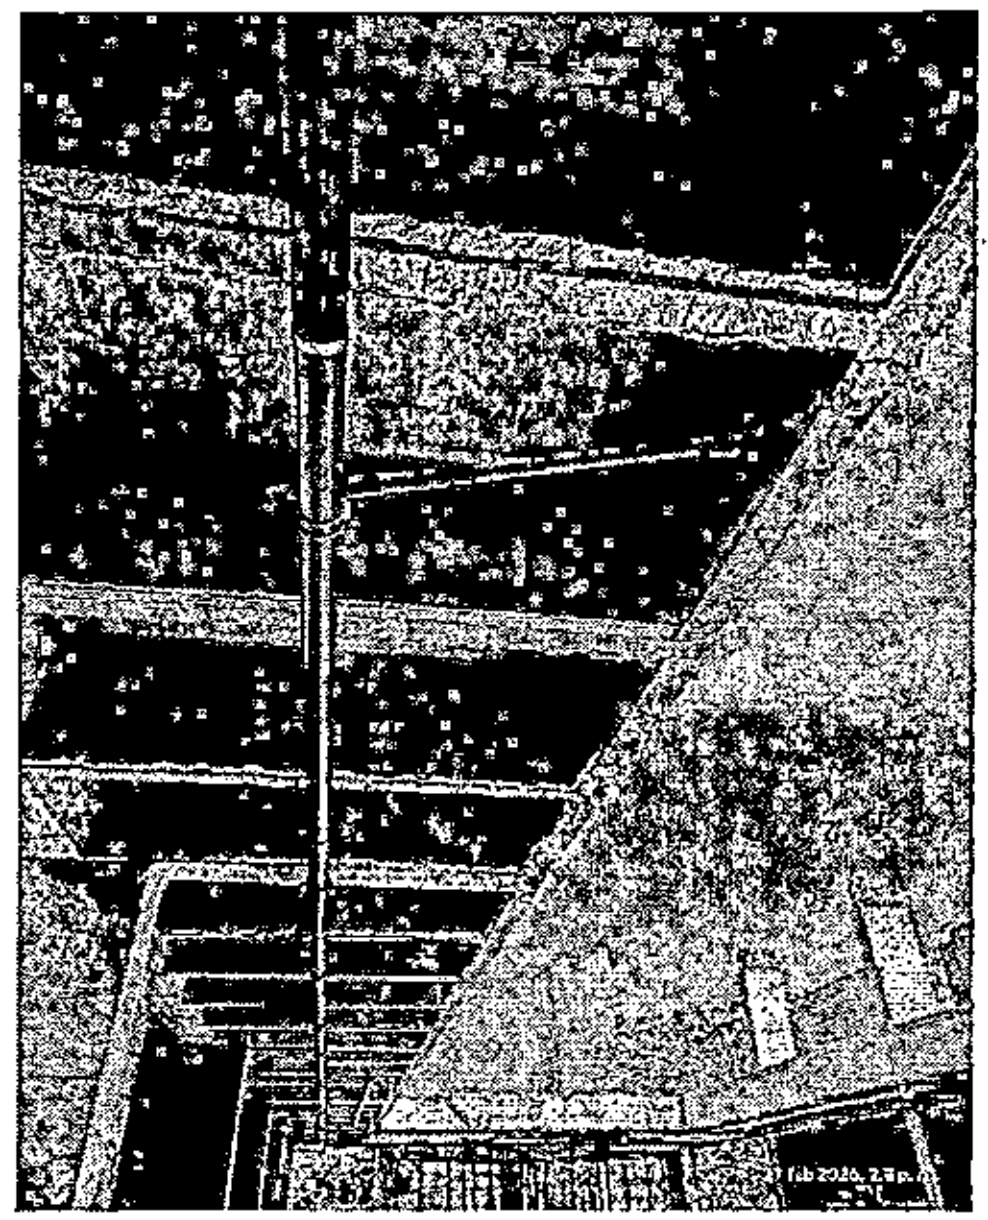

OBSERVACIONES

ELABORÓ	APROBÓ	REVISÓ
BRAYAN CUAVAS SALCEDO	RAFAEL CABRALES	ALEJANDRA SANCHEZ
Brayan Cuav	[firma]	[firma]

Gobernación del MAGDALENA


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO:	
VERSIÓN:	
FECHA DE APROBACIÓN	
PÁGINA	1 DE 1

ACTA PARCIAL DE OBRA No.	6	PERIODO DE EJECUCIÓN	19 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2026		
CONTRATO DE OBRA No.			CONTRATO DE INTERVENTORIA No. GI-1324-2025		
CONTRATISTA	Consorcio Centro Cambia	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA	CONTRATISTA	CONSORCIO AVANZA MAGDALENA 025	OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA
DIRECTOR DE OBRA	JESUS CERVANTES		DIRECTOR INTERVENTORIA	DAVINSON GRAVINI POLO	
RESIDENTE DE OBRA	BRAYAN CUAVAS SALCEDO		RESIDENTE DE INTERVENTORIA	ALEJANDRA SANCHEZ CERÓN	
CAPITULO	20.00		SUBCAPITULO	20.03.05	FECHA
ITEM	20.03.05.20	DESCRIPCIÓN	SOPORTE SISMORRESISTENTE DE 2 VIAS	UNIDAD	UN

NO.	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL
	SOPORTE SISMORRESISTENTE DE 2 VIAS 3"						16	16.00
						TOTAL ACTIVIDAD		16.00
						ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR		
						TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS		16.00

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA

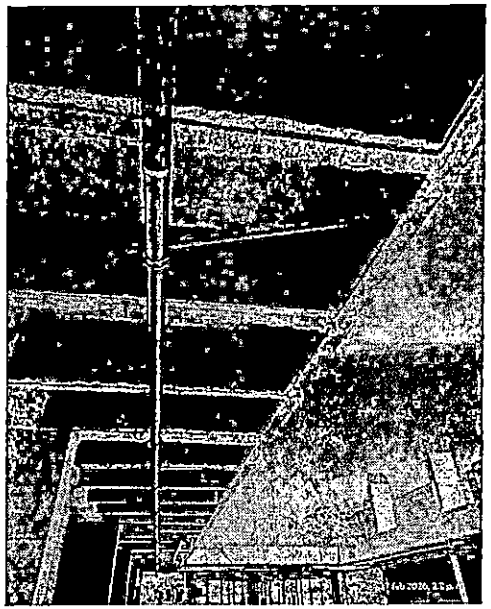

OBSERVACIONES

ELABORÓ	APROBÓ	REVISÓ
BRAYAN CUAVAS SALCEDO	RAFAEL CABRALES	ALEJANDRA SANCHEZ

Gobernación del MAGDALENA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA


CÓDIGO:	
VERSIÓN:	
FECHA DE APROBACIÓN	
PÁGINA	1 DE 1

ACTA PARCIAL DE OBRA No.	6	PERÍODO DE EJECUCIÓN	19 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2026
CONTRATO DE OBRA No.		CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CI-1324-2025	

CONTRATISTA	Consorcio Centro Cambia	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA	CONTRATISTA	CONSORCIO AVANZA MAGDALENA 025	OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA
DIRECTOR DE OBRA	JESUS CERVANTES		DIRECTOR INTERVENTORIA	DAVINSON GRAVINI POLO	
RESIDENTE DE OBRA	BRAYAN CUAVAS SALCEDO		RESIDENTE DE INTERVENTORIA	ALEJANDRA SANCHEZ CERÓN	
CAPITULO	20.00		SUBCAPITULO	20.03.05	FECHA
ITEM	20.03.05.23	DESCRIPCIÓN	ROCIADOR RESPUESTA RAPIDA STANDAR K:5,6 UP-RIGHT	UNIDAD	UN

No.	DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL
	ROCIADOR RESPUESTA RAPIDA STANDAR K:5,6 UP-RIGHT						40	40.00
							TOTAL ACTIVIDAD	40.00
							ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR	
							TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS	40.00

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA

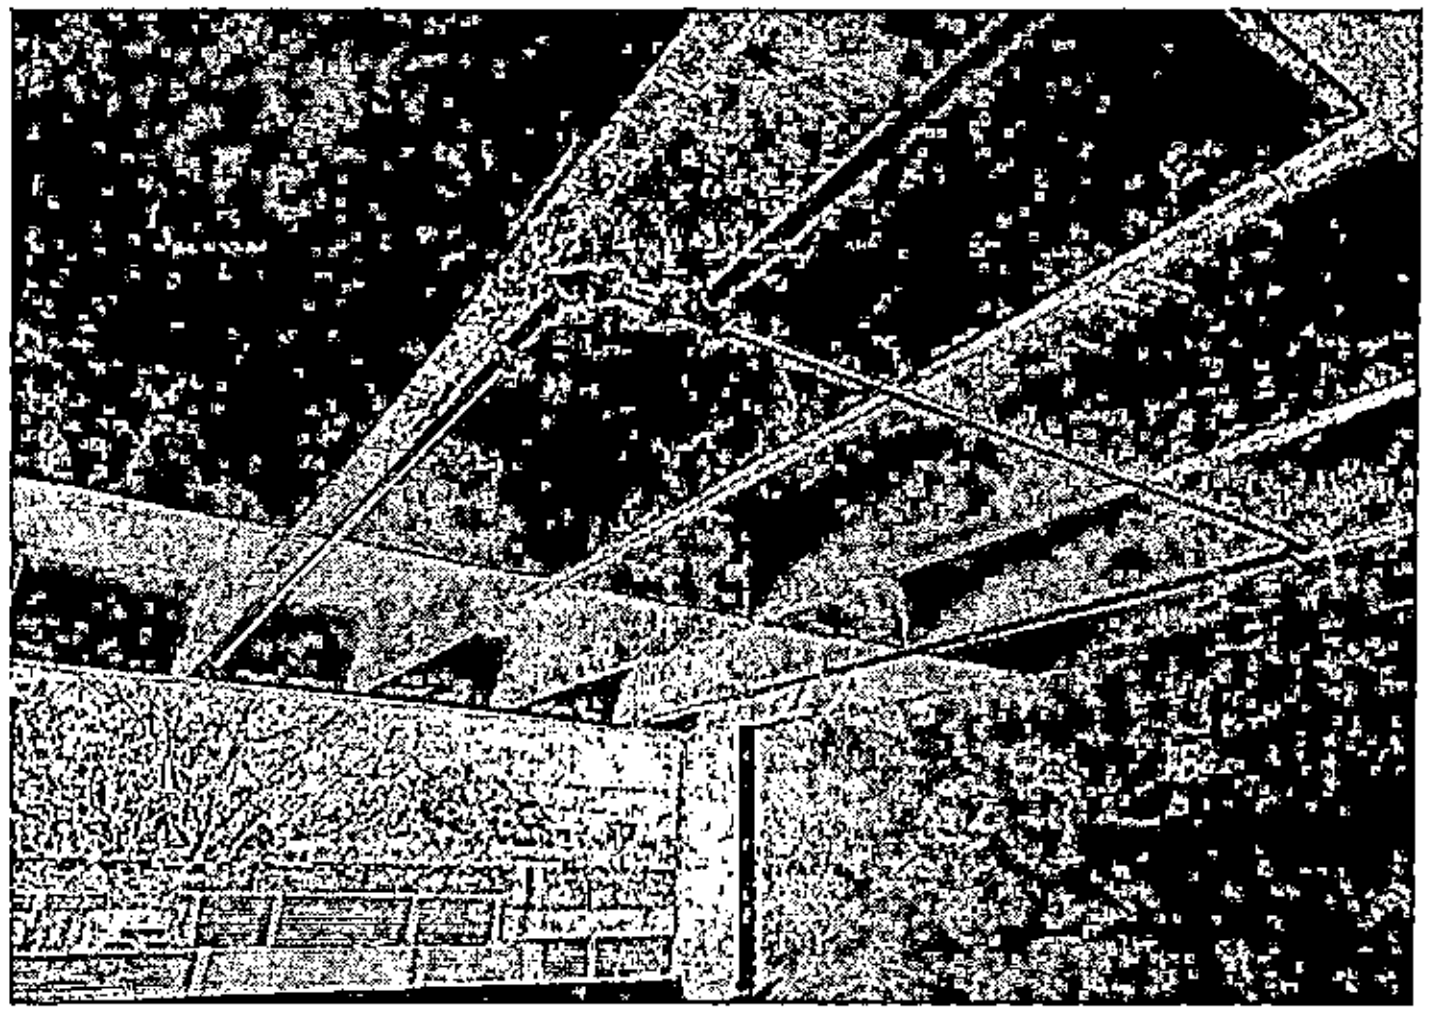

OBSERVACIONES

ELABORO	APROBÓ	REVISO
BRAYAN CUAVAS SALCEDO	RAFAEL CABRALES	ALEJANDRA SANCHEZ

Gobernación del MAGDALENA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA


CÓDIGO:	
VERSIÓN:	
FECHA DE APROBACIÓN	
PÁGINA	1 DE 1

ACTA PARCIAL DE OBRA No.	6	PERIODO DE EJECUCIÓN	19 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2026

CONTRATO DE OBRA No.			CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: CI-1324-2025		
CONTRATISTA	Consorcio Centro Cambia	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA	CONTRATISTA	CONSORCIO AVANZA MAGDALENA 025	OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA
DIRECTOR DE OBRA	JESUS CERVANTES		DIRECTOR INTERVENTORIA	DAVINSON GRAVINI POLO	
RESIDENTE DE OBRA	BRAYAN CUAVAS SALCEDO		RESIDENTE DE INTERVENTORIA	ALEJANDRA SANCHEZ CERÓN	
CAPITULO	20.00		SUBCAPITULO	20.03.05	FECHA
ITEM	20.03.05.25	DESCRIPCIÓN	MONTAJE ROCIADOR		UNIDAD: UN

No.	DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL
	MONTAJE ROCIADOR						40	40.00
							TOTAL ACTIVIDAD	40.00
							ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR	
							TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS	40.00

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA

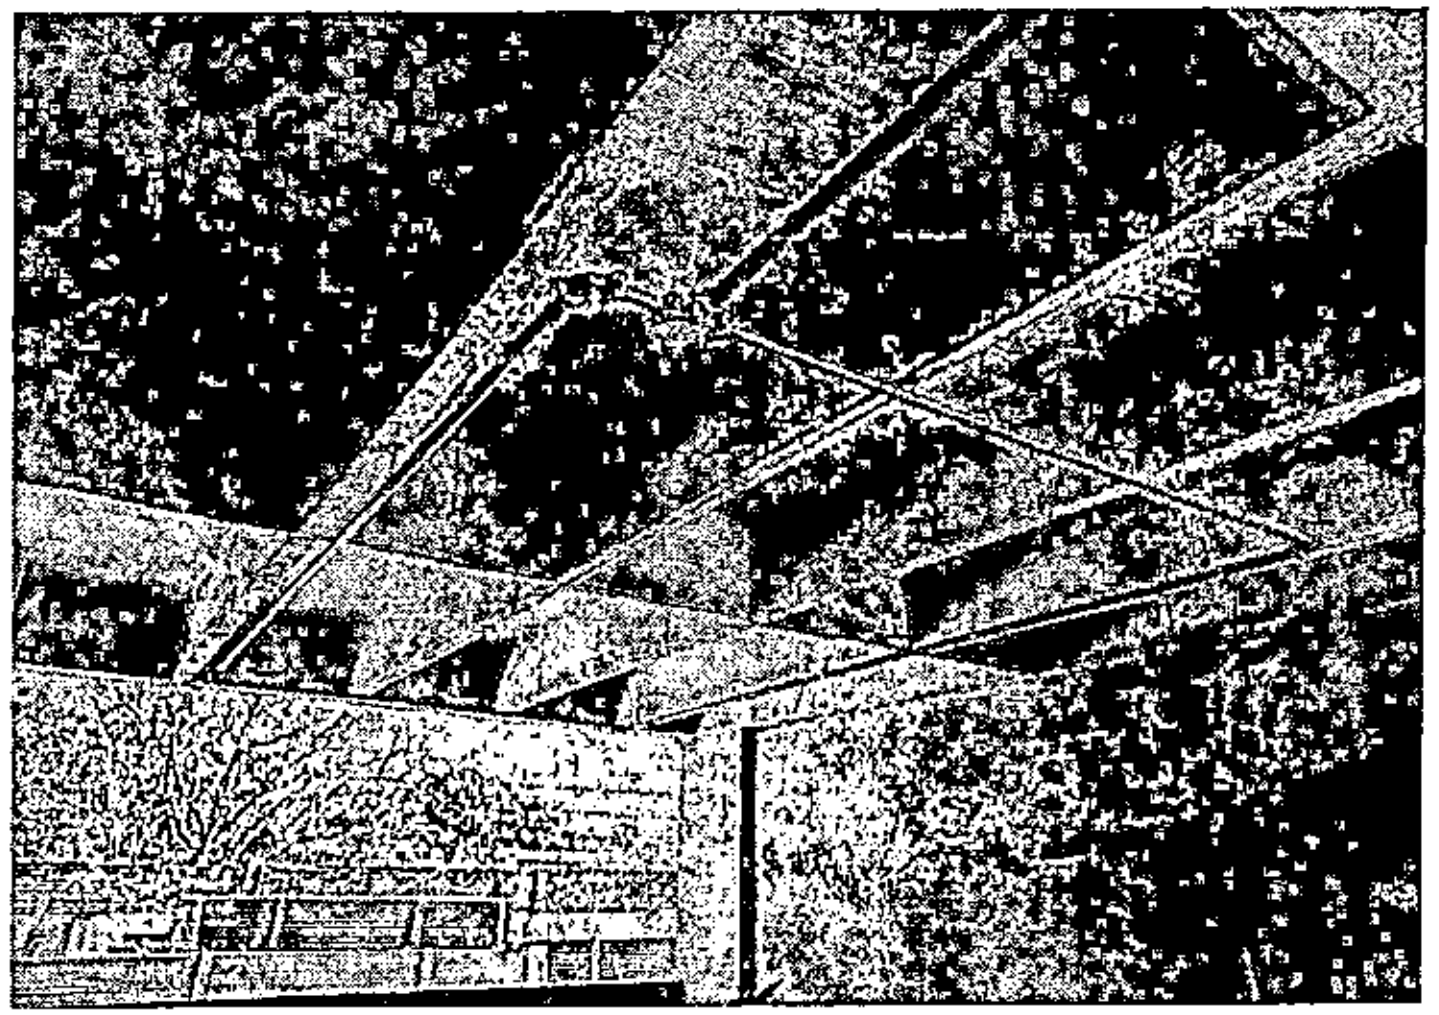

OBSERVACIONES

ELABORO	APROBÓ	REVISÓ
BRAYAN CUAVAS SALCEDO	RAFAEL CABRALES	ALEJANDRA SANCHEZ
Brayan Cuavas		

Gobernación del MAGDALENA


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO:	
VERSIÓN:	
FECHA DE APROBACIÓN	
PÁGINA	1 DE 1

ACTA PARCIAL DE OBRA No.	6	PERIODO DE EJECUCIÓN	19 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2026		
CONTRATO DE OBRA No.			CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CI-1324-2025		
CONTRATISTA	Consorcio Centro Cambia	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA	CONTRATISTA	CONSORCIO AVANZA MAGDALENA 025	OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA
DIRECTOR DE OBRA	JESUS CERVANTES		DIRECTOR INTERVENTORIA	DAVINSON GRAVINI POLO	
RESIDENTE DE OBRA	BRAYAN CUAVAS SALCEDO		RESIDENTE DE INTERVENTORIA	ALEJANDRA SANCHEZ CERÓN	
CAPITULO	20.00		SUBCAPITULO	20.03.06	FECHA
ITEM	20.03.06.01	DESCRIPCIÓN: SANITARIOS DE PUSH			UNIDAD: UN

NO.	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL
	SANITARIOS DE PUSH 4"						6	6.00
	Sanitarios de push 4" instalados según diseño.							
						TOTAL ACTIVIDAD		6.00
						ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR		
						TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS		6.00

LOCALIZACIÓN Y ESQUEMA

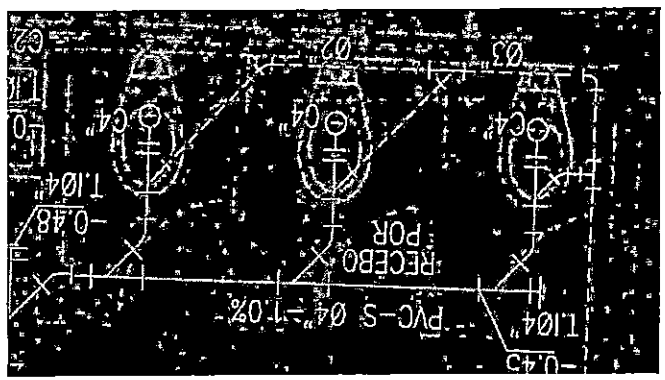

OBSERVACIONES

ELABORÓ	APROBÓ	REVISÓ
BRAYAN CUAVAS SALCEDO	RAFAEL CABRALES	ALEJANDRA SANCHEZ

Gobernación del MAGDALENA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO:	
VERSIÓN:	
FECHA DE APROBACIÓN	
PÁGINA	1 DE 1


ACTA PARCIAL DE OBRA No.	6	PERIODO DE EJECUCIÓN	19 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2026
CONTRATO DE OBRA No.		CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	CI-1324-2025
CONTRATISTA	Consorcio Centro Cambia	CONTRATISTA	CONSORCIO AVANZA MAGDALENA 025
DIRECTOR DE OBRA	JESUS CERVANTES	DIRECTOR INTERVENTORIA	DAVINSON GRAVINI POLO
RESIDENTE DE OBRA	BRAYAN CUAVAS SALCEDO	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	ALEJANDRA SANCHEZ CERÓN
CAPITULO	20.00	SUBCAPITULO	20.03.06
ITEM	20.03.06.02	DESCRIPCIÓN	LAVAMANOS
UNIDAD	UN		

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA

OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA

No.	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	CANTIDAD	TOTALES
	LAVAMANOS 2"						9	9.00
	Lavamanos 2" instalados según diseño.							
							TOTAL ACTIVIDAD	9.00
							ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR	
							TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS	9.00

LOCALIZACIÓN Y ESQUEMA

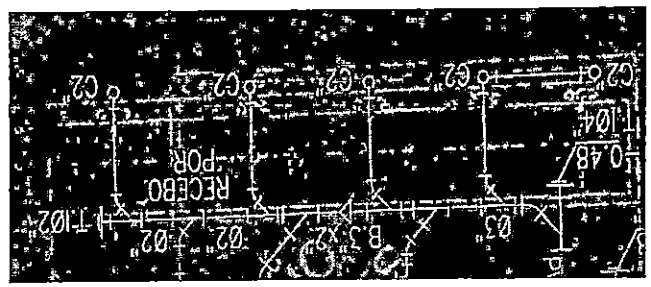

OBSERVACIONES

ELABORO	APROBÓ	REVISÓ
BRAYAN CUAVAS SALCEDO	RAFAEL CABRALES	ALEJANDRA SANCHEZ

Gobernación del MAGDALENA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA


CÓDIGO:	
VERSIÓN:	
FECHA DE APROBACIÓN	
PÁGINA	1 DE 1

ACTA PARCIAL DE OBRA No.	6	PERIODO DE EJECUCIÓN	19 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2026

CONTRATO DE OBRA No.			CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CI-1324-2025		
CONTRATISTA	Consorcio Centro Cambia	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA	CONTRATISTA	CONSORCIO AVANZA MAGDALENA 025	OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA
DIRECTOR DE OBRA	JESUS CERVANTES		DIRECTOR INTERVENTORIA	DAVINSON GRAVINI POLO	
RESIDENTE DE OBRA	BRAYAN CUAVAS SALCEDO		RESIDENTE DE INTERVENTORIA	ALEJANDRA SANCHEZ CERÓN	
CAPITULO	20.00		SUBCAPITULO	20.03.06	FECHA
ITEM 20.03.06.03	DESCRIPCIÓN	ORINAL			UNIDAD UN

No	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL
	ORINAL 2"						4	4.00
	Orinal 2" instalados según diseño.							
							TOTAL ACTIVIDAD	4.00
							ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR	
							TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS	4.00

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA

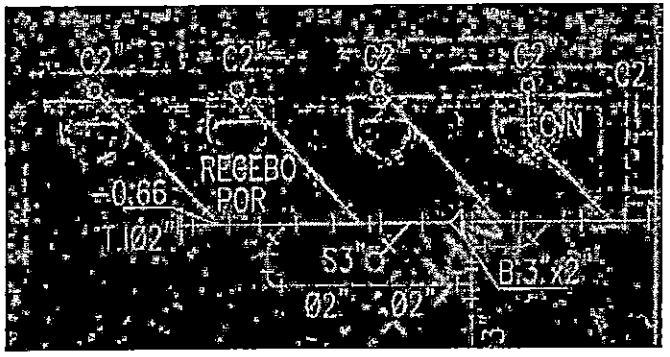

OBSERVACIONES

ELABORO	APROBO	REVISO
BRAYAN CUAVAS SALCEDO	RAFAEL CABRALES	ALEJANDRA SANCHEZ

Gobernación del MAGDALENA


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO:	
VERSIÓN:	
FECHA DE APROBACIÓN	
PÁGINA	1 DE 1

ACTA PARCIAL DE OBRA No.	6	PERIODO DE EJECUCIÓN	19 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2026		
CONTRATO DE OBRA No.			CONTRATO DE INTERVENTORIA No. GI-1324-2025		
CONTRATISTA	Consorcio Centro Cambia	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA	CONTRATISTA	CONSORCIO AVANZA MAGDALENA 025	OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA
DIRECTOR DE OBRA	JESUS CERVANTES		DIRECTOR INTERVENTORIA	DAVINSON GRAVINI POLO	
RESIDENTE DE OBRA	BRAYAN CUAVAS SALCEDO		RESIDENTE DE INTERVENTORIA	ALEJANDRA SANCHEZ CERÓN	
CAPITULO	20.00		SUBCAPITULO	20.03.06	FECHA:
ITEM	20.03.06.05	DESCRIPCIÓN	SIFON DE PISO		UNIDAD: UN

NO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL
	SIFON DE PISO 3"						4	4.00
	Sifón de piso 3" instalados según diseño.							
						TOTAL ACTIVIDAD		4.00
						ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR		
						TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS		4.00

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA

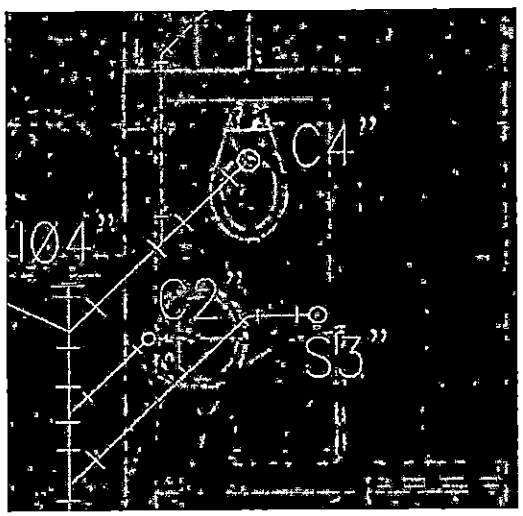

OBSERVACIONES

ELABORÓ	APROBÓ	REVISÓ
BRAYAN CUAVAS SALCEDO	RAFAEL CABRALES	ALEJANDRA SANCHEZ

Gobernación del MAGDALENA


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO:	
VERSIÓN:	
FECHA DE APROBACIÓN	
PÁGINA	1 DE 1

ACTA PARCIAL DE OBRA No.	6	PERIODO DE EJECUCIÓN	19 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2026		
CONTRATO DE OBRA No.			CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CI-1324-2025		
CONTRATISTA	Consorcio Centro Cambia	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA	CONTRATISTA	CONSORCIO AVANZA MAGDALENA 025	OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA
DIRECTOR DE OBRA	JESUS CERVANTES		DIRECTOR INTERVENTORIA	DAVINSON GRAVINI POLO	
RESIDENTE DE OBRA	BRAYAN CUAVAS SALCEDO		RESIDENTE DE INTERVENTORIA	ALEJANDRA SANCHEZ CERÓN	
CAPITULO	20.00		SUBCAPITULO	20.03.07	FECHA
ITEM	20.03.07.01	DESCRIPCIÓN	TUBERIA PVC-S		UNIDAD: ML

NO.	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL
	TUBERIA PVC-S 6"	5						5.00
							TOTAL ACTIVIDAD	5.00
							ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR	
							TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS	5.00

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA

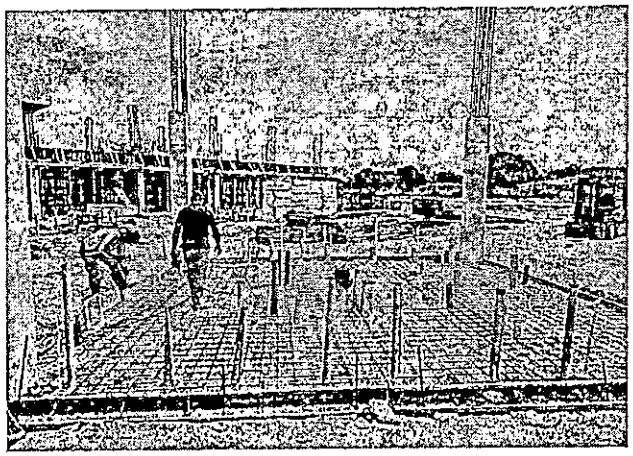

OBSERVACIONES

ELABORO	APROBÓ	REVISÓ
BRAYAN CUAVAS SALCEDO	RAFAEL CABRALES	ALEJANDRA SANCHEZ

Gobernación del MAGDALENA


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO:	
VERSIÓN:	
FECHA DE APROBACIÓN	
PÁGINA	1 DE 1

ACTA PARCIAL DE OBRA No.	6	PERIODO DE EJECUCIÓN	19 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2026		
CONTRATO DE OBRA No.		CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: CI-1324-2025			
CONTRATISTA	Consorcio Centro Cambia	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA	CONTRATISTA	CONSORCIO AVANZA MAGDALENA 025	OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA
DIRECTOR DE OBRA	JESUS CERVANTES		DIRECTOR INTERVENTORIA	DAVINSON GRAVINI POLO	
RESIDENTE DE OBRA	BRAYAN CUAVAS SALCEDO		RESIDENTE DE INTERVENTORIA	ALEJANDRA SANCHEZ CERÓN	
CAPITULO	20.00		SUBCAPITULO	20.03.07	FECHA
ITEM	20.03.07.02	DESCRIPCIÓN	TUBERIA PVC-L		UNIDAD: ML

NO.	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL
	TUBERIA PVC-L 3"	33						33.00
							TOTAL ACTIVIDAD	33.00
							ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR	
							TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS	33.00

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA

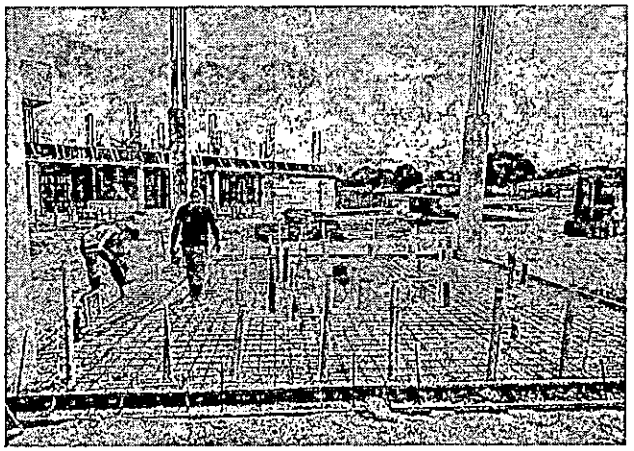

OBSERVACIONES

ELABORÓ	APROBÓ	REVISÓ
BRAYAN CUAVAS SALCEDO	RAFAEL CABRALES	ALEJANDRA SANCHEZ

Gobernación del MAGDALENA


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO:	
VERSIÓN:	
FECHA DE APROBACIÓN	
PÁGINA	1 DE 1

ACTA PARCIAL DE OBRA No.	6	PERIODO DE EJECUCIÓN	19 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2026		
CONTRATO DE OBRA No.			CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	CI-1324-2025	
CONTRATISTA	Consorcio Centro Cambia	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA	CONTRATISTA	CONSORCIO AVANZA MAGDALENA 025	OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA
DIRECTOR DE OBRA	JESÚS CERVANTES		DIRECTOR INTERVENTORIA	DAVINSON GRAVINI POLO	
RESIDENTE DE OBRA	BRAYAN CUAVAS SALCEDO		RESIDENTE DE INTERVENTORIA	ALEJANDRA SANCHEZ CERÓN	
CAPITULO:	20.00		SUBCAPITULO	20.03.07	FECHA:
ITEM	20.03.07.03	DESCRIPCIÓN	TUBERIA PVC-L		UNIDAD: ML

No.	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL
	TUBERIA PVC-L 2"	8						8.00

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA

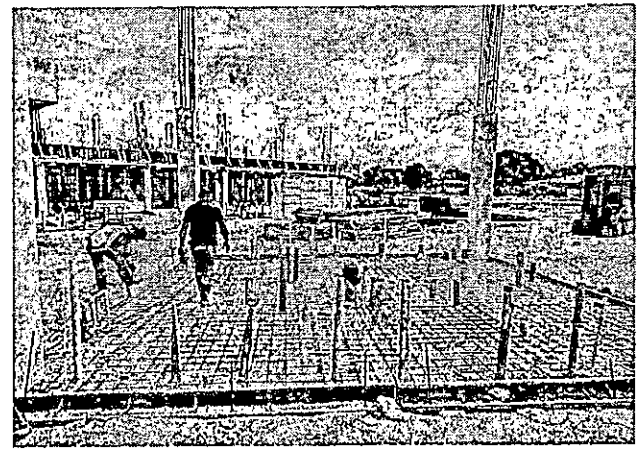

TOTAL ACTIVIDAD	8.00
ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR	
TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS	8.00

OBSERVACIONES

ELABORÓ	APROBÓ	REVISÓ
BRAYAN CUAVAS SALCEDO	RAFAEL CABRALES	ALEJANDRA SANCHEZ

Gobernación del MAGDALENA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA


CÓDIGO:	
VERSIÓN:	
FECHA DE APROBACIÓN	
PÁGINA	1 DE 1

ACTA PARCIAL DE OBRA No.	6	PERIODO DE EJECUCIÓN:	19 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2026

CONTRATO DE OBRA No:			CONTRATO DE INTERVENTORIA No: CI-1324-2025		
CONTRATISTA	Consorcio Centro Cambia	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA	CONTRATISTA	CONSORCIO AVANZA MAGDALENA 025	OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA
DIRECTOR DE OBRA	JESUS CERVANTES		DIRECTOR INTERVENTORIA	DAVINSON GRAVINI POLO	
RESIDENTE DE OBRA	BRAYAN CUAVAS SALCEDO		RESIDENTE DE INTERVENTORIA	ALEJANDRA SANCHEZ CERÓN	
CAPITULO:	20.00		SUBCAPITULO	20.03.08	FECHA:
ITEM	20.03.08.01	DESCRIPCIÓN	TUBERIA PVC-S		UNIDAD: ML

ITEM	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL
	TUBERIA PVC-S 6"	10						10.00
							TOTAL ACTIVIDAD	10.00
							ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR	
							TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS	10.00

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA

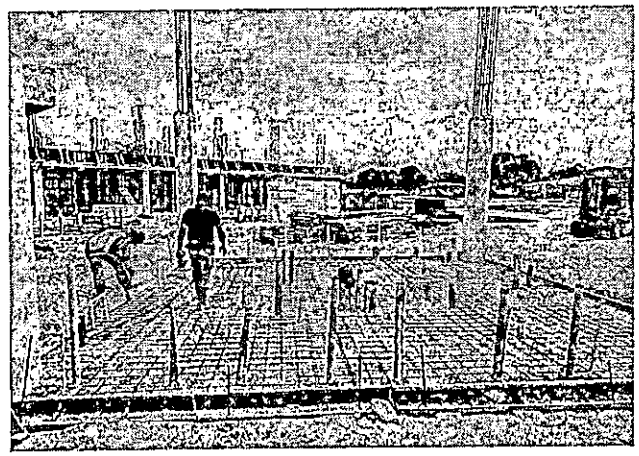

OBSERVACIONES

ELABORÓ	APROBÓ	REVISÓ
BRAYAN CUAVAS SALCEDO	RAFAEL CABRALES	ALEJANDRA SANCHEZ

Gobernación del MAGDALENA


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO:	
VERSIÓN:	
FECHA DE APROBACIÓN	
PÁGINA	1 DE 1

ACTA PARCIAL DE OBRA No.	6	PERIODO DE EJECUCIÓN	19 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2026		
CONTRATO DE OBRA No.			CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: CI-1324-2025		
CONTRATISTA	Consorcio Centro Cambia	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA	CONTRATISTA	CONSORCIO AVANZA MAGDALENA 025	OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA
DIRECTOR DE OBRA	JESUS CERVANTES		DIRECTOR INTERVENTORIA	DAVINSON GRAVINI POLO	
RESIDENTE DE OBRA	BRAYAN CUAVAS SALCEDO		RESIDENTE DE INTERVENTORIA	ALEJANDRA SANCHEZ CERÓN	
CAPITULO	20.00		SUBCAPITULO	20.03.08	FECHA
ITEM	20.03.08.02	DESCRIPCIÓN	TUBERIA PVC-S		UNIDAD: ML

NO.	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL
	TUBERIA PVC-S 4"	42.08						42.08
							TOTAL ACTIVIDAD	42.08
							ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR	
							TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS	42.08

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA

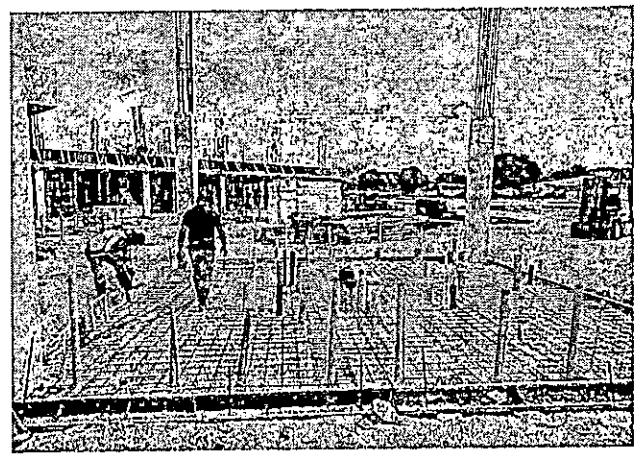

OBSERVACIONES

ELABORO	APROBO	REVISO
BRAYAN CUAVAS SALCEDO	RAFAEL CABRALES	ALEJANDRA SANCHEZ

Gobernación del MAGDALENA	# MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	CÓDIGO:	
		VERSIÓN:	
		FECHA DE APROBACIÓN	
		PÁGINA	1 DE 1


ACTA PARCIAL DE OBRA No.	6	PERIODO DE EJECUCIÓN	19 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2026

CONTRATO DE OBRA No.			CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CI-1324-2025		
CONTRATISTA	Consorcio Centro Cambia	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA	CONTRATISTA	CONSORCIO AVANZA MAGDALENA 025	OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA
DIRECTOR DE OBRA	JESUS CERVANTES		DIRECTOR INTERVENTORIA	DAVINSON GRAVINI POLO	
RESIDENTE DE OBRA	BRAYAN CUAVAS SALCEDO		RESIDENTE DE INTERVENTORIA	ALEJANDRA SANCHEZ CERÓN	
CAPITULO	20.00		SUBCAPITULO	20.03.08	FECHA:

ITEM	20.03.08.03	DESCRIPCIÓN	TUBERIA PVC-S	UNIDAD	ML

No.	DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL
	TUBERIA PVC-S 3"	17.81						17.81
							TOTAL ACTIVIDAD	17.81
							ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR	
							TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS	17.81

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA

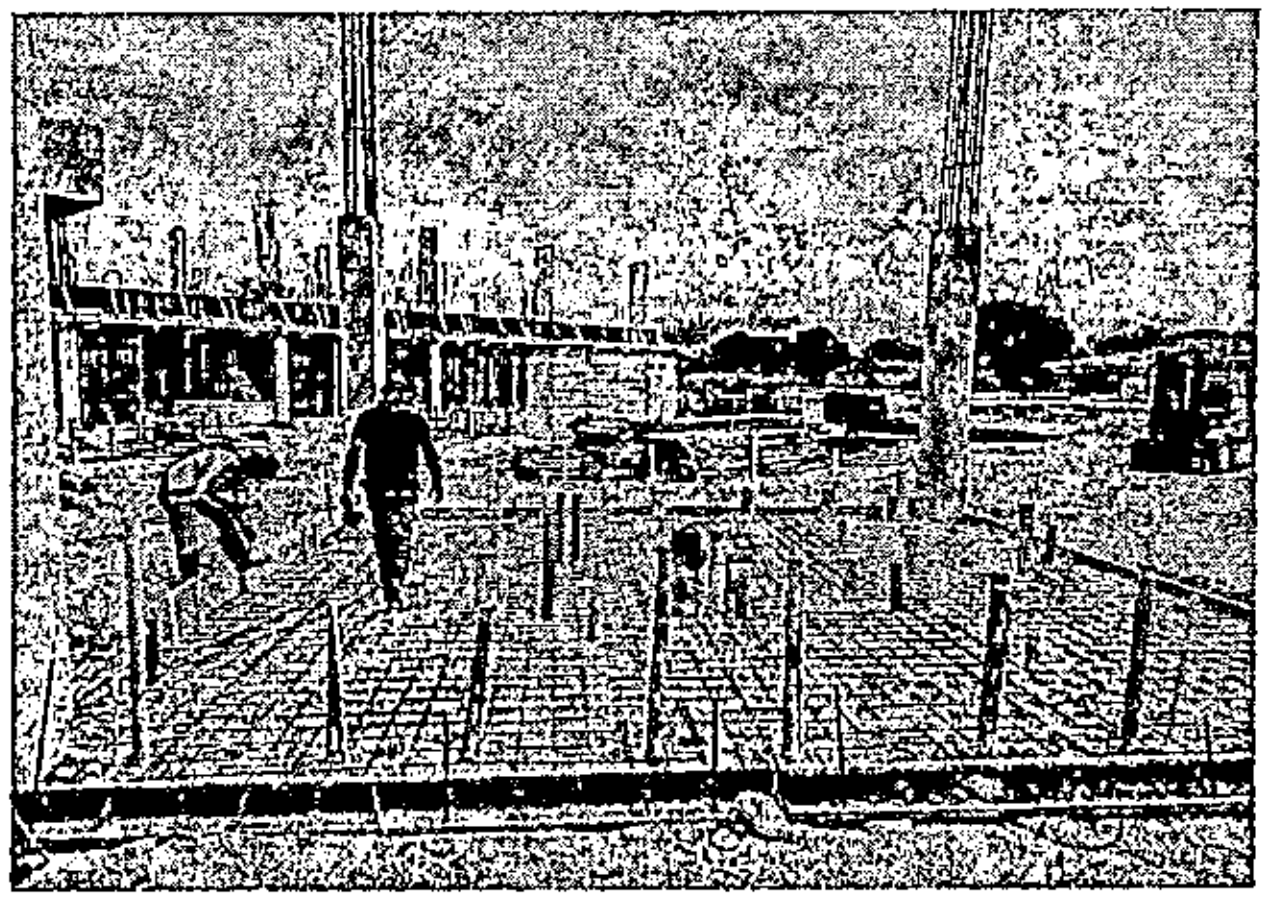

OBSERVACIONES

ELABORÓ	APROBÓ	REVISÓ
BRAYAN CUAVAS SALCEDO	RAFAEL CABRALES	ALEJANDRA SANCHEZ

Gobernación del MAGDALENA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO:	
VERSIÓN:	
FECHA DE APROBACIÓN	
PÁGINA	1 DE 1

ACTA PARCIAL DE OBRA No	6	PERIODO DE EJECUCIÓN	19 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2026
CONTRATO DE OBRA No.		CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CI-1324-2025	
CONTRATISTA	Consorcio Centro Cambia	CONTRATISTA	CONSORCIO AVANZA MAGDALENA 025
DIRECTOR DE OBRA	JESUS CERVANTES	DIRECTOR INTERVENTORIA	DAVINSON GRAVINI POLO
RESIDENTE DE OBRA	BRAYAN CUAVAS SALCEDO	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	ALEJANDRA SANCHEZ CERÓN
CAPITULO	20.00	SUBCAPITULO	20.03.08
ITEM	20.03.08.04	DESCRIPCIÓN	TUBERIA PVC-S

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA


OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA

FECHA:

UNIDAD: ML

No.	DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL
	TUBERIA PVC-S 2"	33.66						33.66
							TOTAL ACTIVIDAD	33.66
							ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR	
							TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS	33.66

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA

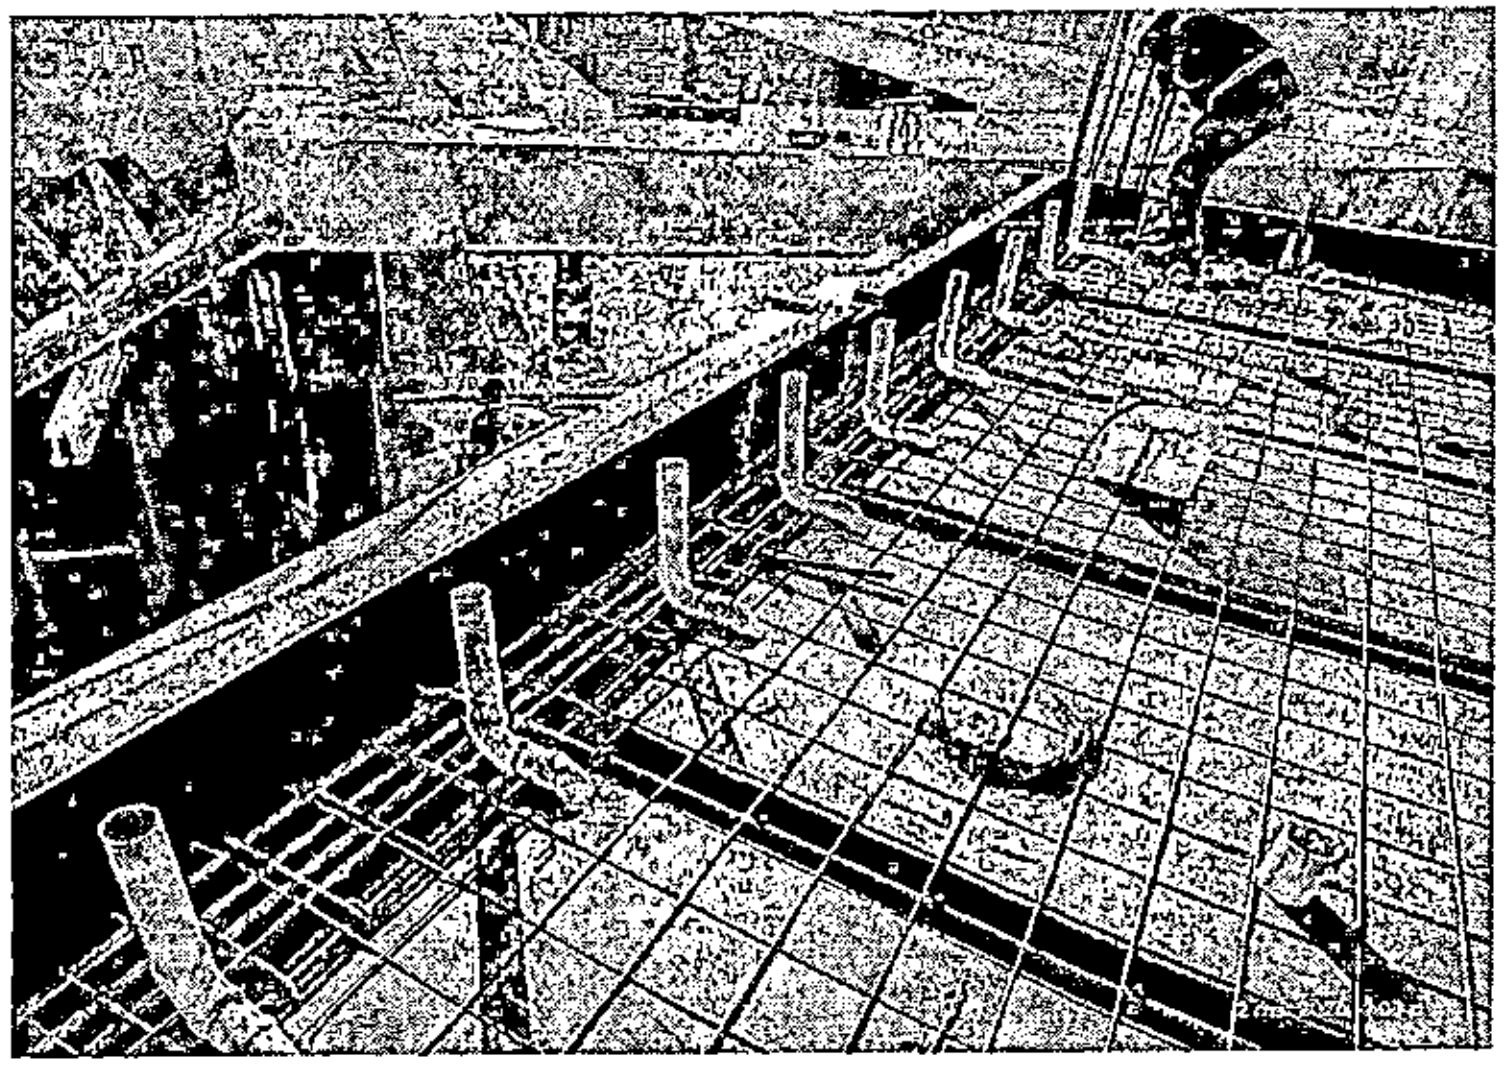

OBSERVACIONES

ELABORÓ	APROBÓ	REVISÓ
BRAYAN CUAVAS SALCEDO	RAFAEL CABRALES	ALEJANDRA SANCHEZ

Gobernación del MAGDALENA


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO:	
VERSIÓN:	
FECHA DE APROBACIÓN	
PÁGINA	1 DE 1

ACTA PARCIAL DE OBRA No.	6	PERIODO DE EJECUCIÓN	19 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2026		
CONTRATO DE OBRA No.			CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CI-1324-2025		
CONTRATISTA	Consorcio Centro Cambia	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA	CONTRATISTA	CONSORCIO AVANZA MAGDALENA 025	OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA
DIRECTOR DE OBRA	JESUS CERVANTES		DIRECTOR INTERVENTORIA	DAVINSON GRAVINI POLO	
RESIDENTE DE OBRA	BRAYAN CUAVAS SALCEDO		RESIDENTE DE INTERVENTORIA	ALEJANDRA SANCHEZ CERÓN	
CAPITULO:	20.00		SUBCAPITULO	20.03.08	FECHA:
ITEM	20.03.08.05	DESCRIPCIÓN	TUBERIA PVC-L		UNIDAD: ML

No.	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	# CANTIDAD	TOTAL
	TUBERIA PVC-L 3"	33.66						33.66
							TOTAL ACTIVIDAD	33.66
							ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR	
							TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS	33.66

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA

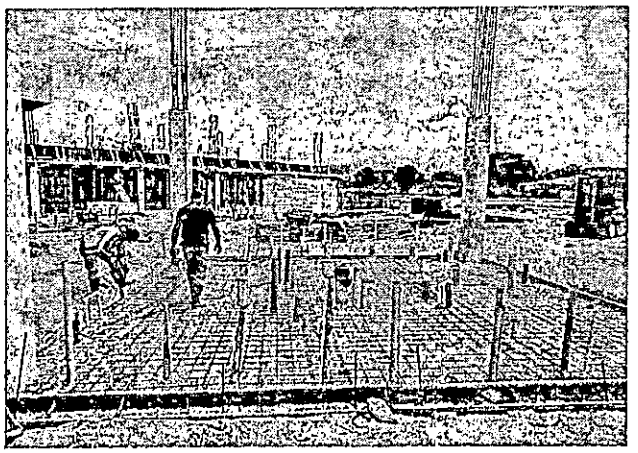

OBSERVACIONES

ELABORÓ	APROBÓ	REVISÓ
BRAYAN CUAVAS SALCEDO	RAFAEL CABRALES	ALEJANDRA SANCHEZ

Gobernación del MAGDALENA


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO:	
VERSIÓN:	
FECHA DE APROBACIÓN	
PÁGINA	1 DE 1

ACTA PARCIAL DE OBRA No.	6	PERIODO DE EJECUCIÓN	19 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2026		
CONTRATO DE OBRA No.			CONTRATO DE INTERVENTORIA No. GI-1324-2025		
CONTRATISTA	Consorcio Centro Cambia	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA	CONTRATISTA	CONSORCIO AVANZA MAGDALENA 025	OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA
DIRECTOR DE OBRA	JESUS CERVANTES		DIRECTOR INTERVENTORIA	DAVINSON GRAVINI POLO	
RESIDENTE DE OBRA	BRAYAN CUAVAS SALCEDO		RESIDENTE DE INTERVENTORIA	ALEJANDRA SANCHEZ CERÓN	
CAPITULO	20.00		SUBCAPITULO	20.03.08	FECHA
ITEM	20.03.08.06	DESCRIPCIÓN	TUBERIA PVC-L	UNIDAD	ML

No.	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL
	TUBERIA PVC-L 2"	56.91						56.91
							TOTAL ACTIVIDAD	56.91
							ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR	
							TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS	56.91

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA

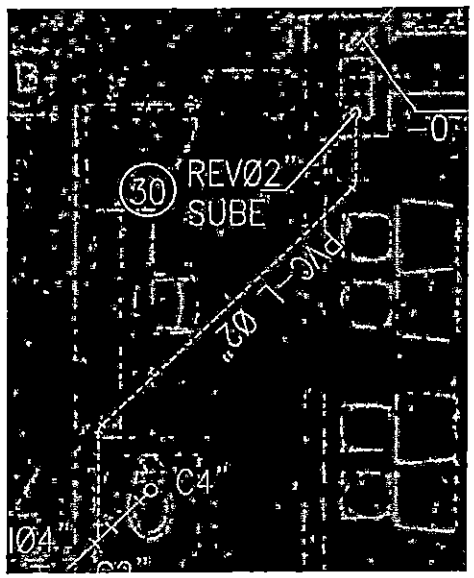

OBSERVACIONES

ELABORÓ	APROBÓ	REVISÓ
BRAYAN CUAVAS SALCEDO	RAFAEL CABRALES	ALEJANDRA SANCHEZ

Gobernación del **MAGDALENA**

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA


CÓDIGO:	
VERSIÓN:	
FECHA DE APROBACIÓN	
PÁGINA	1 DE 1

ACTA PARCIAL DE OBRA No.	6	PERIODO DE EJECUCIÓN	19 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2026

CONTRATO DE OBRA No.			CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CI-1324-2025		
CONTRATISTA	Consorcio Centro Cambia	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA	CONTRATISTA	CONSORCIO AVANZA MAGDALENA 025	OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA
DIRECTOR DE OBRA	JESUS CERVANTES		DIRECTOR INTERVENTORIA	DAVINSON GRAVINI POLO	
RESIDENTE DE OBRA	BRAYAN CUAVAS SALCEDO		RESIDENTE DE INTERVENTORIA	ALEJANDRA SANCHEZ CERÓN	
CAPÍTULO	20.00		SUBCAPITULO	20.03.09	FECHA:
ITEM	20.03.09.01	DESCRIPCIÓN	TUBERIA PVC-S		UNIDAD: ML

No.	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL
	TUBERIA PVC-S 6"	15						15.00
							TOTAL ACTIVIDAD	15.00
							ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR	
							TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS	15.00

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA

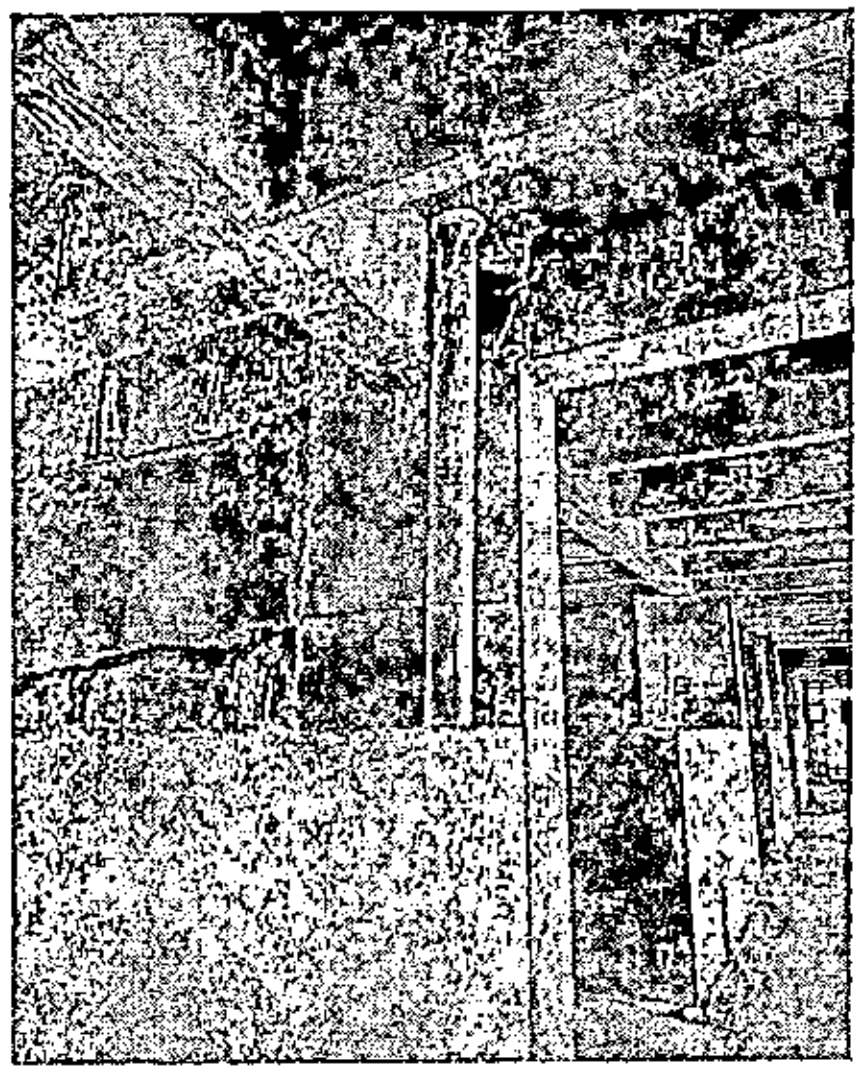

OBSERVACIONES

ELABORÓ	APROBÓ	REVISÓ
BRAYAN CUAVAS SALCEDO	RAFAEL CABRALES	ALEJANDRA SANCHEZ

Gobernación del MAGDALENA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO:	
VERSIÓN:	
FECHA DE APROBACIÓN	
PÁGINA	1 DE 1

ACTA PARCIAL DE OBRA No.	6	PERIODO DE EJECUCIÓN	19 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2026
CONTRATO DE OBRA No.		CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CI-1324-2025	
CONTRATISTA	Consorcio Centro Cambia	CONTRATISTA	CONSORCIO AVANZA MAGDALENA 025
DIRECTOR DE OBRA	JESUS CERVANTES	DIRECTOR INTERVENTORIA	DAVINSON GRAVINI POLO
RESIDENTE DE OBRA	BRAYAN CUAVAS SALCEDO	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	ALEJANDRA SANCHEZ CERÓN
CAPITULO	20.00	SUBCAPITULO	20.05.12
ITEM	20.05.12.02	DESCRIPCIÓN	CAJAS DE INSPECCION TIPO C (80X80)

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA


OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA

FECHA:

UNIDAD: UN

No.	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL
	CAJAS DE INSPECCION TIPO C (80X80)						3	3.00
	TOTAL ACTIVIDAD							3.00
	ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR							
	TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS							3.00

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA

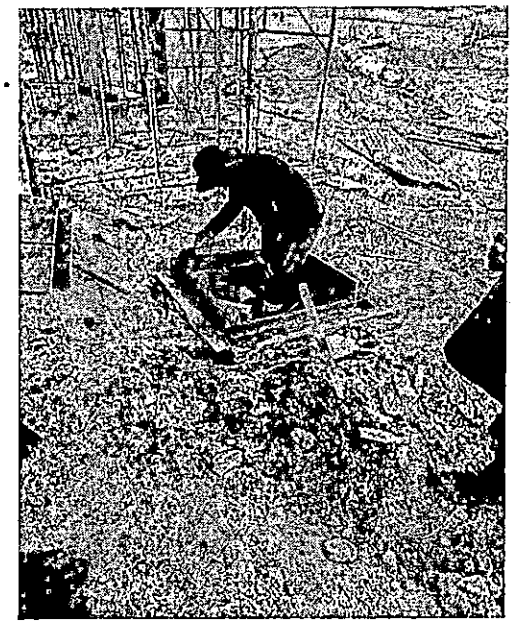

OBSERVACIONES

ELABORÓ	APROBÓ	REVISÓ
BRAYAN CUAVAS SALCEDO	RAFAEL CABRALES	ALEJANDRA SANCHEZ

Gobernación del MAGDALENA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO:	
VERSIÓN:	
FECHA DE APROBACIÓN	
PÁGINA	1 DE 1

ACTA PARCIAL DE OBRA No.	6	PERÍODO DE EJECUCIÓN	19 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2026		
CONTRATO DE OBRA No.			CONTRATO DE INTERVENTORIA No. GI-1324-2025		
CONTRATISTA	Consorcio Centro Cambia	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA	CONTRATISTA	CONSORCIO AVANZA MAGDALENA 025	OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA
DIRECTOR DE OBRA	JESUS CERVANTES		DIRECTOR INTERVENTORIA	DAVINSON GRAVINI POLO	
RESIDENTE DE OBRA	BRAYAN CUAVAS SALCEDO		RESIDENTE DE INTERVENTORIA	ALEJANDRA SANCHEZ CERÓN	
CAPITULO	20.00		SUBCAPITULO	20.03.05	FECHA
ITEM	20.03.19.08	DESCRIPCIÓN: KIT DE TRANSICION ACERO A C900			UNIDAD: UN

NO.	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL	LOCALIZACIÓN / ESQUEMA
	KIT DE TRANSICION ACERO A C900 4"						4	4.00	
	TOTAL ACTIVIDAD							4.00	
	ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR								
	TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS							4.00	

OBSERVACIONES

ELABORO	APROBÓ	REVISÓ
BRAYAN CUAVAS SALCEDO	RAFAEL CABRALES	ALEJANDRA SANCHEZ

Gobernación del **MAGDALENA**	**MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA**	CÓDIGO:	
		VERSIÓN:	
		FECHA DE APROBACIÓN	
		PÁGINA	1 DE 1


ACTA PARCIAL DE OBRA No.	6	PERIODO DE EJECUCIÓN	19 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2026

CONTRATO DE OBRA No.			CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CI-1324-2025		
CONTRATISTA	Consorcio Centro Cambia	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA	CONTRATISTA	CONSORCIO AVANZA MAGDALENA 025	OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA
DIRECTOR DE OBRA	JESUS CERVANTES		DIRECTOR INTERVENTORIA	DAVINSON GRAVINI POLO	
RESIDENTE DE OBRA	BRAYAN CUAVAS SALCEDO		RESIDENTE DE INTERVENTORIA	ALEJANDRA SANCHEZ CERÓN	
CAPITULO	23.00		SUBCAPITULO	23.4	FECHA

ITEM	23.4.8	DESCRIPCIÓN	Alimentador a tablero iluminación exterior (TIE) trifásico 440V de baja tensión en cable de cobre aislado 4 AWG THW (fases), 6 AWG THW (neutro), 8 AWG THW (tierra) en ducto conduit PVC de 1x1 1/4" . Long: 8m.	UNIDAD	ML

No.	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL
	Alimentador a tablero iluminación exterior (TIE) trifásico 440V de baja tensión en cable de cobre aislado 4 AWG THW (fases), 6 AWG THW (neutro), 8 AWG THW (tierra) en ducto conduit PVC de 1x1 1/4" . Long: 8m.	8						8.00
							TOTAL ACTIVIDAD	8.00
							ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR	
							TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS	8.00

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA

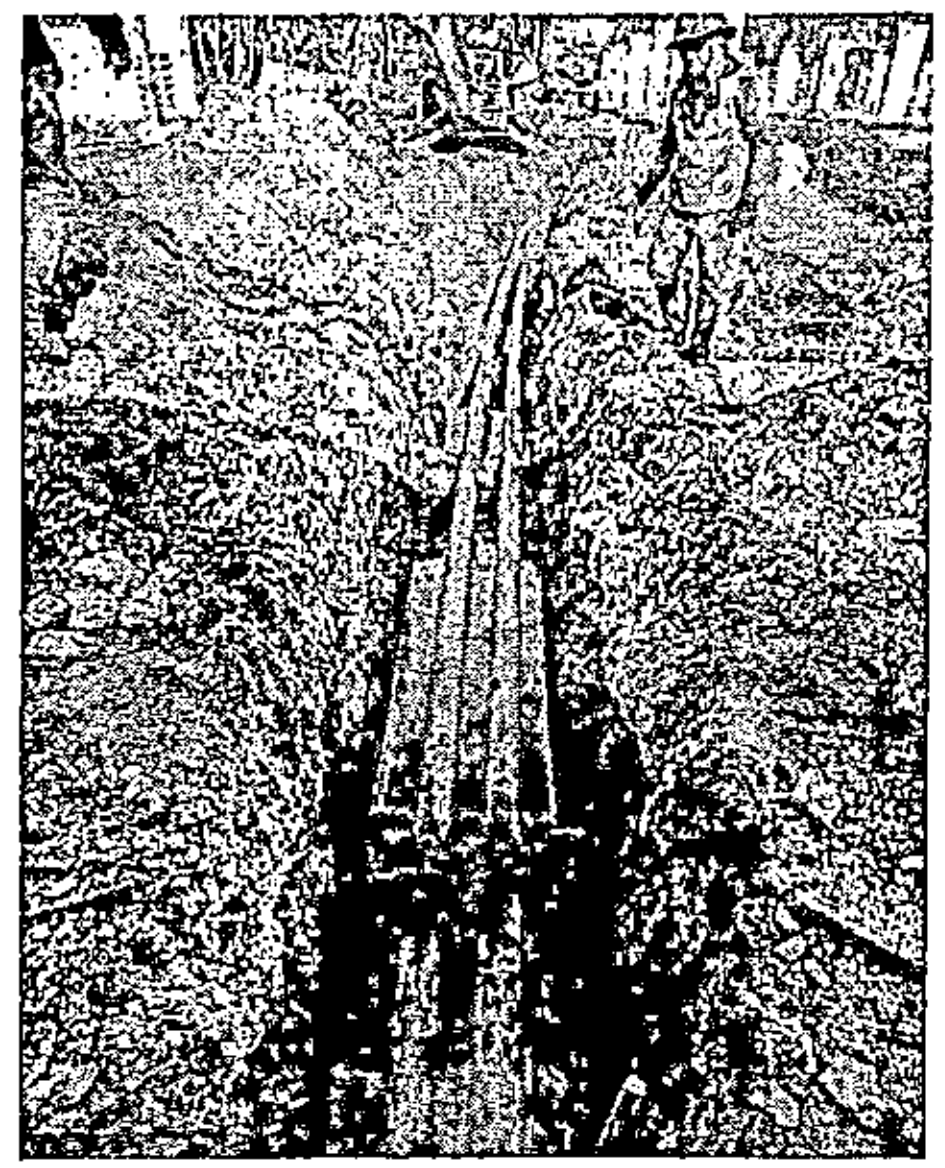

OBSERVACIONES

ELABORÓ	APROBÓ	REVISÓ
BRAYAN CUAVAS SALCEDO	RAFAEL CABRALES	ALEJANDRA SANCHEZ

Gobernación del MAGDALENA


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO:	
VERSIÓN:	
FECHA DE APROBACIÓN	
PÁGINA	1 DE 1

ACTA PARCIAL DE OBRA No.	6		PERIODO DE EJECUCIÓN	19 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2026	
CONTRATO DE OBRA No.				CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CI-1324-2025	
CONTRATISTA	Consorcio Centro Cambia	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA	CONTRATISTA	CONSORCIO AVANZA MAGDALENA 025	OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA
DIRECTOR DE OBRA	JESUS CERVANTES		DIRECTOR INTERVENTORIA	DAVINSON GRAVINI POLO	
RESIDENTE DE OBRA	BRAYAN CUAVAS SALCEDO		RESIDENTE DE INTERVENTORIA	ALEJANDRA SANCHEZ CERÓN	
CAPITULO:	23.00		SUBCAPITULO	23.5	FECHA:
ITEM	23.5.1	DESCRIPCIÓN: Alimentador trifásico 220V desde transformador trifásico reductor hasta el tablero principal de 220V en cable de cobre aislado 3x500 MCM Centelflex (fases), 3x 500 MCM Centelflex (neutro), 3/0 AWG Centelflex (tierra) en ducto conduit PVC de 3x4". Long: 28m.			UNIDAD: ML

NO.	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL
	Alimentador trifásico 220V desde transformador trifásico reductor hasta el tablero principal de 220V en cable de cobre aislado 3x500 MCM Centelflex (fases), 3x 500 MCM Centelflex (neutro), 3/0 AWG Centelflex (tierra) en ducto conduit PVC de 3x4". Long: 28m.	28						28.00
							TOTAL ACTIVIDAD	28.00
							ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR	
							TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS	28.00

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA

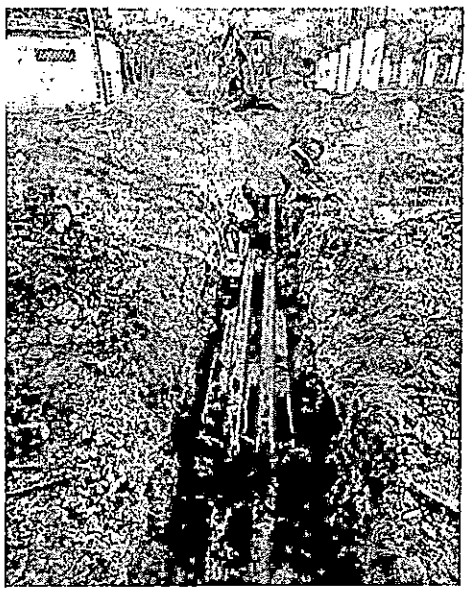

OBSERVACIONES

ELABORÓ	APROBÓ	REVISÓ
BRAYAN CUAVAS SALCEDO	RAFAEL CABRALES	ALEJANDRA SANCHEZ

Gobernación del MAGDALENA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO:	
VERSIÓN:	
FECHA DE APROBACIÓN	
PÁGINA	1 DE 1

ACTA PARCIAL DE OBRA No.	6		PERIODO DE EJECUCIÓN	19 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2026	
CONTRATO DE OBRA No.			CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CI-1324-2025		
CONTRATISTA	Consorcio Centro Cambia	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA	CONTRATISTA	CONSORCIO AVANZA MAGDALENA 025	OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA
DIRECTOR DE OBRA	JESUS CERVANTES		DIRECTOR INTERVENTORIA	DAVINSON GRAVINI POLO	
RESIDENTE DE OBRA	BRAYAN CUAVAS SALCEDO		RESIDENTE DE INTERVENTORIA	ALEJANDRA SANCHEZ CERÓN	
CAPITULO	23.00		SUBCAPITULO	23.5	FECHA:
ITEM	23.5.3	DESCRIPCIÓN: Alimentador a tablero de iluminaciòn pasillos en cable de cobre aislado 6 AWG THW (fases), 8 AWG THW (neutro), 8 AWG THW (tierra) en ducto conduit PVC de 1x1 1/4" . Long: 8m		UNIDAD	ML

NO.	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	CANTIDAD	CANTIDAD TOTAL
	Alimentador a tablero de iluminaciòn pasillos en cable de cobre aislado 6 AWG THW (fases), 8 AWG THW (neutro), 8 AWG THW (tierra) en ducto conduit PVC de 1x1 1/4" . Long: 8m	8						8.00
	TOTAL ACTIVIDAD							8.00
	ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR							
	TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS							8.00

LOCALIZACIÓN Y ESQUEMA



OBSERVACIONES

ELABORO	APROBÓ	REVISÓ
BRAYAN CUAVAS SALCEDO	RAFAEL CABRALES	ALEJANDRA SANCHEZ

Gobernación del **MAGDALENA**

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO:	
VERSIÓN:	
FECHA DE APROBACIÓN	
PÁGINA	1 DE 1

ACTA PARCIAL DE OBRA No.	6	PERIODO DE EJECUCIÓN	19 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2026

CONTRATO DE OBRA No.

CONTRATISTA	Consorcio Centro Cambia	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA
DIRECTOR DE OBRA	JESUS CERVANTES	
RESIDENTE DE OBRA	BRAYAN CUAVAS SALCEDO	
CAPITULO	23.00	


CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CI-1324-2025

CONTRATISTA	CONSORCIO AVANZA MAGDALENA 025	OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA
DIRECTOR INTERVENTORIA	DAVINSON GRAVINI POLO	
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	ALEJANDRA SANCHEZ CERÓN	
SUBCAPITULO	23.5	FECHA

ITEM	23.5.5	DESCRIPCIÓN	Alimentador a tablero luces y tomas 1 (TLT1) trifásico 220V de baja tensión en cable de cobre aislado 2 AWG (fases), 4 AWG (neutro), 6 AWG (tierra) en ducto conduit PVC de 1x1 1/2" . Long: 8m.	UNIDAD	ML

No	DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL
	Alimentador a tablero luces y tomas 1 (TLT1) trifásico 220V de baja tensión en cable de cobre aislado 2 AWG (fases), 4 AWG (neutro), 6 AWG (tierra) en ducto conduit PVC de 1x1 1/2" . Long: 8m.	8						8.00
							TOTAL ACTIVIDAD	8.00
							ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR	
							TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS	8.00

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA

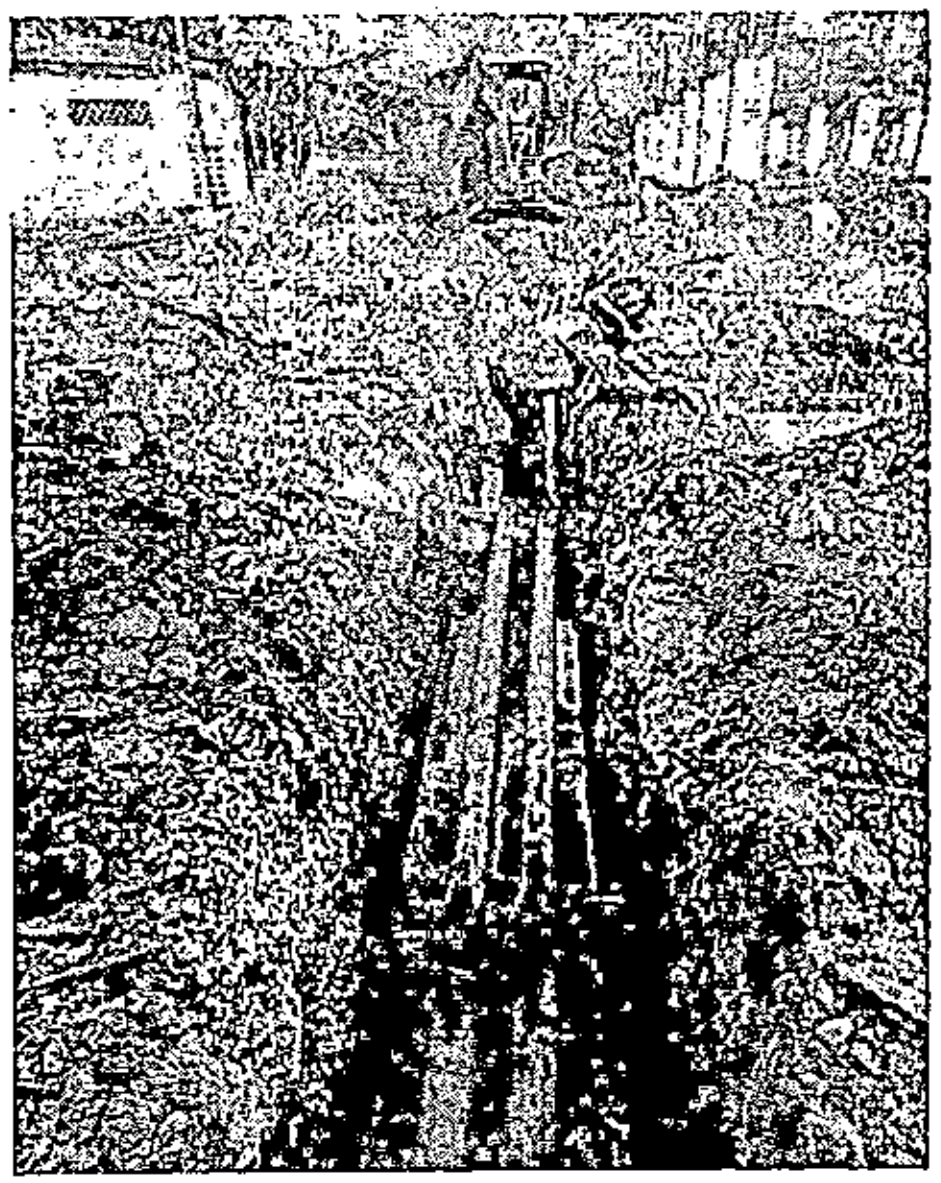

OBSERVACIONES

ELABORO	APROBÓ	REVISO
BRAYAN CUAVAS SALCEDO	RAFAEL CABRALES	ALEJANDRA SANCHEZ
[signature]	[signature]	[signature]

Gobernación del
MAGDALENA


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO:	
VERSIÓN:	
FECHA DE APROBACIÓN	
PÁGINA	1 DE 1

ACTA PARCIAL DE OBRA No.	6		PERIODO DE EJECUCIÓN	19 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2026	
CONTRATO DE OBRA No.			CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	CI-1324-2025	
CONTRATISTA	Consorcio Centro Cambia	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA	CONTRATISTA	CONSORCIO AVANZA MAGDALENA 025	OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA
DIRECTOR DE OBRA	JESUS CERVANTES		DIRECTOR INTERVENTORIA	DAVINSON GRAVINI POLO	
RESIDENTE DE OBRA	BRAYAN CUAVAS SALCEDO		RESIDENTE DE INTERVENTORIA	ALEJANDRA SANCHEZ CERÓN	
CAPITULO	23.00		SUBCAPITULO	23.5	FECHA
ITEM	23.5.6	DESCRIPCION: Tablero de distribución luces y tomas 1 (TLT1) de 30 circuitos trifasico con puerta y chapa, con espacio para totalizador, 1 interruptor 3x100A, 20 breakers de 1x20A, 4 de 2x20A enchufables.			UNIDAD: U

NO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL
	Tablero de distribución luces y tomas 1 (TLT1) de 30 circuitos trifasico con puerta y chapa, con espacio para totalizador, 1 interruptor 3x100A, 20 breakers de 1x20A, 4 de 2x20A enchufables.						1	1.00
						TOTAL ACTIVIDAD		1.00
						ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR		
						TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS		1.00

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA

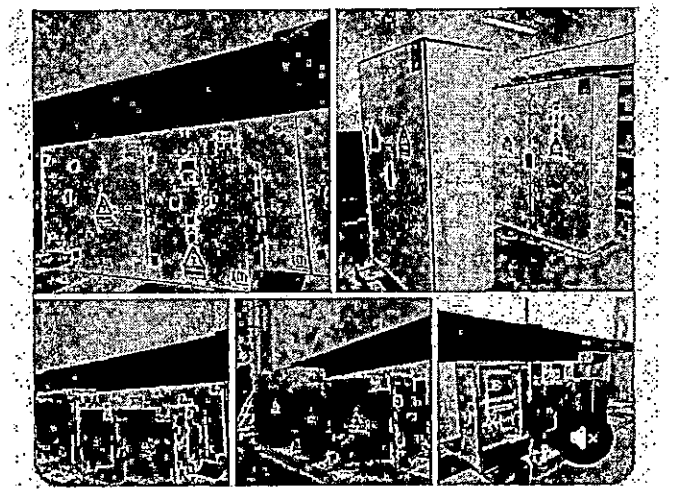

OBSERVACIONES

ELABORO	APROBÓ	REVISÓ
BRAYAN CUAVAS SALCEDO	RAFAEL CABRALES	ALEJANDRA SANCHEZ

Gobernación del MAGDALENA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO:	
VERSIÓN:	
FECHA DE APROBACIÓN	
PÁGINA	1 DE 1

ACTA PARCIAL DE OBRA No.	6	PERIODO DE EJECUCIÓN	19 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2026
CONTRATO DE OBRA No.		CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	CI-1324-2025
CONTRATISTA	Consorcio Centro Cambia	CONTRATISTA	CONSORCIO AVANZA MAGDALENA 025
DIRECTOR DE OBRA	JESUS CERVANTES	DIRECTOR INTERVENTORIA	DAVINSON GRAVINI POLO
RESIDENTE DE OBRA	BRAYAN CUAVAS SALCEDO	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	ALEJANDRA SANCHEZ CERÓN
CAPITULO	23.00	SUBCAPITULO	23.5
ITEM	23.5.7	DESCRIPCIÓN	Alimentador a tablero regulado 1 (TR1) trifásico 220V de baja tensión en cable de cobre aislado 6 AWG THW (fases), 6 AWG (neutro), 10 AWG (tierra) en ducto conduit PVC de 1x1 1/4" . Long: 12m. Llega hasta conmutador pasando por UPS trifásica de 10 KVA (la incluye).

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA


OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA

FECHA:

UNIDAD: ML

NO.	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL
	Alimentador a tablero regulado 1 (TR1) trifásico 220V de baja tensión en cable de cobre aislado 6 AWG THW (fases), 6 AWG (neutro), 10 AWG (tierra) en ducto conduit PVC de 1x1 1/4" . Long: 12m. Llega hasta conmutador pasando por UPS trifásica de 10 KVA (la incluye).	12						12.00
							TOTAL ACTIVIDAD	12.00
							ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR	
							TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS	12.00

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA

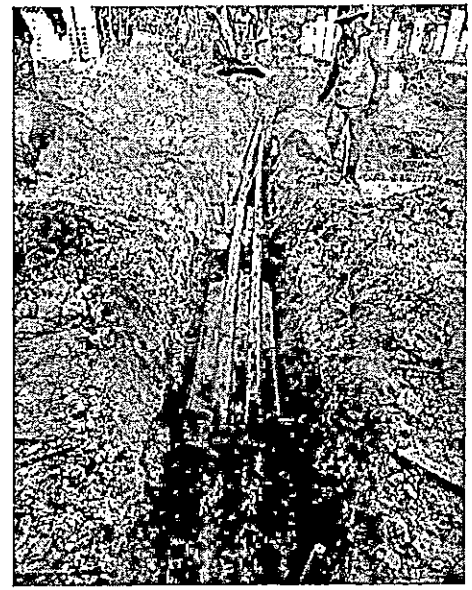

OBSERVACIONES

ELABORÓ	APROBÓ	REVISÓ
BRAYAN CUAVAS SALCEDO	RAFAEL CABRALES	ALEJANDRA SANCHEZ

Gobernación del
MAGDALENA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO:	
VERSIÓN:	
FECHA DE APROBACIÓN	
PÁGINA	1 DE 1

ACTA PARCIAL DE OBRA No.	6	PERIODO DE EJECUCIÓN	19 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2026
CONTRATO DE OBRA No.		CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	CI-1324-2025
CONTRATISTA	Consorcio Centro Cambia	CONTRATISTA	CONSORCIO AVANZA MAGDALENA 025
DIRECTOR DE OBRA	JESUS CERVANTES	DIRECTOR INTERVENTORIA	DAVINSON GRAVINI POLO
RESIDENTE DE OBRA	BRAYAN CUAVAS SALCEDO	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	ALEJANDRA SANCHEZ CERÓN
CAPITULO	23.00	SUBCAPITULO	23.5
ITEM	23.5.8	DESCRIPCION	Alimentador a conmutador tablero regulado 1 (TR1) trifásico 220V de baja tensión en cable de cobre aislado 6 AWG THW (fases), 6 AWG (neutro), 10 AWG (tierra) en ducto conduit PVC de 1x1 1/4" . Long: 12m.

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA


OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA

FECHA:

UNIDAD: ML

NO.	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO/#	AREA	VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL
	Alimentador a conmutador tablero regulado 1 (TR1) trifásico 220V de baja tensión en cable de cobre aislado 6 AWG THW (fases), 6 AWG (neutro), 10 AWG (tierra) en ducto conduit PVC de 1x1 1/4" . Long: 12m.	12						12.00
	TOTAL ACTIVIDAD							12.00
	ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR							
	TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS							12.00

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA

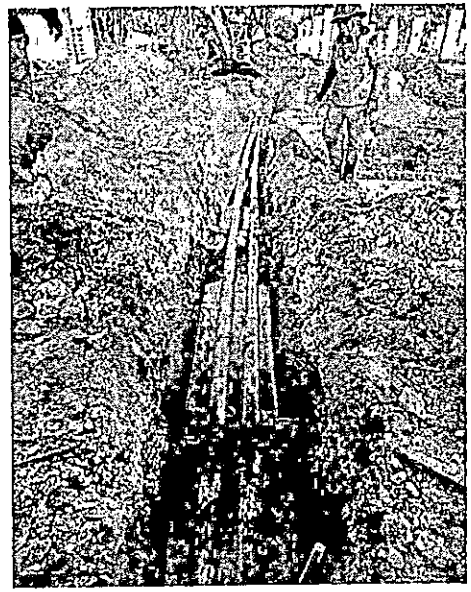

OBSERVACIONES

ELABORÓ	APROBÓ	REVISÓ
BRAYAN CUAVAS SALCEDO	RAFAEL GABRALES	ALEJANDRA SANCHEZ

Gobernación del MAGDALENA


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO:	
VERSIÓN:	
FECHA DE APROBACIÓN	
PÁGINA	1 DE 1

ACTA PARCIAL DE OBRA No.	6		PERÍODO DE EJECUCIÓN	19 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2026	
CONTRATO DE OBRA No.			CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	CI-1324-2025	
CONTRATISTA	Consorcio Centro Cambia	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA	CONTRATISTA	CONSORCIO AVANZA MAGDALENA 025	OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA
DIRECTOR DE OBRA	JESUS CERVANTES		DIRECTOR INTERVENTORIA	DAVINSON GRAVINI POLO	
RESIDENTE DE OBRA	BRAYAN CUAVAS SALCEDO		RESIDENTE DE INTERVENTORIA	ALEJANDRA SANCHEZ CERÓN	
CAPITULO	23.00		SUBCAPITULO	23.5	FECHA:
ITEM	23.5.9	DESCRIPCION: Tablero de distribución regulado 1 (TR1) de 12 circuitos trifasico con puerta y chapa, con espacio para totalizador, 1 interruptor 3x40A, 1 breaker 3x20A, 4 breaker 1x20A enchufables.		UNIDAD	U

No	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL
	Tablero de distribución regulado 1 (TR1) de 12 circuitos trifasico con puerta y chapa, con espacio para totalizador, 1 interruptor 3x40A, 1 breaker 3x20A, 4 breaker 1x20A enchufables.						1	1.00
						TOTAL ACTIVIDAD		1.00
						ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR		
						TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS		1.00

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA

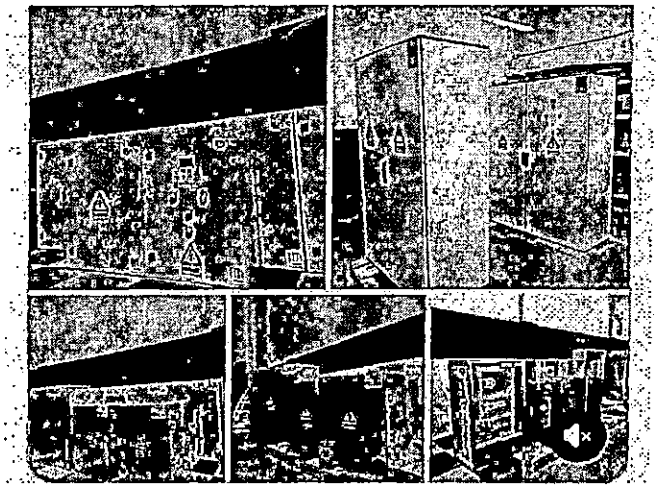

OBSERVACIONES

ELABORÓ	APROBÓ	REVISÓ
BRAYAN CUAVAS SALCEDO	RAFAEL CABRALES	ALEJANDRA SANCHEZ

Gobernación del MAGDALENA


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO:	
VERSIÓN:	
FECHA DE APROBACIÓN	
PÁGINA	1 DE 1

ACTA PARCIAL DE OBRA No.	6		PERIODO DE EJECUCIÓN	19 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2026	
CONTRATO DE OBRA No.				CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CI-1324-2025	
CONTRATISTA	Consorcio Centro Cambia	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA	CONTRATISTA	CONSORCIO AVANZA MAGDALENA 025	OBJETO; INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA
DIRECTOR DE OBRA	JESUS CERVANTES		DIRECTOR INTERVENTORIA	DAVINSON GRAVINI POLO	
RESIDENTE DE OBRA	BRAYAN CUAVAS SALCEDO		RESIDENTE DE INTERVENTORIA	ALEJANDRA SANCHEZ CERÓN	
CAPITULO	23.00		SUBCAPITULO	23.5	FECHA:
ITEM	23.5.10	DESCRIPCIÓN: Alimentador a tablero toma especial 2 (TTE2) trifásico 220V de baja tensión en cable de cobre aislado 1/0 AWG THW (fases), 2 AWG (neutro), 6 AWG (tierra) en ducto conduit PVC de 1x2" . Long: 54m.			UNIDAD: ML

No	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL
	Alimentador a tablero toma especial 2 (TTE2) trifásico 220V de baja tensión en cable de cobre aislado 1/0 AWG THW (fases), 2 AWG (neutro), 6 AWG (tierra) en ducto conduit PVC de 1x2" . Long: 54m.	54						54.00
	TOTAL ACTIVIDAD							54.00
	ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR							
	TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS							54.00

LOCALIZACIÓN Y ESQUEMA

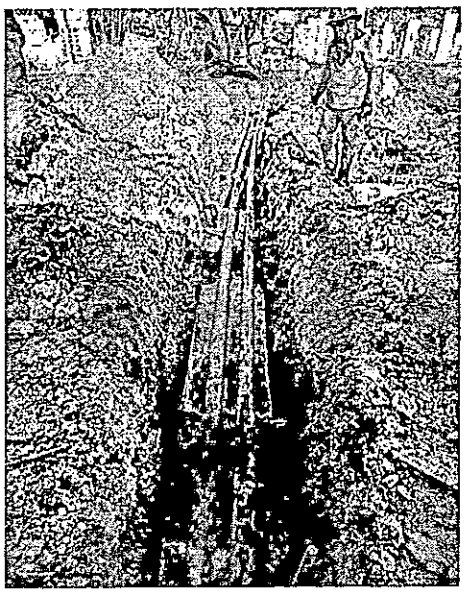

OBSERVACIONES

ELABORÓ	APROBÓ	REVISÓ
BRAYAN CUAVAS SALCEDO	RAFAEL CABRALES	ALEJANDRA SANCHEZ

Gobernación del MAGDALENA


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO:	
VERSIÓN:	
FECHA DE APROBACIÓN	
PÁGINA	1 DE 1

ACTA PARCIAL DE OBRA No.	6		PERIODO DE EJECUCIÓN	19 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2026	
CONTRATO DE OBRA No.		OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA	CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	CI-1324-2025	OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA
CONTRATISTA	Consorcio Centro Cambia		CONTRATISTA	CONSORCIO AVANZA MAGDALENA 025	
DIRECTOR DE OBRA	JESUS CERVANTES		DIRECTOR INTERVENTORIA	DAVINSON GRAVINI POLO	
RESIDENTE DE OBRA	BRAYAN CUAVAS SALCEDO		RESIDENTE DE INTERVENTORIA	ALEJANDRA SANCHEZ CERÓN	
CAPITULO	23.00		SUBCAPITULO	23.5	FECHA:
ITEM	23.5.11	DESCRIPCIÓN	Tablero de distribución toma especial 2 (TTE2) de 42 circuitos trifasico con puerta y chapa, con espacio para totalizador, 1 interruptor 3x115A, 11 breakers de 3x30A enchufables.		UNIDAD: 0

NO.	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL
	Tablero de distribución toma especial 2 (TTE2) de 42 circuitos trifasico con puerta y chapa, con espacio para totalizador, 1 interruptor 3x115A, 11 breakers de 3x30A enchufables.						1	1.00
						TOTAL ACTIVIDAD		1.00
						ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR		
						TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS		1.00

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA

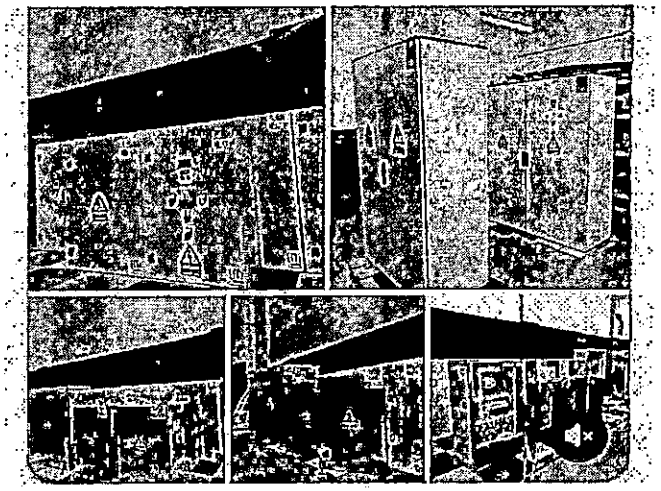

OBSERVACIONES

ELABORÓ	APROBÓ	REVISÓ
BRAYAN CUAVAS SALCEDO	RAFAEL CABRALES	ALEJANDRA SANCHEZ

Gobernación del MAGDALENA


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO:	
VERSIÓN:	
FECHA DE APROBACIÓN	
PÁGINA	1 DE 1

ACTA PARCIAL DE OBRA No.	6	PERIODO DE EJECUCIÓN	19 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2026		
CONTRATO DE OBRA No.			CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CI-1324-2025		
CONTRATISTA	Consorcio Centro Cambia	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA	CONTRATISTA	CONSORCIO AVANZA MAGDALENA 025	OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA
DIRECTOR DE OBRA	JESUS CERVANTES		DIRECTOR INTERVENTORIA	DAVINSON GRAVINI POLO	
RESIDENTE DE OBRA	BRAYAN CUAVAS SALCEDO		RESIDENTE DE INTERVENTORIA	ALEJANDRA SANCHEZ CERÓN	
CAPITULO	23.00		SUBCAPITULO	23.5	FECHA
ITEM	23.5.12	DESCRIPCION: Alimentador a tablero luces y tomas 2 (TLT2) trifásico 220V de baja tensión en cable de cobre aislado 2 AWG THW (fases), 4 AWG THW (neutro), 8 AWG THW (tierra) en ducto conduit PVC de 1x1 1/2" . Long: 56m.		UNIDAD	ML

NO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL
	Alimentador a tablero luces y tomas 2 (TLT2) trifásico 220V de baja tensión en cable de cobre aislado 2 AWG THW (fases), 4 AWG THW (neutro), 8 AWG THW (tierra) en ducto conduit PVC de 1x1 1/2" . Long: 56m.	56						56.00
							TOTAL ACTIVIDAD	56.00
							ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR	
							TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS	56.00

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA

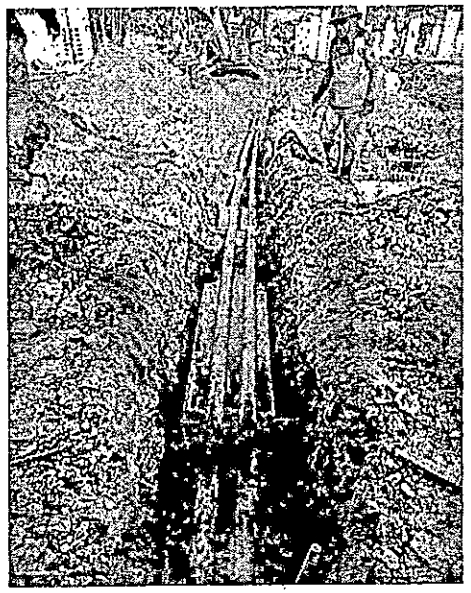

OBSERVACIONES

ELABORÓ	APROBÓ	REVISÓ
BRAYAN CUAVAS SALCEDO	RAFAEL CABRALES	ALEJANDRA SANCHEZ

Gobernación del MAGDALENA


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO:	
VERSIÓN:	
FECHA DE APROBACIÓN	
PÁGINA	1 DE 1

ACTA PARCIAL DE OBRA No.	6		PERIODO DE EJECUCIÓN:	19 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2026	
CONTRATO DE OBRA No.				CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CI-1324-2025	
CONTRATISTA	Consorcio Centro Cambia	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA	CONTRATISTA	CONSORCIO AVANZA MAGDALENA 025	OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA
DIRECTOR DE OBRA	JESUS CERVANTES		DIRECTOR INTERVENTORIA	DAVINSON GRAVINI POLO	
RESIDENTE DE OBRA	BRAYAN CUAVAS SALCEDO		RESIDENTE DE INTERVENTORIA	ALEJANDRA SANCHEZ CERÓN	
CAPITULO	23.00		SUBCAPITULO	23.5	FECHA:
ITEM	23.5.13	DESCRIPCIÓN	Tablero de distribución luces y tomas 2 (TLT2) de 24 circuitos trifasico con puerta y chapa, con espacio para totalizador, 1 interruptor 3x60A, 20 breakers de 1x20A y/o 1x15A enchufables.	UNIDAD	U

ITEM	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	VARIA	VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL
	Tablero de distribución luces y tomas 2 (TLT2) de 24 circuitos trifasico con puerta y chapa, con espacio para totalizador, 1 interruptor 3x60A, 20 breakers de 1x20A y/o 1x15A enchufables.						1	1.00
						TOTAL ACTIVIDAD		1.00
						ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR		
						TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS		1.00

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA

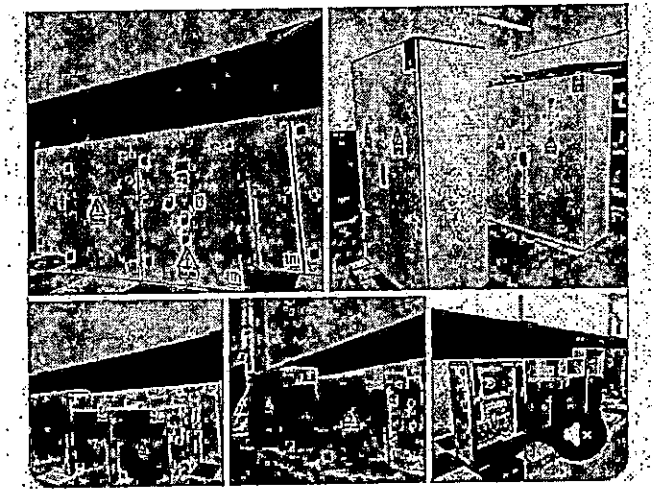

OBSERVACIONES

ELABORÓ	APROBÓ	REVISÓ
BRAYAN CUAVAS SALCEDO	RAFAEL CABRALES	ALEJANDRA SANCHEZ

Gobernación del MAGDALENA


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO:	
VERSIÓN:	
FECHA DE APROBACIÓN	
PÁGINA	1 DE 1

ACTA PARCIAL DE OBRA No.	6	PERIODO DE EJECUCIÓN	19 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2026
CONTRATO DE OBRA No.		CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	CI-1324-2025
CONTRATISTA	Consorcio Centro Cambia	CONTRATISTA	CONSORCIO AVANZA MAGDALENA 025
DIRECTOR DE OBRA	JESUS CERVANTES	DIRECTOR INTERVENTORIA	DAVINSON GRAVINI POLO
RESIDENTE DE OBRA	BRAYAN CUAVAS SALCEDO	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	ALEJANDRA SANCHEZ CERÓN
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA		OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA	
CAPITULO	23.00	SUBCAPITULO	23.5
FECHA			
ITEM	23.5.20	DESCRIPCIÓN	Alimentador a tablero general distribución 1 (TGD-1) trifásico 220V de baja tensión en cable de cobre aislado 1/0 AWG THW (fases), 2 AWG THW (neutro), 6 AWG THW (tierra) en ducto conduit PVC de 1x2" . Long: 32m.
UNIDAD	ML		

NO.	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL
	Alimentador a tablero general distribución 1 (TGD-1) trifásico 220V de baja tensión en cable de cobre aislado 1/0 AWG THW (fases), 2 AWG THW (neutro), 6 AWG THW (tierra) en ducto conduit PVC de 1x2" . Long: 32m.	1						1.00
	TOTAL ACTIVIDAD							1.00
	ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR							
	TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS							1.00

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA

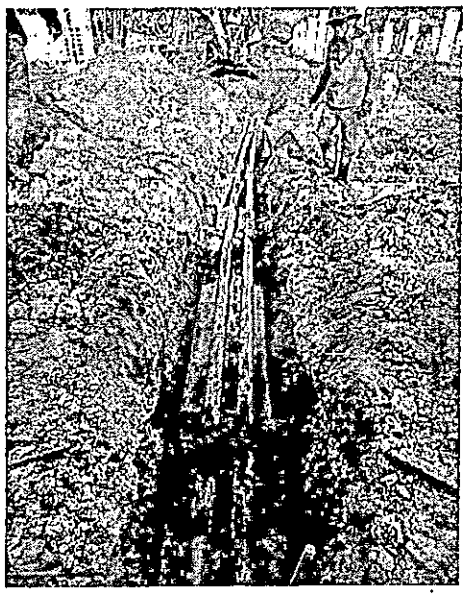

OBSERVACIONES

ELABORÓ	APROBÓ	REVISÓ
BRAYAN CUAVAS SALCEDO	RAFAEL CABRALES	ALEJANDRA SANCHEZ

Gobernación del MAGDALENA


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO:	
VERSIÓN:	
FECHA DE APROBACIÓN	
PÁGINA	1 DE 1

ACTA PARCIAL DE OBRA No.	6		PERIODO DE EJECUCIÓN	19 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2026	
CONTRATO DE OBRA No.			CONTRATO DE INTERVENTORIA No. GI-1324-2025		
CONTRATISTA	Consorcio Centro Cambia	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA	CONTRATISTA	CONSORCIO AVANZA MAGDALENA 025	OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA
DIRECTOR DE OBRA	JESUS CERVANTES		DIRECTOR INTERVENTORIA	DAVINSON GRAVINI POLO	
RESIDENTE DE OBRA	BRAYAN CUAVAS SALCEDO		RESIDENTE DE INTERVENTORIA	ALEJANDRA SANCHEZ CERÓN	
CAPITULO	23.00		SUBCAPITULO	23.5	FECHA
ITEM	23.5.21	DESCRIPCIÓN: Tablero trifásico general distribución 1 (TGD-1) cumple RETIE. Interruptor totalizador 220V, 115A, barraje trifásico de 150A, 220V, un interruptor 3x90A 30 kA, dos interruptores 3x30A 30kA. Un supresor de transientes tipo B			UNIDAD: U

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL
Tablero trifásico general distribución 1 (TGD-1) cumple RETIE. Interruptor totalizador 220V, 115A, barraje trifásico de 150A, 220V, un interruptor 3x90A 30 kA, dos interruptores 3x30A 30kA. Un supresor de transientes tipo B						1	1.00
					TOTAL ACTIVIDAD		1.00
					ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR		
					TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS		1.00

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA

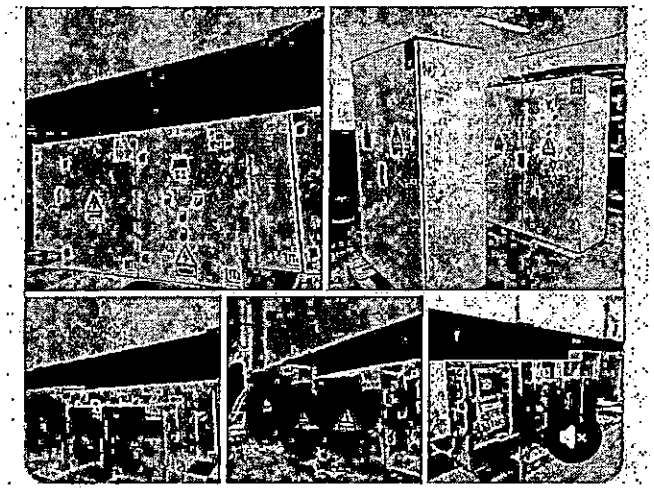

OBSERVACIONES

ELABORÓ	APROBÓ	REVISÓ
BRAYAN CUAVAS SALCEDO	RAFAEL CABRALES	ALEJANDRA SANCHEZ

Gobernación del MAGDALENA


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO:	
VERSIÓN:	
FECHA DE APROBACIÓN	
PÁGINA	1 DE 1

ACTA PARCIAL DE OBRA No.	6		PERÍODO DE EJECUCIÓN	19 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2026	
CONTRATO DE OBRA No.			CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CI-1324-2025	
CONTRATISTA	Consorcio Centro Cambia	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA	CONTRATISTA	CONSORCIO AVANZA MAGDALENA 025	OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA
DIRECTOR DE OBRA	JESUS CERVANTES		DIRECTOR INTERVENTORIA	DAVINSON GRAVINI POLO	
RESIDENTE DE OBRA	BRAYAN CUAVAS SALCEDO		RESIDENTE DE INTERVENTORIA	ALEJANDRA SANCHEZ CERÓN	
CAPITULO	23.00		SUBCAPITULO	23.5	FECHA:
ITEM	23.5.21	DESCRIPCIÓN: Tablero trifásico general distribución 2 (TGD-2) cumple RETIE. Interruptor totalizador 220V, 125A, barraje trifásico de 150A, 220V, un interruptor 3x100A, dos interruptores 3x30A. Un supresor de transientes tipo B			UNIDAD: 0

NO.	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL
	Tablero trifásico general distribución 2 (TGD-2) cumple RETIE. Interruptor totalizador 220V, 125A, barraje trifásico de 150A, 220V, un interruptor 3x100A, dos interruptores 3x30A. Un supresor de transientes tipo B						1	1.00
						TOTAL ACTIVIDAD		1.00
						ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR		
						TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS		1.00

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA

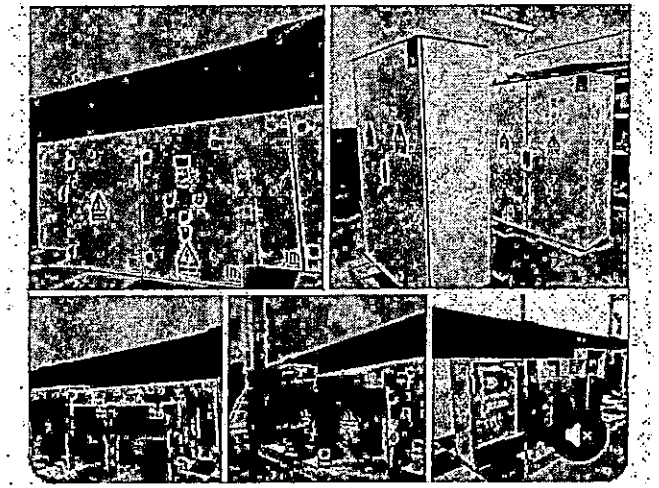

OBSERVACIONES

ELABORÓ	APROBÓ	REVISÓ
BRAYAN CUAVAS SALCEDO	RAFAEL CABRALES	ALEJANDRA SANCHEZ

Gobernación del MAGDALENA


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO:	
VERSIÓN:	
FECHA DE APROBACIÓN	
PÁGINA	1 DE 1

ACTA PARCIAL DE OBRA No.	6	PERIODO DE EJECUCIÓN	19 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2026		
CONTRATO DE OBRA No.		CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	CI-1324-2025		
CONTRATISTA	Consorcio Centro Cambia	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA	CONTRATISTA	CONSORCIO AVANZA MAGDALENA 025	OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA
DIRECTOR DE OBRA	JESUS CERVANTES		DIRECTOR INTERVENTORIA	DAVINSON GRAVINI POLO	
RESIDENTE DE OBRA	BRAYAN CUAVAS SALCEDO		RESIDENTE DE INTERVENTORIA	ALEJANDRA SANCHEZ CERÓN	
CAPITULO	23.00		SUBCAPITULO	23.6	FECHA
ITEM 23.6.1.1	DESCRIPCIÓN	Subalimentador a tablero regulado 1.1 (TR1.1) trifásico 220V de baja tensión en cable de cobre aislado 6 AWG THW (fases), 4 AWG THW (neutro), 8 AWG LH (tierra) en ducto conduit PVC de 1 1/4" . Long: 58m.	UNIDAD	ML	

NO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL
	Subalimentador a tablero regulado 1.1 (TR1.1) trifásico 220V de baja tensión en cable de cobre aislado 6 AWG THW (fases), 4 AWG THW (neutro), 8 AWG LH (tierra) en ducto conduit PVC de 1 1/4" . Long: 58m.	58						58.00
							TOTAL ACTIVIDAD	58.00
							ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR	
							TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS	58.00

LOCALIZACIÓN Y ESQUEMA

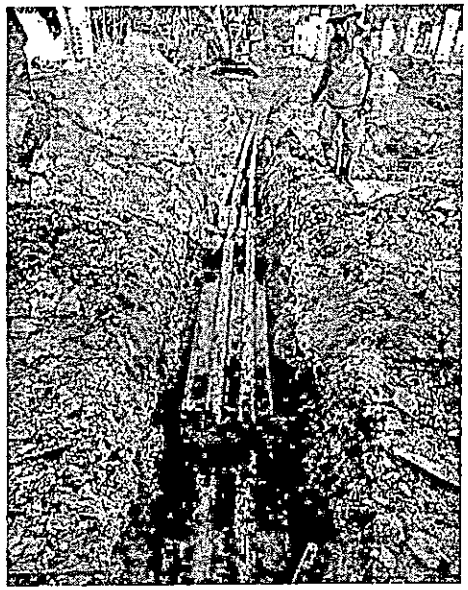

OBSERVACIONES

ELABORÓ	APROBÓ	REVISÓ
BRAYAN CUAVAS SALCEDO	RAFAEL CABRALES	ALEJANDRA SANCHEZ

Gobernación del MAGDALENA


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO:	
VERSIÓN:	
FECHA DE APROBACIÓN	
PÁGINA	1 DE 1

ACTA PARCIAL DE OBRA No.	6	PERIODO DE EJECUCIÓN	19 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2026		
CONTRATO DE OBRA No.			CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CI-1324-2025		
CONTRATISTA	Consorcio Centro Cambia	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA	CONTRATISTA	CONSORCIO AVANZA MAGDALENA 025	OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA
DIRECTOR DE OBRA	JESUS CERVANTES		DIRECTOR INTERVENTORIA	DAVINSON GRAVINI POLO	
RESIDENTE DE OBRA	BRAYAN CUAVAS SALCEDO		RESIDENTE DE INTERVENTORIA	ALEJANDRA SANCHEZ CERÓN	
CAPITULO	23.00		SUBCAPITULO	23.6	FECHA
ITEM	23.6.1.1	DESCRIPCIÓN: Tablero de distribución regulado 1.1 (TR1.1) de 12 circuitos trifasico con puerta y chapa, con espacio para totalizador, 1 interruptor 3x30A, 5 breaker 1x20A enchufables.			UNIDAD: U

ITEM	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	No. DE CANTIDAD	TOTAL
	Tablero de distribución regulado 1.1 (TR1.1) de 12 circuitos trifasico con puerta y chapa, con espacio para totalizador, 1 interruptor 3x30A, 5 breaker 1x20A enchufables.						1	1.00
						TOTAL ACTIVIDAD		1.00
						ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR		
						TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS		1.00

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA

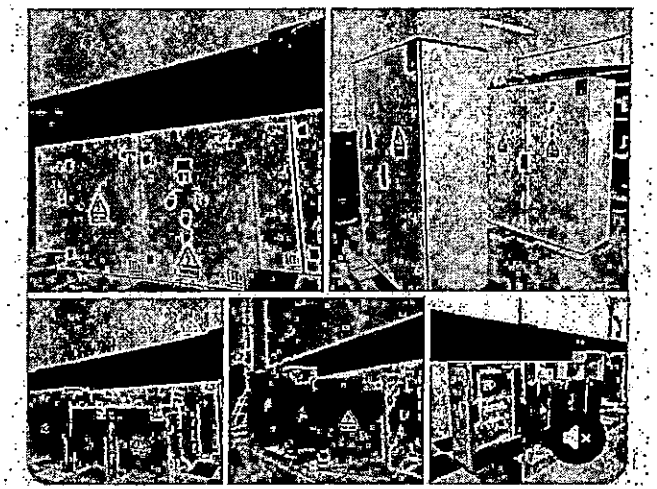

OBSERVACIONES

ELABORÓ	APROBÓ	REVISÓ
BRAYAN CUAVAS SALCEDO	RAFAEL CABRALES	ALEJANDRA SANCHEZ

Gobernación del MAGDALENA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO:	
VERSIÓN:	
FECHA DE APROBACIÓN	
PÁGINA	1 DE 1

ACTA PARCIAL DE OBRA No.	6	PERÍODO DE EJECUCIÓN	19 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2026		
CONTRATO DE OBRA No.		CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CI-1324-2025			
CONTRATISTA	Consorcio Centro Cambia	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA	CONTRATISTA	CONSORCIO AVANZA MAGDALENA 025	OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA
DIRECTOR DE OBRA	JESUS CERVANTES		DIRECTOR INTERVENTORIA	DAVINSON GRAVINI POLO	
RESIDENTE DE OBRA	BRAYAN CUAVAS SALCEDO		RESIDENTE DE INTERVENTORIA	ALEJANDRA SANCHEZ CERÓN	
CAPITULO	23.00		SUBCAPITULO	23.6	FECHA
ITEM	23.6.3.1	DESCRIPCIÓN	Subalimentador de TGD-2 a tablero luces y tomas 4 (TLT4) trifásico 220V de baja tensión en cable de cobre aislado 2 AWG THW (fases), 4 AWG THW (neutro), 8 AWG THW (tierra) en ducto conduit PVC de 1x1 1/2" . Long: 6m.	UNIDAD	ML	

NO.	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL
	Subalimentador de TGD-2 a tablero luces y tomas 4 (TLT4) trifásico 220V de baja tensión en cable de cobre aislado 2 AWG THW (fases), 4 AWG THW (neutro), 8 AWG THW (tierra) en ducto conduit PVC de 1x1 1/2" . Long: 6m.	6						6.00

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA



TOTAL ACTIVIDAD	6.00
ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR	
TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS	6.00

OBSERVACIONES

ELABORÓ	APROBÓ	REVISÓ
BRAYAN CUAVAS SALCEDO	RAFAEL CABRALES	ALEJANDRA SANCHEZ

Gobernación del MAGDALENA


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO:	
VERSIÓN:	
FECHA DE APROBACIÓN	
PÁGINA	1 DE 1

ACTA PARCIAL DE OBRA No.	6	PERIODO DE EJECUCIÓN	19 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2026		
CONTRATO DE OBRA No.			CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CI-1324-2025		
CONTRATISTA	Consorcio Centro Cambia	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA	CONTRATISTA	CONSORCIO AVANZA MAGDALENA 025	OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA
DIRECTOR DE OBRA	JESUS CERVANTES		DIRECTOR INTERVENTORIA	DAVINSON GRAVINI POLO	
RESIDENTE DE OBRA	BRAYAN CUAVAS SALCEDO		RESIDENTE DE INTERVENTORIA	ALEJANDRA SANCHEZ CERÓN	
CAPITULO	23.00		SUBCAPITULO	23.6	FECHA
ITEM	23.6.3.2	DESCRIPCIÓN: Tablero de distribución luces y tomas 4 (TLT4) de 36 circuitos trifasico con puerta y chapa, con espacio para totalizador, 1 interruptor 3x100A, 2 breakers de 2x20A, 31 breakers de 1x20A y/o 1x15A enchufables.			UNIDAD U

No.	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL
	Tablero de distribución luces y tomas 4 (TLT4) de 36 circuitos trifasico con puerta y chapa, con espacio para totalizador, 1 interruptor 3x100A, 2 breakers de 2x20A, 31 breakers de 1x20A y/o 1x15A enchufables.						1	1.00
						TOTAL ACTIVIDAD		1.00
						ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR		
						TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS		1.00

LOCALIZACIÓN Y ESQUEMA

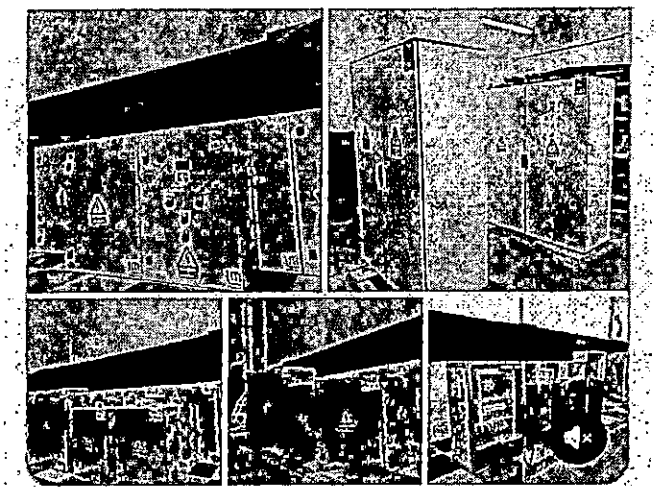

OBSERVACIONES

ELABORÓ	APROBÓ	REVISÓ
BRAYAN CUAVAS SALCEDO	RAFAEL CABRALES	ALEJANDRA SANCHEZ

Gobernación del MAGDALENA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO:	
VERSIÓN:	
FECHA DE APROBACIÓN	
PÁGINA	1 DE 1

ACTA PARCIAL DE OBRA No.	6	PERÍODO DE EJECUCIÓN	19 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2026

CONTRATO DE OBRA No.			CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CI-1324-2025		
CONTRATISTA	Consorcio Centro Cambia	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA	CONTRATISTA	CONSORCIO AVANZA MAGDALENA 025	OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA
DIRECTOR DE OBRA	JESUS CERVANTES		DIRECTOR INTERVENTORIA	DAVINSON GRAVINI POLO	
RESIDENTE DE OBRA	BRAYAN CUAVAS SALCEDO		RESIDENTE DE INTERVENTORIA	ALEJANDRA SANCHEZ CERÓN	
CAPITULO	23.00		SUBCAPITULO	23.6	FECHA:
ITEM	23.6.3.3	DESCRIPCIÓN: subalimentador a tablero regulado 3 (TR3) trifásico 220V de baja tensión en cable de cobre aislado 6 AWG THW (fases), 6 AWG THW (neutro), 10 AWG THW (tierra) en ducto conduit PVC de 1x1 1/4" . Long: 14m. Llega hasta conmutador pasando por UPS trifásica de 10 KVA.		UNIDAD	ML

NO.	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL
	subalimentador a tablero regulado 3 (TR3) trifásico 220V de baja tensión en cable de cobre aislado 6 AWG THW (fases), 6 AWG THW (neutro), 10 AWG THW (tierra) en ducto conduit PVC de 1x1 1/4" . Long: 14m. Llega hasta conmutador pasando por UPS trifásica de 10 KVA.	14						14.00
							TOTAL ACTIVIDAD	14.00
							ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR	
							TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS	14.00

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA



OBSERVACIONES

ELABORO	APROBÓ	REVISÓ
BRAYAN CUAVAS SALCEDO	RAFAEL CABRALES	ALEJANDRA SANCHEZ

Gobernación del
MAGDALENA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO:	
VERSIÓN:	
FECHA DE APROBACIÓN	
PÁGINA	1 DE 1

ACTA PARCIAL DE OBRA No.	6	PERIODO DE EJECUCIÓN	19 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2026
CONTRATO DE OBRA No.		CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CI-1324-2025	
CONTRATISTA	Consorcio Centro Cambia	CONTRATISTA	CONSORCIO AVANZA MAGDALENA 025
DIRECTOR DE OBRA	JESUS CERVANTES	DIRECTOR INTERVENTORIA	DAVINSON GRAVINI POLO
RESIDENTE DE OBRA	BRAYAN CUAVAS SALCEDO	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	ALEJANDRA SANCHEZ CERÓN
CAPITULO:	23.00	SUBCAPITULO:	23.6
ITEM:	23.6.3.4	DESCRIPCIÓN:	Subalimentador a conmutador tablero regulado 3 (TR3) trifásico 220V de baja tensión en cable de cobre aislado 6 AWG THW (fases), 6 AWG THW (neutro), 10 AWG THW (tierra) en ducto conduit PVC de 1x1 1/4" . Long: 14m.
UNIDAD	ML		

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA

OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA

FECHA:

NO.	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL
	Subalimentador a conmutador tablero regulado 3 (TR3) trifásico 220V de baja tensión en cable de cobre aislado 6 AWG THW (fases), 6 AWG THW (neutro), 10 AWG THW (tierra) en ducto conduit PVC de 1x1 1/4" . Long: 14m.	14						14.00
							TOTAL ACTIVIDAD	14.00
							ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR	
							TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS	14.00

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA



OBSERVACIONES

ELABORÓ	APROBÓ	REVISÓ
BRAYAN CUAVAS SALCEDO	RAFAEL CABRALES	ALEJANDRA SANCHEZ

Gobernación del MAGDALENA


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO:	
VERSIÓN:	
FECHA DE APROBACIÓN	
PÁGINA	1 DE 1

ACTA PARCIAL DE OBRA No.	6	PERIODO DE EJECUCIÓN	19 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2026
CONTRATO DE OBRA No.		CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CI-1324-2025	
CONTRATISTA	Consorcio Centro Cambia	CONTRATISTA	CONSORCIO AVANZA MAGDALENA 025
DIRECTOR DE OBRA	JESUS CERVANTES	DIRECTOR INTERVENTORIA	DAVINSON GRAVINI POLO
RESIDENTE DE OBRA	BRAYAN CUAVAS SALCEDO	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	ALEJANDRA SANCHEZ CERÓN
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA	OBJETO	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA
CAPITULO	23.00	SUBCAPITULO	23.6
FECHA			
ITEM	23.6.3.5	DESCRIPCIÓN	Tablero de distribución regulado 3 (TR3) de 12 circuitos trifasico con puerta y chapa, con espacio para totalizador, 1 interruptor 3x30A, 9 breaker 1x20A enchufables.
UNIDAD	U		

No	DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL
	Tablero de distribución regulado 3 (TR3) de 12 circuitos trifasico con puerta y chapa, con espacio para totalizador, 1 interruptor 3x30A, 9 breaker 1x20A enchufables.						1	1.00
							TOTAL ACTIVIDAD	1.00
							ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR	
							TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS	1.00

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA

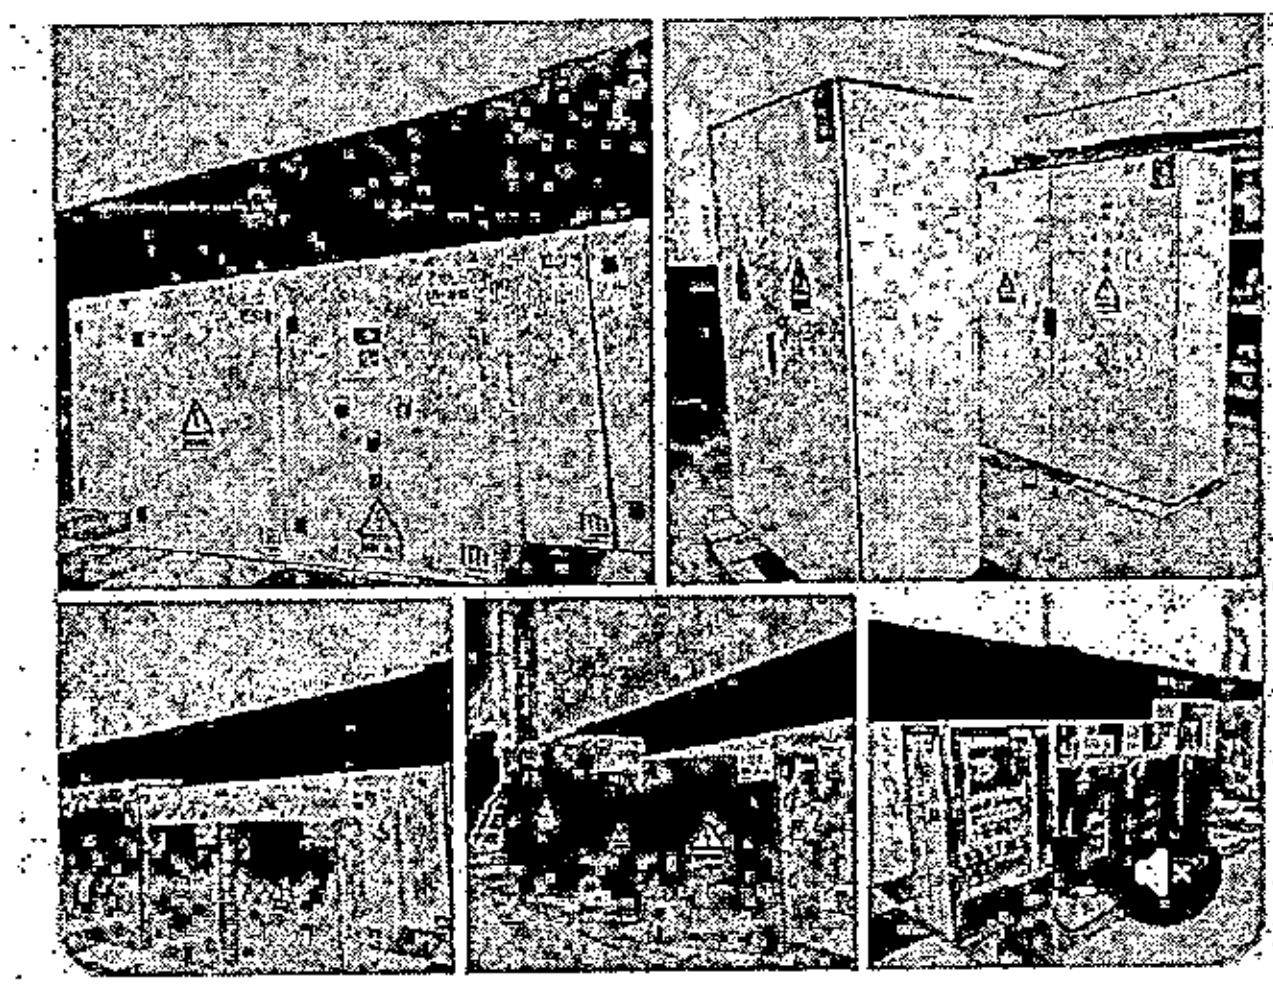

OBSERVACIONES

ELABORÓ	APROBÓ	REVISÓ
BRAYAN CUAVAS SALCEDO	RAFAEL CABRALES	ALEJANDRA SANCHEZ
[firma]	[firma]	[firma]

Gobernación del MAGDALENA


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO:	
VERSIÓN:	
FECHA DE APROBACIÓN	
PÁGINA	1 DE 1

ACTA PARCIAL DE OBRA No.	6	PERIODO DE EJECUCIÓN	19 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2026		
CONTRATO DE OBRA No.		CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CI-1324-2025			
CONTRATISTA	Consorcio Centro Cambia	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA	CONTRATISTA	CONSORCIO AVANZA MAGDALENA 025	OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA
DIRECTOR DE OBRA	JESUS CERVANTES		DIRECTOR INTERVENTORIA	DAVINSON GRAVINI POLO	
RESIDENTE DE OBRA	BRAYAN CUAVAS SALCEDO		RESIDENTE DE INTERVENTORIA	ALEJANDRA SANCHEZ CERÓN	
CAPITULO	23.00		SUBCAPITULO	23.6	FECHA
ITEM	23.6.8.2	DESCRIPCIÓN	Tablero iluminaciòn exterior 1. Cofre encendido manual y automático para iluminación de urbanismo parte posterior bloques a, b,c.	UNIDAD	U

NO.	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL
	Tablero iluminaciòn exterior 1. Cofre encendido manual y automático para iluminación de urbanismo parte posterior bloques a, b,c.						1	1.00
	TOTAL ACTIVIDAD							1.00
	ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR							
	TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS							1.00

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA

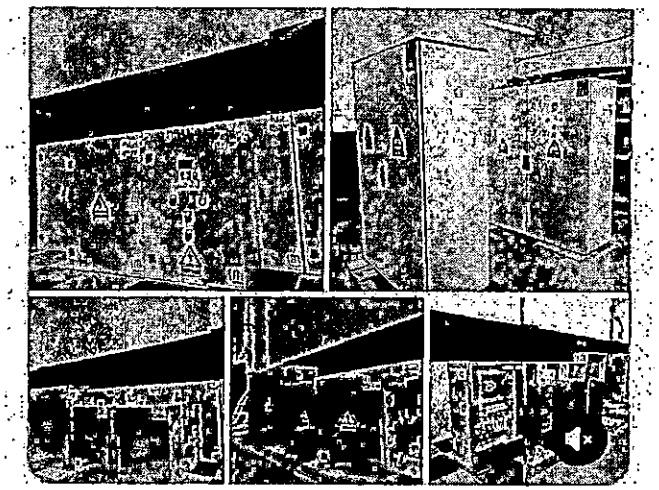

OBSERVACIONES

ELABORO	APROBÒ	REVISÒ
BRAYAN CUAVAS SALCEDO	RAFAEL CABRALES	ALEJANDRA SANCHEZ


Gobernación del MAGDALENA	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	CÓDIGO:	
		VERSIÓN:	
		FECHA DE APROBACIÓN	
		PÁGINA	1 DE 1

ACTA PARCIAL DE OBRA No.	6	PERIODO DE EJECUCIÓN	19 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2026

CONTRATO DE OBRA No.			CONTRATO DE INTERVENTORIA No. GI-1324-2025		
CONTRATISTA	Consorcio Centro Cambia	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA	CONTRATISTA	CONSORCIO AVANZA MAGDALENA 025	OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA
DIRECTOR DE OBRA	JESUS CERVANTES		DIRECTOR INTERVENTORIA	DAVINSON GRAVINI POLO	
RESIDENTE DE OBRA	BRAYAN CUAVAS SALCEDO		RESIDENTE DE INTERVENTORIA	ALEJANDRA SANCHEZ CERÓN	
CAPITULO	12.00		SUBCAPITULO	12.01	FECHA:
ITEM	12.01.01	DESCRIPCIÓN	V-1 9.35 x 1.80 - Exterior		UNIDAD: UN

No	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES					CANTIDAD	TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN		
	V-1 9.35 x 1.80 - Exterior						1	1.00
							TOTAL ACTIVIDAD	1.00
							ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR	
							TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS	1.00

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA

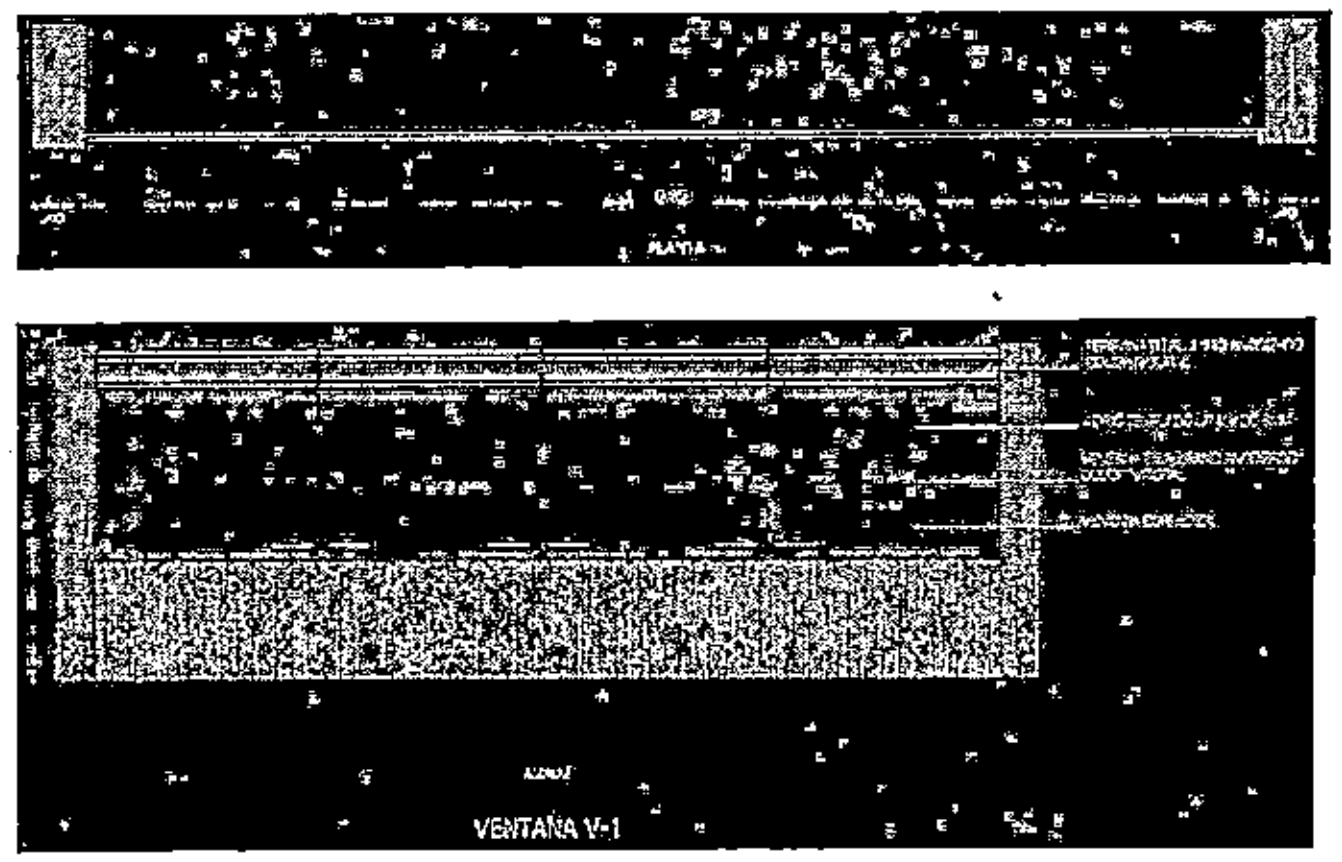

OBSERVACIONES

ELABORO	APROBÓ	REVISO
BRAYAN CUAVAS SALCEDO	RAFAEL CABRALES	ALEJANDRA SANCHEZ
Brayan Cuavas		

Gobernación del MAGDALENA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO:	
VERSIÓN:	
FECHA DE APROBACIÓN	
PÁGINA	1 DE 1

ACTA PARCIAL DE OBRA No.	6	PERIODO DE EJECUCIÓN	19 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2026
CONTRATO DE OBRA No.		CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CI-1324-2025	
CONTRATISTA	Consorcio Centro Cambia	CONTRATISTA	CONSORCIO AVANZA MAGDALENA 025
DIRECTOR DE OBRA	JESUS CERVANTES	DIRECTOR INTERVENTORIA	DAVINSON GRAVINI POLO
RESIDENTE DE OBRA	BRAYAN CUAVAS SALCEDO	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	ALEJANDRA SANCHEZ CERÓN
CAPITULO	12.00	SUBCAPITULO	12.01
ITEM	12.01.02	DESCRIPCIÓN	V-2 8.95 x 2.25 - Exterior

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA


OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA


FECHA:

UNIDAD: UN

No.	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL
	V-2 8.95 x 2.25 - Exterior						1	1.00
	TOTAL ACTIVIDAD							1.00
	ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR							
	TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS							1.00

LOCALIZACIÓN Y ESQUEMA





OBSERVACIONES

ELABORÓ	APROBÓ	REVISÓ
BRAYAN CUAVAS SALCEDO	RAFAEL GABRALES	ALEJANDRA SANCHEZ

Gobernación del MAGDALENA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA


CÓDIGO:	
VERSIÓN:	
FECHA DE APROBACIÓN	
PÁGINA	1 DE 1

ACTA PARCIAL DE OBRA No.	6	PERIODO DE EJECUCIÓN	19 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2026		
CONTRATO DE OBRA No.			CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CI-1324-2025		
CONTRATISTA	Consorcio Centro Cambia	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA	CONTRATISTA	CONSORCIO AVANZA MAGDALENA 025	OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA
DIRECTOR DE OBRA	JESUS CERVANTES		DIRECTOR INTERVENTORIA	DAVINSON GRAVINI POLO	
RESIDENTE DE OBRA	BRAYAN CUAVAS SALCEDO		RESIDENTE DE INTERVENTORIA	ALEJANDRA SANCHEZ CERÓN	
CAPITULO	12.00		SUBCAPITULO	12.01	FECHA:
ITEM	12.01.03	DESCRIPCIÓN	V-3 6.85 x 1.80 - Exterior		UNIDAD: UN

No.	DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL
	V-3 6.85 x 1.80 - Exterior						1	1.00
							TOTAL ACTIVIDAD	1.00
							ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR	
							TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS	1.00

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA



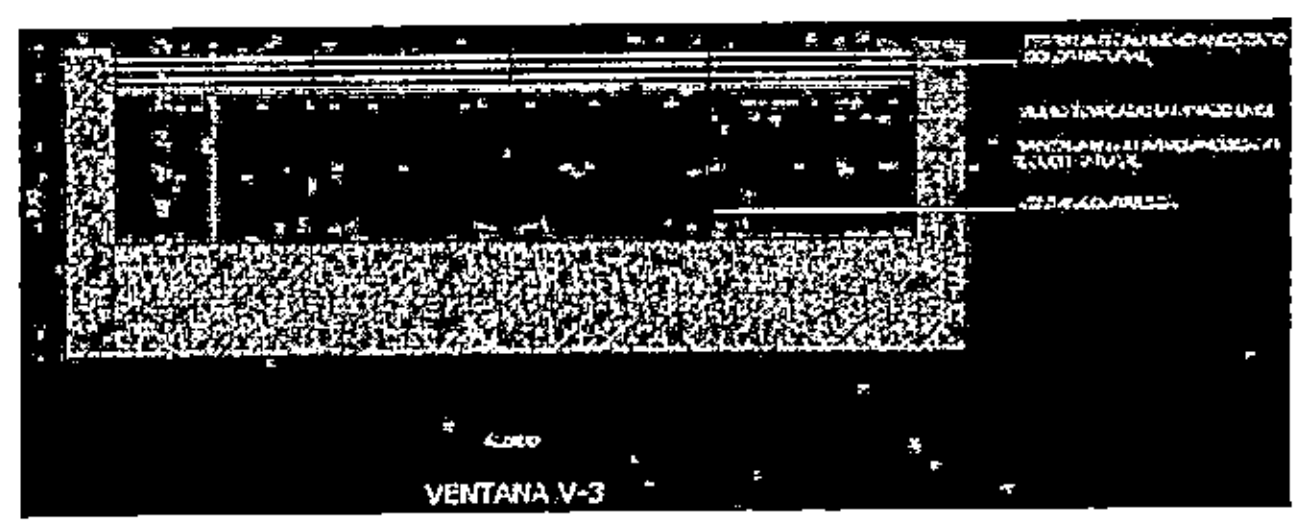

OBSERVACIONES

ELABORÓ	APROBÓ	REVISÓ
BRAYAN CUAVAS SALCEDO	RAFAEL CABRALES	ALEJANDRA SÁNCHEZ

Gobernación del MAGDALENA


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA


CÓDIGO:	
VERSIÓN:	
FECHA DE APROBACIÓN	
PÁGINA	1 DE 1

ACTA PARCIAL DE OBRA No.:	6	PERÍODO DE EJECUCIÓN:	19 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2026		
CONTRATO DE OBRA No.:			CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: CI-1324-2026		
CONTRATISTA:	Consorcio Centro Cambia	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA	CONTRATISTA:	CONSORCIO AVANZA MAGDALENA 025	OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA
DIRECTOR DE OBRA:	JESUS CERVANTES		DIRECTOR INTERVENTORIA:	DAVINSON GRAVINI POLO	
RESIDENTE DE OBRA:	BRAYAN CUAVAS SALCEDO		RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	ALEJANDRA SANCHEZ CERÓN	
CAPITULO:	12.00		SUBCAPITULO:	12.01	FECHA:
ITEM:	12.01.04	DESCRIPCIÓN: V-4 6.85 x 2.25 - Exterior			UNIDAD: UN

No.	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL
	V-4 6.85 x 2.25 - Exterior						1	1.00
	TOTAL ACTIVIDAD							1.00
	ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR							
	TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS							1.00

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA



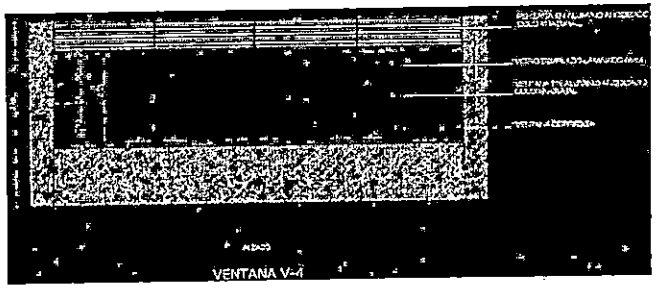

OBSERVACIONES

ELABORO	APROBÓ	REVISÓ
BRAYAN CUAVAS SALCEDO	RAFAEL CABRALES	ALEJANDRA SANCHEZ

Gobernación del MAGDALENA	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	CÓDIGO:	
		VERSIÓN:	
		FECHA DE APROBACIÓN	
		PÁGINA	1 DE 1


ACTA PARCIAL DE OBRA No.	6	PERIODO DE EJECUCIÓN	19 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2026

CONTRATO DE OBRA No.			CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CI-1324-2026		
CONTRATISTA	Consorcio Centro Cambia	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA	CONTRATISTA	CONSORCIO AVANZA MAGDALENA 025	OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA
DIRECTOR DE OBRA	JESUS CERVANTES		DIRECTOR INTERVENTORIA	DAVINSON GRAVINI POLO	
RESIDENTE DE OBRA	BRAYAN CUAVAS SALCEDO		RESIDENTE DE INTERVENTORIA	ALEJANDRA SANCHEZ CERÓN	
CAPITULO	12.00		SUBCAPITULO	12.01	FECHA
ITEM	12.01.05	DESCRIPCIÓN	V-5 8.70 x 1.80 - Exterior		UNIDAD: UN

No.	DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL
	V-5 8.70 x 1.80 - Exterior						1	1.00
							TOTAL ACTIVIDAD	1.00
							ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR	
							TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS	1.00

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA





OBSERVACIONES

ELABORO	APROBO	REVISO
BRAYAN CUAVAS SALCEDO	RAFAEL CABRALES	ALEJANDRA SANCHEZ


Gobernación del MAGDALENA	# MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	CÓDIGO:	
		VERSIÓN:	
		FECHA DE APROBACIÓN	
		PÁGINA	1 DE 1

ACTA PARCIAL DE OBRA No.	6	PERIODO DE EJECUCIÓN	19 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2026

CONTRATO DE OBRA No.			CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CI-1324-2026		
CONTRATISTA	Consorcio Centro Cambia	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA	CONTRATISTA	CONSORCIO AVANZA MAGDALENA 025	OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA
DIRECTOR DE OBRA	JESUS CERVANTES		DIRECTOR INTERVENTORÍA	DAVINSON GRAVINI POLO	
RESIDENTE DE OBRA	BRAYAN CUAVAS SALCEDO		RESIDENTE DE INTERVENTORIA	ALEJANDRA SANCHEZ CERÓN	
CAPITULO:	12.00		SUBCAPITULO	12.01	FECHA:
ITEM	12.01.06	DESCRIPCIÓN	V-6 8.70 x 2.25 - Exterior		UNIDAD: UN

No.	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL
	V-6 8.70 x 2.25 - Exterior						1	1.00
							TOTAL ACTIVIDAD	1.00
							ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR	
							TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS	1.00

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA

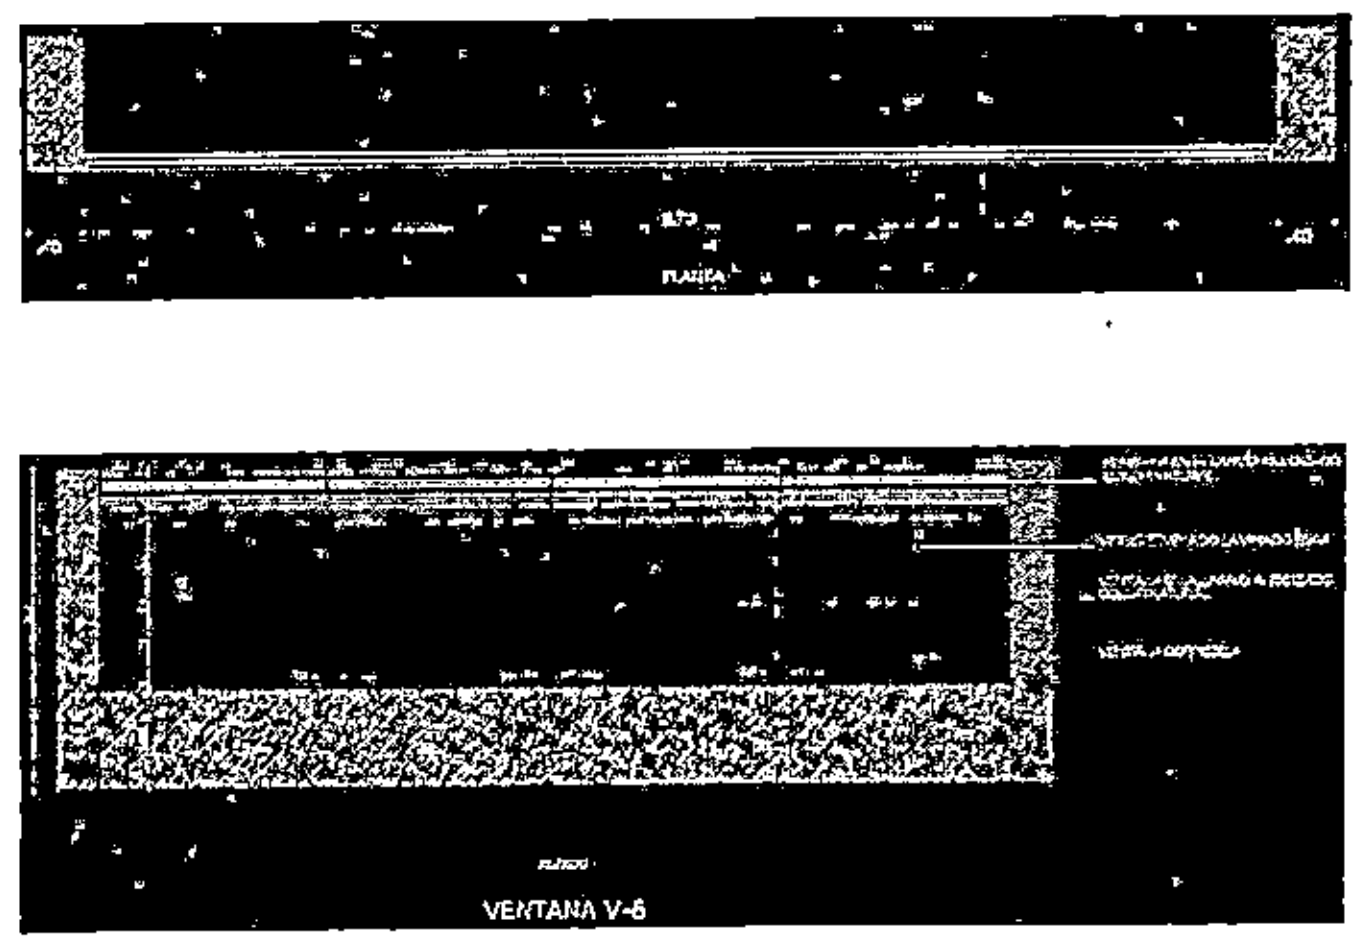

OBSERVACIONES

ELABORÓ	APROBÓ	REVISÓ
BRAYAN CUAVAS SALCEDO	RAFAEL CABRALES	ALEJANDRA SANCHEZ

Gobernación del MAGDALENA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO:	
VERSIÓN:	
FECHA DE APROBACIÓN	
PAGINA	1 DE 1

ACTA PARCIAL DE OBRA No.	6		PERIODO DE EJECUCIÓN	19 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2026	
CONTRATO DE OBRA No.			CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CI-1324-2026		
CONTRATISTA	Consorcio Centro Cambia	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA	CONTRATISTA	CONSORCIO AVANZA MAGDALENA 025	OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA
DIRECTOR DE OBRA	JESUS CERVANTES		DIRECTOR INTERVENTORIA	DAVINSON GRAVINI POLO	
RESIDENTE DE OBRA	BRAYAN CUAVAS SALCEDO		RESIDENTE DE INTERVENTORIA	ALEJANDRA SANCHEZ CERÓN	
CAPITULO:	26.00		SUBCAPITULO	26.1	FECHA:
ITEM	26.10	DESCRIPCIÓN	Suministro e instalación de cerramiento perimetral según diseño		UNIDAD: ML

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL	LOCALIZACIÓN Y ESQUEMA
Suministro e instalación de cerramiento perimetral según diseño	120						120.00	
						TOTAL ACTIVIDAD	120.00	
						ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR		
						TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS	120.00	

OBSERVACIONES

ELABORÓ	APROBÓ	REVISÓ
BRAYAN CUAVAS SALCEDO	RAFAEL CABRALES	ALEJANDRA SANCHEZ

Gobernación del MAGDALENA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO:	
VERSIÓN:	
FECHA DE APROBACIÓN	
PÁGINA	1 DE 1

ACTA PARCIAL DE OBRA No.	6		PERIODO DE EJECUCIÓN	19 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2026	
CONTRATO DE OBRA No.			CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	CI-1324-2025	
CONTRATISTA	Consorcio Centro Cambia	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA	CONTRATISTA	CONSORCIO AVANZA MAGDALENA 025	OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA
DIRECTOR DE OBRA	JESUS CERVANTES		DIRECTOR INTERVENTORIA	DAVINSON GRAVINI POLO	
RESIDENTE DE OBRA	BRAYAN CUAVAS SALCEDO		RESIDENTE DE INTERVENTORIA	ALEJANDRA SANCHEZ CERÓN	
CAPITULO:	27.00		SUBCAPITULO	27.1	FECHA:
ITEM	27.10	DESCRIPCIÓN: Demolición de muro perimetral existente. (Incluye retiro)			UNIDAD: M2

No.	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL	LOCALIZACIÓN / ESQUEMA
	Demolición de muro perimetral existente. (Incluye retiro)				450			450.00	
	TOTAL ACTIVIDAD							450.00	
	ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR								
	TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS							450.00	

OBSERVACIONES

ELABORÓ	APROBÓ	REVISÓ
BRAYAN CUAVAS SALCEDO	RAFAEL CABRALES	ALEJANDRA SANCHEZ

Gobernación del
MAGDALENA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO:	
VERSIÓN:	
FECHA DE APROBACIÓN	
PÁGINA	1 DE 1

ACTA PARCIAL DE OBRA No.	6	PERIODO DE EJECUCIÓN	19 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2026

CONTRATO DE OBRA No.

CONTRATISTA	Consorcio Centro Cambia	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA
DIRECTOR DE OBRA	JESUS CERVANTES	
RESIDENTE DE OBRA	BRAYAN CUAVAS SALCEDO	
CAPITULO:	27.00	

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: CI-1324-2025

CONTRATISTA	CONSORCIO AVANZA MAGDALENA 025	OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA
DIRECTOR INTERVENTORIA	DAVINSON GRAVINI POLO	
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	ALEJANDRA SANCHEZ CERÓN	
SUBCAPITULO	27.2	

ITEM	27.20	DESCRIPCIÓN	Demolición de cimiento muro perimetral existente. (Incluye retiro)	UNIDAD	M3
FECHA:					

No	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES: LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL
	Demolición de cimiento muro perimetral existente. (Incluye retiro)					30.00		30.00
							TOTAL ACTIVIDAD	30.00
							ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR	
							TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS	30.00

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA

OBSERVACIONES

ELABORO	APROBÓ	REVISÓ
BRAYAN CUAVAS SALCEDO	RAFAEL CABRALES	ALEJANDRA SANCHEZ

Gobernación del MAGDALENA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO:	
VERSIÓN:	
FECHA DE APROBACIÓN	
PÁGINA	1 DE 1

ACTA PARCIAL DE OBRA No.	6		PERIODO DE EJECUCIÓN	19 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2026	
CONTRATO DE OBRA No.			CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	CI-1324-2026	
CONTRATISTA	Consorcio Centro Cambia	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA	CONTRATISTA	CONSORCIO AVANZA MAGDALENA 025	OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA
DIRECTOR DE OBRA	JESUS CERVANTES		DIRECTOR INTERVENTORIA	DAVINSON GRAVINI POLO	
RESIDENTE DE OBRA	BRAYAN CUAVAS SALCEDO		RESIDENTE DE INTERVENTORIA	ALEJANDRA SANCHEZ CERÓN	
CAPITULO:	32.00		SUBCAPITULO	32.1	FECHA:
ITEM	32.10	DESCRIPCIÓN: Dinteles descolcados anclados econ epoxico			UNIDAD: ML

No.	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL	LOCALIZACIÓN / ESQUEMA
	Dinteles descolcados anclados econ epoxico)	100						100.00	
	TOTAL ACTIVIDAD							100.00	
	ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR								
	TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS							100.00	

OBSERVACIONES

ELABORO	APROBÓ	REVISÓ
BRAYAN CUAVAS SALCEDO	RAFAEL CABRALES	ALEJANDRA SANCHEZ

Gobernación del MAGDALENA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO:	
VERSIÓN:	
FECHA DE APROBACIÓN	
PÁGINA	1 DE 1

ACTA PARCIAL DE OBRA No.	6	PERÍODO DE EJECUCIÓN	19 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2026

CONTRATO DE OBRA No.			CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CI-1324-2025		
CONTRATISTA	Consorcio Centro Cambia	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA	CONTRATISTA	CONSORCIO AVANZA MAGDALENA 025	OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA
DIRECTOR DE OBRA	JESUS CERVANTES		DIRECTOR INTERVENTORIA	DAVINSON GRAVINI POLO	
RESIDENTE DE OBRA	BRAYAN CUAVAS SALCEDO		RESIDENTE DE INTERVENTORIA	ALEJANDRA SANCHEZ CERÓN	
CAPITULO	35.00		SUBCAPITULO	35.1	FECHA:
ITEM	35.10	DESCRIPCIÓN	Buitron en bloque de concreto		UNIDAD: ML

No.	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL
	Buitron en bloque de concreto							
	BLOQUE A	3.25					8	26.00
	BLOQUE B	3.25					5.00	16.25
	BLOQUE C	3.25					10.00	32.50
	TOTAL ACTIVIDAD							74.76
	ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR							
	TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS							74.76

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA



OBSERVACIONES

ELABORO	APROBÓ	REVISÓ
BRAYAN CUAVAS SALCEDO	RAFAEL CABRALES	ALEJANDRA SANCHEZ

CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES

CONSORCIO CENTRO CAMBIA
NIT. 901936019-5

Santa Marta, Marzo 30 de 2026

Señores
EFRAÍN VARGAS CORVACHO
secretario de infraestructura
GOBERNACION DEL MAGDALENA
Carrera 1 No.16-15 Palacio Tayrona - Santa Marta Santa Marta

REFERENCIA: **CONTRATO N° 0782 DE 2025 - "CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA"**

Respetados señores:

Con el fin de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, y la Ley 828 de 2003, bajo la gravedad de juramento:

Yo, **JESUS CERVANTES CEBALLOS**, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.691.435 DE Chimichagua Cesar actuando en calidad de Representante Legal del CONSORCIO CENTRO CAMBIA.

CERTIFICO:

Que el **CONSORCIO CENTRO CAMBIA** identificado con el NIT 901.936.019-5, ha dado cumplimiento oportuno y afiliación de los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto al Sistema de Seguridad Social para el contrato en referencia, en cuánto a Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales, y Cajas de Compensación Familiar, correspondientes a los últimos seis meses, contados a partir de la fecha de inicio del presente contrato.

Atentamente,

JESUS CERVANTES CEBALLOS
Cedula de Ciudadanía N° 19.691.435
R/L CONSORCIO CENTRO CAMBIA.

Resumen Información del Contrato

Información Básica

Objeto:	CONSTRUCCION DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL CENTRO CAMBIA EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA		
Valor:	Valor Inicial: $44.855.783.740,31 + Adiciones: 0 = Valor Vigente: $44.855.783.740,31		
Nombre o Código:	CO-0782-2025	Modalidad de Selección:	LICITACIONES PÚBLICAS
Procedimiento / Causal:	LICITACIÓN PÚBLICA	Tipo de Contrato:	Contrato de Obra
Fecha de Suscripción (aaaa/mm/dd):	2025/05/21	Fecha del Acta de Inicio (aaaa/mm/dd):	2025/05/21
Fecha de Finalización (aaaa/mm/dd):	2026/07/21	Fecha de Finalización Ampliada (aaaa/mm/dd):	2026/08/11
Plazo de Ejecución:	426 Dia(s)	Año de Suscripción:	2025
Dias Suspensión	21	Anticipo:	No
Estado actual del contrato:	RENDIDO EXTEMPORANEO	Novedades del contrato:	SUSPENSION REINICIO
Fecha de rendición Extemporanea	2025/07/03	Fecha(s) de Rendición Modificada(s):	
El contrato ya fue auditado?	NO	Fecha(s) de Auditoría:	

Atención! Contrato celebrado con Prespuesto SGR.

Vigencias para el contrato actual

VIGENCIA	VALOR	TIPO	FECHA VINCULACIÓN

Agregar / Editar Vigencias

Rubros asociados al contrato

RUBRO PRESUPUESTAL	VIGENCIA	ORIGEN	TIPO	SECTOR	VALOR DISPONIBLE
00AR.2201.0700.2025.00247.0002.01-732-DESARROLLO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CONSTRUCCION DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL CENTRO CAMBIA EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA	2025/2026	Nación SGR	Inversión	Educación	$0,00
0300-3-22020708-2.3.2.1.1.1.2.7-983-EDIFICIOS EDUCATIVOS	2025	Empréstitos	Inversión	Educación	$0,00

Agregar / Editar Rubros

Certificado Disponibilidad Presupuestal (C.D.P.)

FASE	C.D.P.	FECHA C.D.P.	RUBRO ORIGEN	VALOR CDP	LIBERADO	ADICIONES	SOPORTE
Precontractual	25181	2025/02/19	00AR.2201.0700.2025.00247.0002.01-732 - DESARROLLO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CONSTRUCCION DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL CENTRO CAMBIA EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA	$15.000.000.000,00	$0,00	$0,00	Contratación Matriz Legal, Contratación Matriz Legal (/handlers/filehandler.ashx?lanx=90515488&lanxa=128725600&eid=f60d7232-12b3-4452-8126-e403c74fd5b6)
Precontractual	359	2025/01/31	0300-3-22020708-2.3.2.1.1.1.2.7-983 - EDIFICIOS EDUCATIVOS	$32.142.179.439,00	$0,00	$0,00	Contratación Matriz Legal, Contratación Matriz Legal (/handlers/filehandler.ashx?lanx=90515504&lanxa=128725627&eid=f60d7232-12b3-4452-8126-e403c74fd5b6)
			Total C.D.P.s:	$47.142.179.439,00	$0,00		

Vincular C.D.P.

Registro Presupuestal (R.P.)

FASE	CODIGO	FECHA R.P.	VALOR R.P.	LIBERADO	ADICIONADO	SOPORTE
Contractual	250203	2025/05/21	$15.000.000.000,00	$0,00	$0,00	Contratación Matriz Legal, Contratación Matriz Legal (/handlers/filehandler.ashx?lanx=90515590&lanxa=128725796&eid=f60d7232-12b3-4452-8126-e403c74fd5b6)
Contractual	2740	2025/05/21	$29.855.783.740,31	$0,00	$0,00	Contratación Matriz Legal, Contratación Matriz Legal (/handlers/filehandler.ashx?lanx=90515646&lanxa=128725909&eid=f60d7232-12b3-4452-8126-e403c74fd5b6)
		Total R.P.s:	$44.855.783.740,31	$0,00		

Agregar / Editar R.P.

Contratistas

IDENTIFICACIÓN	NOMBRES / RAZÓN SOCIAL	TIPO CONTRATISTA	FECHA VINCULACIÓN
901936019	CONSORCIO CENTRO CAMBIA	Consorcio	2025/06/24

Agregar / Editar Contratista

Supervisores - Interventores

IDENTIFICACIÓN	NOMBRES / RAZÓN SOCIAL	TIPO SUPERVISOR	FECHA VINCULACIÓN
7629011	EFRAIN VARGAS CORVACHO	Interno	2025/06/24

Agregar / Editar Supervisores

Fechas Registradas

FECHA	DESCRIPCIÓN	FECH REGIST
2025/05/21	Fecha de Suscripción (Firma Contrato)	2025/0
2025/05/21	Fecha de Inicio (Acta de Inicio)	2025/0
2026/07/21	Fecha de Finalización (Proceso Inicio)	2025/0
2024/11/14	Fecha de Publicación en el SECOP Ver Publicación (https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7686663&isFromPublicArea=True&isModal=False)	2025/0

Agregar / Editar Fechas

Documentos de Legalidad Anexados

ETAPA - FASE	DESCRIPCIÓN	ARCHIVOS	REQUISITO
Precontractual Elaboración Contrato	CDP/COMPROBANTE DE PRESUPUESTO O EL QUE HAGA SUS VECES(AGR)	1	Requerido
Precontractual Elaboración Contrato	CDP/COMPROBANTE DE PRESUPUESTO O EL QUE HAGA SUS VECES(AGR)	1	Requerido
Contractual Registro Contratación	REGISTRO PRESUPUESTAL (AGR)	1	Requerido
Contractual Registro Contratación	REGISTRO PRESUPUESTAL (AGR)	1	Requerido
Precontractual Elaboración Contrato	INFORME DE EVALUACIÓN DE /OFERTAS (AGR)	1	Requerido
Precontractual Elaboración Contrato	AVISO DE CONVOCATORIA	1	Requerido
Precontractual Elaboración Contrato	ACTA DE RECOMENDACIÓN DEL COMITÉ EVALUADOR (AGR)	1	Requerido
Precontractual Elaboración Contrato	ACTO ADMINISTRATIVO DE APERTURA DEL PROCESO DE SELECCIÓN (AGR)	1	Requerido
Precontractual Elaboración Contrato	ACTO ADMINISTRATIVO ADJUDICACIÓNAGR)	1	Requerido
Precontractual Elaboración Contrato	DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE COMITÉ EVALUADOR	1	Requerido
Precontractual Elaboración Contrato	ACTA DE AUDIENCIA DE ACLARACIÓN DE PLIEGO DE CONDICIONES U OTRAS (AGR)	1	Requerido
Precontractual Elaboración Contrato	ANÁLISIS DEL SECTOR (AGR)	1	Requerido
Precontractual Elaboración Contrato	ESTUDIOS PREVIOS(AGR)	1	Requerido
Precontractual Elaboración Contrato	PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES (AGR)	1	Requerido
Precontractual Elaboración Contrato	ACTA DE CIERRE DEL PROCESO Y DE RECIBO DE LAS OFERTAS (AGR)	1	Requerido
Precontractual Elaboración Contrato	ANEXO AL PLIEGO DE CONDICIONES (AGR)	1	Requerido
Precontractual Elaboración Contrato	OBSERVACIONES AL PROYECTO DE PLIEGOS DE CONDICIONES (AGR)	1	Requerido
Precontractual Elaboración Contrato	PLIEGOS DE CONDICIONES O TERMINOS DE REFERENCIA (AGR)	1	Requerido
Precontractual Elaboración Contrato	DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y REQUISITOS DE CONTRATACIÓN (AGR)	1	Requerido
Contractual Registro Contratación	CONTRATO O SU EQUIVALENTE(AGR)	1	Requerido
Contractual Registro Contratación	ACTA DE INICIO (AGR)	1	Requerido
Contractual Registro Contratación	DESIGNACIÓN DEL SUPERVISOR(AGR)	1	Requerido
Contractual En Ejecución	INFORMES POR PARTE DEL CONTRATISTA	6	Requerido
Contractual En Ejecución	INFORMES DE SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA(AGR)	6	Requerido
Contractual En Ejecución	FACTURAS O CUENTAS DE COBRO(AGR)	6	Informativo
Contractual En Ejecución	PÓLIZAS (AGR)	2	Informativo
Contractual En Ejecución	PAGOS REALIZADOS (AGR)	1	Requerido
Contractual Suspensión	SUSPENSIÓN (AGR)	1	Informativo
Contractual Reinicio	REINICIO (AGR)	1	Informativo

Anexar Documentos

Pólizas Registradas: Si el contrato requiere expedición de garantías, por favor ingreselas en este apartado.

ASEGURADORA	CÓDIGO PÓLIZA	VALOR ASEGURADO	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA REGISTRO	DOCUMENTO SOPORTE

Agregar / Eliminar Pólizas

Novedades - Adiciones

TIPO NOVEDAD	CÓDIGO CONTRATO	MODALIDAD CONTRATO	TIPOLOGÍA CONTRATO	DOCUMENTO SOPORTE	FECHA ADICIÓN	VALOR ADICIÓN	
					Total Adiciones:	$0,00	

Agregar Adiciones

Novedades - Prórroga

TIPO NOVEDAD	CÓDIGO CONTRATO	MODALIDAD CONTRATO	TIPOLOGÍA CONTRATO	FECHA APROB. PRÓRROGA	FECHA INICIO PRÓRROGA	FECHA TERMINACIÓN PRÓRROGA	DOCUMENTO SOPORTE	
NO SE ENCONTRARON NOVEDADES DE PRÓRROGA								

Agregar Prórrogas

Novedades - Adición/Prórroga

TIPO NOVEDAD	CÓDIGO CONTRATO	MODALIDAD CONTRATO	TIPOLOGÍA CONTRATO	FECHA APROB. PRÓRROGA	FECHA INICIO PRÓRROGA	FECHA TERMINACIÓN PRÓRROGA	DOCUMENTO SOPORTE	FECHA ADICIÓN	VALOR ADICIÓN	
								Total Adiciones:	$0,00	

Agregar Adiciones/Prórrogas

Novedades - Cesión

TIPO NOVEDAD	FECHA APROB. CESIÓN	CONTRATISTA CEDENTE	CONTRATISTA CESIONARIO	SOPORTE	
NO SE ENCONTRARON NOVEDADES DE CESIÓN					

Agregar Novedad Cesión

Novedades - Otrosí

TIPO NOVEDAD	FECHA APROB. OTROSÍ	CÓDIGO OTROSÍ	OBSERVACIONES	SOPORTE	
NO SE ENCONTRARON NOVEDADES DE OTROSÍ					

Agregar Novedad Otrosí

Novedades - Suspensión

TIPO NOVEDAD	FECHA APROB. SUSPENSIÓN	OBSERVACIONES	DOCUMENTO SOPORTE
Suspensión	2025/12/29		PDF Soporte Aprobación Suspensión (/handlers/filehandler.ashx?ianx=99854310&ianxa=142852892&eid=f60d7232-12b3-4452-8126-e403c74fd5b6)

Agregar Novedad Suspensión

Novedades - Reinicio

TIPO NOVEDAD	FECHA APROB. REINICIO	OBSERVACIONES	SOPORTE
Reinicio	2026/01/19		PDF Soporte Aprobación Reinicio (/handlers/filehandler.ashx?ianx=99854707&ianxa=142853383&eid=f60d7232-12b3-4452-8126-e403c74fd5b6)

Agregar Novedad Reinicio

Novedades - Terminación

TIPO NOVEDAD	TIPO TERMINACIÓN	FECHA APROB. TERMINACIÓN	SOPORTE
NO SE ENCONTRARON NOVEDADES DE TERMINACIÓN			

Agregar Novedad Terminación

Novedades - Liquidación

TIPO NOVEDAD	TIPO LIQUIDACION	FECHA APROB. LIQUIDACIÓN	VALOR RECURSOS LIBERADOS	SOPORTE
NO SE ENCONTRARON NOVEDADES DE LIQUIDACIÓN				

Agregar Novedad Liquidación

Traza del contrato

CREACIÓN REINICIO FEBRERO. 3 DE 2026
USR: MAGALY COTES
Observaciones: 'sin Observaciones'

CREACIÓN SUSPENSIÓN FEBRERO. 3 DE 2026
USR: MAGALY COTES
Observaciones: 'sin Observaciones'

Febrero. de 2026

RENDIDO EXTEMPORANEO JULIO 3 DE 2025
USR: Rafael Martinez

Julio de 2025

VERIFICADO JUNIO 24 DE 2025
USR: JENNY CAMACHO

EDICIÓN CONTRATO JUNIO 24 DE 2025
USR: JENNY CAMACHO
Observaciones: 'SUPERVISOR EFRAIN VARGAS CORVACHO VINCULADO AL CONTRATO ACTUAL.'

EDICIÓN CONTRATO JUNIO 24 DE 2025
USR: JENNY CAMACHO
Observaciones: 'CONTRATISTA CONSORCIO CENTRO CAMBIA VINCULADO AL CONTRATO ACTUAL.'

EDICIÓN CONTRATO JUNIO 24 DE 2025
USR: JENNY CAMACHO

EDICIÓN CONTRATO JUNIO 24 DE 2025
USR: JENNY CAMACHO

EDICIÓN CONTRATO JUNIO 24 DE 2025
USR: JENNY CAMACHO
Observaciones: 'RP 2740 VINCULADO AL CONTRATO ACTUAL'

EDICIÓN CONTRATO JUNIO 24 DE 2025
USR: JENNY CAMACHO
Observaciones: 'RP 250203 VINCULADO AL CONTRATO ACTUAL'

EDICIÓN CONTRATO JUNIO 24 DE 2025
USR: JENNY CAMACHO
Observaciones: 'CDP 359 - 2025/01/31 - $32.142.179.439,00 VINCULADO AL CONTRATO ACTUAL'

EDICIÓN CONTRATO JUNIO 24 DE 2025
USR: JENNY CAMACHO
Observaciones: 'CDP 25181 - 2025/02/19 - $15.000.000.000,00 VINCULADO AL CONTRATO ACTUAL'

EDICIÓN CONTRATO JUNIO 24 DE 2025
USR: JENNY CAMACHO

EDICIÓN CONTRATO JUNIO 24 DE 2025
USR: JENNY CAMACHO
Observaciones: 'RUBRO 0300-3-22020708-2.3.2.1.1.1.2.7-983: EDIFICIOS EDUCATIVOS >>> 2025 VINCULADO AL CONTRATO ACTUAL'

EDICIÓN CONTRATO JUNIO 24 DE 2025
USR: JENNY CAMACHO

REGISTRADO JUNIO 24 DE 2025

USR: JENNY CAMACHO

Obseravaciones: 'RUBRO 00AR.2201.0700.2025.00247.0002.01-732: DESARROLLO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CONSTRUCCION DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL CENTRO CAMBIA EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA >>> 2025 VINCULADO AL CONTRATO ACTUAL'

Junio de 2025

Cerrar
