San Gil, 20 de febrero de 2026

Doctora:
EDNA ROCIO CASTELLANOS MARTINEZ
Subdirector de Planeación y Ordenamiento ambiental
Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS
San Gil, Santander.

Referencia: contrato de obra No 01053-2025, cuyo objeto es "IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS PRODUCTIVOS SILVOPASTORILES EN PRADERAS ESTABLECIDAS EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER".

Asunto: Pago Acta de recibo final

Cordial saludo.


Por medio del presente me permito remitirle la siguiente documentación del Contrato de obra No. 01053-2025, suscrito entre la CAS y CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL SISTEMAS SILVOPASTORILES, representado legalmente por la señora MARIA MAGDALENA CADENA ZARATE, cuyo objeto es: "IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS PRODUCTIVOS SILVOPASTORILES EN PRADERAS ESTABLECIDAS EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER". con el fin de proceder a realizar Pago Acta de recibo final

Anexo:

- ✓ Informe Interventoría Externa
- ✓ Informe Avance Y Ejecución Contrato De Obra. (Contratista)
- ✓ Acta Final
- ✓ Factura Electrónica FE 2
- ✓ Copia RUT
- ✓ Certificación Bancaria.
- ✓ Certificado Pago Parafiscales
- ✓ Pago Seguridad Social
- ✓ Pago Seguridad Social Representante Legal

Sin otro particular me despido

Atentamente;



HERNANDO LEGUIZAMÓN GALINDO
Interventor

Diagonal 82c No 73º-80 Bogotá D.C.
E-mail herlega2024@gmail.com
Tel. 3102340904.

San Gil, 20 de febrero de 2026

.

Doctora:
LAURA ROXANA DÍAZ
Tesorera
Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS
San gil, Santander.

Referencia: contrato de obra No 01053-2025, cuyo objeto es "IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS PRODUCTIVOS SILVOPASTORILES EN PRADERAS ESTABLECIDAS EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER".

Asunto: Pago Acta final

Cordial saludo.

Por medio del presente me permito remitirle la siguiente documentación del Contrato de obra No. 01053-2025, suscrito entre la CAS y CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL SISTEMAS SILVOPASTORILES, representado legalmente por la señora MARIA MAGDALENA CADENA ZARATE, cuyo objeto es: "IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS PRODUCTIVOS SILVOPASTORILES EN PRADERAS ESTABLECIDAS EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER". con el fin de proceder a realizar Pago Acta final

CONTRATO DE OBRA	No 01053-2025
OBJETO	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS PRODUCTIVOS SILVOPASTORILES EN PRADERAS ESTABLECIDAS EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER.
PLAZO	CUATRO MESES (4) MESES, QUINCE (15) DÍAS, sin exceder el 31 de diciembre de 2025
VALOR	QUINIENTOS VEINTIDÓS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS MCTE. ($522.835.089,00) IVA incluido
CONTRATANTE	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER-CAS
NIT	804.000.292-0

CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL SISTEMAS SILVOPASTORILES
NIT	901.980.916-3
REPRESENTANTE LEGAL	MARIA MAGDALENA CADENA ZARATE
CEDULA DE CIUDADANÍA	1.096.211.185 de Barrancabermeja
VLOR INICIAL	QUINIENTOS VEINTIDÓS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS MCTE. ($522.835.089,00) IVA incluido
FECHA DE INICIO	08/09/2025
FECHA DE TERMINACION	31/12/2025
INTERVENTORÍA EXTERNA	HERNANDO LEGUIZAMÓN GALINDO
CEDULA DE CIUDADANÍA	C.C. No. 7.160.171 de Tunja
SUPERVISOR	EDNA ROCIO CASTELLANOS MARTINEZ Subdirectora de Planeación y Ordenamiento ambiental
VALOR A PAGAR	QUINIENTOS VEINTIDÓS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS MCTE. ($522.835.089,00) IVA incluido
ACTA A PAGAR:	01 final
PAGO No: (En Números)	Uno

CLÁUSULA TERCERA. - FORMA DE PAGO: LA CORPORACION LA CORPORACION pagará al CONTRATISTA el valor del contrato, de la siguiente manera: Mediante actas parciales de avance de obra, certificadas por la interventoría, hasta un máximo del 90% del valor total del contrato y el saldo del 10% se pagará con la suscripción del acta de Recibo Final, previo recibo a satisfacción de la interventoría con la entrega del informe final y los soportes respectivos y evidencias: acta de recibo final de las obras. Informe final, Archivo fotográfico de realización de los trabajos, acta de terminación del contrato y esta acta obtenga el visto bueno del interventor de la obra y se encuentre debidamente firmada por el contratista, soportes del pago de nómina (salarios y prestaciones sociales), seguridad social y aportes parafiscales, Que el interventor expida un certificado de recibo final de la obra a entera satisfacción. Para efectos de cada pago, el contratista deberá adjuntar con los informes, la factura y la constancia del pago de los aportes al sistema general de seguridad social en salud y pensiones, riesgos profesionales y aportes parafiscales, de la totalidad del personal asignado para la ejecución del contrato. El oferente adjudicatario deberá indicar el número de cuenta activa y el nombre del titular de la misma en donde La CORPORACIÓN consignará los respectivos pagos. Cuando se realicen contratos con auto retenedores, deberán informar en la factura esta condición a fin de no realizar retención alguna. Los pagos incluirán todos los costos directos e indirectos y el IVA, en que incurra el contratista para la ejecución del objeto y obligaciones contractuales conforme con la oferta presentada por él. Los pagos antes señalados se realizarán con sujeción al PAC de la C.A.S., de tal manera que ésta no asume responsabilidad alguna

por la demora que pueda presentarse en dichos pagos, y por lo tanto, EL CONTRATISTA cumplirá con sus obligaciones y no podrá aducir como justificación alguna para su no realización, demora en el pago. La C.A.S. hará las retenciones a que haya lugar sobre el pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes, el contratista asumirá los impuestos de ley aplicables al contrato. Los pagos serán efectuados por la Sub dirección Administrativa y Financiera en la cuenta bancaria designada por EL CONTRATISTA tal como consta en documento presentado por el mismo, previo cumplimiento de los requisitos establecidos para tal fin. EL CONTRATISTA con la suscripción del contrato, acepta que en el evento que el valor total a pagar por cada factura tenga centavos, estos deberán ser ajustados o aproximados al peso, ya sea por exceso cuando la suma sea igual o mayor a 0,50 centavos o por defecto cuando la suma sea menor a 0.50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el contrato. La C.A.S. sólo adquiere obligaciones con el adjudicatario en el presente proceso de selección y bajo ningún motivo o circunstancia efectuará pagos a terceros.

BALANCE FINANCIERO		
DETALLE	**VALOR ($)**	**VALOR ($)**
VALOR INICIAL	$ 522.835.089,00	
VALOR ADICIONAL	0,00	
VALOR ACTA FINAL No.1		$ 522.835.089,00
SALDO A FAVOR DE LA CAS:		$ 0,00
TOTAL (SUMAS IGUALES)	$ 522.835.089,00	$ 522.835.089,00

Teniendo en cuenta lo anterior se autoriza el pago del Acta final del contrato de obra No. 01053-2025, correspondiente al 100% del valor del contrato por un valor de suma de QUINIENTOS VEINTIDÓS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS MCTE, ($522.835.089,00) una vez cumplidos los requisitos del perfeccionamiento y legalización con el visto bueno del interventor.

Sin otro particular me despido

Atentamente:

HERNANDO LEGUIZAMÓN GALINDO
Interventor

MEMORANDO SPL.283.2026

PARA: **LAURA DIAZ CASTILLO**
Tesorera - CAS

DE: **EDNA ROCIO CASTELLANOS MARTINEZ**
Subdirectora de Planeación y Ordenamiento Ambiental-CAS

ASUNTO: **Trámite de pago final del Contrato de Obra No. 1053-2025 proceso secop II LP2-006-2025**

FECHA: 29 de abril de 2026

Cordial saludo:

Por medio del presente me permito remitirle la siguiente documentación del contrato de obra No. 1053-2025, suscrito entre la CAS y UNION TEMPORAL SISTEMAS SILVOPASTORILES, representado legalmente por la señora MARIA MAGDALENA CADENA ZARATE, cuyo objeto es: "IMPLEMENTACION DE SISTEMAS PRODUCTIVOS SILVOPASTORILES EN PRADERAS ESTABLECIDAS EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER" con el fin de proceder a realizar el pago total, Acta final:

- Oficio de remisión
- Certificación bancaria
- Factura electrónica de Venta
- RUT
- Tarjeta Profesional Revisora Fiscal
- Certificado de aportes parafiscales
- Pago de aportes parafiscales del personal y Representante Legal
- Informe de ejecución obra e interventoría
- Bitácoras de obra
- (F-PCT-034) Informe Supervisión e Interventoría
- Reevaluación de proveedores
- Acta Final

OBJETO:	**"IMPLEMENTACION DE SISTEMAS PRODUCTIVOS SILVOPASTORILES EN PRADERAS ESTABLECIDAS EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER"**
FECHA DEL CONTRATO:	27/08/2025
CONTRATANTE:	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER-CAS
NIT:	804.000.292-0
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL SISTEMAS SILVOPASTORILES
NIT:	901.980.916-3
REPRESENTANTE LEGAL:	MARIA MAGDALENA CADENA ZARATE
C.C. No.:	C.C. No. 1.096.211.185 de Barrancabermeja
VALOR DEL CONTRATO:	**QUINIENTOS VEINTIDOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS ($522.835.089,00),** IVA incluido
SUPERVISOR:	EDNA ROCIO CASTELLANOS MARTINEZ

CARGO:	Subdirectora de Planeación y Ordenamiento ambiental
PLAZO:	CUATRO (04) MESES y QUINCE (15) DÍAS, sin exceder 31 de diciembre de 2025.
FECHA DE INICIO:	08/09/2025
FECHA DE TERMINACION:	31/12/2025
INTERVENTORÍA EXTERNA	HERNANDO LEGUIZAMON GALINDO
CEDULA DE CIUDADANÍA	C.C. No. 7.160.171 de Tunja.

En Virtud de la CLAUSULA TERCERA. - **FORMA DE PAGO**: LA CORPORACION pagará al CONTRATISTA el valor del contrato, de la siguiente manera: Mediante actas parciales de avance de obra, certificadas por la interventoría, hasta un máximo del 90% del valor total del contrato y el saldo del 10% se pagará con la suscripción del acta de Recibo Final, previo recibo a satisfacción de la interventoría con la entrega del informe final y los soportes respectivos y evidencias: acta de recibo final de las obras. Informe final, Archivo fotográfico de realización de los trabajos, acta de terminación del contrato y esta acta obtenga el visto bueno del interventor de la obra y se encuentre debidamente firmada por el contratista, soportes del pago de nómina (salarios y prestaciones sociales), seguridad social y aportes parafiscales, Que el interventor expida un certificado de recibo final de la obra a entera satisfacción. Para efectos de cada pago, el contratista deberá adjuntar con los informes, la factura y la constancia del pago de los aportes al sistema general de seguridad social en salud y pensiones, riesgos profesionales y aportes parafiscales, de la totalidad del personal asignado para la ejecución del contrato.

Balance financiero:

VALOR DEL CONTRATO:	$ 522.835.089,00
DURACIÓN DEL CONTRATO	CUATRO (04) MESES Y QUINCE (15) DÍAS, sin exceder el 31 de diciembre de 2025
FECHA DE INICIO	08 de septiembre de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	31 de diciembre de 2025
VALOR ACTA FINAL	$ 522.835.089,00
SALDO POR PAGAR	$0,00

Teniendo en cuenta lo anterior se autoriza el pago del Acta final del contrato de obra No. 1053-2025, por un valor de QUINIENTOS VEINTIDÓS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS MCTE. ($522.835.089,00) IVA incluido, según contrato de obra No. 1053-2025 una vez cumplidos los requisitos del perfeccionamiento y legalización con el visto bueno del interventor.

Atentamente,

EDNA ROCIO CASTELLANOS MARTINEZ
Subdirectora de Planeación y Ordenamiento Ambiental-CAS

	NOMBRE	FIRMA
Proyectó	Natalia Estévez Corredor – Contratista SPL	

Certificado Bancario

Viernes, 20 de febrero de 2026

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que UNION TEMPORAL SISTEMAS SILVOPASTORILES identificado(a) con NIT 901980916, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	30600009801	2025/10/15	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

Espacio para
Logo Corporativo

UNIN TEMPORAL SISTEMAS SILVOPASTORILES
NIT 901.980.916-3
CLL 44 28C 68
Tel: 3223907049
Barrancabermeja - Colombia
auxiliarcontableaire@gmail.com

No. FE 3

Señores	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS		
NIT	804.000.292-0	**Teléfono**	(607) 0000000 - Ext. 000
Dirección	CR 12 9 06 BRR LA PLAYA	**Ciudad**	San Gil - Colombia

Fecha y hora comprobante	Fecha de Vencimiento
2026-04-28	2026-04-28

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	SERVICIO DE RESTAURACION DE ECOSISTEMAS CONT. 01053-2025	1.00	287,433,495.00
2	SERVICIO DE ESTABLECIMIENTO DE ESPECIES VEGETALES CONT. 01053-2025	1.00	111,829,650.00
3	ADMINISTRACION (24%)	1.00	95,823,154.80
4	IMPREVISTOS (1%)	1.00	3,992,631.45
5	UTILIDAD (5%) 19.963.157,25 IVA 19% 3.792.999,88 TOTAL 23.756.157,13	1.00	23,756,157.13

Total items: 5

Total Bruto	519,042,088.50
IVA 19%	3,792,999.88
Total a Pagar	522,835,088.38

Valor en Letras:
Quinientos veintidos millones ochocientos treinta y cinco mil ochenta y ocho pesos m/cte con treinta y ocho cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-04-28 por $ 522,835,088.38

Observaciones:

Este es un borrador de la factura para fines informativos. No reemplaza la factura de venta ni el documento equivalente.

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 25 — Solicitud de inscripción Unión temporal y/o Consorcio

4. Número de formulario: 141198870443

(415)7707212489984(8020) 000014119887044 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 9 8 0 9 1 6	3	Impuestos y Aduanas de Barrancabermeja 2 9	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social: UNIÓN TEMPORAL SISTEMAS SILVOPASTORILES

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Santander 6 8	Barrancabermeja 0 8 1

41. Dirección principal: CL 44 # 28 C - 68 BRR PALMIRA

42. Correo electrónico: asociacioninaire@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 7 6 1 2 6 8 0 5	3 1 1 5 3 7 6 7 4 0

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 2	51. Código	52. Número establecimientos
8 1 3 0	2 0 2 5 0 7 2 1					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	4	8	5	5	1	4																			

07- Retención en la fuente a título de rent

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

55 - Informante de Beneficiarios Finales

14- Informante de exogena

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] — 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: CADENA ZARATE MARIA MAGDALENA

985. Cargo: Representante Legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141198870443

(415)7707212489984(8020) **000014119887044 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 9 8 0 9 1 6	3	Impuestos y Aduanas de Barrancabermeja	2 9	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	7	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 5 0 7 2 1	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro		
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	6 8	
79. Ciudad/Municipio	0 8 1	

Vigencia

80. Desde	2 0 2 5 0 7 2 1	
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1		Año Mes Día		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141198870443

(415)7707212489984(8020) **000014119887044 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 9 8 0 9 1 6	3	Impuestos y Aduanas de Barrancabermeja	2 9	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 5 0 7 2 1

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 0 9 6 2 1 1 1 8 5		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
CADENA	ZARATE	MARIA	MAGDALENA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 5 0 7 2 1

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 9 6 2 3 4 0 5 2		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
PEREIRA	ORTEGA	ANGIE	GEORGINA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141198870443

(415)7707212489984(8020) **000014119887044 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 9 8 0 9 1 6	3	Impuestos y Aduanas de Barrancabermeja 2 9	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 8 6 0 1 5 4	1	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: ASOCIACION INNOVADORES DE LA RECUPERACION ECOLOGICA AIRE

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	8 0	2 0 2 5 0 7 2 1	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	8 0 4 0 0 7 7 5 7	5	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: CORPORACION PARA LA INNOVACION TECNOLOGICA

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	1 0	2 0 2 5 0 7 2 1	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	8 0 4 0 0 4 4 7 0	3	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: TRANSTECOL S.A.S.

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	1 0	2 0 2 5 0 7 2 1	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

MEMORANDO SPL.284.2026

PARA: **MARIA DEL CARMEN GONZALEZ MACIAS**
Contadora – CAS

DE: **EDNA ROCIO CASTELLANOS MARTINEZ**
Subdirectora de Planeación y Ordenamiento Ambiental-CAS

ASUNTO: **CONTRATO DE OBRA No. 1053-2025 proceso secop II LP2-006-2025**

FECHA: **29 de abril de 2026**

Cordial Saludo

Comedidamente me remito a usted con el fin de informar que el CONTRATO DE OBRA No. 1053-2025 proceso secop II LP2-006-2025**,** el cual tiene como objeto: "IMPLEMENTACION DE SISTEMAS PRODUCTIVOS SILVOPASTORILES EN PRADERAS ESTABLECIDAS EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER", es un contrato de obra, ejecutado en el municipio de La Paz. De igual manera, se informa que el pago a realizar es pago total correspondiente a QUINIENTOS VEINTIDOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS ($522.835.089,00), IVA incluido.

Lo anterior para su conocimiento y demás fines pertinentes.

EDNA ROCIO CASTELLANOS MARTINEZ
Subdirectora de Planeación y Ordenamiento Ambiental-CAS

	NOMBRE	FIRMA
Proyectó	Natalia Estévez Corredor – Contratista SPL	

cas.gov.co
SC3264-1
SA367-1
ST-CER944508

Barrancabermeja, 31 de diciembre de 2025

Señores

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER
CAS

Ref.: Certificado de Aportes Parafiscales

En mi calidad de CONTADOR y para dar cumplimiento a lo preceptuado en los artículos 50 de la Ley 789 de 2002 y 9º de la Ley 828 de 2003, **CERTIFICO:**

Que la UNIÓN TEMPORAL SISTEMAS SILVOPASTORILES, identificada con NIT No.901.980.916-3 durante los últimos cuatro (4) meses calendario legalmente exigibles y anteriores al presente proceso contractual, ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

De igual forma, respecto a contratos de prestación de servicios y en desarrollo de lo manifestado por el Ministerio de la Protección mediante conceptos Nos. 184946 del 29 de Junio de 2010 y 10240140240 del 19 de Mayo de 2011, así como, en cumplimiento de lo previsto por el artículo 23 del Decreto 1703 de 2002, la empresa ha verificado que su personal realiza los aportes integrales al sistema de seguridad social de forma anticipada.

Todo lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y la Ley 1393 de julio 12 de 2010.

Dado en Barrancabermeja a los 31 días del mes diciembre de 2025.

Agradecemos su atención prestada

Cordialmente,



FABIAN ARTURO VESGA DUARTE

Cc. 1.096.211.267 Barrancabermeja

TP: 242388-T

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.096.211.267

VESGA DUARTE

APELLIDOS

FABIAN ARTURO

NOMBRES

Fabian Vesga

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 22-MAR-1991

BARRANCABERMEJA
(SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.75 ESTATURA

A+ G.S. RH

M SEXO

13-JUL-2009 BARRANCABERMEJA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-2701900-00175976-M-1096211267-20090908 0015817228A 1 27006717

Scanned with CamScanner




JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

242388-T

FABIAN ARTURO
VESGA DUARTE
C.C. 1096211267
RES. INSCRIPCION 423 DEL 25/05/2018
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARAMANGA

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

249440 268248

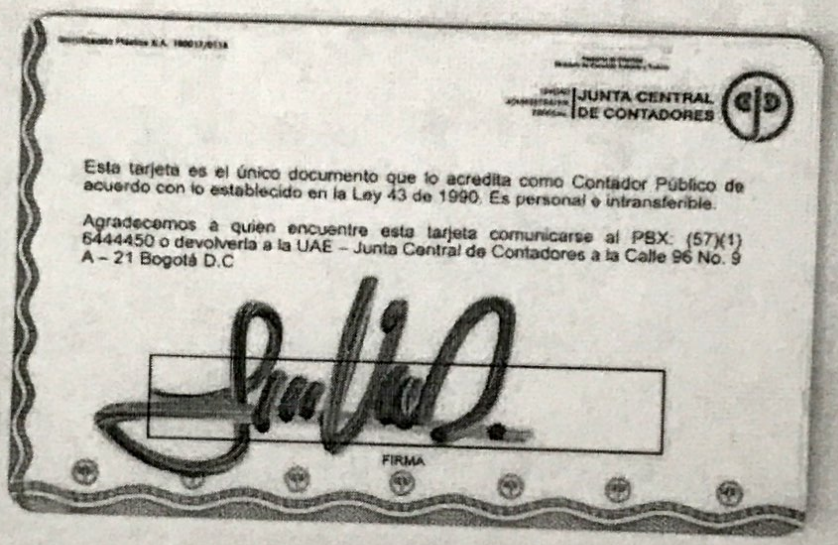

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C

FIRMA

Scanned with CamScanner

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

8020ACD6CF0D6198

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **FABIAN ARTURO VESGA DUARTE** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1096211267 de BARRANCABERMEJA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 242388-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

8020ACD6CF0D6198

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **FABIAN ARTURO VESGA DUARTE** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1096211267 de BARRANCABERMEJA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 242388-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.096.211.267

VESGA DUARTE

APELLIDOS

FABIAN ARTURO

NOMBRES

Fabian Vesga

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 22-MAR-1991

BARRANCABERMEJA
(SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.75 ESTATURA

A+ G.S. RH

M SEXO

13-JUL-2009 BARRANCABERMEJA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-2701900-00175976-M-1096211267-20090908 0015817228A 1 27006717

Scanned with CamScanner




JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

242388-T

FABIAN ARTURO
VESGA DUARTE
C.C. 1096211267
RES. INSCRIPCION 423 DEL 25/05/2018
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARAMANGA

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

249440 268248

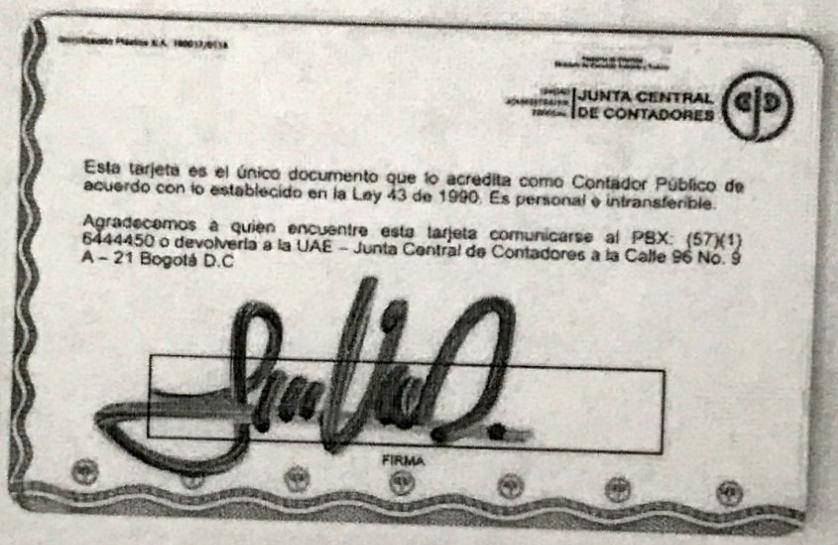

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C

FIRMA

Scanned with CamScanner

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901980916	3	UNION TEMPORAL SILVOPASTORILES	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CAJASAN	CLL 44 #28C-68	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	3115376740	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	1825298353	9492406952	E	2025/10/06	2025/10/03	BANCOLOMBIA	0	$338,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1096211185	CADENA MARIA	25-14	23	$1,091,350	$174,700	EPS037	23	$1,091,350	$43,700	CCF39	23	$1,091,350	$43,700	14-4	23	$1,091,350	$76,000	23	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					**$1,091,350**	**$174,700**			**$1,091,350**	**$43,700**			**$1,091,350**	**$43,700**			**$1,091,350**	**$76,000**		**$0**	**$0**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$174,700	$0	$0	$174,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$174,700	$0	$0	$174,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$76,000	$0	$0	$76,000
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	$76,000	$0	$0	$76,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$43,700	$0	$0	$43,700
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	1	$43,700	$0	$0	$43,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$43,700	$0	$0	$43,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$43,700	$0	$0	$43,700
TOTAL				1	$338,100	$0	$0	$338,100

2025/10/06 08:20 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901980916	3	UNION TEMPORAL SILVOPASTORILES	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CAJASAN	CLL 44 #28C-68	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	3115376740	Si

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: CAJASAN (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$99,100		$0	$0
Centro de Trabajo: COLPATRIA V (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$99,100		$0	$0
Ciudad: BARRANCABERMEJA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$99,100		$0	$0
1	CC 1096211185	CADENA MARIA	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
Total Afiliados(1)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$99,100		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1911555046	9493485496	E	2025/11/07	2025/11/07	BANCOLOMBIA	0	$440,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$99,100	$0	$0	$99,100
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	$99,100	$0	$0	$99,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$0	$0	$57,000
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	1	$57,000	$0	$0	$57,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$0	$0	$57,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$57,000	$0	$0	$57,000
TOTAL				**1**	**$440,900**	**$0**	**$0**	**$440,900**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901980916	3	UNION TEMPORAL SILVOPASTORILES	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CAJASAN	CLL 44 #28C-68	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	3115376740	Si

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: CAJASAN (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$99,100		$0	$0
Centro de Trabajo: COLPATRIA V (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$99,100		$0	$0
Ciudad: BARRANCABERMEJA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$99,100		$0	$0
1	CC 1096211185	CADENA MARIA	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
Total Afiliados(1)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$99,100		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	1977782318	9495005177	E	2025/12/04	2025/12/03	BANCOLOMBIA	0	$440,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$99,100	$0	$0	$99,100
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	$99,100	$0	$0	$99,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$0	$0	$57,000
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	1	$57,000	$0	$0	$57,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$0	$0	$57,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$57,000	$0	$0	$57,000
TOTAL				**1**	**$440,900**	**$0**	**$0**	**$440,900**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900860154	1	ASOCIACION INNOVADORES DE LA RECUPERACION ECOLOGICA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONTRATO 2017	CALLE 44 28C-68	BUCARAMANGA-SANTANDER	6126805	Si

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: CONTRATO 2017 (90 Afiliados)						$111,840,676	$17,897,500			$112,196,551	$4,474,100			$138,391,615	$5,523,400			$120,737,551	$4,026,700		$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (90 Afiliados)						$111,840,676	$17,897,500			$112,196,551	$4,474,100			$138,391,615	$5,523,400			$120,737,551	$4,026,700		$0	$0
Ciudad: BARRANCABERMEJA Depto: SANTANDER (10 Afiliados)						$12,726,000	$2,036,500			$15,573,000	$623,400			$16,823,000	$673,400			$15,573,000	$132,100		$0	$0
1	CC	37575479	CORPAS NANCY	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF38	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
2	CC	1096183655	FLOREZ SARA	230301	30	$1,423,500	$227,800	ESSC24	30	$1,423,500	$57,000	CCF38	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
3	CC	37934430	GOMEZ ADELA		0	$0	$0	EPS017	17	$806,650	$32,300	CCF38	17	$806,650	$32,300	14-4	17	$806,650	$0	17	$0	$0
4	CC	37934430	GOMEZ ADELA		0	$0	$0	EPS017	13	$616,850	$24,700	CCF38	13	$616,850	$24,700	14-4	13	$616,850	$0	13	$0	$0
5	CC	91429734	JIMENEZ WALTER	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF38	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
6	CC	1137195076	MERCADO ALBERTO	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF38	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
7	CC	13570727	MORA CARLOS	230301	3	$142,350	$22,800	EPS037	3	$142,350	$5,700	CCF38	3	$142,350	$5,700	14-4	3	$142,350	$10,000	3	$0	$0
8	CC	13570727	MORA CARLOS	230301	7	$332,150	$53,200	EPS037	7	$332,150	$13,300	CCF38	7	$332,150	$13,300	14-4	7	$332,150	$0	7	$0	$0
9	CC	13570727	MORA CARLOS	230301	4	$189,800	$30,400	EPS037	4	$189,800	$7,600	CCF38	4	$189,800	$7,600	14-4	4	$189,800	$0	4	$0	$0
10	CC	13570727	MORA CARLOS	230301	16	$759,200	$121,500	EPS037	16	$759,200	$30,400	CCF38	16	$759,200	$30,400	14-4	16	$759,200	$0	16	$0	$0
11	CC	37939658	NUÑEZ MARTHA	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF38	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
12	CC	13887226	PINEDA GUILLERMO		0	$0	$0	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF38	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
13	CC	37576001	POLANCO YESY	230301	30	$2,500,000	$400,000	EPS005	30	$2,500,000	$100,000	CCF38	30	$3,750,000	$150,000	14-4	30	$2,500,000	$60,900	30	$0	$0
14	CC	1096254945	TRIANA DAYANNA	230301	30	$1,685,000	$269,600	EPS037	30	$1,685,000	$67,400	CCF38	30	$1,685,000	$67,400	14-4	30	$1,685,000	$8,800	30	$0	$0
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (73 Afiliados)						$89,506,051	$14,323,300			$92,353,051	$3,679,700			$111,959,990	$4,465,200			$95,200,051	$3,790,300		$0	$0
15	CC	1096957169	ARCINIEGAS JUAN	25-14	18	$1,500,000	$240,000	EPS005	18	$1,500,000	$60,000	CCF39	18	$2,277,778	$91,200	14-4	18	$1,500,000	$104,400	18	$0	$0
16	CC	91324515	BASTIDAS JOSE	25-14	18	$854,100	$136,700	EPS002	18	$854,100	$34,200	CCF39	18	$1,105,190	$44,300	14-4	18	$854,100	$59,500	18	$0	$0
17	CC	37555125	BAYONA MARIA	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
18	CC	1098719806	BERNAL ERIKA	230301	30	$1,423,500	$227,800	ESSC24	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
19	CC	1102863911	BERTEL LISETH	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
20	CC	1098679470	BLANCO OLGA	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
21	CC	1003249559	BONETT JUAN	230301	18	$1,020,000	$163,200	EPS037	18	$1,020,000	$40,800	CCF39	18	$1,657,500	$66,300	14-4	18	$1,020,000	$71,000	18	$0	$0
22	CC	37578496	CADENA ELIZABETH	230301	4	$189,800	$30,400	EPS037	4	$189,800	$7,600	CCF39	4	$375,646	$15,100	14-4	4	$189,800	$13,300	4	$0	$0
23	CC	1096211185	CADENA MARIA	25-14	30	$4,800,000	$768,000	EPS037	30	$4,800,000	$192,000	CCF39	30	$4,800,000	$192,000	14-4	30	$4,800,000	$25,100	30	$0	$0
24	CC	1095921730	CASTELLANOS DIANA	230301	18	$854,100	$136,700	ESSC24	18	$854,100	$34,200	CCF39	18	$1,186,250	$47,500	14-4	18	$854,100	$59,500	18	$0	$0
25	CC	91518672	CASTILLO FREDY	230301	15	$711,750	$113,900	EPS010	15	$711,750	$28,500	CCF39	15	$1,229,746	$49,200	14-4	15	$711,750	$49,600	15	$0	$0
26	CC	91518672	CASTILLO FREDY	230301	3	$142,350	$22,800	EPS010	3	$142,350	$0	CCF39	3	$142,350	$0	14-4	3	$142,350	$0	3	$0	$0
27	CC	1098758144	CEPEDA LEIDY	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
28	CC	1098814538	CHAPARRO YULIANA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
29	CC	1005343385	CONDE YURANY	230301	30	$2,240,000	$358,400	EPS005	30	$2,240,000	$89,600	CCF39	30	$2,240,000	$89,600	14-4	30	$2,240,000	$0	30	$0	$0
30	CC	37711095	CONTRERAS EMILSEN	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
31	CC	1099282169	CORTES JUAN	230301	16	$759,200	$121,500	EPS010	16	$759,200	$30,400	CCF39	16	$1,291,035	$51,700	14-4	16	$759,200	$52,900	16	$0	$0
32	CC	1099282169	CORTES JUAN	230301	1	$47,450	$7,600	EPS010	1	$47,450	$0	CCF39	1	$47,450	$0	14-4	1	$47,450	$0	1	$0	$0
33	CC	1099282169	CORTES JUAN	230301	1	$47,450	$7,600	EPS010	1	$47,450	$1,900	CCF39	1	$47,450	$1,900	14-4	1	$47,450	$0	1	$0	$0
34	CC	1098688703	CRUZ DIEGO	231001	18	$1,170,000	$187,200	EPS037	18	$1,170,000	$46,800	CCF39	18	$1,898,542	$76,000	14-4	18	$1,170,000	$81,500	18	$0	$0
35	CC	1096957615	DUARTE DANIA	230201	16	$1,680,000	$268,800	EPS005	16	$1,680,000	$67,200	CCF39	16	$2,716,875	$108,700	14-4	16	$1,680,000	$117,000	16	$0	$0
36	CC	1096957615	DUARTE DANIA	230201	2	$210,000	$33,600	EPS005	2	$210,000	$8,400	CCF39	2	$210,000	$8,400	14-4	2	$210,000	$0	2	$0	$0
37	CC	1096957274	FAYAD NICOLAS	230301	18	$1,500,000	$240,000	EPS005	18	$1,500,000	$60,000	CCF39	18	$1,812,500	$72,500	14-4	18	$1,500,000	$104,400	18	$0	$0
38	CC	91217067	GAMEZ FELIX		0	$0	$0	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
39	CC	1097912054	GARCIA JHONNATHAN	230301	16	$759,200	$121,500	EPS005	16	$759,200	$30,400	CCF39	16	$1,115,075	$44,700	14-4	16	$759,200	$52,900	16	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
40	CC	1097912054	GARCIA JHONNATHAN	230301	2	$94,900	$15,200	EPS005	2	$94,900	$0	CCF39	2	$94,900	$0	14-4	2	$94,900	$0	2	$0	$0
41	CC	1098713098	GARCIA MIGUEL	230301	18	$854,100	$136,700	EPS017	18	$854,100	$34,200	CCF39	18	$1,259,402	$50,400	14-4	18	$854,100	$59,500	18	$0	$0
42	CC	1098793582	GARCIA MILTON	230201	18	$1,170,000	$187,200	EPS037	18	$1,170,000	$46,800	CCF39	18	$1,595,208	$63,900	14-4	18	$1,170,000	$81,500	18	$0	$0
43	CC	1095825849	GOMEZ NELSON	230201	15	$711,750	$113,900	EPS005	15	$711,750	$28,500	CCF39	15	$1,055,762	$42,300	14-4	15	$711,750	$49,600	15	$0	$0
44	CC	1095825849	GOMEZ NELSON	230201	3	$142,350	$22,800	EPS005	3	$142,350	$5,700	CCF39	3	$142,350	$5,700	14-4	3	$142,350	$0	3	$0	$0
45	CC	1098760058	GUARIN ADRIANA	230301	28	$1,328,600	$212,600	EPS046	28	$1,328,600	$53,200	CCF39	28	$1,328,600	$53,200	14-4	28	$1,328,600	$13,900	28	$0	$0
46	CC	1098760058	GUARIN ADRIANA	230301	2	$94,900	$15,200	EPS046	2	$94,900	$3,800	CCF39	2	$94,900	$3,800	14-4	2	$94,900	$0	2	$0	$0
47	CC	91514289	GUARIN JUAN	230201	17	$1,105,000	$176,800	EPS037	17	$1,105,000	$44,200	CCF39	17	$1,836,250	$73,500	14-4	17	$1,105,000	$77,000	17	$0	$0
48	CC	91514289	GUARIN JUAN	230201	1	$65,000	$10,400	EPS037	1	$65,000	$2,600	CCF39	1	$65,000	$2,600	14-4	1	$65,000	$0	1	$0	$0
49	CC	63480551	GUTIERREZ ADRIANA	230201	30	$1,423,500	$227,800	ESSC24	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
50	CC	72172212	HERRERA MIGUEL	230201	18	$854,100	$136,700	EPS017	18	$854,100	$34,200	CCF39	18	$1,387,912	$55,600	14-4	18	$854,100	$59,500	18	$0	$0
51	CC	1005052010	HORMIGA CRISTIAN	230301	16	$1,333,334	$213,400	EPS005	16	$1,333,334	$53,400	CCF39	16	$2,267,361	$90,700	14-4	16	$1,333,334	$92,900	16	$0	$0
52	CC	1005052010	HORMIGA CRISTIAN	230301	2	$166,667	$26,700	EPS005	2	$166,667	$6,700	CCF39	2	$166,667	$6,700	14-4	2	$166,667	$0	2	$0	$0
53	CC	1098734602	HOYOS LUZ	230301	15	$711,750	$113,900	EPS037	15	$711,750	$28,500	CCF39	15	$711,750	$28,500	14-4	15	$711,750	$7,500	15	$0	$0
54	CC	1098734602	HOYOS LUZ	230301	15	$711,750	$113,900	EPS037	15	$711,750	$28,500	CCF39	15	$711,750	$28,500	14-4	15	$711,750	$0	15	$0	$0
55	CC	1102370695	JAIMES MARIA	25-14	18	$854,100	$136,700	EPS046	18	$854,100	$34,200	CCF39	18	$1,158,571	$46,400	14-4	18	$854,100	$59,500	18	$0	$0
56	CC	1002330045	JUNCO JUAN	230201	30	$3,500,000	$560,000	EPS037	30	$3,500,000	$140,000	CCF39	30	$3,500,000	$140,000	14-4	30	$3,500,000	$18,300	30	$0	$0
57	CC	1095931619	MARTINEZ JHON	230301	18	$854,100	$136,700	EPS037	18	$854,100	$34,200	CCF39	18	$1,387,912	$55,600	14-4	18	$854,100	$59,500	18	$0	$0
58	CC	1098656390	MEDINA ANDRES	230301	18	$854,100	$136,700	EPS010	18	$854,100	$34,200	CCF39	18	$992,496	$39,700	14-4	18	$854,100	$59,500	18	$0	$0
59	CC	1007470412	MENESES DIEGO	230301	18	$1,500,000	$240,000	EPS005	18	$1,500,000	$60,000	CCF39	18	$2,375,000	$95,000	14-4	18	$1,500,000	$104,400	18	$0	$0
60	CC	1005337697	MORALES MICHAEL	230301	15	$711,750	$113,900	EPS037	15	$711,750	$28,500	CCF39	15	$1,002,381	$40,100	14-4	15	$711,750	$49,600	15	$0	$0
61	CC	1005337697	MORALES MICHAEL	230301	2	$94,900	$15,200	EPS037	2	$94,900	$3,800	CCF39	2	$94,900	$3,800	14-4	2	$94,900	$0	2	$0	$0
62	CC	1005337697	MORALES MICHAEL	230301	1	$47,450	$7,600	EPS037	1	$47,450	$0	CCF39	1	$47,450	$0	14-4	1	$47,450	$0	1	$0	$0
63	CC	1140415486	MORENO SERGIO	230201	18	$854,100	$136,700	EPS002	18	$854,100	$34,200	CCF39	18	$1,255,448	$50,300	14-4	18	$854,100	$59,500	18	$0	$0
64	CC	1098757812	OCHOA FABIAN	230301	18	$854,100	$136,700	ESSC24	18	$854,100	$34,200	CCF39	18	$1,008,312	$40,400	14-4	18	$854,100	$59,500	18	$0	$0
65	CC	63507990	OJEDA BETSABE	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
66	CC	1090363811	ORDOÑEZ JOSE	230201	18	$1,170,000	$187,200	EPS010	18	$1,170,000	$46,800	CCF39	18	$1,901,250	$76,100	14-4	18	$1,170,000	$81,500	18	$0	$0
67	CC	1096219631	ORTIZ ADRIANA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
68	CC	42484201	OSORIO LUZ		0	$0	$0	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
69	CC	1098617741	PACHON EDINSON	230301	18	$854,100	$136,700	EPS010	18	$854,100	$34,200	CCF39	18	$1,387,912	$55,600	14-4	18	$854,100	$59,500	18	$0	$0
70	CC	1143262515	PAIMA BRAYAN	230301	18	$854,100	$136,700	EPS002	18	$854,100	$34,200	CCF39	18	$1,385,935	$55,500	14-4	18	$854,100	$59,500	18	$0	$0
71	CC	1098638768	PARRA LUIS	230301	30	$1,650,000	$264,000	EPS005	30	$1,650,000	$66,000	CCF39	30	$1,650,000	$66,000	14-4	30	$1,650,000	$114,900	30	$0	$0
72	CC	1043125813	PAVA JESUS	230301	18	$854,100	$136,700	EPS002	18	$854,100	$34,200	CCF39	18	$1,387,912	$55,600	14-4	18	$854,100	$59,500	18	$0	$0
73	CC	1096234052	PEREIRA ANGIE	230301	30	$2,800,000	$448,000	EPS037	30	$2,800,000	$112,000	CCF39	30	$2,800,000	$112,000	14-4	30	$2,800,000	$14,700	30	$0	$0
74	CC	91500408	PICON ELISAIN	230301	30	$1,423,500	$227,800	MIN001	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
75	PT	5050919	PINEDA OMAIRA	230301	14	$910,177	$145,700	EPS002	14	$910,177	$36,500	CCF39	14	$973,444	$39,000	14-4	14	$910,177	$9,600	14	$0	$0
76	CC	1005327428	PINTO JENNYFER	230301	18	$854,100	$136,700	EPS017	18	$854,100	$34,200	CCF39	18	$1,387,912	$55,600	14-4	18	$854,100	$59,500	18	$0	$0
77	CC	1005231248	RAMIREZ ANDREA	25-14	18	$1,500,000	$240,000	EPS037	18	$1,500,000	$60,000	CCF39	18	$1,725,694	$69,100	14-4	18	$1,500,000	$104,400	18	$0	$0
78	CC	1098819118	RAMOS CAMILO	230301	18	$854,100	$136,700	EPS002	18	$854,100	$34,200	CCF39	18	$1,385,935	$55,500	14-4	18	$854,100	$59,500	18	$0	$0
79	CC	63510804	RAYO BLANCA	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
80	CC	28020791	REINA GIRLEZA	230301	16	$1,067,625	$170,900		0	$0	$0	CCF39	16	$1,067,625	$42,800	14-4	30	$1,423,500	$7,500	16	$0	$0
81	CC	1005161447	REY JUAN	230301	28	$1,328,600	$212,600	ESSC24	28	$1,328,600	$53,200	CCF39	28	$1,328,600	$53,200	14-4	28	$1,328,600	$57,800	28	$0	$0
82	CC	1005161447	REY JUAN	230301	2	$94,900	$15,200	ESSC24	2	$94,900	$3,800	CCF39	2	$94,900	$3,800	14-4	2	$94,900	$0	2	$0	$0
83	CC	37546799	RICO JACKELINNE	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
84	CC	13719299	RIVERA JUAN	25-14	17	$1,105,000	$176,800	EPS037	17	$1,105,000	$44,200	CCF39	17	$1,300,000	$52,000	14-4	17	$1,105,000	$77,000	17	$0	$0
85	CC	13719299	RIVERA JUAN	25-14	1	$65,000	$10,400	EPS037	1	$65,000	$2,600	CCF39	1	$65,000	$2,600	14-4	1	$65,000	$0	1	$0	$0
86	CC	1005107015	RODRIGUEZ HANS	25-14	18	$1,170,000	$187,200	EPS017	18	$1,170,000	$46,800	CCF39	18	$1,665,625	$66,700	14-4	18	$1,170,000	$81,500	18	$0	$0
87	CC	13507666	ROJAS JOSE	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
88	CC	13744232	ROJAS NESTOR	230201	18	$854,100	$136,700	EPS037	18	$854,100	$34,200	CCF39	18	$1,209,975	$48,400	14-4	18	$854,100	$59,500	18	$0	$0
89	CC	63343647	RONDON CLARA	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
90	CC	28015815	ROSADO MARIELA		0	$0	$0	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
91	CC	1098792345	RUEDA BRANDON	230201	18	$854,100	$136,700	EPS037	18	$854,100	$34,200	CCF39	18	$1,372,096	$54,900	14-4	18	$854,100	$59,500	18	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
92	CC	1098666573	RUEDA JHONATTAN	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
93	CC	1095791956	SANCHEZ DANIEL	230301	18	$854,100	$136,700	EPS042	18	$854,100	$34,200	CCF39	18	$925,275	$37,100	14-4	18	$854,100	$59,500	18	$0	$0
94	CC	1005236279	SANDOVAL KAROL	230301	28	$1,328,600	$212,600	EPS041	28	$1,328,600	$53,200	CCF39	28	$1,328,600	$53,200	14-4	28	$1,328,600	$13,900	28	$0	$0
95	CC	1005236279	SANDOVAL KAROL	230301	2	$94,900	$15,200	EPS041	2	$94,900	$0	CCF39	2	$94,900	$0	14-4	2	$94,900	$0	2	$0	$0
96	CC	37722410	SANDOVAL YOLANDA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$34,700	30	$0	$0
97	CC	1098679492	SANTOYO MONICA	230201	18	$854,100	$136,700	EPS017	18	$854,100	$34,200	CCF39	18	$1,387,912	$55,600	14-4	18	$854,100	$59,500	18	$0	$0
98	CC	63352680	SARMIENTO CENAIDA	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$0	30	$0	$0
99	CC	37615301	SUAREZ DIVA	230901	30	$1,893,073	$302,900	EPS037	30	$1,893,073	$75,800	CCF39	30	$1,893,073	$75,800	14-4	30	$1,893,073	$131,800	30	$0	$0
100	CC	1090510772	SUESCUN YADIR	230301	18	$854,100	$136,700	EPS002	18	$854,100	$34,200	CCF39	18	$1,381,981	$55,300	14-4	18	$854,100	$59,500	18	$0	$0
101	CC	52066402	TORRES GLADYS	25-14	4	$355,875	$57,000		0	$0	$0	CCF39	4	$355,875	$14,300	14-4	30	$1,423,500	$14,900	4	$0	$0
102	CC	1095802894	VILLAMIZAR ESLEYDER	230301	18	$854,100	$136,700	EPS042	18	$854,100	$34,200	CCF39	18	$915,390	$36,700	14-4	18	$854,100	$59,500	18	$0	$0
Ciudad: LETICIA Depto: AMAZONAS (2 Afiliados)						**$2,491,125**	**$398,700**			**$0**	**$0**			**$2,491,125**	**$99,800**			**$2,847,000**	**$29,800**		**$0**	**$0**
103	CC	41056195	DEL AGUILA MARIA	230301	30	$1,423,500	$227,800		0	$0	$0	CCF65	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
104	CC	41058537	PEÑA LILIANA	230301	21	$1,067,625	$170,900		0	$0	$0	CCF65	21	$1,067,625	$42,800	14-4	30	$1,423,500	$14,900	21	$0	$0
Ciudad: PUERTO CARREÑO Depto: VICHADA (4 Afiliados)						**$5,694,000**	**$911,200**			**$4,270,500**	**$171,000**			**$5,694,000**	**$228,000**			**$5,694,000**	**$59,600**		**$0**	**$0**
105	CC	1012414948	BALANTA BELKIS	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF68	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
106	CC	42548845	GAITAN ENEILA	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF68	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
107	CC	1126705610	LEMUS MARIA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF68	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
108	CC	1127384990	RAMIREZ LEYDI	230301	30	$1,423,500	$227,800		0	$0	$0	CCF68	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
Ciudad: SAN ANDRES Depto: SAN ANDRES (1 Afiliados)						**$1,423,500**	**$227,800**			**$0**	**$0**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,423,500**	**$14,900**		**$0**	**$0**
109	CC	40989228	JARAMILLO ANGELA	230301	26	$1,423,500	$227,800		0	$0	$0	CCF64	26	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$14,900	26	$0	$0
Total			**Afiliados(90)**			**$111,840,676**	**$17,897,500**			**$112,196,551**	**$4,474,100**			**$138,391,615**	**$5,523,400**			**$120,737,551**	**$4,026,700**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2026-01	2022496168	9496657255	E	2026/01/15	2025/12/19	BANCOLOMBIA	0	$31,921,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				85	$17,897,500	$0	$0	$17,897,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$187,200	$0	$0	$187,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	19	$4,458,600	$0	$0	$4,458,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	48	$9,565,600	$0	$0	$9,565,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	16	$3,383,200	$0	$0	$3,383,200
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$302,900	$0	$0	$302,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				90	$4,026,700	$0	$0	$4,026,700
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	90	$4,026,700	$0	$0	$4,026,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 5)				90	$5,523,400	$0	$0	$5,523,400
CAFABA	CCF38	890,270,275	5	10	$673,400	$0	$0	$673,400
CAFAMAZ	CCF65	800,003,122	6	2	$99,800	$0	$0	$99,800
CAJASAI	CCF64	892,400,320	5	1	$57,000	$0	$0	$57,000
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	73	$4,465,200	$0	$0	$4,465,200
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	4	$228,000	$0	$0	$228,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				84	$4,474,100	$0	$0	$4,474,100
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	2	$68,400	$0	$0	$68,400
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	6	$296,400	$0	$0	$296,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	6	$233,000	$0	$0	$233,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	6	$240,600	$0	$0	$240,600
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	$57,000	$0	$0	$57,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	26	$1,587,700	$0	$0	$1,587,700
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	5	$281,200	$0	$0	$281,200
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	2	$91,200	$0	$0	$91,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	16	$754,700	$0	$0	$754,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	14	$863,900	$0	$0	$863,900
TOTAL				**90**	**$31,921,700**	**$0**	**$0**	**$31,921,700**

Certificados de Aportes

Se certifica que TRANSTECOL SAS identificado(a) con NI 804004470 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para CESAR AUGUSTO CANO SAAVEDRA identificado(a) con CC 14232910

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		
9491793722	1780259704	E	2025-09-16	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	29									X									4%	$237,700
9491793722	1780259704	E	2025-09-16	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	1										X								0%	$0
9491793722	1780259704	E	2025-09-16	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-08	29									X									4.35%	$258,500
9491793722	1780259704	E	2025-09-16	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-08	1										X								0%	$0
9491793722	1780259704	E	2025-09-16	CCF	CCF34	COFREM	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-08	29									X									4%	$237,700
9491793722	1780259704	E	2025-09-16	CCF	CCF34	COFREM	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-08	1										X								0%	$0

Este certificado se expide el día 2025-09-16 a las 11:33.

Certificados de Aportes

Se certifica que TRANSTECOL SAS identificado(a) con NI 804004470 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para DANY ALEXANDER SANCHEZ CAMACHO identificado(a) con CC 1096951656

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	
9491797237	1780268630	E	2025-09-16	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30																	4%	$120,000
9491797237	1780268630	E	2025-09-16	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-08	30																	16%	$480,000
9491797237	1780268630	E	2025-09-16	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-08	30																		$0
9491797237	1780268630	E	2025-09-16	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-08	30																		$0
9491797237	1780268630	E	2025-09-16	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-08	30																	0%	$0
9491797237	1780268630	E	2025-09-16	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-08	30																	0%	$0
9491797237	1780268630	E	2025-09-16	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-08	30																	0.522%	$15,700
9491797237	1780268630	E	2025-09-16	CCF	CCF40	COMFENALCO SANTANDER	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-08	30																	4%	$120,000

Este certificado se expide el día 2025-09-16 a las 11:35.

aportes en línea

Certificados de Aportes

Se certifica que TRANSTECOL SAS identificado(a) con NI 804004470 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para CESAR AUGUSTO CANO SAAVEDRA identificado(a) con CC 14232910

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		
9493305803	1860197873	E	2025-10-17	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30									X									4%	$207,100
9493305803	1860197873	E	2025-10-17	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30									X									4.35%	$225,200
9493305803	1860197873	E	2025-10-17	CCF	CCF34	COFREM	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30									X									4%	$207,100

Este certificado se expide el día 2025-10-17 a las 03:20.

Certificados de Aportes

Se certifica que TRANSTECOL SAS identificado(a) con NI 804004470 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para DANY ALEXANDER SANCHEZ CAMACHO identificado(a) con CC 1096951656

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	
9493308027	1860253720	E	2025-10-17	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	21																	4%	$84,000
9493308027	1860253720	E	2025-10-17	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	9													X				4%	$36,000
9493308027	1860253720	E	2025-10-17	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	21																	16%	$336,000
9493308027	1860253720	E	2025-10-17	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	9													X				16%	$144,000
9493308027	1860253720	E	2025-10-17	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-09	21																		$0
9493308027	1860253720	E	2025-10-17	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-09	9													X					$0
9493308027	1860253720	E	2025-10-17	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-09	21																		$0
9493308027	1860253720	E	2025-10-17	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-09	9													X					$0
9493308027	1860253720	E	2025-10-17	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-09	21																	0%	$0
9493308027	1860253720	E	2025-10-17	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-09	9													X				0%	$0
9493308027	1860253720	E	2025-10-17	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-09	21																	0%	$0
9493308027	1860253720	E	2025-10-17	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-09	9													X				0%	$0
9493308027	1860253720	E	2025-10-17	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	21																	0.522%	$11,000
9493308027	1860253720	E	2025-10-17	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	9													X				0%	$0
9493308027	1860253720	E	2025-10-17	CCF	CCF40	COMFENALCO SANTANDER	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	21																	4%	$84,000
9493308027	1860253720	E	2025-10-17	CCF	CCF40	COMFENALCO SANTANDER	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	9													X				4%	$36,000

Este certificado se expide el día 2025-10-17 a las 03:19.

Certificados de Aportes

Se certifica que TRANSTECOL SAS identificado(a) con NI 804004470 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para CESAR AUGUSTO CANO SAAVEDRA identificado(a) con CC 14232910

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		
9494862794	1940777578	E	2025-11-19	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	17									X									4%	$111,200
9494862794	1940777578	E	2025-11-19	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	13											X							4%	$52,000
9494862794	1940777578	E	2025-11-19	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	17									X									4.35%	$120,900
9494862794	1940777578	E	2025-11-19	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	13											X							0%	$0
9494862794	1940777578	E	2025-11-19	CCF	CCF34	COFREM	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	17									X									4%	$111,200
9494862794	1940777578	E	2025-11-19	CCF	CCF34	COFREM	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	13											X							4%	$52,000

Este certificado se expide el día 2025-11-19 a las 04:25.

Certificados de Aportes

Se certifica que TRANSTECOL SAS identificado(a) con NI 804004470 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para DANY ALEXANDER SANCHEZ CAMACHO identificado(a) con CC 1096951656

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	
9496514075	2013854677	E	2025-12-16	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	25		X							X									4%	$172,000
9496514075	2013854677	E	2025-12-16	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	25		X							X									16%	$687,700
9496514075	2013854677	E	2025-12-16	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-11	25		X							X										$0
9496514075	2013854677	E	2025-12-16	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-11	25		X							X										$0
9496514075	2013854677	E	2025-12-16	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-11	25		X							X									0%	$0
9496514075	2013854677	E	2025-12-16	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-11	25		X							X									0%	$0
9496514075	2013854677	E	2025-12-16	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	25		X							X									0.522%	$22,500
9496514075	2013854677	E	2025-12-16	CCF	CCF40	COMFENALCO SANTANDER	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	25		X							X									4%	$249,500

Este certificado se expide el día 2025-12-17 a las 08:37.

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901980916	3	UNION TEMPORAL SILVOPASTORILES	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CAJASAN	CLL 44 #28C-68	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	3115376740	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	158695225	9501796179	E	2025/12/04	2026/03/24	BANCOLOMBIA	110	$86,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1096951656	SANCHEZ DANY	230301	5	$260,000	$41,600	EPS005	5	$260,000	$10,400	CCF39	5	$260,000	$10,400	14-4	5	$260,000	$18,100	5	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					**$260,000**	**$41,600**			**$260,000**	**$10,400**			**$260,000**	**$10,400**			**$260,000**	**$18,100**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$41,600	$2,900	$0	$44,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$41,600	$2,900	$0	$44,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$18,100	$1,300	$0	$19,400
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	$18,100	$1,300	$0	$19,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$10,400	$800	$0	$11,200
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	1	$10,400	$800	$0	$11,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$10,400	$800	$0	$11,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$10,400	$800	$0	$11,200
TOTAL				**1**	**$80,500**	**$5,800**	**$0**	**$86,300**

Certificados de Aportes

Se certifica que TRANSTECOL SAS identificado(a) con NI 804004470 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para ANGEL DAVID ACERO DIAZ identificado(a) con CC 1123802990

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	
9496509738	2013868491	E	2025-12-16	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30									X									4%	$90,400
9496509738	2013868491	E	2025-12-16	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30									X									16%	$361,600
9496509738	2013868491	E	2025-12-16	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-11	30									X										$0
9496509738	2013868491	E	2025-12-16	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-11	30									X										$0
9496509738	2013868491	E	2025-12-16	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-11	30									X									0%	$0
9496509738	2013868491	E	2025-12-16	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-11	30									X									0%	$0
9496509738	2013868491	E	2025-12-16	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30									X									4.35%	$98,300
9496509738	2013868491	E	2025-12-16	CCF	CCF34	COFREM	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30									X									4%	$90,400

Este certificado se expide el día 2025-12-17 a las 08:38.

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901980916	3	UNION TEMPORAL SILVOPASTORILES	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CAJASAN	CLL 44 #28C-68	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	3115376740	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2026-01	158746000	9501814089	E	2026/01/07	2026/03/24	BANCOLOMBIA	76	$509,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1096951656	SANCHEZ DANY	230301	30	$1,560,000	$249,600	EPS005	30	$1,560,000	$62,400	CCF39	30	$1,635,833	$65,500	14-4	30	$1,560,000	$108,600	30	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					**$1,560,000**	**$249,600**			**$1,560,000**	**$62,400**			**$1,635,833**	**$65,500**			**$1,560,000**	**$108,600**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$249,600	$12,000	$0	$261,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$249,600	$12,000	$0	$261,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$108,600	$5,200	$0	$113,800
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	$108,600	$5,200	$0	$113,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$65,500	$3,200	$0	$68,700
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	1	$65,500	$3,200	$0	$68,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$62,400	$3,000	$0	$65,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$62,400	$3,000	$0	$65,400
TOTAL				**1**	**$486,100**	**$23,400**	**$0**	**$509,500**

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Comprobante de pago

Jueves, 02 de octubre de 2025, 4:15:12 p.m.
Aire
NIT: 900860154

Número del registro
1

Fecha de aplicación
30 Sept 2025

Nombre del destinatario
Maria Magdalena

Identificación destinatario
1096211185

Producto destino
306 - 22853643 -

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 1.157.375,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Comprobante de pago

Miércoles, 05 de noviembre de 2025, 3:32:06 p.m.
Aire
NIT: 900860154

Número del registro
1

Fecha de aplicación
31 Oct 2025

Nombre del destinatario
Maria Magdalena Ca

Identificación destinatario
1096211185

Producto destino
306 - 22853643 -

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 1.509.620,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Empresa: UT SISTEMAS SILVOPAS **Nit:** 901980916
Usuario: MARIA MAGDALENA CADENA ZARATE

6 de Enero de 2026 8:13:20 AM
Dirección IP: 190.13.54.233

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: martes, 06 de enero de 2026 - 7:26 AM

Consulta del Detalle de la Transacción

Encabezado | **Detalle** | Verificación | Confirmación

Bancolombia NIT 890903938-8
UT SISTEMAS SILVOPAS
NIT: 901980916
FECHA: 06/01/2026

Entidad	BANCOLOMBIA
Producto Beneficiario	30622853643
Identificación Beneficiario	1096211185
Tipo de Identificación	1
Nombre del Beneficiario	MARIA MAGDALENA CA
Tipo de Producto	Ahorros
Tipo de Transacción	37
Valor	1,509,620.00
Oficina de Entrega	0
Referencia	
Lugar de Pago	
Número de Celular	
Fecha Aplicación	2025/12/01
E-mail	
Identificación del Autorizado	
Estado del Pago:	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA

Regresar

Empresa: UT SISTEMAS SILVOPAS **Nit:** 901980916
Usuario: MARIA MAGDALENA CADENA ZARATE

6 de Enero de 2026 8:12:37 AM
Dirección IP: 190.13.54.233

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: martes, 06 de enero de 2026 - 7:26 AM

Consulta del Detalle de la Transacción

Encabezado | **Detalle** | Verificación | Confirmación

Bancolombia NIT 890903938-8
UT SISTEMAS SILVOPAS
NIT: 901980916
FECHA: 06/01/2026

Entidad	BANCOLOMBIA
Producto Beneficiario	30622853643
Identificación Beneficiario	1096211185
Tipo de Identificación	1
Nombre del Beneficiario	MARIA MAGDALENA CA
Tipo de Producto	Ahorros
Tipo de Transacción	37
Valor	2,261,824.00
Oficina de Entrega	0
Referencia	
Lugar de Pago	
Número de Celular	
Fecha Aplicación	2025/12/31
E-mail	
Identificación del Autorizado	
Estado del Pago:	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA

Regresar

Empresa: UT SISTEMAS SILVOPAS **Nit:** 901980916
Usuario: MARIA MAGDALENA CADENA ZARATE

6 de Enero de 2026 8:11:06 AM
Dirección IP: 190.13.54.233

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: martes, 06 de enero de 2026 - 7:26 AM

Consulta del Detalle de la Transacción

Encabezado | **Detalle** | Verificación | Confirmación

Bancolombia NIT 890903938-8
UT SISTEMAS SILVOPAS
NIT: 901980916
FECHA: 06/01/2026

Entidad	BANCOLOMBIA
Producto Beneficiario	30622853643
Identificación Beneficiario	1096211185
Tipo de Identificación	1
Nombre del Beneficiario	MARIA MAGDALENA CA
Tipo de Producto	Ahorros
Tipo de Transacción	37
Valor	509,599.00
Oficina de Entrega	0
Referencia	
Lugar de Pago	
Número de Celular	
Fecha Aplicación	2025/12/19
E-mail	
Identificación del Autorizado	
Estado del Pago:	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA

Regresar

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Comprobante de pago

Jueves, 02 de octubre de 2025, 4:15:12 p.m.
Aire
NIT: 900860154

Número del registro
1

Fecha de aplicación
30 Sept 2025

Nombre del destinatario
Maria Magdalena

Identificación destinatario
1096211185

Producto destino
306 - 22853643 -

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 1.157.375,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Comprobante de pago

Miércoles, 05 de noviembre de 2025, 3:32:06 p.m.
Aire
NIT: 900860154

Número del registro
1

Fecha de aplicación
31 Oct 2025

Nombre del destinatario
Maria Magdalena Ca

Identificación destinatario
1096211185

Producto destino
306 - 22853643 -

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 1.509.620,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Empresa: UT SISTEMAS SILVOPAS **Nit:** 901980916
Usuario: MARIA MAGDALENA CADENA ZARATE

6 de Enero de 2026 8:13:20 AM
Dirección IP: 190.13.54.233

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: martes, 06 de enero de 2026 - 7:26 AM

Consulta del Detalle de la Transacción

Encabezado | **Detalle** | Verificación | Confirmación

Bancolombia NIT 890903938-8
UT SISTEMAS SILVOPAS
NIT: 901980916
FECHA: 06/01/2026

Entidad	BANCOLOMBIA
Producto Beneficiario	30622853643
Identificación Beneficiario	1096211185
Tipo de Identificación	1
Nombre del Beneficiario	MARIA MAGDALENA CA
Tipo de Producto	Ahorros
Tipo de Transacción	37
Valor	1,509,620.00
Oficina de Entrega	0
Referencia	
Lugar de Pago	
Número de Celular	
Fecha Aplicación	2025/12/01
E-mail	
Identificación del Autorizado	
Estado del Pago:	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA

Regresar

Empresa: UT SISTEMAS SILVOPAS **Nit:** 901980916
Usuario: MARIA MAGDALENA CADENA ZARATE

6 de Enero de 2026 8:12:37 AM
Dirección IP: 190.13.54.233

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: martes, 06 de enero de 2026 - 7:26 AM

Consulta del Detalle de la Transacción

Encabezado | **Detalle** | Verificación | Confirmación

Bancolombia NIT 890903938-8
UT SISTEMAS SILVOPAS
NIT: 901980916
FECHA: 06/01/2026

Entidad	BANCOLOMBIA
Producto Beneficiario	30622853643
Identificación Beneficiario	1096211185
Tipo de Identificación	1
Nombre del Beneficiario	MARIA MAGDALENA CA
Tipo de Producto	Ahorros
Tipo de Transacción	37
Valor	2,261,824.00
Oficina de Entrega	0
Referencia	
Lugar de Pago	
Número de Celular	
Fecha Aplicación	2025/12/31
E-mail	
Identificación del Autorizado	
Estado del Pago:	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA

Regresar

Empresa: UT SISTEMAS SILVOPAS **Nit:** 901980916
Usuario: MARIA MAGDALENA CADENA ZARATE

6 de Enero de 2026 8:11:06 AM
Dirección IP: 190.13.54.233

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: martes, 06 de enero de 2026 - 7:26 AM

Consulta del Detalle de la Transacción

Encabezado | **Detalle** | Verificación | Confirmación

Bancolombia NIT 890903938-8
UT SISTEMAS SILVOPAS
NIT: 901980916
FECHA: 06/01/2026

Entidad	BANCOLOMBIA
Producto Beneficiario	30622853643
Identificación Beneficiario	1096211185
Tipo de Identificación	1
Nombre del Beneficiario	MARIA MAGDALENA CA
Tipo de Producto	Ahorros
Tipo de Transacción	37
Valor	509,599.00
Oficina de Entrega	0
Referencia	
Lugar de Pago	
Número de Celular	
Fecha Aplicación	2025/12/19
E-mail	
Identificación del Autorizado	
Estado del Pago:	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA

Regresar

ASOCIACION AIRE

NOMINA SEPTIEMBRE 2025

Datos Generales					Devengos				Deducciones			Neto	
Identificacion	NOMBRE COMPLETO	Cargo	Fecha Ingreso	Dias	SUELDO	INACTIVIDAD	AUX TRANS	Total Pagos	PENSION	SALUD	TOTAL DESCUENTOS	Total Neto Pagado	Cuenta Bancaria
1096234052	ANGIE GEORGINA PEREIRA ORTEGA	COORDINADOR TALENTO HUMANO	01/05/2025	30	2,800,000	-	200,000	3,000,000	112,000	112,000	224,000	2,776,000	30630743865
37576001	YESY LOANA POLANCO RODRIGUEZ	COORDINADOR HSEQ	01/01/2025	30	2,500,000	-	200,000	2,700,000	100,000	100,000	200,000	2,500,000	49674453832
91356179	JONATHAN ALBERTO PESCA DIAZ	PROFESIONAL SST	13/06/2025	29	2,416,667	83,333	193,333	2,693,333	100,000	100,000	200,000	2,493,333	3154592737
TOTALES					**7,716,667**	**83,333**	**593,333**	**8,393,333**	**312,000**	**312,000**	**624,000**	**7,769,333**	

ELABORÓ:

ANGIE GEORGINA PEREIRA ORTEGA
DIRECTOR TALENTO HUMANO

ASOCIACION AIRE

NOMINA OCTUBRE 2025

Datos Generales					Devengos			Deducciones				Neto	
Identificacion	NOMBRE COMPLETO	Cargo	Fecha Ingreso	Dias	SUELDO	AUX TRANS	Total Pagos	SALUD	PENSION	OTROS DESCUENTOS	TOTAL DESCUENTOS	Total Neto Pagado	Cuenta Bancaria
1096234052	ANGIE GEORGINA PEREIRA ORTEGA	COORDINADOR TALENTO HUMANO	01/05/2025	30	2,800,000	200,000	3,000,000	112,000	112,000		224,000	2,776,000	30630743865
37576001	YESY LOANA POLANCO RODRIGUEZ	COORDINADOR HSEQ	01/01/2025	30	2,500,000	200,000	2,700,000	100,000	100,000		200,000	2,500,000	49674453832
91356179	JONATHAN ALBERTO PESCA DIAZ	PROFESIONAL SST	13/06/2025	23	1,916,667	153,333	2,070,000	76,667	76,667	52,500	205,834	1,864,166	3154592737
TOTALES					**7,216,667**	**553,333**	**7,770,000**	**288,667**	**288,667**	**52,500**	**629,834**	**7,140,166**	

ELABORÓ:

ANGIE GEORGINA PEREIRA ORTEGA
DIRECTOR TALENTO HUMANO

ASOCIACION AIRE

NOMINA NOVIEMBRE 2025

Datos Generales					Devengos			Deducciones			Neto	
Identificacion	**NOMBRE COMPLETO**	**Cargo**	**Fecha Ingreso**	**Dias**	**SUELDO**	**AUX TRANS**	**Total Pagos**	**SALUD**	**PENSION**	**TOTAL DESCUENTOS**	**Total Neto Pagado**	**Cuenta Bancaria**
1096234052	ANGIE GEORGINA PEREIRA ORTEGA	COORDINADOR TALENTO HUMANO	01/05/2025	30	2,800,000	200,000	3,000,000	112,000	112,000	224,000	2,776,000	30630743865
37576001	YESY LOANA POLANCO RODRIGUEZ	COORDINADOR HSEQ	01/01/2025	30	2,500,000	200,000	2,700,000	100,000	100,000	200,000	2,500,000	49674453832
91356179	JONATHAN ALBERTO PESCA DIAZ	PROFESIONAL SST	13/06/2025	27	2,250,000	180,000	2,430,000	90,000	90,000	180,000	2,250,000	3154592737
TOTALES					**7,550,000**	**580,000**	**8,130,000**	**302,000**	**302,000**	**604,000**	**7,526,000**	

ELABORÓ:

ANGIE GEORGINA PEREIRA ORTEGA
DIRECTOR TALENTO HUMANO

ASOCIACION AIRE

NOMINA DICIEMBRE 2025

Datos Generales					Devengos					Deducciones		Neto	
Identificacion	NOMBRE COMPLETO	Cargo	Fecha Ingreso	Dias	SUELDO	AUX TRANS	Otros Pagos	Total Pagos	SALUD	PENSION	TOTAL DESCUENTOS	Total Neto Pagado	Cuenta Bancaria
1096234052	ANGIE GEORGINA PEREIRA ORTEGA	COORDINADOR TALENTO HUMANO	01/05/2025	30	2,800,000	200,000	-	3,000,000	112,000	112,000	224,000	2,776,000	30630743865
37576001	YESY LOANA POLANCO RODRIGUEZ	COORDINADOR HSEQ	01/01/2025	30	2,500,000	200,000	-	2,700,000	100,000	100,000	200,000	2,500,000	49674453832
TOTALES					**5,300,000**	**400,000**	**-**	**5,700,000**	**212,000**	**212,000**	**424,000**	**5,276,000**	



ELABORÓ:



ANGIE GEORGINA PEREIRA ORTEGA
DIRECTOR TALENTO HUMANO

UNION TEMPORAL SISTEMAS SILVOPASTORILES

NOMINA NOVIEMBRE 2025

Datos Generales						Devengos			Deducciones			Neto
Identificacion	NOMBRE COMPLETO	CENTROCOSTO	Cargo	Fecha Ingreso	Dias	SUELDO	AUX TRANS	Total Pagos	SALUD	PENSION	TOTAL DESCUENTOS	Total Neto Pagado
1096211185	MARIA MAGDALENA CADENA ZARATE	UT SILVOPASTORILES	REP LEGAL	8/09/2025	30	1.423.500	200.000	1.623.500	56.940	56.940	113.880	1.509.620
1096951656	DANY ALEXANDER SANCHEZ CAMACHO	UT SILVOPASTORILES	COORDINADOR DE ENTREGAS	26/11/2025	5	260.000	33.333	293.333	10.400	10.400	20.800	272.533
TOTALES						**1.423.500**	**200.000**	**1.623.500**	**56.940**	**56.940**	**113.880**	**1.509.620**

Dany A Sanchez

ELABORÓ:

Angie G. Pereira O.

ANGIE GEORGINA PEREIRA ORTEGA
DIRECTOR TALENTO HUMANO

UNION TEMPORAL SISTEMAS SILVOPASTORILES

NOMINA DICIEMBRE 2025

Datos Generales						Devengos			Deducciones			Neto
Identificacion	**NOMBRE COMPLETO**	**CENTROCOSTO**	**Cargo**	**Fecha Ingreso**	**Dias**	**SUELDO**	**AUX TRANS**	**Total Pagos**	**SALUD**	**PENSION**	**TOTAL DESCUENTOS**	**Total Neto Pagado**
1096211185	MARIA MAGDALENA CADENA ZARATE	UT SILVOPASTORILES	REP LEGAL	8/09/2025	30	1.423.500	200.000	1.623.500	56.940	56.940	113.880	1.509.620
1096951656	DANY ALEXANDER SANCHEZ CAMACHO	UT SILVOPASTORILES	COORDINADOR DE ENTREGAS	26/11/2025	30	1.560.000	200.000	1.760.000	62.400	62.400	124.800	1.635.200
TOTALES						**1.423.500**	**200.000**	**1.623.500**	**56.940**	**56.940**	**113.880**	**1.509.620**

ELABORÓ:

ANGIE GEORGINA PEREIRA ORTEGA
DIRECTOR TALENTO HUMANO

UNIÓN TEMPORAL
SISTEMAS SILVOPASTORILES

CONTRATO DE OBRA NUMERO: 1053-2025

OBJETO DEL CONTRATO: "IMPLEMENTACION DE SISTEMAS PRODUCTIVOS SILVOPASTORILES EN PRADERAS ESTABLECIDAS EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER"

INFORME FINAL

PERIODO INFORMADO: 08/09/2025 – 31/12/2025



Contratante: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER-CAS
Contratista de obra: UNION TEMPORAL SISTEMAS SILVOPASTORILES.
Contratista de Interventoría: HERNANDO LEGUIZAMON GALINDO

DICIEMBRE DE 2025.

Tabla de contenido

1. INTRODUCCIÓN 3
2. Objetivos 4
2.1. Objetivo general. 4
2.1.1. Objetivos específicos. 4
3. Resumen ejecutivo del periodo presentado. 4
4. Descripción del proyecto 5
4.1. Acta de entrega y recibo final 6
4.2. Localización general del proyecto. 7
4.3. Localización de los usuarios en las veredas 8
4.4. Presupuesto detallado del contrato. 9
4.5. Especificaciones técnicas. 9
4.6. Garantías constituidas por el contratista. 9
4.7. Información del contratista. 10
4.8. Equipo profesional propuesto del contratista. 10
4.9. Cronograma de trabajo 11
5. Actividades ejecutadas en el periodo del presente informe final. 11
6. Fichas de predios intervenidos 19
7. Correspondencia 34
8. Actas desarrolladas en el mes. 34
9. Informe avance físico informe final. 34
10. Avance del plazo del contrato hasta informe final. 34
11. Avance financiero del contrato hasta informe final. 34
12. Análisis del avance del contrato informe final 36
13. Actas de mayores y menores 36
14. Actas y documentos. 36
15. Bitácora de obra. 36
16. Administración. 37
17. Visitas de supervisión. 37
18. Conclusiones 37

1. INTRODUCCIÓN

El departamento de Santander es reconocido por su notable versatilidad en actividades económicas. Esta diversidad se ve favorecida por su geografía, que abarca diferentes pisos térmicos y zonas de relieve, desde la cordillera oriental hasta el valle del Magdalena.
Dentro de las actividades económicas que sobre salen están: la minería, servicios, agroindustria, turismo y ganadería

En cuanto a la actividad pecuaria, en Santander, [1]Vélez es considerada la provincia con mayor superficie para esta actividad económica, con 593 mil hectáreas, al mismo tiempo que registra el mayor número de unidades productivas, seguida por la Comunera con 322 mil hectáreas, la de Mares con más de 287 mil hectáreas y, finalmente la provincia de Soto que cuenta con casi 250 mil hectáreas destinadas a la ganadería

Por lo anterior descrito, es necesario implementar acciones que aporten a la recuperación de las áreas desgastas por el sobrepastoreo y por la tala de árboles, siendo la práctica de sistemas silvopastoriles una alternativa que fortalece la disponibilidad de bosques, pastos y a la actividad ganadera en una región, apuntando a la sostenibilidad ambiental en el departamento

[2]Este proyecto en el municipio de La Paz, Santander, busca transformar la ganadería tradicional en un modelo más sostenible y rentable mediante la implementación de sistemas silvopastoriles. Estos sistemas asocian la ganadería con árboles y arbustos, recreando un hábitat similar a un bosque. El objetivo es fortalecer la acción climática, reducir la pérdida de biodiversidad y promover una relación positiva entre la sociedad y la naturaleza a través de la conservación de los recursos naturales.

[1] https://www.camaradirecta.com/noticias/la-vocacion-productiva-de-santander-es-liderada-por-la-actividad-pecuaria#:~:text=provincias%20de%20Santander.-,Por%20esto%2C%20en%20el%20informe%20mencionado%2C%20V%C3%A9lez%20es%20considerada%20la,servicios%20delegados%20por%20el%20estado.
[2] Información suministrada por la CAS-Requerimiento técnico para contratación

2. Objetivos

2.1. Objetivo general.

La implementar sistemas silvopastoriles para la transformación del modelo ganadero tradicional y conservación de la biodiversidad en el municipio de la Paz, Santander

2.1.1. Objetivos específicos.

a) Implementar acciones para la restauración de áreas afectadas por los sistemas agropecuarios tradicionales.
b) Realizar la plantación arbórea de especies forestales y forrajeras en predios seleccionados.

3. Resumen ejecutivo del periodo presentado.

El contrato de obra No 1052-2025 con objeto "implementación de sistemas productivos silvopastoriles en praderas establecidas en el municipio de la paz del departamento de Santander" busca la eficiencia en la ganadería con enfoque de sostenibilidad y maximizar la producción de servicios ecosistémicos. Este contrato ira desde el 8 de septiembre al 31 de diciembre de 2025, tres (3) meses y veinticuatro (24) días.

a. Estado de las actividades

El contrato se ejecutó en su totalidad sin contratiempos cumpliendo con las actividades contractuales:

Se realizo la limpieza y la instalación de 15 unidades de encerramiento para una para cada uno de los beneficiarios donde cada encerramiento fue de 350 metros lineales.

La actividad de Limpieza, adecuación del terreno y establecimiento de pasturas se finalizó, cumpliendo así con las de 30 hectáreas intervenidas conforme a los dispuesto en el contrato

La actividad de Siembra de árboles forestales y forrajeros también se finalizó, cumpliendo así con las de 30 hectáreas intervenidas conforme a lo dispuesto en el contrato.

Se instalaron 15 unidades para reservorio de agua en cada una de las quince parcelas beneficiadas en el municipio de La Paz, en el departamento de Santander.

4. Descripción del proyecto

Proyecto que se está ejecutando tiene como fin el establecimiento de un sistema silvopastoril con el objetivo de transformar el modelo ganadero tradicional - con base únicamente en pastos y con poca consideración sobre sus efectos ambientales - en una ganadería eficiente en términos de biodiversidad y producción de carne y leche, que genere riqueza y prosperidad para el territorio, conservando los recursos naturales.

Con la reconversión de la actividad de ganadería, se busca encaminar el ejercicio de esta actividad económica a un desarrollo sostenible donde se concientice a cerca de la responsabilidad ambiental que este sector productivo debe tener.

El enfoque en el cual se basa dicha reconversión permitirá mejorar las funciones ecosistémicas y un mejor retorno económico de la actividad ganadera (relacionado con los servicios ecosistémicos) en el mediano y largo plazo. Dentro de este proceso de reconversión ganadera los sistemas silvopastoriles desempeñan un rol fundamental. Son sistemas de producción ganadera que asocian los pastos con una muy fuerte presencia de árboles y arbustos, que con un adecuado manejo permiten una ganadería altamente eficiente, rentable y que conserva los recursos naturales.

El objetivo del proyecto no es simplemente sembrar unos pocos árboles que le den sombra al ganado; o que les sirvan a las aves para anidar; o que embellezcan el paisaje. Es necesario que la ganadería se desarrolle bajo muchos árboles que con un adecuado manejo permitirán maximizar la producción de servicios ecosistémicos, mejorar las funciones ecosistémicas, árboles, arbustos, pasto y los beneficios de la actividad ganadera. Sumado a esto los sistemas silvopastoriles, estarán acompañados de sistemas de almacenamiento de agua para reducir algunos riesgos asociados al cambio climático.

4.1. Acta de entrega y recibo final

CONTRATO DE OBRA	01053-2025
FECHA:	27/08/2025
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:	Licitación Pública
CLASE DE CONTRATO:	Contrato de Obra Pública
CONTRATISTA:	Unión Temporal Sistemas Silvopastoriles (AIRE 80% – TRANSTECOL S.A.S 10% – C.I.T.I 10%)
NIT:	901.980.916-3
SUPERVISOR:	Edna Rocío Castellanos Martínez, subdirectora de Planeación y Ordenamiento Ambiental – CAS
INTERVENTOR:	Hernando Leguizamón Galindo, C.C. 7.160.171 de Tunja
OBJETO DEL CONTRATO:	Implementación de sistemas productivos silvopastoriles en praderas establecidas en el municipio de La Paz, Santander
ACTIVIDADES:	▪ Implementar acciones de restauración en áreas afectadas por sistemas agropecuarios tradicionales. ▪ Instalación de aislamientos con postes plásticos y alambre de púas. ▪ Limpieza, adecuación de terreno y establecimiento de pasturas. ▪ Instalación de sistemas de reservorio de agua (tanques 5.000 lts). ▪ Plantación arbórea de especies forestales y forrajeras (Abarco, Cedro, Guayacán, Matarratón, Botón de Oro, etc.)
VALOR DEL CONTRATO:	$522.835.089 COP
FORMA DE PAGO:	Contra actas parciales de avance y recibo a satisfacción (según contrato)
PLAZO DE EJECUCIÓN:	03 meses y 24 días, sin exceder el 31 de diciembre de 2025
LUGAR DE EJECUCIÓN	Municipio de La Paz, Departamento de Santander
FECHA DE INICIACIÓN:	08/09/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	31/12/2025
PERIODO DEL INFORME PARA PAGO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO PARCIAL UNO (1):	08/09/2025 a 31/12/2025
FECHA ADICIONES:	N/A.
FECHA SUSPENSIONES:	N/A.
FECHA MODIFICACIONES:	N/A.

4.2. Localización general del proyecto.



[3]El municipio de La Paz, se encuentra ubicado en la provincia de Vélez del departamento de Santander, al norte del país.

Es un municipio enclavado en las montañas de Santander, a 241 km al norte de Bogotá, 237 km al sur occidente de Bucaramanga, la capital del Departamento, 33 km al nor-nororiente de Vélez, la capital de la provincia, a 1934 m s. n. m. y con un clima promedio de 17 °C, cubierto en su mayoría por un verde característico, ricas tierras y agradables paisajes, bañados por quebradas, pequeños cauces, y bordeado por ríos de exuberante belleza como Opón y Suárez.

El proyecto se ejecutará en las veredas: Casas Blancas, Los Medios, Trochas, centro, La Linterna y La Mata.

A continuación, se relacionan los beneficiarios del proyecto y su ubicación

ITEM	BENEFICIARIOS	IDENTIFICACIÓN	MUNICIPIO/VEREDA	N° MATRICULA
1	GABRIELINA DIAZ DE CASTILLO	28475902	CASAS BLANCAS	32461329
2	OLFER ALZA MEDINA	13957167	CASAS BLANCAS	32468301
3	NILSON CRUZ AGUDELO	91017689	TROCHAS	32440002
4	FLOR MARIA MATEUS DE ORDUÑA	28476872	CENTRO	32458210
5	BALVINA ORDUÑA DE PARDO	28204287	CENTRO	32482911

[3] https://es.wikipedia.org/wiki/La_Paz_(Santander)

ITEM	BENEFICIARIOS	IDENTIFICACIÓN	MUNICIPIO/VEREDA	N° MATRICULA
6	JORGE AUGUSTO FUENTES BARRERA	5668951	CASAS BLANCAS	32425951
7	MARIA ELVIA SANTAMARIA AMADO	51714440	LA MATA	32425796
	JAIME DIAZ VARGAS	5668450		
8	ALEXANDER MELO OLARTE	13526104	CENTRO	32426401
9	ATANAEL MEDINA ALMANZAR	5568400	CENTRO	32431386
10	OLGA LUCIA DIAZ AMADO	52101952	LA LINTERNA	324682
11	EMILSE ORDUÑA MEDINA	28205008	CENTRO	32455512
12	LILIANA MELO GALEANO	1096619121	LA LINTERNA	3247085
13	GABRIELINA OVALLE VELANDIA	28205455	TROCHAS	32421671
14	SEGUNDO JULIO LEÓN MATEUS	5667996	CENTRO	32438476
15	ALEJANDRO SANTAMARIA ARIZA	1005206020	CENTRO	32441596

4.3. Localización de los usuarios en las veredas



Imagen capturada en https://es.scribd.com/document/443440116/MAPA-DE-LA-PAZ-cartografia-santander

4.4. Presupuesto detallado del contrato.

CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO DE OBRA						
ITEM	**DESCRIPCIÓN**		**UND**	**CANTIDAD**	**V/ UNITARIO**	**V/ TOTAL**
1. Servicio de restauración de ecosistemas	1.1	Limpieza e instalación del cerramiento perimetral de la unidad productiva	Ha	15	$ 10.753.685	$ 161.305.275
	1.2	Limpieza, adecuación del terreno y establecimiento de pasturas	Ha	30	$ 2.018.149	$ 60.544.470
	1.3	Instalación de sistemas para el reservorio de agua.	Un	15	$ 4.372.250	$ 65.583.750
2. Servicio de establecimiento de especies vegetales	2.1	Siembra de árboles forestales y forrajeros.	Ha	30	$ 3.727.655	$ 111.829.650
					TOTAL, COSTO DIRECTO	**$ 399.263.145**
ADMINISTRACION (24%)			%	24,00%		$ 95.823.154,80
IMPREVISTOS (1%)			%	1,00%		$ 3.992.631,45
UTILIDAD (5%)			%	5,00%		$ 19.963.157,25
IVA 19 % (Sobre la Utilidad)			%	19,00%		$ 3.792.999,88
					TOTAL, COSTO INDIRECTO	**$ 123.571.943**
TOTAL, COSTOS PROYECTO						**$ 522.835.089**

4.5. Especificaciones técnicas.

El proyecto se formula conforme a los lineamientos técnicos establecidos por la Corporación Autónoma Regional de Santander **- CAS**

4.6. Garantías constituidas por el contratista.

En esta tabla se relacionan las garantías constituidas por UNIÓN TEMPORAL SISTEMAS SILVOPASTORILES, para la ejecución del contrato.

Póliza de seguro de cumplimiento entidad estatal

Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO		**Póliza No:** 14-44-101243276	
RIESGO ASEGURADO	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
		DESDE	**HASTA**
Cumplimiento del Contrato.	$ 104.567.017,80	9/08/2025	7/10/2026
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones:	$ 104.567.017,80	9/08/2025	1/10/2029
Calidad del servicio	$ 104.567.018,80	9/08/2025	1/10/2027

Póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual derivada de cumplimiento

Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO		**Póliza No:** 14-40-101075387	
RIESGO ASEGURADO	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
		DESDE	**HASTA**
Predios Laborales, y Operaciones	$ 284.700.000,00	9/08/2025	1/10/2026
Contratistas y subcontratistas	$ 284.700.001,00	9/08/2025	1/10/2026
Vehículos propios y no propios	$ 284.700.002,00	9/08/2025	1/10/2026

4.7. Información del contratista.

Dirección oficina:	Calle 44 No 28C-68 Barrio Palmira.
Representante Legal:	MAGDALENA CADENA ZARATE.
Municipio:	Barrancabermeja, Santander.
Página web - Correo electrónico:	asociacioninaire@gmail.com
Teléfonos:	Celular: 3115376740

4.8. Equipo profesional propuesto del contratista.

NOMBRE:	**PROFESION:**	**CARGO:**
CESAR AUGUSTO CANO SAAVEDDRA - CC. 14.232.910, Florencia.	INGENIERO FORESTAL con MATRICULA PROFESIONAL TP (00000-09013 DE 24/10/1986)	DIRECTOR DE PROYECTO/OBRA
DANY ALEXANDER SANCHEZ CAMACHO - CC. 1.096.951.656, Molagavita	INGENIERO AMBIENTAL MATRICULA PROFESIONAL 151021-0592020 STD desde el 25 de octubre de 2021.	COORDINADOR DE ENTREGAS
YESY LOANA POLANCO RODRIGUEZ, CC. 37.576.001 de Barrancabermeja	PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, Resolución No 03807 del 26 de marzo de 2019	PROFESIONAL EN SALUD Y SEGURIDAD ENEL TRABAJO
ANGIE GEORGINA PEREIRA ORTEGA, CC 11.096.234.052, Barrancabermeja	INGENIERA INDUSTRIAL, 151239-0537222 STD desde el 2 de octubre de 2020.	ADMINISTRADORA

4.9. Cronograma de trabajo

IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS PRODUCTIVOS SILVOPASTORILES EN PRADERAS ESTABLECIDAS EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ DEPARTAMENTO DE SANTANDER.							CRONOGRAMA																								
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO			Cantidad	Unidad	VALOR		Septiembre					Octubre					Noviembre					Diciembre									
			Ha	Und	Unitario	Total	S1	S2	S3	S4	S4	S1	S2	S3	S4	S5	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S4	S5					
Proceso Administrativo y etapa de contratacion																															
Objetivo específico 1. Implementar acciones para la restauración de áreas afectadas por los sistemas agropecuarios tradicionales.																															
1. Servicio de restauración de ecosistemas	1.1	Limpieza e instalación del cerramiento perimetral de la unidad productiva	15	Ha	$ 10.753.685	$ 161.305.275																									
	1.2	Limpieza, adecuacióndel terreno y establecimiento de pasturas	30	Ha	$ 2.018.149	$ 60.544.470																									
	1.3	Instalacióndе sistemas para el reservorio de agua.	15	Unidades	$ 4.372.250	$ 65.583.750																									
Objetivo específico 2. Realizar la plantación arbórea de especies forestales y forrajeras en predios seleccionados.																															
2. Servicio de establecimiento de especies vegetales	2.1	Siembra de árboles forestales y forrajeros.	30	Ha	$ 3.727.655	$ 111.829.650																									
Cierre y Liquidacion																															
SUBTOTAL 1: COSTOS DIRECTOS						$ 399.263.145																									
ADMINISTRACIÓN					24,00%	$ 95.823.155																									
IMPREVISTOS					1,00%	$ 3.992.631																									
UTILIDAD					5,00%	$ 19.963.157																									
IVA					19,00%	$ 3.793.000																									
VALOR TOTAL DEL PROYECTO						$ 522.835.089																									

5. Actividades ejecutadas en el periodo del presente informe final.

- **Objetivo del informe final.**

Informar a la Corporación Autónoma Regional de Santander – **CAS**, el cobro del desarrollo del objeto contractual, en el periodo comprendido entre el **08/9/2025,** y el **31/12/2025**, correspondiente al segundo informe de avance del **CONATRATO DE OBRA No 1053-2025,** de acuerdo con las siguientes consideraciones:

- **Inicio de actividades.**

El desarrollo del **CONTRATO,** se inició mediante acta suscrita por los intervinientes el día ocho de (08) de septiembre de 2025, con la firma de las partes intervinientes en la misma, por tanto la **UNION TEMPORAL SISTEMAS PASTORILES,** su condición de Contratista de obra, ha dado inicio a las actividades previas en aras del cumplimiento a las especificaciones técnicas, alcance financiero y desarrollo administrativo del mismo con base en las condiciones contempladas en los estudios previos y pliegos de condiciones definitivos que sirvieron de fundamento jurídico al proceso de contratación pública que originó el contrato.

Actividades.
Limpieza e instalación del cerramiento perimetral de la unidad productiva.

Se realizó despeje manual de arbustos, pastos y otros y la limpieza de residuos sólidos. Se trazó líneas rectas para optimizar el espacio y buscar la uniformidad.

Se instalo el aislamiento con postes de madera plástica y alambre de púas, en cada uno de los surcos de árboles formando callejuelas de tal manera que diera protección a las especies vegetales plantadas. La unidad productiva corresponde a dos (2) hectáreas, está diseñada para 350 metros lineales de aislamiento, correspondiente a 119 postes en madera plástica con una longitud igual o superior a 2,1 metros y un ancho mínimo de 0,08 metros. para cerca, distribuidos cada 2,94 metros y 10 (diez) pie de amigos en concreto distribuidos dependiendo de la topografía y las condiciones del terreno, con 3 líneas de alambre de púas calibre 12,5". Los postes fueron enterrados a una profundidad de 50 cm, con una distancia entre postes de 2,94 metros. La cerca se instaló con tres (3) líneas de alambre de púas calibre 12,5", con distancias entre 0,3 metros y/o 0,4 metros entre sí.

Relación de los 15 beneficiarios con establecimiento de aislamiento

UNIÓN TEMPORAL
SISTEMAS SILVOPASTORILES

CONTRATO DE OBRA No: 01053-2025

IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS PRODUCTIVOS SILVOPASTORILES EN PRADERAS ESTABLECIDAS EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ DEPARTAMENTO DE SANTANDER

ITEM	ACTIVIDAD	PREDIO	PROPIETARIO	METROS	KILOMETROS
1.1	Limpieza e instalación del cerramiento perimetral de la unidad productiva	Las Vegas, vereda El Centro, Municipio de la paz-Santander	Flor Maria mateus	350,00 m	0,35 km
		Predio Tierra de Flores, Vereda El Centro, Municipio de Municipio de la paz-Santander	Emilse Orduña	350,00 m	0,35 km
		Predio Las Flores, Vereda El Centro, Municipio de Municipio de la paz-Santander	Atanael Medina	350,00 m	0,35 km
		Predio Vanegas, vereda El Centro, Municipio de la paz-Santander	Alexander Melo	350,00 m	0,35 km
		Predio La Florida, vereda, La Mata, Municipio de la paz-Santander	Maria Elvira Santamaria Amado/Jaime Diaz	350,00 m	0,35 km
		Predio La Palestina, vereda, Trochas, Municipio de la paz-Santander	Nilson Cruz Agudelo	350,00 m	0,35 km
		Predio Buena Vista, vereda La Linterna, Municipio de La Paz-Santander	Liliana Melo Galeano	350,00 m	0,35 km
		Predio Peña Blanca, vereda La Linterna, Municipio de La Paz-Santander	Olga Lucia Diaz Amado	350,00 m	0,35 km
		Predio Lote 2, vereda El Centro, Municipio de La Paz-Santander	Belvina Orduña De Pardo	350,00 m	0,35 km
		Predio La Esperanza, vereda Casa Blancas, Municipio de La Paz-Santander	Gabrielina Diaz de Castillo	350,00 m	0,35 km
		Predio Lote, vereda Casa Blancas, Municipio de La Paz-Santander	Jorge Ugusto Fuentes Barrera	350,00 m	0,35 km
		Predio La Quinta, vereda Casa Blancas, Municipio de La Paz-Santander	Olfer Alza Camacho	350,00 m	0,35 km
		Predio Las Acacias, vereda El Centro, Municipio de la paz-Santander	Alejandro Santamaria Ariza	350,00 m	0,35 km
		Predio El Porvenir, vereda El Centro, Municipio de la paz-Santander	Segundo Julio Leon Mateus	350,00 m	0,35 km
		Predio La Belleza, vereda, Trochas, Municipio de la paz-Santander	Gabrielina Ovalle Velandia	350,00 m	0,35 km
ESTADO DE LA ACTIVIDAD		EN EJECUCIÓN	TOTAL	4550,00 m	4,55 km

Página 1

5.1.1. Limpieza, adecuación del terreno y establecimiento de pasturas.

Se realizó rocería mecánica para retirar arbustos, pastos y otros y se realizó la limpieza manual de residuos sólidos en predios intervenidos sumando las 30 hectáreas sembradas contractuales.
Las actividades previas para el establecimiento de las pasturas fueron: se crearon surcos en las praderas a intervenir para des compactar el suelo, restituyendo la circulación de aire y agua, para favorecer el flujo de nutrientes y el desarrollo radicular de los materiales forrajeros existentes en la pradera.

El establecimiento de pasto se realizó siguiendo las indicaciones de las especificaciones técnicas del contrato:
Fertilización: se incorporó al suelo fertilizante para praderas con el fin de mejorar las condiciones físicas, químicas y biológicas preexistentes en los suelos intervenidos, aplicando 100 kg por hectárea con el método al voleo.
Siembra de praderas; se realizó el establecimiento de la pastura tipo Brachiarias (Brachiaria Decumbes); la siembra se realizó al voleo, contemplando el establecimiento estimado de 4 kg por hectárea, o la siembra de material vegetativo de sitios cercanos.

Relación de los 15 beneficiarios con siembra de pastos sumando 30 hectáreas sembradas

UNIÓN TEMPORAL SISTEMAS SILVOPASTORILES	CONTRATO DE OBRA No: 01053-2025										
	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS PRODUCTIVOS SILVOPASTORILES EN PRADERAS ESTABLECIDAS EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ DEPARTAMENTO DE SANTANDER										
				Septiembre 8 al 7 de octubre		octubre 8 al 7 de noviembre		Noviembre 8 al 7 de diciembre		Dicembre 8 al 31	
ITEM	ACTIVIDAD	PREDIO	PROPIETARIO	HECTAREAS	METROS	HECTAREAS	METROS	HECTAREAS	METROS	HECTAREAS	METROS
1,1	Limpieza, adecuacióndel terreno y establecimiento de pasturas	Las Vegas, vereda El Centro, Municipio de la paz-Santander	Flor Maria mateus			2 Ha	20000 m				
		Predio Tierra de Flores, Vereda El Centro, Municipio de Municipio de la paz-Santander	Emilse Orduña			2 Ha	20000 m				
		Predio Las Flores, Vereda El Centro, Municipio de Municipio de la paz-Santander	Atanael Medina			2 Ha	20000 m				
		Predio Vanegas, vereda El Centro, Municipio de la paz-Santander	Alexander Melo					2 Ha	20000 m		
		Predio La Florida, vereda, La Mata, Municipio de la paz-Santander	Maria Elvira Santamaria Amado/Jaime Diaz			2 Ha	20000 m				
		Predio La Palestina, vereda, Trochas, Municipio de la paz-Santander	Nilson Cruz Agudelo					2 Ha	20000 m		
		Predio Buena Vista, vereda La Linterna, Municipio de La Paz-Santander	Liliana Melo Galeano					2 Ha	20000 m		
		Predio Peña Blanca, vereda La Linterna, Municipio de La Paz-Santander	Olga Lucia Diaz Amado					2 Ha	20000 m		
		Predio Lote 2, vereda El Centro, Municipio de La Paz-Santander	Balvina Orduña De Pardo					2 Ha	20000 m		
		Predio La Esperanza, vereda Casa Blancas, Municipio de La Paz-Santander	Gabrielina Diaz Castillo					2 Ha	20000 m		
		Predio Lote, vereda Casa Blancas, Municipio de La Paz-Santander	Jorge Ugusto Fuentes Barrera					2 Ha	20000 m		
		Predio La Quinta, vereda Casa Blancas, Municipio de La Paz-Santander	Olfer Alza Camacho					2 Ha	20000 m		
		Predio Las Acacias, vereda El Centro, Municipio de la paz-Santander	Alejandro Santamaria Ariza							2 Ha	20000 m
		Predio El Porvenir, vereda El Centro, Municipio de la paz-Santander	Segundo Julio Leon Mateus							2 Ha	20000 m
		Predio La Belleza, vereda, Trochas, Municipio de la paz-Santander	Gabrielina Ovalle Velandia							2 Ha	20000 m
ESTADO DE LA ACTIVIDAD		EN EJECUCIÓN	TOTAL	0	0	8 Ha	80000 m	16 Ha	160000 m	6 Ha	60000 m

5.1.2. Instalación de sistemas para el reservorio de agua.

Con el fin de aportar a la mitigación de los riesgos asociados al cambio climático, se instalaron 15 unidades y puesta en funcionamiento de los sistemas para el reservorio de agua

Cada unidad productiva (comprendida por 2 hectáreas) tiene un sistema para el reservorio de agua, con las siguientes características:
a. Capacidad volumétrica: 5.000 litros de agua.
b. Capacidad de carga: 5.000 Kg.
c. Material del tanque: Polietileno bicapa.
d. Material de recubrimiento: Sin recubrimiento; debe contar con protección UV y resistente a la intemperie.
e. Cubierta (tapa): en polietileno con aletas que permiten que la tapa permanezca fija.
f. Accesorios de salida: Juego de conexiones, adaptador macho en PVC de 1" Ø, con empaque de caucho de 1" Ø por fuera y tuerca de 1" Ø por dentro (SALIDA).
g. Accesorios adicionales: Salida en tubo de PVC para agua potable de 1" Ø por 1 metros de largo, llave de registro lisa en PVC de 1" Ø, todo debidamente soldado.
h. Manguera para riego de 1" Ø, instalada con abrazadera de seguridad en acero inoxidable.

Se realizaron actividades de adecuación o replanteo del terreno en el sitio seleccionado para la instalación del tanque. La instalación de los accesorios se hizo conforme a las especificaciones técnicas del productor.

Relación de los 15 beneficiarios con la instalación de los 15 sistemas de reservorio de agua

UNIÓN TEMPORAL SISTEMAS SILVOPASTORILES	CONTRATO DE OBRA No: 01053-2025
	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS PRODUCTIVOS SILVOPASTORILES EN PRADERAS ESTABLECIDAS EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ DEPARTAMENTO DE SANTANDER

				Septiembre 8 al 7 de octubre	octubre 8 al 7 de noviembre	Noviembre 8 al 7 de diciembre	Dicembre 8 al 31
ITEM	ACTIVIDAD	PREDIO	PROPIETARIO	UNIDADES	UNIDADES	UNIDADES	UNIDADES
1,1	Instalaciónde sistemas para el reservorio de agua.	Las Vegas, vereda El Centro, Municipio de la paz-Santander	Flor Maria mateus				1 Und
		Predio Tierra de Flores, Vereda El Centro, Municipio de Municipio de la paz-Santander	Emilse Orduña				1 Und
		Predio Las Flores, Vereda El Centro, Municipio de Municipio de la paz-Santander	Atanael Medina				1 Und
		Predio Vanegas, vereda El Centro, Municipio de la paz-Santander	Alexander Melo				1 Und
		Predio La Florida, vereda, La Mata, Municipio de la paz-Santander	Maria Elvira Santamaria Amado/Jaime Diaz				1 Und
		Predio La Palestina, vereda, Trochas, Municipio de la paz-Santander	Nilson Cruz Agudelo				1 Und
		Predio Buena Vista, vereda La Linterna, Municipio de La Paz-Santander	Liliana Melo Galeano				1 Und
		Predio Peña Blanca, vereda La Linterna, Municipio de La Paz-Santander	Olga Lucia Diaz Amado				1 Und
		Predio Lote 2, vereda El Centro, Municipio de La Paz-Santander	Balvina Orduña De Pardo				1 Und
		Predio La Esperanza, vereda Casa Blancas, Municipio de La Paz-Santander	Gabrielina Diaz Castillo				1 Und
		Predio Lote, vereda Casa Blancas, Municipio de La Paz-Santander	Jorge Ugusto Fuentes Barrera				1 Und
		Predio La Quinta, vereda Casa Blancas, Municipio de La Paz-Santander	Olfer Alza Camacho				1 Und
		Predio Las Acacias, vereda El Centro, Municipio de la paz-Santander	Alejandro Santamaria Ariza				1 Und
		Predio El Porvenir, vereda El Centro, Municipio de la paz-Santander	Segundo Julio Leon Mateus				1 Und
		Predio La Belleza, vereda, Trochas, Municipio de la paz-Santander	Gabrielina Ovalle Velandia				1 Und
ESTADO DE LA ACTIVIDAD		EN EJECUCIÓN	TOTAL	0 Unidades	0 Unidades	0 Unidades	15 Unidades

5.1.3. Siembra de árboles forestales y forrajeros.

Se demarcó un trazado (surcos) antes de iniciar la actividad de limpieza las unidades productivas seleccionadas (comprendida por 2 hectáreas)

Siembra de árboles forestales

La limpieza a las áreas a intervenir, se realizaron inicialmente con rocería mecánica para retirar los pastos y otros arbustos y posteriormente se ejecutó la limpieza manual para retiro de residuos sólidos.

Se plantaron 32 individuos de especies forestales entre Abarco (Cariniana pyriformis) y Guayacán amarillo (Tabebuia chrysantha), Se sembraron 510 árboles de especies forrajeras entre Matarratón (Gliricidia sepium) y Botón de oro (Tithonia diversifolia) los cuales fueron reproducidas a partir de semillas certificadas, con previo trazado en cada uno de los 15 predios intervenidos.

Los árboles de especies forestales maderables se distribuyeron en el área aislada. En total se plantarán 542 árboles por hectárea (32 forestales y 510 forrajeros por Ha), para un total de 1084 árboles por unidad productiva para las 2 hectáreas en cada predio. Para la siembra de los árboles de especies forestales, se realizó el ahoyado de forma manual. Una vez hecho los surcos ahoyados, se distribuyeron en cada hoyo las plantas de las especies definidas, retirando la bolsa y colocando la parte radicular de la planta dentro del sustrato apisonándolo para garantizar un buen anclaje; la siembra se realizó aprovechando el segundo periodo del año de lluvias para garantizar su regado.
En el sembrado de los árboles de especies forestales se adicionaron 10 g de hidroretenedor, para mejorar la capacidad de absorción y retención de agua y nutrientes en el suelo.
Se realizó la fertilización de las plántulas, con la aplicación en cada hoyo de 1 Kg de abono orgánico y 0,1 Kg de cal agrícola por árbol. Se humedeció el pan de tierra y se compactó antes de retirar la bolsa, evitando el desmoronamiento del sustrato.
El retiro de la bolsa plástica se realizó haciendo dos cortes longitudinales a la misma.

Siembra de material vegetal de especies forrajeras
Para la siembra de los árboles de especies forrajeras, se realizó el ahoyado de forma manual, se distribuyó en cada hoyo las semillas de las especies definidas en la cantidad definida y en de acuerdo a las especificaciones de distancias sugeridas en el diseño. La siembra se realizó durante la segunda temporada de lluvias del año para asegurar su riego natural.

Las semillas de especies forrajeras se plantaron en tres bolillos, entre 2 y 3 metros de separación dependiendo de las condiciones topográficas,
Para el sembrado de los árboles de especies forrajeras se adicionaron 10 g de hidroretenedor, para mejorar la capacidad de absorción y retención de agua y nutrientes en el suelo. También se aplicó fertilizante de las semillas, aplicando en cada hoyo 0,48 kg de abono orgánico.
Todos los residuos sólidos como bolsas plásticas, guacales, estopas, costales y demás residuos fueron retirados el área de trabajo.

Relación de los 15 beneficiarios con forestales y forrajeros, sumando 30 hectáreas sembradas

UNIÓN TEMPORAL SISTEMAS SILVOPASTORILES	CONTRATO DE OBRA No: 01053-2025
	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS PRODUCTIVOS SILVOPASTORILES EN PRADERAS ESTABLECIDAS EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ DEPARTAMENTO DE SANTANDER


				Septiembre 8 al 7 de octubre		octubre 8 al 7 de noviembre		Noviembre 8 al 7 de diciembre		Dicembre 8 al 31	
ITEM	ACTIVIDAD	PREDIO	PROPIETARIO	HECTAREAS	METROS	HECTAREAS	METROS	HECTAREAS	METROS	HECTAREAS	METROS
1,1	Siembra de árboles forestales y forrajeros.	Las Vegas, vereda El Centro, Municipio de la paz-Santander	Flor Maria mateus			2 Ha	20000 m				
		Predio Tierra de Flores, Vereda El Centro, Municipio de Municipio de la paz-Santander	Emilse Orduña			2 Ha	20000 m				
		Predio Las Flores, Vereda El Centro, Municipio de Municipio de la paz-Santander	Atanael Medina			2 Ha	20000 m				
		Predio Vanegas, vereda El Centro, Municipio de la paz-Santander	Alexander Melo					2 Ha	20000 m		
		Predio La Florida, vereda, La Mata, Municipio de la paz-Santander	Maria Elvira Santamaria Amado/Jaime Diaz			2 Ha	20000 m				
		Predio La Palestina, vereda, Trochas, Municipio de la paz-Santander	Nilson Cruz Agudelo					2 Ha	20000 m		
		Predio Buena Vista, vereda La Linterna, Municipio de La Paz-Santander	Liliana Melo Galeano					2 Ha	20000 m		
		Predio Peña Blanca, vereda La Linterna, Municipio de La Paz-Santander	Olga Lucia Diaz Amado					2 Ha	20000 m		
		Predio Lote 2, vereda El Centro, Municipio de La Paz-Santander	Balvina Orduña De Pardo					2 Ha	20000 m		
		Predio La Esperanza, vereda Casa Blancas, Municipio de La Paz-Santander	Gabrielina Diaz Castillo					2 Ha	20000 m		
		Predio Lote, vereda Casa Blancas, Municipio de La Paz-Santander	Jorge Ugusto Fuentes Barrera					2 Ha	20000 m		
		Predio La Quinta, vereda Casa Blancas, Municipio de La Paz-Santander	Olfer Alza Camacho					2 Ha	20000 m		
		Predio Las Acacias, vereda El Centro, Municipio de la paz-Santander	Alejandro Santamaria Ariza							2 Ha	20000 m
		Predio El Porvenir, vereda El Centro, Municipio de la paz-Santander	Segundo Julio Leon Mateus							2 Ha	20000 m
		Predio La Belleza, vereda, Trochas, Municipio de la paz-Santander	Gabrielina Ovalle Velandia							2 Ha	20000 m
ESTADO DE LA ACTIVIDAD		EN EJECUCIÓN	TOTAL	0	0	8 Ha	80000 m	16 Ha	160000 m	6 Ha	60000 m

5.1.4. Recurso empleado: personal, equipos

Para las actividades realizadas dé cuenta con el equipo mínimo quienes han realizado las visitas a campo, se ha gestionado y comprado material vegetal, insumos para el cercado, insecticida, semillas de pasto, arboles guayacán, se ha alquilado transporte vehicular y mular.

6. Fichas de predios intervenidos

Beneficiario: Emilse Orduña				Vereda: el Centro -La Paz.
				
Actividad	Insumos	Unidad	Cantidad	Avance de obra
Limpieza e instalación del cerramiento perimetral de la unidad productiva.	Postes plásticos	Und	119	100%
	Postes de concreto	Und	10	
	Rollos de alambre calibre12,5	Rollo	3	
	Cajas de grapas por Kg	Caja	3	
Limpieza, adecuación del terreno y establecimiento de pasturas.	Semilla por Kg de pasto brachiaria decumbens	Kilo	8	100%
Instalación de sistemas para el reservorio de agua.	Tanque plástico bicapa por 5000 L	Und	1	100%
	Accesorios para tanque (válvulas, mangueras, tubería, abrazaderas, soldadura…)	Global	1	
Siembra de árboles forestales y forrajeros.	Plántulas forestales Guayacán, cedro y abarco	Und	64	100%
	Semillas de plántulas de especies forrajeras priorizadas (Matarratón - Botón de Oro) por Kg	Kilo	0,2	
	Abono orgánico por bulto de 50 Kg	Bulto	12	
	Hidroretenedor	Kilogramo	1,2	

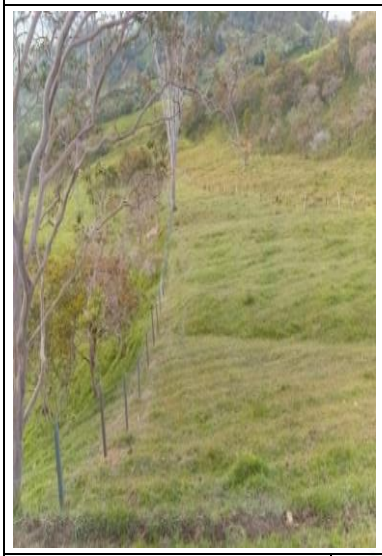Beneficiario: Flor María Mateus				Vereda: el Centro -La Paz.
				
Actividad	Insumos	Unidad	Cantidad	Avance de obra
Limpieza e instalación del cerramiento perimetral de la unidad productiva.	Postes plásticos	Und	119	100%
	Postes de concreto	Und	10	
	Rollos de alambre calibre12,5	Rollo	3	
	Cajas de grapas por Kg	Caja	3	
Limpieza, adecuación del terreno y establecimiento de pasturas.	Semilla por Kg de pasto brachiaria decumbens	Kilo	8	100%
Instalación de sistemas para el reservorio de agua.	Tanque plástico bicapa por 5000 L	Und	1	100%
	Accesorios para tanque (válvulas, mangueras, tubería, abrazaderas, soldadura…)	Global	1	
Siembra de árboles forestales y forrajeros.	Plántulas forestales Guayacán, cedro y abarco	Und	64	100%
	Semillas de plántulas de especies forrajeras priorizadas (Matarratón - Botón de Oro) por Kg	Kilo	0,2	
	Abono orgánico por bulto de 50 Kg	Bulto	12	
	Hidroretenedor	Kilogramo	1,2	

Beneficiario: Atanael Medina			Vereda: el Centro -La Paz.	
				
Actividad	Insumos	Unidad	Cantidad	Avance de obra
Limpieza e instalación del cerramiento perimetral de la unidad productiva.	Postes plásticos	Und	119	100%
	Postes de concreto	Und	10	
	Rollos de alambre calibre12,5	Rollo	3	
	Cajas de grapas por Kg	Caja	3	
Limpieza, adecuación del terreno y establecimiento de pasturas.	Semilla por Kg de pasto brachiaria decumbens	Kilo	8	100%
Instalación de sistemas para el reservorio de agua.	Tanque plástico bicapa por 5000 L	Und	1	100%
	Accesorios para tanque (válvulas, mangueras, tubería, abrazaderas, soldadura…)	Global	1	
Siembra de árboles forestales y forrajeros.	Plántulas forestales Guayacán, cedro y abarco	Und	64	100%
	Semillas de plántulas de especies forrajeras priorizadas (Matarratón - Botón de Oro) por Kg	Kilo	0,2	
	Abono orgánico por bulto de 50 Kg	Bulto	12	
	Hidroretenedor	Kilogramo	1,2	


Beneficiario: María Elvia Santamaria				Vereda: -vereda La Mata-La Paz..
				
Actividad	Insumos	Unidad	Cantidad	Avance de obra
Limpieza e instalación del cerramiento perimetral de la unidad productiva.	Postes plásticos	Und	119	100%
	Postes de concreto	Und	10	
	Rollos de alambre calibre12,5	Rollo	3	
	Cajas de grapas por Kg	Caja	3	
Limpieza, adecuación del terreno y establecimiento de pasturas.	Semilla por Kg de pasto brachiaria decumbens	Kilo	8	100%
Instalación de sistemas para el reservorio de agua.	Tanque plástico bicapa por 5000 L	Und	1	100%
	Accesorios para tanque (válvulas, mangueras, tubería, abrazaderas, soldadura…)	Global	1	
Siembra de árboles forestales y forrajeros.	Plántulas forestales Guayacán, cedro y abarco	Und	64	100%
	Semillas de plántulas de especies forrajeras priorizadas (Matarratón - Botón de Oro) por Kg	Kilo	0,2	
	Abono orgánico por bulto de 50 Kg	Bulto	12	
	Hidroretenedor	Kilogramo	1,2	


Beneficiario: Nilson Cruz			Vereda: Trochas-La Paz
			

Actividad	Insumos	Unidad	Cantidad	Avance de obra
Limpieza e instalación del cerramiento perimetral de la unidad productiva.	Postes plásticos	Und	119	100%
	Postes de concreto	Und	10	
	Rollos de alambre calibre12,5	Rollo	3	
	Cajas de grapas por Kg	Caja	3	
Limpieza, adecuación del terreno y establecimiento de pasturas.	Semilla por Kg de pasto brachiaria decumbens	Kilo	8	100%
Instalación de sistemas para el reservorio de agua.	Tanque plástico bicapa por 5000 L	Und	1	100%
	Accesorios para tanque (válvulas, mangueras, tubería, abrazaderas, soldadura…)	Global	1	
Siembra de árboles forestales y forrajeros.	Plántulas forestales Guayacán, cedro y abarco	Und	64	100%
	Semillas de plántulas de especies forrajeras priorizadas (Matarratón - Botón de Oro) por Kg	Kilo	0,2	
	Abono orgánico por bulto de 50 Kg	Bulto	12	
	Hidroretenedor	Kilogramo	1,2	

Beneficiario: Alexander Melo			Vereda: El Centro-La Paz.	
				
Actividad	Insumos	Unidad	Cantidad	Avance de obra
Limpieza e instalación del cerramiento perimetral de la unidad productiva.	Postes plásticos	Und	119	100%
	Postes de concreto	Und	10	
	Rollos de alambre calibre12,5	Rollo	3	
	Cajas de grapas por Kg	Caja	3	
Limpieza, adecuación del terreno y establecimiento de pasturas.	Semilla por Kg de pasto brachiaria decumbens	Kilo	8	100%
Instalación de sistemas para el reservorio de agua.	Tanque plástico bicapa por 5000 L	Und	1	100%
	Accesorios para tanque (válvulas, mangueras, tubería, abrazaderas, soldadura…)	Global	1	
Siembra de árboles forestales y forrajeros.	Plántulas forestales Guayacán, cedro y abarco	Und	64	100%
	Semillas de plántulas de especies forrajeras priorizadas (Matarratón - Botón de Oro) por Kg	Kilo	0,2	
	Abono orgánico por bulto de 50 Kg	Bulto	12	
	Hidroretenedor	Kilogramo	1,2	

Beneficiario: Olga Lucia Amado			Vereda: La Linterna-La Paz.	
				
Actividad	Insumos	Unidad	Cantidad	Avance de obra
Limpieza e instalación del cerramiento perimetral de la unidad productiva.	Postes plásticos	Und	119	100%
	Postes de concreto	Und	10	
	Rollos de alambre calibre12,5	Rollo	3	
	Cajas de grapas por Kg	Caja	3	
Limpieza, adecuación del terreno y establecimiento de pasturas.	Semilla por Kg de pasto brachiaria decumbens	Kilo	8	100%
Instalación de sistemas para el reservorio de agua.	Tanque plástico bicapa por 5000 L	Und	1	100%
	Accesorios para tanque (válvulas, mangueras, tubería, abrazaderas, soldadura…)	Global	1	
Siembra de árboles forestales y forrajeros.	Plántulas forestales Guayacán, cedro y abarco	Und	64	100%
	Semillas de plántulas de especies forrajeras priorizadas (Matarratón - Botón de Oro) por Kg	Kilo	0,2	
	Abono orgánico por bulto de 50 Kg	Bulto	12	
	Hidroretenedor	Kilogramo	1,2	

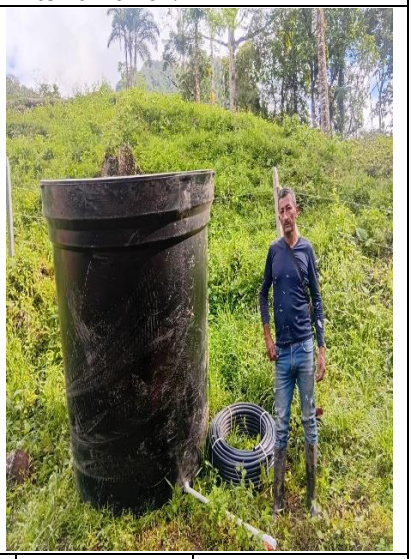Beneficiario: Liliana Melo		Vereda: La Linterna-La Paz.		
				
Actividad	Insumos	Unidad	Cantidad	Avance de obra
Limpieza e instalación del cerramiento perimetral de la unidad productiva.	Postes plásticos	Und	119	100%
	Postes de concreto	Und	10	
	Rollos de alambre calibre12,5	Rollo	3	
	Cajas de grapas por Kg	Caja	3	
Limpieza, adecuación del terreno y establecimiento de pasturas.	Semilla por Kg de pasto brachiaria decumbens	Kilo	8	100%
Instalación de sistemas para el reservorio de agua.	Tanque plástico bicapa por 5000 L	Und	1	100%
	Accesorios para tanque (válvulas, mangueras, tubería, abrazaderas, soldadura…)	Global	1	
Siembra de árboles forestales y forrajeros.	Plántulas forestales Guayacán, cedro y abarco	Und	64	100%
	Semillas de plántulas de especies forrajeras priorizadas (Matarratón - Botón de Oro) por Kg	Kilo	0,2	
	Abono orgánico por bulto de 50 Kg	Bulto	12	
	Hidroretenedor	Kilogramo	1,2	

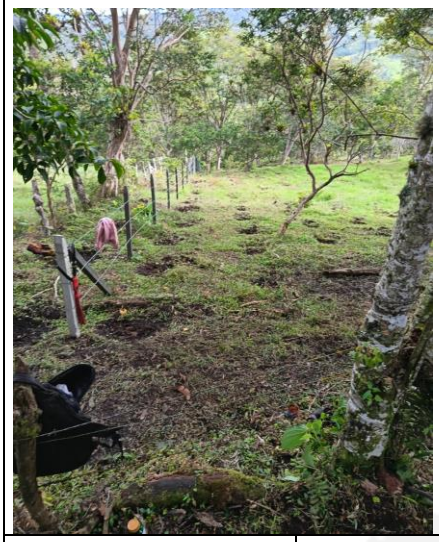
Beneficiario: Balvina orduña			Vereda: El Centro-La Paz.	
				
Actividad	Insumos	Unidad	Cantidad	Avance de obra
Limpieza e instalación del cerramiento perimetral de la unidad productiva.	Postes plásticos	Und	119	100%
	Postes de concreto	Und	10	
	Rollos de alambre calibre12,5	Rollo	3	
	Cajas de grapas por Kg	Caja	3	
Limpieza, adecuación del terreno y establecimiento de pasturas.	Semilla por Kg de pasto brachiaria decumbens	Kilo	8	100%
Instalación de sistemas para el reservorio de agua.	Tanque plástico bicapa por 5000 L	Und	1	100%
	Accesorios para tanque (válvulas, mangueras, tubería, abrazaderas, soldadura…)	Global	1	
Siembra de árboles forestales y forrajeros.	Plántulas forestales Guayacán, cedro y abarco	Und	64	100%
	Semillas de plántulas de especies forrajeras priorizadas (Matarratón - Botón de Oro) por Kg	Kilo	0,2	
	Abono orgánico por bulto de 50 Kg	Bulto	12	
	Hidroretenedor	Kilogramo	1,2	

Beneficiario: Gabrielina Diaz			Vereda: Trochas-La Paz.	
				
Actividad	Insumos	Unidad	Cantidad	Avance de obra
Limpieza e instalación del cerramiento perimetral de la unidad productiva.	Postes plásticos	Und	119	100%
	Postes de concreto	Und	10	
	Rollos de alambre calibre12,5	Rollo	3	
	Cajas de grapas por Kg	Caja	3	
Limpieza, adecuación del terreno y establecimiento de pasturas.	Semilla por Kg de pasto brachiaria decumbens	Kilo	8	100%
Instalación de sistemas para el reservorio de agua.	Tanque plástico bicapa por 5000 L	Und	1	100%
	Accesorios para tanque (válvulas, mangueras, tubería, abrazaderas, soldadura…)	Global	1	
Siembra de árboles forestales y forrajeros.	Plántulas forestales Guayacán, cedro y abarco	Und	64	100%
	Semillas de plántulas de especies forrajeras priorizadas (Matarratón - Botón de Oro) por Kg	Kilo	0,2	
	Abono orgánico por bulto de 50 Kg	Bulto	12	
	Hidroretenedor	Kilogramo	1,2	

Beneficiario: Jorge Fuentes			Vereda: Casa Blancas-La Paz.	
				
Actividad	Insumos	Unidad	Cantidad	Avance de obra
Limpieza e instalación del cerramiento perimetral de la unidad productiva.	Postes plásticos	Und	119	100%
	Postes de concreto	Und	10	
	Rollos de alambre calibre12,5	Rollo	3	
	Cajas de grapas por Kg	Caja	3	
Limpieza, adecuación del terreno y establecimiento de pasturas.	Semilla por Kg de pasto brachiaria decumbens	Kilo	8	100%
Instalación de sistemas para el reservorio de agua.	Tanque plástico bicapa 5000 L	Und	1	100%
	Accesorios para tanque (válvulas, mangueras, tubería, abrazaderas, soldadura…)	Global	1	
Siembra de árboles forestales y forrajeros.	Plántulas forestales Guayacán, cedro y abarco	Und	64	100%
	Semillas de plántulas de especies forrajeras priorizadas (Matarratón - Botón de Oro) por Kg	Kilo	0,2	
	Abono orgánico por bulto de 50 Kg	Bulto	12	
	Hidroretenedor	Kilogramo	1,2	

Beneficiario: Olfer Alza			Vereda: Casa Blancas-La Paz.	
				
Actividad	Insumos	Unidad	Cantidad	Avance de obra
Limpieza e instalación del cerramiento perimetral de la unidad productiva.	Postes plásticos	Und	119	100%
	Postes de concreto	Und	10	
	Rollos de alambre calibre12,5	Rollo	3	
	Cajas de grapas por Kg	Caja	3	
Limpieza, adecuación del terreno y establecimiento de pasturas.	Semilla por Kg de pasto brachiaria decumbens	Kilo	8	100%
Instalación de sistemas para el reservorio de agua.	Tanque plástico bicapa 5000 L	Und	1	100%
	Accesorios para tanque (válvulas, mangueras, tubería, abrazaderas, soldadura…)	Global	1	
Siembra de árboles forestales y forrajeros.	Plántulas forestales Guayacán, cedro y abarco	Und	64	100%
	Semillas de plántulas de especies forrajeras priorizadas (Matarratón - Botón de Oro) por Kg	Kilo	0,2	
	Abono orgánico por bulto de 50 Kg	Bulto	12	
	Hidroretenedor	Kilogramo	1,2	

Beneficiario: Alejandro Santamaria			Vereda: El Centro-La Paz.	
				
Actividad	Insumos	Unidad	Cantidad	Avance de obra
Limpieza e instalación del cerramiento perimetral de la unidad productiva.	Postes plásticos	Und	119	100%
	Postes de concreto	Und	10	
	Rollos de alambre calibre12,5	Rollo	3	
	Cajas de grapas por Kg	Caja	3	
Limpieza, adecuación del terreno y establecimiento de pasturas.	Semilla por Kg de pasto brachiaria decumbens	Kilo	8	100%
Instalación de sistemas para el reservorio de agua.	Tanque plástico bicapa por 5000 L	Und	1	100%
	Accesorios para tanque (válvulas, mangueras, tubería, abrazaderas, soldadura…)	Global	1	
Siembra de árboles forestales y forrajeros.	Plántulas forestales Guayacán, cedro y abarco	Und	64	100%
	Semillas de plántulas de especies forrajeras priorizadas (Matarratón - Botón de Oro) por Kg	Kilo	0,2	
	Abono orgánico por bulto de 50 Kg	Bulto	12	
	Hidroretenedor	Kilogramo	1,2	

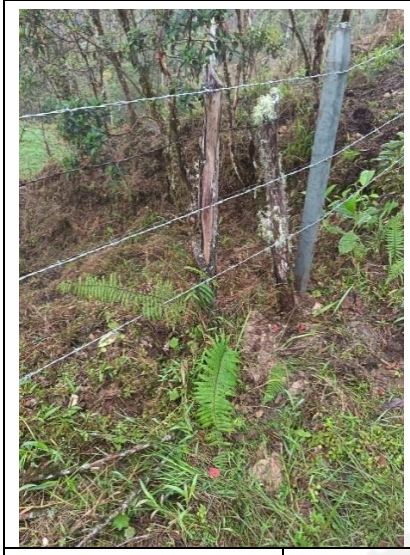Beneficiario: Segundo Julio León Mateus			Vereda: El Centro-La Paz.	
				
Actividad	Insumos	Unidad	Cantidad	Avance de obra
Limpieza e instalación del cerramiento perimetral de la unidad productiva.	Postes plásticos	Und	119	100%
	Postes de concreto	Und	10	
	Rollos de alambre calibre12,5	Rollo	3	
	Cajas de grapas por Kg	Caja	3	
Limpieza, adecuación del terreno y establecimiento de pasturas.	Semilla por Kg de pasto brachiaria decumbens	Kilo	8	100%
Instalación de sistemas para el reservorio de agua.	Tanque plástico bicapa por 5000 L	Und	1	100%
	Accesorios para tanque (válvulas, mangueras, tubería, abrazaderas, soldadura…)	Global	1	
Siembra de árboles forestales y forrajeros.	Plántulas forestales Guayacán, cedro y abarco	Und	64	100%
	Semillas de plántulas de especies forrajeras priorizadas (Matarratón - Botón de Oro) por Kg	Kilo	0,2	
	Abono orgánico por bulto de 50 Kg	Bulto	12	
	Hidroretenedor	Kilogramo	1,2	

Beneficiario: Gabrielina Ovalle			Vereda: Trochas-La Paz.	
				
Actividad	Insumos	Unidad	Cantidad	Avance de obra
Limpieza e instalación del cerramiento perimetral de la unidad productiva.	Postes plásticos	Und	119	100%
	Postes de concreto	Und	10	
	Rollos de alambre calibre12,5	Rollo	3	
	Cajas de grapas por Kg	Caja	3	
Limpieza, adecuación del terreno y establecimiento de pasturas.	Semilla por Kg de pasto brachiaria decumbens	Kilo	8	100%
Instalación de sistemas para el reservorio de agua.	Tanque plástico bicapa por 5000 L	Und	1	100%
	Accesorios para tanque (válvulas, mangueras, tubería, abrazaderas, soldadura…)	Global	1	
Siembra de árboles forestales y forrajeros.	Plántulas forestales Guayacán, cedro y abarco	Und	64	100%
	Semillas de plántulas de especies forrajeras priorizadas (Matarratón - Botón de Oro) por Kg	Kilo	0,2	
	Abono orgánico por bulto de 50 Kg	Bulto	12	
	Hidroretenedor	Kilogramo	1,2	

7. Correspondencia

Ninguna.

8. Actas desarrolladas en el mes.

Acta de inicio: ocho (08) de septiembre de 2025.

9. Informe avance físico informe final.

AVANCE FISICO DEL AVANCE PERIODO ANTERIOR	**25,06%**
AVANCE FISICO ACUMULADO:	**100%**
AVANCE FISICO POR EJECUTAR:	**0%**

10. Avance del plazo del contrato hasta informe final.

Tiempo inicial:	**TRES (03) MESES VEINTICUATRO (24) DIAS.**
Tiempo Transcurrido:	**TRES (03) MES. 24 días**
Avance Porcentual del plazo de ejecución:	**100%**
Avance Porcentual Restante del plazo de ejecución:	**0%**

11. Avance financiero del contrato hasta informe final.

INFORMACION FINANCIERA - INFORME FINAL	
VALOR INICIAL:	**$ 522.835.089 M/L.**
AVANCE EJECUTADO PERIODO INFORME FINAL	**$ 522.835.089 M/L**
ACUMULADO EJECUTADO	**$ 522.835.089 M/L.**
TOTAL, AVANCE EJECUTADO HASTA INFORME FINAL	**$ 522.835.089 M/L**
FALTANTE POR EJECUTAR	**$ 0 M/L.**

La ejecución del **CONTRATO**, a la fecha del presente informe para entrega final arroja los siguientes índices:
La cifra de ejecución en el período informado es de: **($ 522.835.089 M/L) M/L**, equivalente a un porcentaje de 100**%** para un total ejecutado acumulado de: **($ 522.835.089 M/L),** equivalente a un porcentaje de 100**%,** del valor total del **CONTRATO,** quedando por ejecutar **CERO PESOS ($ 0) M/L,** equivalente a un porcentaje de 0**%,** del valor inicial del **CONTRATO**.
.

UNIÓN TEMPORAL
SISTEMAS SILVOPASTORILES

ANEXO 1. CUADRO DE AVANCE DE ACTIVIDADES OBRA - INFORME FINAL

Corresponde al Informe de avance	Final	Periodo del Informe:	08/09/2025 - 31/12/2025
Nombre del proyecto:	OBJETO DEL CONTRATO: IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS PRODUCTIVOS SILVOPASTORILES EN PRADERAS ESTABLECIDAS EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ DEPARTAMENTO DE SANTANDER.		

CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO DE OBRA							MODIFICACIONES DEL CONTRATO (Describa las cantidades y valores unitarios ajustados, los cuales no podrán incurrir en incrementos del presupuesto total aprobado. En caso de no requerir modificaciones, estos valores deben ser iguales a las cantidades y valores aprobados del proyecto)			
ITEM		DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	(+) O (-) CANTIDAD	CANTIDAD TOTAL	V/UNITARIO	V/TOTAL
1. Servicio de restauración de ecosistemas	1.1	Limpieza e instalación del cerramiento perimetral de la unidad productiva	Ha	15	$ 10.753.685	$ 161.305.275				
	1.2	Limpieza, adecuaciónde terreno y establecimiento de pasturas	Ha	30,00	$ 2.018.149	$ 60.544.470				
	1.3	Instalaciónde sistemas para el reservorio de agua.	Un	15	$ 4.372.250	$ 65.583.750				
2. Servicio de establecimiento de especies vegetales	2.1	Siembra de árboles forestales y forrajeros.	Ha	30,00	$ 3.727.655	$ 111.829.650				
					TOTAL COSTO DIRECTO	$ 399.263.145				
ADMINISTRACION (24%)			%	24,00%		$ 95.823.154,80				
IMPREVISTOS (1%)			%	1,00%		$ 3.992.631,45				
UTILIDAD (5%)			%	5,00%		$ 19.963.157,25				
IVA 19% (Sobre la Utilidad)			%	19,00%		$ 3.792.999,88				
					TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 123.571.943				
TOTAL COSTOS PROYECTO						$ 522.835.089				

INTERVENTOR:	HHERNANDO LEGIZAMON GALINDO Nit 7160171-2	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 01019-2025
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL SISTEMAS SILVOPASTORILES NIT: 901.980.916-3 - R.L MARIA MAGDALENA CADENA ZARATE.	CONTRATO DE OBRA No: 01053-2025

EJECUCIÓN DEL PROYECTO

CANTIDADES (UN)			VALORES ($)			SALDOS FALTANTE POR EJECUTAR	
ACUMULADO INFORME ANTERIOR	AVANCE PRESENTE INFORME	AVANCE ACUMULADO	VALOR ACUMULADO INFORME ANTERIOR	VALOR PRESENTE INFORME	VALOR AVANCE ACUMULADO	CANTIDAD	VALOR
15,00	0,00	**15,00**	$ 161.305.275	$ -	**$ 161.305.275**	0,00	$ -
24,00	6,00	**30,00**	$ 48.435.576	$ 12.108.894	**$ 60.544.470**	0,00	$ -
0,00	15,00	**15,00**	$ -	$ 65.583.750	**$ 65.583.750**	0,00	$ -
24,00	6,00	**30,00**	$ 89.463.720	$ 22.365.930	**$ 111.829.650**	0,00	$ -
			$ 299.204.571	$ 100.058.574	$ 399.263.145	0,00	**$ -**
			$ 71.809.097	$ 24.014.058	$ 95.823.155		$ -
			$ 2.992.045,71	$ 1.000.586	$ 3.992.631,45		$ -
			$ 14.960.229	$ 5.002.929	$ 19.963.157,25		$ -
			$ 2.842.443	$ 950.556	$ 3.793.000		$ -
							$ -
			$ 391.808.386	**$ 131.026.703**	**$ 522.835.089**		**$ -**
			74,94%	**25%**	**100,00%**		**0,00%**

12. Análisis del avance del contrato informe final

Las actividades realizadas han consistido en la instalación de aislamiento en 15 parcelas, la siembra de pasturas, forrajeros y forestales en 24 hectáreas respectivamente. Se ha hecho trazado y entrega de insumos de siembra para los tres nuevos predios. Los tanques serán instalados para el próximo periodo. En total se han cercado los 15 predios y sembrado pasto, forrajero y forestales en 12 parcelas equivalente a 24 hectáreas.

Las actividades hasta fecha se han realizado en normalidad, las constantes lluvias han dificultado el acceso a los predios y limitado la ejecución de las actividades. en general las actividades se desarrollan conforme al cronograma de trabajo

1. VALOR TOTAL DEL CONTRATO	
1.1 Contrato inicial	**$ 522.835.089**
1.2 Adiciones	**$ 0.00**
2. PAGOS EFECTUADOS	
2.1 Primer pago **ACTA PARCIAL 01**	**0**
2.1.2 VALOR NETO Pago Acta Parcial 01	**0**
2.2 Segundo pago **ACTA PARCIAL**	**0**
2.2.1 Valor NETO **PAGO ACTA PARCIAL 02**	**0**
3. Valor pagado a la fecha	**$ 0.00**
4. SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	**$ 522.835.089 M/L L**
5. SALDO A FAVOR DE CAS	**$ 0.00.**

13. Actas de mayores y menores

No aplica.

14. Actas y documentos.

Hasta el momento del presente informe de acta de cobro No 1, han sido legalizado mediante firma los siguientes documentos relativos al desarrollo del contrato de obra:

- Acta: **inicio de actividades:**
  Fecha: **Ocho (08) septiembre 2025.**

15. Bitácora de obra.

Durante este periodo transcurrido del contrato se ha registrado actividades en bitácora. (anexo)

16. Administración.

Se reseña por parte del contratista el cumplimiento de cada Uno de los aspectos administrativos contemplados por el contrato de obra, durante el periodo del presente informe, y a lo largo del plazo de ejecución de este, la **U.T SILVOPASTORILES**, en su condición de ejecutor, ha realizado la inversión y seguimiento a los aspectos relacionados con **SST,** de acuerdo a lo estipulado en su propuesta para el proceso de contratación pública que origino el contrato de la referencia.

17. Visitas de supervisión.

Para el presente periodo de ejecución, se realizó visita de campo por parte de la supervisión e interventoría.


18. Conclusiones

- Se instalaron 15 unidades de aislamiento o cercado en los predios de beneficiarios del proyecto silvopastoril.
- Se ha realizado establecimiento de pastos y especies forestales en 15 predios equivalentes a 30 hectáreas que contempla em contrato de obra
- Se instalaron 15 unidades de sistemas para reservorio de agua, uno en cada predio beneficiado
- Se sembró 30 hectáreas de pasturas en los 15 predios beneficiados en el proyecto



MAGDALENA CADENA ZARATE
Representante legal
Unión Temporal Sistemas Silvopastoriles
ANEXOS: cuadro de avances en Excel, bitácora.

BITACORA

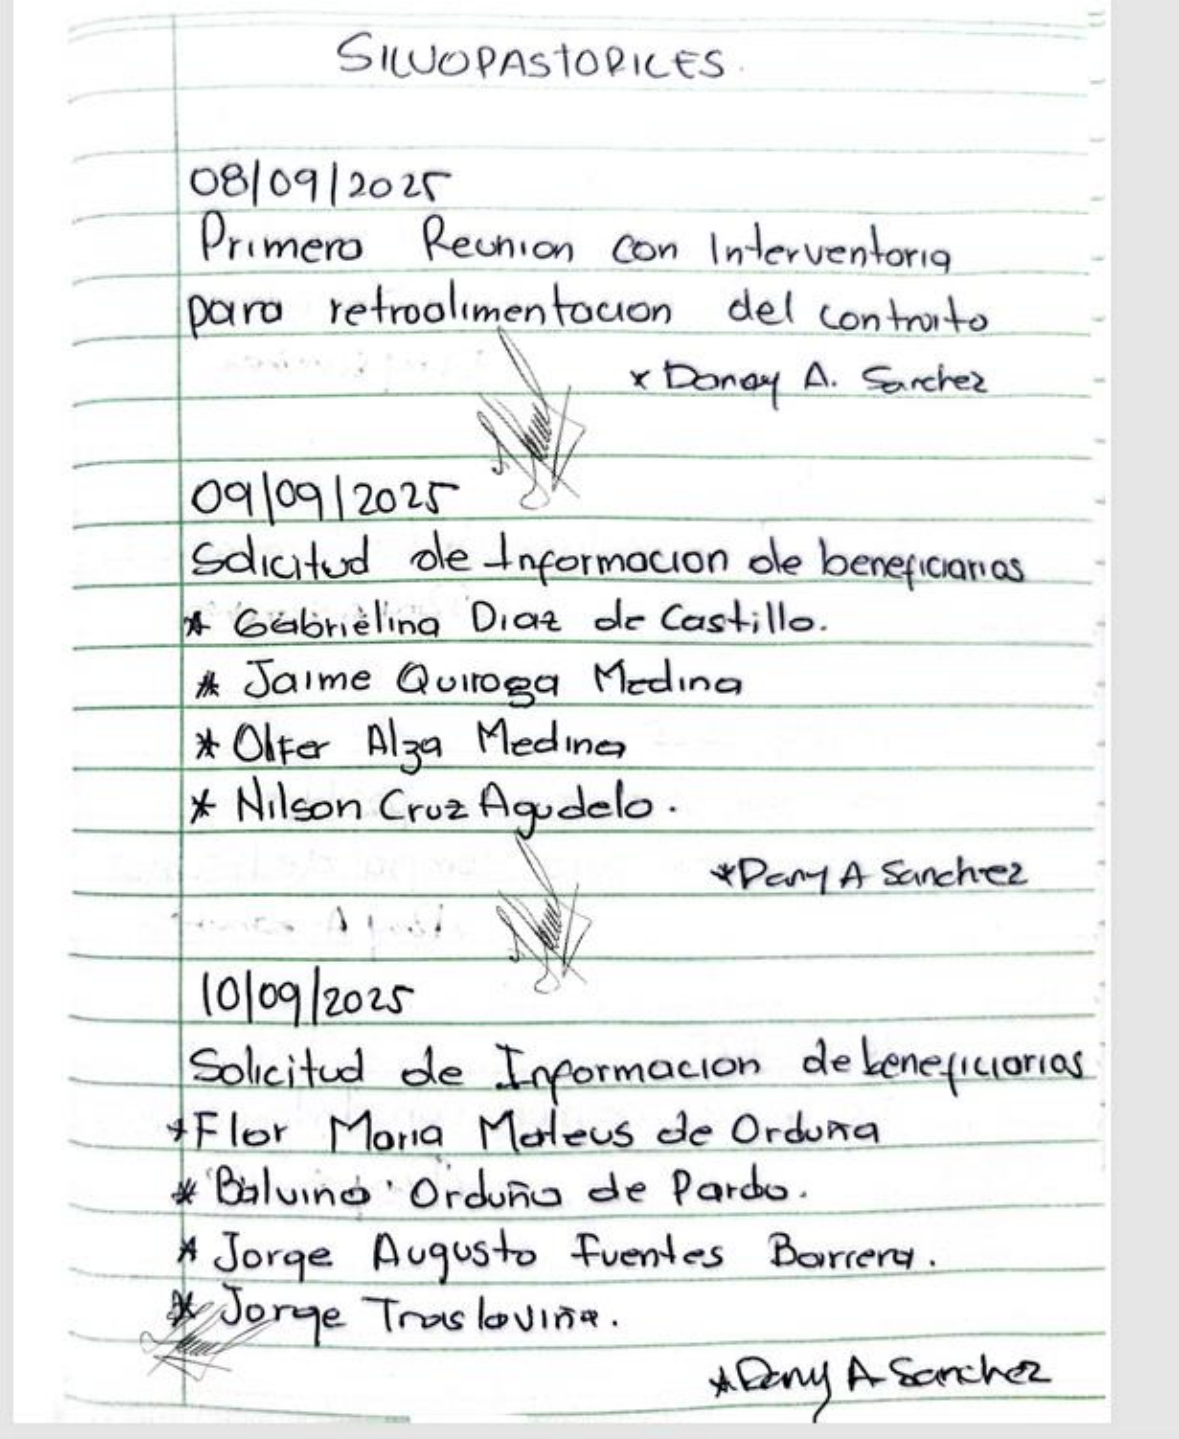

SILVOPASTORICES.

08/09/2025
Primera Reunion con Interventoria para retroalimentacion del contrato
* Danay A. Sanchez

09/09/2025
Solicitud de Informacion de beneficiarios
* Gabrielina Diaz de Castillo.
* Jaime Quiroga Medina
* Olfer Alza Medina
* Nilson Cruz Agudelo.
*Dany A Sanchez

10/09/2025
Solicitud de Informacion de beneficiarios
*Flor Maria Mateus de Orduña
* Baluino Orduña de Pardo.
* Jorge Augusto Fuentes Barrera.
* Jorge Trasloviña.
*Dany A Sanchez

11/09/2025
Se Recoge Informacion de beneficiarios Alexander Melo - Abnoel Medina - Olga Lucia Diaz - Emilse Orduño Medina Liliana Melo Coleano.
* Dany Sanchez

12/09/2025
Se Realiza Analisis de la Informacion
* Dany A Sanchez

15/09/2025
Se hace contacto con posibles Proveedores para compra de Insumos
* Dany A. Sanchez

16/09/2025
Se hace reunion con Interventoria
* Dany Sanchez

17/09/2025
Se hace contacto con los beneficiarios.
* Dany A Sanchez

18/09/2025
Socializacion del contrato en el municipio de la paz en compañia de la Alcaldesa, Delegados de la CAS, Gobernacion de Santander Interventoria beneficiarios y Contratista.
* Dany Sanchez

19/09/2025
Se hace los primeros acercamientos personales con los beneficiarios
* Dany Sanchez

22/09/2025.
Visita a Proveedore para Insumo del contrato en la ciudad de Bogota
* Dany Sanchez

23/09/2025.
Visita a Moniquira para Cotizacion de postes de concreto.
* Dany Sanchez

24/09/2025
Visita a proveedor para la cotizacion de semillas de pasto y forrajero para el contrato.
* Dany Sanchez


25/09/2025
Visita proveedores en la paz para los insumo del contrato
* Dany Sanchos

26/09/2025
Reunion con interventoria para tratar temas de las dificultades con los accesos a los predios y condiciones naturales para la entrega de los Insumos

27/09/2025.
Visita a los Predios de Flor Maria Moteus de Orduña se realiza reconocimiento de los predios, vias de acceso, modalidad de transporte.
* Dany Sanchez

29/09/2025
Visita a el predio de la señora Maria Elvia SantaMaria. se realiza reconocimiento del predio vias de acceso, modalidad de transporte
* Dany A Sanchez

30/09/2025
Visita a el predio del señor Alexander Melo. se hace reconocimiento de Predios vias de acceso y que Metodo de transporte se puedeutilizar
* Dany Sanchez

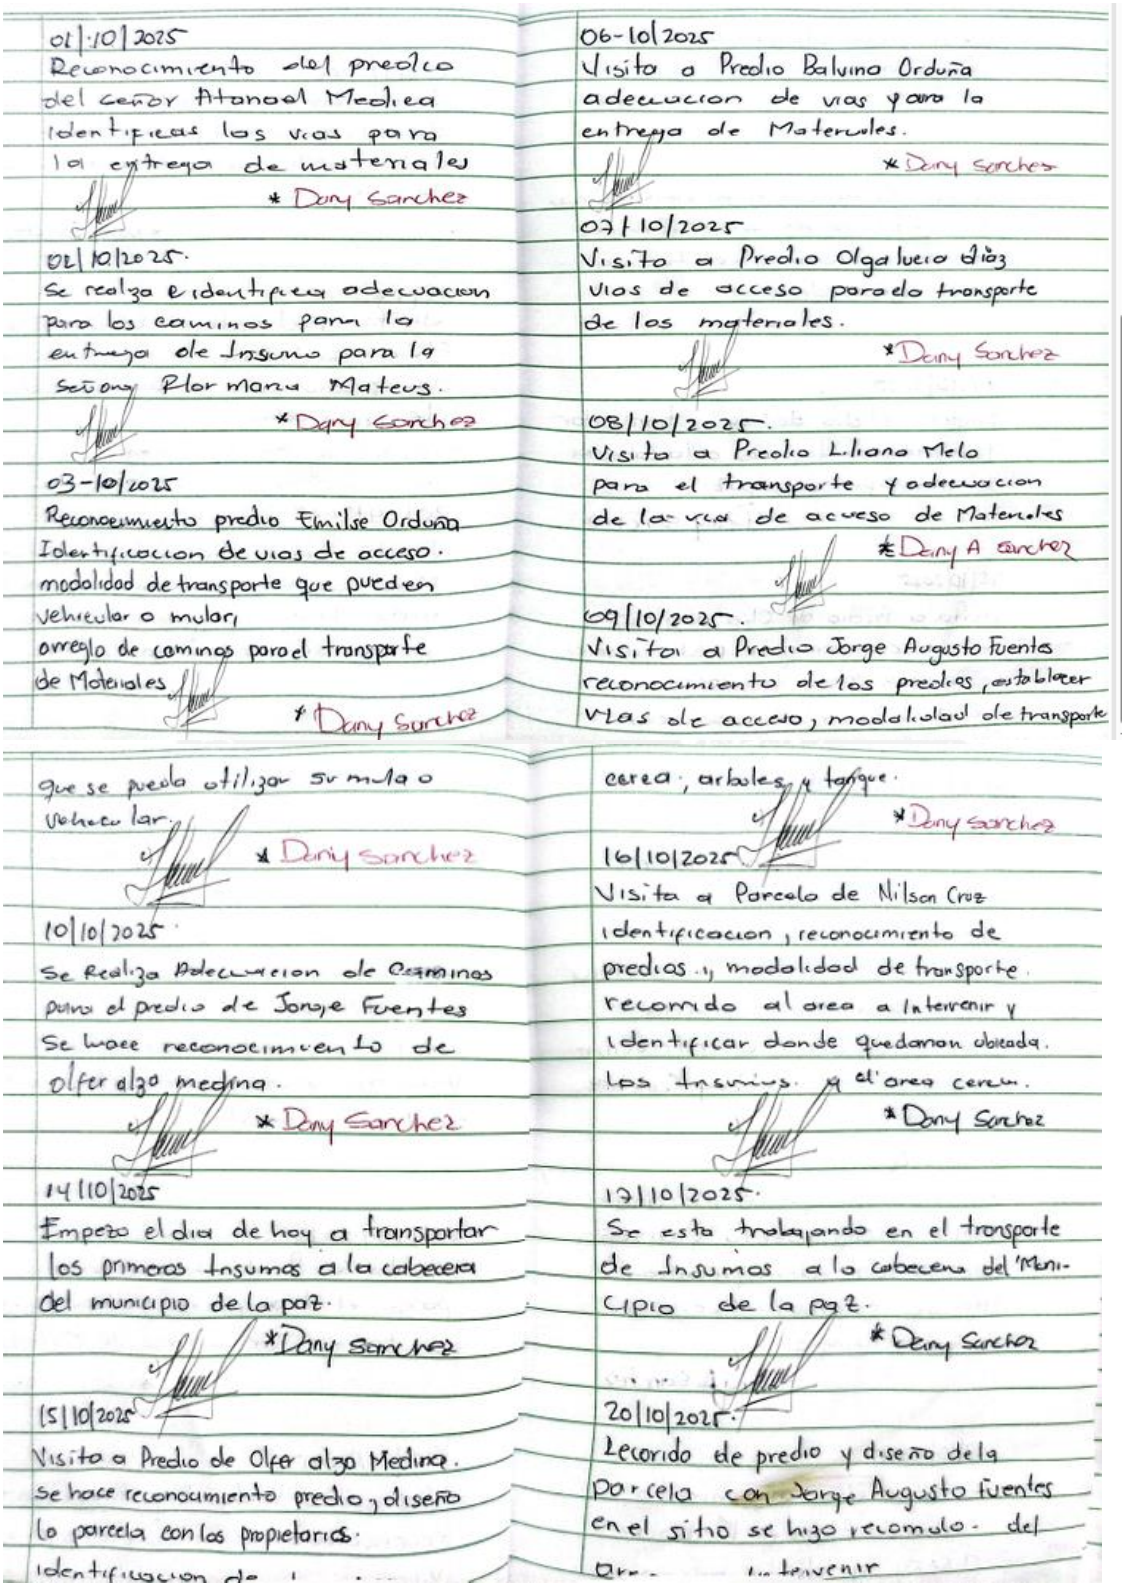

01/10/2025
Reconocimiento del predio del señor Atanael Medina identificar las vias para la entrega de materiales
* Dany Sanchez

02/10/2025.
Se realiza identificacion adecuacion para los caminos para la entrega de Insumo para la señora Flor Maria Mateus.
* Dany Sanchez

03-10/2025
Reconocimiento predio Emilse Orduña
Identificacion de vias de acceso.
modalidad de transporte que pueden vehicular o mular,
arreglo de caminos para el transporte de Materiales
* Dany Sanchez

06-10/2025
Visito a Predio Balvino Orduña
adecuacion de vias para la entrega de Materiales.
* Dany Sanchez

07/10/2025
Visito a Predio Olga lucia Diaz
vias de acceso para el transporte de los materiales.
* Dany Sanchez

08/10/2025.
Visito a Predio Liliana Melo
para el transporte y adecuacion de la via de acceso de Materiales
* Dany A Sanchez

09/10/2025.
Visita a Predio Jorge Augusto Fuentes
reconocimiento de los predios, establecer vias de acceso, modalidad de transporte que se puede utilizar si mula o vehiculo.
* Dany Sanchez

10/10/2025.
Se Realiza Adecuacion de Caminos para el predio de Jorge Fuentes
Se hace reconocimiento de Olfer alzo medina.
* Dany Sanchez

14/10/2025
Empezo el dia de hoy a transportar los primeros insumos a la cabecera del municipio de la paz.
* Dany Sanchez


15/10/2025
Visito a Predio de Olfer alzo Medina.
se hace reconocimiento predio, diseño lo parcela con los propietarios.
identificacion de

cerca, arboles, y tanque.
* Dany Sanchez

16/10/2025
Visita a Parcela de Nilson Cruz
identificacion, reconocimiento de predios, y modalidad de transporte.
recorrido al area a intervenir y identificar donde quedaran ubicada.
los insumos y el area cercar.
* Dany Sanchez

17/10/2025.
Se esta trabajando en el transporte de Insumos a la cabecera del Municipio de la paz.
* Dany Sanchez

20/10/2025.
Recorrido de predio y diseño de la Parcela con Jorge Augusto fuentes
en el sitio se hizo recorrido del Area a intervenir

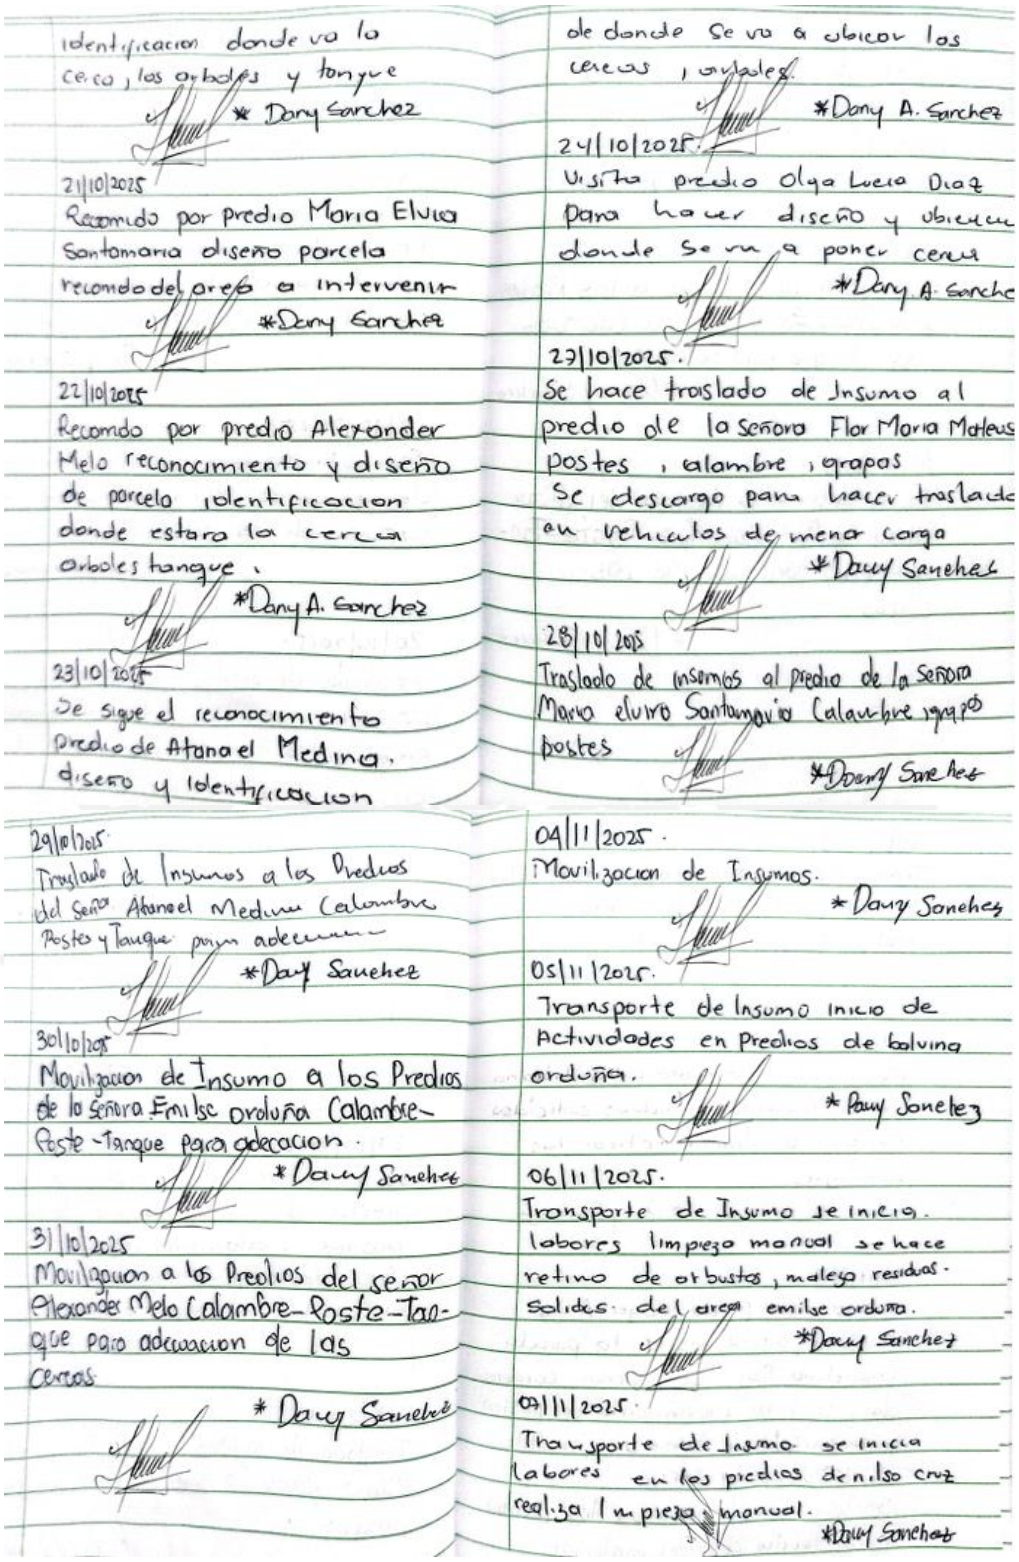

identificacion donde va la cerca, los arboles y tanque
* Dany Sanchez

21/10/2025
Recorrido por predio Maria Elvira Santamaria diseño parcela recorrido del area a intervenir
*Dany Sanchez

22/10/2025
Recorrido por predio Alexander Melo reconocimiento y diseño de parcela identificacion donde estara la cerca arboles tanque.
*Dany A. Sanchez

23/10/2025
Se sigue el reconocimiento Predio de Atanael Medina. diseño y identificacion de donde se va a ubicar los cercas, arboles.
*Dany A. Sanchez

24/10/2025.
Visita predio Olga Lucia Diaz para hacer diseño y ubicacion donde se va a poner cerca
*Dany A. Sanche

27/10/2025.
Se hace traslado de Insumo al predio de la señora Flor Maria Mateus postes, alambre, grapas
Se descargo para hacer traslado en vehiculos de menor carga
*Dany Sanchez

28/10/2025
Traslado de insumos al predio de la Señora Maria elvira Santamaria Calambre, grapas postes
*Dany Sanchez

29/10/2025
Traslado de Insumos a los Predios del Señor Atanael Medina Calambre Postes y Tanque para adecuacion
*Dany Sanchez

30/10/2025
Movilizacion de Insumo a los Predios de la Señora Emilse Orduña Calambre-Poste-Tanque para adecuacion.
*Dany Sanchez

31/10/2025
Movilizacion a los Predios del señor Alexander Melo Calambre-Poste-Tanque para adecuacion de las cercas
*Dany Sanchez

04/11/2025.
Movilizacion de Insumos.
*Dany Sanchez

05/11/2025.
Transporte de Insumo inicio de Actividades en Predios de Salvina orduña.
*Dany Sanchez

06/11/2025.
Transporte de Insumo se inicia. labores limpieza manual se hace retiro de arbustos, maleza residuos. Solidos. del area emilse orduña.
*Dany Sanchez

07/11/2025.
Transporte de Insumo se inicia labores en los predios de nilso cruz realiza limpieza manual.
*Dany Sanchez

10/11/2025.
Transporte insumos inicio actividades en el predio Liliana melo.
realizo limpieza manual.
*Dany Sanchez

11/11/2025.
Movilizacion de materiales liliana melo recogiendo residuos solidos del area o intervenir retirar las hormigas
*Dany Sanchez

12/11/2025
Realiza visita parcela Holger Anza diseño la parcela visito la parcela Gabrielino Diaz Se pusieron cordenadas, se hizo movimiento de postes a la parcela de Jaime Diaz, instalo el 80% de la cerca
Se hizo movilizacion en los predios veredo trocha se llevo material

Nilson Cruz y Viviana melo a la vereda la linterna.
Diseño trazo en la parcela de la señora Flor Maria Mateus. para siembra
*Dany Sanchez

13/11/2025.
Terminacion de la cerca donde el beneficiario Jaime Diaz, se inicio.
la colocacion de cabo de alambre en el predio del señor Atanael Medina.
Movilizacion de postes a Hombro el predio. del señor Atanael.
*Dany Sanchez

14/11/2025.
Continua. las tareas del dia Anterias transporte de poste en el predio del señor Atanael. Medina.
*Dany Sánchez

18-11/2025
Se continuan actividades en la finca de don Emirso la señora Flor Mario Mateos - Siembra de Arboles plateos. Especie Maderable Siembra de Especie Forrajeras y ovayalo plateado.
*Dany Sanchez

19/11/2025
Se terminan las actividades de cercado, de siembra de pasto y Forestales y Forrajeros en el predio de Emilse Orduña.
Tambien se terminaron las actividades en la parcela de la señora Flor Marie Mateus solo falto el tanque de agua., traslado de insumos a Jose Fuentes
*Dany Sanchez


20-11/2025
En el predio de Maria Elvira Sedamanía se sembraron los forestales y forrajeros quedando completa estas actividades. con el cercado de

21-11/2025
Se inician labores de tumbado, dirigido para siembra de forestales, forrajeros y pastos en el predio de Alexander Melo y Gabriel Diaz
*Dany Sanchez

22-11/2025
Se inician labores de cercado en los predios de Liliana Melo y Olga Lucia Diaz en la Vereda la Linterna. y trazado para siembra
*Dany Sanchez

24-11/2025
Se da inicio a las al cercado de Nilson Cruz. en trochas, se hizo trazado y limpieza
Se siembra en el predio de Atanael Medina la parcela quedo 100% encerca y siembra
*Dany Sanchez

25-11/2025
Se dejaron los insumos para cercado, siembra de pastos y arboles en el predio de Ofa Alza.
Se hace limpieza mecanica y manual para hacer el trazado de la cerca
*Dany Sanchez

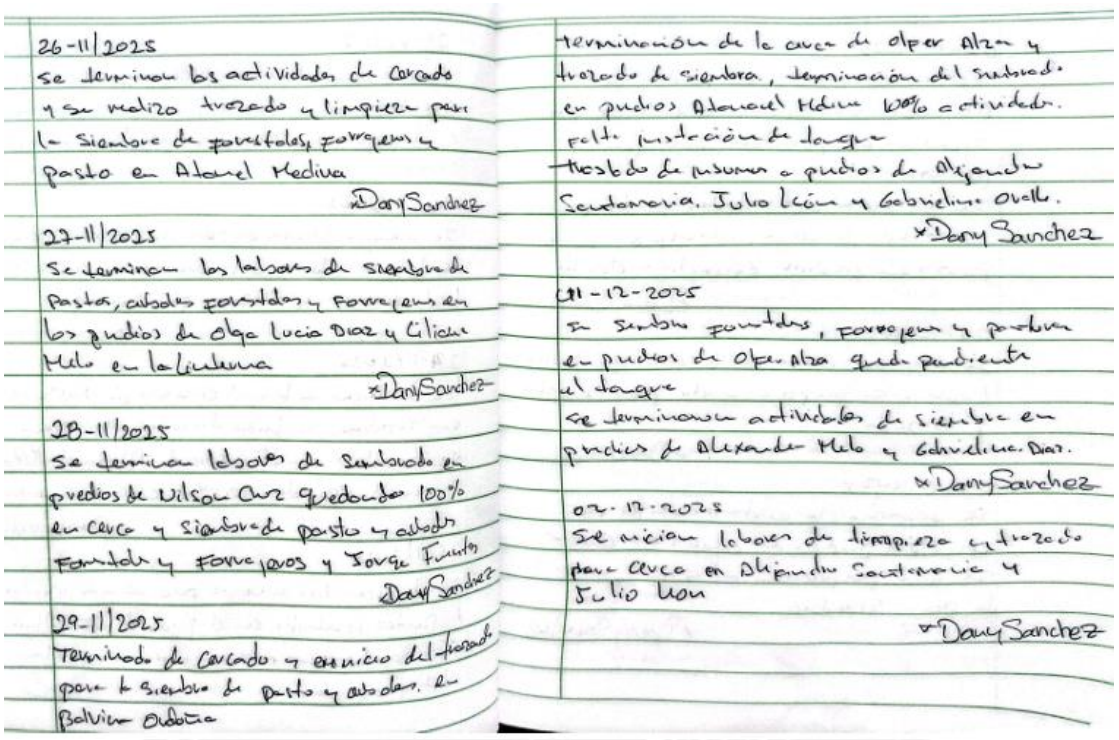

26-11/2025
Se terminan las actividades de cercado y se realizo trazado y limpieza para la siembra de forestales, forrajeras y pasto en Atanel Medina
Dany Sanchez

27-11/2025
Se terminan las labores de siembra de pasto, arboles forestales y forrajeras en los predios de Olga Lucia Diaz y Cilicia Mejia en la Ventana
Dany Sanchez

28-11/2025
Se terminan labores de sembrado en predios de Nilson Cruz quedando 100% en cerca y siembra de pasto y arboles forestales y forrajeros y Jorge Fuentes
Dany Sanchez

29-11/2025
Terminado de cercado y ahoyado del trazado para la siembra de pasto y arboles en Bolivia Oubtia

terminación de la cerca de Oper Alza y trazado de siembra, terminación del sembrado en predios Atanael Medina 100% actividades. falta instalación de bebedero
Traslado de personal a predios de Alejandro Santamaria, Julio León y Gabrielina Ovalle.
Dany Sanchez

01-12-2025
Se siembra forestales, forrajeras y pastos en predios de Oper Alza queda pendiente el bebedero
Se terminan actividades de siembra en predios de Alexander Mejia y Gabrielina Diaz.
Dany Sanchez

02-12-2025
Se inician labores de limpieza y trazado para cerca en Alejandro Santamaria y Julio León
Dany Sanchez

03-12-2025
Se instala cerca en predios de Alejandro Santamaria y trazado para siembra de forestales, forrajeras y pasto.
Se inician actividades de limpieza y trazado de cerca, ahoyado para postes en predios Gabrielina Ovalle.
Dany Sanchez

04-12-2025
Se termina cerca en predios de Julio León y se prepara suelo para siembra y trazado
Dany Sanchez

05-12-2025
Se termina la instalación de cerca en predios de Gabrielina Ovalle
Se inicia preparación del suelo y trazado para siembra.
Dany Sanchez

06-12-2025
Se prepara material para siembra, se suspende labores por lluvias en los predios
Dany Sanchez

09-12-2025
Se inician actividades de ahoyado y siembra de especies forestales, forrajeras y pasto en el predio de Alejandro Santamaria
Dany Sanchez

10-12-2025
Se inician actividades de siembra en predio de Julio León, ahoyado, siembra de semilla forrajera y pasto, siembra de Forestales.
Dany Sanchez

11-12-2025
Se terminan actividades de siembra en predio de Alejandro Santamaria.
Dany Sanchez

12-12/25
Se realiza actividades de siembra de especies forrajeros, forestales y frutos en la parcela de Gabrielina Ovalle.
*Dany Sanchez

13-12/2025
Se dio terminación a las actividades de siembra de semilla de pastos, forrajeros y plantulas forestales en el predio de Segundo Julio León.
* Dany Sanchez

15-12-2025
Se realizó visita de la supervisión por parte de la gobernación de Santander. a los predios intervenidos.
Se termina la actividad de siembra de semilla de pastos, forestales y forrajeros, se hace adecuación del lugar para el tanque.
*Dany Sanchez

16-12-2025
continuamos las visitas de la supervisión e intervención a los predios intervenidos se inicia la adecuación del lugar don de se instalarán los sistemas para reservorio de agua en cada predio.
*Dany Sanchez

17-12-2025
se terminaron las visitas de la supervisión e intervención a los predios intervenidos.
se continuo con la adecuación de los sitios donde se instalaran los sistemas para reservorio de agua
*Dany Sanchez

18-12-2025
Se realizaron los tanques de almacenamiento de agua con sus accesorios y llevados a bodega
*Dany Sanchez

19-12-2025
Se Realizo el traslado de los sistemas para reservorio de agua e instalación en los predios de Flor María Mateus y Enrika Ovalle.
*Dany Sanchez

20-12-2025
Se instalaron los sistemas para reservorio de agua en los predios de los beneficiarios Atanel Medina y Alexander Melo
*Dany Sanchez

22-12-2025
se instalaron los Sistemas para reservorio de agua en las parcelas de las Señoras Olga Lucia Diaz y Liliana Melo
*Dany Sanchez

23-12-2025
Se instalo sistema para reservorio de agua en el predio de María Elvira Santamaría

y Janine Dias en la Vereda la Mesta y Olfel Alza
*Dany Sanchez

24-25 de diciembre no se trabajo.
*Dany Sanchez

26-12-2025
Se instalaron los sistemas para reservorio de agua en las parcelas de los beneficiarios Gabrielina Diaz y Jorge Fuentes en la Vereda Casas Blancas
*Dany Sanchez

27-12-2025
Se realizo la instalación de los sistemas para reservorio de agua en las parcelas de Gabrielina Ovalle y Nilson Cruz.
*Dany Sanchez

29-12-2025
Se instalo el sistema para reservorio de agua en los predios de los beneficiarios

Alejandro Santamaría y Julio León en la Vereda Centro.



*Dany Sanchez

30-12-2025

Instalación del sistema para el reservorio de agua en la parcela de Balvina Ordoñez



*Dany Sanchez

31-12-2025

Finalización de actividades de campo.



*Dany Sanchez

UNIÓN TEMPORAL
SISTEMAS SILVOPASTORILES

UNION TEMPORAL SISTEMAS SILVOPASTORILES
PROGRAMA DE TRABAJO DE OBRA

OBJETO CONTRATO	PERIODO	Responsable
IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS PRODUCTIVOS SILVOPASTORILES EN PRADERAS ESTABLECIDAS EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ DEPARTAMENTO DE SANTANDER	DEL 8 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	INGENIERO FORESTAL DANY SANCHEZ
	CRONOGRAMA (SEMANAS)	

N° DE ACTIV	ACTIVIDADES	INDICADOR DE GESTION	TOTAL		Sept 8 a Octubre 7				Octubre 8 a Nov 7				Nov 8 a Diciemb 7				Diciemb 8 a Diciemb 31				INDICADOR	MEDIO DE CONTROL	FRECUENCIA DE REVISION	RECURSOS NECESARIOS	RESPONSABLE
					1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4					
1.1	**Limpieza e instalación del cerramiento perimetral de la unidad productiva**	Unidades de aislamiento istalados	15	Planeado																	Instacion de aislamientosl = (numero de predios con aislmiento) / (Número total de presioas a aislar) *100	Supervision de obra e informe	Mensual	MATERIALES (gudañadora, barra, machete, paladraga, pita, estacas,postes plasticoa, alambre pua, grapas, obreros	PROFESIONAL COORDINADOR
				Ejecutado	0				4 Unidades				11 Unidades												
1.2	**Limpieza, adecuaciónde terreno y establecimiento de pasturas**	Hestareas adeacuadas con el establecimiento de pasturas	30	Planeado																	Hectareas adecuads para sembrar pasto (Hectareas sembradas de pastos)/(Hectareas totales a semrar pasturas)*100	Supervision de obra e informe		MATERIALES (gudañadora, semillas de pasto, estacas, azadón, barra, bulto de abono, machete, hidroretenedor, obreros, baldes, agua	
				Ejecutado	0				0 Ha				24 Ha				6 Ha								
1.3	**Instalaciónde sistemas para el reservorio de agua.**	Unidades de sistemas instalados para el reservorio de agua	15	Planeado																	Instacion de reservorios de agual = (numero de tanques instalados) / (Número total de tanques ainstalar) *100	Supervision de obra e informe		MATERIALES (tanques doble capa de 5.000 litros, accesorios, pegante pvc, cinta teflon, palas, machetes,piizon obreros	
				Ejecutado	0				0				0				15 Unidades								
2.1	**Siembra de árboles forestales y forrajeros.**	Hectareas sembrads con arboles forestales y forrajeros	30	Planeado																	Hectareas sembradas de forestales y forrajeros (Hectareas sembradas)/(Hectareas totales a semrar)*100	Supervision de obra e informe		MATERIALES (gudañadora, semillas de boton de oro y mata raton, plantulas de gayacan, cedro, ebarcoo, estacas, azadón, barra, bulto de abono, machete, hidroretenedor, obreros, baldes, agua	
				Ejecutado									24 ha				6 Ha								

EJECUTADO	
PLANEADO	

UNIÓN TEMPORAL
SISTEMAS SILVOPASTORILES

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

CAS 4.0

NOMBRE DEL PROYECTO:	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS PRODUCTIVOS SILVOPASTORILES EN PRADERAS ESTABLECIDAS EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ DEPARTAMENTO DE SANTANDER
FECHA DE INICIO DE INICIO:	septiembre 8 de 2025
FECHA DE TERMINACION:	DICIEMBRE 31 DEL 2025

N°	META	N° DE ACTIV	ACTIVIDADES	INDICADOR DE GESTION	TOTAL	TIEMPO (Meses)	ESTADO	Sept 8 a Octub 7				Octub 8 a Nov 7				Nov 8 a Diciem 7				Diciem 8 a Diciem 31			
								1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Servicio de restauración de ecosistemas	1.1	Limpieza e instalación del cerramiento perimetral de la unidad productiva	Unidades de aislamiento istalados	15	3,83	Planeado																
							Ejecutado	0				4 Unidades				11 Unidades							
		1.2	Limpieza, adecuacióndel terreno y establecimiento de pasturas	Hestareas adeacuadas con el establecimiento de pasturas	30		Planeado																
							Ejecutado	0				0				24 Ha				6 Ha			
		1.3	Instalaciónde sistemas para el reservorio de agua.	Unidades de sistemas instalados para el reservorio de agua	15		Planeado																
							Ejecutado	0				0				0				15 Unidades			
2	Servicio de establecimiento de especies vegetales	2.1	Siembra de árboles forestales y forrajeros.	Hectareas sembrads con arboles forestales y forrajeros	30		Planeado																
							Ejecutado	0				0				24 Ha				6 Ha			

EJECUTADO	
PLANEADO	

UNIÓN TEMPORAL
SISTEMAS SILVOPASTORILES

CONTRATO DE OBRA No: 01053-2025

IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS PRODUCTIVOS SILVOPASTORILES EN PRADERAS ESTABLECIDAS EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ DEPARTAMENTO DE SANTANDER

					Septiembre 8 al 7 de octubre		octubre 8 al 7 de noviembre		Noviembre 8 al 7 de diciembre		Dicembre 8 al 31	
	ITEM	ACTIVIDAD	PREDIO	PROPIETARIO	HECTAREAS	METROS	HECTAREAS	METROS	HECTAREAS	METROS	HECTAREAS	METROS
1	1,1	Siembra de árboles forestales y forrajeros.	Las Vegas, vereda El Centro, Municipio de la paz-Santander	Flor Maria mateus			2 Ha	20000 m				
2			Predio Tierra de Flores, Vereda El Centro, Municipio de Municipio de la paz-Santander	Emilse Orduña			2 Ha	20000 m				
3			Predio Las Flores, Vereda El Centro, Municipio de Municipio de la paz-Santander	Atanael Medina			2 Ha	20000 m				
4			Predio Vanegas, vereda El Centro, Municipio de la paz-Santander	Alexander Melo					2 Ha	20000 m		
5			Predio La Florida, vereda, La Mata, Municipio de la paz-Santander	Maria Elvira Santamaria Amado/Jaime Diaz			2 Ha	20000 m				
6			Predio La Palestina, vereda, Trochas, Municipio de la paz-Santander	Nilson Cruz Agudelo					2 Ha	20000 m		
7			Predio Buena Vista, vereda La Linterna, Municipio de La Paz-Santander	Liliana Melo Galeano					2 Ha	20000 m		
8			Predio Peña Blanca, vereda La Linterna, Municipio de La Paz-Santander	Olga Lucia Diaz Amado					2 Ha	20000 m		
9			Predio Lote 2, vereda El Centro, Municipio de La Paz-Santander	Balvina Orduña De Pardo					2 Ha	20000 m		
10			Predio La Esperanza, vereda Casa Blancas, Municipio de La Paz-Santander	Gabrielina Diaz Castillo					2 Ha	20000 m		
11			Predio Lote, vereda Casa Blancas, Municipio de La Paz-Santander	Jorge Ugusto Fuentes Barrera					2 Ha	20000 m		
12			Predio La Quinta, vereda Casa Blancas, Municipio de La Paz-Santander	Olfer Alza Camacho					2 Ha	20000 m		
13			Predio Las Acacias, vereda El Centro, Municipio de la paz-Santander	Alejandro Santamaria Ariza							2 Ha	20000 m
			Predio El Porvenir, vereda El Centro, Municipio de la paz-Santander	Segundo Julio Leon Mateus							2 Ha	20000 m
			Predio La Belleza, vereda, Trochas, Municipio de la paz-Santander	Gabrielina Ovalle Velandia							2 Ha	20000 m
	ESTADO DE LA ACTIVIDAD		EN EJECUCIÓN	TOTAL	0	0	8 Ha	80000 m	16 Ha	160000 m	6 Ha	60000 m

MARIA MAGDALENA CADENA ZARATE.
R.L UNIÓN TEMPORAL SISTEMAS SILVOPASTORILES - **NIT: 901.980.916-3**
CONTRATISTA

INFORME DE INTERVENTORÍA No. 04

PERIODO DE REPORTE (8 de diciembre al 31 de diciembre de 2025)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 01019-2025

CONTRATISTA: HERNANDO LEGUIZAMÓN GALINDO
CC. 7.160.961

OBJETO CONTRATO DE INTERVENTORÍA: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA EL PROYECTO: "EJECUCIÓN DEL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS PRODUCTIVOS SILVOPASTORILES EN PRADERAS ESTABLECIDAS EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER.

VALOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS. ($ 54.638.787,72)

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL INTERVENTORÍA: CUATRO MESES (4) MESES, QUINCE (15) DÍAS, sin exceder 31 de diciembre de 2025.

FECHA DE INICIO CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 08/09/2025

FECHA TERMINACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 31/12/2025

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN..... 4

1. OBJETIVOS..... 4

2. RESUMÉN EJECUTIVO..... 5

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO..... 6

4. DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORÍA..... 7

4.1. Localización general el proyecto objeto de interventoría..... 8

5. Actividades ejecutadas en el periodo de reporte por parte del contratista de obra..... 13

8. ACTAS Y DOCUMENTOS..... 37

9. BITACORA DE OBRA..... 37

10. ADMINISTRACIÓN..... 37

11. VISITAS DE SUPERVICIÓN..... 38

12. CONCLUSIONES CONTRATO DE OBRA..... 38

13. OBSERVACIONES..... **¡Error! Marcador no definido.**

14. CONTRATO DE INTERVENTORIA N°. 01019-2025..... 39

14.1. DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA..... 39

14.2. ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORIA..... 40

14.2.1. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS:..... 41

14.2.2. ACTIVIDADES FINANCIERAS:..... 42

14.2.3. ACTIVIDADES DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD:..... 42

14.2.4. CUADRO AVANCE DE INTERVENTORÍA..... 43

15. CUADRO DE CONTROL DE POLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA..... 43

16. RELACION DE PERSONAL Y OTROS RECURSOS DE LA INTERVENTORIA..... 44

16.1. Personal:..... 44

16.2. Otros Recursos:..... 44

17. CONCLUSIONES, OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES..... 45

17.1. CONCLUSIONES..... 45

17.2. OBSERVACIONES..... 45

17.3. RECOMENDACIONES..... 46

18. REGISTRO FOTOGRÁFICO. 46

INTRODUCCIÓN.

El presente informe corresponde al seguimiento técnico, administrativo, jurídico y financiero realizado al proyecto denominado "IMPLEMENTACION DE SISTEMAS PRODUCTIVOS SILVOPASTORILES EN PRADERAS ESTABLECIDAS EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER", localizado en jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS),

Este proyecto surge como respuesta a la necesidad de fortalecer los procesos de manejo sostenible de los recursos naturales renovables y la restauración ecológica en sistemas productivos ganaderos, promoviendo alternativas que integren la conservación ambiental con la productividad. La implementación del sistema silvopastoril busca incrementar la biodiversidad en el agroecosistema, optimizar el uso de los recursos disponibles, mejorar la fertilidad del suelo, brindar bienestar animal y aumentar la productividad de leche y carne, en un marco de sostenibilidad económica, social y ambiental.

La Interventoría Técnica, Administrativa, Jurídica y Financiera realiza el seguimiento permanente a las actividades de ejecución del contrato de obra, garantizando el cumplimiento de los objetivos propuestos. Su labor no se limita únicamente a la verificación de los avances físicos, sino que además contribuye activamente al buen desarrollo del proyecto mediante la formulación de recomendaciones técnicas, observaciones de campo y la unificación de criterios en la aplicación de las especificaciones técnicas relacionadas con el establecimiento e instalación de las especies arbóreas forrajeras y de sombrío que conforman el sistema silvopastoril.

1. OBJETIVOS.

1.1. OBJETIVO GENERAL.

Ejercer la interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental del contrato de obra destinado a la implementación de sistemas silvopastoriles en el municipio de La Paz, Santander, garantizando que las actividades se desarrollen conforme a las especificaciones eficiencia contractuales, técnicas y normativas vigentes, asegurando la calidad, y sostenibilidad ambiental del proyecto, así como la correcta utilización de los recursos públicos asignados.

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

- Realizar el seguimiento técnico y operativo a la ejecución del contrato de obra, verificando la correcta aplicación de los procedimientos establecidos para la preparación del terreno, instalación de sistemas silvopastoriles y manejo de especies forrajeras y arbóreas.

- Supervisar los aspectos administrativos y financieros del contrato, garantizando que la programación, los recursos, los tiempos y los pagos corresponden al avance físico real del proyecto y al cumplimiento de los compromisos contractuales.

- Asegurar el cumplimiento de los lineamientos ambientales y de seguridad industrial, promoviendo prácticas sostenibles que contribuyan a la restauración ecológica, la conservación de la biodiversidad y la eficiencia productiva en las unidades ganaderas beneficiadas.

2. RESUMÉN EJECUTIVO.

Periodo de informe: Cierre contractual

El Contrato de Obra No. 1053-2025, cuyo objeto es la “Implementación de Sistemas Productivos Silvopastoriles en Praderas Establecidas en el Municipio de La Paz, Departamento de Santander”, tuvo como finalidad fortalecer la eficiencia de los sistemas ganaderos mediante un enfoque de sostenibilidad ambiental, promoviendo el mejoramiento productivo y la maximización de los servicios ecosistémicos en el territorio.

La ejecución contractual se desarrolló dentro del período comprendido entre el 8 de septiembre y el 31 de diciembre de 2025 , con una duración total de tres (3) meses y veinticuatro (24) días, culminando satisfactoriamente dentro del plazo inicialmente pactado.

Estado de las Actividades

Conforme a la verificación realizada por la Interventoría Técnica, Administrativa y Financiera, el contrato fue ejecutado en su totalidad, alcanzando el 100% de las actividades previstas , sin que se presenten contratiempos que afectarán el cumplimiento del objeto contractual.

Durante la ejecución se desarrollaron las siguientes actividades:

- Se realizó la limpieza e instalación de quince (15) unidades de cerramiento perimetral , una en cada predio beneficiario, con una longitud aproximada de trescientos cincuenta (350) metros lineales por unidad , conforme a las especificaciones técnicas establecidas.
- Se culminó la actividad de limpieza, adecuación del terreno y establecimiento de pasturas , alcanzando una cobertura total de treinta (30) hectáreas intervenidas , en cumplimiento de las metas contractuales.
- Se finalizó la siembra de especies forestales y forrajeras en una extensión equivalente a treinta (30) hectáreas , fortaleciendo el componente arbóreo y la estructura del sistema silvopastoril.
- Se instalaron quince (15) unidades de reservorio de agua , una por cada parcela beneficiaria, garantizando el abastecimiento hídrico necesario para el adecuado funcionamiento del sistema productivo implementado.

La Interventoría constató en campo que las actividades ejecutadas cumplen con las especificaciones técnicas, los diseños aprobados y los lineamientos ambientales establecidos, certificando el adecuado desarrollo del contrato y su cierre operativo dentro del plazo previsto.

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

Proyecto que se está ejecutando tiene como fin el establecimiento de un sistema silvopastoril con el objetivo de transformar el modelo ganadero tradicional - con base únicamente en pastos y con poca consideración sobre sus efectos ambientales - en una ganadería eficiente en términos de biodiversidad y producción de carne y leche, que genere riqueza y prosperidad para el territorio, conservando los recursos naturales.

Con la reconversión de la actividad de ganadería, se busca encaminar el ejercicio de esta actividad económica a un desarrollo sostenible donde se concientice a cerca de la responsabilidad ambiental que este sector productivo debe tener.

El enfoque en el cual se basa dicha reconversión permitirá mejorar las funciones ecosistémicas y un mejor retorno económico de la actividad ganadera (relacionado con los servicios

ecosistémicos) en el mediano y largo plazo. Dentro de este proceso de reconversión ganadera los sistemas silvopastoriles desempeñan un rol fundamental. Son sistemas de producción ganadera que asocian los pastos con una muy fuerte presencia de árboles y arbustos, que con un adecuado manejo permiten una ganadería altamente eficiente, rentable y que conserva los recursos naturales.

El objetivo del proyecto no es simplemente sembrar unos pocos árboles que le den sombra al ganado; o que les sirvan a las aves para anidar; o que embellezcan el paisaje. Es necesario que la ganadería se desarrolle bajo muchos árboles que con un adecuado manejo permitirán maximizar la producción de servicios ecosistémicos, mejorar las funciones ecosistémicas, árboles, arbustos, pasto y los beneficios de la actividad ganadera. Sumado a esto los sistemas silvopastoriles, estarán acompañados de sistemas de almacenamiento de agua para reducir algunos riesgos asociados al cambio climático.

4. DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORÍA

CONTRATO No.:	01053-2025		
CONTRATISTA:	Unión Temporal Sistemas Silvopastoriles (AIRE 80% – TRANSTECOL S.A.S 10% – C.I.T.I 10%)		
Nit o C.C. No.	901.980.916-3		
OBJETO:	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS PRODUCTIVOS SILVOPASTORILES EN PRADERAS ESTABLECIDAS EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ, SANTANDER		
VALOR INICIAL:	$522.835.089 COP		
VALOR ADICIONAL:			
PLAZO CONTRATO:	CUATRO MESES (4) MESES, QUINCE (15) DÍAS, sin exceder 31 de diciembre de 2025.		
PLAZO ADICIONAL:			
SUPERVISOR:	EDNA ROCIO CASTELLANOS MARTINEZ		
CARGO SUPERVISOR	SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL		
FECHA INICIO DEL CONTRATO:	08/09/2025		
FECHA DE SUSPENSIÓN		**No Aplica**	X
FECHA DE REINICIO		**No Aplica**	X
FECHA DE TERMINACIÓN 1:	31/12/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN 2 (Si aplica)			
VALOR A PAGAR			
ACTA A PAGAR:			

PAGO No: (En Números)	

4.1. Localización general el proyecto objeto de interventoría.



El municipio de La Paz se encuentra ubicado en la provincia de Vélez del departamento de Santander, al norte del país.

Es un municipio enclavado en las montañas de Santander, a 241 km al norte de Bogotá, 237 km al sur occidente de Bucaramanga, la capital del Departamento, 33 km al nor-nororiente de Vélez, la capital de la provincia, a 1934 m s. n. m. y con un clima promedio de 17 °C, cubierto en su mayoría por un verde característico, ricas tierras y agradables paisajes, bañados por quebradas, pequeños cauces, y bordeado por ríos de exuberante belleza como Opón y Suárez.


El proyecto se ejecutará en las veredas: Casas Blancas, Los Medios, Trochas, centro, La Linterna y La Mata.

A continuación, se relacionan los beneficiarios del proyecto y su ubicación

ITEM	BENEFICIARIOS	IDENTIFICACIÓN	MUNICIPIO/VEREDA	N° MATRICULA
1	GABRIELINA DIAZ DE CASTILLO	28475902	CASAS BLANCAS	32461329
2	OLFER ALZA MEDINA	13957167	CASAS BLANCAS	32468301
3	NILSON CRUZ AGUDELO	91017689	TROCHAS	32440002

ITEM	BENEFICIARIOS	IDENTIFICACIÓN	MUNICIPIO/VEREDA	N° MATRICULA
4	FLOR MARIA MATEUS DE ORDUÑA	28476872	CENTRO	32458210
5	BALVINA ORDUÑA DE PARDO	28204287	CENTRO	32482911
6	JORGE AUGUSTO FUENTES BARRERA	5668951	CASAS BLANCAS	32425951
7	MARIA ELVIA SANTAMARIA AMADO	51714440	LA MATA	32425796
	JAIME DIAZ VARGAS	5668450		
8	ALEXANDER MELO OLARTE	13526104	CENTRO	32426401
9	ATANAEL MEDINA ALMANZAR	5568400	CENTRO	32431386
10	OLGA LUCIA DIAZ AMADO	52101952	LA LINTERNA	324682
11	EMILSE ORDUÑA MEDINA	28205008	CENTRO	32455512
12	LILIANA MELO GALEANO	1096619121	LA LINTERNA	3247085
13	GABRIELINA OVALLE VELANDIA	28205455	TROCHAS	32421671
14	SEGUNDO JULIO LEON MATEUS	5667996	CENTRO	32438476
15	ALEJANDRO SANTAMARIA ARIZA	1005206020	CENTRO	

Localización geográfica de los usuarios

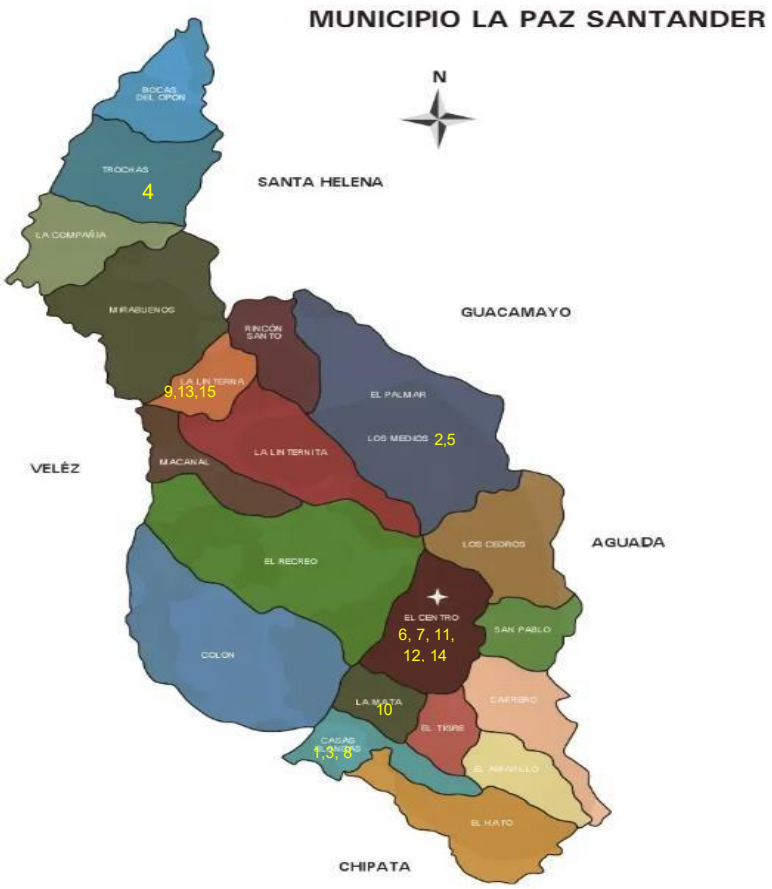

4.2. Presupuesto detallado del contrato de obra

PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS PRODUCTIVOS SILVOPASTORILES EN PRADERAS ESTABLECIDAS EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ DEPARTAMENTO DE SANTANDER.						
Objetivo específico 1. Implementar acciones para la restauración de áreas afectadas por los sistemas agropecuarios tradicionales.						
PRODUCTO	**ITEM**	**ACTIVIDAD**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
1. Servicio de restauración de ecosistemas	1.1	Limpieza e instalación del cerramiento perimetral de la unidad productiva.	UND	15,00	$ 10.753.685,00	$ 161.305.275,00
	1.2	Limpieza, adecuación del terreno y establecimiento de pasturas.	HECTÁREA	30	$ 2.018.149,00	$ 60.544.470,00
	1.3	Instalación de sistemas para el reservorio de agua.	UND	15	$ 4.372.250,00	$ 65.583.750,00
Objetivo específico 2. Realizar la plantación arbórea de especies forestales y forrajeras en predios seleccionados.						
2. Servicio de establecimiento de especies vegetales	2.1	Siembra de árboles forestales y forrajeros.	HECTÁREA	30	$ 3.727.655,00	$ 111.829.650,00
					SUBTOTAL 1: COSTOS DIRECTOS	**$ 399.263.145,00**
					ADMINISTRACIÓN 24,00%	$ 95.823.154,80
					IMPREVISTOS 1,00%	$ 3.992.631,45
					UTILIDAD 5,00%	$ 19.963.157,25
					IVA 19,00%	$ 3.792.999,88
					VALOR TOTAL (COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS)	**$ 522.835.089,00**

4.3. Especificaciones técnicas del contrato de obra.

El proyecto se formula conforme a los lineamientos técnicos establecidos por la Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS

4.4. Garantías constituidas por el contratista de obra

En la siguiente tabla se relacionan las garantías constituidas por UNIÓN TEMPORAL SISTEMAS SILVOPASTORILES, para la ejecución del contrato.

Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO		**Póliza No:** 14-44-101243276	
RIESGO ASEGURADO	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
		DESDE	**HASTA**
Cumplimiento del Contrato.	$ 104.567.017,80	9/08/2025	7/10/2026
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones:	$ 104.567.017,80	9/08/2025	1/10/2029
Calidad del servicio	$ 104.567.018,80	9/08/2025	1/10/2027

Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO		**Póliza No:** 14-40-101075387	
RIESGO ASEGURADO	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
		DESDE	**HASTA**
Predios Laborales, y Operaciones	$ 284.700.000,00	9/08/2025	1/10/2026
Contratistas y subcontratistas	$ 284.700.001,00	9/08/2025	1/10/2026
Vehículos propios y no propios	$ 284.700.002,00	9/08/2025	1/10/2026

4.5. Información general del contratista de obra.

Dirección oficina:	Calle 44 No 28C-68 Barrio Palmira.
Representante Legal:	MAGDALENA CADENA ZARATE.
Municipio:	Barrancabermeja, Santander.
Página web - Correo electrónico:	asociacioninaire@gmail.com
Teléfonos:	Celular: 3115376740

4.6. Equipo técnico y profesional empleado por el contratista de obra.

NOMBRE:	PROFESION:	CARGO:
CESAR AUGUSTO CANO SAAVEDDRA - CC. 14.232.910, Florencia.	INGENIERO FORESTAL con MATRICULA PROFESIONAL TP (00000-09013 DE 24/10/1986)	DIRECTOR DE PROYECTO/OBRA
DANY ALEXANDER SANCHEZ CAMACHO - CC. 1.096.951.656, Molagavita	INGENIERO AMBIENTAL MATRICULA PROFESIONAL 151021-0592020 STD desde el 25 de octubre de 2021.	COORDINADOR DE ENTREGAS
JONATHAN ALBERTO PESCA DIAZ) - CC. 91356179 Bucaramanga.	PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, Resolución No 29558 del 26 de diciembre de 2022	PROFESIONAL EN SALUD Y SEGURIDAD ENEL TRABAJO
ANGIE GEORGINA PEREIRA ORTEGA, CC 11.096.234.052, Barrancabermeja	INGENIERA INDUSTRIAL, 151239-0537222 STD desde el 2 de octubre de 2020.	ADMINISTRADORA

4.7. Cronograma de trabajo contrato de obra.

IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS PRODUCTIVOS SILVOPASTORILES EN PRADERAS ESTABLECIDAS EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ DEPARTAMENTO DE SANTANDER.			CRONOGRAMA																												
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO			Cantidad	Unidad	VALOR		Septiembre					Octubre					Noviembre					Diciembre									
			Ha	Und	Unitario	Total	S1	S2	S3	S4	S4	S1	S2	S3	S4	S5	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S5		
Proceso Administrativo y etapa de contratacion																															
Objetivo específico 1. Implementar acciones para la restauración de áreas afectadas por los sistemas agropecuarios tradicionales.																															
1. Servicio de restauración de ecosistemas	1.1	Limpieza e instalación del cerramiento perimetral de la unidad productiva	15	Unidad	$ 10.754.679	$ 161.320.185																									
	1.2	Limpieza, adecuacióndel terreno y establecimiento de pasturas	30	Ha	$ 2.018.167	$ 60.545.010																									
	1.3	Instalacióndе sistemas para el reservorio de agua.	15	Unidades	$ 4.372.252	$ 65.583.780																									
Objetivo específico 2. Realizar la plantación arbórea de especies forestales y forrajeras en predios seleccionados.																															
2. Servicio de establecimiento de especies vegetales	2.1	Siembra de árboles forestales y forrajeros.	30	Ha	$ 3.727.724	$ 111.831.720																									
Cierre y Liquidacion																															
SUBTOTAL 1: COSTOS DIRECTOS						$ 399.280.695																									
ADMINISTRACIÓN					24,00%	$ 95.827.367																									
IMPREVISTOS					1,00%	$ 3.992.807																									
UTILIDAD					5,00%	$ 19.964.035																									
IVA					19,00%	$ 3.793.167																									
VALOR TOTAL DEL PROYECTO						$ 522.858.070																									

5. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO DE REPORTE POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA.

El desarrollo del CONTRATO, se inició mediante acta suscrita por los intervinientes el día ocho (08) de septiembre de 2025, con la firma de las partes intervinientes en la misma, por tanto la UNION TEMPORAL SISTEMAS PASTORILES, su condición de Contratista de obra, ha dado inicio a las actividades previas en aras del cumplimiento a las especificaciones técnicas, alcance financiero y desarrollo administrativo del mismo con base en las condiciones contempladas en los estudios previos y pliegos de condiciones definitivos que sirvieron de fundamento jurídico al proceso de contratación pública que originó el contrato.

5.1. Descripción de actividades de obra.

5.1.1. Limpieza e instalación del cerramiento perimetral de la unidad productiva.

Se realizó despeje manual de arbustos, pastos y otros y la limpieza de residuos sólidos. Se trazó líneas rectas para optimizar el espacio y buscar la uniformidad.

Se instalo el aislamiento con postes de madera plástica y alambre de púas, en cada uno de los surcos de árboles formando callejuelas de tal manera que diera protección a las especies vegetales plantadas. La unidad productiva corresponde a dos (2) hectáreas, está diseñada para 350 metros lineales de aislamiento, correspondiente a 119 postes en madera plástica con una longitud igual o superior a 2,1 metros y un ancho mínimo de 0,08 metros. para cerca, distribuidos cada 2,94 metros y 10 (diez) pie de amigos en concreto distribuidos dependiendo de la topografía y las condiciones del terreno, con 3 líneas de alambre de púas calibre 12,5”. Los postes fueron enterrados a una profundidad de 50 cm, con una distancia entre postes de 2,94 metros. La cerca se instaló con tres (3) líneas de alambre de púas calibre 12,5”, con distancias entre 0,3 metros y/o 0,4 metros entre sí.

Relación de los 15 beneficiarios con establecimiento de aislamiento

UNIÓN TEMPORAL
SISTEMAS SILVOPASTORILES

CONTRATO DE OBRA No: 01053-2025

IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS PRODUCTIVOS SILVOPASTORILES EN PRADERAS ESTABLECIDAS EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ DEPARTAMENTO DE SANTANDER

ITEM	ACTIVIDAD	PREDIO	PROPIETARIO	METROS	KILOMETROS
1.1	Limpieza e instalación del cerramiento perimetral de la unidad productiva	Las Vegas, vereda El Centro, Municipio de la paz-Santander	Flor Maria mateus	350,00 m	0,35 km
		Predio Tierra de Flores, Vereda El Centro, Municipio de Municipio de la paz-Santander	Emilse Orduña	350,00 m	0,35 km
		Predio Las Flores, Vereda El Centro, Municipio de Municipio de la paz-Santander	Atanael Medina	350,00 m	0,35 km
		Predio Vanegas, vereda El Centro, Municipio de la paz-Santander	Alexander Melo	350,00 m	0,35 km
		Predio La Florida, vereda, La Mata, Municipio de la paz-Santander	Maria Elvira Santamaria Amado/Jaime Diaz	350,00 m	0,35 km
		Predio La Palestina, vereda, Trochas, Municipio de la paz-Santander	Nilson Cruz Agudelo	350,00 m	0,35 km
		Predio Buena Vista, vereda La Linterna, Municipio de La Paz-Santander	Liliana Melo Galeano	350,00 m	0,35 km
		Predio Peña Blanca, vereda La Linterna, Municipio de La Paz-Santander	Olga Lucia Diaz Amado	350,00 m	0,35 km
		Predio Lote 2, vereda El Centro, Municipio de La Paz-Santander	Belvina Orduña De Pardo	350,00 m	0,35 km
		Predio La Esperanza, vereda Casa Blancas, Municipio de La Paz-Santander	Gabrielina Diaz de Castillo	350,00 m	0,35 km
		Predio Lote, vereda Casa Blancas, Municipio de La Paz-Santander	Jorge Ugusto Fuentes Barrera	350,00 m	0,35 km
		Predio La Quinta, vereda Casa Blancas, Municipio de La Paz-Santander	Olfer Alza Camacho	350,00 m	0,35 km
		Predio Las Acacias, vereda El Centro, Municipio de la paz-Santander	Alejandro Santamaria Ariza	350,00 m	0,35 km
		Predio El Porvenir, vereda El Centro, Municipio de la paz-Santander	Segundo Julio Leon Mateus	350,00 m	0,35 km
		Predio La Belleza, vereda, Trochas, Municipio de la paz-Santander	Gabrielina Ovalle Velandia	350,00 m	0,35 km
ESTADO DE LA ACTIVIDAD		EN EJECUCIÓN	TOTAL	4550,00 m	4,55 km

Página 1

5.1.2. 5.1.2.Limpieza, adecuación del terreno y establecimiento de pasturas.

Se realizó rocería mecánica para retirar arbustos, pastos y otros y se realizó la limpieza manual de residuos sólidos en predios intervenidos sumando las 30 hectáreas sembradas contractuales.

Las actividades previas para el establecimiento de las pasturas fueron: se crearon surcos en las praderas a intervenir para des compactar el suelo, restituyendo la circulación de aire y agua, para favorecer el flujo de nutrientes y el desarrollo radicular de los materiales forrajeros existentes en la pradera.

El establecimiento de pasto se realizó siguiendo las indicaciones de las especificaciones técnicas del contrato:

Fertilización: se incorporó al suelo fertilizante para praderas con el fin de mejorar las condiciones físicas, químicas y biológicas preexistentes en los suelos intervenidos, aplicando 100 kg por hectárea con el método al voleo.

Siembra de praderas: se realizó el establecimiento de la pastura tipo Brachiarias (Brachiaria Decumbens); la siembra se realizó al voleo, contemplando el establecimiento estimado de 4 kg por hectárea, o la siembra de material vegetativo de sitios cercanos.

Relación de los 15 beneficiarios con siembra de pastos sumando 30 hectáreas sembradas

UNIÓN TEMPORAL SISTEMAS SILVOPASTORILES	CONTRATO DE OBRA No: 01053-2025											
	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS PRODUCTIVOS SILVOPASTORILES EN PRADERAS ESTABLECIDAS EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ DEPARTAMENTO DE SANTANDER											
				Septiembre 8 al 7 de octubre		octubre 8 al 7 de noviembre		Noviembre 8 al 7 de diciembre		Diciembre 8 al 31	
ITEM	ACTIVIDAD	PREDIO	PROPIETARIO	HECTAREAS	METROS	HECTAREAS	METROS	HECTAREAS	METROS	HECTAREAS	METROS
1,1	Limpieza, adecuacióndel terreno y establecimiento de pasturas	Las Vegas, vereda El Centro, Municipio de la paz-Santander	Flor Maria mateus			2 Ha	20000 m				
		Predio Tierra de Flores, Vereda El Centro, Municipio de Municipio de la paz-Santander	Emilse Orduña			2 Ha	20000 m				
		Predio Las Flores, Vereda El Centro, Municipio de Municipio de la paz-Santander	Atanael Medina			2 Ha	20000 m				
		Predio Vanegas, vereda El Centro, Municipio de la paz-Santander	Alexander Melo					2 Ha	20000 m		
		Predio La Florida, vereda, La Mata, Municipio de la paz-Santander	Maria Elvira Santamaria Amado/Jaime Diaz			2 Ha	20000 m				
		Predio La Palestina, vereda, Trochas, Municipio de la paz-Santander	Nilson Cruz Agudelo					2 Ha	20000 m		
		Predio Buena Vista, vereda La Linterna, Municipio de La Paz-Santander	Liliana Melo Galeano					2 Ha	20000 m		
		Predio Peña Blanca, vereda La Linterna, Municipio de La Paz-Santander	Olga Lucia Diaz Amado					2 Ha	20000 m		
		Predio Lote 2, vereda El Centro, Municipio de La Paz-Santander	Balvina Orduña De Pardo					2 Ha	20000 m		
		Predio La Esperanza, vereda Casa Blancas, Municipio de La Paz-Santander	Gabrielina Diaz Castillo					2 Ha	20000 m		
		Predio Lote, vereda Casa Blancas, Municipio de La Paz-Santander	Jorge Ugusto Fuentes Barrera					2 Ha	20000 m		
		Predio La Quinta, vereda Casa Blancas, Municipio de La Paz-Santander	Olfer Alza Camacho					2 Ha	20000 m		
		Predio Las Acacias, vereda El Centro, Municipio de la paz-Santander	Alejandro Santamaria Ariza							2 Ha	20000 m
		Predio El Porvenir, vereda El Centro, Municipio de la paz-Santander	Segundo Julio Leon Mateus							2 Ha	20000 m
		Predio La Belleza, vereda, Trochas, Municipio de la paz-Santander	Gabrielina Ovalle Velandia							2 Ha	20000 m
	ESTADO DE LA ACTIVIDAD	EN EJECUCIÓN	TOTAL	0	0	8 Ha	80000 m	16 Ha	160000 m	6 Ha	60000 m

5.1.3. Instalación de sistemas para el reservorio de agua.

Con el fin de aportar a la mitigación de los riesgos asociados al cambio climático, se instalaron 15 unidades y puesta en funcionamiento de los sistemas para el reservorio de agua

Cada unidad productiva (comprendida por 2 hectáreas) tiene un sistema para el reservorio de agua, con las siguientes características:

a) Capacidad volumétrica: 5.000 litros de agua.
b) Capacidad de carga: 5.000 Kg.
c) Material del tanque: Polietileno bicapa.
d) Material de recubrimiento: Sin recubrimiento; debe contar con protección UV y resistente a la intemperie.
e) Cubierta (tapa): en polietileno con aletas que permiten que la tapa permanezca fija.
f) Accesorios de salida: Juego de conexiones, adaptador macho en PVC de 1” Ø, con empaque de caucho de 1" Ø por fuera y tuerca de 1" Ø por dentro (SALIDA).
g) Accesorios adicionales: Salida en tubo de PVC para agua potable de 1” Ø por 1 metros de largo, llave de registro lisa en PVC de 1” Ø, todo debidamente soldado.
h) Manguera para riego de 1” Ø, instalada con abrazadera de seguridad en acero inoxidable.

Se realizaron actividades de adecuación o replanteo del terreno en el sitio seleccionado para la instalación del tanque. La instalación de los accesorios se hizo conforme a las especificaciones técnicas del productor.

Relación de los 15 beneficiarios con la instalación de los 15 sistemas de reservorio de agua

UNIÓN TEMPORAL SISTEMAS SILVOPASTORILES	CONTRATO DE OBRA No: 01053-2025						
	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS PRODUCTIVOS SILVOPASTORILES EN PRADERAS ESTABLECIDAS EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ DEPARTAMENTO DE SANTANDER						
				Septiembre 8 al 7 de octubre	octubre 8 al 7 de noviembre	Noviembre 8 al 7 de diciembre	Dicembre 8 al 31
ITEM	ACTIVIDAD	PREDIO	PROPIETARIO	UNIDADES	UNIDADES	UNIDADES	UNIDADES
		Las Vegas, vereda El Centro, Municipio de la paz-Santander	Flor Maria mateus				1 Und
		Predio Tierra de Flores, Vereda El Centro, Municipio de Municipio de la paz-Santander	Emilse Orduña				1 Und
		Predio Las Flores, Vereda El Centro, Municipio de Municipio de la paz-Santander	Atanael Medina				1 Und

		Predio Vanegas, vereda El Centro, Municipio de la paz-Santander	Alexander Melo				1 Und
		Predio La Florida, vereda, La Mata, Municipio de la paz-Santander	Maria Elvira Santamaria Amado/Jaime Diaz				1 Und
		Predio La Palestina, vereda, Trochas, Municipio de la paz-Santander	Nilson Cruz Agudelo				1 Und
		Predio Buena Vista, vereda La Linterna, Municipio de La Paz-Santander	Liliana Melo Galeano				1 Und
	Instalaciónde sistemas para el reservorio de agua.	Predio Peña Blanca, vereda La Linterna, Municipio de La Paz-Santander	Olga Lucia Diaz Amado				1 Und
		Predio Lote 2, vereda El Centro, Municipio de La Paz-Santander	Balvina Orduña De Pardo				1 Und
		Predio La Esperanza, vereda Casa Blancas, Municipio de La Paz-Santander	Gabrielina Diaz Castillo				1 Und
1,1		Predio Lote, vereda Casa Blancas, Municipio de La Paz-Santander	Jorge Ugusto Fuentes Barrera				1 Und
		Predio La Quinta, vereda Casa Blancas, Municipio de La Paz-Santander	Olfer Alza Camacho				1 Und
		Predio Las Acacias, vereda El Centro, Municipio de la paz-Santander	Alejandro Santamaria Ariza				1 Und
		Predio El Porvenir, vereda El Centro, Municipio de la paz-Santander	Segundo Julio Leon Mateus				1 Und
		Predio La Belleza, vereda, Trochas, Municipio de la paz-Santander	Gabrielina Ovalle Velandia				1 Und
	ESTADO DE LA ACTIVIDAD	**EN EJECUCIÓN**	**TOTAL**	**0 Unidades**	**0 Unidades**	**0 Unidades**	**15 Unidades**

5.1.4. Siembra de árboles forestales y forrajeros..

Se demarcó un trazado (surcos) antes de iniciar la actividad de limpieza las unidades productivas seleccionadas (comprendida por 2 hectáreas)

Siembra de árboles forestales

La limpieza a las áreas a intervenir, se realizaron inicialmente con rocería mecánica para retirar los pastos y otros arbustos y posteriormente se ejecutó la limpieza manual para retiro de residuos sólidos. Se plantaron 32 individuos de especies forestales entre Abarco (Cariniana pyriformis) y Guayacán amarillo (Tabebuia chrysantha), Se sembraron 510 árboles de especies forrajeras entre Matarratón (Gliricidia sepium) y Botón de oro (Tithonia diversifolia) los cuales fueron reproducidas a partir de semillas certificadas, con previo trazado en cada uno de los 15 predios intervenidos.

Los árboles de especies forestales maderables se distribuyeron en el área aislada. En total se plantarán 542 árboles por hectárea (32 forestales y 510 forrajeros por Ha), para un total de 1084 árboles por unidad productiva para las 2 hectáreas en cada predio. Para la siembra de los árboles de especies forestales, se realizó el ahoyado de forma manual. Una vez hecho los surcos ahoyados, se distribuyeron en cada hoyo las plantas de las especies definidas, retirando la bolsa y colocando la parte radicular de la planta dentro del sustrato apisonándolo para garantizar un buen anclaje; la

siembra se realizó aprovechando el segundo periodo del año de lluvias para garantizar su regado. En el sembrado de los árboles de especies forestales se adicionaron 10 g de hidroretenedor, para mejorar la capacidad de absorción y retención de agua y nutrientes en el suelo. Se realizó la fertilización de las plántulas, con la aplicación en cada hoyo de 1 Kg de abono orgánico y 0,1 Kg de cal agrícola por árbol. Se humedeció el pan de tierra y se compactó antes de retirar la bolsa, evitando el desmoronamiento del sustrato. El retiro de la bolsa plástica se realizó haciendo dos cortes longitudinales a la misma.

Siembra de material vegetal de especies forrajeras

Para la siembra de los árboles de especies forrajeras, se realizó el ahoyado de forma manual, se distribuyó en cada hoyo las semillas de las especies definidas en la cantidad definida y en de acuerdo a las especificaciones de distancias sugeridas en el diseño. La siembra se realizó durante la segunda temporada de lluvias del año para asegurar su riego natural.

Las semillas de especies forrajeras se plantaron en tres bolillos, entre 2 y 3 metros de separación dependiendo de las condiciones topográficas, Para el sembrado de los árboles de especies forrajeras se adicionaron 10 g de hidroretenedor, para mejorar la capacidad de absorción y retención de agua y nutrientes en el suelo. También se aplicó fertilizante de las semillas, aplicando en cada hoyo 0,48 kg de abono orgánico.

Todos los residuos sólidos como bolsas plásticas, guacales, estopas, costales y demás residuos fueron retirados el área de trabajo.

Relación de los 15 beneficiarios con forestales y forrajeros, sumando 30 hectáreas sembradas

UNIÓN TEMPORAL SISTEMAS SILVOPASTORILES	CONTRATO DE OBRA No: 01053-2025											
	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS PRODUCTIVOS SILVOPASTORILES EN PRADERAS ESTABLECIDAS EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ DEPARTAMENTO DE SANTANDER											
				Septiembre 8 al 7 de octubre		octubre 8 al 7 de noviembre		Noviembre 8 al 7 de diciembre		Dicembre 8 al 31	
ITEM	ACTIVIDAD	PREDIO	PROPIETARIO	HECTAREAS	METROS	HECTAREAS	METROS	HECTAREAS	METROS	HECTAREAS	METROS
		Las Vegas, vereda El Centro, Municipio de la paz-Santander	Flor María mateus			2 Ha	20000 m				
		Predio Tierra de Flores, Vereda El Centro, Municipio de Municipio de la paz-Santander	Emilse Orduña			2 Ha	20000 m				
		Predio Las Flores, Vereda El Centro, Municipio de Municipio de la paz-Santander	Atanael Medina			2 Ha	20000 m				

		Predio Vanegas, vereda El Centro, Municipio de la paz-Santander	Alexander Melo					2 Ha	20000 m		
		Predio La Florida, vereda, La Mata, Municipio de la paz-Santander	Maria Elvira Santamaria Amado/Jaime Diaz			2 Ha	20000 m				
		Predio La Palestina, vereda, Trochas, Municipio de la paz-Santander	Nilson Cruz Agudelo					2 Ha	20000 m		
		Predio Buena Vista, vereda La Linterna, Municipio de La Paz-Santander	Liliana Melo Galeano					2 Ha	20000 m		
	Siembra de árboles forestales y forrajeros.	Predio Peña Blanca, vereda La Linterna, Municipio de La Paz-Santander	Olga Lucia Diaz Amado					2 Ha	20000 m		
		Predio Lote 2, vereda El Centro, Municipio de La Paz-Santander	Balvina Orduña De Pardo					2 Ha	20000 m		
		Predio La Esperanza, vereda Casa Blancas, Municipio de La Paz-Santander	Gabrielina Diaz Castillo					2 Ha	20000 m		
1,1		Predio Lote, vereda Casa Blancas, Municipio de La Paz-Santander	Jorge Ugusto Fuentes Barrera					2 Ha	20000 m		
		Predio La Quinta, vereda Casa Blancas, Municipio de La Paz-Santander	Olfer Alza Camacho					2 Ha	20000 m		
		Predio Las Acacias, vereda El Centro, Municipio de la paz-Santander	Alejandro Santamaria Ariza							2 Ha	20000 m
		Predio El Porvenir, vereda El Centro, Municipio de la paz-Santander	Segundo Julio Leon Mateus							2 Ha	20000 m
		Predio La Belleza, vereda, Trochas, Municipio de la paz-Santander	Gabrielina Ovalle Velandia							2 Ha	20000 m
	ESTADO DE LA ACTIVIDAD	EN EJECUCION	TOTAL	0	0	8 Ha	80000 m	16 Ha	160000 m	6 Ha	60000 m

5.1.5. Recurso empleado en el contrato de obra.

Para las actividades realizadas se cuenta con el equipo mínimo quienes han realizado las visitas a campo, se ha gestionado y comprado material vegetal, insumos para el cercado, insecticida, semillas de pasto, arboles guayacán, se ha alquilado transporte vehicular y mular.

6. FICHAS DE PREDIOS INTERVENIDOS.


Beneficiario: Emilse Orduña	Vereda: el Centro -La Paz.





Actividad	Insumos	Unidad	Cantidad	Avance de obra
Limpieza e instalación del cerramiento perimetral de la unidad productiva.	Postes plásticos	Und	119	100%
	Postes de concreto	Und	10	
	Rollos de alambre calibre12,5	Rollo	3	
	Cajas de grapas por Kg	Caja	3	
Limpieza, adecuación del terreno y establecimiento de pasturas.	Semilla por Kg de pasto brachiaria decumbens	Kilo	8	100%
Instalación de sistemas para el reservorio de agua.	Tanque plástico bicapa por 5000 L	Und	1	100%
	Accesorios para tanque (válvulas, mangueras, tubería, abrazaderas, soldadura…)	Global	1	
Siembra de árboles forestales y forrajeros.	Plántulas forestales Guayacán, cedro y abarco	Und	64	100%
	Semillas de plántulas de especies forrajeras priorizadas (Matarratón - Botón de Oro) por Kg	Kilo	0,2	
	Abono orgánico por bulto de 50 Kg	Bulto	12	
	Hidroretenedor	Kilogramo	1,2	

Beneficiario: Flor María Mateus	Vereda: el Centro -La Paz.

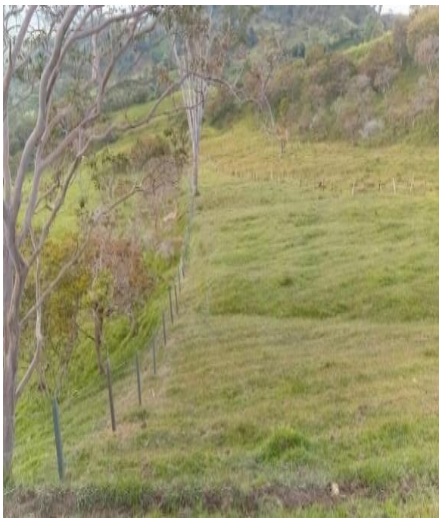Actividad	Insumos	Unidad	Cantidad	Avance de obra
Limpieza e instalación del cerramiento perimetral de la unidad productiva.	Postes plásticos	Und	119	100%
	Postes de concreto	Und	10	
	Rollos de alambre calibre12,5	Rollo	3	
	Cajas de grapas por Kg	Caja	3	
Limpieza, adecuación del terreno y establecimiento de pasturas.	Semilla por Kg de pasto brachiaria decumbens	Kilo	8	100%
Instalación de sistemas para el reservorio de agua.	Tanque plástico bicapa por 5000 L	Und	1	100%
	Accesorios para tanque (válvulas, mangueras, tubería, abrazaderas, soldadura…)	Global	1	
Siembra de árboles forestales y forrajeros.	Plántulas forestales Guayacán, cedro y abarco	Und	64	100%
	Semillas de plántulas de especies forrajeras priorizadas (Matarratón - Botón de Oro) por Kg	Kilo	0,2	
	Abono orgánico por bulto de 50 Kg	Bulto	12	
	Hidroretenedor	Kilogramo	1,2	

Beneficiario: Atanael Medina		Vereda: el Centro -La Paz.		
				
Actividad	Insumos	Unidad	Cantidad	Avance de obra
Limpieza e instalación del cerramiento perimetral de la unidad productiva.	Postes plásticos	Und	119	100%
	Postes de concreto	Und	10	
	Rollos de alambre calibre12,5	Rollo	3	
	Cajas de grapas por Kg	Caja	3	
Limpieza, adecuación del terreno y establecimiento de pasturas.	Semilla por Kg de pasto brachiaria decumbens	Kilo	8	100%
Instalación de sistemas para el reservorio de agua.	Tanque plástico bicapa por 5000 L	Und	1	100%
	Accesorios para tanque (válvulas, mangueras, tubería, abrazaderas, soldadura…)	Global	1	
Siembra de árboles forestales y forrajeros.	Plántulas forestales Guayacán, cedro y abarco	Und	64	100%
	Semillas de plántulas de especies forrajeras priorizadas (Matarratón - Botón de Oro) por Kg	Kilo	0,2	
	Abono orgánico por bulto de 50 Kg	Bulto	12	
	Hidroretenedor	Kilogramo	1,2	

Beneficiario: María Elvia Santamaria		Vereda: -vereda La Mata-La Paz..		
				
Actividad	Insumos	Unidad	Cantidad	Avance de obra
Limpieza e instalación del cerramiento perimetral de la unidad productiva.	Postes plásticos	Und	119	100%
	Postes de concreto	Und	10	
	Rollos de alambre calibre12,5	Rollo	3	
	Cajas de grapas por Kg	Caja	3	
Limpieza, adecuación del terreno y establecimiento de pasturas.	Semilla por Kg de pasto brachiaria decumbens	Kilo	8	100%
Instalación de sistemas para el reservorio de agua.	Tanque plástico bicapa por 5000 L	Und	1	100%
	Accesorios para tanque (válvulas, mangueras, tubería, abrazaderas, soldadura…)	Global	1	
Siembra de árboles forestales y forrajeros.	Plántulas forestales Guayacán, cedro y abarco	Und	64	100%
	Semillas de plántulas de especies forrajeras priorizadas (Matarratón - Botón de Oro) por Kg	Kilo	0,2	
	Abono orgánico por bulto de 50 Kg	Bulto	12	
	Hidroretenedor	Kilogramo	1,2	

Beneficiario: Nilson Cruz		Vereda: Trochas-La Paz		
				
Actividad	Insumos	Unidad	Cantidad	Avance de obra
Limpieza e instalación del cerramiento perimetral de la unidad productiva.	Postes plásticos	Und	119	100%
	Postes de concreto	Und	10	
	Rollos de alambre calibre12,5	Rollo	3	
	Cajas de grapas por Kg	Caja	3	
Limpieza, adecuación del terreno y establecimiento de pasturas.	Semilla por Kg de pasto brachiaria decumbens	Kilo	8	100%
Instalación de sistemas para el reservorio de agua.	Tanque plástico bicapa por 5000 L	Und	1	100%
	Accesorios para tanque (válvulas, mangueras, tubería, abrazaderas, soldadura…)	Global	1	
Siembra de árboles forestales y forrajeros.	Plántulas forestales Guayacán, cedro y abarco	Und	64	100%
	Semillas de plántulas de especies forrajeras priorizadas (Matarratón - Botón de Oro) por Kg	Kilo	0,2	
	Abono orgánico por bulto de 50 Kg	Bulto	12	
	Hidroretenedor	Kilogramo	1,2	

<table>
<tr><td colspan="3">Beneficiario: Alexander Melo</td><td colspan="3">Vereda: El Centro-La Paz.</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>Actividad</td><td>Insumos</td><td>Unidad</td><td>Cantidad</td><td colspan="2">Avance de obra</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Limpieza e instalación del cerramiento perimetral de la unidad productiva.</td><td>Postes plásticos</td><td>Und</td><td>119</td><td colspan="2" rowspan="4">100%</td></tr>
<tr><td>Postes de concreto</td><td>Und</td><td>10</td></tr>
<tr><td>Rollos de alambre calibre12,5</td><td>Rollo</td><td>3</td></tr>
<tr><td>Cajas de grapas por Kg</td><td>Caja</td><td>3</td></tr>
<tr><td>Limpieza, adecuación del terreno y establecimiento de pasturas.</td><td>Semilla por Kg de pasto brachiaria decumbens</td><td>Kilo</td><td>8</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Instalación de sistemas para el reservorio de agua.</td><td>Tanque plástico bicapa por 5000 L</td><td>Und</td><td>1</td><td colspan="2" rowspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>Accesorios para tanque (válvulas, mangueras, tubería, abrazaderas, soldadura…)</td><td>Global</td><td>1</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Siembra de árboles forestales y forrajeros.</td><td>Plántulas forestales Guayacán, cedro y abarco</td><td>Und</td><td>64</td><td colspan="2" rowspan="4">100%</td></tr>
<tr><td>Semillas de plántulas de especies forrajeras priorizadas (Matarratón - Botón de Oro) por Kg</td><td>Kilo</td><td>0,2</td></tr>
<tr><td>Abono orgánico por bulto de 50 Kg</td><td>Bulto</td><td>12</td></tr>
<tr><td>Hidroretenedor</td><td>Kilogramo</td><td>1,2</td></tr>
</table>

Beneficiario: Olga Lucia Amado		Vereda: La Linterna-La Paz.		
				
Actividad	Insumos	Unidad	Cantidad	Avance de obra
Limpieza e instalación del cerramiento perimetral de la unidad productiva.	Postes plásticos	Und	119	100%
	Postes de concreto	Und	10	
	Rollos de alambre calibre12,5	Rollo	3	
	Cajas de grapas por Kg	Caja	3	
Limpieza, adecuación del terreno y establecimiento de pasturas.	Semilla por Kg de pasto brachiaria decumbens	Kilo	8	100%
Instalación de sistemas para el reservorio de agua.	Tanque plástico bicapa por 5000 L	Und	1	100%
	Accesorios para tanque (válvulas, mangueras, tubería, abrazaderas, soldadura…)	Global	1	
Siembra de árboles forestales y forrajeros.	Plántulas forestales Guayacán, cedro y abarco	Und	64	100%
	Semillas de plántulas de especies forrajeras priorizadas (Matarratón - Botón de Oro) por Kg	Kilo	0,2	
	Abono orgánico por bulto de 50 Kg	Bulto	12	
	Hidroretenedor	Kilogramo	1,2	

<table>
<tr><td colspan="3">Beneficiario: Liliana Melo</td><td colspan="3">Vereda: La Linterna-La Paz.</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>Actividad</td><td>Insumos</td><td>Unidad</td><td>Cantidad</td><td colspan="2">Avance de obra</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Limpieza e instalación del cerramiento perimetral de la unidad productiva.</td><td>Postes plásticos</td><td>Und</td><td>119</td><td colspan="2" rowspan="4">100%</td></tr>
<tr><td>Postes de concreto</td><td>Und</td><td>10</td></tr>
<tr><td>Rollos de alambre calibre12,5</td><td>Rollo</td><td>3</td></tr>
<tr><td>Cajas de grapas por Kg</td><td>Caja</td><td>3</td></tr>
<tr><td>Limpieza, adecuación del terreno y establecimiento de pasturas.</td><td>Semilla por Kg de pasto brachiaria decumbens</td><td>Kilo</td><td>8</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Instalación de sistemas para el reservorio de agua.</td><td>Tanque plástico bicapa por 5000 L</td><td>Und</td><td>1</td><td colspan="2" rowspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>Accesorios para tanque (válvulas, mangueras, tubería, abrazaderas, soldadura…)</td><td>Global</td><td>1</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Siembra de árboles forestales y forrajeros.</td><td>Plántulas forestales Guayacán, cedro y abarco</td><td>Und</td><td>64</td><td colspan="2" rowspan="4">100%</td></tr>
<tr><td>Semillas de plántulas de especies forrajeras priorizadas (Matarratón - Botón de Oro) por Kg</td><td>Kilo</td><td>0,2</td></tr>
<tr><td>Abono orgánico por bulto de 50 Kg</td><td>Bulto</td><td>12</td></tr>
<tr><td>Hidroretenedor</td><td>Kilogramo</td><td>1,2</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="3">Beneficiario: Balvina orduña</td><td colspan="3">Vereda: El Centro-La Paz.</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>Actividad</td><td>Insumos</td><td>Unidad</td><td>Cantidad</td><td colspan="2">Avance de obra</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Limpieza e instalación del cerramiento perimetral de la unidad productiva.</td><td>Postes plásticos</td><td>Und</td><td>119</td><td colspan="2" rowspan="4">100%</td></tr>
<tr><td>Postes de concreto</td><td>Und</td><td>10</td></tr>
<tr><td>Rollos de alambre calibre12,5</td><td>Rollo</td><td>3</td></tr>
<tr><td>Cajas de grapas por Kg</td><td>Caja</td><td>3</td></tr>
<tr><td>Limpieza, adecuación del terreno y establecimiento de pasturas.</td><td>Semilla por Kg de pasto brachiaria decumbens</td><td>Kilo</td><td>8</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Instalación de sistemas para el reservorio de agua.</td><td>Tanque plástico bicapa por 5000 L</td><td>Und</td><td>1</td><td colspan="2" rowspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>Accesorios para tanque (válvulas, mangueras, tubería, abrazaderas, soldadura…)</td><td>Global</td><td>1</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Siembra de árboles forestales y forrajeros.</td><td>Plántulas forestales Guayacán, cedro y abarco</td><td>Und</td><td>64</td><td colspan="2" rowspan="4">100%</td></tr>
<tr><td>Semillas de plántulas de especies forrajeras priorizadas (Matarratón - Botón de Oro) por Kg</td><td>Kilo</td><td>0,2</td></tr>
<tr><td>Abono orgánico por bulto de 50 Kg</td><td>Bulto</td><td>12</td></tr>
<tr><td>Hidroretenedor</td><td>Kilogramo</td><td>1,2</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="3">Beneficiario: Gabrielina Diaz</td><td colspan="3">Vereda: Trochas-La Paz.</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>Actividad</td><td>Insumos</td><td>Unidad</td><td>Cantidad</td><td colspan="2">Avance de obra</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Limpieza e instalación del cerramiento perimetral de la unidad productiva.</td><td>Postes plásticos</td><td>Und</td><td>119</td><td colspan="2" rowspan="4">100%</td></tr>
<tr><td>Postes de concreto</td><td>Und</td><td>10</td></tr>
<tr><td>Rollos de alambre calibre12,5</td><td>Rollo</td><td>3</td></tr>
<tr><td>Cajas de grapas por Kg</td><td>Caja</td><td>3</td></tr>
<tr><td>Limpieza, adecuación del terreno y establecimiento de pasturas.</td><td>Semilla por Kg de pasto brachiaria decumbens</td><td>Kilo</td><td>8</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Instalación de sistemas para el reservorio de agua.</td><td>Tanque plástico bicapa por 5000 L</td><td>Und</td><td>1</td><td colspan="2" rowspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>Accesorios para tanque (válvulas, mangueras, tubería, abrazaderas, soldadura…)</td><td>Global</td><td>1</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Siembra de árboles forestales y forrajeros.</td><td>Plántulas forestales Guayacán, cedro y abarco</td><td>Und</td><td>64</td><td colspan="2" rowspan="4">100%</td></tr>
<tr><td>Semillas de plántulas de especies forrajeras priorizadas (Matarratón - Botón de Oro) por Kg</td><td>Kilo</td><td>0,2</td></tr>
<tr><td>Abono orgánico por bulto de 50 Kg</td><td>Bulto</td><td>12</td></tr>
<tr><td>Hidroretenedor</td><td>Kilogramo</td><td>1,2</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="3">Beneficiario: Jorge Fuentes</td><td colspan="3">Vereda: Casa Blancas-La Paz.</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>Actividad</td><td>Insumos</td><td>Unidad</td><td>Cantidad</td><td colspan="2">Avance de obra</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Limpieza e instalación del cerramiento perimetral de la unidad productiva.</td><td>Postes plásticos</td><td>Und</td><td>119</td><td colspan="2" rowspan="4">100%</td></tr>
<tr><td>Postes de concreto</td><td>Und</td><td>10</td></tr>
<tr><td>Rollos de alambre calibre12,5</td><td>Rollo</td><td>3</td></tr>
<tr><td>Cajas de grapas por Kg</td><td>Caja</td><td>3</td></tr>
<tr><td>Limpieza, adecuación del terreno y establecimiento de pasturas.</td><td>Semilla por Kg de pasto brachiaria decumbens</td><td>Kilo</td><td>8</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Instalación de sistemas para el reservorio de agua.</td><td>Tanque plástico bicapa 5000 L</td><td>Und</td><td>1</td><td colspan="2" rowspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>Accesorios para tanque (válvulas, mangueras, tubería, abrazaderas, soldadura…)</td><td>Global</td><td>1</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Siembra de árboles forestales y forrajeros.</td><td>Plántulas forestales Guayacán, cedro y abarco</td><td>Und</td><td>64</td><td colspan="2" rowspan="4">100%</td></tr>
<tr><td>Semillas de plántulas de especies forrajeras priorizadas (Matarratón - Botón de Oro) por Kg</td><td>Kilo</td><td>0,2</td></tr>
<tr><td>Abono orgánico por bulto de 50 Kg</td><td>Bulto</td><td>12</td></tr>
<tr><td>Hidroretenedor</td><td>Kilogramo</td><td>1,2</td></tr>
</table>

Beneficiario: Olfer Alza		Vereda: Casa Blancas-La Paz.		
				
Actividad	Insumos	Unidad	Cantidad	Avance de obra
Limpieza e instalación del cerramiento perimetral de la unidad productiva.	Postes plásticos	Und	119	100%
	Postes de concreto	Und	10	
	Rollos de alambre calibre12,5	Rollo	3	
	Cajas de grapas por Kg	Caja	3	
Limpieza, adecuación del terreno y establecimiento de pasturas.	Semilla por Kg de pasto brachiaria decumbens	Kilo	8	100%
Instalación de sistemas para el reservorio de agua.	Tanque plástico bicapa 5000 L	Und	1	100%
	Accesorios para tanque (válvulas, mangueras, tubería, abrazaderas, soldadura…)	Global	1	
Siembra de árboles forestales y forrajeros.	Plántulas forestales Guayacán, cedro y abarco	Und	64	100%
	Semillas de plántulas de especies forrajeras priorizadas (Matarratón - Botón de Oro) por Kg	Kilo	0,2	
	Abono orgánico por bulto de 50 Kg	Bulto	12	
	Hidroretenedor	Kilogramo	1,2	

<table>
<tr><td colspan="3">Beneficiario: Alejandro Santamaria</td><td colspan="3">Vereda: El Centro-La Paz.</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>Actividad</td><td>Insumos</td><td>Unidad</td><td>Cantidad</td><td colspan="2">Avance de obra</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Limpieza e instalación del cerramiento perimetral de la unidad productiva.</td><td>Postes plásticos</td><td>Und</td><td>119</td><td colspan="2" rowspan="4">100%</td></tr>
<tr><td>Postes de concreto</td><td>Und</td><td>10</td></tr>
<tr><td>Rollos de alambre calibre12,5</td><td>Rollo</td><td>3</td></tr>
<tr><td>Cajas de grapas por Kg</td><td>Caja</td><td>3</td></tr>
<tr><td>Limpieza, adecuación del terreno y establecimiento de pasturas.</td><td>Semilla por Kg de pasto brachiaria decumbens</td><td>Kilo</td><td>8</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Instalación de sistemas para el reservorio de agua.</td><td>Tanque plástico bicapa por 5000 L</td><td>Und</td><td>1</td><td colspan="2" rowspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>Accesorios para tanque (válvulas, mangueras, tubería, abrazaderas, soldadura…)</td><td>Global</td><td>1</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Siembra de árboles forestales y forrajeros.</td><td>Plántulas forestales Guayacán, cedro y abarco</td><td>Und</td><td>64</td><td colspan="2" rowspan="4">100%</td></tr>
<tr><td>Semillas de plántulas de especies forrajeras priorizadas (Matarratón - Botón de Oro) por Kg</td><td>Kilo</td><td>0,2</td></tr>
<tr><td>Abono orgánico por bulto de 50 Kg</td><td>Bulto</td><td>12</td></tr>
<tr><td>Hidroretenedor</td><td>Kilogramo</td><td>1,2</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="3">Beneficiario: Segundo Julio León Mateus</td><td colspan="3">Vereda: El Centro-La Paz.</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>Actividad</td><td>Insumos</td><td>Unidad</td><td>Cantidad</td><td colspan="2">Avance de obra</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Limpieza e instalación del cerramiento perimetral de la unidad productiva.</td><td>Postes plásticos</td><td>Und</td><td>119</td><td colspan="2" rowspan="4">100%</td></tr>
<tr><td>Postes de concreto</td><td>Und</td><td>10</td></tr>
<tr><td>Rollos de alambre calibre12,5</td><td>Rollo</td><td>3</td></tr>
<tr><td>Cajas de grapas por Kg</td><td>Caja</td><td>3</td></tr>
<tr><td>Limpieza, adecuación del terreno y establecimiento de pasturas.</td><td>Semilla por Kg de pasto brachiaria decumbens</td><td>Kilo</td><td>8</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Instalación de sistemas para el reservorio de agua.</td><td>Tanque plástico bicapa por 5000 L</td><td>Und</td><td>1</td><td colspan="2" rowspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>Accesorios para tanque (válvulas, mangueras, tubería, abrazaderas, soldadura…)</td><td>Global</td><td>1</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Siembra de árboles forestales y forrajeros.</td><td>Plántulas forestales Guayacán, cedro y abarco</td><td>Und</td><td>64</td><td colspan="2" rowspan="4">100%</td></tr>
<tr><td>Semillas de plántulas de especies forrajeras priorizadas (Matarratón - Botón de Oro) por Kg</td><td>Kilo</td><td>0,2</td></tr>
<tr><td>Abono orgánico por bulto de 50 Kg</td><td>Bulto</td><td>12</td></tr>
<tr><td>Hidroretenedor</td><td>Kilogramo</td><td>1,2</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="3">Beneficiario: Gabrielina Ovalle</td><td colspan="3">Vereda: Trochas-La Paz.</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>Actividad</td><td>Insumos</td><td>Unidad</td><td>Cantidad</td><td colspan="2">Avance de obra</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Limpieza e instalación del cerramiento perimetral de la unidad productiva.</td><td>Postes plásticos</td><td>Und</td><td>119</td><td colspan="2" rowspan="4">100%</td></tr>
<tr><td>Postes de concreto</td><td>Und</td><td>10</td></tr>
<tr><td>Rollos de alambre calibre12,5</td><td>Rollo</td><td>3</td></tr>
<tr><td>Cajas de grapas por Kg</td><td>Caja</td><td>3</td></tr>
<tr><td>Limpieza, adecuación del terreno y establecimiento de pasturas.</td><td>Semilla por Kg de pasto brachiaria decumbens</td><td>Kilo</td><td>8</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Instalación de sistemas para el reservorio de agua.</td><td>Tanque plástico bicapa por 5000 L</td><td>Und</td><td>1</td><td colspan="2" rowspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>Accesorios para tanque (válvulas, mangueras, tubería, abrazaderas, soldadura…)</td><td>Global</td><td>1</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Siembra de árboles forestales y forrajeros.</td><td>Plántulas forestales Guayacán, cedro y abarco</td><td>Und</td><td>64</td><td colspan="2" rowspan="4">100%</td></tr>
<tr><td>Semillas de plántulas de especies forrajeras priorizadas (Matarratón - Botón de Oro) por Kg</td><td>Kilo</td><td>0,2</td></tr>
<tr><td>Abono orgánico por bulto de 50 Kg</td><td>Bulto</td><td>12</td></tr>
<tr><td>Hidroretenedor</td><td>Kilogramo</td><td>1,2</td></tr>
</table>

7. CORRESPONDENCIA.

Para el presente periodo de reporte no se presenta información relacionada.

8. ACTAS DESARROLLADAS EN EL MES.

- Acta de inicio: ocho (08) de septiembre de 2025.

8.1. Avance fisico de obra informe N° 4.

AVANCE FISICO DEL AVANCE INFORME No 4:	**25.06 %**
AVANCE FISICO ACUMULADO:	**100 %**
AVANCE FISICO POR EJECUTAR:	**00.00 %**

8.2. Avance del plazo de contrato corte informe N° 4.

Tiempo inicial:	**TRES (03) MESES (24) DIAS.**	
Tiempo Transcurrido:	**Tres (03) MES.**	Veinticuatro (24) días
Avance Porcentual del plazo de ejecución:		**100 %**
Avance Porcentual del plazo de ejecución:		**00.00 %**

8.3. Avance financiero del contrato de obra corte informe N° 4.

INFORMACION FINANCIERA - INFORME FINAL	
VALOR INICIAL:	**$ 522.858.070 M/L.**
AVANCE EJECUTADO PERIODO INFORME FINAL	**$ 522.858.070 M/L**
ACUMULADO EJECUTADO	**$ 522.858.070 M/L.**
TOTAL, AVANCE EJECUTADO HASTA INFORME FINAL	**$ 522.858.070 M/L**
FALTANTE POR EJECUTAR	**$ 0 M/L.**

La ejecución del CONTRATO, a la fecha del presente informe para entrega final arroja los siguientes índices:

La cifra de ejecución en el período informado es de: ($ 522.858.070 M/L) M/L, equivalente a un porcentaje de 100% para un total ejecutado acumulado de: ($ 522.858.070 M/L), equivalente a un porcentaje de 100%, del valor total del CONTRATO, quedando por ejecutar CERO PESOS ($ 0) M/L, equivalente a un porcentaje de 0%, del valor inicial del CONTRATO..

8.4. Avance general del contrato de obra.

Las actividades ejecutadas en el periodo de reporte se concentran en desarrollar las actividades pendientes con respecto al avance anterior, quedando en cierre tecnico y operativo dentro de los plazos establecidos

1. VALOR TOTAL DEL CONTRATO	
1.1 Contrato inicial	**$ 522.858.070**
1.2 Adiciones	**$ 0.00**
2. PAGOS EFECTUADOS	
2.1 Primer pago **ACTA PARCIAL 01**	**0**
2.1.2 VALOR NETO Pago Acta Parcial 01	**0**
2.2 Segundo pago **ACTA PARCIAL**	**0**
2.2.1 Valor NETO **PAGO ACTA PARCIAL 02**	**0**
3. Valor pagado a la fecha	**$ 0.00**
4. SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	**$ 522.858.070 M/L L**
5. SALDO A FAVOR DE CAS	**$ 0.00.**

9. ACTAS Y DOCUMENTOS.

Hasta el momento del presente informe No 3, han sido legalizado mediante firma los siguientes documentos relativos al desarrollo del contrato de obra:

- Acta: **inicio de actividades:**
  Fecha: **Ocho (08) septiembre 2025.**

10. BITACORA DE OBRA

Durante este periodo y en general el tiempo de ejecución del contrato de obra, se llevó a cabo la reseña diaria del desarrollo del convenio mediante un libro de anotaciones o Bitácora de obra. Adjunto se comparte la bitácora de obra correspondiente al primer informe.

11. ADMINISTRACIÓN

Se reseña por parte del contratista el cumplimiento de cada Uno de los aspectos administrativos contemplados por el contrato de obra, durante el periodo del presente informe, y a lo largo del plazo de ejecución de este, la U.T SILVOPASTORILES, en su condición de ejecutor, ha realizado la inversión y seguimiento a los aspectos relacionados con SST, de acuerdo a lo estipulado en su propuesta para el proceso de contratación pública que origino el contrato de la referencia

12. VISITAS DE SUPERVICIÓN

Para el presente periodo de reporte se reporta visita de supervición por parte de la Gobernación de Santander, dicha visita contó con el acompañamiento de los responsables de obra y la interventoría.

13. CONCLUSIONES CONTRATO DE OBRA

- Se instalaron 15 unidades de aislamiento o cercado en los predios de beneficiarios del proyecto silvopastoril.
- Se ha realizado establecimiento de pastos y especies forestales en 15 predios equivalentes a 30 hectáreas que contempla em contrato de obra
- Se instalaron 15 unidades de sistemas para reservorio de agua, uno en cada predio beneficiado
- Se sembró 30 hectáreas de pasturas en los 15 predios beneficiados en el proyecto

.



MAGDALENA CADENA ZARATE
Representante legal
Unión Temporal Sistemas Silvopastoriles
ANEXOS: Bitacora de obra, Cuadro de avances en Excel, Registro fotográfico, Acta de inicio, Planilla de SS.

14. CONTRATO DE INTERVENTORIA N°. 01019-2025

14.1. DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

CONTRATO No.:	01019-2025		
CONTRATISTA:	HERNANDO LEGUIZAMÓN GALINDO		
Nit o C.C. No.	7.160.961		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA EL PROYECTO: "EJECUCIÓN DEL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS PRODUCTIVOS SILVOPASTORILES EN PRADERAS ESTABLECIDAS EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER.		
VALOR INICIAL:	CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS. ($ 54.638.787,72)		
VALOR ADICIONAL:			
PLAZO CONTRATO:	CUATRO MESES (4) MESES, QUINCE (15) DÍAS, sin exceder 31 de diciembre de 2025.		
PLAZO ADICIONAL:			
SUPERVISOR:	EDNA ROCIO CASTELLANOS MARTINEZ		
CARGO SUPERVISOR	SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL		
FECHA INICIO DEL CONTRATO:	08/09/2025		
FECHA DE SUSPENSIÓN		**No Aplica**	X
FECHA DE REINICIO		**No Aplica**	X
FECHA DE TERMINACIÓN 1:	31/12/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN 2 (Si aplica)			
VALOR A PAGAR			
ACTA A PAGAR:			
PAGO No: (En Números)			

14.2. ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORIA

Durante el periodo objeto del presente informe, la Interventoría Técnica, Administrativa, Jurídica y Financiera llevó a cabo las siguientes actividades orientadas al seguimiento, control y verificación del cumplimiento contractual:

- ✓ **Verificación técnica de los cambios solicitados por el contratista de obra:** Se realiza la verificación y evaluación técnica y juridica de los cambios solicitados por el contratista de obra, con énfasis en la inclusión de nuevos usuarios y el cambio de las dimensiones del tanque para un usuario.

- ✓ **Verificación de áreas a intervenir**: Se realizó la inspección y verificación de las áreas definidas para intervención incluyendo los cambios de tres usuarios, con énfasis en la preparación del terreno y la adecuación de las condiciones edáficas requeridas para el establecimiento del sistema silvopastoril.

- ✓ **Revisión de insumos y herramientas**: Se efectuó la revisión técnica de los insumos a aplicar y las herramientas a utilizar durante las labores de campo, verificando su conformidad con las especificaciones contractuales y los requerimientos técnicos establecidos.

- ✓ **Seguimiento por actividad:** Se adelantó la verificación del proceso de ejecución de cada actividad, asegurando que las labores se desarrollaran conforme a los procedimientos establecidos en el programa de obra, arrojando un avance físico del proyecto de 74.94 %.

- ✓ **Control técnico del programa de obra**: La Interventoría verificó el cumplimiento de las especificaciones técnicas, aprobó el programa de obra presentado por el contratista y realizó seguimiento permanente a su ejecución, garantizando la correcta secuencia y calidad de las actividades.

- ✓ **Supervisión de materiales e insumos**: Se efectuó control sobre los materiales, insumos y labores de mantenimiento, verificando que correspondieran a los definidos en el contrato y que cumplieran con las condiciones de calidad, seguridad, economía y estabilidad requeridas.

- ✓ **Medición de cantidades ejecutadas**: Se realizaron las mediciones de las cantidades de obra ejecutadas durante el periodo, con el fin de determinar los avances físicos y financieros del proyecto.

- ✓ **Verificación de condiciones laborales y de seguridad**: Se revisó el cumplimiento de las medidas de seguridad industrial y control ocupacional exigidas al personal de obra, así como

la evidencia de pago de salarios y aportes al sistema de seguridad social, conforme a la normatividad vigente.

- ✓ **Elaboración de informes de avance**: Se elaboraron y presentaron los informes técnicos y administrativos de avance de obra, con los respectivos registros fotográficos, observaciones y recomendaciones, orientados a garantizar la trazabilidad y transparencia en el desarrollo del contrato.

14.2.1. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS:

En el marco de las funciones de control y seguimiento administrativo del contrato de obra, la Interventoría Técnica, Administrativa, Jurídica y Financiera adelantó las siguientes acciones orientadas a garantizar el cumplimiento de los requisitos legales, contractuales y de gestión institucional:

- ✓ **Seguimiento a la programación de obra**: Se efectuó un control permanente sobre la programación de las actividades ejecutadas por el contratista, verificando el cumplimiento de los cronogramas establecidos y promoviendo la articulación oportuna entre los componentes técnicos, financieros y logísticos del proyecto, arrojando para el presente periodo de reporte un avance fisico de 74.94%.

- ✓ **Verificación de permisos y trámites requeridos**: La Interventoría constató la existencia y vigencia de los permisos, autorizaciones y trámites ambientales necesarios para el desarrollo de las actividades del proyecto, asegurando que todas las acciones se enmarcaran en la normativa aplicable.

- ✓ **Control de afiliación y seguridad social**: Se verificó la afiliación del personal vinculado al proyecto, tanto de la obra como de la interventoría, a los sistemas de seguridad social integral (salud, pensión, riesgos laborales y parafiscales), garantizando el cumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad ocupacional.

- ✓ **Comunicación institucional y social:** Se mantuvo una comunicación constante y efectiva con la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS), la veeduría ciudadana y las comunidades locales involucradas, facilitando la socialización de avances, la atención de inquietudes y la transparencia en la ejecución del contrato.

- ✓ **Revisión y actualización de pólizas**: Se realizó la verificación y actualización de las pólizas contractuales exigidas, comprobando su vigencia, cobertura y cumplimiento de los montos asegurados, de acuerdo con los requerimientos establecidos por la entidad contratante.

14.2.2. ACTIVIDADES FINANCIERAS:

En el componente financiero, la Interventoría efectuó el seguimiento y control a la ejecución económica del contrato, verificando la coherencia entre los avances físicos de la obra y la ejecución presupuestal, con el fin de garantizar la adecuada utilización de los recursos públicos asignados.

- ✓ **Cumplimiento de la programación de la obra:** Se llevó a cabo la revisión y control financiero del avance de obra, verificando la correspondencia entre las actividades ejecutadas y los recursos invertidos en cada periodo. De esta manera, se asegura que los pagos realizados al contratista se encuentren debidamente justificados con base en las cantidades de obra ejecutadas, las actas de seguimiento y los informes técnicos, en cumplimiento de la programación establecida en el cronograma contractual.

14.2.3. ACTIVIDADES DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD:

Durante el periodo evaluado, la Interventoría desarrolló actividades orientadas a garantizar el cumplimiento de los estándares de calidad establecidos en el contrato y en el plan de aseguramiento de la calidad presentado por el contratista. Estas acciones permiten verificar la idoneidad de los materiales, equipos, procedimientos y personal involucrado en la ejecución del proyecto.

- ✓ **Verificación de la gestión de calidad:** Se realizó la revisión y seguimiento a la gestión de calidad presentada por el contratista, verificando que las actividades desarrolladas se ajusten a los parámetros técnicos, ambientales y administrativos establecidos en dicho documento, así como a las especificaciones contractuales.

- ✓ **Control de materiales, maquinaria y personal:** Se efectuó la verificación de los resultados de las pruebas y ensayos aplicados al control de materiales, maquinaria y equipos empleados en la ejecución del proyecto. Adicionalmente, se revisó la idoneidad y calificación técnica del personal operativo y administrativo vinculado al contrato, asegurando su correspondencia con los perfiles exigidos.

- ✓ **Cumplimiento de la seguridad industrial y social:** Se supervisó la aplicación de los protocolos de seguridad industrial y salud en el trabajo, garantizando que el contratista implemente las medidas de prevención y control de riesgos laborales conforme a la normatividad vigente y a las políticas de seguridad establecidas.

- ✓ **Control de pólizas:** Se verificó la vigencia, alcance y cobertura de las pólizas de cumplimiento, responsabilidad civil y riesgos laborales, asegurando que estas cumplan con las condiciones contractuales y salvaguarden los intereses del proyecto y de la entidad contratante.

14.2.4. CUADRO AVANCE DE INTERVENTORÍA

A continuación, se muestra el resumen del avance financiero del contrato de interventoría, donde se relacionan los valores asociados al costo total, las ejecuciones acumuladas y el porcentaje de cumplimiento a la fecha de corte del presente informe.

DESCRIPCIÓN	VLR. INICIAL	EJECUTADO		POR EJECUTAR	
		VALOR	%	VALOR	%
VLR. CONTRATO INICIAL	$ 54.638.787,72	$ 54.638.787,72	100%	$ 00.00	00.00%

15. CUADRO DE CONTROL DE POLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Nombre de la Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

N.º DE LA PÓLIZA	CONCEPTO DEL AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		Desde (dd, mm, aaaa)	Hasta (dd, mm, aaaa)	
33-44-101265996	Cumplimiento del contrato	19/08/2025	30/06/2026	$ 10.927.757.54
96-44-101158764	Calidad del servicio	19/08/2025	31/12/2026	$ 10.927.757.54
96-44-101158764	Pago de salarios prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	19/08/2025	31/12/2028	$ 10.927.757.54
33-40-101086747	Predios Labores y Operaciones	19/08/2025	31/12/2025	$284.700.000,00
33-40-101086747	Contratistas y subcontratistas	19/08/2025	31/12/2025	$284.700.000,00
33-40-101086747	Vehículos propios y no propios	19/08/2025	31/12/2025	$284.700.000,00

16. RELACION DE PERSONAL Y OTROS RECURSOS DE LA INTERVENTORIA

A continuación, se detalla la información correspondiente al equipo humano y a los recursos asignados por la interventoría para la ejecución de las labores técnicas, administrativas, financieras y de aseguramiento de la calidad, conforme a los requerimientos contractuales.

16.1. Personal:

CARGO- PROFESIÓN	CANT	NOMBRE-PROFESIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	DEDICACIÓN
Coordinador-Ingeniero agrónomo	1	Hernando Leguizamón Galindo	7.160.171	75%
Profesional de campo- Ingeniero Forestal	1	Jeffrey Alexander Castañeda Fierro	1`110.535.384	100%
Contador	1	Ernesto Niño Cortes	19.334.987	10%
Abogado	**1**	Javier Ernesto Martínez Borda	1.015.395.219	10%
Asistente- secretaría	**1**	Deisy Daniela Lesmes Martínez	1.053.282.250	10%

16.2. Recurso empleado por la interventoría: personal, equipos:

CANTIDAD	CARGO/OFICIO	SUELDO Y / O JORNAL MENSUAL	MESES	DEDICACION	VALOR PARCIAL
COSTO PERSONAL					
	PERFIL PROFESIONAL				
1	Coordinador	$ 2.692.850,00	4,5	75%	$ 9.088.368,75
1	Profesional de campo	$ 2.216.697,00	4,5	100%	$ 9.975.136,50
1	Profesional Abogado	$ 2.216.697,00	4,5	10%	$ 997.513,65
1	Profesional Contador	$ 2.216.697,00	4,5	10%	$ 997.513,65
1	Asistencia - secretaria	$ 1.620.080,00	4,5	10%	$ 729.036,00
Subtotal Personal					$ 21.787.568,55
	FACTOR MULTIPLICADOR				2,107392
	SUBTOTAL				**$ 45.914.947,66**
IVA (19%)					$ 8.723.840,06
COSTO TOTAL					**$ 54.638.787,72**

17. CONCLUSIONES, OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

17.1. CONCLUSIONES

- El Contrato de Obra No. 1053-2025 fue ejecutado en su totalidad, alcanzando un avance físico del 100% , conforme a las actividades establecidas en el alcance contractual.

- Se verificó la instalación de quince (15) unidades de aislamiento o cerramiento perimetral , una en cada predio beneficiario del proyecto silvopastoril, cumpliendo con las especificaciones técnicas definidas.

- Se realizó el establecimiento de pasturas y siembra de especies forestales y forrajeras en quince (15) predios , equivalentes a una cobertura total de treinta (30) hectáreas , en concordancia con las metas contempladas en el contrato de obra.

- Se instalaron quince (15) sistemas de reservorio de agua , uno por cada predio beneficiado, garantizando la disponibilidad hídrica para el funcionamiento adecuado del sistema productivo implementado.

- La ejecución de las actividades se desarrolló dentro del plazo contractual inicialmente pactado, culminando el 31 de diciembre de 2025 , sin requerir prórrogas ni modificaciones que alteraran el objeto del contrato.

- Desde el punto de vista técnico, administrativo y operativo, el contrato cumple satisfactoriamente con los objetivos propuestos, consolidando la implementación de sistemas productivos silvopastoriles en el municipio de La Paz, Santander.

17.2. OBSERVACIONES

- Durante la ejecución contractual se presentaron retos logísticos asociados a condiciones climáticas y de acceso a algunos predios; no obstante, dichas situaciones fueron superadas mediante ajustes operativos y estrategias logísticas que permitieron garantizar el cumplimiento total de las actividades.

- La interventoría realizó seguimiento permanente a la ejecución técnica y verificó en campo el cumplimiento de las especificaciones contractuales, constatando que las actividades ejecutadas corresponden a lo pactado en el contrato.

- No se evidencian actividades pendientes de ejecución ni obligaciones técnicas sin cumplir al momento del cierre del contrato.

17.3. RECOMENDACIONES

- Proceder con los trámites administrativos correspondientes al cierre y liquidación del contrato , teniendo en cuenta que se cumplió con la totalidad del objeto contractual y las metas establecidas.

- Recomendar a los beneficiarios realizar el periódico de mantenimiento de los sistemas implementados (cerramientos, reservorios y componentes arbóreo), con el fin de garantizar la sostenibilidad y permanencia de los resultados obtenidos.

- Promover el seguimiento posterior por parte de las entidades competentes, con el propósito de evaluar el desempeño productivo y ambiental del sistema silvopastoril implementado y fortalecer su replicabilidad en otras zonas del departamento.

18. REGISTRO FOTOGRÁFICO.



Fotografía No	**1**
Fecha:	17/12/2025
Observaciones:	Verificación de estableciemiento y supervivencia especies forestales

	
Fotografía No	**2**
Fecha:	17/12/2025
Observaciones:	Verificación de estableciemiento y supervivencia especies forestales

	
Fotografía No	**3**
Fecha:	17/12/2025
Observaciones:	Verificación de trazado y estableciemiento de cercos

	
Fotografía No	**4**
Fecha:	17/12/2025
Observaciones:	Verificación de trazado y estableciemiento de cercos

	
Fotografía No	**5**
Fecha:	17/12/2025
Observaciones:	Verificación de estableciemiento y supervivencia especies forestales



Fotografía No	**6**
Fecha:	17/12/2025
Observaciones:	Verificación de estableciemiento y supervivencia especies forrajeras



Fotografía No	**7**
Fecha:	17/12/2025
Observaciones:	Verificación de estableciemiento y supervivencia especies forestales



Fotografía No	**8**
Fecha:	17/12/2025
Observaciones:	Verificación de trazado y estableciemiento de cercos (verificación con funcionarios de la Gobernación de Santander)



Fotografía No	**9**
Fecha:	17/12/2025
Observaciones:	Verificación general del sistema silvopastoríl (verificación con funcionarios de la Gobernación de Santander y beneficiarios)

	
Fotografía No	**10**
Fecha:	17/12/2025
Observaciones:	Verificación de estableciemiento y supervivencia especies forestales

	
Fotografía No	**11**
Fecha:	17/12/2025
Observaciones:	Verificación de estableciemiento y supervivencia especies forestales

	
Fotografía No	**12**
Fecha:	17/12/2025
Observaciones:	Verificación de trazado y estableciemiento de cercos

	
Fotografía No	**13**
Fecha:	17/12/2025
Observaciones:	Verificación de estableciemiento y supervivencia de *Brachiaria decumbens*

	
Fotografía No	**14**
Fecha:	17/12/2025
Observaciones:	Verificación de estableciemiento y supervivencia especies forestales

	
Fotografía No	**15**
Fecha:	17/12/2025
Observaciones:	Verificación de estableciemiento y supervivencia especies forestales



Fotografía No	**16**
Fecha:	17/12/2025
Observaciones:	Verificación de trazado y establecieento de especies forrajeras



Fotografía No	**17**
Fecha:	16/12/2025
Observaciones:	Verificación general del sistema silvopastoríl (verificación con funcionarios de la Gobernación de Santander y beneficiarios)

	
Fotografía No	**18**
Fecha:	16/12/2025
Observaciones:	Verificación de trazado y estableciemiento de cercos (verificación con funcionarios de la Gobernación de Santander)

	
Fotografía No	**19**
Fecha:	16/12/2025
Observaciones:	Verificación general de las especificaciones técnicas del sistema silvopastoríl (verificación con funcionarios de la Gobernación de Santander)

	
Fotografía No	**20**
Fecha:	16/12/2025
Observaciones:	Verificación de estableciemiento y supervivencia especies forestales

	
Fotografía No	**21**
Fecha:	17/12/2025
Observaciones:	Verificación trazado y establecimieto de mejoras de pasturas con *Brachiaria decumbens*



HERNANDO LEGUIZAMÓN GALINDO

Interventor

Anexos: Bitácora de obra, Planillas de seguridad social, cuadros de avance de obra.

INFORME DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE ACTIVIDADES

1. Información General del Contrato

CONTRATO No.:	01053-2025		
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL SISTEMAS SILVOPASTORILES		
Nit o C.C. No.	Nit. 901.958.070-6		
OBJETO:	"IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS PRODUCTIVOS SILVOPASTORILES EN PRADERAS ESTABLECIDAS EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER"		
VALOR INICIAL:	$ 522.835.089,00		
VALOR ADICIONAL:	NA		
PLAZO CONTRATO:	CUATRO MESES (4) MESES, QUINCE (15) DÍAS, sin exceder 31 de diciembre de 2025		
PLAZO ADICIONAL:	NA		
SUPERVISOR:	EDNA ROCIO CASTELLANOS MARTINEZ		
CARGO SUPERVISOR	Subdirectora de Planeación y Ordenamiento ambiental		
FECHA INICIO DEL CONTRATO:	08 de septiembre 2025		
FECHA DE SUSPENSIÓN		**No Aplica**	
FECHA DE REINICIO		**No Aplica**	
FECHA DE TERMINACIÓN 1:	31 de diciembre de 2025		
FECHA DE TERMINACIÓN 2 (Si aplica)			
VALOR A PAGAR	$ 522.835.089,00		
ACTA A PAGAR:	1		
PAGO No: (En Números)	01		

2. Información Financiera del Contrato

A continuación, se presenta el balance económico del contrato a la fecha:

VALOR DEL CONTRATO:	$ 522.835.089,00	
VALOR PAGADO (A la fecha del informe)		$ 522.835.089,00
VALOR POR EJECUTAR		$ 0.00
SUMAS IGUALES	$ 522.835.089,00	$ 522.835.089,00

3. Control Pago de Seguridad Social.

PERIODO PAGO	No PLANILLA	V/PAGADO SALUD	V/PAGADO PENSION	V/PAGADO ARL	V/PAGADO TOTAL
Septiembre	9491797237 9491793722 9493014979	$120,000 $237,700 $212.000	$480.000 $0 $848.000	$15.700 $258.500 $75.600	$ 615.700 $ 496.200 $ 1.135.000
Octubre	9493308027 9493305803 9494457526	$ 207,100 $ 84.000 $ 212.000	$ 336,000 0 $ 848.000	$ 11.000 $225,200 $75.600	$ 554.100 $ 309.200 $ 1.135.000
Noviembre	9494862794 9496514075 1992928532	$$ 207,100 $ 84.000 $ 212.000 212.000	$ 687,700 0 $ 848.000	$ 11.000 $225,200 $75.600	$ 554.100 $ 309.200 $ 1.135.000
Diciembre	9496514075 9494862794 1992928532	$ 207,100 $ 84.000 $ 212.000	$ 687,700 0 $ 848.000	$ 11.000 $225,200 $75.600	$ 554.100 $ 309.200 $ 1.135.000

4. Obligaciones Contractuales.

(Realizar descripción de las actividades técnicas y financieras desarrolladas)

Por medio del presente se deja constancia que las actividades realizadas durante el periodo de pago son:

(Incluir actividades y presupuesto ejecutado del avance o ejecución a cobrar)

Actividades y cantidades ejecutadas						
ITEM	**DESCRIPCIÓN**		**UND**	**CANTIDAD**	**V/ UNITARIO**	**V/ TOTAL**
1. Servicio de restauración de ecosistemas	1.1	Limpieza e instalación del cerramiento perimetral de la unidad productiva	Ha	15	$10.754.679	$ 161.320.185
	1.2	Limpieza, adecuacióndel terreno y establecimiento de pasturas	Ha	30,00	$ 2.018.167	$ 60.545.010

	1.3	Instalaciónde sistemas para el reservorio de agua.	Un	15,00	$ 4.372.252	$ 65.583.780
Objetivo específico 2. Realizar la plantación arbórea de especies forestales y forrajeras en predios seleccionados						
2. Servicio de establecimiento de especies vegetales	2.1	Siembra de árboles forestales y forrajeros.	Ha	30,00	$ 3.727.724	$ 111.831.720
					TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 399.280.695**
ADMINISTRACION (24%)			%	24,00%		$ 95.827.366,80
IMPREVISTOS (1%)			%	1,00%		$ 3.992.806,95
UTILIDAD (5%)			%	5,00%		$ 19.964.034,75
IVA 19% (Sobre la Utilidad)			%	19,00%		$ 3.793.166,60
					TOTAL COSTO INDIRECTO	**$ 123.577.375**
TOTAL COSTOS PROYECTO						**$ 522.835.089,00)**

5. Balance Financiero

VALOR DEL CONTRATO:	$ 522.835.089,00
DURACIÓN DEL CONTRATO	CUATRO MESES (4) MESES, QUINCE (15) DÍAS, sin exceder 31 de diciembre de 2025
FECHA DE INICIO	08/09/2025
FECHA DE TERMINACIÓN	31/12/2025
VALOR ACTA RECIBO No.01 FINAL	$ 522.835.089,00
SALDO POR PAGAR:	$ 522.835.089,00

El valor total ejecutado a la fecha equivale A **QUINIENTOS VEINTIDÓS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS MCTE. ($522.835.089,00) IVA incluido** correspondiente a una ejecución física y financiera del 100% del objeto contractual.

Así mismo, bajo la gravedad de juramento el SUPERVISOR certifica que verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista y el pago de los aportes al sistema de seguridad social y Fondo de Pensiones, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002**. Anexo informe contable y planillas de pago Seguridad social.**

6. Seguimiento al Control Ambiental:

IMPACTO AMBIENTAL	MEDIDA DE CONTROL EXIGIDA	MEDIDA DE CONTROL REALIZADA	ESTADO DE CUMPLIMIENTO
Contaminación por desechos plásticos (Bolsas, recipientes de bebidas y alimentos)	Separación de residuos	Recolección de residuos solidos	Bueno

7. Seguimiento al Control de Riesgos:

RIESGOS Y PELIGROS EN EL PROYECTO	MEDIDAS DE CONTROL SOLCITADAS	MEDIDAS DE CONTROL APLICADAS	ESTADO DE CUMPLIMIENTO
Accidentes por mordeduras de Ofidios	Capacitación disponibilidad Botiquín primeros auxilios	Contactos con entidades de salud	Bueno
Accidentes por utilización de herramientas y equipos	Capacitación disponibilidad Botiquín primeros auxilios	Contactos con entidades de salud	Bueno

En consecuencia, con base en los informes presentados por el Contratista, respecto a las actividades ejecutadas en el presente contrato y como parte de la constancia para acceder a los recursos financieros aportados por parte de la Corporación Autónoma Regional de Santander, el (supervisor interventor) CERTIFICA el cumplimiento del contrato a satisfacción, en el periodo mencionado, y hace constar que la información suministrada en el presente informe es veraz y cumple con los parámetros establecidos con el objeto del contrato.

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe en la ciudad de San Gil, a los veinte (20) días del mes de enero del año 2026

HERNANDO LEGUIZAMÓN GALINDO
Interventor

Proyecto:

EVIDENCIAS





Fotografía No	**1**
Fecha:	Noviembre de 2025
Observaciones:	Verificación actividades de preparación de terreno y aislamientos





Fotografía No	**2**
Fecha:	Noviembre de 2025
Observaciones:	Verificación establecimiento de siembras





Fotografía No	**3**
Fecha:	Noviembre de 2025
Observaciones:	Verificación establecimiento de cercas





Fotografía No	**4**
Fecha:	Noviembre de 2025
Observaciones:	Verificación siembra y fertilización de especies forestales y forrajeras





Fotografía No	**5**
Fecha:	Diciembre de 2025
Observaciones:	Verificación establecimiento de aislamiento y plantaciones forestales







Fotografía No	**6**
Fecha:	Diciembre de 2025
Observaciones:	Verificación establecimiento de aislamiento, plantaciones forestales y pastos





Fotografía No	**7**
Fecha:	Diciembre de 2025
Observaciones:	Verificación instalación de tanques





Fotografía No	**8**
Fecha:	Diciembre de 2025
Observaciones:	Verificación instalación de tanques





Fotografía No	**9**
Fecha:	Diciembre de 2025
Observaciones:	Verificación instalación de tanques

Mediante el registro de sus datos personales en el presente documento usted autoriza a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos con la finalidad de que lleve el control de ingreso o asistencia, lo contacte , consulte la información registrada en otras bases de datos o archivos de cualquier entidad pública o privada, nacional o internacional, adelante trámites ante autoridades y atienda requerimientos de entidades públicas o privadas y, en general, para que la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS cumpla las demás finalidades establecidas en el aviso de privacidad publicado en http://cas.gov.co, el cual declara haber leído previamente al otorgamiento de la autorización.
Como titular de la información tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar sus datos personales, solicitar prueba de la autorización otorgada para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos. El responsable del tratamiento es la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS, ubicada en la Carrera 12 No. 9-06, San Gil, Santander PBX: (57 7)723 8925, 7240765 correo electrónico: contactenos@cas.gov.co

	INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL SUPERVISION E INTERVENTORIA	**Codigo: F-PCT-008** **Versión: 10** **Hoja 1 de 1**
Proceso de Contratacion		**Fecha Aprobación: 15/12/2022**

FECHA DE PRESENTACION DEL INFORME: 31-12-2025	**ESTADO DEL CONTRATO: EN EJECUCIÓN**
CONTRATO No: 01053-2025	**TIPO DE CONTRATO: OBRA**
CONTRATISTA: UNION TEMPORAL SISTEMAS SILVOPASTORILES	
Nit o C.C. No. **NIT: 901980916-3**	**No. DE INFORME: 4**
OBJETO: IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS PRODUCTIVOS SILVOPASTORILES EN PRADERAS ESTABLECIDAS EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ DEPARTAMENTO DE SANTANDER.	
VALOR INICIAL: $ 522.835.089	**VALOR ADICIONAL:**
PLAZO CONTRATO: 04 meses y 15 días, sin exceder el 31 de diciembre de 2025	**PLAZO ADICIONAL:**

SUPERVISOR: EDNA ROCIO CASTELLANOS MARTINEZ

CARGO SUPERVISOR: Subdirectora de Planeación y Ordenamiento ambiental

INTERVENTOR: HERNANDO LEGUIZAMÓN GALINDO

FECHA INICIO DEL CONTRATO:	8/09/2025				
FECHA DE SUSPENSIÓN:		NO APLICA		**TERMINO DE LA SUSPENSION:**	
FECHA DE REINICIO:		NO APLICA		**TIEMPO DE PRORROGAS:**	
FECHA DE TERMINACIÓN 1:	22/12/2025			**FECHA DE TERMINACIÓN 2:**	31/12/2025
PERIODO DEL INFORME:	08/12/2025 AL 31/12/2025				

ALCANCES O ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL OBJETO CONTRACTUAL

INFORME SUPERVISION O INTERVENTORIA	4	08/12/2025 AL 31/12/2025

AVANCES DE EJECUCIÓN

ALCANCE	PRESUP. CONTRATO	VALOR ADICIONAL	VALOR PAGADO	PLAZO DEL CONTRATO	TIEMPO EJECUTADO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO PAGADO %
1.1 Limpieza e instalación del cerramiento perimetral de la unidad productiva	$ 161.320.185	**0**	**0**	Hasta 31/12/2025	4 MES 15 DÍAS	**100%**	**0**
1.2 Limpieza, adecuacióndel terreno y establecimiento de pasturas	$ 60.545.010	0	0	Hasta 31/12/2025	4 MES 15 DÍAS	**100%**	0
1.3 Instalaciónde sistemas para el reservorio de agua.	$ 65.583.780	0	0	Hasta 31/12/2025	4 MES 15 DÍAS	**100%**	0
2.1 Siembra de árboles forestales y forrajeros.	$ 111.831.720	0	0	Hasta 31/12/2025	4 MES 15 DÍAS	**100%**	0
SUBTOTAL COSTO DIRECTO	$ 399.280.695						
Administración (24%)	$ 95.827.367	0	0	Hasta 31/12/2025			0
Imprevistos (1%)	$ 3.992.807	0	0	Hasta 31/12/2025			0
Utilidad (5%)	$ 19.964.035	0	0	Hasta 31/12/2025			0
IVA (19% Sobre utilidad)	$ 3.793.167	0	0	Hasta 31/12/2025			0
SUBTOTAL COSTO INDIRECTO	$ 123.577.375						
TOTAL COSTO PROYECTO	$ 522.858.070						

Acta No.	CONCEPTO (Inicio,prorroga, Suspen, Reincio,etc)	FECHADEL ACTA	POLIZA	FECHA TERMINACION DEL ACTA	VALORES			
					VALOR PAGADO	SALDO POR PAGAR	AMORTIZADO	PAGOS ACUMULADOS
1	Inicio	8/9/2025	14-44-101243276	22/12/2025	0	$ 522.835.089,00	0	0
1	Aclaratoria Acta de Inicio	16/10/2025		31/12/2025				

OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES

El Contrato de Obra No. 1053-2025 fue ejecutado en su totalidad, alcanzando un avance físico del 100% , conforme a las actividades establecidas en el alcance contractual.

Se verificó la instalación de quince (15) unidades de aislamiento o cerramiento perimetral , una en cada predio beneficiario del proyecto silvopastoril, cumpliendo con las especificaciones técnicas definidas.

Se realizó el establecimiento de pasturas y siembra de especies forestales y forrajeras en quince (15) predios , equivalentes a una cobertura total de treinta (30) hectáreas , en concordancia con las metas contempladas en el contrato de obra.

La ejecución de las actividades se desarrolló dentro del plazo contractual inicialmente pactado, culminando el 31 de diciembre de 2025 , sin requerir prórrogas ni modificaciones que alteraran el objeto del contrato.

FIRMA INTERVENTOR **FIRMA SUPERVISOR**

ANEXO: SOPORTE DE AVANCE

Verificación y seguimiento actividades ejecutadas



Mediante el registro de sus datos personales en el presente documento usted autoriza a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos con la finalidad de que lleve el control de ingreso o asistencia, lo contacte , consulte la información registrada en otras bases de datos o archivos de cualquier entidad pública o privada, nacional o internacional, adelante trámites ante autoridades y atienda requerimientos de entidades públicas o privadas y, en general, para que la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS cumpla las demás finalidades establecidas en el aviso de privacidad publicado en http://cas.gov.co, el cual declara haber leído previamente al otorgamiento de la autorización.

Como titular de la información tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar sus datos personales, solicitar prueba de la autorización otorgada para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos. El responsable del tratamiento es la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS, ubicada en la Carrera 12 No. 9-06, San Gil, Santander PBX: (57 7)723 8925, 7240765 correo electrónico: contactenos@cas.gov.co

ACTA DE TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO
CONTRATO DE OBRA No. 01053-2025

CONTRATO DE OBRA	01053-2025	
CONTRATANTE	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER-CAS	
NIT	804.000.292-0	
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL SISTEMAS SILVOPASTORILES	
NIT	901.980.916-3	
REPRESENTANTE LEGAL	MARIA MAGDALENA CADENA ZARATE	
	C.C. 1.096.211.185 de Barrancabermeja	
OBJETO	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS PRODUCTIVOS SILVOPASTORILES EN PRADERAS ESTABLECIDAS EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER	
VALOR DEL CONTRATO	QUINIENTOS VEINTIDÓS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS MCTE. ($522.835.089,00) IVA incluido	
TIEMPO DE EJECUCIÓN INICIAL	CUATRO (04) MESES Y QUINCE (15) DÍAS SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	
INTERVENTORÍA	HERNANDO LEGUIZAMÓN GALINDO	
IDENTIFICACIÓN R/L	C.C. 7.160.171 de Tunja	
SUPERVISOR	EDNA ROCIO CASTELLANOS MARTINEZ	
	Subdirectora de Planeación y Ordenamiento Ambiental.	
ACTA DE INICIO	**FECHA DE INICIO**: 08 de septiembre de 2025	**FECHA DE TERMINACIÓN:** 31 de diciembre de 2025

En San Gil, a los treinta y un (31) días del mes de diciembre de dos mil veinticinco (2025), se reunieron las partes intervinientes en el presente contrato contando con la participación de la señora **MARIA MAGDALENA CADENA ZÁRATE**, identificada con cédula de ciudadanía No. **1.096.211.185** de Barrancabermeja , Representante legal de la **UNIÓN TEMPORAL SISTEMAS SILVOPASTORILES** , identificada con NIT **901.980.916-3** en calidad de Contratista, y **HERNANDO LEGUIZAMÓN GALINDO** identificado con cédula de ciudadanía No. **7.160.171** de Tunja, en calidad de Interventoría externa del Contrato de Obra Pública No. **01053-2025** , con el fin de suscribir la presente ACTA DE TERMINACIÓN del contrato No. **01053-2025** cuyo objeto es **"IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS PRODUCTIVOS SILVOPASTORILES EN PRADERAS ESTABLECIDAS EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER"**; y dando cumplimiento a la cláusula Décimo cuarta teniendo en cuenta las siguientes consideraciones.

CONSIDERACIONES

1. Que el día veintisiete (27) de agosto de 2025 , se suscribió el CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 01053-2025 , entre la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE

SANTANDER CAS y la UNIÓN TEMPORAL SISTEMAS SILVOPASTORILES (Integrantes: ASOCIACIÓN INNOVADORES DE LA RECUPERACIÓN ECOLÓGICA AIRE con NIT 900.860.154-1, con un porcentaje de participación del 80%; TRANSTECOL S.A.S con NIT 804.004.470-3, con un porcentaje de participación del 10%; y CORPORACIÓN PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA C.I.T.I. con NIT 804.007.757-5, con un porcentaje de participación del 10%) , representado legalmente por la señora MARIA MAGDALENA CADENA ZÁRATE con C.C. No. 1.096.211.185 de Barrancabermeja, con el objeto de realizar la "IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS PRODUCTIVOS SILVOPASTORILES EN PRADERAS ESTABLECIDAS EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER" por un valor de QUINIENTOS VEINTIDÓS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS M. CTE. ($522.835.089,00).

2. Que el día 08 de septiembre de 2025, se suscribió ACTA DE INICIO del contrato de obra No. 01053-2025.

3. Que mediante el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 25-03666 del 20 de mayo de 2025 y el consecuente Registro Presupuestal No. 25-06160 de fecha 27 de agosto de 2025, la Corporación garantizó la suficiencia de recursos para amparar el gasto derivado de la ejecución del proyecto, con cargo a los rubros destinados a la conservación de la biodiversidad y servicios ecosistémicos.

4. Que la vigilancia de la ejecución del contrato fue realizada mediante interventoría técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica a través del contrato de interventoría No.1019-2025, conforme a lo establecido en la Cláusula Novena del clausulado contractual, con el objeto de asegurar que las actividades se ajusten estrictamente al anexo técnico y a las necesidades de restauración del territorio.

5. Que, en desarrollo del objeto contractual, el contratista ejecutó satisfactoriamente la implementación de acciones de restauración, la instalación de aislamientos con postes de madera plástica y alambre de púas, la limpieza y adecuación de terrenos para el establecimiento de pasturas, así como la instalación de sistemas de reservorio de agua de 5.000 litros y la plantación de especies forestales priorizadas como Abarco, Cedro y Guayacán.

6. Que, a la fecha de suscripción del presente documento, se certifica por parte de la interventoría el cumplimiento del 100% de las actividades pactadas dentro del término legal de ejecución, el cual venció el día 31 de diciembre de 2025 sin que se presentaran suspensiones o prórrogas que modificaran el cronograma inicial.

7. Que, de conformidad con lo previsto en la Cláusula Décima Cuarta, el contrato llega a su etapa de terminación definitiva por vencimiento del plazo y cumplimiento integral de las obligaciones contraídas, procediendo las partes a formalizar el cierre de la ejecución para dar inicio al respectivo trámite de recibo a satisfacción y liquidación del vínculo negocial.

cas.gov.co
SC3264-1
SA367-1
ST-CER944508

8. Que, en virtud de lo anteriormente expuesto,

ACUERDAN

PRIMERO: Que se da por terminado el tiempo de ejecución del **Contrato de Obra No. 01053-2025**, en el que se certifica por parte de HERNANDO LEGUIZAMÓN GALINDO interventor externo, que la empresa **UNIÓN TEMPORAL SISTEMAS SILVOPASTORILES**, da cumplimiento del 100% de las actividades establecidas en el contrato y su anexo técnico.

SEGUNDO: Que se procederá por parte de la interventoría a realizar la respectiva verificación y recibo de las actividades contratadas, para lo cual la **UNIÓN TEMPORAL SISTEMAS SILVOPASTORILES** deberá realizar los respectivos ajustes o recomendaciones por parte de la interventoría y presentar el informe final técnico, administrativo y financiero con los respectivos soportes y evidencias con el fin de proceder con el acta de recibo a satisfacción y posterior liquidación. Teniendo en cuenta lo anterior, una vez la interventoría verifique y apruebe las actividades e informes y se realice la respectiva Liquidación de Contrato No. 01053-2025, la **CAS** efectuará el pago final correspondiente como saldo a favor del contratista conforme a la disponibilidad de recursos y la forma de pago pactada.

En constancia firman quienes en ella intervinieron,

HERNANDO LEGUIZAMÓN GALINDO
C.C. No. 7.160.171 de Tunja
Interventoría Externa

MARIA MAGDALENA CADENA ZARATE C.C. No. 1.096.211.185 de Barrancabermeja **UNIÓN TEMPORAL SISTEMAS SILVOPASTORILES**
Contratista

cas.gov.co

ACTA DE RECIBO FINAL
CONTRATO DE OBRA No. 01053-2025
LP2-006-2025

En la ciudad de San Gil a los dieciséis (16) días del mes de abril de 2026, se reunieron los señores: **EDNA ROCIO CASTELLANOS MARTINEZ** actuando en calidad de Supervisor de la **CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS**, el señor **HERNANDO LEGUIZAMÓN GALINDO** identificado con cedula de ciudadanía No. 7.160.171 de Tunja, en calidad de Interventor Externo del Contrato de obra No. 01053-2025 y por otra parte, **MARIA MAGDALENA CADENA ZARATE,** identificada con cedula de ciudadanía No. 1.096.211.185 de Barrancabermeja, Representante Legal del UNIÓN TEMPORAL SISTEMAS SILVOPASTORILES, identificada con NIT. 901.980.916-3 en calidad de Contratista, con el fin de suscribir la presente ACTA DE RECIBO FINAL del contrato de obra No. 01053-2025.

1. DATOS GENERALES DEL PROCESO

CONTRATO No.	01053-2025
No. PROCESO SECOP	LP2-006-2025
CONTRATANTE	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER-CAS
NIT	804.000.292-0
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL SISTEMAS SILVOPASTORILES
NIT	901.980.916-3
REPRESENTANTE LEGAL	MARIA MAGDALENA CADENA ZARATE
OBJETO	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS PRODUCTIVOS SILVOPASTORILES EN PRADERAS ESTABLECIDAS EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO	QUINIENTOS VEINTIDÓS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS MCTE. ($522.835.089,00) IVA incluido
FORMA DE PAGO:	LA CORPORACION pagará al CONTRATISTA el valor del contrato, de la siguiente manera: Mediante actas parciales de avance de obra, certificadas por la interventoría, hasta un máximo del 90% del valor total del contrato y el saldo del 10% se pagará

	con la suscripción del acta de Recibo Final, previo recibo a satisfacción de la interventoría con la entrega del informe final y los soportes respectivos y evidencias: acta de recibo final de las obras. Informe final, Archivo fotográfico de realización de los trabajos, acta de terminación del contrato y esta acta obtenga el visto bueno del interventor de la obra y se encuentre debidamente firmada por el contratista, soportes del pago de nómina (salarios y prestaciones sociales), seguridad social y aportes parafiscales, Que el interventor expida un certificado de recibo final de la obra a entera satisfacción. Para efectos de cada pago, el contratista deberá adjuntar con los informes, la factura y la constancia del pago de los aportes al sistema general de seguridad social en salud y pensiones, riesgos profesionales y aportes parafiscales, de la totalidad del personal asignado para la ejecución del contrato. El oferente adjudicatario deberá indicar el número de cuenta activa y el nombre del titular de la misma en donde La CORPORACIÓN consignará los respectivos pagos. Cuando se realicen contratos con auto retenedores, deberán informar en la factura esta condición a fin de no realizar retención alguna. Los pagos incluirán todos los costos directos e indirectos y el IVA, en que incurra el contratista para la ejecución del objeto y obligaciones contractuales conforme con la oferta presentada por él. Los pagos antes señalados se realizarán con sujeción al PAC de la C.A.S., de tal manera que ésta no asume responsabilidad alguna por la demora que pueda presentarse en dichos pagos, y por lo tanto, EL CONTRATISTA cumplirá con sus obligaciones y no podrá aducir como justificación alguna para su no realización, demora en el pago. La C.A**.**S. hará las retenciones a que haya lugar sobre el pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes, el contratista asumirá los impuestos de ley aplicables al contrato. Los pagos serán efectuados por la Sub dirección Administrativa y Financiera en la cuenta bancaria designada por EL CONTRATISTA tal como consta en documento presentado por el mismo, previo cumplimiento de los requisitos establecidos para tal fin. EL CONTRATISTA con la suscripción del contrato, acepta que en el evento que el valor total a pagar por cada factura tenga centavos, estos deberán ser ajustados o aproximados al peso, ya sea por exceso cuando la suma sea igual o mayor a 0,50 centavos o por defecto cuando la suma sea menor a 0.50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el contrato. La C.A**.**S. sólo adquiere obligaciones con el adjudicatario en el presente proceso de selección y bajo ningún motivo o circunstancia efectuará pagos a terceros. **Nota:** EL

	CONTRATISTA DEBE PRESENTAR UN CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO CON LAS ACTIVIDADES PRINCIPALES QUE DENOTA LA FORMA DE PAGO Y RESPECTO DEL CUAL LA INTERVENTORIA HARÁ EL RESPECTIVO SEGUIMIENTO.
PLAZO INICIAL	CUATRO (04) MESES Y QUINCE (15) DÍAS, sin exceder el 31 de diciembre de 2025
FECHA ACTA DE INICIO	08 de septiembre de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	31 de diciembre de 2025

ADICIONES:

NÚMERO DEL ADICIONAL	FECHA DE SUSCRIPCION	VALOR ADICIONADO
No aplica		

PRORROGAS:

NÚMERO DE PRORROGA	FECHA DE SUSCRIPCION	TIEMPO
No aplica		

MODIFICATORIO:

NÚMERO DE MODIFICATORIO	FECHA DE SUSCRIPCION	OBJETO DEL MODIFICATORIO
1	26/12/2025	Modificación de la Clausula Cuarta del contrato de obra No. 1053-2025, debido a que 3 beneficiarios inicialmente referidos, no cumplían con las condiciones aptas para ser intervenidos o desistieron de su participación, lo que dio lugar a la búsqueda de nuevos beneficiarios.

SUSPENSIONES

No. SUSPENSION	FECHA DE SUSCRIPCION	TIEMPO DE LA SUSPENSION	SUSCRIPCION DEL REINICIO
No aplica			

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

PLAZO FINAL	FECHA DE TERMINACION DEFINITIVA
TRES (03) MESES Y VEINTICUATRO (24) DÍAS	31 de diciembre de 2025

Que el balance Financiero es el siguiente:

VALOR DEL CONTRATO:	$ 522.835.089,00
DURACIÓN DEL CONTRATO	CUATRO (04) MESES Y QUINCE (15) DÍAS, sin exceder el 31 de diciembre de 2025
FECHA DE INICIO	08 de septiembre de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	31 de diciembre de 2025
VALOR ACTA RECIBO FINAL (a pagar)	$ 522.835.089,00
SALDO POR PAGAR	$0,00

CONSIDERACIONES

1. Que el día veintisiete (27) de agosto de 2025 , se suscribió el CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 01053-2025 , entre la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS y la UNIÓN TEMPORAL SISTEMAS SILVOPASTORILES (Integrantes: ASOCIACIÓN INNOVADORES DE LA RECUPERACIÓN ECOLÓGICA AIRE con NIT 900.860.154-1, con un porcentaje de participación del 80%; TRANSTECOL S.A.S con NIT 804.004.470-3, con un porcentaje de participación del 10%; y CORPORACIÓN PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA C.I.T.I. con NIT 804.007.757-5, con un porcentaje de participación del 10%) , representado legalmente por la señora MARIA MAGDALENA CADENA ZÁRATE con C.C. No. 1.096.211.185 de Barrancabermeja, con el objeto de realizar la “IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS PRODUCTIVOS SILVOPASTORILES EN PRADERAS ESTABLECIDAS EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER” por un valor de QUINIENTOS VEINTIDÓS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS M. CTE. ($522.835.089,00).

2. Que el día 08 de septiembre de 2025, se suscribió ACTA DE INICIO del contrato de obra No. 01053-2025.

3. Que la vigilancia de la ejecución fue reforzada mediante interventoría técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica, conforme a lo establecido en la Cláusula Novena del clausulado contractual, con el objeto de asegurar que las actividades se ajustaran estrictamente al anexo técnico y a las necesidades de restauración del territorio.

4. Que, en desarrollo del objeto contractual, el contratista ejecutó satisfactoriamente la implementación de acciones de restauración, la instalación de aislamientos con postes de madera plástica y alambre de púas, la limpieza y adecuación de terrenos para el establecimiento de pasturas, así como la instalación de sistemas de reservorio de agua de 5.000 litros y la plantación de especies forestales priorizadas como Abarco, Cedro y Guayacán.

5. Que, a la fecha de suscripción del presente documento, se certifica por parte de la interventoría el cumplimiento del 100% de las actividades pactadas dentro del término legal de ejecución, el cual venció el día 31 de diciembre de 2025 sin que se presentaran suspensiones o prórrogas que modificaran el cronograma inicial.

6. Que, de conformidad con lo previsto en la Cláusula Décima Cuarta, el contrato llega a su etapa de terminación definitiva por vencimiento del plazo y cumplimiento integral de las obligaciones contraídas, procediendo las partes a formalizar el cierre de la ejecución para dar inicio al respectivo trámite de recibo a satisfacción y liquidación del vínculo negocial.

7. Que el 31 de diciembre de 2025 se suscribe acta de terminación por mutuo acuerdo del contrato de obra No. 01053-2025, con el fin de que la supervisión y la interventoría realicen la respectiva verificación y recibo de las actividades contratadas, para lo cual el contratista se compromete a realizar los ajustes o recomendaciones que haga la supervisión, así como presentar los respectivos soportes al informe final para proceder posteriormente a su recibo final y liquidación.

8. Que la supervisión realiza visita de verificación al cumplimiento de las actividades planteadas en el objeto contractual, los días 11, 12 y 13 de febrero de 2026, evidenciándose el 100% de ejecución de las actividades objeto del contrato.

9. Que el contratista UNIÓN TEMPORAL SISTEMAS SILVOPASTORILES, identificado con NIT. 901.980.916-3, hace entrega a HERNANDO LEGUIZAMÓN GALINDO (Interventoría Externa) del informe final mediante oficio con fecha 20 de febrero de 2026, allegando toda la documentación para el trámite del acta de recibo final correspondiente a la ejecución total del objeto contractual, que contiene lo siguiente:

- Oficio Dirigido a la Supervisión
- Informe Contable y Financiero.
- Factura Electrónica
- RUT
- Certificación Bancaria
- Certificado de Pago de Parafiscales
- Copia Pago de Parafiscales
- Copia Pago de Nómina
- Tarjeta Profesional Contadora
- Certificado de Junta de Contadores
- Informe final de obra e interventoría
- Anexos

10. Que las actividades pactadas y ejecutadas corresponden a las siguientes:

PRESUPUESTO EJECUTADO						
ITEM	**DESCRIPCIÓN**		**UND**	**CANTIDAD**	**V/ UNITARIO**	**V/ TOTAL**
1. Servicio de restauración de ecosistemas	1.1	Limpieza e instalación del cerramiento perimetral de la unidad productiva	Ha	15	$ 10.753.685	$ 161.305.275
	1.2	Limpieza, adecuación del terreno y establecimiento de pasturas	Ha	30,00	$ 2.018.149	$ 60.544.470
	1.3	Instalación de sistemas para el reservorio de agua.	Un	15	$ 4.372.250	$ 65.583.750
2. Servicio de establecimiento de especies vegetales	2.1	Siembra de árboles forestales y forrajeros.	Ha	30,00	$ 3.727.655	$ 111.829.650
				TOTAL, COSTO DIRECTO		**$ 399.263.145**
ADMINISTRACION (24%)			%	24,00%		$ 95.823.154,80
IMPREVISTOS (1%)			%	1,00%		$ 3.992.631,45
UTILIDAD (5%)			%	5,00%		$ 19.963.157,25
IVA 19% (Sobre la Utilidad)			%	19,00%		$ 3.792.999,88

TOTAL, COSTO INDIRECTO	**$ 123.571.943**
TOTAL, COSTOS PROYECTO	**$ 522.835.089**

El valor total ejecutado corresponde a QUINIENTOS VEINTIDÓS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS MCTE. ($522.835.089,00) IVA incluido

11. Que el contratista presentó toda la documentación requerida para dar trámite al acta de recibo final, de acuerdo con los soportes recibidos se encuentra a paz y salvo con los sistemas de seguridad social en salud, pensión, ARL y parafiscales, esta interventoría externa de conformidad con lo dispuesto en el artículo 83 de la Constitución Política, presume su veracidad, como se puede evidenciar en el informe de interventoría.

12. Que la CAS hará el desembolso al contratista UNIÓN TEMPORAL SISTEMAS SILVOPASTORILES, identificado con NIT. 901.980.916-3, representada legalmente por la señora MARIA MAGDALENA CADENA ZARATE identificada con CC 1.096.211.185 de Barrancabermeja, por el valor equivalente a QUINIENTOS VEINTIDÓS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS MCTE. ($522.835.089,00) MCTE correspondiente al valor total de la ejecución física y financiera descrita en la presente acta de recibo final equivalente al 100% del objeto contractual.

13. Que el interventor HERNANDO LEGUIZAMÓN GALINDO y según los términos y condiciones establecidos en el contrato de Obra No. 01053-2025, avala lo que en la presente acta se suscribe.

14. La ejecución del contrato de obra recibida por la interventoría externa se encuentra de conformidad con la relación de ítems y cantidades descritas en los anexos y el informe de supervisión e interventoría **F-PCT-034-2022** que forman parte integral de la presente acta.

15. Que el porcentaje de ejecución del Contrato de obra No. 01053-2025 de un 100%.

16. Que, en razón a lo expuesto las partes,

ACUERDAN

1. Recibir a entera satisfacción por parte de la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS, el objeto contractual y el informe final presentado por el contratista y recibidos a satisfacción por la Interventoría externa, HERNANDO LEGUIZAMÓN GALINDO.

2. El Interventor HERNANDO LEGUIZAMÓN GALINDO, ha verificado la ejecución de las actividades del Contrato de obra No. 01053-2025, observando que cumple con lo estipulado en el objeto contractual, de acuerdo con la relación de documentos y con los anexos que forman parte integral de la presente acta.

3. Autorizar el desembolso al contratista UNIÓN TEMPORAL SISTEMAS SILVOPASTORILES el valor equivalente a QUINIENTOS VEINTIDÓS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS MCTE. ($522.835.089,00) MCTE correspondiente al pago final de la ejecución total del objeto contractual.

En constancia, de lo anterior se firma la presente acta por las personas que en ella intervinieron:

MARIA MAGDALENA CADENA ZARATE
R.L UNIÓN TEMPORAL SISTEMAS SILVOPASTORILES
CONTRATISTA

HERNANDO LEGUIZAMÓN GALINDO
INTERVENTOR

Vo.bo. EDNA ROCIO CASTELLANOS MARTINEZ
Supervisora
Subdirectora de Planeación y Ordenamiento Ambiental – CAS-

Proyectó: Hernando Leguizamón Galindo – RL Interventoría
Revisó: Natalia Estevez - Apoyo Supervisión CAS
Revisó: Abg. Edilsa Karina Figueredo A.-Abogada SPL CAS. EKarinaFigueredoA

Mediante el registro de sus datos personales en el presente documento usted autoriza a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos con la finalidad de que lleve el control de ingreso o asistencia, lo contacte , consulte la información registrada en otras bases de datos o archivos de cualquier entidad pública o privada, nacional o internacional, adelante trámites ante autoridades y atienda requerimientos de entidades públicas o privadas y, en general, para que la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS cumpla las demás finalidades establecidas en el aviso de privacidad publicado en http://cas.gov.co, el cual declara haber leído previamente al otorgamiento de la autorización.
Como titular de la información tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar sus datos personales, solicitar prueba de la autorización otorgada para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos. El responsable del tratamiento es la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS, ubicada en la Carrera 12 No. 9-06, San Gil, Santander PBX: (57 7)723 8925, 7240765 correo electrónico: contactenos@cas.gov.co

	REEVALUACION DE PROVEEDORES DE OBRAS PUBLICAS	Código F-PCT-013 Versión: 07 Página 1 de 3 Fecha de Aprobación:01/06/2020

REEVALUACION DE PROVEEDORES DE OBRAS PUBLICAS	
NOMBRE DEL PROVEEDOR: **UNIÓN TEMPORAL SISTEMAS SILVOPASTORILES**	**Numero del Contrato o Convenio** **01053-2025**
PRODUCTO O SERVICIO SUMINISTRADO: IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS PRODUCTIVOS SILVOPASTORILES EN PRADERAS ESTABLECIDAS EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER	**Fecha de Evaluación** **15-01-2026**
EVALUADO POR : HERNANDO LEGUIZAMÓN GALINDO	
OBSERVACIONES: El proveedor suministró el servicio contratado cumpliendo con los términos, condiciones técnicas y plazo establecidos en el contrato 00732-2025	

CRITERIOS	CALIFICACIÓN
CUMPLIMIENTO DE PLAZOS	0.75
CALIDAD DE LA OBRA	1.80
PROGRAMAS DE GESTIÓN	0.40
CONTROLES OPERACIONALES	0.60
REQUISITOS LEGALES	0.80
FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA	0.50
CALIFICACION TOTAL	4.85

Nivel de Calificación

Tipo de Proveedor	Calificación	Acción a Seguir
Proveedor Confiable	Mayor o igual a 3 puntos.	Se envía comunicación al proveedor para invitarlo a que continúe mejorando continuamente su desempeño.
Proveedor No Confiable	Menor a 3 puntos.	Se envía comunicación al proveedor en la cual se le recomienda mejorar su desempeño con base en los aspectos débiles.

CRITERIOS	PESO (%)	PUNTAJE			CALIFICACIÓN
		5	3	1	
Cumplimiento de Plazos: como referencia los plazos establecidos para la ejecución del objeto del contrato.	15%	El objeto se ejecuta conforme a lo pactado en el contrato.	Existen prórrogas que equivalen hasta el 30% del plazo inicialmente establecido por demoras u otras situaciones inherentes a los proveedores.	Existen prórrogas que equivalen a más del 50% del plazo inicialmente establecido por demoras u otras situaciones inherentes a los proveedores.	
Calidad de la Obra: Hace referencia al cumplimiento del objeto contractualmente pactado, al valor agregado generado.	35%	El proveedor cumple con el 100% del objeto contractualmente pactado.	N/A	El proveedor incumple con el objeto contractualmente pactado.	
Programas de Gestión (Ambiental y Seguridad y Salud Ocupacional)	10%	Siempre aplicó los programas de gestión	Algunas veces aplicó los programas de gestión	No aplico los programas de gestión	
Controles Operacionales	15%	Siempre aplicó los controles operacionales	En algunas ocasiones aplicó los controles operacionales	No aplicó los controles operacionales exigidos	
Requisitos Legales	15%	Siempre cumplió con los requisitos legales	En algunas ocasiones aplicó los requisitos legales	Nunca cumplió con los requisitos legales	

Formación y Toma de Conciencia	10%	Todos los trabajadores conocían los requisitos ambientales y en todos se evidencia la toma de conciencia (lo aplican)	Algunos trabajadores del contratista conocen y aplican los requisitos ambientales	No se evidenció toma de conciencia de los requisitos ambientales exigidos	

Nota: Para diligenciar la casilla de **CALIFICACIÓN** se debe multiplicar el puntaje asignado en cada criterio, por el porcentaje establecido y se lleva al cuadro resumen de la primera hoja, donde se obtiene la **CALIFICACIÓN TOTAL** que es la sumatoria de las calificaciones asignadas.

FIRMA DEL INTERVENTOR

Mediante el registro de sus datos personales en el presente documento usted autoriza a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos con la finalidad de que lleve el control de ingreso o asistencia, lo contacte , consulte la información registrada en otras bases de datos o archivos de cualquier entidad pública o privada, nacional o internacional, adelante trámites ante autoridades y atienda requerimientos de entidades públicas o privadas y, en general, para que la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS cumpla las demás finalidades establecidas en el aviso de privacidad publicado en http://cas.gov.co, el cual declara haber leído previamente al otorgamiento de la autorización.
Como titular de la información tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar sus datos personales, solicitar prueba de la autorización otorgada para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos. El responsable del tratamiento es la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS, ubicada en la Carrera 12 No. 9-06, San Gil, Santander PBX: (57 7)723 8925, 7240765 correo electrónico: contactenos@cas.gov.co

SILVOPASTORICES.

08/09/2025
Primera Reunion con Interventoria para retroalimentacion del contrato

* Donay A. Sanchez

09/09/2025
Solicitud de Informacion de beneficiarios
* Gabrielina Diaz de Castillo.
* Jaime Quiroga Medina
* Olfer Alza Medina
* Nilson Cruz Agudelo.

*Dany A Sanchez

10/09/2025
Solicitud de Informacion de beneficiarios
*Flor Maria Mateus de Orduña
* Baluino Orduña de Pardo.
* Jorge Augusto Fuentes Barrera.
* Jorge Traslaviña.

*Dany A Sanchez

11/09/2025
Se Recoge Informacion de beneficiarios Alexander Meb - Atanael Medina - Olga Lucia Diaz - Emilse Orduño Medina Liliana Melo Galeano.

* Dany Sanchez

12/09/2025
Se Realiza Analisis de la Informacion

*Dany A Sanchez

15/09/2025
Se hace contacto con posibles Proveedores para compra de Insumos

* Dany A. Sanchez

16/09/2025
Se hace reunion con Interventoria

*Dany. Sanchez

17/09/2025
Se hace contacto con los beneficiarios.

* Dany A Sanchez

18/09/2025
Socializacion del contrato en el municipio de la paz en compañia de la Alcaldesa, Delegados de la CAS, Gobernacion de Santander Interventoria beneficiarios y Contratista.

* Dany Sanchez

19/09/2025
Se hace los primeros acercamientos personales con los beneficiarios

* Dany Sanchez

22/09/2025.
Visita a Proveedore para Insumo del contrato en la ciudad de Bogota

* Dany Sanchez

23/09/2025.
Visita a Moniquira para Cotizacion de postes de concreto.

*Dany Sanchez

24/09/2025
Visita a proveedor para la cotizacion de semillas de posto y forragero para el contrato.

*Dany sanchez

25/09/2025
Visita proveedores en la paz para los insumo del contrato

*Dany Sanchos

26/09/2025
Reunion con Interventoria para tratar temas de las dificultades con los accesos a los predios y condiciones naturales para la entrega de los Insumos

27/09/2025.
Visita a los Predios de flor Maria Moteos de Orduña se realiza reconocimiento de los predios, vias de acceso, modalidad de transporte.

*Dany Sanchez

29/09/2025
Visita a el predio de la señora Maria Elvia SantaMaria, se realiza reconocimiento del predio vias de acceso, modalidad de transporte.

*Dany A-Sanchez

30/09/2025
Visita a el predio del señor Alexander Melo. se hace reconocimiento de Predios vias de acceso y que metodo de transporte se puedeutilzar

*Dany Sanchez

01/10/2025
Reconocimiento del predio del señor Atanael Medina identificar las vias para la entrega de materiales

* Dany Sanchez

02/10/2025.
Se realza e identifica adecuacion para los caminos para la entrega ole Insumo para la señora Flor Maria Mateus.

* Dany Sanchez

03-10/2025
Reconocimiento predio Emilse Orduña
Identificacion de vias de acceso.
modalidad de transporte que pueden vehicular o mular,
arreglo de caminos para el transporte de Materiales

* Dany Sanchez

06-10/2025
Visita a Predio Balvino Orduña adecuacion de vias para la entrega de Materiales.

* Dany Sanchez

07/10/2025
Visito a Predio Olga lucia Diaz vias de acceso para el transporte de los materiales.

* Dany Sanchez

08/10/2025.
Visita a Predio Liliana Melo para el transporte y adecuacion de la via de acceso de Materiales

* Dany A Sanchez

09/10/2025.
Visita a Predio Jorge Augusto Fuentes reconocimiento de los predios, establecer vias de acceso, modalidad de transporte

06-10/2025
Visita a Predio Balvina Orduña
adecuacion de vias y para la
entrega de Materiales.



*Dany Sanchez

07/10/2025
Visita a Predio Olga lucia Diaz
vias de acceso para el transporte
de los materiales.



*Dany Sanchez

08/10/2025.
Visita a Predio Liliana Melo
para el transporte y adecuacion
de la via de acceso de Materiales



*Dany A sanchez

09/10/2025.
Visita a Predio Jorge Augusto Fuentes
reconocimiento de los predios, establecer
vias de acceso, modalidad de transporte

que se pueda utilizar su mula o vehiculo.

* Dany Sanchez

10/10/2025.

Se Realiza Adecuacion de Caminos para el predio de Jorge Fuentes Se hace reconocimiento de olfer alzo medina.

* Dany Sanchez

14/10/2025

Empezo el dia de hoy a transportar los primeros insumos a la cabecera del municipio de la paz.

*Dany Sanchez

15/10/2025

Visita a Predio de Olfer alzo Medina. se hace reconocimiento predio, diseño lo parcela con los propietarios. identificacion de

cerca, arboles, y tanque.

*Dany Sanchez

16/10/2025

Visita a Parcela de Nilson Cruz identificacion, reconocimiento de predios., modalidad de transporte. recorrido al area a intervenir y identificar donde quedaran ubicada. los insumos. y el area cerca.

*Dany Sanchez

17/10/2025.

Se esta trabajando en el transporte de insumos a la cabecera del Municipio de la paz.

*Dany Sanchez

20/10/2025.

Recorido de predio y diseño de la parcela con Jorge Augusto fuentes en el sitio se hizo recorrido del area a intervenir

identificacion donde va la cerca, los arboles y tanque

* Dany Sanchez

21/10/2025

Recomido por predio Maria Elvira Santamaria diseño parcela recomido del area a intervenir

*Dany Sanchez

22/10/2025

Recomido por predio Alexander Melo reconocimiento y diseño de parcela identificacion donde estara la cerca arboles tanque.

*Dany A. Sanchez

23/10/2025

Se sigue el reconocimiento predio de Atanael Medina. diseño y identificacion de donde se va a ubicar los cercas, arboles.

*Dany A. Sanchez

24/10/2025.

Visita predio Olga Lucia Diaz para hacer diseño y ubicacion donde se va a poner cerca

*Dany. A. Sanche

27/10/2025.

Se hace traslado de Insumo al predio de la señora Flor Maria Mateus postes, alambre, grapas

Se descargo para hacer traslado en vehiculos de menor carga

*Dany Sanchez

28/10/2025

Traslado de insumos al predio de la señora Maria elvira Santamaria Calaurbre, grapas postes

*Dany Sanchez

29/10/2025.
Traslado de Insumos a los Predios del señor Afranoel Medina Calambre Postes y Tanque para adecuacion

*Davy Sanchez

30/10/2025
Movilizacion de Insumo a los Predios de la señora Emilse oroluña Calambre- Poste -Tanque para adecuacion.

*Davy Sanchez

31/10/2025
Movilizacion a los Predios del señor Alexander Melo Calambre- Poste-Tanque para adecuacion de las cercas.

*Davy Sanchez

04/11/2025.
Movilizacion de Insumos.

*Davy Sanchez

05/11/2025.
Transporte de Insumo inicio de Actividades en Predios de Salvina orduña.

*Davy Sanchez

06/11/2025.
Transporte de Insumo se inicio. labores limpieza manual se hace retiro de arbustos, maleza residuos. Solidos del area emilse orduña.

*Davy Sanchez

07/11/2025.
Transporte de Insumo se inicia labores en los predios de nilso cruz realiza limpieza manual.

*Davy Sanchez

10/11/2025.
Transporte insumos inicio actividad en el predio Liliana melo.
realiza limpieza manual.

*Dany Sanchez

11/11/2025.
Movilizacion de materiales Liliana melo. recogiendo residuos solidos del area o intervenir retirar las hormigas

*Dany Sanchez

12/11/2025
Realiza visita parcela Holger Anza diseño la parcela. visito la parcela Gabrielina Diaz Se pusieron cordenadas, se hizo movimiento de postes a la parcela de Jaime Diaz, instalo el 80% de la cerca
Se hizo movilizacion en los predios vereda trocha se llevo material Nilson Cruz y Liviana melo a la vereda la linteaa.
Diseño traso en la parcela de la señora Flor Maria Mateus. para siembra

*Dany Sanchez

13/11/2025.
Terminacion de la cerca donde el beneficiario Jaime Diaz, se inicio.
la colocade incabo de alambre en el predio del señor Atanael Medina.
Movilizacion de postes a Hombro el predio. del señor Atanael.

*Dany Sanchez

14/11/2025.
Continua. las tareas del dia Anterias transporte de poste en el predio del señor Atanael. Medina.

*Dany Sanchez

10/11/2025.
Transporte insumos inicio actividad en el predio Liliana melo.
realiza limpieza manual.

*Dany Sanchez

11/11/2025.
Movilizacion de materiales Liliana melo. recogiendo residuos solidos del area o intervenir retirar las hormigas

*Dany Sanchez

12/11/2025
Realiza visita parcela Holger Anzo diseño la parcela. visito la parcela Gabrielina Diaz se pusieron cordenadas, se hizo movimiento de postes a la parcela de Jaime Diaz, instalo el 80% de la cerca
Se hizo movilizacion en los predios vereda trocha se llevo material Nilson Cruz y Liliana melo a la vereda la linteaa.
Diseño traso en la parcela de la señora Flor Maria Mateus. para sembrar

*Dany Sanchez

13/11/2025.
Terminacion de la cerca donde el beneficiario Jaime Diaz, se inicio. la colocade incabo de alambre en el predio del señor Atanael Medina.
Movilizacion de postes a Hombro el predio. del señor Atanael.

*Dany Sanchez

14/11/2025.
Continua. las tareas del dia Anterias transporte de poste en el predio del señor Atanael. Medina.

*Dany Sanchez

18-11/2025

Se continuan actividades en la finca de don Emirso la señora Flor Mario Mateos - Siembra de Arboles plateas. Especie Maderable Siembra de Especie Forrajeras y ouyaulo plateado.

*Dany Sanchez

19/11/2025

Se terminan las actividades de cercado, de siembra de pasto y Forestales y Forrajeros en el predio de Emilse Orduña.

Tambien se terminaron las actividades en la parcela de la Señora Flor Maria Mateus solo falto el tanque de agua., traslado de insumos a Jorge Fuentes

*Dany Sanc

20-11/2025

En el predio de Maria Elvira Santamaría se sembraron los Forestales y Forrajeros quedando completa estas actividades. con el cercado 100%

21-11/2025

Se inician labores de trazado, dividido para siembra de Forestales, Forrajeros y pastos. en el predio de Alexander Melo y Sahid Lina Díaz

*Dany Sanchez

22-11/2025

Se inician labores de cercado en los predios de Liliana Melo y Olga Lucia Diaz en la Vereda la Linterna. y trazado para siembre

*Dany Sanchez

24-11/2025

Se da inicio a las al cercado de Nilson cruz. en trochas, Se hizo trazado y limpieza. se sembro en el predio de Manuel Medina la parcela queda 100% en cerca y siembre

*Dany Sanchez

25-11/2025

se dejaron los insumos para cercado, siembre de pastos y arboles en el predio de Ofir Alza. se hace limpieza mecánica y manual para hacer el trazado de la cerca

*Dany Sanchez

26-11/2025
se terminan las actividades de cercado y se realizo trazado y limpieza para la siembra de forestales, forrajeros y pasto en Ataniel Medina

*DanySanchez

27-11/2025
Se terminan las labores de siembra de pastos, arboles forestales y forrajeros en los predios de Olga Lucia Diaz y Liliana Mulo en la Libertad

*DanySanchez

28-11/2025
Se terminan labores de sembrado en predios de Nilson Cruz quedando 100% en cerca y siembra de pasto y arboles forestales y forrajeros y Jorge Fuentes

*DanySanchez

29-11/2025
Terminado de cercado y comienzo del trazado para la siembra de pasto y arboles en Belvira Arbotia

terminación de la cerca de Olfer Alza y trazado de siembra, terminación del sembrado en predios Ataniel Medina 100% actividades. Falta instalación de tanque
traslado de insumos a predios de Alejandro Santamaria, Julio León y Gabrielina Ovalle.

*DanySanchez

01-12-2025
Se siembra forestales, forrajeros y pastura en predios de Olfer Alza queda pendiente el tanque
se terminaron actividades de siembra en predios de Alexander Mulo y Gabrielina Diaz.

*DanySanchez

02-12-2025
Se inician labores de limpieza y trazado para cerca en Alejandro Santamaria y Julio Leon

*DanySanchez

03-12-2025
Se instala cerco en predios de Alejandro Santamaria y trazado para siembra de Forestales, Forrajeras y pasto.
Se inician actividades de limpieza y trazado de arco, ahoyado para postes en predios Gabriel Ovalle.
*Dany Sanchez

04-12-2025
Se termina cerco en predios de Julio León y se prepara suelo para siembra y trazado
*Dany Sanchez

05.12.2025
Se termina la instalación de cerco en predios de Gabriel Ovalle
Se inia preparacion del suelo y trazado para siembra.
*Dany Sanchez

06-12-2025
Se prepara material para siembra, se suspende labor por lluvias en los predios
*Dany Sanchez

09-12-2025
Se inician actividades de ahoyado y siembra de especies Forestales, Forrajeras y pasto en el predio de Alejandro Santamaria
*Dany Sanchez

10-12-2025
Se inician actividades de siembra en predio de Julio León, ahoyado, siembra de semilla Forrajera y pasto, siembra de Forestales.
*Dany Sanchez

11-12-2025
Se terminan actividades de siembra en predio de Alejandro Santamaria.
*Dany Sanchez

Powered by CamScanner

03-12-2025
Se instala cerco en predios de Alejandro Santamaria y trazado para siembra de Forestales, Forrajeras y pasto.
Se inician actividades de limpieza y trazado de arco, ahoyado para postes en predios Gabriel Ovalle.
*Dany Sanchez

04-12-2025
Se termina cerco en predios de Julio León y se prepara suelo para siembra y trazado
*Dany Sanchez

05.12.2025
Se termina la instalación de cerco en predios de Gabriel Ovalle
Se inia preparacion del suelo y trazado para siembra.
*Dany Sanchez

06-12-2025
Se prepara material para siembra, se suspende labor por lluvias en los predios
*Dany Sanchez

09-12-2025
Se inician actividades de ahoyado y siembra de especies Forestales, Forrajeras y pasto en el predio de Alejandro Santamaria
*Dany Sanchez

10-12-2025
Se inician actividades de siembra en predio de Julio León, ahoyado, siembra de semilla Forrajera y pasto, siembra de Forestales.
*Dany Sanchez

11-12-2025
Se terminan actividades de siembra en predio de Alejandro Santamaria.
*Dany Sanchez

Powered by CamScanner

12-12/25
Se realiza actividades de siembra de especies forrajeras, forestales y pasto en la parcela de Gabriela Ovalle.
*Dany Sanchez

13-12/2025
Se dio terminación a las actividades de siembra de semilla de pastos, forrajeras y plantas forestales en el predio de Segundo Julio León.
* Dany Sanchez

15-12-2025
Se realizó visita de la supervisión por parte de la gobernación de Santander. a los predios intervenidos.
Se termina la actividad de siembra de semilla de pastura, forestales y forrajeros, se hace adecuación del lugar para el tanque.
* Dany Sanchez

16-12-2025
continuamos las visitas de la supervisión e interventoría a los predios intervenidos se inicio la adecuación del lugar dónde se instalarán los sistemas para reservorio de agua en cada predio.
* Dany Sanchez

17-12-2025
Se terminaron las visitas de la supervisión e interventoría a los predios intervenidos.
Se continuo con la adecuación de los sitios donde se instalaran los sistemas para reservorio de agua
* Dany Sanchez

18-12-2025
Se realizaron los tanques de almacenamiento de agua con sus accesorios y llevados a bodega
*Dany Sanchez

19-12-2025
Se Realizo el traslado de los sistemas para reservorio de agua e instalación en los predios de Flor Maria Mateus y Emilia Ovalle.
*Dany Sanchez

20-12-2025
Se instalaron los sistemas para reservorio de agua en los predios de los beneficiarios Atanel Medina y Alexander Melo
*Dany Sanchez

22-12-2025
Se instalaron los Sistemas para reservorio de agua en los parcelas de las Señoras Olga Lucia Diaz y Liliana Melo
*Dany Sanchez

23-12-2025
Se instalo sistema para reservorio de agua en el predio de Maria Elvira Santamaria y Jaime Dias en la Vereda la Mesa y Olfel Alza
*Dany Sanchez

24-25 de diciembre no se trabajo.
*Dany Sanchez

26-12-2025
Se instalaron los sistemas para reservorio de agua en las parcelas de los beneficiarios Gabrielina Diaz y Jorge Fuentes en la Vereda Casas Blancas
*Dany Sanchez

27-12-2025
Se realizo la instalación de los sistemas para reservorio de agua en las parcelas de Gabrielina Ovalle y Nilson Cruz.
*Dany Sanchez

29-12-2025
Se instalo el sistema para reservorio de agua en los predios de los beneficiarios

Alejandro Santamaría y Julio León en la Mesa Central.

*Dany Sanchez

30-12-2025

Instalación del sistema para el reservorio de agua en la parcela de Balvina Orduña

*Dany Sanchez

31-12-2025

Finalización de actividades de campo.

*Dany Sanchez
