
Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1	000	INICIO	0 días	lun 6/04/26	lun 6/04/26
2	**001**	**CRONOGRAMA ALCALDÍA**	**539.75 días**	**lun 6/04/26**	**lun 27/09/27**
3	**001.001**	**PRELIMINARES**	**36 días**	**lun 6/04/26**	**sáb 9/05/26**
4	001.001.009	CERRAMIENTO	7 días	lun 6/04/26	sáb 11/04/26
5	001.001.010	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	2 días	sáb 11/04/26	mar 14/04/26
6	001.001.011	BODEGA	7 días	mar 14/04/26	mar 21/04/26
7	001.001.012	CAMPAMENTO	7 días	mar 14/04/26	mar 21/04/26
8	001.001.013	BAÑOS PROVISIONALES	7 días	mar 14/04/26	mar 21/04/26
9	001.001.014	DEMOLICION PISOS,ANDENES Y PAVIMENTO	5 días	mar 14/04/26	sáb 18/04/26
10	001.001.015	CORTE DE RAICES	15 días	sáb 25/04/26	sáb 9/05/26
11	**001.002**	**EXCAVACIONES Y CIMENTACION**	**302.2 días**	**sáb 18/04/26**	**mar 16/02/27**
12	**001.002.007**	**BLOQUE 1**	**168.6 días**	**sáb 18/04/26**	**mar 29/09/27**
13	001.002.007.023	EXCAVACIÓN RAMPA 12%	7 días	sáb 18/04/26	sáb 25/04/26
14	001.002.007.024	EXCAVACIÓN	7 días	mié 17/06/26	mié 24/06/26
15	001.002.007.025	APANTALLAMIENTO Y POLOS A TIERRA	5 días	mié 24/06/26	sáb 27/06/26
16	001.002.007.026	DREN FRANCÉS INTERNO	5 días	mié 24/06/26	sáb 27/06/26
17	001.002.007.027	RELLENO Y COMPACTACIÓN	6 días	sáb 27/06/26	sáb 4/07/26
18	001.002.007.028	SOLADO DE LIMPIEZA	3 días	sáb 4/07/26	mié 8/07/26
19	001.002.007.029	AMARRE PARRILLA REFUERZO INFERIOR VIGAS DESCOLGADAS	8 días	mié 8/07/26	mié 15/07/26
20	001.002.007.030	FUNDIDA TORTA INFERIOR	1 día	mié 15/07/26	jue 16/07/26
21	001.002.007.031	AMARRE ACEROS 2/2 VIGAS DE CIMENTACIÓN	4 días	jue 16/07/26	mar 21/07/26
22	001.002.007.032	POSICIONAMIENTO CASETÓN	1 día	mar 21/07/26	mié 22/07/26
23	001.002.007.033	FUNDIDA 2/2 VIGAS CIMENTACIÓ	1 día	mié 22/07/26	jue 23/07/26
24	001.002.007.034	QUEMADA DE PLACA CONTRAPISO Y DILATACIÓN	1 día	jue 23/07/26	vie 24/07/26
25	001.002.007.035	DREN FRANCÉS PERIMETRAL	20 días	vie 11/09/26	mar 29/09/26
26	**001.002.008**	**BLOQUE 2**	**161.6 días**	**sáb 25/04/26**	**mar 29/09/26**
27	001.002.008.026	EXCAVACIÓN	15 días	sáb 25/04/26	sáb 9/05/26
28	001.002.008.027	DREN FRANCÉS INTERNO	5 días	sáb 9/05/26	jue 14/05/26
29	001.002.008.037	APANTALLAMIENTO Y POLOS A TIERRA	5 días	sáb 9/05/26	jue 14/05/26
30	001.002.008.028	RELLENO Y COMPACTACIÓN	6 días	jue 14/05/26	mié 20/05/26
31	001.002.008.029	SOLADO DE LIMPIEZA	3 días	mié 3/06/26	sáb 6/06/26
32	001.002.008.030	AMARRE PARRILLA REFUERZO INFERIOR VIGAS DESCOLGADAS	20 días	sáb 6/06/26	vie 26/06/26
33	001.002.008.031	FUNDIDA TORTA INFERIOR	1 día	sáb 27/06/26	sáb 27/06/26
34	001.002.008.032	AMARRE ACEROS 2/2 VIGAS DE CIMENTACIÓN	6 días	mar 30/06/26	lun 6/07/26
35	001.002.008.033	POSICIONAMIENTO CASETÓN	1 día	lun 6/07/26	mar 7/07/26
36	001.002.008.034	FUNDIDA 2/2 VIGAS CIMENTACIÓ	1 día	mar 7/07/26	mié 8/07/26
37	001.002.008.035	QUEMADA DE PLACA CONTRAPISO Y DILATACIÓN	1 día	mié 8/07/26	jue 9/07/26
38	001.002.008.036	DREN FRANCÉS PERIMETRAL	20 días	vie 11/09/26	mar 29/09/26
39	**001.002.009**	**BLOQUE 3**	**146.6 días**	**sáb 9/05/26**	**mar 29/09/26**
40	001.002.009.046	EXCAVACIÓN	15 días	sáb 9/05/26	sáb 23/05/26
41	001.002.009.047	DREN FRANCÉS INTERNO	5 días	sáb 23/05/26	jue 28/05/26
42	001.002.009.048	APANTALLAMIENTO Y POLOS A TIERRA	5 días	sáb 23/05/26	jue 28/05/26
43	001.002.009.049	RELLENO Y COMPACTACIÓN	6 días	jue 28/05/26	mié 3/06/26
44	001.002.009.050	SOLADO DE LIMPIEZA	3 días	mié 3/06/26	sáb 6/06/26
45	001.002.009.051	AMARRE PARRILLA REFUERZO INFERIOR VIGAS DESCOLGADAS	20 días	sáb 6/06/26	vie 26/06/26
46	001.002.009.052	FUNDIDA TORTA INFERIOR	1 día	sáb 27/06/26	sáb 27/06/26
47	001.002.009.053	AMARRE ACEROS 2/2 VIGAS DE CIMENTACIÓN	5 días	sáb 27/06/26	vie 3/07/26
48	001.002.009.054	POSICIONAMIENTO CASETÓN	1 día	vie 3/07/26	sáb 4/07/26
49	001.002.009.055	FUNDIDA 2/2 VIGAS CIMENTACIÓ	1 día	sáb 4/07/26	sáb 4/07/26
50	001.002.009.056	QUEMADA DE PLACA CONTRAPISO Y DILATACIÓN	1 día	sáb 4/07/26	lun 6/07/26
51	001.002.009.057	DREN FRANCÉS PERIMETRAL	20 días	vie 11/09/26	mar 29/09/26
52	**001.002.010**	**BLOQUE 4**	**131.6 días**	**sáb 23/05/26**	**mar 29/09/26**
53	001.002.010.019	EXCAVACION 320	12 días	sáb 23/05/26	jue 4/06/26
54	001.002.010.020	EXCAVACION PAJARITA Y PERFIL	10 días	sáb 27/06/26	mar 7/07/26
55	001.002.010.021	DREN FRANCÉS INTERNO	5 días	mar 7/07/26	sáb 11/07/26
56	001.002.010.022	APANTALLAMIENTO Y POLOS A TIERRA	5 días	mar 7/07/26	sáb 11/07/26
57	001.002.010.023	RELLENO Y COMPACTACION A-38 ZAPATAS	5 días	sáb 11/07/26	jue 16/07/26
58	001.002.010.024	SOLADO ZAPATAS	3 días	jue 16/07/26	sáb 18/07/26
59	001.002.010.025	AMARRE PARRILLAS ZAPATAS	6 días	sáb 18/07/26	sáb 25/07/26
60	001.002.010.026	FUNDIDA ZAPATAS	1 día	sáb 25/07/26	lun 27/07/26
61	001.002.010.027	RELLENO AFIRMADO A38 ZAPAT	3 días	mié 5/08/26	sáb 8/08/26
62	001.002.010.028	FUNDIDA MUERTOS EN CICLOPE	1 día	jue 30/07/26	jue 30/07/26
63	001.002.010.029	SOLADO VIGAS CIMETACION	3 días	sáb 25/07/26	mié 29/07/26
64	001.002.010.030	AMARRE VIGAS DE CIMENTACIO	4 días	mié 29/07/26	sáb 1/08/26
65	001.002.010.031	FUNDIDA VIGAS DE CIMENTACIO	1 día	sáb 1/08/26	sáb 1/08/26
66	001.002.010.032	POSICIONAMIENTO DREN FRANCES PERIMETRAL	20 días	vie 11/09/26	mar 29/09/26
67	001.002.010.033	RELLENO MATERIAL A38	5 días	mié 5/08/26	lun 10/08/26
68	001.002.010.034	POSICIONAMIENTO MALLA ELECTROSOLDADA	1 día	lun 10/08/26	mar 11/08/26
69	001.002.010.035	FUNDIDA CONTRAPISO	1 día	mar 11/08/26	mié 12/08/26
70	001.002.010.036	QUEMADA PLACA	1 día	mié 12/08/26	jue 13/08/26
71	**001.002.011**	**BLOQUE 5**	**119.6 días**	**jue 4/06/26**	**mar 29/09/26**
72	001.002.011.068	EXCAVACION 320	12 días	jue 4/06/26	mié 17/06/26
73	001.002.011.069	EXCAVACION PAJARITA Y PERFIL	10 días	mié 17/06/26	vie 26/06/26
74	001.002.011.070	DREN FRANCÉS INTERNO	5 días	sáb 27/06/26	jue 2/07/26
75	001.002.011.071	APANTALLAMIENTO Y POLOS A TIERRA	5 días	sáb 27/06/26	jue 2/07/26
76	001.002.011.072	RELLENO Y COMPACTACION A-38 ZAPATAS	5 días	jue 2/07/26	mar 7/07/26
77	001.002.011.073	SOLADO ZAPATAS	3 días	mar 7/07/26	vie 10/07/26
78	001.002.011.074	AMARRE PARRILLAS ZAPATAS	4 días	vie 10/07/26	lun 13/07/26
79	001.002.011.075	FUNDIDA ZAPATAS	1 día	mar 14/07/26	mar 14/07/26
80	001.002.011.076	RELLENO AFIRMADO A38 ZAPAT	3 días	sáb 25/07/26	mar 28/07/26
81	001.002.011.077	SOLADO VIGAS CIMETACION	3 días	mar 14/07/26	jue 16/07/26
82	001.002.011.078	AMARRE VIGAS DE CIMENTACIO	4 días	jue 16/07/26	mar 21/07/26
83	001.002.011.079	FUNDIDA VIGAS DE CIMENTACIO	1 día	mar 21/07/26	mié 22/07/26
84	001.002.011.080	POSICIONAMIENTO DREN FRANCES PERIMETRAL	20 días	vie 11/09/26	mar 29/09/26
85	001.002.011.081	RELLENO MATERIAL A38	5 días	sáb 25/07/26	jue 30/07/26
86	001.002.011.082	POSICIONAMIENTO MALLA ELECTROSOLDADA	1 día	jue 30/07/26	jue 30/07/26
87	001.002.011.083	FUNDIDA CONTRAPISO	1 día	vie 31/07/26	vie 31/07/26
88	001.002.011.084	QUEMADA PLACA	1 día	vie 31/07/26	sáb 1/08/26
89	001.002.012	**RELLENOS TALUDES**	30 días	mar 29/09/26	jue 29/10/26
90	**001.002.013**	**RAMPAS DE ACCESO**	**5 días**	**jue 11/02/27**	**mar 16/02/27**
91	001.002.013.001	AMARRE DE ACERO	3 días	jue 11/02/27	sáb 13/02/27
92	001.002.013.002	FUNDIDA	1 día	sáb 13/02/27	lun 15/02/27
93	001.002.013.003	DILATACIÓN CONCRETO	1 día	lun 15/02/27	mar 16/02/27
94	**001.003**	**ESTRUCTURA**	**294.2 días**	**sáb 4/07/26**	**jue 29/04/27**
95	**001.003.027**	**TORRE A**	**232.2 días**	**sáb 4/07/26**	**jue 25/02/27**
96	**001.003.027.233**	**PISO SOTANO - PISO 1**	**71.5 días**	**sáb 4/07/26**	**sáb 12/09/26**
97	**001.003.027.233.004**	**BLOQUE 3**	**55.5 días**	**sáb 4/07/26**	**vie 28/08/26**
98	001.003.027.233.004.	AMARRE GRUPO 1 COLUMNAS Y MUROS DE	3 días	sáb 4/07/26	mié 8/07/26
99	001.003.027.233.004.	ARMADO	1.5 días	mié 8/07/26	jue 9/07/26
100	001.003.027.233.004.	FUNDIDA	1 día	jue 9/07/26	vie 10/07/26
101	001.003.027.233.004.	ARMADO MURO DE CONTENCIÓN 1	0.7 días	lun 6/07/26	mar 7/07/26
102	001.003.027.233.004.	FUNDIDA MURO 1	0.7 días	mar 7/07/26	mar 7/07/26
103	001.003.027.233.004.	DESARMADO MURO 1	0.7 días	mar 7/07/26	mié 8/07/26
104	001.003.027.233.004.	ARMADO MURO DE CONTENCIÓN 2	0.7 días	mié 8/07/26	jue 9/07/26
105	001.003.027.233.004.	FUNDIDA MURO 2	0.7 días	jue 9/07/26	jue 9/07/26
106	001.003.027.233.004.	DESARMADO MURO 2	0.7 días	jue 9/07/26	vie 10/07/26
107	001.003.027.233.004.	AMARRE GRUPO 2 COLUMNAS Y MUROS	3 días	mié 8/07/26	sáb 11/07/26
108	001.003.027.233.004.	ARMADO	1.5 días	sáb 11/07/26	sáb 11/07/26
109	001.003.027.233.004.	FUNDIDA	1 día	sáb 11/07/26	lun 13/07/26
110	001.003.027.233.004.	ARMADO MURO DE CONTENCIÓN 3	0.7 días	sáb 11/07/26	sáb 11/07/26
111	001.003.027.233.004.	FUNDIDA MURO 3	0.7 días	vie 10/07/26	sáb 11/07/26
112	001.003.027.233.004.	DESARMADO MURO 3	0.7 días	sáb 11/07/26	sáb 11/07/26
113	001.003.027.233.004.	ARMADO MURO DE CONTENCIÓN 4	0.7 días	sáb 11/07/26	sáb 11/07/26
114	001.003.027.233.004.	FUNDIDA MURO 4	0.7 días	sáb 11/07/26	lun 13/07/26
115	001.003.027.233.004.	DESARMADO MURO 4	0.7 días	lun 13/07/26	lun 13/07/26
116	001.003.027.233.004.	ARMADO MURO DE CONTENCIÓN 5	0.7 días	lun 13/07/26	mar 14/07/26
117	001.003.027.233.004.	FUNDIDA MURO 5	0.7 días	mar 14/07/26	mié 15/07/26
118	001.003.027.233.004.	DESARMADO MURO 5	0.7 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26
119	001.003.027.233.004.	AMARRE GRUPO 3 COLUMNAS Y MUROS	3 días	sáb 11/07/26	lun 13/07/26



Proyecto: CRONOGRAMA ALCA
Fecha: vie 10/04/26

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · solo el comienzo · Tareas externas · Fecha límite · División crítica · Progreso manual
División · Resumen · Tarea inactiva · Resumen inactivo · solo duración · Resumen manual · solo fin · Hito externo · Tareas críticas · Progreso


Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
120	001.003.027.233.004.	ARMADO	1.5 días	mar 14/07/26	mié 15/07/26
121	001.003.027.233.004.	FUNDIDA	1 día	mié 15/07/26	jue 16/07/26
122	001.003.027.233.004.	ARMADO MURO DE CONTENCIÓN 6	0.7 días	mié 15/07/26	mié 15/07/26
123	001.003.027.233.004.	FUNDIDA MURO 6	0.7 días	mié 15/07/26	jue 16/07/26
124	001.003.027.233.004.	DESARMADO MURO 6	0.7 días	jue 16/07/26	vie 17/07/26
125	001.003.027.233.004.	ARMADO MURO DE CONTENCIÓN 7	0.7 días	vie 17/07/26	vie 17/07/26
126	001.003.027.233.004.	FUNDIDA MURO 7	0.7 días	vie 17/07/26	sáb 18/07/26
127	001.003.027.233.004.	DESARMADO MURO 7	0.7 días	sáb 18/07/26	sáb 18/07/26
128	001.003.027.233.004.	AMARRE GRUPO 4 COLUMNAS Y MUROS	3 días	mar 14/07/26	jue 16/07/26
129	001.003.027.233.004.	ARMADO	1.5 días	mié 15/07/26	jue 16/07/26
130	001.003.027.233.004.	FUNDIDA	1 día	jue 16/07/26	vie 17/07/26
131	001.003.027.233.004.	ARMADO MURO DE CONTENCIÓN 8	0.7 días	sáb 18/07/26	sáb 18/07/26
132	001.003.027.233.004.	FUNDIDA MURO 8	0.7 días	sáb 18/07/26	mar 21/07/26
133	001.003.027.233.004.	DESARMADO MURO 8	0.7 días	mar 21/07/26	mar 21/07/26
134	001.003.027.233.004.	ARMADO MURO DE CONTENCIÓN 9	0.7 días	mar 21/07/26	mié 22/07/26
135	001.003.027.233.004.	FUNDIDA MURO 9	0.7 días	mié 22/07/26	jue 23/07/26
136	001.003.027.233.004.	DESARMADO MURO 9	0.7 días	jue 23/07/26	jue 23/07/26
137	001.003.027.233.004.	APUNTALAMIENTO Y POSICIONAMIENTO	5 días	sáb 1/08/26	vie 7/08/26
138	001.003.027.233.004.	AMARRE DE ACERO	4 días	vie 7/08/26	lun 10/08/26
139	001.003.027.233.004.	POSICIONAMIENTO DE CASETON Y MALLA	1 día	lun 10/08/26	mar 11/08/26
140	001.003.027.233.004.	FUNDIDA	1 día	mar 11/08/26	mié 12/08/26
141	001.003.027.233.004.	DESAPUNTALAMIENTO PARCIAL Y RETIRO DE	1 día	sáb 15/08/26	mar 18/08/26
142	001.003.027.233.004.	DESAPUNTALAMIENTO TOT	1 día	jue 27/08/26	vie 28/08/26
143	**001.003.027.233.005**	**BLOQUE 2**	**49.2 días**	**jue 16/07/26**	**jue 3/09/26**
144	001.003.027.233.005.	AMARRE GRUPO 1 COLUMNAS Y MUROS DE	3 días	jue 16/07/26	sáb 18/07/26
145	001.003.027.233.005.	ARMADO	1.5 días	sáb 18/07/26	mié 22/07/26
146	001.003.027.233.005.	FUNDIDA	1 día	mié 22/07/26	mié 22/07/26
147	001.003.027.233.005.	ARMADO MURO DE CONTENCIÓN 10	0.7 días	jue 23/07/26	vie 24/07/26
148	001.003.027.233.005.	FUNDIDA MURO 10	0.7 días	vie 24/07/26	sáb 25/07/26
149	001.003.027.233.005.	DESARMADO MURO 10	0.7 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26
150	001.003.027.233.005.	ARMADO MURO DE CONTENCIÓN 11	0.7 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26
151	001.003.027.233.005.	FUNDIDA MURO 11	0.7 días	sáb 25/07/26	lun 27/07/26
152	001.003.027.233.005.	DESARMADO MURO 11	0.7 días	lun 27/07/26	lun 27/07/26
153	001.003.027.233.005.	AMARRE GRUPO 2 COLUMNAS Y MUROS	3 días	sáb 18/07/26	jue 23/07/26
154	001.003.027.233.005.	ARMADO	1.5 días	jue 23/07/26	vie 24/07/26
155	001.003.027.233.005.	FUNDIDA	1 día	vie 24/07/26	sáb 25/07/26
156	001.003.027.233.005.	AMARRE GRUPO 3 COLUMNAS Y MUROS	3 días	jue 23/07/26	sáb 25/07/26
157	001.003.027.233.005.	ARMADO	1 día	sáb 25/07/26	lun 27/07/26
158	001.003.027.233.005.	FUNDIDA	1 día	lun 27/07/26	mar 28/07/26
159	001.003.027.233.005.	AMARRE GRUPO 4 COLUMNAS Y MUROS	3 días	sáb 25/07/26	mié 29/07/26
160	001.003.027.233.005.	ARMADO	1.5 días	mié 29/07/26	jue 30/07/26
161	001.003.027.233.005.	FUNDIDA	1 día	jue 30/07/26	vie 31/07/26
162	001.003.027.233.005.	ARMADO MURO DE CONTENCIÓN 12	0.7 días	mié 29/07/26	mié 29/07/26
163	001.003.027.233.005.	FUNDIDA MURO 12	0.7 días	mié 29/07/26	jue 30/07/26
164	001.003.027.233.005.	DESARMADO MURO 12	0.7 días	jue 30/07/26	vie 31/07/26
165	001.003.027.233.005.	ARMADO MURO DE CONTENCIÓN 13	0.7 días	vie 31/07/26	vie 31/07/26
166	001.003.027.233.005.	FUNDIDA MURO 13	0.7 días	vie 31/07/26	sáb 1/08/26
167	001.003.027.233.005.	DESARMADO MURO 13	0.7 días	sáb 1/08/26	sáb 1/08/26
168	001.003.027.233.005.	APUNTALAMIENTO Y POSICIONAMIENTO	6 días	mié 5/08/26	mar 11/08/26
169	001.003.027.233.005.	AMARRE DE ACERO	5 días	mar 11/08/26	sáb 15/08/26
170	001.003.027.233.005.	POSICIONAMIENTO DE CASETON Y MALLA	1 día	sáb 15/08/26	mar 18/08/26
171	001.003.027.233.005.	FUNDIDA	1 día	mar 18/08/26	mié 19/08/26
172	001.003.027.233.005.	DESAPUNTALAMIENTO PARCIAL Y RETIRO DE	1 día	sáb 22/08/26	sáb 22/08/26
173	001.003.027.233.005.	DESAPUNTALAMIENTO TOT	1 día	mié 2/09/26	jue 3/09/26
174	**001.003.027.233.006**	**BLOQUE 1**	**47.5 días**	**mié 29/07/26**	**sáb 12/09/26**
175	001.003.027.233.006.	AMARRE GRUPO 1 COLUMNAS Y MUROS DE	3 días	mié 29/07/26	vie 31/07/26
176	001.003.027.233.006.	ARMADO COLUMNAS	1.5 días	vie 31/07/26	sáb 1/08/26
177	001.003.027.233.006.	FUNDIDA	1 día	sáb 1/08/26	lun 3/08/26
178	001.003.027.233.006.	ARMADO MURO DE CONTENCIÓN 14	0.7 días	sáb 1/08/26	sáb 1/08/26
179	001.003.027.233.006.	FUNDIDA MURO 14	0.7 días	sáb 1/08/26	lun 3/08/26
180	001.003.027.233.006.	DESARMADO MURO 14	0.7 días	lun 3/08/26	mar 4/08/26
181	001.003.027.233.006.	ARMADO MURO DE CONTENCIÓN 15	0.7 días	mar 4/08/26	mar 4/08/26
182	001.003.027.233.006.	FUNDIDA MURO 15	0.7 días	mar 4/08/26	mié 5/08/26
183	001.003.027.233.006.	DESARMADO MURO 15	0.7 días	mié 5/08/26	jue 6/08/26
184	001.003.027.233.006.	AMARRE GRUPO 2 COLUMNAS Y MUROS	3 días	vie 31/07/26	lun 3/08/26
185	001.003.027.233.006.	ARMADO COLUMNAS	1.5 días	lun 3/08/26	mié 5/08/26
186	001.003.027.233.006.	FUNDIDA	1 día	mié 5/08/26	jue 6/08/26
187	001.003.027.233.006.	AMARRE GRUPO 3 COLUMNAS Y MUROS	3 días	lun 3/08/26	jue 6/08/26
188	001.003.027.233.006.	ARMADO COLUMNAS	1.5 días	jue 6/08/26	vie 7/08/26
189	001.003.027.233.006.	FUNDIDA	1 día	sáb 8/08/26	sáb 8/08/26
190	001.003.027.233.006.	AMARRE GRUPO 4 COLUMNAS Y MUROS	3 días	jue 6/08/26	sáb 8/08/26
191	001.003.027.233.006.	ARMADO COLUMNAS	1.5 días	sáb 8/08/26	lun 10/08/26
192	001.003.027.233.006.	FUNDIDA	1 día	lun 10/08/26	mar 11/08/26
193	001.003.027.233.006.	ARMADO MURO DE CONTENCIÓN 16	0.7 días	sáb 8/08/26	lun 10/08/26
194	001.003.027.233.006.	FUNDIDA MURO 16	0.7 días	lun 10/08/26	lun 10/08/26
195	001.003.027.233.006.	DESARMADO MURO 16	0.7 días	lun 10/08/26	mar 11/08/26
196	001.003.027.233.006.	ARMADO MURO DE CONTENCIÓN 17	0.7 días	mar 11/08/26	mié 12/08/26
197	001.003.027.233.006.	FUNDIDA MURO 17	0.7 días	mié 12/08/26	mié 12/08/26
198	001.003.027.233.006.	DESARMADO MURO 17	0.7 días	mié 12/08/26	jue 13/08/26
199	001.003.027.233.006.	APUNTALAMIENTO Y POSICIONAMIENTO	5 días	mar 18/08/26	sáb 22/08/26
200	001.003.027.233.006.	AMARRE DE ACERO	4 días	sáb 22/08/26	mié 26/08/26
201	001.003.027.233.006.	POSICIONAMIENTO DE CASETON Y MALLA	1 día	mié 26/08/26	jue 27/08/26
202	001.003.027.233.006.	FUNDIDA	1 día	jue 27/08/26	vie 28/08/26
203	001.003.027.233.006.	DESAPUNTALAMIENTO PARCIAL Y RETIRO DE	1 día	mar 1/09/26	mié 2/09/26
204	001.003.027.233.006.	DESAPUNTALAMIENTO TOT	1 día	vie 11/09/26	sáb 12/09/26
205	**001.003.027.234**	**PISO 1-PISO 2**	**45.5 días**	**mié 2/09/26**	**jue 15/10/26**
206	**001.003.027.234.003**	**BLOQUE 1**	**29.5 días**	**mié 2/09/26**	**mar 29/09/2**
207	001.003.027.234.003.	AMARRE GRUPO 1 COLUMNAS Y MUROS DE	2 días	mié 2/09/26	jue 3/09/26
208	001.003.027.234.003.	ARMADO COLUMNAS	1.5 días	jue 3/09/26	sáb 5/09/26
209	001.003.027.234.003.	FUNDIDA	1 día	sáb 5/09/26	sáb 5/09/26
210	001.003.027.234.003.	AMARRE GRUPO 2 COLUMNAS Y MUROS	2 días	jue 3/09/26	sáb 5/09/26
211	001.003.027.234.003.	ARMADO COLUMNAS	1.5 días	sáb 5/09/26	lun 7/09/26
212	001.003.027.234.003.	FUNDIDA	1 día	lun 7/09/26	mar 8/09/26
213	001.003.027.234.003.	APUNTALAMIENTO Y POSICIONAMIENTO	5 días	vie 4/09/26	mié 9/09/26
214	001.003.027.234.003.	AMARRE DE ACERO	4 días	mié 9/09/26	sáb 12/09/26
215	001.003.027.234.003.	POSICIONAMIENTO DE CASETON Y MALLA	1 día	sáb 12/09/26	sáb 12/09/26
216	001.003.027.234.003.	FUNDIDA	1 día	sáb 12/09/26	lun 14/09/26
217	001.003.027.234.003.	DESAPUNTALAMIENTO PARCIAL Y RETIRO DE	1 día	vie 18/09/26	sáb 19/09/26
218	001.003.027.234.003.	DESAPUNTALAMIENTO TOT	1 día	lun 28/09/26	mar 29/09/2
219	**001.003.027.234.004**	**BLOQUE 2**	**41.5 días**	**sáb 5/09/26**	**jue 15/10/26**
220	001.003.027.234.004.	AMARRE GRUPO 1 COLUMNAS Y MUROS	4 días	sáb 5/09/26	mié 9/09/26
221	001.003.027.234.004.	ARMADO COLUMNAS	3 días	mié 9/09/26	sáb 12/09/26
222	001.003.027.234.004.	FUNDIDA	1 día	sáb 12/09/26	sáb 12/09/26
223	001.003.027.234.004.	AMARRE GRUPO 2 COLUMNAS Y MUROS	4 días	mié 9/09/26	sáb 12/09/26
224	001.003.027.234.004.	ARMADO COLUMNAS	3 días	sáb 12/09/26	mié 16/09/26
225	001.003.027.234.004.	FUNDIDA	1 día	mié 16/09/26	jue 17/09/26
226	001.003.027.234.004.	APUNTALAMIENTO Y POSICIONAMIENTO	5 días	sáb 19/09/26	jue 24/09/26
227	001.003.027.234.004.	AMARRE DE ACERO	4 días	jue 24/09/26	sáb 26/09/26
228	001.003.027.234.004.	POSICIONAMIENTO DE CASETON Y MALLA	1 día	sáb 26/09/26	lun 28/09/26
229	001.003.027.234.004.	FUNDIDA	1 día	lun 28/09/26	mar 29/09/26

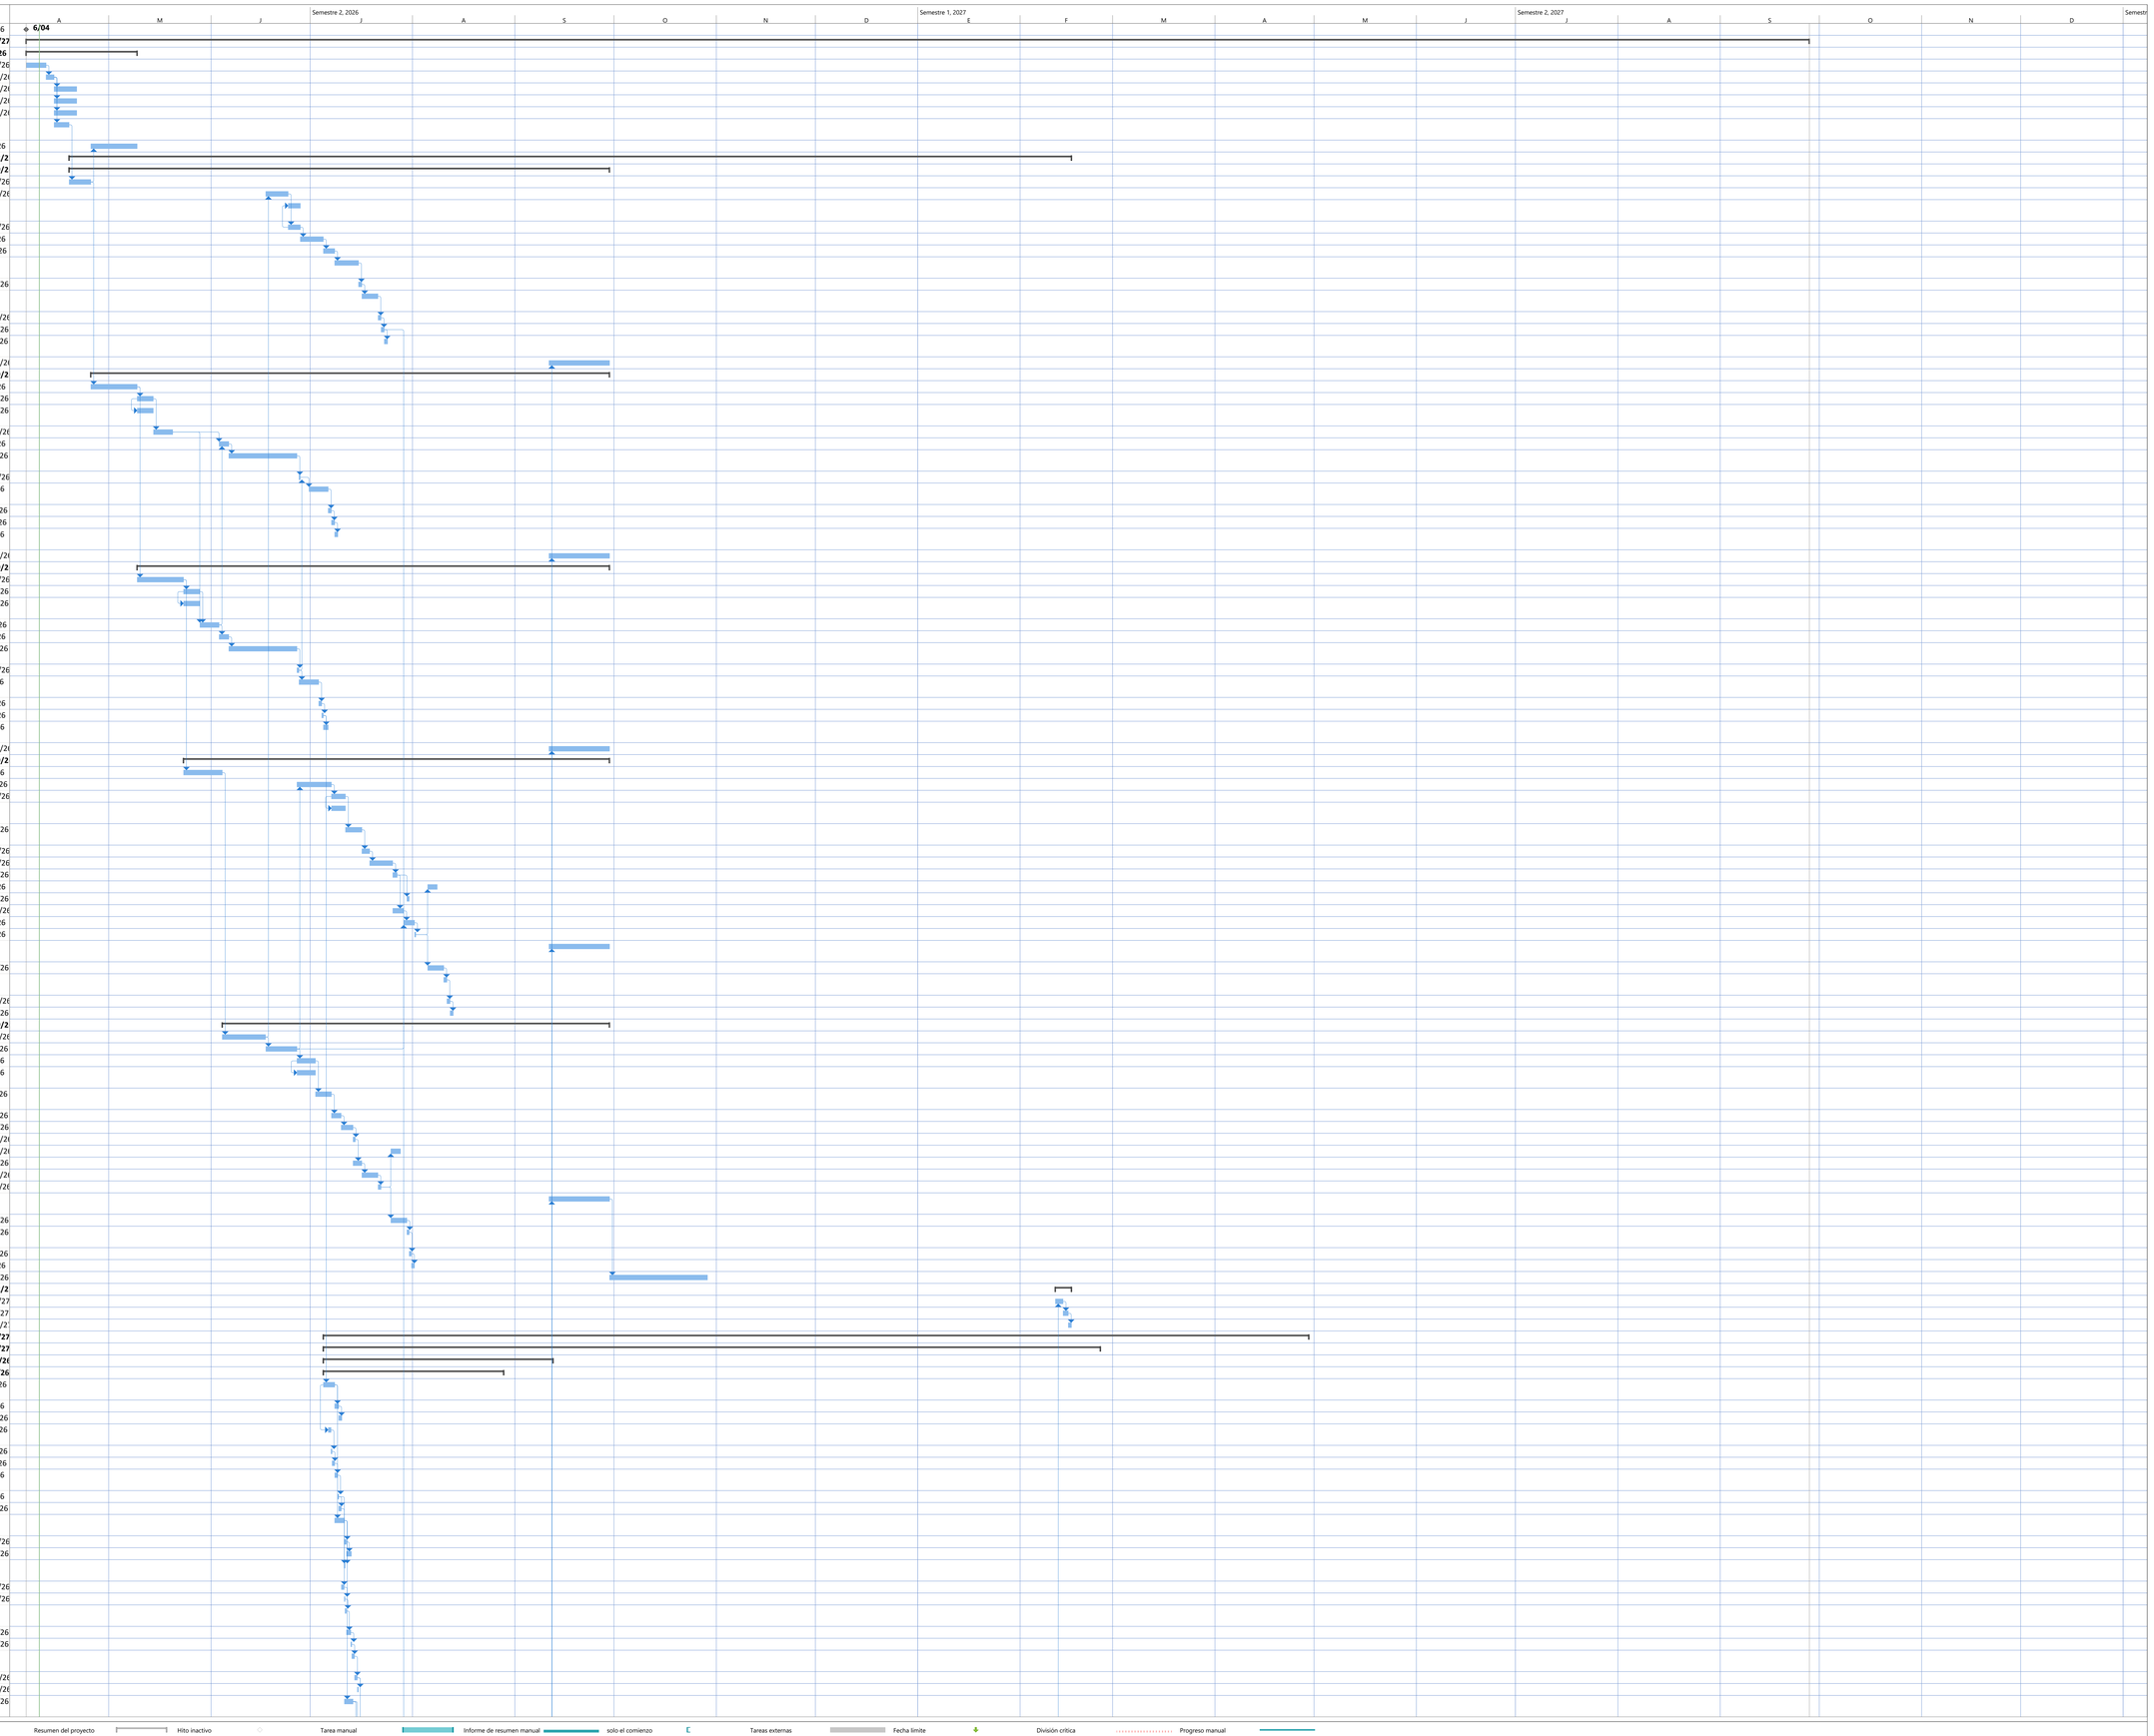


Proyecto: CRONOGRAMA ALCA
Fecha: vie 10/04/26

Tarea · División · Hito · Resumen · Resumen del proyecto · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Tarea manual · solo duración · Informe de resumen manual · Resumen manual · solo el comienzo · solo fin · Tareas externas · Hito externo · Fecha límite · Tareas críticas · División crítica · Progreso · Progreso manual


Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
230	001.003.027.234.004.	DESAPUNTALAMIENTO PARCIAL Y RETIRO DE	1 día	sáb 3/10/26	sáb 3/10/26
231	001.003.027.234.004.	DESAPUNTALAMIENTO TOT	1 día	mié 14/10/26	jue 15/10/26
232	**001.003.027.235**	**PISO 2-PISO 3**	**46 días**	**lun 14/09/26**	**mié 28/10/26**
233	**001.003.027.235.006**	**BLOQUE 1**	**32.7 días**	**lun 14/09/26**	**vie 16/10/26**
234	001.003.027.235.006.	AMARRE GRUPO 1 COLUM	2 días	lun 14/09/26	mié 16/09/26
235	001.003.027.235.006.	ARMADO COLUMNAS	2 días	mié 16/09/26	vie 18/09/26
236	001.003.027.235.006.	FUNDIDA	1 día	vie 18/09/26	sáb 19/09/26
237	001.003.027.235.006.	AMARRE GRUPO 2 COLUM	2 días	mié 16/09/26	vie 18/09/26
238	001.003.027.235.006.	ARMADO COLUMNAS	2 días	vie 18/09/26	sáb 19/09/26
239	001.003.027.235.006.	FUNDIDA	1 día	sáb 19/09/26	lun 21/09/26
240	001.003.027.235.006.	APUNTALAMIENTO Y POSICIONAMIENTO	4 días	lun 21/09/26	jue 24/09/26
241	001.003.027.235.006.	AMARRE DE ACERO	4 días	jue 24/09/26	lun 28/09/26
242	001.003.027.235.006.	POSICIONAMIENTO DE CASETON Y MALLA	1 día	lun 28/09/26	mar 29/09/26
243	001.003.027.235.006.	FUNDIDA	1 día	mar 29/09/26	mié 30/09/26
244	001.003.027.235.006.	DESAPUNTALAMIENTO PARCIAL Y RETIRO DE	1 día	sáb 3/10/26	lun 5/10/26
245	001.003.027.235.006.	DESAPUNTALAMIENTO TOT	1 día	jue 15/10/26	vie 16/10/26
246	**001.003.027.235.007**	**BLOQUE 2**	**30 días**	**mar 29/09/26**	**mié 28/10/26**
247	001.003.027.235.007.	AMARRE GRUPO 1 COLUM	2 días	mar 29/09/26	jue 1/10/26
248	001.003.027.235.007.	ARMADO COLUMNAS	2 días	jue 1/10/26	sáb 3/10/26
249	001.003.027.235.007.	FUNDIDA	1 día	sáb 3/10/26	sáb 3/10/26
250	001.003.027.235.007.	AMARRE GRUPO 2 COLUM	2 días	jue 1/10/26	sáb 3/10/26
251	001.003.027.235.007.	ARMADO COLUMNAS	1 día	sáb 3/10/26	sáb 3/10/26
252	001.003.027.235.007.	FUNDIDA	1 día	sáb 3/10/26	lun 5/10/26
253	001.003.027.235.007.	APUNTALAMIENTO Y POSICIONAMIENTO	4 días	sáb 3/10/26	jue 8/10/26
254	001.003.027.235.007.	AMARRE DE ACERO	3 días	jue 8/10/26	sáb 10/10/26
255	001.003.027.235.007.	POSICIONAMIENTO DE CASETON Y MALLA	1 día	sáb 10/10/26	dom 11/10/26
256	001.003.027.235.007.	FUNDIDA	1 día	mar 13/10/26	mar 13/10/26
257	001.003.027.235.007.	DESAPUNTALAMIENTO PARCIAL Y RETIRO DE	1 día	sáb 17/10/26	sáb 17/10/26
258	001.003.027.235.007.	DESAPUNTALAMIENTO TOT	1 día	mié 28/10/26	mié 28/10/26
259	**001.003.027.236**	**PISO 3-PISO 4**	**38 días**	**mié 30/09/26**	**sáb 7/11/26**
260	001.003.027.236.045	AMARRE GRUPO 1 COLUMNA	1 día	mié 30/09/26	jue 1/10/26
261	001.003.027.236.046	ARMADO COLUMNAS	1 día	jue 1/10/26	vie 2/10/26
262	001.003.027.236.047	FUNDIDA	1 día	vie 2/10/26	sáb 3/10/26
263	001.003.027.236.048	AMARRE GRUPO 2 COLUMNA	1 día	jue 1/10/26	vie 2/10/26
264	001.003.027.236.049	ARMADO COLUMNAS	1 día	vie 2/10/26	sáb 3/10/26
265	001.003.027.236.050	FUNDIDA	1 día	sáb 3/10/26	sáb 3/10/26
266	001.003.027.236.051	AMARRE GRUPO 3 COLUMNA	1 día	mar 13/10/26	mié 14/10/26
267	001.003.027.236.052	ARMADO COLUMNAS	1 día	mié 14/10/26	jue 15/10/26
268	001.003.027.236.053	FUNDIDA	1 día	jue 15/10/26	vie 16/10/26
269	001.003.027.236.054	AMARRE GRUPO 4 COLUMNA	1 día	mié 14/10/26	jue 15/10/26
270	001.003.027.236.055	ARMADO COLUMNAS	1 día	jue 15/10/26	vie 16/10/26
271	001.003.027.236.056	FUNDIDA	1 día	vie 16/10/26	sáb 17/10/26
272	001.003.027.236.057	APUNTALAMIENTO Y POSICIONAMIENTO CAMILLA	9 días	jue 8/10/26	sáb 17/10/26
273	001.003.027.236.058	AMARRE DE ACERO	4 días	vie 16/10/26	mar 20/10/26
274	001.003.027.236.059	POSICIONAMIENTO DE CASETON Y MALLA	1 día	mar 20/10/26	mié 21/10/26
275	001.003.027.236.060	FUNDIDA	1 día	mié 21/10/26	jue 22/10/26
276	001.003.027.236.061	DESAPUNTALAMIENTO PARCIAL Y RETIRO DE	1 día	sáb 24/10/26	lun 26/10/26
277	001.003.027.236.062	DESAPUNTALAMIENTO TOTAL	1 día	vie 6/11/26	sáb 7/11/26
278	**001.003.027.237**	**PISO 4 - PISO 5**	**29 días**	**jue 22/10/26**	**vie 20/11/26**
279	001.003.027.237.032	AMARRE GRUPO 1 COLUMNA	1 día	jue 22/10/26	vie 23/10/26
280	001.003.027.237.033	ARMADO COLUMNAS	1 día	vie 23/10/26	sáb 24/10/26
281	001.003.027.237.034	FUNDIDA	1 día	sáb 24/10/26	sáb 24/10/26
282	001.003.027.237.035	AMARRE GRUPO 2 COLUMNA	1 día	vie 23/10/26	sáb 24/10/26
283	001.003.027.237.036	ARMADO COLUMNAS	1 día	sáb 24/10/26	sáb 24/10/26
284	001.003.027.237.037	FUNDIDA	1 día	sáb 24/10/26	sáb 24/10/26
285	001.003.027.237.038	AMARRE GRUPO 3 COLUMNA	1 día	sáb 24/10/26	sáb 24/10/26
286	001.003.027.237.039	ARMADO COLUMNAS	1 día	sáb 24/10/26	sáb 24/10/26
287	001.003.027.237.040	FUNDIDA	1 día	sáb 24/10/26	lun 26/10/26
288	001.003.027.237.041	AMARRE GRUPO 4 COLUMNA	1 día	sáb 24/10/26	sáb 24/10/26
289	001.003.027.237.042	ARMADO COLUMNAS	1 día	sáb 24/10/26	lun 26/10/26
290	001.003.027.237.043	FUNDIDA	1 día	lun 26/10/26	mar 27/10/26
291	001.003.027.237.044	APUNTALAMIENTO Y POSICIONAMIENTO CAMILLA	4 días	lun 26/10/26	vie 30/10/26
292	001.003.027.237.045	AMARRE DE ACERO	4 días	mié 28/10/26	sáb 31/10/26
293	001.003.027.237.046	POSICIONAMIENTO DE CASETON Y MALLA	1 día	sáb 31/10/26	mar 3/11/26
294	001.003.027.237.047	FUNDIDA	1 día	mar 3/11/26	mié 4/11/26
295	001.003.027.237.048	DESAPUNTALAMIENTO PARCIAL Y RETIRO DE	1 día	sáb 7/11/26	lun 9/11/26
296	001.003.027.237.049	DESAPUNTALAMIENTO TOTAL	1 día	jue 19/11/26	vie 20/11/26
297	**001.003.027.238**	**PISO 5 - PISO 6**	**29 días**	**mié 4/11/26**	**mié 2/12/26**
298	001.003.027.238.032	AMARRE GRUPO 1 COLUMNA	1 día	mié 4/11/26	jue 5/11/26
299	001.003.027.238.033	ARMADO COLUMNAS	1 día	jue 5/11/26	vie 6/11/26
300	001.003.027.238.034	FUNDIDA	1 día	vie 6/11/26	sáb 7/11/26
301	001.003.027.238.035	AMARRE GRUPO 2 COLUMNA	1 día	jue 5/11/26	vie 6/11/26
302	001.003.027.238.036	ARMADO COLUMNAS	1 día	vie 6/11/26	sáb 7/11/26
303	001.003.027.238.037	FUNDIDA	1 día	sáb 7/11/26	sáb 7/11/26
304	001.003.027.238.038	AMARRE GRUPO 3 COLUMNA	1 día	vie 6/11/26	sáb 7/11/26
305	001.003.027.238.039	ARMADO COLUMNAS	1 día	sáb 7/11/26	sáb 7/11/26
306	001.003.027.238.040	FUNDIDA	1 día	sáb 7/11/26	lun 9/11/26
307	001.003.027.238.041	AMARRE GRUPO 4 COLUMNA	1 día	sáb 7/11/26	sáb 7/11/26
308	001.003.027.238.042	ARMADO COLUMNAS	1 día	sáb 7/11/26	lun 9/11/26
309	001.003.027.238.043	FUNDIDA	1 día	lun 9/11/26	mar 10/11/26
310	001.003.027.238.044	APUNTALAMIENTO Y POSICIONAMIENTO CAMILLA	4 días	lun 9/11/26	jue 12/11/26
311	001.003.027.238.045	AMARRE DE ACERO	4 días	mar 10/11/26	sáb 14/11/26
312	001.003.027.238.046	POSICIONAMIENTO DE CASETON Y MALLA	1 día	sáb 14/11/26	sáb 14/11/26
313	001.003.027.238.047	FUNDIDA	1 día	sáb 14/11/26	mar 17/11/26
314	001.003.027.238.048	DESAPUNTALAMIENTO PARCIAL Y RETIRO DE	1 día	sáb 21/11/26	sáb 21/11/26
315	001.003.027.238.049	DESAPUNTALAMIENTO TOTAL	1 día	mar 1/12/26	mié 2/12/26
316	**001.003.027.239**	**PISO 6-PISO 7**	**29 días**	**mar 17/11/26**	**mar 15/12/26**
317	001.003.027.239.025	AMARRE GRUPO 1 COLUMNA	1 día	mar 17/11/26	mié 18/11/26
318	001.003.027.239.026	ARMADO COLUMNAS	1 día	mié 18/11/26	jue 19/11/26
319	001.003.027.239.027	FUNDIDA	1 día	jue 19/11/26	vie 20/11/26
320	001.003.027.239.028	AMARRE GRUPO 2 COLUMNA	1 día	mié 18/11/26	jue 19/11/26
321	001.003.027.239.029	ARMADO COLUMNAS	1 día	jue 19/11/26	vie 20/11/26
322	001.003.027.239.030	FUNDIDA	1 día	vie 20/11/26	sáb 21/11/26
323	001.003.027.239.031	AMARRE GRUPO 3 COLUMNA	1 día	jue 19/11/26	vie 20/11/26
324	001.003.027.239.032	ARMADO COLUMNAS	1 día	vie 20/11/26	sáb 21/11/26
325	001.003.027.239.033	FUNDIDA	1 día	sáb 21/11/26	sáb 21/11/26
326	001.003.027.239.034	AMARRE GRUPO 4 COLUMNA	1 día	vie 20/11/26	sáb 21/11/26
327	001.003.027.239.035	ARMADO COLUMNAS	1 día	sáb 21/11/26	lun 23/11/26
328	001.003.027.239.036	FUNDIDA	1 día	sáb 21/11/26	sáb 21/11/26
329	001.003.027.239.037	APUNTALAMIENTO Y POSICIONAMIENTO CAMILLA	4 días	sáb 21/11/26	jue 26/11/26
330	001.003.027.239.038	AMARRE DE ACERO	4 días	mar 24/11/26	vie 27/11/26
331	001.003.027.239.039	POSICIONAMIENTO DE CASETON Y MALLA	1 día	vie 27/11/26	sáb 28/11/26
332	001.003.027.239.040	FUNDIDA	1 día	sáb 28/11/26	sáb 28/11/26
333	001.003.027.239.041	DESAPUNTALAMIENTO PARCIAL Y RETIRO DE	1 día	jue 3/12/26	vie 4/12/26
334	001.003.027.239.042	DESAPUNTALAMIENTO TOTAL	1 día	lun 14/12/26	mar 15/12/26
335	**001.003.027.240**	**PISO 7 - PISO 8**	**29 días**	**sáb 28/11/26**	**jue 7/01/27**
336	001.003.027.240.026	AMARRE GRUPO 1 COLUMNA	1 día	sáb 28/11/26	lun 30/11/26
337	001.003.027.240.027	ARMADO COLUMNAS	1 día	lun 30/11/26	mar 1/12/26
338	001.003.027.240.028	FUNDIDA	1 día	mar 1/12/26	mié 2/12/26
339	001.003.027.240.029	AMARRE GRUPO 2 COLUMNA	1 día	lun 30/11/26	mar 1/12/26
340	001.003.027.240.030	ARMADO COLUMNAS	1 día	mar 1/12/26	mié 2/12/26
341	001.003.027.240.031	FUNDIDA	1 día	mié 2/12/26	jue 3/12/26
342	001.003.027.240.032	AMARRE GRUPO 3 COLUMNA	1 día	mar 1/12/26	mié 2/12/26
343	001.003.027.240.033	ARMADO COLUMNAS	1 día	mié 2/12/26	jue 3/12/26
344	001.003.027.240.034	FUNDIDA	1 día	jue 3/12/26	vie 4/12/26
345	001.003.027.240.035	AMARRE GRUPO 4 COLUMNA	1 día	mié 2/12/26	jue 3/12/26
346	001.003.027.240.036	ARMADO COLUMNAS	1 día	jue 3/12/26	vie 4/12/26
347	001.003.027.240.037	FUNDIDA	1 día	vie 4/12/26	sáb 5/12/26
348	001.003.027.240.038	APUNTALAMIENTO Y POSICIONAMIENTO CAMILLA	4 días	vie 4/12/26	mié 9/12/26
349	001.003.027.240.039	AMARRE DE ACERO	4 días	sáb 5/12/26	vie 11/12/26
350	001.003.027.240.040	POSICIONAMIENTO DE CASETON Y MALLA	1 día	vie 11/12/26	sáb 12/12/26
351	001.003.027.240.041	FUNDIDA	1 día	sáb 12/12/26	sáb 12/12/26
352	001.003.027.240.042	DESAPUNTALAMIENTO PARCIAL Y RETIRO DE	1 día	mié 16/12/26	jue 17/12/26
353	001.003.027.240.043	DESAPUNTALAMIENTO TOTAL	1 día	mié 6/01/27	jue 7/01/27

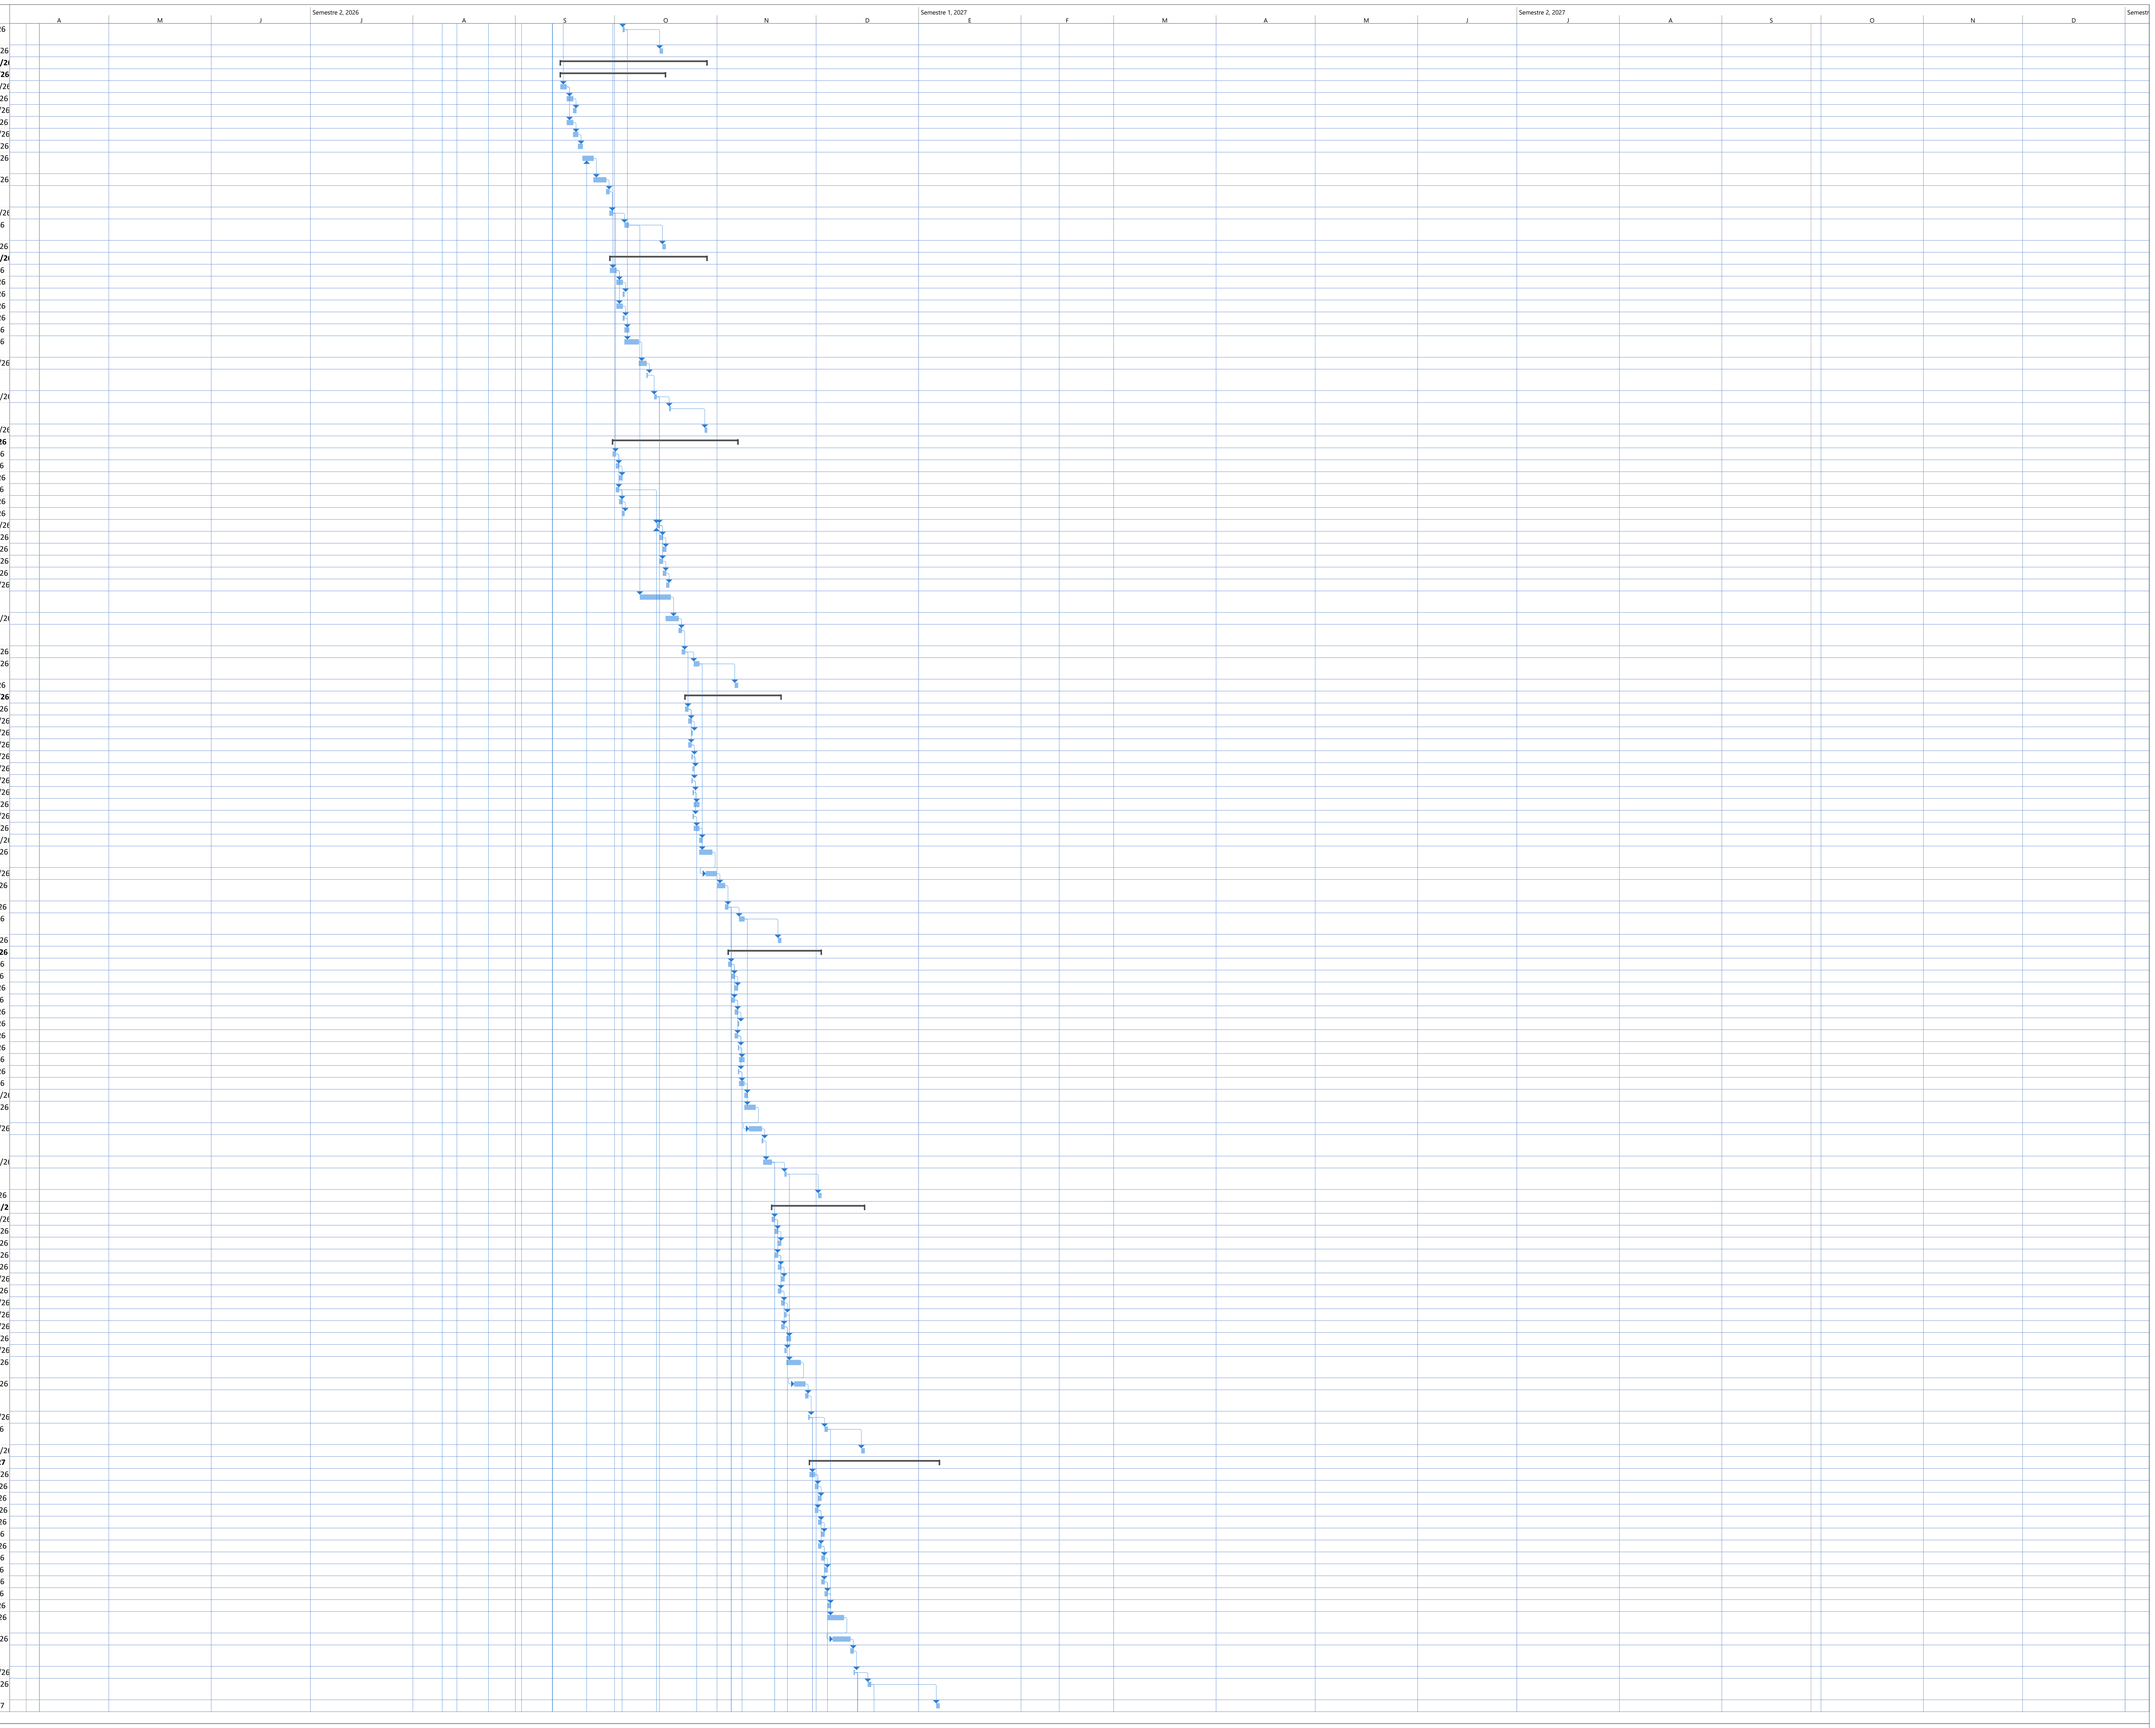


Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
354	**001.003.027.241**	**PISO 8 - PISO 9**	**29 días**	**sáb 12/12/26**	**mar 19/01/27**
355	001.003.027.241.029	AMARRE GRUPO 1 COLUMNA	1 día	sáb 12/12/26	lun 14/12/26
356	001.003.027.241.030	ARMADO COLUMNAS	1 día	lun 14/12/26	lun 14/12/26
357	001.003.027.241.031	FUNDIDA	1 día	lun 14/12/26	mar 15/12/26
358	001.003.027.241.032	AMARRE GRUPO 2 COLUMNA	1 día	lun 14/12/26	lun 14/12/26
359	001.003.027.241.033	ARMADO COLUMNAS	1 día	lun 14/12/26	mar 15/12/26
360	001.003.027.241.034	FUNDIDA	1 día	mar 15/12/26	mié 16/12/26
361	001.003.027.241.035	AMARRE GRUPO 3 COLUMNA	1 día	lun 14/12/26	mar 15/12/26
362	001.003.027.241.036	ARMADO COLUMNAS	1 día	mar 15/12/26	mié 16/12/26
363	001.003.027.241.037	FUNDIDA	1 día	mié 16/12/26	jue 17/12/26
364	001.003.027.241.038	AMARRE GRUPO 4 COLUMNA	1 día	mar 15/12/26	mié 16/12/26
365	001.003.027.241.039	ARMADO COLUMNAS	1 día	mié 16/12/26	jue 17/12/26
366	001.003.027.241.040	FUNDIDA	1 día	jue 17/12/26	vie 18/12/26
367	001.003.027.241.041	APUNTALAMIENTO Y POSICIONAMIENTO CAMILLA	4 días	jue 17/12/26	lun 21/12/26
368	001.003.027.241.042	AMARRE DE ACERO	4 días	sáb 19/12/26	mié 23/12/26
369	001.003.027.241.043	POSICIONAMIENTO DE CASETON Y MALLA	1 día	mié 23/12/26	jue 24/12/26
370	001.003.027.241.044	FUNDIDA	1 día	jue 24/12/26	lun 4/01/27
371	001.003.027.241.045	DESAPUNTALAMIENTO PARCIAL Y RETIRO DE	1 día	vie 8/01/27	sáb 9/01/27
372	001.003.027.241.046	DESAPUNTALAMIENTO TOTAL	1 día	lun 18/01/27	mar 19/01/27
373	**001.003.027.242**	**PISO 9 - PISO 10**	**29 días**	**lun 4/01/27**	**sáb 30/01/27**
374	001.003.027.242.028	AMARRE GRUPO 1 COLUMNA	1 día	lun 4/01/27	mar 5/01/27
375	001.003.027.242.029	ARMADO COLUMNAS	1 día	mar 5/01/27	mié 6/01/27
376	001.003.027.242.030	FUNDIDA	1 día	mié 6/01/27	jue 7/01/27
377	001.003.027.242.031	AMARRE GRUPO 2 COLUMNA	1 día	mar 5/01/27	mié 6/01/27
378	001.003.027.242.032	ARMADO COLUMNAS	1 día	mié 6/01/27	jue 7/01/27
379	001.003.027.242.033	FUNDIDA	1 día	jue 7/01/27	vie 8/01/27
380	001.003.027.242.034	AMARRE GRUPO 3 COLUMNA	1 día	mié 6/01/27	jue 7/01/27
381	001.003.027.242.035	ARMADO COLUMNAS	1 día	jue 7/01/27	vie 8/01/27
382	001.003.027.242.036	FUNDIDA	1 día	vie 8/01/27	sáb 9/01/27
383	001.003.027.242.037	AMARRE GRUPO 4 COLUMNA	1 día	jue 7/01/27	vie 8/01/27
384	001.003.027.242.038	ARMADO COLUMNAS	1 día	vie 8/01/27	sáb 9/01/27
385	001.003.027.242.039	FUNDIDA	1 día	sáb 9/01/27	sáb 9/01/27
386	001.003.027.242.040	APUNTALAMIENTO Y POSICIONAMIENTO CAMILLA	4 días	sáb 9/01/27	mar 12/01/27
387	001.003.027.242.041	AMARRE DE ACERO	4 días	sáb 9/01/27	jue 14/01/27
388	001.003.027.242.042	POSICIONAMIENTO DE CASETON Y MALLA	1 día	jue 14/01/27	vie 15/01/27
389	001.003.027.242.043	FUNDIDA	1 día	vie 15/01/27	sáb 16/01/27
390	001.003.027.242.044	DESAPUNTALAMIENTO PARCIAL Y RETIRO DE	1 día	mié 20/01/27	jue 21/01/27
391	001.003.027.242.045	DESAPUNTALAMIENTO TOTAL	1 día	sáb 30/01/27	sáb 30/01/27
392	**001.003.027.243**	**PISO 10 - PISO 11**	**29 días**	**sáb 16/01/27**	**vie 12/02/27**
393	001.003.027.243.028	AMARRE GRUPO 1 COLUMNA	1 día	sáb 16/01/27	sáb 16/01/27
394	001.003.027.243.029	ARMADO COLUMNAS	1 día	sáb 16/01/27	lun 18/01/27
395	001.003.027.243.030	FUNDIDA	1 día	lun 18/01/27	mar 19/01/27
396	001.003.027.243.031	AMARRE GRUPO 2 COLUMNA	1 día	sáb 16/01/27	lun 18/01/27
397	001.003.027.243.032	ARMADO COLUMNAS	1 día	lun 18/01/27	mar 19/01/27
398	001.003.027.243.033	FUNDIDA	1 día	mar 19/01/27	mié 20/01/27
399	001.003.027.243.034	AMARRE GRUPO 3 COLUMNA	1 día	lun 18/01/27	mar 19/01/27
400	001.003.027.243.035	ARMADO COLUMNAS	1 día	mar 19/01/27	mié 20/01/27
401	001.003.027.243.036	FUNDIDA	1 día	mié 20/01/27	jue 21/01/27
402	001.003.027.243.037	AMARRE GRUPO 4 COLUMNA	1 día	mar 19/01/27	mié 20/01/27
403	001.003.027.243.038	ARMADO COLUMNAS	1 día	mié 20/01/27	jue 21/01/27
404	001.003.027.243.039	FUNDIDA	1 día	jue 21/01/27	vie 22/01/27
405	001.003.027.243.040	APUNTALAMIENTO Y POSICIONAMIENTO CAMILLA	4 días	jue 21/01/27	lun 25/01/27
406	001.003.027.243.041	AMARRE DE ACERO	4 días	sáb 23/01/27	mar 26/01/27
407	001.003.027.243.042	POSICIONAMIENTO DE CASETON Y MALLA	1 día	mar 26/01/27	mié 27/01/27
408	001.003.027.243.043	FUNDIDA	1 día	mié 27/01/27	jue 28/01/27
409	001.003.027.243.044	DESAPUNTALAMIENTO PARCIAL Y RETIRO DE	1 día	lun 1/02/27	mar 2/02/27
410	001.003.027.243.045	DESAPUNTALAMIENTO TOTAL	1 día	jue 11/02/27	vie 12/02/27
411	**001.003.027.244**	**PISO 11-CUBIERTA**	**29 días**	**jue 28/01/27**	**jue 25/02/27**
412	001.003.027.244.041	AMARRE GRUPO 1 COLUMNA	1 día	jue 28/01/27	vie 29/01/27
413	001.003.027.244.042	ARMADO COLUMNAS	1 día	vie 29/01/27	sáb 30/01/27
414	001.003.027.244.043	FUNDIDA	1 día	sáb 30/01/27	sáb 30/01/27
415	001.003.027.244.044	AMARRE GRUPO 2 COLUMNA	1 día	vie 29/01/27	sáb 30/01/27
416	001.003.027.244.045	ARMADO COLUMNAS	1 día	sáb 30/01/27	sáb 30/01/27
417	001.003.027.244.046	FUNDIDA	1 día	sáb 30/01/27	lun 1/02/27
418	001.003.027.244.047	AMARRE GRUPO 3 COLUMNA	1 día	sáb 30/01/27	sáb 30/01/27
419	001.003.027.244.048	ARMADO COLUMNAS	1 día	sáb 30/01/27	lun 1/02/27
420	001.003.027.244.049	FUNDIDA	1 día	lun 1/02/27	mar 2/02/27
421	001.003.027.244.050	AMARRE GRUPO 4 COLUMNA	1 día	sáb 30/01/27	lun 1/02/27
422	001.003.027.244.051	ARMADO COLUMNAS	1 día	lun 1/02/27	mar 2/02/27
423	001.003.027.244.052	FUNDIDA	1 día	mar 2/02/27	mié 3/02/27
424	001.003.027.244.053	APUNTALAMIENTO Y POSICIONAMIENTO CAMILLA	4 días	mar 2/02/27	sáb 6/02/27
425	001.003.027.244.054	AMARRE DE ACERO	4 días	jue 4/02/27	lun 8/02/27
426	001.003.027.244.055	POSICIONAMIENTO DE CASETON Y MALLA	1 día	lun 8/02/27	mar 9/02/27
427	001.003.027.244.056	FUNDIDA	1 día	mar 9/02/27	mié 10/02/27
428	001.003.027.244.057	DESAPUNTALAMIENTO PARCIAL Y RETIRO DE	1 día	sáb 13/02/27	sáb 13/02/27
429	001.003.027.244.058	DESAPUNTALAMIENTO TOTAL	1 día	mié 24/02/27	jue 25/02/27
430	**001.003.027.245**	**ESCALERAS**	**125 días**	**vie 2/10/26**	**mié 10/02/27**
431	**001.003.027.245.013**	**PISO SOTANO - PISO 1**	**3 días**	**vie 2/10/26**	**lun 5/10/26**
432	001.003.027.245.013.	ESCALERA 1	1 día	vie 2/10/26	sáb 3/10/26
433	001.003.027.245.013.	FUNDIDA	1 día	sáb 3/10/26	sáb 3/10/26
434	001.003.027.245.013.	ESCALERA 2	1 día	sáb 3/10/26	sáb 3/10/26
435	001.003.027.245.013.	FUNDIDA	1 día	sáb 3/10/26	lun 5/10/26
436	**001.003.027.245.014**	**PISO 1-PISO 2**	**5 días**	**sáb 3/10/26**	**jue 8/10/26**
437	001.003.027.245.014.	ESCALERA 1	2 días	sáb 3/10/26	mar 6/10/26
438	001.003.027.245.014.	FUNDIDA	1 día	mar 6/10/26	mié 7/10/26
439	001.003.027.245.014.	ESCALERA 2	2 días	mar 6/10/26	mié 7/10/26
440	001.003.027.245.014.	FUNDIDA	1 día	mié 7/10/26	jue 8/10/26
441	**001.003.027.245.015**	**PISO 2-PISO 3**	**3 días**	**mié 7/10/26**	**sáb 10/10/26**
442	001.003.027.245.015.	ESCALERA 1	1 día	mié 7/10/26	jue 8/10/26
443	001.003.027.245.015.	FUNDIDA	1 día	jue 8/10/26	vie 9/10/26
444	001.003.027.245.015.	ESCALERA 2	1 día	jue 8/10/26	vie 9/10/26
445	001.003.027.245.015.	FUNDIDA	1 día	vie 9/10/26	sáb 10/10/26
446	**001.003.027.245.016**	**PISO 3-PISO 4**	**18 días**	**vie 9/10/26**	**mar 27/10/26**
447	001.003.027.245.016.	ESCALERA 1	2 días	vie 9/10/26	sáb 10/10/26
448	001.003.027.245.016.	FUNDIDA	1 día	sáb 10/10/26	mar 13/10/26
449	001.003.027.245.016.	ESCALERA 2	1 día	sáb 24/10/26	lun 26/10/26
450	001.003.027.245.016.	FUNDIDA	1 día	lun 26/10/26	mar 27/10/26
451	**001.003.027.245.017**	**PISO 4 - PISO 5**	**9 días**	**lun 26/10/26**	**jue 5/11/26**
452	001.003.027.245.017.	ESCALERA 1	1 día	lun 26/10/26	mar 27/10/26
453	001.003.027.245.017.	FUNDIDA	1 día	mié 4/11/26	jue 5/11/26
454	001.003.027.245.017.	ESCALERA 2	1 día	mar 27/10/26	mié 28/10/26
455	001.003.027.245.017.	FUNDIDA	1 día	mié 4/11/26	jue 5/11/26
456	**001.003.027.245.018**	**PISO 5 - PISO 6**	**10 días**	**sáb 7/11/26**	**mié 18/11/26**
457	001.003.027.245.018.	ESCALERA 1	1 día	sáb 7/11/26	lun 9/11/26
458	001.003.027.245.018.	FUNDIDA	1 día	mar 17/11/26	mié 18/11/26
459	001.003.027.245.018.	ESCALERA 2	1 día	lun 9/11/26	mar 10/11/26
460	001.003.027.245.018.	FUNDIDA	1 día	mar 17/11/26	mié 18/11/26
461	**001.003.027.245.019**	**PISO 6-PISO 7**	**10 días**	**sáb 21/11/26**	**lun 30/11/26**
462	001.003.027.245.019.	ESCALERA 1	1 día	sáb 21/11/26	sáb 21/11/26
463	001.003.027.245.019.	FUNDIDA	1 día	sáb 28/11/26	lun 30/11/26
464	001.003.027.245.019.	ESCALERA 2	1 día	sáb 21/11/26	lun 23/11/26
465	001.003.027.245.019.	FUNDIDA	1 día	sáb 28/11/26	lun 30/11/26
466	**001.003.027.245.020**	**PISO 7 - PISO 8**	**10 días**	**jue 3/12/26**	**lun 14/12/26**
467	001.003.027.245.020.	ESCALERA 1	1 día	jue 3/12/26	vie 4/12/26
468	001.003.027.245.020.	FUNDIDA	1 día	sáb 12/12/26	lun 14/12/26
469	001.003.027.245.020.	ESCALERA 2	1 día	vie 4/12/26	sáb 5/12/26
470	001.003.027.245.020.	FUNDIDA	1 día	sáb 12/12/26	lun 14/12/26
471	**001.003.027.245.021**	**PISO 8 - PISO 9**	**10 días**	**mié 16/12/26**	**mar 5/01/27**
472	001.003.027.245.021.	ESCALERA 1	1 día	mié 16/12/26	jue 17/12/26
473	001.003.027.245.021.	FUNDIDA	1 día	lun 4/01/27	mar 5/01/27
474	001.003.027.245.021.	ESCALERA 2	1 día	jue 17/12/26	vie 18/12/26
475	001.003.027.245.021.	FUNDIDA	1 día	lun 4/01/27	mar 5/01/27
476	**001.003.027.245.022**	**PISO 9 - PISO 10**	**10 días**	**vie 8/01/27**	**sáb 16/01/27**
477	001.003.027.245.022.	ESCALERA 1	1 día	vie 8/01/27	sáb 9/01/27
478	001.003.027.245.022.	FUNDIDA	1 día	sáb 16/01/27	sáb 16/01/27
479	001.003.027.245.022.	ESCALERA 2	1 día	sáb 9/01/27	sáb 9/01/27
480	001.003.027.245.022.	FUNDIDA	1 día	sáb 16/01/27	sáb 16/01/27
481	**001.003.027.245.023**	**PISO 10 - PISO 11**	**10 días**	**mié 20/01/27**	**vie 29/01/27**
482	001.003.027.245.023.	ESCALERA 1	1 día	mié 20/01/27	jue 21/01/27
483	001.003.027.245.023.	FUNDIDA	1 día	jue 28/01/27	vie 29/01/27
484	001.003.027.245.023.	ESCALERA 2	1 día	jue 21/01/27	vie 22/01/27
485	001.003.027.245.023.	FUNDIDA	1 día	jue 28/01/27	vie 29/01/27

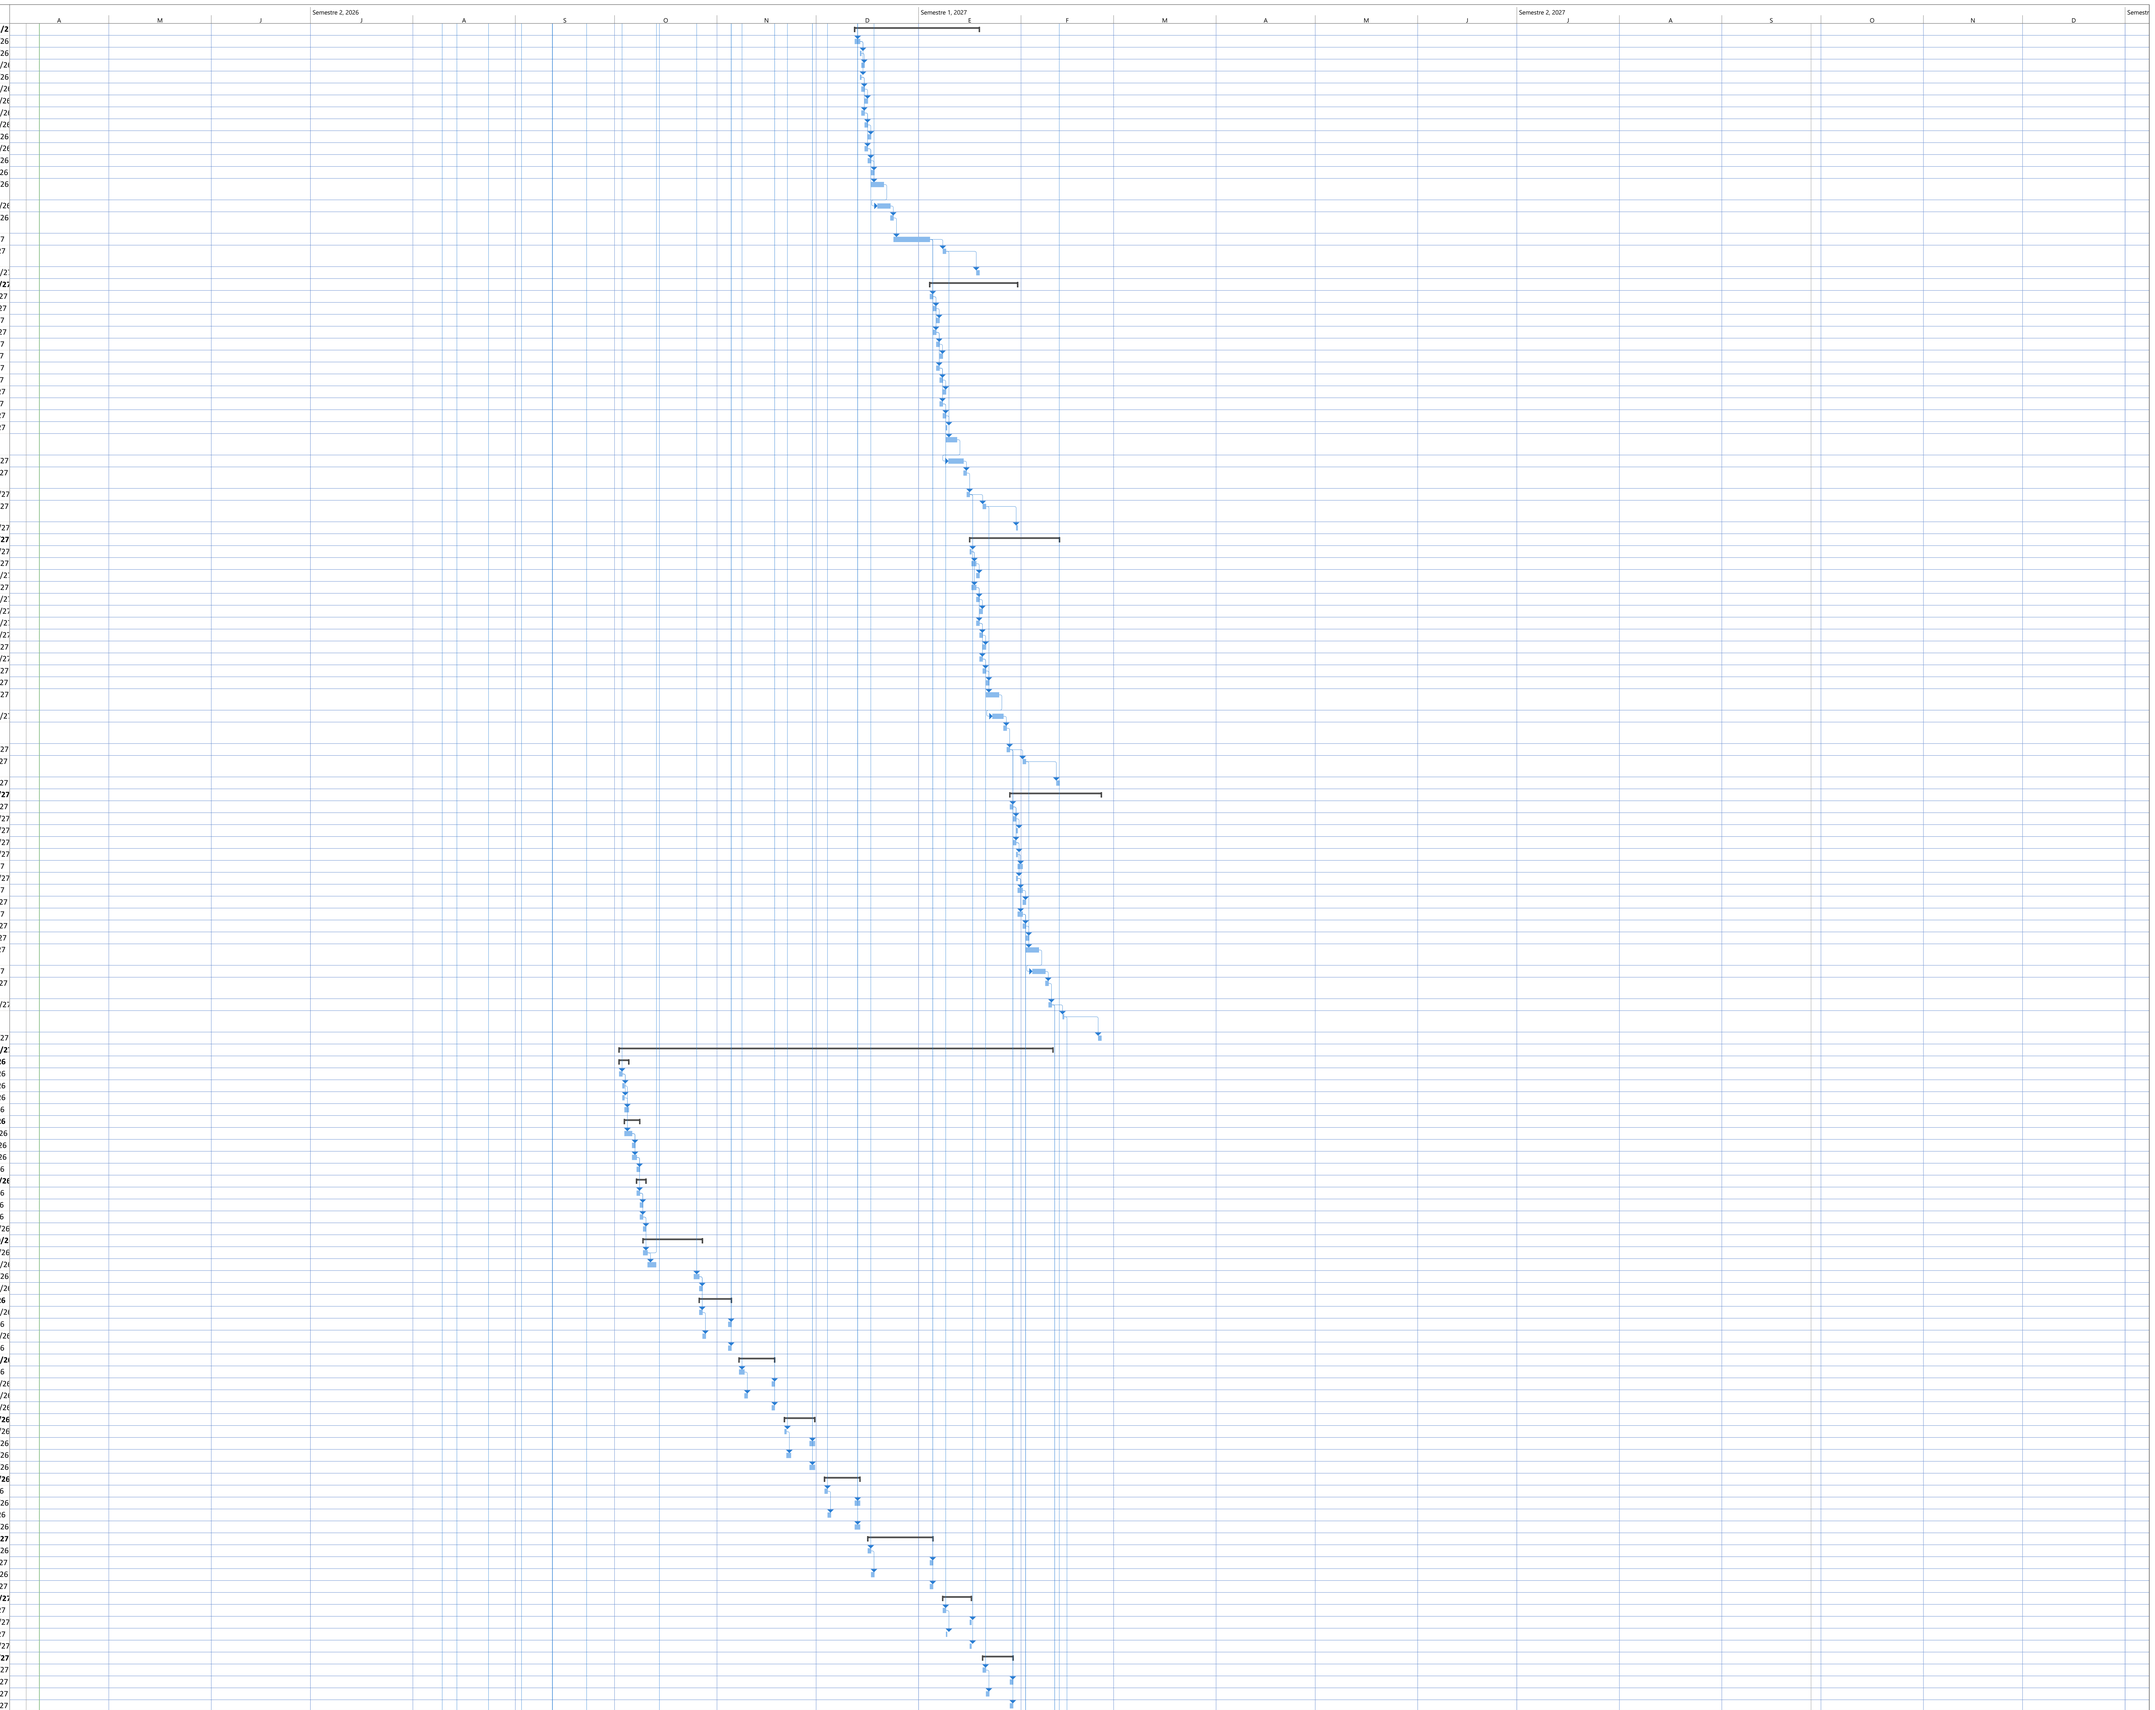

Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
486	**001.003.027.245.024**	**PISO 11-CUBIERTA**	**10 días**	**lun 1/02/27**	**mié 10/02/27**
487	001.003.027.245.024.	ESCALERA 1	1 día	lun 1/02/27	mar 2/02/27
488	001.003.027.245.024.	FUNDIDA	1 día	mié 10/02/27	mié 10/02/27
489	001.003.027.245.024.	ESCALERA 2	1 día	mar 2/02/27	mié 3/02/27
490	001.003.027.245.024.	FUNDIDA	1 día	mié 10/02/27	mié 10/02/27
491	**001.003.028**	**TORRE B**	**258.2 días**	**sáb 8/08/26**	**jue 29/04/27**
492	**001.003.028.006**	**PISO SOTANO - PISO 1**	**56.2 días**	**sáb 8/08/26**	**vie 2/10/26**
493	**001.003.028.006.003**	**BLOQUE 4**	**41.2 días**	**sáb 8/08/26**	**vie 18/09/26**
494	001.003.028.006.003.	AMARRE GRUPO 1 COLUMNAS Y MUROS DE	3 días	sáb 8/08/26	mié 12/08/26
495	001.003.028.006.003.	ARMADO	1.5 días	mié 12/08/26	jue 13/08/26
496	001.003.028.006.003.	FUNDIDA	1 día	jue 13/08/26	vie 14/08/26
497	001.003.028.006.003.	ARMADO MURO DE CONTENCIÓN 18	0.7 días	jue 13/08/26	vie 14/08/26
498	001.003.028.006.003.	FUNDIDA MURO 18	0.7 días	vie 14/08/26	vie 14/08/26
499	001.003.028.006.003.	DESARMADO MURO 18	0.7 días	vie 14/08/26	sáb 15/08/26
500	001.003.028.006.003.	ARMADO MURO DE CONTENCIÓN 19	0.7 días	sáb 15/08/26	sáb 15/08/26
501	001.003.028.006.003.	FUNDIDA MURO 19	0.7 días	sáb 15/08/26	sáb 15/08/26
502	001.003.028.006.003.	DESARMADO MURO 19	0.7 días	sáb 15/08/26	mar 18/08/26
503	001.003.028.006.003.	AMARRE GRUPO 2 COLUMNAS Y MUROS	3 días	mié 12/08/26	sáb 15/08/26
504	001.003.028.006.003.	ARMADO	1.5 días	sáb 15/08/26	sáb 15/08/26
505	001.003.028.006.003.	FUNDIDA	1 día	sáb 15/08/26	mar 18/08/26
506	001.003.028.006.003.	AMARRE GRUPO 3 COLUMNAS Y MUROS	3 días	sáb 15/08/26	mar 18/08/26
507	001.003.028.006.003.	ARMADO	1.5 días	mar 18/08/26	jue 20/08/26
508	001.003.028.006.003.	FUNDIDA	1 día	jue 20/08/26	vie 21/08/26
509	001.003.028.006.003.	AMARRE GRUPO 4 COLUMNAS Y MUROS	3 días	mar 18/08/26	vie 21/08/26
510	001.003.028.006.003.	ARMADO	1.5 días	vie 21/08/26	sáb 22/08/26
511	001.003.028.006.003.	FUNDIDA	1 día	sáb 22/08/26	lun 24/08/26
512	001.003.028.006.003.	ARMADO MURO DE CONTENCIÓN 20	0.7 días	mar 18/08/26	mar 18/08/26
513	001.003.028.006.003.	FUNDIDA MURO 20	0.7 días	mar 18/08/26	mié 19/08/26
514	001.003.028.006.003.	DESARMADO MURO 20	0.7 días	mié 19/08/26	jue 20/08/26
515	001.003.028.006.003.	ARMADO MURO DE CONTENCIÓN 21	0.7 días	jue 20/08/26	jue 20/08/26
516	001.003.028.006.003.	FUNDIDA MURO 21	0.7 días	jue 20/08/26	vie 21/08/26
517	001.003.028.006.003.	DESARMADO MURO 21	0.7 días	vie 21/08/26	sáb 22/08/26
518	001.003.028.006.003.	APUNTALAMIENTO Y POSICIONAMIENTO	5 días	sáb 22/08/26	vie 28/08/26
519	001.003.028.006.003.	AMARRE DE ACERO	4 días	vie 28/08/26	mar 1/09/26
520	001.003.028.006.003.	POSICIONAMIENTO DE CASETON Y MALLA	1 día	mar 1/09/26	mié 2/09/26
521	001.003.028.006.003.	FUNDIDA	1 día	mié 2/09/26	jue 3/09/26
522	001.003.028.006.003.	DESAPUNTALAMIENTO PARCIAL Y RETIRO DE	1 día	sáb 5/09/26	lun 7/09/26
523	001.003.028.006.003.	DESAPUNTALAMIENTO TOT	1 día	jue 17/09/26	vie 18/09/26
524	**001.003.028.006.004**	**BLOQUE 5**	**44.2 días**	**vie 21/08/26**	**vie 2/10/26**
525	001.003.028.006.004.	AMARRE GRUPO 1 COLUMNAS Y MUROS DE	3 días	vie 21/08/26	lun 24/08/26
526	001.003.028.006.004.	ARMADO	1.5 días	lun 24/08/26	mar 25/08/26
527	001.003.028.006.004.	FUNDIDA	1 día	mar 25/08/26	mié 26/08/26
528	001.003.028.006.004.	ARMADO MURO DE CONTENCIÓN 22	0.7 días	sáb 22/08/26	sáb 22/08/26
529	001.003.028.006.004.	FUNDIDA MURO 22	0.7 días	sáb 22/08/26	sáb 22/08/26
530	001.003.028.006.004.	DESARMADO MURO 22	0.7 días	sáb 22/08/26	lun 24/08/26
531	001.003.028.006.004.	ARMADO MURO DE CONTENCIÓN 23	0.7 días	lun 24/08/26	lun 24/08/26
532	001.003.028.006.004.	FUNDIDA MURO 23	0.7 días	lun 24/08/26	mar 25/08/26
533	001.003.028.006.004.	DESARMADO MURO 23	0.7 días	mar 25/08/26	mié 26/08/26
534	001.003.028.006.004.	AMARRE GRUPO 2 COLUMNAS Y MUROS	3 días	lun 24/08/26	jue 27/08/26
535	001.003.028.006.004.	ARMADO	1.5 días	jue 27/08/26	vie 28/08/26
536	001.003.028.006.004.	FUNDIDA	1 día	vie 28/08/26	sáb 29/08/26
537	001.003.028.006.004.	ARMADO MURO DE CONTENCIÓN 24	0.7 días	mié 26/08/26	mié 26/08/26
538	001.003.028.006.004.	FUNDIDA MURO 24	0.7 días	mié 26/08/26	jue 27/08/26
539	001.003.028.006.004.	DESARMADO MURO 24	0.7 días	jue 27/08/26	vie 28/08/26
540	001.003.028.006.004.	ARMADO MURO DE CONTENCIÓN 25	0.7 días	vie 28/08/26	vie 28/08/26
541	001.003.028.006.004.	FUNDIDA MURO 25	0.7 días	vie 28/08/26	sáb 29/08/26
542	001.003.028.006.004.	DESARMADO MURO 25	0.7 días	sáb 29/08/26	sáb 29/08/26
543	001.003.028.006.004.	AMARRE GRUPO 3 COLUMNAS Y MUROS	3 días	jue 27/08/26	sáb 29/08/26
544	001.003.028.006.004.	ARMADO	1.5 días	sáb 29/08/26	lun 31/08/26
545	001.003.028.006.004.	FUNDIDA	1 día	lun 31/08/26	mar 1/09/26
546	001.003.028.006.004.	ARMADO MURO DE CONTENCIÓN 26	0.7 días	sáb 29/08/26	sáb 29/08/26
547	001.003.028.006.004.	FUNDIDA MURO 26	0.7 días	sáb 29/08/26	lun 31/08/26
548	001.003.028.006.004.	DESARMADO MURO 26	0.7 días	lun 31/08/26	mar 1/09/26
549	001.003.028.006.004.	ARMADO MURO DE CONTENCIÓN 27	0.7 días	mar 1/09/26	mar 1/09/26
550	001.003.028.006.004.	FUNDIDA MURO 27	0.7 días	mar 1/09/26	mié 2/09/26
551	001.003.028.006.004.	DESARMADO MURO 27	0.7 días	mié 2/09/26	jue 3/09/26
552	001.003.028.006.004.	ARMADO MURO DE CONTENCIÓN 28	0.7 días	jue 3/09/26	jue 3/09/26
553	001.003.028.006.004.	FUNDIDA MURO 28	0.7 días	jue 3/09/26	vie 4/09/26
554	001.003.028.006.004.	DESARMADO MURO 28	0.7 días	vie 4/09/26	sáb 5/09/26
555	001.003.028.006.004.	AMARRE GRUPO 4 COLUMNAS Y MUROS	3 días	sáb 29/08/26	mar 1/09/26
556	001.003.028.006.004.	ARMADO	1.5 días	mié 2/09/26	jue 3/09/26
557	001.003.028.006.004.	FUNDIDA	1 día	jue 3/09/26	vie 4/09/26
558	001.003.028.006.004.	ARMADO MURO DE CONTENCIÓN 29	0.7 días	sáb 5/09/26	sáb 5/09/26
559	001.003.028.006.004.	FUNDIDA MURO 29	0.7 días	sáb 5/09/26	sáb 5/09/26
560	001.003.028.006.004.	DESARMADO MURO 29	0.7 días	sáb 5/09/26	lun 7/09/26
561	001.003.028.006.004.	ARMADO MURO DE CONTENCIÓN 30	0.7 días	lun 7/09/26	lun 7/09/26
562	001.003.028.006.004.	FUNDIDA MURO 30	0.7 días	lun 7/09/26	mar 8/09/26
563	001.003.028.006.004.	DESARMADO MURO 30	0.7 días	mar 8/09/26	mié 9/09/26
564	001.003.028.006.004.	ARMADO MURO DE CONTENCIÓN 31	0.7 días	mié 9/09/26	mié 9/09/26
565	001.003.028.006.004.	FUNDIDA MURO 31	0.7 días	mié 9/09/26	jue 10/09/26
566	001.003.028.006.004.	DESARMADO MURO 31	0.7 días	jue 10/09/26	vie 11/09/26
567	001.003.028.006.004.	APUNTALAMIENTO Y POSICIONAMIENTO	6 días	sáb 5/09/26	vie 11/09/26
568	001.003.028.006.004.	AMARRE DE ACERO	5 días	mié 9/09/26	lun 14/09/26
569	001.003.028.006.004.	POSICIONAMIENTO DE CASETON Y MALLA	2 días	lun 14/09/26	mié 16/09/26
570	001.003.028.006.004.	FUNDIDA	1 día	mié 16/09/26	jue 17/09/26
571	001.003.028.006.004.	DESAPUNTALAMIENTO PARCIAL Y RETIRO DE	1 día	lun 21/09/26	lun 21/09/26
572	001.003.028.006.004.	DESAPUNTALAMIENTO TOT	1 día	jue 1/10/26	vie 2/10/26
573	**001.003.028.007**	**PISO 1-PISO 2**	**40 días**	**lun 1/02/27**	**jue 11/03/27**
574	001.003.028.007.019	AMARRE GRUPO 1 COLUMNA	1.5 días	lun 1/02/27	mar 2/02/27
575	001.003.028.007.020	ARMADO COLUMNAS	1 día	mar 2/02/27	mié 3/02/27
576	001.003.028.007.021	FUNDIDA	1 día	mié 3/02/27	jue 4/02/27
577	001.003.028.007.022	AMARRE GRUPO 2 COLUMNA	1.5 días	mar 2/02/27	jue 4/02/27
578	001.003.028.007.023	ARMADO COLUMNAS	1 día	jue 4/02/27	vie 5/02/27
579	001.003.028.007.024	FUNDIDA	1 día	vie 5/02/27	sáb 6/02/27
580	001.003.028.007.025	AMARRE GRUPO 3 COLUMNA	1.5 días	jue 4/02/27	vie 5/02/27
581	001.003.028.007.026	ARMADO COLUMNAS	1 día	vie 5/02/27	sáb 6/02/27
582	001.003.028.007.027	FUNDIDA	1 día	sáb 6/02/27	sáb 6/02/27
583	001.003.028.007.028	AMARRE GRUPO 4 COLUMNA	1.5 días	vie 5/02/27	sáb 6/02/27
584	001.003.028.007.029	ARMADO COLUMNAS	1 día	sáb 6/02/27	lun 8/02/27
585	001.003.028.007.030	FUNDIDA	1 día	lun 8/02/27	mar 9/02/27
586	001.003.028.007.031	APUNTALAMIENTO Y POSICIONAMIENTO CAMILLA	4 días	sáb 13/02/27	jue 18/02/27
587	001.003.028.007.032	AMARRE DE ACERO	4 días	jue 18/02/27	lun 22/02/27
588	001.003.028.007.033	POSICIONAMIENTO DE CASETON Y MALLA	1 día	lun 22/02/27	mar 23/02/27
589	001.003.028.007.034	FUNDIDA	1 día	mar 23/02/27	mié 24/02/27
590	001.003.028.007.035	DESAPUNTALAMIENTO PARCIAL Y RETIRO DE	1 día	sáb 27/02/27	sáb 27/02/27
591	001.003.028.007.036	DESAPUNTALAMIENTO TOTAL	1 día	mié 10/03/27	jue 11/03/27
592	**001.003.028.008**	**PISO 3-PISO 4**	**31 días**	**mié 24/02/27**	**mar 30/03/27**
593	001.003.028.008.019	AMARRE GRUPO 1 COLUMNA	1 día	mié 24/02/27	jue 25/02/27
594	001.003.028.008.020	ARMADO COLUMNAS	1 día	jue 25/02/27	vie 26/02/27
595	001.003.028.008.021	FUNDIDA	1 día	vie 26/02/27	vie 26/02/27
596	001.003.028.008.022	AMARRE GRUPO 2 COLUMNA	1 día	jue 25/02/27	vie 26/02/27
597	001.003.028.008.023	ARMADO COLUMNAS	1 día	vie 26/02/27	vie 26/02/27
598	001.003.028.008.024	FUNDIDA	1 día	vie 26/02/27	sáb 27/02/27
599	001.003.028.008.025	AMARRE GRUPO 3 COLUMNA	1 día	vie 26/02/27	vie 26/02/27
600	001.003.028.008.026	ARMADO COLUMNAS	1 día	vie 26/02/27	sáb 27/02/27
601	001.003.028.008.027	FUNDIDA	1 día	sáb 27/02/27	sáb 27/02/27
602	001.003.028.008.028	AMARRE GRUPO 4 COLUMNA	1 día	vie 26/02/27	sáb 27/02/27

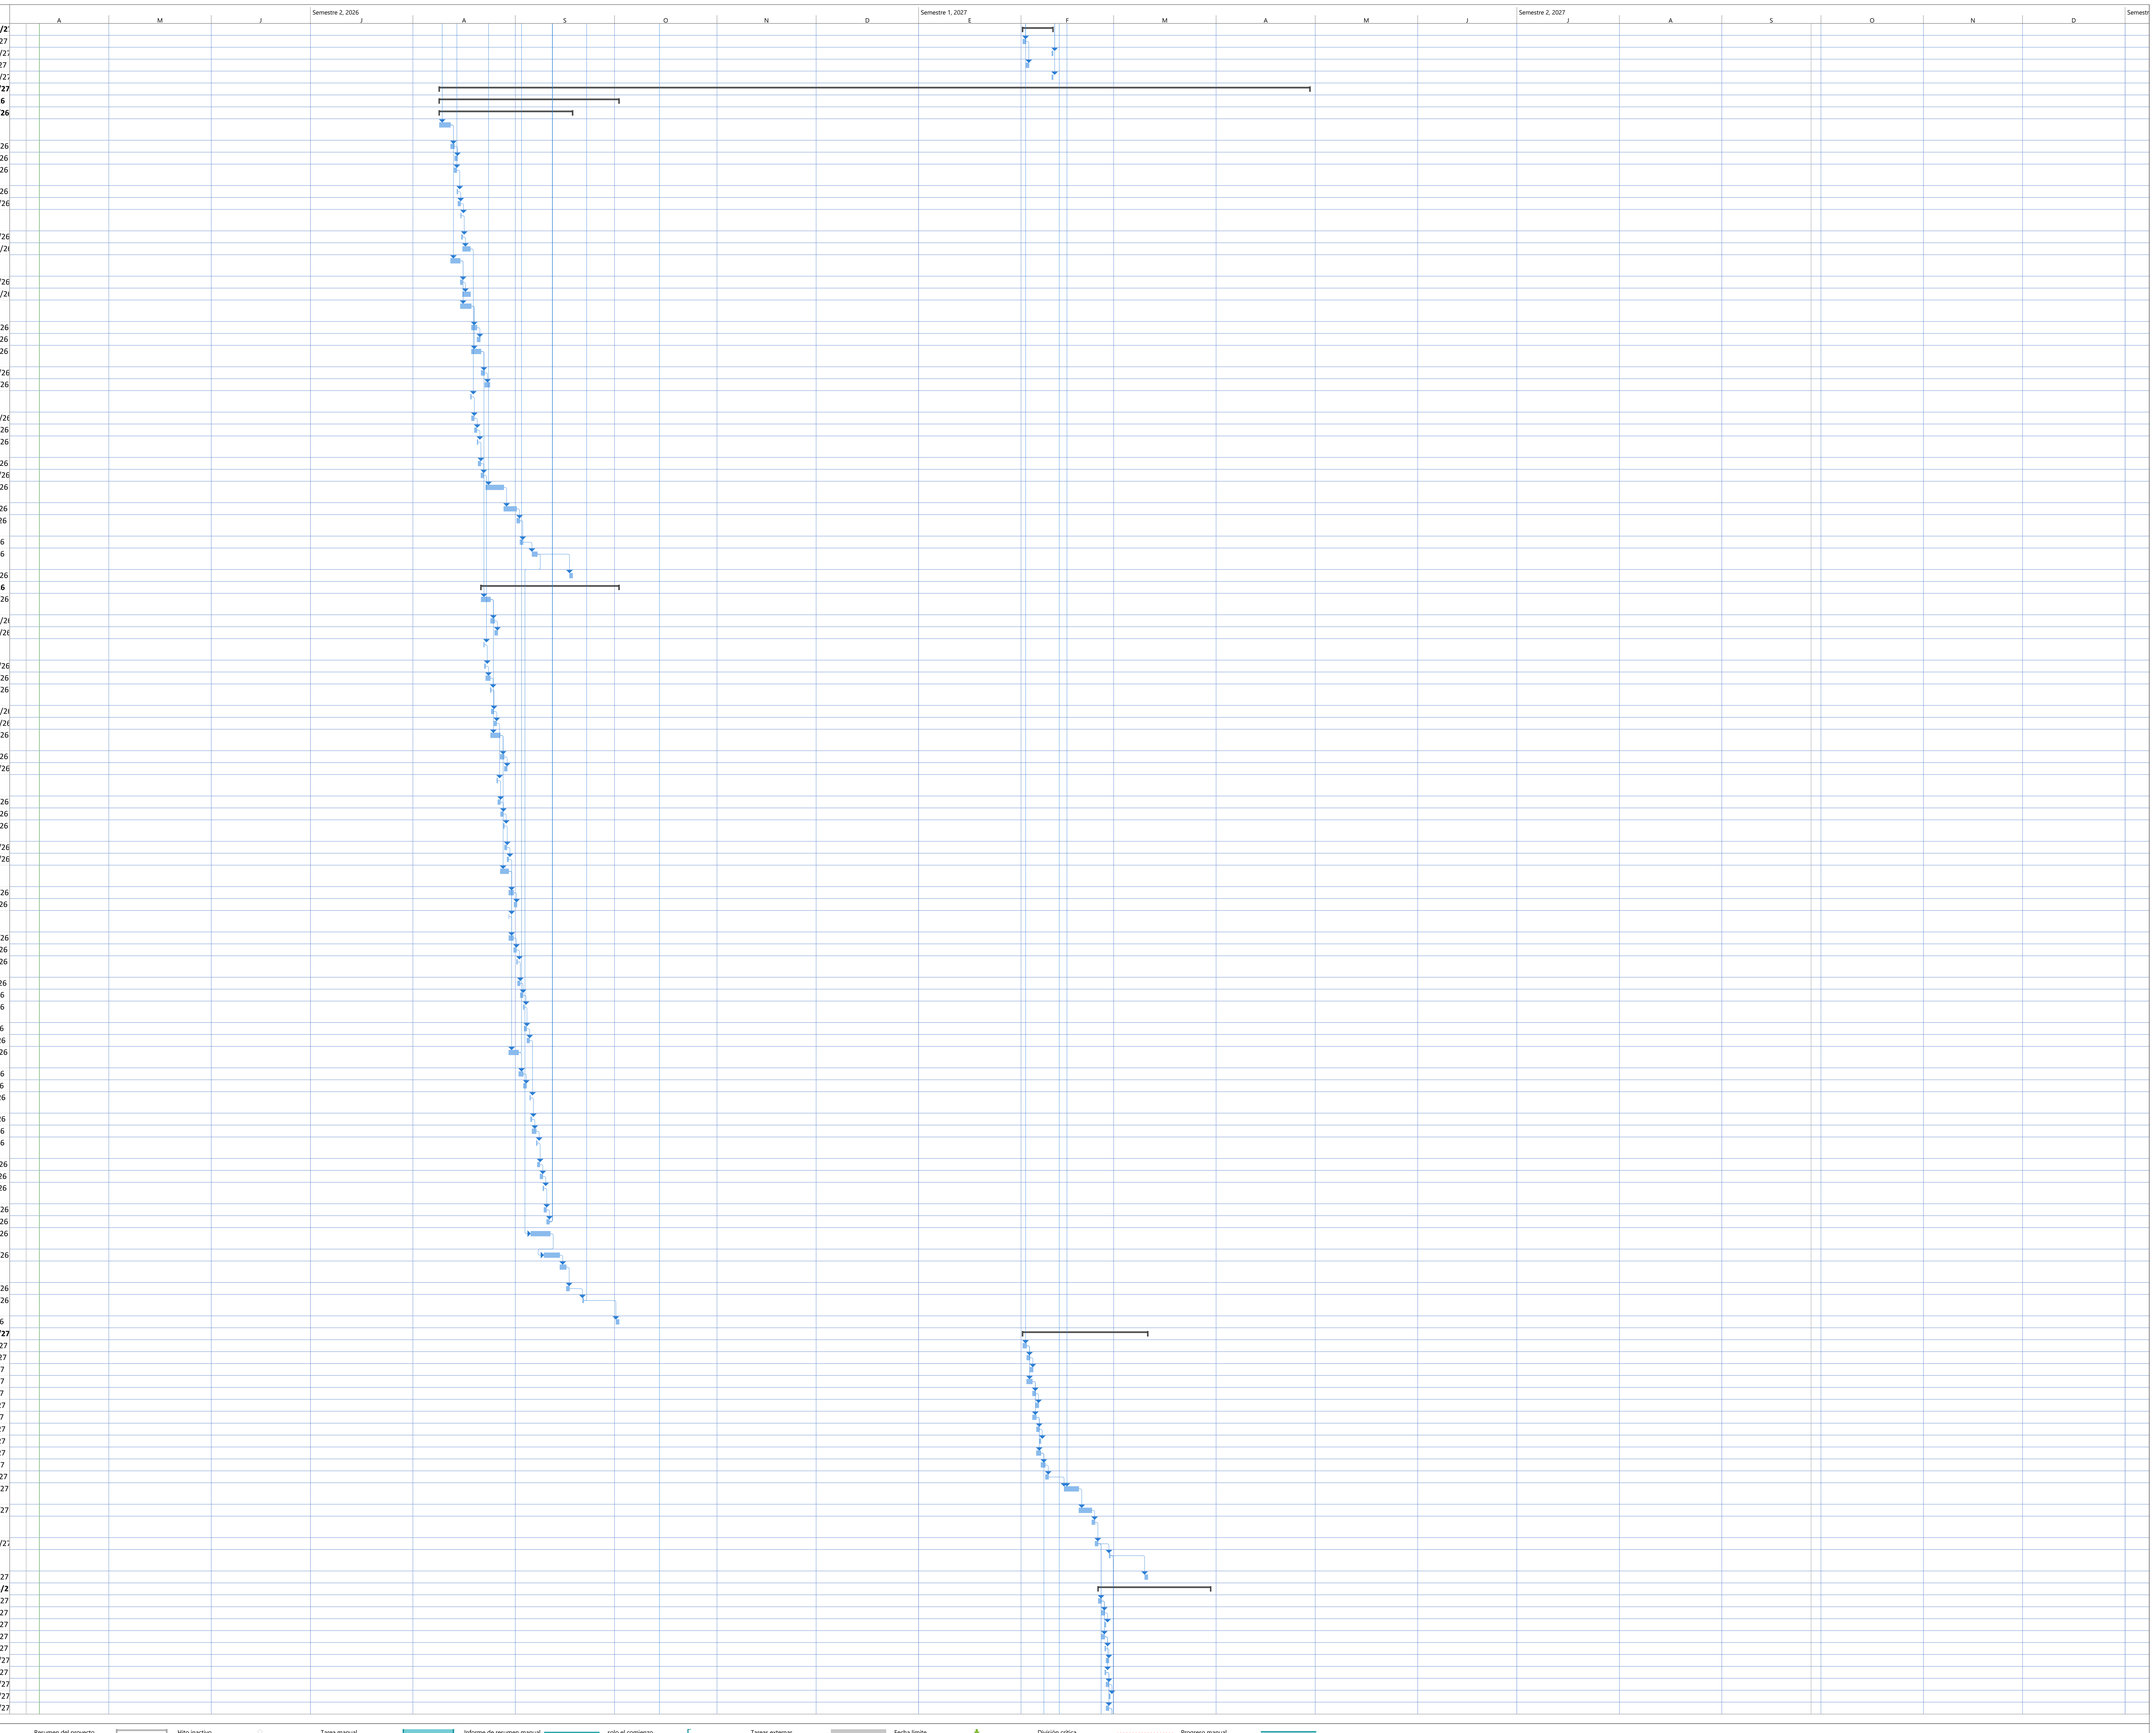

Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
603	001.003.028.008.029	ARMADO COLUMNAS	1 día	sáb 27/02/27	sáb 27/02/27
604	001.003.028.008.030	FUNDIDA	1 día	sáb 27/02/27	lun 1/03/27
605	001.003.028.008.031	APUNTALAMIENTO Y POSICIONAMIENTO CAMILLA	4 días	sáb 27/02/27	jue 4/03/27
606	001.003.028.008.032	AMARRE DE ACERO	4 días	jue 4/03/27	lun 8/03/27
607	001.003.028.008.033	POSICIONAMIENTO DE CASETON Y MALLA	1 día	lun 8/03/27	mar 9/03/27
608	001.003.028.008.034	FUNDIDA	1 día	mar 9/03/27	mié 10/03/27
609	001.003.028.008.035	DESAPUNTALAMIENTO PARCIAL Y RETIRO DE	1 día	sáb 13/03/27	sáb 13/03/27
610	001.003.028.008.036	DESAPUNTALAMIENTO TOTAL	1 día	lun 29/03/27	mar 30/03/27
611	**001.003.028.009**	**PISO 4-PISO 5**	**31 días**	**mié 10/03/27**	**mar 13/04/27**
612	001.003.028.009.020	AMARRE GRUPO 1 COLUMNA	1.5 días	mié 10/03/27	jue 11/03/27
613	001.003.028.009.021	ARMADO COLUMNAS	1 día	jue 11/03/27	vie 12/03/27
614	001.003.028.009.022	FUNDIDA	1 día	vie 12/03/27	sáb 13/03/27
615	001.003.028.009.023	AMARRE GRUPO 2 COLUMNA	1.5 días	jue 11/03/27	sáb 13/03/27
616	001.003.028.009.024	ARMADO COLUMNAS	1 día	sáb 13/03/27	sáb 13/03/27
617	001.003.028.009.025	FUNDIDA	1 día	sáb 13/03/27	sáb 13/03/27
618	001.003.028.009.026	AMARRE GRUPO 3 COLUMNA	1.5 días	sáb 13/03/27	sáb 13/03/27
619	001.003.028.009.027	ARMADO COLUMNAS	1 día	sáb 13/03/27	lun 15/03/27
620	001.003.028.009.028	FUNDIDA	1 día	lun 15/03/27	mar 16/03/27
621	001.003.028.009.029	AMARRE GRUPO 4 COLUMNA	1.5 días	sáb 13/03/27	lun 15/03/27
622	001.003.028.009.030	ARMADO COLUMNAS	1 día	lun 15/03/27	mar 16/03/27
623	001.003.028.009.031	FUNDIDA	1 día	mar 16/03/27	mié 17/03/27
624	001.003.028.009.032	APUNTALAMIENTO Y POSICIONAMIENTO CAMILLA	4 días	sáb 13/03/27	jue 18/03/27
625	001.003.028.009.033	AMARRE DE ACERO	4 días	jue 18/03/27	mar 23/03/27
626	001.003.028.009.034	POSICIONAMIENTO DE CASETON Y MALLA	1 día	mar 23/03/27	mié 24/03/27
627	001.003.028.009.035	FUNDIDA	1 día	mié 24/03/27	lun 29/03/27
628	001.003.028.009.036	DESAPUNTALAMIENTO PARCIAL Y RETIRO DE	1 día	vie 2/04/27	sáb 3/04/27
629	001.003.028.009.037	DESAPUNTALAMIENTO TOTAL	1 día	lun 12/04/27	mar 13/04/27
630	**001.003.028.010**	**ESTRUCTURA METALICA**	**28 días**	**sáb 3/04/27**	**jue 29/04/27**
631	**001.003.028.010.021**	**PISO 5**	**8 días**	**sáb 3/04/27**	**sáb 10/04/27**
632	001.003.028.010.021.	IZAJE VIGAS IPE	5 días	sáb 3/04/27	mié 7/04/27
633	001.003.028.010.021.	INSTALACIÓN METALDECK	2 días	mié 7/04/27	vie 9/04/27
634	001.003.028.010.021.	FUNDIDA	1 día	vie 9/04/27	sáb 10/04/27
635	**001.003.028.010.022**	**PISO 4**	**8 días**	**mié 7/04/27**	**jue 15/04/27**
636	001.003.028.010.022.	IZAJE VIGAS IPE	5 días	mié 7/04/27	lun 12/04/27
637	001.003.028.010.022.	INSTALACIÓN METALDECK	2 días	lun 12/04/27	mié 14/04/27
638	001.003.028.010.022.	FUNDIDA	1 día	mié 14/04/27	jue 15/04/27
639	**001.003.028.010.023**	**PISO 3**	**8 días**	**lun 12/04/27**	**mar 20/04/27**
640	001.003.028.010.023.	IZAJE VIGAS IPE	5 días	lun 12/04/27	sáb 17/04/27
641	001.003.028.010.023.	INSTALACIÓN METALDECK	2 días	sáb 17/04/27	lun 19/04/27
642	001.003.028.010.023.	FUNDIDA	1 día	lun 19/04/27	mar 20/04/27
643	**001.003.028.010.024**	**PISO 2**	**8 días**	**sáb 17/04/27**	**sáb 24/04/27**
644	001.003.028.010.024.	IZAJE VIGAS IPE	5 días	sáb 17/04/27	mié 21/04/27
645	001.003.028.010.024.	INSTALACIÓN METALDECK	2 días	mié 21/04/27	vie 23/04/27
646	001.003.028.010.024.	FUNDIDA	1 día	vie 23/04/27	sáb 24/04/27
647	**001.003.028.010.025**	**PISO 1**	**8 días**	**mié 21/04/27**	**jue 29/04/27**
648	001.003.028.010.025.	IZAJE VIGAS IPE	5 días	mié 21/04/27	lun 26/04/27
649	001.003.028.010.025.	INSTALACIÓN METALDECK	2 días	lun 26/04/27	mié 28/04/27
650	001.003.028.010.025.	FUNDIDA	1 día	mié 28/04/27	jue 29/04/27
651	**001.003.028.011**	**ESCALERAS**	**49 días**	**sáb 6/02/27**	**mar 30/03/27**
652	**001.003.028.011.001**	**PISO SOTANO - PISO 1**	**2 días**	**sáb 6/02/27**	**mar 9/02/27**
653	001.003.028.011.001.	ESCALERA 1	1 día	sáb 6/02/27	lun 8/02/27
654	001.003.028.011.001.	FUNDIDA	1 día	lun 8/02/27	mar 9/02/27
655	**001.003.028.011.002**	**PISO 1-PISO 2**	**18 días**	**lun 8/02/27**	**jue 25/02/27**
656	001.003.028.011.002.	ESCALERA 1	2 días	lun 8/02/27	mié 10/02/27
657	001.003.028.011.002.	FUNDIDA	1 día	mié 24/02/27	jue 25/02/27
658	001.003.028.011.002.	ESCALERA 2	2 días	mié 10/02/27	jue 11/02/27
659	001.003.028.011.002.	FUNDIDA	1 día	mié 24/02/27	jue 25/02/27
660	**001.003.028.011.003**	**PISO 3-PISO 4**	**12 días**	**sáb 27/02/27**	**jue 11/03/27**
661	001.003.028.011.003.	ESCALERA 1	1 día	sáb 27/02/27	sáb 27/02/27
662	001.003.028.011.003.	FUNDIDA	1 día	mié 10/03/27	jue 11/03/27
663	**001.003.028.011.004**	**PISO 4-PISO 5**	**10 días**	**lun 15/03/27**	**mar 30/03/27**
664	001.003.028.011.004.	ESCALERA 1	1 día	lun 15/03/27	mar 16/03/27
665	001.003.028.011.004.	FUNDIDA	1 día	lun 29/03/27	mar 30/03/27
666	**001.004**	**MAMPOSTERIA - PAÑETES-SOBREPISO - REDES**	**309 días**	**mar 13/10/26**	**jue 26/08/27**
667	**001.004.004**	**TORRE A**	**297 días**	**mar 13/10/26**	**sáb 14/08/27**
668	**001.004.004.040**	**PISO SOTANO - PISO 1**	**253 días**	**mar 13/10/26**	**vie 2/07/27**
669	001.004.004.040.011	LEVANTAMIENTO MUROS DE MAMPOSTERIA CONFINADA	12 días	mar 13/10/26	sáb 24/10/26
670	001.004.004.040.016	INSTALACIÓN RED HIDRAULICA Y AVANCES	8 días	mié 21/10/26	mié 28/10/26
671	001.004.004.040.012	PAÑETE	12 días	sáb 24/10/26	vie 6/11/26
672	001.004.004.040.013	DILATACIONES MAMPOSTERIA CON	5 días	vie 6/11/26	mié 11/11/26
673	001.004.004.040.014	RCI	15 días	sáb 21/11/26	sáb 5/12/26
674	001.004.004.040.015	RED ELECTRICA, VOZ Y DATOS,SANITARIA, AIRE ACONDICIONADO	18 días	sáb 5/12/26	mié 23/12/26
675	001.004.004.040.017	CABLEADO RED ELECTRICA, VOZ Y DATOS	4 días	lun 28/06/27	vie 2/07/27
676	**001.004.004.041**	**PISO 1-PISO 2**	**245 días**	**sáb 24/10/26**	**mar 6/07/27**
677	001.004.004.041.010	LEVANTAMIENTO MUROS DE MAMPOSTERIA CONFINADA	15 días	sáb 24/10/26	lun 9/11/26
678	001.004.004.041.017	INSTALACIÓN RED HIDRAULICA Y AVANCES	8 días	jue 5/11/26	vie 13/11/26
679	001.004.004.041.011	PAÑETE	15 días	lun 9/11/26	mar 24/11/26
680	001.004.004.041.012	DILATACIONES MAMPOSTERIA CON	5 días	mar 24/11/26	sáb 28/11/26
681	001.004.004.041.013	SACANÚCLEOS RED SANITARI	10 días	sáb 14/11/26	mar 24/11/26
682	001.004.004.041.014	SOBREPISO 4 CM	15 días	mar 24/11/26	mié 9/12/26
683	001.004.004.041.015	RCI	15 días	sáb 5/12/26	sáb 19/12/26
684	001.004.004.041.016	RED ELECTRICA, VOZ Y DATOS,SANITARIA, AIRE ACONDICIONADO	15 días	mié 23/12/26	sáb 16/01/27
685	001.004.004.041.018	CABLEADO RED ELECTRICA, VOZ Y DATOS	4 días	vie 2/07/27	mar 6/07/27
686	**001.004.004.042**	**PISO 2-PISO 3**	**234 días**	**lun 9/11/26**	**sáb 10/07/27**
687	001.004.004.042.010	LEVANTAMIENTO MUROS DE MAMPOSTERIA CONFINADA	10 días	lun 9/11/26	jue 19/11/26
688	001.004.004.042.017	INSTALACIÓN RED HIDRAULICA Y AVANCES	8 días	sáb 14/11/26	lun 23/11/26
689	001.004.004.042.011	PAÑETE	10 días	jue 19/11/26	sáb 28/11/26
690	001.004.004.042.012	DILATACIONES MAMPOSTERIA CON	5 días	sáb 28/11/26	jue 3/12/26
691	001.004.004.042.013	SACANÚCLEOS RED SANITARI	10 días	jue 19/11/26	sáb 28/11/26
692	001.004.004.042.014	SOBREPISO 4 CM	15 días	sáb 28/11/26	lun 14/12/26
693	001.004.004.042.015	RCI	15 días	sáb 19/12/26	mié 13/01/27
694	001.004.004.042.016	RED ELECTRICA, VOZ Y DATOS,SANITARIA, AIRE ACONDICIONADO	15 días	sáb 16/01/27	sáb 30/01/27
695	001.004.004.042.018	CABLEADO RED ELECTRICA, VOZ Y DATOS	4 días	mar 6/07/27	sáb 10/07/27
696	**001.004.004.043**	**PISO 3-PISO 4**	**228 días**	**jue 19/11/26**	**mié 14/07/27**
697	001.004.004.043.010	LEVANTAMIENTO MUROS DE MAMPOSTERIA CONFINADA	10 días	jue 19/11/26	sáb 28/11/26
698	001.004.004.043.017	INSTALACIÓN RED HIDRAULICA Y AVANCES	8 días	mié 25/11/26	mié 2/12/26
699	001.004.004.043.011	PAÑETE	10 días	sáb 28/11/26	mié 9/12/26
700	001.004.004.043.012	DILATACIONES MAMPOSTERIA CON	5 días	mié 9/12/26	lun 14/12/26
701	001.004.004.043.013	SACANÚCLEOS RED SANITARI	10 días	sáb 28/11/26	mié 9/12/26
702	001.004.004.043.014	SOBREPISO 4 CM	20 días	mié 9/12/26	jue 7/01/27
703	001.004.004.043.015	RCI	15 días	jue 14/01/27	jue 28/01/27
704	001.004.004.043.016	RED ELECTRICA, VOZ Y DATOS,SANITARIA, AIRE ACONDICIONADO	15 días	sáb 30/01/27	sáb 13/02/27
705	001.004.004.043.018	CABLEADO RED ELECTRICA, VOZ Y DATOS	4 días	sáb 10/07/27	mié 14/07/27
706	**001.004.004.044**	**PISO 4 - PISO 5**	**222 días**	**sáb 28/11/26**	**sáb 17/07/27**
707	001.004.004.044.010	LEVANTAMIENTO MUROS DE MAMPOSTERIA CONFINADA	10 días	sáb 28/11/26	mié 9/12/26
708	001.004.004.044.017	INSTALACIÓN RED HIDRAULICA Y AVANCES	8 días	vie 4/12/26	sáb 12/12/26
709	001.004.004.044.011	PAÑETE	10 días	mié 9/12/26	vie 18/12/26
710	001.004.004.044.012	DILATACIONES MAMPOSTERIA CON	5 días	sáb 19/12/26	mié 23/12/26
711	001.004.004.044.013	SACANÚCLEOS RED SANITARI	10 días	mié 9/12/26	sáb 19/12/26
712	001.004.004.044.014	SOBREPISO 4 CM	15 días	sáb 19/12/26	mar 12/01/27
713	001.004.004.044.015	RCI	15 días	jue 28/01/27	jue 11/02/27
714	001.004.004.044.016	RED ELECTRICA, VOZ Y DATOS,SANITARIA, AIRE ACONDICIONADO	15 días	sáb 13/02/27	sáb 27/02/27

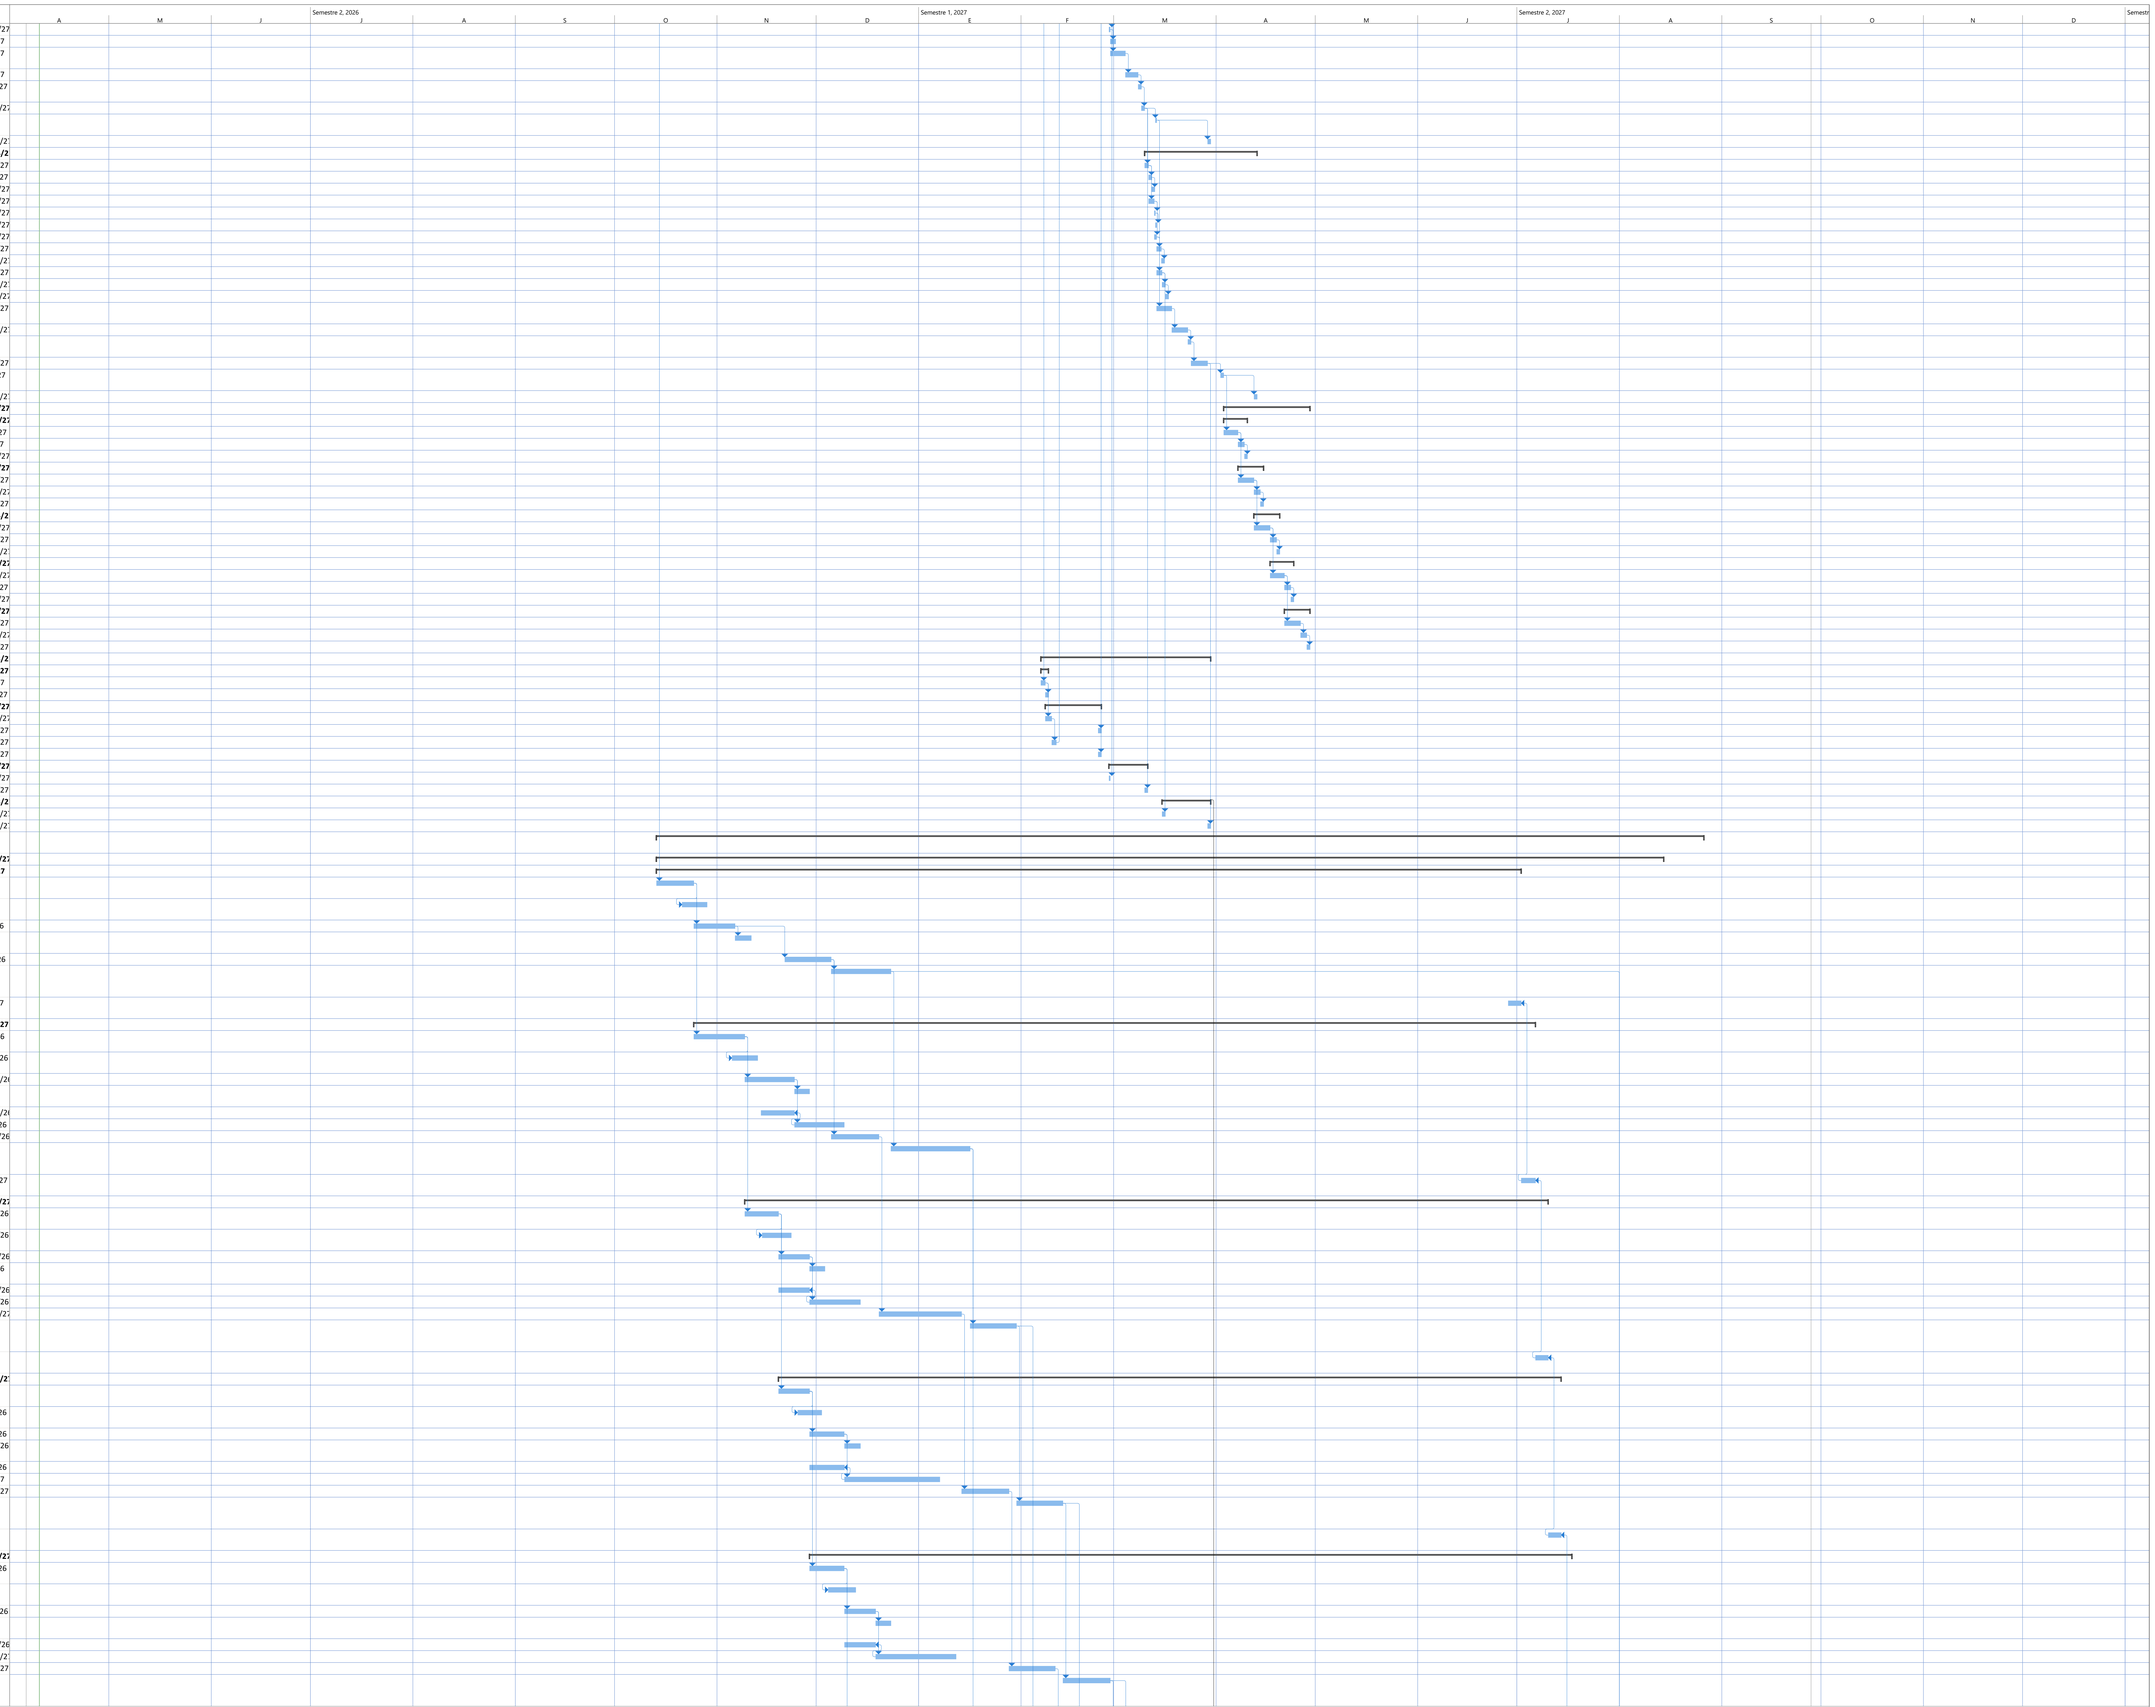

Proyecto: CRONOGRAMA ALCA
Fecha: vie 10/04/26

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · solo el comienzo · Tareas externas · Fecha límite · División crítica · Progreso manual
División · Resumen · Tarea inactiva · Resumen inactivo · solo duración · Resumen manual · solo fin · Hito externo · Tareas críticas · Progreso


Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
715	001.004.004.044.018	CABLEADO RED ELECTRICA, VOZ Y DATOS	4 días	mié 14/07/27	sáb 17/07/27
716	**001.004.004.045**	**PISO 5 - PISO 6**	**216 días**	**mié 9/12/26**	**jue 22/07/27**
717	001.004.004.045.010	LEVANTAMIENTO MUROS DE MAMPOSTERIA CONFINADA	10 días	mié 9/12/26	vie 18/12/26
718	001.004.004.045.017	INSTALACIÓN RED HIDRAULICA Y AVANCES	8 días	mar 15/12/26	mar 22/12/26
719	001.004.004.045.011	PAÑETE	10 días	sáb 19/12/26	jue 7/01/27
720	001.004.004.045.012	DILATACIONES MAMPOSTERIA CON	5 días	jue 7/01/27	mar 12/01/27
721	001.004.004.045.013	SACANÚCLEOS RED SANITARI/	10 días	sáb 19/12/26	jue 7/01/27
722	001.004.004.045.014	SOBREPISO 4 CM	15 días	jue 7/01/27	jue 21/01/27
723	001.004.004.045.015	RCI	15 días	jue 11/02/27	jue 25/02/27
724	001.004.004.045.016	RED ELECTRICA, VOZ Y DATOS,SANITARIA, AIRE ACONDICIONADO	15 días	sáb 27/02/27	sáb 13/03/27
725	001.004.004.045.018	CABLEADO RED ELECTRICA, VOZ Y DATOS	4 días	sáb 17/07/27	jue 22/07/27
726	**001.004.004.046**	**PISO 6-PISO 7**	**210 días**	**sáb 19/12/26**	**lun 26/07/27**
727	001.004.004.046.010	LEVANTAMIENTO MUROS DE MAMPOSTERIA CONFINADA	10 días	sáb 19/12/26	jue 7/01/27
728	001.004.004.046.017	INSTALACIÓN RED HIDRAULICA Y AVANCES	8 días	jue 24/12/26	lun 11/01/27
729	001.004.004.046.011	PAÑETE	10 días	jue 7/01/27	sáb 16/01/27
730	001.004.004.046.012	DILATACIONES MAMPOSTERIA CON	5 días	sáb 16/01/27	jue 21/01/27
731	001.004.004.046.013	SACANÚCLEOS RED SANITARI/	10 días	jue 7/01/27	sáb 16/01/27
732	001.004.004.046.014	SOBREPISO 4 CM	15 días	sáb 16/01/27	sáb 30/01/27
733	001.004.004.046.015	RCI	15 días	jue 25/02/27	jue 11/03/27
734	001.004.004.046.016	RED ELECTRICA, VOZ Y DATOS,SANITARIA, AIRE ACONDICIONADO	15 días	sáb 13/03/27	vie 2/04/27
735	001.004.004.046.018	CABLEADO RED ELECTRICA, VOZ Y DATOS	4 días	jue 22/07/27	lun 26/07/27
736	**001.004.004.047**	**PISO 7 - PISO 8**	**204 días**	**jue 7/01/27**	**vie 30/07/27**
737	001.004.004.047.010	LEVANTAMIENTO MUROS DE MAMPOSTERIA CONFINADA	10 días	jue 7/01/27	sáb 16/01/27
738	001.004.004.047.017	INSTALACIÓN RED HIDRAULICA Y AVANCES	8 días	mié 13/01/27	mié 20/01/27
739	001.004.004.047.011	PAÑETE	10 días	sáb 16/01/27	mar 26/01/27
740	001.004.004.047.012	DILATACIONES MAMPOSTERIA CON	5 días	mar 26/01/27	sáb 30/01/27
741	001.004.004.047.013	SACANÚCLEOS RED SANITARI/	10 días	sáb 16/01/27	mar 26/01/27
742	001.004.004.047.014	SOBREPISO 4 CM	15 días	mar 26/01/27	mar 9/02/27
743	001.004.004.047.015	RCI	15 días	jue 11/03/27	mar 30/03/27
744	001.004.004.047.016	RED ELECTRICA, VOZ Y DATOS,SANITARIA, AIRE ACONDICIONADO	15 días	vie 2/04/27	vie 16/04/27
745	001.004.004.047.018	CABLEADO RED ELECTRICA, VOZ Y DATOS	4 días	lun 26/07/27	vie 30/07/27
746	**001.004.004.048**	**PISO 8 - PISO 9**	**198 días**	**sáb 16/01/27**	**mar 3/08/27**
747	001.004.004.048.010	LEVANTAMIENTO MUROS DE MAMPOSTERIA CONFINADA	10 días	sáb 16/01/27	mar 26/01/27
748	001.004.004.048.017	INSTALACIÓN RED HIDRAULICA Y AVANCES	8 días	vie 22/01/27	vie 29/01/27
749	001.004.004.048.011	PAÑETE	10 días	mar 26/01/27	jue 4/02/27
750	001.004.004.048.012	DILATACIONES MAMPOSTERIA CON	5 días	jue 4/02/27	mar 9/02/27
751	001.004.004.048.013	SACANÚCLEOS RED SANITARI/	10 días	mar 26/01/27	jue 4/02/27
752	001.004.004.048.014	SOBREPISO 4 CM	15 días	jue 4/02/27	jue 18/02/27
753	001.004.004.048.015	RCI	15 días	mar 30/03/27	mar 13/04/27
754	001.004.004.048.016	RED ELECTRICA, VOZ Y DATOS,SANITARIA, AIRE ACONDICIONADO	15 días	vie 16/04/27	vie 30/04/27
755	001.004.004.048.018	CABLEADO RED ELECTRICA, VOZ Y DATOS	4 días	vie 30/07/27	mar 3/08/27
756	**001.004.004.049**	**PISO 9 - PISO 10**	**192 días**	**mar 26/01/27**	**vie 6/08/27**
757	001.004.004.049.010	LEVANTAMIENTO MUROS DE MAMPOSTERIA CONFINADA	10 días	mar 26/01/27	jue 4/02/27
758	001.004.004.049.017	INSTALACIÓN RED HIDRAULICA Y AVANCES	8 días	sáb 30/01/27	lun 8/02/27
759	001.004.004.049.011	PAÑETE	10 días	jue 4/02/27	sáb 13/02/27
760	001.004.004.049.012	DILATACIONES MAMPOSTERIA CON	5 días	sáb 13/02/27	jue 18/02/27
761	001.004.004.049.013	SACANÚCLEOS RED SANITARI/	10 días	jue 4/02/27	sáb 13/02/27
762	001.004.004.049.014	SOBREPISO 4 CM	15 días	sáb 13/02/27	sáb 27/02/27
763	001.004.004.049.015	RCI	15 días	mar 13/04/27	mar 27/04/27
764	001.004.004.049.016	RED ELECTRICA, VOZ Y DATOS,SANITARIA, AIRE ACONDICIONADO	15 días	vie 30/04/27	lun 17/05/27
765	001.004.004.049.018	CABLEADO RED ELECTRICA, VOZ Y DATOS	4 días	mar 3/08/27	vie 6/08/27
766	**001.004.004.050**	**PISO 10 - PISO 11**	**194 días**	**jue 28/01/27**	**mar 10/08/27**
767	001.004.004.050.009	INSTALACIÓN RED HIDRAULICA Y AVANCES	8 días	jue 28/01/27	jue 4/02/27
768	001.004.004.050.010	LEVANTAMIENTO MUROS DE MAMPOSTERIA CONFINADA	10 días	jue 4/02/27	sáb 13/02/27
769	001.004.004.050.017	INSTALACIÓN RED HIDRAULICA Y AVANCES	8 días	mié 10/02/27	mié 17/02/27
770	001.004.004.050.011	PAÑETE	10 días	sáb 13/02/27	mar 23/02/27
771	001.004.004.050.012	DILATACIONES MAMPOSTERIA CON	5 días	mar 23/02/27	sáb 27/02/27
772	001.004.004.050.013	SACANÚCLEOS RED SANITARI/	10 días	sáb 13/02/27	mar 23/02/27
773	001.004.004.050.014	SOBREPISO 4 CM	15 días	mar 23/02/27	mar 9/03/27
774	001.004.004.050.015	RCI	15 días	mar 27/04/27	vie 14/05/27
775	001.004.004.050.016	RED ELECTRICA, VOZ Y DATOS,SANITARIA, AIRE ACONDICIONADO	15 días	lun 17/05/27	mar 1/06/27
776	001.004.004.050.018	CABLEADO RED ELECTRICA, VOZ Y DATOS	4 días	vie 6/08/27	mar 10/08/27
777	**001.004.004.051**	**PISO 11-CUBIERTA**	**180 días**	**sáb 13/02/27**	**sáb 14/08/27**
778	001.004.004.051.010	LEVANTAMIENTO MUROS DE MAMPOSTERIA CONFINADA	10 días	sáb 13/02/27	mar 23/02/27
779	001.004.004.051.017	INSTALACIÓN RED HIDRAULICA Y AVANCES	8 días	vie 19/02/27	sáb 27/02/27
780	001.004.004.051.011	PAÑETE	10 días	mar 23/02/27	jue 4/03/27
781	001.004.004.051.012	DILATACIONES MAMPOSTERIA CON	5 días	jue 4/03/27	mar 9/03/27
782	001.004.004.051.013	SACANÚCLEOS RED SANITARI/	10 días	mar 23/02/27	jue 4/03/27
783	001.004.004.051.014	SOBREPISO 4 CM	15 días	jue 4/03/27	jue 18/03/27
784	001.004.004.051.015	RCI	15 días	vie 14/05/27	sáb 29/05/27
785	001.004.004.051.016	RED ELECTRICA, VOZ Y DATOS,SANITARIA, AIRE ACONDICIONADO	15 días	mar 1/06/27	mié 16/06/27
786	001.004.004.051.018	CABLEADO RED ELECTRICA, VOZ Y DATOS	4 días	mar 10/08/27	sáb 14/08/27
787	**001.004.004.052**	**CUBIERTA**	**118 días**	**mar 23/02/27**	**jue 24/06/27**
788	001.004.004.052.008	LEVANTAMIENTO MUROS DE MAMPOSTERIA CONFINADA	10 días	mar 23/02/27	jue 4/03/27
789	001.004.004.052.009	PAÑETE	10 días	jue 4/03/27	sáb 13/03/27
790	001.004.004.052.010	DILATACIONES MAMPOSTERIA CON	5 días	sáb 13/03/27	jue 18/03/27
791	001.004.004.052.011	SACANÚCLEOS AGUAS LLUVIA	10 días	jue 4/03/27	sáb 13/03/27
792	001.004.004.052.012	SOBREPISO 4 CM	15 días	sáb 13/03/27	vie 2/04/27
793	001.004.004.052.013	RED ELECTRICA, VOZ Y DATOS,SANITARIA, AIRE ACONDICIONADO	8 días	jue 17/06/27	jue 24/06/27
794	**001.004.005**	**TORRE B**	**182 días**	**mar 23/02/27**	**jue 26/08/27**
795	**001.004.005.014**	**PISO 1-PISO 2**	**174 días**	**mar 23/02/27**	**jue 19/08/27**
796	001.004.005.014.010	LEVANTAMIENTO MUROS DE MAMPOSTERIA CONFINADA	12 días	mar 23/02/27	sáb 6/03/27
797	001.004.005.014.017	INSTALACIÓN RED HIDRAULICA Y AVANCES	8 días	mié 3/03/27	mié 10/03/27
798	001.004.005.014.011	PAÑETE	12 días	sáb 6/03/27	jue 18/03/27
799	001.004.005.014.012	DILATACIONES MAMPOSTERIA CON	5 días	jue 18/03/27	mar 23/03/27
800	001.004.005.014.013	SACANÚCLEOS RED SANITARI/	10 días	lun 8/03/27	jue 18/03/27
801	001.004.005.014.014	SOBREPISO 4 CM	15 días	jue 18/03/27	mar 6/04/27
802	001.004.005.014.015	RCI	15 días	sáb 29/05/27	lun 14/06/27
803	001.004.005.014.016	RED ELECTRICA, VOZ Y DATOS,SANITARIA, AIRE ACONDICIONADO	15 días	jue 24/06/27	vie 9/07/27
804	001.004.005.014.018	CABLEADO RED ELECTRICA, VOZ Y DATOS	4 días	sáb 14/08/27	jue 19/08/27
805	**001.004.005.015**	**PISO 3-PISO 4**	**166 días**	**sáb 6/03/27**	**lun 23/08/27**
806	001.004.005.015.010	LEVANTAMIENTO MUROS DE MAMPOSTERIA CONFINADA	10 días	sáb 6/03/27	mar 16/03/27
807	001.004.005.015.017	INSTALACIÓN RED HIDRAULICA Y AVANCES	8 días	vie 12/03/27	vie 19/03/27
808	001.004.005.015.011	PAÑETE	10 días	mar 16/03/27	mar 30/03/27
809	001.004.005.015.012	DILATACIONES MAMPOSTERIA CON	5 días	mar 30/03/27	sáb 3/04/27
810	001.004.005.015.013	SACANÚCLEOS RED SANITARI/	10 días	mar 16/03/27	mar 30/03/27




Proyecto: CRONOGRAMA ALCA
Fecha: vie 10/04/26

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · solo el comienzo · Tareas externas · Fecha límite · División crítica · Progreso manual
División · Resumen · Tarea inactiva · Resumen inactivo · solo duración · Resumen manual · solo fin · Hito externo · Tareas críticas · Progreso

Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
811	001.004.005.015.014	SOBREPISO 4 CM	15 días	mar 30/03/27	mar 13/04/27
812	001.004.005.015.015	RCI	15 días	lun 14/06/27	lun 28/06/27
813	001.004.005.015.016	RED ELECTRICA, VOZ Y DATOS,SANITARIA, AIRE ACONDICIONADO	15 días	vie 9/07/27	sáb 24/07/27
814	001.004.005.015.018	CABLEADO RED ELECTRICA, VOZ Y DATOS	4 días	jue 19/08/27	lun 23/08/27
815	**001.004.005.016**	**PISO 4-PISO 5**	**160 días**	**mar 16/03/27**	**jue 26/08/27**
816	001.004.005.016.010	LEVANTAMIENTO MUROS DE MAMPOSTERIA CONFINADA	10 días	mar 16/03/27	mar 30/03/27
817	001.004.005.016.017	INSTALACIÓN RED HIDRAULICA Y AVANCES	8 días	sáb 20/03/27	sáb 3/04/27
818	001.004.005.016.011	PAÑETE	10 días	mar 30/03/27	jue 8/04/27
819	001.004.005.016.012	DILATACIONES MAMPOSTERIA CON	5 días	vie 9/04/27	mar 13/04/27
820	001.004.005.016.013	SACANÚCLEOS RED SANITARI/	10 días	mar 30/03/27	vie 9/04/27
821	001.004.005.016.014	SOBREPISO 4 CM	15 días	vie 9/04/27	vie 23/04/27
822	001.004.005.016.015	RCI	15 días	vie 23/04/27	sáb 8/05/27
823	001.004.005.016.016	RED ELECTRICA, VOZ Y DATOS,SANITARIA, AIRE ACONDICIONADO	15 días	sáb 24/07/27	sáb 7/08/27
824	001.004.005.016.018	CABLEADO RED ELECTRICA, VOZ Y DATOS	4 días	lun 23/08/27	jue 26/08/27
825	**001.004.005.017**	**CUBIERTA**	**143 días**	**mar 30/03/27**	**vie 20/08/27**
826	001.004.005.017.027	LEVANTAMIENTO MUROS DE MAMPOSTERIA CONFINADA	10 días	mar 30/03/27	jue 8/04/27
827	001.004.005.017.033	INSTALACIÓN RED HIDRAULICA Y AVANCES	8 días	lun 5/04/27	lun 12/04/27
828	001.004.005.017.028	PAÑETE	10 días	vie 9/04/27	sáb 17/04/27
829	001.004.005.017.029	DILATACIONES MAMPOSTERIA CON	5 días	sáb 17/04/27	vie 23/04/27
830	001.004.005.017.030	SACANÚCLEOS RED AGUA LLU	10 días	vie 9/04/27	sáb 17/04/27
831	001.004.005.017.031	SOBREPISO 4 CM	15 días	sáb 17/04/27	mar 4/05/27
832	001.004.005.017.032	RED ELECTRICA, VOZ Y DATOS,SANITARIA, AIRE ACONDICIONADO	12 días	sáb 7/08/27	vie 20/08/27
833	**001.005**	**DRY WALL**	**218 días**	**sáb 16/01/27**	**dom 22/08/27**
834	**001.005.035**	**TORRE A**	**211.44 días**	**sáb 16/01/27**	**sáb 14/08/27**
835	001.005.035.013	**PISO SOTANO - PISO 1**	15 días	sáb 31/07/27	sáb 14/08/27
836	001.005.035.014	**PISO 1-PISO 2**	20 días	sáb 16/01/27	jue 4/02/27
837	001.005.035.015	**PISO 2-PISO 3**	15 días	jue 4/02/27	jue 18/02/27
838	001.005.035.016	**PISO 3-PISO 4**	15 días	jue 18/02/27	jue 4/03/27
839	001.005.035.017	**PISO 4 - PISO 5**	15 días	jue 4/03/27	jue 18/03/27
840	001.005.035.018	**PISO 5 - PISO 6**	15 días	vie 19/03/27	mié 7/04/27
841	001.005.035.019	**PISO 6-PISO 7**	15 días	mié 7/04/27	mié 21/04/27
842	001.005.035.020	**PISO 7 - PISO 8**	15 días	mié 21/04/27	vie 7/05/27
843	001.005.035.021	**PISO 8 - PISO 9**	15 días	vie 7/05/27	sáb 22/05/27
844	001.005.035.022	**PISO 9 - PISO 10**	15 días	sáb 22/05/27	sáb 5/06/27
845	001.005.035.023	**PISO 10 - PISO 11**	16 días	sáb 5/06/27	mar 22/06/27
846	001.005.035.024	**PISO 11-CUBIERTA**	15 días	mar 22/06/27	mié 7/07/27
847	**001.005.036**	**TORRE B**	**45 días**	**vie 9/07/27**	**dom 22/08/27**
848	001.005.036.004	**PISO 1-PISO 2**	15 días	vie 9/07/27	sáb 24/07/27
849	001.005.036.005	**PISO 3-PISO 4**	15 días	sáb 24/07/27	sáb 7/08/27
850	001.005.036.006	**PISO 4-PISO 5**	15 días	sáb 7/08/27	dom 22/08/27
851	**001.006**	**VENTANERIA**	**235 días**	**jue 4/02/27**	**sáb 25/09/27**
852	**001.006.004**	**FACHADA**	**235 días**	**jue 4/02/27**	**sáb 25/09/27**
853	**001.006.004.020**	**TORRE A**	**180 días**	**jue 4/02/27**	**jue 5/08/27**
854	001.006.004.020.023	**PISO 1-PISO 2**	20 días	jue 4/02/27	mar 23/02/27
855	001.006.004.020.024	**PISO 2-PISO 3**	20 días	mar 23/02/27	sáb 13/03/27
856	001.006.004.020.025	**PISO 3-PISO 4**	20 días	sáb 13/03/27	mié 7/04/27
857	001.006.004.020.026	**PISO 4 - PISO 5**	15 días	mié 7/04/27	mié 21/04/27
858	001.006.004.020.027	**PISO 5 - PISO 6**	15 días	mié 21/04/27	vie 7/05/27
859	001.006.004.020.028	**PISO 6-PISO 7**	15 días	vie 7/05/27	sáb 22/05/27
860	001.006.004.020.029	**PISO 7 - PISO 8**	15 días	sáb 22/05/27	sáb 5/06/27
861	001.006.004.020.030	**PISO 8 - PISO 9**	15 días	sáb 5/06/27	lun 21/06/27
862	001.006.004.020.031	**PISO 9 - PISO 10**	15 días	lun 21/06/27	mar 6/07/27
863	001.006.004.020.032	**PISO 10 - PISO 11**	15 días	mar 6/07/27	mié 21/07/27
864	001.006.004.020.033	**PISO 11-CUBIERTA**	15 días	mié 21/07/27	jue 5/08/27
865	**001.006.004.021**	**TORRE B**	**55 días**	**jue 5/08/27**	**sáb 25/09/27**
866	001.006.004.021.007	**PISO 1-PISO 2**	20 días	jue 5/08/27	mar 24/08/27
867	001.006.004.021.008	**PISO 3-PISO 4**	20 días	mar 24/08/27	sáb 11/09/27
868	001.006.004.021.009	**PISO 4-PISO 5**	15 días	sáb 11/09/27	sáb 25/09/27
869	**001.006.005**	**INTERIOR**	**140 días**	**mié 14/04/27**	**mié 1/09/27**
870	**001.006.005.003**	**TORRE A**	**110 días**	**mié 14/04/27**	**mar 3/08/27**
871	001.006.005.003.012	**PISO 1-PISO 2**	10 días	mié 14/04/27	sáb 24/04/27
872	001.006.005.003.013	**PISO 2-PISO 3**	10 días	sáb 24/04/27	mié 5/05/27
873	001.006.005.003.014	**PISO 3-PISO 4**	10 días	mié 5/05/27	sáb 15/05/27
874	001.006.005.003.015	**PISO 4 - PISO 5**	10 días	sáb 15/05/27	mar 25/05/27
875	001.006.005.003.016	**PISO 5 - PISO 6**	10 días	mar 25/05/27	vie 4/06/27
876	001.006.005.003.017	**PISO 6-PISO 7**	10 días	vie 4/06/27	mar 15/06/27
877	001.006.005.003.018	**PISO 7 - PISO 8**	10 días	mar 15/06/27	jue 24/06/27
878	001.006.005.003.019	**PISO 8 - PISO 9**	10 días	jue 24/06/27	sáb 3/07/27
879	001.006.005.003.020	**PISO 9 - PISO 10**	10 días	sáb 3/07/27	mié 14/07/27
880	001.006.005.003.021	**PISO 10 - PISO 11**	10 días	mié 14/07/27	sáb 24/07/27
881	001.006.005.003.022	**PISO 11-CUBIERTA**	10 días	sáb 24/07/27	mar 3/08/27
882	**001.006.005.004**	**TORRE B**	**30 días**	**mar 3/08/27**	**mié 1/09/27**
883	001.006.005.004.004	**PISO 1-PISO 2**	10 días	mar 3/08/27	jue 12/08/27
884	001.006.005.004.005	**PISO 3-PISO 4**	10 días	jue 12/08/27	lun 23/08/27
885	001.006.005.004.006	**PISO 4-PISO 5**	10 días	lun 23/08/27	mié 1/09/27
886	**001.007**	**ENCHAPES Y ACABADOS**	**278 días**	**jue 17/12/26**	**lun 27/09/27**
887	**001.007.003**	**TORRE A**	**263 días**	**jue 17/12/26**	**lun 13/09/27**
888	**001.007.003.001**	**SOTANO PISO 1**	**226.44 días**	**jue 17/12/26**	**lun 9/08/27**
889	001.007.003.001.001	PINTURA Y ESTUCO A 3 MANOS PRIMERA MANO	12 días	jue 17/12/26	jue 7/01/27
890	001.007.003.001.002	SEGUNDA Y TERCER MANO	8 días	sáb 31/07/27	lun 9/08/27
891	**001.007.003.002**	**PISO 1-PISO 2**	**199 días**	**jue 7/01/27**	**sáb 24/07/27**
892	001.007.003.002.010	PINTURA Y ESTUCO A 3 MANOS PRIMERA MANO	10 días	jue 7/01/27	sáb 16/01/27
893	001.007.003.002.011	SEGUNDA Y TERCER MANO	5 días	mié 21/07/27	sáb 24/07/27
894	001.007.003.002.007	ENCHAPES MUROS	10 días	sáb 24/04/27	mié 5/05/27
895	001.007.003.002.008	ENCHAPES PISOS Y GUARDAE	6 días	mié 5/05/27	mié 12/05/27
896	001.007.003.002.009	ALFOMBRA Y GUARDAESCOB/	5 días	jue 15/07/27	mié 21/07/27
897	**001.007.003.003**	**PISO 2-PISO 3**	**194 días**	**sáb 16/01/27**	**vie 30/07/27**
898	001.007.003.003.010	PINTURA Y ESTUCO A 3 MANOS PRIMERA MANO	10 días	sáb 16/01/27	mar 26/01/27
899	001.007.003.003.011	SEGUNDA Y TERCER MANO	5 días	sáb 24/07/27	vie 30/07/27
900	001.007.003.003.007	ENCHAPES MUROS	10 días	mié 5/05/27	sáb 15/05/27
901	001.007.003.003.008	ENCHAPES PISOS Y GUARDAE	6 días	sáb 15/05/27	vie 21/05/27
902	001.007.003.003.009	ALFOMBRA Y GUARDAESCOB/	5 días	mié 21/07/27	sáb 24/07/27
903	**001.007.003.004**	**PISO 3-PISO 4**	**191 días**	**mar 26/01/27**	**jue 5/08/27**
904	001.007.003.004.010	PINTURA Y ESTUCO A 3 MANOS PRIMERA MANO	10 días	mar 26/01/27	jue 4/02/27
905	001.007.003.004.011	SEGUNDA Y TERCER MANO	7 días	vie 30/07/27	jue 5/08/27
906	001.007.003.004.007	ENCHAPES MUROS	10 días	sáb 15/05/27	mar 25/05/27
907	001.007.003.004.008	ENCHAPES PISOS Y GUARDAE	6 días	mar 25/05/27	sáb 29/05/27
908	001.007.003.004.009	ALFOMBRA Y GUARDAESCOB/	5 días	sáb 24/07/27	vie 30/07/27
909	**001.007.003.005**	**PISO 4 - PISO 5**	**186 días**	**jue 4/02/27**	**mar 10/08/27**
910	001.007.003.005.010	PINTURA Y ESTUCO A 3 MANOS PRIMERA MANO	10 días	jue 4/02/27	sáb 13/02/27
911	001.007.003.005.011	SEGUNDA Y TERCER MANO	5 días	vie 6/08/27	mar 10/08/27
912	001.007.003.005.007	ENCHAPES MUROS	10 días	mar 25/05/27	vie 4/06/27
913	001.007.003.005.008	ENCHAPES PISOS Y GUARDAE	6 días	vie 4/06/27	vie 11/06/27
914	001.007.003.005.009	ALFOMBRA Y GUARDAESCOB/	5 días	vie 30/07/27	mié 4/08/27
915	**001.007.003.006**	**PISO 5 - PISO 6**	**181 días**	**sáb 13/02/27**	**sáb 14/08/27**
916	001.007.003.006.010	PINTURA Y ESTUCO A 3 MANOS PRIMERA MANO	10 días	sáb 13/02/27	mar 23/02/27
917	001.007.003.006.011	SEGUNDA Y TERCER MANO	5 días	mar 10/08/27	sáb 14/08/27
918	001.007.003.006.007	ENCHAPES MUROS	10 días	vie 4/06/27	mar 15/06/27
919	001.007.003.006.008	ENCHAPES PISOS Y GUARDAE	6 días	mar 15/06/27	sáb 19/06/27
920	001.007.003.006.009	ALFOMBRA Y GUARDAESCOB/	5 días	mié 4/08/27	sáb 7/08/27
921	**001.007.003.007**	**PISO 6-PISO 7**	**176 días**	**mar 23/02/27**	**sáb 21/08/27**
922	001.007.003.007.010	PINTURA Y ESTUCO A 3 MANOS PRIMERA MANO	10 días	mar 23/02/27	jue 4/03/27
923	001.007.003.007.011	SEGUNDA Y TERCER MANO	5 días	sáb 14/08/27	sáb 21/08/27
924	001.007.003.007.007	ENCHAPES MUROS	10 días	mar 15/06/27	jue 24/06/27
925	001.007.003.007.008	ENCHAPES PISOS Y GUARDAE	6 días	jue 24/06/27	mié 30/06/27
926	001.007.003.007.009	ALFOMBRA Y GUARDAESCOB/	5 días	sáb 7/08/27	vie 13/08/27
927	**001.007.003.008**	**PISO 7 - PISO 8**	**171 días**	**jue 4/03/27**	**mié 25/08/27**
928	001.007.003.008.010	PINTURA Y ESTUCO A 3 MANOS PRIMERA MANO	10 días	jue 4/03/27	sáb 13/03/27
929	001.007.003.008.011	SEGUNDA Y TERCER MANO	5 días	sáb 21/08/27	mié 25/08/27
930	001.007.003.008.007	ENCHAPES MUROS	10 días	jue 24/06/27	sáb 3/07/27
931	001.007.003.008.008	ENCHAPES PISOS Y GUARDAE	6 días	sáb 3/07/27	sáb 10/07/27
932	001.007.003.008.009	ALFOMBRA Y GUARDAESCOB/	5 días	vie 13/08/27	jue 19/08/27
933	**001.007.003.009**	**PISO 8 - PISO 9**	**166 días**	**sáb 13/03/27**	**lun 30/08/27**

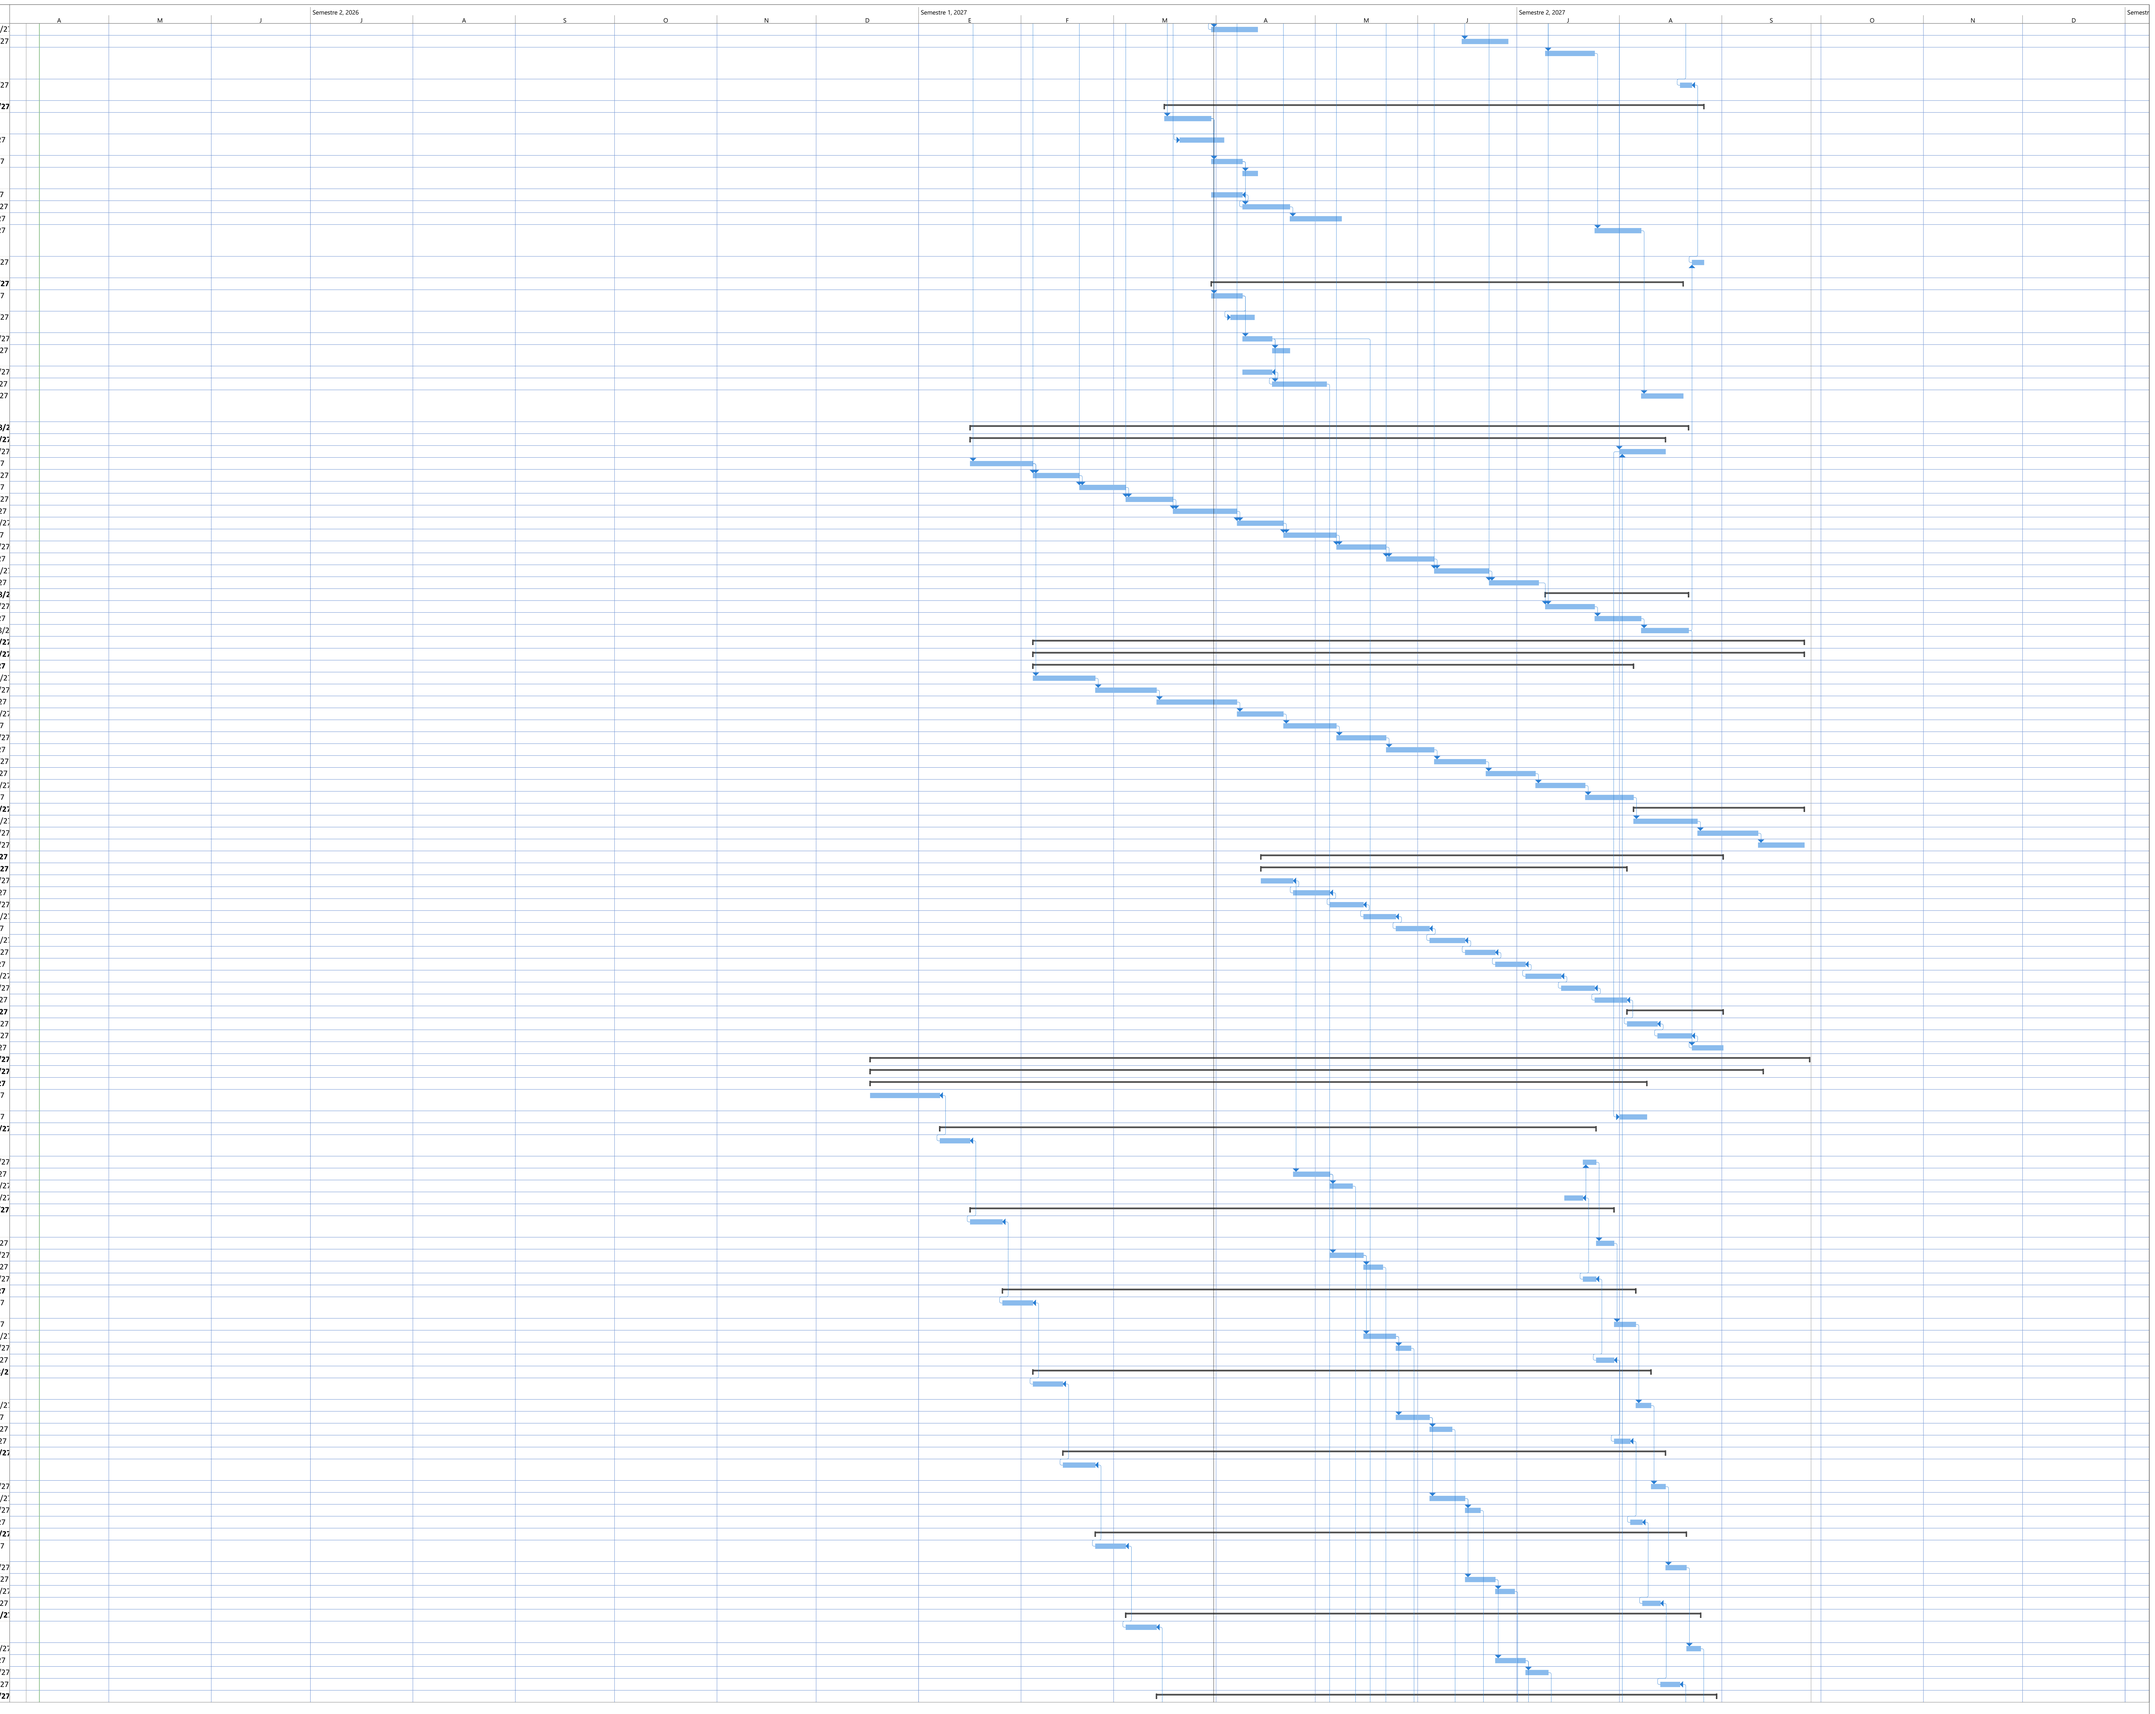

Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
934	001.007.003.009.010	PINTURA Y ESTUCO A 3 MANOS PRIMERA MANO	10 días	sáb 13/03/27	mié 24/03/27
935	001.007.003.009.011	SEGUNDA Y TERCER MANO	5 días	mié 25/08/27	lun 30/08/27
936	001.007.003.009.007	ENCHAPES MUROS	10 días	sáb 3/07/27	mié 14/07/27
937	001.007.003.009.008	ENCHAPES PISOS Y GUARDAE	6 días	mié 14/07/27	lun 19/07/27
938	001.007.003.009.009	ALFOMBRA Y GUARDAESCOB	5 días	jue 19/08/27	lun 23/08/27
939	**001.007.003.010**	**PISO 9 - PISO 10**	**161 días**	**mié 24/03/27**	**sáb 4/09/27**
940	001.007.003.010.010	PINTURA Y ESTUCO A 3 MANOS PRIMERA MANO	10 días	mié 24/03/27	mié 7/04/27
941	001.007.003.010.011	SEGUNDA Y TERCER MANO	5 días	lun 30/08/27	sáb 4/09/27
942	001.007.003.010.007	ENCHAPES MUROS	10 días	mié 14/07/27	sáb 24/07/27
943	001.007.003.010.008	ENCHAPES PISOS Y GUARDAE	6 días	sáb 24/07/27	vie 30/07/27
944	001.007.003.010.009	ALFOMBRA Y GUARDAESCOB	5 días	lun 23/08/27	sáb 28/08/27
945	**001.007.003.011**	**PISO 10 - PISO 11**	**156 días**	**mié 7/04/27**	**mié 8/09/27**
946	001.007.003.011.010	PINTURA Y ESTUCO A 3 MANOS PRIMERA MANO	10 días	mié 7/04/27	vie 16/04/27
947	001.007.003.011.011	SEGUNDA Y TERCER MANO	5 días	sáb 4/09/27	mié 8/09/27
948	001.007.003.011.007	ENCHAPES MUROS	10 días	sáb 24/07/27	mar 3/08/27
949	001.007.003.011.008	ENCHAPES PISOS Y GUARDAE	6 días	mar 3/08/27	sáb 7/08/27
950	001.007.003.011.009	ALFOMBRA Y GUARDAESCOB	5 días	sáb 28/08/27	jue 2/09/27
951	**001.007.003.012**	**PISO 11-CUBIERTA**	**151 días**	**vie 16/04/27**	**lun 13/09/27**
952	001.007.003.012.010	PINTURA Y ESTUCO A 3 MANOS PRIMERA MANO	10 días	vie 16/04/27	sáb 24/04/27
953	001.007.003.012.011	SEGUNDA Y TERCER MANO	5 días	mié 8/09/27	lun 13/09/27
954	001.007.003.012.007	ENCHAPES MUROS	10 días	mar 3/08/27	jue 12/08/27
955	001.007.003.012.008	ENCHAPES PISOS Y GUARDAE	6 días	jue 12/08/27	jue 19/08/27
956	001.007.003.012.009	ALFOMBRA Y GUARDAESCOB	5 días	jue 2/09/27	mar 7/09/27
957	**001.007.004**	**TORRE B**	**156 días**	**sáb 24/04/27**	**lun 27/09/27**
958	**001.007.004.001**	**PISO 1-PISO 2**	**146 días**	**sáb 24/04/27**	**sáb 18/09/27**
959	001.007.004.001.010	PINTURA Y ESTUCO A 3 MANOS PRIMERA MANO	10 días	sáb 24/04/27	vie 7/05/27
960	001.007.004.001.011	SEGUNDA Y TERCER MANO	5 días	lun 13/09/27	sáb 18/09/27
961	001.007.004.001.007	ENCHAPES MUROS	10 días	jue 12/08/27	dom 22/08/27
962	001.007.004.001.008	ENCHAPES PISOS Y GUARDAE	6 días	lun 23/08/27	sáb 28/08/27
963	001.007.004.001.009	ALFOMBRA Y GUARDAESCOB	5 días	mar 7/09/27	sáb 11/09/27
964	**001.007.004.002**	**PISO 3-PISO 4**	**141 días**	**vie 7/05/27**	**jue 23/09/27**
965	001.007.004.002.010	PINTURA Y ESTUCO A 3 MANOS PRIMERA MANO	10 días	vie 7/05/27	lun 17/05/27
966	001.007.004.002.011	SEGUNDA Y TERCER MANO	5 días	sáb 18/09/27	jue 23/09/27
967	001.007.004.002.007	ENCHAPES MUROS	10 días	lun 23/08/27	mié 1/09/27
968	001.007.004.002.008	ENCHAPES PISOS Y GUARDAE	6 días	mié 1/09/27	mar 7/09/27
969	001.007.004.002.009	ALFOMBRA Y GUARDAESCOB	5 días	sáb 11/09/27	jue 16/09/27
970	**001.007.004.003**	**PISO 4-PISO 5**	**136 días**	**lun 17/05/27**	**lun 27/09/27**
971	001.007.004.003.010	PINTURA Y ESTUCO A 3 MANOS PRIMERA MANO	10 días	lun 17/05/27	jue 27/05/27
972	001.007.004.003.011	SEGUNDA Y TERCER MANO	5 días	jue 23/09/27	lun 27/09/27
973	001.007.004.003.007	ENCHAPES MUROS	10 días	mié 1/09/27	vie 10/09/27
974	001.007.004.003.008	ENCHAPES PISOS Y GUARDAE	6 días	vie 10/09/27	jue 16/09/27
975	001.007.004.003.009	ALFOMBRA Y GUARDAESCOB	5 días	jue 16/09/27	mar 21/09/27
976	**001.008**	**APARATOS SANITARIOS**	**137 días**	**mié 12/05/27**	**jue 23/09/27**
977	**001.008.016**	**TORRE A**	**107 días**	**mié 12/05/27**	**mié 25/08/27**
978	001.008.016.023	**PISO 1-PISO 2**	7 días	mié 12/05/27	mar 18/05/27
979	001.008.016.024	**PISO 2-PISO 3**	7 días	vie 21/05/27	vie 28/05/27
980	001.008.016.025	**PISO 3-PISO 4**	7 días	sáb 29/05/27	mar 8/06/27
981	001.008.016.026	**PISO 4 - PISO 5**	7 días	vie 11/06/27	jue 17/06/27
982	001.008.016.027	**PISO 5 - PISO 6**	7 días	sáb 19/06/27	sáb 26/06/27
983	001.008.016.028	**PISO 6-PISO 7**	7 días	mié 30/06/27	mié 7/07/27
984	001.008.016.029	**PISO 7 - PISO 8**	7 días	sáb 10/07/27	sáb 17/07/27
985	001.008.016.030	**PISO 8 - PISO 9**	7 días	mié 21/07/27	mar 27/07/27
986	001.008.016.031	**PISO 9 - PISO 10**	7 días	vie 30/07/27	jue 5/08/27
987	001.008.016.032	**PISO 10 - PISO 11**	7 días	sáb 7/08/27	sáb 14/08/27
988	001.008.016.033	**PISO 11-CUBIERTA**	7 días	jue 19/08/27	mié 25/08/27
989	**001.008.017**	**TORRE B**	**27 días**	**sáb 28/08/27**	**jue 23/09/27**
990	001.008.017.007	**PISO 1-PISO 2**	7 días	sáb 28/08/27	sáb 4/09/27
991	001.008.017.008	**PISO 3-PISO 4**	7 días	mar 7/09/27	lun 13/09/27
992	001.008.017.009	**PISO 4-PISO 5**	7 días	jue 16/09/27	jue 23/09/27
993	**001.009**	**CARPINTERIA Y PUERTAS CORTA FUEGO**	**136 días**	**mié 12/05/27**	**mié 22/09/27**
994	**001.009.001**	**TORRE A**	**106 días**	**mié 12/05/27**	**mar 24/08/27**
995	001.009.001.016	**PISO 1-PISO 2**	6 días	mié 12/05/27	lun 17/05/27
996	001.009.001.017	**PISO 2-PISO 3**	6 días	vie 21/05/27	jue 27/05/27
997	001.009.001.018	**PISO 3-PISO 4**	6 días	sáb 29/05/27	sáb 5/06/27
998	001.009.001.019	**PISO 4 - PISO 5**	6 días	vie 11/06/27	mié 16/06/27
999	001.009.001.020	**PISO 5 - PISO 6**	6 días	sáb 19/06/27	sáb 26/06/27
1000	001.009.001.021	**PISO 6-PISO 7**	6 días	mié 30/06/27	mar 6/07/27
1001	001.009.001.022	**PISO 7 - PISO 8**	6 días	sáb 10/07/27	vie 16/07/27
1002	001.009.001.023	**PISO 8 - PISO 9**	6 días	mié 21/07/27	lun 26/07/27
1003	001.009.001.024	**PISO 9 - PISO 10**	6 días	vie 30/07/27	jue 5/08/27
1004	001.009.001.025	**PISO 10 - PISO 11**	6 días	sáb 7/08/27	sáb 14/08/27
1005	001.009.001.026	**PISO 11-CUBIERTA**	6 días	jue 19/08/27	mar 24/08/27
1006	**001.009.002**	**TORRE B**	**26 días**	**sáb 28/08/27**	**mié 22/09/27**
1007	001.009.002.007	**PISO 1-PISO 2**	6 días	sáb 28/08/27	vie 3/09/27
1008	001.009.002.008	**PISO 3-PISO 4**	6 días	mar 7/09/27	sáb 11/09/27
1009	001.009.002.009	**PISO 4-PISO 5**	6 días	jue 16/09/27	mié 22/09/27
1010	**001.010**	**CUBIERTA**	**24 días**	**vie 23/04/27**	**mar 18/05/27**
1011	**001.010.001**	**TERCER PISO**	**20 días**	**vie 23/04/27**	**vie 14/05/27**
1012	001.010.001.001	POYOS EN CONCRETO H=15 CM	7 días	vie 23/04/27	jue 29/04/27
1013	001.010.001.002	MEDIAS CAÑA MORTERO 1:5	3 días	jue 29/04/27	mar 4/05/27
1014	001.010.001.003	IMPERMEABILIZACIÓN MANTO ASFÁLTICO	4 días	mar 4/05/27	sáb 8/05/27
1015	001.010.001.004	INSTALACIÓN GRAMA SINTETICA NEW GOLDEN	6 días	sáb 8/05/27	vie 14/05/27
1016	**001.010.002**	**CUBIERTA TORRE A**	**14 días**	**jue 29/04/27**	**sáb 15/05/27**
1017	001.010.002.001	POYOS EN CONCRETO H=15 CM	5 días	jue 29/04/27	jue 6/05/27
1018	001.010.002.002	MEDIAS CAÑA MORTERO 1:5	2 días	jue 6/05/27	sáb 8/05/27
1019	001.010.002.003	IMPERMEABILIZACIÓN MANTO ASFÁLTICO	3 días	sáb 8/05/27	mié 12/05/27
1020	001.010.002.004	INSTALACIÓN GRAMA SINTETICA NEW GOLDEN	4 días	mié 12/05/27	sáb 15/05/27
1021	**001.010.003**	**CUBIERTA TORRE B**	**14 días**	**mar 4/05/27**	**mar 18/05/27**
1022	001.010.003.001	POYOS EN CONCRETO H=15 CM	5 días	mar 4/05/27	sáb 8/05/27
1023	001.010.003.002	MEDIAS CAÑA MORTERO 1:5	2 días	sáb 8/05/27	mié 12/05/27
1024	001.010.003.003	IMPERMEABILIZACIÓN MANTO ASFÁLTICO	3 días	mié 12/05/27	vie 14/05/27
1025	001.010.003.004	INSTALACIÓN GRAMA SINTETICA NEW GOLDEN	4 días	vie 14/05/27	mar 18/05/27
1026	001.011	**URBANISMO**	60 días	sáb 31/07/27	lun 27/09/27
1027	001.012	**DOTACION**	60 días	sáb 31/07/27	lun 27/09/27
1028	**001.013**	**OTROS**	**161.11 días**	**mar 30/03/27**	**sáb 4/09/27**
1029	001.013.001	TOPELLANTAS	20 días	mar 3/08/27	sáb 21/08/27
1030	001.013.002	PINTURA LINEA SEPARACION PARQUEADEROS	15 días	sáb 21/08/27	sáb 4/09/27
1031	001.013.003	CANALETA SOTANO	20 días	mar 3/08/27	sáb 21/08/27
1032	001.013.004	ASCENSORES	90 días	mar 4/05/27	sáb 31/07/27
1033	001.013.005	TANQUES	30 días	lun 3/05/27	mié 2/06/27
1034	001.013.006	PINTURA COLUMNAS Y PANTALLAS	90 días	jue 27/05/27	mar 24/08/27
1035	001.013.007	BARANDA	90 días	mar 30/03/27	lun 28/06/27
1036	001.028	FIN	0 días	lun 27/09/27	lun 27/09/27

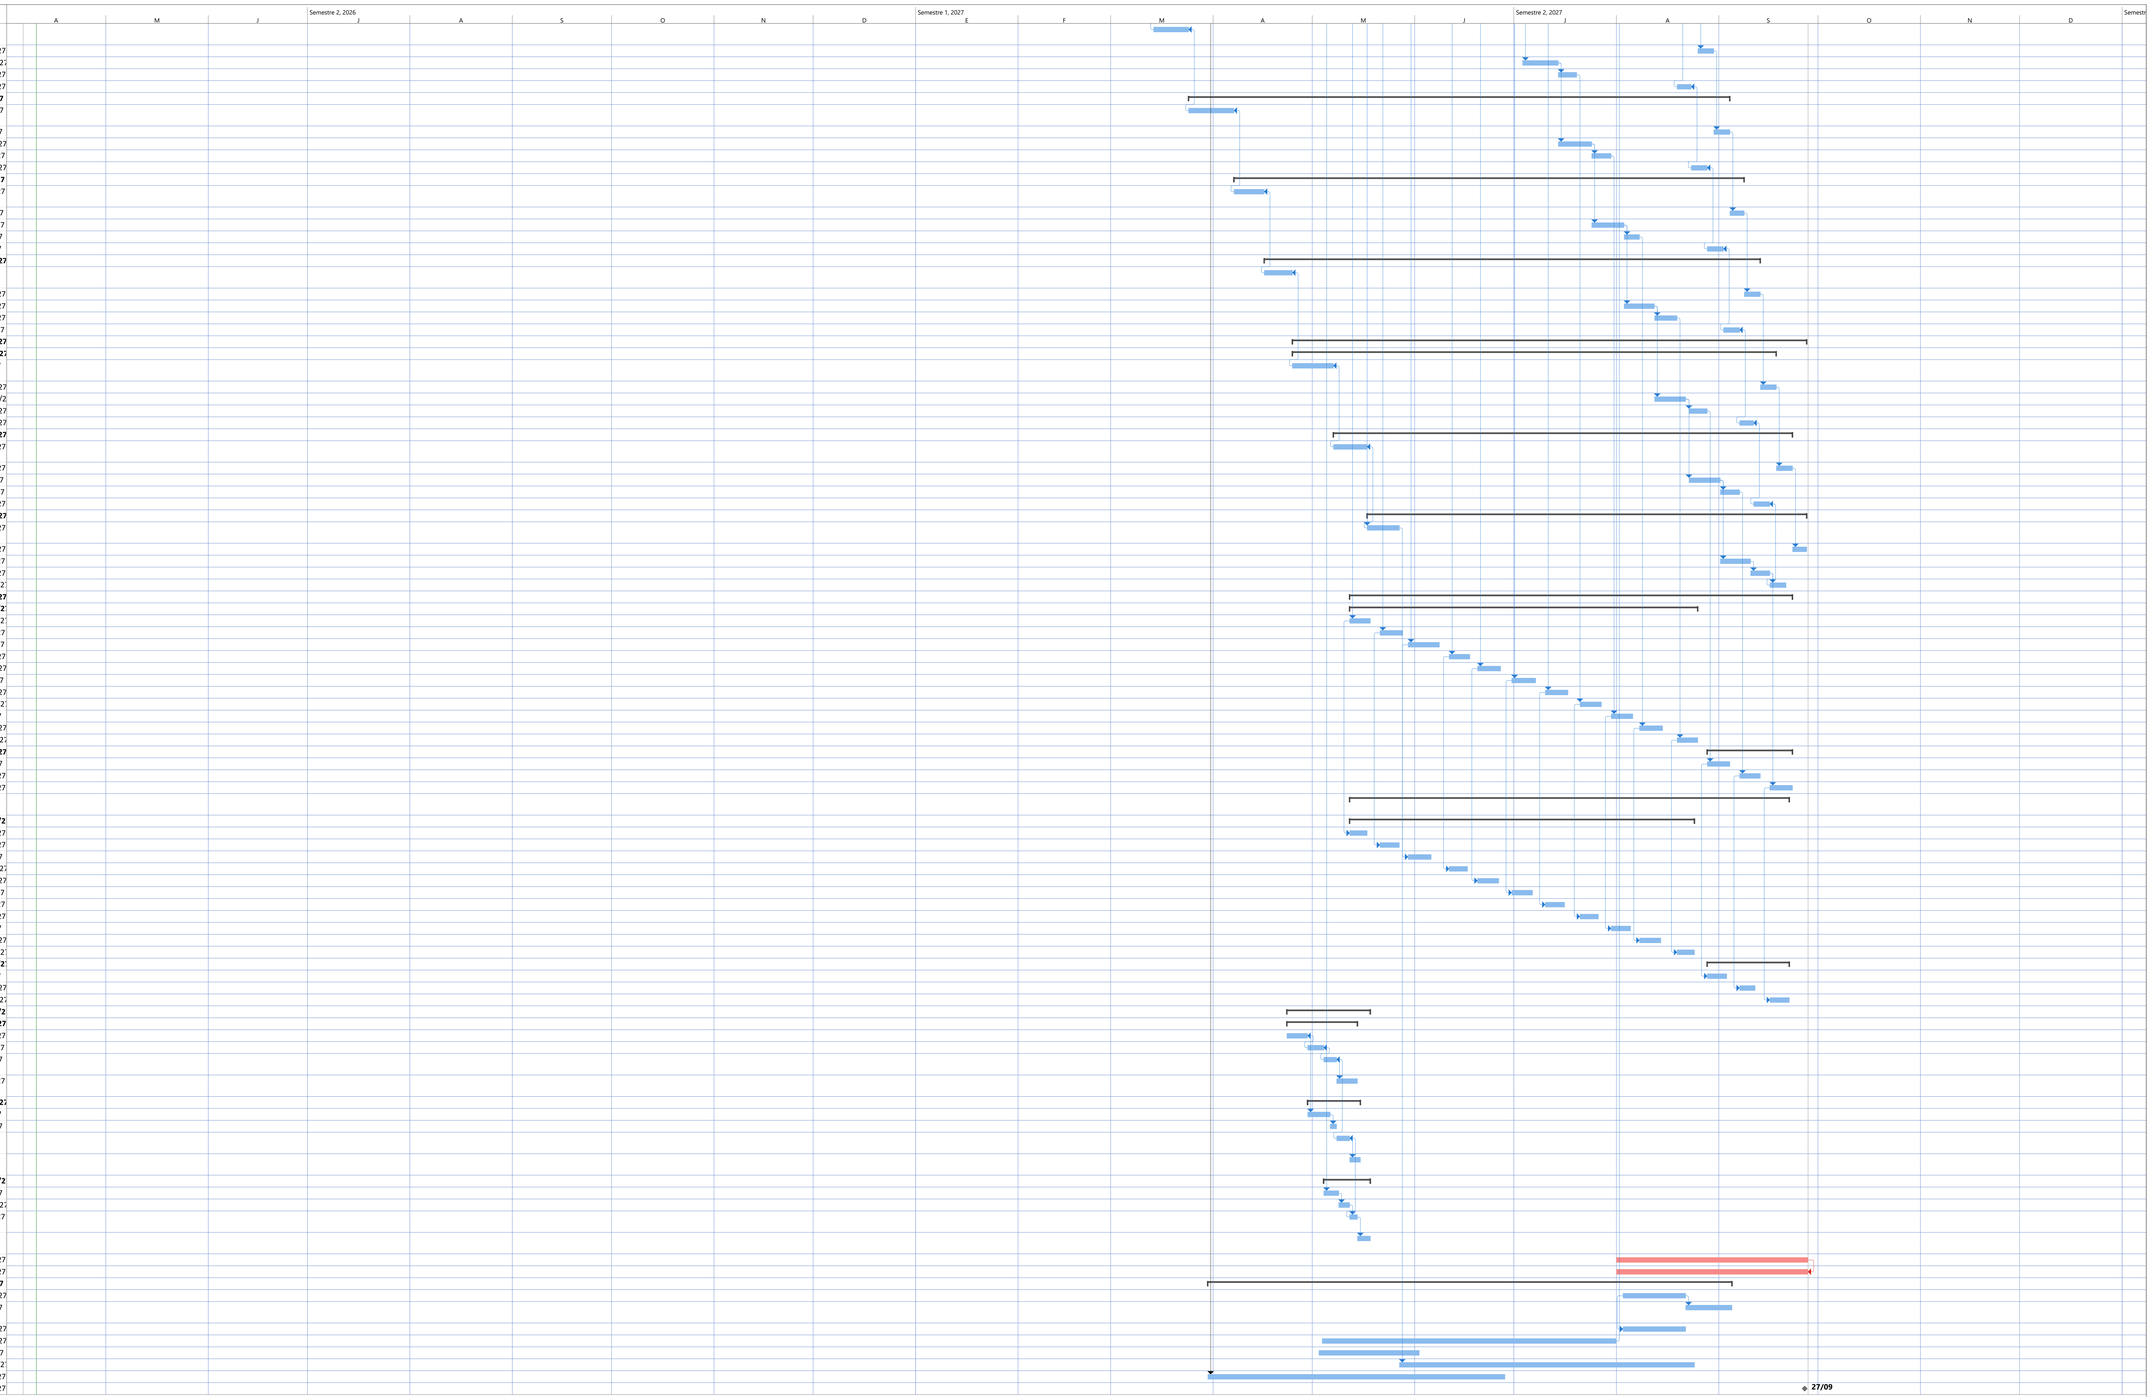

Proyecto: CRONOGRAMA ALCA
Fecha: vie 10/04/26

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · solo el comienzo · Tareas externas · Fecha límite · División crítica · Progreso manual
División · Resumen · Tarea inactiva · Resumen inactivo · solo duración · Resumen manual · solo fin · Hito externo · Tareas críticas · Progreso
