PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	1056931299
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JOHAN SEBASTIAN OROZCO BURGOS
CIUDAD/MUNICIPIO.	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	BARRIO SOAQUIRA	TELÉFONO:	7266222
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicios personales n.c.p.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		6011536697	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	abril AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES abril	AÑO 2026
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)		2026/04/21	NÚMERO AUTORIZACIÓN.		242435432

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 0	$ 280.200
SUBTOTALES:										**$ 280.200**	**$ 0**	**$ 280.200**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 218.900
SUBTOTALES:													**$ 218.900**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 218.900**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 9.200	$ 9.200	$ 0	$ 0	$ 9.200
SUBTOTALES:									**$ 9.200**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 9.200**

DATOS DEL COTIZANTE / NOVEDADES / LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

INFORME DE ACTIVIDADES
CONTRATO No. 022 DE 2026

INFORME CONTRATISTA

PERIODO: 01 DE ABRIL AL 29 DE ABRIL 2026

OBJETO: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES A LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ENCAMINADO AL APOYO DE LA SUPERVISIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, SOCIAL Y COMUNITARIOS EN EL MUNICIPIO DE TOCA

CONTRATISTA: JOHAN SEBASTIAN OROZCO BURGOS

FECHA DE INFORME: 30 DE ABRIL DE 2026

TOCA - 2026

TABLA DE CONTENIDO

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO No. 022 DE 2026 1
1. *INTRODUCCION* 3
2. *DATOS GENERALES DEL CONTRATO* 3
3. *ACTIVIDADES PACTADAS* 4
a. **Descripción de las actividades desarrollas (01/04/2026 – 29/04/2026)** 4
4. *CONTROL TECNICO* 7
4.1 CONTROL DE AVANCE FÍSICO. 7
a.) Detalle descriptivo del avance del contrato. 7
b.) Descripción por ítems de las actividades ejecutadas y tabla de avance (Actividad Contractual o actividad actual, actividad ejecutada en el periodo, actividad acumulada y porcentajes de ejecución). 7
c.) Tabla de control y Grafico del avance físico. Programado Vs Ejecutado 7
5. *INCONVENIENTES PRESENTADOS:* 8
6. *CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES* 8
7. *ANEXOS* 8
a. *APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL* 8
8. *CORRESPONDENCIA.* 8
9. *REGISTRO FOTOGRÁFICO* 8
6 **OTROS. (01/04/2026 a 29/04/2026)** 15
a.) *No se presenta soporte adicional al entregado.* 15

1. INTRODUCCION

El presente informe se presenta en cumplimiento del contrato suscrito con la Alcaldía de Toca bajo la modalidad de Contratación Directa, prestación de servicios 22 DE 2026 cuyo objeto es "PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES A LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ENCAMINADO AL APOYO DE LA SUPERVISIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, SOCIAL Y COMUNITARIOS EN EL MUNICIPIO DE TOCA" el informe presenta el avance del periodo: primero (01) de abril al veintinueve (29) de abril del 2026, bajo el desarrollo de las actividades suscritas por la entidad en el periodo que se relaciona.

2. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

TIPO Y No. DEL CONTRATO O CONVENIO	PRESTACION DE SERVICIOS No. 022 DE 2026
OBJETO	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES A LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ENCAMINADO AL APOYO DE LA SUPERVISIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, SOCIAL Y COMUNITARIOS EN EL MUNICIPIO DE TOCA
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TOCA
NIT	800099642-6
REPRESENTANTE LEGAL	GERMAN ALONSO BECERRA LOPEZ
CEDULA DE CIUDADANIA	79.986.723 DE BOGOTÁ
CONTRATISTA	JOHAN SEBASTIAN OROZCO BURGOS
CEDULA DE CIUDADANIA	1.056.931.299 DE TOCA
SUPERVISOR	MARTHA LILIANA RACHEN CELY
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	NUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE. ($9.000.000,00)
CDP	No. 45 DE FECHA 22 DE ENERO DE 2026
RUBROS	23201010010302-01-124303-16-2402041: Mantenimiento red vial municipal-FTE: SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN- DEP: Administración Central-SEC: Transporte – PROG: Infraestructura red vial regional- SUBP: Intersubsectorial Transporte- PROD: Vía terciaria mejorada 2320202009-76-124303-16-4599037: Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial – FTE: SGP-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN – DEP: Administración Central – SEC: Gobierno Territorial- PROG: Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial – SUPB: Intersubsectorial Gobierno- PROD: Servicio de actualización del Sistema de Gestión.
ADICIÓN 1	CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000,00) M/CTE
FECHA ADICIONAL 1	VEINTICUATRO (24) DE ABRIL DE 2026
CDP ADICIONAL 1	No 108 DE FECHA 22 DE ABRIL DE 2026

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	TRECE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($13.500.000,00)
PLAZO Y VIGENCIA INICIAL	TRES (03) MESES
PLAZO ADICIONAL	UN (01) MES Y QUINCE (15) DIAS
FECHA SUSCRIPCION CONTRATO	VEINTINUEVE (29) DE ENERO DE 2026
FECHA DE INICIO	TREINTA (30) DE ENERO DE 2026
VALOR ACTA PARCIAL N°1	TRES MILLONES DE PESOS M/CTE. ($3.000.000,00)
VALOR ACTA PARCIAL N°2	TRES MILLONES DE PESOS M/CTE. ($3.000.000,00)
VALOR A CANCELAR EN LA PRESENTE ACTA	TRES MILLONES DE PESOS M/CTE. ($3.000.000,00)
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($4.500.000,00)

3. ACTIVIDADES PACTADAS

OBLIGACIONES ESPECIFICAS
1. Apoyar y acompañar a la Secretaría de Planeación y Obras Públicas del municipio de Toca en el diagnóstico, formulación, elaboración, ejecución y seguimiento de proyectos que involucren la construcción, demolición, adecuación, mantenimiento o mejoramiento de obras civiles a cargo del municipio.
2. Brindar apoyo técnico a la Secretaría de Planeación y Obras Públicas en la ejecución de las labores de interventoría y supervisión de los contratos y proyectos que le sean asignados, verificando el cumplimiento de las especificaciones técnicas, cronogramas, presupuestos y la normatividad vigente.
3. Apoyar la estructuración y preparación de la documentación técnica preliminar requerida para los procesos contractuales que adelante el municipio, de conformidad con la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y las demás normas, leyes y decretos que las modifiquen, adicionen o reglamenten.
4. Apoyar a la Secretaría de Planeación y Obras Públicas en la organización, desarrollo y seguimiento de los diferentes comités de obra de los proyectos que se ejecuten en el municipio, así como elaborar y presentar informes mensuales de ejecución de actividades, conforme a los formatos y lineamientos establecidos por el supervisor del contrato.
5. Apoyar técnica y operativamente a la Secretaría de Planeación y Obras Públicas en la planificación, seguimiento, mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura vial urbana y rural del municipio, incluyendo vías terciarias, caminos veredales y obras complementarias, de acuerdo con los lineamientos técnicos y la normatividad vigente.

a. Descripción de las actividades desarrollas (01/04/2026 – 29/04/2026)

NUMERO DE LA ACTIVIDAD DESARROLLADA	ACTIVIDAD DESARROLLADA	EVIDENCIA	ANEXOS CANTIDAD DE FOLIOS.
1. Apoyar y acompañar a la Secretaría de Planeación y Obras Públicas del municipio de Toca en el diagnóstico, formulación, elaboración, ejecución y seguimiento de proyectos que involucren la construcción, demolición, adecuación, mantenimiento o mejoramiento de obras civiles a cargo del municipio.	- Se apoyo a la secretaria de planeación en la visita técnica al predio de Yeison Pirajan y Lina Pirajan -	Se evidencia mediante registro fotográfico	
2. Brindar apoyo técnico a la Secretaría de Planeación y Obras Públicas en la ejecución de las labores de interventoría y supervisión de los contratos y proyectos que le sean asignados, verificando el cumplimiento de las especificaciones técnicas, cronogramas, presupuestos y la normatividad vigente.	- Se apoyo a la secretaria de planeación en la supervisión de la CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LA VÍA URBANA EN LA CARRERA 5ª CON CALLE 4 DEL MUNICIPIO DE TOCA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"	Se evidencia mediante registro fotográfico	
3.Apoyar la estructuración y preparación de la documentación técnica preliminar	• Se apoyo a la secretaria de planeación en la elaboración de presupuestos	Se evidencia mediante registro fotográfico	

requerida para los procesos contractuales que adelante el municipio, de conformidad con la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y las demás normas, leyes y decretos que las modifiquen, adicionen o reglamenten.	para el proyecto de vivienda		
4.Apoyar a la Secretaría de Planeación y Obras Públicas en la organización, desarrollo y seguimiento de los diferentes comités de obra de los proyectos que se ejecuten en el municipio, así como elaborar y presentar informes mensuales de ejecución de actividades, conforme a los formatos y lineamientos establecidos por el supervisor del contrato.	• Se apoyo a la secretaria de planeación en la reunión de virtual ANM- 21 de abril de 2026 - Boyacá	Se evidencia mediante registro fotográfico	
5. Apoyar técnica y operativamente a la Secretaría de Planeación y Obras Públicas en la planificación, seguimiento, mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura vial urbana y rural del municipio, incluyendo vías terciarias, caminos veredales y obras complementarias, de acuerdo con los lineamientos técnicos y	• Se apoyo a la secretaria de planeación en el reparcheo de la vía Toca-Paipa	Se evidencia mediante registro fotográfico	

la normatividad vigente.			

4. CONTROL TECNICO

4.1 CONTROL DE AVANCE FÍSICO.


a.) Detalle descriptivo del avance del contrato.

Dentro del contrato de CPS para el mes de abril se destacaron principalmente actividades que corresponden la supervisión de contratos de obra e interventoría, además de la visita a zonas requeridas para la supervisión por parte del profesional de apoyo.

b.) Descripción por ítems de las actividades ejecutadas y tabla de avance (Actividad Contractual o actividad actual, actividad ejecutada en el periodo, actividad acumulada y porcentajes de ejecución).

ITEM	DESCRIPCIÓN	AVANCE DE EJECUCIÓN
1	Desarrollo de actividades relacionadas con el seguimiento a las obras que se llevan a cabo en el municipio, como la presentación de informes, actas, oficios, etc. a los que tenga lugar la secretaria de planeación y obras públicas del municipio de Toca. A su vez, la participación en visitas técnicas en zona rural y urbana del Municipio de Toca.	66,66 %

c.) Tabla de control y Grafico del avance físico. Programado Vs Ejecutado.

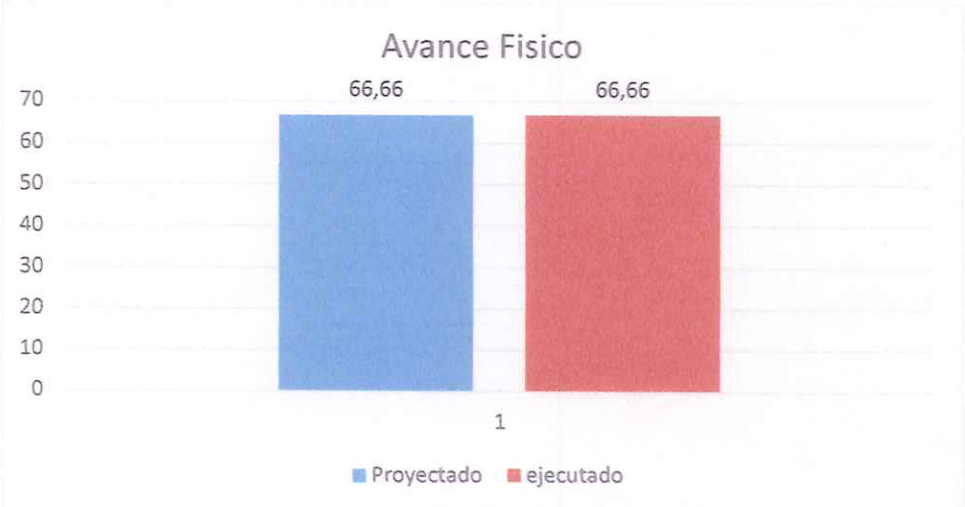

AVANCE DE EJECUCIÓN GENERAL					
% DE AVANCE CTO	66,66 %	% TIEMPO TRANSCURRIDO	66,66 %	% PAGOS AUTORIZADOS	66,66%

5. INCONVENIENTES PRESENTADOS:

Dentro de le ejecución del contrato No. 022 DE 2026 a la fecha no se han presentado inconvenientes.

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES (Primero (01) de abril al veintinueve (29) de abril de 2026).

a.) Se puede concluir que el contrato y las actividades que hacen parte de este se han cumplido sin ningún contratiempo.

7. ANEXOS

SEGURIDAD SOCIAL. ()- Copia de las planillas de pago. (planilla detallada).

a. APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL

DESCRIPCIÓN	PAGO POR PERIODOS						Valor Total Pagado
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	
No. Planilla	6005964296	6005964466	6008444161	6011536697	-	-	
Salud	7.300,00	218.900,00	218.900,00	218.900,00	-	-	$ 664.000,00
Pensión	9.400,00	280.200,00	280.200,00	280.200,00	-	-	$ 850.000,00
ARL	400	9.200	9.200	9.200	-	-	$ 28.000
Aportes ARP	-	-	-	-	-	-	$ 0,00
Valor pagado por periodo	**17.100,00**	**508.300,00**	**508.300,00-**	**508.300,00-**	-	-	**1.542.000,00**


8. CORRESPONDENCIA. (Primero (01) de abril al veintinueve (29) de abril de 2026).


a.) Anexar copia de correspondencia enviada y recibida durante el periodo del informe. (Orden cronológico). N/A


9. REGISTRO FOTOGRÁFICO. (Primero (01) de abril al veintinueve (29) de abril de 2026).


Anexar registro fotográfico por ítem, de las actividades desarrolladas en el periodo del informe (Cada imagen debe tener su respectiva descripción). Todas las actividades deben tener soporte fotográfico, pantallazos etc.


1. **EVIDENCIA** Apoyar y acompañar a la Secretaría de Planeación y Obras Públicas del municipio de Toca en el diagnóstico, formulación, elaboración, ejecución y seguimiento de proyectos que involucren la construcción, demolición, adecuación, mantenimiento o mejoramiento de obras civiles a cargo del municipio.

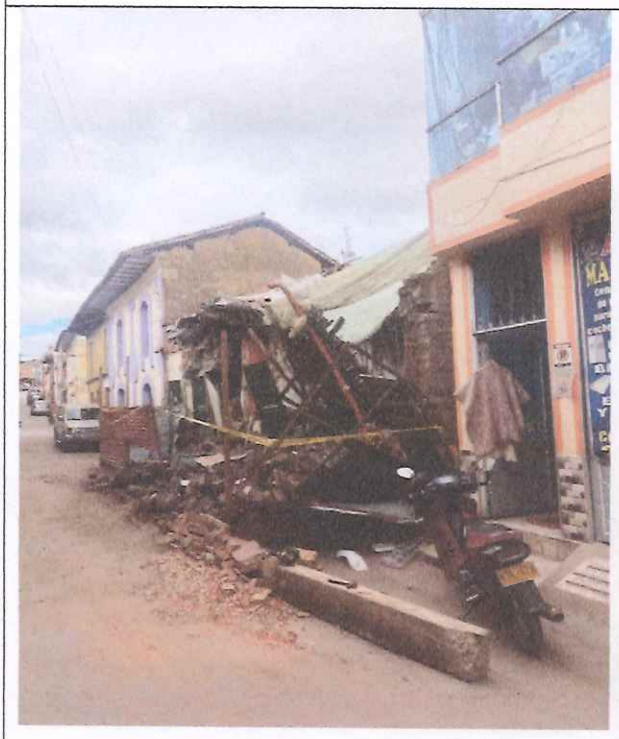

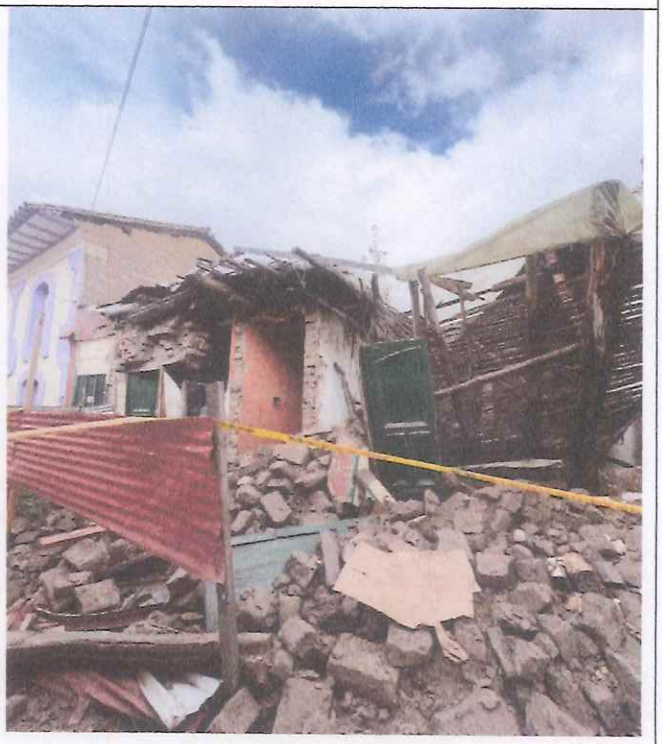


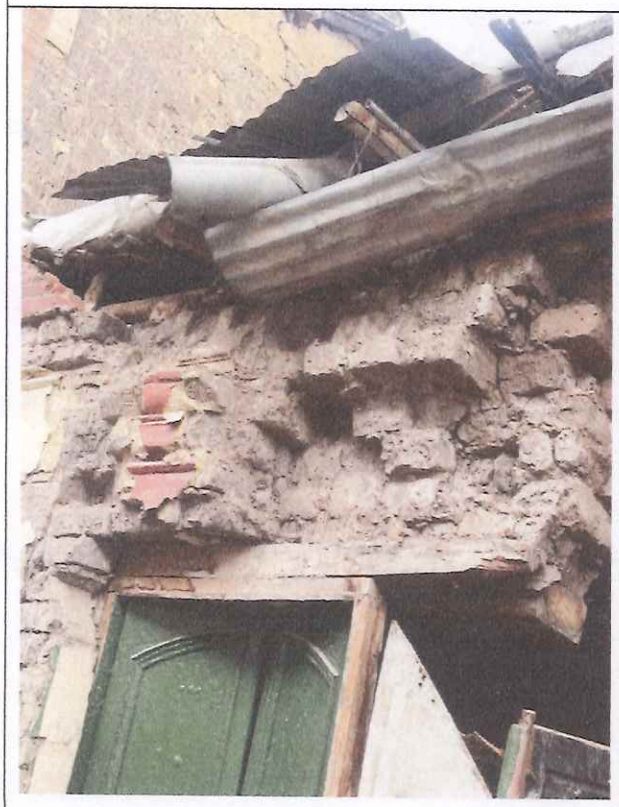

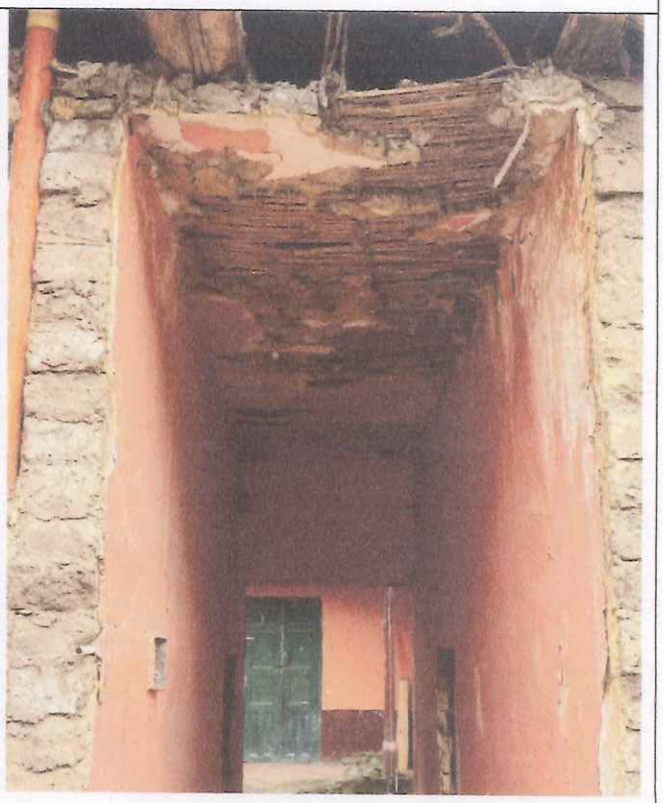

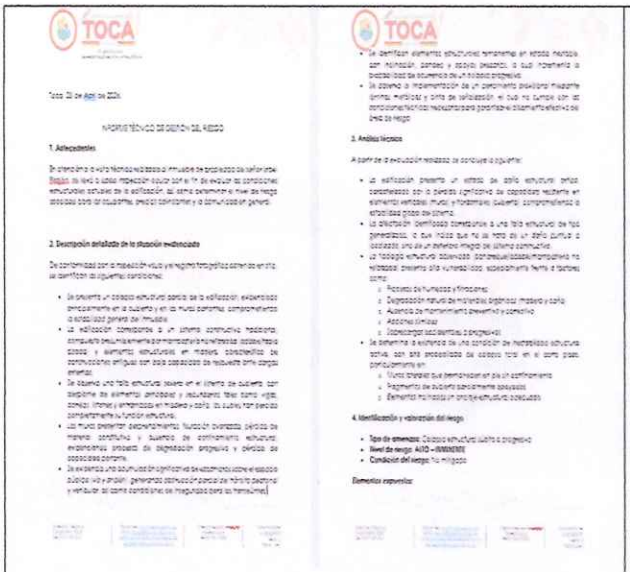

Informe técnico

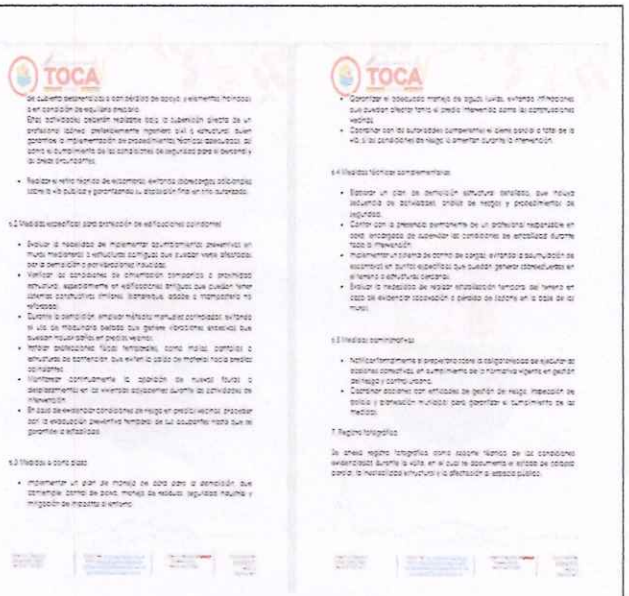

Informe técnico

Se apoyo a la secretaria de planeación en visita técnica a predio de Yeison Pirajan y Lina Pirajan. a

2. **EVIDENCIA** Brindar apoyo técnico a la Secretaría de Planeación y Obras Públicas en la ejecución de las labores de interventoría y supervisión de los contratos y proyectos que le sean asignados, verificando el cumplimiento de las especificaciones técnicas, cronogramas, presupuestos y la normatividad vigente










Se apoyo Seguimiento a la CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LA VÍA URBANA EN LA CARRERA 5ª CON CALLE 4 DEL MUNICIPIO DE TOCA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"

3. Apoyar la estructuración y preparación de la documentación técnica preliminar requerida para los procesos contractuales que adelante el municipio, de conformidad con la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y las demás normas, leyes y decretos que las modifiquen, adicionen o reglamenten.

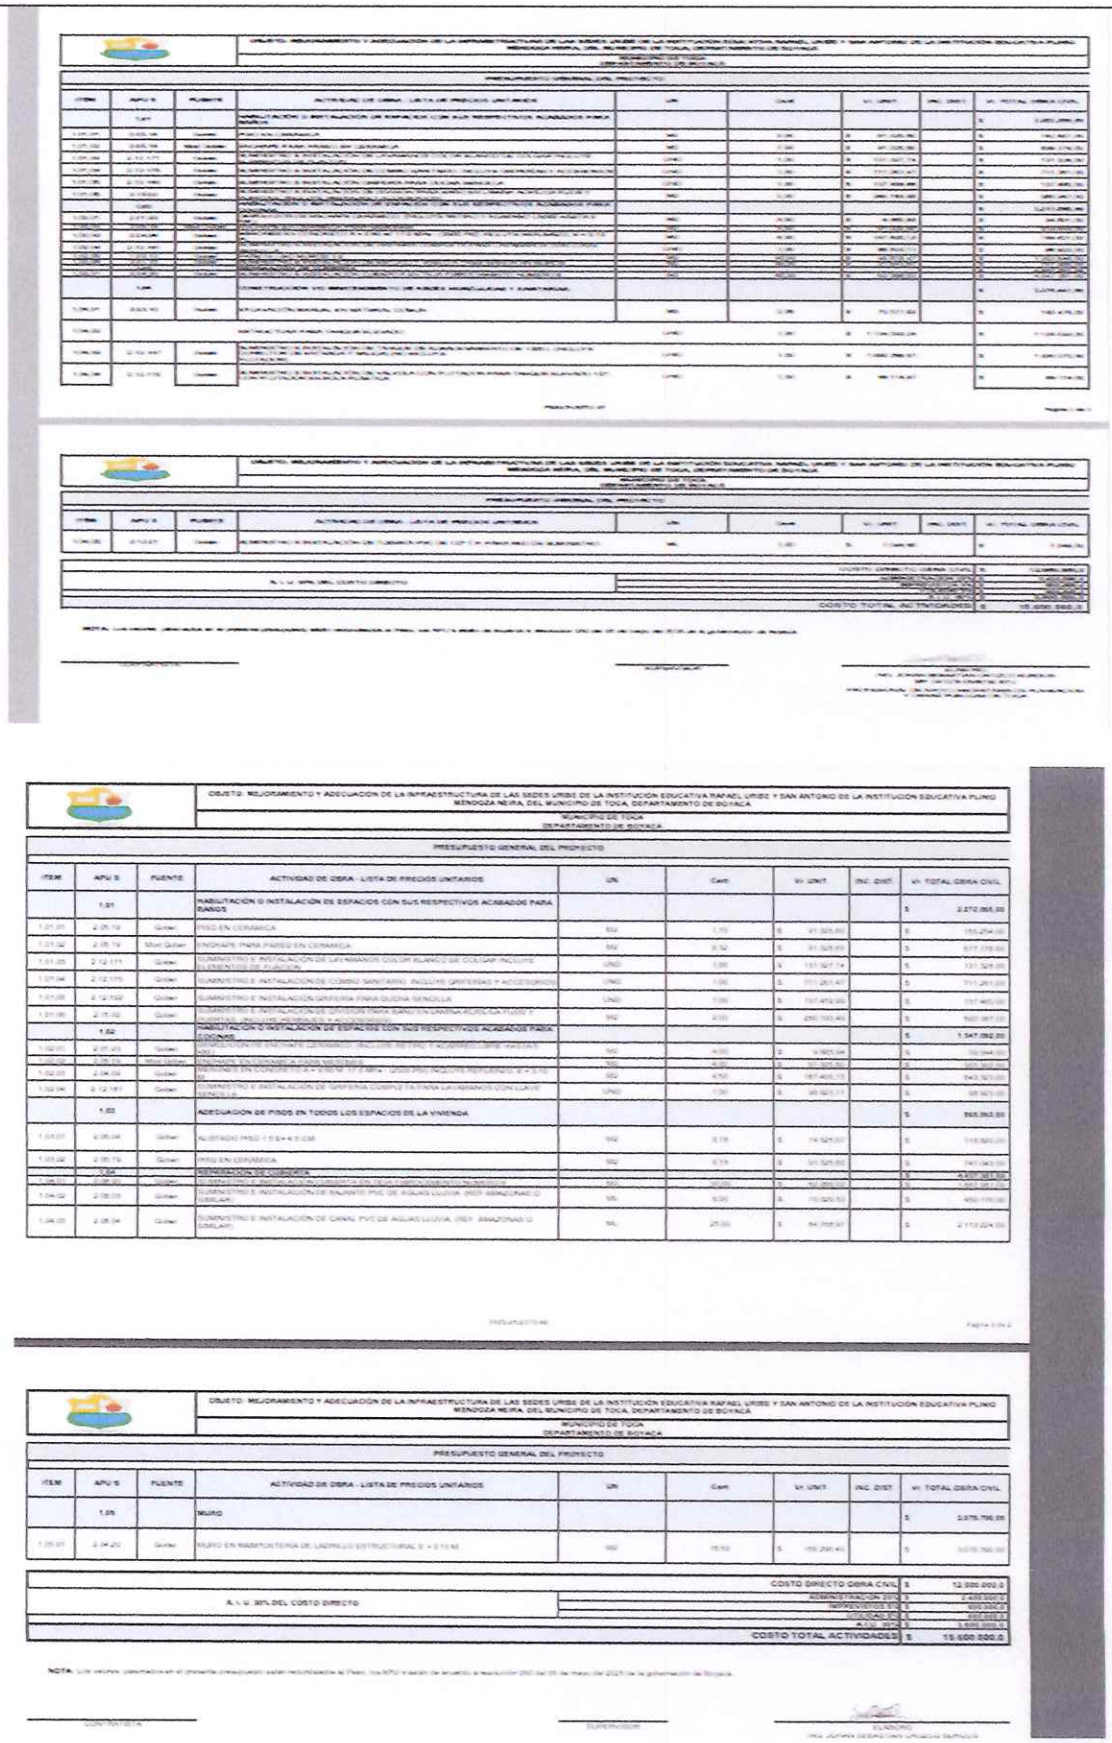

OBJETO: MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS SEDES URIBE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA RAFAEL URIBE Y SAN ANTONIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PLINIO MENDOZA NEIRA, DEL MUNICIPIO DE TOCA, DEPARTAMENTO DE BOYACA

MUNICIPIO DE TOCA
DEPARTAMENTO DE BOYACA

PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTO

ITEM	APU S	FUENTE	ACTIVIDAD DE OBRA - LISTA DE PRECIOS UNITARIOS	UN	Cant	Vr. UNIT.	INC. DIST.	Vr. TOTAL OBRA CIVIL
	1.01		HABILITACION O INSTALACION DE ESPACIOS CON SUS RESPECTIVOS ACABADOS PARA BANOS					$ 2.272.068,00
1.01.01	2.05.10	Gobernación	PISO EN CERAMICA	M2	1,10	$ 91.525,00		$ 100.677,50
1.01.02	2.05.10	Mod Gobernación	ENCHAPE PARA PARED EN CERAMICA	M2	6,32	$ 91.525,00		$ 578.509,00
1.01.03	2.12.171	Gobernación	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS COLOR BLANCO DE COLGAR INCLUYE ELEMENTOS DE PLASTICO	UND	1,00	$ 131.327,14		$ 131.327,00
1.01.04	2.12.175	Gobernación	SUMINISTRO E INSTALACION DE COMBO SANITARIO INCLUYE CERTEZAS Y ACCESORIOS	UND	1,00	$ 111.261,47		$ 111.261,00
1.01.05	2.12.150	Gobernación	SUMINISTRO E INSTALACION GRIFERIA PARA DUCHA SENCILLA	UND	1,00	$ 137.402,00		$ 137.402,00
1.01.06	2.15.02	Gobernación	SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISION PARA BAÑO EN LAMINA RIJIDA FLUID Y ACABADO INCLUYE HERRAJES Y ACCESORIOS	M2	4,00	$ 260.100,40		$ 940.401,00
	1.02		HABILITACION O INSTALACION DE ESPACIOS CON SUS RESPECTIVOS ACABADOS PARA COCINAS					$ 1.547.092,00
1.02.01	2.01.23	Gobernación	DEMOLICION DE PISOS INCLUYE CARGUE, RETIRO Y ACOPIO DE SOBRANTES DENTRO DE LA OBRA	M2	4,00	$ 9.900,04		$ 39.944,00
1.02.02	2.05.10	Mod Gobernación	ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUEBLES	M2	6,40	$ 91.525,00		$ 585.920,00
1.02.03	2.04.09	Gobernación	MUEBLES EN CONCRETO DE 0.4 X 0.6 X 0.85 m - CON PISO INCLUYE REFUERZO 0.4 X 0.6	M2	4,50	$ 187.405,73		$ 843.925,00
1.02.04	2.12.181	Gobernación	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA COMPLETA PARA LAVAMANOS CON LLAVE SENCILLA	UND	1,00	$ 96.923,11		$ 96.923,00
	1.03		ADECUACION DE PISOS EN TODOS LOS ESPACIOS DE LA VIVIENDA					$ 965.363,00
1.03.01	2.05.04	Gobernación	ALISTADO PISO 1:5 e = 0.03	M2	8,00	$ 14.521,07		$ 116.000,00
1.03.02	2.05.10	Gobernación	PISO EN CERAMICA	M2	8,00	$ 91.525,00		$ 732.000,00
	1.04		REPARACION DE CUBIERTA					$ 4.937.961,00
1.04.01	2.08.03	Gobernación	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANOA EN LAMINA GALVANIZADA	ML	10,00	$ 142.994,00		$ 1.429.940,00
1.04.02	2.08.03	Gobernación	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE PVC DE AGUAS LLUVIA (REF. AMAZONAS O SIMILAR)	ML	4,00	$ 70.525,50		$ 282.102,00
1.04.03	2.08.04	Gobernación	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL PVC DE AGUAS LLUVIA (REF. AMAZONAS O SIMILAR)	ML	25,00	$ 84.709,97		$ 2.119.924,00

PRESUPUESTO

Página 1 de 2

OBJETO: MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS SEDES URIBE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA RAFAEL URIBE Y SAN ANTONIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PLINIO MENDOZA NEIRA, DEL MUNICIPIO DE TOCA, DEPARTAMENTO DE BOYACA

MUNICIPIO DE TOCA
DEPARTAMENTO DE BOYACA

PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTO

ITEM	APU S	FUENTE	ACTIVIDAD DE OBRA - LISTA DE PRECIOS UNITARIOS	UN	Cant	Vr. UNIT.	INC. DIST.	Vr. TOTAL OBRA CIVIL
	1.05		MURO					$ 3.075.796,05
1.05.01	2.04.20	Gobernación	MURO EN MAMPOSTERIA DE LADRILLO ESTRUCTURAL E = 0.13 M.	M2	15,10	$ 159.290,43		$ 2.405.790,00

	COSTO DIRECTO OBRA CIVIL	$ 12.000.000,0
A. I. U. 30% DEL COSTO DIRECTO	ADMINISTRACION 20%	$ 2.400.000,0
	IMPUESTOS 5%	$ 600.000,0
	UTILIDAD 5%	$ 600.000,0
	A.I.U. 30%	$ 3.600.000,0
	COSTO TOTAL ACTIVIDADES	$ 15.600.000,0

NOTA: Los valores identificados en el presente presupuesto estan relacionados al Plan Vial MPO y basado en el acuerdo 010 del 05 de mayo del 2021 de la gobernación de Boyaca


CONTRATISTA

SUPERVISOR


ALCALDE

Se apoyo a la secretaria de planeación en la elaboración de presupuesto para el proyecto de vivienda.

4.Apoyar a la Secretaría de Planeación y Obras Públicas en la organización, desarrollo y seguimiento de los diferentes comités de obra de los proyectos que se ejecuten en el municipio, así como elaborar y presentar informes mensuales de ejecución de actividades, conforme a los formatos y lineamientos establecidos por el supervisor del contrato.

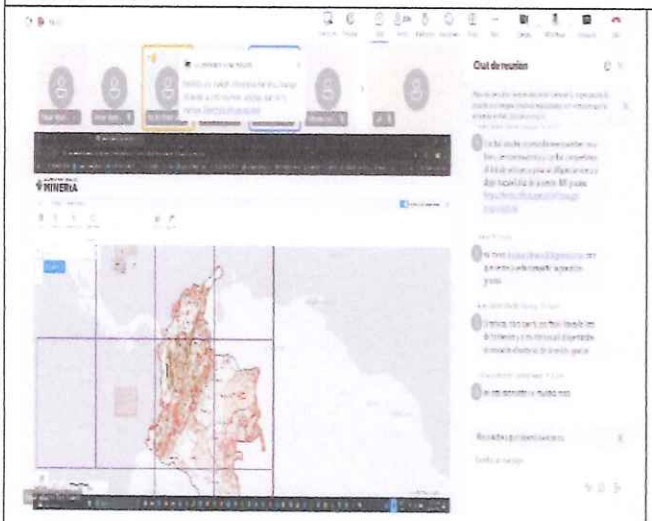

Reunión Agencia Nacional de Minería


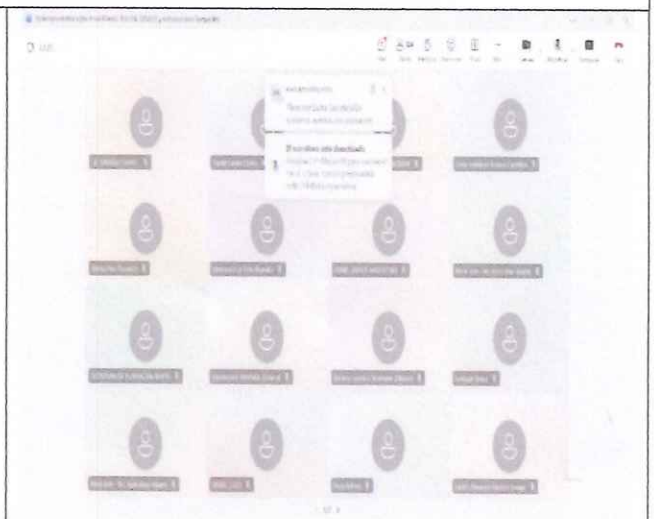




Reunión Agencia Nacional de Minería

5 EVIDENCIA: Apoyar técnica y operativamente a la Secretaría de Planeación y Obras Públicas en la planificación, seguimiento, mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura vial urbana y rural del municipio, incluyendo vías terciarias, caminos veredales y obras complementarias, de acuerdo con los lineamientos técnicos y la normatividad vigente.



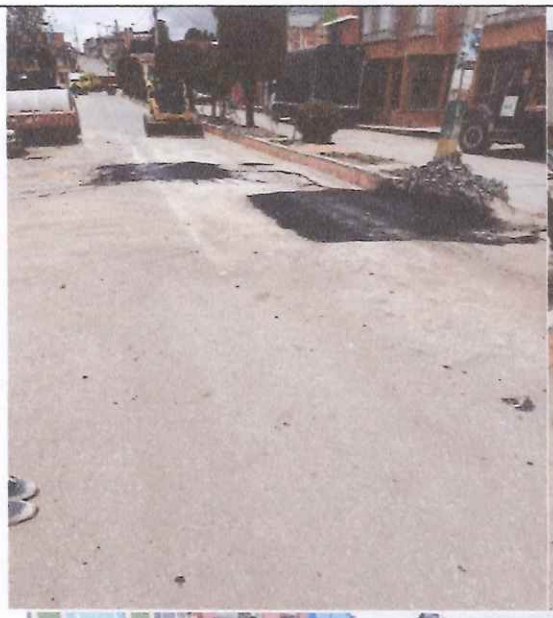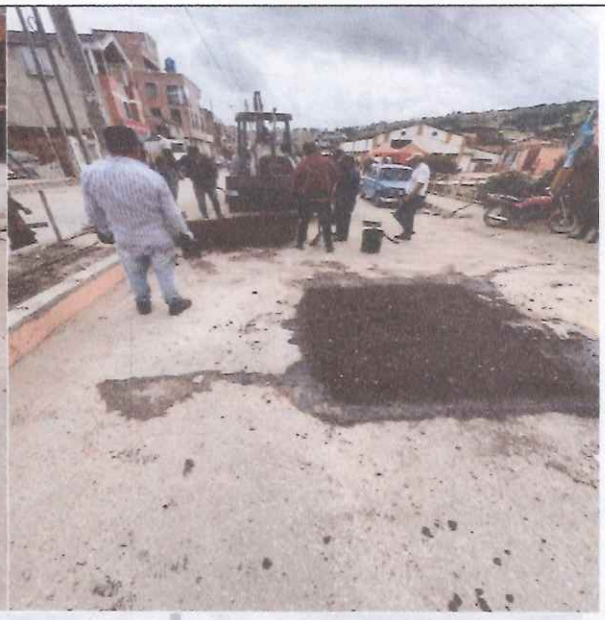

Se apoyo a la secretaria de planeación en la supervisión del mantenimiento de la infraestructura vial urbana del municipio de Toca, por medio de reparcheo

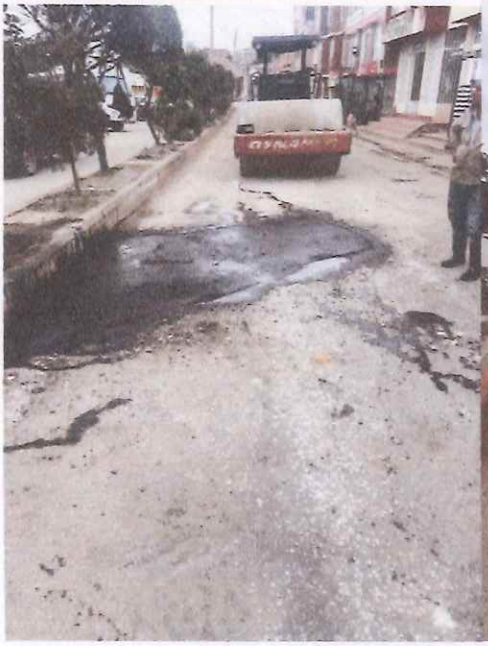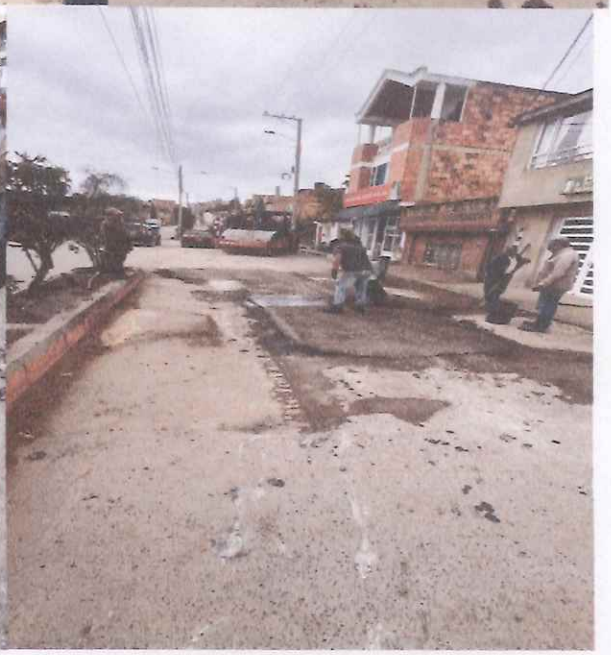6 OTROS. (01/04/2026 a 29/04/2026).

a.) No se presenta soporte adicional al entregado.

FIRMA DEL CONTRATISTA	
NOMBRE	JOHAN SEBASTIAN OROZCO BURGOS
N° DE IDENTIFICACION	1.056.931.299 DE TOCA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE TOCA BOYACÁ

NIT. 800.099.642-6
Secretaría de Planeación

INFORME SUPERVISION

Informe de Supervisión	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
3	022 DE 2026

DEPENDENCIA:	Secretaria de Planeación y Obras Publicas				**FECHA:**	30	de	ABRIL	de	2026		
PERIODO:	DEL	1	de	ABRIL	de	2026	**AL**	29	de	ABRIL	de	2026

INFORMACIÓN CONTRATO

OBJETO:	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES A LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ENCAMINADO AL APOYO DE LA SUPERVISIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, SOCIAL Y COMUNITARIOS EN EL MUNICIPIO DE TOCA						
N° Contrato	022 DE 2026	**Fecha de suscripción contrato**	29 de enero de 2026		**Fecha de Terminación inicial del contrato**	29 de abril de 2026	
N° CDP	45	**Fecha CDP**	22 de enero de 2026	**RP**	72	**Fecha RP**	29 de enero de 2026
N° CDP	108	**Fecha CDP**	22 de abril de 2026	**RP**	307	**Fecha RP**	24 de abril de 2026
Nombre del Supervisor:	MARTHA LILIANA RACHEN CELY			**Identificación:**		C.C. No.1056928341	

INFORMACIÓN CONTRATISTA

Nombre Contratista:	JOHAN SEBASTIAN OROZCO BURGOS		**Identificación:**	1.056.931.299 DE TOCA
Teléfono:	3195217568		**Dirección:**	CALLE 5 N 8 - 87
Cuenta Bancaria:	Ahorros	488443132235,00	Banco:	DAVIVIENDA


FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN

FECHA DE INICIACIÓN	30 de enero de 2026
PLAZO INICIAL	TRES (03) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO INICIAL	29 de abril de 2026
ADICIONES EN PLAZO	1
PLAZO ADICIONAL	UN (01) MES Y QUINCE (15) DIAS
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)	13 de junio de 2026

AVANCE DE EJECUCIÓN

% DE AVANCE CTO	**66,7%**	**% TIEMPO TRANSCURRIDO**	**66,7%**	**% PAGOS AUTORIZADOS**	**66,7%**

INFORME SUPERVISION

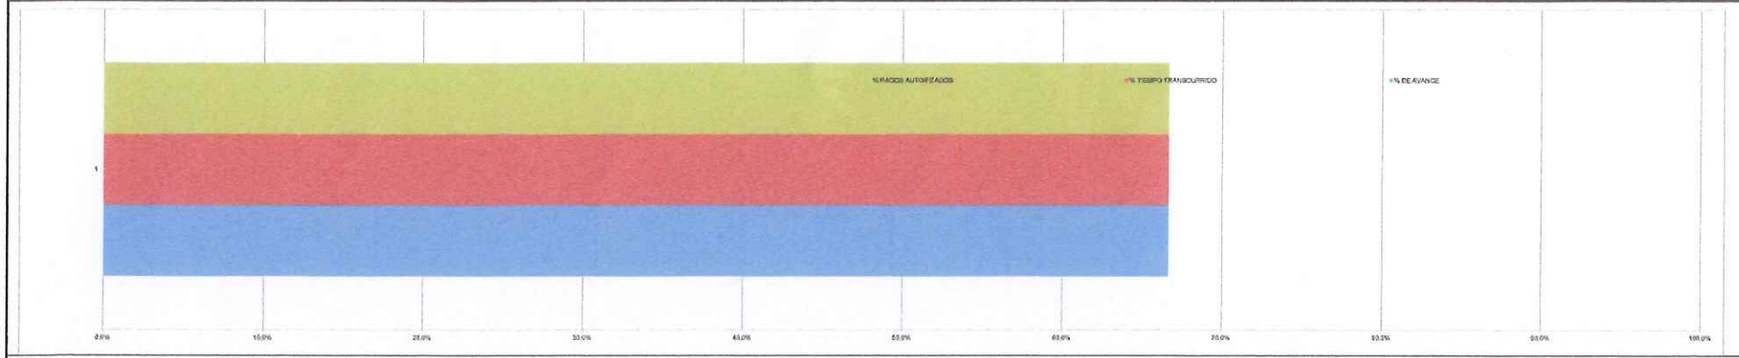

SEGUIMIENTO FINANCIERO

DESCRIPCIÓN	VALOR
Valor Inicial del contrato:	$ 9.000.000,00
Valor Adición	$ 4.500.000,00
Valor Total del contrato:	$ 13.500.000,00
Pago anticipado	$ 0,00
Valor Pagado	$ 6.000.000,00
Valor a pagar en el periodo:	$ 3.000.000,00
Valor Ejecutado	$ 9.000.000,00
Saldo:	$ 4.500.000,00
TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS	**$ 9.000.000,00**

APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL

DESCRIPCIÓN	PAGO POR PERIODOS												Valor Total Pagado
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
No. Planilla	6005964296	6005964466	6008444161	6011536697									
Salud	$ 7.300,00	218.900,00	218.900,00	218.900,00									$ 664.000,00
Pensión	9.400,00	280.200,00	280.200,00	280.200,00									$ 850.000,00
ARL	400	9.200	9.200	9.200									$ 28.000,00
Aportes ARP							-						$ 0,00
Valor pagado por periodo	**17.100,00**	**508.300,00**	**508.300,00**	**508.300,00**	-	-	-	-	**0**	-	-	-	**1.542.000,00**

INFORME SUPERVISION

SEGUIMIENTO TECNICO

ITEMS	OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	LUGAR DE CONSULTA MEDIO DE EVIDENCIA Y FOLIOS
1	1.Apoyar y acompañar a la Secretaría de Planeación y Obras Públicas del municipio de Toca en el diagnóstico, formulación, elaboración, ejecución y seguimiento de proyectos que involucren la construcción, demolición, adecuación, mantenimiento o mejoramiento de obras civiles a cargo del municipio.	Se realiza visita tecnica a la sede policarpa , se realiza visita tecnica al predio de Yeison Pirajan y Lina Marcela para verificar el estado actual de la vivienda.	Se evidencia mediante registro fotográfico



Se realiza visita tecnica predio de Yeison Pirajan y Lina Pirajan



Se realiza visita tecnica predio de Yeison Pirajan y Lina Pirajan

ITEMS	OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	LUGAR DE CONSULTA MEDIO DE EVIDENCIA Y FOLIOS
2	Brindar apoyo técnico a la Secretaría de Planeación y Obras Públicas en la ejecución de las labores de interventoría y supervisión de los contratos y proyectos que le sean asignados, verificando el cumplimiento de las especificaciones técnicas, cronogramas, presupuestos y la normatividad vigente.	Se prestó apoyo en la supervisión de la CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LA VÍA URBANA EN LA CARRERA 5ª CON CALLE 4 DEL MUNICIPIO DE TOCA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	Se evidencia mediante registro fotográfico



Extendida de material



Instalación de Sardinel

INFORME SUPERVISION





Amarre y figurado de acero



Aplicaciónn de pavimento rigido

ITEMS	OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	LUGAR DE CONSULTA MEDIO DE EVIDENCIA Y FOLIOS
3	Apoyar la estructuración y preparación de la documentación técnica preliminar requerida para los procesos contractuales que adelante el municipio, de conformidad con la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y las demás normas, leyes y decretos que las modifiquen, adicionen o reglamenten.	Se realizan presupuestos para el proyectop de vivienda	Se evidencia mediante registro fotográfico

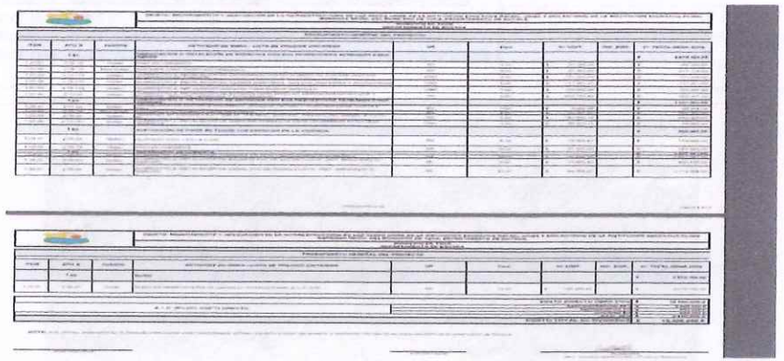


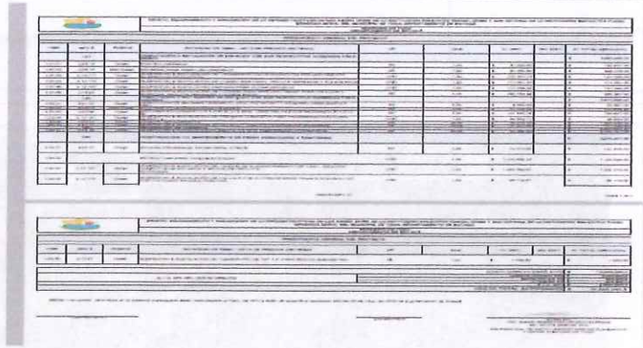

INFORME SUPERVISION



Compactando material de fresado

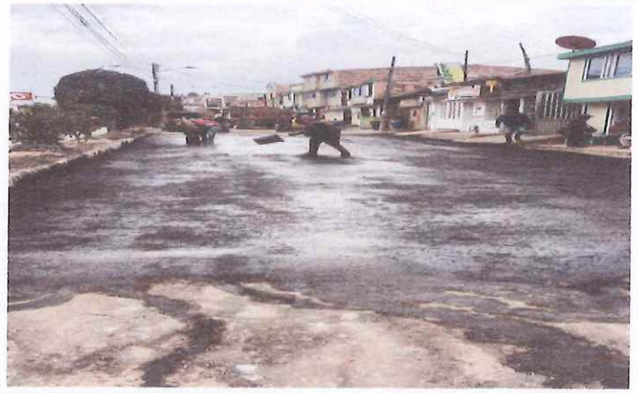

Aplicación de emulsión

OBSERVACIONES

FIRMA:

NOMBRE: MARTHA LILIANA RACHEN CELY
VoBo Supervisor

Documentos y folios Anexos	01. Certificado de Cumplimiento de actividades. 02. Certificado de pago de planilla.

CERTIFICADO DE PAGO PARA EL COTIZANTE

DAVIVIENDA

Certificamos que JOHAN SEBASTIAN con documento CEDULA DE CIUDADANIA 1056931299, realizó el pago de aportes a la seguridad social del Señor (a) JOHAN SEBASTIAN OROZCO BURGOS con documento CC 1056931299, como se detalla a continuación:

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número de Planilla	6011536697	Tipo de Planilla	I-INDEPENDIENTES
Periodo Cotizado Otros	ABRIL/2026	Periodo Cotización Salud	ABRIL/2026
Fecha Pago	2026/04/21	Número de Autorización	242435432

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL			
PENSIÓN		Administradora	230201- PROTECCION
Días	30	Tarifa	16,000 %
Indicador tarifa especial	Normal		
SALUD		Administradora	EPS037 - NUEVA E.P.S
Días	30	Tarifa	12,500 %
RIESGOS PROFESIONALES		Administradora	14-23 - POSITIVA COMPAÑIA DE
Días	30	Tarifa	0,522 %
Clase de Riesgo	1		

Cotizante exonerado pago aportes salud, SENA e ICBF (Reforma Tributaria): NO

Planilla Pagada
Planilla Pagada

Teniendo en cuenta el cumplimiento de las obligaciones pactadas con el contratista **JOHAN SEBASTIAN OROZCO BURGOS,** identificado con la C. C. No 1.056.931.299 de Toca, sobre las actividades desarrolladas para dar cumplimiento a los términos contratados y los resultados obtenidos, una vez recibido a satisfacción, se certifica el cumplimiento de las mismas entre el periodo comprendido entre el 01 de abril al 29 de abril de 2026, por ende, se autoriza el pago correspondiente.

Contrato	022 de 2026
Tipo de contrato	Prestación de servicios
Contratista	**JOHAN SEBASTIAN OROZCO BURGOS**
Cédula o NIT	CC. No 1.056.931.299 de Toca
Objeto:	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES A LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ENCAMINADO AL APOYO DE LA SUPERVISIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, SOCIAL Y COMUNITARIOS EN EL MUNICIPIO DE TOCA
Registro Presupuestal Y Rubro	72 rubro 23201010010302-01-124303-16-2402041, 2320202009-76-124303-16-4599037 307 rubro 2320202009-76-124303-16-4599037
Plazo del contrato:	TRES (03) MESES
Plazo total	TRES (03) MESES
Fecha de inicio	Enero 30 de 2026
Prorrogas	1
Fecha de suspensión	N/A
Fecha de reinicio	N/A
Fecha de terminación según contrato inicial	Abril 29 de 2026
Valor inicial pactado	NUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE. ($9.000.000,00)
Valor adicional	CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000,00)
Valor final:	TRECE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($13.500.000,00)
Valor a pagado hasta el 7 de abril de 2026	SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($6.000.000,00)
Valor a pagar hasta el 29 de abril de 2026	TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000,00)
Saldo no ejecutado	CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000,00)

Porcentaje de ejecución financiera hasta el 28 de febrero de 2026:	66.66%
Porcentaje de avance de ejecución física hasta el 31 de marzo de 2026:	66.66%
Numero de planilla	6011536697
Periodo cotizado	Abril de 2026

De conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 se verificó que el (la) contratista se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales (si aplica) y demás aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral.

En lo referente a lo dispuesto en el artículo 23 del Decreto 1703 de 2002, Artículo 135 de la Ley 1753, Decreto 1273 de 2018, se verificó que el contratista cumplió con el pago de las cotizaciones al Sistema de Seguridad Social Integral, a través de la planilla integrada de liquidación de aportes (PILA) y teniendo en cuenta los ingresos percibidos en el periodo de cotización dentro del plazo establecido.

En constancia se firma a los treinta (30) días del mes de abril de dos mil veintiséis (2026).

Interventor o Supervisor,

MARTHA LILIANA RACHEN CELY
Secretaria de Planeación

Anexos: Informe de Actividades, Aportes a Seguridad Social de abril de 2026.

CERTIFICACION PARA RETENCION EN LA FUENTE DE TRABAJDORES INDEPENDIENTES POR RENTAS DE TRABAJO

Toca, abril de 2026
Señores
Secretario de Hacienda Municipal
Municipio de Toca

Referencia: Certificación para efectos de retención en la fuente.

CERTIFICACION BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

Yo. **JOHAN SEBASTIAN OROZCO BURGOS**, identificado con la cedula de ciudadanía Numero 1.056.931.299 expedida en Toca, con el fin de dar cumplimiento al numeral 6 del artículo 1.2.4.1.6 del Decreto Único Tributario 1625 de 2016 (Modificado por el articulo 9 del decreto 2231 de 2023) y el articulo 1.2.4.1.17 parágrafo 4 (modificado por el artículo 11 del Decreto 2231 de 2023), el cual aplica sobre los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos provenientes de honorarios y compensaciones por servicios personales bajo ciertas circunstancias, declaro que:

Seleccionar:

1. No tomaré costos y deducciones a las rentas generadas por este pago por lo tanto serán consideradas como rentas de trabajo, solicito me sea aplicado la retención en la fuente del artículo 383 del E.T. ____X____.
2. Manifiesto que tomare como costos y deducciones en mi declaración de renta, y por tanto solicito me sea aplicado las tarifas ordinarias de retención en la fuente de los artículos 392 al 401 del E.T. es decir las retenciones del 4%, 6%, 10% u 11% según sea el caso _____

Cordialmente,

JOHAN SEBASTIAN OROZCO BURGOS
C.C. 1.056.931.299 de Toca.
Contratista

TOCA 30/ABRIL/2026

CUENTA DE COBRO N°003

MUNICIPIO DE TOCA

IDENTIFICADO CON NIT No 800.099.642-6

DEBE A:

JOHAN SEBASTIAN OROZCO BURGOS

C.C. No 1.056.931.299 de Toca- Boyacá.

La suma de:

TRES MILLONES DE PESOS M/CTE

($3.000.000)

Por concepto de Acta Parcial 3. Contrato de prestación de servicios profesionales N°022 de 2026 del treinta (30) de enero de 2026

La presente la expido ya que no estoy obligado a facturar, puesto que pertenezco al grupo de **NO RESPONSABLES DE IVA,** y cumplo con los requisitos que se establecen en el artículo 437 parágrafo 3 del estatuto tributario.

Cordialmente,

JOHAN SEBASTIAN OROZCO

C.C No 1.056.931.299 de Toca, Boyacá

Nota: Anexo seguridad social mes de abril de 2026.

NIT. 800.099.642-6
Secretaria de Planeación y Obras Publicas

ACTA DE PAGO PARCIAL No. 03

FECHA PRESENTE ACTA:	30 de abril de 2026		
CONTRATO No.:	022 DE 2026	**FECHA:**	30 de enero de 2026
TIPO DE CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	**PROCESO No.:**	MT-CD-2026-022
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISIÓN DEL AVANCE DE LOS INSTRUMENTOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE TOCA		
VALOR INICIAL CONTRATADO:	NUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE. ($9.000.000,00)		
VALOR ADICIONAL:	CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.00,00)		
VALOR TOTAL CONTRATADO:	TRECE MILLONES QUINIENTOS MIL DE PESOS M/CTE. ($13.500.000,00)		
CONTRATISTA:	JOHAN SEBASTIAN OROZCO BURGOS		
SUPERVISOR	MARTHA LILIANA RACHEN CELY		
FECHA DE INICIACIÓN	30 de enero de 2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	TES (03) MESES		
PRORROGA No 01	UN (01) MES Y QUINCE (15) DIAS		
PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN	CUATRO (04) MESES Y QUINCE (15) DIAS		
FECHA DE TERMINACION INICIAL	VEINTINUEVE (29) DE ENERO DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN MODIFICADA:	TRECE (13) DE JUNIO 2026		

ANTECEDENTES DEL CONTRATO:

PRORROGAS

PRORROGA No.	TIEMPO
No 01	UN (01) MES Y QUINECE (15) DIAS

ADICIONALES

ADICIONAL No.	VALOR
No. 01	$ 4.500.000,00

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA	TIEMPO
XX	XX

VALOR TOTAL CONTRATADO:	TRECE MILLONES QUINIENTOS MIL DE PESOS M/CTE. ($13.500.000,00)
FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN:	TRECE (13) DE JUNIO 2026

En el Municipio de Toca , a los TREINTA (30) días del mes de ABRIL del año 2026 se reunieron JOHAN SEBASTIAN OROZCO BURGOS en representación propia como CONTRATISTA y la Arquitecta MARTHA LILIANA RACHEN CELY como supervisora del Municipio de Toca con el fin de suscribir el

Acta de Pago Parcial No. 03, del Contrato anteriormente citado, de acuerdo a lo consagrado en el informe de actividades presentado por el contratista, el cual hace parte integral de la presente acta y se dejan las siguientes consideraciones:

1. Mediante la suscripción de la presente acta de pago parcial, el contratista y el Supervisor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, y en esa medida deben garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales de las dos partes.

2. Que en la minuta del contrato de prestación de servicios en su clausula septima se estableció la siguiente forma de pago: La Entidad Contratante pagará al Contratista el valor del contrato será cancelado mediante

3. Que el contratista presentó el informe de avance de ejecución de actividades entre el periodo del 01 de ABRIL al 29 de ABRIL de 2026.

4. Que el contratista presentó los soportes de pago al Sistema General de Seguridad Social, correspondiente al mes de ABRIL de 2026.

1. BALANCE GENERAL

CONCEPTO	VALOR CONTRATO	VALOR EJECUTADO	VALOR ORDEN DE PAGO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 9.000.000,00		
VALOR ADICIONES	$ 4.500.000,00		
VALOR ANTICIPO INICIAL		$ -	$
VALOR ACTAS PARCIALES		$ -	$ 6.000.000,00
VALOR EJECUTADO		$ 9.000.000,00	$ -
VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL			$ 3.000.000,00
VALOR POR EJECUTAR		$ 4.500.000,00	$ 4.500.000,00
TOTALES	**$ 13.500.000,00**	**$ 13.500.000,00**	**$ 13.500.000,00**
VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA			**$ 3.000.000,00**

Nota: El valor a pagar en la presente acta parcial No. 03 es la suma de: TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000,00) M/CTE.

2. ORDENES DE PAGO

El valor pagado y sus respectivos ajustes, se relacionan en el siguiente cuadro.

ACTA No.	PERIODO DE EJECUCIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA	VALOR
1,00	30 DE ENERO DE 2026 AL 28 DE FEBRERO DE 2026	194,00	3/03/2026	$ 3.000.000,00
2,00	01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026	308,00	9/04/2026	$ 3.000.000,00
3,00	01 DE ABRIL AL 29 DE ABRIL DE 2026	0,00		$ 3.000.000,00
TOTALES				$ 9.000.000,00

ACTA	FECHA
ACTA DE INICIO	30/01/2026
ACTA PARCIAL 1	3/03/2026
ACTA PARCIAL 2	7/04/2026
ADICIONAL No 1 y PRORROGA No 1	24/04/2026
ACTA PARCIAL 3	30/04/2026

ÍTEM	DOCUMENTOS ENTREGADOS	UNIDAD	CANTIDAD
1	Informe de avance de prestacion de servicios del periodo del 01/04/2026 al 29/04/2026 del contrato de prestacion de No. 022 DE 2026	1	1,00

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

JOHAN SEBASTIAN OROZCO BURGOS
Contratista

MARTHA LILIANA RACHEN CELY
Secretaria de Planeación
Supervisora
