INFORME EJECUTIVO

UT SAN DIEGO
2026
NIT: 901.957.338-1

MES DE FEBRERO 2026
-MARZO DE 2026

UNION TEMPORAL SAN DIEGO

UT SAN DIEGO
2026
NIT: 901.957.338-1

CONTRATO DE OBRA No. 1381 DE 2025


Realizar la adecuación y/o construcción de obras complementarias requeridas para fortalecer el Sistema, mejorar la experiencia del usuario y renovar sus condiciones físicas, las cuales se realizarán sobre la infraestructura del componente BRT del sistema de transporte masivo de la ciudad de Bogotá D.C., que se encuentran a cargo de la Empresa de Transporte del Tercer Milenio -TRANSMILENIO S.A.

INFORME EJECUTIVO

UT SAN DIEGO
2026
NIT: 901.957.338-1

MES DE FEBRERO 2026
-MARZO DE 2026

Imagen 1.UBICACION FRENTES DE OBRA Lote 2

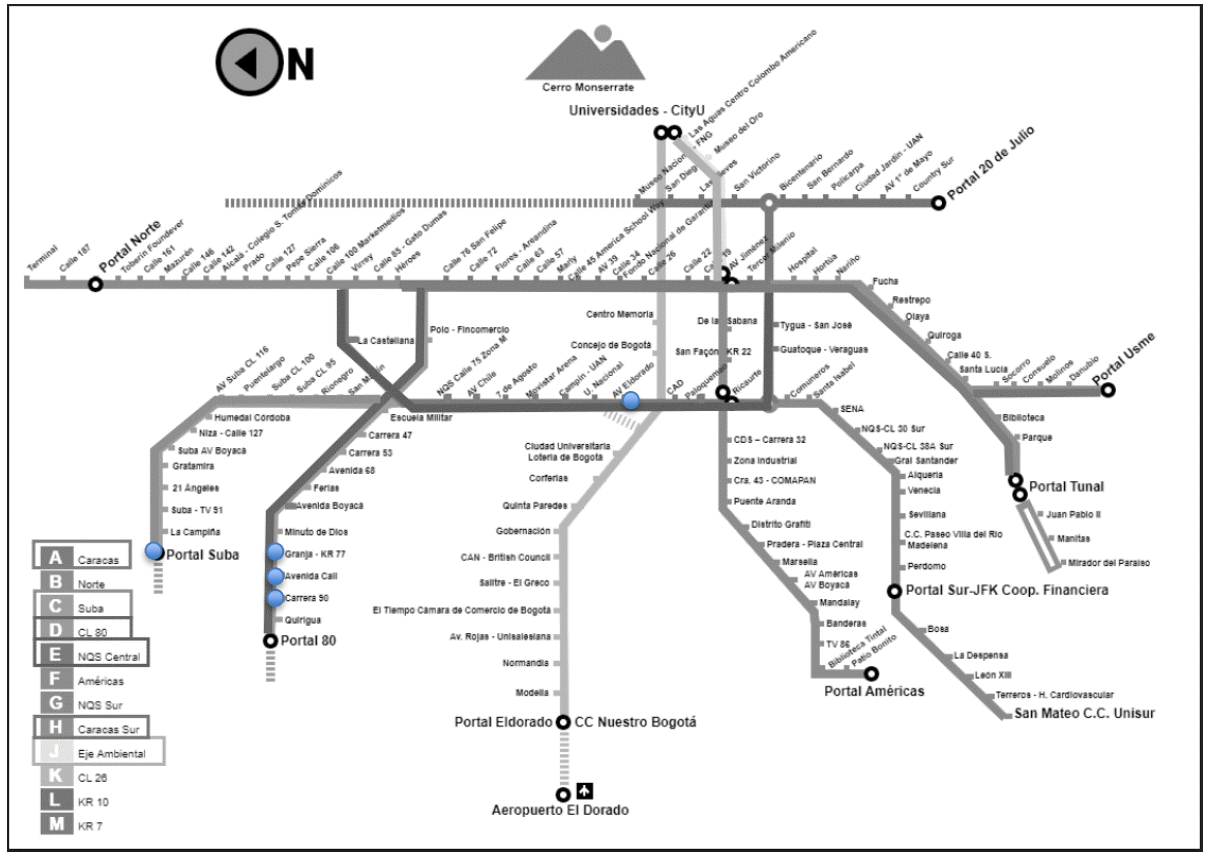

INFORME EJECUTIVO

UT SAN DIEGO
2026
NIT: 901.957.338-1


MES DE FEBRERO 2026 -MARZO DE 2026

Actividades Ejecutadas entre el 21 de Febrero de 2026 al 20 de Marzo del 2026.

MET-03	1381-L2-046	NQS CENTRAL -E	AV EL DORADO	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO TIPO ONDA	100%

Tabla de cantidades		
Cantidad teórica	**Cantidad ejecutada**	**% avance**
154	154	100%

ANTES

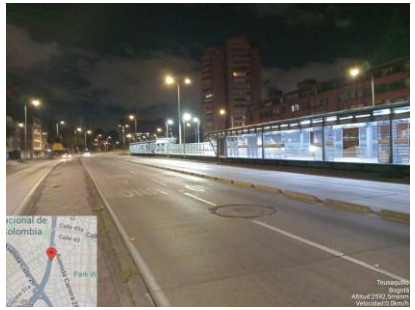

DURANTE





DESPUES



Se implementa PMT se realiza la demolición de los tope llantas o separadores viales y se instala cerramiento tipo onda efectuándose el vaciado en concreto acelerado de la viga la cual se dilata cada junta y se instala la señalización con el chevrón y cintas reflectivas en los costados oriental de la Estación

INFORME EJECUTIVO

UT SAN DIEGO
2026
NIT: 901.957.338-1


MES DE FEBRERO 2026 -MARZO DE 2026

Actividades Ejecutadas entre el 21 de Febrero de 2026 al 20 de Marzo del 2026.


MET-05	1381-L2-047	SUBA - C	PORTAL SUBA	SUMINISTRO E INSTALACION DE CELOSIA EN CERRAMIENTO PARA DIVISION OPERATIVA DE PLATAFORMAS DE PORTALES	100 %

Tabla de cantidades		
Cantidad teórica	Cantidad ejecutada	% avance
377,65	377,65	100%

ANTES

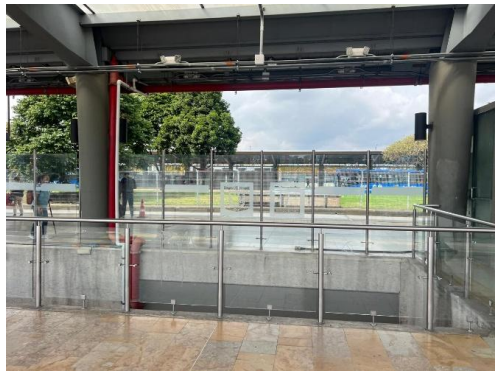

DURANTE

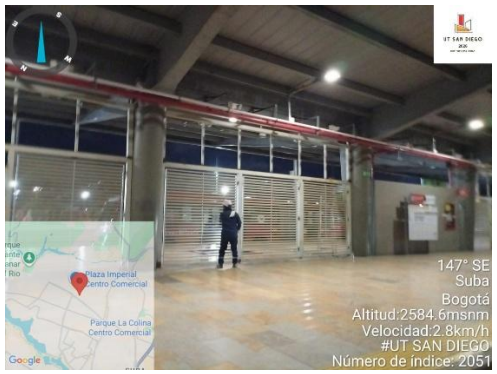

DESPUES



Se instalan las celosías de los divisorios de buses troncal y buses articulados y biarticulados respetando las distancias que conforman los espacios para la operatividad de los buses en la plataforma 1.

INFORME EJECUTIVO

UT SAN DIEGO
2026
NIT: 901.957.338-1


MES DE FEBRERO 2026 -MARZO DE 2026

Actividades Ejecutadas entre el 21 de Febrero de 2026 al 20 de Marzo del 2026.

MET-06	1381-L2-048	SUBA - C	PORTAL SUBA	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA MICROPERFORADA EN CERRAMIENTO PARA DIVISION OPERATIVA DE PLATAFORMAS DE PORTALES	100 %

Tabla de cantidades		
Cantidad teórica	Cantidad ejecutada	% avance
274,58	274,58	100 %

ANTES

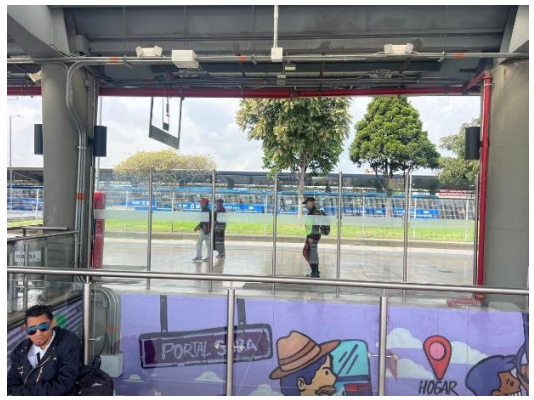

DURANTE



DESPUES



Se instala lamina microperforada en la parte superior del cerramiento divisorio de las plataforma 2.

INFORME EJECUTIVO

UT SAN DIEGO
2026
NIT: 901.957.338-1


MES DE FEBRERO 2026 -MARZO DE 2026

Actividades Ejecutadas entre el 21 de Febrero de 2026 al 20 de Marzo del 2026.


OBC-02	1381-L2-049	CALLE 80 - D	AV CALI	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN ESTACIONES, (OBC-02)	EN EJECUCIÓN


Tabla de cantidades		
Cantidad teórica	**Cantidad ejecutada**	**% avance**
EN EJECUCION	EN EJECUCION	EN EJECUCION

ANTES

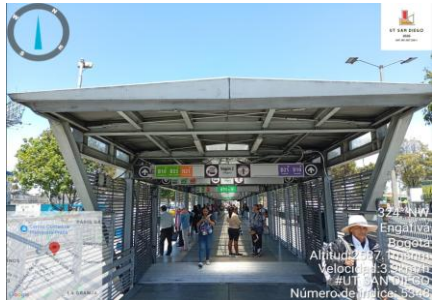

DURANTE

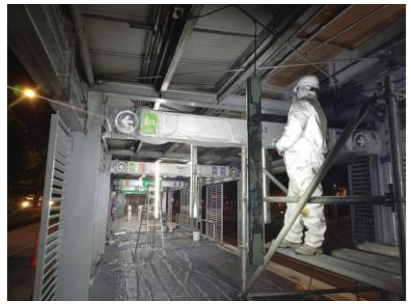

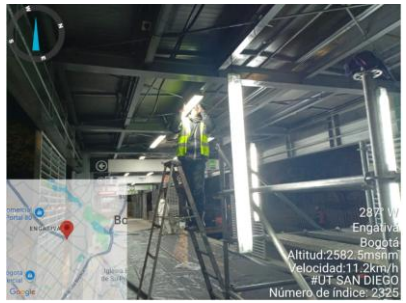

DESPUES

- Se realiza limpieza y pintura en la estructura existente para poder realizar la instalación de la teja.

INFORME EJECUTIVO

UT SAN DIEGO
2026
NIT: 901.957.338-1

MES DE FEBRERO 2026 -MARZO DE 2026

Actividades Ejecutadas entre el 21 de Febrero de 2026 al 20 de Marzo del 2026.


OBC-02	1381-L2-050	CALLE 80 - D	CARRERA 90	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN ESTACIONES, (OBC-02)	EN EJECUCIÓN

Tabla de cantidades		
Cantidad teórica	**Cantidad ejecutada**	**% avance**
EN EJECUCION	EN EJECUCION	EN EJECUCION

ANTES



DURANTE

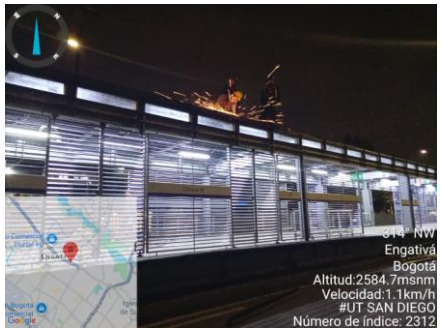



DESPUES

- Se realiza limpieza y pintura en la estructura existente para poder realizar la instalación de la teja.
- se desmontan laterales de la cubierta.

INFORME EJECUTIVO

UT SAN DIEGO
2026
NIT: 901.957.338-1

MES DE FEBRERO 2026 -MARZO DE 2026

Actividades Ejecutadas entre el 21 de Febrero de 2026 al 20 de Marzo del 2026.

OBC-02	1381-L2-051	CALLE 80 - D	GRANJA CARRERA 75	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN ESTACIONES, (OBC-02)	EN EJECUCIÓN

Tabla de cantidades		
Cantidad teórica	**Cantidad ejecutada**	**% avance**
EN EJECUCION	EN EJECUCION	EN EJECUCION

ANTES



DURANTE





DESPUES

- Se realiza limpieza y pintura en la estructura existente para poder realizar la instalación de la teja.
- Se desmontan laterales de la cubierta
- Inicio del montaje de la primera capa de la cubierta.

INFORME EJECUTIVO

Actividades Ejecutadas entre el 21 de Febrero de 2026 al 20 de Marzo del 2026.

UT SAN DIEGO
2026
NIT: 901.957.338-1

MES DE FEBRERO 2026
-MARZO DE 2026

COMPONENTE TECNICO



REALIZACION DE SLUM



MUESTRAS DE LABORATORIO





CONTROL DE PERFORACIONES





FUNDIDA DE VIGA

Todas las actividades fueron gestionadas y ejecutadas, con revisión en campo y aprobación de la interventoría, asegurando el estricto cumplimiento de los procedimientos y lineamientos establecidos. Se fundió la viga con concreto de 3.000psi acelerado a tres días del cerramiento, posteriormente se realizaron las debidas dilataciones , instalación del chevron y cintas reflectivas. En el costado oriental de la Estación AV DORADO.

INFORME EJECUTIVO

Actividades Ejecutadas entre el 21 de Enero de 2026 al 20 de Febrero del 2026.

UT SAN DIEGO
2026
NIT: 901.957.338-1

MES DE FEBRERO 2026
-MARZO DE 2026

COMPONENTE DE CALIDAD





MEDICION DE ESPESORES




REALIZACION DE SLUM



TRABAJOS CONSTRUCCION EN TALLER



ENSAYOS DE LABORATORIO





SOLDADURA



ALMACENAMIENTO DE MATERIAL

En el componente de calidad, se realizaron mediciones para verificar las distancias entre los elementos de las celosías y el cerramiento tipo onda.

De igual manera, se verificaron los cordones de soldadura y la adecuada aplicación de la barrera, garantizando el cumplimiento de las especificaciones técnicas y los estándares de calidad establecidos


INFORME EJECUTIVO


UT SAN DIEGO
2026
NIT: 901.957.338-1

MES DE FEBRERO 2026 -MARZO DE 2026

Actividades Ejecutadas entre el 21 de Febrero de 2026 al 20 de Marzo del 2026.

COMPONENTE SST

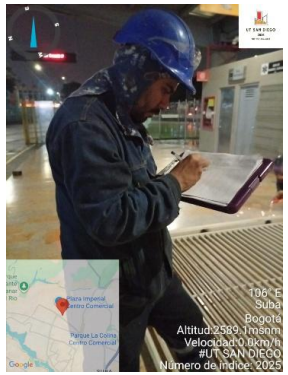

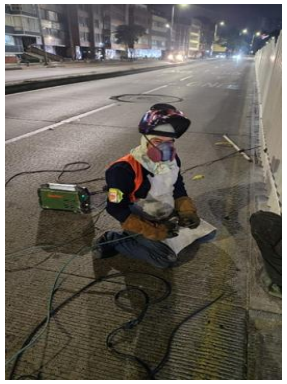


VERIFICACION DE USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y PLANILLAS







DEMARCACION Y PROTECCION ESPACIOS DE TRABAJO EN OBRA



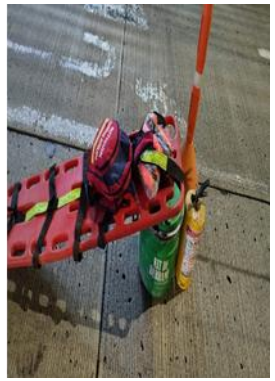

ELEMENTOS DE SEGURIDAD

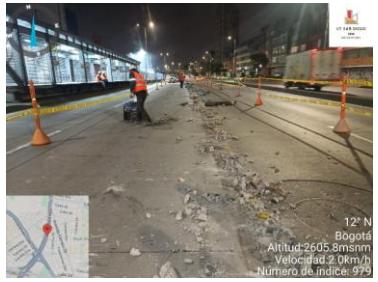

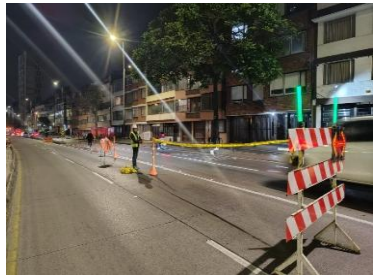

SEÑALIZACION ESPACIOS DE TRABAJO EN OBRA

Se realizaron los respectivos cerramientos y la señalización de obra. Cada punto de trabajo contó con su respectivo extintor y camilla, el personal dispuso de la dotación completa, en cumplimiento de las normas de seguridad establecidas.

INFORME EJECUTIVO

UT SAN DIEGO
2026
NIT: 901.957.338-1

MES DE FEBRERO 2026
-MARZO DE 2026

Actividades Ejecutadas entre el 21 de Febrero de 2026 al 20 de Marzo del 2026.

COMPONENTE AMBIENTAL







KIT DE DERAMES







RESPEL





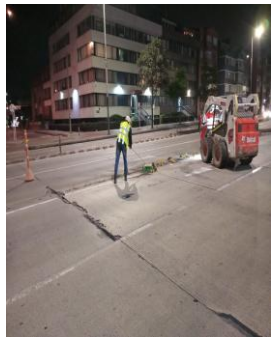

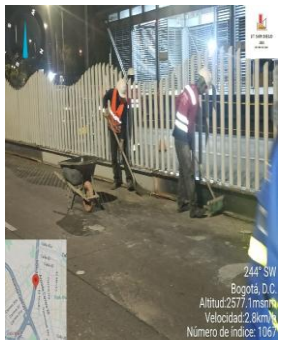

ASEO DE OBRA





PUNTOS DE ACOPIO

Las actividades se ejecutaron cumpliendo normativas ambientales y de gestión. Se garantizó la correcta identificación y manejo de residuos peligrosos y de construcción, con disposición en sitios autorizados. El manejo de sustancias químicas cumplió con el Sistema Globalmente Armonizado (SGA) .

INFORME EJECUTIVO

Actividades Ejecutadas entre el 21 de Febrero de 2026 al 20 de Marzo del 2026.

UT SAN DIEGO
2026
NIT: 901.957.338-1

MES DE FEBRERO 2026
-MARZO DE 2026

CONCLUSION

Las actividades realizadas corresponden al proceso de construcción de las ordenes de trabajos autorizadas y correspondientes a los lineamientos dados por interventoría y Transmilenio. En el periodo de Febrero de 2026 – Marzo de 2026.

- Los materiales utilizados presentan resistencia y durabilidad , se realizan los correctos anclajes que permiten soportar acciones externas o impactos moderados.
- El cerramiento cumple con funciones de delimitar , proteger áreas y control de accesos y seguridad de entorno.
- El proceso constructivo se ejecuto con los criterios técnicos establecidos cumpliendo con alineaciones, nivelaciones en el área designada.
- El cerramiento cumple con requerimientos de seguridad prevención y control de evasión.
- El material de las celosías tiene propiedades que garantizan impactos moderados, con uniones, soldaduras y fijaciones sin defectos visibles, Se encuentran alineadas.
- Se verifica la barrera y recubrimientos según especificaciones lo que ayuda a minimizar deterioro por agentes ambientales.
