| MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ NIT. 800102912-2 | INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISION | Código: | FT-GJC-GCT-023 |
|---|---|---|---|
| | | Versión: | 01 |
| | | Fecha de aprobación: | 20-06-2025 |

**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN**
**CONTRATO No SPOPM-CO-557-2025 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ E INGSERH S.A.S.**

HERNANDO BLADIMIR CABRERA ORDOÑEZ, en calidad de secretario de planeación y obras públicas municipal designado como supervisor del OBRA **No SPOPM-CO-557-2025 SUSCRITO** entre el municipio del valle del Guamuez y la empresa **INGSERH S.A.S** identificada con Nit No: 900128087-6, representada legalmente por ***NOREYDI JULIETH ORTEGA PEÑAFIEL*** identificada con C.C. No1.126.456.040 expedida en Valle del Guamuez, por medio del presente documento presento informe final sobre la ejecución en los siguientes términos:

| **I. DATOS DEL CONTRATO SUPERVISADO** | | |
|---|---|---|
| **1.- Número del Contrato o Contrato:** | SPOPM-CO-557-2025 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025. | |
| **2.- Modalidad Selección:** | ***CONTRATACION DIRECTA*** | |
| **3.- Clase de Contrato o Contrato:** | ***OBRA*** | |
| **4.- Partes:** | **MUNICIPIO DEL VALLE DEL GUAMUEZ**<br>Nit 800102912-2<br>R/L **JEURIN ZAN MENESES GOMEZ**<br>Alcalde Municipal | |
| | **CONTRATISTA:**<br>INGSERH S.A.S<br>NIT: 900128087-6<br>R/L: NOREYDI JULIETH ORTEGA PEÑAFIEL.<br>C.C. No1.126.456.040 expedida en Valle del Guamuez. | |
| **5.- Supervisor del Contrato o Contrato** | HERNANDO BLADIMIR CABRERA ORDOÑEZ<br>*SECRETARIO DE DESPACHO*<br>SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS | |
| **6.- Objeto del Contrato o Contrato:** | OBRAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA EROSIÓN EN LA QUEBRADA EL AFILADOR, CON ALCANTARILLA COMPLEMENTARIA PARA ENCAUZAR CAUDALES Y PROTEGER LA BANCA VIAL EN LA VEREDA LA PRIMAVERA DEL VALLE DEL GUAMUEZ, PUTUMAYO. | |
| **7.- Valor del Contrato o Contrato** | Valor Inicial del Contrato | CINCUENTA ,Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($55.460.330,52 MCTE) |
| **8.- Certificado(S) de disponibilidad presupuestal y Registro(S) presupuestal (es)** | Disponibilidad presupuestal:<br>No.2025000695<br>Fecha: 08/10/2025<br>Valor: 55.460.330,52 | Registro presupuestal:<br>No. 2025000825<br>Fecha:23/09/2025<br>Valor:55.460.330,52 |
| **9.- Estampillas** | Recibo: N° 2025006343 | Fecha: 24/09/2025 |
| **10.- Duración y Ejecución del Contrato o Contrato:** | Plazo inicial: | UN (01) MES |
| | F. de Suscripción: | 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 |
| | F. de Acta de inicio | 06 DE OCTUBRE DE 2025 |
| | Fecha de Terminación inicial: | 05 DE NOVIEMBRE DE 2025 |
| | Fecha de Terminación Anticipada: | N.A |
| | Fecha de Prórroga: | N.A |

| | Fecha de terminación final: | N.A |
|---|---|---|
| **11.- Suspensión y reinicio Contrato o Contrato:** | **Acta de Suspensión** | **Acta de Reinicio** |
| | N.A | N.A |

## 2. DATOS DEL SUPERVISOR

La supervisión del presente OBRA fue ejercida por el (los) siguiente(s) funcionario(s):

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL SUPERVISOR | HERNANDO BLADIMIR CABRERA ORDOÑEZ |
| IDENTIFICACIÓN | 1.061.762.436 DE POPAYÁN |
| DEPENDENCIA | SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS |
| CARGO | SECRETARIO DE DESPACHO |
| PERIODO DE SUPERVISIÓN | UN (01) MES |

## 3. MODIFICACIONES

**A. PRÓRROGAS:**

| | |
|---|---|
| PRÓRROGA | (Ninguna) |

**B. ADICIONES:**

| | |
|---|---|
| ADICIONAL | (Ninguna) |

## 4. RELACIÓN DE PÓLIZAS

### RELACIÓN DE PÓLIZAS DEL OBRA DE OBRA

**Tipo de póliza:** Cumplimiento del contrato
**Tipo de movimiento:** Expedición
**Entidad aseguradora:** SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT: 860009578-6
**Tomador:** INGSERH S.A.S
**Póliza No.:** 41-44-101297560 (Anexo 0)
**Fecha de expedición:** 23/09/2025
**RESOLUCION No** OJMVG-217-2025 del 25/09/2025
**Estado de póliza:** Aprobado

| AMPAROS | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEGURADA |
|---|---|---|---|
| Cumplimiento del contrato | 19/09/2025 | 19/04/2026 | $ 5.546.033,10 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo. | 19/09/2025 | 19/02/2026 | $ 27.730.165,50 |
| Pago de salarios, prestaciones legales y sociales e indemnizaciones laborales. | 19/09/2025 | 19/10/2028 | $ 2.773.016,55 |
| Estabilidad y Calidad de la obra | 19/09/2025 | 19/10/2030 | $ 5.546.033,10 |

**Tipo de póliza:** Responsabilidad Civil Extracontractual
**Tipo de movimiento:** Emisión Original
**Entidad aseguradora:** SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT: 860009578-6
**Tomador:** INGSERH S.A.S
**Póliza No.:** 41-40-101057420 (Anexo 0)
**Fecha de expedición:** 23/09/2025
**RESOLUCION No** OJMVG-217-2025 del 25/09/2025
**Estado de póliza:** Aprobado

| AMPAROS | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEGURADA |
|---|---|---|---|
| Predios labores y operaciones | 19/09/2025 | 19/10/2025 | $ 284.700.000,00 |
| Responsabilidad Civil Patronal | 19/09/2025 | 19/10/2025 | $ 284.700.000,00 |
| Contratistas y Subcontratistas | 19/09/2025 | 19/10/2025 | $ 284.700.000,00 |
| Vehículos propios y no propios | 19/09/2025 | 19/10/2025 | $ 284.700.000,00 |
| Daño emergente y lucro cesante | 19/09/2025 | 19/10/2025 | $ 284.700.000,00 |
| Perjuicios extrapatrimoniales | 19/09/2025 | 19/10/2025 | $ 284.700.000,00 |

**Tipo de póliza:** Cumplimiento del contrato
**Tipo de movimiento:** anexo de modificación.
**Entidad aseguradora:** SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT: 860009578-6
**Tomador:** INGSERH S.A.S
**Póliza No.:** 41-44-101297560 (Anexo 1)
**Fecha de expedición:** 08/10/2025
**RESOLUCION No** OJMVG-249-2025 del 15/10/2025
**Estado de póliza:** NO Aprobado

| AMPAROS | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEGURADA |
|---|---|---|---|
| Amparos | 0 | 0 | 0 |

**Tipo de póliza:** Responsabilidad Civil Extracontractual
**Tipo de movimiento:** anexo de modificación.
**Entidad aseguradora:** SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT: 860009578-6

**Tomador:** INGSERH S.A.S
**Póliza No.:** 41-40-101057420 (Anexo 1)
**Fecha de expedición:** 08/10/2025
**RESOLUCION No** OJMVG-249-2025 del 15/10/2025
**Estado de póliza:** NO Aprobado

| AMPAROS | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEGURADA |
|---|---|---|---|
| AMPAROS | 0 | 0 | 0 |

**Tipo de póliza:** Cumplimiento del contrato
**Tipo de movimiento:** anexo de traslado de vigencia.
**Entidad aseguradora:** SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT: 860009578-6
**Tomador:** INGSERH S.A.S
**Póliza No.:** 41-44-101297560 (Anexo 2)
**Fecha de expedición:** 08/10/2025
**RESOLUCION No** OJMVG-249-2025 del 15/10/2025
**Estado de póliza:** Aprobado

| AMPAROS | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEGURADA |
|---|---|---|---|
| Cumplimiento del contrato | 06/10/2025 | 06/05/2026 | $ 5.546.033,10 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo. | 06/10/2025 | 08/03/2026 | $ 27.730.165,50 |
| Pago de salarios, prestaciones legales y sociales e indemnizaciones laborales. | 06/10/2025 | 05/11/2028 | $ 2.773.016,55 |
| Estabilidad y Calidad de la obra | 06/10/2025 | 05/11/2030 | $ 5.546.033,10 |

**Tipo de póliza:** Responsabilidad Civil Extracontractual
**Tipo de movimiento:** anexo de traslado de vigencia.
**Entidad aseguradora:** SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT: 860009578-6
**Tomador:** INGSERH S.A.S
**Póliza No.:** 41-40-101057420 (Anexo 2)
**Fecha de expedición:** 08/10/2025
**RESOLUCION No** OJMVG-249-2025 del 15/10/2025
**Estado de póliza:** Aprobado

| AMPAROS | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEGURADA |
|---|---|---|---|
| Predios labores y operaciones | 06/10/2025 | 05/11/2025 | $ 284.700.000,00 |
| Responsabilidad Civil Patronal | 06/10/2025 | 05/11/2025 | $ 284.700.000,00 |
| Contratistas y Subcontratistas | 06/10/2025 | 05/11/2025 | $ 284.700.000,00 |
| Vehículos propios y no propios | 06/10/2025 | 05/11/2025 | $ 284.700.000,00 |
| Daño emergente y lucro cesante | 06/10/2025 | 05/11/2025 | $ 284.700.000,00 |
| Perjuicios extrapatrimoniales | 06/10/2025 | 05/11/2025 | $ 284.700.000,00 |

**Tipo de póliza:** CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
**Tipo de movimiento:** Anexo no causa prima.
**Entidad aseguradora:** SEGUROS DEL ESTADO S.A. S.A. NIT: 860009578-6
**Tomador:** INGSERH S.A.S
**Póliza No.:** 41-44-101297560 (Anexo 3)
**Fecha de expedición:** 11/11/2025
**RESOLUCION No** OJMVG-354-2025 del 18/12/2025
**Estado de póliza: No** Aprobado

| AMPAROS | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEGURADA |
|---|---|---|---|
| Cumplimiento del contrato | 06/10/2025 | 06/05/2026 | $ 5.546.033,10 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo. | 06/10/2025 | 08/03/2026 | $ 27.730.165,50 |
| Pago de salarios, prestaciones legales y sociales e indemnizaciones laborales. | 06/10/2025 | 05/11/2028 | $ 2.773.016,55 |
| Estabilidad y Calidad de la obra | 05/11/2025 | 05/11/2030 | $ 5.546.033,10 |

**Tipo de póliza:** CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
**Tipo de movimiento:** Anexo no causa prima.
**Entidad aseguradora:** SEGUROS DEL ESTADO S.A. S.A. NIT: 860009578-6
**Tomador:** INGSERH S.A.S
**Póliza No.:** 41-44-101297560 (Anexo 4)
**Fecha de expedición:** 11/11/2025
**RESOLUCION No** OJMVG-314-2025 del 01/12/2025
**Estado de póliza:** Aprobado

| AMPAROS | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEGURADA |
|---|---|---|---|
| Cumplimiento del contrato | 06/10/2025 | 06/05/2026 | $ 5.546.033,10 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo. | 06/10/2025 | 08/03/2026 | $ 27.730.165,50 |
| Pago de salarios, prestaciones legales y sociales e indemnizaciones laborales. | 06/10/2025 | 05/11/2028 | $ 2.773.016,55 |
| Estabilidad y Calidad de la obra | 05/11/2025 | 05/11/2030 | $ 5.546.033,10 |

## 5. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBLIGACIONES ESPECIFICAS

Frente a las obligaciones generales del contratista, el supervisor mediante el presente informe declara su cabal Cumplimiento del contrato.

| OBLIGACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| El contratista deberá cumplir con la ejecución del contrato de acuerdo con las especificaciones técnicas de las actividades de obras a realizar garantizando eficiencia en el desarrollo del contrato. | X | | El contratista a cabalidad con las especificaciones técnicas estipuladas en el contrato de obra garantizando la eficiencia y desarrollo del contrato. |
| El contratista dispondrá de un sitio que reúna condiciones adecuadas, comodidad, ventilación, protección y seguridad, para el almacenamiento de los materiales que se utilizaran para la obra | X | | El contratista aseguró la implementación de procedimientos adecuados para el almacenamiento de los materiales, garantizando que estos conservaran sus propiedades físicas y mecánicas en condiciones óptimas, conforme a las especificaciones técnicas y normativas vigentes, con el fin de asegurar su correcta utilización en las actividades constructivas. |
| Utilizar materiales y equipos de calidad de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en la oferta económica y aceptadas por la Entidad Territorial | X | | Se evidencia que se utilizo los materiales y equipo necesario para la correcta ejecución de la obra. |
| Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término | X | | El contratista corrió con los costos y riesgo con el fin de cumplir las normas de calidad |

| | | | |
|---|---|---|---|
| indicado por el supervisor, toda actividad ejecutada que resulte defectuosa según el análisis de calidad o que no cumpla las normas de calidad requeridas para la obra, ya sea por causa de los insumos o de la mano de obra | | | requerida. |
| Realizar el cerramiento provisional de la obra y/o de las zonas por intervenir, de acuerdo con las especificaciones dadas, que proteja los sitios de construcción de la obra del acceso de personas ajenas a los trabajos, con el fin de evitar perturbaciones de tránsito e incomodidades a los vecinos. De igual forma, deberá realizar el mantenimiento del campamento y del cerramiento, durante toda la ejecución de la obra | X | | Se ejecuta el cerramiento provisional de la vía conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el proyecto, con el propósito de delimitar y proteger el área de construcción. Esta medida preventiva garantiza la seguridad de los transeúntes y mitiga el riesgo de incidentes en la zona de intervención, en cumplimiento de la normativa vigente en materia de seguridad vial y ocupación del espacio público. |
| Aportar para la ejecución de la obra todas las herramientas y equipos que sean necesarios para la correcta ejecución de esta | X | | El contratista aporto todas las herramientas y equipo. |
| Cumplir con todas las normas de seguridad y salud en el trabajo, para el inicio de las obras cuanto haya lugar | X | | El contratista cumplió con todas las normas de seguridad y salud en el trabajo. |
| Asumir los costos de transporte de materiales y demás gastos ocasionados inherentes a la ejecución del contrato | X | | El contratista asumió los cotos de transporte de materiales y demás gastos ocasionados inherentes a la ejecución del contrato. |
| Contar con un libro de control y/o bitácora de obra en el cual quedará constancia de todo lo pertinente en la ejecución de la obra. Este libro será suscrito por el contratista y/o sus | X | | El contratista cuenta con un libro de control y/o bitácora de obra en el cual quedo constancia de todo lo pertinente en la ejecución de la obra. Este libro fue suscrito por el contratista y/o sus representantes y por el supervisor del contrato |

| | | | |
|---|---|---|---|
| representantes y por el supervisor del contrato | | | |
| En caso de requerirse presentar el plan manejo de tránsito, que comprende adelantar todas las gestiones necesarias ante las autoridades respectivas, para la obtención de los permisos requeridos en la ejecución de obra, diferentes a los previamente obtenidos, tales como: cruce de vías, cierre temporal de vías, accesos a cada área, ingreso del personal, horarios de trabajo, excavaciones, o cualquier intervención del espacio público. | X | | No se requiere plan manejo de tránsito, ya que el flujo de habitantes en este sector es mínimo y se encuentra en una vía terciaria. |
| Retirar los materiales sobrantes y depositarlos en un lugar adecuado y entregar las áreas intervenidas en perfecto estado y limpieza. | X | | El contratista entrega el área de trabajo limpia y libre de escombros. |
| Reponer, por su cuenta y riesgo, las obras de terceros que resulten afectadas durante el proceso constructivo | X | | El contratista manifestó su disposición de asumir, bajo su propia responsabilidad, los riesgos derivados de terceros que pudieran generarse durante la ejecución de la obra. No obstante, en la presente ocasión no se registraron incidentes de esta naturaleza, garantizando el normal desarrollo de las actividades constructivas conforme a las condiciones contractuales y normativas aplicables |

## 6. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| OBLIGACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| MANEJO DE AGUAS | X | | Se ejecuta el desvío provisional del cauce mediante la disposición de sacos de arena, con el objetivo de controlar el flujo hídrico y permitir el desarrollo seguro de las actividades constructivas en la zona de intervención. Esta medida se implementa conforme a las especificaciones técnicas del proyecto y a las |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | disposiciones normativas aplicables en materia de manejo ambiental y seguridad en obras hidráulicas, garantizando la protección del área de trabajo y la mitigación de riesgos asociados. |
| EXCAVACION TALUD | X | | Realizaron la excavación como descapote del área vegetal y la excavación más profunda para ampliar el área donde se realiza la alcantarilla organizando mejor la zona de trabajo. |
| PLACA CONCRETO 2000 PSI | X | | Se ejecuta una placa de concreto tipo solado, ubicada en la base de la tubería, con el propósito de brindar soporte y estabilidad durante su instalación. Esta placa se construye en concreto de baja resistencia, con una capacidad de diseño de 2.000 PSI, conforme a las especificaciones técnicas del proyecto y a las normas aplicables para elementos de apoyo en obras de infraestructura. |
| INSTALACION DE TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO | X | | Se realiza la instalación de tubería de concreto reforzado de 36" |
| ATRAQUE CONCRETO D 2000 PSI | X | | Se ejecutó un atraque de concreto con el objetivo de proporcionar soporte y estabilidad a la tubería instalada. Dicho elemento fue construido en concreto de baja resistencia, con una capacidad de diseño de 2.000 PSI, conforme a las especificaciones técnicas del proyecto y a las disposiciones normativas aplicables para obras de infraestructura hidráulica. |
| CONCRETO CLASE D (3000 PSI) | X | | Se ejecuta una placa de concreto de clase D, destinada a la conformación de las paredes de la estructura de alcantarilla, garantizando su estabilidad y resistencia conforme a las especificaciones del proyecto. Adicionalmente, se construye una placa superior sobre la tubería, elaborada con el mismo tipo de concreto, con el fin de proporcionar soporte estructural y protección, en cumplimiento de las normas técnicas aplicables para obras de infraestructura hidráulica. |
| ACERO FY=40 MPA | X | | Se ejecuta el armado de refuerzo transversal con varillas de acero de 3/8", complementado con refuerzo vertical en varillas de ½", dispuesto con espaciamientos uniformes de 20 cm. Esta configuración estructural se implementa con el fin de garantizar la estabilidad y resistencia de las aletas, placas de pared y cimentaciones, en cumplimiento de las especificaciones técnicas del proyecto y de las normas constructivas aplicables. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| MALLA ELECTROSOLDADA 5 MM | X | | Se instaló la malla de refuerzo en la placa de concreto construida sobre la tubería, con el fin de garantizar la adecuada distribución de cargas y aumentar la capacidad estructural del elemento. La disposición de la malla se realizó conforme a las especificaciones técnicas del proyecto y a las normas aplicables de construcción, asegurando la resistencia y durabilidad de la estructura. |
| RELLENOS CON SUBBASE GRANULAR DEBIDAMENTE COMPACTADA | X | | Se ejecuta el relleno sobre la placa de concreto destinada al curso vehicular, con el fin de garantizar la adecuada nivelación, estabilidad y resistencia de la superficie. Este procedimiento se realiza conforme a las especificaciones técnicas del proyecto y a las normas de construcción aplicables, asegurando la correcta compactación y el cumplimiento de los parámetros de soporte estructural requeridos para el tránsito vehicular. |

## 7. RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL

| ÍTEM | PERIODO DE PAGO | ENTREGA DE PLANILLA |
|---|---|---|
| **COLONIA EDINSON** | | |
| **PLANILLA Y FECHA DE PAGO** | **Planilla No. 9494470503**<br>**Fecha: 02/12/2025** | **APORTES EN LINEA** |
| **PENSIÓN** | **Entidad:** COLPENSIONES<br>**Fecha:** 2025-10<br>**Valor:** 7.700 | **CUMPLE** |
| **SALUD** | **Entidad:** EMSSANAR<br>**Fecha:** 2025-11<br>**Valor:** $ 1.950 | **CUMPLE** |
| **CCF** | **Entidad:** CONFAMILIAR PUTUMAYO<br>**Fecha:** 2025/11<br>**Valor:** $1.925 | **CUMPLE** |
| **RIESGOS PROFESIONALES** | **Entidad:** Positiva Compañía de seguros.<br>**Fecha:** 2025/11<br>**Valor:** $325 | **CUMPLE** |
| **FIGUEROA EDWIN** | | |
| **PLANILLA Y FECHA DE PAGO** | **Planilla No. 9494470503**<br>**Fecha: 02/12/2025** | **APORTES EN LINEA** |
| **PENSIÓN** | **Entidad:** PORVENIR<br>**Fecha:** 2025-10<br>**Valor:** 7.700 | **CUMPLE** |
| **SALUD** | **Entidad:** NUEVA EPS MOVILIDAD<br>**Fecha:** 2025-11<br>**Valor:** $ 2.000 | **CUMPLE** |

| | | |
|---|---|---|
| **CCF** | **Entidad:** CONFAMILIAR PUTUMAYO<br>**Fecha:** 2025/11<br>**Valor:** $1.925 | **CUMPLE** |
| **RIESGOS PROFESIONALES** | **Entidad:** Positiva Compañía de seguros.<br>**Fecha:** 2025/11<br>**Valor:** $325 | **CUMPLE** |
| **NARVAEZ JIMMY** | | |
| **PLANILLA Y FECHA DE PAGO** | **Planilla No. 9494470503**<br>**Fecha: 02/12/2025** | **APORTES EN LINEA** |
| **PENSIÓN** | **Entidad:** COLFONDOS<br>**Fecha:** 2025-10<br>**Valor:** 7.700 | **CUMPLE** |
| **SALUD** | **Entidad:** EMSSANAR<br>**Fecha:** 2025-11<br>**Valor:** $ 1.950 | **CUMPLE** |
| **CCF** | **Entidad:** CONFAMILIAR PUTUMAYO<br>**Fecha:** 2025/11<br>**Valor:** $1.925 | **CUMPLE** |
| **RIESGOS PROFESIONALES** | **Entidad:** Positiva Compañía de seguros.<br>**Fecha:** 2025/11<br>**Valor:** $325 | **CUMPLE** |
| **JHON RODRIGUEZ** | | |
| **PLANILLA Y FECHA DE PAGO** | **Planilla No. 9494470503**<br>**Fecha: 02/12/2025** | **APORTES EN LINEA** |
| **PENSIÓN** | **Entidad:** PORVENIR<br>**Fecha:** 2025-10<br>**Valor**: 24.500 | **CUMPLE** |
| **SALUD** | **Entidad:** NUEVA E.P.S<br>**Fecha:** 2025-11<br>**Valor:** $ 6.200 | **CUMPLE** |
| **CCF** | **Entidad:** CONFAMILIAR PUTUMAYO<br>**Fecha:** 2025/11<br>**Valor:** $6.125 | **CUMPLE** |
| **RIESGOS PROFESIONALES** | **Entidad:** Positiva Compañía de seguros.<br>**Fecha:** 2025/11<br>**Valor:** 825 | **CUMPLE** |

| ÍTEM | PERIODO DE PAGO | ENTREGA DE PLANILLA |
|---|---|---|
| **COLONIA EDINSON** | | |
| **PLANILLA Y FECHA DE PAGO** | **Planilla No. 9495813263**<br>**Fecha: 02/12/2025** | **APORTES EN LINEA** |
| **PENSIÓN** | **Entidad:** COLPENSIONES<br>**Fecha:** 2025-11 | **CUMPLE** |

| | | |
|---|---|---|
| | **Valor:** 227.800 | |
| **SALUD** | **Entidad:** EMSSANAR<br>**Fecha:** 2025-12<br>**Valor:** $ 57.000 | **CUMPLE** |
| **CCF** | **Entidad:** CONFAMILIAR PUTUMAYO<br>**Fecha:** 2025/11<br>**Valor:** $ 57.000 | **CUMPLE** |
| **RIESGOS PROFESIONALES** | **Entidad:** Positiva Compañía de seguros.<br>**Fecha:** 2025/11<br>**Valor:** $7.500 | **CUMPLE** |
| **FIGUEROA EDWIN** | | |
| **PLANILLA Y FECHA DE PAGO** | **Planilla No. 9495813263**<br>**Fecha: 02/12/2025** | **APORTES EN LINEA** |
| **PENSIÓN** | **Entidad:** PORVENIR<br>**Fecha:** 2025-11<br>**Valor:** 227.800 | **CUMPLE** |
| **SALUD** | **Entidad:** NUEVA EPS MOVILIDAD<br>**Fecha:** 2025-12<br>**Valor:** $ 57.000 | **CUMPLE** |
| **CCF** | **Entidad:** CONFAMILIAR PUTUMAYO<br>**Fecha:** 2025/12<br>**Valor:** $57.000 | **CUMPLE** |
| **RIESGOS PROFESIONALES** | **Entidad:** Positiva Compañía de seguros.<br>**Fecha:** 2025/12<br>**Valor:** $7.500 | **CUMPLE** |
| **NARVAEZ JIMMY** | | |
| **PLANILLA Y FECHA DE PAGO** | **Planilla No. 9495813263**<br>**Fecha: 02/12/2025** | **APORTES EN LINEA** |
| **PENSIÓN** | **Entidad:** COLFONDOS<br>**Fecha:** 2025-11<br>**Valor:** 227.800 | **CUMPLE** |
| **SALUD** | **Entidad:** EMSSANAR<br>**Fecha:** 2025-12<br>**Valor:** $ 57.000 | **CUMPLE** |
| **CCF** | **Entidad:** CONFAMILIAR PUTUMAYO<br>**Fecha:** 2025/12<br>**Valor:** $57.000 | **CUMPLE** |
| **RIESGOS PROFESIONALES** | **Entidad:** Positiva Compañía de seguros.<br>**Fecha:** 2025/12<br>**Valor:** $7.500 | **CUMPLE** |
| **JHON RODRIGUEZ** | | |
| **PLANILLA Y FECHA DE PAGO** | **Planilla No. 9495813263**<br>**Fecha: 02/12/2025** | **APORTES EN LINEA** |
| **PENSIÓN** | **Entidad:** PORVENIR<br>**Fecha:** 2025-11 | **CUMPLE** |

| | | |
|---|---|---|
| | **Valor**: 730.600 | |
| **SALUD** | **Entidad:** NUEVA E.P.S<br>**Fecha:** 2025-12<br>**Valor:** $ 182.700 | **CUMPLE** |
| **CCF** | **Entidad:** CONFAMILIAR PUTUMAYO<br>**Fecha:** 2025/12<br>**Valor:** $ 182.700 | **CUMPLE** |
| **RIESGOS PROFESIONALES** | **Entidad:** Positiva Compañía de seguros.<br>**Fecha:** 2025/12<br>**Valor: 23.900** | **CUMPLE** |

## 8. CONSTANCIAS DEL SUPERVISOR

*La supervisión del informe detalla las actividades realizadas en relación con los aspectos técnicos y administrativos para la entrega y recibo final de la obra, abarcando el periodo desde el 06 de octubre de 2025 hasta el 05 De noviembre De 2025. Durante este tiempo, se llevaron a cabo todas las actividades estipuladas en el contrato de obra, asegurando el Cumplimiento del contrato de los objetivos establecidos.*

*Teniendo en cuenta lo dispuesto en el literal (f) en la cláusula ocho (08) del contrato de obra Nª SPOPM-CO-557-2025, en lo que respecta la forma de pago sobre los aportes al sistema general de seguridad social integral (SGSS), INGSERH S.A.S, Representada Legalmente por la señora: NOREYDI JULIETH ORTEGA PEÑAFIEL Identificada con Nª C.C. 1.126.456.040 expedida en Valle del Guamuez (P), presenta las planillas Tipo E de seguridad social correspondiente al plazo de ejecución de UN (01) MES, por tiempo parcial según consta en el decreto 1072 de 2015, a partir del artículo 2.2.1.6.4.1.*

*Es importante señalar que los profesionales de la Secretaría de Planeación y Obras Públicas Municipal brindaron acompañamiento técnico permanente en campo, con el objetivo de asegurar que la ejecución del proceso constructivo se desarrollara bajo los más altos estándares de calidad y en estricto Cumplimiento del contrato de las especificaciones establecidas en el contrato de referencia.*

*Se deja constancia que, en el marco de las funciones de supervisión contractual, se realizaron los requerimientos formales a la empresa INGSERH S.A.S. para la entrega de la factura electrónica y de la planilla de aportes al Sistema de Seguridad Social, documentos que no fueron allegados en el momento de la finalización de la obra. Dichos soportes fueron presentados con posterioridad, en cumplimiento de las obligaciones contractuales y de las disposiciones normativas vigentes.*

## 9. SOPORTES DOCUMENTALES

*(Señalar aquí los soportes como facturas o documentos equivalentes, contratos, entre otros que soporten el pago a efectuarse.)*

| INFORME PERIODO | CUMPLE |
|---|---|
| **DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA EJECUCION DEL CONTRATO**<br>1. Pólizas de cumplimiento 41-44-101297560 ANEXO 0,1,2,3,4, pólizas de responsabilidad civil Nº 41-40-101057420 anexo 0,1,2,3. | **SI** |

| | |
|---|---|
| 2. Acta de recibo final.<br>3. Informe de ejecución por parte del contratista | |
| **OBSERVACIONES** | **CUMPLE** |
| 1. Salvedad para la entrega.<br>2. Se entrega factura electrónica del 4 de diciembre de 2025.<br>3. Copia de Planilla de aportes a seguridad social Tipo E correspondiente al periodo de ejecución del contrato. Se pagan el 02 de diciembre de 2025<br>4. Certificación de Cumplimiento del contrato del pago de aportes a Seguridad Social suscrita por el contratista y un contador.<br>5. Pago de contribución a FIC SENA. | **SI** |

## 10. RESUMEN DE LA EJECUCCION FINANCIERA

De acuerdo con la ejecución contractual se realizaron los siguientes desembolsos, para el caso de los contratos

| **BALANCE DEL CONTRATO O CONTRATO** | |
|---|---|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO O CONTRATO | $55.460.330,52 |
| VALOR DE ANTICIPO DEL APORTE POR EL MUNICIPIO (50%) | $ 0 |
| VALOR ADICIÓN AL CONTRATO O CONTRATO | **$ 0** |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONTRATO | $55.460.330,52 |
| VALOR DISMINUIDO DEL CONTRATO | **0** |
| SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA | $55.460.330,52 |
| VALOR NO EJECUTADO A FAVOR DEL MUNICIPIO | $0 |
| **INFORMACION DEL ACTA FINAL** | |
| PORCENTAJE DE EJECUCIÓN CONTRATO O CONTRATO | **100%** |
| VALOR EJECUTADO ACTA FINAL (Valor total contratado X porcentaje ejecutado) | $ 55.460.330,52 |
| VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO ACTA FINAL (100%) | **$ 0** |
| TOTAL NETO A PAGAR EN ACTA FINAL | $ 55.460.330,52 |
| PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACTA FINAL | **100%** |
| **VALORES ACUMULADOS DEL CONTRATO O CONTRATO** | |
| SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO | **0** |
| SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA | $ 55.460.330,52 |
| **PORCENTAJES POR EJECUTAR DEL CONTRATO O CONTRATO** | |
| PORCENTAJE POR EJECUTAR: | **0%** |
| PORCENTAJE POR AMORTIZAR: | **0%** |
| PORCENTAJE POR EJECUTAR SEGÚN VALOR TOTAL | **0%** |

NOTA: En caso de ser necesario indicar las observaciones frente a la ejecución financiera. Adicionar las filas necesarias en caso de contratos donde existan rendimientos financieros, reembolsos, entre otros.

**CONSTANCIA DE REFRENDACIÓN:**

Obrando en mi condición de supervisor del contrato de suministro, dejo constancia de que la refrendación realizada a los documentos del expediente contractual objeto de vigilancia, da cuenta de la verificación de la existencia de los originales dentro de la carpeta contentiva de los mismos; sin embargo la veracidad de la información allí contenida es de exclusiva responsabilidad del emisor o de quien haga su aporte, teniendo en cuenta lo invocado en el principio de buena fe contenido en el Art. 83 de la C.P., el que obliga a que las autoridades públicas presuman la buena fe en las actuaciones de los particulares y obliga a que tanto autoridades públicas como particulares actúen de buena fe.

***"C.P. 1991. ARTICULO 83.*** *Las actuaciones de los particulares y de las autoridades deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas".*

Para constancia se firma a los dieciocho (18) días del mes de diciembre de 2025.

**SUPERVISOR:**

**HERNANDO BLADIMIR CABRERA ORDOÑEZ**
**Secretario de Planeación y Obras publicas**

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Elaboró Parte técnica* | *Lisbeth Yurany Yandun Narvaez* | *Apoyo Profesional SPOPM* | |

## ANEXO FOTOGRAFICO

**1. EXCAVACION DEL TALUD**



| |
|---|
| ***2. PLACA DE CONCRETO DE 2000 PSI*** |
|  |
| ***3. INSTALACION DE TUBERIA DE CONCRETO*** |






***4. ATRAQUE DE CONCRETO***



***5. CRONCRETO CLASE D***



***6. ACERO FY =40 MPA***

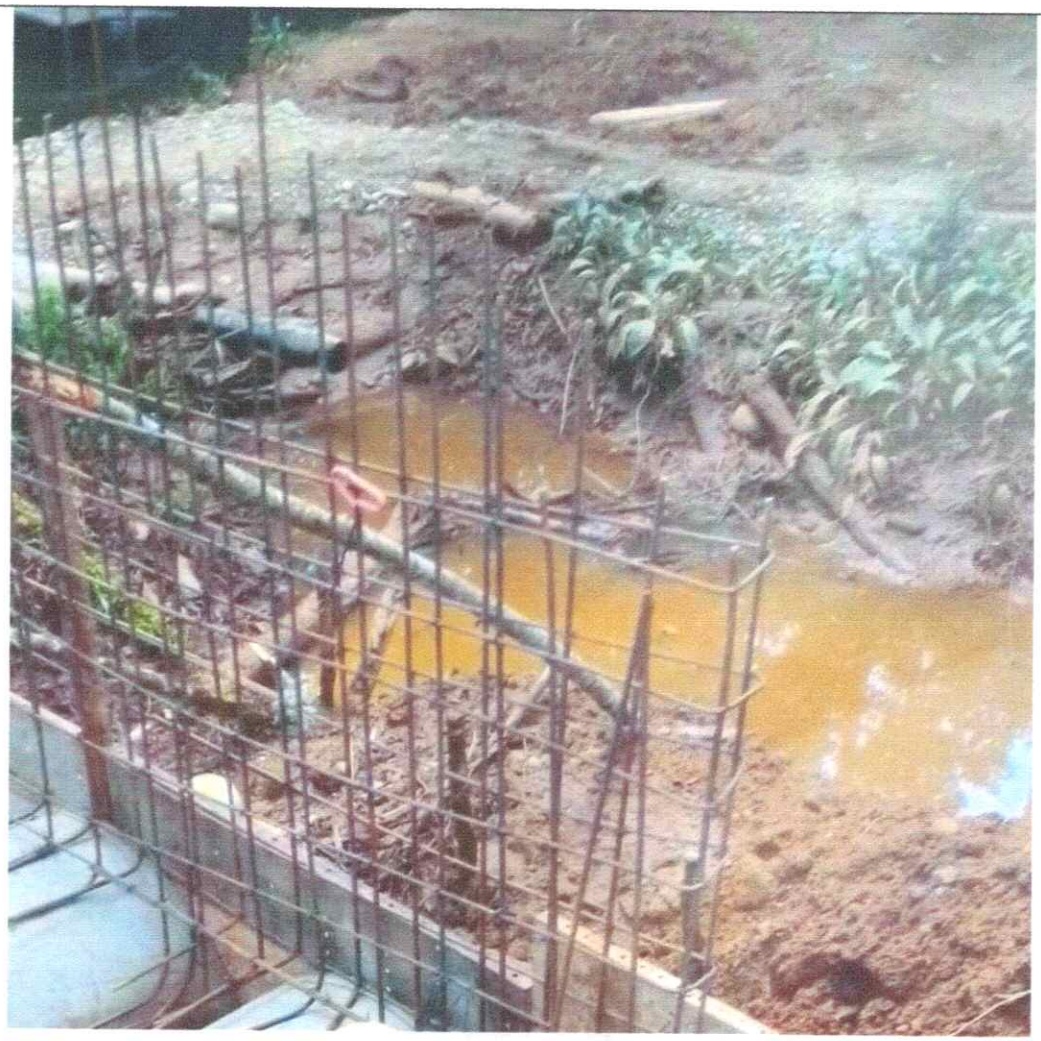

***7. MALLA ELECTROSOLDADA***



**8. RELLENOS CON SUBBASE GRANULAR DEBIDAMENTE COMPACTADA**



