ALSUCON

REGISTRO FOTOGRÁFICO

3103120472 alsuconsas@gmail.com Cra. 23a #25-47 - B. El Porvenir Saravena - Arauca

BATERIA SANITARIA ESCOLAR	
ITEM 1.1 Demolición manual de alistado de piso y material de acabado de tipo liviano (cerámico, arcilla. gres, o baldosas livianas de cemento) con espesor 4 cm o menor. Incluye cargue, retiro, disposición de escombros a sitio autorizado.	UNIDAD: M2





Esta actividad se realizó la demolición total de área contractual para garantizar los nuevos enchapes instalados, teniendo en cuenta que las cerámicas existentes son extruidas y levantadas con herramientas manuales y finalmente cargadas al sitio aprobado por el supervisor de la obra.






BATERIA SANITARIA ESCOLAR	
ITEM 1.2 Desmonte manual de aparatos sanitarios de tipo cerámico (indiferente de si es sanitario lavamanos orinal etc., tamaño, ubicación, o características particulares), en el caso de lavamanos y/o lavaplatos incluye su grifería si es de sobreponer.	UNIDAD: UND





Esta actividad se ejecutó de acuerdo a los números de aparatos sanitarios por desinstalar en los diferentes módulos que conforman la batería sanitaria, por lo tanto, son extraídos manualmente sin demolerlos para hacer su entrega formal a la administración de la institución educativa.



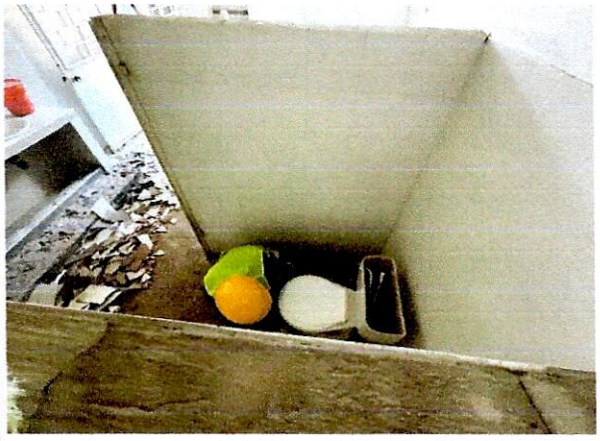

BATERIA SANITARIA ESCOLAR	
ITEM 1.3 Alistado de pisos con mortero impermeabilizado integralmente 1:3 h.<=4 cm, sin pendiente.	UNIDAD: M2





Esta actividad se ejecutó de acuerdo al diseño de mezcla establecido preparando la mezcla para vaciar sobre la superficie alistada y nivelada, posteriormente se realizó el allanado para garantizar el instalado de cerámica.





BATERIA SANITARIA ESCOLAR	
ITEM 1.4 Acabado de piso con enchape cerámico antiderrapante / antideslizante de 30x30 cm color blanco para superficie antideslizante y reticulado, impermeable, resistente a las manchas y al rayado, tráfico comercial moderado, tipo Baldosa Antideslizante para Baños de ALFA o equivalente de igual calidad o superior. Incluye dilatación y emboquille, aparejado según diseño. Pegado con mezcla lista de fábrica.	UNIDAD: M2





Esta actividad se ejecuto teniendo en cuenta las especificaciones técnicas establecidas para garantizar esta instalación, así mismo las cerámicas son colocadas y niveladas sobre la superficie del piso en mortero fundido.





BATERIA SANITARIA ESCOLAR	
ITEM 1.5 Sanitario cerámico de tanque, dos piezas, con asiento redondo, tipo Acuaplus de CORONA o equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro, asiento plástico redondo color blanco, montaje, contenido completo del tanque, acople y conexión, regulador de caudal (válvula plástica) y complementarios para su puesta en funcionamiento. NO incluye puntos hidrosanitarios.	UNIDAD: UND





Esta actividad se ejecutó de acuerdo a los puntos indicados en el los planos establecidos, estos aparatos sanitarios como inodoro se instalaron de acuerdo a las especificaciones técnicas para garantizar su funcionalidad.





BATERIA SANITARIA ESCOLAR	
ITEM 1.6 Orinal cerámico infantil de colgar, orificio de conexión superior, tipo Residencial de CORONA o equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro, montaje, sifón tipo botella y conexión completa. NO incluye punto hidrosanitario	UNIDAD: UND





Esta actividad se ejecutó de acuerdo a los puntos indicados en el los planos establecidos, estos aparatos sanitarios como orinales tipo infantil en el módulo de los baños de niños, estos se instalaron de acuerdo a la especificaciones técnicas para garantizar su funcionalidad.






BATERIA SANITARIA ESCOLAR	
ITEM 1.7 Impermeabilización e imprimación de placa de entrepiso o superior a la interperie, incluye impermeabilizante y pinturas acrilicas para su acabado final (incluye retiro y limpieza)	UNIDAD: M2






Esta actividad se ejecutó para garantizar las humedades internas de la batería sanitaria y principalmente la placa aérea estructural, se realizó la aplicación de impermeabilizantes sobre la superficie superior de la placa aplicando en varias capas para su respectiva adherencia.

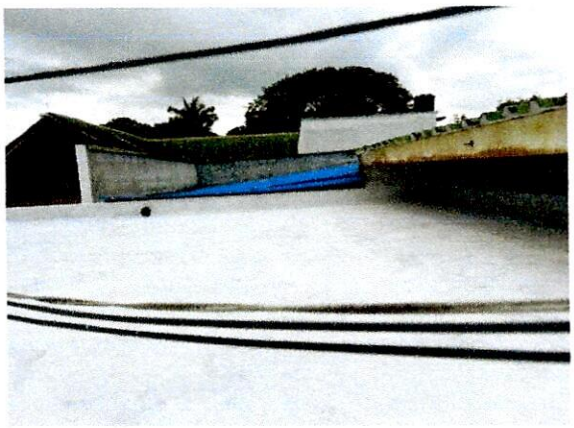



BATERIA SANITARIA ESCOLAR	
ITEM 1.8 Suministro e instalación de puerta en aluminio para divisiones en batería sanitaria escolar, incluye bisagras y pasadores en acero galvanizado (medidas según planos)	UNIDAD: UND

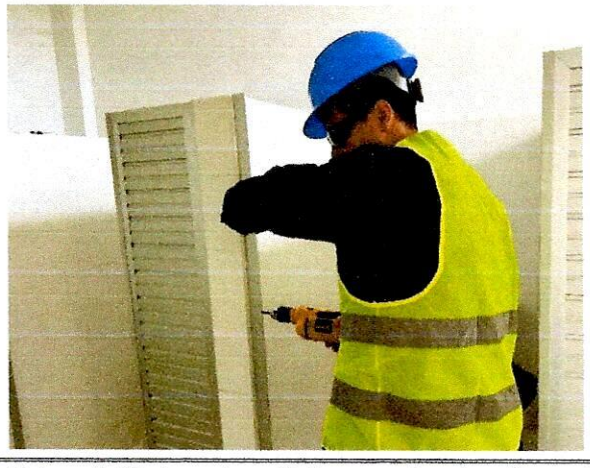



Esta actividad se ejecutó de acuerdo a las dimensiones y detalles de la puerta mostrada en los planos se realizó la fijación sobre los muros divisorios teniendo en cuenta que son articuladas hacia adentro para garantizar su funcionalidad y estado de la misma.

