Bogotá D.C., 23 de abril de 2026

Ingeniero
RICARDO POVEDA ALVAREZ
Director de interventoría
Pran Construcciones
E-mail: pran.construcciones.sas@gmail.com

Referencia: Contrato de obra Nº USPEC-CTO-290-2024. MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LOS PABELLONES 10 Y 11 EN EL ESTABLECIMIENTO CPMS GIRÓN A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE", todo de conformidad al pliego de condiciones y a la propuesta que hace parte integral del presente contrato.

Asunto: Remisión programación actividades remanentes prorroga.

Por medio de la presente comunicación, nos permitimos remitir la programación de las actividades remanentes necesarias para la finalización del contrato, con especial énfasis en aquellas correspondientes a la actividad de Cerramiento Perimetral Vertical de Cubierta, conforme se detalla a continuación:

1. Trabajos en taller.

Con el propósito de optimizar el avance del proyecto y cumplir con el plazo estimado de un (1) mes, se desarrollarán actividades en taller. Esta estrategia permitirá aprovechar mejor el tiempo disponible, facilitando la ejecución de labores en jornadas más amplias que las permitidas dentro de los centros penitenciarios.

Adicionalmente, la ejecución en taller reduce la necesidad de cumplir con los requisitos de ingreso a los pabellones 10 y 11, y minimiza las interrupciones derivadas de operativos de seguridad propios del establecimiento carcelario.

La cuadrilla metalmecánica encargada de estas actividades estará conformada por:

- Soldadores de estructura: 1.
- Esmeriladores: 1.
- Ayudantes metalmecánicos: 1.
- Pintores: 1.

2. Gestión de permisos de ingreso al CPAMS Girón.

A medida que se finalicen en taller las secciones correspondientes a los tramos de cerramiento, estas serán trasladadas al sitio de obra, con el fin de avanzar de manera simultánea en la instalación.

En este sentido, se tiene previsto que para el día 22 de mayo de 2026 se encuentren en trámite los permisos de ingreso al CPAMS Girón, tanto para el personal como para los materiales y equipos requeridos para la ejecución de las actividades.

3. Instalación de malla en el centro penitenciario.


Las actividades dentro del CPAMS Girón consistirán en la instalación de la malla previamente prefabricada en taller, lo cual permitirá optimizar los tiempos de ejecución, estimándose una duración aproximada de seis (6) días para esta etapa.

La cuadrilla encargada de los trabajos en el centro penitenciario será diferente a la del taller, con el fin de garantizar el avance en dos frentes simultáneos. Esta estará conformada por:


- Soldadores de estructura: 1.
- Ayudantes metalmecánicos: 1.
- Pintor: 1.

Finalmente, se deja constancia de que, conforme a la presente solicitud, el presente documento se suscribe como evidencia de la aprobación de las partes intervinientes, correspondientes a la obra y la interventoría, siendo esta última PRAN Construcciones.

Cordialmente,



VÍCTOR HUGO GONZÁLEZ SANDOVAL
REPRESENTANTE DEL CONSORCIO GJ 63
C.C. No. 19.159.579 de Bogotá



RICARDO POVEDA ALVAREZ
Director de Interventoría


CONSORCIO
GJ-G63
NIT 901900744-1

ANEXO

CONTRATO DE OBRA N°USPEC-CTO290-2024

ADECUACION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PABELLON 10 Y 11 EN EL ESTABLECIMIENTO CPMS GIRON A PRECIO UNITARIO SIN FORMULA DE REAJUSTE

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1		Entrega materiales en Taller	4 días	jue 30/04/26	mar 5/05/26	
2		Entrega en taller 30% de Avance	0 días	vie 15/05/26	vie 15/05/26	
3		Recibo de materiales en Taller	0 días	mar 5/05/26	mar 5/05/26	
4		Inicio de fabricacion de de Cerramiento perimetral vertical para estructura metalica de cubierta en taller	17 días	mié 6/05/26	jue 28/05/26	1
5		Inicio de instalacion en obra	0 días	vie 22/05/26	vie 22/05/26	6
6		Gestion de ingreso a CPAMS Giron	0 días	vie 22/05/26	vie 22/05/26	
7		Instalacion del cerramiento Pabellon CPAMS Giron	5 días	lun 25/05/26	vie 29/05/26	4CC
8		FIN	0 días	vie 29/05/26	vie 29/05/26	7

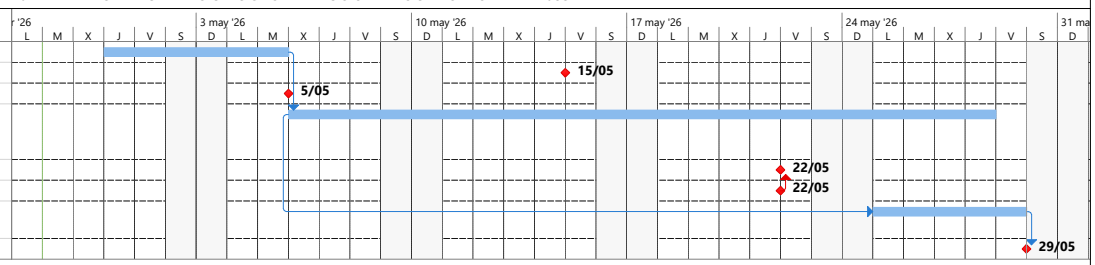

VÍCTOR HUGO GONZÁLEZ SANDOVAL
REPRESENTANTE DEL CONSORCIO
C.C. No. 19.159.579 de Bogotá

RICARDO POVEDA ALVAREZ
Director de Interventoría

Proyecto: Proyecto VHGS
Fecha: mar 28/04/26


Tarea	Resumen del proyecto	Tarea manual	solo el comienzo	Fecha límite			
División	Tarea inactiva	solo duración	solo fin	Progreso			
Hito	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Tareas externas	Progreso manual			
Resumen	Resumen inactivo	Resumen manual	Hito externo				

VICTOR HUGO GONZALEZ SANDOVAL
REPRESENTANTE DEL CONSORCIO
CC 19159579 de BOGOTA

Proyecto VHGS

CONFORMACION DE CUADRILLAS

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predeceso	Nombres de los recursos
1		1 Entrega materiales en Taller	4 días	jue 30/04/26	mar 5/05/26		AYUDANTE
2		2 Entrega en taller 30% de Avance	0 días	vie 15/05/26	vie 15/05/26		
3		3 Recibo de materiales en Taller	0 días	mar 5/05/26	mar 5/05/26		AYUDANTE;MAESTRO
4		4 Inicio de fabricacion de de Cerramiento perimetral vertical para es	17 días	mié 6/05/26	jue 28/05/26	1	AYUDANTE;SOLDADOR
5		5 Inicio de instalacion en obra	0 días	vie 22/05/26	vie 22/05/26	6	
6		6 Gestion de ingreso a CPAMS Giron	0 días	vie 22/05/26	vie 22/05/26		
7		7 Instalacion del cerramiento Pabellon CPAMS Giron	5 días	lun 25/05/26	vie 29/05/26	4CC	AYUDANTE;SOLDADOR
8		8 FIN	0 días	vie 29/05/26	vie 29/05/26	7	



VÍCTOR HUGO GONZÁLEZ SANDOVAL
REPRESENTANTE DEL CONSORCIO
C.C. No. 19.159.579 de Bogotá



RICARDO POVEDA ALVAREZ
Director de Interventoría
