## 1. INFORMACIÓN GENERAL

| ÍTEM | INFORMACIÓN |
|---|---|
| Entidad Territorial | Municipio de Paipa. |
| Dependencia | Secretaria de Infraestructura Pública y Movilidad. |
| Tipo de Informe | ☐ Mensual ☐ Parcial ◙ Final ☐ Extraordinario |
| Periodo Evaluado | Del 30-01-2025 al 25-03-2025 y del 20-05-2025 al 11-06-2025 |
| Fecha de Elaboración | 05 de marzo de 2026 |

## 2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

| ÍTEM | DETALLE |
|---|---|
| Número del contrato | 306 de 2024 |
| Modalidad de selección | Concurso de Méritos Abierto |
| Contratista | App Control Ingeniería S.A.S. |
| NIT/Cédula | 900.446.925-7 |
| Objeto contractual | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL, Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN LP-MP-002 DE 2024 CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE MALLA VIAL URBANA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. |
| Valor inicial del contrato | Ochenta y cinco millones cuarenta y cuatro mil quinientos cuarenta pesos ($85.044.540.00) |
| Adiciones (si aplica) | Dieciocho millones doscientos cincuenta y tres mil cien pesos ($18.253.100.00) |
| Valor total actual | Ciento tres millones doscientos noventa y siete mil seiscientos cuarenta pesos ($103.297.640,00) |
| Plazo inicial | Cuatro (04) meses contados a partir de la suscripción del acta inicio. |
| Prórrogas (si aplica) | 3 meses y 20 días |
| Fecha de inicio | 30 de agosto del 2024 |
| Fecha de terminación prevista | 11 de junio del 2025 |
| Supervisor designado | Jorge Edwin López Torres.<br>Secretario de Infraestructura y Movilidad Publica |




Carrera 22 N° 25-14
Teléfono: (608) 7 850 131/ 7 850135/ 7 851998
www.paipa-boyaca.gov.co E-mail: contactenos@paipa-boyaca.gov.co
alcaldia@paipa-boyaca.gov.co
Código postal: 15516

| ÍTEM | DETALLE |
|---|---|
| Acto administrativo de designación | Designación de supervisión de fecha 22 de agosto de 2024 |

## 3. AVANCE TÉCNICO DEL CONTRATO

| DESCRIPCIÓN | INFORMACIÓN |
|---|---|
| Actividades ejecutadas en el periodo | Durante el período el contratista de interventoría ejerció control integral mediante la ejecución de actividades de seguimiento técnico, administrativo, financiero, jurídico, ambiental y social, orientadas a la verificación y cumplimiento de las obligaciones contractuales. En desarrollo de dichas funciones, se adelantaron procesos de revisión, validación y aval de las actividades ejecutadas, conforme a los diseños, especificaciones técnicas, documentos contractuales y normatividad vigente aplicable, garantizando la trazabilidad, calidad y correcta ejecución del objeto contractual. A las siguientes actividades |

| | | |
|---|---|---|
| **CAP 1: CARRERA 10 COLEGIO FRAY ARTURO AYALA** | | |
| **1.1 REALIZAR PRELIMINARES** | | |
| EXCAVACIÓN DE CORTES, CANALES Y PRESTAMOS EN MATERIAL COMÚN A MAQUINA INCLUYE CARGUE Y ACARREO LIBRE DE 5KM | m³ | 83,63 |
| RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO CON VIBROCOMPACADOR | m³ | 0,00 |
| SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PARA AFIRMADO HASTA UN DIÁMETRO DE 2" Y UN ÍNDICE PLÁSTICO MENOR O IGUAL 9% Y COMPACTO AL 95% PROCTOR, INCLUYE ACARREO LIBRE 5 KM (**) | m³ | 43,60 |
| TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO). | m³-Km | 253,49 |
| **1.2. OBRAS DE DRENAJE, PROTECCIÓN Y ESTRUCTURAS** | | |
| EXCAVACIONES MECÁNICAS VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO | m³ | 2,27 |
| EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN | m³ | 9,47 |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SARDINEL PREFABRICADO A-10, INCLUYE MORTERO DE PEGA SEGÚN NORMA NTC-4109 | ml | 35,40 |
| SUMIDERO LATERAL SL - 200 H=1.25M (FUNDIDO EN SITIO, CONCRETO HECHO EN | UND | 0,00 |






Carrera 22 N° 25-14
Teléfono: (608) 7 850 131/ 7 850135/ 7 851998
www.paipa-boyaca.gov.co E-mail: contactenos@paipa-boyaca.gov.co
alcaldia@paipa-boyaca.gov.co
Código postal: 15516

| DESCRIPCIÓN | INFORMACIÓN | | |
|---|---|---|---|
| | OBRA. INCL. SUMINI, FORMA, REF Y CONST. INCL. TAPA)9 | | |
| | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=10" | ml | 8,80 |
| | RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O VIBROCOMPACTADOR | m³ | 17,43 |
| | RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN COMPACTADO CON PLANTA VIBRADORA | m³ | 0,00 |
| | RELLENO GRAVILLA COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA | m³ | 0,00 |
| | RELLENO ARENA DE PEÑA COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA | m³ | 0,22 |
| | TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO) | m³-Km | 101,27 |
| | PUNTO ACOMETIDA 1/2" | UND | 0,00 |
| | **1.3. PAVIMENTO FLEXIBLE** | | |
| | SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO PARA SUBBASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM) | m³ | 19,14 |
| | SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO PARA BASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM | m³ | 17,92 |
| | IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1H | m² | 112,00 |
| | CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE, INCLUYE BARRIDO, SUMINISTRO Y COMPACTACIÓN (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM) NORMA INVIAS (**) | m³ | 9,25 |
| | TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO). | m³-Km | 2.006,68 |
| | TRANSPORTE DE MEZCLA ASFÁLTICA DESPUÉS DE 5 KM, (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO). | m³-Km | 253,69 |
| | **1.4 SEÑALIZACIÓN VIAL** | | |
| | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL DE TRANSITO 60 x 60 CM | UND | 12,00 |
| | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ACRÍLICA CON MICROESFERAS, LÍNEAS CONTINUAS Y DISCONTINUAS DE 12 CM SEGÚN NORMAS INVIAS | ML | 316,50 |
| | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SEÑAL VIAL PREVENTIVA, TAMAÑO 75*75 cm. SEGÚN NORMA INVIAS | UND | 1,00 |
| | MARCAS VIALES CON PINTURA DE TRAFICO SEGÚN NORMA INVIAS Y DISEÑO (INCLUYE MICROESFERAS) | M2 | 10,00 |
| | **CAP 2: CARRERA 13A BARRIO VILLA JARDÍN** | | |
| | **2.1 REALIZAR PRELIMINARES** | | |






Carrera 22 N° 25-14
Teléfono: (608) 7 850 131/ 7 850135/ 7 851998
www.paipa-boyaca.gov.co E-mail: contactenos@paipa-boyaca.gov.co
alcaldia@paipa-boyaca.gov.co
Código postal: 15516

| DESCRIPCIÓN | INFORMACIÓN | | |
|---|---|---|---|
| | EXCAVACIÓN DE CORTES, CANALES Y PRESTAMOS EN MATERIAL COMÚN A MAQUINA INCLUYE CARGUE Y ACARREO LIBRE DE 5KM | m³ | 1.122,92 |
| | SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PARA AFIRMADO HASTA UN DIÁMETRO DE 2" Y UN ÍNDICE PLÁSTICO MENOR O IGUAL 9% Y COMPACTO AL 95% PROCTOR, INCLUYE ACARREO LIBRE 5 KM (**) | m³ | 785,20 |
| | TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO). | m³-Km | 4.869,03 |
| | **2.2. OBRAS DE DRENAJE, PROTECCIÓN Y ESTRUCTURAS** | | |
| | EXCAVACIONES MECÁNICAS VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO | m³ | 3,12 |
| | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN | m³ | 29,12 |
| | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SARDINEL PREFABRICADO A-10, INCLUYE MORTERO DE PEGA SEGÚN NORMA NTC-4109 | ml | 265,40 |
| | SUMIDERO LATERAL SL - 200 H=1.25M (FUNDIDO EN SITIO, CONCRETO HECHO EN OBRA. INCL. SUMINI, FORMA, REF Y CONST. INCL. TAPA) | Und | 0,00 |
| | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=10" | ml | 12,00 |
| | RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O VIBROCOMPACTADOR | m³ | 53,67 |
| | RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN COMPACTADO CON PLANTA VIBRADORA | m³ | 0,00 |
| | RELLENO GRAVILLA COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA | m³ | 0,00 |
| | RELLENO ARENA DE PEÑA COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA | m³ | 0,54 |
| | TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO) | m³-Km | 332,75 |
| | PUNTO ACOMETIDA 1/2" | Und | Und 0,00 |
| | **2.3.PAVIMENTO FLEXIBLE** | | |
| | SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO PARA SUBBASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM) | m³ | 133,27 |
| | SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO PARA BASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM | m³ | 125,00 |
| | IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1H | m² | 693,91 |
| | CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE, INCLUYE BARRIDO, | m³ | 53,67 |






Carrera 22 N° 25-14
Teléfono: (608) 7 850 131/ 7 850135/ 7 851998
www.paipa-boyaca.gov.co E-mail: contactenos@paipa-boyaca.gov.co
alcaldia@paipa-boyaca.gov.co
Código postal: 15516

| DESCRIPCIÓN | INFORMACIÓN | | |
|---|---|---|---|
| | SUMINISTRO Y COMPACTACIÓN ( INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM) NORMA INVIAS (**) | | |
| | TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO). | m³-Km | 4.532,67 |
| | TRANSPORTE DE MEZCLA ASFÁLTICA DESPUÉS DE 5 KM, (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO). | m³-Km | 1.362,68 |
| | **2.4 SEÑALIZACIÓN VIAL** | | |
| | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL DE TRANSITO 60 x 60 CM | UND | 14,00 |
| | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ACRÍLICA CON MICROESFERAS, LÍNEAS CONTINUAS Y DISCONTINUAS DE 12 CM SEGÚN NORMAS INVIAS | ML | 753,40 |
| | MARCAS VIALES CON PINTURA DE TRAFICO SEGÚN NORMA INVIAS Y DISEÑO (INCLUYE MICROESFERAS) | M2 | 136,77 |
| | **CAP 3: CALLE 17 POLIDEPORTIVO SAN MIGUEL** | | |
| | **3.1 REALIZAR PRELIMINARES** | | |
| | EXCAVACIÓN DE CORTES, CANALES Y PRESTAMOS EN MATERIAL COMÚN A MAQUINA INCLUYE CARGUE Y ACARREO LIBRE DE 5KM | m³ | 140,11 |
| | SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PARA AFIRMADO HASTA UN DIÁMETRO DE 2" Y UN ÍNDICE PLÁSTICO MENOR O IGUAL 9% Y COMPACTO AL 95% PROCTOR, INCLUYE ACARREO LIBRE 5 KM (**) | m³ | 75,07 |
| | TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO). | m³-Km | 725,10 |
| | **3.2. OBRAS DE DRENAJE, PROTECCIÓN Y ESTRUCTURAS** | | |
| | EXCAVACIONES MECÁNICAS VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO | m³ | 1,24 |
| | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN | m³ | 8,82 |
| | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SARDINEL PREFABRICADO A-10, INCLUYE MORTERO DE PEGA SEGÚN NORMA NTC-4109 | ml | -20,00 |
| | SUMIDERO LATERAL SL - 200 H=1.25M (FUNDIDO EN SITIO, CONCRETO HECHO EN OBRA. INCL. SUMINI, FORMA, REF Y CONST. INCL. TAPA) | Und | 0,00 |
| | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=10" | ml | 4,83 |
| | RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O VIBROCOMPACTADOR | m³ | 22,29 |
| | RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN COMPACTADO CON PLANTA VIBRADORA | m³ | 0,00 |




Carrera 22 N° 25-14
Teléfono: (608) 7 850 131/ 7 850135/ 7 851998
www.paipa-boyaca.gov.co E-mail: contactenos@paipa-boyaca.gov.co
alcaldia@paipa-boyaca.gov.co
Código postal: 15516

| DESCRIPCIÓN | INFORMACIÓN | | |
|---|---|---|---|
| | RELLENO GRAVILLA COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA | m³ | 0,00 |
| | RELLENO ARENA DE PEÑA COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA | m³ | 0,34 |
| | TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO) | m³-Km | 215,32 |
| | PUNTO ACOMETIDA 1/2" | Und | 0,00 |
| | **3.3.PAVIMENTO FLEXIBLE** | | |
| | SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO PARA SUBBASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM) | m³ | 32,17 |
| | SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO PARA BASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM | m³ | 30,31 |
| | IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1H | m² | 578,81 |
| | CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE, INCLUYE BARRIDO, SUMINISTRO Y COMPACTACIÓN ( INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM) NORMA INVIAS (**) | m³ | 46,18 |
| | TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO). | m³-Km | 2.158,63 |
| | TRANSPORTE DE MEZCLA ASFÁLTICA DESPUÉS DE 5 KM, (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO). | m³-Km | 1.228,39 |
| | **3.4 SEÑALIZACIÓN VIAL** | | |
| | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL DE TRANSITO 60 x 60 CM | UND | 12,00 |
| | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ACRÍLICA CON MICROESFERAS, LÍNEAS CONTINUAS Y DISCONTINUAS DE 12 CM SEGÚN NORMAS INVIAS | ML | 308,80 |
| | MARCAS VIALES CON PINTURA DE TRAFICO SEGÚN NORMA INVIAS Y DISEÑO (INCLUYE MICROESFERAS) | M2 | 56,96 |
| | **CAP 4: CALLE 33 BARRIO VILLA DEL PRADO - CASTILLA** | | |
| | **4.1 REALIZAR PRELIMINARES** | | |
| | EXCAVACIÓN DE CORTES, CANALES Y PRESTAMOS EN MATERIAL COMÚN A MAQUINA INCLUYE CARGUE Y ACARREO LIBRE DE 5KM | m³ | 69,45 |
| | SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PARA AFIRMADO HASTA UN DIÁMETRO DE 2" Y UN ÍNDICE PLÁSTICO MENOR O IGUAL 9% Y COMPACTO AL 95% PROCTOR, INCLUYE ACARREO LIBRE 5 KM (**) | m³ | 44,12 |
| | TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO). | m³-Km | 304,08 |






Carrera 22 N° 25-14
Teléfono: (608) 7 850 131/ 7 850135/ 7 851998
www.paipa-boyaca.gov.co E-mail: contactenos@paipa-boyaca.gov.co
alcaldia@paipa-boyaca.gov.co
Código postal: 15516

| DESCRIPCIÓN | INFORMACIÓN | | |
|---|---|---|---|
| | **4.2. OBRAS DE DRENAJE, PROTECCIÓN Y ESTRUCTURAS** | | |
| | EXCAVACIONES MECÁNICAS VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO | m³ | 0,00 |
| | SUMIDERO LATERAL SL - 200 H=1.25M (FUNDIDO EN SITIO, CONCRETO HECHO EN OBRA. INCL. SUMINI, FORMA, REF Y CONST. INCL. TAPA) | Und | 0,00 |
| | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=10" | ml | 0,00 |
| | RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O VIBROCOMPACTADOR | m³ | 0,00 |
| | RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN COMPACTADO CON PLANTA VIBRADORA | m³ | 0,00 |
| | RELLENO GRAVILLA COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA | m³ | 0,00 |
| | RELLENO ARENA DE PEÑA COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA | m³ | 0,00 |
| | TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO) | m³-Km | 0,00 |
| | **4.3.PAVIMENTO FLEXIBLE** | | |
| | SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO PARA SUBBASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM) | m³ | 9,88 |
| | SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO PARA BASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM | m³ | 9,34 |
| | IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1H | m² | 58,25 |
| | CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE, INCLUYE BARRIDO, SUMINISTRO Y COMPACTACIÓN ( INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM) NORMA INVIAS (**) | m³ | 3,50 |
| | TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO). | m³-Km | 246,89 |
| | TRANSPORTE DE MEZCLA ASFÁLTICA DESPUÉS DE 5 KM, (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO). | m³-Km | 86,77 |
| | **4.4 SEÑALIZACIÓN VIAL** | | |
| | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL DE TRANSITO 60 x 60 CM | UND | 8,00 |
| | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ACRÍLICA CON MICROESFERAS, LÍNEAS CONTINUAS Y DISCONTINUAS DE 12 CM SEGÚN NORMAS INVIAS | ML | 387,00 |
| | MARCAS VIALES CON PINTURA DE TRAFICO SEGÚN NORMA INVIAS Y DISEÑO (INCLUYE MICROESFERAS) | M2 | 39,40 |
| | **ÍTEMS NO PREVISTOS** | | |






Carrera 22 N° 25-14
Teléfono: (608) 7 850 131/ 7 850135/ 7 851998
www.paipa-boyaca.gov.co E-mail: contactenos@paipa-boyaca.gov.co
alcaldia@paipa-boyaca.gov.co
Código postal: 15516

| DESCRIPCIÓN | INFORMACIÓN |
|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO | Km | 0,118 |
| | CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) SIN REFUERZO (INCLUYE SELLO DE JUNTAS) | m³ | 65,03 |
| | CONSTRUCCIÓN DE SUMIDERO, REJILLAS 0.12*0.55*0.60 | Und | 7,00 |
| | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO PVC SANITARIO D=10" | Und | 7,00 |
| | CORTE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO | ml | 649,71 |
| | SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa | Kg | 1.241,61 |
| | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMALLA CON RESISTENCIA ULTIMA A 50 KN/M | m² | 1.058,12 |
| | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000) PARA BASES | m³ | 12,10 |
| | PEDRAPLÉN COMPACTO | m³ | 246,29 |
| | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T, RESIST ULTIMA A LA ROTURA(TIRA ANCHA)=33.8 KN/M PARA SEPARACIÓN SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES Y/O SUBDRENES/FILTROS | M2 | 7,18 |
| | MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 0.15 M D= 5MM (INCLUYE SUMINISTRO FIJACION E INSTALACION) | KG | 1.296,87 |
| | SUMINISTRO E INSTALACION DE BORDILLO PREFABRICADO A-80 | ML | 85,20 |
| | RETIRO DE TOCONES - RAICES | UND | 25,00 |
| | INSTALACION CERCA DE ALAMBRE DE PUAS 5 LINEAS (NO INCLUYE INSUMOS DE POSTES NI ALAMBRE). | ML | 188,00 |
| | DESMONTE ALAMBRE PÚAS CERRAMIENTO 3 - 5 LÍNEAS INCLUYE POSTES. | ML | 188,00 |
| | REALCE DE POZOS CILINDRICO DIAMETRO 1.7M H=0.3M INCLUYE MOVIMIENTO DE CARGUES CON RETRO | UND | 5,00 |
| | | | |
| | PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO (P.M.T)=(B) | % | 0,34 |
| | PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA AMBIENTAL (P.A.G.A)=( C) | % | 0,22 |

| | |
|---|---|
| Porcentaje de avance físico programado | 100% |
| Porcentaje de avance físico ejecutado | 97.78% |
| Estado actual del contrato | ◙ Normal ☐ Atrasado ☐ Suspendido |
| Análisis del cumplimiento técnico | Las actividades ejecutadas fueron debidamente verificadas y avaladas, realizándose el seguimiento técnico y administrativo por parte de la supervisión, quienes ejercieron control permanente sobre la ejecución contractual. Como resultado, se evidenció el cumplimiento de las especificaciones técnicas y demás documentos contractuales, así como de la normatividad vigente aplicable, garantizando la |






Carrera 22 N° 25-14
Teléfono: (608) 7 850 131/ 7 850135/ 7 851998
www.paipa-boyaca.gov.co E-mail: contactenos@paipa-boyaca.gov.co
alcaldia@paipa-boyaca.gov.co
Código postal: 15516

| DESCRIPCIÓN | INFORMACIÓN |
|---|---|
| | calidad de las actividades desarrolladas y la adecuada ejecución del objeto contractual. |

## 4. AVANCE FINANCIERO

| ÍTEM | INFORMACIÓN |
|---|---|
| Valor ejecutado en el periodo | $ 49.801.559,40 |
| Valor total ejecutado a la fecha | $ 101.004.432.39 |
| Porcentaje de ejecución financiera | 97.78% |
| Pagos realizados (Actas/Cuentas) | $ 51.202.872,99 |
| Saldo sin ejecutar (liberar por el municipio ) | $ 2.293.207.61 |
| Información Pago de Seguridad Social | El contratista presenta las planillas de pago de seguridad social y aportes correspondientes a los siguientes períodos:<br>• **Enero de 2025:** Planillas N.° 9481035703 y 9482594650.<br>• **Febrero de 2025:** Planillas N.° 1071192789, 9483127921 y 9497142544.<br>• **Marzo de 2025:** Planillas N.° 1073440063, 9484179569 y 9497142568.<br>• **Mayo de 2025:** Planillas N.° 1077858172, R-9496153777, 9487715058 y 9497142588.<br>• **Junio de 2025:** Planillas N.° 9497142618 y 9488675229.<br><br>Asimismo, se adjunta certificación de pago de aportes parafiscales expedida por el señor WALTER YESID JIMÉNEZ ZAPATA, identificado con tarjeta profesional N.° 276787-T, en calidad de contador de la empresa APP CONTROL INGENIERÍA S.A.S., con fecha 05 de marzo de 2026.<br><br>De igual forma, se anexan los documentos que acreditan la idoneidad del profesional, consistentes en copia de la tarjeta profesional de Contador Público y certificación de |




Carrera 22 N° 25-14
Teléfono: (608) 7 850 131/ 7 850135/ 7 851998
www.paipa-boyaca.gov.co E-mail: contactenos@paipa-boyaca.gov.co
alcaldia@paipa-boyaca.gov.co
Código postal: 15516

| ÍTEM | INFORMACIÓN |
|---|---|
| | antecedentes disciplinarios expedida por la Junta Central de Contadores con fecha 11 de febrero de 2026 |
| Persona Jurídica | APP CONTROL INGIENERÍA S.A.S. |
| Fecha Certificación de Antecedentes | 11 de febrero de 2026 |
| Persona Natural | N/A |
| Datos Certificación o Planilla de Persona Natural | N/A |
| No Planilla | Planillas N.° 9481035703, 9482594650,1071192789, 9483127921 9497142544, 1073440063, 9484179569, 9497142568, 1077858172, R-9496153777, 9487715058 y 9497142588, 9497142618 y 9488675229 |

| 5 **INFORME TECNICO RECIBO A SATISFACCION DE BIENES Y/O SERVICIOS** |
|---|
| Se recibe a entera satisfacción, mediante acta de recibo final suscrita el 05 de marzo de 2026, el Contrato de Interventoría N.° 306 de 2024, cuyo objeto es: *"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN LP-MP-002 DE 2024, CUYO OBJETO ES EL MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ".*<br><br>Lo anterior, en consideración a que el contratista cumplió a cabalidad con la ejecución de las obligaciones contractuales, así como con el seguimiento técnico, administrativo y financiero del Contrato de Obra N.° 288 de 2024, objeto de la interventoría, el cual fue debidamente celebrado, ejecutado y liquidado |
| |

## 6. VERIFICACIÓN DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

| ÍTEM | RESULTADO |
|---|---|
| Cumplimiento de obligaciones contractuales | Se constata que el contratista de interventoría cumplió de manera integral con las obligaciones contractuales a su cargo, correspondientes a los componentes técnico, administrativo, financiero, jurídico, ambiental y social, en el marco del seguimiento y control sobre las obras ejecutadas mediante el Contrato de Obra N.° 288 de 2024, objeto de la |

<table>
<tr><th>ÍTEM</th><th>RESULTADO</th></tr>
<tr><td></td><td>interventoría, el cual se encuentra debidamente ejecutado, recibido a satisfacción y liquidado.<br>De igual manera, la supervisión ejerció un control permanente sobre el Contrato de Interventoría, verificando la correcta ejecución de las actividades, la conformidad con las especificaciones técnicas y contractuales, y el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables, evidenciando que el contratista dio cumplimiento pleno a sus obligaciones.</td></tr>
<tr><td>Verificación de cumplimiento de bienes adquiridos</td><td>El supervisor certifica que el contratista de interventoría cumplió en su totalidad con las obligaciones establecidas en el contrato durante el período correspondiente</td></tr>
<tr><td>Aportes a seguridad social y parafiscales</td><td>◙ Cumple ☐ No cumple</td></tr>
<tr><td>Pólizas y garantías</td><td>◙ Vigentes ☐ Requieren actualización</td></tr>
<tr><td>Observaciones</td><td>Este contrato está bajo el amparo de la póliza contractual N° 600-47-994000073147, expedida por Aseguradora solidaria
<table>
<tr><th>Compañía Aseguradora</th><th>Póliza No.04</th><th>Amparos</th><th colspan="2">Vigencia</th></tr>
<tr><th></th><th></th><th></th><th>Desde</th><th>Hasta</th></tr>
<tr><td>Aseguradora solidaria</td><td>600-47-994000073147</td><td>Cumplimiento</td><td>2024-08-16</td><td>2025-10-07</td></tr>
<tr><td>Aseguradora solidaria</td><td>600-47-994000073147</td><td>Pago de salarios</td><td>2024-08-16</td><td>2028-06-07</td></tr>
<tr><td>Aseguradora solidaria</td><td>600-47-994000073147</td><td>Calidad del servicio</td><td>2024-08-16</td><td>2030-31-01</td></tr>
</table>
Mediante acta de aprobación de pólizas emitida por la Subsecretaria de Compras Públicas y Gestión Contractual de fecha 21 de mayo de 2025 se aprobó el anexo 4 de la póliza 600-47-994000073147. En la cual la entidad reconoce y aprueba dichos amparos
<table>
<tr><th>Compañía Aseguradora</th><th>Póliza No.05</th><th>Amparos</th><th colspan="2">Vigencia</th></tr>
<tr><th></th><th></th><th></th><th>Desde</th><th>Hasta</th></tr>
<tr><td>Aseguradora solidaria</td><td>600-47-994000073147</td><td>Cumplimiento</td><td>2024-08-16</td><td>2025-11-07</td></tr>
<tr><td>Aseguradora solidaria</td><td>600-47-994000073147</td><td>Pago de salarios</td><td>2024-08-16</td><td>2028-07-07</td></tr>
<tr><td>Aseguradora solidaria</td><td>600-47-994000073147</td><td>Calidad del servicio</td><td>2024-08-16</td><td>2030-01-03</td></tr>
</table>
Mediante acta de aprobación de pólizas emitida por la Subsecretaria de Compras Públicas y Gestión Contractual de fecha 28 de mayo de 2025 se aprobó el anexo 5 de la póliza</td></tr>
</table>




Carrera 22 N° 25-14
Teléfono: (608) 7 850 131/ 7 850135/ 7 851998
www.paipa-boyaca.gov.co E-mail: contactenos@paipa-boyaca.gov.co
alcaldia@paipa-boyaca.gov.co
Código postal: 15516

| ÍTEM | RESULTADO |
|---|---|
| | 600-47-994000073147, en la cual la entidad reconoce y aprueba dichos amparos |

## 7. MATRIZ DE RIESGOS Y EVENTUALES INCUMPLIMIENTOS

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| Riesgos materializados | Ninguno. |
| Medidas adoptadas | N/A |
| Posibles incumplimientos detectados | N/A |
| Acciones correctivas o recomendaciones | N/A |

## 8. MODIFICACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA)

| ÍTEM | INFORMACIÓN |
|---|---|
| Tipo de modificación | ☐ Adición ☐Prórroga ■ Suspensión ☐ Cesión |
| Justificación | La suspensión se solicitó atendiendo el requerimiento del contratista del Contrato de Obra N.° 288 de 2024, quien manifestó retrasos en el suministro de materiales esenciales por parte de ASFALTO S.A.S. y PREDUCOL S.A.S., así como la necesidad de ejecutar intervenciones adicionales no contempladas en el contrato original, incluyendo el realce de pozos y construcción de infraestructura de alcantarillado. Adicionalmente, se requiere un análisis y balance detallado de las cantidades de obra para ajustar los volúmenes ejecutados y por ejecutar, y se ha considerado el impacto de las condiciones climáticas. En consecuencia, el contratista de interventoría solicitó la suspensión del Contrato de Interventoría N.° 306 de 2024 bajo las mismas condiciones del contrato de obra, con el fin de garantizar el equilibrio en |






Carrera 22 N° 25-14
Teléfono: (608) 7 850 131/ 7 850135/ 7 851998
www.paipa-boyaca.gov.co E-mail: contactenos@paipa-boyaca.gov.co
alcaldia@paipa-boyaca.gov.co
Código postal: 15516

| ÍTEM | INFORMACIÓN |
|---|---|
| | los plazos de ambos contratos, dado que la interventoría es un contrato accesorio cuya ejecución depende directamente del Contrato de Obra. |
| Tipo de modificación | ■ Adición ■ Prórroga ☐ Suspensión ☐ Cesión |
| | Se requirió una **adición en valor y prórroga** del Contrato de Interventoría N.° 306 de 2024 con el fin de garantizar el adecuado seguimiento técnico, financiero, administrativo y jurídico de las actividades adicionales derivadas del Contrato de Obra N.° 288 de 2024, incluyendo mayores y menores cantidades de obra e ítems no previstos. Esta medida responde a la necesidad de asegurar la correcta ejecución y terminación de las obras, dado que dichos ajustes resultan indispensables para el cumplimiento del objeto contractual. En consecuencia, se procedió a la adición y prórroga del Contrato de Interventoría, de conformidad con la extensión y modificaciones aplicadas al contrato de obra objeto de la interventoría. |

## 9. CONCLUSIONES DEL SUPERVISOR

| ÍTEM | INFORMACIÓN |
|---|---|
| Concepto sobre el estado general del contrato | El contrato se ha ejecutado de conformidad con lo establecido, sin presentarse novedades que afecten su desarrollo. El contratista ha dado cumplimiento a todas las obligaciones contractuales en los componentes técnico, administrativo, financiero, jurídico, ambiental y social. Asimismo, se constata que se han realizado oportunamente los pagos correspondientes y la emisión de actas parciales, sin generar retrasos ni vencimientos en la facturación.<br>La documentación requerida para la verificación del cumplimiento contractual se encuentra completa y debidamente soportada, lo que permite proceder al recibo final y a la liquidación del contrato con plena conformidad. |
| Recomendación | ☐ Continuar ☐ Requerir contratista ☐ Iniciar proceso sancionatorio ■ Liquidar |

## 10. ANEXOS




Carrera 22 N° 25-14
Teléfono: (608) 7 850 131/ 7 850135/ 7 851998
www.paipa-boyaca.gov.co E-mail: contactenos@paipa-boyaca.gov.co
alcaldia@paipa-boyaca.gov.co
Código postal: 15516

| DOCUMENTOS ANEXOS |
|---|
| Informe y registro fotográfico. |
| Facturación. |
| Informe recibo final contratista, aportes seguridad social, ingreso almacén |
| |

## 11. FIRMA

| ÍTEM | INFORMACIÓN |
|---|---|
| Nombre del Supervisor | Jorge Edwin López Torres. |
| Cargo SEC. Infraestructura | Secretario de Infraestructura y Movilidad Publica. |
| Firma | |
| Fecha | 05/03/2026 |





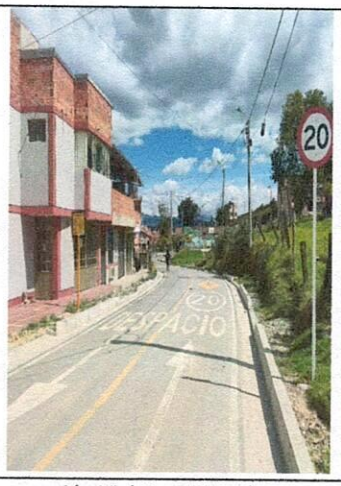
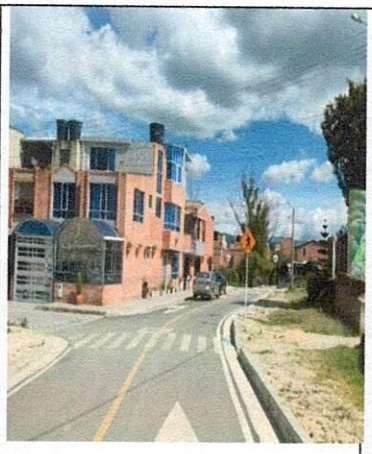

Carrera 22 N° 25-14
Teléfono: (608) 7 850 131/ 7 850135/ 7 851998
www.paipa-boyaca.gov.co E-mail: contactenos@paipa-boyaca.gov.co
alcaldia@paipa-boyaca.gov.co
Código postal: 15516








# REGISTRO FOTOGRÁFICO INFORME DE SUPERVISIÓN ACTA RECIBO FINAL




**CONTRATO 306 DE 2024 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN LP-MP-002 DE 2024 CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE MALLA VIAL URBANA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ**

**Periodo del: 30/01/2025 al 25-03-2025 y del 20-05-2025 al 11-06-2025**


## TRAMO SAN MIGUEL

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| Demarcación Vial San Miguel | Demarcación Vial San Miguel | Carpeta Asfáltica |
|  |  |  |
| Carpeta Asfáltica | Carpeta Asfáltica | Carpeta Asfáltica |

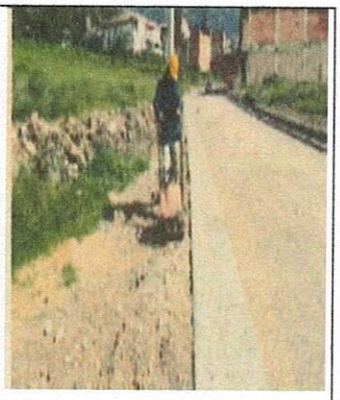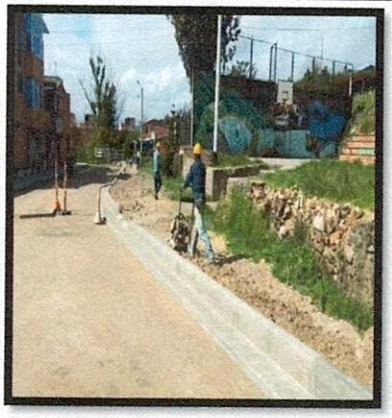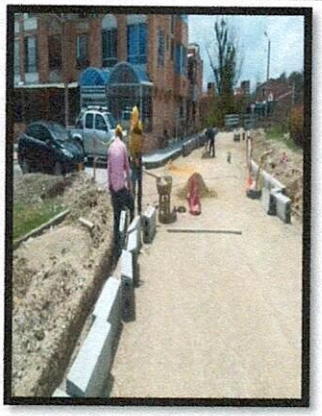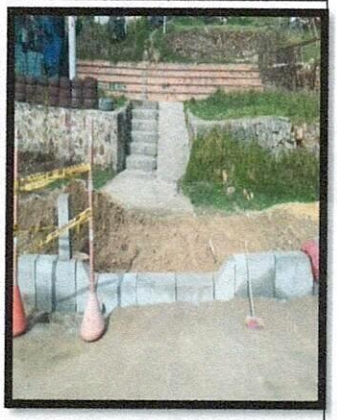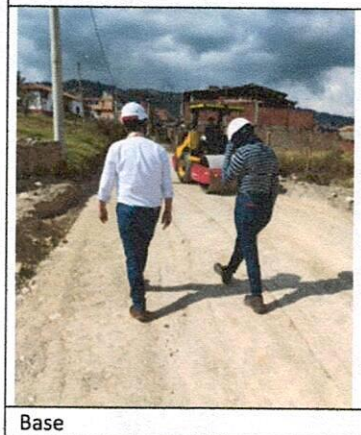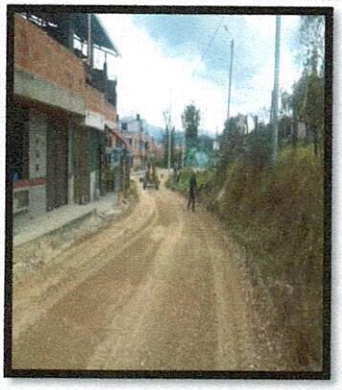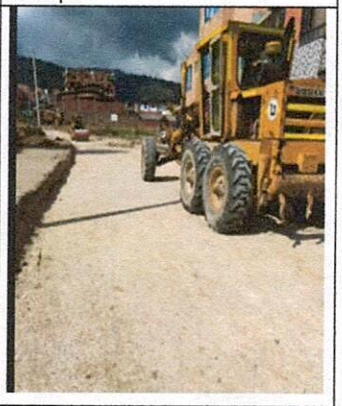
| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| Carpeta Asfáltica | Imprimacion | Relleno Areas Bordillos |
|  |  |  |
| Relleno Areas Bordillos | Instalacion Bordillos | Instalacion Bordillos Bajo Rampa |
|  |  |  |
| Base | Nivelacion Base | Nivelacion Base |
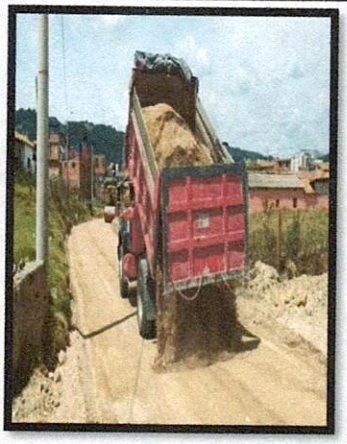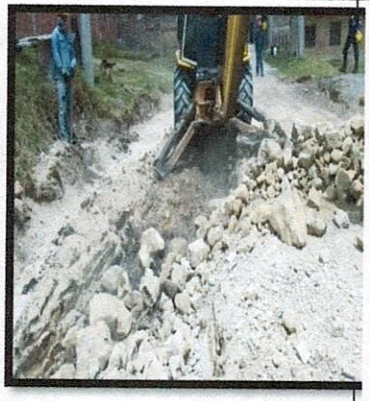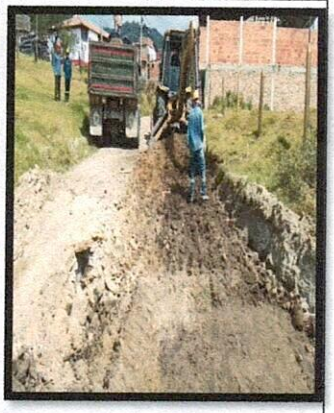
| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| Material Subbase | Transporte Material | Instalacion Geomalla |
|  |  |  |
| Sello En Material De Afirmado | Mejoramiento En Pedraplen | Mejoramiento En Pedraplen |
|  |  | |
| Mejoramiento En Pedraplen | Mejoramiento En Pedraplen | |


# TRAMO FRAY ARTURO

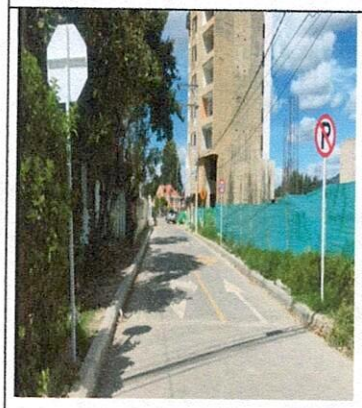


Demarcación Vial

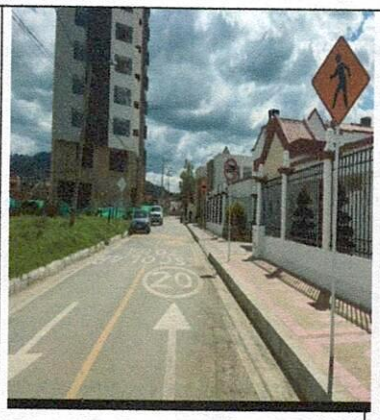


Demarcación Vial

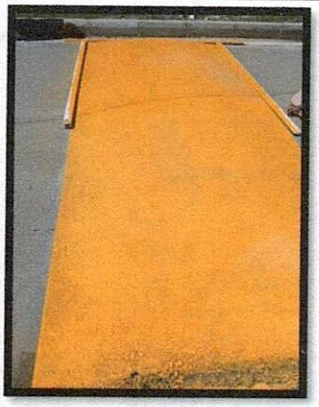

Demarcación Vial

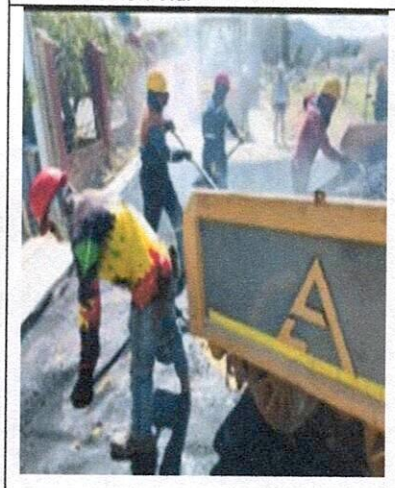


Carpeta Asfáltica

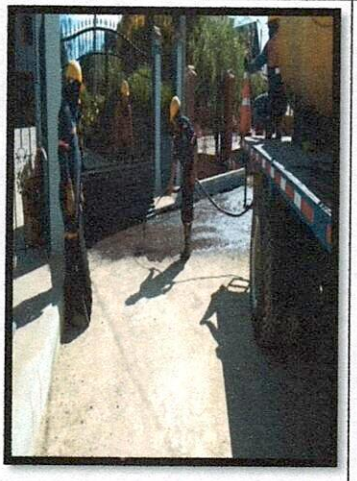

Imprimación



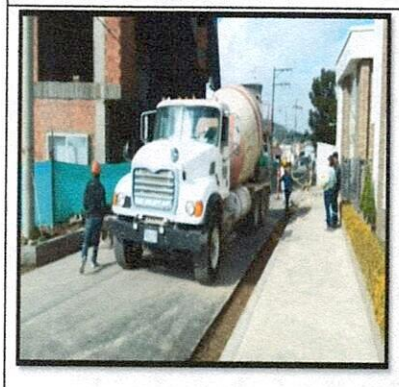
Corte, Acero Concreto Tapa Pozos




Concreto Cunetas



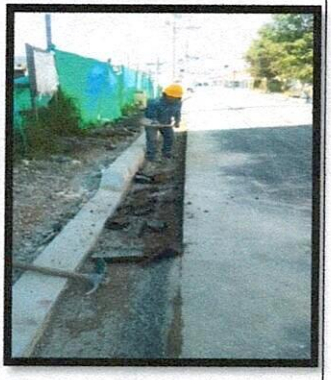
Excavación Cunetas




Excavación Cunetas

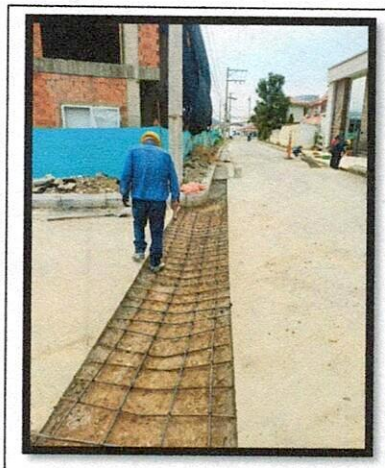


Acero Cunetas En V

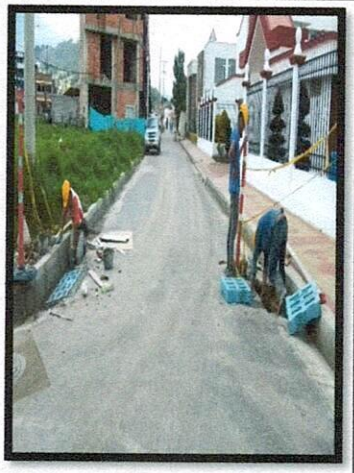

Sumideros

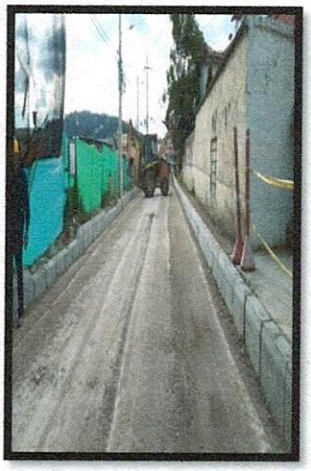


Sellado Base

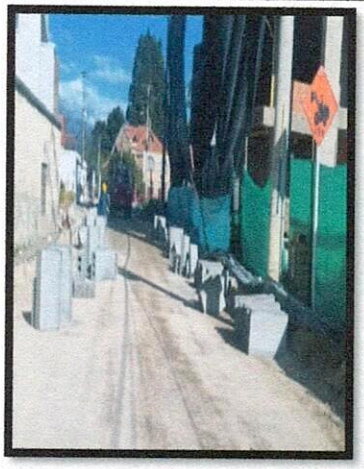

Instalación Sardineles



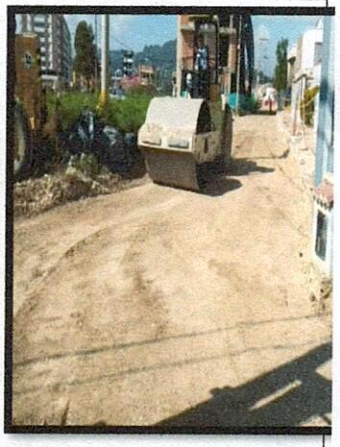Extendido Base



Extendido Subbsae

## TRAMO VILLA JARDIN



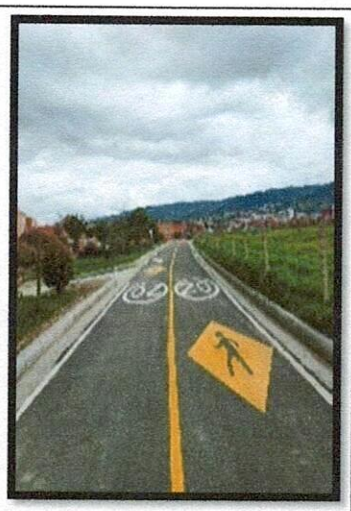
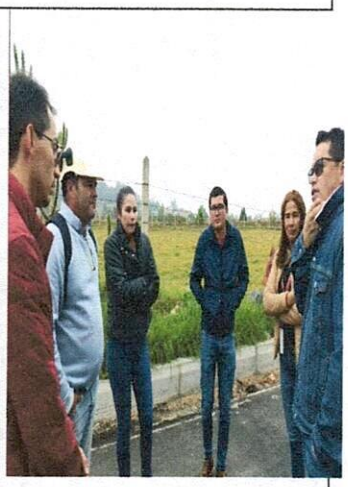
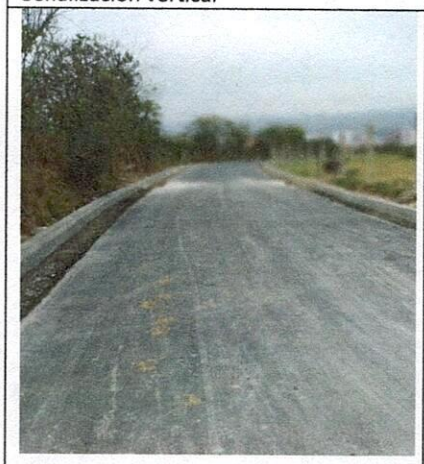
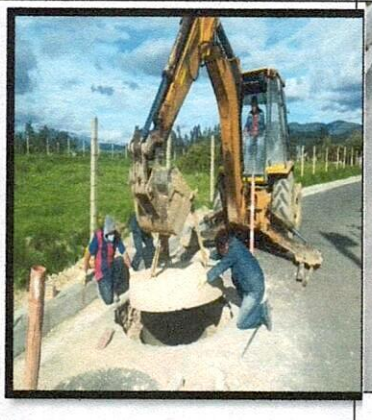

Demarcación Vial













Demarcación Vial




Señalización vertical



| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| Señalización vertical | Demarcación Vial | Reunión obra |
|  |  |  |
| Excavación cunetas | Instalación rejillas sumideros | Concreto cunetas |
|  |  |  |
| Realce de pozos | Realce de pozos | Concreto bordes pozos |
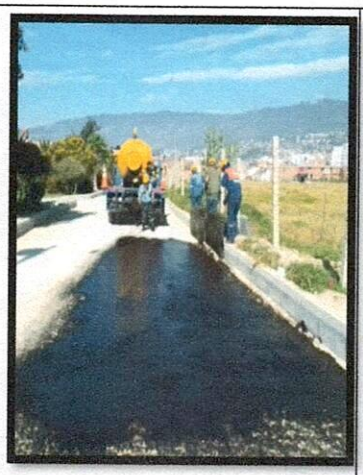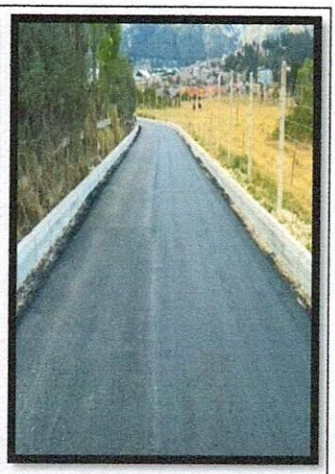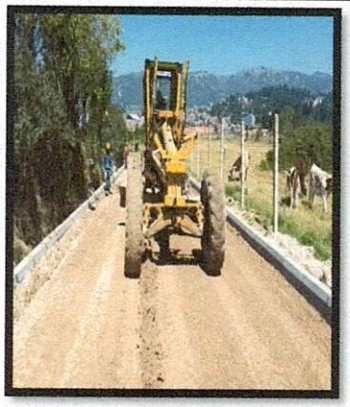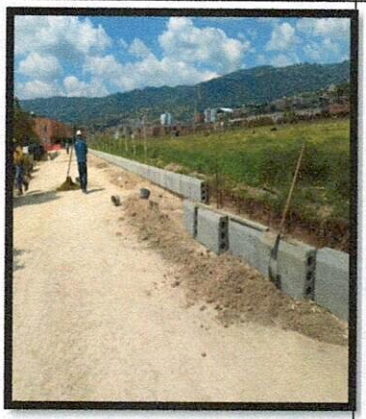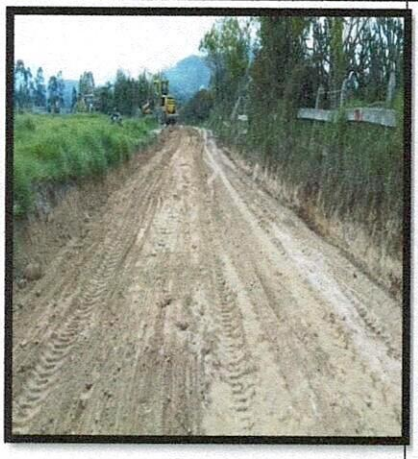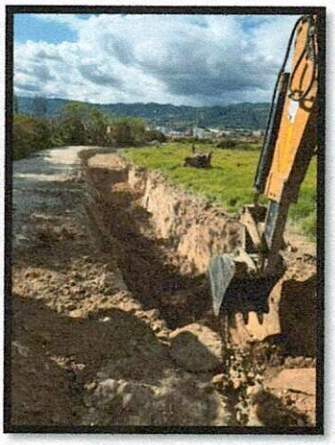
| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| Concreto bordes pozos | imprimación | Carpeta asfáltica |
|  |  |  |
| Extendido base | Instalación sardineles | Instalación geo malla |
|  |  |  |
| Extendiso subbase | Excavaciones mejoramiento ampliación | Compactación afirmado subrasante |
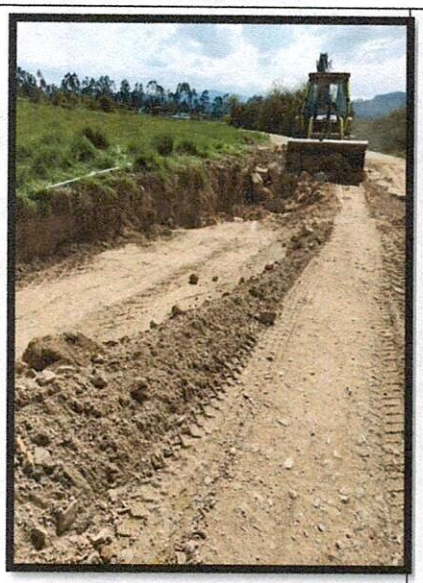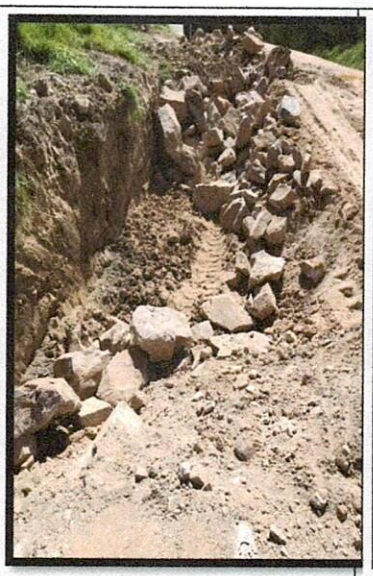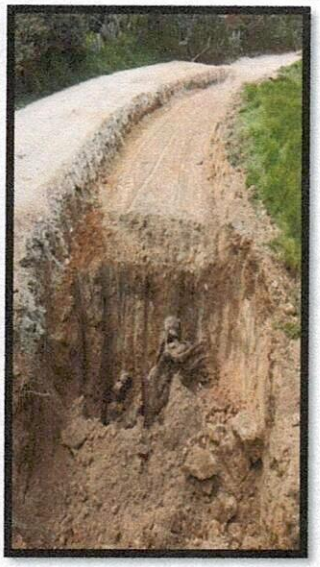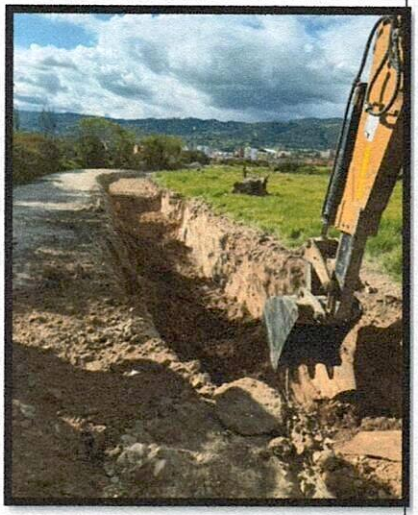
| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| Mejoramiento predraplen y afirmado | Mejoramiento predraplen y afirmado | Retiro de tocones |
|  |  | |
| Retiro de tocones | Retiro de tocones | |

**BARRIO VILLA DEL PRADO - CASTILLA**
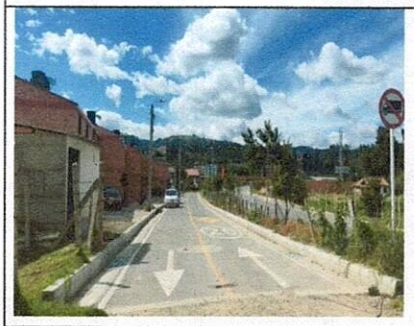
| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| Demarcación vial y señalización | Demarcación vial y señalización | Demarcación vial y señalización |
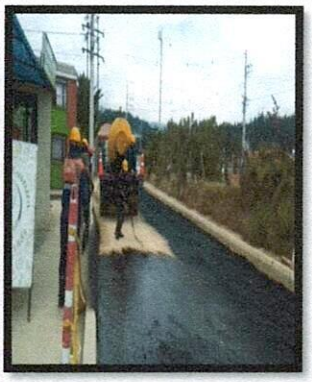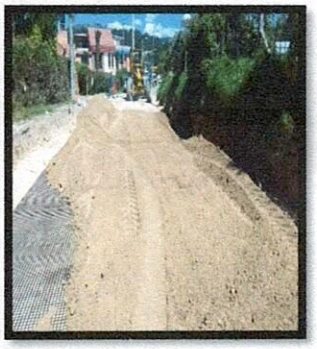
| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| Demarcación vial y señalización | Carpeta asfáltica | imprimación |
|  |  |  |
| Concreto cunetas | Sellado base | Extendido subbase |
|  |  | |
| Instalación geo malla | Mejoramiento subrasante | |

**JORGE EDWIN LÓPEZ TORRES**
**SUPERVISOR DEL CONTRATO**
**SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y MOVILIDAD**
**ALCALDIA DE PAIPA**

Gmail camilo rojas <ingcamilorojasf2024@gmail.com>

# LISTA DE CHEQUEO PARA RECIBO Y LIQUIDACION

1 mensaje

**camilo rojas** <ingcamilorojasf2024@gmail.com> 4 de noviembre de 2025 a las 10:32 p.m.
Para: "APP CONTROL INGENIERIA S.A.S" <appcontrolingenieria@gmail.com>

CORDIAL SALUDO ENVIO LISTA DE CHEQUEO RECIBO FINAL Y LIQUIDACION

EN RECIBO FINAL SE DEBE COMPLEMENTAR CON LO PRESENTADO EN EL ACTA PARCIAL 1 YA QUE EL RECIBO FINAL ES SIMILAR A LA PARCIAL

QUEDO ATENTO A CUALQUIER ACLARACION ENVIO FORMATO ACTA DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACION Y GUIA LIQUIDACION

**6 archivos adjuntos**

**LISTA DE CHEQUERO FINAL.xlsx**
62K

**GCO-F-14 FORMATO ACTA RECIBO.xls**
93K

**Certif.Cumplimiento 020 DE 2023.docx**
60K

**GCO-F-15 Acta de Liquidación CTO 020 DE 2023 (1).docx**
74K

**Of.1008 Solic.Liquidación 020 DE 2023.docx**
44K

**liquidacion cto 202.pdf**
1638K

Gmail camilo rojas <ingcamilorojasf2024@gmail.com>

# SOLICITUD ENTREGA INFORMACION PARA RECIBO Y LIQUIDACION CONTRATO 306 de 2024

1 mensaje

**camilo rojas** <ingcamilorojasf2024@gmail.com> 20 de noviembre de 2025 a las 6:05 p.m.
Para: "APP CONTROL INGENIERIA S.A.S" <appcontrolingenieria@gmail.com>

Cordial saludo
de manera atenta y en atención a los trámites contractuales en cada dependencia se solicita de manera urgente se entregue la información correspondiente para los trámites de recibo y liquidación del contrato de acuerdo a la lista de chequeo enviada el dia 04-011-2025 quedamos atentos , en razon a que se acerca el mes de diciembre y se presenta flujo de tramites en las dependencias agradezco lo mas pronto la entrega de dicha informacion

---------- Forwarded message ---------
De: **camilo rojas** <ingcamilorojasf2024@gmail.com>
Date: mar, 4 nov 2025 a la(s) 10:32 p.m.
Subject: LISTA DE CHEQUEO PARA RECIBO Y LIQUIDACION
To: APP CONTROL INGENIERIA S.A.S <appcontrolingenieria@gmail.com>

CORDIAL SALUDO ENVIO LISTA DE CHEQUEO RECIBO FINAL Y LIQUIDACION

EN RECIBO FINAL SE DEBE COMPLEMENTAR CON LO PRESENTADO EN EL ACTA PARCIAL 1 YA QUE EL RECIBO FINAL ES SIMILAR A LA PARCIAL

QUEDO ATENTO A CUALQUIER ACLARACION ENVIO FORMATO ACTA DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACION Y GUIA LIQUIDACION

**6 archivos adjuntos**

**LISTA DE CHEQUERO FINAL.xlsx**
62K

**GCO-F-14 FORMATO ACTA RECIBO.xls**
93K

**Certif.Cumplimiento 020 DE 2023.docx**
60K

**GCO-F-15 Acta de Liquidación CTO 020 DE 2023 (1).docx**
74K

**Of.1008 Solic.Liquidación 020 DE 2023.docx**
44K

**liquidacion cto 202.pdf**
1638K

Gmail infraestructura paipa-boyaca.gov.co <infraestructura@paipa-boyaca.gov.co>

# SOLICITUD ENTREGA DOCUMENTACION TRAMITE RECIBO FINAL Y LIQUIDACION CONTRATO 306 DE 2024

**infraestructura paipa-boyaca.gov.co** <infraestructura@paipa-boyaca.gov.co> 26 de noviembre de 2025 a las 11:54
Para: "APP CONTROL INGENIERIA S.A.S" <appcontrolingenieria@gmail.com>

---------- Forwarded message ---------
De: **DIEGO SUA** <diegogsua96@gmail.com>
Date: mié, 26 nov 2025 a las 9:38
Subject: SOLICITUD ENTREGA DOCUMENTACION TRAMITE RECIBO FINAL Y LIQUIDACION CONTRATO 306 DE 2024
To: <infraestructura@paipa-boyaca.gov.co>

cordial saludo

Me permito remitir en archivo adjunto oficio 831 dirigido APP control ingeniería para solicitar la documentación correspondiente para el trámite del **Acta de Recibo Final y liquidación del Contrato de N° 306 de 2024**, cuyo objeto corresponde a la "Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, ambiental y social al contrato que resultó del proceso de licitación LP-MP-002 de 2024, cuyo objeto es el mejoramiento de la malla vial urbana en el municipio de Paipa, departamento de Boyacá"

quedo atento a cualquier inquietud.

--

Municipio de Paipa

**JORGE EDWIN LOPEZ TORRES**
Secretario de Infraestructura pública y movilidad
ALCALDIA MUNICIPAL DE PAIPA
Cel: 3183659270
Dirección: Carrera 22 No 25-14 Tercer Piso
https://www.paipa-boyaca.gov.co/
PBX: (608) 7850131 / 7850135
Código Postal: 15044

SOLICITUD DOCUMENTOS LIQUIDACION.pdf
172K

| | ALCALDIA DE PAIPA | | |
|---|---|---|---|
| | Modelo Integrado de Planeación Y Gestión - MIPG | Código: GOA–F - 16 | NIT: 891.801.240-1 |
| | Formato | Versión: 01 | |
| | Comunicaciones - Oficios | Fecha Versión: 02/01/2024 | |
| | | Página 1 de 1 | |

| Código Dependencia | - | Código Serie | - | Código Subserie | - | Radicado | - | Número | Marque con X | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | - | 11 | - | | - | | - | 831 | Interna | |
| | | | | | | | | | Externa | X |

| Fecha Emisión | Día | Mes | Año |
|---|---|---|---|
| | 25 | 11 | 2025 |

| | |
|---|---|
| Dirigida a | SEBASTIAN TOLEDO MOYA |
| Cargo / Empleo | R/L A.P.P CONTROL INGENIERIA S.A.S |
| Entidad | CONTRATISTA CONTRATO 306 DE 2024 |
| Contacto | appcontrolingenieria@gmail.com<br>CALLE 43 N 8ª-06 Tunja |

| | |
|---|---|
| Asunto | **SOLICITUD ENTREGA DOCUMENTACION TRAMITE RECIBO FINAL Y LIQUIDACION CONTRATO 306 DE 2024** |

Respetados señores

La Secretaria de Infraestructura Pública y Movilidad le(s) presenta un cordial saludo y les augura los mejores éxitos en sus labores diarias.

De manera atenta, y en calidad de supervisión, nos permitimos solicitar la **entrega prioritaria** de la documentación requerida de acuerdo con la **lista de chequeo enviada el día 04 de noviembre de 2025**

Dicha documentación es necesaria para adelantar los **trámites de recibo y liquidación del Contrato 306 de 2024**, cuyo objeto corresponde a la *"Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, ambiental y social al contrato que resulte del proceso de licitación LP-MP-002 de 2024, cuyo objeto es el mejoramiento de la malla vial urbana en el municipio de Paipa, departamento de Boyacá"*.

Lo anterior, teniendo en cuenta que se trata de un **contrato financiado con recursos de regalías**, por lo que es indispensable realizar el **cierre correspondiente** conforme a la normatividad aplicable.

Por lo anterior se requiere la entrega de dicha información a más tardar el día 28 de noviembre de 2025

Agradecemos su atención y solicitamos dar prioridad a esta gestión

Cordialmente.

| | |
|---|---|
| Emite | JORGE EDWIN LOPEZ TORRES |
| Empleo | Secretario de Infraestructura Pública y Movilidad |

| Validación | Nombre Completo / Empleo | Vo.Bo. |
|---|---|---|
| Proyectó | Diego Sebastián González Sua / Profesional Apoyo S. infraestructura | |
| Aprobó | Jorge Edwin López Torres / Secretario de Infraestructura Pública y Movilidad | |

| No | Archivado en |
|---|---|
| | |

| No | Anexos | Folios. |
|---|---|---|
| 1 | | |
| 2 | | |

| No | Tipo | Gestión documental (¿A Quién? – Empleo) |
|---|---|---|
| | Copia | |
| | Copia | |

| Elaboró | Revisó | Aprobó |
|---|---|---|
| Responsables del proceso | Responsable de Gestión Documental | Responsable de Planeación-MIPG |

Gmail infraestructura paipa-boyaca.gov.co <infraestructura@paipa-boyaca.gov.co>

# REITERACION SOLICITUD ENTREGA DOCUMENTACION TRAMITE RECIBO FINAL Y LIQUIDACION CONTRATO 306 DE 2024

**camilo rojas** <ingcamilorojasf2024@gmail.com> 30 de diciembre de 2025 a las 10:42
Para: "infraestructura paipa-boyaca.gov.co" <infraestructura@paipa-boyaca.gov.co>

Respetados señores
La Secretaria de Infraestructura Pública y Movilidad le(s) presenta un cordial saludo y les augura los mejores éxitos en sus labores diarias.
De manera atenta, y en calidad de supervisión, nos permitimos Reiterar la entrega prioritaria de la documentación requerida de acuerdo con la lista de chequeo enviada el día 04 de noviembre de 2025 , requerimentos de los dias 20-11-2025 y 26-11-2025 y oficio 831 a lo cual no se ha dado contestacion por el contratista

**4 adjuntos**

- **LISTA CHEQUEO 04-11-2025.pdf**
  64K
- **REQUERIMIENTO 20-11-2025.pdf**
  71K
- **Gmail - Fwd_ SOLICITUD ENTREGA DOCUMENT...NAL Y LIQUIDACION CONTRATO 306 DE 2024 26-11-2025.pdf**
  120K
- **OFICIO 986 DE 2025.pdf**
  275K
