Agustín Codazzi, 13 de abril de 2026.

Señores;
MINISTERIO DEL DEPORTE
JOSE ALBEIRO GRISALES VALENCIA
Supervisor del convenio
Av. Cra 68 No. 55 65
Bogotá D.C

REFERENCIA: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° COID 1063 - 2024 QUE TIENE POR OBJETO **"AUNAR ESFUERZO TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO EN EL BARRIO CAMILO TORRES EN EL MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI"**

ASUNTO: SOLICITUD DE MODIFICATORIA N°4 – MODIFICACIÓN DEL PLAZO DEL CONVENIO DE LA REFERENCIA.

Por medio de la presente, y teniendo en cuenta que el Municipio de Agustín Codazzi – Cesar y el Ministerio del Deporte suscribieron el Convenio Interadministrativo No. COID-1063 de 2024, cuyo objeto consiste en "aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la ejecución del proyecto denominado construcción de escenario deportivo en el barrio Camilo Torres en el municipio de Agustín Codazzi", me permito solicitar respetuosamente la modificación de la Cláusula Tercera (Plazo de Ejecución), con el fin de **prorrogar su vigencia hasta el 30 de septiembre de 2026**, con fundamento en las siguientes consideraciones de orden técnico, administrativo y contractual:

- Que el 26 de diciembre de 2024 se suscribió el Convenio Interadministrativo No. COID-1063 de 2024.

- Que el 27 de diciembre de 2024 se suscribió el Acta de Inicio del referido convenio, estableciéndose inicialmente como plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2024.

- Que, mediante Modificación No. 1 suscrita el 30 de diciembre de 2024, se ajustó la Cláusula Tercera del convenio, ampliando el plazo de ejecución hasta el 31 de marzo de 2025.

- Que, mediante Modificación No. 2 suscrita el 29 de marzo de 2025, se realizó

Proyectó:	EDWIN JOSÉ TARIFFA BOCANEGRA – JEFE DE INTERVENTORIA
Revisó: - Aprobó:	JULIO CESAR MARTINEZ DAZA – SECRETARIO DE PLANEACION
Los arriba firmantes declaran que el contenido del presente decreto se encuentra ajustado a la normatividad vigente, por lo cual bajo nuestra responsabilidad lo presento para su firma.	

un nuevo ajuste a la Cláusula Tercera del convenio, ampliando su plazo hasta el 31 de diciembre de 2025.

- Que el 22 de mayo de 2025 el Municipio de Agustín Codazzi – Cesar suscribió el Contrato de Obra No. LP-001-2025, derivado del convenio, cuyo objeto corresponde a la ejecución física del proyecto.

- Que el 26 de mayo de 2025 el Municipio de Agustín Codazzi – Cesar suscribió el Contrato de Interventoría No. CMA-002-2025, con el propósito de garantizar el seguimiento técnico, administrativo, financiero y jurídico del contrato de obra.

- Que, mediante Modificación No. 3 suscrita el 15 de julio de 2025, se realizó un nuevo ajuste a la Cláusula Tercera del convenio, ampliando su plazo hasta el 30 de abril de 2026.

- Que en la actualidad el Contrato de Obra No. LP-001-2025 y el Contrato de Interventoría No. CMA-002-2025 se encuentran en la fase final de ejecución, registrando un **avance físico aproximado del 99%,** lo que evidencia el cumplimiento sustancial de las metas del proyecto.

No obstante, lo anterior, es importante señalar que, si bien la ejecución física de la obra se encuentra finalizada, aún se deben surtir actividades indispensables para su recibo a satisfacción y puesta en funcionamiento, tales como la obtención de certificaciones reglamentarias, entre ellas los certificados **RETIE** y **RETILAP,** los cuales son requisitos obligatorios para la correcta operación del escenario deportivo y en condiciones normales dicho trámite cuenta con un lapso de **30 días** hasta obtener las certificaciones correspondientes.

Adicionalmente, se hace necesario contar con un plazo razonable para adelantar el proceso de liquidación de los contratos derivados, en cumplimiento de la normatividad vigente, garantizando así la verificación final de las obligaciones, la consolidación de la información técnica y financiera, y el cierre adecuado del proyecto. Según lo establecido en la **CLÁUSULA 22. LIQUIDACIÓN** del contrato de obra **LP-001-2025** "El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la materia. El término para la liquidación del contrato será de **CUATRO (4) MESES**."; por lo cual, es necesario disponer de dicho lapso de tiempo para realizar la debida liquidación de los contratos derivados.

En ese sentido, y considerando que el plazo actual del **convenio expira el 30 de abril de 2026**, se concluye que el mismo resulta insuficiente para garantizar la terminación integral del proyecto en condiciones óptimas de calidad, funcionalidad y cumplimiento normativo, así como para adelantar los trámites administrativos posteriores a la ejecución.

En consecuencia, y en atención a los principios de eficiencia, planeación, responsabilidad y economía que rigen la función administrativa, solicitamos

Proyectó:	EDWIN JOSÉ TARIFFA BOCANEGRA – JEFE DE INTERVENTORIA
Revisó: - Aprobó:	JULIO CESAR MARTINEZ DAZA – SECRETARIO DE PLANEACION
Los arriba firmantes declaran que el contenido del presente decreto se encuentra ajustado a la normatividad vigente, por lo cual bajo nuestra responsabilidad lo presento para su firma.	

respetuosamente la modificación del plazo del Convenio Interadministrativo No. COID-1063 de 2024, en el sentido de conceder **una prórroga hasta el 30 de septiembre de 2026**, término que permitirá asegurar la finalización total del proyecto y su adecuada entrega a la comunidad beneficiaria.

Finalmente, agradecemos la atención prestada a la presente solicitud y reiteramos nuestro compromiso institucional, así como nuestro interés en continuar contando con el valioso apoyo del Ministerio del Deporte, en la medida en que la ampliación del plazo garantizará la continuidad del convenio y el cumplimiento de los fines que motivaron su suscripción, en beneficio de la población del Municipio de Agustín Codazzi.

Cordialmente,

HERNÁN EDUARDO BAQUERO RODRÍGUEZ
ALCALDE MUNICIPAL
Agustín Codazzi, Cesar

Proyectó:	EDWIN JOSÉ TARIFFA BOCANEGRA – JEFE DE INTERVENTORIA
Revisó: - Aprobó:	JULIO CESAR MARTINEZ DAZA – SECRETARIO DE PLANEACION
Los arriba firmantes declaran que el contenido del presente decreto se encuentra ajustado a la normatividad vigente, por lo cual bajo nuestra responsabilidad lo presento para su firma.	

CRONOGRAMA PRÓRROGA 04 AL CONVENIO COID-1063-2024

REPÚBLICA DE COLOMBIA ALCALDIA MUNICIPAL DE AGSUTIN CODAZZI (CESAR)
NIT. 800.096.558-1
SECRETARIA DE PLANEACION

MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI - DEPARTAMENTO DE CESAR

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO EN EL BARRIO CAMILO TORRES EN EL MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI.

DATOS GENERALES

Valor total del Convenio: **$8.034.997.263,00**

Duración: 5 meses (proceso de contratacion, apertura, evaluacion y adjudicación de contratos obra e interventoría) + 1 meses (legalizacion de contratos de obra e interventoria y aprobacion de poliza) + 1 meses (apropiación de estudios y diseños) + 11 meses (Ejecución de obra) + 4 meses (Liquidacion de contratos de obra e intervenotria) = **21 meses**

ITEM	DESCRIPCION	ENERO / 2025.	FEBRERO / 2025.	MARZO / 2025.	ABRIL / 2025,	MAYO / 2025,	JUNIO / 2025,	JULIO /2025,	AGOSTO /2025,	SEPT / 2025.	OCT / 2025.	NOV / 2025.	DIC / 2025.	ENE / 2026.	FEB / 2026.	MARZ/ 2026.	ABR/ 2026.	MAYO/ 2026.	JUNIO/ 2026.	JULIO/ 2026.	AGOST/ 2026.	SEPT/ 2026.
1	PUBLICACIÓN PROCESOS OBRA E INTERVENTORÍA		5/02/2025 a 20/02/2026																			
2	ADJUDICACION CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA			26/03/2025 a 15/05/2025																		
3	SUSCRIPCIÓN Y LEGALIZACIÓN CONTRATOS					22/05/2025																
4	APROPIACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS						2/07/2025															
5	PLAZO DE EJECUCION DE OBRA							08/07/2025 a 07/04/2026														
6	ENTREGA RETIE Y RETILAP																07/04/2026 a 31/05/2026					
7	LIQUIDACION CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA																		1/6/2026 - 30/9/2/26			

JULIO CESAR MARTINEZ DAZA
SECRETARIO DE PLANEACION MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI

Outlook

RV: REFERENCIA: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° COID 1063 - 2024 QUE TIENE POR OBJETO "AUNAR ESFUERZO TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO EN EL BARRIO CAMILO TORRES EN EL...

Desde Katheryn Cortes Reinel <Kacortes@mindeporte.gov.co>
Fecha Mié 15/04/2026 11:34
Para Gustavo Andres Benjumea Serrano <gubenjumea@mindeporte.gov.co>

1 archivo adjunto (1 MB)
SOLICITUD DE PRORROGA 4-MINISTERIO DEPORTE_0001.pdf;

Cordialmente,

Deporte

Katheryn Cortés Reinel
Contratista
GIT de Infraestructura
kacortes@mindeporte.gov.co
Teléfono: (601) 4377030 Ext. 0000
Línea Gratuita Nacional 01 8000 910 237
Dirección: Avenida carrera 68 No. 55-65
Bogotá - Colombia
www.mindeporte.gov.co
Redes sociales: Ministerio del Deporte - @Mindeportecol

Sé consciente con el ambiente, solo si es necesario imprime este correo

De: Alcaldia Agustin Codazzi Cesar <alcaldia@agustincodazzi-cesar.gov.co>
Enviado: miércoles, 15 de abril de 2026 10:59 a. m.
Para: Jorge Alonso Martinez Caceres <Jomartinez@mindeporte.gov.co>; Jose Albeiro Grisales Valencia <Jgrisales@mindeporte.gov.co>; Contacto <Contacto@mindeporte.gov.co>; Katheryn Cortes Reinel <Kacortes@mindeporte.gov.co>; Sec. Planeación Agustín Codazzi <planeacion@agustincodazzi-cesar.gov.co>
Asunto: REFERENCIA: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° COID 1063 - 2024 QUE TIENE POR OBJETO "AUNAR ESFUERZO TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO EN EL BARRIO CAMILO TORRES EN EL MUN...

Agustín Codazzi, 13 de abril de 2026.

Señores;
MINISTERIO DEL DEPORTE
JOSE ALBEIRO GRISALES VALENCIA
Supervisor del convenio
Av. Cra 68 No. 55 65
Bogotá D.C

REFERENCIA: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° COID 1063 - 2024 QUE TIENE POR OBJETO **"AUNAR ESFUERZO TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO EN EL BARRIO CAMILO TORRES EN EL MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI"**

ASUNTO: SOLICITUD DE MODIFICATORIA N°4 – MODIFICACIÓN DEL PLAZO DEL CONVENIO DE LA REFERENCIA.

Atentamente.
Alcaldía Municipal
Municipio de Agustín Codazzi - Cesar

Deporte	PROCESO:	APOYO A LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y CIENTÍFICA	Versión: 1
	FORMATO:	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	Código: ATC-FR-046
			Fecha: 6/04/2026

1. INFORMACIÓN GENERAL

SEMANA No. 39 **DEL** lunes, 30 de marzo de 2026 **AL** domingo, 05 de abril de 2026

TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA O CONSULTORÍA: 271,00 **MUNICIPIO:** AGUSTIN CODAZZI

TIEMPO RESTANTE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 2,00 **DEPARTAMENTO: CESAR** **BARRIO/VEREDA: AGUSTIN CODAZZI**

NOMBRE DEL SUPERVISOR **JULIO CESAR MARTINEZ**

INTERVENTORÍA O CONSULTORIA: **CONSORCIO INTER ESCENARIO CDZ 25**

OBJETO DEL CONTRATO DE INTRVENTORIA O CONSULTORIA

INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO EN EL BARRIO CAMILO TORRES EN EL MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI CÉSAR

CONTRATO DE INTERVENTORÍA O CONSULTORIA

Interventor o Consultor:	CONSORCIO INTER ESCENARIO CDZ 25
Contrato No.	CMA-002 DE 2025
Valor Inicial:	$ 524.518.976,00
Valor anticipo :(si aplica)	$ 262.259.488,00
Valor adición(es) MinDeporte:	0
Valor adición(es) Ente territorial	0
Valor Actualizado:	$ 524.518.976,00
Plazo Inicial (dias):	273,00
Fecha de Inicio:	martes, 8 de julio de 2025
Prórroga No.	0
Suspensión No. y fecha:	0
Reinicio No. y fecha:	0
Fecha de Terminación Actualizada	7/04/2026
Plazo Actualizado:	NUEVE (9) MESES

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO PARQUE CAMILO TORRES
Contrato No.	LP-001 DE 2025
Valor Inicial:	$ 7.509.319.051,00
Valor anticipo :(si aplica)	$ 3.754.659.525,50
Valor adición(es) MinDeporte:	$ -
Valor adición(es) Ente territorial	$ -
Valor Actualizado:	$ 7.509.319.051,00
Plazo Inicial (dias):	273,00
Fecha de Inicio:	martes, 8 de julio de 2025
Prórroga No.	$ -
Suspensión No. y fecha:	N/A
Reinicio No. y fecha:	N/A
Fecha de Terminación Actualizada	7/04/2026
Plazo Actualizado:	NUEVE (9) MESES

2. PROGRAMACIÓN

% DE AVANCE OBRA PROGRAMADO	ACUMULADO
	99,81%

% DE AVANCE OBRA EJECUTADO	ACUMULADO
	99,06%

% DE ATRASO	ACUMULADO
	0,74%

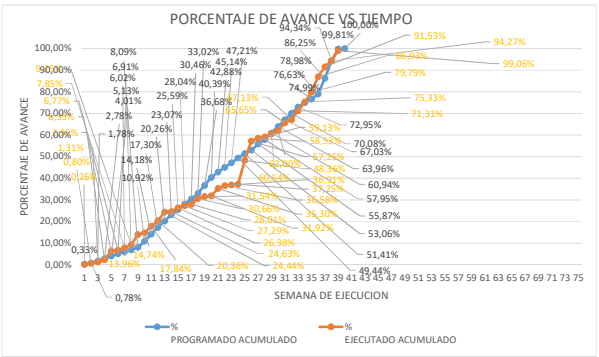
% DE AVANCE OBRA

CAPITULOS	INICIO	FIN	DURACIÓN (DIAS)	% PESO ACTIVIDAD	% PROGRAMADO ACUMULADO	% EJECUTADO ACUMULADO	% ATRASO
OBRAS PRELIMINARES	lunes, 14 de julio de 2025	martes, 23 de septiembre de 2025	71	5,32%	5,32%	5,32%	0,00%
EXCAVACION	viernes, 22 de agosto de 2025	jueves, 9 de octubre de 2025	48	1,68%	1,68%	1,68%	0,00%
GRADERIAS	lunes, 15 de septiembre de 2025	viernes, 5 de diciembre de 2025	81	3,00%	3,00%	2,95%	0,05%
CAFETERIA	miércoles, 17 de septiembre de 2025	viernes, 6 de marzo de 2026	170	7,03%	7,03%	6,78%	0,24%
CANCHA MULTIFUNCIONAL	miércoles, 17 de septiembre de 2025	jueves, 25 de diciembre de 2025	99	6,29%	6,29%	6,27%	0,02%
CANCHA DE FUTBOL	lunes, 4 de agosto de 2025	martes, 7 de abril de 2026	246	48,12%	48,12%	48,12%	0,00%
URBANISMO Y MOVILIARIO	sábado, 26 de julio de 2025	sábado, 7 de febrero de 2026	196	15,58%	15,49%	15,08%	0,41%
ACOMETIDA, GABINETE DE MEDIDA Y ACONDICIONAMIENTO PUNTO DE CONEXIÓN	martes, 12 de agosto de 2025	jueves, 26 de febrero de 2026	198	5,47%	5,47%	5,47%	0,00%
INSTALACIONES INTERNAS	martes, 12 de agosto de 2025	jueves, 26 de febrero de 2026	198	2,80%	2,80%	2,80%	0,00%
SISTEMA DE APANTALLAMIENTO Y PUESTA A TIERRA	martes, 12 de agosto de 2025	jueves, 26 de febrero de 2026	198	3,02%	3,02%	3,02%	0,00%
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	miércoles, 17 de septiembre de 2025	viernes, 12 de diciembre de 2025	86	0,37%	0,37%	0,285%	0,09%
CERTIFICACIÓN RETIE	lunes, 2 de marzo de 2026	martes, 7 de abril de 2026	36	0,11%	0,08%	0,11%	-0,03%
CERTIFICACIÓN RETILAP	lunes, 2 de marzo de 2026	martes, 7 de abril de 2026	36	0,20%	0,15%	0,20%	-0,05%
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	martes, 8 de julio de 2025	martes, 7 de abril de 2026	273	1,00%	0,97%	0,97%	0,00%
TOTAL				100,00%	**99,81%**	**99,06%**	**0,74%**

3. RECURSOS DE INTERVENTORÍA O CONSULTORÍA:

PERSONAL DE INTERVENTORÍA	CARGO	CANTIDAD (DIAS)
JESUS ARMANDO CERVANTES CEBALLOS	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	
NICOLAS SALAS BARON	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	
MALKY TERRAZA	PROFESIONAL SST	
EDUARDO HERNANDEZ	AMBIENTAL	
GLEIMYS CAMPO	SECRETARIA	
ENSAYOS / ANÁLISIS / LABORATORIOS / EQUIPOS / OTROS	OBSERVACIONES / RESULTADO	

4. CURVA DE AVANCE



5. ACTIVIDADES

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

8.8. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MEDIDOR 2Φ CONFORMADO POR: MEDIDOR, CABLEADO Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

8.9. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BAJANTE PARA ACOMETIDA EN TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA DE 1 1/2"X6M . INCLUYE ACRÍLICO DE IDENTIFICACIÓN DE ACOMETIDAS

8.10. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CONDUIT 1X1 1/2". DESDE PUNTO APOYO HASTA GABINETE DE CONTROL DE ILUMINACIÓN.

8.11. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA CU 2#2/0F+1#6T CU, DESDE BORNES DE TRANSFORMADOR HASTA GABINETE PRINCIPAL. INCLUYE BORNERAS DE CONEXIÓN.

8.14. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SALIDA DE ILUMINACIÓN PARA CANCHAS. INCLUYE CAJA RAWELT 4"X4", CABLEADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

8.15. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SALIDA DE ILUMINACIÓN PARA LUMINARIA LED PARA ILUMINACIÓN GENERAL DEL PARQUE. INCLUYE CABLEADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

8.16. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SALIDA DE ILUMINACIÓN PARA LOCALES EN CU 1#12F+1#12T+1#12T AWG EN TUBERÍA PVC 3/4". INCLUYE BORNAS TERMINALES.

8.17. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SALIDA DE INTERRUPTOR SENCILLO PARA LOCALES EN CU 1#12F+1#12T+1#12T AWG EN TUBERÍA PVC 3/4". INCLUYE APARATO Y BORNAS TERMINALES.

8.18. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SALIDA DE TOMACORRIENTES PARA LOCALES EN CU 1#12F+1#12T+1#12T AWG EN TUBERÍA PVC 3/4". INCLUYE BORNAS TERMINALES.

8.19. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SALIDA DE ILUMINACIÓN PARA GRADAS EN CU 1#12F+1#12T+1#12T AWG EN TUBERÍA EMT 3/4". INCLUYE BORNAS TERMINALES.

8.20. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA CU 2#2F+1#8T AWG EN TUBERÍA PVC 1" PARA ILUMINACION CANCHA. INCLUYE BORNAS TERMINALES.

8.21. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA CU 2#4F+1#8T AWG EN TUBERÍA PVC 1" PARA ILUMINACION CANCHA. INCLUYE BORNAS TERMINALES.

8.22.SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA CU 2#8F+1#10T AWG EN TUBERÍA PVC 3/4" PARA ILUMINACION DEL PARQUE. INCLUYE BORNAS TERMINALES.

8.23. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA CU 2#10F+1#10N+1#12T AWG EN TUBERÍA PVC 3/4" PARA TABLEROS DE LOCALES. INCLUYE BORNAS TERMINALES.

8.24. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE GFCI.

8.25. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE.

8.26. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PROYECTOR LED JETA PRO 500 W O SIMILAR.

8.27. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PROYECTOR LED JETA PRO 300 W O SIMILAR.

8.30. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LUMINARIA BALA LED RD 30 W O SIMILAR.

8.31. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED HERMÉTICA 2X18 W O SIMILAR.

8.32. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED EMERGENCIA 2X1,6 W O SIMILAR.

8.33. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PUNTAS CAPTORAS DE 1M. INCLUYE BASE PARA PUNTA CAPTORA.

8.34. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BAJANTES. INCLUYE TUBERIA IMC DE 1/2", CAJA METALICA DOBLE FONDO, CONECTRO BIMETALICO Y CABLE DESNUDO 1/0 PARA CONEXIÓN AL ANILLO INFERIOR.

8.35. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CABLE DESNUDO #1/0.

8.36. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE VARILLA CU 5/8 X 2,4M. INCLUYE HIDROSOLTA, SOLDAUDURA EXOTERMICA, GRAPA DE CONEXIÓN BIMETALICA.

8.37. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CAJA PREFABRICADA 30X30CM.

8.38. SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE VARILLA CU 2,4M 5/8 PARA ATERRIZAR POSTES METÁLICOS, CABLE CU 8 DESNUDO, SOLDADURA EXOTERMICA 115G, CEMENTO CONDUCTIVO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU

INP.8.40. SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA ESTRUCTURAS DE MEDIA TENSION EN ANILLO CON CABLE DE COBRE DESNUDO #2AWG.
INP. 8.41. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO AUTOMATIZADO PARA CONTROL DE ALUMBRADO EXTERIOR, INCLUYE ACCESORIOS PARA CONEXIÓN RESANE (OBRA CIVIL) Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.
INP. 8.42. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA DE PUESTA A TIERRA, CONFORMADA POR 3 VARILLAS DE COBRE Y 15MTS DE CABLE NO 2 DESNUDO PARA SUBIR HASTA GABINETE DE DISTRIBUCION.
INP. 8.43. GABINETE DE MEDIDORES PARA 4 USUARIOS EN BAJA TENSIÓN, IP65, LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 16 Y PUERTA CALIBRE 14, COLOR RAL7035, PINTURA EPOXICA, CON BARRAJE PARA 200A. SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR.
INP. 8.44. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROYECTOR LED 440W, TEMPERATURA DE COLOR: 5000K, ACABADO GRIS, POTENCIA DE ENTRADA: 440W, FLUJO LUMINOSO: 71200LM, GRADO DE PROTECCIÓN: IP66/IK08, TENSIÓN DE OPERACIÓN: 100-277V, FRECUENCIA: 50/60HZ, ÁNGULO DE APERTURA: 45°, DIMENSIONES (LXWXH):546X495X71.5MM, PESO: 23.4KG, FACTOR DE POTENCIA: 0.95, REPRODUCCIÓN DE COLOR (IRC)≥70, DISTORSIÓN ARMÓNICA(THD)<20%, VIDA ÚTIL: 100000H, EFICACIA: 130LM/W.
INP. 8.45. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACRILICO O CUALQUIER OTRO ELEMENTO QUE RESISTA LA HUMEDAD, OXIDACIÓN Y RAYOS UV PARA IDENTIFICACIÓN DE ACOMETIDAS. NOTA: SE DEBERÁ MARCAR EL CIRCUITO A LO MÍNIMO CADA 3 CAJAS DE INSPECCIÓN, EN DERIVACIONES Y EMPALMES DEL CIRCUITO.
INP. 8.46. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESPUMA EXPANSIVA MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (SIKA BOOM), PARA SELLADO DE DUCTOS EN SALIDAS DE CAJAS DE INSPECCIÓN.
ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LA SIGUIENTE SEMANA

6.12. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SHOCKPAD (COLCHON) 20 MM ESPESOR , PARA CANCHA SINTETICA.
6.13. GRAMA SINTETICA DE POLIETILENO FIBRILADO, RETORCIDO, ESTABILIZADO Y RESISTENTE A LOS RAYOS UV DE FIBRA DE THIOLON GRASS DE TEN CATE NICOLON (CERTIFICADO ISO 9001 - ISO 14001) PARA CAMPO RECREATIVO, INSTALAR SEGÚN RECOMENDACIONES DEL PROVEEDOR. INCLUYE ARENA DE SILICE, CAUCHO Y DEMARCACIONES.
7.1. CONSTRUCCION DE PISO ESTAMPADO CONTINUO DE CONCRETO IMPRESO COLOR SEGUN DISEÑO CON APARIENCIA ANTIDESLIZANTE CADA 3 MTS. REALIZADO CON CONCRETO DE 3.000 PSI INCLUYE MALLA ELECTRO SOLDADA: ACABADO IMPRESO EN RELIEVE Y TRATADO SUPERFICIALMENTE CON MORTERO D
7.4. SUMINISTRO E INSTALACION DE LOSETA EN FORMA HEXAGONAL
7.5. BANCA EN CONCRETO ANTIBANDALICA REFETENCIA MALMÖ
7.6. BANCA EN CONCRETO ANTIBANDALICA REFETENCIA LANDOM
7.7. CANECAS TIPO KQ1 DE CONCRETO DE TRES COMPARTIMENTOS
7.11. EMPRADIZACION CON GRAMA NATURAL
INP 7.17. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARQUE INFANTIL TIPO CASTILLO PARA UN ÁREA APROXIMADA DE OCUPACIÓN DE 180 M2
8. CAPITULO ELECTRICO
RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO
la obra se encuentra en un avance un poco por debajo de lo programado el contratista realiza acopio de material
6. OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES DE INTERVENTORÍA O CONSULTORÍA
se recomienda al contratista agilizar las actividades

Diligenciar el presente formato, según intructivo del presente informe.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, en el Municipio de Codazzi el dia 06 del mes de abril de 2026

INTERVENTORÍA O CONSULTORIA:



Firma:

Nombre y Cédula: NICOLAS SALAS BARON

Cargo: RESIDENTE DE INTERVENTORIA




Original: Mindeporte

1era copia : Interventor



2da copia : Supervisor Ente Territorial

Deporte	**PROCESO:** APOYO A LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y CIENTÍFICA		**Versión:** 1
			Código: ATC-FR-046
	FORMATO: INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA O CONSULTORÍA		**Fecha:** DIA: 05/04/2026
MUNICIPIO	AGUSTIN CODAZZI		**REVISIÓN:**
FECHA DE CORTE DEL INFORME	**DIA:** 05/04/2026	**DE: (TOTAL DIAS)**	**CONTRATO No.** LP-001 DE 2025 **CONTRATISTA:** CONSORCIO PARQUE CAMILO TORRES
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO 08/07/2025	24-Jan-00		martes, 7 de abril de 2026

REGISTRO FOTOGRÁFICO

		
8.9. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BAJANTE PARA ACOMETIDA EN TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA DE 1 1/2"X6M . INCLUYE ACRÍLICO DE IDENTIFICACIÓN DE ACOMETIDAS	8.10. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CONDUIT 1X1 1/2". DESDE PUNTO APOYO HASTA GABINETE DE CONTROL DE ILUMINACIÓN.	8.11. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA CU 2#2/0F+1#6T CU, DESDE BORNES DE TRANSFORMADOR HASTA GABINETE PRINCIPAL. INCLUYE BORNERAS DE CONEXIÓN.
		
8.14. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SALIDA DE ILUMINACIÓN PARA CANCHAS. INCLUYE CAJA RAWELT 4"X4". CABLEADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	8.15. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SALIDA DE ILUMINACIÓN PARA LUMINARIA LED PARA ILUMINACIÓN GENERAL DEL PARQUE. INCLUYE CABLEADO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	8.16. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SALIDA DE ILUMINACIÓN PARA LOCALES EN CU 1#12F+1#12T+1#12T AWG EN TUBERÍA PVC 3/4". INCLUYE BORNAS TERMINALES.
		
8.17. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SALIDA DE INTERRUPTOR SENCILLO PARA LOCALES EN CU 1#12F+1#12T+1#12T AWG EN TUBERÍA PVC 3/4". INCLUYE APARATO Y BORNAS TERMINALES.	8.18. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SALIDA DE TOMACORRIENTES PARA LOCALES EN CU 1#12F+1#12T+1#12T AWG EN TUBERÍA PVC 3/4". INCLUYE BORNAS TERMINALES.	8.19. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SALIDA DE ILUMINACIÓN PARA GRADAS EN CU 1#12F+1#12T+1#12T AWG EN TUBERÍA EMT 3/4". INCLUYE BORNAS TERMINALES.
		
8.20. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA CU 2#2F+1#8T AWG EN TUBERÍA PVC 1" PARA ILUMINACION CANCHA. INCLUYE BORNAS TERMINALES.	8.21. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA CU 2#4F+1#8T AWG EN TUBERÍA PVC 1" PARA ILUMINACION CANCHA. INCLUYE BORNAS TERMINALES.	8.22.SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA CU 2#8F+1#10T AWG EN TUBERÍA PVC 3/4" PARA ILUMINACION DEL PARQUE. INCLUYE BORNAS TERMINALES.
		
8.23. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA CU 2#10F+1#10N+1#12T AWG EN TUBERÍA PVC 3/4" PARA TABLEROS DE LOCALES. INCLUYE BORNAS	8.24. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE GFCI.	8.25. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE.
		
8.26. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PROYECTOR LED JETA PRO 500 W O SIMILAR.	8.27. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PROYECTOR LED JETA PRO 300 W O SIMILAR.	8.30. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LUMINARIA BALA LED RD 30 W O SIMILAR.
		
8.31. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED HERMÉTICA 2X18 W O SIMILAR.	8.32. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED EMERGENCIA 2X1,6 W O SIMILAR.	8.34. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BAJANTES. INCLUYE TUBERIA IMC DE 1/2", CAJA METALICA DOBLE FONDO, CONECTRO BIMETALICO Y CABLE DESNUDO 1/0 PARA CONEXIÓN AL ANILLO INFERIOR.

Deporte	**PROCESO:** APOYO A LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y CIENTÍFICA		**Versión:** 1
			Código: ATC-FR-046
	FORMATO: INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA O CONSULTORÍA		**Fecha:** DIA: 05/04/2026
MUNICIPIO	AGUSTIN CODAZZI		**REVISIÓN:**
FECHA DE CORTE DEL INFORME	**DIA: 05/04/2026**	**DE: (TOTAL DIAS)**	**CONTRATO No.** LP-001 DE 2025 **CONTRATISTA:** CONSORCIO PARQUE CAMILO TORRES

		
8.35. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CABLE DESNUDO #1/0.	INP. 8.41. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO AUTOMATIZADO PARA CONTROL DE ALUMBRADO EXTERIOR, INCLUYE ACCESORIOS PARA CONEXIÓN RESANE (OBRA CIVIL) Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	INP. 8.43. GABINETE DE MEDIDORES PARA 4 USUARIOS EN BAJA TENSIÓN, IP65, LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 16 Y PUERTA CALIBRE 14, COLOR RAL7035, PINTURA EPOXICA, CON BARRAJE PARA 200A. SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR.
		
INP. 8.44. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROYECTOR LED 440W, TEMPERATURA DE COLOR: 5000K, ACABADO GRIS, POTENCIA DE ENTRADA: 440W, FLUJO LUMINOSO: 71200LM, GRADO DE PROTECCIÓN: IP66/IK08, TENSIÓN DE OPERACIÓN: 100-277V, FRECUENCIA: 50/60HZ, ÁNGULO DE APERTURA: 45°, DIMENSIONES (LXWXH):546X495X71.5MM, PESO: 23.4KG, FACTOR DE POTENCIA: 0.95, REPRODUCCIÓN DE COLOR (IRC)≥70, DISTORSIÓN ARMÓNICA(THD)<20%, VIDA ÚTIL: 100000H, EFICACIA: 130LM/W.	INP. 8.46. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESPUMA EXPANSIVA MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (SIKA BOOM), PARA SELLADO DE DUCTOS EN SALIDAS DE CAJAS DE INSPECCIÓN.	

JULIO CESAR MARTINEZ DAZA

FIRMA: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
