


Id	Modo de tar	Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% compl	Costo
0		**0**	**OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARQUE METROPOLITANO DE MANIZALES**	**273 días**	**jue 17/07/25**	**sáb 30/05/26**	**90%**	**$ 6.831.683.528,00**
1		**1**	**OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARQUE METROPOLITANO DE MANIZALES**	**273 días**	**jue 17/07/25**	**sáb 30/05/26**	**90%**	**$ 6.831.683.528,00**
2		2	INICIO DE CONTRATO	0 días	jue 17/07/25	jue 17/07/25	100%	$ 0,00
3		3	LOGISTICA, REVISIÓN Y&0 AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS	0 días	vie 18/07/25	vie 18/07/25	100%	$ 0,00
4		**4**	**ZONA1**	**272 días**	**jue 17/07/25**	**vie 29/05/26**	**94%**	**$ 1.794.141.921,75**
5		5	**INICIO**	0 días	jue 17/07/25	jue 17/07/25	0%	$ 0,00
6		**6**	**PLAZOLETA METROPOLITANA Y TEATRINO**	**263 días**	**lun 28/07/25**	**vie 29/05/26**	**94%**	**$ 1.794.141.921,75**
7		**7**	**PRELIMINARES**	**19 días**	**lun 28/07/25**	**lun 18/08/25**	**100%**	**$ 45.816.641,50**
8		8	ROCERIA Y LIMPIEZA	2 días	lun 28/07/25	mar 29/07/25	100%	$ 4.966.068,25
9		9	LOCALIZACION Y REPLANTEO	5 días	mié 30/07/25	lun 4/08/25	100%	$ 18.647.419,00
10		1.	DESCAPOTE MECANICO e=0.20 m.	5 días	mar 5/08/25	sáb 9/08/25	100%	$ 5.951.888,25
11		1.	INSTALACION PROVISIONAL DE ACUEDUCTO	7 días	lun 11/08/25	lun 18/08/25	100%	$ 685.338,00
12		1.	INSTALACION PROVISIONAL DE ENERGIA	7 días	lun 11/08/25	lun 18/08/25	100%	$ 101.528,00
13		1.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CERRAMIENTO PROVISIONAL EN LÁMINA GALVANIZADA H= 2.4M (Incluye guadua cepa, puntillas y demás elementos para su correcta instalación y funcionamiento)	7 días	lun 11/08/25	lun 18/08/25	100%	$ 15.464.400,00

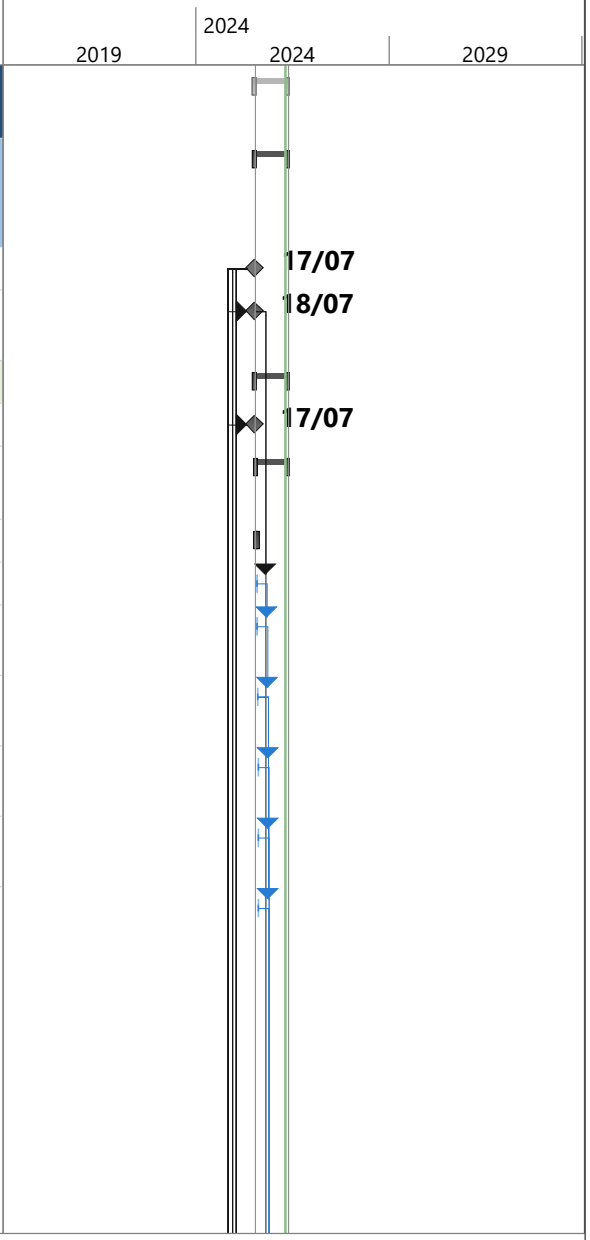


Id	Modo de tar	Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% compl	Costo
14		**1.**	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**	**106 días**	**lun 8/09/25**	**jue 8/01/26**	**100%**	**$ 214.127.210,20**
15		1.	EXCAVACIÓN EN ZANJA - MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0 M	105 días	lun 8/09/25	mié 7/01/26	100%	$ 0,00
16		1.	RELLENO, CONFORMACION Y COMPACTACION A MAQUINA CON MATERIAL DE PRESTAMO	88 días	lun 8/09/25	jue 18/12/25	100%	$ 78.833.898,00
17		1.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PIEDRAPLEN COMPACTO, INCLUYE TRANSPORTE	88 días	lun 8/09/25	jue 18/12/25	100%	$ 0,00
18		1.	EXCAVACION MECANICA EN ZANJA (RETROEXCAVADORA)	106 días	lun 8/09/25	jue 8/01/26	100%	$ 0,00
19		1.	EXCAVACIÓN EN ZANJA - CONGLOMERADO - 0.0 A 2.0 M	106 días	lun 8/09/25	jue 8/01/26	100%	$ 0,00
20		2.	EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS - CONGLOMERADO - 0.0 A 2.0 M	106 días	lun 8/09/25	jue 8/01/26	100%	$ 0,00
21		2.	EXCAVACIÓN MECANIZADA CIELO ABIERTO-MAT COMÚN/CONGLOM 0.0 A 6.0 M.	106 días	lun 8/09/25	jue 8/01/26	100%	$ 32.811.813,00
22		2.	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE MECANICO, DISPOSICIÓN EN BOTADERO (HASTA 25	106 días	lun 8/09/25	jue 8/01/26	100%	$ 102.481.499,20
23		**2.**	**MATERIAL GRANULAR**	**182 días**	**jue 16/10/25**	**vie 15/05/26**	**98%**	**$ 121.089.976,88**

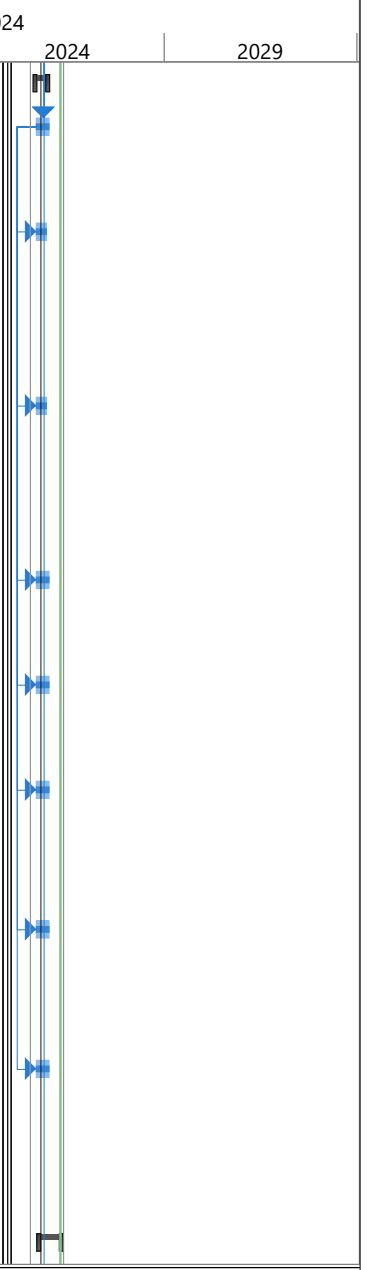


Id	Modo de tar	Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% compl	Costo
24		2.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION AFIRMADO COMPACTADO PARA ESTRUCTURAS	178 días	jue 16/10/25	lun 11/05/26	95%	$ 17.150.500,00
25		2.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUB BASE COMPACTADA CON CILINDRO	157 días	vie 14/11/25	vie 15/05/26	100%	$ 89.043.342,88
26		2.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION AFIRMADO PARA ANDENES	11 días	jue 16/04/26	mar 28/04/26	100%	$ 14.896.134,00
27		**2.**	**DRENAJES**	**40 días**	**mié 5/11/25**	**sáb 20/12/25**	**100%**	**$ 13.976.515,75**
28		2.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PASES EN TUBERIA PVC AGUAS LLUVIAS DE 4" PARA MUROS	15 días	mié 5/11/25	vie 21/11/25	100%	$ 4.001.824,00
29		2.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION FILTRO DRENAJE (0.30 x 1.20 m.) Tubo Drenaje Corrugado de 4" con filtro. Incluye relleno piedra filtro, Geotextil NT 3000	15 días	sáb 22/11/25	mar 9/12/25	100%	$ 2.854.857,75
30		3.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION FILTRO DRENAJE (0.30 x 1.80 m.) Tubo Drenaje Corrugado de 4" con filtro. Incluye relleno piedra filtro, Geotextil NT 3000	10 días	mié 10/12/25	sáb 20/12/25	100%	$ 7.119.834,00

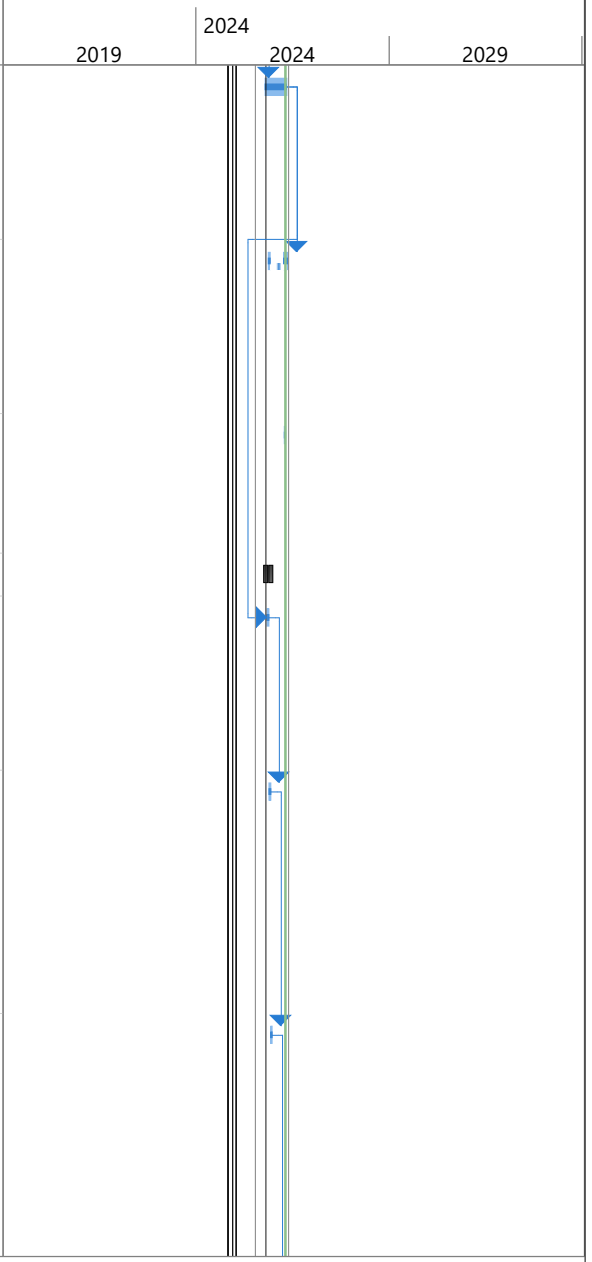


Id	Mo de tar	Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% compl	Costo
31		**3.**	**ZONAS DURAS**	**63 días**	**sáb 7/03/26**	**mar 19/05/26**	**89%**	**$ 921.211.407,62**
32		3.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PLACA CONTRAPISO CONCRETO 3000 PSI E=0.10 m	63 días	sáb 7/03/26	mar 19/05/26	95%	$ 258.404.213,70
33		3.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ANDEN CONCRETO 3000 PSI E= 0.10M. ACABADO: ESCOBIADO	40 días	lun 9/03/26	jue 23/04/26	100%	$ 71.675.820,00
34		3.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MUROS DE CONTENCION CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI H<3.0M. NO INCLUYE REFUERZO.	10 días	mar 10/03/26	vie 20/03/26	100%	$ 119.893.423,67
35		3.	ESTAMPADO SOBRE CONCRETO CON MOLDE METÁLICO HEXAGONAL	5 días	mar 14/04/26	sáb 18/04/26	0%	$ 3.885.907,50
36		3.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ZAPATA CONCRETO 3000 PSI	31 días	jue 12/03/26	jue 16/04/26	100%	$ 71.241.248,80
37		3.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESCALAS CONCRETO 3000 PSI E= 0.10M. SOBRE TIERRA ACABADO ESCOBIADO	26 días	mié 15/04/26	jue 14/05/26	75%	$ 34.032.341,00

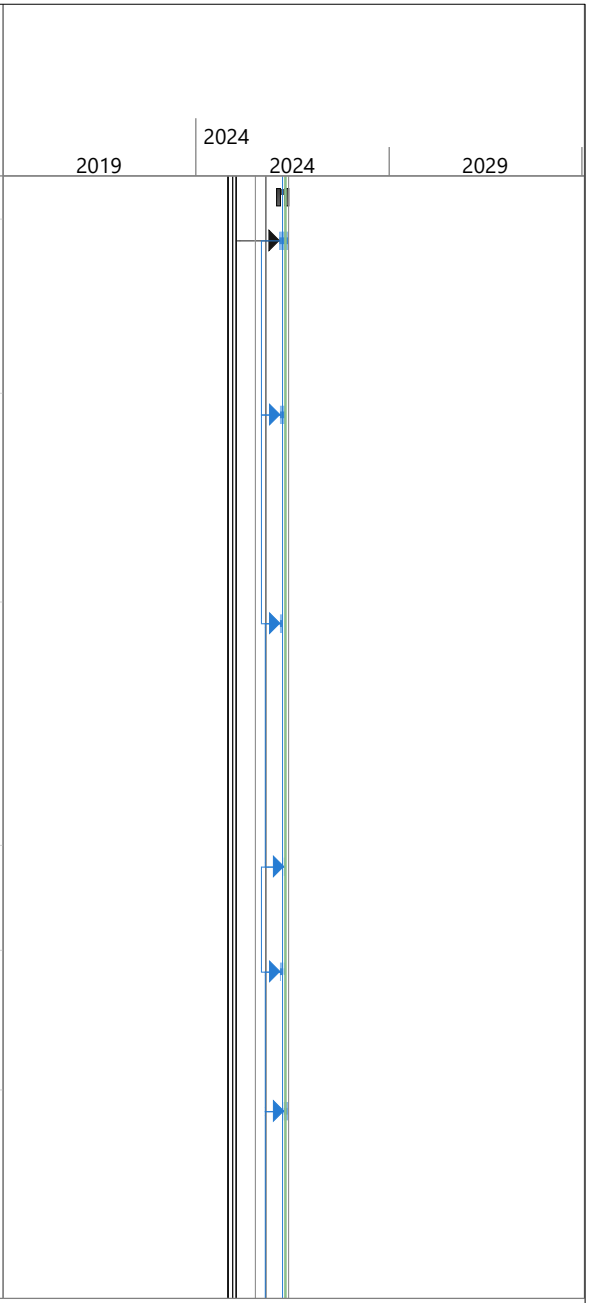


Id	Modo de tar	Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% compl	Costo
38		3.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VIGA CIMENTACION CONCRETO 4000 PSI	10 días	jue 16/04/26	lun 27/04/26	100%	$ 2.574.619,05
39		3.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VIGA AEREA CONCRETO 4000 PSI .	10 días	vie 17/04/26	mar 28/04/26	100%	$ 3.804.075,75
40		4.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION COLUMNAS CONCRETO 4000 PSI A LA VISTA	10 días	mié 6/05/26	sáb 16/05/26	0%	$ 18.506.490,00
41		4.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SOLADO DE LIMPIEZA 2.000 PSI E = 5 CM	15 días	sáb 14/03/26	mar 31/03/26	100%	$ 95.486.688,00
42		4.	SUMINISTRO,TRANSPOR E INSTALACION REVOQUE LISO MUROS 1:3 INTERIOR (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES	13 días	lun 4/05/26	lun 18/05/26	100%	$ 5.204.928,75
43		4.	SUMINISTRO,TRANSPOR E INSTALACION REVOQUE LISO COLUMNAS Y VIGAS UNA (1) CARA 1:3	15 días	sáb 14/03/26	mar 31/03/26	100%	$ 2.583.530,20

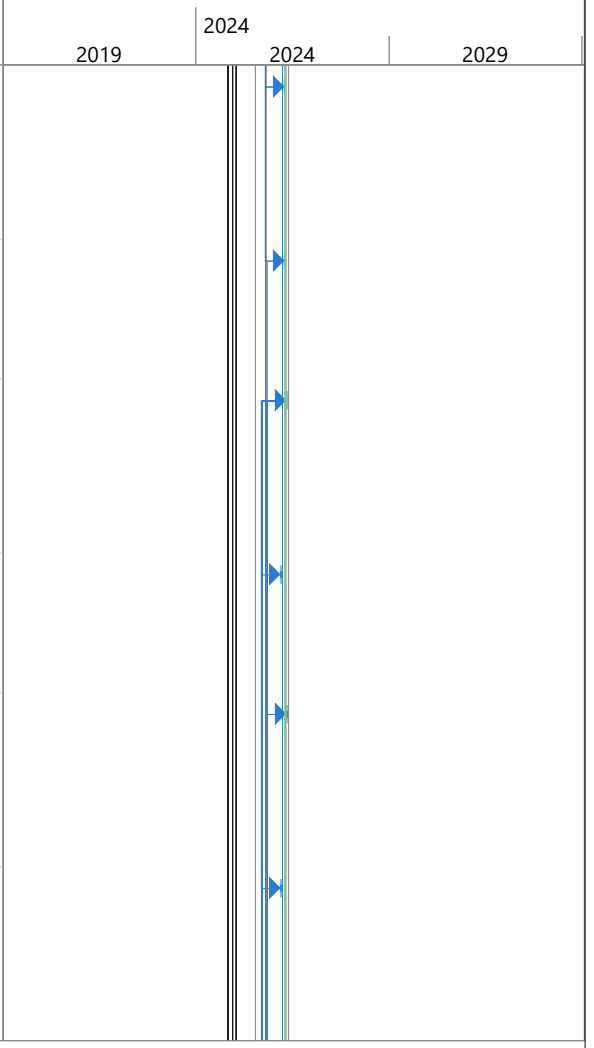


Id	Modo de tar	Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% compl	Costo
44		4.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR 3 MANOS FACHADAS (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO.	5 días	mié 18/03/26	lun 23/03/26	100%	$ 4.947.852,00
45		4.	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION ACERO DE 60000 PSI (INCLUYE ALAMBRE NEGRO Y FIGURACION)	15 días	sáb 14/03/26	mar 31/03/26	100%	$ 92.547.768,00
46		4.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MURO EN BLOQUE Concreto estructural liso 12*20*40 cm. (Incluye grouting y refuerzo)	5 días	jue 7/05/26	mar 12/05/26	0%	$ 6.410.939,04
47		4.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SARDINEL ANCHO = 10 CM H = ENTRE 17 Y 24 CM EN CONCRETO 3000 PSI	7 días	mié 18/03/26	mié 25/03/26	100%	$ 0,00

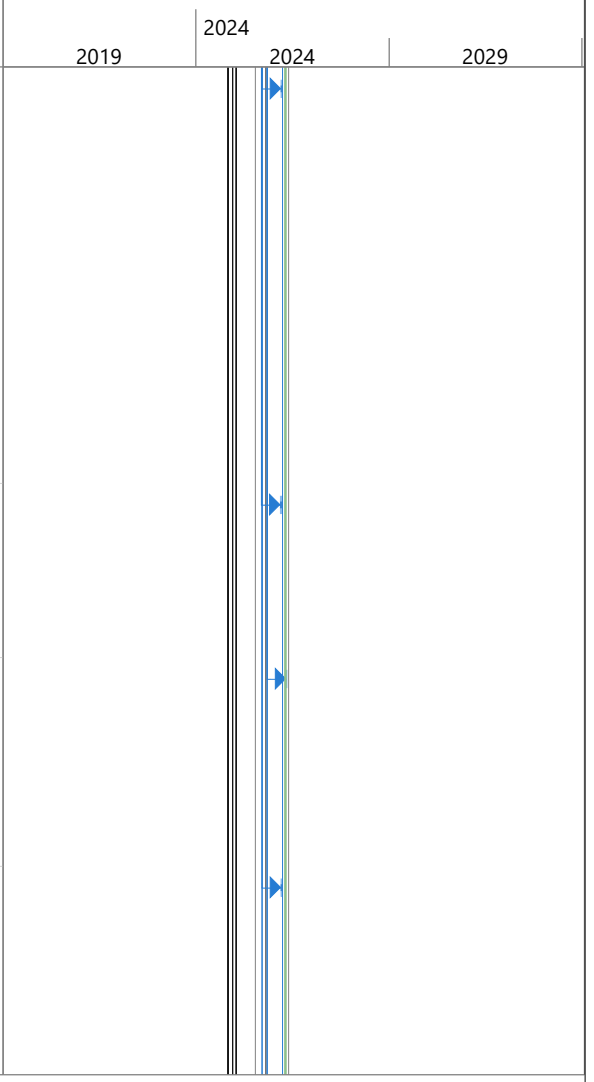


Id	Mo de tar	Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% compl	Costo
48		4.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SARDINEL ANCHO = 10 CM H = ENTRE 25 Y 30 CM EN CONCRETO 3000 PSI	6 días	mié 18/03/26	mar 24/03/26	100%	$ 0,00
49		4.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MALLA ELECTROSOLDADA M-131 Q-3.1 F 5.0mm c/.15m en ambos sentidos (Incluye alambre negro, colocación y traslapo).	44 días	mié 18/03/26	jue 7/05/26	98%	$ 65.848.114,16
50		5.	CORTE MECANIZADO DE PAVIMENTO A=5 mm profundidad un tercio del espesor	3 días	jue 7/05/26	sáb 9/05/26	95%	$ 7.991.637,50
51		5.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION JUNTA DE DILATACION PARA PLACA CONTRAPISO (Inlcuye sellante)	5 días	jue 7/05/26	mar 12/05/26	100%	$ 15.127.502,50
52		5.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ALISTADO PISOS Mortero 1:3 Impermeabilizado e= 0.03	4 días	lun 11/05/26	jue 14/05/26	100%	$ 6.043.986,00

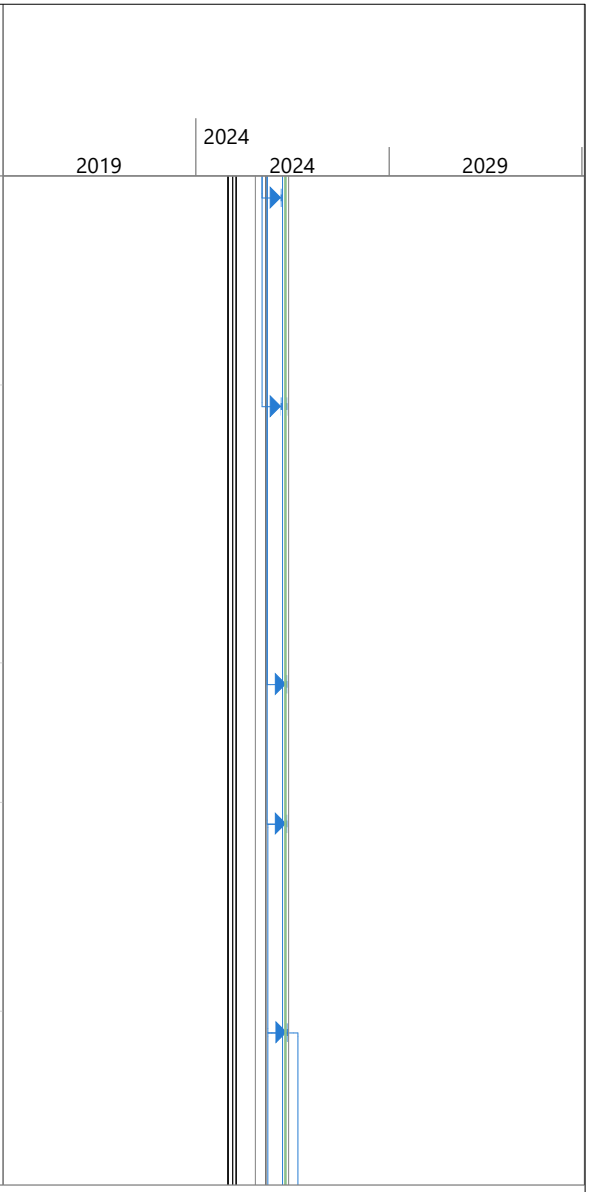


Id	Mo de tar	Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% compl	Costo
53		5.	SUMINISTRO,TRANSPOR E INSTALACION REVOQUE LISO MUROS 1:3 IMPERMEABILIZADO (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES) PARA ALTURAS MENORES A 3 METROS	3 días	vie 15/05/26	lun 18/05/26	100%	$ 4.025.322,00
54		5.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERAMICA PISO PARED CORONA O SIMILAR PARA PISCINAS. COLOR INSTALADO A 90° (INCLUYE BOQUILLA COLOR Y WIN). INCLUYE MORTERO DE PEGA Y/O NIVELACIÓN	8 días	sáb 9/05/26	lun 18/05/26	0%	$ 30.975.000,00
55		**5.**	**ACERO**	**115 días**	**mar 6/01/26**	**mar 19/05/26**	**91%**	**$ 236.094.300,00**
56		5.	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION ACERO DE 60000 PSI (INCLUYE ALAMBRE NEGRO Y FIGURACION)	110 días	mar 6/01/26	mié 13/05/26	96%	$ 90.123.000,00
57		5.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTRUCTURA METÁLICA EN Perfil Lámina Delgada PHR ASTM A500 Grado 50. Calibre según diseño (Incluye vigas, cerchas, correas, anticorrosivo y esmalte)	35 días	jue 5/03/26	mar 14/04/26	100%	$ 127.138.500,00

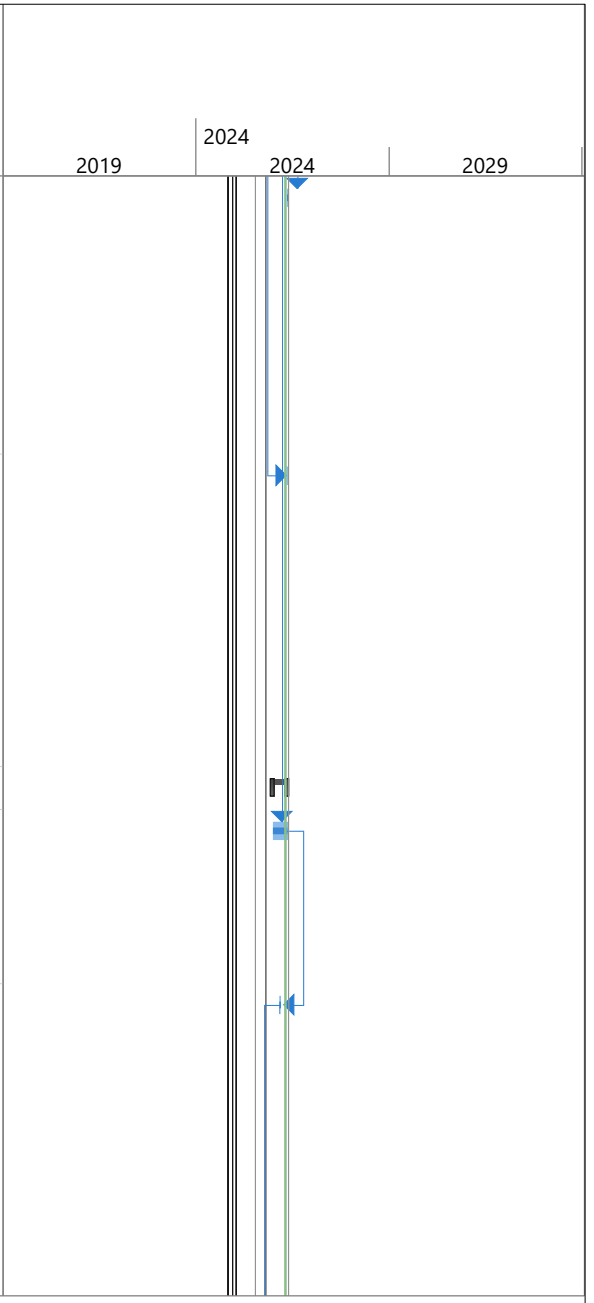


Id	Mo de tar	Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% compl	Costo
58		5.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ESTRUCTURA Y LONA PARA CUBRIR TODA EL AREA DEL TEATRINO (Incluye plataforma y escalas de acceso).	35 días	jue 9/04/26	mar 19/05/26	65%	$ 18.832.800,00
59		**5.**	**EMPRADIZACION**	**29 días**	**sáb 10/01/26**	**jue 12/02/26**	**100%**	**$ 0,00**
60		6.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE EMPRADIZACIÓN DE TALUDES Y ZONAS VERDES	29 días	sáb 10/01/26	jue 12/02/26	100%	$ 0,00
61		**6.**	**MOBILIARIO URBANO**	**17 días**	**sáb 9/05/26**	**jue 28/05/26**	**75%**	**$ 74.309.004,00**
62		6.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN BANCA MODULAR CORRIDA, EN CONCRETO PULIDO, IGUAL O SIMILAR A: TIPO KÖNKRETUS REFERENCIA: BANCA DOBBELT MÓDULO "A". A:1,8 M X H:0,45 M X P:0,45 M. (336 KG/UN)	17 días	sáb 9/05/26	jue 28/05/26	75%	$ 74.309.004,00
63		**6.**	**ADICIONALES ALCALDÍA DE MANIZALES**	**102 días**	**sáb 31/01/26**	**vie 29/05/26**	**74%**	**$ 136.390.457,80**
64		6.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TECHADO PROVISIONAL EN GUADUA Y PLÁSTICO	13 días	sáb 31/01/26	sáb 14/02/26	100%	$ 0,00

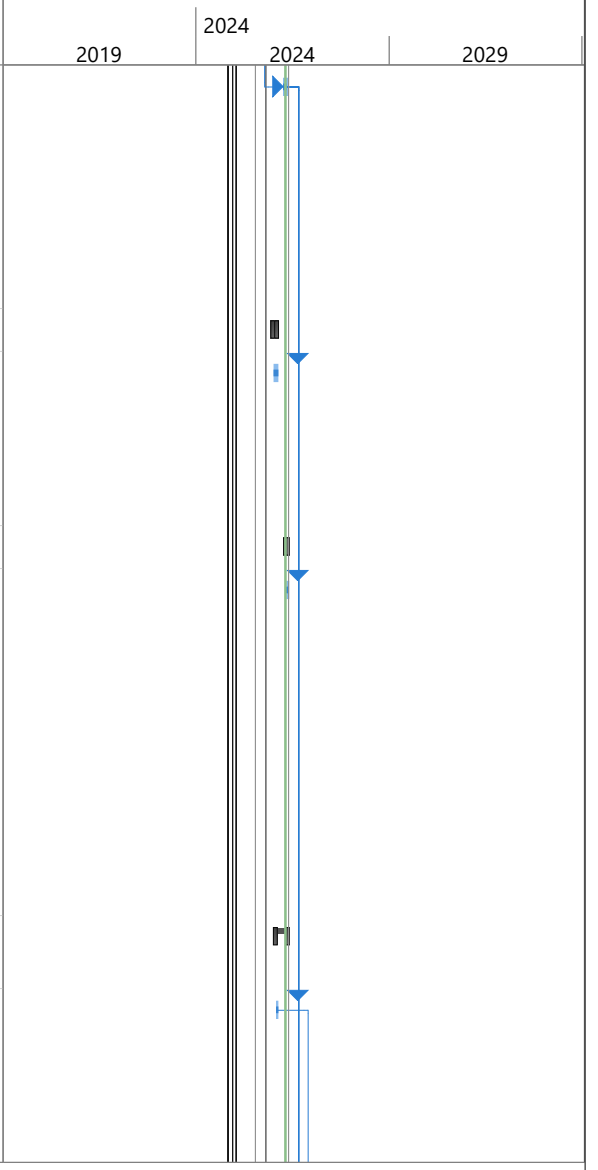


Id	Mo de tar	Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% compl	Costo
65		6.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TEJA TRASLUCIDA CINDURIB a=0.88 m. o similar. Cristal o Opal según diseño. (Incluye instalación, ganchos de fijación y el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje.)	7 días	vie 22/05/26	vie 29/05/26	75%	$ 5.406.849,00
66		6.	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE DILATACIONES ESTRUCTURALES CON ICOPOR E=2.0CM Y SELLO CON SIKAFLEX 1A PLUS	12 días	vie 8/05/26	jue 21/05/26	100%	$ 4.055.258,80
67		6.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MASTIL PARA BANDERAS EN TUBERIA A 500 GRADO C DE 4", ESPESOR DE PARED DE 6,0MM SOLDADO A PLATINA DE 3/4" CON PERNOS DE 3/4" INSCRUSTADOS EN PEDESTAL DE CONCRETO (NO INCLUIDO). INCLUYE: Pernos, platinas, tuercas, so	12 días	vie 8/05/26	jue 21/05/26	4%	$ 30.303.400,00

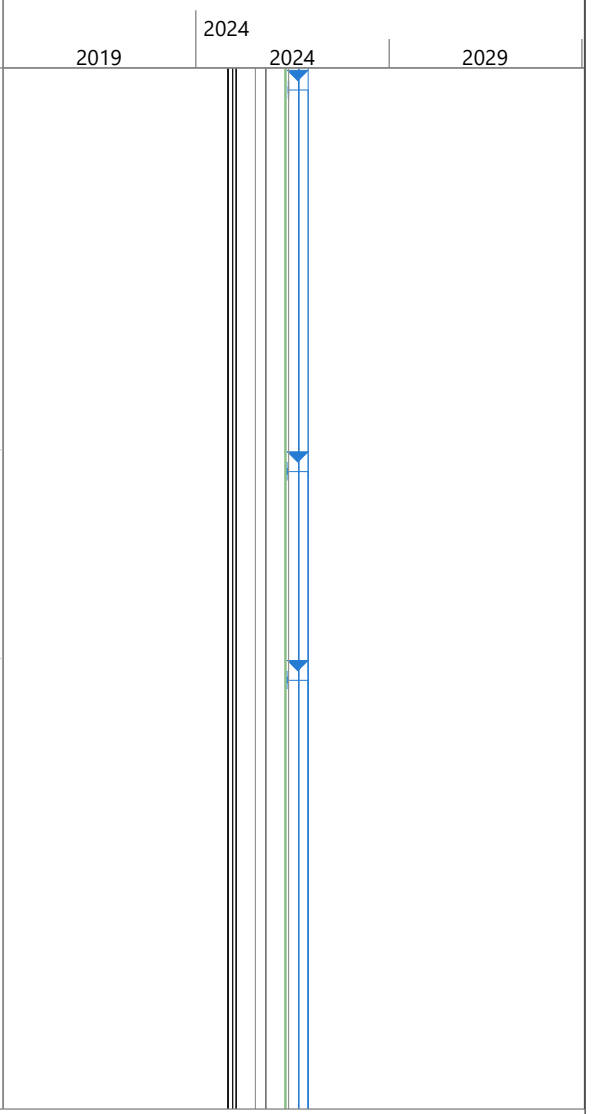


Id	Mo de tar	Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% compl	Costo
68		6.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUERTA METALICA LÁMINA COLD ROLLED CAL. 20 CON MARCO SENCILLO (INCLUYE ANTICORROSIVO + PINTURA ACEITE + MARCO EN LAMINA CAL. 20 CARGADOS EN CONCRETO). INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL	12 días	vie 8/05/26	jue 21/05/26	60%	$ 3.040.960,00
69		6.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VENTANA CORREDIZA FIJA EN ALUMINIO ANODIZADO VIDRIO 6 MM (INCLUYE MARCO EN PERFILERIA PB 3831 O SIMILAR Y VIDRIO CRISTAL DE 6 MM.). INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE, A	12 días	vie 8/05/26	jue 21/05/26	60%	$ 9.141.816,00

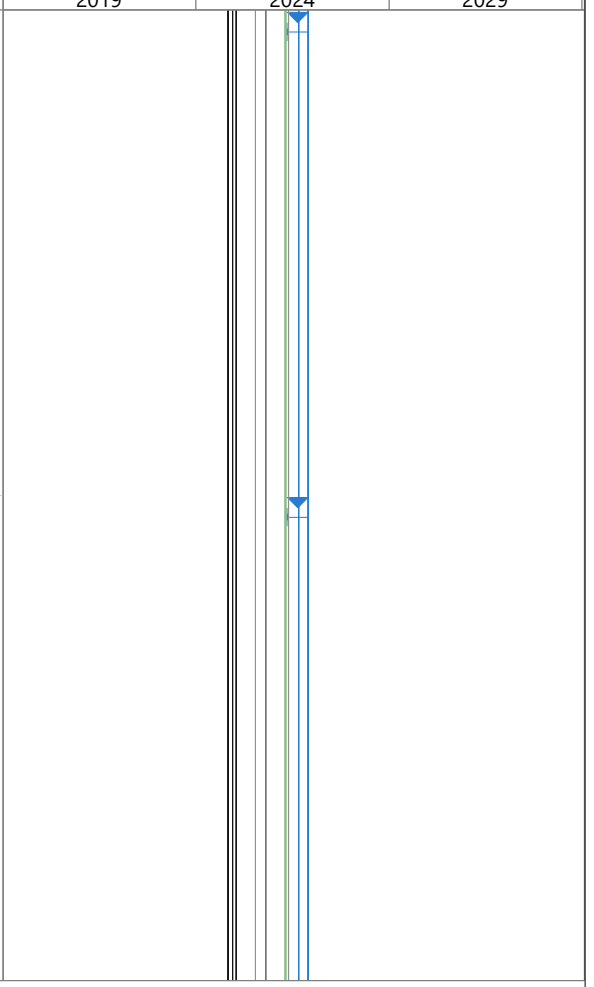


Id	Mo de tar	Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% compl	Costo
70		7.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUERTA METALICA TIPO CORTINA LÁMINA GALVANIZADA CAL. 20 (INCLUYE ANTICORROSIVO + PINTURA ELECTROSTATICA+ MARCO LÁMINA GALVANIZADA CAL. 20 CARGADOS EN CONCRETO). INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS	12 días	vie 8/05/26	jue 21/05/26	60%	$ 32.632.760,00
71		7.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN MESON ACERO INOXIDABLE CAL. 20 ANCHO = 0,60M	12 días	vie 8/05/26	jue 21/05/26	70%	$ 10.634.712,00
72		7.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN LAVAPLATO ACERO INOXIDABLE CA. 20 POCETA .70X.40X.35M	12 días	vie 8/05/26	jue 21/05/26	75%	$ 2.514.772,00
73		7.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CARTERA VENTANAS Y PUERTAS EN MORTERO 1:3 ANCHO 15-20 CMS.	12 días	vie 8/05/26	jue 21/05/26	75%	$ 1.778.600,00

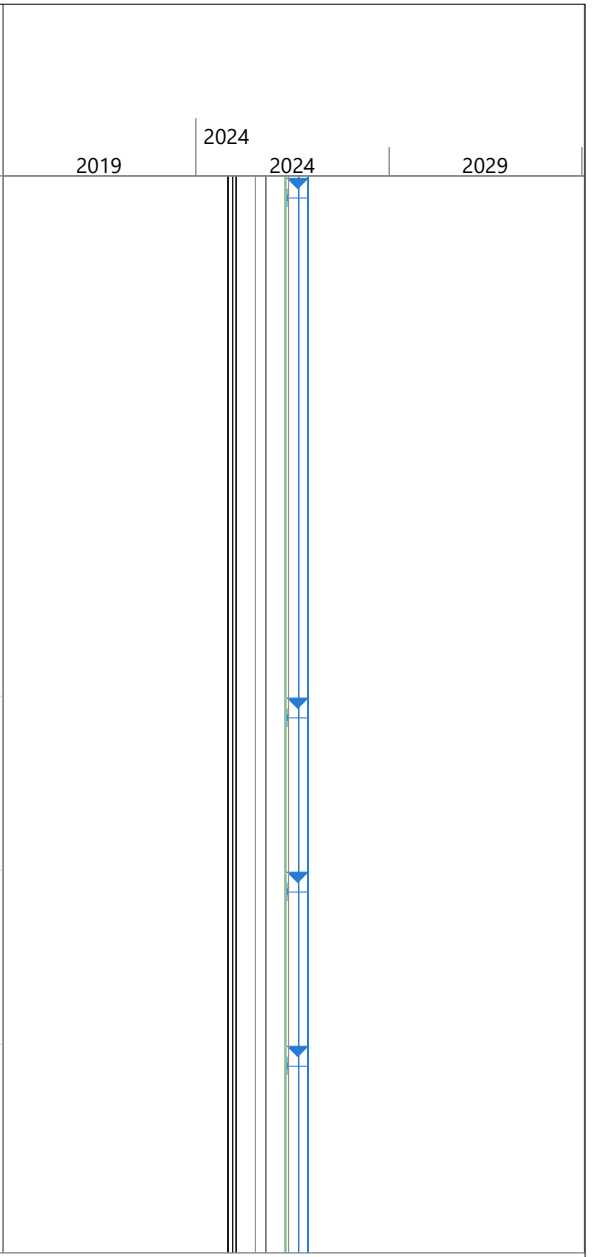


Id	Mo de tar	Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% compl	Costo
74		7.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR 3 MANOS FACHADAS (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO.	12 días	vie 8/05/26	jue 21/05/26	68%	$ 4.507.360,00
75		7.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PINTURA SOBRE REVOQUE VINILO 3 MANOS SOBRE MURO (INCLUYE 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES).COLOR SEGÚN DISEÑO POR M2	12 días	vie 8/05/26	jue 21/05/26	75%	$ 3.574.230,00
76		7.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO DESAGUE PVC 2" Aparatos sanitarios y desagues (INCLUYE CODO, YEE Y ACCESORIOS)	12 días	vie 8/05/26	jue 21/05/26	100%	$ 438.972,00

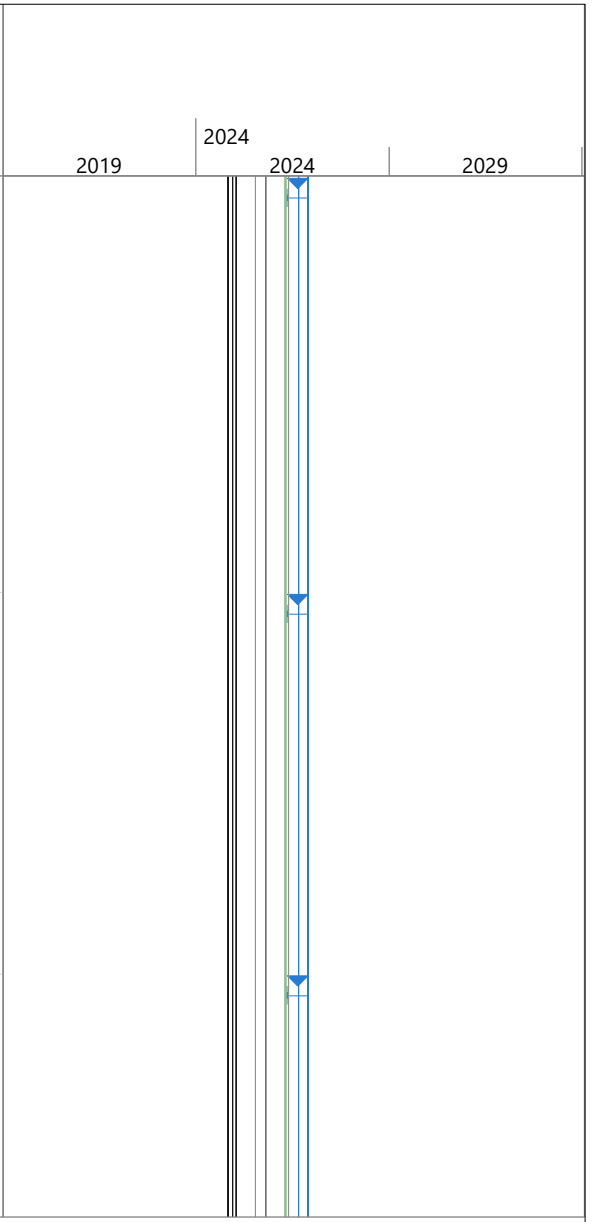


Id	Mo de tar	Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% compl	Costo
77		7.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC-S 3" (RED SANITARIA, INCLUYE ACCESORIOS)	12 días	vie 8/05/26	jue 21/05/26	100%	$ 2.103.960,00
78		7.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO AGUA FRIA 1/2" PVC -P (Incluye accesorios de instalación)	12 días	vie 8/05/26	jue 21/05/26	100%	$ 322.308,00
79		7.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BORDILLO BASE PARA MUROS EN DRYWALL Y/O SUPERBOARD H = ENTRE 0,15 Y 0,18M Y A= ENTRE 0,9 Y 0,10M	12 días	vie 8/05/26	jue 21/05/26	100%	$ 3.438.960,00
80		8.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE MURO EN SUPERBOARD 8 MM PINTADO Y TERMINADO (DOS CARAS). INCLUYE PERFILERÍA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	12 días	vie 8/05/26	jue 21/05/26	100%	$ 21.495.540,00
81		8.	INSTALACIONES ELECTRICAS E ILUMINACION	12 días	vie 8/05/26	jue 21/05/26	0%	$ 1.000.000,00
82		**8.**	**ASEO GENERAL Y LIMPIE**	**5 días**	**lun 25/05/26**	**vie 29/05/26**	**12%**	**$ 11.723.472,00**
83		8.	ASEO GENERAL	5 días	lun 25/05/26	vie 29/05/26	12%	$ 11.723.472,00
84		**8.**	**OBRAS EXTERIORES**	**44 días**	**sáb 28/03/26**	**mar 19/05/26**	**99%**	**$ 19.402.936,00**

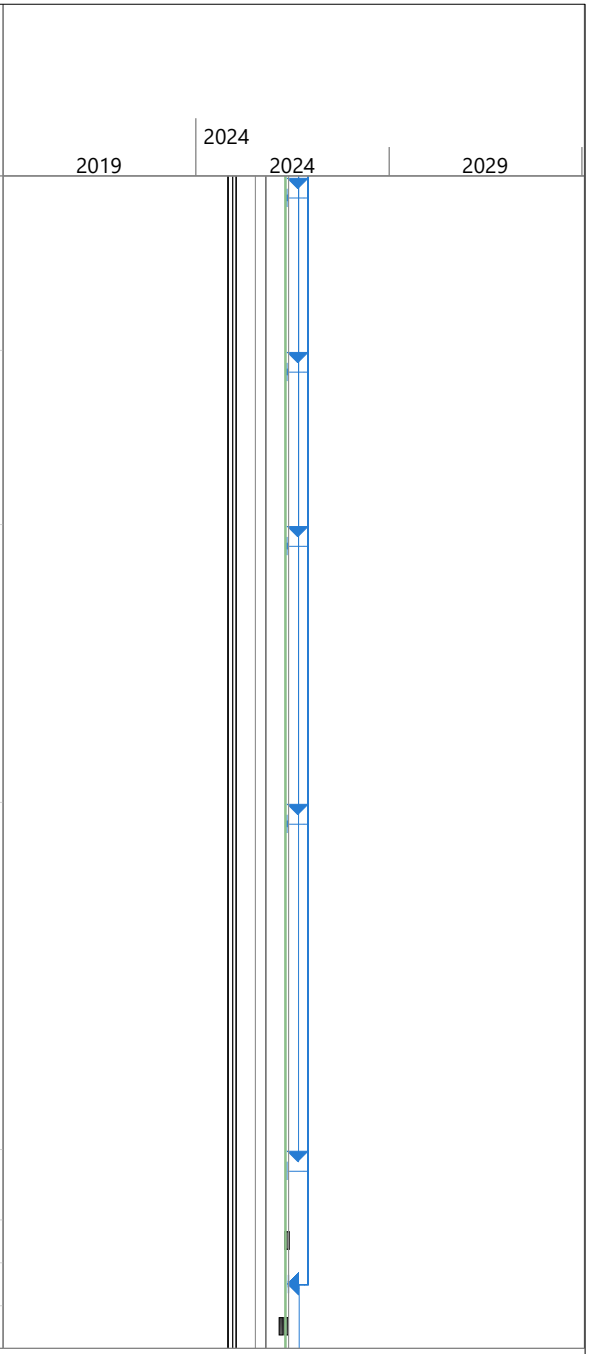


Id	Mo de tar	Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% compl	Costo
85		8.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PLATINA DE 3/4" CON PERNOS DE 3/4" L=0,4M INSCRUSTADOS EN PEDESTAL DE CONCRETO (NO INCLUIDO). INCLUYE: Pernos, platina de 0,27*0,27, tuercas, pintura, soldadura	44 días	sáb 28/03/26	mar 19/05/26	100%	$ 19.402.936,00
86		8..	**FIN**	0 días	mar 19/05/26	mar 19/05/26	0%	$ 0,00
87		**8.**	**ZONA 2**	**199 días**	**mar 30/09/25**	**mar 19/05/26**	**97%**	**$ 285.806.802,81**
88		8..	INICIO	0 días	mar 30/09/25	mar 30/09/25	0%	$ 0,00
89		**8.**	**PARQUEADEROS ZONA SUR Y ACCESOS**	**199 días**	**mar 30/09/25**	**mar 19/05/26**	**97%**	**$ 285.806.802,81**
90		**9.**	**PRELIMINARES**	**119 días**	**mar 30/09/25**	**sáb 14/02/26**	**100%**	**$ 18.215.654,18**
91		9.	ROCERIA Y LIMPIEZA	118 días	mié 1/10/25	sáb 14/02/26	100%	$ 2.010.929,70
92		9.	LOCALIZACION Y REPLANTEO	67 días	mié 1/10/25	mié 17/12/25	100%	$ 5.921.015,34
93		9.	DESCAPOTE MECANICO e=0.20 m.	39 días	jue 16/10/25	sáb 29/11/25	100%	$ 2.537.863,14
94		9.	INSTALACION PROVISIONAL DE ACUEDUCTO	13 días	mié 1/10/25	mié 15/10/25	100%	$ 685.338,00
95		9.	INSTALACION PROVISIONAL DE ENERGIA	13 días	mié 1/10/25	mié 15/10/25	100%	$ 101.528,00

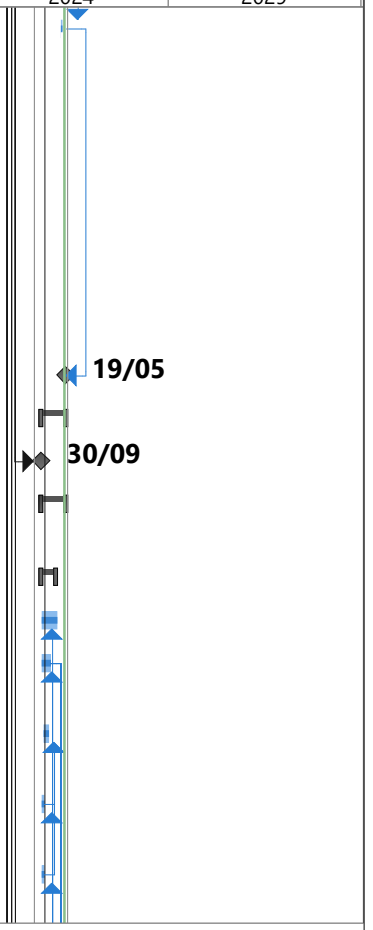


Id	Mo de tar	Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% compl	Costo
96		9.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CERRAMIENTO PROVISIONAL EN LÁMINA GALVANIZADA H= 2.4M (Incluye guadua cepa, puntillas y demás elementos para su correcta instalación y funcionamiento)	1 día	mar 30/09/25	mar 30/09/25	100%	$ 6.958.980,00
97		**9.**	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**	**152 días**	**sáb 15/11/25**	**lun 11/05/26**	**98%**	**$ 94.602.081,63**
98		9.	EXCAVACIÓN EN ZANJA - MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0 M	152 días	sáb 15/11/25	lun 11/05/26	95%	$ 0,00
99		9.	RELLENO, CONFORMACION Y COMPACTACION A MAQUINA CON MATERIAL DE PRESTAMO	152 días	sáb 15/11/25	lun 11/05/26	95%	$ 70.356.000,00
100		1.	EXCAVACION MECANICA EN ZANJA (RETROEXCAVADORA)	100 días	sáb 15/11/25	mié 11/03/26	100%	$ 0,00
101		1.	EXCAVACIÓN EN ZANJA - CONGLOMERADO - 0.0 A 2.0 M	100 días	sáb 15/11/25	mié 11/03/26	100%	$ 0,00
102		1.	EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS - CONGLOMERADO - 0.0 A 2.0 M	100 días	sáb 15/11/25	mié 11/03/26	100%	$ 0,00
103		1.	EXCAVACIÓN MECANIZADA CIELO ABIERTO-MAT COMÚN/CONGLOM 0.0 A 6.0 M.	100 días	sáb 15/11/25	mié 11/03/26	100%	$ 5.470.976,00

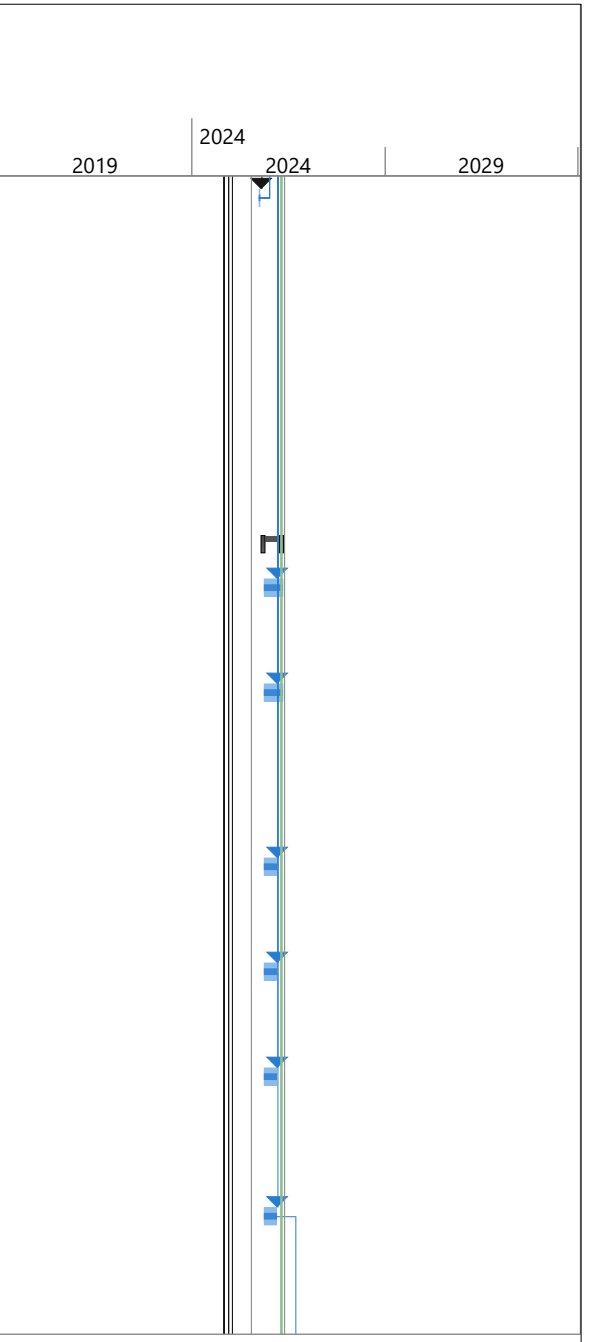


Id	Mo de tar	Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% compl	Costo
104		1.	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE MECANICO, DISPOSICIÓN EN BOTADERO (HASTA 25	1 día	mié 11/03/26	mié 11/03/26	95%	$ 18.775.105,63
105		**1.**	**MATERIAL GRANULAR**	**68 días**	**lun 2/03/26**	**mar 19/05/26**	**92%**	**$ 97.159.465,85**
106		1.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION AFIRMADO COMPACTADO PARA ESTRUCTURAS	61 días	lun 2/03/26	lun 11/05/26	95%	$ 622.835,40
107		1.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION AFIRMADO PARA ANDENES	60 días	mié 11/03/26	mar 19/05/26	95%	$ 3.658.700,85
108		1.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PIEDRAPLEN COMPACTO, INCLUYE TRANSPORTE	4 días	sáb 14/03/26	mié 18/03/26	100%	$ 0,00
109		1.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUB BASE COMPACTADA CON CILINDRO	20 días	sáb 18/04/26	lun 11/05/26	75%	$ 92.877.929,60
110		**1.**	**DRENAJES**	**24 días**	**sáb 3/01/26**	**vie 30/01/26**	**100%**	**$ 14.617.716,70**
111		1.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PASES EN TUBERIA PVC AGUAS LLUVIAS DE 4" PARA MUROS	8 días	sáb 3/01/26	lun 12/01/26	100%	$ 12.119.525,70

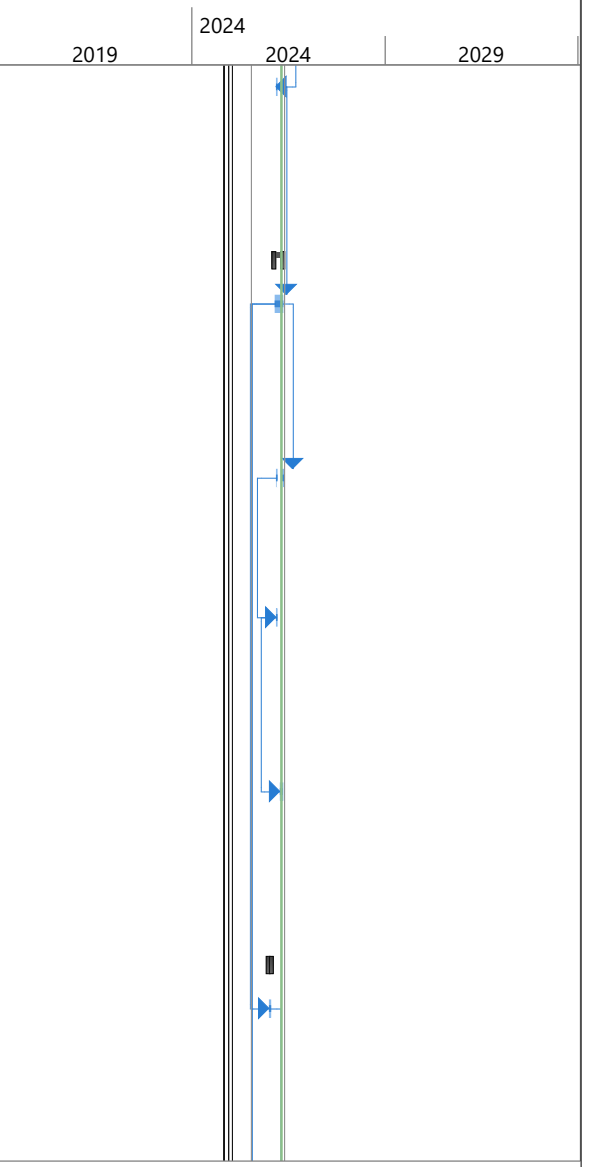


Id	Modo de tar	Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% compl	Costo
112		1.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION FILTRO DRENAJE (0.30 x 1.20 m.) Tubo Drenaje Corrugado de 4" con filtro. Incluye relleno piedra filtro, Geotextil NT 3000	9 días	mar 13/01/26	jue 22/01/26	100%	$ 0,00
113		1.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION FILTRO DRENAJE (0.30 x 1.80 m.) Tubo Drenaje Corrugado de 4" con filtro. Incluye relleno piedra filtro, Geotextil NT 3000	7 días	vie 23/01/26	vie 30/01/26	100%	$ 2.498.191,00
114		**1.**	**ZONAS DURAS**	**68 días**	**mar 24/02/26**	**mié 13/05/26**	**70%**	**$ 44.859.334,55**
115		1.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MEZCLA ASFALTICA TIPO MDC-19. Extendido mecánico y compactado	8 días	mar 5/05/26	mié 13/05/26	0%	$ 0,00
116		1.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DEMARCACION HORIZONTAL DE VIAS PINTURA TIPO TRAFICO	3 días	lun 11/05/26	mié 13/05/26	0%	$ 2.160.579,75

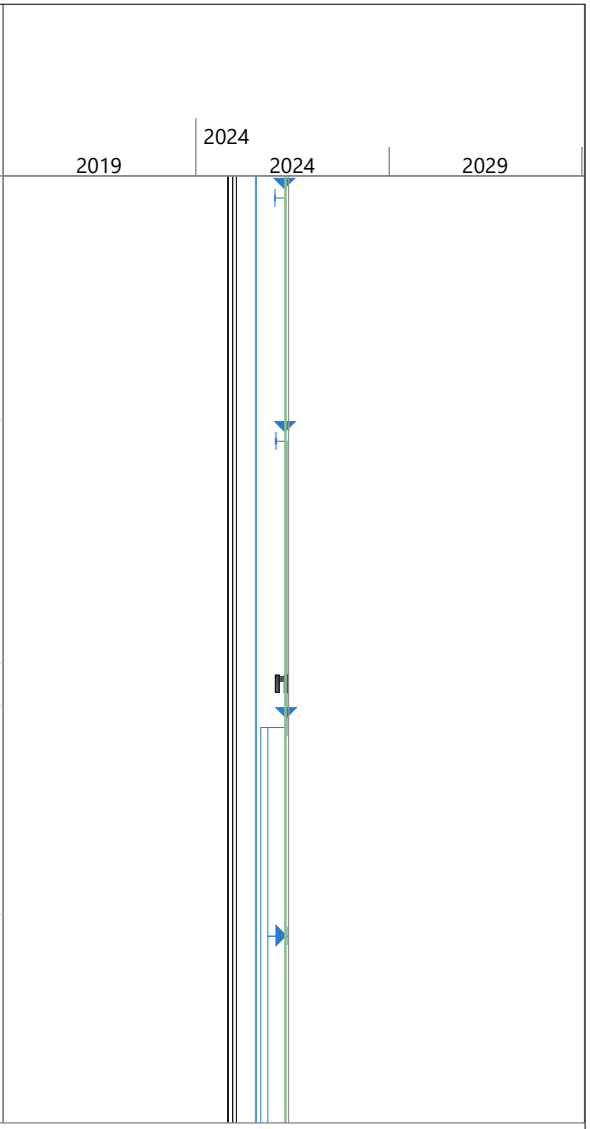


Id	Modo de tar	Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% compl	Costo
117		1.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TOPELLANTAS PREFABRICADO EN CONCRETO CON PINTURA ACRILICA PARA TRAFICO H=15 CM, B=20 CM Y L=50 CM.	3 días	lun 11/05/26	mié 13/05/26	0%	$ 6.088.836,00
118		1.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ANDEN CONCRETO 3000 PSI E= 0.10M. ACABADO: ESCOBIADO	5 días	vie 8/05/26	mié 13/05/26	100%	$ 22.776.982,80
119		1.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MUROS DE CONTENCION CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI H<3.0M. NO INCLUYE REFUERZO.	7 días	mar 5/05/26	mar 12/05/26	100%	$ 7.785.287,25
120		1.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ZAPATA CONCRETO 3000 PSI	7 días	mar 24/02/26	mar 3/03/26	100%	$ 6.047.648,75
121		1.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SARDINEL ANCHO = 10 CM H = ENTRE 17 Y 24 CM EN CONCRETO 3000 PSI	7 días	lun 6/04/26	lun 13/04/26	100%	$ 0,00

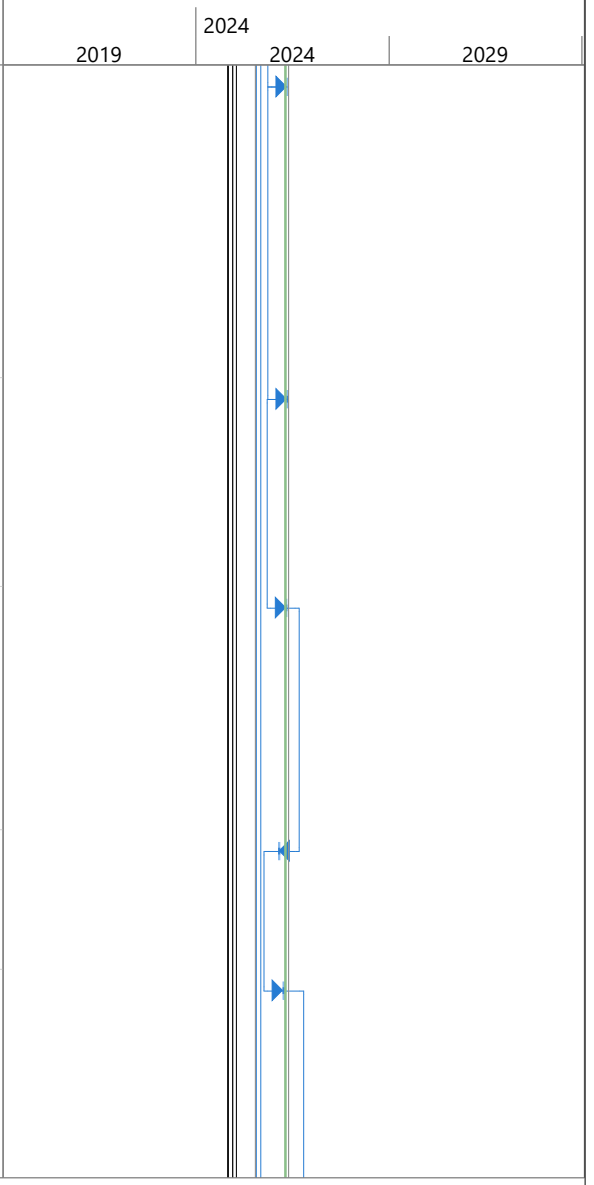


Id	Mo de tar	Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% compl	Costo
122		1.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SARDINEL ANCHO = 10 CM H = ENTRE 25 Y 30 CM EN CONCRETO 3000 PSI	6 días	mar 7/04/26	lun 13/04/26	100%	$ 0,00
123		**1.**	**ACERO**	**10 días**	**mar 3/03/26**	**vie 13/03/26**	**100%**	**$ 11.099.617,50**
124		1.	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION ACERO DE 60000 PSI (INCLUYE ALAMBRE NEGRO Y FIGURACION)	8 días	jue 5/03/26	vie 13/03/26	100%	$ 7.716.787,50
125		1.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MALLA ELECTROSOLDADA M-131 Q-3.1 F 5.0mm c/.15m en ambos sentidos (Incluye alambre negro, colocación y traslapo).	10 días	mar 3/03/26	vie 13/03/26	100%	$ 3.382.830,00
126		**1.**	**EMPRADIZACION**	**20 días**	**mar 20/01/26**	**mié 11/02/26**	**100%**	**$ 0,00**
127		1.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE EMPRADIZACIÓN DE TALUDES Y ZONAS VERDES	20 días	mar 20/01/26	mié 11/02/26	100%	$ 0,00
128		**1.**	**ADICIONALES ALCALDÍA DE MANIZALES**	**75 días**	**lun 26/01/26**	**mié 22/04/26**	**100%**	**$ 392.444,40**
129		1.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TECHADO PROVISIONAL EN GUADUA Y PLÁSTICO	15 días	lun 26/01/26	mié 11/02/26	100%	$ 0,00

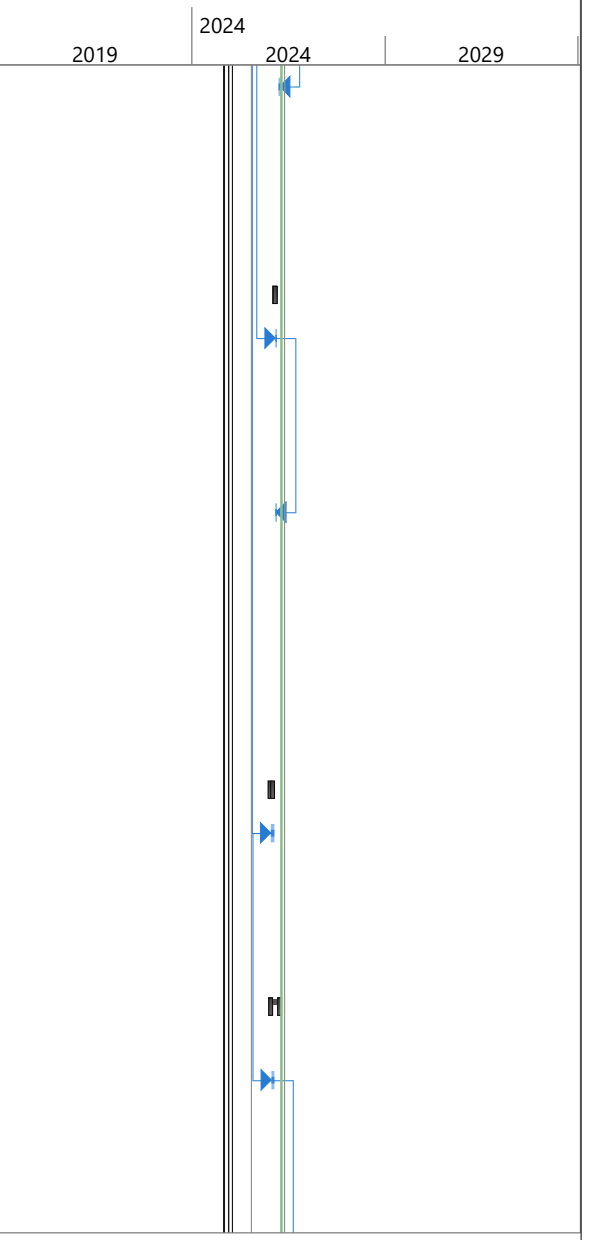


Id	Mo de tar	Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% compl	Costo
130		1.	CONFORMACIÓN DE TALUDES CON EQUIPO MECÁNICO	7 días	mié 4/02/26	mié 11/02/26	100%	$ 0,00
131		1.	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE DILATACIONES ESTRUCTURALES CON ICOPOR E=2.0CM Y SELLO CON SIKAFLEX 1A PLUS	16 días	sáb 4/04/26	mié 22/04/26	100%	$ 392.444,40
132		**1.**	**ASEO GENERAL Y LIMPIE**	**5 días**	**jue 7/05/26**	**mar 12/05/26**	**60%**	**$ 4.860.488,00**
133		1.	ASEO GENERAL	5 días	jue 7/05/26	mar 12/05/26	60%	$ 4.860.488,00
134		1..	FIN	0 días	mar 12/05/26	mar 12/05/26	0%	$ 0,00
135		**1.**	**ZONA 3**	**228 días**	**sáb 30/08/25**	**sáb 23/05/26**	**76%**	**$ 189.799.304,60**
136		1..	INICIO	0 días	sáb 30/08/25	sáb 30/08/25	0%	$ 0,00
137		**1.**	**PARQUEADERO ZONA NORT**	**228 días**	**sáb 30/08/25**	**sáb 23/05/26**	**76%**	**$ 189.799.304,60**
138		**1.**	**PRELIMINARES**	**208,89 d**	**sáb 30/08/25**	**jue 30/04/26**	**100%**	**$ 15.516.407,84**
139		1.	ROCERIA Y LIMPIEZA	26 días	sáb 30/08/25	mar 30/09/25	100%	$ 1.886.040,00
140		1.	LOCALIZACION Y REPLANTEO	18 días	vie 10/04/26	jue 30/04/26	100%	$ 5.847.130,44
141		1.	DESCAPOTE MECANICO e=0.20 m.	18 días	vie 10/04/26	jue 30/04/26	100%	$ 2.380.248,00
142		1.	INSTALACION PROVISIONAL DE ACUEDUCTO	26 días	sáb 30/08/25	mar 30/09/25	100%	$ 685.338,00
143		1.	INSTALACION PROVISIONAL DE ENERGIA	26 días	sáb 30/08/25	mar 30/09/25	100%	$ 101.528,00

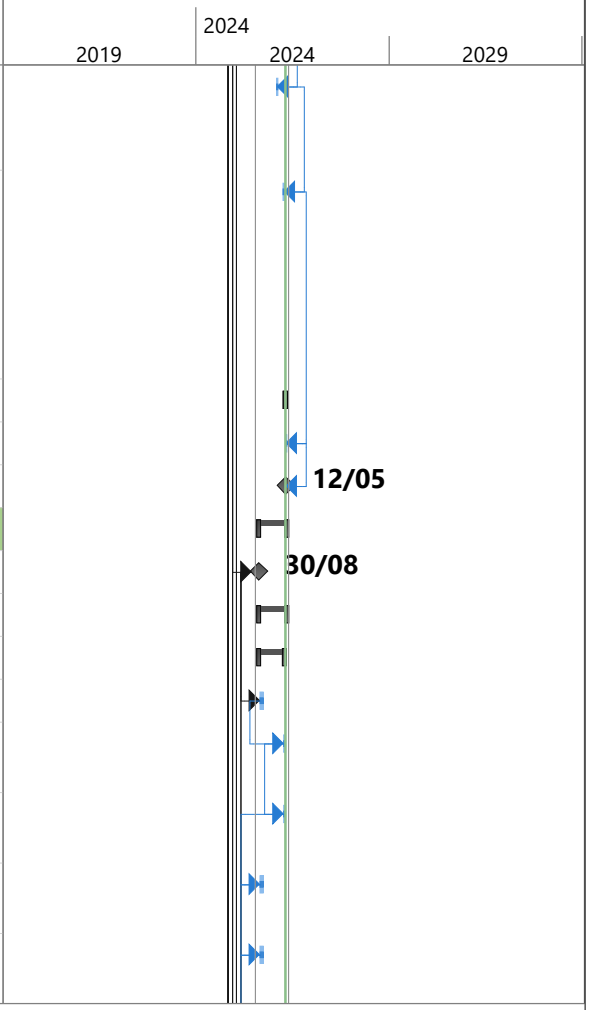


Id	Mo de tar	Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% compl	Costo
144		1.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CERRAMIENTO PROVISIONAL EN LÁMINA GALVANIZADA H= 2.4M (Incluye guadua cepa, puntillas y demás elementos para su correcta instalación y funcionamiento)	26 días	sáb 30/08/25	mar 30/09/25	100%	$ 4.616.123,40
145		**1.**	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**	**37 días**	**vie 3/04/26**	**sáb 16/05/26**	**85%**	**$ 50.827.881,30**
146		1.	EXCAVACIÓN EN ZANJA - MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0 M	9 días	vie 3/04/26	mar 14/04/26	100%	$ 0,00
147		1.	EXCAVACION MECANICA EN ZANJA (RETROEXCAVADORA)	37 días	vie 3/04/26	sáb 16/05/26	78%	$ 8.232.120,00
148		1.	EXCAVACIÓN EN ZANJA - CONGLOMERADO - 0.0 A 2.0 M	9 días	vie 3/04/26	mar 14/04/26	100%	$ 31.804.344,00
149		1.	EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS - CONGLOMERADO - 0.0 A 2.0 M	9 días	vie 3/04/26	mar 14/04/26	100%	$ 1.725.300,00
150		1.	EXCAVACIÓN MECANIZADA CIELO ABIERTO-MAT COMÚN/CONGLOM 0.0 A 6.0 M.	9 días	vie 3/04/26	mar 14/04/26	100%	$ 9.066.117,30
151		1.	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE MECANICO, DISPOSICIÓN EN BOTADERO (HASTA 25	29 días	vie 3/04/26	jue 7/05/26	75%	$ 0,00
152		**1.**	**MATERIAL GRANULAR**	**14 días**	**jue 7/05/26**	**sáb 23/05/26**	**0%**	**$ 104.453.111,18**

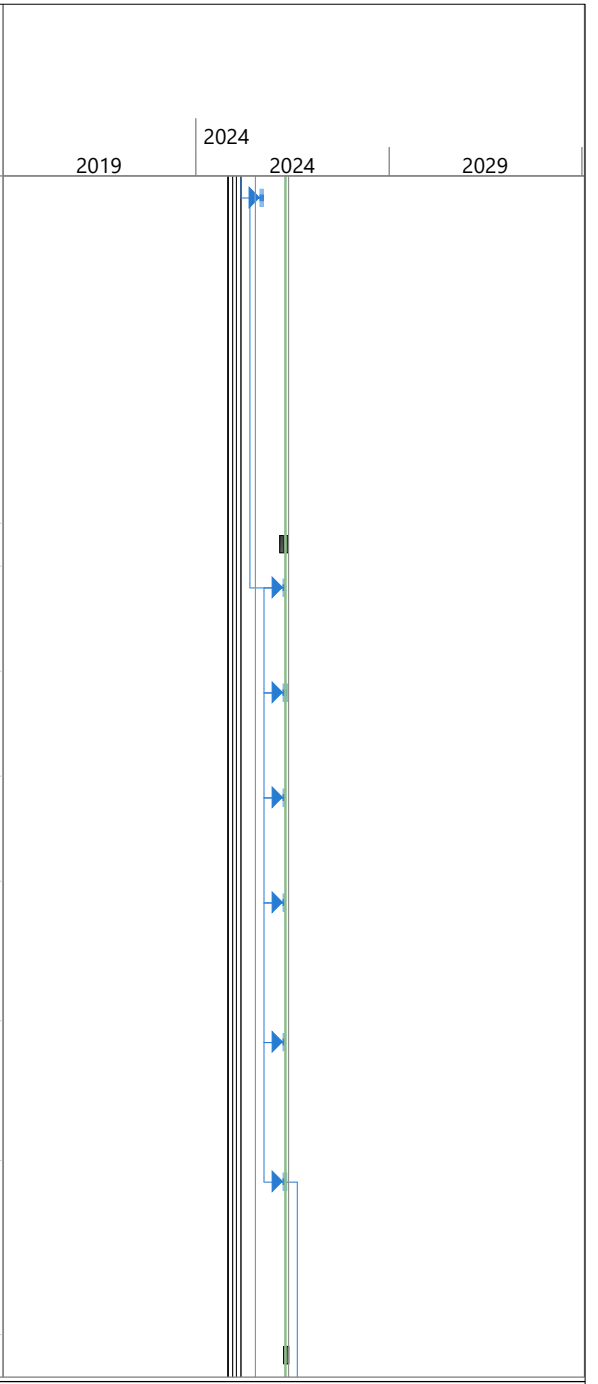


Id	Mo de tar	Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% compl	Costo
153		1.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION AFIRMADO COMPACTADO PARA ESTRUCTURAS	9 días	jue 7/05/26	lun 18/05/26	0%	$ 16.897.795,20
154		1.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION AFIRMADO PARA ANDENES	5 días	lun 18/05/26	sáb 23/05/26	0%	$ 14.180.306,40
155		1.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUB BASE COMPACTADA CON CILINDRO	5 días	lun 18/05/26	sáb 23/05/26	0%	$ 73.375.009,58
156		**1.**	**ZONAS DURAS**	**5 días**	**lun 18/05/26**	**sáb 23/05/26**	**0%**	**$ 4.023.914,40**
157		1.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MEZCLA ASFALTICA TIPO MDC-19. Extendido mecánico y compactado	5 días	lun 18/05/26	sáb 23/05/26	0%	$ 0,00
158		1.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DEMARCACION HORIZONTAL DE VIAS PINTURA TIPO TRAFICO	5 días	lun 18/05/26	sáb 23/05/26	0%	$ 0,00

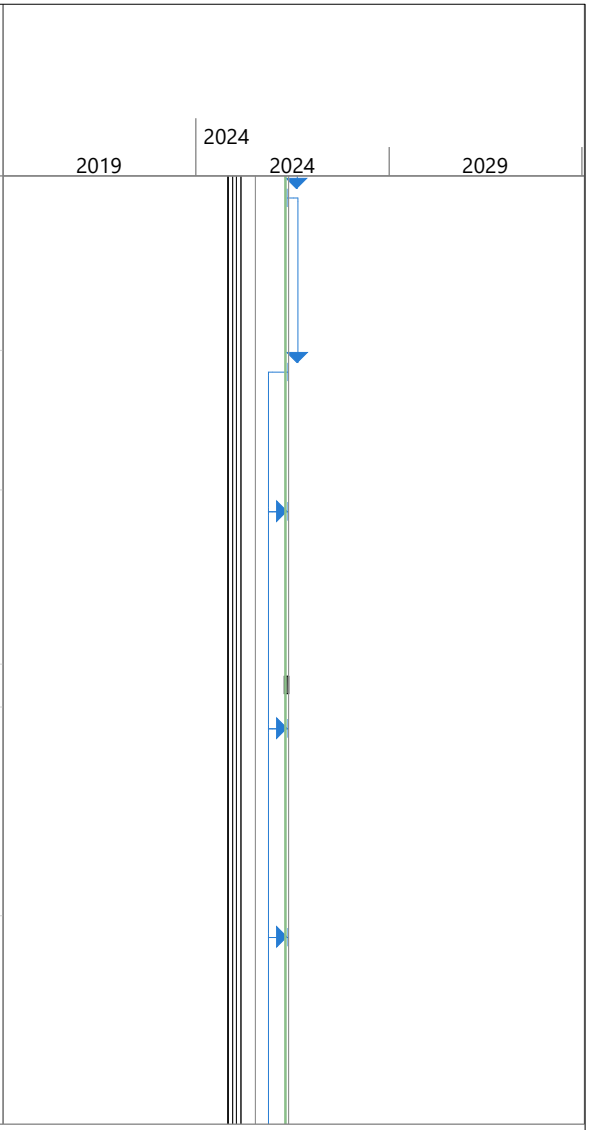


Id	Mo de tar	Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% compl	Costo
159		1.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TOPELLANTAS PREFABRICADO EN CONCRETO CON PINTURA ACRILICA PARA TRAFICO H=15 CM, B=20 CM Y L=50 CM.	5 días	lun 18/05/26	sáb 23/05/26	0%	$ 0,00
160		1.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ANDEN CONCRETO 3000 PSI E= 0.10M. ACABADO: ESCOBIADO	5 días	lun 18/05/26	sáb 23/05/26	0%	$ 4.023.914,40
161		1.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SARDINEL ANCHO = 10 CM H = ENTRE 17 Y 24 CM EN CONCRETO 3000 PSI	5 días	lun 18/05/26	sáb 23/05/26	0%	$ 0,00
162		1.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SARDINEL ANCHO = 10 CM H = ENTRE 25 Y 30 CM EN CONCRETO 3000 PSI	5 días	lun 18/05/26	sáb 23/05/26	0%	$ 0,00
163		**1.**	**ACERO**	**9 días**	**mar 10/03/26**	**jue 19/03/26**	**100%**	**$ 2.009.670,00**
164		1.	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION ACERO DE 60000 PSI (INCLUYE ALAMBRE NEGRO Y FIGURACION)	9 días	mar 10/03/26	jue 19/03/26	100%	$ 1.412.700,00

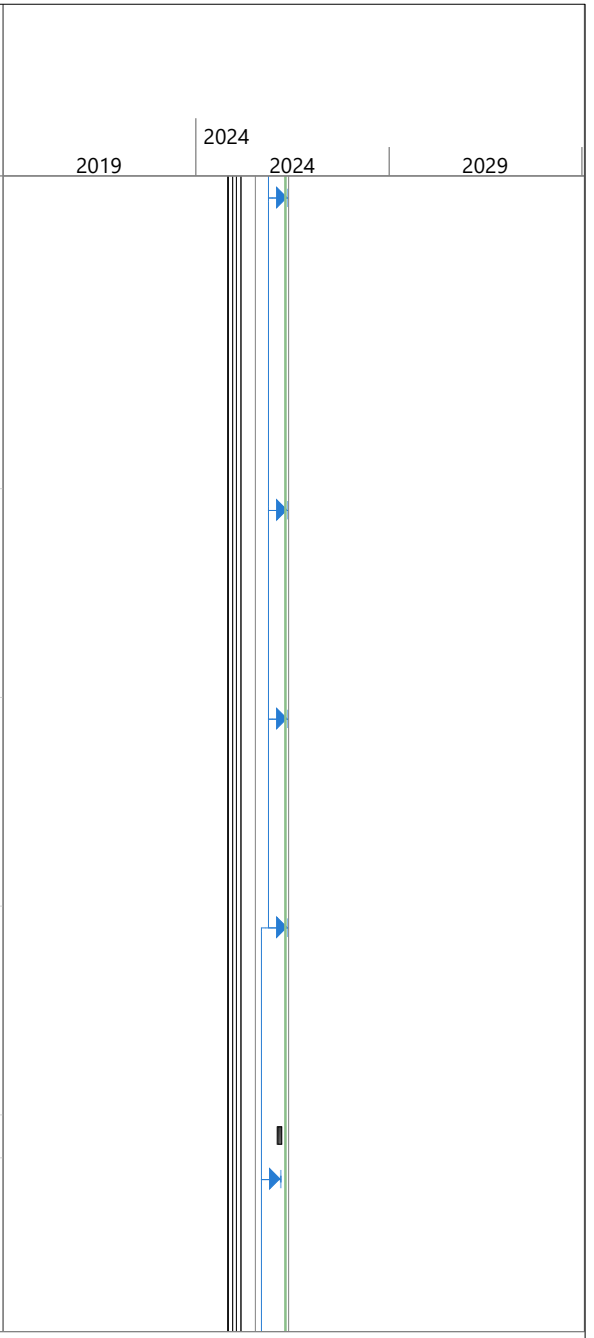


Id	Mo de tar	Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% compl	Costo
165		1.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MALLA ELECTROSOLDADA M-131 Q-3.1 F 5.0mm c/.15m en ambos sentidos (Incluye alambre negro, colocación y traslapo).	9 días	mar 10/03/26	jue 19/03/26	100%	$ 596.970,00
166		**1.**	**EMPRADIZACION**	**28 días**	**mié 14/01/26**	**sáb 14/02/26**	**100%**	**$ 0,00**
167		1.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE EMPRADIZACIÓN DE TALUDES Y ZONAS VERDES	28 días	mié 14/01/26	sáb 14/02/26	100%	$ 0,00
168		**1.**	**MOBILIARIO URBANO**	**9 días**	**mar 5/05/26**	**jue 14/05/26**	**0%**	**$ 8.248.302,00**
169		1.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE BARANDA METALICA CONFORMADA POR 3 VARILLAS LISAS 5/8" CADA 20 CM SOLDADAS A TUBO AGUAS NEGRAS 2" EN LA PARTE SUPERIOR Y EN LA PARTE INFERIOR A PLATINA DE 1-1/2" X 1/4" PINTURA COLOR OXIDO SEGÚN DISEÑO	9 días	mar 5/05/26	jue 14/05/26	0%	$ 0,00

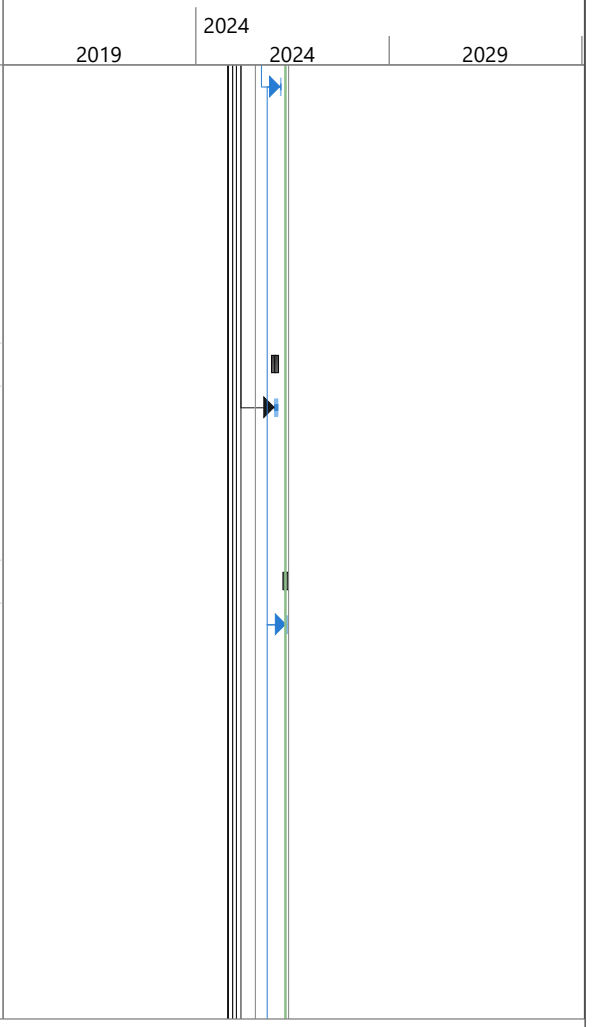


Id	Mo de tar	Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% compl	Costo
170		1.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN BICIPARQUEADEROS, EN CONCRETO PULIDO, IGUAL O SIMILAR A: TIPO KÖNKRETUS REFERENCIA: BICIPARQUEADERO MC 60. A:0,13 M X H:0,80 M X P:0,69 M. (41 KG/UN) (MU 10). INCLUYE DADOS DE CONCRETO, ACERO Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU	9 días	mar 5/05/26	jue 14/05/26	0%	$ 8.248.302,00
171		**1.**	**ADICIONALES ALCALDÍA DE MANIZALES**	**199 días**	**sáb 30/08/25**	**lun 20/04/26**	**50%**	**$ 0,00**
172		1.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TECHADO PROVISIONAL EN GUADUA Y PLÁSTICO	1 día	sáb 30/08/25	lun 1/09/25	100%	$ 0,00
173		1.	CONFORMACIÓN DE TALUDES CON EQUIPO MECÁNICO	1 día	sáb 18/04/26	lun 20/04/26	0%	$ 0,00
174		**1.**	**ASEO GENERAL Y LIMPIE**	**11 días**	**sáb 9/05/26**	**jue 21/05/26**	**0%**	**$ 4.720.017,88**
175		1.	ASEO GENERAL	5 días	sáb 9/05/26	jue 14/05/26	0%	$ 4.720.017,88
176		1..	FIN	0 días	jue 21/05/26	jue 21/05/26	0%	$ 0,00
177		**1.**	**ZONA 4**	**228,89 d**	**sáb 30/08/25**	**lun 25/05/26**	**78%**	**$ 396.896.079,04**
178		1..	INICIO	0 días	sáb 30/08/25	sáb 30/08/25	100%	$ 0,00
179		**1.**	**ACCESO NORTE + GRADERIAS + BATERIAS SANITARIAS**	**228,89 días**	**sáb 30/08/25**	**lun 25/05/26**	**78%**	**$ 396.896.079,04**
180		**1.**	**PRELIMINARES**	**170 días**	**sáb 30/08/25**	**mar 17/03/26**	**100%**	**$ 5.492.498,00**

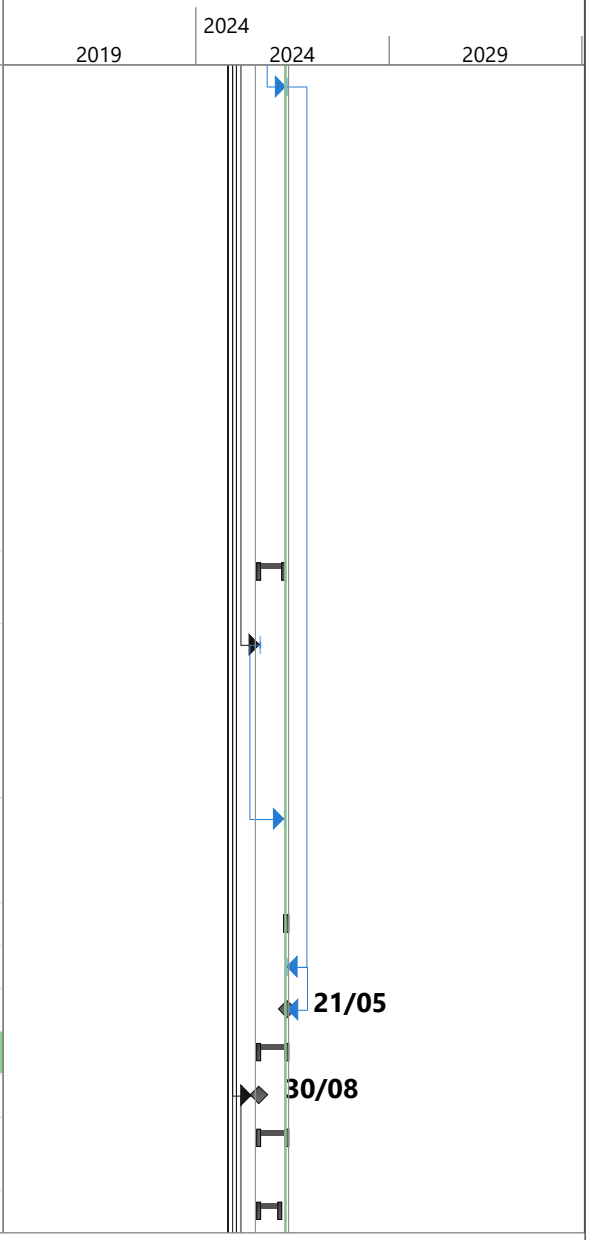


Id	Mo de tar	Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% compl	Costo
181		1.	ROCERIA Y LIMPIEZA	170 días	sáb 30/08/25	mar 17/03/26	100%	$ 0,00
182		1.	LOCALIZACION Y REPLANTEO	170 días	sáb 30/08/25	mar 17/03/26	100%	$ 2.385.972,00
183		1.	DESCAPOTE MECANICO e=0.20 m.	170 días	sáb 30/08/25	mar 17/03/26	100%	$ 0,00
184		1.	INSTALACION PROVISIONAL DE ACUEDUCTO	170 días	sáb 30/08/25	mar 17/03/26	100%	$ 685.338,00
185		1.	INSTALACION PROVISIONAL DE ENERGIA	170 días	sáb 30/08/25	mar 17/03/26	100%	$ 101.528,00
186		1.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CERRAMIENTO PROVISIONAL EN LÁMINA GALVANIZADA H= 2.4M (Incluye guadua cepa, puntillas y demás elementos para su correcta instalación y funcionamiento)	170 días	sáb 30/08/25	mar 17/03/26	100%	$ 2.319.660,00
187		**1.**	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**	**178 días**	**lun 20/10/25**	**jue 14/05/26**	**85%**	**$ 8.274.557,20**
188		1.	EXCAVACIÓN EN ZANJA - MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0 M	84 días	lun 20/10/25	dom 25/01/26	100%	$ 0,00
189		1.	EXCAVACIÓN EN ZANJA - CONGLOMERADO - 0.0 A 2.0 M	84 días	lun 20/10/25	dom 25/01/26	100%	$ 0,00
190		1.	EXCAVACION MECANICA EN ZANJA (RETROEXCAVADORA)	178 días	lun 20/10/25	jue 14/05/26	80%	$ 0,00
191		1.	EXCAVACIÓN MECANIZADA CIELO ABIERTO-MAT COMÚN/CONGLOM 0.0 A 6.0 M.	178 días	lun 20/10/25	jue 14/05/26	80%	$ 2.553.517,20

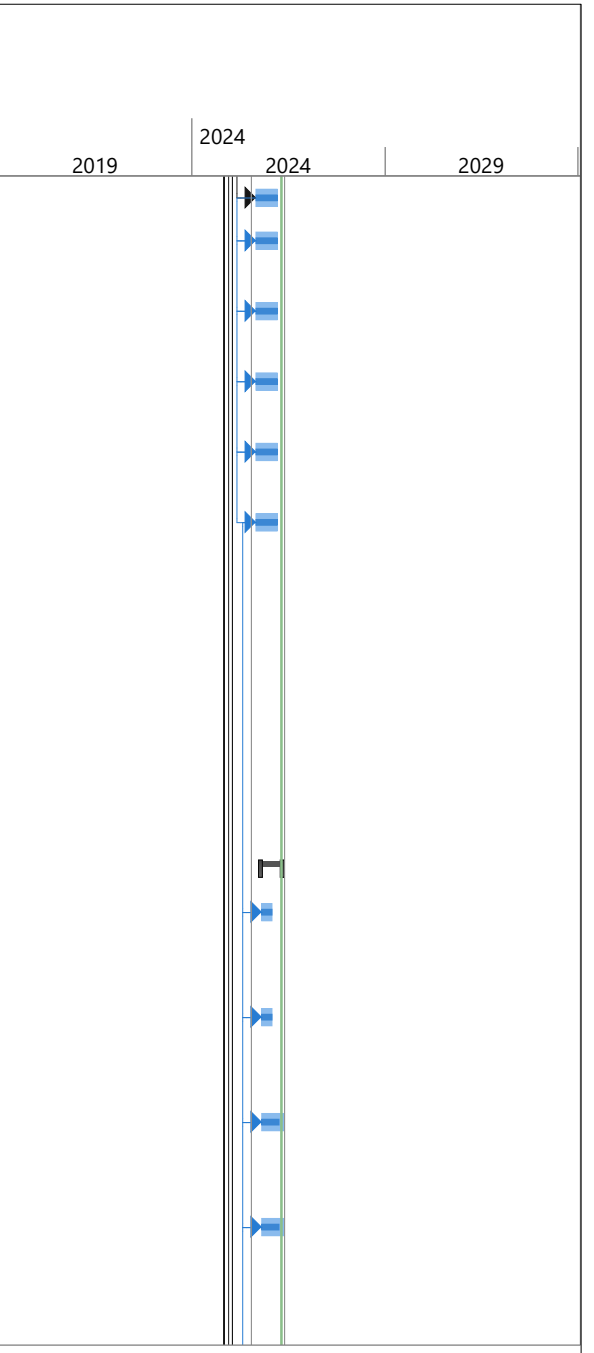


Id	Mo de tar	Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% compl	Costo
192		1.	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE MECANICO, DISPOSICIÓN EN BOTADERO (HASTA 25	178 días	lun 20/10/25	jue 14/05/26	80%	$ 5.721.040,00
193		**1.**	**MOBILIARIO Y PAISAJISM**	**70 días**	**mar 3/03/26**	**vie 22/05/26**	**67%**	**$ 42.608.581,00**
194		1.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE GRADERIA MOVIL ACOPRESA O SIMILAR EN ALUMINIO NATURAL DE 4 FILAS X 3.0M DE LARGO. NO ELEVADA. CAPACIDAD 28PERSONAS. INCLUYE BARANDAS. INCLUYE FLETE Y MONTAJE	18 días	mar 3/03/26	lun 23/03/26	100%	$ 30.133.561,00
195		1.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TOTEM, EN CONCRETO PULIDO, IGUAL O SIMILAR A: TIPO CALIZO REFERENCIA: MOBILE A LA MEDIDA. A:2,40 M X H:0,50 M X P:0,50 M. (745KG/UN) (MU 14). INCLUYE DADOS DE ANCLAJE, ACERO, PERNOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORREC	18 días	sáb 2/05/26	vie 22/05/26	0%	$ 9.622.425,00

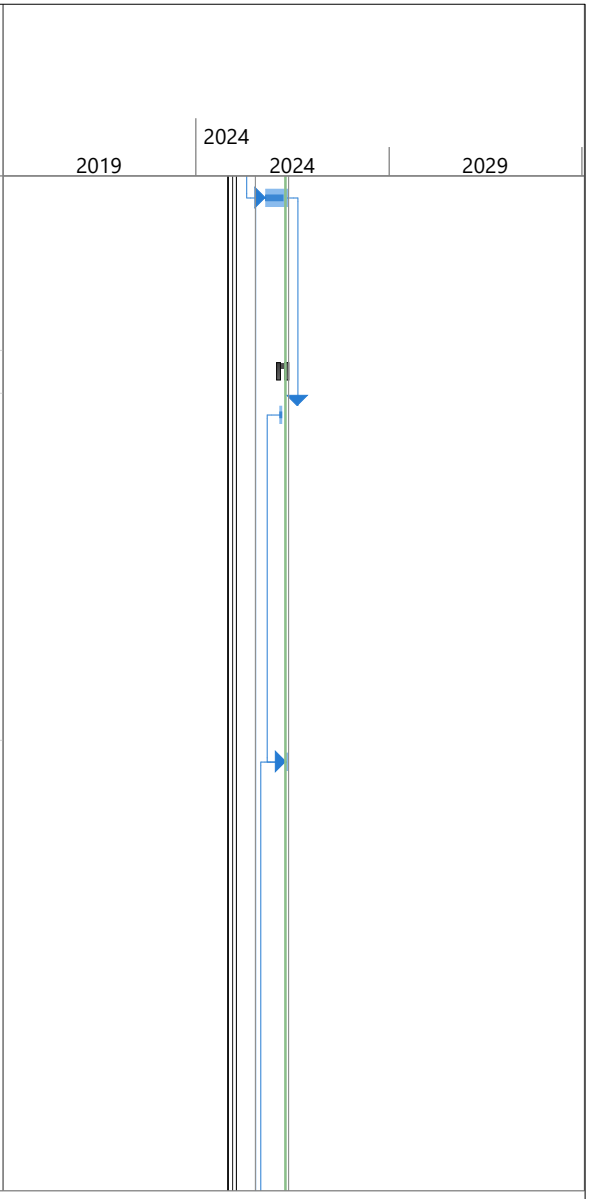


Id	Modo de tar	Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% compl	Costo
196		1.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE BARANDA METALICA CONFORMADA POR 3 VARILLAS LISAS 5/8" CADA 20 CM SOLDADAS A TUBO AGUAS NEGRAS 2" EN LA PARTE SUPERIOR Y EN LA PARTE INFERIOR A PLATINA DE 1-1/2" X 1/4" PINTURA COLOR OXIDO SEGÚN DISEÑO	18 días	mar 3/03/26	lun 23/03/26	100%	$ 2.852.595,00
197		**1.**	**MATERIAL GRANULAR**	**48 días**	**mar 3/03/26**	**lun 27/04/26**	**51%**	**$ 9.896.530,00**
198		1.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION AFIRMADO COMPACTADO PARA ESTRUCTURAS	11 días	mar 3/03/26	sáb 14/03/26	100%	$ 5.957.556,00
199		1.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION AFIRMADO PARA ANDENES	48 días	mar 3/03/26	lun 27/04/26	40%	$ 3.938.974,00
200		**2.**	**ZONAS DURAS - ESCALERAS - MUROS**	**51 días**	**mar 17/03/26**	**jue 14/05/26**	**36%**	**$ 66.166.563,00**
201		2.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PLACA CONTRAPISO CONCRETO 3000 PSI E=0.10 m	11 días	mar 17/03/26	sáb 28/03/26	100%	$ 29.172.908,00

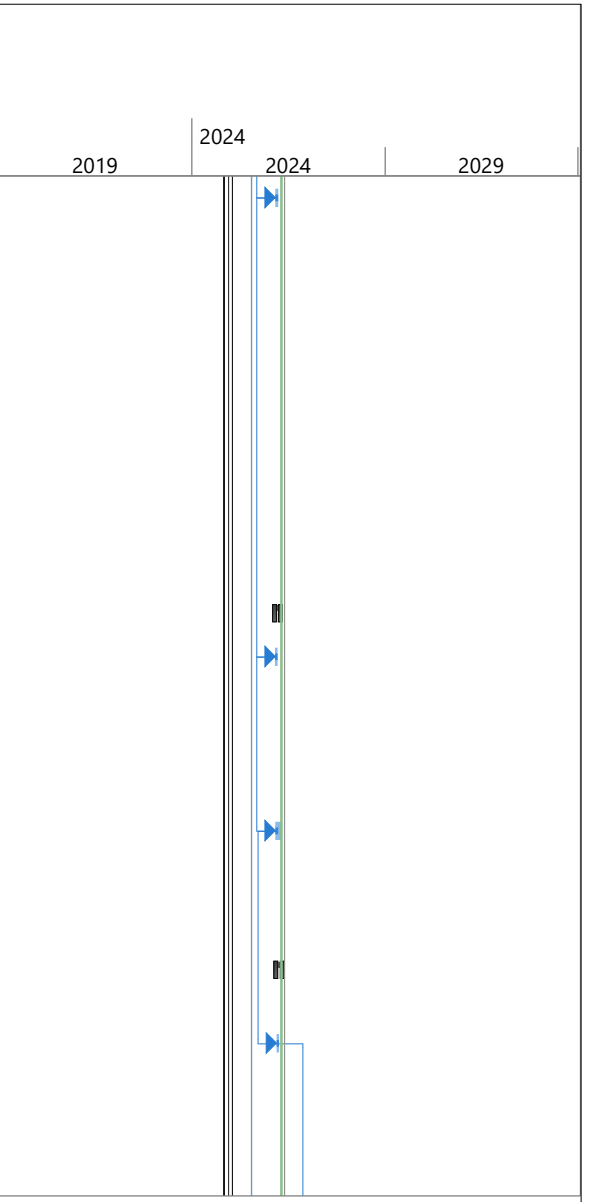


Id	Mo de tar	Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% compl	Costo
202		2.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ANDEN CONCRETO 3000 PSI E= 0.10M. ACABADO: ESCOBIADO	11 días	sáb 2/05/26	jue 14/05/26	0%	$ 22.853.160,00
203		2.	ESTAMPADO SOBRE CONCRETO CON MOLDE METÁLICO HEXAGONAL	11 días	sáb 2/05/26	jue 14/05/26	0%	$ 1.238.985,00
204		2.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GRAVILLA LAVADA Nº2 (Incluye dilatación pvc)	11 días	sáb 2/05/26	jue 14/05/26	0%	$ 696.550,00
205		2.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MALLA ELECTROSOLDADA M-131 Q-3.1 F 5.0mm c/.15m en ambos sentidos (Incluye alambre negro, colocación y traslapo).	47 días	mar 17/03/26	sáb 9/05/26	9%	$ 8.223.240,00
206		2.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION JUNTA DE DILATACION PARA PLACA CONTRAPISO (Inlcuye sellante)	11 días	jue 30/04/26	mar 12/05/26	0%	$ 3.272.880,00
207		2.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SARDINEL ANCHO = 10 CM H = ENTRE 17 Y 24 CM EN CONCRETO 3000 PSI	11 días	mar 17/03/26	sáb 28/03/26	100%	$ 0,00

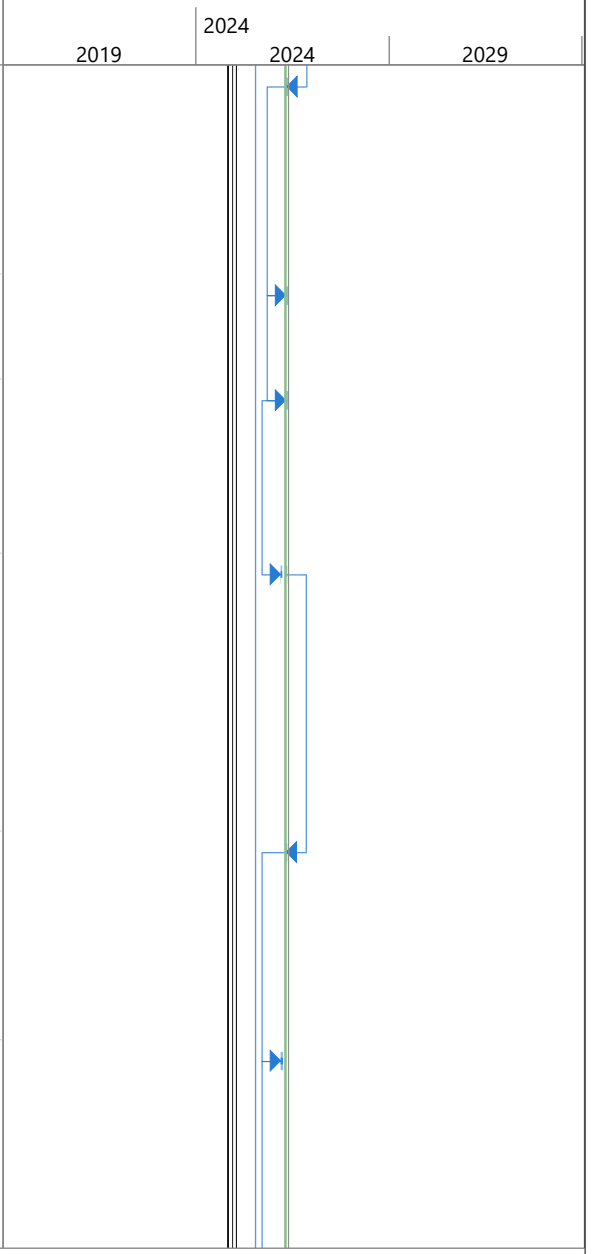


Id	Modo de tar	Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% compl	Costo
208		2.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SARDINEL ANCHO = 10 CM H = ENTRE 25 Y 30 CM EN CONCRETO 3000 PSI	11 días	mar 17/03/26	sáb 28/03/26	100%	$ 0,00
209		2.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ALISTADO PISOS Mortero 1:3 e= 0.03 mts	11 días	mar 17/03/26	sáb 28/03/26	100%	$ 708.840,00
210		**2.**	**EMPRADIZACION**	**11 días**	**mar 3/02/26**	**sáb 14/02/26**	**100%**	**$ 0,00**
211		2.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE EMPRADIZACIÓN DE TALUDES Y ZONAS VERDES	11 días	mar 3/02/26	sáb 14/02/26	100%	$ 0,00
212		**2.**	**UNIDAD DE BATERIAS SANITARIAS**	**95 días**	**mar 3/02/26**	**lun 25/05/26**	**59%**	**$ 222.891.626,84**
213		2.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VIGA CIMENTACION CONCRETO 3000 PSI	31 días	mar 3/02/26	mar 10/03/26	100%	$ 4.045.125,00
214		2.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PLACA CONTRAPISO CONCRETO 3000 PSI	31 días	mar 3/02/26	mar 10/03/26	100%	$ 14.493.273,84
215		2.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SOLADO DE LIMPIEZA 2.000 PSI E = 5 CM	31 días	mar 3/02/26	mar 10/03/26	100%	$ 493.425,90

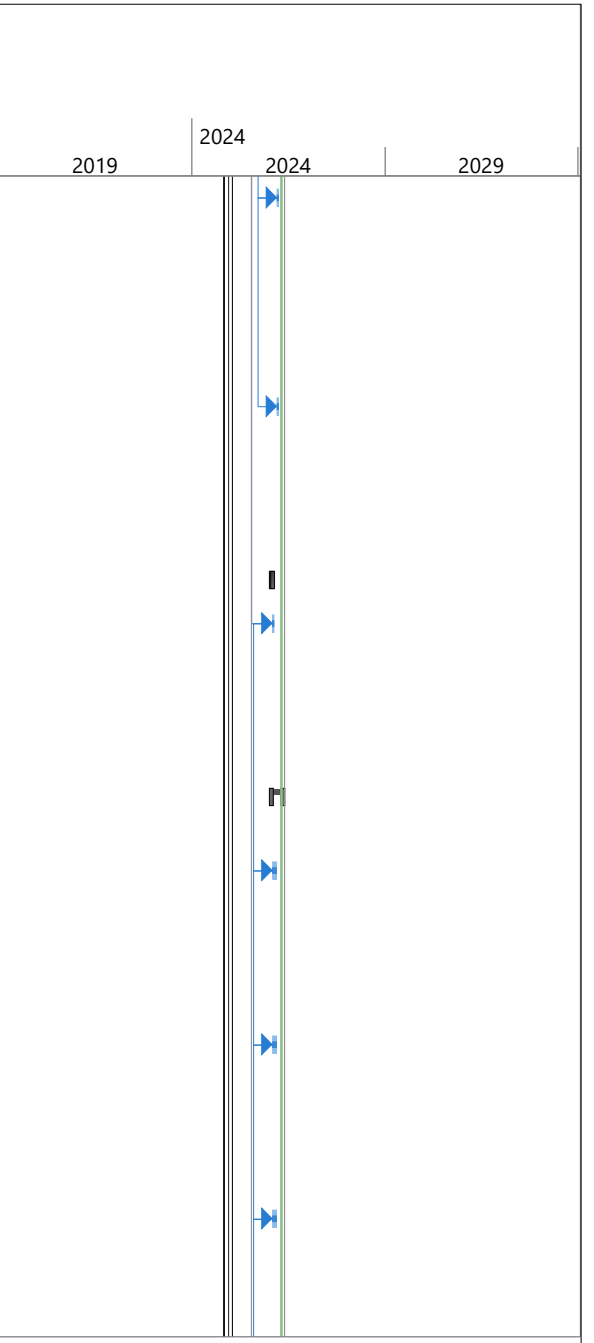


Id	Mo de tar	Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% compl	Costo
216		2.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE VIGAS Y COLUMNAS DE 0,20 *13 CMS CONCRETO DE 3000 PSI. NO INCLUYE REFUERZO	31 días	mar 3/02/26	mar 10/03/26	100%	$ 11.428.608,00
217		2.	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE MURO EN LADRILLO FAROL PANDERETA E=12CMS. INCLUYE MORTERO DE PEGA.	31 días	mar 3/02/26	mar 10/03/26	100%	$ 0,00
218		2.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CINTAS DE AMARRE EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0,15*0,15 (INCLUYE ACERO DE REFUERZO)	15 días	jue 7/05/26	lun 25/05/26	0%	$ 922.222,95
219		2.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PLACA MACIZA AEREA CONCRETO 3000 PSI e= 0.10m	31 días	mar 3/02/26	mar 10/03/26	100%	$ 13.656.373,05
220		2.	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION ACERO DE 60000 PSI (INCLUYE ALAMBRE NEGRO Y FIGURACION)	31 días	mar 3/02/26	mar 10/03/26	100%	$ 14.315.200,00

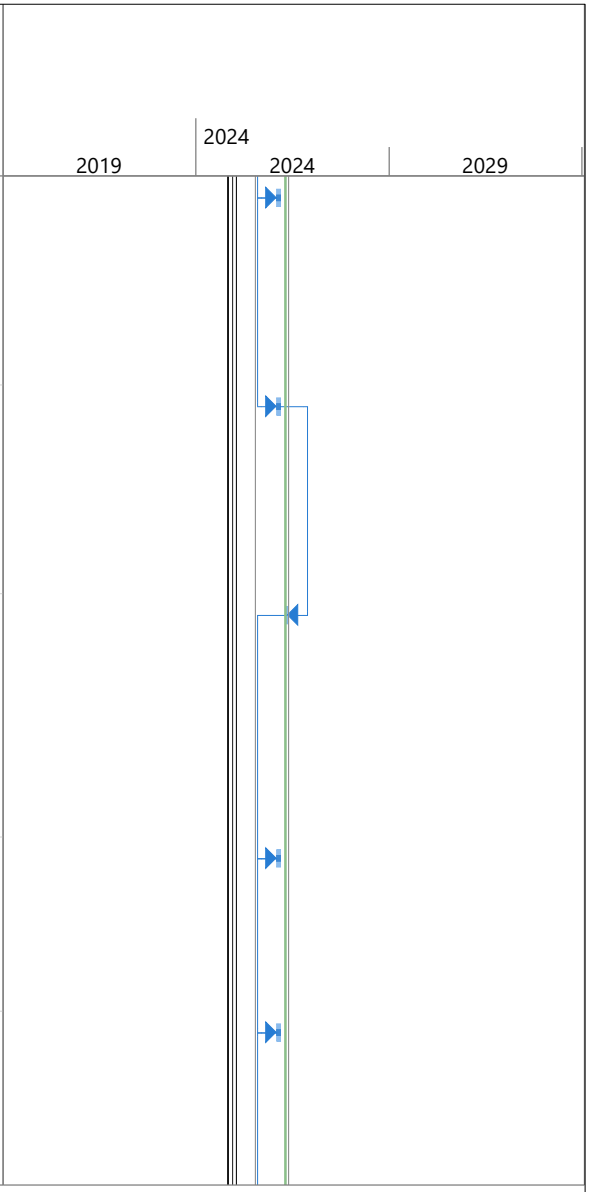


Id	Mo de tar	Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% compl	Costo
221		2.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MALLA ELECTROSOLDADA M-131 Q-3.1 F 5.0mm c/.15m en ambos sentidos (Incluye alambre negro, colocación y traslapo).	31 días	mar 3/02/26	mar 10/03/26	100%	$ 1.094.445,00
222		2.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VIGA CANALES CONCRETO 3000 PSI 0,135M3/ML	18 días	mié 29/04/26	mar 19/05/26	0%	$ 3.959.875,50
223		2.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERAMICA PISO ANTIQUE TIPO ALFA O SIMILAR. COLOR BEIGE O BLANCO SEGÚN DISEÑO (INCLUYE BOQUILLA.). INCLUYE MORTERO DE PEGA Y/O NIVELACIÓN.	18 días	mié 29/04/26	mar 19/05/26	0%	$ 5.197.664,20
224		2.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERAMICA PARED COLOR BEIGE O BLANCO HASTA $40.000 x M2. SEGÚN DISEÑO (INCLUYE BOQUILLA COLOR Y WIN.)	20 días	mié 29/04/26	jue 21/05/26	0%	$ 6.924.999,00

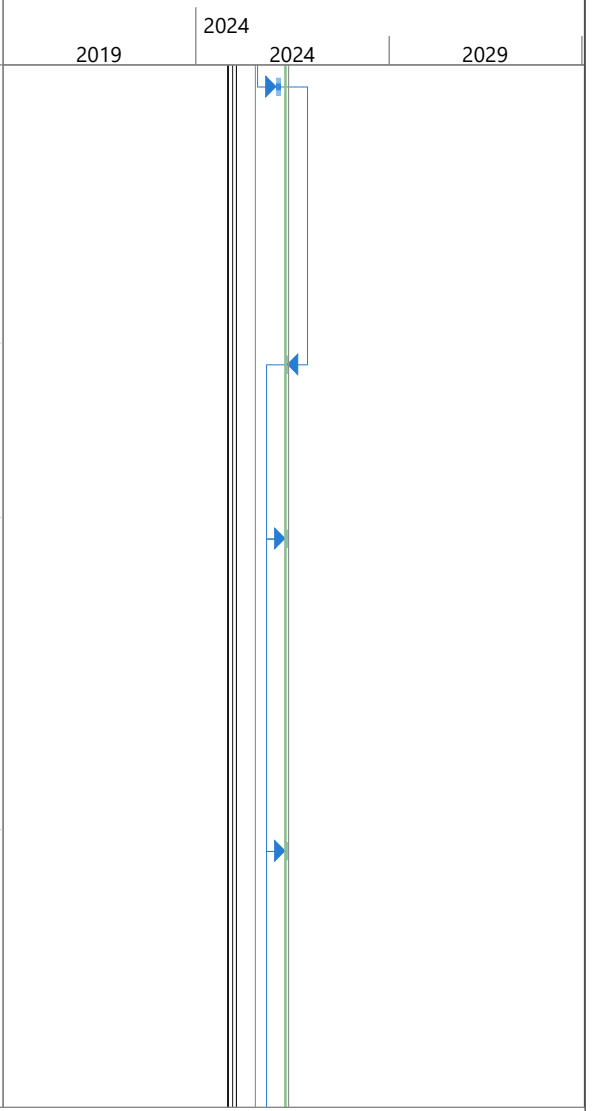


Id	Modo de tar	Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% compl	Costo
225		2.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GUARDAESCOBA CERAMICA TIPO ANTIQUE H = 10 CM. TIPO ALFA O SIMILAR. COLOR BEIGE O BLANCO SEGÚN DISEÑO (INCLUYE BOQUILLA.). INCLUYE MORTERO DE PEGA Y/O NIVELACIÓN	20 días	mié 29/04/26	jue 21/05/26	0%	$ 275.886,00
226		2.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PINTURA SOBRE REVOQUE VINILO 3 MANOS SOBRE MURO (INCLUYE 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES).COLOR SEGÚN DISEÑO POR M2	20 días	mié 29/04/26	jue 21/05/26	0%	$ 3.587.227,20
227		2.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y VINILO 3 MANOS BAJO PLACA INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO.	20 días	mié 29/04/26	jue 21/05/26	0%	$ 2.944.123,05

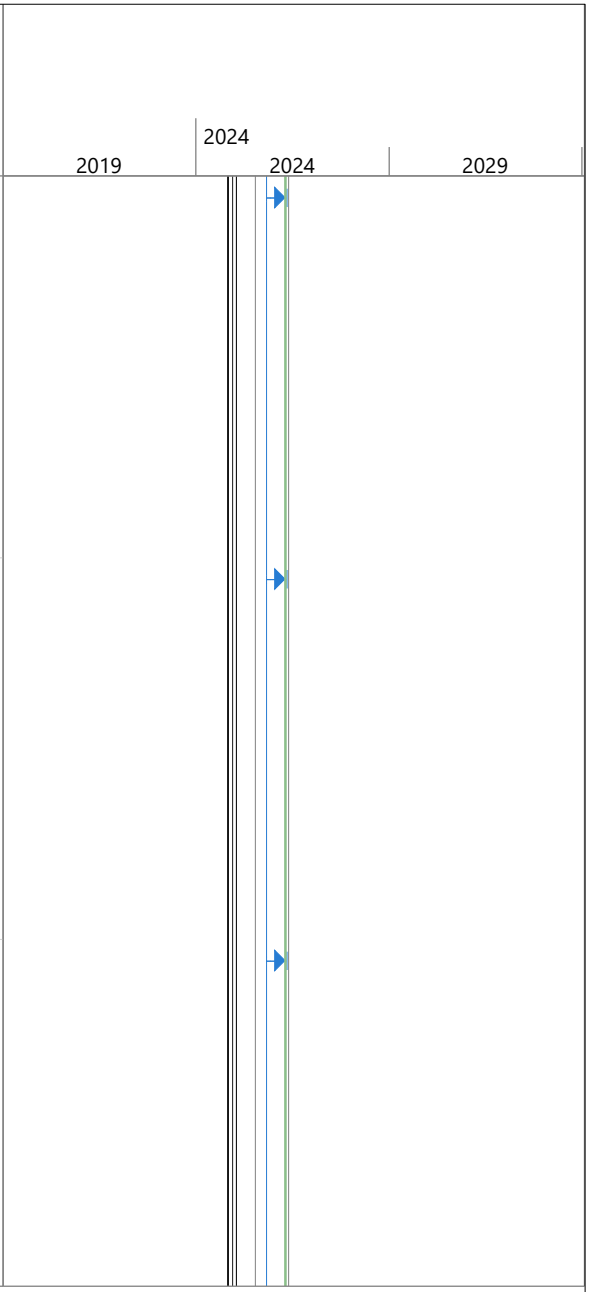


Id	Mo de tar	Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% compl	Costo
228		2.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR 3 MANOS FACHADAS (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO.	20 días	mié 29/04/26	jue 21/05/26	0%	$ 2.591.732,00
229		2.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LAVAMANOS DE EMPOTRAR LINEA SAN LORENZO COLOR BLANCO DE CORONA REF: O19001001 O SIMILAR. (INCLUYE ELEMENTOS DE GRIFERÍA PARA INSTALACIÓN).	20 días	mié 29/04/26	jue 21/05/26	0%	$ 6.555.900,00
230		2.	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION MESON EN GRANITO NATURAL CRISTAL PULIDO Y BRILLADO, PARA INCRUSTAR LAVAMANOS A=0.60M	20 días	mié 29/04/26	jue 21/05/26	0%	$ 7.722.532,50

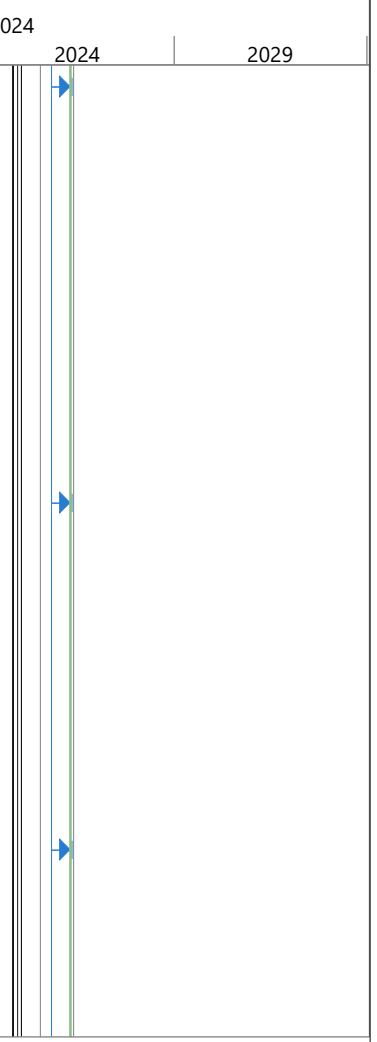


Id	Modo de tar	Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% compl	Costo
231		2.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SANITARIO MONTECARLO ELONGADO BLANCO CORONA O SIMILAR. (CONJUNTO SANITARIO QUE INCLUYE SANITARIO, TAPA, ACCESORIOS DE CONEXIÓN E INSTALACIÓN.)	20 días	mié 29/04/26	jue 21/05/26	0%	$ 8.524.448,00
232		2.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ORINAL INSTITUCIONAL MEDIANO DE ENTRADA SUPERIOR EN PORCELANA COLOR BLANCO LINEA POLO (CORONA) REF: 088621001 O SIMILAR. INCLUYE GRIFERÍA PUSH Y VÁLVULA ANTIVANDÁLICA.	20 días	mié 29/04/26	jue 21/05/26	0%	$ 5.830.370,00
233		2.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO DESAGUE PVC 3" Aparatos sanitarios y desagues (INCLUYE CODO, YEE Y ACCESORIOS)	31 días	mar 3/02/26	mar 10/03/26	100%	$ 1.108.144,00

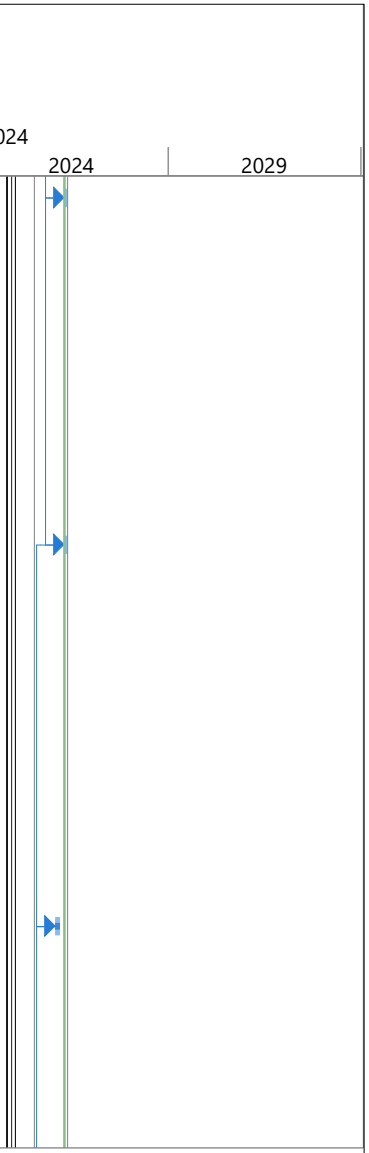


Id	Modo de tar	Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% compl	Costo
234		2.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO DESAGUE PVC 2" Aparatos sanitarios y desagues (INCLUYE CODO, YEE Y ACCESORIOS)	31 días	mar 3/02/26	mar 10/03/26	100%	$ 1.865.631,00
235		2.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 3" (INCLUYE CODO, UNION Y ACCESORIOS DE FIJACION)	20 días	vie 1/05/26	sáb 23/05/26	0%	$ 351.729,00
236		2.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC-S 3" (RED SANITARIA, INCLUYE ACCESORIOS)	31 días	mar 3/02/26	mar 10/03/26	100%	$ 483.910,80
237		2.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC-S 4" (RED SANITARIA, INCLUYE ACCESORIOS)	31 días	mar 3/02/26	mar 10/03/26	100%	$ 611.560,80
238		2.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC-S 6" (RED SANITARIA, INCLUYE ACCESORIOS)	31 días	mar 3/02/26	mar 10/03/26	100%	$ 751.934,40
239		2.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO AGUA FRIA 1/2" PVC -P (Incluye accesorios de instalación)	31 días	mar 3/02/26	mar 10/03/26	100%	$ 2.256.156,00

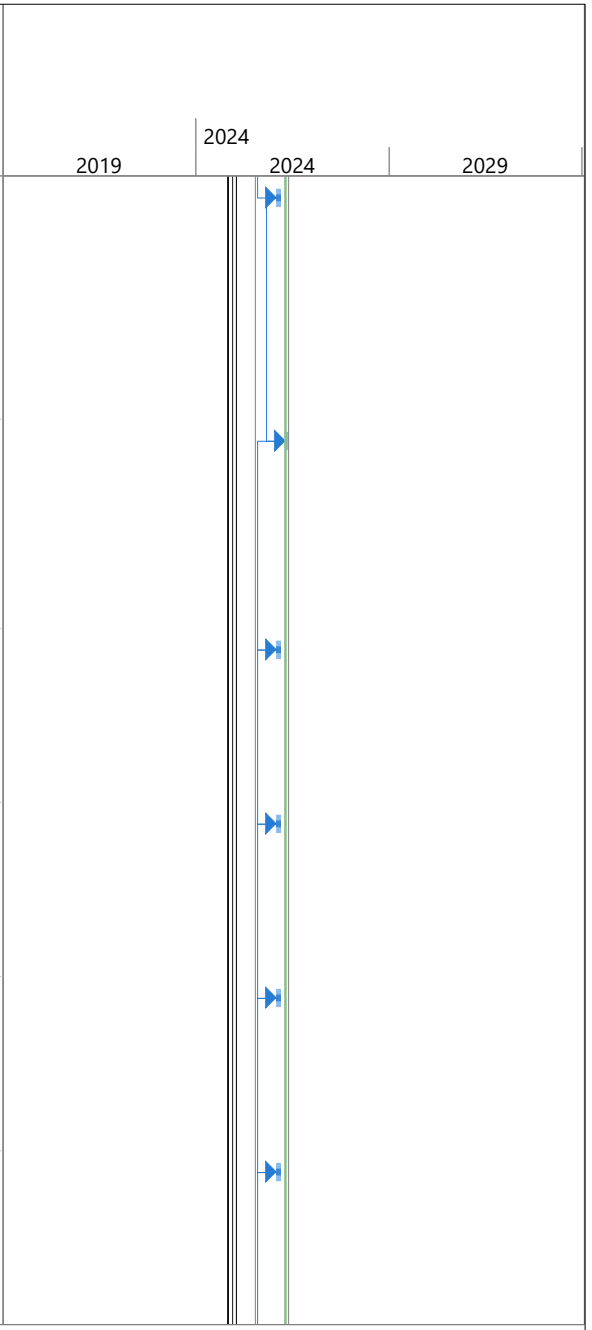


Id	Mo de tar	Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% compl	Costo
240		2.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN SIFÓN PVC-S 2"	31 días	mar 3/02/26	mar 10/03/26	100%	$ 248.054,00
241		2.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CAJA DE INSPECCIÓN EMPALME DOMICILIARIO TIPO I (0,60X0,60 M) EN CONCRETO CLASE II	31 días	mar 3/02/26	mar 10/03/26	100%	$ 1.881.005,55
242		2.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE DIVISIONES SANITARIAS EN ACERO INOXIDABLE CAL. 20 SATINADAS, LAMINA CONFORMADO EN PANELES TIPO SANDWICH, COMPUESTA DE 3 PIEZAS BASICAS: PUERTA, PARAL Y TABIQUE (INCLUYE PIEZAS PARA EL EMSANBLE ENTRE SI Y	15 días	jue 7/05/26	sáb 23/05/26	0%	$ 51.534.900,55

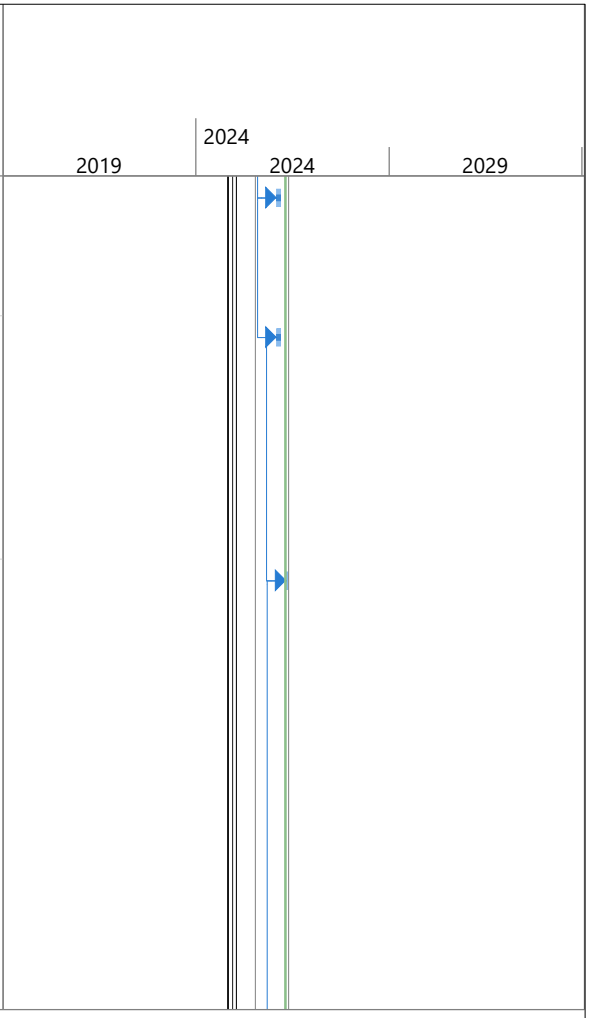


Id	Mo de tar	Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% compl	Costo
243		2.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUERTA METALICA LÁMINA COLD ROLLED CAL. 20 CON MARCO SENCILLO (INCLUYE ANTICORROSIVO + PINTURA ACEITE + MARCO EN LAMINA CAL. 20 CARGADOS EN CONCRETO). INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL	15 días	jue 7/05/26	sáb 23/05/26	0%	$ 1.520.480,00
244		2.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VENTANA CORREDIZA FIJA EN ALUMINIO ANODIZADO VIDRIO 6 MM (INCLUYE MARCO EN PERFILERIA PB 3831 O SIMILAR Y VIDRIO CRISTAL DE 6 MM.). INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE, A	15 días	jue 7/05/26	sáb 23/05/26	0%	$ 4.611.005,50
245		2.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CARTERA VENTANAS Y PUERTAS EN MORTERO 1:3 ANCHO 15-20 CMS.	15 días	jue 7/05/26	sáb 23/05/26	0%	$ 736.340,40




Id	Mo de tar	Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% compl	Costo
246		2.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TAPA P/CAJA DE INSPECCIÓN TIPO I (0,6X0,6X0,1 M) CONCRETO CLASE II	15 días	jue 7/05/26	sáb 23/05/26	0%	$ 747.312,00
247		2.	SUMINISTRO,TRANSPOR E INSTALACION REVOQUE LISO MUROS 1:3 INTERIOR (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES	15 días	jue 7/05/26	sáb 23/05/26	0%	$ 9.182.813,25
248		2.	SUMINISTRO,TRANSPOR E INSTALACION REVOQUE LISO BAJO PLACAS 1:3 IMPERMEABILIZADO (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	15 días	jue 7/05/26	sáb 23/05/26	0%	$ 3.849.030,45
249		2.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION IMPERMEABILIZACION FIBER GLASS P-3 con refuerzo en poliester . (remates, emulsión asfaltica)	15 días	jue 7/05/26	sáb 23/05/26	0%	$ 7.103.808,75
250		2.	INSTALACIONES ELECTRICAS E ILUMINACION	92 días	mar 3/02/26	mié 20/05/26	60%	$ 2.000.000,00
251		2.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MURO EN BLOQUE Concreto estructural liso 12*20*40 cm. (Incluye grouting y refuerzo)	31 días	mar 3/02/26	mar 10/03/26	100%	$ 17.484.379,20
252		**2.**	**ADICIONALES ALCALDÍA DE MANIZALES**	**4 días**	**mié 11/02/26**	**sáb 14/02/26**	**100%**	**$ 344.064,00**

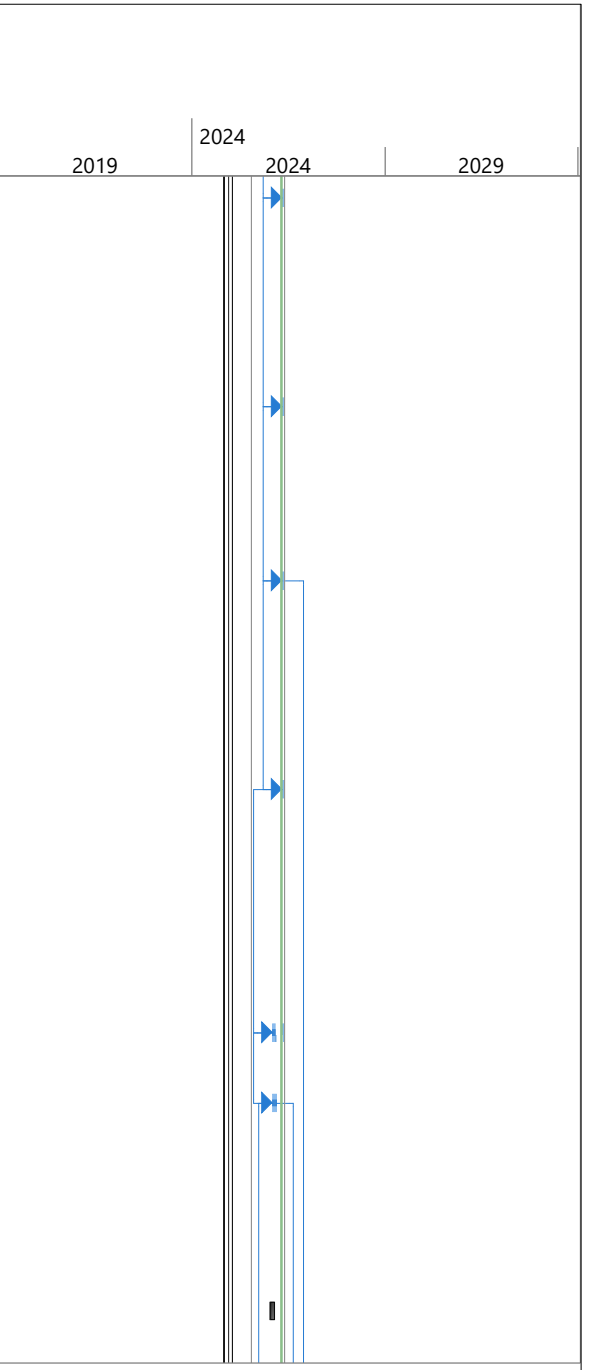


Id	Mo de tar	Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% compl	Costo
253		2.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TECHADO PROVISIONAL EN GUADUA Y PLÁSTICO	4 días	mié 11/02/26	sáb 14/02/26	100%	$ 0,00
254		2.	JORNAL AYUDANTE	4 días	mié 11/02/26	sáb 14/02/26	100%	$ 344.064,00
255		**2.**	**ASEO GENERAL Y LIMPIE**	**4 días**	**mié 20/05/26**	**sáb 23/05/26**	**0%**	**$ 1.926.044,00**
256		2.	ASEO GENERAL	4 días	mié 20/05/26	sáb 23/05/26	0%	$ 1.926.044,00
257		**2.**	**OBRAS EXTERIORES**	**51 días**	**jue 26/03/26**	**sáb 23/05/26**	**99%**	**$ 39.295.615,00**
258		2.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PLATINA DE 3/4" CON PERNOS DE 3/4" L=0,4M INSCRUSTADOS EN PEDESTAL DE CONCRETO (NO INCLUIDO). INCLUYE: Pernos, platina de 0,27*0,27, tuercas, pintura, soldadura	4 días	jue 26/03/26	lun 30/03/26	100%	$ 5.197.215,00
259		2.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTRUCTURA METÁLICA EN Perfil Lámina Delgada PHR ASTM A500 Grado 50. Calibre según diseño (Incluye vigas, cerchas, correas, anticorrosivo y esmalte)	4 días	jue 26/03/26	lun 30/03/26	100%	$ 34.098.400,00
260		2..	FIN	0 días	sáb 23/05/26	sáb 23/05/26	0%	$ 0,00
261		**2.**	**ZONA 5**	**225 días**	**sáb 30/08/25**	**mar 19/05/26**	**91%**	**$ 675.341.505,81**
262		2..	INICIO	0 días	sáb 30/08/25	sáb 30/08/25	100%	$ 0,00

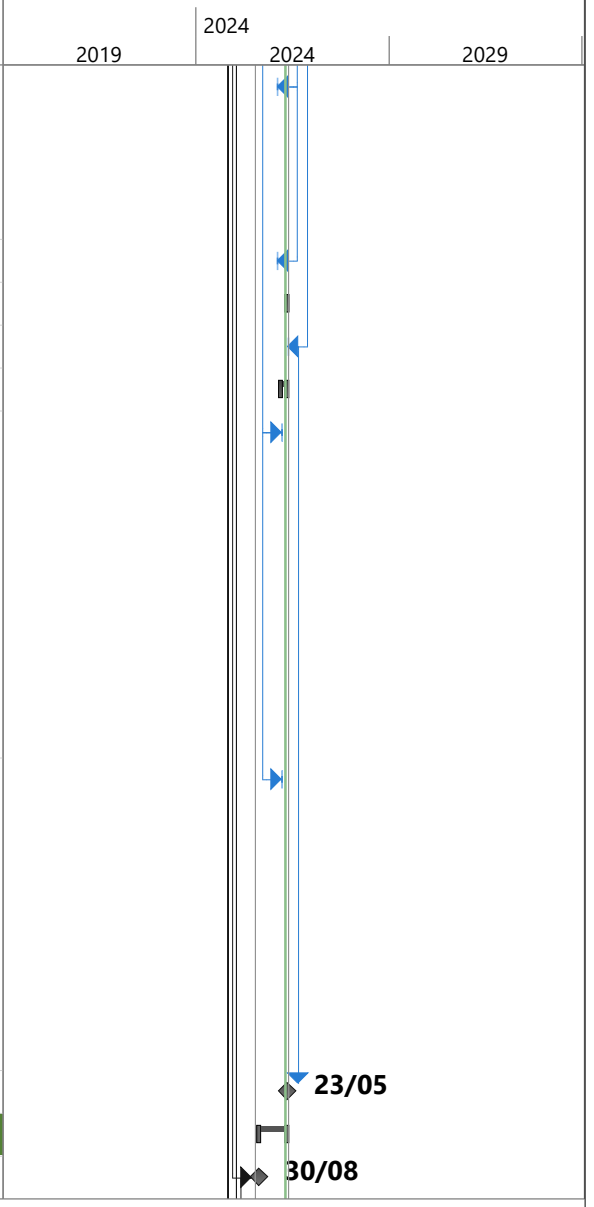


Id	Mo de tar	Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% compl	Costo
263		**2.**	**SENDERO ENTRE PLAZOLETA Y ZONAS DEL NORTE + MIRADORES**	**225 días**	**sáb 30/08/25**	**mar 19/05/26**	**91%**	**$ 675.341.505,81**
264		**2.**	**PRELIMINARES**	**26 días**	**sáb 30/08/25**	**mar 30/09/25**	**95%**	**$ 21.081.756,44**
265		2.	ROCERIA Y LIMPIEZA	26 días	sáb 30/08/25	mar 30/09/25	90%	$ 2.669.230,20
266		2.	LOCALIZACION Y REPLANTEO	26 días	sáb 30/08/25	mar 30/09/25	90%	$ 14.256.999,00
267		2.	DESCAPOTE MECANICO e=0.20 m.	26 días	sáb 30/08/25	mar 30/09/25	90%	$ 3.368.661,24
268		2.	INSTALACION PROVISIONAL DE ACUEDUCTO	26 días	sáb 30/08/25	mar 30/09/25	100%	$ 685.338,00
269		2.	INSTALACION PROVISIONAL DE ENERGIA	26 días	sáb 30/08/25	mar 30/09/25	100%	$ 101.528,00
270		2.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CERRAMIENTO PROVISIONAL EN LÁMINA GALVANIZADA H= 2.4M (Incluye guadua cepa, puntillas y demás elementos para su correcta instalación y funcionamiento)	26 días	sáb 30/08/25	mar 30/09/25	100%	$ 0,00
271		**2.**	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**	**197 días**	**mié 1/10/25**	**lun 18/05/26**	**96%**	**$ 105.041.515,77**
272		2.	EXCAVACIÓN EN ZANJA - MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0 M	117 días	mié 1/10/25	sáb 14/02/26	100%	$ 0,00
273		2.	RELLENO, CONFORMACION Y COMPACTACION A MAQUINA CON MATERIAL DE PRESTAMO	187 días	mié 1/10/25	mié 6/05/26	95%	$ 8.553.837,60

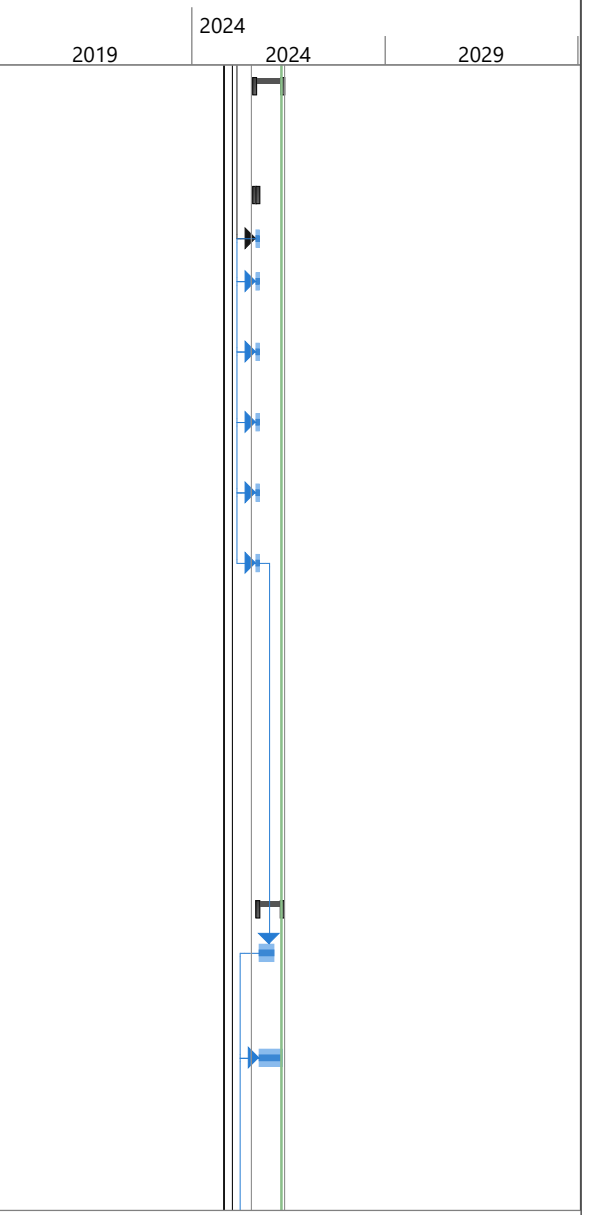


Id	Modo de tar	Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% compl	Costo
274		2.	CONFORMACIÓN DE TALUDES CON EQUIPO MECÁNICO	117 días	mié 1/10/25	vie 13/02/26	100%	$ 0,00
275		2.	EXCAVACIÓN EN ZANJA - CONGLOMERADO - 0.0 A 2.0 M	117 días	mié 1/10/25	vie 13/02/26	100%	$ 0,00
276		2.	EXCAVACION MECANICA EN ZANJA (RETROEXCAVADORA)	117 días	mié 1/10/25	vie 13/02/26	100%	$ 0,00
277		2.	EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS - CONGLOMERADO - 0.0 A 2.0 M	117 días	mié 1/10/25	vie 13/02/26	100%	$ 0,00
278		2.	EXCAVACIÓN MECANIZADA CIELO ABIERTO-MAT COMÚN/CONGLOM 0.0 A 6.0 M.	197 días	mié 1/10/25	lun 18/05/26	90%	$ 18.191.110,50
279		2.	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE MECANICO, DISPOSICIÓN EN BOTADERO (HASTA 25	197 días	mié 1/10/25	lun 18/05/26	90%	$ 78.296.567,67
280		**2.**	**MOBILIARIO Y PAISAJISM**	**108 días**	**mié 14/01/26**	**mar 19/05/26**	**42%**	**$ 82.108.486,00**
281		2.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE EMPRADIZACIÓN DE TALUDES Y ZONAS VERDES	66 días	mié 14/01/26	mar 31/03/26	100%	$ 0,00

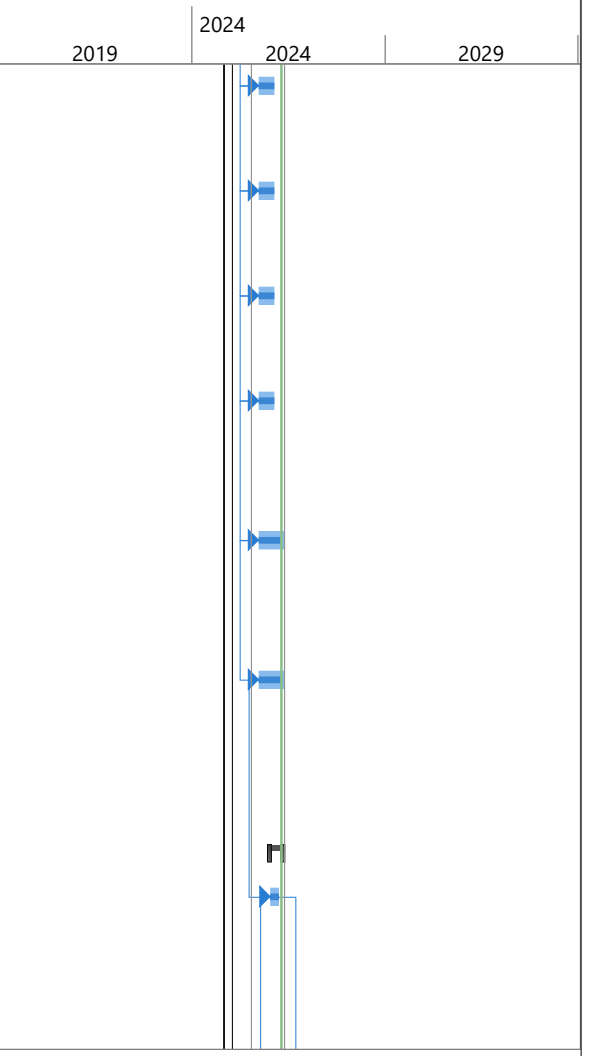


Id	Modo de tar	Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% compl	Costo
282		2.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TOTEM, EN CONCRETO PULIDO, IGUAL O SIMILAR A: TIPO CALIZO REFERENCIA: MOBILE A LA MEDIDA. A:2,40 M X H:0,50 M X P:0,50 M. (745KG/UN) (MU 14). INCLUYE DADOS DE ANCLAJE, ACERO, PERNOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORREC	23 días	jue 23/04/26	mar 19/05/26	0%	$ 38.489.700,00
283		2.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN BANCA MODULAR CORRIDA, EN CONCRETO PULIDO, IGUAL O SIMILAR A: TIPO KÖNKRETUS REFERENCIA: BANCA DOBBELT MÓDULO "A". A:1,8 M X H:0,45 M X P:0,45 M. (336 KG/UN)	23 días	jue 23/04/26	mar 19/05/26	0%	$ 8.256.556,00
284		2.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN BANCA MODULAR CORRIDA CON ESPALDAR, EN CONCRETO PULIDO, IGUAL O SIMILAR A: TIPO KÖNKRETUS REFERENCIA: BANCA DOBBELT MÓDULO "A" CON ESPALDAR. A:1,8 M X H:0,79 M X P:0,45 M . (522 KG/UN)	23 días	jue 23/04/26	mar 19/05/26	0%	$ 10.638.276,00

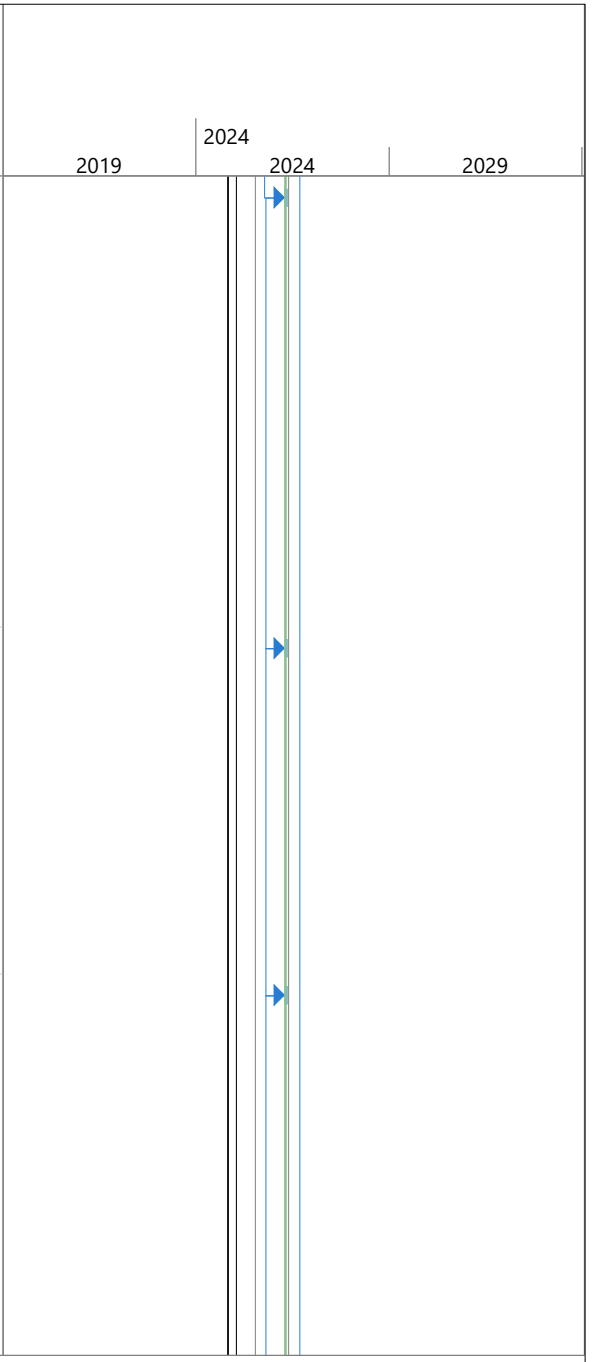


Id	Mo de tar	Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% compl	Costo
285		2.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN BANCA MODULAR CORRIDA CON ESPALDAR, EN CONCRETO PULIDO, IGUAL O SIMILAR A: TIPO KÖNKRETUS REFERENCIA: BANCA OLAND CON ESPALDAR. A:1,8 M X H:0,79 M X P:0,57 M. (369 KG/UN) (MU 03). INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU C	23 días	jue 23/04/26	mar 19/05/26	0%	$ 24.723.954,00
286		**2.**	**MATERIAL GRANULAR**	**87 días**	**lun 1/12/25**	**mié 11/03/26**	**98%**	**$ 37.069.208,00**
287		2.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION AFIRMADO COMPACTADO PARA ESTRUCTURAS	87 días	lun 1/12/25	mié 11/03/26	100%	$ 2.527.448,00
288		2.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION AFIRMADO PARA ANDENES	52 días	lun 1/12/25	vie 30/01/26	95%	$ 34.541.760,00
289		**2.**	**ZONAS DURAS - ESCALERAS - MUROS**	**106 días**	**mar 13/01/26**	**vie 15/05/26**	**95%**	**$ 390.570.747,00**
290		2.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PLACA CONTRAPISO CONCRETO 3000 PSI E=0.10 m	15 días	mar 13/01/26	jue 29/01/26	100%	$ 0,00

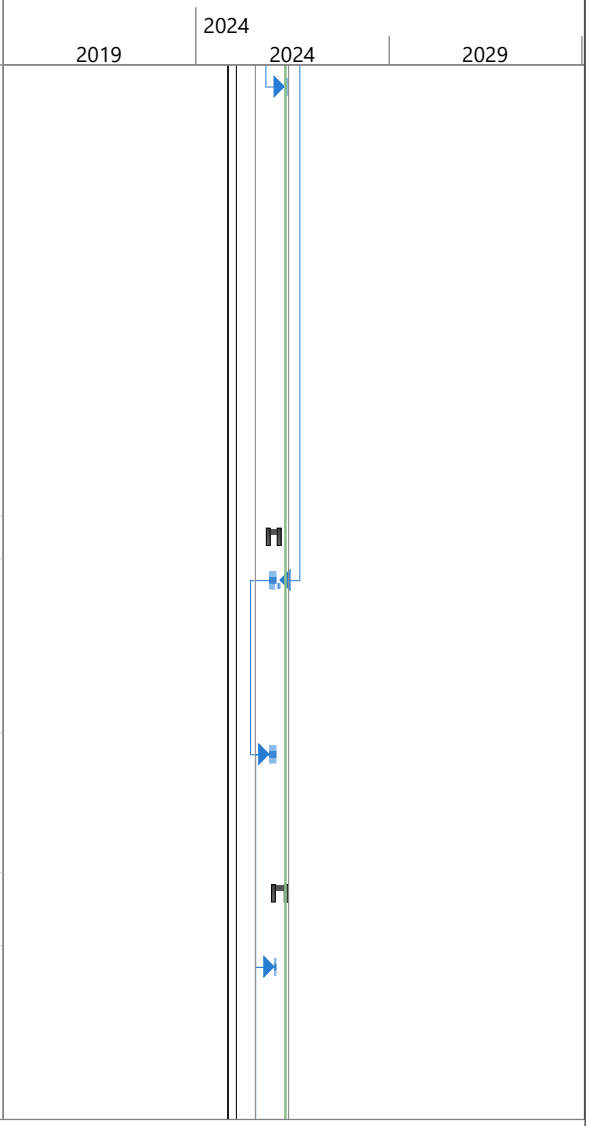


Id	Mo de tar	Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% compl	Costo
291		2.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ANDEN CONCRETO 3000 PSI E= 0.10M. ACABADO: ESCOBIADO	106 días	mar 13/01/26	vie 15/05/26	95%	$ 285.688.074,00
292		2.	ESTAMPADO SOBRE CONCRETO CON MOLDE METÁLICO HEXAGONAL	106 días	mar 13/01/26	vie 15/05/26	90%	$ 17.140.599,00
293		2.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MUROS DE CONTENCION CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI H<3.0M. NO INCLUYE REFUERZO.	15 días	mar 13/01/26	jue 29/01/26	100%	$ 32.495.112,00
294		2.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ZAPATA CONCRETO 3000 PSI	15 días	mar 13/01/26	vie 30/01/26	100%	$ 21.981.872,00
295		2.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GRAVILLA LAVADA Nº2 (Incluye dilatación pvc)	15 días	mar 13/01/26	vie 30/01/26	100%	$ 6.547.570,00
296		2.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MALLA ELECTROSOLDADA M-131 Q-3.1 F 5.0mm c/.15m en ambos sentidos (Incluye alambre negro, colocación y traslapo).	106 días	mar 13/01/26	vie 15/05/26	95%	$ 25.142.320,00

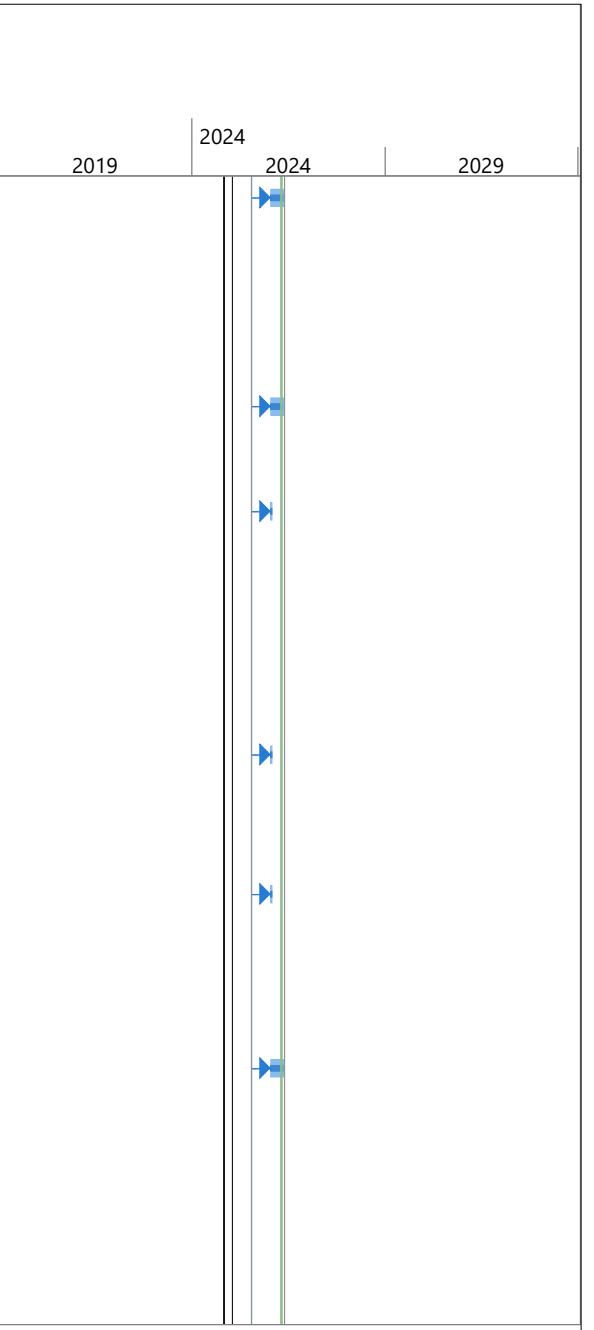


Id	Mo de tar	Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% compl	Costo
297		2.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SARDINEL ANCHO = 10 CM H = ENTRE 17 Y 24 CM EN CONCRETO 3000 PSI	15 días	mar 13/01/26	vie 30/01/26	100%	$ 0,00
298		2.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SARDINEL ANCHO = 10 CM H = ENTRE 25 Y 30 CM EN CONCRETO 3000 PSI	15 días	mar 13/01/26	vie 30/01/26	100%	$ 0,00
299		2.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ALISTADO PISOS Mortero 1:3 e= 0.03 mts	15 días	mar 13/01/26	vie 30/01/26	100%	$ 1.575.200,00
300		**3.**	**ACERO**	**55 días**	**mar 13/01/26**	**mar 17/03/26**	**95%**	**$ 26.841.000,00**
301		3.	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION ACERO DE 60000 PSI (INCLUYE ALAMBRE NEGRO Y FIGURACION)	55 días	mar 13/01/26	mar 17/03/26	95%	$ 26.841.000,00
302		**3.**	**EMPRADIZACION**	**10 días**	**mié 4/02/26**	**sáb 14/02/26**	**100%**	**$ 0,00**
303		3.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE EMPRADIZACIÓN DE TALUDES Y ZONAS VERDES	10 días	mié 4/02/26	sáb 14/02/26	100%	$ 0,00
304		**3.**	**ADICIONALES ALCALDÍA DE MANIZALES**	**8 días**	**vie 6/02/26**	**sáb 14/02/26**	**100%**	**$ 2.277.848,00**

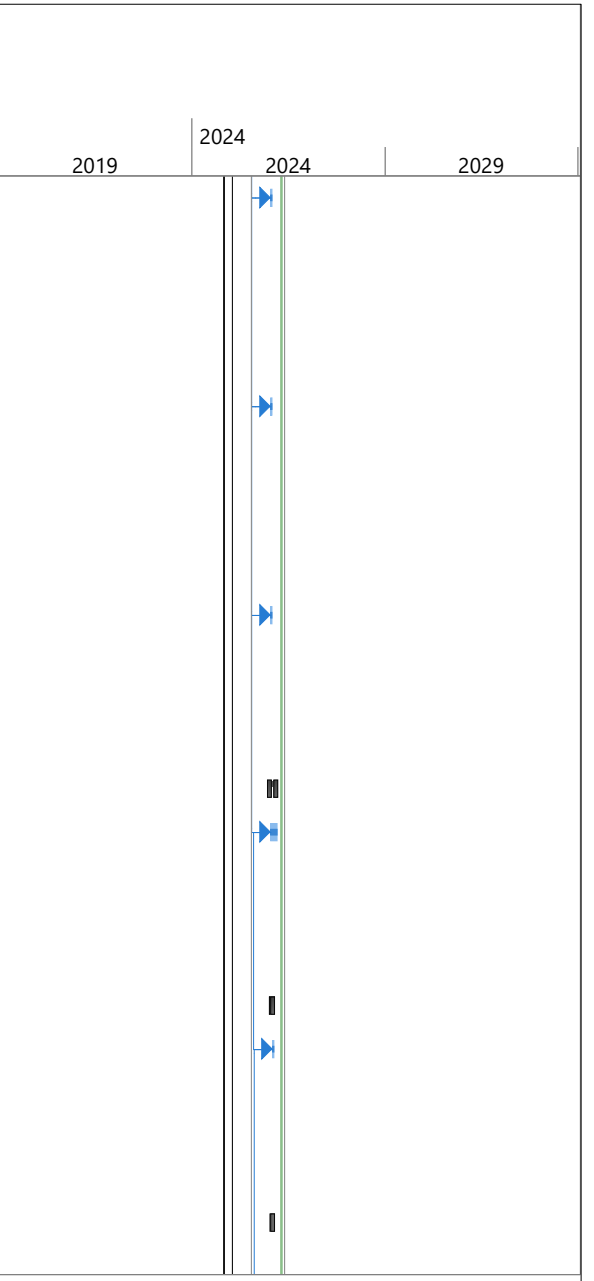


Id	Modo de tar	Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% compl	Costo
305		3.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TECHADO PROVISIONAL EN GUADUA Y PLÁSTICO	8 días	vie 6/02/26	sáb 14/02/26	100%	$ 0,00
306		3.	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE DILATACIONES ESTRUCTURALES CON ICOPOR E=2.0CM Y SELLO CON SIKAFLEX 1A PLUS	8 días	vie 6/02/26	sáb 14/02/26	100%	$ 1.933.784,00
307		3.	JORNAL AYUDANTE	8 días	vie 6/02/26	sáb 14/02/26	100%	$ 344.064,00
308		**3.**	**ASEO GENERAL Y LIMPIE**	**8 días**	**vie 8/05/26**	**sáb 16/05/26**	**0%**	**$ 10.350.944,60**
309		3.	ASEO GENERAL	8 días	vie 8/05/26	sáb 16/05/26	0%	$ 10.350.944,60
310		3..	FIN	0 días	sáb 16/05/26	sáb 16/05/26	0%	$ 0,00
311		**3.**	**ZONA 6**	**114 días**	**mié 14/01/26**	**mié 27/05/26**	**73%**	**$ 310.533.293,41**
312		3..	INICIO	0 días	mié 14/01/26	mié 14/01/26	100%	$ 0,00
313		**3.**	**ACCESO PRINCIPAL CALLE 4**	**95 días**	**vie 6/02/26**	**mié 27/05/26**	**73%**	**$ 310.533.293,41**
314		**3.**	**PRELIMINARES**	**8 días**	**vie 6/02/26**	**sáb 14/02/26**	**100%**	**$ 3.333.667,52**
315		3.	ROCERIA Y LIMPIEZA	8 días	vie 6/02/26	sáb 14/02/26	100%	$ 379.142,40
316		3.	LOCALIZACION Y REPLANTEO	8 días	vie 6/02/26	sáb 14/02/26	100%	$ 1.689.168,24
317		3.	DESCAPOTE MECANICO e=0.20 m.	8 días	vie 6/02/26	sáb 14/02/26	100%	$ 478.490,88
318		3.	INSTALACION PROVISIONAL DE ACUEDUCTO	8 días	vie 6/02/26	sáb 14/02/26	100%	$ 685.338,00
319		3.	INSTALACION PROVISIONAL DE ENERGIA	8 días	vie 6/02/26	sáb 14/02/26	100%	$ 101.528,00

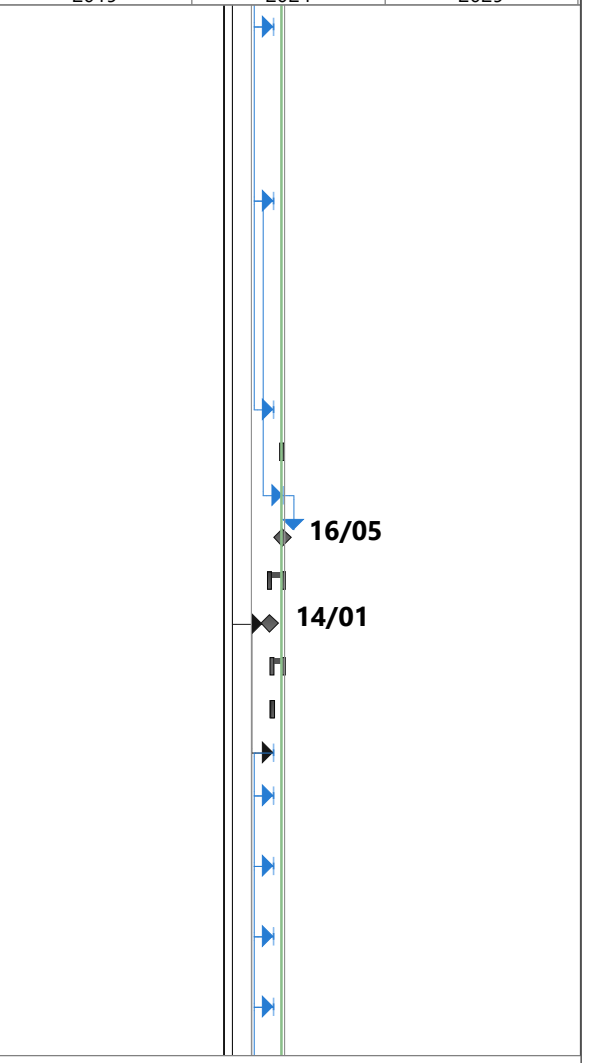


Id	Modo de tar	Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% compl	Costo
320		3.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CERRAMIENTO PROVISIONAL EN LÁMINA GALVANIZADA H= 2.4M (Incluye guadua cepa, puntillas y demás elementos para su correcta instalación y funcionamiento)	8 días	vie 6/02/26	sáb 14/02/26	100%	$ 0,00
321		**3.**	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**	**78 días**	**lun 9/02/26**	**sáb 9/05/26**	**88%**	**$ 37.715.004,76**
322		3.	EXCAVACIÓN EN ZANJA - MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0 M	17 días	lun 9/02/26	vie 27/02/26	100%	$ 0,00
323		3.	RELLENO, CONFORMACION Y COMPACTACION A MAQUINA CON MATERIAL DE PRESTAMO	78 días	lun 9/02/26	sáb 9/05/26	80%	$ 31.792.997,40
324		3.	EXCAVACIÓN EN ZANJA - CONGLOMERADO - 0.0 A 2.0 M	17 días	lun 9/02/26	vie 27/02/26	100%	$ 0,00
325		3.	EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS - CONGLOMERADO - 0.0 A 2.0 M	17 días	lun 9/02/26	vie 27/02/26	100%	$ 948.915,00
326		3.	EXCAVACION MECANICA EN ZANJA (RETROEXCAVADORA)	17 días	lun 9/02/26	vie 27/02/26	100%	$ 0,00
327		3.	EXCAVACIÓN MECANIZADA CIELO ABIERTO-MAT COMÚN/CONGLOM 0.0 A 6.0 M.	17 días	lun 9/02/26	vie 27/02/26	80%	$ 1.246.935,00

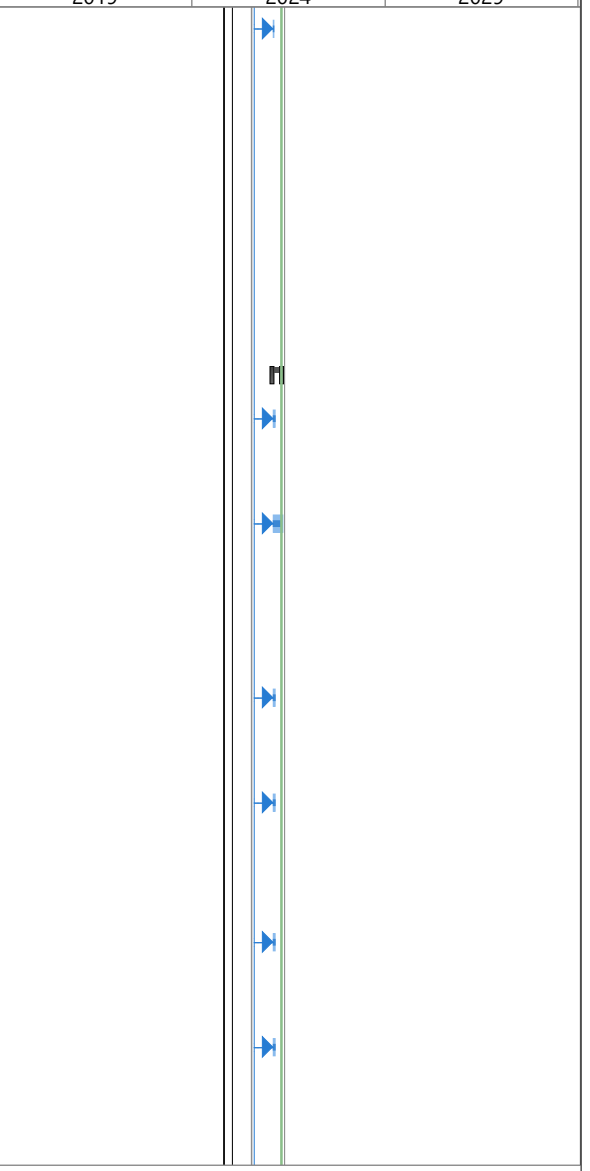


Id	Mo de tar	Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% compl	Costo
328		3.	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE MECANICO, DISPOSICIÓN EN BOTADERO (HASTA 25	17 días	lun 9/02/26	vie 27/02/26	80%	$ 3.726.157,36
329		**3.**	**MOBILIARIO Y PAISAJISM**	**6 días**	**jue 7/05/26**	**mié 13/05/26**	**0%**	**$ 18.894.832,00**
330		3.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN BANCA MODULAR CORRIDA, EN CONCRETO PULIDO, IGUAL O SIMILAR A: TIPO KÖNKRETUS REFERENCIA: BANCA DOBBELT MÓDULO "A". A:1,8 M X H:0,45 M X P:0,45 M. (336 KG/UN)	6 días	jue 7/05/26	mié 13/05/26	0%	$ 8.256.556,00
331		3.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN BANCA MODULAR CORRIDA CON ESPALDAR, EN CONCRETO PULIDO, IGUAL O SIMILAR A: TIPO KÖNKRETUS REFERENCIA: BANCA DOBBELT MÓDULO "A" CON ESPALDAR. A:1,8 M X H:0,79 M X P:0,45 M . (522 KG/UN)	6 días	jue 7/05/26	mié 13/05/26	0%	$ 10.638.276,00
332		**3.**	**MATERIAL GRANULAR**	**6 días**	**jue 7/05/26**	**mié 13/05/26**	**0%**	**$ 8.063.453,85**
333		3.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION AFIRMADO COMPACTADO PARA ESTRUCTURAS	6 días	jue 7/05/26	mié 13/05/26	0%	$ 7.889.230,00

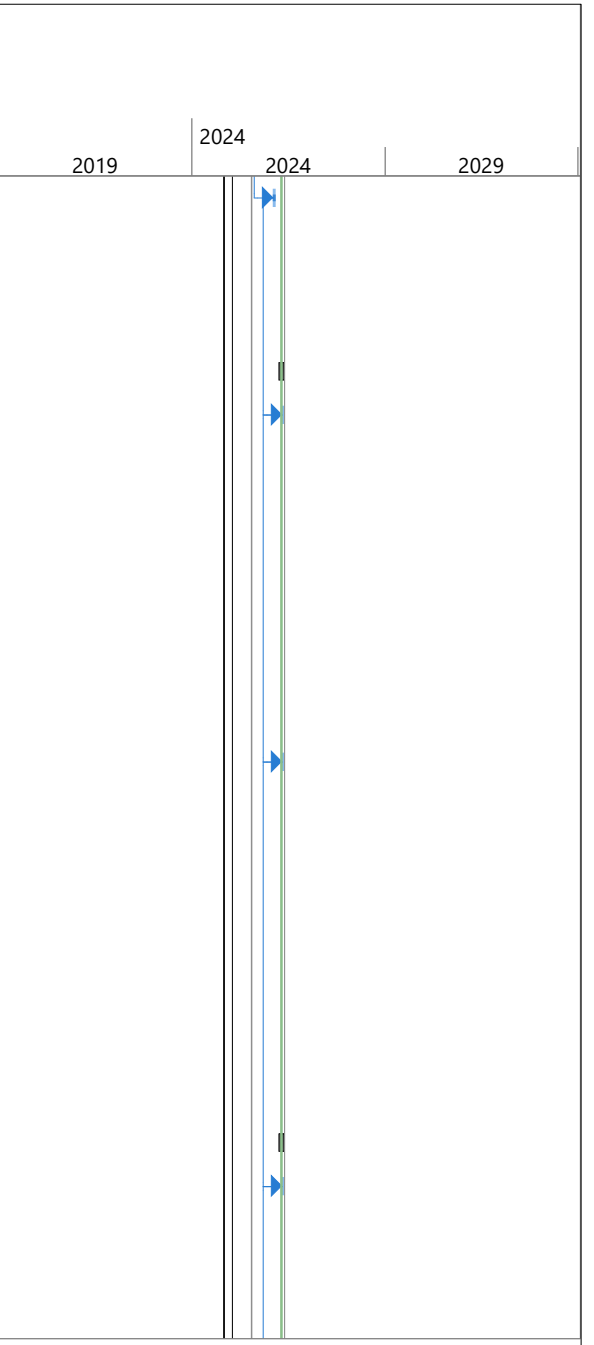


Id	Mo de tar	Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% compl	Costo
334		3.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION AFIRMADO PARA ANDENES	6 días	jue 7/05/26	mié 13/05/26	0%	$ 174.223,85
335		**3.**	**ZONAS DURAS - ESCALERAS - MUROS**	**54 días**	**lun 16/03/26**	**sáb 16/05/26**	**38%**	**$ 96.945.636,80**
336		3.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PLACA CONTRAPISO CONCRETO 3000 PSI E=0.10 m	5 días	jue 7/05/26	mar 12/05/26	0%	$ 26.337.410,40
337		3.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ANDEN CONCRETO 3000 PSI E= 0.10M. ACABADO: ESCOBIADO	5 días	jue 7/05/26	mar 12/05/26	0%	$ 670.652,40
338		3.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GRAVILLA LAVADA Nº2 (Incluye dilatación pvc)	5 días	lun 16/03/26	vie 20/03/26	100%	$ 1.358.272,50
339		3.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MALLA ELECTROSOLDADA M-131 Q-3.1 F 5.0mm c/.15m en ambos sentidos (Incluye alambre negro, colocación y traslapo).	5 días	mar 12/05/26	sáb 16/05/26	0%	$ 4.462.350,75
340		3.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SOLADO DE LIMPIEZA 2.000 PSI E = 5 CM	5 días	lun 16/03/26	vie 20/03/26	100%	$ 468.072,00

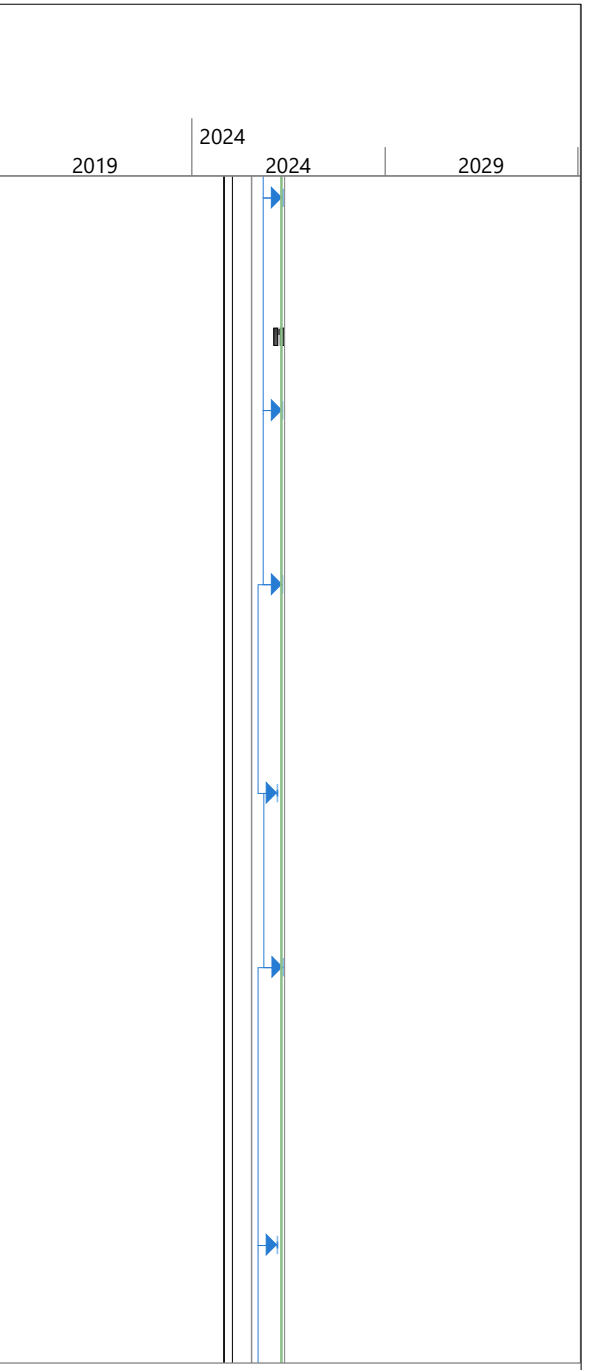


Id	Modo de tar	Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% compl	Costo
341		3.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MUROS DE CONTENCION CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI H<3.0M. NO INCLUYE REFUERZO.	5 días	lun 16/03/26	vie 20/03/26	100%	$ 2.465.639,25
342		3.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ZAPATA CONCRETO 3000 PSI	5 días	mar 12/05/26	sáb 16/05/26	0%	$ 5.258.825,00
343		3.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VIGA CIMENTACION CONCRETO 4000 PSI	5 días	lun 16/03/26	vie 20/03/26	100%	$ 1.921.357,50
344		3.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION COLUMNAS CONCRETO 4000 PSI A LA VISTA	5 días	mar 12/05/26	sáb 16/05/26	0%	$ 49.967.523,00
345		3.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION JUNTA DE DILATACION PARA PLACA CONTRAPISO (Inlcuye sellante)	5 días	mar 12/05/26	sáb 16/05/26	0%	$ 3.763.812,00
346		3.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SARDINEL ANCHO = 10 CM H = ENTRE 17 Y 24 CM EN CONCRETO 3000 PSI	5 días	mar 12/05/26	sáb 16/05/26	0%	$ 0,00

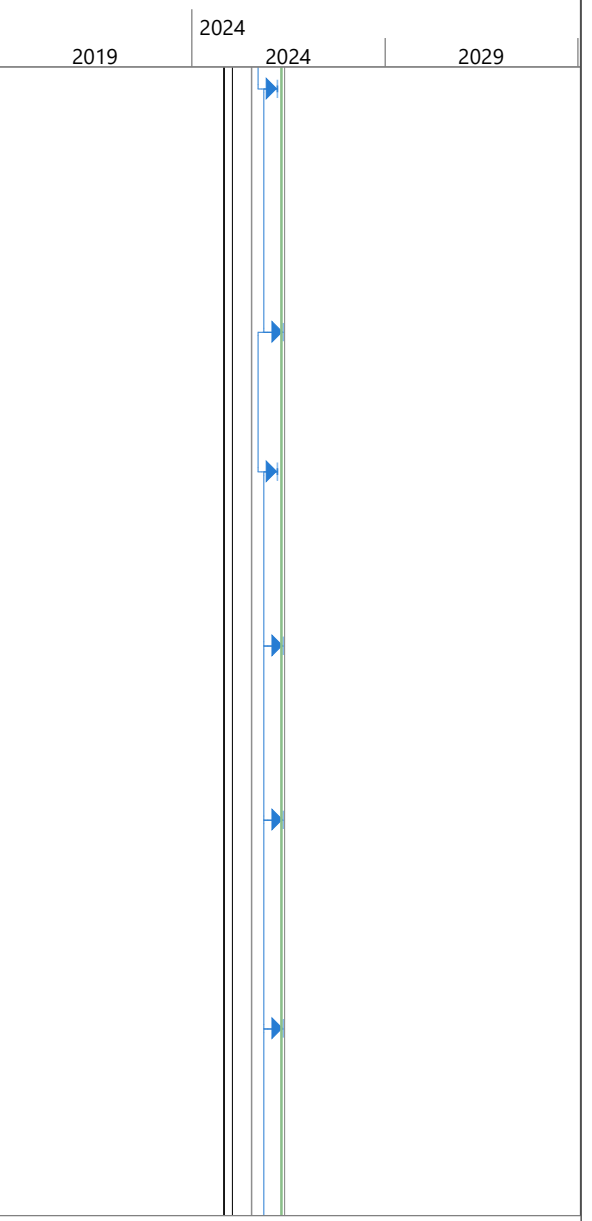


Id	Mo de tar	Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% compl	Costo
347		3.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SARDINEL ANCHO = 10 CM H = ENTRE 25 Y 30 CM EN CONCRETO 3000 PSI	5 días	mar 12/05/26	sáb 16/05/26	0%	$ 0,00
348		3.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ALISTADO PISOS Mortero 1:3 e= 0.03 mts	5 días	lun 16/03/26	vie 20/03/26	100%	$ 271.722,00
349		**3.**	**ACERO**	**55 días**	**lun 16/03/26**	**lun 18/05/26**	**73%**	**$ 125.905.200,00**
350		3.	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION ACERO DE 60000 PSI (INCLUYE ALAMBRE NEGRO Y FIGURACION)	55 días	lun 16/03/26	lun 18/05/26	80%	$ 35.788.000,00
351		3.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTRUCTURA METÁLICA EN Perfil Lámina Delgada PHR ASTM A500 Grado 50. Calibre según diseño (Incluye vigas, cerchas, correas, anticorrosivo y esmalte)	5 días	lun 11/05/26	vie 15/05/26	0%	$ 90.117.200,00
352		**3.**	**EMPRADIZACION**	**5 días**	**mar 10/02/26**	**sáb 14/02/26**	**100%**	**$ 0,00**
353		3.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE EMPRADIZACIÓN DE TALUDES Y ZONAS VERDES	5 días	mar 10/02/26	sáb 14/02/26	100%	$ 0,00
354		**3.**	**ADICIONALES ALCALDÍA DE MANIZALES**	**5 días**	**mar 10/02/26**	**sáb 14/02/26**	**100%**	**$ 15.540.092,00**

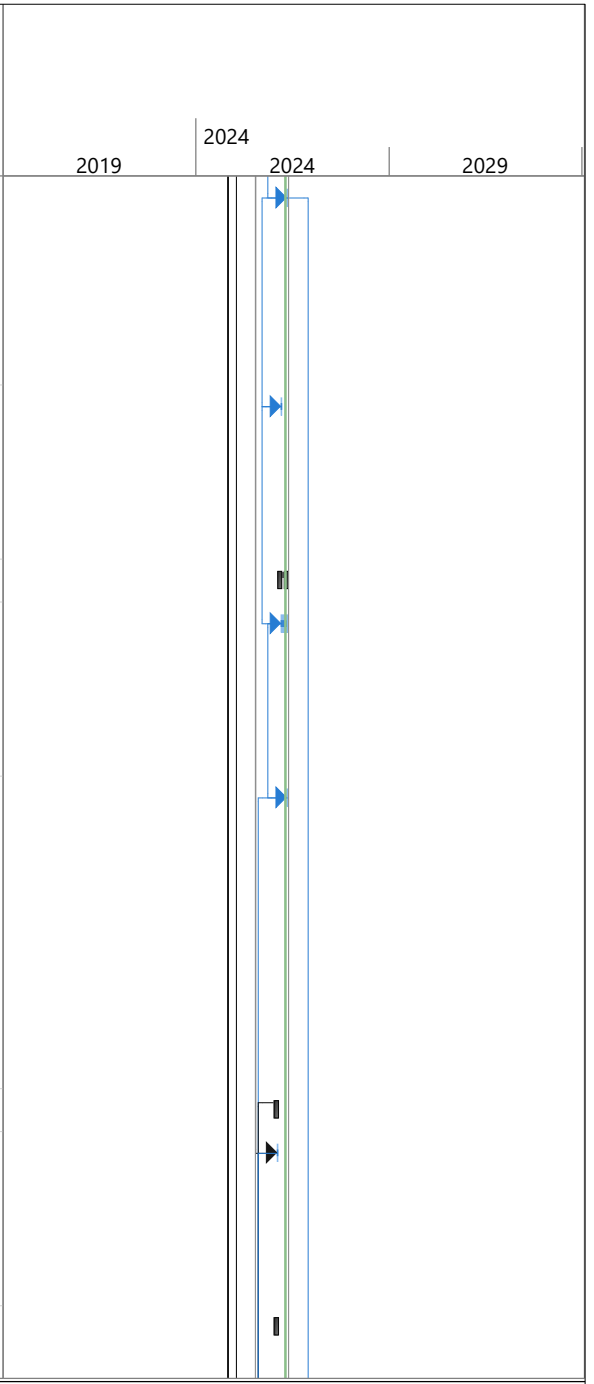


Id	Mo de tar	Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% compl	Costo
355		3.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TECHADO PROVISIONAL EN GUADUA Y PLÁSTICO	5 días	mar 10/02/26	sáb 14/02/26	100%	$ 0,00
356		3.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TEJA TRASLUCIDA CINDURIB a=0.88 m. o similar. Cristal o Opal según diseño. (Incluye instalación, ganchos de fijación y el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje.)	5 días	mar 10/02/26	sáb 14/02/26	100%	$ 15.139.152,00
357		3.	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE DILATACIONES ESTRUCTURALES CON ICOPOR E=2.0CM Y SELLO CON SIKAFLEX 1A PLUS	5 días	mar 10/02/26	sáb 14/02/26	100%	$ 56.876,00
358		3.	JORNAL AYUDANTE	5 días	mar 10/02/26	sáb 14/02/26	100%	$ 344.064,00
359		**3.**	**ASEO GENERAL Y LIMPIE**	**4 días**	**sáb 23/05/26**	**mié 27/05/26**	**0%**	**$ 1.363.558,48**
360		3.	ASEO GENERAL	4 días	sáb 23/05/26	mié 27/05/26	0%	$ 1.363.558,48
361		**3.**	**OBRAS EXTERIORES**	**4 días**	**sáb 23/05/26**	**mié 27/05/26**	**0%**	**$ 2.771.848,00**

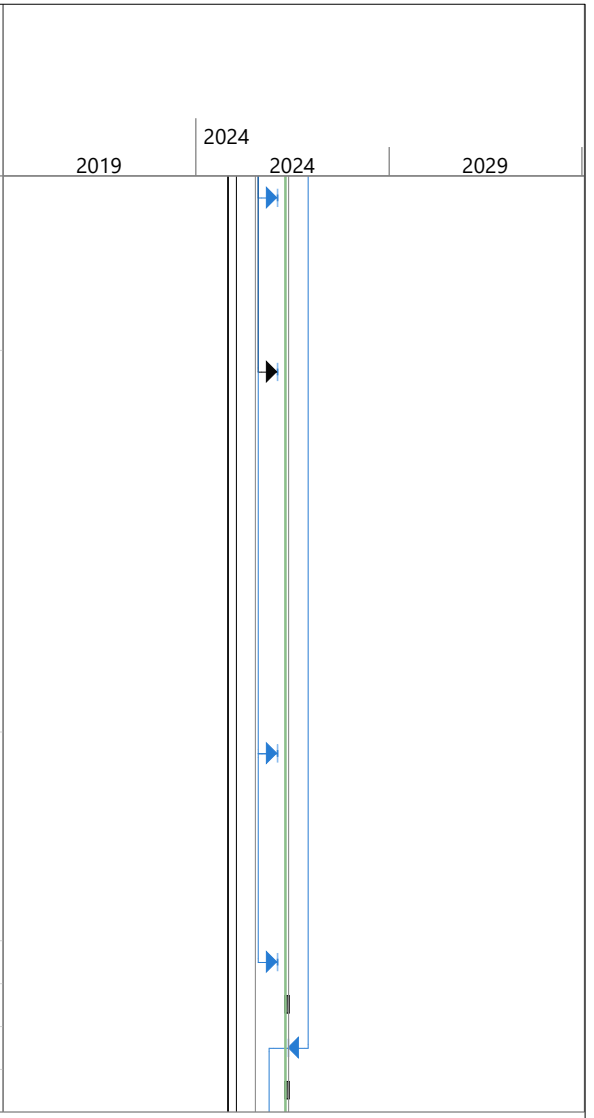


Id	Mo de tar	Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% compl	Costo
362		3.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PLATINA DE 3/4" CON PERNOS DE 3/4" L=0,4M INSCRUSTADOS EN PEDESTAL DE CONCRETO (NO INCLUIDO). INCLUYE: Pernos, platina de 0,27*0,27, tuercas, pintura, soldadura	4 días	sáb 23/05/26	mié 27/05/26	0%	$ 2.771.848,00
363		3..	FIN	0 días	mié 27/05/26	mié 27/05/26	0%	$ 0,00
364		**3.**	**ZONA 7**	**273 días**	**jue 17/07/25**	**sáb 30/05/26**	**93%**	**$ 212.087.671,01**
365		3..	INICIO	0 días	jue 17/07/25	jue 17/07/25	100%	$ 0,00
366		**3.**	**CANCHA BADMINTON**	**273 días**	**jue 17/07/25**	**sáb 30/05/26**	**93%**	**$ 212.087.671,01**
367		**3.**	**PRELIMINARES**	**52 días**	**jue 17/07/25**	**lun 15/09/25**	**100%**	**$ 4.304.857,04**
368		3.	ROCERIA Y LIMPIEZA	52 días	jue 17/07/25	lun 15/09/25	100%	$ 265.738,20
369		3.	LOCALIZACION Y REPLANTEO	52 días	jue 17/07/25	lun 15/09/25	100%	$ 2.916.882,00
370		3.	DESCAPOTE MECANICO e=0.20 m.	52 días	jue 17/07/25	lun 15/09/25	100%	$ 335.370,84
371		3.	INSTALACION PROVISIONAL DE ACUEDUCTO	52 días	jue 17/07/25	lun 15/09/25	100%	$ 685.338,00
372		3.	INSTALACION PROVISIONAL DE ENERGIA	52 días	jue 17/07/25	lun 15/09/25	100%	$ 101.528,00

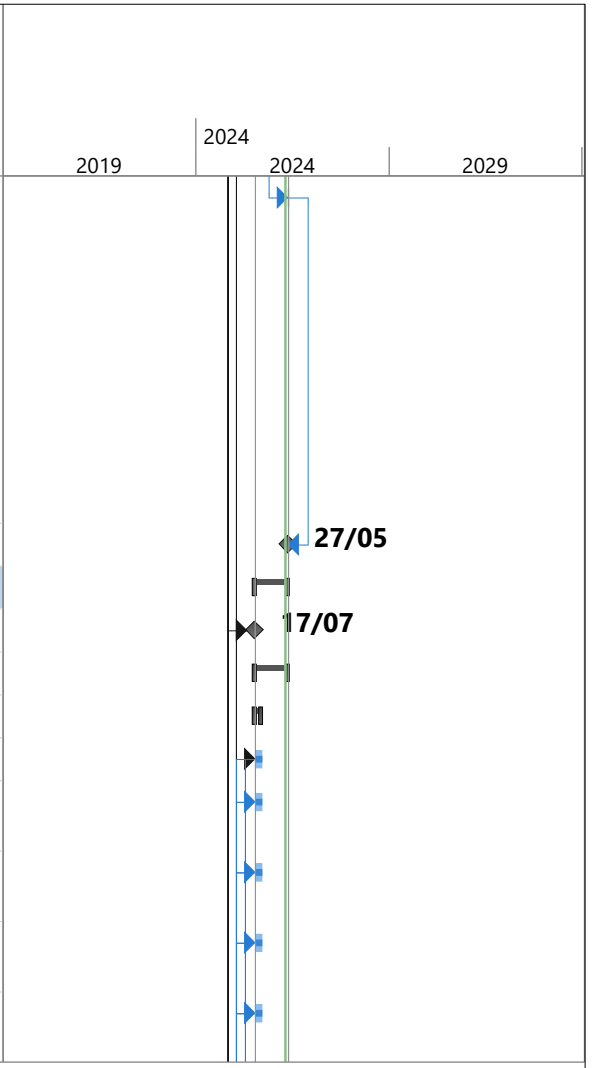

Id	Mo de tar	Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% compl	Costo
373		3.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CERRAMIENTO PROVISIONAL EN LÁMINA GALVANIZADA H= 2.4M (Incluye guadua cepa, puntillas y demás elementos para su correcta instalación y funcionamiento)	52 días	jue 17/07/25	lun 15/09/25	100%	$ 0,00
374		**3.**	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**	**13 días**	**sáb 20/09/25**	**sáb 4/10/25**	**100%**	**$ 37.335.506,75**
375		3.	EXCAVACIÓN EN ZANJA - MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0 M	13 días	sáb 20/09/25	sáb 4/10/25	100%	$ 0,00
376		3.	RELLENO, CONFORMACION Y COMPACTACION A MAQUINA CON MATERIAL DE PRESTAMO	13 días	sáb 20/09/25	sáb 4/10/25	100%	$ 0,00
377		3.	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION	13 días	sáb 20/09/25	sáb 4/10/25	100%	$ 0,00
378		3.	EXCAVACION MECANICA EN ZANJA (RETROEXCAVADORA)	13 días	sáb 20/09/25	sáb 4/10/25	100%	$ 0,00
379		3.	EXCAVACIÓN EN ZANJA - CONGLOMERADO - 0.0 A 2.0 M	13 días	sáb 20/09/25	sáb 4/10/25	100%	$ 0,00
380		3.	EXCAVACIÓN MECANIZADA CIELO ABIERTO-MAT COMÚN/CONGLOM 0.0 A 6.0 M.	13 días	sáb 20/09/25	sáb 4/10/25	100%	$ 7.879.548,76

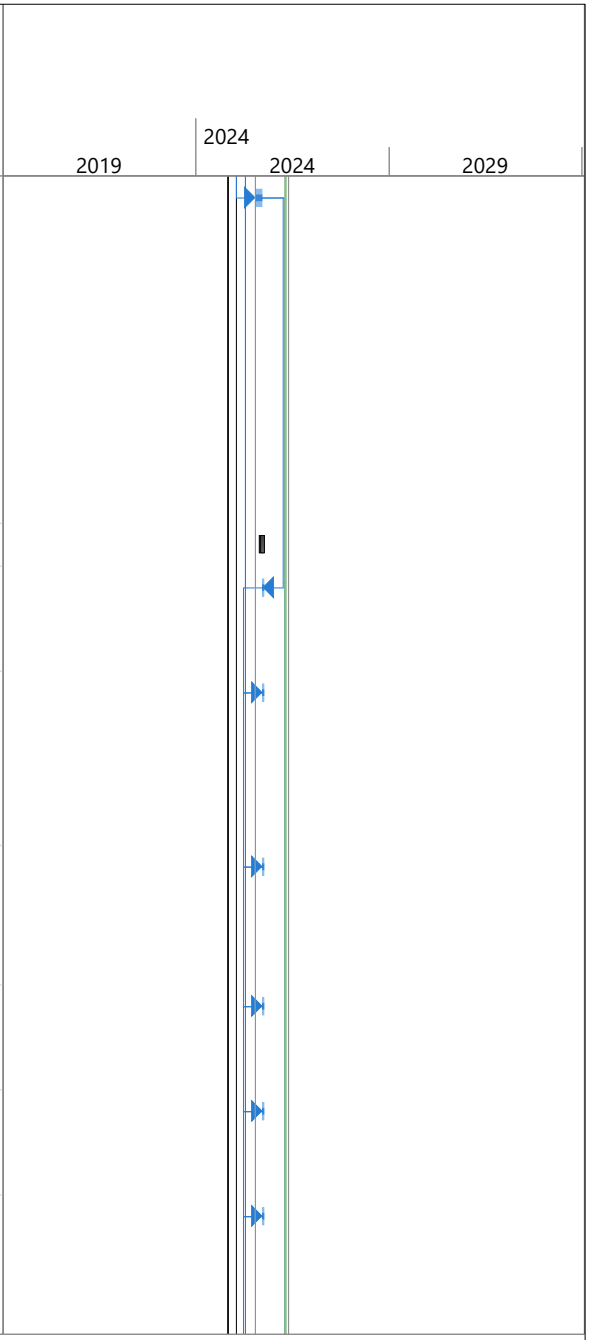


Id	Mo de tar	Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% compl	Costo
381		3.	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE MECANICO, DISPOSICIÓN EN BOTADERO (HASTA 25	13 días	sáb 20/09/25	sáb 4/10/25	100%	$ 29.455.957,99
382		**3.**	**MATERIAL GRANULAR**	**8 días**	**sáb 4/10/25**	**lun 13/10/25**	**100%**	**$ 8.448.897,60**
383		3.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION AFIRMADO COMPACTADO PARA ESTRUCTURAS	8 días	sáb 4/10/25	lun 13/10/25	100%	$ 8.448.897,60
384		3.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION AFIRMADO PARA ANDENES	8 días	sáb 4/10/25	lun 13/10/25	100%	$ 0,00
385		**3.**	**ZONAS DURAS**	**113 días**	**mar 14/10/25**	**sáb 21/02/26**	**100%**	**$ 40.200.038,66**
386		3.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MEZCLA ASFALTICA TIPO MDC-19. Extendido mecánico y compactado	5 días	jue 16/10/25	mar 21/10/25	100%	$ 0,00
387		3.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ANDEN CONCRETO 3000 PSI E= 0.10M. ACABADO: ESCOBIADO	10 días	vie 24/10/25	mar 4/11/25	100%	$ 33.933.480,00
388		3.	ESTAMPADO SOBRE CONCRETO CON MOLDE METÁLICO HEXAGONAL	10 días	vie 24/10/25	mar 4/11/25	100%	$ 0,00

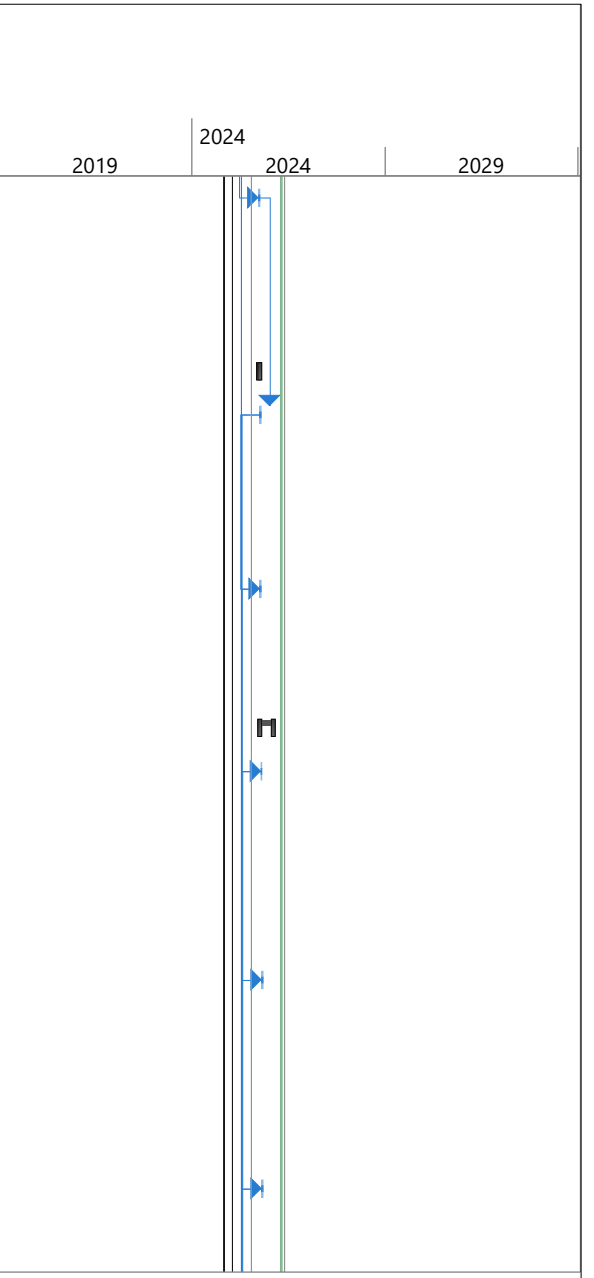


Id	Mo de tar	Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% compl	Costo
389		3.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESCALAS CONCRETO 3000 PSI E= 0.10M. SOBRE TIERRA ACABADO ESCOBIADO	104 días	vie 24/10/25	sáb 21/02/26	100%	$ 1.235.295,50
390		3.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SARDINEL ANCHO = 10 CM H = ENTRE 17 Y 24 CM EN CONCRETO 3000 PSI	10 días	vie 24/10/25	mar 4/11/25	100%	$ 0,00
391		3.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MALLA ELECTROSOLDADA M-131 Q-3.1 F 5.0mm c/.15m en ambos sentidos (Incluye alambre negro, colocación y traslapo).	10 días	mar 14/10/25	vie 24/10/25	100%	$ 5.031.263,16
392		**3.**	**ALCANTARILLADO**	**5 días**	**jue 9/10/25**	**mar 14/10/25**	**100%**	**$ 3.001.716,00**
393		3.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CAJA DE INSPECCIÓN EMPALME DOMICILIARIO TIPO I (0,60X0,60 M) EN CONCRETO CLASE II INCLUYE TAPA Y CAÑUELA	5 días	jue 9/10/25	mar 14/10/25	100%	$ 1.500.566,00
394		3.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PASES EN TUBERIA PVC AGUAS LLUVIAS DE 4" PARA MUROS	5 días	jue 9/10/25	mar 14/10/25	100%	$ 278.608,00


Id	Mo de tar	Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% compl	Costo
395		3.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIA DE 4"	5 días	jue 9/10/25	mar 14/10/25	100%	$ 1.222.542,00
396		**3.**	**OBRAS EXTERIORES**	**124 días**	**vie 7/11/25**	**mar 31/03/26**	**100%**	**$ 70.841.615,96**
397		3.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN TUBERÍA GALVANIZADA PARA CERRAMIENTO Ø 2", MURO EN CONCRETO A LA VISTA E= 0,12M H= 0,4M CON MORTERO DE REVOQUE IMPERMEABILIZADO, MALLA ESLABONADA CA. 10 OJO 2-1/4"X2-1/4", VIGA EN CONCRETO	1 día	lun 2/03/26	lun 2/03/26	100%	$ 0,00
398		3.	SUMINISTRO . FABRICACION E INSTALACION DE CERRAMIENTO METALICO EN MALLA ESLABONADA DE 6,0 METROS DE ALTURA , SEGÚN DISEÑO RECIBIDO (Incluye paral en tubo galvanizado cada 3,0 metros , tableros de malla eslabonada de 1 1/4 x 2 1/4 calibre 10 , platinas de	25 días	mar 3/03/26	mar 31/03/26	100%	$ 63.219.033,96

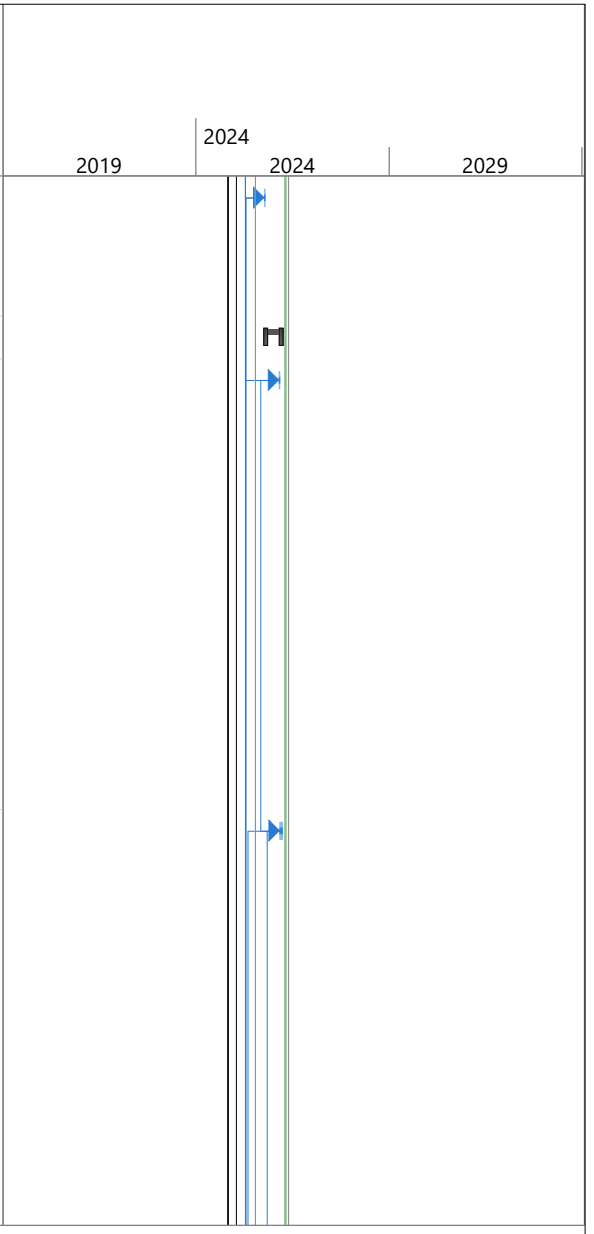


Id	Mo de tar	Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% compl	Costo
399		3.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PLATINA DE 3/4" CON PERNOS DE 3/4" L=0,4M INSCRUSTADOS EN PEDESTAL DE CONCRETO (NO INCLUIDO). INCLUYE: Pernos, platina de 0,27*0,27, tuercas, pintura, soldadura	25 días	vie 7/11/25	vie 5/12/25	100%	$ 7.622.582,00
400		**4.**	**EMPRADIZACION**	**16 días**	**mié 28/01/26**	**sáb 14/02/26**	**100%**	**$ 0,00**
401		4.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE EMPRADIZACIÓN DE TALUDES Y ZONAS VERDES	16 días	mié 28/01/26	sáb 14/02/26	100%	$ 0,00
402		**4.**	**MOBILIARIO URBANO**	**12 días**	**jue 7/05/26**	**mié 20/05/26**	**0%**	**$ 15.319.885,00**
403		4.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN BANCA MODULAR CORRIDA CON ESPALDAR, EN CONCRETO PULIDO, IGUAL O SIMILAR A: TIPO KÖNKRETUS REFERENCIA: BANCA OLAND CON ESPALDAR. A:1,8 M X H:0,79 M X P:0,57 M. (369 KG/UN) (MU 03). INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU C	12 días	jue 7/05/26	mié 20/05/26	0%	$ 15.319.885,00
404		**4.**	**PINTURA**	**12 días**	**lun 18/05/26**	**sáb 30/05/26**	**0%**	**$ 26.274.283,60**

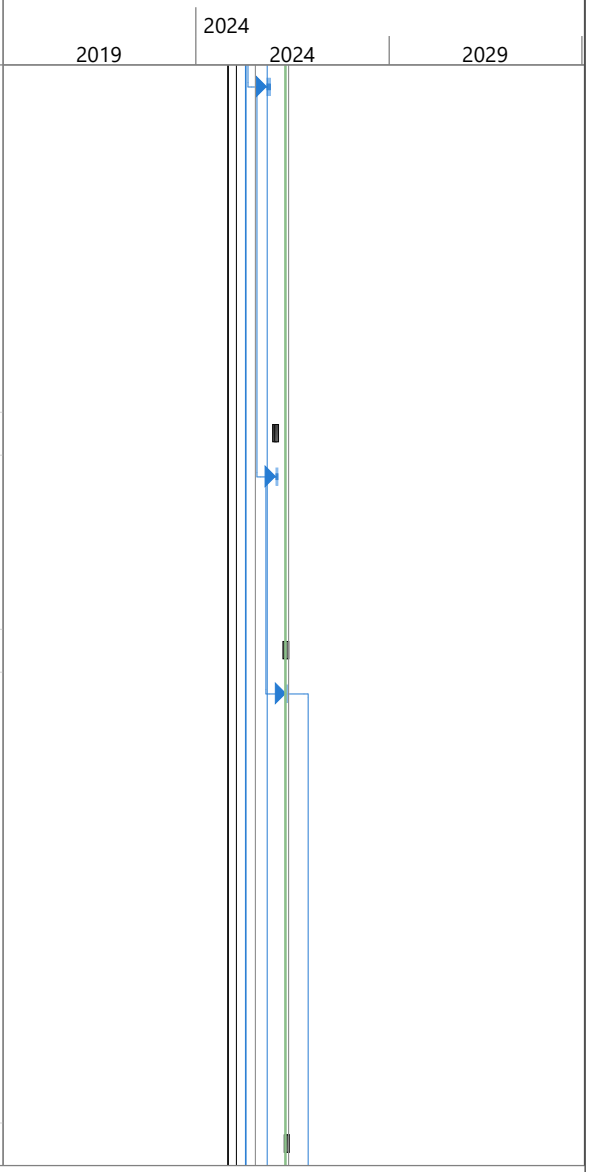


Id	Mo de tar	Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% compl	Costo
405		4.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE RECUBRIMIENTO ACRÍLICO SINTÉTICO ACRYTECH STEGASS SOBRE PLACAS DE CONCRETO. Incluye una capa de acrilyc resurfer con arena de cuarzo, una capa de acrytech color con arena de cuarzo y una capa de acrytech color sin	12 días	lun 18/05/26	sáb 30/05/26	0%	$ 16.240.000,00
406		4.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PINTURA TOTAL DE CANCHA Y DEMARCACIÓN DE LÍNEAS, EN PLACA DE CONCRETO. PINTURA SIKA SPORTLINE O SIMILAR CON ANTIDESLIZANTE NO ABRASIVO INMERSO. VARIOS COLORES, SEGÚN DISEÑO	12 días	lun 18/05/26	sáb 30/05/26	0%	$ 10.034.283,60
407		**4.**	**ADICIONALES ALCALDÍA DE MANIZALES**	**89 días**	**lun 2/02/26**	**vie 15/05/26**	**68%**	**$ 4.786.758,00**
408		4.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TECHADO PROVISIONAL EN GUADUA Y PLÁSTICO	12 días	lun 2/02/26	sáb 14/02/26	100%	$ 0,00
409		4.	JORNAL AYUDANTE	11 días	mar 3/02/26	sáb 14/02/26	100%	$ 3.956.736,00

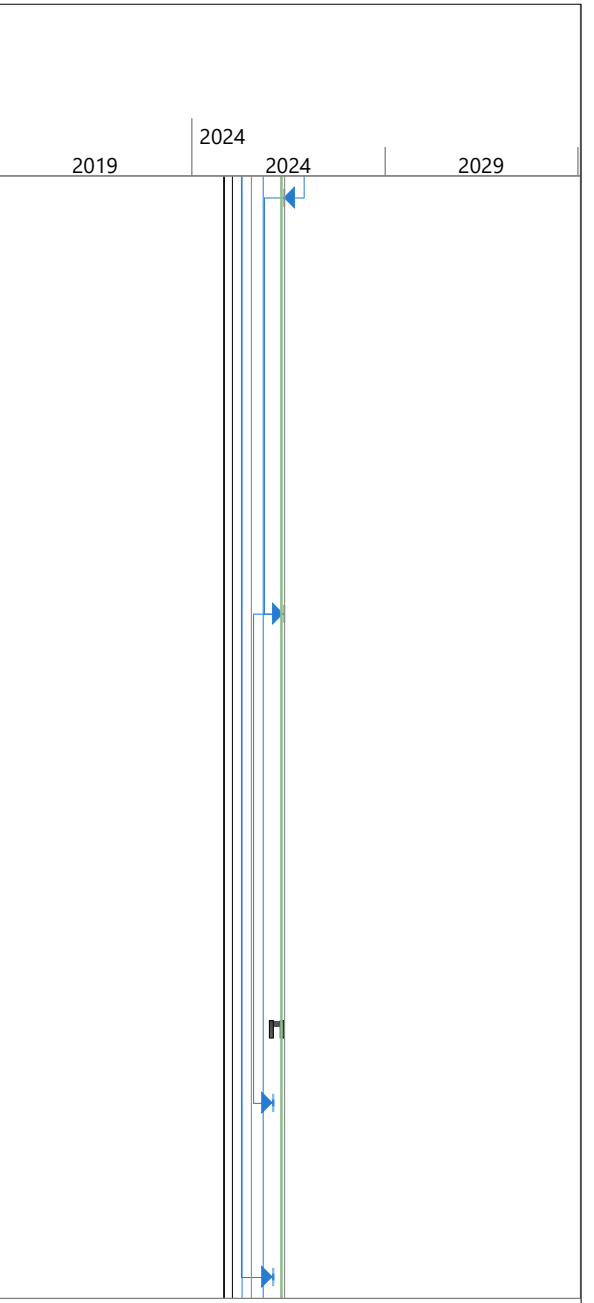


Id	Mo de tar	Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% compl	Costo
410		4.	SUMINISTRO, TRANSORTE E INSTALACION DE TUBOS Y MALLA PARA VOLEIBOL O BADMINTON, INCLUYE TODOS LOS ADITAMENTOS, HUECOS PARA HINCAR LOS TUBOS Y DEMAS ACTIVIDADES Y MATERIALES PARA SU FUNCIONAMIENTO. (TUBOS AN Ø 2")	11 días	lun 4/05/26	vie 15/05/26	0%	$ 830.022,00
411		**4.**	**ASEO GENERAL Y LIMPIE**	**3 días**	**lun 25/05/26**	**mié 27/05/26**	**0%**	**$ 1.574.112,40**
412		4.	ASEO GENERAL	3 días	lun 25/05/26	mié 27/05/26	0%	$ 1.574.112,40
413		4..	FIN	0 días	**mié 27/05/26**	**mié 27/05/26**	0%	$ 0,00
414		**4.**	**N1**	**5 días**	**jue 16/10/25**	**mar 21/10/25**	**100%**	**$ 46.570.775,04**
415		**4.**	**CANCHA BADMINTON**	**5 días**	**jue 16/10/25**	**mar 21/10/25**	**100%**	**$ 46.570.775,04**
416		4.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PLACA CONTRAPISO CONCRETO 3000 PSI	5 días	jue 16/10/25	mar 21/10/25	100%	$ 38.606.315,04
417		4.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MALLA ELECTROSOLDADA M-188 Q-5 F 6 mm c/.15m en ambos sentidos (Incluye alambre negro, colocación y traslapo)	5 días	jue 16/10/25	mar 21/10/25	100%	$ 7.964.460,00
418		**4.**	**ZONA 8**	**267 días**	**jue 17/07/25**	**sáb 23/05/26**	**94%**	**$ 282.301.276,22**
419		4..	INICIO	0 días	jue 17/07/25	jue 17/07/25	100%	$ 0,00
420		**4.**	**CANCHA VOLEY ARENA**	**267 días**	**jue 17/07/25**	**sáb 23/05/26**	**94%**	**$ 282.301.276,22**
421		**4.**	**PRELIMINARES**	**52 días**	**jue 17/07/25**	**lun 15/09/25**	**100%**	**$ 4.636.616,00**
422		4.	ROCERIA Y LIMPIEZA	52 días	jue 17/07/25	lun 15/09/25	100%	$ 362.700,00

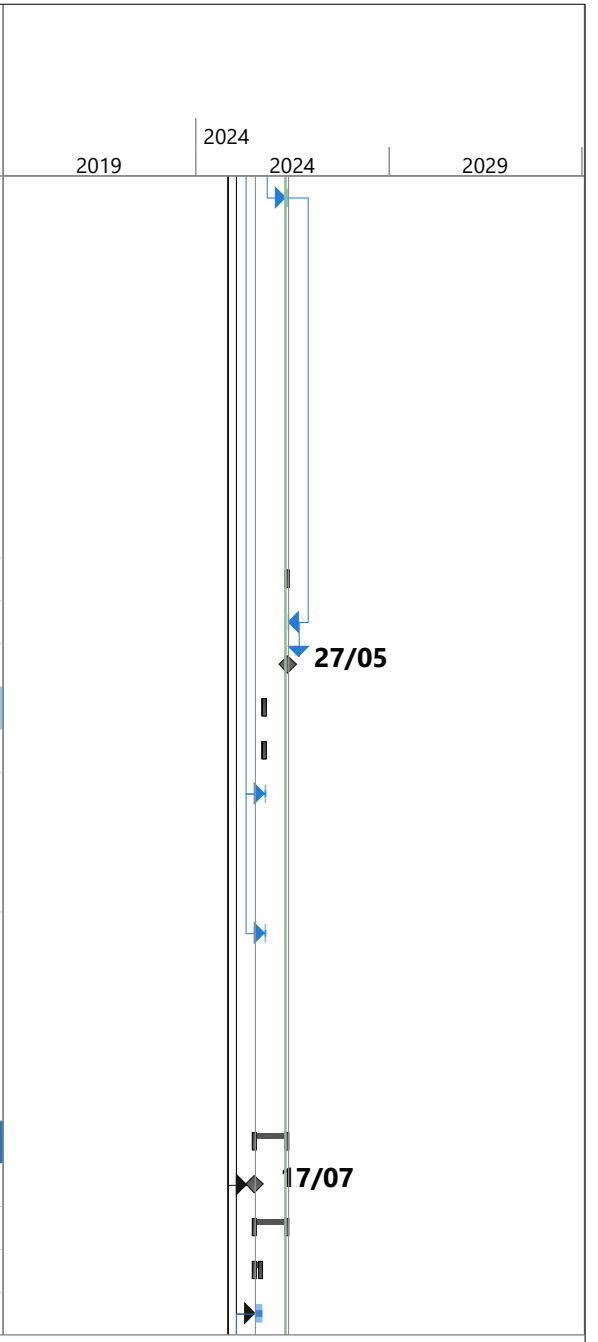

Id	Mo de tar	Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% compl	Costo
423		4.	LOCALIZACION Y REPLANTEO	52 días	jue 17/07/25	lun 15/09/25	100%	$ 3.029.310,00
424		4.	DESCAPOTE MECANICO e=0.20 m.	52 días	jue 17/07/25	lun 15/09/25	100%	$ 457.740,00
425		4.	INSTALACION PROVISIONAL DE ACUEDUCTO	52 días	jue 17/07/25	lun 15/09/25	100%	$ 685.338,00
426		4.	INSTALACION PROVISIONAL DE ENERGIA	52 días	jue 17/07/25	lun 15/09/25	100%	$ 101.528,00
427		4.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CERRAMIENTO PROVISIONAL EN LÁMINA GALVANIZADA H= 2.4M (Incluye guadua cepa, puntillas y demás elementos para su correcta instalación y funcionamiento)	52 días	jue 17/07/25	lun 15/09/25	100%	$ 0,00
428		**4.**	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**	**10 días**	**mar 14/10/25**	**vie 24/10/25**	**100%**	**$ 18.470.104,69**
429		4.	EXCAVACIÓN EN ZANJA - MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0 M	10 días	mar 14/10/25	vie 24/10/25	100%	$ 0,00
430		4.	RELLENO, CONFORMACION Y COMPACTACION A MAQUINA CON MATERIAL DE PRESTAMO	10 días	mar 14/10/25	vie 24/10/25	100%	$ 6.603.612,00
431		4.	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION	10 días	mar 14/10/25	vie 24/10/25	100%	$ 1.110.371,00
432		4.	EXCAVACION MECANICA EN ZANJA (RETROEXCAVADORA)	10 días	mar 14/10/25	vie 24/10/25	100%	$ 0,00

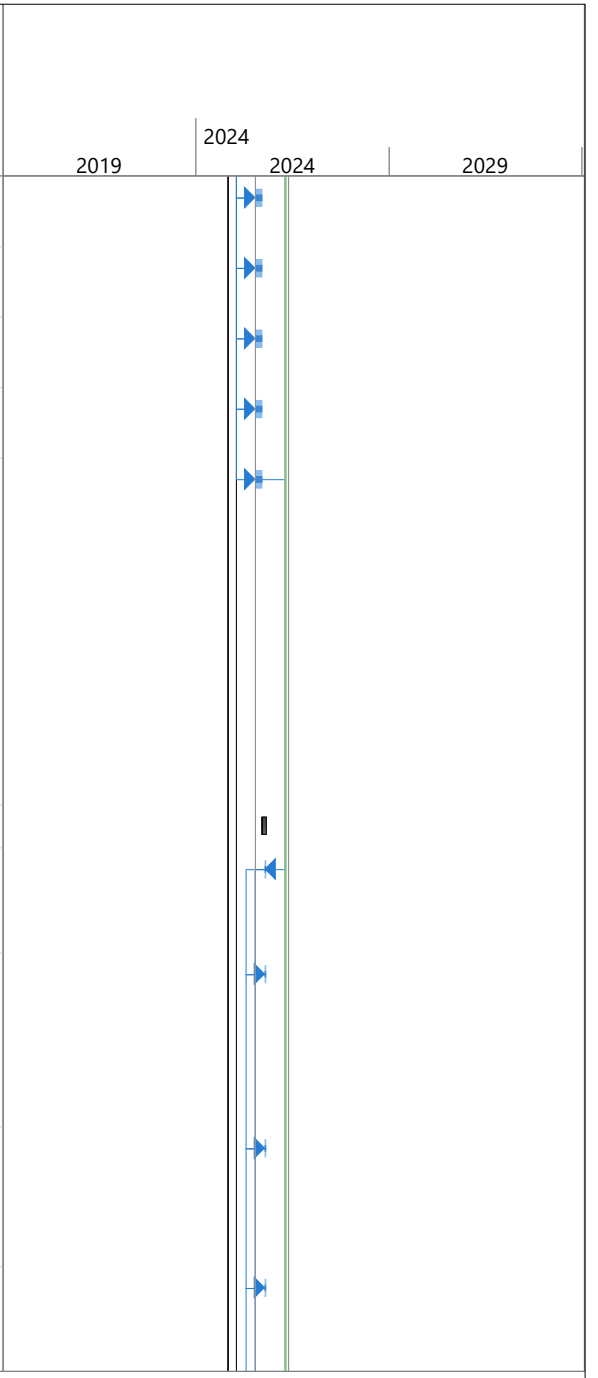


Id	Mo de tar	Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% compl	Costo
433		4.	EXCAVACIÓN EN ZANJA - CONGLOMERADO - 0.0 A 2.0 M	10 días	mar 14/10/25	vie 24/10/25	100%	$ 0,00
434		4.	EXCAVACIÓN MECANIZADA CIELO ABIERTO-MAT COMÚN/CONGLOM 0.0 A 6.0 M.	10 días	mar 14/10/25	vie 24/10/25	100%	$ 6.300.749,70
435		4.	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE MECANICO, DISPOSICIÓN EN BOTADERO (HASTA 25	10 días	mar 14/10/25	vie 24/10/25	100%	$ 4.455.371,99
436		**4.**	**MATERIAL GRANULAR**	**149 días**	**lun 24/11/25**	**vie 15/05/26**	**84%**	**$ 91.918.649,00**
437		4.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION AFIRMADO COMPACTADO PARA ESTRUCTURAS	6 días	lun 24/11/25	sáb 29/11/25	100%	$ 7.762.876,00
438		4.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION AFIRMADO PARA ANDENES	6 días	lun 24/11/25	sáb 29/11/25	100%	$ 0,00
439		4.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MATERIAL GRANULAR (TRITURADO) PARA PARQUEADEROS.	6 días	lun 24/11/25	sáb 29/11/25	100%	$ 7.100.719,00
440		4.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ARENA TIPO SILICE SIN TRANSFORMAR	63 días	mié 4/03/26	vie 15/05/26	80%	$ 77.055.054,00
441		**4.**	**ZONAS DURAS**	**22 días**	**lun 1/12/25**	**vie 26/12/25**	**100%**	**$ 13.906.501,60**

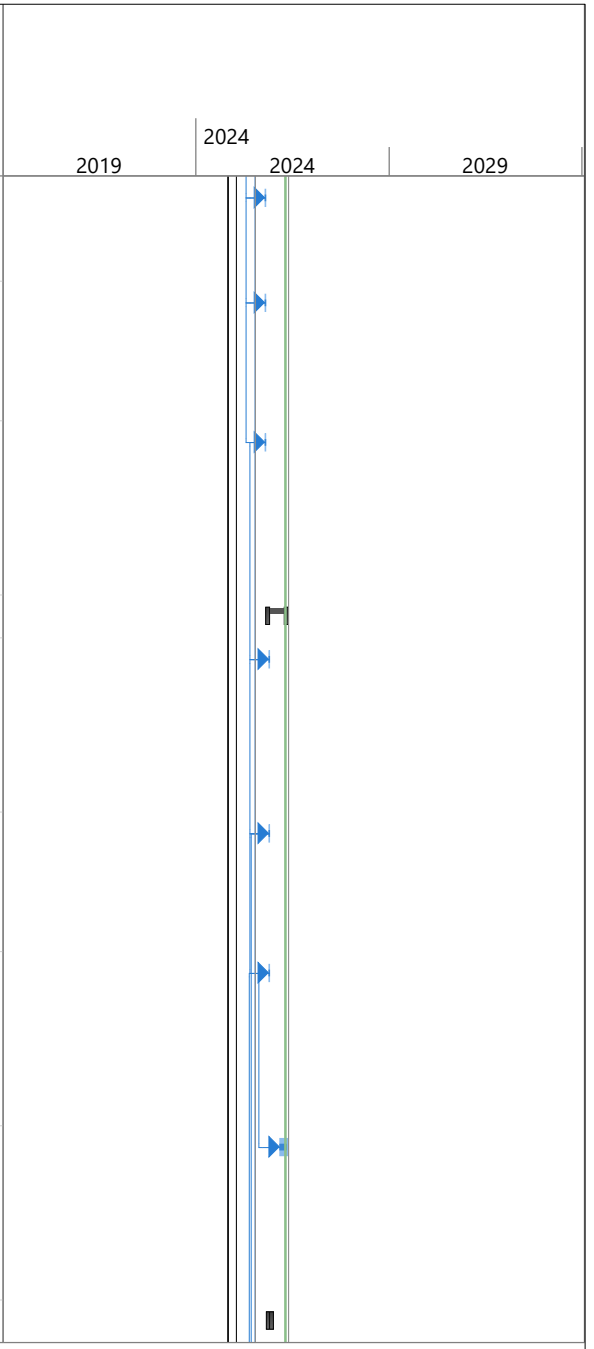


Id	Modo de tar	Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% compl	Costo
442		4.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ANDEN CONCRETO 3000 PSI E= 0.10M. ACABADO: ESCOBIADO	20 días	mié 3/12/25	vie 26/12/25	100%	$ 10.526.304,00
443		4.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESCALAS CONCRETO 3000 PSI E= 0.10M. SOBRE TIERRA ACABADO ESCOBIADO	14 días	lun 1/12/25	mar 16/12/25	100%	$ 1.482.354,60
444		4.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SARDINEL ANCHO = 10 CM H = ENTRE 17 Y 24 CM EN CONCRETO 3000 PSI	1 día	mié 3/12/25	mié 3/12/25	100%	$ 0,00
445		4.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MALLA ELECTROSOLDADA M-131 Q-3.1 F 5.0mm c/.15m en ambos sentidos (Incluye alambre negro, colocación y traslapo).	20 días	mié 3/12/25	vie 26/12/25	100%	$ 1.591.920,00
446		4.	CORTE MECANIZADO DE PAVIMENTO A=5 mm profundidad un tercio del espesor	1 día	mié 3/12/25	mié 3/12/25	100%	$ 305.923,00
447		**4.**	**ALCANTARILLADO**	**12 días**	**lun 2/02/26**	**sáb 14/02/26**	**100%**	**$ 7.073.367,10**


Id	Modo de tar	Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% compl	Costo
448		4.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CAJA DE INSPECCIÓN EMPALME DOMICILIARIO TIPO I (0,60X0,60 M) EN CONCRETO CLASE II INCLUYE TAPA Y CAÑUELA	12 días	lun 2/02/26	sáb 14/02/26	100%	$ 1.500.566,00
449		4.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC-S 6" (RED SANITARIA, INCLUYE ACCESORIOS)	12 días	lun 2/02/26	sáb 14/02/26	100%	$ 1.879.836,00
450		4.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION FILTRO DRENAJE (0.60 x 0.40 m.) Tubo Drenaje Corrugado de 4" con filtro. Incluye relleno piedra filtro, Geotextil NT 3000	1 día	sáb 14/02/26	sáb 14/02/26	100%	$ 3.692.965,10
451		**4.**	**OBRAS EXTERIORES**	**98 días**	**lun 1/12/25**	**mar 24/03/26**	**100%**	**$ 76.584.619,13**
452		4.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN TUBERÍA GALVANIZADA PARA CERRAMIENTO Ø 2", MURO EN CONCRETO A LA VISTA E= 0,12M H= 0,4M CON MORTERO DE REVOQUE IMPERMEABILIZADO, MALLA ESLABONADA CA. 10 OJO 2-1/4"X2-1/4", VIGA EN CONCRETO	16 días	vie 6/03/26	mar 24/03/26	100%	$ 0,00

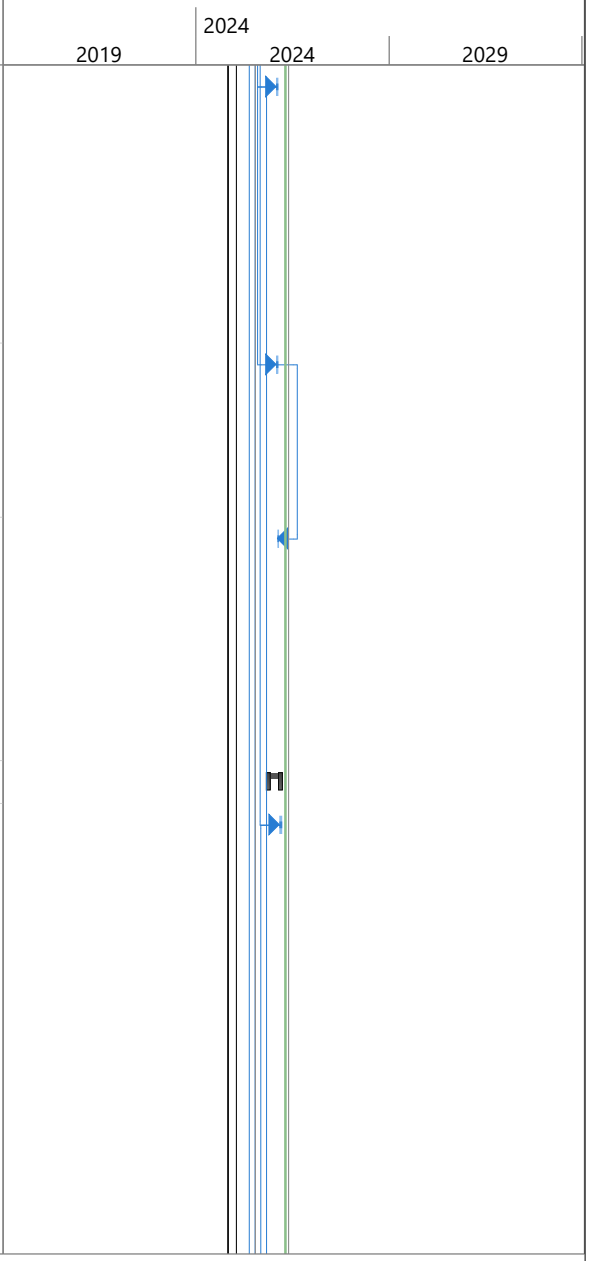


Id	Mo de tar	Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% compl	Costo
453		4.	SUMINISTRO . FABRICACION E INSTALACION DE CERRAMIENTO METALICO EN MALLA ESLABONADA DE 6,0 METROS DE ALTURA , SEGÚN DISEÑO RECIBIDO (Incluye paral en tubo galvanizado cada 3,0 metros , tableros de malla eslabonada de 1 1/4 x 2 1/4 calibre 10 , platinas de	16 días	vie 6/03/26	mar 24/03/26	100%	$ 68.269.075,13
454		4.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PLATINA DE 3/4" CON PERNOS DE 3/4" L=0,4M INSCRUSTADOS EN PEDESTAL DE CONCRETO (NO INCLUIDO). INCLUYE: Pernos, platina de 0,27*0,27, tuercas, pintura, soldadura	17 días	lun 1/12/25	vie 19/12/25	100%	$ 8.315.544,00
455		**4.**	**EMPRADIZACION**	**37 días**	**vie 14/11/25**	**vie 26/12/25**	**100%**	**$ 0,00**
456		4.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE EMPRADIZACIÓN DE TALUDES Y ZONAS VERDES	37 días	vie 14/11/25	vie 26/12/25	100%	$ 0,00
457		**4.**	**MOBILIARIO URBANO**	**16 días**	**mié 6/05/26**	**sáb 23/05/26**	**0%**	**$ 4.377.110,00**

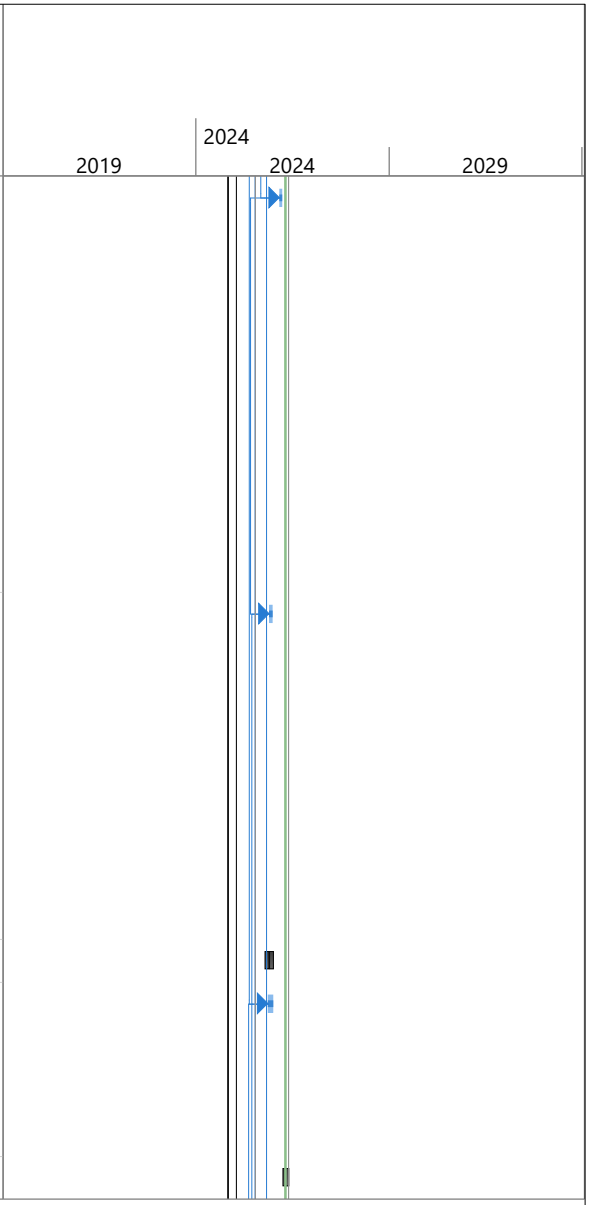


Id	Mo de tar	Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% compl	Costo
458		4.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN BANCA MODULAR CORRIDA CON ESPALDAR, EN CONCRETO PULIDO, IGUAL O SIMILAR A: TIPO KÖNKRETUS REFERENCIA: BANCA OLAND CON ESPALDAR. A:1,8 M X H:0,79 M X P:0,57 M. (369 KG/UN) (MU 03). INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU C	16 días	mié 6/05/26	sáb 23/05/26	0%	$ 4.377.110,00
459		**4.**	**ADICIONALES ALCALDÍA DE MANIZALES**	**262 días**	**jue 17/07/25**	**lun 18/05/26**	**79%**	**$ 63.171.290,70**
460		4.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TECHADO PROVISIONAL EN GUADUA Y PLÁSTICO	1 día	jue 17/07/25	jue 17/07/25	100%	$ 0,00
461		4.	JORNAL AYUDANTE	1 día	jue 17/07/25	jue 17/07/25	100%	$ 3.956.736,00
462		4.	SOBREACARREO EN VOLQUETA	9 días	lun 10/11/25	mié 19/11/25	100%	$ 43.354.080,00
463		4.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GEOTEXTIL NO TEJIDO 3000	8 días	jue 11/12/25	vie 19/12/25	100%	$ 10.401.057,70
464		4.	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION ESTRUCTURA PARA JUEGO DE VOLEY PLAYA, INCLUYE MALLA, POSTES, PINTURA PARA SILLA	5 días	mié 13/05/26	lun 18/05/26	0%	$ 5.459.417,00
465		**4.**	**ASEO GENERAL Y LIMPIE**	**5 días**	**mié 13/05/26**	**lun 18/05/26**	**0%**	**$ 2.163.018,00**

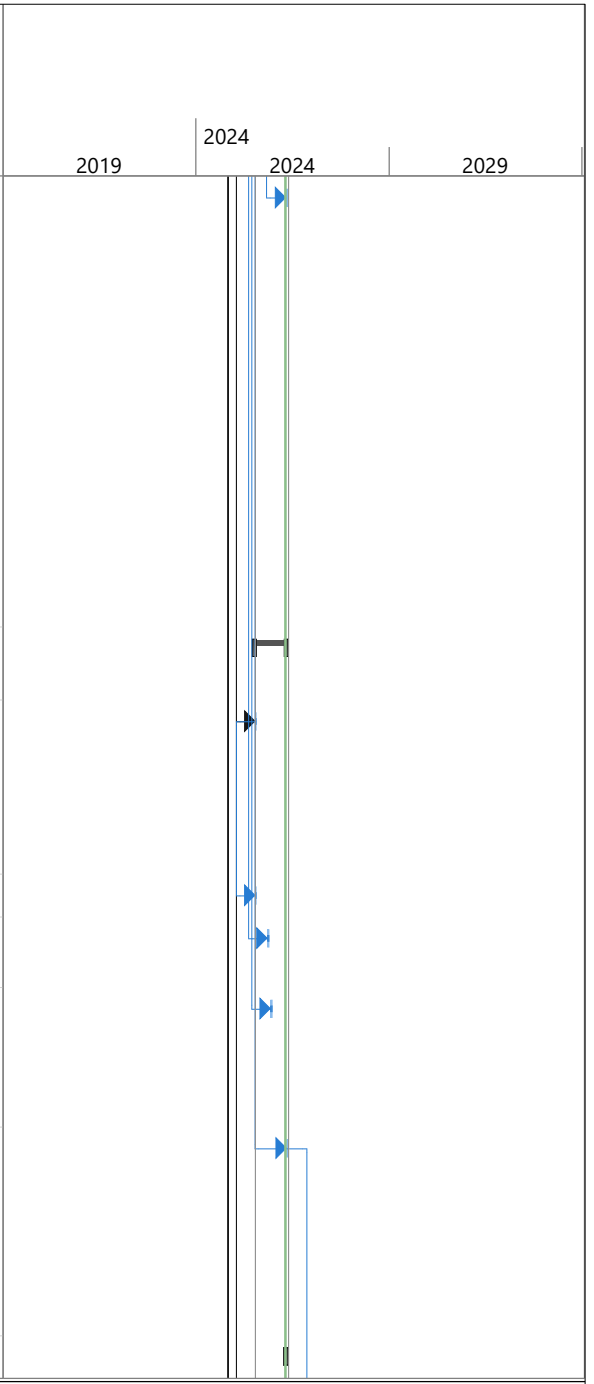


Id	Modo de tar	Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% compl	Costo
466		4.	ASEO GENERAL	5 días	mié 13/05/26	lun 18/05/26	0%	$ 2.163.018,00
467		4..	FIN	0 días	lun 18/05/26	lun 18/05/26	0%	$ 0,00
468		**4.**	**ZONA 9**	**267 días**	**jue 17/07/25**	**sáb 23/05/26**	**85%**	**$ 456.307.428,98**
469		4..	INICIO	0 días	jue 17/07/25	jue 17/07/25	100%	$ 0,00
470		**4.**	**CANCHA MULTIPLE Y GRADERIAS MOVILES**	**267 días**	**jue 17/07/25**	**sáb 23/05/26**	**85%**	**$ 456.307.428,98**
471		**4.**	**PRELIMINARES**	**156 días**	**jue 17/07/25**	**jue 15/01/26**	**100%**	**$ 32.266.348,20**
472		4.	ROCERIA Y LIMPIEZA	51 días	jue 17/07/25	lun 15/09/25	100%	$ 0,00
473		4.	LOCALIZACION Y REPLANTEO	51 días	jue 17/07/25	lun 15/09/25	100%	$ 4.565.826,00
474		4.	DESCAPOTE MECANICO e=0.20 m.	51 días	jue 17/07/25	lun 15/09/25	100%	$ 0,00
475		4.	INSTALACION PROVISIONAL DE ACUEDUCTO	51 días	jue 17/07/25	lun 15/09/25	100%	$ 685.338,00
476		4.	INSTALACION PROVISIONAL DE ENERGIA	51 días	jue 17/07/25	lun 15/09/25	100%	$ 101.528,00
477		4.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CERRAMIENTO PROVISIONAL EN LÁMINA GALVANIZADA H= 2.4M (Incluye guadua cepa, puntillas y demás elementos para su correcta instalación y funcionamiento)	51 días	jue 17/07/25	lun 15/09/25	100%	$ 4.883.520,00
478		4.	DEMOLICION PLACA DE CONTRAPISO HASTA E=0.20 M (INCLUYE RETIRO)	4 días	sáb 10/01/26	jue 15/01/26	100%	$ 21.494.176,20

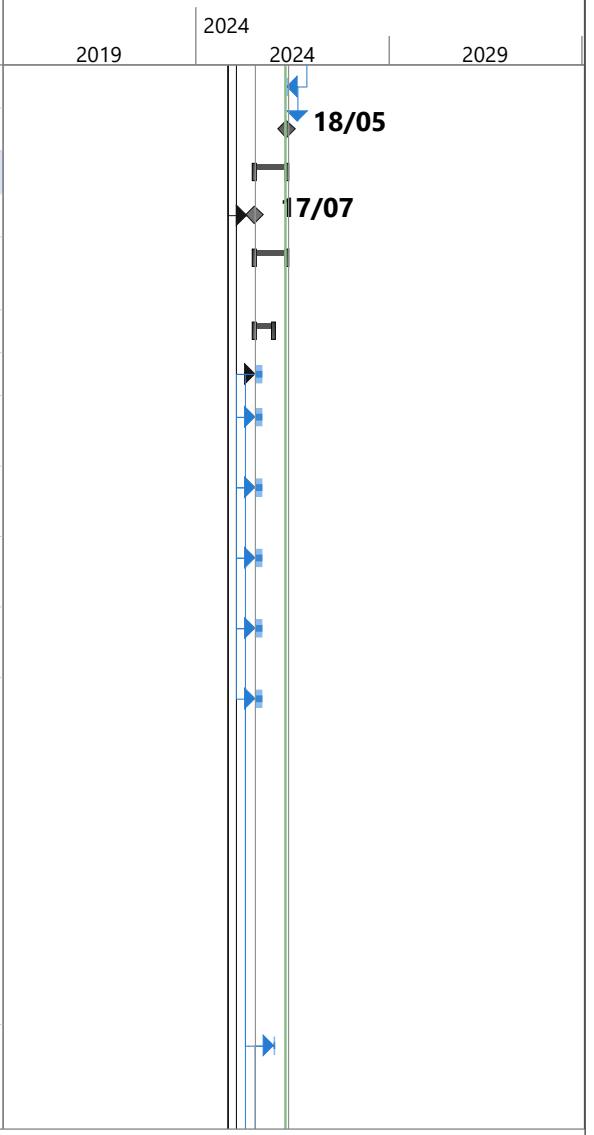


Id	Mo de tar	Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% compl	Costo
479		4.	DESMONTE PORTERÍAS DE MICROFUTBOL CON EXTENSIÓN Y TABLERO PARA BALONCESTO INCLUYE RETIRO	4 días	sáb 10/01/26	jue 15/01/26	100%	$ 535.960,00
480		**4.**	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**	**13 días**	**jue 15/01/26**	**vie 30/01/26**	**100%**	**$ 10.335.847,95**
481		4.	EXCAVACIÓN EN ZANJA - MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0 M	13 días	jue 15/01/26	vie 30/01/26	100%	$ 0,00
482		4.	EXCAVACIÓN EN ZANJA - CONGLOMERADO - 0.0 A 2.0 M	13 días	jue 15/01/26	vie 30/01/26	100%	$ 0,00
483		4.	RELLENO, CONFORMACION Y COMPACTACION A MAQUINA CON MATERIAL DE PRESTAMO	13 días	jue 15/01/26	vie 30/01/26	100%	$ 740.592,00
484		4.	EXCAVACIÓN MECANIZADA CIELO ABIERTO-MAT COMÚN/CONGLOM 0.0 A 6.0 M.	13 días	jue 15/01/26	vie 30/01/26	100%	$ 0,00
485		4.	EXCAVACION MECANICA EN ZANJA (RETROEXCAVADORA)	13 días	jue 15/01/26	vie 30/01/26	100%	$ 0,00
486		4.	EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS - MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0 M	13 días	jue 15/01/26	vie 30/01/26	100%	$ 0,00
487		4.	EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS - CONGLOMERADO - 0.0 A 2.0 M	13 días	jue 15/01/26	vie 30/01/26	100%	$ 9.595.255,95

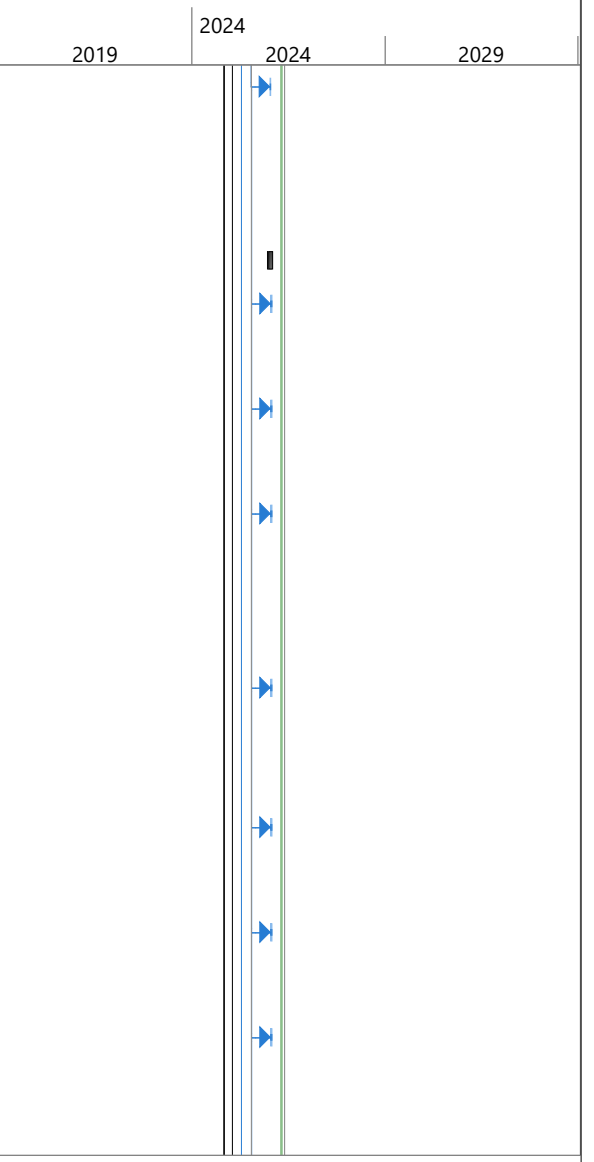


Id	Mo de tar	Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% compl	Costo
488		4.	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE MECANICO, DISPOSICIÓN EN BOTADERO (HASTA 25	13 días	jue 15/01/26	vie 30/01/26	100%	$ 0,00
489		4.	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION	13 días	jue 15/01/26	vie 30/01/26	100%	$ 0,00
490		**4.**	**MATERIAL GRANULAR**	**58 días**	**jue 15/01/26**	**lun 23/03/26**	**100%**	**$ 26.410.956,90**
491		4.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION AFIRMADO COMPACTADO PARA ESTRUCTURAS	13 días	jue 15/01/26	vie 30/01/26	100%	$ 0,00
492		4.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION AFIRMADO PARA ANDENES	13 días	lun 9/03/26	lun 23/03/26	100%	$ 0,00
493		4.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUB BASE COMPACTADA CON CILINDRO	13 días	lun 9/03/26	lun 23/03/26	100%	$ 26.410.956,90
494		**4.**	**ZONAS DURAS - ESCALERAS - MUROS**	**19 días**	**lun 2/03/26**	**lun 23/03/26**	**100%**	**$ 126.613.077,00**
495		4.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MEZCLA ASFALTICA TIPO MDC-19. Extendido mecánico y compactado	1 día	lun 2/03/26	lun 2/03/26	100%	$ 0,00

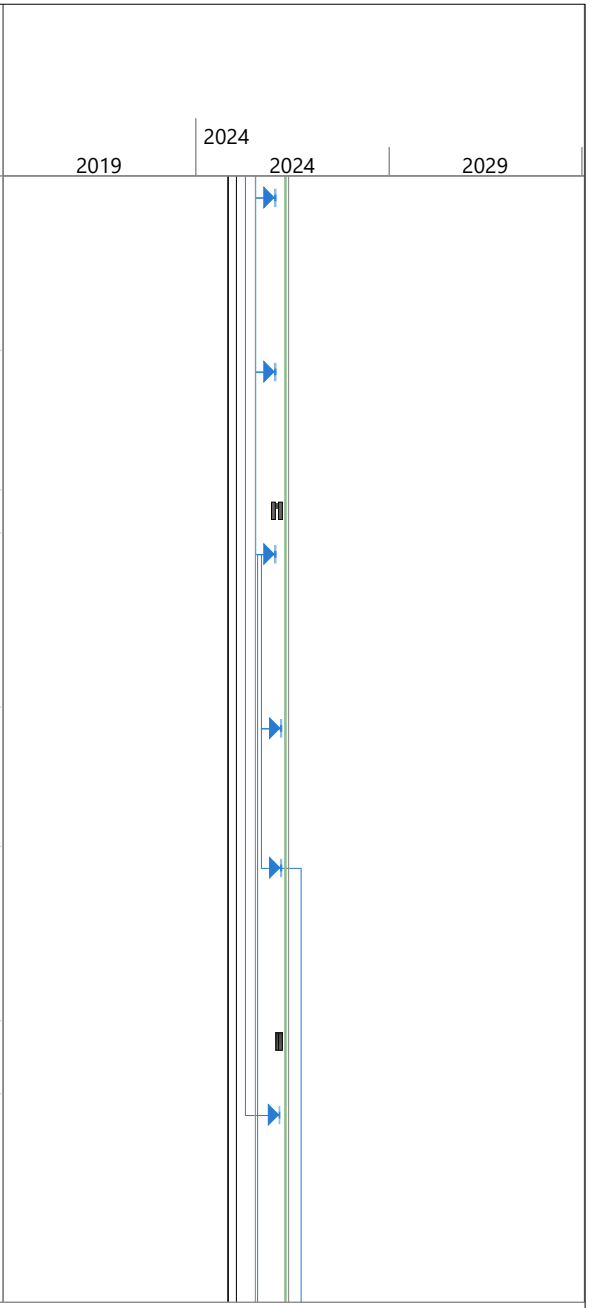


Id	Modo de tar	Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% compl	Costo
496		4.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ANDEN CONCRETO 3000 PSI E= 0.10M. ACABADO: ESCOBIADO	11 días	mié 11/03/26	lun 23/03/26	100%	$ 87.396.024,00
497		4.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MUROS DE CONTENCION CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI H<3.0M. NO INCLUYE REFUERZO.	1 día	mié 11/03/26	mié 11/03/26	100%	$ 9.477.741,00
498		4.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ZAPATA CONCRETO 3000 PSI	1 día	mié 11/03/26	mié 11/03/26	100%	$ 6.310.590,00
499		4.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MALLA ELECTROSOLDADA M-131 Q-3.1 F 5.0mm c/.15m en ambos sentidos (Incluye alambre negro, colocación y traslapo).	11 días	mié 11/03/26	lun 23/03/26	100%	$ 14.546.169,00
500		5.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SARDINEL ANCHO = 10 CM H = ENTRE 17 Y 24 CM EN CONCRETO 3000 PSI	1 día	mié 11/03/26	mié 11/03/26	100%	$ 0,00

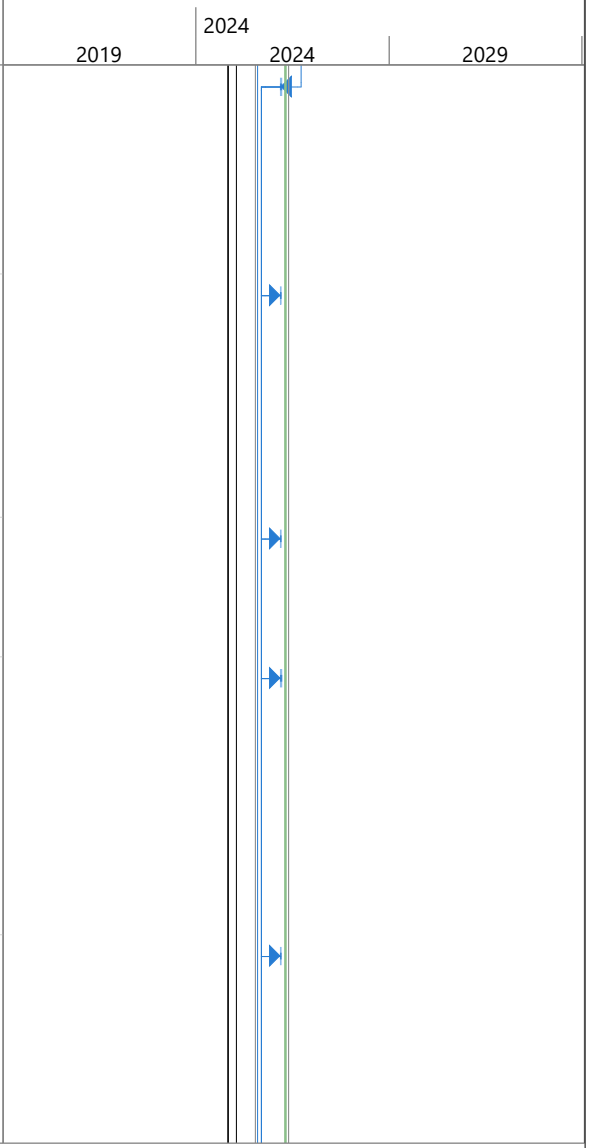


Id	Modo de tar	Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% compl	Costo
501		5.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SARDINEL ANCHO = 10 CM H = ENTRE 25 Y 30 CM EN CONCRETO 3000 PSI	1 día	mié 11/03/26	mié 11/03/26	100%	$ 0,00
502		5.	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE DILATACIONES ESTRUCTURALES CON ICOPOR E=2.0CM Y SELLO CON SIKAFLEX 1A PLUS	1 día	mié 11/03/26	mié 11/03/26	100%	$ 455.008,00
503		5.	CORTE MECANIZADO DE PAVIMENTO A=5 mm profundidad un tercio del espesor	1 día	mié 11/03/26	mié 11/03/26	100%	$ 8.427.545,00
504		**5.**	**ACERO**	**10 días**	**mié 11/03/26**	**sáb 21/03/26**	**100%**	**$ 10.065.375,00**
505		5.	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION ACERO DE 60000 PSI (INCLUYE ALAMBRE NEGRO Y FIGURACION)	10 días	mié 11/03/26	sáb 21/03/26	100%	$ 10.065.375,00
506		**5.**	**OBRAS EXTERIORES**	**64 días**	**mié 11/03/26**	**sáb 23/05/26**	**42%**	**$ 116.432.985,93**

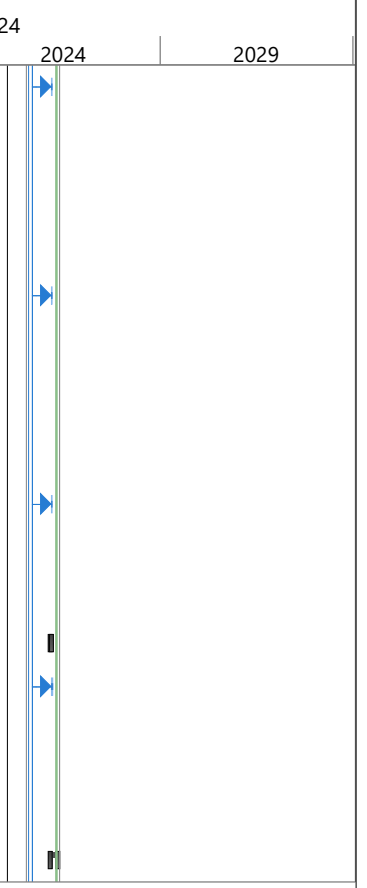


Id	Mo de tar	Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% compl	Costo
507		5.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN TUBERÍA GALVANIZADA PARA CERRAMIENTO Ø 2", MURO EN CONCRETO A LA VISTA E= 0,12M H= 0,4M CON MORTERO DE REVOQUE IMPERMEABILIZADO, MALLA ESLABONADA CA. 10 OJO 2-1/4"X2-1/4", VIGA EN CONCRETO	56 días	mié 11/03/26	jue 14/05/26	50%	$ 0,00
508		5.	SUMINISTRO . FABRICACION E INSTALACION DE CERRAMIENTO METALICO EN MALLA ESLABONADA DE 6,0 METROS DE ALTURA , SEGÚN DISEÑO RECIBIDO (Incluye paral en tubo galvanizado cada 3,0 metros , tableros de malla eslabonada de 1 1/4 x 2 1/4 calibre 10 , platinas de	54 días	mié 11/03/26	mar 12/05/26	30%	$ 97.821.167,93

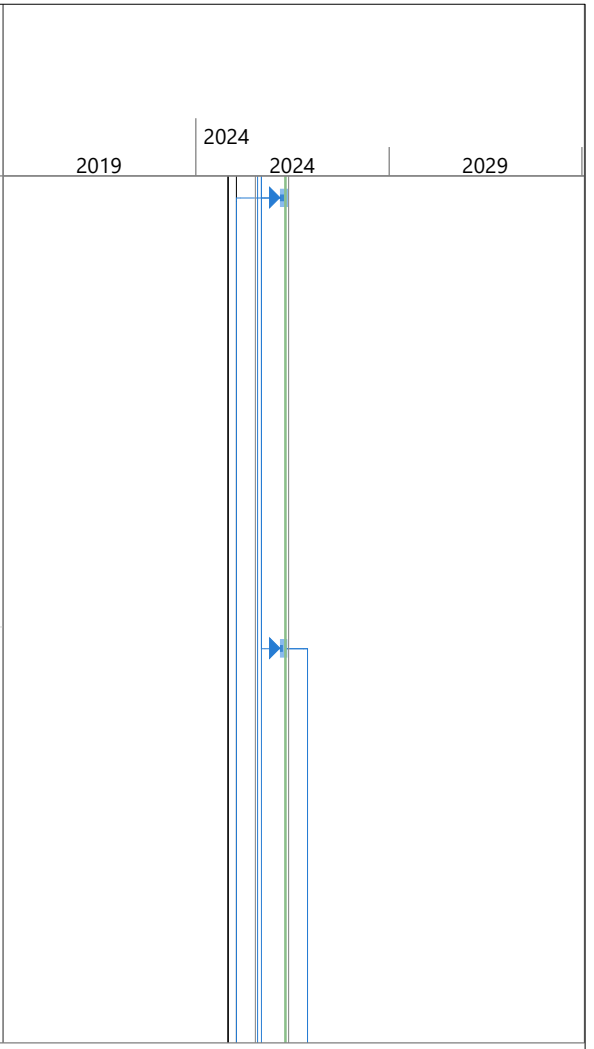


Id	Mo de tar	Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% compl	Costo
509		5.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PLATINA DE 3/4" CON PERNOS DE 3/4" L=0,4M INSCRUSTADOS EN PEDESTAL DE CONCRETO (NO INCLUIDO). INCLUYE: Pernos, platina de 0,27*0,27, tuercas, pintura, soldadura	11 días	mié 11/03/26	lun 23/03/26	100%	$ 11.780.354,00
510		5.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PORTERÍA DE MICROFUTBOL CON EXTENSIÓN Y TABLERO PARA BALONCESTO - INCLUYE ARO Y MALLA BALONCESTO	12 días	lun 11/05/26	sáb 23/05/26	0%	$ 6.831.464,00
511		**5.**	**EMPRADIZACION**	**11 días**	**mar 3/02/26**	**sáb 14/02/26**	**100%**	**$ 0,00**
512		5.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE EMPRADIZACIÓN DE TALUDES Y ZONAS VERDES	11 días	mar 3/02/26	sáb 14/02/26	100%	$ 0,00
513		**5.**	**PINTURA**	**10 días**	**lun 11/05/26**	**jue 21/05/26**	**0%**	**$ 74.553.200,00**

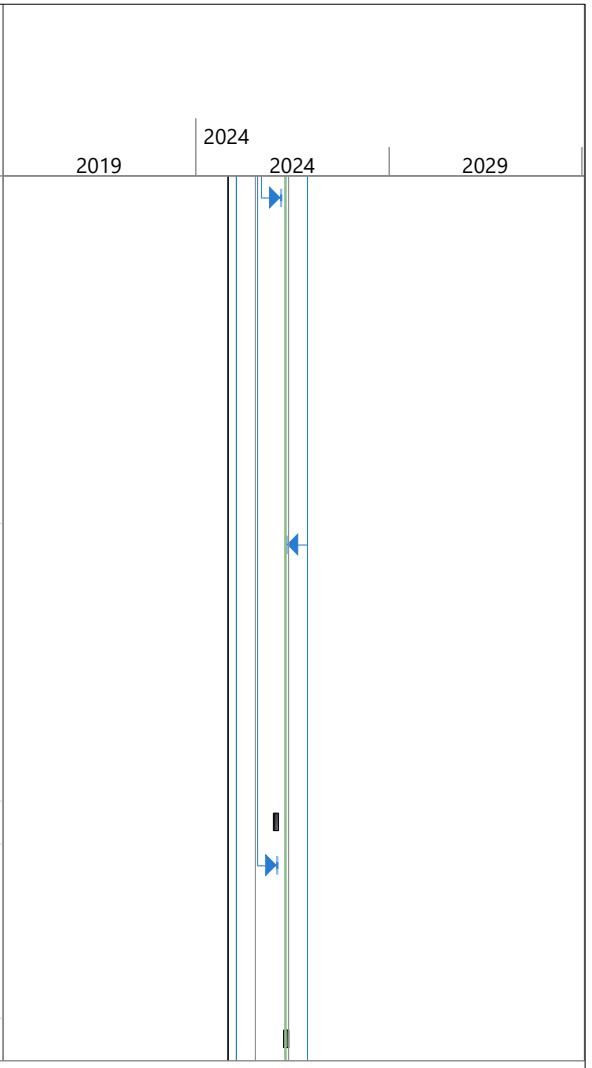


Id	Mo de tar	Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% compl	Costo
514		5.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE RECUBRIMIENTO ACRÍLICO SINTÉTICO ACRYTECH STEGASS SOBRE PLACAS DE CONCRETO. Incluye una capa de acrilyc resurfer con arena de cuarzo, una capa de acrytech color con arena de cuarzo y una capa de acrytech color sin	10 días	lun 11/05/26	jue 21/05/26	0%	$ 74.553.200,00
515		5.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PINTURA TOTAL DE CANCHA Y DEMARCACIÓN DE LÍNEAS, EN PLACA DE CONCRETO. PINTURA SIKA SPORTLINE O SIMILAR CON ANTIDESLIZANTE NO ABRASIVO INMERSO. VARIOS COLORES, SEGÚN DISEÑO	10 días	lun 11/05/26	jue 21/05/26	0%	$ 0,00
516		**5.**	**MOBILIARIO Y PAISAJISM**	**6 días**	**mié 11/03/26**	**mar 17/03/26**	**100%**	**$ 51.404.656,00**

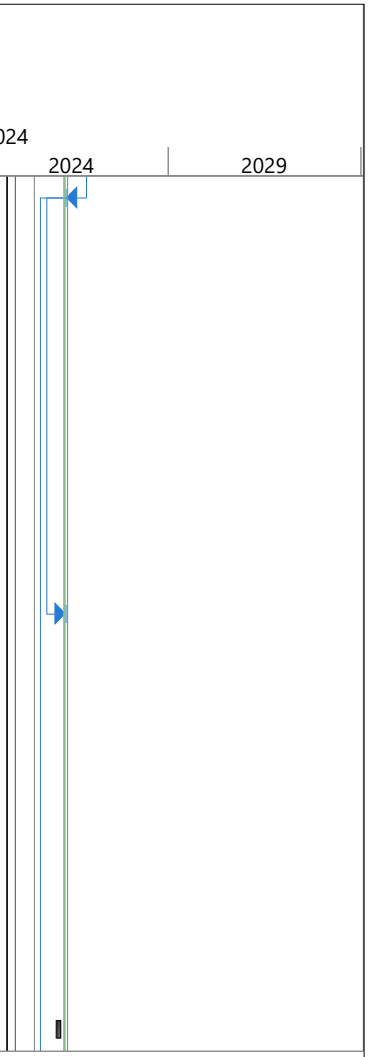


Id	Mo de tar	Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% compl	Costo
517		5.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE GRADERIA MOVIL ACOPRESA O SIMILAR EN ALUMINIO NATURAL DE 4 FILAS X 3.0M DE LARGO. NO ELEVADA. CAPACIDAD 28PERSONAS. INCLUYE BARANDAS. INCLUYE FLETE Y MONTAJE	6 días	mié 11/03/26	mar 17/03/26	100%	$ 51.404.656,00
518		**5.**	**ADICIONALES ALCALDÍA DE MANIZALES**	**1 día**	**jue 17/07/25**	**jue 17/07/25**	**100%**	**$ 4.539.280,00**
519		5.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TECHADO PROVISIONAL EN GUADUA Y PLÁSTICO	1 día	jue 17/07/25	jue 17/07/25	100%	$ 0,00
520		5.	JORNAL AYUDANTE	1 día	jue 17/07/25	jue 17/07/25	100%	$ 3.956.736,00
521		5.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PASES EN TUBERIA PVC AGUAS LLUVIAS DE 4" PARA MUROS	1 día	jue 17/07/25	jue 17/07/25	100%	$ 582.544,00
522		**5.**	**ASEO GENERAL Y LIMPIE**	**4 días**	**mar 19/05/26**	**vie 22/05/26**	**0%**	**$ 3.685.702,00**
523		5.	ASEO GENERAL	4 días	mar 19/05/26	vie 22/05/26	0%	$ 3.685.702,00
524		5..	FIN	0 días	vie 22/05/26	vie 22/05/26	0%	$ 0,00
525		**5.**	**ZONA 10**	**268 días**	**jue 17/07/25**	**lun 25/05/26**	**95%**	**$ 685.360.640,25**
526		5..	INICIO	0 días	jue 17/07/25	jue 17/07/25	100%	$ 0,00
527		**5.**	**JUEGOS INFANTILES + GIMNASIO BIOSALUDABLE + CALISTENIA**	**268 días**	**jue 17/07/25**	**lun 25/05/26**	**95%**	**$ 685.360.640,25**
528		**5.**	**PRELIMINARES**	**52 días**	**jue 17/07/25**	**lun 15/09/25**	**100%**	**$ 21.414.493,60**

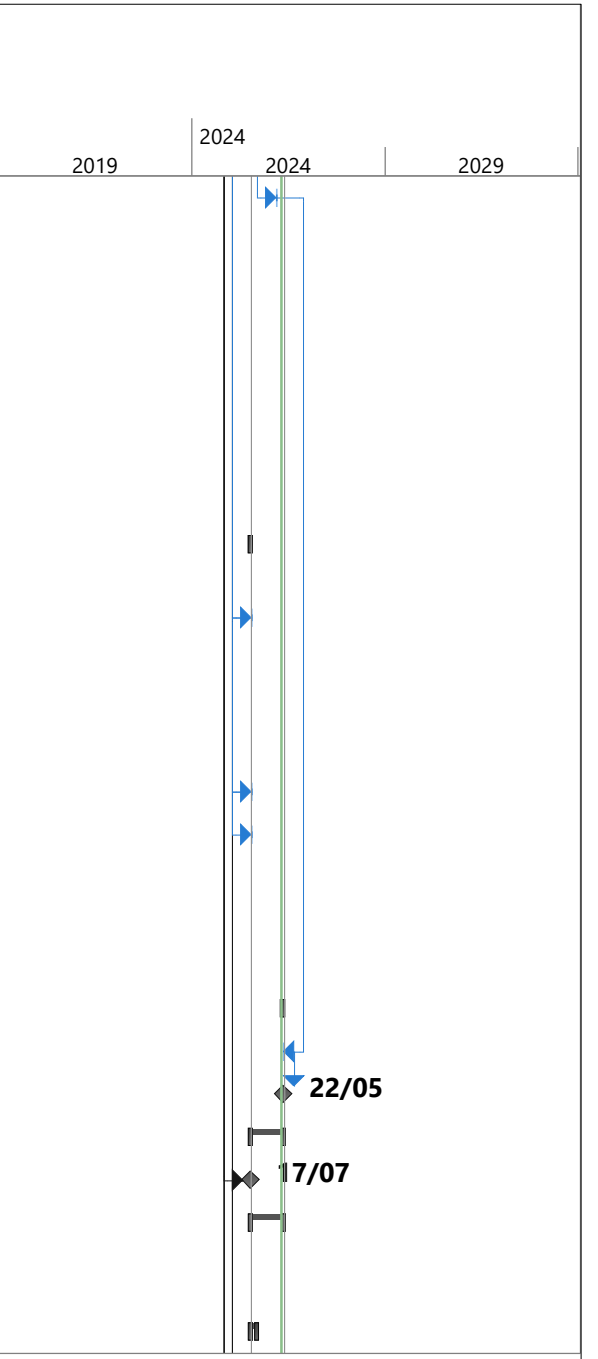

Id	Modo de tar	Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% compl	Costo
529		5.	ROCERIA Y LIMPIEZA	52 días	jue 17/07/25	lun 15/09/25	100%	$ 400.380,50
530		5.	LOCALIZACION Y REPLANTEO	52 días	jue 17/07/25	lun 15/09/25	100%	$ 6.383.908,00
531		5.	DESCAPOTE MECANICO e=0.20 m.	52 días	jue 17/07/25	lun 15/09/25	100%	$ 505.294,10
532		5.	INSTALACION PROVISIONAL DE ACUEDUCTO	52 días	jue 17/07/25	lun 15/09/25	100%	$ 685.338,00
533		5.	INSTALACION PROVISIONAL DE ENERGIA	52 días	jue 17/07/25	lun 15/09/25	100%	$ 101.528,00
534		5.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CERRAMIENTO PROVISIONAL EN LÁMINA GALVANIZADA H= 2.4M (Incluye guadua cepa, puntillas y demás elementos para su correcta instalación y funcionamiento)	52 días	jue 17/07/25	lun 15/09/25	100%	$ 13.338.045,00
535		**5.**	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**	**24 días**	**mié 3/12/25**	**mar 30/12/25**	**100%**	**$ 48.205.727,65**
536		5.	EXCAVACIÓN EN ZANJA - MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0 M	24 días	mié 3/12/25	mar 30/12/25	100%	$ 0,00
537		5.	EXCAVACIÓN EN ZANJA - CONGLOMERADO - 0.0 A 2.0 M	24 días	mié 3/12/25	mar 30/12/25	100%	$ 0,00
538		5.	RELLENO, CONFORMACION Y COMPACTACION A MAQUINA CON MATERIAL DE PRESTAMO	24 días	mié 3/12/25	mar 30/12/25	100%	$ 36.113.734,56

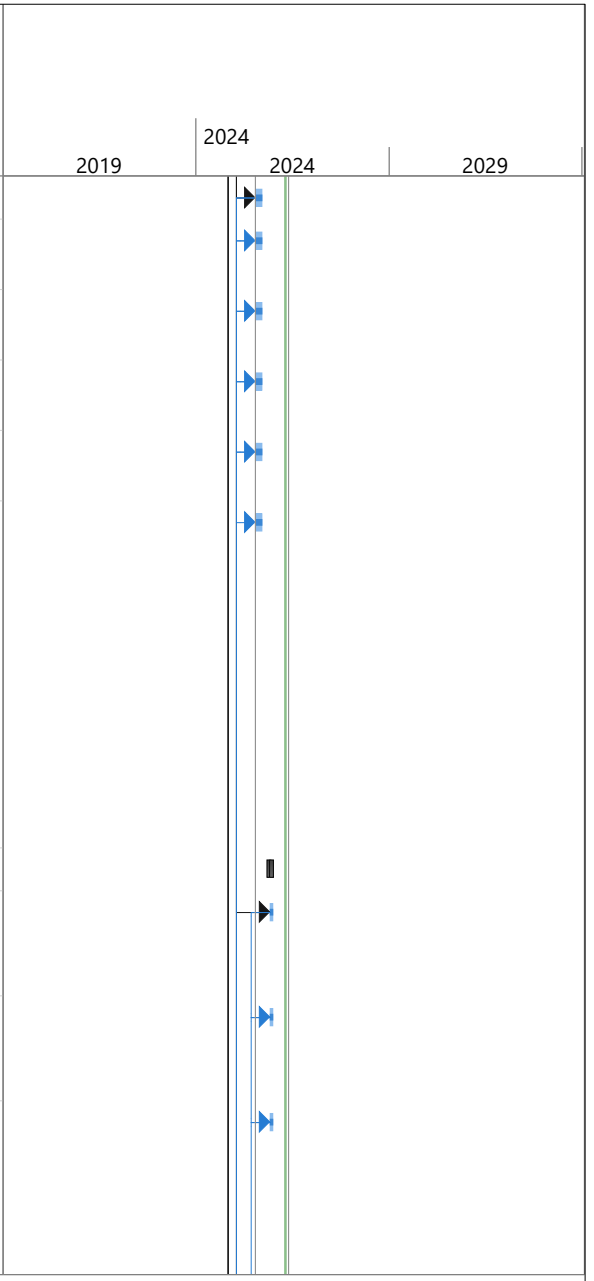


Id	Mo de tar	Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% compl	Costo
539		5.	EXCAVACIÓN MECANIZADA CIELO ABIERTO-MAT COMÚN/CONGLOM 0.0 A 6.0 M.	24 días	mié 3/12/25	mar 30/12/25	100%	$ 3.279.696,15
540		5.	EXCAVACION MECANICA EN ZANJA (RETROEXCAVADORA)	24 días	mié 3/12/25	mar 30/12/25	100%	$ 0,00
541		5.	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE MECANICO, DISPOSICIÓN EN BOTADERO (HASTA 25	24 días	mié 3/12/25	mar 30/12/25	100%	$ 3.738.381,94
542		5.	CONFORMACIÓN DE TALUDES CON EQUIPO MECÁNICO	24 días	mié 3/12/25	mar 30/12/25	100%	$ 5.073.915,00
543		**5.**	**MATERIAL GRANULAR**	**23 días**	**mié 3/12/25**	**mar 30/12/25**	**100%**	**$ 18.865.550,00**
544		5.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION AFIRMADO COMPACTADO PARA ESTRUCTURAS	23 días	mié 3/12/25	mar 30/12/25	100%	$ 18.865.550,00
545		**5.**	**ZONAS DURAS - ESCALER**	**257 días**	**jue 17/07/25**	**mar 12/05/26**	**97%**	**$ 188.363.010,00**
546		5.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MEZCLA ASFALTICA TIPO MDC-19. Extendido mecánico y compactado	1 día	jue 17/07/25	jue 17/07/25	100%	$ 0,00
547		5.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ANDEN CONCRETO 3000 PSI E= 0.10M. ACABADO: ESCOBIADO	138 días	mié 3/12/25	mar 12/05/26	95%	$ 152.354.400,00

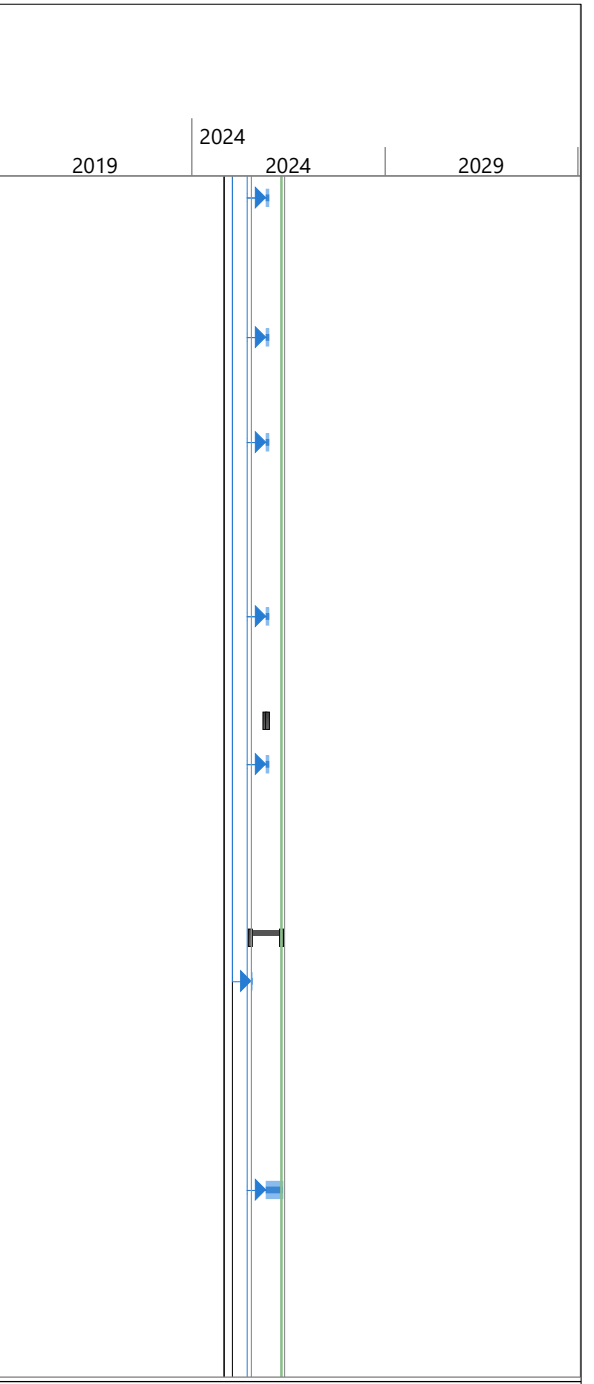


Id	Mo de tar	Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% compl	Costo
548		5.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MALLA ELECTROSOLDADA M-188 Q-5 F 6 mm c/.15m en ambos sentidos (Incluye alambre negro, colocación y traslapo).	138 días	mié 3/12/25	mar 12/05/26	95%	$ 34.650.000,00
549		5.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SARDINEL ANCHO = 10 CM H = ENTRE 17 Y 24 CM EN CONCRETO 3000 PSI	81 días	mié 3/12/25	vie 6/03/26	100%	$ 0,00
550		5.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SARDINEL ANCHO = 10 CM H = ENTRE 25 Y 30 CM EN CONCRETO 3000 PSI	81 días	mié 3/12/25	vie 6/03/26	100%	$ 0,00
551		5.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ALISTADO PISOS Mortero 1:3 e= 0.03 mts	81 días	mié 3/12/25	vie 6/03/26	100%	$ 1.358.610,00
552		**5.**	**PISOS**	**19 días**	**lun 4/05/26**	**lun 25/05/26**	**0%**	**$ 216.202.998,00**

Id	Mo de tar	Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% compl	Costo
553		5.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE GRAMA SINTETICA CON FIBRAS DE POLIETILENO MONOFILAMENTADO BICOLOR CON UNA ALTURA DE 50MM, RESISTENETE A RAYOS UV, INCLUYE (CINTA DE UNION, PEGANTE ADHESIVO, DEMARACACION DE COLOR BLANCO, RELLENA CON ARENA FINA LIMP	19 días	lun 4/05/26	lun 25/05/26	0%	$ 0,00
554		5.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE GRAMA SINTETICA CON FIBRAS DE MONOFILAMENTO RECTO Y MONOFILAMENTO RETORCIDO CON UNA ALTURA DE 30 mm , QUE CUENTE CON CERTIFICADO UV DEFENDER Y HEALTH PROTECTION , ADEMAS QUE CUMPLA CON LAS NORMAS TECNICAS ASTM , EN	19 días	lun 4/05/26	lun 25/05/26	0%	$ 216.202.998,00
555		**5.**	**MOBILIARIO Y PAISAJISM**	**49 días**	**vie 27/03/26**	**vie 22/05/26**	**82%**	**$ 183.199.161,00**
556		5.	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE JUEGO INFANTIL METALICO (SUBE Y	4 días	vie 27/03/26	mar 31/03/26	100%	$ 10.990.746,00


Id	Modo de tar	Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% compl	Costo
557		5.	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE JUEGO INFANTIL METALICO PEQUEÑO (INCLUYE TORRE DE VIGILANCIA,RODADERO, COLUMPIO DOBLE)	4 días	mar 19/05/26	vie 22/05/26	0%	$ 32.805.252,00
558		5.	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE JUEGO INFANTIL METALICO GRANDE (INCLUYE DOS TORRES DE VIGILANCIA,DOS LISADEROS,DOS ESCALERAS DE ACCESO,DOS COLUMPIOS).	4 días	mar 19/05/26	vie 22/05/26	0%	$ 65.448.772,00
559		5.	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE JUEGO INFANTIL METALICO (COLUMPIO	4 días	vie 27/03/26	mar 31/03/26	100%	$ 22.844.826,00
560		5.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE EQUIPO PARA GIMNASIO AL AIRE (ESQUI O BICICLETA O ELIPTICA O EXTENSOR O BANCO ABDOMINAL DOBLE O BANCA ABDOMINAL INCLINADO O VAIVEN. REF. XTENSOR O SIMILAR) - Incluye todos los elementos para anclaje y su correcta i	4 días	vie 27/03/26	mar 31/03/26	100%	$ 7.913.060,00

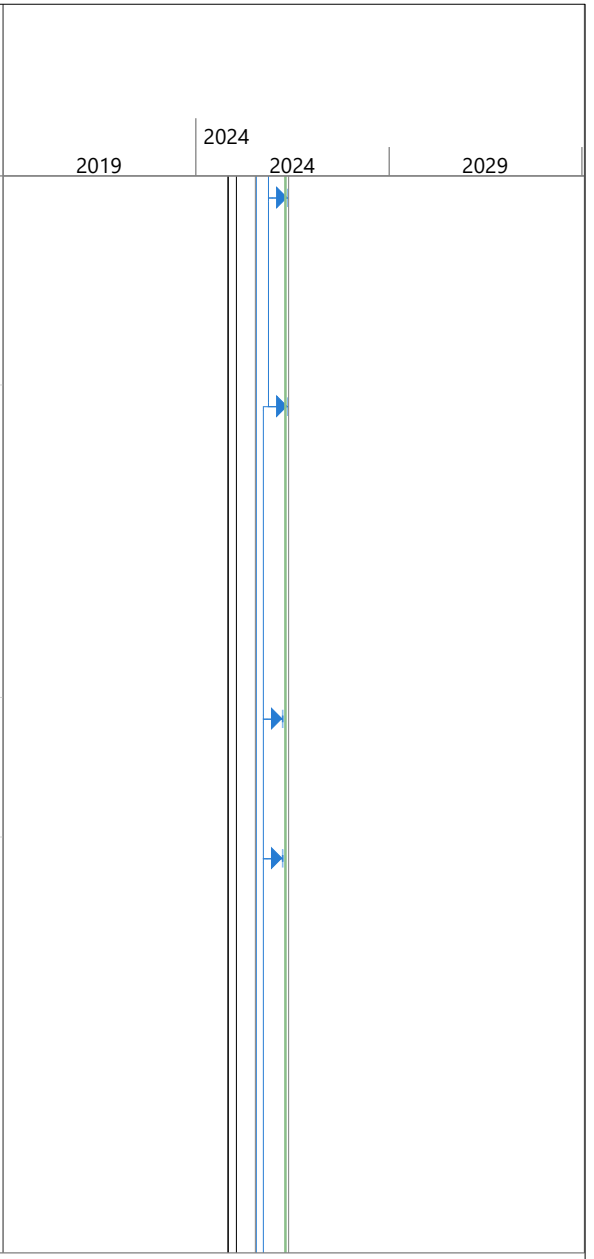


Id	Mo de tar	Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% compl	Costo
561		5.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE EQUIPO PARA GIMNASIO AL AIRE (PRENSA DE PIERNA DOBLE O PRESS DE PRECHO DOBLE O PRESS DE ESPALDA DOBLW. REF. XTENSOR O SIMILAR) - Incluye todos los elementos para anclaje y su correcta instalación y funcionamiento)	4 días	vie 27/03/26	mar 31/03/26	100%	$ 13.937.784,00
562		5.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MAQUINA PARA GIMNASIO BIOSALUDABLE, IGUAL O SIMILAR A: MARCA PARQUES INFANTILES HOLDING KIDS REFERENCIA TWISTER (MU 24). INCLUYE DADOS DE ANCLAJE, PERNOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIE	4 días	vie 27/03/26	mar 31/03/26	100%	$ 3.250.969,00

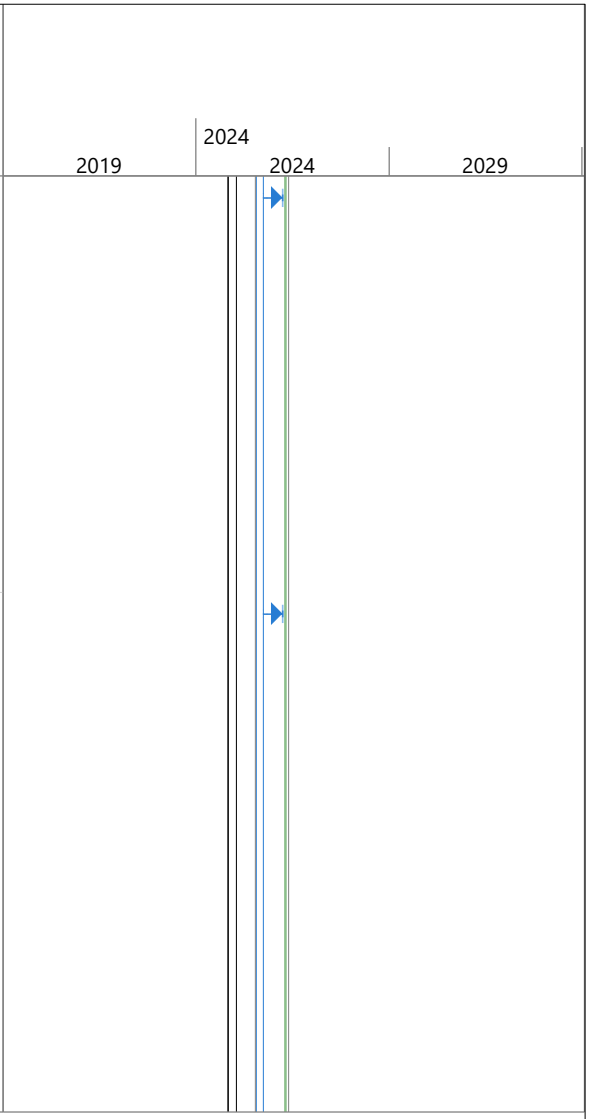


Id	Mo de tar	Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% compl	Costo
563		5.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MAQUINA PARA GIMNASIO BIOSALUDABLE, IGUAL O SIMILAR A: MARCA PARQUES INFANTILES HOLDING KIDS REFERENCIA SURF/PENDULO (MU 25). INCLUYE DADOS DE ANCLAJE, PERNOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIO	4 días	vie 27/03/26	mar 31/03/26	100%	$ 6.501.938,00
564		5.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MAQUINA PARA GIMNASIO BIOSALUDABLE, IGUAL O SIMILAR A: MARCA PARQUES INFANTILES HOLDING KIDS REFERENCIA CAMINADOR AEREO (MU 26). INCLUYE DADOS DE ANCLAJE, PERNOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUN	4 días	vie 27/03/26	mar 31/03/26	100%	$ 6.501.938,00

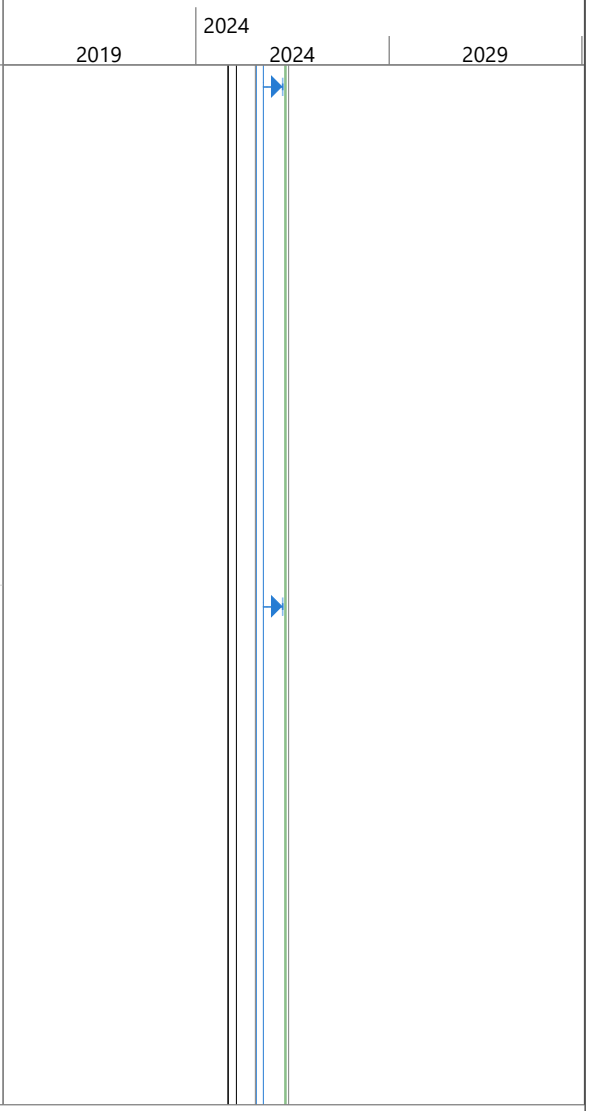


Id	Modo de tar	Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% compl	Costo
565		5.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MAQUINA PARA GIMNASIO BIOSALUDABLE, IGUAL O SIMILAR A: MARCA PARQUES INFANTILES HOLDING KIDS REFERENCIA BARRAS (MU 27). INCLUYE DADOS DE ANCLAJE, PERNOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIEN	4 días	vie 27/03/26	mar 31/03/26	100%	$ 6.501.938,00
566		5.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MAQUINA PARA GIMNASIO BIOSALUDABLE, IGUAL O SIMILAR A: MARCA PARQUES INFANTILES HOLDING KIDS REFERENCIA VOLANTE (MU 28). INCLUYE DADOS DE ANCLAJE, PERNOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIE	4 días	vie 27/03/26	mar 31/03/26	100%	$ 6.501.938,00
567		**5.**	**EMPRADIZACION**	**20 días**	**vie 23/01/26**	**sáb 14/02/26**	**100%**	**$ 0,00**

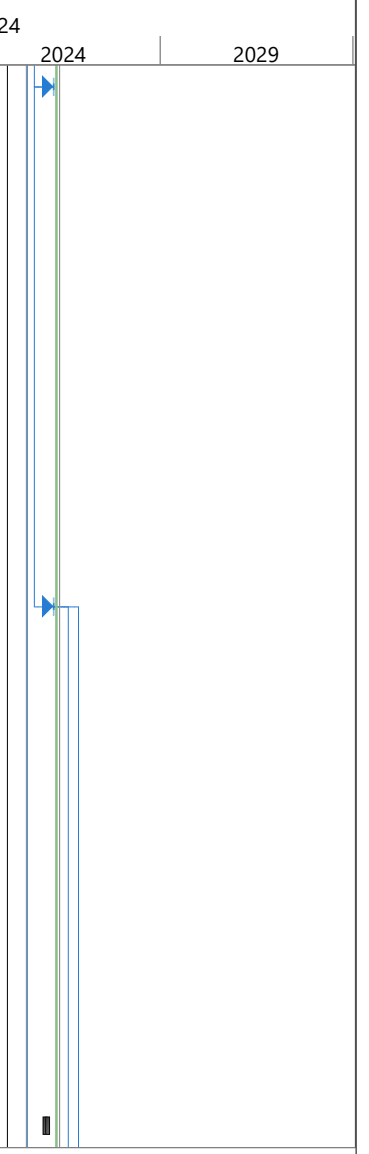


Id	Mo de tar	Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% compl	Costo
568		5.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE EMPRADIZACIÓN DE TALUDES Y ZONAS VERDES	20 días	vie 23/01/26	sáb 14/02/26	100%	$ 0,00
569		**5.**	**ADICIONALES ALCALDÍA DE MANIZALES**	**20 días**	**vie 23/01/26**	**sáb 14/02/26**	**100%**	**$ 3.956.736,00**
570		5.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TECHADO PROVISIONAL EN GUADUA Y PLÁSTICO	20 días	vie 23/01/26	sáb 14/02/26	100%	$ 0,00
571		5.	JORNAL AYUDANTE	4 días	mié 11/02/26	sáb 14/02/26	100%	$ 3.956.736,00
572		**5.**	**ASEO GENERAL Y LIMPIE**	**2 días**	**jue 21/05/26**	**vie 22/05/26**	**0%**	**$ 5.152.964,00**
573		5.	ASEO GENERAL	2 días	jue 21/05/26	vie 22/05/26	0%	$ 5.152.964,00
574		5..	FIN	0 días	vie 22/05/26	vie 22/05/26	0%	$ 0,00
575		**5.**	**ZONA 11**	**255 días**	**jue 17/07/25**	**sáb 9/05/26**	**96%**	**$ 313.779.412,72**
576		5..	INICIO	0 días	jue 17/07/25	jue 17/07/25	0%	$ 0,00
577		**5.**	**TERRAZAS - ZONAS DE ESTANCIA**	**255 días**	**jue 17/07/25**	**sáb 9/05/26**	**96%**	**$ 313.779.412,72**
578		**5.**	**PRELIMINARES**	**202 días**	**jue 17/07/25**	**lun 9/03/26**	**100%**	**$ 5.367.850,72**
579		5.	ROCERIA Y LIMPIEZA	202 días	jue 17/07/25	lun 9/03/26	100%	$ 368.422,60
580		5.	LOCALIZACION Y REPLANTEO	202 días	jue 17/07/25	lun 9/03/26	100%	$ 3.747.600,00
581		5.	DESCAPOTE MECANICO e=0.20 m.	202 días	jue 17/07/25	lun 9/03/26	100%	$ 464.962,12
582		5.	INSTALACION PROVISIONAL DE ACUEDUCTO	202 días	jue 17/07/25	lun 9/03/26	100%	$ 685.338,00
583		5.	INSTALACION PROVISIONAL DE ENERGIA	202 días	jue 17/07/25	lun 9/03/26	100%	$ 101.528,00

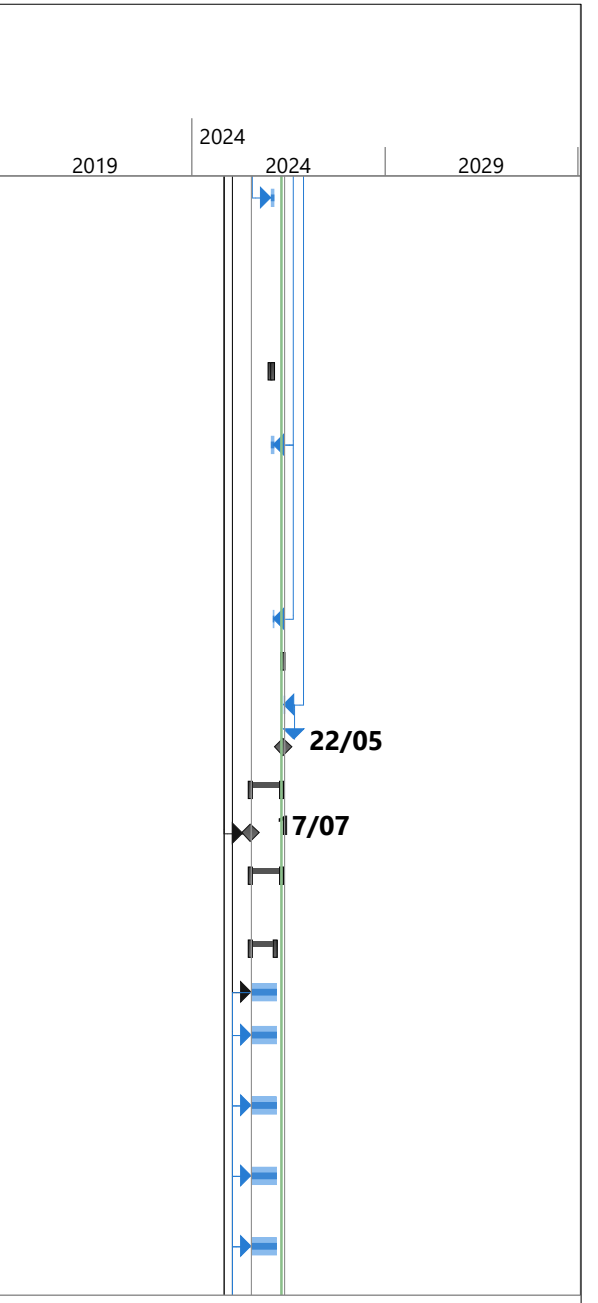

Id	Mo de tar	Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% compl	Costo
584		5.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CERRAMIENTO PROVISIONAL EN LÁMINA GALVANIZADA H= 2.4M (Incluye guadua cepa, puntillas y demás elementos para su correcta instalación y funcionamiento)	202 días	jue 17/07/25	lun 9/03/26	100%	$ 0,00
585		**5.**	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**	**124 días**	**sáb 1/11/25**	**mié 25/03/26**	**100%**	**$ 37.875.193,00**
586		5.	EXCAVACIÓN EN ZANJA - MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0 M	124 días	sáb 1/11/25	mié 25/03/26	100%	$ 0,00
587		5.	RELLENO, CONFORMACION Y COMPACTACION A MAQUINA CON MATERIAL DE PRESTAMO	124 días	sáb 1/11/25	mié 25/03/26	100%	$ 23.848.913,88
588		5.	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION	124 días	sáb 1/11/25	mié 25/03/26	100%	$ 0,00
589		5.	EXCAVACION MECANICA EN ZANJA (RETROEXCAVADORA)	124 días	sáb 1/11/25	mié 25/03/26	100%	$ 0,00
590		5.	EXCAVACIÓN EN ZANJA - CONGLOMERADO - 0.0 A 2.0 M	124 días	sáb 1/11/25	mié 25/03/26	100%	$ 0,00
591		5.	EXCAVACIÓN MECANIZADA CIELO ABIERTO-MAT COMÚN/CONGLOM 0.0 A 6.0 M.	124 días	sáb 1/11/25	mié 25/03/26	100%	$ 4.853.405,25

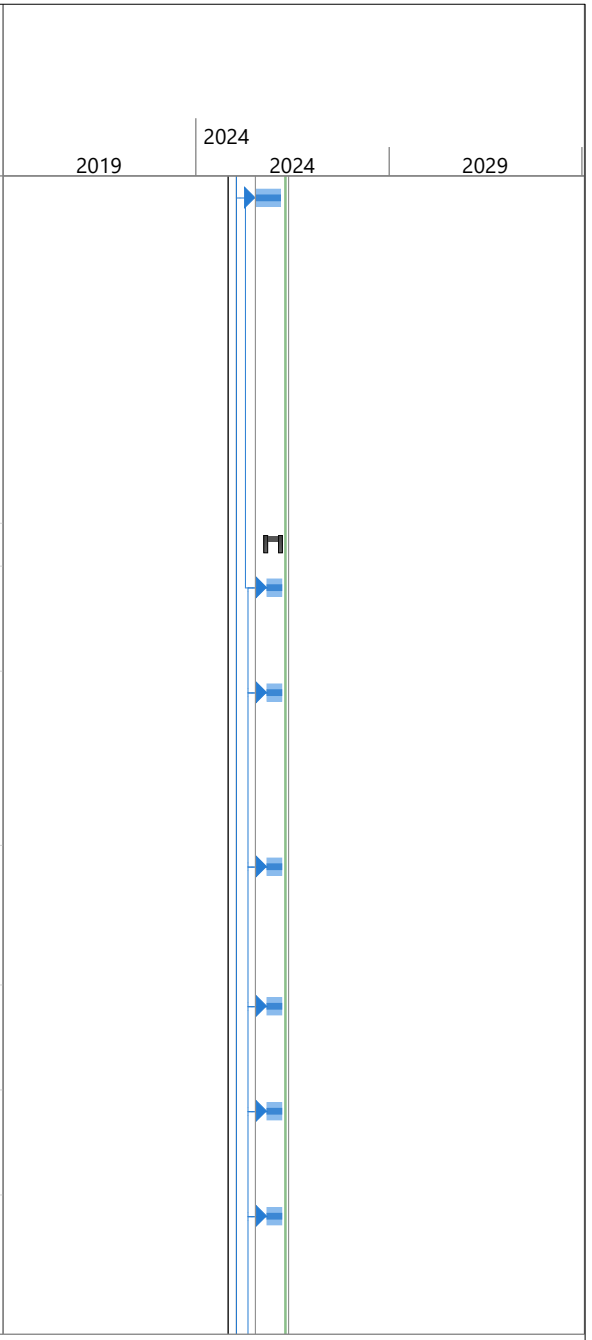


Id	Mo de tar	Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% compl	Costo
592		5.	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE MECANICO, DISPOSICIÓN EN BOTADERO (HASTA 25	124 días	sáb 1/11/25	mié 25/03/26	100%	$ 9.172.873,87
593		**5.**	**MATERIAL GRANULAR**	**127 días**	**sáb 1/11/25**	**sáb 28/03/26**	**100%**	**$ 8.898.465,40**
594		5.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION AFIRMADO COMPACTADO PARA ESTRUCTURAS	127 días	sáb 1/11/25	sáb 28/03/26	100%	$ 622.835,40
595		5.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION AFIRMADO PARA ANDENES	127 días	sáb 1/11/25	sáb 28/03/26	100%	$ 8.275.630,00
596		**5.**	**ZONAS DURAS**	**80 días**	**jue 5/02/26**	**vie 8/05/26**	**89%**	**$ 118.877.493,50**
597		5.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PLACA CONTRAPISO CONCRETO 3000 PSI E=0.10 m	45 días	jue 5/02/26	sáb 28/03/26	100%	$ 143.497,00
598		5.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ANDEN CONCRETO 3000 PSI E= 0.10M. ACABADO: ESCOBIADO	80 días	jue 5/02/26	vie 8/05/26	50%	$ 0,00
599		5.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MUROS DE CONTENCION CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI H<3.0M. NO INCLUYE REFUERZO.	45 días	jue 5/02/26	sáb 28/03/26	100%	$ 0,00

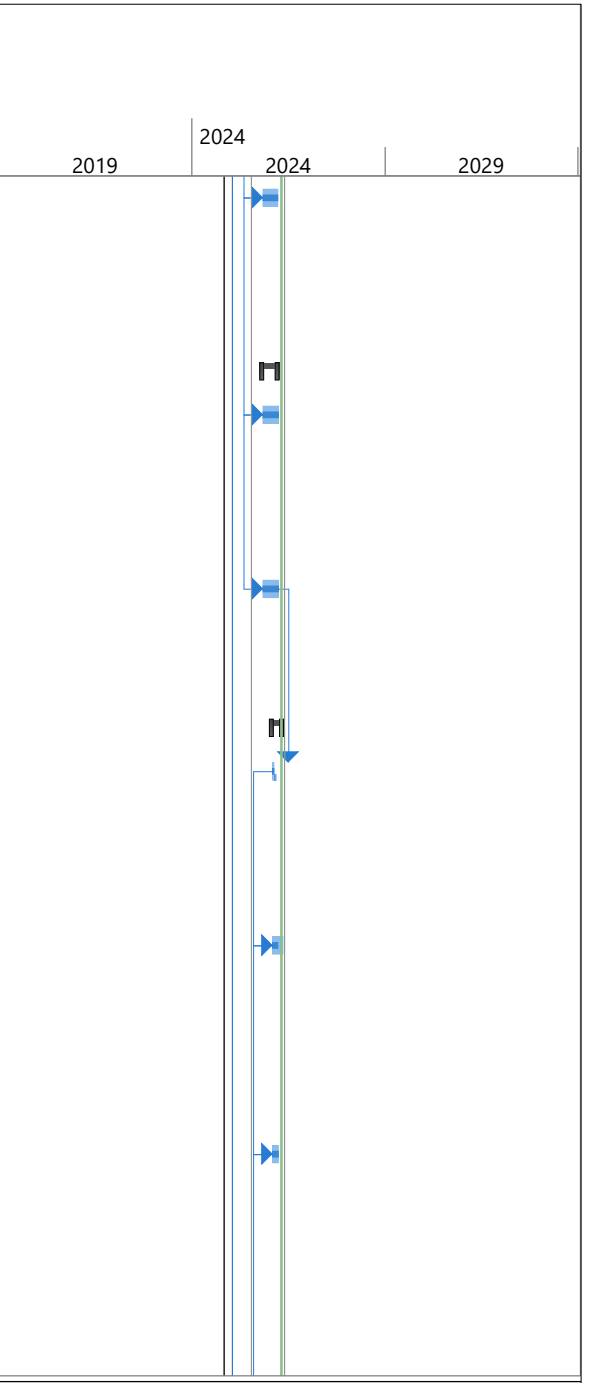


Id	Mo de tar	Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% compl	Costo
600		6.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ZAPATA CONCRETO 3000 PSI	45 días	jue 5/02/26	sáb 28/03/26	100%	$ 0,00
601		6.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SARDINEL ANCHO = 10 CM H = ENTRE 17 Y 24 CM EN CONCRETO 3000 PSI	45 días	jue 5/02/26	sáb 28/03/26	100%	$ 0,00
602		6.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MALLA ELECTROSOLDADA M-131 Q-3.1 F 5.0mm c/.15m en ambos sentidos (Incluye alambre negro, colocación y traslapo).	45 días	jue 5/02/26	sáb 28/03/26	100%	$ 0,00
603		6.	CORTE MECANIZADO DE PAVIMENTO A=5 mm profundidad un tercio del espesor	45 días	jue 5/02/26	sáb 28/03/26	100%	$ 0,00
604		6.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION JUNTA DE DILATACION PARA PLACA CONTRAPISO (Inlcuye sellante)	45 días	jue 5/02/26	sáb 28/03/26	100%	$ 0,00
605		6.	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO PEATONAL EN GRAMOQUIN DE CEMENTO (29 x 43 x 8 cms)	45 días	jue 5/02/26	sáb 28/03/26	50%	$ 97.858.598,50


Id	Modo de tar	Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% compl	Costo
606		6.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VIGA CIMENTACION CONCRETO 3000 PSI	45 días	jue 5/02/26	sáb 28/03/26	100%	$ 11.256.000,00
607		6.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SOLADO DE LIMPIEZA 2.000 PSI E = 5 CM	45 días	jue 5/02/26	sáb 28/03/26	100%	$ 117.018,00
608		6.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MURO EN BLOQUE Concreto estructural liso 12*20*40 cm. (Incluye grouting y refuerzo)	45 días	jue 5/02/26	sáb 28/03/26	100%	$ 9.502.380,00
609		**6.**	**ACERO**	**9 días**	**jue 5/02/26**	**sáb 14/02/26**	**100%**	**$ 13.867.850,00**
610		6.	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION ACERO DE 60000 PSI (INCLUYE ALAMBRE NEGRO Y FIGURACION)	9 días	jue 5/02/26	sáb 14/02/26	100%	$ 13.867.850,00
611		**6.**	**EMPRADIZACION**	**6 días**	**lun 9/02/26**	**sáb 14/02/26**	**100%**	**$ 5.849.280,00**
612		6.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE EMPRADIZACIÓN DE TALUDES Y ZONAS VERDES	6 días	lun 9/02/26	sáb 14/02/26	100%	$ 5.849.280,00
613		**6.**	**MOBILIARIO URBANO**	**6 días**	**lun 4/05/26**	**sáb 9/05/26**	**0%**	**$ 119.199.470,10**

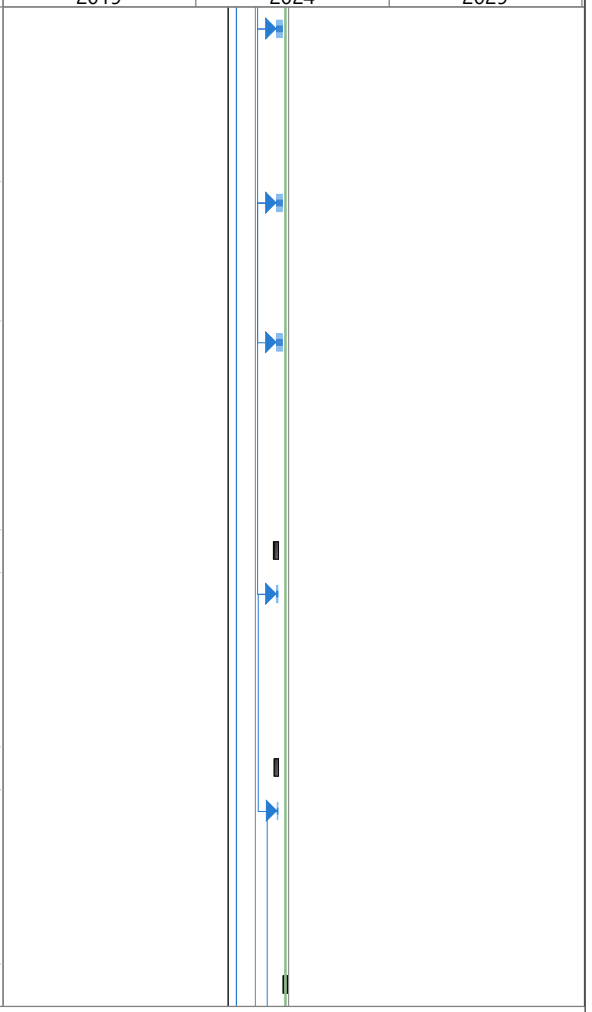

Id	Mo de tar	Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% compl	Costo
614		6.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN BANCA MODULAR CORRIDA CON ESPALDAR, EN CONCRETO PULIDO, IGUAL O SIMILAR A: TIPO KÖNKRETUS REFERENCIA: BANCA OLAND CON ESPALDAR. A:1,8 M X H:0,79 M X P:0,57 M. (369 KG/UN) (MU 03). INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU C	6 días	lun 4/05/26	sáb 9/05/26	0%	$ 2.891.691,00
615		6.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN BANCA MODULAR EN CONCRETO PULIDO, IGUAL O SIMILAR A: TIPO KÖNKRETUS REFERENCIA: BANCA SAMLE. A:1,82 M X H:0,43 M X P:0,78 M. (251 KG/UN) (MU 04)	6 días	lun 4/05/26	sáb 9/05/26	0%	$ 21.675.520,00

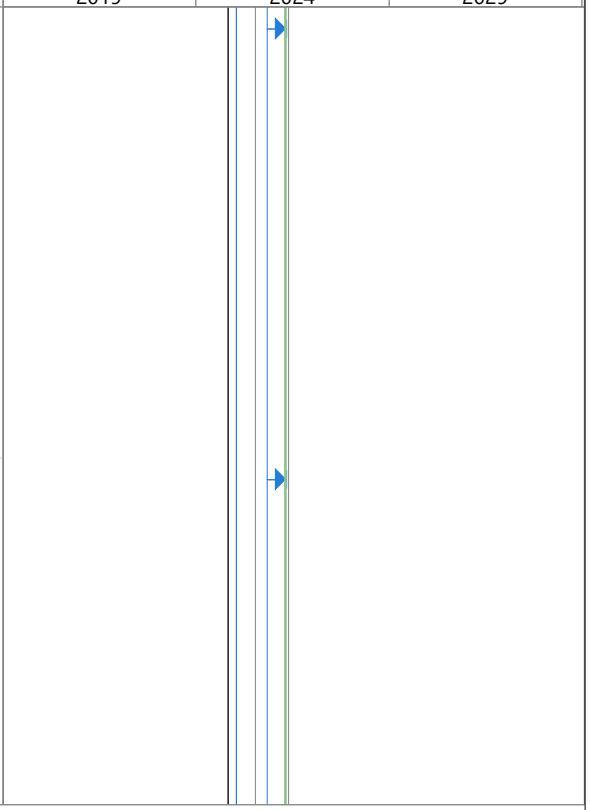


Id	Mo de tar	Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% compl	Costo
616		6.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN BANCA MODULAR EN CONCRETO PULIDO CON ESPALDAR, IGUAL O SIMILAR A: TIPO KÖNKRETUS REFERENCIA: BANCA SAMLE CON ESPALDAR. A:0,81 M X H:0,64 M X P:0,78 M. (251 KG/UN) (MU 05). INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA	6 días	lun 4/05/26	sáb 9/05/26	0%	$ 22.558.504,00
617		6.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MESA DE EMPOTRAR CON JUEGO EN CERAMICA, IGUAL O SIMILAR A: MARCA CALIZO, REFERENCIA MOBILE COMBO MESA DE JUEGOS CON CUATRO BUTACOS, MEDIDAS 700X700X750 - 350X350X450 (MU 08). INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU COR	6 días	lun 4/05/26	sáb 9/05/26	0%	$ 32.241.688,00

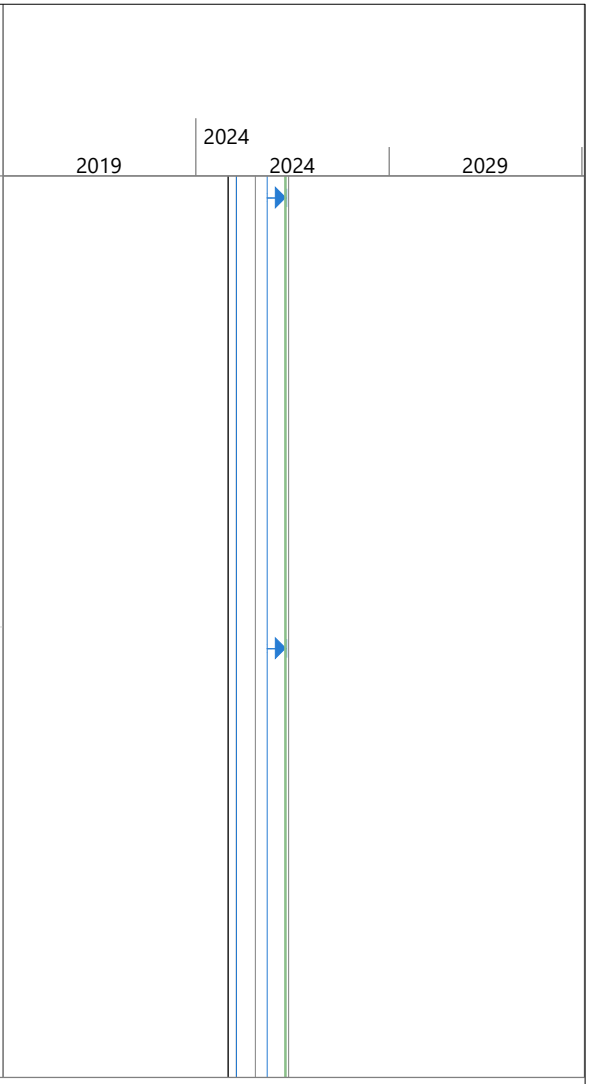


Id	Mo de tar	Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% compl	Costo
618		6.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN JARDINERA EN CONCRETO PULIDO, IGUAL O SIMILAR A: TIPO KÖNKRETUS REFERENCIA: JARDINERA SAMLE. A:0,81 M X H:0,44 M X P:0,78 M. (133 KG/UN) (MU 09). INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y	6 días	lun 4/05/26	sáb 9/05/26	0%	$ 6.524.548,00
619		6.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TOTEM, EN CONCRETO PULIDO, IGUAL O SIMILAR A: TIPO CALIZO REFERENCIA: MOBILE A LA MEDIDA. A:2,40 M X H:0,50 M X P:0,50 M. (745KG/UN) (MU 14). INCLUYE DADOS DE ANCLAJE, ACERO, PERNOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORREC	6 días	lun 4/05/26	sáb 9/05/26	0%	$ 9.622.425,00

Id	Mo de tar	Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% compl	Costo
620		6.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE BARANDA METALICA CONFORMADA POR 3 VARILLAS LISAS 5/8" CADA 20 CM SOLDADAS A TUBO AGUAS NEGRAS 2" EN LA PARTE SUPERIOR Y EN LA PARTE INFERIOR A PLATINA DE 1-1/2" X 1/4" PINTURA COLOR OXIDO SEGÚN DISEÑO	6 días	lun 4/05/26	sáb 9/05/26	0%	$ 23.685.094,10
621		**6.**	**ADICIONALES ALCALDÍA DE MANIZALES**	**1 día**	**jue 17/07/25**	**jue 17/07/25**	**100%**	**$ 3.843.810,00**
622		6.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TECHADO PROVISIONAL EN GUADUA Y PLÁSTICO	1 día	jue 17/07/25	jue 17/07/25	100%	$ 0,00
623		6.	JORNAL AYUDANTE	1 día	jue 17/07/25	jue 17/07/25	100%	$ 573.440,00
624		6.	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE DILATACIONES ESTRUCTURALES CON ICOPOR E=2.0CM Y SELLO CON SIKAFLEX 1A PLUS	1 día	jue 17/07/25	jue 17/07/25	100%	$ 3.270.370,00
625		**6.**	**ASEO GENERAL Y LIMPIE**	**2 días**	**vie 8/05/26**	**sáb 9/05/26**	**0%**	**$ 0,00**
626		6.	ASEO GENERAL	2 días	vie 8/05/26	sáb 9/05/26	0%	$ 0,00
627		6..	FIN	0 días	sáb 9/05/26	sáb 9/05/26	0%	$ 0,00
628		**6.**	**ZONA 12**	**273 días**	**jue 17/07/25**	**sáb 30/05/26**	**96%**	**$ 193.886.985,44**
629		6..	INICIO	0 días	jue 17/07/25	jue 17/07/25	0%	$ 0,00
630		**6.**	**CAI + PARQUEADEROS**	**113 días**	**mar 20/01/26**	**sáb 30/05/26**	**96%**	**$ 193.886.985,44**

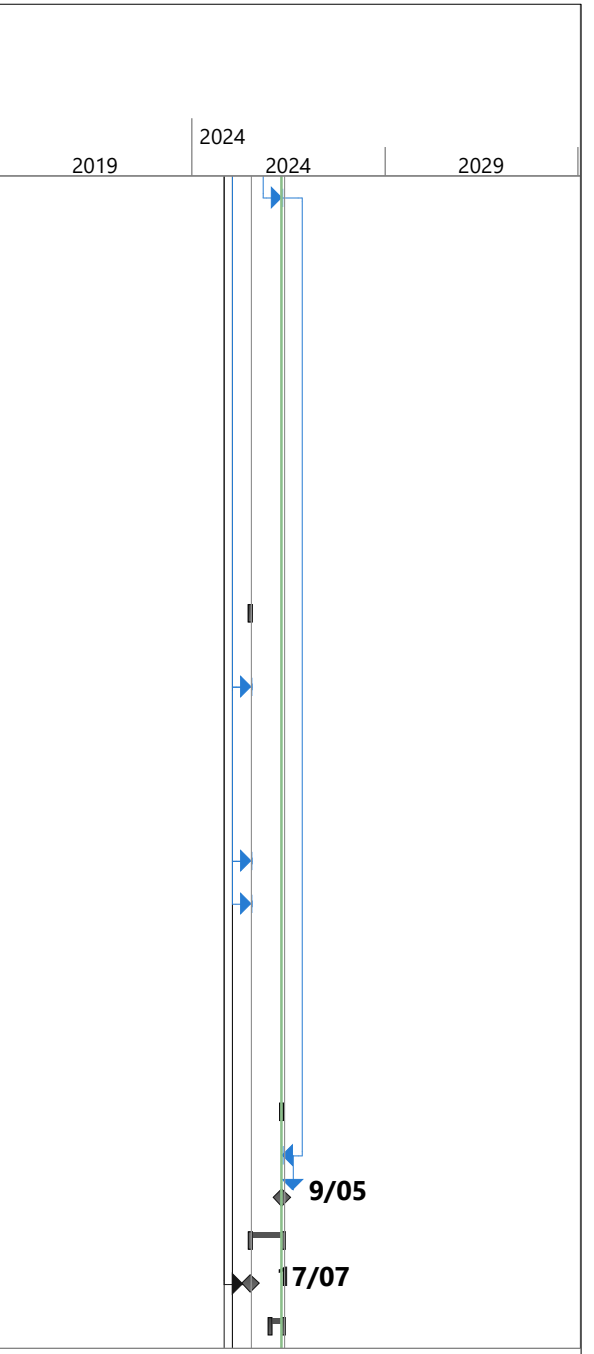


Id	Mo de tar	Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% compl	Costo
631		**6.**	**PRELIMINARES**	**51 días**	**mar 20/01/26**	**jue 19/03/26**	**100%**	**$ 9.023.798,00**
632		6.	ROCERIA Y LIMPIEZA	51 días	mar 20/01/26	jue 19/03/26	100%	$ 284.115,00
633		6.	LOCALIZACION Y REPLANTEO	51 días	mar 20/01/26	jue 19/03/26	100%	$ 880.686,00
634		6.	DESCAPOTE MECANICO e=0.20 m.	51 días	mar 20/01/26	jue 19/03/26	100%	$ 358.563,00
635		6.	INSTALACION PROVISIONAL DE ACUEDUCTO	51 días	mar 20/01/26	jue 19/03/26	100%	$ 685.338,00
636		6.	INSTALACION PROVISIONAL DE ENERGIA	51 días	mar 20/01/26	jue 19/03/26	100%	$ 710.696,00
637		6.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CERRAMIENTO PROVISIONAL EN LÁMINA GALVANIZADA H= 2.4M (Incluye guadua cepa, puntillas y demás elementos para su correcta instalación y funcionamiento)	51 días	mar 20/01/26	jue 19/03/26	100%	$ 6.104.400,00
638		**6.**	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**	**12 días**	**mié 18/03/26**	**mar 31/03/26**	**100%**	**$ 31.090.422,39**
639		6.	EXCAVACIÓN EN ZANJA - MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0 M	12 días	mié 18/03/26	mar 31/03/26	100%	$ 438.570,00
640		6.	EXCAVACIÓN EN ZANJA - CONGLOMERADO - 0.0 A 2.0 M	12 días	mié 18/03/26	mar 31/03/26	100%	$ 611.622,00
641		6.	EXCAVACION MECANICA EN ZANJA (RETROEXCAVADORA)	12 días	mié 18/03/26	mar 31/03/26	100%	$ 35.180,00

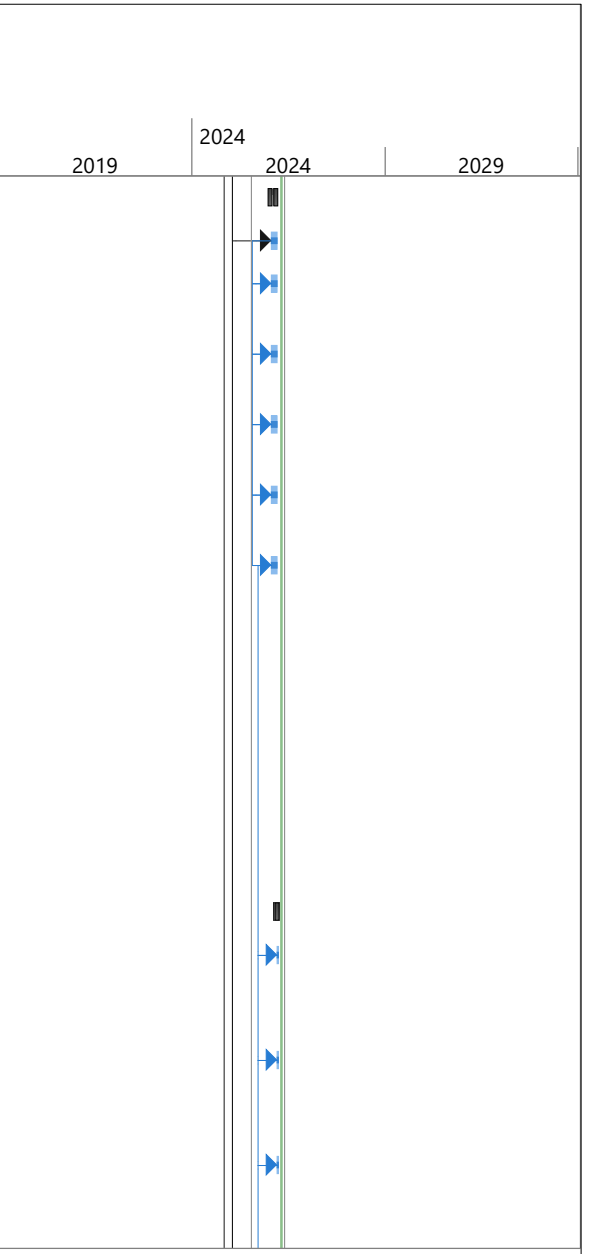


Id	Mo de tar	Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% compl	Costo
642		6.	EXCAVACIÓN MECANIZADA CIELO ABIERTO-MAT COMÚN/CONGLOM 0.0 A 6.0 M.	12 días	mié 18/03/26	mar 31/03/26	100%	$ 9.836.517,45
643		6.	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE MECANICO, DISPOSICIÓN EN BOTADERO (HASTA 25	12 días	mié 18/03/26	mar 31/03/26	100%	$ 20.168.532,94
644		**6.**	**MATERIAL GRANULAR**	**11 días**	**mié 6/05/26**	**lun 18/05/26**	**0%**	**$ 4.920.860,00**
645		6.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION AFIRMADO COMPACTADO PARA ESTRUCTURAS	11 días	mié 6/05/26	lun 18/05/26	0%	$ 1.624.788,00
646		6.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUB BASE COMPACTADA CON CILINDRO	11 días	mié 6/05/26	lun 18/05/26	0%	$ 3.296.072,00
647		**6.**	**ZONAS DURAS - ESCALERAS - MUROS**	**10 días**	**mié 18/03/26**	**sáb 28/03/26**	**100%**	**$ 21.908.391,00**
648		6.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PLACA CONTRAPISO CONCRETO 3000 PSI E=0.10 m	10 días	mié 18/03/26	sáb 28/03/26	100%	$ 4.878.898,00
649		6.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MEZCLA ASFALTICA TIPO MDC-19. Extendido mecánico y compactado	10 días	mié 18/03/26	sáb 28/03/26	100%	$ 5.275.941,00


Id	Modo de tar	Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% compl	Costo
650		6.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DEMARCACION HORIZONTAL DE VIAS PINTURA TIPO TRAFICO	10 días	mié 18/03/26	sáb 28/03/26	100%	$ 2.321.466,00
651		6.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TOPELLANTAS PREFABRICADO EN CONCRETO CON PINTURA ACRILICA PARA TRAFICO H=15 CM, B=20 CM Y L=50 CM.	10 días	mié 18/03/26	sáb 28/03/26	100%	$ 482.280,00
652		6.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MALLA ELECTROSOLDADA M-131 Q-3.1 F 5.0mm c/.15m en ambos sentidos (Incluye alambre negro, colocación y traslapo).	10 días	mié 18/03/26	sáb 28/03/26	100%	$ 676.566,00
653		6.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION JUNTA DE DILATACION PARA PLACA CONTRAPISO (Inlcuye sellante)	10 días	mié 18/03/26	sáb 28/03/26	100%	$ 1.132.920,00

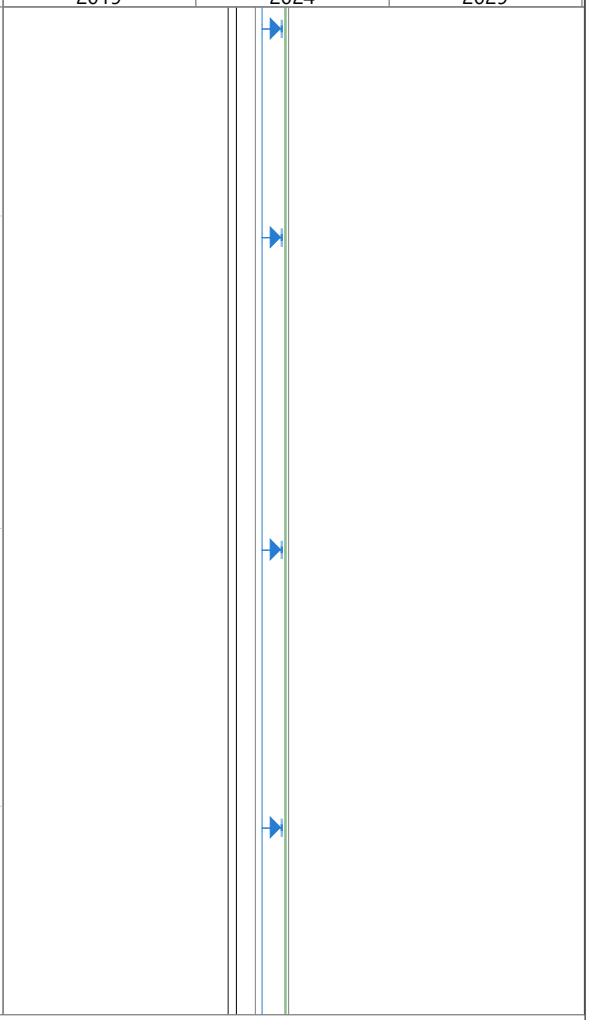

Id	Modo de tar	Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% compl	Costo
654		6.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SARDINEL ANCHO = 10 CM H = ENTRE 17 Y 24 CM EN CONCRETO 3000 PSI	10 días	mié 18/03/26	sáb 28/03/26	100%	$ 2.757.720,00
655		6.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SARDINEL ANCHO = 10 CM H = ENTRE 25 Y 30 CM EN CONCRETO 3000 PSI	10 días	mié 18/03/26	sáb 28/03/26	100%	$ 4.067.560,00
656		6.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ALISTADO PISOS Mortero 1:3 e= 0.03 mts	10 días	mié 18/03/26	sáb 28/03/26	100%	$ 315.040,00
657		**6.**	**CAI**	**10 días**	**mié 18/03/26**	**sáb 28/03/26**	**100%**	**$ 121.329.778,05**
658		6.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VIGA CIMENTACION CONCRETO 3000 PSI	10 días	mié 18/03/26	sáb 28/03/26	100%	$ 4.045.125,00
659		6.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PLACA CONTRAPISO CONCRETO 3000 PSI	10 días	mié 18/03/26	sáb 28/03/26	100%	$ 8.270.964,00
660		6.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SOLADO DE LIMPIEZA 2.000 PSI E = 5 CM	10 días	mié 18/03/26	sáb 28/03/26	100%	$ 351.054,00

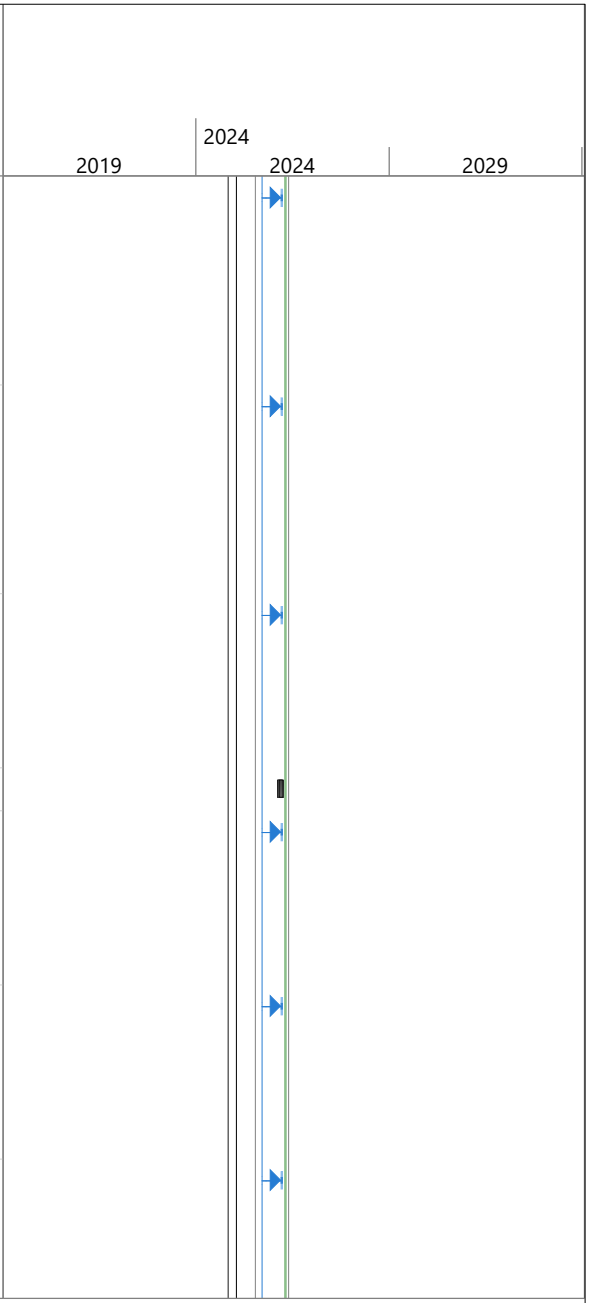


Id	Mo de tar	Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% compl	Costo
661		6.	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION MURO EN CONCRETO 28 MPA, NO INCLUYE REFUERZO	10 días	mié 18/03/26	sáb 28/03/26	100%	$ 15.120.768,00
662		6.	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE MURO EN LADRILLO FAROL PANDERETA E=12CMS. INCLUYE MORTERO DE PEGA.	10 días	mié 18/03/26	sáb 28/03/26	100%	$ 1.105.360,00
663		6.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CINTAS DE AMARRE EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0,15*0,15 (INCLUYE ACERO DE REFUERZO)	10 días	mié 18/03/26	sáb 28/03/26	100%	$ 1.166.448,00
664		6.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PLACA MACIZA AEREA CONCRETO 3000 PSI e= 0.10m	10 días	mié 18/03/26	sáb 28/03/26	100%	$ 6.884.120,00
665		6.	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION ACERO DE 60000 PSI (INCLUYE ALAMBRE NEGRO Y FIGURACION)	10 días	mié 18/03/26	sáb 28/03/26	100%	$ 26.841.000,00

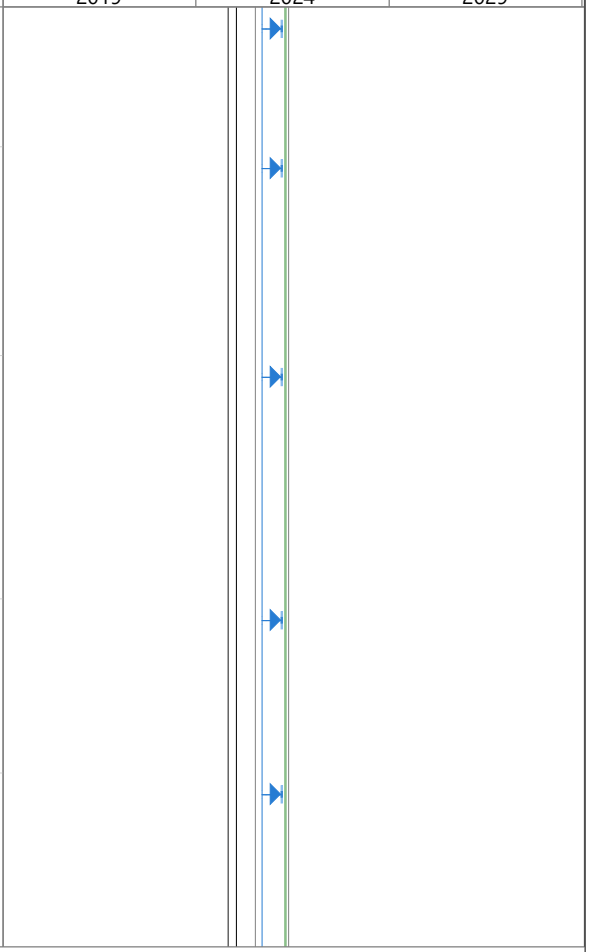


Id	Mo de tar	Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% compl	Costo
666		6.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MALLA ELECTROSOLDADA M-131 Q-3.1 F 5.0mm c/.15m en ambos sentidos (Incluye alambre negro, colocación y traslapo).	10 días	mié 18/03/26	sáb 28/03/26	100%	$ 1.392.930,00
667		6.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VIGA CANALES CONCRETO 3000 PSI 0,135M3/ML	10 días	mié 18/03/26	sáb 28/03/26	100%	$ 1.229.775,00
668		6.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERAMICA PISO ANTIQUE TIPO ALFA O SIMILAR. COLOR BEIGE O BLANCO SEGÚN DISEÑO (INCLUYE BOQUILLA.). INCLUYE MORTERO DE PEGA Y/O NIVELACIÓN.	10 días	mié 18/03/26	sáb 28/03/26	100%	$ 3.365.740,00
669		6.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GUARDAESCOBA CERAMICA TIPO ANTIQUE H = 10 CM. TIPO ALFA O SIMILAR. COLOR BEIGE O BLANCO SEGÚN DISEÑO (INCLUYE BOQUILLA.). INCLUYE MORTERO DE PEGA Y/O NIVELACIÓN	10 días	mié 18/03/26	sáb 28/03/26	100%	$ 1.485.540,00

Id	Mo de tar	Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% compl	Costo
670		6.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERAMICA PARED COLOR BEIGE O BLANCO HASTA $40.000 x M2. SEGÚN DISEÑO (INCLUYE BOQUILLA COLOR Y WIN.)	10 días	mié 18/03/26	sáb 28/03/26	100%	$ 1.997.120,00
671		6.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PINTURA SOBRE REVOQUE VINILO 3 MANOS SOBRE MURO (INCLUYE 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES).COLOR SEGÚN DISEÑO POR M2	10 días	mié 18/03/26	sáb 28/03/26	100%	$ 2.274.510,00
672		6.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y VINILO 3 MANOS BAJO PLACA INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO.	10 días	mié 18/03/26	sáb 28/03/26	100%	$ 2.944.123,05

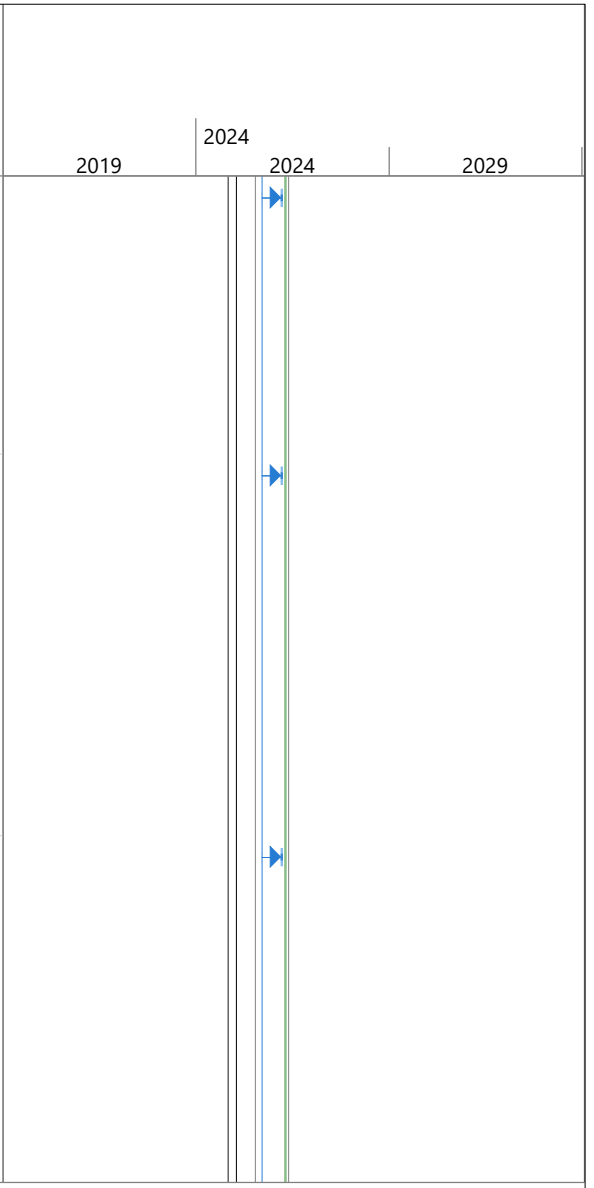


Id	Mo de tar	Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% compl	Costo
673		6.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR 3 MANOS FACHADAS (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO.	10 días	mié 18/03/26	sáb 28/03/26	100%	$ 2.868.320,00
674		6.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LAVAMANOS DE EMPOTRAR LINEA SAN LORENZO COLOR BLANCO DE CORONA REF: O19001001 O SIMILAR. (INCLUYE ELEMENTOS DE GRIFERÍA PARA INSTALACIÓN).	10 días	mié 18/03/26	sáb 28/03/26	100%	$ 655.590,00
675		6.	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION MESON EN GRANITO NATURAL CRISTAL PULIDO Y BRILLADO, PARA INCRUSTAR LAVAMANOS A=0.60M	10 días	mié 18/03/26	sáb 28/03/26	100%	$ 5.818.295,00

Id	Modo de tar	Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% compl	Costo
676		6.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MUEBLE BAJO MESON ANCHO: 0.60 M. CON FACHADA: MADECOR 19 MM. INTERIOR: MADECOR 15 MM. TIPO PIZANO O SIMILAR. ACABADO: SEGÚN PINTA SELECCIONADA DE CARTA COLORES MADECOR. (INCLUYE HOJAS PARA PUERTAS CON 2 RANURAS HOR	10 días	mié 18/03/26	sáb 28/03/26	100%	$ 4.025.190,00
677		6.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SANITARIO MONTECARLO ELONGADO BLANCO CORONA O SIMILAR. (CONJUNTO SANITARIO QUE INCLUYE SANITARIO, TAPA, ACCESORIOS DE CONEXIÓN E INSTALACIÓN.)	10 días	mié 18/03/26	sáb 28/03/26	100%	$ 1.121.638,00

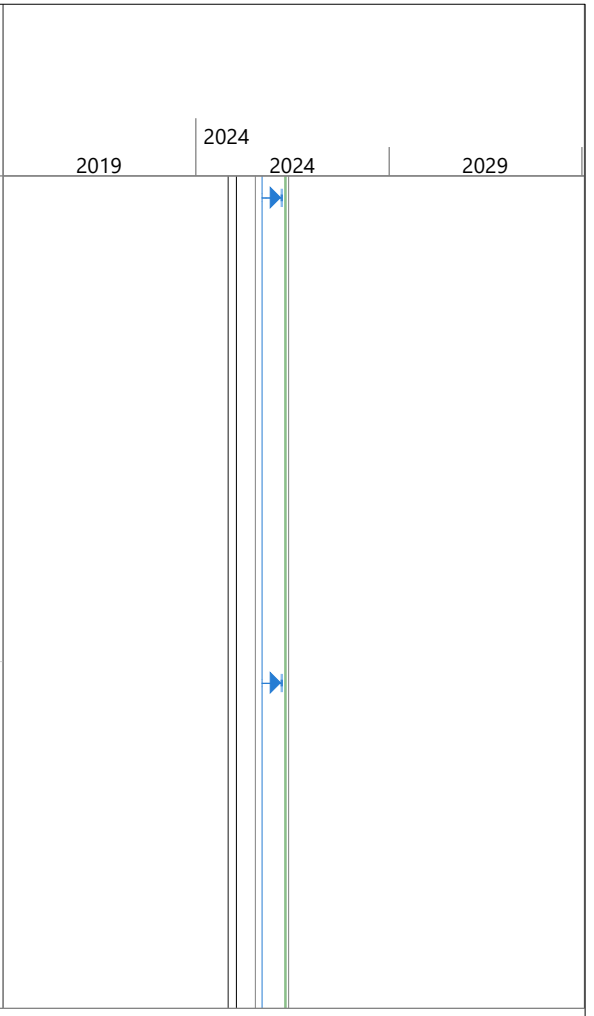

Id	Modo de tar	Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% compl	Costo
678		6.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ORINAL INSTITUCIONAL MEDIANO DE ENTRADA SUPERIOR EN PORCELANA COLOR BLANCO LINEA POLO (CORONA) REF: 088621001 O SIMILAR. INCLUYE GRIFERÍA PUSH Y VÁLVULA ANTIVANDÁLICA.	10 días	mié 18/03/26	sáb 28/03/26	100%	$ 1.166.074,00
679		6.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO DESAGUE PVC 3" Aparatos sanitarios y desagues (INCLUYE CODO, YEE Y ACCESORIOS)	10 días	mié 18/03/26	sáb 28/03/26	100%	$ 138.518,00
680		6.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO DESAGUE PVC 2" Aparatos sanitarios y desagues (INCLUYE CODO, YEE Y ACCESORIOS)	10 días	mié 18/03/26	sáb 28/03/26	100%	$ 329.229,00
681		6.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 3" (INCLUYE CODO, UNION Y ACCESORIOS DE FIJACION)	10 días	mié 18/03/26	sáb 28/03/26	100%	$ 156.324,00


Id	Mo de tar	Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% compl	Costo
682		6.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC-S 3" (RED SANITARIA, INCLUYE ACCESORIOS)	10 días	mié 18/03/26	sáb 28/03/26	100%	$ 70.132,00
683		6.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC-S 4" (RED SANITARIA, INCLUYE ACCESORIOS)	10 días	mié 18/03/26	sáb 28/03/26	100%	$ 177.264,00
684		6.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC-S 6" (RED SANITARIA, INCLUYE ACCESORIOS)	10 días	mié 18/03/26	sáb 28/03/26	100%	$ 980.784,00
685		6.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO AGUA FRIA 1/2" PVC -P (Incluye accesorios de instalación)	10 días	mié 18/03/26	sáb 28/03/26	100%	$ 241.731,00
686		6.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN SIFÓN PVC-S 2"	10 días	mié 18/03/26	sáb 28/03/26	100%	$ 124.027,00
687		6.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CAJA DE INSPECCIÓN EMPALME DOMICILIARIO TIPO I (0,60X0,60 M) EN CONCRETO CLASE II	10 días	mié 18/03/26	sáb 28/03/26	100%	$ 545.219,00

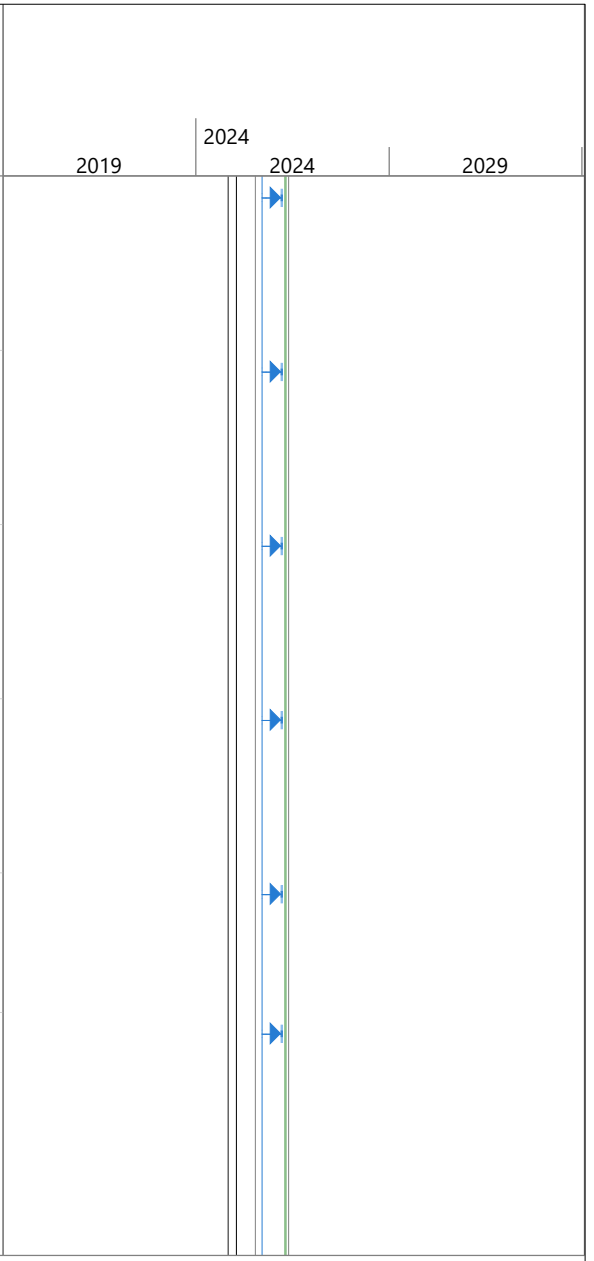


Id	Mo de tar	Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% compl	Costo
688		6.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUERTA METALICA LÁMINA COLD ROLLED CAL. 20 CON MARCO SENCILLO (INCLUYE ANTICORROSIVO + PINTURA ACEITE + MARCO EN LAMINA CAL. 20 CARGADOS EN CONCRETO). INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL	10 días	mié 18/03/26	sáb 28/03/26	100%	$ 2.280.720,00
689		6.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VENTANA CORREDIZA FIJA EN ALUMINIO ANODIZADO VIDRIO 6 MM (INCLUYE MARCO EN PERFILERIA PB 3831 O SIMILAR Y VIDRIO CRISTAL DE 6 MM.). INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE, A	10 días	mié 18/03/26	sáb 28/03/26	100%	$ 8.379.998,00
690		6.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CARTERA VENTANAS Y PUERTAS EN MORTERO 1:3 ANCHO 15-20 CMS.	10 días	mié 18/03/26	sáb 28/03/26	100%	$ 782.584,00

Id	Mo de tar	Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% compl	Costo
691		6.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TAPA P/CAJA DE INSPECCIÓN TIPO I (0,6X0,6X0,1 M) CONCRETO CLASE II	10 días	mié 18/03/26	sáb 28/03/26	100%	$ 249.104,00
692		6.	SUMINISTRO,TRANSPOR E INSTALACION REVOQUE LISO MUROS 1:3 INTERIOR (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES	10 días	mié 18/03/26	sáb 28/03/26	100%	$ 6.034.700,00
693		6.	SUMINISTRO,TRANSPOR E INSTALACION REVOQUE LISO BAJO PLACAS 1:3 IMPERMEABILIZADO (INCLUYE FILOS Y	10 días	mié 18/03/26	sáb 28/03/26	100%	$ 1.940.280,00
694		6.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION IMPERMEABILIZACION FIBER GLASS P-3 con refuerzo en poliester . (remates, emulsión asfaltica)	10 días	mié 18/03/26	sáb 28/03/26	100%	$ 3.769.480,00
695		6.	INSTALACIONES ELECTRICAS E	10 días	mié 18/03/26	sáb 28/03/26	100%	$ 1.000.000,00
696		**6.**	**EMPRADIZACION**	**9 días**	**mié 18/03/26**	**vie 27/03/26**	**100%**	**$ 1.077.510,00**
697		6.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE EMPRADIZACIÓN DE TALUDES Y ZONAS VERDES	9 días	mié 18/03/26	vie 27/03/26	100%	$ 1.077.510,00
698		**6.**	**ADICIONALES ALCALDÍA DE MANIZALES**	**19 días**	**sáb 9/05/26**	**sáb 30/05/26**	**0%**	**$ 3.825.304,00**

Id	Mo de tar	Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% compl	Costo
699		6.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TECHADO PROVISIONAL EN GUADUA Y PLÁSTICO	9 días	sáb 9/05/26	mar 19/05/26	0%	$ 3.481.240,00
700		7.	JORNAL AYUDANTE	4 días	mié 27/05/26	sáb 30/05/26	0%	$ 344.064,00
701		**7.**	**ASEO GENERAL Y LIMPIE**	**4 días**	**vie 27/03/26**	**mar 31/03/26**	100%	**$ 710.922,00**
702		7.	ASEO GENERAL	4 días	vie 27/03/26	mar 31/03/26	100%	$ 710.922,00
703		7..	FIN	0 días	mar 31/03/26	mar 31/03/26	100%	$ 0,00
704		**7.**	**ZONA 13**	**83 días**	**lun 9/02/26**	**sáb 16/05/26**	**92%**	**$ 108.898.772,01**
705		7..	INICIO	0 días	lun 9/02/26	lun 9/02/26	100%	$ 0,00
706		**7.**	**ACCESO ZONA NOROCCIDENTAL**	**83 días**	**mar 10/02/26**	**sáb 16/05/26**	**92%**	**$ 108.898.772,01**
707		**7.**	**PRELIMINARES**	**5 días**	**mar 10/02/26**	**sáb 14/02/26**	**100%**	**$ 8.160.816,56**
708		7.	ROCERIA Y LIMPIEZA	5 días	mar 10/02/26	sáb 14/02/26	100%	$ 446.967,30
709		7.	LOCALIZACION Y REPLANTEO	5 días	mar 10/02/26	sáb 14/02/26	100%	$ 1.530.270,00
710		7.	DESCAPOTE MECANICO e=0.20 m.	5 días	mar 10/02/26	sáb 14/02/26	100%	$ 564.088,26
711		7.	INSTALACION PROVISIONAL DE ACUEDUCTO	5 días	mar 10/02/26	sáb 14/02/26	100%	$ 685.338,00
712		7.	INSTALACION PROVISIONAL DE ENERGIA	5 días	mar 10/02/26	sáb 14/02/26	100%	$ 101.528,00

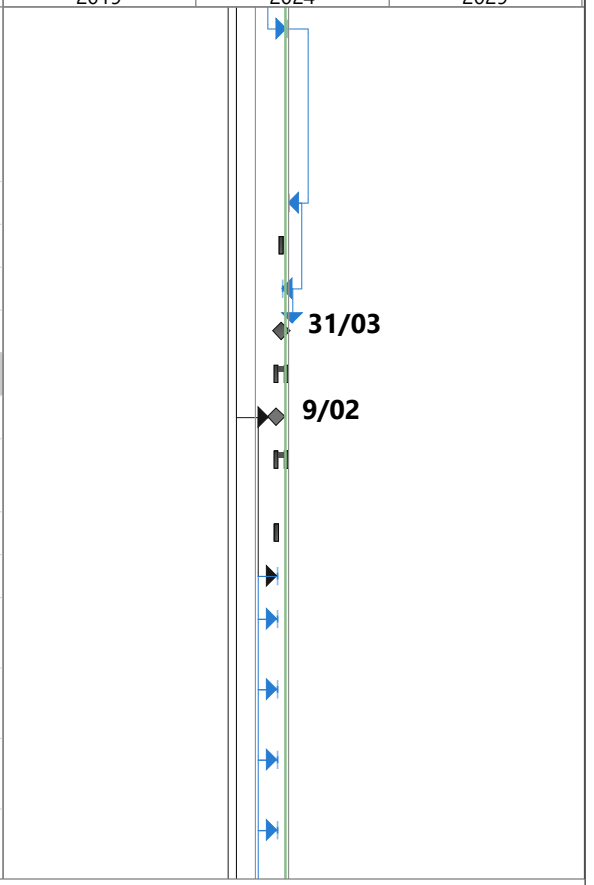


Id	Mo de tar	Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% compl	Costo
713		7.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CERRAMIENTO PROVISIONAL EN LÁMINA GALVANIZADA H= 2.4M (Incluye guadua cepa, puntillas y demás elementos para su correcta instalación y funcionamiento)	5 días	mar 10/02/26	sáb 14/02/26	100%	$ 4.832.625,00
714		**7.**	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**	**5 días**	**mar 10/02/26**	**sáb 14/02/26**	**100%**	**$ 13.498.980,59**
715		7.	EXCAVACIÓN EN ZANJA - MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0 M	5 días	mar 10/02/26	sáb 14/02/26	100%	$ 0,00
716		7.	RELLENO, CONFORMACION Y COMPACTACION A MAQUINA CON MATERIAL DE PRESTAMO	5 días	mar 10/02/26	sáb 14/02/26	100%	$ 74.059,20
717		7.	EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS - CONGLOMERADO - 0.0 A 2.0 M	5 días	mar 10/02/26	sáb 14/02/26	100%	$ 0,00
718		7.	EXCAVACIÓN EN ZANJA - CONGLOMERADO - 0.0 A 2.0 M	5 días	mar 10/02/26	sáb 14/02/26	100%	$ 0,00
719		7.	EXCAVACIÓN MECANIZADA CIELO ABIERTO-MAT COMÚN/CONGLOM 0.0 A 6.0 M.	5 días	mar 10/02/26	sáb 14/02/26	100%	$ 1.710.871,95

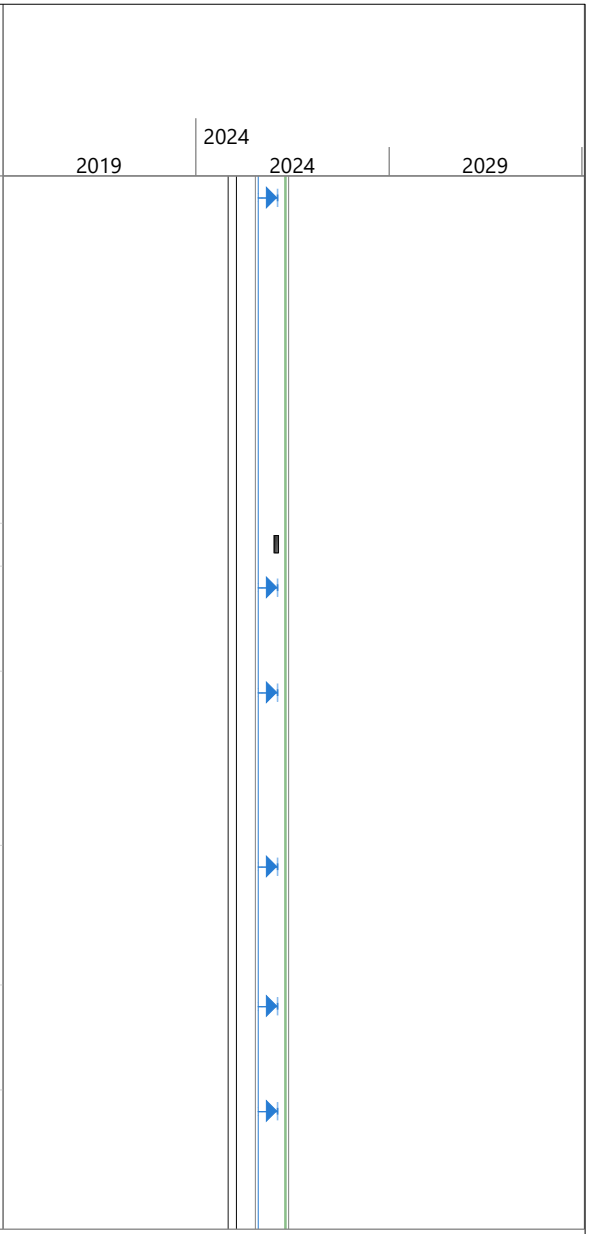


Id	Mo de tar	Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% compl	Costo
720		7.	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE MECANICO, DISPOSICIÓN EN BOTADERO (HASTA 25	5 días	mar 10/02/26	sáb 14/02/26	100%	$ 11.714.049,44
721		**7.**	**MATERIAL GRANULAR**	**3 días**	**mié 11/02/26**	**vie 13/02/26**	**100%**	**$ 30.316.738,76**
722		7.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION AFIRMADO COMPACTADO PARA ESTRUCTURAS	3 días	mié 11/02/26	vie 13/02/26	100%	$ 30.316.738,76
723		**7.**	**ZONAS DURAS**	**3 días**	**mié 11/02/26**	**vie 13/02/26**	**100%**	**$ 40.801.860,30**
724		7.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PLACA CONTRAPISO CONCRETO 3000 PSI E=0.10 m	3 días	mié 11/02/26	vie 13/02/26	100%	$ 33.398.890,00
725		7.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MUROS DE CONTENCION CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI H<3.0M. NO INCLUYE REFUERZO.	3 días	mié 11/02/26	vie 13/02/26	100%	$ 1.639.008,75
726		7.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ZAPATA CONCRETO 3000 PSI	3 días	mié 11/02/26	vie 13/02/26	100%	$ 1.209.529,75
727		7.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESCALAS CONCRETO 3000 PSI E= 0.10M. SOBRE TIERRA ACABADO ESCOBIADO	3 días	mié 11/02/26	vie 13/02/26	100%	$ 1.976.472,80

Id	Mo de tar	Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% compl	Costo
728		7.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SARDINEL ANCHO = 10 CM H = ENTRE 17 Y 24 CM EN CONCRETO 3000 PSI	3 días	mié 11/02/26	vie 13/02/26	100%	$ 0,00
729		7.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SARDINEL ANCHO = 10 CM H = ENTRE 25 Y 30 CM EN CONCRETO 3000 PSI	3 días	mié 11/02/26	vie 13/02/26	100%	$ 0,00
730		7.	CORTE MECANIZADO DE PAVIMENTO A=5 mm profundidad un tercio del espesor	3 días	mié 11/02/26	vie 13/02/26	100%	$ 891.167,00
731		7.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION JUNTA DE DILATACION PARA PLACA CONTRAPISO (Inlcuye sellante)	3 días	mié 11/02/26	vie 13/02/26	100%	$ 1.686.792,00
732		**7.**	**ACERO**	**3 días**	**mié 11/02/26**	**vie 13/02/26**	**100%**	**$ 6.824.781,00**
733		7.	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION ACERO DE 60000 PSI (INCLUYE ALAMBRE NEGRO Y FIGURACION)	3 días	mié 11/02/26	vie 13/02/26	100%	$ 1.949.526,00


Id	Mo de tar	Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% compl	Costo
734		7.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MALLA ELECTROSOLDADA M-131 Q-3.1 F 5.0mm c/.15m en ambos sentidos (Incluye alambre negro, colocación y traslapo).	3 días	mié 11/02/26	vie 13/02/26	100%	$ 4.875.255,00
735		**7.**	**MOBILIARIO URBANO**	**4 días**	**lun 11/05/26**	**jue 14/05/26**	**0%**	**$ 9.164.780,00**
736		7.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN BICIPARQUEADEROS, EN CONCRETO PULIDO, IGUAL O SIMILAR A: TIPO KÖNKRETUS REFERENCIA: BICIPARQUEADERO MC 60. A:0,13 M X H:0,80 M X P:0,69 M. (41 KG/UN) (MU 10). INCLUYE DADOS DE CONCRETO, ACERO Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU	4 días	lun 11/05/26	jue 14/05/26	0%	$ 9.164.780,00
737		**7.**	**EMPRADIZACION**	**4 días**	**mié 11/02/26**	**sáb 14/02/26**	**100%**	**$ 0,00**
738		7.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE EMPRADIZACIÓN DE TALUDES Y ZONAS VERDES	4 días	mié 11/02/26	sáb 14/02/26	100%	$ 0,00
739		**7.**	**ADICIONALES ALCALDÍA DE MANIZALES**	**3 días**	**jue 12/02/26**	**sáb 14/02/26**	**100%**	**$ 130.814,80**

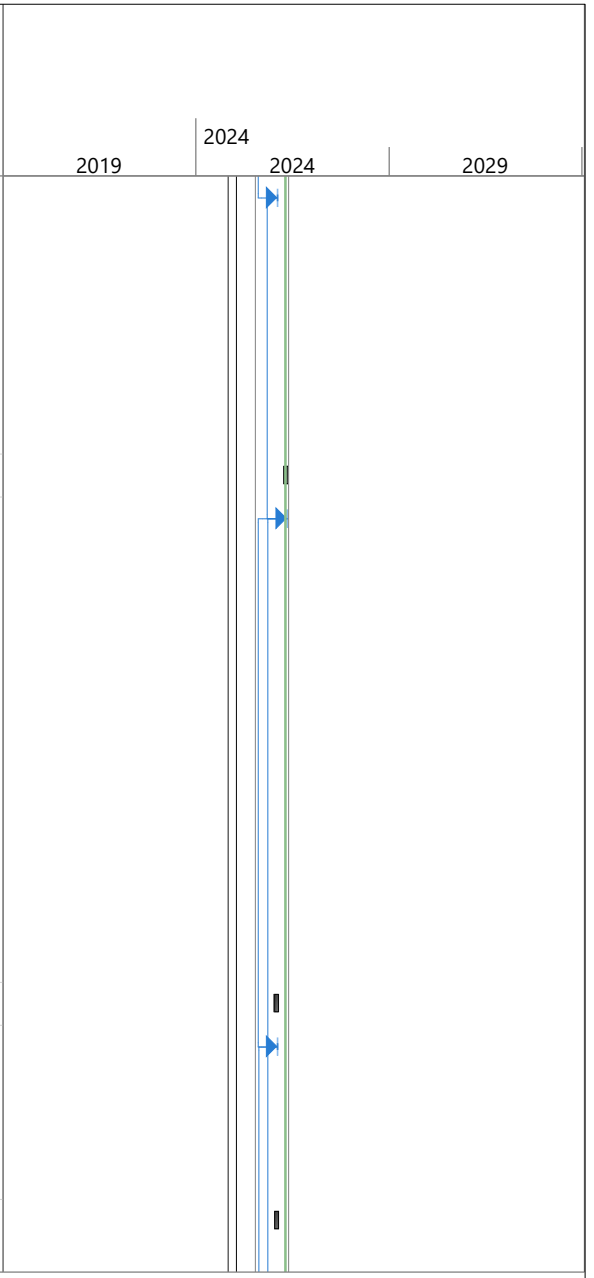


Id	Mo de tar	Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% compl	Costo
740		7.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TECHADO PROVISIONAL EN GUADUA Y PLÁSTICO	3 días	jue 12/02/26	sáb 14/02/26	100%	$ 0,00
741		7.	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE DILATACIONES ESTRUCTURALES CON ICOPOR E=2.0CM Y SELLO CON SIKAFLEX 1A PLUS	3 días	jue 12/02/26	sáb 14/02/26	100%	$ 130.814,80
742		**7.**	**ASEO GENERAL Y LIMPIE**	**5 días**	**mar 12/05/26**	**sáb 16/05/26**	**0%**	**$ 0,00**
743		7.	ASEO GENERAL	5 días	mar 12/05/26	sáb 16/05/26	0%	$ 0,00
744		7..	FIN	0 días	sáb 16/05/26	sáb 16/05/26	0%	$ 0,00
745		**7.**	**ZONA 14**	**94 días**	**jue 29/01/26**	**mar 19/05/26**	**85%**	**$ 453.216.770,91**
746		7..	INICIO	0 días	jue 29/01/26	jue 29/01/26	100%	$ 0,00
747		**7.**	**SENDERO Y PAISAJISMO**	**90 días**	**mié 4/02/26**	**mar 19/05/26**	**85%**	**$ 453.216.770,91**
748		**7.**	**PRELIMINARES**	**10 días**	**mié 4/02/26**	**sáb 14/02/26**	**100%**	**$ 63.860.843,05**
749		7.	ROCERIA Y LIMPIEZA	10 días	mié 4/02/26	sáb 14/02/26	100%	$ 11.207.331,30
750		7.	TALA DE ARBOLES MEDIANO PORTE H= 10 - 15M (INCLUYE RETIRO)	10 días	mié 4/02/26	sáb 14/02/26	100%	$ 3.856.944,00
751		7.	TALA DE ARBOLES GRAN PORTE H > 15M (INCLUYE RETIRO)	10 días	mié 4/02/26	sáb 14/02/26	100%	$ 1.889.920,00
752		7.	LOCALIZACION Y REPLANTEO	10 días	mié 4/02/26	sáb 14/02/26	100%	$ 31.978.870,00
753		7.	DESCAPOTE MECANICO e=0.20 m.	10 días	mié 4/02/26	sáb 14/02/26	100%	$ 14.140.911,75
754		7.	INSTALACION PROVISIONAL DE ACUEDUCTO	10 días	mié 4/02/26	sáb 14/02/26	100%	$ 685.338,00

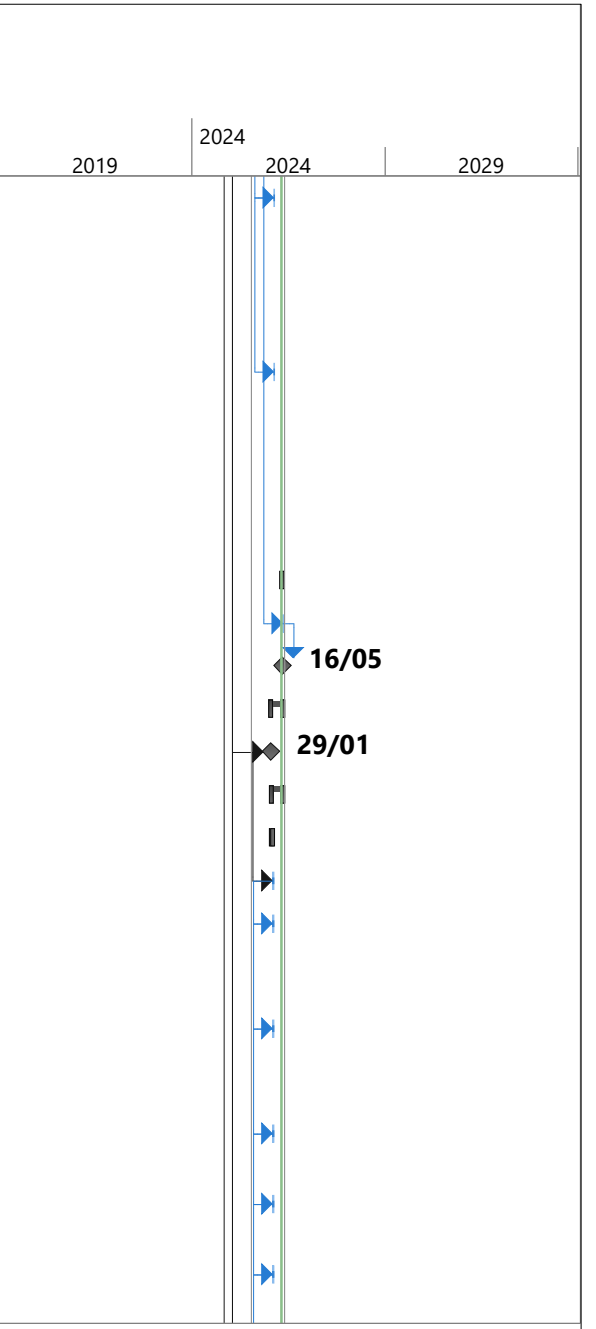

Id	Mo de tar	Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% compl	Costo
755		7.	INSTALACION PROVISIONAL DE ENERGIA	10 días	mié 4/02/26	sáb 14/02/26	100%	$ 101.528,00
756		7.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CERRAMIENTO PROVISIONAL EN LÁMINA GALVANIZADA H= 2.4M (Incluye guadua cepa, puntillas y demás elementos para su correcta instalación y funcionamiento)	10 días	mié 4/02/26	sáb 14/02/26	100%	$ 0,00
757		**7.**	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**	**83 días**	**vie 6/02/26**	**mié 13/05/26**	**98%**	**$ 151.501.376,80**
758		7.	EXCAVACIÓN EN ZANJA - MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0 M	8 días	vie 6/02/26	sáb 14/02/26	98%	$ 0,00
759		7.	RELLENO, CONFORMACION Y COMPACTACION A MAQUINA CON MATERIAL DE PRESTAMO	8 días	vie 6/02/26	sáb 14/02/26	98%	$ 0,00
760		7.	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION	8 días	vie 6/02/26	sáb 14/02/26	98%	$ 0,00
761		7.	EXCAVACION MECANICA EN ZANJA (RETROEXCAVADORA)	8 días	vie 6/02/26	sáb 14/02/26	98%	$ 0,00
762		7.	EXCAVACIÓN EN ZANJA - CONGLOMERADO - 0.0 A 2.0 M	8 días	vie 6/02/26	sáb 14/02/26	98%	$ 0,00

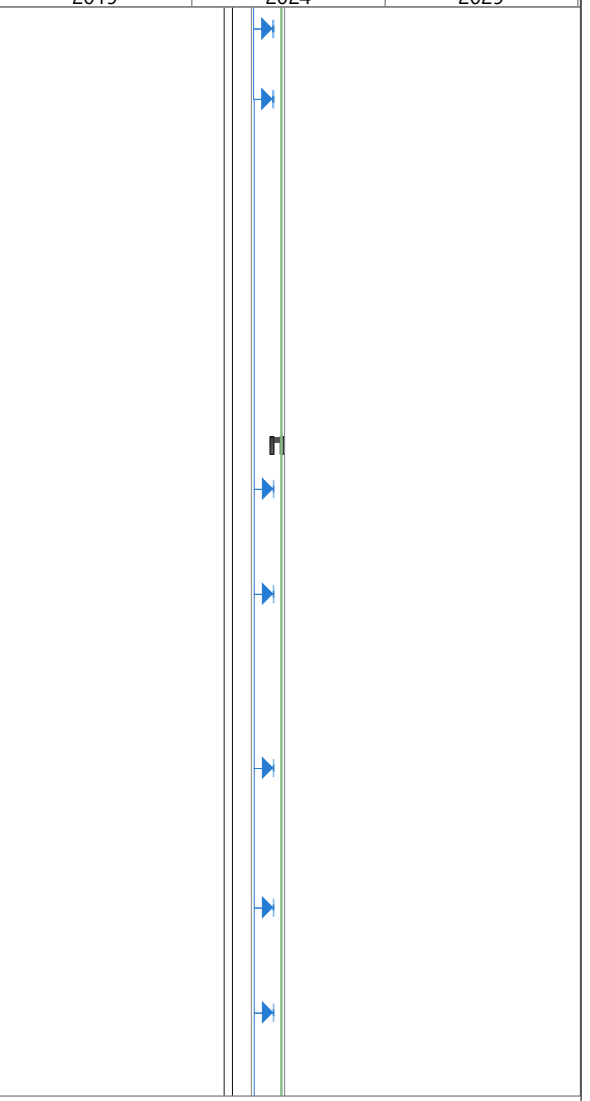


Id	Mo de tar	Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% compl	Costo
763		7.	EXCAVACIÓN MECANIZADA CIELO ABIERTO-MAT COMÚN/CONGLOM 0.0 A 6.0 M.	83 días	vie 6/02/26	mié 13/05/26	98%	$ 8.161.896,60
764		7.	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE MECANICO, DISPOSICIÓN EN BOTADERO (HASTA 25	83 días	vie 6/02/26	mié 13/05/26	98%	$ 143.339.480,20
765		**7.**	**MATERIAL GRANULAR**	**8 días**	**vie 6/02/26**	**sáb 14/02/26**	**100%**	**$ 0,00**
766		7.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION AFIRMADO PARA ANDENES	8 días	vie 6/02/26	sáb 14/02/26	100%	$ 0,00
767		**7.**	**ZONAS DURAS**	**6 días**	**lun 9/02/26**	**sáb 14/02/26**	**100%**	**$ 73.746.551,36**
768		7.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PLACA CONTRAPISO CONCRETO 3000 PSI E=0.10 m	6 días	lun 9/02/26	sáb 14/02/26	100%	$ 0,00
769		7.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MUROS DE CONTENCION CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI H<3.0M. NO INCLUYE REFUERZO.	6 días	lun 9/02/26	sáb 14/02/26	100%	$ 0,00
770		7.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ZAPATA CONCRETO 3000 PSI	6 días	lun 9/02/26	sáb 14/02/26	100%	$ 0,00

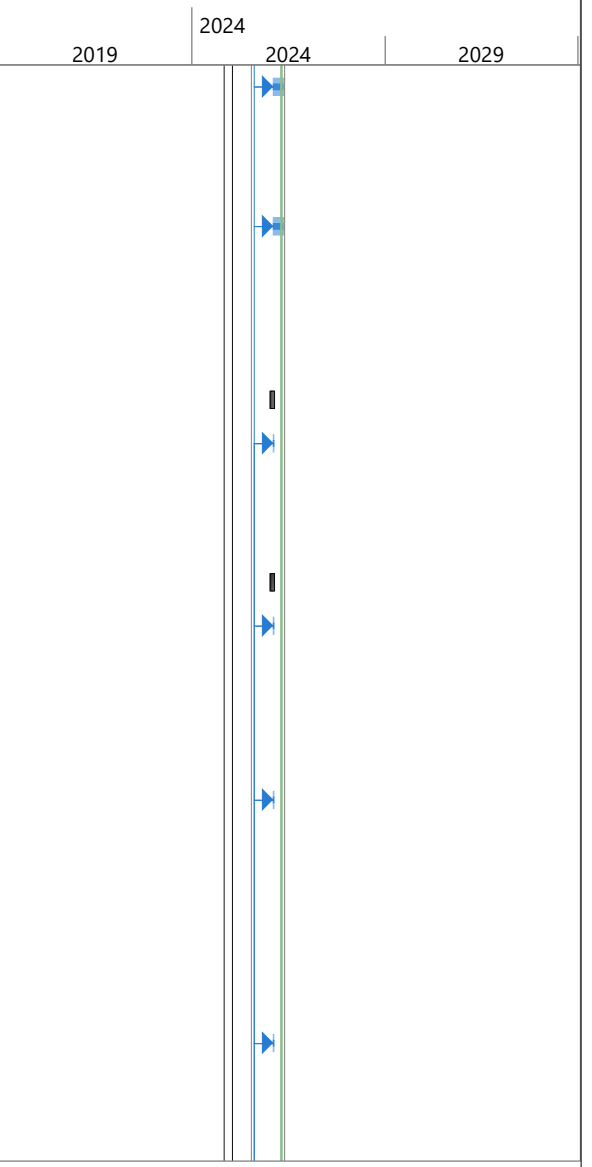


Id	Mo de tar	Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% compl	Costo
771		7.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SARDINEL ANCHO = 10 CM H = ENTRE 17 Y 24 CM EN CONCRETO 3000 PSI	6 días	lun 9/02/26	sáb 14/02/26	100%	$ 0,00
772		7.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SARDINEL ANCHO = 10 CM H = ENTRE 25 Y 30 CM EN CONCRETO 3000 PSI	6 días	lun 9/02/26	sáb 14/02/26	100%	$ 0,00
773		7.	CORTE MECANIZADO DE PAVIMENTO A=5 mm profundidad un tercio del espesor	6 días	lun 9/02/26	sáb 14/02/26	100%	$ 0,00
774		7.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION JUNTA DE DILATACION PARA PLACA CONTRAPISO (Inlcuye sellante)	6 días	lun 9/02/26	sáb 14/02/26	100%	$ 0,00
775		7.	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO DE 3000 psi PARA CUNETA EN "V" EN SENDERO DE CICLOMONTAÑISMO	6 días	lun 9/02/26	sáb 14/02/26	100%	$ 73.746.551,36
776		**7.**	**ACERO**	**8 días**	**vie 6/02/26**	**sáb 14/02/26**	**100%**	**$ 0,00**
777		7.	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION ACERO DE 60000 PSI (INCLUYE ALAMBRE NEGRO Y FIGURACION)	8 días	vie 6/02/26	sáb 14/02/26	100%	$ 0,00


Id	Mo de tar	Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% compl	Costo
778		7.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MALLA ELECTROSOLDADA M-131 Q-3.1 F 5.0mm c/.15m en ambos sentidos (Incluye alambre negro, colocación y traslapo).	8 días	vie 6/02/26	sáb 14/02/26	100%	$ 0,00
779		**7.**	**ARBOLES Y PLANTAS ORNAMENTALES**	**82 días**	**vie 6/02/26**	**mar 12/05/26**	**50%**	**$ 137.587.506,00**
780		7.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE INDIVIDUOS ARBORESOS HASTA H=1.80m (Incluye tierra negra)	82 días	vie 6/02/26	mar 12/05/26	50%	$ 50.756.706,00
781		7.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PLANTA ORNAMENTALES (Incluye tierra negra)	82 días	vie 6/02/26	mar 12/05/26	50%	$ 86.830.800,00
782		**7.**	**EMPRADIZACION**	**82 días**	**vie 6/02/26**	**mar 12/05/26**	**95%**	**$ 0,00**
783		7.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE EMPRADIZACIÓN DE TALUDES Y ZONAS VERDES	82 días	vie 6/02/26	mar 12/05/26	95%	$ 0,00
784		**7.**	**ADICIONALES ALCALDÍA DE MANIZALES**	**8 días**	**vie 6/02/26**	**sáb 14/02/26**	**100%**	**$ 26.520.493,70**
785		7.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TECHADO PROVISIONAL EN GUADUA Y PLÁSTICO	8 días	vie 6/02/26	sáb 14/02/26	100%	$ 0,00

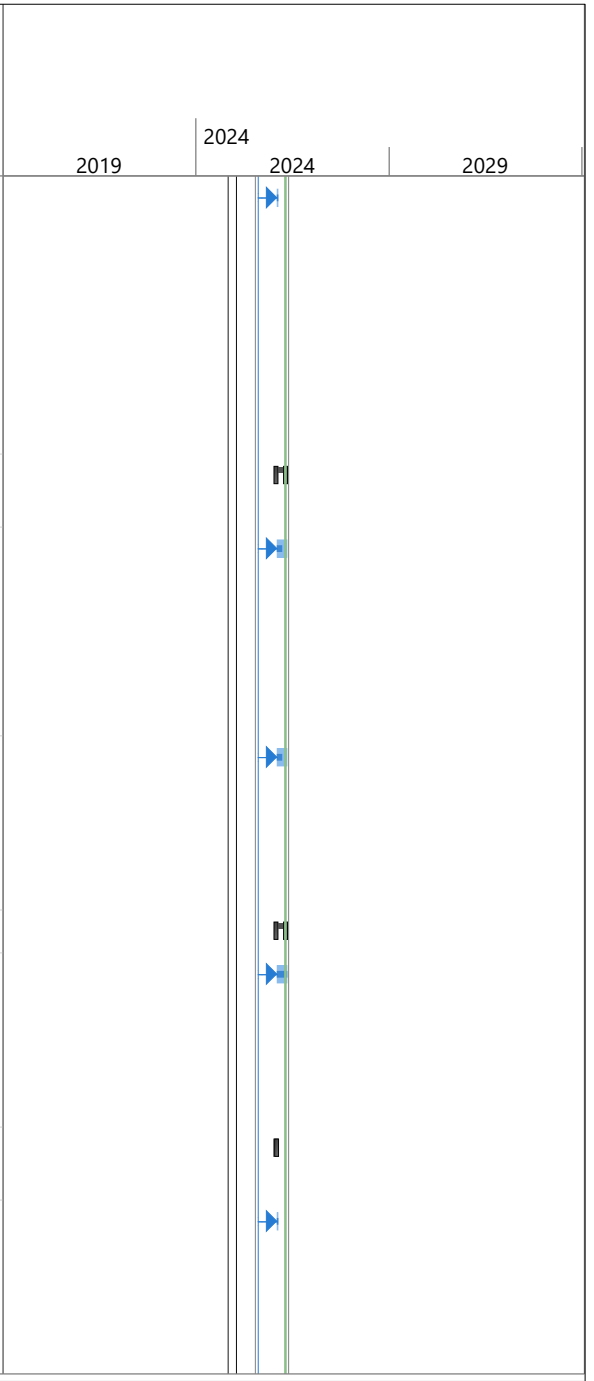


Id	Mo de tar	Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% compl	Costo
786		7.	CONFORMACIÓN DE TALUDES CON EQUIPO MECÁNICO	8 días	vie 6/02/26	sáb 14/02/26	100%	$ 24.570.797,70
787		7.	JORNAL AYUDANTE	8 días	vie 6/02/26	sáb 14/02/26	100%	$ 1.949.696,00
788		**7.**	**ASEO GENERAL Y LIMPIE**	**7 días**	**mar 12/05/26**	**mar 19/05/26**	**0%**	**$ 0,00**
789		7.	ASEO GENERAL	7 días	mar 12/05/26	mar 19/05/26	0%	$ 0,00
790		7..	FIN	0 días	mar 19/05/26	mar 19/05/26	0%	$ 0,00
791		**7.**	**ZONA 15**	**26 días**	**jue 17/07/25**	**vie 15/08/25**	**100%**	**$ 31.195.448,00**
792		7..	INICIO	0 días	jue 17/07/25	jue 17/07/25	100%	$ 0,00
793		**7.**	**ENSAYOS DE LABORATORIC**	**26 días**	**jue 17/07/25**	**vie 15/08/25**	**100%**	**$ 31.195.448,00**
794		7.	PERFORACION MECANICA EN SUELO ANTROPICO CON EQUIPO TIPO PETTET O SIMILAR	26 días	jue 17/07/25	vie 15/08/25	100%	$ 11.995.200,00
795		7.	ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO (GRUESOS) Y POR HIDROMETRO	26 días	jue 17/07/25	vie 15/08/25	100%	$ 476.000,00
796		7.	ENSAYO DE LIMITES DE ATTERBERG (LIMITE LIQUIDO Y PLASTICO)	26 días	jue 17/07/25	vie 15/08/25	100%	$ 238.000,00
797		7.	DETERMINACION DE CONTENIDO DE HUMEDAD NATURAL	26 días	jue 17/07/25	vie 15/08/25	100%	$ 57.120,00
798		7.	ENSAYO DE COMPRESION INCONFINADA (UC)	26 días	jue 17/07/25	vie 15/08/25	100%	$ 238.000,00
799		7.	ENSAYO DE CORTE DIRECTO NO DRENADO (UU)	26 días	jue 17/07/25	vie 15/08/25	100%	$ 952.000,00
800		8.	ENSAYO DE PENETRACION ESTANDAR (STANDARD PENETRATION TEST SPT)	26 días	jue 17/07/25	vie 15/08/25	100%	$ 142.800,00
801		8.	MOVILIZACION INTERNA DE EQUIPOS	26 días	jue 17/07/25	vie 15/08/25	100%	$ 317.328,00

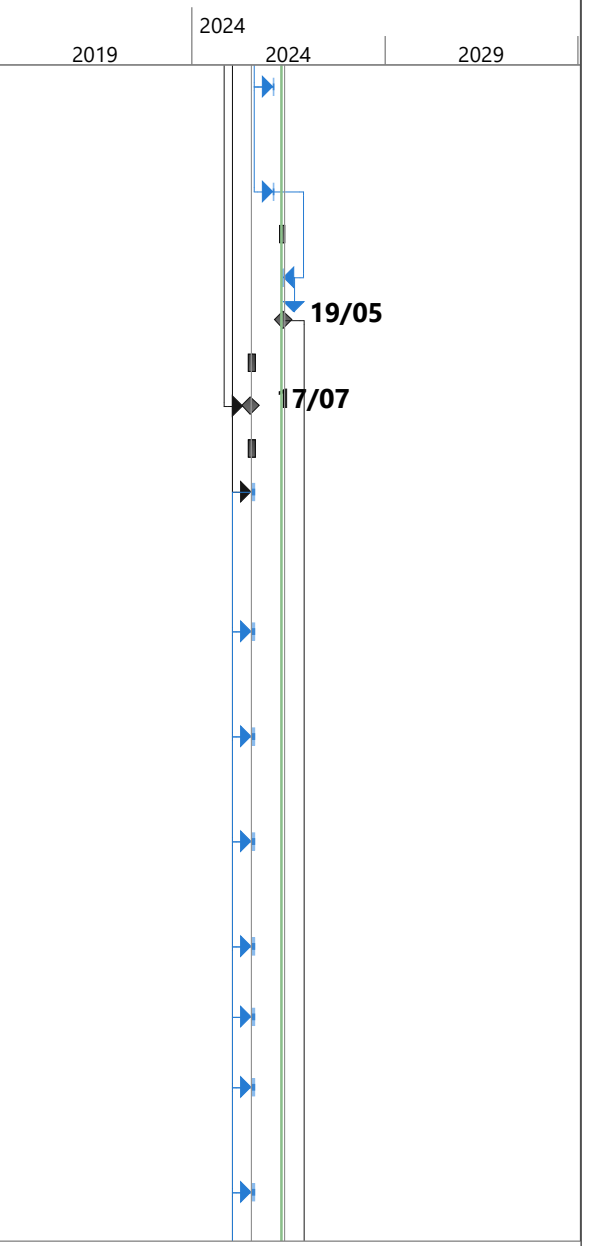


Id	Mo de tar	Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% compl	Costo
802		8.	ENSAYO DE REFRACCION SISMICA PARA MEDICION DE VELOCIDAD DE PROPAGACION DE VELOCIDAD DE ONDAS	26 días	jue 17/07/25	vie 15/08/25	100%	$ 7.854.000,00
803		8.	ENSAYO GEOELECTRICO O DE RESISTIVIDAD ELECTRICA PARA MEDIDION DE RESISTENCIA DEL SUELO AL PASO DE LA CORRIENTE ELECTRICA	26 días	jue 17/07/25	vie 15/08/25	100%	$ 8.925.000,00
804		**8..**	**ADICIONAL No. 1**	**15 días**	**mié 13/05/26**	**sáb 30/05/26**	**0%**	**$ 395.559.440,00**
805		**8..**	**CANTIDADES ELECTRICAS PARA INSTALACIONES INTERNAS - PARQUE METROPOLITANO**	**9 días**	**lun 18/05/26**	**jue 28/05/26**	**0%**	**$ 0,00**
806		8..	INICIO	0 días	lun 18/05/26	lun 18/05/26	0%	$ 0,00
807		8..	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT PVC 1"	9 días	mar 19/05/26	jue 28/05/26	0%	$ 0,00
808		8..	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT PVC 1_1/2".	9 días	mar 19/05/26	jue 28/05/26	0%	$ 0,00
809		8..	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE TABLERO DE 6 CIRCUITOS 2F4H, CON PUERTA. BARRAJE PARA 200A BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA CALIDAD LEGRAND, SIEMENS, SQARED O SUPERIOR DE MARCA RECONOCIDA Y HOMOLOGADA POR EL CIDET	3 días	mar 26/05/26	jue 28/05/26	0%	$ 0,00

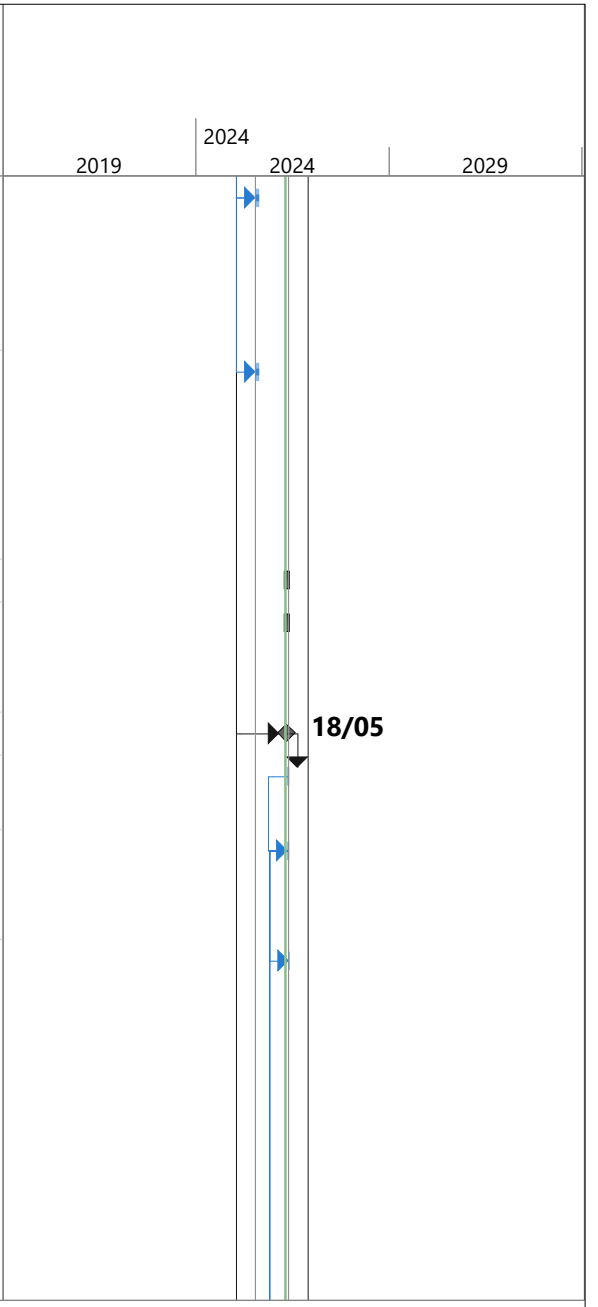


Id	Mo de tar	Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% compl	Costo
810		8..	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR ENCHUFABLE 1X20A. CALIDAD LEGRAND, SIEMENS, SQARED O SUPERIOR DE MARCA RECONOCIDA Y HOMOLOGADA POR EL	3 días	mar 26/05/26	jue 28/05/26	0%	$ 0,00
811		8..	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA, INCLUYE: TOMACORRIENTE, CAJA 4"X4" CON SUPLEMENTO, ADAPTADOR TERMINAL DE PVC SCH40 1/2", CURVA DE PVC SCH40 1/2", CÓDIGO DE COLORES Y ACCESORIOS. SIN CANALIZAR NI CABLEAR.	3 días	mar 26/05/26	jue 28/05/26	0%	$ 0,00
812		8..	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE TIPO GFCI CON CABLE #12 LIBRE DE HALÓGENOS Y TUBERÍA PVC 1/2"	3 días	mar 26/05/26	jue 28/05/26	0%	$ 0,00
813		8..	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN SALIDA DE IILUMINACIÓN EN TUBERÍA PVC SCH40 1/2", CABLE 12 AWG HFFR LS	2 días	mié 27/05/26	jue 28/05/26	0%	$ 0,00

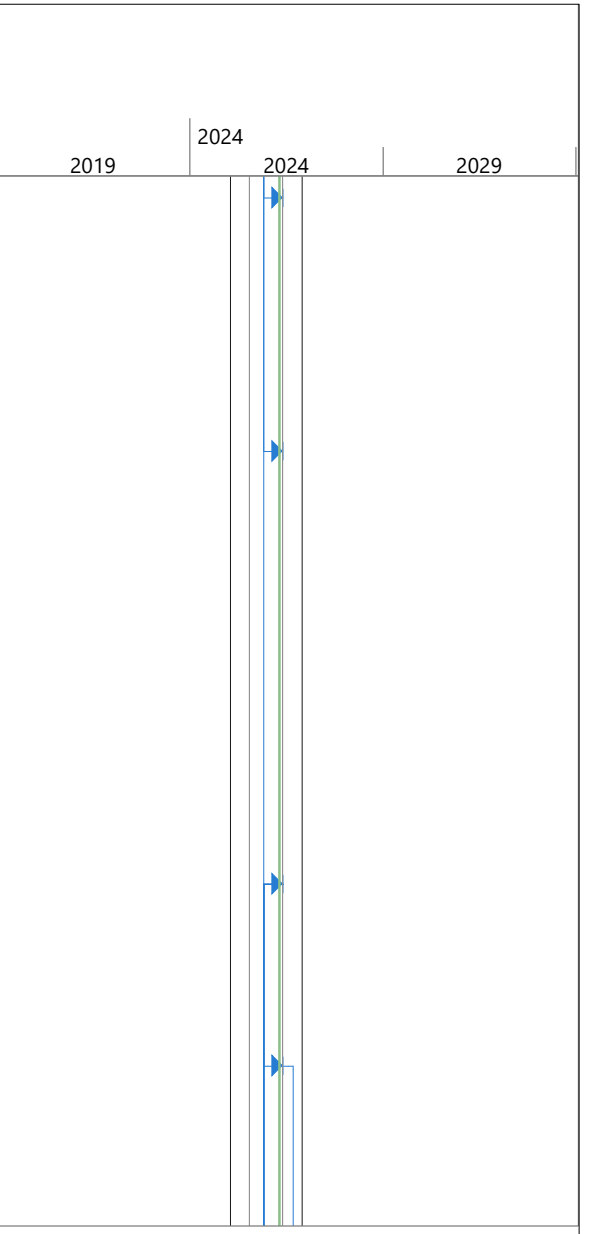

Id	Mo de tar	Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% compl	Costo
814		8..	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR 18W LUZ BLANCA NEUTRA 1080 LÚMENES TIPO SYLVANA O SIMILAR	2 días	mié 27/05/26	jue 28/05/26	0%	$ 0,00
815		8..	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED REDONDO 12W DE INCRUSTAR, 4000K, TIPO P24628 Ó SIMILAR	2 días	mié 27/05/26	jue 28/05/26	0%	$ 0,00
816		8..	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN LAMPARA LED 2 X (18W - 25W) 6500 K Ó SIMILAR (INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN E INSTALACIÓN)	2 días	mié 27/05/26	jue 28/05/26	0%	$ 0,00
817		8..	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBERIA CONDUIT EMT 1/2", CABLE N° 12 AWG HEEP LS	2 días	mié 27/05/26	jue 28/05/26	0%	$ 0,00
818		8..	SUMINISTRO E INSTALACION TOTALIZADOR 3X50A 25KA	2 días	mié 27/05/26	jue 28/05/26	0%	$ 0,00
819		8..	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN TABLERO ELECTRICO DE 0,40M X 0,30M X 0,20 TIPO INTEMPERIE PARA PUESTA EN MARCHA DE BOMBAS HIDRÁULICAS. INCLUYE (1) TOTALIZADOR 3X50, (2) TOTALIZADORES 3X40, (2) BREAKERS TIPO RIEL 1x20A.	2 días	mié 27/05/26	jue 28/05/26	0%	$ 0,00

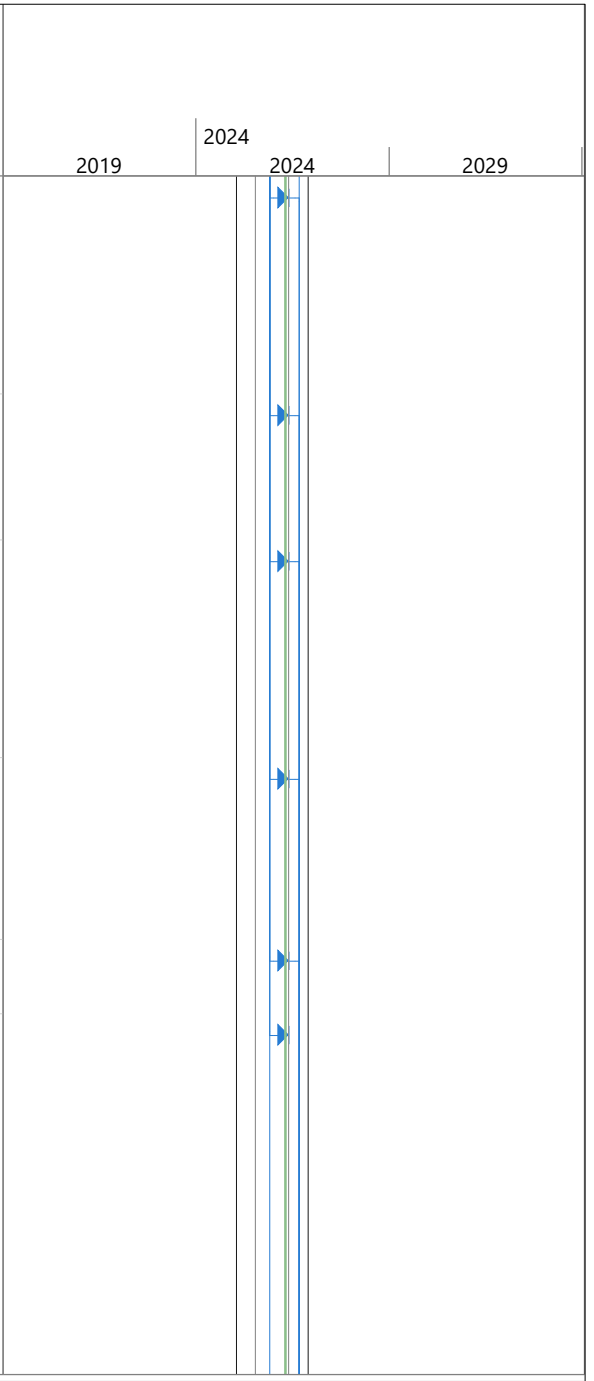


Id	Mo de tar	Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% compl	Costo
820		8..	SUMINISTRO E INSTALACION DE PROGRAMADOR HORARIO ELECTROMECANICO EN CAJA METALICA	2 días	mié 27/05/26	jue 28/05/26	0%	$ 0,00
821		8..	FIN	0 días	jue 28/05/26	jue 28/05/26	0%	$ 0,00
822		**8..**	**CANTIDADES ELECTRICAS PARA ACOMETIDAS Y MEDIA TENSIÓN - PARQUE METROPOLITANO**	**11 días**	**mié 13/05/26**	**mar 26/05/26**	**0%**	**$ 0,00**
823		8..	INICIO	0 días	mié 13/05/26	mié 13/05/26	0%	$ 0,00
824		8..	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CONTADOR 2F TRIFILAR 120/208V M	9 días	sáb 16/05/26	mar 26/05/26	0%	$ 0,00
825		8..	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CONTADOR 3F TRIFASICO 120/208V M	6 días	mié 20/05/26	mar 26/05/26	0%	$ 0,00
826		8..	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SISTEMA DE PUESTA A TIERRA GENERAL CON UNA VARILA DE COBRE 5/8X2.4M	4 días	vie 22/05/26	mar 26/05/26	0%	$ 0,00
827		8..	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT PVC DB 3".	3 días	vie 22/05/26	lun 25/05/26	0%	$ 0,00
828		8..	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TRIPOLAR TIPO INDUSTRIAL CAJA MOLDEADA 3X100A; 25KA/240V. CALIDAD LEGRAND, SIEMENS, MERLIN GERIN O SUPERIOR DE MARCA RECONOCIDA Y HOMOLOGADA POR EL CIDET	3 días	vie 22/05/26	lun 25/05/26	0%	$ 0,00

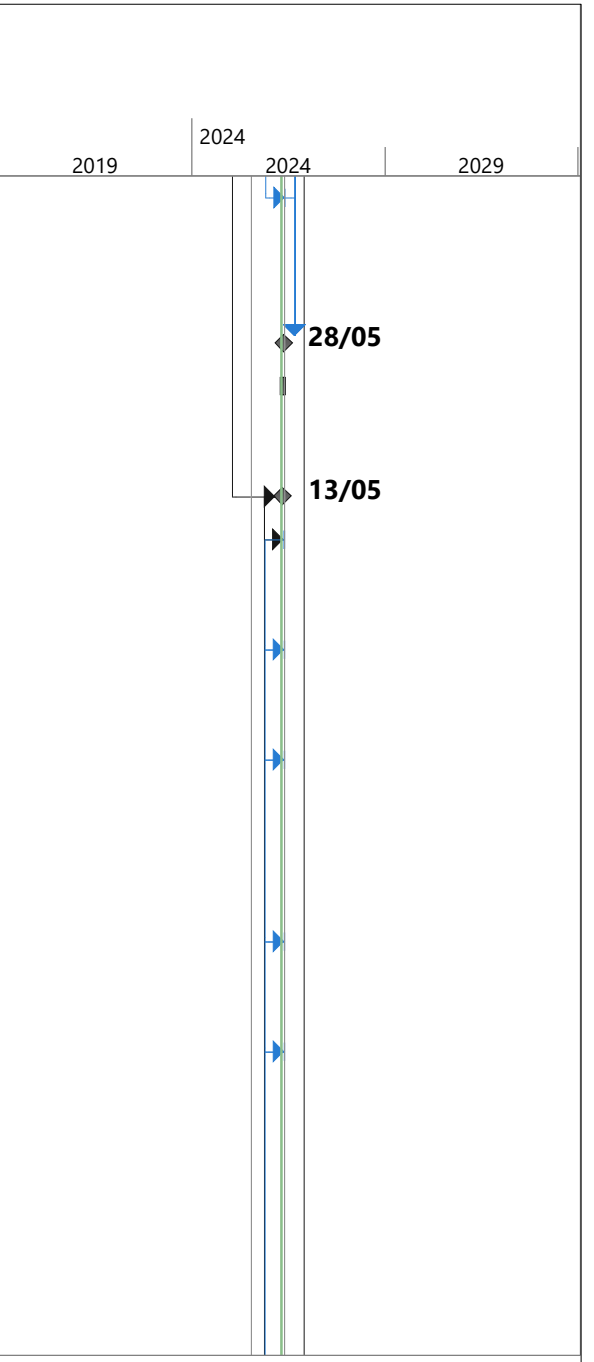


Id	Modo de tar	Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% compl	Costo
829		8..	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ACOMETIDA 3F5H CU THHN/THWN EN CABLE 3X2AWG + 2AWG (N) + DESNUDO 4 AWG. NO INCLUYE CONDULINADO.	3 días	vie 22/05/26	lun 25/05/26	0%	$ 0,00
830		8..	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ACOMETIDA 2F4H CU THHN/THWN EN CABLE 2X2AWG + 2AWG (N) + DESNUDO 4 AWG (T). NO INCLUYE CONDULINADO.	3 días	vie 22/05/26	lun 25/05/26	0%	$ 0,00
831		8..	SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE METALICO PARA 6 MEDIDORES RESIDENCIALES CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR I HASTA 100A, BARRAJES N Y T.	3 días	vie 22/05/26	lun 25/05/26	0%	$ 0,00
832		8..	SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE METALICO PARA 10 MEDIDORES RESIDENCIALES CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR I HASTA 100A, BARRAJES N Y T.	3 días	vie 22/05/26	lun 25/05/26	0%	$ 0,00
833		8..	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION KIT DE PUESTA A TIERRA. INCLUYE VARILLA 5/8" X	3 días	vie 22/05/26	lun 25/05/26	0%	$ 0,00
834		8..	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMINALES PREMOLDEADAS PARA	3 días	vie 22/05/26	lun 25/05/26	0%	$ 0,00

Id	Mo de tar	Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% compl	Costo
835		8..	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE DESCARGADORES DE SOBRETENSION (PARARRAYOS) ZNO 10KV / 10KA (JUEGO DE TRES UNIDADES)	3 días	vie 22/05/26	lun 25/05/26	0%	$ 0,00
836		8..	TRASLADO DE ESTRUCTURA EN MEDIA TENSION INCLUYE DESMONTE E INSTALACION DE TRANSFORMADOR, ESTRUCTURA DE SECCIONAMIENTO, Y SISTEMA DE PUESTA A	3 días	vie 22/05/26	lun 25/05/26	0%	$ 0,00
837		8..	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CORTACIRCUITOS 15KV / 100A (JUEGO DE TRES	3 días	vie 22/05/26	lun 25/05/26	0%	$ 0,00
838		8..	LINEA VIVA EN RED DE MEDIA TENSIÓN 13200V	3 días	vie 22/05/26	lun 25/05/26	0%	$ 0,00
839		8..	CERTIFICACIÓN RETIE DE LA INSTALACIÓN	3 días	vie 22/05/26	lun 25/05/26	0%	$ 0,00
840		8..	FIN	0 días	lun 25/05/26	lun 25/05/26	0%	$ 0,00
841		**8..**	**MOVIMIENTO DE POSTE ELECTRICO CALLE 48**	**15 días**	**jue 14/05/26**	**sáb 30/05/26**	**0%**	**$ 197.271.923,00**

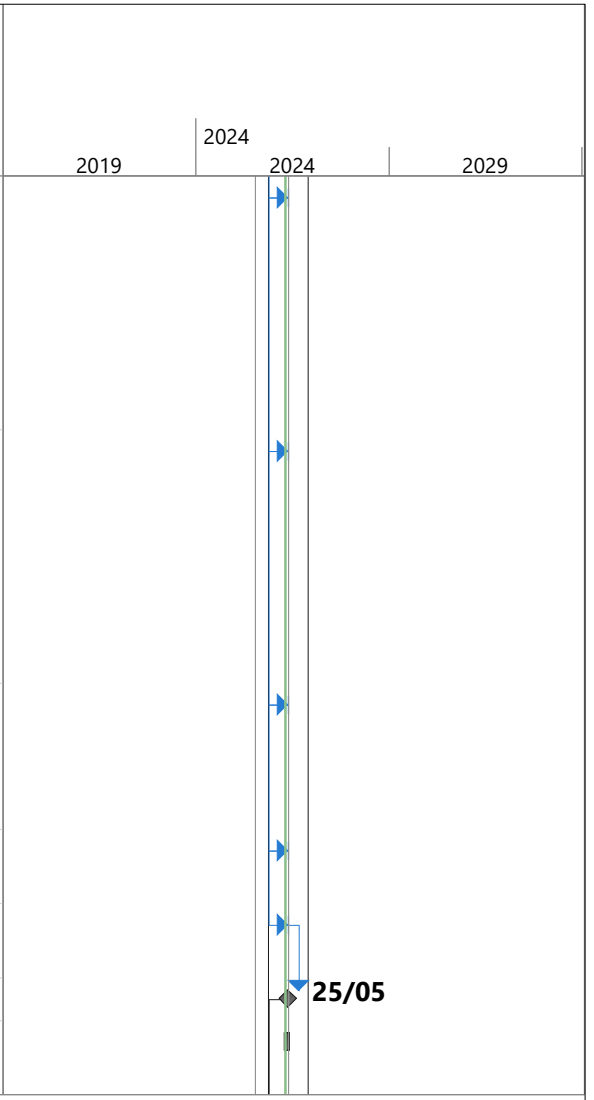

Id	Mo de tar	Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% compl	Costo
842		8..	Retiro de poste y estructura.Retiro de 221 metros lineales de cable #2 ACSR Cambio de armados de suspensión a retención. Hincado de poste de 16 mt Montaje de transformador trifásico de 30 KVA con sus respetivos bajantes Montaje de 830 metros de cable #2	2 días	sáb 23/05/26	lun 25/05/26	0%	$ 0,00
843		8..	SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA BAJA TENSIÓN EN (2) PORYECTOS CALLE 48 Y CRA 37 CORRESPONDIENTEMENTE, PARA LA ALIMENTACIÓN PRINICIPAL DESDE TRANSFORMADOR HASTA GABIENTES DE MEDIDORES Y ACOMETIDAS A TABLEROS INDIVIDUALES, INCLUYE: (ACOMET	15 días	jue 14/05/26	sáb 30/05/26	0%	$ 197.271.923,00
844		**8..**	**CERRAMIENTO PERIMETRAL**	**5 días**	**sáb 23/05/26**	**jue 28/05/26**	**0%**	**$ 198.287.517,00**
845		8..	Suministro, transporte e instalación de cerramiento en tubería galvanizada para cerramiento ø 2", muro en concreto a la vista e= 0,12m h= 0,4m con mortero de revoque impermeabilizado, malla eslabonada ca. 10 ojo 2-1/4"x2-1/4", viga en concreto reforzado	2 días	sáb 23/05/26	lun 25/05/26	0%	$ 0,00

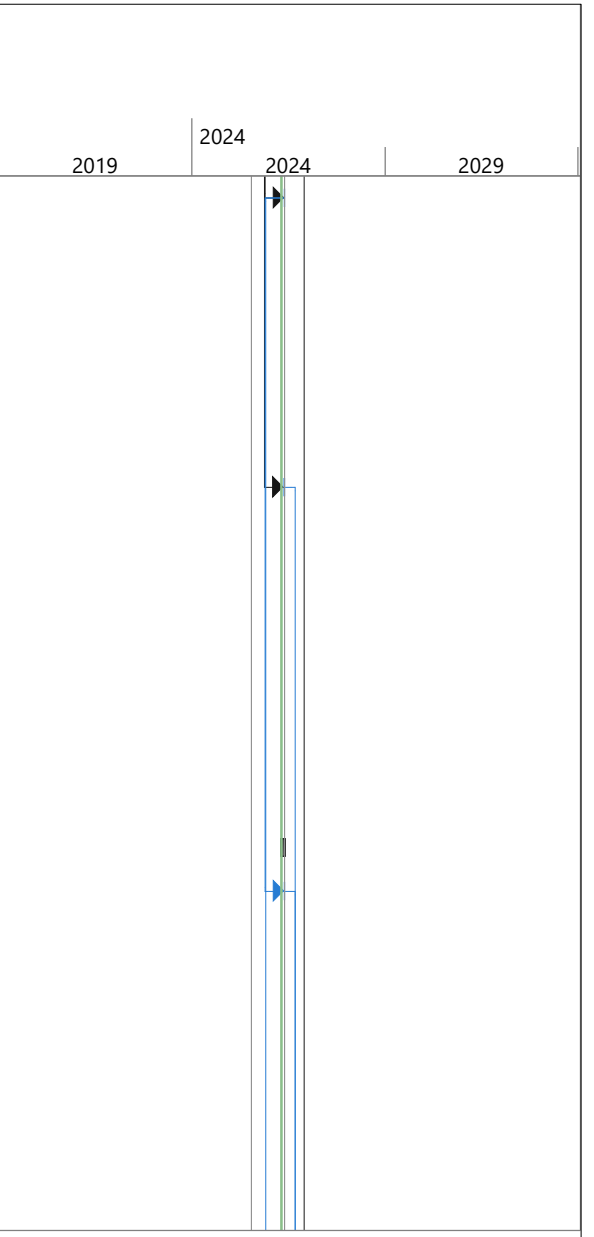

Id	Mo de tar	Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% compl	Costo
846		8..	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CERRAMIENTO PERIMETRAL CONFORMADA POR VARILLAS LISAS 5/8 (SEGÚN DISEÑO) SOLDADAS A DOS TUBOS CUADRADOS 1 x 1 , ANCLADA POR MEDIO DE TUBERIA RECTANGULAR 3 x 1 1/2 , PINTURA COLOR NEGRO SEGÚN DISEÑO (Incluye base	2 días	mié 27/05/26	jue 28/05/26	0%	$ 198.287.517,00
847		8..	FIN	0 días	sáb 30/05/26	sáb 30/05/26	0%	$ 0,00

