

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
1		**PROYECTO:**	**224 días?**	**mié 11/06/25**	**vie 7/08/26**	**$ 16.479.905.103,00**
2		**TRAMO 1 CALLE 1 ENTRE LA CRA 2 Y LA VIA MONTERIA-CERETÉ**	**140 días**	**mié 11/06/25**	**lun 15/12/25**	**$ 2.869.147.655,00**
3		**ACTIVIDADES PRELIMINARES**	**115 días**	**mié 11/06/25**	**mié 12/11/25**	**$ 283.627.170,00**
4		DEMOLICIÓN DE BORDILLOS DE CONCRETO	60 días	mié 11/06/25	lun 1/09/25	$ 9.835.568,00
5		CORTE DE PISO EN TABLON Y PLANTILLA DE CONCRETO E= 0.10MTS/0.15MTS CON CORTADORA	20 días	mié 11/06/25	mié 9/07/25	$ 0,00
6		DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO	55 días	mié 11/06/25	lun 25/08/25	$ 30.168.978,00
7		DEMOLICION DE ESTRUCTURAS	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
8		DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO	65 días	mié 11/06/25	sáb 6/09/25	$ 15.375.117,00
9		EXCAVACIONES MECÁNICAS CON EXCAVADORA PARA FALLOS EN SUB RASANTE. PROFUNDIDAD > 50 CM. NO INCLUYE RETIRO	45 días	mié 25/06/25	lun 25/08/25	$ 10.962.946,00
10		EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	35 días	mié 11/06/25	lun 28/07/25	$ 46.389.240,00
11		CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	80 días	lun 28/07/25	mié 12/11/25	$ 162.363.227,00
12		REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURA MENOR O IGUAL H= 5 M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAIZ)	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
13		REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURA ENTRE H= 5.1M A 10M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAIZ)	10 días	mar 15/07/25	lun 28/07/25	$ 640.683,00
14		REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURAS ENTRE H= 10.1M A 15 M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAÍZ)	10 días	lun 28/07/25	lun 11/08/25	$ 2.860.731,00
15		PODA DE FORMACIÓN ÁRBOLES ALTURA MENOR O IGUAL H= 5 M (INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS)	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
16		SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ARBOLES DE ESPECIES NATIVAS DE 1.5 M DE ALTURA, INCLUYE EXCAVACION, ABONO ORGANICO, TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO	10 días	lun 11/08/25	lun 25/08/25	$ 5.030.680,00
17		**SUBRASANTE Y SUBBASE**	**77 días**	**mar 17/06/25**	**lun 29/09/25**	**$ 707.406.118,00**
18		MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON MATERIAL SELECCIONADO	70 días	mar 17/06/25	vie 19/09/25	$ 245.105.122,00
19		MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJÓN O SIMILAR)	70 días	mié 25/06/25	jue 25/09/25	$ 95.237.208,00
20		SUBBASE GRANULAR CLASE C	70 días	vie 27/06/25	lun 29/09/25	$ 291.028.355,00
21		GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	70 días	vie 27/06/25	lun 29/09/25	$ 76.035.433,00
22		**PAVIMENTO Y BORDILLOS**	**95 días**	**mié 11/06/25**	**jue 16/10/25**	**$ 1.612.403.797,00**
23		PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO MR (40 Kg/cm2)	65 días	mié 9/07/25	jue 2/10/25	$ 1.387.789.641,00
24		ADECUACIÓN DE CÁMARAS DE INSPECCIÓN (MANHOLES) EN CONCRETO DE 3000 PSI	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
25		BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	45 días	mar 19/08/25	jue 16/10/25	$ 189.085.660,00
26		ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa	20 días	sáb 6/09/25	jue 2/10/25	$ 35.528.496,00
27		**SEÑALIZACION**	**123 días**	**mié 11/06/25**	**vie 21/11/25**	**$ 35.017.676,00**
28		SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON LAMINA RETROREFLECTIVA DE 60CM X 60CM	10 días	lun 20/10/25	sáb 1/11/25	$ 7.051.656,00
29		SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON DOBLE LAMINA RETROREFLECTIVA DE 60CM X 60CM	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
30		DEMARCACION HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRILICA BASE SOLVENTE - M2. (INCLUYE IMPRIMANTE, SUMINISTRO, APLICACIÓN CON EQUIPO Y MICROESFERAS)	10 días	lun 20/10/25	sáb 1/11/25	$ 2.824.837,00

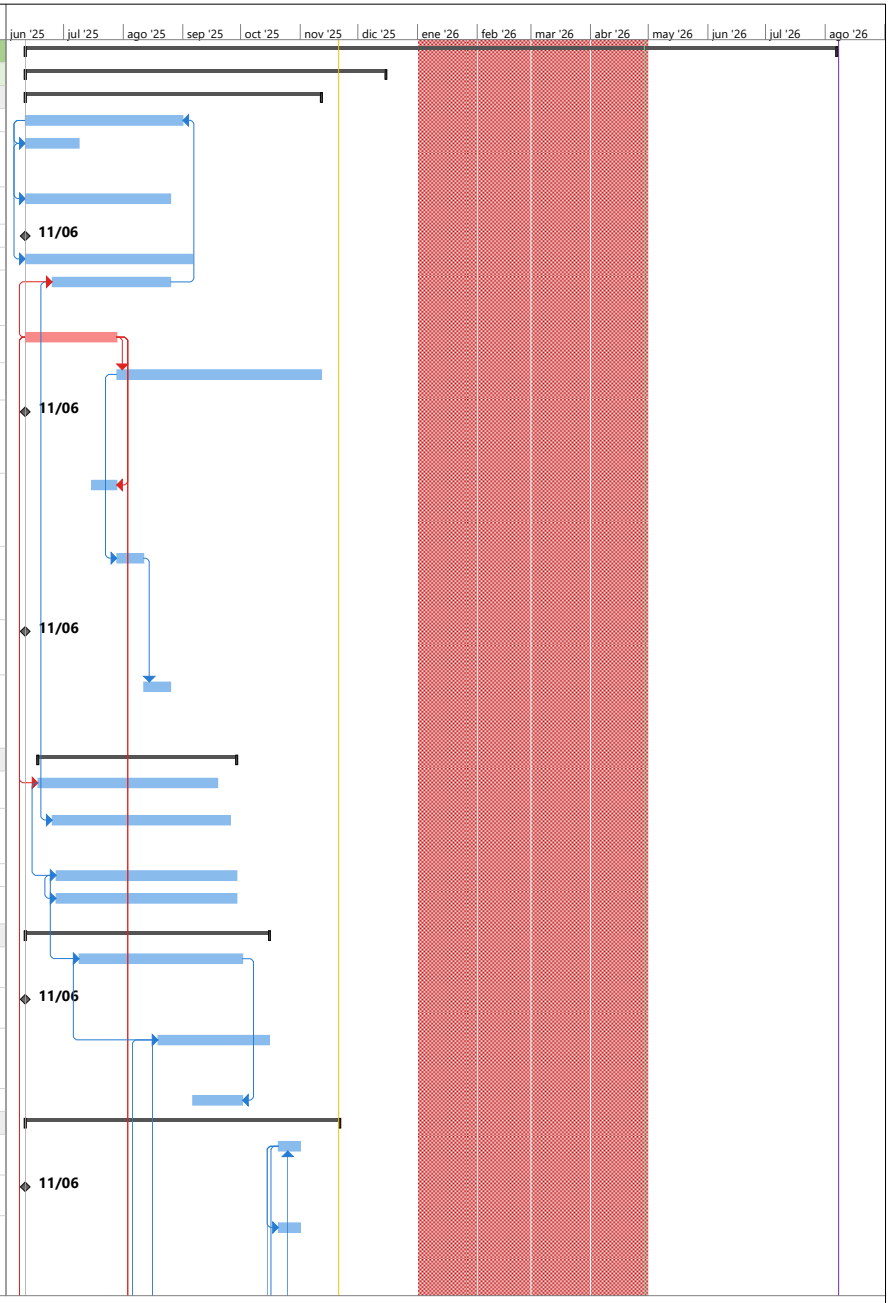

Proyecto: Project V1_ING LUIS
Fecha: mié 29/04/26

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
31		DEMARCACION HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRILICA BASE SOLVENTE - M (12 CM). (INCLUYE IMPRIMANTE, SUMINISTRO, APLICACIÓN CON EQUIPO Y MICROESFERAS)	25 días	lun 20/10/25	vie 21/11/25	$ 20.068.560,00
32		REDUCTORES DE VELOCIDAD TIPO RESALTO PLÁSTICO PERNADO	10 días	mié 22/10/25	mié 5/11/25	$ 5.072.623,00
33		**ESPACIO PUBLICO ANDENES Y MOBILIARIOS**	**120 días**	**mié 11/06/25**	**mar 18/11/25**	**$ 161.659.547,00**
34		S/I TABLETA GUÍA PREF. TÁCTIL PARA DISCAP. EN CONCRETO DE 0.20m X 0.20m X 0.06m COLOR AMARILLO TIPO TOPEROL (UNA HILERA) CON MORTERO 1:4, INCLUYE ARENA H.=0.04 m, RELLENO CON MATERIAL COMPACTADO SELECCIONADO DE 0.20m Y JUNTAS SELLADAS	45 días	lun 25/08/25	mié 22/10/25	$ 42.194.724,00
35		FRANJA DEMARCADORA PARA LIMITADOS VISUALES CON ADOQUÍN EN CONCRETO DE 20cm X 10cm X 6cm COLOR AMARILLO PARA EMBEBER EN MORTERO, APAREJADO SEGÚN DISEÑO. INCLUYE MORTERO 1:4, ARENA H.=4 CM, INSTALACIÓN, COMPACTACIÓN, JUNTAS SELLADAS CON ARENA	45 días	lun 25/08/25	mié 22/10/25	$ 36.667.953,00
36		CONSTRUCCIÓN PISO EN CONCRETO ESTAMPADO TIPO RONDA, 21 MPA (3.000 PSI). E=0,08M FUNDIDO EN SITIO, JUNTAS SEGÚN DISEÑO. INCLUYE EXCAVACIÓN, MATERIAL SELECCIONADO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.	55 días	lun 11/08/25	mié 22/10/25	$ 77.415.071,00
37		RAMPA PEATONAL INCLUYE BORDILLOS DE CAMBIO DE NIVEL, SARDINEL, ADOQUÍN TÁCTIL TIPO ALERTA Y PLANTILLA EN CONCRETO	10 días	mié 22/10/25	mié 5/11/25	$ 3.204.855,00
38		RAMPA PARA USO VEHICULAR DE 4.20M X 1.20M, INCLUYE BORDILLO DE CONCRETO DE CAMBIO DE NIVEL, LOSETA TOPEROL, ADOQUIN EN CONCRETO DE 20CM X 10CM X 6CM COLOR AMARILLO, PLACA ENCONCRETO 0.15MTS DE ESPESOR, EXCAVACIONMANUAL, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
39		S/I BOLARDOS ALTO EN HIERRO TIPO M63 - IDU EMPOTRADOS EN CONCRETO; INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	10 días	mié 5/11/25	mar 18/11/25	$ 2.176.944,00
40		**OTRAS ACTIVIDADES**	**35 días**	**mié 11/06/25**	**lun 28/07/25**	**$ 107.745,00**
41		S/I TUBERÍA PARA PROLONGACIÓN DE DRENAJES DE AGUAS LLUVIA EN 4". INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO	2 días	vie 25/07/25	lun 28/07/25	$ 0,00
42		REPARACIÓN DE DOMICILIARIAS DEL ACUEDUCTO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	4 días	mié 23/07/25	lun 28/07/25	$ 107.745,00
43		REUBICACIÓN TÍPICA MEDIDORES DE GAS RED DOMICILIARIA.	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
44		**BOX CULVERT**	**0 días**	**mié 11/06/25**	**mié 11/06/25**	**$ 0,00**
45		EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN BAJO AGUA	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
46		GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
47		CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
48		RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
49		MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJON O SIMILAR)	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
50		CONCRETO RESISTENCIA 28 MPA CLASE C (PARA ESTRUCTURA)	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00

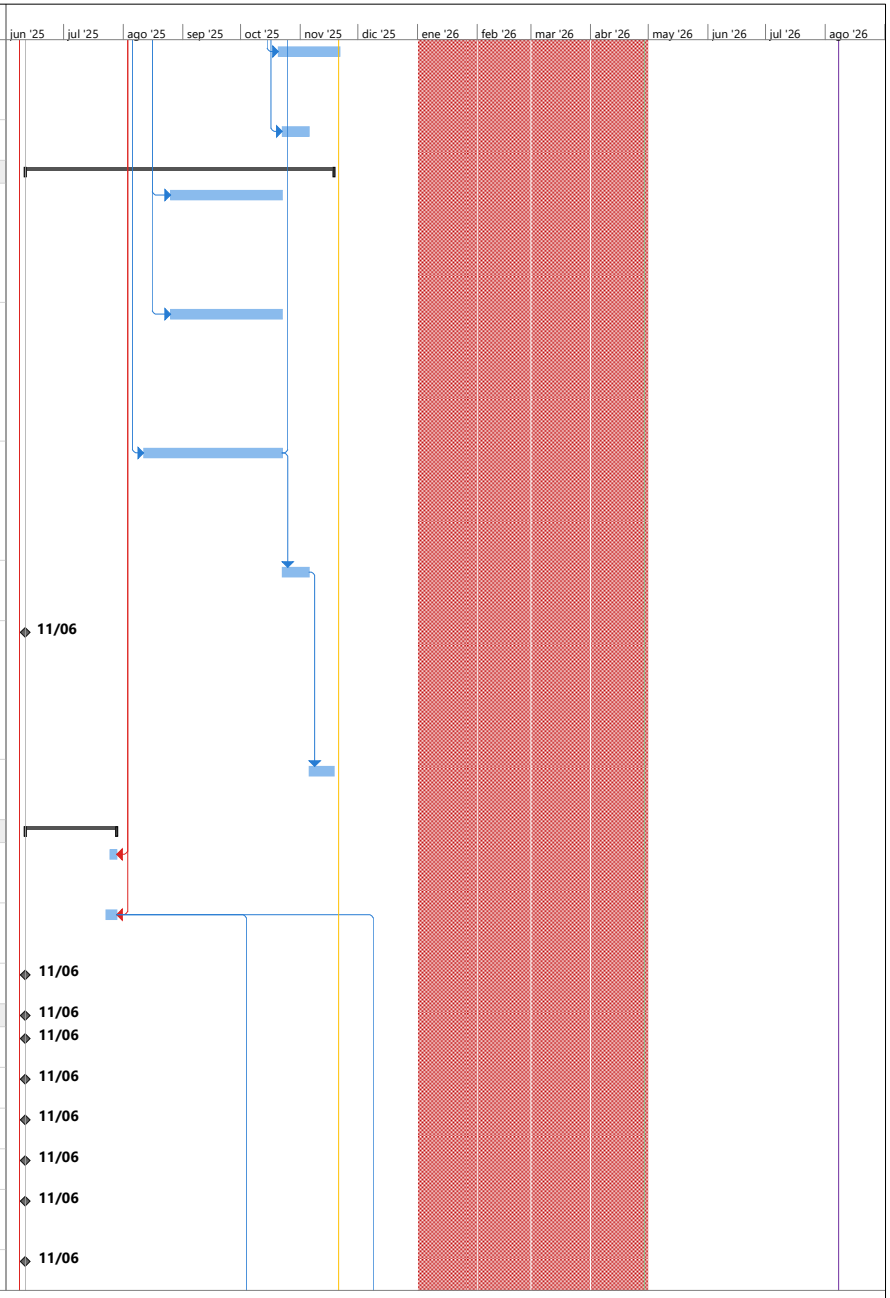

Proyecto: Project V1_ING LUIS
Fecha: mié 29/04/26

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
51		ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
52		BARANDA METÁLICA PARA TRÁFICO VEHICULAR	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
53		MANEJO DE CAUCE DE AGUA	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
54		JUNTA PARA MURO EN CINTA PVC	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
55		CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA CLASE F (SOLADO)	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
56		**CUNETAS Y SUMIDEROS**	**0 días**	**mié 11/06/25**	**mié 11/06/25**	**$ 0,00**
57		EXCAVACION MANUAL	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
58		CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
59		GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
60		RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
61		ACERO DE REFUERZO FY = 420 MPA	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
62		CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
63		SUMIDERO TIPO VENTANA EN CONCRETO	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
64		**RED DE MEDIA TENSION (13.200) VOL.**	**0 días**	**mié 11/06/25**	**mié 11/06/25**	**$ 0,00**
65		SUMINISTRO, INSTALACION E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS - 750 KGF).	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
66		SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE CIMENTACION CILINDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS - 750 KGF).	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
67		SUMINISTRO, INSTALACION E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS - 1050 KGF).	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
68		SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE CIMENTACION CILINDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS - 1050 KGF).	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
69		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ALINEACION CON DISPOSICIÓN EN BANDERA BIFASICO A 13.2 KV., E INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
70		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ANGULO CON DISPOSICIÓN EN BANDERA A 13.2 KV., E INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
71		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN FIN DE LINEA COMPACTA CON DISPOSICIÓN CENTRAL BIFASICO A 13.2 KV., E INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
72		SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA MT BIFASICA AEREA EN CABLE DESNUDO DE ALUMINIO ACSR - No. 1/0 AWG.	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
73		SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA MT BIFASICA AEREA EN CABLE AISLADO DE ALUMINIO ECOLOGICO - No. 1/0 AWG.	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
74		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA RETENIDA MT EN POSTE DE 12m A POSTE DE 9m	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
75		INSTALACION EN CALIENTE DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA SECCIONADOR BIFASICO A 13.2 KV.	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
76		INSTALACION CON TENSION DE ARMADO PARA ESTRUCTURA DE MT BIFASICO A 13.2 KV.	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00

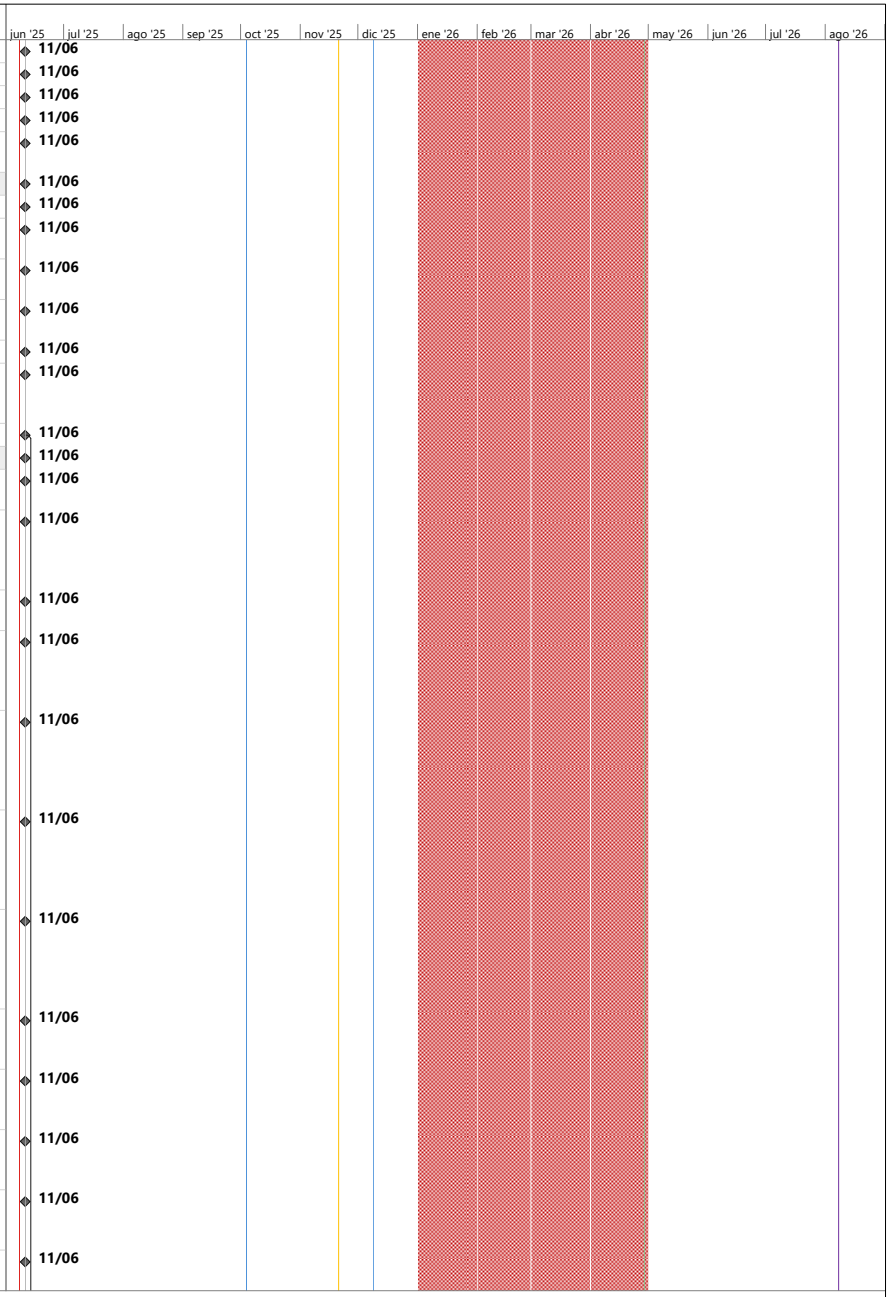

Proyecto: Project V1_ING LUIS
Fecha: mié 29/04/26

Tarea | Resumen del proyecto | Tarea manual | solo el comienzo | Fecha límite | Progreso manual
División | Tarea inactiva | solo duración | solo fin | Tareas críticas
Hito | Hito inactivo | Informe de resumen manual | Tareas externas | División crítica
Resumen | Resumen inactivo | Resumen manual | Hito externo | Progreso


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
77		INSTALACION CON TENSION A 13.2 KV. DE POSTE EN CONCRETO	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
78		**RED DE BAJA TENSION (240/120) VOL.**	**139 días**	**mié 11/06/25**	**sáb 13/12/25**	**$ 14.250.335,00**
79		INSTALACION E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 1050 KGF).	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
80		SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE CIMENTACION CILINDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 1050 KGF).	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
81		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ALINEACION - ANGULO - FINAL DE CIRCUITO PARA BT A 240/120 VOL.	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
82		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ANCLAJE PARA BT A 240/120 VOL.	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
83		SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA BT BIFASICA AEREA EN CABLE TRIPLEX DE ALUMINIO - No. 2 AWG.	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
84		SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA BT BIFASICA AEREA EN CABLE TRIPLEX DE ALUMINIO - No. 1/0 AWG.	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
85		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA RETENIDA A TIERRA EN POSTE DE 9 MTS.	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
86		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA PUESTA A TIERRA DE RED TRENSADA DE BT A 120/240 VOL., EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
87		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA CAJA DE CONEXIÓN (4 USUARIOS) A RED TRENSADA DE BT A 120/240 VOL.	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
88		DESINSTALACION DE POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 1050 750-510 KGF).	4 días	mar 9/12/25	sáb 13/12/25	$ 14.250.335,00
89		DESMONTE, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA RED DE TELECOMUNICACIONES	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
90		**SUBESTACIONES ELECTRICAS (13.200/240/120) VOL.**	**0 días**	**mié 11/06/25**	**mié 11/06/25**	**$ 0,00**
91		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ADECUACION DE SUBESTACION BIFASICA EN POSTE A (13.200/240/120) VOL.,INCLUYE: INSTALACION PUENTES DE SECCIONADOR, ESTRUCTURA DE PROTECCIONES, SECCIONADOR, DPS, DESMONTE Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR.	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
92		**ALUMBRADO PUBLICO, ALIMENTADORES Y MEDIDAS DE BAJA TENSION (240/120) VOL.**	**0 días**	**mié 11/06/25**	**mié 11/06/25**	**$ 0,00**
93		SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE CABLE CONCENTRICO DE ALUMINIO - (2xNo. 6 + 1xNo. 6) AWG.	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
94		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA REUBICACION DE MEDIDOR (240/120) VOL.	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
95		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA REINSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO.	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
96		**ITEM NO PREVISTO**	**112 días**	**mié 11/06/25**	**vie 7/11/25**	**$ 34.634.597,00**
97		CONEXION ACOMETIDAS DOMICILIARIA PVC NUEVA 8" X 6", (INCULYE ACCESORIOS, TUBERIA PVC LPROMEDIO= 10M)	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00

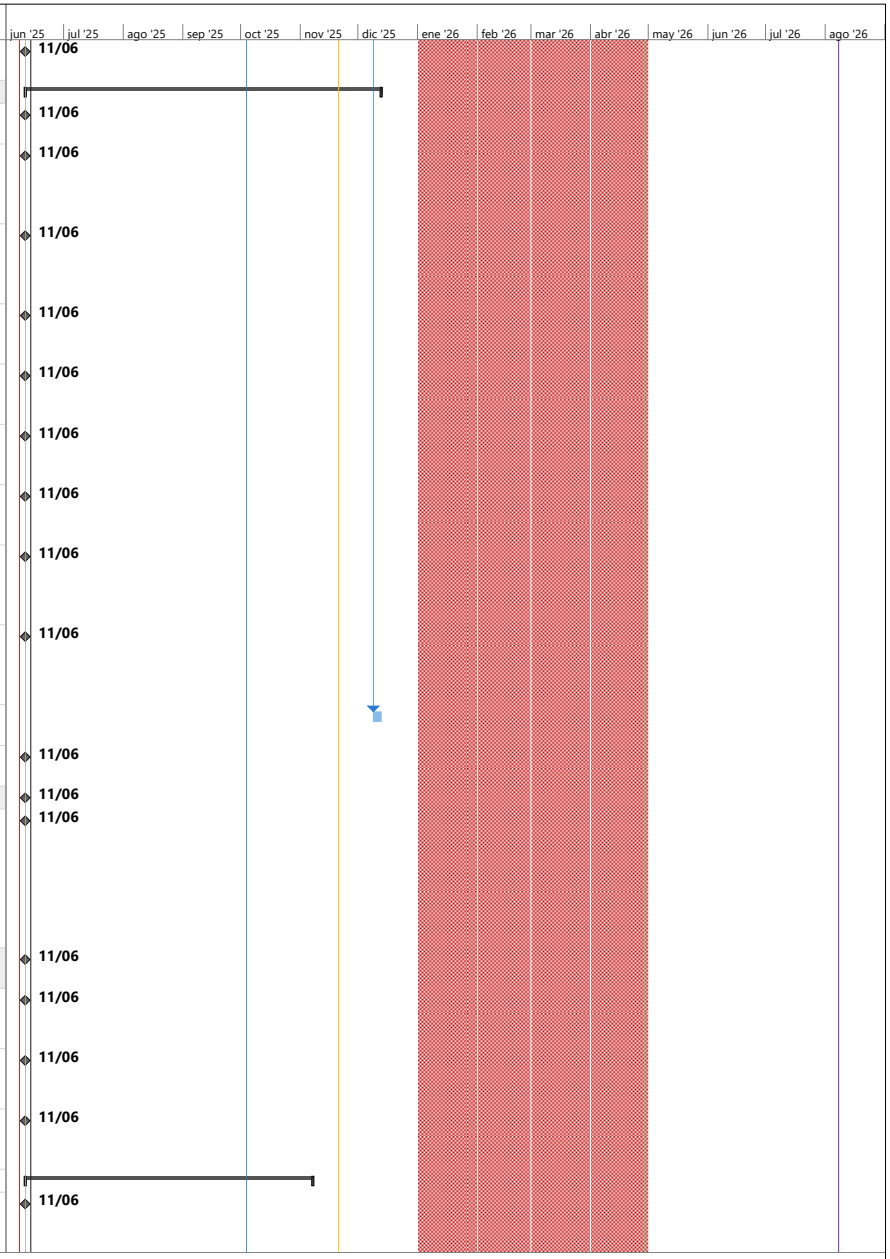

Proyecto: Project V1_ING LUIS
Fecha: mié 29/04/26

Tarea	Resumen del proyecto	Tarea manual	solo el comienzo	Fecha límite	Progreso manual
División	Tarea inactiva	solo duración	solo fin	Tareas críticas	
Hito	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Tareas externas	División crítica	
Resumen	Resumen inactivo	Resumen manual	Hito externo	Progreso	


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
98		REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES Y ARBUSTOS CON DAP MENOR O IGUAL A 10 CM INCLUYE TRANSPORTE RESIDUOS)	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
99		CONFORMACIÓN DE TERRAPLÉN CON MATERIAL DE PRÉSTAMO	25 días	sáb 4/10/25	vie 7/11/25	$ 14.593.729,00
100		RAMPA PARA USO VEHICULAR, INCLUYE BORDILLO DE CONCRETO DE CAMBIO DE NIVEL, LOSETA TOPEROL, ADOQUIN EN CONCRETO DE 20CM X 10CM X 6CM COLOR AMARILLO,	25 días	sáb 4/10/25	vie 7/11/25	$ 2.722.018,00
101		CONCRETO DE 3000 PSI PARA BORDILLO H:1.0M * 0,20 M, FUNDIDO IN SITU REFORZADO	25 días	jue 2/10/25	mié 5/11/25	$ 17.318.850,00
102		REUBICACION TUBERIA SANITARIA 6".	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
103		**ITEM NO PREVISTO 2**	**140 días**	**mié 11/06/25**	**lun 15/12/25**	**$ 20.040.670,00**
104		CONCRETO DE 3000 PSI PARA BORDILLO H: VARIABLE * 0,20 M, FUNDIDO IN SITU REFORZADO	15 días	mié 5/11/25	mar 25/11/25	$ 4.019.809,00
105		CONSTRUCCIÓN PISO EN CONCRETO ESTAMPADO TIPO RONDA, 21 MPA (3.000 PSI). E=0,08M FUNDIDO EN SITIO, JUNTAS SEGÚN DISEÑO.	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
106		CONSTRUCCIÓN DE PISO EN CONCRETO 21 MPA (3.000 PSI) E=0,08M FUNDIDO EN SITIO, JUNTAS SEGÚN DISEÑO. INCLUYE RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.	5 días	mié 12/11/25	mar 18/11/25	$ 2.280.640,00
107		CONCRETO DE 3000 PSI PARA BORDILLO H: 20 CM FUNDIDO IN SITU ESPESOR=20 CM	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
108		S/I TABLETA GUÍA PREF. TÁCTIL PARA DISCAP. EN CONCRETO DE 0.20m X 0.20m X 0.06m COLOR AMARILLO TIPO TOPEROL (UNA HILERA) CON MORTERO 1:4, INCLUYE ARENA H.=0.04 m, JUNTAS SELLADAS	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
109		RAMPA PARA USO VEHICULAR SOBRE CUNETA, INCLUYE BORDILLO DE CONCRETO DE CAMBIO DE NIVEL, LOSETA TOPEROL, ADOQUIN EN CONCRETO DE 20CM X 10CM X 6CM COLOR AMARILLO, PLACA 0,15MTS DE ESPESOR. INCLUYE ACERO DE REFUERZO	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
110		EXCAVACIONES MECÁNICAS CON EXCAVADORA PROFUNDIDAD <2M NO INCLUYE RETIRO	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
111		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO PVC 8	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
112		CONCRETO RESISTENCIA 21 MPA PARA CONSTRUCCION DE MH	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
113		REUBICACION DE CAJA DE REGISTRO DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC DE 6	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
114		REUBICACION DE REGISTRO DE AGUA POTABLE	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
115		TAPAS DE INSPECCION CUNETAS	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
116		SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS METÁLICAS TIPO PANAL (TRAFICO PESADO) PARA CARCAMOS	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
117		INSTALACION E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS - 1050 KGF).	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
118		SUMINISTRO, INSTALACION E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 1050 KGF).	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
119		CONCRETO DE 3000 PSI FUNDIDO IN SITU PARA DESCOLES	15 días	mar 25/11/25	lun 15/12/25	$ 13.740.221,00
120		**FIN TRAMO 1**	**0 días**	**mié 11/06/25**	**mié 11/06/25**	**$ 0,00**
121		**TRAMO 2 CRA 6 ENTRE CALLES 97 Y 101**	**223 días**	**mié 11/06/25**	**jue 6/08/26**	**$ 2.117.045.221,37**
122		**ACTIVIDADES PRELIMINARES**	**175 días**	**mié 11/06/25**	**vie 5/06/26**	**$ 172.277.438,37**
123		DEMOLICIÓN DE BORDILLOS DE CONCRETO	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
124		CORTE DE PISO EN TABLON Y PLANTILLA DE CONCRETO E= 0.10MTS/0.15MTS CON CORTADORA	5 días	mar 9/12/25	lun 15/12/25	$ 10.357.965,00
125		DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO	40 días	mié 5/11/25	mar 5/05/26	$ 3.858.758,00
126		DEMOLICION DE ESTRUCTURAS	40 días	mié 5/11/25	mar 5/05/26	$ 4.214.027,00

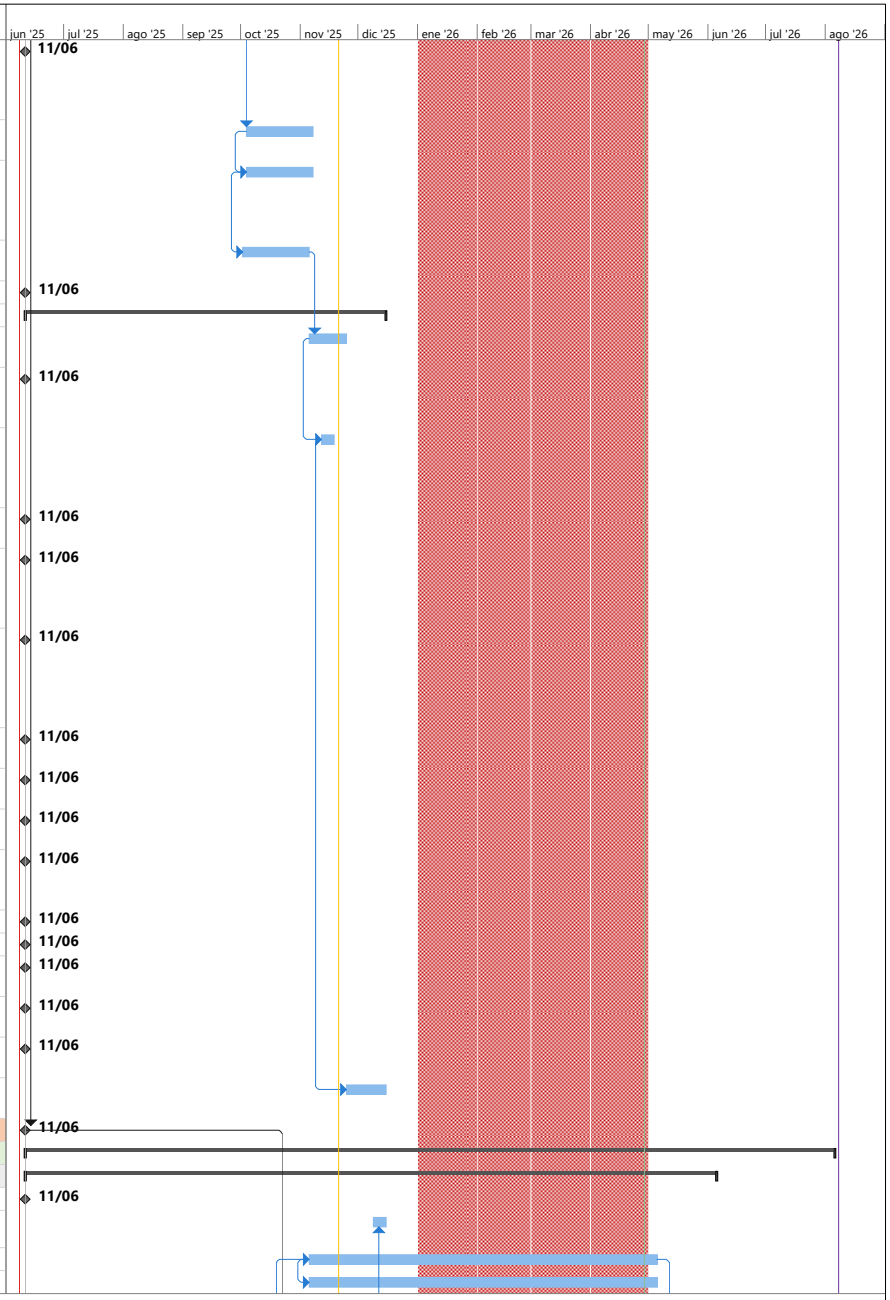

Proyecto: Project V1_ING LUIS
Fecha: mié 29/04/26

Tarea	Resumen del proyecto	Tarea manual	solo el comienzo	Fecha límite	Progreso manual
División	Tarea inactiva	solo duración	solo fin	Tareas críticas	
Hito	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Tareas externas	División crítica	
Resumen	Resumen inactivo	Resumen manual	Hito externo	Progreso	


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
127		DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 2.079.734,37
128		EXCAVACIONES MECÁNICAS CON EXCAVADORA PARA FALLOS EN SUB RASANTE. PROFUNDIDAD > 50 CM. NO INCLUYE RETIRO	30 días	mié 5/11/25	lun 15/12/25	$ 2.278.096,00
129		EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	35 días	mié 22/10/25	mar 9/12/25	$ 18.237.476,00
130		CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	20 días	jue 13/11/25	mié 10/12/25	$ 60.651.357,00
131		REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURA MENOR O IGUAL H= 5 M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAIZ)	4 días	mié 10/12/25	lun 15/12/25	$ 2.947.392,00
132		REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURA ENTRE H= 5.1M A 10M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAIZ)	15 días	lun 15/12/25	mar 12/05/26	$ 19.861.173,00
133		REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURAS ENTRE H= 10.1M A 15 M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAÍZ)	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
134		PODA DE FORMACIÓN ÁRBOLES ALTURA MENOR O IGUAL H= 5 M (INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS)	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
135		SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ARBOLES DE ESPECIES NATIVAS DE 1.5 M DE ALTURA, INCLUYE EXCAVACION, ABONO ORGANICO, TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO	20 días	mar 12/05/26	vie 5/06/26	$ 47.791.460,00
136		**SUBRASANTE Y SUBBASE**	**42 días**	**mar 9/12/25**	**mar 9/06/26**	**$ 245.074.895,00**
137		MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON MATERIAL SELECCIONADO	40 días	mar 9/12/25	vie 5/06/26	$ 89.618.675,00
138		MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJÓN O SIMILAR)	35 días	lun 15/12/25	vie 5/06/26	$ 19.797.840,00
139		SUBBASE GRANULAR CLASE C	40 días	jue 11/12/25	mar 9/06/26	$ 107.162.653,00
140		GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	40 días	jue 11/12/25	mar 9/06/26	$ 28.495.727,00
141		**PAVIMENTO Y BORDILLOS**	**60 días**	**jue 11/12/25**	**vie 3/07/26**	**$ 614.150.844,00**
142		PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO MR (40 Kg/cm2)	40 días	jue 11/12/25	mar 9/06/26	$ 483.837.108,00
143		ADECUACIÓN DE CÁMARAS DE INSPECCIÓN (MANHOLES) EN CONCRETO DE 3000 PSI	5 días	mar 9/06/26	lun 15/06/26	$ 2.164.940,00
144		BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	40 días	jue 18/12/25	mar 16/06/26	$ 70.739.824,00
145		ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa	20 días	mar 9/06/26	vie 3/07/26	$ 57.408.972,00
146		**SEÑALIZACION**	**208 días**	**mié 11/06/25**	**vie 17/07/26**	**$ 25.996.684,00**
147		SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON LAMINA RETROREFLECTIVA DE 60CM X 60CM	15 días	vie 8/05/26	jue 28/05/26	$ 5.876.380,00
148		SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON DOBLE LAMINA RETROREFLECTIVA DE 60CM X 60CM	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
149		DEMARCACION HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRILICA BASE SOLVENTE - M2. (INCLUYE IMPRIMANTE, SUMINISTRO, APLICACIÓN CON EQUIPO Y MICROESFERAS)	15 días	jue 28/05/26	mar 16/06/26	$ 8.619.623,00
150		DEMARCACION HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRILICA BASE SOLVENTE - M (12 CM). (INCLUYE IMPRIMANTE, SUMINISTRO, APLICACIÓN CON EQUIPO Y MICROESFERAS)	15 días	mar 16/06/26	lun 6/07/26	$ 9.232.066,00
151		REDUCTORES DE VELOCIDAD TIPO RESALTO PLÁSTICO PERNADO	10 días	lun 6/07/26	vie 17/07/26	$ 2.268.615,00
152		**ESPACIO PUBLICO ANDENES Y MOBILIARIOS**	**220 días**	**mié 11/06/25**	**lun 3/08/26**	**$ 52.793.745,00**
153		S/I TABLETA GUÍA PREF. TÁCTIL PARA DISCAP. EN CONCRETO DE 0.20m X 0.20m X 0.06m COLOR AMARILLO TIPO TOPEROL (UNA HILERA) CON MORTERO 1:4, INCLUYE ARENA H.=0.04 m, RELLENO CON MATERIAL COMPACTADO SELECCIONADO DE 0.20m Y JUNTAS SELLADAS	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
154		FRANJA DEMARCADORA PARA LIMITADOS VISUALES CON ADOQUÍN EN CONCRETO DE 20cm X 10cm X 6cm COLOR AMARILLO PARA EMBEBER EN MORTERO, APAREJADO SEGÚN DISEÑO. INCLUYE MORTERO 1:4, ARENA H.=4 CM, INSTALACIÓN, COMPACTACIÓN, JUNTAS SELLADAS CON ARENA	35 días	jue 18/06/26	lun 3/08/26	$ 28.545.369,00

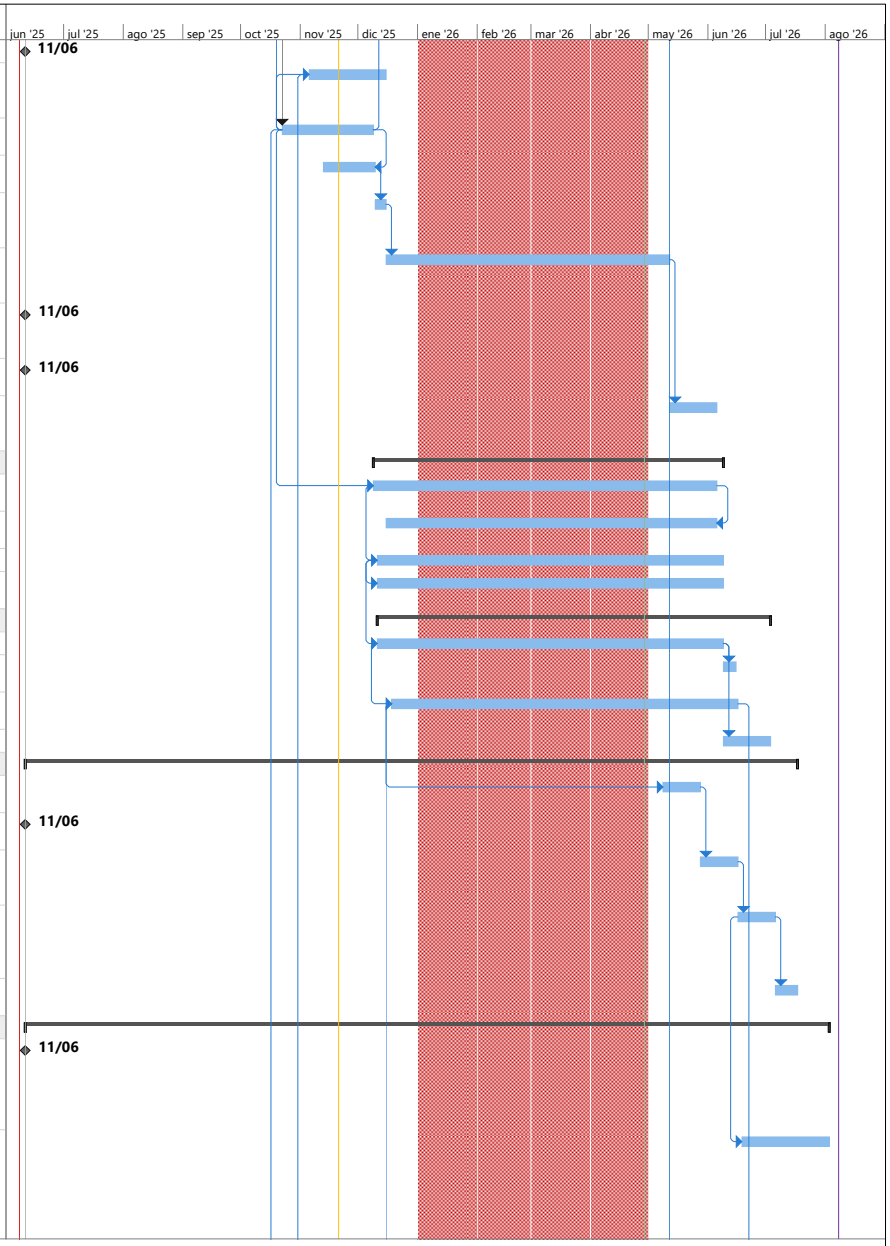

Proyecto: Project V1_ING LUIS
Fecha: mié 29/04/26

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
155		CONSTRUCCIÓN PISO EN CONCRETO ESTAMPADO TIPO RONDA, 21 MPA (3.000 PSI). E=0,08M FUNDIDO EN SITIO, JUNTAS SEGÚN DISEÑO. INCLUYE EXCAVACIÓN, MATERIAL SELECCIONADO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.	45 días	jue 28/05/26	vie 24/07/26	$ 0,00
156		RAMPA PEATONAL INCLUYE BORDILLOS DE CAMBIO DE NIVEL, SARDINEL, ADOQUÍN TÁCTIL TIPO ALERTA Y PLANTILLA EN CONCRETO	12 días	jue 9/07/26	vie 24/07/26	$ 12.819.420,00
157		RAMPA PARA USO VEHICULAR DE 4.20M X 1.20M, INCLUYE BORDILLO DE CONCRETO DE CAMBIO DE NIVEL, LOSETA TOPEROL, ADOQUIN EN CONCRETO DE 20CM X 10CM X 6CM COLOR AMARILLO, PLACA ENCONCRETO 0.15MTS DE ESPESOR, EXCAVACIONMANUAL, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
158		S/I BOLARDOS ALTO EN HIERRO TIPO M63 - IDU EMPOTRADOS EN CONCRETO; INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	3 días	vie 24/07/26	mar 28/07/26	$ 11.428.956,00
159		**OTRAS ACTIVIDADES**	**183 días**	**mié 11/06/25**	**mar 16/06/26**	**$ 15.223.209,00**
160		S/I TUBERÍA PARA PROLONGACIÓN DE DRENAJES DE AGUAS LLUVIA EN 4". INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO	30 días	vie 8/05/26	mar 16/06/26	$ 10.590.174,00
161		REPARACIÓN DE DOMICILIARIAS DEL ACUEDUCTO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	35 días	mié 22/10/25	mar 9/12/25	$ 4.633.035,00
162		REUBICACIÓN TÍPICA MEDIDORES DE GAS RED DOMICILIARIA.	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
163		**BOX CULVERT**	**44 días**	**jue 21/05/26**	**jue 16/07/26**	**$ 120.041.687,00**
164		EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN BAJO AGUA	10 días	jue 21/05/26	mié 3/06/26	$ 1.051.194,00
165		GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	5 días	lun 25/05/26	sáb 30/05/26	$ 822.479,00
166		CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	10 días	mié 27/05/26	mar 9/06/26	$ 1.528.090,00
167		RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	10 días	vie 29/05/26	jue 11/06/26	$ 3.064.932,00
168		MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJON O SIMILAR)	10 días	mar 2/06/26	lun 15/06/26	$ 2.356.992,00
169		CONCRETO RESISTENCIA 28 MPA CLASE C (PARA ESTRUCTURA)	35 días	mar 2/06/26	jue 16/07/26	$ 48.259.567,00
170		ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa	35 días	mar 2/06/26	jue 16/07/26	$ 40.378.223,00
171		BARANDA METÁLICA PARA TRÁFICO VEHICULAR	20 días	mar 9/06/26	vie 3/07/26	$ 8.337.585,00
172		MANEJO DE CAUCE DE AGUA	15 días	lun 15/06/26	vie 3/07/26	$ 11.846.670,00
173		JUNTA PARA MURO EN CINTA PVC	10 días	lun 22/06/26	vie 3/07/26	$ 1.185.824,00
174		CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA CLASE F (SOLADO)	10 días	lun 22/06/26	vie 3/07/26	$ 1.210.131,00
175		**CUNETAS Y SUMIDEROS**	**223 días**	**mié 11/06/25**	**jue 6/08/26**	**$ 539.617.502,00**
176		EXCAVACION MANUAL	30 días	mié 27/05/26	vie 3/07/26	$ 25.636.138,00
177		CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	30 días	vie 29/05/26	mar 7/07/26	$ 21.222.048,00
178		GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
179		RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	20 días	lun 1/06/26	vie 26/06/26	$ 10.448.580,00
180		ACERO DE REFUERZO FY = 420 MPA	28 días	lun 8/06/26	lun 13/07/26	$ 169.087.963,00
181		CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	45 días	mié 10/06/26	jue 6/08/26	$ 280.331.873,00
182		SUMIDERO TIPO VENTANA EN CONCRETO	45 días	mié 10/06/26	jue 6/08/26	$ 32.890.900,00
183		**RED DE MEDIA TENSION (13.200) VOL.**	**199 días**	**mié 11/06/25**	**mar 7/07/26**	**$ 66.462.395,00**
184		SUMINISTRO, INSTALACION E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS - 750 KGF).	0 días	mié 24/12/25	mié 24/12/25	$ 0,00
185		SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE CIMENTACION CILINDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS - 750 KGF).	10 días	mié 27/05/26	mar 9/06/26	$ 3.723.192,00
186		SUMINISTRO, INSTALACION E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS - 1050 KGF).	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
187		SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE CIMENTACION CILINDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS - 1050 KGF).	10 días	mar 9/06/26	lun 22/06/26	$ 3.502.794,00

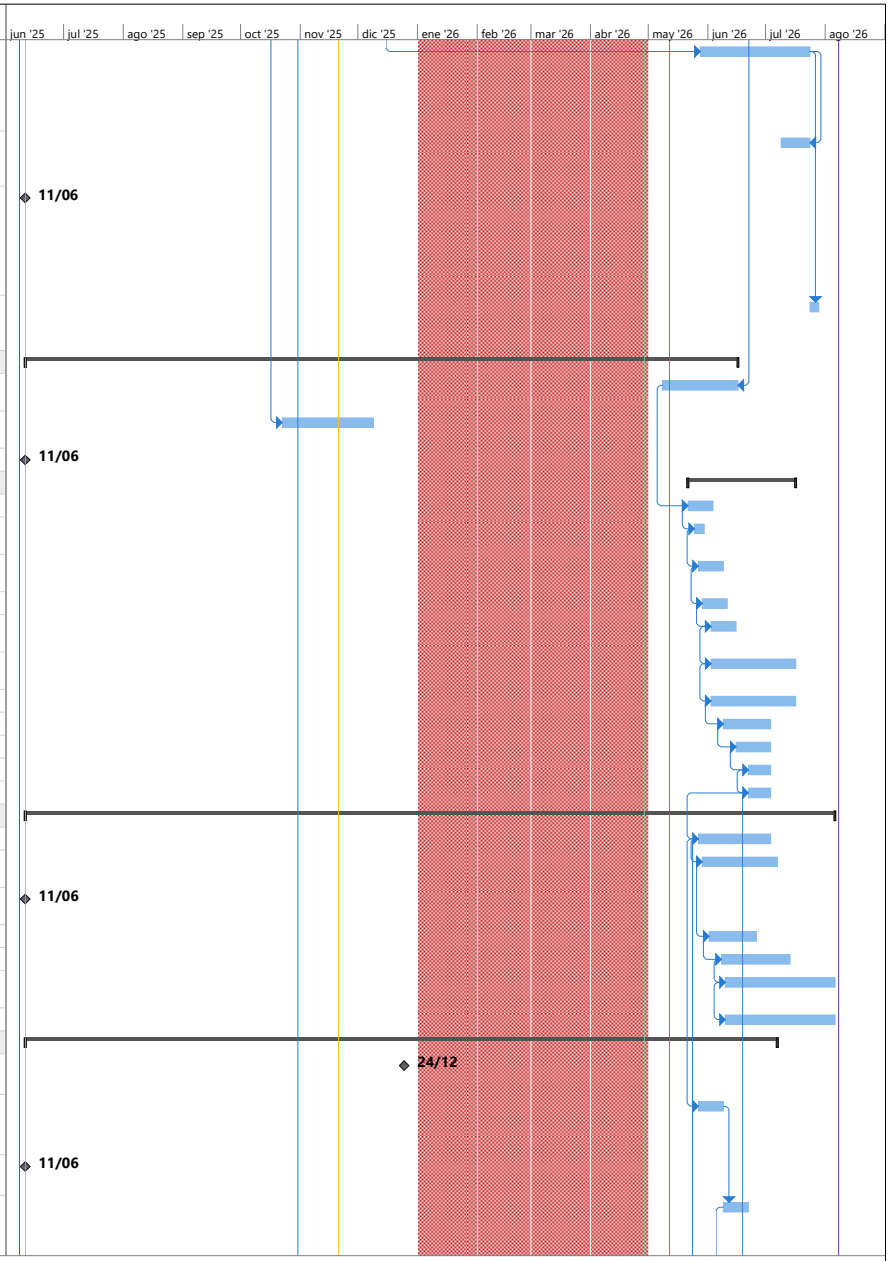

Proyecto: Project V1_ING LUIS
Fecha: mié 29/04/26

Tarea	Resumen del proyecto	Tarea manual	solo el comienzo	Fecha límite	Progreso manual
División	Tarea inactiva	solo duración	solo fin	Tareas críticas	
Hito	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Tareas externas	División crítica	
Resumen	Resumen inactivo	Resumen manual	Hito externo	Progreso	


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
188		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ALINEACION CON DISPOSICIÓN EN BANDERA BIFASICO A 13.2 KV., E INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	15 días	jue 11/06/26	mar 30/06/26	$ 16.042.730,00
189		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ANGULO CON DISPOSICIÓN EN BANDERA A 13.2 KV., E INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	5 días	lun 15/06/26	lun 22/06/26	$ 5.481.933,00
190		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN FIN DE LINEA COMPACTA CON DISPOSICIÓN CENTRAL BIFASICO A 13.2 KV., E INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	5 días	lun 15/06/26	lun 22/06/26	$ 4.473.546,00
191		SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA MT BIFASICA AEREA EN CABLE DESNUDO DE ALUMINIO ACSR - No. 1/0 AWG.	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
192		SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA MT BIFASICA AEREA EN CABLE AISLADO DE ALUMINIO ECOLOGICO - No. 1/0 AWG.	15 días	mié 17/06/26	mar 7/07/26	$ 33.238.200,00
193		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA RETENIDA MT EN POSTE DE 12m A POSTE DE 9m	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
194		INSTALACION EN CALIENTE DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA SECCIONADOR BIFASICO A 13.2 KV.	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
195		INSTALACION CON TENSION DE ARMADO PARA ESTRUCTURA DE MT BIFASICO A 13.2 KV.	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
196		INSTALACION CON TENSION A 13.2 KV. DE POSTE EN CONCRETO	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
197		**RED DE BAJA TENSION (240/120) VOL.**	**204 días**	**mié 11/06/25**	**lun 13/07/26**	**$ 39.893.689,00**
198		INSTALACION E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 1050 KGF).	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
199		SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE CIMENTACION CILINDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 1050 KGF).	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
200		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ALINEACION - ANGULO - FINAL DE CIRCUITO PARA BT A 240/120 VOL.	5 días	lun 22/06/26	sáb 27/06/26	$ 6.674.591,00
201		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ANCLAJE PARA BT A 240/120 VOL.	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
202		SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA BT BIFASICA AEREA EN CABLE TRIPLEX DE ALUMINIO - No. 2 AWG.	5 días	lun 22/06/26	sáb 27/06/26	$ 1.903.340,00
203		SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA BT BIFASICA AEREA EN CABLE TRIPLEX DE ALUMINIO - No. 1/0 AWG.	5 días	mié 24/06/26	mar 30/06/26	$ 2.545.700,00
204		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA RETENIDA A TIERRA EN POSTE DE 9 MTS.	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
205		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA PUESTA A TIERRA DE RED TRENSADA DE BT A 120/240 VOL., EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
206		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA CAJA DE CONEXIÓN (4 USUARIOS) A RED TRENSADA DE BT A 120/240 VOL.	10 días	mar 30/06/26	lun 13/07/26	$ 14.455.158,00
207		DESINSTALACION DE POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 1050 750-510 KGF).	5 días	lun 22/06/26	sáb 27/06/26	$ 12.954.850,00
208		DESMONTE, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA RED DE TELECOMUNICACIONES	5 días	lun 22/06/26	sáb 27/06/26	$ 1.360.050,00
209		**SUBESTACIONES ELECTRICAS (13.200/240/120) VOL.**	**20 días**	**jue 2/07/26**	**mar 28/07/26**	**$ 10.281.318,00**
210		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ADECUACION DE SUBESTACION BIFASICA EN POSTE A (13.200/240/120) VOL.,INCLUYE: INSTALACION PUENTES DE SECCIONADOR, ESTRUCTURA DE PROTECCIONES, SECCIONADOR, DPS, DESMONTE Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR.	20 días	jue 2/07/26	mar 28/07/26	$ 10.281.318,00

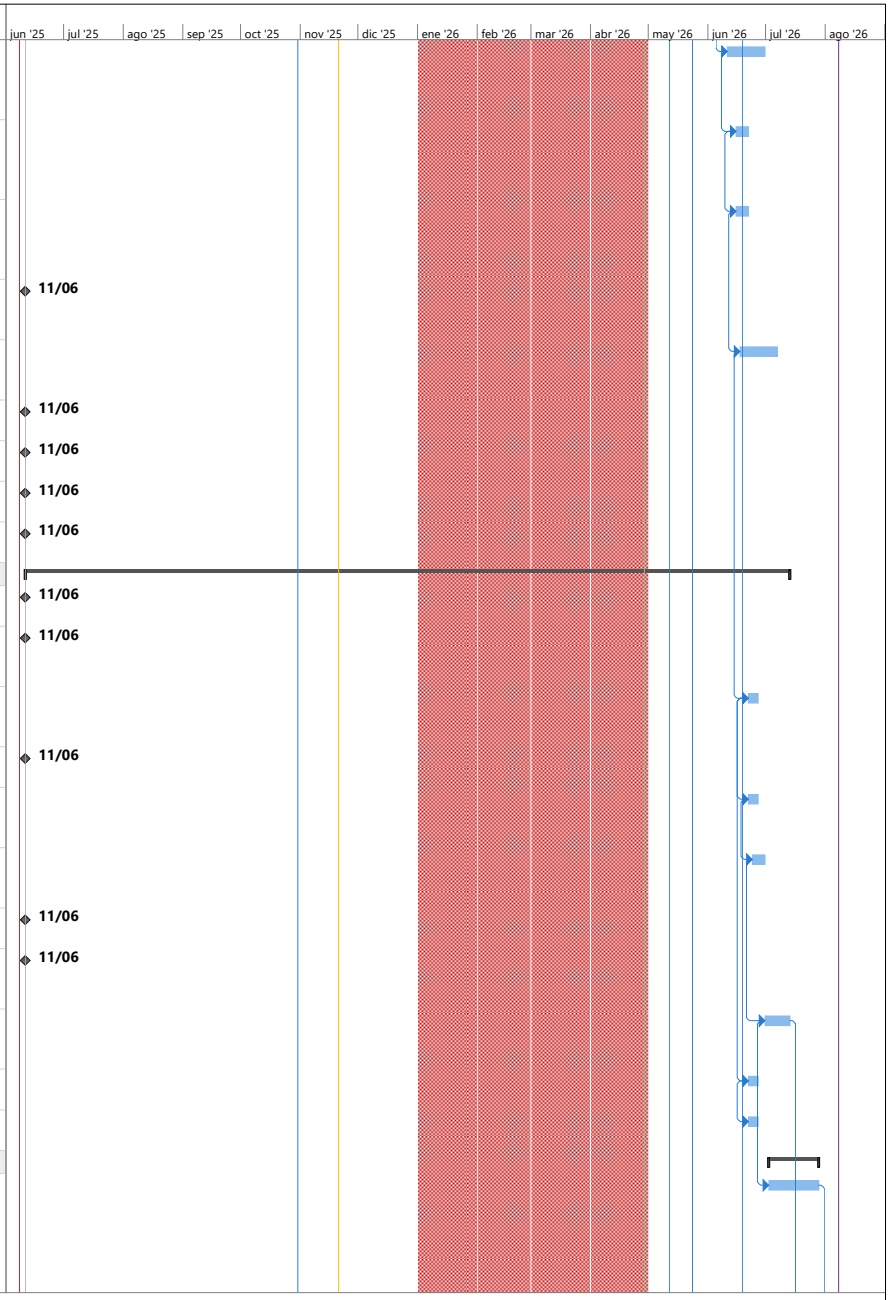

Proyecto: Project V1_ING LUIS
Fecha: mié 29/04/26

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
211		**ALUMBRADO PUBLIICO, ALIMENTADORES Y MEDIDAS DE BAJA TENSION (240/120) VOL.**	**6 días**	**mar 28/07/26**	**mié 5/08/26**	**$ 11.047.461,00**
212		SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE CABLE CONCENTRICO DE ALUMINIO - (2xNo. 6 + 1xNo. 6) AWG.	6 días	mar 28/07/26	mié 5/08/26	$ 3.041.560,00
213		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA REUBICACION DE MEDIDOR (240/120) VOL.	6 días	mar 28/07/26	mié 5/08/26	$ 1.225.666,00
214		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA REINSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO.	6 días	mar 28/07/26	mié 5/08/26	$ 6.780.235,00
215		**ITEM NO PREVISTO**	**217 días**	**mié 11/06/25**	**mié 29/07/26**	**$ 22.728.706,00**
216		CONEXION ACOMETIDAS DOMICILIARIA PVC NUEVA 8" X 6", (INCULYE ACCESORIOS, TUBERIA PVC LPROMEDIO= 10M)	25 días	sáb 27/06/26	mié 29/07/26	$ 10.027.016,00
217		REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES Y ARBUSTOS CON DAP MENOR O IGUAL A 10 CM INCLUYE TRANSPORTE RESIDUOS)	25 días	mar 12/05/26	vie 12/06/26	$ 6.942.986,00
218		CONFORMACIÓN DE TERRAPLÉN CON MATERIAL DE PRÉSTAMO	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
219		RAMPA PARA USO VEHICULAR, INCLUYE BORDILLO DE CONCRETO DE CAMBIO DE NIVEL, LOSETA TOPEROL, ADOQUIN EN CONCRETO DE 20CM X 10CM X 6CM COLOR AMARILLO,	25 días	sáb 27/06/26	mié 29/07/26	$ 0,00
220		CONCRETO DE 3000 PSI PARA BORDILLO H:1.0M * 0,20 M, FUNDIDO IN SITU REFORZADO	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
221		REUBICACION TUBERIA SANITARIA 6".	5 días	mié 5/11/25	mié 12/11/25	$ 5.758.704,00
222		**ITEM NO PREVISTO 2**	**220 días**	**mié 11/06/25**	**lun 3/08/26**	**$ 181.455.648,00**
223		CONCRETO DE 3000 PSI PARA BORDILLO H: VARIABLE * 0,20 M, FUNDIDO IN SITU REFORZADO	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
224		CONSTRUCCIÓN PISO EN CONCRETO ESTAMPADO TIPO RONDA, 21 MPA (3.000 PSI). E=0,08M FUNDIDO EN SITIO, JUNTAS SEGÚN DISEÑO.	30 días	mar 9/06/26	jue 16/07/26	$ 56.910.343,00
225		CONSTRUCCIÓN DE PISO EN CONCRETO 21 MPA (3.000 PSI) E=0,08M FUNDIDO EN SITIO, JUNTAS SEGÚN DISEÑO. INCLUYE RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
226		CONCRETO DE 3000 PSI PARA BORDILLO H: 20 CM FUNDIDO IN SITU ESPESOR=20 CM	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
227		S/I TABLETA GUÍA PREF. TÁCTIL PARA DISCAP. EN CONCRETO DE 0.20m X 0.20m X 0.06m COLOR AMARILLO TIPO TOPEROL (UNA HILERA) CON MORTERO 1:4, INCLUYE ARENA H.=0.04 m, JUNTAS SELLADAS	40 días	vie 12/06/26	lun 3/08/26	$ 30.444.594,00
228		RAMPA PARA USO VEHICULAR SOBRE CUNETA, INCLUYE BORDILLO DE CONCRETO DE CAMBIO DE NIVEL, LOSETA TOPEROL, ADOQUIN EN CONCRETO DE 20CM X 10CM X 6CM COLOR AMARILLO, PLACA 0,15MTS DE ESPESOR. INCLUYE ACERO DE REFUERZO	15 días	sáb 27/06/26	jue 16/07/26	$ 9.327.502,00
229		EXCAVACIONES MECÁNICAS CON EXCAVADORA PROFUNDIDAD <2M NO INCLUYE RETIRO	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
230		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO PVC 8	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
231		CONCRETO RESISTENCIA 21 MPA PARA CONSTRUCCION DE MH	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
232		REUBICACION DE CAJA DE REGISTRO DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC DE 6	50 días	mié 12/11/25	lun 25/05/26	$ 70.556.564,00
233		REUBICACION DE REGISTRO DE AGUA POTABLE	15 días	lun 25/05/26	vie 12/06/26	$ 6.167.388,00
234		TAPAS DE INSPECCION CUNETAS	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
235		SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS METÁLICAS TIPO PANAL (TRAFICO PESADO) PARA CARCAMOS	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
236		INSTALACION E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS - 1050 KGF).	15 días	lun 13/07/26	vie 31/07/26	$ 8.049.257,00
237		SUMINISTRO, INSTALACION E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 1050 KGF).	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
238		CONCRETO DE 3000 PSI FUNDIDO IN SITU PARA DESCOLES	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00

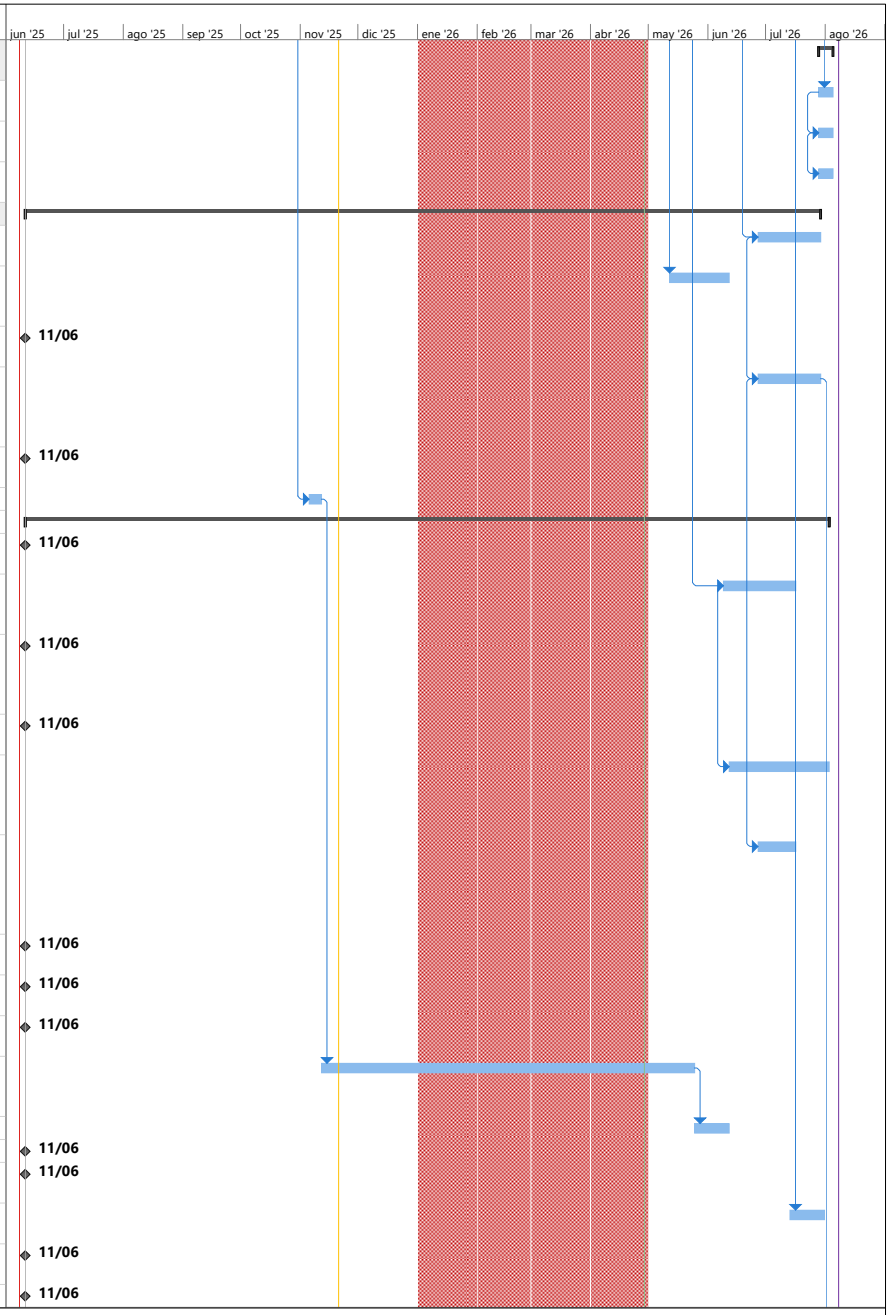

Proyecto: Project V1_ING LUIS
Fecha: mié 29/04/26

Tarea | Resumen del proyecto | Tarea manual | solo el comienzo | Fecha límite | Progreso manual
División | Tarea inactiva | solo duración | solo fin | Tareas críticas
Hito | Hito inactivo | Informe de resumen manual | Tareas externas | División crítica
Resumen | Resumen inactivo | Resumen manual | Hito externo | Progreso


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
239		**FIN TRAMO 2**	**0 días**	**mié 29/07/26**	**mié 29/07/26**	$ 0,00
240		**TRAMO 3 CALLE 94 ENTRE LA CALLE 93 Y CRA 2A-MOCARÌ**	**217 días**	**mié 11/06/25**	**mié 29/07/26**	**$ 2.664.095.628,00**
241		**ACTIVIDADES PRELIMINARES**	**185 días**	**mié 11/06/25**	**jue 18/06/26**	**$ 291.234.007,00**
242		DEMOLICIÓN DE BORDILLOS DE CONCRETO	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
243		CORTE DE PISO EN TABLON Y PLANTILLA DE CONCRETO E= 0.10MTS/0.15MTS CON CORTADORA	45 días	jue 16/10/25	lun 15/12/25	$ 7.103.891,00
244		DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO	45 días	mié 29/10/25	mar 5/05/26	$ 3.567.359,00
245		DEMOLICION DE ESTRUCTURAS	4 días	mar 5/05/26	lun 11/05/26	$ 476.102,00
246		DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
247		EXCAVACIONES MECÁNICAS CON EXCAVADORA PARA FALLOS EN SUB RASANTE. PROFUNDIDAD > 50 CM. NO INCLUYE RETIRO	80 días	mié 29/10/25	jue 18/06/26	$ 9.404.306,00
248		EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	60 días	lun 4/08/25	mié 22/10/25	$ 40.406.357,00
249		CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	80 días	sáb 6/09/25	lun 22/12/25	$ 139.672.592,00
250		REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURA MENOR O IGUAL H= 5 M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS,	3 días	lun 22/12/25	sáb 2/05/26	$ 4.631.616,00
251		REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURA ENTRE H= 5.1M A 10M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS,	7 días	sáb 2/05/26	mar 12/05/26	$ 24.345.954,00
252		REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURAS ENTRE H= 10.1M A 15 M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS,	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
253		PODA DE FORMACIÓN ÁRBOLES ALTURA MENOR O IGUAL H= 5 M (INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS)	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
254		SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ARBOLES DE ESPECIES NATIVAS DE 1.5 M DE ALTURA, INCLUYE EXCAVACION, ABONO ORGANICO, TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO	20 días	mar 12/05/26	vie 5/06/26	$ 61.625.830,00
255		**SUBRASANTE Y SUBBASE**	**45 días**	**mié 29/10/25**	**mar 5/05/26**	**$ 496.161.238,00**
256		MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON MATERIAL SELECCIONADO	40 días	mié 29/10/25	lun 22/12/25	$ 165.935.635,00
257		MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJÓN O SIMILAR)	35 días	mié 5/11/25	lun 22/12/25	$ 81.691.200,00
258		SUBBASE GRANULAR CLASE C	40 días	mié 5/11/25	mar 5/05/26	$ 197.025.564,00
259		GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS	40 días	mié 5/11/25	mar 5/05/26	$ 51.508.839,00
260		**PAVIMENTO Y BORDILLOS**	**55 días**	**mié 12/11/25**	**sáb 30/05/26**	**$ 1.120.401.856,00**
261		PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO MR (40 Kg/cm2)	35 días	mié 12/11/25	mar 5/05/26	$ 910.593.243,00
262		ADECUACIÓN DE CÁMARAS DE INSPECCIÓN (MANHOLES) EN CONC	5 días	mar 5/05/26	mar 12/05/26	$ 4.871.115,00
263		BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	30 días	mar 18/11/25	mar 5/05/26	$ 117.112.628,00
264		ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa	20 días	mar 5/05/26	sáb 30/05/26	$ 87.824.870,00
265		**SEÑALIZACION**	**17 días**	**mié 17/12/25**	**sáb 16/05/26**	**$ 31.424.861,00**
266		SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON LAMINA RETROREFLECTIVA DE	10 días	mié 17/12/25	jue 7/05/26	$ 5.876.380,00
267		SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON DOBLE LAMINA RETROREFLECT	10 días	mié 17/12/25	jue 7/05/26	$ 1.837.648,00
268		DEMARCACION HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRILICA BASE SOLVENTE - M2. (INCLUYE IMPRIMANTE,	10 días	lun 4/05/26	sáb 16/05/26	$ 7.313.620,00
269		DEMARCACION HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRILICA BASE SOLVENTE - M (12 CM). (INCLUYE IMPRIMANTE,	10 días	lun 4/05/26	sáb 16/05/26	$ 13.674.875,00
270		REDUCTORES DE VELOCIDAD TIPO RESALTO PLÁSTICO PERNADO	10 días	lun 4/05/26	sáb 16/05/26	$ 2.722.338,00
271		**ESPACIO PUBLICO ANDENES Y MOBILIARIOS**	**185 días**	**mié 11/06/25**	**jue 18/06/26**	**$ 218.527.101,00**
272		S/I TABLETA GUÍA PREF. TÁCTIL PARA DISCAP. EN CONCRETO DE 0.20m X 0.20m X 0.06m COLOR AMARILLO TIPO TOPEROL (UNA HILERA) CON MORTERO 1:4, INCLUYE ARENA H.=0.04 m, RELLENO CON MATERIAL COMPACTADO SELECCIONADO DE 0.20m Y JUNTAS SELLADAS	60 días	mar 25/11/25	jue 18/06/26	$ 51.061.291,00
273		FRANJA DEMARCADORA PARA LIMITADOS VISUALES CON ADOQUÍN EN CONCRETO DE 20cm X 10cm X 6cm COLOR AMARILLO PARA EMBEBER EN MORTERO, APAREJADO SEGÚN DISEÑO. INCLUYE MORTERO 1:4, ARENA H.=4 CM, INSTALACIÓN, COMPACTACIÓN, JUNTAS SELLADAS CON ARENA	60 días	mar 25/11/25	jue 18/06/26	$ 44.857.008,00

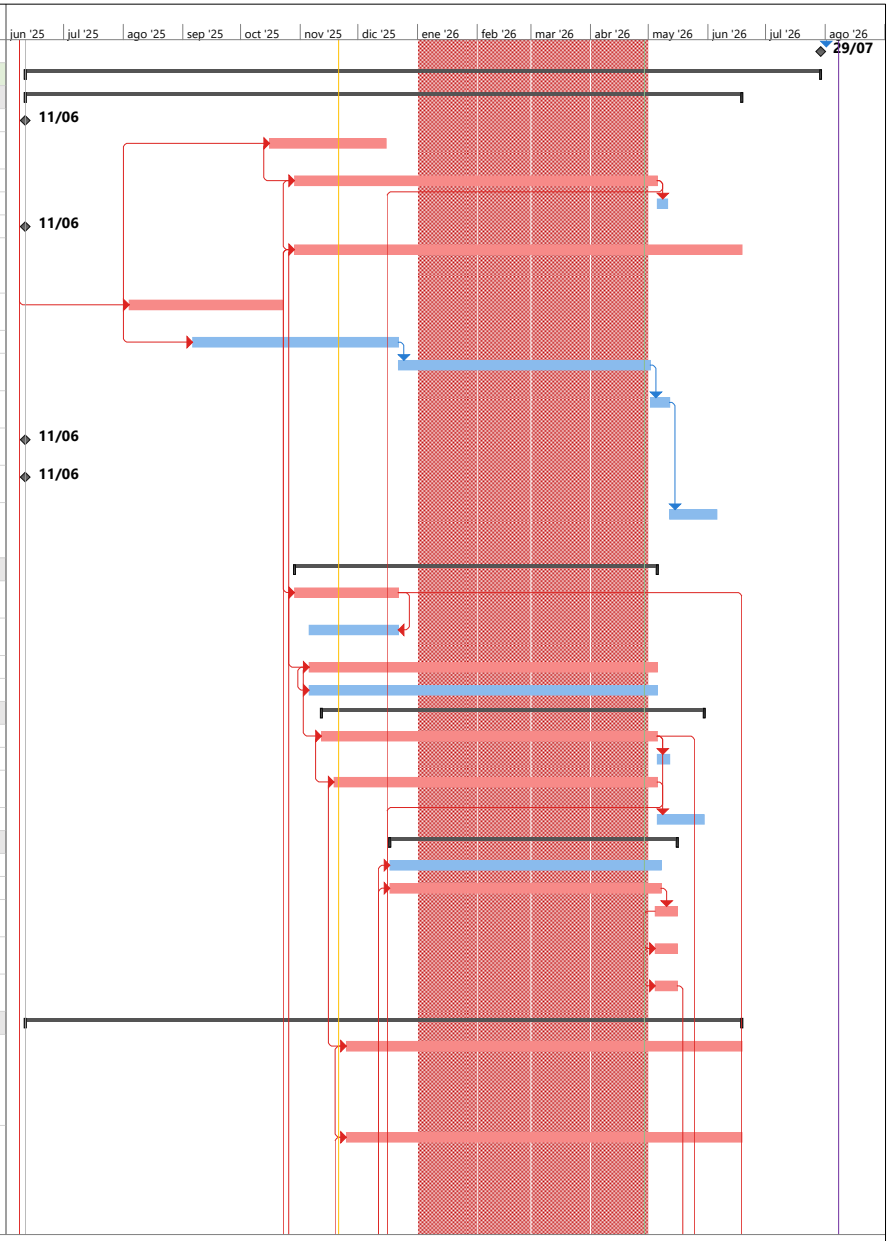

Proyecto: Project V1_ING LUIS
Fecha: mié 29/04/26

Tarea | Resumen del proyecto | Tarea manual | solo el comienzo | Fecha límite | Progreso manual
División | Tarea inactiva | solo duración | solo fin | Tareas críticas
Hito | Hito inactivo | Informe de resumen manual | Tareas externas | División crítica
Resumen | Resumen inactivo | Resumen manual | Hito externo | Progreso


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
274		CONSTRUCCIÓN PISO EN CONCRETO ESTAMPADO TIPO RONDA, 21 MPA (3.000 PSI). E=0,08M FUNDIDO EN SITIO, JUNTAS SEGÚN DISEÑO. INCLUYE EXCAVACIÓN, MATERIAL SELECCIONADO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.	45 días	mar 25/11/25	sáb 30/05/26	$ 94.550.774,00
275		RAMPA PEATONAL INCLUYE BORDILLOS DE CAMBIO DE NIVEL, SARDINEL, ADOQUÍN TÁCTIL TIPO ALERTA Y PLANTILLA EN CONCRETO	12 días	lun 1/12/25	mié 17/12/25	$ 12.819.420,00
276		RAMPA PARA USO VEHICULAR DE 4.20M X 1.20M, INCLUYE BORDILLO DE CONCRETO DE CAMBIO DE NIVEL, LOSETA TOPEROL, ADOQUIN EN CONCRETO DE 20CM X 10CM X 6CM COLOR AMARILLO, PLACA ENCONCRETO 0.15MTS DE ESPESOR, EXCAVACIONMANUAL, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
277		S/I BOLARDOS ALTO EN HIERRO TIPO M63 - IDU EMPOTRADOS EN CONCRETO; INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	3 días	mié 17/12/25	lun 22/12/25	$ 15.238.608,00
278		**OTRAS ACTIVIDADES**	**170 días**	**mié 11/06/25**	**sáb 30/05/26**	**$ 11.768.899,00**
279		S/I TUBERÍA PARA PROLONGACIÓN DE DRENAJES DE AGUAS LLUVIA EN 4". INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO	20 días	lun 22/12/25	lun 25/05/26	$ 5.950.669,00
280		REPARACIÓN DE DOMICILIARIAS DEL ACUEDUCTO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	25 días	lun 22/12/25	sáb 30/05/26	$ 5.818.230,00
281		REUBICACIÓN TÍPICA MEDIDORES DE GAS RED DOMICILIARIA.	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
282		**BOX CULVERT**	**215 días**	**mié 11/06/25**	**lun 27/07/26**	**$ 17.282.930,00**
283		EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN BAJO AGUA	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
284		GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
285		CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
286		RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
287		MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJON O SIMILAR)	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
288		CONCRETO RESISTENCIA 28 MPA CLASE C (PARA ESTRUCTURA)	30 días	jue 18/06/26	lun 27/07/26	$ 17.282.930,00
289		ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
290		BARANDA METÁLICA PARA TRÁFICO VEHICULAR	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
291		MANEJO DE CAUCE DE AGUA	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
292		JUNTA PARA MURO EN CINTA PVC	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
293		CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA CLASE F (SOLADO)	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
294		**CUNETAS Y SUMIDEROS**	**217 días**	**mié 11/06/25**	**mié 29/07/26**	**$ 28.119.532,00**
295		EXCAVACION MANUAL	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
296		CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
297		GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
298		RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
299		ACERO DE REFUERZO FY = 420 MPA	20 días	jue 25/06/26	mar 21/07/26	$ 16.736.111,00
300		CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	25 días	sáb 27/06/26	mié 29/07/26	$ 11.383.421,00
301		SUMIDERO TIPO VENTANA EN CONCRETO	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
302		**RED DE MEDIA TENSION (13.200) VOL.**	**217 días**	**mié 11/06/25**	**mié 29/07/26**	**$ 124.776.760,00**
303		SUMINISTRO, INSTALACION E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS - 750 KGF).	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
304		SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE CIMENTACION CILINDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO	45 días	lun 18/05/26	mar 14/07/26	$ 6.515.586,00
305		SUMINISTRO, INSTALACION E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO D	45 días	lun 25/05/26	mar 21/07/26	$ 19.671.944,00
306		SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE CIMENTACION CILINDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO	45 días	mié 27/05/26	jue 23/07/26	$ 9.340.784,00
307		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ALINEACION CON DISPOSICIÓN EN BANDERA BIFASICO A 13.2 KV., E INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE	45 días	vie 29/05/26	sáb 25/07/26	$ 32.085.460,00
308		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ANGULO CON DISPOSICIÓN EN BANDERA A 13.2 KV., E INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	45 días	sáb 30/05/26	lun 27/07/26	$ 16.445.799,00

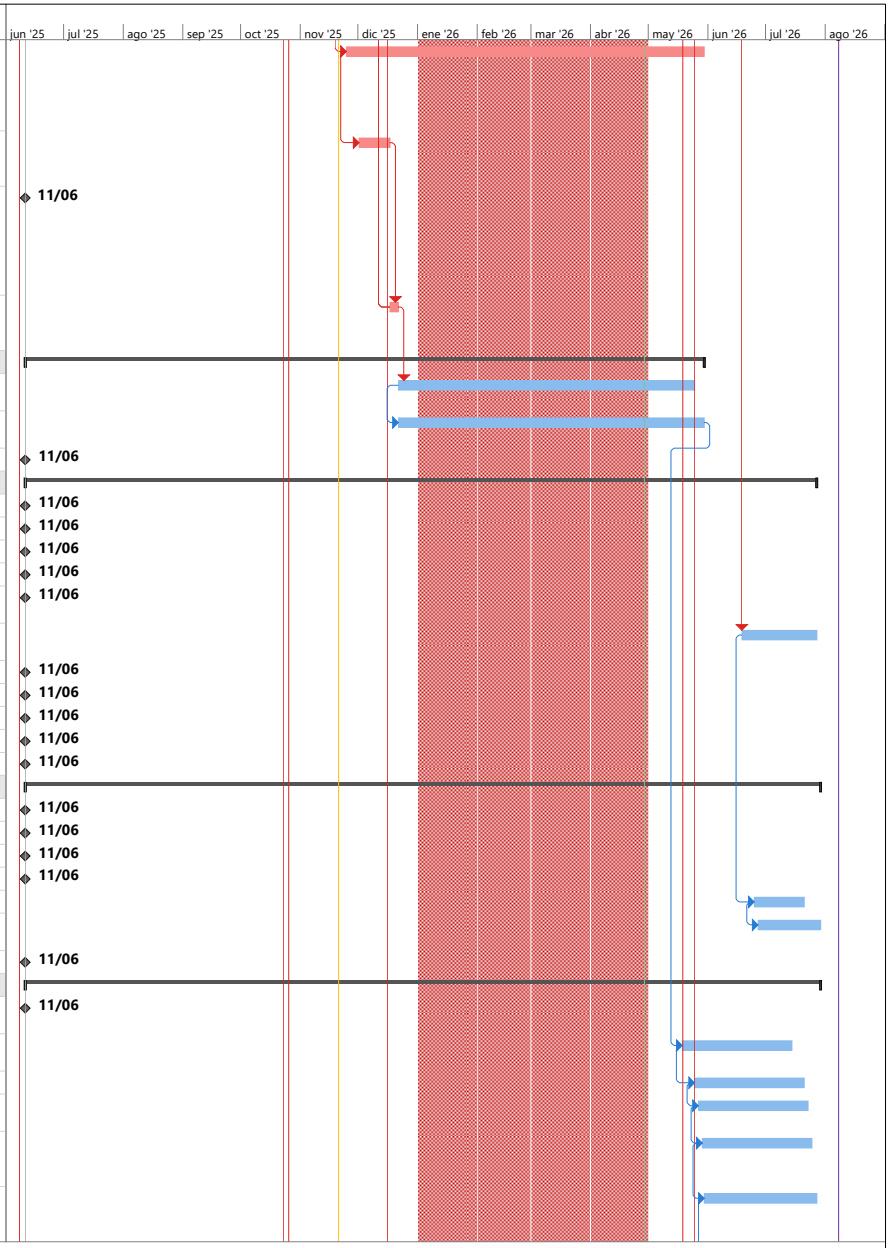

Proyecto: Project V1_ING LUIS
Fecha: mié 29/04/26

Tarea | Resumen del proyecto | Tarea manual | solo el comienzo | Fecha límite | Progreso manual
División | Tarea inactiva | solo duración | solo fin | Tareas críticas
Hito | Hito inactivo | Informe de resumen manual | Tareas externas | División crítica
Resumen | Resumen inactivo | Resumen manual | Hito externo | Progreso


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
309		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN FIN DE LINEA COMPACTA CON DISPOSICIÓN CENTRAL BIFASICO A 13.2 KV., E INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
310		SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA MT BIFASICA AEREA EN CABLE DESNUDO DE ALUMINIO ACSR - No. 1/0 AWG.	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
311		SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA MT BIFASICA AEREA EN CABLE AISLADO DE ALUMINIO ECOLOGICO - No. 1/0 AWG.	45 días	mar 2/06/26	mié 29/07/26	$ 33.238.200,00
312		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA RETENIDA MT EN POSTE DE 12m A POSTE DE 9m	45 días	mar 2/06/26	mié 29/07/26	$ 5.308.441,00
313		INSTALACION EN CALIENTE DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA SECCIONADOR BIFASICO A 13.2 KV.	45 días	mar 2/06/26	mié 29/07/26	$ 2.170.546,00
314		INSTALACION CON TENSION DE ARMADO PARA ESTRUCTURA DE MT BIFASICO A 13.2 KV.	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
315		INSTALACION CON TENSION A 13.2 KV. DE POSTE EN CONCRETO	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
316		**RED DE BAJA TENSION (240/120) VOL.**	**216 días**	**mié 11/06/25**	**mar 28/07/26**	**$ 83.984.914,00**
317		INSTALACION E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 1050 KGF).	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
318		SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE CIMENTACION CILINDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO	15 días	mié 10/06/26	lun 29/06/26	$ 1.826.838,00
319		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ALINEACION - ANGULO - FINAL DE CIRCUITO PARA BT	15 días	vie 12/06/26	mié 1/07/26	$ 9.535.130,00
320		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ANCLAJE PARA BT A 240/120 VOL.	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
321		SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA BT BIFASICA AEREA EN CABLE TRIPLEX DE ALUMINIO - No. 2 AWG.	30 días	vie 19/06/26	mar 28/07/26	$ 1.903.340,00
322		SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA BT BIFASICA AEREA EN CABLE TRIPLEX DE ALUMINIO - No. 1/0 AWG.	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 3.563.980,00
323		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA RETENIDA A TIERRA EN POSTE DE 9 MTS.	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 1.842.600,00
324		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA PUESTA A TIERRA DE RED TRENSADA DE BT A 120/240 VOL., EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
325		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA CAJA DE CONEXIÓN (4 USUARIOS) A RED TRENSADA DE BT A 120/240 VOL.	25 días	mar 16/06/26	vie 17/07/26	$ 28.910.316,00
326		DESINSTALACION DE POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 1050 750-510 KGF).	20 días	mar 16/06/26	sáb 11/07/26	$ 33.682.610,00
327		DESMONTE, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA RED DE TELECOMUNICACIONES	20 días	mar 16/06/26	sáb 11/07/26	$ 2.720.100,00
328		**SUBESTACIONES ELECTRICAS (13.200/240/120) VOL.**	**5 días**	**mar 16/06/26**	**mar 23/06/26**	**$ 30.843.954,00**
329		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ADECUACION DE SUBESTACION BIFASICA EN POSTE A (13.200/240/120) VOL.,INCLUYE: INSTALACION PUENTES DE SECCIONADOR, ESTRUCTURA DE PROTECCIONES, SECCIONADOR, DPS, DESMONTE Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR.	5 días	mar 16/06/26	mar 23/06/26	$ 30.843.954,00
330		**ALUMBRADO PUBLIICO, ALIMENTADORES Y MEDIDAS DE BAJA TENSION (240/120) VOL.**	**29 días**	**mar 16/06/26**	**jue 23/07/26**	**$ 23.282.535,00**
331		SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE CABLE CONCENTRICO DE ALUMINIO - (2xNo. 6 + 1xNo. 6) AWG.	25 días	mar 16/06/26	vie 17/07/26	$ 4.562.340,00
332		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA REUBICACION DE MEDIDOR (240/120) VOL.	25 días	jue 18/06/26	mar 21/07/26	$ 6.128.330,00
333		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA REINSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO.	25 días	lun 22/06/26	jue 23/07/26	$ 12.591.865,00
334		**ITEM NO PREVISTO**	**215 días**	**mié 11/06/25**	**lun 27/07/26**	**$ 80.438.977,00**
335		CONEXION ACOMETIDAS DOMICILIARIA PVC NUEVA 8" X 6", (INCULYE ACCESORIOS, TUBERIA PVC LPROMEDIO= 10M)	70 días	lun 22/12/25	lun 27/07/26	$ 40.108.064,00
336		REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES Y ARBUSTOS CON DAP MENOR O IGUAL A 10 CM INCLUYE TRANSPORTE RESIDUOS)	25 días	lun 22/12/25	sáb 30/05/26	$ 4.885.805,00

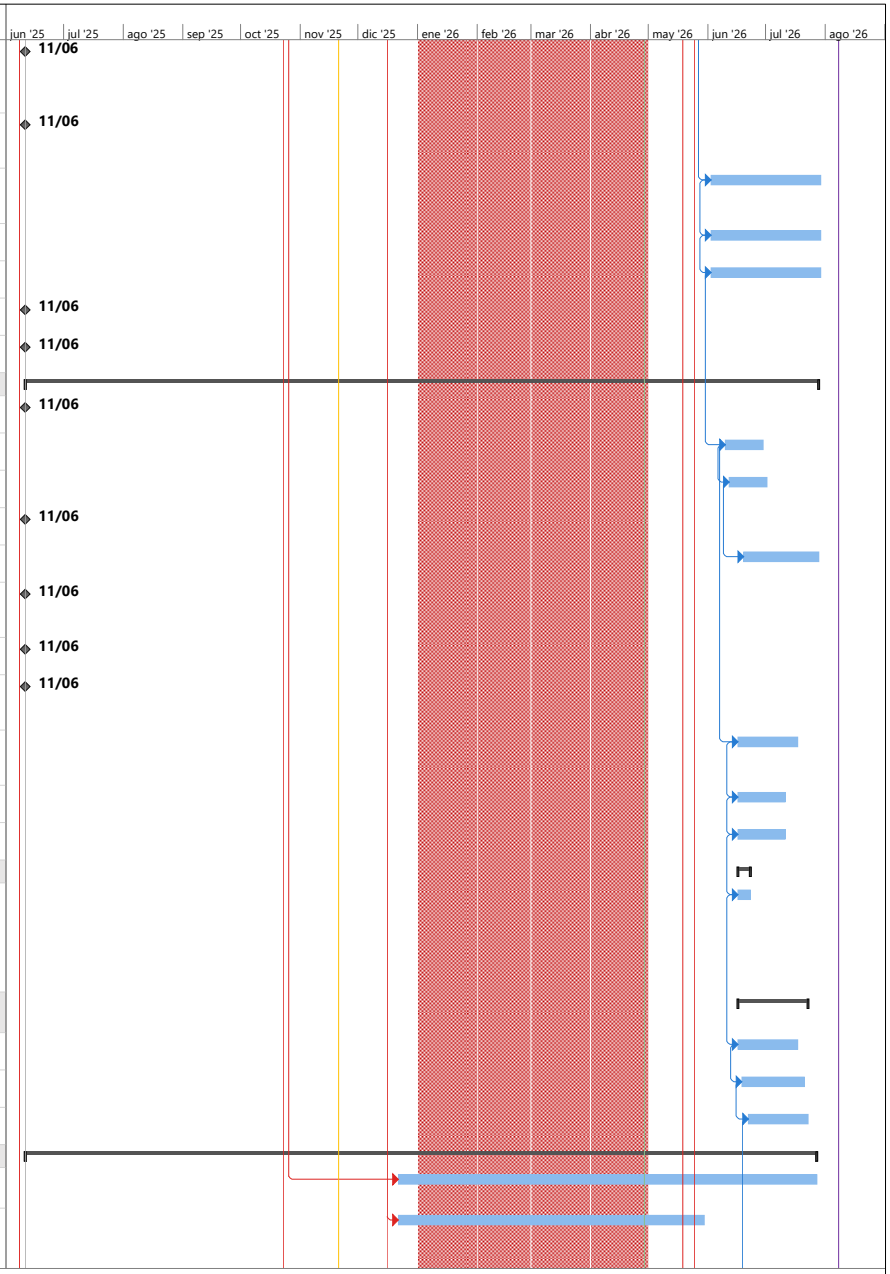

Proyecto: Project V1_ING LUIS
Fecha: mié 29/04/26

Tarea | Resumen del proyecto | Tarea manual | solo el comienzo | Fecha límite | Progreso manual
División | Tarea inactiva | solo duración | solo fin | Tareas críticas
Hito | Hito inactivo | Informe de resumen manual | Tareas externas | División crítica
Resumen | Resumen inactivo | Resumen manual | Hito externo | Progreso


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
337		CONFORMACIÓN DE TERRAPLÉN CON MATERIAL DE PRÉSTAMO	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
338		RAMPA PARA USO VEHICULAR, INCLUYE BORDILLO DE CONCRETO DE CAMBIO DE NIVEL, LOSETA TOPEROL, ADOQUIN EN CONCRETO DE 20CM X 10CM X 6CM COLOR AMARILLO,	45 días	lun 22/12/25	jue 25/06/26	$ 28.863.732,00
339		CONCRETO DE 3000 PSI PARA BORDILLO H:1.0M * 0,20 M, FUNDIDO IN SITU REFORZADO	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
340		REUBICACION TUBERIA SANITARIA 6".	25 días	mié 29/10/25	lun 1/12/25	$ 6.581.376,00
341		**ITEM NO PREVISTO 2**	**205 días**	**mié 11/06/25**	**mar 14/07/26**	**$ 105.848.064,00**
342		CONCRETO DE 3000 PSI PARA BORDILLO H: VARIABLE * 0,20 M, FUNDIDO IN SITU REFORZADO	15 días	jue 25/06/26	mar 14/07/26	$ 15.050.632,00
343		CONSTRUCCIÓN PISO EN CONCRETO ESTAMPADO TIPO RONDA, 21 MPA (3.000 PSI). E=0,08M FUNDIDO EN SITIO, JUNTAS SEGÚN DISEÑO.	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
344		CONSTRUCCIÓN DE PISO EN CONCRETO 21 MPA (3.000 PSI) E=0,08M FUNDIDO EN SITIO, JUNTAS SEGÚN DISEÑO. INCLUYE RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
345		CONCRETO DE 3000 PSI PARA BORDILLO H: 20 CM FUNDIDO IN SITU ESPESOR=20 CM	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
346		S/I TABLETA GUÍA PREF. TÁCTIL PARA DISCAP. EN CONCRETO DE 0.20m X 0.20m X 0.06m COLOR AMARILLO TIPO TOPEROL (UNA HILERA) CON MORTERO 1:4, INCLUYE ARENA H.=0.04 m, JUNTAS SELLADAS	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
347		RAMPA PARA USO VEHICULAR SOBRE CUNETA, INCLUYE BORDILLO DE CONCRETO DE CAMBIO DE NIVEL, LOSETA TOPEROL, ADOQUIN EN CONCRETO DE 20CM X 10CM X 6CM COLOR AMARILLO, PLACA 0,15MTS DE ESPESOR. INCLUYE ACERO DE REFUERZO	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
348		EXCAVACIONES MECÁNICAS CON EXCAVADORA PROFUNDIDAD <2M NO INCLUYE RETIRO	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
349		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO PVC 8	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
350		CONCRETO RESISTENCIA 21 MPA PARA CONSTRUCCION DE MH	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
351		REUBICACION DE CAJA DE REGISTRO DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC DE 6	45 días	mié 3/12/25	mar 9/06/26	$ 46.133.138,00
352		REUBICACION DE REGISTRO DE AGUA POTABLE	45 días	mar 9/12/25	vie 12/06/26	$ 3.581.064,00
353		TAPAS DE INSPECCION CUNETAS	50 días	jue 11/12/25	lun 22/06/26	$ 927.994,00
354		SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS METÁLICAS TIPO PANAL (TRAFICO PESADO) PARA CARCAMOS	50 días	mié 17/12/25	sáb 27/06/26	$ 20.477.184,00
355		INSTALACION E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS - 1050 KGF).	10 días	sáb 27/06/26	vie 10/07/26	$ 14.948.620,00
356		SUMINISTRO, INSTALACION E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 1050 KGF).	10 días	sáb 27/06/26	vie 10/07/26	$ 4.729.432,00
357		CONCRETO DE 3000 PSI FUNDIDO IN SITU PARA DESCOLES	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
358		**FIN TRAMO 3**	**0 días**	**sáb 16/05/26**	**sáb 16/05/26**	$ 0,00
359		**TRAMO 4 CARRERA 2A ENTRE CALLES 93 Y 94**	**221 días**	**mié 11/06/25**	**mar 4/08/26**	**$ 181.974.734,00**
360		**ACTIVIDADES PRELIMINARES**	**190 días**	**mié 11/06/25**	**jue 25/06/26**	**$ 11.726.556,00**
361		DEMOLICIÓN DE BORDILLOS DE CONCRETO	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
362		CORTE DE PISO EN TABLON Y PLANTILLA DE CONCRETO E= 0.10MTS/0.15MTS CON CORTADORA	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
363		DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
364		DEMOLICION DE ESTRUCTURAS	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
365		DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
366		EXCAVACIONES MECÁNICAS CON EXCAVADORA PARA FALLOS EN SUB RASANTE. PROFUNDIDAD > 50 CM. NO INCLUYE RETIRO	5 días	mar 30/09/25	lun 6/10/25	$ 0,00

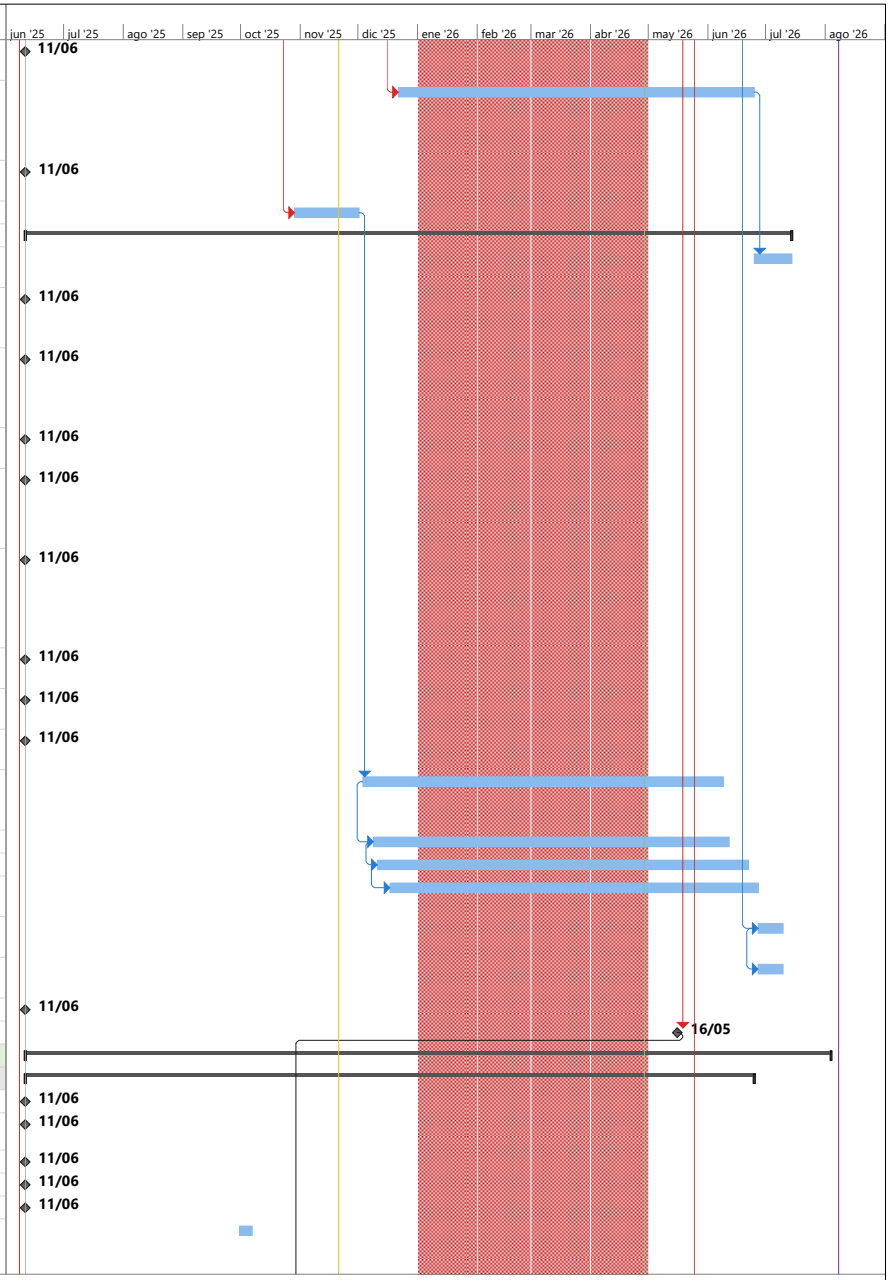

Proyecto: Project V1_ING LUIS
Fecha: mié 29/04/26

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
367		EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	20 días	lun 25/05/26	jue 18/06/26	$ 2.839.264,00
368		CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	25 días	lun 25/05/26	jue 25/06/26	$ 8.887.292,00
369		REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURA MENOR O IGUAL H= 5 M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS,	1 día	mié 11/06/25	jue 12/06/25	$ 0,00
370		REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURA ENTRE H= 5.1M A 10M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS,	1 día	mié 11/06/25	jue 12/06/25	$ 0,00
371		REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURAS ENTRE H= 10.1M A 15 M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS,	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
372		PODA DE FORMACIÓN ÁRBOLES ALTURA MENOR O IGUAL H= 5 M (INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS)	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
373		SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ARBOLES DE ESPECIES NATIVAS DE 1.5 M DE ALTURA, INCLUYE EXCAVACION, ABONO ORGANICO, TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO	15 días	mié 11/06/25	mié 2/07/25	$ 0,00
374		**SUBRASANTE Y SUBBASE**	**195 días**	**mié 11/06/25**	**mié 1/07/26**	**$ 35.938.059,00**
375		MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON MATERIAL SELECCIONAD	18 días	mié 27/05/26	jue 18/06/26	$ 14.249.158,00
376		MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJÓN O SIMILAR)	20 días	mié 11/06/25	mié 9/07/25	$ 0,00
377		SUBBASE GRANULAR CLASE C	20 días	vie 5/06/26	mié 1/07/26	$ 16.908.861,00
378		GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS	3 días	mié 27/05/26	sáb 30/05/26	$ 4.780.040,00
379		**PAVIMENTO Y BORDILLOS**	**206 días**	**mié 11/06/25**	**mié 15/07/26**	**$ 117.978.480,00**
380		PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO MR (40 Kg/cm2)	25 días	vie 12/06/26	mar 14/07/26	$ 79.989.893,00
381		ADECUACIÓN DE CÁMARAS DE INSPECCIÓN (MANHOLES) EN CONC	10 días	mié 11/06/25	mié 25/06/25	$ 0,00
382		BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	16 días	jue 25/06/26	mié 15/07/26	$ 6.939.092,00
383		ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa	5 días	mié 8/07/26	mar 14/07/26	$ 31.049.495,00
384		**SEÑALIZACION**	**206 días**	**mié 11/06/25**	**mié 15/07/26**	**$ 3.142.732,00**
385		SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON LAMINA RETROREFLECTIVA DE	1 día	mar 14/07/26	mié 15/07/26	$ 2.350.552,00
386		SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON DOBLE LAMINA RETROREFLECT	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
387		DEMARCACION HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRILICA BASE SOLVENTE - M2. (INCLUYE IMPRIMANTE,	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
388		DEMARCACION HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRILICA BASE SOLVENTE - M (12 CM). (INCLUYE IMPRIMANTE,	1 día	mar 14/07/26	mié 15/07/26	$ 792.180,00
389		REDUCTORES DE VELOCIDAD TIPO RESALTO PLÁSTICO PERNADO	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
390		**ESPACIO PUBLICO ANDENES Y MOBILIARIOS**	**206 días**	**mié 11/06/25**	**mié 15/07/26**	**$ 11.285.567,00**
391		S/I TABLETA GUÍA PREF. TÁCTIL PARA DISCAP. EN CONCRETO DE 0.20m X 0.20m X 0.06m COLOR AMARILLO TIPO TOPEROL (UNA HILERA) CON MORTERO 1:4, INCLUYE ARENA H.=0.04 m, RELLENO CON MATERIAL COMPACTADO SELECCIONADO DE 0.20m Y JUNTAS SELLADAS	5 días	jue 9/07/26	mié 15/07/26	$ 3.025.455,00
392		FRANJA DEMARCADORA PARA LIMITADOS VISUALES CON ADOQUÍN EN CONCRETO DE 20cm X 10cm X 6cm COLOR AMARILLO PARA EMBEBER EN MORTERO, APAREJADO SEGÚN DISEÑO. INCLUYE MORTERO 1:4, ARENA H.=4 CM, INSTALACIÓN, COMPACTACIÓN, JUNTAS SELLADAS CON ARENA	5 días	jue 9/07/26	mié 15/07/26	$ 2.657.842,00
393		CONSTRUCCIÓN PISO EN CONCRETO ESTAMPADO TIPO RONDA, 21 MPA (3.000 PSI). E=0,08M FUNDIDO EN SITIO, JUNTAS SEGÚN DISEÑO. INCLUYE EXCAVACIÓN, MATERIAL SELECCIONADO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.	5 días	jue 9/07/26	mié 15/07/26	$ 5.602.270,00
394		RAMPA PEATONAL INCLUYE BORDILLOS DE CAMBIO DE NIVEL, SARDINEL, ADOQUÍN TÁCTIL TIPO ALERTA Y PLANTILLA EN CONCRETO	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
395		RAMPA PARA USO VEHICULAR DE 4.20M X 1.20M, INCLUYE BORDILLO DE CONCRETO DE CAMBIO DE NIVEL, LOSETA TOPEROL, ADOQUIN EN CONCRETO DE 20CM X 10CM X 6CM COLOR AMARILLO, PLACA ENCONCRETO 0.15MTS DE ESPESOR, EXCAVACIONMANUAL, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
396		S/I BOLARDOS ALTO EN HIERRO TIPO M63 - IDU EMPOTRADOS EN CONCRETO; INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
397		**OTRAS ACTIVIDADES**	**0 días**	**mié 11/06/25**	**mié 11/06/25**	**$ 0,00**

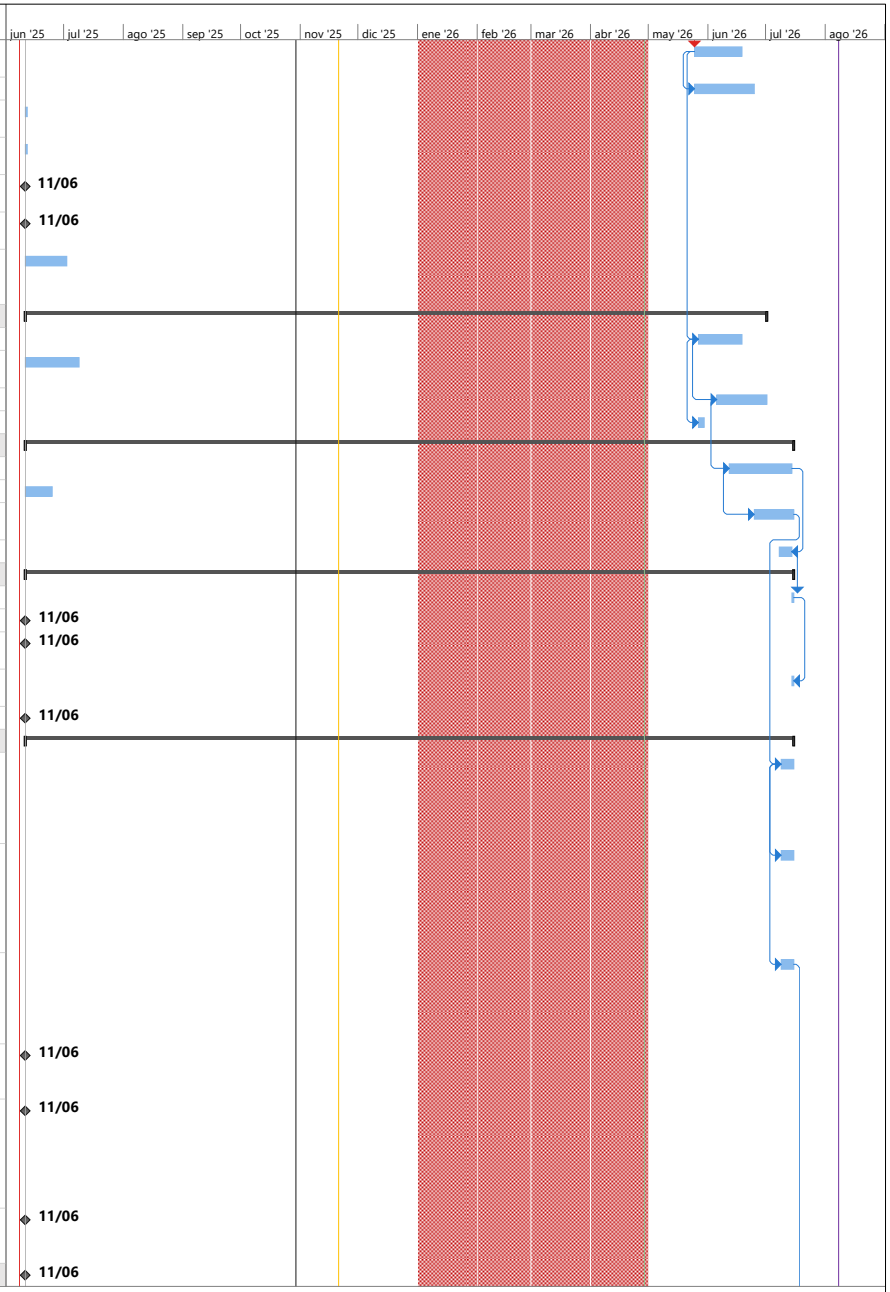

Proyecto: Project V1_ING LUIS
Fecha: mié 29/04/26

Tarea	Resumen del proyecto	Tarea manual	solo el comienzo	Fecha límite	Progreso manual		
División	Tarea inactiva	solo duración	solo fin	Tareas críticas			
Hito	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Tareas externas	División crítica			
Resumen	Resumen inactivo	Resumen manual	Hito externo	Progreso			


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
398		S/I TUBERÍA PARA PROLONGACIÓN DE DRENAJES DE AGUAS LLUVIA EN 4". INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
399		REPARACIÓN DE DOMICILIARIAS DEL ACUEDUCTO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
400		REUBICACIÓN TÍPICA MEDIDORES DE GAS RED DOMICILIARIA.	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
401		**BOX CULVERT**	**0 días**	**mié 11/06/25**	**mié 11/06/25**	**$ 0,00**
402		EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN BAJO AGUA	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
403		GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
404		CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
405		RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
406		MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJON O SIMILAR)	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
407		CONCRETO RESISTENCIA 28 MPA CLASE C (PARA ESTRUCTURA)	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
408		ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
409		BARANDA METÁLICA PARA TRÁFICO VEHICULAR	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
410		MANEJO DE CAUCE DE AGUA	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
411		JUNTA PARA MURO EN CINTA PVC	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
412		CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA CLASE F (SOLADO)	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
413		**CUNETAS Y SUMIDEROS**	**0 días**	**mié 11/06/25**	**mié 11/06/25**	**$ 0,00**
414		EXCAVACION MANUAL	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
415		CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
416		GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
417		RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
418		ACERO DE REFUERZO FY = 420 MPA	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
419		CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
420		SUMIDERO TIPO VENTANA EN CONCRETO	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
421		**RED DE MEDIA TENSION (13.200) VOL.**	**15 días**	**mié 11/06/25**	**mié 2/07/25**	**$ 0,00**
422		SUMINISTRO, INSTALACION E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO D	10 días	mié 11/06/25	mié 25/06/25	$ 0,00
423		SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE CIMENTACION CILINDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO	10 días	mié 11/06/25	mié 25/06/25	$ 0,00
424		SUMINISTRO, INSTALACION E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS - 1050 KGF).	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
425		SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE CIMENTACION CILINDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS - 1050 KGF).	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
426		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ALINEACION CON DISPOSICIÓN EN BANDERA BIFASICO A 13.2 KV., E INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE	10 días	mié 11/06/25	mié 25/06/25	$ 0,00
427		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ANGULO CON DISPOSICIÓN EN BANDERA A 13.2 KV., E INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	10 días	mié 11/06/25	mié 25/06/25	$ 0,00
428		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN FIN DE LINEA COMPACTA CON DISPOSICIÓN CENTRAL BIFASICO A 13.2 KV., E INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	10 días	mié 11/06/25	mié 25/06/25	$ 0,00
429		SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA MT BIFASICA AEREA EN CABLE DESNUDO DE ALUMINIO ACSR - No. 1/0 AWG.	15 días	mié 11/06/25	mié 2/07/25	$ 0,00
430		SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA MT BIFASICA AEREA EN CABLE AISLADO DE ALUMINIO ECOLOGICO - No. 1/0 AWG.	15 días	mié 11/06/25	mié 2/07/25	$ 0,00
431		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA RETENIDA MT EN POSTE DE 12m A POSTE DE 9m	10 días	mié 11/06/25	mié 25/06/25	$ 0,00
432		INSTALACION EN CALIENTE DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA SECCIONADOR BIFASICO A 13.2 KV.	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
433		INSTALACION CON TENSION DE ARMADO PARA ESTRUCTURA DE MT BIFASICO A 13.2 KV.	15 días	mié 11/06/25	mié 2/07/25	$ 0,00
434		INSTALACION CON TENSION A 13.2 KV. DE POSTE EN CONCRETO	15 días	mié 11/06/25	mié 2/07/25	$ 0,00
435		**RED DE BAJA TENSION (240/120) VOL.**	**221 días**	**mié 11/06/25**	**mar 4/08/26**	**$ 1.903.340,00**

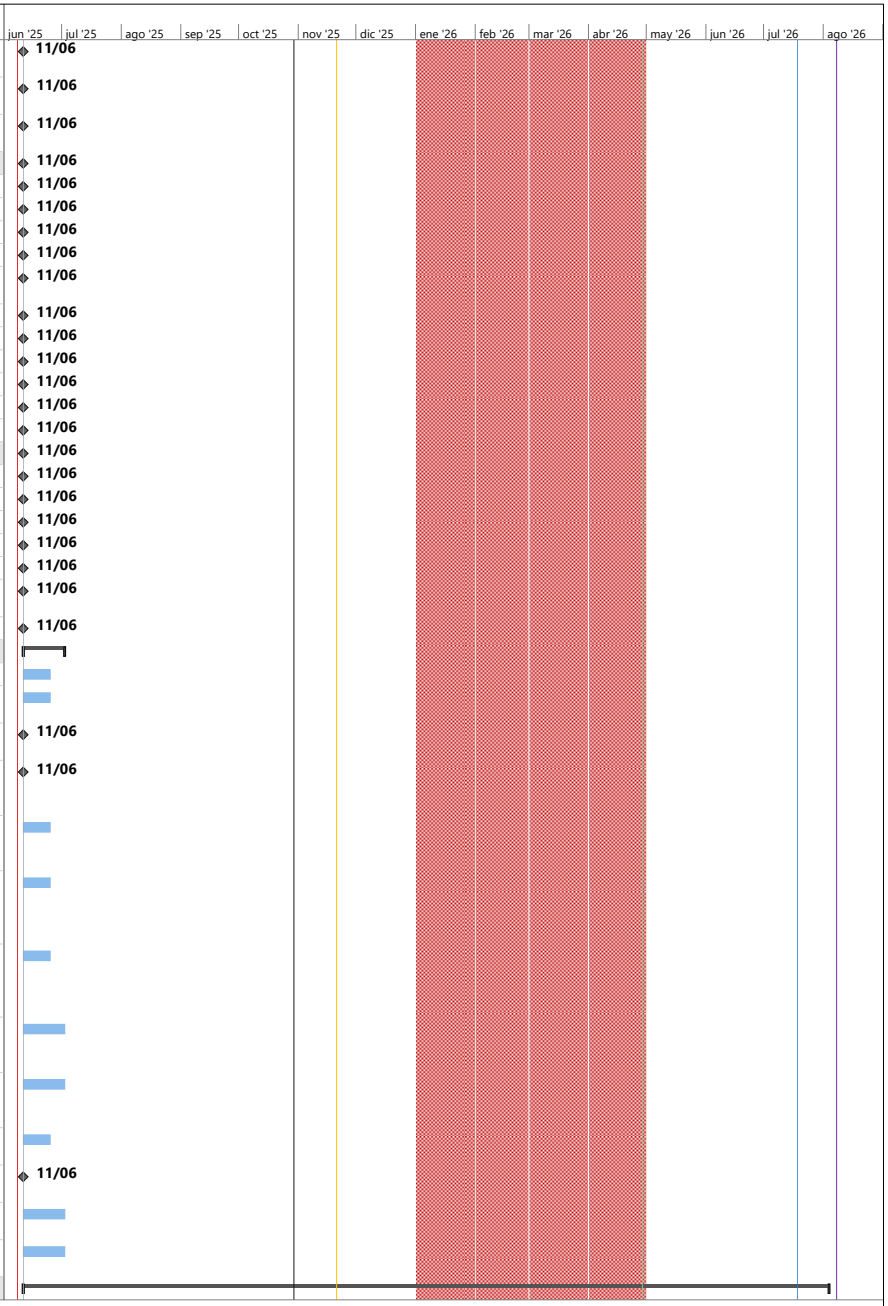

Proyecto: Project V1_ING LUIS
Fecha: mié 29/04/26

Tarea	Resumen del proyecto	Tarea manual	solo el comienzo	Fecha límite	Progreso manual		
División	Tarea inactiva	solo duración	solo fin	Tareas críticas			
Hito	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Tareas externas	División crítica			
Resumen	Resumen inactivo	Resumen manual	Hito externo	Progreso			


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
436		INSTALACION E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 1050 KGF).	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
437		SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE CIMENTACION CILINDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 1050 KGF).	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
438		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ALINEACION - ANGULO - FINAL DE CIRCUITO PARA BT A 240/120 VOL.	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
439		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ANCLAJE PARA BT A 240/120 VOL.	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
440		SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA BT BIFASICA AEREA EN CABLE TRIPLEX DE ALUMINIO - No. 2 AWG.	15 días	mié 15/07/26	mar 4/08/26	$ 1.903.340,00
441		SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA BT BIFASICA AEREA EN CABLE TRIPLEX DE ALUMINIO - No. 1/0 AWG.	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
442		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA RETENIDA A TIERRA EN POSTE DE 9 MTS.	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
443		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA PUESTA A TIERRA DE RED TRENSADA DE BT A 120/240 VOL., EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
444		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA CAJA DE CONEXIÓN (4 USUARIOS) A RED TRENSADA DE BT A 120/240 VOL.	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
445		DESINSTALACION DE POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 1050 750-510 KGF).	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
446		DESMONTE, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA RED DE TELECOMUNICACIONES	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
447		**SUBESTACIONES ELECTRICAS (13.200/240/120) VOL.**	**0 días**	**mié 11/06/25**	**mié 11/06/25**	**$ 0,00**
448		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ADECUACION DE SUBESTACION BIFASICA EN POSTE A (13.200/240/120) VOL.,INCLUYE: INSTALACION PUENTES DE SECCIONADOR, ESTRUCTURA DE PROTECCIONES, SECCIONADOR, DPS, DESMONTE Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR.	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
449		**ALUMBRADO PUBLIICO, ALIMENTADORES Y MEDIDAS DE BAJA TENSION (240/120) VOL.**	**0 días**	**mié 11/06/25**	**mié 11/06/25**	**$ 0,00**
450		SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE CABLE CONCENTRICO DE ALUMINIO - (2xNo. 6 + 1xNo. 6) AWG.	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
451		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA REUBICACION DE MEDIDOR (240/120) VOL.	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
452		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA REINSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO.	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
453		**ITEM NO PREVISTO**	**0 días**	**mié 11/06/25**	**mié 11/06/25**	**$ 0,00**
454		CONEXION ACOMETIDAS DOMICILIARIA PVC NUEVA 8" X 6", (INCULYE ACCESORIOS, TUBERIA PVC LPROMEDIO= 10M)	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
455		REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES Y ARBUSTOS CON DAP MENOR O IGUAL A 10 CM INCLUYE TRANSPORTE RESIDUOS)	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
456		CONFORMACIÓN DE TERRAPLÉN CON MATERIAL DE PRÉSTAMO	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
457		RAMPA PARA USO VEHICULAR, INCLUYE BORDILLO DE CONCRETO DE CAMBIO DE NIVEL, LOSETA TOPEROL, ADOQUIN EN CONCRETO DE 20CM X 10CM X 6CM COLOR AMARILLO,	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
458		CONCRETO DE 3000 PSI PARA BORDILLO H:1.0M * 0,20 M, FUNDIDO IN SITU REFORZADO	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
459		REUBICACION TUBERIA SANITARIA 6".	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
460		**ITEM NO PREVISTO 2**	**0 días**	**mié 11/06/25**	**mié 11/06/25**	**$ 0,00**
461		CONCRETO DE 3000 PSI PARA BORDILLO H: VARIABLE * 0,20 M, FUNDIDO IN SITU REFORZADO	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
462		CONSTRUCCIÓN PISO EN CONCRETO ESTAMPADO TIPO RONDA, 21 MPA (3.000 PSI). E=0,08M FUNDIDO EN SITIO, JUNTAS SEGÚN DISEÑO.	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00

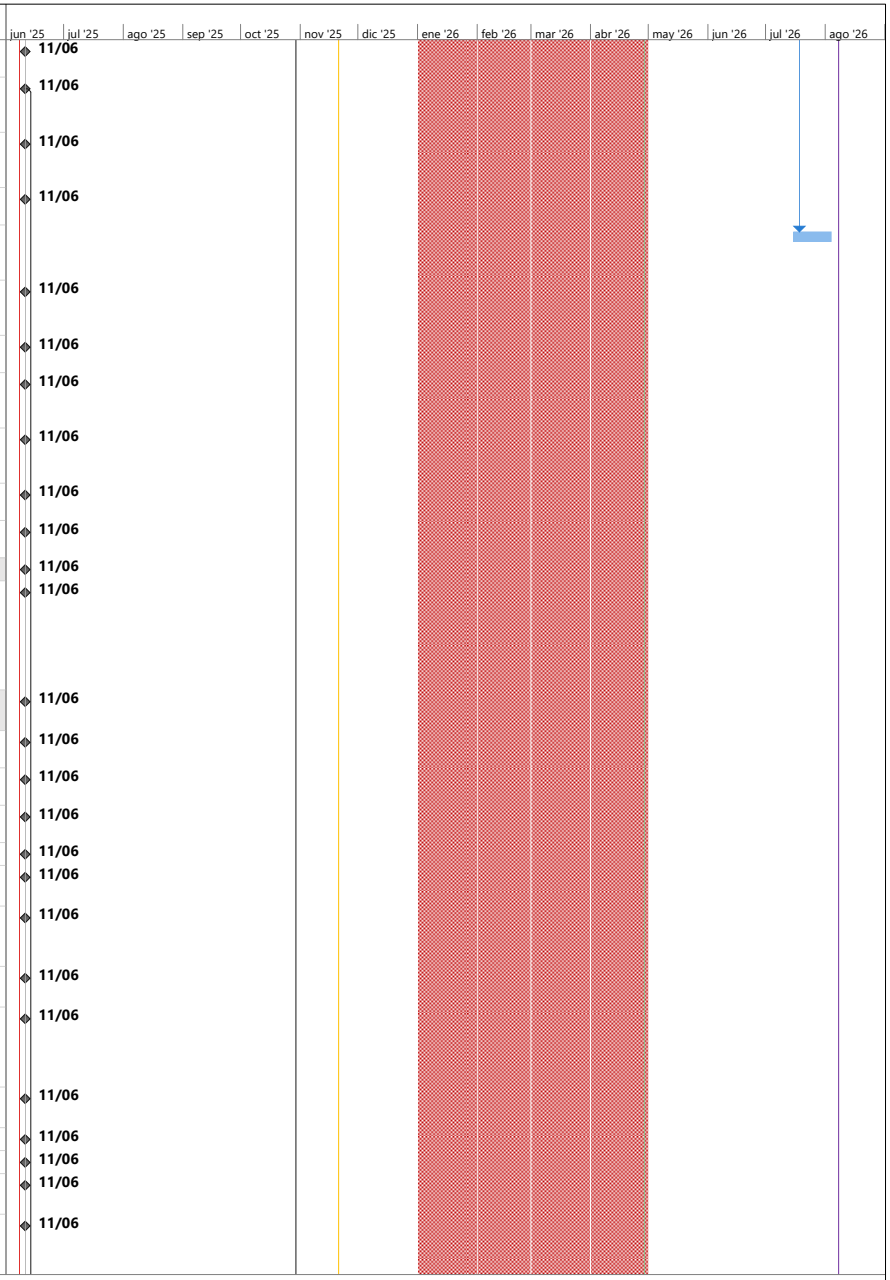

Proyecto: Project V1_ING LUIS
Fecha: mié 29/04/26

Tarea | Resumen del proyecto | Tarea manual | solo el comienzo | Fecha límite | Progreso manual
División | Tarea inactiva | solo duración | solo fin | Tareas críticas
Hito | Hito inactivo | Informe de resumen manual | Tareas externas | División crítica
Resumen | Resumen inactivo | Resumen manual | Hito externo | Progreso


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
463		CONSTRUCCIÓN DE PISO EN CONCRETO 21 MPA (3.000 PSI) E=0,08M FUNDIDO EN SITIO, JUNTAS SEGÚN DISEÑO. INCLUYE RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
464		CONCRETO DE 3000 PSI PARA BORDILLO H: 20 CM FUNDIDO IN SITU ESPESOR=20 CM	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
465		S/I TABLETA GUÍA PREF. TÁCTIL PARA DISCAP. EN CONCRETO DE 0.20m X 0.20m X 0.06m COLOR AMARILLO TIPO TOPEROL (UNA HILERA) CON MORTERO 1:4, INCLUYE ARENA H.=0.04 m, JUNTAS SELLADAS	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
466		RAMPA PARA USO VEHICULAR SOBRE CUNETA, INCLUYE BORDILLO DE CONCRETO DE CAMBIO DE NIVEL, LOSETA TOPEROL, ADOQUIN EN CONCRETO DE 20CM X 10CM X 6CM COLOR AMARILLO, PLACA 0,15MTS DE ESPESOR. INCLUYE ACERO DE REFUERZO	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
467		EXCAVACIONES MECÁNICAS CON EXCAVADORA PROFUNDIDAD <2M NO INCLUYE RETIRO	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
468		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO PVC 8	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
469		CONCRETO RESISTENCIA 21 MPA PARA CONSTRUCCION DE MH	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
470		REUBICACION DE CAJA DE REGISTRO DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC DE 6	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
471		REUBICACION DE REGISTRO DE AGUA POTABLE	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
472		TAPAS DE INSPECCION CUNETAS	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
473		SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS METÁLICAS TIPO PANAL (TRAFICO PESADO) PARA CARCAMOS	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
474		INSTALACION E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS - 1050 KGF).	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
475		SUMINISTRO, INSTALACION E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 1050 KGF).	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
476		CONCRETO DE 3000 PSI FUNDIDO IN SITU PARA DESCOLES	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
477		**FIN TRAMO 4**	**0 días**	**mié 11/06/25**	**mié 11/06/25**	**$ 0,00**
478		**TRAMO 5 CALLE 95 ENTRE LA CRA 4 Y LA VIA MONTERIA-CERETÉ-MOCARÌ**	**222 días**	**mié 11/06/25**	**mié 5/08/26**	**$ 3.231.352.023,63**
479		**ACTIVIDADES PRELIMINARES**	**221 días**	**mié 11/06/25**	**mar 4/08/26**	**$ 252.587.529,00**
480		DEMOLICIÓN DE BORDILLOS DE CONCRETO	45 días	vie 19/12/25	mié 24/06/26	$ 828.840,00
481		CORTE DE PISO EN TABLON Y PLANTILLA DE CONCRETO E= 0.10MTS/0.15MTS CON CORTADORA	75 días	mar 23/12/25	mar 4/08/26	$ 12.771.206,00
482		DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO	55 días	sáb 2/05/26	sáb 11/07/26	$ 7.897.962,00
483		DEMOLICION DE ESTRUCTURAS	45 días	mar 5/05/26	mié 1/07/26	$ 11.590.135,00
484		DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
485		EXCAVACIONES MECÁNICAS CON EXCAVADORA PARA FALLOS EN SUB RASANTE. PROFUNDIDAD > 50 CM. NO INCLUYE RETIRO	60 días	lun 17/11/25	jue 11/06/26	$ 11.566.783,00
486		EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	40 días	mar 4/11/25	lun 4/05/26	$ 34.992.970,00
487		CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	40 días	jue 6/11/25	mié 6/05/26	$ 120.570.990,00
488		REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURA MENOR O IGUAL H= 5 M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS,	3 días	vie 19/12/25	vie 1/05/26	$ 2.105.280,00
489		REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURA ENTRE H= 5.1M A 10M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS,	7 días	vie 19/12/25	mié 6/05/26	$ 14.095.026,00
490		REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURAS ENTRE H= 10.1M A 15 M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAÍZ)	20 días	mié 6/05/26	lun 1/06/26	$ 953.577,00
491		PODA DE FORMACIÓN ÁRBOLES ALTURA MENOR O IGUAL H= 5 M (INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS)	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
492		SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ARBOLES DE ESPECIES NATIVAS DE 1.5 M DE ALTURA, INCLUYE EXCAVACION, ABONO ORGANICO, TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO	40 días	lun 1/06/26	mié 22/07/26	$ 35.214.760,00
493		**SUBRASANTE Y SUBBASE**	**45 días**	**vie 19/12/25**	**mié 24/06/26**	**$ 427.886.746,00**
494		MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON MATERIAL SELECCIONADO	35 días	vie 19/12/25	jue 11/06/26	$ 130.483.417,00
495		MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJÓN O SIMILAR)	35 días	lun 11/05/26	mié 24/06/26	$ 100.482.854,00

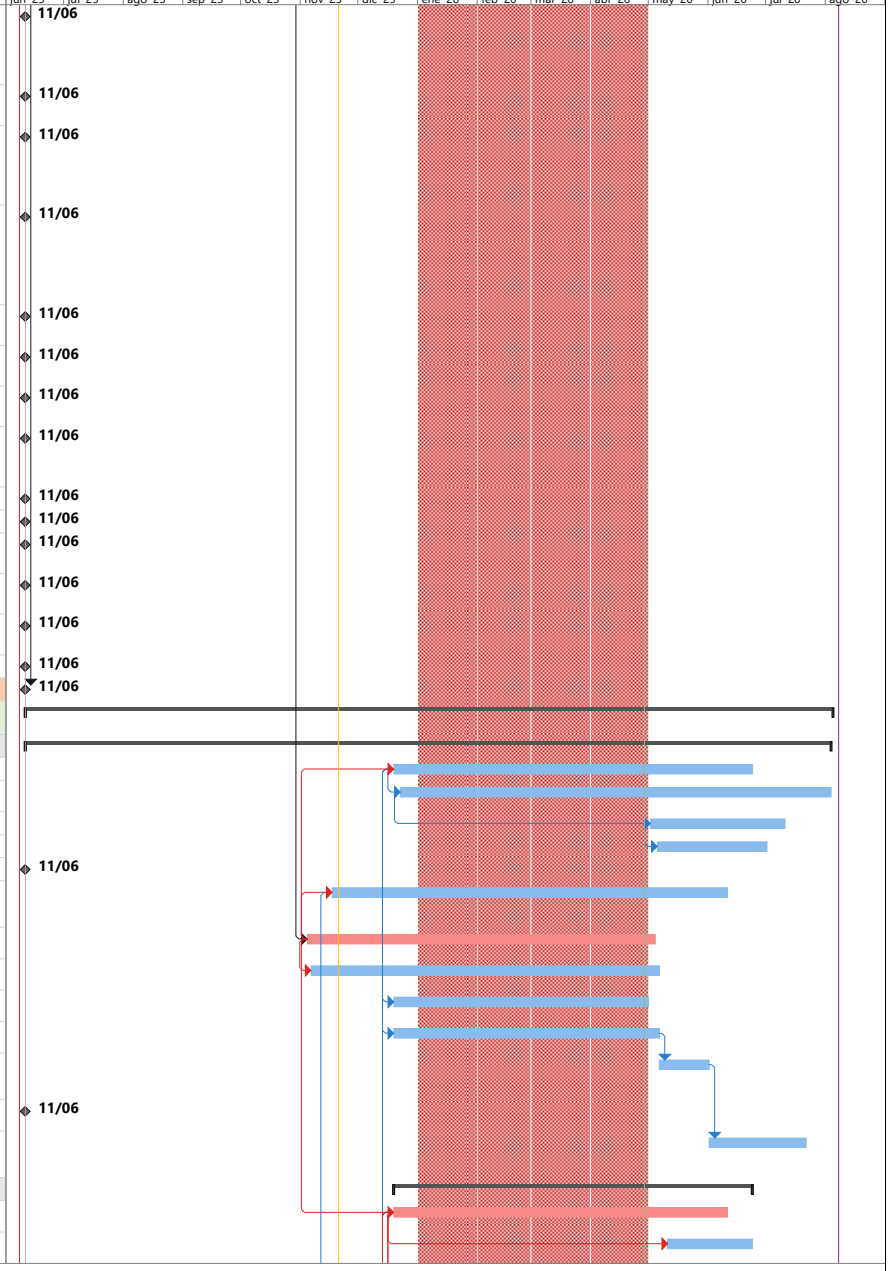

Proyecto: Project V1_ING LUIS
Fecha: mié 29/04/26

Tarea | Resumen del proyecto | Tarea manual | solo el comienzo | Fecha límite | Progreso manual
División | Tarea inactiva | solo duración | solo fin | Tareas críticas
Hito | Hito inactivo | Informe de resumen manual | Tareas externas | División crítica
Resumen | Resumen inactivo | Resumen manual | Hito externo | Progreso


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
496		SUBBASE GRANULAR CLASE C	35 días	mar 23/12/25	sáb 13/06/26	$ 154.940.381,00
497		GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	30 días	vie 19/12/25	jue 4/06/26	$ 41.980.094,00
498		**PAVIMENTO Y BORDILLOS**	**62 días**	**mar 23/12/25**	**vie 17/07/26**	**$ 947.000.767,00**
499		PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO MR (40 Kg/cm2)	35 días	mar 23/12/25	sáb 13/06/26	$ 732.489.217,00
500		ADECUACIÓN DE CÁMARAS DE INSPECCIÓN (MANHOLES) EN CONC	7 días	sáb 13/06/26	mar 23/06/26	$ 6.494.820,00
501		BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	20 días	mar 23/06/26	vie 17/07/26	$ 121.701.001,00
502		ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa	20 días	mar 19/05/26	sáb 13/06/26	$ 86.315.729,00
503		**SEÑALIZACION**	**214 días**	**mié 11/06/25**	**sáb 25/07/26**	**$ 31.286.442,00**
504		SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON LAMINA RETROREFLECTIVA DE 60CM X 60CM	3 días	vie 17/07/26	mié 22/07/26	$ 8.226.932,00
505		SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON DOBLE LAMINA RETROREFLECT	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
506		DEMARCACION HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRILICA BASE SOLVENTE - M2. (INCLUYE IMPRIMANTE, SUMINISTRO, APLICACIÓN CON EQUIPO Y MICROESFERAS)	2 días	vie 17/07/26	mar 21/07/26	$ 6.384.906,00
507		DEMARCACION HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRILICA BASE SOLVENTE - M (12 CM). (INCLUYE IMPRIMANTE, SUMINISTRO, APLICACIÓN CON EQUIPO Y MICROESFERAS)	6 días	vie 17/07/26	sáb 25/07/26	$ 14.859.712,00
508		REDUCTORES DE VELOCIDAD TIPO RESALTO PLÁSTICO PERNADO	2 días	vie 17/07/26	mar 21/07/26	$ 1.814.892,00
509		**ESPACIO PUBLICO ANDENES Y MOBILIARIOS**	**213 días**	**mié 11/06/25**	**vie 24/07/26**	**$ 98.846.083,00**
510		S/I TABLETA GUÍA PREF. TÁCTIL PARA DISCAP. EN CONCRETO DE 0.20m X 0.20m X 0.06m COLOR AMARILLO TIPO TOPEROL (UNA HILERA) CON MORTERO 1:4, INCLUYE ARENA H.=0.04 m, RELLENO CON MATERIAL COMPACTADO SELECCIONADO DE 0.20m Y JUNTAS SELLADAS	20 días	mar 23/06/26	vie 17/07/26	$ 4.367.936,00
511		FRANJA DEMARCADORA PARA LIMITADOS VISUALES CON ADOQUÍN EN CONCRETO DE 20cm X 10cm X 6cm COLOR AMARILLO PARA EMBEBER EN MORTERO, APAREJADO SEGÚN DISEÑO. INCLUYE MORTERO 1:4, ARENA H.=4 CM, INSTALACIÓN, COMPACTACIÓN, JUNTAS SELLADAS CON ARENA	20 días	lun 29/06/26	vie 24/07/26	$ 45.935.655,00
512		CONSTRUCCIÓN PISO EN CONCRETO ESTAMPADO TIPO RONDA, 21 MPA (3.000 PSI). E=0,08M FUNDIDO EN SITIO, JUNTAS SEGÚN DISEÑO. INCLUYE EXCAVACIÓN, MATERIAL SELECCIONADO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.	20 días	lun 29/06/26	vie 24/07/26	$ 8.088.158,00
513		RAMPA PEATONAL INCLUYE BORDILLOS DE CAMBIO DE NIVEL, SARDINEL, ADOQUÍN TÁCTIL TIPO ALERTA Y PLANTILLA EN CONCRETO	15 días	lun 6/07/26	vie 24/07/26	$ 19.229.130,00
514		RAMPA PARA USO VEHICULAR DE 4.20M X 1.20M, INCLUYE BORDILLO DE CONCRETO DE CAMBIO DE NIVEL, LOSETA TOPEROL, ADOQUIN EN CONCRETO DE 20CM X 10CM X 6CM COLOR AMARILLO, PLACA ENCONCRETO 0.15MTS DE ESPESOR, EXCAVACIONMANUAL, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
515		S/I BOLARDOS ALTO EN HIERRO TIPO M63 - IDU EMPOTRADOS EN CONCRETO; INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	4 días	sáb 11/07/26	jue 16/07/26	$ 21.225.204,00
516		**OTRAS ACTIVIDADES**	**179 días**	**mié 11/06/25**	**jue 11/06/26**	**$ 10.778.536,00**
517		S/I TUBERÍA PARA PROLONGACIÓN DE DRENAJES DE AGUAS LLUVIA EN 4". INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO	15 días	vie 22/05/26	jue 11/06/26	$ 6.253.246,00
518		REPARACIÓN DE DOMICILIARIAS DEL ACUEDUCTO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	15 días	vie 22/05/26	jue 11/06/26	$ 4.525.290,00
519		REUBICACIÓN TÍPICA MEDIDORES DE GAS RED DOMICILIARIA.	10 días	mié 11/06/25	mié 25/06/25	$ 0,00
520		**BOX CULVERT**	**57 días**	**vie 22/05/26**	**mar 4/08/26**	**$ 265.513.733,00**
521		EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN BAJO AGUA	2 días	vie 22/05/26	mar 26/05/26	$ 1.313.993,00
522		GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPA	2 días	mar 26/05/26	jue 28/05/26	$ 851.237,00
523		CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	2 días	vie 22/05/26	mar 26/05/26	$ 1.910.113,00
524		RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	12 días	mar 26/05/26	mié 10/06/26	$ 9.603.454,00
525		MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJON O SIMILAR)	2 días	mar 26/05/26	jue 28/05/26	$ 5.553.216,00
526		CONCRETO RESISTENCIA 28 MPA CLASE C (PARA ESTRUCTURA)	50 días	lun 1/06/26	mar 4/08/26	$ 138.665.367,00
527		ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa	35 días	vie 29/05/26	lun 13/07/26	$ 76.247.875,00
528		BARANDA METÁLICA PARA TRÁFICO VEHICULAR	15 días	lun 1/06/26	vie 19/06/26	$ 13.673.639,00
529		MANEJO DE CAUCE DE AGUA	20 días	vie 22/05/26	mié 17/06/26	$ 11.846.670,00
530		JUNTA PARA MURO EN CINTA PVC	20 días	jue 2/07/26	mar 28/07/26	$ 1.630.508,00

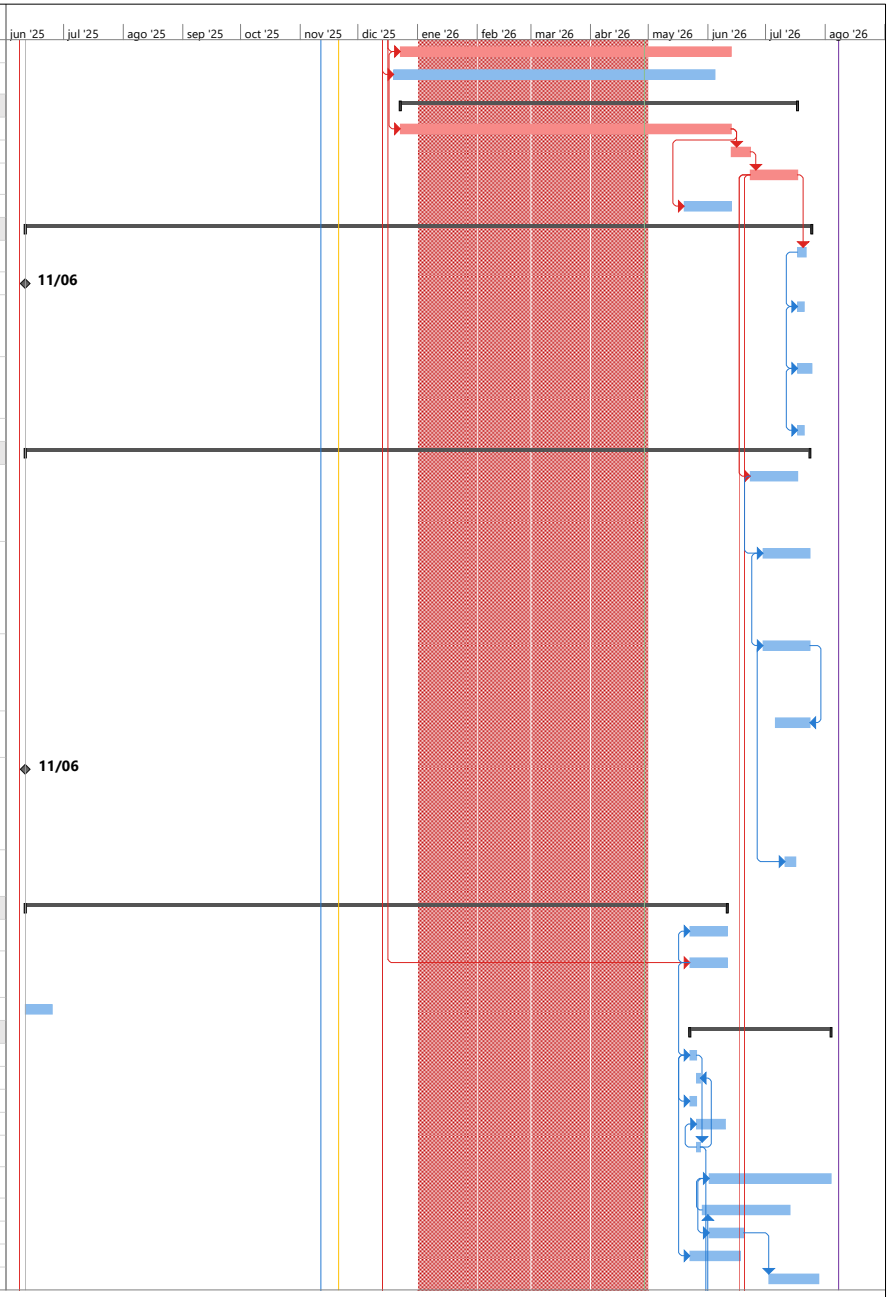

Proyecto: Project V1_ING LUIS
Fecha: mié 29/04/26

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
531		CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA CLASE F (SOLADO)	1 día	jue 28/05/26	vie 29/05/26	$ 4.217.661,00
532		**CUNETAS Y SUMIDEROS**	**30 días**	**mar 23/06/26**	**jue 30/07/26**	**$ 799.130.641,63**
533		EXCAVACION MANUAL	10 días	mar 23/06/26	lun 6/07/26	$ 37.695.686,00
534		CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	10 días	vie 26/06/26	jue 9/07/26	$ 38.488.692,00
535		GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPA	10 días	vie 26/06/26	jue 9/07/26	$ 0,00
536		RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	20 días	lun 6/07/26	jue 30/07/26	$ 22.145.791,00
537		ACERO DE REFUERZO FY = 420 MPA	20 días	lun 6/07/26	jue 30/07/26	$ 256.527.412,63
538		CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	20 días	lun 6/07/26	jue 30/07/26	$ 412.321.900,00
539		SUMIDERO TIPO VENTANA EN CONCRETO	7 días	mié 22/07/26	jue 30/07/26	$ 31.951.160,00
540		**RED DE MEDIA TENSION (13.200) VOL.**	**222 días**	**mié 11/06/25**	**mié 5/08/26**	**$ 29.725.299,00**
541		SUMINISTRO, INSTALACION E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS - 750 KGF).	18 días	mié 11/06/25	lun 7/07/25	$ 0,00
542		SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE CIMENTACION CILINDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS - 750 KGF).	18 días	lun 29/06/26	mié 22/07/26	$ 930.798,00
543		SUMINISTRO, INSTALACION E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS - 1050 KGF).	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
544		SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE CIMENTACION CILINDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS - 1050 KGF).	10 días	mar 7/07/26	lun 20/07/26	$ 2.335.196,00
545		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ALINEACION CON DISPOSICIÓN EN BANDERA BIFASICO A 13.2 KV., E INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	18 días	mié 1/07/26	vie 24/07/26	$ 3.208.546,00
546		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ANGULO CON DISPOSICIÓN EN BANDERA A 13.2 KV., E INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	18 días	vie 3/07/26	lun 27/07/26	$ 5.481.933,00
547		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN FIN DE LINEA COMPACTA CON DISPOSICIÓN CENTRAL BIFASICO A 13.2 KV., E INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	15 días	vie 10/07/26	mié 29/07/26	$ 4.473.546,00
548		SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA MT BIFASICA AEREA EN CABLE DESNUDO DE ALUMINIO ACSR - No.	20 días	mié 11/06/25	mié 9/07/25	$ 0,00
549		SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA MT BIFASICA AEREA EN CABLE AISLADO DE ALUMINIO ECOLOGICO - No. 1/0 AWG.	20 días	vie 10/07/26	mié 5/08/26	$ 13.295.280,00
550		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA RETENIDA MT EN POSTE DE 12m A POSTE DE 9m	20 días	mié 11/06/25	mié 9/07/25	$ 0,00
551		INSTALACION EN CALIENTE DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA SECCIONADOR BIFASICO A 13.2 KV.	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
552		INSTALACION CON TENSION DE ARMADO PARA ESTRUCTURA DE M	20 días	mié 11/06/25	mié 9/07/25	$ 0,00
553		INSTALACION CON TENSION A 13.2 KV. DE POSTE EN CONCRETO	20 días	mié 11/06/25	mié 9/07/25	$ 0,00
554		**RED DE BAJA TENSION (240/120) VOL.**	**221 días**	**mié 11/06/25**	**mar 4/08/26**	**$ 25.464.113,00**
555		INSTALACION E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 1050 KGF).	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
556		SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE CIMENTACION CILINDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 1050 KGF).	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 1.826.838,00
557		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ALINEACION - ANGULO - FINAL DE CIRCUITO PARA	18 días	mar 7/07/26	mié 29/07/26	$ 1.907.026,00
558		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ANCLAJE PARA BT A 240/120 VOL.	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
559		SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA BT BIFASICA AEREA EN CABLE TRIPLEX DE ALUMINIO - No. 2 AWG.	20 días	jue 9/07/26	mar 4/08/26	$ 1.903.340,00
560		SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA BT BIFASICA AEREA EN CABLE TRIPLEX DE ALUMINIO - No. 1/0 AWG.	5 días	sáb 11/07/26	vie 17/07/26	$ 1.018.280,00
561		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA RETENIDA A TIERRA EN POSTE DE 9 MTS.	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
562		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA PUESTA A TIERRA DE RED TRENSADA DE BT A 120/240 VOL., EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
563		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA CAJA DE CONEXIÓN (4 USUARIOS) A RED TRENSADA DE BT A	18 días	sáb 11/07/26	mar 4/08/26	$ 7.227.579,00
564		DESINSTALACION DE POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 1050 750-510 KGF).	15 días	sáb 11/07/26	jue 30/07/26	$ 7.772.910,00
565		DESMONTE, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA RED DE	18 días	sáb 11/07/26	mar 4/08/26	$ 3.808.140,00
566		**SUBESTACIONES ELECTRICAS (13.200/240/120) VOL.**	**0 días**	**mié 11/06/25**	**mié 11/06/25**	**$ 0,00**

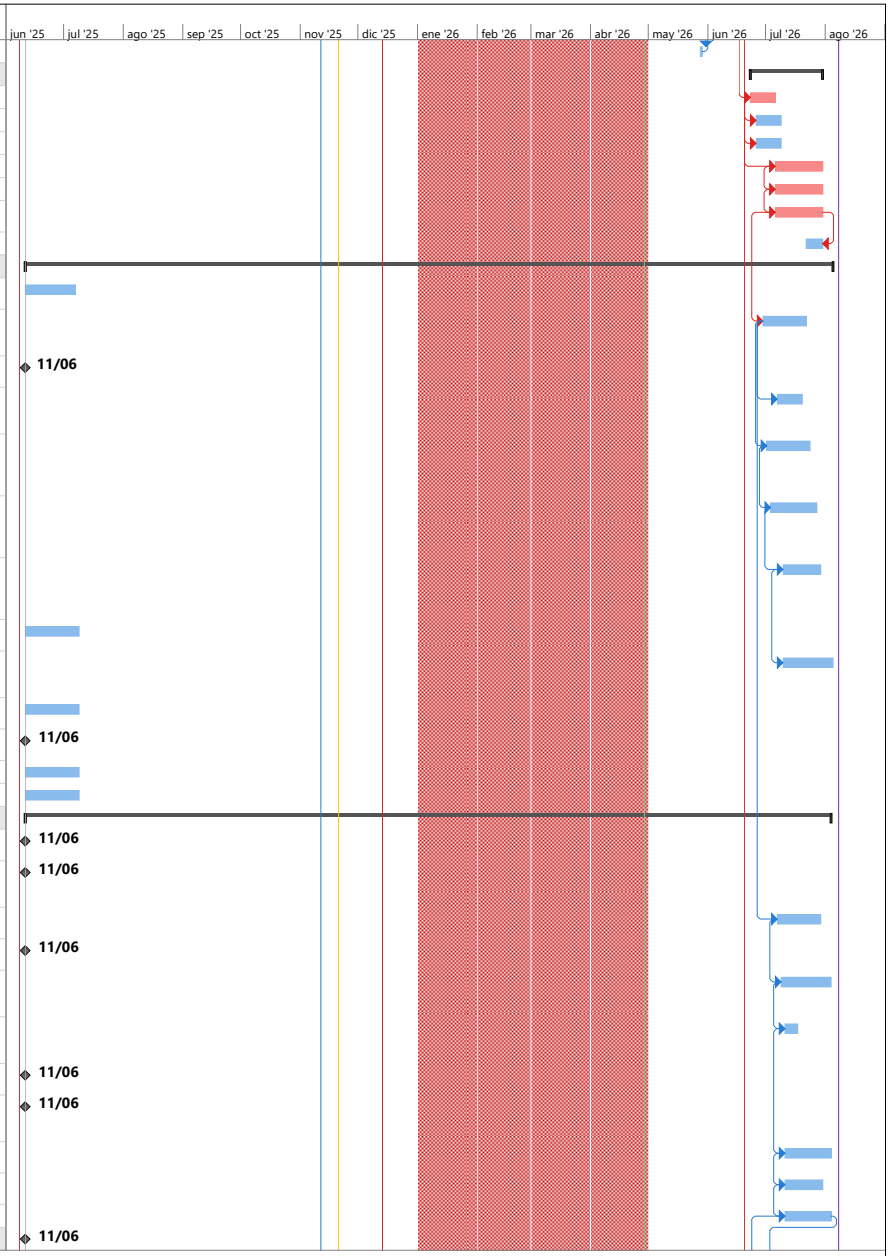

Proyecto: Project V1_ING LUIS
Fecha: mié 29/04/26

Tarea | Resumen del proyecto | Tarea manual | solo el comienzo | Fecha límite | Progreso manual
División | Tarea inactiva | solo duración | solo fin | Tareas críticas
Hito | Hito inactivo | Informe de resumen manual | Tareas externas | División crítica
Resumen | Resumen inactivo | Resumen manual | Hito externo | Progreso


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
567		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ADECUACION DE SUBESTACION BIFASICA EN POSTE A (13.200/240/120) VOL.,INCLUYE: INSTALACION PUENTES DE SECCIONADOR, ESTRUCTURA DE PROTECCIONES, SECCIONADOR, DPS, DESMONTE Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR.	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
568		**ALUMBRADO PUBLIICO, ALIMENTADORES Y MEDIDAS DE BAJA TENSION (240/120) VOL.**	**218 días**	**mié 11/06/25**	**jue 30/07/26**	**$ 8.655.768,00**
569		SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE CABLE CONCENTRICO DE ALUMINIO - (2xNo. 6 + 1xNo. 6) AWG.	25 días	lun 29/06/26	jue 30/07/26	$ 3.041.560,00
570		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA REUBICACION DE MEDIDOR (240/120) VOL.	18 días	lun 29/06/26	mié 22/07/26	$ 3.676.998,00
571		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA REINSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO.	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 1.937.210,00
572		**ITEM NO PREVISTO**	**221 días**	**mié 11/06/25**	**mar 4/08/26**	**$ 150.907.486,00**
573		CONEXION ACOMETIDAS DOMICILIARIA PVC NUEVA 8" X 6", (INCULYE ACCESORIOS, TUBERIA PVC LPROMEDIO= 10M)	60 días	lun 17/11/25	jue 11/06/26	$ 112.803.930,00
574		REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES Y ARBUSTOS CON DAP MENOR O IGUAL A 10 CM INCLUYE TRANSPORTE RESIDUOS)	15 días	vie 19/12/25	sáb 16/05/26	$ 3.600.067,00
575		CONFORMACIÓN DE TERRAPLÉN CON MATERIAL DE PRÉSTAMO	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
576		RAMPA PARA USO VEHICULAR, INCLUYE BORDILLO DE CONCRETO DE CAMBIO DE NIVEL, LOSETA TOPEROL, ADOQUIN EN CONCRETO DE 20CM X 10CM X 6CM COLOR AMARILLO,	28 días	lun 29/06/26	mar 4/08/26	$ 30.390.129,00
577		CONCRETO DE 3000 PSI PARA BORDILLO H:1.0M * 0,20 M, FUNDIDO IN SITU REFORZADO	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
578		REUBICACION TUBERIA SANITARIA 6".	5 días	vie 19/12/25	lun 4/05/26	$ 4.113.360,00
579		**ITEM NO PREVISTO 2**	**206 días**	**mié 11/06/25**	**mié 15/07/26**	**$ 183.568.880,00**
580		CONCRETO DE 3000 PSI PARA BORDILLO H: VARIABLE * 0,20 M, FUNDIDO IN SITU REFORZADO	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
581		CONSTRUCCIÓN PISO EN CONCRETO ESTAMPADO TIPO RONDA, 21 MPA (3.000 PSI). E=0,08M FUNDIDO EN SITIO, JUNTAS SEGÚN DISEÑO.	50 días	lun 4/05/26	mar 7/07/26	$ 83.930.859,00
582		CONSTRUCCIÓN DE PISO EN CONCRETO 21 MPA (3.000 PSI) E=0,08M FUNDIDO EN SITIO, JUNTAS SEGÚN DISEÑO. INCLUYE RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
583		CONCRETO DE 3000 PSI PARA BORDILLO H: 20 CM FUNDIDO IN SITU ESPESOR=20 CM	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
584		S/I TABLETA GUÍA PREF. TÁCTIL PARA DISCAP. EN CONCRETO DE 0.20m X 0.20m X 0.06m COLOR AMARILLO TIPO TOPEROL (UNA HILERA) CON MORTERO 1:4, INCLUYE ARENA H.=0.04 m, JUNTAS SELLADAS	45 días	lun 11/05/26	mar 7/07/26	$ 44.899.411,00
585		RAMPA PARA USO VEHICULAR SOBRE CUNETA, INCLUYE BORDILLO DE CONCRETO DE CAMBIO DE NIVEL, LOSETA TOPEROL, ADOQUIN EN CONCRETO DE 20CM X 10CM X 6CM COLOR AMARILLO, PLACA 0,15MTS DE ESPESOR. INCLUYE ACERO DE REFUERZO	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
586		EXCAVACIONES MECÁNICAS CON EXCAVADORA PROFUNDIDAD <2M NO INCLUYE RETIRO	15 días	sáb 16/05/26	jue 4/06/26	$ 6.059.362,00
587		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO PVC 8	10 días	sáb 16/05/26	vie 29/05/26	$ 17.383.687,00
588		CONCRETO RESISTENCIA 21 MPA PARA CONSTRUCCION DE MH	10 días	mar 12/05/26	lun 25/05/26	$ 10.895.193,00
589		REUBICACION DE CAJA DE REGISTRO DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC DE 6	8 días	jue 4/06/26	lun 15/06/26	$ 13.568.570,00
590		REUBICACION DE REGISTRO DE AGUA POTABLE	8 días	jue 4/06/26	lun 15/06/26	$ 3.382.116,00
591		TAPAS DE INSPECCION CUNETAS	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
592		SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS METÁLICAS TIPO PANAL (TRAFICO PESADO) PARA CARCAMOS	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
593		INSTALACION E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS - 1050 KGF).	5 días	jue 9/07/26	mié 15/07/26	$ 3.449.682,00

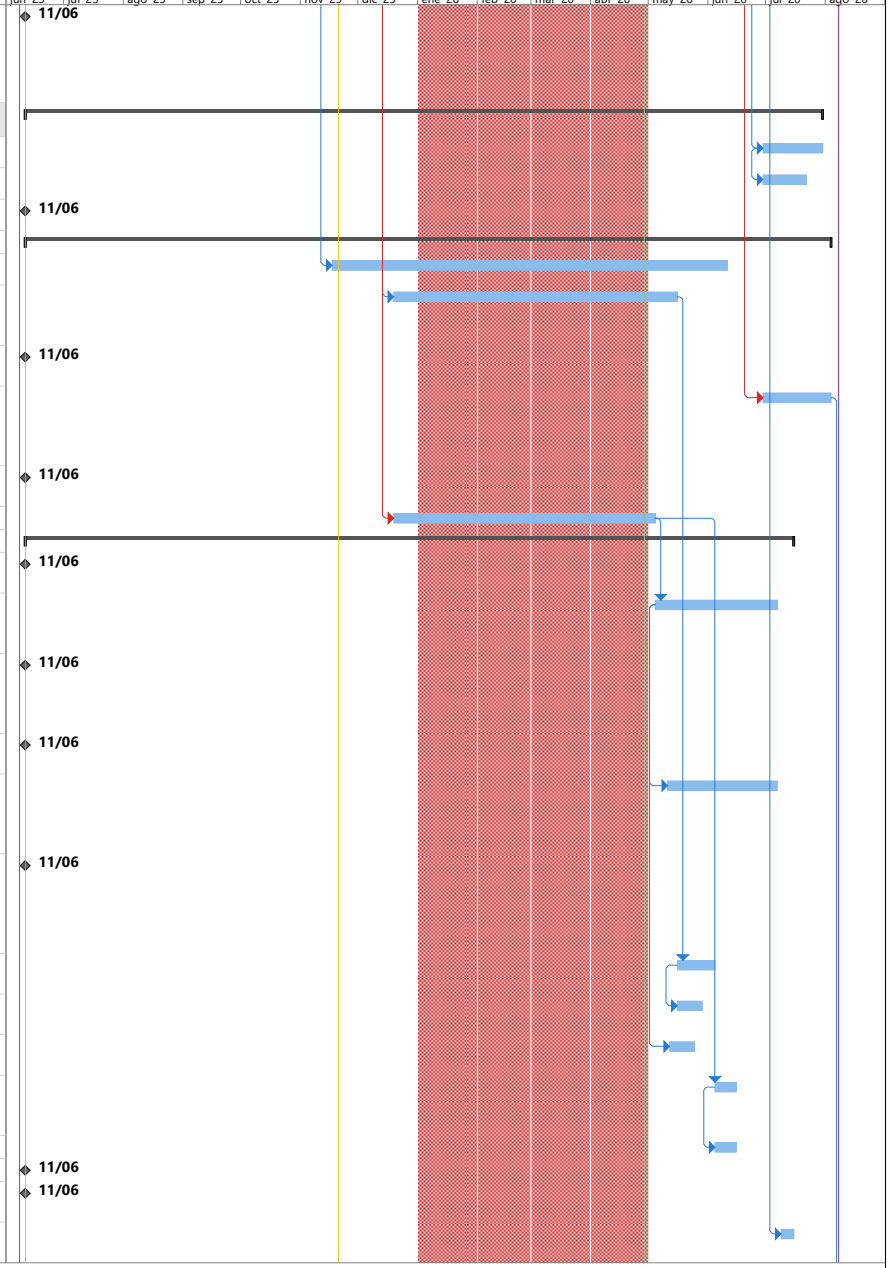

Proyecto: Project V1_ING LUIS
Fecha: mié 29/04/26

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
594		SUMINISTRO, INSTALACION E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 1050 KGF).	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
595		CONCRETO DE 3000 PSI FUNDIDO IN SITU PARA DESCOLES	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
596		**FIN TRAMO 5**	**0 días**	**mar 4/08/26**	**mar 4/08/26**	**$ 0,00**
597		**TRAMO 6 CALLE 126A ENTRE LA CALLE 126 Y LA CRA 1D-GARZONES**	**223 días?**	**mié 11/06/25**	**jue 6/08/26**	**$ 4.807.138.778,00**
598		**ACTIVIDADES PRELIMINARES**	**222 días**	**mié 11/06/25**	**mié 5/08/26**	**$ 297.041.488,00**
599		DEMOLICIÓN DE BORDILLOS DE CONCRETO	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
600		CORTE DE PISO EN TABLON Y PLANTILLA DE CONCRETO E= 0.10MTS/0.15MTS CON CORTADORA	30 días	lun 22/12/25	vie 5/06/26	$ 10.704.190,00
601		DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO	30 días	lun 22/12/25	vie 5/06/26	$ 8.910.616,00
602		DEMOLICION DE ESTRUCTURAS	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
603		DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
604		EXCAVACIONES MECÁNICAS CON EXCAVADORA PARA FALLOS EN SUB RASANTE. PROFUNDIDAD > 50 CM. NO INCLUYE RETIRO	75 días	mié 11/06/25	vie 19/09/25	$ 0,00
605		EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	90 días	mar 18/11/25	mar 21/07/26	$ 52.994.739,00
606		CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	35 días	jue 18/06/26	lun 3/08/26	$ 165.880.917,00
607		REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURA MENOR O IGUAL H= 5 M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAIZ)	3 días	mié 29/07/26	lun 3/08/26	$ 4.210.560,00
608		REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURA ENTRE H= 5.1M A 10M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAIZ)	2 días	lun 3/08/26	mié 5/08/26	$ 14.095.026,00
609		REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURAS ENTRE H= 10.1M A 15 M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAÍZ)	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
610		PODA DE FORMACIÓN ÁRBOLES ALTURA MENOR O IGUAL H= 5 M (INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS)	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
611		SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ARBOLES DE ESPECIES NATIVAS DE 1.5 M DE ALTURA, INCLUYE EXCAVACION, ABONO ORGANICO, TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO	0 días	mié 5/08/26	mié 5/08/26	$ 40.245.440,00
612		**SUBRASANTE Y SUBBASE**	**215 días**	**mié 11/06/25**	**lun 27/07/26**	**$ 557.470.563,00**
613		MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON MATERIAL SELECCIONADO	90 días	mar 25/11/25	lun 27/07/26	$ 222.889.202,00
614		MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJÓN O SIMILAR)	75 días	mié 11/06/25	vie 19/09/25	$ 0,00
615		SUBBASE GRANULAR CLASE C	80 días	mié 3/12/25	jue 23/07/26	$ 264.644.508,00
616		GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	75 días	mié 3/12/25	jue 16/07/26	$ 69.936.853,00
617		**PAVIMENTO Y BORDILLOS**	**80 días**	**vie 12/12/25**	**jue 30/07/26**	**$ 1.527.101.423,00**
618		PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO MR (40 Kg/cm2)	65 días	vie 12/12/25	sáb 11/07/26	$ 1.245.617.884,00
619		ADECUACIÓN DE CÁMARAS DE INSPECCIÓN (MANHOLES) EN CONCRETO DE 3000 PSI	15 días	sáb 11/07/26	jue 30/07/26	$ 9.742.230,00
620		BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	30 días	mar 23/06/26	jue 30/07/26	$ 106.095.275,00
621		ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa	30 días	mié 3/06/26	sáb 11/07/26	$ 165.646.034,00
622		**SEÑALIZACION**	**7 días**	**lun 6/07/26**	**mar 14/07/26**	**$ 72.150.411,00**
623		SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON LAMINA RETROREFLECTIVA DE 60CM X 60CM	7 días	lun 6/07/26	mar 14/07/26	$ 19.392.054,00
624		SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON DOBLE LAMINA RETROREFLECTIVA DE 60CM X 60CM	2 días	sáb 11/07/26	mar 14/07/26	$ 918.824,00
625		DEMARCACION HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRILICA BASE SOLVENTE - M2. (INCLUYE IMPRIMANTE, SUMINISTRO, APLICACIÓN CON EQUIPO Y MICROESFERAS)	2 días	sáb 11/07/26	mar 14/07/26	$ 10.825.318,00
626		DEMARCACION HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRILICA BASE SOLVENTE - M (12 CM). (INCLUYE IMPRIMANTE, SUMINISTRO, APLICACIÓN CON EQUIPO Y MICROESFERAS)	7 días	lun 6/07/26	mar 14/07/26	$ 20.596.680,00
627		REDUCTORES DE VELOCIDAD TIPO RESALTO PLÁSTICO PERNADO	2 días	sáb 11/07/26	mar 14/07/26	$ 20.417.535,00
628		**ESPACIO PUBLICO ANDENES Y MOBILIARIOS**	**218 días**	**mié 11/06/25**	**jue 30/07/26**	**$ 216.334.802,00**

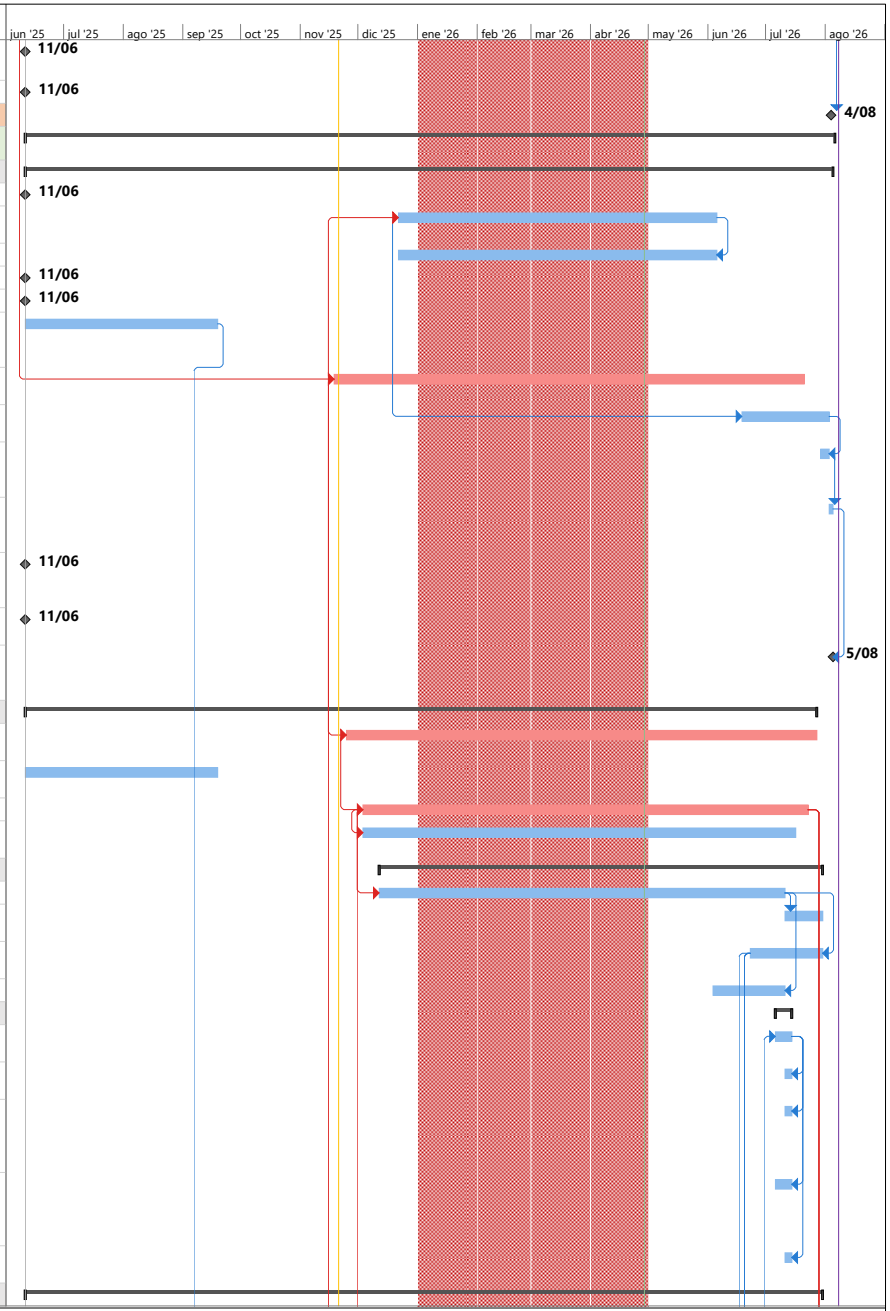

Proyecto: Project V1_ING LUIS
Fecha: mié 29/04/26

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
629		S/I TABLETA GUÍA PREF. TÁCTIL PARA DISCAP. EN CONCRETO DE 0.20m X 0.20m X 0.06m COLOR AMARILLO TIPO TOPEROL (UNA HILERA) CON MORTERO 1:4, INCLUYE ARENA H.=0.04 m, RELLENO CON MATERIAL COMPACTADO SELECCIONADO DE 0.20m Y JUNTAS SELLADAS	25 días	lun 29/06/26	jue 30/07/26	$ 38.238.360,00
630		FRANJA DEMARCADORA PARA LIMITADOS VISUALES CON ADOQUÍN EN CONCRETO DE 20cm X 10cm X 6cm COLOR AMARILLO PARA EMBEBER EN MORTERO, APAREJADO SEGÚN DISEÑO. INCLUYE MORTERO 1:4, ARENA H.=4 CM, INSTALACIÓN, COMPACTACIÓN, JUNTAS SELLADAS CON ARENA	25 días	lun 29/06/26	jue 30/07/26	$ 66.291.466,00
631		CONSTRUCCIÓN PISO EN CONCRETO ESTAMPADO TIPO RONDA, 21 MPA (3.000 PSI). E=0,08M FUNDIDO EN SITIO, JUNTAS SEGÚN DISEÑO. INCLUYE EXCAVACIÓN, MATERIAL SELECCIONADO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.	25 días	lun 29/06/26	jue 30/07/26	$ 70.806.406,00
632		RAMPA PEATONAL INCLUYE BORDILLOS DE CAMBIO DE NIVEL, SARDINEL, ADOQUÍN TÁCTIL TIPO ALERTA Y PLANTILLA EN CONCRETO	10 días	vie 17/07/26	jue 30/07/26	$ 19.229.130,00
633		RAMPA PARA USO VEHICULAR DE 4.20M X 1.20M, INCLUYE BORDILLO DE CONCRETO DE CAMBIO DE NIVEL, LOSETA TOPEROL, ADOQUIN EN CONCRETO DE 20CM X 10CM X 6CM COLOR AMARILLO, PLACA ENCONCRETO 0.15MTS DE ESPESOR, EXCAVACIONMANUAL, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
634		S/I BOLARDOS ALTO EN HIERRO TIPO M63 - IDU EMPOTRADOS EN CONCRETO; INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	5 días	vie 17/07/26	vie 24/07/26	$ 21.769.440,00
635		**OTRAS ACTIVIDADES**	**20 días**	**sáb 27/06/26**	**jue 23/07/26**	**$ 33.548.951,00**
636		S/I TUBERÍA PARA PROLONGACIÓN DE DRENAJES DE AGUAS LLUVIA EN 4". INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO	15 días	vie 3/07/26	jue 23/07/26	$ 17.045.137,00
637		REPARACIÓN DE DOMICILIARIAS DEL ACUEDUCTO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	20 días	sáb 27/06/26	jue 23/07/26	$ 14.868.810,00
638		REUBICACIÓN TÍPICA MEDIDORES DE GAS RED DOMICILIARIA.	5 días	jue 16/07/26	jue 23/07/26	$ 1.635.004,00
639		**BOX CULVERT**	**192 días**	**mié 11/06/25**	**sáb 27/06/26**	**$ 18.078.748,00**
640		EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN BAJO AGUA	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
641		GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
642		CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
643		RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
644		MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJON O SIMILAR)	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
645		CONCRETO RESISTENCIA 28 MPA CLASE C (PARA ESTRUCTURA)	25 días	mié 27/05/26	sáb 27/06/26	$ 18.078.748,00
646		ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
647		BARANDA METÁLICA PARA TRÁFICO VEHICULAR	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
648		MANEJO DE CAUCE DE AGUA	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
649		JUNTA PARA MURO EN CINTA PVC	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
650		CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA CLASE F (SOLADO)	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
651		**CUNETAS Y SUMIDEROS**	**222 días**	**mié 11/06/25**	**mié 5/08/26**	**$ 1.602.622.639,00**
652		EXCAVACION MANUAL	45 días	mié 27/05/26	jue 23/07/26	$ 87.815.997,00
653		CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	35 días	mar 9/06/26	jue 23/07/26	$ 72.695.755,00
654		GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	35 días	mié 11/06/25	lun 28/07/25	$ 0,00
655		RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	35 días	lun 15/06/26	mié 29/07/26	$ 37.051.100,00
656		ACERO DE REFUERZO FY = 420 MPA	35 días	lun 22/06/26	mié 5/08/26	$ 512.725.582,00
657		CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	70 días	jue 7/05/26	mié 5/08/26	$ 828.431.885,00
658		SUMIDERO TIPO VENTANA EN CONCRETO	15 días	mar 2/06/26	lun 22/06/26	$ 63.902.320,00
659		**RED DE MEDIA TENSION (13.200) VOL.**	**220 días?**	**mié 11/06/25**	**lun 3/08/26**	**$ 127.765.098,00**
660		SUMINISTRO, INSTALACION E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS - 750 KGF).	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00

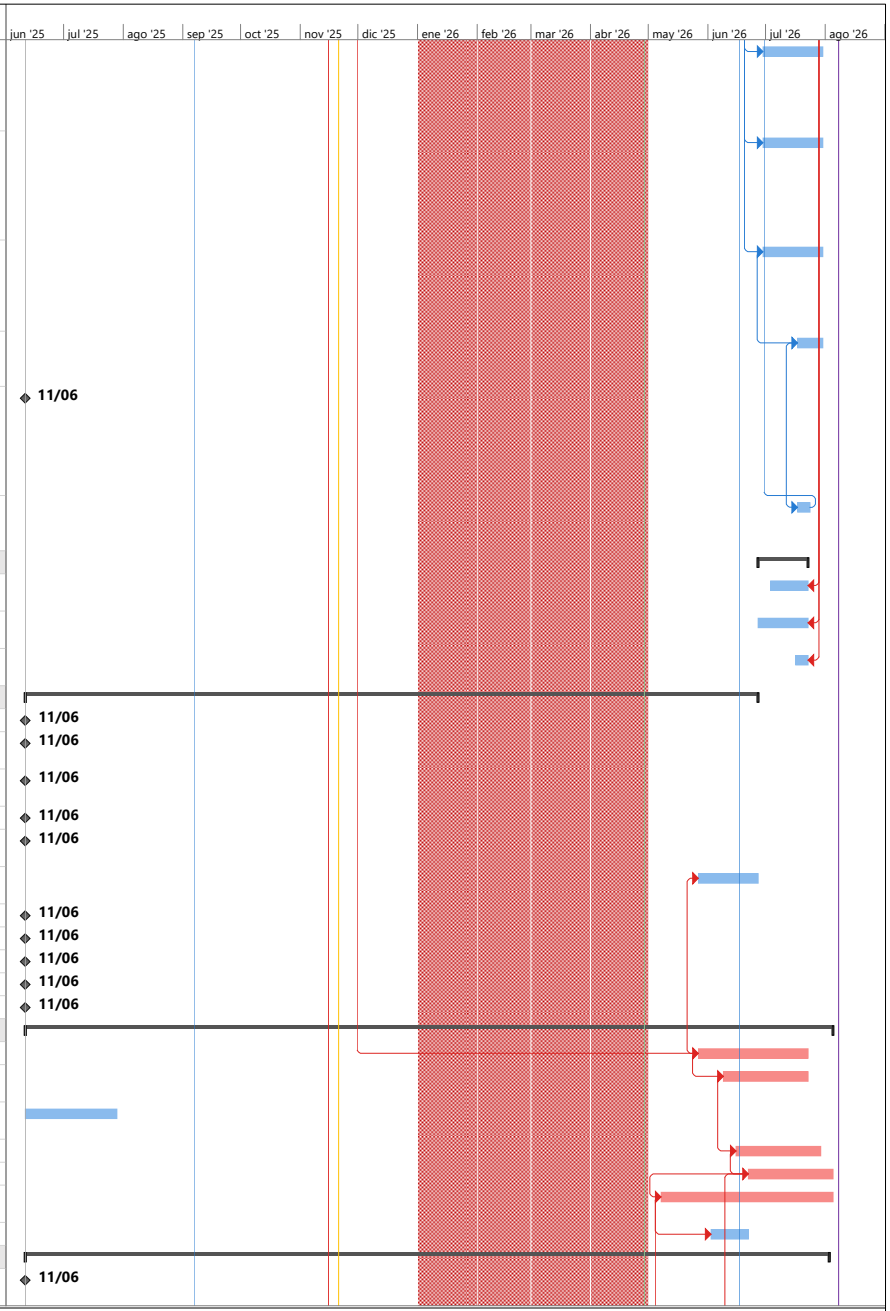

Proyecto: Project V1_ING LUIS
Fecha: mié 29/04/26

Tarea	Resumen del proyecto	Tarea manual	solo el comienzo	Fecha límite	Progreso manual		
División	Tarea inactiva	solo duración	solo fin	Tareas críticas			
Hito	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Tareas externas	División crítica			
Resumen	Resumen inactivo	Resumen manual	Hito externo	Progreso			


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
661		SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE CIMENTACION CILINDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS - 750 KGF).	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
662		SUMINISTRO, INSTALACION E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS - 1050 KGF).	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
663		SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE CIMENTACION CILINDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS - 1050 KGF).	20 días	lun 15/06/26	vie 10/07/26	$ 5.837.990,00
664		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ALINEACION CON DISPOSICIÓN EN BANDERA BIFASICO A 13.2 KV., E INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	20 días	sáb 27/06/26	jue 23/07/26	$ 12.834.184,00
665		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ANGULO CON DISPOSICIÓN EN BANDERA A 13.2 KV., E INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
666		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN FIN DE LINEA COMPACTA CON DISPOSICIÓN CENTRAL BIFASICO A 13.2 KV., E INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	20 días	lun 29/06/26	vie 24/07/26	$ 4.473.546,00
667		SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA MT BIFASICA AEREA EN CABLE DESNUDO DE ALUMINIO ACSR - No. 1/0 AWG.	1 día?	mié 11/06/25	jue 12/06/25	$ 0,00
668		SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA MT BIFASICA AEREA EN CABLE AISLADO DE ALUMINIO ECOLOGICO - No. 1/0 AWG.	20 días	mié 1/07/26	lun 27/07/26	$ 26.401.808,00
669		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA RETENIDA MT EN POSTE DE 12m A POSTE DE 9m	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
670		INSTALACION EN CALIENTE DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA SECCIONADOR BIFASICO A 13.2 KV.	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
671		INSTALACION CON TENSION DE ARMADO PARA ESTRUCTURA DE MT BIFASICO A 13.2 KV.	20 días	mié 8/07/26	lun 3/08/26	$ 28.021.585,00
672		INSTALACION CON TENSION A 13.2 KV. DE POSTE EN CONCRETO	20 días	mié 8/07/26	lun 3/08/26	$ 50.195.985,00
673		**RED DE BAJA TENSION (240/120) VOL.**	**219 días**	**mié 11/06/25**	**vie 31/07/26**	**$ 24.205.265,00**
674		INSTALACION E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 1050 KGF).	20 días	lun 15/06/26	vie 10/07/26	$ 1.229.299,00
675		SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE CIMENTACION CILINDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 1050 KGF).	20 días	mié 17/06/26	lun 13/07/26	$ 608.946,00
676		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ALINEACION - ANGULO - FINAL DE CIRCUITO PARA BT A 240/120 VOL.	20 días	vie 19/06/26	mié 15/07/26	$ 1.907.026,00
677		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ANCLAJE PARA BT A 240/120 VOL.	20 días	mié 24/06/26	lun 20/07/26	$ 1.168.623,00
678		SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA BT BIFASICA AEREA EN CABLE TRIPLEX DE ALUMINIO - No. 2 AWG.	35 días	lun 15/06/26	mié 29/07/26	$ 1.903.340,00
679		SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA BT BIFASICA AEREA EN CABLE TRIPLEX DE ALUMINIO - No. 1/0 AWG.	20 días	lun 15/06/26	vie 10/07/26	$ 509.140,00
680		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA RETENIDA A TIERRA EN POSTE DE 9 MTS.	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
681		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA PUESTA A TIERRA DE RED TRENSADA DE BT A 120/240 VOL., EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
682		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA CAJA DE CONEXIÓN (4 USUARIOS) A RED TRENSADA DE BT A 120/240 VOL.	20 días	vie 3/07/26	mié 29/07/26	$ 4.818.386,00
683		DESINSTALACION DE POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 1050 750-510 KGF).	20 días	mar 7/07/26	vie 31/07/26	$ 9.068.395,00
684		DESMONTE, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA RED DE TELECOMUNICACIONES	15 días	mar 7/07/26	sáb 25/07/26	$ 2.992.110,00
685		**SUBESTACIONES ELECTRICAS (13.200/240/120) VOL.**	**20 días**	**mié 17/06/26**	**lun 13/07/26**	**$ 10.281.318,00**

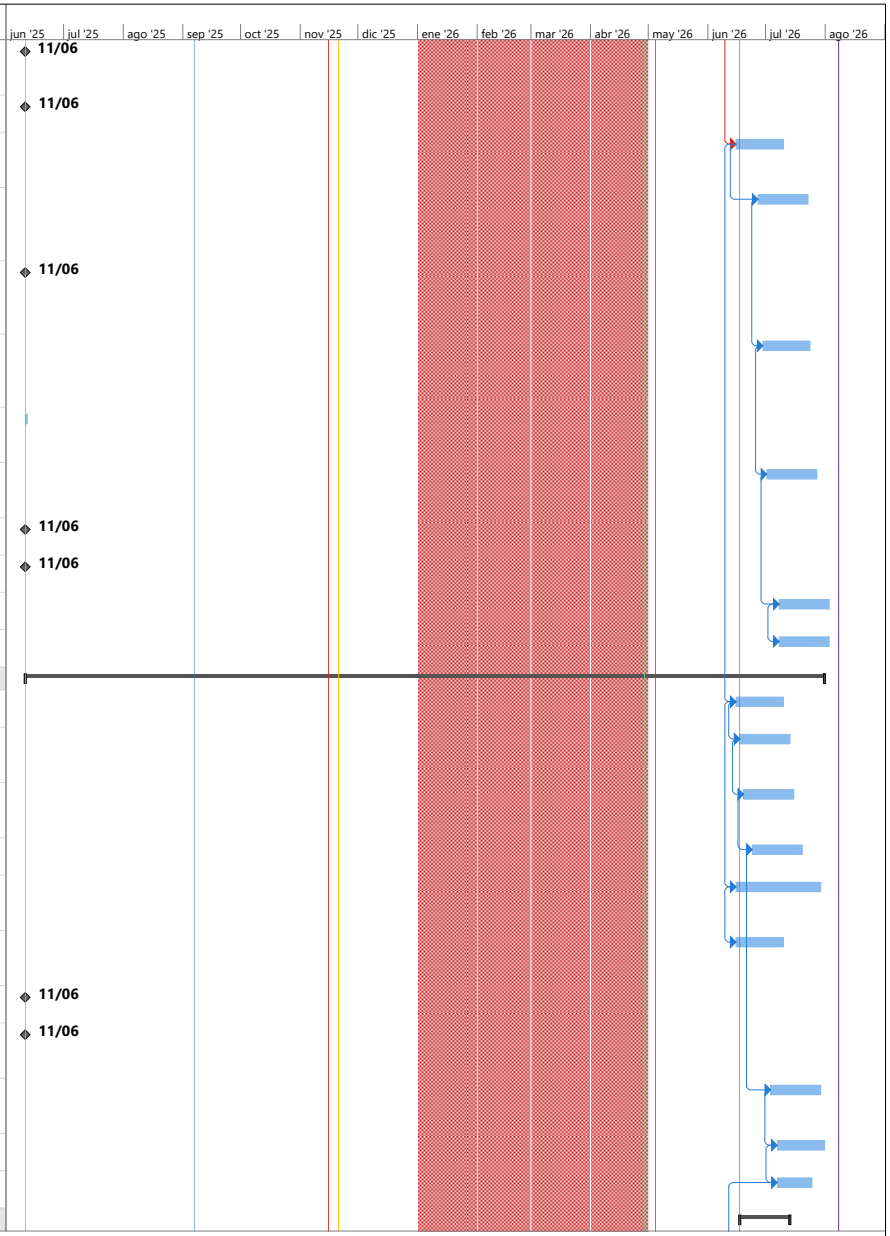

Proyecto: Project V1_ING LUIS
Fecha: mié 29/04/26

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
686		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ADECUACION DE SUBESTACION BIFASICA EN POSTE A (13.200/240/120) VOL.,INCLUYE: INSTALACION PUENTES DE SECCIONADOR, ESTRUCTURA DE PROTECCIONES, SECCIONADOR, DPS, DESMONTE Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR.	20 días	mié 17/06/26	lun 13/07/26	$ 10.281.318,00
687		**ALUMBRADO PUBLICO, ALIMENTADORES Y MEDIDAS DE BAJA TENSION (240/120) VOL.**	**206 días**	**mié 11/06/25**	**mié 15/07/26**	**$ 7.884.585,00**
688		SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE CABLE CONCENTRICO DE ALUMINIO - (2xNo. 6 + 1xNo. 6) AWG.	20 días	mié 17/06/26	lun 13/07/26	$ 3.041.560,00
689		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA REUBICACION DE MEDIDOR (240/120) VOL.	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
690		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA REINSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO.	20 días	vie 19/06/26	mié 15/07/26	$ 4.843.025,00
691		**ITEM NO PREVISTO**	**215 días**	**mié 11/06/25**	**lun 27/07/26**	**$ 45.290.593,00**
692		CONEXION ACOMETIDAS DOMICILIARIA PVC NUEVA 8" X 6", (INCULYE ACCESORIOS, TUBERIA PVC LPROMEDIO= 10M)	50 días	lun 25/05/26	lun 27/07/26	$ 17.547.278,00
693		REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES Y ARBUSTOS CON DAP MENOR O IGUAL A 10 CM INCLUYE TRANSPORTE RESIDUOS)	15 días	mié 8/07/26	lun 27/07/26	$ 12.857.382,00
694		CONFORMACIÓN DE TERRAPLÉN CON MATERIAL DE PRÉSTAMO	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
695		RAMPA PARA USO VEHICULAR, INCLUYE BORDILLO DE CONCRETO DE CAMBIO DE NIVEL, LOSETA TOPEROL, ADOQUIN EN CONCRETO DE 20CM X 10CM X 6CM COLOR AMARILLO,	20 días	mar 23/06/26	vie 17/07/26	$ 12.417.917,00
696		CONCRETO DE 3000 PSI PARA BORDILLO H:1.0M * 0,20 M, FUNDIDO IN SITU REFORZADO	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
697		REUBICACION TUBERIA SANITARIA 6".	5 días	vie 12/09/25	vie 19/09/25	$ 2.468.016,00
698		**ITEM NO PREVISTO 2**	**223 días**	**mié 11/06/25**	**jue 6/08/26**	**$ 267.362.894,00**
699		CONCRETO DE 3000 PSI PARA BORDILLO H: VARIABLE * 0,20 M, FUNDIDO IN SITU REFORZADO	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
700		CONSTRUCCIÓN PISO EN CONCRETO ESTAMPADO TIPO RONDA, 21 MPA (3.000 PSI). E=0,08M FUNDIDO EN SITIO, JUNTAS SEGÚN DISEÑO.	35 días	sáb 30/05/26	mar 14/07/26	$ 59.098.397,00
701		CONSTRUCCIÓN DE PISO EN CONCRETO 21 MPA (3.000 PSI) E=0,08M FUNDIDO EN SITIO, JUNTAS SEGÚN DISEÑO. INCLUYE RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
702		CONCRETO DE 3000 PSI PARA BORDILLO H: 20 CM FUNDIDO IN SITU ESPESOR=20 CM	35 días	sáb 30/05/26	mar 14/07/26	$ 49.479.720,00
703		S/I TABLETA GUÍA PREF. TÁCTIL PARA DISCAP. EN CONCRETO DE 0.20m X 0.20m X 0.06m COLOR AMARILLO TIPO TOPEROL (UNA HILERA) CON MORTERO 1:4, INCLUYE ARENA H.=0.04 m, JUNTAS SELLADAS	30 días	vie 12/06/26	mar 21/07/26	$ 31.617.564,00
704		RAMPA PARA USO VEHICULAR SOBRE CUNETA, INCLUYE BORDILLO DE CONCRETO DE CAMBIO DE NIVEL, LOSETA TOPEROL, ADOQUIN EN CONCRETO DE 20CM X 10CM X 6CM COLOR AMARILLO, PLACA 0,15MTS DE ESPESOR. INCLUYE ACERO DE REFUERZO	38 días	jue 18/06/26	jue 6/08/26	$ 36.632.172,00
705		EXCAVACIONES MECÁNICAS CON EXCAVADORA PROFUNDIDAD <2M NO INCLUYE RETIRO	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
706		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO PVC 8	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
707		CONCRETO RESISTENCIA 21 MPA PARA CONSTRUCCION DE MH	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
708		REUBICACION DE CAJA DE REGISTRO DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC DE 6	45 días	lun 18/05/26	mar 14/07/26	$ 47.489.995,00
709		REUBICACION DE REGISTRO DE AGUA POTABLE	5 días	vie 5/06/26	vie 12/06/26	$ 2.387.376,00
710		TAPAS DE INSPECCION CUNETAS	25 días	vie 5/06/26	mié 8/07/26	$ 13.455.913,00

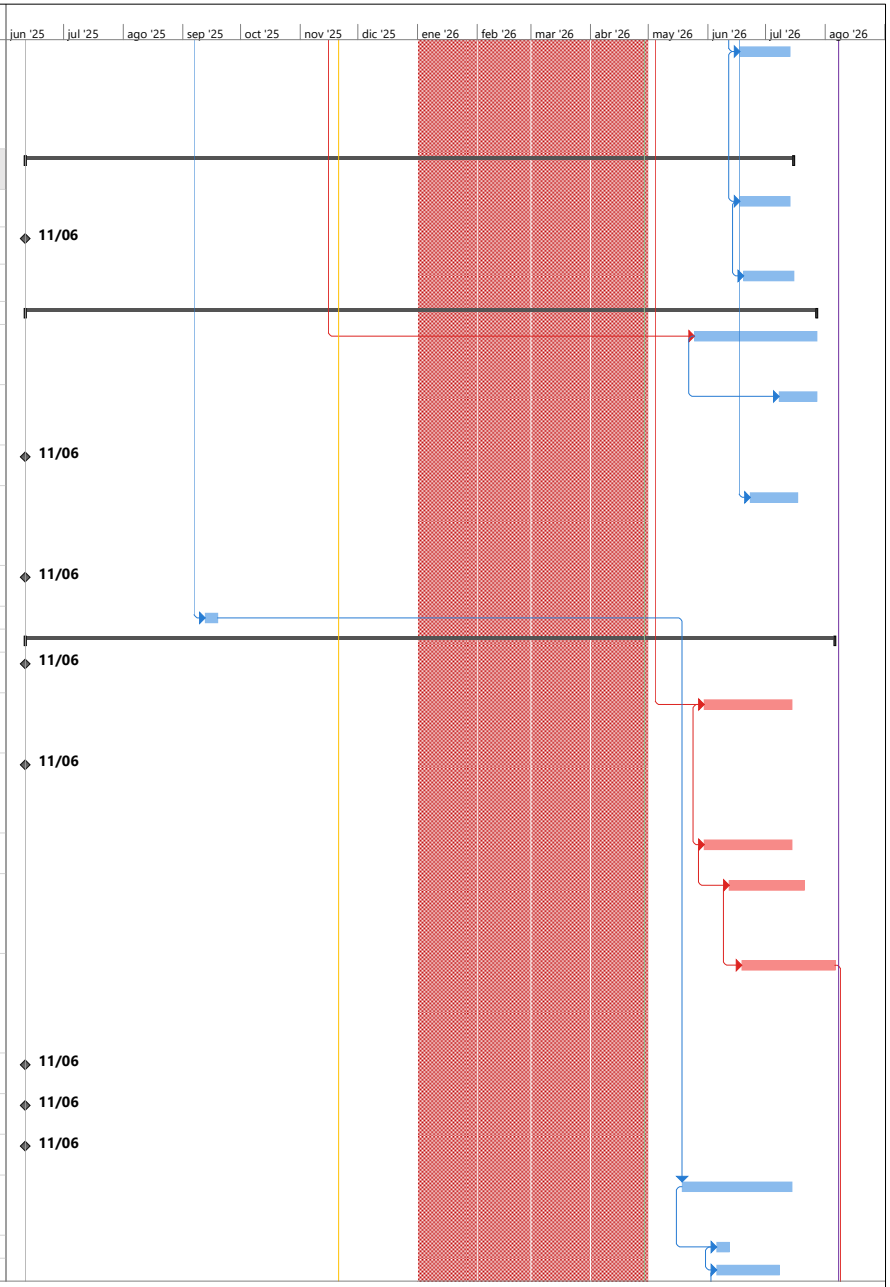

Proyecto: Project V1_ING LUIS
Fecha: mié 29/04/26

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
711		SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS METÁLICAS TIPO PANAL (TRAFICO PESADO) PARA CARCAMOS	30 días	vie 12/06/26	mar 21/07/26	$ 21.452.288,00
712		INSTALACION E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS - 1050 KGF).	15 días	lun 15/06/26	vie 3/07/26	$ 5.749.469,00
713		SUMINISTRO, INSTALACION E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 1050 KGF).	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
714		CONCRETO DE 3000 PSI FUNDIDO IN SITU PARA DESCOLES	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
715		**FIN TRAMO 6**	**0 días**	**jue 6/08/26**	**jue 6/08/26**	**$ 0,00**
716		**TRAMO 7 CRA 1D ENTRE LAS CALLES 126 Y 126A-GARZONES**	**154 días?**	**mié 11/06/25**	**lun 11/05/26**	**$ 449.509.704,00**
717		**ACTIVIDADES PRELIMINARES**	**133 días**	**mié 11/06/25**	**jue 4/12/25**	**$ 24.980.490,00**
718		DEMOLICIÓN DE BORDILLOS DE CONCRETO	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
719		CORTE DE PISO EN TABLON Y PLANTILLA DE CONCRETO E= 0.10MTS/0.15MTS CON CORTADORA	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
720		DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
721		DEMOLICION DE ESTRUCTURAS	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
722		DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
723		EXCAVACIONES MECÁNICAS CON EXCAVADORA PARA FALLOS EN SUB RASANTE. PROFUNDIDAD > 50 CM. NO INCLUYE RETIRO	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
724		EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	15 días	lun 10/11/25	vie 28/11/25	$ 6.048.368,00
725		CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	15 días	sáb 15/11/25	jue 4/12/25	$ 18.932.122,00
726		REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURA MENOR O IGUAL H= 5 M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAIZ)	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
727		REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURA ENTRE H= 5.1M A 10M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAIZ)	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
728		REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURAS ENTRE H= 10.1M A 15 M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS,	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
729		PODA DE FORMACIÓN ÁRBOLES ALTURA MENOR O IGUAL H= 5 M (INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS)	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
730		SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ARBOLES DE ESPECIES NATIVAS DE 1.5 M DE ALTURA, INCLUYE EXCAVACION, ABONO ORGANICO, TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
731		**SUBRASANTE Y SUBBASE**	**131 días**	**mié 11/06/25**	**mar 2/12/25**	**$ 74.392.494,00**
732		MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON MATERIAL SELECCIONADO	10 días	mar 18/11/25	lun 1/12/25	$ 29.593.820,00
733		MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJÓN O SIMILAR)	10 días	mié 11/06/25	mié 25/06/25	$ 0,00
734		SUBBASE GRANULAR CLASE C	10 días	mié 19/11/25	mar 2/12/25	$ 35.135.296,00
735		GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS	10 días	mar 18/11/25	lun 1/12/25	$ 9.663.378,00
736		**PAVIMENTO Y BORDILLOS**	**22 días**	**mié 26/11/25**	**sáb 2/05/26**	**$ 208.843.973,00**
737		PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO MR (40 Kg/cm2)	18 días	mié 26/11/25	vie 19/12/25	$ 166.126.009,00
738		ADECUACIÓN DE CÁMARAS DE INSPECCIÓN (MANHOLES) EN CONC	1 día	jue 18/12/25	vie 19/12/25	$ 1.082.470,00
739		BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	8 días	lun 15/12/25	sáb 2/05/26	$ 33.591.096,00
740		ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa	3 días	mar 16/12/25	vie 19/12/25	$ 8.044.398,00
741		**SEÑALIZACION**	**137 días**	**mié 11/06/25**	**jue 11/12/25**	**$ 13.110.645,00**
742		SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON LAMINA RETROREFLECTIVA DE	2 días	mar 9/12/25	jue 11/12/25	$ 2.350.552,00
743		SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON DOBLE LAMINA RETROREFLECT	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
744		DEMARCACION HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRILICA BASE SOLVENTE - M2. (INCLUYE IMPRIMANTE,	2 días	mar 9/12/25	jue 11/12/25	$ 1.393.070,00
745		DEMARCACION HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRILICA BASE SOLVENTE - M (12 CM). (INCLUYE IMPRIMANTE,	2 días	mar 9/12/25	jue 11/12/25	$ 3.922.347,00
746		REDUCTORES DE VELOCIDAD TIPO RESALTO PLÁSTICO PERNADO	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 5.444.676,00
747		**ESPACIO PUBLICO ANDENES Y MOBILIARIOS**	**140 días**	**mié 11/06/25**	**lun 15/12/25**	**$ 62.647.171,00**
748		S/I TABLETA GUÍA PREF. TÁCTIL PARA DISCAP. EN CONCRETO DE 0.20m X 0.20m X 0.06m COLOR AMARILLO TIPO TOPEROL (UNA HILERA) CON MORTERO 1:4, INCLUYE ARENA H.=0.04 m, RELLENO	15 días	mar 18/11/25	mar 9/12/25	$ 14.305.278,00

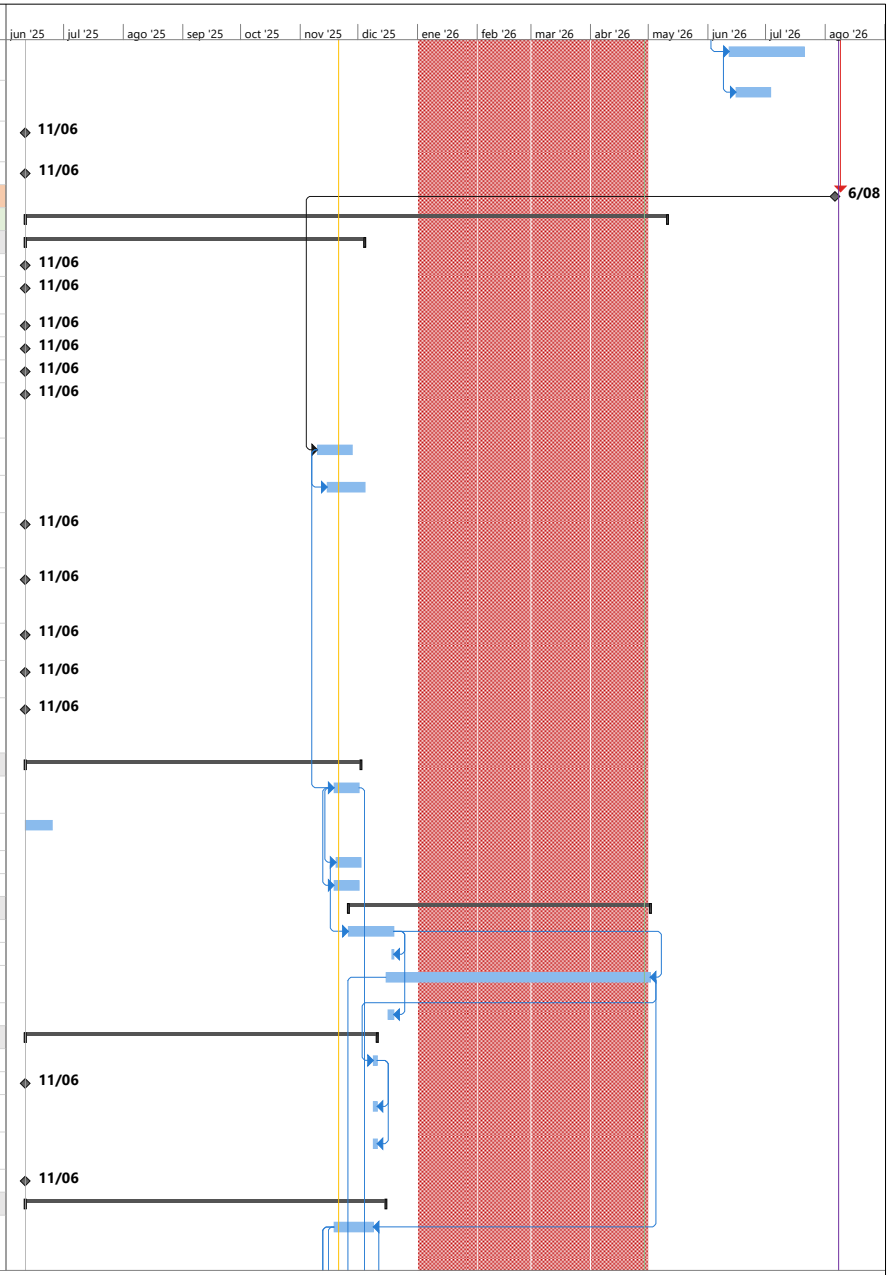

Proyecto: Project V1_ING LUIS
Fecha: mié 29/04/26

Tarea | Resumen del proyecto | Tarea manual | solo el comienzo | Fecha límite | Progreso manual
División | Tarea inactiva | solo duración | solo fin | Tareas críticas
Hito | Hito inactivo | Informe de resumen manual | Tareas externas | División crítica
Resumen | Resumen inactivo | Resumen manual | Hito externo | Progreso


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
749		FRANJA DEMARCADORA PARA LIMITADOS VISUALES CON ADOQUÍN EN CONCRETO DE 20cm X 10cm X 6cm COLOR AMARILLO PARA EMBEBER EN MORTERO, APAREJADO SEGÚN DISEÑO. INCLUYE MORTERO 1:4, ARENA H.=4 CM, INSTALACIÓN, COMPACTACIÓN, JUNTAS SELLADAS CON ARENA	15 días	mar 18/11/25	mar 9/12/25	$ 12.567.093,00
750		CONSTRUCCIÓN PISO EN CONCRETO ESTAMPADO TIPO RONDA, 21 MPA (3.000 PSI). E=0,08M FUNDIDO EN SITIO, JUNTAS SEGÚN DISEÑO. INCLUYE EXCAVACIÓN, MATERIAL SELECCIONADO, Y	20 días	mar 18/11/25	lun 15/12/25	$ 27.692.008,00
751		RAMPA PEATONAL INCLUYE BORDILLOS DE CAMBIO DE NIVEL, SARDINEL, ADOQUÍN TÁCTIL TIPO ALERTA Y PLANTILLA EN	10 días	mar 25/11/25	mar 9/12/25	$ 4.273.140,00
752		RAMPA PARA USO VEHICULAR DE 4.20M X 1.20M, INCLUYE BORDILLO DE CONCRETO DE CAMBIO DE NIVEL, LOSETA TOPEROL, ADOQUIN EN CONCRETO DE 20CM X 10CM X 6CM COLOR AMARILLO, PLACA ENCONCRETO 0.15MTS DE ESPESOR, EXCAVACIONMANUAL, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
753		S/I BOLARDOS ALTO EN HIERRO TIPO M63 - IDU EMPOTRADOS EN CONCRETO; INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA	5 días	mar 9/12/25	lun 15/12/25	$ 3.809.652,00
754		**OTRAS ACTIVIDADES**	**139 días**	**mié 11/06/25**	**sáb 13/12/25**	**$ 1.467.113,00**
755		S/I TUBERÍA PARA PROLONGACIÓN DE DRENAJES DE AGUAS LLUVIA EN 4". INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO	3 días	lun 1/12/25	jue 4/12/25	$ 605.153,00
756		REPARACIÓN DE DOMICILIARIAS DEL ACUEDUCTO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	6 días	jue 4/12/25	sáb 13/12/25	$ 861.960,00
757		REUBICACIÓN TÍPICA MEDIDORES DE GAS RED DOMICILIARIA.	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
758		**BOX CULVERT**	**0 días**	**mié 11/06/25**	**mié 11/06/25**	**$ 0,00**
759		EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN BAJO AGUA	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
760		GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
761		CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
762		RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
763		MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJON O SIMILAR)	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
764		CONCRETO RESISTENCIA 28 MPA CLASE C (PARA ESTRUCTURA)	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
765		ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
766		BARANDA METÁLICA PARA TRÁFICO VEHICULAR	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
767		MANEJO DE CAUCE DE AGUA	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
768		JUNTA PARA MURO EN CINTA PVC	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
769		CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA CLASE F (SOLADO)	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
770		**CUNETAS Y SUMIDEROS**	**0 días**	**mié 11/06/25**	**mié 11/06/25**	**$ 0,00**
771		EXCAVACION MANUAL	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
772		CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
773		GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
774		RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
775		ACERO DE REFUERZO FY = 420 MPA	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
776		CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
777		SUMIDERO TIPO VENTANA EN CONCRETO	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
778		**RED DE MEDIA TENSION (13.200) VOL.**	**154 días**	**mié 11/06/25**	**lun 11/05/26**	**$ 23.940.608,00**
779		SUMINISTRO, INSTALACION E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS - 750 KGF).	10 días	mié 11/06/25	mié 25/06/25	$ 0,00
780		SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE CIMENTACION CILINDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS - 750 KGF).	10 días	mar 9/12/25	lun 22/12/25	$ 2.792.394,00
781		SUMINISTRO, INSTALACION E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS - 1050 KGF).	10 días	mié 11/06/25	mié 25/06/25	$ 0,00
782		SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE CIMENTACION CILINDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS - 1050 KGF).	10 días	mié 11/06/25	mié 25/06/25	$ 0,00
783		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ALINEACION CON DISPOSICIÓN EN BANDERA BIFASICO A 13.2 KV., E INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	10 días	jue 11/12/25	vie 1/05/26	$ 9.625.638,00

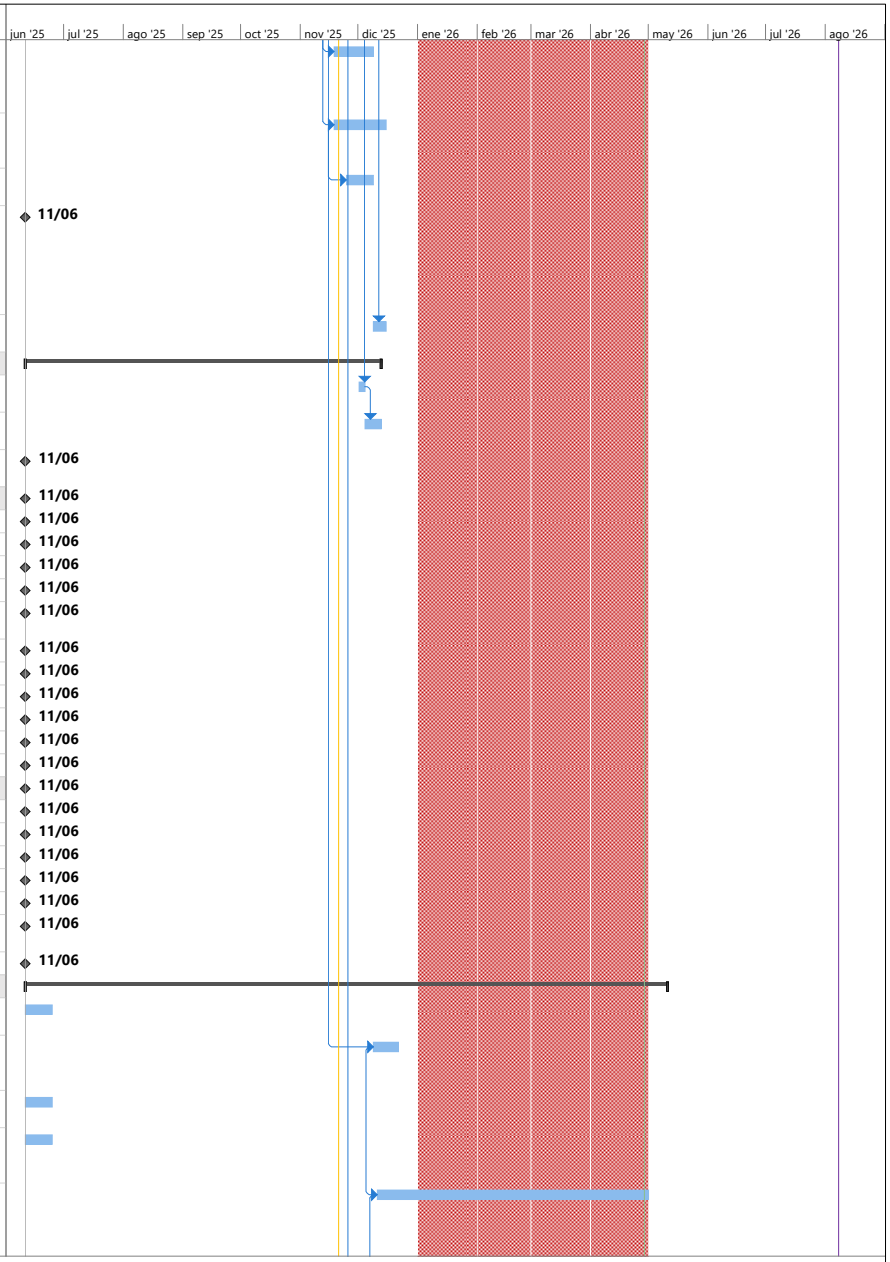

Proyecto: Project V1_ING LUIS
Fecha: mié 29/04/26

Tarea | Resumen del proyecto | Tarea manual | solo el comienzo | Fecha límite | Progreso manual
División | Tarea inactiva | solo duración | solo fin | Tareas críticas
Hito | Hito inactivo | Informe de resumen manual | Tareas externas | División crítica
Resumen | Resumen inactivo | Resumen manual | Hito externo | Progreso


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
784		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ANGULO CON DISPOSICIÓN EN BANDERA A 13.2 KV., E INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	10 días	mié 11/06/25	mié 25/06/25	$ 0,00
785		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN FIN DE LINEA COMPACTA CON DISPOSICIÓN CENTRAL BIFASICO A 13.2 KV., E INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	10 días	mié 11/06/25	mié 25/06/25	$ 0,00
786		SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA MT BIFASICA AEREA EN CABLE DESNUDO DE ALUMINIO ACSR - No. 1/0 AWG.	10 días	mié 11/06/25	mié 25/06/25	$ 0,00
787		SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA MT BIFASICA AEREA EN CABLE AISLADO DE ALUMINIO ECOLOGICO - No. 1/0 AWG.	15 días	sáb 13/12/25	lun 11/05/26	$ 11.522.576,00
788		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA RETENIDA MT EN POSTE DE 12m A POSTE DE 9m	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
789		INSTALACION EN CALIENTE DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA SECCIONADOR BIFASICO A 13.2 KV.	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
790		INSTALACION CON TENSION DE ARMADO PARA ESTRUCTURA DE MT BIFASICO A 13.2 KV.	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
791		INSTALACION CON TENSION A 13.2 KV. DE POSTE EN CONCRETO	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
792		**RED DE BAJA TENSION (240/120) VOL.**	**151 días?**	**mié 11/06/25**	**mié 6/05/26**	**$ 17.331.487,00**
793		INSTALACION E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 1050 KGF).	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
794		SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE CIMENTACION CILINDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 1050 KGF).	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
795		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ALINEACION - ANGULO - FINAL DE CIRCUITO PARA BT A 240/120 VOL.	7 días	sáb 13/12/25	mar 23/12/25	$ 2.860.539,00
796		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ANCLAJE PARA BT A 240/120 VOL.	1 día?	mié 11/06/25	jue 12/06/25	$ 0,00
797		SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA BT BIFASICA AEREA EN CABLE TRIPLEX DE ALUMINIO - No. 2 AWG.	10 días	mar 16/12/25	mié 6/05/26	$ 2.031.744,00
798		SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA BT BIFASICA AEREA EN CABLE TRIPLEX DE ALUMINIO - No. 1/0 AWG.	7 días	mar 16/12/25	sáb 2/05/26	$ 509.140,00
799		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA RETENIDA A TIERRA EN POSTE DE 9 MTS.	1 día?	mié 11/06/25	jue 12/06/25	$ 0,00
800		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA PUESTA A TIERRA DE RED TRENSADA DE BT A 120/240 VOL., EN	1 día?	mié 11/06/25	jue 12/06/25	$ 0,00
801		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA CAJA DE CONEXIÓN (4 USUARIOS) A RED TRENSADA DE BT A	7 días	mar 16/12/25	sáb 2/05/26	$ 7.227.579,00
802		DESINSTALACION DE POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 1050 750-5	7 días	jue 18/12/25	mar 5/05/26	$ 3.886.455,00
803		DESMONTE, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA RED DE	7 días	jue 18/12/25	mar 5/05/26	$ 816.030,00
804		**SUBESTACIONES ELECTRICAS (13.200/240/120) VOL.**	**7 días**	**mié 11/06/25**	**jue 19/06/25**	**$ 10.281.318,00**
805		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ADECUACION DE SUBESTACION BIFASICA EN POSTE A (13.200/240/120) VOL.,INCLUYE: INSTALACION PUENTES DE SECCIONADOR, ESTRUCTURA DE PROTECCIONES, SECCIONADOR, DES- DESMONTE Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR	7 días	mié 11/06/25	jue 19/06/25	$ 10.281.318,00
806		**ALUMBRADO PUBLICO, ALIMENTADORES Y MEDIDAS DE BAJA TENSION (240/120) VOL.**	**7 días**	**mié 11/06/25**	**jue 19/06/25**	**$ 4.426.595,00**
807		SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE CABLE CONCENTRICO DE ALUMINIO - (2xNo. 6 + 1xNo. 6) AWG.	7 días	mié 11/06/25	jue 19/06/25	$ 1.520.780,00
808		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA REUBICACION DE MEDIDOR (240/120) VOL.	7 días	mié 11/06/25	jue 19/06/25	$ 0,00
809		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA REINSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO.	7 días	mié 11/06/25	jue 19/06/25	$ 2.905.815,00
810		**ITEM NO PREVISTO**	**140 días**	**mié 11/06/25**	**lun 15/12/25**	**$ 5.788.022,00**
811		**CONEXION ACOMETIDAS DOMICILIARIA PVC NUEVA 8" X 6", (INCULYE ACCESORIOS, TUBERIA PVC LPROMEDIO= 10M)**	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
812		REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES Y ARBUSTOS CON DAP MENOR O IGUAL A 10 CM INCLUYE TRANSPORTE RESIDUOS)	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00

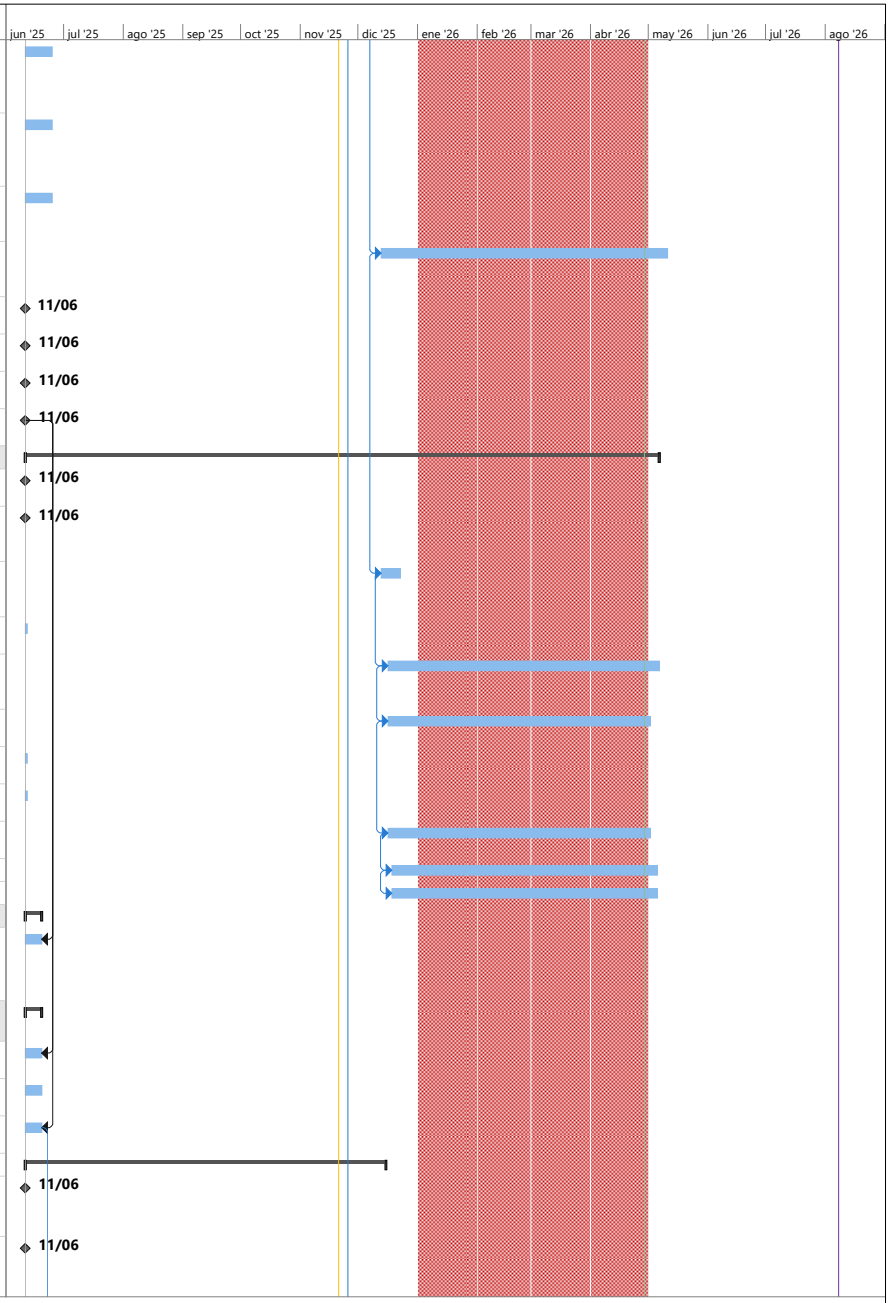

Proyecto: Project V1_ING LUIS
Fecha: mié 29/04/26

Tarea | Resumen del proyecto | Tarea manual | solo el comienzo | Fecha límite | Progreso manual
División | Tarea inactiva | solo duración | solo fin | Tareas críticas
Hito | Hito inactivo | Informe de resumen manual | Tareas externas | División crítica
Resumen | Resumen inactivo | Resumen manual | Hito externo | Progreso

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
813		CONFORMACIÓN DE TERRAPLÉN CON MATERIAL DE PRÉSTAMO	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
814		RAMPA PARA USO VEHICULAR, INCLUYE BORDILLO DE CONCRETO DE CAMBIO DE NIVEL, LOSETA TOPEROL, ADOQUIN EN CONCRETO DE 20CM X 10CM X 6CM COLOR AMARILLO,	10 días	lun 1/12/25	lun 15/12/25	$ 5.788.022,00
815		CONCRETO DE 3000 PSI PARA BORDILLO H:1.0M * 0,20 M, FUNDIDO IN SITU REFORZADO	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
816		REUBICACION TUBERIA SANITARIA 6".	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
817		**ITEM NO PREVISTO 2**	**150 días**	**mié 11/06/25**	**mar 5/05/26**	**$ 2.299.788,00**
818		CONCRETO DE 3000 PSI PARA BORDILLO H: VARIABLE * 0,20 M, FUNDIDO IN SITU REFORZADO	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
819		CONSTRUCCIÓN PISO EN CONCRETO ESTAMPADO TIPO RONDA, 21 MPA (3.000 PSI). E=0,08M FUNDIDO EN SITIO, JUNTAS SEGÚN DISEÑO.	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
820		CONSTRUCCIÓN DE PISO EN CONCRETO 21 MPA (3.000 PSI) E=0,08M FUNDIDO EN SITIO, JUNTAS SEGÚN DISEÑO. INCLUYE RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
821		CONCRETO DE 3000 PSI PARA BORDILLO H: 20 CM FUNDIDO IN SITU ESPESOR=20 CM	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
822		S/I TABLETA GUÍA PREF. TÁCTIL PARA DISCAP. EN CONCRETO DE 0.20m X 0.20m X 0.06m COLOR AMARILLO TIPO TOPEROL (UNA HILERA) CON MORTERO 1:4, INCLUYE ARENA H.=0.04 m, JUNTAS SELLADAS	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
823		RAMPA PARA USO VEHICULAR SOBRE CUNETA, INCLUYE BORDILLO DE CONCRETO DE CAMBIO DE NIVEL, LOSETA TOPEROL, ADOQUIN EN CONCRETO DE 20CM X 10CM X 6CM COLOR AMARILLO, PLACA 0,15MTS DE ESPESOR. INCLUYE ACERO DE REFUERZO	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
824		EXCAVACIONES MECÁNICAS CON EXCAVADORA PROFUNDIDAD <2M NO INCLUYE RETIRO	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
825		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO PVC 8	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
826		CONCRETO RESISTENCIA 21 MPA PARA CONSTRUCCION DE MH	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
827		REUBICACION DE CAJA DE REGISTRO DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC DE 6	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
828		REUBICACION DE REGISTRO DE AGUA POTABLE	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
829		TAPAS DE INSPECCION CUNETAS	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
830		SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS METÁLICAS TIPO PANAL (TRAFICO PESADO) PARA CARCAMOS	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
831		INSTALACION E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS - 1050 KGF).	10 días	lun 15/12/25	mar 5/05/26	$ 2.299.788,00
832		SUMINISTRO, INSTALACION E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 1050 KGF).	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
833		CONCRETO DE 3000 PSI FUNDIDO IN SITU PARA DESCOLES	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
834		**FIN TRAMO 7**	**0 días**	**jue 19/06/25**	**jue 19/06/25**	**$ 0,00**
835		**PGIO**	**224 días**	**mié 11/06/25**	**vie 7/08/26**	**$ 122.779.191,00**
836		**TRAMITES ANTE ENTIDAD AMBIENTAL**	**224 días**	**mié 11/06/25**	**vie 7/08/26**	**$ 27.729.720,00**
837		**TRAMITES, y LEGALIZACIONES (AFINIA)**	**224 días**	**mié 11/06/25**	**vie 7/08/26**	**$ 9.132.448,00**

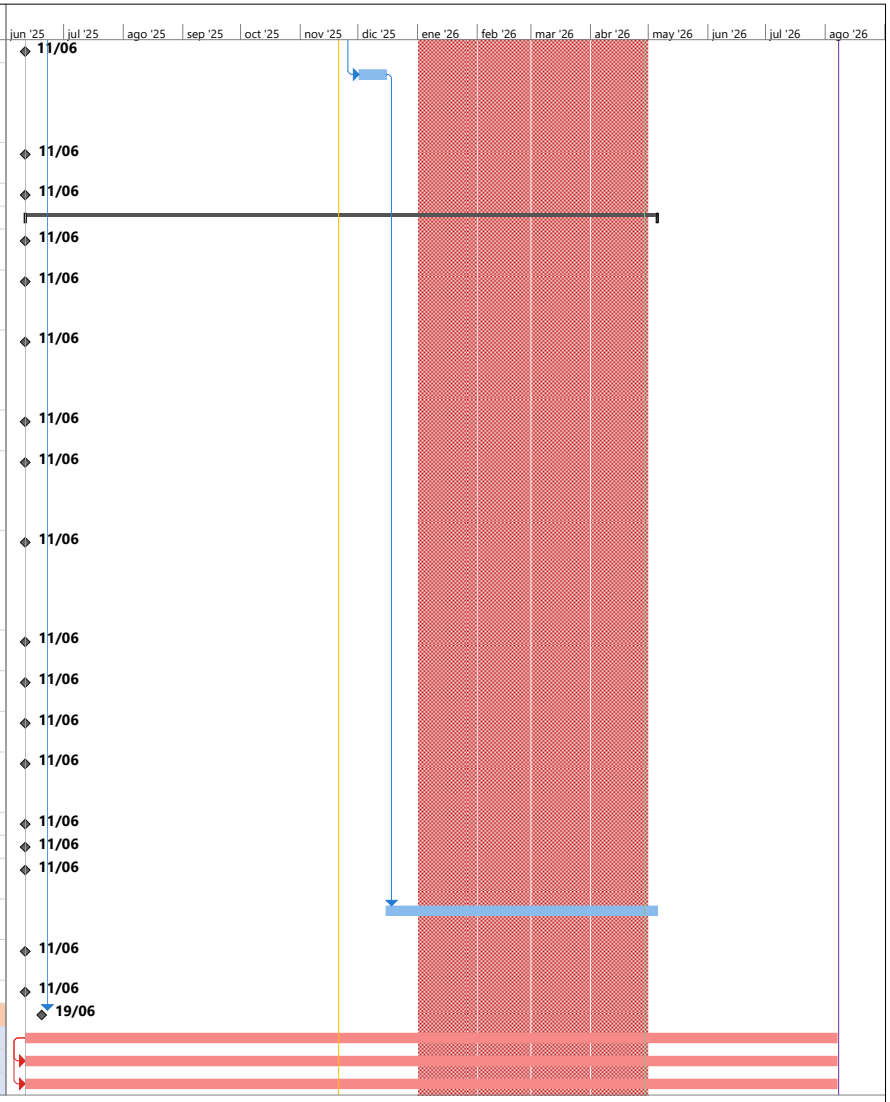

Proyecto: Project V1_ING LUIS
Fecha: mié 29/04/26

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual
