Montería, Córdoba

28 de noviembre de 2025

OF 098-2025

Sres.:

JASEN CONSULTORES S.A.S

Johnny Castillo Curieux

Copia:

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

Iris Spath Camaño

REF: CONTRATO DE OBRA LP-SIM-004-2025 PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 9 Y 10 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.

ASUNTO: SOLICITUD DE PRÓRROGA PARA LA FINALIZACIÓN DEL PROYECTO

Cordial saludo,

Por medio del presente, el CONSORCIO BAREM 9-10, en atención que el contrato de obra tiene fecha de finalización del 31 de diciembre de 2025, teniendo en cuenta los impedimentos que han incidido directamente en la correcta ejecución de los plazos contractuales, colocamos en su consideración valorar la aprobación de una prórroga al contrato de obra de tres (3) meses para la culminación de las actividades contratadas.

Esta solicitud se fundamenta en diversas circunstancias presentadas durante la ejecución del contrato, las cuales no dependen directamente de nuestra gestión y han generado retrasos significativos en el cronograma de obra. Entre ellas se encuentran:

- Ejecución de nuevas acometidas domiciliarias de alcantarillado no contempladas en la programación inicial, necesarias para garantizar el adecuado funcionamiento del sistema de alcantarillado en el sector.
- Reparación de acometidas domiciliarias existentes que presentaban fallas o que actualmente interfieren con la conformación de la estructura del pavimento, cuya intervención es indispensable para garantizar el adecuado funcionamiento del sistema y salvaguardar la estabilidad del pavimento.

Calle 67 #5-40 Montería
consorciobarem910@gmail.com
3145713218

- El colapso recurrente del sistema de alcantarillado, situación que ha sido reportada en varias oportunidades y que ha generado afectaciones que impiden el desarrollo continuo de las actividades de instalación y reparación de acometidas, lo cual a su vez interfiere directamente en los procesos de pavimentación.
- La presencia de tuberías de acueducto en la zona de intervención, ubicadas a lo ancho de la vía y a profundidades que interfieren con las excavaciones mecánicas y han generado retrasos en la ejecución de las actividades programadas.
- Condiciones climáticas adversas con lluvias recurrentes durante los meses de julio, agosto y septiembre, las cuales provocaron interrupciones en las actividades de excavación, conformación de estructura y pavimentación, afectando de manera significativa la continuidad y el rendimiento del avance programado.

Estas situaciones han alterado de manera considerable el avance previsto y hacen necesaria la ampliación del plazo contractual por el termino de 3 meses con el fin de garantizar la correcta ejecución de los trabajos, el cumplimiento de las especificaciones técnicas y la adecuada calidad de la obra.

Adicionalmente, es importante precisar que, conforme al régimen general de contratación estatal contenido en la Ley 80 de 1993, la prórroga del contrato no se encuentra prohibida, siempre que responda a circunstancias debidamente justificadas y no implique la alteración del objeto contractual. En ese sentido, la ampliación solicitada corresponde exclusivamente a una extensión del plazo de ejecución, sin que ello conlleve la inclusión de nuevos ítems, actividades adicionales o modificaciones presupuestales, manteniéndose incólumes las condiciones técnicas, económicas y jurídicas originalmente acordadas.


Por lo anterior, solicito respetuosamente la aprobación de la prórroga mencionada y quedo atento a cualquier requerimiento adicional o documentación de soporte que se considere necesaria.

Agradecemos la atención.

José Hernández Benavides

R.L. CONSORCIO BAREM 9-10


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
1		**PROYECTO:**	**222 días**	**mié 11/06/25**	**mar 31/03/26**	**$ 16.479.905.103,00**
2		**TRAMO 1 CALLE 1 ENTRE LA CRA 2 Y LA VIA MONTERIA-CERETÉ**	**123 días**	**mié 11/06/25**	**vie 21/11/25**	**$ 2.814.015.482,00**
3		**ACTIVIDADES PRELIMINARES**	**115 días**	**mié 11/06/25**	**mié 12/11/25**	**$ 287.148.678,00**
4		DEMOLICIÓN DE BORDILLOS DE CONCRETO	60 días	mié 11/06/25	lun 1/09/25	$ 9.946.080,00
5		CORTE DE PISO EN TABLON Y PLANTILLA DE CONCRETO E= 0.10MTS/0.15MTS CON CORTADORA	20 días	mié 11/06/25	mié 9/07/25	$ 2.067.016,00
6		DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO	55 días	mié 11/06/25	lun 25/08/25	$ 31.943.624,00
7		DEMOLICION DE ESTRUCTURAS	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
8		DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO	65 días	mié 11/06/25	sáb 6/09/25	$ 19.757.600,00
9		EXCAVACIONES MECÁNICAS CON EXCAVADORA PARA FALLOS EN SUB RASANTE. PROFUNDIDAD > 50 CM. NO INCLUYE RETIRO	45 días	mié 25/06/25	lun 25/08/25	$ 12.985.242,00
10		EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	35 días	mié 11/06/25	lun 28/07/25	$ 44.043.627,00
11		CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	80 días	lun 28/07/25	mié 12/11/25	$ 158.186.289,00
12		REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURA MENOR O IGUAL H= 5 M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAIZ)	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
13		REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURA ENTRE H= 5.1M A 10M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAIZ)	10 días	mar 15/07/25	lun 28/07/25	$ 1.281.366,00
14		REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURAS ENTRE H= 10.1M A 15 M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAÍZ)	10 días	lun 28/07/25	lun 11/08/25	$ 1.907.154,00
15		PODA DE FORMACIÓN ÁRBOLES ALTURA MENOR O IGUAL H= 5 M (INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS)	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
16		SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ARBOLES DE ESPECIES NATIVAS DE 1.5 M DE ALTURA, INCLUYE EXCAVACION, ABONO ORGANICO, TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO	10 días	lun 11/08/25	lun 25/08/25	$ 5.030.680,00
17		**SUBRASANTE Y SUBBASE**	**42 días**	**mié 11/06/25**	**mié 6/08/25**	**$ 718.032.128,00**
18		MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON MATERIAL SELECCIONADO	70 días	mar 17/06/25	vie 19/09/25	$ 240.955.872,00
19		MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJÓN O SIMILAR)	70 días	mié 25/06/25	jue 25/09/25	$ 112.805.280,00
20		SUBBASE GRANULAR CLASE C	70 días	vie 27/06/25	lun 29/09/25	$ 289.960.304,00
21		GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	70 días	vie 27/06/25	lun 29/09/25	$ 74.310.672,00
22		**PAVIMENTO Y BORDILLOS**	**95 días**	**mié 11/06/25**	**jue 16/10/25**	**$ 1.576.973.281,00**
23		PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO MR (40 Kg/cm2)	65 días	mié 9/07/25	jue 2/10/25	$ 1.370.886.637,00
24		ADECUACIÓN DE CÁMARAS DE INSPECCIÓN (MANHOLES) EN CONCRETO DE 3000 PSI	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
25		BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	45 días	mar 19/08/25	jue 16/10/25	$ 190.897.344,00
26		ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa	20 días	sáb 6/09/25	jue 2/10/25	$ 15.189.300,00
27		**SEÑALIZACION**	**123 días**	**mié 11/06/25**	**vie 21/11/25**	**$ 30.220.098,00**
28		SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON LAMINA RETROREFLECTIVA DE 60CM X 60CM	10 días	lun 20/10/25	sáb 1/11/25	$ 4.701.104,00
29		SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON DOBLE LAMINA RETROREFLECTIVA DE 60CM X 60CM	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
30		DEMARCACION HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRILICA BASE SOLVENTE - M2. (INCLUYE IMPRIMANTE, SUMINISTRO, APLICACIÓN CON EQUIPO Y MICROESFERAS)	10 días	lun 20/10/25	sáb 1/11/25	$ 2.728.096,00
31		DEMARCACION HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRILICA BASE SOLVENTE - M (12 CM). (INCLUYE IMPRIMANTE, SUMINISTRO, APLICACIÓN CON EQUIPO Y MICROESFERAS)	25 días	lun 20/10/25	vie 21/11/25	$ 20.068.560,00
32		REDUCTORES DE VELOCIDAD TIPO RESALTO PLÁSTICO PERNADO	10 días	mié 22/10/25	mié 5/11/25	$ 2.722.338,00
33		**ESPACIO PUBLICO ANDENES Y MOBILIARIOS**	**120 días**	**mié 11/06/25**	**mar 18/11/25**	**$ 160.462.719,00**

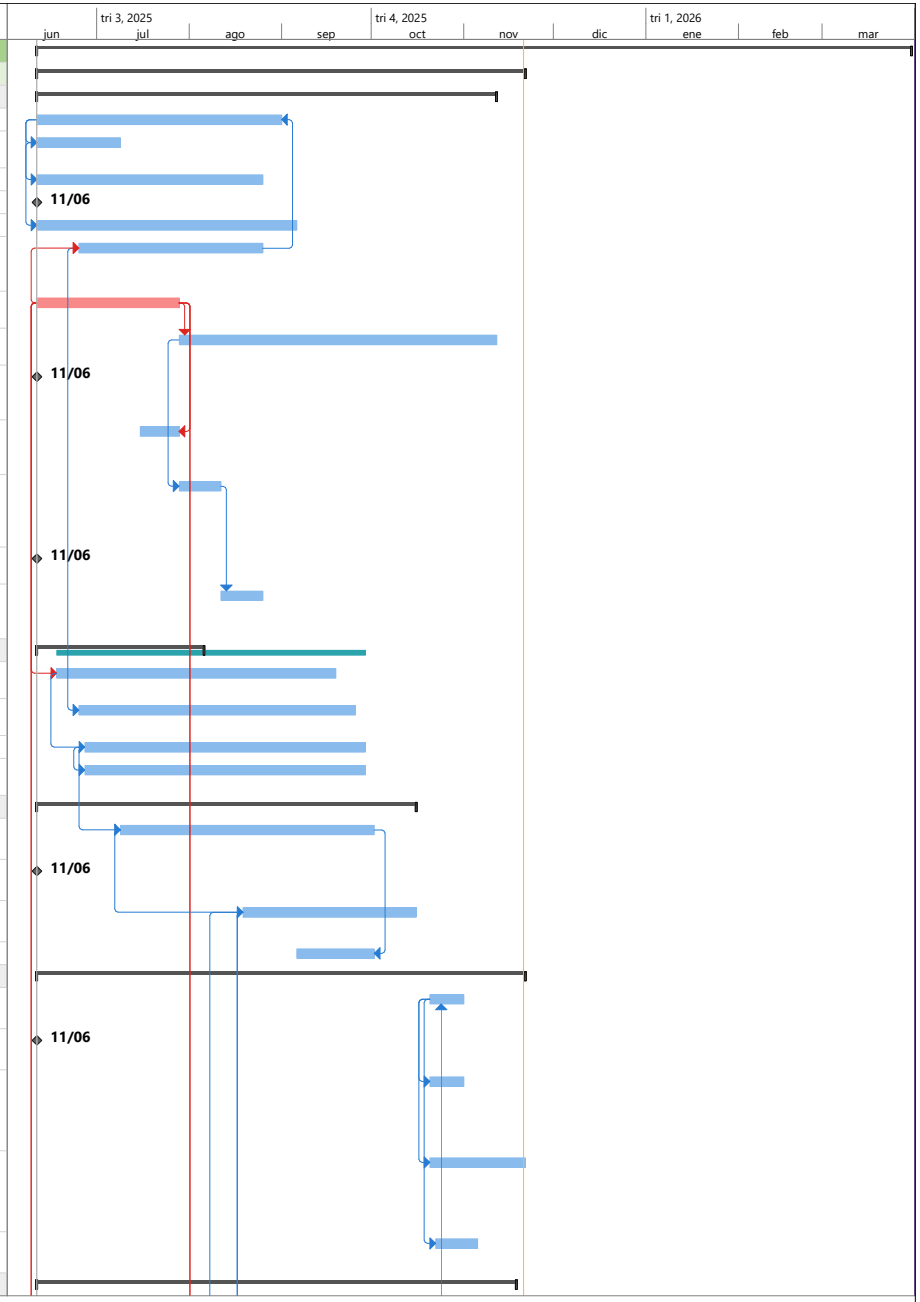

Proyecto: Project V1_ING LUIS H
Fecha: lun 6/04/26

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
34		S/I TABLETA GUÍA PREF. TÁCTIL PARA DISCAP. EN CONCRETO DE 0.20m X 0.20m X 0.06m COLOR AMARILLO TIPO TOPEROL (UNA HILERA) CON MORTERO 1:4, INCLUYE ARENA H.=0.04 m, RELLENO CON MATERIAL COMPACTADO SELECCIONADO DE 0.20m Y JUNTAS SELLADAS	45 días	lun 25/08/25	mié 22/10/25	$ 40.932.054,00
35		FRANJA DEMARCADORA PARA LIMITADOS VISUALES CON ADOQUÍN EN CONCRETO DE 20cm X 10cm X 6cm COLOR AMARILLO PARA EMBEBER EN MORTERO, APAREJADO SEGÚN DISEÑO. INCLUYE MORTERO 1:4, ARENA H.=4 CM, INSTALACIÓN, COMPACTACIÓN, JUNTAS SELLADAS CON ARENA	45 días	lun 25/08/25	mié 22/10/25	$ 35.958.423,00
36		CONSTRUCCIÓN PISO EN CONCRETO ESTAMPADO TIPO RONDA, 21 MPA (3.000 PSI). E=0,08M FUNDIDO EN SITIO, JUNTAS SEGÚN DISEÑO. INCLUYE EXCAVACIÓN, MATERIAL SELECCIONADO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.	55 días	lun 11/08/25	mié 22/10/25	$ 78.170.256,00
37		RAMPA PEATONAL INCLUYE BORDILLOS DE CAMBIO DE NIVEL, SARDINEL, ADOQUÍN TÁCTIL TIPO ALERTA Y PLANTILLA EN CONCRETO	10 días	mié 22/10/25	mié 5/11/25	$ 2.136.570,00
38		RAMPA PARA USO VEHICULAR DE 4.20M X 1.20M, INCLUYE BORDILLO DE CONCRETO DE CAMBIO DE NIVEL, LOSETA TOPEROL, ADOQUIN EN CONCRETO DE 20CM X 10CM X 6CM COLOR AMARILLO, PLACA ENCONCRETO 0.15MTS DE ESPESOR, EXCAVACIONMANUAL, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
39		S/I BOLARDOS ALTO EN HIERRO TIPO M63 - IDU EMPOTRADOS EN CONCRETO; INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	10 días	mié 5/11/25	mar 18/11/25	$ 3.265.416,00
40		**OTRAS ACTIVIDADES**	**35 días**	**mié 11/06/25**	**lun 28/07/25**	**$ 3.477.403,00**
41		S/I TUBERÍA PARA PROLONGACIÓN DE DRENAJES DE AGUAS LLUVIA EN 4". INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO	2 días	vie 25/07/25	lun 28/07/25	$ 2.723.188,00
42		REPARACIÓN DE DOMICILIARIAS DEL ACUEDUCTO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	4 días	mié 23/07/25	lun 28/07/25	$ 754.215,00
43		REUBICACIÓN TÍPICA MEDIDORES DE GAS RED DOMICILIARIA.	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
44		**BOX CULVERT**	**0 días**	**mié 11/06/25**	**mié 11/06/25**	**$ 0,00**
45		EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN BAJO AGUA	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
46		GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
47		CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
48		RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
49		MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJON O SIMILAR)	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
50		CONCRETO RESISTENCIA 28 MPA CLASE C (PARA ESTRUCTURA)	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
51		ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
52		BARANDA METÁLICA PARA TRÁFICO VEHICULAR	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
53		MANEJO DE CAUCE DE AGUA	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
54		JUNTA PARA MURO EN CINTA PVC	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
55		CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA CLASE F (SOLADO)	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
56		**CUNETAS Y SUMIDEROS**	**0 días**	**mié 11/06/25**	**mié 11/06/25**	**$ 0,00**
57		EXCAVACION MANUAL	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
58		CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
59		GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
60		RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00

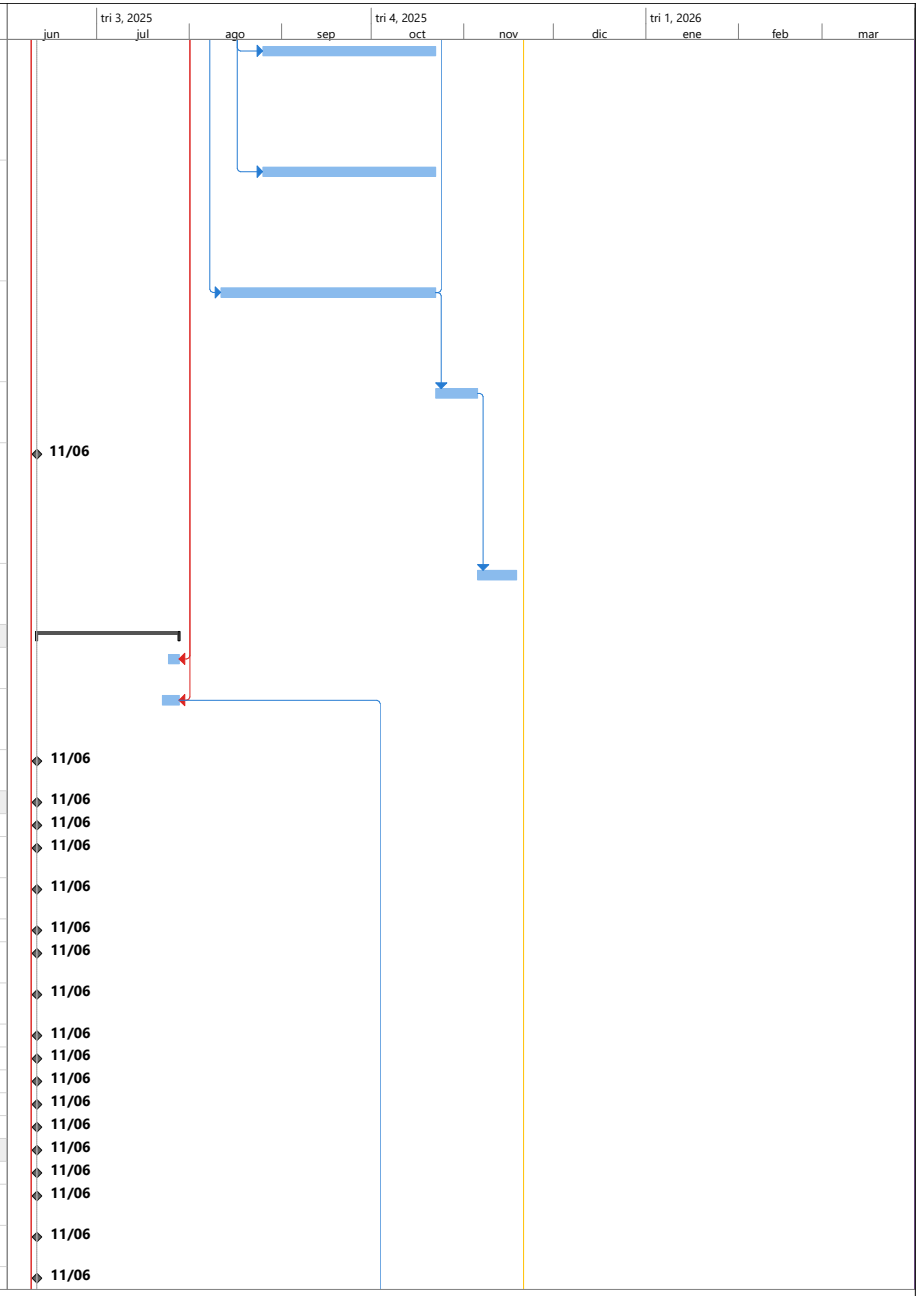

Proyecto: Project V1_ING LUIS H
Fecha: lun 6/04/26

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
61		ACERO DE REFUERZO FY = 420 MPA	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
62		CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
63		SUMIDERO TIPO VENTANA EN CONCRETO	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
64		**RED DE MEDIA TENSION (13.200) VOL.**	**0 días**	**mié 11/06/25**	**mié 11/06/25**	**$ 0,00**
65		SUMINISTRO, INSTALACION E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS - 750 KGF).	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
66		SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE CIMENTACION CILINDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS - 750 KGF).	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
67		SUMINISTRO, INSTALACION E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS - 1050 KGF).	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
68		SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE CIMENTACION CILINDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS - 1050 KGF).	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
69		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ALINEACION CON DISPOSICIÓN EN BANDERA BIFASICO A 13.2 KV., E INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
70		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ANGULO CON DISPOSICIÓN EN BANDERA A 13.2 KV., E INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
71		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN FIN DE LINEA COMPACTA CON DISPOSICIÓN CENTRAL BIFASICO A 13.2 KV., E INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
72		SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA MT BIFASICA AEREA EN CABLE DESNUDO DE ALUMINIO ACSR - No. 1/0 AWG.	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
73		SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA MT BIFASICA AEREA EN CABLE AISLADO DE ALUMINIO ECOLOGICO - No. 1/0 AWG.	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
74		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA RETENIDA MT EN POSTE DE 12m A POSTE DE 9m	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
75		INSTALACION EN CALIENTE DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA SECCIONADOR BIFASICO A 13.2 KV.	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
76		INSTALACION CON TENSION DE ARMADO PARA ESTRUCTURA DE MT BIFASICO A 13.2 KV.	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
77		INSTALACION CON TENSION A 13.2 KV. DE POSTE EN CONCRETO	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
78		**RED DE BAJA TENSION (240/120) VOL.**	**0 días**	**mié 11/06/25**	**mié 11/06/25**	**$ 0,00**
79		INSTALACION E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 1050 KGF).	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
80		SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE CIMENTACION CILINDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 1050 KGF).	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
81		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ALINEACION - ANGULO - FINAL DE CIRCUITO PARA BT A 240/120 VOL.	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
82		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ANCLAJE PARA BT A 240/120 VOL.	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
83		SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA BT BIFASICA AEREA EN CABLE TRIPLEX DE ALUMINIO - No. 2 AWG.	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00

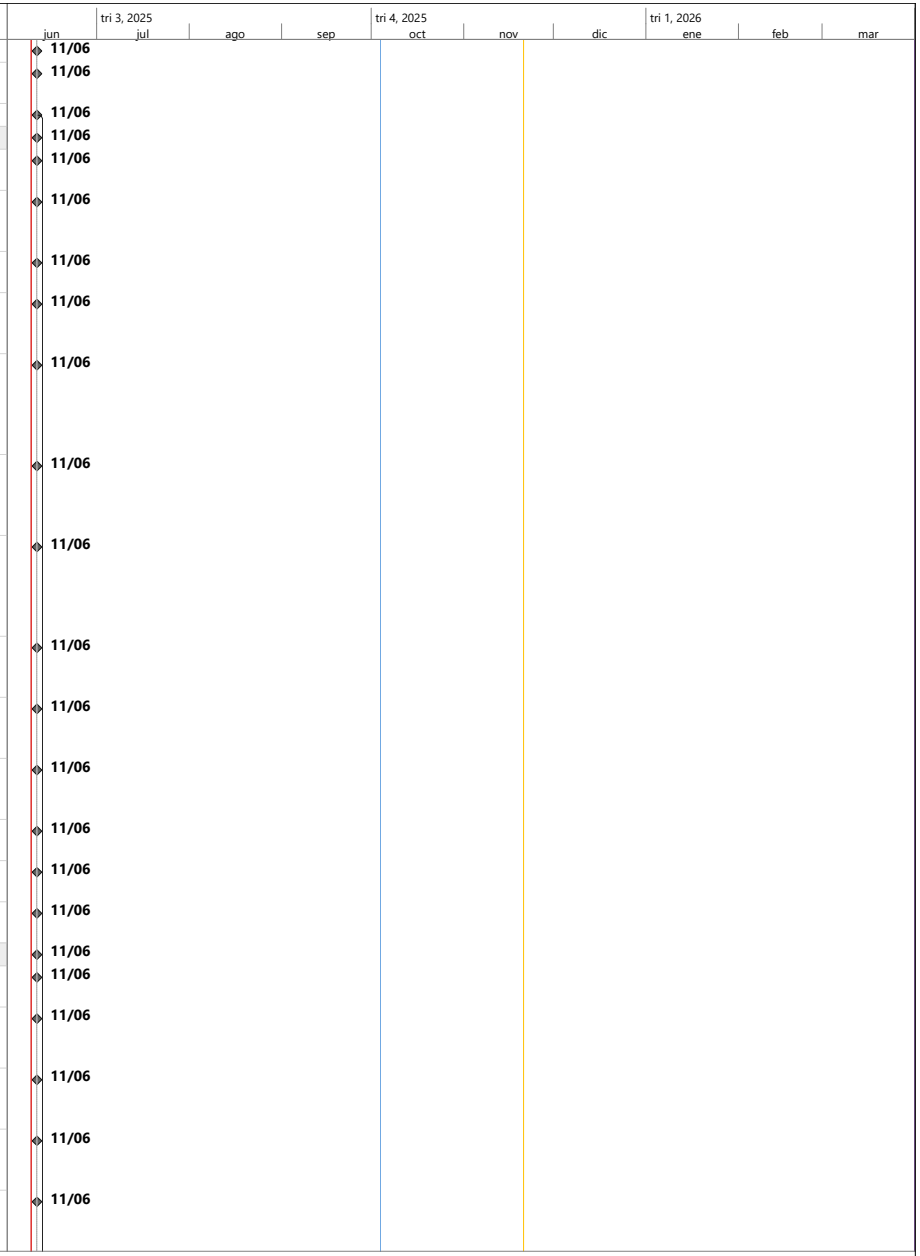

Proyecto: Project V1_ING LUIS H
Fecha: lun 6/04/26

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
84		SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA BT BIFASICA AEREA EN CABLE TRIPLEX DE ALUMINIO - No. 1/0 AWG.	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
85		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA RETENIDA A TIERRA EN POSTE DE 9 MTS.	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
86		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA PUESTA A TIERRA DE RED TRENSADA DE BT A 120/240 VOL., EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
87		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA CAJA DE CONEXIÓN (4 USUARIOS) A RED TRENSADA DE BT A 120/240 VOL.	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
88		DESINSTALACION DE POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 1050 750-510 KGF).	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
89		DESMONTE, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA RED DE TELECOMUNICACIONES	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
90		**SUBESTACIONES ELECTRICAS (13.200/240/120) VOL.**	**0 días**	**mié 11/06/25**	**mié 11/06/25**	**$ 0,00**
91		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ADECUACION DE SUBESTACION BIFASICA EN POSTE A (13.200/240/120) VOL.,INCLUYE: INSTALACION PUENTES DE SECCIONADOR, ESTRUCTURA DE PROTECCIONES, SECCIONADOR, DPS, DESMONTE Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR.	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
92		**ALUMBRADO PUBLIICO, ALIMENTADORES Y MEDIDAS DE BAJA TENSION (240/120) VOL.**	**0 días**	**mié 11/06/25**	**mié 11/06/25**	**$ 0,00**
93		SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE CABLE CONCENTRICO DE ALUMINIO - (2xNo. 6 + 1xNo. 6) AWG.	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
94		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA REUBICACION DE MEDIDOR (240/120) VOL.	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
95		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA REINSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO.	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
96		**ITEM NO PREVISTO**	**112 días**	**mié 11/06/25**	**vie 7/11/25**	**$ 37.701.175,00**
97		CONEXION ACOMETIDAS DOMICILIARIA PVC NUEVA 8" X 6", (INCULYE ACCESORIOS, TUBERIA PVC LPROMEDIO= 10M)	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
98		REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES Y ARBUSTOS CON DAP MENOR O IGUAL A 10 CM INCLUYE TRANSPORTE RESIDUOS)	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
99		CONFORMACIÓN DE TERRAPLÉN CON MATERIAL DE PRÉSTAMO	25 días	sáb 4/10/25	vie 7/11/25	$ 14.593.729,00
100		RAMPA PARA USO VEHICULAR, INCLUYE BORDILLO DE CONCRETO DE CAMBIO DE NIVEL, LOSETA TOPEROL, ADOQUIN EN CONCRETO DE 20CM X 10CM X 6CM COLOR AMARILLO,	25 días	sáb 4/10/25	vie 7/11/25	$ 5.788.596,00
101		CONCRETO DE 3000 PSI PARA BORDILLO H:1.0M * 0,20 M, FUNDIDO IN SITU REFORZADO	25 días	jue 2/10/25	mié 5/11/25	$ 17.318.850,00
102		REUBICACION TUBERIA SANITARIA 6".	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
103		**FIN TRAMO 1**	**0 días**	**mié 11/06/25**	**mié 11/06/25**	**$ 0,00**
104		**TRAMO 2 CRA 6 ENTRE CALLES 97 Y 101**	**217 días**	**mié 11/06/25**	**mar 24/03/26**	**$ 1.546.704.149,00**
105		**ACTIVIDADES PRELIMINARES**	**178 días**	**mié 11/06/25**	**mar 3/02/26**	**$ 230.790.121,00**
106		DEMOLICIÓN DE BORDILLOS DE CONCRETO	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
107		CORTE DE PISO EN TABLON Y PLANTILLA DE CONCRETO E= 0.10MT	5 días	mar 9/12/25	lun 15/12/25	$ 16.240.840,00
108		DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO	40 días	mié 5/11/25	lun 29/12/25	$ 10.966.912,00
109		DEMOLICION DE ESTRUCTURAS	40 días	mié 5/11/25	lun 29/12/25	$ 16.093.812,00
110		DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
111		EXCAVACIONES MECÁNICAS CON EXCAVADORA PARA FALLOS EN SUB RASANTE. PROFUNDIDAD > 50 CM. NO INCLUYE RETIRO	30 días	mié 5/11/25	lun 15/12/25	$ 4.266.580,00

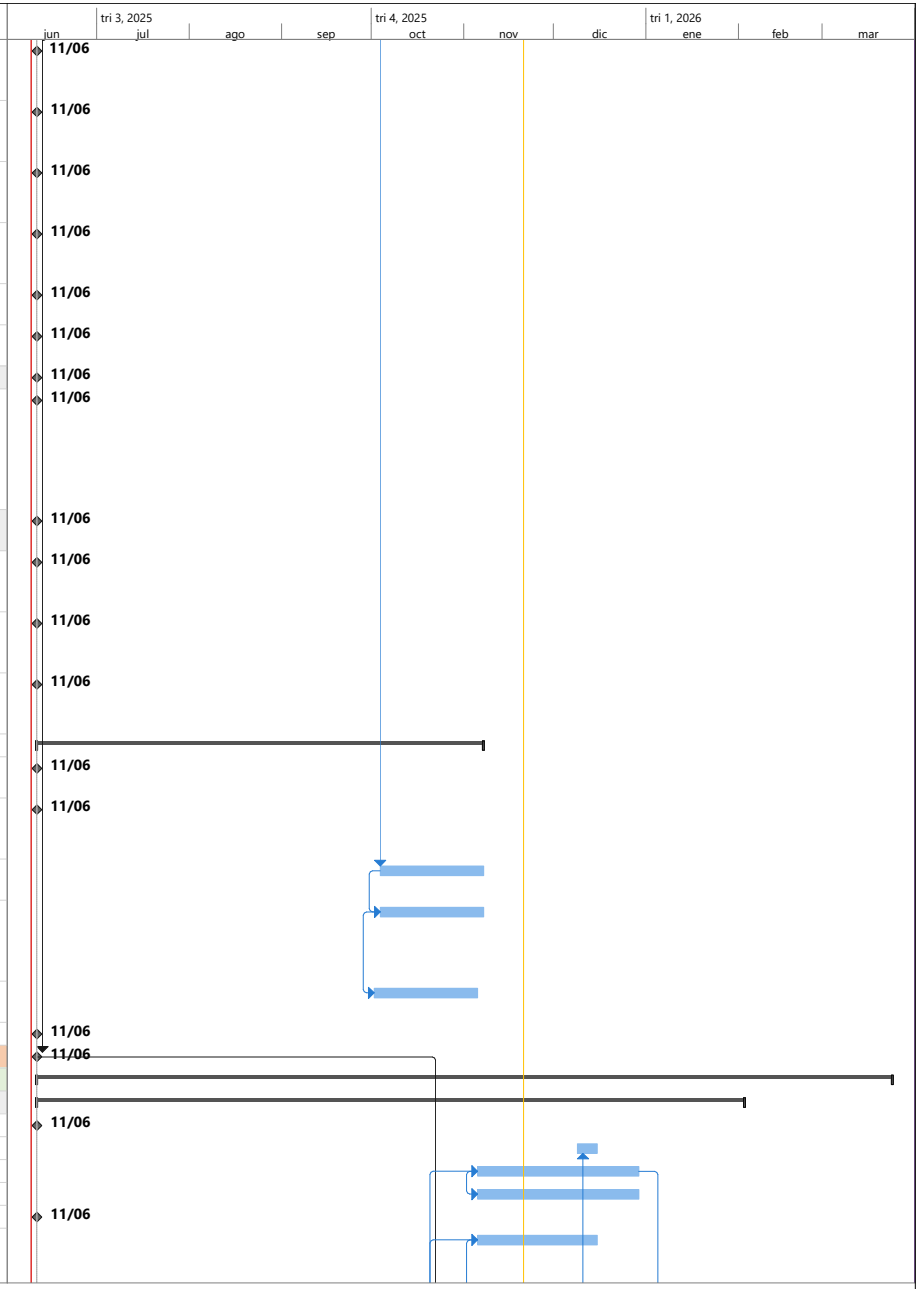

Proyecto: Project V1_ING LUIS H
Fecha: lun 6/04/26

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
112		EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	35 días	mié 22/10/25	mar 9/12/25	$ 18.557.859,00
113		CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	20 días	jue 13/11/25	mié 10/12/25	$ 64.766.719,00
114		REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURA MENOR O IGUAL H= 5 M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS,	4 días	mié 10/12/25	lun 15/12/25	$ 6.736.896,00
115		REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURA ENTRE H= 5.1M A 10M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS,	15 días	lun 15/12/25	lun 5/01/26	$ 23.064.588,00
116		REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURAS ENTRE H= 10.1M A 15 M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS,	2 días	lun 5/01/26	mié 7/01/26	$ 1.907.154,00
117		PODA DE FORMACIÓN ÁRBOLES ALTURA MENOR O IGUAL H= 5 M (INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS)	1 día	mié 7/01/26	jue 8/01/26	$ 274.581,00
118		SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ARBOLES DE ESPECIES NATIVAS DE 1.5 M DE ALTURA, INCLUYE EXCAVACION, ABONO ORGANICO, TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO	20 días	jue 8/01/26	mar 3/02/26	$ 67.914.180,00
119		**SUBRASANTE Y SUBBASE**	**42 días**	**mar 9/12/25**	**lun 2/02/26**	**$ 275.955.415,00**
120		MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON MATERIAL SELECCIONADO	40 días	mar 9/12/25	jue 29/01/26	$ 92.366.418,00
121		MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJÓN O SIMILAR)	35 días	lun 15/12/25	jue 29/01/26	$ 37.066.824,00
122		SUBBASE GRANULAR CLASE C	40 días	jue 11/12/25	lun 2/02/26	$ 117.364.437,00
123		GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPA	40 días	jue 11/12/25	lun 2/02/26	$ 29.157.736,00
124		**PAVIMENTO Y BORDILLOS**	**197 días**	**mié 11/06/25**	**jue 26/02/26**	**$ 663.415.631,00**
125		PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO MR (40 Kg/cm2)	40 días	jue 11/12/25	lun 2/02/26	$ 554.850.904,00
126		ADECUACIÓN DE CÁMARAS DE INSPECCIÓN (MANHOLES) EN CONCRETO DE 3000 PSI	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
127		BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	40 días	jue 18/12/25	lun 9/02/26	$ 77.221.727,00
128		ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa	20 días	lun 2/02/26	jue 26/02/26	$ 31.343.000,00
129		**SEÑALIZACION**	**208 días**	**mié 11/06/25**	**jue 12/03/26**	**$ 23.646.132,00**
130		SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON LAMINA RETROREFLECTIVA DE 60CM X 60CM	15 días	jue 1/01/26	mié 21/01/26	$ 3.525.828,00
131		SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON DOBLE LAMINA RETROREFLEC	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
132		DEMARCACION HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRILICA BASE SOLVENTE - M2. (INCLUYE IMPRIMANTE, SUMINISTRO, APLICACIÓN CON EQUIPO Y MICROESFERAS)	15 días	mié 21/01/26	lun 9/02/26	$ 8.619.623,00
133		DEMARCACION HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRILICA BASE SOLVENTE - M (12 CM). (INCLUYE IMPRIMANTE, SUMINISTRO, APLICACIÓN CON EQUIPO Y MICROESFERAS)	15 días	lun 9/02/26	vie 27/02/26	$ 9.232.066,00
134		REDUCTORES DE VELOCIDAD TIPO RESALTO PLÁSTICO PERNADO	10 días	vie 27/02/26	jue 12/03/26	$ 2.268.615,00
135		**ESPACIO PUBLICO ANDENES Y MOBILIARIOS**	**216 días**	**mié 11/06/25**	**lun 23/03/26**	**$ 156.831.371,00**
136		S/I TABLETA GUÍA PREF. TÁCTIL PARA DISCAP. EN CONCRETO DE 0.20m X 0.20m X 0.06m COLOR AMARILLO TIPO TOPEROL (UNA HILERA) CON MORTERO 1:4, INCLUYE ARENA H.=0.04 m, RELLENO CON MATERIAL COMPACTADO SELECCIONADO DE 0.20m Y JUNTAS SELLADAS	35 días	mié 14/01/26	vie 27/02/26	$ 32.240.186,00
137		FRANJA DEMARCADORA PARA LIMITADOS VISUALES CON ADOQUÍN EN CONCRETO DE 20cm X 10cm X 6cm COLOR AMARILLO PARA EMBEBER EN MORTERO, APAREJADO SEGÚN DISEÑO. INCLUYE MORTERO 1:4, ARENA H.=4 CM, INSTALACIÓN,	35 días	vie 16/01/26	mar 3/03/26	$ 28.322.791,00
138		CONSTRUCCIÓN PISO EN CONCRETO ESTAMPADO TIPO RONDA, 21 MPA (3.000 PSI). E=0,08M FUNDIDO EN SITIO, JUNTAS SEGÚN DISEÑO. INCLUYE EXCAVACIÓN, MATERIAL SELECCIONADO, Y	45 días	mié 21/01/26	jue 19/03/26	$ 62.344.892,00
139		RAMPA PEATONAL INCLUYE BORDILLOS DE CAMBIO DE NIVEL, SARDINEL, ADOQUÍN TÁCTIL TIPO ALERTA Y PLANTILLA EN	12 días	mié 4/03/26	jue 19/03/26	$ 19.229.130,00
140		RAMPA PARA USO VEHICULAR DE 4.20M X 1.20M, INCLUYE BORDILLO DE CONCRETO DE CAMBIO DE NIVEL, LOSETA TOPEROL, ADOQUIN EN CONCRETO DE 20CM X 10CM X 6CM COLOR AMARILLO, PLACA ENCONCRETO 0.15MTS DE ESPESOR, EXCAVACIONMANUAL, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
141		S/I BOLARDOS ALTO EN HIERRO TIPO M63 - IDU EMPOTRADOS EN CONCRETO; INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA	3 días	jue 19/03/26	lun 23/03/26	$ 14.694.372,00
142		**OTRAS ACTIVIDADES**	**83 días**	**mié 22/10/25**	**lun 9/02/26**	**$ 19.531.439,00**

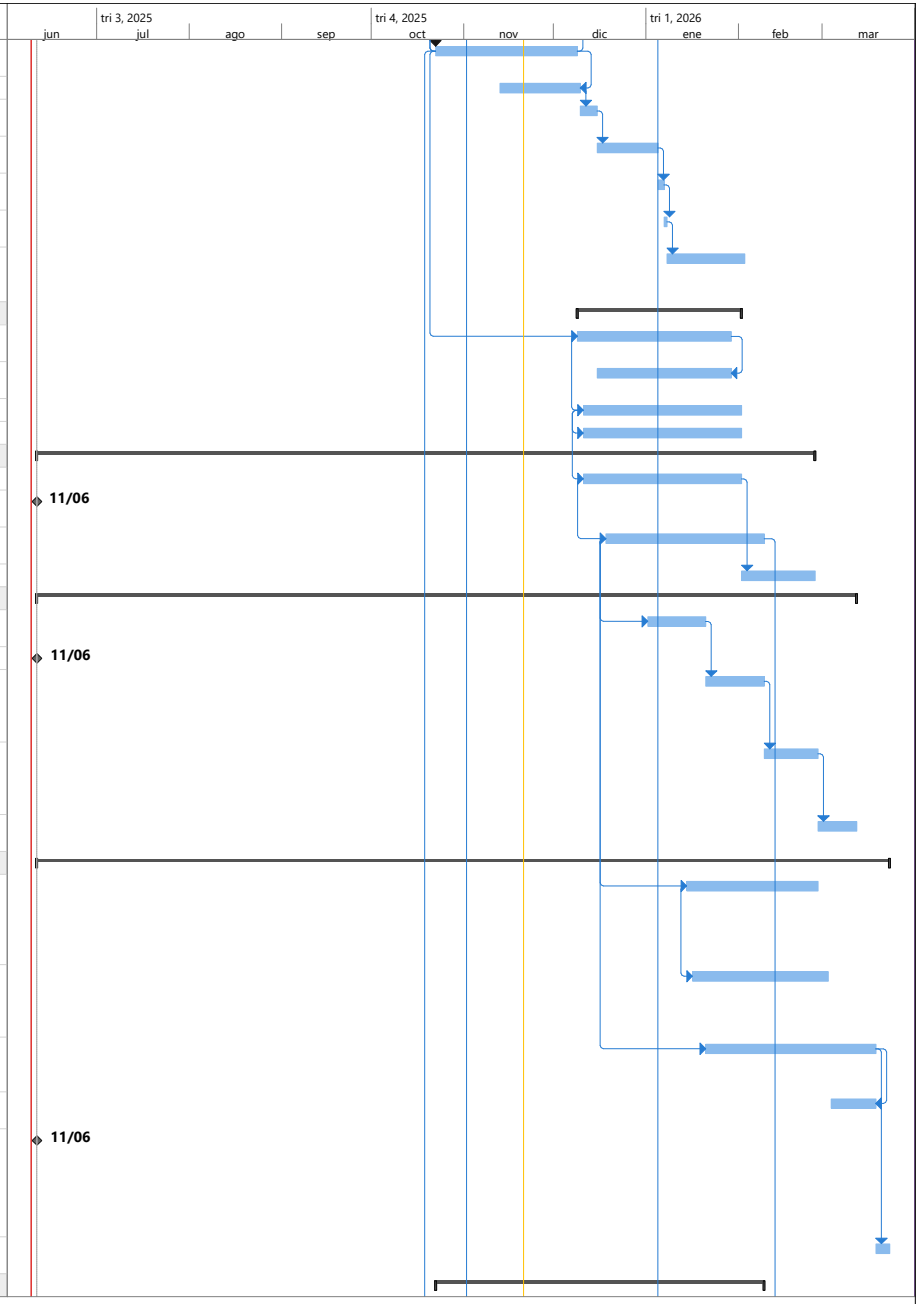

Proyecto: Project V1_ING LUIS H
Fecha: lun 6/04/26

Tarea	Resumen del proyecto	Tarea manual	solo el comienzo	Fecha límite	Progreso manual
División	Tarea inactiva	solo duración	solo fin	Tareas críticas	
Hito	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Tareas externas	División crítica	
Resumen	Resumen inactivo	Resumen manual	Hito externo	Progreso	


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
143		S/I TUBERÍA PARA PROLONGACIÓN DE DRENAJES DE AGUAS LLUVIA EN 4". INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO	30 días	jue 1/01/26	lun 9/02/26	$ 10.287.598,00
144		REPARACIÓN DE DOMICILIARIAS DEL ACUEDUCTO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	35 días	mié 22/10/25	mar 9/12/25	$ 8.835.090,00
145		REUBICACIÓN TÍPICA MEDIDORES DE GAS RED DOMICILIARIA.	5 días	mar 9/12/25	lun 15/12/25	$ 408.751,00
146		**BOX CULVERT**	**44 días**	**mié 14/01/26**	**mié 11/03/26**	**$ 143.249.009,00**
147		EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN BAJO AGUA	10 días	mié 14/01/26	mar 27/01/26	$ 2.668.927,00
148		GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	5 días	vie 16/01/26	vie 23/01/26	$ 575.160,00
149		CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	10 días	mar 20/01/26	lun 2/02/26	$ 4.729.037,00
150		RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	10 días	jue 22/01/26	mié 4/02/26	$ 3.042.229,00
151		MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJON O SIMILAR)	10 días	lun 26/01/26	sáb 7/02/26	$ 4.499.712,00
152		CONCRETO RESISTENCIA 28 MPA CLASE C (PARA ESTRUCTURA)	35 días	lun 26/01/26	mié 11/03/26	$ 69.114.637,00
153		ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa	35 días	lun 26/01/26	mié 11/03/26	$ 34.867.400,00
154		BARANDA METÁLICA PARA TRÁFICO VEHICULAR	20 días	lun 2/02/26	jue 26/02/26	$ 8.671.089,00
155		MANEJO DE CAUCE DE AGUA	15 días	sáb 7/02/26	jue 26/02/26	$ 11.846.670,00
156		JUNTA PARA MURO EN CINTA PVC	10 días	vie 13/02/26	jue 26/02/26	$ 1.185.824,00
157		CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA CLASE F (SOLADO)	10 días	vie 13/02/26	jue 26/02/26	$ 2.048.324,00
158		**CUNETAS Y SUMIDEROS**	**143,38 días**	**mié 11/06/25**	**jue 18/12/25**	**$ 0,00**
159		EXCAVACION MANUAL	0 días	jue 18/12/25	jue 18/12/25	$ 0,00
160		CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
161		GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPA	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
162		RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
163		ACERO DE REFUERZO FY = 420 MPA	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
164		CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
165		SUMIDERO TIPO VENTANA EN CONCRETO	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
166		**RED DE MEDIA TENSION (13.200) VOL.**	**146,88 días**	**mié 11/06/25**	**mié 24/12/25**	**$ 0,00**
167		SUMINISTRO, INSTALACION E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO (	0 días	mié 24/12/25	mié 24/12/25	$ 0,00
168		SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE CIMENTACION CILINDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS - 750 KGF)	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
169		SUMINISTRO, INSTALACION E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO (	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
170		SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE CIMENTACION CILINDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS - 1050 KGF)	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
171		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ALINEACION CON DISPOSICIÓN EN BANDERA BIFASICO A 13.2 KV., E INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
172		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ANGULO CON DISPOSICIÓN EN BANDERA A 13.2 KV., E INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
173		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN FIN DE LINEA COMPACTA CON DISPOSICIÓN CENTRAL BIFASICO A 13.2 KV., E INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
174		SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA MT BIFASICA AEREA EN CABLE DESNUDO DE ALUMINIO ACSR - No. 1/0 AWG	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
175		SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA MT BIFASICA AEREA EN CABLE AISLADO DE ALUMINIO ECOLOGICO - No. 1/0 AWG	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
176		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA RETENIDA MT EN POSTE DE 12m A POSTE DE 9m	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
177		INSTALACION EN CALIENTE DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA SECCIONADOR BIFASICO A 13.2 KV.	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
178		INSTALACION CON TENSION DE ARMADO PARA ESTRUCTURA DE N	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
179		INSTALACION CON TENSION A 13.2 KV. DE POSTE EN CONCRETO	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
180		**RED DE BAJA TENSION (240/120) VOL.**	**0 días**	**mié 11/06/25**	**mié 11/06/25**	**$ 0,00**

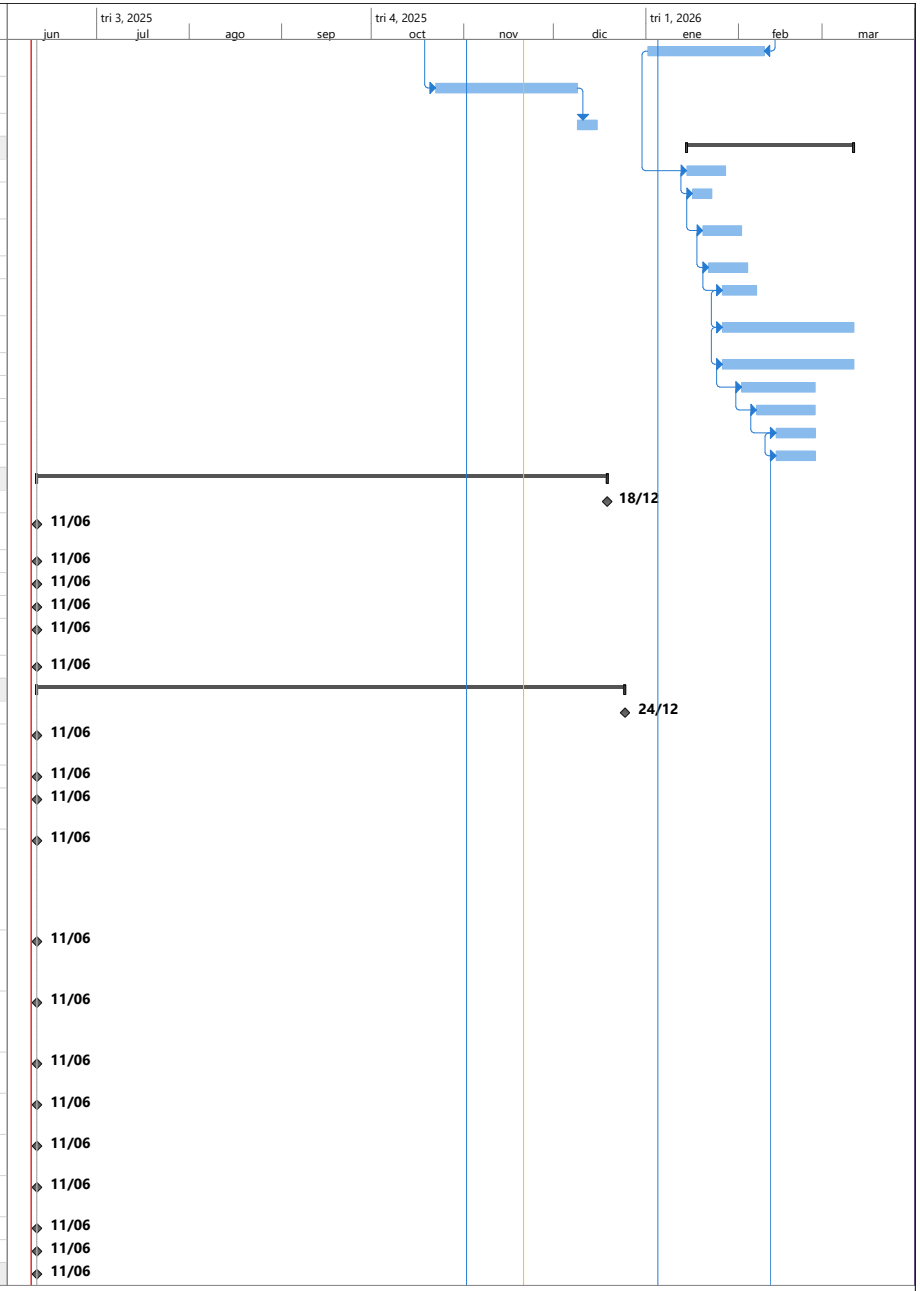

Proyecto: Project V1_ING LUIS H
Fecha: lun 6/04/26

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
181		INSTALACION E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 10	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
182		SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE CIMENTACION CILINDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 1050 KGF)	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
183		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ALINEACION - ANGULO - FINAL DE CIRCUITO PARA BT A 240/120 VOL.	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
184		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ANCLAJE PARA BT A 240/120 VOL.	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
185		SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA BT BIFASICA AEREA EN CABLE TRIPLEX DE ALUMINIO - No. 2 AWG.	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
186		SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA BT BIFASICA AEREA EN CABLE TRIPLEX DE ALUMINIO - No. 1/0 AWG.	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
187		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA RETENIDA A TIERRA EN POSTE DE 9 MTS.	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
188		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA PUESTA A TIERRA DE RED TRENSADA DE BT A 120/240 VOL., EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
189		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA CAJA DE CONEXIÓN (4 USUARIOS) A RED TRENSADA DE BT A 120/240 VOL	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
190		DESINSTALACION DE POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 1050 750-	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
191		DESMONTE, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA RED DE	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
192		**SUBESTACIONES ELECTRICAS (13.200/240/120) VOL.**	**0 días**	**mié 11/06/25**	**mié 11/06/25**	**$ 0,00**
193		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ADECUACION DE SUBESTACION BIFASICA EN POSTE A (13.200/240/120) VOL.,INCLUYE: INSTALACION PUENTES DE SECCIONADOR, ESTRUCTURA DE PROTECCIONES, SECCIONADOR, DPS, DESMONTE Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR.	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
194		**ALUMBRADO PUBLIICO, ALIMENTADORES Y MEDIDAS DE BAJA TENSION (240/120) VOL.**	**0 días**	**mié 11/06/25**	**mié 11/06/25**	**$ 0,00**
195		SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE CABLE CONCENTRICO DE ALUMINIO - (2xNo. 6 + 1xNo. 6) AWG.	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
196		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA REUBICACION DE MEDIDOR (240/120) VOL.	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
197		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA REINSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO.	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
198		**ITEM NO PREVISTO**	**217 días**	**mié 11/06/25**	**mar 24/03/26**	**$ 33.285.031,00**
199		CONEXION ACOMETIDAS DOMICILIARIA PVC NUEVA 8" X 6", (INCULYE ACCESORIOS, TUBERIA PVC LPROMEDIO= 10M)	25 días	vie 20/02/26	mar 24/03/26	$ 10.027.016,00
200		REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES Y ARBUSTOS CON DAP MENOR O IGUAL A 10 CM INCLUYE TRANSPORTE RESIDUOS)	25 días	lun 5/01/26	jue 5/02/26	$ 6.942.986,00
201		CONFORMACIÓN DE TERRAPLÉN CON MATERIAL DE PRÉSTAMO	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
202		RAMPA PARA USO VEHICULAR, INCLUYE BORDILLO DE CONCRETO DE CAMBIO DE NIVEL, LOSETA TOPEROL, ADOQUIN EN CONCRETO DE 20CM X 10CM X 6CM COLOR AMARILLO,	25 días	vie 20/02/26	mar 24/03/26	$ 13.024.341,00
203		CONCRETO DE 3000 PSI PARA BORDILLO H:1.0M * 0,20 M, FUNDIDO IN SITU REFORZADO	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
204		REUBICACION TUBERIA SANITARIA 6".	5 días	mié 5/11/25	mié 12/11/25	$ 3.290.688,00
205		**FIN TRAMO 2**	**0 días**	**mar 24/03/26**	**mar 24/03/26**	$ 0,00
206		**TRAMO 3 CALLE 94 ENTRE LA CALLE 93 Y CRA 2A-MOCARÌ**	**220 días**	**mié 11/06/25**	**vie 27/03/26**	**$ 2.551.631.462,00**
207		**ACTIVIDADES PRELIMINARES**	**185 días**	**mié 11/06/25**	**mié 11/02/26**	**$ 250.840.341,00**
208		DEMOLICIÓN DE BORDILLOS DE CONCRETO	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
209		CORTE DE PISO EN TABLON Y PLANTILLA DE CONCRETO E= 0.10MTS/0.15MTS CON CORTADORA	45 días	jue 16/10/25	lun 15/12/25	$ 13.841.625,00
210		DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO	45 días	mié 29/10/25	lun 29/12/25	$ 7.835.734,00
211		DEMOLICION DE ESTRUCTURAS	4 días	lun 29/12/25	vie 2/01/26	$ 1.059.836,00
212		DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
213		EXCAVACIONES MECÁNICAS CON EXCAVADORA PARA FALLOS EN SUB RASANTE. PROFUNDIDAD > 50 CM. NO INCLUYE RETIRO	80 días	mié 29/10/25	mié 11/02/26	$ 7.584.317,00

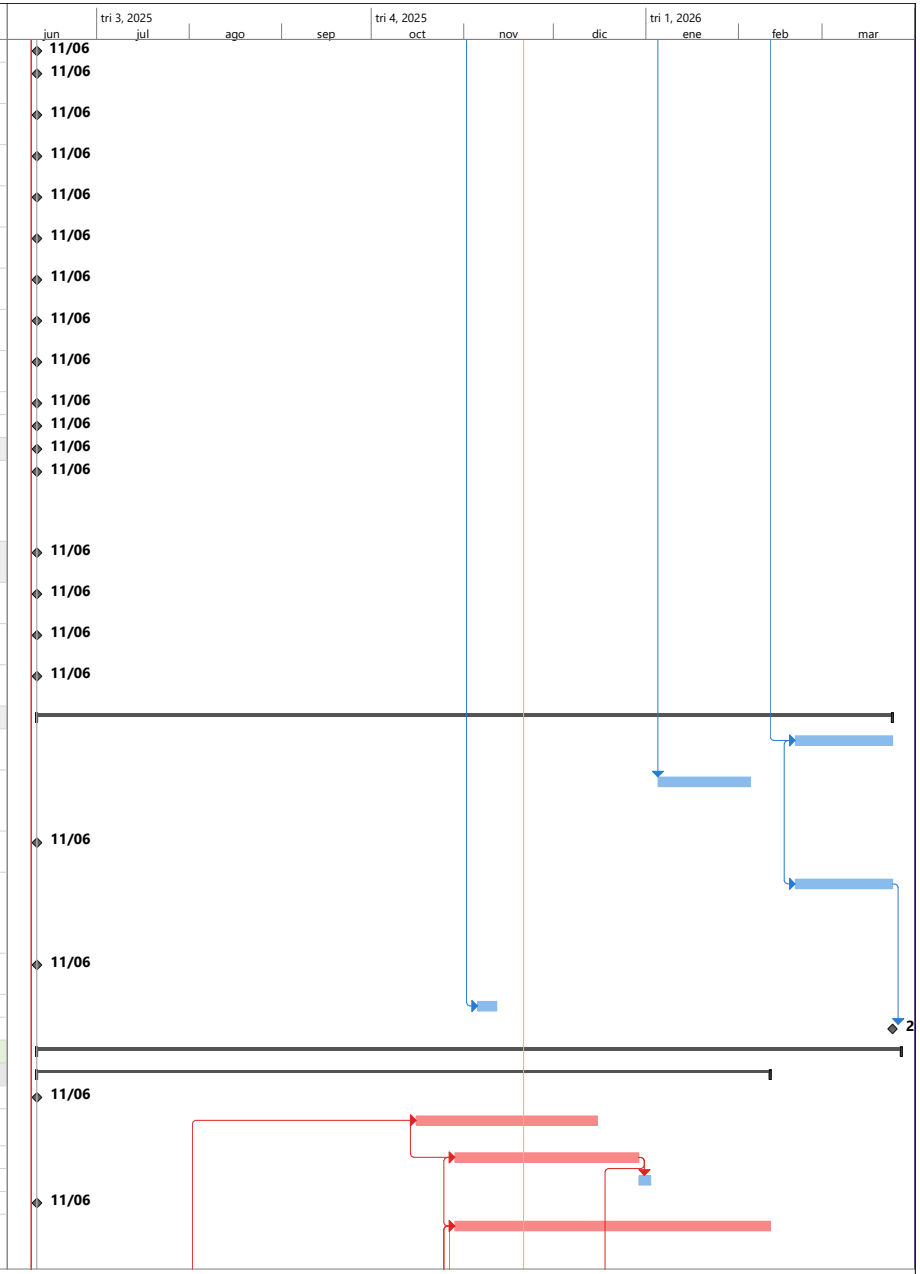

Proyecto: Project V1_ING LUIS H
Fecha: lun 6/04/26

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
214		EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	60 días	lun 4/08/25	mié 22/10/25	$ 39.346.692,00
215		CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	80 días	sáb 6/09/25	lun 22/12/25	$ 135.031.074,00
216		REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURA MENOR O IGUAL H= 5 M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS,	3 días	lun 22/12/25	vie 26/12/25	$ 2.526.336,00
217		REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURA ENTRE H= 5.1M A 10M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS,	7 días	vie 26/12/25	lun 5/01/26	$ 12.172.977,00
218		REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURAS ENTRE H= 10.1M A 15 M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS,	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
219		PODA DE FORMACIÓN ÁRBOLES ALTURA MENOR O IGUAL H= 5 M (INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS)	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
220		SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ARBOLES DE ESPECIES NATIVAS DE 1.5 M DE ALTURA, INCLUYE EXCAVACION, ABONO ORGANICO, TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO	20 días	lun 5/01/26	jue 29/01/26	$ 31.441.750,00
221		**SUBRASANTE Y SUBBASE**	**45 días**	**mié 29/10/25**	**lun 29/12/25**	**$ 484.696.134,00**
222		MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON MATERIAL SELECCIONADO	40 días	mié 29/10/25	lun 22/12/25	$ 164.190.819,00
223		MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJÓN O SIMILAR)	35 días	mié 5/11/25	lun 22/12/25	$ 65.884.176,00
224		SUBBASE GRANULAR CLASE C	40 días	mié 5/11/25	lun 29/12/25	$ 203.985.490,00
225		GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPA	40 días	mié 5/11/25	lun 29/12/25	$ 50.635.649,00
226		**PAVIMENTO Y BORDILLOS**	**55 días**	**mié 12/11/25**	**vie 23/01/26**	**$ 1.196.599.746,00**
227		PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO MR (40 Kg/cm2)	35 días	mié 12/11/25	lun 29/12/25	$ 964.500.249,00
228		ADECUACIÓN DE CÁMARAS DE INSPECCIÓN (MANHOLES) EN CONC	5 días	lun 29/12/25	lun 5/01/26	$ 541.235,00
229		BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	30 días	mar 18/11/25	lun 29/12/25	$ 114.383.662,00
230		ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa	20 días	lun 29/12/25	vie 23/01/26	$ 117.174.600,00
231		**SEÑALIZACION**	**17 días**	**mié 17/12/25**	**vie 9/01/26**	**$ 31.424.862,00**
232		SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON LAMINA RETROREFLECTIVA DE	10 días	mié 17/12/25	mié 31/12/25	$ 5.876.380,00
233		SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON DOBLE LAMINA RETROREFLEC	10 días	mié 17/12/25	mié 31/12/25	$ 1.837.648,00
234		DEMARCACION HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRILICA BASE SOLVENTE - M2. (INCLUYE IMPRIMANTE,	10 días	sáb 27/12/25	vie 9/01/26	$ 7.313.620,00
235		DEMARCACION HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRILICA BASE SOLVENTE - M (12 CM). (INCLUYE IMPRIMANTE,	10 días	sáb 27/12/25	vie 9/01/26	$ 13.674.876,00
236		REDUCTORES DE VELOCIDAD TIPO RESALTO PLÁSTICO PERNADO	10 días	sáb 27/12/25	vie 9/01/26	$ 2.722.338,00
237		**ESPACIO PUBLICO ANDENES Y MOBILIARIOS**	**60 días**	**mar 25/11/25**	**mié 11/02/26**	**$ 217.958.055,00**
238		S/I TABLETA GUÍA PREF. TÁCTIL PARA DISCAP. EN CONCRETO DE 0.20m X 0.20m X 0.06m COLOR AMARILLO TIPO TOPEROL (UNA HILERA) CON MORTERO 1:4, INCLUYE ARENA H.=0.04 m, RELLENO CON MATERIAL COMPACTADO SELECCIONADO DE 0.20m Y JUNTAS SELLADAS	60 días	mar 25/11/25	mié 11/02/26	$ 50.772.328,00
239		FRANJA DEMARCADORA PARA LIMITADOS VISUALES CON ADOQUÍN EN CONCRETO DE 20cm X 10cm X 6cm COLOR AMARILLO PARA EMBEBER EN MORTERO, APAREJADO SEGÚN DISEÑO. INCLUYE MORTERO 1:4, ARENA H.=4 CM, INSTALACIÓN, COMPACTACIÓN, JUNTAS SELLADAS CON ARENA	60 días	mar 25/11/25	mié 11/02/26	$ 44.603.209,00
240		CONSTRUCCIÓN PISO EN CONCRETO ESTAMPADO TIPO RONDA, 21 MPA (3.000 PSI). E=0,08M FUNDIDO EN SITIO, JUNTAS SEGÚN DISEÑO. INCLUYE EXCAVACIÓN, MATERIAL SELECCIONADO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.	45 días	mar 25/11/25	vie 23/01/26	$ 92.347.546,00
241		RAMPA PEATONAL INCLUYE BORDILLOS DE CAMBIO DE NIVEL, SARDINEL, ADOQUÍN TÁCTIL TIPO ALERTA Y PLANTILLA EN CONCRETO	12 días	lun 1/12/25	mié 17/12/25	$ 12.819.420,00
242		RAMPA PARA USO VEHICULAR DE 4.20M X 1.20M, INCLUYE BORDILLO DE CONCRETO DE CAMBIO DE NIVEL, LOSETA TOPEROL, ADOQUIN EN CONCRETO DE 20CM X 10CM X 6CM COLOR AMARILLO, PLACA ENCONCRETO 0.15MTS DE ESPESOR, EXCAVACIONMANUAL, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	12 días	mié 3/12/25	vie 19/12/25	$ 0,00
243		S/I BOLARDOS ALTO EN HIERRO TIPO M63 - IDU EMPOTRADOS EN CONCRETO; INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	3 días	mié 17/12/25	lun 22/12/25	$ 17.415.552,00
244		**OTRAS ACTIVIDADES**	**25 días**	**lun 22/12/25**	**vie 23/01/26**	**$ 10.561.475,00**

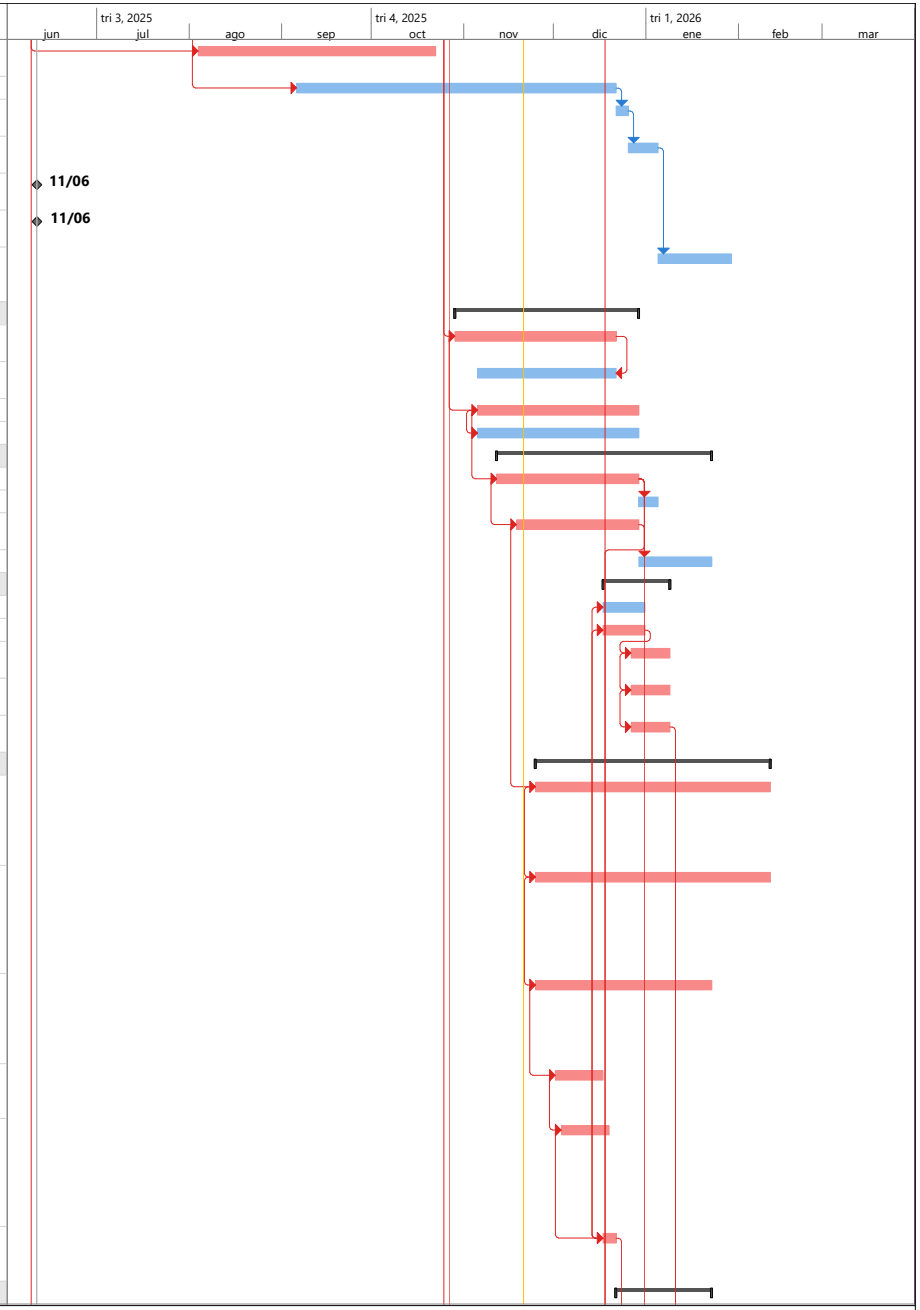

Proyecto: Project V1_ING LUIS H
Fecha: lun 6/04/26

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
245		S/I TUBERÍA PARA PROLONGACIÓN DE DRENAJES DE AGUAS LLUVIA EN 4". INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO	20 días	lun 22/12/25	vie 16/01/26	$ 5.950.669,00
246		REPARACIÓN DE DOMICILIARIAS DEL ACUEDUCTO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	25 días	lun 22/12/25	vie 23/01/26	$ 4.202.055,00
247		REUBICACIÓN TÍPICA MEDIDORES DE GAS RED DOMICILIARIA.	10 días	lun 5/01/26	vie 16/01/26	$ 408.751,00
248		**BOX CULVERT**	**0 días**	**mié 11/06/25**	**mié 11/06/25**	**$ 0,00**
249		EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN BAJO AGUA	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
250		GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPA	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
251		CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
252		RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
253		MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJON O SIMILAR)	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
254		CONCRETO RESISTENCIA 28 MPA CLASE C (PARA ESTRUCTURA)	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
255		ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
256		BARANDA METÁLICA PARA TRÁFICO VEHICULAR	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
257		MANEJO DE CAUCE DE AGUA	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
258		JUNTA PARA MURO EN CINTA PVC	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
259		CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA CLASE F (SOLADO)	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
260		**CUNETAS Y SUMIDEROS**	**0 días**	**mié 11/06/25**	**mié 11/06/25**	**$ 0,00**
261		EXCAVACION MANUAL	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
262		CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
263		GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPA	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
264		RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
265		ACERO DE REFUERZO FY = 420 MPA	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
266		CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
267		SUMIDERO TIPO VENTANA EN CONCRETO	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
268		**RED DE MEDIA TENSION (13.200) VOL.**	**60 días**	**sáb 10/01/26**	**vie 27/03/26**	**$ 161.330.425,00**
269		SUMINISTRO, INSTALACION E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS - 750 KGF).	45 días	sáb 10/01/26	lun 9/03/26	$ 12.459.936,00
270		SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE CIMENTACION CILINDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE	45 días	mar 13/01/26	mié 11/03/26	$ 2.792.394,00
271		SUMINISTRO, INSTALACION E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO (	45 días	jue 15/01/26	vie 13/03/26	$ 0,00
272		SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE CIMENTACION CILINDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE	45 días	lun 19/01/26	mar 17/03/26	$ 0,00
273		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ALINEACION CON DISPOSICIÓN EN BANDERA BIFASICO A 13.2 KV., E INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE	45 días	mié 21/01/26	jue 19/03/26	$ 6.417.092,00
274		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ANGULO CON DISPOSICIÓN EN BANDERA A 13.2 KV., E INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	45 días	vie 23/01/26	sáb 21/03/26	$ 5.481.933,00
275		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN FIN DE LINEA COMPACTA CON DISPOSICIÓN CENTRAL BIFASICO A 13.2 KV., E INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN	45 días	lun 26/01/26	mar 24/03/26	$ 4.473.546,00
276		SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA MT BIFASICA AEREA EN CABLE DESNUDO DE ALUMINIO ACSR - No.	45 días	lun 26/01/26	mar 24/03/26	$ 27.840.500,00
277		SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA MT BIFASICA AEREA EN CABLE AISLADO DE ALUMINIO ECOLOGICO - No. 1/0 AWG.	45 días	jue 29/01/26	vie 27/03/26	$ 44.317.600,00
278		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA RETENIDA MT EN POSTE DE 12m A POSTE DE 9m	45 días	jue 29/01/26	vie 27/03/26	$ 10.616.882,00
279		INSTALACION EN CALIENTE DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA SECCIONADOR BIFASICO A 13.2 KV.	45 días	jue 29/01/26	vie 27/03/26	$ 0,00
280		INSTALACION CON TENSION DE ARMADO PARA ESTRUCTURA DE MT BIFASICO A 13.2 KV.	45 días	jue 29/01/26	vie 27/03/26	$ 16.812.951,00
281		INSTALACION CON TENSION A 13.2 KV. DE POSTE EN CONCRETO	45 días	jue 29/01/26	vie 27/03/26	$ 30.117.591,00
282		**RED DE BAJA TENSION (240/120) VOL.**	**218 días**	**mié 11/06/25**	**mié 25/03/26**	**$ 61.963.017,00**
283		INSTALACION E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 1050 KGF).	15 días	jue 5/02/26	mar 24/02/26	$ 1.229.299,00
284		SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE CIMENTACION CILINDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE	15 días	sáb 7/02/26	jue 26/02/26	$ 608.946,00

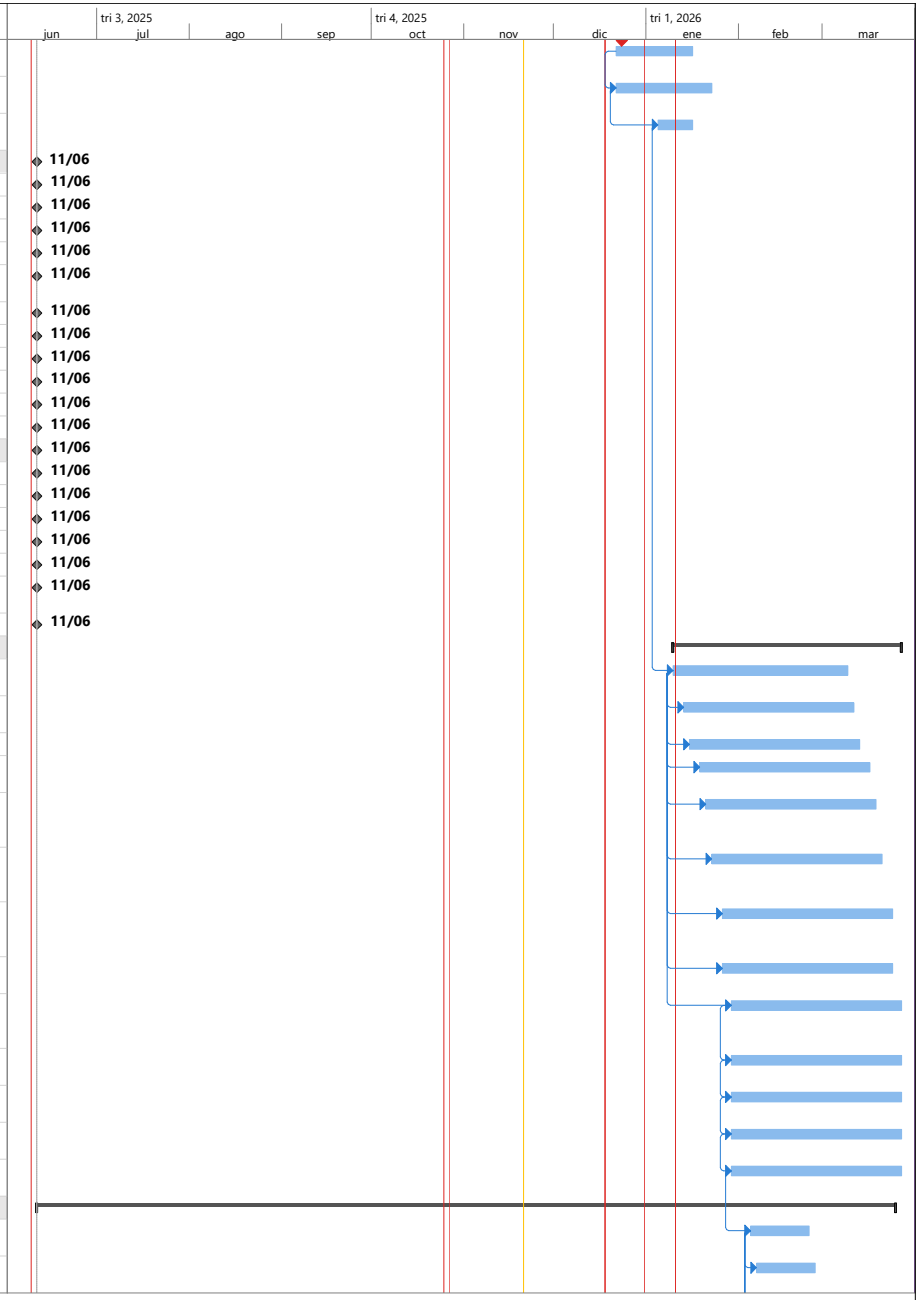

Proyecto: Project V1_ING LUIS H
Fecha: lun 6/04/26

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
285		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ALINEACION - ANGULO - FINAL DE CIRCUITO PARA	15 días	mar 10/02/26	lun 2/03/26	$ 3.814.052,00
286		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ANCLAJE PARA BT A 240/120 VOL.	15 días	jue 12/02/26	mié 4/03/26	$ 1.168.623,00
287		SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA BT BIFASICA AEREA EN CABLE TRIPLEX DE ALUMINIO - No. 2 AWG.	30 días	lun 16/02/26	mié 25/03/26	$ 20.365.738,00
288		SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA BT BIFASICA AEREA EN CABLE TRIPLEX DE ALUMINIO - No. 1/0 AWG.	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
289		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA RETENIDA A TIERRA EN POSTE DE 9 MTS.	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
290		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA PUESTA A TIERRA DE RED TRENSADA DE BT A 120/240 VOL., EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
291		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA CAJA DE CONEXIÓN (4 USUARIOS) A RED TRENSADA DE BT A 120/240 VOL.	25 días	mié 18/02/26	sáb 21/03/26	$ 16.864.351,00
292		DESINSTALACION DE POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 1050 750-510 KGF).	20 días	mié 18/02/26	lun 16/03/26	$ 5.181.940,00
293		DESMONTE, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA RED DE TELECOMUNICACIONES	20 días	mié 18/02/26	lun 16/03/26	$ 12.730.068,00
294		**SUBESTACIONES ELECTRICAS (13.200/240/120) VOL.**	**5 días**	**mié 18/02/26**	**mar 24/02/26**	**$ 0,00**
295		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ADECUACION DE SUBESTACION BIFASICA EN POSTE A (13.200/240/120) VOL.,INCLUYE: INSTALACION PUENTES DE SECCIONADOR, ESTRUCTURA DE PROTECCIONES, SECCIONADOR, DPS, DESMONTE Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR.	5 días	mié 18/02/26	mar 24/02/26	$ 0,00
296		**ALUMBRADO PUBLIICO, ALIMENTADORES Y MEDIDAS DE BAJA TENSION (240/120) VOL.**	**29 días**	**mié 18/02/26**	**jue 26/03/26**	**$ 41.598.806,00**
297		SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE CABLE CONCENTRICO DE ALUMINIO - (2xNo. 6 + 1xNo. 6) AWG.	25 días	mié 18/02/26	sáb 21/03/26	$ 36.498.720,00
298		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA REUBICACION DE MEDIDOR (240/120) VOL.	25 días	vie 20/02/26	mar 24/03/26	$ 1.225.666,00
299		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA REINSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO.	25 días	lun 23/02/26	jue 26/03/26	$ 3.874.420,00
300		**ITEM NO PREVISTO**	**215 días**	**mié 11/06/25**	**sáb 21/03/26**	**$ 94.658.601,00**
301		CONEXION ACOMETIDAS DOMICILIARIA PVC NUEVA 8" X 6", (INCULYE ACCESORIOS, TUBERIA PVC LPROMEDIO= 10M)	70 días	lun 22/12/25	sáb 21/03/26	$ 50.135.080,00
302		REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES Y ARBUSTOS CON DAP MENOR O IGUAL A 10 CM INCLUYE TRANSPORTE RESIDUOS)	25 días	lun 22/12/25	vie 23/01/26	$ 4.885.805,00
303		CONFORMACIÓN DE TERRAPLÉN CON MATERIAL DE PRÉSTAMO	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
304		RAMPA PARA USO VEHICULAR, INCLUYE BORDILLO DE CONCRETO DE CAMBIO DE NIVEL, LOSETA TOPEROL, ADOQUIN EN CONCRETO DE 20CM X 10CM X 6CM COLOR AMARILLO,	45 días	lun 22/12/25	mié 18/02/26	$ 28.942.980,00
305		CONCRETO DE 3000 PSI PARA BORDILLO H:1.0M * 0,20 M, FUNDIDO IN SITU REFORZADO	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
306		REUBICACION TUBERIA SANITARIA 6".	25 días	mié 29/10/25	lun 1/12/25	$ 10.694.736,00
307		**FIN TRAMO 3**	**0 días**	**vie 9/01/26**	**vie 9/01/26**	$ 0,00
308		**TRAMO 4 CARRERA 2A ENTRE CALLES 93 Y 94**	**221 días**	**mié 11/06/25**	**lun 30/03/26**	**$ 491.917.357,00**
309		**ACTIVIDADES PRELIMINARES**	**175 días**	**mié 11/06/25**	**jue 29/01/26**	**$ 58.789.944,00**
310		DEMOLICIÓN DE BORDILLOS DE CONCRETO	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
311		CORTE DE PISO EN TABLON Y PLANTILLA DE CONCRETO E= 0.10MTS/0.15MTS CON CORTADORA	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
312		DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
313		DEMOLICION DE ESTRUCTURAS	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
314		DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
315		EXCAVACIONES MECÁNICAS CON EXCAVADORA PARA FALLOS EN SUB RASANTE. PROFUNDIDAD > 50 CM. NO INCLUYE RETIRO	5 días	vie 16/01/26	vie 23/01/26	$ 512.575,00

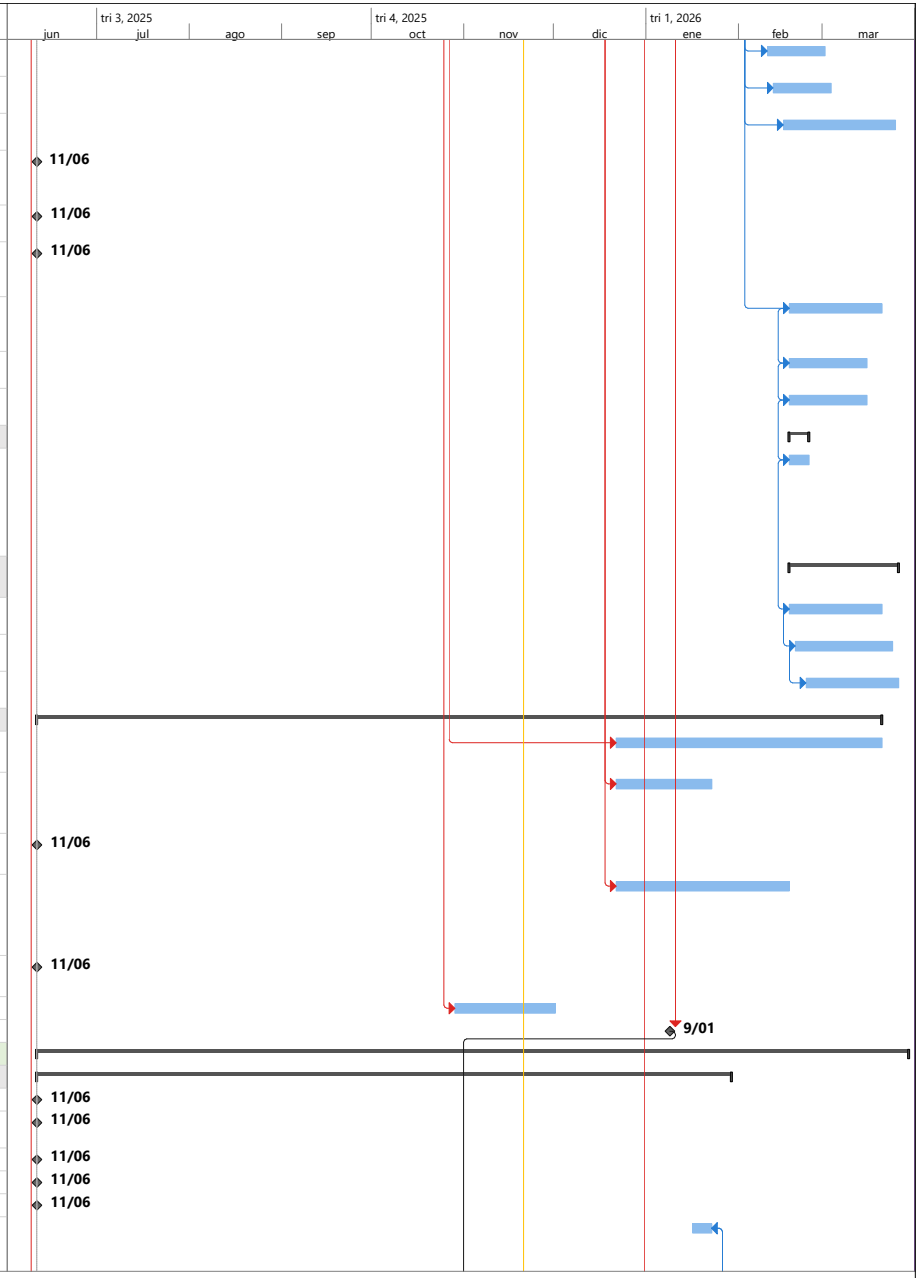

Proyecto: Project V1_ING LUIS H
Fecha: lun 6/04/26

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
316		EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	20 días	lun 29/12/25	vie 23/01/26	$ 2.744.119,00
317		CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	25 días	lun 29/12/25	jue 29/01/26	$ 9.392.187,00
318		REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURA MENOR O IGUAL H= 5 M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS,	1 día	jue 22/01/26	vie 23/01/26	$ 2.526.336,00
319		REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURA ENTRE H= 5.1M A 10M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS,	1 día	jue 22/01/26	vie 23/01/26	$ 12.172.977,00
320		REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURAS ENTRE H= 10.1M A 15 M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS,	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
321		PODA DE FORMACIÓN ÁRBOLES ALTURA MENOR O IGUAL H= 5 M (INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS)	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
322		SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ARBOLES DE ESPECIES NATIVAS DE 1.5 M DE ALTURA, INCLUYE EXCAVACION, ABONO ORGANICO, TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO	15 días	lun 5/01/26	vie 23/01/26	$ 31.441.750,00
323		**SUBRASANTE Y SUBBASE**	**30 días**	**lun 29/12/25**	**jue 5/02/26**	**$ 55.585.393,00**
324		MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON MATERIAL SELECCIONA	18 días	mié 31/12/25	vie 23/01/26	$ 26.684.806,00
325		MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJÓN O SIMILAR)	20 días	lun 29/12/25	vie 23/01/26	$ 4.452.840,00
326		SUBBASE GRANULAR CLASE C	20 días	sáb 10/01/26	jue 5/02/26	$ 21.083.061,00
327		GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPA	3 días	mié 31/12/25	lun 5/01/26	$ 3.364.686,00
328		**PAVIMENTO Y BORDILLOS**	**26 días**	**vie 16/01/26**	**jue 19/02/26**	**$ 139.920.695,00**
329		PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO MR (40 Kg/cm2)	25 días	vie 16/01/26	mié 18/02/26	$ 99.668.486,00
330		ADECUACIÓN DE CÁMARAS DE INSPECCIÓN (MANHOLES) EN CON	10 días	jue 5/02/26	mié 18/02/26	$ 3.247.410,00
331		BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	16 días	jue 29/01/26	jue 19/02/26	$ 6.626.199,00
332		ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa	5 días	mié 11/02/26	mié 18/02/26	$ 30.378.600,00
333		**SEÑALIZACION**	**191 días**	**mié 11/06/25**	**jue 19/02/26**	**$ 3.142.732,00**
334		SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON LAMINA RETROREFLECTIVA DE	1 día	mié 18/02/26	jue 19/02/26	$ 2.350.552,00
335		SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON DOBLE LAMINA RETROREFLEC	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
336		DEMARCACION HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRILICA BASE SOLVENTE - M2. (INCLUYE IMPRIMANTE,	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
337		DEMARCACION HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRILICA BASE SOLVENTE - M (12 CM). (INCLUYE IMPRIMANTE,	1 día	mié 18/02/26	jue 19/02/26	$ 792.180,00
338		REDUCTORES DE VELOCIDAD TIPO RESALTO PLÁSTICO PERNADO	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
339		**ESPACIO PUBLICO ANDENES Y MOBILIARIOS**	**191 días**	**mié 11/06/25**	**jue 19/02/26**	**$ 11.810.396,00**
340		S/I TABLETA GUÍA PREF. TÁCTIL PARA DISCAP. EN CONCRETO DE 0.20m X 0.20m X 0.06m COLOR AMARILLO TIPO TOPEROL (UNA HILERA) CON MORTERO 1:4, INCLUYE ARENA H.=0.04 m, RELLENO CON MATERIAL COMPACTADO SELECCIONADO DE 0.20m Y JUNTAS SELLADAS	5 días	jue 12/02/26	jue 19/02/26	$ 3.439.320,00
341		FRANJA DEMARCADORA PARA LIMITADOS VISUALES CON ADOQUÍN EN CONCRETO DE 20cm X 10cm X 6cm COLOR AMARILLO PARA EMBEBER EN MORTERO, APAREJADO SEGÚN DISEÑO. INCLUYE MORTERO 1:4, ARENA H.=4 CM, INSTALACIÓN, COMPACTACIÓN, JUNTAS SELLADAS CON ARENA	5 días	jue 12/02/26	jue 19/02/26	$ 3.021.420,00
342		CONSTRUCCIÓN PISO EN CONCRETO ESTAMPADO TIPO RONDA, 21 MPA (3.000 PSI). E=0,08M FUNDIDO EN SITIO, JUNTAS SEGÚN DISEÑO. INCLUYE EXCAVACIÓN, MATERIAL SELECCIONADO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.	5 días	jue 12/02/26	jue 19/02/26	$ 5.349.656,00
343		RAMPA PEATONAL INCLUYE BORDILLOS DE CAMBIO DE NIVEL, SARDINEL, ADOQUÍN TÁCTIL TIPO ALERTA Y PLANTILLA EN CONCRETO	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
344		RAMPA PARA USO VEHICULAR DE 4.20M X 1.20M, INCLUYE BORDILLO DE CONCRETO DE CAMBIO DE NIVEL, LOSETA TOPEROL, ADOQUIN EN CONCRETO DE 20CM X 10CM X 6CM COLOR AMARILLO, PLACA ENCONCRETO 0.15MTS DE ESPESOR, EXCAVACIONMANUAL, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
345		S/I BOLARDOS ALTO EN HIERRO TIPO M63 - IDU EMPOTRADOS EN CONCRETO; INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
346		**OTRAS ACTIVIDADES**	**0 días**	**mié 11/06/25**	**mié 11/06/25**	**$ 0,00**

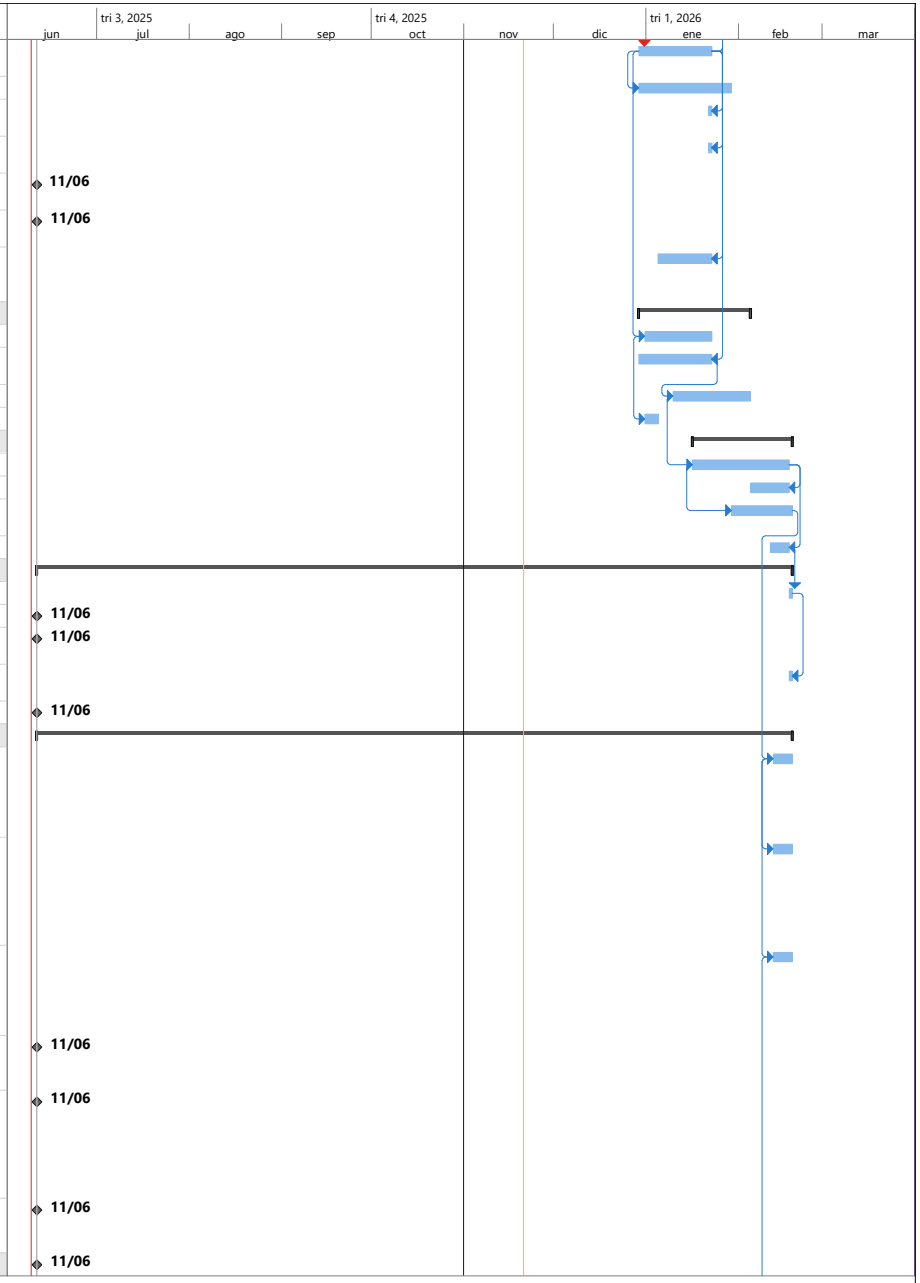

Proyecto: Project V1_ING LUIS H
Fecha: lun 6/04/26

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
347		S/I TUBERÍA PARA PROLONGACIÓN DE DRENAJES DE AGUAS LLUVIA EN 4". INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
348		REPARACIÓN DE DOMICILIARIAS DEL ACUEDUCTO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
349		REUBICACIÓN TÍPICA MEDIDORES DE GAS RED DOMICILIARIA.	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
350		**BOX CULVERT**	**0 días**	**mié 11/06/25**	**mié 11/06/25**	**$ 0,00**
351		EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN BAJO AGUA	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
352		GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPA	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
353		CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
354		RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
355		MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJON O SIMILAR)	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
356		CONCRETO RESISTENCIA 28 MPA CLASE C (PARA ESTRUCTURA)	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
357		ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
358		BARANDA METÁLICA PARA TRÁFICO VEHICULAR	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
359		MANEJO DE CAUCE DE AGUA	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
360		JUNTA PARA MURO EN CINTA PVC	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
361		CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA CLASE F (SOLADO)	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
362		**CUNETAS Y SUMIDEROS**	**0 días**	**mié 11/06/25**	**mié 11/06/25**	**$ 0,00**
363		EXCAVACION MANUAL	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
364		CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
365		GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPA	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
366		RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
367		ACERO DE REFUERZO FY = 420 MPA	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
368		CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
369		SUMIDERO TIPO VENTANA EN CONCRETO	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
370		**RED DE MEDIA TENSION (13.200) VOL.**	**214 días**	**mié 11/06/25**	**vie 20/03/26**	**$ 130.654.638,00**
371		SUMINISTRO, INSTALACION E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO (	10 días	jue 12/02/26	mié 25/02/26	$ 12.459.936,00
372		SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE CIMENTACION CILINDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE	10 días	jue 12/02/26	mié 25/02/26	$ 2.792.394,00
373		SUMINISTRO, INSTALACION E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS - 1050 KGF).	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
374		SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE CIMENTACION CILINDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS - 1050 KGF).	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
375		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ALINEACION CON DISPOSICIÓN EN BANDERA BIFASICO A 13.2 KV., E INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE	10 días	vie 13/02/26	jue 26/02/26	$ 3.208.546,00
376		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ANGULO CON DISPOSICIÓN EN BANDERA A 13.2 KV., E INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	10 días	lun 16/02/26	vie 27/02/26	$ 5.481.933,00
377		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN FIN DE LINEA COMPACTA CON DISPOSICIÓN CENTRAL BIFASICO A 13.2 KV., E INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	10 días	mié 18/02/26	mar 3/03/26	$ 4.473.546,00
378		SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA MT BIFASICA AEREA EN CABLE DESNUDO DE ALUMINIO ACSR - No. 1/0 AWG.	15 días	jue 19/02/26	mar 10/03/26	$ 27.840.500,00
379		SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA MT BIFASICA AEREA EN CABLE AISLADO DE ALUMINIO ECOLOGICO - No. 1/0 AWG.	15 días	sáb 21/02/26	jue 12/03/26	$ 22.158.800,00
380		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA RETENIDA MT EN POSTE DE 12m A POSTE DE 9m	10 días	mar 24/02/26	lun 9/03/26	$ 5.308.441,00
381		INSTALACION EN CALIENTE DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA SECCIONADOR BIFASICO A 13.2 KV.	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
382		INSTALACION CON TENSION DE ARMADO PARA ESTRUCTURA DE MT BIFASICO A 13.2 KV.	15 días	jue 26/02/26	mié 18/03/26	$ 16.812.951,00
383		INSTALACION CON TENSION A 13.2 KV. DE POSTE EN CONCRETO	15 días	lun 2/03/26	vie 20/03/26	$ 30.117.591,00
384		**RED DE BAJA TENSION (240/120) VOL.**	**221 días**	**mié 11/06/25**	**lun 30/03/26**	**$ 51.383.358,00**

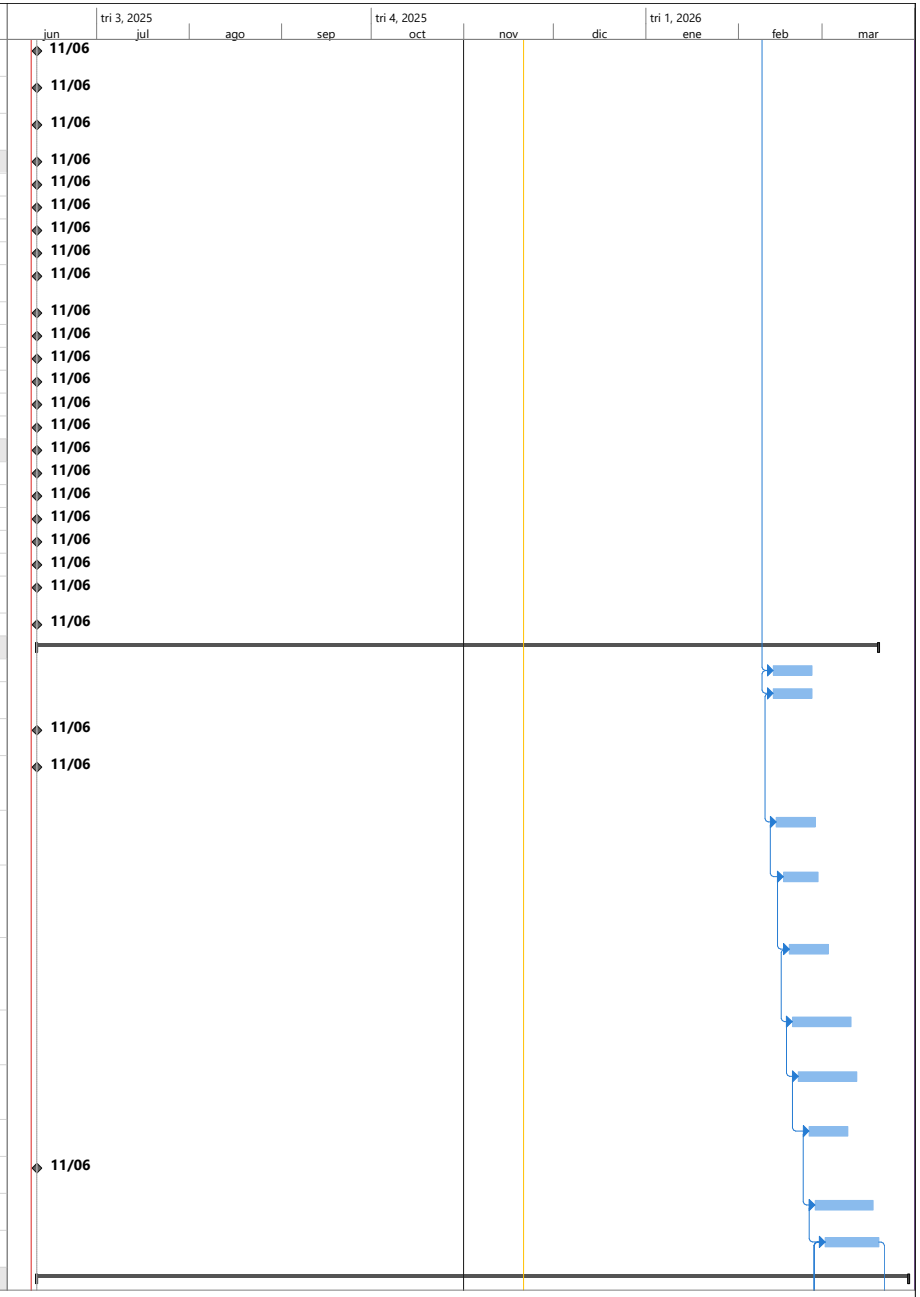

Proyecto: Project V1_ING LUIS H
Fecha: lun 6/04/26

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
385		INSTALACION E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 10	5 días	vie 20/03/26	jue 26/03/26	$ 1.229.299,00
386		SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE CIMENTACION CILINDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE	5 días	lun 23/03/26	lun 30/03/26	$ 608.946,00
387		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ALINEACION - ANGULO - FINAL DE CIRCUITO PARA	5 días	lun 2/03/26	sáb 7/03/26	$ 1.907.026,00
388		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ANCLAJE PARA BT A 240/120 VOL.	5 días	lun 2/03/26	sáb 7/03/26	$ 1.168.623,00
389		SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA BT BIFASICA AEREA EN CABLE TRIPLEX DE ALUMINIO - No. 2 AWG.	15 días	lun 2/03/26	vie 20/03/26	$ 20.270.571,00
390		SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA BT BIFASICA AEREA EN CABLE TRIPLEX DE ALUMINIO - No. 1/0 AWG.	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
391		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA RETENIDA A TIERRA EN POSTE DE 9 MTS.	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
392		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA PUESTA A TIERRA DE RED TRENSADA DE BT A 120/240 VOL., EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
393		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA CAJA DE CONEXIÓN (4 USUARIOS) A RED TRENSADA DE BT A 120/240 VOL.	15 días	lun 2/03/26	vie 20/03/26	$ 9.636.772,00
394		DESINSTALACION DE POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 1050 750-510 KGF).	15 días	mié 4/03/26	lun 23/03/26	$ 3.886.455,00
395		DESMONTE, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA RED DE TELECOMUNICACIONES	15 días	vie 6/03/26	mié 25/03/26	$ 12.675.666,00
396		**SUBESTACIONES ELECTRICAS (13.200/240/120) VOL.**	**0 días**	**mié 11/06/25**	**mié 11/06/25**	**$ 0,00**
397		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ADECUACION DE SUBESTACION BIFASICA EN POSTE A (13.200/240/120) VOL.,INCLUYE: INSTALACION PUENTES DE SECCIONADOR, ESTRUCTURA DE PROTECCIONES, SECCIONADOR, DPS, DESMONTE Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR.	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
398		**ALUMBRADO PUBLIICO, ALIMENTADORES Y MEDIDAS DE BAJA TENSION (240/120) VOL.**	**15 días**	**vie 6/03/26**	**mié 25/03/26**	**$ 40.630.201,00**
399		SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE CABLE CONCENTRICO DE ALUMINIO - (2xNo. 6 + 1xNo. 6) AWG.	15 días	vie 6/03/26	mié 25/03/26	$ 36.498.720,00
400		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA REUBICACION DE MEDIDOR (240/120) VOL.	10 días	mar 10/03/26	lun 23/03/26	$ 1.225.666,00
401		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA REINSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO.	5 días	jue 12/03/26	jue 19/03/26	$ 2.905.815,00
402		**ITEM NO PREVISTO**	**0 días**	**mié 11/06/25**	**mié 11/06/25**	**$ 0,00**
403		CONEXION ACOMETIDAS DOMICILIARIA PVC NUEVA 8" X 6", (INCULYE ACCESORIOS, TUBERIA PVC LPROMEDIO= 10M)	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
404		REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES Y ARBUSTOS CON DAP MENOR O IGUAL A 10 CM INCLUYE TRANSPORTE RESIDUOS)	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
405		CONFORMACIÓN DE TERRAPLÉN CON MATERIAL DE PRÉSTAMO	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
406		RAMPA PARA USO VEHICULAR, INCLUYE BORDILLO DE CONCRETO DE CAMBIO DE NIVEL, LOSETA TOPEROL, ADOQUIN EN CONCRETO DE 20CM X 10CM X 6CM COLOR AMARILLO,	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
407		CONCRETO DE 3000 PSI PARA BORDILLO H:1.0M * 0,20 M, FUNDIDO IN SITU REFORZADO	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
408		REUBICACION TUBERIA SANITARIA 6".	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
409		**FIN TRAMO 4**	**0 días**	**lun 30/03/26**	**lun 30/03/26**	**$ 0,00**
410		**TRAMO 5 CALLE 95 ENTRE LA CRA 4 Y LA VIA MONTERIA-CERETÉ-MOCARÌ**	**222 días**	**mié 11/06/25**	**mar 31/03/26**	**$ 3.011.454.799,00**
411		**ACTIVIDADES PRELIMINARES**	**221 días**	**mié 11/06/25**	**lun 30/03/26**	**$ 206.154.690,00**
412		DEMOLICIÓN DE BORDILLOS DE CONCRETO	45 días	vie 19/12/25	mar 17/02/26	$ 828.840,00
413		CORTE DE PISO EN TABLON Y PLANTILLA DE CONCRETO E= 0.10MTS/0.15MTS CON CORTADORA	75 días	mar 23/12/25	lun 30/03/26	$ 12.771.206,00
414		DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO	55 días	vie 26/12/25	vie 6/03/26	$ 7.898.046,00
415		DEMOLICION DE ESTRUCTURAS	45 días	lun 29/12/25	mar 24/02/26	$ 11.591.470,00
416		DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00

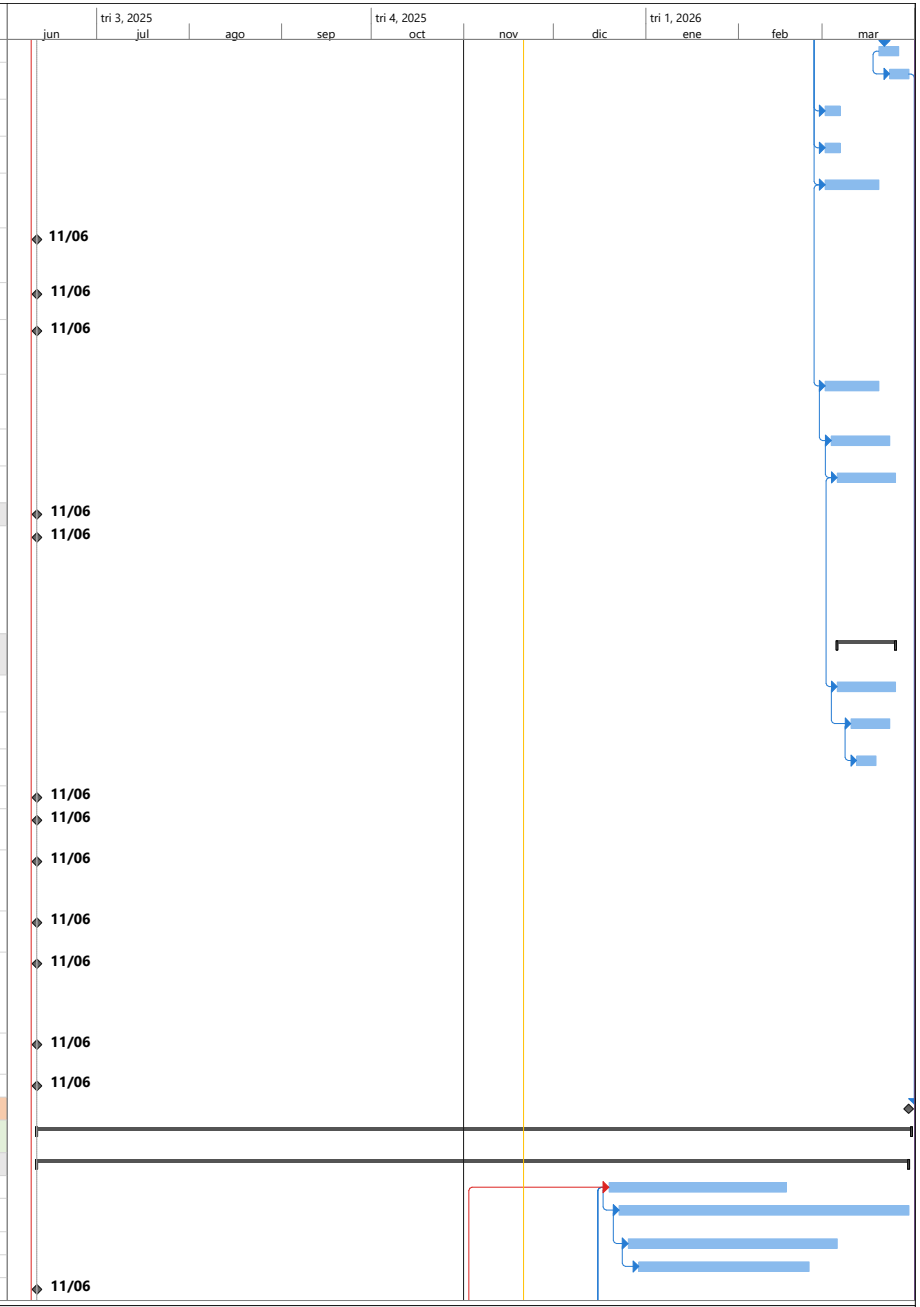

Proyecto: Project V1_ING LUIS H
Fecha: lun 6/04/26

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
417		EXCAVACIONES MECÁNICAS CON EXCAVADORA PARA FALLOS EN SUB RASANTE. PROFUNDIDAD > 50 CM. NO INCLUYE RETIRO	60 días	lun 17/11/25	mié 4/02/26	$ 5.494.191,00
418		EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	40 días	mar 4/11/25	sáb 27/12/25	$ 27.318.696,00
419		CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	40 días	jue 6/11/25	mar 30/12/25	$ 94.111.178,00
420		REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURA MENOR O IGUAL H= 5 M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS,	3 días	vie 19/12/25	jue 25/12/25	$ 2.526.336,00
421		REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURA ENTRE H= 5.1M A 10M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS,	7 días	vie 19/12/25	mar 30/12/25	$ 12.172.977,00
422		REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURAS ENTRE H= 10.1M A 15 M INCLUYE TRANSPORTE DE	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
423		PODA DE FORMACIÓN ÁRBOLES ALTURA MENOR O IGUAL H= 5 M (INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS)	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
424		SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ARBOLES DE ESPECIES NATIVAS DE 1.5 M DE ALTURA, INCLUYE EXCAVACION, ABONO ORGANICO,	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 31.441.750,00
425		**SUBRASANTE Y SUBBASE**	**45 días**	**vie 19/12/25**	**mar 17/02/26**	**$ 354.275.518,00**
426		MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON MATERIAL SELECCIONADO	35 días	vie 19/12/25	mié 4/02/26	$ 118.945.541,00
427		MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJÓN O SIMILAR)	35 días	vie 2/01/26	mar 17/02/26	$ 47.729.088,00
428		SUBBASE GRANULAR CLASE C	35 días	mar 23/12/25	vie 6/02/26	$ 148.760.334,00
429		GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	30 días	vie 19/12/25	mié 28/01/26	$ 38.840.555,00
430		**PAVIMENTO Y BORDILLOS**	**62 días**	**mar 23/12/25**	**jue 12/03/26**	**$ 974.906.888,00**
431		PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO MR (40 Kg/cm2)	35 días	mar 23/12/25	vie 6/02/26	$ 703.315.420,00
432		ADECUACIÓN DE CÁMARAS DE INSPECCIÓN (MANHOLES) EN CON	7 días	vie 6/02/26	lun 16/02/26	$ 6.494.820,00
433		BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	20 días	lun 16/02/26	jue 12/03/26	$ 124.294.248,00
434		ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa	20 días	lun 12/01/26	vie 6/02/26	$ 140.802.400,00
435		**SEÑALIZACION**	**214 días**	**mié 11/06/25**	**vie 20/03/26**	**$ 28.935.890,00**
436		SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON LAMINA RETROREFLECTIVA DE 60CM X 60CM	3 días	jue 12/03/26	mar 17/03/26	$ 5.876.380,00
437		SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON DOBLE LAMINA RETROREFLE	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
438		DEMARCACION HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRILICA BASE SOLVENTE - M2. (INCLUYE IMPRIMANTE, SUMINISTRO, APLICACIÓN CON EQUIPO Y MICROESFERAS)	2 días	jue 12/03/26	lun 16/03/26	$ 6.384.906,00
439		DEMARCACION HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRILICA BASE SOLVENTE - M (12 CM). (INCLUYE IMPRIMANTE, SUMINISTRO, APLICACIÓN CON EQUIPO Y MICROESFERAS)	6 días	jue 12/03/26	vie 20/03/26	$ 14.859.712,00
440		REDUCTORES DE VELOCIDAD TIPO RESALTO PLÁSTICO PERNADO	2 días	jue 12/03/26	lun 16/03/26	$ 1.814.892,00
441		**ESPACIO PUBLICO ANDENES Y MOBILIARIOS**	**213 días**	**mié 11/06/25**	**jue 19/03/26**	**$ 241.836.234,00**
442		S/I TABLETA GUÍA PREF. TÁCTIL PARA DISCAP. EN CONCRETO DE 0.20m X 0.20m X 0.06m COLOR AMARILLO TIPO TOPEROL (UNA HILERA) CON MORTERO 1:4, INCLUYE ARENA H.=0.04 m, RELLENO CON MATERIAL COMPACTADO SELECCIONADO DE 0.20m Y JUNTAS SELLADAS	20 días	lun 16/02/26	jue 12/03/26	$ 53.784.086,00
443		FRANJA DEMARCADORA PARA LIMITADOS VISUALES CON ADOQUÍN EN CONCRETO DE 20cm X 10cm X 6cm COLOR AMARILLO PARA EMBEBER EN MORTERO, APAREJADO SEGÚN DISEÑO. INCLUYE MORTERO 1:4, ARENA H.=4 CM, INSTALACIÓN, COMPACTACIÓN, JUNTAS SELLADAS CON ARENA	20 días	sáb 21/02/26	jue 19/03/26	$ 47.248.966,00
444		CONSTRUCCIÓN PISO EN CONCRETO ESTAMPADO TIPO RONDA, 21 MPA (3.000 PSI). E=0,08M FUNDIDO EN SITIO, JUNTAS SEGÚN DISEÑO. INCLUYE EXCAVACIÓN, MATERIAL SELECCIONADO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.	20 días	sáb 21/02/26	jue 19/03/26	$ 100.348.848,00
445		RAMPA PEATONAL INCLUYE BORDILLOS DE CAMBIO DE NIVEL, SARDINEL, ADOQUÍN TÁCTIL TIPO ALERTA Y PLANTILLA EN CONCRETO	15 días	vie 27/02/26	jue 19/03/26	$ 19.229.130,00
446		RAMPA PARA USO VEHICULAR DE 4.20M X 1.20M, INCLUYE BORDILLO DE CONCRETO DE CAMBIO DE NIVEL, LOSETA TOPEROL, ADOQUIN EN CONCRETO DE 20CM X 10CM X 6CM COLOR AMARILLO, PLACA ENCONCRETO 0.15MTS DE ESPESOR, EXCAVACIONMANUAL, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
447		S/I BOLARDOS ALTO EN HIERRO TIPO M63 - IDU EMPOTRADOS EN CONCRETO; INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	4 días	vie 6/03/26	mié 11/03/26	$ 21.225.204,00
448		**OTRAS ACTIVIDADES**	**15 días**	**jue 15/01/26**	**mié 4/02/26**	**$ 11.187.287,00**

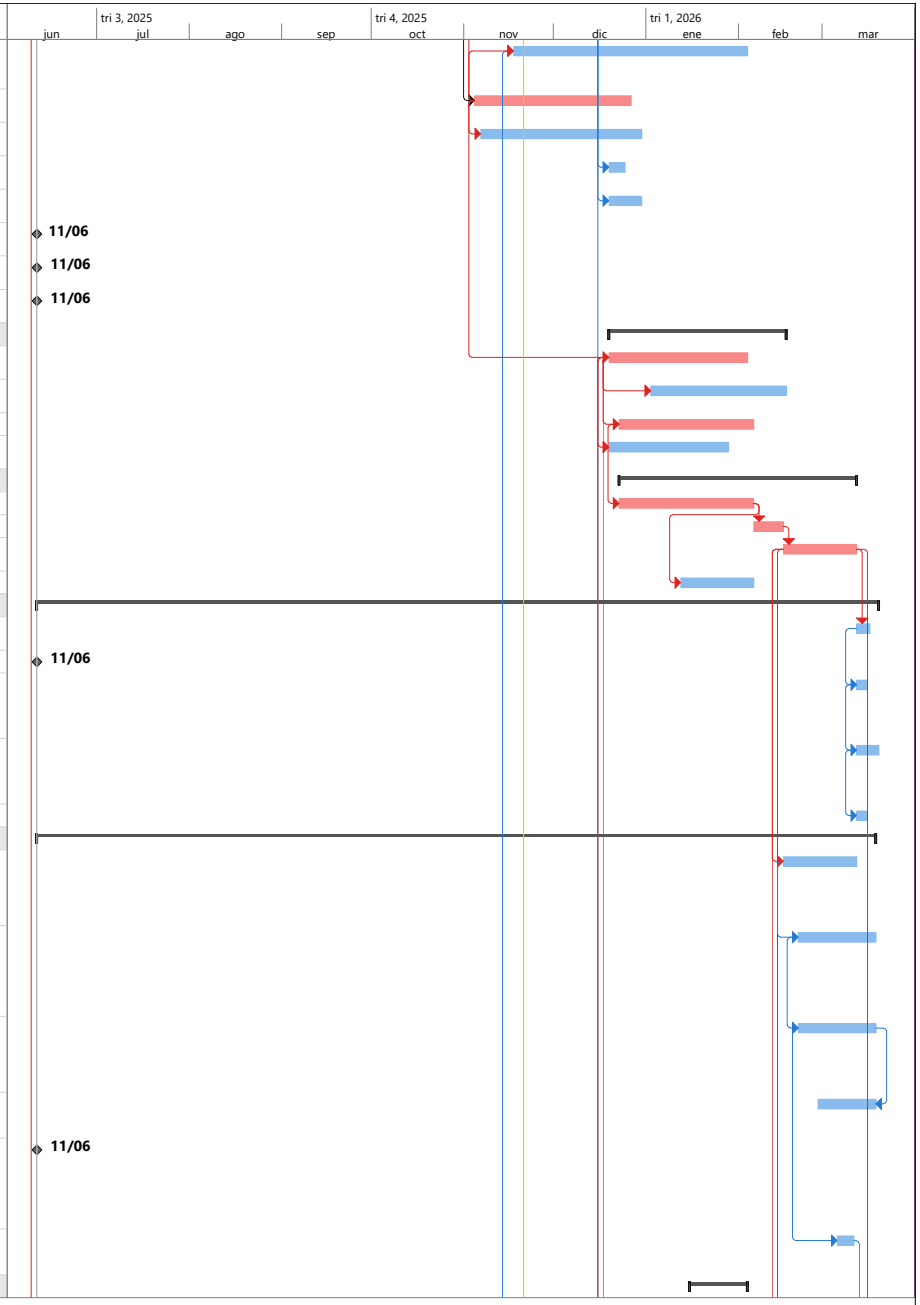

Proyecto: Project V1_ING LUIS H
Fecha: lun 6/04/26

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
449		S/I TUBERÍA PARA PROLONGACIÓN DE DRENAJES DE AGUAS LLUVIA EN 4". INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO	15 días	jue 15/01/26	mié 4/02/26	$ 6.253.246,00
450		REPARACIÓN DE DOMICILIARIAS DEL ACUEDUCTO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	15 días	jue 15/01/26	mié 4/02/26	$ 4.525.290,00
451		REUBICACIÓN TÍPICA MEDIDORES DE GAS RED DOMICILIARIA.	10 días	jue 15/01/26	mié 28/01/26	$ 408.751,00
452		**BOX CULVERT**	**57 días**	**jue 15/01/26**	**lun 30/03/26**	**$ 234.366.556,00**
453		EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN BAJO AGUA	2 días	jue 15/01/26	lun 19/01/26	$ 3.837.411,00
454		GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAP	2 días	lun 19/01/26	mié 21/01/26	$ 747.708,00
455		CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	2 días	jue 15/01/26	lun 19/01/26	$ 4.729.037,00
456		RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	12 días	lun 19/01/26	mar 3/02/26	$ 3.087.635,00
457		MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJON O SIMILAR)	2 días	lun 19/01/26	mié 21/01/26	$ 6.374.592,00
458		CONCRETO RESISTENCIA 28 MPA CLASE C (PARA ESTRUCTURA)	50 días	sáb 24/01/26	lun 30/03/26	$ 98.208.239,00
459		ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa	35 días	jue 22/01/26	sáb 7/03/26	$ 87.883.602,00
460		BARANDA METÁLICA PARA TRÁFICO VEHICULAR	15 días	sáb 24/01/26	jue 12/02/26	$ 13.673.639,00
461		MANEJO DE CAUCE DE AGUA	20 días	jue 15/01/26	mar 10/02/26	$ 11.846.670,00
462		JUNTA PARA MURO EN CINTA PVC	20 días	mié 25/02/26	lun 23/03/26	$ 1.185.824,00
463		CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA CLASE F (SOLADO)	1 día	mié 21/01/26	jue 22/01/26	$ 2.792.199,00
464		**CUNETAS Y SUMIDEROS**	**30 días**	**lun 16/02/26**	**mié 25/03/26**	**$ 608.850.324,00**
465		EXCAVACION MANUAL	10 días	lun 16/02/26	vie 27/02/26	$ 32.412.687,00
466		CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	10 días	jue 19/02/26	mié 4/03/26	$ 26.831.796,00
467		GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAP	10 días	jue 19/02/26	mié 4/03/26	$ 15.118.282,00
468		RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	20 días	vie 27/02/26	mié 25/03/26	$ 20.198.083,00
469		ACERO DE REFUERZO FY = 420 MPA	20 días	vie 27/02/26	mié 25/03/26	$ 168.400.996,00
470		CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	20 días	vie 27/02/26	mié 25/03/26	$ 332.732.120,00
471		SUMIDERO TIPO VENTANA EN CONCRETO	7 días	mar 17/03/26	mié 25/03/26	$ 13.156.360,00
472		**RED DE MEDIA TENSION (13.200) VOL.**	**221 días**	**mié 11/06/25**	**lun 30/03/26**	**$ 126.181.092,00**
473		SUMINISTRO, INSTALACION E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS - 750 KGF).	18 días	mié 18/02/26	jue 12/03/26	$ 12.459.936,00
474		SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE CIMENTACION CILINDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE	18 días	mar 24/02/26	jue 19/03/26	$ 2.792.394,00
475		SUMINISTRO, INSTALACION E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS - 1050 KGF).	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
476		SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE CIMENTACION CILINDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS - 1050 KGF).	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
477		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ALINEACION CON DISPOSICIÓN EN BANDERA BIFASICO A 13.2 KV., E INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE	18 días	jue 26/02/26	sáb 21/03/26	$ 3.208.546,00
478		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ANGULO CON DISPOSICIÓN EN BANDERA A 13.2 KV., E INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO	18 días	lun 2/03/26	mar 24/03/26	$ 5.481.933,00
479		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN FIN DE LINEA COMPACTA CON DISPOSICIÓN CENTRAL BIFASICO A 13.2 KV., E INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
480		SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA MT BIFASICA AEREA EN CABLE DESNUDO DE ALUMINIO ACSR - No.	20 días	mié 4/03/26	lun 30/03/26	$ 27.840.500,00
481		SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA MT BIFASICA AEREA EN CABLE AISLADO DE ALUMINIO ECOLOGICO -	20 días	mié 18/02/26	lun 16/03/26	$ 22.158.800,00
482		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA RETENIDA MT EN POSTE DE 12m A POSTE DE 9m	20 días	mié 4/03/26	lun 30/03/26	$ 5.308.441,00
483		INSTALACION EN CALIENTE DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA SECCIONADOR BIFASICO A 13.2 KV.	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
484		INSTALACION CON TENSION DE ARMADO PARA ESTRUCTURA DE I	20 días	mié 18/02/26	lun 16/03/26	$ 16.812.951,00
485		INSTALACION CON TENSION A 13.2 KV. DE POSTE EN CONCRETO	20 días	mar 24/02/26	sáb 21/03/26	$ 30.117.591,00
486		**RED DE BAJA TENSION (240/120) VOL.**	**222 días**	**mié 11/06/25**	**mar 31/03/26**	**$ 42.080.842,00**
487		INSTALACION E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 1050 KGF).	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
488		SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE CIMENTACION CILINDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 1050 KGF).	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
489		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ALINEACION - ANGULO - FINAL DE CIRCUITO PARA	18 días	mié 25/02/26	vie 20/03/26	$ 1.907.026,00

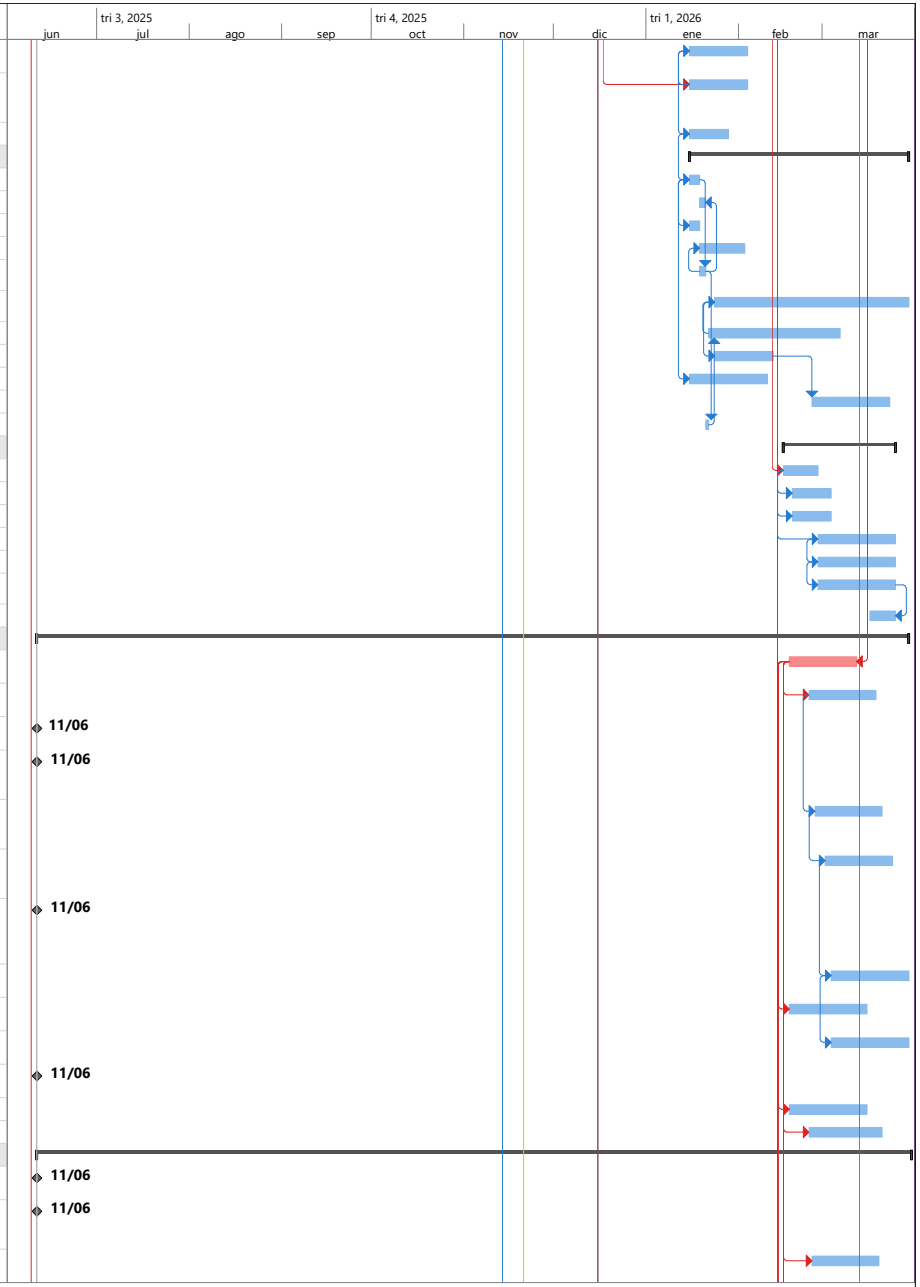

Proyecto: Project V1_ING LUIS H
Fecha: lun 6/04/26

Tarea | Resumen del proyecto | Tarea manual | solo el comienzo | Fecha límite | Progreso manual
División | Tarea inactiva | solo duración | solo fin | Tareas críticas
Hito | Hito inactivo | Informe de resumen manual | Tareas externas | División crítica
Resumen | Resumen inactivo | Resumen manual | Hito externo | Progreso


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
490		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ANCLAJE PARA BT A 240/120 VOL.	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
491		SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA BT BIFASICA AEREA EN CABLE TRIPLEX DE ALUMINIO - No. 2 AWG.	20 días	jue 5/03/26	mar 31/03/26	$ 20.270.571,00
492		SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA BT BIFASICA AEREA EN CABLE TRIPLEX DE ALUMINIO - No. 1/0 AWG.	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
493		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA RETENIDA A TIERRA EN POSTE DE 9 MTS.	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
494		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA PUESTA A TIERRA DE RED TRENSADA DE BT A 120/240 VOL., EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
495		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA CAJA DE CONEXIÓN (4 USUARIOS) A RED TRENSADA DE BT A	18 días	mar 24/02/26	jue 19/03/26	$ 7.227.579,00
496		DESINSTALACION DE POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 1050 750-510 KGF).	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
497		DESMONTE, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA RED D	18 días	mié 25/02/26	vie 20/03/26	$ 12.675.666,00
498		**SUBESTACIONES ELECTRICAS (13.200/240/120) VOL.**	**0 días**	**mié 11/06/25**	**mié 11/06/25**	**$ 0,00**
499		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ADECUACION DE SUBESTACION BIFASICA EN POSTE A (13.200/240/120) VOL.,INCLUYE: INSTALACION PUENTES DE SECCIONADOR, ESTRUCTURA DE PROTECCIONES, SECCIONADOR, DPS, DESMONTE Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR.	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
500		**ALUMBRADO PUBLIICO, ALIMENTADORES Y MEDIDAS DE BAJA TENSION (240/120) VOL.**	**215 días**	**mié 11/06/25**	**sáb 21/03/26**	**$ 37.724.386,00**
501		SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE CABLE CONCENTRICO DE ALUMINIO - (2xNo. 6 + 1xNo. 6) AWG.	25 días	mié 18/02/26	sáb 21/03/26	$ 36.498.720,00
502		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA REUBICACION DE MEDIDOR (240/120) VOL.	18 días	mié 18/02/26	jue 12/03/26	$ 1.225.666,00
503		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA REINSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO.	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
504		**ITEM NO PREVISTO**	**221 días**	**mié 11/06/25**	**lun 30/03/26**	**$ 144.955.092,00**
505		CONEXION ACOMETIDAS DOMICILIARIA PVC NUEVA 8" X 6", (INCULYE ACCESORIOS, TUBERIA PVC LPROMEDIO= 10M)	60 días	lun 17/11/25	mié 4/02/26	$ 100.270.160,00
506		REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES Y ARBUSTOS CON DAP MENOR O IGUAL A 10 CM INCLUYE TRANSPORTE RESIDUOS)	15 días	vie 19/12/25	vie 9/01/26	$ 3.600.067,00
507		CONFORMACIÓN DE TERRAPLÉN CON MATERIAL DE PRÉSTAMO	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
508		RAMPA PARA USO VEHICULAR, INCLUYE BORDILLO DE CONCRETO DE CAMBIO DE NIVEL, LOSETA TOPEROL, ADOQUIN EN CONCRETO DE 20CM X 10CM X 6CM COLOR AMARILLO,	28 días	sáb 21/02/26	lun 30/03/26	$ 30.390.129,00
509		CONCRETO DE 3000 PSI PARA BORDILLO H:1.0M * 0,20 M, FUNDIDO IN SITU REFORZADO	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
510		REUBICACION TUBERIA SANITARIA 6".	5 días	vie 19/12/25	sáb 27/12/25	$ 10.694.736,00
511		**FIN TRAMO 5**	**0 días**	**mié 11/03/26**	**mié 11/03/26**	**$ 0,00**
512		**TRAMO 6 CALLE 126A ENTRE LA CALLE 126 Y LA CRA 1D-GARZONES**	**222 días**	**mié 11/06/25**	**mar 31/03/26**	**$ 5.173.001.064,00**
513		**ACTIVIDADES PRELIMINARES**	**222 días**	**mié 11/06/25**	**mar 31/03/26**	**$ 289.011.357,00**
514		DEMOLICIÓN DE BORDILLOS DE CONCRETO	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
515		CORTE DE PISO EN TABLON Y PLANTILLA DE CONCRETO E= 0.10MTS/0.15MTS CON CORTADORA	30 días	lun 22/12/25	jue 29/01/26	$ 10.704.190,00
516		DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO	30 días	lun 22/12/25	jue 29/01/26	$ 6.324.668,00
517		DEMOLICION DE ESTRUCTURAS	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
518		DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
519		EXCAVACIONES MECÁNICAS CON EXCAVADORA PARA FALLOS EN SUB RASANTE. PROFUNDIDAD > 50 CM. NO INCLUYE RETIRO	75 días	lun 22/12/25	vie 27/03/26	$ 9.519.257,00
520		EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	90 días	mar 18/11/25	lun 16/03/26	$ 48.769.130,00
521		CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	35 días	mié 11/02/26	vie 27/03/26	$ 167.553.049,00
522		REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURA MENOR O IGUAL H= 5 M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAIZ)	3 días	mar 24/03/26	vie 27/03/26	$ 2.526.336,00

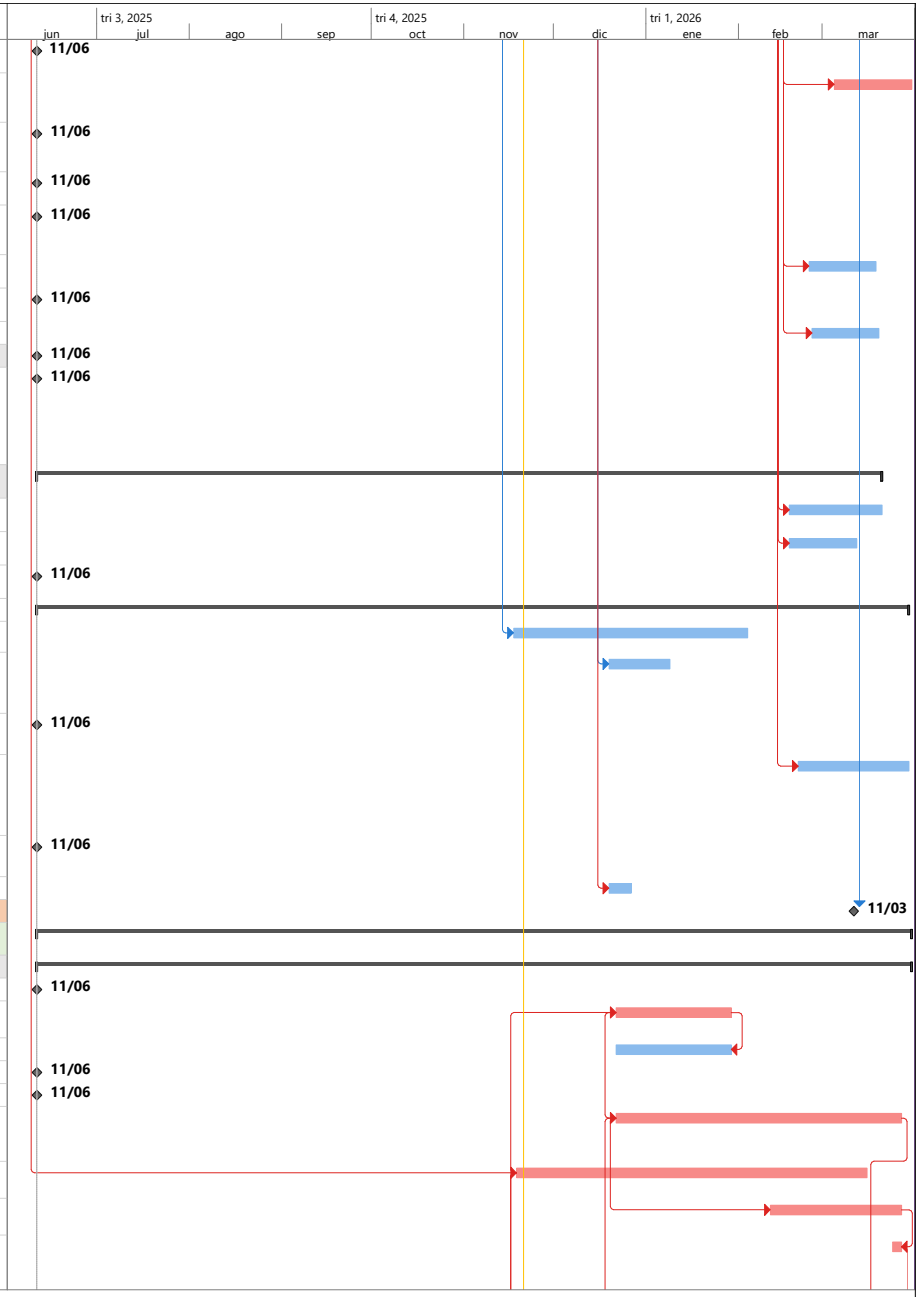

Proyecto: Project V1_ING LUIS H
Fecha: lun 6/04/26

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
523		REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURA ENTRE H= 5.1M A 10M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAIZ)	2 días	vie 27/03/26	mar 31/03/26	$ 12.172.977,00
524		REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURAS ENTRE H= 10.1M A 15 M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAÍZ)	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
525		PODA DE FORMACIÓN ÁRBOLES ALTURA MENOR O IGUAL H= 5 M (INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS)	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
526		SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ARBOLES DE ESPECIES NATIVAS DE 1.5 M DE ALTURA, INCLUYE EXCAVACION, ABONO ORGANICO, TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO	0 días	mar 31/03/26	mar 31/03/26	$ 31.441.750,00
527		**SUBRASANTE Y SUBBASE**	**95 días**	**mar 25/11/25**	**vie 27/03/26**	**$ 614.988.786,00**
528		MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON MATERIAL SELECCIONADO	90 días	mar 25/11/25	sáb 21/03/26	$ 206.080.680,00
529		MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJÓN O SIMILAR)	75 días	lun 22/12/25	vie 27/03/26	$ 82.695.600,00
530		SUBBASE GRANULAR CLASE C	80 días	mié 3/12/25	mié 18/03/26	$ 261.161.910,00
531		GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	75 días	mié 3/12/25	mié 11/03/26	$ 65.050.596,00
532		**PAVIMENTO Y BORDILLOS**	**80 días**	**vie 12/12/25**	**mié 25/03/26**	**$ 1.668.530.654,00**
533		PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO MR (40 Kg/cm2)	65 días	vie 12/12/25	vie 6/03/26	$ 1.234.732.365,00
534		ADECUACIÓN DE CÁMARAS DE INSPECCIÓN (MANHOLES) EN CONCRETO DE 3000 PSI	15 días	vie 6/03/26	mié 25/03/26	$ 7.036.055,00
535		BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	30 días	lun 16/02/26	mié 25/03/26	$ 172.281.184,00
536		ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa	30 días	mar 27/01/26	vie 6/03/26	$ 254.481.050,00
537		**SEÑALIZACION**	**7 días**	**vie 27/02/26**	**lun 9/03/26**	**$ 42.248.731,00**
538		SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON LAMINA RETROREFLECTIVA DE 60CM X 60CM	7 días	vie 27/02/26	lun 9/03/26	$ 7.639.294,00
539		SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON DOBLE LAMINA RETROREFLECTIVA DE 60CM X 60CM	2 días	vie 6/03/26	lun 9/03/26	$ 918.824,00
540		DEMARCACION HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRILICA BASE SOLVENTE - M2. (INCLUYE IMPRIMANTE, SUMINISTRO, APLICACIÓN CON EQUIPO Y MICROESFERAS)	2 días	vie 6/03/26	lun 9/03/26	$ 10.825.318,00
541		DEMARCACION HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRILICA BASE SOLVENTE - M (12 CM). (INCLUYE IMPRIMANTE, SUMINISTRO, APLICACIÓN CON EQUIPO Y MICROESFERAS)	7 días	vie 27/02/26	lun 9/03/26	$ 20.596.680,00
542		REDUCTORES DE VELOCIDAD TIPO RESALTO PLÁSTICO PERNADO	2 días	vie 6/03/26	lun 9/03/26	$ 2.268.615,00
543		**ESPACIO PUBLICO ANDENES Y MOBILIARIOS**	**218 días**	**mié 11/06/25**	**mié 25/03/26**	**$ 328.194.980,00**
544		S/I TABLETA GUÍA PREF. TÁCTIL PARA DISCAP. EN CONCRETO DE 0.20m X 0.20m X 0.06m COLOR AMARILLO TIPO TOPEROL (UNA HILERA) CON MORTERO 1:4, INCLUYE ARENA H.=0.04 m, RELLENO CON MATERIAL COMPACTADO SELECCIONADO DE 0.20m Y JUNTAS SELLADAS	25 días	sáb 21/02/26	mié 25/03/26	$ 76.524.870,00
545		FRANJA DEMARCADORA PARA LIMITADOS VISUALES CON ADOQUÍN EN CONCRETO DE 20cm X 10cm X 6cm COLOR AMARILLO PARA EMBEBER EN MORTERO, APAREJADO SEGÚN DISEÑO. INCLUYE MORTERO 1:4, ARENA H.=4 CM, INSTALACIÓN, COMPACTACIÓN, JUNTAS SELLADAS CON ARENA	25 días	sáb 21/02/26	mié 25/03/26	$ 67.226.595,00
546		CONSTRUCCIÓN PISO EN CONCRETO ESTAMPADO TIPO RONDA, 21 MPA (3.000 PSI). E=0,08M FUNDIDO EN SITIO, JUNTAS SEGÚN DISEÑO. INCLUYE EXCAVACIÓN, MATERIAL SELECCIONADO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.	25 días	sáb 21/02/26	mié 25/03/26	$ 139.091.057,00
547		RAMPA PEATONAL INCLUYE BORDILLOS DE CAMBIO DE NIVEL, SARDINEL, ADOQUÍN TÁCTIL TIPO ALERTA Y PLANTILLA EN CONCRETO	10 días	jue 12/03/26	mié 25/03/26	$ 19.229.130,00
548		RAMPA PARA USO VEHICULAR DE 4.20M X 1.20M, INCLUYE BORDILLO DE CONCRETO DE CAMBIO DE NIVEL, LOSETA TOPEROL, ADOQUIN EN CONCRETO DE 20CM X 10CM X 6CM COLOR AMARILLO, PLACA ENCONCRETO 0.15MTS DE ESPESOR, EXCAVACIONMANUAL, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00

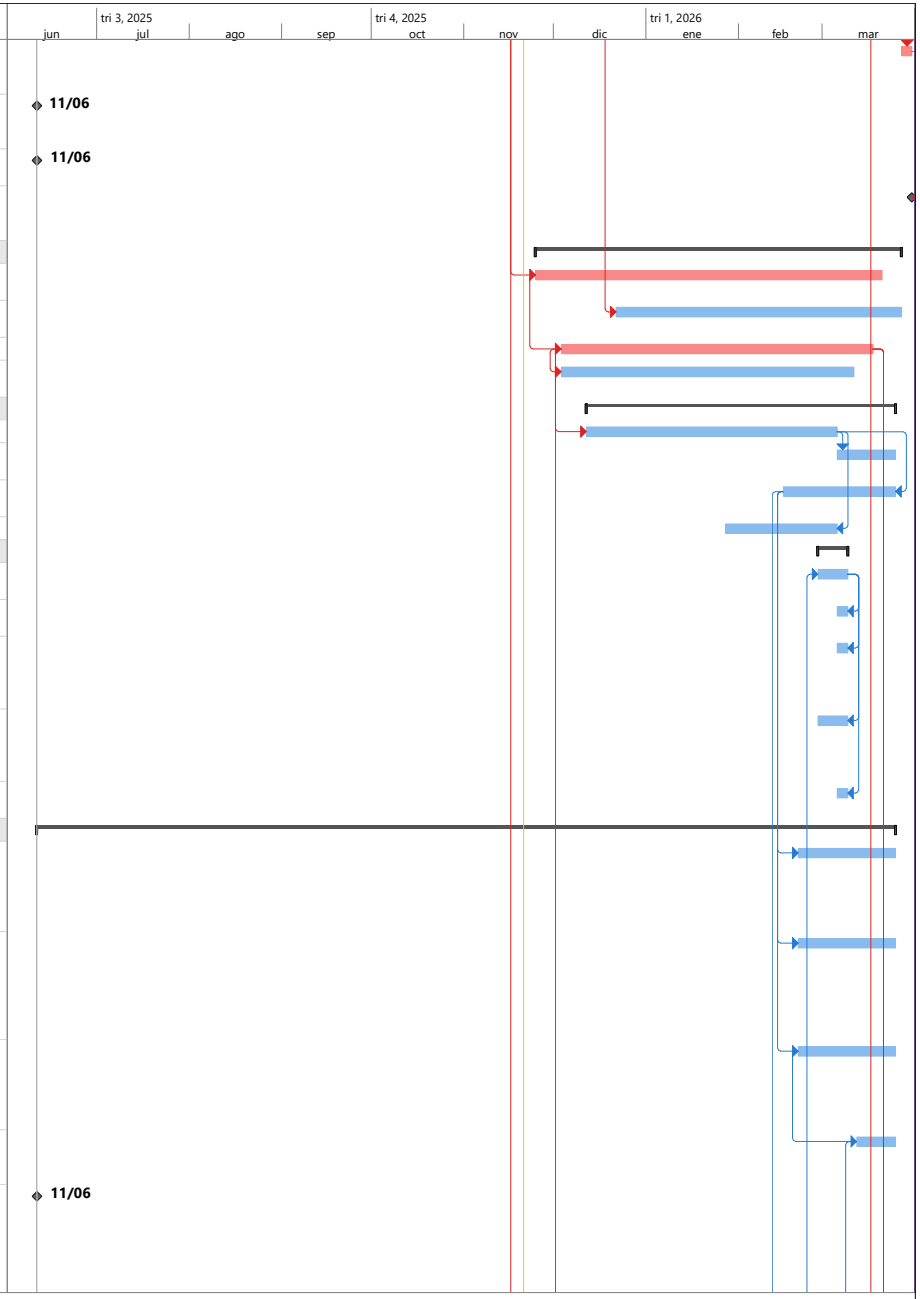

Proyecto: Project V1_ING LUIS H
Fecha: lun 6/04/26

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
549		S/I BOLARDOS ALTO EN HIERRO TIPO M63 - IDU EMPOTRADOS EN CONCRETO; INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	5 días	jue 12/03/26	jue 19/03/26	$ 26.123.328,00
550		**OTRAS ACTIVIDADES**	**20 días**	**vie 20/02/26**	**mié 18/03/26**	**$ 31.213.251,00**
551		S/I TUBERÍA PARA PROLONGACIÓN DE DRENAJES DE AGUAS LLUVIA EN 4". INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO	15 días	jue 26/02/26	mié 18/03/26	$ 15.935.690,00
552		REPARACIÓN DE DOMICILIARIAS DEL ACUEDUCTO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	20 días	vie 20/02/26	mié 18/03/26	$ 14.868.810,00
553		REUBICACIÓN TÍPICA MEDIDORES DE GAS RED DOMICILIARIA.	5 días	mié 11/03/26	mié 18/03/26	$ 408.751,00
554		**BOX CULVERT**	**0 días**	**mié 11/06/25**	**mié 11/06/25**	**$ 0,00**
555		EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN BAJO AGUA	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
556		GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
557		CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
558		RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
559		MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJON O SIMILAR)	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
560		CONCRETO RESISTENCIA 28 MPA CLASE C (PARA ESTRUCTURA)	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
561		ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
562		BARANDA METÁLICA PARA TRÁFICO VEHICULAR	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
563		MANEJO DE CAUCE DE AGUA	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
564		JUNTA PARA MURO EN CINTA PVC	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
565		CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA CLASE F (SOLADO)	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
566		**CUNETAS Y SUMIDEROS**	**70 días**	**mié 31/12/25**	**mar 31/03/26**	**$ 1.815.572.545,00**
567		EXCAVACION MANUAL	45 días	mar 20/01/26	mié 18/03/26	$ 65.575.924,00
568		CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	35 días	lun 2/02/26	mié 18/03/26	$ 54.284.910,00
569		GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	35 días	lun 2/02/26	mié 18/03/26	$ 42.667.008,00
570		RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	35 días	sáb 7/02/26	mar 24/03/26	$ 57.707.766,00
571		ACERO DE REFUERZO FY = 420 MPA	35 días	vie 13/02/26	mar 31/03/26	$ 523.686.077,00
572		CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	70 días	mié 31/12/25	mar 31/03/26	$ 991.772.960,00
573		SUMIDERO TIPO VENTANA EN CONCRETO	15 días	lun 26/01/26	vie 13/02/26	$ 79.877.900,00
574		**RED DE MEDIA TENSION (13.200) VOL.**	**38 días**	**sáb 7/02/26**	**vie 27/03/26**	**$ 142.353.160,00**
575		SUMINISTRO, INSTALACION E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS - 750 KGF).	20 días	sáb 7/02/26	jue 5/03/26	$ 4.153.312,00
576		SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE CIMENTACION CILINDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS - 750 KGF).	20 días	mar 10/02/26	sáb 7/03/26	$ 930.798,00
577		SUMINISTRO, INSTALACION E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS - 1050 KGF).	20 días	jue 12/02/26	mar 10/03/26	$ 9.835.972,00
578		SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE CIMENTACION CILINDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS - 1050 KGF).	20 días	mié 18/02/26	lun 16/03/26	$ 2.335.196,00
579		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ALINEACION CON DISPOSICIÓN EN BANDERA BIFASICO A 13.2 KV., E INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	20 días	vie 20/02/26	mié 18/03/26	$ 0,00
580		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ANGULO CON DISPOSICIÓN EN BANDERA A 13.2 KV., E INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	20 días	lun 23/02/26	vie 20/03/26	$ 10.963.866,00
581		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN FIN DE LINEA COMPACTA CON DISPOSICIÓN CENTRAL BIFASICO A 13.2 KV., E INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	20 días	mié 25/02/26	lun 23/03/26	$ 4.473.546,00
582		SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA MT BIFASICA AEREA EN CABLE DESNUDO DE ALUMINIO ACSR - No. 1/0 AWG.	20 días	mié 25/02/26	lun 23/03/26	$ 16.704.300,00

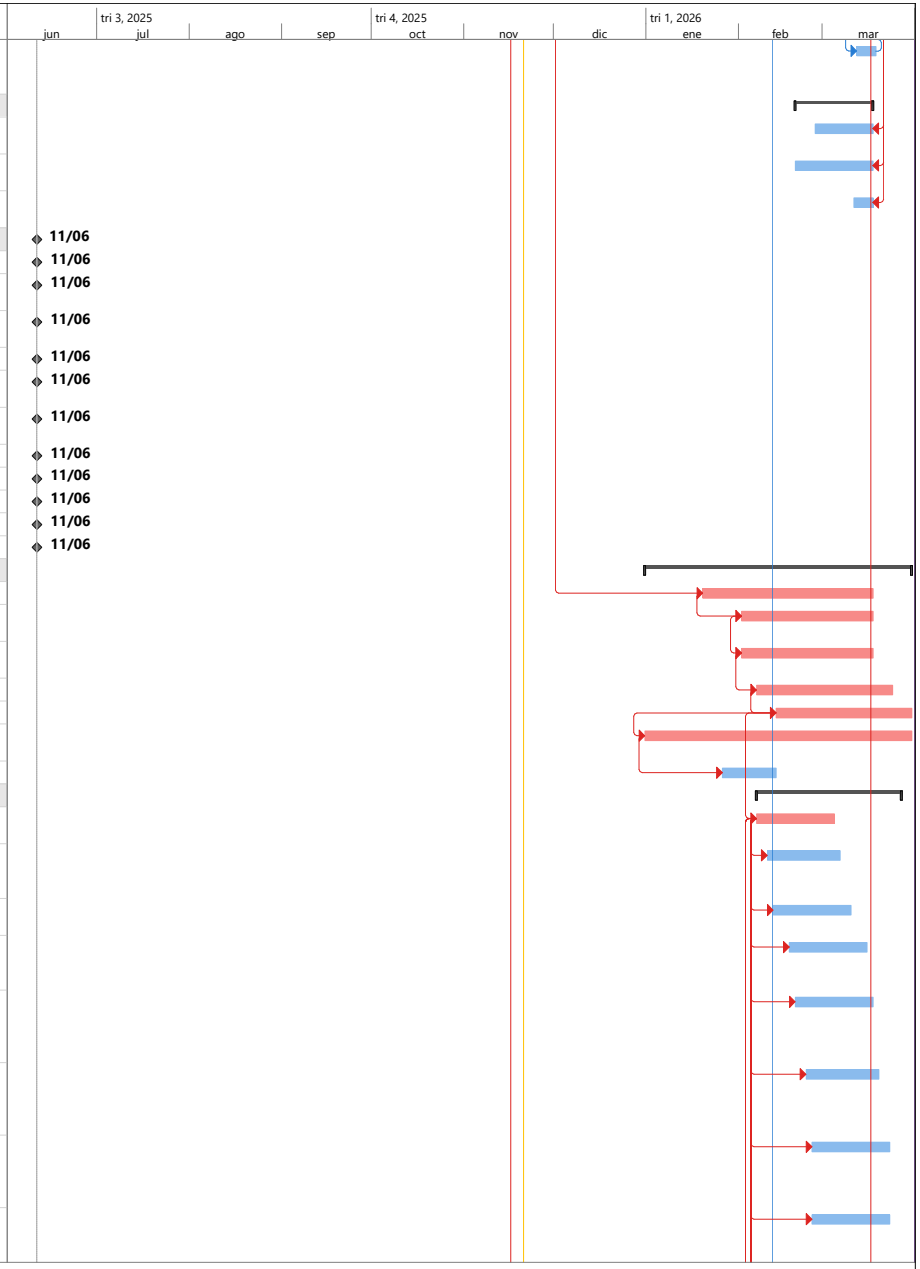

Proyecto: Project V1_ING LUIS H
Fecha: lun 6/04/26

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
583		SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA MT BIFASICA AEREA EN CABLE AISLADO DE ALUMINIO ECOLOGICO - No. 1/0 AWG.	20 días	jue 26/02/26	mar 24/03/26	$ 33.238.200,00
584		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA RETENIDA MT EN POSTE DE 12m A POSTE DE 9m	20 días	jue 26/02/26	mar 24/03/26	$ 10.616.882,00
585		INSTALACION EN CALIENTE DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA SECCIONADOR BIFASICO A 13.2 KV.	20 días	sáb 7/02/26	jue 5/03/26	$ 2.170.546,00
586		INSTALACION CON TENSION DE ARMADO PARA ESTRUCTURA DE MT BIFASICO A 13.2 KV.	20 días	mar 3/03/26	vie 27/03/26	$ 16.812.951,00
587		INSTALACION CON TENSION A 13.2 KV. DE POSTE EN CONCRETO	20 días	sáb 7/02/26	jue 5/03/26	$ 30.117.591,00
588		**RED DE BAJA TENSION (240/120) VOL.**	**40 días**	**sáb 7/02/26**	**mar 31/03/26**	**$ 71.175.068,00**
589		INSTALACION E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 1050 KGF).	20 días	sáb 7/02/26	jue 5/03/26	$ 3.687.897,00
590		SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE CIMENTACION CILINDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 1050 KGF).	20 días	lun 16/02/26	jue 12/03/26	$ 1.826.838,00
591		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ALINEACION - ANGULO - FINAL DE CIRCUITO PARA BT A 240/120 VOL.	20 días	mié 18/02/26	lun 16/03/26	$ 4.767.565,00
592		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ANCLAJE PARA BT A 240/120 VOL.	20 días	vie 20/02/26	mié 18/03/26	$ 0,00
593		SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA BT BIFASICA AEREA EN CABLE TRIPLEX DE ALUMINIO - No. 2 AWG.	35 días	mar 10/02/26	jue 26/03/26	$ 30.453.440,00
594		SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA BT BIFASICA AEREA EN CABLE TRIPLEX DE ALUMINIO - No. 1/0 AWG.	20 días	sáb 7/02/26	jue 5/03/26	$ 4.073.120,00
595		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA RETENIDA A TIERRA EN POSTE DE 9 MTS.	20 días	jue 26/02/26	mar 24/03/26	$ 1.842.600,00
596		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA PUESTA A TIERRA DE RED TRENSADA DE BT A 120/240 VOL., EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	20 días	mar 3/03/26	vie 27/03/26	$ 3.617.214,00
597		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA CAJA DE CONEXIÓN (4 USUARIOS) A RED TRENSADA DE BT A 120/240 VOL.	20 días	jue 5/03/26	mar 31/03/26	$ 7.227.579,00
598		DESINSTALACION DE POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 1050 750-510 KGF).	20 días	jue 5/03/26	mar 31/03/26	$ 3.886.455,00
599		DESMONTE, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA RED DE TELECOMUNICACIONES	15 días	vie 6/03/26	mié 25/03/26	$ 9.792.360,00
600		**SUBESTACIONES ELECTRICAS (13.200/240/120) VOL.**	**20 días**	**sáb 7/02/26**	**jue 5/03/26**	**$ 20.562.636,00**
601		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ADECUACION DE SUBESTACION BIFASICA EN POSTE A (13.200/240/120) VOL.,INCLUYE: INSTALACION PUENTES DE SECCIONADOR, ESTRUCTURA DE PROTECCIONES, SECCIONADOR, DPS, DESMONTE Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR.	20 días	sáb 7/02/26	jue 5/03/26	$ 20.562.636,00
602		**ALUMBRADO PUBLIICO, ALIMENTADORES Y MEDIDAS DE BAJA TENSION (240/120) VOL.**	**20 días**	**sáb 7/02/26**	**jue 5/03/26**	**$ 63.697.144,00**
603		SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE CABLE CONCENTRICO DE ALUMINIO - (2xNo. 6 + 1xNo. 6) AWG.	20 días	sáb 7/02/26	jue 5/03/26	$ 55.888.665,00
604		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA REUBICACION DE MEDIDOR (240/120) VOL.	20 días	sáb 7/02/26	jue 5/03/26	$ 4.902.664,00
605		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA REINSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO.	20 días	sáb 7/02/26	jue 5/03/26	$ 2.905.815,00
606		**ITEM NO PREVISTO**	**220 días**	**mié 11/06/25**	**vie 27/03/26**	**$ 85.452.752,00**
607		**CONEXION ACOMETIDAS DOMICILIARIA PVC NUEVA 8" X 6", (INCULYE ACCESORIOS, TUBERIA PVC LPROMEDIO= 10M)**	50 días	vie 16/01/26	sáb 21/03/26	$ 25.067.540,00
608		REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES Y ARBUSTOS CON DAP MENOR O IGUAL A 10 CM INCLUYE TRANSPORTE RESIDUOS)	15 días	mar 3/03/26	sáb 21/03/26	$ 12.857.382,00
609		**CONFORMACIÓN DE TERRAPLÉN CON MATERIAL DE PRÉSTAMO**	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00

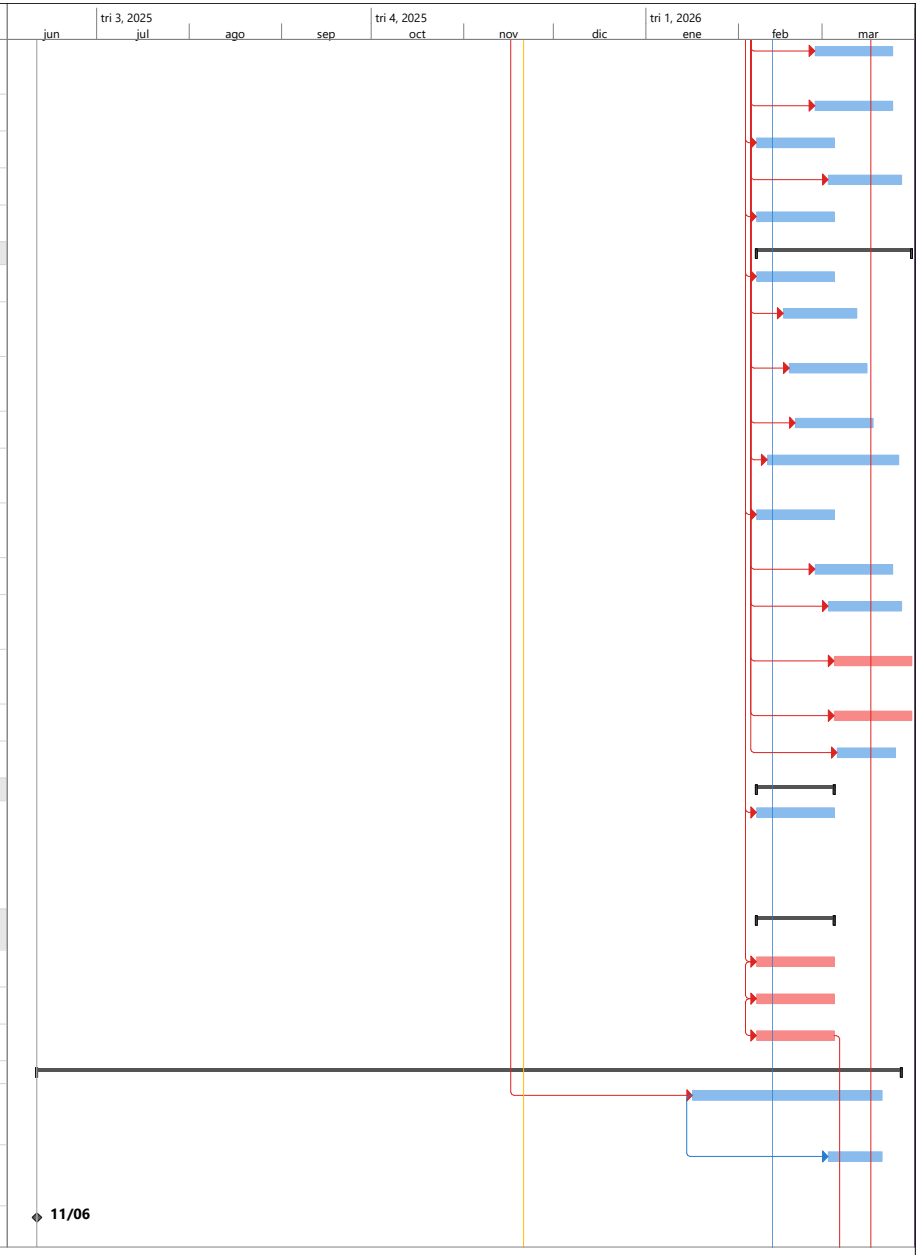

Proyecto: Project V1_ING LUIS H
Fecha: lun 6/04/26

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
610		RAMPA PARA USO VEHICULAR, INCLUYE BORDILLO DE CONCRETO DE CAMBIO DE NIVEL, LOSETA TOPEROL, ADOQUIN EN CONCRETO DE 20CM X 10CM X 6CM COLOR AMARILLO,	20 días	lun 16/02/26	jue 12/03/26	$ 43.414.470,00
611		CONCRETO DE 3000 PSI PARA BORDILLO H:1.0M * 0,20 M, FUNDIDO IN SITU REFORZADO	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
612		REUBICACION TUBERIA SANITARIA 6".	5 días	sáb 21/03/26	vie 27/03/26	$ 4.113.360,00
613		**FIN TRAMO 6**	**0 días**	**jue 5/03/26**	**jue 5/03/26**	**$ 0,00**
614		**TRAMO 7 CRA 1D ENTRE LAS CALLES 126 Y 126A-GARZONES**	**129 días**	**mié 11/06/25**	**sáb 29/11/25**	**$ 731.539.431,00**
615		**ACTIVIDADES PRELIMINARES**	**124 días**	**mié 11/06/25**	**lun 24/11/25**	**$ 79.682.001,00**
616		DEMOLICIÓN DE BORDILLOS DE CONCRETO	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
617		CORTE DE PISO EN TABLON Y PLANTILLA DE CONCRETO E= 0.10MT	2 días	mié 29/10/25	vie 31/10/25	$ 922.775,00
618		DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO	2 días	mié 29/10/25	vie 31/10/25	$ 716.588,00
619		DEMOLICION DE ESTRUCTURAS	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
620		DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
621		EXCAVACIONES MECÁNICAS CON EXCAVADORA PARA FALLOS EN SUB RASANTE. PROFUNDIDAD > 50 CM. NO INCLUYE RETIRO	3 días	mar 28/10/25	vie 31/10/25	$ 1.450.369,00
622		EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	15 días	vie 10/10/25	vie 31/10/25	$ 5.904.025,00
623		CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	15 días	sáb 18/10/25	vie 7/11/25	$ 20.750.475,00
624		REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURA MENOR O IGUAL H= 5 M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAIZ)	10 días	vie 7/11/25	jue 20/11/25	$ 2.526.336,00
625		REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURA ENTRE H= 5.1M A 10M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAIZ)	10 días	vie 7/11/25	jue 20/11/25	$ 13.454.343,00
626		REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURAS ENTRE H= 10.1M A 15 M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS,	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
627		PODA DE FORMACIÓN ÁRBOLES ALTURA MENOR O IGUAL H= 5 M (INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS)	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
628		SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ARBOLES DE ESPECIES NATIVAS DE 1.5 M DE ALTURA, INCLUYE EXCAVACION, ABONO ORGANICO,	20 días	mar 28/10/25	lun 24/11/25	$ 33.957.090,00
629		**SUBRASANTE Y SUBBASE**	**11 días**	**mar 21/10/25**	**mié 5/11/25**	**$ 92.284.824,00**
630		MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON MATERIAL SELECCIONADO	10 días	mar 21/10/25	mar 4/11/25	$ 31.400.883,00
631		MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJÓN O SIMILAR)	10 días	mar 21/10/25	mar 4/11/25	$ 12.599.640,00
632		SUBBASE GRANULAR CLASE C	10 días	mié 22/10/25	mié 5/11/25	$ 38.032.074,00
633		GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAP/	10 días	mar 21/10/25	mar 4/11/25	$ 10.252.227,00
634		**PAVIMENTO Y BORDILLOS**	**22 días**	**mié 29/10/25**	**jue 27/11/25**	**$ 216.002.192,00**
635		PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO MR (40 Kg/cm2)	18 días	mié 29/10/25	vie 21/11/25	$ 179.759.235,00
636		ADECUACIÓN DE CÁMARAS DE INSPECCIÓN (MANHOLES) EN CON	1 día	jue 20/11/25	vie 21/11/25	$ 541.235,00
637		BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	8 días	lun 17/11/25	jue 27/11/25	$ 32.808.522,00
638		ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa	3 días	mar 18/11/25	vie 21/11/25	$ 2.893.200,00
639		**SEÑALIZACION**	**116 días**	**mié 11/06/25**	**jue 13/11/25**	**$ 5.903.055,00**
640		SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON LAMINA RETROREFLECTIVA DE	2 días	mar 11/11/25	jue 13/11/25	$ 587.638,00
641		SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON DOBLE LAMINA RETROREFLEC	0 días	jue 13/11/25	jue 13/11/25	$ 0,00
642		DEMARCACION HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRILICA BASE SOLVENTE - M2. (INCLUYE IMPRIMANTE,	2 días	mar 11/11/25	jue 13/11/25	$ 1.393.070,00
643		DEMARCACION HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRILICA BASE SOLVENTE - M (12 CM). (INCLUYE IMPRIMANTE,	2 días	mar 11/11/25	jue 13/11/25	$ 3.922.347,00
644		REDUCTORES DE VELOCIDAD TIPO RESALTO PLÁSTICO PERNADO	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
645		**ESPACIO PUBLICO ANDENES Y MOBILIARIOS**	**119 días**	**mié 11/06/25**	**lun 17/11/25**	**$ 63.018.335,00**
646		S/I TABLETA GUÍA PREF. TÁCTIL PARA DISCAP. EN CONCRETO DE 0.20m X 0.20m X 0.06m COLOR AMARILLO TIPO TOPEROL (UNA HILERA) CON MORTERO 1:4, INCLUYE ARENA H.=0.04 m, RELLENO	15 días	mar 21/10/25	mar 11/11/25	$ 14.564.434,00
647		FRANJA DEMARCADORA PARA LIMITADOS VISUALES CON ADOQUÍN EN CONCRETO DE 20cm X 10cm X 6cm COLOR AMARILLO PARA EMBEBER EN MORTERO, APAREJADO SEGÚN DISEÑO. INCLUYE MORTERO 1:4, ARENA H.=4 CM, INSTALACIÓN,	15 días	mar 21/10/25	mar 11/11/25	$ 12.794.707,00

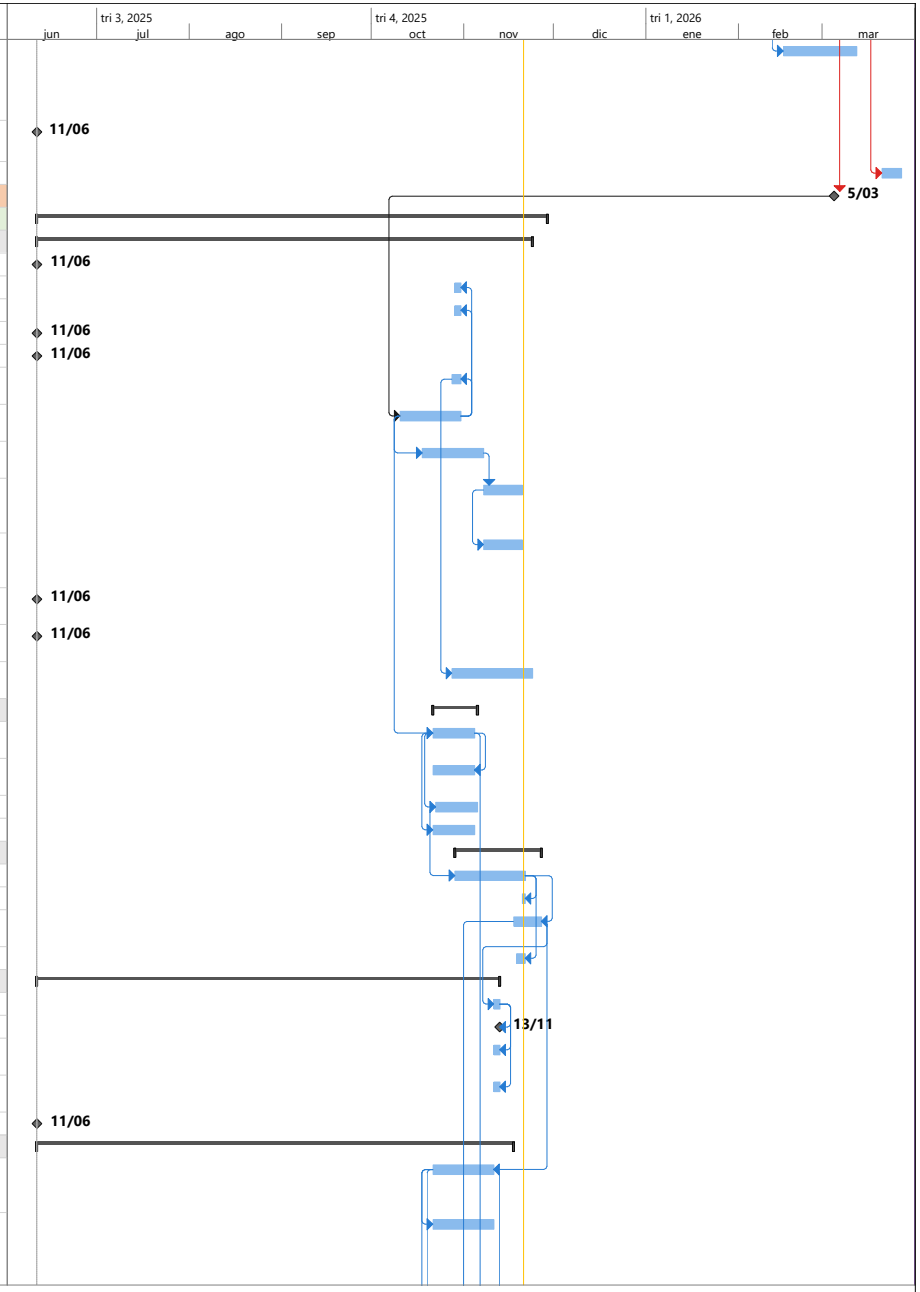

Proyecto: Project V1_ING LUIS H
Fecha: lun 6/04/26

Tarea	Resumen del proyecto	Tarea manual	solo el comienzo	Fecha límite	Progreso manual
División	Tarea inactiva	solo duración	solo fin	Tareas críticas	
Hito	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Tareas externas	División crítica	
Resumen	Resumen inactivo	Resumen manual	Hito externo	Progreso	


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
648		CONSTRUCCIÓN PISO EN CONCRETO ESTAMPADO TIPO RONDA, 21 MPA (3.000 PSI). E=0,08M FUNDIDO EN SITIO, JUNTAS SEGÚN DISEÑO. INCLUYE EXCAVACIÓN, MATERIAL SELECCIONADO, Y	20 días	mar 21/10/25	lun 17/11/25	$ 26.487.930,00
649		RAMPA PEATONAL INCLUYE BORDILLOS DE CAMBIO DE NIVEL, SARDINEL, ADOQUÍN TÁCTIL TIPO ALERTA Y PLANTILLA EN	10 días	mar 28/10/25	mar 11/11/25	$ 4.273.140,00
650		RAMPA PARA USO VEHICULAR DE 4.20M X 1.20M, INCLUYE BORDILLO DE CONCRETO DE CAMBIO DE NIVEL, LOSETA TOPEROL, ADOQUIN EN CONCRETO DE 20CM X 10CM X 6CM COLOR AMARILLO, PLACA ENCONCRETO 0.15MTS DE ESPESOR, EXCAVACIONMANUAL, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
651		S/I BOLARDOS ALTO EN HIERRO TIPO M63 - IDU EMPOTRADOS EN CONCRETO; INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA	5 días	mar 11/11/25	lun 17/11/25	$ 4.898.124,00
652		**OTRAS ACTIVIDADES**	**118 días**	**mié 11/06/25**	**sáb 15/11/25**	**$ 2.677.418,00**
653		S/I TUBERÍA PARA PROLONGACIÓN DE DRENAJES DE AGUAS LLUVIA EN 4". INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO	3 días	mar 4/11/25	vie 7/11/25	$ 1.815.458,00
654		REPARACIÓN DE DOMICILIARIAS DEL ACUEDUCTO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	6 días	vie 7/11/25	sáb 15/11/25	$ 861.960,00
655		REUBICACIÓN TÍPICA MEDIDORES DE GAS RED DOMICILIARIA.	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
656		**BOX CULVERT**	**0 días**	**mié 11/06/25**	**mié 11/06/25**	**$ 0,00**
657		EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN BAJO AGUA	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
658		GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPA	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
659		CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
660		RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
661		MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJON O SIMILAR)	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
662		CONCRETO RESISTENCIA 28 MPA CLASE C (PARA ESTRUCTURA)	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
663		ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
664		BARANDA METÁLICA PARA TRÁFICO VEHICULAR	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
665		MANEJO DE CAUCE DE AGUA	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
666		JUNTA PARA MURO EN CINTA PVC	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
667		CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA CLASE F (SOLADO)	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
668		**CUNETAS Y SUMIDEROS**	**0 días**	**mié 11/06/25**	**mié 11/06/25**	**$ 0,00**
669		EXCAVACION MANUAL	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
670		CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
671		GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPA	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
672		RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
673		ACERO DE REFUERZO FY = 420 MPA	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
674		CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
675		SUMIDERO TIPO VENTANA EN CONCRETO	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
676		**RED DE MEDIA TENSION (13.200) VOL.**	**15 días**	**mar 11/11/25**	**sáb 29/11/25**	**$ 119.230.659,00**
677		SUMINISTRO, INSTALACION E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS - 750 KGF).	10 días	mar 11/11/25	lun 24/11/25	$ 4.153.312,00
678		SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE CIMENTACION CILINDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS - 750 KGF).	10 días	mar 11/11/25	lun 24/11/25	$ 930.798,00
679		SUMINISTRO, INSTALACION E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS - 1050 KGF).	10 días	mar 11/11/25	lun 24/11/25	$ 9.835.972,00
680		SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE CIMENTACION CILINDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS - 1050 KGF).	10 días	mar 11/11/25	lun 24/11/25	$ 2.335.196,00
681		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ALINEACION CON DISPOSICIÓN EN BANDERA BIFASICO A 13.2 KV., E INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	10 días	mar 11/11/25	lun 24/11/25	$ 0,00
682		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ANGULO CON DISPOSICIÓN EN BANDERA A 13.2 KV., E INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	10 días	mar 11/11/25	lun 24/11/25	$ 10.963.866,00

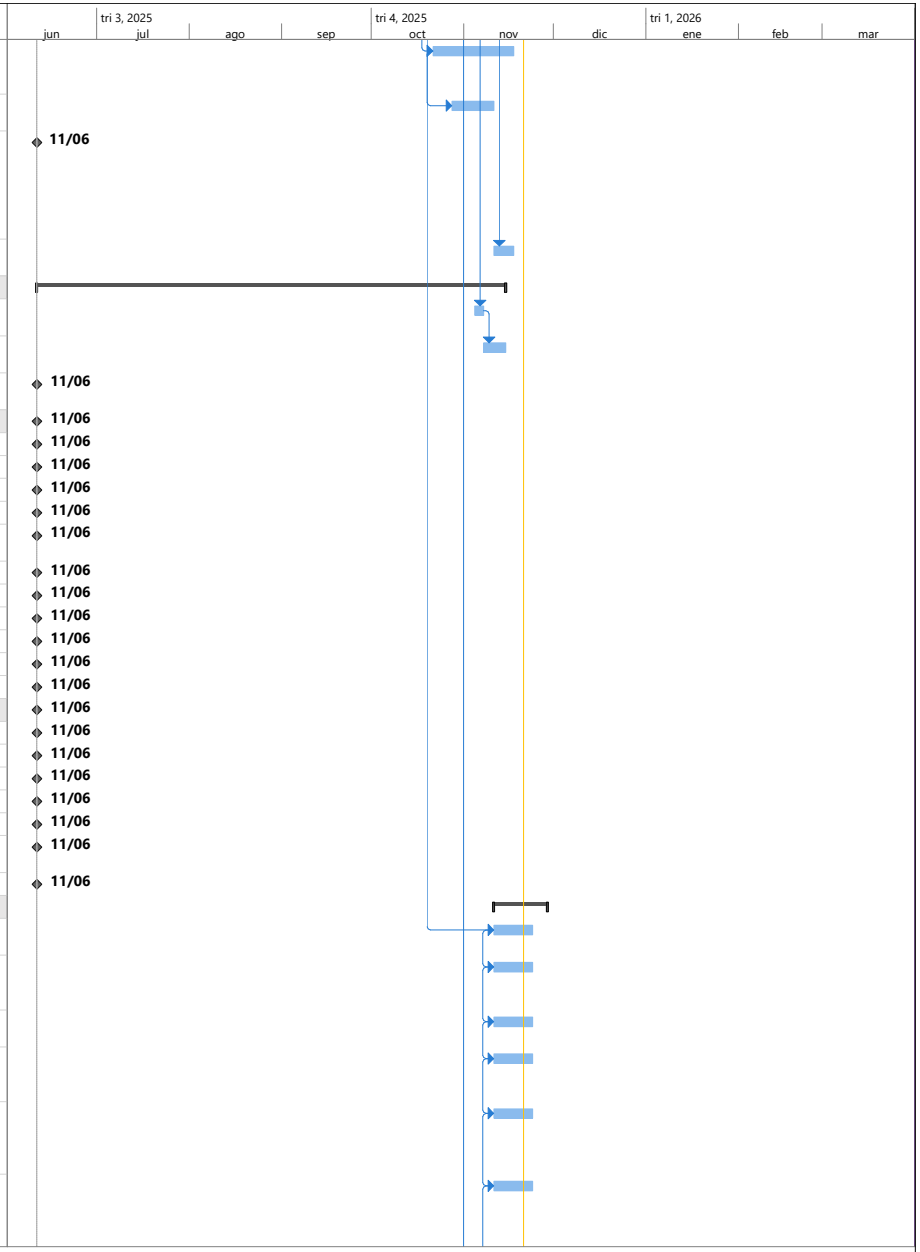

Proyecto: Project V1_ING LUIS H
Fecha: lun 6/04/26

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
683		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN FIN DE LINEA COMPACTA CON DISPOSICIÓN CENTRAL BIFASICO A 13.2 KV., E INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	10 días	mar 11/11/25	lun 24/11/25	$ 4.473.546,00
684		SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA MT BIFASICA AEREA EN CABLE DESNUDO DE ALUMINIO ACSR - No. 1/0 AWG.	10 días	mar 11/11/25	lun 24/11/25	$ 16.704.300,00
685		SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA MT BIFASICA AEREA EN CABLE AISLADO DE ALUMINIO ECOLOGICO - No. 1/0 AWG.	15 días	mar 11/11/25	sáb 29/11/25	$ 33.238.200,00
686		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA RETENIDA MT EN POSTE DE 12m A POSTE DE 9m	10 días	mar 11/11/25	lun 24/11/25	$ 5.308.441,00
687		INSTALACION EN CALIENTE DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA SECCIONADOR BIFASICO A 13.2 KV.	10 días	mar 11/11/25	lun 24/11/25	$ 0,00
688		INSTALACION CON TENSION DE ARMADO PARA ESTRUCTURA DE MT BIFASICO A 13.2 KV.	10 días	mar 11/11/25	lun 24/11/25	$ 11.208.634,00
689		INSTALACION CON TENSION A 13.2 KV. DE POSTE EN CONCRETO	10 días	mar 11/11/25	lun 24/11/25	$ 20.078.394,00
690		**RED DE BAJA TENSION (240/120) VOL.**	**10 días**	**lun 17/11/25**	**sáb 29/11/25**	**$ 69.332.468,00**
691		INSTALACION E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 1050 KGF).	7 días	lun 17/11/25	mié 26/11/25	$ 3.687.897,00
692		SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE CIMENTACION CILINDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 1050 KGF).	7 días	lun 17/11/25	mié 26/11/25	$ 1.826.838,00
693		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ALINEACION - ANGULO - FINAL DE CIRCUITO PARA BT A 240/120 VOL.	7 días	lun 17/11/25	mié 26/11/25	$ 4.767.565,00
694		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ANCLAJE PARA BT A 240/120 VOL.	7 días	lun 17/11/25	mié 26/11/25	$ 0,00
695		SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA BT BIFASICA AEREA EN CABLE TRIPLEX DE ALUMINIO - No. 2 AWG.	10 días	lun 17/11/25	sáb 29/11/25	$ 30.453.440,00
696		SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA BT BIFASICA AEREA EN CABLE TRIPLEX DE ALUMINIO - No. 1/0 AWG.	7 días	lun 17/11/25	mié 26/11/25	$ 4.073.120,00
697		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA RETENIDA A TIERRA EN POSTE DE 9 MTS.	7 días	lun 17/11/25	mié 26/11/25	$ 0,00
698		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA PUESTA A TIERRA DE RED TRENSADA DE BT A 120/240 VOL., EN	7 días	lun 17/11/25	mié 26/11/25	$ 3.617.214,00
699		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA CAJA DE CONEXIÓN (4 USUARIOS) A RED TRENSADA DE BT A	7 días	lun 17/11/25	mié 26/11/25	$ 7.227.579,00
700		DESINSTALACION DE POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 1050 750-	7 días	lun 17/11/25	mié 26/11/25	$ 3.886.455,00
701		DESMONTE, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA RED DE	7 días	lun 17/11/25	mié 26/11/25	$ 9.792.360,00
702		**SUBESTACIONES ELECTRICAS (13.200/240/120) VOL.**	**7 días**	**vie 14/11/25**	**lun 24/11/25**	**$ 10.281.318,00**
703		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ADECUACION DE SUBESTACION BIFASICA EN POSTE A (13.200/240/120) VOL.,INCLUYE: INSTALACION PUENTES DE SECCIONADOR, ESTRUCTURA DE PROTECCIONES, SECCIONADOR,	7 días	vie 14/11/25	lun 24/11/25	$ 10.281.318,00
704		**ALUMBRADO PUBLICO, ALIMENTADORES Y MEDIDAS DE BAJA TENSION (240/120) VOL.**	**7 días**	**vie 14/11/25**	**lun 24/11/25**	**$ 65.891.415,00**
705		SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE CABLE CONCENTRICO DE ALUMINIO - (2xNo. 6 + 1xNo. 6) AWG.	7 días	vie 14/11/25	lun 24/11/25	$ 55.888.665,00
706		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA REUBICACION DE MEDIDOR (240/120) VOL.	7 días	vie 14/11/25	lun 24/11/25	$ 6.128.330,00
707		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA REINSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO.	7 días	vie 14/11/25	lun 24/11/25	$ 3.874.420,00
708		**ITEM NO PREVISTO**	**119 días**	**mié 11/06/25**	**lun 17/11/25**	**$ 7.235.746,00**
709		CONEXION ACOMETIDAS DOMICILIARIA PVC NUEVA 8" X 6", (INCULYE ACCESORIOS, TUBERIA PVC LPROMEDIO= 10M)	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
710		REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES Y ARBUSTOS CON DAP MENOR O IGUAL A 10 CM INCLUYE TRANSPORTE RESIDUOS)	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
711		CONFORMACIÓN DE TERRAPLÉN CON MATERIAL DE PRÉSTAMO	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00

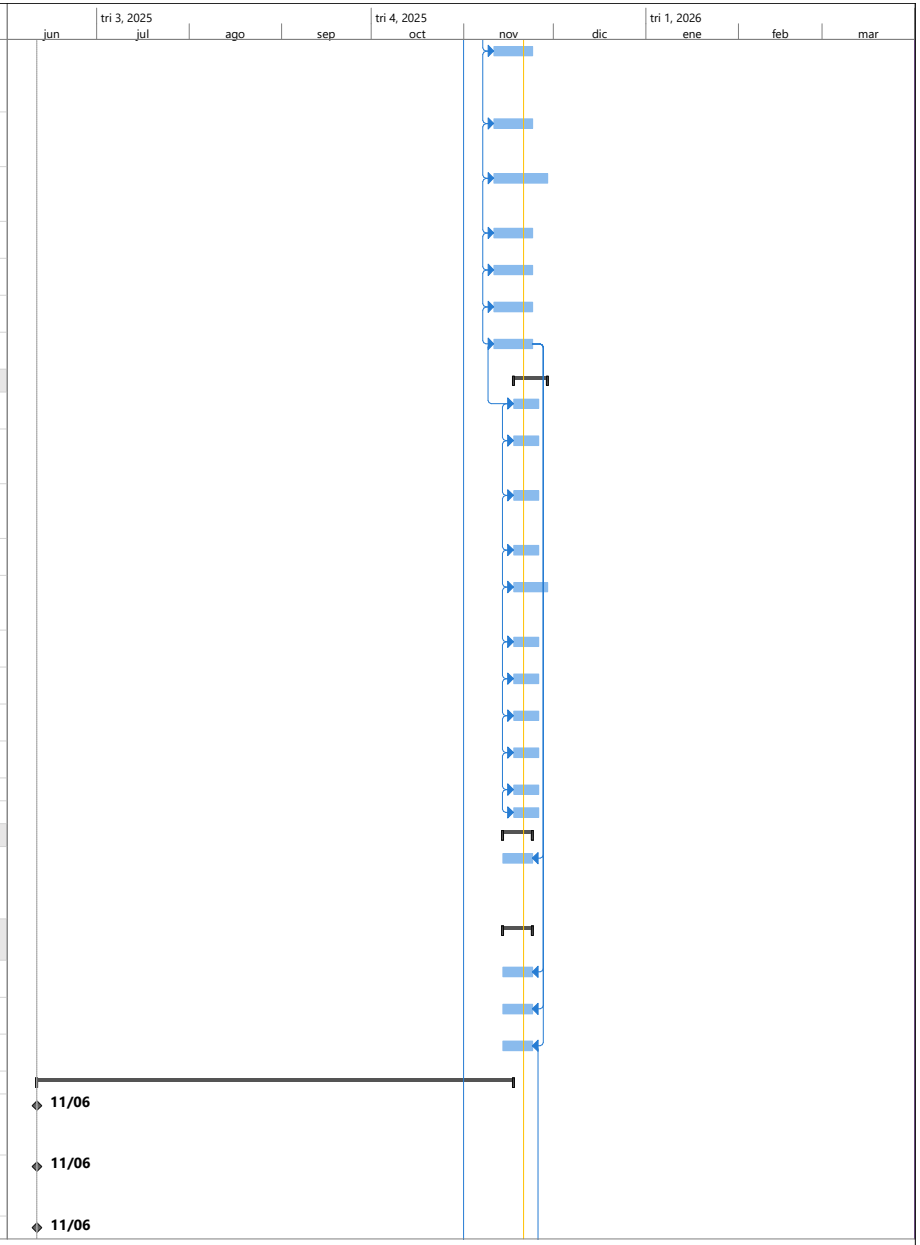

Proyecto: Project V1_ING LUIS H
Fecha: lun 6/04/26

Tarea | Resumen del proyecto | Tarea manual | solo el comienzo | Fecha límite | Progreso manual
División | Tarea inactiva | solo duración | solo fin | Tareas críticas
Hito | Hito inactivo | Informe de resumen manual | Tareas externas | División crítica
Resumen | Resumen inactivo | Resumen manual | Hito externo | Progreso

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
712		RAMPA PARA USO VEHICULAR, INCLUYE BORDILLO DE CONCRETO DE CAMBIO DE NIVEL, LOSETA TOPEROL, ADOQUIN EN CONCRETO DE 20CM X 10CM X 6CM COLOR AMARILLO,	10 días	mar 4/11/25	lun 17/11/25	$ 7.235.746,00
713		CONCRETO DE 3000 PSI PARA BORDILLO H:1.0M * 0,20 M, FUNDIDO IN SITU REFORZADO	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
714		REUBICACION TUBERIA SANITARIA 6".	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	$ 0,00
715		**FIN TRAMO 7**	**0 días**	**lun 24/11/25**	**lun 24/11/25**	**$ 0,00**
716		**PGIO**	**222 días**	**mié 11/06/25**	**mar 31/03/26**	**$ 122.779.191,00**
717		**TRAMITES ANTE ENTIDAD AMBIENTAL**	**222 días**	**mié 11/06/25**	**mar 31/03/26**	**$ 27.729.720,00**
718		**TRAMITES, y LEGALIZACIONES (AFINIA)**	**222 días**	**mié 11/06/25**	**mar 31/03/26**	**$ 9.132.448,00**

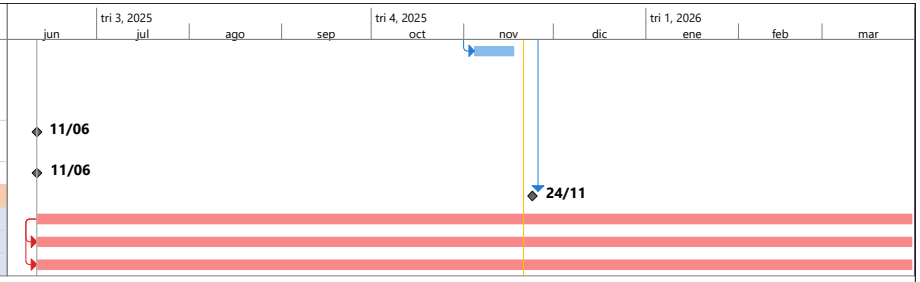

Proyecto: Project V1_ING LUIS H
Fecha: lun 6/04/26

Tarea	Resumen del proyecto	Tarea manual	solo el comienzo	Fecha límite	Progreso manual
División	Tarea inactiva	solo duración	solo fin	Tareas críticas	
Hito	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Tareas externas	División crítica	
Resumen	Resumen inactivo	Resumen manual	Hito externo	Progreso	
