PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8155097

INFORME SEMANAL No 20 **LOTE COP No 16**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 20 (Consecutivo) **DEL** 16/2/2026 (dd-mm-aa) **AL** 22/2/2026 (dd-mm-aa)

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 142 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORÍA


Contratista:	CONSORCIO EL MILAGROSO 2025	**Interventoria**	PROBINTEC S.A.S
RL del consorcio	RAFAEL MOGOLLÓN RODRÍGUEZ	**RL de Interventoria**	SANDRA STELLA MORENO BUITRAGO
Contrato No.	CO1.PCCNTR.8155097	**Contrato No.**	CO1.PCCNTR.8168931
Objeto	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS LOTE 16"	**Objeto**	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No. 6
Valor Inicial :	$ 2.455.237.837,00	**Valor Inicial:**	$ 796.278.928,00
AIU	33,88% $ 831.834.579,18	**Valor Adicional No. 1 del 26 de diciembre de 2026:**	$ 139.026.666,00
COSTO DIRECTO	$ 1.623.403.257,82	**Valor Total del Contrato:**	$ 935.305.594,00
OFERTADO	$ 2.333.628.557,00		
EMERGENCIAS	$ 100.000.000,00		
VALOR PARCIAL CON EMERGENCIAS	$ 2.433.628.557,00		
DIFERENCIA PARA EMERGENCIAS	$ 21.609.280,00		
Valor Parcial (Inicial + Emergencias)	$ 121.609.280,00		
Valor adicional No. 1:	$ 380.000.000,00		
Valor inicial No. 1 emergencias:	$ 200.000.000,00		
Valor adicional No.1 Obras Contractuales:	$ 180.000.000,00		
VALOR TOTAL INICIAL MAS EMERGENCIA	$ 2.835.237.837,00		
VALOR TOTAL EMERGENCIAS	$ 321.609.280,00		
VALOR TOTAL PARA OBRAS CONTRACTUALES	$ 2.513.628.557,00		
Plazo Inicial:	SIETE (7) MESES	**Plazo Inicial:**	SIETE (7) MESES
Fecha de Iniciación:	03/10/2025	**Fecha de Iniciación:**	03/10/2025
Fecha de Vencimiento:	02/05/2026	**Fecha de Vencimiento:**	02/05/2026

AVANCE DEL CONTRATO

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	4,37%	58,57%	Obra Física Ejecutada (%)	7,81%	68,36%
Valor de la Obra programada:	$ 107.293.893,48	$ 1.438.032.801,13	Valor de la Obra Ejecutada:	$ 191.683.925,42	$ 1.678.330.435,72

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONTRATO

	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	54,20%	60,55%	9,79%
Durante el periodo	4,37%	7,81%	
Acumulado actual	58,57%	68,36%	

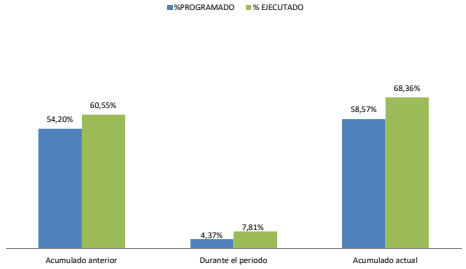

CPF	LOCALIDAD	COLEGIO	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA	%PROGRAMADO ACUMULADO	%EJECUTADO ACUMULADO	%DIFERENCIA ACUMULADO
915	FONTIBON	INTEGRADO DE FONTIBON - SEDE A	0,19%	0,38%	0,19%	45,81%	93,42%	47,61%
920	FONTIBON	ANTONIO VAN UDEN - SEDE C	5,84%	5,16%	-0,68%	38,37%	63,08%	24,71%
901	FONTIBON	INSTITUTO TECNICO INTERNACIONAL . SEDE A	5,92%	4,93%	-0,99%	51,31%	66,41%	15,10%
1408	LOS MARTIRES	REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA - SEDE B	7,23%	0,03%	-7,20%	58,60%	47,99%	-10,61%
1632	PUENTE ARANDA	MARCO ANTONIO CARREÑO SILVA - SEDE B	3,88%	0,88%	-3,00%	33,66%	64,16%	30,50%
1614	PUENTE ARANDA	JULIO ARMERO GARAVITO - SEDE B	0,19%	36,92%	36,73%	42,61%	69,26%	26,65%
1603	PUENTE ARANDA	CULTURA POPULAR - SEDE C	7,34%	6,35%	-0,99%	100,00%	72,99%	-27,01%
			4,37%	7,81%	3,44%	52,91%	68,19%	15,28%

EMERGENCIAS Y/O OBRAS PRIORITARIAS

CPF	LOCALIDAD	COLEGIO	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA	VALOR TOTAL	VALOR CONTRATO	DIFERENCIA
1616	PUENTE ARANDA	SILVERIA ESPINOSA DE RENDON - SEDE A	0,00%	100,00%	100,00%	$ 8.789.206,00	$ 8.789.206,00	$ -
1609	PUENTE ARANDA	SILVERIA ESPINOSA DE RENDON - SEDE B	0,00%	100,00%	100,00%	$ 17.578.413,00	$ 17.578.413,00	$ -
1612	PUENTE ARANDA	EL JAZMIN - SEDE B	0,00%	100,00%	100,00%	$ 1.953.157,00	$ 1.953.157,00	$ -
914	FONTIBON	RODRIGO ARENAS BETANCOURT - SEDE A	0,00%	100,00%	100,00%	$ 1.953.157,00	$ 1.953.157,00	$ -
909	FONTIBON	VILLEMAR EL CARMEN - SEDE B	0,00%	100,00%	100,00%	$ 1.953.157,00	$ 1.953.157,00	$ -
915	FONTIBON	INTEGRADO DE FONTIBON - SEDE A	0,00%	100,00%	100,00%	$ 1.953.157,00	$ 1.953.157,00	$ -
929	FONTIBON	MARIA JOSEFA CANELONES - SEDE A	0,00%	0,00%	0,00%	$ 10.000.000,00	$ -	$ 10.000.000,00
909	FONTIBON	VILLEMAR EL CARMEN - SEDE B	0,00%	100,00%	100,00%	$ 35.000.000,00	$ -	$ 35.000.000,00
					87,50%	$ 79.180.247,00	$ 321.609.280,00	$ (242.429.033,00)

AVANCE FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$ 2.455.237.837,34
VALOR PARCIAL 1	$ 88.202.201,00	
VALOR PARCIAL 2		
TOTAL VALOR FACTURADO	$ 88.202.201,00	
SUMAS IGUALES	$ 2.367.035.636,34	$ 2.367.035.636,34


INDICADOR FINANCIERO	VALOR FACTURADO	VALOR PAGADO
	$ 88.202.201,00	$ 88.202.201,00

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

INDICADOR TECNICO	% DE AVANCE PROGRAMADO	% DE AVANCE EJECUTADO	% RETRASO - / % ADELANTO +
	58,57%	68,36%	9,79%

INDICADOR TIEMPO	DIAS	RETRASO
	142	14

CURVA S

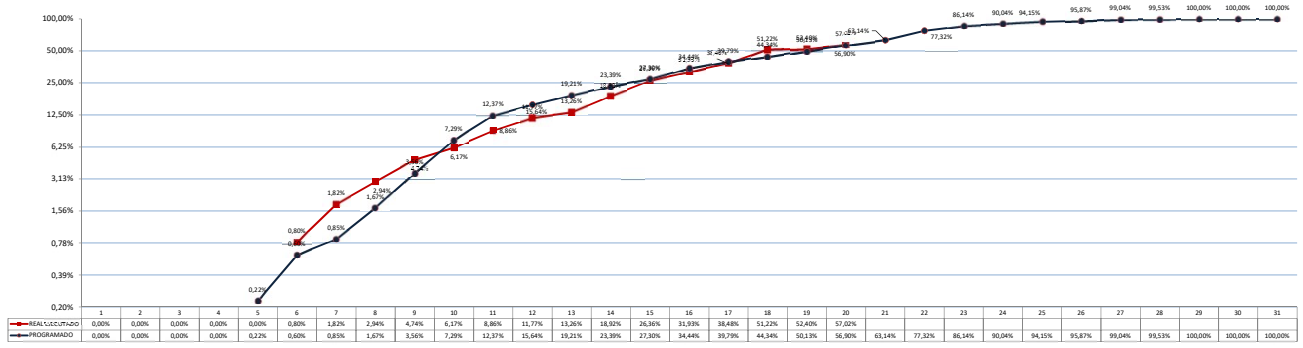

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,80%	1,82%	2,94%	4,74%	6,17%	8,86%	11,77%	13,26%	18,92%	26,36%	31,93%	38,48%	51,22%	52,40%	57,02%											
PROGRAMADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,22%	0,60%	0,85%	1,67%	3,56%	7,29%	12,37%	15,64%	19,21%	23,39%	27,30%	34,44%	39,79%	44,34%	50,13%	56,90%	63,14%	77,32%	86,14%	90,04%	94,15%	95,87%	99,04%	99,53%	100,00%	100,00%	100,00%

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8155097

INFORME SEMANAL No 20 **LOTE COP No 16**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 20 (Consecutivo) **DEL** 16/2/2026 (dd-mm-aa) **AL** 22/2/2026 (dd-mm-aa)

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 142 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato)

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No. CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato)

LOTE COP: 16

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO INTEGRADO DE FONTIBON - SEDE A (ANEXO 1 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades tecnicas: Se evidencia que las actividades correspondientes a las dos áreas intervenidas presentan los siguientes avances:
- **Sala CRIL:** Se ejecutaron las actividades correctivas en la pintura del área de las cerchas, conforme a lo previamente informado. Asimismo, se realizó la reparación de la pintura en muros, mediante la aplicación de esmalte y posterior acabado en vinilo. Se verificó la instalación del flanche y de los angeos correspondientes a la lucarna. De igual manera, se adelantaron actividades de aseo fino en el área en general. El día viernes se llevó a cabo el proceso de pulido de la baldosa, con el fin de dejar el espacio en condiciones óptimas para su entrega.
- **La Casona:** Se finalizó en su totalidad la fundida de las zapatas y se proyecta dar continuidad con la ejecución de la placa de contrapiso. Se programó la entrega del Aula CRIL para el día lunes 23 de febrero de 2026 a la rectoría, por parte de la SED y la interventoría. Durante la reunión sostenida con el apoyo a la supervisión, se solicitó y autorizó la pintura de la puerta de ingreso al aula en color negro.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado, en la revisión efectuada el día de hoy, se evidenció la presencia de 2 trabajadores ejecutando actividades de preparación de mezcla para el vaciado correspondiente a la cuarta zapata y en el aula CRIL.
Previo al inicio de las labores, se verificó el diligenciamiento adecuado del ATS, encontrándose debidamente firmado por el personal involucrado y acorde con la actividad a desarrollar. Así mismo, se validó la realización de la respectiva charla de seguridad, en la cual se socializaron los riesgos asociados a la actividad, tales como manipulación de materiales, sobreesfuerzos, exposición a polvo y posibles atrapamientos, así como las medidas preventivas y el uso obligatorio de los EPP.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: A la fecha, la institución presenta un avance físico del 0,38 % en la ejecución de las actividades programadas, frente a un valor esperado del 0,19 % para el periodo evaluado. Esto refleja un desarrollo superior de un 0,19 %, de acuerdo a la revision del acta parcial N°3 la cual evidencia cantidades ejecutadas de programaciones anteriores.

4.1. Actividades programadas NO ejecutadas: N/A

4.2. Actividades EJECUTADAS a la fecha: Se da de acuerdo a la revision del acta parcial N°3 la cual evidencia cantidades ejecutadas de programaciones anteriores no finalizadas o ejecutadas en su totalidad.

Colegio Integrado de Fontibon - Sede A — SEMANA N°20 (del al 22 02)

(a) ITEM ENTIDAD.	(b) DESCRIPCION ACTIVIDAD	MAYOR O MENOR CANTIDAD	CANTIDAD CONSUMIDA	(c) UNID.	CONDICIONES CONTRACTUALES (d) CANT	(e) VR UNIT	(f) VR PARCIAL	% PROGRAMADO	CANT. EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	% DE CANT. EJECT.	% DE VALOR EJECT.
1.2.6	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA H= 0,05 A 0,10 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	-112,5	93,54	M2	40,79	$ 66.870,00	$ 2.727.627,00	0,00%	5,79	$ 387.177,00	14%	0,06%
12.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	14,29	60,00	M2	74,29	$ 20.902,00	$ 1.552.810,00	0,00%	10	$ 209.020,00	13%	0,19%

5. Generales: En esta misma área se observó que el flanche no llega hasta el extremo final del muro, debido a que en dicho punto no cuenta con superficie de adherencia. Adicionalmente, se evidenció que, como consecuencia del cambio de la teja correspondiente al pasillo, esta fue instalada por encima, generando un taponamiento. Durante la revisión de preentrega se identificó que una de las lámparas no se encuentra alineada, situación atribuida a la desviación de la cercha donde fue instalada. En el área de La Casona se evidenció un asentamiento considerable de la estructura, con aparición de nuevas fisuras y ampliación significativa de las existentes. Se observa movimiento en el sector de las columnas, así como separación visible en la fachada izquierda y en la ventanería del mismo costado.
En atención a lo anterior, el contratista solicitó de manera urgente la visita de su especialista estructural para el día viernes 20 de febrero. A su vez, el apoyo a la supervisión del contrato y la Directora de Interventoría solicitaron la programación de una visita conjunta con los especialistas estructurales de las tres partes para su respectiva revisión el día lunes 23 de febrero de 2026.

6. Ambiental: Se realizó recorrido en el frente, se reportó la disposición de parte de residuos, al igual se sigue evidenciando materiales de construcción y residuos que está cerca de las zonas verdes y a unos individuos arbóreos, se evidencia un gran desorden en el frente, por lo que se recomienda realizar la disposición total del material, garantizar jornadas de orden y aseo periódicamente e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA).

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO ANTONIO VAN UDEN - SEDE C (ANEXO 2 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: A la fecha, se evidencia que la ejecución de las actividades en la institución se desarrolla de la siguiente manera:
- **Batería de baños:** Se adelanta la instalación de baldosa vitroprensada, enchape de muros y media caña en granito en las cuatro (04) áreas que conforman la batería de baños. En las zonas correspondientes a niños y niñas se ejecutó el revoque total de los muros. Asimismo, se dio continuidad al pañete del cuarto de aseo y de los muros levantados conforme a la nueva distribución establecida en el esquema aprobado.
- **Biblioteca:** Se realizó jornada de orden y aseo general en el área, con el fin de habilitar el espacio y dar continuidad a las actividades de pintura.
- **Bloque Alianza:** Teniendo en cuenta que la institución efectuó la entrega del aula pendiente en este bloque, se procedió con el retiro de la ventanería que se encontraba pendiente y se ejecutó la instalación de las respectivas cintas de acabado.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado no se evidenció la ejecución de actividades en el colegio; en consecuencia, no se generaron reportes, registros ni soportes por parte del área de SST. Así mismo, al no presentarse frentes de obra activos, no fue requerido el diligenciamiento de ATS, la realización de charlas de seguridad, ni el acompañamiento o inspecciones SST durante dicho periodo.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: A la fecha, la institución presenta un avance físico del 5,16 % en la ejecución de las actividades, frente a un valor esperado del 5,84 % para el periodo evaluado. Esto refleja un desarrollo inferior de un 0,68 %, de acuerdo a la revision del acta parcial N°3 la cual evidencia cantidades ejecutadas de programaciones anteriores, pero debido a los incumplimientos en la programacion de la semana presenta un desarrollo inferior.

4.1. Actividades programadas NO ejecutadas: Se evidencia que las actividades no ejecutadas corresponden a la instalacion de elementos electricos que no fueron requeridos en el transcurso de la semana, al igual que se refiere a actividades de impermeabilizacion de cubierta qeu no han sido instalados.
Los ítems no desarrollados a la fecha son los siguientes:
- **RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS.**
- **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4".**
- **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS.**
- **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS.**
- **ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M.**
- **PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0,60 M DE ANCHO.**
- **FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DESARROLLO 80 CM.**
- **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLO (80 A 100 CM).**

4.2. Actividades EJECUTADAS a la fecha: Se da de acuerdo a la revision del acta parcial N°3 la cual evidencia cantidades ejecutadasde programaciones anteriores no finalizadas o ejecutadas en su totalidad.

Colegio Antonio Van Uden - Sede C — SEMANA N°20 (del al 22 02)

(a) ITEM ENTIDAD.	(b) DESCRIPCION ACTIVIDAD	MAYOR O MENOR CANTIDAD	CANTIDAD CONSUMIDA	(c) UNID.	CONDICIONES CONTRACTUALES (d) CANT	(e) VR UNIT	(f) VR PARCIAL	% PROGRAMADO	CANT. EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	% DE CANT. EJECT.	% DE VALOR EJECT.
1.1.4	CERRAMIENTO EN TEJA DE ZINC CALIBRE 35 ALTURA = 2.4 M (incluye postes de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con tornillo dry wall 1 1/2") NOTA: el item incluye revision periodica de su estado fisico	-12,61	66,06	M	33,45	$ 149.738,00	$ 5.008.730,00	0,00%	37,54	$ 5.621.164,52	112%	1,22%
1.2.10	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.10 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	-7,43	50,68	M2	43,25	$ 21.882,00	$ 833.422,86	0,00%	5,43	$ 117.140,26	13%	0,03%
1.2.21	DESMONTE RETIRO DE TUBERIAS HORIZONTALMENTE DISTINTOS DE 4", 3", 2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	-18,73	97,99	M	99,20	$ 20.941,00	$ 789.657,26	0,00%	5,25	$ 109.418,66	13%	0,02%
1.2.23	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESCARTE DE LA ESTRUCTURA METALICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CORCHOS, CORREAS Y/O PERFILERIA METALICA, INSTALACIONES ELECTRICAS O TUBERIAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	20,04	367,29	M2	298,43	$ 39.960,00	$ 10.649.228,00	0,00%	67,96	$ 2.416.997,40	23%	0,52%
1.2.38	DESMONTE RETIRO DE TUBERIAS HORIZONTALES DISTINTOS DE 1-1/2", 1-1/4", 1", 3/4", 1/2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	-5,19	32,41	M	39,60	$ 8.670,00	$ 334.662,86	0,00%	10,26	$ 87.220,20	26%	0,02%
1.2.44	DEMOLICION DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0.30 M INCLUYE AJUSTES Y ACOPIO EXISTENTE (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	-25,15	35,53	M2	6,47	$ 97.964,00	$ 633.827,36	0,00%	2,89	$ 283.116,96	45%	0,06%
2.2.5	COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0.15 X 12 CM (NO INCLUYE ACERO)	0,52	19,79	M	20,30	$ 61.842,00	$ 1.255.413,00	0,00%	7,28	$ 450.217,04	36%	0,10%
2.2.15	PLACA CONTRAPISO DE 10 CM - CONCRETO 3000 PSI, INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN.	3,08	34,30	M2	36,28	$ 111.346,00	$ 4.039.343,00	0,00%	1,85	$ 210.621,54	5%	0,05%
3.1.2	MURO EN CONCRETO BLOQUE ESTRIADO No. 4	6,65	90,94	M2	97,54	$ 69.475,00	$ 3.940.224,00	0,00%	13,94	$ 964.592,32	24%	0,21%
4.2.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN OPTICA DE RED 2" INCLUYE ACCESORIOS	-2,09	5,09	UN	8,00	$ 139.950,00	$ 810.130,00	0,00%	2,00	$ 280.032,77	38%	0,06%
4.6.6	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO SANITARIO 2"	-4,00	17,00	UN	13,00	$ 94.196,00	$ 1.224.548,00	0,00%	6	$ 564.936,00	46%	0,12%
12.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	132,94	191,62	M2	319,56	$ 20.902,00	$ 6.999.535,00	0,00%	61,62	$ 1.706.072,24	29%	0,37%
12.2.2	PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM)	108,95	45,03	M	153,98	$ 19.530,00	$ 2.774.720,00	0,00%	20,03	$ 391.040,40	13%	0,08%
12.2.7	SUMINISTRO Y APLICACION SOBRE SUPERFICIES Y MUROS DE PINTURA ESMALTE TIPO 1 LAVABLE A TRES MANOS COLORES VARIADOS DE ACUERDO A CUBIERTA (SIC) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y HERRAMIENTA E IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA APLICACION Y LIMPIEZA)	20,17	251,97	M2	272,14	$ 29.793,00	$ 8.096.961,00	0,00%	151,97	$ 4.021.940,41	56%	0,96%
12.2.11	BASE PINTURA PARA BLANQUEAR FACHADAS TIPO 2 (1 MANO) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y HERRAMIENTA E IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA APLICACION Y LIMPIEZA)	-155,19	222,89	M2	65,70	$ 23.604,00	$ 1.549.709,00	0,00%	192,89	$ 4.552.575,56	277%	0,96%
12.3.3	SUMINISTRO Y APLICACION DE ESMALTE EN LA TOTALIDAD DEL ELEMENTO ESTRUCTURAL A DOS MANOS (CERCHAS, VIGAS, COLUMNAS Y ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA, ENTRE OTROS INCLUYE TODAS LAS CARAS, ARISTAS Y VERTICES HASTA UN DESARROLLO DE 1,2 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	-21,71	181,29	M	159,58	$ 8.672,00	$ 1.419.754,00	0,00%	106,71	$ 946.731,12	67%	0,20%
19.1.2	EMBALLAJE EN POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD Y DISPOSICIÓN FINAL DE TEJA EN ASBESTO	-305,67	4.210,00	KG	3.904,33	$ 3.500,00	$ 13.743.848,00	0,00%	620	$ 2.886.400,00	21%	0,62%

5. Generales: N/A

6. Ambiental: Se verifico el cerramiento en buen estado, se reportó la disposición de parte de los residuos, se evidencian materiales de construcción y RCDs generados por las demoliciones acopiados y debidamente en lonas en menor cantidad, por lo que se recomienda realizar la disposición adecuadamente el material posteriormente respecto a las especificaciones técnicas y ambientales.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO TECNICO INTERNACIONAL - SEDE A (ANEXO 3 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Durante la semana se ejecutaron actividades por frentes de trabajo al interior de la institución educativa, conforme se detalla a continuación:
- **Batería de baños de bachillerato:** Se ejecutaron actividades de remate y definición de la tubería de reventilación, incluyendo su respectiva conexión. No se evidenció el desarrollo de otras actividades durante el transcurso de la semana.
- **Batería de baños de primaria:** Se dio continuidad a las actividades de destroncado y pulido de pisos durante la semana.
- **Aula múltiple:** Se realizaron actividades de demolición de pisos en dos aulas correspondientes a esta área, así como la limpieza de las superficies intervenidas. Asimismo, se ejecutó el desarrollo de las cintas en los vanos destinados a las rejillas de ventilación en dos (02) aulas. En la fachada se evidenció la ejecución de pintura en la canal y en sus respectivos soportes. De igual manera, se realizaron actividades de reparación y remate en la

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se adelantaron actividades de pulido de pisos y medias cañas en los baños correspondientes a las áreas de primaria y bachillerato. En el marco del seguimiento al componente de SST, se evidenció que esta actividad genera material particulado en suspensión, constituyendo un riesgo potencial para el personal operativo y para la comunidad educativa. En tal sentido, se recomienda al contratista reforzar las medidas de control orientadas a la mitigación del polvo, tales como:
Uso permanente y adecuado de protección respiratoria con filtro para material particulado, Uso obligatorio de gafas de seguridad para protección ocular, Implementación de aislamiento físico del área intervenida mediante cerramiento provisional, Instalación de señalización preventiva visible que restrinja el acceso a personal no autorizado.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: A la fecha, la institución presenta un avance físico del 5,92 % en la ejecución de las actividades, frente a un avance esperado del 4,93 % para el periodo evaluado. Esto representa una desviación negativa del 0,99 %, de acuerdo a la revision del acta parcial N°3 la cual evidencia cantidades ejecutadas de programaciones anteriore. Pero debido a los incumplimientos en la programacion de la semana presenta un desarrollo inferior.

4.1. Actividades programadas NO ejecutadas: Se evidencia que ciertas actividades programadas no fueron requeridas en el periodo de ejecucion y tampoco se realizo la instalacion de aparatos electricos y acabados en el area de bateria de baños.
Los ítems no desarrollados a la fecha son los siguientes:
- **TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA.**
- **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR AUTOMATICO TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 1X20A 10 KA.**
- **PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM).**
- **CIELO RASO BLANCO PVC SISTEMA 200 GS COLOR BLANCO.**

4.2. Actividades EJECUTADAS a la fecha: Se da de acuerdo a la revision del acta parcial N°3 la cual evidencia cantidades ejecutadasde programaciones anteriores no finalizadas o ejecutadas en su totalidad.

Colegio Tecnico Internacional - Sede A — SEMANA N°20 (del al 22 02)

(a) ITEM ENTIDAD.	(b) DESCRIPCION ACTIVIDAD	MAYOR O MENOR CANTIDAD	CANTIDAD CONSUMIDA	(c) UNID.	CONDICIONES CONTRACTUALES (d) CANT	(e) VR UNIT	(f) VR PARCIAL	% PROGRAMADO	CANT. EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	% DE CANT. EJECT.	% DE VALOR EJECT.
1.1.4	CERRAMIENTO EN TEJA DE ZINC CALIBRE 35 ALTURA = 2.4 M (incluye postes de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con tornillo dry wall 1 1/2") NOTA: el item incluye revision periodica de su estado fisico	-97,96	166,24	M	68,28	$ 149.738,00	$ 10.224.111,00	0,00%	69,73	$ 10.441.230,74	102%	2,38%
1.2.10	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.10 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	-4,04	64,48	M2	60,44	$ 21.882,00	$ 1.304.416,00	0,00%	3,54	$ 76.400,28	6%	0,02%
4.6.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2"	6,00	23,00	UN	28,00	$ 61.485,00	$ 1.721.524,00	0,00%	5	$ 307.416,00	18%	0,07%
4.6.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	-5,00	25,00	UN	20,00	$ 61.485,00	$ 1.229.660,00	0,00%	18	$ 1.106.177,00	90%	0,27%
4.6.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 4"	0,00	21,00	UN	21,00	$ 175.973,00	$ 3.695.433,00	0,00%	2	$ 351.946,00	10%	0,08%
7.2.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GUARDA ESCOBA EN PVC	2,28	70,02	M	72,22	$ 10.979,00	$ 792.963,00	0,00%	30,02	$ 329.569,58	42%	0,08%
7.2.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO VINILICO HETEROGENEO ALTO TRÁFICO	-0,87	107,58	M2	106,71	$ 229.557,00	$ 24.496.027,00	0,00%	32,58	$ 7.478.967,06	31%	1,70%

5. Generales: Se observa que, por parte de la institución, se llevó a cabo la depuración de material eléctrico y sanitario ubicado en el área destinada al acopio de residuos de obra. El apoyo a la supervisión del contrato informó que se estableció contacto con la rectora de la institución para tratar lo correspondiente a esta situación.
Igualmente se informa que hubo baja afluencia de personal en el transcurso de la semana por temas relacionados al paro que se presente en la ciudad y genero problemas de movilidad tanto en horas de ingreso como de salida para el personal de obra.

6. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, Se verifico el cerramiento en buen estado, se verifica que la mezcla de concreto se realizó en batea metálica, se evidencia material de construcción y RCD acopiados, sin afectación a sumideros, se recomendo al contralista realizar jornadas de orden y aseo periódicamente al igual que implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA). se reporta que se evidencia unidades sanitarias y luminarias en el frente que no son parte de este contrato, por lo que se sugiere a la institución organizar estos residuos.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO REPUBLICA DE VENEZUELA - SEDE B (ANEXO 4 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Durante el período evaluado no se ejecutaron actividades constructivas representativas. Únicamente se realizó aplicación de pintura en la cara interna de la puerta de la rectoría y de la biblioteca.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado no se evidenció la ejecución de actividades en el colegio; en consecuencia, no se generaron reportes, registros ni soportes por parte del área de SST. Así mismo, al no presentarse frentes de obra activos, no fue requerido el diligenciamiento de ATS, la realización de charlas de seguridad, ni el acompañamiento o inspecciones SST durante dicho periodo.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: A la fecha, la institución presenta un avance físico del **47.99 %** en la ejecución de las actividades, frente a un avance esperado del **58.79 %** para el periodo evaluado. Esto representa una desviación negativa del **10.80%**, donde se evidencia que se han realizado actividades no programadas correspondientes al desarrollo de la reparacion y la pintura del punto fijo.

4.1. Actividades programadas NO ejecutadas:
- **PINTURA EXTERIOR DFE ALTA RESISTENCIA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)**
- **PINTURA EXTERIOR DE ALTA RESISTENCIA A TRES MANOS (A 0.6M, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS**
- **EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)**
- **SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI**
- **DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE ADOQUÍN**

4.2. Actividades EJECUTADAS a la fecha: N/A

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA **CO1.PCCNTR.8155097**

INFORME SEMANAL No 20 **LOTE COP No 16**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 20 (Consecutivo) **DEL** 16/2/2026 (dd-mm-aa) **AL** 22/2/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 142 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

5. Generales: Durante la semana se realizó visita técnica con el ingeniero de apoyo a la supervisión, la dirección de interventoria y los residentes de obra e interventoría. En el recorrido se revisó el alcance de las emergencias, posibles ítems de pintura para balance y las intervenciones generales requeridas, especialmente en baños por presencia de humedades y en fachada. Asimismo, se evaluo la necesidad de una bajante y el estado de las canchas, evidenciando que los arcos no cuentan con malla y no tienen aplicacion de anticorrosivo

6. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, no se encuentran acopios y anteriormente se reportó retiro de escombros al igual se recomendó al contratista implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA)

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO MARCO ANTONIO CARREÑO - SEDE B (ANEXO 5 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Durante el periodo reportado se ejecutaron las siguientes actividades:
- Ejecución de trabajos de enchape de piso
- Aplicación de boquilla.
- Pulida de piso
- Demolición de enchape
- Lijado y alistamiento de muros.
- Resane y tratamiento de superficies.
- Instalación de puertas.
- Jornada de aseo en áreas intervenidas.

2. Seguridad social y SST: Durante la semana se contó con la presencia de la profesional SST por parte del contratista, quien realizó la verificación del personal en obra. Se efectuó la entrega de EPP a dos trabajadores que, aunque habían estado vinculados con anterioridad al proyecto, retomaron actividades. Asimismo, se desarrollaron charlas de sensibilización enfocadas en el autocuidado y en los peligros asociados al orden y aseo en el área de trabajo. Se validó que todo el personal contara con los elementos de protección personal requeridos para el desarrollo de sus labores.
Adicionalmente, se realizó la entrega de un botiquín de primeros auxilios por parte del consorcio en la institución, con el fin de fortalecer las condiciones de atención inmediata ante cualquier eventualidad en obra. Finalmente, se inspeccionó el cerramiento de obra, constatando que se encuentra en condiciones adecuadas y que cumple con los requerimientos de señalización establecidos.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: A la fecha, la institución presenta un avance físico del **64.16 %** en la ejecución de las actividades, frente a un avance esperado del **33.53 %** para el periodo evaluado. Esto representa una desviación positiva del **30.63 %**, donde se evidencia que se han realizado actividades no programadas.

4.1. Actividades programadas NO ejecutadas: N/A

4.2. Actividades EJECUTADAS a la fecha: Se deja constancia de que el contratista ha ejecutado actividades que no se encuentran contempladas en la programación contractual y que, por tanto, no aportan al porcentaje de avance. Entre ellas se incluyen avances en enchape, aplicación de pañete, retiro de enchape en muros y piso,aplicacion de estuco, enchape de guardaescobas y la desconexión de veinte (20) puntos eléctricos, actividad no contractual.
En consecuencia, se requiere que estos ítems sean revisados e incluidos en el balance y ajustados en la programación correspondiente.

5. Generales: En el comité realizado durante la semana, y conforme a lo definido por el equipo técnico, se aprobaron las siguientes actividades:
- Enchape en el área inferior de los mesones del laboratorio.
- Aplicación de pintura en las gavetas del laboratorio.
- Retiro del enchape existente en el piso del pasillo y en dos aulas, con el fin de unificar el acabado.

6. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, cuenta con el cerramiento adecuado en el frente, se reportó ingreso de material y puertas, se acopiaron adecuadamente al igual que los RCD, se recomienda garantizar jornadas de orden y aseo periódicamente, disponer adecuadamente todos los residuos al igual se recomendo al contratista implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA).

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO JULIO GARAVITO ARMERO - SEDE B (ANEXO 6 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Durante la semana se ejecutaron actividades por frentes de trabajo al interior de la institución educativa, conforme se detalla a continuación:
- Oficinas administrativas: Se realizó la instalación en su totalidad de las platinas en las áreas de oficinas, pagaduría y hall de distribución. Asimismo, se ejecutó la instalación de la perfilería correspondiente a la estructura de cubierta y a la fachada interna del colegio. En la revisión efectuada se identificó que, en las zonas de intersección, se presentan detalles en las uniones que a la fecha no han sido subsanados, por lo cual se solicitó su respectiva corrección.

2. Seguridad Social y SST: Se contó con la presencia de la profesional SST, quien realizó la verificación del personal entrante, constatando que contara con los elementos de protección personal requeridos.
En esta institución ingresaron 2 soldadores, quienes ejecutarán la instalación de la estructura en perfilería para la cubierta. Se verificó de manera permanente que los trabajadores utilizaran adecuadamente sus EPP, tales como gafas de seguridad, máscaras de protección, guantes, botas y tapabocas, considerando que también se estaban aplicando pinturas en platinas y perfilería metálica. Adicionalmente, se desarrollaron charlas de autocuidado y prevención de peligros químicos asociados a las actividades en ejecución. Se realizó jornada de aseo general, incluyendo el retiro de escombros restantes en el área intervenida, así como el ingreso de material necesario para dar continuidad a la ejecución de la obra.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: A la fecha, la institución presenta un avance físico del 36,92 % en la ejecución de las actividades, frente a un avance esperado del 0,19 % para el periodo evaluado. Esto representa una desviación positiva del 36,73 % , de acuerdo a la revision del acta parcial N°3 la cual evidencia cantidades ejecutadas de programaciones anteriores, sobre todo en la cantidad de KG correspondiente a la estructura metalica de la cubierta.

4.1. Actividades programadas NO ejecutadas: N/A

4.2. Actividades EJECUTADAS a la fecha: Se da de acuerdo a la revision del acta parcial N°3 la cual evidencia cantidades ejecutadas de programaciones anteriores no finalizadas o ejecutadas en su totalidad.

Colegio Julio Garavito Armero - Sede B								SEMANA 8 (26 al 28 2026)				
(a) ITEM ENTIDAD.	(b) DESCRIPCION ACTIVIDAD	MAYOR O MENOR CANTIDAD	CANTIDAD CONSUMIDA	(c) UNID.	CONDICIONES CONTRACTUALES			% PROGRAMADO	CANT. EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	% DE CANT. EJECT.	% DE VALOR EJECT.
					(d) CANT	(e) VR UNIT	(f) VR PARCIAL					
1.1.4	CERRAMIENTO EN TEJA DE ZINC CALIBRE 33 ALTURA = 2.4 M (incluye postes de madera 4"x4" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y zampes con tornillo dry wall 1 1/2"). NOTA: el ítem incluye revision periódica de su estado físico.	-20,67	44,22	M	23,38	$ 149.788,00	$ 3.496.382,00	0,00%	17,92	$ 2.683.304,96	77%	2,32%
1.2.20	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANCLAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS)	-8,36	149,50	M2	141,14	$ 35.565,00	$ 5.019.644,00	0,00%	49,5	$ 1.760.467,50	35%	1,82%
2.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO 12 X 20 CM EN CONCRETO DE 3000 PSI, NO INCLUYE REFUERZO.	-14,63	66,90	M	52,27	$ 101.666,00	$ 5.314.186,00	0,00%	56,9	$ 3.791.549,20	71%	3,28%
2.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA, INCLUYE CAVE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	-1.345,27	1.557,91	KG	214,64	$ 22.296,00	$ 4.786.043,00	0,00%	1557,91	$ 34.736.277,18	726%	30,05%

5. Generales: De acuerdo con lo anterior, se ha realizado seguimiento continuo a la instalación de los perfiles, verificando que su ejecución se ajusta a lo previamente concertado. No obstante, se continuará con el control y seguimiento diario de esta actividad.
Teniendo en cuenta la instalación de la perfilería de fachada, se consultó con el apoyo a la supervisión de obra la forma de instalación de la baranda, definiéndose que esta se ejecutará siguiendo la misma secuencia de la perfilería, es decir, de manera interna en cada área delimitada.

6. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, se verifica que la mezcla de concreto se realiza en batea metálica, se reporta ingreso de material, los cuales fueron acopiados adecuadamente, se recomienda garantizar jornadas de orden y aseo periódicamente al igual que implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA).

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO CULTURA POPULAR - SEDE C (ANEXO 7 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Durante la semana se ejecutaron actividades por frentes de trabajo al interior de la institución educativa, conforme se detalla a continuación:
- Cuatro (04) módulos – Oficinas administrativas: Se dio continuidad a las actividades de corrección de pintura en las áreas intervenidas durante la instalación de las puertas. Asimismo, se ejecutó en su totalidad la instalación de tubería MT y puntos eléctricos en los cuatro (04) módulos. Se evidenció la instalación del "pie de amigo" correspondiente a la canal, el cual se encuentra en proceso de revisión por parte de la interventoría para su respectivo aval.
Adicionalmente, se informa que se dio inicio a las actividades de reparación de la perfilería y de la cubierta tipo sándwich, quedando a la espera de su finalización para realizar la correspondiente revisión.
- Shut de basuras: Se evidenció la instalación de la fachada principal en sistema liviano, la cual fue retirada temporalmente para permitir el ingreso de la tubería MT. De igual manera, se realizó la instalación del enchape de muros en su totalidad.
- Garita de vigilancia: Se efectuó el relleno de las áreas donde previamente se realizaron excavaciones y regatas para la instalación de las redes hidráulicas e hidrosanitarias. Asimismo, se ejecutó la instalación de enchape en algunas áreas; quedando pendientes la ejecución de la bocapuerta y la media caña. De igual forma, se realizó el cambio del acople del lavamanos, dado que este se vio afectado durante el proceso de cambio del piso.

2. Seguridad Social y SST: La profesional SST hizo presencia en la institución, realizando la verificación del personal en obra y gestionando la firma de los ATS, correspondientes a las actividades en ejecución. Se llevó a cabo la verificación del personal, constatando que todos los trabajadores contaran con los EPP requeridos para el desarrollo de sus labores.
Al igual que en las demás instituciones, se realizó jornada de aseo general en las áreas intervenidas. Se verificó que el cerramiento de obra se encuentra en buen estado y cumple con las condiciones de seguridad establecidas. Adicionalmente, se ejecutó la reparación de las redes hidrosanitarias que habían resultado afectadas, situación que había dejado sin suministro de agua al área de vigilancia. Asimismo, se realizó el respectivo taponamiento de las conexiones intervenidas, garantizando el adecuado funcionamiento del sistema.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: A la fecha, la institución presenta un avance físico del 6,35 % en la ejecución de las actividades programadas, frente a un valor esperado del 7,34 % para el periodo evaluado. Esto refleja un desarrollo inferior de un 0,99 % , se informa que este porcentaje se desarrolla de esta manera debido que a la fecha esta institucion ya deberia estar finalizada, de acuerdo a esto no se presentara ningun sobre avance de las actividades proximas a ejecutar.

4.1. Actividades programadas NO ejecutadas: Se evidencia que las actividades que no presentan desarrollo de actividades hacen referencia a la programacion en general, teniendo esto en cuenta y que a la fecha la programacion de la institucion deberia haberse finalizado se solicito la presentacion de un plan de emergencia para la finalizacion de la institucion.

4.2. Actividades EJECUTADAS a la fecha: N/A

5. Generales: Por parte del apoyo a la supervisión, se solicita continuar con el ritmo de trabajo, teniendo en cuenta que la fecha de entrega de este frente corresponde a la semana N.° 21 y que el mismo debe ser entregado en su totalidad a la institución. Durante el recorrido realizado por la interventoría se evidenciaron varios detalles en el área correspondiente a los cuatro (04) módulos, relacionados con la reinstalación de la cubierta y la perfilería, tales como abolladuras, manchas de pintura y orificios en los perfiles producto de la instalación de la tornillería. En consecuencia, se solicita la subsanación de dichas observaciones.
Igualmente, se observó que la rampa correspondiente a la puerta de salida de la institución para la disposición de basuras no ha sido ejecutada, siendo esta necesaria para garantizar la adecuada movilidad. Por lo anterior, se solicita su ejecución a la mayor brevedad posible.

6. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, Se evidencia una unidad sanitaria, se cuenta con el cerramiento adecuado, se recomienda al contratista que al finalizar las actividades se debe garantizar que el frente quede ordenado, limpio y sin residuos.

FIRMAS

ARQ. LORENA RODRIGUEZ ROBRIGUEZ
DIRECTORA DE INTERVENTORIA

ARQ. NELLY NATALIA MORA LA ROTTA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ING. LUIS EMIRO BLANCO MORENO
APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

ING. KATHERINE CAROLINA NÚÑEZ OSORIO
PROFESIONAL SST

ING. CHRISTIAN FELIPE RODRIGUEZ
PROFESIONAL AMBIENTAL

ING. CRISTIAN BARRERA DONCELL
PROFESIONAL COSTOS Y PRESUPUESTOS

ING. GERMAN ADOLFO LIVIA QUINTERO
PROFESIONAL ELECTRICO

ING. ROBINSON VILLAMIL ROJAS
PROFESIONAL HIDRAULICO

ING. DIEGO FERNANDO OLARTE DIAZ
PROFESIONAL ESTRUCTURAL

FECHA:	23/02/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	INFORME APOYO A LA SUPERVISION
DIAS RESTANTES	69 Dias		GRUPO 16
ESTADO GENERAL DEL PROYECTO			
CORTE DEL INFORME:	CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2025	
22 de febrero de 2026	CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:	PROBINTEC S.A.S	

FECHAS		
DATOS:	INTERVENTORIA	OBRA
CONTRATO	CO1.PCCNTR.8168931	CO1.PCCNTR.8155097
INICIO	3 de octubre de 2025	3 de octubre de 2025
TERMINACION INICIAL	2 de mayo de 2026	2 de mayo de 2026
TERMINACION FINAL	2 de mayo de 2026	2 de mayo de 2026

PLAZOS EN DIAS		
ETAPA:	INTERVENTORIA	OBRA
INICIAL	211	211
SUSPENSIONES		
PRÓRROGAS		
TOTAL	211	211

VALOR CONTRATO		
ETAPA:	INTERVENTORIA	OBRA
INICIAL	$ 796.278.928,00	$ 2.455.237.837,00
ADICIONES	$ 139.026.666,00	$ 380.000.000,00
TOTAL	$ 935.305.594,00	$ 2.835.237.837,00

MODIFICACIONESDEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

MOD No	FECHA DE LA MODIFICACION	VALOR ADICION	PRORROGA	OTRO ASPECTO
1	26/12/2025	$ 139.026.666,00		
2				
3				
4				

MODIFICACIONESDEL CONTRATO DE OBRA

MOD No	FECHA DE LA MODIFICACION	VALOR ADICION	PRORROGA	OTRO ASPECTO
1	12/12/2025	$ 380.000.000,00		
2				
3				
4				

POLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORIA — GARANTE: SEGUROS DEL ESTADO

POLIZA	CUMPLIMIENTO DESDE	CUMPLIMIENTO HASTA	CALIDAD DEL SERVICIO DESDE	CALIDAD DEL SERVICIO HASTA	SALARIOS Y PRESTACIONES DESDE	SALARIOS Y PRESTACIONES HASTA
400 47 994000110040	19 9 2025	3 1 2027	3 5 2026	3 5 2031	19 9 2025	3 5 2029

POLIZAS CONTRATO DE OBRA — COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

POLIZA	CUMPLIMIENTO DESDE	CUMPLIMIENTO HASTA	SALARIOS Y PRESTACIONES DESDE	SALARIOS Y PRESTACIONES HASTA	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA DESDE	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA HASTA	POLIZA	RESPONSABILIDAD CIVIL DESDE	RESPONSABILIDAD CIVIL HASTA

CPF	COLEGIO	LOCALIDAD	SEDE	NOMBRE SEDE	AVANCE ANTERIOR	AVANCE ACTUAL (23/01/2026)	PROGR %	EJECUTADO VS PROG	Vlr FRENTE APROBADO	Vlr FRENTE A ESTE PERIODO	FECHA INICIO CRONOGRAMA	FECHA FIN CRONOGRAMA	jul-2025	jul-2025	ago-2025	ago-2025	sep-2025	sep-2025	oct-2025	oct-2025	nov-2025	dic-2025	dic-2025	ene-2026	ene-2026	feb-2026	feb-2026	mar-2026	mar-2026
915	INTEGRADO DE FONTIBÓN	FONTIBÓN	A	INTEGRADO DE FONTIBÓN	93,04%	93,42%	-0,38%		$ 149.356.686,19	$ 68.516.715,63	06/11/2025	27/02/2026																	
920	ANTONIO VAN UDEN	FONTIBÓN	C	SAN VICENTE	57,91%	63,08%	-5,17%		$ 490.905.466,84	$ 148.872.531,50	18/11/2025	13/04/2026																	
901	INSTITUTO TÉCNICO INTERNACIONAL	FONTIBÓN	A	INSTITUTO TÉCNICO INTERNACIONAL	61,48%	66,41%	-4,93%		$ 506.491.008,39	$ 185.980.389,67	06/11/2025	01/04/2026																	
1408	COLEGIO REPUBLICA BOLIVARIANA DE	LOS MÁRTIRES	B	SAMPER MENDOZA	47,98%	47,99%	-0,03%		$ 222.333.302,02	$ 95.891.221,84	24/11/2025	18/04/2026																	
1632	MARCO ANTONIO CARREÑO SILVA (IED)	PUENTE ARANDA	B	MARCO ANTONIO CARREÑO SILVA	63,28%	64,16%	-0,88%		$ 449.716.114,81	$ 82.663.507,58	06/11/2025	01/04/2026																	
1614	JULIO GARAVITO ARMERO (IED)	PUENTE ARANDA	B	MUZU No. 1	32,34%	69,26%	-35,92%		$ 215.764.375,07	$ 36.438.122,74	21/11/2025	11/05/2026																	
1603	CULTURA POPULAR (IED)	PUENTE ARANDA	C	DIEGO LUIS CORDOBA	66,64%	72,99%	-6,35%		$ 196.253.062,23	$ 47.667.255,85	13/11/2025	24/01/2026																	
TOTAL FRENTES DE OBRA						68,19%	-4,20%		$ 2.131.822.015,46	$ 667.219.745																		
EMERGENCIAS ATENDIDAS DURANTE EL PERIODO																												
1616	SILVERIA ESPINOSA DE RENDON (IED)	PUENTE ARANDA	B	RAFAEL POMBO		100,00%	100,00%	✓	$ 8.789.206,00	$ 8.789.206,00																		
1609	SILVERIA ESPINOSA DE RENDON (IED)	PUENTE ARANDA	A	SILVERIA ESPINOSA DE RENDON		100,00%	100,00%	✓	$ 17.578.413,00	$ 17.578.413,00																		
1612	EL JAZMIN (IED)	PUENTE ARANDA	B	LA PRIMAVERA		100,00%	100,00%	✓	$ 1.953.157,00	$ 1.953.157,00																		
914	RODRIGO ARENAS BETANCOURT	FONTIBÓN	A	SIMÓN BOLIVAR		100,00%	100,00%	✓	$ 1.953.157,00	$ 1.953.157,00																		
909	VILLEMAR EL CARMEN	FONTIBÓN	B	SANTA CECILIA		100,00%	100,00%	✓	$ 1.953.157,00	$ 1.953.157,00																		
915	INTEGRADO DE FONTIBÓN	FONTIBÓN	A	INTEGRADO DE FONTIBÓN		100,00%	100,00%	✓	$ 1.953.157,00	$ 1.953.157,00																		
929	MARIA JOSEFA CANELONES	FONTIBÓN	A	MARIA JOSEFA CANELONES		0,00%	0%	✓	$ 10.000.000,00	$ -																		
909	VILLEMAR EL CARMEN	FONTIBÓN	B	SANTA CECILIA		100,00%	100%	✓	$ 35.000.000,00	$ -																		
TOTAL FRENTES DE OBRA						87,50%	87,50%	✓	$ 79.180.247	$ 34.180.247																		

ACUMULADO FRENTES DE OBRA				
TERMINADAS	EN EJECUCION	POR INICIAR	TOTAL	VALOR
0	7	0	7	$ 667.219.745
ACUMULADO EMERGENCIAS				
7	0	1	8	$ 34.180.247
TOTAL				
7	7	1	15	$ 701.399.992
FRENTES POR LOCALIDAD				

| RELACION DE PAGOS EFECTUADOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

	PROGRAMACIÓN				REAL			ACUMULADO			
INFORME	SEMANA	FECHA	PROGRAMADO	% PROGRAMADO	AVANCE	EJECUTADO	DIFERENCIA	PROGRAMADO		EJECUTADO	
1	sem 1	03-oct-25	$ -	0,00%	0,00%	$ -	$ -	0,00%	$ -	0,00%	$0,00
2	sem 2	13-oct-25	$ -	0,00%	0,00%	$ -	$ -	0,00%	$ -	0,00%	$0,00
3	sem 3	20-oct-25	$ -	0,00%	0,00%	$ -	$ -	0,00%	$ -	0,00%	$0,00
4	sem 4	27-oct-25	$ -	0,00%	0,00%	$ -	$ -	0,00%	$ -	0,00%	$0,00
5	sem 5	03-nov-25	$ 4.755.494,21	0,22%	0,00%	$ -	$ 4.755.494,21	0,22%	$ 4.755.494,21	0,00%	$0,00
6	sem 6	10-nov-25	$ 8.125.912,59	0,38%	0,80%	$ 16.977.206,64	$ (8.851.294,05)	0,60%	$ 12.881.406,80	0,80%	$16.977.206,64
7	sem 7	17-nov-25	$ 5.288.020,00	0,25%	1,02%	$ 21.771.422,72	$ (16.483.402,72)	0,85%	$ 18.169.426,80	1,82%	$38.748.629,36
8	sem 8	24-nov-25	$ 17.444.983,27	0,82%	1,13%	$ 23.997.772,21	$ (6.552.788,94)	1,67%	$ 35.614.410,07	2,94%	$62.746.401,57
9	sem 9	01-dic-25	$ 40.343.446,53	1,89%	1,80%	$ 38.340.052,51	$ 2.003.394,02	3,56%	$ 75.957.856,60	4,74%	$101.086.454,08
10	sem 10	08-dic-25	$ 79.444.682,79	3,73%	1,43%	$ 30.382.417,28	$ 49.062.265,51	7,29%	$ 155.402.539,39	6,17%	$131.468.871,36
11	sem 11	15-dic-25	$ 108.209.197,15	5,08%	2,69%	$ 57.402.366,83	$ 50.806.830,32	12,37%	$ 263.611.736,54	8,86%	$188.871.238,19
12	sem 12	22-dic-25	$ 69.900.889,80	3,28%	2,91%	$ 62.085.827,21	$ 7.815.062,59	15,64%	$ 333.512.626,34	11,77%	$250.957.065,40
13	sem 13	29-dic-25	$ 75.956.528,24	3,56%	1,49%	$ 31.686.383,67	$ 44.270.144,57	19,21%	$ 409.469.154,58	13,26%	$282.643.449,07
14	sem 14	05-ene-26	$ 89.212.283,49	4,18%	5,66%	$ 120.616.837,44	$ (31.404.553,95)	23,39%	$ 498.681.438,07	18,92%	$403.260.286,51
15	sem 15	12-ene-26	$ 83.223.770,74	3,90%	7,45%	$ 158.783.369,63	$ (75.559.598,89)	27,30%	$ 581.905.208,81	26,36%	$562.043.656,14
16	sem 16	19-ene-26	$ 152.231.709,97	7,14%	5,56%	$ 118.625.799,96	$ 33.605.910,01	34,44%	$ 734.136.918,78	31,93%	$680.669.456,10
17	sem 17	26-ene-26	$ 114.051.601,68	5,35%	6,55%	$ 139.680.056,20	$ (25.628.454,52)	39,79%	$ 848.188.520,46	38,48%	$820.349.512,30
18	sem 18	02-feb-26	$ 97.149.131,29	4,56%	12,74%	$ 271.555.749,04	$ (174.406.617,75)	44,34%	$ 945.337.651,75	51,22%	$1.091.905.261,34
19	sem 19	09-feb-26	$ 123.336.874,83	5,79%	1,19%	$ 25.293.497,30	$ 98.043.377,53	50,13%	$ 1.068.674.526,58	52,40%	$1.117.198.758,64
20	sem 20	16-feb-26	$ 144.354.651,09	6,77%	4,62%	$ 98.397.025,80	$ 45.957.625,29	56,90%	$ 1.213.029.177,67	57,02%	$1.215.595.784,44
21	sem 21	23-feb-26	$ 133.044.130,87	6,24%	0,00%	$ -	$ 133.044.130,87	63,14%	$ 1.346.073.308,54		$1.215.595.784,44
22	sem 22	02-mar-26	$ 302.192.068,33	14,17%	0,00%	$ -	$ 302.192.068,33	77,32%	$ 1.648.265.376,87		$1.215.595.784,44
23	sem 23	09-mar-26	$ 188.077.906,58	8,82%	0,00%	$ -	$ 188.077.906,58	86,14%	$ 1.836.343.283,45		$1.215.595.784,44
24	sem 24	16-mar-26	$ 83.278.260,58	3,91%	0,00%	$ -	$ 83.278.260,58	90,04%	$ 1.919.621.544,03		$1.215.595.784,44
25	sem 25	23-mar-26	$ 87.605.509,23	4,11%	0,00%	$ -	$ 87.605.509,23	94,15%	$ 2.007.227.053,26		$1.215.595.784,44
26	sem 26	30-mar-26	$ 36.671.729,02	1,72%	0,00%	$ -	$ 36.671.729,02	95,87%	$ 2.043.898.782,28		$1.215.595.784,44
27	sem 27	06-abr-26	$ 67.465.761,55	3,16%	0,00%	$ -	$ 67.465.761,55	99,04%	$ 2.111.364.543,83		$1.215.595.784,44
28	sem 28	13-abr-26	$ 10.504.787,87	0,49%	0,00%	$ -	$ 10.504.787,87	99,53%	$ 2.121.869.331,70		$1.215.595.784,44
29	sem 29	20-abr-26	$ 10.012.682,84	0,47%	0,00%	$ -	$ 10.012.682,84	100,00%	$ 2.131.882.014,54		$1.215.595.784,44
30	sem 30	27-abr-26	$ -	0,00%	0,00%	$ -	$ -	100,00%	$ 2.131.882.014,54		$1.215.595.784,44
31	sem 31	04-may-26	$ -	0,00%	0,00%	$ -	$ -	100,00%	$ 2.131.882.014,54		$0,00
32	sem 32	11-may-26		0,00%	0,00%			100,00%	$ 2.131.882.014,54		
33	sem 33	18-may-26		0,00%	0,00%			100,00%	$ 2.131.882.014,54		
34	sem 34	25-may-26		0,00%	0,00%			100,00%	$ 2.131.882.014,54		
35	sem 35	01-jun-26		0,00%	0,00%			100,00%	$ 2.131.882.014,54		
36	sem 36	08-jun-26		0,00%	0,00%			100,00%	$ 2.131.882.014,54		
37	sem 37	15-jun-26		0,00%	0,00%			100,00%	$ 2.131.882.014,54		
38	sem 38	22-jun-26		0,00%	0,00%			100,00%	$ 2.131.882.014,54		
39	sem 39	29-jun-26		0,00%	0,00%			100,00%	$ 2.131.882.014,54		
40	sem 40	06-jul-26		0,00%	0,00%			100,00%	$ 2.131.882.014,54		
41	sem 41	13-jul-26		0,00%	0,00%			100,00%	$ 2.131.882.014,54		
42	sem 42	20-jul-26		0,00%	0,00%			100,00%	$ 2.131.882.014,54		
43	sem 43	27-jul-26		0,00%	0,00%			100,00%	$ 2.131.882.014,54		
			$ 2.131.882.014,54	100,00%	57,02%						

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 20 | **LOTE COP No 16**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 20 (Consecutivo) **DEL** 16/2/2026 (dd-mm-aa) **AL** 22/2/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 142 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

COLEGIO INTEGRADO DE FONTIBON - SEDE A (ANEXO 1 REGISTRO FOTOGRÁFICO)



Se evidencia que se estan ultimando detalles de pintura en el area de la cercha.



Se evidencia que se esta realizando detalles de pintura en el area que presenta detalles.



Se evidencia que se esta finalizando el armado de la zapata N°4.



Se evidencia que se realiza el encofrado con la formaleta de la zapata N°4.



Se evidencia que se esta realizando la mezcla para fundir la zapata N°4, se revisa dosificacion.



Se evidencia que la zapata N°4 se encuentra en procesode fraguado,

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 20 | **LOTE COP No 16**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 20 (Consecutivo) **DEL** 16/2/2026 (dd-mm-aa) **AL** 22/2/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 142 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

COLEGIO INTEGRADO DE FONTIBON - SEDE A (ANEXO 1 REGISTRO FOTOGRÁFICO)




Se evidencia que se realizo los detalles correspondientes al ingreso del aula CRIL.



Se evidencia que se realizo los detalles correspondientes al ingreso del aula CRIL.



Se evidencia que se avanza en la limpieza de tuberia MT, tuberia de gas natural y canaleta.

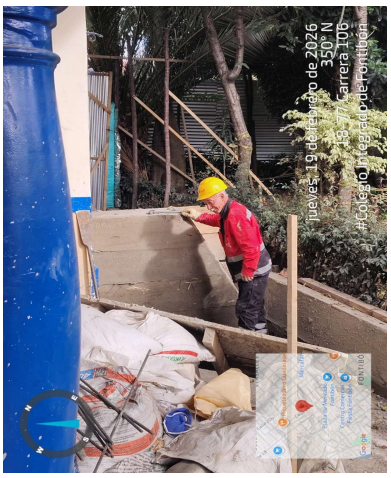

Se evidencia que se realiza el desencofrado de la zapata N°4.



Se evidencia que se avanza en la limpieza de canaleta.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 20 | **LOTE COP No 16**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


SEMANA No. 20 (Consecutivo) **DEL** 16/2/2026 (dd-mm-aa) **AL** 22/2/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 142 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

COLEGIO ANTONIO VAN UDEN - SEDE C (ANEXO 2 REGISTRO FOTOGRÁFICO)



Se evidencia que se esta realizando el enchape de muros en la bateria de baños, en el area de niños.

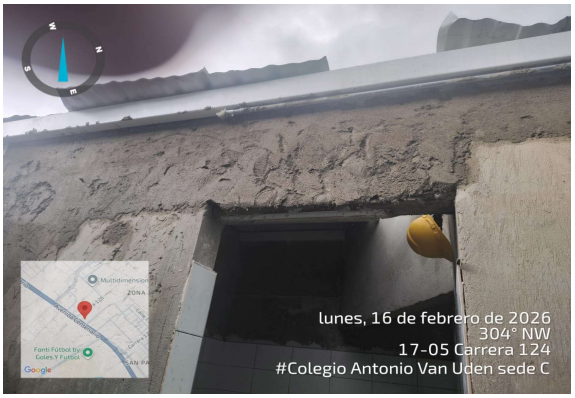

Se evidencia que se estan realizando actividades de pañete en el area de la bateria de baños, en los muros realizados de acuerdo a la nueva disposicion de esta.




Se evidencia que se esta realizando el pañete en el area de la bateria de baños, correspondiente al cuarto de servicios.



Se evidencia que finalizo la aplicación de la media caña en granito en la bateria de baños, en el area de niñas.



Se evidencia que el enchape de muros de la bateria de baños, area de niños en un 90%.

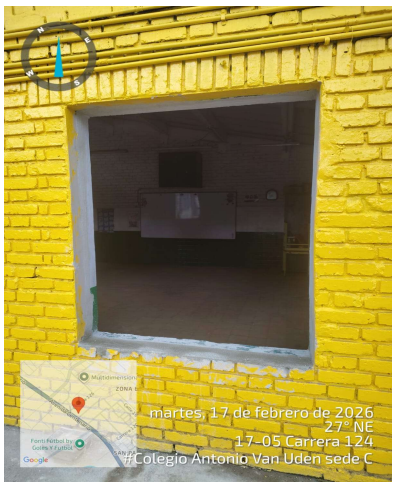

Se evidencia que se realiza el retiro de la ventanas del aula pendiente en el bloque alianza.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 20 **LOTE COP No 16**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 20 (Consecutivo) **DEL** 16/2/2026 (dd-mm-aa) **AL** 22/2/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 142 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

COLEGIO ANTONIO VAN UDEN - SEDE C (ANEXO 2 REGISTRO FOTOGRÁFICO)



Se evidencia que se realiza la instalacion de la baldosa del piso de la bateria de baños, correspondiente al area de profesores.



Se evidencia que se realiza el retiro de la ventanas del aula pendiente en el bloque alianza.



Se evidencia el avance del enchape de muros en la bateria de baños, area de baño de profesores.



Se evidencia que se esta realizando el dintel en la bateria de baños, correspondiente al vano de la puerta del cuarto de aseo.



Se evidencia que se realiza jornada de aseo en el area correspondiente a la biblioteca.



Se evidencia que se da inicio al revoque de muros, correpondiente al area de niños y niñas.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 20 | **LOTE COP No 16**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


SEMANA No. 20 (Consecutivo) **DEL** 16/2/2026 (dd-mm-aa) **AL** 22/2/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 142 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

COLEGIO ANTONIO VAN UDEN - SEDE C (ANEXO 2 REGISTRO FOTOGRÁFICO)



Se evidencia que se realiza la mediacaña en granito en la bateria de baños, correspondiente al area de profesores.

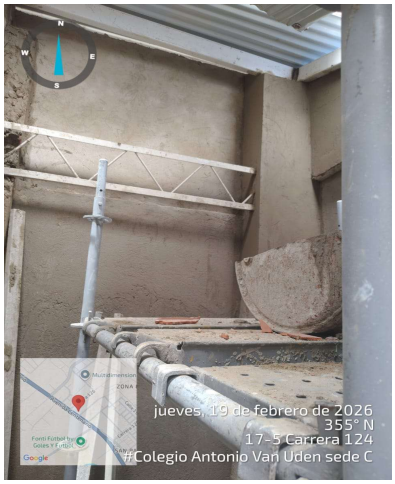

Se evidencia que se esta afinando el pañete correspondiente al cuarto de aseo, en la bateria de baños.



Se evidencia la finalizacion del enchape de muros y la mediacaña en granito correspondiente al baño de servicios generales.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 20 | **LOTE COP No 16**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


SEMANA No. 20 (Consecutivo) **DEL** 16/2/2026 (dd-mm-aa) **AL** 22/2/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 142 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

COLEGIO TECNICO INTERNACIONAL - SEDE A (ANEXO 3 REGISTRO FOTOGRÁFICO)




Se evidencia que se esta realizando la reparacion de los vanos correspondiente a las rejillas de ventilacion internamente de la segunda aula de las aulas multiples.

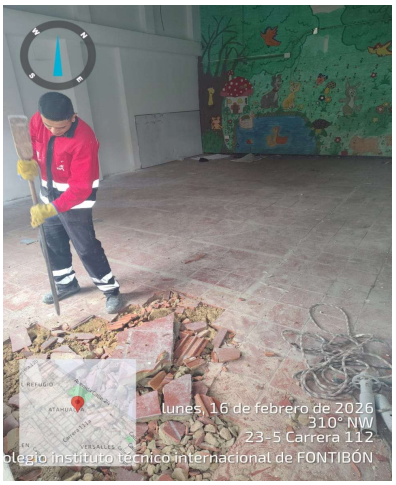

Se evidencia que se esta realizando en levantamiento del enchape de la segunda aula de las aulas multiples.




Se evidencia la demolicion y limpieza en su totalidad del un aula del aula multiple.

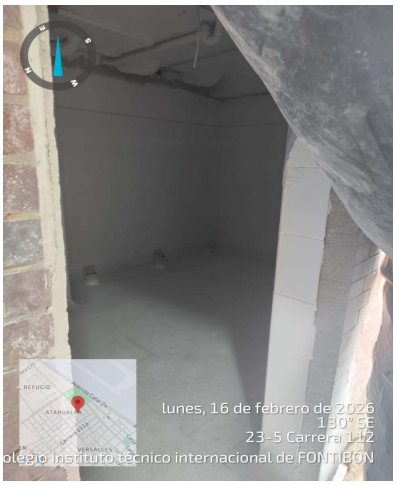

Se esta realizando el destroncado y pulido de la baldosa vibroprensada en la bateria de baños de primaria, area de niños.



Se evidencia que se realiza el detallado de la pintura en el area de la canal y la perfileria correspondiente a esta.

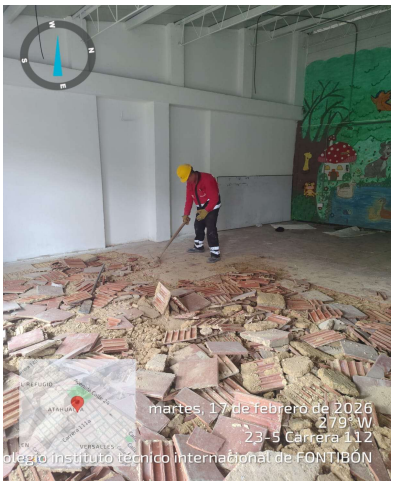

Se evidencia el avance en la demolicion del acabado de la segunda aula correspondiente al aula multiple.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 20 | **LOTE COP No 16**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 20 (Consecutivo) **DEL** 16/2/2026 (dd-mm-aa) **AL** 22/2/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 142 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

COLEGIO TECNICO INTERNACIONAL - SEDE A (ANEXO 3 REGISTRO FOTOGRÁFICO)



Se da inicio a la aplicación de la primera capa de pintura correspondiente a la fachada del aula multiple.



Se da inicio a la aplicación de la primera capa de pintura correspondiente a la fachada del aula multiple.



Se evidencia la finalizacion de la demolicion del enchape de la segunda aula, correspondiente al aula multiple.



Se evidencia que se realiza el detallado de la tuberia de ventilacion de la bateria de baños de bachillerato, area de mujeres.



Se evidencia que se realiza el remate de los detalles de la fachada del aula multiple.



Se da inicio a la aplicación de la primera capa de pintura correspondiente a la fachada del aula multiple.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 20 **LOTE COP No 16**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 20 (Consecutivo) **DEL** 16/2/2026 (dd-mm-aa) **AL** 22/2/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 142 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

COLEGIO TECNICO INTERNACIONAL - SEDE A (ANEXO 3 REGISTRO FOTOGRÁFICO)



Se realiza la conexión del codo correspondiente a la reventilacion de la bateria de baños, area de mujeres.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 20 **LOTE COP No 16**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 20 (Consecutivo) **DEL** 16/2/2026 (dd-mm-aa) **AL** 22/2/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 142 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

COLEGIO REPUBLICA DE VENEZUELA - SEDE B (ANEXO 4 REGISTRO FOTOGRÁFICO)



Ausencia de Malla para aro de baloncesto



Aplicación de pintura en muros.



Área de la cancha limpia y despejada, libre de materiales y residuos.



Area de la cancha.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 20 **LOTE COP No 16**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 20 (Consecutivo) **DEL** 16/2/2026 (dd-mm-aa) **AL** 22/2/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 142 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

COLEGIO MARCO ANTONIO CARREÑO - SEDE B (ANEXO 5 REGISTRO FOTOGRÁFICO)



Se realiza resane y estucado en el hall de la institución



Se inicia el enchapado del guardaescobas en el pasillo de la institución



AplicaciÓn del estuco impermeabliante para zonas humedas en el hall de la institución



Se está ejecutando la aplicación de boquilla en los guardaescobas de la totalidad del hall.



Aplicación de boquilla en los guardaescobas



Se realizan labores de desbastado para corregir desniveles e impurezas en la superficie del enchape.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 20 | **LOTE COP No 16**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 20 (Consecutivo) **DEL** 16/2/2026 (dd-mm-aa) **AL** 22/2/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 142 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

COLEGIO MARCO ANTONIO CARREÑO - SEDE B (ANEXO 5 REGISTRO FOTOGRÁFICO)



se realiza apliación de una capa de pintura blanca en el auditorio



Se planifica la ejecución del enchape y la colocación de baldosín en el área de laboratorio de la institución



Se realizó la llegada de material necesario para la ejecución de la obra



Se realizan labores de desbastado en los salones



Se hace la llegada de las puertas de los salones de la institcuión



Se realiza el lijado de los muros previamente estucados en los salones de la institución

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 20 | **LOTE COP No 16**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 20 (Consecutivo) **DEL** 16/2/2026 (dd-mm-aa) **AL** 22/2/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 142 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

COLEGIO JULIO GARAVITO ARMERO - SEDE B (ANEXO 6 REGISTRO FOTOGRÁFICO)




Se evidencia que se esta relizando la instalacion de perfileria, teniendo encuenta que ya se realizo la instalacion de



Se evidencia que se esta relizando la instalacion de perfileria, teniendo encuenta que ya se realizo la




Se evidencia que se esta realizando la instalacion de la perfileria en general.

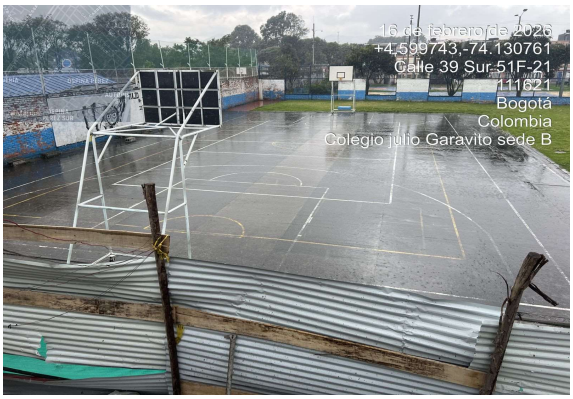

Lunes: Se detienen actividades por el alto nivel de lluvias y no es posible retomarlas en el transcurso del dia.



Se evidencia que se realizo jornada de orden y aseo en el area de acopio.

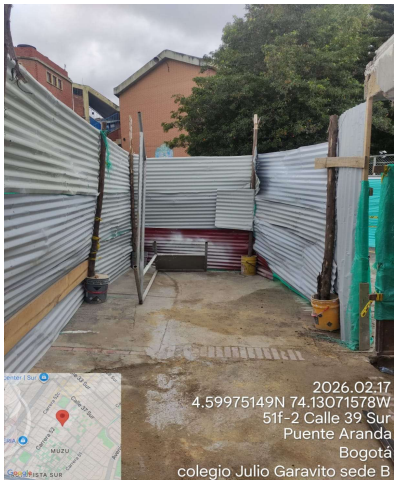

Se evidencia que se realizo jornada de orden y aseo en el area de acopio.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 20 **LOTE COP No 16**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 20 (Consecutivo) **DEL** 16/2/2026 (dd-mm-aa) **AL** 22/2/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 142 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

COLEGIO JULIO GARAVITO ARMERO - SEDE B (ANEXO 6 REGISTRO FOTOGRÁFICO)



Se evidencia que se presentan areas en la cuales no se han finalizado las actividades de pañete, se le realiza la recomendación al contratista.



Se evidencia que se presentan areas en la cuales no se han finalizado las actividades de pañete, se le realiza la recomendación al contratista.



Se evidencia que se realizo la instalacion de toda la perfileria, a la fecha presenta detalles en su instalacion en las intersecciones la cuales no ha sido finalizadas.



Se evidencia en la instalacion de la perfileria en ciertas intersecciones no se han realizado los punto de soldadura.



Se evidencia que se esta realizando la instalacion de la platinas correspondientes al hall de distribucion.



Se evidencia que se realizo la instalacion de platinas y perfileria del area de pagaduria.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 20 **LOTE COP No 16**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 20 (Consecutivo) **DEL** 16/2/2026 (dd-mm-aa) **AL** 22/2/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 142 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

COLEGIO JULIO GARAVITO ARMERO - SEDE B (ANEXO 6 REGISTRO FOTOGRÁFICO)



Se evidencia que se esta finalizando la actividade de pañete (Afinado) de ciertas areas pendientes.




Se observa que se realizo la instalacion de la perfileria en su totalidad correspondiente a la fachada y cubierta del hall de distribucion.



Se observa que se realizo la instalacion de la perfileria en su totalidad correspondiente a la fachada y cubierta del hall de distribucion.



Se evidencia la instalacion de platinas y la soldarura de perfiles correspondiente al hall de distribucion .

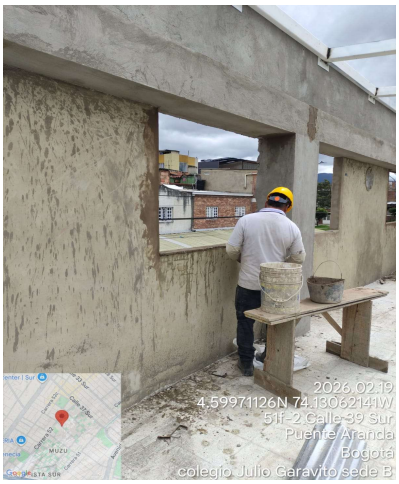

Se evidencia que se esta realizando la cintas de la ventaneria correspondiente a fachada principal.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 20 **LOTE COP No 16**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 20 (Consecutivo) **DEL** 16/2/2026 (dd-mm-aa) **AL** 22/2/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 142 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16


COLEGIO CULTURA POPULAR - SEDE C (ANEXO 7 REGISTRO FOTOGRÁFICO)



Se evidencia que se realiza el detallado de la pintura de lo marcos en el modulo de aulas administrativas correspondiente a la reparacion de estas.



Se evidencia que se realiza el detallado de la pintura de lo marcos en el modulo de aulas administrativas correspondiente a la reparacion de estas.

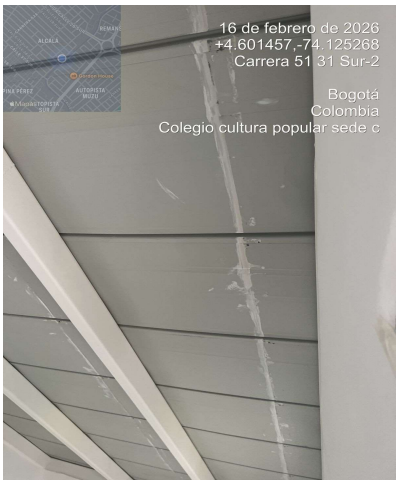


Se evidencian manchas de pintura en la cubierta del modulo de aulas administrativas que corresponden a la reinstalacion de la cubierta y la perfileria.



Se evidencia que se realiza la instalacion de los pie de amigos correspondiente a la canal del modulo de aulas administrativas.



Se evidencia que se realiza la instalacion de los pie de amigos correspondiente a la canal del modulo de aulas administrativas.

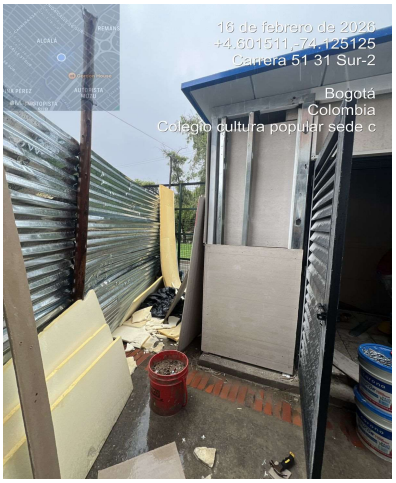

Se da inicio a la instalacion del superboard en fachada del shut de basuras.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 20 | **LOTE COP No 16**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 20 (Consecutivo) **DEL** 16/2/2026 (dd-mm-aa) **AL** 22/2/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 142 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

COLEGIO CULTURA POPULAR - SEDE C (ANEXO 7 REGISTRO FOTOGRÁFICO)



Se finaliza la instalacion de la baldosa vibroprensada del shut de basuras y se da inicio a la instalacion del enchape de muros.



Se evidencia que se realiza el detallado de la pintura de lo marcos en el modulo de aulas administrativas correspondiente a la reparacion de estas.



Se evidencia que se realiza el relleno del area que se regateo y excavo para realizar las conexiones hidrosanitarias e hidraulicas, esta pendiente la ejecucion de la bocapuerta y del cambio del enchape.



Se realiza la instalacion del acople de lavamanos correspondiente al baño de la garita de seguridad que se vio afectada en las ejecuciones.



Se observa que se realizo la instalacion de la baldosa vibroprensada correspondiente al baño de la garita de seguridad.



Se evidencian detalles en la cubierta tipo sandwich de los 04 modulos correspondiente a la reinstalacion de esta (Se observan manchas de pintura, abolladuras y orificios correspondiente a la instalacion de tornilleria)

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 20 **LOTE COP No 16**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 20 (Consecutivo) **DEL** 16/2/2026 (dd-mm-aa) **AL** 22/2/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 142 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

COLEGIO CULTURA POPULAR - SEDE C (ANEXO 7 REGISTRO FOTOGRÁFICO)




Se evidencia el avance del enchape de muro en el area del shut de basuras.



Se evidencia que se ejecuto en esta semana la instalacion del 90% de la tuberia MT y puntos electricos correspondientes a los 04 modulos.



Se evidencia que se realiza la instalacion de las laminas de superborad en su totalidad en la fachada correspondiente al shut de basuras.

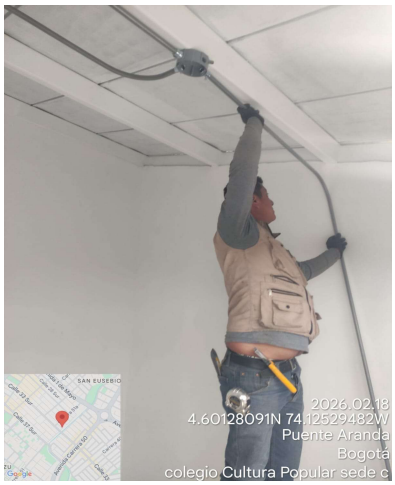

Se evidencia que se ejecuto en esta semana la instalacion del 90% de la tuberia MT y puntos electricos correspondientes a los 04 modulos.



Se evidencia que se esta realizando la reparacion de los detalles reportados correspondiente a la reinstalacion de la cubierta.



Se evidencia el avance del 90% del enchape de muros correspondiente al shut de basuras.
