PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8155097

INFORME SEMANAL No 21 **LOTE COP No 16**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 21 (Consecutivo) **DEL** 23/2/2026 (dd-mm-aa) **AL** 1/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 149 días

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORÍA


Contratista:	CONSORCIO EL MILAGROSO 2025	**Interventoria**	PROBINTEC S.A.S
RL del consorcio	RAFAEL MOGOLLÓN RODRÍGUEZ	**RL de Interventoria**	SANDRA STELLA MORENO BUITRAGO
Contrato No.	CO1.PCCNTR.8155097	**Contrato No.**	CO1.PCCNTR.8168931
Objeto	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS LOTE 16"	**Objeto**	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No. 6
Valor Inicial :	$ 2.455.237.837,00	**Valor Inicial:**	$ 796.278.928,00
AIU	33,88% $ 831.834.579,18	**Valor Adicional No. 1 del 26 de diciembre de 2026:**	$ 139.026.666,00
COSTO DIRECTO	$ 1.623.403.257,82	**Valor Total del Contrato:**	$ 935.305.594,00
OFERTADO	$ 2.333.628.557,00		
EMERGENCIAS	$ 100.000.000,00		
VALOR PARCIAL CON EMERGENCIAS	$ 2.433.628.557,00		
DIFERENCIA PARA EMERGENCIAS	$ 21.609.280,00		
Valor Parcial (Inicial + Emergencias)	$ 121.609.280,00		
Valor adicional No. 1:	$ 380.000.000,00		
Valor inicial No. 1 emergencias:	$ 200.000.000,00		
Valor adicional No.1 Obras Contractuales:	$ 180.000.000,00		
VALOR TOTAL INICIAL MAS EMERGENCIA	$ 2.835.237.837,00		
VALOR TOTAL EMERGENCIAS	$ 321.609.280,00		
VALOR TOTAL PARA OBRAS CONTRACTUALES	$ 2.513.628.557,00		
Plazo Inicial:	SIETE (7) MESES	**Plazo Inicial:**	SIETE (7) MESES
Fecha de Iniciación:	03/10/2025	**Fecha de Iniciación:**	03/10/2025
Fecha de Vencimiento:	02/05/2026	**Fecha de Vencimiento:**	02/05/2026

AVANCE DEL CONTRATO

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	5,38%	63,95%	Obra Física Ejecutada (%)	2,07%	70,43%
Valor de la Obra programada:	$ 132.126.870,46	$ 1.570.159.671,59	Valor de la Obra Ejecutada:	$ 50.788.348,40	$ 1.729.188.933,77

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONTRATO

	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	58,57%	68,36%	6,48%
Durante el periodo	5,38%	2,07%	
Acumulado actual	63,95%	70,43%	

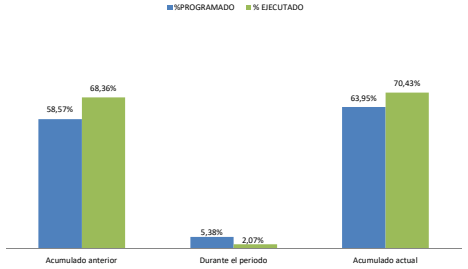

CPF	LOCALIDAD	COLEGIO	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA	%PROGRAMADO ACUMULADO	%EJECUTADO ACUMULADO	%DIFERENCIA ACUMULADO
915	FONTIBON	INTEGRADO DE FONTIBON - SEDE A	18,23%	2,34%	-15,89%	100,00%	95,76%	-4,24%
920	FONTIBON	ANTONIO VAN UDEN - SEDE C	3,96%	3,94%	-0,02%	42,33%	67,02%	24,69%
901	FONTIBON	INSTITUTO TECNICO INTERNACIONAL . SEDE A	4,00%	4,02%	0,02%	55,31%	70,44%	15,13%
1408	LOS MARTIRES	REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA - SEDE B	4,23%	0,15%	-4,08%	62,88%	48,14%	-14,74%
1632	PUENTE ARANDA	MARCO ANTONIO CARREÑO SILVA - SEDE B	2,75%	0,03%	-2,72%	36,41%	64,19%	27,78%
1614	PUENTE ARANDA	JULIO ARMERO GARAVITO - SEDE B	3,51%	3,65%	0,14%	46,12%	72,91%	26,79%
1603	PUENTE ARANDA	CULTURA POPULAR - SEDE C	0,99%	0,35%	-0,64%	100,00%	98,50%	-1,50%
			5,38%	2,07%	-3,31%	63,29%	73,85%	10,56%

EMERGENCIAS Y/O OBRAS PRIORITARIAS

CPF	LOCALIDAD	COLEGIO	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA	VALOR TOTAL	VALOR CONTRATO	DIFERENCIA
1616	PUENTE ARANDA	SILVERIA ESPINOSA DE RENDON - SEDE A	0,00%	100,00%	100,00%	$ 8.789.206,00	$ 8.789.206,00	$ -
1609	PUENTE ARANDA	SILVERIA ESPINOSA DE RENDON - SEDE B	0,00%	100,00%	100,00%	$ 17.578.413,00	$ 17.578.413,00	$ -
1612	PUENTE ARANDA	EL JAZMIN - SEDE B	0,00%	100,00%	100,00%	$ 1.953.157,00	$ 1.953.157,00	$ -
914	FONTIBON	RODRIGO ARENAS BETANCOURT - SEDE A	0,00%	100,00%	100,00%	$ 1.953.157,00	$ 1.953.157,00	$ -
909	FONTIBON	VILLEMAR EL CARMEN - SEDE B	0,00%	100,00%	100,00%	$ 1.953.157,00	$ 1.953.157,00	$ -
915	FONTIBON	INTEGRADO DE FONTIBON - SEDE A	0,00%	100,00%	100,00%	$ 1.953.157,00	$ 1.953.157,00	$ -
929	FONTIBON	MARIA JOSEFA CANELONES - SEDE A	0,00%	0,00%	0,00%	$ 10.000.000,00	$ -	$ 10.000.000,00
909	FONTIBON	VILLEMAR EL CARMEN - SEDE B	0,00%	100,00%	100,00%	$ 35.000.000,00	$ -	$ 35.000.000,00
					87,50%	$ 79.180.247,00	$ 321.609.280,00	$ (242.429.033,00)

AVANCE FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$ 2.455.237.837,34
VALOR PARCIAL 1	$ 88.202.201,00	
VALOR PARCIAL 2	$ 500.169.705,00	
VALOR PARCIAL 3	$ 521.807.681,00	
TOTAL VALOR FACTURADO	$ 1.110.179.587,00	
SUMAS IGUALES	$ 1.345.058.250,34	$ 1.345.058.250,34


INDICADOR FINANCIERO	VALOR FACTURADO	VALOR PAGADO
	$ 1.110.179.587,00	$ 1.110.179.587,00

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

INDICADOR TECNICO	% DE AVANCE PROGRAMADO	% DE AVANCE EJECUTADO	% RETRASO - % ADELANTO +
	63,95%	70,43%	6,48%

INDICADOR TIEMPO	DIAS	RETRASO
	149	10

CURVA S

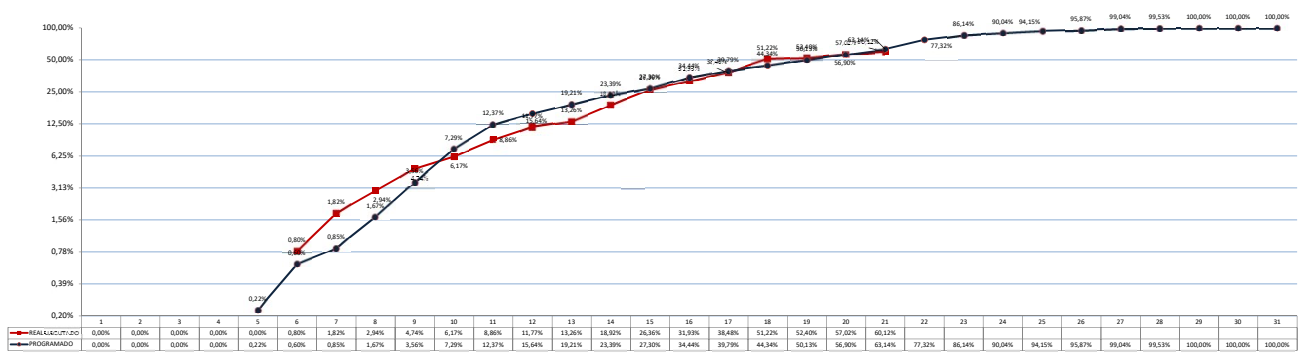

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
REAL/EJECUTADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,80%	1,82%	2,94%	4,74%	6,17%	8,86%	11,77%	13,26%	18,92%	26,36%	31,93%	38,48%	51,22%	52,40%	57,02%	60,12%										
PROGRAMADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,22%	0,60%	0,85%	1,67%	3,56%	7,29%	12,37%	15,64%	19,21%	23,39%	27,30%	34,44%	39,79%	44,34%	50,13%	56,90%	63,14%	77,32%	86,14%	90,04%	94,15%	95,87%	99,04%	99,53%	100,00%	100,00%	100,00%

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8155097

INFORME SEMANAL No 21 **LOTE COP No 16**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 21 (Consecutivo) **DEL** 23/2/2026 (dd-mm-aa) **AL** 1/3/2026 (dd-mm-aa)

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 149 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO INTEGRADO DE FONTIBON - SEDE A (ANEXO 1 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades tecnicas: Se evidencian los siguientes avances en las dos áreas intervenidas:
- Sala CRIL: Se finalizaron las actividades de detalles, acabados y aseo fino del área. La entrega formal se realizó el lunes 23 de febrero de 2026; por parte de la institución se hizo el recibimiento y se dejó un listado con recomendaciones y requerimientos, a los cuales se indicó que se daría respuesta vía correo electrónico.
- La Casona: Se derivaron las bajantes de aguas lluvias de la canal hacia el cárcamo. Se rellenaron las zonas pendientes y se instaló malla electrosoldada para proceder con la fundición de la placa de contrapiso, dándole el acabado afinado definido para el andén del área, de acuerdo con lo acordado el viernes 13 de febrero.
2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se avanzó en la instalación y conexión de bajantes y canaletas al cárcamo de aguas residuales, ejecutando la colocación de tubería de conexión bajo placa de cemento y la instalación de malla metálica entre zapatas. De igual manera, se realizaron actividades de nivelación de terreno y preparación de mezcla de concreto (cemento, arena y gravilla) para el desarrollo de las obras correspondientes. Se validó en sitio la presencia de personal previamente aprobado por la interventoría, así como el uso adecuado de EPP acordes a las actividades ejecutadas.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: A la fecha, la institución presenta un avance físico del 2,34% en la ejecución de las actividades programadas, frente a un valor esperado del 28,92 % para el periodo evaluado. Esto refleja un desarrollo inferior de un 26,58 % , esto debido que la programacion planteada por parte del contratista se observa que se finalizo y a la fecha no se ha terminado la ejecucion de las actividades.

4.1. Actividades programadas NO ejecutadas: Se observa que la programacion establecida a la fecha se cumplio y las actividades no han sido finalizadas, de acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta que las actividades de la casona son las unicas pendientes se debe presentar un plan de accion para la ejecucion de estas.

4.2. Actividades EJECUTADAS a la fecha: N/A

5. Generales: Durante la entrega estuvieron presentes el apoyo a la supervisión, el gestor territorial de la localidad de Fontibón, el residente de obra, la residente e inspectora de interventoría, y por parte de la institución el rector, la profesora encargada del aula y el almacenista. Se remitió respuesta formal a la directora de interventoría y al apoyo a la supervisión para su aprobación; a la fecha no se ha recibido respuesta, igualmente se solicitaron correcciones adicionales por parte del apoyo a la supervisión: instalación de 03 tapaciegas en cajas eléctricas sin sellar, ajuste de una canaleta y ajuste de ciertas láminas de la cubierta tipo sándwich. Estas actividades se ejecutaron, se registraron fotográficamente y se entregaron las evidencias a la institución.

6. Ambiental: se realizó recorrido en el frente, se reportó la disposición de parte de residuos, al igual se sigue evidenciando materiales de construcción y residuos que está cerca de las zonas verdes y a unos individuos arbóreos, por lo que se recomienda realizar la disposición total del material, garantizar jornadas de orden y aseo periódicamente e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA).

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO ANTONIO VAN UDEN - SEDE C (ANEXO 2 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: A la fecha, la ejecución de las actividades en la institución se presenta así:
- Batería de baños: Se ejecutaron múltiples actividades vinculadas a la finalización del pañete en el cuarto de aseo y el área del lavatraperos. Con esto se avanzó en las labores de enchape, tanto en los espacios mencionados como en la fachada donde se instalarán los lavamanos.
- Biblioteca: Al inicio de la semana no se observó avance significativo; posteriormente se aplicó recubrimiento tipo dry-wall en la canal y se realizaron trabajos de fondeo en la fachada principal, preparándola para pintura.
- Bloque Alianza: Se completó el remate general de la fachada en los vanos de las ventanas retiradas semanas anteriores; actualmente se espera la llegada de los elementos pendientes. Paralelamente, y según autorizaciones previas, se instaló la película samblasting en la fachada de la portería y en las aulas infantiles.
- Bloque Amarillo (aulas infantiles): Se instaló, conforme a lo autorizado, la película samblasting en el aula que se encuentra en uso.
2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenció la ejecución de actividades correspondientes al enchapado del último baño, específicamente el sellado de los espacios entre baldosas con cemento blanco. En la verificación realizada en campo se constató la presencia de 3 trabajadores debidamente aprobados por la interventoría, quienes ejecutaban las labores con la dotación y los EPP adecuados para este tipo de actividad.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: A la fecha, la institución presenta un avance físico del 3,94 % en la ejecución de las actividades, frente a un valor esperado del 3,96 % para el periodo evaluado. Esto refleja un desarrollo inferior de un 0,02 % , este minimo valor se debe a un tema de ejecucion de cantidades esperadas.

4.1. Actividades programadas NO ejecutadas: N/A

4.2. Actividades EJECUTADAS a la fecha: N/A

5. Generales: N/A

6. Ambiental: Se verifico el cerramiento en buen estado, se reportó la disposición de parte de los residuos, se evidencian materiales de construcción y RCDs generados por las demoliciones acopiados y debidamente en lonas en menor cantidad, por lo que se recomienda garantizar jornadas de orden y aseo periódicamente y realizar la disposición adecuadamente el material posteriormente respecto a las especificaciones técnicas y ambientales.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO TECNICO INTERNACIONAL - SEDE A (ANEXO 3 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Durante la semana se ejecutaron actividades por frentes de trabajo al interior de la institución educativa, conforme se detalla a continuación:
- Batería de baños – Bachillerato: Se realizó la instalación de la perfilería metálica correspondiente a la estructura del cielo raso en PVC, la cual fue dispuesta a una distancia de 5 cm de la placa de entrepiso. Esta actividad presenta un avance aproximado del 90%.
- Batería de baños – Primaria: Se ejecutaron los filos en los vanos correspondientes a los accesos a las áreas de niños y niñas, así como en el vano para la instalación de la puerta del cuarto de aseo. De igual manera, se dio inicio a la instalación de la perfilería metálica para la estructura del cielo raso en PVC, actividad que a la fecha registra un avance poco significativo.
- Aula múltiple: Al interior se desarrollaron actividades relacionadas con el cambio de pisos, incluyendo la ejecución del cargue y nivelación en su totalidad. Se reporta la finalización de una de las aulas y de la bodega, así como un avance del 50% en la segunda aula en cuanto a la instalación del enchape. En el área exterior se adelantaron labores de pintura en la fachada.
2. Seguridad social y SST: Durante el periodo reportado se evidenció la ejecución de actividades correspondientes a la instalación de cielo raso en PVC en el bloque de primaria. Como acción correctiva inmediata, dichos trabajadores fueron retirados de la obra el miércoles 25 de febrero 2026, dejando la respectiva observación para control y verificación por parte del contratista. Como actividad de apoyo, el jueves a las 9:00 a.m. se dio inicio a labores de limpieza en los baños portátiles, con el fin de mejorar las condiciones de higiene del área destinada a servicios temporales, evidenciando mejora en el orden y salubridad del espacio.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: A la fecha, la institución presenta un avance físico del 4,02 % en la ejecución de las actividades, frente a un avance esperado del 4,00 % para el periodo evaluado. Esto representa una desviación positiva del 0,02 % , debido al desarrollo mínimo pero superior de cantidades en ciertas actividades.

4.1. Actividades programadas NO ejecutadas: N/A

4.2. Actividades EJECUTADAS a la fecha: N/A

5. Generales: Durante la semana fue necesario realizar un llamado de atención y el retiro de personal, debido a que algunos trabajadores no se encontraban incluidos en el listado de personal autorizado para la ejecución de actividades. En consecuencia, se solicitó al contratista el envío de la documentación correspondiente al responsable de SST de la interventoría, la cual fue remitida el día viernes. Esta situación generó retrasos en la actividad de instalación de cielos rasos.

6. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, Se verifico el cerramiento en buen estado, se evidencia material de construcción y RCD (Volumen medio) acopiados, sin afectación a sumideros, se recomendo al contratista realizar jornadas de orden y aseo periódicamente al igual que implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA).

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO REPUBLICA DE VENEZUELA - SEDE B (ANEXO 4 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Durante el periodo evaluado no se ejecutaron actividades constructivas representativas. Únicamente se realizó bajante de agua lluvia al piso, queda pendiente la conexión con caja.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se realizó el anclaje de la bajante al muro, conforme a la programación establecida. Durante este mismo periodo no se ejecutaron actividades en cubierta; en consecuencia, no fue necesario tramitar permisos de trabajo en alturas ni realizar inspecciones de los EPCC. Así mismo, se evidenció que el personal encargado de la ejecución de las actividades se encuentra debidamente aprobado por la interventoría, en cumplimiento de los procedimientos establecidos para el ingreso y permanencia en obra.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: A la fecha, la institución presenta un avance físico del **48.14%** en la ejecución de las actividades, frente a un avance esperado del **63.07 %** para el periodo evaluado. Esto representa una desviación negativa del **14.93%**, donde se evidencia que se han realizado actividades no programadas correspondientes al desarrollo de la reparacion y la pintura del punto fijo.

4.1. Actividades programadas NO ejecutadas:
- PINTURA EXTERIOR DFE ALTA RESISTENCIA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)
- PINTURA EXTERIOR DE ALTA RESISTENCIA A TRES MANOS (A 0.6M, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS
- EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)
- SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI
- DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE ADOQUÍN
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)

4.2. Actividades EJECUTADAS a la fecha: N/A

5. Generales: Durante la semana se realizó visita técnica con el ingeniero de apoyo a la supervisión, la dirección de interventoría y los residentes de obra e interventoría. En el recorrido se revisó el alcance de las emergencias, posibles ítems de pintura para balance y las intervenciones generales requeridas, especialmente en baños por presencia de humedades y en fachada. Asimismo, se evaluo la necesidad de una bajante y el estado de las canchas; evidenciando que los arcos no cuentan con malla y no tienen aplicacion de anticorrosivo.

6. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, no se encuentran acopios de residuos ni material, al igual se recomendó al contratista si realiza actividades implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA)

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO MARCO ANTONIO CARREÑO - SEDE B (ANEXO 5 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Durante el periodo reportado se ejecutaron las siguientes actividades:
- Ejecución de trabajos de enchape de piso y guardaescobas
- Demolición de enchape
- Lijado y alistamiento de muros.
- Resane y tratamiento de superficies.
- Instalación de puertas.
- Jornada de aseo en áreas intervenidas.
2. Seguridad social y SST: Durante la semana se ejecutaron actividades de demolición en el área del auditorio y trabajos de soldadura en las puertas del hall de salida. En el marco del seguimiento realizado por la interventoría, se verificó el diligenciamiento de los permisos de trabajo en caliente correspondientes a las labores de soldadura, así como el adecuado uso de los EPP requeridos para este tipo de actividad. De igual manera, se validó el diligenciamiento de los ATS, conforme a las tareas desarrolladas. Se recomienda al contratista gestionar de manera oportuna la evacuación de los escombros acumulados en los salones y en el área de cerramiento, con el fin de liberar espacios de trabajo y circulación. Lo anterior, con el propósito de mantener adecuadas condiciones de orden y aseo en obra, prevenir la ocurrencia de incidentes y garantizar un entorno seguro tanto para el personal operativo como para la comunidad educativa.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: A la fecha, la institución presenta un avance físico del **64.16 %** en la ejecución de las actividades, frente a un avance esperado del **33.53 %** para el periodo evaluado. Esto representa una desviación positiva del **30.63 %**, donde se evidencia que se han realizado actividades no programadas.

4.1. Actividades programadas NO ejecutadas: N/A

4.2. Actividades EJECUTADAS a la fecha: Se deja constancia de que el contratista ha ejecutado actividades que no se encuentran contempladas en la programación contractual y que, por tanto, no aportan al porcentaje de avance. Entre ellas se incluyen avances en enchape, aplicación de pañete, retiro de enchape en muros y piso,aplicacion de estuco, enchape de guardaerscobas, puertas y la desconexión de veinte (20) puntos eléctricos, actividad no contractual. En consecuencia, se requiere que estos ítems sean revisados y ajustados en la programación correspondiente al balance

5. Generales: En el comité realizado durante la semana, y conforme a lo definido por el equipo técnico, se aprobaron las siguientes actividades:
- Enchape en el área inferior de los mesones del laboratorio.
- Aplicación de pintura en las gavetas del laboratorio.
- Retiro del enchape existente en el piso del pasillo y en dos aulas, con el fin de unificar el acabado.
- Se encontro bajo el piso de auditorio otro enchape, el cual se tuvo que demoler de igual manera para posterior instalacion correcta de piso

6. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, cuenta con el cerramiento adecuado en el frente, se acopiaron adecuadamente los RCD posteriormente se registró la disposición de parte de estos residuos, se recomienda garantizar jornadas de orden y aseo periódicamente, disponer adecuadamente todos los residuos al igual se recomendo al contratista implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA).

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO JULIO GARAVITO ARMERO - SEDE B (ANEXO 6 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Durante la semana se ejecutaron actividades por frentes de trabajo al interior de la institución educativa, conforme se detalla a continuación:
- Oficinas administrativas: Se desarrollaron actividades relacionadas con la estructura metálica de cubierta en las áreas del hall de distribución, oficinas administrativas y pagaduría, ejecutándose los cordones de soldadura en las intersecciones y la aplicación de pintura en su totalidad. En el área de coordinación se finalizó la viga corona y el pañete de las cuchillas, lo cual permitió la posterior instalación de las platinas para la perfilería.
De igual manera, se realizaron actividades en la canal correspondiente al hall de distribución, ejecutando la unión de tramos mediante cordones de soldadura interna y la aplicación de pintura en su totalidad, quedando lista para su instalación en el área indicada.
Se adelantaron actividades de pañete en el área de la escalera; no obstante, se evidencia que se encuentra pendiente el afinado final de esta superficie.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se realizó inspección técnica, evidenciando la culminación de la soldadura de los cordones de amarre entre perfiles, así como la aplicación de una capa de pintura sobre los perfiles intervenidos. En la verificación en campo se constató la presencia de 2 soldadores e instaladores del área operativa, debidamente aprobados por la interventoría, quienes ejecutaban las actividades con los EPP acordes a labores de soldadura. De igual manera, se validó el diligenciamiento de los permisos de trabajo en caliente correspondientes a las actividades desarrolladas, en cumplimiento de los lineamientos SST.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: A la fecha, la institución presenta un avance físico del 3,65 % en la ejecución de las actividades, frente a un avance esperado del 3,51 % para el periodo evaluado. Esto representa una desviación positiva del 0,14 % , en referencia a actividades en mayores cantidades.

4.1. Actividades programadas NO ejecutadas: N/A

4.2. Actividades EJECUTADAS a la fecha: N/A

5. Generales: Se informa que las actividades presentaron afectaciones debido a condiciones climáticas adversas, lo cual impactó el desarrollo normal de las mismas.
Durante la semana, el apoyo a la supervisión y la directora de interventoría realizaron visita a la institución, en la cual se autorizó la intervención de pintura de las puertas del primer nivel con el fin de generar uniformidad, definiéndose el color negro para que armonice con las puertas del nivel superior. Asimismo, se observaron detalles de remate, solicitando al contratista su respectiva atención y corrección.
Se realizó llamado de atención respecto al cerramiento, ya que se evidenció afectación en una de las láminas, solicitando su pronta reparación.
Finalmente, durante la instalación de la canal en el área de coordinación, se observó la presencia de una luminaria que interfería con la actividad. Por instrucción del apoyo a la supervisión, se solicitó su retiro temporal y posterior reubicación una vez finalizada la instalación autorizada.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA **CO1.PCCNTR.8155097**

INFORME SEMANAL No.21 **LOTE COP No.16**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 21 (Consecutivo) **DEL** 23/2/2026 (dd-mm-aa) **AL** 1/3/2026 (dd-mm-aa)

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 149 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato)

LOTE COP: 16

6. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, se verifica que la mezcla de concreto se realiza en batea metálica, se reporta ingreso de material, los cuales fueron acopiados adecuadamente, se recomienda garantizar jornadas de orden y aseo periódicamente al igual que implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA).

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO CULTURA POPULAR - SEDE C (ANEXO 7 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Durante la semana se ejecutaron actividades por frentes de trabajo al interior de la institución educativa, conforme se detalla a continuación:
- Cuatro (04) módulos – Oficinas administrativas: Se evidenció la finalización de las actividades eléctricas que se encontraban pendientes. Asimismo, se registró avance en los trabajos de acabados, específicamente en pintura e instalación de enchape. En el área exterior se culminaron los detalles del bordillo, el cual fue rematado con gravilla.
- Shut de basuras: Se evidenció la finalización de las actividades eléctricas, así como de la pintura exterior correspondiente a la fachada y la bajante de aguas lluvias. De igual manera, se desarrollaron las cuatro (04) rampas previstas para el recorrido y disposición final de los residuos.
No obstante, se encuentran pendientes las actividades relacionadas con la ejecución de la media caña y la terminación del piso. En cuanto al cielo raso, se realizó la instalación de la perfilería y el recubrimiento con láminas de superboard, finalizando los remates necesarios para la posterior instalación de los elementos eléctricos.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se realizó llamado de atención al personal que se encontraba ejecutando actividades en las instalaciones de la IED, recordando la prohibición de fumar dentro del colegio, en cumplimiento de las normas internas y lineamientos de SST. Se dejó la respectiva anotación en bitácora, consignando el nombre y número de cédula de la persona involucrada, como medida de control y seguimiento por parte de la interventoría. Así mismo, se informa que este frente de obra se encuentra previsto para su entrega dentro del presente periodo reportado.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: A la fecha, la institución presenta un avance físico del 0,35 % en la ejecución de las actividades programadas, frente a un valor esperado del 0,99 % para el periodo evaluado. Esto refleja un desarrollo inferior de un 0,64 % , se informa que este porcentaje se desarrolla de esta manera debido que a la fecha esta institucion ya deberia estar finalizada, de acuerdo a esto no se presentara ningun sobre avance de las actividades proximas a ejecutar.

4.1. Actividades programadas NO ejecutadas: Se evidencia que las actividades que no presentan desarrollo de actividades hacen referencia a la programacion en general, teniendo esto en cuenta y que a la fecha la programacion de la institucion deberia haberse finalizado se solicito la presentacion de un plan de emergencia para la finalizacion de la institucion.

4.2. Actividades EJECUTADAS a la fecha: N/A

5. Generales: Se informa que la entrega de la institución quedó programada para el 04 de marzo de 2026. En este sentido, se coordinó con el residente de obra una revisión previa con el fin de realizar pruebas y evidenciar detalles que requieren atención prioritaria, los cuales deberán ser subsanados a más tardar el lunes 02 de marzo.

6. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, Se evidencia una unidad sanitaria, se cuenta con el cerramiento adecuado, se encuentra un volumen medio de residuos por lo que se recomienda al contratista que al finalizar las actividades se debe garantizar que el frente quede ordenado, limpio y sin residuos.

FIRMAS

ARQ. LORENA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
DIRECTORA DE INTERVENTORIA

ARQ. NELLY NATALIA MORA LA ROTTA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ING. LUIS EMIRO BLANCO MORENO
APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

ING. KATHERINE CAROLINA NUÑEZ OSORIO
PROFESIONAL SST

ING. CHRISTIAN FELIPE RODRIGUEZ
PROFESIONAL AMBIENTAL

ING. CRISTIAN BARRERA DONCELL
PROFESIONAL COSTOS Y PRESUPUESTOS

ING. GERMÁN ADOLFO NIVIA QUINTERO
PROFESIONAL ELECTRICO

ING. ROBINSON VILLAMIL ROJAS
PROFESIONAL HIDRAULICO

ING. DIEGO FERNANDO OLARTE DIAZ
PROFESIONAL ESTRUCTURAL

FECHA:	02/03/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	INFORME APOYO A LA SUPERVISION
DIAS RESTANTES	69 Dias		GRUPO 16
ESTADO GENERAL DEL PROYECTO			
CORTE DEL INFORME:	CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2025	
22 de febrero de 2026	CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:	PROBINTEC S.A.S	

FECHAS		
DATOS:	INTERVENTORIA	OBRA
CONTRATO	CO1.PCCNTR.8168931	CO1.PCCNTR.8155097
INICIO	3 de octubre de 2025	3 de octubre de 2025
TERMINACION INICIAL	2 de mayo de 2026	2 de mayo de 2026
TERMINACION FINAL	2 de mayo de 2026	2 de mayo de 2026

PLAZOS EN DIAS		
ETAPA:	INTERVENTORIA	OBRA
INICIAL	211	211
SUSPENSIONES		
PRÓRROGAS		
TOTAL	211	211

VALOR CONTRATO		
ETAPA:	INTERVENTORIA	OBRA
INICIAL	$ 796.278.928,00	$ 2.455.237.837,00
ADICIONES	$ 139.026.666,00	$ 380.000.000,00
TOTAL	$ 935.305.594,00	$ 2.835.237.837,00

MODIFICACIONESDEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

MOD No	FECHA DE LA MODIFICACION	VALOR ADICION	PRORROGA	OTRO ASPECTO
1	26/12/2025	$ 139.026.666,00		
2				
3				
4				

MODIFICACIONESDEL CONTRATO DE OBRA

MOD No	FECHA DE LA MODIFICACION	VALOR ADICION	PRORROGA	OTRO ASPECTO
1	12/12/2025	$ 380.000.000,00		
2				
3				
4				

POLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORIA — GARANTE: SEGUROS DEL ESTADO

POLIZA	CUMPLIMIENTO DESDE	CUMPLIMIENTO HASTA	CALIDAD DEL SERVICIO DESDE	CALIDAD DEL SERVICIO HASTA	SALARIOS Y PRESTACIONES DESDE	SALARIOS Y PRESTACIONES HASTA
400 47 994000110040	19 9 2025	3 1 2027	3 5 2026	3 5 2031	19 9 2025	3 5 2029

POLIZAS CONTRATO DE OBRA — COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

POLIZA	CUMPLIMIENTO DESDE	CUMPLIMIENTO HASTA	SALARIOS Y PRESTACIONES DESDE	SALARIOS Y PRESTACIONES HASTA	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA DESDE	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA HASTA	POLIZA	RESPONSABILIDAD CIVIL DESDE	RESPONSABILIDAD CIVIL HASTA

CÓ	COLEGIO	LOCALIDAD	SEDE	NOMBRE SEDE	AVANCE ANTERIOR	AVANCE ACTUAL (01/03/2026)	PROGR %	EJECUTADO VS PROG	Vlr FRENTE APROBADO	Vlr FRENTE A ESTE PERIODO	FECHA INICIO CRONOGRAMA	FECHA FIN CRONOGRAMA	jul-2025	jul-2025	ago-2025	ago-2025	sep-2025	sep-2025	oct-2025	oct-2025	nov-2025	dic-2025	dic-2025	ene-2026	ene-2026	feb-2026	feb-2026	mar-2026	mar-2026
915	INTEGRADO DE FONTIBÓN	FONTIBÓN	A	INTEGRADO DE FONTIBÓN	93,04%	95,76%	-2,72%		$ 149.356.686,19	$ 68.516.715,63	05/11/2025	27/02/2026																	
920	ANTONIO VAN UDEN	FONTIBÓN	C	SAN VICENTE	57,91%	67,02%	-9,11%		$ 490.905.466,84	$ 148.872.531,50	18/11/2025	13/04/2026																	
901	INSTITUTO TÉCNICO INTERNACIONAL	FONTIBÓN	A	INSTITUTO TÉCNICO INTERNACIONAL	61,48%	70,44%	-8,96%		$ 506.491.008,39	$ 185.980.389,67	06/11/2025	01/04/2026																	
1408	COLEGIO REPUBLICA BOLIVARIANA DE	LOS MÁRTIRES	B	SAMPER MENDOZA	47,98%	48,14%	-0,16%		$ 222.333.302,02	$ 95.891.221,84	24/11/2025	18/04/2026																	
1632	MARCO ANTONIO CARREÑO SILVA (IED)	PUENTE ARANDA	B	MARCO ANTONIO CARREÑO SILVA	63,28%	64,19%	-0,91%		$ 449.716.114,81	$ 82.663.507,58	06/11/2025	01/04/2026																	
1614	JULIO GARAVITO ARMERO (IED)	PUENTE ARANDA	B	MUZU No. 1	32,34%	72,91%	-40,57%		$ 215.764.375,07	$ 36.438.122,74	21/11/2025	11/05/2026																	
1603	CULTURA POPULAR (IED)	PUENTE ARANDA	C	DIEGO LUIS CORDOBA	66,64%	98,50%	-31,86%		$ 196.253.062,23	$ 47.667.255,85	13/11/2025	24/01/2026																	
TOTAL FRENTES DE OBRA						73,85%	-7,25%		$ 2.131.822.015,46	$ 667.219.745																		
EMERGENCIAS ATENDIDAS DURANTE EL PERIODO																												
1616	SILVERIA ESPINOSA DE RENDON (IED)	PUENTE ARANDA	B	RAFAEL POMBO		100,00%	100,00%		$ 8.789.206,00	$ 8.789.206,00																		
1609	SILVERIA ESPINOSA DE RENDON (IED)	PUENTE ARANDA	A	SILVERIA ESPINOSA DE RENDON		100,00%	100,00%		$ 17.578.413,00	$ 17.578.413,00																		
1612	EL JAZMIN (IED)	PUENTE ARANDA	B	LA PRIMAVERA		100,00%	100,00%		$ 1.953.157,00	$ 1.953.157,00																		
914	RODRIGO ARENAS BETANCOURT	FONTIBÓN	A	SIMÓN BOLIVAR		100,00%	100,00%		$ 1.953.157,00	$ 1.953.157,00																		
909	VILLEMAR EL CARMEN	FONTIBÓN	B	SANTA CECILIA		100,00%	100,00%		$ 1.953.157,00	$ 1.953.157,00																		
915	INTEGRADO DE FONTIBÓN	FONTIBÓN	A	INTEGRADO DE FONTIBÓN		100,00%	100,00%		$ 1.953.157,00	$ 1.953.157,00																		
929	MARIA JOSEFA CANELONES	FONTIBÓN	A	MARIA JOSEFA CANELONES		0,00%	0%		$ 10.000.000,00	$ -																		
909	VILLEMAR EL CARMEN	FONTIBÓN	B	SANTA CECILIA		100,00%	100%		$ 35.000.000,00	$ -																		
TOTAL FRENTES DE OBRA						87,50%	87,50%		$ 79.180.247	$ 34.180.247																		

ACUMULADO FRENTES DE OBRA				
TERMINADAS	EN EJECUCION	POR INICIAR	TOTAL	VALOR
0	7	0	7	$ 667.219.745
ACUMULADO EMERGENCIAS				
7	0	1	8	$ 34.180.247
TOTAL				
7	7	1	15	$ 701.399.992
FRENTES POR LOCALIDAD				


RELACION DE PAGOS EFECTUADOS																												
N◦ACTA INTERVENTORIA	VALOR	N◦ACTA OBRA	VALOR	N◦ACTA INTERVENTORIA	VALOR	N◦ACTA INTERVENTORIA	VALOR	N◦ACTA INTERVENTORIA	VALOR	N◦ACTA INTERVENTORIA	VALOR	N◦ACTA INTERVENTORIA	VALOR	N◦ACTA INTERVENTORIA	VALOR	N◦ACTA INTERVENTORIA	VALOR	N◦ACTA INTERVENTORIA	VALOR	N◦ACTA INTERVENTORIA	VALOR	N◦ACTA INTERVENTORIA	VALOR	N◦ACTA INTERVENTORIA	VALOR	N◦ACTA INTERVENTORIA	VALOR	N◦ACTA INTERVENTORIA	VALOR
1		1		1		1		12		12		23		34															
2		2	$ 500.169.705,00	2		2		13		13		24		35															
3		3	$ 521.807.681,00	3		3		14		14		25		36															
4		4		4		4		15		15		26		37															
5		5		5		5		16		16		27		38															
6		6		6		6		17		17		28		39															
7		7		7		7		18		18		29		40															
8		8		8		8		19		19		30		TOTAL INTERVENTORIA															
9		9		9		9		20		20		31																	
10		10	TOTAL OBRA	10		10		21		21		32																	
11		11	$ 1.021.977.386,00	11		11		22		22		33		$															

AVANCE GENERAL			
	TECNICO	FINANCIERO	TIEMPO
AVANCE	73,85%	36,09%	67,36%
PROGRAMADO	-7,25%		
ATRASO	81,11%	EN EJECUCION	
FECHA APROBACION CRONOGRAMA			


AVANCE GENERAL



EMERGENCIAS



AVANCE FÍSICO



AVANCE DE LOS FRENTES



OBSERVACIONES:

	PROGRAMACIÓN				REAL			ACUMULADO			
INFORME	SEMANA	FECHA	PROGRAMADO	% PROGRAMADO	AVANCE	EJECUTADO	DIFERENCIA	PROGRAMADO		EJECUTADO	
1	sem 1	03-oct-25	$ -	0,00%	0,00%	$ -	$ -	0,00%	$ -	0,00%	$0,00
2	sem 2	13-oct-25	$ -	0,00%	0,00%	$ -	$ -	0,00%	$ -	0,00%	$0,00
3	sem 3	20-oct-25	$ -	0,00%	0,00%	$ -	$ -	0,00%	$ -	0,00%	$0,00
4	sem 4	27-oct-25	$ -	0,00%	0,00%	$ -	$ -	0,00%	$ -	0,00%	$0,00
5	sem 5	03-nov-25	$ 4.755.494,21	0,22%	0,00%	$ -	$ 4.755.494,21	0,22%	$ 4.755.494,21	0,00%	$0,00
6	sem 6	10-nov-25	$ 8.125.912,59	0,38%	0,80%	$ 16.977.206,64	$ (8.851.294,05)	0,60%	$ 12.881.406,80	0,80%	$16.977.206,64
7	sem 7	17-nov-25	$ 5.288.020,00	0,25%	1,02%	$ 21.771.422,72	$ (16.483.402,72)	0,85%	$ 18.169.426,80	1,82%	$38.748.629,36
8	sem 8	24-nov-25	$ 17.444.983,27	0,82%	1,13%	$ 23.997.772,21	$ (6.552.788,94)	1,67%	$ 35.614.410,07	2,94%	$62.746.401,57
9	sem 9	01-dic-25	$ 40.343.446,53	1,89%	1,80%	$ 38.340.052,51	$ 2.003.394,02	3,56%	$ 75.957.856,60	4,74%	$101.086.454,08
10	sem 10	08-dic-25	$ 79.444.682,79	3,73%	1,43%	$ 30.382.417,28	$ 49.062.265,51	7,29%	$ 155.402.539,39	6,17%	$131.468.871,36
11	sem 11	15-dic-25	$ 108.209.197,15	5,08%	2,69%	$ 57.402.366,83	$ 50.806.830,32	12,37%	$ 263.611.736,54	8,86%	$188.871.238,19
12	sem 12	22-dic-25	$ 69.900.889,80	3,28%	2,91%	$ 62.085.827,21	$ 7.815.062,59	15,64%	$ 333.512.626,34	11,77%	$250.957.065,40
13	sem 13	29-dic-25	$ 75.956.528,24	3,56%	1,49%	$ 31.686.383,67	$ 44.270.144,57	19,21%	$ 409.469.154,58	13,26%	$282.643.449,07
14	sem 14	05-ene-26	$ 89.212.283,49	4,18%	5,66%	$ 120.616.837,44	$ (31.404.553,95)	23,39%	$ 498.681.438,07	18,92%	$403.260.286,51
15	sem 15	12-ene-26	$ 83.223.770,74	3,90%	7,45%	$ 158.783.369,63	$ (75.559.598,89)	27,30%	$ 581.905.208,81	26,36%	$562.043.656,14
16	sem 16	19-ene-26	$ 152.231.709,97	7,14%	5,56%	$ 118.625.799,96	$ 33.605.910,01	34,44%	$ 734.136.918,78	31,93%	$680.669.456,10
17	sem 17	26-ene-26	$ 114.051.601,68	5,35%	6,55%	$ 139.680.056,20	$ (25.628.454,52)	39,79%	$ 848.188.520,46	38,48%	$820.349.512,30
18	sem 18	02-feb-26	$ 97.149.131,29	4,56%	12,74%	$ 271.555.749,04	$ (174.406.617,75)	44,34%	$ 945.337.651,75	51,22%	$1.091.905.261,34
19	sem 19	09-feb-26	$ 123.336.874,83	5,79%	1,19%	$ 25.293.497,30	$ 98.043.377,53	50,13%	$ 1.068.674.526,58	52,40%	$1.117.198.758,64
20	sem 20	16-feb-26	$ 144.354.651,09	6,77%	4,62%	$ 98.397.025,80	$ 45.957.625,29	56,90%	$ 1.213.029.177,67	57,02%	$1.215.595.784,44
21	sem 21	23-feb-26	$ 133.044.130,87	6,24%	3,10%	$ 65.986.851,22	$ 67.057.279,65	63,14%	$ 1.346.073.308,54	60,12%	$1.281.582.635,66
22	sem 22	02-mar-26	$ 302.192.068,33	14,17%	0,00%	$ -	$ 302.192.068,33	77,32%	$ 1.648.265.376,87		$1.281.582.635,66
23	sem 23	09-mar-26	$ 188.077.906,58	8,82%	0,00%	$ -	$ 188.077.906,58	86,14%	$ 1.836.343.283,45		$1.281.582.635,66
24	sem 24	16-mar-26	$ 83.278.260,58	3,91%	0,00%	$ -	$ 83.278.260,58	90,04%	$ 1.919.621.544,03		$1.281.582.635,66
25	sem 25	23-mar-26	$ 87.605.509,23	4,11%	0,00%	$ -	$ 87.605.509,23	94,15%	$ 2.007.227.053,26		$1.281.582.635,66
26	sem 26	30-mar-26	$ 36.671.729,02	1,72%	0,00%	$ -	$ 36.671.729,02	95,87%	$ 2.043.898.782,28		$1.281.582.635,66
27	sem 27	06-abr-26	$ 67.465.761,55	3,16%	0,00%	$ -	$ 67.465.761,55	99,04%	$ 2.111.364.543,83		$1.281.582.635,66
28	sem 28	13-abr-26	$ 10.504.787,87	0,49%	0,00%	$ -	$ 10.504.787,87	99,53%	$ 2.121.869.331,70		$1.281.582.635,66
29	sem 29	20-abr-26	$ 10.012.682,84	0,47%	0,00%	$ -	$ 10.012.682,84	100,00%	$ 2.131.882.014,54		$1.281.582.635,66
30	sem 30	27-abr-26	$ -	0,00%	0,00%	$ -	$ -	100,00%	$ 2.131.882.014,54		$1.281.582.635,66
31	sem 31	04-may-26	$ -	0,00%	0,00%	$ -	$ -	100,00%	$ 2.131.882.014,54		$0,00
32	sem 32	11-may-26		0,00%	0,00%			100,00%	$ 2.131.882.014,54		
33	sem 33	18-may-26		0,00%	0,00%			100,00%	$ 2.131.882.014,54		
34	sem 34	25-may-26		0,00%	0,00%			100,00%	$ 2.131.882.014,54		
35	sem 35	01-jun-26		0,00%	0,00%			100,00%	$ 2.131.882.014,54		
36	sem 36	08-jun-26		0,00%	0,00%			100,00%	$ 2.131.882.014,54		
37	sem 37	15-jun-26		0,00%	0,00%			100,00%	$ 2.131.882.014,54		
38	sem 38	22-jun-26		0,00%	0,00%			100,00%	$ 2.131.882.014,54		
39	sem 39	29-jun-26		0,00%	0,00%			100,00%	$ 2.131.882.014,54		
40	sem 40	06-jul-26		0,00%	0,00%			100,00%	$ 2.131.882.014,54		
41	sem 41	13-jul-26		0,00%	0,00%			100,00%	$ 2.131.882.014,54		
42	sem 42	20-jul-26		0,00%	0,00%			100,00%	$ 2.131.882.014,54		
43	sem 43	27-jul-26		0,00%	0,00%			100,00%	$ 2.131.882.014,54		
			$ 2.131.882.014,54	100,00%	60,12%						

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 21 | **LOTE COP No 16**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 21 (Consecutivo) **DEL** 23/2/2026 (dd-mm-aa) **AL** 1/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 149 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

COLEGIO INTEGRADO DE FONTIBON - SEDE A (ANEXO 1 REGISTRO FOTOGRÁFICO)



Entrega aula CRI: Se evidencia que se realiza la entrega del aula en mencion y el estado de esta se encuentra en optimas condiciones.



Entrega aula CRI: Se evidencia que se realiza la entrega del aula en mencion y el estado de esta se encuentra en optimas condiciones.



Entrega aula CRI: Se evidencia que se realiza la entrega del aula en mencion y el estado de esta se encuentra en optimas condiciones.



Entrega aula CRI: Se evidencia que se realiza la entrega del aula en mencion y el estado de esta se encuentra en optimas condiciones.



Entrega aula CRI: Se realizan observaciones en referencia a la instalacion de la canal, la cual se informa que se dara respuesta por parte del apoyo de la supervision via e-mail.



Entrega aula CRI: Se evidencia que se realiza la entrega del aula en mencion y el estado de esta se encuentra en optimas condiciones.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 21 | **LOTE COP No 16**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 21 (Consecutivo) **DEL** 23/2/2026 (dd-mm-aa) **AL** 1/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 149 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

COLEGIO INTEGRADO DE FONTIBON - SEDE A (ANEXO 1 REGISTRO FOTOGRÁFICO)



Entrega aula CRI: Se evidencia el ajuste de la canaleta de acuerdo a lo observado durante la entrega, se autoriza por parte del apoyo a la supervision.




Entrega aula CRI: Se evidencia la instalacion de tapa ciega plastica blanca de acuerdo a los detalles observados durante la entrega, autoriza el apoyo de la supervision.



Entrega aula CRI: Se evidencia la instalacion de tapa ciega plastica blanca de acuerdo a los detalles observados durante la entrega, autoriza el apoyo de la supervision.



Entrega aula CRI: Se evidencia que se realiza la instalacion de tornilleria internamente en la cubierta tipo sandwich.

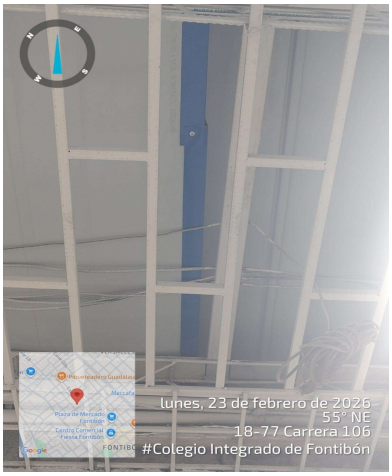

Entrega aula CRI: Se evidencia que se realiza la instalacion de tornilleria internamente en la cubierta tipo sandwich.



Se evidencia la instalacion de malla electrosoldada y que se da inicio a la fundida de la placa de contrapiso para el anden de la casona.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 21 | **LOTE COP No 16**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 21 (Consecutivo) **DEL** 23/2/2026 (dd-mm-aa) **AL** 1/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 149 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

COLEGIO INTEGRADO DE FONTIBON - SEDE A (ANEXO 1 REGISTRO FOTOGRÁFICO)



Se evidencia la instalacion de malla electrosoldada y que se da inicio a la fundida de la placa de contrapiso para el anden de la casona.



Se evidencia que se realiza la derivacion de la bajante de aguas lluvias del costado derecho de la casona.



Se evidencia la dosificacion de las cantidades requeridas para la mezcla de placa del anden en el area del casona.



Se evidencia que se realiza en sitio la mezcla para la placa del anden con mezcladora en sitio.



Se evidencia que se afina y se da acabado al area ya fundida en referencia a la placa del anden en la casona.



Se evidencia que se realiza el desarrollo de la instalacion de las bajantes de aguas lluvias correspondientes a la canal de la casona.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 21 | **LOTE COP No 16**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 21 (Consecutivo) **DEL** 23/2/2026 (dd-mm-aa) **AL** 1/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 149 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

COLEGIO INTEGRADO DE FONTIBON - SEDE A (ANEXO 1 REGISTRO FOTOGRÁFICO)



Se evidencia que se afina y se da acabado al area ya fundida en referencia a la placa del anden en la casona.



Se evidencia que se esta realizando la placa correspondiente al anden en el area de la casona .

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 21 | **LOTE COP No 16**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 21 (Consecutivo) **DEL** 23/2/2026 (dd-mm-aa) **AL** 1/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 149 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16


COLEGIO ANTONIO VAN UDEN - SEDE C (ANEXO 2 REGISTRO FOTOGRÁFICO)



Se evidencia que se realizan actividades de reparacion de pintura en la fachada donde se retiraron las ventanas pendientes en el bloque alianza.



Se evidencia que se realiza la instalacion de la pelicula de samblasting correspondiente al area del blqoue infantil.

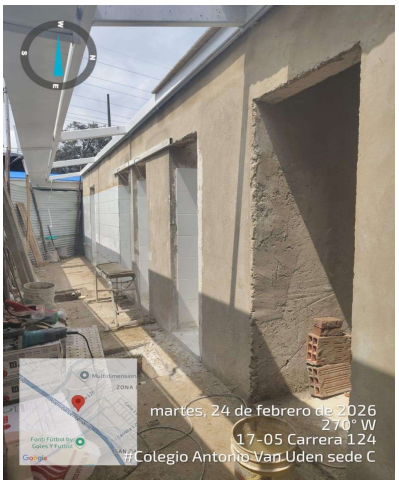

Se evidencia que se esta realizando el desarrollo de enchape en fachada de la bateria de baños, correspondiente al area de lavamanos.



Se evidencia que se realiza la instalacion de la pelicula de samblasting correspondiente al area del blqoue alianza.



Se evidencia que se realizan actividades de reparacion de pintura en la fachada donde se retiraron las ventanas pendientes en el bloque alianza.



Se evidencia que se avanza en la actividad de revoque del enchape en muros en la bateria de baños, corresponde al area de niños, niñas y servicios.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 21 **LOTE COP No 16**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 21 (Consecutivo) **DEL** 23/2/2026 (dd-mm-aa) **AL** 1/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 149 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

COLEGIO ANTONIO VAN UDEN - SEDE C (ANEXO 2 REGISTRO FOTOGRÁFICO)



No se evidencian avances en las actividades del area de la biblioteca hasta el dia Miercoles de la semana en curso.



Se evidencia que se avanza en las actividades de pañete en la bateria de baños, en el area del cuarto de aseo y el lavatraperos.



Se evidencia que se esta realizando la instalacion del recubrimiento de la canal en drywall en el area de la biblioteca.



Se evidencia que se da incio al pulido de la media caña correpondiente a la bateria de baños, en el area de los niños, niñas y servicios.



Se evidencia que se realiza en el area de la biblioteca la primera capa de fondeo de la fachada.



Se evidencia que se realiza en el area de la biblioteca la primera capa de fondeo de la fachada.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 21 | **LOTE COP No 16**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


SEMANA No. 21 (Consecutivo) **DEL** 23/2/2026 (dd-mm-aa) **AL** 1/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 149 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

COLEGIO ANTONIO VAN UDEN - SEDE C (ANEXO 2 REGISTRO FOTOGRÁFICO)



Se evidencia que se avanza en actividades de destroncado y pulido del piso de la bateria de baños, donde ya se finalizo la instalacion de la media caña en granito.

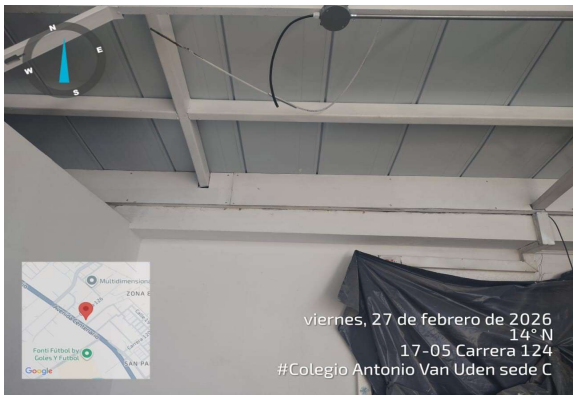

Se evidencia que se finaliza un tramo del recubrimiento en drywall que se esta realizando en el area final de la cubierta del modulo de la cubierta.



Se evidencia que se realiza el enchape y el revoque del area correspondiente al cuarto de aseo y al lavapatraperos.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 21 **LOTE COP No 16**


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 21 (Consecutivo) **DEL** 23/2/2026 (dd-mm-aa) **AL** 1/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 149 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

COLEGIO TECNICO INTERNACIONAL - SEDE A (ANEXO 3 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

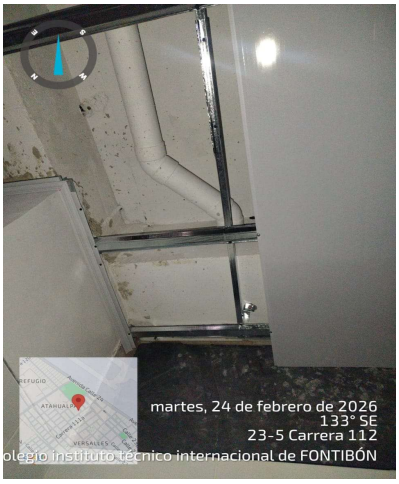

Se evidencia la instalacion de la estructura metalica correspondiente al cielo razo de la bateria de baño de bachillerato.



Se evidencia que se realizo en su totalidad la instalacion del cielo razo en PVC en la bateria de baños de bachillerato.



Se evidencia que se esta realizando la mezcla y la dosificacion de la mezcla para el cargue del piso de las aulas correspondientes a las aulas multiples.



Se evidencia la finalizacion del cargue de piso de un aula de las aulas multiples.



Se evidencia que se avanza en la ejecucion del cargue del piso del un aula de las aulas multiples.



Se evidencia que se da inicio a la instalacion del enchape en unas de las aulas de las aulas multiples.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 21 | **LOTE COP No 16**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 21 (Consecutivo) **DEL** 23/2/2026 (dd-mm-aa) **AL** 1/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 149 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

COLEGIO TECNICO INTERNACIONAL - SEDE A (ANEXO 3 REGISTRO FOTOGRÁFICO)



Se evidencia que se esta realizando la instalacion de la estructura correspondiente al cielo razo en PVC de la bateria de baños de bachillerato.



Se evidencia la aplicación de la primera capa de pintura correspondiente a la fachada del aula multiple.



Se evidencia que se esta realizando la instalacion de la estructura correspondiente al cielo razo en PVC de la bateria de baños de bachillerato.



Se evidencia la aplicación de la primera capa de pintura correspondiente a la fachada del aula multiple.



Se evidencia que se avanza la instalacion del enchape en unas de las aulas de las aulas multiples.



Se evidencia que se avanza la instalacion del enchape en unas de las aulas de las aulas multiples.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784


INFORME SEMANAL No 21 | **LOTE COP No 16**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 21 (Consecutivo) **DEL** 23/2/2026 (dd-mm-aa) **AL** 1/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 149 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

COLEGIO TECNICO INTERNACIONAL - SEDE A (ANEXO 3 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

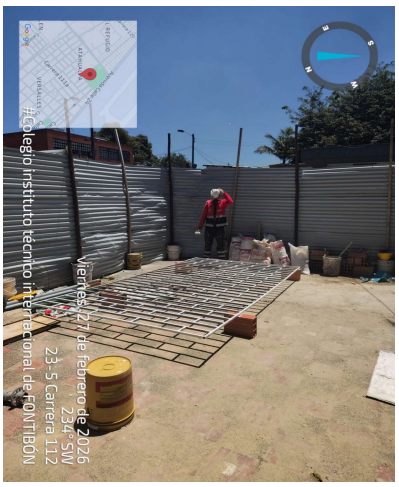

Se evidencia que se esta realizando el mantenimiento de la reja, la cual posteriormente se debe instalar en el area de la bodega.



Se evidencia que se estan rematando los vanos de las puertas de la bateria de baños de primaria.



Se evidencia que se finaliza la instalacion del enchape en unas de las aulas de las aulas multiples.



Se evidencia que se finaliza el enchape de la bodega en el area del aula multiple.



Se evidencia un avance en el 90% de la pintura de la fachada del aula multiple.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 21 **LOTE COP No 16**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 21 (Consecutivo) **DEL** 23/2/2026 (dd-mm-aa) **AL** 1/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 149 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

COLEGIO REPUBLICA DE VENEZUELA - SEDE B (ANEXO 4 REGISTRO FOTOGRÁFICO)



Área de la cancha limpia y despejada, libre de materiales y residuos.



Anclaje de Bajante en la parte frontal de la cubierta.



Andamio , en condiciones desfavorables , sin mínimos de seguridad .



Área de la cancha

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 21 **LOTE COP No 16**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 21 (Consecutivo) **DEL** 23/2/2026 (dd-mm-aa) **AL** 1/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 149 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16


COLEGIO MARCO ANTONIO CARREÑO - SEDE B (ANEXO 5 REGISTRO FOTOGRÁFICO)




Instalación y soldadura de puertas a los marcos de la institución



Soldadura de puertas recientemente llegadas a la obra.

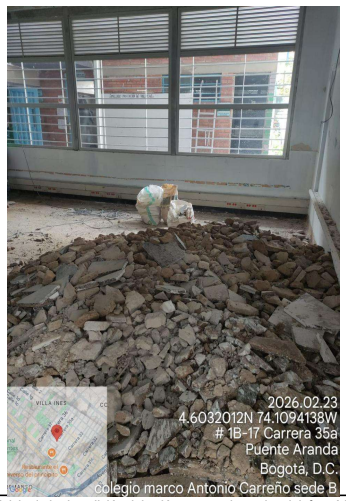

Inicio de la demolición del salón que contiene el rack informático.

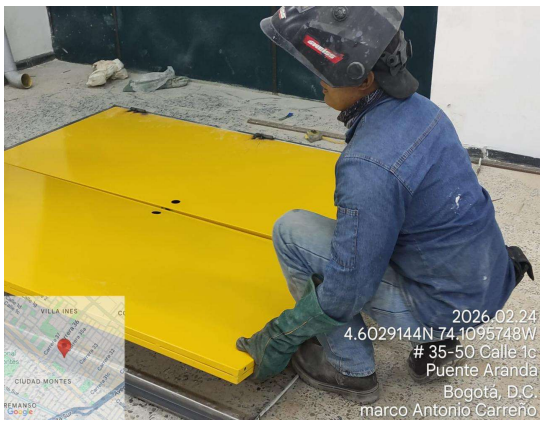

Soldadura de puertas a los marcos de entrada y salida del hall de la institución.



Culminación de la demolición del enchape del hall.



Inicio de la demolición del enchape del auditorio.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 21 | **LOTE COP No 16**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 21 (Consecutivo) **DEL** 23/2/2026 (dd-mm-aa) **AL** 1/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 149 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

COLEGIO MARCO ANTONIO CARREÑO - SEDE B (ANEXO 5 REGISTRO FOTOGRÁFICO)



Se evidencia el hallazgo de una segunda capa de enchape durante la demolición del revestimiento en el auditorio



Se evidencia la instalación de las puertas de salida del hall de la institución



Alistamiento del piso del hall de la institución



Aplicación de la primera capa de pintura blanca en los salones ya enchapados.



Alistamiento del piso para la colocación del nuevo enchape.



Clasificación y acopio de escombros producto de la demolición

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 21 | **LOTE COP No 16**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


SEMANA No. 21 (Consecutivo) **DEL** 23/2/2026 (dd-mm-aa) **AL** 1/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 149 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

COLEGIO MARCO ANTONIO CARREÑO - SEDE B (ANEXO 5 REGISTRO FOTOGRÁFICO)



Retiro de escombros

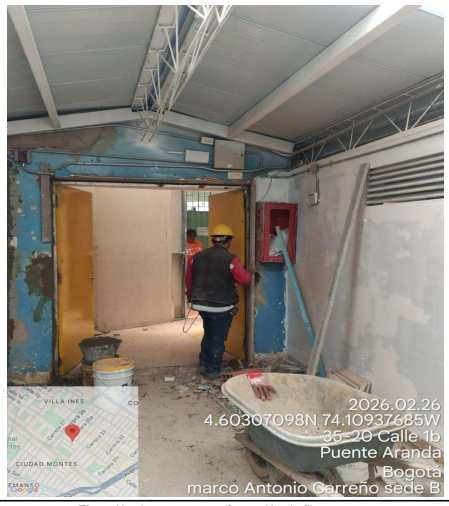

Ejecución de pañete y conformación de filos en marcos.



Aplicación de pañete en las columnas del hall de la institución.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 21 **LOTE COP No 16**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 21 (Consecutivo) **DEL** 23/2/2026 (dd-mm-aa) **AL** 1/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 149 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

COLEGIO JULIO GARAVITO ARMERO - SEDE B (ANEXO 6 REGISTRO FOTOGRÁFICO)



Se realizan los cordones de soldadura correspondiente a las intersecciones de la perfileria metalica de la cubierta del area administrativa.



Se realizan los cordones de soldadura correspondiente a las intersecciones de la perfileria metalica de la cubierta del area administrativa.



Se evidencia que se finalizo la actividad de viga corona y pañete de la cuchilla del area de coordinacion.



Se evidencia que se estan realizando los cordones de soldadura externa correspondiente a la canal del area administrativa.



Se evidencia que se realiza la instalacion de las platinas correspondientes al area de coordinacion.



Se evidencia que se aplica la capa de pintura de la canal proxima a instalar.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 21 **LOTE COP No 16**


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 21 (Consecutivo) **DEL** 23/2/2026 (dd-mm-aa) **AL** 1/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 149 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

COLEGIO JULIO GARAVITO ARMERO - SEDE B (ANEXO 6 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

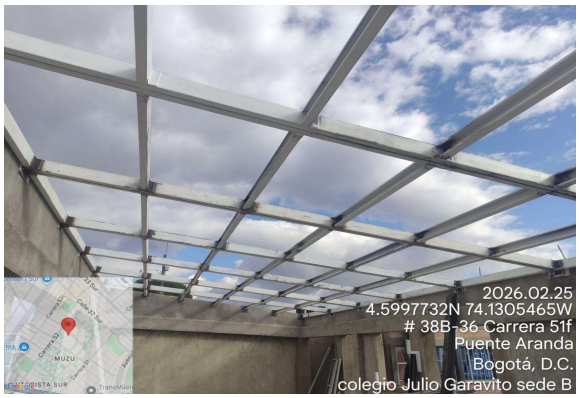

Se evidencia que se da la primera capa de pintura correspondiente a la estructura metalica del area administrativa.



Se evidencia que se realiza la instalacion de la canal correspondiente al area administrativa y al hall de distribucion.



Se evidencia que se realiza la instalacion de la canal correspondiente al area administrativa y al hall de distribucion.



Se evidencia que se realiza la pintura de la perfileria metalica correspondiente al area administrativa.



Se evidencia que se esta finalizando el pañete del area de la escalera, se encuentra pendiente el afinado de este.



Se evidencia que se realiza la pintura de la perfileria metalica correspondiente al area de la coordinacion.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 21 **LOTE COP No 16**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 21 (Consecutivo) **DEL** 23/2/2026 (dd-mm-aa) **AL** 1/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 149 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

COLEGIO JULIO GARAVITO ARMERO - SEDE B (ANEXO 6 REGISTRO FOTOGRÁFICO)



Se evidencia que se realiza la pintura de la perfileria metalica correspondiente al area de la pagaduria.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 21 **LOTE COP No 16**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 21 (Consecutivo) **DEL** 23/2/2026 (dd-mm-aa) **AL** 1/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 149 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

COLEGIO CULTURA POPULAR - SEDE C (ANEXO 7 REGISTRO FOTOGRÁFICO)



Se evidencia que se realizo el cableado de los puntos electricos de las 02 areas a intervenir (Shut de basuras y modulos administrativos).



Se evidencia que se realizo el cableado de los puntos electricos de las 02 areas a intervenir (Shut de basuras y modulos administrativos).



Se evidencia que se realiza el cielo razo en superboard correspondiente al shut de basuras.



Se evidencia que se realiza el revoque correspondiente al enchape del muros del shut de basuras.



Se evidencia que los vidrios que sufrieron daños durante la ejecucion de actividades no han sido a la fecha.



Se evidencia que se realiza la instalacion de aparatos electricos en las 02 areas a intervenir (Shut de basuras y modulos administrativos).

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 21 | **LOTE COP No 16**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 21 (Consecutivo) **DEL** 23/2/2026 (dd-mm-aa) **AL** 1/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 149 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

COLEGIO CULTURA POPULAR - SEDE C (ANEXO 7 REGISTRO FOTOGRÁFICO)



Se evidencia que se finaliza la ejecucion y detalles pendientes de las 04 rampas correspondientes al recorrido de los desechos.



Se evidencia que se finaliza la ejecucion y detalles pendientes de las 04 rampas correspondientes al recorrido de los desechos.



Se eivdencian detalles en los filos correspondientes a la fachada del shut de basuras.



Se evidencia que esta pendiente la ejecucion de la gravilla mona correspondiente a la media caña del shut de basuras.



Se evidencia que se realiza la instalacion de aparatos electricos en las 02 areas a intervenir (Shut de basuras y modulos administrativos).



Se evidencia que se realiza la instalacion de aparatos electricos en las 02 areas a intervenir (Shut de basuras y modulos administrativos).

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784


INFORME SEMANAL No 21 | **LOTE COP No 16**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 21 (Consecutivo) **DEL** 23/2/2026 (dd-mm-aa) **AL** 1/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 149 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

COLEGIO CULTURA POPULAR - SEDE C (ANEXO 7 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

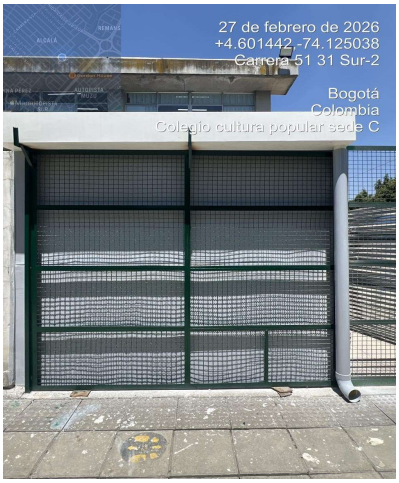

Se evidencia que se realiza la pintura de la bajante de aguas lluvias correspondiente a la canal de la cubierta del shut de basuras.




Se evidencia que se realiza la instalacion de aparatos electricos en las 02 areas a intervenir (Shut de basuras y modulos administrativos).



Se evidencia que se realiza el bordillo en gravilla mona en lo que se refiere al acceso a los modulos administrativos.



Se evidencia la instalacion del tablero electrico correspondiente al control y suministro de energia de las nuevas instalaciones.

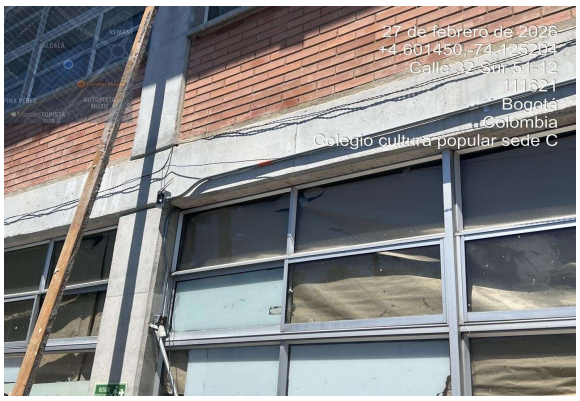

Se evidencia que se realizo la instalacion de tuberia MT correspondiente al recorrido para la conexión del tablero nuevo con el existente en las aulas.



Se evidencia que se finalizo la pintura de la fachada correspondiente al shut de basuras.
