PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8155097

INFORME SEMANAL No 22 **LOTE COP No 16**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 22 (Consecutivo) **DEL** 2/3/2026 (dd-mm-aa) **AL** 8/3/2026 (dd-mm-aa)

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 156 días

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORÍA


Contratista:	CONSORCIO EL MILAGROSO 2025	**Interventoria**	PROBINTEC S.A.S
RL del consorcio	RAFAEL MOGOLLÓN RODRÍGUEZ	**RL de Interventoría**	SANDRA STELLA MORENO BUITRAGO
Contrato No.	CO1.PCCNTR.8155097	**Contrato No.**	CO1.PCCNTR.8168931
Objeto	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS LOTE 16"	**Objeto**	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No. 6
Valor Inicial :	$ 2.455.237.837,00	**Valor Inicial:**	$ 796.278.928,00
AIU	33,88% $ 831.834.579,18	**Valor Adicional No. 1 del 26 de diciembre de 2026:**	$ 139.026.666,00
COSTO DIRECTO	$ 1.623.403.257,82	**Valor Total del Contrato:**	$ 935.305.594,00
OFERTADO	$ 2.176.494.644,00		
EMERGENCIAS	$ 100.000.000,00		
VALOR PARCIAL CON EMERGENCIAS	$ 2.276.494.644,00		
DIFERENCIA PARA EMERGENCIAS	$ 178.743.193,00		
Valor Parcial (Inicial + Emergencias)	$ 278.743.193,00		
Valor adicional No. 1:	$ 380.000.000,00		
Valor inicial No. 1 emergencias:	$ 200.000.000,00		
Valor adicional No.1 Obras Contractuales:	$ 180.000.000,00		
VALOR TOTAL INICIAL MAS EMERGENCIA	$ 2.835.237.837,00		
VALOR TOTAL EMERGENCIAS	$ 478.743.193,00		
VALOR TOTAL PARA OBRAS CONTRACTUALES	$ 2.356.494.644,00		
Plazo Inicial:	SIETE (7) MESES	**Plazo Inicial:**	SIETE (7) MESES
Fecha de Iniciación:	03/10/2025	**Fecha de Iniciación:**	03/10/2025
Fecha de Vencimiento:	02/05/2026	**Fecha de Vencimiento:**	02/05/2026

AVANCE DEL CONTRATO

	SEMANAL	ACUMULADO		ACUMULADO
Obra programada (%)	6,35%	70,30%	Obra Física Ejecutada (%)	4,11%	74,54%
Valor de la Obra programada:	$ 155.802.378,17	$ 1.725.926.974,93	Valor de la Obra Ejecutada:	$ 100.980.424,75	$ 1.830.204.433,35

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONTRATO

	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	63,95%	70,43%	4,25%
Durante el periodo	6,35%	4,11%	
Acumulado actual	70,30%	74,54%	

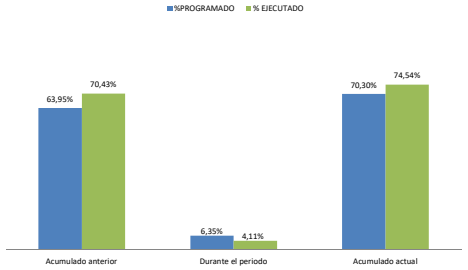

CPF	LOCALIDAD	COLEGIO	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA	%PROGRAMADO ACUMULADO	%EJECUTADO ACUMULADO	%DIFERENCIA ACUMULADO
915	FONTIBON	INTEGRADO DE FONTIBON - SEDE A	15,89%	12,52%	-3,37%	100,00%	99,50%	-0,50%
920	FONTIBON	ANTONIO VAN UDEN - SEDE C	6,43%	4,02%	-2,41%	48,76%	71,04%	22,28%
901	FONTIBON	INSTITUTO TECNICO INTERNACIONAL . SEDE A	5,54%	0,42%	-5,12%	60,85%	63,57%	2,72%
1408	LOS MARTIRES	REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA - SEDE B	0,93%	0,05%	-0,88%	63,81%	48,43%	-15,38%
1632	PUENTE ARANDA	MARCO ANTONIO CARREÑO SILVA - SEDE B	10,26%	1,46%	-8,80%	46,54%	65,65%	19,11%
1614	PUENTE ARANDA	JULIO ARMERO GARAVITO - SEDE B	4,73%	10,32%	5,59%	50,85%	83,23%	32,38%
1603	PUENTE ARANDA	CULTURA POPULAR - SEDE C	0,64%	0,00%	-0,64%	100,00%	98,50%	-1,50%
			6,35%	4,11%	-2,23%	67,26%	75,70%	8,44%

EMERGENCIAS Y/O OBRAS PRIORITARIAS

CPF	LOCALIDAD	COLEGIO	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA	VALOR TOTAL	VALOR CONTRATO	DIFERENCIA
1616	PUENTE ARANDA	SILVERIA ESPINOSA DE RENDON - SEDE A	0,00%	100,00%	100,00%	$ 8.789.206,00	$ 8.789.206,00	$ -
1609	PUENTE ARANDA	SILVERIA ESPINOSA DE RENDON - SEDE B	0,00%	100,00%	100,00%	$ 17.578.413,00	$ 17.578.413,00	$ -
1612	PUENTE ARANDA	EL JAZMIN - SEDE B	0,00%	100,00%	100,00%	$ 1.953.157,00	$ 1.953.157,00	$ -
914	FONTIBON	RODRIGO ARENAS BETANCOURT - SEDE A	0,00%	100,00%	100,00%	$ 1.953.157,00	$ 1.953.157,00	$ -
909	FONTIBON	VILLEMAR EL CARMEN - SEDE B	0,00%	100,00%	100,00%	$ 1.953.157,00	$ 1.953.157,00	$ -
915	FONTIBON	INTEGRADO DE FONTIBON - SEDE A	0,00%	100,00%	100,00%	$ 1.953.157,00	$ 1.953.157,00	$ -
929	FONTIBON	MARIA JOSEFA CANELONES - SEDE A	0,00%	0,00%	0,00%	$ 10.000.000,00	$ -	$ 10.000.000,00
909	FONTIBON	VILLEMAR EL CARMEN - SEDE B	0,00%	100,00%	100,00%	$ 35.000.000,00	$ -	$ 35.000.000,00
					87,50%	$ 79.180.247,00	$ 478.743.193,00	$ (399.562.946,00)

AVANCE FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$ 2.455.237.837,34
VALOR PARCIAL 1	$ 88.202.201,00	
VALOR PARCIAL 2	$ 500.169.705,00	
VALOR PARCIAL 3	$ 521.807.681,00	
TOTAL VALOR FACTURADO	$ 1.110.179.587,00	
SUMAS IGUALES	$ 1.345.058.250,34	$ 1.345.058.250,34


INDICADOR FINANCIERO	VALOR FACTURADO	VALOR PAGADO
	$ 1.110.179.587,00	$ 1.110.179.587,00

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

INDICADOR TECNICO	% DE AVANCE PROGRAMADO	% DE AVANCE EJECUTADO	% RETRASO - % ADELANTO +
	70,30%	74,54%	4,25%

INDICADOR TIEMPO	DIAS	RETRASO
	156	7

CURVA S

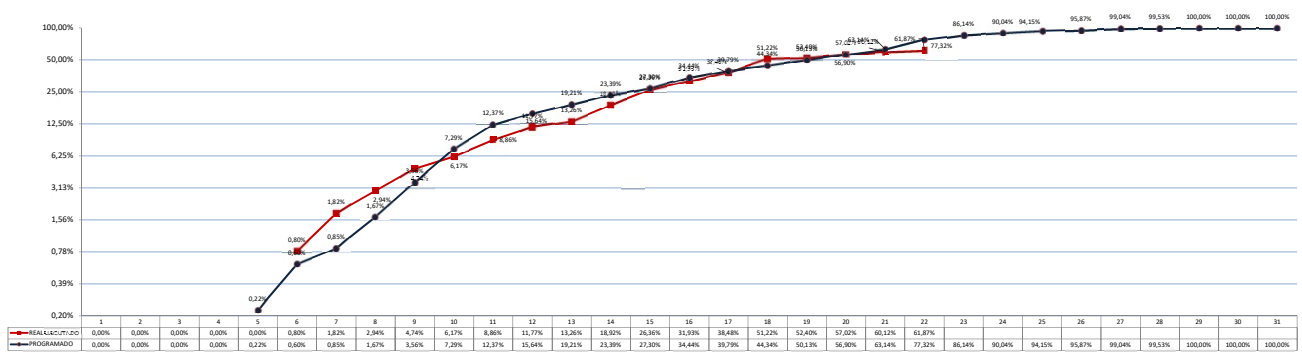

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
REAL/EJECUTADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,80%	1,82%	2,94%	4,74%	6,17%	8,86%	11,77%	13,26%	18,92%	26,36%	31,93%	38,48%	51,22%	52,40%	57,02%	60,12%	61,87%									
PROGRAMADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,22%	0,60%	0,85%	1,67%	3,56%	7,29%	12,37%	15,64%	19,21%	23,39%	27,30%	34,44%	39,79%	44,34%	50,13%	56,90%	63,14%	77,32%	86,14%	90,04%	94,15%	95,87%	99,04%	99,53%	100,00%	100,00%	100,00%

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8155097

INFORME SEMANAL No 22 **LOTE COP No 16**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 22 (Consecutivo) **DEL** 2/3/2026 (dd-mm-aa) **AL** 8/3/2026 (dd-mm-aa)

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 156 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato)

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No. CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato)

LOTE COP: 16

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO INTEGRADO DE FONTIBON - SEDE A (ANEXO 1 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades tecnicas: Se evidencian los siguientes avances en las dos áreas intervenidas:
La Casona: Se llevaron a cabo diferentes procesos relacionados con la fundida de la placa de contrapiso correspondiente al andén, iniciando con el alistamiento del área de intervención, seguido de la instalación de malla electrosoldada, la fundida de la placa de contrapiso y la ejecución del acabado del andén, alcanzando un avance aproximado del 90%. De igual manera, se avanzó en la conexión de la tubería de aguas lluvias y se realizó la instalación de las respectivas abrazaderas.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenció el avance en la toma de medidas en el área de intervención. En cuanto al componente de SST, no se ejecutaron actividades especificas durante el periodo reportado, debido a que únicamente se realizaron labores preliminares de verificación y medición.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: A la fecha, la institución presenta un avance fisico del 9,23% en la ejecución de las actividades programadas, frente a un valor esperado del 15,89 % para el periodo evaluado. Esto refleja un desarrollo inferior de un 6,66 % , esto debido que la programacion planteada por parte del contratista se observa que se finalizo y a la fecha no se ha terminado la ejecucion de las actividades.

4.1. Actividades programadas NO ejecutadas: Se observa que la programacion establecida a la fecha se cumplio y las actividades no han sido finalizadas, de acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta que las actividades de la casona son las unicas pendientes se debe presentar un plan de accion para la ejecucion de estas.

4.2. Actividades EJECUTADAS a la fecha: N/A

5. Generales: Debido a que, a la fecha, la Casona presenta un alto grado de asentamiento, se autorizó la instalación de apuntalamientos conforme al diseño enviado por el apoyo de supervisión.
Adicionalmente, durante el transcurso de la semana, la institución reportó la presencia de humedad en el área del aula CRI y el desprendimiento de la teja que cubre el hall de ingreso a esta. Frente a esta situación, el contratista aseguró la teja mediante amarres a la estructura existente y realizó una revisión del flanche, sin evidenciar presencia de humedad ni rastros de filtración en los muros. Finalmente, durante el Comité de Obra N.° 11, se realizó la programación de actividades con la institución para el día martes 17 de marzo.

6. Ambiental: Se realizó recorrido en el frente, se sigue evidenciando materiales de construcción y residuos que está cerca de las zonas verdes y a unos individuos arbóreos, por lo que se recomienda realizar la disposición total del material, garantizar jornadas de orden y aseo periódicamente e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA).

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO ANTONIO VAN UDEN - SEDE C (ANEXO 2 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: A la fecha, la ejecución de las actividades en la institución se presenta de la siguiente manera:
Batería de baños: Se evidencia que, en lo referente a los pisos, se realizó el pulido de estos, así como del área de la media caña y las bocapuertas. De igual manera, se finalizó la instalación del enchape de la poceta lavatraperos. En cuanto a la cubierta, se concluyó la pintura de la perfilería metálica. Asimismo, tanto en la estructura de la cubierta como en los muros se dio inicio a la instalación de la tubería MT y de los puntos eléctricos con su respectivo cableado. En estos mismos muros se avanzó en las actividades de aplicación de estuco.
Biblioteca: Se realizaron actividades correspondientes a la aplicación de la segunda capa de pintura en el área general. En el área del armario se efectuó la limpieza del muro y se procedió con la nueva aplicación de pintura. En el exterior, se realizó la aplicación de pintura de fondeo en el área de la viga.
Bloque Alianza: Se evidenció la llegada del material correspondiente a la ventanería; actualmente se está a la espera de su instalación.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado no se evidenció la ejecución de actividades relacionadas con el componente de SST en el frente de obra. Por lo tanto, no se registraron verificaciones, inspecciones ni seguimiento a actividades asociadas a este componente durante dicho periodo.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: A la fecha, la institución presenta un avance fisico del 4,02 % en la ejecución de las actividades, frente a un valor esperado del 6,43 % para el periodo evaluado. Esto refleja un desarrollo inferior de un 2,41 % , este minimo valor se debe a un tema de ejecucion de cantidades esperadas.

4.1. Actividades programadas NO ejecutadas: Se evidencia que las actividades que no presentan desarrollo son actividades derivadas de la instalacion de cubierta y actividades que estaban programadas durante el periodo pero que no fueron requeridas.
Los items no desarrollados a la fecha son los siguientes:
- TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 20 METROS.
- FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO.

4.2. Actividades EJECUTADAS a la fecha: Las actividades desarrolladas hacen referencia a las actividades de acabados en muros, tanto pañete como estuco.

Colegio Antonio Van Uden - Sede C						SEMANA N°22 (03 al 08-03)				
			CONDICIONES CONTRACTUALES							
(a) ITEM ENTIDAD.	(b) DESCRIPCION ACTIVIDAD	(c) UNID.	(d) CANT	(e) VR UNIT	(f) VR PARCIAL	% PROGRAMADO	CANT. EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	% DE CANT. EJECT.	% DE VALOR EJECT.
12.1.2	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FLOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	168,30	$ 43.150,00	$ 7.262.145,00	0,00%	20	$ 863.000,00	12%	0,19%
12.1.6	ESTUCO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	39,88	$ 13.118,00	$ 523.146,00	0,00%	10	$ 131.180,00	25%	0,03%

5. Generales: N/A

6. Ambiental: Se verifico el cerramiento en buen estado, se evidencian materiales de construcción y RCD (Volumen medio) generados por las demoliciones acopiados y debidamente en lonas, por lo que se recomienda garantizar jornadas de orden y aseo periódicamente y realizar la disposición adecuadamente el material posteriormente respecto a las especificaciones técnicas y ambientales.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO TECNICO INTERNACIONAL - SEDE A (ANEXO 3 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Durante la semana se ejecutaron actividades en diferentes frentes de trabajo al interior de la institución educativa, conforme se detalla a continuación:
Batería de baños – Bachillerato: Se realizó en su totalidad la instalación del cielo raso en PVC, incluyendo sus respectivos remates y detalles, y posteriormente se avanzó con la instalación de las luminarias. En cuanto a los muros, se efectuó la instalación de win y enchape en el área de los vanos de las puertas. Asimismo, se llevó a cabo la reparación de los muros afectados en el área de las conexiones hidrosanitarias e hidráulicas.
Batería de baños – Primaria: En lo relacionado con los muros, se realizó la instalación de win y enchape en el área de los vanos de las puertas. De igual manera, se dio inicio a la instalación del cielo raso en PVC en el área de niñas, junto con la instalación de sus respectivas luminarias; el área de niños continúa pendiente de esta actividad. En la parte exterior de esta área se realizaron los remates del guardaescoba y se llevó a cabo la instalación del codo y la salida de reventilación con su respectivo recubrimiento.
Aula múltiple: En lo referente a los pisos, se realizó la aplicación y finalización de la boquilla. Asimismo, se ejecutaron los remates en los vanos correspondientes para la instalación de la ventanería y las rejillas de ventilación, actividad que también dio inicio durante la semana.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenciaron actividades correspondientes a la instalación de lámparas en el baño de mujeres, así como la ejecución de remates en los baños de hombres y del área de primaria. Durante la verificación en campo se constató la presencia de 3 personas laborando, quienes se encontraban debidamente aprobadas para el desarrollo de las actividades. Desde el componente de SST, se validó que el personal ejecutara las labores con el uso adecuado de los EPP y la respectiva dotación, con el fin de prevenir riesgos durante la ejecución de los trabajos.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: A la fecha, la institución presenta un avance fisico del 0,42 % en la ejecución de las actividades, frente a un avance esperado del 5,54 % para el periodo evaluado. Esto representa una desviación negativa del 5,12 % , debido a que no se ejecutaron actividades programadas en su 100%.

4.1. Actividades programadas NO ejecutadas: Las actividades no desarrolladas a las fecha corresponden a actividades programadas pero no requeridas durante el periodo en mencion y al desarrollo de actividades correspondiente a acabados de las baterias de baños programadas en su 100% .
Los items no desarrollados a la fecha son los siguientes:
- TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 20 METROS.
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA, DOBLE MANIJA INTERIOR - EXTERIOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH).
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1".
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL.

4.2. Actividades EJECUTADAS a la fecha: N/A

5. Generales: Durante el Comité de Obra N.° 11, el apoyo de supervisión fue enfático en que la batería de baños de bachillerato debe quedar finalizada durante el mes de marzo. Esta entrega deberá ir acompañada de una capacitación especifica sobre el uso y mantenimiento de las divisiones de baños en acero inoxidable.

6. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, Se verifico el cerramiento en buen estado, se evidencia material de construcción y RCD (Volumen medio) acopiados, sin afectación a sumideros, se recomendo al contratista disponer adecuadamente ante el gestor, realizar jornadas de orden y aseo periódicamente al igual que implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA).

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO REPUBLICA DE VENEZUELA - SEDE B (ANEXO 4 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Durante el periodo evaluado no se ejecutaron actividades constructivas.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado no se evidenció la ejecución de actividades relacionadas con el componente de SST en el frente de obra. Por lo tanto, no se registraron verificaciones, inspecciones ni seguimiento a actividades asociadas a este componente durante dicho periodo.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: A la fecha, la institución presenta un avance fisico del **48.43%** en la ejecución de las actividades, frente a un avance esperado del **63.99 %** para el periodo evaluado. Esto representa una desviación negativa del **15.56%**,.

4.1. Actividades programadas NO ejecutadas:
- PINTURA EXTERIOR DFE ALTA RESISTENCIA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)
- PINTURA EXTERIOR DE ALTA RESISTENCIA A TRES MANOS (A 0.6M, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS
- EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)
- SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI
- DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE ADOQUÍN
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)
- Se aclara que la actividad respecto a la instalacion de la estructura metalica cambio de alcance, incrementando en su nivel de complejidad frente a lo inicialmente previsto, derivado de nuevas condiciones técnicas identificadas durante la ejecución.

4.2. Actividades EJECUTADAS a la fecha: N/A

5. Generales: El ingeniero apoyo a la supervision solicita realizar la conexión a la caja de inspección correspondiente.

6. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, no se encuentran acopios de residuos ni material, al igual se recomendó al contratista si realiza actividades implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA)

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO MARCO ANTONIO CARREÑO - SEDE B (ANEXO 5 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Durante el periodo reportado se ejecutaron las siguientes actividades:
- Trabajos en estructura de cubierta
- Pintura
- Jornada de aseo en áreas intervenidas.
2. Seguridad social y SST: Durante la semana se ejecutaron actividades de soldadura de ángulos en cerchas, resanes de muros y lijado de muros. Durante la verificación en campo se evidenció la presencia de 3 trabajadores y 1 soldador, quienes se encontraban debidamente aprobados por la interventoría para el desarrollo de las actividades.
Desde el componente de SST, se verificó que el personal realizara las labores con el uso adecuado de los EPP correspondientes a cada actividad, con el fin de prevenir riesgos asociados a trabajos en caliente, manipulación de herramientas y ejecución de labores de obra.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: A la fecha, la institución presenta un avance fisico del **65.65 %** en la ejecución de las actividades, frente a un avance esperado del **46.54 %** para el periodo evaluado. Esto representa una desviación positiva del **19.11 %**, donde se evidencia que se han realizado actividades no programadas.

4.1. Actividades programadas NO ejecutadas: N/A

4.2. Actividades EJECUTADAS a la fecha: Se deja constancia de que el contratista ha ejecutado actividades que no se encuentran contempladas en la programación contractual y que, por tanto, no aportan al porcentaje de avance. Entre ellas se incluyen avances en enchape, aplicación de pañete, retiro de enchape en muros y piso,aplicacion de estuco, enchape de guardaescobas, puertas y la desconexión de veinte (20) puntos eléctricos, actividad no contractual.
En consecuencia, se requiere que estos ítems sean revisados y ajustados en la programación correspondiente al balance.
5. Generales: En el comité realizado durante la semana, y conforme a lo definido por el equipo técnico, se aprobaron las siguientes actividades:
- Enchape en el área inferior de los mesones del laboratorio.
- Aplicación de pintura en las gavetas del laboratorio.
- Retiro del enchape existente en el piso del pasillo y en dos aulas, con el fin de unificar el acabado.
- Se encontro bajo el piso de auditorio otro enchape, el cual se tuvo que demoler de igual manera para posterior instalacion correcta de piso.

6. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, cuenta con el cerramiento adecuado en el frente, se evidencio que el área de acopios fue trasladado provisionalmente a un salón de la institución con el objetivo de organizar el frente de trabajo y los materiales de obra, otro salón será destinado temporalmente para guardar las pertenencias de los trabajadores, se registró la disposición de parte de estos residuos, se recomienda garantizar jornadas de orden y aseo periódicamente, disponer adecuadamente todos los residuos al igual se recomendo al contratista implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA).

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO JULIO GARAVITO ARMERO - SEDE B (ANEXO 6 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Durante la semana se ejecutaron actividades en diferentes frentes de trabajo al interior de la institución educativa, conforme se detalla a continuación:
Oficinas administrativas: Se realizó en su totalidad la instalación de la cubierta tipo sándwich. Asimismo, se evidenció un avance significativo en la aplicación de estuco tanto en los muros interiores como en los correspondientes a las fachadas internas.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se realizó inspección técnica, evidenciando la culminación de la soldadura de los cordones de amarre entre perfiles, con el fin de garantizar la estabilidad y seguridad estructural de la base de la cubierta. Desde el componente de SST, se verificó que el personal ejecutara las labores con el uso adecuado de los EPP y la respectiva dotación. Así mismo, se realizó la recomendación al contratista de instalar de manera completa los andamios utilizados en la actividad, incluyendo las barandas de protección, y realizar las inspecciones correspondientes a estos equipos. De igual manera, se recordó que los andamios deben contar con la respectiva certificación para su uso, con el fin de garantizar condiciones seguras durante el desarrollo de las labores.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA **CO1.PCCNTR.8155097**

INFORME SEMANAL No 22 **LOTE COP No 16**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 22 (Consecutivo) **DEL** 2/3/2026 (dd-mm-aa) **AL** 8/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 156 días

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: A la fecha, la institución presenta un avance físico del 10,32 % en la ejecución de las actividades, frente a un avance esperado del 4,73 % para el periodo evaluado. Esto representa una desviación positiva del 5,59 % , en referencia a actividades desarrolladas nos programadas.

4.1. Actividades programadas NO ejecutadas: N/A

4.2. Actividades EJECUTADAS a la fecha: Se evidencia que las actividades que tuvieron un desarrollo no programado hacer referencia al desarrollo del suministro e instalacion de la canal y la cubierta tiposandwich en su totalidad.

Colegio Julio Garavito Armero - Sede B						SEMANA N°22 (02 al 08.03)				
(a) ITEM ENTIDAD	(b) DESCRIPCION ACTIVIDAD	(c) UNID.	CONDICIONES CONTRACTUALES			% PROGRAMADO	CANT. EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	% DE CANT. EJECT.	% DE VALOR EJECT.
			(d) CANT	(e) VR UNIT	(f) VR PARCIAL					
16.1.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 900 A 400 mm) CON AISLANTE EN POLURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm y 40 mm. PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACIÓN CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEGÚN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS)	M2	149,43	$ 256.229,00	$ 38.288.299,00	0,00%	40	$ 10.249.160,00	27%	8,87%
16.1.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLO (80 A 100 CM). INCLUYE SOPORTES METÁLICOS PARA FIJAR LA CANAL EN LA FACHADA, ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE.	M	16,99	$ 319.940,00	$ 5.435.781,00	0,00%	5	$ 1.599.700,00	29%	1,38%

5. Generales: Durante el proceso de diagramación de la escalera se identificó una diferencia aproximada de 6 cm en las medidas, por lo cual se procedió a realizar una nueva diagramación con el fin de evitar que dicha irregularidad resulte visible en el acabado final.
Durante el Comité de Obra N.° 11, el apoyo a la supervisión definió el diseño de la ventanería correspondiente a las fachadas interna y externa de esta área. Se realiza un llamado de atención por el estado actual del cerramiento correspondiente a la zona de intervención.

6. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, se realizó el mantenimiento al cerramiento, se verifica que la mezcla de concreto se realiza en batea metálica, se realizó traslado de escombros provenientes del IED Cultura popular Sede C, se evidencio falta de orden en la zona de acopio de materiales y residuos, se recomienda organizar una zona de acopio, organizada, garantizar jornadas de orden y aseo periódicamente al igual que implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA).

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO CULTURA POPULAR - SEDE C (ANEXO 7 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se tiene prevista la entrega de este frente de obra, teniendo en cuenta el avance y culminación de las actividades programadas en el área intervenida. Se espera que, previo a la entrega, se verifique el cumplimiento de las condiciones técnicas, de seguridad y de orden en el frente de trabajo.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: A la fecha, la institución presenta un avance físico del 0,35 % en la ejecución de las actividades programadas, frente a un valor esperado del 0,99 % para el periodo evaluado. Esto refleja un desarrollo inferior de un 0,64 % , se informa que este porcentaje se desarrolla de esta manera debido que a la fecha esta institucion ya deberia estar finalizada, de acuerdo a esto no se presentara ningun sobre avance de las actividades proximas a ejecutar.

4.1. Actividades programadas NO ejecutadas: Se evidencia que las actividades que no presentan desarrollo de actividades hacen referencia a la programacion en general, teniendo esto en cuenta y que a la fecha la programacion de la institucion deberia haberse finalizado se solicito la presentacion de un plan de emergencia para la finalizacion de la institucion.

4.2. Actividades EJECUTADAS a la fecha: N/A

5. Generales: Durante la semana, el día lunes, se realizó la entrega formal de la institución a la interventoría. No obstante, durante la revisión se evidenció que la obra presentaba un alto número de detalles pendientes en diferentes áreas, razón por la cual no fue recibida. En consecuencia, la entrega que se encontraba programada para el día miércoles no se llevó a cabo y fue reprogramada por parte del apoyo a la supervisión. En este sentido, se elaboró un listado de observaciones, el cual se ha venido actualizando diariamente con el fin de hacer seguimiento a la corrección de los pendientes y verificar la posibilidad de realizar la entrega el día martes 11 de marzo de 2026.

6. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, se cuenta con el cerramiento adecuado, se realizó la recolección y traslado de escombros a IED Julio Garavito armero, con el fin de organizar la zona intervenida, se realizó la limpieza de los sifones que fueron instalados, se recomienda al contratista que al finalizar las actividades se debe garantizar que el frente quede ordenado y limpio.

FIRMAS

ARQ. LORENA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
DIRECTORA DE INTERVENTORIA

ARQ. NELLY NATALIA MORA LA ROTTA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ING. LUIS EMIRO BLANCO MORENO
APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

ING. KATHERINE CAROLINA NÚÑEZ OSORIO
PROFESIONAL SST

ING. CHRISTIAN FELIPE RODRIGUEZ
PROFESIONAL AMBIENTAL

ING. CRISTIAN BARRERA DONCELL
PROFESIONAL COSTOS Y PRESUPUESTOS

FECHA:	09/03/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	INFORME APOYO A LA SUPERVISION
DIAS RESTANTES	69 Dias		GRUPO 16
ESTADO GENERAL DEL PROYECTO			
CORTE DEL INFORME:	CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2025	
22 de febrero de 2026	CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:	PROBINTEC S.A.S	

FECHAS		
DATOS:	INTERVENTORIA	OBRA
CONTRATO	CO1.PCCNTR.8168931	CO1.PCCNTR.8155097
INICIO	3 de octubre de 2025	3 de octubre de 2025
TERMINACION INICIAL	2 de mayo de 2026	2 de mayo de 2026
TERMINACION FINAL	2 de mayo de 2026	2 de mayo de 2026

PLAZOS EN DIAS		
ETAPA:	INTERVENTORIA	OBRA
INICIAL	211	211
SUSPENSIONES		
PRÓRROGAS		
TOTAL	211	211

VALOR CONTRATO		
ETAPA:	INTERVENTORIA	OBRA
INICIAL	$ 796.278.928,00	$ 2.455.237.837,00
ADICIONES	$ 139.026.666,00	$ 380.000.000,00
TOTAL	$ 935.305.594,00	$ 2.835.237.837,00

MODIFICACIONESDEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

MOD No	FECHA DE LA MODIFICACION	VALOR ADICION	PRORROGA	OTRO ASPECTO
1	26/12/2025	$ 139.026.666,00		
2				
3				
4				

MODIFICACIONESDEL CONTRATO DE OBRA

MOD No	FECHA DE LA MODIFICACION	VALOR ADICION	PRORROGA	OTRO ASPECTO
1	12/12/2025	$ 380.000.000,00		
2				
3				
4				

POLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORIA — GARANTE: SEGUROS DEL ESTADO

POLIZA	CUMPLIMIENTO DESDE	CUMPLIMIENTO HASTA	CALIDAD DEL SERVICIO DESDE	CALIDAD DEL SERVICIO HASTA	SALARIOS Y PRESTACIONES DESDE	SALARIOS Y PRESTACIONES HASTA
400 47 994000110040	19 9 2025	3 1 2027	3 5 2026	3 5 2031	19 9 2025	3 5 2029

POLIZAS CONTRATO DE OBRA — COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

POLIZA	CUMPLIMIENTO DESDE	CUMPLIMIENTO HASTA	SALARIOS Y PRESTACIONES DESDE	SALARIOS Y PRESTACIONES HASTA	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA DESDE	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA HASTA	POLIZA	RESPONSABILIDAD CIVIL DESDE	RESPONSABILIDAD CIVIL HASTA

CIP	COLEGIO	LOCALIDAD	SEDE	NOMBRE SEDE	AVANCE ANTERIOR	AVANCE ACTUAL (01/03/2026)	PROGR %	EJECUTADO VS PROG	Vlr FRENTE APROBADO	Vlr FRENTE A ESTE PERIODO	FECHA INICIO CRONOGRAMA	FECHA FIN CRONOGRAMA	jul-2025	jul-2025	ago-2025	ago-2025	sep-2025	sep-2025	oct-2025	oct-2025	nov-2025	dic-2025	dic-2025	ene-2026	ene-2026	feb-2026	feb-2026	mar-2026	mar-2026
915	INTEGRADO DE FONTIBÓN	FONTIBÓN	A	INTEGRADO DE FONTIBÓN	93,04%	98,50%	-6,46%		$ 149.356.686,19	$ 68.516.715,63	06/11/2025	27/02/2026																	
520	ANTONIO VAN UDEN	FONTIBÓN	C	SAN VICENTE	57,91%	71,04%	-13,13%		$ 490.905.466,84	$ 148.872.531,50	18/11/2025	13/04/2026																	
901	INSTITUTO TÉCNICO INTERNACIONAL	FONTIBÓN	A	INSTITUTO TÉCNICO INTERNACIONAL	61,48%	63,57%	-2,09%		$ 506.491.008,39	$ 185.980.389,67	06/11/2025	01/04/2026																	
1408	COLEGIO REPUBLICA BOLIVARIANA DE	LOS MÁRTIRES	B	SAMPER MENDOZA	47,98%	48,43%	-0,47%		$ 222.333.302,02	$ 95.891.221,84	24/11/2025	18/04/2026																	
1632	MARCO ANTONIO CARREÑO SILVA (IED)	PUENTE ARANDA	B	MARCO ANTONIO CARREÑO SILVA	63,28%	65,65%	-2,37%		$ 449.716.114,81	$ 82.663.507,58	06/11/2025	01/04/2026																	
1614	JULIO GARAVITO ARMERO (IED)	PUENTE ARANDA	B	MUZU No. 1	32,34%	63,23%	-30,89%		$ 215.764.375,07	$ 36.438.122,74	21/11/2025	11/05/2026																	
1603	CULTURA POPULAR (IED)	PUENTE ARANDA	C	DIEGO LUIS CORDOBA	66,64%	98,50%	-31,86%		$ 196.253.062,23	$ 47.667.255,85	13/11/2025	24/01/2026																	
TOTAL FRENTES DE OBRA						75,70%	-8,25%		$ 2.131.822.015,46	$ 667.219.745																			
EMERGENCIAS ATENDIDAS DURANTE EL PERIODO																													
1616	SILVERIA ESPINOSA DE RENDON (IED)	PUENTE ARANDA	B	RAFAEL POMBO		100,00%	100,00%	✓	$ 8.789.206,00	$ 8.789.206,00																			
1609	SILVERIA ESPINOSA DE RENDON (IED)	PUENTE ARANDA	A	SILVERIA ESPINOSA DE RENDON		100,00%	100,00%	✓	$ 17.578.413,00	$ 17.578.413,00																			
1612	EL JAZMIN (IED)	PUENTE ARANDA	B	LA PRIMAVERA		100,00%	100,00%	✓	$ 1.953.157,00	$ 1.953.157,00																			
914	RODRIGO ARENAS BETANCOURT	FONTIBÓN	A	SIMÓN BOLIVAR		100,00%	100,00%	✓	$ 1.953.157,00	$ 1.953.157,00																			
909	VILLEMAR EL CARMEN	FONTIBÓN	B	SANTA CECILIA		100,00%	100,00%	✓	$ 1.953.157,00	$ 1.953.157,00																			
915	INTEGRADO DE FONTIBÓN	FONTIBÓN	A	INTEGRADO DE FONTIBÓN		100,00%	100,00%	✓	$ 1.953.157,00	$ 1.953.157,00																			
529	MARIA JOSEFA CANELONES	FONTIBÓN	A	MARIA JOSEFA CANELONES		0,00%	0%	✓	$ 10.000.000,00	$ -																			
909	VILLEMAR EL CARMEN	FONTIBÓN	B	SANTA CECILIA		100,00%	100%	✓	$ 35.000.000,00	$ -																			
TOTAL FRENTES DE OBRA						87,50%	87,50%		$ 79.180.247	$ 34.180.247																			

ACUMULADO FRENTES DE OBRA				
TERMINADAS	EN EJECUCION	POR INICIAR	TOTAL	VALOR
0	7	0	7	$ 667.219.745
ACUMULADO EMERGENCIAS				
7	0	1	8	$ 34.180.247
TOTAL				
7	7		15	$ 701.399.992
FRENTES POR LOCALIDAD				


RELACION DE PAGOS EFECTUADOS																													
N◦ ACTA INTERVENTORIA	VALOR	N◦ ACTA OBRA	VALOR	N◦ ACTA INTERVENTORIA	VALOR	N◦ ACTA INTERVENTORIA	VALOR	N◦ ACTA INTERVENTORIA	VALOR	N◦ ACTA INTERVENTORIA	VALOR	N◦ ACTA INTERVENTORIA	VALOR	N◦ ACTA INTERVENTORIA	VALOR	N◦ ACTA INTERVENTORIA	VALOR	N◦ ACTA INTERVENTORIA	VALOR	N◦ ACTA INTERVENTORIA	VALOR	N◦ ACTA INTERVENTORIA	VALOR	N◦ ACTA INTERVENTORIA	VALOR	N◦ ACTA INTERVENTORIA	VALOR	N◦ ACTA INTERVENTORIA	VALOR
1		12		1		12		23		34																			
2	$ 500.169.705,00	13		2		13		24		35																			
3	$ 521.807.681,00	14		3		14		25		36																			
4		15		4		15		26		37																			
5		16		5		16		27		38																			
6		17		6		17		28		39																			
7		18		7		18		29		40																			
8		19		8		19		30		TOTAL INTERVENTORIA																			
9		20		9		20		31																					
10		TOTAL OBRA		10		21		32																					
11	$ 1.021.977.386,00			11		22		33		$																			

AVANCE GENERAL			
	TECNICO	FINANCIERO	TIEMPO
AVANCE	75,70%	36,09%	67,36%
PROGRAMADO	-8,25%		
ATRASO	83,95%	EN EJECUCION	
FECHA APROBACION CRONOGRAMA			


AVANCE GENERAL



EMERGENCIAS



AVANCE FÍSICO



AVANCE DE LOS FRENTES



OBSERVACIONES:

	PROGRAMACIÓN				REAL			ACUMULADO			
INFORME	SEMANA	FECHA	PROGRAMADO	% PROGRAMADO	AVANCE	EJECUTADO	DIFERENCIA	PROGRAMADO		EJECUTADO	
1	sem 1	03-oct-25	$ -	0,00%	0,00%	$ -	$ -	0,00%	$ -	0,00%	$0,00
2	sem 2	13-oct-25	$ -	0,00%	0,00%	$ -	$ -	0,00%	$ -	0,00%	$0,00
3	sem 3	20-oct-25	$ -	0,00%	0,00%	$ -	$ -	0,00%	$ -	0,00%	$0,00
4	sem 4	27-oct-25	$ -	0,00%	0,00%	$ -	$ -	0,00%	$ -	0,00%	$0,00
5	sem 5	03-nov-25	$ 4.755.494,21	0,22%	0,00%	$ -	$ 4.755.494,21	0,22%	$ 4.755.494,21	0,00%	$0,00
6	sem 6	10-nov-25	$ 8.125.912,59	0,38%	0,80%	$ 16.977.206,64	$ (8.851.294,05)	0,60%	$ 12.881.406,80	0,80%	$16.977.206,64
7	sem 7	17-nov-25	$ 5.288.020,00	0,25%	1,02%	$ 21.771.422,72	$ (16.483.402,72)	0,85%	$ 18.169.426,80	1,82%	$38.748.629,36
8	sem 8	24-nov-25	$ 17.444.983,27	0,82%	1,13%	$ 23.997.772,21	$ (6.552.788,94)	1,67%	$ 35.614.410,07	2,94%	$62.746.401,57
9	sem 9	01-dic-25	$ 40.343.446,53	1,89%	1,80%	$ 38.340.052,51	$ 2.003.394,02	3,56%	$ 75.957.856,60	4,74%	$101.086.454,08
10	sem 10	08-dic-25	$ 79.444.682,79	3,73%	1,43%	$ 30.382.417,28	$ 49.062.265,51	7,29%	$ 155.402.539,39	6,17%	$131.468.871,36
11	sem 11	15-dic-25	$ 108.209.197,15	5,08%	2,69%	$ 57.402.366,83	$ 50.806.830,32	12,37%	$ 263.611.736,54	8,86%	$188.871.238,19
12	sem 12	22-dic-25	$ 69.900.889,80	3,28%	2,91%	$ 62.085.827,21	$ 7.815.062,59	15,64%	$ 333.512.626,34	11,77%	$250.957.065,40
13	sem 13	29-dic-25	$ 75.956.528,24	3,56%	1,49%	$ 31.686.383,67	$ 44.270.144,57	19,21%	$ 409.469.154,58	13,26%	$282.643.449,07
14	sem 14	05-ene-26	$ 89.212.283,49	4,18%	5,66%	$ 120.616.837,44	$ (31.404.553,95)	23,39%	$ 498.681.438,07	18,92%	$403.260.286,51
15	sem 15	12-ene-26	$ 83.223.770,74	3,90%	7,45%	$ 158.783.369,63	$ (75.559.598,89)	27,30%	$ 581.905.208,81	26,36%	$562.043.656,14
16	sem 16	19-ene-26	$ 152.231.709,97	7,14%	5,56%	$ 118.625.799,96	$ 33.605.910,01	34,44%	$ 734.136.918,78	31,93%	$680.669.456,10
17	sem 17	26-ene-26	$ 114.051.601,68	5,35%	6,55%	$ 139.680.056,20	$ (25.628.454,52)	39,79%	$ 848.188.520,46	38,48%	$820.349.512,30
18	sem 18	02-feb-26	$ 97.149.131,29	4,56%	12,74%	$ 271.555.749,04	$ (174.406.617,75)	44,34%	$ 945.337.651,75	51,22%	$1.091.905.261,34
19	sem 19	09-feb-26	$ 123.336.874,83	5,79%	1,19%	$ 25.293.497,30	$ 98.043.377,53	50,13%	$ 1.068.674.526,58	52,40%	$1.117.198.758,64
20	sem 20	16-feb-26	$ 144.354.651,09	6,77%	4,62%	$ 98.397.025,80	$ 45.957.625,29	56,90%	$ 1.213.029.177,67	57,02%	$1.215.595.784,44
21	sem 21	23-feb-26	$ 133.044.130,87	6,24%	3,10%	$ 65.986.851,22	$ 67.057.279,65	63,14%	$ 1.346.073.308,54	60,12%	$1.281.582.635,66
22	sem 22	02-mar-26	$ 302.192.068,33	14,17%	1,75%	$ 37.330.123,72	$ 264.861.944,61	77,32%	$ 1.648.265.376,87	61,87%	$1.318.912.759,38
23	sem 23	09-mar-26	$ 188.077.906,58	8,82%	0,00%	$ -	$ 188.077.906,58	86,14%	$ 1.836.343.283,45		$1.318.912.759,38
24	sem 24	16-mar-26	$ 83.278.260,58	3,91%	0,00%	$ -	$ 83.278.260,58	90,04%	$ 1.919.621.544,03		$1.318.912.759,38
25	sem 25	23-mar-26	$ 87.605.509,23	4,11%	0,00%	$ -	$ 87.605.509,23	94,15%	$ 2.007.227.053,26		$1.318.912.759,38
26	sem 26	30-mar-26	$ 36.671.729,02	1,72%	0,00%	$ -	$ 36.671.729,02	95,87%	$ 2.043.898.782,28		$1.318.912.759,38
27	sem 27	06-abr-26	$ 67.465.761,55	3,16%	0,00%	$ -	$ 67.465.761,55	99,04%	$ 2.111.364.543,83		$1.318.912.759,38
28	sem 28	13-abr-26	$ 10.504.787,87	0,49%	0,00%	$ -	$ 10.504.787,87	99,53%	$ 2.121.869.331,70		$1.318.912.759,38
29	sem 29	20-abr-26	$ 10.012.682,84	0,47%	0,00%	$ -	$ 10.012.682,84	100,00%	$ 2.131.882.014,54		$1.318.912.759,38
30	sem 30	27-abr-26	$ -	0,00%	0,00%	$ -	$ -	100,00%	$ 2.131.882.014,54		$1.318.912.759,38
31	sem 31	04-may-26	$ -	0,00%	0,00%	$ -	$ -	100,00%	$ 2.131.882.014,54		$0,00
32	sem 32	11-may-26		0,00%	0,00%			100,00%	$ 2.131.882.014,54		
33	sem 33	18-may-26		0,00%	0,00%			100,00%	$ 2.131.882.014,54		
34	sem 34	25-may-26		0,00%	0,00%			100,00%	$ 2.131.882.014,54		
35	sem 35	01-jun-26		0,00%	0,00%			100,00%	$ 2.131.882.014,54		
36	sem 36	08-jun-26		0,00%	0,00%			100,00%	$ 2.131.882.014,54		
37	sem 37	15-jun-26		0,00%	0,00%			100,00%	$ 2.131.882.014,54		
38	sem 38	22-jun-26		0,00%	0,00%			100,00%	$ 2.131.882.014,54		
39	sem 39	29-jun-26		0,00%	0,00%			100,00%	$ 2.131.882.014,54		
40	sem 40	06-jul-26		0,00%	0,00%			100,00%	$ 2.131.882.014,54		
41	sem 41	13-jul-26		0,00%	0,00%			100,00%	$ 2.131.882.014,54		
42	sem 42	20-jul-26		0,00%	0,00%			100,00%	$ 2.131.882.014,54		
43	sem 43	27-jul-26		0,00%	0,00%			100,00%	$ 2.131.882.014,54		
			$ 2.131.882.014,54	100,00%	61,87%						

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 22 | **LOTE COP No 16**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


SEMANA No. 22 (Consecutivo) **DEL** 2/3/2026 (dd-mm-aa) **AL** 8/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 156 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16


COLEGIO INTEGRADO DE FONTIBON - SEDE A (ANEXO 1 REGISTRO FOTOGRÁFICO)



Se evidencia que se le da acabado al area fundida la semana pasada que se encontraba pendiente.

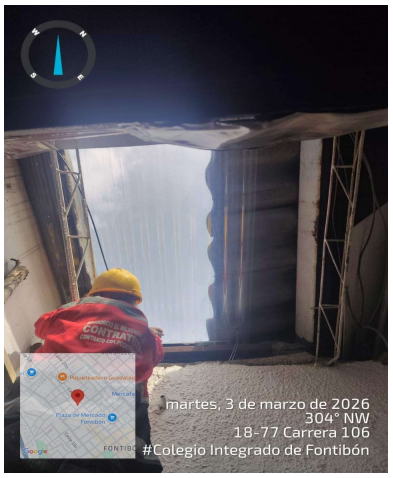

Se realiza la reinstalacion de la teja de cubierta del hall de paso al aula CRI donde se evidencia que esta no se encontraba asegurada.

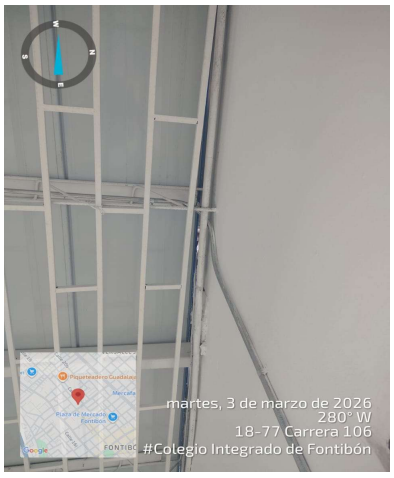

No se evidencia area de filtracion en el area del aula CRI, de acuerdo al reporte de la institucion.



Se realiza el alistado del area correspondiente a la placa del anden de acceso a la casona.



Se evidencia que se realiza la instalacion de la malla electrosoldada y se empieza a fundir la placa de contrapiso correspondiente al anden del area de las escaleras.



Se evidencia que se realiza la conexión de la tuberia de aguas lluvias.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 22 | **LOTE COP No 16**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 22 (Consecutivo) **DEL** 2/3/2026 (dd-mm-aa) **AL** 8/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 156 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

COLEGIO INTEGRADO DE FONTIBON - SEDE A (ANEXO 1 REGISTRO FOTOGRÁFICO)



Se evidencia que se realiza el escobeado al area de la placa correspondiente al acceso a las escaleras de la casona.



Se evidencia que se funde la placa del area correspondiente al ingreso a la casona.



Se evidencia que se realiza la conexión de la tuberia de aguas lluvias.



Se evidencia que se realiza la instalacion de las abrazaderas correspondientes a la tuberia de aguas lluvias.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 22 | **LOTE COP No 16**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 22 (Consecutivo) **DEL** 2/3/2026 (dd-mm-aa) **AL** 8/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 156 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

COLEGIO ANTONIO VAN UDEN - SEDE C (ANEXO 2 REGISTRO FOTOGRÁFICO)



Se evidencia que se debe realiza el raspado de los muros correspondiente al armario en el area de la biblioteca.



Se evidencia que se finalizaron actividades de pintura correspondiente a la perfileria metalica de la cubierta de la bateria de baños.



Se evidencia que se finalizo el enchape de la poceta lavatraperos en la bateria de baños.



Se evidencia que en el area de la cuhillas se adelantan actividades de pañete en el area de la bateria de baños.



Se evidencia que en el area de la cuhillas se adelantan actividades de pañete en el area de la bateria de baños.



Se evidencia que se realizo la pintura de fondeo del armario en el area de la biblioteca

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 22 **LOTE COP No 16**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 22 (Consecutivo) **DEL** 2/3/2026 (dd-mm-aa) **AL** 8/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 156 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

COLEGIO ANTONIO VAN UDEN - SEDE C (ANEXO 2 REGISTRO FOTOGRÁFICO)



Se evidencia que se siguen adelantando actividades de pulido en el piso, media caña y bocapuertas correspondientes a la bateria de baños.



Se evidencia que se avanza la segunda capa de pintura en el area de la biblioteca.



Se evidencia que se avanza la segunda capa de pintura en el area de la biblioteca.



Se evidencia que se da inicio a la instalacion de tuberia MT y puntos electricos, con su respectivo cableado en el rea de la bateria de baños.



Se evidencia que se da inicio a la instalacion de tuberia MT y puntos electricos, con su respectivo cableado en el rea de la bateria de baños.



Se evidencia que se realiza el armado del andamio para la ejecucion de la pintura de fondeo de la fachada (Viga).

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 22 | **LOTE COP No 16**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 22 (Consecutivo) **DEL** 2/3/2026 (dd-mm-aa) **AL** 8/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 156 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

COLEGIO TECNICO INTERNACIONAL - SEDE A (ANEXO 3 REGISTRO FOTOGRÁFICO)



Se evidencia que se finaliza la instalacion de la cornisa correspondiente al remate final del cielo razo en PVC correspondiente a la bateria de baños de bachillerato.



Se evidencia que se finaliza la instalacion de la cornisa correspondiente al remate final del cielo razo en PVC correspondiente a la bateria de baños de bachillerato.



Se evidencia que se realiza la reparacion de ciertos puntos correspondiente a los vanos del aula multiple.



Se evidencia que se da inicio a la aplicación de la boquilla correspondiente al aula multiple.



Se evidencia que se da inicio a la instalacion de la estructura del cielo razo en PVC, correspondiente a la bateria de baños de primaria.



Se evidencia que se da inicio a la instalacion del cielo razo en PVC correspondiente a la bateria de baños de primaria, area de niñas.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784


INFORME SEMANAL No 22 | **LOTE COP No 16**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 22 (Consecutivo) **DEL** 2/3/2026 (dd-mm-aa) **AL** 8/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 156 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

COLEGIO TECNICO INTERNACIONAL - SEDE A (ANEXO 3 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

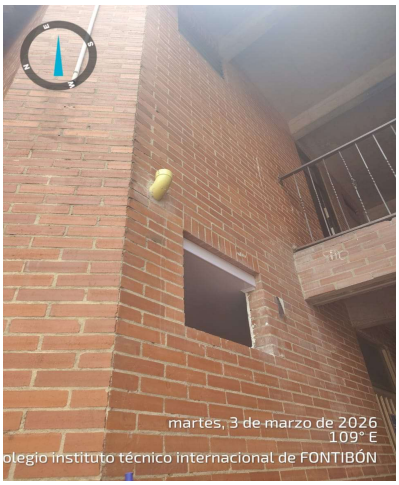

Se evidencia que se realiza la instalacion del codo correspondiente a la tuberia de ventilacion de la bateria de baños de primaria.



Se evidencia que se finaliza la instalacion del cielo razo en PVC y que se realiza la salida de los puntos electricos en la bateria de baños de bachillerato.



Se evidencia la instalacion del win en el area del vano de la puerta de la bateria de baños de bachillerato.



Se evidencia que se realiza la reparacion del enchape en el area correspondiente a los puntos hidraulicos e hidrosanitarios de la bateria de baños de bachillerato pendiente.



Se evidencia que se realiza en remate de enchape en el area del vano de la puerta.



Se evidencia que se realiza la boquilla del enchape instalado en el area del aula multiple.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 22 | **LOTE COP No 16**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 22 (Consecutivo) **DEL** 2/3/2026 (dd-mm-aa) **AL** 8/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 156 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

COLEGIO TECNICO INTERNACIONAL - SEDE A (ANEXO 3 REGISTRO FOTOGRÁFICO)



Se evidencia que se realiza la instalacion de lamparas en la bateria de baños de bachillerato en su totalidad.



Se evidencia la instalacion de lamparas en la bateria de baños de primaria, area de niñas.



Se evidencia que se esta realizando la instalacion de ventanas y rejillas de ventilacion correspondiente al aula multiple.



Se evidencia que se esta realizando la instalacion de ventanas y rejillas de ventilacion correspondiente al aula multiple.



Se evidencia que se esta realizando la reparacion del guardaescoba exterior correspondiente a la bateria de baños de primaria.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 22 **LOTE COP No 16**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 22 (Consecutivo) **DEL** 2/3/2026 (dd-mm-aa) **AL** 8/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 156 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

COLEGIO REPUBLICA DE VENEZUELA - SEDE B (ANEXO 4 REGISTRO FOTOGRÁFICO)



Área de la cancha limpia y despejada, libre de materiales y residuos.



Anclaje de Bajante en la parte frontal de la cubierta.



Retiro de Andamio, en condiciones desfavorables, sin mínimos de seguridad.



Pintura en estructura de la cancha de baloncesto en el Área de la cancha.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 22 | **LOTE COP No 16**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 22 (Consecutivo) **DEL** 2/3/2026 (dd-mm-aa) **AL** 8/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 156 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

COLEGIO MARCO ANTONIO CARREÑO - SEDE B (ANEXO 5 REGISTRO FOTOGRÁFICO)




Se realiza la aplicación de la primera capa de pintura en aceite color blanco en los salones de la institución.



Se ejecuta el pañete del guardascobas en el auditorio, con el fin de mejorar el acabado y nivelación de esta área.



Se realiza la fundición de dos tapas de cajas de inspección correspondientes al área del auditorio.

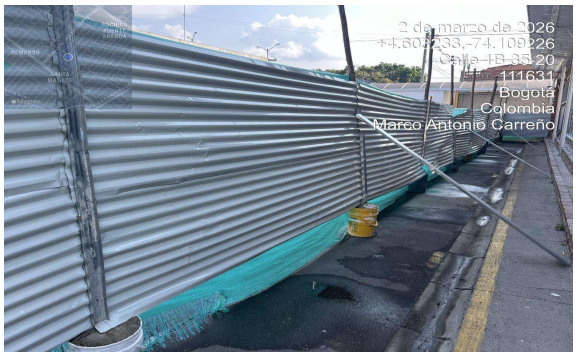

Se lleva a cabo la estructuración y refuerzo del cerramiento de la institución, debido a que este se encontraba en condiciones de inestabilidad.



Se realiza la soldadura de ángulos o soportes metálicos en el área del hall de la institución, actividad ejecutada por el soldador.



Se ejecuta el arreglo del marco de la puerta de uno de los salones, así como la fundición del pañete en el filo correspondiente.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 22 **LOTE COP No 16**


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 22 (Consecutivo) **DEL** 2/3/2026 (dd-mm-aa) **AL** 8/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 156 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16


COLEGIO MARCO ANTONIO CARREÑO - SEDE B (ANEXO 5 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

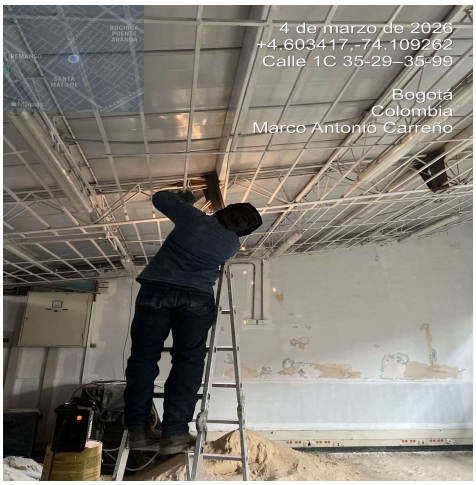

Se realiza la soldadura de ángulos metálicos en los diferentes salones de la institución, con el fin de garantizar soporte estructural.



Se efectúa corrección de pintura en diferentes áreas, debido a imperfecciones presentadas en el estucado previo.

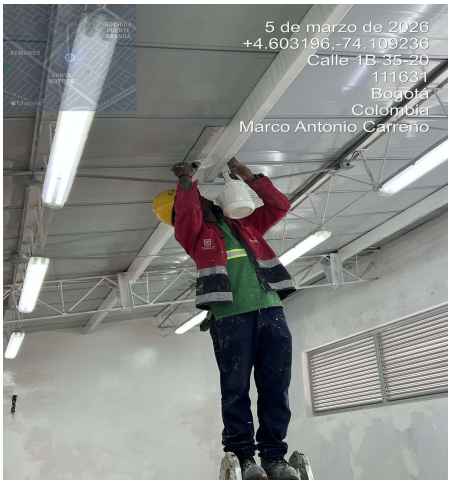

Se realiza la aplicación de pintura a los perfiles y ángulos metálicos previamente instalados, como protección y acabado final.



Se ejecuta la limpieza de la tubería correspondiente a la red eléctrica de media tensión (MT) de la institución, con el fin de garantizar su adecuado estado y funcionamiento.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784


INFORME SEMANAL No 22 | **LOTE COP No 16**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 22 (Consecutivo) **DEL** 2/3/2026 (dd-mm-aa) **AL** 8/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 156 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16


COLEGIO JULIO GARAVITO ARMERO - SEDE B (ANEXO 6 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

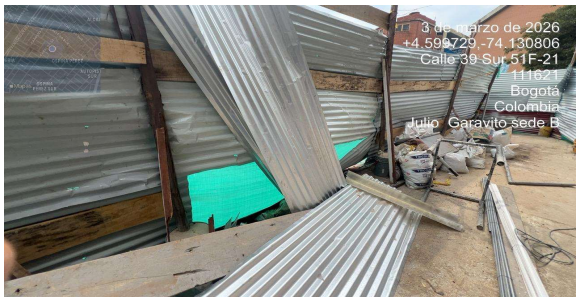

Se realiza llamado de atencion por el estado del cerramiento.



Se observa que se realiza la instalacion de la canal correspondiente al area administrativa y al hall de distribucion.

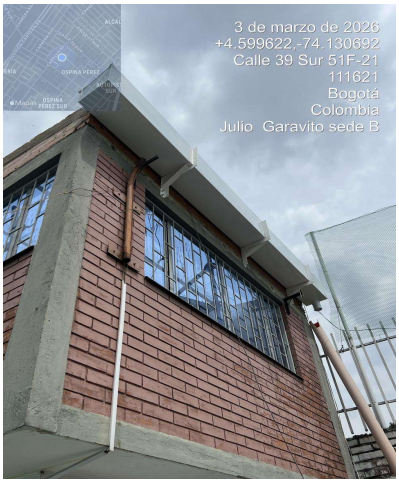

Se evidencia que se realiza la instalacion de la canal correspondiente al area de coordinacion.



Se evidencia el avance de la instalacion de cubierta en el area administrativa donde se observa un 75%.



Se evidencia que se avanza en el estuco del area de pagaduria.



Se evidencia que se realiza la instalacion del 25% pendiente de la cubierta del area administrativa.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 22 **LOTE COP No 16**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 22 (Consecutivo) **DEL** 2/3/2026 (dd-mm-aa) **AL** 8/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 156 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

COLEGIO JULIO GARAVITO ARMERO - SEDE B (ANEXO 6 REGISTRO FOTOGRÁFICO)



Se evidencia que en el area exterior de la fachada interna corrspondiente al hall de distribucion se avanza en la aplicación del estuco.



Se evidencia que se realiza la instalacion de la cubierta en el area de coordinacion.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 22 **LOTE COP No 16**


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 22 (Consecutivo) **DEL** 2/3/2026 (dd-mm-aa) **AL** 8/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 156 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

COLEGIO CULTURA POPULAR - SEDE C (ANEXO 7 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

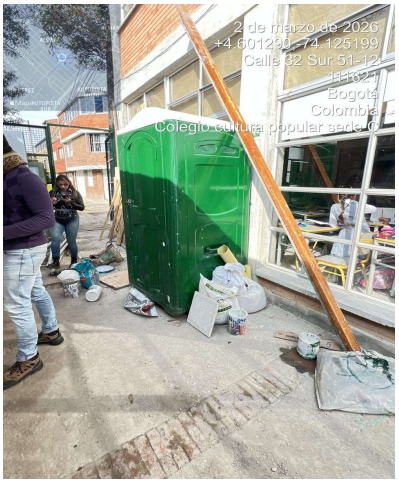

Debido que a la fecha se presenta un alto nivel de detalles en la institucion, de acuerdo a la revision realizada el dia Lunes la entrega programada no fue posible que se llevara a cabo y debio se reprogramada.



Debido que a la fecha se presenta un alto nivel de detalles en la institucion, de acuerdo a la revision realizada el dia Lunes la entrega programada no fue posible que se llevara a cabo y debio se reprogramada.



Debido que a la fecha se presenta un alto nivel de detalles en la institucion, de acuerdo a la revision realizada el dia Lunes la entrega programada no fue posible que se llevara a cabo y debio se reprogramada.



Debido que a la fecha se presenta un alto nivel de detalles en la institucion, de acuerdo a la revision realizada el dia Lunes la entrega programada no fue posible que se llevara a cabo y debio se reprogramada.



Debido que a la fecha se presenta un alto nivel de detalles en la institucion, de acuerdo a la revision realizada el dia Lunes la entrega programada no fue posible que se llevara a cabo y debio se reprogramada.



Debido que a la fecha se presenta un alto nivel de detalles en la institucion, de acuerdo a la revision realizada el dia Lunes la entrega programada no fue posible que se llevara a cabo y debio se reprogramada.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 22 | **LOTE COP No 16**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 22 (Consecutivo) **DEL** 2/3/2026 (dd-mm-aa) **AL** 8/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 156 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

COLEGIO CULTURA POPULAR - SEDE C (ANEXO 7 REGISTRO FOTOGRÁFICO)



Debido que a la fecha se presenta un alto nivel de detalles en la institucion, de acuerdo a la revision realizada el dia Lunes la entrega programada no fue posible que se llevara a cabo y debio se reprogramada.



Debido que a la fecha se presenta un alto nivel de detalles en la institucion, de acuerdo a la revision realizada el dia Lunes la entrega programada no fue posible que se llevara a cabo y debio se reprogramada.



Debido que a la fecha se presenta un alto nivel de detalles en la institucion, de acuerdo a la revision realizada el dia Lunes la entrega programada no fue posible que se llevara a cabo y debio se reprogramada.



Debido que a la fecha se presenta un alto nivel de detalles en la institucion, de acuerdo a la revision realizada el dia Lunes la entrega programada no fue posible que se llevara a cabo y debio se reprogramada.



Debido que a la fecha se presenta un alto nivel de detalles en la institucion, de acuerdo a la revision realizada el dia Lunes la entrega programada no fue posible que se llevara a cabo y debio se reprogramada.
