PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8155097

INFORME SEMANAL No 23 **LOTE COP No 16**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 23 (Consecutivo) **DEL** 9/3/2026 (dd-mm-aa) **AL** 15/3/2026 (dd-mm-aa)

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 163 días

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato)

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No. CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato)

LOTE COP: 16

CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORÍA


Contratista:	CONSORCIO EL MILAGROSO 2025	**Interventoria**	PROBINTEC S.A.S
RL del consorcio	RAFAEL MOGOLLÓN RODRÍGUEZ	**RL de Interventoria**	SANDRA STELLA MORENO BUITRAGO
Contrato No.	CO1.PCCNTR.8155097	**Contrato No.**	CO1.PCCNTR.8168931
Objeto	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS LOTE 16"	**Objeto**	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No. 6
Valor Inicial :	$ 2.455.237.837,00	**Valor Inicial:**	$ 796.278.928,00
AIU	33,88% $ 831.834.579,18	**Valor Adicional No. 1 del 26 de diciembre de 2026:**	$ 139.026.666,00
COSTO DIRECTO	$ 1.623.403.257,82	**Valor Total del Contrato:**	$ 935.305.594,00
OFERTADO	$ 2.176.494.644,00		
EMERGENCIAS	$ 100.000.000,00		
VALOR PARCIAL CON EMERGENCIAS	$ 2.276.494.644,00		
DIFERENCIA PARA EMERGENCIAS	$ 178.743.193,00		
Valor Parcial (Inicial + Emergencias)	$ 278.743.193,00		
Valor adicional No. 1:	$ 380.000.000,00		
Valor inicial No. 1 emergencias:	$ 200.000.000,00		
Valor adicional No.1 Obras Contractuales:	$ 180.000.000,00		
VALOR TOTAL INICIAL MAS EMERGENCIA	$ 2.835.237.837,00		
VALOR TOTAL EMERGENCIAS	$ 478.743.193,00		
VALOR TOTAL PARA OBRAS CONTRACTUALES	$ 2.356.494.644,00		
Plazo Inicial:	SIETE (7) MESES	**Plazo Inicial:**	SIETE (7) MESES
Fecha de Iniciación:	03/10/2025	**Fecha de Iniciación:**	03/10/2025
Fecha de Vencimiento:	02/05/2026	**Fecha de Vencimiento:**	02/05/2026

AVANCE DEL CONTRATO

	SEMANAL	ACUMULADO		ACUMULADO
Obra programada (%)	3,08%	73,38%	Obra Física Ejecutada (%)	1,86%	76,40%
Valor de la Obra programada:	$ 75.516.100,90	$ 1.801.548.300,31	Valor de la Obra Ejecutada:	$ 45.702.498,59	$ 1.875.836.782,29

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONTRATO

	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	70,30%	74,54%	3,03%
Durante el periodo	3,08%	1,86%	
Acumulado actual	73,38%	76,40%	

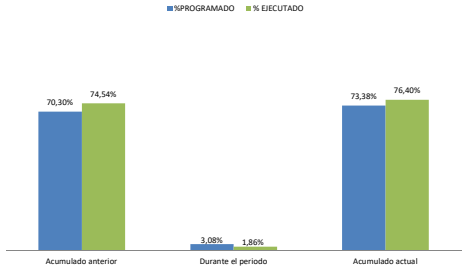

CPF	LOCALIDAD	COLEGIO	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA	%PROGRAMADO ACUMULADO	%EJECUTADO ACUMULADO	%DIFERENCIA ACUMULADO
915	FONTIBON	INTEGRADO DE FONTIBON - SEDE A	3,37%	3,37%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
920	FONTIBON	ANTONIO VAN UDEN - SEDE C	2,01%	0,21%	-1,80%	50,77%	71,25%	20,48%
901	FONTIBON	INSTITUTO TECNICO INTERNACIONAL . SEDE A	4,78%	3,61%	-1,17%	65,63%	67,18%	1,55%
1408	LOS MARTIRES	REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA - SEDE B	1,42%	1,11%	-0,31%	63,27%	46,38%	-16,89%
1632	PUENTE ARANDA	MARCO ANTONIO CARREÑO SILVA - SEDE B	9,12%	0,19%	-8,93%	53,90%	50,09%	-3,81%
1614	PUENTE ARANDA	JULIO ARMERO GARAVITO - SEDE B	0,19%	3,90%	3,71%	51,04%	87,13%	36,09%
1603	PUENTE ARANDA	CULTURA POPULAR - SEDE C	0,64%	0,64%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
			3,08%	1,86%	-1,21%	73,49%	85,11%	11,62%

EMERGENCIAS Y/O OBRAS PRIORITARIAS

CPF	LOCALIDAD	COLEGIO	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA	VALOR TOTAL	VALOR CONTRATO	DIFERENCIA
1616	PUENTE ARANDA	SILVERIA ESPINOSA DE RENDON - SEDE A	0,00%	100,00%	100,00%	$ 8.789.206,00	$ 8.789.206,00	$ -
1609	PUENTE ARANDA	SILVERIA ESPINOSA DE RENDON - SEDE B	0,00%	100,00%	100,00%	$ 17.578.413,00	$ 17.578.413,00	$ -
1612	PUENTE ARANDA	EL JAZMIN - SEDE B	0,00%	100,00%	100,00%	$ 1.953.157,00	$ 1.953.157,00	$ -
914	FONTIBON	RODRIGO ARENAS BETANCOURT - SEDE A	0,00%	100,00%	100,00%	$ 1.953.157,00	$ 1.953.157,00	$ -
909	FONTIBON	VILLEMAR EL CARMEN - SEDE B	0,00%	100,00%	100,00%	$ 1.953.157,00	$ 1.953.157,00	$ -
915	FONTIBON	INTEGRADO DE FONTIBON - SEDE A	0,00%	100,00%	100,00%	$ 1.953.157,00	$ 1.953.157,00	$ -
929	FONTIBON	MARIA JOSEFA CANELONES - SEDE A	0,00%	0,00%	0,00%	$ 10.000.000,00	$ -	$ 10.000.000,00
909	FONTIBON	VILLEMAR EL CARMEN - SEDE B	0,00%	100,00%	100,00%	$ 35.000.000,00	$ -	$ 35.000.000,00
					87,50%	$ 79.180.247,00	$ 478.743.193,00	$ (399.562.946,00)

AVANCE FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$ 2.455.237.837,34
VALOR PARCIAL 1	$ 88.202.201,00	
VALOR PARCIAL 2	$ 500.169.705,00	
VALOR PARCIAL 3	$ 521.807.681,00	
TOTAL VALOR FACTURADO	$ 1.110.179.587,00	
SUMAS IGUALES	$ 1.345.058.250,34	$ 1.345.058.250,34


INDICADOR FINANCIERO	VALOR FACTURADO	VALOR PAGADO
	$ 1.110.179.587,00	$ 1.110.179.587,00

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

INDICADOR TECNICO	% DE AVANCE PROGRAMADO	% DE AVANCE EJECUTADO	% RETRASO - % ADELANTO +
	73,38%	76,40%	3,03%

INDICADOR TIEMPO	DIAS	RETRASO
	163	5

CURVA S

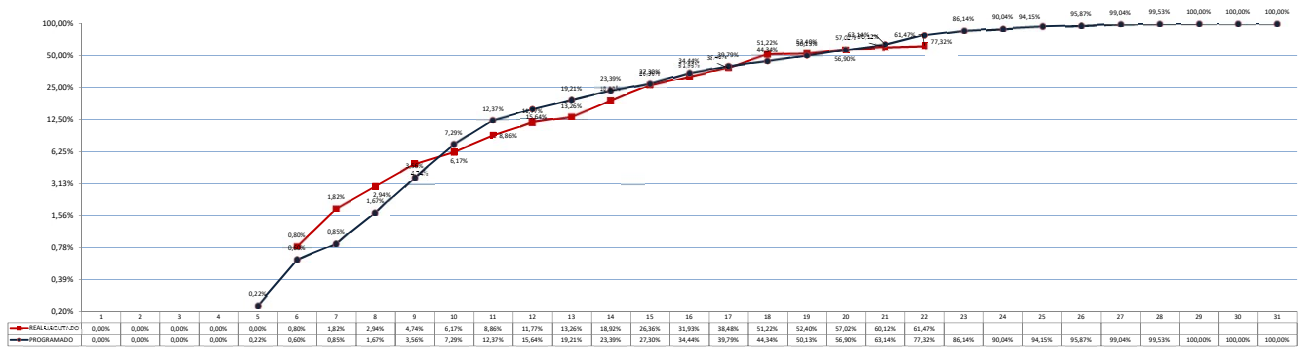

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
REALEJECUTADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,80%	1,82%	2,94%	4,74%	6,17%	8,86%	11,77%	13,26%	18,92%	26,36%	31,93%	38,48%	51,22%	52,40%	57,02%	60,12%	61,47%									
PROGRAMADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,22%	0,60%	0,85%	1,67%	3,56%	7,29%	12,37%	15,64%	19,21%	23,39%	27,30%	34,44%	39,79%	44,34%	50,13%	56,90%	63,14%	77,32%	86,14%	90,04%	94,15%	95,87%	99,04%	99,53%	100,00%	100,00%	100,00%

GENERALIDADES EN RELACION A LOS 07 FRENTES DE TRABAJO

1.Comite de obra N°12: Se lleva a cabo el comité de obra N.12 solicitado por la supervisión; este cuenta con la participación del Supervisor del contrato, la Interventoría, el contratista de obra.

2.Revision de acta parcial N°04: Se lleva a cabo la revision del acta parcial N.04 solicitado por la supervisión; este cuenta con la participación del Supervisor del contrato, la Interventoría, el contratista de obra. Se remiten detalles y se solicita fecha de entrega de esta subsanada para el dia Sabado 14 de Marzo de 2026.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8155097

INFORME SEMANAL No 23 **LOTE COP No 16**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 23 (Consecutivo) **DEL** 9/3/2026 (dd-mm-aa) **AL** 15/3/2026 (dd-mm-aa)

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 163 días

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO INTEGRADO DE FONTIBON - SEDE A (ANEXO 1 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades tecnicas: Se evidencian los siguientes avances en el área pendiente de intervención:
La Casona: Se evidenció la ejecución de actividades correspondientes a la finalización de la fundida de la placa de contrapiso del andén y su respectivo acabado. Asimismo, se finalizaron las actividades relacionadas con el pulido de detalles de pintura en la canal instalada previamente y la instalación de abrazaderas para el desagüe.
De acuerdo con lo anterior, se ejecutaron en su totalidad los seis (06) apuntalamientos en las áreas correspondientes a cuatro (04) contrafuertes y dos (02) ubicados en el área de los leones.
Teniendo en cuenta que se realizará la entrega de la institución, se llevó a cabo una jornada de aseo general en toda el área de intervención y en el espacio que había sido asignado como punto de acopio de materiales. Debido a que la intervención realizada corresponde a una acción de mitigación, se dejó instalado el cerramiento en lámina de zinc con recubrimiento en polisombra, finalizando además el área donde se encontraba el acceso o broche de ingreso a este sector.
2. Seguridad Social y SST: Durante la semana se constató que el cerramiento perimetral se encuentra en buenas condiciones, recubierto con tejas de zinc y polisombra, y debidamente señalizado. Asimismo, se evidenció buen orden y aseo en la zona de trabajo, con un proceso activo de recolección de residuos y organización del área. Durante la visita se realizó acompañamiento por parte del personal de SST, con el fin de reforzar el uso adecuado de los EPP y efectuar la entrega de los elementos pendientes al personal. De igual manera, se verificó que los cárcamos asociados a las bajantes pluviales se encuentran limpios y protegidos con malla, con el fin de evitar la caída de residuos al sistema de desagüe.
Adicionalmente, se programó el retiro del baño portátil del colegio para el jueves, como parte del proceso de ordenamiento del área de obra. Finalmente, se definió que los residuos generados en este frente de obra serán trasladados al Colegio Técnico Internacional, el cual funcionará como punto de acopio zonal en Fontibón para su posterior recolección.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: A la fecha, la institución presenta un desarrollo del 100% de las actividades y la institucion se encuentra lista para entrega.

4.1. Actividades programadas NO ejecutadas: N/A

4.2. Actividades EJECUTADAS a la fecha: N/A

5. Generales: Durante el Comité de Obra N.° 12, el apoyo a la supervisión informó que la entrega de la institución a la SED se realizaría el martes 17 de marzo de 2026. En este mismo espacio se indicó la importancia de realizar una revisión y poda de los árboles, debido a que se presenta una alta acumulación de residuos vegetales en la canal, lo cual puede afectar el correcto funcionamiento de esta y de las bajantes. Frente a esta observación, el apoyo a la supervisión informó que ya se realizó la solicitud correspondiente para la intervención silvicultural.
De acuerdo con la presentación del balance presupuestal, se evidenció un desfase en el presupuesto, por lo cual el apoyo a la supervisión autorizó que los apuntalamientos que inicialmente se presentarían como NP sean tramitados y presentados como atención por emergencia.

6. Ambiental: Se realizó recorrido en el frente, se sigue evidenciando residuos que está cerca de las zonas verdes y a unos individuos arbóreos, por lo que se recomienda realizar la disposición total del material, garantizar jornadas de orden y aseo periódicamente e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA).

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO ANTONIO VAN UDEN - SEDE C (ANEXO 2 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: A la fecha, la ejecución de las actividades en la institución se presenta de la siguiente manera:
- **Batería de baños:** Se evidencia la continuidad en la ejecución de actividades de estuco en los muros, específicamente en la parte superior de estos y en las cuchillas, así como el estucado completo de algunos muros. Igualmente, se realizaron actividades de impermeabilización en la placa correspondiente al tanque de suministro, así como el respectivo llenado del tanque para verificar su correcto funcionamiento.
- **Biblioteca:** Se ejecutaron actividades de pintura en los muros y en el recubrimiento en superboard de la canal de la cubierta de esta área. De igual manera, se avanzó en la pintura e instalación de las puertas de las aulas.
- **Bloque Alianza:** Se evidenció la instalación de la ventanería del aula pendiente, así como la pintura del muro interno correspondiente a este espacio. Se encuentra pendiente la instalación de los vidrios de dicha ventanería.

2. Seguridad Social y SST: Se programó y ejecutó nuevamente la limpieza de los baños portátiles los lunes y jueves, con el fin de reforzar las rutinas de aseo y las condiciones de higiene en las unidades sanitarias. El jueves se llevó a cabo una charla de seguridad dirigida por el técnico de SST y la ingeniera ambiental del contratista, enfocada en el uso adecuado de los EPP, trabajos seguros en alturas y armado seguro de andamios.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: A la fecha, la institución presenta un avance físico del 0,21 % en la ejecución de las actividades, frente a un valor esperado del 2,01 % para el periodo evaluado. Esto refleja un desarrollo inferior de un 1,8 % , este valor se debe a un tema de ejecucion de actividades en cantidades menores a las esperadas y su valor financiero no tienen peso sobre el presupuesto.

4.1. Actividades programadas NO ejecutadas: Se evidencia que las actividades no desarrolladas en este periodo pero programadas responde a actividades no requeridas pero programadas y actividades derivadas pero pendiente por actividades no ejecutadas.
Los items no desarrollados a la fecha son los siguientes:
- TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 20 METROS.
- CIELO RASO BLANCO PVC SISTEMA 200 GS COLOR BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ACCESORIOS, INSTALACIÓN DE LÁMPARA, SOPORTES ETC.) ESPESOR (7 MM - 10 MM) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)

4.2. Actividades EJECUTADAS a la fecha: N/A

5. Generales: Durante el Comité de Obra N.° 12, se evidenció que la cubierta correspondiente al hall de distribución que comunica con la batería de baños requiere una revisión para definir su correcta distribución. De acuerdo con lo anterior, el contratista solicitó realizar una visita en sitio en compañía de la SED y la interventoría, con el fin de establecer la solución técnica correspondiente.
De acuerdo con la presentación del balance presupuestal, se evidenció un desfase en el presupuesto, por lo cual el apoyo a la supervisión autorizó que las actividades relacionadas con la cubierta del hall de distribución y la instalación de rejas de protección sean presentadas como obra prioritaria. En lo que respecta a las rejas de protección, se modificó la cantidad inicialmente prevista y se solicitó que su instalación se realice únicamente en la fachada correspondiente a la portería.

6. Ambiental: Se verifico el cerramiento en buen estado, se evidencian materiales de construcción y RCD (Volumen medio) acopiados y debidamente en lonas, por lo que se recomienda garantizar jornadas de orden y aseo periódicamente y realizar la disposición adecuadamente el material posteriormente respecto a las especificaciones técnicas y ambientales.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO TECNICO INTERNACIONAL - SEDE A (ANEXO 3 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Durante la semana se ejecutaron actividades en diferentes frentes de trabajo al interior de la institución educativa, conforme se detalla a continuación:
- **Batería de baños – Bachillerato:** Se realizaron actividades de pulido de la baldosa de pisos, así como el remate de los muros en la unión entre el cielo raso y la instalación de los enchapes. De igual manera, se ejecutaron los remates correspondientes al área interna de los registros.
- **Batería de baños – Primaria:** Se llevaron a cabo actividades de pulido de la baldosa de pisos y remates en los muros en la unión entre el cielo raso y los enchapes, así como los remates en el área interna de los registros. Adicionalmente, se realizaron trabajos en los vanos de remate y la instalación de las rejillas de ventilación correspondientes. Se evidenció la finalización de la instalación de la bajante de reventilación y su respectivo recubrimiento en carpintería metálica.
- **Aula múltiple:** Se están ultimando detalles relacionados con la pintura de la estructura metálica, el remate de la instalación de guardaescobas y la boquilla de la cerámica. En cuanto a la instalación de la carpintería metálica correspondiente a ventanas y rejillas de ventilación, se adelantan resanes en la fachada. Asimismo, se evidenció la instalación interna del extractor de aire, previamente autorizado por el supervisor. Finalmente, se realizó el mantenimiento de la reja existente, la cual fue nuevamente instalada en el área de la hoyleta.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado El personal de SST realizó una capacitación sobre el uso adecuado de los EPP, con énfasis en trabajos seguros en alturas y en las condiciones requeridas para el desarrollo de actividades en zonas elevadas. Se indicó la necesidad de coordinar la ejecución de trabajo seguro en alturas para la instalación del tubo de ventilación de los baños de primaria, debido a la altura presente en estos frentes de trabajo.
De igual manera, se realizaron actividades de limpieza de los baños portátiles en horas de la mañana del martes, mejorando las condiciones de higiene en el área de trabajo y se dejó previsto que en este colegio se consolidará un punto de acopio temporal para luminarias y material residual de construcción, con el fin de programar posteriormente una recolección organizada de dichos residuos.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: A la fecha, la institución presenta un avance físico del 3,61 % en la ejecución de las actividades, frente a un avance esperado del 4,78 % para el periodo evaluado. Esto representa una desviación negativa del 1,17 %, debido a que no se observa el desarrollo de actividades en referencia a la instalacion de aparatos sanitarios.

4.1. Actividades programadas NO ejecutadas: Se evidencia que las actividades no desarrolladas en este periodo pero programadas responde a actividades no requeridas pero programadas y actividades derivadas pero pendiente por actividades no ejecutadas.
Los items no desarrollados a la fecha son los siguientes:
- TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 20 METROS.
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL LÍNEA INFANTIL COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH) .
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH) .
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS CORRIDO EN POLICUARZO CON SUBDIVISIÓN POR MÓDULO DE SERVICIO, FALDON FRONTAL DE 30 CM, SALPICADERO DE 6 CM, REENGRUESE DE 3 CM TERMINADO ANCHO 50 CM Y DISTANCIAMIENTO MINIMO ENTRE EJES DE GRIFOS A 60CM.
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN).
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLÁSTICA.
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 4 MM FLOTANTE CON ESTRUCTURA EN TUBULAR DE 1" EN ALUMINIO

4.2. Actividades EJECUTADAS a la fecha: Se evidencia que las actividades ejecutadas fuera de programacion obedecen a actividades que se requieren para los acabados mayores de las areas y poder avanzar en los detalles menores.

Colegio Técnico Internacional - Sede A						SEMANA N°23 (09 al 15-03)				
(a) ITEM ENTIDAD	(b) DESCRIPCION ACTIVIDAD	(c) UNID.	CONDICIONES CONTRACTUALES			% PROGRAMADO	CANT. EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	% DE CANT. EJECT.	% DE VALOR EJECT.
			(d) CANT	(e) VR UNIT	(f) VR PARCIAL					
8.1.42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO LED HERMÉTICA DE SOBREPONER 2X24W INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	12,00	$ 202.961,00	$ 2.435.532,00	0,00%	10	$ 2.029.610,00	83%	0,41%
9.2.8	VENTANERIA ALUMINIO PLA PINTURA NEGRA ELECTROSTATICA 5+3, SUMINISTRO E INSTALACION	M2	9,56	788.289,00	$ 7.551.809,00	0,00%	3	$ 2.364.867,00	31%	0,48%
9.2.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANERIA EN ALUMINIO CON PERSIANA	M2	2,01	$ 724.676,00		0,00%	2	$ 1.449.352,00	41%	0,29%
10.1.26	ALQUILER BAÑO PORTATIL COMPLETO INCLUYE SANITARIO ORINAL Y LAVAMANOS PARA OBRAS MODALIDAD DE EMERGENCIA EN CONDICIONES ESPECIALES INCLUYE 5 ASEOS	MES	16,00	$ 876.140,00	$ 14.018.240,00	0,00%	8	$ 7.009.120,00	50%	1,42%
11.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES PARA BAÑO INSTITUCIONAL CONFUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIACIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DET	M2	78,80	$ 957.420,00	$ 75.444.696,00	0,00%	5	$ 4.787.100,00	6%	0,97%

5. Generales: Durante el Comité de Obra N.° 12, se informó que se tenía prevista la instalación de la bajante de reventilación correspondiente a la batería de baños de bachillerato; sin embargo, debido a que en el área donde se debe realizar el armado del andamio transita personal de la institución, el contratista solicitó que se realice la señalización adecuada del área de trabajo. Frente a esta solicitud, el apoyo a la supervisión aprobó la medida, pero solicitó que se realice una comunicación vía WhatsApp para remitirla al gestor territorial, con el fin de coordinar el apoyo con la institución.
De acuerdo con la presentación del balance presupuestal, se evidenció un desfase en el presupuesto, por lo cual el apoyo a la supervisión autorizó que las actividades correspondientes a la instalación de pérgolas en el área del auditorio y el punto de refrigerio, el cambio del policarbonato de la cubierta de la tarima y la instalación de rejas de protección en el aula múltiple sean retiradas del presupuesto y no se ejecuten.

6. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, Se verifico el cerramiento en buen estado, se evidencia material de construcción y RCD (Volumen medio-alto) acopiados, sin afectación a sumideros, se recomendo al contratista disponer adecuadamente ante el gestor ya que cuentan con la cantidad minima,al igual, realizar jornadas de orden y aseo periódicamente al igual que implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA).

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO REPUBLICA DE VENEZUELA - SEDE B (ANEXO 4 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Durante el período evaluado se realizo el cerramiento para iniciar con actividades de pergola.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado no se evidenció la ejecución de actividades relacionadas con el componente de SST en el frente de obra. Por lo tanto, no se registraron verificaciones, inspecciones ni seguimiento a actividades asociadas a este componente durante dicho periodo.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: Para el presente informe se ajustaron las cantidades conforme al balance presentado; no obstante, se precisa que aún existen algunas actividades que no cuentan con programación, por lo que no son evaluadas en el presente informe.

4.1. Actividades programadas NO ejecutadas:
- PINTURA EXTERIOR DFE ALTA RESISTENCIA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)
- PINTURA EXTERIOR DE ALTA RESISTENCIA A TRES MANOS (A 0.6M, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS
- EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)
- SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI
- DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE ADOQUÍN
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)
- Se aclara que la actividad respecto a la inslatacion de la estructura metalica cambio de alcance, incrementando en su nivel de complejidad frente a lo inicialmente previsto, derivado de nuevas condiciones técnicas identificadas durante la ejecución.

4.2. Actividades EJECUTADAS a la fecha: N/A

5. Generales: El ingeniero apoyo a la supervision solicita realizar la conexión a la caja de inspección correspondiente. La interventoria reitera la solicitud de andamio para acceder a la cubierta a hacer una verificacion

6. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, no se encuentran acopios de RCD ni material, se encuentran residuos vegetal al igual se recomendó al contratista si realiza otras actividades implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA)

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO MARCO ANTONIO CARREÑO - SEDE B (ANEXO 5 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Durante el periodo reportado se ejecutaron las siguientes actividades:
- Trabajos demolicion de piso
- Estuco y sika
- Bajante
- Jornada de aseo en áreas intervenidas.

2. Seguridad social y SST: Durante este periodo se realizó verificación del uso de EPP por parte del personal en obra, incluyendo guantes, cascos y gafas de seguridad, debido a que se están ejecutando actividades de demolición en el área intervenida. Con el fin de no afectar las actividades académicas del colegio, se habilitó un área de acopio temporal dentro de la zona intervenida, destinada al almacenamiento de mobiliario y equipos institucionales.
Se realizó el traslado de equipos y elementos del segundo piso, área correspondiente a sala de profesores y sala informática, donde se encontraban almacenados equipos tecnológicos, microscopios y demás elementos institucionales. Esta actividad se efectuó con acompañamiento de la coordinadora del colegio y una docente, quienes realizaron registro mediante lista de chequeo de los elementos trasladados, garantizando control y verificación del inventario durante el proceso.
Se realizó verificación del estado y correcto funcionamiento del cerramiento actual, con el fin de garantizar condiciones adecuadas de seguridad y delimitación del área de obra.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: Para el presente informe se ajustaron las cantidades de acuerdo con el balance presentado; sin embargo, varias actividades, algunas de las cuales ya se encuentran ejecutadas, aún no cuentan con programación, razón por la cual no se consideraron dentro de este informe. Se precisa que el porcentaje de atraso reportado también se ve influenciado por esta situación. Se espera que para el próximo informe se cuente con la programación correspondiente, con el fin de que el reporte de avance refleje de manera más precisa las actividades efectivamente ejecutadas.

4.1. Actividades programadas NO ejecutadas:
- MURO EN DRYWALL DOBLE CARA E= 10 CM, LÁMINA DE FIBROCEMENTO RESISTENTE A LA HUMEDAD 1/2" INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN.

4.2. Actividades EJECUTADAS a la fecha: Se deja constancia de que el contratista ha ejecutado actividades que no se encuentran contempladas en la programación contractual y que, por tanto, no aportan al porcentaje de avance. Entre ellas se incluyen avances en enchape, aplicación de pañete, retiro de enchape en muros y piso,aplicacion de estuco, enchape de guardaescobas, puertas y la desconexión de veinte (20) puntos eléctricos, actividad no contractual.
En consecuencia, se requiere que estos ítems sean revisados y ajustados en la programación correspondiente al balance

5. Generales: En el comité realizado durante la semana, y conforme a lo definido por el ingeniero apoyo a la supervision, se estableció que la bajante del aula posterior del colegio sallera por el muro hacia la calle.

6. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, cuenta con el cerramiento adecuado en el frente, se evidencio que el área de acopios fue trasladado provisionalmente a un salón de la institución con el objetivo de organizar el frente de trabajo y los materiales de obra, cuenta con gran cantidad de residuos en el frente , se recomienda garantizar jornadas de orden y aseo periódicamente, disponer adecuadamente todos los residuos al igual se recomendo al contratista implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA).

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA **CO1.PCCNTR.8155097**

INFORME SEMANAL No 23 **LOTE COP No 16**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 23 (Consecutivo) **DEL** 9/3/2026 (dd-mm-aa) **AL** 15/3/2026 (dd-mm-aa)

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 163 días

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato)

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No. CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato)

LOTE COP: 16

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO JULIO GARAVITO ARMERO - SEDE B (ANEXO 6 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Durante la semana se ejecutaron actividades en diferentes frentes de trabajo al interior de la institución educativa, conforme se detalla a continuación:
Oficinas administrativas: Se evidencia la continuidad en la ejecución de actividades de estuco en el área de las oficinas. Asimismo, se observa la realización de remates de mampostería correspondientes a la reparación del vano existente para el extractor de ventilación. Igualmente, se ejecutaron remates de las cintas de la ventanería en general y se realizó la toma de medidas de los vanos, con el fin de enviar la información a producción para la fabricación de la ventanería.
En el área de las escaleras, se realizó la diagramación y el punto de arranque para la instalación de la baldosa, la cual fue instalada en su totalidad. De igual manera, se ejecutaron actividades correspondientes al revoque o acabado final de la baldosa instalada.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se realizó verificación del estado y correcto funcionamiento de los andamios utilizados en la ejecución de las actividades de obra, al igual que se efectuó verificación de los EPP del personal presente en obra, incluyendo casco, botas de seguridad y líneas de vida.
Se verificó el uso de tapabocas por parte del personal, debido a que se están ejecutando actividades de lijado de estuco en los muros del segundo piso del área administrativa, lo cual genera material particulado. Se le recomienda al contratista realizar la reposición de dotación al personal e implementar jornadas de orden y aseo. En el área se evidencia acumulación de materiales como chatarra, puertas en desuso, escombros y otros residuos de obra, por lo que se recomienda realizar clasificación y retiro de estos elementos para mejorar las condiciones de orden y seguridad.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: A la fecha, la institución presenta un avance físico del 3,65 % en la ejecución de las actividades, frente a un avance esperado del 3,51 % para el periodo evaluado. Esto representa una desviación positiva del 0,14 % , en referencia a actividades en mayores cantidades.

4.1. Actividades programadas NO ejecutadas: N/A

4.2. Actividades EJECUTADAS a la fecha: Se evidencia que las actividades que tuvieron un desarrollo no programado hacer referencia al desarrollo del suministro e instalacion de la canal y la cubierta tiposandwich en su totalidad.

Colegio Julio Garavito Armero - Sede B						SEMANA Nº23 (09 al 15-03)				
			CONDICIONES CONTRACTUALES							
(a) ITEM ENTIDAD.	(b) DESCRIPCION ACTIVIDAD	(c) UNID.	(d) CANT.	(e) VR UNIT	(f) VR PARCIAL	% PROGRAMADO	CANT. EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	% DE CANT. EJECT.	% DE VALOR EJECT.
16.1.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 200 A 450 mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm y 40 mm. PANEL METALICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER, LIBRE DE ACEITES – FIJACION CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 .INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEGUN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).	M2	149,43	$ 266.229,00	$ 39.266.299,00	0,00%	16	$ 3.940.436,00	10%	0,32%
16.1.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLO (85 A 100 CM) INCLUYE SOPORTES METALICOS PARA FIJAR LA CANAL EN LA FACHADA ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE	M	16,99	$ 319.940,00	$ 5.435.791,00	0,00%	2	$ 639.880,00	12%	0,59%

5. Generales: N/A

6. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, cuenta con el cerramiento adecuado, se verifica que la mezcla de concreto se realiza en batea metálica, se reportó el ingreso de material, se evidencio falta de orden en la zona de acopio de materiales y residuos, se recomienda organizar una sola zona de acopio, disponer los residuos, garantizar jornadas de orden y aseo periódicamente al igual que implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA).

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO CULTURA POPULAR - SEDE C (ANEXO 7 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: Se realizó la entrega definitiva de las áreas intervenidas del colegio, teniendo en cuenta que la entrega anterior había sido aplazada debido a observaciones relacionadas con pintura, acabados, manejo de basuras y nivelación de algunas luminarias.
Durante la jornada se llevó a cabo recorrido de verificación de las actividades ejecutadas y de los espacios intervenidos, evidenciando la corrección de las observaciones previamente realizadas.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: A la fecha, la institución presenta un avance físico del 0,35 % en la ejecución de las actividades programadas, frente a un valor esperado del 0,99 % para el periodo evaluado. Esto refleja un desarrollo inferior de un 0,64 % , se informa que este porcentaje se desarrolla de esta manera debido que a la fecha esta institucion ya deberia estar finalizada, de acuerdo a esto no se presentara ningun sobre avance de las actividades proximas a ejecutar.

4.1. Actividades programadas NO ejecutadas: N/A

4.2. Actividades EJECUTADAS a la fecha: N/A

5. Generales: El día martes 10 de marzo se realizó, en compañía del apoyo a la supervisión, directora de interventoría, director de obra, gestor territorial, trabajadora social, residente e inspector de interventoría, residente de obra y personal de remates y aseo, la entrega de las áreas intervenidas a la institución.
La revisión fue realizada por parte del coordinador de la institución, debido a que el rector no se encontraba presente. Durante la inspección se evidenció que las áreas fueron recibidas sin observaciones y a conformidad por parte de los presentes; sin embargo, queda pendiente la recolección de la firma del acta de entrega de espacios.
Durante la entrega, el apoyo a la supervisión identificó dos detalles que deben ser atendidos:
• En el módulo N.° 4 de las aulas administrativas, se debe realizar la instalación de una película tipo sandblasting.
• Se debe realizar el sellado de la caja de inspección de la garita de vigilancia mediante un cordón de Sikaflex.
Por parte del contratista, aún se encuentran pendientes las actividades correspondientes a la instalación del flanche del shut de basuras, así como la entrega formal y física del manual de mantenimiento. La ultima actividad descrita quedo programada para su entrega el día lunes 15 de marzo de 2026.

6. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, no se encuentra acopio de material ni RCD en el frente, se realizó la jornada de orden y aseo, terminaron actividades por lo que se generó acta de entrega en esta institución.

FIRMAS

ARQ. LORENA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
DIRECTORA DE INTERVENTORIA

ARQ. NELLY NATALIA MORA LA ROTTA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ING. LUIS EMIRO BLANCO MORENO
APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

ING. KATHERINE CAROLINA NUÑEZ OSORIO
PROFESIONAL SST

ING. CHRISTIAN FELIPE RODRIGUEZ
PROFESIONAL AMBIENTAL

ING. CRISTIAN BARRERA DONCELL
PROFESIONAL COSTOS Y PRESUPUESTOS

ING. DERMAN ADOLFO NIVIA QUINTERO
PROFESIONAL ELECTRICO

ING. ROBINSON VILLAMIL ROJAS
PROFESIONAL HIDRAULICO

ING. DIEGO FERNANDO OLARTE DIAZ
PROFESIONAL ESTRUCTURAL

FECHA:	16/03/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	INFORME APOYO A LA SUPERVISION
DIAS RESTANTES	69 Días		GRUPO 16
ESTADO GENERAL DEL PROYECTO			
CORTE DEL INFORME:	CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO ESTABLECIMIENTOS	
22 de febrero de 2026	CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:	PROBINTEC S.A.S	

FECHAS			PLAZOS EN DIAS			VALOR CONTRATO		
DATOS:	INTERVENTORIA	OBRA	ETAPA:	INTERVENTORIA	OBRA	ETAPA:	INTERVENTORIA	OBRA
CONTRATO	CO1.PCCNTR.8168931	CO1.PCCNTR.8155097	INICIAL	211	211	INICIAL	$ 796.278.928.00	$ 2.455.237.837.00
INICIO	3 de octubre de 2025	3 de octubre de 2025	SUSPENSIONES			ADICIÓNES	$ 139.026.666.00	$ 380.000.000.00
TERMINACION INICIAL	2 de mayo de 2026	2 de mayo de 2026	PRORROGAS			TOTAL	$ 935.305.594.00	$ 2.835.237.837.00
TERMINACION FINAL	2 de mayo de 2026	2 de mayo de 2026	TOTAL	211	211			

MODIFICACIONESDEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

MOD No	FECHA DE LA MODIFICACION	VALOR ADICION	PRORROGA	OTRO ASPECTO
1	26/12/2025	$ 139.026.666.00		
2				
3				
4				

MODIFICACIONESDEL CONTRATO DE OBRA

MOD No	FECHA DE LA MODIFICACION	VALOR ADICION	PRORROGA	OTRO ASPECTO
1	12/12/2025	$ 380.000.000.00		
2				
3				
4				

POLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORIA — GARANTE: SEGUROS DEL ESTADO

POLIZA	CUMPLIMIENTO DESDE	CUMPLIMIENTO HASTA	CALIDAD DEL SERVICIO DESDE	CALIDAD DEL SERVICIO HASTA	SALARIOS Y PRESTACIONES DESDE	SALARIOS Y PRESTACIONES HASTA
400 47 994000110040	19 9 2025	3 1 2027	3 5 2026	3 5 2031	19 9 2025	3 5 2029

POLIZAS CONTRATO DE OBRA — COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

POLIZA	CUMPLIMIENTO DESDE	CUMPLIMIENTO HASTA	SALARIOS Y PRESTACIONES DESDE	SALARIOS Y PRESTACIONES HASTA	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA DESDE	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA HASTA	POLIZA	RESPONSABILIDAD CIVIL DESDE	RESPONSABILIDAD CIVIL HASTA

CPF	COLEGIO	LOCALIDAD	SEDE	NOMBRE SEDE	AVANCE ANTERIOR	AVANCE ACTUAL (01/03/2026)	PROGR %	EJECUTADO VS PROG	Vlr FRENTE APROBADO	Vlr FRENTE A ESTE PERIODO	FECHA INICIO CRONOGRAMA	FECHA FIN CRONOGRAMA	jul-2025	jul-2025	ago-2025	ago-2025	sep-2025	sep-2025	oct-2025	oct-2025	nov-2025	nov-2025	dic-2025	dic-2025	ene-2026	ene-2026	feb-2026	feb-2026	mar-2026	mar-2026
915	INTEGRADO DE FONTIBÓN	FONTIBÓN	A	INTEGRADO DE FONTIBÓN	93.04%	100.00%	-6.96%		$ 140.356.686.10	$ 68.516.715.63	06/11/2025	27/02/2026																		
920	ANTONIO VAN UDEN	FONTIBÓN	C	SAN VICENTE	57.91%	71.25%	-13.34%		$ 490.905.466.84	$ 149.872.531.50	18/11/2025	13/04/2026																		
901	INSTITUTO TÉCNICO INTERNACIONAL	FONTIBÓN	A	INSTITUTO TÉCNICO INTERNACIONAL	61.48%	67.18%	-5.70%		$ 506.491.008.39	$ 185.980.389.67	06/11/2025	01/04/2026																		
1408	COLEGIO REPUBLICA BOLIVARIANA DE	LOS MÁRTIRES	B	SAMPER MENDOZA	47.96%	46.38%	#¡VALOR!	#¡VALOR!	$ 222.333.302.02	$ 95.881.221.84	24/11/2025	18/04/2026																		
1632	MARCO ANTONIO CARREÑO SILVA (IED)	PUENTE ARANDA	B	MARCO ANTONIO CARREÑO SILVA	63.28%	50.09%	#¡VALOR!	#¡VALOR!	$ 449.716.114.81	$ 82.863.507.58	06/11/2025	01/04/2026																		
1614	JULIO GARAVITO ARMERO (IED)	PUENTE ARANDA	B	MUZU No. 1	32.34%	87.13%	-54.79%		$ 215.764.375.07	$ 36.438.122.74	21/11/2025	11/05/2026																		
1603	CULTURA POPULAR (IED)	PUENTE ARANDA	C	DIEGO LUIS CORDOBA	66.64%	100.00%	-33.36%		$ 106.253.062.23	$ 47.667.255.85	13/11/2025	24/01/2026																		
TOTAL FRENTES DE OBRA						85.11%	#¡VALOR!	#¡VALOR!	$ 2.131.822.015.46	$ 667.219.745																				
EMERGENCIAS ATENDIDAS DURANTE EL PERIODO																														
1616	SILVERIA ESPINOSA DE RENDON (IED)	PUENTE ARANDA	B	RAFAEL POMBO		100.00%	100.00%	✓	$ 8.789.206.00	$ 8.789.206.00																				
1609	SILVERIA ESPINOSA DE RENDON (IED)	PUENTE ARANDA	A	SILVERIA ESPINOSA DE RENDON		100.00%	100.00%	✓	$ 17.578.413.00	$ 17.578.413.00																				
1612	EL JAZMIN (IED)	PUENTE ARANDA	B	LA PRIMAVERA		100.00%	100.00%	✓	$ 1.953.157.00	$ 1.953.157.00																				
914	RODRIGO ARENAS BETANCOURT	FONTIBÓN	A	SIMÓN BOLÍVAR		100.00%	100.00%	✓	$ 1.953.157.00	$ 1.953.157.00																				
909	VILLEMAR EL CARMEN	FONTIBÓN	B	SANTA CECILIA		100.00%	100.00%	✓	$ 1.953.157.00	$ 1.953.157.00																				
915	INTEGRADO DE FONTIBÓN	FONTIBÓN	A	INTEGRADO DE FONTIBÓN		100.00%	100.00%	✓	$ 1.953.157.00	$ 1.953.157.00																				
929	MARIA JOSEFA CANELONES	FONTIBÓN	A	MARIA JOSEFA CANELONES		0.00%	0%	✓	$ 10.000.000.00	$ -																				
909	VILLEMAR EL CARMEN	FONTIBÓN	B	SANTA CECILIA		100.00%	100%	✓	$ 35.000.000.00	$ -																				
TOTAL FRENTES DE OBRA						87.50%	87.50%	✓	$ 78.180.247	$ 34.180.247																				

ACUMULADO FRENTES DE OBRA

TERMINADAS	EN EJECUCION	POR INICIAR	TOTAL	VALOR
2	3	0	5	$ 667.219.745
ACUMULADO EMERGENCIAS				
7	0	1	8	$ 34.180.247
TOTAL				
9	3	1	13	$ 701.399.992
FRENTES POR LOCALIDAD				

RELACION DE PAGOS EFECTUADOS

No ACTA OBRA	VALOR	No ACTA OBRA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR
1		12		1		12		23		34	
2	$ 500.169.705.00	13		2		13		24		35	
3	$ 521.807.681.00	14		3		14		25		36	
4		15		4		15		26		37	
5		16		5		16		27		38	
6		17		6		17		28		39	
7		18		7		18		29		40	
8		19		8		19		30		TOTAL INTERVENTORIA	
9		20		9		20		31		$ -	
10		TOTAL OBRA		10		21		32			
11		$ 1.021.977.386.00		11		22		33			


AVANCE GENERAL

AVANCE	TECNICO	FINANCIERO	TIEMPO
	85.11%	36.05%	67.30%
PROGRAMADO	#¡VALOR!		
ATRASO	#¡VALOR!	EN EJECUCION	
FECHA APROBACION CRONOGRAMA			


AVANCE GENERAL



EMERGENCIAS



AVANCE FÍSICO



AVANCE DE LOS FRENTES



OBSERVACIONES:

	PROGRAMACIÓN				REAL			ACUMULADO			
INFORME	SEMANA	FECHA	PROGRAMADO	% PROGRAMADO	AVANCE	EJECUTADO	DIFERENCIA	PROGRAMADO		EJECUTADO	
1	sem 1	03-oct-25	$ -	0.00%	0.00%	$ -	$ -	0.00%	$ -	0.00%	$0.00
2	sem 2	13-oct-25	$ -	0.00%	0.00%	$ -	$ -	0.00%	$ -	0.00%	$0.00
3	sem 3	20-oct-25	$ -	0.00%	0.00%	$ -	$ -	0.00%	$ -	0.00%	$0.00
4	sem 4	27-oct-25	$ -	0.00%	0.00%	$ -	$ -	0.00%	$ -	0.00%	$0.00
5	sem 5	03-nov-25	$ 4.755.494.21	0.22%	0.00%	$ -	$ 4.755.494.21	0.22%	$ 4.755.494.21	0.00%	$0.00
6	sem 6	10-nov-25	$ 8.125.912.59	0.38%	0.80%	$ 16.977.206.64	$ (8.851.294.05)	0.60%	$ 12.881.406.80	0.80%	$16.977.206.64
7	sem 7	17-nov-25	$ 5.288.020.00	0.25%	1.02%	$ 21.771.422.72	$ (16.483.402.72)	0.85%	$ 18.169.426.80	1.82%	$38.748.629.36
8	sem 8	24-nov-25	$ 17.444.983.27	0.82%	1.13%	$ 23.997.772.21	$ (6.552.788.94)	1.67%	$ 35.614.410.07	2.94%	$62.746.401.57
9	sem 9	01-dic-25	$ 40.343.446.53	1.89%	1.80%	$ 38.340.052.51	$ 2.003.394.02	3.56%	$ 75.957.856.60	4.74%	$101.086.454.08
10	sem 10	08-dic-25	$ 79.444.682.79	3.73%	1.43%	$ 30.382.417.28	$ 49.062.265.51	7.29%	$ 155.402.539.39	6.17%	$131.468.871.36
11	sem 11	15-dic-25	$ 108.209.197.15	5.08%	2.69%	$ 57.402.366.83	$ 50.806.830.32	12.37%	$ 263.611.736.54	8.86%	$188.871.238.19
12	sem 12	22-dic-25	$ 69.900.889.80	3.28%	2.91%	$ 62.085.827.21	$ 7.815.062.59	15.64%	$ 333.512.626.34	11.77%	$250.957.065.40
13	sem 13	29-dic-25	$ 75.956.528.24	3.56%	1.49%	$ 31.686.383.67	$ 44.270.144.57	19.21%	$ 409.469.154.58	13.26%	$282.643.449.07
14	sem 14	05-ene-26	$ 89.212.283.49	4.18%	5.66%	$ 120.616.837.44	$ (31.404.553.95)	23.39%	$ 498.681.438.07	18.92%	$403.260.286.51
15	sem 15	12-ene-26	$ 83.223.770.74	3.90%	7.45%	$ 158.783.369.63	$ (75.559.598.89)	27.30%	$ 581.905.208.81	26.36%	$562.043.656.14
16	sem 16	19-ene-26	$ 152.231.709.97	7.14%	5.56%	$ 118.625.799.96	$ 33.605.910.01	34.44%	$ 734.136.918.78	31.93%	$680.669.456.10
17	sem 17	26-ene-26	$ 114.051.601.68	5.35%	6.55%	$ 139.680.056.20	$ (25.628.454.52)	39.79%	$ 848.188.520.46	38.48%	$820.349.512.30
18	sem 18	02-feb-26	$ 97.149.131.29	4.56%	12.74%	$ 271.555.749.04	$ (174.406.617.75)	44.34%	$ 945.337.651.75	51.22%	$1.091.905.261.34
19	sem 19	09-feb-26	$ 123.336.874.83	5.79%	1.19%	$ 25.293.497.30	$ 98.043.377.53	50.13%	$ 1.068.674.526.58	52.40%	$1.117.198.758.64
20	sem 20	16-feb-26	$ 144.354.651.09	6.77%	4.62%	$ 98.397.025.80	$ 45.957.625.29	56.90%	$ 1.213.029.177.67	57.02%	$1.215.595.784.44
21	sem 21	23-feb-26	$ 133.044.130.87	6.24%	3.10%	$ 65.986.851.22	$ 67.057.279.65	63.14%	$ 1.346.073.308.54	60.12%	$1.281.582.635.66
22	sem 22	02-mar-26	$ 302.192.068.33	14.17%	1.36%	$ 28.959.518.19	$ 273.232.550.14	77.32%	$ 1.648.265.376.87	61.47%	$1.310.542.153.85
23	sem 23	09-mar-26	$ 188.077.906.58	8.82%	0.00%	$ -	$ 188.077.906.58	86.14%	$ 1.836.343.283.45		$1.310.542.153.85
24	sem 24	16-mar-26	$ 83.278.260.58	3.91%	0.00%	$ -	$ 83.278.260.58	90.04%	$ 1.919.621.544.03		$1.310.542.153.85
25	sem 25	23-mar-26	$ 87.605.509.23	4.11%	0.00%	$ -	$ 87.605.509.23	94.15%	$ 2.007.227.053.26		$1.310.542.153.85
26	sem 26	30-mar-26	$ 36.671.729.02	1.72%	0.00%	$ -	$ 36.671.729.02	95.87%	$ 2.043.898.782.28		$1.310.542.153.85
27	sem 27	06-abr-26	$ 67.465.761.55	3.16%	0.00%	$ -	$ 67.465.761.55	99.04%	$ 2.111.364.543.83		$1.310.542.153.85
28	sem 28	13-abr-26	$ 10.504.787.87	0.49%	0.00%	$ -	$ 10.504.787.87	99.53%	$ 2.121.869.331.70		$1.310.542.153.85
29	sem 29	20-abr-26	$ 10.012.682.84	0.47%	0.00%	$ -	$ 10.012.682.84	100.00%	$ 2.131.882.014.54		$1.310.542.153.85
30	sem 30	27-abr-26	$ -	0.00%	0.00%	$ -	$ -	100.00%	$ 2.131.882.014.54		$1.310.542.153.85
31	sem 31	04-may-26	$ -	0.00%	0.00%	$ -	$ -	100.00%	$ 2.131.882.014.54		$0.00
32	sem 32	11-may-26		0.00%	0.00%			100.00%	$ 2.131.882.014.54		
33	sem 33	18-may-26		0.00%	0.00%			100.00%	$ 2.131.882.014.54		
34	sem 34	25-may-26		0.00%	0.00%			100.00%	$ 2.131.882.014.54		
35	sem 35	01-jun-26		0.00%	0.00%			100.00%	$ 2.131.882.014.54		
36	sem 36	08-jun-26		0.00%	0.00%			100.00%	$ 2.131.882.014.54		
37	sem 37	15-jun-26		0.00%	0.00%			100.00%	$ 2.131.882.014.54		
38	sem 38	22-jun-26		0.00%	0.00%			100.00%	$ 2.131.882.014.54		
39	sem 39	29-jun-26		0.00%	0.00%			100.00%	$ 2.131.882.014.54		
40	sem 40	06-jul-26		0.00%	0.00%			100.00%	$ 2.131.882.014.54		
41	sem 41	13-jul-26		0.00%	0.00%			100.00%	$ 2.131.882.014.54		
42	sem 42	20-jul-26		0.00%	0.00%			100.00%	$ 2.131.882.014.54		
43	sem 43	27-jul-26		0.00%	0.00%			100.00%	$ 2.131.882.014.54		
			$ 2.131.882.014.54	100.00%	61.47%						

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 23 | **LOTE COP No 16**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 23 (Consecutivo) **DEL** 9/3/2026 (dd-mm-aa) **AL** 15/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 163 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16


COLEGIO INTEGRADO DE FONTIBON - SEDE A (ANEXO 1 REGISTRO FOTOGRÁFICO)



Se evidencia que se estan realizando actividades de pintura (Detalles) en la canal instalada previamente.



Se evidencia que se finaliza la instalacion de la abrazaderas en los desagues instalados.

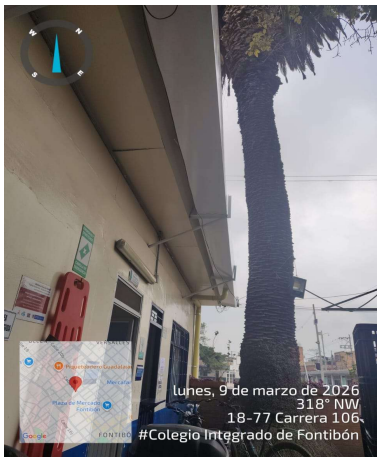

Se evidencia que se estan realizando actividades de pintura (Detalles) en la canal instalada previamente.



Se evidencia que se realiza la pintura de las platinas correspondientes a los apuntalamientos.



Se evidencia que se da incio a la instalacion de platinas y perfiles correspondientes a los apuntalamientos.



Se evidencia que llega el material en su totalidad para la ejecucion de los apuntalamientos.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 23 | **LOTE COP No 16**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


SEMANA No. 23 (Consecutivo) **DEL** 9/3/2026 (dd-mm-aa) **AL** 15/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 163 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

COLEGIO INTEGRADO DE FONTIBON - SEDE A (ANEXO 1 REGISTRO FOTOGRÁFICO)



Se evidencian los puntos de soldadura y de anclaje del paral correspondiente a los apuntalamientos.

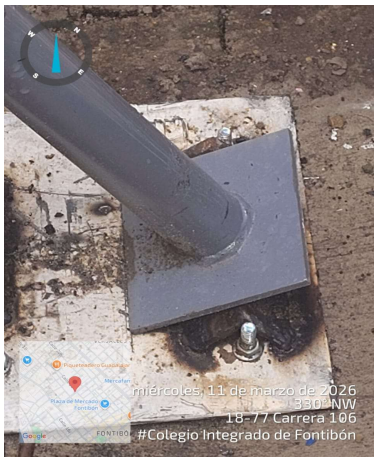

Se evidencian los puntos de soldadura y de anclaje del paral correspondiente a los apuntalamientos.



Se evidencia el avance de la ejecucion de los apuntalamientos correspondiente al area de los contrafuertes fundidos anteriormente.



Se evidencia el avance de la ejecucion de los apuntalamientos correspondiente al area de los contrafuertes fundidos anteriormente.



Se evidencia que en el area de los leones se realiza la instalacion de los 02 apuntalamientos correspondientes a esta.



Se evidencia la instalacion de la platina, la perfileria y el paral correspondiente al apuntalamiento del area de los leones.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 23 | **LOTE COP No 16**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 23 (Consecutivo) **DEL** 9/3/2026 (dd-mm-aa) **AL** 15/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 163 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16


COLEGIO INTEGRADO DE FONTIBON - SEDE A (ANEXO 1 REGISTRO FOTOGRÁFICO)




Se evidencia que el cerramiento esta en buen estado y de acuerdo a los estipulado para su entrega.



Se evidencia que el cerramiento esta en buen estado y de acuerdo a los estipulado para su entrega.

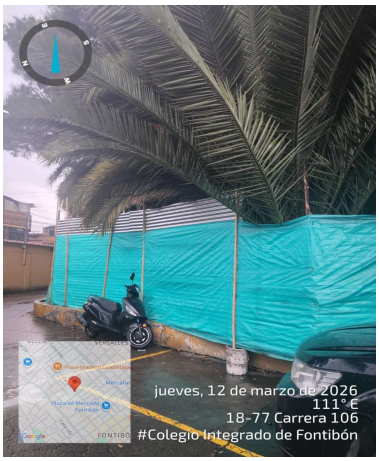

Se evidencia que el cerramiento esta en buen estado y de acuerdo a los estipulado para su entrega.

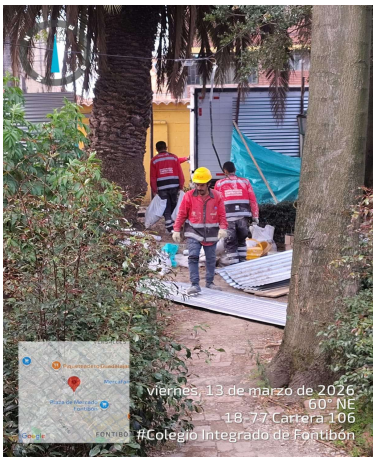

Se evidencia que el personal de obra se encuentra en jornada de aseo en el area de acopio de la institucion.



Se evidencia que se realiza orden y aseo en el area de acopio que se asigno en la institucion.



Se evidencia que se esta realizando el cerramiento en el area donde se encontraba el broche en polisombra para el acceso al area de la casona, durante las ejecuciones.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 23 | **LOTE COP No 16**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 23 (Consecutivo) **DEL** 9/3/2026 (dd-mm-aa) **AL** 15/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 163 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

COLEGIO ANTONIO VAN UDEN - SEDE C (ANEXO 2 REGISTRO FOTOGRÁFICO)



Se evidencia que se realiza en sitio la pintura correspondiente a las puertas del area de la biblioteca.



Se evidencia que se avanza en las actividades de pintura en el recubrimiento en drywall correspondiente a la canal del area de la biblioteca.



Se evidencia que se avanza en las actividades de estuco en el area de los muros y cuchillas correspondiente a la bateria de baños.



Se evidencia que se continua con las actividades de pintura en muros correspondiente al area de la biblioteca.



Se evidencia que se avanza en las actividades de estuco en el area de los muros y cuchillas correspondiente a la bateria de baños.



Se evidencia que se continua con las actividades de pintura en muros correspondiente al area de la biblioteca.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 23 | **LOTE COP No 16**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 23 (Consecutivo) **DEL** 9/3/2026 (dd-mm-aa) **AL** 15/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 163 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16


COLEGIO ANTONIO VAN UDEN - SEDE C (ANEXO 2 REGISTRO FOTOGRÁFICO)



Se evidencia que se avanza en las actividades de estuco en el area de los muros y cuchillas correspondiente a la bateria de baños.



Se realiza un llamado de atencion por el estado de la polisombra del cerramiento correspondiente al area de la biblioteca.

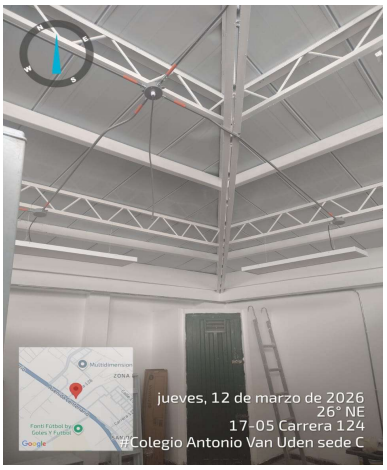

Se evidencia que se da inicio a la instalacion de lamparas correspondiente a la biblioteca.



Se evidencia que se avanza en el estuco de la fachada de la bateria de baños.



Se evidencia la llegada de material correspondiente a la ventaneria del bloque alianza y las divisiones de baño en acero inoxidable de la bateria de baños.



Se evidencia que se realizo la instalacion de la ventaneria pendiente en el aula del bloque alianza, se encuentra pendiente la instalacion de los vidrios.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 23 | **LOTE COP No 16**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 23 (Consecutivo) **DEL** 9/3/2026 (dd-mm-aa) **AL** 15/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 163 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16


COLEGIO ANTONIO VAN UDEN - SEDE C (ANEXO 2 REGISTRO FOTOGRÁFICO)



Se evidencia el funcionamiento de la lamparas que estan siendo instaladas en la biblioteca.



Se evidencia que se realizo la instalacion del tanque, despues de la que la placa fue correctamente impermeabilizada y este fue puesto a llenar.

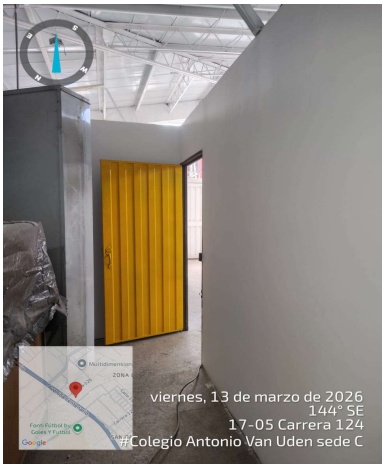

Se evidencia que se realizo la instalacion de las puertas en el area de la biblioteca, despues de que fueron pintadas en sitio.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 23 | **LOTE COP No 16**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 23 (Consecutivo) **DEL** 9/3/2026 (dd-mm-aa) **AL** 15/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 163 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

COLEGIO TECNICO INTERNACIONAL - SEDE A (ANEXO 3 REGISTRO FOTOGRÁFICO)



Se evidencia que se finaliza el mantenimiento de la reja correspondiente a la cubierta de la bodega en el aula multiple.



Se evidencia que se esta realizando el remate de pintura correspondiente a la perfileria metalica de la cubierta de las aulas multiples.




Se evidencia que se esta realizando la limpieza y el remate de las areas correspondientes a los registros de las baterias de baños de primaria y bachillerato.



Se evidencia que se finaliza de rematar los vanos correspondiente al area de instalacion de rejillas de ventilacion de la bateria de baños de primaria.



Se evidencia que se realiza la instalacion en su totalidad de la bajante de reventilacion y el recubrimiento de esta en carpinteria metalica de la bateria de baños de primaria.

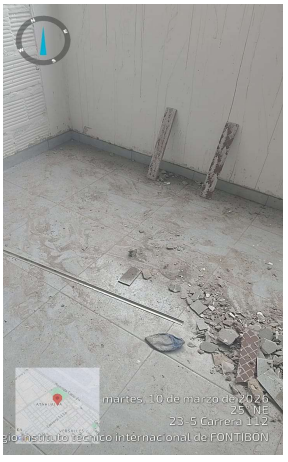

Se evidencia que se realiza el remate de los guardaescobas y el emboquillado de la ceramica correspondiente al aula mutliple.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 23 | **LOTE COP No 16**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 23 (Consecutivo) **DEL** 9/3/2026 (dd-mm-aa) **AL** 15/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 163 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

COLEGIO TECNICO INTERNACIONAL - SEDE A (ANEXO 3 REGISTRO FOTOGRÁFICO)



Se evidencia que se esta realizando el remate del area para la instalacion del extractor de ventilacion del auditorio en el aula multiple.



Se evidencia que se da inicio a la actividad del brillado de la baldosa correspondiente a la bateria de baños de bachillerato.



Se evidencia que se realiza la instalacion del extractor de ventilacion correspondiente al auditoria del aula multiple.



Se evidencia que se realiza la instalacion de la reja correspondiente a la cubierta de la bodega, material existente se le realizo mantenimiento.



Se evidencia que se estan realizando los remates correspondientes a la fachada del aula multiple.



Se evidencia que se estan realizando los remates correspondientes a la fachada del aula multiple.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 23 | **LOTE COP No 16**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 23 (Consecutivo) **DEL** 9/3/2026 (dd-mm-aa) **AL** 15/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 163 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

COLEGIO TECNICO INTERNACIONAL - SEDE A (ANEXO 3 REGISTRO FOTOGRÁFICO)



Se evidencia que se realizo el brillado de la baldosa correspondiente a la bateria de baños de primaria.



Se evidencia que se esta realizando el remate del muro correspondiente al area entre el muro y el cielo razo de la bateria de baños de bachillerato.



Se evidencia que se realizo el brillado de la baldosa correspondiente a la bateria de baños de bachillerato.



Se evidencia que se esta realizando el remate de pintura correspondiente a la perfileria metalica de la cubierta de las aulas multiples.



Se evidencia que se realiza la instalacion de rejillas de ventilacion correspondiente a la bateria de baños de primaria.



Se evidencia que se realiza la instalacion de las rejillas de ventilacion de las aulas correspondientes a las aulas multiples.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 23 **LOTE COP No 16**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 23 (Consecutivo) **DEL** 9/3/2026 (dd-mm-aa) **AL** 15/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 163 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16


COLEGIO TECNICO INTERNACIONAL - SEDE A (ANEXO 3 REGISTRO FOTOGRÁFICO)



Se evidencia que se esta realizando el remate del guardaescoba correspondiente al auditoria de area aula multiple.



Se evidencia que se realiza la instalacion de rejillas de ventilacion correspondiente a la bateria de baños de primaria.

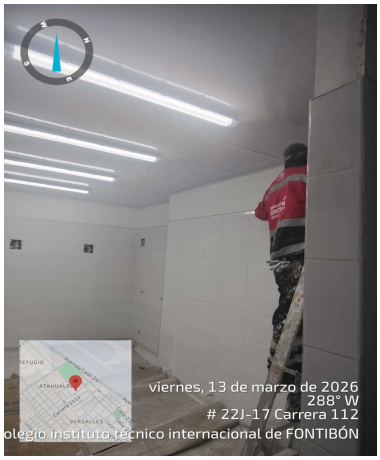

Se evidencia que se esta realizando el remate del muro correspondiente al area entre el muro y el cielo razo de la bateria de baños de primaria.



Se evidencia que se realiza el cambio de piezas de mamposteria que se vieron afectados durante la ejecucion de actividades.

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 23 | **LOTE COP No 16**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 23 (Consecutivo) **DEL** 9/3/2026 (dd-mm-aa) **AL** 15/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 163 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

COLEGIO REPUBLICA DE VENEZUELA - SEDE B (ANEXO 4 REGISTRO FOTOGRÁFICO)



Emergencia silvicultural



Anclaje de Bajante en la parte frontal de la cubierta.



Emergencia silvicultural



Área de la cancha limpia y despejada, libre de materiales y residuos.




Pared con humedad, parte lateral de la fachada.



Bajante en la fahada principal, con adicion de codo



Cerramiento área de la cancha

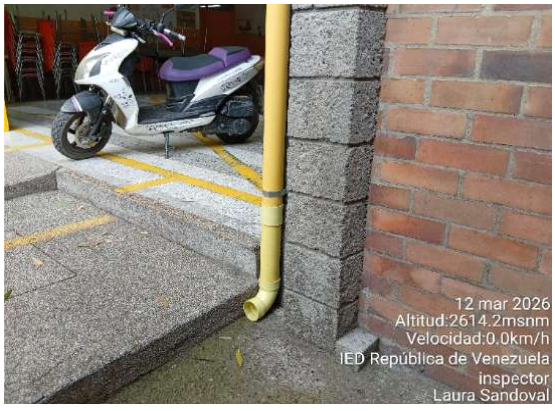

Codo de bajante, en la parte frontal de la fachada

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 23 **LOTE COP No 16**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 23 (Consecutivo) **DEL** 9/3/2026 (dd-mm-aa) **AL** 15/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 163 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

COLEGIO REPUBLICA DE VENEZUELA - SEDE B (ANEXO 4 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 23 | **LOTE COP No 16**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


SEMANA No. 23 (Consecutivo) **DEL** 9/3/2026 (dd-mm-aa) **AL** 15/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 163 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

COLEGIO MARCO ANTONIO CARREÑO - SEDE B (ANEXO 5 REGISTRO FOTOGRÁFICO)



Aplicación de segunda capa de pintura blanca en aceite en algunos salones.

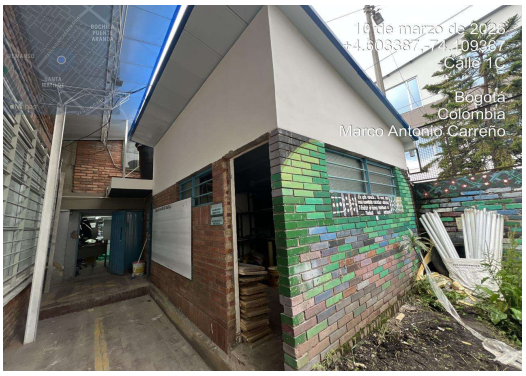


Aplicación de estuco Sika y estucado en el área exterior de la institución.



Inicio del traslado de equipos y mobiliario ubicados en el segundo piso.



Desocupación parcial del área del segundo piso para permitir la intervención.

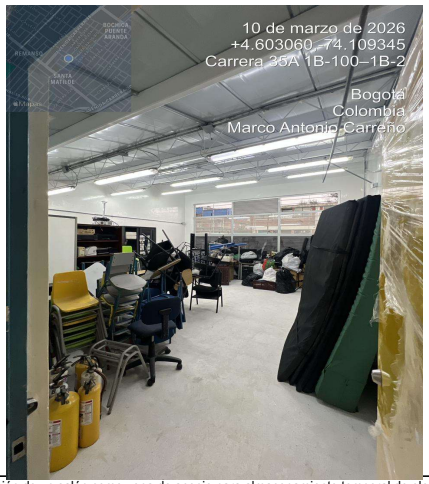

Adecuación de un salón como zona de acopio para almacenamiento temporal de elementos trasladados.



Elaboración de lista de chequeo para control de los elementos trasladados, realizada por personal de la institución

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 23 **LOTE COP No 16**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 23 (Consecutivo) **DEL** 9/3/2026 (dd-mm-aa) **AL** 15/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 163 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

COLEGIO MARCO ANTONIO CARREÑO - SEDE B (ANEXO 5 REGISTRO FOTOGRÁFICO)



Demolición del enchape existente en el segundo piso.



Retiro del cielo raso del segundo piso.



Ingreso de materiales para la instalación de la bajante de la canal del módulo exterior de la institución

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 23 | **LOTE COP No 16**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 23 (Consecutivo) **DEL** 9/3/2026 (dd-mm-aa) **AL** 15/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 163 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

COLEGIO JULIO GARAVITO ARMERO - SEDE B (ANEXO 6 REGISTRO FOTOGRÁFICO)




Se evidencia que se esta realizando la correcta apetura del vano correspondiente al ducto de ventilacion para dar inicio a la ejecucion de la mamposteria de fachada.



Se evidencia el avance en la actividad de estuco general del area administrativa.



Se evidencia el avance en la actividad de estuco general del area administrativa.

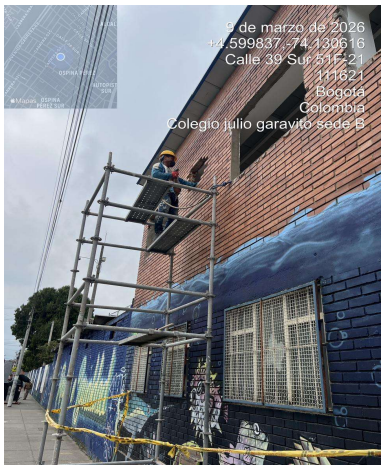

Se evidencia que se esta realizando la correcta apetura del vano correspondiente al ducto de ventilacion para dar inicio a la ejecucion de la mamposteria de fachada.



Se evidencia el avance en la actividad de estuco general del area administrativa correspondiente a la pagaduria.



Se evidencia que se avanza en la instalacion de baldosa, correspondiente a la huella, contrahuella y descanso de la escalera.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 23 | **LOTE COP No 16**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 23 (Consecutivo) **DEL** 9/3/2026 (dd-mm-aa) **AL** 15/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 163 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

COLEGIO JULIO GARAVITO ARMERO - SEDE B (ANEXO 6 REGISTRO FOTOGRÁFICO)



Se evidencia que se realiza la reparacion de mamposteria correspondiente al ducto de ventilacion que se encontraba en esta area de las oficinas administrativas.



Se evidencia que se realiza el remate con boquillera correspondiente al remate (Ejecucion de cinta) de ventaneria del area administrativa.



Se evidencia la instalacion de piezas correspondiente a la contrahuella del area de la escalera.



Se evidencia que se finaliza la instalacion de baldosa correspondiente a la huella y contrahuella de la escalera.



Se evidencia que se realiza el remate con boquillera correspondiente al remate (Ejecucion de cinta) de ventaneria del area administrativa.



Se evidencia que se realiza el remate con boquillera correspondiente al remate (Ejecucion de cinta) de ventaneria del area administrativa.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 23 **LOTE COP No 16**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 23 (Consecutivo) **DEL** 9/3/2026 (dd-mm-aa) **AL** 15/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 163 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

COLEGIO JULIO GARAVITO ARMERO - SEDE B (ANEXO 6 REGISTRO FOTOGRÁFICO)



Se evidencia que se realiza el remate del pañete del area reparada, se esta en la ultima fase afinado.



Se evidencia que se estucan los vanos anteriormente rematados correspondiente al area administrativa.



Se evidencia que se estucan los vanos anteriormente rematados correspondiente al area administrativa.



Se evidencia que se finaliza el emboquillado correspondiente al enchape de la escalera.



Se evidencia que se finaliza el emboquillado correspondiente al enchape de la escalera.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 23 | **LOTE COP No 16**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 23 (Consecutivo) **DEL** 9/3/2026 (dd-mm-aa) **AL** 15/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 163 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

COLEGIO CULTURA POPULAR - SEDE C (ANEXO 7 REGISTRO FOTOGRÁFICO)



Registro fotografico del estado final de la intervencion para entrega a la SED e institucion.




Registro fotografico del estado final de la intervencion para entrega a la SED e institucion.



Registro fotografico del estado final de la intervencion para entrega a la SED e institucion.



Registro fotografico del estado final de la intervencion para entrega a la SED e institucion.

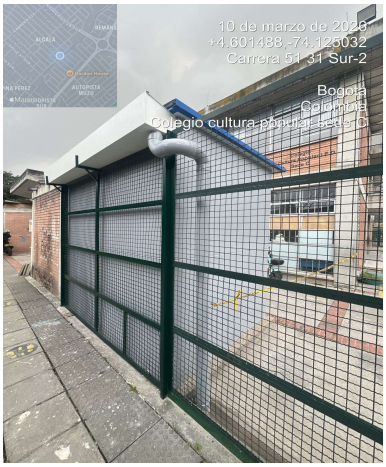

Registro fotografico del estado final de la intervencion para entrega a la SED e institucion.



Registro fotografico del estado final de la intervencion para entrega a la SED e institucion.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 23 | **LOTE COP No 16**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


SEMANA No. 23 (Consecutivo) **DEL** 9/3/2026 (dd-mm-aa) **AL** 15/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 163 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16


COLEGIO CULTURA POPULAR - SEDE C (ANEXO 7 REGISTRO FOTOGRÁFICO)



Registro fotografico del estado final de la intervencion para entrega a la SED e institucion.

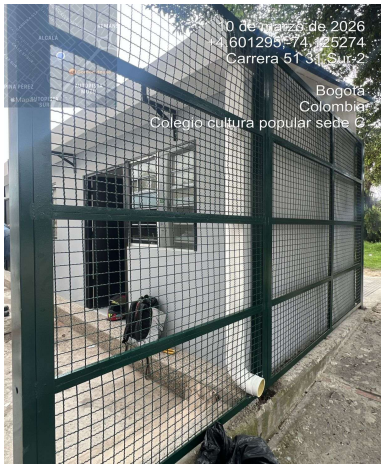

Registro fotografico del estado final de la intervencion para entrega a la SED e institucion.

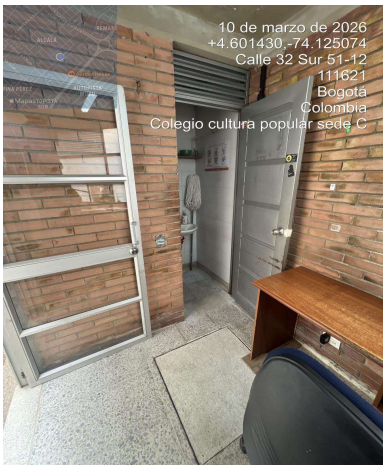

Registro fotografico del estado final de la intervencion para entrega a la SED e institucion.



Registro fotografico del estado final de la intervencion para entrega a la SED e institucion.



Registro fotografico del estado final de la intervencion para entrega a la SED e institucion.



Registro fotografico del estado final de la intervencion para entrega a la SED e institucion.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 23 | **LOTE COP No 16**


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 23 (Consecutivo) **DEL** 9/3/2026 (dd-mm-aa) **AL** 15/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 163 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

COLEGIO CULTURA POPULAR - SEDE C (ANEXO 7 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

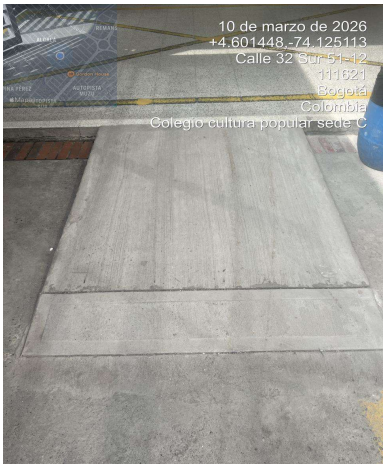

Registro fotografico del estado final de la intervencion para entrega a la SED e institucion.



Registro fotografico del estado final de la intervencion para entrega a la SED e institucion.



Registro fotografico del estado final de la intervencion para entrega a la SED e institucion.



Registro fotografico del estado final de la intervencion para entrega a la SED e institucion.



Registro fotografico del estado final de la intervencion para entrega a la SED e institucion.



Registro fotografico del estado final de la intervencion para entrega a la SED e institucion.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 23 | **LOTE COP No 16**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 23 (Consecutivo) **DEL** 9/3/2026 (dd-mm-aa) **AL** 15/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 163 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

COLEGIO CULTURA POPULAR - SEDE C (ANEXO 7 REGISTRO FOTOGRÁFICO)



Registro fotografico del estado final de la intervencion para entrega a la SED e institucion.



Registro fotografico del estado final de la intervencion para entrega a la SED e institucion.



Registro fotografico del estado final de la intervencion para entrega a la SED e institucion.



Registro fotografico del estado final de la intervencion para entrega a la SED e institucion.



Registro fotografico del estado final de la intervencion para entrega a la SED e institucion.



Registro fotografico del estado final de la intervencion para entrega a la SED e institucion.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 23 | **LOTE COP No 16**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 23 (Consecutivo) **DEL** 9/3/2026 (dd-mm-aa) **AL** 15/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 163 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

COLEGIO CULTURA POPULAR - SEDE C (ANEXO 7 REGISTRO FOTOGRÁFICO)



Registro fotografico del estado final de la intervencion para entrega a la SED e institucion.



Registro fotografico del estado final de la intervencion para entrega a la SED e institucion.
