PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA **CO1.PCCNTR.8155097**

INFORME SEMANAL No 28 **LOTE COP No 16**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 28 (Consecutivo) **DEL** 13/4/2026 (dd-mm-aa) **AL** 19/4/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 198 días

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORÍA


Contratista:	CONSORCIO EL MILAGROSO 2025	**Interventoria**	PROBINTEC S.A.S
RL del consorcio	RAFAEL MOGOLLÓN RODRÍGUEZ	**RL de Interventoría**	SANDRA STELLA MORENO BUITRAGO
Contrato No.	CO1.PCCNTR.8155097	**Contrato No.**	CO1.PCCNTR.8168931
Objeto	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS LOTE 16"	**Objeto**	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No. 6
Valor Inicial :	$ 2,455,237,837.00	**Valor Inicial:**	$ 796,278,928.00
AIU	33.88% $ 831,834,579.18	**Valor Adicional No. 1 del 26 de diciembre de 2026:**	$ 139,026,666.00
COSTO DIRECTO	$ 1,623,403,257.82	**Valor Total del Contrato:**	$ 935,305,594.00
OFERTADO	$ 2,176,494,644.00		
EMERGENCIAS	$ 100,000,000.00		
VALOR PARCIAL CON EMERGENCIAS	$ 2,276,494,644.00		
DIFERENCIA PARA EMERGENCIAS	$ 178,743,193.00		
Valor Parcial (Inicial + Emergencias)	$ 278,743,193.00		
Valor adicional No. 1:	$ 380,000,000.00		
Valor inicial No. 1 emergencias:	$ 200,000,000.00		
Valor adicional No.1 Obras Contractuales:	$ 180,000,000.00		
VALOR TOTAL INICIAL MAS EMERGENCIA	$ 2,835,237,837.00		
VALOR TOTAL EMERGENCIAS	$ 478,743,193.00		
VALOR TOTAL PARA OBRAS CONTRACTUALES	$ 2,356,494,644.00		
Plazo Inicial:	SIETE (7) MESES	**Plazo Inicial:**	SIETE (7) MESES
Fecha de Iniciación:	3/10/2025	**Fecha de Iniciación:**	3/10/2025
Fecha de Vencimiento:	2/05/2026	**Fecha de Vencimiento:**	2/05/2026

AVANCE DEL CONTRATO

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	1.48%	97.63%	Obra Física Ejecutada (%)	5.20%	94.73%
Valor de la Obra programada:	$ 36,302,445.16	$ 2,397,013,625.44	Valor de la Obra Ejecutada:	$ 127,672,367.52	$ 2,325,846,802.99

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONTRATO

	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	96.15%	89.53%	
Durante el periodo	1.48%	5.20%	-2.90%
Acumulado actual	97.63%	94.73%	

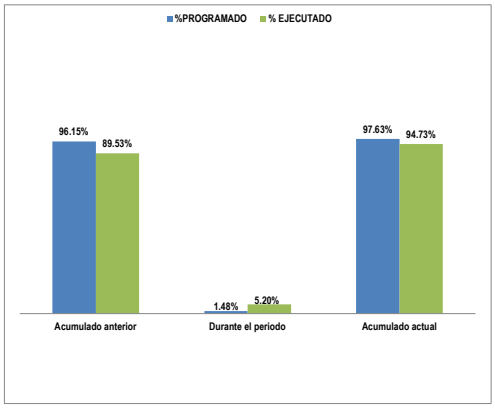

CPF	LOCALIDAD	COLEGIO	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA	%PROGRAMADO ACUMULADO	%EJECUTADO ACUMULADO	%DIFERENCIA ACUMULADO
915	FONTIBON	INTEGRADO DE FONTIBON - SEDE A	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
920	FONTIBON	ANTONIO VAN UDEN - SEDE C	2.00%	0.75%	-1.25%	100.00%	98.75%	-1.25%
901	FONTIBON	INSTITUTO TECNICO INTERNACIONAL . SEDE A	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
1408	LOS MARTIRES	REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA - SEDE B	0.00%	28.90%	28.90%	100.00%	83.55%	-16.45%
1632	PUENTE ARANDA	MARCO ANTONIO CARREÑO SILVA - SEDE B	1.12%	1.22%	0.10%	100.00%	88.04%	-11.96%
1614	PUENTE ARANDA	JULIO ARMERO GARAVITO - SEDE B	7.23%	5.53%	-1.70%	83.43%	92.74%	9.31%
1603	PUENTE ARANDA	CULTURA POPULAR - SEDE C	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
			1.48%	5.20%	3.72%	97.63%	94.73%	-2.91%

EMERGENCIAS Y/O OBRAS PRIORITARIAS

CPF	LOCALIDAD	COLEGIO	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA	VALOR TOTAL	VALOR CONTRATO	DIFERENCIA
1616	PUENTE ARANDA	SILVERIA ESPINOSA DE RENDON - SEDE A (SILVICULTURAL)	0.00%	100.00%	100.00%	$ 17,578,413.00	$ 17,578,413.00	$ -
1609	PUENTE ARANDA	SILVERIA ESPINOSA DE RENDON - SEDE B (SILVICULTURAL)	0.00%	100.00%	100.00%	$ 8,789,206.00	$ 8,789,206.00	$ -
1612	PUENTE ARANDA	EL JAZMIN - SEDE A (SILVICULTURAL)	0.00%	100.00%	100.00%	$ 1,953,157.00	$ 1,953,157.00	$ -
914	FONTIBON	RODRIGO ARENAS BETANCOURT - SEDE A (SILVICULTURAL)	0.00%	100.00%	100.00%	$ 1,953,157.00	$ 1,953,157.00	$ -
909	FONTIBON	VILLEMAR EL CARMEN - SEDE B (SILVICULTURAL)	0.00%	100.00%	100.00%	$ 1,953,157.00	$ 1,953,157.00	$ -
915	FONTIBON	INTEGRADO DE FONTIBON - SEDE A (SILVICULTURAL)	0.00%	100.00%	100.00%	$ -	$ -	$ -
929	FONTIBON	MARIA JOSEFA CANELONES - SEDE A (OBRA)	0.00%	0.00%	0.00%	$ 9,318,316.00	$ 9,318,316.00	$ -
909	FONTIBON	VILLEMAR EL CARMEN - SEDE B (OBRA)	0.00%	100.00%	100.00%	$ 11,281,557.00	$ 11,281,557.00	$ -
1612	PUENTE ARANDA	EL JAZMIN - SEDE B (OBRA)	0.00%	10.00%	10.00%	$ 102,903,305.00	$ 102,903,305.00	$ -
	PUENTE ARANDA	LA MERCED - SEDE A (OBRA)	0.00%	5.00%	5.00%	$ 53,124,579.00	$ 53,124,579.00	$ -
1408	LOS MARTIRES	REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA - SEDE B (SILVICULTURAL)	0.00%	100.00%	100.00%	$ 1,953,157.00	$ 1,953,157.00	$ -
					74.09%	$ 210,808,004.00	$ 478,743,193.00	$ (267,935,189.00)

AVANCE FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$ 2,455,237,837.34
VALOR PARCIAL 1	$ 88,202,201.00	
VALOR PARCIAL 2	$ 500,169,705.00	
VALOR PARCIAL 3	$ 521,807,681.00	
VALOR PARCIAL 4	$ 327,265,136.00	
TOTAL VALOR FACTURADO	$ 1,437,444,723.00	
SUMAS IGUALES	$ 1,017,793,114.34	$ 1,017,793,114.34


INDICADOR FINANCIERO	VALOR FACTURADO	VALOR PAGADO
	$ 1,437,444,723.00	$ 1,110,179,587.00

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

INDICADOR TECNICO	% DE AVANCE PROGRAMADO	% DE AVANCE EJECUTADO	% RETRASO - % ADELANTO +
	97.63%	94.73%	-2.90%

INDICADOR TIEMPO	DIAS	RETRASO
	198	-6

CURVA S

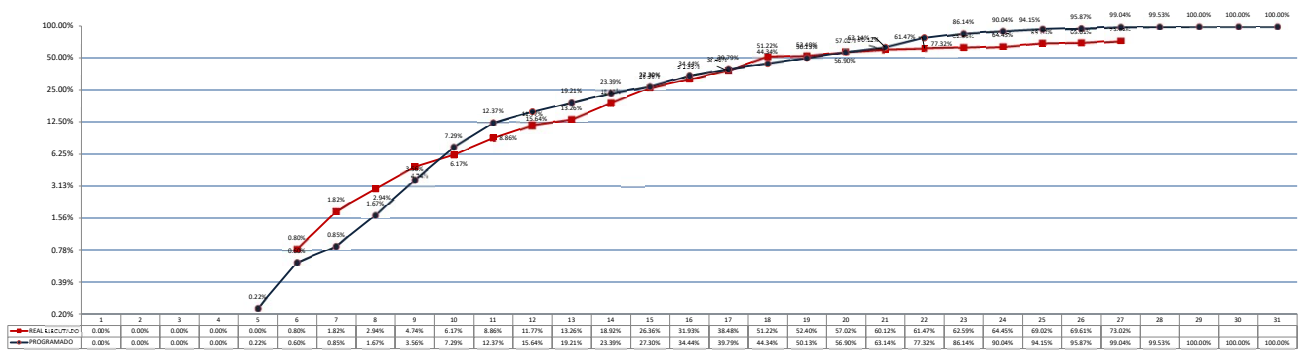

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
REAL EJECUTADO	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.80%	1.82%	2.94%	4.74%	6.17%	8.86%	11.77%	13.26%	18.92%	26.36%	31.93%	38.48%	51.22%	52.40%	57.02%	60.12%	61.47%	62.59%	64.45%	69.02%	69.61%	73.02%				
PROGRAMADO	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.22%	0.60%	0.85%	1.67%	3.56%	7.29%	12.37%	15.64%	19.21%	23.39%	27.30%	34.44%	39.79%	44.34%	50.13%	56.90%	63.14%	77.32%	86.14%	90.04%	94.15%	95.87%	99.04%	99.53%	100.00%	100.00%	100.00%

GENERALIDADES EN RELACION A LOS 07 FRENTES DE TRABAJO

1.Comite de obra N°16: Se lleva a cabo el comité de obra N.16 solicitado por la supervisión; este cuenta con la participación del Supervisor del contrato, la Interventoría y el contratista de obra. (se levanta Acta de reunión).

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8155097

INFORME SEMANAL No 28 **LOTE COP No 16**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 28 (Consecutivo) **DEL** 13/4/2026 (dd-mm-aa) **AL** 19/4/2026 (dd-mm-aa)

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 198 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO INTEGRADO DE FONTIBON - SEDE A (ANEXO 1 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: Se evidencia que en referencia a la parte presupuestal y de programacion la institucion presenta un cumplimiento del 100%.

4.1. Actividades programadas NO ejecutadas: N/A

4.2. Actividades EJECUTADAS a la fecha: N/A

5. Generales: Se hace entrega del acta de obra fisica al Ingeniero de Apoyo a la Supervisión, con el fin de gestionar la recolección de firmas por parte de los diferentes representantes legales. Asimismo, se deja constancia de la instalación de la puerta previamente acordada, destinada al acceso al área de almacén en la casona.

6. Ambiental: Se realizó recorrido en el frente, no se evidencia residuos en el frente, se recomienda garantizar jornadas de orden y aseo periódicamente e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA).

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO ANTONIO VAN UDEN - SEDE C (ANEXO 2 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Durante la semana se ejecutaron actividades en diferentes frentes de trabajo al interior de la institución educativa, conforme se detalla a continuación:
- Batería de baños: Se realizaron actividades de acabado en estuco y pintura. Asimismo, se llevó a cabo la instalación de puertas, espejos y tapas de registro, junto con los ajustes en la instalación de desagües y acoples de suministro, dejando la batería de baños lista para su respectiva entrega.
- Biblioteca: Se ejecutaron trabajos relacionados con los detalles de pintura general, tanto en áreas internas como en fachada. Adicionalmente, se dio inicio a la instalación de la ventanería.
- Bloque Alianza: Se realizaron detalles de pintura en la fachada sobre la Calle 13, portería y batería de baños. De manera paralela. se llevó a cabo la instalación de perfiles y el respectivo aseo de la ventanería.
2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado, las actividades se concentraron principalmente en las áreas de baños, bloque Alianza y biblioteca, donde se adelantaron labores conforme a la programación establecida en obra. Así mismo, se realizó seguimiento permanente al personal presente en frente de trabajo, verificando que contara con la documentación y aprobaciones requeridas para el ingreso, así como el uso adecuado de los EPP de acuerdo con las actividades ejecutadas.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: A la fecha, la institución presenta un avance físico del 0,75% en la ejecución de las actividades, frente a un valor esperado del 2.00 % para el periodo evaluado. Esto refleja un desarrollo inferior de un 1,25 %, donde se evidencia que a la fecha la institucion deberia estar finalizada y presenta un atraso que es tomado como incumplimiento.

4.1. Actividades programadas NO ejecutadas: Se evidencia que la programacion establecida por parte del propietario se encuentra en incumplimiento y las actividades atrasadas corresponden en primera instancia a la instalacion de ventanas de la biblioteca.

4.2. Actividades EJECUTADAS a la fecha: N/A

5. Generales: De acuerdo con lo programado por el Ingeniero de Apoyo a la Supervisión, se efectuó la entrega oficial el día viernes 17 de abril de 2026 de la batería de baños, el Bloque Alianza y las aulas de primera infancia a la rectora y su equipo acompañante. La entrega se realizó de manera presencial; sin embargo, la firma del acta quedó pendiente y deberá ser gestionada el día lunes 20 de abril de 2026. En el Comité de Obra N.° 16, y conforme a lo expuesto por la residente de obra y la directora de interventoría, el Ingeniero de Apoyo a la Supervisión informó que realizó la revisión de las áreas correspondientes a la entrega programada. Asimismo, se comunicó que la biblioteca no podrá ser entregada en la fecha prevista, debido a inconvenientes relacionados con la instalación de la ventanería.

6. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, Se verifico el cerramiento en buen estado, se evidencian materiales de construcción y todos los RCD fueron dispuestos adecuadamente, por lo que se recomienda garantizar jornadas de orden y aseo periódicamente y realizar la disposición adecuadamente el material posteriormente respecto a las especificaciones técnicas y ambientales.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO TECNICO INTERNACIONAL - SEDE A (ANEXO 3 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Durante la semana se ejecutaron actividades en diferentes frentes de trabajo al interior de la institución educativa, conforme se detalla a continuación:
- Aula múltiple: Se atendieron detalles de estuco y pintura; asimismo, se realizó el respectivo aseo del área. Posteriormente, se efectuó la entrega total del espacio a la institución, a conformidad y sin observaciones.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado, se ejecutaron labores de remates en pintura en el aula múltiple, incluyendo remates en las puertas, ventanas y parte exterior. Se validó que el personal utilizara de manera adecuada los EPP en las actividades de soldadura , al igual que en las actividades de excavación.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: Se evidencia que en referencia a la parte presupuestal y de programacion la institucion presenta un cumplimiento del 100%.

4.1. Actividades programadas NO ejecutadas: N/A

4.2. Actividades EJECUTADAS a la fecha: N/A

5. Generales: Durante el proceso de entrega del aula mencionada, la directora de interventoría realizó algunas observaciones relacionadas con las baterías de baños de primaria y bachillerato, especificamente en lo concerniente a la instalación de desagües, así como a la instalación de griferías y sanitarios que presentan filtraciones. Estas mismas novedades fueron reportadas por la rectoría, por lo que se procedió a su atención. Se encuentra pendiente concertar con la rectora la entrega de dichas actividades una vez sean subsanadas.

6. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, Se verifico el cerramiento en buen estado, se sigue evidenciando material de construcción y RCD (Volumen medio) acopiados, parte de estos en las zonas verdes por lo que si se llega a evidenciar algún daño se debe recuperar esta área, se recomendo al contratista disponer adecuadamente ante el gestor ya que cuentan con la cantidad minima,al igual, realizar jornadas de orden y aseo periódicamente, limpiar la zona verde e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA).

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO REPUBLICA DE VENEZUELA - SEDE B (ANEXO 4 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Durante el periodo evaluado se hizo armado de la estructura metalica de pergola

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado, desde el componente SST se evidenció la continuidad en las actividades de instalación de estructura metálica para pérgola. Así mismo, se realizó verificación al personal respecto al uso adecuado de los EPP para labores de manipulación de puildora y actividades de corte. De igual manera, se evidenció el cerramiento perimetral en adecuadas condiciones, contribuyendo al control de riesgos y a la seguridad en el área intervenida.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: Para el presente informe se ajustaron las cantidades conforme al balance presentado en la semana.

4.1. Actividades programadas NO ejecutadas:
- PINTURA EXTERIOR DE ALTA RESISTENCIA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)
- PINTURA EXTERIOR DE ALTA RESISTENCIA A TRES MANOS (A 0.6M, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS
- VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)
- PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM)
- DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE ADOQUÍN
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLO (80 A 100 CM). INCLUYE SOPORTES METÁLICOS PARA FIJAR LA CANAL EN LA FACHADA, ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE.
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC S 4" INCLUYE ACCESORIOS
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINA EN POLICARBONATO ALVEOLAR 6 MM (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)
- DESMONTE DE TANQUE ELEVADO (INCLUYE DESCONEXIÓN, ACCESORIOS DE TAPONAMIENTO, ANDAMIO CERTIFICADO, DISPOSICIÓN Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)
- DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDRÁULICAS EXISTENTES DE 1-1/2", 1-1/4", 1", 3/4", 1/2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)
- FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO
- ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA
- NP30 REINSTALACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO INCLUYE
SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEVADOR MECANICO, TUBERIA Y ACCESORIOS INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO

4.2. Actividades EJECUTADAS a la fecha: N/A

5. Generales: Durante el comité de obra la interventoria reitero que lleva mes y medio solicitando un andamio para poder verificar la instalacion del manto asfaltico, adicionalmente se destaco que es necesario conectar la bajante de aguas lluvias a una caja de inspeccion. El ingeniero apoyo a la supervision menciono que se debe dar solucion a filtraicon que se esta dando en un baño de la institucion, adicionalmente menciono que el carcamo de la cancha debe ser soondeado para evitar inundaciones de la sede. De igual manera se recordo que se debe realizar la tala del arbol y que este sera pagado de acuerdo a lo contractual, a menos que tenga una altura mayor a 22m, ya que en ese caso se generaria un NP.

6. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, se evidencia el cerramiento adecuado, se encuentra material y residuo que genero se acopio en lonas (Volumen medio) sin señalizar, por lo que se recomendó al contratista realizar la disposición adecuada, realizar jornadas de orden y aseo, si realiza otras actividades implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA)

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO MARCO ANTONIO CARREÑO - SEDE B (ANEXO 5 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Durante el periodo reportado se realizo instalacion de perfileria que servira como soporte de la cubierta en segundo piso, tambien se realizo instalacion de piso, bocapuertas y canales del segundo piso

2. Seguridad social y SST: Durante el periodo evaluado se realizó verificación del uso y estado de los andamios, evidenciando condiciones adecuadas para el desarrollo seguro de las actividades. Así mismo, se observó supervisión de trabajos en alturas por parte del personal SST del contratista, orientada al cumplimiento de los protocolos de seguridad establecidos. De igual manera, se evidenció el uso de línea de vida durante las labores de pañete exterior en mampostería y en la caseta del segundo piso. Adicionalmente, se registró la recepción en obra de material correspondiente a tres canales. Finalmente, se identificaron afectaciones en el cerramiento y se gestionó su reparación y mejoramiento, intervención ejecutada el día viernes 17 de abril.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: Para el presente informe se ajustaron las cantidades de acuerdo con el balance presentado esta semana.

4.1. Actividades programadas NO ejecutadas:
- MURO EN DRYWALL DOBLE CARA E= 10 CM, LÁMINA DE FIBROCEMENTO RESISTENTE A LA HUMEDAD 1/2" INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN.
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T)
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.
- MURO EN DRYWALL DOBLE CARA E= 10 CM, LÁMINA DE FIBROCEMENTO RESISTENTE A LA HUMEDAD 1/2" INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN.
- VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)
- FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO
- SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm y 40 mm. PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACIÓN CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEGÚN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR AUTOMATICO TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 1X20A 10 KA
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED DE SOBREPONER 120 X 30CM, 40 W. INCLUYE MARCO, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARA PISO FORMATO 45 X45, INCLUYE GUARDAESCOBA
- SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDA ESCOBAS EN TABLETA
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESQUINERO PLÁSTICO
- ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA
- AFINADO IMPERMEABILIZADO PENDIENTADO MORTERO 1:3 E= 0.10 M PARA CUBIERTA NO TRANSITABLE DE BLOQUE 11 (COCINA)
- ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE CUALQUIER SUPERFICIE EN CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 DESDE 0,61 M HASTA 1,3 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)
- NP 26 DESMONTE DE CERRAMIENTO EN TEJA DE ZINC, INCLUYE CARGUE Y RETIRO
- NP45 REINSTALACIÓN DE PUNTOS DE DATOS, INCLUYE PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
- NP47
REINSTALACIÓN DE RED REGULADA PUESTOS DE TRABAJO
- VINILO

4.2. Actividades EJECUTADAS a la fecha: Se deja constancia de que el contratista ha ejecutado actividades que no se encuentran contempladas en la programación contractual, pero estan incluidas enm el balance. En consecuencia, se requiere que estos ítems sean revisados y ajustados en la programación correspondiente al balance

5. Generales: Durante el comité de obra realizado en la Secretaría de Educación, se reiteró que la fecha de entrega establecida corresponde al 27 de abril. Se aclaro que respecto a lo electrico de la sede en primer piso no es alccance, por lo que el contratista debe dejar todo tal cual.

6. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, se evidencio un volumen medio de residuos y material, se realiza mezcla de cemento en batea metálica, se recomienda organizar la zona de acopio, garantizar jornadas de orden y aseo periódicamente, disponer adecuadamente todos los residuos ante el gestor adecuado e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA).

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO JULIO GARAVITO ARMERO - SEDE B (ANEXO 6 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Durante la semana se ejecutaron actividades en diferentes frentes de trabajo al interior de la institución educativa, conforme se detalla a continuación:
- Oficinas administrativas: Se avanzó en la instalación de guardaescobas; sin embargo, debido a la ejecución de un nuevo muro, la cantidad prevista de este elemento aumentó, por lo que no fue posible concluir su totalidad. Asimismo, se ejecutaron las bocapuertas, las cuales fueron ajustadas al evidenciarse que no contaban con la dilatación en cobre requerida.
- Baño de seguridad: Debido a afectaciones por cambios en la tonalidad de las piezas de enchape, se realizó su retiro y posterior reposición, junto con la aplicación de la boquilla correspondiente. Posteriormente, se efectuó la instalación de los aparatos sanitarios y las conexiones de desagüe y suministro.
- Escaleras: Se llevó a cabo la aplicación de gravilla lavada, finalizando completamente esta actividad.
2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo evaluado se realizó verificación al estado general y uso de los andamios destinados a actividades de pintura, evidenciando condiciones adecuadas para su utilización. Así mismo, se verificó la instalación y funcionamiento de las baterías sanitarias, observándose su operatividad, y se confirmó la ejecución de labores de aseo de baños el miércoles por la empresa encargada. De igual manera, se adelantaron actividades de orden y aseo mediante la recolección de material acopiado y retiro de escombros. En cuanto al cerramiento perimetral, este se encuentra firme y estable; no obstante, presenta afectaciones menores ocasionadas por impactos derivados de actividades deportivas.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA **CO1.PCCNTR.8155097**

INFORME SEMANAL No 28 **LOTE COP No 16**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 28 (Consecutivo) **DEL** 13/4/2026 (dd-mm-aa) **AL** 19/4/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 198 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

actualización actividades de orden y aseo mediante la recolección de material escombro y retiro de escombros. En cuanto a cerramiento perimetral, este se encuentra firme y estable, no obstante, presenta afectaciones menores ocasionadas por impactos derivados de actividades deportivas.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: A la fecha, la institución presenta un avance físico del 5,53 % en la ejecución de las actividades, frente a un valor esperado del 7.23 % para el periodo evaluado. Esto refleja un desarrollo inferior de un 1,70 %, donde se evidencia que a la fecha hay actividades pendientes en referencia al suministro e instalacion de la ventaneria.

4.1. Actividades programadas NO ejecutadas: No se identifica en obra que se encuentre el suministro de la ventaneria y por ende la instalacion de estas.

4.2. Actividades EJECUTADAS a la fecha: N/A

5. Generales: En el Comité de Obra N.° 16, el interventor definió los colores y las ubicaciones para su aplicación en la fachada. Asimismo, se indicó que las puertas correspondientes a la garita de vigilancia y al área de cocineta deberán ser pintadas de color negro, y que en el baño de seguridad se instalará un extractor de olores. De igual forma, se aclaró que las rejas de protección de la fachada externa del primer nivel no presentarán modificaciones, al igual que el bloque de coordinación, donde únicamente se realizará limpieza de mampostería.
Durante la semana también se realizó una visita por parte de la directora de interventoría, en la cual se identificaron algunos hallazgos que, en el marco del comité, fueron solicitados al director de obra para su respectiva atención.

6. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, cuenta con el cerramiento perimetral adecuado, se evidencio retiro de escombros y residuos de construcción y demolición, al igual quedan material y residuos (un bajo volumen) acopiados adecuadamente,Por lo que se recomienda disponer todo, garantizar jornadas de orden y aseo periódicamente al igual que implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA).

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO CULTURA POPULAR - SEDE C (ANEXO 7 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: Se evidencia que en referencia a la parte presupuestal y de programacion la institucion presenta un cumplimiento del 100%.

4.1. Actividades programadas NO ejecutadas: N/A

4.2. Actividades EJECUTADAS a la fecha: N/A

5. Generales: N/A

6. Ambiental: No se encuentra acopio de material ni RCD en el frente, terminaron actividades por lo que se generó acta de entrega en esta institución.

FIRMAS

ARQ. LORENA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
DIRECTORA DE INTERVENTORIA

ARQ. NELLY NATALIA MORA LA ROTTA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ING. LUIS EMIRO BLANCO MORENO
APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

ING. KATHERINE CAROLINA NUÑEZ OSORIO
PROFESIONAL SST

ING. CHRISTIAN FELIPE RODRIGUEZ
PROFESIONAL AMBIENTAL

ING. CRISTIAN BARRERA DONCELL
PROFESIONAL COSTOS Y PRESUPUESTOS

| | | |

	PROGRAMACIÓN				REAL			ACUMULADO			
INFORME	SEMANA	FECHA	PROGRAMADO	% PROGRAMADO	AVANCE	EJECUTADO	DIFERENCIA	PROGRAMADO		EJECUTADO	
1	sem 1	3-oct-25	$ -	0.00%	0.00%	$ -	$ -	0.00%	$ -	0.00%	$0.00
2	sem 2	13-oct-25	$ -	0.00%	0.00%	$ -	$ -	0.00%	$ -	0.00%	$0.00
3	sem 3	20-oct-25	$ -	0.00%	0.00%	$ -	$ -	0.00%	$ -	0.00%	$0.00
4	sem 4	27-oct-25	$ -	0.00%	0.00%	$ -	$ -	0.00%	$ -	0.00%	$0.00
5	sem 5	3-nov-25	$ 4,755,494.21	0.22%	0.00%	$ -	$ 4,755,494.21	0.22%	$ 4,755,494.21	0.00%	$0.00
6	sem 6	10-nov-25	$ 8,125,912.59	0.38%	0.80%	$ 16,977,206.64	$ (8,851,294.05)	0.60%	$ 12,881,406.80	0.80%	$16,977,206.64
7	sem 7	17-nov-25	$ 5,288,020.00	0.25%	1.02%	$ 21,771,422.72	$ (16,483,402.72)	0.85%	$ 18,169,426.80	1.82%	$38,748,629.36
8	sem 8	24-nov-25	$ 17,444,983.27	0.82%	1.13%	$ 23,997,772.21	$ (6,552,788.94)	1.67%	$ 35,614,410.07	2.94%	$62,746,401.57
9	sem 9	1-dic-25	$ 40,343,446.53	1.89%	1.80%	$ 38,340,052.51	$ 2,003,394.02	3.56%	$ 75,957,856.60	4.74%	$101,086,454.08
10	sem 10	8-dic-25	$ 79,444,682.79	3.73%	1.43%	$ 30,382,417.28	$ 49,062,265.51	7.29%	$ 155,402,539.39	6.17%	$131,468,871.36
11	sem 11	15-dic-25	$ 108,209,197.15	5.08%	2.69%	$ 57,402,366.83	$ 50,806,830.32	12.37%	$ 263,611,736.54	8.86%	$188,871,238.19
12	sem 12	22-dic-25	$ 69,900,889.80	3.28%	2.91%	$ 62,085,827.21	$ 7,815,062.59	15.64%	$ 333,512,626.34	11.77%	$250,957,065.40
13	sem 13	29-dic-25	$ 75,956,528.24	3.56%	1.49%	$ 31,686,383.67	$ 44,270,144.57	19.21%	$ 409,469,154.58	13.26%	$282,643,449.07
14	sem 14	5-ene-26	$ 89,212,283.49	4.18%	5.66%	$ 120,616,837.44	$ (31,404,553.95)	23.39%	$ 498,681,438.07	18.92%	$403,260,286.51
15	sem 15	12-ene-26	$ 83,223,770.74	3.90%	7.45%	$ 158,783,369.63	$ (75,559,598.89)	27.30%	$ 581,905,208.81	26.36%	$562,043,656.14
16	sem 16	19-ene-26	$ 152,231,709.97	7.14%	5.56%	$ 118,625,799.96	$ 33,605,910.01	34.44%	$ 734,136,918.78	31.93%	$680,669,456.10
17	sem 17	26-ene-26	$ 114,051,601.68	5.35%	6.55%	$ 139,680,056.20	$ (25,628,454.52)	39.79%	$ 848,188,520.46	38.48%	$820,349,512.30
18	sem 18	2-feb-26	$ 97,149,131.29	4.56%	12.74%	$ 271,555,749.04	$ (174,406,617.75)	44.34%	$ 945,337,651.75	51.22%	$1,091,905,261.34
19	sem 19	9-feb-26	$ 123,336,874.83	5.79%	1.19%	$ 25,293,497.30	$ 98,043,377.53	50.13%	$ 1,068,674,526.58	52.40%	$1,117,198,758.64
20	sem 20	16-feb-26	$ 144,354,651.09	6.77%	4.62%	$ 98,397,025.80	$ 45,957,625.29	56.90%	$ 1,213,029,177.67	57.02%	$1,215,595,784.44
21	sem 21	23-feb-26	$ 133,044,130.87	6.24%	3.10%	$ 65,986,851.22	$ 67,057,279.65	63.14%	$ 1,346,073,308.54	60.12%	$1,281,582,635.66
22	sem 22	2-mar-26	$ 302,192,068.33	14.17%	1.36%	$ 28,959,518.19	$ 273,232,550.14	77.32%	$ 1,648,265,376.87	61.47%	$1,310,542,153.85
23	sem 23	9-mar-26	$ 188,077,906.58	8.82%	1.11%	$ 23,746,298.25	$ 164,331,608.33	86.14%	$ 1,836,343,283.45	62.59%	$1,334,288,452.10
24	sem 24	16-mar-26	$ 83,278,260.58	3.91%	1.86%	$ 39,714,826.84	$ 43,563,433.74	90.04%	$ 1,919,621,544.03	64.45%	$1,374,003,278.94
25	sem 25	23-mar-26	$ 87,605,509.23	4.11%	4.57%	$ 97,485,710.00	$ (9,880,200.77)	94.15%	$ 2,007,227,053.26	69.02%	$1,471,488,988.94
26	sem 26	30-mar-26	$ 36,671,729.02	1.72%	0.59%	$ 12,586,346.12	$ 24,085,382.90	95.87%	$ 2,043,898,782.28	69.61%	$1,484,075,335.06
27	sem 27	6-abr-26	$ 67,465,761.55	3.16%	3.41%	$ 72,654,892.31	$ (5,189,130.76)	99.04%	$ 2,111,364,543.83	73.02%	$1,556,730,227.37
28	sem 28	13-abr-26	$ 10,504,787.87	0.49%	0.00%	$ -	$ 10,504,787.87	99.53%	$ 2,121,869,331.70		$1,556,730,227.37
29	sem 29	20-abr-26	$ 10,012,682.84	0.47%	0.00%	$ -	$ 10,012,682.84	100.00%	$ 2,131,882,014.54		$1,556,730,227.37
30	sem 30	27-abr-26	$ -	0.00%	0.00%	$ -	$ -	100.00%	$ 2,131,882,014.54		$1,556,730,227.37
31	sem 31	4-may-26	$ -	0.00%	0.00%	$ -	$ -	100.00%	$ 2,131,882,014.54		$0.00
32	sem 32	11-may-26		0.00%	0.00%			100.00%	$ 2,131,882,014.54		
33	sem 33	18-may-26		0.00%	0.00%			100.00%	$ 2,131,882,014.54		
34	sem 34	25-may-26		0.00%	0.00%			100.00%	$ 2,131,882,014.54		
35	sem 35	1-jun-26		0.00%	0.00%			100.00%	$ 2,131,882,014.54		
36	sem 36	8-jun-26		0.00%	0.00%			100.00%	$ 2,131,882,014.54		
37	sem 37	15-jun-26		0.00%	0.00%			100.00%	$ 2,131,882,014.54		
38	sem 38	22-jun-26		0.00%	0.00%			100.00%	$ 2,131,882,014.54		
39	sem 39	29-jun-26		0.00%	0.00%			100.00%	$ 2,131,882,014.54		
40	sem 40	6-jul-26		0.00%	0.00%			100.00%	$ 2,131,882,014.54		
41	sem 41	13-jul-26		0.00%	0.00%			100.00%	$ 2,131,882,014.54		
42	sem 42	20-jul-26		0.00%	0.00%			100.00%	$ 2,131,882,014.54		
43	sem 43	27-jul-26		0.00%	0.00%			100.00%	$ 2,131,882,014.54		
			$ 2,131,882,014.54	100.00%	73.02%						

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 28 **LOTE COP No 16**


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


SEMANA No. 28 (Consecutivo) **DEL** 13/4/2026 (dd-mm-aa) **AL** 19/4/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 198 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

COLEGIO INTEGRADO DE FONTIBON - SEDE A (ANEXO 1 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

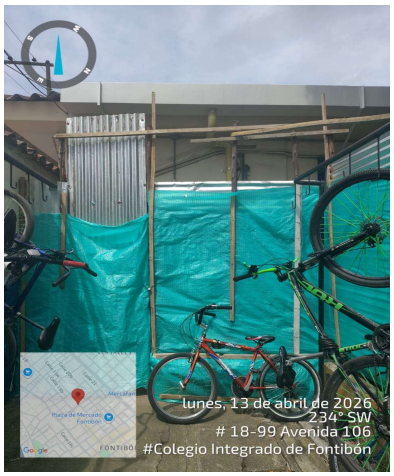

Se realiza la apertura de la puerta correspondiente al ingreso del area del almacen en la casona.

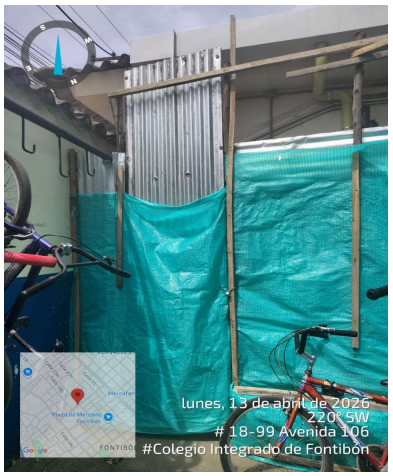

Se realiza la apertura de la puerta correspondiente al ingreso del area del almacen en la casona.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 28 | **LOTE COP No 16**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 28 (Consecutivo) **DEL** 13/4/2026 (dd-mm-aa) **AL** 19/4/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 198 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

COLEGIO ANTONIO VAN UDEN - SEDE C (ANEXO 2 REGISTRO FOTOGRÁFICO)



Se realiza la instalacion de los espejos en la bateria de baños.



Se evidencia que se esta realizando la correcion de detalles en los muros sin enchape en ciertas areas de la bateria de baños.



Se evidencia que se realiza la instalacion y el remate de las puertas en el area de la bateria de baños.



Se evidencia que no se han finalizado las actividades de aseo en ciertos elementos del bloque alianza.



Se evidencia que se realiza la aplicación de la ultima capa de pintura epoxica en la bateria de baños.



Se evidencia que se esta realizando la correccion de detalles en el area correspondiente al area de la cenefa de la fachada a la Calle 13.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784


INFORME SEMANAL No 28 | **LOTE COP No 16**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 28 (Consecutivo) **DEL** 13/4/2026 (dd-mm-aa) **AL** 19/4/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 198 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

COLEGIO ANTONIO VAN UDEN - SEDE C (ANEXO 2 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

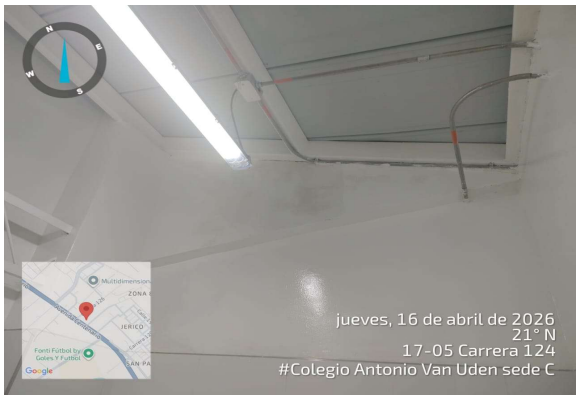

Se evidencia una humedad existente en el area correspondiente al deposito en la bateria de baños, la cual se encuentra en tratamiento.



Se evidencia que de acuerdo a las recomendaciones realizadas por parte de la Directora de interventoria se realiza el respectivo ajuste en la instalacion de los desagues de la bateria de baños.



Se evidencia la instalacion de taparegistros en las respectivas areas de la bateria de baños.



Entrega bloque alianza.



Entrega bloque alianza.



Entrega bloque alianza.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 28 | **LOTE COP No 16**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 28 (Consecutivo) **DEL** 13/4/2026 (dd-mm-aa) **AL** 19/4/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 198 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

COLEGIO ANTONIO VAN UDEN - SEDE C (ANEXO 2 REGISTRO FOTOGRÁFICO)



Entrega bloque alianza.



Entrega bloque alianza.




Entrega bloque alianza.



Entrega de bateria de baños.



Entrega de bateria de baños.

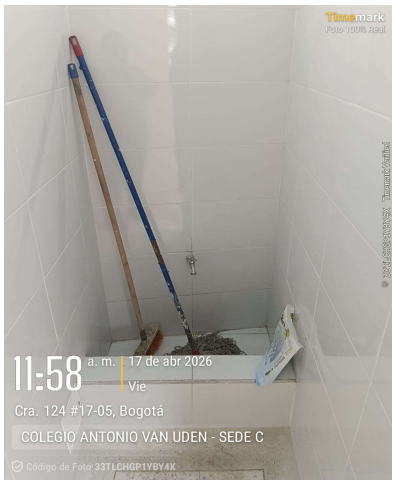

Entrega de bateria de baños.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 28 | **LOTE COP No 16**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 28 (Consecutivo) **DEL** 13/4/2026 (dd-mm-aa) **AL** 19/4/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 198 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

COLEGIO ANTONIO VAN UDEN - SEDE C (ANEXO 2 REGISTRO FOTOGRÁFICO)



Entrega de bateria de baños.



Entrega de bateria de baños.



Entrega de bateria de baños.



Entrega de bateria de baños.



Entrega de bateria de baños.



Entrega de bateria de baños.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 28 | **LOTE COP No 16**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 28 (Consecutivo) **DEL** 13/4/2026 (dd-mm-aa) **AL** 19/4/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 198 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

COLEGIO ANTONIO VAN UDEN - SEDE C (ANEXO 2 REGISTRO FOTOGRÁFICO)



Entrega de bateria de baños.



Entrega de bateria de baños.



Entrega de bateria de baños.



Entrega de bateria de baños.



Entrega de aulas de primaria infancia.



Entrega de aulas de primaria infancia.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 28 **LOTE COP No 16**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 28 (Consecutivo) **DEL** 13/4/2026 (dd-mm-aa) **AL** 19/4/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 198 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

COLEGIO ANTONIO VAN UDEN - SEDE C (ANEXO 2 REGISTRO FOTOGRÁFICO)



Entrega de aulas de primaria infancia.



Entrega de aulas de primaria infancia.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 28 | **LOTE COP No 16**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 28 (Consecutivo) **DEL** 13/4/2026 (dd-mm-aa) **AL** 19/4/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 198 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

COLEGIO TECNICO INTERNACIONAL - SEDE A (ANEXO 3 REGISTRO FOTOGRÁFICO)



Se evidencia que se realizan actividades de aseo a la tuberia EMT en el aula multiple.



Se realizan actividades de retoque de estuco en los muros correspondientes al aula mutliple.



Se evidencia que ciertas hojas de las puertas presentan detalles de pintura en el aula mutliple.



Se realizan actividades de retoque de pintura en los muros correspondientes al aula mutliple.



Se realizan retoques de pintura en la reja correspondiente al area TEC.



Se estan realizando actividades de limpieza en las aulas correspondientes al aula multiple.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 28 | **LOTE COP No 16**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 28 (Consecutivo) **DEL** 13/4/2026 (dd-mm-aa) **AL** 19/4/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 198 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

COLEGIO TECNICO INTERNACIONAL - SEDE A (ANEXO 3 REGISTRO FOTOGRÁFICO)



Entrega de aula multiple.



Entrega de aula multiple.



Entrega de aula multiple.



Entrega de aula multiple.



Entrega de aula multiple.



Entrega de aula multiple.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 28 | **LOTE COP No 16**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 28 (Consecutivo) **DEL** 13/4/2026 (dd-mm-aa) **AL** 19/4/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 198 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

COLEGIO TECNICO INTERNACIONAL - SEDE A (ANEXO 3 REGISTRO FOTOGRÁFICO)



Entrega de aula multiple.



Entrega de aula multiple.



Entrega de aula multiple.



Entrega de aula multiple.



Entrega de aula multiple.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 28 | **LOTE COP No 16**

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | BOGOTÁ

SEMANA No. 28 (Consecutivo) **DEL** 13/4/2026 (dd-mm-aa) **AL** 19/4/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 198 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

COLEGIO REPUBLICA DE VENEZUELA - SEDE B (ANEXO 4 REGISTRO FOTOGRÁFICO)



Estructura metálica de la pérgola



Bajante en fachada principal



Emergencia silviculturales clase III



Estructura metálica



Dado ,con platina y perfil instalado



Estructura metálica



Acopió de estructura metálica, cubierta y acopiada



Perfilería Metálica

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 28 | **LOTE COP No 16**

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | BOGOTÁ


SEMANA No. 28 (Consecutivo) **DEL** 13/4/2026 (dd-mm-aa) **AL** 19/4/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 198 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

COLEGIO MARCO ANTONIO CARREÑO - SEDE B (ANEXO 5 REGISTRO FOTOGRÁFICO)



Destroncamiento de piso en salones

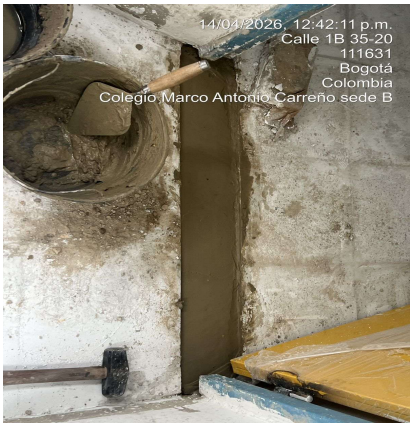

Bocapuerta



Pulido de piso en algunos salones.



Bocapuerta



Aplicación de pañete en mampostería y viga cinta del segundo piso.



Recepción de tres canaletas para instalación en segundo piso.



Instalación de pies de amigo para soporte de canaletas.



Instalación de pies de amigo para soporte de canaletas.



Terminación de pañete en mampostería y viga cinta.



Inicio de aplicación de pintura anticorrosiva (3 en 1) en perfilería.



Aplicación de pintura 3 en 1 en perfilería con acabados.



Aplicación de boquilla y destroncamiento de piso.



Pintura en módulo inferior, incluyendo resane y acabado en perfilería.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 28 **LOTE COP No 16**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 28 (Consecutivo) **DEL** 13/4/2026 (dd-mm-aa) **AL** 19/4/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 198 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

COLEGIO JULIO GARAVITO ARMERO - SEDE B (ANEXO 6 REGISTRO FOTOGRÁFICO)



Se evidencia que ciertas areas de la cubierta en el area interna presentan detalles de aseo en los traslapes en el area administrativa.



Se evidencia que se realiza la composicion del area correspondiente a donde va la bocapuerta en el area administrativa.



Se evidencia que no se ha realizado la instalacion de las piezas pendientes en el baño de vigilancia.



Se evidencia que se realiza la instalacion del sanitario correspondiente al baño de vigilancia.



Se realiza la instalacion de piezas de enchape en muros pendientes en el baño de seguridad.



Se realiza el retiro de la pieza correspondiente al area donde se realizara la instalacion del extractor de olores correspondiente al baño de seguridad.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 28 **LOTE COP No 16**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 28 (Consecutivo) **DEL** 13/4/2026 (dd-mm-aa) **AL** 19/4/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 198 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16


COLEGIO JULIO GARAVITO ARMERO - SEDE B (ANEXO 6 REGISTRO FOTOGRÁFICO)



Se realiza la instalacion del lavamanos y el desague del baño de seguridad.




Se realiza la fundida de las correspondientes bocapuertas en el area administrativa.

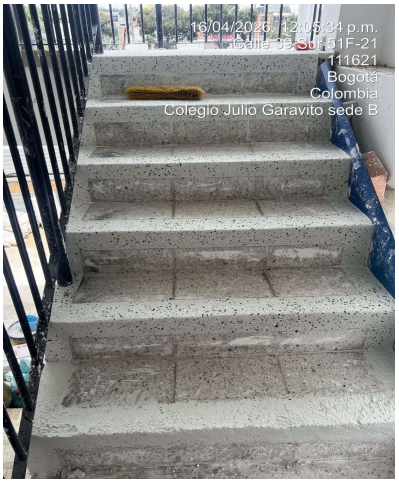


Se realiza el remate de las escaleras en el area correspondiente de acuerdo al diseño y el lavado de esta.



Se realiza el retiro de las bocapuertas instaladas y se realiza la instalacion de la dilatacion en cobre por recomendación del contratista en el area administrativa.

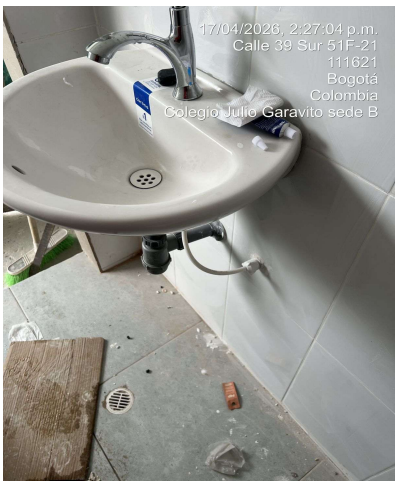

Se realiza la instalacion de la griferia del lavamanos y la instalacion de acople de suministro de este en el area del baño de seguridad.

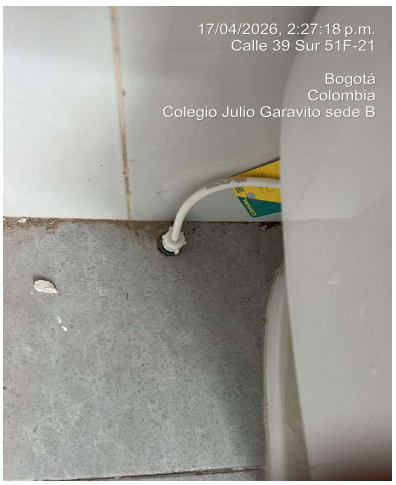

Se realiza la instalacion del acople de suministro del sanitario del baño de seguridad.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 28 **LOTE COP No 16**


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 28 (Consecutivo) **DEL** 13/4/2026 (dd-mm-aa) **AL** 19/4/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 198 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

COLEGIO JULIO GARAVITO ARMERO - SEDE B (ANEXO 6 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

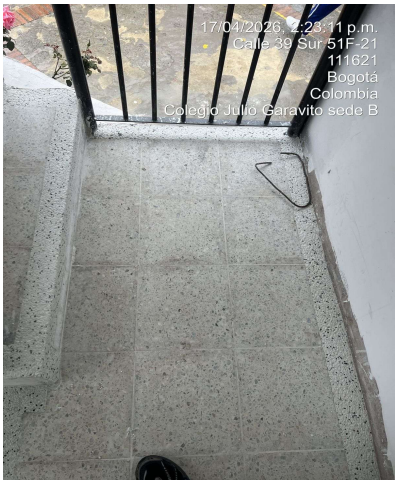

Se realiza el remate de las escaleras en el area correspondiente de acuerdo al diseño y el lavado de esta.
