INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA **CO1.PCCNTR.8155343**

INFORME SEMANAL No 22 **LOTE COP No 17**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 22 (Consecutivo) **DEL** 2/3/2026 (dd-mm-aa) **AL** 8/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 156 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17

CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORÍA


Contratista:	CONSORCIO CAPITAL LM		**Interventoria**	PROBINTEC S.A.S	
RL del consorcio	LUIS MILTON ORTIZ VERGEL		**RL de Interventoría**	SANDRA STELLA MORENO BUITRAGO	
Contrato No.	CO1.PCCNTR.8155343		**Contrato No.**	CO1.PCCNTR.8168931	
Objeto	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.		**Objeto**	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No. 6	
VALOR DEL CONTRATO		$ 2.220.672.788,00	**Valor Inicial:**	$ 796.278.928,00	
AIU	35,95%	$ 798.331.867,29	**Valor Adicional No. 1 del 26 de diciembre de 2026:**	$ 139.026.666,00	
COSTO DIRECTO		$ 1.422.340.920,71	**Valor Total del Contrato:**	**$ 935.305.594,00**	
OFERTADO		**$ 2.109.535.964,00**			
EMERGENCIAS		$ 100.000.000,00			
VALOR PARCIAL CON EMERGENCIAS		**$ 2.209.535.964,00**			
DIFERENCIA PARA EMERGENCIAS		$ 11.136.824,00			
Valor Parcial (Inicial + Emergencias)		**$ 111.136.824,00**			
Valor adicional No. 1:		**$ 791.000.000,00**			
Valor inicial No. 1 emergencias:		**$ 200.000.000,00**			
Valor adicional No.1 Obras Contractuales:		**$ 591.000.000,00**			
VALOR TOTAL INICIAL + EMERGENCIA		**$ 3.011.672.788,00**			
VALOR TOTAL EMERGENCIAS		**$ 411.136.824,00**			
VALOR TOTAL PARA OBRAS CONTRACTUALES		**$ 2.600.535.964,00**			
Plazo Inicial:	SIETE (7) MESES		**Plazo Inicial:**	SIETE (7) MESES	**PLAZO TOTAL PROYECTO**
Fecha de Iniciación:	3/10/2025		**Fecha de Iniciación:**	3/10/2025	212
Fecha de Finalizacion:	2/05/2026		**Fecha de Vencimiento:**	2/05/2026	

AVANCE DEL CONTRATO

	SEMANAL	ACUMULADO			ACUMULADO
Obra programada (%)	1,44%	35,68%	Obra Física Ejecutada (%)	1,96%	36,31%
Valor de la Obra programada:	$ 37.350.198,00	$ 788.279.574,00	Valor de la Obra Ejecutada:	$ 43.279.286,00	$ 944.124.582,00

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONTRATO

SEGUIMIENTO EN % DE LA PROGRAMACIÓN DE OBRA			
	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	34,24%	34,35%	0,63%
Durante el periodo	1,44%	1,96%	
Acumulado actual	35,68%	36,31%	

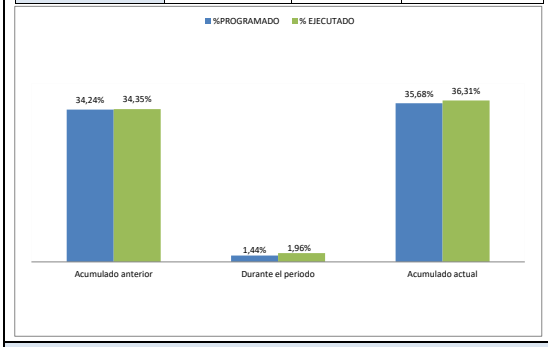

OBRAS CONTRATO INICIAL

DESCRIPCION DE LA SEDE			AVANCE SEMANAL			AVANCE ACUMULADO		
CPF	LOCALIDAD	COLEGIO	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA	% PROGRAMADO ACUMULADO	% EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
1074	ENGATIVA	JUSTO VICTOR CHARRY (IED)	1,00%	1,30%	0,30%	55,00%	55,30%	0,30%
1076	ENGATIVA	RODOLFO LLINAS (IED)	1,30%	3,80%	2,50%	74,30%	76,80%	2,50%
1029	ENGATIVA	REPUBLICA DE CHINA (IED)	1,84%	0,97%	-0,87%	17,33%	10,27%	-7,06%
1048	ENGATIVA	JOSE ASUNCION SILVA (IED)	4,20%	7,70%	3,50%	6,00%	7,70%	1,70%
1303	TEUSAQUILLO	MANUELA BELTRAN SEDE B (IED)	0,25%	0,20%	-0,05%	0,82%	1,81%	0,99%
1407	LOS MÁRTIRES	COLEGIO PANAMERICANO (IED)	2,40%	1,20%	-1,20%	55,00%	61,60%	6,60%
1035	ENGATIVA	MARCO TULIO FERNANDEZ (IED)	0,50%	0,50%	0,00%	33,50%	33,50%	0,00%
ADM	TEUSAQUILLO	OTIC - DATE CENTER	0,00%	0,00%	0,00%	43,46%	43,46%	0,00%
TOTAL PROMEDIO			1,44%	1,96%	0,52%	35,68%	36,31%	0,63%

EMERGENCIAS Y/O OBRAS PRIORITARIAS

CPF	LOCALIDAD	COLEGIO	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA	VALOR TOTAL	VALOR CONTRATO	DIFERENCIA
1037	ENGATIVA	SAN JOSE DEL NORTE SEDE A (IED)	0,00%	0,00%	0,00%	-		
1413	LOS MARTIRES	SAN FRANCISCO DE ASIS (IED)	0,00%	0,00%	0,00%	-		
1072	ENGATIVA	COLEGIO LAS MERCEDES (IED)	80,00%	80,00%	0,00%	3.966.712,00		
1036	ENGATIVA	MARCO TULIO FERNANDEZ SEDE C (IED)	100,00%	100,00%	0,00%	991.678,00		
1041	ENGATIVA	LA PALESTINA (IED)	0,00%	0,00%	0,00%	-		
	ENGATIVA	REPUBLICA DE COLOMBIA	0,00%	0,00%	0,00%			
						$ 4.958.390,00	$ 411.136.824,00	$ 406.178.434,00

AVANCE FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$ 2.220.672.788,00
VALOR PARCIAL 1		**$ 250.642.138,00**
VALOR PARCIAL 2		**$ 118.871.524,00**
TOTAL VALOR FACTURADO		$ 369.513.662,00
SUMAS IGUALES		$ 1.851.159.126,00

INDICADOR FINANCIERO	VALOR FACTURADO	VALOR PAGADO
	$ 369.513.662,00	$ 369.513.662,00

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

INDICADOR TECNICO	% AVANCE PROGRAMADO	% DE AVANCE EJECUTADO	% RETRASO - / % ADELANDO +
	35,68%	**36,31%**	**0,63%**

INDICADOR TIEMPO	DIAS	AVANCE
	156	**73,58%**

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA **CO1.PCCNTR.8155343**


INFORME SEMANAL No 22 **LOTE COP No 17**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 22 (Consecutivo) **DEL** 2/3/2026 (dd-mm-aa) **AL** 8/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 156 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17

CURVA S

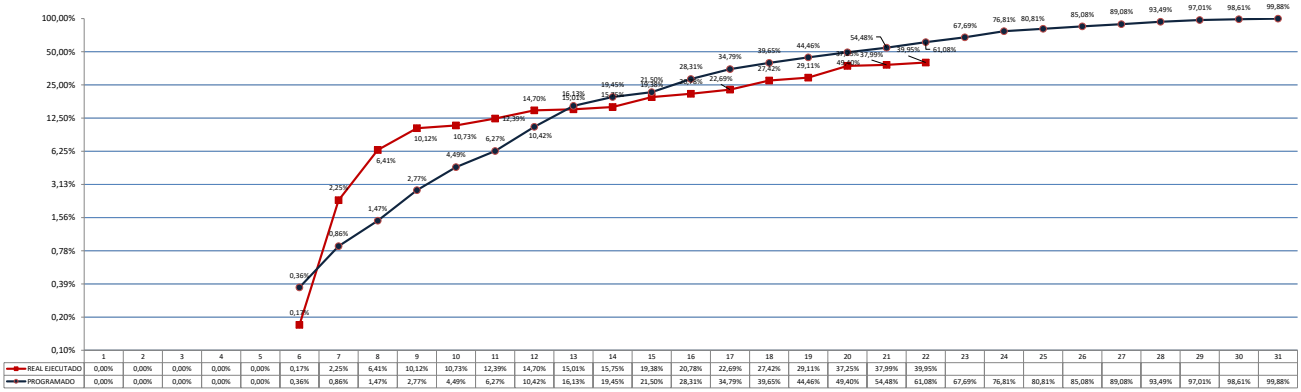

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
REAL EJECUTADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,17%	2,25%	6,41%	10,12%	10,73%	12,39%	14,70%	15,01%	15,75%	19,38%	20,78%	22,69%	27,42%	29,11%	37,25%	37,99%	39,95%									
PROGRAMADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,36%	0,86%	1,47%	2,77%	4,49%	6,27%	10,42%	16,13%	19,45%	21,50%	28,31%	34,79%	39,65%	44,46%	49,40%	54,48%	61,08%	67,69%	76,81%	80,81%	85,08%	89,08%	93,49%	97,01%	98,61%	99,88%

SEGUIMIENTO AL FLUJO DE OBRA EMITIDO POR EL CONTRATISTA - RESPONDE A LA PROGRAMACION DE OBRA

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO JUSTO VICTOR CHARRY SEDE A (ANEXO 1 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: No se evidenciaron actividades de obra, en la semana se realiza el suministro de lamina dde superboard provisional para zona domo.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado no se evidenciaron labores **de ejecucion, se realiza el suministro de cielo falso para zona comedor escolar.**

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: Para el presente periodo no se ejecutaron ninguna actividad

4.1. Actividades programadas NO ejecutadas: A LA FECHA DEL CIERRE DEL PRESENTE INFORME EL CONTRATISTA NO HA FINALIZADO LABORES DE CORRECCION DE POLIUREA - INSTALACION DE CIELO FALSO EN ZONA COMEDOR

4.2. Actividades Ejecutadas a la fecha: N/A

5. Generales: Durante el periodo reportado se llevó a cabo el comité de obra N°.10 solicitado por la supervisión en la sede de la Secretaria de Educacion SED; este cuenta con la participación del Supervisor del contrato, la Interventoría y el contratista de obra. (se levanta Acta de reunión).
No se presentaron situaciones de emergencia en las sedes intervenidas.
Se presentó BALANCE GENERAL N° 3 por parte del Contratista, para revision a aprobacion por parte de la Interventoria.

6. Aspectos ambientales: se reportan residuos acopiados en el frente por lo que se espera que realice la disposición total de los escombros respecto a las especificaciones técnicas y ambientales al igual que realizar posteriormente una jornada de limpieza y aseo.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO RODOLFO LLINAS SEDE A (ANEXO 2 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Se inician labores de Suministro e instalacion de Piso en porcelanatro 60x60 en el salon 104 B

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo se realizaron Actividades de verificacion del correcto diligenciamiento de los permisos de trabajo en alturas, así como el uso adecuado de los EPP y de los EPCC por parte del personal involucrado.
Adicionalmente, se validó la ejecución de inspecciones de seguridad, con el fin de identificar y controlar oportunamente los riesgos asociados a la actividad, garantizando el cumplimiento de los procedimientos establecidos.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: N/A

4.1. Actividades programadas NO ejecutadas:

4.2. Actividades ejecutadas a la fecha: Suministro e instalacion de porcelanato

5. Generales: Durante el periodo reportado se llevó a cabo el comité de obra N°.10 solicitado por la supervisión en la sede de la Secretaria de Educacion SED ; este cuenta con la participación del Supervisor del contrato, la Interventoría y el contratista de obra. (se levanta Acta de reunión).
No se presentaron situaciones de emergencia en las sedes intervenidas.
Se presentó EL Acta parcial n° 3 la cual esta sujeta a revision por parte de la Interventoria.

6. Aspectos ambientales: Se realizo visita al frente, se encuentra acopios de residuos debidamente señalizados y cubiertos y se espera que realice la disposición total de los escombros, al igual se garantiza una jornada de orden y aseo en la institución.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO REPUBLICA DE CHINA - SEDE B (ANEXO 3 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Durante la presente semana, en la sede República de China se ejecutaron las siguientes actividades:
- Instalacion de manto y relleno de subbsase

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenciaron actividades de apique en el área de intervención. En cuanto al componente de SST, no se registraron actividades adicionales de seguimiento o control, debido a que durante la visita únicamente se estaban ejecutando labores puntuales de apique. No obstante, se recomienda al contratista garantizar el cumplimiento de las medidas de seguridad y el uso adecuado de los EPP durante el desarrollo de este tipo de actividades.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: La sede presenta un atraso de -7,99%, ya que no se estan ejecutando actividades

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA **CO1.PCCNTR.8155343**

INFORME SEMANAL No 22 **LOTE COP No 17**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 22 (Consecutivo) **DEL** 2/3/2026 (dd-mm-aa) **AL** 8/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 156 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17

4.1. Actividades programadas NO ejecutadas: Durante el periodo en curso, de acuerdo con la programación vigente, se tenía previsto ejecutar los siguientes ítems:
1.3.5: LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A CÁRCAMO (INCLUYE DESMONTE Y MONTAJE DE REJILLA, LIMPIEZA, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL SOBRANTE, RESANE DE GRIETAS Y BORDE), esta actividad se realizara al final de la obra, ya que el alcance cambio. (congelada), esta actividad se reprograma teniendo en cuenta que se modifico el alcance de la intervencion.
16.1.21: SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE POLIUREA PURA DE ALTO DESEMPEÑO E= 2 MM
NP. 20.5. REINSTALACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 500 LT(NO INCLUYE REPOSICION NI INSTALACION DE ACCESORIOS)
1.2.23.DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) esta actividad esta programada del 7 al 12 de marzo, por lo cual ya empezo a sumar en el porcentaje programado.

4.2. Actividades ejecutadas a la fecha: Demolicion placa zona Parqueadero

5. Generales: Durante el período se llevó a cabo el Comité de Obra, para la sede República de China el ingeniero apoyo a la supervisión indicó que no se ejecutarán las cajas en el pasillo de la institución, sino una única caja en el exterior. Asimismo, se definió la instalación de dos bajantes distribuidas a cada lado del pasillo en tubería de 3", manteniendo la tubería de 4" en los extremos. Igualmente, se indicó que el policarbonato no deberá desinstalarse hasta realizar la intervención y cambio del piso, junto con las actividades necesarias para la ejecución de las bajantes. Finalmente, se reitera que el personal que se presente en obra sin previa aprobacion de la interventoría no podrá ingresar a la sede.

6. Aspectos ambientales:Se realiza visita al frente, no cuentan con cerramiento, se evidencia material de construcción y RCD (sin cubrimiento ni protección) acopiado, pero se recomienda proteger el sumidero cerca, una jornada de orden y aseo, disponer los residuos ante un gestor autorizado e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA)

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO JOSE ASUNCION SILVA SEDE A (ANEXO 4 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Durante la semana en curso se realizan actividades de Suministro e instalacion de Cieloraso en PVC para la zona de baños de docentes, de la misma manera se realiza la instalacion de muro dos caras superboard 6 mm para la zona de Salon de DOcentes.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se realiza aprobacion de la cuadrilla de trabajo para el frente.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: Se inician actividades con el 7% de ejecucion en la semana

4.1. Actividades programadas NO ejecutadas: Durante el periodo en curso, de acuerdo con la programación vigente, se tenía previsto ejecutar los siguientes ítems:
PINTURA DE MURO EN SUPERBOARD

4.2. Actividades ejecutadas a la fecha: Suministro e instalacion de Cielo rsao PVC y Lamina de Superboard

5. Generales: Durante el periodo reportado se llevó a cabo el comité de obra N°.12 solicitado por la supervisión en la sede de la Secretaria de Educacion Distrital; este cuenta con la participación del Supervisor del contrato, la Interventoría y el contratista de obra. (se levanta Acta de reunión).
Donde se solicita el inicio inmediato de labores sobre este frente.

6. Aspectos ambientales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO MANUELA BELTRAN SEDE B (ANEXO 5 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Durante el periodo reportado se realizaron las siguientes actividades:
•Compactacion de la subbase

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenciaron actividades de aplicación de recebo en el área de intervención. Se verificó la presencia de un trabajador ejecutando la labor, quien se encontraba debidamente aprobado para el desarrollo de la actividad.
Desde el componente SST, se validó el uso adecuado de los EPP y la respectiva dotación. Así mismo, se realizó la inspección de las herramientas utilizadas, con el fin de verificar que se encontraran en condiciones seguras para su uso y prevenir la ocurrencia de incidentes durante la ejecución de la actividad.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: Se ejecutaron actividades de compactacion de la subbase

4.1. Actividades programadas NO ejecutadas: De acuerdo con la programacion, ya se debio realizar la ejecucion del item

ítem: 15.1.12=SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÓDULO AULA ESCOLAR TIPO (S/DISEÑO - VER FICHA TECNICA Y PLANOS), EN ESTRUCTURA METÁLICA DESMONTABLE, ENSAMBLADA POR MEDIOS MECÁNICOS (TORNILLERÍA, PERNOS), CUBIERTA A UN AGUA Y ÁREA DE CIRCULACIÓN. INCLUYE PUERTAS, VENTANAS, ACABADOS, ILUMINACIÓN, REDES ELÉCTRICAS E HIDROSANITARIAS. AREA 52 M2, esta actividad se reprogramo para inicio el 16 de marzo y entrega dentro del tiempo contrctual, por tiempos de las definiones tecnicas.

4.2. Actividades ejecutadas a la fecha: Demolicion de placa.

5. Generales: En el comité realizado en la SED, el ingeniero de apoyo a la supervisión solicitó la elaboración de un NP para voz y datos y deberá contar con la debida certificación. Asimismo, indicó que, de ser necesario, se solicitará a la supervisión el acompañamiento o asesoría por parte del área TIC.

6. Aspectos ambientales: : El frente de obra cuenta con el debido cerramiento y señalización, se evidencia que los residuos fueron dispuestos adecuadamente, por lo que se recomienda acopiar adecuadamente el material que ingrese e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA).

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO PANAMERICANO SEDE A (ANEXO 6 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Durante el período reportado continuan actividades de montaje de cubierta en zona Auditorio y ensamble de nueva estructura, cielo rasos en puntos fijos zona de salones.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se llevaron a cabo diversas actividades en materia de SST, orientadas a la prevención de riesgos y al control de condiciones peligrosas en los frentes de obra. Entre ellas, se evidenció el diligenciamiento de los respectivos ATS para las labores de desmonte de aulas modulares, en los cuales se identificaron peligros, se valoraron riesgos y se establecieron las medidas de control necesarias para la ejecución segura de la actividad

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: Se han ejecutado actividades de obra alistado en concreto en placa de cubierta. CAP 16 CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

4.1. Actividades programadas NO ejecutadas: Durante el periodo en curso, de acuerdo con la programación vigente, se tenía previsto ejecutar los siguientes ítems:
16.1.1: FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO
16.1.4: MANTO ASFÁLTICO IMPERMEABILIZANTE (IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE HUMEDAD) (la actividad esta sujeta a finalizar el alistado en mortero del acabado de la losa)

NOTA: El contratista realizará un NP donde se incluya el desmonte del cuarto de sonido

4.2. Actividades ejecutadas a la fecha: N/A

5. Generales: Durante el periodo reportado se realizaron labores de acuerdo al cronograma establecido.

6. Aspectos ambientales: Se realizo visita al frente, cuentan con punto ecológico, se verifico que los residuos de construcción y demolición están acopiados adecuadamente, pero sin señalización ni delimitación, por lo que se recomendó al contratista realizar la disposición cuando tengan la cantidad mínima teniendo en cuenta todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA)

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA **CO1.PCCNTR.8155343**

INFORME SEMANAL No 22 **LOTE COP No 17**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 22 (Consecutivo) **DEL** 2/3/2026 (dd-mm-aa) **AL** 8/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 156 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO MARCO TULIO FERNANDEZ (ANEXO 7 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnica: No se realizan actividades sobre el frente

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: Se debe iniciar la semana 23 con la instalacion de cubiertas en zonas previamente desmontadas ocn el fin de no generar retrasos en el Cronograma de Obra.

4.1. Actividades programadas NO ejecutadas: Durante el periodo en curso, de acuerdo con la programación vigente, se tenía previsto ejecutar los siguientes ítems:

2.3.2: CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 20 A 30 CM DE PROFUNDIDAD CON REJILLA PLÁSTICA (TRÁFICO PESADO) ANTIDESLIZANTE. INCLUYE ACABADO, PENDIENTADO Y MEDIA CAÑA.
2.5.1: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)
4.2.3: SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS
4.7.1: CAJA DE INSPECCION 60 X 60 CM, INCLUYE TAPA PREFABRICADA
18.1.2: EMBALAJE EN POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD Y DISPOSICIÓN FINAL DE TEJA EN ASBESTO
18.1.3: RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE OBRA CON CARACTERISTICAS PELIGROSAS Y/O CONTAMINANTES (PINTURA CON PLOMO, CONCRETO CONTAMINADO CON ACEITE, ENTRE OTRAS) INCLUYE CERTIFICACION, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL A GESTOR AUTORIZADO -
VIGA 30 X 40 EN CONCRETO 3000 PSI(INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, NO INCLUYE ACERO -
-SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm y 40 mm.
PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2)
CARAS CON PINTURA POLIESTER - -MURO TRABA NORMAL EN LADRILLO PRENSADO LIVIANO 24 X 12 X 6 ACABADO A LA
VISTA. (INLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE, MORTERO, ANDAMIOS, FORMALETA, INSTALACIÓN, LIMPIEZA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN).

4.2. Actividades ejecutadas: N/A

5. Generales: Durante el periodo reportado se llevó a cabo el comité de obra N°.12 solicitado por la supervisión en la sede IED RODOLFO LLINAS ; este cuenta con la participación del Supervisor del contrato, la Interventoría y el contratista de obra. (se levanta Acta de reunión).
Se solicita realizar un escarifiacdo y retiro de material existente de Subbase y aplicar una nueva capa estabilizada con 0,15 cm de espesor con el fin de mejorar la capacidad portante del terreno.

6. Aspectos ambientales: Se solicita continuar con retiro de Residuos de demolicion y construccion RCD, se solicita mejorar el manejo de acopio de cubierta en Asbesto cemento previamente desmontada.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO OTIC CALLE 63 (ANEXO 8 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Durante el periodo reportado NO se ejecutaron actividades en la sede.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado NO se evidenció la ejecución de actividades en el colegio; en consecuencia, no se generaron reportes, registros ni soportes por parte del área de SST. Así mismo, al no presentarse frentes de obra activos, no fue requerido el diligenciamiento de ATS, la realización de charlas de seguridad, ni el acompañamiento o inspecciones SST durante dicho periodo.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: Durante el periodo NO se ejecutaron actividades de obra.

4.1. Actividades programadas NO ejecutadas: Durante el periodo en curso, de acuerdo con la programación vigente, se tenía previsto ejecutar los siguientes ítems:
ítem 9.1.15: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERA TIPO GATO, ACCESO A CUBIERTA EN TUBO AGUAS NEGRAS EN 1-1/4" Y PASO EN TUBO DE 1"

4.2. Actividades ejecutadas a la fecha: Se ejecutaron actividades no incluidas en presupuesto:
ítem 10.1.26: ALQUILER BAÑO PORTÁTIL COMPLETO INCLUYE SANITARIO, ORINAL Y LAVAMANOS.
ÍTEM 12.1.1: PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)

5. Generales: N/A

6. Aspectos ambientales: El contratista no ha realizado actividades en el frente, pero sigue presentando residuos del mallas, pintura y estuco en el frente sin acopiar, ya es constante el tema por lo que se hace un llamado de atención y se recomienda realizar la disposición adecuada ya que puede representar un riesgo en la salud. el cerramiento es adecuado, pero sin señalización. No se impactó en los sumideros o cunetas. El colegio cuenta con punto ecológico.

EMERGENCIAS

1. ACTIVIDADES TECNICAS: Se realiza la Poda de ocho (8) arboles existentes Clase II (H=15-20m) en la IED la Merced, asi como la poda de un (01) individuo arboreo clase III (h=15-20m) sobre las zonas verdes de la IED La Merced, labores consistentes en el corte y retiro de ramas secas, enfermas o con riesgo de caida, con el objetivo de mejorar las condiciones fitosanitarias y de seguridad del entorno.

Las anteriores actividades representan un 100% sobre el alcance destinado a la fecha para el frente Marco Tulio SEDE C y un 80% para el frente de IED La Merced dado que se encuentra pendiente la repocision de adoquines sobre algunas zonas.

FIRMAS

ARQ. LORENA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
DIRECTORA DE INTERVENTORÍA

ING. GERMAN ALBERTO ESPITIA ROJAS
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

ING. LUIS EMIRO BLANCO MORENO
APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

ING. KATHERINE CAROLINA NUNEZ OSORIO
PROFESIONAL SST

ING. CHRISTIAN FELIPE RODRIGUEZ
PROFESIONAL AMBIENTAL

ING. CRISTIAN BARRERA DONCELL
PROFESIONAL COSTOS Y PRESUPUESTOS

ING. GERMAN ADOLFO NIVIA QUINTERO
PROFESIONAL ELECTRICO

ING. ROBINSON VILLAMIL ROJAS
PROFESIONAL HIDRÁULICO

ING. DIEGO FERNANDO OLARTE ORTIZ
PROFESIONAL ESTRUCTURAL

FECHA:	9/03/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.		INFORME	
DIAS RESTANTES	141 Días	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO		APOYO A LA SUPERVISION	
ESTADO GENERAL DEL PROYECTO		SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANANCIA		GRUPO	17
		DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS			
CORTE DEL INFORME:	CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO CAPITAL LM			
12 de diciembre de 2025	CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:	PROBINTEC S.A.S			

FECHAS			PLAZOS EN DIAS			VALOR CONTRATO		
DATOS:	INTERVENTORIA	OBRA	ETAPA:	INTERVENTORIA	OBRA	ETAPA:	INTERVENTORIA	OBRA
CONTRATO	CO1.PCCNTR.8168931	CO1.PCCNTR.8155343	INICIAL	211	211	INICIAL	$ 796.278.928	$ 2.220.672.788
INICIO	3 de octubre de 2025	3 de octubre de 2025	SUSPENSIONES			ADICIONES		
TERMINACION INICIAL	2 de mayo de 2026	2 de mayo de 2026	PRÓRROGAS			TOTAL	$ 796.278.928,00	$ 2.220.672.788,00
TERMINACION FINAL	2 de mayo de 2026	2 de mayo de 2026	TOTAL	211	211			

MODIFICACIONESDEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

MOD No	FECHA DE LA MODIFICACION	VALOR ADICION	PRORROGA (DIAS)	OTRO ASPECTO
1				
2				
3				
4				

MODIFICACIONESDEL CONTRATO DE OBRA

MOD No	FECHA DE LA MODIFICACION	VALOR ADICION	PRORROGA	OTRO ASPECTO
1				
2				
3				
4				

POLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORIA — GARANTE: — SEGUROS DEL ESTADO

POLIZA	CUMPLIMIENTO DESDE	CUMPLIMIENTO HASTA	CALIDAD DEL SERVICIO DESDE	CALIDAD DEL SERVICIO HASTA	SALARIOS Y PRESTACIONES DESDE	SALARIOS Y PRESTACIONES HASTA
400 47 99400011040	19 9 2025	3 1 2027	3 5 2026	3 5 2031	19 9 2025	5 2029

POLIZAS CONTRATO DE OBRA — SEGUROS DEL ESTADO

POLIZA	CUMPLIMIENTO DESDE	CUMPLIMIENTO HASTA	SALARIOS Y PRESTACIONES DESDE	SALARIOS Y PRESTACIONES HASTA	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA DESDE	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA HASTA	POLIZA	RESPONSABILIDAD CIVIL DESDE	RESPONSABILIDAD CIVIL HASTA
96102	4 9 2025	9 12 2026	4 9 2025	9 4 2029	9 4 2026	9 4 2028	27662	4 9 2025	9 4 2026

CPF	COLEGIO	LOCALIDAD	SEDE	NOMBRE SEDE	AVANCE ANTERIOR	AVANCE ACTUAL (18/01/2026)		PROGR %	EJECUTADO VS PROG	Vlr FRENTE APROBADO	Vlr FRENTE A ESTE PERIODO	FECHA INICIO CRONOGRAMA	FECHA FIN CRONOGRAMA	jul-2025	jul-2025	ago-2025	ago-2025	sep-2025	sep-2025	oct-2025	oct-2025	nov-2025	nov-2025	dic-2025	dic-2025	ene-2026	ene-2026	feb-2026	feb-2026	mar-2026	mar-2026
1074	COLEGIO JUSTO VICTOR CHARRY (IED)	ENGATIVA	A	GARCES NAVAS III	53,00%	55,30%		55,00%		$ 241.333.081		6/11/2025	11/03/2026																
1076	COLEGIO RODOLFO LLINAS (IED)	ENGATIVA	A	RODOLFO LLINAS	74,30%	76,80%		74,30%		$ 265.020.456		28/11/2025	14/04/2026																
1029	COLEGIO REPUBLICA DE CHINA (IED)	ENGATIVA	B	PRIMAVERA NORTE	10,00%	10,26%		18,58%		$ 59.937.127		6/11/2025	18/03/2026																
1048	COLEGIO JOSE ASUNCION SILVA (IED)	ENGATIVA	A	JOSE ASUNCION SILVA	6,00%	6,50%		6,00%		$ 177.681.099		12/01/2026	30/04/2026																
1303	COLEGIO MANUELA BELTRAN (IED)	TEUSAQUILLO	B	ANTONIO NARIÑO	0,00%	2,28%		0,82%		$ 643.879.211		15/01/2026	30/04/2026																
1407	COLEGIO PANAMERICANO (IED)	LOS MÁRTIRES	A	PANAMERICANO	56,00%	60,40%		55,00%		$ 356.063.923		5/12/2025	30/04/2026																
1035	COLEGIO MARCO TULIO FERNANDEZ (IED)	ENGATIVA	D	SAN IGNACIO	33,50%	38,50%		33,50%		$ 246.822.791		5/12/2025	30/04/2026																
ADM	OTIC	TEUSAQUILLO	A	OTIC CALLE 63	43,43%	43,46%		43,46%		$ 19.661.312		28/11/2025	30/01/2026																
	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																									
	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																									
	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																									
	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																									
	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																									
TOTAL FRENTES DE OBRA						36,06%		35,83%		$ 2.010.399.000	$ -																		
EMERGENCIAS ATENDIDAS DURANTE EL PERIODO																													
1037	COLEGIO SAN JOSE NORTE (IED)	ENGATIVA	A	SAN JOSE NORTE																									
1413	COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS (IED)	LOS MÁRTIRES	A	NACIONAL FEMENINO																									
1072	COLEGIO LAS MERCEDES (IED)	ENGATIVA	A	COLEGIO LAS MERCEDES (IED)																									
1036	COLEGIO MARCO TULIO FERNANDEZ (IED)	ENGATIVA	C	SAN JOAQUIN																									
	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																									
	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																									
	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																									
	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																									
	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																									
	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																									
	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																									
	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																									
	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																									
	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																									
	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																									
	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																									
	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																									
	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																									
	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																									
	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																									
	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																									
	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																									
	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																									
	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																									
	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																									
	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																									
	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																									
	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																									
	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																									
	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																									
	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																									
	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																									
TOTAL FRENTES DE OBRA						#¡DIV/0!	###	#¡DIV/0!	######	$ -	$ -																		

ACUMULADO FRENTES DE OBRA

TERMINADAS	EN EJECUCION	POR INICIAR	TOTAL	VALOR
0	8	0	8	$ -
0	0	0	0	$ -
TOTAL				
0	8	0	8	$ -

FRENTES POR LOCALIDAD

ACUMULADO EMERGENCIAS


RELACION DE PAGOS EFECTUADOS


	No ACTA OBRA	VALOR	No ACTA OBRA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR
	1	$ 250.642.138,00	12		1		12		23		34	
ACUMULADO EMERGENCIAS	2		13		2		13		24		35	
	3		14		3		14		25		36	
TOTAL	4		15		4		15		26		37	
	5		16		5		16		27		38	
	6		17		6		17		28		39	
	7		18		7		18		29		40	
	8		19		8		19		30		TOTAL INTERVENTORIA	
	9		20	TOTAL OBRA	9		20		31			
	10			$ 250.642.138,00	10		21		32			
	11				11		22		33		$ -	


AVANCE GENERAL


	TECNICO	FINANCIERO	TIEMPO
AVANCE	36,06%	11,29%	33,18%
PROGRAMADO	35,83%		
ATRASO	0,23%	EN EJECUCION	

FECHA APROBACION CRONOGRAMA









OBSERVACIONES:

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 22 **LOTE COP No 17**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 22 (Consecutivo) **DEL** 2/2/2026 (dd-mm-aa) **AL** 8/2/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 156 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17

ANEXO 2 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO RODOLFO LLINÁS - SEDE A




llegada de material. Porcelanato 61x61 y pegacore



Acopio de material



Alistamineto de piso

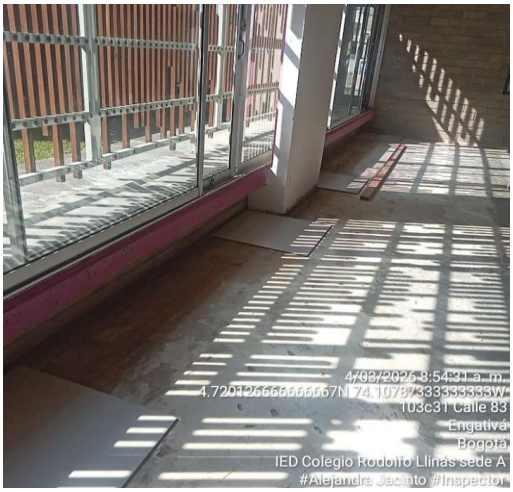

Modulacion de enchape



Instalación de enchape



Utiloizacion de nivel laser

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 22 **LOTE COP No 17**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 22 (Consecutivo) **DEL** 2/2/2026 (dd-mm-aa) **AL** 8/2/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 156 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17

ANEXO 2 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO RODOLFO LLINÁS - SEDE A



Utilizacion de nivel de burbuja y boquilla para asegurar la correcta instalacion



Instalcion al 70% de enchape en salon B-104

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 22 **LOTE COP No 17**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 22 (Consecutivo) **DEL** 2/2/2026 (dd-mm-aa) **AL** 8/2/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 156 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17

ANEXO 3 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO REPUBLICA DE CHINA SEDE B



Vista general del espacio sin actividades ejecutadas en la obra.☐



Excavación del área.



Vista general de la obra.



Avance en la excavación.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 22 **LOTE COP No 17**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 22 (Consecutivo) **DEL** 2/3/2026 (dd-mm-aa) **AL** 8/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 156 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17

ANEXO 3 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO MANUELA BELTRÀN SEDE B



Recebo, acopiado y cubierto



Aplicacion de recebo en placa 10 cm



Compactación de recebo



Acopie de escombro



Compactación de recebo



Compactación de recebo

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 22 **LOTE COP No 17**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 22 (Consecutivo) **DEL** 2/3/2026 **AL** 8/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 156 dias

TRATO DE INTERVENTORI CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17

ANEXO 1 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO PANAMERICANO SEDE A



MUCHO DESORDEN EN EL AREA DE TRABAJO






COLOCACION DE ANGULOS DE 10CM PARA LOS SOPORTES DE PERFILES



SOLDADURA

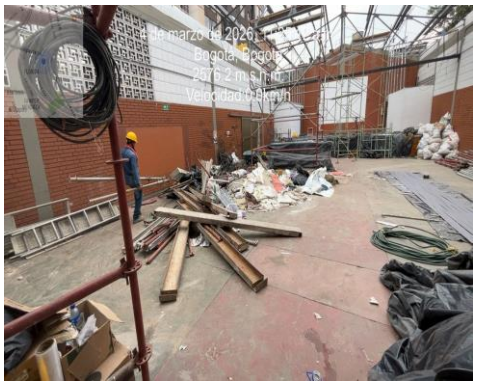

RECOLECCION DE ESCOMBROS PARA MANTENER EL LUGAR LIMPIO



SOLDADURA DE PERFILERIA



INSTALACION DE PERFILERIA



SOLDADURA DE PERFILERIA

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 22 **LOTE COP No 17**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 22 (Consecutivo) **DEL** 2/3/2026 (dd-mm-aa) **AL** 8/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 156 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17

ANEXO 3 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO IED MARCO TULIO FERNANDEZ SEDE D



Nivelación y fundicion de carcamo



Fundición de anden



Demolicion de muro de alinderamiento con casa vecina, por parte de los propietarios



Instalacion de cerramiento en el muro de alinderamiento demolido



Retiro y Disposición de residuo de excavación



Limpieza y preparación para punto de votación



Se continua Fundicion y nivelación de carcamo



Ingreso de Baños portatiles para punto de votación



Isntalación y acondicionamiento de cerramiento para punto de Votación



Isntalación y acondicionamiento de cerramiento para punto de Votación



Acondicionamiento temporal para punto de votación



Acondicionamiento temporal para punto de votación
