INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA **CO1.PCCNTR.8155343**

INFORME SEMANAL No 23 **LOTE COP No 17**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 23 (Consecutivo) **DEL** 9/3/2026 (dd-mm-aa) **AL** 15/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 163 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17

CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORÍA


Contratista:	CONSORCIO CAPITAL LM		**Interventoria**	PROBINTEC S.A.S	
RL del consorcio	LUIS MILTON ORTIZ VERGEL		**RL de Interventoria**	SANDRA STELLA MORENO BUITRAGO	
Contrato No.	CO1.PCCNTR.8155343		**Contrato No.**	CO1.PCCNTR.8168931	
Objeto	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.		**Objeto**	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No. 6	
VALOR DEL CONTRATO		$ 2.220.672.788,00	**Valor Inicial:**	$ 796.278.928,00	
AIU	35,95%	$ 798.331.867,29	**Valor Adicional No. 1 del 26 de diciembre de 2026:**	$ 139.026.666,00	
COSTO DIRECTO		$ 1.422.340.920,71	**Valor Total del Contrato:**	$ 935.305.594,00	
OFERTADO		$ 2.109.535.964,00			
EMERGENCIAS		$ 100.000.000,00			
VALOR PARCIAL CON EMERGENCIAS		$ 2.209.535.964,00			
DIFERENCIA PARA EMERGENCIAS		$ 11.136.824,00			
Valor Parcial (Inicial + Emergencias)		$ 111.136.824,00			
Valor adicional No. 1:		$ 791.000.000,00			
Valor inicial No. 1 emergencias:		$ 200.000.000,00			
Valor adicional No.1 Obras Contractuales:		$ 591.000.000,00			
VALOR TOTAL INICIAL + EMERGENCIA		$ 3.011.672.788,00			
VALOR TOTAL EMERGENCIAS		$ 411.136.824,00			
VALOR TOTAL PARA OBRAS CONTRACTUALES		$ 2.600.535.964,00			
Plazo Inicial:	SIETE (7) MESES		**Plazo Inicial:**	SIETE (7) MESES	**PLAZO TOTAL PROYECTO**
Fecha de Iniciación:	3/10/2025		**Fecha de Iniciación:**	3/10/2025	212
Fecha de Finalizacion:	2/05/2026		**Fecha de Vencimiento:**	2/05/2026	

AVANCE DEL CONTRATO

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	2,10%	38,74%	Obra Física Ejecutada (%)	2,64%	40,29%
Valor de la Obra programada:	$ 54.578.749,00	$ 866.057.090,00	Valor de la Obra Ejecutada:	$ 58.221.273,00	$ 1.047.755.940,00

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONTRATO

SEGUIMIENTO EN % DE LA PROGRAMACIÓN DE OBRA	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	36,65%	37,66%	1,55%
Durante el periodo	2,10%	2,64%	
Acumulado actual	38,74%	40,29%	

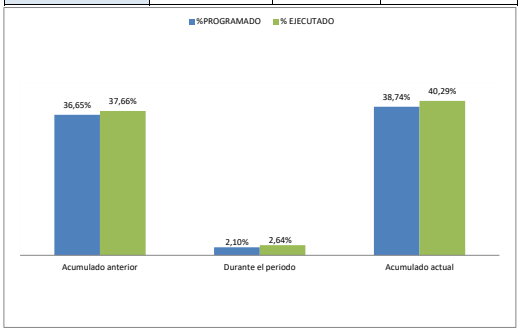

OBRAS CONTRATO INICIAL

DESCRIPCION DE LA SEDE			AVANCE SEMANAL			AVANCE ACUMULADO		
CPF	LOCALIDAD	COLEGIO	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA	% PROGRAMADO ACUMULADO	% EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
1074	ENGATIVA	JUSTO VICTOR CHARRY (IED)	0,00%	0,00%	0,00%	55,00%	55,30%	0,30%
1076	ENGATIVA	RODOLFO LLINAS (IED)	4,12%	3,14%	-0,98%	78,42%	79,94%	1,52%
1029	ENGATIVA	REPUBLICA DE CHINA (IED)	3,36%	6,54%	3,18%	21,50%	25,00%	3,50%
1048	ENGATIVA	JOSE ASUNCION SILVA (IED)	0,00%	2,60%	2,60%	6,00%	10,30%	4,30%
1303	TEUSAQUILLO	MANUELA BELTRAN SEDE B (IED)	1,11%	4,20%	3,09%	9,07%	8,62%	-0,45%
1407	LOS MÁRTIRES	COLEGIO PANAMERICANO (IED)	7,00%	3,60%	-3,40%	62,00%	65,20%	3,20%
1035	ENGATIVA	MARCO TULIO FERNANDEZ (IED)	1,20%	1,00%	-0,20%	34,50%	34,50%	0,00%
ADM	TEUSAQUILLO	OTIC - DATE CENTER	0,00%	0,00%	0,00%	43,46%	43,46%	0,00%
TOTAL PROMEDIO			2,10%	2,64%	0,54%	38,74%	40,29%	1,55%

EMERGENCIAS Y/O OBRAS PRIORITARIAS

CPF	LOCALIDAD	COLEGIO	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA	VALOR TOTAL	VALOR CONTRATO	DIFERENCIA
1037	ENGATIVA	SAN JOSE DEL NORTE SEDE A (IED)	0,00%	0,00%	0,00%	-		
1413	LOS MARTIRES	SAN FRANCISCO DE ASIS (IED)	0,00%	0,00%	0,00%	-		
1072	ENGATIVA	COLEGIO LAS MERCEDES (IED)	80,00%	80,00%	0,00%	3.966.712,00		
1036	ENGATIVA	MARCO TULIO FERNANDEZ SEDE C (IED)	100,00%	100,00%	0,00%	991.678,00		
1041	ENGATIVA	LA PALESTINA (IED)	0,00%	0,00%	0,00%	-		
	ENGATIVA	REPUBLICA DE COLOMBIA	10,00%	10,00%	0,00%	5.000.000,00		
						$ 9.958.390,00	$ 411.136.824,00	$ 401.178.434,00

AVANCE FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$ 2.220.672.788,00
VALOR PARCIAL 1		$ 250.642.138,00
VALOR PARCIAL 2		$ 118.871.524,00
TOTAL VALOR FACTURADO		$ 369.513.662,00
SUMAS IGUALES		$ 1.851.159.126,00

INDICADOR FINANCIERO	VALOR FACTURADO	VALOR PAGADO
	$ 369.513.662,00	$ 369.513.662,00

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

INDICADOR TECNICO	% AVANCE PROGRAMADO	% DE AVANCE EJECUTADO	% RETRASO - / % ADELANDO +
	38,74%	40,29%	1,55%

INDICADOR TIEMPO	DIAS	AVANCE
	163	76,89%

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA **CO1.PCCNTR.8155343**


INFORME SEMANAL No 23 **LOTE COP No 17**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 23 (Consecutivo) **DEL** 9/3/2026 (dd-mm-aa) **AL** 15/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 163 días

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17

CURVA S

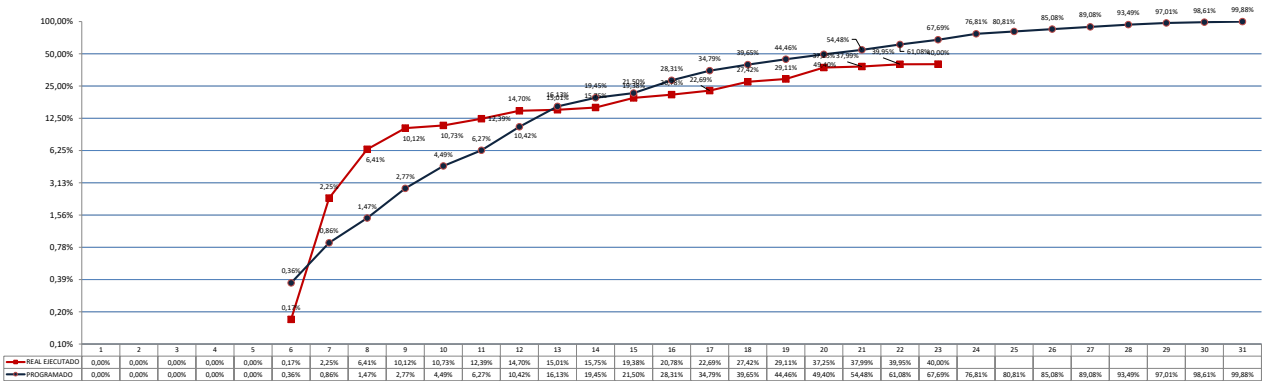

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
REAL EJECUTADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,17%	2,25%	6,41%	10,12%	10,73%	12,39%	14,70%	15,01%	15,75%	19,38%	20,78%	22,69%	27,42%	29,11%	37,25%	37,99%	39,95%	40,00%								
PROGRAMADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,36%	0,86%	1,47%	2,77%	4,49%	6,27%	10,42%	16,13%	19,45%	21,50%	28,31%	34,79%	39,65%	44,46%	49,40%	54,48%	61,08%	67,69%	76,81%	80,81%	85,08%	89,08%	93,49%	97,01%	98,61%	99,88%

SEGUIMIENTO AL FLUJO DE OBRA EMITIDO POR EL CONTRATISTA - RESPONDE A LA PROGRAMACION DE OBRA

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO JUSTO VICTOR CHARRY SEDE A (ANEXO 1 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: No se evidenciaron actividades de obra en la semana.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado no se evidenciaron labores **de ejecucion, se realiza el suministro de cielo falso para zona comedor escolar.**

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: Para el presente periodo no se ejecutaron ninguna actividad

4.1. Actividades programadas NO ejecutadas: A LA FECHA DEL CIERRE DEL PRESENTE INFORME EL CONTRATISTA NO HA FINALIZADO LABORES DE CORRECCION DE POLIUREA - INSTALACION DE CIELO FALSO EN ZONA COMEDOR

4.2. Actividades Ejecutadas a la fecha: N/A

5. Generales: Durante el periodo reportado se llevó a cabo el comité de obra N°.13 solicitado por la supervisión en la sede de la Secretaria de Educacion SED; este cuenta con la participación del Supervisor del contrato, la Interventoría y el contratista de obra. (se levanta Acta de reunión).
No se presentaron situaciones de emergencia en las sedes intervenidas.
Se presentó BALANCE GENERAL N° 4 por parte del Contratista, para revision a aprobacion por parte de la Interventoria.

6. Aspectos ambientales: se reportan residuos acopiados en el frente por lo que se espera que realice la disposición total de los escombros respecto a las especificaciones técnicas y ambientales al igual que realizar posteriormente una jornada de limpieza y aseo.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO RODOLFO LLINAS SEDE A (ANEXO 2 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Se inician labores de Suministro e instalacion de Piso en porcelanatro 60x60 en el salon 103 B

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo se realizaron Actividades de verificacion del correcto diligenciamiento de los permisos de trabajo en alturas, así como el uso adecuado de los EPP y de los EPCC por parte del personal involucrado.
Adicionalmente, se validó la ejecución de inspecciones de seguridad, con el fin de identificar y controlar oportunamente los riesgos asociados a la actividad, garantizando el cumplimiento de los procedimientos establecidos.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: N/A

4.1. Actividades programadas NO ejecutadas:

4.2. Actividades ejecutadas a la fecha: Suministro e instalacion de porcelanato

5. Generales: Durante el periodo reportado se llevó a cabo el comité de obra N°.13 solicitado por la supervisión en la sede de la Secretaria de Educacion SED ; este cuenta con la participación del Supervisor del contrato, la Interventoría y el contratista de obra. (se levanta Acta de reunión).
No se presentaron situaciones de emergencia en las sedes intervenidas.
Se presentó EL Acta parcial nº 4 la cual esta sujeta a revision por parte de la Interventoria.

6. Aspectos ambientales: Se realizo visita al frente, se encuentra acopios de residuos debidamente señalizados y cubiertos y se espera que realice la disposición total de los escombros, al igual se garantiza una jornada de orden y aseo en la institución.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA **CO1.PCCNTR.8155343**

INFORME SEMANAL No 23 **LOTE COP No 17**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 23 (Consecutivo) **DEL** 9/3/2026 (dd-mm-aa) **AL** 15/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 163 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO REPUBLICA DE CHINA - SEDE B (ANEXO 3 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas:Durante la presente semana, en la sede República de China se ejecutaron las siguientes actividades:
-Relleno de subbase
-Inicio de la demolicion de placa de contrapiso hall
-Demolicion de alistado de piso en hall (x2), se encontro que al demoler el alistado, habia otro piso debajo, el cual de igual forma se tuvo que demoler

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenciaron actividades de retiro de material. Desde el componente de SST, se verificó que el personal desarrollara las actividades utilizando correctamente los EPP. Adicionalmente, se constató:
•Manipulación segura de los materiales, minimizando riesgos de cortes o golpes.
•Mantenimiento del orden y limpieza en el área de trabajo para prevenir accidentes por tropiezos o caídas.
•Supervisión constante del cumplimiento de los protocolos de trabajo seguro durante la actividad.
Se recomienda continuar con la vigilancia estricta del uso de EPP y la correcta gestión de los materiales retirados, asegurando la integridad del personal y la seguridad del área de trabajo.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: Para el presente informe se consideró el balance realizado; no obstante, se resalta que algunos ítems nuevos incluidos en este aún no cuentan con programación, razón por la cual no fue posible realizar su respectiva evaluación en el presente informe.

4.1. Actividades programadas NO ejecutadas: Durante el periodo en curso, de acuerdo con la programación vigente, se tenía previsto ejecutar los siguientes ítems:
1.3.5: LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A CÁRCAMO (INCLUYE DESMONTE Y MONTAJE DE REJILLA, LIMPIEZA, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL SOBRANTE, RESANE DE GRIETAS Y BORDE), esta actividad se realizara al final de la obra, ya que el alcance cambio. (congelada), esta actividad se reprograma teniendo en cuenta que se modifico el alcance de la intervencion.
16.1.21: SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE POLIUREA PURA DE ALTO DESEMPEÑO E= 2 MM
NP. 20.5. REINSTALACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 500 LT(NO INCLUYE REPOSICION NI INSTALACION DE ACCESORIOS)

4.2. Actividades ejecutadas a la fecha: Relleno de subbase, demolicion de piso, demolicion de alistado de piso

5. Generales: Durante el periodo del presente informe se realizó comité de obra, donde se definió que la caja de inspección prevista al exterior del pasillo se ejecutará al interior debido a la presencia de una viga, posteriormente se debera hacer una marcación solicitada por la ingeniera de apoyo a la supervisión. El contratista indicó que la impermeabilización de la placa se realizará la próxima semana con poliurea y se establecio que se presentará una propuesta para ejecutar la estructura de los tanques mediante un pedestal en lugar de cuatro columnas. Adicionalmente, durante el ingreso de material se presentó un impacto contra un muro, generando una grieta, daño que deberá ser asumido y reparado por el contratista. Adicionalmente, se generó un espacio con la supervision, el contratista y la interventoria para realizar la revisión de las actividades ejecutadas correspondientes al Acta No. 4.

6. Aspectos ambientales:Se realiza visita al frente, no cuentan con cerramiento, se realiza excavación en el frente y se ha realizo la disposición adecuada de estos, se realiza limpieza en los accesos al frente de obra, al igual se recomienda realizar estas jornadas de orden y aseo periódicamente e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA)

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO JOSE ASUNCION SILVA SEDE A (ANEXO 4 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Durante la semana en curso se realizan actividades de Suministro e instalacion de Cieloraso en PVC para la zona de baños de docentes, de la misma manera continua la instalacion de muro dos caras superboard 6 mm para la zona de Salon de Docentes.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se realiza aprobacion de la cuadrilla de trabajo para el frente.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: Continuan actividades de acuerdo a programacion

4.1. Actividades programadas NO ejecutadas: Durante el periodo en curso, de acuerdo con la programación vigente, se tenía previsto ejecutar los siguientes ítems:
PINTURA DE MURO EN SUPERBOARD

4.2. Actividades ejecutadas a la fecha: Suministro e instalacion de Cielo rsao PVC y Lamina de Superboard

5. Generales: Durante el periodo reportado se llevó a cabo el comité de obra N°.13 solicitado por la supervisión en la sede de la Secretaria de Educacion Distrital; este cuenta con la participación del Supervisor del contrato, la Interventoría y el contratista de obra. (se levanta Acta de reunión).
Donde se solicita el inicio inmediato de labores sobre este frente.

6. Aspectos ambientales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO MANUELA BELTRAN SEDE B (ANEXO 5 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Durante el periodo reportado se realizaron las siguientes actividades:
-Compactacion de la subbase
-Localizacion y replanteo topografico

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenciaron actividades desarrolladas por la comisión de topografía. Desde el componente de SST, se verificó que el personal ejecutara las labores utilizando correctamente los EPP. Asimismo, se constató el cumplimiento de los protocolos de seguridad, manteniendo el área de trabajo ordenada y libre de riesgos que pudieran afectar la integridad del personal.

3. Aspectos de calidad: Se solicito al contratista realizar ensayo de densidad.

4. Programación de obra: Se ejecutaron actividades de compactacion de la subbase y se conto con la comision topografica

4.1. Actividades programadas NO ejecutadas: De acuerdo con la programacion, ya se debio realizar la ejecucion del item

ítem: 15.1.12=SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÓDULO AULA ESCOLAR TIPO (S/DISEÑO - VER FICHA TECNICA Y PLANOS), EN ESTRUCTURA METÁLICA DESMONTABLE, ENSAMBLADA POR MEDIOS MECÁNICOS (TORNILLERÍA, PERNOS), CUBIERTA A UN AGUA Y ÁREA DE CIRCULACIÓN. INCLUYE PUERTAS, VENTANAS, ACABADOS, ILUMINACIÓN, REDES ELÉCTRICAS E HIDROSANITARIAS. AREA 52 M2, esta actividad se reprogramo para inicio el 16 de marzo y entrega dentro del tiempo contrctual, por tiempos de las definiones tecnicas.
-2.2.13.PLACA CONTRAPISO DE 10 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN. actividad programada al 9 de marzo
-2.2.16.PEDESTALES EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDANTE. NO INCLUYE ACERO). actividad programada al 9 de marzo
-2.4.1SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI actividad programada al 6 de marzo
-2.4.2.SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M actividad programada al 7 de marzo

4.2. Actividades ejecutadas a la fecha: Compactacion de subbase

5. Generales: En el comité realizado en la SED, el ingeniero de apoyo a la supervisión reitero el NP de voz y datos , recalcando el hecho de que se debe realizar de manera urgente.

6. Aspectos ambientales: : El frente de obra cuenta con el debido cerramiento y señalización, se evidencian residuos acopiados (sin cubrir), por lo que se recomienda disponer adecuadamente, acopiar el material que ingrese e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA).

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA **CO1.PCCNTR.8155343**

INFORME SEMANAL No 23 **LOTE COP No 17**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 23 (Consecutivo) **DEL** 9/3/2026 (dd-mm-aa) **AL** 15/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 163 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO PANAMERICANO SEDE A (ANEXO 6 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Durante el período reportado continuan actividades de desmonte de cubierta en zona Auditorio y finaliza labores de pintura anticorrosiva de nueva estructura

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se llevaron a cabo diversas actividades en materia de SST, orientadas a la prevención de riesgos y al control de condiciones peligrosas en los frentes de obra. Entre ellas, se evidenció el diligenciamiento de los respectivos ATS para las labores de desmonte de aulas modulares, en los cuales se identificaron peligros, se valoraron riesgos y se establecieron las medidas de control necesarias para la ejecución segura de la actividad

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: Se han ejecutado actividades de obra de acuerdo a Reprogramacion

4.1. Actividades programadas NO ejecutadas: Durante el periodo en curso, de acuerdo con la programación vigente, se tenía previsto ejecutar los siguientes ítems:
16.1.1: FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO
16.2.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOF UPVC 2,5MM (INCLUYE CABALLETE, ANDAMIOS, TEJA Y TORNILLERIA)
NOTA: El contratista realizará un NP donde se incluya el desmonte del cuarto de sonido

4.2. Actividades ejecutadas a la fecha: N/A

5. Generales: Durante el periodo reportado se realizaron labores de acuerdo al cronograma establecido.

6. Aspectos ambientales: Se realizo visita al frente, cuentan con punto ecológico, se verifico que los residuos de construcción y demolición están acopiados adecuadamente, pero sin señalización ni delimitación, por lo que se recomendó al contratista realizar la disposición cuando tengan la cantidad mínima teniendo en cuenta todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA)

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO MARCO TULIO FERNANDEZ (ANEXO 7 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnica: No se realizan actividades nuevas sobre el frente, se efectuan juntas de contraccion para la placa de cancha con disco de corte diamantado.

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: Se debe iniciar la semana 23 con la instalacion de cubiertas en zonas previamente desmontadas ocn el fin de no generar retrasos en el Cronograma de Obra.

4.1. Actividades programadas NO ejecutadas: Durante el periodo en curso, de acuerdo con la programación vigente, se tenía previsto ejecutar los siguientes ítems:

2.3.2: CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 20 A 30 CM DE PROFUNDIDAD CON REJILLA PLÁSTICA (TRÁFICO PESADO) ANTIDESLIZANTE. INCLUYE ACABADO, PENDIENTADO Y MEDIA CAÑA.
2.5.1: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)
4.2.3: SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS
4.7.1: CAJA DE INSPECCION 60 X 60 CM, INCLUYE TAPA PREFABRICADA
18.1.2: EMBALAJE EN POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD Y DISPOSICIÓN FINAL DE TEJA EN ASBESTO
18.1.3: RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE OBRA CON CARACTERISTICAS PELIGROSAS Y/O CONTAMINANTES (PINTURA CON PLOMO, CONCRETO CONTAMINADO CON ACEITE, ENTRE OTRAS) INCLUYE CERTIFICACION, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL A GESTOR AUTORIZADO -
VIGA 30 X 40 EN CONCRETO 3000 PSI(INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, NO INCLUYE ACERO -
-SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm y 40 mm.
PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2)
CARAS CON PINTURA POLIESTER - -MURO TRABA NORMAL EN LADRILLO PRENSADO LIVIANO 24 X 12 X 6 ACABADO A LA
VISTA. (INLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE, MORTERO, ANDAMIOS, FORMALETA, INSTALACIÓN, LIMPIEZA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN).

4.2. Actividades ejecutadas: N/A

5. Generales: Durante el periodo reportado se llevó a cabo el comité de obra N°.12 solicitado por la supervisión en la sede IED RODOLFO LLINAS ; este cuenta con la participación del Supervisor del contrato, la Interventoría y el contratista de obra. (se levanta Acta de reunión).
Se solicita realizar un escarifiacdo y retiro de material existente de Subbase y aplicar una nueva capa estabilizada con 0,15 cm de espesor con el fin de mejorar la capacidad portante del terreno.

6. Aspectos ambientales: Se solicita continuar con retiro de Residuos de demolicion y construccion RCD, se solicita mejorar el manejo de acopio de cubierta en Asbesto cemento previamente desmontada.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO OTIC CALLE 63 (ANEXO 8 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Durante el periodo reportado NO se ejecutaron actividades en la sede.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado NO se evidenció la ejecución de actividades en el colegio; en consecuencia, no se generaron reportes, registros ni soportes por parte del área de SST. Así mismo, al no presentarse frentes de obra activos, no fue requerido el diligenciamiento de ATS, la realización de charlas de seguridad, ni el acompañamiento o inspecciones SST durante dicho periodo.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: Durante el periodo NO se ejecutaron actividades de obra.

4.1. Actividades programadas NO ejecutadas: Durante el periodo en curso, de acuerdo con la programación vigente, se tenía previsto ejecutar los siguientes ítems:
ítem 9.1.15: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERA TIPO GATO, ACCESO A CUBIERTA EN TUBO AGUAS NEGRAS EN 1-1/4" Y PASO EN TUBO DE 1"

4.2. Actividades ejecutadas a la fecha: Se ejecutaron actividades no incluidas en presupuesto:
ítem 10.1.26: ALQUILER BAÑO PORTÁTIL COMPLETO INCLUYE SANITARIO, ORINAL Y LAVAMANOS.
ÍTEM 12.1.1: PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)

5. Generales: N/A

6. Aspectos ambientales: El contratista no ha realizado actividades en el frente, pero sigue presentando residuos del mallas, pintura y estuco en el frente sin acopiar, ya es constante el tema por lo que se hace un llamado de atención y se recomienda realizar la disposición adecuada ya que puede representar un riesgo en la salud. el cerramiento es adecuado, pero sin señalización. No se impactó en los sumideros o cunetas. El colegio cuenta con punto ecológico.

EMERGENCIAS

1. ACTIVIDADES TECNICAS: Se realizan actividades preliminares y de demolicion en le IED Republica de Colombia Sede A

FIRMAS

ARQ. LORENA RODRIGUEZ RODRIGUEZ DIRECTORA DE INTERVENTORÍA	ING. GERMAN ALBERTO ESPITIA ROJAS RESIDENTE DE INTERVENTORIA	ING. LUIS EMIRO BLANCO MORENO APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
ING. KATHERINE CAROLINA NUNEZ OSORIO PROFESIONAL SST	ING. CHRISTIAN FELIPE RODRIGUEZ PROFESIONAL AMBIENTAL	ING. CRISTIAN BARRERA DONCELL PROFESIONAL COSTOS Y PRESUPUESTOS
ING. GERMAN ADOLFO NIÑA QUINTERO PROFESIONAL ELECTRICO	ING. ROBINSON VILLAMIL ROJAS PROFESIONAL HIDRÁULICO	ING. DIEGO FERNANDO OLARTE ORTIZ PROFESIONAL ESTRUCTURAL

FECHA:	16/03/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	INFORME APOYO A LA SUPERVISION
DIAS RESTANTES	141 Días	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANANCIA	GRUPO 17
ESTADO GENERAL DEL PROYECTO		DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	
CORTE DEL INFORME:	CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO CAPITAL LM	
12 de diciembre de 2025	CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:	PROBINTEC S.A.S	

FECHAS			PLAZOS EN DIAS			VALOR CONTRATO		
DATOS:	INTERVENTORIA	OBRA	ETAPA:	INTERVENTORIA	OBRA	ETAPA:	INTERVENTORIA	OBRA
CONTRATO	CO1.PCCNTR.8168931	CO1.PCCNTR.8155343	INICIAL	211	211	INICIAL	$ 796.278.928	$ 2.220.672.788
INICIO	3 de octubre de 2025	3 de octubre de 2025	SUSPENSIONES			ADICIONES		
TERMINACION INICIAL	2 de mayo de 2026	2 de mayo de 2026	PRÓRROGAS			TOTAL	$ 796.278.928,00	$ 2.220.672.788,00
TERMINACION FINAL	2 de mayo de 2026	2 de mayo de 2026	TOTAL	211	211			

MODIFICACIONESDEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

MOD No	FECHA DE LA MODIFICACION	VALOR ADICION	PRORROGA (DIAS)	OTRO ASPECTO
1				
2				
3				
4				

MODIFICACIONESDEL CONTRATO DE OBRA

MOD No	FECHA DE LA MODIFICACION	VALOR ADICION	PRORROGA	OTRO ASPECTO
1				
2				
3				
4				

POLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORIA — GARANTE: | SEGUROS DEL ESTADO

POLIZA	CUMPLIMIENTO DESDE	CUMPLIMIENTO HASTA	CALIDAD DEL SERVICIO DESDE	CALIDAD DEL SERVICIO HASTA	SALARIOS Y PRESTACIONES DESDE	SALARIOS Y PRESTACIONES HASTA
400 47 99400011040	19 9 2025	3 1 2027	3 5 2026	3 5 2031	19 9 2025	3 5 2029

POLIZAS CONTRATO DE OBRA — SEGUROS DEL ESTADO

POLIZA	CUMPLIMIENTO DESDE	CUMPLIMIENTO HASTA	SALARIOS Y PRESTACIONES DESDE	SALARIOS Y PRESTACIONES HASTA	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA DESDE	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA HASTA	POLIZA	RESPONSABILIDAD CIVIL DESDE	RESPONSABILIDAD CIVIL HASTA
96102	4 9 2025	9 12 2026	4 9 2025	9 4 2026	9 4 2026	9 4 2028	27662	4 9 2025	9 4 2026

CPF	COLEGIO	LOCALIDAD	SEDE	NOMBRE SEDE	AVANCE ANTERIOR	AVANCE ACTUAL (18/01/2026)		PROGR %	EJECUTADO VS PROG	Vlr FRENTE APROBADO	Vlr FRENTE A ESTE PERIODO	FECHA INICIO CRONOGRAMA	FECHA FIN CRONOGRAMA	jul-2025	jul-2025	ago-2025	ago-2025	sep-2025	sep-2025	oct-2025	oct-2025	nov-2025	nov-2025	dic-2025	dic-2025	ene-2026	ene-2026	feb-2026	feb-2026	mar-2026	mar-2026
1074	COLEGIO JUSTO VICTOR CHARRY (IED)	ENGATIVA	A	GARCES NAVAS III	55,30%	55,30%		55,00%		$ 241.333.081		6/11/2025	11/03/2026																		
1076	COLEGIO RODOLFO LLINAS (IED)	ENGATIVA	A	RODOLFO LLINAS	76,80%	79,94%		78,42%		$ 265.020.456		28/11/2025	14/04/2026																		
1029	COLEGIO REPUBLICA DE CHINA (IED)	ENGATIVA	B	PRIMAVERA NORTE	10,27%	25,00%		21,50%		$ 59.937.127		6/11/2025	18/03/2026																		
1048	COLEGIO JOSE ASUNCION SILVA (IED)	ENGATIVA	A	JOSE ASUNCION SILVA	7,70%	10,30%		6,00%		$ 177.681.099		12/01/2026	30/04/2026																		
1303	COLEGIO MANUELA BELTRAN (IED)	TEUSAQUILLO	B	ANTONIO NARIÑO	1,81%	4,73%		9,07%		$ 643.879.211		15/01/2026	30/04/2026																		
1407	COLEGIO PANAMERICANO (IED)	LOS MÁRTIRES	A	PANAMERICANO	61,60%	65,20%		62,00%		$ 356.063.923		5/12/2025	30/04/2026																		
1035	COLEGIO MARCO TULIO FERNANDEZ (IED)	ENGATIVA	D	SAN IGNACIO	33,50%	34,50%		34,50%		$ 246.822.791		5/12/2025	30/04/2026																		
ADM	OTIC	TEUSAQUILLO	A	OTIC CALLE 63	43,43%	43,46%		43,46%		$ 19.661.312		28/11/2025	30/01/2026																		
	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																										
	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																										
	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																										
	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																										
	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																										
TOTAL FRENTES DE OBRA						39,80%		38,74%		$ 2.010.399.000	$ -																				
EMERGENCIAS ATENDIDAS DURANTE EL PERIODO																														
1037	COLEGIO SAN JOSE NORTE (IED)	ENGATIVA	A	SAN JOSE NORTE																										
1413	COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS (IED)	LOS MÁRTIRES	A	NACIONAL FEMENINO																										
1072	COLEGIO LAS MERCEDES (IED)	ENGATIVA	A	COLEGIO LAS MERCEDES (IED)																										
1036	COLEGIO MARCO TULIO FERNANDEZ (IED)	ENGATIVA	C	SAN JOAQUIN																										
	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																										
	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																										
	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																										
	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																										
	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																										
	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																										
	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																										
	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																										
	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																										
	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																										
	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																										
	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																										
	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																										
	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																										
	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																										
	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																										
	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																										
	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																										
	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																										
	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																										
	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																										
	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																										
	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																										
	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																										
	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																										
	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																										
	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																										
	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A																										
TOTAL FRENTES DE OBRA						#¡DIV/0!	###	#¡DIV/0!	######	$ -	$ -																				

ACUMULADO FRENTES DE OBRA

TERMINADAS	EN EJECUCION	POR INICIAR	TOTAL	VALOR
0	8	0	8	$ -
ACUMULADO EMERGENCIAS				
0	0	0	0	$ -
TOTAL				
0	8	0	8	$ -
FRENTES POR LOCALIDAD				

RELACION DE PAGOS EFECTUADOS

	No ACTA OBRA	VALOR	No ACTA OBRA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR
	1	$ 250.642.138,00	12		1		12		23		34	
ACUMULADO EMERGENCIAS	2		13		2		13		24		35	
	3		14		3		14		25		36	
TOTAL	4		15		4		15		26		37	
	5		16		5		16		27		38	
FRENTES POR LOCALIDAD	6		17		6		17		28		39	
	7		18		7		18		29		40	
	8		19		8		19		30			
	9		20	TOTAL OBRA	9		20		31			
	10			$ 250.642.138,00	10		21		32			
	11				11		22		33			


AVANCE GENERAL

	TECNICO	FINANCIERO	TIEMPO
AVANCE	39,80%	11,29%	33,18%
PROGRAMADO	38,74%		
ATRASO	1,06%	EN EJECUCION	


FECHA APROBACION CRONOGRAMA

TOTAL INTERVENTORIA $ -


AVANCE GENERAL




EMERGENCIAS



AVANCE FÍSICO



AVANCE DE LOS FRENTES



OBSERVACIONES:

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 22 **LOTE COP No 17**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


SEMANA No. 22 (Consecutivo) **DEL** 9/3/2026 (dd-mm-aa) **AL** 15/03/269 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 163 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17

ANEXO 2 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO RODOLFO LLINÁS - SEDE A




llegada de material. Porcelanato 61x61 y pegacore

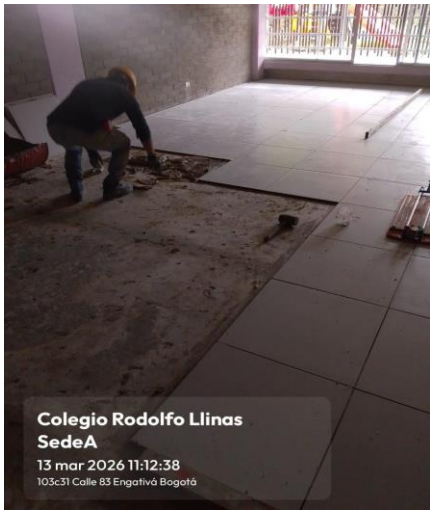

Acopio de material



Alistamineto de piso

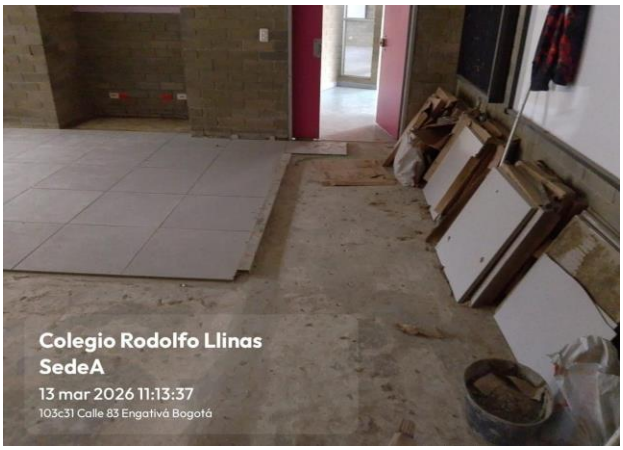

Modulacion de enchape

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 23 **LOTE COP No 17**

PROBINTEC S.A.S


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 23 (Consecutivo) **DEL** 9/3/2026 (dd-mm-aa) **AL** 15/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 163 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17


ANEXO 3 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO REPUBLICA DE CHINA SEDE B

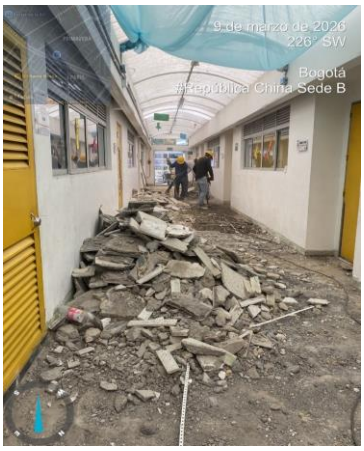

Demolición de piso.




Excavación del área.

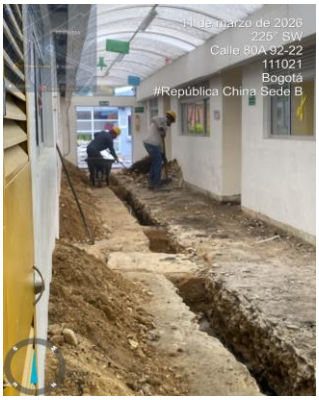



Recolección del material excavado.



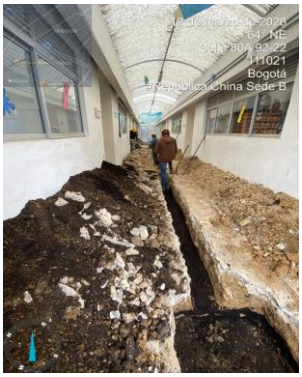

Excavación

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 23 **LOTE COP No 17**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 23 (Consecutivo) **DEL** 9/3/2026 (dd-mm-aa) **AL** 15/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 163 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17

ANEXO 3 REGISTRO FOTOGRÁFICO IED JOSE ASUNCION SILVA



Suministro e Instalacion de cielo raso en PVC



Suministro e Instalacion de cielo raso en PVC



Instalacion de Muro en Superboard Doble Cara



Aplicación de estuco de Nivelacion Muro en Superboard

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 23 **LOTE COP No 17**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 23 (Consecutivo) **DEL** 9/3/2026 (dd-mm-aa) **AL** 15/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación 163 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No #¡REF! (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** #¡REF! (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17

ANEXO 3 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO MANUELA BELTRÀN SEDE B




Recebo compactado




Toma de niveles por parte de la comisión de topografía.



Comisión de topografía

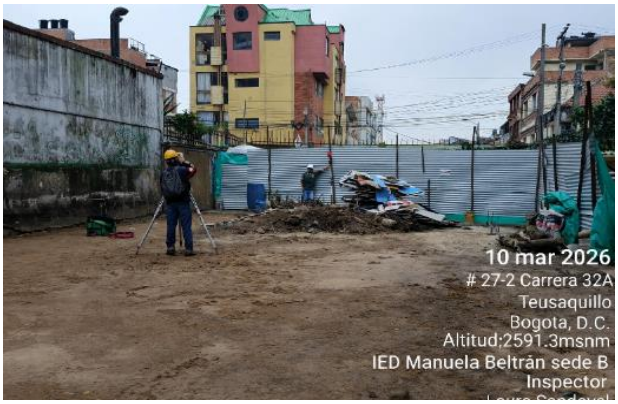

Comisión de topografía

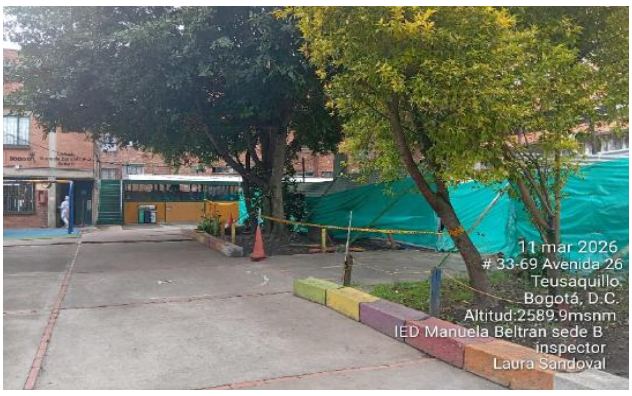

Área de Cerramiento



Área de compactación de Recebo



Comisión de topografía



Comisión de topografía

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 18 **LOTE COP No 17**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 18 (Consecutivo) **DEL** 9/3/2026 **AL** 15/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 163 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17


ANEXO 2 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO PANAMERICANO SEDE A



DESMONTAJE DE TEJA FALTANTE PARA INSTALAR CORREAS Y PLATINAS FALTANTES.




SUSPENDIERON ACTIVIDADES POR FUERTES LLUVIAS.

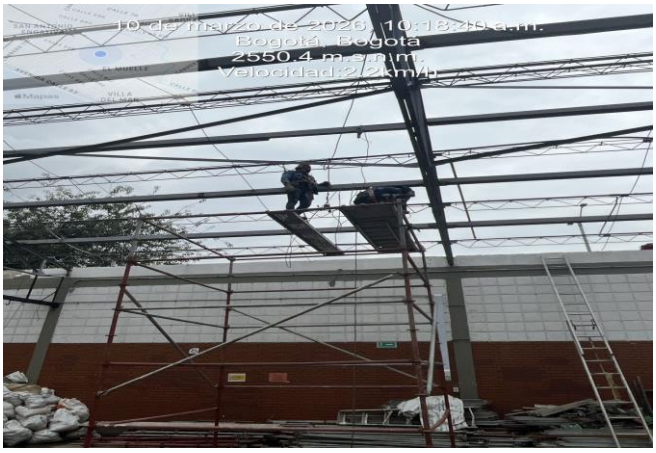


MONTAJE DE PERFILERIA.



SOLDANDO LA ESTRUCTURA

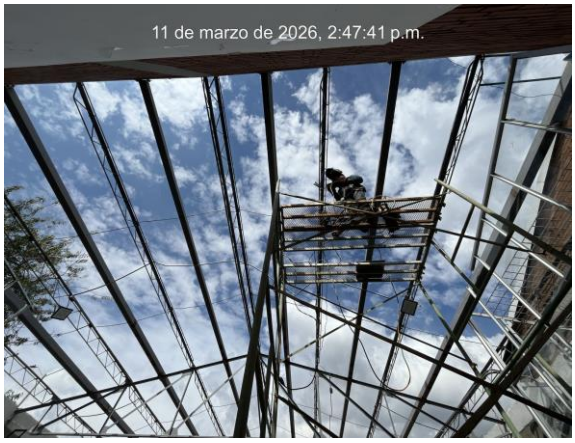

INICIO DE PINTADO A LA ESTRUCTURA.

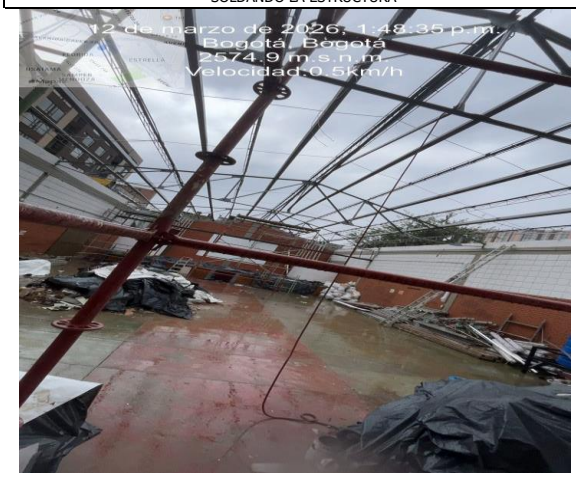

SUSPENDEN ACTIVIDADES POR FUERTES LLUVIAS.



REMATE DE PINTADO A LA ESTRUCTURA



MEDIDAS: 0,80M DE DISTANCIA ENTRE EJES.



DEVIDO A FUERTES LLUVIAS SE CAYO 1.30M DETECHO PROVICIONAL DE SUPER BOARD.



TERMINACION DE ESTRUCTURA METALICA DE LA CUBIERTA.



REMATE DE PINTURA AMARILLA A VIGAS Y MUROS DEL COLEGIO.

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 22 **LOTE COP No 17**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 22 (Consecutivo) **DEL** 2/3/2026 (dd-mm-aa) **AL** 8/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 156 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17

ANEXO 3 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO IED MARCO TULIO FERNANDEZ SEDE D



Juntas de Conrtaccion Placa de Cancha



Corte con disco diamantado



Juntas de Contraccion losa en Concreto

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 18 **LOTE COP No 17**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 18 (Consecutivo) **DEL** 9/3/2026 **AL** 15/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 163 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17

ANEXO 1 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO LAS MERCEDES SEDE A



3 TRAMOS DE ADOQUIN INSTALADO



INSTALACION EN CURSO



1TRAMO MAS INSTALADO



TRAMOS INSTALADOS DE TABLONES DE 40*40
