PROBINTEC S.A.S

# INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

**CONTRATO DE OBRA** **CO1.PCCNTR.8155350**

**INFORME SEMANAL No 20** **LOTE COP No 18**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

**SEMANA No.** 20 (Consecutivo) **DEL** 16/2/2026 (dd-mm-aa) **AL** 22/2/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 142 dias

**CONTRATO DE INTERVENTORIA No** CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

## CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORÍA


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contratista:** | CONSORCIO EDUCATIVO 25 | | **Interventoria** | PROBINTEC S.A.S | |
| **RL del consorcio** | DAYANNA ALEJANDRA BAQUERO AGUILAR | | **RL de Interventoría** | SANDRA STELLA MORENO BUITRAGO | |
| **Contrato No.** | CO1.PCCNTR.8155350 | | **Contrato No.** | CO1.PCCNTR.8168931 | |
| **Objeto** | "ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS LOTE 18" | | **Objeto** | INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No. 6 | |
| **VALOR DEL CONTRATO** | | **$ 2.551.797.666,00** | **Valor Inicial:** | $ | 796.278.928,00 |
| **AIU** | 33,17% | $ 846.431.285,81 | **Valor Adicional No. 1 del 26 de diciembre de 2026:** | $ | 139.026.666,00 |
| **COSTO DIRECTO** | | $ 1.705.366.380,19 | **Valor Total del Contrato:** | **$** | **935.305.594,00** |
| **OFERTADO** | | **$ 2.322.865.467,00** | | | |
| **EMERGENCIAS** | | $ 100.000.000,00 | | | |
| **VALOR PARCIAL CON EMERGENCIAS** | | **$ 2.422.865.467,00** | | | |
| **DIFERENCIA PARA EMERGENCIAS** | | $ 128.932.199,00 | | | |
| **Valor Parcial (Inicial + Emergencias)** | | **$ 228.932.199,00** | | | |
| **Valor adicional No. 1:** | | **$ 645.761.648,00** | | | |
| **Valor inicial No. 1 emergencias:** | | $ 200.000.000,00 | | | |
| **Valor adicional No.1 Obras Contractuales:** | | **$ 445.761.648,00** | | | |
| **VALOR TOTAL MÁS EMERGENCIA** | | **$ 3.197.559.314,00** | | | |
| **VALOR TOTAL EMERGENCIAS** | | $ 428.932.199,00 | | | |
| **VALOR TOTAL PARA OBRAS CONTRACTUALES** | | **$ 2.768.627.115,00** | | | |
| **Plazo Inicial:** | SIETE (7) MESES | | **Plazo Inicial:** | SIETE (7) MESES | |
| **Fecha de Iniciación:** | 3/10/2025 | | **Fecha de Iniciación:** | 3/10/2025 | |
| **Fecha de Vencimiento:** | 2/05/2026 | | **Fecha de Vencimiento:** | 2/05/2026 | |

## AVANCE DEL CONTRATO

| | SEMANAL | ACUMULADO | | | ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|
| Obra programada (%) | 4,41% | 38,31% | Obra Física Ejecutada (%) | 1,80% | 42,36% |
| Valor de la Obra programada: | $ 122.136.008,00 | $ 1.060.700.600,00 | Valor de la Obra Ejecutada: | $ 49.874.840,00 | $ 1.172.829.998,00 |

## GRÁFICA DE AVANCE DEL CONTRATO

| | SEGUIMIENTO EN % DE LA PROGRAMACIÓN DE OBRA | | |
|---|---|---|---|
| | %PROGRAMADO | % EJECUTADO | DIFERENCIA |
| Acumulado anterior | 33,90% | 40,56% | **4,05%** |
| Durante el periodo | 4,41% | 1,80% | |
| Acumulado actual | 38,31% | 42,36% | |

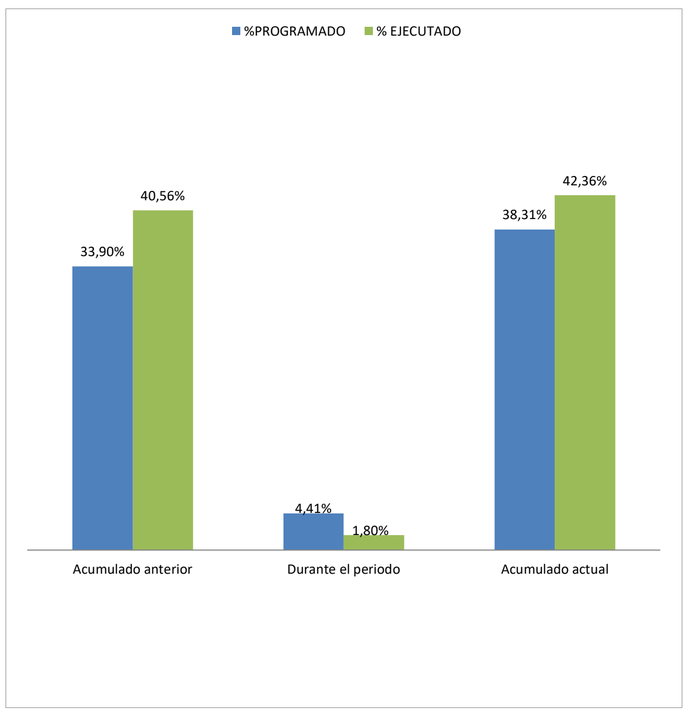


**OBRAS CONTRATO INICIAL**

| CPF | LOCALIDAD | COLEGIO | %PROGRAMADO | % EJECUTADO | DIFERENCIA | %PROGRAMADO ACUMULADO | %EJECUTADO ACUMULADO | DIFERENCIA ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1078 | ENGATIVA | RODOLFO LLINAS - SEDE B | 1,34% | 0,73% | -0,61% | 56,54% | 59,30% | 2,76% |
| 1052 | ENGATIVA | SIMÓN BOLIVAR - SEDE A | 11,40% | 2,18% | -9,22% | 44,75% | 34,88% | -9,87% |
| 1066 | ENGATIVA | MAGDALENA ORTEGA - SEDE A | 0,55% | 0,08% | -0,47% | 21,36% | 71,57% | 50,21% |
| 1019 | ENGATIVA | JORGE GAITAN CORTES - SEDE B | 7,55% | 0,28% | -7,27% | 21,14% | 26,25% | 5,11% |
| 1001 | ENGATIVA | TABORA - SEDE A | 5,46% | 6,21% | 0,75% | 54,38% | 52,72% | -1,66% |
| 1061 | ENGATIVA | INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE A | 1,17% | 0,32% | -0,85% | 21,77% | 18,74% | -3,03% |
| 1008 | ENGATIVA | INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE C | 3,41% | 2,81% | -0,60% | 48,25% | 33,07% | -15,18% |
| **TOTAL PROMEDIO FRENTES CONTRACTUALES** | | | **4,41%** | **1,80%** | **-2,61%** | **38,31%** | **42,36%** | **4,06%** |
| **FRENTES ADICIONALES SEGÚN ADICIONAL No. 001** | | | | | | | | |
| 1021 | ENGATIVA | ANTONIO VILLAVICENCIO - SEDE B | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 1079 | ENGATIVA | ABEL RODRIGUEZ CESPEDES - SEDE A | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| **TOTAL PROMEDIO FRENTES ADICIONALES** | | | **0,00%** | **0,00%** | **0,00%** | **0,00%** | **0,00%** | **0,00%** |

**EMERGENCIAS Y/O OBRAS PRIORITARIAS**

| CPF | LOCALIDAD | COLEGIO | %PROGRAMADO | % EJECUTADO | DIFERENCIA | VALOR TOTAL | VALOR CONTRATO | DIREFENCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1020 | ENGATIVA | DIRECCIÓN LOCAL DE ENGATIVA | 0,00% | 33,74% | 33,74% | $ 38.193.723,00 | | |
| 1057 | ENGATIVA | LA PALESTINA - SEDE B | 100,00% | 100,00% | | $ 1.273.680,00 | | |
| 1061 | ENGATIVA | INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE A | 100,00% | 100,00% | | $ 9.076.835,00 | | |
| 1001 | ENGATIVA | TABORA - SEDE A | 100,00% | 100,00% | | $ 2.913.171,00 | | |
| 1025 | ENGATIVA | MIGUEL ANTONIO CARO - SEDE A | 0,00% | 0,00% | | $ - | | |
| 1073 | ENGATIVA | TORQUIGUA - SEDE A | 0,00% | 3,26% | 3,26% | $ 150.294.734,00 | | |
| 1061 | ENGATIVA | INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE A | 100,00% | 100,00% | | $ 43.248.915,00 | | |
| 1080 | ENGATIVA | LUICILA RUBIO DE LAVERDE | 100,00% | 100,00% | | $ - | | |
| | | | 62,50% | 67,13% | | $ 245.001.058,00 | $ 428.932.199,00 | **$ 183.931.141,00** |

**NOTA:**

## AVANCE FINANCIERO

| VALOR INICIAL DEL CONTRATO + ADICIONAL No. 001 | | $ 3.197.559.314,00 |
|---|---|---|
| VALOR PARCIAL 1 | $ 401.759.103,00 | |
| VALOR PARCIAL 2 | $ 390.609.626,00 | |
| VALOR PARCIAL 3 | $ 418.962.720,00 | |
| TOTAL VALOR FACTURADO | $ 1.211.331.449,00 | |
| SUMAS IGUALES | $ 1.986.227.865,00 | $ 1.986.227.865,00 |

| INDICADOR FINANCIERO | VALOR FACTURADO | VALOR PAGADO |
|---|---|---|
| | $ 1.211.331.449,00 | $ 792.368.729,00 |

## RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

| INDICADOR TECNICO | % AVANCE PROGRAMADO | % DE AVANCE EJECUTADO | % RETRASO - / % ADELANDO + |
|---|---|---|---|
| | **38,31%** | **42,36%** | **4,05%** |

| INDICADOR TIEMPO | DIAS | RETRASO |
|---|---|---|
| | **142** | **5,75** |

PROBINTEC S.A.S

# INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

**CONTRATO DE OBRA** **CO1.PCCNTR.8155350**

**INFORME SEMANAL No 20** **LOTE COP No 18**


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

**SEMANA No.** 20 (Consecutivo) **DEL** 16/2/2026 (dd-mm-aa) **AL** 22/2/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 142 dias

**CONTRATO DE INTERVENTORIA No** CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

## CURVA S

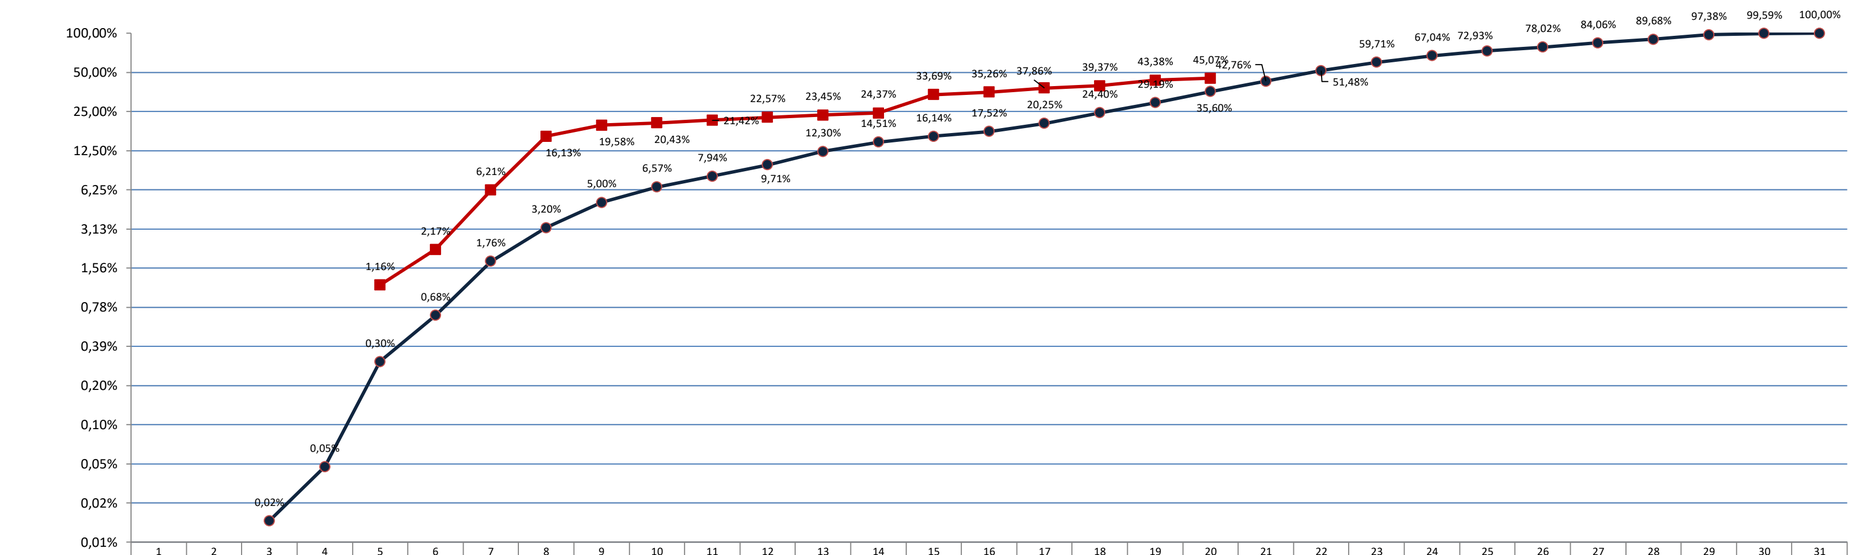


| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REAL EJECUTADO | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,16% | 2,17% | 6,21% | 16,13% | 19,58% | 20,43% | 21,42% | 22,57% | 23,45% | 24,37% | 33,69% | 35,26% | 37,86% | 39,37% | 43,38% | 45,07% | | | | | | | | | | | |
| PROGRAMADO | 0,00% | 0,00% | 0,02% | 0,05% | 0,30% | 0,68% | 1,76% | 3,20% | 5,00% | 6,57% | 7,94% | 9,71% | 12,30% | 14,51% | 16,14% | 17,52% | 20,25% | 24,40% | 29,19% | 35,60% | 42,76% | 51,48% | 59,71% | 67,04% | 72,93% | 78,02% | 84,06% | 89,68% | 97,38% | 99,59% | 100,00% |

**SEGUIMIENTO AL FLUJO DE OBRA EMITIDO POR EL CONTRATISTA - RESPONDE A LA PROGRAMACION DE OBRA**

## ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO RODOLFO LLINAS - SEDE B (ANEXO 1 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

**1. Actividades Tecnicas:** El contratista de obra realizó actividades de construcción de mediacaña impermeabilizada en la cubierta del shut de basuras y adicional realizó la instalación de acero para el muro del cerramiento perimetral.

**2. Seguridad Social y SST:** Durante el periodo reportado se inició la actividad de instalación de concreto ciclópeo en el cerramiento perimetral, labor que comprende la preparación del terreno, con riesgos asociados a manipulación de cargas, golpes, contacto con material cementante y tránsito en áreas intervenidas. En el marco del seguimiento efectuado por la interventoría, se verificó en campo el uso adecuado de los EPP por parte del personal operativo, conforme a los riesgos identificados para la actividad. Así mismo, se validó el diligenciamiento del ATS, los permisos de trabajo correspondientes y la realización de charlas de seguridad previas al inicio de la jornada, orientadas a socializar los riesgos específicos de la actividad y las medidas de control a implementar.

**3. Aspectos de calidad:** Las actividades contractuales se han venido desarrollando conforme a los parámetros de calidad, estipulados dentro de las especificaciones técnicas.

**4. Programación de obra:** Según el cronograma de obra presentado por el contratista, en esta sede se presenta un sobre avance del 2,76%. Se realizó el reajuste del porcentaje programado para este frente.

**4.1 Actividades programadas NO ejecutadas:**
**1.2.18 DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS.**
**1.2.19 DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS**

**4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.**

**5. Ambiental:** Se realizo recorrido en el frente, cuentan con el cerramiento perimetral y señalización adecuado, se verifica que la mezcla de concreto se realiza en batea metálica, , se evidencia RCD acopiado en las zonas verdes y desorden en el frente por lo que se recomienda jornada de orden y aseo, disponer adecuadamente el material a un centro de aprovechamiento.

**6. Generales:** Dentro del periodo establecido se lleva a cabo el comité de obra No. 10 solicitado por la supervisión, este cuenta con la participación del Supervisor del contrato, la Interventoría y el Contratista de Obra (se levanta Acta de reunión). Se le solicita al contratista de obra entregar los documentos modificados (balance, cronograma de obra, flujo de inversión) respecto al adicional que tuvo el contrato de obra. El contratis presenta acta parcial No. 3 con sus debidas memorias de cantidades, la cual fue aprobada por la interventoría.

## ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO SIMÓN BOLIVAR - SEDE A (ANEXO 2 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

**1. Actividades Tecnicas:** Durante la presente semana se realizaron las siguientes actividades:
Se realizó estucado de paredes en la sala de sistemas.
Se ejecutó estucado en bordes de vanos.
Se efectuó instalación eléctrica en la sala de sistemas.

**2. Seguridad Social y SST:** Durante el periodo reportado se evidenciaron actividades correspondientes al estucado de paredes y bordes de vanos, labores propias de acabado que implican manipulación de herramientas manuales, generación de material particulado y posturas prolongadas de trabajo. Durante el desarrollo de dichas actividades, la interventoría realizó supervisión en campo, verificando el cumplimiento de los procedimientos establecidos, las condiciones locativas del área intervenida y la implementación de medidas de control frente a los riesgos identificados. Así mismo, se validó el uso adecuado de los EPP por parte del personal operativo. Se constató que el cerramiento perimetral se encuentra en condiciones adecuadas, con la respectiva señalización preventiva y de prohibición, garantizando la delimitación del área de trabajo y reduciendo la exposición de la comunidad educativa a los riesgos derivados de la ejecución de obra. De igual manera, se evidenciaron jornadas de orden y aseo en el frente de trabajo, contribuyendo a la mitigación de riesgos asociados a caídas al mismo nivel, golpes y acumulación de residuos. También se verificó la realización de inspecciones de seguridad y el desarrollo de charlas de seguridad dirigidas al personal, como parte de las acciones de fortalecimiento de la cultura preventiva en obra.

**3. Aspectos de calidad:** Las actividades contractuales se han venido desarrollando conforme a los parámetros de calidad, estipulados dentro de las especificaciones técnicas.

**4. Programación de obra:** El contratista de obra cuenta con un retraso del 9,87%.

**4.1 Actividades programadas NO ejecutadas:**
**4.9.5. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE ALMACENAMIENTO DE 5000 LTS**
**7.2.1.SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE PULIDO Y BRILLADO**
**10.1.17SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA COMPLETA PARA TANQUE DE RESERVA INCLUYE CONEXIONES Y ACCESORIOS**
**15.1.12SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÓDULO AULA ESCOLAR TIPO (S/DISEÑO - VER FICHA TECNICA Y PLANOS), EN ESTRUCTURA METÁLICA DESMONTABLE, ENSAMBLADA POR MEDIOS MECÁNICOS (TORNILLERÍA, PERNOS), CUBIERTA A UN AGUA Y ÁREA DE CIRCULACIÓN. INCLUYE PUERTAS, VENTANAS, ACABADOS, ILUMINACIÓN, REDES ELÉCTRICAS E HIDROSANITARIAS. AREA 52 M2**
No obstante, se deja constancia de que el impacto principal en el indicador de retraso obedece específicamente al Ítem 15.1.12, el cual incide de manera significativa en el comportamiento general del avance programado. Este ítem, por sí solo, genera un atraso equivalente a 9,02%

**4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.**

**5. Ambiental:** se realizó recorrido en el frente, se reportó que se usa los puntos ecológicos dentro de la institución, se evidencia mezcla de concreto en batea metálica, se encuentra material de construcción debidamente acopiado y alejados de sumideros, las zonas verdes se encuentran libres, se presenta desorden en el frente por lo que se recomienda realizar jornadas de orden y aseo periódicamente e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental.

**6. Generales:** Se le manifiesta al contratista aumentar la mano de obra para cumplir con los tiempos estipulados en el cronograma de obra; Dentro del periodo establecido se lleva a cabo el comité de obra No. 10 solicitado por la supervisión, este cuenta con la participación del Supervisor del contrato, la Interventoría y el Contratista de Obra (se levanta Acta de reunión). Se le solicita al contratista de obra entregar los documentos modificados (balance, cronograma de obra, flujo de inversión) respecto al adicional que tuvo el contrato de obra. El contratis presenta acta parcial No. 3 con sus debidas memorias de cantidades, la cual fue aprobada por la interventoría. Se realiza visita pore parte de la OTIC, para conexion del rack.

PROBINTEC S.A.S

# INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

**CONTRATO DE OBRA** **CO1.PCCNTR.8155350**

**INFORME SEMANAL No 20** **LOTE COP No 18**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

**SEMANA No.** 20 (Consecutivo) **DEL** 16/2/2026 (dd-mm-aa) **AL** 22/2/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 142 dias

**CONTRATO DE INTERVENTORIA No** CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

## ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO MAGDALENA ORTEGA - SEDE A (ANEXO 3 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

**1. Actividades Tecnicas:** El contratista realizó actividades de excavación en la zona donde se va a instalar el shut de basuras.

**2. Seguridad Social y SST:** Durante el periodo reportado se evidenció el inicio de las actividades de excavación en el área destinada para la construcción del cuarto de almacenamiento de basuras, labores que implican riesgos asociados a caídas a diferente nivel, sobreesfuerzos o herramientas en el sector intervenido. En el marco del seguimiento realizado por la interventoría, se verificó en campo el uso adecuado de los EPP por parte del personal operativo, conforme a los riesgos identificados en la matriz de peligros del proyecto. Así mismo, se constató la realización de charlas de seguridad previas al inicio de las actividades, orientadas a reforzar las medidas preventivas, los procedimientos de trabajo seguro y la identificación de condiciones inseguras en el área de intervención.

**3. Aspectos de calidad:** Las actividades contractuales se han venido desarrollando conforme a los parámetros de calidad, estipulados dentro de las especificaciones técnicas.

**4. Programación de obra:** El contratista de obra cuenta con un avance por encima de lo programdo del 50,21%, esto debido a que el contratista a ejecutado actividades NO contempladas dentro del diagnostico inicial. Se realizó un reajuste a la porcentaje ejecutado en base al adicional realizado al presupuesto del frente.

**4.1 Actividades programadas NO ejecutadas:** N/A.

**4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.**

**5. Ambiental:** Se realizo recorrido en el frente, cuenta con cerramiento en buen estado y señalizado, se evidencia RCD, una gran cantidad al igual se recomendo al contratista jornadas de orden y aseo, disponer los residuos adecuadamente e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA).

**6. Generales:** Dentro del periodo establecido se lleva a cabo el comité de obra No. 10 solicitado por la supervisión, este cuenta con la participación del Supervisor del contrato, la Interventoría y el Contratista de Obra (se levanta Acta de reunión). Se le solicita al contratista de obra entregar los documentos modificados (balance, cronograma de obra, flujo de inversión) respecto al adicional que tuvo el contrato de obra. El contratis presenta acta parcial No. 3 con sus debidas memorias de cantidades, la cual fue aprobada por la interventoría.

## ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO JORGE GAITAN CORTES - SEDE B (ANEXO 4 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

**1. Actividades Tecnicas:** Durante la presente semana se realizaron las siguientes actividades:
- Se realizo ensayo de cono de arena para verificación de densidad del material compactado.

**2. Seguridad Social y SST:** Durante el periodo reportado se evidenciaron actividades correspondientes al ensayo de densidades mediante el método del cono de arena, procedimiento técnico utilizado para verificar el grado de compactación del material en campo. En el marco del seguimiento realizado, se validó que el cerramiento perimetral del área intervenida se encuentra en óptimas condiciones, garantizando la delimitación del frente de obra y la protección de la comunidad educativa. Así mismo, se constató que la señalización preventiva y de advertencia se encuentra instalada de manera visible y adecuada. Cabe señalar que durante el periodo evaluado no se evidenció presencia de personal operativo ejecutando actividades constructivas en el frente de obra, más allá de las relacionadas con el desarrollo del ensayo técnico mencionado.

**3. Aspectos de calidad:** Las actividades contractuales se han venido desarrollando conforme a los parámetros de calidad, estipulados dentro de las especificaciones técnicas.

**4. Programación de obra:** Según el cronograma de obra presentado por el contratista, en esta sede se presenta un sobre avance del 5,11%.

**4.1. Actividades programadas no ejecutadas:** Se aclara que esta actividad correspondiente al item 2.2.14. se tiene programada hasta la semana 21, sin embargo se coloca debido a que ya empezaron los tiempos de ejecucion según programacion. De igual hay items ejecutados que no se encuentran programados contractualmente como el geotextil, este se ajustara con el balance en el siguiente informe.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2.14 | PLACA CONTRAPISO DE 15 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN (NO INCLUYE ACERO) | M2 | 422.30 | $ 129,792.00 | $ 54,811,162.00 | 86.94 |

**5. Ambiental:** Se realizo recorrido en el frente, se evidencia el cerramiento adecuado, se reporta que se hará uso de los puntos ecológicos, se evidencia presencia de material de construcción en las zonas verdes por lo que se recomendó al contratista realizar una jornada de aseo e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA).

**6. Generales:** Dentro del periodo establecido se lleva a cabo el comité de obra No. 10 solicitado por la supervisión, este cuenta con la participación del Supervisor del contrato, la Interventoría y el Contratista de Obra (se levanta Acta de reunión). Se le solicita al contratista de obra entregar los documentos modificados (balance, cronograma de obra, flujo de inversión) respecto al adicional que tuvo el contrato de obra. El contratis presenta acta parcial No. 3 con sus debidas memorias de cantidades, la cual fue aprobada por la interventoría. Se realizó acompañamiento al ensayo de cono de arena, y una vez verificados los resultados obtenidos, la interventoría otorgó el aval correspondiente para continuar con la ejecución de las capas posteriores.

## ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO TABORA - SEDE A (ANEXO 5 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

**1. Actividades Tecnicas:** El contratista realizó actividades de excavación en la zona verde donde se instalarán las bancas y domo (lateral izquierdo de la cancha). Adicional inició la instalación de relleno en recebo debidamente compactado en la zona mencionada anteriormente.

**2. Seguridad Social y SST:** Durante el periodo reportado se iniciaron las actividades de excavación manual, así como a la extensión de material recebo, labores que implican riesgos asociados a sobreesfuerzos, caídas al mismo y diferente nivel, y tránsito de personal en áreas intervenidas. En el desarrollo de estas actividades, la interventoría realizó verificación en campo, constatando el uso adecuado de los EPP por parte de los trabajadores, acorde con los riesgos identificados para este tipo de labores. Así mismo, se validó la inspección previa y el estado general de las herramientas manuales utilizadas, con el fin de prevenir incidentes derivados de fallas mecánicas o deterioro de los equipos. No obstante, durante el recorrido se evidenció que el cerramiento perimetral presenta deterioro en algunos tramos, lo que podría comprometer la adecuada delimitación del área de obra. En consecuencia, se recomendó en campo al contratista realizar el mantenimiento o reposición inmediata del cerramiento, garantizando condiciones óptimas de seguridad y evitando posibles incidentes con la comunidad educativa.

**3. Aspectos de calidad:** Las actividades contractuales se han venido desarrollando conforme a los parámetros de calidad, estipulados dentro de las especificaciones técnicas.

**4. Programación de obra:** Según el cronograma de obra presentado por el contratista, en esta sede se presenta un retraso del 1,66%. El contratista inició actividades de urbanismo, sin embargo hay actividades que ya están programadas con respecto a la intervención de esta zona, la cual genera retraso en el periodo reportado.

**4.1 Actividades programadas NO ejecutadas:**
**15.1.15 BANCA EN CONCRETO TIPO M31 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**

**4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.**

**5. Ambiental:** El contratista cuenta con cerramiento, se encuentra materiales en el frente acopiados adecuadamente, las zonas verdes se van a endurecer en el frente, se encuentra desorden en el frente, por lo que se recomienda tener solo una zona de acopio de residuos, garantizar jornadas de orden y aseo periódicamente, disponer adecuadamente e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA).

**6. Generales:** Se le manifiesta al contratista aumentar la mano de obra para cumplir con los tiempos estipulados en el cronograma de obra; Dentro del periodo establecido se lleva a cabo el comité de obra No. 10 solicitado por la supervisión, este cuenta con la participación del Supervisor del contrato, la Interventoría y el Contratista de Obra (se levanta Acta de reunión). Se le solicita al contratista de obra entregar los documentos modificados (balance, cronograma de obra, flujo de inversión) respecto al adicional que tuvo el contrato de obra. El contratis presenta acta parcial No. 3 con sus debidas memorias de cantidades, la cual fue aprobada por la interventoría.

## ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE A (ANEXO 6 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

**1. Actividades Tecnicas:** El contratista de obra realizó actividades de obra tales como: desmonte e instalación de enchape, preparación de filos en las divisiones en mampostería de los baños.

**2. Seguridad Social y SST:** Durante el periodo reportado se iniciaron las labores de instalación de enchape en los baños, actividad correspondiente a la fase de acabados, que implica manipulación de herramientas manuales, adhesivos, materiales cerámicos y posibles riesgos asociados a cortes, golpes, caídas al mismo nivel y exposición a material particulado. En el marco del seguimiento realizado por la interventoría, se efectuó verificación en campo de las condiciones de seguridad durante la ejecución de la actividad. No obstante, se evidenció personal sin el uso adecuado del casco de seguridad. En consecuencia, se realizó recomendación directa en campo al contratista para reforzar el cumplimiento del uso obligatorio de los EPP, especialmente el casco de seguridad, garantizando la protección frente a riesgos por caída de objetos o golpes contra estructuras existentes. Así mismo, se sugiere fortalecer las charlas de seguridad y el control permanente por parte del área de SST, a fin de prevenir incidentes.

**3. Aspectos de calidad:** Las actividades contractuales se han venido desarrollando conforme a los parámetros de calidad, estipulados dentro de las especificaciones técnicas.

**4. Programación de obra:** Según el cronograma de obra presentado por el contratista, en esta sede se presenta un retraso del 3,03%. Se realizó el reajuste del porcentaje programado para este frente.

**4.1 Actividades programadas NO ejecutadas:** Las actividades correspondientes a la intervención de la cubierta del hall de circulación, tales como:
**Ítem 1.2.23. DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE.**
**Ítem 2.5.1. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA.**
NO se ejecutaron durante el tiempo previsto debido a que no se definiron oportunamente los criterios necesarios para su desarrollo, los cuales eran indispensables para el inicio de las actividades correspondientes a la cubierta del hall de circulación.
Las actividades que no se ejecutaron en el periodo reportado son:
**Ítem 9.2.2. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANERIA EN ALUMINIO CON CUERPOS FIJOS Y CORREDIZOS.**
**Ítem 10.1.1. SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE INCRUSTAR COLOR BLANCO (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFÓN COMPLETO TIPO BOTELLA Y GRIFERÍA TIPO PUSH)**

**4.2 Actividades ejecutadas NO programadas:** N/A.

**5. Ambiental:** Se realizo recorrido en el frente, cuentan con el cerramiento perimetral adecuado con señalización, se reporta ingreso de material, se evidencia los sanitarios anteriormente desmontados sin cubrir por lo que se recomienda al contratista presentar solo una zona de acopio de residuos, tomar las medidas necesarias por las zonas verdes, así como una jornada de orden y aseo e implementar todas las especificaciones respectivas al Plan de Manejo Ambiental (PMA).

**6. Generales:** Se le manifiesta al contratista aumentar la mano de obra para cumplir con los tiempos estipulados en el cronograma de obra; Dentro del periodo establecido se lleva a cabo el comité de obra No. 10 solicitado por la supervisión, este cuenta con la participación del Supervisor del contrato, la Interventoría y el Contratista de Obra (se levanta Acta de reunión). Se le solicita al contratista de obra entregar los documentos modificados (balance, cronograma de obra, flujo de inversión) respecto al adicional que tuvo el contrato de obra. El contratis presenta acta parcial No. 3 con sus debidas memorias de cantidades, la cual fue aprobada por la interventoría.

PROBINTEC S.A.S

# INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

**CONTRATO DE OBRA** CO1.PCCNTR.8155350

**INFORME SEMANAL No 20** **LOTE COP No 18**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

**SEMANA No.** 20 (Consecutivo) **DEL** 16/2/2026 (dd-mm-aa) **AL** 22/2/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 142 dias

**CONTRATO DE INTERVENTORIA No** CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

## ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE C (ANEXO 7 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

**1. Actividades Tecnicas:** El contratista de obra realizó actividades de ampliación de vanos de las ventanas del aula de música y actividades de excavación en la zona dura de transición que conduce al shut de basuras.

**2. Seguridad Social y SST:** Durante el periodo reportado se llevó a cabo la instalación de la cubierta en el aula de música, actividad que implica trabajos en altura, manipulación de materiales y herramientas, así como control de riesgos asociados a caída de objetos y desplazamientos en superficie elevada. De manera paralela, se continuó con las actividades de excavación en la zona de circulación hacia el cuarto de almacenamiento de basuras. Durante el desarrollo de dichas actividades, la interventoría realizó supervisión en campo, verificando el cumplimiento de los procedimientos establecidos, las condiciones locativas del área intervenida y la adecuada implementación de las medidas de control frente a los riesgos identificados en la matriz correspondiente. Así mismo, se validó el uso adecuado de los EPP por parte del personal operativo, acorde con la naturaleza de las labores ejecutadas. De igual manera, se constató el adecuado acopio y organización de los materiales en obra, manteniendo condiciones de orden y delimitación que contribuyen a la prevención de incidentes y a la optimización de las condiciones de seguridad en el frente de trabajo.

**3. Aspectos de calidad:** Las actividades contractuales se han venido desarrollando conforme a los parámetros de calidad, estipulados dentro de las especificaciones técnicas.

**4. Programación de obra:** Según el cronograma de obra presentado por el contratista, en esta sede se presenta un retraso del 15,18%

**4.1 Actividades programadas NO ejecutadas:**
**Ítem 1.2.18. DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS.**
Nota: El retraso reportado en el periodo corresponde a las actividades de intervención en el shut de basura, son actividades que se programaron en periodos anteriores, por ende, el retraso acumulado es elevado.

**4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.**

**5. Ambiental:** Se realizo recorrido en el frente, se evidencia cerramiento en buen estado con señalización, se hizo retiro de chatarra adecuadamente, al igual, se encuentra gran cantidad de RCD y material en zonas verdes, se evidencia tejas de asbesto embaladas, pero se recomienda hacer la disposicion de los RESPEL en el menor tiempo posible, disponer adecuadamente los RCD teniendo en cuenta las especificaciones técnicas y ambientales.

**6. Generales:** Se le manifiesta al contratista aumentar la mano de obra para cumplir con los tiempos estipulados en el cronograma de obra; Dentro del periodo establecido se lleva a cabo el comité de obra No. 10 solicitado por la supervisión, este cuenta con la participación del Supervisor del contrato, la Interventoría y el Contratista de Obra (se levanta Acta de reunión). Se le solicita al contratista de obra entregar los documentos modificados (balance, cronograma de obra, flujo de inversión) respecto al adicional que tuvo el contrato de obra. El contratis presenta acta parcial No. 3 con sus debidas memorias de cantidades, la cual fue aprobada por la interventoría.

## ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA DIRECCIÓN LOCAL DE ENGATIVA (DILE) (ANEXO 8 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

**1. Actividades Tecnicas:** El contratista de obra realizó actividades de resane y remates en los muros internos del baño de hombres.

**2. Seguridad Social y SST:** Durante el periodo reportado se iniciaron las actividades de instalación de enchapes en las áreas intervenidas. De igual manera, se inició el proceso de emboquillado, orientado al sellado de juntas, mejoramiento de acabados y protección de las superficies instaladas. En materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, se validó el diligenciamiento de los ATS correspondientes a las actividades ejecutadas, constatando la identificación de peligros, valoración de riesgos y definición de controles preventivos. Así mismo, se verificó que el personal cuenta con la dotación reglamentaria y el uso adecuado de los EPP, acordes a los riesgos asociados a las labores de instalación y acabado, tales como guantes, gafas de seguridad, tapabocas y botas de seguridad.

**3. Aspectos de calidad:** Las actividades contractuales se han venido desarrollando conforme a los parámetros de calidad, estipulados dentro de las especificaciones técnicas.

**4. Programación de obra:** Las actividades se vienen desarrollando sin ningún tipo de inconveniente, cumpliendo con el plan de trabajo expuesto ante la interventoría.

**5. Ambiental:** Se realiza recorrido en el frente, se evidencia el cerramiento, se reporta la disposición adecuada de todos los residuos en el frente por lo que se recomiendo garantizar jornadas de orden y aseo e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA).

**6. Generales:** Dentro del periodo establecido se lleva a cabo el comité de obra No. 10 solicitado por la supervisión, este cuenta con la participación del Supervisor del contrato, la Interventoría y el Contratista de Obra (se levanta Acta de reunión). Se le solicita al contratista de obra entregar los documentos modificados (balance, cronograma de obra, flujo de inversión) respecto al adicional que tuvo el contrato de obra. El contratis presenta acta parcial No. 3 con sus debidas memorias de cantidades, la cual fue aprobada por la interventoría.

## ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO TORQUIGUA - SEDE A (ANEXO 9 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

**1. Actividades Tecnicas:** El contratista de obra realizó actividades de excavación y relleno en las áreas de ciculación requeridas para la intervención y área donde se va a instalar el shut de basuras.

**2. Seguridad Social y SST:** Durante el periodo reportado se evidenció la presencia de personal de obra en el frente intervenido, iniciando las actividades preliminares programadas. Dentro de las labores ejecutadas, se realizó la instalación de cerramientos, con el fin de delimitar el área de trabajo, controlar accesos y prevenir la exposición de terceros a los riesgos propios de la obra. Así mismo, se tiene previsto iniciar las actividades de demolición de la zona dura donde se planteó la ubicación del tanque, por lo cual se verifican previamente las condiciones de seguridad, señalización del área y control de riesgos asociados a trabajos de demolición. En materia de SST, se constató que el personal presente en obra cuenta con los EPP adecuados para la actividad a desarrollar y dotación reglamentaria, conforme a los riesgos identificados.

**3. Aspectos de calidad:** Las actividades contractuales se han venido desarrollando conforme a los parámetros de calidad, estipulados dentro de las especificaciones técnicas.

**4. Programación de obra:** Las actividades se vienen desarrollando sin ningún tipo de inconveniente, cumpliendo con el plan de trabajo expuesto ante la interventoría.

**5. Ambiental:** Se realizo recorrido en el frente, se evidencia el cerramiento adecuado, se realizó la actividad de endurecer la zona verde, se evidencia RCD en el frente, se realizó la disposición adecuada, se recomienda implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental.

**6. Generales:** Dentro del periodo establecido se lleva a cabo el comité de obra No. 10 solicitado por la supervisión, este cuenta con la participación del Supervisor del contrato, la Interventoría y el Contratista de Obra (se levanta Acta de reunión). Se le solicita al contratista de obra entregar los documentos modificados (balance, cronograma de obra, flujo de inversión) respecto al adicional que tuvo el contrato de obra. El contratis presenta acta parcial No. 3 con sus debidas memorias de cantidades, la cual fue aprobada por la interventoría.

## FIRMAS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ARQ. LORENA RODRIGUEZ RODRIGUEZ**<br>DIRECTORA DE INTERVENTORÍA | **ING. CARLOS MAURICIO MONTENEGRO BAUTISTA**<br>RESIDENTE DE INTERVENTORÍA | **ARQ. PAULA ANDREA MARTINEZ MORALES**<br>RESIDENTE DE INTERVENTORÍA | **ING. LUIS EMIRO BLANCO MORENO**<br>APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA |
| **KATERIN CAROLINA NUNEZ OSORIO**<br>PROFESIONAL SST | **ING.CHRISTIAN FELIPE RODRIGUEZ BELTRAN**<br>ESPECIALISTA AMBIENTAL | **ING.CHRISTIAN FABIAN BARRERA DONCEL**<br>PROFESIONAL COSTOS Y PRESUPUESTOS | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA: | 23/02/2026 | ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.<br>SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO<br>SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA<br>DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | INFORME<br>APOYO A LA SUPERVISION |
| DIAS RESTANTES | 69 Días | | GRUPO 18 |
| ESTADO GENERAL DEL PROYECTO | | | |
| CORTE DEL INFORME: | CONTRATISTA DE OBRA: | CONSORCIO EDUCATIVO 25 | |
| 22 de febrero de 2026 | CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: | PROBINTEC S.A.S | |

| FECHAS | | | PLAZOS EN DIAS | | | VALOR CONTRATO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATOS: | INTERVENTORIA | OBRA | ETAPA: | INTERVENTORIA | OBRA | ETAPA: | INTERVENTORIA | OBRA |
| CONTRATO | CO1.PCCNTR.8168931 | CO1.PCCNTR.8155350 | INICIAL | 211 | 211 | INICIAL | $ 796.278.928 | $ 2.551.797.666 |
| INICIO | 3 de octubre de 2025 | 3 de octubre de 2025 | SUSPENSIONES | | | ADICIÓNES | $ 139.026.666,00 | $ 645.761.648,00 |
| TERMINACION INICIAL | 2 de mayo de 2026 | 2 de mayo de 2026 | PRÓRROGAS | | | TOTAL | $ 935.305.594,00 | $ 3.197.559.314,00 |
| TERMINACION FINAL | 2 de mayo de 2026 | 2 de mayo de 2026 | TOTAL | 211 | 211 | | | |

**MODIFICACIONESDEL CONTRATO DE INTERVENTORIA**

| MOD No | FECHA DE LA MODIFICACION | VALOR ADICION | PRORROGA (DIAS) | OTRO ASPECTO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26/12/2025 | $ 139.026.666,00 | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |

**MODIFICACIONESDEL CONTRATO DE OBRA**

| MOD No | FECHA DE LA MODIFICACION | VALOR ADICION | PRORROGA | | OTRO ASPECTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12/12/2025 | $ 645.761.648,00 | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |

**POLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORIA** — GARANTE: SEGUROS DEL ESTADO

| POLIZA | CUMPLIMIENTO DESDE | | | CUMPLIMIENTO HASTA | | | CALIDAD DEL SERVICIO DESDE | | | CALIDAD DEL SERVICIO HASTA | | | SALARIOS Y PRESTACIONES DESDE | | | SALARIOS Y PRESTACIONES HASTA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 47 994000110040 | 19 | 9 | 2025 | 3 | 1 | 2027 | 3 | 5 | 2026 | 3 | 5 | 2031 | 19 | 9 | 2025 | 3 | 5 | 2029 |

**POLIZAS CONTRATO DE OBRA** — COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

| POLIZA | CUMPLIMIENTO DESDE | | | CUMPLIMIENTO HASTA | | | SALARIOS Y PRESTACIONES DESDE | | | SALARIOS Y PRESTACIONES HASTA | | | ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA DESDE | | | ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA HASTA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CV-100054114 | 8 | 9 | 2025 | 3 | 1 | 2027 | 8 | 9 | 2025 | 2 | 5 | 2029 | 10 | 4 | 2026 | 2 | 5 | 2029 |

| POLIZA | RESPONSABILIDAD CIVIL DESDE | | | RESPONSABILIDAD CIVIL HASTA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CV – 100015150 | 8 | 9 | 2025 | 10 | 4 | 2026 |

| CPF | COLEGIO | LOCALIDAD | SEDE | NOMBRE SEDE | AVANCE ANTERIOR | AVANCE ACTUAL (18/01/2026) | | PROGR % | EJECUTADO VS PROG | VlrFRENTE APROBADO | VlrFRENTE A ESTE PERIODO | FECHA INICIO CRONOGRAMA | FECHA FIN CRONOGRAMA | jul-2025 | jul-2025 | ago-2025 | ago-2025 | sep-2025 | sep-2025 | oct-2025 | oct-2025 | nov-2025 | nov-2025 | dic-2025 | dic-2025 | ene-2026 | ene-2026 | feb-2026 | feb-2026 | mar-2026 | mar-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1078 | COLEGIO RODOLFO | ENGATIVA | B | BOCHICA COMPARTIR | 58,57% | 59,30% | | 56,54% | | $ 183.643.811,00 | | 21/11/2025 | 27/03/2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1052 | COLEGIO SIMON BOLIVAR | ENGATIVA | A | SIMON BOLIVAR | 32,67% | 34,88% | | 44,75% | | $ 763.383.605,00 | | 15/10/2025 | 24/04/2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1066 | COLEGIO MAGDALENA | ENGATIVA | A | MAGDALENA ORTEGA DE NARIÑO | 71,49% | 71,57% | | 21,36% | | $ 296.018.724,00 | | 10/11/2025 | 30/04/2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1019 | COLEGIO JORGE GAITAN | ENGATIVA | B | LA ESPAÑOLA | 25,96% | 26,25% | | 21,14% | | $ 344.591.831,00 | | 9/12/2025 | 23/04/2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1001 | COLEGIO TABORA (IED) | ENGATIVA | A | TABORA | 46,51% | 52,72% | | 54,38% | | $ 158.125.362,00 | | 21/11/2025 | 27/03/2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1061 | COLEGIO INSTITUTO | ENGATIVA | A | FRANCISCO JOSE DE CALDAS | 18,42% | 18,74% | | 21,77% | | $ 397.128.110,00 | | 6/11/2025 | 25/04/2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1008 | COLEGIO INSTITUTO | ENGATIVA | C | CLEMENCIA DE CAYCEDO | 30,26% | 33,07% | | 48,25% | | $ 295.736.072,00 | | 21/11/2025 | 26/03/2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1021 | COLEGIO ANTONIO VILLAVICENCIO (IED) | ENGATIVA | B | LOS LAURELES | | 0,00% | | 0,00% | | $ 90.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1079 | COLEGIO ABEL | ENGATIVA | A | ABEL RODRÍGUEZ CÉSPEDES | | 0,00% | | 0% | | $ 100.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL FRENTES DE OBRA | | | | | | 42,36% | | 29,80% | | $ 2.628.627.515,00 | $ - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EMERGENCIAS ATENDIDAS DURANTE EL PERIODO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1057 | COLEGIO LA PALESTINA (IED) | ENGATIVA | B | LA PALESTINA | | 100,00% | | 100,00% | | $ 1.273.680,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1061 | TECNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSE DE | ENGATIVA | A | FRANCISCO JOSE DE CALDAS | | 100,00% | | 100,00% | | $ 9.076.835,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1001 | COLEGIO TABORA (IED) | ENGATIVA | A | TABORA | | 100,00% | | 100,00% | | $ 2.913.171,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1020 | DIRECCIÓN LOCAL DE ENGATIVA | ENGATIVA | #N/D | DIRECCIÓN LOCAL DE ENGATIVA | | 33,74% | | 0,00% | | $ 38.193.723 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1025 | COLEGIO MIGUEL | ENGATIVA | A | MIGUEL ANTONIO CARO | | 0,00% | | 0,00% | | $ - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1073 | COLEGIO TORQUIGUA (IED) | ENGATIVA | A | COLEGIO TORQUIGUA (IED) | | 3,26% | | 0,00% | | $ 150.294.734 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1061 | COLEGIO INSTITUTO | ENGATIVA | A | FRANCISCO JOSE DE CALDAS | | 100,00% | | 100,00% | | $ 43.248.915 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1080 | COLEGIO LUCILA RUBIO | ENGATIVA | A | LUCILA RUBIO DE LAVERDE | | 100,00% | | 100% | | $ - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL FRENTES DE OBRA | | | | | | 67,13% | | 62,50% | | $ 245.001.058,00 | $ - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**ACUMULADO FRENTES DE OBRA**


| TERMINADAS | EN EJECUCION | POR INICIAR | TOTAL | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 2 | 9 | $ - |
| ACUMULADO EMERGENCIAS | | | | |
| 5 | 2 | 1 | 8 | $ - |
| TOTAL | | | | |
| 5 | 9 | 3 | 17 | $ - |
| FRENTES POR LOCALIDAD | | | | |


**RELACION DE PAGOS EFECTUADOS**


| No ACTA OBRA | VALOR | No ACTA OBRA | VALOR | No ACTA INTERVENTORIA | VALOR | No ACTA INTERVENTORIA | VALOR | No ACTA INTERVENTORIA | VALOR | No ACTA INTERVENTORIA | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 12 | | 1 | | 12 | | 23 | | 34 | |
| 2 | | 13 | | 2 | | 13 | | 24 | | 35 | |
| 3 | | 14 | | 3 | | 14 | | 25 | | 36 | |
| 4 | | 15 | | 4 | | 15 | | 26 | | 37 | |
| 5 | | 16 | | 5 | | 16 | | 27 | | 38 | |
| 6 | | 17 | | 6 | | 17 | | 28 | | 39 | |
| 7 | | 18 | | 7 | | 18 | | 29 | | 40 | |
| 8 | | 19 | | 8 | | 19 | | 30 | | TOTAL INTERVENTORIA | |
| 9 | | 20 | | 9 | | 20 | | 31 | | | |
| 10 | | TOTAL OBRA | | 10 | | 21 | | 32 | | | |
| 11 | | $ - | | 11 | | 22 | | 33 | | $ - | |


**AVANCE GENERAL**

| AVANCE GENERAL | TECNICO | FINANCIERO | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| AVANCE | 42,36% | 0,00% | 67,30% |
| PROGRAMADO | 29,80% | | |
| ATRASO | 12,56% | EN EJECUCION | |
| FECHA APROBACION CRONOGRAMA | | | |

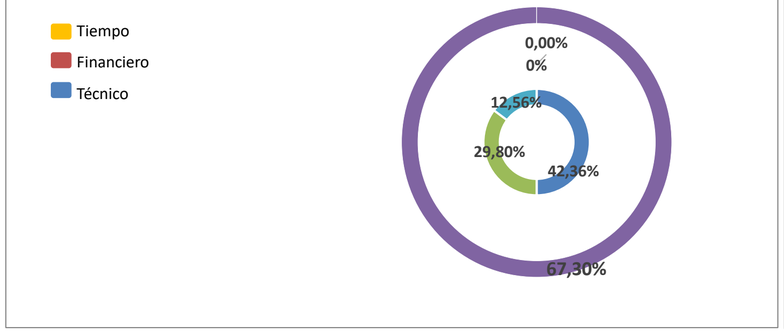

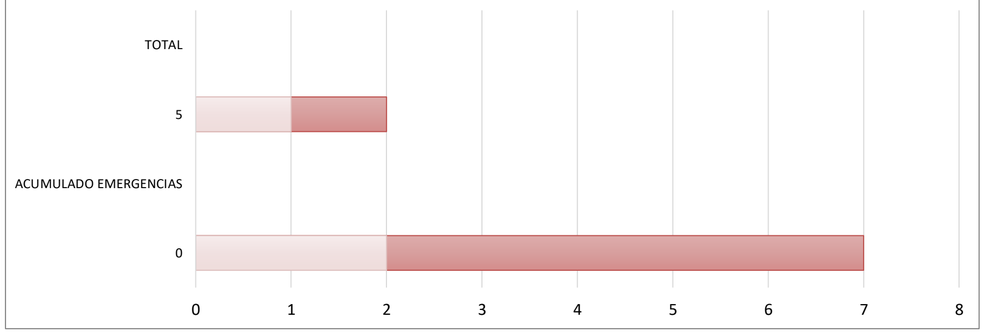
**OBSERVACIONES:**
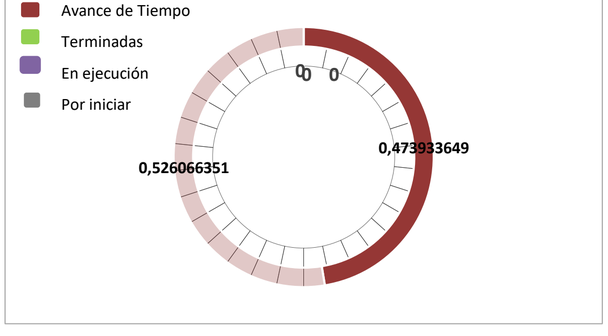
# INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA
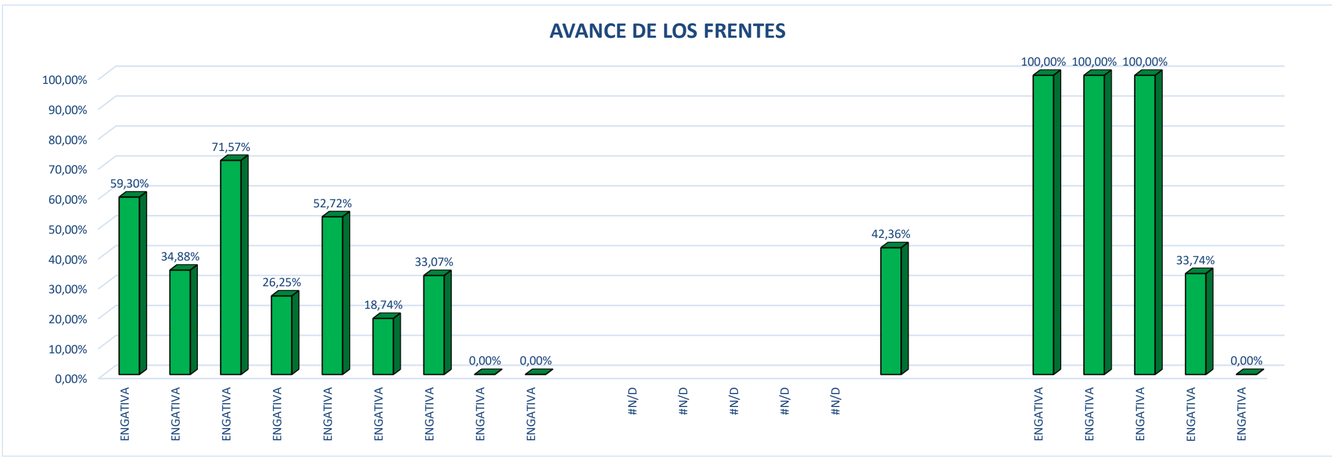
## CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

**INFORME SEMANAL No 20** **LOTE COP No 18**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

**SEMANA No.** 20 (Consecutivo) **DEL** 16/2/2026 (dd-mm-aa) **AL** 22/2/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 142 dias

**CONTRATO DE INTERVENTORIA No** CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

## ANEXO 1 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO RODOLFO LLINAS - SEDE B




Instalación de concreto ciclopeo - Muro de cerramiento perimetral.




Instalación de concreto ciclopeo - Muro de cerramiento perimetral.




Instalación de concreto ciclopeo - Muro de cerramiento perimetral.




Preparación de concreto ciclopeo.




Instalación de acero para construcción de muro de cerramiento perimetral.




Instalación de acero para construcción de muro de cerramiento perimetral.

PROBINTEC S.A.S

# INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

## CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

**INFORME SEMANAL No 20** **LOTE COP No 18**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

**SEMANA No.** 20 (Consecutivo) **DEL** 16/2/2026 (dd-mm-aa) **AL** 22/2/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 142 dias

**CONTRATO DE INTERVENTORIA No** CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

## ANEXO 1 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO RODOLFO LLINAS - SEDE B




Instalación de acero para construcción de muro de cerramiento perimetral.




Instalación de acero para construcción de muro de cerramiento perimetral.




Instalación de acero para construcción de muro de cerramiento perimetral.




Construcción de mediacaña impermeabilizada - cubierta shut de basuras.




Construcción de mediacaña impermeabilizada - cubierta shut de basuras.




Construcción de mediacaña impermeabilizada - cubierta shut de basuras.

# INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

## CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

**INFORME SEMANAL No 20** **LOTE COP No 18**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


**SEMANA No.** 20 (Consecutivo) **DEL** 16/2/2026 (dd-mm-aa) **AL** 22/2/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 142 dias

**CONTRATO DE INTERVENTORIA No** CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

## ANEXO 2 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO SIMÓN BOLIVAR - SEDE A




Estucado de perfiles de vanos

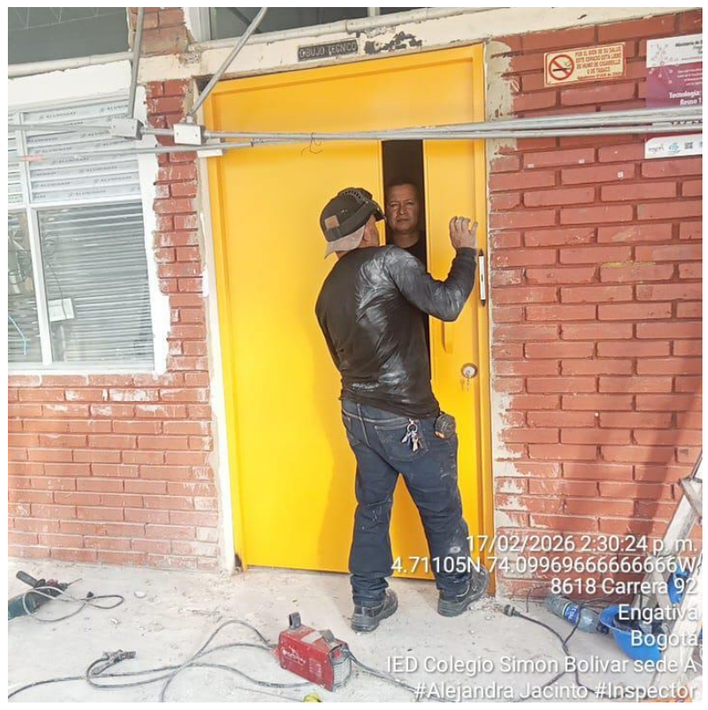


Instalacion de puertas




Instalacion de tuberia para red electrica




Visita OTIC




Resane de bordes con mortero entre muro y cubierta




Aplicación de revestimiento en las 4 paredes

# INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

## CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

**INFORME SEMANAL No 20** **LOTE COP No 18**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

**SEMANA No.** 20 (Consecutivo) **DEL** 16/2/2026 (dd-mm-aa) **AL** 22/2/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 142 dias

**CONTRATO DE INTERVENTORIA No** CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

## ANEXO 2 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO SIMÓN BOLIVAR - SEDE A




Instalacion de Platinas del siguiente salon para Cubierta




Aplicación de pintura en vanos

# INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

## CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

**INFORME SEMANAL No 20** **LOTE COP No 18**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

**SEMANA No.** 20 (Consecutivo) **DEL** 16/2/2026 (dd-mm-aa) **AL** 22/2/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 142 dias

**CONTRATO DE INTERVENTORIA No** CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

## ANEXO 3 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO MAGDALENA ORTEGA - SEDE A




Excavación - Zona shut de basuras.




Excavación - Zona shut de basuras.




Excavación - Zona shut de basuras.




Recolección de material resultante de excavación.




Recolección de material resultante de excavación.

Soporte de encofrado de descansos en escaleras.

# INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

## CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

**INFORME SEMANAL No 20** **LOTE COP No 18**

PROBINTEC S.A.S


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


**SEMANA No.** 20 (Consecutivo) **DEL** 16/2/2026 (dd-mm-aa) **AL** 22/2/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 142 dias

**CONTRATO DE INTERVENTORIA No** CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

## ANEXO 4 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO JORGE GAITAN CORTES - SEDE B

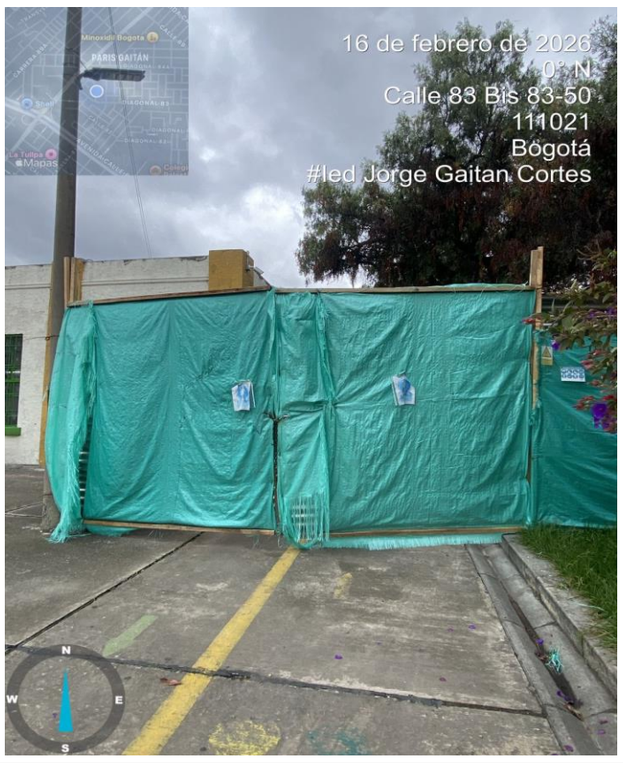



Vista general del espacio sin actividades ejecutadas en la obra.

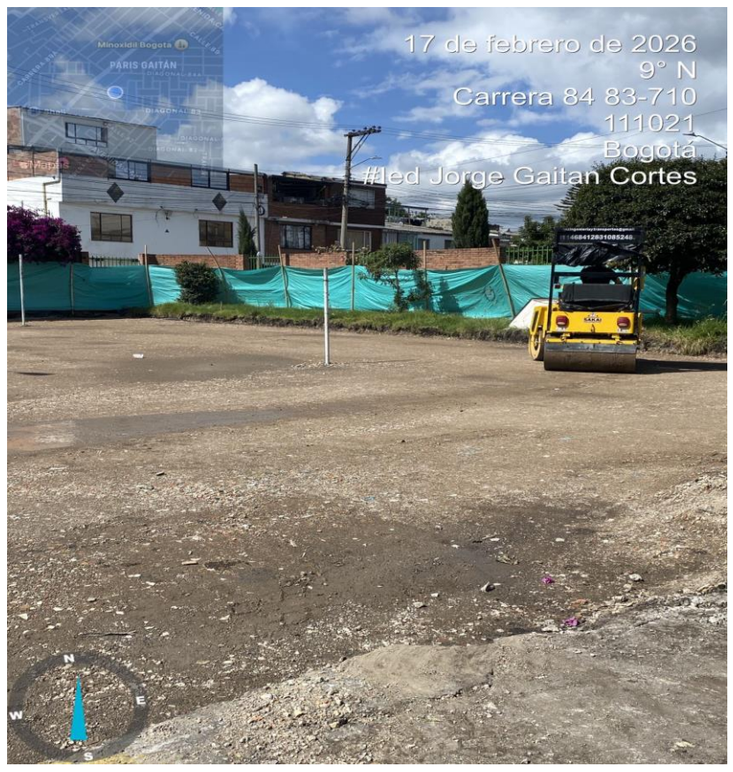


Compactación de la base, asegurando uniformidad y estabilidad para la siguiente capa de obra




Vista general de la obra.

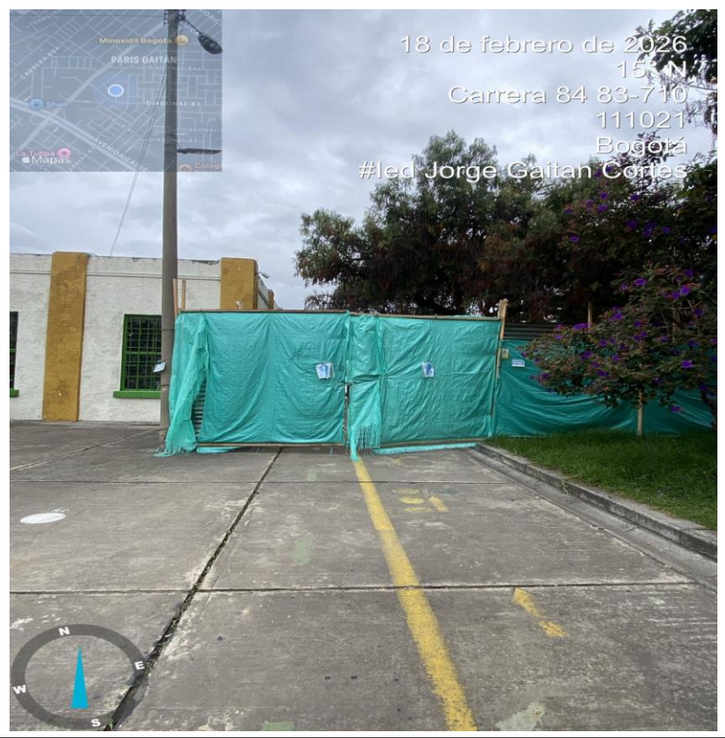


Vista general del espacio sin actividades ejecutadas en la obra.




Pruebas de densidad.




Vista general de la obra.

# INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

## CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

**INFORME SEMANAL No 20** **LOTE COP No 18**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

**SEMANA No.** 20 (Consecutivo) **DEL** 16/2/2026 (dd-mm-aa) **AL** 22/2/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 142 dias

**CONTRATO DE INTERVENTORIA No** CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

## ANEXO 5 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO TABORA - SEDE A




Retiro de material proveniente de la excavación.




Retiro de material proveniente de la excavación.




Retiro de material proveniente de la excavación.




Excavación manual en material común.




Extensión de recebo - Zona urbanismo lateral izquierdo de la cancha.




Extensión de recebo - Zona urbanismo lateral izquierdo de la cancha.

# INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

## CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

**INFORME SEMANAL No 20** **LOTE COP No 18**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


**SEMANA No.** 20 (Consecutivo) **DEL** 16/2/2026 (dd-mm-aa) **AL** 22/2/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 142 dias

**CONTRATO DE INTERVENTORIA No** CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

## ANEXO 5 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO TABORA - SEDE A




Compactación de recebo - Zona urbanismo lateral izquierdo de la cancha.

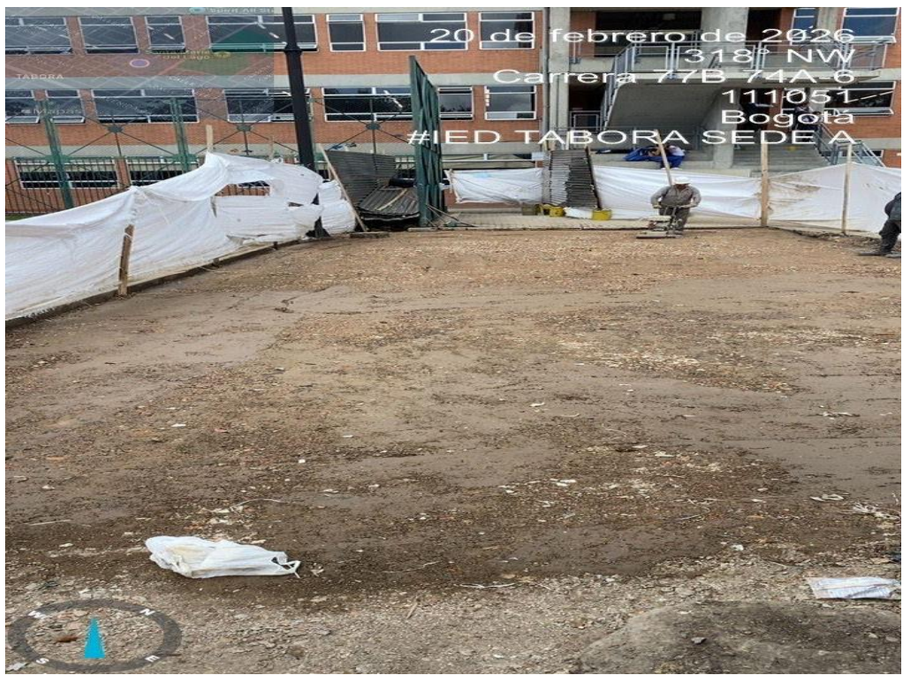


Compactación de recebo - Zona urbanismo lateral izquierdo de la cancha.




Compactación de recebo - Zona urbanismo lateral izquierdo de la cancha.




Apique de verificación de niveles en las capas compactadas - Zona urbanismo lateral izquierdo de la cancha.




Apique de verificación de niveles en las capas compactadas - Zona urbanismo lateral izquierdo de la cancha.




Apique de verificación de niveles en las capas compactadas - Zona urbanismo lateral izquierdo de la cancha.

# INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

## CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

**INFORME SEMANAL No 20** **LOTE COP No 18**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

**SEMANA No.** 20 (Consecutivo) **DEL** 16/2/2026 (dd-mm-aa) **AL** 22/2/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 142 dias

**CONTRATO DE INTERVENTORIA No** CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

## ANEXO 6 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE A




Reparación de filos en las divisiones en mampostería - Zona baños




Reparación de filos en las divisiones en mampostería - Zona baños




Instalación de enchape - Zona baños.




Reparación de filos en las divisiones en mampostería - Zona baños




Reparación de filos en las divisiones en mampostería - Zona baños




Reparación de filos en las divisiones en mampostería - Zona baños

# INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

## CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

**INFORME SEMANAL No 20** **LOTE COP No 18**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

**SEMANA No.** 20 (Consecutivo) **DEL** 16/2/2026 (dd-mm-aa) **AL** 22/2/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 142 dias

**CONTRATO DE INTERVENTORIA No** CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

**ANEXO 6 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE A**




Instalación de enchape - Zona baños.




Reparación de filos en las divisiones en mampostería - Zona baños



Instalación de enchape - Zona baños.



Instalación de enchape - Zona baños.

# INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

## CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

**INFORME SEMANAL No 20** **LOTE COP No 18**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

**SEMANA No.** 20 (Consecutivo) **DEL** 16/2/2026 (dd-mm-aa) **AL** 22/2/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 142 dias

**CONTRATO DE INTERVENTORIA No** CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

## ANEXO 7 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE C




Excavación de sendero de circulación hacia el shut de basuras.




Excavación de sendero de circulación hacia el shut de basuras.




Excavación de sendero de circulación hacia el shut de basuras.




Excavación de sendero de circulación hacia el shut de basuras.




Recolección de material proveniente de la excavación.




Excavación de sendero de circulación hacia el shut de basuras.

# INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

## CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

**INFORME SEMANAL No 20** **LOTE COP No 18**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

**SEMANA No.** 20 (Consecutivo) **DEL** 16/2/2026 (dd-mm-aa) **AL** 22/2/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 142 dias

**CONTRATO DE INTERVENTORIA No** CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

## ANEXO 7 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE C




Expansión de vanos de ventana - Zona aula de música.




Expansión de vanos de ventana - Zona aula de música.




Expansión de vanos de ventana - Zona aula de música.




Expansión de vanos de ventana - Zona aula de música.




Expansión de vanos de ventana - Zona aula de música.




Expansión de vanos de ventana - Zona aula de música.

PROBINTEC S.A.S

# INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

## CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

**INFORME SEMANAL No 20** **LOTE COP No 18**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

**SEMANA No.** 20 (Consecutivo) **DEL** 16/2/2026 (dd-mm-aa) **AL** 22/2/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 142 dias

**CONTRATO DE INTERVENTORIA No** CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

## ANEXO 8 REGISTRO FOTOGRÁFICO DIRECCIÓN LOCAL DE ENGATIVA (DILE)




Resanes y remates - Zona baños de hombres.




Resanes y remates - Zona baños de hombres.




Resanes y remates - Zona baños de hombres.




Resanes y remates - Zona baños de hombres.




Resanes y remates - Zona baños de hombres.




Resanes y remates - Zona baños de hombres.

PROBINTEC S.A.S

# INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

## CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

**INFORME SEMANAL No 20** **LOTE COP No 18**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

**SEMANA No.** 20 (Consecutivo) **DEL** 16/2/2026 (dd-mm-aa) **AL** 22/2/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 142 dias

**CONTRATO DE INTERVENTORIA No** CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

## ANEXO 8 REGISTRO FOTOGRÁFICO DIRECCIÓN LOCAL DE ENGATIVA (DILE)




Resanes y remates - Zona baños de hombres.




Resanes y remates - Zona baños de hombres.




Resanes y remates - Zona baños de hombres.




Resanes y remates - Zona baños de hombres.

# INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

## CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

**INFORME SEMANAL No 20** **LOTE COP No 18**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

**SEMANA No.** 20 (Consecutivo) **DEL** 16/2/2026 (dd-mm-aa) **AL** 22/2/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 142 dias

**CONTRATO DE INTERVENTORIA No** CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

## ANEXO 9 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO TORQUIGUA - SEDE A



Excavación - Zona de sendero de circulación.



Excavación - Zona de sendero de circulación.



Excavación - Zona shut de basuras.




Instalación de tubería de 4".




Relleno en recebo compactado - Zona de sendero de circulación.




Relleno en recebo compactado - Zona de sendero de circulación.

# INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

## CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

**INFORME SEMANAL No 20** **LOTE COP No 18**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

**SEMANA No.** 20 (Consecutivo) **DEL** 16/2/2026 (dd-mm-aa) **AL** 22/2/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 142 dias

**CONTRATO DE INTERVENTORIA No** CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

## ANEXO 9 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO TORQUIGUA - SEDE A




Relleno en recebo compactado - Zona shut de basuras.



Relleno en recebo compactado - Zona donde quedará el tanque de almacenamiento.
