PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8155350

INFORME SEMANAL No 22 **LOTE COP No 18**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 22 (Consecutivo) **DEL** 2/3/2026 (dd-mm-aa) **AL** 8/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 156 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORÍA


Contratista:	CONSORCIO EDUCATIVO 25		**Interventoria**	PROBINTEC S.A.S	
RL del consorcio	DAYANNA ALEJANDRA BAQUERO AGUILAR		**RL de Interventoría**	SANDRA STELLA MORENO BUITRAGO	
Contrato No.	CO1.PCCNTR.8155350		**Contrato No.**	CO1.PCCNTR.8168931	
Objeto	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS LOTE 18"		**Objeto**	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No. 6	
VALOR DEL CONTRATO		**$ 2.551.797.666,00**	**Valor Inicial:**	$	796.278.928,00
AIU	33,17%	$ 846.431.285,81	**Valor Adicional No. 1 del 26 de diciembre de 2026:**	$	139.026.666,00
COSTO DIRECTO		$ 1.705.366.380,19	**Valor Total del Contrato:**	**$**	**935.305.594,00**
OFERTADO		**$ 2.322.865.467,00**			
EMERGENCIAS		$ 100.000.000,00			
VALOR PARCIAL CON EMERGENCIAS		**$ 2.422.865.467,00**			
DIFERENCIA PARA EMERGENCIAS		$ 128.932.199,00			
Valor Parcial (Inicial + Emergencias)		**$ 228.932.199,00**			
Valor adicional No. 1:		**$ 645.761.648,00**			
Valor inicial No. 1 emergencias:		$ 200.000.000,00			
Valor adicional No.1 Obras Contractuales:		**$ 445.761.648,00**			
VALOR TOTAL MÁS EMERGENCIA		**$ 3.197.559.314,00**			
VALOR TOTAL EMERGENCIAS		**$ 428.932.199,00**			
VALOR TOTAL PARA OBRAS CONTRACTUALES		**$ 2.768.627.115,00**			
Plazo Inicial:	SIETE (7) MESES		**Plazo Inicial:**	SIETE (7) MESES	
Fecha de Iniciación:	3/10/2025		**Fecha de Iniciación:**	3/10/2025	
Fecha de Vencimiento:	2/05/2026		**Fecha de Vencimiento:**	2/05/2026	

AVANCE DEL CONTRATO

	SEMANAL	ACUMULADO			ACUMULADO
Obra programada (%)	4,64%	31,86%	Obra Física Ejecutada (%)	1,47%	49,99%
Valor de la Obra programada:	$ 128.424.746,00	$ 882.045.047,00	Valor de la Obra Ejecutada:	$ 40.738.370,00	$ 1.384.076.247,00

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONTRATO

	SEGUIMIENTO EN % DE LA PROGRAMACIÓN DE OBRA		
	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	27,22%	48,52%	**18,13%**
Durante el periodo	4,64%	1,47%	
Acumulado actual	31,86%	49,99%	

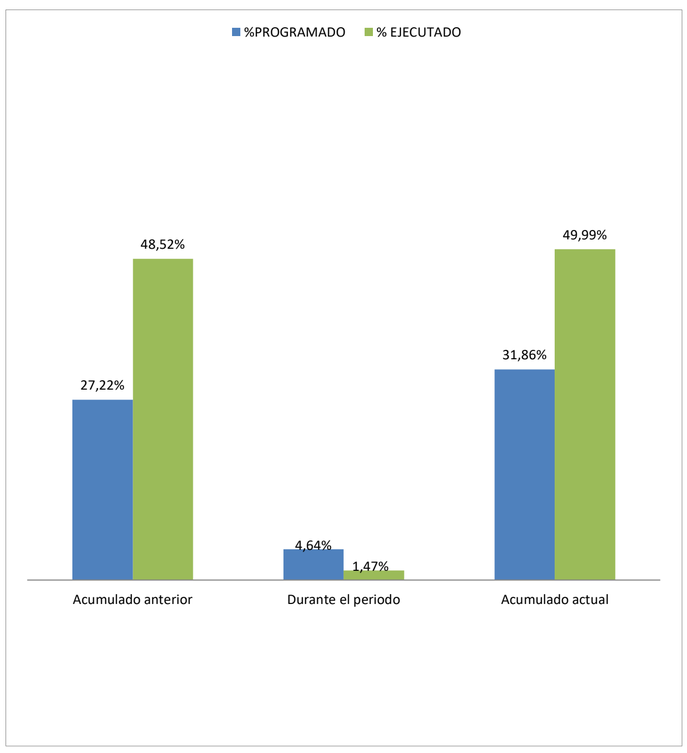

OBRAS CONTRATO INICIAL

CPF	LOCALIDAD	COLEGIO	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA	%PROGRAMADO ACUMULADO	%EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA ACUMULADO
1078	ENGATIVA	RODOLFO LLINAS - SEDE B	5,10%	3,75%	-1,35%	32,55%	66,35%	33,80%
1052	ENGATIVA	SIMÓN BOLIVAR - SEDE A	4,50%	1,81%	-2,69%	44,29%	39,02%	-5,27%
1066	ENGATIVA	MAGDALENA ORTEGA - SEDE A	5,83%	0,61%	-5,22%	21,80%	85,81%	64,01%
1019	ENGATIVA	JORGE GAITAN CORTES - SEDE B	4,30%	0,00%	-4,30%	20,99%	24,67%	3,68%
1001	ENGATIVA	TABORA - SEDE A	6,09%	1,29%	-4,80%	49,90%	63,72%	13,82%
1061	ENGATIVA	INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE A	0,22%	1,42%	1,20%	14,93%	21,84%	6,91%
1008	ENGATIVA	INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE C	6,43%	1,42%	-5,01%	38,56%	48,52%	9,96%
TOTAL PROMEDIO FRENTES CONTRACTUALES			**4,64%**	**1,47%**	**-3,17%**	**31,86%**	**49,99%**	**18,13%**
FRENTES ADICIONALES SEGÚN ADICIONAL No. 001								
1021	ENGATIVA	ANTONIO VILLAVICENCIO - SEDE B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1079	ENGATIVA	ABEL RODRIGUEZ CESPEDES - SEDE A	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL PROMEDIO FRENTES ADICIONALES			**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

EMERGENCIAS Y/O OBRAS PRIORITARIAS

CPF	LOCALIDAD	COLEGIO	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA	VALOR TOTAL	VALOR CONTRATO	DIREFENCIA
1020	ENGATIVA	DIRECCIÓN LOCAL DE ENGATIVA	0,00%	53,65%	53,65%	$ 38.193.723,00		
1057	ENGATIVA	LA PALESTINA - SEDE B	100,00%	100,00%	0,00%	$ 1.273.680,00		
1061	ENGATIVA	INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE A	100,00%	100,00%	0,00%	$ 9.076.835,00		
1001	ENGATIVA	TABORA - SEDE A	100,00%	100,00%	0,00%	$ 2.913.171,00		
1025	ENGATIVA	MIGUEL ANTONIO CARO - SEDE A	0,00%	52,00%	52,00%	$ 20.073.306,12		
1073	ENGATIVA	TORQUIGUA - SEDE A	0,00%	30,44%	30,44%	$ 150.294.734,00		
1061	ENGATIVA	INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE A	100,00%	100,00%	0,00%	$ 43.248.915,00		
1080	ENGATIVA	LUICILA RUBIO DE LAVERDE	100,00%	100,00%	0,00%	$ 5.658.379,98		
1049	ENGATIVA	JUAN DEL CORRAL - SEDE A	0,00%	0,00%	0,00%			
			55,56%	70,68%		$ 270.732.744,10	$ 428.932.199,00	**$ 158.199.454,90**

NOTA:

AVANCE FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO + ADICIONAL No. 001		**$ 3.197.559.314,00**
VALOR PARCIAL 1	$ 401.759.103,00	
VALOR PARCIAL 2	$ 392.605.364,00	
VALOR PARCIAL 3	$ 419.080.656,00	
TOTAL VALOR FACTURADO	$ 1.213.445.123,00	
SUMAS IGUALES	$ 1.984.114.191,00	$ 1.984.114.191,00

INDICADOR FINANCIERO	VALOR FACTURADO	VALOR PAGADO
	$ 1.213.445.123,00	$ 794.364.467,00

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

INDICADOR TECNICO	% AVANCE PROGRAMADO	% DE AVANCE EJECUTADO	% RETRASO - / % ADELANDO +
	31,86%	**49,99%**	**18,13%**

INDICADOR TIEMPO	DIAS	RETRASO
	156	**28,29**

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA **CO1.PCCNTR.8155350**

INFORME SEMANAL No 22 **LOTE COP No 18**


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 22 (Consecutivo) **DEL** 2/3/2026 (dd-mm-aa) **AL** 8/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 156 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

CURVA S

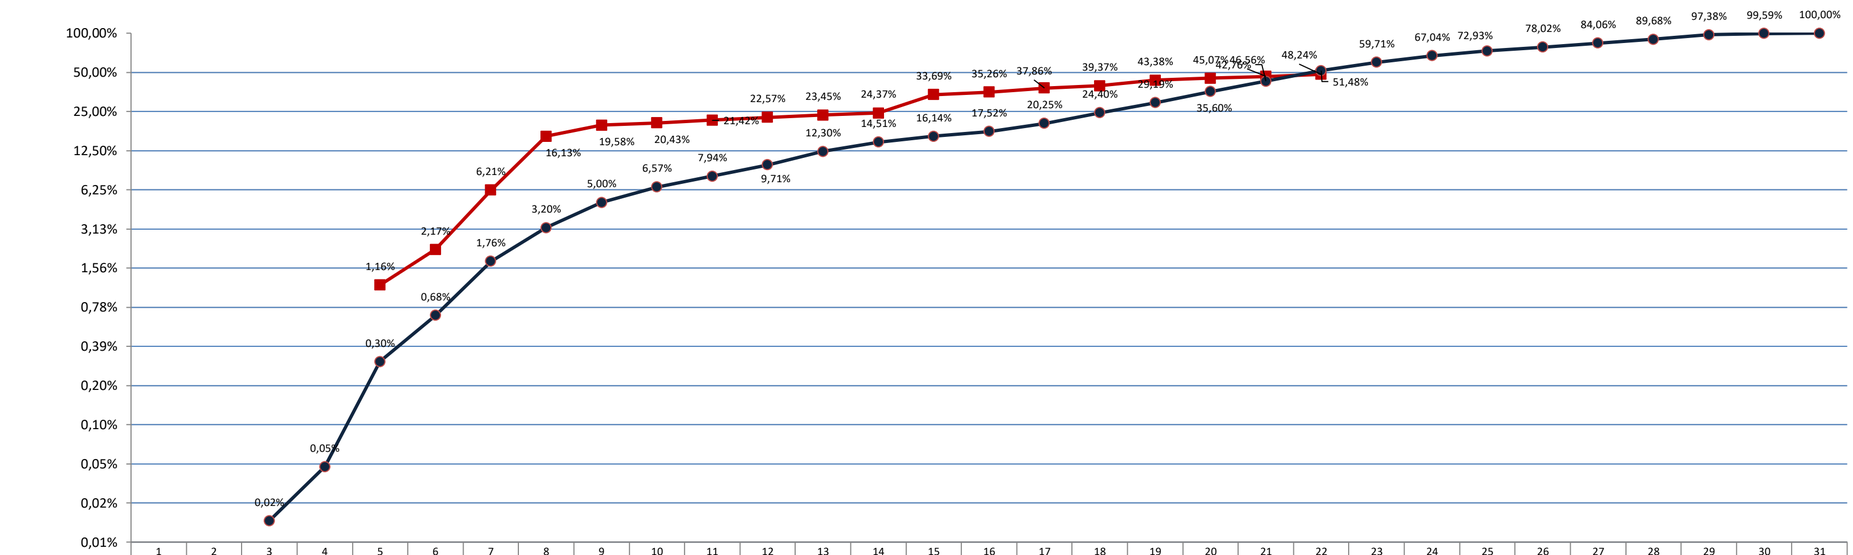

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
REAL EJECUTADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,16%	2,17%	6,21%	16,13%	19,58%	20,43%	21,42%	22,57%	23,45%	24,37%	33,69%	35,26%	37,86%	39,37%	43,38%	45,07%	46,56%	48,24%									
PROGRAMADO	0,00%	0,00%	0,02%	0,05%	0,30%	0,68%	1,76%	3,20%	5,00%	6,57%	7,94%	9,71%	12,30%	14,51%	16,14%	17,52%	20,25%	24,40%	29,19%	35,60%	42,76%	51,48%	59,71%	67,04%	72,93%	78,02%	84,06%	89,68%	97,38%	99,59%	100,00%

SEGUIMIENTO AL FLUJO DE OBRA EMITIDO POR EL CONTRATISTA - RESPONDE A LA PROGRAMACION DE OBRA

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO RODOLFO LLINAS - SEDE B (ANEXO 1 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: El contratista de obra realizó actividades de desmonte y suministro e instalación de puerta persiana en el shut de basura. Adicional realizó actividades de conformación de formaleta para la columna del muro de cerramiento.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se realizó la instalación de las puertas en el cuarto de almacenamiento. Para la ejecución de estos trabajos se verificó que el personal contara con la debida autorización de ingreso al proyecto y que utilizara correctamente los EPP, tales como casco de seguridad, con el fin de prevenir riesgos asociados a golpes. Adicionalmente, se recomienda al contratista reforzar las jornadas de orden y aseo en el área de trabajo, con el propósito de mantener condiciones seguras, evitar la acumulación de materiales y reducir riesgos de caídas al mismo nivel o incidentes durante el desarrollo de las actividades.

3. Aspectos de calidad: Las actividades contractuales se han venido desarrollando conforme a los parámetros de calidad, estipulados dentro de las especificaciones técnicas.

4. Programación de obra: Según el cronograma de obra presentado por el contratista, en esta sede se presenta un sobre avance del 33,80%. Se realizó el reajuste del porcentaje programado y ejecutado en base a los balances presentados por el contratista de obra.

4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A.

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.

5. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, cuentan con el cerramiento perimetral y señalización adecuado, se evidencia RCD acopiado cerca a los individuos arbóreos sin la protección adecuada, se recomienda jornada de orden y aseo, disponer adecuadamente el material a un centro de aprovechamiento.

6. Generales: Dentro del periodo establecido se lleva a cabo al comité de obra No. 11 solicitado por la supervisión, este cuenta con la participación del Supervisor del contrato, la Interventoría y el Contratista de Obra (se levanta Acta de reunión). Se le solicita al contratista de obra entregar los documentos modificados (cronograma de obra, flujo de inversión) respecto al adicional que tuvo el contrato de obra y los balances presentados.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO SIMÓN BOLIVAR - SEDE A (ANEXO 2 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Durante la presente semana se realizaron las siguientes actividades:
Pañete.
Excavacion para cimentacion de aula modular
Instalacion de perfileria para la cubierta.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenciaron actividades de resane y pañete de vigas, pintura en perfilería metálica, instalación de perfilería metálica y excavación para la cimentación del salón modular. Para el desarrollo de estas labores se validó la presencia de 6 trabajadores debidamente aprobados para el ingreso al proyecto. Desde el componente de SST, se verificó que el personal realizara las actividades con el uso adecuado de los EPP requeridos para cada tarea. Asimismo, se efectuó la inspección de los andamios utilizados en las actividades en altura, con el fin de confirmar que se encontraran en condiciones seguras para su uso y así prevenir riesgos asociados a caídas o golpes durante la ejecución de los trabajos.

3. Aspectos de calidad: Las actividades contractuales se han venido desarrollando conforme a los parámetros de calidad, estipulados dentro de las especificaciones técnicas.

4. Programación de obra: El contratista de obra cuenta con un avance por debajo de lo programado del 5.27%.

4.1 Actividades programadas NO ejecutadas:
16.1.18SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm y 40 mm. PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACIÓN CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEGÚN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).
15.1.12SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÓDULO AULA ESCOLAR TIPO (S/DISEÑO - VER FICHA TECNICA Y PLANOS), EN ESTRUCTURA METÁLICA DESMONTABLE, ENSAMBLADA POR MEDIOS MECÁNICOS (TORNILLERÍA, PERNOS), CUBIERTA A UN AGUA Y ÁREA DE CIRCULACIÓN. INCLUYE PUERTAS, VENTANAS, ACABADOS, ILUMINACIÓN, REDES ELÉCTRICAS E HIDROSANITARIAS. AREA 52 M2

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.

5. Ambiental: se realizó recorrido en el frente, se reportó que se usa los puntos ecológicos dentro de la institución, se evidencia mezcla de concreto en batea metálica, se encuentra material debidamente acopiado y alejados de sumideros, las zonas verdes se encuentran libres, se recomienda garantizar jornadas de orden y aseo periódicamente e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental.

6. Generales: Dentro del periodo establecido se lleva a cabo al comité de obra No. 11 solicitado por la supervisión, este cuenta con la participación del Supervisor del contrato, la Interventoría y el Contratista de Obra (se levanta Acta de reunión). Se le solicita al contratista de obra entregar los documentos modificados (cronograma de obra, flujo de inversión) respecto al adicional que tuvo el contrato de obra y los balances presentados. Debido a temas de recursos , se establece que para la sede, no se ejecutarán las actividades contempladas para el tanque.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA **CO1.PCCNTR.8155350**

INFORME SEMANAL No 22 **LOTE COP No 18**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 22 (Consecutivo) **DEL** 2/3/2026 (dd-mm-aa) **AL** 8/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 156 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO MAGDALENA ORTEGA - SEDE A (ANEXO 3 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: El contratista realizó actividades de suministro e instalación de relleno en recebo debidamente compactado para las zona del sendero y shut de basuras.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenciaron actividades de instalación de geotextil en la zona destinada para el cuarto de almacenamiento de basuras y en el área correspondiente al sendero peatonal. Para el desarrollo de estas labores se verificó que el personal realizara las actividades con el uso adecuado de los EPP requeridos para la tarea. Así mismo, se validó el diligenciamiento del ATS, con el fin de identificar los riesgos asociados a la actividad y establecer las medidas de control necesarias para prevenir incidentes o accidentes durante la ejecución de los trabajos.

3. Aspectos de calidad: Las actividades contractuales se han venido desarrollando conforme a los parámetros de calidad, estipulados dentro de las especificaciones técnicas.

4. Programación de obra: El contratista de obra cuenta con un avance por encima de lo programdo del 64,01%, Se realizó el reajuste del porcentaje programado y ejecutado en base a los balances presentados por el contratista de obra.

4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A.

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.

5. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, cuenta con cerramiento en buen estado y señalizado, se realizó la disposición de los residuos de excavación total al igual se recomendo al contratista jornadas de orden y aseo periodicamente, e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA).

6. Generales: Dentro del periodo establecido se lleva a cabo al comité de obra No. 11 solicitado por la supervisión, este cuenta con la participación del Supervisor del contrato, la Interventoría y el Contratista de Obra (se levanta Acta de reunión). Se le solicita al contratista de obra entregar los documentos modificados (cronograma de obra, flujo de inversión) respecto al adicional que tuvo el contrato de obra y los balances presentados.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO JORGE GAITAN CORTES - SEDE B (ANEXO 4 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Durante la presente semana se realizaron las siguientes actividades:
- Se realizo ensayo de cono de arena para verificación de densidad del material compactado y mantenimiento a puerta de la institucion.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado no se evidenció la presencia de personal laborando en el frente de obra, por lo cual no se registró ejecución de actividades ni desarrollo de trabajos asociados al proyecto durante dicho periodo. Desde el componente de SST, no se presentaron novedades relacionadas con incidentes, accidentes o condiciones inseguras.

3. Aspectos de calidad: Las actividades contractuales se han venido desarrollando conforme a los parámetros de calidad, estipulados dentro de las especificaciones técnicas. Se realizo ensayo de densidades con cono de arena.

4. Programación de obra: El contratista de obra cuenta con un avance positivo de 3.68%

4.1. Actividades programadas no ejecutadas: N/A.

5. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, se evidencia el cerramiento adecuado, se evidencia presencia de material de construcción en las zonas verdes por lo que si se llega a evidenciar algún daño se debe recuperar esta área, se recomendó al contratista realizar una jornada de aseo e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA).

6. Generales: Dentro del periodo establecido se lleva a cabo al comité de obra No. 11 solicitado por la supervisión, este cuenta con la participación del Supervisor del contrato, la Interventoría y el Contratista de Obra (se levanta Acta de reunión). Se le solicita al contratista de obra entregar los documentos modificados (cronograma de obra, flujo de inversión) respecto al adicional que tuvo el contrato de obra y los balances presentados. Durante una reunión sostenida entre la supervisión, la interventoría y el contratista, se acordó ajustar la solución de bombeo de la cancha con el fin de evitar la ejecución de obras adicionales a futuro y garantizar el adecuado funcionamiento del sistema. Adicionalmente, se solicita la elaboración del NP correspondiente para el mantenimiento de la puerta.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO TABORA - SEDE A (ANEXO 5 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: El contratista realizó actividades de trasiego de material (arena) a la zona donde se instalará el adoquin. Adicional se realizó la instalación de dicho material en sitio.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenciaron actividades de compactación de material en el área de trabajo. Durante la verificación en campo se observó el desarrollo de las labores por parte del personal, por lo cual desde el componente de SST se recomienda reforzar el uso adecuado de los EPP, especialmente el casco de seguridad, con el fin de prevenir riesgos asociados a golpes o caída de objetos durante la ejecución de la actividad.

3. Aspectos de calidad: Las actividades contractuales se han venido desarrollando conforme a los parámetros de calidad, estipulados dentro de las especificaciones técnicas.

4. Programación de obra: Según el cronograma de obra presentado por el contratista, en esta sede se presenta un sobre avance del 13,82%. Se realizó el reajuste del porcentaje programado y ejecutado en base a los balances presentados por el contratista de obra.

4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A.

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.

5. Ambiental: El contratista se encuentra en mal estado, se encuentra materiales y RCD en el frente acopiados adecuadamente, las zonas verdes se van a endurecer en el frente, por lo que se recomienda garantizar jornadas de orden y aseo periódicamente, disponer adecuadamente e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA).

6. Generales: Dentro del periodo establecido se lleva a cabo al comité de obra No. 11 solicitado por la supervisión, este cuenta con la participación del Supervisor del contrato, la Interventoría y el Contratista de Obra (se levanta Acta de reunión). Se le solicita al contratista de obra entregar los documentos modificados (cronograma de obra, flujo de inversión) respecto al adicional que tuvo el contrato de obra y los balances presentados.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE A (ANEXO 6 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: El contratista de obra realizó actividades de obra tales como: desmonte e instalación de enchape, preparación de filos en las divisiones en mampostería de los baños y aplicación de pintura blanca en la estructura de la cubierta del baño.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenciaron actividades de enchape y pañete en los muros exteriores del baño. Desde el componente de SST, se recomienda reforzar el uso adecuado de los EPP, especialmente el casco de seguridad, durante la ejecución de las labores. Así mismo, se recomienda garantizar el correcto diligenciamiento del ATS y mantener un cerramiento perimetral adecuado en el área de intervención, con el fin de prevenir el ingreso de personal no autorizado y mitigar riesgos durante el desarrollo de las actividades. De igual manera, se verificó la realización de inspecciones a los andamios utilizados, con el propósito de asegurar que estos se encuentren en condiciones seguras para su uso.

3. Aspectos de calidad: Las actividades contractuales se han venido desarrollando conforme a los parámetros de calidad, estipulados dentro de las especificaciones técnicas.

4. Programación de obra: Según el cronograma de obra presentado por el contratista, en esta sede se presenta un sobre avance del 6,91%. Se realizó el reajuste del porcentaje programado y ejecutado en base a los balances presentados por el contratista de obra.

4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A.

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.

5. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, cuentan con el cerramiento perimetral adecuado con señalización, se reporta RCD en lonas y acopiados, se evidencia los sanitarios anteriormente desmontados sin cubrir por lo que se recomienda al contratista realizar una jornada de orden y aseo e implementar todas las especificaciones respectivas al Plan de Manejo Ambiental (PMA) Teniendo en cuenta el radicado N.2025EE296403 y el acta de visita MAR-20250903-00735 se da autorización a la tala de 16 individuos arbóreos en esta institución, ya se realizó la tala a quince (15) árboles en la zona pero queda uno (1) para terminar esta actividad por lo que se recomienda realizar el procedimiento adecuadamente, disponer todos los residuos vegetales y al finalizar la actividad silvicultural presentar el informe final con registro fotográfico al igual se debe complementar el anexo PM04-PR29-F8 para presentar ante la secretaria distrital de ambiente (SDA).

6. Generales: Dentro del periodo establecido se lleva a cabo al comité de obra No. 11 solicitado por la supervisión, este cuenta con la participación del Supervisor del contrato, la Interventoría y el Contratista de Obra (se levanta Acta de reunión). Se le solicita al contratista de obra entregar los documentos modificados (cronograma de obra, flujo de inversión) respecto al adicional que tuvo el contrato de obra y los balances presentados.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8155350

INFORME SEMANAL No 22 **LOTE COP No 18**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 22 (Consecutivo) **DEL** 2/3/2026 (dd-mm-aa) **AL** 8/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 156 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE C (ANEXO 7 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: El contratista de obra realizó actividades de suministro e instalación de geotextil, recebo debidamente compactado y concreto de 3000 psi en la zona dura de transición que conduce al shut de basuras. Adicional realizó labores de pañete en los filos de las ventanas del aula de música.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenciaron actividades correspondientes a la instalación de malla y fundida de concreto para la construcción del sendero peatonal. Así mismo, se realizó seguimiento a las labores de fundida de viguetas y columnetas en las ventanas del aula de música, y se ejecutó la instalación de geotextil en el área del sendero peatonal. Desde el componente de SST, se verificó que el personal desarrollara las actividades con el uso adecuado de los EPP. De igual manera, se validó el diligenciamiento del ATS, con el fin de identificar los riesgos asociados a las labores y establecer las medidas preventivas necesarias para el desarrollo seguro de las actividades.

3. Aspectos de calidad: Las actividades contractuales se han venido desarrollando conforme a los parámetros de calidad, estipulados dentro de las especificaciones técnicas.

4. Programación de obra: Según el cronograma de obra presentado por el contratista, en esta sede se presenta un sobre avance del 9,96%. Se realizó el reajuste del porcentaje programado y ejecutado en base a los balances presentados por el contratista de obra.

4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A.

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.

5. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, se evidencia cerramiento en buen estado con señalización, al igual, se encuentra gran cantidad de RCD, material, tejas de asbesto embaladas debidamente acopiadas, pero se recomienda hacer la disposicion de los RESPEL en el menor tiempo posible, disponer adecuadamente los RCD teniendo en cuenta las especificaciones técnicas y ambientales.

6. Generales: Dentro del periodo establecido se lleva a cabo al comité de obra No. 11 solicitado por la supervisión, este cuenta con la participación del Supervisor del contrato, la Interventoría y el Contratista de Obra (se levanta Acta de reunión). Se le solicita al contratista de obra entregar los documentos modificados (cronograma de obra, flujo de inversión) respecto al adicional que tuvo el contrato de obra y los balances presentados.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA DIRECCIÓN LOCAL DE ENGATIVA (DILE) (ANEXO 8 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: El contratista de obra realizó actividades de aplicación de estuco y pintura en el muro exterior de la rampa.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se inició la actividad de aplicación de estuco y pintura en el muro exterior de la rampa de acceso a los baños. Desde el componente de SST, se verificó el ATS previo al desarrollo de las labores. Así mismo, se validó que el personal ejecutara las actividades con el uso adecuado de los EPP. De igual manera, se realizó la inspección de herramientas manuales utilizadas en la actividad, con el fin de verificar que se encontraran en condiciones seguras para su uso y prevenir la ocurrencia de incidentes o accidentes durante la ejecución de los trabajos.

3. Aspectos de calidad: Las actividades contractuales se han venido desarrollando conforme a los parámetros de calidad, estipulados dentro de las especificaciones técnicas.

4. Programación de obra: Las actividades se vienen desarrollando sin ningún tipo de inconveniente, cumpliendo con el plan de trabajo expuesto ante la interventoría.

5. Ambiental: Se realiza recorrido en el frente, anteriormente se reportó la disposición adecuada de todos los residuos en el frente por lo que se recomienda garantizar una jornada de orden y aseo para la entrega de este frente.

6. Generales: Dentro del periodo establecido se lleva a cabo al comité de obra No. 11 solicitado por la supervisión, este cuenta con la participación del Supervisor del contrato, la Interventoría y el Contratista de Obra (se levanta Acta de reunión). Se le solicita al contratista de obra entregar los documentos modificados (cronograma de obra, flujo de inversión) respecto al adicional que tuvo el contrato de obra y los balances presentados.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO TORQUIGUA - SEDE A (ANEXO 9 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: El contratista de obra realizó actividades de suministro e instalación de concreto de 3000 psi en todas las áreas de circulación intervenidas en el alcance de la necesidad, en la rampa de acceso al shut y área donde va el shut de basuras. Adicional realizó la construcción de bordillo en la rampa de acceso al shut de basuras.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenciaron actividades correspondientes a la construcción del bordillo en sitio para la rampa de acceso al cuarto de almacenamiento. Desde el SST, se verificó que el personal desarrollara las labores con el uso adecuado de EPP, con el fin de prevenir riesgos asociados a la manipulación de materiales, herramientas y ejecución de actividades de obra civil.

3. Aspectos de calidad: Las actividades contractuales se han venido desarrollando conforme a los parámetros de calidad, estipulados dentro de las especificaciones técnicas.

4. Programación de obra: Las actividades se vienen desarrollando sin ningún tipo de inconveniente, cumpliendo con el plan de trabajo expuesto ante la interventoría.

5. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, se evidencia el cerramiento adecuado, se realiza mezcla de concreto en batea metálica, el material se encuentra acopiado adecuadamente, pero en zona verde, por lo que si se llega a evidenciar algún daño se debe recuperar esta área, se recomienda implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental.

6. Generales: Dentro del periodo establecido se lleva a cabo al comité de obra No. 11 solicitado por la supervisión, este cuenta con la participación del Supervisor del contrato, la Interventoría y el Contratista de Obra (se levanta Acta de reunión). Se le solicita al contratista de obra entregar los documentos modificados (cronograma de obra, flujo de inversión) respecto al adicional que tuvo el contrato de obra y los balances presentados.

FIRMAS

ARQ. LORENA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
DIRECTORA DE INTERVENTORÍA

ING. CARLOS MAURICIO MONTENEGRO BAUTISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

ARQ. PAULA ANDREA MARTINEZ MORALES
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

ING. LUIS EMIRO BLANCO MORENO
APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

KATERIN CAROLINA NUÑEZ OSORIO
PROFESIONAL SST

ING.CHRISTIAN FELIPE RODRIGUEZ BELTRAN
ESPECIALISTA AMBIENTAL

ING.CHRISTIAN FABIAN BARRERA DONCEL
PROFESIONAL COSTOS Y PRESUPUESTOS

FECHA:	9/03/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	INFORME APOYO A LA SUPERVISION
DIAS RESTANTES	62 Días		GRUPO 18
ESTADO GENERAL DEL PROYECTO			
CORTE DEL INFORME:	CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO EDUCATIVO 25	
1 de marzo de 2026	CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:	PROBINTEC S.A.S	

FECHAS		
DATOS:	INTERVENTORIA	OBRA
CONTRATO	CO1.PCCNTR.8168931	CO1.PCCNTR.8155350
INICIO	3 de octubre de 2025	3 de octubre de 2025
TERMINACION INICIAL	2 de mayo de 2026	2 de mayo de 2026
TERMINACION FINAL	2 de mayo de 2026	2 de mayo de 2026

PLAZOS EN DIAS		
ETAPA:	INTERVENTORIA	OBRA
INICIAL	211	211
SUSPENSIONES		
PRÓRROGAS		
TOTAL	211	211

VALOR CONTRATO		
ETAPA:	INTERVENTORIA	OBRA
INICIAL	$ 796.278.928	$ 2.551.797.666
ADICIÓNES	$ 139.026.666,00	$ 645.761.648,00
TOTAL	$ 935.305.594,00	$ 3.197.559.314,00

MODIFICACIONESDEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

MOD No	FECHA DE LA MODIFICACION	VALOR ADICION	PRORROGA (DIAS)	OTRO ASPECTO
1	26/12/2025	$ 139.026.666,00		
2				
3				
4				

MODIFICACIONESDEL CONTRATO DE OBRA

MOD No	FECHA DE LA MODIFICACION	VALOR ADICION	PRORROGA		OTRO ASPECTO
1	12/12/2025	$ 645.761.648,00			
2					
3					
4					

POLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORIA — GARANTE: SEGUROS DEL ESTADO

POLIZA	CUMPLIMIENTO DESDE	CUMPLIMIENTO HASTA	CALIDAD DEL SERVICIO DESDE	CALIDAD DEL SERVICIO HASTA	SALARIOS Y PRESTACIONES DESDE	SALARIOS Y PRESTACIONES HASTA
400 47 994000110040	19 9 2025	3 1 2027	3 5 2026	3 5 2031	19 9 2025	3 5 2029

POLIZAS CONTRATO DE OBRA — COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

POLIZA	CUMPLIMIENTO DESDE	CUMPLIMIENTO HASTA	SALARIOS Y PRESTACIONES DESDE	SALARIOS Y PRESTACIONES HASTA	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA DESDE	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA HASTA	POLIZA	RESPONSABILIDAD CIVIL DESDE	RESPONSABILIDAD CIVIL HASTA
CV-100054114	8 9 2025	3 1 2027	8 9 2025	2 5 2029	10 4 2026	2 5 2029	CV – 100015150	8 9 2025	10 4 2026

CPF	COLEGIO	LOCALIDAD	SEDE	NOMBRE SEDE	AVANCE ANTERIOR	AVANCE ACTUAL (18/01/2026)		PROGR %	EJECUTADO VS PROG	VlrFRENTE APROBADO	VlrFRENTE A ESTE PERIODO	FECHA INICIO CRONOGRAMA	FECHA FIN CRONOGRAMA	jul-2025	jul-2025	ago-2025	ago-2025	sep-2025	sep-2025	oct-2025	oct-2025	nov-2025	nov-2025	dic-2025	dic-2025	ene-2026	ene-2026	feb-2026	feb-2026	mar-2026	mar-2026
1078	COLEGIO RODOLFO	ENGATIVA	B	BOCHICA COMPARTIR	62,60%	66,35%		32,55%		$ 183.643.811,00		21/11/2025	27/03/2026																		
1052	COLEGIO SIMON BOLIVAR	ENGATIVA	A	SIMON BOLIVAR	37,21%	39,02%		44,29%		$ 763.383.605,00		15/10/2025	24/04/2026																		
1066	COLEGIO MAGDALENA	ENGATIVA	A	MAGDALENA ORTEGA DE NARIÑO	85,20%	85,81%		21,80%		$ 296.018.724,00		10/11/2025	30/04/2026																		
1019	COLEGIO JORGE GAITAN	ENGATIVA	B	LA ESPAÑOLA	31,03%	24,67%		20,99%		$ 344.591.831,00		9/12/2025	23/04/2026																		
1001	COLEGIO TABORA (IED)	ENGATIVA	A	TABORA	62,43%	63,72%		49,90%		$ 158.125.362,00		21/11/2025	27/03/2026																		
1061	COLEGIO INSTITUTO	ENGATIVA	A	FRANCISCO JOSE DE CALDAS	20,42%	21,84%		14,93%		$ 397.128.110,00		6/11/2025	25/04/2026																		
1008	COLEGIO INSTITUTO	ENGATIVA	C	CLEMENCIA DE CAYCEDO	47,10%	48,52%		38,56%		$ 295.736.072,00		21/11/2025	26/03/2026																		
1021	COLEGIO ANTONIO VILLAVICENCIO (IED)	ENGATIVA	B	LOS LAURELES		0,00%		0,00%		$ 90.000.000																					
1079	COLEGIO ABEL	ENGATIVA	A	ABEL RODRÍGUEZ CÉSPEDES		0,00%		0%		$ 100.000.000																					
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																											
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																											
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																											
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																											
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																											
TOTAL FRENTES DE OBRA						49,99%		24,78%		$ 2.628.627.515,00	$ -																				
EMERGENCIAS ATENDIDAS DURANTE EL PERIODO																															
1057	COLEGIO LA PALESTINA (IED)	ENGATIVA	B	LA PALESTINA		100,00%		100,00%		$ 1.273.680,00																					
1061	TECNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSE DE	ENGATIVA	A	FRANCISCO JOSE DE CALDAS		100,00%		100,00%		$ 9.076.835,00																					
1001	COLEGIO TABORA (IED)	ENGATIVA	A	TABORA		100,00%		100,00%		$ 2.913.171,00																					
1020	DIRECCIÓN LOCAL DE ENGATIVA	ENGATIVA	#N/D	DIRECCIÓN LOCAL DE ENGATIVA		33,74%		0,00%		$ 38.193.723																					
1025	COLEGIO MIGUEL	ENGATIVA	A	MIGUEL ANTONIO CARO		0,00%		0,00%		$ 20.073.306																					
1073	COLEGIO TORQUIGUA (IED)	ENGATIVA	A	COLEGIO TORQUIGUA (IED)		3,26%		0,00%		$ 150.294.734																					
1061	COLEGIO INSTITUTO	ENGATIVA	A	FRANCISCO JOSE DE CALDAS		100,00%		100,00%		$ 43.248.915																					
1080	COLEGIO LUCILA RUBIO	ENGATIVA	A	LUCILA RUBIO DE LAVERDE		100,00%		100%		$ 5.658.380																					
1049	COLEGIO INSTITUTO	ENGATIVA	A	JUAN DEL CORRAL		0%		0%																							
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																											
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																											
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																											
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																											
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																											
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																											
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																											
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																											
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																											
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																											
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																											
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																											
TOTAL FRENTES DE OBRA						59,67%		55,56%		$ 270.732.744,10	$ -																				

ACUMULADO FRENTES DE OBRA


TERMINADAS	EN EJECUCION	POR INICIAR	TOTAL	VALOR
0	7	2	9	$ -
ACUMULADO EMERGENCIAS				
5	2	2	9	$ -
TOTAL				
5	9	4	18	$ -
FRENTES POR LOCALIDAD				


RELACION DE PAGOS EFECTUADOS


No ACTA OBRA	VALOR	No ACTA OBRA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR
1		12		1		12		23		34	
2		13		2		13		24		35	
3		14		3		14		25		36	
4		15		4		15		26		37	
5		16		5		16		27		38	
6		17		6		17		28		39	
7		18		7		18		29		40	
8		19		8		19		30		TOTAL INTERVENTORIA	
9		20		9		20		31			
10		TOTAL OBRA		10		21		32			
11		$ -		11		22		33		$ -	


AVANCE GENERAL

AVANCE	TECNICO	FINANCIERO	TIEMPO
	49,99%	0,00%	70,62%
PROGRAMADO	24,78%		
ATRASO	25,21%	EN EJECUCION	
FECHA APROBACION CRONOGRAMA			

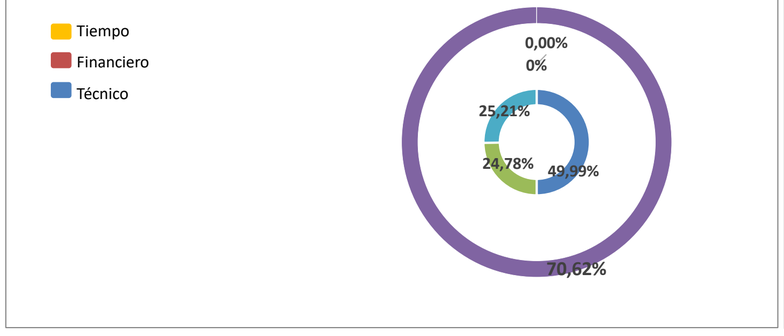

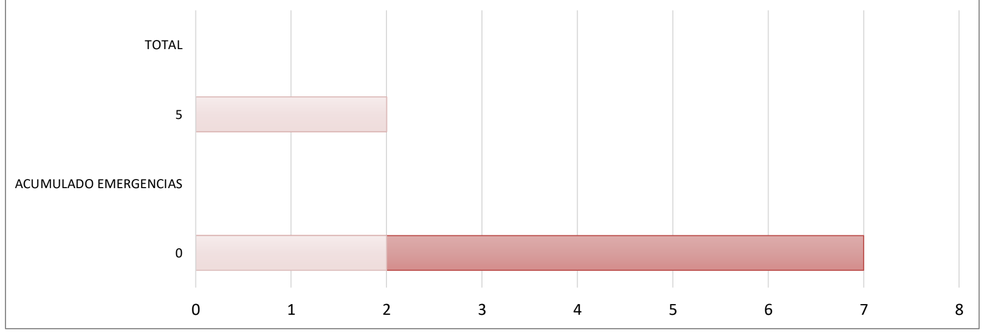

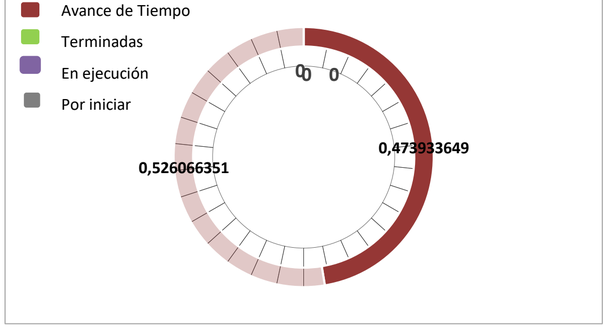

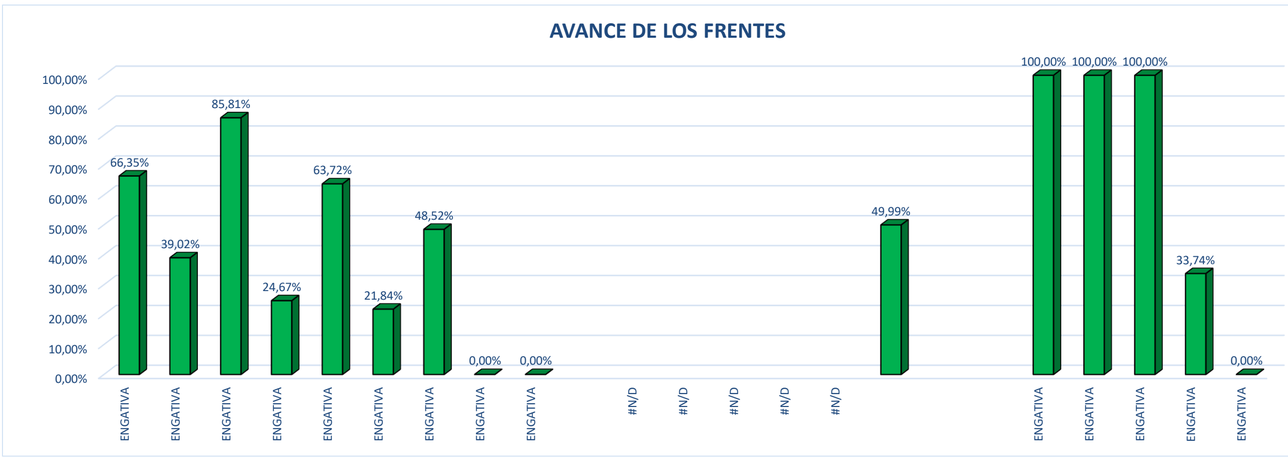

OBSERVACIONES:

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 22 **LOTE COP No 18**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


SEMANA No. 22 (Consecutivo) **DEL** 2/3/2026 (dd-mm-aa) **AL** 8/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 156 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ANEXO 1 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO RODOLFO LLINAS - SEDE B



Instalación de formaleta para columna en muro de cerramiento perimetral

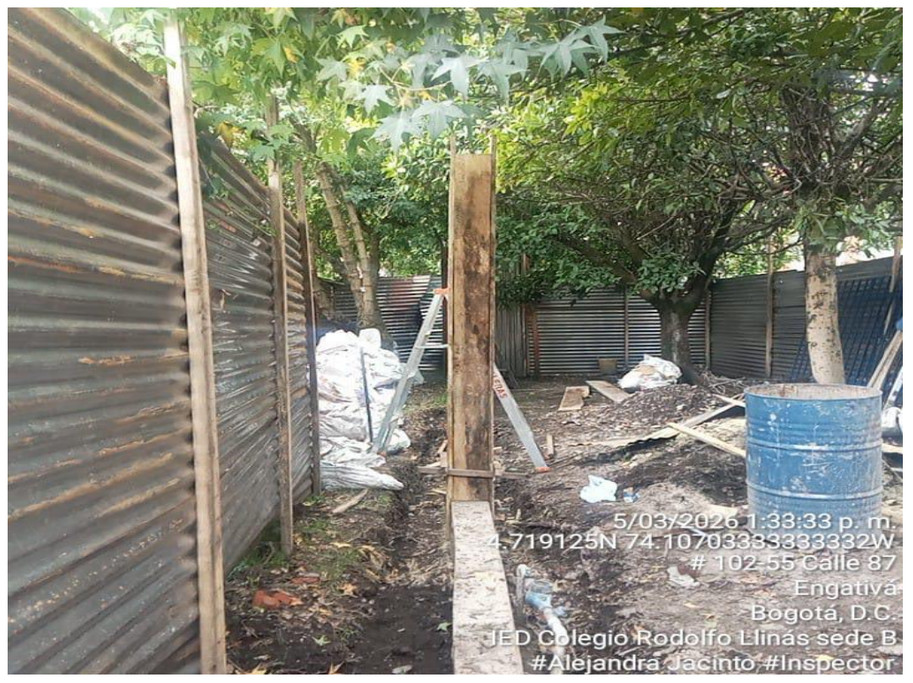


Instalación de formaleta para columna en muro de cerramiento perimetral




Instalación de formaleta para columna en muro de cerramiento perimetral



Suministro e instalación de puerta persiana - shut de basuras.

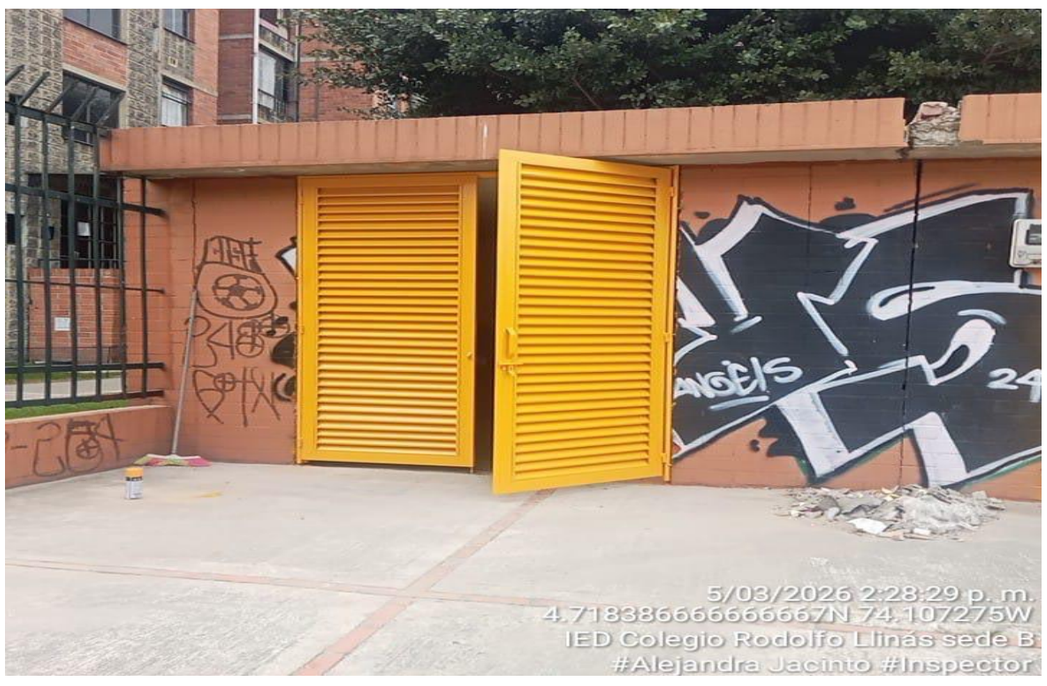

Suministro e instalación de puerta persiana - shut de basuras.

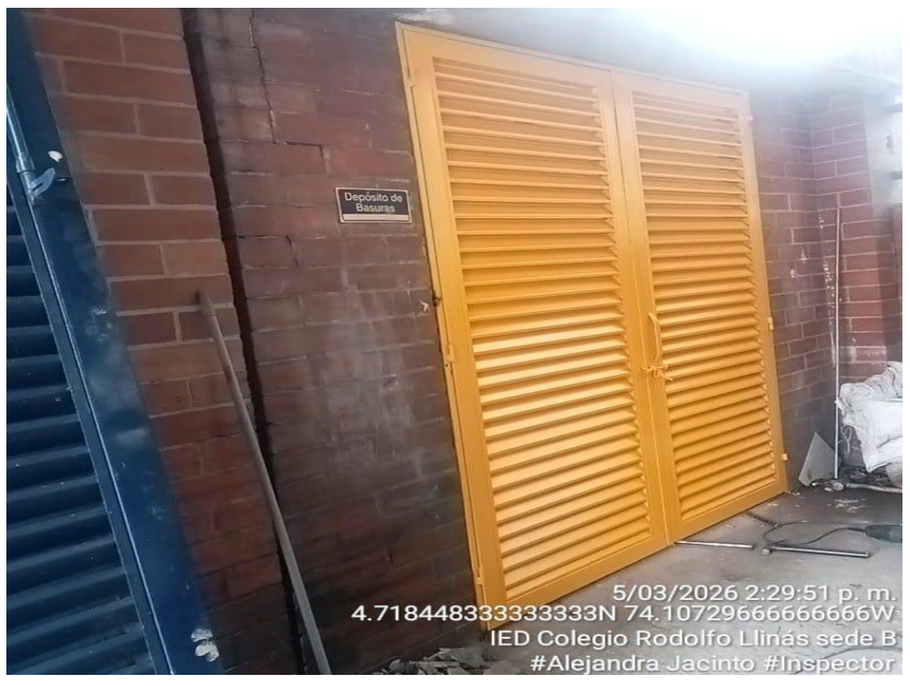

Suministro e instalación de puerta persiana - shut de basuras.

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 22 **LOTE COP No 18**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 22 (Consecutivo) **DEL** 2/3/2026 (dd-mm-aa) **AL** 8/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 156 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ANEXO 2 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO SIMÓN BOLIVAR - SEDE A



Mezcla para pañete de muro



Pañete de antepecho en muro de fachada



Pañete de filos de columnas



Aplicación de pintura para perfileria de cubierta



Instalacion de platinas



Instalacion de perfileria metalica

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 22 **LOTE COP No 18**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 22 (Consecutivo) **DEL** 2/3/2026 (dd-mm-aa) **AL** 8/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 156 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ANEXO 2 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO SIMÓN BOLIVAR - SEDE A



Replanteo en el terreno para salon moadular



Excavacion para cimentacion

Estucado de vigas

Pintura muros

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 22 **LOTE COP No 18**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 22 (Consecutivo) **DEL** 2/3/2026 (dd-mm-aa) **AL** 8/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 156 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ANEXO 3 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO MAGDALENA ORTEGA - SEDE A



Retiro de material proveniente de la excavación.



Retiro de material proveniente de la excavación.



Instalación de geotextil - Zona shut de basuras.



Instalación de geotextil - Sendero peatonal.



Instalación de geotextil - Sendero peatonal.



Instalación de geotextil - Sendero peatonal.

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 22 **LOTE COP No 18**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 22 (Consecutivo) **DEL** 2/3/2026 (dd-mm-aa) **AL** 8/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 156 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ANEXO 3 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO MAGDALENA ORTEGA - SEDE A



Instalación de recebo debidamente compactado - Sendero peatonal.



Instalación de recebo debidamente compactado - Sendero peatonal.



Instalación de recebo debidamente compactado - Sendero peatonal.



Instalación de recebo debidamente compactado - Sendero peatonal.

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 22 **LOTE COP No 18**

PROBINTEC S.A.S


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 22 (Consecutivo) **DEL** 2/3/2026 (dd-mm-aa) **AL** 8/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 156 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18


ANEXO 4 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO JORGE GAITAN CORTES - SEDE B

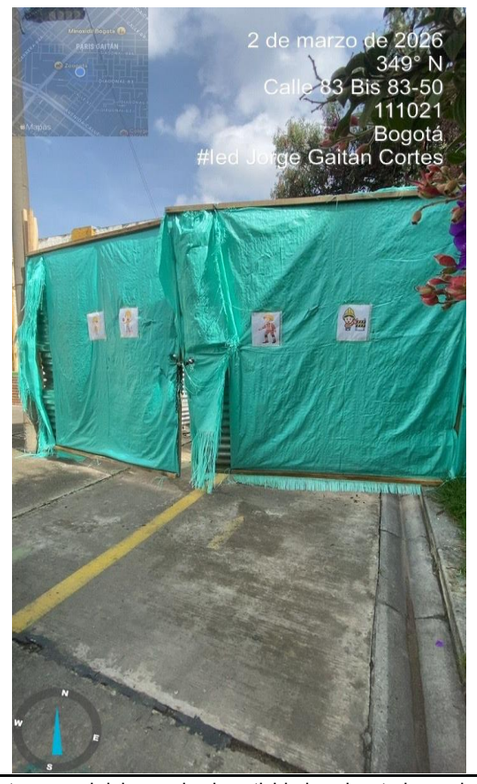


Vista general del espacio sin actividades ejecutadas en la obra.



Vista general del espacio sin actividades ejecutadas en la obra.

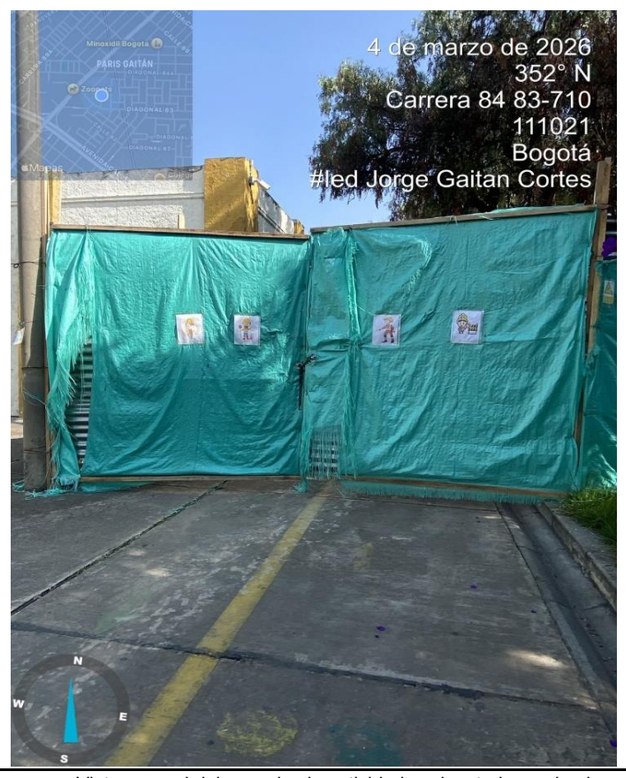

Vista general del espacio sin actividades ejecutadas en la obra.

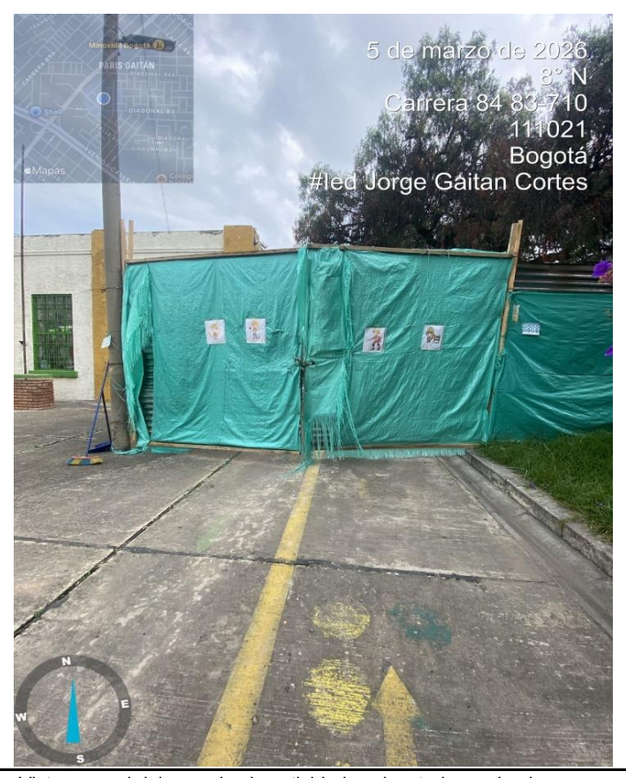

Vista general del espacio sin actividades ejecutadas en la obra.

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 22 **LOTE COP No 18**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 22 (Consecutivo) **DEL** 2/3/2026 (dd-mm-aa) **AL** 8/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 156 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ANEXO 5 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO TABORA - SEDE A



Instalación de material - Zona lateral izquierda de la cancha.



Trasiego del material.



Instalación de material - Zona lateral izquierda de la cancha.



Instalación de material - Zona lateral izquierda de la cancha.



Instalación de material - Zona lateral izquierda de la cancha.



Instalación de material - Zona lateral izquierda de la cancha.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 22 **LOTE COP No 18**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


SEMANA No. 22 (Consecutivo) **DEL** 2/3/2026 (dd-mm-aa) **AL** 8/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 156 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ANEXO 5 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO TABORA - SEDE A



Instalación de material - Zona lateral izquierda de la cancha.

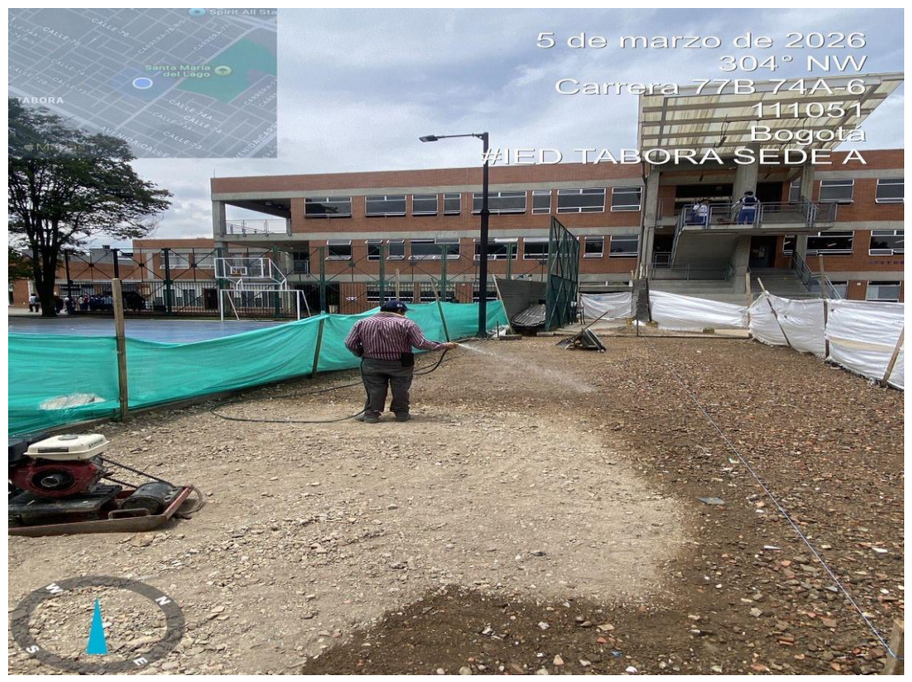

Instalación de material - Zona lateral izquierda de la cancha.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 22 **LOTE COP No 18**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 22 (Consecutivo) **DEL** 2/3/2026 (dd-mm-aa) **AL** 8/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 156 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ANEXO 6 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE A



Instalación de enchape - Zona baños.



Instalación de enchape - Zona baños.



Instalación de enchape - Zona baños.



Instalación de enchape - Zona baños.



Instalación de enchape - Zona baños.



Instalación de enchape - Zona baños.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 22 **LOTE COP No 18**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 22 (Consecutivo) **DEL** 2/3/2026 (dd-mm-aa) **AL** 8/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 156 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ANEXO 6 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE A



Instalación de pañete en muros exteriores - zona de baños.



Instalación de enchape - Zona baños.



Instalación de pañete en muros exteriores - zona de baños.



Instalación de enchape - Zona baños.



Instalación de pañete en muros exteriores - zona de baños.



Instalación de enchape - Zona baños.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 22 **LOTE COP No 18**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 22 (Consecutivo) **DEL** 2/3/2026 (dd-mm-aa) **AL** 8/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 156 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ANEXO 7 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE C



Instalación de acero de refuerzo para viguetas y columnetas de las ventanas - Aula de música.



Instalación de acero de refuerzo para viguetas y columnetas de las ventanas - Aula de música.



Instalación de bordillo A80 para sendero de circulación.



Instalación de acero de refuerzo para viguetas y columnetas de las ventanas - Aula de música.



Instalación de concreto de 3000 psi para viguetas y columnetas de las ventanas - Aula de música.



Instalación de geotextil - Zona sendero peatonal.

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 22 **LOTE COP No 18**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 22 (Consecutivo) **DEL** 2/3/2026 (dd-mm-aa) **AL** 8/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 156 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ANEXO 7 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE C



Instalación de concreto de 3000 psi para viguetas y columnetas de las ventanas - Aula de música.



Instalación de recebo debidamente compactado - Zona sendero peatonal.



Instalación de malla electrosoldada - Zona sendero peatonal.



Instalación de concreto de 3000 psi - Zona sendero peatonal.



Instalación de concreto de 3000 psi - Zona sendero peatonal.



Instalación de concreto de 3000 psi - Zona sendero peatonal.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 22 **LOTE COP No 18**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 22 (Consecutivo) **DEL** 2/3/2026 (dd-mm-aa) **AL** 8/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 156 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ANEXO 8 REGISTRO FOTOGRÁFICO DIRECCIÓN LOCAL DE ENGATIVA (DILE)



Resanes y aplicación de pintura en muros exteriores - Zona baños de hombres.



Resanes y aplicación de pintura en muros exteriores - Zona baños de hombres.



Resanes y aplicación de pintura en muros exteriores - Zona baños de hombres.



Resanes y aplicación de pintura en muros exteriores - Zona baños de hombres.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 22 | **LOTE COP No 18**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 22 (Consecutivo) **DEL** 2/3/2026 (dd-mm-aa) **AL** 8/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 156 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ANEXO 9 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO TORQUIGUA - SEDE A



Instalación de concreto para placa de contrapiso - Sendero peatonal.



Instalación de concreto para placa de contrapiso - Sendero peatonal.



Instalación de acero de refuerzo para bordillo - Rampa de acceso al shut



Instalación de acero de refuerzo para bordillo - Rampa de acceso al shut



Instalación de acero de refuerzo para bordillo - Rampa de acceso al shut



Instalación de concreto de 3000 psi para bordillo - Rampa de acceso al shut

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 22 | **LOTE COP No 18**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 22 (Consecutivo) **DEL** 2/3/2026 (dd-mm-aa) **AL** 8/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 156 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18


ANEXO 9 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO TORQUIGUA - SEDE A



Instalación de malla electrosoldada - Zona donde quedará el shut de basuras y rampa de acceso.



Instalación de concreto para placa de contrapiso - Sendero peatonal.

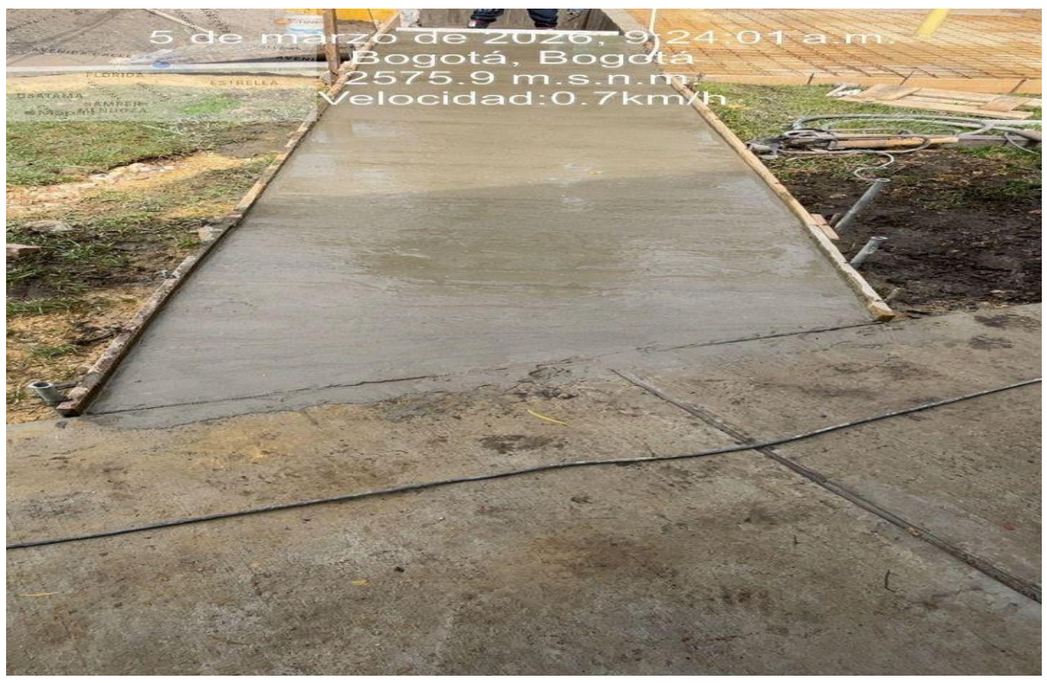

Instalación de concreto para placa de contrapiso - Sendero peatonal.



Instalación de concreto para placa de contrapiso - Sendero peatonal.



Jornada de aseo.



Instalación de concreto para placa de contrapiso - Zona shut de basuras y rampa de acceso.
