PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA **CO1.PCCNTR.8155350**

INFORME SEMANAL No 23 **LOTE COP No 18**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 23 (Consecutivo) **DEL** 9/3/2026 (dd-mm-aa) **AL** 15/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 163 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORÍA


Contratista:	CONSORCIO EDUCATIVO 25		**Interventoria**	PROBINTEC S.A.S	
RL del consorcio	DAYANNA ALEJANDRA BAQUERO AGUILAR		**RL de Interventoría**	SANDRA STELLA MORENO BUITRAGO	
Contrato No.	CO1.PCCNTR.8155350		**Contrato No.**	CO1.PCCNTR.8168931	
Objeto	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS LOTE 18"		**Objeto**	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No. 6	
VALOR DEL CONTRATO		**$ 2.551.797.666,00**	**Valor Inicial:**	$	796.278.928,00
AIU	33,17%	$ 846.431.285,81	**Valor Adicional No. 1 del 26 de diciembre de 2026:**	$	139.026.666,00
COSTO DIRECTO		$ 1.705.366.380,19	**Valor Total del Contrato:**	**$**	**935.305.594,00**
OFERTADO		**$ 2.322.865.467,00**			
EMERGENCIAS		$ 100.000.000,00			
VALOR PARCIAL CON EMERGENCIAS		**$ 2.422.865.467,00**			
DIFERENCIA PARA EMERGENCIAS		$ 128.932.199,00			
Valor Parcial (Inicial + Emergencias)		**$ 228.932.199,00**			
Valor adicional No. 1:		**$ 645.761.648,00**			
Valor inicial No. 1 emergencias:		$ 200.000.000,00			
Valor adicional No.1 Obras Contractuales:		**$ 445.761.648,00**			
VALOR TOTAL MÁS EMERGENCIA		**$ 3.197.559.314,00**			
VALOR TOTAL EMERGENCIAS		**$ 428.932.199,00**			
VALOR TOTAL PARA OBRAS CONTRACTUALES		**$ 2.768.627.115,00**			
Plazo Inicial:	SIETE (7) MESES		**Plazo Inicial:**	SIETE (7) MESES	
Fecha de Iniciación:	3/10/2025		**Fecha de Iniciación:**	3/10/2025	
Fecha de Vencimiento:	2/05/2026		**Fecha de Vencimiento:**	2/05/2026	

AVANCE DEL CONTRATO

	SEMANAL	ACUMULADO			ACUMULADO
Obra programada (%)	3,57%	37,25%	Obra Física Ejecutada (%)	2,00%	54,44%
Valor de la Obra programada:	$ 98.839.988,00	$ 1.031.313.600,00	Valor de la Obra Ejecutada:	$ 55.253.887,00	$ 1.507.121.946,00

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONTRATO

	SEGUIMIENTO EN % DE LA PROGRAMACIÓN DE OBRA		
	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	33,68%	52,44%	**17,19%**
Durante el periodo	3,57%	2,00%	
Acumulado actual	37,25%	54,44%	

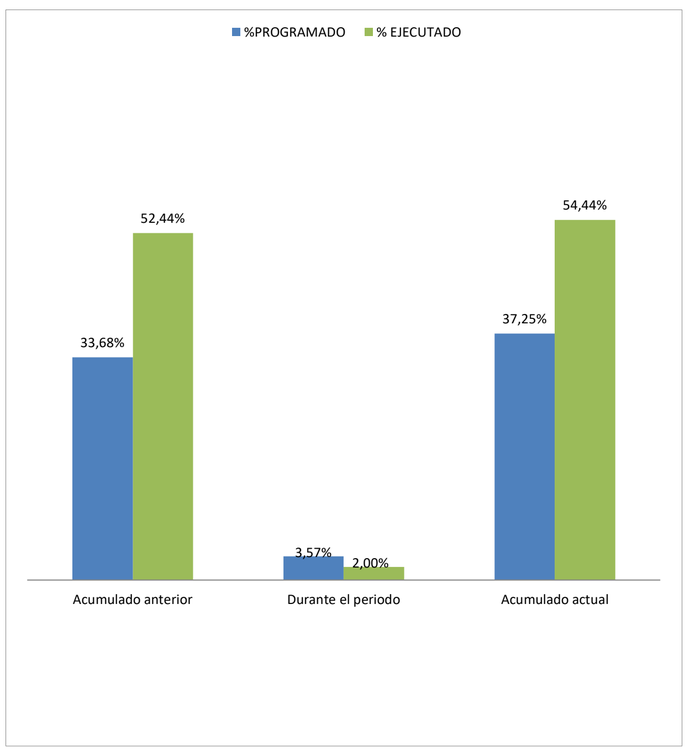

OBRAS CONTRATO INICIAL

CPF	LOCALIDAD	COLEGIO	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA	%PROGRAMADO ACUMULADO	%EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA ACUMULADO
1078	ENGATIVA	RODOLFO LLINAS - SEDE B	3,27%	0,43%	-2,84%	35,82%	66,78%	30,96%
1052	ENGATIVA	SIMÓN BOLIVAR - SEDE A	2,68%	8,54%	5,86%	53,80%	50,26%	-3,54%
1066	ENGATIVA	MAGDALENA ORTEGA - SEDE A	5,86%	0,16%	-5,70%	27,66%	85,97%	58,31%
1019	ENGATIVA	JORGE GAITAN CORTES - SEDE B	0,83%	1,37%	0,54%	27,74%	40,52%	12,78%
1001	ENGATIVA	TABORA - SEDE A	3,25%	2,36%	-0,89%	53,15%	66,08%	12,93%
1061	ENGATIVA	INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE A	2,31%	0,26%	-2,05%	17,24%	22,10%	4,86%
1008	ENGATIVA	INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE C	6,79%	0,85%	-5,94%	45,35%	49,37%	4,02%
TOTAL PROMEDIO FRENTES CONTRACTUALES			**3,57%**	**2,00%**	**-1,57%**	**37,25%**	**54,44%**	**17,19%**
FRENTES ADICIONALES SEGÚN ADICIONAL No. 001								
1021	ENGATIVA	ANTONIO VILLAVICENCIO - SEDE B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1079	ENGATIVA	ABEL RODRIGUEZ CESPEDES - SEDE A	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL PROMEDIO FRENTES ADICIONALES			**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

EMERGENCIAS Y/O OBRAS PRIORITARIAS

CPF	LOCALIDAD	COLEGIO	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA	VALOR TOTAL	VALOR CONTRATO	DIREFENCIA
1020	ENGATIVA	DIRECCIÓN LOCAL DE ENGATIVA	0,00%	53,65%	53,65%	$ 38.193.723,00		
1057	ENGATIVA	LA PALESTINA - SEDE B	100,00%	100,00%	0,00%	$ 1.273.680,00		
1061	ENGATIVA	INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE A	100,00%	100,00%	0,00%	$ 9.076.835,00		
1001	ENGATIVA	TABORA - SEDE A	100,00%	100,00%	0,00%	$ 2.913.171,00		
1025	ENGATIVA	MIGUEL ANTONIO CARO - SEDE A	0,00%	52,00%	52,00%	$ 20.073.306,12		
1073	ENGATIVA	TORQUIGUA - SEDE A	0,00%	30,44%	30,44%	$ 150.294.734,00		
1061	ENGATIVA	INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE A	100,00%	100,00%	0,00%	$ 43.248.915,00		
1080	ENGATIVA	LUICILA RUBIO DE LAVERDE	100,00%	100,00%	0,00%	$ 5.658.379,98		
1049	ENGATIVA	JUAN DEL CORRAL - SEDE A	0,00%	0,00%	0,00%			
			55,56%	70,68%		$ 270.732.744,10	$ 428.932.199,00	**$ 158.199.454,90**

NOTA:

AVANCE FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO + ADICIONAL No. 001		**$ 3.197.559.314,00**
VALOR PARCIAL 1	$ 401.759.103,00	
VALOR PARCIAL 2	$ 392.605.364,00	
VALOR PARCIAL 3	$ 419.080.656,00	
TOTAL VALOR FACTURADO	$ 1.213.445.123,00	
SUMAS IGUALES	$ 1.984.114.191,00	$ 1.984.114.191,00

INDICADOR FINANCIERO	VALOR FACTURADO	VALOR PAGADO
	$ 1.213.445.123,00	$ 794.364.467,00

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

INDICADOR TECNICO	% AVANCE PROGRAMADO	% DE AVANCE EJECUTADO	% RETRASO - / % ADELANDO +
	37,25%	**54,44%**	**17,19%**

INDICADOR TIEMPO	DIAS	RETRASO
	163	**28,01**

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8155350

INFORME SEMANAL No 23 **LOTE COP No 18**


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 23 (Consecutivo) **DEL** 9/3/2026 (dd-mm-aa) **AL** 15/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 163 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

CURVA S

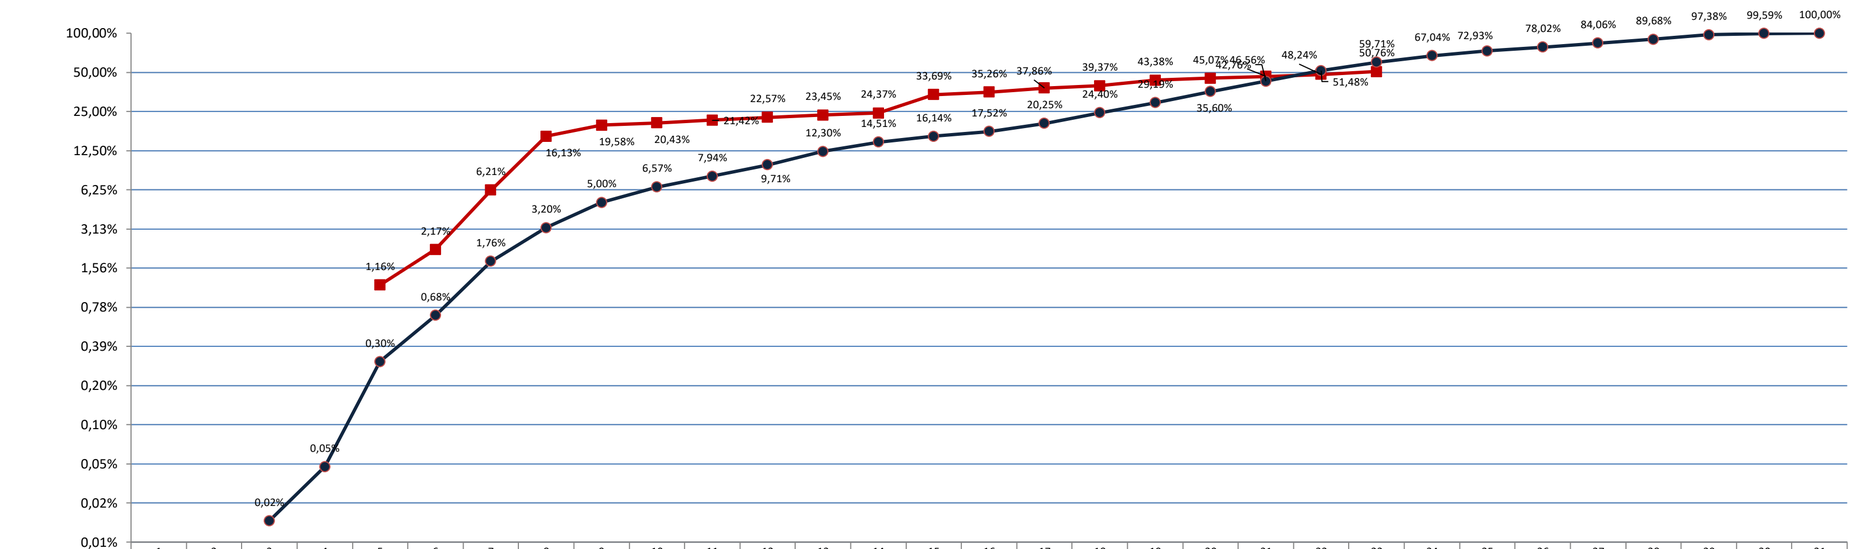

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
REAL EJECUTADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,16%	2,17%	6,21%	16,13%	19,58%	20,43%	21,42%	22,57%	23,45%	24,37%	33,69%	35,26%	37,86%	39,37%	43,38%	45,07%	46,56%	48,24%	50,76%								
PROGRAMADO	0,00%	0,00%	0,02%	0,05%	0,30%	0,68%	1,76%	3,20%	5,00%	6,57%	7,94%	9,71%	12,30%	14,51%	16,14%	17,52%	20,25%	24,40%	29,19%	35,60%	42,76%	51,48%	59,71%	67,04%	72,93%	78,02%	84,06%	89,68%	97,38%	99,59%	100,00%

SEGUIMIENTO AL FLUJO DE OBRA EMITIDO POR EL CONTRATISTA - RESPONDE A LA PROGRAMACION DE OBRA

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO RODOLFO LLINAS - SEDE B (ANEXO 1 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: El contratista de obra realizó actividades de instalación de manto asfaltico en la cubierta del shut de basuras e instalación de concreto de 3000 psi para la columna del cerramiento. Adicional inició actividades de instalación de ladrillo para el antepecho del cerramiento perimetral.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se inició la instalación del manto asfáltico en el frente de obra. Desde el enfoque de SST. Se recomienda garantizar que el personal cumpla con el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP)
Adicionalmente, se sugiere:
•Delimitar y señalizar la zona de trabajo para evitar ingreso de personal no autorizado.
•Mantener orden y limpieza en el área de instalación para prevenir caídas o tropiezos.
•Verificar las condiciones de las herramientas y equipos antes y durante su uso.
•Asegurar ventilación adecuada y control del humo o vapores generados por el asfalto caliente. En términos generales, se evidencia la ejecución de la actividad conforme a protocolos de SST, recomendándose supervisión continua para minimizar riesgos de accidentes o incidentes.

3. Aspectos de calidad: Las actividades contractuales se han venido desarrollando conforme a los parámetros de calidad, estipulados dentro de las especificaciones técnicas.

4. Programación de obra: Según el cronograma de obra presentado por el contratista, en esta sede se presenta un sobre avance del 30,96%. Se realizó el reajuste del porcentaje programado y ejecutado en base a los balances presentados por el contratista de obra.

4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A.

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.

5. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, cuentan con el cerramiento perimetral y señalización adecuado, se evidencia RCD acopiado cerca a los individuos arbóreos sin la protección adecuada, se recomienda jornada de orden y aseo, disponer adecuadamente el material a un centro de aprovechamiento.

6. Generales: Dentro del periodo establecido se lleva a cabo al comité de obra No. 12 solicitado por la supervisión, este cuenta con la participación del Supervisor del contrato, la Interventoría y el Contratista de Obra (se levanta Acta de reunión). Se le solicita al contratista de obra entregar los documentos modificados (cronograma de obra, flujo de inversión) respecto al adicional que tuvo el contrato de obra y los balances presentados.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO SIMÓN BOLIVAR - SEDE A (ANEXO 2 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Durante la presente semana se realizaron las siguientes actividades:
Pañete.
Subbase para dados de aula modular
Instalacion de perfileria para la cubierta.
Armado de dados aula modular
Inicio de fundida de dados aula modular
Pintura perfileria metalica

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenciaron actividades de corte de varilla para la elaboración de flejes. Se valida que el personal se encuentra debidamente aprobado para el desarrollo de la actividad y cuenta con los EPP requeridos. No obstante, se recomienda realizar jornadas de orden y aseo en el frente de trabajo, así como establecer un único punto de acopio para el material producto de excavación, con el fin de prevenir condiciones inseguras que puedan generar incidentes o accidentes.

3. Aspectos de calidad: Las actividades contractuales se han venido desarrollando conforme a los parámetros de calidad, estipulados dentro de las especificaciones técnicas.

4. Programación de obra: El contratista de obra cuenta con un avance por debajo de lo programado del 3,54%.

4.1 Actividades programadas NO ejecutadas:
16.1.18SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm y 40 mm. PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACIÓN CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEGÚN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).
15.1.12 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÓDULO AULA ESCOLAR TIPO (S/DISEÑO - VER FICHA TECNICA Y PLANOS), EN ESTRUCTURA METÁLICA DESMONTABLE, ENSAMBLADA POR MEDIOS MECÁNICOS (TORNILLERÍA, PERNOS), CUBIERTA A UN AGUA Y ÁREA DE CIRCULACIÓN. INCLUYE PUERTAS, VENTANAS, ACABADOS, ILUMINACIÓN, REDES ELÉCTRICAS E HIDROSANITARIAS. AREA 52 M2
5.1.26 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN. Actividad programada hasta el 10 de marzo
5.1.29 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1-1/2". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN. Actividad programada hasta el 13 de marzo
5.1.5 SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.
7.2.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE PULIDO Y BRILLADO
12.2.4 PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)
Las actividades programadas NO ejecutadas corresponden a las aulas que se encuentran descubiertas, por lo que se recomienda la instalacion de la cubierta, para posteriormente ejecutar las actividades electricas y de pintura de dichas aulas. De igual manera se aclara que el porcentaje de retraso corresponde en su mayoria a el aula modular.

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.

5. Ambiental: se realizó recorrido en el frente, se reportó que se usa los puntos ecológicos dentro de la institución, se evidencia mezcla de concreto en batea metálica, se encuentra material y residuos debidamente acopiados y alejados de sumideros, las zonas verdes se encuentran libres, se recomienda disponer adecuadamente los residuos, garantizar jornadas de orden y aseo periódicamente e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental.

6. Generales: Dentro del periodo establecido se lleva a cabo al comité de obra No. 12 solicitado por la supervisión, este cuenta con la participación del Supervisor del contrato, la Interventoría y el Contratista de Obra (se levanta Acta de reunión). Se le solicita al contratista de obra entregar los documentos modificados (cronograma de obra, flujo de inversión) respecto al adicional que tuvo el contrato de obra y los balances presentados. Debido a temas de recursos , se establece que para la sede, no se ejecutarán las actividades contempladas para el tanque. En el comité de obra realizado el 13 de marzo, se establecieron los siguientes compromisos: el contratista informó que la cubierta llegaría el mismo 13 de marzo y que su instalación se realizaría durante la semana siguiente. Así mismo, manifestó que actualmente se encuentran adelantando en taller la fabricación del aula modular. Adicionalmente, respecto a esta aula modular, el apoyo a la supervisión solicitó la realización de un ejercicio financiero que permita verificar y analizar los precios y valores asociados a su ejecución.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA **CO1.PCCNTR.8155350**

INFORME SEMANAL No 23 **LOTE COP No 18**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 23 (Consecutivo) **DEL** 9/3/2026 (dd-mm-aa) **AL** 15/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 163 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO MAGDALENA ORTEGA - SEDE A (ANEXO 3 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: El contratista realizó actividades de suministro e instalación de relleno en recebo debidamente compactado para las zona del sendero y shut de basuras.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenció la continuidad de las actividades de compactación de recebo en el sendero peatonal que conduce al cuarto de almacenamiento de basuras. Desde el enfoque de SST, se verificó que el personal presente en el frente de trabajo cuenta con los EPP adecuados para el desarrollo de la actividad. Asimismo, se evidenció la realización de inspecciones preoperacionales a las herramientas manuales y a la compactadora, lo cual permite identificar de manera anticipada posibles fallas mecánicas o condiciones inseguras antes del inicio de la operación, contribuyendo a la prevención de incidentes o accidentes laborales. La actividad evaluada presenta riesgos asociados principalmente a exposición a vibraciones, ruido, golpes por manejo de herramientas, posibles atrapamientos con equipos y tránsito de personal en el área de intervención.

3. Aspectos de calidad: Las actividades contractuales se han venido desarrollando conforme a los parámetros de calidad, estipulados dentro de las especificaciones técnicas.

4. Programación de obra: El contratista de obra cuenta con un avance por encima de lo programdo del 58,31%, Se realizó el reajuste del porcentaje programado y ejecutado en base a los balances presentados por el contratista de obra.

4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A.

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.

5. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, cuenta con cerramiento en buen estado y señalizado, se realizó la disposición de los residuos de excavación total, se acopia y protege adecuadamente el material que ingreso al igual se recomendo al contratista jornadas de orden y aseo periodicamente, e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA).

6. Generales: Dentro del periodo establecido se lleva a cabo al comité de obra No. 12 solicitado por la supervisión, este cuenta con la participación del Supervisor del contrato, la Interventoría y el Contratista de Obra (se levanta Acta de reunión). Se le solicita al contratista de obra entregar los documentos modificados (cronograma de obra, flujo de inversión) respecto al adicional que tuvo el contrato de obra y los balances presentados.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO JORGE GAITAN CORTES - SEDE B (ANEXO 4 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Durante la presente semana se realizaron las siguientes actividades:
- Se aplico acomodo la ultima capa de subbase para bombeo de la cancha, tambien fue el equipo de topografia, para corroborar los niveles y la ubicación de la cancha. Tambien se realizaron labores de pintura en la puerta del ingreso al colegio.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenció la presencia de personal realizando las actividades de pintura en la puerta de ingreso al colegio. Desde el enfoque de SST, es importante verificar que el personal cuente con los EPP adecuados. Asimismo, se recomienda mantener las medidas de ventilación adecuada en el área de trabajo, delimitar la zona para evitar la interacción con estudiantes y visitantes, y garantizar la correcta disposición de materiales y herramientas, minimizando el riesgo de resbalones, caídas o contacto con sustancias químicas.

3. Aspectos de calidad: Las actividades contractuales se han venido desarrollando conforme a los parámetros de calidad, estipulados dentro de las especificaciones técnicas. Se realizo ensayo de densidades con cono de arena.

4. Programación de obra: Para el presente informe se tuvieron en cuenta algunos ítems adicionales que habían sido ejecutados previamente, (como el geotextil), pero que no habían podido considerarse en informes anteriores debido a que no se encontraban incluidos en el presupuesto. Al incorporarlos en el balance para este periodo, se refleja un mayor avance en la ejecución de la obra.

4.1. Actividades programadas no ejecutadas:
16.1.2 CANAL EN PVC AMAZONAS O EQUIVALENTE, INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) programado del 9 al 10 de marzo
16.1.3 BAJANTE EN PVC BLANCO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) programado del 11 al 12 de marzo
16.1.7 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA UPVC 2,0 MM TIPO ECOROOF O SIMILAR (INCLUIDO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, CABALLETE, ANDAMIO CERTIFICADO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS) programado al 9 de marzo
8.1.2 MURO EN DRYWALL DOBLE CARA E= 10 CM, LÁMINA DE FIBROCEMENTO RESISTENTE A LA HUMEDAD 1/2" INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN.
16.1.11 SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN PERFIL ESTRUCTURAL EN C PARA CUBIERTA, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE EN UNA CUANTIA DE 11 KG/M2
Las actividades programadas no ejecutadas corresponden a las relacionadas con el Shut

5. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, se evidencia el cerramiento adecuado, se evidencia presencia de material de construcción en las zonas verdes por lo que si se llega a evidenciar algún daño se debe recuperar esta área, se recomendó al contratista realizar una jornada de aseo e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA).

6. Generales: Dentro del periodo establecido se lleva a cabo al comité de obra No. 12 solicitado por la supervisión, este cuenta con la participación del Supervisor del contrato, la Interventoría y el Contratista de Obra (se levanta Acta de reunión). Se le solicita al contratista de obra entregar los documentos modificados (cronograma de obra, flujo de inversión) respecto al adicional que tuvo el contrato de obra y los balances presentados. En el comité realizado, el contratista se comprometió a ejecutar la fundida de la cancha durante la próxima semana, entre miércoles y jueves. Así mismo, se indicó que debe realizarse la corrección de la pintura de la puerta, en el marco del mantenimiento entregado. Adicionalmente, respecto al shut, se planteó la posibilidad de manejar dos tonos de pintura para integrarlo con el entorno, considerando el uso de un tono gris.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO TABORA - SEDE A (ANEXO 5 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: El contratista realizó actividades de instalación de adoquin en su respectiva cama de arena.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenciaron actividades de trasiego de material en el frente de obra. Desde la perspectiva de SST, se recomienda que el personal haga uso adecuado de los EPP, especialmente el casco de seguridad, con el fin de prevenir lesiones por golpes o caída de objetos durante la manipulación y traslado de los materiales. Adicionalmente, es pertinente mantener las prácticas de orden y aseo en el área de trabajo, señalización de las zonas de trasiego y supervisión constante para minimizar riesgos y garantizar la seguridad del personal.

3. Aspectos de calidad: Las actividades contractuales se han venido desarrollando conforme a los parámetros de calidad, estipulados dentro de las especificaciones técnicas.

4. Programación de obra: Según el cronograma de obra presentado por el contratista, en esta sede se presenta un sobre avance del 12,93%. Se realizó el reajuste del porcentaje programado y ejecutado en base a los balances presentados por el contratista de obra.

4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A.

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.

5. Ambiental: El cerramiento en algunos tramos se encuentra en mal estado, se encuentra materiales y RCD en el frente acopiados, pero debe contar con la debida protección y señalización, por lo que se realizó un llamado de atención, las zonas verdes se van a endurecer en el frente, por lo que se recomienda garantizar jornadas de orden y aseo periódicamente, disponer adecuadamente e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA).

6. Generales: Dentro del periodo establecido se lleva a cabo al comité de obra No. 12 solicitado por la supervisión, este cuenta con la participación del Supervisor del contrato, la Interventoría y el Contratista de Obra (se levanta Acta de reunión). Se le solicita al contratista de obra entregar los documentos modificados (cronograma de obra, flujo de inversión) respecto al adicional que tuvo el contrato de obra y los balances presentados.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE A (ANEXO 6 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: El contratista de obra realizó actividades de obra tales como: desmonte e instalación de enchape, preparación de filos en las divisiones en mampostería de los baños e instalación de pañete en muros exteriores e interiores de los baños.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidencia la ejecución de actividades de compactación de recebo en el frente de obra, a actividad presenta riesgos asociados principalmente a vibraciones, atrapamientos, golpes por objetos. Desde el enfoque de SST, se observa que el personal cuenta con los EPP requeridos para el desarrollo de la actividad. Adicionalmente, se evidencia la realización de inspecciones preoperacionales a las herramientas y a la compactadora utilizada en el proceso, lo cual constituye una medida preventiva importante para identificar posibles fallas mecánicas o condiciones inseguras antes del inicio de la operación. En términos generales, se evidencia cumplimiento de las medidas básicas de control en SST para la actividad observada; no obstante, se recomienda mantener el seguimiento permanente a las inspecciones preoperacionales, el uso adecuado de los EPP y la señalización del área de trabajo para prevenir incidentes durante el desarrollo de las actividades.

3. Aspectos de calidad: Las actividades contractuales se han venido desarrollando conforme a los parámetros de calidad, estipulados dentro de las especificaciones técnicas.

4. Programación de obra: Según el cronograma de obra presentado por el contratista, en esta sede se presenta un sobre avance del 4,86%. Se realizó el reajuste del porcentaje programado y ejecutado en base a los balances presentados por el contratista de obra.

4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A.

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.

5. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, cuentan con el cerramiento perimetral adecuado con señalización, se reporta RCD en lonas y acopiados (volumen alto), por lo que se realizó un llamado de atención para que realicen la debida disposición ya que cuentan con la cantidad mínima, se evidencia los sanitarios anteriormente desmontados sin cubrir por lo que se recomienda al contratista realizar una jornada de orden y aseo e implementar todas las especificaciones respectivas al Plan de Manejo Ambiental (PMA). Teniendo en cuenta el radicado N.2025EE296403 y el acta de visita MAR-20250903-00735 se da autorización a la tala de 16 individuos arbóreos en esta institución, ya se realizó la tala a quince (15) árboles en la zona pero queda uno (1) para terminar esta actividad por lo que se recomienda realizar el procedimiento adecuadamente, disponer todos los residuos vegetales y al finalizar la actividad silvicultural presentar el informe final con registro fotográfico al igual se debe complementar el anexo PM04-PR29-F8 para presentar ante la secretaria distrital de ambiente (SDA)

6. Generales: Dentro del periodo establecido se lleva a cabo al comité de obra No. 12 solicitado por la supervisión, este cuenta con la participación del Supervisor del contrato, la Interventoría y el Contratista de Obra (se levanta Acta de reunión). Se le solicita al contratista de obra entregar los documentos modificados (cronograma de obra, flujo de inversión) respecto al adicional que tuvo el contrato de obra y los balances presentados.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA **CO1.PCCNTR.8155350**

INFORME SEMANAL No 23 **LOTE COP No 18**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 23 (Consecutivo) **DEL** 9/3/2026 (dd-mm-aa) **AL** 15/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 163 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE C (ANEXO 7 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: El contratista de obra realizó actividades de pañete y estuco en los filos de las ventanas del aula de música.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenciaron actividades de pañete en los filos de las puertas y ventanas del aula de música. Desde el enfoque de SST, se recomienda que el personal utilice de manera adecuada el casco de seguridad, con el fin de prevenir posibles golpes o lesiones durante la ejecución de la actividad. Adicionalmente, es recomendable mantener orden y limpieza en el área de trabajo, así como la correcta disposición de herramientas y materiales, para minimizar riesgos asociados a caídas, golpes o tropiezos.

3. Aspectos de calidad: Las actividades contractuales se han venido desarrollando conforme a los parámetros de calidad, estipulados dentro de las especificaciones técnicas.

4. Programación de obra: Según el cronograma de obra presentado por el contratista, en esta sede se presenta un sobre avance del 4,02%. Se realizó el reajuste del porcentaje programado y ejecutado en base a los balances presentados por el contratista de obra.

4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A.

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.

5. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, se evidencia cerramiento en buen estado con señalización, al igual, se encuentra gran cantidad de RCD, material, por lo que se realizó un llamado de atención para que realicen la debida disposición ya que cuentan con la cantidad mínima, las tejas de asbesto embaladas debidamente acopiadas fueron dispuestas, pero se recomienda realizar una jornada de orden y aseo e implementar todas las especificaciones respectivas al Plan de Manejo Ambiental (PMA) .

6. Generales: Dentro del periodo establecido se lleva a cabo al comité de obra No. 12 solicitado por la supervisión, este cuenta con la participación del Supervisor del contrato, la Interventoría y el Contratista de Obra (se levanta Acta de reunión). Se le solicita al contratista de obra entregar los documentos modificados (cronograma de obra, flujo de inversión) respecto al adicional que tuvo el contrato de obra y los balances presentados.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA DIRECCIÓN LOCAL DE ENGATIVA (DILE) (ANEXO 8 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: El contratista NO realizó actividades de obra.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado no se evidenció la ejecución de actividades en el colegio; en consecuencia, no se generaron reportes, registros ni soportes por parte del área de SST. Así mismo, al no presentarse frentes de obra activos, no fue requerido el diligenciamiento de ATS, la realización de charlas de seguridad, ni el acompañamiento o inspecciones SST durante dicho periodo.

3. Aspectos de calidad: Las actividades contractuales se han venido desarrollando conforme a los parámetros de calidad, estipulados dentro de las especificaciones técnicas.

4. Programación de obra: Las actividades se vienen desarrollando sin ningún tipo de inconveniente, cumpliendo con el plan de trabajo expuesto ante la interventoría.

5. Ambiental: Se realiza recorrido en el frente, no se presentan residuos ni material en el frente por lo que se realizo una entrega parcial de este frente, si se llegan a realizar actividades se recomienda implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA).

6. Generales: Dentro del periodo establecido se lleva a cabo al comité de obra No. 12 solicitado por la supervisión, este cuenta con la participación del Supervisor del contrato, la Interventoría y el Contratista de Obra (se levanta Acta de reunión). Se le solicita al contratista de obra entregar los documentos modificados (cronograma de obra, flujo de inversión) respecto al adicional que tuvo el contrato de obra y los balances presentados. Se realizó la entrega de espacios (batería sanitaria de hombres) al cuerpo administrativo en conjunto con el residente de obra y apoyo a la supervisión del contrato.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO TORQUIGUA - SEDE A (ANEXO 9 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: El contratista NO realizó actividades de obra.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado no se evidenció la ejecución de actividades en el colegio; en consecuencia, no se generaron reportes, registros ni soportes por parte del área de SST. Así mismo, al no presentarse frentes de obra activos, no fue requerido el diligenciamiento de ATS, la realización de charlas de seguridad, ni el acompañamiento o inspecciones SST durante dicho periodo.

3. Aspectos de calidad: Las actividades contractuales se han venido desarrollando conforme a los parámetros de calidad, estipulados dentro de las especificaciones técnicas.

4. Programación de obra: Las actividades se vienen desarrollando sin ningún tipo de inconveniente, cumpliendo con el plan de trabajo expuesto ante la interventoría.

5. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, se evidencia el cerramiento adecuado, no se han realizado actividades esta semana, se recomienda implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental.

6. Generales: Dentro del periodo establecido se lleva a cabo al comité de obra No. 12 solicitado por la supervisión, este cuenta con la participación del Supervisor del contrato, la Interventoría y el Contratista de Obra (se levanta Acta de reunión). Se le solicita al contratista de obra entregar los documentos modificados (cronograma de obra, flujo de inversión) respecto al adicional que tuvo el contrato de obra y los balances presentados.

FIRMAS

ARQ. LORENA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
DIRECTORA DE INTERVENTORÍA

ING. CARLOS MAURICIO MONTENEGRO BAUTISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

ARQ. PAULA ANDREA MARTINEZ MORALES
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

ING. LUIS EMIRO BLANCO MORENO
APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

KATERIN CAROLINA NUNEZ OSORIO
PROFESIONAL SST

ING.CHRISTIAN FELIPE RODRIGUEZ BELTRAN
ESPECIALISTA AMBIENTAL

ING.CHRISTIAN FABIAN BARRERA DONCEL
PROFESIONAL COSTOS Y PRESUPUESTOS

FECHA:	16/03/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	INFORME APOYO A LA SUPERVISION
DIAS RESTANTES	48 Días		GRUPO 18
ESTADO GENERAL DEL PROYECTO			
CORTE DEL INFORME:	CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO EDUCATIVO 25	
15 de marzo de 2026	CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:	PROBINTEC S.A.S	

FECHAS		
DATOS:	INTERVENTORIA	OBRA
CONTRATO	CO1.PCCNTR.8168931	CO1.PCCNTR.8155350
INICIO	3 de octubre de 2025	3 de octubre de 2025
TERMINACION INICIAL	2 de mayo de 2026	2 de mayo de 2026
TERMINACION FINAL	2 de mayo de 2026	2 de mayo de 2026

PLAZOS EN DIAS		
ETAPA:	INTERVENTORIA	OBRA
INICIAL	211	211
SUSPENSIONES		
PRÓRROGAS		
TOTAL	211	211

VALOR CONTRATO		
ETAPA:	INTERVENTORIA	OBRA
INICIAL	$ 796.278.928	$ 2.551.797.666
ADICIÓNES	$ 139.026.666,00	$ 645.761.648,00
TOTAL	$ 935.305.594,00	$ 3.197.559.314,00

MODIFICACIONESDEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

MOD No	FECHA DE LA MODIFICACION	VALOR ADICION	PRORROGA (DIAS)	OTRO ASPECTO
1	26/12/2025	$ 139.026.666,00		
2				
3				
4				

MODIFICACIONESDEL CONTRATO DE OBRA

MOD No	FECHA DE LA MODIFICACION	VALOR ADICION	PRORROGA		OTRO ASPECTO
1	12/12/2025	$ 645.761.648,00			
2					
3					
4					

POLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORIA — GARANTE: SEGUROS DEL ESTADO

POLIZA	CUMPLIMIENTO DESDE			CUMPLIMIENTO HASTA			CALIDAD DEL SERVICIO DESDE			CALIDAD DEL SERVICIO HASTA			SALARIOS Y PRESTACIONES DESDE			SALARIOS Y PRESTACIONES HASTA		
400 47 994000110040	19	9	2025	3	1	2027	3	5	2026	3	5	2031	19	9	2025	3	5	2029

POLIZAS CONTRATO DE OBRA — COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

POLIZA	CUMPLIMIENTO DESDE			CUMPLIMIENTO HASTA			SALARIOS Y PRESTACIONES DESDE			SALARIOS Y PRESTACIONES HASTA			ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA DESDE			ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA HASTA		
CV-100054114	8	9	2025	3	1	2027	8	9	2025	2	5	2029	10	4	2026	2	5	2029

POLIZA	RESPONSABILIDAD CIVIL DESDE			RESPONSABILIDAD CIVIL HASTA		
CV – 100015150	8	9	2025	10	4	2026

CPF	COLEGIO	LOCALIDAD	SEDE	NOMBRE SEDE	AVANCE ANTERIOR	AVANCE ACTUAL (18/01/2026)		PROGR %	EJECUTADO VS PROG	VlrFRENTE APROBADO	VlrFRENTE A ESTE PERIODO	FECHA INICIO CRONOGRAMA	FECHA FIN CRONOGRAMA	jul-2025	jul-2025	ago-2025	ago-2025	sep-2025	sep-2025	oct-2025	oct-2025	nov-2025	nov-2025	dic-2025	dic-2025	ene-2026	ene-2026	feb-2026	feb-2026	mar-2026	mar-2026
1078	COLEGIO RODOLFO	ENGATIVA	B	BOCHICA COMPARTIR	66,35%	66,78%		35,82%		$ 183.643.811,00		21/11/2025	27/03/2026																		
1052	COLEGIO SIMON BOLIVAR	ENGATIVA	A	SIMON BOLIVAR	39,02%	50,26%		53,80%		$ 763.383.605,00		15/10/2025	24/04/2026																		
1066	COLEGIO MAGDALENA	ENGATIVA	A	MAGDALENA ORTEGA DE NARIÑO	85,81%	85,97%		27,66%		$ 296.018.724,00		10/11/2025	30/04/2026																		
1019	COLEGIO JORGE GAITAN	ENGATIVA	B	LA ESPAÑOLA	24,67%	40,52%		27,74%		$ 344.591.831,00		9/12/2025	23/04/2026																		
1001	COLEGIO TABORA (IED)	ENGATIVA	A	TABORA	63,72%	66,08%		53,15%		$ 158.125.362,00		21/11/2025	27/03/2026																		
1061	COLEGIO INSTITUTO	ENGATIVA	A	FRANCISCO JOSE DE CALDAS	21,84%	22,10%		17,24%		$ 397.128.110,00		6/11/2025	25/04/2026																		
1008	COLEGIO INSTITUTO	ENGATIVA	C	CLEMENCIA DE CAYCEDO	48,52%	49,37%		45,35%		$ 295.736.072,00		21/11/2025	26/03/2026																		
1021	COLEGIO ANTONIO VILLAVICENCIO (IED)	ENGATIVA	B	LOS LAURELES		0,00%		0,00%		$ 90.000.000																					
1079	COLEGIO ABEL	ENGATIVA	A	ABEL RODRÍGUEZ CÉSPEDES		0,00%		0%		$ 100.000.000																					
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																											
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																											
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																											
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																											
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																											
TOTAL FRENTES DE OBRA						54,44%		28,97%		$ 2.628.627.515,00	$ -																				
EMERGENCIAS ATENDIDAS DURANTE EL PERIODO																															
1057	COLEGIO LA PALESTINA (IED)	ENGATIVA	B	LA PALESTINA		100,00%		100,00%		$ 1.273.680,00																					
1061	TECNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSE DE	ENGATIVA	A	FRANCISCO JOSE DE CALDAS		100,00%		100,00%		$ 9.076.835,00																					
1001	COLEGIO TABORA (IED)	ENGATIVA	A	TABORA		100,00%		100,00%		$ 2.913.171,00																					
1020	DIRECCIÓN LOCAL DE ENGATIVA	ENGATIVA	#N/D	DIRECCIÓN LOCAL DE ENGATIVA		33,74%		0,00%		$ 38.193.723																					
1025	COLEGIO MIGUEL	ENGATIVA	A	MIGUEL ANTONIO CARO		0,00%		0,00%		$ 20.073.306																					
1073	COLEGIO TORQUIGUA (IED)	ENGATIVA	A	COLEGIO TORQUIGUA (IED)		3,26%		0,00%		$ 150.294.734																					
1061	COLEGIO INSTITUTO	ENGATIVA	A	FRANCISCO JOSE DE CALDAS		100,00%		100,00%		$ 43.248.915																					
1080	COLEGIO LUCILA RUBIO	ENGATIVA	A	LUCILA RUBIO DE LAVERDE		100,00%		100%		$ 5.658.380																					
1049	COLEGIO INSTITUTO	ENGATIVA	A	JUAN DEL CORRAL		0%		0%																							
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																											
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																											
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																											
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																											
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																											
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																											
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																											
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																											
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																											
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																											
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																											
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																											
TOTAL FRENTES DE OBRA						59,67%		55,56%		$ 270.732.744,10	$ -																				

ACUMULADO FRENTES DE OBRA


TERMINADAS	EN EJECUCION	POR INICIAR	TOTAL	VALOR
0	7	2	9	$ -
ACUMULADO EMERGENCIAS				
5	2	2	9	$ -
TOTAL				
5	9	4	18	$ -
FRENTES POR LOCALIDAD				


RELACION DE PAGOS EFECTUADOS


No ACTA OBRA	VALOR	No ACTA OBRA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR
1		12		1		12		23		34	
2		13		2		13		24		35	
3		14		3		14		25		36	
4		15		4		15		26		37	
5		16		5		16		27		38	
6		17		6		17		28		39	
7		18		7		18		29		40	
8		19		8		19		30		TOTAL INTERVENTORIA	
9		20		9		20		31			
10		TOTAL OBRA		10		21		32			
11		$ -		11		22		33		$ -	


AVANCE GENERAL

AVANCE	TECNICO	FINANCIERO	TIEMPO
	54,44%	0,00%	77,25%
PROGRAMADO	28,97%		
ATRASO	25,47%	EN EJECUCION	
FECHA APROBACION CRONOGRAMA			

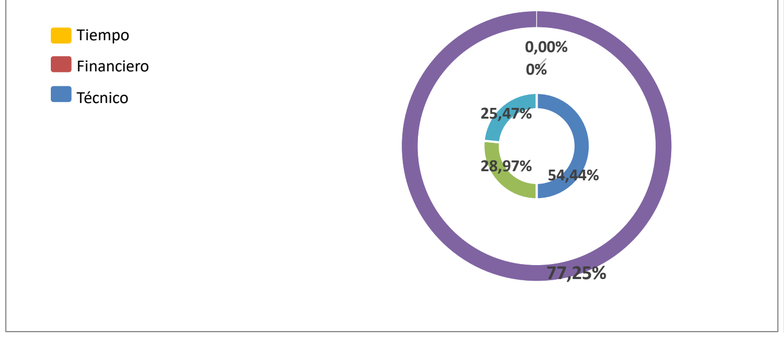

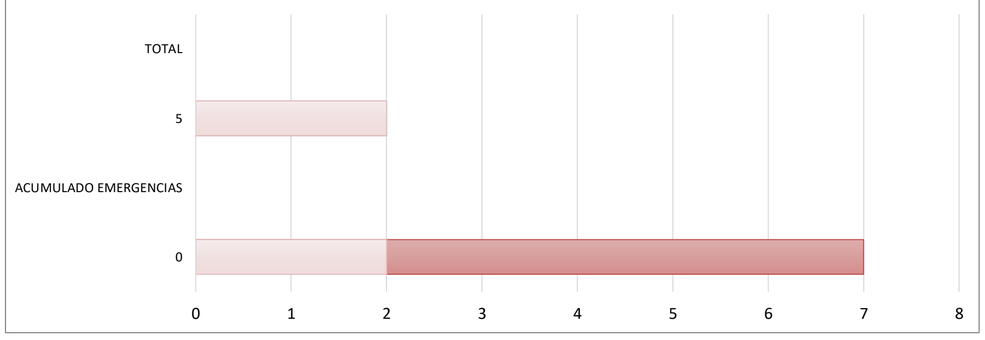

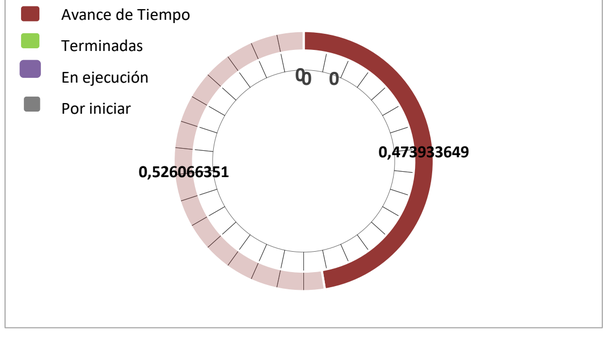

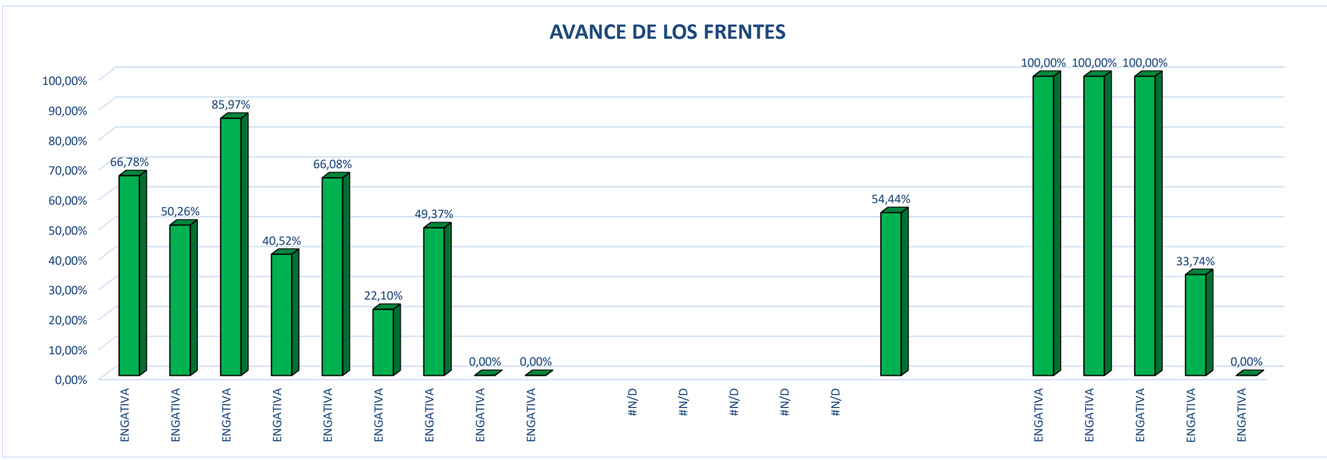

OBSERVACIONES:

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 23 **LOTE COP No 18**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 23 (Consecutivo) **DEL** 9/3/2026 (dd-mm-aa) **AL** 15/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 163 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ANEXO 1 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO RODOLFO LLINAS - SEDE B



Suministro e instalación de concreto de 3000 psi para columna - Cerramiento perimetral.



Suministro e instalación de concreto de 3000 psi para columna - Cerramiento perimetral.



Suministro e instalación de concreto de 3000 psi para columna - Cerramiento perimetral.



Suministro e instalación de concreto de 3000 psi para columna - Cerramiento perimetral.



Instalación de manto asfaltico - Cubierta shut de basuras.



Instalación de manto asfaltico - Cubierta shut de basuras.

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 23 **LOTE COP No 18**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 23 (Consecutivo) **DEL** 9/3/2026 (dd-mm-aa) **AL** 15/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 163 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ANEXO 1 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO RODOLFO LLINAS - SEDE B



Instalación de manto asfaltico - Cubierta shut de basuras.



Instalación de manto asfaltico - Cubierta shut de basuras.



Instalación de ladrillo para muro de antepecho - Cerramiento perimetral.



Instalación de ladrillo para muro de antepecho - Cerramiento perimetral.

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 23 **LOTE COP No 18**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 23 (Consecutivo) **DEL** 9/3/2026 (dd-mm-aa) **AL** 15/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 163 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ANEXO 2 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO SIMÓN BOLIVAR - SEDE A



Excavacion para dados de aula modular



Perfiles metalicos soporte de cubierta y pañetes



Armado de dados



Figurado de varilla



Fundicion de dados



Fundicion de dados

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 23 **LOTE COP No 18**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 23 (Consecutivo) **DEL** 9/3/2026 (dd-mm-aa) **AL** 15/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 163 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ANEXO 3 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO MAGDALENA ORTEGA - SEDE A



Compactación de recebo - Sendero peatonal.



Compactación de recebo - Sendero peatonal.



Compactación de recebo - Sendero peatonal.



Compactación de recebo - Sendero peatonal.



Compactación de recebo - Sendero peatonal.



Compactación de recebo - Sendero peatonal.

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 23 **LOTE COP No 18**


PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


SEMANA No. 23 (Consecutivo) **DEL** 9/3/2026 (dd-mm-aa) **AL** 15/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 163 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18


ANEXO 4 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO JORGE GAITAN CORTES - SEDE B

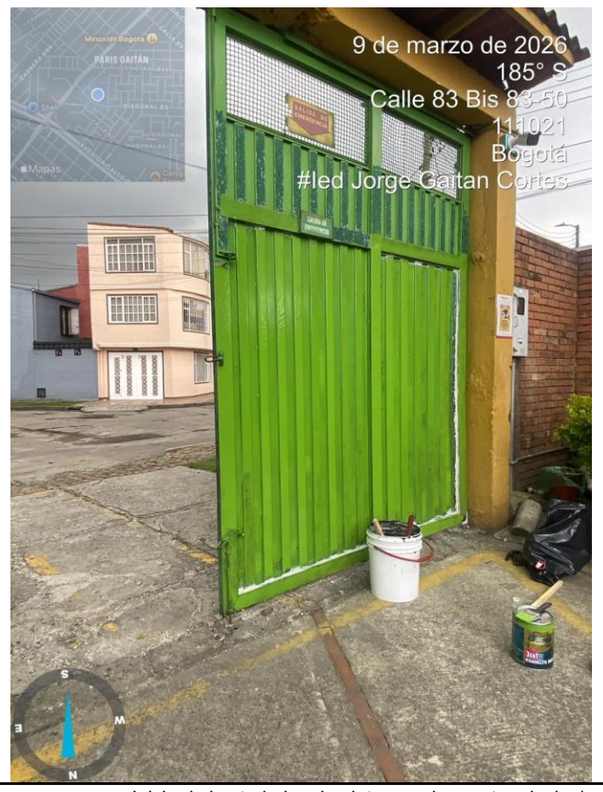

Inicio de los trabajos de pintura en la puerta principal.

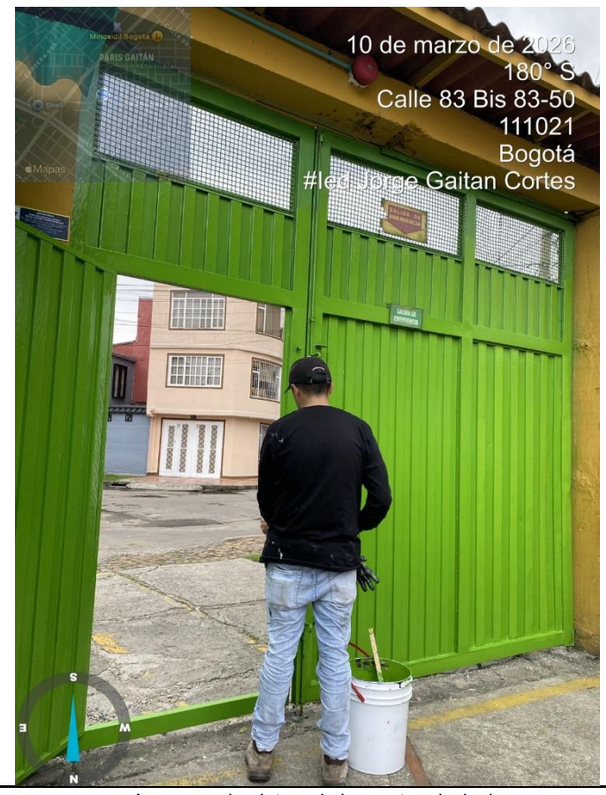

Avance en la pintura de la puerta principal.

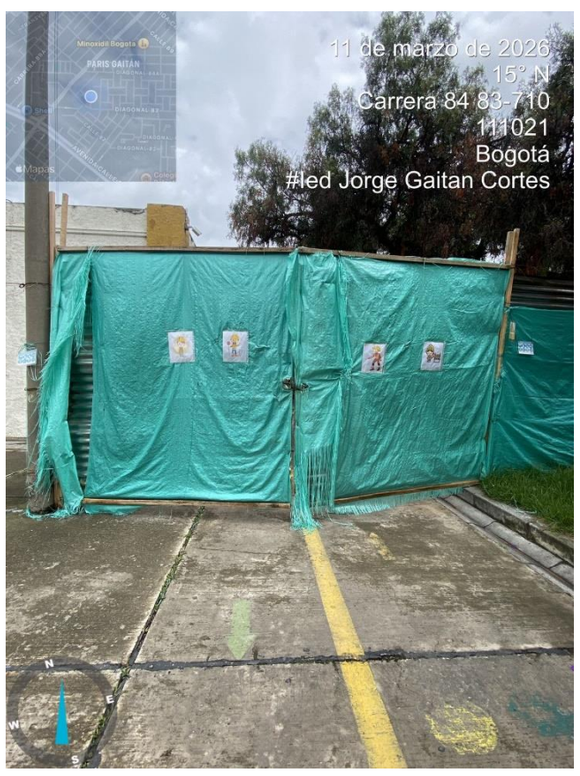

Vista general del espacio sin actividades ejecutadas en la obra.



Vista general del espacio sin actividades ejecutadas en la obra.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 23 **LOTE COP No 18**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 23 (Consecutivo) **DEL** 9/3/2026 (dd-mm-aa) **AL** 15/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 163 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ANEXO 5 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO TABORA - SEDE A



Instalación de cama de arena - Zona lateral izquierda de la cancha.



Instalación de cama de arena - Zona lateral izquierda de la cancha.



Instalación de cama de arena - Zona lateral izquierda de la cancha.



Instalación de cama de arena - Zona lateral izquierda de la cancha.



Instalación de cama de arena - Zona lateral izquierda de la cancha.



Instalación de cama de arena - Zona lateral izquierda de la cancha.

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 23 | **LOTE COP No 18**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 23 (Consecutivo) **DEL** 9/3/2026 (dd-mm-aa) **AL** 15/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 163 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ANEXO 5 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO TABORA - SEDE A



Instalación de adoquin - Zona lateral izquierda de la cancha.



Instalación de adoquin - Zona lateral izquierda de la cancha.

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 23 **LOTE COP No 18**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 23 (Consecutivo) **DEL** 9/3/2026 (dd-mm-aa) **AL** 15/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 163 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ANEXO 6 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE A



Instalación de enchape - Zona baños.



Instalación de enchape - Zona baños.



Instalación de enchape - Zona baños.



Instalación de enchape - Zona baños.



Instalación de pañete muros interiores - Zona baños.



Instalación de pañete muros interiores - Zona baños.

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 23 **LOTE COP No 18**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 23 (Consecutivo) **DEL** 9/3/2026 (dd-mm-aa) **AL** 15/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 163 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ANEXO 6 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE A



Instalación de pañete muros interiores - Zona baños.



Instalación de pañete muros interiores - Zona baños.



Instalación de pañete muros exteriores - Zona baños.



Instalación de pañete muros exteriores - Zona baños.



Instalación de enchape en la pileta exterior - zona de baños.



Instalación de pañete muros internos - Zona baños.

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 23 **LOTE COP No 18**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 23 (Consecutivo) **DEL** 9/3/2026 (dd-mm-aa) **AL** 15/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 163 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ANEXO 7 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE C



Instalación de pañete en filos de marco para puerta - Aula de música.



Instalación de pañete en filos de marco para puerta - Aula de música.



Instalación de pañete en filos de marco para puerta - Aula de música.



Instalación de pañete en filos de ventana - Aula de música.



Instalación de pañete en filos de ventana - Aula de música.



Instalación de pañete en filos de ventana - Aula de música.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 23 **LOTE COP No 18**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 23 (Consecutivo) **DEL** 9/3/2026 (dd-mm-aa) **AL** 15/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 163 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ANEXO 7 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE C



Estuco para muros internos del aula de música.



Pintura para muros internos del aula de música.
